CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

CONTRATO X CONVENIO ☐

Proyecto relacionado en el POAI (S): EJECUTAR ESTUDIOS Y ACCIONES PARA EL MONITOREO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE (INCLUYENDO RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL), LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RUIDO Y PLAN DE DESCONTAMINACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) EN LOS TERRITORIOS ASIGNADOS, ASÍ COMO LA OPERACIÓN FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAR CVS.

LOCALIZACIÓN: Todos los municipios del departamento de Córdoba Vereda: NO APLICA

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 07 de abril a 22 de junio de 2026

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL
DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	**026 de 2026**
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	**CONSULTORÍA**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	31 DE MARZO DE 2026
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS REGIONES COLOMBIANAS - FUNSOSTENIBLE
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS DAVID MONTAÑO ORTIZ
OBJETO:	EJECUTAR ESTUDIOS Y ACCIONES PARA EL MONITOREO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE (INCLUYENDO RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL), LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RUIDO Y PLAN DE DESCONTAMINACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) EN LOS TERRITORIOS ASIGNADOS, ASÍ COMO LA OPERACIÓN FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAR CVS.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
CVS		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($1.442.174.180,00)
ANTICIPO (30%):	Si (X) No___ Valor: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($432.652.254)
PLAZO:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	07 DE DICIEMBRE DE 2026

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NO APLICA	NO APLICAS
	Reinicio No. 1	**NO APLICA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NO APLICA**		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	*NO APLICA*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	NO APLICA		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	correspondenciacrp@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**53-44-101044191**			**ANEXO No 1**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	SÍ	31/03/2026	15/06/2027	$ 288.434.836,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SÍ	31/03/2026	15/12/2029	$ 432.652.254,00
Calidad del servicio	SÍ	31/03/2026	15/12/2028	$ 288.434.836,00

Powered by CamScanner

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SI	31/03/2026	15/06/2027	$ 144.217.418,00
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	SI	31/03/2026	15/12/2026	$ 525.271.500,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

NO SE REALIZARON REQUERIMIENTO Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA PERIODO	CANT EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACTIVIDAD
1	Mantenimiento de estaciones semiautomáticas del SVCA del Alto San Jorge (son 2 Modelo PQ 200). Incluye cambio de filtros, cambio o reparación de elementos electrónicos, adecuación de bombas de vacío, y demás actividades necesarias para el óptimo funcionamiento.	Estación	2	2	2	100%
2	Mantenimiento de estaciones automáticas del SVCA del Alto San Jorge (son 4 Modelo T640). Incluye cambio o reparación de elementos electrónicos y mecánicos, adecuación de bombas de vacío, y demás actividades necesarias para el óptimo funcionamiento.	Estación	4	4	4	100%
3	Calibración de equipos de medición de olores ofensivos ACRULOG PPM No. V-2361910-V1	Equipo	3	3	3	100%
4	Logística para la desmantelación de SVCA del municipio de Montería	Estación	4	4	4	100%
5	Toma de muestras de material particulado PM10, en campaña de monitoreo de la calidad del aire en el alto San Jorge. Monitoreo de material particulado PM10 por 24 horas durante 18 días	Muestras	180	0	0	0%

Powered by CamScanner

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA PERIODO	CANT EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACTIVIDAD
	seguidos en los sitios definidos en el diseño del SVCA del Alto San Jorge (son 10 sitios). Embalaje (cadena de custodia), envío a laboratorio certificado por el IDEAM y procesamiento de datos.					
6	Toma de muestras de material particulado PM2.5, en campaña de monitoreo de la calidad del aire en el alto San Jorge. Monitoreo de material particulado PM2.5 por 24 horas durante 18 días seguidos en los sitios definidos en el diseño del SVCA del Alto San Jorge (son 10 sitios) Embalaje (cadena de custodia), envío a laboratorio certificado por el IDEAM y procesamiento de datos	Muestras	180	0	0	0%
7	Toma de muestras con equipos automáticos de Dióxido de azufre (S02), Dióxido de Nitrógeno (N02), Ozono (O3), Monóxido de Carbono (CO), en campaña de monitoreo de la calidad del aire en el alto San Jorge. (10 puntos x 18 días)	Muestras	180	0	0	0%
8	Medición de ruido ambiental en jornada diurna y nocturna para la elaboración del mapa de ruido en el departamento de Córdoba	Puntos	32	0	0	0%
9	Modelación acústica utilizando sotfware soundPLAN	Documento	1	0	0	0%
10	Jornada de medición de ruido en el departamento de Córdoba de acuerdo a especificaciones técnicas, zonas-puntos, entrega de análisis	Puntos	30	0	0	0%
11	Plan de descontaminación de ruido en el departamento de Córdoba	Documento	1	0	0	0%

Powered by CamScanner

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA PERIODO	CANT EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACTIVIDAD
12	Campaña de monitoreo contaminantes criterio Montería MP2,5 (24horas); NO2 Automático; CO2 (rack); CO (1hora); O3 (automático) * 18 días continuos, por 24 horas en los sitios definidos en SVCA de Montería (4 puntos), conforme lo establecido en el protocolo para monitoreo de aire. Incluye embalaje (cadena de custodia), envío a laboratorio certificado por el IDEAM y procesamiento de datos. Incluye informe.	Muestras	72	0	0	0%
13	Seguimiento y control a establecimientos del sector salud, estaciones de servicio (EDS) y automotriz en el marco del Plan Departamental de Residuos Peligrosos (RESPEL)	Visitas	100	0	0	0%

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
1	Mantenimiento de estaciones semiautomáticas del SVCA del Alto San Jorge (son 2 Modelo PQ 200).	Informe de mantenimiento	100%
2	Mantenimiento de estaciones automáticas del SVCA del Alto San Jorge (son 4 Modelo T640)	Informe de mantenimiento	100%
3	Logística para la desmantelación de SVCA del municipio de Montería	Informe del desmantelamiento del SVCA de Montería	100%
4	Calibración de equipos de medición de olores ofensivos ACRULOG PPM No. V-2361910-V1	Calibración de tres equipos ACRULOG – Olores Ofensivos	100%
5	Toma de muestras e informe de material particulado PM10, en	Informe de la campaña de monitoreo	0%

Powered by CamScanner

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
	campaña de monitoreo de la calidad del aire en el alto San Jorge. Monitoreo de material particulado PM10 por 24 horas durante 18 días seguidos en los sitios definidos en el diseño del SVCA del Alto San Jorge Campaña PM10, por 24 horas durante 18 días en los sitios definidos en el diseño del SVCA alto San Jorge.		
6	Toma de muestras e informe de material particulado PM2.5, en campaña de monitoreo de la calidad del aire en el alto San Jorge. Monitoreo de material particulado PM2.5 por 24 horas durante 18 días seguidos en los sitios definidos en el diseño del SVCA del Alto San Jorge	Informe de la campaña de monitoreo	0%
7	Toma de muestras con equipos automáticos de Dióxido de azufre (S02), Dióxido de Nitrógeno (N02), Ozono (O3), Monóxido de Carbono (CO), en campaña de monitoreo de la calidad del aire en el alto San Jorge. (10 puntos x 18 días) (Informe y análisis de los resultados)	Informe de la campaña de monitoreo	0%
8	Campaña de monitoreo contaminantes criterio Montería MP2,5 (24horas); NO2 Automático; CO2 (rack); CO (1hora); O3 (automático) * 18 días continuos, por 24 horas en los sitios definidos en SVCA de Montería (4 puntos), conforme lo establecido en el protocolo para monitoreo de aire.	Informe de la campaña de monitoreo	0%

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
CVS		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
	Incluye embalaje (cadena de custodia), envío a laboratorio certificado por el IDEAM y procesamiento de datos. Incluye informe.		
9	Jornadas de medición de ruido (30) en el departamento de Córdoba de acuerdo a especificaciones técnicas, zonas-puntos, entrega de análisis e informes.	Informe de las jornadas de medición de ruido	0%
10	Seguimiento y control a establecimientos del sector salud, estaciones de servicio (EDS) y automotriz en el marco del Plan Departamental de Residuos Peligrosos (RESPEL)	Informe de seguimiento a RESPEL en el departamento de Córdoba.	0%
11	Medición de ruido ambiental en jornada diurna y nocturna para la elaboración del mapa de ruido en el departamento de Córdoba	Informe de Mapa de ruido con resultados de las mediciones realizadas.	0%
12	Modelación acústica utilizando sotfware soundPLAN	Mapa de ruido.	0%
13	Plan de descontaminación de ruido en el departamento de Córdoba	Documento Plan de Descontaminación de Ruido	0%
14	Informe final de las actividades	Informe final de las actividades del contrato 026 de 2026	0%

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES
Cronograma planteado

Powered by CamScanner


	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
CVS		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

No.	Actividades	MESES DE EJECUCIÓN							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mantenimiento de estaciones semiautomáticas del SVCA del Alto San Jorge (son 2 Modelo PQ 200).	X	X	X					
2	Mantenimiento de estaciones automáticas del SVCA del Alto San Jorge (son 4 Modelo T640)	X	X	X					
3	Logistica para la desmantelacion de SVCA del municipio de Montería	X	X	X					
4	Calibración de equipos de medición de olores ofensivos ACRULOG PPM No. V-2361910-V1	X	X	X					
5	Toma de muestras e informe de material particulado PM10, en campaña de monitoreo de la calidad del aire en el alto San Jorge. Monitoreo de material particulado PM10 por 24 horas durante 18 días seguidos en los sitios definidos en el diseño del SVCA del Alto San Jorge Campaña PM10, por 24 horas durante 18 días en los sitios definidos en el diseño del SVCA alto San Jorge.				X	X	X		
6	Toma de muestras e informe de material particulado PM2.5, en campaña de monitoreo de la calidad del aire en el alto San Jorge. Monitoreo de material particulado PM2.5 por 24 horas durante 18 días seguidos en los sitios definidos en el diseño del SVCA del Alto San Jorge				X	X	X		
7	Toma de muestras con equipos automáticos de Dióxido de azufre (S02), Dióxido de Nitrógeno (N02), Ozono (O3), Monóxido de Carbono (CO), en campaña de monitoreo de la calidad del aire en el alto San Jorge. (10 puntos x 18 días) (Informe y análisis de los resultados)				X	X	X		
8	Campaña de monitoreo contaminantes criterio Montería MP2,5 (24horas); NO2 Autómatico; CO2 (rack); CO (1hora); O3 (automático) * 18 días continuos, por 24 horas en los sitios definidos en SVCA de monteria (4 puntos), conforme lo establecido en el protocolo para monitoreo de aire. Incluye embalaje (cadena de custodia), envio a laboratorio certificado por el IDEAM y procesamiento de datos. Incluye informe.				X	X	X		
9	Jornadas de medición de ruido (30) en el departamento de Córdoba de acuerdo a especificaciones técnicas, zonas-puntos, entrega de análisis e informes.				X	X	X		
10	Seguimiento y control a establecimientos del sector salud, estaciones de servicio (EDS) y automotriz en el marco del Plan Departamental de Residuos Peligrosos (RESPEL)							X	X
11	Medición de ruido ambiental en jornada diurna y nocturna para la elaboración del mapa de ruido en el departamento de Córdoba							X	X
12	Modelación acústica utilizando sotfware soundPLAN							X	X
13	Plan de descontaminación de ruido en el departamento de Córdoba							X	X
14	Informe final de las actividades								X

La siguiente gráfica muestra el avance programado versus el avance real del contrato N°026 de 2026 celebrado entre CVS y FUNSOSTENIBLE, en este se puede observar que para el corte del 22 de junio de 2026 se tiene un avance del 40% de las actividades contratadas, cumpliendo con lo proyectado.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
CVS		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

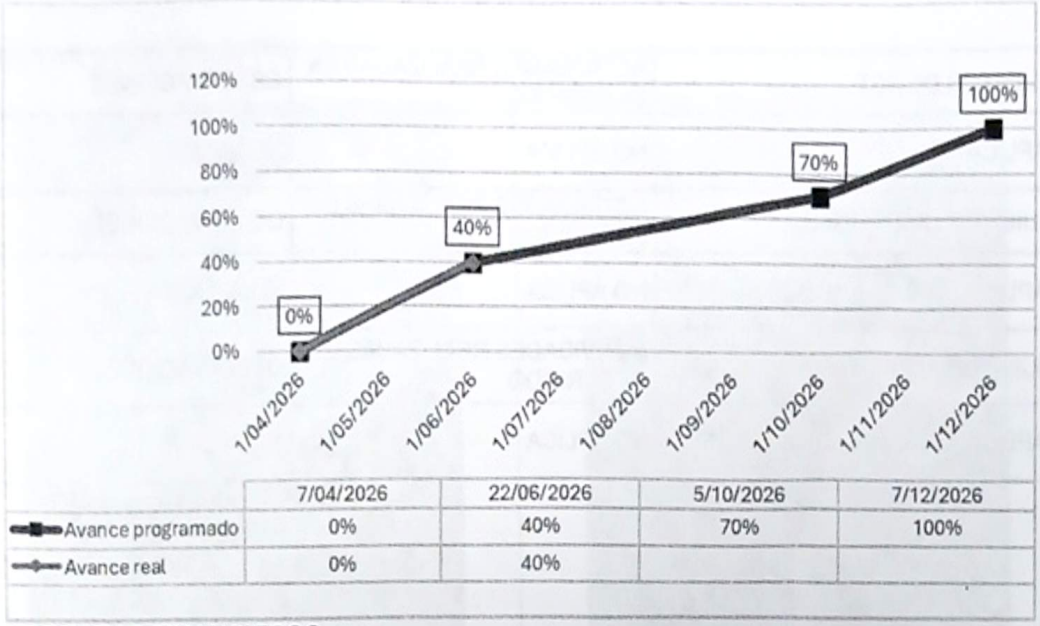

	7/04/2026	22/06/2026	5/10/2026	7/12/2026
Avance programado	0%	40%	70%	100%
Avance real	0%	40%		

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO $ 1.442.174.180,00
VALOR ANTICIPO $ 432.652.254,00
% AVANCE FINANCIERO: 40%

NCEP TO	FECHAS	VALOR	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ. ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	PRESUPUESTO NO EJECUTADO	SALDO
CRIP ÓN	31/03/26	$1.442.174.180	0	0	0	0	0	0	0	$1.442.174.180
ICIP	21/05/26	0	$432.652.254	0	0	$432.652.254	0	0	0	$1.442.174.180
TA 1	22/06/26	0	0	$576.869.672	$173.060.902	$259.591.352	$403.808.770	0	0	$865.304.508
OTAL		$1.442.174.180	$432.652.254	$576.869.672	$173.060.902	$259.591.352	$403.808.770	0	0	$865.304.508

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO
NO APLICA

Powered by CamScanner

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30 Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
REQUISITOS DE CALIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
REQUISITOS AMBIENTALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
CVS		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:10/12/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



Figura 1. Estación Puerto Libertador



Figura 2. Estado inicial Estación ubicada en el hospital de San José de Uré



Figura 3. Mantenimiento de estaciones



Figura 4. Traslado de estación de Puerto Libertador

Powered by CamScanner



Figura 5. Tarjeta electrónica oxidada estación Torno Rojo



Figura 6. Estación CESUM

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De las inspecciones de seguimiento realizadas, se concluye que:

- El contratista presenta avances en las actividades del contrato 026 de 2026, en la USB anexa se presentan los informes y evidencias.
- Se recibe a satisfacción los productos del acta parcial 1, el avance actual del contrato 026 de 2026 es del 40%.

Para constancia se firma a los 22 días del mes de junio del año 2026 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

ALBEIRO ANTONIO ARRIETA LOPEZ
SUPERVISOR CONTRATO N°026 DE 2026

22 de junio de 2026

Powered by CamScanner
