345

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
CONTRATO DE OBRA No. SPO-CO-007-2025

CONTRATANTE:	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ- EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT. CONTRATANTE:	900.304.997-8
CONTRATISTA:	OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO
IDENTIFICACION:	C.C. No. 87.219.077 de Ipiales (N)
NIT:	87.219.077-5
SUPERVISOR:	CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, Y COMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – PUTUMAYO
VALOR:	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($261.000.000).
PLAZO:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS, SIN SUPERAR 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	22 DE DICIEMBRE DE 2025

En el Municipio del Valle del Guamuez, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron en las instalaciones de la Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Valle Del Guamuez - EMSERPUVAG S.A. E.S.P., **CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA**, Gerente de EMSERPUVAG S.A. E.S.P., en calidad de **SUPERVISOR** del **Contrato de Obra No. SPO-CO-007-2025**, y el ingeniero **OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO** identificado con cedula de ciudadanía No. 87.219.077 de Ipiales (N), Identificado con Nit. No. 87.219.077-5 , actuando como **CONTRATISTA DE OBRA**, mediante el presente documento se deja constancia del **Acta Parcial No. 1.**

Mediante el presente documento se deja constancia que **EL CONTRATISTA**, en el período comprendido entre el 28 de noviembre de 2025 al 22 de diciembre de 2025, ejecutó las actividades y cantidades de obra correspondientes a las establecidas en el **Acta de Recibo Parcial No. 1 Financiera**, con la cual se certifica que los ítems allí relacionados fueron ejecutados a plena satisfacción y conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, minuta contractual, presupuesto y especificaciones técnicas:

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@emserpuvag.gov.co

~~84~~ 346

BALANCE

VALORES DEL CONTRATO	
Valor Inicial Del Contrato	$ 261.000.000,00
Valor Adicional	$ 0.00
Valor Actual Del Contrato	$ 261.000.000,00
Saldo A Favor De EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 0.00

VALORES CANCELADOS	
Anticipo Contrato	$ 0,00
Valor Según Acta De Recibo Parcial No. 1	$ 157.651.152,00
Valor Amortización del Anticipo para el Acta De Recibo Parcial No. 1	$ 78.300.000,00
Valor Ejecutado Acumulado (60.40%)	$ 157.651.152,00
Valor Real A Pagar Según Acta Parcial No. 1 Con Amortización De Anticipo	$ 79.351.152,00
Saldo Por Amortizar	$ 0,00
Saldo Por Ejecutar	$ 103.348.848,00

VALORES POR EJECUTAR	
Valor Por Ejecutar (39.60%)	$ 103.348.848,00

VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINTO CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 157.651.152,00)

El SUPERVISOR, deja constancia de la entrega del Acta de Recibo Parcial No. 1 real y conforme a las especificaciones técnicas requeridas tanto en estudios previos, invitación, minuta contractual y cada una de las actividades contractuales ejecutadas y relacionadas en el **Acta de Recibo Parcial No. 01 Financiera** anexa al presente documento.

El recibo parcial de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.

POR EL CONTRATISTA	**POR LA SUPERVISIÓN**
OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO **C.C. No. 87.219.077 de Ipiales (N)**	**R.L. CARLOS ESNEHIDER QUIROZ C.** **C.C. No. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (P)**
Nit. No. 87.219.077-5	GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P. Nit. No. 900.304.997-8

Proyectó y Reviso P.T.: EDELBERTO JEREZ NOVOA
Apoyo Profesional Emserpuvag S.A. E.S.P.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@emserpuvag.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ EMSERPUVAG S.A. E.S.P. NIT. 900.304.997-8 CERTIFICACIÓN	NÚMERO SPO-CO-007-2025 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025

EL GERENTE DE LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P." NIT: 900.304.997-8.

CERTIFICA QUE

En ejecución del Contrato de Obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025, que tiene por objeto: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, Y COMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – PUTUMAYO", presento a la Empresa el informe para el Acta de Recibo Parcial No. 1 del seguimiento y control a la ejecución de las obras correspondiente al Contrato de Obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025, durante el periodo comprendido entre el 28 de noviembre del 2025 al 22 de diciembre del 2025, y se encuentran conforme a los requisitos técnicos, administrativos, financieros, ambientales y jurídicos establecidos en el Contrato de Obra No. SPO-CO-007-2025.

De acuerdo con lo anterior y una vez revisado el Informe De Obra, El Gerente De EMSERPUVAG S.A. E.S.P., en calidad de Supervisor del Contrato de Obra, certifica que el Informe para el Acta de Recibo Parcial No. 1 del Contrato de Obra, CUMPLE con el 60.40% de ejecución física acumulada y está cumpliendo con los con los requisitos establecidos en el Contrato de Obra No. SPO-CO-007-2025.

Para constancia se firma en el Municipio de Valle del Guamuez – Putumayo, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del 2025.

Cordialmente;

R.L. CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
Nit. No. 900.304.997-8

Proyecto: EDELBERTO JEREZ NOVOA
Apoyo Profesional Emserpuvag S.A. E.S.P.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@emserpuvag.gov.co

~~86~~
348

INFORME ACTA PARCIAL No. 01, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P.

BENEFICIARIO

LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P." NIT: 900.304.997-8..

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P SIGLAS EMSERPUVAG S.A. E.S.P. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, Y COMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – PUTUMAYO".

SUPERVISOR DE CONVENIO:
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.

Compromiso de Todos...

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 01, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P.

BENEFICIARIO

LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P." NIT: 900.304.997-8..

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P SIGLAS EMSERPUVAG S.A. E.S.P. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, Y COMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – PUTUMAYO".

SUPERVISOR DE CONVENIO:
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

INFORME ACTA PARCIAL No. 01 EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P SIGLAS EMSERPUVAG S.A. E.S.P. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, Y COMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – PUTUMAYO"

BENEFICIARIO: EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P."

CONTRATO DE OBRA No. SPO-CO-007-2025 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, Y COMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – PUTUMAYO

CONTRATISTA: OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO
C.C. No. 87.219.077 Ipiales Nariño

SUPERVISOR DE CONTRATO:
CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
C.C. NO. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez.
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

SUPERVISOR DE CONVENIO:
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.

PERIODO DEL INFORME
31 DE OCTUBRE DE 2025 – 22 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DEL INFORME
22 DE DICIEMBRE DE 2025

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
2.1. Objetivo General 6
2.2. Objetivos Específicos 6
3. ASPECTO GENERAL DE LOS CONTRATOS 7
2.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
2.4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 8
2.5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
2.7. INFORMACIÓN JURÍDICA CONTRATO DE OBRA 10
2.8. CONTROL DE PÓLIZAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 11
2.9. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA. 12
3. INFORME ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 13
3.1. UBICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 13
3.2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025. 15
3.3. CANTIDADES Y ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO 23
3.4. ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS. 24
3.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 25
3.6. PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO. 28
3.7. SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES. 28
4. AVANCE CONTABLE, FINANCIERO Y EN TIEMPO 29
4.1. AVANCE CONTABLE Y FINANCIERO. 29
4.2. AVANCE EN TIEMPO CONTRATO DE OBRA. 31
4.3. AVANCE EN TIEMPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025. 31
4.3.1. AVANCE FÍSICO 31
4.3.2. AVANCE FINANCIERO 32
4.3.3. AVANCE PROGRAMACIÓN FINAL 32
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 33

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

TABLA DE TABLAS

Tabla 1 Ficha Técnica del Convenio Interadministrativo 8
Tabla 2. Ficha Técnica del Contrato de Obra 9
Tabla 3 Información Jurídica convenio interadministrativo 10
Tabla 4. Información Jurídica Contrato de Obra 10
Tabla 5. Información General Póliza Cumplimiento Del Convenio Interadministrativo Anexo 0. 11
Tabla 6. Información General Póliza Cumplimiento Del Convenio Interadministrativo Anexo 1. 11
Tabla 7. Información General De Las Pólizas Del Contrato De Obra. 12
Tabla 8. Póliza Cumplimiento Del Contrato De Obra Anexo 0 12
Tabla 9. Póliza Responsabilidad Civil Del Contrato De Obra Anexo 0 13
Tabla 10 obligaciones de la empresa – clausula séptima del convenio 15
Tabla 11. Cantidades Y Actividades Convenio Inicial 23
Tabla 12. Actividades Contractuales Ejecutadas 25
Tabla 13. Descripción De Las Actividades Desarrolladas. 26
Tabla 14 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 28
Tabla 15 Pagos De Seguridad Social Contrato De Obra 29
Tabla 16. Informe Contable Y Financiero Contrato De Obra 29
Tabla 17. Informe Contable Y Financiero Convenio Interadministrativo 30
Tabla 18 Avance En Tiempo contrato de Obra 31
Tabla 19. Avance En Tiempo Convenio Interadministrativo 31
Tabla 20. Balance Convenio 32

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

1. INTRODUCCIÓN

A continuación, se presenta el Informe pago parcial No. 01 en el marco del cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025, suscrito entre la Administración Municipal de Valle del Guamuez y la Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Municipio Valle Del Guamuez "EMSERPUVAG S.A. E.S.P., cuyo objeto es *"Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Entre El Municipio Valle Del Guamuez Y Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios De El Valle Del Guamuez S.A E.S. P Siglas EMSERPUVAG S.A. E.S.P. Para La Ejecución Del Proyecto De Inversión Denominado "Mejoramiento Y Adecuación De La Celda No. 01 Del Sitio De Disposición Final De Residuos Sólidos, Localizado En La Vereda La Primavera, Y Complementación De Acciones De Fortalecimiento Al Proceso De Aprovechamiento, Para Garantizar La Buena Prestación Del Servicio Público De Aseo En El Municipio Valle Del Guamuez – Putumayo""*., en el cual se detalla cada una de las actividades de obras desarrolladas desde el día 31 de octubre de 2025 hasta 22 de diciembre de 2025.

En el contexto de la Política Nacional Ambiental que destaca el recurso agua como el eje central; el manejo integral de los residuos sólidos se constituye en una de las prioridades, debido a la gran afectación sanitaria y ambiental que se está causando al recurso agua como al suelo por el inadecuado manejo que se realiza en la mayoría de los Municipios. De allí que el objetivo fundamental de la administración de la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P." es "Impedir o minimizar de la manera más eficiente, los riesgos que para los seres humanos y el medio ambiente ocasionan los residuos sólidos, esto es garantizando de manera eficiente la prestación del servicio público de aseo en sus actividades de recolección, barrido y limpieza, transporte, aprovechamiento y disposición final, esta última dispendiosa de realizar debido a los altos costos técnicos, y operacionales, además del grave riesgo que representa para los recursos naturales y la salud de las personas, por los impactos negativos que genera.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Presentar informe pago parcial No. 01 de las actividades del Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025, que tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P SIGLAS EMSERPUVAG S.A. E.S.P. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, Y COMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – PUTUMAYO" por parte de la EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P. en el seguimiento hecho al Contrato de Obra No. SPO-CO-007-2025 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

2.2. Objetivos Específicos

- Describir las actividades adelantadas para la optimización del lugar de disposición final de residuos sólidos y ampliación de las chimeneas para la evacuación de gases.
- Presentar el análisis de avance del proyecto alcanzado durante el periodo de ejecución del 31 de octubre de 2025 hasta 22 de diciembre de 2025.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

3. ASPECTO GENERAL DE LOS CONTRATOS.

3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El presente contrato se ejecuta en el sector rural del Municipio de Valle del Guamuez, exactamente en la vereda la primavera.

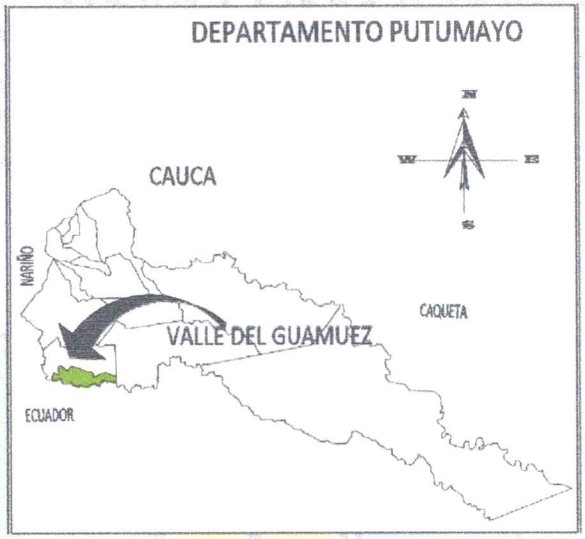


Ilustración 1 Localización ambiro departamental

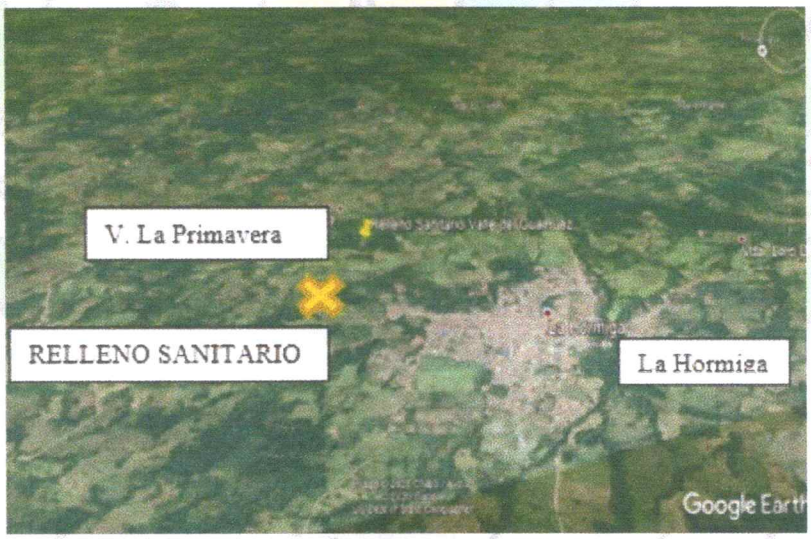


Ilustración 2 Localización Vereda La Primavera - Municipio de Valle del Guamuez

A Continuación, se presenta el estado actual del Contrato de Obra donde se relaciona la información básica contemplada en ellos.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

3.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

En el siguiente cuadro se relaciona la información general del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Tabla 1 Ficha Técnica del Convenio Interadministrativo

TIPO DE CONVENIO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.
CONVENIO No.	SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
BENEFICIARIO:	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P." NIT: 900.304.997-8.
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P SIGLAS EMSERPUVAG S.A. E.S.P. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, Y COMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – PUTUMAYO"
APORTE DEL MUNICIPIO:	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($260.000.000,00)
APORTE DE LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERPUVAG S.A. E.S.P.:	UN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($1.000.000,00).
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($261.000.000,00)
APORTE ADICIONAL DEL MUNICIPIO:	N/A

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($261.000.000,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES SIN SUPERAR 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE INICIO:	31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:	30 DE DICIEMBRE DE 2025

3.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

En el siguiente cuadro se relaciona la información jurídica del Contrato de Obra No. SPO-CO-007-2025 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Tabla 2. Ficha Técnica del Contrato de Obra

TIPO DE CONTRATO:	OBRA.
CONTRATO No.	SPO-CO-007-2025 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P." NIT: 900.304.997-8.
CONTRATISTA:	OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO C.C. 87.219.077 DE IPIALES NARIÑO
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, Y COMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – PUTUMAYO"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($261.000.000,00)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($261.000.000,00)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	UN (01) MES QUINCE (15) DIAS SIN SUPERAR 31 DE DICIEMBRE

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

FECHA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN No. 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

3.4. INFORMACIÓN JURÍDICA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

En el siguiente cuadro se relaciona la información jurídica del convenio interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Tabla 3 Información Jurídica convenio interadministrativo

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2025
APORTE DEL MUNICIPIO:	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($260.000.000,00)
APORTE DEL BENEFICIARIO EMSERPUVAG S.A. E.S.P.:	UN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($1.000.000,00).
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($261.000.000,00)
VALOR ADICION APORTE DEL MUNICIPIO:	N/A
VALOR FINAL DEL CONVENIO:	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($261.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES SIN SUPERAR 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE INICIO:	31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:	30 DE DICIEMBRE DE 2025

3.5. INFORMACIÓN JURÍDICA CONTRATO DE OBRA

En el siguiente cuadro se relaciona la información jurídica del Contrato de Obra No. SPO - CO- 007 – 2025 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Tabla 4. Información Jurídica Contrato de Obra

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	UN (01) MES QUINCE (15) DIAS SIN SUPERAR 31 DE DICIEMBRE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($261.000.000,00)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($261.000.000,00)
FECHA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

3.6. CONTROL DE PÓLIZAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

El convenio interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 no aplican garantías Desde el punto de vista jurídico, los convenios interadministrativos no requieren la constitución de pólizas de garantías porque su naturaleza no contractual, su carácter colaborativo, la ausencia de riesgo conmutativo y la relación entre entidades públicas hacen inaplicable el régimen general de garantías establecido para los contratos estatales típicos. El control y seguimiento al cumplimiento de estos convenios se ejerce por la vía del control fiscal y la supervisión administrativa, y no mediante instrumentos asegurativos.

En la siguiente tabla se relaciona la información básica de la póliza del convenio interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025. Cumplimiento general del contrato. **1.** Cumplimiento **2.** Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo.

Tabla 5. Información General Póliza Cumplimiento Del Convenio Interadministrativo Anexo 0.

TIPO DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL NIT. 860.037.013-6		
TOMADOR	EMSERPUVAG S.A. E.S.P. NIT: 900.304.997-8		
BENEFICIARIO	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT 800.102.912-2		
POLIZA	No. De POLIZA		FECHA DE EXPEDICION
PÓLIZA No. 0	AGP-100005542 Anexo 0		31/10/2025
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
Cumplimiento	31/10/2025	30/06/2026	26.100.000,00
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	31/10/2025	30/06/2026	78.000.000,00
NOTA. Aprobada bajo RESOLUCIÓN NÚMERO OJMVG - 280 del 31 de octubre de 2025, según lo establecido en el decreto número 0149 del 23 de septiembre de 2021 "*Manual de Contratación*".			

Tabla 6. Información General Póliza Cumplimiento Del Convenio Interadministrativo Anexo 1.

TIPO DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL NIT. 860.037.013-6		
TOMADOR	EMSERPUVAG S.A. E.S.P. NIT: 900.304.997-8		
BENEFICIARIO	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT 800.102.912-2		
POLIZA	No. De POLIZA		FECHA DE EXPEDICION
PÓLIZA No. 0	AGP-100005542 Anexo 1		10/11/2025
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

Cumplimiento	31/10/2025	30/06/2026	26.100.000,00
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	31/10/2025	30/06/2026	78.000.000,00
NOTA. Aprobada bajo RESOLUCIÓN NÚMERO OJMVG - 355 del 17 de diciembre de 2025, según lo establecido en el decreto número 0149 del 23 de septiembre de 2021 "*Manual de Contratación*".			

3.7. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA.

En las siguientes tablas se relaciona la información básica de las pólizas del Contrato de Obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de octubre de 2025. Cumplimiento general del contrato. **1.** Cumplimiento **2.** Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo. **3.** Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar para la ejecución del contrato **4.** Estabilidad Y Calidad De La Obra. **5.** Predios, Labores Y Operaciones, Contratistas Y Subcontratistas, Rce Patronal, Vehículos Propios Y No Propios, Gastos Médicos, Responsabilidad Civil Cruzada

Tabla 7. Información General De Las Pólizas Del Contrato De Obra.

TIPO DE PÓLIZA	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	
ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL NIT. 860.037.013	
TOMADOR	OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO NIT: 87219077-5	
BENEFICIARIO	EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	
POLIZA	No. De POLIZA	FECHA DE EXPEDICION
PÓLIZA No. 0	AGP-100006142 Anexo 0	28/11/2025

Tabla 8. Póliza Cumplimiento Del Contrato De Obra Anexo 0

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	28/11/2025	30/06/2026	26.100.000,00
Buen manejo del anticipo	28/11/2025	30/06/2026	78.300.000,00
Prestaciones sociales	28/11/2025	31/12/2028	26.100.000,00
Calidad del servicio	28/11/2025	31/12/2030	26.100.000,00
NOTA. Aprobada bajo RESOLUCIÓN NÚMERO 705 del 28 de noviembre 04 de 2025, según lo establecido en el acuerdo número 003 del 28 de noviembre de 2014 "*Manual de Contratación*", articulo 43 "*Aprobación de la Garantía de Cumplimiento*"			

TIPO DE PÓLIZA	RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL
ENTIDAD ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL NIT. 860.037.013
TOMADOR	OSWALDO VLADIMIR BASTIDAS MELO NIT: 87219077-5
BENEFICIARIO	EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

POLIZA	No. De POLIZA	FECHA DE EXPEDICION
PÓLIZA No. 0	AGP-100001117 Anexo 0	28/11/2025

Tabla 9. Póliza Responsabilidad Civil Del Contrato De Obra Anexo 0

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios, Labores Y Operaciones	28/11/2025	31/12/2025	284.700.000,0
Rce Patronal	28/11/2025	31/12/2025	284.700.000,0
Contratistas y subcontratistas	28/11/2025	31/12/2025	284.700.000,0
Vehículos propios y no propios	28/11/2025	31/12/2025	284.700.000,0
NOTA. Aprobada bajo RESOLUCIÓN NÚMERO 705 del 28 de noviembre 04 de 2025, según lo establecido en el acuerdo número 003 del 28 de noviembre de 2014 "*Manual de Contratación*", articulo 43 "*Aprobación de la Garantía de Cumplimiento"*			

4. INFORME ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

Teniendo en cuenta que el día 31 de octubre 2025, por medio de acto administrativo "*ACTA DE INICIO*" se habilita EMSERPUVAG S.A. E.S.P. a ejecutar las cantidades y actividades contempladas en el marco del Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Se realiza el reporte de ejecución de actividades contractuales mediante informe de ejecución del Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 por parte de EMSERPUVAG S.A. E.S.P., donde se realiza la presentación y entrega del informe para el Acta Parcial No. 1 del Convenio, de los cuales se deriva todo el proceso de contratación, perfeccionamiento y ejecución del Contrato De Obra No. SPO-CO-007-2025 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

4.1. UBICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto que tiene como objeto "***MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA, Y COMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ – PUTUMAYO***", tiene como epicentro desarrollo coordenadas geográficas 0° 25' 58" N, 76° 53' 23" W, vereda La Primavera Municipio Valle del Guamuez, departamento del Putumayo.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co






Ilustración 3 Localización general del proyecto

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

4.2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Cumpliendo con lo estipulado en la cláusula séptima – compromisos de las partes se puede describir los siguientes aspectos:

Tabla 10 obligaciones de la empresa – clausula séptima del convenio

4.2.1. COMPROMISOS GENERALES DE LA EMPRESA EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

DESCRIPCIÓN	SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO
Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. durante toda la vigencia del convenio.	La empresa EMSERPUVAG S.A. E.S.P. ha cumplido con el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social, se anexo la certificación de cumplimiento de los aportes a parafiscales establecidos y copias de las planillas de seguridad social y parafiscales de los meses de noviembre, diciembre del año 2025.
Ejecutar el objeto del convenio con idoneidad, oportunidad y eficiencia, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el presente instrumento, el presupuesto, el cronograma de ejecución y demás documentos que hacen parte integral del convenio.	Se ha cumplido parcialmente la ejecución contractual y todos los compromisos contenidos en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025, se anexo copia del Contrato De Obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025, con los correspondientes anexos entre los más específicos están: Acta de Recibo Parcial No. 1 del Contrato De Obra, contiene Acta Financiera con sus respectivas Memorias de Cálculo, Informe De Ejecución Del Contrato De Obra Detallado, con todos los anexos necesarios, certificación de cumplimiento supervisor del contrato. Informe de Recibo Parcial No. 1 de Supervisión, con todos los respectivos anexos.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co
Compromiso de Todos...

Adelantar el proceso de contratación de bienes, obras o servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme a su Manual de Contratación y al régimen especial de derecho privado establecido en la Ley 142 de 1994, aplicando la modalidad procedente de acuerdo con la cuantía complejidad y naturaleza del objeto a contratar.	Se ha hecho el debido proceso jurídico de acuerdo con el Manual de Contratación y a la modalidad prevista para este proceso. Se anexa copia de la Minuta del Contrato De Obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025.

4.2.2. COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA EMPRESA EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

DESCRIPCIÓN	SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO
Ejecutar el objeto del convenio conforme al proyecto aprobado, atendiendo las especificaciones técnicas, estudios, diseños cronograma, presupuesto y demás documentos contractuales.	El presente informe, realizado muestra específicamente el cumplimento según el Acta Recibo Parcial No. 1 en un 60.40% de las obligaciones contractuales del periodo del informe, asi mismo también la ejecución acumulada del 60.40% de las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 del 31 de octubre de 2025.
Acreditar y mantener al día el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social integral y aportes parafiscales, conforme a la Ley 1150 de 2007, Ley 789 de 2002 y demás normas vigentes.	La empresa EMSERPUVAG S.A. E.S.P. ha cumplido con el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social, se anexo la certificación de cumplimiento de los aportes a parafiscales establecidos y copias de las planillas de seguridad social y parafiscales de los meses de noviembre, diciembre del año 2025.
Ejecutar el objeto del convenio con idoneidad, eficiencia y oportunidad, en concordancia con los principios de planeación economía transparencia, responsabilidad y eficacia que orientan la contratación estatal.	El presente informe, realizado muestra específicamente la Ejecución y cumplimiento del objeto del convenio con idoneidad, eficiencia y oportunidad, en concordancia con los principios de planeación, economía, transparencia, responsabilidad y eficacia

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co
Compromiso de Todos...

	que orientan la contratación estatal. A través del Acta Recibo Parcial No. 1 en un 60.40% de las obligaciones contractuales del periodo del informe, asi mismo también la ejecución acumulada del 60.40% de las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 del 31 de octubre de 2025.
Cumplir con la normatividad técnica aplicable a los servicios de saneamiento básico, incluyendo el Reglamento Técnico del Sector de Aqua Potable y Saneamiento Básico RAS, la Norma Sismo Resistente NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas-NTC, y demás regulaciones ambientales, sanitarias y de calidad vigentes.	El presente informe, muestra específicamente el cumplimento según del Acta Recibo Parcial No. 1 en un 60.40% de las obligaciones contractuales del periodo del informe, asi mismo también la ejecución acumulada del 60.40% de las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 del 31 de octubre de 2025, el cual se ejecuta de acuerdo con los estudios y diseños entregados por la supervisión del convenio ejercida por la Secretaria De Planeación Y Obras Públicas Municipal a la empresa EMSERPUVAG S.A. E.S.P. Además para el seguimiento se tuvo en cuenta las siguientes normas y códigos: La calidad de los materiales que se utilizan en las obras, los trabajos de ejecución de las obras civiles y complementarias, la instalación de materiales y accesorios, se realizan cumpliendo con los requisitos y procedimientos exigidos en los pliegos, asi mismo como los establecidos en las normas que les sean aplicables, de las cuales se citan las siguientes: • Norma RAS 2000 • Resolución No. 330 DE 2017 • Resolución No.799 de 2021 • Resolución No.908 de 2021

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

	• NSR 2010 • Decreto No. 1711 de 2021 • Decreto No. 1401 de 2023 • Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC • American Concrete Instituto ACI • American National Standards Institute Inc. ANSI
Administrar los recursos del convenio con destinación exclusiva al objeto contractual, asegurando un manejo responsable y permitiendo el control fiscal, administrativo y ciudadano	Una vez firmado el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 del 31 de octubre de 2025, y haber tenido en cuenta el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000876 y Registro presupuestal No. 2025000975 por un valor de $260.000.000,00 por parte de la Alcaldía Municipal De Valle Del Guamuez, por la Empresa se generó el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000413 y Registro presupuestal No. 2025000503 por un valor de $260.000.000,00 asi mismo el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000393 y Registro presupuestal No. 2025000503 por un valor de $1.000.000,00 por parte EMSERPUVAG S.A. E.S.P. posteriormente se realiza la correspondiente contratación de Contrato De Obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025.
Adelantar el proceso de contratación de bienes, obras o servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme a su Manual de Contratación y al régimen especial de derecho privado establecido en la Ley 142 de 1994, aplicando la modalidad procedente de acuerdo con la cuantía complejidad y naturaleza del objeto a contratar incluyendo las garantías contractuales según los estudios previos	Se adelanto el proceso de contratación de bienes, obras o servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme a su Manual de Contratación y al régimen especial de derecho privado establecido en la Ley 142 de 1994, aplicando la modalidad procedente de acuerdo con la cuantía, complejidad y naturaleza del objeto a contratar. Del cual dio origen al Contrato De Obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co
Compromiso de Todos...

Abrir una cuenta bancaria de ahorros exclusiva para la administración de los recursos transferidos por el Municipio destinando los mismos únicamente al cumplimiento del objeto del convenio y reintegrando al Municipio los saldos no ejecutados y los rendimientos financieros que se generen.	Se aperturo la cuenta de ahorros No. 45100004879 por parte de EMSERPUVAG S.A. E.S.P. cuenta bancaria de ahorros exclusiva para la administración de los recursos transferidos por el Municipio de Valle del Guamuez al Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 del 31 de octubre de 2025, los que se destinan únicamente al cumplimiento del objeto del convenio y los saldos no ejecutados y los rendimientos financieros que se generen se reintegran al Municipio.
Aportar al convenio la suma de UN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.000.000 MDA/CTE), destinados a cofinanciar las actividades necesarias para el mejoramiento y adecuación de la celda no 01 del sitio de disposición final de residuos solides, localizado en la vereda la primavera, y complementación de acciones de fortalecimiento al proceso de aprovechamiento para garantizar la buena prestación del servicio público de aseo objeto del convenio. Estos recursos se ejecutarán de manera complementaria a los aportes del Municipio y deberán ser invertidos exclusivamente en los fines del convenio, conforme al presupuesto aprobado y bajo supervisión del Municipio.	EMSERPUVAG S.A. E.S.P. Aporto al convenio la suma de $1.000.000,00 destinados a cofinanciar las actividades necesarias para la ampliación del alcantarillado sanitario objeto del convenio, de acuerdo con el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000393 y Registro presupuestal No. 2025000503 por un valor de $1.000.000,00
Aportar los recursos técnicos, humanos, financieros y operativos que se requieran para la adecuada ejecución del convenio Cualquier modificación o sustitución de personal clave debera contar con la aprobación previa y escrita de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio.	EMSERPUVAG S.A. E.S.P. aporto todo los recursos técnicos, humanos, financieros y operativos que se requieran para la adecuada ejecución del convenio, y adelanto el proceso de contratación de bienes, obras o servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme a su Manual de Contratación y al régimen especial de derecho privado establecido en la Ley 142 de 1994, aplicando la modalidad procedente de acuerdo con

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co
Compromiso de Todos...

	la cuantía, complejidad y naturaleza del objeto a contratar. Del cual dio origen al Contrato De Obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025.
Cumplir con las obligaciones de visibilidad y socialización del proyecto, incluyendo la instalación de vallas informativas piezas de divulgación y demás mecanismos de información exigidos por el Municipio o por la normatividad aplicable.	La Alcaldía Municipal De Valle Del Guamuez y EMSERPUVAG S.A E.S.P. llevaron a cabo la socialización donde se hicieron las recomendaciones y sugerencias necesarias para el desarrollo normal en la ejecución del Convenio Interadministrativo que derivo en el Contrato de obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025, Cuyo Objeto Es: Mejoramiento Y Adecuación De La Celda No. 01 Del Sitio De Disposición Final De Residuos Sólidos, Localizado En La Vereda La Primavera, Y Complementación De Acciones De Fortalecimiento Al Proceso De Aprovechamiento, Para Garantizar La Buena Prestación Del Servicio Público De Aseo En El Municipio Valle Del Guamuez – Putumayo.
Ejecutar los recursos de acuerdo con el presupuesto oficial, cualquier modificación de diseños, rediseños o ajustes técnicos debera contar con la autorización previa del Municipio y los costos adicionales serán asumidos por la Empresa.	El presente informe, realizado muestra específicamente el cumplimento según el Acta Recibo Parcial No. 1 en un 60.40% de las obligaciones contractuales del periodo del informe, asi mismo también la ejecución acumulada del 60.40% de las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 del 31 de octubre de 2025.
Gestionar y obtener en coordinación con las autoridades competentes, los permisos, licencias o autorizaciones ambientales sanitarias o de otra índole que sean necesarias para la ejecución de las obras.	Por parte de EMSERPUVAG S.A. E.S.P. no se tiene que Gestionar o obtener, en coordinación con las autoridades competentes, ningún permisos, licencias o autorizaciones ambientales, sanitarias o de otra índole para la ejecución de las obras teniendo en cuenta que emitieron un concepto de viabilidad técnica, financiera, económica y ambiental con fecha

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

	del 23/10/2025, donde su código BPIN No. 202500000038487 firmado por el Secretario De Planeación y Obras Públicas, Jefe Banco De Proyectos y Apoyo Profesional De La Secretaría De Planeación De Obras Públicas Municipal, por un valor de $261.000.000,00. Así mismo también emitieron un concepto de viabilidad técnica por parte del profesional encargado de realizar dicha revisión en la Secretaría De Planeación De Obras Públicas el día 21/10/2025 por un valor de $261.000.000,00.
Coordinar con la Secretaria de Planeación y Obras la revisión técnica antes, durante y después de la ejecución de la obra atendiendo las observaciones o requerimientos de la supervisión.	EMSERPUVAG S.A. E.S.P. ha coordinado junto a la Secretaria De Planeación y Obras Públicas Municipal, la socialización del proyecto y también en varias oportunidades visitas técnicas de inspección de la obra para ver el desarrollo de la ejecución del contrato de obra acompañado por la supervisión de los contratos y del convenio y revisar el cumplimiento satisfactorio al Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 del 31 de octubre de 2025.
Presentar al Municipio informes de avance periódicos y un informe final de ejecución, acompañados de soportes técnicos administrativos y financieros que acrediten la correcta aplicación de los recursos.	El presente informe, realizado muestra específicamente el cumplimento según el Acta Recibo Parcial No. 1 en un 60.40% de las obligaciones contractuales del periodo del informe, asi mismo también la ejecución acumulada del 60.40% de las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 del 31 de octubre de 2025.
Facilitar el ejercicio de la supervisión municipal, asi como el control fiscal y disciplinario por parte de los órganos competentes, suministrando oportunamente toda la documentación, archivos y demás información que se requiera	Se tiene a disposición de la supervisión municipal, asi como el control fiscal y disciplinario por parte de los órganos competentes, un archivo físico detallado y con toda la información necesaria de los procesos de contratación ejercida por parte de EMSERPUVAG S.A. E.S.P. del Contrato de obra

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

	No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025, Cuyo Objeto Es: Mejoramiento Y Adecuación De La Celda No. 01 Del Sitio De Disposición Final De Residuos Sólidos, Localizado En La Vereda La Primavera, Y Complementación De Acciones De Fortalecimiento Al Proceso De Aprovechamiento, Para Garantizar La Buena Prestación Del Servicio Público De Aseo En El Municipio Valle Del Guamuez – Putumayo.
Consultar con la Secretaria de Planeación y Obras cualquier modificación sustancial al convenio, adjuntando los soportes que justifiquen la solicitud.	Hasta el día de hoy no se tuvo que consultar de ninguna manera a la Secretaría de Planeación y Obras Municipal para ningún tipo de modificación sustancial al convenio, ningún cambio alguno ni cambio de especificaciones técnicas o ningún cambio de materiales en las actividades contractuales ejecutadas.
Conservar los archivos técnicos, financieros y contractuales relacionados con el convenio durante el término legal correspondiente y ponerlos a disposición de las autoridades cuando sean requeridos.	Contiene archivo físico detallado y con toda la información necesaria de los procesos de contratación ejercida por parte de EMSERPUVAG S.A. E.S.P. del del Contrato de obra No. SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre del 2025, Cuyo Objeto Es: Mejoramiento Y Adecuación De La Celda No. 01 Del Sitio De Disposición Final De Residuos Sólidos, Localizado En La Vereda La Primavera, Y Complementación De Acciones De Fortalecimiento Al Proceso De Aprovechamiento, Para Garantizar La Buena Prestación Del Servicio Público De Aseo En El Municipio Valle Del Guamuez – Putumayo.
Asumir las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del presente convenio, de su condición como ejecutor de recursos públicos y aquellas establecidas en la normatividad vigente, especialmente en materia de transparencia eficiencia. control fiscal y responsabilidad en el manejo de recursos	El presente informe, realizado muestra específicamente el cumplimento según el 60.40% de las obligaciones contractuales del periodo del informe, asi mismo también la ejecución acumulada del 60.40%

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

	de las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 del 31 de octubre de 2025.

4.3. CANTIDADES Y ACTIVIDADES PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO

En las siguientes tablas (11 y 12) se describen las cantidades, actividades y presupuesto discriminado por actividad para su ejecución:

Tabla 11. Cantidades Y Actividades Convenio Inicial

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES				
	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	MEJORAMIENTO DE LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS				
1.01	Conformación y compactación de residuos sólidos que diariamente llegan a la celda en operación.	Tn	2470	44898	$ 110,898,060.00
1.02	Suministro e Instalación de cal para estabilización de residuos sólidos en la celda.	Kg	2470	3600	$ 8,892,000.00
1.03	Suministro e Instalación de material tipo arcilla para tapado de residuos sólidos.	M3	370.5	51076	$ 18,923,658.00
1.04	Ampliación de chimeneas existentes en la celda.	ML	15	442243	$ 6,633,645.00
2.0 ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN OPERACIÓN					

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES				
	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
2.01	Limpieza de dispositivos de entrada y salida del humedal artificial (cajillas del S.T.L.)	UND	4.00	$ 271,950.00	$ 1,087,800.00
2.02	Limpieza y lavado de lecho filtrante (Grava) del humedal artificial en áreas obstruidas por sedimentos (Incluye extracción y resiembra de plántulas en el área de lavado)	M3	164.00	$ 92,447.00	$ 15,161,308.00
2.03	Extracción de lodos en los tanques sedimentadores y filtro fafa.	M3	65.80	$ 271,950.00	$ 17,894,310.00
2.04	Extracción de lodos en laguna de oxidación	M3	23.34	$ 271,950.00	$ 6,347,313.00
	TOTAL COSTO DIRECTO (A)				**$ 185,838,094.00**
	ADMINISTRACION (22%)	**29.00%**			**$ 53,893,047.00**
	IMPREVISTOS (3%)	**1.00%**			**$ 1,858,381.00**
	UTILIDADES (5%)	**4.00%**			**$ 7,433,524.00**
	TOTAL COSTO DIRECTO (B)	**34.00%**			**$ 63,184,952.00**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			**un**	**$ 11,976,954.00**
	TOTAL COSTO OBRA				**$ 261,000,000.00**
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**$ 261,000,000.00**

4.4. ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS.

En la siguiente tabla se describen las actividades y cantidades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2025 hasta 22 de diciembre de 2025.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

Tabla 12. Actividades Contractuales Ejecutadas

CONDICIONES INICIALES						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		SALDOS	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VL. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
1.0	MEJORAMIENTO DE LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS										
1.01	Conformación y compactación de residuos sólidos que diariamente llegan a la celda en operación.	Tn	2,470.00	$ 44,898.00	$ 110,898,060.00		$ 0.00	1848.00	$ 82,971,504.00	622.00	$ 27,926,556.00
1.02	Suministro e Instalación de cal para estabilización de residuos solidos en la celda.	Kg	2,470.00	$ 3,600.00	$ 8,892,000.00		$ 0.00	1848.00	$ 6,652,800.00	622.00	$ 2,239,200.00
1.03	Suministro e Instalación de material tipo arcilla para tapado de residuos solidos.	M3	370.50	$ 51,076.00	$ 18,923,658.00		$ 0.00	277.20	$ 14,158,267.00	93.30	$ 4,765,391.00
1.04	Ampliación de chimeneas existentes en la celda.	ML	15.00	$ 442,243.00	$ 6,633,645.00		$ 0.00	15.00	$ 6,633,645.00	0.00	$ 0.00
2.0	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN OPERACIÓN										
2.01	Limpieza de dispositivos de entrada y salida del humedal artificial (cajillas del S.T.L.)	UND	4.00	$ 271,950.00	$ 1,087,800.00		$ 0.00		$ 0.00	4.00	$ 1,087,800.00
2.02	Limpieza y lavado de lecho filtrante (Grava) del humedal artificial en areas obstruidas por sedimentos (Incluye extraccion y resienmbra de plantulas en el area de lavado)	M3	164.00	$ 92,447.00	$ 15,161,308.00		$ 0.00		$ 0.00	164.00	$ 15,161,308.00
2.03	Extracción de lodos en los tanques sedimentadores y filtro fafa.	M3	65.80	$ 271,950.00	$ 17,894,310.00		$ 0.00		$ 0.00	65.80	$ 17,894,310.00
2.04	Extracción de lodos en laguna de oxidacion	M3	23.34	$ 271,950.00	$ 6,347,313.00		$ 0.00		$ 0.00	23.34	$ 6,347,313.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			%	**$ 185,838,094.00**		**$ 0.00**		**$ 110,416,216.00**		**$ 75,421,878.00**
	COSTOS INDIRECTOS	Administracion		29%	$ 53,893,047.00		$ 0.00		$ 32,020,702.00		$ 21,872,345.00
		Utilidad		4%	$ 7,433,524.00		$ 0.00		$ 4,416,649.00		$ 3,016,875.00
		Imprevistos		1%	$ 1,858,381.00		$ 0.00		$ 1,104,162.00		$ 754,219.00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**34%**	**$ 63,184,952.00**		**$ 0.00**		**$ 37,541,513.00**		**$ 25,643,439.00**
	TOTAL COSTO DE OBRA				**$ 249,023,046.00**		**$ 0.00**		**$ 147,957,729.00**		**$ 101,065,317.00**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			**PMA**	**$ 11,976,954.00**				**$ 9,693,423.00**		**$ 2,283,531.00**
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				**$ 261,000,000.00**		**$ 0.00**		**$ 157,651,152.00**		**$ 103,348,848.00**
	PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRACTUAL DEL CONVENIO						**0.00%**		**60.40%**		**39.60%**

4.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas en el marco del desarrollo del contrato de obra.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

Tabla 13. Descripción De Las Actividades Desarrolladas.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES		
ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN
1,0	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CELDA DEL SISTEMA NUEVO.	
1,1	Conformación y compactación de residuos sólidos que diariamente llegan a la celda en operación.	Este ítem consiste en el movimiento de residuos sólidos para su respectiva adecuación y conformación de tal forma que el volumen suelto de los residuos sólidos quede compactado sobre el nivel del terraplén. Este ítem se refiere a la conformación, compactación de residuos sólidos que diariamente llegan al relleno sanitario, de tal forma que se realice una adecuación de estos materiales en concordancia a las normas técnicas y ambientales establecidas para este tipo de procedimientos. Procedimiento De Ejecución • Se mueven los residuos sólidos con retroexcavadora. • Se adecua el espacio para conformar capas de 50cm. • Se Compactan los residuos solidos • Se Verifica que el asentamiento de los residuos sea el esperado.
1,2	Suministro e Instalación de cal para estabilización de residuos sólidos en la celda.	Este ítem se refiere al suministro e instalación de cal para estabilización de residuos sólidos, y consiste en añadir la dosis adecuada de cal para mantener el PH a 12 durante el tiempo suficiente (mínimo 2 h) para eliminar o reducir los microorganismos patógenos y los responsables de los olores. Procedimiento De Ejecución • Se esparce la dosis de cal adecuada a los residuos sólidos. • Se Verifica que el PH se mantenga en 12 durante 2 horas
1,3	Suministro e Instalación de material tipo arcilla	Este trabajo consiste en el Suministro e Instalación de material de cobertura intermedio y final para tapado de residuos sólidos en los lugares indicados en los planos del proyecto o donde lo señale el Interventor. Procedimiento De Ejecución

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

ACTIVIDADES CONTRACTUALES		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN**
	para tapado de residuos sólidos.	• Se determinan las especificaciones del material de cobertura a utilizar. • Se verifican los niveles para rellenos. • Se Verifican los alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales. • Se selecciona el material para relleno. • Se verifican métodos para colocación y compactación del material. • Se aplico y se extendió el material en capas horizontales de 30 cms. • Se rego el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. • Se compacto por medio de equipos manuales y mecánicos. • Se verifico las condiciones finales de compactación y niveles definitivos.
1,4	Ampliación de chimeneas existentes en la celda.	Esta actividad consistió en la ampliación de chimeneas existentes de acuerdo al avance en las capas de compactación de los residuos sólidos en la celda en operación. Contienen malla electrosoldada de 3 Ml de altura * 0,65 M * 0,8 M para evacuación de gases. Procedimiento De Ejecución • Se Consulto el Proyecto sanitario. • Se Consulto las recomendaciones técnicas del fabricante. • Se Realizo el mantenimiento a la estructura de arranque de la chimenea. • Se Coloco la malla electrosoldada alrededor de los puntales. • Se Coloco el templete en alambre galvanizado para darle firmeza a la chimenea. • Se Coloco la tubería de 4" perforada. • Se Coloco la piedra bola preferiblemente de diámetro menos a 16cm.

Los resultados obtenidos de la ejecución del contrato de obra fueron revisadas y aprobadas mediante interventoría que se describen en la anterior tabla.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co
Compromiso de Todos...

4.6. PERSONAL Y EQUIPO UTILIZADO.

Para el desarrollo del contrato de obra se empleó a:

2. Ingeniero civiles para director de obra y residente de obra
1. Oficial de obra
3. Ayudantes de obra
1. Operador de máquina.;

los equipos que se utilizaron fueron
1. Volqueta.
2. Retroexcavadora
3. Herramienta menor;

para el desarrollo del contrato de consultoría se empleó a un profesional con experiencia en la dirección de interventoría.

4.7. SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES.

Una vez revisada las planillas de seguridad social y aportes parafiscales relacionadas en los contratos de obra y consultoría se verifica que los pagos corresponden a lo establecido por la ley.

Tabla 14 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

AÑO Y MES	No. DE PLANILLA DE PAGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADOR	FECHA DE PAGO
Periodo pensión: 2025/10. Periodo Salud: 2025/11	35442274	EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	26/11/2025
Periodo pensión: 2025/11. Periodo Salud: 2025/12	35670246	EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	17/12/2025
Periodo pensión: 2025/12. Periodo Salud: 2026/01	35724585	EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	17/12/2025

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

Tabla 15 Pagos De Seguridad Social Contrato De Obra

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADOR	No. PLANILLA	VALOR	FECHA DE PAGO	PERIODO
Oswaldo Vladimir Bastidas Melo	9495657249	$1,498,400	2025/12/09	11/ Noviembre
Jorge David Montenegro López	9496175171	$2,547,600	2025/12/09	11/ noviembre - diciembre

5. AVANCE CONTABLE, FINANCIERO Y EN TIEMPO

Seguidamente se describen los avances contables, financieros en tiempo y ejecución del a la fecha del periodo correspondiente.

5.1. AVANCE CONTABLE Y FINANCIERO.

Los valores relacionados (tabla 16), corresponden al valor financiero y contable avanzado en Contrato De Obra No SPO-CO-007-2025 del 28 de noviembre de 2025, que inicia del 28 de noviembre al 22 de diciembre de 2025, donde se reporta 60.40% de avance en 25 días de ejecución, equivalente a CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 157,651,152.00), mismo valor acumulado reportado en el Acta de Recibo parcial No. 01. De la misma manera se reporta (Tabla 17) el valor equivalente al Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 del 60.40% que asciende a CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 157,651,152.00), de los cuales se cumplen 60.40% con el objeto contractual inicial del proyecto y se avanza a satisfacción de las partes.

Tabla 16. Informe Contable Y Financiero Contrato De Obra

CONTRATO DE OBRA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 261,000,000.00
VALOR ADICIONADO	$ 0.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 261,000,000.00
ANTICIPO CONTRATO (30.00 %)	$ 78,300,000.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 (60.40%)	$ 157,651,152.00

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PARCIAL No. 1	$ 78,300,000.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (60.40%)	$ 157,651,152.00
VALOR REAL A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 (30.40%)	$ 79,351,152.00
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 103,348,848.00
VALOR NETO A PAGAR (30.40%)	$ 79,351,152.00

Tabla 17. Informe Contable Y Financiero Convenio Interadministrativo

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 261,000,000.00
VALOR ADICIONAL DEL CONVENIO:	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	**$ 261,000,000.00**
APORTE TOTAL DEL MUNICIPIO AL CONVENIO:	$ 260,000,000.00
APORTE TOTAL DE EMSERPUVAG S.A. E.S.P. AL CONVENIO:	$ 1,000,000.00
ANTICIPO (30.00 %) APORTE TOTAL DEL MUNICIPIO	$ 78,000,000.00
ANTICIPO (30.00 %) APORTE TOTAL DE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 300,000.00
VALOR TOTAL ANTICIPO DEL CONVENIO:	**$ 78,300,000.00**
VALOR PAGADO EN ACTAS PARCIALES (0%):	$ 0.00
VALOR EJECUTADO EN ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONVENIO: 60.40%	**$ 157,651,152.00**
VALOR EJECUTADO DEL ACTA RECIBO PARCIAL No. 01 DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO:	$ 157,047,124.60
VALOR EJECUTADO DEL APORTE DE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 604,027.40
VALOR EJECUTADO ACUMULADO DEL CONVENIO: (60.40%):	**$ 157,651,152.00**
VALOR NETO A PAGAR DEL CONVENIO: (39.60%):	**$ 79,047,124.60**
VALOR A PAGAR DEL APORTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO:	$ 79,047,124.60

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

VALOR A PAGAR DEL APORTE DE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.:	$ 304,027.40

5.2. AVANCE EN TIEMPO CONTRATO DE OBRA.

Relación de avance respecto al tiempo del contrato de obra del 28 de noviembre al 22 de diciembre de 2025.

Tabla 18 Avance En Tiempo contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	
FECHA DE INICIO	28 de noviembre de 2025
FECHA TERMINACIÓN No. 1:	31 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	34 DÍAS
FECHA DE REPORTE:	22 de diciembre de 2025
TIEMPO EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01	25 DÍAS
PLAZO POR EJECUTAR	9 DÍAS
AVANCE DE OBRA RESPECTO AL TIEMPO	73.52%

5.3. AVANCE EN TIEMPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Relación de avance respecto al tiempo Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025 su periodo ejecutado va desde el 31 de octubre de 2025 al 22 diciembre de 2025.

5.3.1. AVANCE FÍSICO

INFORME No.	PERIODO		AVANCE FÍSICO %	
	DESDE	HASTA	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO
Parcial No. 1	31/10/2025	22/12/2025	60.40%	60.40%

Tabla 19. Avance En Tiempo Convenio Interadministrativo

CONVENIO	
FECHA DE INICIO	31 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN No. 1	30 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (2) Meses

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

FECHA DE REPORTE	22 de diciembre de 2025
TIEMPO EJECUTADO	53 DÍAS
PLAZO POR EJECUTAR	8 DÍAS
Avance De Convenio Interadministrativo Respecto Al Tiempo.	86.88%

5.3.2. AVANCE FINANCIERO

Tabla 20. Balance Convenio

VALORES DEL CONVENIO	
Valor Aporte Inicial Del Municipio	$ 260,000,000.00
Valor Aporte De EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 1,000,000.00
Valor Inicial Del Convenio	$ 261,000,000.00
Valor Adicional Del Aporte Del Municipio Al Convenio	$ 0.00
Valor Total Del Convenio	$ 261,000,000.00
Valor Acta Parcial No. 1 Del Convenio (60.40%)	$ 157,651,152.00
VALORES CANCELADOS	
Anticipo Inicial (30.00%) Del Aporte Del Municipio Al Convenio	$ 78,000,000.00
Anticipo Inicial (30.00%) Del Aporte De EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 300,000.00
VALORES POR PAGAR	
Valor Acta De Recibo Parcial No. 01 Del Aporte Del Municipio Al Convenio (60.40%)	$ 157,047,124.60
Valor Amortización en acta de Recibo Parcial No. 01 Del Aporte Del Municipio Al Convenio (100%)	$ 78,000,000.00
Valor A Pagar Presente Acta Parcial No. 01 Del Aporte Del Municipio Al Convenio (30.40%)	$ 79,047,124.60

5.3.3. AVANCE PROGRAMACIÓN FINAL

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

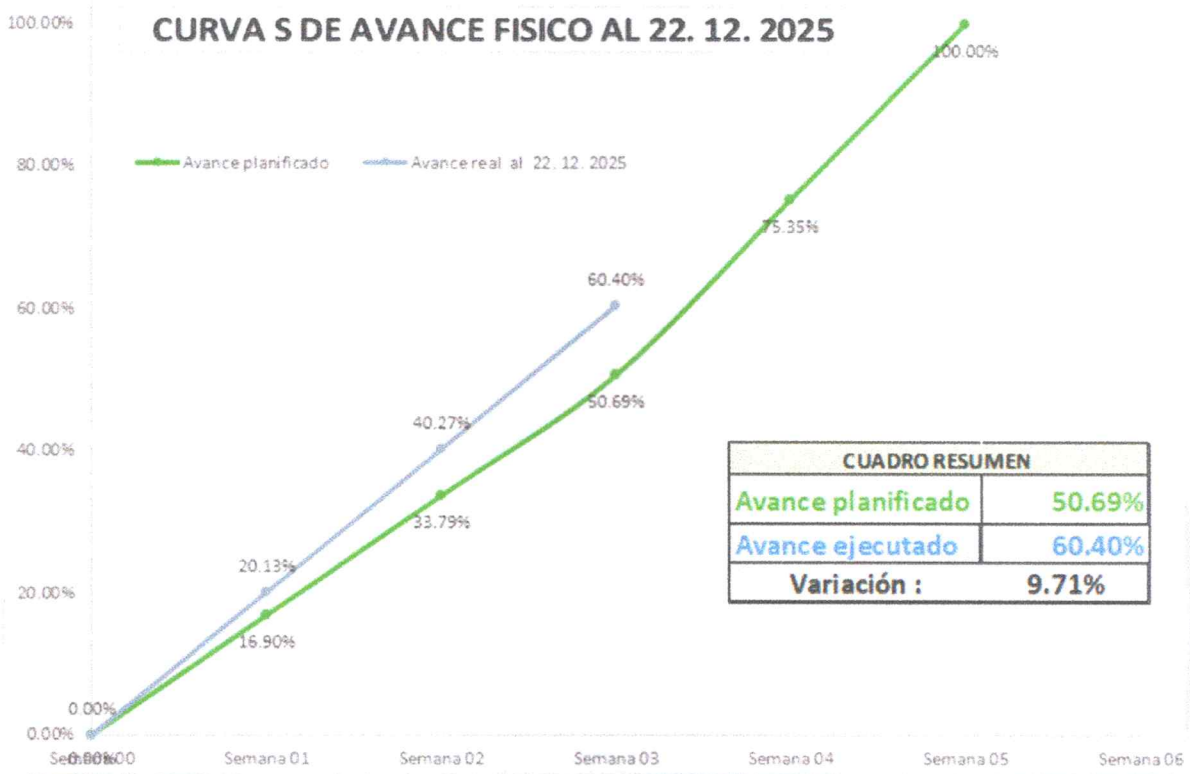


Ilustración 4 Avance programación del convenio

Como se puede observar en la ilustración No. 04 el avance del convenio interadministrativo con respecto al tiempo, programación inicial y avance financiero real de los cuales se tiene como soporte las actas de avance parcial No. 01 respectivamente y el valor por cancelar en el giro de la presente acta.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- A la fecha administrativamente se han celebrado las actas de inicio con fecha 31 de octubre de 2025 del Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-047-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025, la empresa EMSERPUVAG S.A. E.S.P. en aras de dar continuidad al trámite administrativo realiza acta de inicio del contrato de obra el día 28 de noviembre de 2025.

- El desarrollo del convenio de manera coordinada entre la supervisión y el beneficiario del convenio, ha permitido la ejecución normal y eficaz de las obras, evitando así inconvenientes, retrasos o aplazamientos en el progreso de las mismas.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

- Se presenta un avance físico ejecutado del 60.40% vs un avance físico programado de 60.40% lo que indica que se da cumplimiento a los plazos acordados y se desarrollan sin mayores contratiempos.

- Las actividades ejecutadas a la fecha han permitido la operación de manera ininterrumpida y dentro de la normatividad técnica de todos los componentes del relleno sanitario.

- Es importante dejar claridad y salvedad del caso, que para el Presente Informe de Acta De Recibo Parcial No. 1, se recibió haciendo falta los siguientes documentos:
  - La bitácora de obra
  - El FIC que se dará con el acta de recibo final del contrato de obra.
  - Pero serán requisitos indispensables en el posterior Informe de Recibo Final De Supervisión y que contenga todos los anexos correspondientes tanto del Informe De Obra e Informe Interventoría y teniendo en cuenta la totalidad de obligaciones generales y especificas contempladas en las minutas contractuales de los contratos de ejecución (Obra e Interventoría) y minuta contractual del Convenio Interadministrativo que serán solicitados para el Acta de Recibo Final y Liquidacion ya en su totalidad

R.L. CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
Nit. No. 900.304.997-8

Proyecto: EDELBERTO JEREZ NOVOA
Apoyo Profesional Emserpuvag S.A. E.S.P.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. MEJORAMIENTO DE LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
1.01 Conformación y compactación de residuos sólidos que diariamente llegan a la celda en operación.	
	
	

1. MEJORAMIENTO DE LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
1.02 Suministro e Instalación de cal para estabilización de residuos sólidos en la celda.	
	
	

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

1. MEJORAMIENTO DE LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
1.03 Suministro e Instalación de material tipo arcilla para tapado de residuos sólidos.	
	
	

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

1. MEJORAMIENTO DE LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CELDA No. 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	
1.04 Ampliación de chimeneas existentes en la celda.	
	
	

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.
EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT. 900.304.997-8

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.

CERTIFICA

Que de acuerdo con el resultado de mis procedimientos de auditoría y con base en la información contenida en las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes – operador ASOPAGOS, correspondientes a los últimos seis (6) meses, la información relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables, observando que la Empresa se encuentra al día por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales y Aportes a la Administradora de Riesgos Laborales durante este periodo.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisora Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue, verificada con las fuentes antes mencionadas.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.

La presente se expide en la ciudad de La Hormiga, municipio Valle del Guamuez, Putumayo el día veintidós (22) de diciembre de 2025.

LEYVI PATRICIA LASSO ARMERO
REVISORA FISCAL
T.P. 173333-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.
EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT. 900.304.997-8



Aportes al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales
EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
Ciudad y fecha: Valle del Guamuez, Putumayo 23 de diciembre de 2025
Válido con firma



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 3 E C 8 9 4 7 A 8 B 2 3 7 8 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEYVI PATRICIA LASSO ARMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1126444726 de VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 173333-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900304997	8	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-865	CRA 6 N5 131 BARRIO LA AMISTAD		3123214143			EMSERPUVAG@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35442274	E	2025-11-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.757.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35442274	2025-11-26	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL							Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 12971074	ACHICANOY CULCHA CLAUDIO AGUSTIN	2.223.050	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.291.538	366.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.291.538	286.500	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.291.538	91.700	2.291.538	99.700	0,04350	2.291.538	45.900	68.800	0	0	01	0	959.300	N	4382101
2	CC 18112865	MEDINA MORENO WILMER JHON	2.331.597	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.331.597	373.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.331.597	291.500	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.331.597	93.300	2.331.597	12.200	0,00522	2.331.597	46.700	70.000	0	0	01	0	886.800	N	1701001
3	CC 18124375	MUÑOZ PEDRO ENRIQUE	2.255.231	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.255.231	360.900	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	2.255.231	282.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.255.231	90.300	2.255.231	55.000	0,02436	2.255.231	45.200	67.700	0	0	01	0	901.100	N	3360001
4	CC 98325930	MUÑOZ YANDAR NICEFORO	1.602.363	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.602.363	256.400	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.602.363	200.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.602.363	64.100	1.602.363	39.100	0,02436	1.602.363	32.100	48.100	0	0	01	0	640.100	N	3360001
5	CC 1126454088	QUIROZ CAMPAÑA CARLOS ESNEHIDER	4.873.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.873.905	779.900	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	4.873.905	609.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	4.873.905	195.000	4.873.905	25.500	0,00522	4.873.905	97.500	146.300	0	0	01	0	1.853.500	N	1701001
6	CC 41119623	TOVAR CHAMORRO NARCISA EVELSI	2.180.738	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.180.738	349.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.180.738	272.600	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.180.738	87.300	2.180.738	11.400	0,00522	2.180.738	43.700	65.500	0	0	01	0	829.500	N	1701001
7	CC 97529053	ZAMBRANO CUACES JESUS NORIEL	1.719.226	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.719.226	275.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.719.226	215.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.719.226	68.800	1.719.226	41.900	0,02436	1.719.226	34.400	51.600	0	0	01	0	686.800	N	3360001

384

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900304997	8	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-865	CRA 6 N5 131 BARRIO LA AMISTAD		3123214143			EMSERPUVAG@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35442274	E	2025-11-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.757.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35442274	2025-11-26	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 12971074	ACHICANOY CULCHA CLAUDIO AGUSTIN	2.223.050	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.291.538	366.760	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.291.538	286.500	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.291.538	91.700	2.291.538	99.700	0,04350	2.291.538	45.900	68.800	0	0	01	0	959.300	N	4382101
2	CC 18112865	MEDINA MORENO WILMER JHON	2.331.597	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.331.597	373.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.331.597	291.500	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.331.597	93.300	2.331.597	12.200	0,00522	2.331.597	46.700	70.000	0	0	01	0	886.800	N	1701001
3	CC 1812437S	MUÑOZ PEDRO ENRIQUE	2.255.231	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.255.231	360.900	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	2.255.231	282.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.255.231	90.300	2.255.231	55.000	0,02436	2.255.231	45.200	67.700	0	0	01	0	901.100	N	3360001
4	CC 98325930	MUÑOZ YANDAR NICEFORO	1.602.363	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.602.363	256.400	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.602.363	200.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.602.363	64.100	1.602.363	39.100	0,02436	1.602.363	32.100	48.100	0	0	01	0	640.100	N	3360001
5	CC 1126454088	QUIROZ CAMPAÑA CARLOS ESNEHIDER	4.873.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.873.905	779.900	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	4.873.905	609.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	4.873.905	195.000	4.873.905	25.500	0,00522	4.873.905	97.500	146.300	0	0	01	0	1.853.500	N	1701001
6	CC 41119623	TOVAR CHAMORRO NARCISA EVELSI	2.180.738	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.180.738	349.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.180.738	272.600	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.180.738	87.300	2.180.738	11.400	0,00522	2.180.738	43.700	65.500	0	0	01	0	829.500	N	1701001
7	CC 97529053	ZAMBRANO CUACES JESUS NORIEL	1.719.226	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.719.226	275.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.719.226	215.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.719.226	68.800	1.719.226	41.900	0,02436	1.719.226	34.400	51.600	0	0	01	0	686.800	N	3360001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900304997	8	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-865	CRA 6 N5 131 BARRIO LA AMISTAD		3123214143			EMSERPUVAG@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35670246	E	2025-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.778.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35670246	2025-12-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 12971074	ACHICANOY CULCHA CLAUDIO AGUSTIN	2.223.050	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.341.612	374.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.341.612	292.800	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.341.612	93.700	2.341.612	101.900	0,04350	2.341.612	46.900	70.300	0	0	01	0	980.300	N	4382101
2	CC 18112865	MEDINA MORENO WILMER JHON	2.331.597	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.331.597	373.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.331.597	291.500	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.331.597	93.300	2.331.597	12.200	0,00522	2.331.597	46.700	70.000	0	0	01	0	886.800	N	1701001
3	CC 18124375	MUÑOZ PEDRO ENRIQUE	2.255.231	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.255.231	360.900	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	2.255.231	282.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.255.231	90.300	2.255.231	55.000	0,02436	2.255.231	45.200	67.700	0	0	01	0	901.100	N	3360001
4	CC 98325930	MUÑOZ YANDAR NICEFORO	1.602.363	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.602.363	256.400	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.602.363	200.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.602.363	64.100	1.602.363	39.100	0,02436	1.602.363	32.100	48.100	0	0	01	0	640.100	N	3360001
5	CC 1126454088	QUIROZ CAMPAÑA CARLOS ESNEHIDER	4.873.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.873.905	779.900	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	4.873.905	609.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	4.873.905	195.000	4.873.905	25.500	0,00522	4.873.905	97.500	146.300	0	0	01	0	1.853.500	N	1701001
6	CC 41119623	TOVAR CHAMORRO NARCISA EVELSI	2.180.738	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.180.738	349.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.180.738	272.600	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.180.738	87.300	2.180.738	11.400	0,00522	2.180.738	43.700	65.500	0	0	01	0	829.500	N	1701001
7	CC 97520053	ZAMBRANO CUACES JESUS NORIEL	1.719.226	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.719.226	275.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.719.226	215.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.719.226	68.800	1.719.226	41.900	0,02436	1.719.226	34.400	51.600	0	0	01	0	686.800	N	3360001

386

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900304997	8	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-865	CRA 6 N5 131 BARRIO LA AMISTAD		3123214143			EMSERPUVAG@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35670246	E	2025-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.778.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35670246	2025-12-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
17.304.672	17.304.672	17.304.672	17.304.672	17.304.672

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	2.769.100	0	0	0	2.769.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	256.400	0	0	0	256.400
PORVENIR	230301	800224808	8	5	2.138.000	0	0	0	2.138.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	374.700	0	0	0	374.700
EPS(Administradoras: 2)				7	2.163.500	0	0	0	2.163.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	1.071.900	0	0	0	1.071.900
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	3	1.091.600	0	0	0	1.091.600
ARP(Administradoras: 1)				7	287.000	0	0	0	287.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	287.000	0	0	0	287.000
CCF(Administradoras: 1)				7	692.500	0	0	0	692.500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891200337	8	7	692.500	0	0	0	692.500
SENA(Administradoras: 1)				7	346.500	0	0	0	346.500
SENA	PASENA	899999034	1	7	346.500	0	0	0	346.500
ICBF(Administradoras: 1)				7	519.500	0	0	0	519.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	519.500	0	0	0	519.500
Gran Total					6.778.100	0	0	0	6.778.100

387

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900304997	8	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-865	CRA 6 N5 131 BARRIO LA AMISTAD		3123214143			EMSERPUVAG@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35724585	E	2025-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.753.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35724585	2026-01-26	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 12971074	ACHICANOY CULCHA CLAUDIO AGUSTIN	2.223.050	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.282.331	365.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.282.331	285.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.282.331	91.300	2.282.331	99.300	0,04350	2.282.331	45.700	68.500	0	0	01	0	955.300	N	4382101
2	CC 18112865	MEDINA MORENO WILMER JHON	2.331.597	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.331.597	373.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.331.597	291.500	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.331.597	93.300	2.331.597	12.200	0,00522	2.331.597	46.700	70.000	0	0	01	0	886.800	N	1701001
3	CC 18124375	MUÑOZ PEDRO ENRIQUE	2.255.231	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.255.231	360.900	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	2.255.231	282.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.255.231	90.300	2.255.231	55.000	0,02436	2.255.231	45.200	67.700	0	0	01	0	901.100	N	3360001
4	CC 98325930	MUÑOZ YANDAR NICEFORO	1.602.363	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.602.363	256.400	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.602.363	200.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.602.363	64.100	1.602.363	39.100	0,02436	1.602.363	32.100	48.100	0	0	01	0	640.100	N	3360001
5	CC 1126454088	QUIROZ CAMPAÑA CARLOS ESNEHIDER	4.873.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.873.905	779.900	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	4.873.905	609.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	4.873.905	195.000	4.873.905	25.500	0,00522	4.873.905	97.500	146.300	0	0	01	0	1.853.500	N	1701001
6	CC 41119623	TOVAR CHAMORRO NARCISA EVELSI	2.180.738	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.180.738	349.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.180.738	272.600	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.180.738	87.300	2.180.738	11.400	0,00522	2.180.738	43.700	65.500	0	0	01	0	829.500	N	1701001
7	CC 97520053	ZAMBRANO CUACES JESUS NORIEL	1.719.226	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.719.226	275.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.719.226	215.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.719.226	68.800	1.719.226	41.900	0,02436	1.719.226	34.400	51.600	0	0	01	0	686.800	N	3360001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900304997	8	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-865	CRA 6 N5 131 BARRIO LA AMISTAD		3123214143			EMSERPUVAG@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35724585	E	2025-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.753.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35724585	2026-01-26	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
17.245.391	17.245.391	17.245.391	17.245.391	17.245.391

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	2.759.600	0	0	0	2.759.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	256.400	0	0	0	256.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	365.200	0	0	0	365.200
PORVENIR	230301	800224808	8	5	2.138.000	0	0	0	2.138.000
EPS(Administradoras: 2)				7	2.156.000	0	0	0	2.156.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	1.064.400	0	0	0	1.064.400
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	3	1.091.600	0	0	0	1.091.600
ARP(Administradoras: 1)				7	284.400	0	0	0	284.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	284.400	0	0	0	284.400
CCF(Administradoras: 1)				7	690.100	0	0	0	690.100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891200337	8	7	690.100	0	0	0	690.100
SENA(Administradoras: 1)				7	345.300	0	0	0	345.300
SENA	PASENA	899999034	1	7	345.300	0	0	0	345.300
ICBF(Administradoras: 1)				7	517.700	0	0	0	517.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	517.700	0	0	0	517.700
Gran Total					6.753.100	0	0	0	6.753.100

389
