CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	Hoja N20o.	De

IDENTIFICACIÓN	
Código y nombre de la unidad administrativa	1000 - Despacho del Alcalde
Código y nombre de la oficina productora	1030 - Oficina de contratación
Código y nombre de la serie documental	1030 - 19 Contratos
Código y nombre de la subserie documental	1030-19.07 Contratos de Obras
Nombre del expediente	1279-2023 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH

CONTENIDO

Ítem	Fecha de incorporación al expediente (AAAA-MM-DD)	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo documental (Descripción)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	1-04-2026	19-06-2026	Oficio de entrega de informe mensual de obra e interventoria	31959	Natalia M	
2	1-04-2026	19-06-2026	Informe mensual de obra N°19 mes de Abril	31960-32134	Natalia M	
3	1-04-2026	19-06-2026	Anexos	32135-32153	Natalia M	

RESPONSABLES

Elaborado por		Responsable del área u oficina productora	
Nombres y apellidos:	Natalia Martinez Arévalo	**Nombres y apellidos:**	
Cargo:	Coordinadora Administrativa	**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**	
Fecha de cierre del expediente (AAAA-MM-DD)			

31959

Villavicencio, 19 de junio de 2026

CER-136-2026

Señora

MARISTELLA SANTANA TORRES
Secretaria de infraestructura
Villavicencio- Meta

REF: contrato de obra pública 1279 de 2023 "Reconstrucción total de la institución educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio meta"

Asunto: Entrega del informe mensual de obra e interventoría a obra del mes de abril.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos remitir para su conocimiento y fines pertinentes el informe mensual de obra e interventoría a obra, correspondiente al mes de abril de 2026, el cual comprende las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026.

1

Agradecemos la atención prestada al presente documento y quedamos atentos a cualquier observación, comentario o requerimiento adicional que consideren pertinente.

Cordialmente,

HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO AR
NIT: 901.983.071-9

INFORME MENSUAL DE OBRA N° 19

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH

CONTRATO 1279 de 2023



"RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".

01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL 2026

VERSION 0

Control de Aprobaciones y Versiones

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	FOLIOS
0	05-05-2026	DOCUMENTO ORIGINAL	177

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL DIANA CAROLINA VEGA CASTILLO ASTRID RUÍZ GONZÁLEZ MARIA DEL PILAR SEPULVÉDA SUÁREZ	
ING. APOYO TÉCNICO PROFESIONAL SST	NOMBRE: ING. YEISON GOMEZ GUERRERO DIRECTOR DE OBRA

INTRODUCCIÓN. 7

OBJETIVOS. 8

Objetivo General. 8

Objetivos Específicos 8

1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA. 9

1.1 Descripción General del Proyecto. 9

1.2 Localización de Obra. 11

1.3 Implantación del Proyecto. 13

1.4 Alcance del Proyecto. 14

1.5 Control de Garantías. 15

2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 37

2.1 Programación de Obra del Proyecto. 37

2.2 Análisis Programado Acumulado vs Ejecutado Acumulado. 37

2.3 Grafica de Avance Físico vs Programado 39

3 COMPONENTE TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA. 40

3.1 Actividades Realizadas 40

Capítulo 3. Trazado y Replanteo Arquitectónico 40

Capítulo 4. Columnas Concreto 28 Mpa-4000 Psi 41

Capítulo 4. Acero de Refuerzo Estructural 42

Items No Previstos 43

Plan de Manejo de Transito (PMT) 52

3.2 Uso de Maquinarias y Equipos. 54

3.3 Bitácora o Libro de Obra 55

3.4 Estado del Tiempo. 55

4 GESTIÓN DE CALIDAD ACORDE AL PLAN DE CALIDAD. 57

4.1 Certificado de Laboratorio 57

4.2 Ensayos de Laboratorios 57

4.3 Ensayos de Muestras de Concreto 57

4.4 Ensayos In Situ 67

4.5 Ensayo de Asentamiento o Slump 68

4.6 Certificado de Calidad de Materiales y Equipos. 69

4.7 Fichas Técnicas de Mortero para Mampostería Estructural 69

4.8 Ladrillo Prensado Estructural 70

4.9 Equipos de Topografía 70

5 INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 72

5.1 Relación del Personal Empleado en la Ejecución de la Obra en el Mes. 81

Powel Ingenieria y Servicios 95

Construcruz (William Cruz-Mampostería) 97

5.2 Registro de Entrega, Reemplazo de EPP´s y Dotación. 100

5.3 Procesos de Inducción al Ingreso de Obra. 100

5.4 Retiros de Personal 103

5.5 Charlas de Seguridad y Capacitaciones. 104

5.6 Control de Actividades de Alto Riesgo. 105

5.7 Inspecciones Planificadas. 106

5.8 Visitas y Comités en Obra 107

5.9 Accidentabilidad. 109

5.10 Frecuencia de Accidentalidad. 110

5.11 Severidad de Accidentalidad. 110

5.12 Ausentismo Laboral. 110

6 INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL. 111

7 MEDIO ABIÓTICO 113

7.1 Manejo y Disposición de Materiales Sobrantes de Demolición Excavación y Construcción 113

7.2 Clasificación de Material Aprovechable y No Aprovechable 114

7.3 Manejo Adecuado de los Materiales de Construcción 114

7.4 Programa para el Manejo Eficiente del Agua y Vertimientos 117

7.5 Manejo de Residuos Líquidos Domésticos 118

7.6 Manejo de Residuos Sólidos y Especiales 119

8 MEDIO BIÓTICO 121

8.1 Programa de Manejo de Remoción de Cobertura Vegetal y Descapote 122

8.2 Manejo de Flora 122

8.3 Manejo de Fauna 124

8.4 Manejo de Sustancias Químicas 124

8.5 Manejo de Señalización en la Obra 126

8.6 Manejo de Maquinaria y Equipos en Obra 126

8.7 Anexo 22: Inspección Ambiental a Contratistas 128

8.8 Anexo: 23 Inspección Maquinaria y Equipo Menor 128

8.9 Anexo: 24 Vales Ingreso de Material 128

8.10 Programa de Educación y Capacitación al Personal del Proyecto 129

8.11 Seguridad y Salud en el Trabajo. 130

8.12 Programa de Información y Participación Comunitaria 131

9 INSPECCIÓN AMBIENTAL. 132

10 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL. 141

11 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 153

11.1 Comité y/o Reuniones de Obra. 153

11.2 Gestión de Comunicaciones 153

12 COMPONENTE FINANCIERO. 155

12.1 Relación Inversión del Anticipo. 155

12.2 Plan de Inversión del Anticipo Versión 3 155

12.3 Ejecución Financiera del Anticipo 166

12.4 Liquidación Del Encargo Fiduciario 168

12.1 Relación Actas de Pago Parcial 169

CONCLUSIÓN. 170

ILUSTRACIONES 174

INTRODUCCIÓN.

El presente Informe Mensual de Obra correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril del 2026 tiene como propósito presentar de manera detallada, verificable y objetiva el avance físico, técnico, administrativo y financiero del proyecto de construcción. Este documento consolida la información necesaria para garantizar el adecuado seguimiento y control.

En este informe se describen las actividades ejecutadas en cada uno de los frentes de trabajo, el uso de recursos, así como la evidencia fotográfica que soporta el progreso alcanzado durante el mes. Asimismo, se integran las novedades y gestiones adelantadas en los componentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), gestión ambiental y gestión social, incluyendo las acciones preventivas y correctivas implementadas.

De igual manera, se presenta el estado contractual, administrativo y financiero actualizado, con reporte de actas parciales, valores ejecutados, pagos tramitados y el cumplimiento documental exigido

OBJETIVOS.

Objetivo General.

Presentar de manera detallada y verificable el avance físico, administrativo, técnico y financiero correspondiente al periodo evaluado, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento, control y toma de decisiones del proyecto de construcción.

Objetivos Específicos

- Describir el avance físico y técnico del proyecto, detallando las actividades ejecutadas, los frentes de trabajo activos, las cantidades desarrolladas, el uso de recursos y la evidencia fotográfica que soporte la ejecución mensual.
- Consolidar la gestión y novedades identificados durante el periodo, así como el reporte integral de la gestión en SST, ambiental y social, incluyendo las acciones implementadas.
- Presentar el estado contractual, administrativo y financiero, reportando actas parciales, valores ejecutados, pagos tramitados, cumplimiento documental.

1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

1.1 Descripción General del Proyecto.

A continuación, se aportarán datos generales del proyecto los cuales permitirán la comprensión del objeto del contrato 1279 de 2023, para su seguimiento y control, los cuales se describen a continuación:

Tabla 1 Datos Generales del Proyecto

Condiciones Generales	
Entidad Contratante	Municipio de Villavicencio
Contratista	Consorcio Educación C&G-MH
Objeto del Contrato	Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta
Representante Legal	Carlos Alberto Ferreira Sandino
Contrato N°	1279 de 2023
BIPN	2021-50001-0023 BPPIM 2021-050001-0021
NIT	901687301-9
Valor del Contrato	$25.094.607.822,56
Anticipo	20%
Valor Anticipo	$5.018.921.564,51
Plazo Inicial	10 meses
Plazo Modificado	7 meses y Once Días
Fecha Contrato	16 de marzo de 2023
Fecha Modificación 1	15 de mayo de 2023
Fecha Acta de Inicio	20 de mayo de 2023

Condiciones Generales	
Fecha Modificación 2	02 de junio de 2023
Fecha Entrega del lote	21 de junio de 2023
Fecha Prorroga No. 1	22 de diciembre de 2023
Plazo Prorroga No. 1	12 meses
Fecha Modificación 3	22 de diciembre de 2023
Suspensión No. 1	26 de abril de 2024
Plazo suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.1 suspensión No. 1	25 de mayo de 2024
Plazo ampliación No.1 suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.2 suspensión No. 1	25 de junio de 2024
Plazo ampliación No.2 suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.3 suspensión No. 1	25 de julio de 2024
Plazo ampliación No.3 suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.4 suspensión No. 1	25 de agosto de 2024
Plazo ampliación No.4 suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.5 suspensión No. 1	25 de septiembre de 2024
Plazo ampliación No.5 suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.6 suspensión No. 1	25 de octubre de 2024
Plazo ampliación No.6 suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.7 suspensión No. 1	25 de noviembre de 2024
plazo ampliación No.7 suspensión No. 1	2 meses

Condiciones Generales	
Fecha ampliación No.8 suspensión No. 1	24 de enero de 2025
plazo ampliación No.8 suspensión No. 1	1 mes
Fecha ampliación No.9 suspensión No. 1	24 de febrero de 2025
Plazo ampliación No.9 suspensión No. 1	2 meses
Fecha ampliación No.10 suspensión No. 1	24 de abril de 2025
Plazo ampliación No.10 suspensión No. 1	2 meses y 10 días
Fecha ampliación No.11 suspensión No. 1	04 de julio de 2025
Plazo ampliación No.11 suspensión No. 1	3 meses
Acta Reinicio	06 de octubre de 2025
Fecha Modificación 4	31 de octubre de 2025
Fecha de Culminación del Contrato	**05 de junio de 2026**

1.2 Localización de Obra.

EL proyecto está ubicado en el corregimiento 4, del centro poblado Altos de Pompeya calle 6 # 19-36, Villavicencio capital del departamento del Meta, en un terreno de 1.8 Ha, destinado para la construcción del nuevo colegio Alfonso López Pumarejo, con una superficie de 0,3392 Km^2.

En la siguiente tabla se adjuntaron los diferentes tipos de coordenadas de ubicación geográfica del centro poblado Altos de Pompeya, información que nos permitirá realizar la ubicación de coordenadas reales para la posterior georreferenciación del proyecto.

Tabla 2 Ubicación Geográfica Centro Poblado Altos de Pompeya

Ubicación Geográfica	
Coordenadas Geográficas	Norte 4°03´48" Oeste 73°23´48"
Coordenada Decimales	Norte 4,063333° Oeste -73,396667°
UTM	449304 677989 18N

Para obtener una mejor comprensión y asimilación de la ubicación geográfica del centro poblado de Altos de Pompeya en la siguiente ilustración se demostrará como el valor informativo de una imagen nos ayuda a entender lo plasmado en los párrafos antes mencionados.

Ilustración 1 Localización del Proyecto



1.3 Implantación del Proyecto.

Implica la distribución y ordenamiento de los espacios para los diferentes fines previstos, correspondería a los diferentes módulos que componen la estructura física y obras de urbanismo del nuevo Colegio Alfonso López Pumarejo.

Ilustración 2 Implantación y Localización General



1.4 Alcance del Proyecto.

El Consorcio Educación C&G-MH, enmarcado en el alcance del contrato llevará a cabo la construcción del Colegio Alfonso López Pumarejo hasta la terminación de las edificaciones y demás construcciones en funcionamiento para ser entregada a la entidad para sus operaciones principales las cuales se describen a continuación:

Tabla 3 Áreas a Construir por Edificaciones

Cuadro de Áreas y Niveles

Módulo	Piso	Espacios	Nivel	Área (m²)	Área (m²) Construida
Administración	1	Rectoría, Recepción, secretarias	3,60	1009,00	2037,00
	2	Salas de Profesores	8,00	1028,00	
Educativo	1	Aulas Primarias	3,00	1784,00	5206,00
	2	Aulas Secundaria	8,00	1784,00	
	3	Talleres y sistemas	11,75	1638,00	
Pre Escolar	1	Aulas Preescolar	5,30	425,00	425,00
Polideportivo	1	Polideportivo	0,99	1088,58	1088,58
TOTAL					**8756.58**

Como parte de la ejecución del Consorcio Educación C&G-MH, para la construcción del proyecto se aplicarán las directrices establecidas en los planes y programas determinados que se implementaran y a continuación se mencionan: Plan de Manejo Ambiental Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-, Plan de Gestión Social, PDT Programa Detallado de Trabajo, Programa de subcontratos y compras, Plan de manejo e inversión de anticipo y plan de calidad.

1.5 Control de Garantías.

Para garantizar la atención de posibles daños ocasionados de manera involuntaria a terceros durante la ejecución de la obra, y en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Obra 1279 de 2023, el Consorcio Educación C&G-MH, mantiene un control sobre las garantías exigidas contractualmente.

En este sentido, se presentan a continuación las tablas de seguimiento y verificación de las pólizas, las cuales respaldan la adecuada cobertura y vigencia de los amparos requeridos para el desarrollo del proyecto:

Tabla 4 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Contrato

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.391,15	16/03/2023	17/01/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.117,00	16/03/2023	17/01/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.117,00	16/03/2023	17/01/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.117,00	16/03/2023	17/01/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial con Fecha de Firma Inicial de Contrato de Obra.

Tabla 5 Póliza de Seguro Cumplimiento Contrato

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.782,30	20/05/2023	30/06/2024

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.564,60	20/05/2023	30/06/2024
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.391,15	20/05/2023	31/12/2026
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.911,50	31/12/2023	31/12/2028

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial Correspondiente a la Actualización con Fecha del Acta de Inicio.

Tabla 6 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Acta de Inicio

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.391,15	16/03/2023	18/01/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.117,00	16/03/2023	18/01/2024
	Responsabilidad	$ 376.419.117,00	16/03/2023	18/01/2024

	Civil patronal			
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.117,00	16/03/2023	18/01/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial con Fecha de Firma Inicial de Contrato de Obra.

Tabla 7 Póliza de Seguro Cumplimiento Acta de Inicio

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.782,30	20/05/2023	30/06/2024
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.564,60	20/05/2023	30/06/2024
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.391,15	20/05/2023	31/12/2026
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.911,50	31/12/2023	31/12/2028

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial Correspondiente a la Actualización con Fecha del Acta de Inicio.

Tabla 8 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Prorroga No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.392,00	20/05/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.117,00	20/05/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.117,00	20/05/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.117,00	20/05/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 9 Póliza de Seguro Cumplimiento – Prorroga No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.782,30	22/12/2023	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.564,60	22/12/2023	30/06/2025

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.391,15	22/12/2023	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.911,50	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 10 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Modificación No. 3.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	20/05/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	20/05/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	20/05/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	20/05/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 11 Póliza de Seguro Cumplimiento – Modificación No. 3

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	22/12/2023	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	22/12/2023	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	22/12/2023	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 12 Póliza de Seguro Cumplimiento – Suspensión No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	26/04/2024	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	26/04/2023	30/06/2025

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	26/04/2023	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 13 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 14 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 1 Suspensión No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	25/05/2024	30/07/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	25/05/2023	30/07/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	25/05/2023	31/01/2028
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	28/02/2025	28/02/2030

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 15 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 1 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	28/02/2025
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	28/02/2025

	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	28/02/2025
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	28/02/2025

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 16 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 2 Suspensión No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	25/06/2024	30/08/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	25/06/2023	30/08/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	25/06/2023	31/02/2028
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	28/03/2025	28/03/2030

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 17 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 2 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta

RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/04/2023	28/03/2025
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/04/2023	28/03/2025
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/04/2023	28/03/2025
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/04/2023	28/03/2025

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 18 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 4 Suspensión No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	23/08/2024	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	23/08/2024	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	23/08/2024	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 19 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 4 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 20 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 5 Suspensión No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	25/09/2024	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	25/09/2024	30/06/2025

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	25/09/2024	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 21 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 5 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 22 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 6 Suspensión No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	25/10/2024	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	25/10/2024	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	25/10/2024	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 23 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 6 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Responsabilidad	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Civil patronal			
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 24 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 7, 8 y 9 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	25/11/2024	30/03/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	25/11/2024	30/03/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	25/11/2024	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 25 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 7, 8 y 9 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 26 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 10 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	25/11/2024	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	25/11/2024	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	25/11/2024	31/12/2027

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 27 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 10 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 28 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 11 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	26/04/2024	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	26/04/2024	30/06/2025

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	26/04/2024	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 29 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 11 Suspensión No. 1.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 30 Póliza de Seguro Cumplimiento – Acta Reinicio

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	20/05/2023	06/12/2026
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	20/05/2023	06/12/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	20/05/2023	06/06/2029
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	20/05/2023	06/06/2031

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 31 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Acta Reinicio

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	06/06/2026
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026
	Responsabilidad	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026

	Civil patronal			
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 32 Póliza de Seguro Cumplimiento – Modificatoria N° 4

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	30/10/2025	06/12/2026
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	30/10/2025	06/12/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	30/10/2025	06/06/2029
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	06/06/2026	06/06/2031

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880 Anexo N° 20 Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 33 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Modificatoria N° 4

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	06/06/2026

	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026

Nota. Póliza de RCE N° 100008195.Anexo 22 Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 34 Póliza de Seguro Cumplimiento – Cesión de Posición Contractual

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	09/12/2025	06/12/2026
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	09/12/2025	06/12/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	09/12/2025	06/06/2029
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	06/06/2026	06/06/2031

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880 Anexo N° 21 y 22 Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Tabla 35 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Cesión de Posición Contractual

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	16/03/2023	06/06/2026
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	16/03/2023	06/06/2026

Nota. Póliza de RCE N° 100008195.Anexo 23 y 24 Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

2 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

El avance en el cumplimiento de las metas se evalúa a partir de la relación del flujo de inversión ajustado conforme a la Modificatoria N.º 4 del 31 de octubre de 2025, evidenciando la correspondencia entre los recursos financieros ejecutados y la programación actualizada del proyecto.

2.1 Programación de Obra del Proyecto.

Tabla 36 Flujo de Inversión Programado Por Mes

Mes	Avance Programado Mensual ($)	% Programado Mensual	Avance Programado Acumulado ($)	% Programado Acumulado
abr-24			$ 5,953,148,568	23.72%
DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 AL 05 OCTUBRE DEL 2025 EL CONTRATO SE ENCONTRABA SUSPENDIDO				
oct-25	$ 642,530,600	2.6%	$6,595,679,167.56	26.3%
nov-25	$ 973,796,537.57	3.9%	$7,569,475,705.13	30.2%
dic-25	$ 1,405,510,239.58	5.6%	$8,974,985,944.71	35.8%
ene-26	$ 1,810,794,424.87	7.2%	$10,785,780,369.58	43.0%
feb-26	$ 1,244,916,756.15	5.0%	$12,030,697,125.73	47.9%
mar-26	$ 1,349,680,916.88	5.4%	$13,380,378,042.61	53.3%
abr-26	$ 2,227,396,129.23	8.9%	$15,607,774,171.84	62.2%
may-26	$ 7,581,610,548.69	30.2%	$23,189,384,720.53	92.4%
jun-26	$ 1,905,222,981.65	7.6%	$25,094,607,702.18	100.0%

2.2 Análisis Programado Acumulado vs Ejecutado Acumulado.

El análisis del programado acumulado frente al ejecutado acumulado se desarrolla a partir de la relación del flujo de inversión ajustado conforme a la Modificatoria N.º 4, del 31 de octubre de 2025, lo cual permite evaluar el comportamiento real de la ejecución del proyecto del colegio respecto a la programación vigente.


Este análisis se soporta en tablas y representaciones gráficas que facilitan la identificación de indicadores de avance del proyecto.

Tabla 37 Relación Avance Programado Acumulado vs Avance Físico Acumulado

Mes	Programado Acumulado ($)	% Programado Acumulado	Ejecutado Mensual ($)	% Ejecutado Mensual	Ejecutado Acumulado ($)	% Ejecutado Acumulado
abr-24	$ 5,953,148,568	23.72%	$ 6,572,277,757.15	26.20%	$ 6,572,277,757.15	26.20%
DEL 26 DE ABRIL DEL 2025 AL 05 OCTUBRE DEL 2025 EL CONTRATO SE ENCONTRABA SUSPENDIDO						
oct-25	$ 6,595,679,167.56	26.3%	$ 225,030,624.35	0.90%	$ 6,797,308,381.50	27.1%
nov-25	$ 7,569,475,705.13	30.2%	$ 772,167,328.50	3.08%	$ 7,569,475,710.00	30.2%
dic-25	$ 8,974,985,944.71	35.8%	$ 702,889,347.04	2.80%	$ 8,272,365,057.04	33.0%
ene-26	$ 10,785,780,369.58	43.0%	$ 656,586,258.56	2.62%	$ 8,928,951,315.60	35.6%
feb-26	$ 12,030,697,125.73	47.9%	$ 1,726,434,140.40	6.88%	$ 10,655,385,456	42.4%
mar-26	$ 13,380,378,042.61	53.3%	$ 1,545,181,475.00	6.16%	$ 12,200,566,931	48,6%
abr-26	$ 15,132,048,444.41	60.3%	$ 931,360,669	3.71%	$ 13.131.927,600	52,3%
may-26	$ 23,189,384,720.53	92.4%				
jun-26	$ 25,094,607,702.18	100.0%				

2.3 Grafica de Avance Físico vs Programado.

Ilustración 3 Curva S Análisis de Avance Físico vs Programado

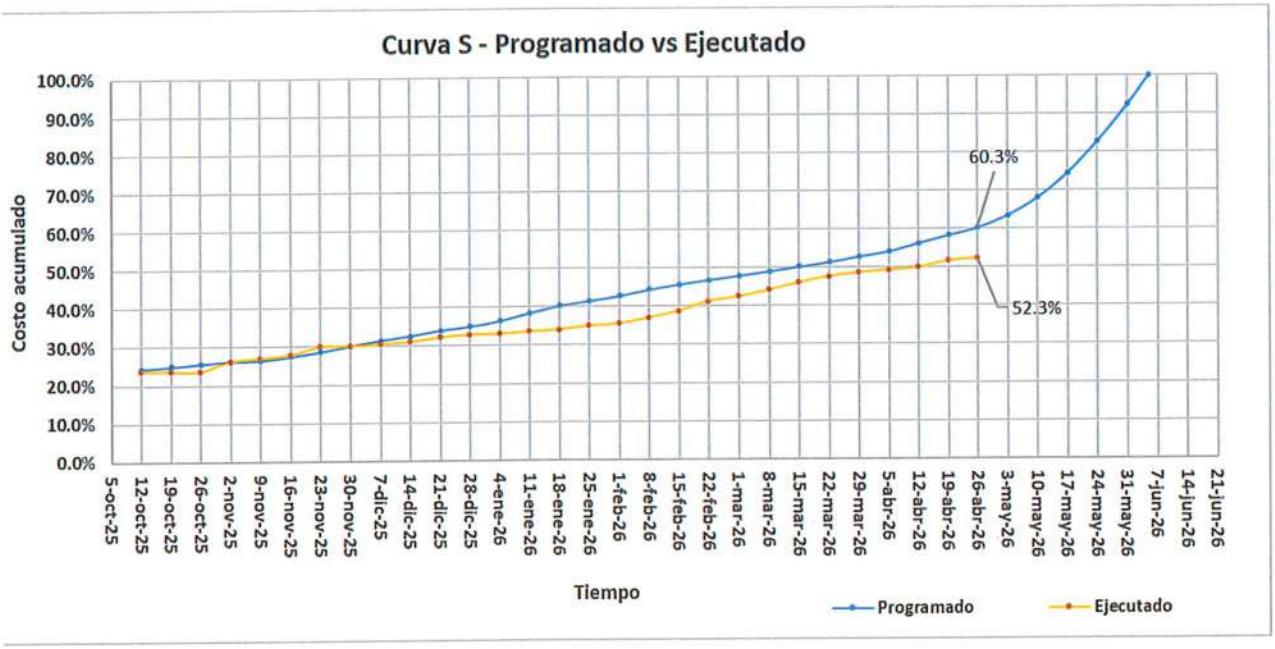

El porcentaje de obra ejecutado a la fecha del presente informe corresponde al 52,3%, frente a un 60,3% programado, conforme a lo evidenciado en la gráfica de control de programación, lo cual indica una diferencia entre la ejecución real y la planificación establecida para el corte evaluado. Ver anexo 1. Acta de avance mensual.

3 COMPONENTE TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA.

El Componente Técnico del Contrato de Obra comprende el conjunto de lineamientos, especificaciones y criterios constructivos que regulan la ejecución de las actividades propias del proyecto Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta

3.1 Actividades Realizadas

Las actividades realizadas corresponden al conjunto de acciones ejecutadas y orientadas al cumplimiento del componente técnico del contrato de obra, las cuales fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas, planos aprobados y lineamientos establecidos para el proyecto.

Estas actividades permiten verificar el avance físico del proyecto, así como el cumplimiento de las condiciones técnicas definidas para la adecuada ejecución de la obra, durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2026, garantizando el control, seguimiento y verificación de las actividades constructivas ejecutadas en obra.

Capítulo 3. Trazado y Replanteo Arquitectónico

Durante el periodo evaluado se ejecutaron las actividades correspondientes al ítem de trazado y replanteo arquitectónico, las cuales consistieron en la verificación, localización y materialización en campo de ejes, alineamientos, cotas y niveles establecidos en los planos arquitectónicos aprobados, permitiendo establecer con precisión la ubicación de los elementos arquitectónicos proyectados, constituyéndose en una actividad fundamental para el adecuado desarrollo de las etapas constructivas posteriores y para el cumplimiento de los criterios técnicos y normativos del proyecto

Tabla 38 Trazado y Replanteo Arquitectónico

Capítulo	Ítem	Descripción	Cantidad
2	2.1.3.	Trazado y Replanteo Arquit	365,58 m^2

Ilustración 4 Trazado y Replanteo Arquitectónico



Capítulo 4. Columnas Concreto 28 Mpa-4000 Psi

Las columnas de concreto constituyen un elemento estructural fundamental cumpliendo la función de transmitir de manera segura las cargas verticales y horizontales hacia la cimentación, garantizando la estabilidad y resistencia del sistema estructural. Asimismo, contribuyen al adecuado comportamiento sísmico de la estructura, asegurando la continuidad estructural y la correcta interacción con vigas y losas.

Ilustración 5 Columnas de Concreto 28 Mpa-4000 Psi



Durante el periodo correspondiente a abril de 2026, se ejecutaron las actividades asociadas a la construcción de columnas en los módulos administrativo, educativo y pedestales de polideportivo conforme a los diseños estructurales aprobados, especificaciones técnicas y normativa vigente, mediante el armado de formaletas aplomadas y posterior vaciado de concreto.

Tabla 39 Columnas de Concreto 28 Mpa-4000 Psi

Capítulo	Ítem	Descripción	Cantidad
4	4.1.1	Columna Concreto 28 Mpa - 4000 psi (m3)	19,89 m^3

Capítulo 4. Acero de Refuerzo Estructural

El acero de refuerzo consiste en barras que, al combinarse con el concreto, conforman el concreto reforzado y permiten mejorar su capacidad resistente y su desempeño estructural, para el Consorcio Educación C&G-MH, desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y preparación del acero de refuerzo de 60.000 PSI, incluyendo su figuración y disposición conforme a las especificaciones establecidas en los planos estructurales, bajo criterios de control técnico, asegurando la correcta identificación,

manipulación y organización del material que garanticen la adecuada integración del refuerzo dentro del sistema estructural proyectado.

Tabla 40 Acero de Refuerzo Estructural

Capítulo	Ítem	Descripción	Cantidad
4	4.9.1	Acero Refuerzo Figurado 412Mpa, (4200 kg/cm2, G60)	30.377,72 kg

En esta fase del proyecto se avanzó en la instalación del acero de refuerzo correspondiente a los elementos estructurales de columnas, vigas de entrepiso, vigas aéreas y pedestales, actividades ejecutadas durante el periodo evaluado en los módulos administrativo, educativo y polideportivo. Estas labores se desarrollaron conforme a los planos estructurales, especificaciones técnicas y procedimientos cumplimiento de los criterios de calidad, y condiciones técnicas requeridas.

Ilustración 6 Acero de Refuerzo Estructural





Items No Previstos

Estos ítems corresponden a actividades complementarias a las inicialmente contratadas para la construcción del Colegio Alfonso López Pumarejo, labores que emergen en la etapa de ejecución como

consecuencia de condiciones no previstas en los estudios y diseños preliminares, y resultan indispensables para garantizar la adecuada materialización del objeto contractual, su incorporación permite asegurar la continuidad técnica del proyecto.

NP 4.3.4 Vigas Aéreas en Concreto

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades relacionadas con la construcción de vigas aéreas en concreto reforzado, elementos estructurales diseñados para la transferencia y distribución de cargas provenientes de losas y otros componentes hacia columnas y apoyos definidos en el sistema estructural.

Tabla 41 Vigas Aéreas en Concreto

Ítem	Descripción	Cantidad
NP 4.3.4	Viga Aérea en Concreto 4000 Psi, a la Vista	56,66 m^3

Su correcta ejecución incide directamente en la seguridad estructural, evitando deformaciones excesivas y posibles fallas en el conjunto, estas labores incluyeron instalación de formaleta, colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto, durante el mes de abril de 2026, en el módulo administrativo, garantizando la estabilidad, rigidez y el adecuado comportamiento estructural de la edificación.

Ilustración 7 Concreto en Vigas Aéreas



NP 4.4.2 Losa Aligeradas de Concreto

El sistema constructivo de losas aligeradas con casetón de poliestireno expandido permite reducir cargas muertas sobre la estructura, garantizando al mismo tiempo la rigidez y capacidad portante requeridas, esta actividad se desarrolla en los módulos administrativo y educativo durante el mes de abril de 2026.

Tabla 42 Losa Aligerada de Concreto

Ítem	Descripción	Cantidad
NP 4.4.2	Losa Aligerada en Concreto a la Vista de 4000 Psi Premezclado, Altura de Losa Entre 0,75 a 0,90 m, Vigas y Riostras Descolgadas Altura Libre Entre 0,63 a 0,78 m, Torta Superior e= 0,12 m.	841,82 m^2

Esta actividad se ejecutó bajo control técnico y geodésico permanente, verificando el correcto armado del acero de refuerzo, la adecuada disposición de los elementos aligerantes y el cumplimiento de los niveles, alineaciones y espesores definidos en los planos estructurales, labores desarrolladas en los módulos administrativo.

Ilustración 8 Losa Aligerada de Concreto



NP 4.4.4 Losa Aligerada en Concreto para Cubiertas

Se ejecutaron actividades correspondientes a la construcción de losa aligerada en concreto para cubierta, concebida como un sistema estructural que optimiza el peso propio mediante la incorporación de elementos de aligeramiento, sin comprometer su capacidad resistente, este tipo de losa permite una adecuada distribución de cargas hacia vigas y apoyos, mejorando el desempeño estructural.

Tabla 43 Losa Aligerada de Concreto en Cubiertas

Ítem	Descripción	Cantidad
NP 4.4.4	Losa Aligerada en Concreto a la Vista para cubierta de 4000 Psi Premezclado, Altura de Losa Entre 0,75 a 0,90 m, Vigas y Riostras Descolgadas Altura Libre Entre 0,63 a 0,78 m, Torta Superior e= 0,12 m.	39,33 m^2

La implementación de este elemento en la reconstrucción total del colegio Alfonso López Pumarejo responde a criterios de eficiencia estructural, durabilidad y comportamiento térmico, asimismo, se garantiza la integración funcional con los demás componentes del sistema constructivo.

Ilustración 9 Losa Aligerada de Concreto en Cubierta



NP 4.9.2. Suministro e Instalación de Malla Electrosoldada

La malla electrosoldada es un elemento de refuerzo ampliamente utilizado en elementos de concreto para controlar la fisuración, mejorar la distribución de esfuerzos y aumentar la durabilidad del sistema constructivo. En el periodo correspondiente a abril de 2026, su utilización fue fundamental en las losas aligerada de los módulos educativo, administrativo y polideportivo.

Tabla 44 Malla Electrosoldada Losa Contrapiso

Ítem	Descripción	Cantidad
NP 4.9.2	Suministro e Instalación de malla Electrosoldada	6.383,35 kg

La correcta colocación de la malla, con recubrimientos adecuados y alineación uniforme, permite garantizar un comportamiento estructural eficiente del contrapiso, optimizando la resistencia ante cargas de servicio y reduciendo la aparición de fisuras por retracción o asentamiento diferencial.

Ilustración 10 Malla Electrosoldada en Losas



NP 8.2 Placa Maciza de Contrapiso 28 Mpa-4000 Psi

Un elemento constructivo en concreto que se ejecuta sobre la base o relleno compactado, cuya función principal es proporcionar una superficie nivelada, resistente y uniforme que sirva de soporte para los acabados finales del piso y para la correcta distribución de cargas de uso, es la placa de contrapiso.

Ilustración 11 Losa de Contrapiso



El desarrollo de esta actividad se realizó durante el mes de abril de 2026, y correspondió a la ejecución de la losa de contrapiso del módulo educativo, incluyendo el vaciado, colocación, nivelación y curado del concreto, previa verificación de dimensiones, cotas y alineamientos, así como de las condiciones del terreno de soporte y la adecuada disposición de los elementos requeridos.

Tabla 45 Losa Contrapiso 4000 Psi

Ítem	Descripción	Cantidad
NP 8.2	Placa Maciza de Contrapiso, 28 Mpa (4000 PSI)	8,83 M^3

NP 11.3 Mampostería Ladrillo Estructural a la Vista

Durante el mes de abril de 2026 se ejecutaron actividades correspondientes a la mampostería en ladrillo estructural a la vista, utilizada como sistema portante y de cerramiento, caracterizada por su capacidad resistente y acabado arquitectónico final sin recubrimientos adicionales. Este elemento contribuye a la estabilidad estructural, garantizando la adecuada transmisión de cargas verticales y laterales hacia la cimentación.

Ilustración 12 Mampostería Estructural a la Vista



Tabla 46 Mampostería Estructural a la Vista

Ítem	Descripción	Cantidad
NP 11.3	Mampostería en Ladrillo Prensado Estructural a la Vista de 0.12X0.06X0.24	85,00 M^2

Su implementación en la reconstrucción del colegio Alfonso López Pumarejo responde a criterios de durabilidad, bajo mantenimiento y calidad estética. Asimismo, se asegura la correcta modulación, alineación y nivelación de los elementos, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y de la NSR-10, particularmente lo establecido en el Título D, Mampostería Estructural, donde se definen los requisitos de diseño, construcción y control para este tipo de sistemas.

NP 11.6 Dovelas en Mortero tipo Grouting para Mampostería

Se ejecutaron en el mes de abril de 2026 actividades correspondientes a la conformación de dovelas en mortero tipo grouting para mampostería, empleadas como elementos de confinamiento y refuerzo en muros estructurales. Estas permiten la integración del acero de refuerzo con las unidades de mampostería, mejorando la capacidad resistente y el comportamiento monolítico del sistema.

Ilustración 13 Dovelas en Mortero tipo Grouting para Mampostería



Su aplicación en la reconstrucción del colegio Alfonso López Pumarejo responde a la necesidad de garantizar continuidad estructural y adecuado desempeño ante cargas sísmicas. Asimismo, se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a lo establecido en el Título D – Mampostería Estructural de la NSR-10, asegurando el cumplimiento de los requisitos de resistencia y calidad.

Tabla 47 Dovelas en Mortero tipo Grouting para Mampostería

Ítem	Descripción	Cantidad
NP 11.6	Dovela en Mortero de Relleno Tipo Grouting para Celdas de Mampostería 17.5 Mpa	13,00 M

Ilustración 14 Excavación con Maquinaria Especializada



Ítem	Descripción	Cantidad
NC 2.3.3	Excavación Mecánica en Conglomerado Humedo H < 4.0m	13,00 M^3

La ejecución de las labores anteriormente descritas refleja el seguimiento de las disposiciones técnicas y parámetros constructivos definidos para el proyecto de Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta, permitiendo verificar la

adecuada implementación de los procedimientos y el control técnico de las intervenciones realizadas. Ver anexo 2. Formato de registro fotográfico.

Plan de Manejo de Transito (PMT)

El propósito principal del manejo de tránsito que se aplicara en la construcción del colegio Alfonso López Pumarejo, es mitigar el impacto en la movilidad ocasionado por la obra mediante alternativas seguras y controladas para los actores viales. (Peatones, transporte público, vehículos privados, transporte de cargas, etc. Ver anexo 3. Informe Aprobación PMT.

Es una herramienta técnica orientada a la formulación de estrategias, alternativas y actividades específicas destinadas a prevenir, minimizar y mitigar los impactos generados sobre las condiciones normales de movilización y desplazamiento de los usuarios de las vías, garantizando la seguridad vial, la continuidad del tránsito y la adecuada gestión de la circulación durante la ejecución de las actividades previstas.

Ilustración 15 Plan de Manejo de Transito abril 2026

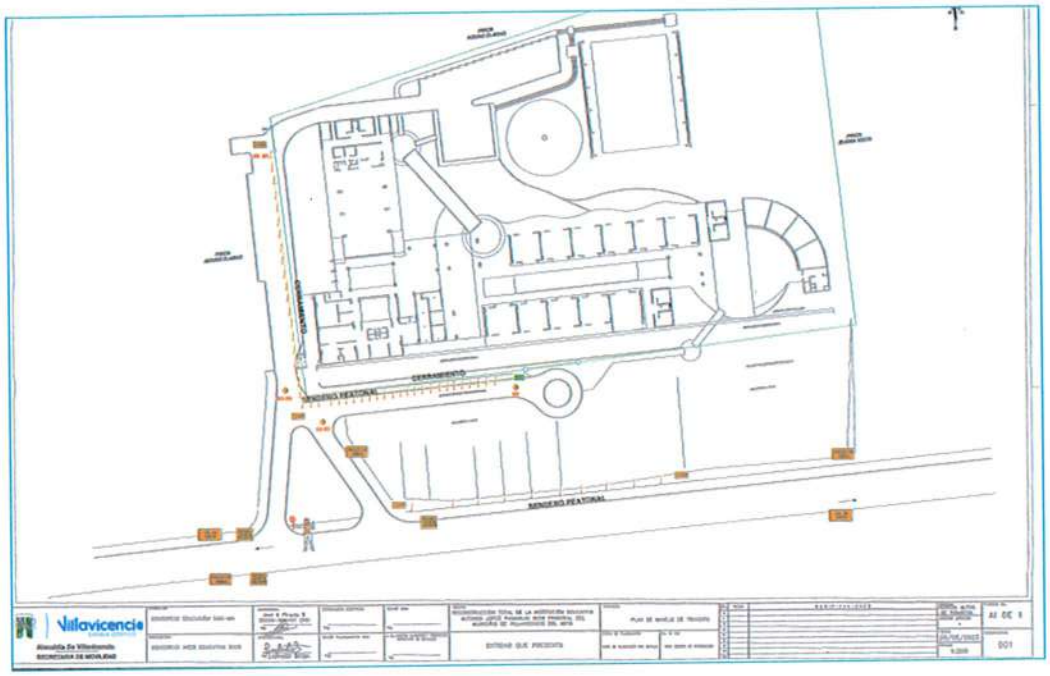


Ilustración 16 Implementación del Plan de Manejo de Transito abril 2026





El uso de controladores viales resulta fundamental, son los responsables de dirigir, regular y supervisar la correcta aplicación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), estas acciones permiten mantener condiciones

seguras para peatones, conductores y personal de obra durante la ejecución de las actividades constructivas, el seguimiento permanente del PMT asegura el cumplimiento de la normativa vigente y fortalece la gestión integral de la seguridad vial.

3.2 Uso de Maquinarias y Equipos.

Para el desarrollo de las actividades constructivas, el Consorcio Educación C&G-MH dispone en obra de la maquinaria y los equipos necesarios, garantizando la ejecución oportuna y eficiente de los procesos. La disponibilidad y operatividad de estos recursos constituye un componente fundamental para asegurar la continuidad de las labores y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Ilustración 17 Maquinaria en Obra abril 2026



En la siguiente tabla se presenta el listado y control de la maquinaria empleada, detallando su estatus operativo y la dedicación asignada al proyecto. Ver anexo 4. Certificados de Maquinarias y Equipos.

Tabla 48 Relación de Maquinarias Usadas en el Periodo abril 2026

Maquinaria	Placa	Marca	Modelo	Estatus	Dedicación
Planta de Concreto	-	DOMAT	DM SERIES	Operativa	100%
Bomba de Concreto	-	HAMAC	DHBT50-10-82	Operativa	100%

Maquinaria	Placa	Marca	Modelo	Estatus	Dedicación
Retroexcavadora	-	SINOMACH	630A	Operativa	100%
Minicargador	-	EARTTHFORCE	S18	Operativa	100%


3.3 Bitácora o Libro de Obra

Se adjuntan al presente informe copias de las anotaciones diarias registradas en la bitácora de obra, documento en el cual se consignan de manera detallada las actividades ejecutadas, las condiciones de operación y los aspectos técnicos relevantes para el seguimiento del proyecto, debidamente firmado por la interventoría y por el constructor, el Consorcio Educación C&G-MH, garantizando la validez y trazabilidad de la información consignada. Ver Anexo 5. Bitácora de Obra."

3.4 Estado del Tiempo.


En el gráfico siguiente se presentan las condiciones climatológicas registradas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, correspondiente a la ejecución de las actividades del proyecto. Esta información permite identificar las variaciones atmosféricas que pudieron incidir en el desarrollo normal de los procesos constructivos.

Ilustración 18 Registro Diario del Clima abril 2026

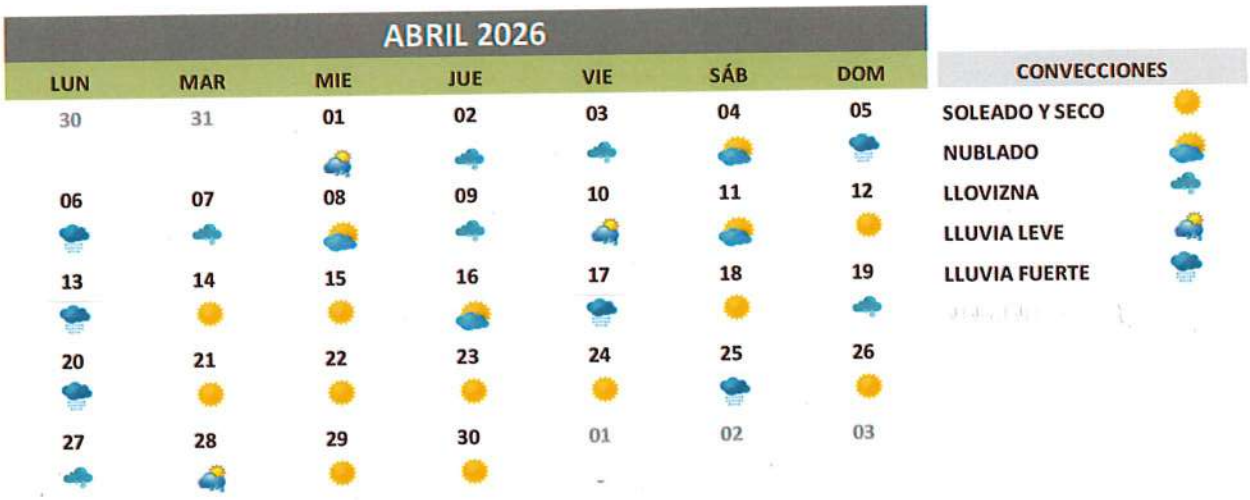

Las observaciones relacionadas con el estado del tiempo fueron consignadas diariamente en la bitácora de obra, con el propósito de facilitar su análisis, seguimiento y correlación con el avance de las actividades ejecutadas, permitiendo evaluar su incidencia en los rendimientos, la programación y la continuidad de los trabajos.

Ilustración 19 Influencia del Clima abril 2026

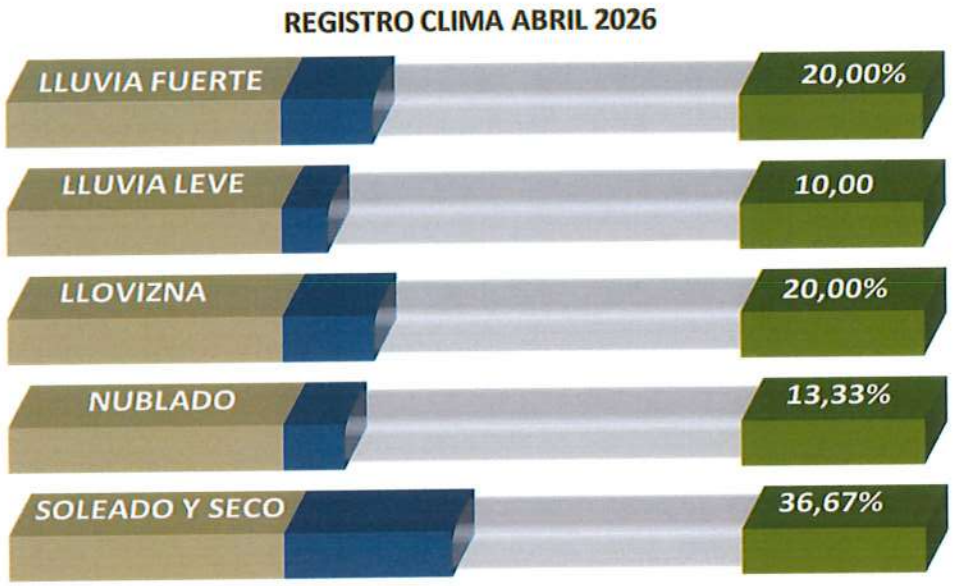

El registro climático de abril de 2026, evidencia una predominancia de condiciones secas, con un 36,67% de días soleados, lo que favorece la continuidad de actividades constructivas. No obstante, se observa una incidencia significativa de precipitación (50% acumulado entre lluvia fuerte, leve y llovizna), lo cual pudo generar interrupciones parciales. Las condiciones nubladas (13,33%), reflejan variabilidad atmosférica intermedia. En conjunto, el comportamiento climático presenta un equilibrio entre periodos secos y húmedos, implicando la necesidad de planificación operativa adaptable.

4 GESTIÓN DE CALIDAD ACORDE AL PLAN DE CALIDAD.

El presente Plan de Calidad ha sido elaborado por el Consorcio Educación C&G-MH, en cumplimiento de los requisitos establecidos para el desarrollo específico del contrato. Su contenido se encuentra estructurado de acuerdo con las directrices definidas en las normas ISO 9001:2015 y GTC-ISO 10005:2019, asegurando la coherencia con el Sistema de Gestión de Calidad implementado por C&G Ingeniería y Construcciones S.A.S., responsable de la administración y ejecución del Contrato No. 1279 de 2023.

4.1 Certificado de Laboratorio

El Consorcio Educación C&G-MH realiza la contratación del laboratorio NHSQ Ingeniería S.A.S., acreditado por el ONAC bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, registro 23-LAB-069, mediante el cual se certifica la calidad de los diseños de mezcla y de los materiales utilizados en los ensayos requeridos, con el propósito de garantizar la idoneidad de los insumos empleados en el proyecto.

La intervención del laboratorio contribuye a la trazabilidad y confiabilidad de los ensayos realizados durante el desarrollo de la obra. Ver anexo 6. Certificado de Laboratorio.

4.2 Ensayos de Laboratorios

Para asegurar la correcta ejecución de las actividades de obra el Consorcio Educación C&G-MH, efectuará los ensayos correspondientes para el control y seguimientos de las características de los materiales empleados de acuerdo a las normas establecidas con el objeto de obtener resultados confiables que aseguren la calidad y confiabilidad de los proyectos.

4.3 Ensayos de Muestras de Concreto

Para garantizar la correcta ejecución de las actividades constructivas, el Consorcio Educación C&G-MH, implementa los ensayos necesarios para el control y seguimiento de las características de los materiales utilizados, en estricto cumplimiento de las normas vigentes. Este proceso permite obtener resultados confiables que respaldan la calidad y la seguridad del proyecto, asegurando que cada elemento cumpla con los parámetros técnicos establecidos.


Tabla 49 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 6-7-8-9-12 Días

ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-189A	MODULO C. PLACA ENTREPISO NIVEL 3 FUNDIDA 3 EJE K-L + 1/3 DEL 11-13 SUR	4000	21/03/2026	28/03/2026	7	23,8	86,4
GT-190A	MODULO C. PLACA ENTREPISO NIVEL 3 FUNDIDA 3 EJES L-M + 1/3 DEL 11-13 SUR	4000	24/03/2026	30/03/2026	6	24,4	92,2
GT-197A	MODULO EDUCATIVO PLACA ENTREPISO NIVEL 3 FUNDIDA 4 SUR ESTE M+1/3 A N 1/3 DEL 11-13	4000	06/04/2026	14/04/2026	8	27,4	99,5
GT-198A	MODULO ADMINISTRATIVO LOSAS Y VIGAS N+6,55 EJE 8 10/H-I VIGAS 201B-211B	4000	06/04/2026	14/04/2026	8	29,9	108,4
GT-199A	MODULO C EDUCATIVO COLUMNA PRIMER PISO EJ P DEL 6-9-11-13	4000	08/04/2026	15/04/2026	7	23,9	86,8
GT-200A	MODULO C EDUCATIVO PLACA ENTREPISO NIVEL 3 FUNDIDA 4 NORTE EJE M 113 A N 113 DEL 6-9	4000	09/04/2026	16/04/2026	7	26,6	96,4
GT-201A	MODULO ADM VIGAS AEREAS N+10.55 404B-405B-406B-408B-409B-410B-411B	4000	13/04/2026	25/04/2026	12	23,6	85,7
GT-202A	MODULO POLIDEPORTIVO LOSA CONTRAPISO ALA B	4000	16/04/2026	25/04/2026	9	25,5	92,4
GT-203A	MODULO C EDUCATIVO PLACA ENTREPISO NIVEL 2 FUNDIDA SUR EJE O + 1/3 A P 1/3 DEL 11-13	4000	16/04/2026	25/04/2026	9	27,0	97,8

ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-204A	MODULO C PLACA ENTRE PISO NIVEL 2 FUNDIDA NORTE EJE O 1/3 AL P 1/3 DEL 6-9	4000	17/04/2026	25/04/2026	8	26,3	95,4
GT-205A	MODULO C EDUCATIVO PLACA ENTRE PISO NIVEL 5 FUNDIDA SUR 5TA EJE N+1/3 AL O 1/3 11-13	4000	17/04/2026	25/04/2026	8	25,2	91,3
GT-206A	MODULO - C EDUCATIVO PLACA ENTRE PISO NIVEL 3 FUNDIDA NORTE EJE N MAS 1/3 A O 1/3 DEL 6 Y 9	4000	23/04/2026	30/04/2026	7	25,9	93,9

Ver anexo 7. Informe Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros de Concreto.

Ilustración 20 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 6-7-8-9-10 Días

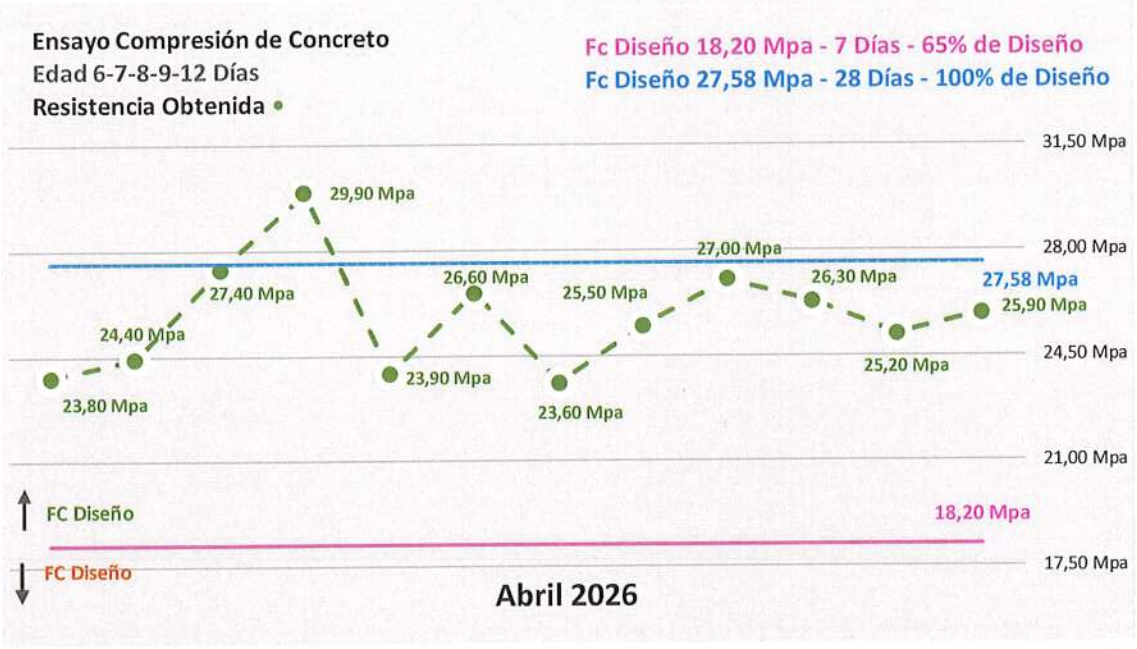

El comportamiento de la resistencia a la compresión del concreto a edades de 6-7-8-9 y 12 días durante abril de 2026, presentan una variabilidad comprendida entre 23,60 MPa y 29,90 MPa, valores que superan ampliamente la resistencia de diseño esperada para esta edad (18,20 MPa, equivalente al 65% de f'c).

La totalidad de los resultados se ubica por encima del umbral mínimo requerido, evidenciando un adecuado desarrollo temprano de resistencia, asimismo, varios registros se aproximan e incluso superan el valor de diseño a 28 días (27,58 MPa), lo que indica un desempeño favorable del concreto, asociado a condiciones adecuadas de dosificación, colocación y curado. En términos generales, se cumple satisfactoriamente con los criterios de calidad establecidos para el control a edad temprana.

Tabla 50 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 14-16-17 Días


ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-183B	MODULO C. PLACA ENTRE PISO NIVEL 3 EJEJ-K +1/3 DEL 6-9	4000	14/03/2026	28/03/2026	14	27,5	99,8
GT-184B	MODULO ADM COL G10-G12-I12-I13	4000	16/03/2026	30/03/2026	14	28,1	1017
GT-185B	MODULO C. EDUCATIVO PLACA CONTRA PISO EJE O-P + 1/3 DEL 6, 9, 11, 13	4000	17/03/2026	31/03/2026	14	27,7	100,4
GT-186B	MODULO C. PLACA ENTRE PISO NIVEL 2 FUNDIDA 5 EJE N-O+1/3 DEL 6-9	4000	18/03/2026	01/04/2026	14	26,0	94,3
GT-187B	POLIDEPORTIVO PEDESTALES B1-B2-B3	4000	19/03/2026	02/04/2026	14	26,5	95,9
GT-188B	MODULO C. EDUCATIVO PLACA ENTRE PISO NIVEL 2 FUNDIDA 5 EJE N-O + 1/3 DEL 11 - 13 SUR	4000	20/03/2026	03/04/2026	14	27,3	98,8
GT-189B	MODULO C. EDUCATIVO PLACA ENTREPISO NIVEL 3 FUNDIDA 3 EJE K-L + 1/3 DEL 11-13 SUR	4000	21/03/2026	04/04/2026	14	25,5	92,5

ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-190B	MODULO C. EDUCATIVO PLACA ENTREPISO NIVEL 3 FUNDIDA 3 EJES L-M + 1/3 DEL 11-13 SUR	4000	24/03/2026	07/04/2026	14	26,6	96,4
GT-191A	MODULO ADMIISTRATIVO VIGAS AEREAS EJE 10,12,13 BC +1/3	4000	27/03/2026	13/04/2026	17	27,7	100,5
GT-192A	POLIDEPORTIVO PEDESTAL B4 Y B5	4000	27/03/2026	13/04/2026	17	28,6	103,6
GT-193A	MODUCLO C EDUCATIVO PLACA ENTREPISO NIVEL 3 FUNDIDA 2/3 EJE K-L-M +1/3 DEL 6 Y 9	4000	27/03/2026	13/04/2026	16	26,0	94,2
GT-194A	MODULO C EDUCATICO COLUMNAS 2 NIVEL EJE O DEL 6-9-11-13	4000	31/03/2026	14/04/2026	14	32,0	115,9
GT-195A	MODULO ADMINISTRATIVO COLUMNA H10-H12-H13	4000	31/03/2026	14/04/2026	14	26,6	96,3
GT-196A	MODULO POLIDEPORTIVO PEDESTAL EJE B6	4000	01/04/2026	15/04/2026	14	31,1	112,7
GT-197B	MODULO EDUCATIVO PLACA ENTREPISO NIVEL 3 FUNDIDA 4 SUR ESTE M+1/3 A N 1/3 DEL 11-13	4000	06/04/2026	20/04/2026	14	31,0	112,4
GT-198B	MODULO ADMI LOSAS Y VIGAS N+6,55 EJE 8 10 /H-I VIGAS 201B-211B	4000	06/04/2026	20/04/2026	14	30,8	111,8
GT-200B	MODULO C EDUCATIVO COLUMNA PRIMER PISO EJ P DEL 6-9-11-13	4000	08/04/2026	22/04/2026	14	28,3	102,5

ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-201B	MODULO ADMINISTRATIVO VIGAS AEREAS N+10.55 404B-405B-406B-408B-409B-410B-411B	4000	13/04/2026	27/04/2026	14	25,1	91,1
GT-202B	MODULO POLIDEPORTIVO LOSA CONTRAPISO ALA B	4000	16/04/2026	30/04/2026	14	25,9	94,0
GT-203B	MODULO C EDUCATIVO PLACA ENTREPISO NIVEL 2 FUNDIDA SUR EJE O + 1/3 A P 1/3 DEL 11-13	4000	16/04/2026	30/04/2026	14	27,8	100,7

Ver anexo 7. Informe Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros de Concreto.

Ilustración 21 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 14-16-17 Días

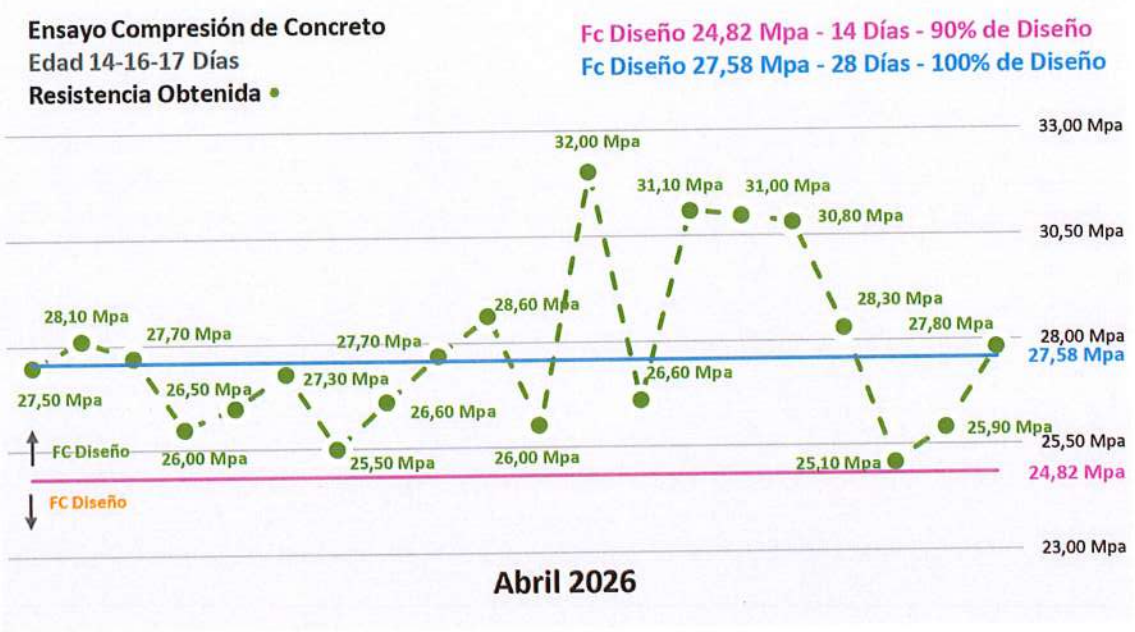

El comportamiento de la resistencia a la compresión del concreto evaluado a edades de 14, 16 y 17 días durante abril de 2026 evidencia valores entre 25,10 MPa y 32,00 MPa, superando en la mayoría de los

casos la resistencia de referencia a 14 días (24,82 MPa, equivalente al 90% de f'c). Se observan resultados que alcanzan y exceden la resistencia de diseño a 28 días (27,58 MPa), lo que indica un adecuado desarrollo mecánico del material. No obstante, se presentan ligeras variaciones puntuales, atribuibles a condiciones de ejecución y curado. En términos generales, el desempeño del concreto es satisfactorio.

Tabla 51 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 28 Días


ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-173C	MODULO C EDUCATIVO PLACA ENTREPISO EJE M Y N MAS 113 DEL 11 Y 13	4000	02/03/2026	30/03/2026	28	34,6	125,6
GT-174C	MODULO C EDUCATIVO COLUMNAS NIVEL 2 EJE L 6-9-11-13	4000	03/03/2026	31/03/2026	28	31,1	112,8
GT-175C	MODULO C. EDUCTAIVO PLACA ENTREPISO EJE MY N MAS 113 DE 6 Y 9 PLACA 4	4000	04/03/2026	01/04/2026	28	28,8	104,5
GT-176C	MODULO C. EDUCATIVO PLACA ENTRE PISO EJE N Y 0 +2/3 DEL 6,9,11,13 MAS VOLADOS	4000	05/03/2026	02/04/2026	28	31,2	113,2
GT-177C	MODULO ADM LOSA Y VIGAS N+6.55 202B-203B-204B-222B-223B-224B-225B	4000	06/03/2026	03/04/2026	28	33,0	119,7
GT-178C	MODULO C. COLUMNAS NIVEL-1 EJES 0, 6, 9, 11, 13	4000	09/03/2026	06/04/2026	28	31,0	112,4
GT-179C	MODULO C PLACA ENTRE PISO NIVEL 3 EJE J Y K+ 1/ 3 DEL 11 Y 13	4000	12/03/2026	09/04/2026	28	27,9	101,1
GT-180C	MODULO ADM LOSA Y VIGAS N+6.55 205B-206B-208B, 210B-211B-221B-222B-	4000	12/03/2026	09/04/2026	28	29,7	107,6

ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
	223B-224B-225B-228B EJE H-I / 10-13						
GT-181C	MODULO ADMINISTRATIVO COLUMNAS EJES G13, I10	4000	12/03/2026	09/04/2026	28	33,4	121,0
GT-182C	MODULO C. EDUCATIVO COLUMNA EJE M 6-9-11-13	4000	13/03/2026	10/04/2026	28	33,2	120,4
GT-183C	MODULO C. EDUCATIVO - PLACA ENTRE PISO NIVEL 3 EJEJ-K + 1/3 DEL 6-9	4000	14/03/2026	11/04/2026	28	28,4	102,9
GT-184C	MODULO ADMINISTRATIVO COLUMNAS G10-G12 I12 - I13	4000	16/03/2026	13/04/2026	28	30,7	111,2
GT-185C	MODULO C. EDUCATIVO PLACA CONTRA PISO EJE O-P +1/3 DEL 6, 9, 11, 13	4000	17/03/2026	14/04/2026	28	29,0	105,0
GT-186C	MODULO C. EDUCATIVO PLACA ENTRE PISO NIVEL 2 FUNDIDA 5 EJE N-O+1/3 DEL 6-9	4000	18/03/2026	15/04/2026	28	27,7	100,5
GT-187C	POLIDEPORTIVO PEDESTALES B1-B2-B3	4000	19/03/2026	16/04/2026	28	30,3	109,8
GT-188C	MODULO C. EDUCATIVO PLACA ENTRE PISO NIVEL 2 FUNDIDA 5 EJE N-O + 1/3 DEL 11 - 13 SUR	4000	20/03/2026	17/04/2026	28	34,1	123,7
GT-189C	MODULO C. EDUCATIVO PLACA ENTREPISO NIVEL 3 FUNDIDA 3 EJE K-L + 1/3 DEL 11-13 SUR	4000	21/03/2026	18/04/2026	28	28,6	103,8
GT-190C	MODULO C. EDUCATIVO PLACA ENTREPISO NIVEL 3 FUNDIDA 3 EJES L-M + 1/3 DEL 11-13 SUR	4000	24/03/2026	21/04/2026	28	28,9	104,8

ID Muestra	Elemento	Fc Diseño (PSI)	Toma Muestra	Fecha Rotura	Curado (Días)	Resistencia Rotura (Mpa)	% Resistencia Respecto f`c
GT-191B	MODULO ADM VIGAS AEREAS EJE 10,12,13 BC+1/3	4000	27/03/2026	24/04/2026	28	28,6	103,9
GT-191C	MODULO ADM VIGAS AEREAS EJE 10,12,13 BC+1/3	4000	27/03/2026	24/04/2026	28	25,1	91,0
GT-192B	POLIDEPORTIVO PEDESTAL B4-B5	4000	27/03/2026	24/04/2026	28	29,5	107,1
GT-192C	POLIDEPORTIVO PEDESTAL B4-B5	4000	27/03/2026	24/04/2026	28	27,0	97,9
GT-193B	MODUCLO C EDUCATIVO PLACA ENTREPISO NIVEL 3 FUNDIDA 2 Y 3 EJE K,L,M +1/3 DEL 6 Y 9	4000	28/03/2026	25/04/2026	28	34,6	125,4
GT-193C	MODUCLO C EDUCATIVO PLACA ENTREPISO NIVEL 3 FUNDIDA 2 Y 3 EJE K,L,M +1/3 DEL 6 Y 9	4000	28/03/2026	25/04/2026	28	33,6	121,9
GT-194B	MODULO C EDUCATICO COLUMNAS 2 NIVEL EJE O DEL 6-9-11-13	4000	31/03/2026	28/04/2026	28	36,0	130,5
GT-194C	MODULO C EDUCATICO COLUMNAS 2 NIVEL EJE O DEL 6-9-11-13	4000	31/03/2026	28/04/2026	28	36,1	130,7
GT-195B	MODULO ADM COLUMNA H10-H12-H13	4000	31/03/2026	28/04/2026	28	30,8	111,6
GT-195C	MODULO ADM COLUMNA H10-H12-H13	4000	31/03/2026	28/04/2026	28	31,1	112,6
GT-196B	MODULO POLIDEPORTIVO PEDESTAL EJE B6	4000	01/04/2026	29/04/2026	28	36,2	131,3
GT-196C	MODULO POLIDEPORTIVO PEDESTAL EJE B6	4000	01/04/2026	29/04/2026	28	37,5	136,1

Ver anexo 7. Informe Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindros de Concreto.

Ilustración 22 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 28 Días

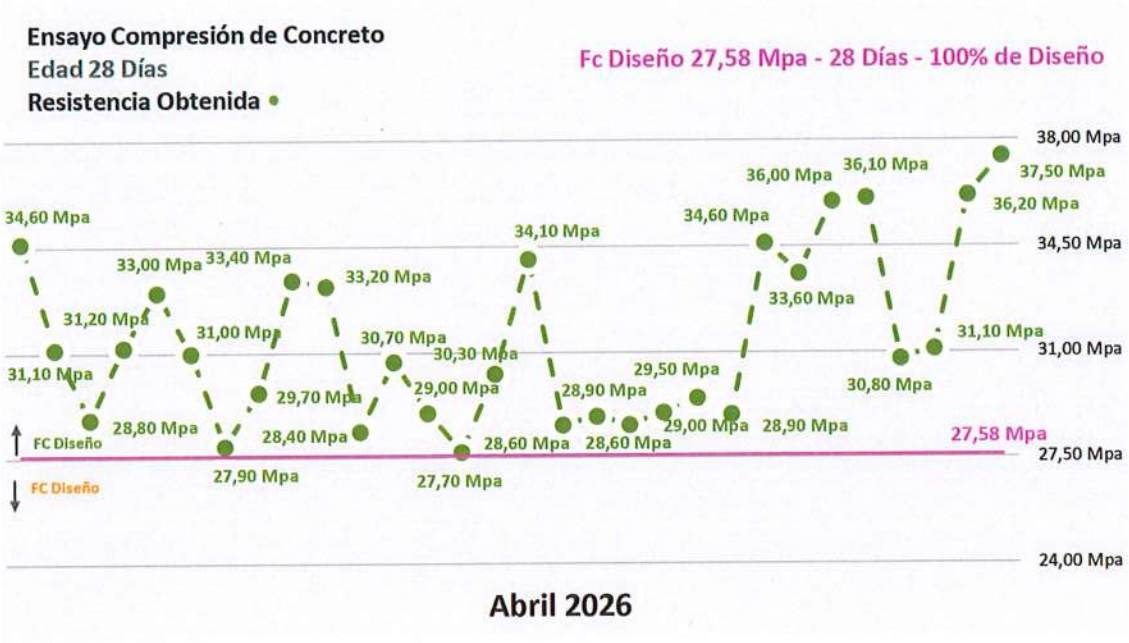

El comportamiento de la resistencia a la compresión del concreto a los 28 días durante abril de 2026 muestra valores comprendidos entre 27,70 MPa y 37,50 MPa, cumpliendo en su totalidad con la resistencia de diseño establecida (27,58 MPa). La mayoría de los resultados se sitúa por encima del valor de referencia, evidenciando un adecuado desarrollo de resistencia y un desempeño estructural favorable. Se destacan incrementos significativos en varios ensayos, lo que sugiere condiciones óptimas en la dosificación, colocación y curado.

En términos generales, el concreto presenta uniformidad y calidad satisfactoria conforme a los criterios técnicos establecidos, demostrando que los resultados obtenidos confirman el cumplimiento del diseño estructural a 28 días, evidenciando comportamiento estable del concreto. Se concluye que la resistencia alcanzada garantiza condiciones adecuadas de desempeño estructural de los elementos evaluados.

Ilustración 23 Toma y Curado de Muestras Concreto



Basándonos en la norma NSR-10, capítulo C.5, sub capítulo C.5.6.2.1, "para los ensayos de resistencia de cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse no menos de una vez al día, ni menos de una vez por cada 40 m3 de concreto, ni menos de una vez por cada 200 m2 de superficie de losas o muros. De igual manera, como mínimo, debe tomarse una muestra por cada 50 tandas de mezclado de cada clase de concreto".

"Cuando en un proyecto dado el volumen total de concreto sea tal que la frecuencia de ensayos requerida por C.5.6.2.1 proporcione menos de cinco ensayos de resistencia para cada clase dada de concreto, los ensayos deben hacerse por lo menos en cinco tandas de mezclado seleccionadas al azar, o en cada tanda cuando se empleen menos de cinco".

4.4 Ensayos In Situ

Los ensayos in situ corresponden al conjunto de pruebas y verificaciones técnicas realizadas directamente en el lugar de la obra, con el propósito de evaluar las condiciones reales de los materiales, del suelo y de las diferentes mezclas de concreto a utilizar, sin alterar su estado natural ni su función dentro del proyecto Reconstrucción Total del Colegio Alfonso López Pumarejo Sede principal del municipio Villavicencio Meta.

El Consorcio Educación C&G-MH ejecuta dichos ensayos como parte integral del control de calidad, garantizando que las actividades constructivas se desarrollen conforme a las especificaciones técnicas y parámetros de diseños establecidos.

4.5 Ensayo de Asentamiento o Slump

El ensayo de asentamiento slump constituye un control fundamental para evaluar la consistencia del concreto fresco y verificar su idoneidad antes de la colocación en obra. Conforme a lo establecido en la NSR-10, específicamente en el numeral C.5.3.3.2, las mezclas de prueba deben presentar un asentamiento dentro del rango definido para la obra, garantizando así la trabajabilidad requerida y la uniformidad del material.

Ilustración 24 Ensayo Asentamiento o Slump



Este parámetro permite identificar variaciones en la dosificación, el contenido de agua o la calidad de los materiales, asegurando que el concreto cumpla con las condiciones necesarias para su adecuado desempeño estructural.

Tabla 52 Ensayo Asentamiento o Slump

Elemento	Concreto PSI	Fecha Toma de Muestra	Asentamiento o Slump
MODULO POLIDEPORTIVO PEDESTAL EJE B6	4000	01-04-2026	7"
MODULO ADMI LOSAS Y VIGAS N+6,55 EJE 8 10 /H-I VIGAS 201B-211B	4000	06-04-2026	7"
MODULO C EDUCATIVO PLACA ENTREPISO NIVEL 2 FUNDIDA SUR EJE O + 1/3 A P 1/3 DEL 11-13	4000	16-04-2026	7"

4.6 Certificado de Calidad de Materiales y Equipos.

Con el objeto de asegurar la confiabilidad de los resultados de seguimiento y medición durante este periodo, se lleva a cabo el control de los equipos que garantizan la validez y fiabilidad de los procedimientos ejecutados. Este proceso incluye la verificación del estado operativo, la calibración vigente y la trazabilidad metrológica de los instrumentos utilizados en obra y de los laboratorios aliados.

4.7 Fichas Técnicas de Mortero para Mampostería Estructural

Se contempló el uso de mortero seco estructural tipo M con una resistencia de 175 kg/cm², empleado en la ejecución de mampostería estructural debido a su alta capacidad de adherencia y resistencia mecánica. Este material garantiza la adecuada transferencia de cargas entre las unidades de mampostería, contribuyendo a la estabilidad y rigidez del sistema constructivo.

Asimismo, se utilizó mortero seco para relleno de celdas (grouting) igualmente con una resistencia de 175 kg/cm², destinado a la integración del refuerzo vertical dentro de los muros, permitiendo un comportamiento monolítico y mejorando la capacidad sismorresistente. Ver anexo 8. Fichas técnicas de morteros para mampostería estructural.

Ambos materiales fueron aplicados conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a lo establecido en el Título D – Mampostería Estructural de la NSR-10, asegurando el cumplimiento de los requisitos de calidad y desempeño estructural.

4.8 Ladrillo Prensado Estructural

En la reconstrucción del colegio Alfonso López Pumarejo, la calidad del ladrillo prensado para mampostería estructural fue verificada conforme a criterios de resistencia a la compresión, uniformidad dimensional y absorción de agua. Estos parámetros garantizan una adecuada adherencia con el mortero y un comportamiento mecánico confiable del sistema. Asimismo, se controló la integridad física de las unidades, asegurando baja presencia de fisuras y bordes definidos. Lo anterior permite cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto y asegurar condiciones de estabilidad y durabilidad estructural. Ver anexo 9. Informe de ensayos de ladrillo prensado estructural.

4.9 Equipos de Topografía.

Durante este periodo se contó con una comisión del Consorcio Educación C&G-MH, con el fin de viabilizar, liberar y cuantificar las actividades ejecutadas. Esta comisión efectuó recorridos técnicos periódicos en frente de obra como respaldo técnico de las actividades de obra.

Tabla 53 Relación de Equipos Topográficos

Equipos	Marca	Modelo	Serie	Fecha Calibración	Vencimiento Calibración
Estación Total	LEIKA	TCR	703	11/10/2025	10/04/2026
Nivel	TOPCON	AT-G4	B38539	16/07/2025	15/01/2026

Ver anexo 10. Certificados de Calibración de Equipos Topográficos

Tabla 54 Equipos de Laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S

Maquinaria	Marca	Modelo	Estatus	intervalo
Pie de Rey	PINZUAR	STAINLESS HARDENED	Operativa	0 mm a 300 mm
Cinta Métrica	STANLEY	N/A	Operativa	0 m 3 m

Maquinaria	Marca	Modelo	Estatus	intervalo
Instrumento de Pesaje no Automático	OHAUS	CD-11	Operativa	20.000 gr
Máquina Para Ensayos De Compresión De Cilindros	OHAUS	PC-42D	Operativa	200 kn
Máquina Para Ensayos De Compresión De Cilindros	OHAUS	PC-42D	Operativa	1000 kn

Ver anexo 11. Certificados de Equipos de Laboratorio.

5 INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El presente informe refleja las actividades realizadas en el período comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, por el componente de SST del Consorcio Educación C&G-MH, con el objetivo de crear entornos de trabajo saludables y seguros, ejecutando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicando las medidas necesarias para minimizar los riesgos existentes en el proyecto, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente (Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015).

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
Levantamiento y Replanteo Topográfico	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección (verificación condiciones del terreno como desniveles o superficies irregulares y la existencia de líneas energizadas y/o de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y gas domiciliario, en caso de alguna eventualidad reportar). -Charla y/o capacitaciones antes de iniciar actividades. -Inspección de equipos y herramienta menor a utilizar -Utilización de Elementos de Protección Personal-EPP durante la ejecución de actividades. -Disponer de Hidratación en el área de trabajo y uso de protección en caso de temperaturas extremas (rayos solares) como monja o capuchón, guantes y gafas. -Realizar Pausas Activas. - En caso de lluvias y condiciones climáticas tormentas y/o vientos fuertes, suspender actividad y salvaguardarse. Reanudar cuando las condiciones sean favorables.

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
Armado, Encofrado y Desencofrado de Acero de Refuerzo para Vigas Aéreas de Cimentación, Mallas para entrepiso y Columnas en los Módulos Administrativo y Educativo.	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e Inspección (verificación condiciones del terreno como desniveles o superficies irregulares y la existencia de líneas energizadas y/o de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y gas domiciliario, en caso de alguna eventualidad reportar). -Charla y/o capacitaciones antes de iniciar actividades. -Inspección de equipos, herramienta menor y elementos a utilizar. -Personal Certificado (trabajo en alturas) y verificación en plataforma de Ministerio de trabajo. -Diligenciamiento y divulgación de Análisis de trabajo seguro (ATS) y Permiso de trabajos. -Utilización de Elementos de Protección Personal básicos-EPP (casco, gafas, ropa de trabajo, guantes y botas de seguridad) y de protección contra caídas (arnés y eslingas) durante la ejecución de actividades. -Identificar puntos de atrapamiento, bordes filosos y puntas expuestas de herramientas, equipos, elementos u objetos utilizados durante la actividad. -Disponer de Hidratación en el área de trabajo y uso de protección en caso de temperaturas extremas (rayos solares) como monja o capuchón, guantes y gafas .-Realizar Pausas Activas.

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	- En caso de lluvias y condiciones climáticas tormentas y/o vientos fuertes, suspender actividad y salvaguardarse. Reanudar cuando las condiciones sean favorables.
Instalación y Desencofrado de Casetón de Icopor en los Módulos Administrativo y Educativo.	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección (verificar condiciones del terreno y el entorno). -Charla y/o capacitaciones antes de iniciar actividades. -Inspección de equipos, herramienta menor y elementos a utilizar. -Personal Certificado (trabajo en alturas) y verificación en plataforma de Ministerio de trabajo. -Diligenciamiento y divulgación de Análisis de trabajo seguro (ATS) y Permiso de trabajos. -Utilización de Elementos de Protección Personal básicos-EPP (casco, gafas, ropa de trabajo, guantes y botas de seguridad) y de protección contra caídas (arnés y eslingas) durante la ejecución de actividades. -Colocar líneas de vida y mantenerse anclado cerca a bordes -No ubicar elementos, implementos o herramientas cerca a los bordes para evitar caída de objetos. -Verificar estado de los tableros provisionales, las conexiones o los cables se encuentren en óptimas condiciones (no tengan segmentos expuestos, encauchetado deteriorado o partes dañadas). En caso de hallar alguna anomalía, reportar inmediatamente.

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	-Identificar puntos de atrapamiento, bordes filosos y puntas expuestas de herramientas, equipos, elementos u objetos utilizados durante la actividad. Disponer de Hidratación en el área de trabajo y uso de protección en caso de temperaturas extremas (rayos solares) como monja o capuchón, guantes y gafas. .-Realizar Pausas Activas. - En caso de lluvias y condiciones climáticas tormentas y/o vientos fuertes, suspender actividad y salvaguardarse. Reanudar cuando las condiciones sean favorables.
Fundida con Concreto de Vigas aéreas de Cimentación, placa de Contrapiso, Entrepiso y Columnas en los Módulos Administrativo y Educativo	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección (verificar condiciones del terreno y el entorno). - Charla previa a iniciar actividades -Inspección de equipos planta de concreto y bomba estacionaria. -Revisión de tablero o móvil eléctrico, conexiones o cables se encuentren en condiciones adecuadas. -Inspección de Herramienta menor a utilizar (martillos, macetas, barras y llaves) -Uso de Elementos de Protección Personal –EPP (casco, gafas, protección auditiva, ropa de trabajo, guantes y botas de seguridad), durante la ejecución de actividad.

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	-Pausas activas e higiene postural al manipular, desplazar la carga (herramientas, tubería y materiales). -Acoplar la tubería asegurando las abrazaderas y empaques utilizando guantes e identificando puntos de atrapamiento o pellizco y teniendo precaución al manipular. Verificación de los parámetros de presión durante el bombeo de concreto. -Disponer de las Fichas de Seguridad (FDS) de los productos químicos utilizados en la obra. (Cemento, adictivo y ACPM). -Disponer de puntos de hidratación para el personal. -Orden y aseo en el área de trabajo.
Instalación de Refuerzos Estructurales (anclajes) en placa de Contrapiso del Módulo Educativo (Mampostería)	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección vías de acceso entrada y salida (verificar condiciones del terreno y el entorno).Incluye verificar la presencia de animales (abejas, avispas, serpientes u otros), en caso de hallarlos reportar. En caso de picaduras o mordeduras reportar inmediatamente y trasladar a centro médico más cercano. -Charla y/o capacitaciones antes de iniciar actividades. - Realizar la manipulación de cargas teniendo en cuenta las características de la carga como: peso, volumen o dimensiones, forma y lugar por el cual se hará el desplazamiento. -En caso de movilizar volúmenes de carga de materiales, utilizar ayuda mecánica como retroexcavadora o minicargador.

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	-Inspección de herramienta menor, equipos (taladro u otros) y elementos a utilizar. -Utilización de Elementos de Protección Personal-EPP durante la ejecución de actividades. -Coordinar y establecer comunicación con personal que se encuentre realizando actividades en el área para el acceso, transito o ejecución no genere interferencia. -Estar alerta y atender las recomendaciones del personal en caso de presentarse actividades en placas de entrepiso y pueda generar la caída de objetos sobre el ´personal y equipos. -Disponer de Hidratación en el área de trabajo y uso de protección en caso de temperaturas extremas (rayos solares) como monja o capuchón, guantes y gafas. -Realizar Pausas Activas. - En caso de lluvias y condiciones climáticas tormentas y/o vientos fuertes, suspender actividad y salvaguardarse. Reanudar cuando las condiciones sean favorables.
Colocación de Ladrillo con mortero en placa de contrapiso del Módulo Educativo (Mampostería).	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección vías de acceso entrada y salida (verificar condiciones del terreno y el entorno).Incluye verificar la presencia de animales (abejas, avispas, serpientes u otros), en caso de hallarlos reportar. En caso de

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	picaduras o mordeduras reportar inmediatamente y trasladar a centro médico más cercano. -Charla y/o capacitaciones antes de iniciar actividades. -Realizar la manipulación de cargas teniendo en cuenta las características de la carga como: peso, volumen o dimensiones, forma y lugar por el cual se hará el desplazamiento. -En caso de movilizar volúmenes de carga de materiales, utilizar ayuda mecánica como retroexcavadora o minicargador. -Inspección de herramienta menor, equipos (Cortadora) y elementos a utilizar. -Utilización de Elementos de Protección Personal-EPP durante la ejecución de actividades como protección facial, guantes además de los básicos. -Coordinar y establecer comunicación con personal que se encuentre realizando actividades en el área para el acceso, transito o ejecución no genere interferencia. -Estar alerta y atender las recomendaciones del personal en caso de presentarse actividades en placas de entrepiso y pueda generar la caída de objetos sobre el ´personal y equipos. -Mantener área en orden y aseo, mediante la recolección de residuos, sobrantes y llevarlos al punto ecológico disponible. -Disponer de Hidratación en el área de trabajo y uso de protección en caso de temperaturas extremas (rayos solares) como monja o capuchón, guantes y gafas.

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	-Realizar Pausas Activas. - En caso de lluvias y condiciones climáticas tormentas y/o vientos fuertes, suspender actividad y salvaguardarse. Reanudar cuando las condiciones sean favorables.
Adecuación de Campamentos o Cuartos de Acopio temporal para el Almacenamiento de Materiales.	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección vías de acceso entrada y salida (verificar condiciones del terreno y el entorno).Incluye verificar la presencia de animales (abejas, avispas, serpientes u otros), en caso de hallarlos reportar. En caso de picaduras o mordeduras reportar inmediatamente y trasladar a centro médico más cercano. -Charla y/o capacitaciones antes de iniciar actividades. -Realizar la manipulación de cargas teniendo en cuenta las características de la carga como: peso, volumen o dimensiones, forma y lugar por el cual se hará el desplazamiento. -Utilización de Elementos de Protección Personal-EPP durante la ejecución de actividades como casco, gafas, protección auditiva (si aplica), guantes, ropa de trabajo y botas de seguridad. -Inspección de herramienta menor o equipos y elementos a utilizar. Identificar bordes filosos, puntas expuestas o áreas de atrapamiento. - De requerirse realizar trabajo en alturas verificar las condiciones de la superficie en la cual se ubicaran a ejecutar la actividad como plataformas


Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	o andamios, se encuentre instalado y armado de manera adecuada, nivelado y asegurado. - Diligenciar el permiso para actividades en alturas e inspeccionar los elementos de protección contra caídas (EPCC), se encuentren en condiciones de uso y en buen estado. -En caso de movilizar volúmenes de carga de materiales, utilizar ayuda mecánica como retroexcavadora o minicargador. No ubicarse en el área de giro de la maquinaria o puntos ciegos en los cuales el operador no tenga visibilidad, mantener comunicación asertiva entre el operador y el personal que está en el área apoyando la actividad de cargue y descargue de los materiales. -Mantener área en orden y aseo, mediante la recolección de residuos, sobrantes y llevarlos al punto ecológico disponible. -Disponer de Hidratación en el área de trabajo y uso de protección en caso de temperaturas extremas (rayos solares) como monja o capuchón, guantes y gafas. -Realizar Pausas Activas Periódicas. - En caso de condiciones climáticas como tormentas vientos y lluvias fuertes; suspender actividad y salvaguardarse. Reanudar cuando las condiciones sean favorables.

Nota. Periodo Comprendido del 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026.

5.1 Relación del Personal Empleado en la Ejecución de la Obra en el Mes.

En el desarrollo del periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2026, se cuentan con colaboradores que participan según su formación y conocimiento en las diferentes actividades puestas en prácticas, por consiguiente, se relacionan al presente informe el personal que hace parte del proyecto los que componen el Consorcio Educación C&G, como el de los diferentes subcontratistas que laboran en la obra.

Ilustración 25 Personal Vinculado por Empresas abril 2026

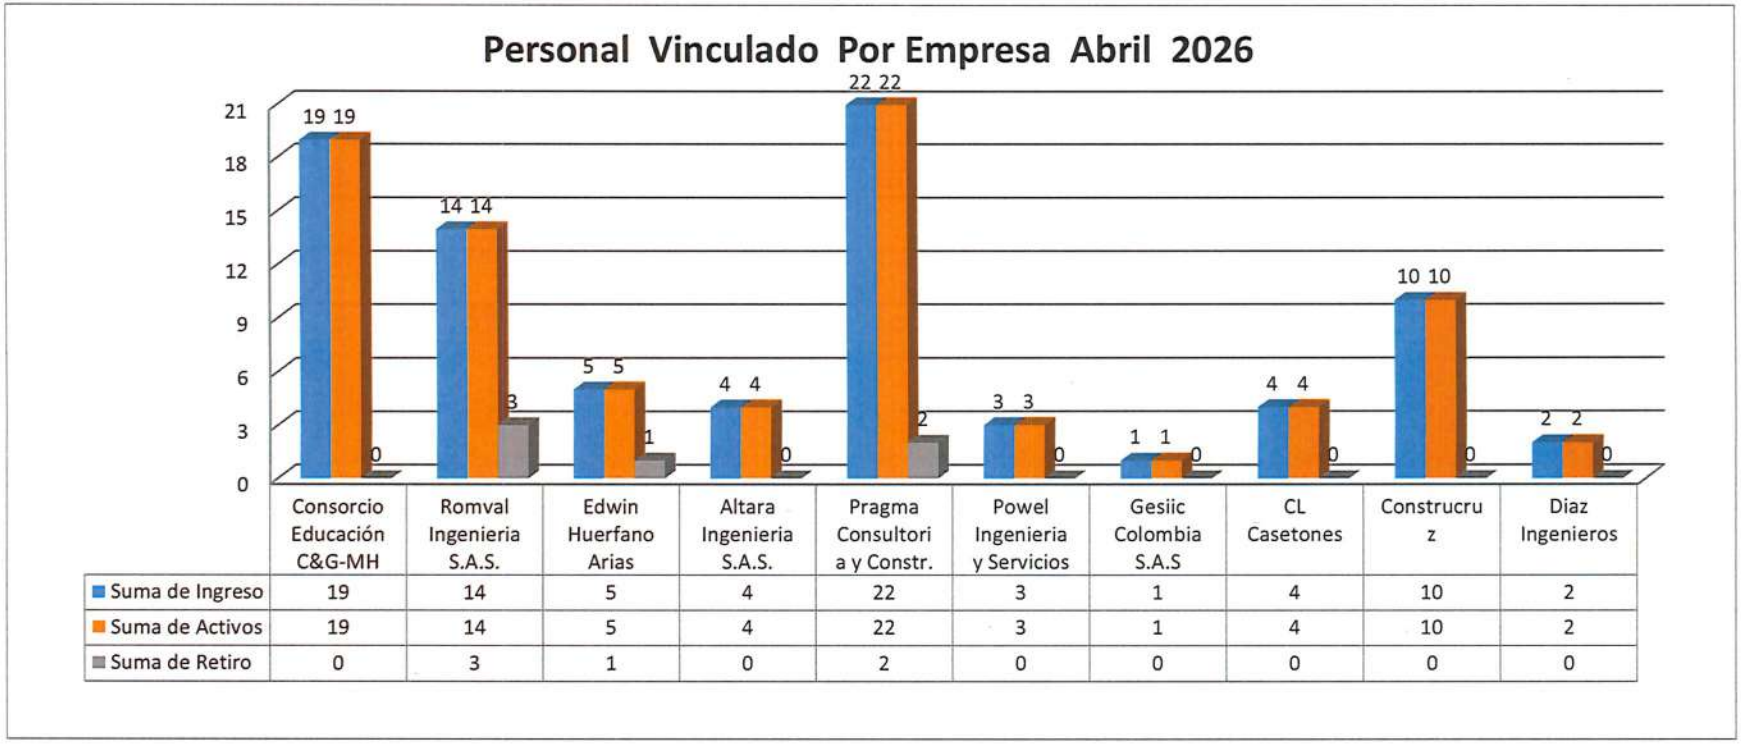

	Consorcio Educación C&G-MH	Romval Ingenieria S.A.S.	Edwin Huerfano Arias	Altara Ingenieria S.A.S.	Pragma Consultoria y Constr.	Powel Ingenieria y Servicios	Gesiic Colombia S.A.S	CL Casetones	Construcruz	Diaz Ingenieros
Suma de Ingreso	19	14	5	4	22	3	1	4	10	2
Suma de Activos	19	14	5	4	22	3	1	4	10	2
Suma de Retiro	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0

Además, se lleva una matriz de control del personal directo e indirecto de obra por trabajador y por empresa las que continúan y/o terminen sus labores con el objeto de controlar la autoliquidación de la seguridad social.

Ilustración 26Personal Vinculado por Profesión Abril 2026



Durante el mes de abril de 2026, el personal vinculado por profesiones, se mantuvieron activos todos los cargos, en los que se presentaron variación en los cargos de oficiales, ayudantes e ingreso de nuevos como los instaladores de redes hidrosanitarias.

Tabla 55 del Personal Profesional en Obra

Nombre	Cédula	Tarjeta Profesional	Cargo	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Yeison Esneyder Gómez G.	86.051.263	25202-090820 CND	Director de Obra	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	6/10/2025	-
Nohora Juliana Jones Ordoñez	63.532.138	68202-152203 CND	Residente de Obra	SANITAS	COLPENSONES	AXA COLPATRIA	COFREM	05/02/2024	-
Joel Pineda Sandoval	1.126.246.825	25202-388151 CND	Residente de Obra	SALUD TOTAL	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COFREM	1/10/2025	-
Carlos Alberto Humoa Acevedo	1.121.913.852	091037-0518607 CND	Residente de Obra	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	6/10/2025	-
Jaime Buitrago Nova	79.464.037	25202.133707 CND	Especialista de Estructuras	FAMISANAR	COLPENSIONES	COLPATRIA	COLSUBSIDIO	6/10/2025	

Diego Alejandro Acosta	1.010.191.750	CN 205-142219	Ingeniero Electricista	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	6/10/2025	-
Claudia Patricia Rodríguez H.	1.010.165.507	25335-200159 CND	Ingeniero Hidráulico	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA SEGUROS	COMPENSAR	6/10/2025	-
Astrid Ruiz González	40.341.812	25238-366217 CND	Ingeniera Ambiental	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	6/10/2025	-
Diana Carolina Vega C.	40.217.089	Resolución 3831	Profesional SST	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	6/10/2025	-
María del Pilar Sepúlveda Suarez	1.018.427.594	1779151023	Profesional Social	SANITAS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	COFREM	6/10/2025	-
Leidy Natalia Martínez Arévalo	1.020.807.368	-	Coordinadora Administrativa	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	20/06/2023	-

Tabla 56 Relación del Personal no Profesional del Contratista de Obra

Nombre	Cédula	Cargo	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Luis Jorge Dueñas A.	4.131.733	Cuidador de Inmueble	CAJACOPI	NO APLICA TIENE ACUERDO PENSIONAL	AXA COLPATRIA	COFREM	26/06/2025	
Diosnell José Mosqueda Torres	5.386.773	Ayudante de Obra	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	4/09/2025	-
Anderson José Méndez M.	6.843.967	Ayudante de Obra	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	4/09/2025	-
Deiver Fernando Fonseca	86.063.011	Almacenista	SALUD TOTAL	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COFREM	04/11/2025	-
María Andrea Monsalve Mejía	20.499.919	Controladora Vial	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRA	COFREM	13/11/2025	-

Ana Mayerly Parada Salgado	1.006.821.856	Controladora Vial	CAJACOPI	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COFREM	13/11/2025	-
Javier Ivan Bedoya Miranda	80.386.966	Ayudante de Obra	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	09/03/2026	-
Edwin Stiven Forero Patiño	1.006.689.217	Ayudante de Obra	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	09/03/2026	-

Tabla 57 Relación del Personal de Contratistas de Obra

Edwin Huérfano

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Edwin Armando Huérfano	1.057.587.959	Topógrafo	Edwin Huérfano	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	-	06/11/2025	-
Jhonnier Andrés Bohórquez	1.006.655.813	Cadenero	Edwin Huérfano	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	-	12/12/2025	-
Carlos Eduardo Castro	1.010.112.452	Cadenero	Edwin Huérfano	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	-	14/04/2026	27/04/2026
Amalia Sanabria Vanegas	28.548.347	Topógrafa	Edwin Huérfano	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	-	16/04/2026	-
Anderson Hernández M	80.920.190	Cadenero	Edwin Huérfano	SANITAS	PORVENIR	SURA	-	28/04/2026	-

Romval Ingenieria S.A.S.

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Ariel Enrrique Martínez	78.675.490	Oficial	Romval Ingenieria	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	4/11/2025	-
Agustín Landázuri	12.831.649	Oficial	Romval Ingenieria	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	6/11/2025	
José Ernesto Cetina	4.102.432	Ayudante de Obra	Romval Ingenieria	FAMISANAR	PROTECCIÓN	SURA	COMPENSAR	6/11/2025	
Fernando Berrio	1.003.931.983	Ayudante de Obra	Romval Ingenieria	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	6/11/2025	
Rufino Mercado Castro	9.251.604	Ayudante de Obra	Romval Ingenieria	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	13/11/2025	
Teobaldo Martínez R.	11.798.455	Oficial	Romval Ingenieria	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	COMPENSAR	1/12/2025	-

Jonathan Enrique Gutiérrez	1.221.973.762	Ayudante de Obra	Romval Ingenieria	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	3/12/2025	
Néstor Rodríguez R.	9.154.867	Oficial	Romval Ingenieria	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	13/01/2026	22/04/2026
Diego Fernando Rodríguez M.	1.121.906.899	Ingeniero Residente	Romval Ingenieria	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	23/01/2026	-
Francisco José Vásquez	1.065.841.379	Oficial	Romval Ingenieria	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMPENSAR	13/02/2026	-
Yuleidi Maria Córdoba	1.003.787.891	Inspector SST	Romval Ingenieria	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMPENSAR	12/03/2026	-
Carlos Alberto Moreno	1.010.112.452	Oficial	Romval Ingenieria	FAMISANAR	COLFONDOS	SURA	COMPENSAR	09/04/2026	18/04/2026
Julio Cesar Useche	93.469.384	Oficial	Romval Ingenieria	SURA EPS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	09/04/2026	18/04/2026

Jairo Lizarazo Medina	1.012.391.911	Ayudante de Obra	Romval Ingenieria	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	COMPENSAR	09/04/2026	

Altara Ingenieria S.A.S.

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Freddy Hinestroza P.	1.105.057.864	Operador de Planta de Concreto	Altara Ingenieria	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	10/11/2025	-
Oscar Guerrero	1.121.816.287	Auxiliar Bomba de Concreto	Altara Ingeniera	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM	19/11/2025	-
Josvitervy Mensa Castro	80.033.326	Operador de Minicargador	Altara Ingenieria	CAPITAL SALUD	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COFREM	02/02/2026	

Giovanny Castañeda F.	16.189.945	Operador Bomba de Concreto	Altara Ingenieria	FAMISANAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COFREM	16/03/2026	

Pragma Consultoría y Construcciones S.A.S.

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Daniel Humberto Parra Montaña	1.121.959.816	Ingeniero Residente	Pragma	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	21/11/2025	
Jamer Moreno	1.042.733.984	Oficial	Pragma	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	COMPENSAR	20/11/2025	25/04/2026
Cesar Villalobos	6.688.582	Oficial	Pragma	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMPENSAR	20/11/2025	-
Víctor Manuel Guerra	1.065.839.522	Ayudante de Obra	Pragma	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	20/11/2025	-
Carlos Luis Estanga	5.765.564	Ayudante de Obra	Pragma	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	22/11/2025	-

Nicolás Valderrama S.	1.121.957.876	Inspector SST	Pragma	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COFREM	30/01/2026	-
Yersón Andrés Cárdenas	1.003.316.722	Oficial	Pragma	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COFREM	02/02/2026	-
Hernando Sánchez Robles	1.216.973.225	Oficial	Pragma	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COFREM	02/02/2026	-
Tiodoberto Ávila Osorio	80.068.655	Oficial	Pragma	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	COFREM	03/02/2026	-
Gustavo Parra Aguirre	1.121.941.624	Ayudante de Obra	Pragma	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM	12/02/2026	-
Rafael Pérez Nieto	1.050.460.376	Oficial	Pragma	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	COFREM	12/02/2026	
Marcial José Narváez	1.103.096.462	Oficial	Pragma	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COFREM	17/02/2026	-
Oromar Moreno Lucumi	1.121.862.773	Ayudante de Obra	Pragma	CAJACOPI	PORVENIR	SURA	COFREM	17/02/2026	-

Juan David González G.	1.050.457.001	Oficial	Pragma	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMPENSAR	21/04/2026	

Powel Ingenieria y Servicios

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Luis Fernando Rodríguez M.	79.637.101	Técnico Electricista	Powel	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM	26/11/2025	-
Cesar Luis Rodríguez	1.006.700.623	Ayudante Básico Elec.	Powel	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM	26/11/2025	-
Juan Sebastián González	1.121.931.529	Ayudante Avanz. Elec.	Powel	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM	07/04/2026	

Gesiic Colombia S.A.S.

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Camilo Andrés Castañeda	1.019.008.320	Operador Retroexcavadora	Gesiic	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM	6/11/2025	-

CL Casetones

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Yorman Chaverra Palomeque	1.001.846.684	Oficial	CL Casetones	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA SEGUROS	-	02/02/2026	-
Leonel de Jesús Álvarez	1.043.606.303	Ayudante de Obra	CL Casetones	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	-	06/02/2026	-
Gregorio Doria López	1.073.816.074	Oficial	CL Casetones	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFANDI	06/02/2026	-

Orinson López Fuentes	1.063.160.288	Oficial	CL Casetones	FAMISANAR	PROTECCION	SURA	COMFANDI	06/02/2026	-

Construcruz (William Cruz-Mampostería)

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Javier Duarte Romero	79.820.487	Oficial	William Cruz	SALUD TOTAL	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	26/03/2026	-
José Henry Rodríguez	79.351.030	Oficial	William Cruz	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	26/03/2026	-
Mauricio Suesca Castro	80.253.039	Oficial	William Cruz	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	15/04/2026	-
Manuel Osorio Clavijo	81.720.908	Oficial	William Cruz	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	27/04/2026	-

Jaider Díaz Silva	1.077.085.879	Oficial	William Cruz	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	27/04/2026	-
Jairo Castiblanco	11.345.874	Oficial	William Cruz	SURA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	27/04/2026	-
Maycol Andrey Rodríguez	1.007.185.710	Ayudante de Obra	William Cruz	FAMISANAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	27/04/2026	-
Héctor Stiven Madrigal	1.075.681.504	Ayudante de Obra	William Cruz	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	27/04/2026	-
Ángela P. García Morales	1.108.928.812	Inspector SST	William Cruz	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	28/04/2026	-
Juan David Moreno F.	1.022.340.155	Ayudante de Obra	William Cruz	COMPENSAR	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	29/04/2026	

Díaz Ingenieros S.A.S.

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF	Fecha ingreso	Fecha Retiro
Manuel Burgos Rodríguez	79.736.177	Instalador de Redes	Díaz Ingenieros	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA SEGUROS	COLSUBSIDIO	25/04/2026	-
Edwin Manuel Oviedo	9.177.195	Instalador de Redes	Díaz Ingenieros	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA SEGUROS	COLSUBSIDIO	25/04/2026	-

. Ver anexo 12. Seguridad Social Consorcio y Contratistas.

5.2 Registro de Entrega, Reemplazo de EPP´s y Dotación.

El Consorcio Educación C&G-MH, adoptará las medidas necesarias para garantizar a sus trabajadores las condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar. Por ello, dotará de la ropa de protección adecuada para evitar daños a la salud, por consiguiente, es indispensable la entrega de dotación de los equipos de protección personal cuando los trabajadores ingresen por primera vez, el reemplazo o sustitución por cualquier daño que sufran los equipos a causa de las actividades laborales, como el registro sistemático de entrega de forma individual. Ver anexo 13. Entrega de elementos de protección personal.

Ilustración 27 Entrega y Reemplazo de Equipos de Protección Personal



5.3 Procesos de Inducción al Ingreso de Obra.

Para el mes de abril de 2026, se presentaron un total de dieciocho (18) ingresos de personal nuevo, los cuales se generaron para los contratistas del proyecto, se procede a realizar los exámenes médicos pre empleo con la finalidad de conocer el estado de salud de los trabajadores al inicio de la relación laboral. (Ver anexo 14. Hojas de Vida Personal).

El personal recibió previo al inicio de sus actividades la inducción correspondiente para visualizar las condiciones que van a desarrollar en el ambiente laboral, los daños que las mismas puedan causar a su

salud y los medios o medidas para prevenirlos, a continuación, se indican las inducciones impartidas. El personal flotante se realizó una socialización de las actividades, riesgos y peligros existentes en obra Ver anexo 15. Formato de inducción de ingreso.

Ilustración 28 Proceso de Inducción




Tabla 58 Proceso de Inducción por Empresas

Inducciones de Ingresos	Powel Ingenieria y Servicios	Romval Ingenieria S.A.S.	Edwin Huérfano	Pragma Consultoría y Constr.	Construcruz	Díaz Ingenieros S.A.S
Información General del Proyecto y presentación de la empresa.	1	3	3	1	8	2
Horarios de Trabajos y Zonas Comunes	1	3	3	1	8	2

Inducciones de Ingresos	Powel Ingenieria y Servicios	Romval Ingenieria S.A.S.	Edwin Huérfano	Pragma Consultoría y Constr.	Construcruz	Díaz Ingenieros S.A.S
Política Integral de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Salud en el trabajo	1	3	3	1	8	2
Cobertura de Seguridad Social, EPS, ARL, AFP, CCF	1	3	3	1	8	2
Notificación de Peligros, Riesgos y Aspectos Ambientales para trabajadores	1	3	3	1	8	2
Actos y Condiciones Inseguras	1	3	3	1	8	2
Reportes de Accidentes e Incidentes en el Trabajo	1	3	3	1	8	2
Normas de Seguridad, Uso de EPPS	1	3	3	1	8	2
Orden y Aseo en los Lugares de Trabajo	1	3	3	1	8	2

Nota. Periodo Comprendido del 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026

Ilustración 29 Participación de Inducciones

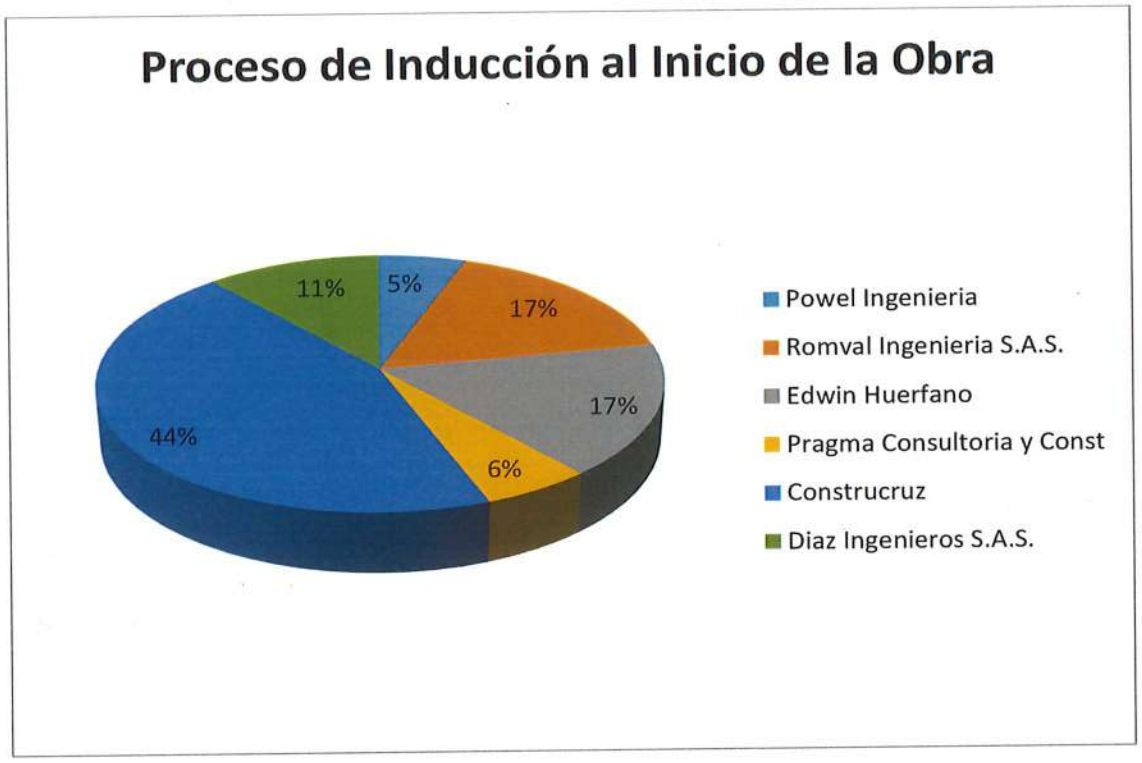

5.4 Retiros de Personal


En el mes de abril de 2026 se generaron ocho (6) retiros de colaboradores de los contratistas activos en el proyecto. Para tal fin se solicita la entrega de la documentación que garantice que las empresas contratistas realizaron los respectivos procesos de liquidación, notificación de examen de egreso y/o realización por parte del ex colaborador en tiempo establecido, paz y salvo, documentos firmados por el personal saliente. Ver anexo 16. Documentos de Retiro de Personal. Nota: En caso que los documentos del personal no se entreguen oportunamente por parte de los contratistas se generan oficio y/o correspondencia por correo para solicitar la documentación.

32063

5.5 Charlas de Seguridad y Capacitaciones.

Nuestros colaboradores en el periodo actual reciben información teórica y práctica, adecuada y en forma periódica para las funciones inherentes a su actividad en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Ver Anexo 17. Cronograma de Capacitaciones. Ver Anexo 18. Listado de Asistencia.

Ilustración 30 Cobertura de Participación Contratista

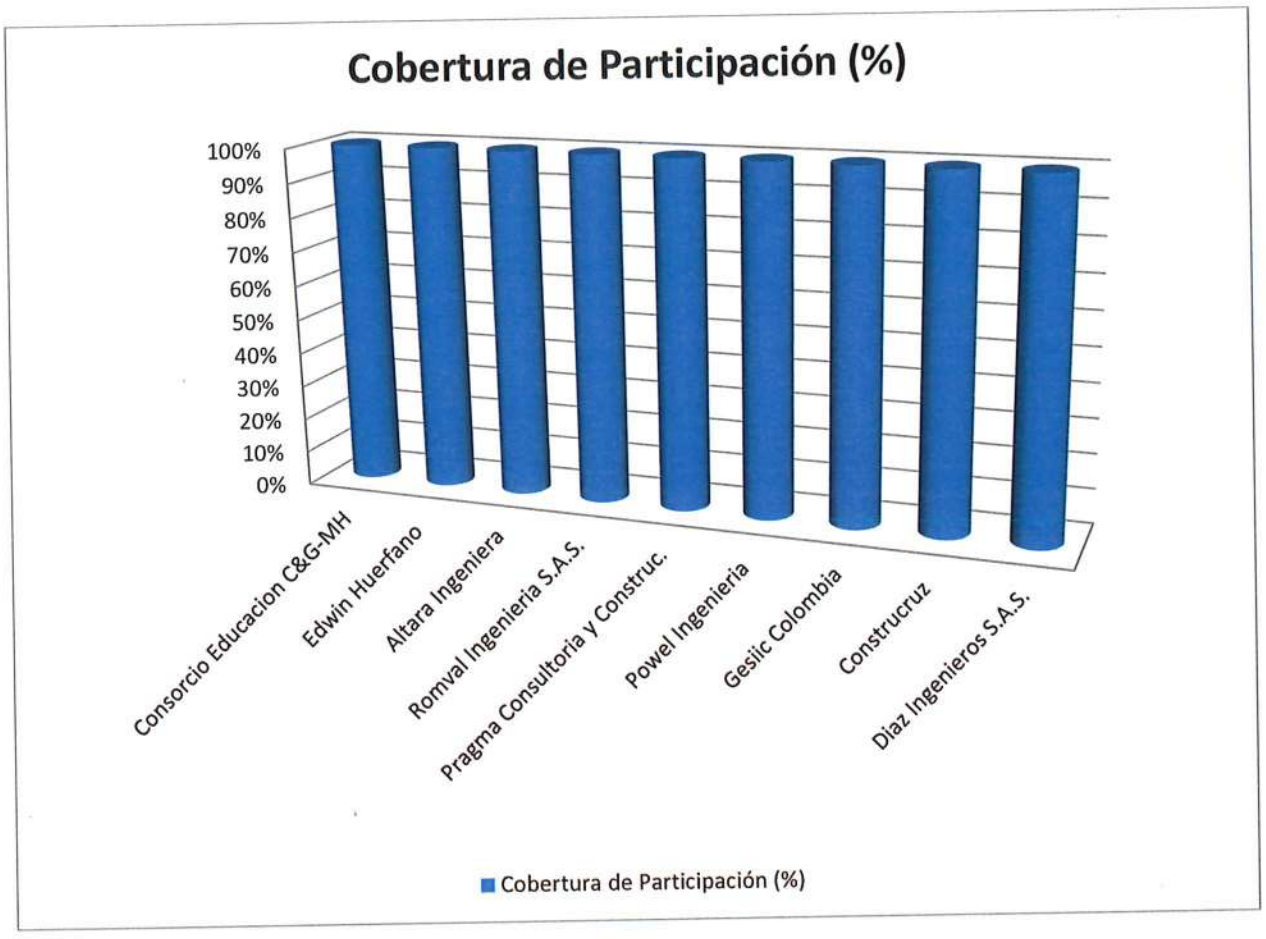

En la anterior ilustración se describen los porcentajes de la cobertura de participación por contratistas, indicando que el compromiso de nuestros colaboradores en los procesos de charlas y capacitaciones.

Ilustración 5 Charlas y Capacitación por Contratista



5.6 Control de Actividades de Alto Riesgo.

Para el desarrollo de todas las actividades consideradas de alto riesgo que por sus condiciones generales se ejecutan mediante la interacción de los elementos del proceso de trabajo y el individuo se establecerán parámetros y criterios de seguridad mediante profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo que cuenten con las competencias para validar y firmar los permisos de trabajo seguro como los permisos para trabajos en caliente, trabajos en alturas, trabajo en espacios confinados, excavaciones, izaje de cargas, etc.) y trabajos especiales no rutinarios. Durante el mes de abril de 2026 se realizaron actividades relacionadas con trabajos en altura desarrolladas por los contratistas. Ver Anexo 19 Permisos de trabajo en alturas e informes de contratistas.

Ilustración 31 Aseguramiento de Actividades de Alto Riesgo en Obra



5.7 Inspecciones Planificadas.

La inspección es uno de los mejores instrumentos disponibles para descubrir los problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes y otras pérdidas. El descubrimiento de las condiciones y prácticas inseguras por medio de la inspección y su rápida corrección, son uno de los mejores métodos que pueda emplear el Consorcio Educación C&G-MH, para prevenir accidentes y proteger a sus trabajadores, así La dirección demuestra al personal su interés y sinceridad en la prevención de accidentes laborales. Ver

Anexo 20 Cronograma General de Inspecciones y Formatos Inspecciones y Preoperacionales en informes de contratistas.

Ilustración 32 Inspecciones Planificadas



5.8 Visitas y Comités en Obra

Durante el mes de abril de 2026 se llevaron a cabo visitas semanales a la obra por parte de las entidades participantes del proyecto, entre ellas la Alcaldía de Villavicencio, Ecopetrol S.A., la Interventoría y

personal directivo del Consorcio Educación. Se realizó la reunión mensual con los integrantes de la veeduría ciudadana el 14 de abril de 2026.

Estos espacios tuvieron como finalidad efectuar seguimiento al avance físico y administrativo del proyecto, verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales y técnicos establecidos, y fortalecer los canales de comunicación y articulación entre las partes interesadas.

Ilustración 33 Comités de Obra



5.9 Accidentabilidad.


En el mes de abril de 2026, se presentó 01 evento que produjo una lesión corporal o funcional resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por lo cual se generó ausentismo laboral o por accidente laboral. (Ver anexo 21 certificado de accidentalidad emitido por ARL).

Descripción del evento: El 13 de abril de 2026 el trabajador (ayudante de obra), estaba realizando corte de madera con equipo (pulidora), para la adecuación de campamento temporal de material, el equipo en mención genera al colaborador herida en la mano izquierda en las falanges distales del segundo, tercer y cuarto dedo con presencia de sangrado. Inmediatamente los compañeros de trabajo quienes se encontraban ejecutando la misma actividad lo ayudan a trasladar e informan inmediatamente al personal de seguridad y salud del trabajo (SST), para ser transportado al centro médico asistencial cercano para ser atendido rápidamente por el personal en turno. El trabajador durante el mes tuvo una incapacidad de 18 días, en los cuales ha estado en proceso de recuperación con acompañamiento y seguimiento asistencial por parte del Consorcio y de la Arl a la cual está afiliado el trabajador.

Tabla 59 Descripción de Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo

INDICADORES SST			
Total de HHTT Mes:	12304	Total HHTT Acumuladas	69255
Número de Accidentes:	1	Días de Ausentismo por Incapacidad	18
Porcentaje de Ausentismo Mes:	0.75%	Días Programados en el mes:	23

Ilustración 34 Indicadores de Accidentalidad

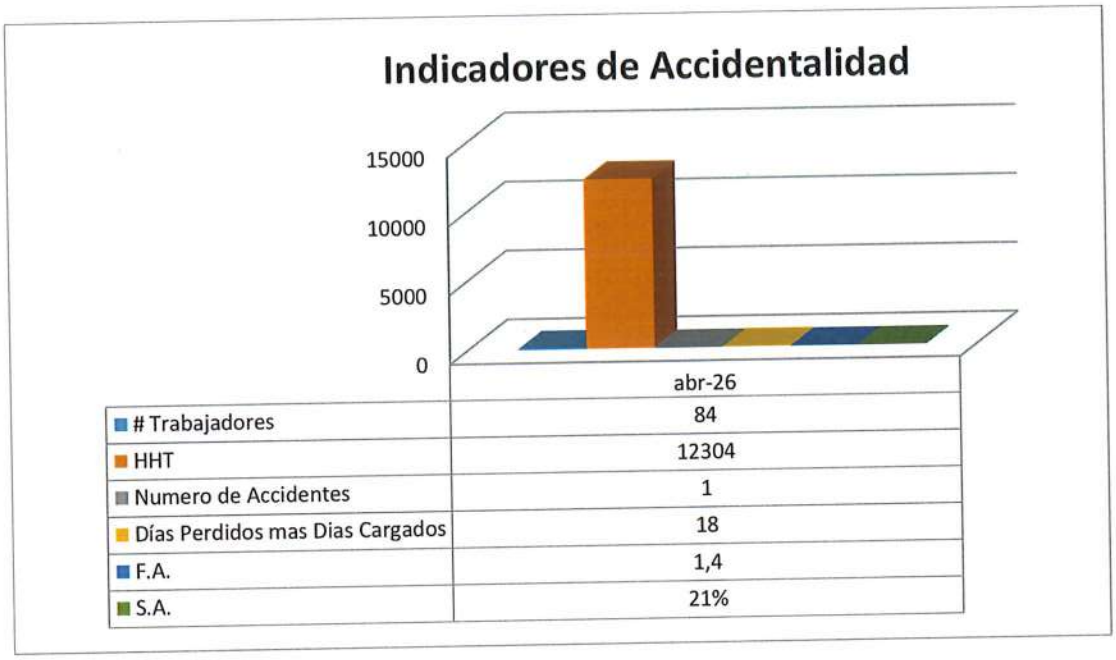

	abr-26
# Trabajadores	84
HHT	12304
Numero de Accidentes	1
Días Perdidos mas Dias Cargados	18
F.A.	1,4
S.A.	21%

5.10 Frecuencia de Accidentalidad.

Frecuencia de accidentalidad = Número de accidentes laborales del periodo/número de trabajadores del mismo periodo X 100.

5.11 Severidad de Accidentalidad.

Los días perdidos por accidentes laborales, para el proyecto se establece la meta de 48% para la frecuencia de severidad, teniendo en cuenta el comportamiento a nivel nacional para el gremio de la construcción.

Frecuencia de severidad = Número de días perdidos por AL + días cargados en el periodo / número de trabajadores del periodo X 100.

5.12 Ausentismo Laboral.

Ausentismo=No de días de ausencia/No de días de trabajo programados en el mes X100.

6 INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL.

El presente informe de gestión ambiental corresponde al seguimiento y control de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, en el marco del proyecto "Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo – Sede Principal del Municipio de Villavicencio, Meta, sector Alto Pompeya".

La gestión ambiental constituye un componente fundamental dentro del desarrollo de proyectos de infraestructura, especialmente en la etapa constructiva, en la cual se generan interacciones directas con el entorno físico, biótico y social. En este sentido, el proyecto cuenta con un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que establece las medidas orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales derivados de las actividades constructivas.

Durante el periodo evaluado, el equipo de gestión ambiental realizó actividades permanentes de seguimiento, control y verificación en campo, con el propósito de asegurar la adecuada implementación de las fichas de manejo ambiental y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. Estas acciones se desarrollaron en concordancia con el avance físico de obra y los lineamientos técnicos establecidos para el proyecto.

El presente documento tiene como finalidad consolidar y presentar de manera técnica las actividades ejecutadas, el estado de implementación de las medidas ambientales y los resultados del seguimiento realizado a los diferentes componentes ambientales, constituyéndose como soporte del compromiso del proyecto con la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del área de influencia.

En este sentido, se realizó seguimiento a las siguientes actividades

- Verificación del ingreso y circulación de maquinaria dentro del área del proyecto, asegurando el cumplimiento de las medidas ambientales y de seguridad establecidas.

- Mantenimiento y estado de la señalización ambiental, preventiva y de seguridad instalada en la obra.
- Inspección de los puntos de atención de emergencias, comprobando la disponibilidad y condiciones de los equipos y elementos de respuesta.
- Revisión de los puntos ecológicos, verificando la correcta separación, almacenamiento temporal y disposición de los residuos sólidos generados.
- Seguimiento al área de acopio de combustibles, constatando el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento seguro y la disponibilidad de kits de contingencia.
- Verificación de las condiciones de orden y aseo en los diferentes frentes de obra.
- Seguimiento a las actividades de limpieza y desinfección de las unidades sanitarias del proyecto.

Adicionalmente, se evidenció la continuidad de actividades constructivas asociadas a la organización y limpieza de acero, adecuaciones locativas y fabricación de concreto en la obra de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, ubicada en el corregimiento Cuatro – sector Alto de Pompeya.

Tabla 60 Control De Manejo Ambiental

ACTIVIDAD PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO	100%	Control y seguimiento ingreso maquinaria y equipo en la obra
MANEJO DE RCD	100%	Control de rutas y registro de transporte de residuos (RCD — escombreras autorizadas).
ORDEN Y ASEO	100%	Mantenimiento de áreas de trabajo en campo

CONTROL Y SEGUIMIENTO	100%	Mantenimiento, Demarcación y señalización ambiental
CONSORCIO EDUCACION C&G	100%	Seguimiento Y Control Permiso Poda Individuo Arbóreo

7 MEDIO ABIÓTICO

A continuación, se presentan los programas que integran el Componente Abiótico del Plan de Manejo Ambiental (PMA), aplicables a las diferentes fases del proceso constructivo. En este apartado se describen las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado, de acuerdo con la aplicabilidad de cada ficha de manejo ambiental y en cumplimiento de los lineamientos establecidos para su adecuada implementación.

Las actividades se desarrollaron con el acompañamiento del equipo de gestión ambiental del proyecto y se documentan mediante una descripción clara y precisa de las operaciones realizadas en cada programa de manejo. Para cada uno de ellos se indica el periodo evaluado, el estado de avance o condición actual de las acciones implementadas y, cuando corresponde, se incorpora el respectivo registro fotográfico como evidencia del cumplimiento y ejecución de las medidas ambientales previstas.

7.1 Manejo y Disposición de Materiales Sobrantes de Demolición Excavación y Construcción

En el desarrollo de las actividades del mes de ABRIL del 2026 no se ha realizado la disposición de los materiales sobrantes de excavación en la empresa Bioagrícola del Llano E.S.P., sitio autorizado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA.) Las volquetas encargadas del transporte del material cubren el volcó con lonas o geotextil, con el fin de minimizar la emisión de material particulado durante el trayecto desde la obra hasta el sitio de disposición final autorizado

7.2 Clasificación de Material Aprovechable y No Aprovechable

Con respecto al manejo de los materiales sobrantes de excavación y demolición, se informa que durante el periodo evaluado no se dispuso de material en la empresa de servicios públicos **Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.**, conforme a los registros de transporte y manifiestos de disposición final.

Adicionalmente, se implementaron las siguientes medidas de manejo:

- Reutilización de material pétreo en rellenos y nivelaciones internas de la obra.
- Control y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD) en escombrera autorizada (**Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.**).

Tabla 61 Disposición Final De Los Residuos De Construcción Y Demolición RCD

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	
EXCAVACION	0
DEMOLICION	0
APROVECHAMIENTO Rellenos Material Excavación (Relleno Exten Mecanico)	0

7.3 Manejo Adecuado de los Materiales de Construcción

Los materiales que ingresan a la obra son utilizados de manera progresiva, de acuerdo con los requerimientos del proceso constructivo; no obstante, algunos son acopiados de forma temporal para su uso posterior.

Los acopios ubicados en los diferentes frentes de trabajo se encuentran debidamente señalizados mediante cinta de seguridad y, cuando se requiere, son cubiertos con plástico negro o material similar,

con el fin de minimizar la dispersión de material particulado, prevenir el arrastre de material por acción del viento o la lluvia y mantener condiciones seguras en las áreas de almacenamiento.

Ilustración 35 Acopio Temporal De Material



Asimismo, la empresa encargada del suministro de agregados pétreos cuenta con los permisos de explotación minera otorgados por la autoridad ambiental competente (CORMACARENA), garantizando que el material proviene de fuentes legalmente autorizadas y ambientalmente responsables.

Durante el mes de ABRIL de 2026, ingresó a la obra un volumen aproximado de 633 m³ de material pétreo, el cual fue utilizado en las actividades programadas para el desarrollo de las obras, de acuerdo con los requerimientos constructivos del proyecto.

Tabla 62 Cantidad de Material

CANTIDAD DE MATERIAL	
GRAVA 3/4	195
GRAVA 1/2	0
CRUDO DE RIO	168M3

ARENA DE PLANTA	270
SUB-BASE	0
MATERIAL SELECCIONADO RIO 2"	0
TOTAL	633M3

7.4 Programa para el Manejo Eficiente del Agua y Vertimientos

El **Consorcio Educativo C&G** dispone de unidades sanitarias exclusivas para el personal de obra, las cuales cuentan con condiciones adecuadas de higienización y mantenimiento, garantizando su correcto uso y contribuyendo al cumplimiento de las condiciones de salud ocupacional y salubridad en el área de trabajo.

El agua empleada para las descargas sanitarias se almacena en canecas y es utilizada durante la jornada laboral; posteriormente, estas son nuevamente abastecidas al día siguiente, evitando almacenamientos prolongados que puedan favorecer la proliferación de vectores y generar afectaciones a las condiciones de higiene y salubridad del proyecto.

Adicionalmente, se realiza seguimiento periódico al estado de las unidades sanitarias, con el fin de verificar su adecuado funcionamiento y asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

El consorcio dispone de una edificación que fue conservada y adaptada para el funcionamiento de las unidades sanitarias, las cuales cuentan con medidas de higienización adecuadas, suministro permanente de elementos de aseo, servicio de energía eléctrica e iluminación apropiada para el uso del personal de obra.

Ilustración 36 Desinfección de Unidades Sanitarias



7.5 Manejo de Residuos Líquidos Domésticos

En el área de desarrollo del proyecto no se identifican cuerpos de agua superficiales que puedan verse afectados o contaminados por las actividades constructivas. No obstante, se implementan medidas orientadas a minimizar la generación de residuos líquidos, evitando su disposición en zonas ambientalmente sensibles.

Estas acciones se aplican especialmente en los sitios donde se ubican las estructuras y durante las labores de preparación de materiales, con el fin de prevenir posibles afectaciones al suelo y al entorno inmediato del proyecto.

En la obra se cuenta con canecas destinadas a la recolección y almacenamiento de agua, las cuales se utilizan para apoyar el desarrollo de las actividades en los diferentes frentes de trabajo, garantizando un uso controlado del recurso hídrico y el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Durante el periodo reportado, se realizó el mantenimiento y limpieza de los pozos de aguas residuales, incluyendo retiro de sedimentos y residuos acumulados, con el propósito de prevenir taponamientos, evitar reboses y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de manejo de aguas residuales del proyecto.

7.6 Manejo de Residuos Sólidos y Especiales

Se realiza mantenimiento periódico a los puntos ecológicos ubicados en sitios estratégicos de la obra, con el fin de garantizar la correcta separación en la fuente de los residuos generados, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Durante el periodo reportado se realizó una jornada general de orden y aseo en todas las áreas de la obra, con el propósito de fortalecer las condiciones de limpieza, organización y manejo adecuado de los residuos generados.

La actividad se llevó a cabo con la participación del personal del Consorcio y trabajadores de los diferentes frentes de obra, realizando:

- Recolección de residuos ordinarios y de embalaje.
- Limpieza de frentes de trabajo y zonas de almacenamiento.
- Organización de áreas comunes y puntos de acopio.

- Disposición de residuos en los sitios establecidos.

Esta actividad ratifica el compromiso del proyecto con el manejo adecuado de residuos sólidos y especiales, el orden en obra y el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas.

Las actividades ejecutadas fueron:

- Mantenimiento de puntos ecológicos mediante pintura de canecas, ajustándolas al nuevo código de colores para la adecuada clasificación de residuos.
- Reposición y cambio de la lona de cerramiento del área de almacenamiento de residuos, garantizando la protección de las canecas frente a la exposición solar y la lluvia, evitando así el deterioro de los recipientes, la contaminación cruzada y la posible proliferación de vectores.
- Rotulación técnica de las canecas conforme al tipo de residuo.
- Entrega de una caneca a cada contratista para promover la correcta gestión y separación de residuos en las áreas de trabajo.

Estas acciones permiten fortalecer el manejo integral de residuos sólidos en obra, prevenir impactos ambientales negativos y mejorar las condiciones de orden y aseo en el frente de trabajo.

Los residuos ordinarios son dispuestos en la entrada de la obra tres (3) veces por semana para su recolección por parte de la empresa de servicios públicos de Villavicencio, Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P., la cual cuenta con los permisos ambientales requeridos para realizar la disposición final en el relleno sanitario autorizado del municipio.

por su parte, los residuos aprovechables son almacenadas en la caneca del rotulo blanco para material aprovechable tales como plásticos, son almacenados temporalmente en áreas designadas dentro de la obra y posteriormente entregados a terceros autorizados para su recolección y adecuado aprovechamiento y tratamiento.

Adicionalmente, se realizan jornadas periódicas de orden y aseo en las áreas de trabajo, con el objetivo de mantener las zonas limpias y organizadas, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo seguro y eficiente de las actividades constructivas.

Ilustració37 Mantenimiento Puntos Ecológicos



8 MEDIO BIÓTICO

A continuación, se presentan los programas que conforman el componente Biótico del Plan de Manejo Ambiental durante la etapa de construcción y la instalación de los componentes necesarios para garantizar la continuidad de los procesos.

El seguimiento y control de estas actividades es realizado por el profesional responsable del área ambiental, con el apoyo de la brigada ambiental, asegurando el cumplimiento de las medidas de manejo establecidas.

8.1 Programa de Manejo de Remoción de Cobertura Vegetal y Descapote

Durante el desarrollo de las actividades correspondientes al mes de ABRIL de 2026, se continuó con el aprovechamiento del material proveniente de excavación para el desarrollo de las diferentes actividades constructivas dentro de la obra del Colegio Alfonso López Pumarejo, ubicado en el corregimiento de Cuatro Altos – Pompeya. Este aprovechamiento se realizó principalmente en actividades de relleno, conformación y nivelación de áreas internas del proyecto, en cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), contribuyendo a la reducción de volúmenes dispuestos externamente y a la optimización del uso de los recursos generados en obra.

Durante el período evaluado, no se realizó la disposición de materiales sobrantes de excavación en la empresa Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P., sitio autorizado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA.

No obstante, como medida preventiva y de control, las volquetas encargadas del transporte de material implementaron el cubrimiento del volco mediante lonas o geotextil, con el fin de minimizar la emisión de material particulado durante el trayecto desde la obra hasta el sitio de disposición final autorizado, en cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA.

8.2 Manejo de Flora

En el marco de las actividades ejecutadas durante el mes de abril, la Empresa Electrificadora del Meta llevó a cabo la poda técnica de individuos arbóreos que interferían con la franja de seguridad de las redes de alta tensión, con el propósito de mitigar riesgos eléctricos y prevenir incidentes en las viviendas aledañas. Así mismo, se continúa con la instalación del cerramiento de protección individual en las áreas intervenidas.

Ilustración 38 Cerramiento de protección individual



Ilustración 39 poda individuos arbóreo



8.3 Manejo de Fauna

Durante el periodo reportado se realizó monitoreo de fauna mediante observación directa en el área de influencia del proyecto, con el fin de verificar posibles afectaciones a especies de fauna silvestre asociadas al desarrollo de las actividades constructivas.

Como resultado del seguimiento realizado, no se evidenció afectación, desplazamiento forzado ni eventos de atropellamiento o perturbación significativa de fauna silvestre en el área intervenida.

Durante las jornadas de observación se registró la presencia de las siguientes especies:

- Tórtola común (conocida localmente como tórtola abuelita).
- Canario amarillo.

La presencia de estas especies indica que, a la fecha, las actividades del proyecto no están generando impactos negativos significativos sobre la fauna aviar del sector.

Se continuará con el monitoreo periódico como medida preventiva dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

8.4 Manejo de Sustancias Químicas

Durante el mes de ABRIL se realizó la inspección del punto de acopio principal de combustibles, verificando el adecuado estado y funcionamiento de los elementos dispuestos para la atención de posibles emergencias, el manejo adecuado de las sustancias químicas en obras civiles es fundamental para proteger la salud de los trabajadores y el medio ambiente, las áreas de almacenamiento se encuentran frescas, secas y bien ventiladas lejos de fuentes de calor. El consorcio cuenta con tres puntos de emergencia distribuidos estratégicamente dentro del proyecto, destinados al manejo de posibles contingencias que puedan presentarse durante las labores diarias en la obra.

Durante el mes de ABRIL se realizó la revisión y verificación de los elementos que conforman dichos puntos, con el fin de asegurar que se encuentren en buen estado y dentro de su fecha de vigencia. Se repusieron los suministros caducados o agotados, garantizando la disponibilidad de los equipos y materiales necesarios para una atención oportuna ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se verificó que los botiquines de emergencia y los kits de control de derrames permanezcan ubicados en lugares frescos, secos y de fácil acceso, y se programaron las acciones correspondientes.

En este punto se encuentran disponibles los equipos y materiales necesarios que permiten garantizar una respuesta oportuna y efectiva ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

- Botiquín primeros auxilios
- Extintor multipropósito
- Camilla de emergencia
- Kit control de derrame

Ilustración 40 Inspección Puntos de Emergencia



8.5 Manejo de Señalización en la Obra

Durante el mes de abril se realizaron actividades de mantenimiento y reposición de la señalización instalada en la obra, así como la delimitación de las zonas de peligro, con el fin de garantizar la seguridad del personal y el adecuado desarrollo de las labores constructivas

Ilustración 41 Mantenimiento de la Señalización



8.6 Manejo de Maquinaria y Equipos en Obra.

Durante el mes de ABRIL de 2026, en la obra se contó con la siguiente maquinaria y equipos: planta de cemento DOMAT, silo y sistema de alimentación de concreto, retroexcavadora SINOMACH y minicargador BOBCAT EARTHFORCE S18.

Ilustración 42 Maquinaria en la Obra



Se realizó la inspección general mensual de la maquinaria que se encuentra operando en las diferentes actividades programadas dentro del proyecto, verificando que cada equipo cuente con los elementos requeridos para la atención de emergencias, tales como extintor multipropósito, así como con los dispositivos de seguridad y operación en condiciones adecuadas.

Previo al inicio de las actividades, se desarrollan charlas preoperacionales y se realiza la firma de permisos de trabajo, con el fin de reforzar las medidas de seguridad industrial y ambiental, y garantizar la correcta operación de los equipos.

Durante la inspección de cada máquina se constató que los elementos de seguridad y operación se encontraban en regla, permitiendo su uso seguro dentro del proyecto.

De acuerdo con la maquinaria utilizada en las actividades de construcción, se puede indicar que los niveles de emisión de ruido se han mantenido por debajo de los límites permisibles establecidos (80 decibeles,

según la Resolución 8321 de 1983), sin generar afectaciones a la comunidad ni a la salud de los trabajadores del proyecto. No obstante, se exige el uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP), especialmente protección auditiva. Cabe resaltar que las labores se desarrollan exclusivamente en jornada diurna.


Finalmente, mediante observación directa durante la operación de la maquinaria, se evidenció que el proyecto cuenta con la adecuada conformación del patio de maniobras, lo cual permite la correcta manipulación de los equipos y contribuye a la prevención de la contaminación del suelo por derrames accidentales de combustibles, aceites o lubricantes.

8.7 Anexo 22: Inspección Ambiental a Contratistas

8.8 Anexo: 23 Inspección Maquinaria y Equipo Menor

8.9 Anexo: 24 Vales Ingreso de Material

Ilustración 43 Puesto de Control Silo Para Concreto

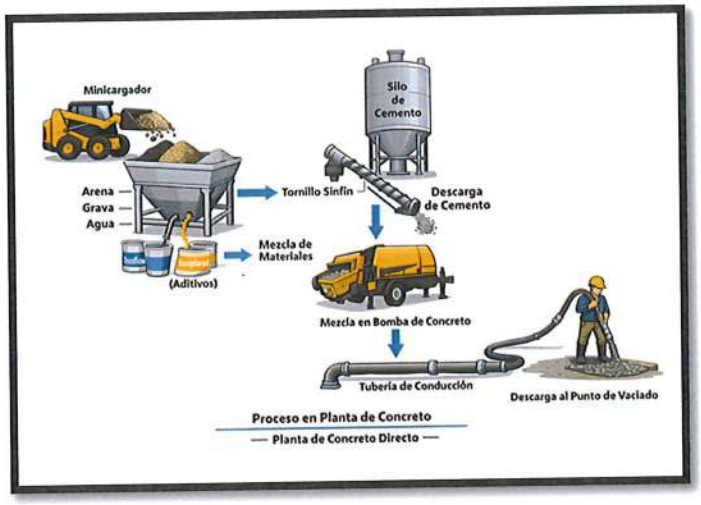

En el desarrollo de las actividades del proyecto, se busca fortalecer la concienciación ambiental de los colaboradores mediante la realización de charlas ambientales orientadas a la importancia del cuidado y el manejo adecuado de los recursos naturales y del entorno.

La educación ambiental permite fortalecer el conocimiento y la sensibilización del personal de obra frente a las principales problemáticas y temáticas ambientales. Al promover la comprensión de estos aspectos, se brindan a los trabajadores las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y adoptar acciones responsables, orientadas al uso eficiente de los recursos naturales y a la protección del entorno, contribuyendo así al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a la sostenibilidad del proyecto.

8.10 Programa de Educación y Capacitación al Personal del Proyecto

Durante el periodo reportado se desarrollaron jornadas de educación y sensibilización ambiental dirigidas al personal operativo del proyecto, con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental y el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA)

Las charlas abordaron temas relacionados con:

- Importancia del cuidado y protección del medio ambiente durante la ejecución de la obra.
- Correcta separación y disposición de residuos.
- Orden y aseo en las áreas de trabajo.
- Prevención de impactos ambientales derivados de malas prácticas operativas.
- Importancia de mantener condiciones seguras para evitar accidentes laborales asociados al desorden y acumulación de residuos.

Estas actividades permitieron generar conciencia en el personal sobre su responsabilidad individual y colectiva en la gestión ambiental del proyecto, promoviendo buenas prácticas ambientales y fortaleciendo el compromiso con la sostenibilidad y la seguridad en obra.

8.11 Seguridad y Salud en el Trabajo.


Todas las actividades constructivas desarrolladas en la obra cuentan con el acompañamiento permanente del equipo de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de manejar, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos que puedan generarse durante la ejecución del proyecto por parte del Consorcio Educación C&G.

La entidad se encuentra comprometida con la seguridad y salud de los trabajadores, promoviendo el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), los cuales constituyen la última barrera de defensa frente a los riesgos presentes en las diferentes labores y áreas de trabajo. Si bien el uso de los EPP no evita completamente la ocurrencia de accidentes, su correcta utilización reduce significativamente la gravedad de las lesiones que puedan presentarse.

Los Elementos de Protección Personal (EPP) son equipos o dispositivos destinados a ser utilizados por los trabajadores para protegerse de los riesgos laborales y garantizar su seguridad y salud en el entorno de trabajo.

- ✓ Realización de charlas ambientales dirigidas al personal operativo.
- ✓ Mantenimiento de la señalización ambiental y de seguridad y salud en el trabajo
- ✓ Señalización de puntos de acopio de materiales, los cuales se mantienen cubiertos con plástico negro.
- ✓ Implementación de señales de obligación, peligro o advertencia, auxilio, prohibición y de equipos contra incendio, garantizando una adecuada comunicación visual en los frentes de trabajo.

Ilustración 44 actividades de medio ambiente

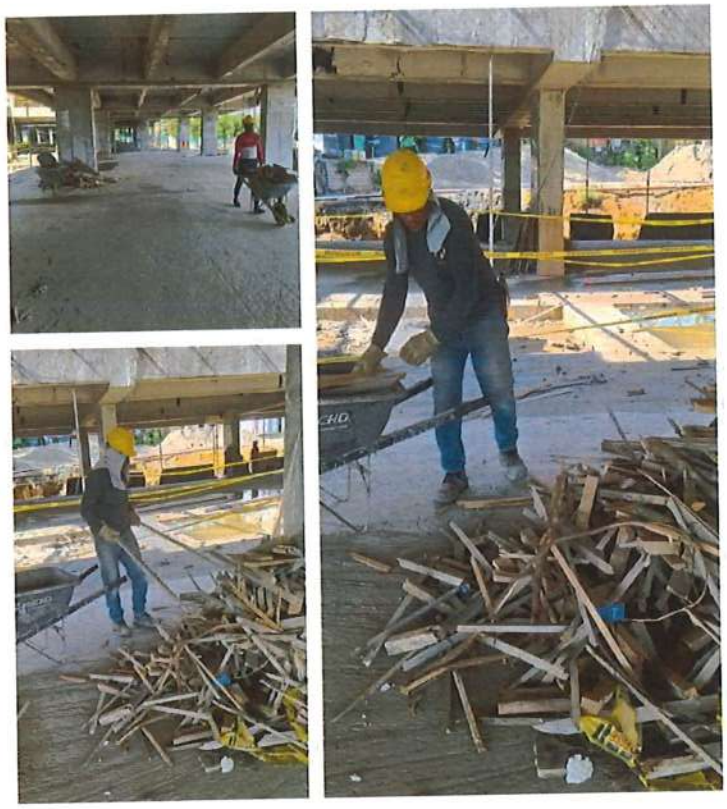

8.12 Programa de Información y Participación Comunitaria

Es importante resaltar que la comunidad se verá directamente beneficiada con la construcción del nuevo Colegio Alfonso López Pumarejo, el cual contribuirá al fortalecimiento de la infraestructura educativa del municipio.

Con el propósito de mantener informada a la comunidad sobre el avance y las actividades desarrolladas durante el proceso constructivo, durante el mes de ABRIL se contó con el acompañamiento de la profesional social del Consorcio, quien participó activamente en las jornadas de socialización y seguimiento en campo.

Ilustración 45 comité mensual



9 INSPECCIÓN AMBIENTAL.

FECHA: 01 DE ABRIL AL 30 de ABRIL DE 2026

RESPONSABLE: ASTRID RUIZ GONZÁLEZ.

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
1. CONSUMO DE ENERGÍA				

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
¿Los monitores que no se están utilizando se encuentran apagados o en suspensión?	x			Los monitores permanecen apagados o en modo suspensión cuando no se encuentran en uso.
Los aparatos eléctricos y/o electrónicos que no se están utilizando se encuentran desenchufados y/o apagados?	x			Durante la ejecución de las actividades se realiza control sobre el uso eficiente de los equipos eléctricos y electrónicos, manteniéndolos apagados cuando no se requieren.
se reutiliza el papel reciclaje	x			Se realiza acopio de papel reutilizable promoviendo prácticas de reciclaje interno.
¿Las luces de lugares no concurridos o donde no se requiere se encuentran apagados?	x			Las luminarias permanecen apagadas en zonas donde no se desarrollan actividades.
¿Se implementan prácticas para el ahorro de energía?	x			Se implementan prácticas orientadas al uso eficiente de la energía mediante la desconexión de equipos inactivos
¿El área cuenta con sistemas ahorradores de energía en buen estado?	x			Se realiza seguimiento periódico al estado y funcionamiento de los sistemas de ahorro energético.
2. CONSUMO DE AGUA				
¿Se implementan buenas prácticas de ahorro de agua?	x			Se aplican buenas prácticas para el uso racional del recurso hídrico durante las actividades constructivas.

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
¿La red hidrosanitaria se encuentra en buenas condiciones de tal manera que no se evidencian fugas de agua o condiciones de humedad?	x			Las redes hidrosanitarias se encuentran en buen estado, sin evidencias de fugas o pérdidas significativas de agua.
3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				
punto(s) ecológico(s) para residuos aprovechables y no aprovechables	x			La obra cuenta con puntos ecológicos para la separación en la fuente de residuos aprovechables y no aprovechables.
¿Cumple con la separación en la fuente de acuerdo con el código de colores establecidos?	x			Se realiza adecuada separación de residuos conforme al código de colores establecido por la normativa vigente.
señalización para la clasificación de residuos en canecas en el punto ecológico	x			Los puntos ecológicos se encuentran señalizados y conformados por canecas según el código de colores
los residuos depositados se encuentran bien clasificados de acuerdo con el código de colores establecido	x			Los residuos ordinarios son evacuados cada tercer día para recolección por la empresa Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P.
El sitio de acopio evidencia la presencia de vectores como moscas, roedores, cucarachas etc.		X		No se evidencia presencia de vectores debido al manejo oportuno y retiro periódico de residuos.
¿los escombros bien almacenados (protegidos del sol y agua) debidamente señalizados	x			Los materiales provenientes de demolición y excavación se almacenan protegidos de la intemperie, señalizados y dispuestos con gestor autorizado.

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
disposición de chatarra con proveedor	x			La chatarra generada es entregada a gestores autorizados para su aprovechamiento.
4. ORDEN Y ASEO				
Área de trabajo limpia y ordenada	x			Se realiza periódicamente orden y aseo en las áreas de trabajo
Área de trabajo demarcada y/o señalizada	x			Las áreas intervenidas cuentan con cierre perimetral y señalización preventiva.
Optimización de recursos en el área (Ahorro de agua, papel, energía)	x			Se efectúa control permanente para el uso eficiente de agua, energía y papel.
5. IMPACTOS AMBIENTALES				
¿Existe aspectos ambientales significativos que no puedan ser controlados por la empresa y dependan de un tercero? (Cliente, Proveedor, Comunidad, etc.).	x			Se identifican actividades o servicios que pueden generar impactos ambientales asociados a terceros.
Los funcionarios/as de la empresa y los contratistas conocen y han apropiado la política ambiental?	x			La política ambiental del consorcio es divulgada al personal administrativo, operativo y subcontratistas.
6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS				
¿Se encuentran identificadas todas las sustancias químicas utilizadas en el área?	x			Las sustancias químicas utilizadas se encuentran debidamente identificadas y almacenadas en área designada.

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
¿Se poseen fichas de seguridad de las sustancias químicas que se manejan en el área?	x			Las fichas de datos de seguridad se mantienen disponibles y visibles para consulta del personal.
Los productos químicos están almacenados en un lugar donde existe ventilación natural y/o forzada?	x			Los productos químicos se almacenan en zonas ventiladas y seguras.
¿Los productos químicos están separados de elementos o equipos que puedan generar chispas?	x			Las sustancias químicas permanecen alejadas de equipos generadores de chispas.
¿Las instalaciones eléctricas de las zonas de almacenamiento de químicos están en buen estado?	x			Se realizan inspecciones periódicas a las instalaciones eléctricas del área de almacenamiento.
7. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS (UNIDADES SANITARIAS)				
Las unidades sanitarias están en buenas condiciones, funcionalidad sin posibles filtraciones y derrames y normas mínimas de higiene	x			Las unidades sanitarias se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento, higiene y sin evidencias de filtraciones o derrames.
8. MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE ACEITES				
Se evidencian derrames y contaminación del suelo por derrame de aceites		X		No se evidencian derrames ni contaminación del suelo; se aplican medidas establecidas en el PMA.
El área de almacenamiento de combustible evita contacto directo con el piso, está señalizada, lejos de fuente	x			El almacenamiento se realiza en zonas señalizadas, con sistema de contención y evitando contacto directo con el suelo.

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
de chispa y dentro de un sistema de contención en caso de derrame				
9. COMBUSTIBLES FÓSILES (ACPM. GASOLINA ETC).				
El área de almacenamiento de combustible evita contacto directo con el piso, está señalizada, lejos de fuente de chispa y dentro de un sistema de contención en caso de derrame	x			El combustible se almacena en áreas seguras, señalizadas y alejadas de fuentes de ignición.
Certificado de calidad combustible disponible			x	No aplica
Se mantienen los equipos apagados en el tiempo en el que el personal no se encuentra en el lugar de trabajo.	x			Los equipos permanecen apagados cuando no se encuentran en operación.
10. PLAN DE EMERGENCIA				
¿Cuenta con un plan de emergencia ambiental actualizado?	x			El consorcio cuenta con plan de emergencia ambiental actualizada, rutas de evacuación señalizadas, identificación de riesgos ambientales y socialización permanente con el personal. Se realiza seguimiento al estado de extintores y disponibilidad de kits de emergencia.
¿Posee planos con las rutas de evacuaciones de la sede?	x			El consorcio contara con un plano de evacuación en caso de presentarse una emergencia

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
¿La sede cuenta con una adecuada señalización para una evacuación en caso de una emergencia ambiental?	x			El consorcio tendrá señalización en todo el perímetro para que los colaboradores tengan conocimiento cuando se presente una emergencia ambiental
Se identifican riesgos ambientales	x			Los riesgos para el medio ambiente se identifican en el centro de trabajo a partir de la formación específica y del conocimiento de los procesos productivos
¿Las personas que laboran en la sede conocen estos riesgos?	X			Se socializará con todo el personal los riesgos ambientales que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades
Se cuenta con extintores cargados y fecha de vencimiento al día.	x			Se realizará seguimiento a los extintores multifuncional ABC de los extintores que se encuentren en el campo de trabajo
Poseen Kit de emergencia.	x			Se tendrá un kit de derrame en el campo de trabajo
11. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS				
El kit de derrames cuenta como mínimo con bolsas rojas, tela olefilica, pala guantes nitrilo y mono gafas	x			El kit de derrames contiene todos los elementos necesarios para la atención de cualquier emergencia
Se tiene kit de derrames cerca del lugar de almacenamiento temporal de residuos líquidos peligrosos	x			El consorcio cuenta con tres kits de derrames para los dos frentes de obra

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
Se tiene kit de derrames cerca de equipo estacionario con potencialidad de derrames de derivados de hidrocarburos	x			Los kits de derrames son idóneos para sustancias químicas, anti derrames que se presenten en el desarrollo de las actividades del proyecto.
Se tiene kit de derrames para vehículo dentro del mismo	x			La máquina que se encuentra en obra cuenta con su kit de derrames
Cuenta con extintor multipropósito de 20 libras cerca del lugar de almacenamiento temporal de residuos peligrosos	x			En el desarrollo de las actividades se tiene instalado dos puntos de emergencia con camilla, extintor multipropósito botiquín de primeros auxilios
Hojas de seguridad de las sustancias químicas disponibles y divulgadas	x			Las hojas de seguridad de las sustancias que químicas se tendrán en un lugar visible para la manipulación adecuada de los colaboradores
Procedimiento operativo para atención de emergencias ambientales (derrames mayores menores, fugas) disponible	x			Se socializará con el personal colaborador el procedimiento operativo para la atención de emergencias ambientales.
Teléfonos de contacto de policía ambiental en caso de encuentro con abejas, serpientes, otros	x			Se divulgará teléfonos de contacto para atención de emergencias.

S: Si Cumple

N: No Cumple

N/A: No Aplica

Responsable de Inspección Ambiental **NOMBRE RESPONSABLE(S) DE LA INSPECCIÓN:**	**ASTRID RUIZ GONZÁLEZ** **INGENIERO AMBIENTAL**

10 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.

El informe de gestión social pretende evidenciar las actividades ejecutas en el periodo comprendido del 1 al 30 de Abril del año 2026 de acuerdo al Plan de Gestión Social, donde se evidencia actividades de los diferentes programas como son atención al usuario, educación y capacitación al personal vinculado al proyecto, programa de vinculación de mano de obra, información o participación comunitaria, plan de compensación socioeconómica y demás actividades de acompañamiento.

Programa de Atención al Usuario.

En este programa se pretende atender quejas peticiones, reclamos Y/o sugerencias que surjan durante la ejecución del proyecto. Este se adelantará de manera virtual haciendo uso de los canales telefónicos y de correo electrónico, atendiendo de manera oportuna todas las PQRS, a las que haya lugar, lo anterior con el fin de generar satisfacción en los usuarios en general del proyecto y mantener una buena imagen institucional en la comunidad.

El punto de atención a la comunidad se estable de manera virtual a través de los canales de comunicación vía telefónica (3138227763) y correo electrónico (social.consorciomh@cyg.com.co).

Durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes atenciones aclarando que no se recibieron oficio o solicitudes por escrito.


Tabla 63 Atención al Usuario.

°	FECHA DE RECIBIDO	REQUERIMIENTO	QUIEN FIRMA	ELULAR	EMAIL	TRAMITE	FECHA DE CIERRE
	05/02/ 2026	Solicitud de tala de árbol presentada por JAC Altos de Pompeya y Edil Corregimiento 4	Marisol Calvo Presidenta JAC Altos de Pompeya y Ana Delia Gutiérrez Edil Corregimiento 4.	3214901466-3132917541	jacaltopompeya@gmail.com anapresidente2009@hotmail.com	Solicitud de poda o tala de árbol.	08/04/2026
	23/02/2026	Reiteración de solicitud de intervención para poda urgente de árbol en contacto con red eléctrica	JULIANA JONES ORDOÑES Representante Legal Suplente CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH		Consorciomh@cyg.com.co	Se realizó la reiteración de la solicitud de poda del árbol enviado desde el consorcio para la Electrificadora del Meta.	08/04/2026
	23/02/2026	Respuesta a solicitud de poda/tala de árbol	María Del Pilar Sepúlveda Residente Social Consorcio Educación C&G - MH	3822776 3	social.consorciomh@cyg.com.co	Se envió respuesta a la solicitud realizada por la Junta de acción comunal del Alto de Pompeya y Edil del corregimiento 4.	08/04/2026

EL 08/04/2026 la Electrificado del Meta realizo la poda solicitada con esto damos por cerrada la solicitud realizada por la Junta de acción comunal del Alto de Pompeya.

Ilustración 46 Atención al Usuario.



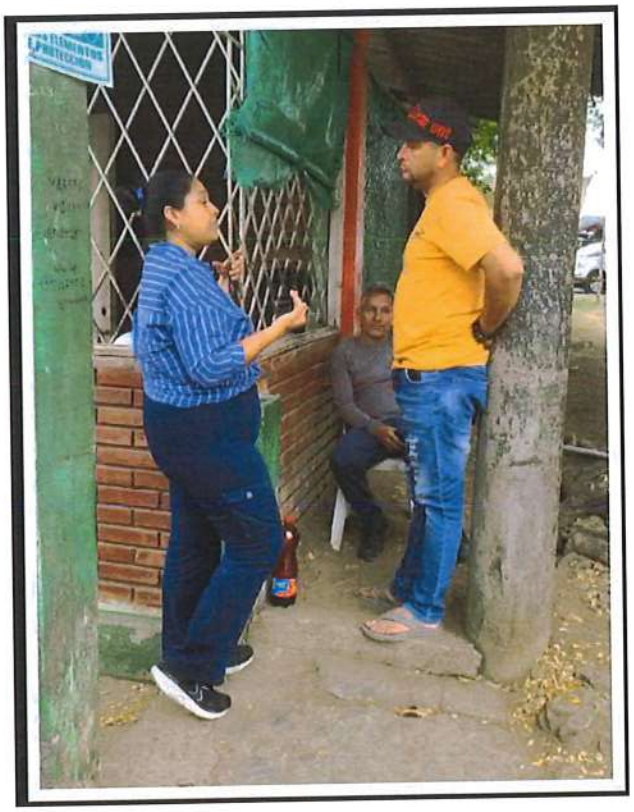

Se realizó atención al usurario de manera presencial a las solicitudes de información sobre proceso de postulación vacantes en obra por parte de la comunidad.

Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto.

En este programa se pretende capacitar al personal vinculado al proyecto en todas las áreas, tiene como propósito fortalecer las habilidades humanas, sociales y éticas del personal vinculado al proyecto, promoviendo conductas responsables, respetuosas y acordes con el entorno comunitario donde se desarrolla la obra.

TALLER DE EMPATÍA Y RESPONSABILIDAD EN SEGURIDAD EN OBRA

Objetivo general

Fortalecer la empatía y el sentido de responsabilidad de los trabajadores frente al cumplimiento de sus funciones, especialmente en temas de seguridad y prevención de riesgos en obra.

Metodología

Se implementó una metodología de aprendizaje vivencial mediante la estrategia de **juego de roles**, complementada con espacios de reflexión grupal orientados a la toma de conciencia.

Los participantes representaron situaciones reales del entorno laboral, analizaron comportamientos inadecuados y propusieron alternativas seguras y empáticas.

Desarrollo de la actividad

La actividad se desarrolló en las siguientes fases:

Representación de casos:

Los trabajadores, organizados en grupos, dramatizaron situaciones relacionadas con el incumplimiento de normas de seguridad.

Cambio de roles:

Los participantes intercambiaron personajes (trabajador, supervisor, SST) para comprender diferentes perspectivas.

Representación con solución:

Se realizó una segunda dramatización aplicando buenas prácticas, comunicación asertiva y cumplimiento de normas.

Reflexión grupal:

Se promovió el análisis mediante preguntas orientadoras sobre empatía, consecuencias de los actos inseguros y responsabilidad individual.

Cierre de la actividad

Se realizó una dinámica denominada **"El compromiso"**, en la cual cada trabajador expresó de manera voluntaria una acción concreta a implementar en su labor diaria, tales como:

- Uso adecuado de EPP

- Reporte oportuno de riesgos
- Cuidado de los compañeros
- Buen uso de las instalaciones

Ilustración 47 Actividad Taller Gestión de Riesgo Biopsicosocial en obra



Anexo 25: Listado de asistencia taller gestión de riesgo biopsicosocial en obra.

Programa de Contratación de Mano de Obra.

En este programa se pretende fomentar la vinculación laboral del personal del Área de Influencia Directa del Proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Especificar los perfiles requeridos concerniente a la mano de obra no calificada de la región, con el fin de divulgar por medio de oficina móvil, las diferentes vacantes laborales en las cuales

especifique: caracterización de la población, número de vacantes, perfiles requeridos como (ayudante de obra, oficial de obra, jefe de obra civil, conserje, entre otros a que allá a lugar), aspirantes presentados, seleccionados, seguimiento al contrato, de igual forma como requisito esencial se solicitará certificado de la JAC de residencia en la zona, adicionalmente a eso el certificado si pertenece o no algún grupo población específica, con la finalidad de asegurar la contratación de mínimo un 30% de las personas a intervenir de manera mensual.

Durante el mes de Abril se registró el ingreso de 14 trabajadores al proyecto. La distribución por cargo de la siguiente manera: (6) seis Oficiales de Obra, (4) cuatro Ayudantes de Obra, (1) un Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y (1) un ayudante avanzado eléctrico y (2) dos instaladores de redes.

Programa de Información y Participación Comunitaria.

El programa de información y participación ciudadana consiste en mantener un sistema de comunicación para el proyecto, que integra estrategias de comunicación comunitaria, social masiva, contribuyendo a la generación de una imagen positiva o sólida del Proyecto, al mejoramiento de las relaciones sociales culturales, organizativas, mediáticas. De igual manera, aportar desde la comunicación al fortalecimiento del capital social de la comunidad objeto en los ámbitos de intervención del proyecto, haciendo énfasis en una participación comunitaria. Visibilizar el alcance y los resultados del proyecto que permita el empoderamiento por parte de las comunidades, el posicionamiento del mismo.

Fortalecer las organizaciones sociales existentes, generar otros espacios de participación o control social con las comunidades del área de influencia del proyecto, contribuyendo a la imagen e identidad del proyecto, para su posicionamiento.

Comité de Vigilancia y Control.

Ilustración 48 Actividad Comité de Vigilancia y Control Abril



El 14 de abril de 2026 se llevó a cabo el Comité de Vigilancia y Control del periodo en mención, con el objetivo de socializar el avance del proyecto en sus componentes técnico, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo (SST) y social, así como atender inquietudes de la veeduría y la comunidad.

Durante la reunión, el Consorcio presentó el estado general del proyecto, reportando un avance físico del 50,0% ejecutado frente a un 56,3% programado, evidenciando un desfase del 6,3%, el cual se encuentra en seguimiento para su control dentro de la ejecución contractual.

En el componente técnico, se socializaron las principales actividades desarrolladas, destacando la ejecución de losas de contrapiso, instalación de malla electrosoldada, armado de acero de refuerzo en columnas, vigas y losas, fundida de concretos estructurales, rellenos, instalación de redes de tuberías, mampostería, así como actividades de acabados como enchapes e instalación de aparatos sanitarios, evidenciando la continuidad en el proceso constructivo.

En el componente ambiental, se informó sobre la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), mediante acciones orientadas a la prevención, mitigación y control de impactos, tales como el manejo adecuado de residuos, señalización, control de maquinaria, mantenimiento de puntos ecológicos y seguimiento a pozos de aguas residuales. Así mismo, se destacó el cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) con la entrega oportuna de informes a la autoridad competente. En relación con el componente forestal, se indicó la protección de los individuos arbóreos existentes y se informó sobre la poda realizada por la Electrificadora del Meta en zonas de interferencia con redes eléctricas, aclarando que futuras intervenciones deben ser gestionadas ante la Alcaldía de Villavicencio.

En cuanto al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, se socializaron las acciones implementadas para garantizar condiciones seguras en la obra, incluyendo inducciones, capacitaciones, entrega de elementos de protección personal, inspecciones y señalización. Se reportó la ocurrencia de un accidente laboral leve, el cual fue atendido de manera oportuna, con seguimiento médico correspondiente, sin mayores afectaciones para el trabajador.

Desde el componente social, se presentó el avance del Plan de Gestión Social, destacando la atención a solicitudes de la comunidad, el desarrollo de capacitaciones orientadas al manejo del riesgo biopsicosocial y el fortalecimiento del clima laboral. Así mismo, se resaltó la vinculación de mano de

obra local, reportando que, de los 49 trabajadores no calificados, 30 pertenecen al área de influencia directa, evidenciando el cumplimiento del compromiso social del proyecto.

Durante el espacio de preguntas, la veeduría manifestó la necesidad de definir una solución concreta frente al sistema de acueducto y alcantarillado de la institución. Al respecto, la interventoría informó que este proceso se encuentra en instancia judicial, siendo el juzgado competente quien determinará la entidad responsable de su ejecución. No obstante, se han adelantado gestiones administrativas entre las entidades involucradas, incluyendo la entrega de planos, diseños y servidumbres. Por su parte, la Alcaldía de Villavicencio indicó que se encuentra adelantando acciones jurídicas para clarificar la situación y garantizar una solución técnica adecuada.

Finalmente, se concluyó que, aunque el proyecto presenta avances significativos en todos sus componentes, es necesario continuar con la articulación interinstitucional para resolver la problemática del sistema de acueducto y alcantarillado, garantizando así la funcionalidad integral de la infraestructura educativa. El Consorcio reiteró su compromiso con la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, mientras que las entidades participantes manifestaron su disposición para continuar acompañando el proceso.

Anexo 26: Listado de asistencia Comité de Vigilancia y Control.

Ilustración 49 Actividad de Información y Socialización Dirigida a los Comerciantes



En cumplimiento del Plan de Gestión Social del contrato de obra pública No. 1279 de 2023, se desarrolló una actividad de información y socialización dirigida a los comerciantes del área de influencia directa del proyecto, ubicado en el corregimiento de Pompeya.

La actividad consistió en la entrega formal de comunicación escrita y socialización verbal del contenido, orientada a informar sobre la no responsabilidad del Consorcio Educación C&G–MH frente a las deudas de carácter personal adquiridas por trabajadores vinculados al proyecto o a sus empresas subcontratistas, precisando que dichas obligaciones corresponden exclusivamente a acuerdos individuales entre las partes.

Asimismo, se reiteró a los actores comunitarios que el contratista garantiza el cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales con su personal, conforme a la normatividad vigente, con el fin de prevenir interpretaciones erróneas que puedan derivar en afectaciones a la relación comunidad–proyecto.

La intervención se desarrolló mediante **estrategia de comunicación directa**, permitiendo la interacción con los comerciantes, la aclaración de inquietudes y la verificación de la apropiación del mensaje socializado.

Resultados de la actividad

- Socialización efectiva del comunicado a los comerciantes del área de influencia directa

Disminución del riesgo de generación de conflictos por situaciones económicas externas al proyecto

- Fortalecimiento de los canales de comunicación entre el consorcio y la comunidad

Generación de confianza y transparencia en la gestión social del proyecto

Alcance

La actividad se enfocó en actores económicos del entorno inmediato del proyecto (comercio local), como parte de las acciones de prevención de conflictividad social y manejo de impactos indirectos derivados de la ejecución de la obra.

Anexo 27: Listado de asistencia entrega de oficio al comercio.

Anexo 28: Oficio para comercio Pompeya.

11 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

11.1 Comité y/o Reuniones de Obra.

A continuación, se relacionan las reuniones y comités de obra en los que se participaron en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026:

Tabla 64 Relación de Actas de Reuniones y/o Comité

Relación de Actas de Reuniones y/o Comité		
Tipo de Acta	Fecha	Descripción
Acta Reunión	14-04-2026	Comité de Obra
Acta Reunión	14-04-2026	Comité de Vigilancia y Control
Acta Reunión	28-04-2026	Comité de Obra

11.2 Gestión de Comunicaciones

El control documental de las comunicaciones tiene como objeto garantizar la trazabilidad y registro formal de la información generada durante la ejecución del proyecto de construcción del Colegio Alfonso López Pumarejo.

Tabla 65 Relación de Correspondencia Enviada

CE	N° sub carpeta	N°	Fecha (dd/mm/aa)	Dirigido a	Asunto
201	126	551	1/04/2026	ROMVAL INGENIERIA S.A.S. Ing. EDWIN FERNEY ROMERO VALENCIA	Respuesta Derecho de Petición enviado por la Señora Sandra Mildred Muñoz
201	125	552	1/04/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Entrega de Ajustes a Memorias y Memorias RCI Modificatoria ° 5
201	127	553	6/04/2026	COMITÉS DE VIGILANCIA Y CONTROL Integrantes	Invitación Comité Social 14 de abril de 2026
201	127	554	7/04/2026	Información sobre deudas de particulares	Información sobre deudas de particulares

201	125	555	8/04/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Respuesta CER-104-2026 – Ajuste Diseños y Modificación N° 5
201	125	556	9/04/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Respuesta CER-102-2026– Respuesta Ajuste Diseños Eléctricos
201	125	557	10/04/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Radicación Informe Mensual de Obra No. 18 correspondiente al mes de marzo 2026
201	125	558	13/04/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Entrega de Diseño estructural de Tanque de Almacenamiento
201	125	559	13/04/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Respuesta CER-102-2026– Estudio de Mercado y Cotizaciones Diseños Eléctricos
201	125	560	15/04/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Radicación Correcciones Acta Parcial de Obra N° 3
201	125	561	16/04/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Radicación Acta Parcial de Obra N° 4
201	125	562	16/04/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Entrega de detalle estructural de mampostería confinada y estructural
201	126	563	20/04/2026	ROMVAL INGENIERIA S.A.S. Ing. EDWIN FERNEY ROMERO VALENCIA	Oficio CER-107-2026 (Reporte de acto inseguro y comportamiento inadecuado del personal en obra).
201	126	564	20/04/2026	ROMVAL INGENIERIA S.A.S. Ing. EDWIN FERNEY ROMERO VALENCIA	Respuesta Derecho de Petición-Pago de suministro de carne por parte del contratista Romval Ingenieria S.A.S.
201	125	565	23/04/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Entrega de detalle estructural de mampostería en ladrillo estructural
201	125	566	23/04/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Respuesta Oficio CER-095-2026 (Observaciones informe del mes de febrero de 2026).
201	126	567	29/04/2026	ROMVAL INGENIERIA S.A.S. Ing. EDWIN FERNEY ROMERO VALENCIA	Terminación del contrato de la referencia
201	125	568	29/04/2026	CONSORCIO EDUCATIVO AR Ing. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	Respuesta Oficio CER-110-2026 - Observaciones al acta parcial No 3

12 COMPONENTE FINANCIERO.

12.1 Relación Inversión del Anticipo.

El contrato establece en su cláusula 6 lo siguiente:

"Se pagará al CONTRATISTA de conformidad con lo establecido por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en los estudios previos la Entidad pagará el contrato celebrado con el adjudicatario de la siguiente manera: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO cancelará al contratista la remuneración a su favor de la siguiente manera: Un anticipo del VEINTE (20%) por ciento del valor del contrato previa aprobación del plan de inversión del anticipo por parte del interventor"

A la fecha se realizó el desembolso total del anticipo por valor de $4.767.975.486.28. A continuación, relacionamos el plan de inversión del anticipo aprobado por Interventoría y el Consorcio:

12.2 Plan de Inversión del Anticipo Versión 3

El 08 de marzo del 2024 por medio de la comunicación N° CE-201-125-250 se presentó a interventoría la modificación del plan de inversión de anticipo ajustando los rubros a las necesidades de obra según la ejecución del contrato así:

Tabla 66 Plan de Inversión del Anticipo Versión 3

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO III			
VALOR DEL CONTARTO DE OBRA		$	25.094.607.822,56
ANTICIPO 20%		$	5.018.921.564,51
IMPUESTO DE GUERRA (5%)		$	250.946.078,23
ANTICIPO 20%		$	4.767.975.486,00
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES	$ 2.002.549.704,24	42,00%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 2.527.027.007,73	53,00%

3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 238.398.774,31	5,00%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 0,00	0,00%
	TOTAL	**$ 4.767.975.486**	100%

Para garantizar el cumplimiento del contrato de obra 1279 del 2023, y enmarcado en plan de inversión del anticipo los datos fiduciarios se nombran a continuación.

Tabla 67 Datos Fiduciarios

Empresa	NIT	Porcentaje Anticipo	Valor
Alianza Fiduciaria	830053812-2	20%	$ 5.018.921.564,51

Tabla 68 Formato de Relación de Inversión Anticipo

N°	Document o Tercero	Fecha De Documento Tercero	Nit Tercero	Nombre Tercero	Concepto	Valor Neto Pago	Clasificación Anticipo	Orden De Giro	Fecha De Giro
1	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	167,217,062.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
2	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	58,000,000.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
3	1001	14/07/2023	529016550	MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	OC 015 -MATERIAL FERRETERIA	506,877.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
4	2263	13/07/2023	901234897-2	ACODEL FERRETERIA DE COLOMBIA SAS	OC 003 -MATERIAL FERRETERIA	7,418,119.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
5	2744	18/07/2023	900539242-5	INVERSIONES ARKA UNION SAS	OC 010 -MATERIAL FERRETERIA	658,042.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
6	1004	14/07/2023	529016550	MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	OC 015 -MATERIAL FERRETERIA	1,219,275.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
7	8106	1/08/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	TRANSPORTE A ESCOMBRERA	23,943,721.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
8	1021	1/09/2023	17343650	WILSON CARDENAS SABOGAL	CORTE N° 4 CONTRATO 001 DEMOLICIÓN	9,589,983.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
9	TAU-9	30/08/2023	529016550	MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	ORDEN DE COMPRA-014 MATERIAL FERRETERIA	2,176,426.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
10	CC049	15/08/2023	900803958-1	ALTARA INGENIERIA SAS	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO OT 007	700,000,000.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023

11	CC 003	28/08/2023	1113624886	ALEXANDER GIRALDO DELGADO	COMISION TOPOGRAFICA 19 07 AL 03 08 DE 2023	4,925,250.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
12	321	25/08/2023	901480671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 027 MATERIAL FERRETERIA	6,810,738.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
13	CC 01	8/09/2023	901.455.591-2	INVESTMENT CREARE SAS	ANTICIPO SUMINISTRO MATERIAL PETREO ORDEN DE COMPRA 050	80,021,559.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
14	4970	4/09/2023	900.887.192-7	MADERAS TELLEZ S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 030 MATERIAL FERRETERIA	4,444,550.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
15	No. 1BV 326	1/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 032 MATERIAL FERRETERIA	447,347.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
16	CC	21/09/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	ANTICIPO DEL CONTRATO DCE 201 147 004 E OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	33,612,625.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
17	CC 01	11/09/2023	900342509-9	MH CONSULTING SAS	ANTICIPO SUMINISTRO REDES ELECTRICAS	420,768,060.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
18	CC 01	19/09/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISION TOPOGRAFICA 6 07 08 09 10 11 12 y 13 DE SEPTIEMBRE 2023	3,526,280.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
19	NOTA DEBITO N°1	21/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 038 MATERIAL FERRETERIA	2,144,806.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
20	No. 1BV 345	26/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 040 MATERIAL FERRETERIA	4,382,665.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
21	01FE-51445	15/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 041 SUMINISTRO ACERO	3,771,933.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
22	01FE-51650	19/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 045 SUMINISTRO ACERO	38,929,551.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023

23	01FE-51756	21/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 046 SUMINISTRO ACERO	11,550,002.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
24	FOS 8321	1/09/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE AGOSTO	35,508,704.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
25	FOS 8576	11/10/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE SEPTIEMBRE I	5,017,014.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
26	FOS 8577	11/10/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE SEPTIEMBRE II	5,294,165.58	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
27	A-380	1/10/2023	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA-052 MADERA	2,957,668.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2023
28	No. 1BV 360	9/10/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-056 MATERIAL FERRETERIA	5,685,010.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2023
29	ALT 285	18/10/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 001 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	179,287,996.42	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 3	22/11/2023
30	CC	21/10/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	ANTICIPO DEL CONTRATO DCE-201-147-004 E OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	22,249,964.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 3	22/11/2023
31	01FE-53555	20/10/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-063 SUMINISTRO ACERO	54,549,598.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2023
32	CC 002	1/11/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (COBRO 1)	3,967,065.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023
33	CC 03	7/11/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA 13, 14, 15, 16, 17, 18 DE OCTUBRE 2023	2,644,710.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023

34	TAU-19	11/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 1 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	9,923,581.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023
35	TAU-20	11/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 2 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	905,008.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023
36	TAU-23	16/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 3 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	7,131,632.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2023
37	FOS 8715	2/11/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE OCTUBRE 2023	40,170,822.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 4	13/12/2023
38	No. 1BV 387	25/10/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-066 MATERIAL FERRETERIA	927,647.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
39	No. 1BV 392	8/11/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-070 MATERIAL FERRETERIA	535,790.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
40	1BV 416	27/11/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-083 MATERIAL FERRETERIA	3,399,818.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
41	1BV 420	9/12/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-087 MATERIAL FERRETERIA	4,870,522.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
42	01FE-54325	1/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-068 SUMINISTRO ACERO	169,304.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
43	01FE-54480	3/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-072 SUMINISTRO ACERO	957,252.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
44	01FE-55455	20/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-074 SUMINISTRO ACERO	52,040,940.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024

45	01FE-55453	20/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-075 SUMINISTRO ACERO	17,072,168.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
46	A-383	1/11/2023	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA-057 MADERA	398,580.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
47	FOS 8915	1/12/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE NOVIEMBRE 2023	4,134,777.33	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
48	ALT 291	6/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 002 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	45,355,552.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
49	292	18/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 001 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	34,690,133.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
50	293	18/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 002 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	40,007,787.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
51	ALT 294	20/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 003 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	41,648,556.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
52	CC 04	1/12/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2023 Y DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023	6,800,560.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
53	CC 04	1/12/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 8 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2023	6,800,560.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
54	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	456,754,809.50	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 6	31/01/2024
55	FVE 311	22/01/2024	901.556.948-1	COMERCIALIZADORA DE CONCRETOS PREMIUM S.A.S ZOMAC	TRANSPORTE DE AGREGADOS ORDEN DE TRABAJO 027	29,925,014.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 7	10/02/2024

56	CC 14176	24/01/2024	891800111-5	DIACO SA	ANTICIPO ACERO	316,540,000.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 7	10/02/2024
57	PROFORMA 4529310575 6	27/01/2024	860002523-1	CEMEX COLOMBIA SA	ANTICIPO CEMENTO GRIS	299,499,200.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 7	10/02/2024
58	SAE 3381	5/12/2023	901.174.550-4	SAE TABLEROS DE CONTROL Y ENERGIA S.A.S.	ORDEN DE COMPRA-076 MATERIAL FERRETERIA PROVISIONAL DE OBRA (CABLE)	4,365,454.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 8	14/02/2024
59	DAFE 6	24/11/2023	901.753.376-3	GNC CONSTRUCCIONES SAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUB BASE ORDEN DE COMPRA 069	5,422,144.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
60	DAFE-13	24/01/2024	901.753.376-3	GNC CONSTRUCCIONES SAS	ORDEN DE COMPRA-088 MATERIAL AGREGADO	3,098,368.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
61	A-384	1/11/2023	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	OC 065 COMPRA MADERA	1,181,432.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 8	14/02/2024
62	A-430	23/01/2024	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	OC 079 COMPRA MADERA	833,952.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 8	14/02/2024
63	ALT-296	23/01/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	TRANSPORTE DE MATERIALES	13,338,000.00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
64	ALT 301	8/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 003 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	20,927,198.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
65	ALT 302	8/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 004 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	22,545,238.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
66	FECV 189	26/01/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	CORTE N° 3 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	13,067,860.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
67	FECV 190	7/02/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	CORTE N° 4 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	32,023,394.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024

68	TAU-32	7/02/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 6 CE-201-147-004 DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO	59,980,201.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
69	CC 06	2/02/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA 20 DÍAS MES DE DICIEMBRE	8,549,700.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 8	14/02/2024
70	ALT 285	18/10/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 001 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	15,794,897.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
71	ALT 304	20/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 004 CONTRATO CE-201-146-002 EXCAVACIÓN	176,133,378.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
72	ALT 305	20/02/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 005 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	32,919,472.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
73	TAU-35	20/02/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 7 CE-201-147-004 DE OBRA PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	27,557,188.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
74	FECV 191	19/02/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CORTE N° 5 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	39,517,236.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
75	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 3	71,631,753.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 9	28/02/2024
76	1191	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-093 SUMINISTRO ACERO	574,770.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
77	1193	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-094 SUMINISTRO ACERO	47,649,147.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
78	1194	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-094 SUMINISTRO ACERO	1,165,962.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
79	1195	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-093 SUMINISTRO ACERO	25,488,372.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024

80	1241	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-100 SUMINISTRO ACERO	53,530,960.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
81	1242	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	20,200,726.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
82	1248	4/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-100 SUMINISTRO ACERO	32,905,404.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
83	1249	1/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	32,172,840.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
84	1253	5/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-101 SUMINISTRO ACERO	75,179,797.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
85	A-450	28/02/2024	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA103 MADERA	3,985,800.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
86	A-451	28/02/2024	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA-103 MADERA	1,303,050.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
87	2448	29/02/2024	901.100.411-1	SOLUINTECO SAS	ORDEN DE COMPRA-103 SUMINISTRO ACERO	8,259,384.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 10	20/03/2024
88	CC 07	1/03/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 09 AL 26 DE ENERO DEL 2023	7,704,130.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
89	ALT 308	6/03/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 006 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	85,059,771.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
90	TAU-36	6/03/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 8 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	38,803,958.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
91	FECV 192	7/03/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CORTE N° 6 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	34,981,301.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024

92	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 4	45,895,714.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 10	20/03/2024
93	1192	9/02/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	24,555,531.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
94	1255	7/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	70,939,946.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
95	1258	3/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	1,185,954.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
96	1259	8/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	65,054,920.00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
97	1261	8/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	7,901,540.50	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
98	1262	8/03/2024	800046125 - 2	FERRELUGUE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-109 SUMINISTRO ACERO	3,738,619.23	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 11	17/04/2024
99	FECV 196	21/03/2024	900.773.521-7	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S	CORTE N° 7 CE-201-147-007CONSTRUCCION CAISSON	42,746,131.98	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
100	CC 09	3/04/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 02AL 04 DE MARZO DEL 2024	856,014.44	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
101	CC 08	3/04/2024	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 02AL 04 DE MARZO DEL 2024	10,272,173.33	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
102				ANULADO					17/04/2024
103	TAU-39	6/04/2024	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N°98 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	35,323,429.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024

104	310	21/03/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N 006 CE 201 146 007 CONCRETO	90,650,204.00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
105	9817	3/04/2024	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE MARZO 2024	14,546,044.40	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 11	17/04/2024
106	310	21/03/2024	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N 007 CE 201 146 007 CONCRETO	12,570,248.56	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 12	24/06/2024
TOTAL						**4,767,975,486.28**			

12.3 Ejecución Financiera del Anticipo

A la fecha del presente informe, se ejecutó el 100% del anticipo aprobado, mediante giros parciales gestionados por la fiduciaria conforme a la planeación contractual.

Tabla 69. Relación de Inversión por Mes y Clasificación

CLASIFICACIÓN ANTICIPO	VALOR GIRADO OCTUBRE 2023	VALOR GIRADO NOVIEMBRE 2023	VALOR GIRADO DICIEMBRE 2023	VALOR GIRADO ENERO 2024	VALOR GIRADO FEBRERO 2024	VALOR GIRADO MARZO 2024	VALOR GIRADO ABRIL 2024	VALOR GIRADO JUNIO 2024	ACUMULADO TOTAL
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$1,285,249,950.00	63,192,276	-	80,372,021	622,420,038	302,416,212	173,376,511	-	$ 2,527,027,007.73
MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	$218,871,200.00	201,537,960	24,571,996	632,057,958	520,647,515	212,444,874	179,847,953	12,570,249	$ 2,002,549,704.24
TRANSPORTE DE MATERIALES	$127,763,604.58	-	40,170,822	4,134,777	51,783,526	-	14,546,044	-	$ 238,398,774.31

COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ -	-	-	-	-	-	-	-	$ -
TOTAL	$1,631,884,754.58	$264,730,236.42	$64,742,818.00	$716,564,755.83	$1,194,851,079.00	$514,861,086.00	$367,770,507.89	$12,570,248.56	$4,767,975,486.28

A la fecha del presente informe, se giraron por medio de la fiducia el valor de **CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 4,767,975,486.28).**

12.4 Liquidación Del Encargo Fiduciario

Una vez ejecutado el 100% del plan de inversión aprobado, se procedió a la liquidación del encargo fiduciario administrado por Alianza Fiduciaria S.A., sin saldos pendientes ni observaciones por parte de la interventoría ni de la entidad contratante.

Adicionalmente, los rendimientos financieros generados por los recursos depositados en el encargo fiduciario fueron debidamente reintegrados al Municipio de Villavicencio el 03 de septiembre del 2024, por un total de 1.133.532,82 discriminados así, la diferencia en el valor total de $110.94 se debe a la cancelación final de la cuenta:

Tabla 70 Giros Rendimientos Financieros

Fecha	Valor
30/09/2023	$ 80,036.63
31/10/2023	$ 199,125.35
30/11/2023	$ 156,189.68
31/12/2023	$ 240,123.16
31/01/2024	$ 232,901.35
29/02/2024	$ 118,976.98
31/03/2024	$ 61,799.39
30/04/2024	$ 11,904.19
30/04/2025	$ 30,280.99
31/05/2025	$ 875.59
30/06/2024	$ 911.55
31/07/2025	$ 410.96
31/08/2024	$ 99.47
30/09/2025	$ 8.47
TOTAL	**$ 1,133,643.76**

Estado de Liquidación:

- **Valor Total Anticipo Girado:** $4.767.975.486,00
- **Valor Ejecutado:** $4.767.975.486,00
- **Rendimientos Financieros Devueltos a la Alcaldía:** $ 1,133,535.82
- **Saldo:** $0
- **Fecha de Liquidación:** 31-10-2024Seguimiento Financiero Control de Actas y Pagos.

A la fecha la entidad realizó el desembolso total del anticipo a la fiducia por valor de $4.767.975.486.28.

Tabla 71 Control y Seguimiento de Anticipo

RP	Detalle	Fecha de pago	%	Valor	Descuentos	Neto Parcial	Desembolsos Acumulados
2929	Anticipo N° 1	14/09/2023	0.16%	$ 80,000,000.00	5%	$ 76,000,000.00	$ 76,000,000.00
2929		22/09/2023	65.22%	$ 3,273,648,510.95	5%	$ 3,109,966,084.95	$ 3,109,966,084.95
2929		22/11/2023	33.18%	$ 1,665,273,053.56	5%	$ 1,582,009,400.56	$ 1,582,009,400.56
Total				**$ 5,018,921,564.51**		**$ 4,767,975,485.51**	**$ 4,767,975,485.51**

12.1 Relación Actas de Pago Parcial

Tabla 72 Control y Seguimiento de Pago de Actas Parciales.

RP	Detalle	Fecha de pago	%	Valor Acta Presente	Amortizado	Neto Parcial	Desembolsos Acumulados
2994	Acta Parcial 1	2/01/2026	20%	$ 5,019,015,322.68	$ 1,003,803,065.00	$ 4,015,212,257.68	$ 178,626,235.00
		26/01/2026					$ 3,033,543,648.00
2994	Acta Parcial 2	N/A	10%	$ 2,509,475,598.89	$ 501,895,120.00	$ 2,007,580,478.89	$ 0.00
2994	Acta Parcial 3	N/A	10%	$ 2,517,873,826.06	$ 503.574.765.00	$ 2,014,299,061.06	$ 0.00
Total				**$ 15,065,416,597.11**	**$ 3,013,083,321.00**	**$ 12,052,333,276.11**	**$ 3,212,169,883.00**

CONCLUSIÓN.

Durante el periodo en referencia, el proyecto evidenció avances significativos en sus componentes físicos, técnicos, administrativos y financieros, los cuales se presentan de manera consolidada en este informe. La información recopilada permite verificar el cumplimiento de las actividades programadas, la correcta utilización de los recursos y la ejecución de acciones orientadas a asegurar el desarrollo eficiente y seguro de la obra.

La gestión realizada en SST, medio ambiente y componente social contribuyó al fortalecimiento de las condiciones de trabajo, al control de impactos y a la atención oportuna de las novedades surgidas durante el mes. En cuanto al ámbito contractual y financiero, se registró el avance correspondiente a los trámites administrativos, pagos y documentación requerida, garantizando la continuidad del proyecto conforme a los lineamientos establecidos.

En conclusión, el informe mensual de noviembre proporciona una visión integral y actualizada del estado del proyecto, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento adecuado para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales y específicos del contrato.

TABLAS

Tabla 1 Datos Generales del Proyecto 9

Tabla 2 Ubicación Geográfica Centro Poblado Altos de Pompeya.....12

Tabla 3 Áreas a Construir por Edificaciones.....14

Tabla 4 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Contrato.....16

Tabla 5 Póliza de Seguro Cumplimiento Contrato.....16

Tabla 6 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Acta de Inicio 17

Tabla 7 Póliza de Seguro Cumplimiento Acta de Inicio 18

Tabla 8 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Prorroga No. 1.....19

Tabla 9 Póliza de Seguro Cumplimiento – Prorroga No. 1 19

Tabla 10 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Modificación No. 3.....20

Tabla 11 Póliza de Seguro Cumplimiento – Modificación No. 3 21

Tabla 12 Póliza de Seguro Cumplimiento – Suspensión No. 1 21

Tabla 13 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Suspensión No. 1.....22

Tabla 14 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 1 Suspensión No. 1.....23

Tabla 15 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 1 Suspensión No. 1.....23

Tabla 16 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 2 Suspensión No. 1.....24

Tabla 17 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 2 Suspensión No. 1.....24

Tabla 18 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 4 Suspensión No. 1.....25

Tabla 19 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 4 Suspensión No. 1. 26

Tabla 20 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 5 Suspensión No. 1 26

Tabla 21 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 5 Suspensión No. 1. 27

Tabla 22 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 6 Suspensión No. 1 28

Tabla 23 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 6 Suspensión No. 1. 28

Tabla 24 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 7, 8 y 9 Suspensión No. 1. 29

Tabla 25 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 7, 8 y 9 Suspensión No. 1. ...30

Tabla 26 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 10 Suspensión No. 1 30

Tabla 27 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 10 Suspensión No. 1. 31

Tabla 28 Póliza de Seguro Cumplimiento – Ampliación No. 11 Suspensión No. 1. 31

Tabla 29 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Ampliación No. 11 Suspensión No. 1. 32

Tabla 30 Póliza de Seguro Cumplimiento – Acta Reinicio 33

Tabla 31 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual –Acta Reinicio 33

Tabla 32 Póliza de Seguro Cumplimiento – Modificatoria N° 4 34

Tabla 33 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Modificatoria N° 4 34

Tabla 34 Póliza de Seguro Cumplimiento – Cesión de Posición Contractual 35

Tabla 35 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Cesión de Posición Contractual 36

Tabla 36 Flujo de Inversión Programado Por Mes 37

Tabla 37 Relación Avance Programado Acumulado vs Avance Físico Acumulado 38

Tabla 38 Trazado y Replanteo Arquitectónico 40

Tabla 39 Columnas de Concreto 28 Mpa-4000 Psi.....42

Tabla 40 Acero de Refuerzo Estructural.....43

Tabla 41 Vigas Aéreas en Concreto 44

Tabla 42 Losa Aligerada de Concreto 45

Tabla 43 Losa Aligerada de Concreto en Cubiertas.....46

Tabla 44 Malla Electrosoldada Losa Contrapiso.....47

Tabla 45 Losa Contrapiso 4000 Psi 49

Tabla 46 Mampostería Estructural a la Vista 50

Tabla 47 Dovelas en Mortero tipo Grouting para Mampostería 51

Tabla 48 Relación de Maquinarias Usadas en el Periodo abril 2026 54

Tabla 49 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 6-7-8-9-12 Días 58

Tabla 50 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 14-16-17 Días.....60

Tabla 51 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 28 Días 63

Tabla 52 Ensayo Asentamiento o Slump 69

Tabla 53 Relación de Equipos Topográficos.....70

Tabla 54 Equipos de Laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S 70

Tabla 55 del Personal Profesional en Obra 84

Tabla 56 Relación del Personal no Profesional del Contratista de Obra.....86

Tabla 57 Relación del Personal de Contratistas de Obra 88

Tabla 58 Proceso de Inducción por Empresas.....101

Tabla 59 Descripción de Indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo 109

Tabla 60 Control De Manejo Ambiental.....112

Tabla 61 Disposición Final De Los Residuos De Construcción Y Demolición RCD 114

Tabla 62 Cantidad de Material.....116

Tabla 63 Atención al Usuario. 142

Tabla 64 Relación de Actas de Reuniones y/o Comité 153

Tabla 65 Relación de Correspondencia Enviada 153

Tabla 66 Plan de Inversión del Anticipo Versión 3 155

Tabla 67 Datos Fiduciarios.....156

Tabla 68 Formato de Relación de Inversión Anticipo.....157

Tabla 69. Relación de Inversión por Mes y Clasificación.....166

Tabla 70 Giros Rendimientos Financieros 168

Tabla 71 Control y Seguimiento de Anticipo 169

Tabla 72 Control y Seguimiento de Pago de Actas Parciales. 169

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización del Proyecto 13

Ilustración 2 Implantación y Localización General 14

Ilustración 3 Curva S Análisis de Avance Físico vs Programado 39

Ilustración 4 Trazado y Replanteo Arquitectónico 41

Ilustración 5 Columnas de Concreto 28 Mpa-4000 Psi 42

Ilustración 6 Acero de Refuerzo Estructural 43

Ilustración 7 Concreto en Vigas Aéreas 45

Ilustración 8 Losa Aligerada de Concreto 46

Ilustración 9 Losa Aligerada de Concreto en Cubierta 47

Ilustración 10 Malla Electrosoldada en Losas 48

Ilustración 11 Losa de Contrapiso 48

Ilustración 12 Mampostería Estructural a la Vista 49

Ilustración 13 Dovelas en Mortero tipo Grouting para Mampostería 50

Ilustración 14 Excavación con Maquinaria Especializada 51

Ilustración 15 Plan de Manejo de Transito abril 2026 53

Ilustración 16 Implementación del Plan de Manejo de Transito abril 2026 53

Ilustración 17 Maquinaria en Obra abril 2026 54

Ilustración 18 Registro Diario del Clima abril 2026 55

Ilustración 19 Influencia del Clima abril 2026 56

Ilustración 20 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 6-7-8-9-10 Días 59

Ilustración 21 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 14-16-17 Días.....62

Ilustración 22 Ensayo a la Compresión 4000 PSI Edad 28 Días.....66

Ilustración 23 Toma y Curado de Muestras Concreto.....67

Ilustración 24 Ensayo Asentamiento o Slump.....68

Ilustración 25 Personal Vinculado por Empresas abril 2026.....82

Ilustración 26Personal Vinculado por Profesión Abril 2026.....83

Ilustración 27 Entrega y Reemplazo de Equipos de Protección Personal.....100

Ilustración 28 Proceso de Inducción.....101

Ilustración 29 Participación de Inducciones.....103

Ilustración 30 Cobertura de Participación Contratista.....104

Ilustración 31 Aseguramiento de Actividades de Alto Riesgo en Obra.....106

Ilustración 32 Inspecciones Planificadas.....107

Ilustración 33 Comités de Obra.....108

Ilustración 34 Indicadores de Accidentalidad.....110

Ilustración 35 Acopio Temporal De Material.....116

Ilustración 36 Desinfección de Unidades Sanitarias.....118

Ilustració37 Mantenimiento Puntos Ecológicos.....121

Ilustración 38 Cerramiento de protección individual.....123

Ilustración 39 poda individuos arbóreo.....123

Ilustración 40 Inspección Puntos de Emergencia 125

Ilustración 41 Mantenimiento de la Señalización 126

Ilustración 42 Maquinaria en la Obra 127

Ilustración 43 Puesto de Control Silo Para Concreto 128

Ilustración 44 actividades de medio ambiente 130

Ilustración 45 comité mensual 132

Ilustración 46 Atención al Usuario. 143

Ilustración 47 Actividad Taller Gestión de Riesgo Biopsicosocial en obra 146

Ilustración 48 Actividad Comité de Vigilancia y Control Abril 148

Ilustración 49 Actividad de Información y Socialización Dirigida a los Comerciantes 151

32135

ANEXO 1. ACTA DE AVANCE MENSUAL

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

Codigo: 1010-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024
Página 1

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%
				ESTADO: EN EJECUCION

			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
1. DEMOLICION Y PRELIMINARES															
1.1	DEMOLICIONES GENERALES														
1.1.1	DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES INCLUYE: (MUROS, ESTRUCT. CONFINAM, CUBIERTA, DESMONTES APARATOS, CARP, Y RETIROS SOBRANTES)	M2	2,392.87	$ 87,530.00	$ 209,447,911.00	2,406.76	$ 210,663,703.00	2,103.59	$ 184,127,232.70	-	$ -	2103.59	$ 184,127,232.70	303.17	$ 26,536,470.10
1.1.2	DEMOLICIÓN PLACAS PISO E=0.10M INC CARGUE MANUAL, RETIRO 5 KM	M2	4,155.53	$ 23,891.00	$ 99,279,767.00	4,291.85	$ 102,536,588.00	3,880.36	$ 92,705,680.76	-	$ -	3880.36	$ 92,705,680.76	411.49	$ 9,830,907.59
NP-01	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO ENTERRADO INCLUYE TRASCIEGO Y CARGUE MANUAL (INCLUYE RETIRO 5 KM)	M3	214.35	$ 376,871.00	$ 80,782,299.00	214.35	$ 80,782,299.00	214.35	$ 80,782,298.85	-	$ -	214.35	$ 80,782,298.85	-	$ -
NP-02	RETIRO DE POSTE DE ENERGÍA EN CONCRETO 8 - 10 M	UND	18.00	$ 108,706.00	$ 1,956,708.00	18.00	$ 1,956,708.00	18.00	$ 1,956,708.00	-	$ -	18.00	$ 1,956,708.00	-	$ -
NP-03	RETIRO DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE	UND	17.00	$ 88,180.00	$ 1,499,060.00	17.00	$ 1,499,060.00	17.00	$ 1,499,060.00	-	$ -	17.00	$ 1,499,060.00	-	$ -
2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO															
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO														
2.1.1	LOCALIZACION TOPOGRAFICA (sardineles y redes)	ML	756.75	$ 1,602.00	$ 1,212,314.00	756.75	$ 1,212,314.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	756.75	$ 1,212,313.50
2.1.2	LOCALIZACION Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA VIAS (excavacion y conformacion de banca - ancho de calzada 6-8m)	ML	377.10	$ 6,938.00	$ 2,616,320.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.3	TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT	M2	6,154.56	$ 4,091.00	$ 25,178,305.00	10,857.98	$ 44,419,996.00	10,492.40	$ 42,924,408.40	365.58	$ 1,495,587.78	10,857.98	$ 44,419,996.18	-	$ -
2.2	DESCAPOTES MAQ./MANUAL														
2.2.1	DESCAPOTE MECANICO.e= < 0.2m,Inc retiro.5 kms	M2	12,025.47	$ 12,936.00	$ 155,561,480.00	11,653.91	$ 150,754,980.00	11,653.91	$ 150,754,979.76	-	$ -	11,653.91	$ 150,754,979.76	-	$ -
2.2.2	DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO	M2	-	$ 7,804.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.3	DESCAPOTE MECANICO.e= <e= 0.15m,Inc retiro.5 kms	M2	-	$ 8,803.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.4	TALA ARBOL CLASE II 5m<H<10m inc. transp5km, desen	UN	-	$ 264,240.00	$ -	13.00	$ 3,435,120.00	13.00	$ 3,435,120.00	-	$ -	13.00	$ 3,435,120.00	-	$ -
2.2.5	TALA ARBOL CLASE III 10m<H<20m inc. transp5km, des	UN	46.00	$ 417,957.00	$ 19,226,022.00	21.00	$ 8,777,097.00	21.00	$ 8,777,097.00	-	$ -	21.00	$ 8,777,097.00	-	$ -
2.2.6	TALA ARBOL CLASE IV 20m<H<30m inc. transp5km, dose	UN	-	$ 681,169.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-04	DESENRAICE DE TOCONES DE ARBOL INCLUYE TRASPORTE 5KM	UND	35.00	$ 251,283.00	$ 8,794,905.00	35.00	$ 8,794,905.00	35.00	$ 8,794,905.00	-	$ -	35.00	$ 8,794,905.00	-	$ -
2.3	EXCAVACIONES														
2.3.1	EXCAV MECAN INC RETIRO DE SOBRANTES(xa cajas vias-	M3	2,168.65	$ 42,059.00	$ 91,211,250.00	2,168.65	$ 91,211,250.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,168.65	$ 91,211,250.35
2.3.2	EXCAVA. MANUAL VIAS CONGLOMER 0,20M. Incl retiro 5 km	M3	197.60	$ 37,329.00	$ 7,376,210.00	197.60	$ 7,376,210.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	197.60	$ 7,376,210.40
2.3.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO HUMEDO H < 4.0M	M3	4,542.19	$ 33,791.00	$ 153,485,142.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.3.4	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	144.55	$ 66,620.00	$ 9,629,921.00	1,005.05	$ 66,956,431.00	1,005.05	$ 66,956,431.00	-	$ -	1,005.05	$ 66,956,431.00	-	$ -
2.3.5	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMER TERRAC. Inc retiro 5 km	M3	2,544.00	$ 45,486.00	$ 115,716,384.00	4,026.94	$ 183,169,393.00	4,026.94	$ 183,169,392.84	-	$ -	4,026.94	$ 183,169,392.84	-	$ -
NP-05	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON INCLUYE CARGUE Y RETIRO 5KM	M3	1,960.89	$ 1,484,770.00	$ 2,911,470,645.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-05-01	EXCAV. HUMEDA CONGLOM. MANUAL, para Caisson/pilot	M3	-	$ 1,106,913.00	$ -	1,646.56	$ 1,822,598,669.00	1,646.56	$ 1,822,598,669.28	-	$ -	1,646.56	$ 1,822,598,669.28	-	$ -
NP-13	DEMOLICIÓN CON QUIMICO EXPANSIVO PARA ROCA	UND	164.00	$ 169,538.00	$ 27,804,232.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-13-01	DEMOLICIÓN CON QUIMICO EXPANSIVO PARA ROCA	UND	-	$ 63,357.00	$ -	4,000.00	$ 253,468,000.00	4,000.00	$ 253,468,000.00	-	$ -	4,000.00	$ 253,468,000.00	-	$ -
NC H.8.9	RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual	M3	-	$ 32,445.00	$ -	1,975.87	$ 64,107,102.00	1,975.87	$ 64,107,102.15	-	$ -	1,975.87	$ 64,107,102.15	-	$ -
2.4	RELLENOS, EXPLANACION, RETIROS														
2.4.1	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio	M3	2,298.02	$ 95,591.00	$ 219,670,030.00	2,298.02	$ 219,670,030.00	497.27	$ 47,534,536.57	-	$ -	497.27	$ 47,534,536.57	1,800.75	$ 172,135,493.25

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO	
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023	
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION	
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026	
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026	
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:	
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%	
				ESTADO: EN EJECUCION	

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
2.4.2	RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno exten mecánico	M3	2,969.91	$ 19,960.00	$ 59,279,404.00	804.95	$ 16,066,802.00	804.95	$ 16,066,802.00	-	$ -	804.95	$ 16,066,802.00	-	$ -
NP-08	RELLENO EN MATERIAL DEL SITIO ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 6%	M3	2,025.35	$ 126,832.00	$ 256,879,191.00	71.20	$ 9,030,438.00	71.20	$ 9,030,438.40	-	$ -	71.20	$ 9,030,438.40	-	$ -
3. CIMENTACIONES															
3.1	BASES - SOLADOS														
3.1.1	CONCRET013,6 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	146.42	$ 567,815.00	$ 83,139,472.00	54.91	$ 31,178,722.00	53.62	$ 30,446,240.30	-	$ -	53.62	$ 30,446,240.30	1.29	$ 732,481.35
NC-01	CONCRETO CICLOPEO. 20.7 MPa (3000 p.s.i)	M3	12.64	$ 586,419.00	$ 7,412,336.00	12.63	$ 7,406,472.00	12.63	$ 7,406,471.97	-	$ -	12.63	$ 7,406,471.97	-	$ -
3.2	ZAPATAS CORRIDAS-AISLADAS														
3.2.1	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro.	M3	-	$ 829,996.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-06	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE BOMBEO)	M3	420.34	$ 1,604,244.00	$ 674,327,923.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-06-01	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE BOMBEO)	M3	-	$ 1,537,202.00	$ -	344.33	$ 529,304,765.00	344.33	$ 529,304,764.66	-	$ -	344.33	$ 529,304,764.66	-	$ -
NP-07	CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE GRUA Y BOMBEO)	M3	1,375.46	$ 1,022,328.00	$ 1,406,171,271.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-07-01	CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE GRUA Y BOMBEO)	M3	-	$ 884,559.00	$ -	1,302.31	$ 1,151,970,031.00	1,302.31	$ 1,151,970,031.29	-	$ -	1,302.31	$ 1,151,970,031.29	-	$ -
NP-09	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD MAYOR A 10M - SIN REFUERZO (INCLUYE BOMBEO)	M3	38.64	$ 1,970,294.00	$ 76,132,160.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-10	CONCRETO DE 4000 PSI TIPO TREMIE PARA CAISSON - PROFUNDIDAD MAYOR A 10 M - SIN REFUERZO (INCLUYE BOMBEO)	M3	126.44	$ 1,088,200.00	$ 137,592,008.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-11	CONCRETO ZAPATA 28 MPa,(4000 psi) No inc hierro.	M3	14.36	$ 1,150,518.00	$ 16,521,438.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-11-01	CONCRETO ZAPATA 28 MPa,(4000 psi) No inc hierro.	M3	-	$ 1,069,468.00	$ -	47.38	$ 50,671,394.00	40.36	$ 43,163,728.48	-	$ -	40.36	$ 43,163,728.48	7.02	$ 7,507,665.36
3.3	VIGAS CIMENTACION														
3.3.1	VIGA CIMENTACION 0.30X0.30 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 6 D=1/2+F3/8 C/15 (Cerramiento)	ML	-	$ 175,666.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.2	CONCRETO VIGA CIMENTA .20,7MPa,(3000 PSI)	M3	-	$ 890,108.00	$ -	50.88	$ 45,288,695.00	50.88	$ 45,288,695.04	-	$ -	50.88	$ 45,288,695.04	-	$ -
NP-12	CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa,(4000 PSI)	M3	831.73	$ 1,087,426.00	$ 904,444,827.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-12-01	CONCRETO VIGA CIMENTACION 28 MPa,(4000 PSI)	M3	-	$ 1,087,740.00	$ -	519.06	$ 564,602,324.00	519.06	$ 564,602,324.40	-	$ -	519.06	$ 564,602,324.40	-	$ -
3.4	ACERO DE REFUERZO														
3.4.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	114,581.77	$ 9,302.00	$ 1,065,839,625.00	148,430.94	$ 1,380,704,604.00	148,313.24	$ 1,379,609,758.48	-	$ -	148,313.24	$ 1,379,609,758.48	117.70	$ 1,094,845.40
4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO															
4.1	COLUMNAS - COLUMNETAS CONCRETO														
4.1.1	COLUMNA CONCRETO 28 Mpa - 4000 psi (m3)	M3	502.84	$ 1,152,183.00	$ 579,363,700.00	269.92	$ 310,997,235.00	173.08	$ 199,419,833.64	19.89	$ 22,916,919.87	192.97	$ 222,336,753.51	76.95	$ 88,660,481.85
4.1.2	COLUMNA CONFIN. CONC.20.7MPa .12x.20 D=4 de 1/2", Fle 3/8" (ml)	ML	1,943.33	$ 95,857.00	$ 186,281,784.00	78.86	$ 7,559,283.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	78.86	$ 7,559,283.02
4.1.3	COLUMNA 0.20 X 0.25 M CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4D=1/2"+F3/8" c/.15 (Cerramiento)	ML	107.20	$ 138,696.00	$ 14,868,211.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2	MUROS CONCRETO														

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO	
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023	
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION	
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026	
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026	
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:	
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%	
				ESTADO: EN EJECUCION	

CONDICIONES ACTUALIZADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
4.2.1	MURO PANTALLA CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm	M3	-	$ 1,054,066.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.2	MURO DE CONTENCION CONCRETO 20.7 MPa - 3000 PSI e=20 cm	M3	34.92	$ 1,054,066.00	$ 36,807,985.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.3	MURO DIVISION BAÑO CONCRETO 20.7 MPa-3000PSI e=10cm, Inc. Malla	M3	14.08	$ 1,259,465.00	$ 17,733,267.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.4	MURO CUCHILLA CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI e=15 cm	M3	355.46	$ 1,289,197.00	$ 458,257,966.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.5	MURO VIGA-CANAL CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI e=10 cm	M3	109.26	$ 1,053,971.00	$ 115,156,871.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.6	MURO MACHON GRAD. CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm	M3	11.64	$ 1,053,971.00	$ 12,268,222.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.7	MURO SOP. MALLA CONCR. A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=12 cm	M3	4.86	$ 1,053,971.00	$ 5,122,299.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 4.2.8	MURO PANTALLA CONCRETO A LA VISTA 28 MPa - 4000 PSI e=10-40 cm	M3	-	$ 1,333,317.00	$ -	55.60	$ 74,132,425.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	55.60	$ 74,132,425.20
4.3	VIGAS - VIGUETAS CONCRETO														
4.3.1	VIGA AEREA AMARRE CONCRETO 20.7 Mpa - 3000 Psi en obra	M3	-	$ 1,066,527.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.3.2	VIGA CONFIN. CONC. 20.7MPa .12x.20 D4 de 3/8" Fle 1/4" (ml)	ML	1,083.14	$ 73,883.00	$ 80,025,633.00	24.70	$ 1,824,910.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24.70	$ 1,824,910.10
4.3.3	VIGA-CINTA. CONC. 20.7MPa .12x.08 D2 de 1/2" Fle 3/8" (ml)	ML	7.50	$ 51,032.00	$ 382,740.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 4.3.4	VIGA AEREA EN CONCRETO 4000 PSI, A LA VISTA	M3	-	$ 1,542,137.00	$ -	89.06	$ 137,342,721.00	32.40	$ 49,965,238.80	56.66	$ 87,377,482.42	89.06	$ 137,342,721.22	-	$ -
NC H.10.4	VIGA AEREA CONCRETO 27,58MPa, (4000 psi). Imper premez.	M3	-	$ 1,409,554.00	$ -	262.13	$ 369,486,390.00	20.41	$ 28,768,997.14	-	$ -	20.41	$ 28,768,997.14	241.72	$ 340,717,392.86
4.4	PLACAS ENTREPISO														
4.4.1	PLACA CONCRETO 20.7 Mpa E=12cm INCLUYE LAMINA METALDECK 2" cal.22, MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	$ 219,161.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 4.4.2	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4000 PSI PREMEZCLADO, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLDADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	$ 495,569.00	$ -	4,678.80	$ 2,318,668,237.00	3,381.82	$ 1,675,925,155.58	841.82	$ 417,179,895.58	4,223.64	$ 2,093,105,051.16	455.16	$ 225,563,186.04
NP 4.4.4	LOSA ALIGERADA EN CONCRETO A LA VISTA PARA CUBIERTAS DE 4000 PSI, ALTURA DE LOSA ENTRE 0,75 a 0,90 m, VIGAS Y RIOSTRAS DESCOLDADAS ALTURA LIBRE ENTRE 0,63 a 0,78 m, TORTA SUPERIOR ESPESOR 0,12 m., ALTURA DE ARMADO DE LA CAMA DE SOPORTE HASTA 3,2 m, ALIGERAMIENTO EN CASETON RECUPERABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO	M2	-	$ 540,414.00	$ -	274.23	$ 148,197,731.00	-	$ -	39.33	$ 21,254,482.62	39.33	$ 21,254,482.62	234.90	$ 126,943,248.60
NC H.10.6	PLACA DE CONCRETO DE 27,6MPa, (4000psi), Impermeab	M3	-	$ 1,433,933.00	$ -	57.75	$ 82,809,631.00	11.84	$ 16,977,766.72	-	$ -	11.84	$ 16,977,766.72	45.91	$ 65,831,864.03
4.5	ESCALERAS EN CONCRETO														
4.5.1	ESCALERA MACIZA DOS TRAMO	M3	45.51	$ 1,097,530.00	$ 49,948,590.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 4.5.2	ESCALERA EN CONCRETO PREMEZCLADO A LA VISTA 28 Mpa - 4000 PSI	M3	-	$ 1,371,056.00	$ -	42.63	$ 58,448,117.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	42.63	$ 58,448,117.28
4.6	PLACAS CONCRETO														
4.6.1	PLAQUETA ENCIMERA AULA e=.08, a=.50-.60m 4D1/2" y 4d3/8" CON. 20.7MPa (m2)	M2	279.73	$ 151,293.00	$ 42,321,191.00	117.95	$ 17,845,009.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	117.95	$ 17,845,009.35
4.6.2	PLAQUETA VIGA-CANAL e=.12, a=.40-.50m CON. 20.7MPa, No incl. acero (m2)	M2	155.47	$ 109,283.00	$ 16,990,228.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.6.3	PLAQUETA ENCIMERA BAÑO e=.08, a=.50-.60m 4D1/2" y 4d3/8" CON. 20.7MPa (m2)	M2	37.02	$ 151,206.00	$ 5,597,646.00	74.11	$ 11,205,877.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	74.11	$ 11,205,876.66
4.6.4	PLACA GRAD.e=0.10 CONCRET. 20.7 MPa-3000 psi (m3)	M3	10.20	$ 966,339.00	$ 9,856,658.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

Codigo: 1010-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024
Página 1

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO	
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023	
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION	
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026	
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026	
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:	
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%	
				ESTADO: EN EJECUCION	

			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
4.7	DINTELES - ALFAJIAS - GARGOLAS														
4.7.1	ALFAJIA 20,7MPa, 3000psi, a=25cm, h=7cm 2D1/2+f3/8")	ML	1,387.06	$ 66,820.00	$ 92,683,349.00	89.73	$ 5,995,759.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	89.73	$ 5,995,758.60
4.7.2	GARGOLA PREFAB. CONCR.	UN	72.00	$ 57,415.00	$ 4,133,880.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 4.7.4	DINTEL EN MAMPOSTERIA 0.06X0.21 LADRILLO PARADO, CONCRETO 3000 PSI	ML	-	$ 71,459.00	$ -	334.48	$ 23,901,606.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	334.48	$ 23,901,606.32
4.8	CUNETAS														
4.8.1	CUNETA CONCRETO 40X50 cm e=.10 (ml)Incl. 6D1/2" y Flej. 3/8"	ML	71.40	$ 180,630.00	$ 12,896,982.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.9	ACERO REFUERZO ESTRUCTURA							0.00							
4.9.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	397,926.77	$ 9,302.00	$ 3,701,514,815.00	248,434.71	$ 2,310,939,672.00	172,953.66	$ 1,608,814,945.32	30,377.72	$ 282,573,551.44	203,331.38	$ 1,891,388,496.76	45,103.33	$ 419,551,175.66
NP 4.9.2	SUMINISTRO EI NSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	-	$ 9,973.00	$ -	54,535.07	$ 543,878,253.00	35,773.34	$ 356,767,519.82	6,383.35	$ 63,661,149.55	42,156.69	$ 420,428,669.37	12,378.38	$ 123,449,583.74
5. ESTRUCTURAS METALICAS															
5.1	COLUMNA METALICA ASTM														
5.1.1	COLUMNA TUBO D=2"x2.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suministr, pint, montaje (ml)	ML	80.77	$ 58,582.00	$ 4,731,668.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.2	COLUMNA TUBO D=6"x6mm. ASTM A-500 GC, Incluye suministr, pint, montaje (ml)	ML	193.20	$ 364,799.00	$ 70,479,167.00	106.34	$ 38,792,726.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	106.34	$ 38,792,725.66
5.1.3	COLUMNA TUBO D=8"x8.2mm. ASTM A-500 GC, Incluye suministr, pint, montaje (ml)	ML	83.60	$ 613,113.00	$ 51,256,247.00	18.00	$ 11,036,034.00	18.00	$ 11,036,034.00	-	$ -	18.00	$ 11,036,034.00	-	$ -
5.2	CELOSIAS-CERCHAS MET. ASTM														
5.2.1	ANCLAJE ESTRUCTURA METALICA														
5.2.1.1	CONTRAVIENTOS D= 1/2 , INCLUYE ANTICORR. Y PINTU	ML	574.70	$ 13,796.00	$ 7,928,561.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.1.2	ANCLAJE ESTRUCTURA, Incluye platinas, angules, pernos, pint, (ml)	KG	1,173.39	$ 17,478.00	$ 20,508,510.00	896.23	$ 15,664,308.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	896.23	$ 15,664,307.94
5.2.2	ANGULOS DE REFUERZO EN CELOCIAS														
5.2.2.1	REFUEZO ANGULO 2"3/16". ASTM A-36 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	81.54	$ 76,295.00	$ 6,221,094.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.3	CORDON RIOSTRA ESTABILIDAD														
5.2.3.1	TUBO HSS D=4"x3mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	62.50	$ 150,308.00	$ 9,394,250.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.4	CORDON SUPERIOR-INFERIOR EN CELOCIAS														
5.2.4.1	TUBO HSS D=2.5"x2.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	187.50	$ 97,279.00	$ 18,239,813.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.4.2	TUBO HSS D=3"x2.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	106.32	$ 109,226.00	$ 11,612,908.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.4.3	TUBO HSS D=4"x3mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	309.69	$ 150,308.00	$ 46,548,885.00	361.08	$ 54,273,213.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	361.08	$ 54,273,212.64
5.2.5	MONTANTES-DIAGONALES EN CELOSIAS														
5.2.5.1	TUBO HSS D=2"x2.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	611.99	$ 82,810.00	$ 50,678,892.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3	PERFILES-CORREAS MET. ASTM														
5.3.1	VIGA CAJON PHR 50x13x1.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	30.78	$ 52,698.00	$ 1,622,044.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.2	VIGA CAJON PHR 50x30x1.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	31.78	$ 59,485.00	$ 1,890,433.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.3	VIGA CAJON PHR 60x40x1.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	20.21	$ 66,726.00	$ 1,348,532.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.4	VIGA CAJON PHR 100x40x2mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	2.38	$ 70,649.00	$ 168,145.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.5	VIGA CAJON PHR 100x100x3mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	264.81	$ 164,084.00	$ 43,451,084.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.6	VIGA CAJON PHR 150x50x3mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	12.03	$ 165,328.00	$ 1,988,896.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.7	VIGA CAJON PHR 150x100x4mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	3.22	$ 248,632.00	$ 800,595.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.8	VIGA CAJON PHR 150x100x6mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	3.22	$ 341,634.00	$ 1,100,061.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.9	VIGA CAJON PHR 160x65x4mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	11.91	$ 198,573.00	$ 2,365,004.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

Codigo: 1010-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024
Página 1

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO	
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023	
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION	
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026	
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026	
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:	
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%	
				ESTADO: EN EJECUCION	

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
5.3.10	VIGA CAJON PHR 180x65x4mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	36.09	$ 216,156.00	$ 7,801,070.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.11	VIGA CAJON PHR 200x70x4mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	78.87	$ 238,971.00	$ 18,847,643.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.12	VIGA CAJON PHR 200x70x6mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	20.08	$ 337,230.00	$ 6,771,578.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.13	VIGA CAJON PHR 200x100x4mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	294.70	$ 294,284.00	$ 86,725,495.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.14	VIGA CAJON PHR 220x160x1.5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	177.13	$ 186,895.00	$ 33,104,711.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.15	VIGA CAJON PHR 250x100x5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	134.30	$ 407,040.00	$ 54,665,472.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.16	VIGA CAJON PHR 250x150x5mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	97.88	$ 462,652.00	$ 45,284,378.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.17	VIGA CAJON PHR 300x100x7mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	158.05	$ 614,178.00	$ 97,070,833.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.18	VIGA CAJON PHR 305x160x3mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	-	$ 366,072.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.19	VIGA CAJON PHR 305x160x2mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	55.17	$ 244,737.00	$ 13,502,140.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.20	VIGA CAJON PHR 350x150x7mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	218.62	$ 765,914.00	$ 167,444,119.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.21	VIGA HEA 320x3mm. ASTM A-36 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	9.98	$ 279,197.00	$ 2,786,386.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.22	VIGA PERFIL C 203x31.6x3mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	34.65	$ 147,729.00	$ 5,118,810.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.23	CORREA PHR C 160x60x2mm. ASTM A-500 GC, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	2,924.65	$ 104,263.00	$ 304,932,783.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 5.3.24	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500C, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	-	$ 26,583.00	$ -	26,059.13	$ 692,729,853.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	26,059.13	$ 692,729,852.79
NP5.3.25	ACERO ESTRUCT. T ASTM A36, Inc sumi, fabri, mont_pin	KG	-	$ 23,894.00	$ -	2,317.20	$ 55,367,177.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,317.20	$ 55,367,176.80
NP 5.3.26	CORREA PHRC 305x80x2.0mm. ASTM A-1011 Gr.50, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	-	$ 153,789.00	$ -	356.13	$ 54,768,877.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	356.13	$ 54,768,876.57
NP 5.3.27	CORREA PHRC 160x60x1.50mm. ASTM A-1011 Gr.50, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	-	$ 97,122.00	$ -	184.30	$ 17,899,585.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	184.30	$ 17,899,584.60
NP 5.3.28	CORREA PHRC 305x80x1.5mm. ASTM A-1011 Gr.50, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	-	$ 130,468.00	$ -	1,337.82	$ 174,542,700.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,337.82	$ 174,542,699.76
NP 5.3.29	CORREA PHRC 254x67x1.5mm. ASTM A-1011 Gr.50, Incluye suminist, pint, montaje (ml)	ML	-	$ 117,618.00	$ -	750.75	$ 88,301,714.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	750.75	$ 88,301,713.50
6. CUBIERTAS-CANALES-BAJANTES															
6.1	CUBIERTA TIPO SANDWICH														
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE ALUMINIO-POLIURETANO	ML	168.06	$ 44,479.00	$ 7,475,141.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.2	PLACA CUBIERTA SUPERBOARD 20mm	M2	50.70	$ 155,338.00	$ 7,875,637.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.3	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM. e=1 cm.	M2	2,906.92	$ 186,048.00	$ 540,826,652.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 6.1.4	CUBIERTA PANEL ISOMETRICO LAMINA DE ACERO PERFILADA PRE PINTADA TIPO 5 OLAS 30MM, CON AISLAMIENTO INYECTADO CON POLIURETANO LINEA CONTINUA DE ALTA DENSIDAD, CHAPA CAL.28	M2	-	$ 226,719.00	$ -	2,554.57	$ 579,169,556.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,554.57	$ 579,169,555.83
6.2	CUBIERTA TERMOACUSTICA														
6.2.1	TEJA AJOVER TERMOACUST a=0,82 m, e=0,27 mm (super)	M2	1,107.20	$ 105,977.00	$ 117,337,734.00	1,107.20	$ 117,337,734.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,107.20	$ 117,337,734.40
6.3	CANALES Y BAJANTES														
6.3.1	CANAL LATON d=0.75	ML	71.50	$ 133,669.00	$ 9,557,334.00	287.33	$ 38,407,114.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	287.33	$ 38,407,113.77
7. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES															
7.1	MURO DIVIS. BLOQUE FLEXA No. 5 (33X11,5X23)	M2	4,040.55	$ 50,600.00	$ 204,451,830.00	74.04	$ 3,746,424.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	74.04	$ 3,746,424.00
7.2	MURO SUPERBOARD D. CARA, e=0,11 , CAL.8 mm inc Pin	M2	91.14	$ 152,250.00	$ 13,876,065.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8. PISOS BASE															

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

Codigo: 1010-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024
Página 1

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO	
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023	
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION	
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026	
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026	
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:	
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%	
				ESTADO: EN EJECUCION	

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
8.1	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI 0.10, INCL. MANTO Y MALLA ELECT.	M2	5,944.71	$ 115,801.00	$ 688,403,363.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NCH.10.8	PLACA DE CONTRAPISO, (20.7 Mpa, 3000 PSI)	M3	-	$ 952,494.00	$ -	158.09	$ 150,579,776.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	158.09	$ 150,579,776.46
NP 8.2	PLACA MACIZA DE CONTRAPISO, 28 Mpa (4000 PSI)	M3	-	$ 1,118,375.00	$ -	364.59	$ 407,748,341.00	339.13	$ 379,273,619.05	8.83	$ 9,875,810.44	347.96	$ 389,149,429.49	16.63	$ 18,598,911.76
9. PAÑETES - REVOQUES															
9.1	PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0,020 mt	M2	7,815.10	$ 23,812.00	$ 186,093,161.00	841.37	$ 20,034,702.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	841.37	$ 20,034,702.44
9.2	PAÑETE IMPERME. MURO EXTERIOR 1:3 e=0.020mt	M2	2,166.31	$ 31,554.00	$ 68,355,746.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10. CARPINTERIAS															
10.1	CARPINTERIA METALICA														
10.1.1	CARPINTERIA FACHADA														
10.1.1.1	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE SCREEN PANEL J HUNTER DOUGLAS MODULO 682mm (según diseño)	M2	-	$ 715,581.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1.2	PUERTA METALICA									-					
10.1.2.1	PUERTA L. C.ROLLED CAL. 18, Segun diseño, incl. Vidrio	M2	453.62	$ 340,535.00	$ 154,473,487.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1.2.2	PUERTA L. C.ROLLED CAL. 18, Entamborada baño	M2	56.03	$ 273,330.00	$ 15,314,680.00	34.98	$ 9,561,083.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	34.98	$ 9,561,083.40
NP 10.1.2.3	DIVISIONES EN LAM. COL ROLLED CAL.18	M2	-	$ 324,030.00	$ -	185.49	$ 60,104,325.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	185.49	$ 60,104,324.70
10.1.3	REJAS - CERRAMIENTO - BARANDAS														
10.1.3.1	BARANDA TUBO REDONDO 3"X2.5MM Y PLAT. 2" X 1/4"	ML	1,227.90	$ 239,866.00	$ 294,531,461.00	467.36	$ 112,103,774.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	467.36	$ 112,103,773.76
10.1.3.2	MALLA ESLABON CORR./ < FIJA S-I 1*3/16 inc diagona	M2	89.60	$ 159,700.00	$ 14,309,120.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1.3.3	PUERTA-REJA TUBO 1 1/4", PEINAZO 4", Segun diseño	M2	444.64	$ 330,223.00	$ 146,830,355.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1.3.4	MODULO EN MALLA PRE ONDULADA 2" CON MARCO EN TUBO CUADRADO DE 2" (CERRAMIENTO)	M2	614.25	$ 179,873.00	$ 110,486,990.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1.3.5	TUBO HSS D=2"x2.5mm. ASTM A-500 GC, Soportes mod. malla (ml)	ML	482.40	$ 82,810.00	$ 39,947,544.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1.4	VENTANA METALICA														
10.1.4.1	VENTANA ALUMINIO CORREDIZAS,CON VIDRIO 4 MM	M2	1,442.38	$ 318,464.00	$ 459,346,104.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP10.1.4.3	ANGEO EN ALUMINIO, INC PERFIL MOSQUETERO Y MARCO EN PERFILERIA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL	M2	-	$ 271,124.00	$ -	179.12	$ 48,563,731.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	179.12	$ 48,563,730.88
NP10.1.4.4	VENTANERIA FIJA CON MARCO Y DIVISIONES EN ALUMINIO anodizado color natural, con sus respectivos empaques, vidrio laminado 3+3 incoloro, modulacion sugun diagramas	M2	-	$ 629,729.00	$ -	807.87	$ 508,739,167.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	807.87	$ 508,739,167.23
NP10.1.4.5	VENTANERIA PROYECTANTE EN MARCO Y DIVISIONES EN ALUMINIO anodizado, color natural, BASCULANTE CON SUS RESPECTIVOS EMPAQUES, BRAZOS, MANIJAS, VIDRIO LAMINADO 3+3 INCOLORO, Modulacion según diagramas	M2	-	$ 653,149.00	$ -	118.19	$ 77,195,680.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	118.19	$ 77,195,680.31
NP10.1.4.6	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO anodizado color natural,con sus respectivos rodamientos, felpas, empaques, cierre, vidrio laminado 3+3incoloro, modulacion según diagramas	M2	-	$ 651,480.00	$ -	70.11	$ 45,675,263.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	70.11	$ 45,675,262.80
NP10.1.4.7	PUERTAS BATIENTES Y DIVISIONES EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, CHAPAS, EMPAQUES, BISAGRAS, VIDRIO LAMINADO 3+3 INCOLORO. Modulación según diagramas	M2	-	$ 697,802.00	$ -	208.71	$ 145,638,255.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	208.71	$ 145,638,255.42

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO	
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023	
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION	
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026	
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026	
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:	
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%	
				ESTADO: EN EJECUCION	

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
NP10.1.4.8	PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL CON SUS RESPECTIVOS RODAMIENTOS FELPAS, EMAPQUES, CHAPA, VIDRIO LAMINADO 3+3. Modulación según diagramas	M2	-	$ 826,626.00	$ -	36.16	$ 29,890,796.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36.16	$ 29,890,796.16
NP 10.1.4.9	PUERTA METALICA TIPO PERSIANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED, ACABADO PINTURA EPOXICA EN POLIURETANO	M2	-	$ 1,028,810.00	$ -	82.94	$ 85,329,501.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	82.94	$ 85,329,501.40
10.2	CARPINTERIA MADERA														
10.2.1	PUERTAS MADERA														
10.2.1.1	PUERT MARC MAD CEDRO e=0,1 ,TAB TRIPLEX 2.1*.6 A ,7	UN	28.00	$ 415,770.00	$ 11,641,560.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11. MUROS ACABADOS															
11.1	CERAMICA MURO FORMATO 30x45CM	M2	1,624.08	$ 72,699.00	$ 118,068,992.00	739.34	$ 53,749,279.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	739.34	$ 53,749,278.66
11.2	BASE MURO DECORADA 31.5X31.5CM	ML	210.00	$ 28,481.00	$ 5,981,010.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 11.3	MAMPOSTERIA EN LADRILLO PRENSADO ESTRUCTURAL A LA VISTA DE 0.12X0.06X0.24	M2	-	$ 188,466.00	$ -	7,311.07	$ 1,377,888,119.00	-	$ -	85.00	$ 16,019,610.00	85.00	$ 16,019,610.00	7,226.07	$ 1,361,868,508.62
NP 11.4	LAVADO DE LADRILLO A LA VISTA	M2	-	$ 11,802.00	$ -	11,541.05	$ 136,207,472.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,541.05	$ 136,207,472.10
NP 11.5	SELLADOR HIDROPROTECTOR DE FACHADA T. 2 MANOS (5 AÑOS)	M2	-	$ 34,397.00	$ -	5,210.71	$ 179,232,792.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,210.71	$ 179,232,791.87
NP 11.6	DOVELA EN MORTERO DE RELLENO TIPO GROUTING PARA CELDAS DE MAMPOSTERIA 17.5	ML	-	$ 16,963.00	$ -	8,316.73	$ 141,076,691.00	-	$ -	13.00	$ 220,519.00	13.00	$ 220,519.00	8,303.73	$ 140,856,171.99
NP 11.7	EPOXICO PARA ANCLAJES ESTRUCTURALES 5/8" PARA VARILLA DE 1/2" X 12 CM, INC REFUERZO	UN	-	$ 43,527.00	$ -	3,756.00	$ 163,487,412.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,756.00	$ 163,487,412.00
12. PISOS-PLACAS ACABADOS															
12.1	ALISTADO PISOS - POYOS														
12.1.1	ALISTADO PISO 4CM MORT. 1:4	M2	570.44	$ 23,200.00	$ 13,234,208.00	7973.25	$ 184,979,400.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,973.25	$ 184,979,400.00
12.1.2	POYOS BASE h=0.08 CONCR. 2560 psi	M2	251.16	$ 57,838.00	$ 14,526,592.00	120.50	$ 6,969,479.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	120.50	$ 6,969,479.00
12.2	PISOS EN CERAMICA - BALSOSA														
12.2.1	GUARDAESCOBA BALDOSA TERRAZO P2 30X8CM	ML	2,272.43	$ 16,164.00	$ 36,731,559.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.2.2	PISO BALDOSA TERRAZO P2 30x30 (Pulida y Abrillantada)	M2	5,082.43	$ 146,298.00	$ 743,549,344.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.2.3	PISO CERAMICA FORMATO 45.8X45.8CM	M2	570.79	$ 78,762.00	$ 44,956,562.00	326.43	$ 25,710,280.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	326.43	$ 25,710,279.66
NP 12.2.4	ENCHAPE DE PISO CORONA DUROPISO CANTERA TRAFICO COMERCIAL	M2	-	$ 98,415.00	$ -	7,643.01	$ 752,186,829.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,643.01	$ 752,186,829.15
NP 12.2.5	GUARDAESCOBA BALDOSA CORONA DUROPISO CANTERA 10CM	ML	-	$ 15,204.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 12.2.5	SELLADOR DE JUNTAS EN POLIURETANO	ML	-	$ 11,020.00	$ -	5,583.09	$ 61,525,652.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,583.09	$ 61,525,651.80
12.3	PISO CONCRETO-MORTERO ENDURECIDO														
12.3.1	ALISTADO PISO 5CM - ENDURECIDO SIKAFLOOR MORT. 1:3	M2	5,168.66	$ 53,558.00	$ 276,823,092.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.3.2	CENEFA PISO 5CM - ENDURECIDO SIKAFLOOR MORT. 1:3	M2	46.56	$ 53,558.00	$ 2,493,660.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 12.3.3	CORTE DE PISO (JUNTA)	ML	-	$ 5,519.00	$ -	487.75	$ 2,691,892.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	487.75	$ 2,691,892.25
12.4	GRANITO PULIDO EN MESONES														
12.4.1	GRANITO PULIDO EN MESON	M2	35.47	$ 121,788.00	$ 4,319,820.00	74.01	$ 9,013,530.00	-	$ -	$ -		-	$ -	74.01	$ 9,013,529.88
13. RECUBRIMIENTOS-DEMARCACION															
13.1	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (SIN/RELLEN)	GB	1.00	$ 736,421.00	$ 736,421.00	1.00	$ 736,421.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 736,421.00
13.2	RECUBRIMIENTO SINT. PLEXIFLOR, incl. afinado de superf.	M2	954.17	$ 78,209.00	$ 74,624,682.00	589.00	$ 46,065,101.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	589.00	$ 46,065,101.00
14. IMPERMEABILIZACIONES															
14.1	IMPERMEMABILIZACION EN INTERPERIE														
14.1.1	MONOCAPA MANTO ASFALTICO PENTAFLEX 3.6MM FOIL AL.REEPOLIE.	M2	1,360.97	$ 41,273.00	$ 56,171,315.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.2.1	MORTERO IMPER. 1:3 DE NIVELACION	M2	1,120.67	$ 21,155.00	$ 23,707,774.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 14.2.2	AFINADO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO PARA CUBIERTA MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 e. prom. 0,07 + MICROFIBRA	M2	-	$ 65,360.00	$ -	329.29	$ 21,522,394.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	329.29	$ 21,522,394.40

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%
				ESTADO: EN EJECUCION

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
NC H.9.13	IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o símil	M2	-	$ 97,343.00	$ -	648.74	$ 63,150,298.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	648.74	$ 63,150,297.82
15. ESTUCOS - PINTURAS															
15.1	ESTUCO INTERIOR - EXTERIOR														
15.1.1	ESTUCO EXTERIOR S/PANETE	M2	1,875.83	$ 16,025.00	$ 30,060,176.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	38.46	$ 424,406.10
15.1.2	ESTUCO INTERIOR S/PANETE	M2	7,655.10	$ 11,035.00	$ 84,474,029.00	38.46	$ 424,406.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
15.2	PINTURA VINILO							0.00						-	$ -
15.2.1	VINILO GRIS BASALTO P/ESTR. EXT	M2	2,782.00	$ 13,852.00	$ 38,536,264.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.2.2	VINILO GRIS BASALTO P/ESTR. INT	M2	2,017.00	$ 12,444.00	$ 25,099,548.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	38.46	$ 380,869.38
15.2.3	VINILO S/ESTUCO INT. 3 MANOS	M2	7,655.10	$ 9,903.00	$ 75,808,455.00	38.46	$ 380,869.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.2.4	CORAZA S/ESTUCO EXT. 2 MANOS	M2	1,875.88	$ 15,050.00	$ 28,231,994.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.2.5	CORAZA S/PANETE 2 MANOS FACH.EX	M2	293.00	$ 19,262.00	$ 5,643,766.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
16. ACABADOS ESPECIALES								0.00							
16.1	CIELORRASOS-VARIOS														
16.1.1	CIELORRASO TABLILLAS PVC RINCONERAS e=10mm	M2	1,588.10	$ 88,780.00	$ 140,991,518.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17. APARATOS SANITARIOS															
17.1	SANITARIO LINEA ECONOMICA	UN	62.00	$ 299,452.00	$ 18,566,024.00	35.00	$ 10,480,820.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35.00	$ 10,480,820.00
17.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INC GRIFERIA ANTIBAN	UN	8.00	$ 878,144.00	$ 7,025,152.00	3.00	$ 2,634,432.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 2,634,432.00
17.3	SANITARIO INFANTIL COMPLETO CRN A	UN	6.00	$ 760,411.00	$ 4,562,466.00	6.00	$ 4,562,466.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 4,562,466.00
17.4	ORINAL PARED MEDIANO Incl. Grife	UN	17.00	$ 527,418.00	$ 8,966,106.00	12.00	$ 6,329,016.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 6,329,016.00
17.5	LAVAMANOS SOBREPONER CASCADA	UN	97.00	$ 538,481.00	$ 52,232,657.00	52.00	$ 28,001,012.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	52.00	$ 28,001,012.00
17.6	LAVAPLATOS CON GRIFERIA	UN	1.00	$ 366,437.00	$ 366,437.00	20.00	$ 7,328,740.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20.00	$ 7,328,740.00
17.7	LAVAPLATOS POCETA CON GRIFERIA	UN	16.00	$ 426,500.00	$ 6,824,000.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.8	DUCHA CON GRIFERIA TIPO II	UN	3.00	$ 156,614.00	$ 469,842.00	23.00	$ 3,602,122.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	23.00	$ 3,602,122.00
18. VIDRIOS - ESPEJOS															
18.1	ESPEJO 4mm	M2	53.50	$ 99,914.00	$ 5,345,399.00	30.80	$ 3,077,351.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	30.80	$ 3,077,351.20
19. DOTACIONES DEPORTIVAS															
19.1	SUMINISTRO E INSTALACION PORTICO MULTIFUNCIONAL	UN	2.00	$ 5,465,187.00	$ 10,930,374.00	2.00	$ 10,930,374.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 10,930,374.00
20. VIAS Y ANDENES - URBANISMO															
20.1	ANDENES - ESCALAS - Urbanismo														
20.1.1	ANDEN CONCRETO MR 3.5 MPa e=0.10 m, Acabado texturizado	M2	962.69	$ 103,235.00	$ 99,383,302.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.1.2	ANDEN EN LOSETA VIBROCOMPACTADA TIPO IDU MR 3.5 MPa (f'c 4500 PS I) TERMINADO COLOR 20% GRIS 80% (Incluye Loseta Táctil y Mortero de Pega 1:3 e=0.04m)	M2	464.60	$ 152,657.00	$ 70,924,442.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.1.3	ANDEN CONSTRUIDO CON GRAMOQUIN C ONCRETO VIBROCOMPACTADO 3500 PSI (Incluye Relleno de celdas con grama trenza)	M2	459.10	$ 126,314.00	$ 57,990,757.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.1.4	ESCALAS SOBRE TERRENO EN CONCRET O DE 3000 PIS (21MPa) (Incluye Malla Electrosoldada M1.31 como refuerzo)	M3	4.22	$ 1,227,296.00	$ 5,179,189.00	4.22	$ 5,179,189.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.22	$ 5,179,189.12
20.2	SUB-BASES - BASES - Urbanismo														
20.2.1	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TRITURADO PARA BASE, ATRAQUE Y/O RELLENO INICIAL TAM. 1 1/2" (INCLUYE ACARREO Y CONFORMACIÓN)	M3	1,008.19	$ 82,527.00	$ 83,202,896.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.3	CUNETAS - SUMIDEROS - Urbanismo														
20.3.1	CUNETAS SECC TRANSV 1.5*0.10mt-3000psi. Inc. refue	ML	150.00	$ 202,815.00	$ 30,422,250.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.3.2	SUMIDERO EN CONCRETO DE 20.7MPA (3000 PSI) DE 1.00M X 0.80M X 0.26M NO INCLUYE REJILLA	UN	7.00	$ 492,304.00	$ 3,446,128.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.3.3	REJILLA SUMIDERO .25*.60 < 21/2"*3/16"	UN	7.00	$ 224,637.00	$ 1,572,459.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.4	PAVIMENTOS - ACEROS - Urbanismo														
20.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ARENA PEÑA (5km)	M3	74.73	$ 113,419.00	$ 8,475,802.00	74.73	$ 8,475,802.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	74.73	$ 8,475,801.87

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

Codigo: 1010-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024
Página 1

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO	
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023	
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION	
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026	
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026	
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:	
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%	
				ESTADO: EN EJECUCION	

			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
20.4.2	PAVICONCR MR=3,8 Incluye Vibra.	M3	376.68	$ 1,018,262.00	$ 383,558,930.00	354.70	$ 361,181,306.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	354.70	$ 361,181,306.10
20.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA	ML	277.60	$ 229,144.00	$ 63,610,374.00	277.60	$ 63,610,374.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	277.60	$ 63,610,374.40
20.5	SARDINELES - BORDILLOS - Urbanismo														
20.5.1	SARDINEL PREF BLOQ CEMENT A-10 20x50x80cm	ML	741.10	$ 69,023.00	$ 51,152,945.00	741.10	$ 51,152,945.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	741.10	$ 51,152,945.30
20.5.2	BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80	ML	756.75	$ 58,921.00	$ 44,586,467.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21. PRADIZACION - Urbanismo															
21.1	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=5CM,CAPA TIERRA NEGRA 7CM	M2	4,559.30	$ 24,473.00	$ 111,579,749.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22. SOBREACARREO-TRANSPORTE MATERIAL															
22.1	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)	TON	6,079.38	$ 55,302.00	$ 336,201,873.00	11,004.03	$ 608,544,867.00	11,004.03	$ 608,544,867.06	-	$ -	11,004.03	$ 608,544,867.06	-	$ -
22.2	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM	165,921.07	$ 1,534.00	$ 254,522,921.00	290,311.75	$ 445,338,225.00	290,311.75	$ 445,338,224.50	-	$ -	290,311.75	$ 445,338,224.50	-	$ -
H.0. MOVIMIENTOS DE TIERRAS															
H.0.1	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	361.22	$ 66,620.00	$ 24,064,476.00	391.58	$ 26,087,060.00	14.99	$ 998,633.80	-	$ -	14.99	$ 998,633.80	376.59	$ 25,088,425.80
H.0.2	EXCAVACION MECANICA CONGLOM, Incl retiro 5 kms	M3	536.82	$ 23,280.00	$ 12,497,170.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.0.3	SUMINISTRO E INSTALACION ARENA PEÑA (5km)	M3	67.88	$ 113,419.00	$ 7,698,882.00	86.43	$ 9,802,804.00	5.34	$ 605,657.46	-	$ -	5.34	$ 605,657.46	81.09	$ 9,197,146.71
H.0.4	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.seleccrio	M3	226.71	$ 95,591.00	$ 21,671,436.00	51.75	$ 4,946,834.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	51.75	$ 4,946,834.25
H.0.5	RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno/compact mecánico	M3	474.28	$ 19,960.00	$ 9,466,629.00	702.18	$ 14,015,513.00	9.65	$ 192,614.00	-	$ -	9.65	$ 192,614.00	692.53	$ 13,822,898.80
H.1. TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PRESION RDE 21															
H.1.1	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3/4" PVC	ML	237.33	$ 6,163.00	$ 1,462,665.00	12.75	$ 78,578.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12.75	$ 78,578.25
H.1.2	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1" PVC	ML	129.19	$ 8,647.00	$ 1,117,106.00	138.30	$ 1,195,880.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	138.30	$ 1,195,880.10
H.1.3	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/2" PVC	ML	127.38	$ 18,214.00	$ 2,320,099.00	379.90	$ 6,919,499.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	379.90	$ 6,919,498.60
H.1.4	TEE PRESION EN PVC D=3/4"	UN	91.00	$ 9,711.00	$ 883,701.00	3.00	$ 29,133.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 29,133.00
H.1.5	TEE PRESION EN PVC D=1"	UN	41.00	$ 11,537.00	$ 473,017.00	49.00	$ 565,313.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	49.00	$ 565,313.00
H.1.6	TEE PRESION EN PVC D=1 1/2"	UN	20.00	$ 14,304.00	$ 286,080.00	49.00	$ 700,896.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	49.00	$ 700,896.00
H.1.7	TEE PRESION EN PVC D=2"	UN	1.00	$ 21,808.00	$ 21,808.00	24.00	$ 523,392.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24.00	$ 523,392.00
H.1.8	CODO PRESION EN PVC D=3/4"	UN	124.00	$ 2,948.00	$ 365,552.00	4.00	$ 11,792.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 11,792.00
H.1.9	CODO PRESION EN PVC D=1"	UN	105.00	$ 4,533.00	$ 475,965.00	136.00	$ 616,488.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	136.00	$ 616,488.00
H.1.10	CODO PRESION EN PVC D=1 1/2"	UN	50.00	$ 11,426.00	$ 571,300.00	69.00	$ 788,394.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	69.00	$ 788,394.00
H.1.11	TEE PRESION EN PVC D=2"	UN	7.00	$ 21,808.00	$ 152,656.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.1.12	REDUCCION PVC PRESION 2" X 1 1/2" PVC	UN	3.00	$ 31,212.00	$ 93,636.00	17.00	$ 530,604.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	17.00	$ 530,604.00
H.1.13	REDUCCION PVC PRESION 1 1/2" X 1" PVC	UN	27.00	$ 9,737.00	$ 262,899.00	16.00	$ 155,792.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16.00	$ 155,792.00
H.1.14	REDUCCION PVC PRESION 1 1/2" X 3/4" PVC	UN	15.00	$ 16,297.00	$ 244,455.00	1.00	$ 16,297.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 16,297.00
H.1.15	REDUCCION PVC PRESION 1" X 3/4" PVC	UN	48.00	$ 3,300.00	$ 158,400.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR MACHO DIAMETRO 3/4"	UN	30.00	$ 6,874.00	$ 206,220.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR MACHO DIAMETRO 1"	UN	30.00	$ 8,454.00	$ 253,620.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR MACHO DIAMETRO 1 1/2"	UN	36.00	$ 10,619.00	$ 382,284.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.1.19	PUNTO HIDRAULICO D=1/2"	PTO	221.00	$ 26,553.00	$ 5,868,213.00	152.00	$ 4,036,056.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	152.00	$ 4,036,056.00
NC H.4.11	CODO PVC PRESION RDE 21 D= 2"	UN	-	$ 19,147.00	$ -	77.00	$ 1,474,319.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	77.00	$ 1,474,319.00
NP H.1.20	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/4" PVC	ML	-	$ 21,151.00	$ -	173.00	$ 3,659,123.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	173.00	$ 3,659,123.00
NP H.1.21	TUBERIA PVC PRESION RDE 13 D=1/2" PVC	ML	-	$ 5,535.00	$ -	149.75	$ 828,866.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	149.75	$ 828,866.25
NC H.4.3	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2" PVC	ML	-	$ 27,230.00	$ -	396.35	$ 10,792,611.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	396.35	$ 10,792,610.50
NP H.1.22	MEDIDOR ULTRASONICO DE 1 1/2" INC ACCESORIOS DE CONEXIÓN	UN	-	$ 5,482,322.00	$ -	1.00	$ 5,482,322.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 5,482,322.00
NP H.1.23	CODO 90° PVC PRESION RDE 21 D= 1 1/4"	UN	-	$ 7,124.00	$ -	158.00	$ 1,125,592.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	158.00	$ 1,125,592.00
NP H.1.24	CODO 90° PVC PRESION RDE 21 D= 1/2"	UN	-	$ 11,870.00	$ -	102.00	$ 1,210,740.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	102.00	$ 1,210,740.00
NP H.1.25	TEE PRESION EN PVC D=1 1/4"	UN	-	$ 17,736.00	$ -	22.00	$ 390,192.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	22.00	$ 390,192.00
NP H.1.26	TEE PRESION EN PVC D=1 /2"	UN	-	$ 2,813.00	$ -	1.00	$ 2,813.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 2,813.00
NP H.1.27	REDUCCION PVC PRESION 2" X 1 1/4" PVC	UN	-	$ 31,838.00	$ -	9.00	$ 286,542.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9.00	$ 286,542.00
NP H.1.28	REDUCCION PVC PRESION 1 1/2" X 1 1/4" PVC	UN	-	$ 16,503.00	$ -	15.00	$ 247,545.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15.00	$ 247,545.00
NP H.1.29	REDUCCION PVC PRESION 1 1/2" X 1/2" PVC	UN	-	$ 15,623.00	$ -	31.00	$ 484,313.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	31.00	$ 484,313.00
NP H.1.30	REDUCCION PVC PRESION 1 1/4" X 3/4" PVC	UN	-	$ 13,536.00	$ -	8.00	$ 108,288.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 108,288.00
NP H.1.31	REDUCCION PVC PRESION 1" X 1/2" PVC	UN	-	$ 3,460.00	$ -	62.00	$ 214,520.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	62.00	$ 214,520.00

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO	
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023	
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION	
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026	
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026	
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:	
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%	
				ESTADO: EN EJECUCION	

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
NP H.1.32	REGISTRO DE BOLA 1 1/4" PVC, inc Universal	UN	-	$ 94,674.00	$ -	17.00	$ 1,609,458.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	17.00	$ 1,609,458.00
NP H.1.33	TANQUE PLASTICO DE 5000 LTS, inc accesorios de conexión	UN	-	$ 5,250,480.00	$ -	3.00	$ 15,751,440.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 15,751,440.00
NP H.1.34	REDUCCION PVC PRESION 2" X 3/4" PVC	UN	-	$ 13,861.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP H.1.34	REDUCCION PVC PRESION 2" X 1/2" PVC	UN	-	$ 13,980.00	$ -	1.00	$ 13,980.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 13,980.00
NP H.1.35	REDUCCION PVC PRESION 2" X 1" PVC	UN	-	$ 14,052.00	$ -	4.00	$ 56,208.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 56,208.00
NP H.1.36	REGISTRO DE BOLA 1" PVC, inc Universal	UN	-	$ 73,809.00	$ -	19.00	$ 1,402,371.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19.00	$ 1,402,371.00
NP H.1.37	CAMARA DE REGISTRO CON REJILLA DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE 1 1/2" 1.10X0.60X0.60 según diseño EAAV	UN	-	$ 873,772.00	$ -	1.00	$ 873,772.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 873,772.00
H.2. TUBERIA Y ACCESORIOS HG															
H.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION CODO HG 3/4"	UN	32.00	$ 7,825.00	$ 250,400.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION CODO HG 1"	UN	30.00	$ 9,639.00	$ 289,170.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION CODO HG 1 1/2"	UN	18.00	$ 15,898.00	$ 286,164.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION CODO HG 2"	UN	4.00	$ 23,245.00	$ 92,980.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.2.5	REGISTRO BOLA metal 1/2. Inc Universal	UN	45.00	$ 47,818.00	$ 2,151,810.00	10.00	$ 478,180.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 478,180.00
H.2.6	REGISTRO BOLA metal 3/4. Inc universal	UN	16.00	$ 52,579.00	$ 841,264.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.2.7	REGISTRO CORTINA 1" PESADO	UN	15.00	$ 97,895.00	$ 1,468,425.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.2.8	TAPAS REGISTRO 20x20	UN	95.00	$ 12,809.00	$ 1,216,855.00	54.00	$ 691,686.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	54.00	$ 691,686.00
H.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA REGISTRO GLOBO DE 1 1/2"	UN	17.00	$ 632,055.00	$ 10,744,935.00	11.00	$ 6,952,605.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11.00	$ 6,952,605.00
H.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA REGISTRO GLOBO DE 2"	UN	2.00	$ 892,479.00	$ 1,784,958.00	11.00	$ 9,817,269.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11.00	$ 9,817,269.00
H.3. RED SANITARIA															
3.1	**BASES - SOLADOS**														
H.3.1.1	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	334.00	$ 40,645.00	$ 13,575,430.00	218.58	$ 8,884,184.00	70.22	$ 2,854,091.90	-	$ -	70.22	$ 2,854,091.90	148.36	$ 6,030,092.20
H.3.1.2	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC	ML	60.80	$ 31,175.00	$ 1,895,440.00	0.43	$ 13,405.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.43	$ 13,405.25
H.3.1.3	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC	ML	388.24	$ 23,069.00	$ 8,956,309.00	273.86	$ 6,317,676.00	36.00	$ 830,484.00	-	$ -	36.00	$ 830,484.00	237.86	$ 5,487,192.34
H.3.1.4	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	262.00	$ 88,643.00	$ 23,224,466.00	126.48	$ 11,211,567.00	52.23	$ 4,629,823.89	-	$ -	52.23	$ 4,629,823.89	74.25	$ 6,581,742.75
3.2	**ZAPATAS CORRIDAS-AISLADAS**														
H.3.2.1	CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGÜE	UN	72.00	$ 21,671.00	$ 1,560,312.00	46.00	$ 996,866.00	13.00	$ 281,723.00	-	$ -	13.00	$ 281,723.00	33.00	$ 715,143.00
H.3.2.2	CODO DE SALIDA EN PVC D=2" DESAGÜE	UN	248.00	$ 8,469.00	$ 2,100,312.00	169.00	$ 1,431,261.00	27.00	$ 228,663.00	-	$ -	27.00	$ 228,663.00	142.00	$ 1,202,598.00
H.3.2.3	SIFON PISO, DUCHA 3",incl. rejilla alum anticucara	UN	55.00	$ 63,613.00	$ 3,498,715.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3	**VIGAS CIMENTACION**														
H.3.3.1	CODO 45° EN PVC D=2" SANITARIO	UN	15.00	$ 9,793.00	$ 146,895.00	72.00	$ 705,096.00	19.00	$ 186,067.00	-	$ -	19.00	$ 186,067.00	53.00	$ 519,029.00
H.3.3.2	CODO 45° EN PVC D=4" SANITARIO	UN	43.00	$ 24,359.00	$ 1,047,437.00	88.00	$ 2,143,592.00	5.00	$ 121,795.00	-	$ -	5.00	$ 121,795.00	83.00	$ 2,021,797.00
NP H.3.3.3	CODO 90°EN PVC D=6" SANITARIO	UN	-	$ 192,560.00	$ -	4.00	$ 770,240.00	4.00	$ 770,240.00	-	$ -	4.00	$ 770,240.00	-	$ -
NP H.3.3.4	CODO 45°EN PVC D=6" SANITARIO	UN	-	$ 80,240.00	$ -	5.00	$ 401,200.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 401,200.00
3.4	**ACEROS DE REFUERZO CIMENTACION**														
H.3.4.1	YEE D=4" PVC Sanitario	UN	166.00	$ 45,669.00	$ 7,581,054.00	63.00	$ 2,877,147.00	5.00	$ 228,345.00	-	$ -	5.00	$ 228,345.00	58.00	$ 2,648,802.00
H.3.4.2	YEE D=3" PVC SANITARIO	UN	3.00	$ 27,653.00	$ 82,959.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.3.4.3	YEE D=2" PVC Sanitario	UN	88.00	$ 19,934.00	$ 1,754,192.00	45.00	$ 897,030.00	13.00	$ 259,142.00	-	$ -	13.00	$ 259,142.00	32.00	$ 637,888.00
H.3.4.4	YEE DOBLE D=4" PVC Sanitario	UN	5.00	$ 75,340.00	$ 376,700.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NC H.6.4	TAPON DE LIMPIEZA D=4" PVC	UN	-	$ 51,525.00	$ -	21.00	$ 1,082,025.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	21.00	$ 1,082,025.00
NP H.3.4.5	SIFON DE PISO D=2", INC REJILLA ANTICUCARACHA	UN	-	$ 45,038.00	$ -	65.00	$ 2,927,470.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	65.00	$ 2,927,470.00
NP H.3.4.6	YEE D=6" PVC SANITARIO	UN	-	$ 260,042.00	$ -	4.00	$ 1,040,168.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 1,040,168.00
NP H.3.4.7	TEE PVC SANITARIA 6"	UN	-	$ 295,474.00	$ -	6.00	$ 1,772,844.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 1,772,844.00
3.5	**REDUCCIONES PVC SANITARIA**														
H.3.5.1	REDUCCION D= 4" X 3" PVC	UN	56.00	$ 48,275.00	$ 2,703,400.00	1.00	$ 48,275.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 48,275.00
H.3.5.2	REDUCCION D= 4" X 2" PVC	UN	71.00	$ 77,559.00	$ 5,506,689.00	40.00	$ 3,102,360.00	6.00	$ 465,354.00	-	$ -	6.00	$ 465,354.00	34.00	$ 2,637,006.00
H.3.5.3	REDUCCION D= 3" X 2" PVC	UN	1.00	$ 32,691.00	$ 32,691.00	1.00	$ 32,691.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 32,691.00
NP H.3.5.4	REDUCCION D= 6" X 4" PVC	UN	-	$ 54,552.00	$ -	12.00	$ 654,624.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 654,624.00
NP H.3.5.5	REDUCCION D= 2" X 1" PVC	UN	-	$ 15,027.00	$ -	12.00	$ 180,324.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 180,324.00
3.6	**RED VENTILACION**														
H.3.6.1	TUBERIA VENTILACION D=2" PVC	ML	207.00	$ 17,401.00	$ 3,602,007.00	112.45	$ 1,956,742.00	26.27	$ 457,124.27	-	$ -	26.27	$ 457,124.27	86.18	$ 1,499,618.18
H.3.6.2	CODO 45° EN PVC D=2" SANITARIO	UN	12.00	$ 9,793.00	$ 117,516.00	126.00	$ 1,233,918.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	126.00	$ 1,233,918.00
H.3.6.3	CODO 45° EN PVC D=3" SANITARIO	UN	55.00	$ 15,863.00	$ 872,465.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.3.6.4	REDUCCION D= 4" X 2" PVC	UN	34.00	$ 77,559.00	$ 2,637,006.00	3.00	$ 232,677.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 232,677.00
NP H.3.6.5	YEE DOBLE D=2"X2" PVC	UN	-	$ 29,934.00	$ -	2.00	$ 59,868.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 59,868.00
NP H.3.6.6	TAPON DE LIMPIEZA D=2" PVC	UN	-	$ 23,694.00	$ -	8.00	$ 189,552.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 189,552.00
NP H.3.6.7	TUBERIA VENTILACION D=3" PVC	ML	-	$ 27,020.00	$ -	57.40	$ 1,550,948.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	57.40	$ 1,550,948.00
NP H.3.6.8	YEE REDUCIDA 6"X4" PVC	UN	-	$ 275,666.00	$ -	19.00	$ 5,237,654.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19.00	$ 5,237,654.00
NP H.3.6.9	YEE REDUCIDA 3"X2" PVC	UN	-	$ 41,604.00	$ -	12.00	$ 499,248.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 499,248.00
NP H.3.6.10	CODO 90° EN PVC D=3" SANITARIO	UN	-	$ 19,989.00	$ -	12.00	$ 239,868.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 239,868.00
NC H.3.1.3	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC	ML	-	$ 23,069.00	$ -	66.70	$ 1,538,702.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	66.70	$ 1,538,702.30

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%
				ESTADO: EN EJECUCION

			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
NC H.3.4.3	YEE D=2" PVC Sanitario	UN	-	$ 19,934.00	$ -	50.00	$ 996,700.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	50.00	$ 996,700.00
NC H.3.5.3	REDUCCION D= 3" X 2" PVC	UN	-	$ 32,691.00	$ -	2.00	$ 65,382.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 65,382.00
NC H.6.2	TAPON LIMPIEZA PVCS 3"	UN	-	$ 27,135.00	$ -	3.00	$ 81,405.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 81,405.00
NC H.6.7	YEE D=4X2" PVC SANITARIO	UN	-	$ 64,047.00	$ -	124.00	$ 7,941,828.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	124.00	$ 7,941,828.00
3.7	**CAJAS DE INSPECCION SANITARIAS**														
H.3.7.1	CAJA INSPEC.50x.50x.50cm.20.7	UN	35.00	$ 451,340.00	$ 15,796,900.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20.00	$ 12,359,140.00
H.3.7.2	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO	UN	1.00	$ 617,957.00	$ 617,957.00	20.00	$ 12,359,140.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 12,345,036.00
H.3.7.3	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO	UN	2.00	$ 1,028,753.00	$ 2,057,506.00	12.00	$ 12,345,036.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 1,581,274.00
NP H.3.7.4	CAJA DE INSPECCION 80X80 EN CONCRETO	UN	-	$ 790,637.00	$ -	2.00	$ 1,581,274.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15.00	$ 10,582,350.00
NP H.3.7.5	CAJA DE INSPECCION 60X60 EN CONCRETO	UN	-	$ 705,490.00	$ -	15.00	$ 10,582,350.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		
H.4. RED DE IMPULSION HIDRAULICA															
H.4.1	TUBERIA AC SCH 10 3"	ML	33.58	$ 53,098.00	$ 1,783,031.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.4.2	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D= 2 1/2"	ML	124.48	$ 40,226.00	$ 5,007,332.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.4.3	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2" PVC	ML	107.70	$ 27,230.00	$ 2,932,671.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.4.4	UNION DE REPARACIÓN O DRESSER 2 1/2"	UN	1.00	$ 180,876.00	$ 180,876.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.4.5	BRIDA ACERO 3"	UN	1.00	$ 198,906.00	$ 198,906.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.4.6	REDUCCION PVC PRESION RDE 21 2 1/2" A 2"	UN	4.00	$ 27,810.00	$ 111,240.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.4.7	TEE ACERO 3"	UN	5.00	$ 62,729.00	$ 313,645.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.4.8	TEE PVC PRESION RDE 21 2 1/2"	UN	4.00	$ 44,047.00	$ 176,188.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.4.9	TEE PRESION EN PVC D=2"	UN	6.00	$ 21,808.00	$ 130,848.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.4.10	CODO PRESION RDE 21 D= 2 1/2"	UN	3.00	$ 44,680.00	$ 134,040.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.4.11	CODO PRESION RDE 21 D= 2"	UN	4.00	$ 19,147.00	$ 76,588.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.4.12	CODO 90° ACERO GALVANIZADO 3"	UN	4.00	$ 61,406.00	$ 245,624.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO PRESION - ABASTECIMIENTO AGUA PREENSAMBLADO 2 BOMBAS DE 7,5 HP	UN	1.00	$ 33,595,285.00	$ 33,595,285.00	2.00	$ 67,190,570.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 67,190,570.00
H.4.14	VALVULA D=2" COMPUERTA BRONCE*	UN	4.00	$ 294,989.00	$ 1,179,956.00	4.00	$ 1,179,956.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 1,179,956.00
H.5. RED CONTRAINCENDIOS															
H.5.1	TUBERIA ASTM A795 SCH10 1"	ML	721.41	$ 45,552.00	$ 32,861,668.00	721.41	$ 32,861,668.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	721.41	$ 32,861,668.32
H.5.2	TUBERIA ASTM A795 SCH10 D= 1 1/4"	ML	27.23	$ 55,093.00	$ 1,500,182.00	27.23	$ 1,500,182.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	27.23	$ 1,500,182.39
H.5.3	TUBERIA AC SCH 10 1,1/2"	ML	129.87	$ 25,973.00	$ 3,373,114.00	129.87	$ 3,373,114.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	129.87	$ 3,373,113.51
H.5.4	TUBERIA ASTM A795 SCH10 D= 2"	ML	513.42	$ 55,093.00	$ 28,285,848.00	513.42	$ 28,285,848.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	513.42	$ 28,285,848.06
H.5.5	TUBERIA AC SCH 10 2,1/2"	ML	101.78	$ 43,747.00	$ 4,452,570.00	101.78	$ 4,452,570.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	101.78	$ 4,452,569.66
H.5.6	TUBERIA AC SCH 10 3"	ML	546.22	$ 53,098.00	$ 29,003,190.00	546.22	$ 29,003,190.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	546.22	$ 29,003,189.56
H.5.7	TUBERIA ASTM A795 SCH10 D= 4"	ML	513.42	$ 137,899.00	$ 70,800,105.00	513.42	$ 70,800,105.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	513.42	$ 70,800,104.58
H.5.8	TUBERIA PVC ALTA PRESION 6" RDE 11 EL	ML	272.13	$ 200,326.00	$ 54,514,714.00	272.13	$ 54,514,714.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	272.13	$ 54,514,714.38
H.5.9	UNION DRESSER 4"	UN	2.00	$ 160,767.00	$ 321,534.00	2.00	$ 321,534.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 321,534.00
H.5.10	TEE ACERO RANURADO UL 1"	UN	38.00	$ 23,230.00	$ 882,740.00	38.00	$ 882,740.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	38.00	$ 882,740.00
H.5.11	TEE ACERO RANURADO UL 1 1/2"	UN	10.00	$ 28,365.00	$ 283,650.00	10.00	$ 283,650.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 283,650.00
H.5.12	TEE ACERO RANURADO UL 2"	UN	62.00	$ 36,223.00	$ 2,245,826.00	62.00	$ 2,245,826.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	62.00	$ 2,245,826.00
H.5.13	TEE ACERO RANURADO UL 2 1/2"	UN	6.00	$ 46,094.00	$ 276,564.00	6.00	$ 276,564.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 276,564.00
H.5.14	TEE ACERO RANURADO UL 3"	UN	3.00	$ 96,309.00	$ 288,927.00	3.00	$ 288,927.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 288,927.00
H.5.15	TEE ACERO RANURADO UL 4"	UN	6.00	$ 90,431.00	$ 542,586.00	6.00	$ 542,586.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 542,586.00
H.5.16	CODO ACERO 90 GRADOS RANURADO UL 1"	UN	29.00	$ 23,034.00	$ 667,986.00	29.00	$ 667,986.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29.00	$ 667,986.00
H.5.17	CODO ACERO 90 GRADOS RANURADO UL 2"	UN	4.00	$ 31,508.00	$ 126,032.00	4.00	$ 126,032.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 126,032.00
H.5.18	CODO 90° RANURADO ACERO Ø 2 1/2"	UN	6.00	$ 33,097.00	$ 198,582.00	6.00	$ 198,582.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 198,582.00
H.5.19	CODO ACERO 90 GRADOS RANURADO UL 3"	UN	35.00	$ 84,135.00	$ 2,944,725.00	35.00	$ 2,944,725.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35.00	$ 2,944,725.00
H.5.20	CODO ACERO 90 GRADOS RANURADO UL 4"	UN	2.00	$ 60,384.00	$ 120,768.00	2.00	$ 120,768.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 120,768.00
H.5.21	CODO PVC GRIS SCH 80 6"	UN	9.00	$ 238,731.00	$ 2,148,579.00	9.00	$ 2,148,579.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9.00	$ 2,148,579.00
H.5.22	TEE PVC GRIS SCH 80 D= 6"	UN	6.00	$ 239,639.00	$ 1,437,834.00	6.00	$ 1,437,834.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 1,437,834.00
H.5.23	VALVULA REDUCTORA DE PRESION 2 1/2"	UN	23.00	$ 4,578,754.00	$ 105,311,342.00	23.00	$ 105,311,342.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	23.00	$ 105,311,342.00
H.5.24	REDUCCIÓN EN ACERO 2 1/2" - 2"	UN	27.00	$ 28,744.00	$ 776,088.00	27.00	$ 776,088.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	27.00	$ 776,088.00
H.5.25	REDUCCIÓN EN ACERO 2" - 1 1/2"	UN	62.00	$ 28,559.00	$ 1,770,658.00	62.00	$ 1,770,658.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	62.00	$ 1,770,658.00
H.5.26	REDUCCIÓN EN ACERO 1 1/2" - 1 1/4"	UN	17.00	$ 23,306.00	$ 396,202.00	17.00	$ 396,202.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	17.00	$ 396,202.00
H.5.27	REDUCCIÓN EN ACERO 1 1/4" - 1 "	UN	59.00	$ 22,276.00	$ 1,314,284.00	59.00	$ 1,314,284.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	59.00	$ 1,314,284.00
H.5.28	SISTEMA DE BOMBEO CONTRAINCENDOS PREENSAMBLADO CON BOMBA DE 60 H.P. CAUDAL MAXIMO 1300 GPM, H máx 82 m.c.a , JOCKEY DE 500 LTS y Tablero de control electrico.	UN	1.00	$ 71,493,269.00	$ 71,493,269.00	1.00	$ 71,493,269.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 71,493,269.00
H.5.29	GABINETE CONTRA INCENDIOS TIPO III	UN	23.00	$ 1,696,424.00	$ 39,017,752.00	23.00	$ 39,017,752.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	23.00	$ 39,017,752.00
H.5.30	VALVULA MARIPOSA 4" SUPERVISADA	UN	4.00	$ 438,097.00	$ 1,752,388.00	4.00	$ 1,752,388.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 1,752,388.00
H.5.31	CHEQUE CORTINA CON DRENAJE- SELLO METALICO 4"	UN	4.00	$ 2,444,836.00	$ 9,779,344.00	4.00	$ 9,779,344.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 9,779,344.00
H.5.32	SUMINISTRO E INSTALACION MANOMETRO 4"	UN	8.00	$ 233,237.00	$ 1,865,896.00	8.00	$ 1,865,896.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 1,865,896.00

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

Codigo: 1010-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024
Página 1

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%
				ESTADO: EN EJECUCION

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
H.5.33	SISTEMA GENERAL ALARMA CONTRAINCENDIOS SEG N 695	UN	1.00	$ 26,540,490.00	$ 26,540,490.00	1.00	$ 26,540,490.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 26,540,490.00
H.5.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR CONTRAINCENDIOS	UN	275.00	$ 110,522.00	$ 30,393,550.00	600.00	$ 66,313,200.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	600.00	$ 66,313,200.00
H.5.35	SUMIN E INST HIDRANTE 4" ESPIGO Y CODO EXT LISO/jh	UN	5.00	$ 2,358,931.00	$ 11,794,655.00	5.00	$ 11,794,655.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 11,794,655.00
H.5.36	SOPORTA ANTISISMICO 4 VÍAS 2 1/2"	UN	20.00	$ 199,344.00	$ 3,986,880.00	20.00	$ 3,986,880.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20.00	$ 3,986,880.00
H.5.37	SOPORTERIA ANTISISMICO LONGITUDINAL 2 1/2"	UN	40.00	$ 97,757.00	$ 3,910,280.00	40.00	$ 3,910,280.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	40.00	$ 3,910,280.00
H.5.38	SOPORTERIA ANTISISMICO TRANSVERSAL 2 1/2"	UN	40.00	$ 99,673.00	$ 3,986,920.00	40.00	$ 3,986,920.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	40.00	$ 3,986,920.00
H.5.39	SOPORTERIA TIPO PERA 2 1/2"	UN	477.00	$ 13,667.00	$ 6,519,159.00	477.00	$ 6,519,159.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	477.00	$ 6,519,159.00
H.5.40	PINTURA TUBO D= 2"	ML	1,181.40	$ 9,235.00	$ 10,910,229.00	1,181.40	$ 10,910,229.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,181.40	$ 10,910,229.00
H.5.41	PINTURA TUBO D= 2 1/2"	ML	513.42	$ 9,311.00	$ 4,780,454.00	513.42	$ 4,780,454.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	513.42	$ 4,780,453.62
H.5.42	PINTURA TUBO D=3"	ML	89.35	$ 9,659.00	$ 863,032.00	89.35	$ 863,032.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	89.35	$ 863,031.65
H.5.43	PINTURA TUBO D= 4"	ML	513.42	$ 11,721.00	$ 6,017,796.00	513.42	$ 6,017,796.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	513.42	$ 6,017,795.82
H.5.44	DETECTOR DE FLUJO TIPO PALUSTRE	UN	4.00	$ 931,798.00	$ 3,727,192.00	4.00	$ 3,727,192.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 3,727,192.00
H.6.	**BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS**														
H.6.1	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	965.00	$ 41,273.00	$ 39,828,445.00	332.47	$ 13,722,034.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	332.47	$ 13,722,034.31
H.6.2	TAPON LIMPIEZA PVCS 3"	UN	42.00	$ 27,135.00	$ 1,139,670.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.6.3	CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE	UN	185.00	$ 21,671.00	$ 4,009,135.00	66.00	$ 1,430,286.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	66.00	$ 1,430,286.00
H.6.4	TAPON LIMPIEZA PVCS 4"	UN	78.00	$ 41,713.00	$ 3,253,614.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.6.5	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	26.00	$ 40,645.00	$ 1,056,770.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.6.6	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC	ML	14.00	$ 31,175.00	$ 436,450.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.6.7	YEE D=4X2" PVC SANITARIO	UN	63.00	$ 64,047.00	$ 4,034,961.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NC H.3.3.2	CODO 45° EN PVC D=4" SANITARIO	UN	-	$ 24,359.00	$ -	6.00	$ 146,154.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 146,154.00
NC H.3.4.1	YEE D=4" PVC Sanitario	UN	-	$ 45,669.00	$ -	6.00	$ 274,014.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 274,014.00
NP H.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE TIPO CUPULA D=∅5X4	UN	-	$ 41,437.00	$ -	25.00	$ 1,035,925.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	25.00	$ 1,035,925.00
NP H.6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAGANTE TIPO CUPULA D=∅8X6	UN	-	$ 142,540.00	$ -	1.00	$ 142,540.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 142,540.00
NP H.6.10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 6" PVC	ML	-	$ 156,685.00	$ -	15.90	$ 2,491,292.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15.90	$ 2,491,291.50
H.7.	**ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS**														
H.7.1	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	89.88	$ 40,645.00	$ 3,653,173.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.7.2	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	37.00	$ 88,643.00	$ 3,279,791.00	244.45	$ 21,668,781.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	244.45	$ 21,668,781.35
H.7.3	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 3722-3 ALCANT. D=315 mm (12") (incl. nivel precision)	ML	12.00	$ 155,937.00	$ 1,871,244.00	12.00	$ 1,871,244.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 1,871,244.00
H.7.4	CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO 3000PSI IMPERMEABILIZADO DE 100X100X120	UN	4.00	$ 1,028,753.00	$ 4,115,012.00	1.00	$ 1,028,753.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,028,753.00
H.7.5	CUNETA B=0.60,A=15cm e=0.10,20,7MPa(3000),Inc exc	ML	70.20	$ 95,808.00	$ 6,725,722.00	70.20	$ 6,725,722.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	70.20	$ 6,725,721.60
H.7.6	CUNETA TIPO ANDEN B=1,00,H=10CM E=0.15, 20,7MPA(3000)	ML	164.00	$ 124,246.00	$ 20,376,344.00	164.00	$ 20,376,344.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	164.00	$ 20,376,344.00
NP H.7.7	TUBERIA PVC CORRUGADA SANITARIA U.M. 8"	ML	-	$ 78,140.00	$ -	627.75	$ 49,052,385.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	627.75	$ 49,052,385.00
H.7.7.	**SISTEMA DE FILTRO EN GRAVA PARA DRENAJE, INFILTRACION Y RETENCION DE AGUAS LLUVIAS**														
H.7.7.1	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	678.60	$ 66,620.00	$ 45,208,332.00	678.60	$ 45,208,332.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	678.60	$ 45,208,332.00
H.7.7.2	GRAVA 1 1/2, INCL. SUMINISTRO, TRANSPORTE EINSTAL	M3	678.60	$ 94,805.00	$ 64,334,673.00	678.60	$ 64,334,673.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	678.60	$ 64,334,673.00
H.7.7.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM	14,218.65	$ 1,534.00	$ 21,811,409.00	14,218.65	$ 21,811,409.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	14,218.65	$ 21,811,409.10
H.7.7.4	SUM E INST GEOTEXTIL NT 2000	M2	2,714.40	$ 10,286.00	$ 27,920,318.00	2,714.40	$ 27,920,318.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,714.40	$ 27,920,318.40
H.8.	**SISTEMA BOMBEO AGUAS RESIDUALES**														
H.8.1.	**POZO EYECTOR SEGÚN DISEÑO**							-		-					
H.8.1.1	CONCRETO (27.6 MPa, 4000 psi),BOX, ALETAS,MUROS AR	M3	3.96	$ 1,380,843.00	$ 5,468,138.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.8.1.2	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	456.41	$ 9,302.00	$ 4,245,526.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

Codigo: 1010-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024
Página 1

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%
				ESTADO: EN EJECUCION

			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
H.8.1.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEEBILIZACION EN POLIUREA O SIMILAR PARA VIGA CANALES EN CONCRETO INCLUYE LIMPIEZA Y CONSTRUCION DE MEDIAS CAÑAS Y CAÑUELA	M2	24.00	$ 67,881.00	$ 1,629,144.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.8.2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMER TERRAC. Inc retiro 5 km	M3	84.00	$ 45,486.00	$ 3,820,824.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION ARENA PEÑA (5km)	M3	11.00	$ 113,419.00	$ 1,247,609.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.8.4	TUB 3" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI	ML	140.00	$ 49,269.00	$ 6,897,660.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.8.5	CAMARA AMORTIGUAMIENTO AGUAS RESIDUALES							-		-					
H.8.5.1	MURO PANTALLA CONCRETO A LA VISTA 21 MPa - 3000 PSI e=10-40 cm	M3	6.60	$ 1,054,066.00	$ 6,956,836.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.8.5.2	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	328.01	$ 9,302.00	$ 3,051,149.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.8.5.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEEBILIZACION EN POLIUREA O SIMILAR PARA VIGA CANALES EN CONCRETO INCLUYE LIMPIEZA Y CONSTRUCION DE MEDIAS CAÑAS Y CAÑUELA	M2	32.00	$ 67,881.00	$ 2,172,192.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.8.6	SISTEMA RAMMING - PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=12", INCLUYE TUBERÍA (Incluye suministro, instalación, transporte y disposición final de sobrantes)	ML	32.00	$ 2,391,523.00	$ 76,528,736.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.8.7	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE RIO TAMAÑO MÁXIMO 2 1/2" (INCLUYE EXPLOTE, CARGUE, ACARREO Y CONFORMACIÓN)	M3	21.00	$ 80,365.00	$ 1,687,665.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.8.8	RELLENOS MATERIAL EXCAVA(Relleno/compact mecánico	M3	52.50	$ 19,960.00	$ 1,047,900.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.8.9	RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual (para alcantarillado)	M3	31.50	$ 31,923.00	$ 1,005,575.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9. CASETA DE EQUIPOS															
H.9.1	TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT	M2	57.21	$ 4,091.00	$ 234,046.00	123.50	$ 505,239.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	123.50	$ 505,238.50
H.9.2	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	2.40	$ 66,620.00	$ 159,888.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.3	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.selecc rio	M3	21.60	$ 95,591.00	$ 2,064,766.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.4	CONCRETO CICLOPEO. 20.7 MPa (3000 p.s.i)	M3	2.40	$ 586,419.00	$ 1,407,406.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.5	ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000 psi)	M3	1.80	$ 830,484.00	$ 1,494,871.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.6	CONCRET012,6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	0.27	$ 567,815.00	$ 153,310.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.7	CONCRETO VIGA CIMENTA ,20,7MPa,(3000 PSI)	M3	1.68	$ 890,108.00	$ 1,495,381.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.8	CONCRETO COLUMNA 20,7MPa, (3000psi) PREMEZ	M3	0.90	$ 1,116,837.00	$ 1,005,153.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.9	MURO LADRI. MACIZO PRENSA. VISTA T. S/FE (1:3)	M2	42.29	$ 185,407.00	$ 7,840,862.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.10	PLACA CONTRAPISO e = 10 cm (20,7Mpa, 3000psi) esta	M2	13.69	$ 149,987.00	$ 2,053,322.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.11	PLACA ALIG/CASET Guad e=0.25,C.20,7MPa(3000)Inc ME	M2	16.00	$ 243,659.00	$ 3,898,544.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.12	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA	ML	16.00	$ 38,947.00	$ 623,152.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.13	IMPERMEAB MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 mm. o simil	M2	16.00	$ 97,343.00	$ 1,557,488.00	70.78	$ 6,889,938.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	70.78	$ 6,889,937.54
H.9.14	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	526.59	$ 9,302.00	$ 4,898,340.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.15	REMATE EN LADRILLO PRENSADO STA FE	ML	18.00	$ 56,990.00	$ 1,025,820.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.16	PAÑETE LISO BAJO PLACAS MORT1:4 e=0,025 m	M2	13.69	$ 31,698.00	$ 433,946.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.17	FILOS Y/O DILATACIONES MORTER01:4	ML	144.60	$ 10,453.00	$ 1,511,504.00	116.60	$ 1,218,820.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	116.60	$ 1,218,819.80
H.9.18	ESTUCO INTERIOR S/PAÑETE	M2	43.64	$ 11,035.00	$ 481,567.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.19	VINILO S/ESTUCO INT. 3 MANOS	M2	43.64	$ 9,903.00	$ 432,167.00	68.00	$ 673,404.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	68.00	$ 673,404.00
H.9.20	PINTURA DE FACHADA IMPERMEABILIZANTE SIKA TRANSPARENTE	M2	52.40	$ 14,485.00	$ 759,014.00	66.17	$ 958,472.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	66.17	$ 958,472.45
H.9.21	VENTANA ALUMNIO BASCULANT Y VIDRIO TRANSP INC TRAN	M2	2.00	$ 585,644.00	$ 1,171,288.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.22	MARCO ALUMINIO. Inc vidrio fijo martillado 4mm	M2	2.00	$ 290,037.00	$ 580,074.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

Codigo: 1010-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024
Página 1

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO	
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023	
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION	
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026	
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026	
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:	
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%	
				ESTADO: EN EJECUCION	

CONDICIONES ACTUALIZADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
H.9.23	PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO	M2	1.76	$ 412,430.00	$ 725,877.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.24	SUMINIS E INSTAL CERRADURA METALICA INCL ACCESORIO	UN	1.00	$ 99,920.00	$ 99,920.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.25	ACOMETIDA PARCIAL 2No 12 +1 No 12	ML	25.00	$ 47,636.00	$ 1,190,900.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.26	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6m	PTO	2.00	$ 101,142.00	$ 202,284.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.27	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE COLOR NARANJ	UN	3.00	$ 128,776.00	$ 386,328.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.28	CARCAMO CCTO SECC 0.4 x 0.4 mt, 20,70 Mpa (3000) e=10cm Inc, Tapa Ccto	UN	1.00	$ 365,884.00	$ 365,884.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.9.29	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBAS NE 3 20-2-220 DE 2 H.P PREENSAMBLADAS MARCA BARNES O SIMILAR	UN	2.00	$ 16,080,074.00	$ 32,160,148.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NC 4.1.2	COLUMNA CONFIN. CONC.20.7MPa .12x.20 D=4 de 1/2", Fle 3/8" (ml)	ML	-	$ 95,857.00	$ -	27.33	$ 2,619,772.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	27.33	$ 2,619,771.81
NC 4.3.2	VIGA CONFIN. CONC. 20.7MPa .12x.20 D4 de 3/8" Fle 1/4" (ml)	ML	-	$ 73,883.00	$ -	29.80	$ 2,201,713.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29.80	$ 2,201,713.40
NC 7.1	MURO DIVIS. BLOQUE FLEXA No. 5 (33X11,5X23)	M2	-	$ 50,600.00	$ -	54.31	$ 2,748,086.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	54.31	$ 2,748,086.00
NC 9.1	PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0,020 mt	M2	-	$ 23,812.00	$ -	66.17	$ 1,575,640.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	66.17	$ 1,575,640.04
NC 9.2	PAÑETE IMPERME. MURO EXTERIOR 1:3 e=0.020mt	M2	-	$ 31,554.00	$ -	69.59	$ 2,195,843.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	69.59	$ 2,195,842.86
NC 6.2.1	TEJA AJOVER TERMOACUST a=0,82 m, e=0,27 mm (super)	M2	-	$ 105,977.00	$ -	57.00	$ 6,040,689.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	57.00	$ 6,040,689.00
H.10. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE															
H.10,1	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	161.84	$ 66,620.00	$ 10,781,781.00	2.16	$ 143,899.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.16	$ 143,899.20
H.10,2	ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCAVACION H=>2 < 4MTS	M2	182.00	$ 26,896.00	$ 4,895,072.00	117.20	$ 3,152,211.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	117.20	$ 3,152,211.20
H.10,3	CAJA INSP1x1x1mt,20,7MPa(3000)e=10cm,3/8c/15 cm	UN	2.00	$ 996,540.00	$ 1,993,080.00	4.00	$ 3,986,160.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 3,986,160.00
H.10,4	VIGA AEREA CONCRETO 27,58MPa, (4000 psi). Imper premez.	M3	2.14	$ 1,409,554.00	$ 3,016,446.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.10,5	CONCRETO VIGA CIMENTA ,20,7MPa,(3000 PSI)	M3	2.45	$ 890,108.00	$ 2,180,765.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.10,6	PLACA DE CONCRETO DE 20,7MPa, (4000psi), Impermeab	M3	6.38	$ 1,433,933.00	$ 9,148,493.00	14.16	$ 20,304,491.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	14.16	$ 20,304,491.28
H.10,7	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UN	4.00	$ 277,074.00	$ 1,108,296.00	4.00	$ 1,108,296.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 1,108,296.00
H.10,8	PLACA DE CONTRAPISO (20.7 Mpa, 3000psi)	M3	5.80	$ 952,494.00	$ 5,524,465.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.10,9	CONCRETO (27.6 MPa, 4000 psi),BOX, ALETAS,MUROS AR	M3	30.29	$ 1,380,843.00	$ 41,825,734.00	95.86	$ 132,367,610.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	95.86	$ 132,367,609.98
H.10,10	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	3,365.25	$ 9,302.00	$ 31,303,556.00	11,662.12	$ 108,481,040.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,662.12	$ 108,481,040.24
H.10,11	CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	2.18	$ 567,815.00	$ 1,237,837.00	6.52	$ 3,702,154.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6.52	$ 3,702,153.80
H.10,12	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2" PVC	ML	120.00	$ 27,230.00	$ 3,267,600.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.10,13	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	36.00	$ 66,620.00	$ 2,398,320.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.10,14	ACOMETIDA AGUA POTABLE INTERVINIENDO RED VEREDA POMPEYA EN PVC 3"x2"	UN	1.00	$ 894,662.00	$ 894,662.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.10,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA SELLO ELASTICO VNA, DE 2" BXB,	UN	3.00	$ 934,226.00	$ 2,802,678.00	4.00	$ 3,736,904.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 3,736,904.00
H.10,16	CODO PRESION RDE 21 D= 2"	UN	8.00	$ 19,147.00	$ 153,176.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.10,17	TEE PRESION EN PVC D=2"	UN	2.00	$ 21,808.00	$ 43,616.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.10,18	CINTA FLEXIBLE JUNTA DILATA/ CONSTRUC. V-15	ML	26.08	$ 37,149.00	$ 968,846.00	73.91	$ 2,745,683.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	73.91	$ 2,745,682.59
H.10,19	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC	ML	6.00	$ 40,645.00	$ 243,870.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
H.10,20	CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE	UN	1.00	$ 21,671.00	$ 21,671.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NC 2.3.3	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO HUMEDO H < 4.0M	M3	-	$ 33,791.00	$ -	956.80	$ 32,331,229.00	-	$ -	260.00	$ 8,785,660.00	260.00	$ 8,785,660.00	696.80	$ 23,545,568.80
NP H.10.21	CAJA DESARENADOR 2.3x2.10 (INCLUYE REJILLA CRIBADO, ACERO DE REFUERZO Y MARCO TAPA)	UN	-	$ 5,544,372.00	$ -	1.00	$ 5,544,372.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 5,544,372.00
E. OBRA INSTALACIÓN ELECTRICA															
E.1	RED MEDIA TENSION Y SUBESTACION														
E.1.1	ESTRUCTURA TIPO 523	UN	1.00	$ 303,617.00	$ 303,617.00	1.00	$ 303,617.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 303,617.00
E.1.2	ESTRUCTURA TIPO 550	UN	1.00	$ 800,587.00	$ 800,587.00	1.00	$ 800,587.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 800,587.00
E.1.3	ESTRUCTURA 711. Incl. pararayos y corta circuitos	UN	1.00	$ 2,055,736.00	$ 2,055,736.00	1.00	$ 2,055,736.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 2,055,736.00
E.1.4	POSTE DE CONCRET012 mx 1050 kg REFORZADO	UN	1.00	$ 1,881,207.00	$ 1,881,207.00	1.00	$ 1,881,207.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,881,207.00

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

Codigo: 1010-F-GCT-81
Version:4
Fecha:17/06/2024
Página 1

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%
				ESTADO: EN EJECUCION

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
E.1.5	ESTRUCTURA CS 274	UN	2.00	$ 779,028.00	$ 1,558,056.00	2.00	$ 1,558,056.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 1,558,056.00
E.1.6	DESMONTE ESTRUCTURAS MT,inc trans.entrega	UN	1.00	$ 89,296.00	$ 89,296.00	1.00	$ 89,296.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 89,296.00
E.1.7	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA	UN	1.00	$ 14,262,610.00	$ 14,262,610.00	1.00	$ 14,262,610.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 14,262,610.00
E.1.8	CONDUCTOR ACSR 3 No. 2 AWG	ML	25.00	$ 8,812.00	$ 220,300.00	25.00	$ 220,300.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	25.00	$ 220,300.00
E.1.9	AFLORAMIENTO RED MT CS400 T.GALVANIZADO IMC 4"x6mt	ML	1.00	$ 1,258,542.00	$ 1,258,542.00	1.00	$ 1,258,542.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,258,542.00
E.1.10	BAJANTE CON TUBO CONDUIT IMC 3" L=6m	UN	2.00	$ 798,998.00	$ 1,597,996.00	2.00	$ 1,597,996.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 1,597,996.00
E.1.11	CANALIZACION PARA 2 DUCTOS PVC 4"	ML	65.00	$ 107,709.00	$ 7,001,085.00	65.00	$ 7,001,085.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	65.00	$ 7,001,085.00
E.1.12	CANALIZACION PARA 1 DUCTO PVC 3" NORMA CS 220	ML	130.00	$ 110,862.00	$ 14,412,060.00	130.00	$ 14,412,060.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	130.00	$ 14,412,060.00
E.1.13	ARMARIO GRUPO DE MEDIDA	UN	1.00	$ 1,561,059.00	$ 1,561,059.00	1.00	$ 1,561,059.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,561,059.00
E.2	ACOMETIDAS BAJA TENSIOIN														
E.2.1	ACOMETIDA PARCIAL 3x(2No3/0)+2 No3/0+1 No2/0 desde el Transformador al Tablero General de Baja Tensión TGBT	ML	66.00	$ 864,112.00	$ 57,031,392.00	66.00	$ 57,031,392.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	66.00	$ 57,031,392.00
E.2.2	ACOMETIDA PARCIAL 3x(2No3/0)+2 No3/0+1 No2/0 desde el Transformador al Tablero de Bomba Contra Incendio. TCBCI	ML	173.00	$ 864,112.00	$ 149,491,376.00	173.00	$ 149,491,376.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	173.00	$ 149,491,376.00
E.2.3	ACOMETIDA PARCIAL 3No3/0+1 No3/0+1 No6 T de la Planta de Emergencia a Tablero General de TGBT	ML	13.00	$ 455,857.00	$ 5,926,141.00	13.00	$ 5,926,141.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13.00	$ 5,926,141.00
E.2.4	ACOMETIDA PARCIAL 3No2/0+1 No2/0+1 N08 Ducto PVC 2 1/2" desde TGBT a Tablero Aulas Piso 1 - TA-P1	ML	25.00	$ 235,019.00	$ 5,875,475.00	25.00	$ 5,875,475.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	25.00	$ 5,875,475.00
E.2.5	ACOMETIDA PARCIAL 3No6+1No6+1No8 Ducto PVC 1 1/2" desde TGBT a TD-OESTE	ML	36.00	$ 70,265.00	$ 2,529,540.00	36.00	$ 2,529,540.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36.00	$ 2,529,540.00
E.2.6	ACOMETIDA PARCIAL 3No4+1No4+1No8 Ducto PVC 2" desde TGBT a TD-ESTE	ML	160.00	$ 77,718.00	$ 12,434,880.00	160.00	$ 12,434,880.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	160.00	$ 12,434,880.00
E.2.7	ACOMETIDA PARCIAL 3No6+1No6+1No8 Ducto PVC 1 1/2" desde TGBT a TD-OESTE	ML	65.00	$ 70,265.00	$ 4,567,225.00	65.00	$ 4,567,225.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	65.00	$ 4,567,225.00
E.2.8	ACOMETIDA PARCIAL 3No4+1No4+1No8 Ducto PVC 2" desde TGBT a TD-ESTE	ML	83.00	$ 77,718.00	$ 6,450,594.00	83.00	$ 6,450,594.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	83.00	$ 6,450,594.00
E.2.9	ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1 No2+1 No8 Ducto PVC 2 1/2" desde TGBT a Tablero Aulas Piso 2 - TA-P2	ML	62.00	$ 233,622.00	$ 14,484,564.00	62.00	$ 14,484,564.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	62.00	$ 14,484,564.00
E.2.10	ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1 No2+1 No8 Ducto PVC 2 1/2" desde TGBT a Tablero de sala de profesores, sala de sistemas y laboratorios TSIS-P2	ML	53.00	$ 233,622.00	$ 12,381,966.00	53.00	$ 12,381,966.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	53.00	$ 12,381,966.00
E.2.11	ACOMETIDA PARCIAL 3No4+1No4+1No8 Ducto PVC 2" desde TGBT a TD-ESTE	ML	67.00	$ 77,718.00	$ 5,207,106.00	67.00	$ 5,207,106.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	67.00	$ 5,207,106.00
E.2.12	ACOMETIDA PARCIAL 3No6+1No6+1No8 Ducto PVC 1 1/2" desde TGBT a TD-OESTE	ML	37.00	$ 70,265.00	$ 2,599,805.00	37.00	$ 2,599,805.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	37.00	$ 2,599,805.00
E.2.13	ACOMETIDA PARCIAL 3No4+1No4+1No8 Ducto PVC 2" desde TGBT a TD-ESTE	ML	8.00	$ 77,718.00	$ 621,744.00	8.00	$ 621,744.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 621,744.00
E.2.14	ACOMETIDA PARCIAL 3No6+1No6+1No8 Ducto PVC 1 1/2" desde TGBT a TD-OESTE	ML	58.00	$ 70,265.00	$ 4,075,370.00	58.00	$ 4,075,370.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	58.00	$ 4,075,370.00
E.2.15	ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No8+1No8 Ducto PVC 1 1/4" T.G.B.T a TGEN-REG	ML	25.00	$ 53,195.00	$ 1,329,875.00	25.00	$ 1,329,875.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	25.00	$ 1,329,875.00
E.2.16	ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No8+1No8 Ducto PVC 1 1/4" TGEN-REG a TREG-ESTE	ML	52.00	$ 53,195.00	$ 2,766,140.00	52.00	$ 2,766,140.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	52.00	$ 2,766,140.00
E.2.17	ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1 No2+1 No8 Ducto PVC 2 1/2" desde el TGBT al Tablero en el cuarto de máquinas Tcuarto-Máq	ML	111.00	$ 233,622.00	$ 25,932,042.00	111.00	$ 25,932,042.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	111.00	$ 25,932,042.00
E.2.18	ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No8+1No8 Ducto PVC 1 1/4" T.G.B.T a T-IEXT	ML	8.00	$ 53,195.00	$ 425,560.00	8.00	$ 425,560.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 425,560.00
E.2.19	ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No8+1No8 Ducto PVC 1 1/4" T.G.B.T a TGEN-REG	ML	12.00	$ 53,195.00	$ 638,340.00	12.00	$ 638,340.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 638,340.00
E.2.20	ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No8+1No8 Ducto PVC 1 1/4" TGEN-REG a TREG-OESTE	ML	15.00	$ 53,195.00	$ 797,925.00	15.00	$ 797,925.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15.00	$ 797,925.00

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO
		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%
				ESTADO: EN EJECUCION

	CONDICIONES ACTUALIZADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL		CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
E.2.21	ACOMETIDA PARCIAL 3No10+1No12 Ducto PVC 3/4"	ML	850.00	$ 55,551.00	$ 47,218,350.00		850.00	$ 47,218,350.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	850.00	$ 47,218,350.00
E.3	TABLEROS ELÉCTRICOS															
E.3.1	TABLERO GENERAL BAJA TENSION INC GABINETE TOTALIZA	UN	1.00	$ 9,510,735.00	$ 9,510,735.00		1.00	$ 9,510,735.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 9,510,735.00
E.3.2	TABLERO PARCIAL12 CIRCUITOS.Inc totalizador,interr	UN	2.00	$ 674,496.00	$ 1,348,992.00		2.00	$ 1,348,992.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 1,348,992.00
E.3.3	TABLERO PARCIAL18CIRCUITOS,inc totalizador,interru	UN	4.00	$ 899,620.00	$ 3,598,480.00		4.00	$ 3,598,480.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 3,598,480.00
E.3.4	TABLERO PARCIAL24CIRCUITOS,inc totalizador,interru	UN	5.00	$ 1,036,297.00	$ 5,181,485.00		5.00	$ 5,181,485.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 5,181,485.00
E.3.5	TABLERO PARCIAL30CIRCUITOS,inc totalizador,interru	UN	2.00	$ 1,274,300.00	$ 2,548,600.00		2.00	$ 2,548,600.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 2,548,600.00
E.3.6	TABLERO PARCIAL36CIRCUITOS,inc totalizador,interru TD- ESTE, TD-OESTE	UN	1.00	$ 1,386,775.00	$ 1,386,775.00		1.00	$ 1,386,775.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,386,775.00
E.3.7	TABLERO PARCIAL6CIRCUITOS,inc totalizador,interru	UN	1.00	$ 533,925.00	$ 533,925.00		1.00	$ 533,925.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 533,925.00
E.3.8	TABLERO GENERAL REGULADO CON BYPASS PARA UPS 10 KVA - TGEN-REG (TRANSFERENCIA	UN	1.00	$ 28,271,390.00	$ 28,271,390.00		1.00	$ 28,271,390.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 28,271,390.00
E.4	TGEN-REG (TRANSFERENCIA AUTOMATICA)															
E.4.1	SALIDA LAMPARA TUBO CONDUIT EMT DE 3/4 Y COND 2N12	UN	1,374.00	$ 189,442.00	$ 260,293,308.00		1,374.00	$ 260,293,308.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,374.00	$ 260,293,308.00
E.4.2	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO O DOBLE TUBO PVC 1/2"	UN	104.00	$ 129,931.00	$ 13,512,824.00		104.00	$ 13,512,824.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	104.00	$ 13,512,824.00
E.4.3	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE TUBO PVC 3/4"	UN	40.00	$ 170,809.00	$ 6,832,360.00		40.00	$ 6,832,360.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	40.00	$ 6,832,360.00
E.4.4	SALIDA INTERRUPTOR COMMUTABLE SENCILLO TUBO PVC 3/4"	UN	4.00	$ 209,180.00	$ 836,720.00		4.00	$ 836,720.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 836,720.00
E.4.5	SALIDA INTERRUPTOR COMMUTABLE DOBLE TUBO PVC 3/4"	UN	2.00	$ 228,365.00	$ 456,730.00		2.00	$ 456,730.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 456,730.00
E.4.6	SALIDA INTERRUPTOR COMMUTABLE TRIPLE TUBO PVC 3/4"	UN	4.00	$ 277,697.00	$ 1,110,788.00		4.00	$ 1,110,788.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 1,110,788.00
E.5	LUMINARIAS															
E.5.1	SUMINSTRO E INSTALACION LUMINARIA 2x32 T8	UN	1,088.00	$ 102,072.00	$ 111,054,336.00		1,088.00	$ 111,054,336.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,088.00	$ 111,054,336.00
E.5.2	SUMINSTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO BALA DE 20W	UN	33.00	$ 122,862.00	$ 4,054,446.00		33.00	$ 4,054,446.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	33.00	$ 4,054,446.00
E.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA 2*32	UN	20.00	$ 139,675.00	$ 2,793,500.00		20.00	$ 2,793,500.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20.00	$ 2,793,500.00
E.5.4	SALIDA DE ILUM EVACUAC INC.TUB EMT 1/2" Y ACCESOR	UN	38.00	$ 351,252.00	$ 13,347,576.00		38.00	$ 13,347,576.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	38.00	$ 13,347,576.00
E.5.5	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2*1.6W 90min	UN	209.00	$ 171,871.00	$ 35,921,039.00		209.00	$ 35,921,039.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	209.00	$ 35,921,039.00
E.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA 96W	UN	24.00	$ 238,997.00	$ 5,735,928.00		24.00	$ 5,735,928.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24.00	$ 5,735,928.00
E.6	SALIDAS DE TOMACORRIENTE															
E.6.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA no incluye tuberia	PTO	448.00	$ 81,097.00	$ 36,331,456.00		448.00	$ 36,331,456.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	448.00	$ 36,331,456.00
E.6.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	PTO	570.00	$ 108,086.00	$ 61,609,020.00		570.00	$ 61,609,020.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	570.00	$ 61,609,020.00
E.6.3	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE COLOR NARANJ	UN	122.00	$ 128,776.00	$ 15,710,672.00		122.00	$ 15,710,672.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	122.00	$ 15,710,672.00
E.6.4	SALIDA PARA TOMA GFCI	PTO	10.00	$ 145,043.00	$ 1,450,430.00		10.00	$ 1,450,430.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 1,450,430.00
E.6.5	SALIDA PARA TOMA BIFASICA ESPECIAL AMP (500)	UN	1.00	$ 1,044,831.00	$ 1,044,831.00		1.00	$ 1,044,831.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1,044,831.00
E.7	CAMARAS DE CONCRETO															
E.7.1	ESTRUCTURA CS 274	UN	22.00	$ 779,028.00	$ 17,138,616.00		6.00	$ 4,674,168.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 4,674,168.00
E.7.2	ESTRUCTURA CS 275	UN	8.00	$ 1,761,580.00	$ 14,092,640.00		8.00	$ 14,092,640.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 14,092,640.00
E.7.3	CAJA DE PASO MAMPOSTERIA 30X30CM	UN	22.00	$ 799,060.00	$ 17,579,320.00		22.00	$ 17,579,320.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	22.00	$ 17,579,320.00
E.7.4	CANALIZACION PARA DOS DUCTOS PVC 2"	ML	70.00	$ 67,086.00	$ 4,696,160.00		70.00	$ 4,696,160.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	70.00	$ 4,696,160.00
E.8	TELECOMUNICACIONES															
E.8.1	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	165.00	$ 53,530.00	$ 8,832,450.00		165.00	$ 8,832,450.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	165.00	$ 8,832,450.00
E.8.2	CABLE CAT 6A UTP 500Mhz 10G 4x2x23AWG	ML	4,363.00	$ 7,442.00	$ 32,469,446.00		4,363.00	$ 32,469,446.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,363.00	$ 32,469,446.00
E.8.3	SUMIN EINST EQUIPO DE COMUNICACIÓN CENTRAL	UN	3.00	$ 17,450,821.00	$ 52,352,463.00		3.00	$ 52,352,463.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 52,352,463.00

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO	
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023	
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION	
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026	
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026	
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:	
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%	
				ESTADO: EN EJECUCION	

CONDICIONES ACTUALIZADAS						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
E.8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PACH PANEL CAT A 24 PUERTOS	UN	4.00	$ 482,209.00	$ 1,928,836.00	4.00	$ 1,928,836.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 1,928,836.00
E.8.5	SWITCHE DE 24 PUERTOS, CAPA TRES 24 PUERTOS 10/100/1000 EN COBRE, MÁS 4 PUERTOS SFP A 1000 O 4 PUERTOS RJ45 A 1000. ADMINISTRABLE POR WEB O POR CONSOLA.	UN	4.00	$ 1,476,675.00	$ 5,906,700.00	4.00	$ 5,906,700.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 5,906,700.00
E.8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT 6A INC. HERRAJE	UN	3.00	$ 707,961.00	$ 2,123,883.00	3.00	$ 2,123,883.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 2,123,883.00
E.8.7	SWITCHE DE 48 PUERTOS, CAPA TRES 48 PUERTOS 10/100/1000 EN COBRE, MÁS 4 PUERTOS SFP A 1000 O 4 PUERTOS RJ45 A 1000. ADMINISTRABLE POR WEB O POR CONSOLA.	UN	3.00	$ 4,290,513.00	$ 12,871,539.00	3.00	$ 12,871,539.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 12,871,539.00
E.8.8	BANDEJA DE FIBRA (CONECTORES LC) QUE INCLUYA DOS MÓDULOS DE FIBRA DE 6 PUERTOS CADA UNO Y UN PACHCORD DE FIBRA ÓPTICA DE 5 FT LC/LC.	UN	3.00	$ 1,594,789.00	$ 4,784,367.00	3.00	$ 4,784,367.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 4,784,367.00
E.8.9	FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3 DE 12 HILOS TIPO INTERIOR,PARA CONECTAR ENTRE EL (PISO -1, PISO 2 Y 3) Y EL RACKPRINCIPAL EN EL PRIMER PISO. SE TIENDE EN TUBERÍA EMT DE 1" INCLUYE LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML	213.00	$ 12,145.00	$ 2,586,885.00	213.00	$ 2,586,885.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	213.00	$ 2,586,885.00
E.8.10	PACH CORD CAT. 6A AZULES PARA EL SISTEMA DE DATOSDE 5 FT PARA EL PACH PANEL.	UN	29.00	$ 70,609.00	$ 2,047,661.00	29.00	$ 2,047,661.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29.00	$ 2,047,661.00
E.8.11	PACH CORD CAT. 6A AZULES PARA EL SISTEMA DE DATOS DE 10 FT PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO.	UN	29.00	$ 55,150.00	$ 1,599,350.00	29.00	$ 1,599,350.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29.00	$ 1,599,350.00
E.8.12	PACH CORD CAT. 6A AZULES PARA EL SISTEMA DE DATOSDE 5 FT PARA EL PACH PANEL	UN	141.00	$ 70,609.00	$ 9,955,869.00	141.00	$ 9,955,869.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	141.00	$ 9,955,869.00
E.8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, UPS TRIFÁSICA DE 15 KVA A 208V CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, TOPOLOGÍA TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSIÓN, ALTA FRECUENCIA, AUTONOMÍA DE 10 MINUTOS. VER FICHA TÉCNICA.	UN	1.00	$ 26,431,690.00	$ 26,431,690.00	1.00	$ 26,431,690.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 26,431,690.00
E.8.14	PUESTA A TIERRA DE LOS RACK DE COMUNICACIONES	UN	3.00	$ 336,965.00	$ 1,010,895.00	3.00	$ 1,010,895.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 1,010,895.00
E.9	ILUMINACIÓN EXTERIOR														
E.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA T. ISLA SCHREDER 70W	UN	13.00	$ 713,249.00	$ 9,272,237.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
E.9.2	REFLECTOR TIPO RCG (Roy alha) o similar	UN	16.00	$ 1,143,629.00	$ 18,298,064.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
E.9.3	POSTE DE CONCRET012 mx 750 kg REFORZADO	UN	13.00	$ 1,483,159.00	$ 19,281,067.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
E.9.4	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION	UN	7.00	$ 323,908.00	$ 2,267,356.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
E.10	BANDEJAS PORTACABLES														
E.10.1	Bandeja tipo malla con borde de seguridad con soldadura en T, de 54x300mm, longitud 3m. Con acabado electro zincado de 20 micras de zinc para uso interior. Se incluyen todos los accesoriosde fijación	ML	629.00	$ 101,320.00	$ 63,730,280.00	629.00	$ 63,730,280.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	629.00	$ 63,730,280.00
E.10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, BANDEJA TIPO MALLA CON BORDE DE SEGURIDAD CON SOLDADURA EN T, DE 54X100MM, LONGITUD 3M. CON ACABADO ELECTRO ZINCADO DE 20 MICRAS DE ZINC PARA USO INTERIOR. SE INCLUYEN TODOS LOS ACCESORIOS DE FIJACIÓN	ML	6.00	$ 124,700.00	$ 748,200.00	6.00	$ 748,200.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 748,200.00

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%
				ESTADO: EN EJECUCION

		CONDICIONES ACTUALIZADAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
E.10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TENDIDO DE DUCTO EVOLUTIVO DPL DE 105X50MM, LONGITUD 2M , CON TABIQUE DE SEPARACIÓN. INCLUYE ACCESORIOS (ÁNGULO INTERNO, EXTERNO, TAPAS, UNIONES, SOPORTE UNIVERSAL Y DERIVACIÓN PLANA).	ML	40.00	$ 146,629.00	$ 5,865,160.00	40.00	$ 5,865,160.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	40.00	$ 5,865,160.00
E.11	GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA														
E.11.1	Planta de emergencia de 54,4KW/68 kVA – 208/120V trifásica, factor de potencia 0.8, 4 hilos, neutro accesible, 120/ 208 Voltios,60 Hz, 1800 r.p.m. Incluye cabina antiruido, tuberia escape de gases, transporte y montaje físico. Y la adecuación eléctrica entre la planta y la transferencia en el Tablero General de Baja Tensión.	UN	1.00	$ 70,245,610.00	$ 70,245,610.00	1.00	$ 70,245,610.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 70,245,610.00
E.12	SISTEMA DE PUIESTA A TIERRA														
E.12.1	SUMINI E INSTAL MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	UN	1.00	$ 2,489,155.00	$ 2,489,155.00	10.00	$ 24,891,550.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 24,891,550.00
E.12.2	SUMIN Y TENDIDO CABLE DE COBRE No.2/0 DESNUDO	ML	40.00	$ 106,339.00	$ 4,253,560.00	361.60	$ 38,452,182.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	361.60	$ 38,452,182.40
E.13	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS - SIPRA														
E.13.1	SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS SEGUN DISEÑO	UN	1.00	$ 29,380,874.00	$ 29,380,874.00	1.00	$ 29,380,874.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 29,380,874.00
E.13.2	SUMIN Y COLOCACION BARRA CAPTORA PARA APANTALLAMIE	UN	33.00	$ 280,517.00	$ 9,257,061.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
G.14	OBRA INSTALACIÓN RED DE GAS														
G.14.1	TUBERIA DE POLIETILENO DE GAS 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	158.62	$ 24,879.00	$ 3,946,307.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
G.14.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA POLIETILENO 3/4"	ML	185.68	$ 14,880.00	$ 2,762,918.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
G.14.3	TUBERIA AG 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	191.80	$ 18,095.00	$ 3,470,621.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
G.14.4	TUBERIA AG 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	160.96	$ 22,988.00	$ 3,700,148.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
G.14.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO GALVANIZADO HG 1 1/4	ML	121.25	$ 49,728.00	$ 6,029,520.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
G.14.6	VALVULA CORTINA 1/2" RED-WHITE (250 psi) o simil	UN	26.00	$ 81,209.00	$ 2,111,434.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
G.14.7	VALVULA DE CORTINA 3/4" RED-WHITE (250 psi)	UN	12.00	$ 40,221.00	$ 482,652.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
G.14.8	REGULADOR GAS R10 PILOTADO	UN	3.00	$ 830,494.00	$ 2,491,482.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
G.14.9	REGULACION DE PRESION DE GAS EN PRIMERA ETAPA.	UN	1.00	$ 1,169,893.00	$ 1,169,893.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
G.14.10	CENTRO DE MEDICION Y REGULACIÓN DE PRESION GAS EN SEGUNDA ETAPA	UN	1.00	$ 1,274,086.00	$ 1,274,086.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
G.14.11	PUNTO PARA GAS 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION	UN	12.00	$ 124,061.00	$ 1,488,732.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
G.14.12	PUNTO PARA GAS 1/2", SUMINISTRO E INSTALACION	UN	22.00	$ 107,195.00	$ 2,358,290.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
G.14.13	POLIVALVULA 1/2" , SUMINISTRO E INSTALACION	UN	5.00	$ 634,982.00	$ 3,174,910.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
G.14.14	REJILLA VENTILACION TIPO PERSIANA PLASTICA 20X20	UN	15.00	$ 30,364.00	$ 455,460.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE MENSUAL

CONTRATO No :	1279 DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR	FECHA DE INICIO CONTRATO
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO VILLAVIVENCIO- META		$ 25,094,607,822.56	$ 12,200,566,931.28	20 DE MAYO DE 2023
		VALOR ANTICIPO:	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 5,018,921,564.51	48.6%	DIECINUEVE (19) MESES Y ONCE (11) DÍAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH R/L CARLOS ALBERTO FERREIRA SANDINO	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	3.71%	06 DE JUNIO DE 2026
INTERVENTOR :	CONSORCIO EDUCATIVO AR R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 931,360,668.70	26 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR:	MARISTELLA SANTANA TORRES	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL PROGRAMADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 25,094,607,702.00	52.3%	60.3%
				ESTADO: EN EJECUCION

	CONDICIONES ACTUALIZADAS					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO 04		CANTIDADES HASTA MARZO 2026		CANTIDADES ABRIL 2026		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				$ 25,051,102,857.00		$ 25,051,102,857.00		$ 12,184,422,837.28		$ 931,360,668.70		$ 13,115,783,505.98		$ 11,935,319,352.26
	VALOR TOTAL AIU (31%)				$ 19,122,979,280.15		$ 19,122,979,280.15		$ 9,301,086,135.33		$ 710,962,342.52		$ 10,012,048,477.85		$ 9,110,930,803.25
	GESTIÓN Y TRAMITE DE CERTIFICACIÓN RETIE				$ 11,900,000.00	1.00	$ 11,900,000.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 11,900,000.00
	GESTIÓN Y TRAMITE DE CERTIFICACIÓN RETILAP				$ 15,460,751.00	1.00	$ 15,460,751.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 15,460,751.00
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 10,421,596.00	1.00	$ 10,421,596.00	1.00	$ 10,421,596.00	-	$ -	1.00	$ 10,421,596.00	-	$ -
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				$ 5,722,498.00	1.00	$ 5,722,498.00	1.00	$ 5,722,498.00	-	$ -	1.00	$ 5,722,498.00	-	$ -
	VALOR TOTAL CONTRATO				$ 25,094,607,702.00		$ 25,094,607,702.00		$ 12,200,566,931		$ 931,360,668.70		$ 13,131,927,600		$ 11,962,680,103

Valor Inicial del Contrato	$ 25,094,607,822.56
Valor Actualizado del contrato Acta Modificatoria No 04	$ 25,094,607,702.00
Valor anticipo 20%	$ 5,018,921,564.51
Valor Ejecutado Acumulado	$ 12,200,566,931.28
Valor Ejecutado Abril 2026	$ 931,360,668.70
Valor Ejecutado Acumulado Total	$ 13,131,927,599.98

EJECUTADO	52.3%
PROGRAMADO	60.3%

NOTAS CONTRATISTA:
1. Los precios aquí cobrados se han establecido con base en los listados de precios e insumos emitidos por el Municipio de Villavicencio, mediante la Resolución No. 1010 del 3 de agosto de 2021, en cumplimiento de lo exigido por la entidad contratante. El Consorcio Educación C&G-MH ha solicitado en repetidas oportunidades la incorporación de una fórmula de reajuste del contrato, con sus debidos sustentos jurídicos y contractuales, por lo que deja expresa constancia de que los precios actuales de mercado son superiores a los aquí establecidos. Asimismo, señala que el AIU que se genere por precios no previstos y/o sus correspondientes adiciones no remunera la totalidad de los costos administrativos e indirectos adicionales asumidos. El Consorcio Educación C&G se reserva el derecho de presentar las reclamaciones económicas que correspondan ante las instancias pertinentes, en caso de no ser resuelto el tema por la entidad contratante.
2. Existen Items establecidos en la presente Acta Parcial N° 2 que corresponden a Items previamente aprobados, aceptados y formalizados mediante la Modificatoria No. 3, suscrita el 22 de diciembre de 2023. Su modificación responde exclusivamente a una directriz de la entidad contratante y a la aprobación de la interventoría. El Consorcio Educación C&G-MH manifiesta que no renuncia a los valores previamente pactados, firmados y avalados, y se reserva el derecho de reclamar los ajustes económicos correspondientes a esta modificación no conciliada, la cual desconoce las aprobaciones iniciales, así como las aclaraciones y explicaciones que se presentaron a la entidad al respecto.
