CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDIZ

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA						
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4										

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025			8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027		11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A					14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025			19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027		22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A					25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
01. JARDÍN INFANTIL OJO DE PERDÍZ													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	-	$ 38.594,00	$ -	34,85	$ 1.345.000,90	-	$ -	34,85	$ 1.345.000,90	34,85	$ 1.345.000,90
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.). INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	118,60	$ 12.903,00	$ 1.530.295,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	260,31	$ 22.597,00	$ 5.882.225,07	296,63	$ 6.702.948,11	-	$ -	296,63	$ 6.702.948,11	296,63	$ 6.702.948,11
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACUSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA	M2	735,00	$ 35.924,00	$ 26.404.140,00	870,13	$ 31.258.550,12	-	$ -	870,13	$ 31.258.550,12	870,13	$ 31.258.550,12
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.	M2	101,83	$ 27.857,00	$ 2.836.678,31	88,61	$ 2.468.408,77	-	$ -	88,61	$ 2.468.408,77	88,61	$ 2.468.408,77
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	224,23	$ 27.857,00	$ 6.246.375,11	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	62,00	$ 14.184,00	$ 879.408,00	82,00	$ 1.163.088,00	-	$ -	82,00	$ 1.163.088,00	82,00	$ 1.163.088,00
1.6.27	DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELÉCTRICAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERISTICAS PARTICULARES). INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA, CABELADO Y APARATOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	62,00	$ 21.263,00	$ 1.318.306,00	82,00	$ 1.743.566,00	-	$ -	82,00	$ 1.743.566,00	82,00	$ 1.743.566,00
1.6.29	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	15,00	$ 11.688,00	$ 175.320,00	15,00	$ 175.320,00	-	$ -	15,00	$ 175.320,00	15,00	$ 175.320,00
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	302,16	$ 9.741,00	$ 2.943.340,56	71,91	$ 700.475,31	-	$ -	71,91	$ 700.475,31	71,91	$ 700.475,31
1,8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	$ 6.856,00	$ -	184,30	$ 1.263.560,80	-	$ -	184,30	$ 1.263.560,80	184,30	$ 1.263.560,80
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3,5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	73,52	$ 9.628,00	$ 707.850,56	96,52	$ 929.294,56	-	$ -	96,52	$ 929.294,56	96,52	$ 929.294,56
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9,00	$ 199.311,00	$ 1.793.799,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 216.629,00	$ 433.258,00	2,00	$ 433.258,00	-	$ -	2,00	$ 433.258,00	2,00	$ 433.258,00
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	16,00	$ 49.640,00	$ 794.240,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	-	$ 36.026,00	$ -	1,00	$ 36.026,00	-	$ -	1,00	$ 36.026,00	1,00	$ 36.026,00
5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INLCUYE APARATO	UN	-	$ 37.500,00	$ -	1,00	$ 37.500,00	-	$ -	1,00	$ 37.500,00	1,00	$ 37.500,00
5,2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 233.378,00	$ 1.867.024,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	UN	-	$ 110.165,00	$ -	1,00	$ 110.165,00	-	$ -	1,00	$ 110.165,00	1,00	$ 110.165,00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	82,00	$ 234.104,00	$ 19.196.528,00	86,00	$ 20.132.944,00	-	$ -	86,00	$ 20.132.944,00	86,00	$ 20.132.944,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	17,00	$ 315.585,00	$ 5.364.945,00	17,00	$ 5.364.945,00	-	$ -	17,00	$ 5.364.945,00	17,00	$ 5.364.945,00
5,3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	73,00	$ 60.035,00	$ 4.382.555,00	82,00	$ 4.922.870,00	-	$ -	82,00	$ 4.922.870,00	82,00	$ 4.922.870,00
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA						
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4										

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025			8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027		11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A					14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025			19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027		22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A					25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
01. JARDÍN INFANTIL OJO DE PERDÍZ													
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	M	565,32	$ 56.225,00	$ 31.785.117,00	580,83	$ 32.657.166,75	-	$ -	580,83	$ 32.657.166,75	580,83	$ 32.657.166,75
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA TIPO LED DE 60 W. INCLUYE . SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9,00	$ 76.275,00	$ 686.475,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	17,00	$ 69.605,00	$ 1.183.285,00	17,00	$ 1.183.285,00	-	$ -	17,00	$ 1.183.285,00	17,00	$ 1.183.285,00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25,00	$ 192.065,00	$ 4.801.625,00	29,00	$ 5.569.885,00	-	$ -	29,00	$ 5.569.885,00	29,00	$ 5.569.885,00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	48,00	$ 192.642,00	$ 9.246.816,00	48,00	$ 9.246.816,00	-	$ -	48,00	$ 9.246.816,00	48,00	$ 9.246.816,00
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	-	$ 70.135,00	$ -	9,00	$ 631.215,00	-	$ -	9,00	$ 631.215,00	9,00	$ 631.215,00
5,6	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN	-	$ 1.052.087,00	$ -	1,00	$ 1.052.087,00	-	$ -	1,00	$ 1.052.087,00	1,00	$ 1.052.087,00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	47,00	$ 220.619,00	$ 10.369.093,00	57,00	$ 12.575.283,00	-	$ -	57,00	$ 12.575.283,00	57,00	$ 12.575.283,00
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	6,00	$ 263.215,00	$ 1.579.290,00	3,00	$ 789.645,00	-	$ -	3,00	$ 789.645,00	3,00	$ 789.645,00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	8,00	$ 173.638,00	$ 1.389.104,00	7,00	$ 1.215.466,00	-	$ -	7,00	$ 1.215.466,00	7,00	$ 1.215.466,00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	6,00	$ 272.141,00	$ 1.632.846,00	7,00	$ 1.904.987,00	-	$ -	7,00	$ 1.904.987,00	7,00	$ 1.904.987,00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	6,00	$ 459.176,00	$ 2.755.056,00	7,00	$ 3.214.232,00	-	$ -	7,00	$ 3.214.232,00	7,00	$ 3.214.232,00
6.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL	UN	12,00	$ 175.673,00	$ 2.108.076,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE	UN	1,00	$ 7.472.944,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	1,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1.027,86	$ 8.605,00	$ 8.844.735,30	1.064,42	$ 9.159.334,10	-	$ -	1.064,42	$ 9.159.334,10	1.064,42	$ 9.159.334,10
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	563,41	$ 49.523,00	$ 27.901.753,43	97,64	$ 4.835.425,72	-	$ -	97,64	$ 4.835.425,72	97,64	$ 4.835.425,72
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	233,07	$ 123.466,00	$ 28.776.220,62	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	101,83	$ 127.357,00	$ 12.968.763,31	84,60	$ 10.774.402,20	-	$ -	84,60	$ 10.774.402,20	84,60	$ 10.774.402,20
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	153,08	$ 15.151,00	$ 2.319.315,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	37,05	$ 23.195,00	$ 859.374,75	12,40	$ 287.618,00	-	$ -	12,40	$ 287.618,00	12,40	$ 287.618,00
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	972,35	$ 4.546,00	$ 4.420.303,10	1.567,40	$ 7.125.400,40	-	$ -	1.567,40	$ 7.125.400,40	1.567,40	$ 7.125.400,40
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	15,44	$ 20.508,00	$ 316.643,52	96,52	$ 1.979.432,16	-	$ -	96,52	$ 1.979.432,16	96,52	$ 1.979.432,16
21.1.9	PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	15,44	$ 76.812,00	$ 1.185.977,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21,2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**												
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	66,55	$ 31.439,00	$ 2.092.265,45	71,91	$ 2.260.778,49	-	$ -	71,91	$ 2.260.778,49	71,91	$ 2.260.778,49
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	75,91	$ 71.517,00	$ 5.428.855,47	449,69	$ 32.160.479,73	63,63	$ 4.550.626,71	386,06	$ 27.609.853,02	449,69	$ 32.160.479,73
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 13.689,00	$ -	567,89	$ 7.773.846,21	85,31	$ 1.167.808,59	482,58	$ 6.606.037,62	567,89	$ 7.773.846,21
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	-	$ 12.878,00	$ -	2.196,01	$ 28.280.216,78	16,77	$ 215.964,06	2.179,24	$ 28.064.252,72	2.196,01	$ 28.280.216,78
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	379,35	$ 29.936,00	$ 11.356.221,60	63,63	$ 1.904.827,68	63,63	$ 1.904.827,68	-	$ -	63,63	$ 1.904.827,68
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 16.676,00	$ -	30,04	$ 500.947,04	30,04	$ 500.947,04	-	$ -	30,04	$ 500.947,04
22,3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	890,60	$ 37.231,00	$ 33.157.928,60	104,42	$ 3.887.661,02	-	$ -	104,42	$ 3.887.661,02	104,42	$ 3.887.661,02
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	260,31	$ 125.559,00	$ 32.684.263,29	296,63	$ 37.244.566,17	-	$ -	296,63	$ 37.244.566,17	296,63	$ 37.244.566,17
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	735,00	$ 253.100,00	$ 186.028.500,00	870,13	$ 220.229.903,00	-	$ -	870,13	$ 220.229.903,00	870,13	$ 220.229.903,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA										
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:							RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES		
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4														

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:		N/A			14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:		N/A			25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
01. JARDÍN INFANTIL OJO DE PERDÍZ													
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	-	$ 99.728,00	$ -	5,80	$ 578.422,40	-	$ -	5,80	$ 578.422,40	5,80	$ 578.422,40
23.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	29,95	$ 148.455,00	$ 4.446.227,25	34,53	$ 5.126.151,15	-	$ -	34,53	$ 5.126.151,15	34,53	$ 5.126.151,15
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA	M	265,72	$ 53.788,00	$ 14.292.547,36	489,59	$ 26.334.066,92	-	$ -	489,59	$ 26.334.066,92	489,59	$ 26.334.066,92
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	118,60	$ 82.182,00	$ 9.746.785,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBERIA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M, INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS	M	102,70	$ 45.109,00	$ 4.632.694,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.14	ADECUACIÓN ENTRAMADO METALICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	187,45	$ 60.695,00	$ 11.377.277,75	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 PELDAÑOS, 2M A 4M	UN	1,00	$ 81.256,00	$ 81.256,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 560.683.924,07		$ 556.744.411,49		$ 8.340.174,08		$ 548.404.237,41		$ 556.744.411,49
	35. DESCRIPCIÓN	%											
	ADMINISTRACIÓN	27,49%			$ 154.132.011,00		$ 153.049.038,72		$ 2.292.713,85		$ 150.756.324,87		$ 153.049.038,72
	IMPREVISTO	1,00%			$ 5.606.839,00		$ 5.567.444,11		$ 83.401,74		$ 4.221.204,02		$ 4.304.605,76
	UTILIDAD	4,00%			$ 22.427.357,00		$ 22.269.776,45		$ 333.606,96		$ 21.936.169,49		$ 22.269.776,45
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 182.166.207,00		$ 180.886.259,28		$ 2.709.722,55		$ 176.913.698,38		$ 179.623.420,93
	AJUSTE AL PESO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	ANTICIPO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 742.850.131,07		$ 737.630.670,77		$ 11.049.896,63		$ 725.317.935,79		$ 736.367.832,42

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

DESCRIPCION	37. No. INFORME MENSUAL	38. PERIODO	39. NOMBRE DEL ARCHIVO	40. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 3	
INFORME SOCIAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Social No 5_10676-2025	
INFORME AMBIENTAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Ambiental No 5_10676-2025	
INFORME SST	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2	
INFORME DE SUPERVISION	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Supervision No 5_10676-2025	
ACTA PARCIAL	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4 Corte General obra_Acta 4_10676-2025	
SOPORTE PAGO SDH	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FE 5 - PAGO HACIENDA RESERVA_ACTA 3 FE 6 - PAGO HACIENDA VIGENCIA_ACTA 3 FE 7 - PAGO HACIENDA ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FACTURA	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FACTURA_FE 5_DISTRITO RESERVA_ACTA 3 FACTURA_FE 6_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 3 FACTURA_FE 7_ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FORMATO MC 14	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	MC-14_DISTRITO_ACTA 3 MC-14_ADULTO MAYOR_ACTA 3	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 12 días del mes de Junio del año 2026

Nombre:	WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C.	79.958.441
Rep Legal.	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit.	902002639-7

Nombre:	HASBA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No.	52.489.943
Rep legal	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit.	902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDIZ

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**001**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.1.4**	**ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

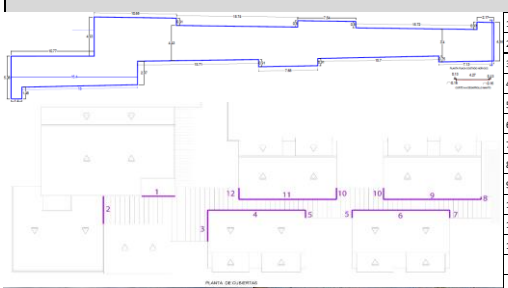ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 3									
	**1. MURO**		1.70	2.65			1.00	4.51	M2	**CORTE 3**
	2. MURO CERCHA		1.00	7.10			1.00	7.10	M2	**CORTE 3**
	3. VIGUETA CARA INFERIOR		0.15	2.04			12.00	3.67	M2	**CORTE 3**
	3. VIGUETA CARA LATERAL			2.04	0.50		24.00	24.48	M2	**CORTE 4**
	4. VIGA CARA INFERIOR		0.40	10.25			6.00	24.60	M2	**CORTE 3**
	4. VIGA CARA LATERAL			10.25	0.50		12.00	61.50	M2	**CORTE 3**
	5. VIGUETA CARA INFERIOR		0.15	5.00			18.00	13.50	M2	**CORTE 3**
	5. VIGUETA CARA LATERAL			5.00	0.50		36.00	90.00	M2	**CORTE 3**
	6. DINTEL		1.00	5.00			9.00	45.00	M2	**CORTE 3**
	7. DINTEL		1.00	4.46			6.00	26.76	M2	**CORTE 3**
	8. VIGUETA DINTEL			4.46	0.50		6.00	13.38	M2	**CORTE 3**
	9. COLUMNA			1.61	2.65		6.00	25.60	M2	**CORTE 3**
	9. COLUMNA		0.33		2.65		6.00	5.25	M2	**CORTE 3**
	10. VIGA CUADRADO INFERIOR		0.15	1.06			6.00	0.95	M2	**CORTE 3**
	10. VIGA CUADRADO LATERAL			1.06	0.50		12.00	6.36	M2	CORTE 3
	11. MURO			4.46	2.65		6.00	70.91	M2	**CORTE 3**
	12. MURO			1.06	2.65		6.00	16.85	M2	**CORTE 3**
								-		
	**MENOS CANTIDAD COBRADA EN RESANE ITEM 21.1.2**	88.08					- 1.00	- 88.08	M2	**CORTE 3**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 4									
	1. MURO			2.76	2.65		1.00	7.31	M2	**CORTE 4**
	2. MURO			2.69	2.65		1.00	7.13	M2	**CORTE 4**
	3. MURO			2.66	2.65		1.00	7.05	M2	**CORTE 4**
	4. MURO			2.60	2.65		1.00	6.89	M2	**CORTE 4**
	5. MURO			2.66	2.65		1.00	7.05	M2	**CORTE 4**
	6. MURO			2.54	2.65		1.00	6.73	M2	**CORTE 4**
										
	MENOS CANTIDAD RESANE ITEM 21.1.2	- 8.44					1.00	- 8.44	M2	**CORTE 4**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 5									
	1. ANTEPECHO / PARAPETO		4.00		0.60		1.00	2.40	M2	**CORTE 5**
	2. ANTEPECHO / PARAPETO		3.40		1.10		1.00	3.74	M2	**CORTE 5**
	3. ANTEPECHO / PARAPETO		2.97		0.80		1.00	2.38	M2	**CORTE 5**
	4. ANTEPECHO / PARAPETO		15.71		0.80		1.00	12.57	M2	**CORTE 5**
	5. ANTEPECHO / PARAPETO		0.91		0.80		2.00	1.46	M2	**CORTE 5**
	6. ANTEPECHO / PARAPETO		15.70		0.80		1.00	12.56	M2	**CORTE 5**
	7. ANTEPECHO / PARAPETO		0.75		0.80		1.00	0.60	M2	**CORTE 5**
	8. ANTEPECHO / PARAPETO		0.93		0.80		1.00	0.74	M2	**CORTE 5**
	9. ANTEPECHO / PARAPETO		15.72		0.80		1.00	12.58	M2	**CORTE 5**
	10. ANTEPECHO / PARAPETO		0.80		0.80		2.00	1.28	M2	**CORTE 5**
	11. ANTEPECHO / PARAPETO		15.74		0.80		1.00	12.59	M2	**CORTE 5**
	12. ANTEPECHO / PARAPETO		0.91		0.80		1.00	0.73	M2	**CORTE 5**
										





TOTAL EJECUTADO	449.69	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	386.06	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**63.63**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
63.63	386.06	**449.69**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDIZ

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**001**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 4									
	1. MURO			2.76	2.65		1.00	7.31	M2	**CORTE 4**
	2. MURO			2.69	2.65		1.00	7.13	M2	**CORTE 4**
	3. MURO			2.66	2.65		1.00	7.05	M2	**CORTE 4**
	4. MURO			2.60	2.65		1.00	6.89	M2	**CORTE 4**
	5. MURO			2.66	2.65		1.00	7.05	M2	**CORTE 4**
	6. MURO			2.54	2.65		1.00	6.73	M2	**CORTE 4**
	CANTIDADES DE MEMORIA 22.1.12									
	1. MURO		1.70	2.65			1.00	4.51	M2	**CORTE 3**
	2. MURO CERCHA		1.00	7.10			1.00	7.10	M2	**CORTE 3**
	3. VIGUETA CARA INFERIOR		0.15	2.04			12.00	3.67	M2	**CORTE 3**
	3. VIGUETA CARA LATERAL			2.04	0.50		24.00	24.48	M2	**CORTE 4**
	4. VIGA CARA INFERIOR		0.40	10.25			6.00	24.60	M2	**CORTE 3**
	4. VIGA CARA LATERAL			10.25	0.50		12.00	61.50	M2	**CORTE 3**
	5. VIGUETA CARA INFERIOR		0.15	5.00			18.00	13.50	M2	**CORTE 3**
	5. VIGUETA CARA LATERAL			5.00	0.50		36.00	90.00	M2	**CORTE 3**
	6. DINTEL		1.00	5.00			9.00	45.00	M2	**CORTE 3**
	7. DINTEL		1.00	4.46			6.00	26.76	M2	**CORTE 3**
	8. VIGUETA DINTEL			4.46	0.50		6.00	13.38	M2	**CORTE 3**
	9. COLUMNA			1.61	2.65		6.00	25.60	M2	**CORTE 3**
	9. COLUMNA		0.33		2.65		6.00	5.25	M2	**CORTE 3**
	10. VIGA CUADRADO INFERIOR		0.15	1.06			6.00	0.95	M2	**CORTE 3**
	10. VIGA CUADRADO LATERAL			1.06	0.50		12.00	6.36	M2	CORTE 3
	11. MURO			4.46	2.65		6.00	70.91	M2	**CORTE 3**
	12. MURO			1.06	2.65		6.00	16.85	M2	**CORTE 3**
								-		
								-		
								-	



							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	567.89	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	482.58	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**85.31**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
85.31	482.58	**567.89**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDIZ

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**001**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**



CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**22.1.11**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 3									
        	**PINTURA EN COLUMNAS DE COMEDOR**									
	1. LISTONES DE MADERA			3.88			23.00	89.24	M	**CORTE 3**
	2. LISTONES DE MADERA			1.56			24.00	37.44	M	**CORTE 3**
	3. LISTONES DE MADERA			3.74			24.00	89.76	M	**CORTE 3**
	4. LISTONES DE MADERA			3.74			24.00	89.76	M	**CORTE 3**
	5. LISTONES DE MADERA			4.03			24.00	96.72	M	**CORTE 3**
	6. LISTONES DE MADERA			2.48			24.00	59.52	M	**CORTE 3**
	7. LISTONES DE MADERA			2.90			24.00	69.60	M	**CORTE 3**
								-		
	PINTURA EN CORREAS									
	1. CORREAS EN COMEDOR			22.00			18.00	396.00	M	**CORTE 3**
	4. CORREAS EN COMEDOR			16.80			4.00	67.20	M	**CORTE 3**
	5. CORREAS EN SALONES			1.78			9.00	16.02	M	**CORTE 3**
	6. CORREAS EN SALONES			15.36			27.00	414.72	M	**CORTE 3**
	7. CORREAS EN SALONES			6.10			24.00	146.40	M	**CORTE 3**
								-		
								-		
								-	

	12. BARANDA			21.00			1.00	21.00	M	**CORTE 4**
	13. BARANDA			3.16			1.00	3.16	M	**CORTE 4**
	14. BARANDA			21.00			1.00	21.00	M	**CORTE 4**
	15. BARANDA			19.60			1.00	19.60	M	**CORTE 4**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
ACTA PARCIAL 5										
	1. BARANDA (Soporte adicional inferior)			2.00			1.00	2.00	M	**CORTE 5**
	2. BARANDA (Soporte adicional inferior)			2.02			1.00	2.02	M	**CORTE 5**
	3. BARANDA (Soporte adicional inferior)			2.00			1.00	2.00	M	**CORTE 5**
	4. BARANDA (Soporte adicional inferior)			0.75			1.00	0.75	M	**CORTE 5**
	5. BARANDA (Soporte adicional inferior)			2.00			1.00	2.00	M	**CORTE 5**
	6. BARANDA (Soporte adicional inferior)			2.00			1.00	2.00	M	**CORTE 5**
	7. BARANDA (Soporte adicional inferior)			0.65			1.00	0.65	M	**CORTE 5**
	8. BARANDA (Soporte adicional inferior)			2.00			1.00	2.00	M	**CORTE 5**
	9. BARANDA (Soporte adicional inferior)			2.00			1.00	2.00	M	**CORTE 5**
	10. BARANDA (Soporte adicional inferior)			0.65			1.00	0.65	M	**CORTE 5**
	11. BARANDA (SOPORTES VERTICALES)			0.10			7.00	0.70	M	**CORTE 5**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
							TOTAL EJECUTADO	2,196.01	M	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	2,179.24	M	
							MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M	
							PRESENTE ACTA	**16.77**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
16.77	2179.24	**2196.01**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDIZ

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**001**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.1.12**	**PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 3									
	1. MURO		1.70	2.65			1.00	4.51	M2	**CORTE 3**
	2. MURO CERCHA		1.00	7.10			1.00	7.10	M2	**CORTE 3**
	3. VIGUETA CARA INFERIOR		0.15	2.04			12.00	3.67	M2	**CORTE 3**
	3. VIGUETA CARA LATERAL			2.04	0.50		24.00	24.48	M2	**CORTE 3**
	4. VIGA CARA INFERIOR		0.40	10.25			6.00	24.60	M2	**CORTE 3**
	4. VIGA CARA LATERAL			10.25	0.50		12.00	61.50	M2	**CORTE 3**
	5. VIGUETA CARA INFERIOR		0.15	5.00			18.00	13.50	M2	**CORTE 3**
	5. VIGUETA CARA LATERAL			5.00	0.50		36.00	90.00	M2	**CORTE 3**
	6. DINTEL		1.00	5.00			9.00	45.00	M2	**CORTE 3**
	7. DINTEL		1.00	4.46			6.00	26.76	M2	**CORTE 3**
	8. VIGUETA DINTEL			4.46	0.50		6.00	13.38	M2	**CORTE 3**
	9. COLUMNA			1.61	2.65		6.00	25.60	M2	**CORTE 3**
	9. COLUMNA		0.33		2.65		6.00	5.25	M2	**CORTE 3**
	10. VIGA CUADRADO INFERIOR		0.15	1.06			6.00	0.95	M2	**CORTE 3**
	10. VIGA CUADRADO LATERAL			1.06	0.50		12.00	6.36	M2	**CORTE 3**
	11. MURO			4.46	2.65		6.00	70.91	M2	**CORTE 3**
	12. MURO			1.06	2.65		6.00	16.85	M2	**CORTE 3**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 4									
								-		
	MENOS CANTIDAD ACTA 3							- 440.42		

ACTA PARCIAL 5











1. ANTEPECHO / PARAPETO		4.00		0.60		1.00	2.40	M2	**CORTE 5**
2. ANTEPECHO / PARAPETO		3.40		1.10		1.00	3.74	M2	**CORTE 5**
3. ANTEPECHO / PARAPETO		2.97		0.80		1.00	2.38	M2	**CORTE 5**
4. ANTEPECHO / PARAPETO		15.71		0.80		1.00	12.57	M2	**CORTE 5**
5. ANTEPECHO / PARAPETO		0.91		0.80		2.00	1.46	M2	**CORTE 5**
6. ANTEPECHO / PARAPETO		15.70		0.80		1.00	12.56	M2	**CORTE 5**
7. ANTEPECHO / PARAPETO		0.75		0.80		1.00	0.60	M2	**CORTE 5**
8. ANTEPECHO / PARAPETO		0.93		0.80		1.00	0.74	M2	**CORTE 5**
9. ANTEPECHO / PARAPETO		15.72		0.80		1.00	12.58	M2	**CORTE 5**
10. ANTEPECHO / PARAPETO		0.80		0.80		2.00	1.28	M2	**CORTE 5**
11. ANTEPECHO / PARAPETO		15.74		0.80		1.00	12.59	M2	**CORTE 5**
12. ANTEPECHO / PARAPETO		0.91		0.80		1.00	0.73	M2	**CORTE 5**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	63.63	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**63.63**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
63.63	0.00	**63.63**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDIZ	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**001**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**


CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.1.16**	**PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL 5									
	1. MURO		10.35		2.65		1.00	27.43	M2	**CORTE 5**
	MENOS VANO - COCINA		-2.80		1.90		1.00	-5.32	M2	**CORTE 5**
	2. MURO		0.60		2.65		2.00	3.18	M2	**CORTE 5**
	3. MURO		1.90		2.50		1.00	4.75	M2	**CORTE 5**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	30.04	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**30.04**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
30.04	0.00	**30.04**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

JARDÍN SOCIAL SANTA MARTA

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:	RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025	7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3 12 2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3 12 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025						
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA						

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *Según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
02. JARDIN SOCIAL SANTA MARTA													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	-	$ 38.594,00	$ -	77,87	$ 3.005.314,78	-	$ -	77,87	$ 3.005.314,78	77,87	$ 3.005.314,78
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	668,27	$ 22.597,00	$ 15.100.897,19	682,08	$ 15.412.961,76	-	$ -	682,08	$ 15.412.930,12	682,08	$ 15.412.930,12
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	104,16	$ 9.741,00	$ 1.014.622,56	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	$ 6.856,00	$ -	299,34	$ 2.052.275,04	-	$ -	299,34	$ 2.052.275,04	299,34	$ 2.052.275,04
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.5	DEMOLICION DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE FACHADA, (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PEGA Y PAÑETE E MÁX. 5CM - ALTURA ENTRE 2 M Y 8 M - CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	114,17	$ 37.869,00	$ 4.323.503,73	101,04	$ 3.826.283,76	-	$ -	101,04	$ 3.826.283,76	101,04	$ 3.826.283,76
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	-	$ 4.908,00	$ -	301,83	$ 1.481.381,64	-	$ -	301,83	$ 1.481.381,64	301,83	$ 1.481.381,64
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3.5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	$ 20.692,00	$ -	101,04	$ 2.090.719,68	101,04	$ 2.090.719,68	-	$ -	101,04	$ 2.090.719,68
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2,00	$ 36.026,00	$ 72.052,00	3,00	$ 108.078,00	-	$ -	3,00	$ 108.078,00	3,00	$ 108.078,00
5,2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 233.378,00	$ -	1,00	$ 233.378,00	-	$ -	1,00	$ 233.378,00	1,00	$ 233.378,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25,00	$ 315.585,00	$ 7.889.625,00	50,00	$ 15.779.250,00	-	$ -	50,00	$ 15.779.250,00	50,00	$ 15.779.250,00
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	70,00	$ 16.054,00	$ 1.123.780,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF	M	-	$ 41.762,00	$ -	7,00	$ 292.334,00	-	$ -	7,00	$ 292.334,00	7,00	$ 292.334,00
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	379,19	$ 56.225,00	$ 21.319.957,75	310,25	$ 17.443.806,25	-	$ -	310,25	$ 17.443.806,25	310,25	$ 17.443.806,25
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2.4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25,00	$ 69.605,00	$ 1.740.125,00	50,00	$ 3.480.250,00	-	$ -	50,00	$ 3.480.250,00	50,00	$ 3.480.250,00
5,6	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN	-	$ 1.052.087,00	$ -	1,00	$ 1.052.087,00	-	$ -	1,00	$ 1.052.087,00	1,00	$ 1.052.087,00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	17,00	$ 220.619,00	$ 3.750.523,00	23,00	$ 5.074.237,00	-	$ -	23,00	$ 5.074.237,00	23,00	$ 5.074.237,00
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	2,00	$ 263.215,00	$ 526.430,00	2,00	$ 526.430,00	-	$ -	2,00	$ 526.430,00	2,00	$ 526.430,00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	9,00	$ 173.638,00	$ 1.562.742,00	8,00	$ 1.389.104,00	-	$ -	8,00	$ 1.389.104,00	8,00	$ 1.389.104,00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	4,00	$ 272.141,00	$ 1.088.564,00	5,00	$ 1.360.705,00	-	$ -	5,00	$ 1.360.705,00	5,00	$ 1.360.705,00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	4,00	$ 459.176,00	$ 1.836.704,00	5,00	$ 2.295.880,00	-	$ -	5,00	$ 2.295.880,00	5,00	$ 2.295.880,00
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE	UN	1,00	$ 7.472.944,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	1,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	562,16	$ 8.605,00	$ 4.837.386,80	638,55	$ 5.494.722,75	-	$ -	638,55	$ 5.494.722,75	638,55	$ 5.494.722,75
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	686,13	$ 49.523,00	$ 33.979.215,99	21,23	$ 1.051.373,29	-	$ -	21,23	$ 1.051.373,29	21,23	$ 1.051.373,29
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1.855,23	$ 15.151,00	$ 28.108.589,73	3,80	$ 57.573,80	-	$ -	3,80	$ 57.573,80	3,80	$ 57.573,80

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025		7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO: 24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO: 24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025							
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA							

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *Segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
02. JARDIN SOCIAL SANTA MARTA													
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	686,13	$ 4.546,00	$ 3.119.146,98	757,44	$ 3.443.322,24	-	$ -	757,44	$ 3.443.322,24	757,44	$ 3.443.322,24
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**												
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	20,83	$ 31.439,00	$ 654.874,37	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	668,27	$ 125.559,00	$ 83.907.312,93	682,10	$ 85.643.793,90	-	$ -	682,10	$ 85.643.793,90	682,10	$ 85.643.793,90
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	-	$ 53.788,00	$ -	299,34	$ 16.100.899,92	-	$ -	299,34	$ 16.100.899,92	299,34	$ 16.100.899,92
23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	165,82	$ 25.409,00	$ 4.213.320,38	195,96	$ 4.979.147,64	-	$ -	195,96	$ 4.979.147,64	195,96	$ 4.979.147,64
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 227.642.317,41		$ 201.148.253,45		$ 2.090.719,68		$ 199.057.502,13		$ 201.148.221,81
	35. DESCRIPCIÓN	%											
	ADMINISTRACIÓN	27,49%			$ 62.578.873,00		$ 55.295.654,87		$ 574.738,84		$ 54.720.907,34		$ 55.295.646,18
	IMPREVISTO	1,00%			$ 2.276.423,00		$ 2.011.482,53		$ 20.907,20		$ 1.870.486,51		$ 1.891.393,71
	UTILIDAD	4,00%			$ 9.105.693,00		$ 8.045.930,14		$ 83.628,79		$ 7.962.300,08		$ 8.045.928,87
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 73.960.989,00		$ 65.353.067,54		$ 679.274,83		$ 64.553.693,93		$ 65.232.968,76
	AJUSTE AL PESO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	ANTICIPO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 301.603.306,41		$ 266.501.320,99		$ 2.769.994,51		$ 263.611.196,06		$ 266.381.190,57

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

DESCRIPCION	37. No. INFORME MENSUAL	38. PERIODO	39. NOMBRE DEL ARCHIVO	40. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 3	
INFORME SOCIAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Social No 5_10676-2025	
INFORME AMBIENTAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Ambiental No 5_10676-2025	
INFORME SST	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2	
INFORME DE SUPERVISION	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Supervision No 5_10676-2025	
ACTA PARCIAL	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4 Corte General obra_Acta 4_10676-2025	
SOPORTE PAGO SDH	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FE 5 - PAGO HACIENDA RESERVA_ACTA 3 FE 6 - PAGO HACIENDA VIGENCIA_ACTA 3 FE 7 - PAGO HACIENDA ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FACTURA	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FACTURA_FE 5_DISTRITO RESERVA_ACTA 3 FACTURA_FE 6_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 3 FACTURA_FE 7_ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FORMATO MC 14	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	MC-14_DISTRITO_ACTA 3 MC-14_ADULTO MAYOR_ACTA 3	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 12 días del mes de Junio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7


Nombre: HAIDRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.483.944
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Fisicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL SANTA MARTA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**002**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/6/2026**


CAPITULO	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**3.5.2**	**LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

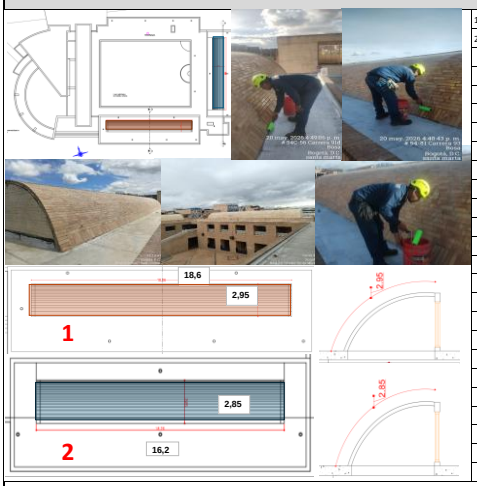ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 4									
	1. LAVADO CON HIDRÓFUGO DOMO 1		2.95	18.60			1.00	54.87	M2	**CORTE 5**
	2. LAVADO CON HIDRÓFUGO DOMO 2		2.85	16.20			1.00	46.17	M2	**CORTE 5**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

	TOTAL EJECUTADO	101.04	M2
	MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
	MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
	PRESENTE ACTA	**101.04**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
101.04	0.00	**101.04**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSÓN GUSTAVO RENÉ CHICAIZA/MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

JARDÍN SOCIAL EL PORVENIR

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA							
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES		
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4											

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:		N/A			14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:		N/A			25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
03. JARDIN SOCIAL PORVENIR													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	-	$ 38.594,00	$ -	89,28	$ 3.445.672,32	-	$ -	89,28	$ 3.445.672,32	89,28	$ 3.445.672,32
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1500 PSI	M	-	$ 99.354,00	$ -	17,15	$ 1.703.921,10	-	$ -	17,15	$ 1.703.921,10	17,15	$ 1.703.921,10
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA	M2	250,80	$ 35.924,00	$ 9.009.739,20	458,46	$ 16.469.717,04	-	$ -	458,46	$ 16.469.717,04	458,46	$ 16.469.717,04
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.23	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER EN MESÓN, Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	6,00	$ 14.887,00	$ 89.322,00	6,00	$ 89.322,00	-	$ -	6,00	$ 89.322,00	6,00	$ 89.322,00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	32,00	$ 14.184,00	$ 453.888,00	32,00	$ 453.888,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	35,44	$ 9.741,00	$ 345.221,04	139,48	$ 1.358.674,68	139,48	$ 1.358.674,68	-	$ -	139,48	$ 1.358.674,68
1,8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	$ 6.856,00	$ -	589,64	$ 4.042.571,84	252,09	$ 1.728.329,04	337,55	$ 2.314.242,80	589,64	$ 4.042.571,84
1,10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**												
1.10.10	DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	10,86	$ 22.604,00	$ 245.479,44	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.4	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES.	M2	221,42	$ 6.420,00	$ 1.421.516,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.11.9	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO)	UN	-	$ 52.695,00	$ -	5,00	$ 263.475,00	-	$ -	5,00	$ 263.475,00	5,00	$ 263.475,00
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2.00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	3,26	$ 64.238,00	$ 209.415,88	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	3,26	$ 97.563,00	$ 318.055,38	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+	UN	1,00	$ 199.311,00	$ 199.311,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2,00	$ 36.026,00	$ 72.052,00	2,00	$ 72.052,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,2	**SALIDAS**												
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	28,00	$ 315.585,00	$ 8.836.380,00	28,00	$ 8.836.380,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	170,00	$ 16.054,00	$ 2.729.180,00	170,00	$ 2.729.180,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	483,33	$ 60.587,00	$ 29.283.514,71	483,33	$ 29.283.514,71	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W , MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	28,00	$ 69.605,00	$ 1.948.940,00	28,00	$ 1.948.940,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	37,00	$ 41.548,00	$ 1.537.276,00	37,00	$ 1.537.276,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	24,00	$ 220.619,00	$ 5.294.856,00	24,00	$ 5.294.856,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 263.215,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	10,00	$ 173.638,00	$ 1.736.380,00	10,00	$ 1.736.380,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	5,00	$ 272.141,00	$ 1.360.705,00	5,00	$ 1.360.705,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	5,00	$ 459.176,00	$ 2.295.880,00	5,00	$ 2.295.880,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE	UN	1,00	$ 7.472.944,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO	UN	25,00	$ 163.009,00	$ 4.075.225,00	25,00	$ 4.075.225,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	660,60	$ 8.605,00	$ 5.684.463,00	660,60	$ 5.684.463,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA										
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES					
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4														

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025		7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoría Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
03. JARDIN SOCIAL PORVENIR													
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.15	PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	603,24	$ 68.841,00	$ 41.527.644,84	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,4	**OTROS**												
7.4.6	ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E=6CM 26X6X6, INSTALADO Y PEGADO CON MORTERO 1:3, SEGÚN FIGURAS EXISTENTES, CONSERVANDO EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO ORIGINAL	M2	10,86	$ 243.075,00	$ 2.639.794,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.18	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	-	$ 123.768,00	$ -	766,03	$ 94.810.001,04	-	$ -	766,03	$ 94.810.001,04	766,03	$ 94.810.001,04
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
11.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	6,00	$ 405.393,00	$ 2.432.358,00	6,00	$ 2.432.358,00	-	$ -	6,00	$ 2.432.358,00	6,00	$ 2.432.358,00
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15,2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION SANDBLASTING COLOR OPAL SOLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	221,42	$ 79.225,00	$ 17.541.999,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	603,24	$ 4.546,00	$ 2.742.329,04	976,55	$ 4.439.396,30	210,52	$ 957.023,92	766,03	$ 3.482.372,38	976,55	$ 4.439.396,30
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PANETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	-	$ 71.517,00	$ -	50,08	$ 3.581.571,36	-	$ -	50,08	$ 3.581.571,36	50,08	$ 3.581.571,36
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 13.689,00	$ -	926,29	$ 12.679.983,81	697,06	$ 9.542.054,34	229,23	$ 3.137.929,47	926,29	$ 12.679.983,81
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	9.825,28	$ 12.878,00	$ 126.529.955,84	10.427,74	$ 134.288.435,72	-	$ -	10.427,74	$ 134.288.435,72	10.427,74	$ 134.288.435,72
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	M2	-	$ 16.676,00	$ -	181,53	$ 3.027.194,28	131,45	$ 2.192.060,20	50,08	$ 835.134,08	181,53	$ 3.027.194,28
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	-	$ 125.559,00	$ -	42,60	$ 5.348.813,40	-	$ -	42,60	$ 5.348.813,40	42,60	$ 5.348.813,40
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y	M2	250,80	$ 253.100,00	$ 63.477.480,00	219,06	$ 55.444.086,00	-	$ -	219,06	$ 55.444.086,00	219,06	$ 55.444.086,00
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSION: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	13,20	$ 99.728,00	$ 1.316.409,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGUN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	155,02	$ 53.788,00	$ 8.338.215,76	303,14	$ 16.305.294,32	-	$ -	303,14	$ 16.305.294,32	303,14	$ 16.305.294,32
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	603,24	$ 41.955,00	$ 25.308.934,20	589,64	$ 24.738.346,20	252,09	$ 10.576.435,95	337,55	$ 14.161.910,25	589,64	$ 24.738.346,20

34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 376.738.080,33		$ 457.513.733,12		$ 26.354.578,13		$ 358.114.256,28		$ 384.468.834,41	
35. DESCRIPCIÓN	%										
ADMINISTRACIÓN	27,49%	$ 103.565.298,00		$ 125.770.525,23		$ 7.244.873,53		$ 98.445.609,05		$ 105.690.482,58	
IMPREVISTO	1,00%	$ 3.767.381,00		$ 4.575.137,33		$ 263.545,78		$ 3.274.388,60		$ 3.537.934,38	
UTILIDAD	4,00%	$ 15.069.523,00		$ 18.300.549,32		$ 1.054.183,13		$ 14.324.570,25		$ 15.378.753,38	
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 122.402.202,00		$ 148.646.211,88		$ 8.562.602,44		$ 116.044.567,90		$ 124.607.170,34	
AJUSTE AL PESO		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
ANTICIPO		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 499.140.282,33		$ 606.159.945,00		$ 34.917.180,57		$ 474.158.824,18		$ 509.076.004,75	

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPE! literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA						
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4										

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	**CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES**										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
03. JARDIN SOCIAL PORVENIR													

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

DESCRIPCION	37. No. INFORME MENSUAL	38. PERIODO	39. NOMBRE DEL ARCHIVO	40. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 3	
INFORME SOCIAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Social No 5_10676-2025	
INFORME AMBIENTAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Ambiental No 5_10676-2025	
INFORME SST	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2	
INFORME DE SUPERVISION	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Supervision No 5_10676-2025	
ACTA PARCIAL	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4 Corte General obra_Acta 4_10676-2025	
SOPORTE PAGO SDH	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FE 5 - PAGO HACIENDA RESERVA_ACTA 3 FE 6 - PAGO HACIENDA VIGENCIA_ACTA 3 FE 7 - PAGO HACIENDA ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FACTURA	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FACTURA_FE 5_DISTRITO RESERVA_ACTA 3 FACTURA_FE 6_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 3 FACTURA_FE 7_ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FORMATO MC 14	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	MC-14_DISTRITO_ACTA 3 MC-14_ADULTO MAYOR_ACTA 3	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 12 días del mes de Junio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7



Nombre: NADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.486.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**003**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.7.1**	**RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.**	**UNIDAD**	**M2**

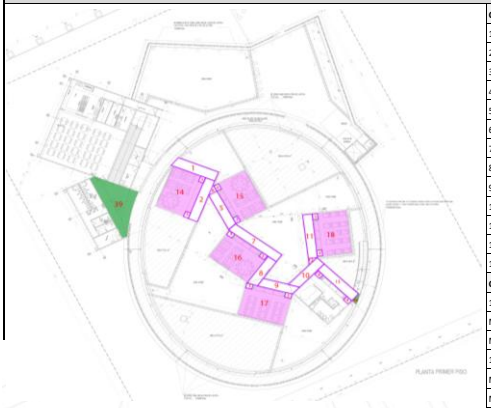

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 5									
	**CIELO RASO PASILLO - PRIMER PISO**									
	1. CIELO RASO	0.20	1.50	7.07			1.00	2.12	M2	**CORTE 5**
	2. CIELO RASO	0.20	1.46	7.32			1.00	2.14	M2	**CORTE 5**
	3. CIELO RASO	0.20	0.63	1.00			10.00	1.26	M2	**CORTE 5**
	4. CIELO RASO	0.20	0.63	1.04			2.00	0.26	M2	**CORTE 5**
	5. CIELO RASO	0.20	1.50	7.24			1.00	2.17	M2	**CORTE 5**
	6. CIELO RASO	0.20	1.00	0.75			1.00	0.15	M2	**CORTE 5**
	7. CIELO RASO	0.20	1.52	8.77			1.00	2.67	M2	**CORTE 5**
	8. CIELO RASO	0.20	1.50	3.45			1.00	1.04	M2	**CORTE 5**
	9. CIELO RASO	0.20	1.57	7.00			1.00	2.20	M2	**CORTE 5**
	10. CIELO RASO	0.20	1.50	6.41			1.00	1.92	M2	**CORTE 5**
	11. CIELO RASO	0.20	1.57	8.43			1.00	2.65	M2	**CORTE 5**
	12. CIELO RASO	0.20	1.20	0.79			1.00	0.19	M2	**CORTE 5**
	13. CIELO RASO	0.20	1.55	7.38			1.00	2.29	M2	**CORTE 5**
	CIELO RASO SALONES - PRIMER PISO									
	14. CIELO RASO	0.20	4.50	7.13			1.00	6.42	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN	0.20	0.76	4.02			1.00	0.61	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS	0.20	-0.02				2.00	-0.01	M2	**CORTE 5**
	15. CIELO RASO	0.20	4.48	7.13			1.00	6.39	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN	0.20	0.71	4.06			1.00	0.58	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS	0.20	-0.02				2.00	-0.01	M2	**CORTE 5**
	16. CIELO RASO	0.20	4.48	7.10			1.00	6.36	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN	0.20	0.78	4.01			1.00	0.63	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS	0.20	-0.02				2.00	-0.01	M2	**CORTE 5**
	17. CIELO RASO	0.20	4.57	7.15			1.00	6.54	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN	0.20	0.75	4.04			1.00	0.61	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS	0.20	-0.02				2.00	-0.01	M2	**CORTE 5**
	18. CIELO RASO	0.20	4.50	7.15			1.00	6.44	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS	0.20	-0.02				2.00	-0.01	M2	**CORTE 5**
	**CIELO RASO RAMPA - SEGUNDO PISO**									
	19. CIELO RASO	0.20	4.94	14.10			1.00	13.93	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNA	0.20	-0.02				1.00	-	M2	**CORTE 5**
	20. CIELO RASO	0.20	0.82	2.31			1.00	0.38	M2	**CORTE 5**
	CIELO RASO SALONES - SEGUNDO PISO									
	21. CIELO RASO	0.20	4.50	7.13			1.00	6.42	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN	0.20	0.76	4.02			1.00	0.61	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS	0.20	-0.02				2.00	-0.01	M2	**CORTE 5**
	22. CIELO RASO	0.20	4.48	7.13			1.00	6.39	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN	0.20	0.71	4.06			1.00	0.58	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS	0.20	-0.02				2.00	-0.01	M2	**CORTE 5**
	23. CIELO RASO	0.20	4.48	7.10			1.00	6.36	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN	0.20	0.78	4.01			1.00	0.63	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS	0.20	-0.02				2.00	-0.01	M2	**CORTE 5**
	24. CIELO RASO	0.20	4.57	7.15			1.00	6.54	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN	0.20	0.75	4.04			1.00	0.61	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS	0.20	-0.02				2.00	-0.01	M2	**CORTE 5**
	25. CIELO RASO	0.20	4.50	7.15			1.00	6.44	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS	0.20	-0.02				2.00	-0.01	M2	**CORTE 5**
	CIELO RASO PASILLO - SEGUNDO PISO									
	26. CIELO RASO	0.20	1.50	7.07			1.00	2.12	M2	**CORTE 5**
	27. CIELO RASO	0.20	1.46	7.32			1.00	2.14	M2	**CORTE 5**
	28. CIELO RASO	0.20	0.63	1.00			10.00	1.26	M2	**CORTE 5**
	29. CIELO RASO	0.20	0.63	1.04			2.00	0.26	M2	**CORTE 5**
	30. CIELO RASO	0.20	1.50	7.24			1.00	2.17	M2	**CORTE 5**
	31. CIELO RASO	0.20	1.00	0.75			1.00	0.15	M2	**CORTE 5**
	32. CIELO RASO	0.20	1.52	8.77			1.00	2.67	M2	**CORTE 5**
	33. CIELO RASO	0.20	1.50	3.45			1.00	1.04	M2	**CORTE 5**
	34. CIELO RASO	0.20	1.57	7.00			1.00	2.20	M2	**CORTE 5**
	35. CIELO RASO	0.20	1.50	6.41			1.00	1.92	M2	**CORTE 5**
	36. CIELO RASO	0.20	1.57	8.43			1.00	2.65	M2	**CORTE 5**
	37. CIELO RASO	0.20	1.20	0.79			1.00	0.19	M2	**CORTE 5**
	38. CIELO RASO	0.20	1.55	7.38			1.00	2.29	M2	**CORTE 5**

	CIELO RASO BAHIAS - PRIMER Y SEGUNDO PISO									
	39. CIELO RASO - ÁREA	0.20	34.22				2.00	13.69	M2	**CORTE 5**
	40. CIELO RASO - ÁREA	0.20	0.74				2.00	0.30	M2	**CORTE 5**
								-		

TOTAL EJECUTADO	139.48	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**139.48**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
139.48	0.00	**139.48**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**003**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.8.1**	**CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M**

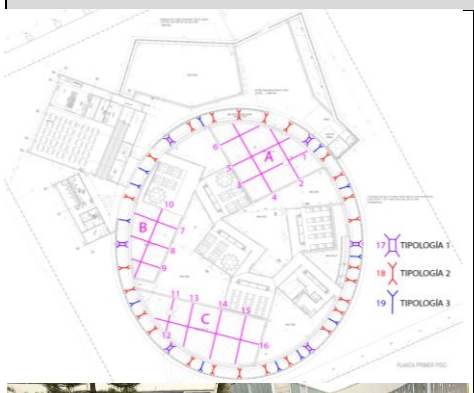ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 3									
   	1. CORTE CON PULIDORA			15.50			1.00	15.50	M	**CORTE 3**
	2. CORTE CON PULIDORA			13.20			1.00	13.20	M	**CORTE 3**
	3. CORTE CON PULIDORA			13.50			1.00	13.50	M	**CORTE 3**
	4. CORTE CON PULIDORA			11.30			1.00	11.30	M	**CORTE 3**
	5. CORTE CON PULIDORA			21.80			1.00	21.80	M	**CORTE 3**
	6. CORTE CON PULIDORA			4.30			1.00	4.30	M	**CORTE 3**
	7. CORTE CON PULIDORA			2.10			1.00	2.10	M	**CORTE 3**
	8. CORTE CON PULIDORA			5.25			1.00	5.25	M	**CORTE 3**
	9. CORTE CON PULIDORA			6.90			1.00	6.90	M	**CORTE 3**
	10. CORTE CON PULIDORA			14.00			1.00	14.00	M	**CORTE 3**
	11. CORTE CON PULIDORA			11.70			1.00	11.70	M	**CORTE 3**
	12. CORTE CON PULIDORA			5.00			1.00	5.00	M	**CORTE 3**
	13. CORTE CON PULIDORA			8.15			1.00	8.15	M	**CORTE 3**
	14. CORTE CON PULIDORA			8.65			1.00	8.65	M	**CORTE 3**
	15. CORTE CON PULIDORA			6.50			1.00	6.50	M	**CORTE 3**
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 4									
   	1. CORTE CON PULIDORA			15.22			1.00	15.22	M	**CORTE 4**
	2. CORTE CON PULIDORA			14.99			1.00	14.99	M	**CORTE 4**
	3. CORTE CON PULIDORA			13.78			1.00	13.78	M	**CORTE 4**
	4. CORTE CON PULIDORA			11.90			1.00	11.90	M	**CORTE 4**
	5. CORTE CON PULIDORA			11.93			1.00	11.93	M	**CORTE 4**
	6. CORTE CON PULIDORA			9.95			1.00	9.95	M	**CORTE 4**
	7. CORTE CON PULIDORA			2.10			1.00	2.10	M	**CORTE 4**
	8. CORTE CON PULIDORA			5.25			1.00	5.25	M	**CORTE 4**
	9. CORTE CON PULIDORA			6.90			1.00	6.90	M	**CORTE 4**
	10. CORTE CON PULIDORA			14.22			1.00	14.22	M	**CORTE 4**
	11. CORTE CON PULIDORA			13.15			1.00	13.15	M	**CORTE 4**
	12. CORTE CON PULIDORA			2.60			1.00	2.60	M	**CORTE 4**
	13. CORTE CON PULIDORA			15.10			1.00	15.10	M	**CORTE 4**
	14. CORTE CON PULIDORA			13.94			1.00	13.94	M	**CORTE 4**
	15. CORTE CON PULIDORA			13.22			1.00	13.22	M	**CORTE 4**
	16. CORTE CON PULIDORA			4.65			1.00	4.65	M	**CORTE 4**
	17. CORTE CON PULIDORA			6.30			1.00	6.30	M	**CORTE 4**
	18. CORTE CON PULIDORA			7.60			1.00	7.60	M	**CORTE 4**
	19. CORTE CON PULIDORA			5.30			1.00	5.30	M	**CORTE 4**
	20. CORTE CON PULIDORA			5.40			1.00	5.40	M	**CORTE 4**
	21. CORTE CON PULIDORA			5.10			1.00	5.10	M	**CORTE 4**
	22. CORTE CON PULIDORA			4.90			1.00	4.90	M	**CORTE 4**
	23. CORTE CON PULIDORA			5.00			1.00	5.00	M	**CORTE 4**
	24. CORTE CON PULIDORA			2.80			1.00	2.80	M	**CORTE 4**
	25. CORTE CON PULIDORA			3.40			1.00	3.40	M	**CORTE 4**
	26. CORTE CON PULIDORA			6.05			1.00	6.05	M	**CORTE 4**
	27. CORTE CON PULIDORA			10.30			1.00	10.30	M	**CORTE 4**
	28. CORTE CON PULIDORA			8.50			1.00	8.50	M	**CORTE 4**
	29. CORTE CON PULIDORA			45.10			1.00	45.10	M	**CORTE 4**
	30. CORTE CON PULIDORA			12.00			1.00	12.00	M	**CORTE 4**
	31. CORTE CON PULIDORA			40.90			1.00	40.90	M	**CORTE 4**
	MENOS ACTA 3							- 147.85		
	ACTA PARCIAL 5									
  	**PATIO A**									
	1. CORTE CON PULIDORA			3.30			1.00	3.30	M	**CORTE 5**
	2. CORTE CON PULIDORA			7.93			1.00	7.93	M	**CORTE 5**
	3. CORTE CON PULIDORA			7.10			1.00	7.10	M	**CORTE 5**
	4. CORTE CON PULIDORA			12.75			1.00	12.75	M	**CORTE 5**
	5. CORTE CON PULIDORA			9.92			1.00	9.92	M	**CORTE 5**
	6. CORTE CON PULIDORA			7.16			1.00	7.16	M	**CORTE 5**
	PATIO B									
	7. CORTE CON PULIDORA			6.73			1.00	6.73	M	**CORTE 5**
	8. CORTE CON PULIDORA			6.16			1.00	6.16	M	**CORTE 5**
	9. CORTE CON PULIDORA			5.09			1.00	5.09	M	**CORTE 5**
	10. CORTE CON PULIDORA			12.10			1.00	12.10	M	**CORTE 5**
	PATIO C									
	11. CORTE CON PULIDORA			1.94			1.00	1.94	M	**CORTE 5**
	12. CORTE CON PULIDORA			2.84			1.00	2.84	M	**CORTE 5**
	13. CORTE CON PULIDORA			7.70			1.00	7.70	M	**CORTE 5**
	14. CORTE CON PULIDORA			8.58			1.00	8.58	M	**CORTE 5**
	15. CORTE CON PULIDORA			8.42			1.00	8.42	M	**CORTE 5**
	16. CORTE CON PULIDORA			14.17			1.00	14.17	M	**CORTE 5**
	CIRCULACIÓN - CIRCUNFERENCIA									
	17. CORTE CON PULIDORA - TIPO 1			4.60			6.00	27.60	M	**CORTE 5**
	18. CORTE CON PULIDORA - TIPO 2			3.00			25.00	75.00	M	**CORTE 5**
	19. CORTE CON PULIDORA - TIPO 3			2.30			12.00	27.60	M	**CORTE 5**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

PATIO A

PATIO A











							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	589.64	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	337.55	M	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M	
PRESENTE ACTA	**252.09**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
252.09	337.55	**589.64**

OBSERVACIONES: LA INTERVENCIÓN CONSITIÓ EN DOS TRATAMIENTOS DIFERENTES; LA PRIMERA INTERVENCIÓN CORRESPONDE AL RESANE DE FISURAS EXISTENTES QUE CONTABA LA PLACA Y QUE REQUERÍAN TRATAMIENTO (CANTIDADES COBRADAS EN ACTAS 3 Y 4) Y LA SEGUNDA INTERVENCIÓN CORRESPONDE A LA INDUCCIÓN DE DILATACIONES QUE INDUZCAN LAS NUEVAS FISURAS ANTE UN POSIBLE FISURAMIENTO DE LAS LOSAS ANTE LOS MOVIMIENTOS TELÚRICOS DEL SUELO. (CANTIDADES COBRADAS EN ACTA 5).

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	003
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/6//26

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**19.1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

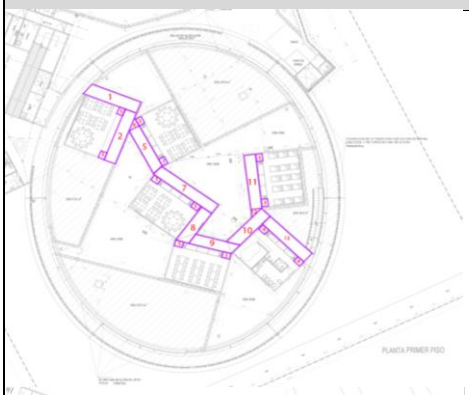ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 4									
    	1. TRIÁNGULO (ZONA C)			9.35	1.65		1.00	15.43	M2	CORTE 4
	2. TRIÁNGULO (ZONA C)			9.35	1.65		1.00	15.43	M2	CORTE 4
	3. TRIANGULO (ZONA C)			18.70	7.09		1.00	132.58	M2	CORTE 4
	4. CUADRADO (ZONA D)		1.65	5.10			1.00	8.42	M2	CORTE 4
	5. CUADRADO (ZONA D)		0.50	2.50			1.00	1.25	M2	CORTE 4
	6. TRIÁNGULO (ZONA D)			6.12	2.65		1.00	16.22	M2	CORTE 4
	7. TRIÁNGULO (ZONA A)			10.85	2.05		1.00	22.24	M2	CORTE 4
	8. TRIÁNGULO (ZONA A)			10.85	2.05		1.00	22.24	M2	CORTE 4
	9. TRIÁNGULO (ZONA A)			21.70	10.23		1.00	221.88	M2	CORTE 4
	10. CUADRADO (ZONA B)		3.20	12.10			1.00	38.72	M2	CORTE 4
	11. TRIÁNGULO (ZONA B)			6.05	4.90		1.00	29.65	M2	CORTE 4
	12. TRIÁNGULO (ZONA B)			6.70	0.65		1.00	4.36	M2	CORTE 4
	13. TRÍANGULO (ZONA B)			6.70	0.65		1.00	4.36	M2	CORTE 4
	14. TRIÁNGULO (ZONA B)			7.30	0.55		1.00	4.02	M2	CORTE 4
	ZONA DE CIRCULACIÓN		1.80	127.35			1.00	229.23	M2	CORTE 4
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 5									
 	**CIELO RASO PASILLO - PRIMER PISO**									
	1. CIELO RASO		1.50	7.07			1.00	10.61	M2	CORTE 5
	2. CIELO RASO		1.46	7.32			1.00	10.69	M2	CORTE 5
	3. CIELO RASO		0.63	1.00			10.00	6.30	M2	CORTE 5
	4. CIELO RASO		0.63	1.04			2.00	1.31	M2	CORTE 5
	5. CIELO RASO		1.50	7.24			1.00	10.86	M2	CORTE 5
	6. CIELO RASO		1.00	0.75			1.00	0.75	M2	CORTE 5
	7. CIELO RASO		1.52	8.77			1.00	13.33	M2	CORTE 5
	8. CIELO RASO		1.50	3.45			1.00	5.18	M2	CORTE 5
	9. CIELO RASO		1.57	7.00			1.00	10.99	M2	CORTE 5
	10. CIELO RASO		1.50	6.41			1.00	9.62	M2	CORTE 5
	11. CIELO RASO		1.57	8.43			1.00	13.24	M2	CORTE 5
	12. CIELO RASO		1.20	0.79			1.00	0.94	M2	CORTE 5
	13. CIELO RASO		1.55	7.38			1.00	11.44	M2	CORTE 5
	CIELO RASO PASILLO - SEGUNDO PISO									
	26. CIELO RASO		1.50	7.07			1.00	10.61	M2	CORTE 5
	27. CIELO RASO		1.46	7.32			1.00	10.69	M2	CORTE 5
	28. CIELO RASO		0.63	1.00			10.00	6.30	M2	CORTE 5
	29. CIELO RASO		0.63	1.04			2.00	1.31	M2	CORTE 5
	30. CIELO RASO		1.50	7.24			1.00	10.86	M2	CORTE 5
	31. CIELO RASO		1.00	0.75			1.00	0.75	M2	CORTE 5
	32. CIELO RASO		1.52	8.77			1.00	13.33	M2	CORTE 5
	33. CIELO RASO		1.50	3.45			1.00	5.18	M2	CORTE 5
	34. CIELO RASO		1.57	7.00			1.00	10.99	M2	CORTE 5
	35. CIELO RASO		1.50	6.41			1.00	9.62	M2	CORTE 5
	36. CIELO RASO		1.57	8.43			1.00	13.24	M2	CORTE 5
	37. CIELO RASO		1.20	0.79			1.00	0.94	M2	CORTE 5
	38. CIELO RASO		1.55	7.38			1.00	11.44	M2	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	976.55	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	766.03	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**210.52**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
210.52	766.03	**976.55**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**004**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 4									
	1. CIELO RASO CIRCULACIÓN (CIRCUNFERENCIA)			1.80	127.35		1.00	229.23	M2	**CORTE 4**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 5									
	**CIELO RASO PASILLO - PRIMER PISO**									
	1. CIELO RASO		1.50	7.07			1.00	10.61	M2	**CORTE 5**
	2. CIELO RASO		1.46	7.32			1.00	10.69	M2	**CORTE 5**
	3. CIELO RASO		0.63	1.00			10.00	6.30	M2	**CORTE 5**
	4. CIELO RASO		0.63	1.04			2.00	1.31	M2	**CORTE 5**
	5. CIELO RASO		1.50	7.24			1.00	10.86	M2	**CORTE 5**
	6. CIELO RASO		1.00	0.75			1.00	0.75	M2	**CORTE 5**
	7. CIELO RASO		1.52	8.77			1.00	13.33	M2	**CORTE 5**
	8. CIELO RASO		1.50	3.45			1.00	5.18	M2	**CORTE 5**
	9. CIELO RASO		1.57	7.00			1.00	10.99	M2	**CORTE 5**
	10. CIELO RASO		1.50	6.41			1.00	9.62	M2	**CORTE 5**
	11. CIELO RASO		1.57	8.43			1.00	13.24	M2	**CORTE 5**
	12. CIELO RASO		1.20	0.79			1.00	0.94	M2	**CORTE 5**
	13. CIELO RASO		1.55	7.38			1.00	11.44	M2	**CORTE 5**
	CIELO RASO SALONES - PRIMER PISO									
	14. CIELO RASO		4.50	7.13			1.00	32.09	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN		0.76	4.02			1.00	3.06	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS		-0.02				2.00	-0.05	M2	**CORTE 5**
	15. CIELO RASO		4.48	7.13			1.00	31.94	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN		0.71	4.06			1.00	2.88	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS		-0.02				2.00	-0.05	M2	**CORTE 5**
	16. CIELO RASO		4.48	7.10			1.00	31.81	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN		0.78	4.01			1.00	3.13	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS		-0.02				2.00	-0.05	M2	**CORTE 5**
	17. CIELO RASO		4.57	7.15			1.00	32.68	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN		0.75	4.04			1.00	3.03	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS		-0.02				2.00	-0.05	M2	**CORTE 5**
	18. CIELO RASO		4.50	7.15			1.00	32.18	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS		-0.02				2.00	-0.05	M2	**CORTE 5**
	CIELO RASO RAMPA - SEGUNDO PISO									
	19. CIELO RASO		4.94	14.10			1.00	69.65	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNA		-0.02				1.00	-0.02	M2	**CORTE 5**
	20. CIELO RASO		0.82	2.31			1.00	1.89	M2	**CORTE 5**
	CIELO RASO SALONES - SEGUNDO PISO									
	21. CIELO RASO		4.50	7.13			1.00	32.09	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN		0.76	4.02			1.00	3.06	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS		-0.02				2.00	-0.05	M2	**CORTE 5**
	22. CIELO RASO		4.48	7.13			1.00	31.94	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN		0.71	4.06			1.00	2.88	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS		-0.02				2.00	-0.05	M2	**CORTE 5**
	23. CIELO RASO		4.48	7.10			1.00	31.81	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN		0.78	4.01			1.00	3.13	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS		-0.02				2.00	-0.05	M2	**CORTE 5**
	24. CIELO RASO		4.57	7.15			1.00	32.68	M2	**CORTE 5**
	MÁS MESÓN		0.75	4.04			1.00	3.03	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS		-0.02				2.00	-0.05	M2	**CORTE 5**
	25. CIELO RASO		4.50	7.15			1.00	32.18	M2	**CORTE 5**
	MENOS COLUMNAS		-0.02				2.00	-0.05	M2	**CORTE 5**
	**CIELO RASO PASILLO - SEGUNDO PISO**									
	26. CIELO RASO		1.50	7.07			1.00	10.61	M2	**CORTE 5**
	27. CIELO RASO		1.46	7.32			1.00	10.69	M2	**CORTE 5**
	28. CIELO RASO		0.63	1.00			10.00	6.30	M2	**CORTE 5**
	29. CIELO RASO		0.63	1.04			2.00	1.31	M2	**CORTE 5**
	30. CIELO RASO		1.50	7.24			1.00	10.86	M2	**CORTE 5**
	31. CIELO RASO		1.00	0.75			1.00	0.75	M2	**CORTE 5**
	32. CIELO RASO		1.52	8.77			1.00	13.33	M2	**CORTE 5**
	33. CIELO RASO		1.50	3.45			1.00	5.18	M2	**CORTE 5**
	34. CIELO RASO		1.57	7.00			1.00	10.99	M2	**CORTE 5**
	35. CIELO RASO		1.50	6.41			1.00	9.62	M2	**CORTE 5**
	36. CIELO RASO		1.57	8.43			1.00	13.24	M2	**CORTE 5**
	37. CIELO RASO		1.20	0.79			1.00	0.94	M2	**CORTE 5**
	38. CIELO RASO		1.55	7.38			1.00	11.44	M2	**CORTE 5**

	CIELO RASO BAHIAS - PRIMER Y SEGUNDO PISO									
	39. CIELO RASO - ÁREA		34.22				2.00	68.44	M2	**CORTE 5**
	40. CIELO RASO - ÁREA		0.74				2.00	1.48	M2	**CORTE 5**
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	926.29	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	229.23	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**697.06**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
697.06	229.23	**926.29**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**003**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**


CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**22.1.16**	**PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 3									
	1. MURO			10.94	2.19		1.00	23.96	M2	**CORTE 3**
	2. MURO		8.60		2.19		1.00	18.83	M2	**CORTE 3**
	3. DESCUENTO DE PUERTA			-2.01	2.05		1.00	- 4.12	M2	**CORTE 3**
	4. COLUMNA CUADRADA		1.45		2.19		1.00	3.18	M2	**CORTE 3**
	5. COLUMNAS REDONDAS Perímetro= 0,94 mts		0.94		2.19		4.00	8.23	M2	**CORTE 3**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 5									
	1. CIELO RASO		10.94	12.06			1.00	131.94	M2	**CORTE 5**
	2. MENOS BUITRÓN		0.30	-0.70			1.00	- 0.21	M2	**CORTE 5**
	3. MENOS COLUMNA REDONDA		-0.07				4.00	- 0.28	M2	**CORTE 5**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	181.53	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	50.08	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**131.45**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
131.45	50.08	**181.53**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSÓN GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**003**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12//6/26**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**23.8.17**	**TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)**		**UNIDAD**	**M**

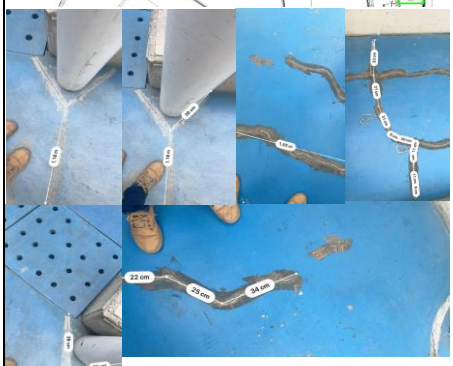
ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL 2									
   	ESPACIO 1			9.95			1.00	9.95	M	**CORTE 2**
	ESPACIO 2			11.93			1.00	11.93	M	**CORTE 2**
	ESPACIO 3			11.90			1.00	11.90	M	**CORTE 2**
	ESPACIO 4			13.78			1.00	13.78	M	**CORTE 2**
	ESPACIO 5			14.99			1.00	14.99	M	**CORTE 2**
	ESPACIO 6			14.22			1.00	14.22	M	**CORTE 2**
	ESPACIO 7			13.15			1.00	13.15	M	**CORTE 2**
	ESPACIO 8			2.60			1.00	2.60	M	**CORTE 2**
	ESPACIO 9			15.10			1.00	15.10	M	**CORTE 2**
	ESPACIO 10			13.94			1.00	13.94	M	**CORTE 2**
	ESPACIO 11			13.22			1.00	13.22	M	**CORTE 2**
	Espacio del acceso			15.22			1.00	15.22	M	**CORTE 2**
	ACTA PARCIAL 3									
   	7. TRATAMIENTO			2.10				2.10	M	**CORTE 3**
	8. TRATAMIENTO			5.25				5.25	M	**CORTE 3**
	9. TRATAMIENTO			6.90				6.90	M	**CORTE 3**
	ACTA PARCIAL 4									
 	16. TRATAMIENTO			4.65			1.00	4.65	M	**CORTE 4**
	17. TRATAMIENTO			6.30			1.00	6.30	M	**CORTE 4**
	18. TRATAMIENTO			7.60			1.00	7.60	M	**CORTE 4**
	19. TRATAMIENTO			5.30			1.00	5.30	M	**CORTE 4**
	20. TRATAMIENTO			5.40			1.00	5.40	M	**CORTE 4**
	21. TRATAMIENTO			5.10			1.00	5.10	M	**CORTE 4**
	22. TRATAMIENTO			4.90			1.00	4.90	M	**CORTE 4**
	23. TRATAMIENTO			5.00			1.00	5.00	M	**CORTE 4**
	24. TRATAMIENTO			2.80			1.00	2.80	M	**CORTE 4**
	25. TRATAMIENTO			3.40			1.00	3.40	M	**CORTE 4**
	26. TRATAMIENTO			6.05			1.00	6.05	M	**CORTE 4**
	27. TRATAMIENTO			10.30			1.00	10.30	M	**CORTE 4**
	28. TRATAMIENTO			8.50			1.00	8.50	M	**CORTE 4**





29. TRATAMIENTO			45.10			1.00	45.10	M	**CORTE 4**
30. TRATAMIENTO			12.00			1.00	12.00	M	**CORTE 4**
31. TRATAMIENTO			40.90			1.00	40.90	M	**CORTE 4**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

ACTA PARCIAL 5

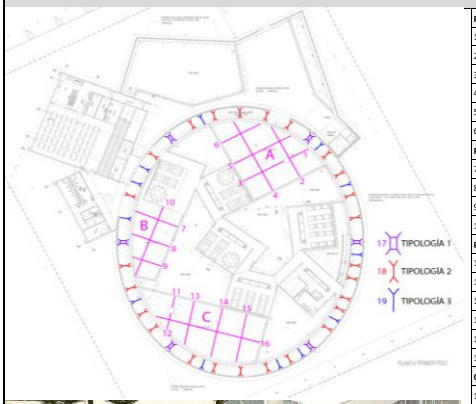











PATIO A									
1. TRATAMIENTO			3.30			1.00	3.30	M	**CORTE 5**
2. TRATAMIENTO			7.93			1.00	7.93	M	**CORTE 5**
3. TRATAMIENTO			7.10			1.00	7.10	M	**CORTE 5**
4. TRATAMIENTO			12.75			1.00	12.75	M	**CORTE 5**
5. TRATAMIENTO			9.92			1.00	9.92	M	**CORTE 5**
6. TRATAMIENTO			7.16			1.00	7.16	M	**CORTE 5**
PATIO B									
7. TRATAMIENTO			6.73			1.00	6.73	M	**CORTE 5**
8. TRATAMIENTO			6.16			1.00	6.16	M	**CORTE 5**
9. TRATAMIENTO			5.09			1.00	5.09	M	**CORTE 5**
10. TRATAMIENTO			12.10			1.00	12.10	M	**CORTE 5**
PATIO C									
11. TRATAMIENTO			1.94			1.00	1.94	M	**CORTE 5**
12. TRATAMIENTO			2.84			1.00	2.84	M	**CORTE 5**
13. TRATAMIENTO			7.70			1.00	7.70	M	**CORTE 5**
14. TRATAMIENTO			8.58			1.00	8.58	M	**CORTE 5**
15. TRATAMIENTO			8.42			1.00	8.42	M	**CORTE 5**
16. TRATAMIENTO			14.17			1.00	14.17	M	**CORTE 5**
CIRCULACIÓN - CIRCUNFERENCIA									
17. TRATAMIENTO - TIPO 1			4.60			6.00	27.60	M	**CORTE 5**
18. TRATAMIENTO - TIPO 2			3.00			25.00	75.00	M	**CORTE 5**
19. TRATAMIENTO - TIPO 3			2.30			12.00	27.60	M	**CORTE 5**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	589.64	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	337.55	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**252.09**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
252.09	337.55	**589.64**

OBSERVACIONES: LA INTERVENCIÓN CONSITIÓ EN DOS TRATAMIENTOS DIFERENTES; LA PRIMERA INTERVENCIÓN CORRESPONDE AL RESANE DE FISURAS EXISTENTES QUE CONTABA LA PLACA Y QUE REQUERÍAN TRATAMIENTO (CANTIDADES COBRADAS EN ACTAS 2, 3 Y 4) Y LA SEGUNDA INTERVENCIÓN CORRESPONDE A LA INDUCCIÓN DE DILATACIONES QUE INDUZCAN LAS NUEVAS FISURAS ANTE UN POSIBLE FISURAMIENTO DE LAS LOSAS ANTE LOS MOVIMIENTOS TELÚRICOS DEL SUELO. (CANTIDADES COBRADAS EN ACTA 5).

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA						
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4										

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025			8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027		11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A					14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025			19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027		22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A					25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
04. JARDIN SOCIAL CAMPO VERDE													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**												
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).	M2	-	$ 5.697,00	$ -	201,33	$ 1.146.977,01	-	$ -	201,33	$ 1.146.977,01	201,33	$ 1.146.977,01
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	-	$ 38.594,00	$ -	38,22	$ 1.475.062,68	-	$ -	38,22	$ 1.475.062,68	38,22	$ 1.475.062,68
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	-	$ 12.903,00	$ -	200,00	$ 2.580.600,00	-	$ -	200,00	$ 2.580.600,00	200,00	$ 2.580.600,00
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	423,93	$ 22.597,00	$ 9.579.546,21	335,17	$ 7.573.836,49	-	$ -	335,17	$ 7.573.836,49	335,17	$ 7.573.836,49
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.8	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	227,31	$ 18.435,00	$ 4.190.459,85	333,39	$ 6.146.044,65	-	$ -	333,39	$ 6.146.044,65	333,39	$ 6.146.044,65
1,8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	$ 6.856,00	$ -	234,82	$ 1.609.925,92	234,82	$ 1.609.925,92	-	$ -	234,82	$ 1.609.925,92
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	32,46	$ 7.070,00	$ 229.492,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M2	8,40	$ 6.474,00	$ 54.381,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.10.10	DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	57,56	$ 22.604,00	$ 1.301.086,24	51,40	$ 1.161.845,60	-	$ -	51,40	$ 1.161.845,60	51,40	$ 1.161.845,60
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	205,28	$ 6.605,00	$ 1.355.874,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	20,99	$ 64.238,00	$ 1.348.355,62	1,35	$ 86.849,78	-	$ -	1,35	$ 86.849,78	1,35	$ 86.849,78
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	17,27	$ 97.563,00	$ 1.684.913,01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	2,00	$ 30.029,00	$ 60.058,00	8,00	$ 240.232,00	-	$ -	8,00	$ 240.232,00	8,00	$ 240.232,00
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	655,35	$ 49.523,00	$ 32.454.898,05	88,83	$ 4.399.128,09	-	$ -	88,83	$ 4.399.128,09	88,83	$ 4.399.128,09
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	536,82	$ 123.466,00	$ 66.279.018,12	140,63	$ 17.363.023,58	-	$ -	140,63	$ 17.363.023,58	140,63	$ 17.363.023,58
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	-	$ 15.151,00	$ -	149,58	$ 2.266.286,58	-	$ -	149,58	$ 2.266.286,58	149,58	$ 2.266.286,58
7,4	**OTROS**												
7.4.9	ADOQUÍN EN ECOLÓGICO GRAMOQUÍN 8 CM	M2	57,56	$ 119.358,00	$ 6.870.246,48	51,40	$ 6.135.001,20	-	$ -	51,40	$ 6.135.001,20	51,40	$ 6.135.001,20
7.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	227,31	$ 152.741,00	$ 34.719.556,71	201,33	$ 30.751.345,53	-	$ -	201,33	$ 30.751.345,53	201,33	$ 30.751.345,53
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14,1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.4	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	-	$ 94.509,00	$ -	2,50	$ 236.272,50	-	$ -	2,50	$ 236.272,50	2,50	$ 236.272,50
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**												
15,1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1.1	CERROJO DE SEGURIDAD, DOBLE CILINDRO DE LLAVE MULTIPUNTO, PESTILLO FIJO, RESISTENTE A VANDALISMO Y GOLPES. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	4,00	$ 46.018,00	$ 184.072,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	-	$ 75.515,00	$ -	8,00	$ 604.120,00	-	$ -	8,00	$ 604.120,00	8,00	$ 604.120,00
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:		N/A			14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:		N/A			25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
04. JARDIN SOCIAL CAMPO VERDE													
16.13	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO	M2	53,87	$ 77.165,00	$ 4.156.878,55	93,27	$ 7.197.179,55	-	$ -	93,27	$ 7.197.179,55	93,27	$ 7.197.179,55
16.14	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2	53,87	$ 16.338,00	$ 880.128,06	93,27	$ 1.523.845,26	-	$ -	93,27	$ 1.523.845,26	93,27	$ 1.523.845,26
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.201,75	$ 4.546,00	$ 5.463.155,50	1.365,06	$ 6.205.562,76	22,89	$ 104.057,94	1.342,17	$ 6.101.504,82	1.365,06	$ 6.205.562,76
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	6,49	$ 20.508,00	$ 133.096,92	90,22	$ 1.850.231,76	-	$ -	90,22	$ 1.850.231,76	90,22	$ 1.850.231,76
21,2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**												
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	2,69	$ 31.439,00	$ 84.570,91	90,59	$ 2.848.059,01	30,00	$ 943.170,00	60,59	$ 1.904.889,01	90,59	$ 2.848.059,01
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	6,49	$ 71.517,00	$ 464.145,33	10,31	$ 737.340,27	-	$ -	10,31	$ 737.340,27	10,31	$ 737.340,27
22.1.7	PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	21,19	$ 13.689,00	$ 290.069,91	304,02	$ 4.161.729,78	-	$ -	304,02	$ 4.161.729,78	304,02	$ 4.161.729,78
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO. APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	11,27	$ 29.936,00	$ 337.378,72	10,31	$ 308.640,16	-	$ -	10,31	$ 308.640,16	10,31	$ 308.640,16
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 16.676,00	$ -	104,32	$ 1.739.640,32	-	$ -	104,32	$ 1.739.640,32	104,32	$ 1.739.640,32
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	632,24	$ 125.559,00	$ 79.383.422,16	335,17	$ 42.083.610,03	-	$ -	335,17	$ 42.083.610,03	335,17	$ 42.083.610,03
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGUN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	-	$ 53.788,00	$ -	559,06	$ 30.070.719,28	-	$ -	559,06	$ 30.070.719,28	559,06	$ 30.070.719,28
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	-	$ 82.182,00	$ -	472,79	$ 38.854.827,78	-	$ -	472,79	$ 38.854.827,78	472,79	$ 38.854.827,78

34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 251.504.804,55	$ 221.357.937,57	$ 2.657.153,86	$ 218.700.783,71	$ 221.357.937,57
35. DESCRIPCIÓN	%					
ADMINISTRACIÓN	27,49%	$ 69.138.671,00	$ 60.851.297,05	$ 730.451,60	$ 60.120.845,45	$ 60.851.297,05
IMPREVISTO	1,00%	$ 2.515.048,00	$ 2.213.579,38	$ 26.571,54	$ 2.153.329,42	$ 2.179.900,96
UTILIDAD	4,00%	$ 10.060.192,00	$ 8.854.317,49	$ 106.286,15	$ 8.748.031,34	$ 8.854.317,49
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 81.713.911,00	$ 71.919.193,92	$ 863.309,29	$ 71.022.206,21	$ 71.885.515,50
AJUSTE AL PESO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ANTICIPO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 333.218.715,55	$ 293.277.131,49	$ 3.520.463,15	$ 289.722.989,92	$ 293.243.453,07

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	**CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES**										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
04. JARDIN SOCIAL CAMPO VERDE													

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

DESCRIPCION	37. No. INFORME MENSUAL	38. PERIODO	39. NOMBRE DEL ARCHIVO	40. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 3	
INFORME SOCIAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Social No 5_10676-2025	
INFORME AMBIENTAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Ambiental No 5_10676-2025	
INFORME SST	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2	
INFORME DE SUPERVISION	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Supervision No 5_10676-2025	
ACTA PARCIAL	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4 Corte General obra_Acta 4_10676-2025	
SOPORTE PAGO SDH	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FE 5 - PAGO HACIENDA RESERVA_ACTA 3 FE 6 - PAGO HACIENDA VIGENCIA_ACTA 3 FE 7 - PAGO HACIENDA ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FACTURA	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FACTURA_FE 5_DISTRITO RESERVA_ACTA 3 FACTURA_FE 6_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 3 FACTURA_FE 7_ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FORMATO MC 14	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	MC-14_DISTRITO_ACTA 3 MC-14_ADULTO MAYOR_ACTA 3	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 12 días del mes de Junio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7


Nombre: NADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.469.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**004**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**




CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.8.1**	**CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M**

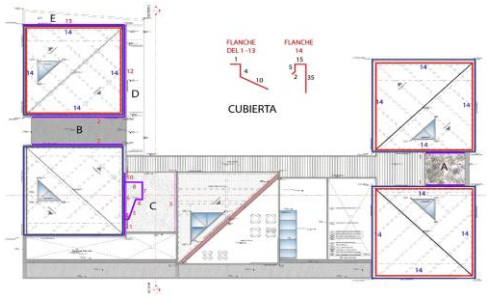ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 5									
	**TERRAZA A**									
	1. CORTE CON PULIDORA			5.70			2.00	11.40	M	**CORTE 5**
	TERRAZA B									
	2. CORTE CON PULIDORA			11.50			2.00	23.00	M	**CORTE 5**
	TERRAZA C									
	3. CORTE CON PULIDORA			8.35			1.00	8.35	M	**CORTE 5**
	4. CORTE CON PULIDORA			0.30			1.00	0.30	M	**CORTE 5**
	5. CORTE CON PULIDORA			2.60			1.00	2.60	M	**CORTE 5**
	6. CORTE CON PULIDORA			1.16			1.00	1.16	M	**CORTE 5**
	7. CORTE CON PULIDORA			2.83			1.00	2.83	M	**CORTE 5**
	8. CORTE CON PULIDORA			2.48			1.00	2.48	M	**CORTE 5**
	9. CORTE CON PULIDORA			5.20			1.00	5.20	M	**CORTE 5**
	10. CORTE CON PULIDORA			1.58			1.00	1.58	M	**CORTE 5**
	11. CORTE CON PULIDORA			1.58			1.00	1.58	M	**CORTE 5**
	TERRAZA D									
	12. CORTE CON PULIDORA			12.04			1.00	12.04	M	**CORTE 5**
	TERRAZA E									
	13. CORTE CON PULIDORA			12.30			1.00	12.30	M	**CORTE 5**
	CUBIERTA F									
	14. CORTE CON PULIDORA			12.50			12.00	150.00	M	**CORTE 5**
								-		
								-		
								-	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**004**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**19.1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 3									
    TOTAL POLIGONO 231,27 M2  	1. ASEO GENERAL - ÁREA DE ZONAS VERDES			127.89				127.89	M2	**CORTE 3**
	2. ASEO GENERAL - EN ÁREAS DE PISO CAUCHO	231.27					1	231.27	M2	**CORTE 3**
			2.49	4.14			-1	- 10.31	M2	**CORTE 3**
			1.44	5.99			-1	- 8.63	M2	**CORTE 3**
			2.14	5.14			-1	- 11.00	M2	**CORTE 3**
	ACTA PARCIAL 4									
           SALÓN A  SALÓN C	2. ASEO GENERAL - TERRAZA TERCER PISO			24.74			1.00	24.74	M2	**CORTE 4**
	3. PISO SALÓN A (SEGUNDO PISO - VERDE)		5.96	8.48			1.00	50.54	M2	**CORTE 4**
	4. PISO SALÓN B (SEGUNDO PISO - VERDE)		5.96	7.52			1.00	44.82	M2	**CORTE 4**
	5. PISO SALÓN C (PRIMER PISO - AMARILLO)		4.70	9.90			1.00	46.53	M2	**CORTE 4**
	6. ASEO GENERAL - CUBIERTAS INCLINADAS		12.50	12.50			4.00	625.00	M2	**CORTE 4**
	7. ASEO GENERAL - CUBIERTAS PLANAS		3.70	11.50			1.00	42.55	M2	**CORTE 4**
	8. ASEO GENERAL - CUBIERTAS PLANAS		6.00	8.35			1.00	50.10	M2	**CORTE 4**
	9. ASEO GENERAL - CUBIERTAS PLANAS		1.98	18.36			1.00	36.35	M2	**CORTE 4**
	10. ASEO GENERAL - CUBIERTAS PLANAS			15.44			1.00	15.44	M2	**CORTE 4**
	11. ASEO GENERAL - CUBIERTA INCLINADA		6.25	12.30			1.00	76.88	M2	**CORTE 4**



							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

ACTA PARCIAL 5



1. ASEO GENERAL - CAMPAMENTO DE OBRA		4.55	5.03				22.89	M2	**CORTE 5**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	1,365.06	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	1,342.17	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X		M2
PRESENTE ACTA	**22.89**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
22.89	1342.17	**1365.06**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**004**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**21.2.1**	**RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 4									
	1. BAJO PLACA - BODEGA TECER PISO	0.20	1.00	1.50			1.00	0.30	M2	**CORTE 4**
	2. BAJO PLACA - SALA CENTRAL AMARILLA	0.20	1.20	1.20			1.00	0.29	M2	**CORTE 4**
	3. JUNTAS DE LADRILLOS EN CUBIERTAS INCLINADAS		0.60	12.50			8.00	60.00	M2	**CORTE 4**
 								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 5									
	1. JUNTAS DE LADRILLOS EN CUBIERTAS INCLINADAS		0.60	12.50			4.00	30.00	M2	**CORTE 5**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	90.59	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	60.59	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**30.00**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
30.00	60.59	**90.59**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA						
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4										

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025			8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027			11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A					14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025			19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027			22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A					25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
05. JARDIN INFANTIL SOCORRO SUR													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**												
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).	M2	-	$ 5.697,00	$ -	19,78	$ 112.686,66	-	$ -	19,78	$ 112.686,66	19,78	$ 112.686,66
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	-	$ 38.594,00	$ -	9,21	$ 355.450,74	-	$ -	9,21	$ 355.450,74	9,21	$ 355.450,74
1,3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	-	$ 18.707,00	$ -	14,00	$ 261.898,00	3,10	$ 57.991,70	10,90	$ 203.906,30	14,00	$ 261.898,00
1.3.7	DESMONTE MANUAL DE REJAS METÁLICAS Y/O VARILLAS DE ACERO EN VANOS DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	-	$ 17.538,00	$ -	15,82	$ 277.451,16	-	$ -	15,82	$ 277.451,16	15,82	$ 277.451,16
1.3.12	DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	46,71	$ 24.637,00	$ 1.150.794,27	48,74	$ 1.200.807,38	-	$ -	48,74	$ 1.200.807,38	48,74	$ 1.200.807,38
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACUSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA	M2	140,70	$ 35.924,00	$ 5.054.506,80	162,56	$ 5.839.805,44	-	$ -	162,56	$ 5.839.805,44	162,56	$ 5.839.805,44
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.1	PICADA DE ALISTADO EN MORTERO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.	M2	-	$ 10.912,00	$ -	2,47	$ 26.952,64	-	$ -	2,47	$ 26.952,64	2,47	$ 26.952,64
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 27.857,00	$ -	1,00	$ 27.857,00	-	$ -	1,00	$ 27.857,00	1,00	$ 27.857,00
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	-	$ 14.184,00	$ -	29,00	$ 411.336,00	2,00	$ 28.368,00	27,00	$ 382.968,00	29,00	$ 411.336,00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	14,00	$ 19.177,00	$ 268.478,00	29,00	$ 556.133,00	2,00	$ 38.354,00	27,00	$ 517.779,00	29,00	$ 556.133,00
1.6.29	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	-	$ 11.688,00	$ -	18,00	$ 210.384,00	-	$ -	18,00	$ 210.384,00	18,00	$ 210.384,00
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	-	$ 9.741,00	$ -	3,50	$ 34.093,50	-	$ -	3,50	$ 34.093,50	3,50	$ 34.093,50
1,8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	$ 6.856,00	$ -	3,71	$ 25.435,76	-	$ -	3,71	$ 25.435,76	3,71	$ 25.435,76
1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 9.015,00	$ -	0,90	$ 8.113,50	-	$ -	0,90	$ 8.113,50	0,90	$ 8.113,50
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	-	$ 10.686,00	$ -	0,90	$ 9.617,40	-	$ -	0,90	$ 9.617,40	0,90	$ 9.617,40
1,9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.9.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	$ 15.642,00	$ -	5,80	$ 90.723,60	-	$ -	5,80	$ 90.723,60	5,80	$ 90.723,60
1,10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE PISOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M2	-	$ 6.474,00	$ -	16,47	$ 106.626,78	-	$ -	16,47	$ 106.626,78	16,47	$ 106.626,78
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	21,90	$ 6.605,00	$ 144.649,50	21,68	$ 143.196,40	-	$ -	21,68	$ 143.196,40	21,68	$ 143.196,40
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	-	$ 42.476,00	$ -	1,00	$ 42.476,00	-	$ -	1,00	$ 42.476,00	1,00	$ 42.476,00
2,2	**CONCRETOS**												
2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	M2	-	$ 26.400,00	$ -	1,00	$ 26.400,00	-	$ -	1,00	$ 26.400,00	1,00	$ 26.400,00

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

| | | |

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026			4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA												
2. ACTA No.	5					5. TIPO DE ACTA PARCIAL:							RECIBO PARCIAL DE OBRA	X		MODIFICACIONES			
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4																		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025			8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027		11. PLAZO:	24	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:		N/A				14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025			19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027		22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:		N/A				25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025												
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
05. JARDIN INFANTIL SOCORRO SUR													
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN	-	$ 1.052.087,00	$ -	1,00	$ 1.052.087,00	-	$ -	1,00	$ 1.052.087,00	1,00	$ 1.052.087,00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	13,00	$ 220.619,00	$ 2.868.047,00	11,00	$ 2.426.809,00	-	$ -	11,00	$ 2.426.809,00	11,00	$ 2.426.809,00
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 263.215,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00	-	$ -	1,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	2,00	$ 173.638,00	$ 347.276,00	2,00	$ 347.276,00	-	$ -	2,00	$ 347.276,00	2,00	$ 347.276,00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	2,00	$ 272.141,00	$ 544.282,00	2,00	$ 544.282,00	-	$ -	2,00	$ 544.282,00	2,00	$ 544.282,00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	2,00	$ 459.176,00	$ 918.352,00	2,00	$ 918.352,00	-	$ -	2,00	$ 918.352,00	2,00	$ 918.352,00
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1,00	$ 7.472.944,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	1,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	160,00	$ 8.605,00	$ 1.376.800,00	101,70	$ 875.128,50	-	$ -	101,70	$ 875.128,50	101,70	$ 875.128,50
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	2,42	$ 49.523,00	$ 119.845,66	2,43	$ 120.340,89	-	$ -	2,43	$ 120.340,89	2,43	$ 120.340,89
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	2,42	$ 127.357,00	$ 308.203,94	2,43	$ 309.477,51	-	$ -	2,43	$ 309.477,51	2,43	$ 309.477,51
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	-	$ 21.009,00	$ -	185,70	$ 3.901.371,30	-	$ -	185,70	$ 3.901.371,30	185,70	$ 3.901.371,30
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	-	$ 26.647,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	7,66	$ 23.195,00	$ 177.673,70	5,27	$ 122.237,65	-	$ -	5,27	$ 122.237,65	5,27	$ 122.237,65
7,4	**OTROS**												
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	0,80	$ 64.673,00	$ 51.738,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	33,12	$ 152.741,00	$ 5.058.781,92	19,78	$ 3.021.216,98	-	$ -	19,78	$ 3.021.216,98	19,78	$ 3.021.216,98
8	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	-	$ 113.182,00	$ -	0,39	$ 44.140,98	0,39	$ 44.140,98	-	$ -	0,39	$ 44.140,98
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	-	$ 126.722,00	$ -	0,90	$ 114.049,80	-	$ -	0,90	$ 114.049,80	0,90	$ 114.049,80
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 204.138,00	$ -	9,78	$ 1.996.469,64	-	$ -	9,78	$ 1.996.469,64	9,78	$ 1.996.469,64
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9,1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**												
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,60	$ 340.611,00	$ 544.977,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1,99	$ 367.647,00	$ 731.617,53	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SIN BATIENTES, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR; INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	M2	-	$ 376.458,00	$ -	12,92	$ 4.863.837,36	-	$ -	12,92	$ 4.863.837,36	12,92	$ 4.863.837,36
9,2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	-	$ 217.074,00	$ -	12,92	$ 2.804.596,08	-	$ -	12,92	$ 2.804.596,08	12,92	$ 2.804.596,08
9,3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ANGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	5,49	$ 150.047,00	$ 823.758,03	1,67	$ 250.578,49	-	$ -	1,67	$ 250.578,49	1,67	$ 250.578,49
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14,1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	17,02	$ 107.142,00	$ 1.823.556,84	17,22	$ 1.844.985,24	-	$ -	17,22	$ 1.844.985,24	17,22	$ 1.844.985,24
14.1.6	TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M	-	$ 61.382,00	$ -	2,22	$ 136.268,04	2,22	$ 136.268,04		$ -	2,22	$ 136.268,04
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**												
15,1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	-	$ 75.515,00	$ -	4,00	$ 302.060,00	4,00	$ 302.060,00	-	$ -	4,00	$ 302.060,00
15,2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE	M2	-	$ 152.990,00	$ -	19,05	$ 2.914.459,50	5,80	$ 887.342,00	13,25	$ 2.027.117,50	19,05	$ 2.914.459,50
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN	M2	6,12	$ 175.628,00	$ 1.074.843,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	46,29	$ 101.945,00	$ 4.719.034,05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**												
16.11	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	6,90	$ 153.589,00	$ 1.059.764,10	5,90	$ 906.175,10	-	$ -	5,90	$ 906.175,10	5,90	$ 906.175,10
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
05. JARDIN INFANTIL SOCORRO SUR													
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	315,17	$ 4.546,00	$ 1.432.762,82	341,87	$ 1.554.141,02	-	$ -	341,87	$ 1.554.141,02	341,87	$ 1.554.141,02
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	-	$ 20.180,00	$ -	79,70	$ 1.608.346,00	23,46	$ 473.422,80	56,24	$ 1.134.923,20	79,70	$ 1.608.346,00
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	-	$ 25.958,00	$ -	47,21	$ 1.225.477,18	-	$ -	47,21	$ 1.225.477,18	47,21	$ 1.225.477,18
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	50,42	$ 71.517,00	$ 3.605.887,14	264,70	$ 18.930.549,90	0,40	$ 28.606,80	264,30	$ 18.901.943,10	264,70	$ 18.930.549,90
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	25,21	$ 13.689,00	$ 345.099,69	253,46	$ 3.469.613,94	-	$ -	253,46	$ 3.469.613,94	253,46	$ 3.469.613,94
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 48.456,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	703,19	$ 12.878,00	$ 9.055.680,82	757,63	$ 9.756.759,14	29,28	$ 377.067,84	728,35	$ 9.379.691,30	757,63	$ 9.756.759,14
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	435,16	$ 29.936,00	$ 13.026.949,76	516,66	$ 15.466.733,76	-	$ -	516,66	$ 15.466.733,76	516,66	$ 15.466.733,76
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES; USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y	M2	-	$ 16.676,00	$ -	220,65	$ 3.679.559,40	0,40	$ 6.670,40	220,25	$ 3.672.889,00	220,65	$ 3.679.559,40
22,3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.4	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS	M2		$ 40.259,00	$ -	10,95	$ 440.836,05	10,95	$ 440.836,05		$ -	10,95	$ 440.836,05
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 37.231,00	$ -	97,56	$ 3.632.256,36	-	$ -	97,56	$ 3.632.256,36	97,56	$ 3.632.256,36
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	9,42	$ 125.559,00	$ 1.182.765,78	17,82	$ 2.237.461,38	0,24	$ 30.134,16	17,58	$ 2.207.327,22	17,82	$ 2.237.461,38
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	147,42	$ 253.100,00	$ 37.312.002,00	168,82	$ 42.728.342,00	-	$ -	168,82	$ 42.728.342,00	168,82	$ 42.728.342,00
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	6,35	$ 99.728,00	$ 633.272,80	8,02	$ 799.818,56	4,62	$ 460.743,36	3,40	$ 339.075,20	8,02	$ 799.818,56
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y ANCLAJES. ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA. ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	56,55	$ 53.788,00	$ 3.041.711,40	158,38	$ 8.518.943,44	-	$ -	158,38	$ 8.518.943,44	158,38	$ 8.518.943,44
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3,03	$ 82.182,00	$ 249.011,46	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	3,15	$ 45.109,00	$ 142.093,35	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 195.645.064,99	$ 204.576.494,93	$ 4.779.500,13	$ 199.796.994,80	$ 204.576.494,93
35. DESCRIPCIÓN	%					
ADMINISTRACIÓN	27,49%	$ 53.782.828,00	$ 56.238.078,46	$ 1.313.884,59	$ 54.924.193,87	$ 56.238.078,46
IMPREVISTO	1,00%	$ 1.956.451,00	$ 2.045.764,95	$ 47.795,00	$ 1.405.783,23	$ 1.453.578,23
UTILIDAD	4,00%	$ 7.825.803,00	$ 8.183.059,80	$ 191.180,01	$ 7.991.879,79	$ 8.183.059,80
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 63.565.082,00	$ 66.466.903,21	$ 1.552.859,60	$ 64.321.856,89	$ 65.874.716,49
AJUSTE AL PESO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ANTICIPO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 259.210.146,99	$ 271.043.398,14	$ 6.332.359,73	$ 264.118.851,69	$ 270.451.211,42

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA						
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4										

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025			8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027		11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A					14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025			19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027		22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A					25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
05. JARDIN INFANTIL SOCORRO SUR													

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

DESCRIPCION	37. No. INFORME MENSUAL	38. PERIODO	39. NOMBRE DEL ARCHIVO	40. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 3	
INFORME SOCIAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Social No 5_10676-2025	
INFORME AMBIENTAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Ambiental No 5_10676-2025	
INFORME SST	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2	
INFORME DE SUPERVISION	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Supervision No 5_10676-2025	
ACTA PARCIAL	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4 Corte General obra_Acta 4_10676-2025	
SOPORTE PAGO SDH	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FE 5 - PAGO HACIENDA RESERVA_ACTA 3 FE 6 - PAGO HACIENDA VIGENCIA_ACTA 3 FE 7 - PAGO HACIENDA ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FACTURA	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FACTURA_FE 5_DISTRITO RESERVA_ACTA 3 FACTURA_FE 6_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 3 FACTURA_FE 7_ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FORMATO MC 14	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	MC-14_DISTRITO_ACTA 3 MC-14_ADULTO MAYOR_ACTA 3	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 12 días del mes de Junio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7


Nombre: HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 53.499.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.3.2**	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.		M2

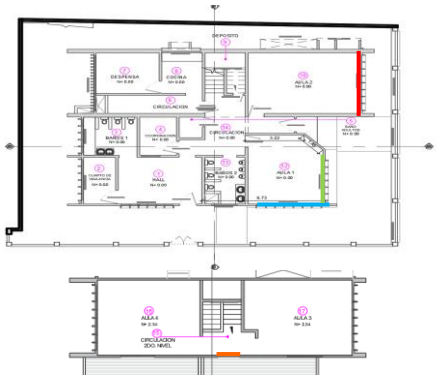ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
		Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
	ACTA PARCIAL 04									
 	PRIMER PISO							-		
	AULA 1							-		
	BATIENTE		0.4		1.24		2.00	0.99	M2	CORTE 4
	FIJO		0.41		1.26		5.00	2.58	M2	CORTE 4
	BATIENTE		0.24		1.37		2.00	0.66	M2	CORTE 4
	FIJO		0.39		1.26		4.00	1.97	M2	CORTE 4
	AULA 2							-		CORTE 4
	BATIENTE		0.38		1.24		2.00	0.94	M2	CORTE 4
	FIJO		0.38		1.26		6.00	2.87	M2	CORTE 4
								-		
	SEGUNDO PISO							-		
	BATIENTE		0.48		0.46		2.00	0.44	M2	CORTE 4
	FIJO		0.93		0.48		1.00	0.45	M2	CORTE 4
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
										
										



	ACTA PARCIAL 05								
	VENTANA EN BAÑO PRIMER PISO		1.4		1.02		1.00	1.43	M2	CORTE 5
	VENTANA EN COCINA		2.12		0.47		1.00	1.00	M2	CORTE 5
	VENTANA EN DESPENSA		1.43		0.47		1.00	0.67	M2	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	14.00	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	10.90	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
PRESENTE ACTA	**3.10**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3.10	10.90	**14.00**




OBSERVACIONES: NO ESTABAN EN BUEN ESTADO PARA SER REUTILIZADOS Y SOLO LA RELACION DE VIDRIOS

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENDON RUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	NOMBRE	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.6.26** DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.		UN

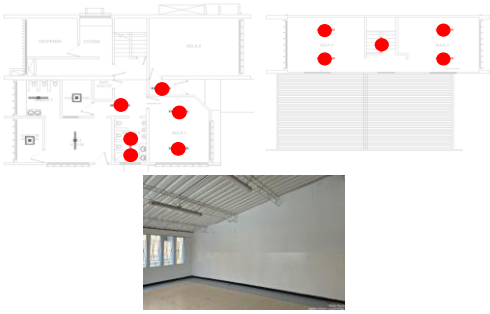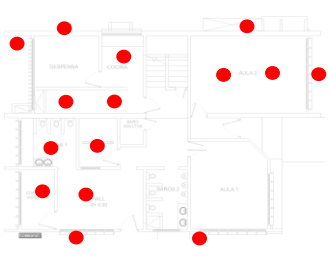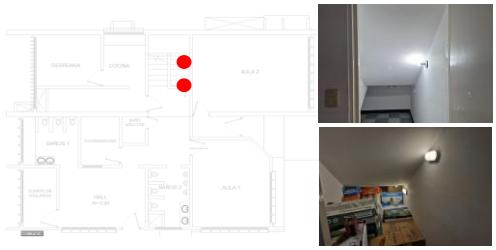ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
		Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
	**ACTA PARCIAL 01**									
	Primer piso							-		
	Pasillo						2.00	2.00	UND	CORTE 1
	baños 2						2.00	2.00	UND	CORTE 1
	Aula 1						2.00	2.00	UND	CORTE 1
								-		
								-		
	Segundo piso							-		
	Aula 3						2.00	2.00	UND	CORTE 1
	Aula 4						2.00	2.00	UND	CORTE 1
	Escalera						1.00	1.00	UND	CORTE 1
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 03									
	**Primer piso**							-		
	Baño						1.00	1.00	UND	CORTE 3
	Cuarto vigilancia						1.00	1.00	UND	CORTE 3
	Hall						1.00	1.00	UND	CORTE 3
	Baño Hall						1.00	1.00	UND	CORTE 3
	Coordinacion						1.00	1.00	UND	CORTE 3
	Fachada exterior						6.00	6.00	UND	CORTE 3
	Cocina						3.00	3.00	UND	CORTE 3
	Aula 2						2.00	2.00	UND	CORTE 3
	ACTA PARCIAL 05									
	**Primer piso**							-		
	Bodega bajo escalera						2.00	2.00	UND	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	29.00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	27.00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	UN	
PRESENTE ACTA	**2.00**	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2.00	27.00	**29.00**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.6.28** DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.		UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
		Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
	ACTA PARCIAL 01									
   	**Primer piso**							-		
	Pasillo						2.00	2.00	UND	CORTE 1
	baños 2						2.00	2.00	UND	CORTE 1
	Aula 1						2.00	2.00	UND	CORTE 1
								-		
								-		
	Segundo piso							-		
	Aula 3						2.00	2.00	UND	CORTE 1
	Aula 4						2.00	2.00	UND	CORTE 1
	Escalera						1.00	1.00	UND	CORTE 1
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 03									
   	**Primer piso**							-		
	Baño						1.00	1.00	UND	CORTE 3
	Cuarto vigilancia						1.00	1.00	UND	CORTE 3
	Hall						1.00	1.00	UND	CORTE 3
	Baño Hall						1.00	1.00	UND	CORTE 3
	Coordinacion						1.00	1.00	UND	CORTE 3
	Fachada exterior						6.00	6.00	UND	CORTE 3
	Cocina						3.00	3.00	UND	CORTE 3
	Aula 2						2.00	2.00	UND	CORTE 3
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05									
  	**Primer piso**							-		
	Bodega bajo escalera						2.00	2.00	UND	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	29.00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	27.00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN	
PRESENTE ACTA	**2.00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2.00	27.00	**29.00**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**2.3.5** ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)		UN

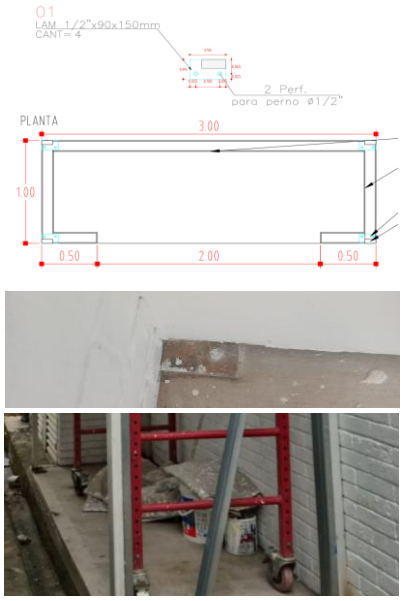ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
		Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
	SOPORTES DE BODEGA - PERNOS DE ANCLAJE						8.00	8.00	UN	
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05									
 	ANCLAJES PARA ANDEN FRENTE BODEGA						4.00	4.00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	12.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	8.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**4.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4.00	8.00	**12.00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	CONTRATO No.	10676	FRENTE OBRA	005
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	CONTRATO No:	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			FECHA	12/6/2026


CAPITULO	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.		ACTA No:	005
ITEM	3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.		M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

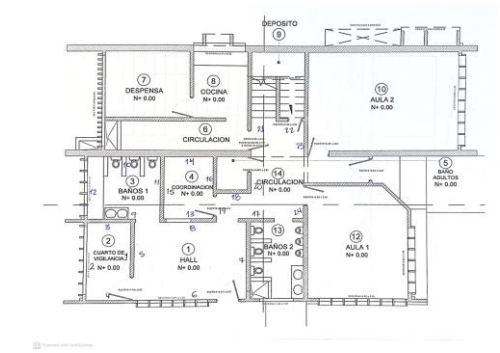



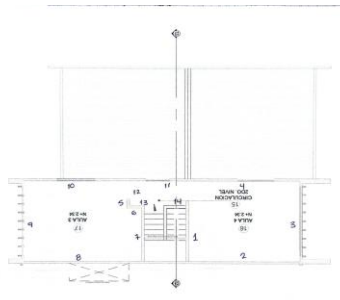


LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Área	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
ACTA PARCIAL 02							-		
PRIMER PISO							-		
1	20,00%	3,34		2,54		1,00	1,70	M2	CORTE 2
menos vano	20,00%	1,00		2,10		- 1,00	- 0,42	M2	CORTE 2
menos vano	20,00%	1,10		1,10		- 1,00	- 0,24	M2	CORTE 2
2	20,00%	3,34		2,45		1,00	1,64	M2	CORTE 2
menos ventana	20,00%	0,44		1,00		- 5,00	- 0,44	M2	CORTE 2
3	20,00%	1,87		2,59		1,00	0,97	M2	CORTE 2
4	20,00%	1,70		2,59		1,00	0,88	M2	CORTE 2
5	20,00%	3,45		2,54		1,00	1,75	M2	CORTE 2
6	20,00%	4,60		3,10		1,00	2,85	M2	CORTE 2
menos puerta	20,00%	0,96		2,20		- 1,00	- 0,42	M2	CORTE 2
menos ventana	20,00%	0,40		1,30		- 6,00	- 0,62	M2	CORTE 2
7	20,00%	3,37		3,42		1,00	2,31	M2	CORTE 2
8	20,00%	4,60		3,10		1,00	2,85	M2	CORTE 2
menos puerta	20,00%	0,88		2,03		- 1,00	- 0,36	M2	CORTE 2
	20,00%	0,95		2,02		1,00	0,38	M2	CORTE 2
menos ventana	20,00%	1,00		1,10		- 1,00	- 0,22	M2	CORTE 2
9	20,00%	3,03		0,85		1,00	0,52	M2	CORTE 2
menos puerta	20,00%	0,97		0,23		- 1,00	- 0,04	M2	CORTE 2
10	20,00%	3,03		0,85		1,00	0,52	M2	CORTE 2
11	20,00%	2,70		1,01		1,00	0,55	M2	CORTE 2
12	20,00%	2,70		0,63		1,00	0,34	M2	CORTE 2
menos ventana	20,00%	0,43		0,38		- 5,00	- 0,16	M2	CORTE 2
13	20,00%	2,00		2,97		1,00	1,19	M2	CORTE 2
menos ventana	20,00%	1,00		1,10		- 1,00	- 0,22	M2	CORTE 2
14	20,00%	2,00		2,97		1,00	1,19	M2	CORTE 2
15	20,00%	2,73		2,70		1,00	1,47	M2	CORTE 2
16	20,00%	2,73		3,09		1,00	1,69	M2	CORTE 2
menos puerta	20,00%	0,78		2,03		- 1,00	- 0,32	M2	CORTE 2
17	20,00%	3,60		3,17		1,00	2,28	M2	CORTE 2
menos puerta	20,00%	0,72		2,03		- 1,00	- 0,29	M2	CORTE 2
	20,00%	0,87		2,03		1,00	0,35	M2	CORTE 2
18	20,00%	1,40		2,25		1,00	0,63	M2	CORTE 2
19	20,00%	1,11		3,08		1,00	0,68	M2	CORTE 2
menos puerta	20,00%	0,78		2,02		- 1,00	- 0,32	M2	CORTE 2
20	20,00%	1,61		3,32		1,00	1,07	M2	CORTE 2
menos puerta	20,00%	0,68		2,02		- 1,00	- 0,27	M2	CORTE 2
21	20,00%	0,83		2,09		1,00	0,35	M2	CORTE 2
22	20,00%	1,17		2,09		1,00	0,49	M2	CORTE 2
menos puerta	20,00%	0,67		2,00		- 1,00	- 0,27	M2	CORTE 2
23	20,00%	1,60		2,09		1,00	0,67	M2	CORTE 2
24	20,00%	1,56		3,00		1,00	0,94	M2	CORTE 2
menos puerta	20,00%	0,88		2,02		- 1,00	- 0,36	M2	CORTE 2
							-		
SEGUNDO PISO							-		
1	20,00%	4,58		3,35		1,00	3,07	M2	CORTE 2
menos puerta	20,00%	1,01		2,07		- 1,00	- 0,42	M2	CORTE 2
2	20,00%	5,84		2,83		1,00	3,30	M2	CORTE 2
3	20,00%	4,58		2,20		1,00	2,02	M2	CORTE 2
menos ventana	20,00%	0,43		1,35		- 8,00	- 0,93	M2	CORTE 2
4	20,00%	5,84		2,83		1,00	3,30	M2	CORTE 2
menos ventana	20,00%	0,43		1,10		- 4,00	- 0,38	M2	CORTE 2
5	20,00%	1,57		2,90		1,00	0,91	M2	CORTE 2
menos puerta	20,00%	1,05		2,05		- 1,00	- 0,43	M2	CORTE 2
6	20,00%	0,77		3,00		1,00	0,46	M2	CORTE 2







7	20,00%	3,02		3,05		1,00	1,84	M2	CORTE 2
8	20,00%	6,10		2,65		1,00	3,23	M2	CORTE 2
9	20,00%	4,58		2,23		1,00	2,04	M2	CORTE 2
menos ventana	20,00%	0,43		1,33		- 8,00	- 0,92	M2	CORTE 2
10	20,00%	5,33		2,60		1,00	2,77	M2	CORTE 2
menos ventana	20,00%	0,43		1,10		- 4,00	- 0,38	M2	CORTE 2
11	20,00%	3,00		3,14		1,00	1,88	M2	CORTE 2
menos ventana	20,00%	1,95		0,51		- 1,00	- 0,20	M2	CORTE 2
12	20,00%	1,41		2,87		1,00	0,81	M2	CORTE 2
menos puerta	20,00%	1,05		2,05		- 1,00	- 0,43	M2	CORTE 2
13	20,00%	0,78		2,98		1,00	0,46	M2	CORTE 2
14	20,00%	1,15		1,25		1,00	0,29	M2	CORTE 2
							-		
							-		
ACTA PARCIAL 03									









DESPENSA PERIMETRAL SUPERIOR							-		
A (ROJO)	20%	3,47		0,25		2,00	0,35	M2	CORTE 3
B (ROJO)	20%	2,89		0,25		2,00	0,29	M2	CORTE 3
CORREDOR DESPENSA							-		
A (VERDE)	20%	5,82		2,18			2,54	M2	CORTE 3
MENOS VANO PUERTA COCINA	20%	0,80		2,18		- 1,00	- 0,35	M2	CORTE 3
B (VERDE)	20%	1,28		2,18			0,56	M2	CORTE 3
MENOS VANO PUERTA ACCESO	20%	0,09		2,18		- 1,00	- 0,04	M2	CORTE 3
C (VERDE)	20%	3,77		2,18			1,64	M2	CORTE 3
D (CYAN)	20%	2,05		0,41			0,17	M2	CORTE 3
							-		
							-		
							-		






Detalle de Ventana




Alzado de elementos de ventana

FACHADA PRINCIPAL (ROJO)	20%	13,93		2,60		1,00	7,24	M2	CORTE 3
CUCHILLA (AMARILLO)	20%	13,93		0,45		1,00	1,25	M2	CORTE 3
BORDES (AZUL)	20%	0,45		1,30		2,00	0,23	M2	CORTE 3
DESCUENTO VENTANA 1 (VERDE)	20%	2,95		1,34		- 1,00	- 0,79	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR VENTANA (AZUL)	20%	0,06	2,70			1,00	0,03	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,19	2,70			1,00	0,10	M2	CORTE 3
CARTERA INFERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,12	2,70			1,00	0,06	M2	CORTE 3
DESCUENTO VENTANA 2 (VERDE)	20%	1,40		0,99		- 1,00	- 0,28	M2	CORTE 3
CARTERA VENTANA (AZUL)	20%	0,07		4,78		1,00	0,07	M2	CORTE 3
DESCUENTO VENTANA 3 (VERDE)	20%	3,61		1,34		- 1,00	- 0,97	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR VENTANA (AZUL)	20%	0,06	3,31			1,00	0,04	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,19	3,31			1,00	0,13	M2	CORTE 3
CARTERA INFERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,12	3,31			1,00	0,08	M2	CORTE 3
ELEMENTO DE VENTANA (VERDE)	20%	0,06		1,69		30,00	0,61	M2	CORTE 3
(MAGENTA)	20%	0,11		0,62		30,00	0,41	M2	CORTE 3
(AZUL)	20%	0,11		0,23		30,00	0,15	M2	CORTE 3
DESCUENTO PUERTA (MAGENTA)	20%	1,00		2,20		- 1,00	- 0,44	M2	CORTE 3
							-		
FACHADA PRINCIPAL BLOQUE B (CYAN)	20%	15,60		4,78			14,91	M2	CORTE 3
CUCHILLA (NARANJA)	20%	15,60		0,64		1,00	2,00	M2	CORTE 3
BORDE 1 (MORADO)	20%	0,24		2,42		1,00	0,12	M2	CORTE 3
DESCUENTO VENTANAS A Y C (VERDE)	20%	2,02		1,13		- 2,00	- 0,91	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR VENTANA (AZUL)	20%	0,60	1,87			2,00	0,45	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,19	1,87			2,00	0,14	M2	CORTE 3
CARTERA INFERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,12	1,87			2,00	0,09	M2	CORTE 3
DESCUENTO VENTANA B (VERDE)	20%	1,25		0,52		- 1,00	- 0,13	M2	CORTE 3
CARTERA VENTANA	20%	0,60	2,29			1,00	0,27	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,19	1,25			1,00	0,05	M2	CORTE 3
CARTERA INFERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,12	1,25			1,00	0,03	M2	CORTE 3
ELEMENTO DE VENTANA (VERDE)	20%	0,06		1,43		20,00	0,34	M2	CORTE 3
(MAGENTA)	20%	0,11		0,55		20,00	0,24	M2	CORTE 3
(AZUL)	20%	0,11		0,17		20,00	0,07	M2	CORTE 3
DESCUENTO FACHADA PRINCIPAL	20%	13,93		2,60		- 1,00	- 7,24	M2	CORTE 3
CUCHILLA	20%	13,93		0,45		- 1,00	- 1,25	M2	CORTE 3
BORDES	20%	0,45		1,30		- 2,00	- 0,23	M2	CORTE 3
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		





Detalle de Ventana A y C





Alzado de elementos de ventana




Detalle de Ventana B











Alzado de elementos de ventana













Alzado de elementos de ventana
















Alzado de elementos de ventana


							-		
FACHADA LATERAL DERECHA BLOQUE A (ROJO)	20%	7,27		2,40		1,00	3,49	M2	CORTE 3
BAJANTE (AMARILLO)	20%	0,12		2,23		1,00	0,05	M2	CORTE 3
DESCUENTO VENTANA 1 (VERDE)	20%	2,92		1,34		- 1,00	- 0,78	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR VENTANA (AZUL)	20%	0,35	6,52			1,00	0,46	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,19	2,67			1,00	0,10	M2	CORTE 3
CARTERA INFERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,12	2,67			1,00	0,06	M2	CORTE 3
ELEMENTO DE VENTANA (VERDE)	20%	0,06		1,67		14,00	0,28	M2	CORTE 3
(MAGENTA)	20%	0,17		0,62		14,00	0,30	M2	CORTE 3
(AZUL)	20%	0,17		0,22		14,00	0,10	M2	CORTE 3
DESCUENTO PUERTA (MAGENTA)	20%	1,00		2,64		- 1,00	- 0,53	M2	CORTE 3
CARA LATERAL 1 (NARANJA)	20%	0,15		2,40		1,00	0,07	M2	CORTE 3
CARA LATERAL 1 (NARANJA)	20%	0,47		1,20		1,00	0,11	M2	CORTE 3
CARA LATERAL 2 (CYAN)	20%	1,53		2,40		1,00	0,73	M2	CORTE 3
DESCUENTO VIGA CANAL	20%	0,35		0,31		- 1,00	- 0,02	M2	CORTE 3
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
FACHADA LATERAL IZQUIERDA BLOQUE B (ROJO)	20%	4,85		5,11		1,00	4,96	M2	CORTE 3
DESCUENTO VENTANA PRIMER Y SEGUNDO NIVEL (VERDE)	20%	4,00		1,31		- 2,00	- 2,10	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR PRIMER NIVEL VENTANA (AZUL)	20%	0,07	3,65			1,00	0,05	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR SEGUNDO NIVEL VENTANA (AZUL)	20%	0,35	3,90			1,00	0,27	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,19	3,65			2,00	0,28	M2	CORTE 3
CARTERA INFERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,12	3,65			2,00	0,18	M2	CORTE 3
ELEMENTO DE VENTANA (VERDE)	20%	0,06		1,67		36,00	0,72	M2	CORTE 3
(MAGENTA)	20%	0,17		0,62		36,00	0,76	M2	CORTE 3
(AZUL)	20%	0,17		0,22		36,00	0,26	M2	CORTE 3
CARAS LATERALES (CYAN)	20%	0,15		5,11		2,00	0,31	M2	CORTE 3
CARAS LATERALES (CYAN)	20%	0,50		2,56		2,00	0,51	M2	CORTE 3
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
FACHADA LATERAL IZQUIERDA BLOQUE A	20%	6,35		2,55		1,00	3,24	M2	CORTE 3
BAJANTES (AMARILLO)	20%	0,13		2,22		2,00	0,12	M2	CORTE 3
DESCUENTO VENTANA 1 (VERDE)	20%	2,58		1,03		- 1,00	- 0,53	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR VENTANA (AZUL)	20%	0,21	3,05			1,00	0,13	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,19	2,38			1,00	0,09	M2	CORTE 3
CARTERA INFERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,12	2,38			1,00	0,06	M2	CORTE 3
DESCUENTO VENTANA 2 (VERDE)	20%	2,49		1,03		- 1,00	- 0,51	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR VENTANA (AZUL)	20%	0,21	2,46			1,00	0,10	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,19	2,29			1,00	0,09	M2	CORTE 3
CARTERA INFERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,12	2,29			1,00	0,05	M2	CORTE 3
CARA LATERAL 1 (NARANJA)	20%	0,11		2,55		1,00	0,06	M2	CORTE 3
CARA LATERAL 1 (NARANJA)	20%	0,66		1,28		1,00	0,17	M2	CORTE 3
CARA LATERAL 2 (CYAN)	20%	0,11		2,55		2,00	0,11	M2	CORTE 3
CARA LATERAL 2 (CYAN)	20%	0,63		1,28		2,00	0,32	M2	CORTE 3
ELEMENTO DE VENTANA (VERDE)	20%	0,06		1,24		24,00	0,36	M2	CORTE 3
(MAGENTA)	20%	0,11		0,40		24,00	0,21	M2	CORTE 3
(AZUL)	20%	0,11		0,22		24,00	0,12	M2	CORTE 3
							-		
							-		
							-		













Alzado de elementos de ventana














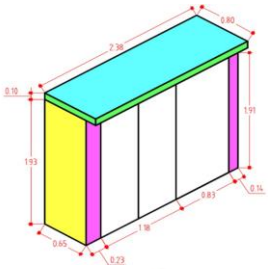













FACHADA LATERAL IZQUIERDA BLOQUE B	20%	4,87		4,72		1,00	4,60	M2	CORTE 3
DESCUENTO ENCHAPE POCETA (AMARILLO)	20%	0,60		0,47		- 1,00	- 0,06		CORTE 3
DESCUENTO VENTANA PRIMER NIVEL (VERDE)	20%	4,01		1,01		- 1,00	- 0,81	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR VENTANA (AZUL)	20%	0,07	3,11			1,00	0,04	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,27	3,11			1,00	0,17	M2	CORTE 3
CARTERA INFERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,12	3,11			1,00	0,07	M2	CORTE 3
DESCUENTO VENTANA SEGUNDO NIVEL (VERDE)	20%	4,01		1,40		- 1,00	- 1,12	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR VENTANA (AZUL)	20%	0,21	3,92			1,00	0,16	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,27	3,66			1,00	0,20	M2	CORTE 3
CARTERA INFERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,12	3,66			1,00	0,09	M2	CORTE 3
CARA LATERAL 1 A (NARANJA)	20%	0,11		4,72		1,00	0,10	M2	CORTE 3
CARA LATERAL 1 A (NARANJA)	20%	0,66		2,36		1,00	0,31	M2	CORTE 3
CARA LATERAL 1B (CYAN)	20%	0,11		4,72		1,00	0,10	M2	CORTE 3
CARA LATERAL 1B (CYAN)	20%	1,37		2,36		1,00	0,65	M2	CORTE 3
DESCUENTO ENCHAPE POCETA (AMARILLO)	20%	0,89		0,47		- 1,00	- 0,08	M2	CORTE 3
CARA LATERAL 2 (MORADO)	20%	0,11		4,72		1,00	0,10	M2	CORTE 3
CARA LATERAL 2 (MORADO)	20%	1,37		2,36		1,00	0,65	M2	CORTE 3
ELEMENTO DE VENTANA (VERDE)	20%	0,06		1,24		58,00	0,86	M2	CORTE 3
(MAGENTA)	20%	0,11		0,40		58,00	0,51	M2	CORTE 3
(AZUL)	20%	0,11		0,22		58,00	0,28	M2	CORTE 3
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
FACHADA POSTERIOR (ROJO)	20%	15,60		4,78			14,91	M2	CORTE 3
CUCHILLA (AMARILLO)	20%	15,60		0,64		1,00	2,00	M2	CORTE 3
BORDE 1 (AZUL)	20%	0,95		2,36		1,00	0,45	M2	CORTE 3
BORDE 2 (AZUL)	20%	0,24		2,42		1,00	0,12	M2	CORTE 3
BAJANTE DERECHA (CYAN)	20%	0,10		4,84		2,00	0,19	M2	CORTE 3
BAJANTE IZQUIERDA (CYAN)	20%	0,10		4,62		1,00	0,09	M2	CORTE 3
BAJANTE IZQUIERDA (CYAN)	20%	0,10		2,72		1,00	0,05	M2	CORTE 3
DESCUENTO VENTANA 1 (VERDE)	20%	2,13		0,33		- 1,00	- 0,14	M2	CORTE 3
CARTERA VENTANA (AZUL)	20%	0,20	2,79			1,00	0,11	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,27	2,13			1,00	0,12	M2	CORTE 3
CARTERA INFERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,12	2,13			1,00	0,05	M2	CORTE 3
DESCUENTO VENTANA 2 (VERDE)	20%	1,42		0,32		- 1,00	- 0,09	M2	CORTE 3
CARTERA VENTANA (AZUL)	20%	0,20	2,10			1,00	0,08	M2	CORTE 3
CARTERA SUPERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,27	1,42			1,00	0,08	M2	CORTE 3
CARTERA INFERIOR ALFAJIA VENTANA (ROJO)	20%	0,12	1,42			1,00	0,03	M2	CORTE 3
							-		
							-		
							-		
CUÁRTOS TÉCNICOS (DEPÓSITOS)							-		
MURO LATERAL	20%	0,65		1,92		1,00	0,25	M2	CORTE 3
PLACA	20%	0,80		2,38		1,00	0,38	M2	CORTE 3
CARTERA LATERAL PLACA	20%	0,80		0,10		1,00	0,02	M2	CORTE 3
DESCUENTO PUERTA 1	20%	1,18		1,83		- 1,00	- 0,43	M2	CORTE 3
DESCUENTO PUERTA 2	20%	0,83		1,83		- 1,00	- 0,30	M2	CORTE 3
							-		
							-		
							-		
							-		
BODEGA 3							-		
MUROS LATERALES	20%	0,50		1,41		2,00	0,28	M2	CORTE 3
MURO FRONTAL	20%	1,25		1,40		1,00	0,35	M2	CORTE 3
DESCUENTO VANO	20%	1,00		1,31		- 1,00	- 0,26	M2	CORTE 3
PLACA	20%	0,47	1,23			1,00	0,12	M2	CORTE 3
							-		
							-		
PARED POSTERIOR	20%	16,30		2,87		1,00	9,36	M2	CORTE 3
MURO INFERIOR (AMARILLO)	20%	4,10	0,10			1,00	0,08	M2	CORTE 3
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

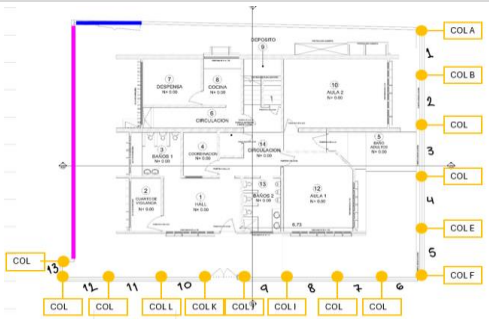









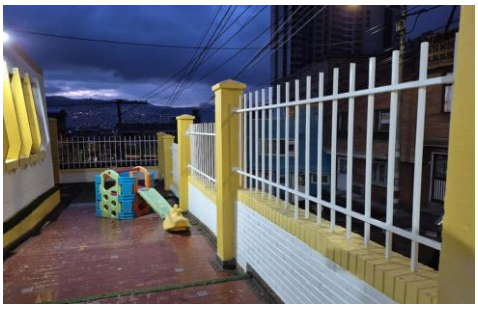


ACTA PARCIAL 04									
PARED LATERAL							-		
MURO	20%	15,00		2,34		1,00	7,02	M2	
CARA SUPERIOR	20%	0,64	15,00			1,00	1,91	M2	
BORDE	20%	0,08	15,00			1,00	0,23	M2	
							-		
MURO POSTERIOR	20%	2,40		1,78		1,00	0,85	M2	
	20%	1,43		1,94		1,00	0,55	M2	
	20%	0,20		2,34		1,00	0,09	M2	
MURO INFERIOR	20%	2,40		1,32		1,00	0,63	M2	
CARA SUPERIOR	20%	2,40	0,28			1,00	0,14	M2	
							-		
CERRAMIENTO INTERIOR							-		
COLUMNA A	20%	0,55		1,90		1,00	0,21	M2	
menos muro	20%	0,25		0,78		- 1,00	- 0,04	M2	
MODULO 1	20%	2,53		0,78		1,00	0,39	M2	
SUPERIOR	20%	0,25	2,53			1,00	0,12	M2	
COLUMNA B	20%	0,75		2,02		1,00	0,30	M2	
menos muro	20%	0,49		0,79		- 1,00	- 0,08	M2	
MODULO 2	20%	2,87		0,79		1,00	0,45	M2	
SUPERIOR	20%	0,25	2,87			1,00	0,14	M2	
COLUMNA C	20%	0,75		2,05		1,00	0,31	M2	
menos muro	20%	0,49		0,81		- 1,00	- 0,08	M2	
MODULO 3	20%	2,90		0,82		1,00	0,48	M2	
SUPERIOR	20%	0,25	2,90			1,00	0,14	M2	
COLUMNA D	20%	0,75		2,20		1,00	0,33	M2	
menos muro	20%	0,49		0,85		- 1,00	- 0,08	M2	
MODULO 4	20%	2,93		0,87		1,00	0,51	M2	
SUPERIOR	20%	0,25	2,93			1,00	0,14	M2	
COLUMNA E	20%	0,75		2,14		1,00	0,32	M2	
menos muro	20%	0,49		0,67		- 1,00	- 0,07	M2	
MODULO 5	20%	2,86		0,46		1,00	0,26	M2	
SUPERIOR	20%	0,25	2,86			1,00	0,14	M2	
COLUMNA F	20%	0,75		1,68		1,00	0,25	M2	
menos muro	20%	0,49		0,39		- 1,00	- 0,04	M2	
MODULO 6	20%	2,02		0,31		1,00	0,13	M2	
SUPERIOR	20%	0,25	2,02			1,00	0,10	M2	
COLUMNA G	20%	0,75		1,60		1,00	0,24	M2	
menos muro	20%	0,49		0,31		- 1,00	- 0,03	M2	
MODULO 7	20%	2,34		0,30		1,00	0,14	M2	
SUPERIOR	20%	0,25	2,34			1,00	0,11	M2	
COLUMNA H	20%	0,75		2,04		1,00	0,31	M2	
menos muro	20%	0,49		0,53		- 1,00	- 0,05	M2	
MODULO 8	20%	2,65		0,86		1,00	0,45	M2	
SUPERIOR	20%	0,25	2,65			1,00	0,13	M2	
COLUMNA I	20%	0,25		2,16		1,00	0,11	M2	
menos muro	20%	0,49		0,82		- 1,00	- 0,08	M2	
MODULO 9	20%	2,61		0,73		1,00	0,38	M2	
SUPERIOR	20%	0,25	2,61			1,00	0,13	M2	
COLUMNA J	20%	0,75		1,88		1,00	0,28	M2	
menos muro	20%	0,25		0,57		- 1,00	- 0,03	M2	
COLUMNA K	20%	0,75		2,09		1,00	0,31	M2	
menos muro	20%	0,25		0,90		- 1,00	- 0,04	M2	
MODULO 10	20%	2,49		2,90		1,00	1,44	M2	
SUPERIOR	20%	0,25	2,49			1,00	0,12	M2	
COLUMNA L	20%	0,75		2,85		1,00	0,43	M2	
menos muro	20%	0,75		0,97		- 1,00	- 0,15	M2	
MODULO 11	20%	2,97		1,04		1,00	0,62	M2	
SUPERIOR	20%	0,25	2,97			1,00	0,15	M2	
COLUMNA M	20%	0,75		3,40		1,00	0,51	M2	
menos muro	20%	0,49		1,02		- 1,00	- 0,10	M2	
MURO INFERIOR	20%	2,97		0,56		1,00	0,33	M2	
MODULO 12	20%	2,35		1,00		1,00	0,47	M2	
SUPERIOR	20%	0,25	2,35			1,00	0,12	M2	
COLUMNA N	20%	0,50		2,62		1,00	0,26	M2	
menos muro	20%	0,49		1,00		- 1,00	- 0,10	M2	
MURO INFERIOR	20%	2,35		0,96		1,00	0,45	M2	
MURO INFERIOR	20%	0,40		0,80		1,00	0,06	M2	
MODULO 13	20%	0,95		0,80		1,00	0,15	M2	

SUPERIOR	20%	0,25	0,95			1,00	0,05	M2	
COLUMNA O	20%	0,75		2,26		1,00	0,34	M2	
menos muro	20%	0,25		0,80		- 1,00	- 0,04	M2	
MURO INFERIOR	20%	0,97		1,10		1,00	0,21	M2	
MURO INFERIOR	20%	0,47		1,10		1,00	0,10	M2	
MURO LATERAL	20%	15,57		1,83		1,00	5,70	M2	
							-		
CERRAMIENTO EXTERIOR							-		
MURO	20%	0,13		1,08			0,03	M2	
COLUMNA A	20%	0,27		2,46			0,13	M2	
MODULO 1	20%	2,36		1,08			0,51	M2	
COLUMNA B	20%	0,27		2,74			0,15	M2	
MODULO 2	20%	2,95		0,95			0,56	M2	
COLUMNA C	20%	0,27		2,64			0,14	M2	
MODULO 3	20%	2,49		0,91			0,45	M2	
COLUMNA D	20%	0,27		2,24			0,12	M2	
COLUMNA E	20%	0,27		2,56			0,14	M2	
MODULO 4	20%	2,61		1,37			0,71	M2	
COLUMNA F	20%	0,27		3,00			0,16	M2	
MODULO 5	20%	2,64		1,53			0,81	M2	
COLUMNA G	20%	0,27		3,10			0,16	M2	
MODULO 6	20%	2,33		1,30			0,61	M2	
COLUMNA H	20%	0,27		2,76			0,15	M2	
MODULO 7	20%	2,00		1,44			0,58	M2	
COLUMNA I	20%	0,27		2,92			0,15	M2	
							-		
ACTA PARCIAL 05							-		
							-		
MURO POSTERIOR (AZUL)	20%	2,40		1,78		1,00	0,85	M2	CORTE 5
	20%	1,41		1,94		1,00	0,55	M2	CORTE 5
	20%	0,46		1,38		1,00	0,13	M2	CORTE 5
CARTERA	20%	2,70	0,21			1,00	0,11	M2	CORTE 5
MURO INFERIOR	20%	2,40		1,29		1,00	0,62	M2	CORTE 5
CARA SUPERIOR	20%	2,40	0,28			1,00	0,14	M2	CORTE 5
CARA LATERAL INFERIOR	20%	0,22		1,32		1,00	0,06	M2	CORTE 5
							-		
MENOS CANTIDAD COBRADA EN ACTA No. 4							-		
MURO POSTERIOR	20%	2,40		1,78		- 1,00	- 0,85	M2	CORTE 5
	20%	1,43		1,94		- 1,00	- 0,55	M2	CORTE 5
	20%	0,20		2,34		- 1,00	- 0,09	M2	CORTE 5
MURO INFERIOR	20%	2,40		1,32		- 1,00	- 0,63	M2	CORTE 5
CARA SUPERIOR	20%	2,40	0,28			- 1,00	- 0,14	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

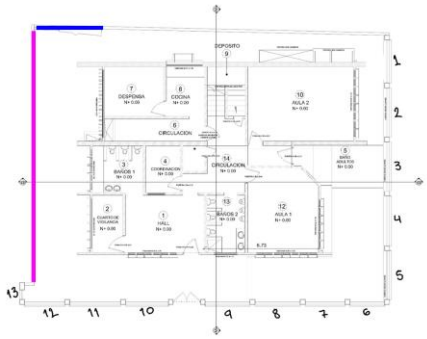

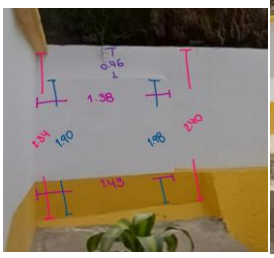

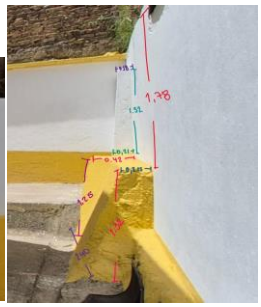

TOTAL EJECUTADO	154,13	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	153,93	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**0,20**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0,20	153,93	**154,13**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/6/2026

CAPITULO	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**4.1.40** SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION		M

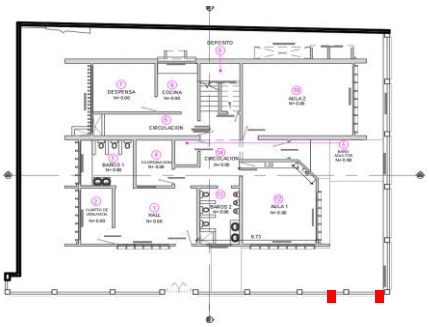ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
		Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
	ACTA PARCIAL 02									
	TUBERIA PARA DESAGUE DE PATIO DE JUEGOS IZQUIERDA			0.90			1.00	0.90	M	
	TUBERIA PARA DESAGUE DE PATIO DE JUEGOS DERECHA			1.26			1.00	1.26	M	
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05									
	CONEXIÓN DE CANAL A DESAGUE			0.80			1.00	0.80	M	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	2.96	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	2.16	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M	
PRESENTE ACTA	**0.80**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
0.80	2.16	**2.96**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**5.2.14**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.		UN


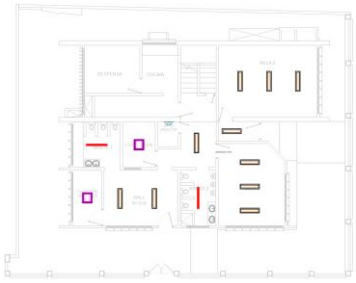
ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
		Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
	ACTA PARCIAL 02									
 Primer piso	**PISO 1**									
	BAÑOS 1						1.00	1.00	UN	CORTE 2
	CUARTO VIGILANCIA						1.00	1.00	UN	CORTE 2
	HALL						4.00	4.00	UN	CORTE 2
	COORDINACION						1.00	1.00	UN	CORTE 2
	BAÑOS 2						1.00	1.00	UN	CORTE 2
	AULA 1						3.00	3.00	UN	CORTE 2
	AULA 2						3.00	3.00	UN	CORTE 2
	PISO 2									
	AULA 3						4.00	4.00	UN	CORTE 2
	AULA 4						4.00	4.00	UN	CORTE 2
	ESCALERAS						2.00	2.00	UN	CORTE 2
 Segundo piso								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 03									
 Primer piso	**PISO 1**							-		
	BODEGA EN ZONA POSTERIOR						2.00	2.00	UN	CORTE 3
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

	ACTA PARCIAL 05									
	Fachada principal						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Fachada Posterior						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Fachada lateral izquierda						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Fachada lateral derecha						1.00	1.00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 								-		

TOTAL EJECUTADO	31.00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	26.00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	UN	
PRESENTE ACTA	**5.00**	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5.00	26.00	**31.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	NOMBRE	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**5.3.12** SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED		UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
		Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
	ACTA PARCIAL 03									
 Primer piso	**PRIMER PISO**							-		
	Hall						2.00	2.00	UN	CORTE 3
	Pasillo piso 1						2.00	2.00	UN	CORTE 3
	Aula 1						3.00	3.00	UN	CORTE 3
	Aula 2						3.00	3.00	UN	CORTE 3
								-		
								-		
								-		
 Segundo piso	**SEGUNDO PISO**							-		
	Aula 3						4.00	4.00	UN	CORTE 3
	Aula 4						4.00	4.00	UN	CORTE 3
	Pasillo escaleras						2.00	2.00	UN	CORTE 3
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	**ACTA PARCIAL 05**									
	Coordinación						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Cuarto de vigilancia						1.00	1.00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	22.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	20.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**2.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2.00	20.00	**22.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**8.1** ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.		M2

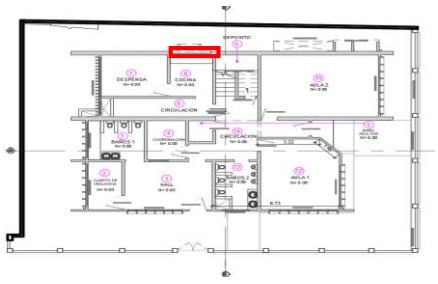



ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Área	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	ACTA PARCIAL 05									
	COCINA							-		
	CARTERA DE VENTANA HORIZONTAL		0.15	2.12				0.32	M2	CORTE 5
	CARTERA DE VENTANA VERTICAL		0.15	0.47				0.07	M2	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	0.39	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**0.39**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0.39	0.00	**0.39**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**14.1.6** TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO		M

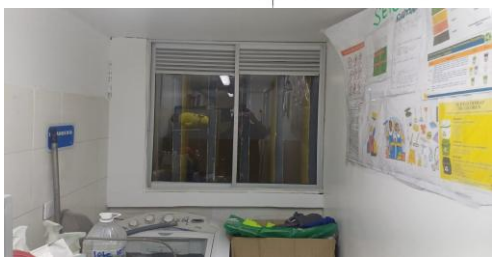ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
		Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
	ACTA PARCIAL 05									
	**LAVANDERIA**							-		
	CARTERA DE VENTANA VERTICAL			1.07			1.00	1.07	M	CORTE 5
	CARTERA DE VENTANA HORIZONTAL			1.15			1.00	1.15	M	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	2.22	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M	
PRESENTE ACTA	**2.22**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2.22	0.00	**2.22**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**15.1.3** CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.		UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
		Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
	ACTA PARCIAL 05									
	PUERTAS							-		
	HALL						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	BAÑO ADULTOS						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	AULA 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	AULA 2						1.00	1.00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	4.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**4.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4.00	0.00	**4.00**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**15.2.2**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.		M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
		Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
	ACTA PARCIAL 04									
 	PRIMER PISO							-		
	HALL (VERDE)							-		
	BATIENTE		0.38		1.27		2.00	0.97	M2	CORTE 4
	FIJA		0.39		1.29		4.00	2.01	M2	CORTE 4
	CUARTO VIGILANCIA (AMARILLO)							-		
	BATIENTE		0.37		0.94		2.00	0.70	M2	CORTE 4
	FIJA		0.39		0.96		3.00	1.12	M2	CORTE 4
 	BAÑOS 1							-		
	BATIENTE		0.38		0.96		2.00	0.73	M2	CORTE 4
	FIJO		0.39		0.985		5.00	1.92	M2	CORTE 4
								-		
	SEGUNDO PISO							-		
	AULA 3							-		
 	AZULES							-		
	BATIENTES		0.385		1.305		2.00	1.00	M2	CORTE 4
	FIJAS		0.395		1.32		6.00	3.13	M2	CORTE 4
	NARANJAS							-		
	BATIENTES		0.385		1.07		2.00	0.82	M2	CORTE 4
	FIJAS		0.395		1.08		2.00	0.85	M2	CORTE 4
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05									
								-		
 	**AULA 4**							-		
	AZULES							-		
	BATIENTES		0.385		1.305		2.00	1.00	M2	CORTE 5
	FIJAS		0.395		1.32		6.00	3.13	M2	CORTE 5
	NARANJAS							-		
	BATIENTES		0.385		1.07		2.00	0.82	M2	CORTE 5
	FIJAS		0.395		1.08		2.00	0.85	M2	CORTE 5
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	19.05	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	13.25	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**5.80**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5.80	13.25	**19.05**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JURAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO		**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**21.1.1**	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.			M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

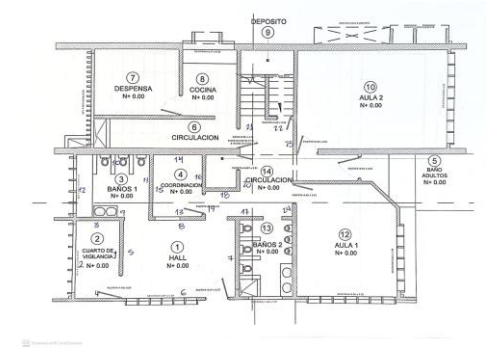







LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Área	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
ACTA PARCIAL 02							-		
PRIMER PISO							-		
1	20.00%	3.34		2.54		1.00	1.70	M2	CORTE 2
menos vano	20.00%	1.00		2.10		- 1.00	- 0.42	M2	CORTE 2
menos vano	20.00%	1.10		1.10		- 1.00	- 0.24	M2	CORTE 2
2	20.00%	3.34		2.45		1.00	1.64	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	0.44		1.00		- 5.00	- 0.44	M2	CORTE 2
3	20.00%	1.87		2.59		1.00	0.97	M2	CORTE 2
4	20.00%	1.70		2.59		1.00	0.88	M2	CORTE 2
5	20.00%	3.45		2.54		1.00	1.75	M2	CORTE 2
6	20.00%	4.60		3.10		1.00	2.85	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	0.96		2.20		- 1.00	- 0.42	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	0.40		1.30		- 6.00	- 0.62	M2	CORTE 2
7	20.00%	3.37		3.42		1.00	2.31	M2	CORTE 2
8	20.00%	4.60		3.10		1.00	2.85	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	0.88		2.03		- 1.00	- 0.36	M2	CORTE 2
	20.00%	0.95		2.02		1.00	0.38	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	1.00		1.10		- 1.00	- 0.22	M2	CORTE 2
9	20.00%	3.03		0.85		1.00	0.52	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	0.97		0.23		- 1.00	- 0.04	M2	CORTE 2
10	20.00%	3.03		0.85		1.00	0.52	M2	CORTE 2
11	20.00%	2.70		1.01		1.00	0.55	M2	CORTE 2
12	20.00%	2.70		0.63		1.00	0.34	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	0.43		0.38		- 5.00	- 0.16	M2	CORTE 2
13	20.00%	2.00		2.97		1.00	1.19	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	1.00		1.10		- 1.00	- 0.22	M2	CORTE 2
14	20.00%	2.00		2.97		1.00	1.19	M2	CORTE 2
15	20.00%	2.73		2.70		1.00	1.47	M2	CORTE 2
16	20.00%	2.73		3.09		1.00	1.69	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	0.78		2.03		- 1.00	- 0.32	M2	CORTE 2
17	20.00%	3.60		3.17		1.00	2.28	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	0.72		2.03		- 1.00	- 0.29	M2	CORTE 2
	20.00%	0.87		2.03		1.00	0.35	M2	CORTE 2
18	20.00%	1.40		2.25		1.00	0.63	M2	CORTE 2
19	20.00%	1.11		3.08		1.00	0.68	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	0.78		2.02		- 1.00	- 0.32	M2	CORTE 2
20	20.00%	1.61		3.32		1.00	1.07	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	0.68		2.02		- 1.00	- 0.27	M2	CORTE 2
21	20.00%	0.83		2.09		1.00	0.35	M2	CORTE 2
22	20.00%	1.17		2.09		1.00	0.49	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	0.67		2.00		- 1.00	- 0.27	M2	CORTE 2
23	20.00%	1.60		2.09		1.00	0.67	M2	CORTE 2
24	20.00%	1.56		3.00		1.00	0.94	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	0.88		2.02		- 1.00	- 0.36	M2	CORTE 2
							-		

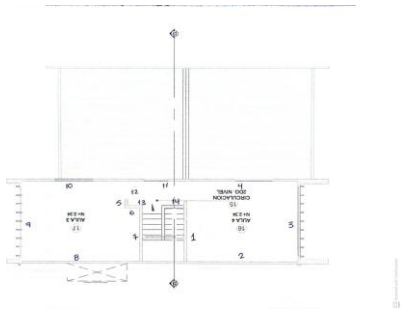














SEGUNDO PISO							-		
1	20.00%	4.58		3.35		1.00	3.07	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	1.01		2.07		- 1.00	- 0.42	M2	CORTE 2
2	20.00%	5.84		2.83		1.00	3.30	M2	CORTE 2
3	20.00%	4.58		2.20		1.00	2.02	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	0.43		1.35		- 8.00	- 0.93	M2	CORTE 2
4	20.00%	5.84		2.83		1.00	3.30	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	0.43		1.10		- 4.00	- 0.38	M2	CORTE 2
5	20.00%	1.57		2.90		1.00	0.91	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	1.05		2.05		- 1.00	- 0.43	M2	CORTE 2
6	20.00%	0.77		3.00		1.00	0.46	M2	CORTE 2
7	20.00%	3.02		3.05		1.00	1.84	M2	CORTE 2
8	20.00%	6.10		2.65		1.00	3.23	M2	CORTE 2
9	20.00%	4.58		2.23		1.00	2.04	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	0.43		1.33		- 8.00	- 0.92	M2	CORTE 2
10	20.00%	5.33		2.60		1.00	2.77	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	0.43		1.10		- 4.00	- 0.38	M2	CORTE 2
11	20.00%	3.00		3.14		1.00	1.88	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	1.95		0.51		- 1.00	- 0.20	M2	CORTE 2
12	20.00%	1.41		2.87		1.00	0.81	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	1.05		2.05		- 1.00	- 0.43	M2	CORTE 2
13	20.00%	0.78		2.98		1.00	0.46	M2	CORTE 2
14	20.00%	1.15		1.25		1.00	0.29	M2	CORTE 2
ACTA PARCIAL 03									
DESPENSA							-		
A	20%	3.47		0.25		2.00	0.35	M2	CORTE 3
B	20%	2.89		0.25		2.00	0.29	M2	CORTE 3
BAJO PLACA	20%	2.89	3.47				2.01	M2	CORTE 3
CORREDOR DESPENSA							-		
A	20%	5.82		2.18			2.54	M2	CORTE 3
MENOS VANO PUERTA	20%	0.8		2.18		-1.00	- 0.35	M2	CORTE 3
B	20%	1.28		2.18			0.56	M2	CORTE 3
MENOS VANO PUERTA	20%	0.09		2.18		-1.00	- 0.04	M2	CORTE 3
C	20%	3.77		2.18			1.64	M2	CORTE 3
D	20%	2.05		0.41			0.17	M2	CORTE 3
BAJO PLACA	20%	1.28	5.82				1.49	M2	CORTE 3











ACTA PARCIAL 05									
MURO DE CONTENCION							-		
PARED LATERAL (ROSA)							-		
MURO	20%	15.00		2.34		1.00	7.02	M2	CORTE 5
CARA SUPERIOR	20%	0.64	15.00			1.00	1.91	M2	CORTE 5
BORDE	20%	0.08	15.00			1.00	0.23	M2	CORTE 5
							-		
MURO POSTERIOR (CYAN)	20%	2.40		1.78		1.00	0.85	M2	CORTE 5
		1.43		1.94		1.00	2.77	M2	CORTE 5
		0.20		2.34		1.00	0.47	M2	CORTE 5
MURO INFERIOR	20%	2.40		1.32		1.00	0.63	M2	CORTE 5
CARA SUPERIOR	20%	2.40	0.28			1.00	0.14	M2	CORTE 5
							-		
PARED POSTERIOR	20%	16.30		2.87		1.00	9.36	M2	CORTE 5
MURO INFERIOR (AMARILLO)	20%	4.10	0.10			1.00	0.08	M2	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	79.70	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	56.24	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**23.46**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
23.46	56.24	**79.70**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**


CAPITULO		**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**22.1.4**	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
		Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
	ACTA PARCIAL 02							-		
	PRIMER PISO							-		
	1	20.00%	3.34		2.54		1.00	1.70	M2	CORTE 2
	menos vano	20.00%	1.00		2.10		- 1.00	- 0.42	M2	CORTE 2
	menos vano	20.00%	1.10		1.10		- 1.00	- 0.24	M2	CORTE 2
	2	20.00%	3.34		2.45		1.00	1.64	M2	CORTE 2
	menos ventana	20.00%	0.44		1.00		- 5.00	- 0.44	M2	CORTE 2
	3	20.00%	1.87		2.59		1.00	0.97	M2	CORTE 2
	4	20.00%	1.70		2.59		1.00	0.88	M2	CORTE 2
	5	20.00%	3.45		2.54		1.00	1.75	M2	CORTE 2
	6	20.00%	4.60		3.10		1.00	2.85	M2	CORTE 2
	menos puerta	20.00%	0.96		2.20		- 1.00	- 0.42	M2	CORTE 2
	menos ventana	20.00%	0.40		1.30		- 6.00	- 0.62	M2	CORTE 2
	7	20.00%	3.37		3.42		1.00	2.31	M2	CORTE 2
	8	20.00%	4.60		3.10		1.00	2.85	M2	CORTE 2
	menos puerta	20.00%	0.88		2.03		- 1.00	- 0.36	M2	CORTE 2
		20.00%	0.95		2.02		1.00	0.38	M2	CORTE 2
	menos ventana	20.00%	1.00		1.10		- 1.00	- 0.22	M2	CORTE 2
	9	20.00%	3.03		0.85		1.00	0.52	M2	CORTE 2
	menos puerta	20.00%	0.97		0.23		- 1.00	- 0.04	M2	CORTE 2
	10	20.00%	3.03		0.85		1.00	0.52	M2	CORTE 2
	11	20.00%	2.70		1.01		1.00	0.55	M2	CORTE 2
	12	20.00%	2.70		0.63		1.00	0.34	M2	CORTE 2
	menos ventana	20.00%	0.43		0.38		- 5.00	- 0.16	M2	CORTE 2
	13	20.00%	2.00		2.97		1.00	1.19	M2	CORTE 2
	menos ventana	20.00%	1.00		1.10		- 1.00	- 0.22	M2	CORTE 2
	14	20.00%	2.00		2.97		1.00	1.19	M2	CORTE 2
	15	20.00%	2.73		2.70		1.00	1.47	M2	CORTE 2
	16	20.00%	2.73		3.09		1.00	1.69	M2	CORTE 2
	menos puerta	20.00%	0.78		2.03		- 1.00	- 0.32	M2	CORTE 2
	17	20.00%	3.60		3.17		1.00	2.28	M2	CORTE 2
	menos puerta	20.00%	0.72		2.03		- 1.00	- 0.29	M2	CORTE 2
		20.00%	0.87		2.03		1.00	0.35	M2	CORTE 2
	18	20.00%	1.40		2.25		1.00	0.63	M2	CORTE 2
	19	20.00%	1.11		3.08		1.00	0.68	M2	CORTE 2
	menos puerta	20.00%	0.78		2.02		- 1.00	- 0.32	M2	CORTE 2
	20	20.00%	1.61		3.32		1.00	1.07	M2	CORTE 2
	menos puerta	20.00%	0.68		2.02		- 1.00	- 0.27	M2	CORTE 2
	21	20.00%	0.83		2.09		1.00	0.35	M2	CORTE 2
	22	20.00%	1.17		2.09		1.00	0.49	M2	CORTE 2
	menos puerta	20.00%	0.67		2.00		- 1.00	- 0.27	M2	CORTE 2
	23	20.00%	1.60		2.09		1.00	0.67	M2	CORTE 2
	24	20.00%	1.56		3.00		1.00	0.94	M2	CORTE 2
	menos puerta	20.00%	0.88		2.02		- 1.00	- 0.36	M2	CORTE 2
								-		

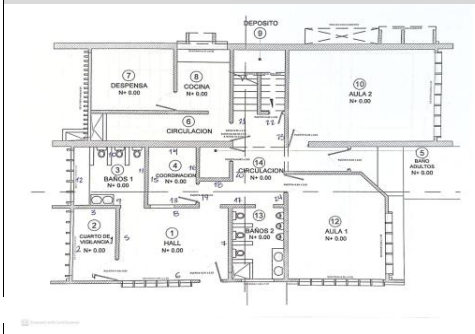





















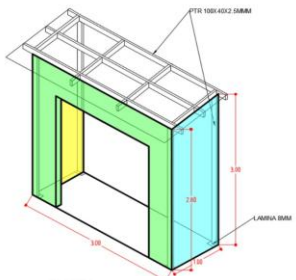





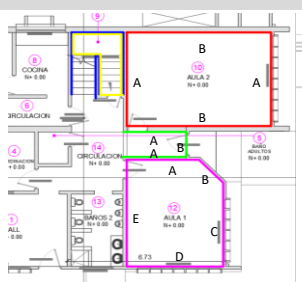



SEGUNDO PISO							-		
1	20.00%	4.58		3.35		1.00	3.07	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	1.01		2.07		- 1.00	- 0.42	M2	CORTE 2
2	20.00%	5.84		2.83		1.00	3.30	M2	CORTE 2
3	20.00%	4.58		2.20		1.00	2.02	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	0.43		1.35		- 8.00	- 0.93	M2	CORTE 2
4	20.00%	5.84		2.83		1.00	3.30	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	0.43		1.10		- 4.00	- 0.38	M2	CORTE 2
5	20.00%	1.57		2.90		1.00	0.91	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	1.05		2.05		- 1.00	- 0.43	M2	CORTE 2
6	20.00%	0.77		3.00		1.00	0.46	M2	CORTE 2
7	20.00%	3.02		3.05		1.00	1.84	M2	CORTE 2
8	20.00%	6.10		2.65		1.00	3.23	M2	CORTE 2
9	20.00%	4.58		2.23		1.00	2.04	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	0.43		1.33		- 8.00	- 0.92	M2	CORTE 2
10	20.00%	5.33		2.60		1.00	2.77	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	0.43		1.10		- 4.00	- 0.38	M2	CORTE 2
11	20.00%	3.00		3.14		1.00	1.88	M2	CORTE 2
menos ventana	20.00%	1.95		0.51		- 1.00	- 0.20	M2	CORTE 2
12	20.00%	1.41		2.87		1.00	0.81	M2	CORTE 2
menos puerta	20.00%	1.05		2.05		- 1.00	- 0.43	M2	CORTE 2
13	20.00%	0.78		2.98		1.00	0.46	M2	CORTE 2
14	20.00%	1.15		1.25		1.00	0.29	M2	CORTE 2
ACTA PARCIAL 03									
DESPENSA							-		
A		3.47		0.25		2.00	1.74	**M2**	CORTE 3
B		2.89		0.25		2.00	1.45	**M2**	CORTE 3
BAJO PLACA		2.89	3.47				10.03	**M2**	CORTE 3
CORREDOR DESPENSA							-		
A		5.82		2.18			12.69	**M2**	CORTE 3
MENOS VANO PUERTA		0.80		2.18		- 1.00	- 1.74	**M2**	CORTE 3
B		1.28		2.18			2.79	**M2**	CORTE 3
MENOS VANO PUERTA		0.09		2.18		- 1.00	- 0.20	**M2**	CORTE 3
C		3.77		2.18			8.22	**M2**	CORTE 3
D		2.05		0.41			0.84	**M2**	CORTE 3
BAJO PLACA		1.28	5.82				7.45	**M2**	CORTE 3
MENOS CANTIDAD DE RESANE ÍTEM 21.1.1 ACTA No. 3		8.66				- 1.00	- 8.66	**M2**	
BODEGA							-		
MUROS LATERALES EXTERNOS		1.00		2.90		2.00	5.80	**M2**	CORTE 3
MENOS VANO PUERTA		2.00		2.21		- 1.00	- 4.42	**M2**	CORTE 3
MURO FRONTAL EXTERNO		3.00		2.80		1.00	8.40	**M2**	CORTE 3
MUROS LATERALES INTERNOS		0.89		2.90		2.00	5.13	**M2**	CORTE 3
MENOS VANO PUERTA		2.00		2.21		- 1.00	- 4.42	**M2**	CORTE 3
PARED FRONTAL INTERNA		2.77		2.80			7.76	**M2**	CORTE 3
CARTERA		6.42	0.12			1.00	0.74	**M2**	CORTE 3
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
ACTA PARCIAL 04									
AULA 1							-		
A		3.09		3.14		1.00	9.69	**M2**	**CORTE 4**
B		1.45		2.88		1.00	4.17	**M2**	**CORTE 4**
C		3.86		2.73		1.00	10.54	**M2**	**CORTE 4**
menos ventana		2.82		1.30		- 1.00	- 3.67	**M2**	**CORTE 4**
D		4.09		2.99		1.00	12.23	**M2**	**CORTE 4**
menos ventana		3.50		1.30		- 1.00	- 4.55	**M2**	**CORTE 4**
E		3.90		3.25		1.00	12.68	**M2**	**CORTE 4**
menos puerta		0.88		2.04		- 1.00	- 1.80	**M2**	**CORTE 4**
							-		









CIRCULACION							-		
A		2.67		3.16		2.00	16.85	M2	CORTE 4
B		1.17		3.16		1.00	3.69	M2	CORTE 4
menos puerta		0.98		2.64		- 1.00	- 2.59	M2	CORTE 4
							-		
AULA 2							-		
A		4.31		2.18		2.00	18.79	M2	CORTE 4
menos ventana		2.92		1.30		- 1.00	- 3.80	M2	CORTE 4
B		6.10		2.18		2.00	26.60	M2	CORTE 4
menos puerta		0.88		2.03		- 1.00	- 1.79	M2	CORTE 4
BAJO PLACA		4.31	6.10			1.00	26.29	M2	CORTE 4
							-		
MUROS DE ESCALERA							-		
A		1.70		5.26		1.00	8.94	M2	CORTE 4
A1		1.20		3.26		1.00	3.91	M2	CORTE 4
B		2.20		1.35		1.00	2.97	M2	CORTE 4
B1		2.20		0.98		1.00	2.15	M2	CORTE 4
PLACA (MORADO)		2.20	1.19			1.00	2.62	M2	CORTE 4
C		1.85		3.72		1.00	6.87	M2	CORTE 4
C1		1.20		3.26		1.00	3.91	M2	CORTE 4
D		1.02		1.56		1.00	1.59	M2	CORTE 4
E		1.84		2.32		1.00	4.26	M2	CORTE 4
F		1.98		1.30		1.00	2.57	M2	CORTE 4
							-		
ACTA PARCIAL 05									
LAVANDERIA							-		
CARTERA DE VENTANA VERTICAL		0.24	1.07			1.00	0.26	M2	CORTE 5
CARTERA DE VENTANA HORIZONTAL		0.12	1.15			1.00	0.14	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	264.70	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	264.30	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**0.40**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0.40	264.30	**264.70**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**22.3.4** ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.		M2

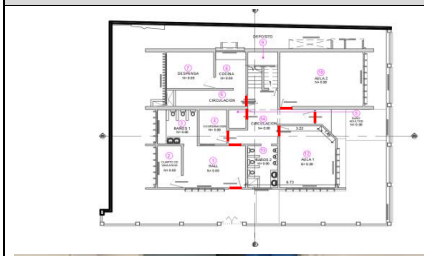



ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Área	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	ACTA PARCIAL 05									
	PINTURA DE PUERTAS							-		
	ENTRADA PRINCIPAL		0.97		2.25		1.00	2.18	M2	CORTE 5
	HALL (MEDIA PUERTA)		0.89		1.00		1.00	0.89	M2	CORTE 5
	COORDINACION		0.92		2.03		1.00	1.87	M2	CORTE 5
	AULA 1 (MEDIA PUERTA)		0.88		1.00		1.00	0.88	M2	CORTE 5
	AULA 2 (MEDIA PUERTA)		0.88		1.00		1.00	0.88	M2	CORTE 5
	ENTRADA LATERAL		0.98		2.00		1.00	1.96	M2	CORTE 5
	BAÑO ADULTOS		0.69		2.03		1.00	1.39	M2	CORTE 5
	CIRCULACION COCINA (MEDIA PUERTA)		0.90		1.00		1.00	0.90	M2	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	10.95	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**10.95**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10.95	0.00	**10.95**




OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**22.1.11**	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.			M

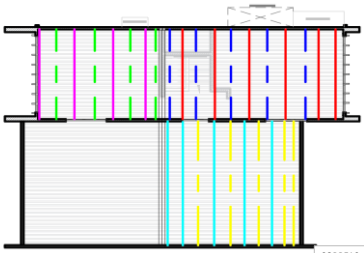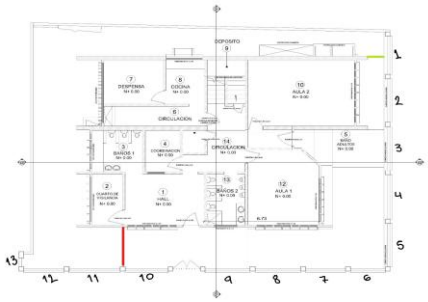ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
		Peso	Ancho	Largo	Alto	Área				
	ACTA PARCIAL 02							-		
    	**CORREAS DE CUBIERTA (LÍNEA CONTINUA)**							-		
	PTR 100X40X2.5MM PRIMER PISO (CYAN)			6.37			5.00	31.85	M	CORTE 2
	PTR 100X40X2.5MM SEGUNDO PISO PENDIENTE 1 (ROJO)			4.75			6.00	28.50	M	CORTE 2
	PTR 100X40X2.5MM SEGUNDO PISO PENDIENTE 2 (MAGENTA)			4.75			4.00	19.00	M	CORTE 2
								-		
	PLATINAS DE CORREAS EXISTENTES (PUNTEADAS)							-		
	LAMINA HR CAL 14 PRIMER PISO (AMARILLO)			6.24			5.00	31.20	M	CORTE 2
	LAMINA HR CAL 14 SEGUNDO PISO PENDIENTE 1 (AZULES)			4.60			5.00	23.00	M	CORTE 2
	LAMINA HR CAL 14 SEGUNDO PISO PENDIENTE 2 (VERDES)			4.60			4.00	18.40	M	CORTE 2
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 03							-		
  	**CORREAS DE CUBIERTA**							-		
	PTR 100X40X2.5MM PRIMER PISO (VERDE)			6.37			5.00	31.85	M	CORTE 3
	LAMINA HR CAL 14 PRIMER PISO (ROJO)			6.24			4.00	24.96	M	CORTE 3
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 04									
	**CERRAMIENTO**							-		
	MODULO 1							-		
	VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4''			1.06			14.00	14.84	**M**	CORTE 4
	CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.10			1.00	1.10	**M**	CORTE 4
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			2.57			2.00	5.14	**M**	CORTE 4
								-		
	MODULO 2							-		
	VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4''			1.06			18.00	19.08	**M**	CORTE 4
	CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.10			1.00	1.10	**M**	CORTE 4
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			2.91			2.00	5.82	**M**	CORTE 4
								-		
	MODULO 3							-		
	VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4''			1.06			18.00	19.08	**M**	CORTE 4
	CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.10			1.00	1.10	**M**	CORTE 4
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			2.94			2.00	5.88	**M**	CORTE 4
								-		

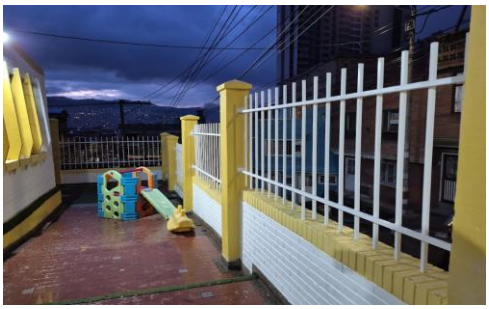





MODULO 4							-		
VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4''			1.06			18.00	19.08	**M**	CORTE 4
CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.10			1.00	1.10	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			2.97			2.00	5.94	**M**	CORTE 4
							-		
MODULO 5							-		
VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4''			1.06			18.00	19.08	**M**	CORTE 4
CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.10			1.00	1.10	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			2.90			2.00	5.80	**M**	CORTE 4
							-		
MODULO 6							-		
VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4''			1.06			12.00	12.72	**M**	CORTE 4
CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.10			1.00	1.10	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			2.02			2.00	4.04	**M**	CORTE 4
							-		
MODULO 7							-		
VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4''			1.06			14.00	14.84	**M**	CORTE 4
CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.10			1.00	1.10	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			2.38			2.00	4.76	**M**	CORTE 4
							-		
MODULO 8							-		
VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4''			1.06			16.00	16.96	**M**	CORTE 4
CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.10			1.00	1.10	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			2.69			2.00	5.38	**M**	CORTE 4
							-		
MODULO 9							-		
VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4''			1.06			16.00	16.96	**M**	CORTE 4
CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.10			1.00	1.10	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			2.65			2.00	5.30	**M**	CORTE 4
							-		
MODULO 10							-		
VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4''			1.06			14.00	14.84	**M**	CORTE 4
CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.10			1.00	1.10	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			2.53			2.00	5.06	**M**	CORTE 4
							-		
MODULO 11							-		
VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4''			1.06			18.00	19.08	**M**	CORTE 4
CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.10			1.00	1.10	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			3.01			2.00	6.02	**M**	CORTE 4
							-		
MODULO 12							-		
VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4''			1.06			14.00	14.84	**M**	CORTE 4
CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.10			1.00	1.10	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			2.39			2.00	4.78	**M**	CORTE 4
							-		
MODULO 13							-		
VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4''			1.10			6.00	6.60	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			0.93			2.00	1.86	**M**	CORTE 4
							-		
PUERTA PRINCIPAL							-		
VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' ENTERO			1.80			8.00	14.40	**M**	CORTE 4
VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' MEDIA ALTURA			0.94			10.00	9.40	**M**	CORTE 4
VERTICAL PERFIL TUBULAR 1''			1.80			4.00	7.20	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			0.73			6.00	4.38	**M**	CORTE 4
							-		
CERRAMIENTO PATIO DELANTERO							-		
ELEMENTO FIJO							-		
VERTICAL PERFIL TUBULAR 1''			0.97			1.00	0.97	**M**	CORTE 4
VERTICAL PERFIL TUBULAR 1''			2.05			1.00	2.05	**M**	CORTE 4
VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' A			1.35			1.00	1.35	**M**	CORTE 4
VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' B			1.62			1.00	1.62	**M**	CORTE 4
VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' C-K			2.05			9.00	18.45	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1''			2.98			1.00	2.98	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' A			2.86			1.00	2.86	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' B			1.41			1.00	1.41	**M**	CORTE 4
							-		
ELEMENTO BATIENTE							-		
VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4''			2.00			9.00	18.00	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.08			3.00	3.24	**M**	CORTE 4
							-		


CERRAMIENTO PATIO TRASERO							-		
ELEMENTO FIJO							-		
DIAGONAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.79			1.00	1.79	**M**	CORTE 4
VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.76			4.00	7.04	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' A						1.00	1.00	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' B			0.49			1.00	0.49	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' C			0.40			1.00	0.40	**M**	CORTE 4
							-		
ELEMENTO BATIENTE							-		
VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4''			1.77			5.00	8.83	**M**	CORTE 4
VERTICAL PERFIL TUBULAR 1''			1.77			2.00	3.53	**M**	CORTE 4
VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' MEDIA			0.83			5.00	4.13	**M**	CORTE 4
HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4''			0.70			3.00	2.10	**M**	CORTE 4
							-		
ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE BODEGA							-		
PTR 100X40X2.5MM HORIZONTAL			3.40			4.00	13.60	**M**	CORTE 4
PTR 100X40X2.5MM TRASVERSAL			1.70			4.00	6.80	**M**	CORTE 4
							-		
GUARDAESCOBAS							-		
HALL			3.16				3.16	**M**	CORTE 4
CUARTO DE VIGILANCIA			2.33				2.33	**M**	CORTE 4
			1..86				-		
			3.33				3.33	**M**	CORTE 4
			1.86				1.86	**M**	CORTE 4
CIRCULACION							-		
			0.33				0.33	**M**	CORTE 4
			1.42				1.42	**M**	CORTE 4
			1.61				1.61	**M**	CORTE 4
			0.52				0.52	**M**	CORTE 4
			2.27				2.27	**M**	CORTE 4
			2.65				2.65	**M**	CORTE 4
			0.18				0.18	**M**	CORTE 4
			2.65				2.65	**M**	CORTE 4
			1.99				1.99	**M**	CORTE 4
							-		
AULA 1							-		
			3.09				3.09	**M**	CORTE 4
			1.45				1.45	**M**	CORTE 4
			3.86				3.86	**M**	CORTE 4
			4.09				4.09	**M**	CORTE 4
			3.02				3.02	**M**	CORTE 4
							-		
AULA 2			4.31				4.31	**M**	CORTE 4
			6.10				6.10	**M**	CORTE 4
			4.31				4.31	**M**	CORTE 4
			5.22				5.22	**M**	CORTE 4
							-		
BODEGA BAJO ESCALERA							-		
			0.29				0.29	**M**	CORTE 4
			0.34				0.34	**M**	CORTE 4
			2.87				2.87	**M**	CORTE 4
			1.92				1.92	**M**	CORTE 4
							-		
ESCALERA							-		
A			0.47			2.00	0.94	**M**	CORTE 4
B			0.48			2.00	0.96	**M**	CORTE 4
C			0.47			2.00	0.94	**M**	CORTE 4
D			0.47			2.00	0.94	**M**	CORTE 4
E			0.47			2.00	0.94	**M**	CORTE 4
F			0.48			2.00	0.96	**M**	CORTE 4
G			4.33			1.00	4.33	**M**	CORTE 4
H			0.48			2.00	0.95	**M**	CORTE 4
I			0.48			2.00	0.95	**M**	CORTE 4
J			0.48			2.00	0.95	**M**	CORTE 4
K			0.47			2.00	0.94	**M**	CORTE 4
L			0.47			2.00	0.94	**M**	CORTE 4
M			0.48			2.00	0.96	**M**	CORTE 4
							-		



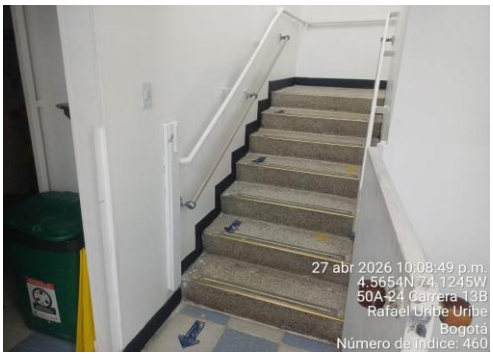





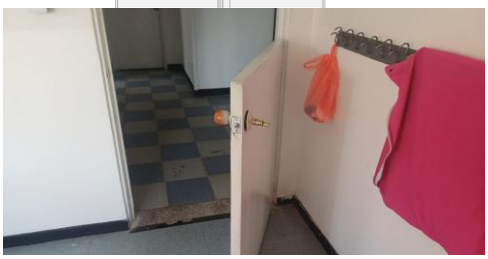

BARANDAS ESCALERA							-		
LATERAL PRIMER PISO A DESCANSO			3.78			1.00	3.78	M	CORTE 4
FRENTE			1.98			1.00	1.98	M	CORTE 4
LATERAL PRIMER PISO A DESCANSO			1.87			1.00	1.87	M	CORTE 4
SOPORTES			0.06			9.00	0.54	M	CORTE 4
LATERAL DESCANSO A SEGUNDO PISO			3.12			1.00	3.12	M	CORTE 4
LATERAL DESCANSO A SEGUNDO PISO			1.95			1.00	1.95	M	CORTE 4
SOPORTES			0.06			8.00	0.48	M	CORTE 4
							-		
							-		
ACTA PARCIAL 05									
MARCOS DE PUERTAS							-		
PRIMER PISO							-		
BAÑOS 2			4.78			1.00	4.78	M	CORTE 5
AULA 1			2.04			1.00	2.04	M	CORTE 5
AULA 2			2.04			1.00	2.04	M	CORTE 5
CIRCULACION			2.36			1.00	2.36	M	CORTE 5
COCINA			5.26			1.00	5.26	M	CORTE 5
							-		
SEGUNDO PISO							-		
ESCALERA			2.50			1.00	2.50	M	CORTE 5
AULA 3			5.15			1.00	5.15	M	CORTE 5
AULA 4			5.15			1.00	5.15	M	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	757.63	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	728.35	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M	
PRESENTE ACTA	**29.28**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
29.28	728.35	**757.63**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**


CAPITULO		**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**22.1.16**	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.			M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







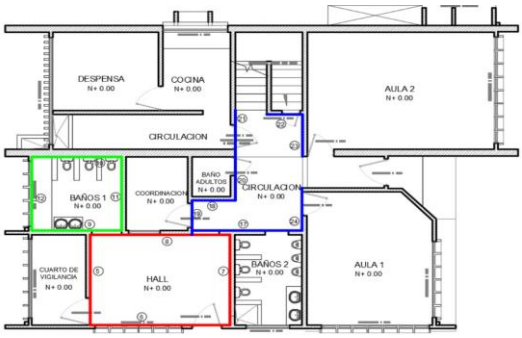










LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Área	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
ACTA PARCIAL 03									
PRIMER PISO							-		
DESPENSA							-		
A		3.47		0.25		2.00	1.74	M2	CORTE 3
B		2.89		0.25		2.00	1.45	M2	CORTE 3
BAJO PLACA		2.89	3.47				10.03	M2	CORTE 3
CORREDOR DESPENSA							-		
A		5.82		2.18			12.69	M2	CORTE 3
MENOS VANO PUERTA		0.80		2.18		- 1.00	- 1.74	M2	CORTE 3
B		1.28		2.18			2.79	M2	CORTE 3
MENOS VANO PUERTA		0.09		2.18		- 1.00	- 0.20	M2	CORTE 3
C		3.77		2.18			8.22	M2	CORTE 3
D		2.05		0.41			0.84	M2	CORTE 3
BAJO PLACA		1.28	5.82				7.45	M2	CORTE 3
							-		
MUROS PRIMER NIVEL							-		
5		3.45		1.20		1.00	4.14	M2	CORTE 3
6		4.60		1.20		1.00	5.52	M2	CORTE 3
menos puerta		0.96		1.20		- 1.00	- 1.15	M2	CORTE 3
menos ventana		0.40		0.65		- 6.00	- 1.56	M2	CORTE 3
7		3.37		1.20		1.00	4.04	M2	CORTE 3
8		4.60		1.20		1.00	5.52	M2	CORTE 3
menos puerta		0.88		2.03		- 1.00	- 1.79	M2	CORTE 3
menos puerta		0.95		2.02		- 1.00	- 1.92	M2	CORTE 3
9		3.03		0.85		1.00	2.58	M2	CORTE 3
menos puerta		0.97		0.23		- 1.00	- 0.22	M2	CORTE 3
10		3.03		0.85		1.00	2.58	M2	CORTE 3
11		2.70		1.01		1.00	2.73	M2	CORTE 3
12		2.70		0.63		1.00	1.70	M2	CORTE 3
17		3.60		1.20		1.00	4.32	M2	CORTE 3
menos puerta		0.72		1.20		- 1.00	- 0.86	M2	CORTE 3
menos puerta		0.87		1.20		- 1.00	- 1.04	M2	CORTE 3
18		1.40		1.20		1.00	1.68	M2	CORTE 3
19		1.11		1.20		1.00	1.33	M2	CORTE 3
menos puerta		0.78		1.20		- 1.00	- 0.94	M2	CORTE 3
20		1.61		1.20		1.00	1.93	M2	CORTE 3
menos puerta		0.68		1.20		- 1.00	- 0.82	M2	CORTE 3
21		0.83		1.20		1.00	1.00	M2	CORTE 3
22		1.17		1.20		1.00	1.40	M2	CORTE 3
menos puerta		0.67		1.20		- 1.00	- 0.80	M2	CORTE 3
23		1.60		1.20		1.00	1.92	M2	CORTE 3
24		1.56		1.20		1.00	1.87	M2	CORTE 3
menos puerta		0.88		1.20		- 1.00	- 1.06	M2	CORTE 3
							-		
SEGUNDO PISO							-		CORTE 3
1		4.58		1.20		1.00	5.50	M2	CORTE 3
menos puerta		1.01		1.20		- 1.00	- 1.21	M2	CORTE 3
2		5.84		1.20		1.00	7.01	M2	CORTE 3
3		4.58		1.20		1.00	5.50	M2	CORTE 3
menos ventana		0.43		0.60		- 8.00	- 2.06	M2	CORTE 3



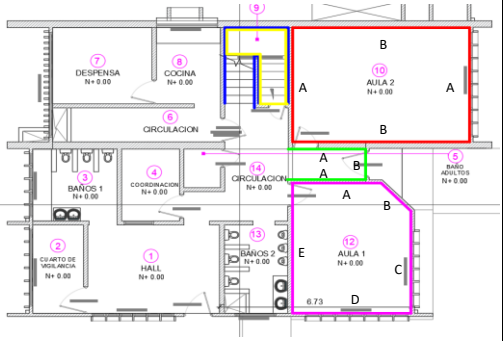



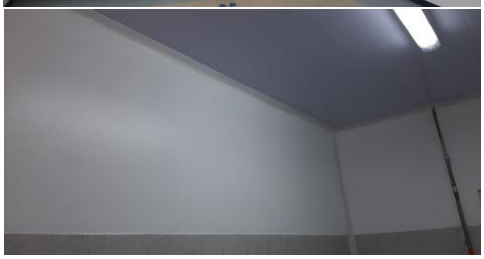

4		5.84		1.20		1.00	7.01	M2	CORTE 3
5		1.57		1.20		1.00	1.88	M2	CORTE 3
menos puerta		1.05		1.20		- 1.00	- 1.26	M2	CORTE 3
6		0.77		1.20		1.00	0.92	M2	CORTE 3
7		3.02		1.20		1.00	3.62	M2	CORTE 3
8		6.10		1.20		1.00	7.32	M2	CORTE 3
9		4.58		1.20		1.00	5.50	M2	CORTE 3
menos ventana		0.43		0.60		- 8.00	- 2.06	M2	CORTE 3
10		5.33		1.20		1.00	6.40	M2	CORTE 3
11		3.00		1.20		1.00	3.60	M2	CORTE 3
12		1.41		1.20		1.00	1.69	M2	CORTE 3
menos puerta		1.05		1.20		- 1.00	- 1.26	M2	CORTE 3
13		0.78		1.20		1.00	0.94	M2	CORTE 3
14		1.15		1.20		1.00	1.38	M2	CORTE 3
							-		
ACTA PARCIAL 04									
							-		
AULA 1							-		
A		3.09		1.20		1.00	3.71		CORTE 4
B		1.45		1.20		1.00	1.74		CORTE 4
C		3.86		1.20		1.00	4.63		CORTE 4
D		4.09		1.20		1.00	4.91		CORTE 4
E		3.90		1.20		1.00	4.68		CORTE 4
							-		
CIRCULACION							-		
A		2.67		1.20		2.00	6.41		CORTE 4
B		1.17		1.20		1.00	1.40		CORTE 4
							-		
AULA 2							-		
A		4.31		1.20		2.00	10.34		CORTE 4
B		6.10		1.20		2.00	14.64		CORTE 4
							-		
MUROS DE ESCALERA							-		
A SUBIENDO		1.70		1.20		1.00	2.04		CORTE 4
A1		1.20		1.20		1.00	1.44		CORTE 4
B		2.20		1.20		1.00	2.64		CORTE 4
B1		2.20		1.20		1.00	2.64		CORTE 4
C		1.85		1.20		1.00	2.22		CORTE 4
C1		1.20		1.20		1.00	1.44		CORTE 4
D		1.02		1.20		1.00	1.22		CORTE 4
E		1.84		1.20		1.00	2.21		CORTE 4
F		1.98		1.20		1.00	2.38		CORTE 4
							-		
BAÑO 1							-		
A		2.71		0.45			1.22		CORTE 4
menos ventana		2.39		0.39			0.93		CORTE 4
B		2.99		0.45			1.35		CORTE 4
C		2.71		0.53			1.44		CORTE 4
menos puerta		0.97		0.23			0.22		CORTE 4
D		2.99		0.45			1.35		CORTE 4
							-		
BAÑO 2							-		
A		3.34		1.00			3.34		CORTE 4
B		2.18		1.00			2.18		CORTE 4
menos ventana		1.00		0.42			0.42		CORTE 4
C		3.34		1.00			3.34		CORTE 4
D		2.18		1.00			2.18		CORTE 4
menos puerta		0.76		0.26			0.20		CORTE 4
							-		





BAÑO 3							-		
A		1.47		1.00			1.47		CORTE 4
menos puerta		0.68		0.21			0.14		CORTE 4
B		1.26		1.00			1.26		CORTE 4
C		1.47		1.00			1.47		CORTE 4
D		1.26		1.00			1.26		CORTE 4
							-		
							-		
ACTA PARCIAL 05									
LAVANDERIA							-		
CARTERA DE VENTANA VERTICAL		0.24	1.07			1.00	0.26	**M2**	CORTE 5
CARTERA DE VENTANA HORIZONTAL		0.12	1.15			1.00	0.14	**M2**	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	220.65	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	220.25	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**0.40**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0.40	220.25	**220.65**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**23.3.4** MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2		M2

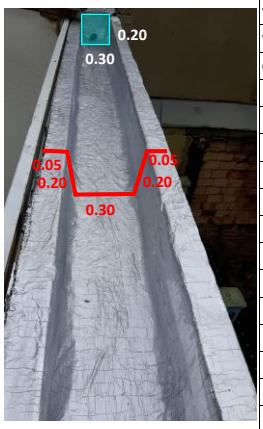ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
		Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
  	VIGA CANAL SEGUNDO PISO		0.80	4.6			2.00	7.36	M2	
	VIGA CANAL PRIMER PISO		0.80	6.24			2.00	9.98	M2	
	CARAS VERTICALES EN LOS EXTREMOS		0.2	0.3			4.00	0.24	M2	
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05									
								-		
 	CARAS EN LOS EXTREMOS		0.2	0.3			4.00	0.24	M2	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	17.82	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	17.58	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
PRESENTE ACTA	**0.24**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0.24	17.58	**17.82**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**005**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**23.4.7** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13		M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
		Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
	ACTA PARCIAL 05									
   Complemento diseñado para teja Ecowall 27 para ofrecer una instalación rápida y sencilla.										
	CABALLETE CUBIERTA SEGUNDO PISO		0.74	4.60			1.00	3.40	M2	CORTE 3
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 5									
   Complemento diseñado para teja Ecowall 27 para ofrecer una instalación rápida y sencilla.	CABALLETE CUBIERTA PRIMER PISO		0.74	6.24			1.00	4.62	M2	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	8.02	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	3.40	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**4.62**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4.62	3.40	**8.02**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

JARDÍN INFANTIL REFUGIO

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:		N/A			14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:		N/A			25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
06. JARDIN INFANTIL REFUGIO													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**												
1.2.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE MESONES EN CONCRETO (INDIFERENTE DE SUS MEDIDAS). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	M2	9,11	$ 21.742,00	$ 198.069,62	3,93	$ 85.446,06	-	$ -	3,93	$ 85.380,83	3,93	$ 85.380,83
1,3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	3,00	$ 28.037,00	$ 84.111,00	4,00	$ 112.148,00	-	$ -	4,00	$ 112.148,00	4,00	$ 112.148,00
1.3.12	DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	-	$ 24.637,00	$ -	8,77	$ 216.066,49	-	$ -	8,77	$ 216.066,49	8,77	$ 216.066,49
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS	M2	282,63	$ 72.169,00	$ 20.397.124,47	293,15	$ 21.156.342,35	-	$ -	293,15	$ 21.155.981,51	293,15	$ 21.155.981,51
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO; DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	7,53	$ 19.387,00	$ 145.984,11	13,04	$ 252.806,48	-	$ -	13,04	$ 252.806,48	13,04	$ 252.806,48
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	$ 10.912,00	$ -	47,68	$ 520.284,16	32,00	$ 349.184,00	15,68	$ 171.100,16	47,68	$ 520.284,16
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	115,52	$ 27.857,00	$ 3.218.040,64	47,67	$ 1.327.943,19	2,23	$ 62.121,11	45,44	$ 1.265.822,08	47,67	$ 1.327.943,19
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.6	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES DE 1/2" A 1,1/2" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'C=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	U	2,00	$ 31.382,00	$ 62.764,00	1,00	$ 31.382,00	-	$ -	1,00	$ 31.382,00	1,00	$ 31.382,00
1.6.7	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES DE 2" A 4" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'C=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	U	1,00	$ 63.773,00	$ 63.773,00	1,00	$ 63.773,00	-	$ -	1,00	$ 63.773,00	1,00	$ 63.773,00
1.6.20	DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLÁSTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, U OTROS RELACIONADOS.	UN	-	$ 121.680,00	$ -	1,00	$ 121.680,00	-	$ -	1,00	$ 121.680,00	1,00	$ 121.680,00
1.6.21	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.	UN	1,00	$ 28.037,00	$ 28.037,00	2,00	$ 56.074,00	-	$ -	2,00	$ 56.074,00	2,00	$ 56.074,00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	11,00	$ 14.184,00	$ 156.024,00	13,00	$ 184.392,00	-	$ -	13,00	$ 184.392,00	13,00	$ 184.392,00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	11,00	$ 19.177,00	$ 210.947,00	13,00	$ 249.301,00	-	$ -	13,00	$ 249.301,00	13,00	$ 249.301,00
1.6.29	DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	UN		$ 11.688,00	$ -	23,00	$ 268.824,00	23,00	$ 268.824,00		$ -	23,00	$ 268.824,00
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,60	$ 9.741,00	$ 15.585,60	1,68	$ 16.364,88	-	$ -	1,68	$ 16.364,88	1,68	$ 16.364,88
1,8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	-	$ 7.070,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 9.015,00	$ -	336,50	$ 3.033.547,50	-	$ -	336,50	$ 3.033.547,50	336,50	$ 3.033.547,50
1.8.4	PICADA Y RAYADA DE MURO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR Y PULIDORA CON DISCO DIAMANTADO GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	4,26	$ 11.609,00	$ 49.454,34	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	3,58	$ 10.686,00	$ 38.255,88	4,68	$ 50.010,48	-	$ -	4,68	$ 50.008,34	4,68	$ 50.008,34
1.8.6	DEMOLICION MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	3,58	$ 10.966,00	$ 39.258,28	9,52	$ 104.396,32	-	$ -	9,52	$ 104.394,13	9,52	$ 104.394,13
1.8.17	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	-	$ 24.675,00	$ -	10,16	$ 250.698,00	-	$ -	10,16	$ 250.698,00	10,16	$ 250.698,00
1,9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA										
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:								RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4														

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025		7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
06. JARDIN INFANTIL REFUGIO													
1.9.1	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADUA O EL BAMBÚ), INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ÁREA CUBIERTA PROYECTADA EN PLANTA.	M2	282,63	$ 21.615,00	$ 6.109.047,45	293,15	$ 6.336.437,25	-	$ -	293,15	$ 6.336.329,18	293,15	$ 6.336.329,18
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M., (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 53.593,00	$ -	15,18	$ 813.541,74	-	$ -	15,18	$ 813.541,74	15,18	$ 813.541,74
1.9.11	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 44.173,00	$ -	0,49	$ 21.644,77	-	$ -	0,49	$ 21.644,77	0,49	$ 21.644,77
1,10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M2	10,57	$ 6.474,00	$ 68.430,18	2,11	$ 13.660,14	2,11	$ 13.660,14	-	$ -	2,11	$ 13.660,14
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	15,50	$ 6.605,00	$ 102.377,50	19,82	$ 130.911,10	-	$ -	19,82	$ 130.911,10	19,82	$ 130.911,10
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	0,90	$ 42.476,00	$ 38.228,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	0,07	$ 36.056,00	$ 2.523,92	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2,2	**CONCRETOS**												
2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	M2	0,23	$ 26.400,00	$ 6.072,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.6	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.	M3	0,06	$ 802.001,00	$ 48.120,06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>6,1<=8,0 CM F'C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	-	$ 277.831,00	$ -	44,98	$ 12.496.838,38	-	$ -	44,98	$ 12.496.838,38	44,98	$ 12.496.838,38
2.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	-	$ 116.827,00	$ -	1,53	$ 178.745,31	-	$ -	1,53	$ 178.745,31	1,53	$ 178.745,31
2,3	**VARIOS - CIMENTACIONES**												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	8,00	$ 29.636,00	$ 237.088,00	10,00	$ 296.360,00	-	$ -	10,00	$ 296.360,00	10,00	$ 296.360,00
2,5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	-	$ 4.908,00	$ -	59,19	$ 290.504,52	-	$ -	59,19	$ 290.504,52	59,19	$ 290.504,52
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	5,58	$ 5.297,00	$ 29.557,26	17,79	$ 94.233,63	-	$ -	17,79	$ 94.233,63	17,79	$ 94.233,63
2,6	**ESTRUCTURAS METALICAS**												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1.326,46	$ 18.149,00	$ 24.073.922,54	712,62	$ 12.933.340,38	-	$ -	712,62	$ 12.933.399,98	712,62	$ 12.933.399,98
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3,1	**MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.**												
3.1.1	MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	-	$ 47.635,00	$ -	0,65	$ 30.962,75	-	$ -	0,65	$ 30.867,48	0,65	$ 30.867,48
3.1.2	MUROS E.=10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.4 33X9X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	4,68	$ 46.615,00	$ 218.158,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.3	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	0,70	$ 193.738,00	$ 135.616,60	4,41	$ 854.384,58	-	$ -	4,41	$ 854.384,58	4,41	$ 854.384,58
3,2	**OTROS MAMPUESTOS.**												
3.2.4	POYOS E = 0,10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60 M (INCLUYE MAMPOSTERÍA, PAÑETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO)	M	2,55	$ 116.439,00	$ 296.919,45	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.5	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	-	$ 25.744,00	$ -	38,20	$ 983.420,80	-	$ -	38,20	$ 983.420,80	38,20	$ 983.420,80
3,5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	48,76	$ 9.628,00	$ 469.461,28	36,30	$ 349.496,40	- 9,83	-$ 94.643,24	46,13	$ 444.139,64	36,30	$ 349.496,40
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4,1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1,00	$ 44.640,00	$ 44.640,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA CALIENTE CPVC LAVAMANOS 1/2"	UN	1,00	$ 46.216,00	$ 46.216,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA DUCHA	UN	-	$ 75.333,00	$ -	1,00	$ 75.333,00	-	$ -	1,00	$ 75.333,00	1,00	$ 75.333,00
4.1.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	-	$ 34.187,00	$ -	2,80	$ 95.723,60	0,60	$ 20.512,20	2,20	$ 75.211,40	2,80	$ 95.723,60
4.1.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 2"	UN	-	$ 42.252,00	$ -	1,00	$ 42.252,00	-	$ -	1,00	$ 42.252,00	1,00	$ 42.252,00
4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	UN	1,00	$ 53.058,00	$ 53.058,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PARED 2"	UN	-	$ 45.587,00	$ -	1,00	$ 45.587,00	-	$ -	1,00	$ 45.587,00	1,00	$ 45.587,00

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA														
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:										RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES			
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4																		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025			8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027		11. PLAZO:	24	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:		N/A				14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025			19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027		22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:		N/A				25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025												
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
06. JARDIN INFANTIL REFUGIO													
4,2	**VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.**												
4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 1/2"	UN	-	$ 67.992,00	$ -	1,00	$ 67.992,00	-	$ -	1,00	$ 67.992,00	1,00	$ 67.992,00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 199.311,00	$ 3.188.976,00	15,00	$ 2.989.665,00	-	$ -	15,00	$ 2.989.665,00	15,00	$ 2.989.665,00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 218.382,00	$ 436.764,00	2,00	$ 436.764,00	-	$ -	2,00	$ 436.764,00	2,00	$ 436.764,00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 216.629,00	$ 216.629,00	2,00	$ 433.258,00	-	$ -	2,00	$ 433.258,00	2,00	$ 433.258,00
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	6,00	$ 49.640,00	$ 297.840,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	-	$ 36.026,00	$ -	12,00	$ 432.312,00	-	$ -	12,00	$ 432.312,00	12,00	$ 432.312,00
5,2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 233.378,00	$ 933.512,00	14,00	$ 3.267.292,00	-	$ -	14,00	$ 3.267.292,00	14,00	$ 3.267.292,00
5.2.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 155.304,00	$ -	2,00	$ 310.608,00	-	$ -	2,00	$ 310.608,00	2,00	$ 310.608,00
5.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	M	-	$ 140.675,00	$ -	3,00	$ 422.025,00	-	$ -	3,00	$ 422.025,00	3,00	$ 422.025,00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	46,00	$ 234.104,00	$ 10.768.784,00	48,00	$ 11.236.992,00	-	$ -	48,00	$ 11.236.992,00	48,00	$ 11.236.992,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00	$ 315.585,00	$ 1.577.925,00	10,00	$ 3.155.850,00	-	$ -	10,00	$ 3.155.850,00	10,00	$ 3.155.850,00
5,3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	-	$ 456.222,00	$ -	1,00	$ 456.222,00	-	$ -	1,00	$ 456.222,00	1,00	$ 456.222,00
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	2,00	$ 57.862,00	$ 115.724,00	1,00	$ 57.862,00	-	$ -	1,00	$ 57.862,00	1,00	$ 57.862,00
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	26,00	$ 60.035,00	$ 1.560.910,00	15,00	$ 900.525,00	-	$ -	15,00	$ 900.525,00	15,00	$ 900.525,00
5.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G	UN	5,00	$ 234.217,00	$ 1.171.085,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	50,00	$ 16.054,00	$ 802.700,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF	M	-	$ 41.762,00	$ -	19,71	$ 823.129,02	-	$ -	19,71	$ 823.129,02	19,71	$ 823.129,02
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	145,00	$ 60.587,00	$ 8.785.115,00	152,07	$ 9.213.465,09	14,37	$ 870.635,19	137,70	$ 8.342.829,90	152,07	$ 9.213.465,09
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	-	$ 56.225,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	-	$ 92.434,00	$ -	16,91	$ 1.563.058,94	-	$ -	16,91	$ 1.563.058,94	16,91	$ 1.563.058,94
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00	$ 69.605,00	$ 348.025,00	10,00	$ 696.050,00	-	$ -	10,00	$ 696.050,00	10,00	$ 696.050,00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 192.065,00	$ 384.130,00	3,00	$ 576.195,00	-	$ -	3,00	$ 576.195,00	3,00	$ 576.195,00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	24,00	$ 192.642,00	$ 4.623.408,00	24,00	$ 4.623.408,00	-	$ -	24,00	$ 4.623.408,00	24,00	$ 4.623.408,00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	$ 41.548,00	$ 249.288,00	6,00	$ 249.288,00	-	$ -	6,00	$ 249.288,00	6,00	$ 249.288,00
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	8,00	$ 70.135,00	$ 561.080,00	10,00	$ 701.350,00	-	$ -	10,00	$ 701.350,00	10,00	$ 701.350,00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00	$ 52.758,00	$ 263.790,00	5,00	$ 263.790,00	-	$ -	5,00	$ 263.790,00	5,00	$ 263.790,00
5,6	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	-	$ 41.486,00	$ -	9,46	$ 392.457,56	-	$ -	9,46	$ 392.457,56	9,46	$ 392.457,56
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN	-	$ 1.052.087,00	$ -	1,00	$ 1.052.087,00	-	$ -	1,00	$ 1.052.087,00	1,00	$ 1.052.087,00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	9,00	$ 220.619,00	$ 1.985.571,00	9,00	$ 1.985.571,00	-	$ -	9,00	$ 1.985.571,00	9,00	$ 1.985.571,00
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 263.215,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00	-	$ -	1,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	2,00	$ 173.638,00	$ 347.276,00	2,00	$ 347.276,00	-	$ -	2,00	$ 347.276,00	2,00	$ 347.276,00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	3,00	$ 272.141,00	$ 816.423,00	3,00	$ 816.423,00	-	$ -	3,00	$ 816.423,00	3,00	$ 816.423,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
06. JARDIN INFANTIL REFUGIO													
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	3,00	$ 459.176,00	$ 1.377.528,00	3,00	$ 1.377.528,00	-	$ -	3,00	$ 1.377.528,00	3,00	$ 1.377.528,00
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1,00	$ 7.472.944,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	1,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO	UN	-	$ 163.009,00	$ -	1,00	$ 163.009,00	-	$ -	1,00	$ 163.009,00	1,00	$ 163.009,00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	200,00	$ 8.605,00	$ 1.721.000,00	122,20	$ 1.051.531,00	122,20	$ 1.051.531,00	-	$ -	122,20	$ 1.051.531,00
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	115,01	$ 49.523,00	$ 5.695.640,23	45,16	$ 2.236.458,68	-	$ -	45,16	$ 2.236.458,68	45,16	$ 2.236.458,68
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	115,01	$ 127.357,00	$ 14.647.328,57	46,58	$ 5.932.289,06	-	$ -	46,58	$ 5.932.289,06	46,58	$ 5.932.289,06
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	-	$ 21.009,00	$ -	250,57	$ 5.264.225,13	-	$ -	250,57	$ 5.264.225,13	250,57	$ 5.264.225,13
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	5,24	$ 26.647,00	$ 139.630,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	84,94	$ 23.195,00	$ 1.970.183,30	47,66	$ 1.105.473,70	-	$ -	47,66	$ 1.105.473,70	47,66	$ 1.105.473,70
7,4	**OTROS**												
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	3,38	$ 64.673,00	$ 218.594,74	16,54	$ 1.069.691,42	-	$ -	16,54	$ 1.069.691,42	16,54	$ 1.069.691,42
7.4.16	WIN DE ALUMINIO	M	-	$ 23.927,00	$ -	20,25	$ 484.521,75	-	$ -	20,25	$ 484.521,75	20,25	$ 484.521,75
8	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES	M2	16,48	$ 113.182,00	$ 1.865.239,36	14,65	$ 1.658.116,30	0,28	$ 31.690,96	14,37	$ 1.626.425,34	14,65	$ 1.658.116,30
8,2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES	M2	-	$ 126.722,00	$ -	13,65	$ 1.729.755,30	-	$ -	13,65	$ 1.729.755,30	13,65	$ 1.729.755,30
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	12,47	$ 204.138,00	$ 2.545.600,86	16,21	$ 3.309.076,98	-	$ -	16,21	$ 3.309.076,98	16,21	$ 3.309.076,98
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9,1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4,38	$ 340.611,00	$ 1.491.876,18	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	-	$ 544.774,00	$ -	8,51	$ 4.636.026,74	-	$ -	8,51	$ 4.636.026,74	8,51	$ 4.636.026,74
9,2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	-	$ 206.808,00	$ -	3,26	$ 674.194,08	3,26	$ 674.194,08	-	$ -	3,26	$ 674.194,08
9,3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 80 X 80 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN	-	$ 228.536,00	$ -	2,64	$ 603.335,04	-	$ -	2,64	$ 603.335,04	2,64	$ 603.335,04
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
11.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	1,00	$ 100.380,00	$ 100.380,00	1,00	$ 100.380,00	-	$ -	1,00	$ 100.380,00	1,00	$ 100.380,00
11,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN		$ 563.554,00	$ -	1,00	$ 563.554,00	1,00	$ 563.554,00	-	$ -	1,00	$ 563.554,00
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM	UN	1,00	$ 249.767,00	$ 249.767,00	1,00	$ 249.767,00	-	$ -	1,00	$ 249.767,00	1,00	$ 249.767,00
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14,1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	24,24	$ 107.142,00	$ 2.597.122,08	60,61	$ 6.493.876,62	-	$ -	60,61	$ 6.493.876,62	60,61	$ 6.493.876,62
14,2	**DIVISIONES.**												
14.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M	-	$ 85.110,00	$ -	25,47	$ 2.167.751,70	8,37	$ 712.370,70	17,10	$ 1.455.381,00	25,47	$ 2.167.751,70
15,2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO Y PLOTADO INCOLORO E =4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	-	$ 152.990,00	$ -	2,11	$ 322.808,90	2,11	$ 322.808,90	-	$ -	2,11	$ 322.808,90
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO Y FLOTADO INCOLORO E =5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	10,57	$ 175.628,00	$ 1.856.387,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø.=2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL./BWG.10 HUECO 2,1/4"X2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	9,88	$ 101.996,00	$ 1.007.720,48	8,77	$ 894.504,92	-	$ -	8,77	$ 894.504,92	8,77	$ 894.504,92

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:		N/A			14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:		N/A			25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
06. JARDIN INFANTIL REFUGIO													
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	76,09	$ 38.828,00	$ 2.954.422,52	44,46	$ 1.726.292,88	-	$ -	44,46	$ 1.726.292,88	44,46	$ 1.726.292,88
16.10	CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE FIJACION; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 Ø=2.5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L=60MM A =25,4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24, CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GUÍA CON GUAYA DE ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA.	M	47,31	$ 60.209,00	$ 2.848.487,79	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	282,63	$ 4.546,00	$ 1.284.835,98	453,12	$ 2.059.883,52	-	$ -	453,12	$ 2.059.883,52	453,12	$ 2.059.883,52
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E =2 CM DANDO ACABADO LISO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	-	$ 20.180,00	$ -	46,13	$ 930.903,40	-	$ -	46,13	$ 930.903,40	46,13	$ 930.903,40
21.1.5	PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	-	$ 30.772,00	$ -	232,10	$ 7.142.181,20	-	$ -	232,10	$ 7.142.058,11	232,10	$ 7.142.058,11
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	-	$ 25.958,00	$ -	128,82	$ 3.343.909,56	-	$ -	128,82	$ 3.343.909,56	128,82	$ 3.343.909,56
21.1.11	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	-	$ 79.240,00	$ -	89,87	$ 7.121.298,80	-	$ -	89,87	$ 7.121.298,80	89,87	$ 7.121.298,80
21,2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**												
21.2.4	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,60	$ 44.852,00	$ 71.763,20	1,68	$ 75.351,36	-	$ -	1,68	$ 75.351,36	1,68	$ 75.351,36
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	249,29	$ 71.517,00	$ 17.828.472,93	448,88	$ 32.102.550,96	78,39	$ 5.606.217,63	370,49	$ 26.496.333,33	448,88	$ 32.102.550,96
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	249,29	$ 13.689,00	$ 3.412.530,81	203,34	$ 2.783.521,26	37,41	$ 512.105,49	165,93	$ 2.271.415,77	203,34	$ 2.783.521,26
22.1.9	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 24.308,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	227,44	$ 12.878,00	$ 2.928.972,32	522,82	$ 6.732.875,96	45,29	$ 583.244,62	477,53	$ 6.149.631,34	522,82	$ 6.732.875,96
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 29.936,00	$ -	101,77	$ 3.046.586,72	17,50	$ 523.880,00	84,27	$ 2.522.706,72	101,77	$ 3.046.586,72
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 16.676,00	$ -	247,21	$ 4.122.473,96	35,45	$ 591.164,20	211,76	$ 3.531.309,76	247,21	$ 4.122.473,96
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	-	$ 125.559,00	$ -	9,95	$ 1.249.312,05	-	$ -	9,95	$ 1.249.111,16	9,95	$ 1.249.111,16
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	271,61	$ 253.100,00	$ 68.744.491,00	293,15	$ 74.196.265,00	-	$ -	293,15	$ 74.194.999,50	293,15	$ 74.194.999,50
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSION: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	29,84	$ 99.728,00	$ 2.975.883,52	4,22	$ 420.852,16	-	$ -	4,22	$ 420.852,16	4,22	$ 420.852,16
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	7,53	$ 214.934,00	$ 1.618.453,02	13,04	$ 2.802.739,36	-	$ -	13,04	$ 2.802.739,36	13,04	$ 2.802.739,36
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	73,12	$ 53.788,00	$ 3.932.978,56	117,09	$ 6.298.036,92	-	$ -	117,09	$ 6.298.036,92	117,09	$ 6.298.036,92
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	14,92	$ 82.182,00	$ 1.226.155,44	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	9,90	$ 45.109,00	$ 446.579,10	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 251.616.005,01	$ 317.634.842,26	$ 12.663.054,98	$ 304.969.623,66	$ 317.632.678,64
35. DESCRIPCIÓN	%					
ADMINISTRACIÓN	27,49%	$ 69.169.240,00	$ 87.317.818,14	$ 3.481.073,81	$ 83.836.149,54	$ 87.317.223,35
IMPREVISTO	1,00%	$ 2.516.160,00	$ 3.176.348,42	$ 126.630,55	$ 2.326.721,30	$ 2.453.351,85
UTILIDAD	4,00%	$ 10.064.640,00	$ 12.705.393,69	$ 506.522,20	$ 12.198.784,95	$ 12.705.307,15
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 81.750.040,00	$ 103.199.560,25	$ 4.114.226,56	$ 98.361.655,79	$ 102.475.882,35
AJUSTE AL PESO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ANTICIPO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 333.366.045,01	$ 420.834.402,51	$ 16.777.281,54	$ 403.331.279,45	$ 420.108.560,99

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA						
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4										

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025			8. VALOR CONTRATO:	$ 13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027		11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A					14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	**CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES**										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025			19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027		22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A					25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
06. JARDIN INFANTIL REFUGIO													

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

DESCRIPCION	37. No. INFORME MENSUAL	38. PERIODO	39. NOMBRE DEL ARCHIVO	40. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 3	
INFORME SOCIAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Social No 5_10676-2025	
INFORME AMBIENTAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Ambiental No 5_10676-2025	
INFORME SST	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2	
INFORME DE SUPERVISION	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Supervision No 5_10676-2025	
ACTA PARCIAL	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4 Corte General obra_Acta 4_10676-2025	
SOPORTE PAGO SDH	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FE 5 - PAGO HACIENDA RESERVA_ACTA 3 FE 6 - PAGO HACIENDA VIGENCIA_ACTA 3 FE 7 - PAGO HACIENDA ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FACTURA	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FACTURA_FE 5_DISTRITO RESERVA_ACTA 3 FACTURA_FE 6_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 3 FACTURA_FE 7_ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FORMATO MC 14	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	MC-14_DISTRITO_ACTA 3 MC-14_ADULTO MAYOR_ACTA 3	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 12 días del mes de Junio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7



Nombre: HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.489.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.5.3**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M**

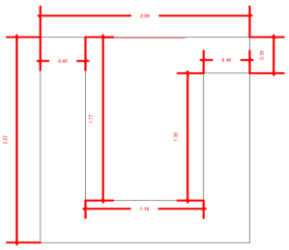ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 02							-		
   	AUX PARVULOS - DEMOLICION DE GUARDAESCOBAS		15.68				1.00	15.68	M	**CORTE 2**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
   	**ACTA PARCIAL 05**							-		
	DESMONTE DE MEDIA CAÑA							-		
	MEDIA CAÑA EXISTENTE COMO GUARDAESCOBAS EN COCINA INFERIOR							-		
	A			9.00			1.00	9.00	M	CORTE 5
	B			1.81			1.00	1.81	M	CORTE 5
	C			0.25			1.00	0.25	M	CORTE 5
	D			2.07			1.00	2.07	M	CORTE 5
	E			0.25			1.00	0.25	M	CORTE 5
	F			0.12			1.00	0.12	M	CORTE 5
	G			0.37			1.00	0.37	M	CORTE 5
	H			2.19			1.00	2.19	M	CORTE 5
	I			2.31			1.00	2.31	M	CORTE 5
	J			0.60			1.00	0.60	M	CORTE 5
	K			3.75			1.00	3.75	M	CORTE 5
	L			1.81			1.00	1.81	M	CORTE 5
	M			2.30			1.00	2.30	M	CORTE 5
								-		
	MEDIA CAÑA EXISTENTE COMO GUARDAESCOBAS EN ALACENA							-		
	HORIZONTALES NIVEL 0			5.17			1.00	5.17	M	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	47.68	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	15.68	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**32.00**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
32.00	15.68	**47.68**




OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.5.5**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**		**UNIDAD**	**M2**

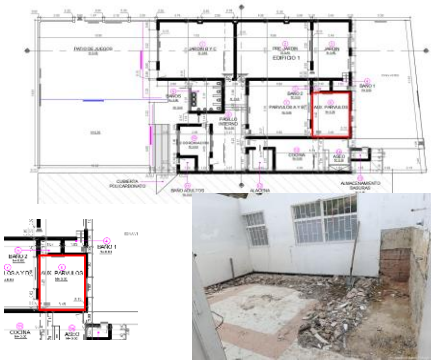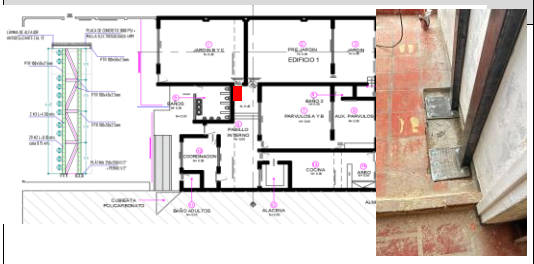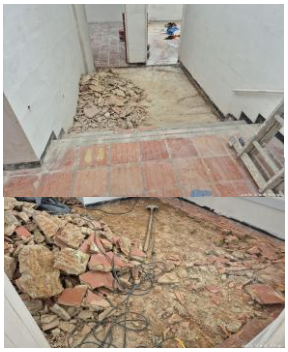ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 01							-		
	AUX PARVULOS		3.45	4.40			1.00	15.18	M2	**CORTE 1**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	**ACTA PARCIAL 02**									
	DEMOLICION DE PISO PARA INSTALACION DE PLATINAS		0.27	0.88			1.00	0.24	M2	**CORTE 2**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 	**ACTA PARCIAL 04**									
								-		
	CIRCULACION 1		2.47	2.10			1.00	5.19	M2	CORTE 4
	CIRCULACION 2		5.53	2.10			1.00	11.61	M2	CORTE 4
	CIRCULACION 3		1.14	2.24			1.00	2.55	M2	CORTE 4
	COORDINACION 1		1.65	3.01			1.00	4.97	M2	CORTE 4
	COORDINACION 2		4.60	1.24			1.00	5.70	M2	CORTE 4
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	**ACTA PARCIAL 05**									
	HUELLAS DE ESCALERA ZONA 1 (ROJO)							-		
	A		0.18	2.10			1.00	0.38	M2	CORTE 5
	B		0.17	2.10			1.00	0.36	M2	CORTE 5
								-		
	CONTRAHUELLAS							-		
	A		0.12	2.10			1.00	0.25	M2	CORTE 5
	B		0.11	2.10			1.00	0.23	M2	CORTE 5
	C		0.10	2.10			1.00	0.21	M2	CORTE 5
								-		





HUELLAS DE ESCALERA ZONA 2 (AZUL)							-		
A		0.10	2.10			1.00	0.21	M2	CORTE 5
B		0.08	2.10			1.00	0.17	M2	CORTE 5
							-		
CONTRAHUELLAS							-		
A		0.10	2.10			1.00	0.21	M2	CORTE 5
B		0.10	2.10			1.00	0.21	M2	CORTE 5
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	47.67	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	45.44	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**2.23**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2.23	45.44	**47.67**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.6.29**	**DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**		**UNIDAD**	**UN**

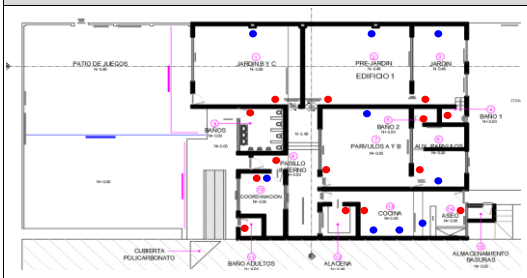ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	**DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS**						-	-		
	INTERRUPTORES (ROJO)							-		
	COORDINACION						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	PASILLO						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	ALACENA						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	COCINA						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	ASEO						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	PARVULOS A Y B						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	AUX PARVULOS						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	JARDIN						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	PRE JARDIN						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	JARDIN B Y C						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	BAÑOS						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	BAÑO 1						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	BAÑO 2						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	BAÑO ADULTOS						1.00	1.00	M2	CORTE 5
							-	-		
	TOMACORRIENTES (AZUL)						-	-		
	COORDINACION						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	COCINA						3.00	3.00	M2	CORTE 5
	PARVULOS A Y B						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	AUX PARVULOS						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	JARDIN						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	PRE JARDIN						1.00	1.00	M2	CORTE 5
	JARDIN B Y C						1.00	1.00	M2	CORTE 5
							-	-		
							-	-		







TOTAL EJECUTADO	23.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**23.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
23.00	0.00	**23.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO


Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO		**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.10.1**	**DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL 05									
VIDRIO VENTANA COORDINACION		0.56		1.115		1.00	0.62	M2	CORTE 5
							-		
VIDRIO DE VENTANA SUPERIOR A		0.38		0.983		2.00	0.75	M2	CORTE 5
VIDRIO DE VENTANA SUPERIOR B		0.38		0.965		2.00	0.74	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	2.11	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**2.11**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2.11	0.00	**2.11**






OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025


CAPITULO	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**3.5.1**	**RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	ACTA PARCIAL 03							-		
								-		
								-		
	PARVULOS							-		
	PARED A	20%	5.96		3.24		1.00	3.86	M2	**CORTE 3**
	PARED B	20%	5.69		2.90		1.00	3.30	M2	**CORTE 3**
	menos puerta	20%	0.88		2.48		- 1.00	- 0.44	M2	**CORTE 3**
	menos ventana	20%	2.57		1.55		- 1.00	- 0.80	M2	**CORTE 3**
	PARED C	20%	5.80		3.24		1.00	3.75	M2	**CORTE 3**
 								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	**COCINA**							-		
	A	20%		9.45	0.71		1.00	1.34	M2	**CORTE 3**
	B	20%		3.31	0.52		1.00	0.34	M2	**CORTE 3**
	C	20%		0.87	0.71		1.00	0.12	M2	**CORTE 3**
	D	20%		6.06	0.71		1.00	0.86	M2	**CORTE 3**
	E	20%		2.41	0.71		1.00	0.34	M2	**CORTE 3**
	F	20%		2.30	0.71		1.00	0.33	M2	**CORTE 3**
	menos puerta	20%		0.83	0.41		- 1.00	- 0.07	M2	**CORTE 3**
	G	20%		0.91	0.71		1.00	0.13	M2	**CORTE 3**
 								-		
	CANAL	20%		3.31	1.27		1.00	0.84	M2	**CORTE 3**
	TUBO DE CANAL	20%		2.47	0.24		1.00	0.12	M2	**CORTE 3**
								-		
								-		
	ALACENA							-		
	PARED FRONTAL	20%		2.09	1.05		1.00	0.44	M2	**CORTE 3**
	menos puerta	20%		0.83	0.41		- 1.00	- 0.07	M2	**CORTE 3**
	PARED LATERAL IZQUIERDA	20%		2.22	1.05		1.00	0.47	M2	**CORTE 3**
	menos ventana de alacena	20%	0.84				- 1.00	- 0.17	M2	**CORTE 3**
	PARED POSTERIOR	20%		2.09	1.05		1.00	0.44	M2	**CORTE 3**
	PARED LATERAL DERECHA	20%		2.22	1.05		1.00	0.47	M2	**CORTE 3**
								-		
								-		
								-		
								-		
 	BAÑO AUX PARVULOS (BAÑO 2)							-		
	PARED A	20%		1.63	0.97		1.00	0.32	M2	**CORTE 3**
	menos vano	20%		0.53	0.71		- 1.00	- 0.08	M2	**CORTE 3**
	PARED B	20%		1.10	0.97		1.00	0.21	M2	**CORTE 3**
	PARED B'	20%		1.10	0.97		1.00	0.21	M2	**CORTE 3**
	menos respiradero	20%		0.18	0.18		- 1.00	- 0.01	M2	**CORTE 3**
	PARED C	20%		1.63	0.97		1.00	0.32	M2	**CORTE 3**
 								-		
	BAÑO ADULTOS							-		
	PARED A	20%		1.37	1.38		1.00	0.38	M2	**CORTE 3**
	PARED B	20%		1.47	1.29		2.00	0.76	M2	**CORTE 3**
	PARED C	20%		1.37	1.19		1.00	0.33	M2	**CORTE 3**
	menos puerta	20%		0.74	0.80		- 1.00	- 0.12	M2	**CORTE 3**














							-		
BATERIA DE NIÑOS							-		
PARED A	20%		3.10	1.10		1.00	0.68	M2	**CORTE 3**
menos ventana	20%		1.33	0.71		- 1.00	- 0.19	M2	**CORTE 3**
menos puerta	20%		0.87	0.77		- 1.00	- 0.13	M2	**CORTE 3**
PARED B	20%		2.87	1.08		1.00	0.62	M2	**CORTE 3**
PARED C	20%		3.10	1.08		1.00	0.67	M2	**CORTE 3**
PARED D	20%		2.87	1.08		1.00	0.62	M2	**CORTE 3**
							-		
BAÑO NIÑOS JARDIN (BAÑO 1)							-		
PARED A	20%		1.13	0.83		1.00	0.19	M2	**CORTE 3**
menos respiradero	20%		0.18	0.18		- 1.00	- 0.01	M2	**CORTE 3**
PARED B	20%		1.63	0.83		1.00	0.27	M2	**CORTE 3**
menos puerta	20%		0.20	0.66		- 1.00	- 0.03	M2	**CORTE 3**
PARED C	20%		1.13	0.83		1.00	0.19	M2	**CORTE 3**
menos ventana	20%		0.34	0.54		- 1.00	- 0.04	M2	**CORTE 3**
PARED D	20%		1.63	0.83		1.00	0.27	M2	**CORTE 3**
LAVACOLAS							-		
A	20%	1.62		2.58		1.00	0.84	M2	**CORTE 3**
menos ventana	20%	1.46		1.53		- 1.00	- 0.45	M2	**CORTE 3**
							-		
B	20%	3.40		0.92		1.00	0.62	M2	**CORTE 3**
menos vano	20%	0.71		0.53		- 1.00	- 0.08	M2	**CORTE 3**
							-		
C	20%	1.62		0.73		1.00	0.24	M2	**CORTE 3**
menos ventana	20%	0.86		0.43		- 1.00	- 0.07	M2	**CORTE 3**
							-		
CARTERA DE BAÑO	20%		2.78	12.00		1.00	6.67	M2	**CORTE 3**
							-		
BAÑO AUX PARVULOS							-		
A - C	20%	1.10		0.97		2.00	0.43	M2	**CORTE 3**
B	20%	1.63		0.97		1.00	0.32	M2	**CORTE 3**
D	20%	1.63		0.97		1.00	0.32	M2	**CORTE 3**
menos puerta	20%	0.71		0.53		- 1.00	- 0.08	M2	**CORTE 3**
							-		
CARTERA RESPIRADERO	20%	0.72		0.16		1.00	0.02	M2	**CORTE 3**
AUX PARVULOS							-		
A	20%	2.82		2.68		1.00	1.51	M2	**CORTE 3**
menos vano	20%	0.88		2.46		- 1.00	- 0.43	M2	**CORTE 3**
menos ventana	20%	0.94		1.53		- 1.00	- 0.29	M2	**CORTE 3**
							-		
CARTERA PUERTA	20%	0.13	3.21			1.00	0.08	M2	**CORTE 3**
							-		
C	20%	2.62		2.23		1.00	1.17	M2	**CORTE 3**
menos ventana	20%	1.65		1.04		- 1.00	- 0.34	M2	**CORTE 3**
							-		
PARVULOS							-		
A	20%	5.69		3.50		1.00	3.98	M2	**CORTE 3**
menos vano	20%	0.84		2.47		- 1.00	- 0.41	M2	**CORTE 3**
menos ventana	20%	2.95		0.92		- 1.00	- 0.54	M2	**CORTE 3**
							-		
BAÑO ADULTOS							-		
A	20%	1.37		1.19		1.00	0.33	M2	**CORTE 3**
menos puerta	20%	0.74		0.80		- 1.00	- 0.12	M2	**CORTE 3**
B	20%	1.47		1.29		1.00	0.38	M2	**CORTE 3**
C	20%	1.37		1.26		1.00	0.35	M2	**CORTE 3**
D	20%	1.47		1.29		1.00	0.38	M2	**CORTE 3**
							-		
BATERIA NIÑOS							-		
A	20%	3.10		1.09		1.00	0.68	M2	**CORTE 3**
menos puerta	20%	0.77		0.87		- 1.00	- 0.13	M2	**CORTE 3**
menos ventana	20%	1.33		0.71		- 1.00	- 0.19	M2	**CORTE 3**
B	20%	2.87		1.09		1.00	0.63	M2	**CORTE 3**
C	20%	3.10		1.09		1.00	0.68	M2	**CORTE 3**
D	20%	2.87		1.09		1.00	0.63	M2	**CORTE 3**
							-		

	BAÑO JARDIN							-		
	A	20%	1.13		0.83		1.00	0.19	M2	**CORTE 3**
	B	20%	1.63		0.83		1.00	0.27	M2	**CORTE 3**
	menos puerta	20%	0.67		0.80		- 1.00	- 0.11	M2	**CORTE 3**
	C	20%	1.13		0.83		1.00	0.19	M2	**CORTE 3**
	D	20%	1.63		0.83		1.00	0.27	M2	**CORTE 3**
								-		
	JARDIN							-		
	A	20%	5.70		2.83		1.00	3.23	M2	**CORTE 3**
	menos puerta	20%	0.90		2.45		- 1.00	- 0.44	M2	**CORTE 3**
	menos ventana	20%	3.18		1.52		- 1.00	- 0.97	M2	**CORTE 3**
	B	20%	3.44		2.62		1.00	1.80	M2	**CORTE 3**
	C	20%	5.70		2.40		1.00	2.74	M2	**CORTE 3**
	menos ventana	20%	1.67		1.05		- 2.00	- 0.70	M2	**CORTE 3**
	D	20%	3.44		2.62		1.00	1.80	M2	**CORTE 3**
	menos puerta	20%	0.66		2.25		- 1.00	- 0.30	M2	**CORTE 3**
	ACTA PARCIAL 05									
	MENOS CANTIDAD COBRO ACTA PARCIAL 03					12.22	- 1.00	- 12.22	M2	CORTE 5
	MURO DE CERRAMIENTO									
	COLUMNA A	20%	0.40		0.50		1.00	0.04	M2	CORTE 5
	MURO A	20%	2.65		0.56		1.00	0.30	M2	CORTE 5
	SUPERIOR A	20%	0.04		2.65		1.00	0.02	M2	CORTE 5
	COLUMNA B	20%	0.20		0.61		1.00	0.02	M2	CORTE 5
	MURO B	20%	2.65		0.59		1.00	0.31	M2	CORTE 5
	SUPERIOR B	20%	0.04		2.65		1.00	0.02	M2	CORTE 5
	COLUMNA C1	20%	0.10		0.70		1.00	0.01	M2	CORTE 5
	COLUMNA C2	20%	0.13		0.28		1.00	0.01	M2	CORTE 5
	MURO C	20%	2.64		0.42		1.00	0.22	M2	CORTE 5
	SUPERIOR C	20%	0.04		2.65		1.00	0.02	M2	CORTE 5
	COLUMNA D1	20%	0.08		0.52		1.00	0.01	M2	CORTE 5
	COLUMNA D2	20%	0.13		0.07		1.00	-		CORTE 5
	MURO D	20%	2.65		0.23		1.00	0.12	M2	CORTE 5
	SUPERIOR D	20%	0.04		2.65		1.00	0.02	M2	CORTE 5
	COLUMNA E	20%	0.20		0.27		1.00	0.01	M2	CORTE 5
	MURO E	20%	2.68		0.31		1.00	0.16	M2	CORTE 5
	SUPERIOR E	20%	0.04		2.68		1.00	0.02	M2	CORTE 5
	MURO F	20%	2.45		0.36		1.00	0.17	M2	CORTE 5
	SUPERIOR F	20%	0.06		2.45		1.00	0.03	M2	CORTE 5
	COLUMNA G	20%	0.20		0.39		1.00	0.02	M2	CORTE 5
	MURO G	20%	2.50		0.45		1.00	0.23	M2	CORTE 5
	SUPERIOR G	20%	0.06		2.50		1.00	0.03	M2	CORTE 5
	COLUMNA H	20%	0.20		0.47		1.00	0.02	M2	CORTE 5
	MURO H	20%	2.50		0.48		1.00	0.24	M2	CORTE 5
	SUPERIOR H	20%	0.06		2.50		1.00	0.03	M2	CORTE 5
	COLUMNA I	20%	0.22		0.50		1.00	0.02	M2	CORTE 5
	MURO I	20%	2.50		0.53		1.00	0.26	M2	CORTE 5
	SUPERIOR I	20%	0.06		2.50		1.00	0.03	M2	CORTE 5
								-		

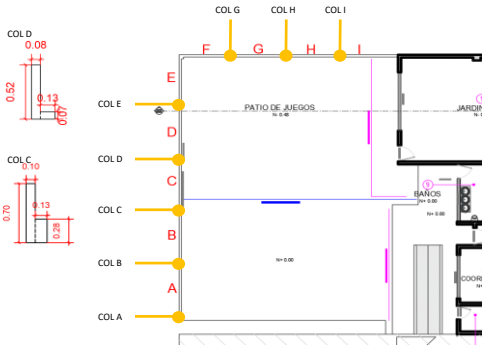





TOTAL EJECUTADO	36.30	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	46.13	M2	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	- **9.83**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
-9.83	46.13	**36.30**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**4.1.42**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION**		**UNIDAD**	**M**

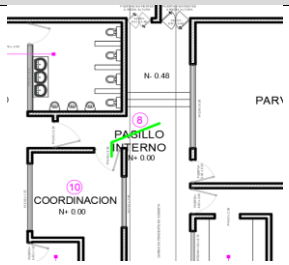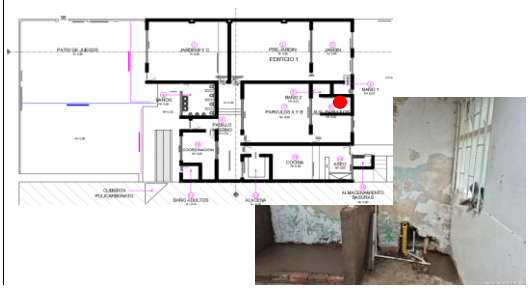ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 04									
	TUBERIA PARA SIFON DE CIRCULACION			1.70			1.00	1.70	M	**CORTE 4**
				0.50			1.00	0.50	M	**CORTE 4**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05									
	TUBERIA SANITARIA LAVACOLAS			0.30			1.00	0.30	M	CORTE 5
				0.50			1.00	0.50	M	CORTE 5
	MENOS PUNTO SANITARIO DE LAVACOLAS			0.20			- 1.00	- 0.20	M	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	2.80	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	2.20	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**0.60**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0.60	2.20	**2.80**





OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.4.18**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**M**

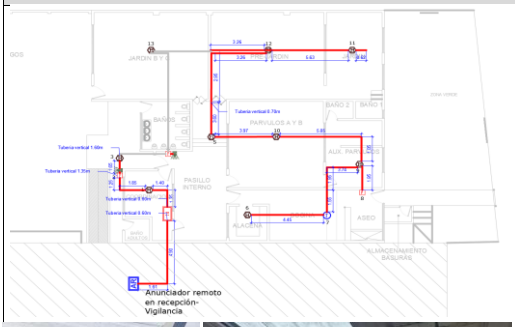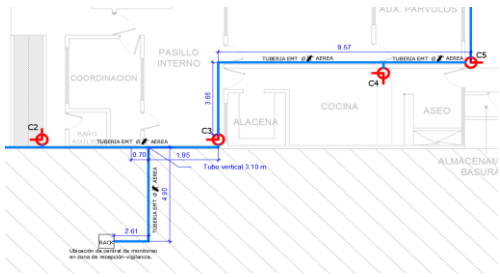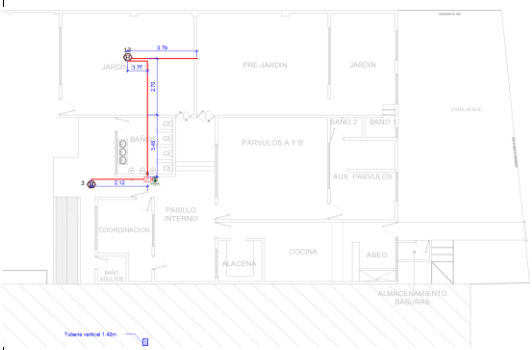ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 03									
	**RED DE DETENCION CONTRA INCENDIOS**							-		
	COCINA			6.00			1.00	6.00	M	CORTE 3
	AUX PARVULOS			1.95			2.00	3.90	M	CORTE 3
				1.05			1.00	1.05	M	CORTE 3
				3.74			1.00	3.74	M	CORTE 3
	PARVULOS A Y B			5.85			1.00	5.85	M	CORTE 3
				3.97			1.00	3.97	M	CORTE 3
	PASILLO INTERNO			3.60			1.00	3.60	M	CORTE 3
				0.70			1.00	0.70	M	CORTE 3
	PRE JARDIN			2.95			1.00	2.95	M	CORTE 3
				3.26			2.00	6.52	M	CORTE 3
				5.63			1.00	5.63	M	CORTE 3
				0.62			1.00	0.62	M	CORTE 3
 	COORDINACION			0.60			2.00	1.20	M	CORTE 3
				1.35			1.00	1.35	M	CORTE 3
				1.40			1.00	1.40	M	CORTE 3
				1.85			1.00	1.85	M	CORTE 3
	RECEPCION			4.90			1.00	4.90	M	CORTE 3
				1.61			1.00	1.61	M	CORTE 3
	PATIO DE JUEGOS EXTERIOR			1.25			1.00	1.25	M	CORTE 3
				1.65			1.00	1.65	M	CORTE 3
				1.60			1.00	1.60	M	CORTE 3
										
				1.35			1.00	1.35	M	CORTE 3
								-		
								-		
								-		
	RED DE CIRCUITO DE CAMARAS							-		
	RECEPCION			2.61			1.00	2.61	M	CORTE 3
				4.90			1.00	4.90	M	CORTE 3
	PASILLO			3.10			1.00	3.10	M	CORTE 3
				0.70			1.00	0.70	M	CORTE 3
				1.95			1.00	1.95	M	CORTE 3
				3.66			1.00	3.66	M	CORTE 3
	PARVULOS A Y B - AUX PARVULOS			9.57			1.00	9.57	M	CORTE 3
	ACTA PARCIAL 04									
	RED DE DETENCION CONTRA INCENDIOS							-		
	JARDIN B Y C			3.79			1.00	3.79	M	**CORTE 4**
				1.77			1.00	1.77	M	**CORTE 4**
				2.70			1.00	2.70	M	**CORTE 4**
	BAÑOS			3.45			1.00	3.45	M	**CORTE 4**
	PASILLO EXTERNO			2.12			1.00	2.12	M	**CORTE 4**
	VIGILANCIA			1.42			1.00	1.42	M	**CORTE 4**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		













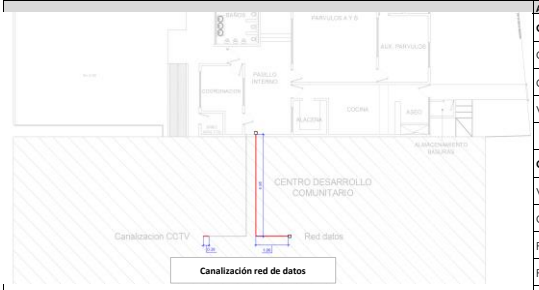

Canalización red de datos

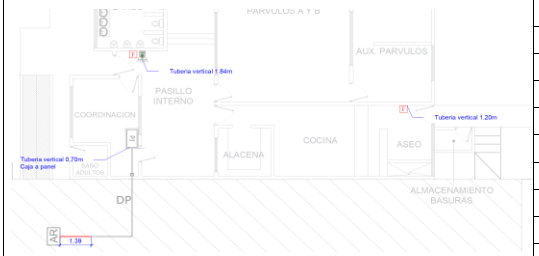

Canalización detección incendio

							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
RED DE CIRCUITO DE CAMARAS							-		
Zona verde			5.54			1.00	5.54	M	**CORTE 4**
			0.47			1.00	0.47	M	**CORTE 4**
			5.30			1.00	5.30	M	**CORTE 4**
							-		
Patio de juegos			3.70			1.00	3.70	M	**CORTE 4**
			3.10			1.00	3.10	M	**CORTE 4**
			0.40			1.00	0.40	M	**CORTE 4**
			0.40			1.00	0.40	M	**CORTE 4**
			5.80			1.00	5.80	M	**CORTE 4**
			2.78			1.00	2.78	M	**CORTE 4**
			5.78			1.00	5.78	M	**CORTE 4**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
ACTA PARCIAL 5									
Canalización red de datos									
Centro desarrollo comunitario			1.90			1.00	1.90	M	**CORTE 5**
Centro desarrollo comunitario			6.95			1.00	6.95	M	**CORTE 5**
Vigilancia			0.39			1.00	0.39	M	**CORTE 5**
Canalización detección incendio									
Vigilancia			1.39			1.00	1.39	M	**CORTE 5**
Coordinación			0.70			1.00	0.70	M	**CORTE 5**
Pasillo interno			1.84			1.00	1.84	M	**CORTE 5**
Pasillo Cocina			1.20			1.00	1.20	M	**CORTE 5**







							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	152.07	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	137.70	M	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M	
PRESENTE ACTA	**14.37**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
14.37	137.70	**152.07**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**6.1.13** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

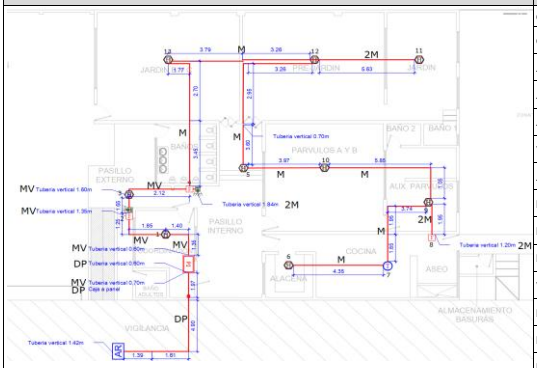

CONVENCIONES
M: 1 CABLE
V: 1 CABLE
MV: 2 CABLES
2M: 2 CABLES
DP: 2 CABLES

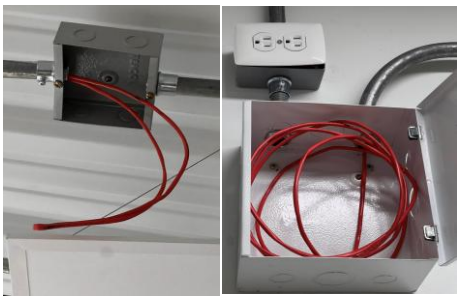

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL 05									
COCINA			4.35			1.00	4.35	M	**CORTE 5**
COCINA			1.65			1.00	1.65	M	**CORTE 5**
AUX PARVULOS			1.95			1.00	1.95	M	**CORTE 5**
AUX PARVULOS			3.74			1.00	3.74	M	**CORTE 5**
AUX PARVULOS			1.95			2.00	3.90	M	**CORTE 5**
VERTICAL- MURO COCINA			1.20			2.00	2.40	M	**CORTE 5**
AUX PARVULOS			1.05			1.00	1.05	M	**CORTE 5**
PARVULOS A Y B			5.85			1.00	5.85	M	**CORTE 5**
PARVULOS A Y B			3.97			1.00	3.97	M	**CORTE 5**
PASILLO INTERNO			3.60			1.00	3.60	M	**CORTE 5**
VERTICAL-MURO PASILLO INTERNO			0.70			1.00	0.70	M	**CORTE 5**
PRE JARDIN			2.95			1.00	2.95	M	**CORTE 5**
PRE JARDIN			3.26			1.00	3.26	M	**CORTE 5**
PRE JARDIN			5.63			2.00	11.26	M	**CORTE 5**
PRE JARDIN			3.26			1.00	3.26	M	**CORTE 5**
JARDIN B Y C			3.79			1.00	3.79	M	**CORTE 5**
JARDIN B Y C			1.77			1.00	1.77	M	**CORTE 5**
JARDIN B Y C			2.70			1.00	2.70	M	**CORTE 5**
BAÑOS			3.45			1.00	3.45	M	**CORTE 5**
VERTICAL-MURO PASILLO EXTERNO			1.84			2.00	3.68	M	**CORTE 5**
PASILLO EXTERNO			2.12			2.00	4.24	M	**CORTE 5**
VERTICAL-MURO PASILLO EXTERNO			1.60			2.00	3.20	M	**CORTE 5**
PASILLO EXTERNO			1.65			2.00	3.30	M	**CORTE 5**
VERTICAL-MURO PASILLO EXTERNO			1.35			2.00	2.70	M	**CORTE 5**
PASILLO EXTERNO			1.25			2.00	2.50	M	**CORTE 5**
COORDINACIÓN			1.85			2.00	3.70	M	**CORTE 5**
COORDINACIÓN			1.40			2.00	2.80	M	**CORTE 5**
COORDINACIÓN			1.35			2.00	2.70	M	**CORTE 5**
VERTICAL-MURO COORDINACIÓN			0.60			2.00	1.20	M	**CORTE 5**
VERTICAL-MURO COORDINACIÓN			0.60			2.00	1.20	M	**CORTE 5**
VERTICAL-MURO COORDINACIÓN			0.70			4.00	2.80	M	**CORTE 5**
COORDINACIÓN			1.97			2.00	3.94	M	**CORTE 5**
VIGILANCIA			4.90			2.00	9.80	M	**CORTE 5**
VIGILANCIA			1.61			2.00	3.22	M	**CORTE 5**
VIGILANCIA			1.39			2.00	2.78	M	**CORTE 5**
VERTICAL- MURO VIGILANCIA			1.42			2.00	2.84	M	**CORTE 5**

TOTAL EJECUTADO	122.20	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**122.20**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
122.20	0.00	**122.20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA





PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**8.1**	**ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.**	**UNIDAD**	**M2**

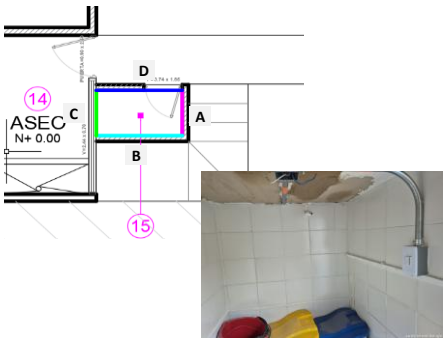ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 02							-		
	**PARED DE COCINA - ZONA ASEO**							-		
	A		2.19		2.00		1.00	4.38	M2	**CORTE 2**
	B		0.37		2.00		1.00	0.74	M2	**CORTE 2**
	C		0.12		2.00		1.00	0.24	M2	**CORTE 2**
	D		0.25		2.00		1.00	0.50	M2	**CORTE 2**
	E		2.07		2.00		1.00	4.14	M2	**CORTE 2**
								-		
    	**REEMPLAZO DE BALDOSAS**							-		
	PARED LATERAL DERECHA		0.20	0.20			4.00	0.16	M2	**CORTE 2**
	PARED POSTERIOR		0.20	0.20			1.00	0.04	M2	**CORTE 2**
	PARED LATERAL IZQUIERDA		0.20	0.20			14.00	0.56	M2	**CORTE 2**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 04							-		
	BASURAS							-		
	A		1.01		0.83		1.00	0.84	M2	CORTE 4
	B		1.66		0.83		1.00	1.38	M2	CORTE 4
	C		1.01		0.83		1.00	0.84	M2	CORTE 4
	D		1.66		0.61		1.00	1.01	M2	CORTE 4
	menos puerta		0.75		0.61		- 1.00	- 0.46	M2	CORTE 4
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05							-		
 	COCINA - ASEO							-		
	PARTE SUPERIOR A (AZUL)		0.12	2.07				0.25	M2	CORTE 5
	PARTE SUPERIOR B (NARANJA)		0.12	0.25				0.03	M2	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	14.65	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	14.37	M2	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**0.28**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0.28	14.37	**14.65**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO		**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**9.2.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
COCINA		1.10		0.58		1.00	0.64	M2	CORTE 5
							-		
PASILLO							-		
A		1.33		0.49		1.00	0.65	M2	CORTE 5
B		1.31		0.49		1.00	0.64	M2	CORTE 5
C		2.71		0.49		1.00	1.33	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	3.26	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**3.26**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3.26	0.00	**3.26**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**11.32**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	TANQUE DE RESERVA DE 500LTS						1.00	1.00	UN	CORTE 5
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
							-	-		
										

TOTAL EJECUTADO	1.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**1.00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1.00	0.00	**1.00**





OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**14.2.7**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 03									
	MURO EN ESTRUCTURA DE TANQUE							-		
	LATERALES				4.40		2.00	8.80	M	CORTE 3
 	FRONTAL	1.89			4.40		1.00	8.30	M	CORTE 3
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05									
	TAPA EN JARDIN	3.43			2.44			8.37	M	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO


Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**15.2.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.**			**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL 05									
VIDRIO VENTANA COORDINACION		0.56		1.115		1.00	0.62	M2	CORTE 5
							-		
VIDRIO DE VENTANA SUPERIOR A		0.38		0.983		2.00	0.75	M2	CORTE 5
VIDRIO DE VENTANA SUPERIOR B		0.38		0.965		2.00	0.74	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	2.11	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**2.11**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2.11	0.00	**2.11**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	CONTRATO No.	10676	FRENTE OBRA	006
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	CONTRATO No:	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			FECHA	12/06/2025

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.		ACTA No:	005
ÍTEM	22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA










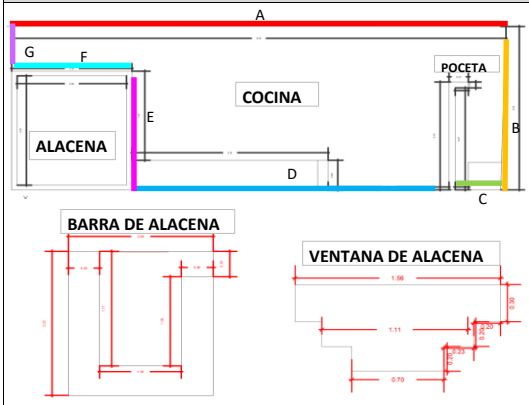











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Area				
ACTA PARCIAL 02									
(1) PARED AUX PARVULOS		3.44		3.31		1.00	11.37	M2	**CORTE 2**
							-		
PARVULOS							-		
PARED A	20%	5.96		3.24		1.00	3.86	M2	**CORTE 2**
PARED B	20%	5.69		2.90		1.00	3.30	M2	**CORTE 2**
menos puerta	20%	0.88		2.48		- 1.00	- 0.44	M2	**CORTE 2**
menos ventana	20%	2.57		1.55		- 1.00	- 0.80	M2	**CORTE 2**
PARED C	20%	5.80		3.24		1.00	3.75	M2	**CORTE 2**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
ACTA PARCIAL 03									
COCINA							-		
A			9.45	0.71		1.00	6.71	M2	**CORTE 3**
B			3.31	0.52		1.00	1.72	M2	**CORTE 3**
C			0.87	0.71		1.00	0.62	M2	**CORTE 3**
D			6.06	0.71		1.00	4.30	M2	**CORTE 3**
E			2.41	0.71		1.00	1.71	M2	**CORTE 3**
F			2.30	0.71		1.00	1.63	M2	**CORTE 3**
menos puerta			0.83	0.41		- 1.00	- 0.34	M2	**CORTE 3**
G			0.91	0.71		1.00	0.65	M2	**CORTE 3**
							-		
CANAL			3.31	1.27		1.00	4.20	M2	**CORTE 3**
TUBO DE CANAL			2.47	0.24		1.00	0.59	M2	**CORTE 3**
							-		
							-		
ALACENA							-		
PARED FRONTAL			2.09	1.05		1.00	2.19	M2	**CORTE 3**
menos puerta			0.83	0.41		- 1.00	- 0.34	M2	**CORTE 3**
PARED LATERAL IZQUIERDA			2.22	1.05		1.00	2.33	M2	**CORTE 3**
menos ventana de alacena					0.84	- 1.00	- 0.84	M2	**CORTE 3**
PARED POSTERIOR			2.09	1.05		1.00	2.19	M2	**CORTE 3**
PARED LATERAL DERECHA			2.22	1.05		1.00	2.33	M2	**CORTE 3**
							-		
							-		
							-		
							-		
BAÑO AUX PARVULOS (BAÑO 2)							-		
PARED A			1.63	0.97		1.00	1.58	M2	**CORTE 3**
menos vano			0.53	0.71		- 1.00	- 0.38	M2	**CORTE 3**
PARED B			1.10	0.97		1.00	1.07	M2	**CORTE 3**
PARED B'			1.10	0.97		1.00	1.07	M2	**CORTE 3**
menos respiradero			0.18	0.18		- 1.00	- 0.03	M2	**CORTE 3**
PARED C			1.63	0.97		1.00	1.58	M2	**CORTE 3**
							-		






















BAÑO ADULTOS							-		
PARED A			1.37	1.38		1.00	1.89	M2	**CORTE 3**
PARED B			1.47	1.29		2.00	3.78	M2	**CORTE 3**
PARED C			1.37	1.19		1.00	1.63	M2	**CORTE 3**
menos puerta			0.74	0.80		- 1.00	- 0.59	M2	**CORTE 3**
							-		
BATERIA DE NIÑOS							-		
PARED A			3.10	1.10		1.00	3.41	M2	**CORTE 3**
menos ventana			1.33	0.71		- 1.00	- 0.94	M2	**CORTE 3**
menos puerta			0.87	0.77		- 1.00	- 0.67	M2	**CORTE 3**
PARED B			2.87	1.08		1.00	3.10	M2	**CORTE 3**
PARED C			3.10	1.08		1.00	3.35	M2	**CORTE 3**
PARED D			2.87	1.08		1.00	3.10	M2	**CORTE 3**
							-		
BAÑO NIÑOS JARDIN (BAÑO 1)							-		
PARED A			1.13	0.83		1.00	0.94	M2	**CORTE 3**
menos respiradero			0.18	0.18		- 1.00	- 0.03	M2	**CORTE 3**
PARED B			1.63	0.83		1.00	1.35	M2	**CORTE 3**
menos puerta			0.20	0.66		- 1.00	- 0.13	M2	**CORTE 3**
PARED C			1.13	0.83		1.00	0.94	M2	**CORTE 3**
menos ventana			0.34	0.54		- 1.00	- 0.18	M2	**CORTE 3**
PARED D			1.63	0.83		1.00	1.35	M2	**CORTE 3**
LAVACOLAS							-		
A		1.62		2.58		1.00	4.18	M2	**CORTE 3**
menos ventana		1.46		1.53		- 1.00	- 2.23	M2	**CORTE 3**
							-		
B		3.40		0.92		1.00	3.11	M2	**CORTE 3**
menos vano		0.71		0.53		- 1.00	- 0.38	M2	**CORTE 3**
							-		
C		1.62		0.73		1.00	1.18	M2	**CORTE 3**
menos ventana		0.86		0.43		- 1.00	- 0.37	M2	**CORTE 3**
							-		
D		3.40		2.50		1.00	8.48	M2	**CORTE 3**
menos vano		0.78		2.43		- 1.00	- 1.90	M2	**CORTE 3**
menos baldosa		2.62		1.51		- 1.00	- 3.96	M2	**CORTE 3**
							-		
CARTERA DE BAÑO			2.78	12.00		1.00	33.36	M2	**CORTE 3**
							-		
BAÑO AUX PARVULOS							-		
A - C		1.10		0.97		2.00	2.13	M2	**CORTE 3**
B		1.63		0.97		1.00	1.58	M2	**CORTE 3**
D		1.63		0.97		1.00	1.58	M2	**CORTE 3**
menos puerta		0.71		0.53		- 1.00	- 0.38	M2	**CORTE 3**
							-		
CARTERA RESPIRADERO		0.72		0.16		1.00	0.12	M2	**CORTE 3**
AUX PARVULOS							-		
A		2.82		2.68		1.00	7.54	M2	**CORTE 3**
menos vano		0.88		2.46		- 1.00	- 2.16	M2	**CORTE 3**
menos ventana		0.94		1.53		- 1.00	- 1.44	M2	**CORTE 3**
							-		
B		3.40		2.50		1.00	8.48	M2	**CORTE 3**
menos vano		0.78		2.43		- 1.00	- 1.90	M2	**CORTE 3**
							-		
CARTERA PUERTA		0.13	3.21			1.00	0.40	M2	**CORTE 3**
							-		
C		2.62		2.23		1.00	5.84	M2	**CORTE 3**
menos ventana		1.65		1.04		- 1.00	- 1.72	M2	**CORTE 3**
							-		
PARVULOS							-		
A		5.69		3.50		1.00	19.92	M2	**CORTE 3**
menos vano		0.84		2.47		- 1.00	- 2.07	M2	**CORTE 3**
menos ventana		2.95		0.92		- 1.00	- 2.71	M2	**CORTE 3**
							-		

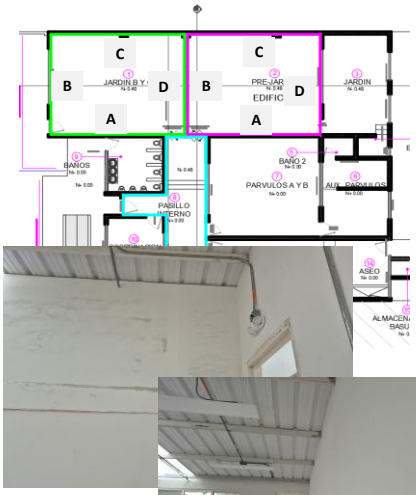




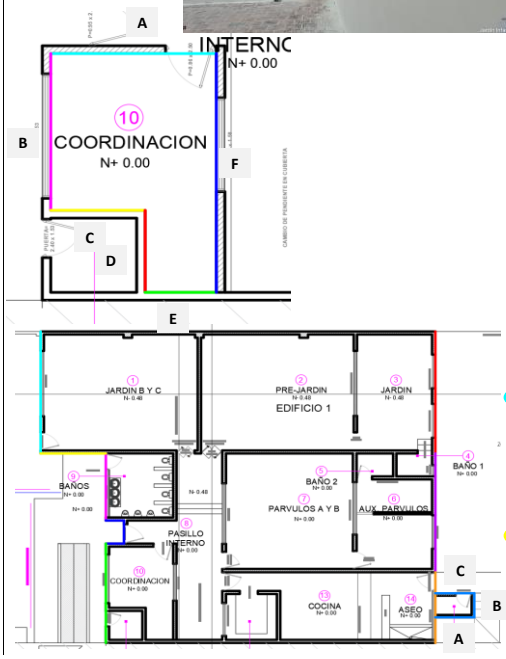

BAÑO ADULTOS							-		
A		1.37		1.19		1.00	1.63	M2	**CORTE 3**
menos puerta		0.74		0.80		- 1.00	- 0.59	M2	**CORTE 3**
B		1.47		1.29		1.00	1.89	M2	**CORTE 3**
C		1.37		1.26		1.00	1.73	M2	**CORTE 3**
D		1.47		1.29		1.00	1.89	M2	**CORTE 3**
							-		
BATERIA NIÑOS							-		
A		3.10		1.09		1.00	3.38	M2	**CORTE 3**
menos puerta		0.77		0.87		- 1.00	- 0.67	M2	**CORTE 3**
menos ventana		1.33		0.71		- 1.00	- 0.94	M2	**CORTE 3**
B		2.87		1.09		1.00	3.13	M2	**CORTE 3**
C		3.10		1.09		1.00	3.38	M2	**CORTE 3**
D		2.87		1.09		1.00	3.13	M2	**CORTE 3**
							-		
BAÑO JARDIN							-		
A		1.13		0.83		1.00	0.94	M2	**CORTE 3**
B		1.63		0.83		1.00	1.35	M2	**CORTE 3**
menos puerta		0.67		0.80		- 1.00	- 0.54	M2	**CORTE 3**
C		1.13		0.83		1.00	0.94	M2	**CORTE 3**
D		1.63		0.83		1.00	1.35	M2	**CORTE 3**
							-		
MENOS CANTIDAD COBRADA EN ITEM 21.1.1 RESANES	46.13					-1.00	- 46.13	M2	**CORTE 3**
ACTA PARCIAL 04									
MENOS CANTIDAD COBRO ACTA PARCIAL 03					31.70	- 1.00	- 31.70	M2	CORTE 4
							-		
							-		
JARDIN B Y C							-		
A		5.88		3.33		1.00	19.58	M2	CORTE 4
menos puerta		0.80		2.50		- 1.00	- 2.00	M2	CORTE 4
B		5.70		2.83		1.00	16.13	M2	CORTE 4
menos puerta		0.89		2.50		- 1.00	- 2.23	M2	CORTE 4
menos ventana		3.22		1.51		- 1.00	- 4.86	M2	CORTE 4
C		5.88		3.33		1.00	19.58	M2	CORTE 4
D		5.70		3.61		1.00	20.58	M2	CORTE 4
							-		
							-		
PRE JARDIN							-		
A		8.25		3.33		1.00	27.47	M2	CORTE 4
menos puerta		0.80		2.50		- 1.00	- 2.00	M2	CORTE 4
B		5.70		3.61		1.00	20.58	M2	CORTE 4
C		8.25		3.33		1.00	27.47	M2	CORTE 4
D		5.70		2.83		1.00	16.13	M2	CORTE 4
menos puerta		0.90		2.50		- 1.00	- 2.25	M2	CORTE 4
menos ventana		3.18		1.52		- 1.00	- 4.83	M2	CORTE 4
							-		
							-		
COORDINACION							-		
A		2.89		2.98		1.00	8.60	M2	CORTE 4
menos puerta		0.84		2.46		- 1.00	- 2.07	M2	CORTE 4
B		3.00		2.85		1.00	8.55	M2	CORTE 4
menos ventana		2.40		1.50		- 1.00	- 3.60	M2	CORTE 4
C		1.68		2.94		1.00	4.93	M2	CORTE 4
D		1.57		3.02		1.00	4.74	M2	CORTE 4
E		1.24		3.06		1.00	3.79	M2	CORTE 4
F		4.60		3.10		1.00	14.26	M2	CORTE 4
menos ventana		1.80		1.52		- 1.00	- 2.74	M2	CORTE 4
							-		
ESTUCO EXTERIOR							-		
FACHADA FRONTAL							-		
SALON		6.00		2.80		1.00	16.80	M2	CORTE 4
BORDES		0.14		0.45		1.00	0.06	M2	CORTE 4
menos puerta		0.80		2.00		- 1.00	- 1.60	M2	CORTE 4
menos ventana		3.24		1.57		- 1.00	- 5.09	M2	CORTE 4
							-		
LATERAL BAÑOS		3.00		2.70		1.00	8.10	M2	CORTE 4
ESCALON 1		0.25		0.16		1.00	0.04	M2	CORTE 4
ESCALON 2		0.65		0.16		1.00	0.10	M2	CORTE 4
ESCALON 3		1.40		0.16		1.00	0.22	M2	CORTE 4
							-		











	FACHADA BATERIA SANITARIA		3.00		2.70		1.00	8.10	M2	CORTE 4
	menos puerta		0.78		2.40		- 1.00	- 1.87	M2	CORTE 4
	menos ventana		2.37		0.72		- 1.00	- 1.71	M2	CORTE 4
								-		
	COORDINACION - BAÑO		4.20		2.70		1.00	11.34	M2	CORTE 4
	menos puerta		0.74		2.30		- 1.00	- 1.70	M2	CORTE 4
	menos ventana		2.41		1.55		- 1.00	- 3.74	M2	CORTE 4
	RESTANTE DE MURO		0.57		2.35		1.00	1.34	M2	CORTE 4
								-		
	FACHADA POSTERIOR							-		
	A		3.51		2.72		1.00	9.53	M2	CORTE 4
	menos basuras		1.26		2.35		- 1.00	- 2.96	M2	CORTE 4
	menos puerta		1.00		2.53		- 1.00	- 2.53	M2	CORTE 4
	menos ventana		3.51		0.76		- 1.00	- 2.67	M2	CORTE 4
								-		
	B		5.65		2.49		1.00	14.04	M2	CORTE 4
	menos ventana		1.63		1.07		- 1.00	- 1.74	M2	CORTE 4
	menos ventana		0.92		1.04		- 1.00	- 0.96	M2	CORTE 4
	menos ventana		0.55		0.53		- 1.00	- 0.29	M2	CORTE 4
								-		
	C		5.65		2.20		1.00	12.40	M2	CORTE 4
	menos ventana		0.80		1.06		- 2.00	- 1.70	M2	CORTE 4
								-		
	BASURAS							-		
	A		1.78		0.88		1.00	1.57	M2	CORTE 4
	B1		0.39		1.18		1.00	0.46	M2	CORTE 4
	B2		0.39		1.59		1.00	0.62	M2	CORTE 4
	B3		0.36		1.76		1.00	0.63	M2	CORTE 4
	C		1.81		1.77		1.00	3.20	M2	CORTE 4
	menos puerta		0.74		1.65		- 1.00	- 1.22	M2	CORTE 4
								-		
								-		
	CUCHILLAS							-		
	CUCHILLA 1	4.54					1.00	4.54	M2	CORTE 4
	CUCHILLA 2		3.05		1.00		1.00	3.05	M2	CORTE 4
	CUCHILLA 3	3.89					1.00	3.89	M2	CORTE 4
	CUCHILLA 4	2.24					1.00	2.24	M2	CORTE 4
	CUCHILLA 5	11.78					1.00	11.78	M2	CORTE 4
								-		
								-		
								-		
	BAJO PLACA DE BASURAS		1.01	1.66			1.00	1.68	M2	CORTE 4
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05									
	ESTUCO EXTERIOR							-		
	ENTRADA FRONTAL		1.16		2.80		1.00	3.25	M2	CORTE 5
	menos puerta		0.84		2.46		- 1.00	- 2.07	M2	CORTE 5
	LATERALES		0.80		2.72		2.00	4.35	M2	CORTE 5
								-		
								-		
	ESTUCO INTERIOR							-		
	CIRCULACIÓN							-		
	MURO A		9.20		3.46		1.00	31.83	M2	CORTE 5
	menos puerta cocina		0.92		2.47		- 1.00	- 2.27	M2	CORTE 5
	menos puerta Parvulos		0.80		2.47		- 1.00	- 1.98	M2	CORTE 5
	menos ventana alacena (Área de AutoCAD)	0.84					- 1.00	- 0.84	M2	CORTE 5
	menos ventana parvulos		2.95		0.93		- 1.00	- 2.74	M2	CORTE 5
	ESCALON 1		2.53		0.20		- 1.00	- 0.51	M2	CORTE 5
	ESCALON 2		2.78		0.16		- 1.00	- 0.44	M2	CORTE 5
	ESCALON 3		3.00		0.20		- 1.00	- 0.60	M2	CORTE 5
								-		
	MURO B		2.10		3.32		1.00	6.96	M2	CORTE 5
								-		



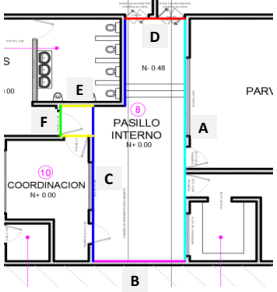



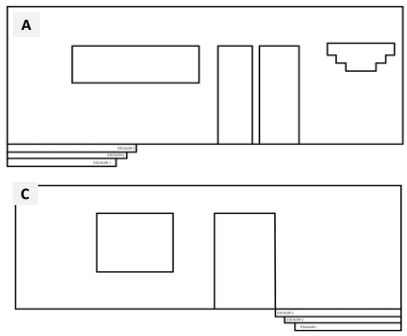

MURO C		9.20		3.20	1.00	29.44	M2	CORTE 5
Menos vano de entrada a pasillo		1.44		2.48	-1.00	- 3.57	M2	CORTE 5
menos ventana de coordinación		1.82		1.52	-1.00	- 2.77	M2	CORTE 5
ESCALON1		2.53		0.20	1.00	0.51	M2	CORTE 5
ESCALON 2		2.78		0.16	1.00	0.44	M2	CORTE 5
ESCALON 3		3.00		0.20	1.00	0.60	M2	CORTE 5
						-		
MURO D		2.10		3.76	1.00	7.90	M2	CORTE 5
menos puertas		0.85		2.52	- 2.00	- 4.28	M2	CORTE 5
						-		
MURO E		2.10		3.10	2.00	13.02	M2	CORTE 5
menos puerta coordinacion		0.84		2.46	- 1.00	- 2.07	M2	CORTE 5
						-		
MURO F		2.10		3.00	1.00	6.30	M2	CORTE 5
menos puerta		0.84		2.46	- 1.00	- 2.07	M2	CORTE 5
						-		

TOTAL EJECUTADO	448.88	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	370.49	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**78.39**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
78.39	370.49	**448.88**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**


CAPITULO		**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M2**

005


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 03									
								-		
	AUX PARVULOS							-		
	A		2.82		2.68		1.00	7.54	M2	CORTE 3
	menos area de facil limpieza		2.82		1.20		- 1.00	- 3.38	M2	CORTE 3
	menos vano		0.88		2.46		- 1.00	- 2.16	M2	CORTE 3
	menos ventana		0.94		1.53		- 1.00	- 1.44	M2	CORTE 3
								-		
	B		3.40		2.50		1.00	8.48	M2	CORTE 3
	menos vano		0.78		2.43		- 1.00	- 1.90	M2	CORTE 3
	menos area de facil limpieza		3.40		1.20		- 1.00	- 4.08	M2	CORTE 3
								-		
	CARTERA PUERTA		0.13	3.21			1.00	0.40	M2	CORTE 3
								-		
	C		2.62		2.23		1.00	5.84	M2	CORTE 3
	menos ventana		1.65		1.04		- 1.00	- 1.72	M2	CORTE 3
								-		
	PARVULOS							-		
	A		5.69		3.50		1.00	19.92	M2	CORTE 3
	menos vano		0.84		2.47		- 1.00	- 2.07	M2	CORTE 3
	menos ventana		2.95		0.92		- 1.00	- 2.71	M2	CORTE 3
	menos area de facil limpieza		5.69		1.20		- 1.00	- 6.83	M2	CORTE 3
	B		5.80		3.24		1.00	18.76	M2	CORTE 3
	menos area de facil limpieza		5.80		1.20		- 1.00	- 6.96	M2	CORTE 3
	C		5.69		2.90		1.00	16.50	M2	CORTE 3
	menos vano		0.88		2.46		- 1.00	- 2.16	M2	CORTE 3
	menos ventana		2.56		1.53		- 1.00	- 3.92	M2	CORTE 3
	menos area de facil limpieza		5.69		1.20		- 1.00	- 6.83	M2	CORTE 3
	D		5.96		3.24		1.00	19.28	M2	CORTE 3
	menos area de facil limpieza		5.96		1.20		- 1.00	- 7.15	M2	CORTE 3
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 04									
								-		
	JARDIN B Y C							-		
	A		5.88		3.33		1.00	19.58	M2	**CORTE 4**
	menos puerta		0.80		2.50		- 1.00	- 2.00	M2	**CORTE 4**
	B		5.70		2.83		1.00	16.13	M2	**CORTE 4**
	menos puerta		0.89		2.50		- 1.00	- 2.23	M2	**CORTE 4**
	menos ventana		3.22		1.51		- 1.00	- 4.86	M2	**CORTE 4**
	C		5.88		3.33		1.00	19.58	M2	**CORTE 4**
	D		5.70		2.21		1.00	12.60	M2	**CORTE 4**
								-		
								-		
	PRE JARDIN							-		
	A		8.25		3.33		1.00	27.47	M2	**CORTE 4**
	menos puerta		0.80		2.50		- 1.00	- 2.00	M2	**CORTE 4**
	B		5.70		2.21		1.00	12.60	M2	**CORTE 4**
	C		8.25		3.33		1.00	27.47	M2	**CORTE 4**
	D		5.70		2.83		1.00	16.13	M2	**CORTE 4**
	menos puerta		0.90		2.50		- 1.00	- 2.25	M2	**CORTE 4**
	menos ventana		3.18		1.52		- 1.00	- 4.83	M2	**CORTE 4**






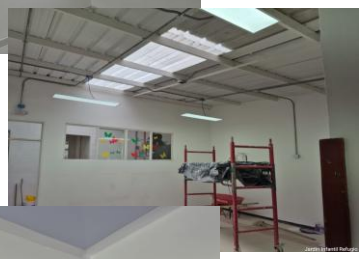



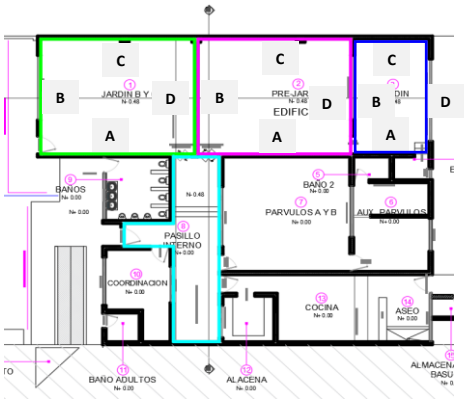





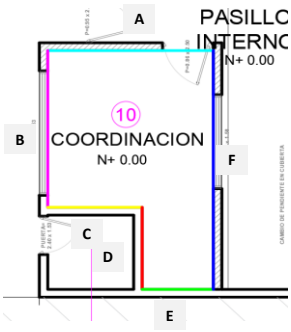





							-		
JARDIN									
A		3.44		2.62		1.00	9.00	M2	CORTE 4
menos vano		0.66		2.25		- 1.00	- 1.49	M2	CORTE 4
B		5.70		2.83		1.00	16.13	M2	CORTE 4
menos puerta		0.90		2.45		- 1.00	- 2.21	M2	CORTE 4
menos ventana		3.10		1.52		- 1.00	- 4.71	M2	CORTE 4
C		3.44		2.62		1.00	9.00	M2	CORTE 4
D		5.70		2.40		1.00	13.68	M2	CORTE 4
menos ventana		1.67		1.05		- 2.00	- 3.51	M2	CORTE 4
							-		
COORDINACION							-		
A		2.89		2.98		1.00	8.60	M2	CORTE 4
menos puerta		0.84		2.46		- 1.00	- 2.07	M2	CORTE 4
B		3.00		2.85		1.00	8.55	M2	CORTE 4
menos ventana		2.40		1.50		- 1.00	- 3.60	M2	CORTE 4
C		1.68		2.94		1.00	4.93	M2	CORTE 4
D		1.57		3.02		1.00	4.74	M2	CORTE 4
E		1.24		3.06		1.00	3.79	M2	CORTE 4
F		4.60		3.10		1.00	14.26	M2	CORTE 4
menos ventana		1.80		1.52		- 1.00	- 2.74	M2	CORTE 4
							-		
							-		
							-		
							-		
MENOS PINTURA ASEPSIA							-		
							-		
JARDIN B Y C							-		
A		5.88		1.20		- 1.00	- 7.06	M2	CORTE 4
B		5.70		1.20		- 1.00	- 6.84	M2	CORTE 4
C		5.88		1.20		- 1.00	- 7.06	M2	CORTE 4
D		5.70		1.20		- 1.00	- 6.84	M2	CORTE 4
							-		
							-		
PRE JARDIN							-		
A		8.25		1.20		- 1.00	- 9.90	M2	CORTE 4
B		5.70		1.20		- 1.00	- 6.84	M2	CORTE 4
C		8.25		1.20		- 1.00	- 9.90	M2	CORTE 4
D		5.70		1.20		- 1.00	- 6.84	M2	CORTE 4
							-		
JARDIN									
A		3.44		1.20		- 1.00	- 4.13	M2	CORTE 4
B		5.70		1.20		- 1.00	- 6.84	M2	CORTE 4
C		3.44		1.20		- 1.00	- 4.13	M2	CORTE 4
D		5.70		1.20		- 1.00	- 6.84	M2	CORTE 4
							-		
ACTA PARCIAL 05									
							-		
							-		
CIRCULACIÓN							-		
MURO A		9.20		3.46		1.00	31.83	M2	CORTE 5
menos puerta cocina		0.92		2.47		- 1.00	- 2.27	M2	CORTE 5
menos puerta Parvulos		0.80		2.47		- 1.00	- 1.98	M2	CORTE 5
menos ventana alacena (Área de AutoCAD)	0.84					- 1.00	- 0.84	M2	CORTE 5
menos ventana parvulos		2.95		0.93		- 1.00	- 2.74	M2	CORTE 5
ESCALON 1		2.53		0.20		- 1.00	- 0.51	M2	CORTE 5
ESCALON 2		2.78		0.16		- 1.00	- 0.44	M2	CORTE 5
ESCALON 3		3.00		0.20		- 1.00	- 0.60	M2	CORTE 5
							-		
MURO B		2.10		3.32		1.00	6.96	M2	CORTE 5
							-		
MURO C		9.20		3.20		1.00	29.44	M2	CORTE 5
Menos vano de entrada a pasillo		1.44		2.48		-1.00	- 3.57	M2	CORTE 5
menos ventana de coordinación		1.82		1.52		-1.00	- 2.77	M2	CORTE 5
ESCALON1		2.53		0.20		1.00	0.51	M2	CORTE 5
ESCALON 2		2.78		0.16		1.00	0.44	M2	CORTE 5
ESCALON 3		3.00		0.20		1.00	0.60	M2	CORTE 5
							-		

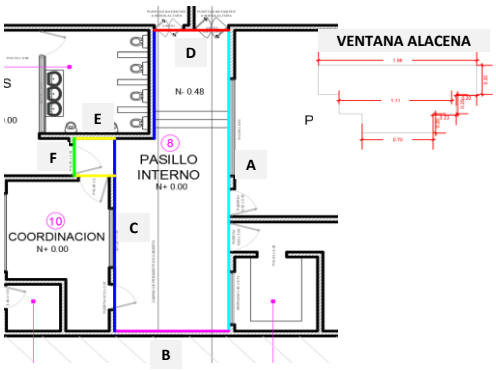







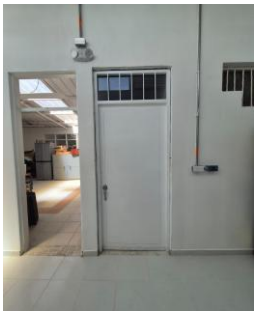

MURO D		2.10		3.76		1.00	7.90	M2	**CORTE 5**
menos puertas		0.85		2.52		- 2.00	- 4.28	M2	**CORTE 5**
							-		
MURO E		2.10		3.10		2.00	13.02	M2	**CORTE 5**
menos puerta coordinacion		0.84		2.46		- 1.00	- 2.07	M2	**CORTE 5**
							-		
MURO F		2.10		3.00		1.00	6.30	M2	**CORTE 5**
menos puerta		0.84		2.46		- 1.00	- 2.07	M2	**CORTE 5**
MENOS PINTURA DE ASEPSIA							-		
MURO A		9.20		1.12		-1.00	- 10.30	M2	**CORTE 5**
ESCALON 1		2.53		0.20		-1.00	- 0.51	M2	**CORTE 5**
ESCALON 2		2.78		0.16		-1.00	- 0.44	M2	**CORTE 5**
ESCALON 3		3.00		0.20		-1.00	- 0.60	M2	**CORTE 5**
							-		
MURO B		2.10		1.12		-1.00	- 2.35	M2	**CORTE 5**
							-		
MURO C		9.20		1.12		-1.00	- 10.30	M2	**CORTE 5**
ESCALON1		2.53		0.20		-1.00	- 0.51	M2	**CORTE 5**
ESCALON 2		2.78		0.16		-1.00	- 0.44	M2	**CORTE 5**
ESCALON 3		3.00		0.20		-1.00	- 0.60	M2	**CORTE 5**
							-		
MURO D		2.10		1.12		-1.00	- 2.35	M2	**CORTE 5**
							-		
MURO E		2.10		1.12		-2.00	- 4.70	M2	**CORTE 5**
							-		
MURO F		2.10		1.12		-1.00	- 2.35	M2	**CORTE 5**
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	203.34	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	165.93	M2	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	37.41	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
37.41	165.93	**203.34**



OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**22.1.11**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	ACTA PARCIAL 02									
   	**PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM**									
	SOPORTE VOLADO EXT PARVULOS			5.00			1.00	5.00	M	**CORTE 2**
	SOPORTE EN PARTE INFERIOR DE CORREDOR			8.00			1.00	8.00	M	**CORTE 2**
	SOPORTES VERTICALES DE CORREDOR			0.62			4.00	2.48	M	**CORTE 2**
	SOPORTES EN MURO DE PASILLO			2.40			2.00	4.80	M	**CORTE 2**
	SOPORTE EN CANAL DE COCINA			3.27			1.00	3.27	M	**CORTE 2**
	SOPORTES TRANSVERSALES DE COCINA			1.66			3.00	4.98	M	**CORTE 2**
	SOPORTES LONGITUDINALES DOS AGUAS			9.40			11.00	103.40	M	**CORTE 2**
	SOPORTES DE PARVULOS Y AUX DE PARVULOS			5.90			4.00	23.60	M	**CORTE 2**
	SOPORTES TRANSVERSALES			1.46			4.00	5.84	M	**CORTE 2**
	SOPORTES DE VOLADO COCINA			3.75			2.00	7.50	M	**CORTE 2**
	SOPORTES DE COCINA INTERNA			3.77			4.00	15.08	M	**CORTE 2**
	SOPORTES TRANSVERSALES			1.20			5.00	6.00	M	**CORTE 2**
								-		
	ANGULO 1/4" X 1 1/2"									
	SOPORTE TRANSVERSAL EN PARVULOS			9.40			1.00	9.40	M	**CORTE 2**
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 03									
 	**PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM**							-		
	PERFILES TRASVERSALES INTERIORES			5.90			16.00	94.40	M	**CORTE 3**
	SOPORTE DE VOLADOS EXTERIORES			5.70			2.00	11.40	M	**CORTE 3**
	SOPORTE VOLADO JARDIN			2.00			3.00	6.00	M	**CORTE 3**
	SOPORTE VOLADO JARDIN B Y C			1.58			3.00	4.74	M	**CORTE 3**
								-		
	PERFIL EXTRA MONTAJE DE COCINA			4.35			1.00	4.35	M	**CORTE 3**
								-		
	ANGULO 1/4" X 1 1/2"							-		
	ANGULO 1			12.90			1.00	12.90	M	**CORTE 3**
	ANGULO 2			6.91			1.00	6.91	M	**CORTE 3**
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 04									
 	**ESTRUCTURA DE POLICARBONATO**							-		
	TRANSVERSAL			1.40			10.00	14.00	M	**CORTE 4**
	LONGITUDINAL			5.32			2.00	10.64	M	**CORTE 4**
								-		
	BARANDAS							-		
	VERTICAL 1			2.38			2.00	4.76	M	**CORTE 4**
	VERTICAL 2			2.17			2.00	4.34	M	**CORTE 4**
	VERTICAL 3			1.95			2.00	3.90	M	**CORTE 4**
	HORIZONTAL 1			2.02			4.00	8.06	M	**CORTE 4**
	HORIZONTAL 2			1.45			2.00	2.90	M	**CORTE 4**
								-		

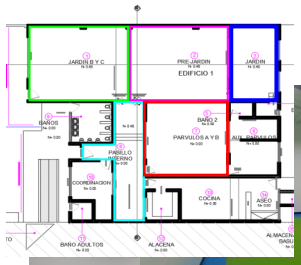






	GUARDAESCOBAS							-		
	SALON PARVULOS A Y B			21.42			1.00	21.42	M	**CORTE 4**
	PREJARDIN			25.66			1.00	25.66	M	**CORTE 4**
	JARDIN B Y C			25.73			1.00	25.73	M	**CORTE 4**
	JARDIN			16.07			1.00	16.07	M	**CORTE 4**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05									
	MARCO DE PUERTAS							-		
	ENTRADA PIRNCIPAL			5.04			1.00	5.04	M	**CORTE 5**
	PARVULOS			5.70			1.00	5.70	M	**CORTE 5**
	AUX PARVULOS (MEDIA PUERTA)			2.48			1.00	2.48	M	**CORTE 5**
	JARDIN			5.81			1.00	5.81	M	**CORTE 5**
	PRE JARDIN			5.74			1.00	5.74	M	**CORTE 5**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	LATERAL DEL TANQUE			1.30			4.00	5.20	M	**CORTE 5**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ESTRUCTURA DE TANQUE							-		
	VERTICALES PTR 100X50X2.5MM			4.60			2.00	9.20	M	**CORTE 5**
	DIAGONALES PTR 100X40X2.5MM			1.08			4.00	4.32	M	**CORTE 5**
	HORIZONTALES PTR 100X40X2.5MM			0.45			4.00	1.80	M	**CORTE 5**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		









TOTAL EJECUTADO	522.82	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	477.53	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**45.29**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
45.29	477.53	**522.82**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	CONTRATO No.	10676	FRENTE OBRA	006
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	CONTRATO No:	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			FECHA	12/06/2025

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	ACTA No:	005	
ÍTEM	22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	UNIDAD	M2	

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA














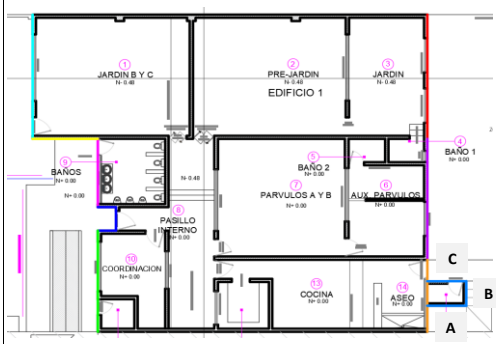




LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL 02									
COCINA							-		
A			9.45	0.71		1.00	6.71	M2	**CORTE 2**
B			3.31	0.52		1.00	1.72	M2	**CORTE 2**
C			0.87	0.71		1.00	0.62	M2	**CORTE 2**
D			6.06	0.71		1.00	4.30	M2	**CORTE 2**
E			2.41	0.71		1.00	1.71	M2	**CORTE 2**
F			2.30	0.71		1.00	1.63	M2	**CORTE 2**
menos puerta			0.83	0.41		- 1.00	- 0.34	M2	**CORTE 2**
G			0.91	0.71		1.00	0.65	M2	**CORTE 2**
							-		
CANAL			3.31	1.27		1.00	4.20	M2	**CORTE 2**
TUBO DE CANAL			2.47	0.24		1.00	0.59	M2	**CORTE 2**
							-		
							-		
ALACENA							-		
PARED FRONTAL			2.09	1.05		1.00	2.19	M2	**CORTE 2**
menos puerta			0.83	0.41		- 1.00	- 0.34	M2	**CORTE 2**
PARED LATERAL IZQUIERDA			2.22	1.05		1.00	2.33	M2	**CORTE 2**
menos ventana	0.84					- 1.00	- 0.84	M2	**CORTE 2**
PARED POSTERIOR			2.09	1.05		1.00	2.19	M2	**CORTE 2**
PARED LATERAL DERECHA			2.22	1.05		1.00	2.33	M2	**CORTE 2**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
ACTA PARCIAL 04									
MENOS COBRO ACTA 02	29.65					- 1.00	- 29.65	M2	**CORTE 4**
							-		
							-		
FACHADA FRONTAL							-		
SALON		6.00		2.8		1.00	16.80	M2	**CORTE 4**
BORDES		0.14		0.45		1.00	0.06	M2	**CORTE 4**
menos puerta		0.80		2		-1.00	- 1.60	M2	**CORTE 4**
menos ventana		3.24		1.57		-1.00	- 5.09	M2	**CORTE 4**
							-		
LATERAL BAÑOS		3.00		2.7		1.00	8.10	M2	**CORTE 4**
ESCALON 1		0.25		0.16		1.00	0.04	M2	**CORTE 4**
ESCALON 2		0.65		0.16		1.00	0.10	M2	**CORTE 4**
ESCALON 3		1.40		0.16		1.00	0.22	M2	**CORTE 4**
							-		
FACHADA BATERIA SANITARIA		3.00		2.7		1.00	8.10	M2	**CORTE 4**
menos puerta		0.78		2.4		-1.00	- 1.87	M2	**CORTE 4**
menos ventana		2.37		0.72		-1.00	- 1.71	M2	**CORTE 4**
							-		
							-		
COORDINACION - BAÑO		4.20		2.7		1.00	11.34	M2	**CORTE 4**
menos puerta		0.74		2.3		-1.00	- 1.70	M2	**CORTE 4**
menos ventana		2.41		1.55		-1.00	- 3.74	M2	**CORTE 4**
RESTANTE DE MURO		0.57		2.35		1.00	1.34	M2	**CORTE 4**
							-		











	FACHADA POSTERIOR							-		
	A		3.51		2.715		1.00	9.53	M2	**CORTE 4**
	menos basuras		1.26		2.35		-1.00	- 2.96	M2	**CORTE 4**
	menos puerta		1.00		2.53		-1.00	- 2.53	M2	**CORTE 4**
	menos ventana		3.51		0.76		-1.00	- 2.67	M2	**CORTE 4**
								-		
	B		5.65		2.485		1.00	14.04	M2	**CORTE 4**
	menos ventana		1.63		1.07		-1.00	- 1.74	M2	**CORTE 4**
	menos ventana		0.92		1.04		-1.00	- 0.96	M2	**CORTE 4**
	menos ventana		0.55		0.53		-1.00	- 0.29	M2	**CORTE 4**
								-		
	C		5.65		2.195		1.00	12.40	M2	**CORTE 4**
	menos ventana		0.80		1.06		-2.00	- 1.70	M2	**CORTE 4**
								-		
	BASURAS							-		
	A		1.78		0.88		1.00	1.57	M2	**CORTE 4**
	B1		0.39		1.18		1.00	0.46	M2	**CORTE 4**
	B2		0.39		1.59		1.00	0.62	M2	**CORTE 4**
	B3		0.36		1.76		1.00	0.63	M2	**CORTE 4**
	C		1.81		1.77		1.00	3.20	M2	**CORTE 4**
	menos puerta		0.74		1.65		-1.00	- 1.22	M2	**CORTE 4**
								-		
								-		
	CUCHILLAS							-		
	CUCHILLA 1	4.54					1.00	4.54	M2	**CORTE 4**
	CUCHILLA 2		3.05		1		1.00	3.05	M2	**CORTE 4**
	CUCHILLA 3	3.89					1.00	3.89	M2	**CORTE 4**
	CUCHILLA 4	2.24					1.00	2.24	M2	**CORTE 4**
	CUCHILLA 5	11.78					1.00	11.78	M2	**CORTE 4**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05									





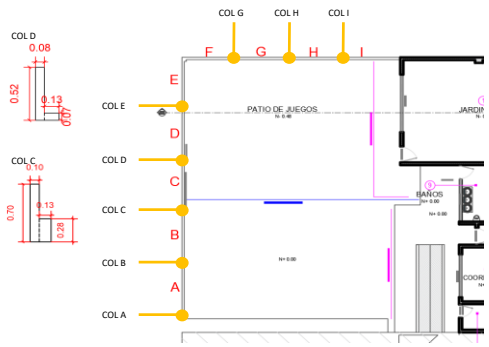

	MURO EXTERIOR							-		
	ENTRADA FRONTAL		1.16		2.80		1.00	3.25	M2	CORTE 5
	menos puerta		0.84		2.46		- 1.00	- 2.07	M2	CORTE 5
	LATERALES		0.80		2.72		2.00	4.35	M2	CORTE 5
								-		
								-		
	MURO DE CERRAMIENTO									
	COLUMNA A		0.40		0.50		1.00	0.20	M2	CORTE 5
	MURO A		2.65		0.56		1.00	1.48	M2	CORTE 5
	SUPERIOR A		0.04		2.65		1.00	0.11	M2	CORTE 5
	COLUMNA B		0.20		0.61		1.00	0.12	M2	CORTE 5
	MURO B		2.65		0.59		1.00	1.55	M2	CORTE 5
	SUPERIOR B		0.04		2.65		1.00	0.11	M2	CORTE 5
	COLUMNA C1		0.10		0.70		1.00	0.07	M2	CORTE 5
	COLUMNA C2		0.13		0.28		1.00	0.04	M2	CORTE 5
	MURO C		2.64		0.42		1.00	1.11	M2	CORTE 5
	SUPERIOR C		0.04		2.65		1.00	0.11	M2	CORTE 5
	COLUMNA D1		0.08		0.52		1.00	0.04	M2	CORTE 5
	COLUMNA D2		0.13		0.07		1.00	0.01	M2	CORTE 5
	MURO D		2.65		0.23		1.00	0.60	M2	CORTE 5
	SUPERIOR D		0.04		2.65		1.00	0.11	M2	CORTE 5







COLUMNA E		0.20		0.27		1.00	0.05	M2	CORTE 5
MURO E		2.68		0.31		1.00	0.82	M2	CORTE 5
SUPERIOR E		0.04		2.68		1.00	0.11	M2	CORTE 5
MURO F		2.45		0.36		1.00	0.87	M2	CORTE 5
SUPERIOR F		0.06		2.45		1.00	0.13	M2	CORTE 5
COLUMNA G		0.20		0.39		1.00	0.08	M2	CORTE 5
MURO G		2.50		0.45		1.00	1.13	M2	CORTE 5
SUPERIOR G		0.06		2.50		1.00	0.14	M2	CORTE 5
COLUMNA H		0.20		0.47		1.00	0.09	M2	CORTE 5
MURO H		2.50		0.48		1.00	1.19	M2	CORTE 5
SUPERIOR H		0.06		2.50		1.00	0.14	M2	CORTE 5
COLUMNA I		0.22		0.50		1.00	0.11	M2	CORTE 5
MURO I		2.50		0.53		1.00	1.31	M2	CORTE 5
SUPERIOR I		0.06		2.50		1.00	0.14	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	101.77	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	84.27	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**17.50**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
17.50	84.27	**101.77**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**006**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.1.16**	**PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

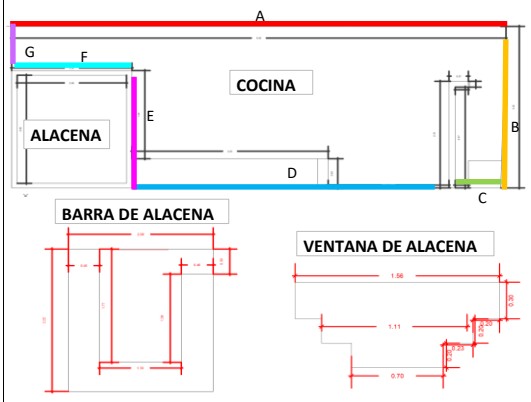











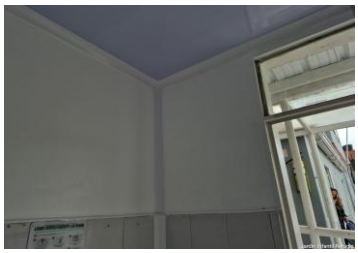



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL 04									
COCINA							-		
A			9.45	0.71		1.00	6.71	M2	**CORTE 4**
B			3.31	0.52		1.00	1.72	M2	**CORTE 4**
C			0.87	0.71		1.00	0.62	M2	**CORTE 4**
D			6.06	0.71		1.00	4.30	M2	**CORTE 4**
E			2.41	0.71		1.00	1.71	M2	**CORTE 4**
F			2.30	0.71		1.00	1.63	M2	**CORTE 4**
menos puerta			0.83	0.41		- 1.00	- 0.34	M2	**CORTE 4**
G			0.91	0.71		1.00	0.65	M2	**CORTE 4**
							-		
CANAL			3.31	1.27		1.00	4.20	M2	**CORTE 4**
TUBO DE CANAL			2.47	0.24		1.00	0.59	M2	**CORTE 4**
							-		
							-		
ALACENA							-		
PARED FRONTAL			2.09	1.05		1.00	2.19	M2	**CORTE 4**
menos puerta			0.83	0.41		- 1.00	- 0.34	M2	**CORTE 4**
PARED LATERAL IZQUIERDA			2.22	1.05		1.00	2.33	M2	**CORTE 4**
menos ventana	0.84					- 1.00	- 0.84	M2	**CORTE 4**
PARED POSTERIOR			2.09	1.05		1.00	2.19	M2	**CORTE 4**
PARED LATERAL DERECHA			2.22	1.05		1.00	2.33	M2	**CORTE 4**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
LAVACOLAS							-		
A		1.62		2.58		1.00	4.18	M2	**CORTE 4**
menos ventana		1.46		1.53		- 1.00	- 2.23	M2	**CORTE 4**
							-		
B		3.40		0.92		1.00	3.11	M2	**CORTE 4**
menos vano		0.71		0.53		- 1.00	- 0.38	M2	**CORTE 4**
							-		
C		1.62		0.73		1.00	1.18	M2	**CORTE 4**
menos ventana		0.86		0.43		- 1.00	- 0.37	M2	**CORTE 4**
							-		
D		3.40		2.50		1.00	8.48	M2	**CORTE 4**
menos vano		0.78		2.43		- 1.00	- 1.90	M2	**CORTE 4**
menos baldosa		2.62		1.51		- 1.00	- 3.96	M2	**CORTE 4**
							-		
CARTERA DE BAÑO			2.78	12.00		1.00	33.36	M2	**CORTE 4**
							-		
BAÑO AUX PARVULOS							-		
A - C		1.10		0.97		2.00	2.13	M2	**CORTE 4**
B		1.63		0.97		1.00	1.58	M2	**CORTE 4**
D		1.63		0.97		1.00	1.58	M2	**CORTE 4**
menos puerta		0.71		0.53		- 1.00	- 0.38	M2	**CORTE 4**
							-		
CARTERA RESPIRADERO		0.72		0.16		1.00	0.12	M2	**CORTE 4**
							-		
AUX PARVULOS							-		
A		2.82		1.12		1.00	3.16	M2	**CORTE 4**
							-		
B		3.40		1.12		1.00	3.81	M2	**CORTE 4**
							-		
CARTERA PUERTA		0.13		1.20		1.00	0.15	M2	**CORTE 4**





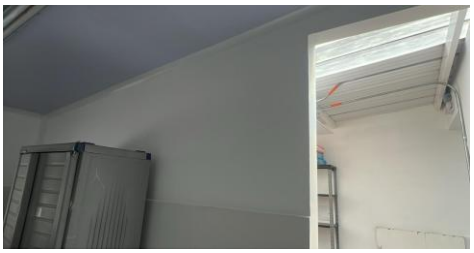


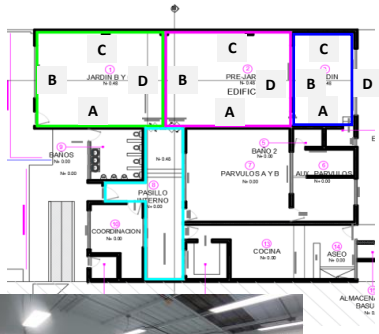







							-		
C		2.62		1.12		1.00	2.93	M2	**CORTE 4**
							-		
PARVULOS							-		
A		5.69		1.12		1.00	6.37	M2	**CORTE 4**
							-		
B		5.80		1.12		1.00	6.50	M2	**CORTE 4**
							-		
C		5.69		1.12		1.00	6.37	M2	**CORTE 4**
							-		
D		5.96		1.12		1.00	6.68	M2	**CORTE 4**
							-		
BAÑO ADULTOS							-		
A		1.37		1.19		1.00	1.63	M2	**CORTE 4**
menos puerta		0.74		0.80		- 1.00	- 0.59	M2	**CORTE 4**
B		1.47		1.29		1.00	1.89	M2	**CORTE 4**
C		1.37		1.26		1.00	1.73	M2	**CORTE 4**
D		1.47		1.29		1.00	1.89	M2	**CORTE 4**
							-		
BATERIA NIÑOS							-		
A		3.10		1.09		1.00	3.38	M2	**CORTE 4**
menos puerta		0.77		0.87		- 1.00	- 0.67	M2	**CORTE 4**
menos ventana		1.33		0.71		- 1.00	- 0.94	M2	**CORTE 3**
B		2.87		1.09		1.00	3.13	M2	**CORTE 4**
C		3.10		1.09		1.00	3.38	M2	**CORTE 4**
D		2.87		1.09		1.00	3.13	M2	**CORTE 4**
							-		
BAÑO JARDIN							-		
A		1.13		0.83		1.00	0.94	M2	**CORTE 4**
B		1.63		0.83		1.00	1.35	M2	**CORTE 4**
menos puerta		0.67		0.80		- 1.00	- 0.54	M2	**CORTE 4**
C		1.13		0.83		1.00	0.94	M2	**CORTE 4**
D		1.63		0.83		1.00	1.35	M2	**CORTE 4**
							-		
JARDIN B Y C							-		
A		5.88		1.12		1.00	6.59	M2	**CORTE 4**
B		5.70		1.12		1.00	6.38	M2	**CORTE 4**
C		5.88		1.12		1.00	6.59	M2	**CORTE 4**
D		5.70		1.12		1.00	6.38	M2	**CORTE 4**
							-		
							-		
PRE JARDIN							-		
A		8.25		1.12		1.00	9.24	M2	**CORTE 4**
B		5.70		1.12		1.00	6.38	M2	**CORTE 4**
C		8.25		1.12		1.00	9.24	M2	**CORTE 4**
D		5.70		1.12		1.00	6.38	M2	**CORTE 4**
							-		
JARDIN									
A		3.44		1.12		1.00	3.85	M2	**CORTE 4**
B		5.70		1.12		1.00	6.38	M2	**CORTE 4**
C		3.44		1.12		1.00	3.85	M2	**CORTE 4**
D		5.70		1.12		1.00	6.38	M2	**CORTE 4**
							-		
							-		
							-		
ACTA PARCIAL 05									
CIRCULACION							-		
MURO A		9.20		1.12		1.00	10.30	M2	CORTE 5
ESCALON 1		2.53		0.20		1.00	0.51	M2	CORTE 5
ESCALON 2		2.78		0.16		1.00	0.44	M2	CORTE 5
ESCALON 3		3.00		0.20		1.00	0.60	M2	CORTE 5
							-		
MURO B		2.10		1.12		1.00	2.35	M2	CORTE 5
							-		
MURO C		9.20		1.12		1.00	10.30	M2	CORTE 5
ESCALON1		2.53		0.20		1.00	0.51	M2	CORTE 5
ESCALON 2		2.78		0.16		1.00	0.44	M2	CORTE 5
ESCALON 3		3.00		0.20		1.00	0.60	M2	CORTE 5
							-		

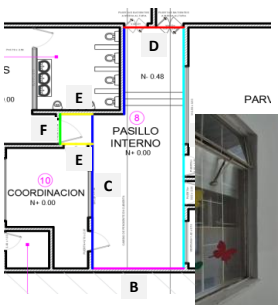







MURO D		2.10		1.12		1.00	2.35	M2	CORTE 5
							-		
MURO E		2.10		1.12		2.00	4.70	M2	CORTE 5
							-		
MURO F		2.10		1.12		1.00	2.35	M2	CORTE 5
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	247.21	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	211.76	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**35.45**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
35.45	211.76	**247.21**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

JARDÍN INFANTIL MARCO IRIARTE

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
07. JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	15,50	$ 38.594,00	$ 598.207,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1,3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.8	DESMONTE MANUAL DE BARANDAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO), CONTEMPLANDO SUS PASAMANOS, APOYOS VERTICALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN PLANTA. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M	-	$ 11.745,00	$ -	12,90	$ 151.510,50	-	$ -	12,90	$ 151.510,50	12,90	$ 151.510,50
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	-	$ 12.903,00	$ -	61,91	$ 798.824,73	52,18	$ 673.278,54	9,73	$ 125.546,19	61,91	$ 798.824,73
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.	M2	790,13	$ 72.169,00	$ 57.022.891,97	682,95	$ 49.287.818,55	13,71	$ 989.436,99	669,24	$ 48.298.381,56	682,95	$ 49.287.818,55
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACUSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 35.924,00	$ -	72,92	$ 2.619.578,08	-	$ -	72,92	$ 2.619.578,08	72,92	$ 2.619.578,08
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.	M2	-	$ 27.857,00	$ -	95,18	$ 2.651.429,26	95,18	$ 2.651.429,26		$ -	95,18	$ 2.651.429,26
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 27.857,00	$ -	36,70	$ 1.022.351,90	-	$ -	36,70	$ 1.022.351,90	36,70	$ 1.022.351,90
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.16	DESMONTE MANUAL DE TUBERÍA POTABLE, SANITARIA, Y/O DE VENTILACIÓN DE DIÁMETROS DESDE 1/2" HASTA 2" Y QUE SE ENCUENTRE EMBEBIDA EN MURO O PLACA Y/O DENTRO DE ALGÚN ELEMENTO PARA DEMOLICIÓN. INCLUYE REGATA PARA EL DESMONTE Y POSTERIOR RESANE, CORTES Y TAPONES DE SUSPENSIÓN TERMINALES EN CASO DE REQUERIRSE, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	$ 196.417,00	$ -	13,35	$ 2.622.166,95	-	$ -	13,35	$ 2.622.166,95	13,35	$ 2.622.166,95
1.6.20	DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLASTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. INCLUYE CARGUE.	UN	-	$ 121.680,00	$ -	1,66	$ 201.988,80	1,66	$ 201.988,80		$ -	1,66	$ 201.988,80
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	50,00	$ 14.184,00	$ 709.200,00	42,00	$ 595.728,00	-	$ -	42,00	$ 595.728,00	42,00	$ 595.728,00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	50,00	$ 19.177,00	$ 958.850,00	42,00	$ 805.434,00	-	$ -	42,00	$ 805.434,00	42,00	$ 805.434,00
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.4	DESMONTE MANUAL DE CIELO RASO EN MADERA, CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 19.287,00	$ -	15,24	$ 293.933,88	8,99	$ 173.390,13	6,25	$ 120.543,75	15,24	$ 293.933,88
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	74,56	$ 20.627,00	$ 1.537.949,12	38,36	$ 791.251,72	-	$ -	38,36	$ 791.251,72	38,36	$ 791.251,72
1,8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	$ 6.856,00	$ -	1,90	$ 13.026,40	1,90	$ 13.026,40		$ -	1,90	$ 13.026,40
1.8.12	DEMOLICION MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERIA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	-	$ 24.853,00	$ -	1,36	$ 33.800,08	-	$ -	1,36	$ 33.800,08	1,36	$ 33.800,08
1.8.15	DEMOLICION MANUAL DE MUROS EN CONCRETO E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	-	$ 29.637,00	$ -	0,62	$ 18.374,94	-	$ -	0,62	$ 18.374,94	0,62	$ 18.374,94
1,9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.9.1	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADUA O EL BAMBÚ). INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ÁREA CUBIERTA PROYECTADA EN PLANTA.	M2	-	$ 21.615,00	$ -	180,45	$ 3.900.426,75	13,71	$ 296.341,65	166,74	$ 3.604.085,10	180,45	$ 3.900.426,75
1.9.8	DEMOLICION DE CONCRETOS ENTERRADOS (PROVISION). INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M3	2,41	$ 210.421,00	$ 507.114,61	0,32	$ 67.334,72	-	$ -	0,32	$ 68.050,15	0,32	$ 68.050,15
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,61	$ 53.593,00	$ 300.656,73	22,50	$ 1.205.842,50	-	$ -	22,50	$ 1.205.928,25	22,50	$ 1.205.928,25

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA																
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:										RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES					
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4																				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025			8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027			11. PLAZO:	24	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A					14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025			19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027			22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A					25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025												
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
07. JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE													
1.9.13	DEMOLICIÓN MANUAL DE ESCALERAS Y/O RAMPAS EN CONCRETO REFORZADO (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA). NO INCLUYE CIMENTACIÓN. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M3 SERÁ MEDIDO EN LA FIGURA ORIGINAL DEMOLIDA. NO EN EL VOLUMEN RETIRADO EN LA VOLQUETA (EL ÍTEM YA INCLUYE PORCENTAJE DE EXPANSIÓN).	M3	34,06	$ 36.670,00	$ 1.248.980,20	19,09	$ 700.030,30	-	$ -	19,09	$ 699.962,83	19,09	$ 699.962,83
1.9.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	22,64	$ 15.642,00	$ 354.134,88	1,20	$ 18.770,40	1,20	$ 18.770,40	-	$ -	1,20	$ 18.770,40
1.9.16	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	-	$ 296.815,00	$ -	0,69	$ 204.802,35	-	$ -	0,69	$ 205.692,80	0,69	$ 205.692,80
1.9.17	DEMOLICIÓN COLUMNA EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	$ 81.285,00	$ -	4,65	$ 377.975,25	-	$ -	4,65	$ 377.975,25	4,65	$ 377.975,25
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	66,00	$ 6.605,00	$ 435.930,00	7,00	$ 46.235,00	-	$ -	7,00	$ 46.235,00	7,00	$ 46.235,00
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS SI ANGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	5,04	$ 64.238,00	$ 323.759,52	14,73	$ 946.225,74	-	$ -	14,73	$ 946.225,74	14,73	$ 946.225,74
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	6,56	$ 97.563,00	$ 640.013,28	14,38	$ 1.402.955,94	-	$ -	14,38	$ 1.402.955,94	14,38	$ 1.402.955,94
2,2	**CONCRETOS**												
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	-	$ 328.579,00	$ -	35,52	$ 11.671.126,08	-	$ -	35,52	$ 11.671.126,08	35,52	$ 11.671.126,08
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	-	$ 106.504,00	$ -	7,00	$ 745.528,00	-	$ -	7,00	$ 745.528,00	7,00	$ 745.528,00
2,3	**VARIOS - CIMENTACIONES**												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	-	$ 29.636,00	$ -	14,00	$ 414.904,00	-	$ -	14,00	$ 414.904,00	14,00	$ 414.904,00
2,5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	-	$ 4.908,00	$ -	47,13	$ 231.314,04	-	$ -	47,13	$ 231.314,04	47,13	$ 231.314,04
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	-	$ 5.297,00	$ -	7,33	$ 38.827,01	-	$ -	7,33	$ 38.805,82	7,33	$ 38.805,82
2,6	**ESTRUCTURAS METALICAS**												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	3.950,67	$ 18.149,00	$ 71.700.709,83	585,70	$ 10.629.869,30	52,32	$ 949.555,68	533,38	$ 9.680.313,62	585,70	$ 10.629.869,30
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3,1	**MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.**												
3.1.1	MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	-	$ 47.635,00	$ -	1,19	$ 56.685,65	-	$ -	1,19	$ 56.804,74	1,19	$ 56.804,74
3.1.3	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	-	$ 193.738,00	$ -	1,09	$ 211.174,42	1,09	$ 211.174,42	-	$ -	1,09	$ 211.174,42
3,2	**OTROS MAMPUESTOS.**												
3.2.1	BORDILLO DE MEDIDAS 13X15 CM (A X H), FABRICADO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO COMÚN MACIZO 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE RUGOSA / RUSTICA, TIPO ARCILLAS ARDESA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, PIEZAS TRABADAS A SOGAS EN DOS HILADAS, INCLUYENDO MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE; PAÑETADO TIPO LISO COMÚN 1:4 E.=1,5 CM, INCLUYENDO FILOS. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI ENCHAPE.	UN	-	$ 80.591,00	$ -	39,96	$ 3.220.416,36	1,20	$ 96.709,20	38,76	$ 3.123.707,16	39,96	$ 3.220.416,36
3.2.5	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	-	$ 25.744,00	$ -	57,51	$ 1.480.537,44	-	$ -	57,51	$ 1.480.537,44	57,51	$ 1.480.537,44
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4,1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	-	$ 70.543,00	$ -	13,35	$ 941.749,05	-	$ -	13,35	$ 941.749,05	13,35	$ 941.749,05
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 126.072,00	$ -	1,00	$ 126.072,00	1,00	$ 126.072,00	-	$ -	1,00	$ 126.072,00
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	23,00	$ 199.311,00	$ 4.584.153,00	23,00	$ 4.584.153,00	23,00	$ 4.584.153,00	-	$ -	23,00	$ 4.584.153,00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETOORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 218.382,00	$ 3.494.112,00	15,00	$ 3.275.730,00	15,00	$ 3.275.730,00	-	$ -	15,00	$ 3.275.730,00
5.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12(FASE+ RETORNO+RETORNO +RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	-	$ 231.135,00	$ -	1,00	$ 231.135,00	1,00	$ 231.135,00	-	$ -	1,00	$ 231.135,00
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	UN	3,00	$ 45.512,00	$ 136.536,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	24,00	$ 49.640,00	$ 1.191.360,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA	UN	1,00	$ 350.787,00	$ 350.787,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	6,00	$ 36.026,00	$ 216.156,00	19,00	$ 684.494,00	19,00	$ 684.494,00	-	$ -	19,00	$ 684.494,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026				4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA											
2. ACTA No.	5						5. TIPO DE ACTA PARCIAL:							RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES			
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4																		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025			8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249							
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027		11. PLAZO:	24	Meses/días							
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A					14. ADICIONES:	N/A								
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO																		
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES																		
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025			19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265							
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027		22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días							
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A					25. ADICIONES:	N/A								
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025																		
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA																		

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
07. JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE													
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X20A 10 KA	UN		$ 101.875,00	$ -	1,00	$ 101.875,00	1,00	$ 101.875,00	-	$ -	1,00	$ 101.875,00
5,2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00	$ 233.378,00	$ 1.166.890,00	33,00	$ 7.701.474,00	33,00	$ 7.701.474,00	-	$ -	33,00	$ 7.701.474,00
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES. ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 229.495,00	$ -	3,00	$ 688.485,00	3,00	$ 688.485,00	-	$ -	3,00	$ 688.485,00
5.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	UN		$ 140.675,00	$ -	8,00	$ 1.125.400,00	8,00	$ 1.125.400,00	-	$ -	8,00	$ 1.125.400,00
5.2.12	UMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 224.332,00	$ -	1,00	$ 224.332,00	1,00	$ 224.332,00	-	$ -	1,00	$ 224.332,00
5.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 128.166,00	$ -	1,00	$ 128.166,00	1,00	$ 128.166,00	-	$ -	1,00	$ 128.166,00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	87,00	$ 234.104,00	$ 20.367.048,00	97,00	$ 22.708.088,00	97,00	$ 22.708.088,00	-	$ -	97,00	$ 22.708.088,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	13,00	$ 315.585,00	$ 4.102.605,00	18,00	$ 5.680.530,00	18,00	$ 5.680.530,00	-	$ -	18,00	$ 5.680.530,00
5,3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA. BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 717.870,00	$ -	1,00	$ 717.870,00	1,00	$ 717.870,00	-	$ -	1,00	$ 717.870,00
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA. BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 456.222,00	$ -	1,00	$ 456.222,00	1,00	$ 456.222,00	-	$ -	1,00	$ 456.222,00
5.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA. BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 743.226,00	$ 743.226,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	4,00	$ 57.862,00	$ 231.448,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	57,00	$ 60.035,00	$ 3.421.995,00	65,00	$ 3.902.275,00	65,00	$ 3.902.275,00	-	$ -	65,00	$ 3.902.275,00
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF	M		$ 41.762,00	$ -	23,20	$ 968.878,40	23,20	$ 968.878,40	-	$ -	23,20	$ 968.878,40
5.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF	M	10,00	$ 65.644,00	$ 656.440,00	2,00	$ 131.288,00	2,00	$ 131.288,00	-	$ -	2,00	$ 131.288,00
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	165,00	$ 60.587,00	$ 9.996.855,00	200,78	$ 12.164.657,86	200,78	$ 12.164.657,86	-	$ -	200,78	$ 12.164.657,86
5.4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 55.840,00	$ -	21,20	$ 1.183.808,00	21,20	$ 1.183.808,00	-	$ -	21,20	$ 1.183.808,00
5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	8,00	$ 92.434,00	$ 739.472,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	13,00	$ 69.605,00	$ 904.865,00	18,00	$ 1.252.890,00	18,00	$ 1.252.890,00	-	$ -	18,00	$ 1.252.890,00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	7,00	$ 192.065,00	$ 1.344.455,00	7,00	$ 1.344.455,00	7,00	$ 1.344.455,00	-	$ -	7,00	$ 1.344.455,00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	51,00	$ 192.642,00	$ 9.824.742,00	51,00	$ 9.824.742,00	51,00	$ 9.824.742,00	-	$ -	51,00	$ 9.824.742,00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 41.548,00	$ 332.384,00	8,00	$ 332.384,00	8,00	$ 332.384,00	-	$ -	8,00	$ 332.384,00
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	22,00	$ 70.135,00	$ 1.542.970,00	25,00	$ 1.753.375,00	25,00	$ 1.753.375,00	-	$ -	25,00	$ 1.753.375,00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 52.758,00	$ 422.064,00	7,00	$ 369.306,00	7,00	$ 369.306,00	-	$ -	7,00	$ 369.306,00
5,6	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN		$ 41.486,00	$ -	17,90	$ 742.599,40	17,90	$ 742.599,40	-	$ -	17,90	$ 742.599,40
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN		$ 1.052.087,00	$ -	1,00	$ 1.052.087,00	1,00	$ 1.052.087,00	-	$ -	1,00	$ 1.052.087,00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	17,00	$ 220.619,00	$ 3.750.523,00	17,00	$ 3.750.523,00	17,00	$ 3.750.523,00	-	$ -	17,00	$ 3.750.523,00
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 263.215,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00	-	$ -	1,00	$ 263.215,00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	3,00	$ 173.638,00	$ 520.914,00	3,00	$ 520.914,00	3,00	$ 520.914,00	-	$ -	3,00	$ 520.914,00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	-	$ 272.141,00	$ -	2,00	$ 544.282,00	2,00	$ 544.282,00	-	$ -	2,00	$ 544.282,00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	-	$ 459.176,00	$ -	2,00	$ 918.352,00	2,00	$ 918.352,00	-	$ -	2,00	$ 918.352,00
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	-	$ 7.472.944,00	$ -	1,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	1,00	$ 7.472.944,00
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO	UN	-	$ 163.009,00	$ -	4,00	$ 652.036,00	4,00	$ 652.036,00	-	$ -	4,00	$ 652.036,00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	-	$ 8.605,00	$ -	203,55	$ 1.751.547,75	203,55	$ 1.751.547,75	-	$ -	203,55	$ 1.751.547,75
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
07. JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE													
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	192,79	$ 123.466,00	$ 23.803.010,14	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	215,39	$ 21.009,00	$ 4.525.128,51	465,05	$ 9.770.235,45	465,05	$ 9.770.235,45	-	$ -	465,05	$ 9.770.235,45
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
11,45	SSUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	-	$ 1.066.996,00	$ -	0,23	$ 245.409,08	0,23	$ 245.409,08	-	$ -	0,23	$ 245.409,08
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14,1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	165,87	$ 107.142,00	$ 17.771.643,54	94,13	$ 10.085.276,46	94,13	$ 10.085.276,46	-	$ -	94,13	$ 10.085.276,46
14.1.6	TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M	-	$ 61.382,00	$ -	6,20	$ 380.568,40	6,20	$ 380.568,40	-	$ -	6,20	$ 380.568,40
14,2	**DIVISIONES**												
14.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M	-	$ 85.110,00	$ -	9,36	$ 796.629,60	-	$ -	9,36	$ 796.629,60	9,36	$ 796.629,60
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**												
16.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI, H=0,10 M, FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO.	M2	25,22	$ 52.987,00	$ 1.336.332,14	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	676,50	$ 4.546,00	$ 3.075.369,00	676,50	$ 3.075.369,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.5	PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	-	$ 30.772,00	$ -	2,39	$ 73.545,08	-	$ -	2,39	$ 73.391,22	2,39	$ 73.391,22
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	-	$ 25.958,00	$ -	233,88	$ 6.071.057,04	-	$ -	233,88	$ 6.071.057,04	233,88	$ 6.071.057,04
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.281,66	$ 13.689,00	$ 17.544.643,74	1.281,66	$ 17.544.643,74	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	437,07	$ 12.878,00	$ 5.628.587,46	863,37	$ 11.118.478,86	20,27	$ 261.037,06	843,10	$ 10.857.441,80	863,37	$ 11.118.478,86
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	316,30	$ 29.936,00	$ 9.468.756,80	316,30	$ 9.468.756,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.15	PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA PARA ACABADO APLICADO SOBRE PAÑETE TOTALMENTE SECO Y/O SUPERFICIES SECAS (POR EJEMPLO SISTEMA DRYWALL DE YESO Y/O FIBROCEMENTO); VERSIÓN BRILLANTE, FORMULADA EN DOS COMPONENTES, IMPERMEABLE AL PASO DE AGUA Y VAPORES, TIPO SIKAGUARD-68 O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICADA EN TRES (3) CAPAS GARANTIZANDO UN ESPESOR FINAL DE 12 MILS (305 MICRONES), INCLUYE DILUCIÓN CON PRODUCTO TIPO COLMASOLVENTE EPÓXICO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES.	M2	739,88	$ 17.970,00	$ 13.295.643,60	739,88	$ 13.295.643,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22,3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	-	$ 37.231,00	$ -	408,00	$ 15.190.248,00	-	$ -	408,00	$ 15.190.248,00	408,00	$ 15.190.248,00
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA D$.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	-	$ 28.498,00	$ -	52,18	$ 1.487.025,64	27,94	$ 796.234,12	24,24	$ 690.791,52	52,18	$ 1.487.025,64
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	66,00	$ 125.559,00	$ 8.286.894,00	13,75	$ 1.726.436,25	7,88	$ 989.404,92	5,87	$ 737.031,33	13,75	$ 1.726.436,25
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y	M2	790,13	$ 253.100,00	$ 199.981.903,00	682,95	$ 172.854.645,00	13,71	$ 3.470.001,00	669,24	$ 169.384.644,00	682,95	$ 172.854.645,00
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	-	$ 99.728,00	$ -	13,86	$ 1.382.230,08	-	$ -	13,86	$ 1.382.230,08	13,86	$ 1.382.230,08
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 D$.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	42,00	$ 53.788,00	$ 2.259.096,00	308,64	$ 16.601.128,32	308,64	$ 16.601.128,32	-	$ -	308,64	$ 16.601.128,32
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	-	$ 82.182,00	$ -	156,77	$ 12.883.672,14	156,77	$ 12.883.672,14	-	$ -	156,77	$ 12.883.672,14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA						
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4										

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027		11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027		22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
07. JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE													
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 513.620.620,07		$ 503.801.532,04		$ 161.088.653,83		$ 299.330.033,27		$ 460.418.687,10
	35. DESCRIPCIÓN	%											
	ADMINISTRACIÓN	27,49%			$ 141.194.308,00		$ 138.495.041,16		$ 44.283.270,94		$ 82.285.826,15		$ 126.569.097,09
	IMPREVISTO	1,00%			$ 5.136.206,00		$ 5.038.015,32		$ 1.610.886,54		$ 2.839.647,20		$ 4.450.533,74
	UTILIDAD	4,00%			$ 20.544.825,00		$ 20.152.061,28		$ 6.443.546,15		$ 11.973.201,32		$ 18.416.747,47
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 166.875.339,00		$ 163.685.117,76		$ 52.337.703,63		$ 97.098.674,67		$ 149.436.378,30
	AJUSTE AL PESO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	ANTICIPO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 680.495.959,07		$ 667.486.649,80		$ 213.426.357,46		$ 396.428.707,94		$ 609.855.065,40

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

DESCRIPCION	37. No. INFORME MENSUAL	38. PERIODO	39. NOMBRE DEL ARCHIVO	40. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 3	
INFORME SOCIAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Social No 5_10676-2025	
INFORME AMBIENTAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Ambiental No 5_10676-2025	
INFORME SST	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2	
INFORME DE SUPERVISION	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Supervision No 5_10676-2025	
ACTA PARCIAL	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4 Corte General obra_Acta 4_10676-2025	
SOPORTE PAGO SDH	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FE 5 - PAGO HACIENDA RESERVA_ACTA 3 FE 6 - PAGO HACIENDA VIGENCIA_ACTA 3 FE 7 - PAGO HACIENDA ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FACTURA	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FACTURA_FE 5_DISTRITO RESERVA_ACTA 3 FACTURA_FE 6_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 3 FACTURA_FE 7_ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FORMATO MC 14	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	MC-14_DISTRITO_ACTA 3 MC-14_ADULTO MAYOR_ACTA 3	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 12 días del mes de Junio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7

Nombre: NADIA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.459.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO		**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.4.2**	**DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.**		**UNIDAD**	**M**

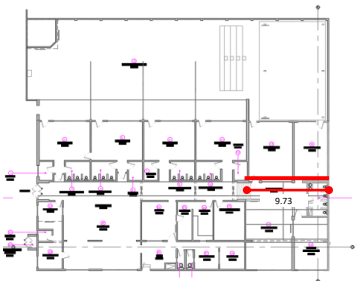ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	**ACTA PARCIAL 02**									
	DESMONTE DE CANAL			9.73			1.00	9.73	M	
 	**ACTA PARCIAL 05**									
 	DESMONTE DE CANAL							-		
	CANAL CENTRAL				24.24		1.00	24.24		
	CANAL EXTERIOR				24.24		1.00	24.24		
	CANAL LAVANDERIA				3.70		1.00	3.70		

TOTAL EJECUTADO	61.91	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	9.73	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**52.18**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
52.18	9.73	**61.91**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA





PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.4.7**	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.**	**UNIDAD**	**M2**

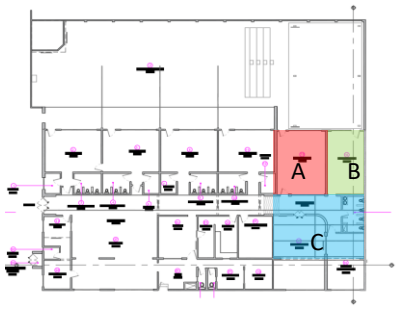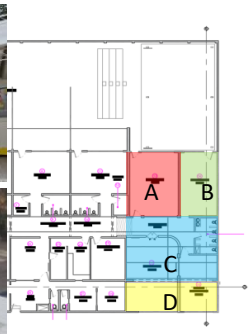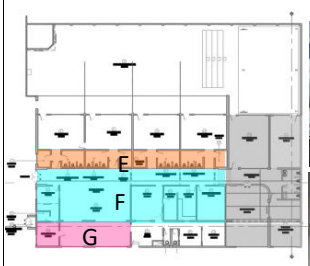ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 01							-		
	CUBIERTA A		7.00	4.07			1.00	28.49	M2	CORTE NO. 1
	CUBIERTA B		7.00	5.25			1.00	36.75	M2	CORTE NO. 1
	CUBIERTA C		9.52	7.50			1.00	71.40	M2	CORTE NO. 1
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 02									
  	CUBIERTA A (SIN COBRAR CORTE No. 1)		7.00	5.19			1.00	36.33	M2	CORTE NO. 2
	CUBIERTA B (SIN COBRAR CORTE No. 1)		7.00	4.37			1.00	30.59	M2	CORTE NO. 2
	CUBIERTA C (SIN COBRAR CORTE No. 1)		9.73	7.08			1.00	68.89	M2	CORTE NO. 2
	CUBIERTA D		9.73	4.20			1.00	40.87	M2	CORTE NO. 2
	MENOS COBRO ACTA PARCIAL 1	- 1.00					136.64	- 136.64	M2	CORTE NO. 2
 								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 03									
  	CUBIERTA E		2.29	24.24			1.00	55.44	M2	CORTE NO. 3
	CUBIERTA F		7.19	24.24			1.00	174.29	M2	CORTE NO. 3
	CUBIERTA G		3.38	9.00			1.00	30.42	M2	CORTE NO. 3
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

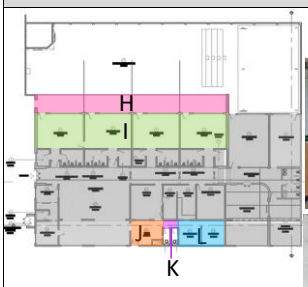





							-		
							-		
ACTA PARCIAL 04									
CUBIERTA H		2.62	24.24				63.51	M2	CORTE NO. 4
CUBIERTA I		5.32	24.24				128.96	M2	CORTE NO. 4
CUBIERTA J		4.16	3.28				13.64	M2	CORTE NO. 4
CUBIERTA K		2.30	3.28				7.54	M2	CORTE NO. 4
CUBIERTA L		5.72	3.28				18.76	M2	CORTE NO. 4
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
ACTA PARCIAL 05									
CUBIERTA M		3.56	3.85				13.71	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		



TOTAL EJECUTADO	682.95	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	669.24	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**13.71**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13.71	669.24	**682.95**

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.5.4**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Area				
ACTA PARCIAL 05									
PLACA DE PISO EXTERIOR (Área de AutoCAD)					95.18	1.00	95.18	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	95.18	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**95.18**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
95.18	0.00	**95.18**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO		**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.6.20**	**DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLÁSTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, U OTROS RELACIONADOS.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

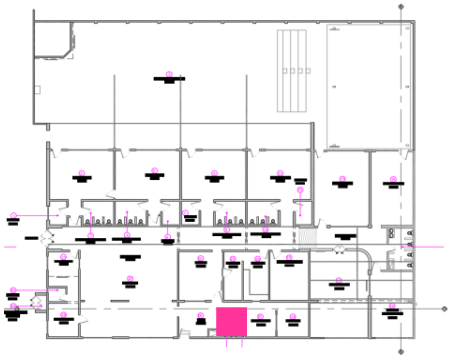



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
ACTA PARCIAL 05									
DESMONTE DE TANQUE	83%					2.00	1.66	UN	CORTE 5
							-		
							-		
							-	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA





PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO		**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.7.4**	**DESMONTE MANUAL DE CIELO RASO EN MADERA, CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**		**UNIDAD**	**M2**

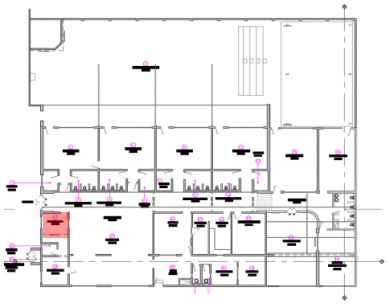ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
  	**ACTA PARCIAL 03**									
								-		
	CIELO RASO COORDINACION		2.24	2.79			1.00	6.25	M2	CORTE NO. 3
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 	**ACTA PARCIAL 05**									
	CIELO RASO AUX COORDINACION		3.28	2.74			1.00	8.99	M2	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	15.24	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	6.25	M2	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**8.99**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8.99	6.25	**15.24**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.8.1**	**CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M**

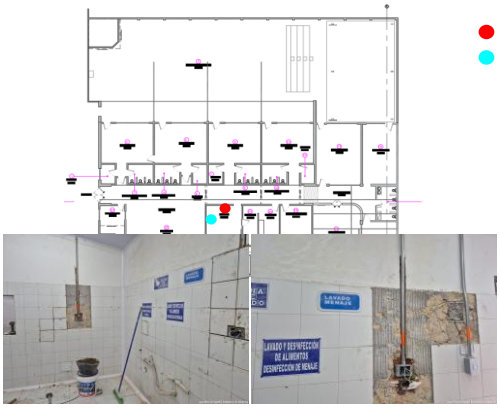ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05							-		
	CORTE PARA INCRUSTACION DE TUBERIA COCINA							-		
	A			0.9			1.00	0.90	M	
	B			1			1.00	1.00	M	
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	1.90	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**1.90**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.90	0.00	**1.90**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.9.1**	**DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADUA O EL BAMBÚ). INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ÁREA CUBIERTA PROYECTADA EN PLANTA.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 02									
 	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN CUBIERTA D		4.20	9.73			1.00	40.87	M2	CORTE NO. 2
 								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 03									
 	CUBIERTA E		2.29	24.24			1.00	55.51	M2	CORTE NO. 3
	CUBIERTA G		3.38	9.00			1.00	30.42	M2	CORTE NO. 3
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-	







	ACTA PARCIAL 04								
	CUBIERTA J		4.16	3.28			13.64	M2	CORTE NO. 4
	CUBIERTA K		2.30	3.28			7.54	M2	CORTE NO. 4
	CUBIERTA L		5.72	3.28			18.76	M2	CORTE NO. 4
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
	ACTA PARCIAL 05								
	CUBIERTA M		3.56	3.85			13.71	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		





TOTAL EJECUTADO	180.45	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	166.74	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**13.71**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
13.71	166.74	**180.45**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025


CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.9.15**	**CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	CORTE PARA INCRISTACION DE TUBO DE TIMBRE			1.2			1.00	1.20	M	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	1.20	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**1.20**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.20	0.00	**1.20**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	CONTRATO No.	10676	FRENTE OBRA	007
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	CONTRATO No:	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			FECHA	12/06/2025

CAPITULO	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.		ACTA No:	005
ÍTEM	2.6.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)		UNIDAD	KG

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 02									
	CUBIERTA A							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			6.95		5.38	5.00	186.78	KG	CORTE NO. 2
	TRANSVERSAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			4.90		5.38	3.00	79.01	KG	CORTE NO. 2
								-		
	CUBIERTA B							-		
	TRANSVERSAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			6.86		5.38	5.00	184.36	KG	CORTE NO. 2
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			4.10		5.38	3.00	66.11	KG	CORTE NO. 2
								-		
	CUBIERTA C							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			9.48		5.38	6.00	305.73	KG	CORTE NO. 2
	VERTICAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			0.34		5.38	12.00	21.93	KG	CORTE NO. 2
								-		
	CUBIERTA D							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			9.73		5.38	4.00	209.20	KG	CORTE NO. 2
								-		
								-		
	MENOS ÁREA DE CUBIERTA	**176.68**				**4.13**	- **1.00**	- **729.97**	**KG**	CORTE NO. 2
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 03							-		
	CUBIERTA E							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			24.24		5.38	1.00	130.29	KG	CORTE NO. 3
	PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE			24.24		1.61	1.00	39.06	KG	CORTE NO. 3
								-		
	CUBIERTA F							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			24.24		5.38	5.00	651.45	KG	CORTE NO. 3
	PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE			24.24		1.61	6.00	234.38	KG	CORTE NO. 3
								-		
	CUBIERTA G							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			9.00		5.38	4.00	193.50	KG	CORTE NO. 3
	TRANSVERSAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			3.38		5.38	2.00	36.34	KG	CORTE NO. 3
								-		
	MENOS ÁREA DE CUBIERTA	**260.14**				**4.13**	- 1.00	- **1,074.79**	KG	CORTE NO. 3
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-	

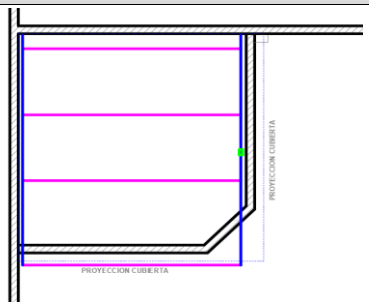



	ACTA PARCIAL 05									
	CUBIERTA M							-		
	TRANSVERSAL A PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			3.30		5.38	4.00	70.95	KG	CORTE 5
	LONGITUDINAL A PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			3.50		5.38	2.00	37.63	KG	CORTE 5
	VERTICAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			0.07		5.38	1.00	0.38	KG	CORTE 5
								-		
	MENOS AREA DE CUBIERTA	13.71				**4.13**	- 1.00	- 56.64	KG	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	585.70	KG	
MENOS ACTAS ANTERIORES	533.38	KG	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	KG	
PRESENTE ACTA	**52.32**	KG	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
52.32	533.38	**585.70**

OBSERVACIONES: ESTA ACTIVIDAD SE PAGA DEBIDO A QUE CORRESPONDE AL EXCEDENTE DE LA ESTRUCTURA QUE NO ESTA DENTRO DE LO CONTEMPLADO EN EL APU DE LA INSTALACION DE LA TEJA ECORROF ITEM 23,4,5, EQUIVALENTE A 4,1316 KG X M2

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO		**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**3.1.3**	**MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL 05									
MURO EN CERRAMIENTO EXTERIOR							-		
LATERAL		0.34		1.4		1.00	0.48	M2	CORTE 5
FRONTAL		0.44		1.4		1.00	0.61	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	1.09	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**1.09**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1.09	0.00	**1.09**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**3.2.1**	**BORDILLO DE MEDIDAS 13X15 CM (A X H), FABRICADO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO COMÚN MACIZO 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE RUGOSA / RÚSTICA, TIPO ARCILLAS ARDESA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, PIEZAS TRABADAS A SOGAS EN DOS HILADAS, INCLUYENDO MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE; PAÑETADO TIPO LISO COMÚN 1:4 E.=1,5 CM, INCLUYENDO FILOS. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI ENCHAPE.**	**UNIDAD**	**UN**

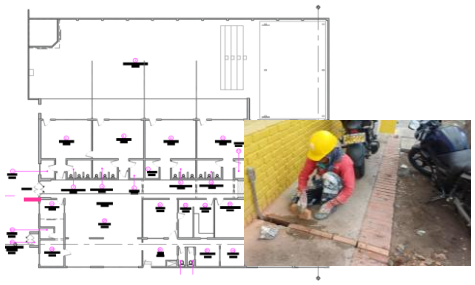ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	ACTA PARCIAL 04									
	LADRILLO EN ANDEN							-		
				1.32				1.32	UN	CORTE 4
				2.67				2.67	UN	CORTE 4
				8.27				8.27	UN	CORTE 4
				2.29				2.29	UN	CORTE 4
				1.50				1.50	UN	CORTE 4
				0.54				0.54	UN	CORTE 4
				2.30				2.30	UN	CORTE 4
				2.31				2.31	UN	CORTE 4
				2.31				2.31	UN	CORTE 4
				1.97				1.97	UN	CORTE 4
				2.32				2.32	UN	CORTE 4
				1.89				1.89	UN	CORTE 4
				0.91				0.91	UN	CORTE 4
				0.31				0.31	UN	CORTE 4
				7.85				7.85	UN	CORTE 4
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05									
	LADRILLO DE ANDEN EN PASILLO FRONTAL			1.20				1.20	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	39.96	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	38.76	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**1.20**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.20	38.76	**39.96**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**





CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.1.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Baño coordinación						1.00	1.00	UN	CORTE 5
										

TOTAL EJECUTADO	1.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**1.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.00	0.00	**1.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.1.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL 05									
Oficina Aux.						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Coordinación						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Circulación salida principal						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Comedor						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Bodega Parvulos 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Baño Parvulos 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Bodega Parvulos 2						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Baño Parvulos 2						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Bodega Parvulos 3						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Baño Parvulos 3						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Bodega Prejardin 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Baño Prejardin 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Circulación zona posterior						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Baño						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Sala de profesores						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Pre- Jardin 4						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Administrativo						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Alacena						2.00	2.00	UN	CORTE 5
Baño zona de lavanderia						2.00	2.00	UN	CORTE 5
Cocina						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Bodega zona posterior						1.00	1.00	UN	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	23.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**23.00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
23.00	0.00	**23.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.1.6**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETOORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

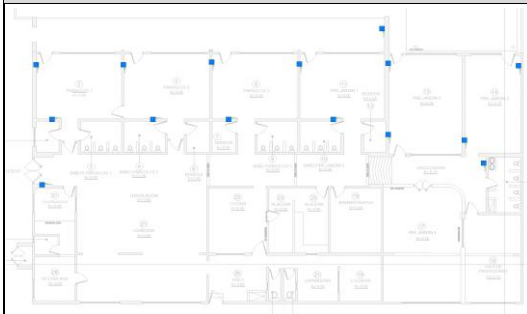ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Parvulos 1						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 2						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 3						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 1						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 2						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 3						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Circulación interna						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Circulación externa						1.00	1.00	UN	CORTE 5
 										

TOTAL EJECUTADO	15.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**15.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
15.00	0.00	**15.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.1.8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12(FASE+ RETORNO+RETORNO +RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

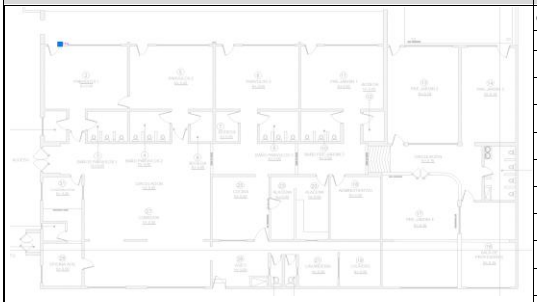ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Circulación zona posterior						1.00	1.00	UN	CORTE 5
										

TOTAL EJECUTADO	1.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**1.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.00	0.00	**1.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.1.24**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Tablero principal "TN"						14.00	14.00	UN	CORTE 5
	Tablero cocina "TC"						5.00	5.00	UN	CORTE 5
 										

TOTAL EJECUTADO	19.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**19.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
19.00	0.00	**19.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.1.30**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X20A 10 KA**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Tablero principal "TN"						1.00	1.00	UN	CORTE 5
										

TOTAL EJECUTADO	1.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**1.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.00	0.00	**1.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.2.2**	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

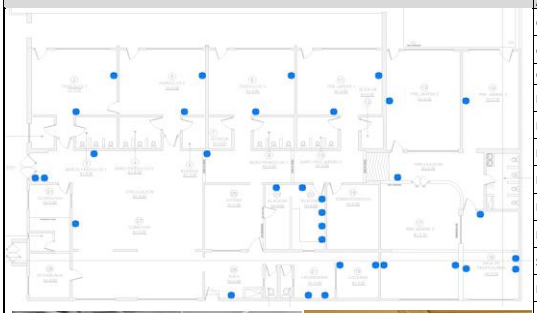ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Circulación acceso principal						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Circulación						3.00	3.00	UN	CORTE 5
	Comedor						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 1						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 2						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 3						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardín 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardín 2						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardín 3						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Sala de profesores						4.00	4.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardín 4						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Alacena						6.00	6.00	UN	CORTE 5
	Lavanderia						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Lockers						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Aseo						1.00	1.00	UN	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	33.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**33.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
33.00	0.00	**33.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.2.4**	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Cocina						3.00	3.00	UN	CORTE 5
 										

TOTAL EJECUTADO	3.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**3.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3.00	0.00	**3.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.2.9**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.**	**UNIDAD**	**M**

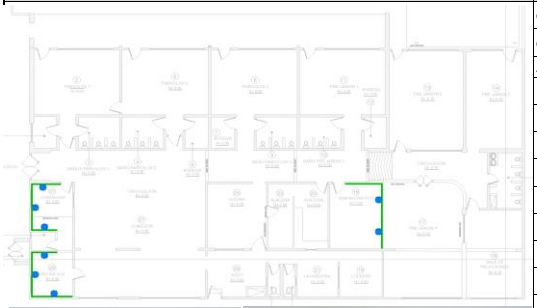ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Coordinación						3.00	3.00	M	CORTE 5
	Oficina Aux.						3.00	3.00	M	CORTE 5
	Administrativo						2.00	2.00	M	CORTE 5
 										

TOTAL EJECUTADO	8.00	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	M
PRESENTE ACTA	**8.00**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8.00	0.00	**8.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.2.12**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Acceso principal						1.00	1.00	UN	CORTE 5
 										

TOTAL EJECUTADO	1.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**1.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.00	0.00	**1.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.2.13**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**	

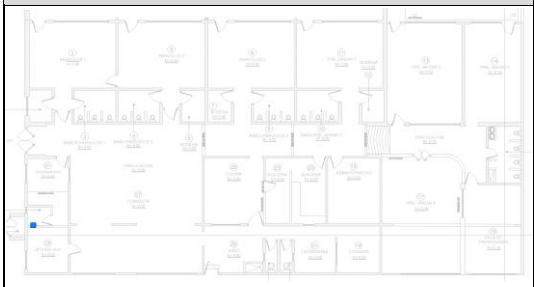ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Baño Coordinación						1.00	1.00	UN	CORTE 5
										

TOTAL EJECUTADO	1.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**1.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.00	0.00	**1.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.2.14** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

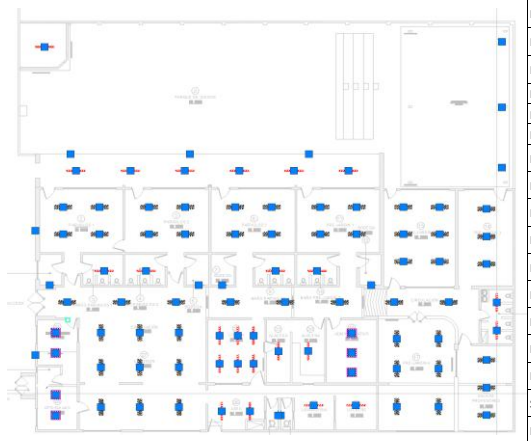ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Parvulos 1						4.00	4.00	UN	CORTE 5
	Bodega Parvulos 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Baño Parvulos 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 2						4.00	4.00	UN	CORTE 5
	Bodega Parvulos 2						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Baño Parvulos 2						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 3						4.00	4.00	UN	CORTE 5
	Bodega Parvulos 3						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Baño Parvulos 3						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre jardin 1						4.00	4.00	UN	CORTE 5
	Bodega Prejardin 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Baño Prejardin 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre jardin 2						6.00	6.00	UN	CORTE 5
	Pre jardin 3						3.00	3.00	UN	CORTE 5
	Baños						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Sala de profesores						3.00	3.00	UN	CORTE 5
	Pre jardin 4						6.00	6.00	UN	CORTE 5
 	Administrativo						3.00	3.00	UN	CORTE 5
	Alacena						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Cocina						6.00	6.00	UN	CORTE 5
	Lockers						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Lavanderia						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Baños						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Aseo						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Comedor						9.00	9.00	UN	CORTE 5
	Oficina Aux.						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Coordinación						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Circulación interna						8.00	8.00	UN	CORTE 5
	Circulación Externa						6.00	6.00	UN	CORTE 5
	Parque de juegos						6.00	6.00	UN	CORTE 5
	Fachada principal						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Deposito exterior parque de juegos						1.00	1.00	UN	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	97.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**97.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
97.00	0.00	**97.00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.2.16**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**	

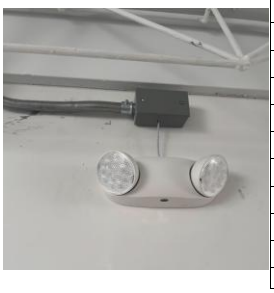ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL 05									
	Circulación externa						4.00	4.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 2						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 3						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre jardin 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre jardin 2						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre jardin 3						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre jardin 4						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Ciculación interna						5.00	5.00	UN	CORTE 5
	Aseo						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Lavanderia						1.00	1.00	UN	CORTE 5
 										

TOTAL EJECUTADO	18.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**18.00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
18.00	0.00	**18.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.3.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL 05									
	Tablero cocina "TC"						1.00	1.00	UN	CORTE 5
										

TOTAL EJECUTADO	1.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**1.00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1.00	0.00	**1.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.3.6**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA**	**UNIDAD**	**UN**

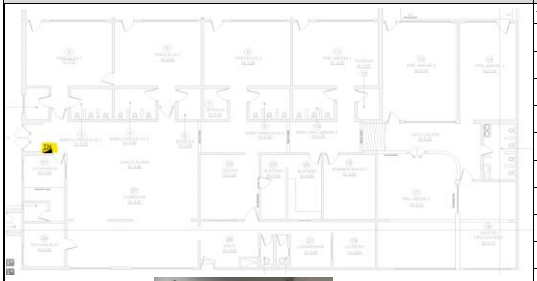ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Tablero principal "TN"						1.00	1.00	UN	CORTE 5
										

TOTAL EJECUTADO	1.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**1.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.00	0.00	**1.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**



CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.3.12**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED**	**UNIDAD**	**UN**

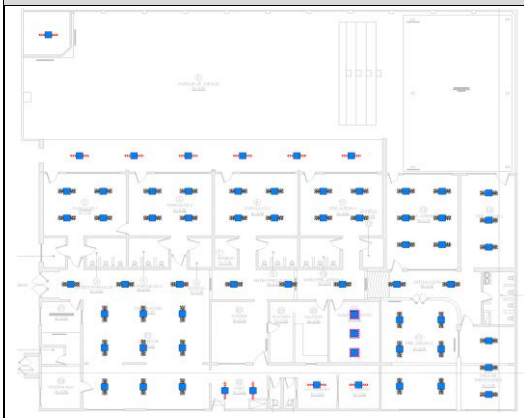ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Parvulos 1						4.00	4.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 2						4.00	4.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 3						4.00	4.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 1						4.00	4.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 2						6.00	6.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 3						3.00	3.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 4						6.00	6.00	UN	CORTE 5
	Sala de profesores						3.00	3.00	UN	CORTE 5
	Lockers						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Lavanderia						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Aseo						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Administrativo						3.00	3.00	UN	CORTE 5
	Comedor						9.00	9.00	UN	CORTE 5
	Ciculación interna						8.00	8.00	UN	CORTE 5
	Ciculación externa						6.00	6.00	UN	CORTE 5
	Deposito parque de juegos						1.00	1.00	UN	CORTE 5
 										

TOTAL EJECUTADO	65.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**65.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
65.00	0.00	**65.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.4.8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF**	**UNIDAD**	**M**

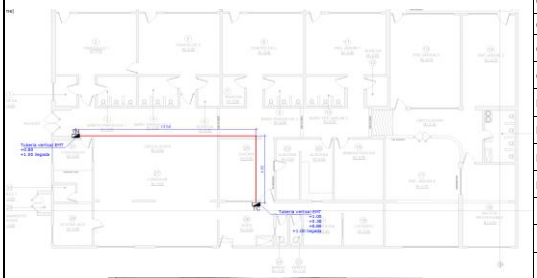ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Coordinación			1.00				1.00	M	CORTE 5
	Coordinación			0.80				0.80	M	CORTE 5
	Circulación			13.50				13.50	M	CORTE 5
	Cocina			4.80				4.80	M	CORTE 5
	Pasillo exterior a cocina			1.00				1.00	M	CORTE 5
	Pasillo exterior a cocina			0.30				0.30	M	CORTE 5
	Pasillo exterior a cocina			0.80				0.80	M	CORTE 5
	Pasillo exterior a cocina			1.00				1.00	M	CORTE 5
										

TOTAL EJECUTADO	23.20	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	M
PRESENTE ACTA	**23.20**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
23.20	0.00	**23.20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.4.9**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Desde tablero existente a tablero proyectado "TN"			2.00			1.00	2.00	M	CORTE 5
										

TOTAL EJECUTADO	2.00	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	M
PRESENTE ACTA	**2.00**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2.00	0.00	**2.00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.4.18**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**M**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	SISTEMA DETECCIÓN INCENDIO									
	COORDINACIÓN			0.96			1.00	0.96	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL			2.25			1.00	2.25	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL			2.50			1.00	2.50	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL			0.33			1.00	0.33	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL			1.22			1.00	1.22	M	CORTE 5
	BODEGA PARVULOS 1			2.63			1.00	2.63	M	CORTE 5
	PARVULOS 1			0.90			1.00	0.90	M	CORTE 5
	PARVULOS 1			2.57			1.00	2.57	M	CORTE 5
	PARVULOS 1			1.75			1.00	1.75	M	CORTE 5
	PARVULOS 1			1.75			1.00	1.75	M	CORTE 5
	PARVULOS 1			2.30			1.00	2.30	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN ZONA POSTERIOR			1.10			1.00	1.10	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN ZONA POSTERIOR			0.30			1.00	0.30	M	CORTE 5
	PARVULOS 1 Y PARVULOS 2			8.88			1.00	8.88	M	CORTE 5
	PREJARDIN 1 Y PREJARDIN 2			11.77			1.00	11.77	M	CORTE 5
	PREJARDIN 2			0.50			1.00	0.50	M	CORTE 5
	PAREJARDIN 3			2.50			1.00	2.50	M	CORTE 5
	PAREJARDIN 3			1.10			1.00	1.10	M	CORTE 5
	PAREJARDIN 3			3.40			1.00	3.40	M	CORTE 5
	PAREJARDIN 3			0.80			1.00	0.80	M	CORTE 5
	PREJARIDN 3 Y JARDIN 2			4.85			1.00	4.85	M	CORTE 5
	PREJARDIN 3 A CIRCULACIÓN			5.00			1.00	5.00	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN			1.10			1.00	1.10	M	CORTE 5
	JARDIN 1			6.40			1.00	6.40	M	CORTE 5
	JARDIN1 Y SALA DE PROFESORES			4.10			1.00	4.10	M	CORTE 5
	JARDIN 1 Y ADMINISTRATIVO			2.91			1.00	2.91	M	CORTE 5
	ADMINISTRATIVO			3.41			1.00	3.41	M	CORTE 5
	ADMINISTRATIVO			0.15			1.00	0.15	M	CORTE 5
	ADMINISTRATIVO			0.25			1.00	0.25	M	CORTE 5
	ALACENA Y COCINA			6.20			1.00	6.20	M	CORTE 5
	ASEO			0.25			1.00	0.25	M	CORTE 5
	ASEO			2.20			1.00	2.20	M	CORTE 5
	COCINA Y ASEO			2.80			1.00	2.80	M	CORTE 5
	COCINA Y CIRCULACIÓN			3.75			1.00	3.75	M	CORTE 5
	COMEDOR Y COCINA			7.40			1.00	7.40	M	CORTE 5
	COMEDOR			1.90			1.00	1.90	M	CORTE 5
	COMEDOR Y OFICINA			5.90			1.00	5.90	M	CORTE 5
	OFICINA Y COORDINACIÓN			6.50			1.00	6.50	M	CORTE 5
	COORDINACIÓN			1.00			1.00	1.00	M	CORTE 5
	SISTEMA DE CCTV									
	COORDINACIÓN			1.60			1.00	1.60	M	CORTE 5
	COORDINACIÓN			3.40			1.00	3.40	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL			0.27			1.00	0.27	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL			0.33			1.00	0.33	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL			2.11			1.00	2.11	M	CORTE 5
	BODEGA PARVULOS 1			2.60			1.00	2.60	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN			0.21			1.00	0.21	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN			1.50			1.00	1.50	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN			6.80			1.00	6.80	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN			1.60			1.00	1.60	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN			1.60			1.00	1.60	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN			0.40			1.00	0.40	M	CORTE 5
	CIRCULACIÓN			14.57			1.00	14.57	M	CORTE 5

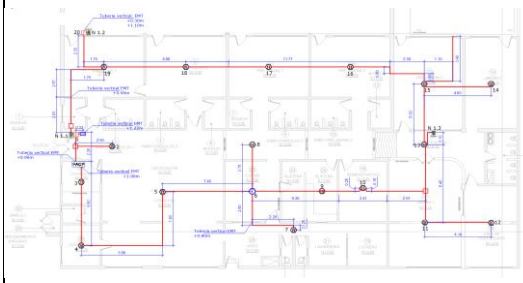









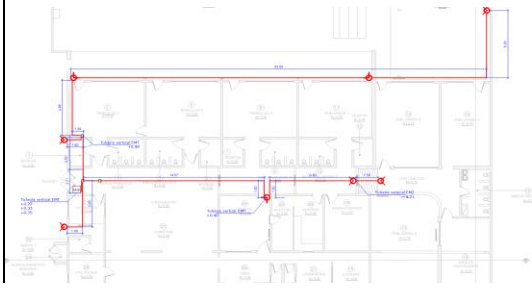


BODEGA PARVULOS 1			1.60			1.00	1.60	M	CORTE 5
PARVULOS 1			0.80			1.00	0.80	M	CORTE 5
PARVULOS 1			1.30			1.00	1.30	M	CORTE 5
PARVULOS 1			4.96			1.00	4.96	M	CORTE 5
CIRCULACIÓN ZONA POSTERIOR			33.55			1.00	33.55	M	CORTE 5
CIRCULACIÓN ZONA POSTERIOR			6.00			1.00	6.00	M	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	200.78	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	M
PRESENTE ACTA	**200.78**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
200.78	0.00	**200.78**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.4.20**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

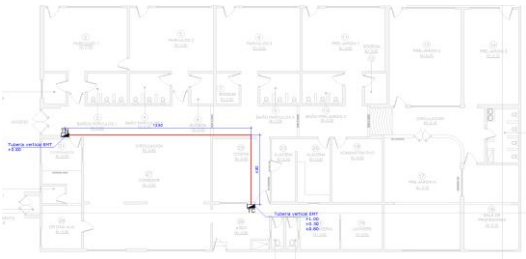



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL 05									
Coordinación			0.80				0.80	M	CORTE 5
Circulación			13.50				13.50	M	CORTE 5
Cocina			4.80				4.80	M	CORTE 5
Pasillo exterior a cocina			1.00				1.00	M	CORTE 5
Pasillo exterior a cocina			0.30				0.30	M	CORTE 5
Pasillo exterior a cocina			0.80				0.80	M	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	21.20	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	M
PRESENTE ACTA	**21.20**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
21.20	0.00	**21.20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.5.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Pasillo zona parque de juegos						4.00	4.00	UN	CORTE 5
	Circulación interna						5.00	5.00	UN	CORTE 5
	Circulación zona de aseo						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 2						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 3						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 2						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 3						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 4						1.00	1.00	UN	CORTE 5
 										

TOTAL EJECUTADO	18.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**18.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
18.00	0.00	**18.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.5.4**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL 05									
Coordinacion						2.00	2.00	UN	CORTE 5
Aux. Coordinacion						2.00	2.00	UN	CORTE 5
Administracion						3.00	3.00	UN	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	7.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**7.00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7.00	0.00	**7.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.5.8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA



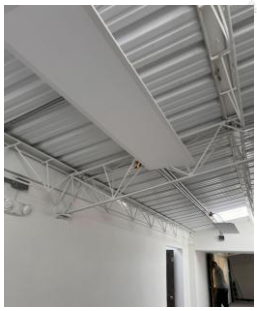



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL 05									
Parvulos 1						4.00	4.00	UN	CORTE 5
Parvulos 2						4.00	4.00	UN	CORTE 5
Parvulos 3						4.00	4.00	UN	CORTE 5
Pre-Jardín 1						4.00	4.00	UN	CORTE 5
Pre-Jardín 2						6.00	6.00	UN	CORTE 5
Pre-Jardín 3						3.00	3.00	UN	CORTE 5
Pre-Jardín 4						6.00	6.00	UN	CORTE 5
Sala de profesores						3.00	3.00	UN	CORTE 5
Circulación						8.00	8.00	UN	CORTE 5
Comedor						9.00	9.00	UN	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	51.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**51.00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
51.00	0.00	**51.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.5.9**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL 05									
	Fachada ingreso principal						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Zona parque de juegos						6.00	6.00	UN	CORTE 5
 										

TOTAL EJECUTADO	8.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**8.00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
8.00	0.00	**8.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.5.10**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER**	**UNIDAD**	**UN**

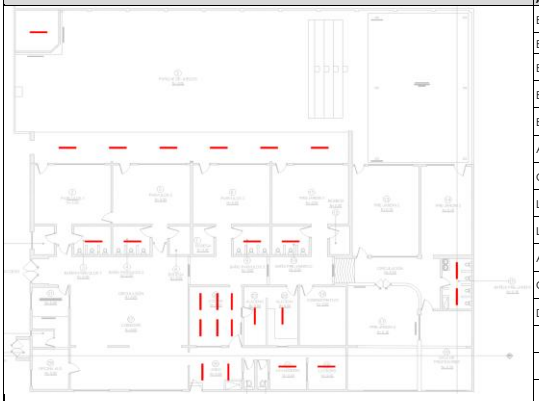





ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL 05									
	Baño Parvulos 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Baño Parvulos 2						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Baño Parvulos 3						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Baño Pre Jardin 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Baños Pre Jardin 2-3-4						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Alacena						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Cocina						6.00	6.00	UN	CORTE 5
	Lockers						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Lavanderia						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Aseo						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Circulación posterior patio de juegos						6.00	6.00	UN	CORTE 5
	Deposito Patio de juegos						1.00	1.00	UN	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	25.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**25.00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
25.00	0.00	**25.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.5.13**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL 05									
Bodega Parvulos 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Bodega Parvulos 2						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Bodega Parvulos 3						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Bodega Pre jardin 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Baño Coordinación						1.00	1.00	UN	CORTE 5
Baño lavanderia						2.00	2.00	UN	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	7.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**7.00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7.00	0.00	**7.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.6.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL 05									
	Coordinación			1.75			1.00	1.75	UN	CORTE 5
	Coordinación			3.17			1.00	3.17	UN	CORTE 5
	Coordinación			1.72			1.00	1.72	UN	CORTE 5
	Oficina Aux.			1.84			1.00	1.84	UN	CORTE 5
	Oficina Aux.			3.28			1.00	3.28	UN	CORTE 5
	Oficina Aux.			2.72			1.00	2.72	UN	CORTE 5
	Administrativo			2.41			1.00	2.41	UN	CORTE 5
	Administrativo			4.61			1.00	4.61	UN	CORTE 5
	Descuento por puntos de tomas en canaleta			0.45			-8.00	-3.60	UN	CORTE 5
 										

TOTAL EJECUTADO	17.90	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**17.90**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
17.90	0.00	**17.90**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.6.8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Coordinación			1.00			1.00	1.00	UN	CORTE 5
										

TOTAL EJECUTADO	1.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**1.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.00	0.00	**1.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**





CAPITULO	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**6.1.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL 05									
	Parvulos 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 2						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Parvulos 3						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 1						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 2						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 3						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin 4						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Administrativo						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Alacena						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Circulación 3						3.00	3.00	UN	CORTE 5
 	Coordinación						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Oficina Aux.						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Comedor						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Sala de profesores						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Aseo						1.00	1.00	UN	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	17.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**17.00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
17.00	0.00	**17.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**6.1.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL 05									
 	Cocina						1.00	1.00	UN	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	1.00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN	
PRESENTE ACTA	**1.00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1.00	0.00	**1.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**6.1.3**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL 05									
	Circulación interna						2.00	2.00	UN	CORTE 5
	Circulación patio de juegos						1.00	1.00	UN	CORTE 5
										

TOTAL EJECUTADO	3.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**3.00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3.00	0.00	**3.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**6.1.4**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL 05									
	Pasillo patrio de juegos						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Circulación interna						1.00	1.00	UN	CORTE 5
 										

TOTAL EJECUTADO	2.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**2.00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2.00	0.00	**2.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**





CAPITULO		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**6.1.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Pasillo juegos infantiles						1.00	1.00	UN	CORTE 5
	Circulación						1.00	1.00	UN	CORTE 5
 										

TOTAL EJECUTADO	2.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**2.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2.00	0.00	**2.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**6.1.9**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Circulación						1.00	1.00	UN	ACTA 5
										

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**6.1.12**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 05									
	Coordinación						1.00	1.00	UN	ACTA 5
	Oficina Aux.						1.00	1.00	UN	ACTA 5
	Cocina						1.00	1.00	UN	ACTA 5
	Alacena						1.00	1.00	UN	ACTA 5
										

TOTAL EJECUTADO	4.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**4.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4.00	0.00	**4.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**6.1.13**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

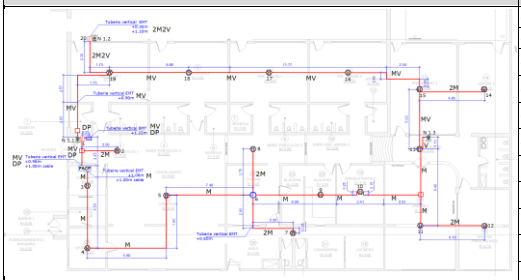





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL 05									
COORDINACIÓN			0.96			4.00	3.84	M	CORTE 5
COORDINACIÓN			1.00			4.00	4.00	M	CORTE 5
CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL			2.25			4.00	9.00	M	CORTE 5
CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL			2.50			2.00	5.00	M	CORTE 5
CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL			0.33			2.00	0.66	M	CORTE 5
CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL			1.22			4.00	4.88	M	CORTE 5
BODEGA PARVULOS 1			2.63			2.00	5.26	M	CORTE 5
PARVULOS 1			0.90			2.00	1.80	M	CORTE 5
PARVULOS 1			2.57			2.00	5.14	M	CORTE 5
PARVULOS 1			1.75			2.00	3.50	M	CORTE 5
PARVULOS 1			1.75			4.00	7.00	M	CORTE 5
PARVULOS 1			2.30			4.00	9.20	M	CORTE 5
CIRCULACIÓN ZONA POSTERIOR			1.10			4.00	4.40	M	CORTE 5
CIRCULACIÓN ZONA POSTERIOR			0.30			4.00	1.20	M	CORTE 5
PARVULOS 1 Y PARVULOS 2			8.88			2.00	17.76	M	CORTE 5
PREJARDIN 1 Y PREJARDIN 2			11.77			2.00	23.54	M	CORTE 5
PREJARDIN 2			0.50			2.00	1.00	M	CORTE 5
PAREJARDIN 3			2.50			2.00	5.00	M	CORTE 5
PAREJARDIN 3			0.80			2.00	1.60	M	CORTE 5
PREJARIDN 3 Y JARDIN 2			4.85			2.00	9.70	M	CORTE 5
PREJARDIN 3 A CIRCULACIÓN			5.00			2.00	10.00	M	CORTE 5
CIRCULACIÓN			1.10			1.00	1.10	M	CORTE 5
JARDIN 1			6.40			1.00	6.40	M	CORTE 5
JARDIN1 Y SALA DE PROFESORES			4.10			2.00	8.20	M	CORTE 5
JARDIN 1 Y ADMINISTRATIVO			2.91			1.00	2.91	M	CORTE 5
ADMINISTRATIVO			3.41			1.00	3.41	M	CORTE 5
ADMINISTRATIVO			0.15			1.00	0.15	M	CORTE 5
ADMINISTRATIVO			0.25			1.00	0.25	M	CORTE 5
ALACENA Y COCINA			6.20			1.00	6.20	M	CORTE 5
ASEO			0.25			1.00	0.25	M	CORTE 5
ASEO			2.20			2.00	4.40	M	CORTE 5
COCINA Y ASEO			2.80			2.00	5.60	M	CORTE 5
COCINA Y CIRCULACIÓN			3.75			2.00	7.50	M	CORTE 5
COMEDOR Y COCINA			7.40			1.00	7.40	M	CORTE 5
COMEDOR			1.90			1.00	1.90	M	CORTE 5
COMEDOR Y OFICINA			5.90			1.00	5.90	M	CORTE 5
OFICINA Y COORDINACIÓN			6.50			1.00	6.50	M	CORTE 5
COORDINACIÓN			1.00			1.00	1.00	M	CORTE 5
COORDINACIÓN			1.00			1.00	1.00	M	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	203.55	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	M
PRESENTE ACTA	**203.55**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
203.55	0.00	**203.55**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**7.3.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA












LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL 05									
MEDIA CAÑA							-		CORTE 5
BAÑO PARVULOS 1							-		
SUPERIOR							-		
A			2.78			2.00	5.56	M	
B			2.29			2.00	4.58	M	
C5			0.20			3.00	0.60	M	
							-		
INFERIOR							-		
A1			0.55			1.00	0.55	M	
A2			1.37			1.00	1.37	M	
A3			0.55			2.00	1.10	M	
A4			1.27			1.00	1.27	M	
A5			0.20			1.00	0.20	M	
B1			2.23			1.00	2.23	M	
C1			0.77			1.00	0.77	M	
C2			0.89			1.00	0.89	M	
C3			0.83			1.00	0.83	M	
C4			0.22			4.00	0.86	M	
D1			0.98			1.00	0.98	M	
E			0.67			2.00	1.34	M	
F			0.81			2.00	1.62	M	
							-		
VERTICAL							-		
A			2.46			2.00	4.92	M	
B			0.52			1.00	0.52	M	
C			2.04			3.00	6.12	M	
D			1.07			2.00	2.14	M	
E			2.04			1.00	2.04	M	
							-		
							-		
BAÑO PARVULOS 2							-		
SUPERIOR							-		
A			2.77			2.00	5.54	M	
B			2.27			2.00	4.54	M	
							-		
INFERIOR							-		
A1			0.84			1.00	0.84	M	
A2			0.82			1.00	0.82	M	
A3			0.86			1.00	0.86	M	
A4			0.14			1.00	0.14	M	
A5			0.13			1.00	0.13	M	
A6			0.21			4.00	0.84	M	
B1			2.09			1.00	2.09	M	
C1			1.24			1.00	1.24	M	
C2			0.53			2.00	1.06	M	
C3			1.37			1.00	1.37	M	
C4			0.21			1.00	0.21	M	
D1			0.97			1.00	0.97	M	
E			0.80			2.00	1.60	M	
F			0.79			2.00	1.58	M	
							-		
VERTICAL							-		
A			2.06			2.00	4.12	M	
B			3.48			1.00	3.48	M	
C			0.51			1.00	0.51	M	
D			1.28			1.00	1.28	M	
E			2.07			1.00	2.07	M	
F			1.08			4.00	4.32	M	
							-		



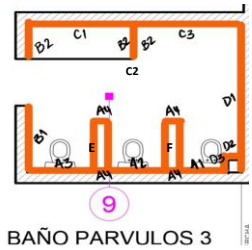

















BAÑO PARVULOS 3							-		
SUPERIOR							-		
A			2.77			2.00	5.54	M	
B			2.24			2.00	4.48	M	
							-		
INFERIOR							-		
A1			0.69			1.00	0.69	M	
A2			0.79			1.00	0.79	M	
A3			0.86			1.00	0.86	M	
A4			0.20			4.00	0.80	M	
B1			0.97			1.00	0.97	M	
B2			0.53			3.00	1.59	M	
C1			1.36			1.00	1.36	M	
C2			0.23			1.00	0.23	M	
C3			1.23			1.00	1.23	M	
D1			2.08			1.00	2.08	M	
D2			0.17			1.00	0.17	M	
D3			0.14			1.00	0.14	M	
E			0.76			2.00	1.52	M	
F			0.78			2.00	1.56	M	
							-		
VERTICAL							-		
A			2.10			1.00	2.10	M	
B			0.66			1.00	0.66	M	
C			0.51			1.00	0.51	M	
D			2.48			1.00	2.48	M	
E			2.11			1.00	2.11	M	
F			2.09			1.00	2.09	M	
G			1.07			4.00	4.28	M	
							-		
							-		
BAÑO PRE JARDIN 2							-		
SUPERIOR							-		
A			2.77			2.00	5.54	M	
B			2.27			2.00	4.54	M	
A5			0.63			1.00	0.63	M	
							-		
INFERIOR							-		
A1			0.86			1.00	0.86	M	
A2			0.87			1.00	0.87	M	
A3			0.79			1.00	0.79	M	
A4			0.20			4.00	0.80	M	
B1			2.24			1.00	2.24	M	
C1			1.26			1.00	1.26	M	
C2			0.54			2.00	1.08	M	
C3			0.19			1.00	0.19	M	
C4			1.38			1.00	1.38	M	
D1			1.00			1.00	1.00	M	
D2			0.54			1.00	0.54	M	
E			0.66			2.00	1.32	M	
F			0.77			2.00	1.54	M	
							-		
VERTICAL							-		
A			2.07			1.00	2.07	M	
B			1.07			2.00	2.14	M	
C			2.07			3.00	6.21	M	
D			2.47			1.00	2.47	M	
E			0.51			1.00	0.51	M	
F			1.28			1.00	1.28	M	
							-		
							-		




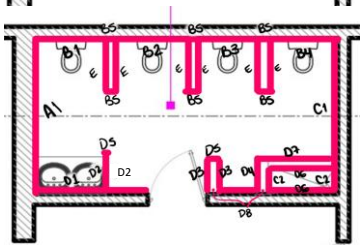


























BAÑO PRE JARDIN							-		
SUPERIOR							-		
A			2.25			2.00	4.50	M	
B			4.00			2.00	8.00	M	
							-		
INFERIOR							-		
A1			2.25			1.00	2.25	M	
B1			0.92			1.00	0.92	M	
B2			0.92			1.00	0.92	M	
B3			0.87			1.00	0.87	M	
B4			0.93			1.00	0.93	M	
B5			0.19			6.00	1.14	M	
C1			1.50			1.00	1.50	M	
C2			0.67			2.00	1.34	M	
D1			1.34			1.00	1.34	M	
D2			0.59			2.00	1.18	M	
D3			0.58			2.00	1.16	M	
D4			0.81			1.00	0.81	M	
D5			0.21			2.00	0.41	M	
D6			0.91			2.00	1.82	M	
D7			1.05			1.00	1.05	M	
D8			0.18			2.00	0.36	M	
E			0.77			6.00	4.62	M	
							-		
VERTICAL							-		
A			2.20			1.00	2.20	M	
B			1.07			6.00	6.42	M	
C			2.68			2.00	5.36	M	
D			1.07			2.00	2.14	M	
E			0.53			1.00	0.53	M	
F			0.99			1.00	0.99	M	
							-		
							-		
BAÑO COORDINACION							-		
SUPERIOR							-		
A			1.29			1.00	1.29	M	
B			1.58			1.00	1.58	M	
C			1.29			1.00	1.29	M	
D			1.58			1.00	1.58	M	
							-		
INFERIOR							-		
A1			0.58			1.00	0.58	M	
B			1.58			2.00	3.16	M	
C			1.29			1.00	1.29	M	
C1			0.19			4.00	0.76	M	
							-		
VERTICAL							-		
A			0.23			1.00	0.23	M	
B			2.25			2.00	4.50	M	
C			1.87			1.00	1.87	M	
							-		
							-		
SUPERIOR							-		
COCINA							-		
A			4.68			1.00	4.68	M	
B			3.58			1.00	3.58	M	
B1			0.30			1.00	0.30	M	
B2			0.87			1.00	0.87	M	
C			3.81			1.00	3.81	M	
D			3.98			1.00	3.98	M	
							-		
ALACENA 1							-		
A			4.72			1.00	4.72	M	
B			2.25			1.00	2.25	M	
C			4.72			1.00	4.72	M	
C5			0.17			1.00	0.17	M	
D			2.25			1.00	2.25	M	
							-		




























ALACENA 2							-		
C			4.72			1.00	4.72	M	
D			1.65			1.00	1.65	M	
E			4.72			1.00	4.72	M	
F			1.65			1.00	1.65	M	
							-		
INFERIOR							-		
COCINA							-		
A1			1.57			1.00	1.57	M	
A2			2.21			1.00	2.21	M	
B			2.91			1.00	2.91	M	
C			4.63			1.00	4.63	M	
D			3.07			1.00	3.07	M	
							-		
ALACENA 2							-		
A1			4.06			1.00	4.06	M	
A2			0.58			2.00	1.16	M	
B1			2.22			2.00	4.44	M	
B2			1.71			1.00	1.71	M	
B3			0.57			7.00	3.99	M	
CO			0.85			2.00	1.70	M	
C2			1.71			3.00	5.13	M	
C3			2.38			1.00	2.38	M	
C4			0.85			1.00	0.85	M	
C5			0.26			1.00	0.26	M	
C6			0.20			2.00	0.40	M	
							-		
D1			3.14			1.00	3.14	M	
							-		
ALACENA 1							-		
C1			1.74			1.00	1.74	M	
E1			1.20			1.00	1.20	M	
F1			1.53			1.00	1.53	M	
F2			2.20			1.00	2.20	M	
							-		
VERTICAL							-		
A			2.52			1.00	2.52	M	
B			0.68			5.00	3.40	M	
C			2.66			2.00	5.32	M	
D			0.81			1.00	0.81	M	
E			0.70			2.00	1.40	M	
F			1.65			1.00	1.65	M	
G			0.62			1.00	0.62	M	
H			0.59			1.00	0.59	M	
I			1.67			1.00	1.67	M	
J			2.50			1.00	2.50	M	
K			3.43			1.00	3.43	M	
L			2.55			2.00	5.10	M	
M			1.68			1.00	1.68	M	
N			1.16			1.00	1.16	M	
O			3.29			1.00	3.29	M	
							-		
SUPERIOR							-		
BAÑO ADULTOS							-		
A			0.80			4.00	3.18	M	
B			2.21			4.00	8.84	M	
							-		
LAVANDERIA							-		
A			3.29			1.00	3.29	M	
A2			0.21			1.00	0.21	M	
B			2.19			1.00	2.19	M	
B2			0.13			1.00	0.13	M	
C1			0.29			1.00	0.29	M	
D			2.48			1.00	2.48	M	
							-		
INFERIOR							-		
ASEO							-		
A1			1.66			1.00	1.66	M	
B1			1.20			1.00	1.20	M	
B2			0.67			1.00	0.67	M	
B3			1.68			1.00	1.68	M	
B4			0.40			1.00	0.40	M	













B5			1.05			1.00	1.05	M	
C1			1.57			1.00	1.57	M	
C2			0.28			1.00	0.28	M	
C3			0.17			1.00	0.17	M	
C4			0.30			2.00	0.60	M	
D1			2.91			1.00	2.91	M	
E			0.99			2.00	1.98	M	
F			0.48			2.00	0.96	M	
							-		
BAÑOS ADULTOS							-		
A			0.80			2.00	1.59	M	
B			2.21			4.00	8.84	M	
							-		
LAVANDERIA							-		
A1			2.46			1.00	2.46	M	
B1			2.48			1.00	2.48	M	
B2			0.12			1.00	0.12	M	
C1			0.27			1.00	0.27	M	
C2			1.00			1.00	1.00	M	
C3			1.00			1.00	1.00	M	
C4			1.32			1.00	1.32	M	
							-		
VERTICALES							-		
A			2.56			1.00	2.56	M	
B			2.56			1.00	2.56	M	
C			0.50			2.00	1.00	M	
D			0.44			3.00	1.32	M	
E			2.38			1.00	2.38	M	
F			2.27			4.00	9.08	M	
G			2.24			4.00	8.96	M	
H			0.20			1.00	0.20	M	
I			1.75			1.00	1.75	M	
J			0.14			1.00	0.14	M	
K			1.90			1.00	1.90	M	
L			2.18			1.00	2.18	M	
M			0.21			1.00	0.21	M	
							-		
BASURAS							-		
SUPERIOR E INFERIOR							-		
A			0.73			2.00	1.46	M	
B			1.62			2.00	3.24	M	
C			0.73			2.00	1.46	M	
D1			0.14			2.00	0.27	M	
D2			0.14			1.00	0.14	M	
							-		
VERTICALES							-		
E			2.06			4.00	8.24	M	
							-		
							-		
POCETA EXTERIOR							-		
INFERIOR							-		
A			0.37			2.00	0.74	M	
B			0.37			2.00	0.74	M	
							-		
VERTICAL							-		
C			0.43			4.00	1.72	M	
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	465.05	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	M
PRESENTE ACTA	**465.05**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
465.05	0.00	**465.05**

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	NOMBRE	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO		**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**11.5**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

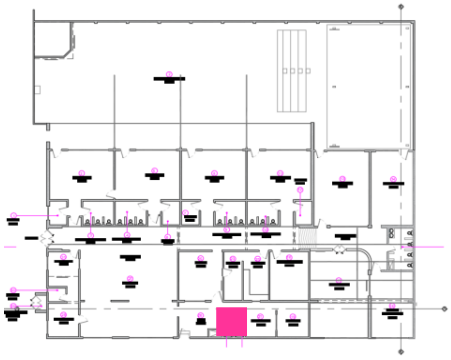



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
ACTA PARCIAL 05									
INSTALACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 1000LTS	11.41%					2.00	0.23	UN	
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	0.23	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**0.23**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
0.23	0.00	**0.23**

OBSERVACIONES:SE REALIZÓ LA REINSTALACIÓN DE TANQUES ELEVADOS EXISTENTES, POR LO QUE SE CONTEMPLA PARA PAGO EL 11.41% QUE ES LO RELACIONADO A MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR SEGÚN APU DEL ÍTEM

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**14.1.1**	**CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL 05									
CIELO RASO							-		
BAÑO PARVULOS 1		2.29	2.78			1.00	6.37	M2	CORTE 5
BAÑO PARVULOS 2		2.27	2.77			1.00	6.29	M2	CORTE 5
BAÑO PARVULOS 3		2.24	2.77			1.00	6.20	M2	CORTE 5
BAÑO PREJARDIN 2		2.27	2.77			1.00	6.29	M2	CORTE 5
BAÑO PREJARDIN		2.25	4.00			1.00	9.00	M2	CORTE 5
COCINA		3.58	4.69			1.00	16.79	M2	CORTE 5
menos campana		0.30	0.87			-1.00	- 0.26	M2	CORTE 5
ALACENAS		4.07	4.72			1.00	19.21	M2	CORTE 5
LAVANDERIA		2.74	3.29			1.00	9.01	M2	CORTE 5
COORDINACION		2.23	2.80			1.00	6.24	M2	CORTE 5
AUX DE COORDINACION		2.74	3.29			1.00	8.99	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	94.13	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**94.13**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
94.13	0.00	**94.13**


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**8.6**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

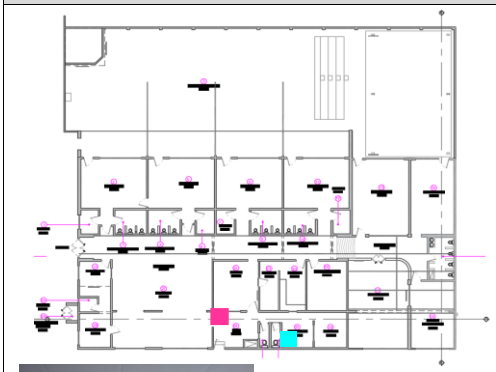





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL 05									
LAVANDERIA LATERAL				1.90		1.00	1.90	M2	
LAVANDERIA FRONTAL				1.74		1.00	1.74	M2	
							-		
ASEO				2.56		1.00	2.56	M2	
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	6.20	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**6.20**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6.20	0.00	**6.20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE


Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**22.1.11**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 02									
	CUBIERTA A							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			6.95			5.00	34.75	M	CORTE NO. 2
	TRASVERSAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			4.90			3.00	14.70	M	CORTE NO. 2
								-		
	CUBIERTA B							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			6.86			5.00	34.30	M	CORTE NO. 2
	TRASVERAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			4.10			3.00	12.30	M	CORTE NO. 2
								-		
	CUBIERTA C							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			9.48			6.00	56.88	M	CORTE NO. 2
	VERTICAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			0.34			12.00	4.08	M	CORTE NO. 2
								-		
	CUBIERTA D							-		
 	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			9.73			4.00	38.92	M	CORTE NO. 2
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 03									
	CUBIERTA E							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			24.24			1.00	24.24	M	CORTE NO. 3
	PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE			24.24			1.00	24.24	M	CORTE NO. 3
								-		
	CUBIERTA F							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			24.24			5.00	121.20	M	CORTE NO. 3
	PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE			24.24			6.00	145.44	M	CORTE NO. 3
								-		
	CUBIERTA G							-		
 	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			9.00			4.00	36.00	M	CORTE NO. 3
	TRANSVERSAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			3.38			2.00	6.76	M	CORTE NO. 3
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-	

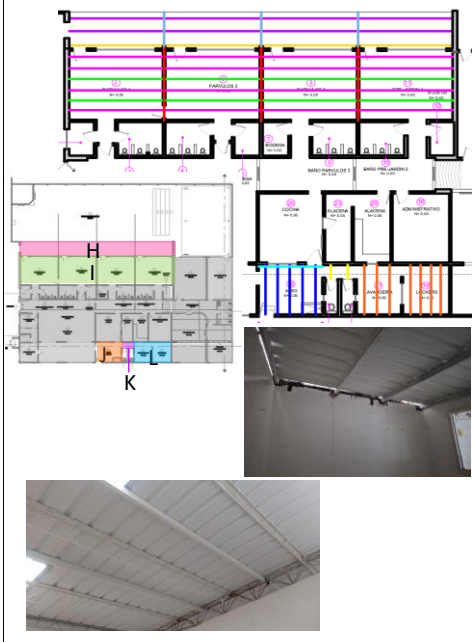





	ACTA PARCIAL 04							-		
	CUBIERTA H							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			24.24			1.00	24.24	M	CORTE NO. 4
	PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE HORIZONTAL			24.24			2.00	48.48	M	CORTE NO. 4
	PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE TRASVERSAL			2.50			3.00	7.50	M	CORTE NO. 4
								-		
	CUBIERTA I							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			24.24			2.00	48.48	M	CORTE NO. 4
	PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE			24.24			4.00	96.96	M	CORTE NO. 4
	PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE TRASVERSAL			4.94			3.00	14.82	M	CORTE NO. 4
								-		
	CUBIERTA J							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			3.52			5.00	17.60	M	CORTE NO. 4
	VERTICAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			4.20			1.00	4.20	M	CORTE NO. 4
								-		
	CUBIERTA K							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			1.19			2.00	2.37	M	CORTE NO. 4
								-		
	CUBIERTA L							-		
	HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			3.52			7.00	24.64	M	CORTE NO. 4
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05									
	CUBIERTA M							-		
	TRANSVERSAL A PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			3.30			4.00	13.20	M	CORTE 5
	LONGITUDINAL A PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			3.50			2.00	7.00	M	CORTE 5
	VERTICAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM			0.07			1.00	0.07	M	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	863.37	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	843.10	M	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M	
PRESENTE ACTA	**20.27**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
20.27	843.10	**863.37**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ/CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2025

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.3.6**	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**		**UNIDAD**	**M**

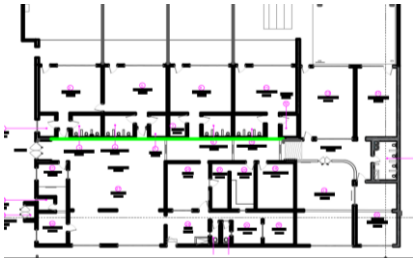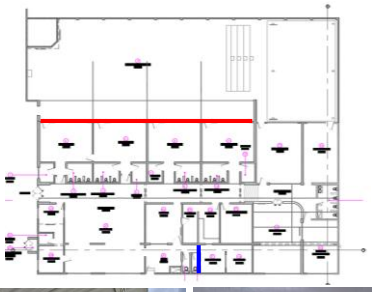ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL 04							-		
	CANAL CENTRAL			24.24			1.00	24.24	M	CORTE 4
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05							-		
	CANAL EXTERIOR			24.24			1.00	24.24	M	CORTE 5
	CANAL LAVANDERIA			3.7			1.00	3.70	M	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 								-		

TOTAL EJECUTADO	52.18	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	24.24	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X		M
PRESENTE ACTA	**27.94**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
27.94	24.24	**52.18**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE


Version: 01

Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**23.3.4** **MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN								
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
ACTA PARCIAL 02									
IMPERMEABILIZACION DE CANAL INTERMEDIA		0.85	6.90			1.00	5.87	M2	
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
ACTA PARCIAL 05									
PLACA DE TANQUES		2.18	2.50			1.00	5.45	M2	CORTE 5
							-		
PLACA SOBRE BASURAS		1.28	1.90			1.00	2.43	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	13.75	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	5.87	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**7.88**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
7.88	5.87	**13.75**


OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**23.4.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)**	**UNIDAD**	**M2**

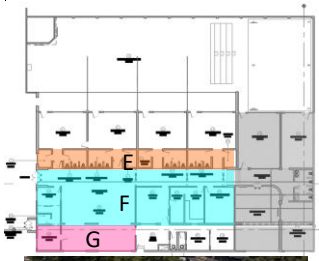
ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
   	**ACTA PARCIAL 02**									
	CUBIERTA A		7.00	5.19			1.00	36.33	M2	CORTE NO. 2
	CUBIERTA B		7.00	4.37			1.00	30.59	M2	CORTE NO. 2
	CUBIERTA C		9.73	7.08			1.00	68.89	M2	CORTE NO. 2
	CUBIERTA D		9.73	4.20			1.00	40.87	M2	CORTE NO. 2
	ACTA PARCIAL 03									
    	CUBIERTA E		2.29	24.24			1.00	55.44	M2	CORTE NO. 3
	CUBIERTA F		7.19	24.24			1.00	174.29	M2	CORTE NO. 3
	CUBIERTA G		3.38	9.00			1.00	30.42	M2	CORTE NO. 3

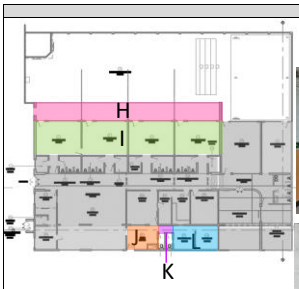






	ACTA PARCIAL 04									
	CUBIERTA H		2.62	24.24				63.51	M2	CORTE NO. 4
	CUBIERTA I		5.32	24.24				128.96	M2	CORTE NO. 4
	CUBIERTA J		4.16	3.28				13.64	M2	CORTE NO. 4
	CUBIERTA K		2.30	3.28				7.54	M2	CORTE NO. 4
	CUBIERTA L		5.72	3.28				18.76	M2	CORTE NO. 4
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 05									
	CUBIERTA M		3.56	3.85				13.71	M2	CORTE 5
								-		
								-		





TOTAL EJECUTADO	682.95	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	669.24	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**13.71**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13.71	669.24	**682.95**

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	NOMBRE	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**23.8.1** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

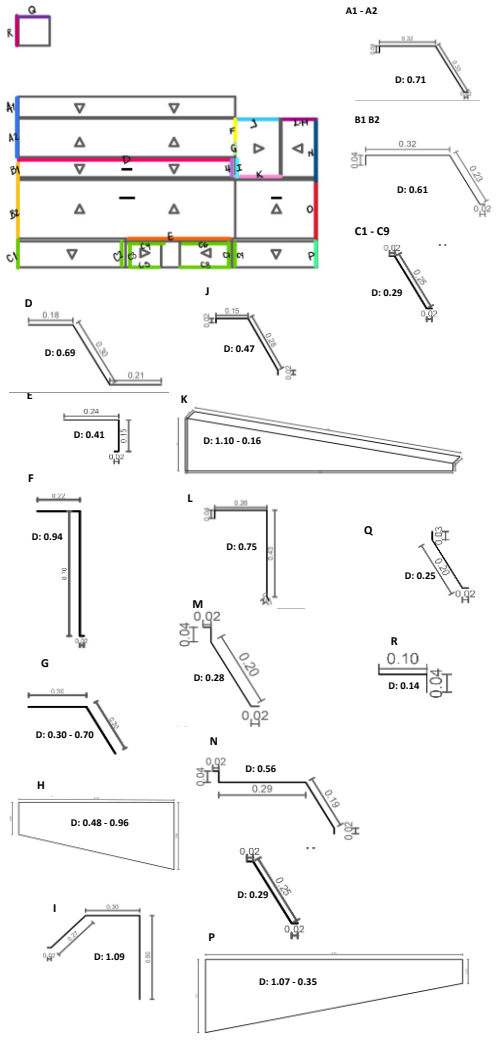

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL 05									
A1	2.84		2.61			1.00	7.41	M	CORTE 5
A2	2.84		5.43			1.00	15.42	M	CORTE 5
B1	2.44		2.22			1.00	5.42	M	CORTE 5
B2	2.44		7.62			1.00	18.59	M	CORTE 5
C1	1.16		3.69			1.00	4.28	M	CORTE 5
C2	1.16		3.62			1.00	4.20	M	CORTE 5
C3	1.16		2.52			1.00	2.92	M	CORTE 5
C4	1.16		4.16			1.00	4.83	M	CORTE 5
C5	1.16		3.91			1.00	4.54	M	CORTE 5
C6	1.16		5.85			1.00	6.79	M	CORTE 5
C7	1.16		3.30			1.00	3.83	M	CORTE 5
C8	1.16		5.64			1.00	6.54	M	CORTE 5
C9	1.16		3.64			1.00	4.22	M	CORTE 5
D	2.76		26.90			1.00	74.24	M	CORTE 5
E	1.64		11.90			1.00	19.52	M	CORTE 5
F	4.48		2.3			1.00	10.30	M	CORTE 5
G	3.20		2.9			1.00	9.28	M	CORTE 5
H	2.84		2.10			1.00	5.96	M	CORTE 5
I	5.08		2.10			1.00	10.67	M	CORTE 5
J	1.88		5.31			1.00	9.98	M	CORTE 5
K SUPERIOR			5.28			1.00	5.28	M	CORTE 5
K LATERAL	2.52		5.20			1.00	13.10	M	CORTE 5
L	2.20		4.44			1.00	9.77	M	CORTE 5
M	1.12		4.44			1.00	4.97	M	CORTE 5
N	2.24		7.10			1.00	15.90	M	CORTE 5
O	1.16		7.35			1.00	8.53	M	CORTE 5
P	3.88		3.80			1.00	14.74	M	CORTE 5
							-		
FLANCHES BODEGA							-		
Q			3.85				3.85	M	CORTE 5
R			3.56				3.56	M	CORTE 5



TOTAL EJECUTADO	308.64	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0.00	M
PRESENTE ACTA	**308.64**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
308.64	0.00	**308.64**

OBSERVACIONES: SE CONTEMPLA UN FACTOR DE CONVERSIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANCHO (DESARROLLO) USADO EN OBRA ES SUPERIOR AL ESPECIFICADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM, CON LA FINALIDAD DE DAR GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; EN LA MEMORIA SE DEJA EL DETALLE DEL DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA CADA CASO

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE


Version: 01


Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**007**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2025**


CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**23.8.5** **CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

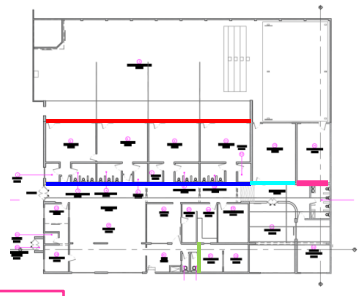


















LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL 05									
CANAL A	3.35		4.50			1.00	15.09	M	CORTE 5
CANAL B	1.88		5.50			1.00	10.35	M	CORTE 5
CANAL C	2.53		24.24			1.00	61.31	M	CORTE 5
CANAL D	2.53		24.24			1.00	61.31	M	CORTE 5
CANAL E	2.35		3.70			1.00	8.71	M	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1

1. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MS	0,004	$308.724,00	$1.286,00
HERRAMIENTA MENOR (5% del valor de mano de obra)	%	0,050	$11.201,00	$560,00
			SUBTOTAL	$1.846,00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Canal X 3 M Medida : 13 Cm Alto De Frente X 9 Cm Alto Trasero X 12 Cm Ancho	UN	0,333	$127.052,00	$42.351,00
Unión A Bajante Pvc - Un	UN	0,500	$37.888,00	$18.944,00
Tapa Externa Derecha Canal - Un	UN	0,500	$1.323,00	$662,00
Soporte De Canal - Para Sostener La Canal De La Pared - Un	UN	1,000	$4.784,00	$4.784,00
			SUBTOTAL	$66.741,00

3. Transportes

Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/und	Vr Unitario
				$0,00
			SUBTOTAL	$0,00

4. Mano de Obra

Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES	H/C	$31.473,00	0,356	$11.201,00
			SUBTOTAL	$11.201,00
			TOTAL COSTO DIRECTO	$79.788,00

Página 23

TOTAL EJECUTADO	156.77	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**156.77**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
156.77	0.00	**156.77**

OBSERVACIONES: SE CONTEMPLA UN FACTOR DE CONVERSIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANCHO (DESARROLLO) USADO EN OBRA ES SUPERIOR AL ESPECIFICADO EN EL APU DEL ÍTEM, CON LA FINALIDAD DE DAR GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; EN LA MEMORIA SE DEJA EL DETALLE DEL DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA CADA CASO

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

JARDÍN INFANTIL COMUNEROS

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA						
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4										

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *Según Acta Balance de Obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
08. JARDIN INFANTIL COMUNEROS													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,2	**DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**												
1.2.1	DEMOLICION MANUAL DE REPISAS MACIZA EN CONCRETO E.<=5,0 CM (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 36.782,00	$ -	1,02	$ 37.517,64	-	$ -	1,02	$ 37.517,64	1,02	$ 37.517,64
1,3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL	U	2,00	$ 28.037,00	$ 56.074,00	3,00	$ 84.111,00	-	$ -	3,00	$ 84.111,00	3,00	$ 84.111,00
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	3,00	$ 24.637,00	$ 73.911,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.3.11	DESMONTE MANUAL DE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO, PULIENDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA DE SOPORTE EXISTENTES QUE AMARRAN LA MALLA AL MARCO EN ÁNGULO Y RETIRANDO LA MISMA, GARANTIZANDO QUE EL MARCO Y SU ESTRUCTURA DE SOPORTE PERMANEZCAN INMODIFICABLES. NO INCLUYE EL RETIRO DE NINGÚN OTRO ELEMENTO. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL	M2	2,64	$ 17.075,00	$ 45.078,00	7,84	$ 133.868,00	7,84	$ 133.868,00	-	$ -	7,84	$ 133.868,00
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	35,32	$ 12.903,00	$ 455.733,96	13,60	$ 175.480,80	13,60	$ 175.480,80	-	$ -	13,60	$ 175.480,80
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. TRANSPORTE Y PROCESO DE	M2	187,82	$ 72.169,00	$ 13.554.781,58	178,22	$ 12.861.959,18	-	$ -	178,22	$ 12.861.887,01	178,22	$ 12.861.887,01
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	21,16	$ 10.912,00	$ 230.897,92	14,45	$ 157.678,40	0,75	$ 8.184,00	13,70	$ 149.494,40	14,45	$ 157.678,40
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA	M2	30,24	$ 27.857,00	$ 842.395,68	14,11	$ 393.062,27	1,00	$ 27.857,00	13,11	$ 365.205,27	14,11	$ 393.062,27
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.20	DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLASTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, U OTROS RELACIONADOS.	UN	1,00	$ 121.680,00	$ 121.680,00	3,00	$ 365.040,00	1,00	$ 121.680,00	2,00	$ 243.360,00	3,00	$ 365.040,00
1.6.26	DESMONTE DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	UN	19,00	$ 14.184,00	$ 269.496,00	14,00	$ 198.576,00	-	$ -	14,00	$ 198.576,00	14,00	$ 198.576,00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELETRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	UN	19,00	$ 19.177,00	$ 364.363,00	22,00	$ 421.894,00	-	$ -	22,00	$ 421.894,00	22,00	$ 421.894,00
1.6.30	RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS. INCLUYE ETIQUETAR CADA COMPONENTE DEL TABLERO, CABLES DE ENTRADA, BREAKERS, HERRAJES, MAMPOSTERIA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES	UN	1,00	$ 101.542,00	$ 101.542,00	1,00	$ 101.542,00	-	$ -	1,00	$ 101.542,00	1,00	$ 101.542,00
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.5	DEMOLICION MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERIA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	38,52	$ 20.627,00	$ 794.552,04	39,54	$ 815.591,58	-	$ -	39,54	$ 815.581,27	39,54	$ 815.581,27
1,8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	-	$ 7.070,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8.13	DEMOLICION MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERIA DE CONCRETO E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	-	$ 26.429,00	$ -	1,88	$ 49.686,52	-	$ -	1,88	$ 49.686,52	1,88	$ 49.686,52
1,11	**OTROS PRELIMINARES**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	-	$ 6.605,00	$ -	3,70	$ 24.438,50	3,70	$ 24.438,50	-	$ -	3,70	$ 24.438,50
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACION. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1,21	$ 36.056,00	$ 43.627,76	0,65	$ 23.436,40	-	$ -	0,65	$ 23.436,40	0,65	$ 23.436,40
2,2	**CONCRETOS**												
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	8,74	$ 106.504,00	$ 930.844,96	6,02	$ 641.154,08	-	$ -	6,02	$ 641.154,08	6,02	$ 641.154,08
2,3	**VARIOS - CIMENTACIONES**												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	48,00	$ 29.636,00	$ 1.422.528,00	15,00	$ 444.540,00	-	$ -	15,00	$ 444.540,00	15,00	$ 444.540,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026		4. TIPO DE CONTRATO:		OBRA								
2. ACTA No.	5				5. TIPO DE ACTA PARCIAL:					RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES			
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4														

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025			8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027		11. PLAZO:	24	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A					14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025			19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027		22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A					25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025												
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(según Acta Balance de Obra) (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
08. JARDIN INFANTIL COMUNEROS													
2,5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG		$ 5.297,00	$ -	12,11	$ 64.146,67	-	$ -	12,11	$ 64.146,67	12,11	$ 64.146,67
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3,2	**OTROS MAMPUESTOS**												
3.2.3	POYO DUCHA	M		$ 49.427,00	$ -	0,75	$ 37.070,25	0,75	$ 37.070,25	-	$ -	0,75	$ 37.070,25
3,5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2		$ 9.628,00	$ -	86,14	$ 829.355,92	-	$ -	86,14	$ 829.355,92	86,14	$ 829.355,92
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4,1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCL 4" - INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	6,00	$ 47.584,00	$ 285.504,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"	UN	1,00	$ 57.013,00	$ 57.013,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4"	UN		$ 141.106,00		2,00	$ 282.212,00	-	$ -	2,00	$ 282.212,00	2,00	$ 282.212,00
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	15,00	$ 199.311,00	$ 2.989.665,00	17,00	$ 3.388.287,00	-	$ -	17,00	$ 3.388.287,00	17,00	$ 3.388.287,00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	1,00	$ 216.629,00	$ 216.629,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	UN	3,00	$ 45.512,00	$ 136.536,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	13,00	$ 49.640,00	$ 645.320,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA	UN	1,00	$ 350.787,00	$ 350.787,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	8,00	$ 36.026,00	$ 288.208,00	12,00	$ 432.312,00	-	$ -	12,00	$ 432.312,00	12,00	$ 432.312,00
5,2	**SALIDAS**												
5.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 159.432,00	$ -	1,00	$ 159.432,00	-	$ -	1,00	$ 159.432,00	1,00	$ 159.432,00
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 233.378,00	$ 466.756,00	18,00	$ 4.200.804,00	-	$ -	18,00	$ 4.200.804,00	18,00	$ 4.200.804,00
5.2.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 155.304,00	$ -	3,00	$ 465.912,00	-	$ -	3,00	$ 465.912,00	3,00	$ 465.912,00
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 229.495,00	$ -	1,00	$ 229.495,00	-	$ -	1,00	$ 229.495,00	1,00	$ 229.495,00
5.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	-	$ 224.332,00	$ -	1,00	$ 224.332,00	-	$ -	1,00	$ 224.332,00	1,00	$ 224.332,00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	47,00	$ 234.104,00	$ 11.002.888,00	46,00	$ 10.768.784,00	-	$ -	46,00	$ 10.768.784,00	46,00	$ 10.768.784,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	6,00	$ 315.585,00	$ 1.893.510,00	11,00	$ 3.471.435,00	-	$ -	11,00	$ 3.471.435,00	11,00	$ 3.471.435,00
5,3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 717.870,00	$ 717.870,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 456.222,00	$ -	1,00	$ 456.222,00	-	$ -	1,00	$ 456.222,00	1,00	$ 456.222,00
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	4,00	$ 57.862,00	$ 231.448,00	2,00	$ 115.724,00	-	$ -	2,00	$ 115.724,00	2,00	$ 115.724,00
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	29,00	$ 60.035,00	$ 1.741.015,00	21,00	$ 1.260.735,00	-	$ -	21,00	$ 1.260.735,00	21,00	$ 1.260.735,00
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	25,00	$ 16.054,00	$ 401.350,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF	M	5,00	$ 65.644,00	$ 328.220,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	65,00	$ 60.587,00	$ 3.938.155,00	83,90	$ 5.083.249,30	-	$ -	83,90	$ 5.083.249,30	83,90	$ 5.083.249,30
5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	5,00	$ 92.434,00	$ 462.170,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	**ILUMINACIÓN.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA								
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES			
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4												

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025		7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	**CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES**										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *Según Acta Balance de Obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
08. JARDIN INFANTIL COMUNEROS													
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 69.605,00	$ 417.630,00	11,00	$ 765.655,00	-	$ -	11,00	$ 765.655,00	11,00	$ 765.655,00
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	-	$ 30.029,00	$ -	9,00	$ 270.261,00	-	$ -	9,00	$ 270.261,00	9,00	$ 270.261,00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	29,00	$ 192.642,00	$ 5.586.618,00	25,00	$ 4.816.050,00	-	$ -	25,00	$ 4.816.050,00	25,00	$ 4.816.050,00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 41.548,00	$ 332.384,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	6,00	$ 70.135,00	$ 420.810,00	6,00	$ 420.810,00	-	$ -	6,00	$ 420.810,00	6,00	$ 420.810,00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 52.758,00	$ 211.032,00	6,00	$ 316.548,00	-	$ -	6,00	$ 316.548,00	6,00	$ 316.548,00
5,6	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN	-	$ 1.052.087,00	$ -	1,00	$ 1.052.087,00	-	$ -	1,00	$ 1.052.087,00	1,00	$ 1.052.087,00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	8,00	$ 220.619,00	$ 1.764.952,00	10,00	$ 2.206.190,00	-	$ -	10,00	$ 2.206.190,00	10,00	$ 2.206.190,00
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 263.215,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00	-	$ -	1,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	2,00	$ 173.638,00	$ 347.276,00	2,00	$ 347.276,00	-	$ -	2,00	$ 347.276,00	2,00	$ 347.276,00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	2,00	$ 272.141,00	$ 544.282,00	2,00	$ 544.282,00	-	$ -	2,00	$ 544.282,00	2,00	$ 544.282,00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	2,00	$ 459.176,00	$ 918.352,00	2,00	$ 918.352,00	-	$ -	2,00	$ 918.352,00	2,00	$ 918.352,00
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1,00	$ 7.472.944,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	1,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO	UN	-	$ 163.009,00	$ -	2,00	$ 326.018,00	-	$ -	2,00	$ 326.018,00	2,00	$ 326.018,00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	80,00	$ 8.605,00	$ 688.400,00	72,44	$ 623.346,20	-	$ -	72,44	$ 623.346,20	72,44	$ 623.346,20
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	30,24	$ 26.040,00	$ 787.449,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	4,32	$ 49.523,00	$ 213.939,36	15,61	$ 773.054,03	-	$ -	15,61	$ 773.054,03	15,61	$ 773.054,03
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	30,24	$ 127.357,00	$ 3.851.275,68	14,11	$ 1.797.007,27	1,00	$ 127.357,00	13,11	$ 1.669.650,27	14,11	$ 1.797.007,27
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	8,74	$ 15.151,00	$ 132.419,74	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	-	$ 21.009,00	$ -	95,69	$ 2.010.351,21	95,69	$ 2.010.351,21	-	$ -	95,69	$ 2.010.351,21
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	21,16	$ 23.195,00	$ 490.806,20	31,88	$ 739.456,60	18,18	$ 421.685,10	13,70	$ 317.771,50	31,88	$ 739.456,60
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9,1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	2,10	$ 367.647,00	$ 772.058,70	3,00	$ 1.102.941,00	-	$ -	3,00	$ 1.102.941,00	3,00	$ 1.102.941,00
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
11.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	-	$ 1.066.996,00	$ -	1,00	$ 1.066.996,00	-	$ -	1,00	$ 1.066.996,00	1,00	$ 1.066.996,00
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14,1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA	M2	153,56	$ 107.142,00	$ 16.452.725,52	35,60	$ 3.814.255,20	-	$ -	35,60	$ 3.814.255,20	35,60	$ 3.814.255,20
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15,1	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	-	$ 75.515,00	$ -	1,00	$ 75.515,00	1,00	$ 75.515,00	-	$ -	1,00	$ 75.515,00
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO, CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA	M2	110,37	$ 38.828,00	$ 4.285.446,36	131,43	$ 5.103.164,04	-	$ -	131,43	$ 5.103.257,23	131,43	$ 5.103.257,23
16.6	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	M2	2,64	$ 90.515,00	$ 238.959,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	321,48	$ 4.546,00	$ 1.461.448,08	287,47	$ 1.306.838,62	287,47	$ 1.306.838,62	-	$ -	287,47	$ 1.306.838,62
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA								
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES			
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4												

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *Según Acta Balance de Obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
08. JARDIN INFANTIL COMUNEROS													
21,1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	170,81	$ 20.508,00	$ 3.502.971,48	92,60	$ 1.899.040,80	-	$ -	92,60	$ 1.898.981,74	92,60	$ 1.898.981,74
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	-	$ 25.958,00	$ -	59,80	$ 1.552.288,40	-	$ -	59,80	$ 1.552.288,40	59,80	$ 1.552.288,40
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 71.517,00	$ -	3,23	$ 230.999,91	-	$ -	3,23	$ 230.999,91	3,23	$ 230.999,91
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE..	M2	-	$ 13.689,00	$ -	305,91	$ 4.187.601,99	-	$ -	305,91	$ 4.187.601,99	305,91	$ 4.187.601,99
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	458,69	$ 48.456,00	$ 22.226.282,64	-	$ -	31,14	-$ 1.508.919,84	31,14	$ 1.508.919,84	-	$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	-	$ 12.878,00	$ -	165,93	$ 2.136.846,54	74,04	-$ 953.487,12	239,97	$ 3.090.333,66	165,93	$ 2.136.846,54
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	854,06	$ 29.936,00	$ 25.567.140,16	226,66	$ 6.785.293,76	-	$ -	226,66	$ 6.785.293,76	226,66	$ 6.785.293,76
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES. APLICADO A	M2		$ 16.676,00	$ -	226,56	$ 3.778.114,56	-	$ -	226,56	$ 3.778.114,56	226,56	$ 3.778.114,56
22,3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.4	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	-	$ 40.259,00	$ -	17,20	$ 692.454,80	17,20	$ 692.454,80	-	$ -	17,20	$ 692.454,80
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	-	$ 37.231,00	$ -	69,98	$ 2.605.425,38	-	$ -	69,98	$ 2.605.425,38	69,98	$ 2.605.425,38
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	-	$ 28.498,00	$ -	23,40	$ 666.853,20	23,40	$ 666.853,20	-	$ -	23,40	$ 666.853,20
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	4,32	$ 125.559,00	$ 542.414,88	8,76	$ 1.099.896,84	-	$ -	8,76	$ 1.099.896,84	8,76	$ 1.099.896,84
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	187,82	$ 253.100,00	$ 47.537.242,00	178,22	$ 45.107.482,00	-	$ -	178,22	$ 45.107.228,90	178,22	$ 45.107.228,90
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	10,25	$ 99.728,00	$ 1.022.212,00	7,49	$ 746.962,72	-	$ -	7,49	$ 746.962,72	7,49	$ 746.962,72
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL	M	13,03	$ 53.788,00	$ 700.857,64	12,95	$ 696.554,60	-	$ -	12,95	$ 696.554,60	12,95	$ 696.554,60
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,32	$ 82.182,00	$ 2.902.668,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	-	$ 45.109,00	$ -	6,20	$ 279.675,80	6,20	$ 279.675,80	-	$ -	6,20	$ 279.675,80
23.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 PELDAÑOS, 2M A 4M	UN	1,00	$ 81.256,00	$ 81.256,00	1,00	$ 81.256,00	-	$ -	1,00	$ 81.256,00	1,00	$ 81.256,00

34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 197.198.018,78	$ 159.078.444,98	$ 3.646.902,32	$ 155.431.241,21	$ 159.078.143,53
35. DESCRIPCIÓN	%					
ADMINISTRACIÓN	27,49%	$ 54.209.735,00	$ 43.730.664,53	$ 1.002.533,45	$ 42.728.048,21	$ 43.730.581,66
IMPREVISTO	1,00%	$ 1.971.980,00	$ 1.590.784,45	$ 36.469,02	$ 1.205.681,77	$ 1.242.150,79
UTILIDAD	4,00%	$ 7.887.921,00	$ 6.363.137,80	$ 145.876,09	$ 6.217.249,65	$ 6.363.125,74
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 64.069.636,00	$ 51.684.586,78	$ 1.184.878,56	$ 50.150.979,63	$ 51.335.858,19
AJUSTE AL PESO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ANTICIPO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 261.267.654,78	$ 210.763.031,76	$ 4.831.780,88	$ 205.582.220,84	$ 210.414.001,72

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÈCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

DESCRIPCION	37. No. INFORME MENSUAL	38. PERIODO	39. NOMBRE DEL ARCHIVO	40. PANTALLAZOS SECOP II

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA						
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4										

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(según Acta Balance Obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
08. JARDIN INFANTIL COMUNEROS													
INFORME TÉCNICO	6		01 de mayo al 31 de mayo 2026		202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 3								
INFORME SOCIAL	6		01 de mayo al 31 de mayo 2026		202604_Pago 4-Informe Social No 5_10676-2025								
INFORME AMBIENTAL	6		01 de mayo al 31 de mayo 2026		202604_Pago 4-Informe Ambiental No 5_10676-2025								
INFORME SST	6		01 de mayo al 31 de mayo 2026		202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2								
INFORME DE SUPERVISION	6		01 de mayo al 31 de mayo 2026		202604_Pago 4-Informe Supervision No 5_10676-2025								
ACTA PARCIAL	5		01 de mayo al 31 de mayo 2026		202604_Pago 4 Corte General obra_Acta 4_10676-2025								
SOPORTE PAGO SDH	5		01 de mayo al 31 de mayo 2026		FE 5 - PAGO HACIENDA RESERVA_ACTA 3 FE 6 - PAGO HACIENDA VIGENCIA_ACTA 3 FE 7 - PAGO HACIENDA ADULTO MAYOR_ACTA 3								
FACTURA	5		01 de mayo al 31 de mayo 2026		FACTURA_FE 5_DISTRITO RESERVA_ACTA 3 FACTURA_FE 6_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 3 FACTURA_FE 7_ADULTO MAYOR_ACTA 3								
FORMATO MC 14	5		01 de mayo al 31 de mayo 2026		MC-14_DISTRITO_ACTA 3 MC-14_ADULTO MAYOR_ACTA 3								





El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 12 días del mes de Junio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7

Nombre: NADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.468.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.3.11**	**DESMONTE MANUAL DE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO, PULIENDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA DE SOPORTE EXISTENTES QUE AMARRAN LA MALLA AL MARCO EN ÁNGULO Y RETIRANDO LA MISMA, GARANTIZANDO QUE EL MARCO Y SU ESTRUCTURA DE SOPORTE PERMANEZCAN INMODIFICABLES. NO INCLUYE EL RETIRO DE NINGÚN OTRO ELEMENTO. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.**			**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
ACTA PARCIAL 5									
1. PATIO INFERIOR		1,63	2,26			1,00	3,68	M2	**CORTE 5**
2. CERRAMIENTO FACHADA LATERAL		1,60	2,60			1,00	4,16	M2	**CORTE 5**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	7,84	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**7,84**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,84	0,00	**7,84**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUACHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO		**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.4.2**	**DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
ACTA PARCIAL 5									
1. CANAL			2,10			1,00	2,10	M	**CORTE 5**
2. CANAL			6,50			1,00	6,50	M	**CORTE 5**
3. CANAL			5,00			1,00	5,00	M	**CORTE 5**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	13,60	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**13,60**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13,60	0,00	**13,60**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.5.3**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL 1									
AULA 3			13,70			1,00	13,70	M	**CORTE 1**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
ACTA PARCIAL 5									
1. DEMOLICIÓN GUARDAESCOBAS			0,75			1,00	0,75	M	**CORTE 5**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	14,45	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	13,70	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**0,75**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0,75	13,70	**14,45**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**



CAPITULO		**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.5.5**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**ACTA PARCIAL 1**									
	AULA 3		3,80	3,45			1,00	13,11	M2	**CORTE 1**
								-		
								-		
								-	

TOTAL EJECUTADO	14,11	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	13,11	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**1,00**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	13,11	**14,11**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**


CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.6.20**	**DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLÁSTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, U OTROS RELACIONADOS.**			**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

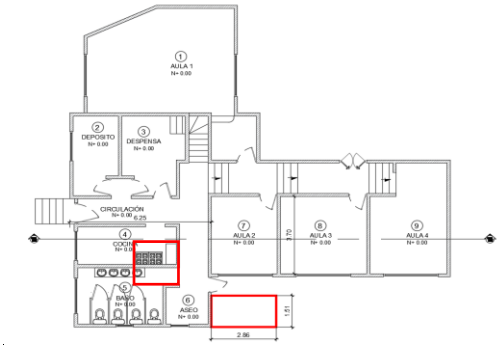





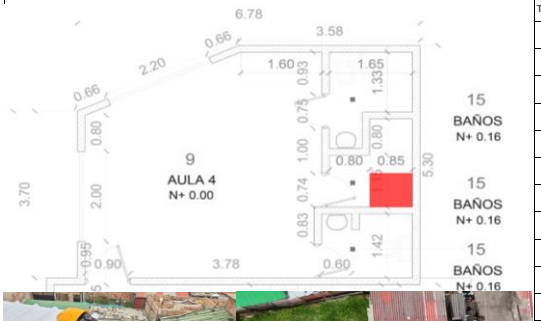





LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
ACTA PARCIAL 2									
SOBRE CUBIERTA EN AREA DE COCINA Y BAÑOS						1,00	1,00	UN	**CORTE 2**
CUARTO DE ASEO						1,00	1,00	UN	**CORTE 2**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
ACTA PARCIAL 5									
TANQUE BAÑO ADULTOS - SEGUNDO PISO		1,00				1,00	1,00	UN	**CORTE 5**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	3,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	2,00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	2,00	**3,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.11.10**	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

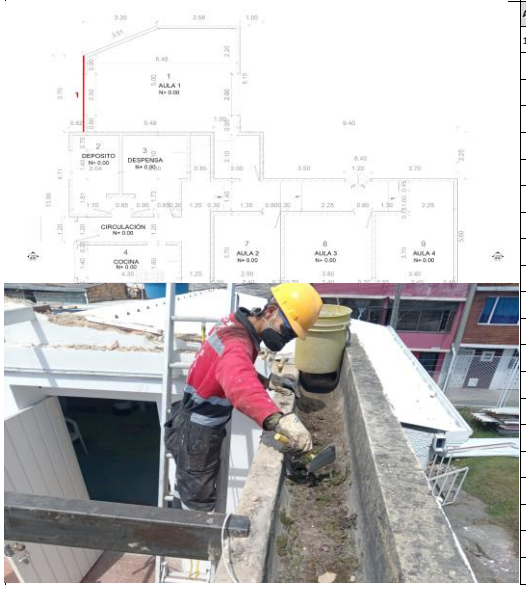

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Área**				
ACTA PARCIAL 5									
1. CANAL			3,70			1,00	3,70	M	**CORTE 5**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	3,70	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M	
PRESENTE ACTA	**3,70**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,70	0,00	**3,70**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUACHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**3.2.3**	**POYO DUCHA**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Área**				
	**ACTA PARCIAL 5**									
	1. ZONA ASEO			0,75			1,00	0,75	M	**CORTE 5**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	0,75	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**0,75**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
0,75	0,00	**0,75**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			**FECHA**	**12/06/2026**


CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**7.3.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

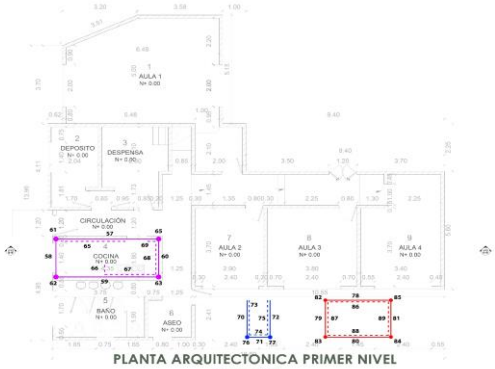

PLANTA ARQUITECTONICA PRIMER NIVEL

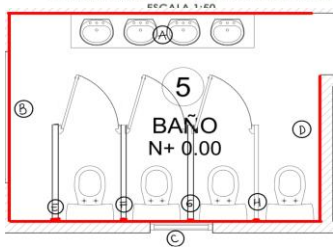

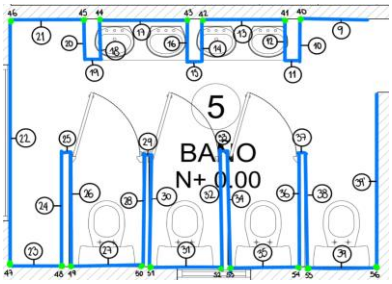






LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
ACTA PARCIAL 5									
MEDIACAÑAS BAÑO SUPERIORES (ROJO)									
A. MEDIACAÑA		3,22				1,00	3,22	M	CORTE 5
B. MEDIACAÑA		2,59				1,00	2,59	M	CORTE 5
C. MEDIACAÑA		3,28				1,00	3,28	M	CORTE 5
D. MEDIACAÑA		2,55				1,00	2,55	M	CORTE 5
E. MEDIACAÑA		0,18				1,00	0,18	M	CORTE 5
F. MEDIACAÑA		0,18				1,00	0,18	M	CORTE 5
G. MEDIACAÑA		0,18				1,00	0,18	M	CORTE 5
H. MEDIACAÑA		0,18				1,00	0,18	M	CORTE 5
MEDIACAÑAS BAÑO INFERIORES (AZUL)									
9. MEDIACAÑA		0,39				1,00	0,39	M	CORTE 5
10. MEDIACAÑA		0,53				1,00	0,53	M	CORTE 5
11. MEDIACAÑA		0,20				1,00	0,20	M	CORTE 5
12. MEDIACAÑA		0,52				1,00	0,52	M	CORTE 5
13. MEDIACAÑA		0,92				1,00	0,92	M	CORTE 5
14. MEDIACAÑA		0,52				1,00	0,52	M	CORTE 5
15. MEDIACAÑA		0,20				1,00	0,20	M	CORTE 5
16. MEDIACAÑA		0,52				1,00	0,52	M	CORTE 5
17. MEDIACAÑA		0,90				1,00	0,90	M	CORTE 5
18. MEDIACAÑA		0,52				1,00	0,52	M	CORTE 5
19. MEDIACAÑA		0,20				1,00	0,20	M	CORTE 5
20. MEDIACAÑA		0,53				1,00	0,53	M	CORTE 5
21. MEDIACAÑA		0,55				1,00	0,55	M	CORTE 5
22. MEDIACAÑA		2,58				1,00	2,58	M	CORTE 5
23. MEDIACAÑA		0,55				1,00	0,55	M	CORTE 5
24. MEDIACAÑA		0,80				1,00	0,80	M	CORTE 5
25. MEDIACAÑA		0,18				1,00	0,18	M	CORTE 5
26. MEDIACAÑA		0,80				1,00	0,80	M	CORTE 5
27. MEDIACAÑA		0,55				1,00	0,55	M	CORTE 5
28. MEDIACAÑA		0,80				1,00	0,80	M	CORTE 5
29. MEDIACAÑA		0,18				1,00	0,18	M	CORTE 5
30. MEDIACAÑA		0,80				1,00	0,80	M	CORTE 5
31. MEDIACAÑA		0,57				1,00	0,57	M	CORTE 5
32. MEDIACAÑA		0,80				1,00	0,80	M	CORTE 5
33. MEDIACAÑA		0,18				1,00	0,18	M	CORTE 5
34. MEDIACAÑA		0,80				1,00	0,80	M	CORTE 5
35. MEDIACAÑA		0,57				1,00	0,57	M	CORTE 5
36. MEDIACAÑA		0,18				1,00	0,18	M	CORTE 5
37. MEDIACAÑA		0,80				1,00	0,80	M	CORTE 5
38. MEDIACAÑA		0,80				1,00	0,80	M	CORTE 5
39. MEDIACAÑA		0,57				1,00	0,57	M	CORTE 5
39'. MEDIACAÑA		1,70				1,00	1,70	M	CORTE 5
MEDIACAÑAS BAÑO VERTICALES (VERDE)									
40. MEDIACAÑA		0,46				1,00	0,46	M	CORTE 5
41. MEDIACAÑA		0,30				1,00	0,30	M	CORTE 5
42. MEDIACAÑA		0,30				1,00	0,30	M	CORTE 5
43. MEDIACAÑA		0,30				1,00	0,30	M	CORTE 5
44. MEDIACAÑA		0,30				1,00	0,30	M	CORTE 5
45. MEDIACAÑA		0,38				1,00	0,38	M	CORTE 5
46. MEDIACAÑA		1,78				1,00	1,78	M	CORTE 5
47. MEDIACAÑA		1,79				1,00	1,79	M	CORTE 5
48. MEDIACAÑA		0,98				1,00	0,98	M	CORTE 5
49. MEDIACAÑA		0,98				1,00	0,98	M	CORTE 5
50. MEDIACAÑA		0,98				1,00	0,98	M	CORTE 5
51. MEDIACAÑA		0,98				1,00	0,98	M	CORTE 5
52. MEDIACAÑA		0,98				1,00	0,98	M	CORTE 5

53. MEDIACAÑA		0,98				1,00	0,98	M	**CORTE 5**
54. MEDIACAÑA		0,98				1,00	0,98	M	**CORTE 5**
55. MEDIACAÑA		0,98				1,00	0,98	M	**CORTE 5**
56. MEDIACAÑA		2,18				1,00	2,18	M	**CORTE 5**
MEDIACAÑAS COCINA SUPERIORES									
57. MEDIACAÑA		3,77				1,00	3,77	M	**CORTE 5**
58. MEDIACAÑA		1,72				1,00	1,72	M	**CORTE 5**
59. MEDIACAÑA		3,76				1,00	3,76	M	**CORTE 5**
60. MEDIACAÑA		1,74				1,00	1,74	M	**CORTE 5**
MEDIACAÑAS COCINA VERTICALES									
61. MEDIACAÑA		0,95				1,00	0,95	M	**CORTE 5**
62. MEDIACAÑA		0,95				1,00	0,95	M	**CORTE 5**
63. MEDIACAÑA		2,20				1,00	2,20	M	**CORTE 5**
64. MEDIACAÑA		2,20				1,00	2,20	M	**CORTE 5**
MEDIACAÑAS COCINA INFERIORES (Línea punteada)									
65. MEDIACAÑA		1,89				1,00	1,89	M	**CORTE 5**
66. MEDIACAÑA		0,60				1,00	0,60	M	**CORTE 5**
67. MEDIACAÑA		1,56				1,00	1,56	M	**CORTE 5**
68. MEDIACAÑA		1,79				1,00	1,79	M	**CORTE 5**
69. MEDIACAÑA		0,48				1,00	0,48	M	**CORTE 5**
MEDIACAÑAS CUARTO DE ASEO SUPERIORES									
70. MEDIACAÑA		0,82				1,00	0,82	M	**CORTE 5**
71. MEDIACAÑA		0,52				1,00	0,52	M	**CORTE 5**
72. MEDIACAÑA		0,82				1,00	0,82	M	**CORTE 5**
MEDIACAÑAS CUARTO DE ASEO INFERIORES (Línea punteada)									
73. MEDIACAÑA		0,82				1,00	0,82	M	**CORTE 5**
74. MEDIACAÑA		0,52				1,00	0,52	M	**CORTE 5**
75. MEDIACAÑA		0,82				1,00	0,82	M	**CORTE 5**
MEDIACAÑAS CUARTO DE ASEO VERTICALES									
76. MEDIACAÑA		1,56				1,00	1,56	M	**CORTE 5**
77. MEDIACAÑA		1,56				1,00	1,56	M	**CORTE 5**
MEDIACAÑAS CUARTO ALMACENAMIENTO SUPERIORES									
78. MEDIACAÑA		1,97				1,00	1,97	M	**CORTE 5**
79. MEDIACAÑA		0,80				1,00	0,80	M	**CORTE 5**
80. MEDIACAÑA		1,97				1,00	1,97	M	**CORTE 5**
81. MEDIACAÑA		0,80				1,00	0,80	M	**CORTE 5**
MEDIACAÑAS CUARTO ALMACENAMIENTO VERTICALES									
82. MEDIACAÑA		2,15				1,00	2,15	M	**CORTE 5**
83. MEDIACAÑA		0,28				1,00	0,28	M	**CORTE 5**
84. MEDIACAÑA		2,15				1,00	2,15	M	**CORTE 5**
85. MEDIACAÑA		0,28				1,00	0,28	M	**CORTE 5**
MEDIACAÑAS CUARTO ALMACENAMIENTO INFERIORES (Línea punteada)									
86. MEDIACAÑA		1,97				1,00	1,97	M	**CORTE 5**
87. MEDIACAÑA		0,80				1,00	0,80	M	**CORTE 5**
88. MEDIACAÑA		1,97				1,00	1,97	M	**CORTE 5**
89. MEDIACAÑA		0,80				1,00	0,80	M	**CORTE 5**
							-		

TOTAL EJECUTADO	95,69	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**95,69**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
95,69	0,00	**95,69**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			**FECHA**	**12/06/2026**



CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**7.3.12**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO**		**UNIDAD**	**M**

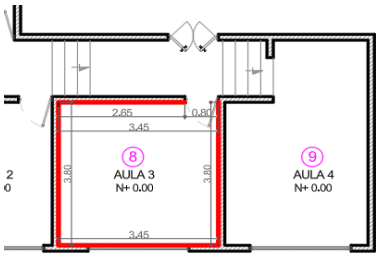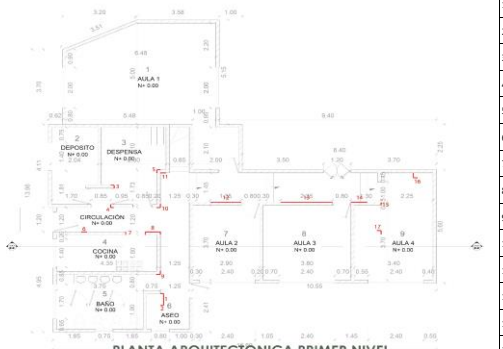ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
	**ACTA PARCIAL 3**									
	AULA 3			3,45			1,00	3,45	M	CORTE 3
				3,80			2,00	7,60	M	CORTE 3
				2,65			1,00	2,65	M	**CORTE 3**
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 5									
	1. ZONA ASEO			0,75			1,00	0,75	M	**CORTE 5**
	2. ZONA DE ASEO			0,15			1,00	0,15	M	**CORTE 5**
	3. DESPENSA			0,21			1,00	0,21	M	**CORTE 5**
	4. DESPENSA			1,02			1,00	1,02	M	**CORTE 5**
	5. DESPENSA			0,32			1,00	0,32	M	**CORTE 5**
	6. ACCESO			0,56			1,00	0,56	M	**CORTE 5**
	7. ACCESO			0,11			1,00	0,11	M	**CORTE 5**
	8. ACCESO			0,99			1,00	0,99	M	**CORTE 5**
	9. ACCESO			0,31			1,00	0,31	M	**CORTE 5**
	10. ACCESO			0,34			1,00	0,34	M	**CORTE 5**
	11. ACCESO			0,18			1,00	0,18	M	**CORTE 5**
	12. PASILLO			1,41			1,00	1,41	M	**CORTE 5**
	13. PASILLO			2,04			1,00	2,04	M	**CORTE 5**
	14. PASILLO			0,78			1,00	0,78	M	**CORTE 5**
	15. AULA 4			0,18			1,00	0,18	M	**CORTE 5**
	16. AULA 4			0,33			1,00	0,33	M	**CORTE 5**
	17 AULA 4			0,30			1,00	0,30	M	**CORTE 5**
	**GUARDAESCOBAS EN SEGUNDO PISO**									
	18. AULA 5B			1,39			1,00	1,39	M	**CORTE 5**
	19. AULA 5B			0,72			1,00	0,72	M	**CORTE 5**
	20. AULA 5B			1,41			1,00	1,41	M	**CORTE 5**
	21. AULA 5B			0,12			1,00	0,12	M	**CORTE 5**
	22. AULA 5B			1,41			1,00	1,41	M	**CORTE 5**
	23. AULA 5B			0,81			1,00	0,81	M	**CORTE 5**
	24. AULA 5B			2,34			1,00	2,34	M	**CORTE 5**
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	31,88	M	0,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	13,70	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M	
PRESENTE ACTA	**18,18**	M	0,00

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
18,18	13,70	**31,88**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**7.2.16**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





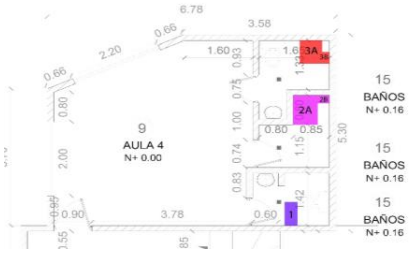






LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Área**				
ACTA PARCIAL 3							-		
AULA 3		3,80	3,45			1,00	13,11	M2	CORTE 3
ACTA PARCIAL 5							-		
1. BAÑO PROFESORES - SEGUNDO PISO		0,30	0,66			1,00	0,20	M2	**CORTE 5**
2. ZONA CAMILLAS A - SEGUNDO PISO		0,48	0,72			1,00	0,35	M2	**CORTE 5**
2. ZONA CAMILLAS B - SEGUNDO PISO		0,12	0,28			1,00	0,03	M2	**CORTE 5**
3. ZONA DUCHA A - SGUNDO PISO		0,59	0,59			1,00	0,35	M2	**CORTE 5**
3. ZONA DUCHA B - SEGUNDO PISO		0,45	0,16			1,00	0,07	M2	**CORTE 5**

TOTAL EJECUTADO	14,11	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	13,11	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**1,00**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	13,11	**14,11**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**15.1.3**	**CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

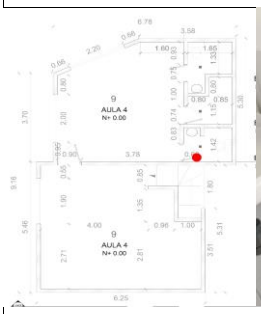



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Área**				
ACTA PARCIAL 5									
1. CERRADURA		1,00				1,00	1,00	UN	**CORTE 5**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**19,1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL NO. 5									
	AULA 1 (AMARILLO)		6,80	6,12			1,00	41,62	M2	CORTE 5
	AULAS 2, 3 Y 4 (ROJO)		6,48	11,00			1,00	71,28	M2	CORTE 5
	HALL AULA 1 (VERDE)		2,80	2,80			1,00	7,84	M2	CORTE 5
	AREA COCINA, BAÑOS Y ZONA DE ASEO (AZUL)		6,42	5,12			1,00	32,87	M2	CORTE 5
	AREA DEPOSITO, DESPENSA Y CIRCULACIÓN PRIMER NIVEL (CYAN)		5,82	5,00			1,00	29,10	M2	CORTE 5
	ZONAS VERDES (1m por el perímetro del cerramiento)		1,00	78,02			1,00	78,02	M2	CORTE 5
	AULA 5 PISO 2 (MAGENTA)		5,82	5,00			1,00	29,10	M2	CORTE 5
	AULA 6 PISO 2 (NARANJA)		6,80	6,12			1,00	41,62	M2	CORTE 5
	DESCUENTO AREA TRIANGULAR		1,76	1,34			- 1,00	- 2,36	M2	CORTE 5
								-		
								-		
								-	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**22.1.10**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

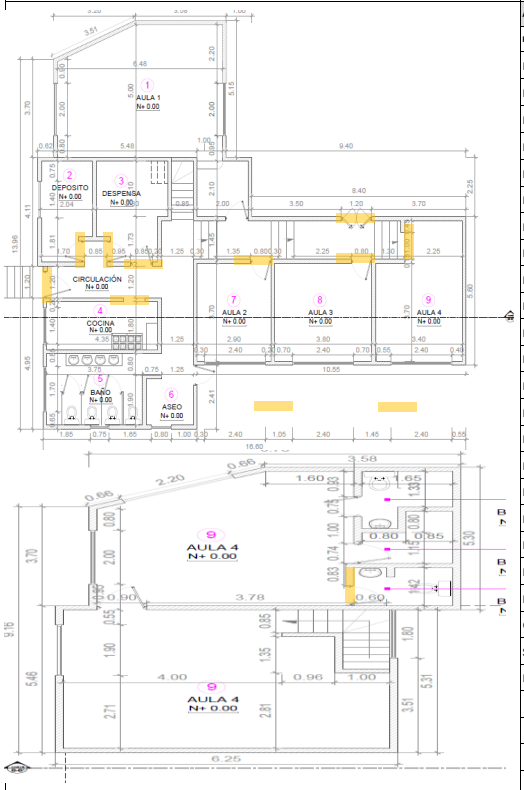







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Área**				
ACTA PARCIAL 4									
PRIMER PISO									
PUERTA PORTERIA "DEPOSITO		0,67	1,98			2,00	2,65	M2	CORTE 4
PUERTA PARQUE		0,57	1,94			2,00	2,21	M2	CORTE 4
PUERTA PARQUE		0,57	1,94			2,00	2,21	M2	CORTE 4
PUERTA AULA 4		0,91	2,03			2,00	3,69	M2	CORTE 4
PUERTA AULA 3		0,75	1,91			2,00	2,87	M2	CORTE 4
PUERTA COORDINACION		0,75	1,95			2,00	2,93	M2	CORTE 4
PUERTA DESPENSA 1		0,68	1,96			2,00	2,67	M2	CORTE 4
PUERTA DESPENSA 1		0,96	1,96			2,00	3,76	M2	CORTE 4
PUERTA ENTRADA		1,03	1,93			2,00	3,98	M2	CORTE 4
PUERTA DEPOSTIO EXTERIOR		0,54	1,63			2,00	1,76	M2	CORTE 4
PUERTA DEPOSTIO EXTERIOR		0,51	1,55			2,00	1,58	M2	CORTE 4
PUERTA SHUT DE BASURA		0,58	1,76			2,00	2,04	M2	CORTE 4
DESCUENTO DE PUERTAS VENTANAS PARQUE		0,50	0,27			- 2,00	- 0,27	M2	CORTE 4
DESCUENTO SHUT		0,51	0,39			- 2,00	- 0,40	M2	CORTE 4
DECUENTO AULA 4		0,38	0,48			- 2,00	- 0,36	M2	CORTE 4
DESCUENTO AULA 3		0,38	0,48			- 2,00	- 0,36	M2	CORTE 4
DESCUENTO COORDINACION		0,38	0,48			- 2,00	- 0,36	M2	CORTE 4
DESCUENTO DESPENSA		0,61	0,29			- 2,00	- 0,35	M2	CORTE 4
DESCUENTO DESPENSA		0,83	0,56			- 2,00	- 0,93	M2	CORTE 4
DESCUENTO ENTRADA		0,96	0,31			- 2,00	- 0,60	M2	CORTE 4
DESCUENTO DESPOSITO EXTERIOR		0,50	0,84			- 2,00	- 0,84	M2	CORTE 4
COCINA		0,74	0,94			1,00	0,70	M2	CORTE 4
SEGUNDO PISO									
BAÑO AULA		0,64	2,00			2,00	2,56	M2	CORTE 4



								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA PARCIAL 5									
								-		
	Menos cantidad cobrada en Acta No. 4	-	1,00				31,14	- 31,14	M2	**CORTE 5**
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	-	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	31,14	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	- **31,14**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
-31,14	31,14	**0,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO		**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.1.11**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

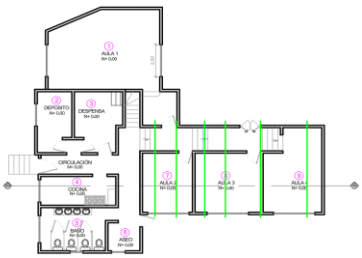







PLANTA ARQUITECTONICA PRIMER NIVEL






PLANTA ARQUITECTONICA SEGUNDO NIVEL












LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL 1									
CERCHAS PRIMER NIVEL			6,48			6,00	38,88	M	Corte No. 1
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
ACTA PARCIAL 2									
MENOS COBRO ACTA 1- CERCHAS PRIMER NIVEL			6,48			- 6,00	- 38,88		Corte No. 2
PERFILES PRIMER NIVEL (rojo)			6,48			8,00	51,84		Corte No. 2
PERFIL SOBRE PASILLO PRIMER NIVEL (verde)			4,80			1,00	4,80		Corte No. 2
PERFILES SOBRE AREA DE ASEO PRIMER NIVEL (Amarillo)			2,97			1,00	2,97		Corte No. 2
PERFILES SOBRE AREA DE BAÑOS PRIMER NIVEL (azul)			2,97			4,00	11,88		Corte No. 2
PERFILES SOBRE AREA HALL AULA 1(cyan)			2,80			1,00	2,80		Corte No. 2
PERFILES SOBRE COCINA (magenta)			2,15			4,00	8,60		Corte No. 2
PERFILES SOBRE AULA 5 (naranja)			5,00			2,00	10,00		Corte No. 2
PERFILES SOBRE AULA 6 (morado)			4,07			1,00	4,07		Corte No. 2
PERFILES SOBRE AULA 6 (morado)			4,81			1,00	4,81		Corte No. 2
PERFILES SOBRE AULA 6 (morado)			5,44			1,00	5,44		Corte No. 2
PERFILES SOBRE AULA 6 (Verde oscuro)			6,12			4,00	24,48		Corte No. 2
							-		
COCINA Y BAÑOS (PRIMER NIVEL)			4,80			1,00	4,80		Corte No. 2
AULA 5 (SEGUNDO NIVEL)			5,00			1,00	5,00		Corte No. 2
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
ACTA PARCIAL 4									
PRIMER PISO									
ESCALERA DE GATO			3,13			2,00	6,26	M	CORTE 4
ESCALERA DE GATO			1,86			2,00	3,72	M	CORTE 4
ENTRADA			4,88			1,00	4,88	M	CORTE 4

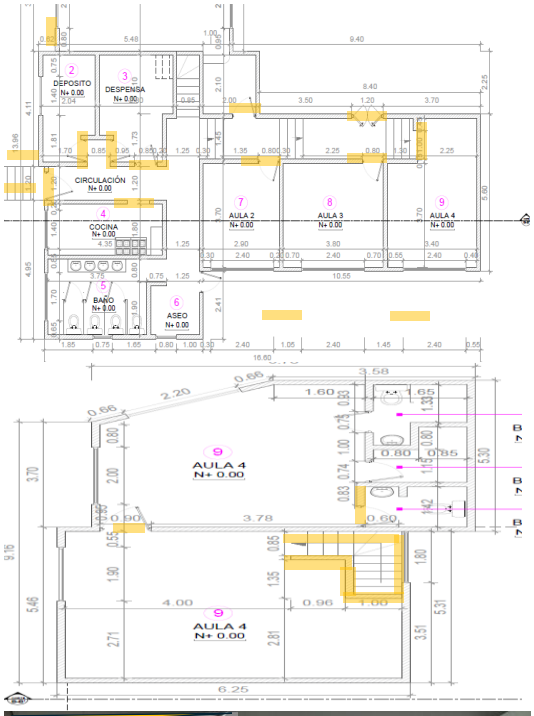


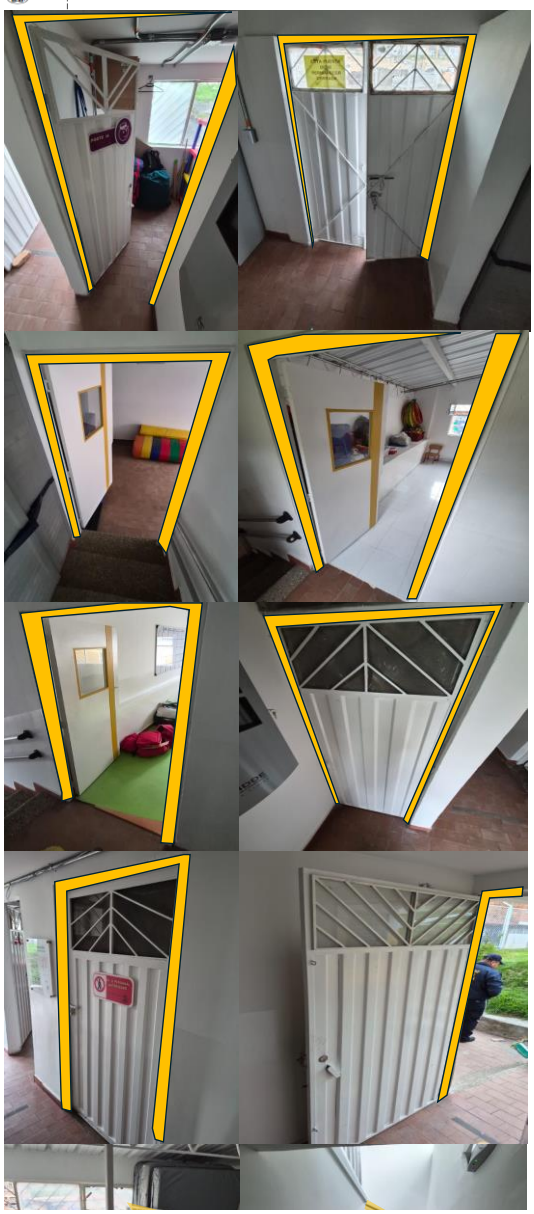


PORTERIA			4,63			1,00	4,63	M	CORTE 4
DESPENSA			4,85			1,00	4,85	M	CORTE 4
DESPENSA			4,63			1,00	4,63	M	CORTE 4
COCINA			4,58			1,00	4,58	M	CORTE 4
AULA 1			4,94			1,00	4,94	M	CORTE 4
COORDINACION			4,70			1,00	4,70	M	CORTE 4
AULA 3			4,64			1,00	4,64	M	CORTE 4
AULA 4			5,10			1,00	5,10	M	CORTE 4
PARQUE			5,02			1,00	5,02	M	CORTE 4
BARNDA EXTERIOR			2,13			4,00	8,52	M	CORTE 4
SEGUNDO PISO						1,00	1,00	M	CORTE 4
AULA 4			4,93			1,00	4,93	M	CORTE 4
BARANDA AULA			2,70			2,00	5,40	M	CORTE 4
BAÑO			4,63			1,00	4,63	M	CORTE 4
BARANDA ESCALERA			5,40			1,00	5,40	M	CORTE 4
							-		
CANALES							-		
JARDIN 1			2,10			1,00	2,10	M	CORTE 4
FACHADA POSTERIOR 2			6,50			1,00	6,50	M	CORTE 4
LATERAL DEPOSITO Y SHUT 3			2,05			1,00	2,05	M	CORTE 4
							-		
							-		
							-	





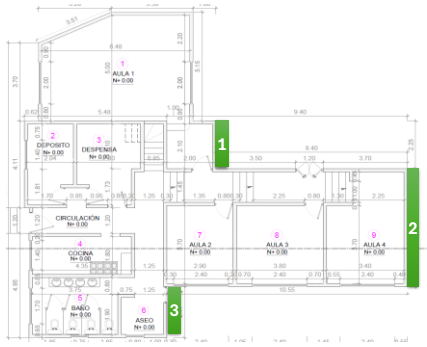
1
2
3
AULA 1 N+ 0.00
DEPOSITO N+ 0.00
DESPENSA N+ 0.00
CIRCULACION N+ 0.00
COCINA N+ 0.00
AULA 2 N+ 0.00
AULA 3 N+ 0.00
AULA 4 N+ 0.00
BAÑO N+ 0.00
ASEO N+ 0.00







							-		
							-		
							-		



							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	165,93	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	239,97	M	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M	
PRESENTE ACTA	- **74,04**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
-74,04	239,97	**165,93**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**22.3.4**	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.**			**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

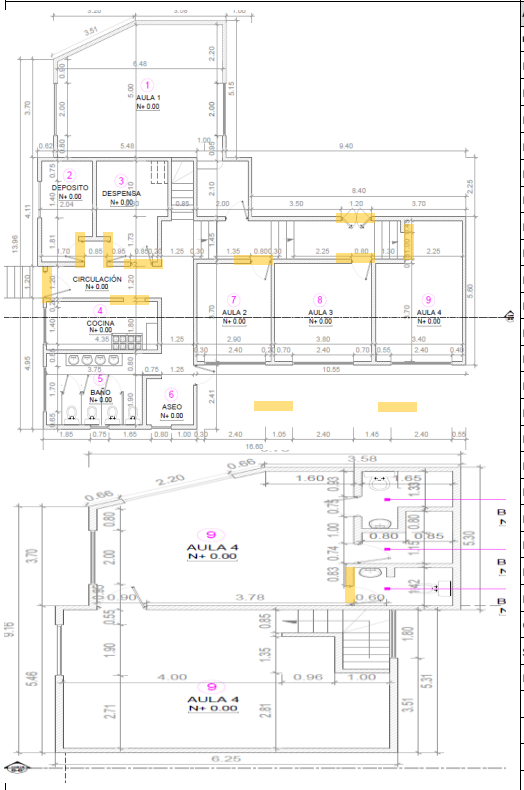







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Área**				
ACTA PARCIAL 5									
PRIMER PISO									
PUERTA PORTERIA "DEPOSITO		0,67	1,98			1,00	1,33	M2	CORTE 5
PUERTA PARQUE		0,57	1,94			1,00	1,11	M2	CORTE 5
PUERTA PARQUE		0,57	1,94			1,00	1,11	M2	CORTE 5
PUERTA AULA 4		0,91	2,03			1,00	1,85	M2	CORTE 5
PUERTA AULA 3		0,75	1,91			1,00	1,43	M2	CORTE 5
PUERTA COORDINACION		0,75	1,95			1,00	1,46	M2	CORTE 5
PUERTA DESPENSA 1		0,68	1,96			1,00	1,33	M2	CORTE 5
PUERTA DESPENSA 1		0,96	1,96			1,00	1,88	M2	CORTE 5
PUERTA ENTRADA		1,03	1,93			1,00	1,99	M2	CORTE 5
PUERTA DEPOSTIO EXTERIOR		0,54	1,63			1,00	0,88	M2	CORTE 5
PUERTA DEPOSTIO EXTERIOR		0,51	1,55			1,00	0,79	M2	CORTE 5
PUERTA SHUT DE BASURA		0,58	1,76			1,00	1,02	M2	CORTE 5
DESCUENTO DE PUERTAS VENTANAS PARQUE		0,50	0,27			- 1,00	- 0,14	M2	CORTE 5
DESCUENTO SHUT		0,51	0,39			- 1,00	- 0,20	M2	CORTE 5
DECUENTO AULA 4		0,38	0,48			- 1,00	- 0,18	M2	CORTE 5
DESCUENTO AULA 3		0,38	0,48			- 1,00	- 0,18	M2	CORTE 5
DESCUENTO COORDINACION		0,38	0,48			- 1,00	- 0,18	M2	CORTE 5
DESCUENTO DESPENSA		0,61	0,29			- 1,00	- 0,18	M2	CORTE 5
DESCUENTO DESPENSA		0,83	0,56			- 1,00	- 0,46	M2	CORTE 5
DESCUENTO ENTRADA		0,96	0,31			- 1,00	- 0,30	M2	CORTE 5
DESCUENTO DESPOSITO EXTERIOR		0,50	0,84			- 1,00	- 0,42	M2	CORTE 5
COCINA		0,74	0,94			1,00	0,70	M2	CORTE 5
SEGUNDO PISO									
BAÑO AULA		0,64	2,00			2,00	2,56	M2	CORTE 5





							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	17,20	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**17,20**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
17,20	0,00	**17,20**



OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	NOMBRE	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 .	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO		**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.3.6**	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**		**UNIDAD**	**M**

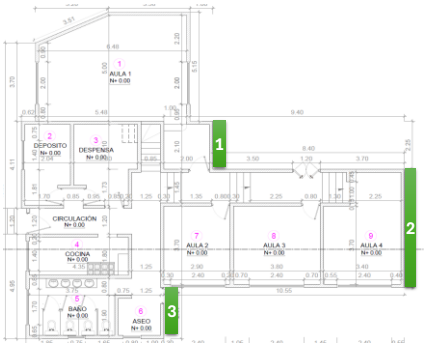ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	ACTA PARCIAL 5									
	**CANALES (FACHADA FRONTAL)**							-		
	COCINA Y BAÑOS (PRIMER NIVEL)			4,80			1,00	4,80	M	CORTE 5
	AULA 5 (SEGUNDO NIVEL)			5,00			1,00	5,00	M	CORTE 5
 								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	**CANALES (FACHADA POSTERIOR)**							-		
	JARDIN 1			2,10			1,00	2,10	M	CORTE 5
	FACHADA POSTERIOR 2			6,50			1,00	6,50	M	CORTE 5
	LATERAL DEPOSITO Y SHUT 3			5,00			1,00	5,00	M	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	23,40	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**23,40**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
23,40	0,00	**23,40**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**008**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**23.8.10**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

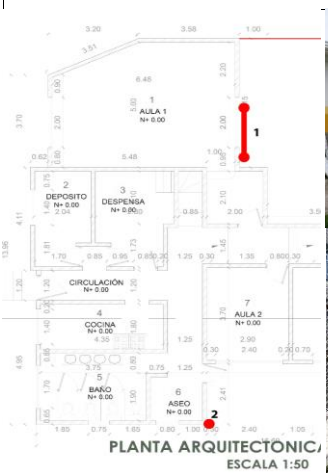





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Área				
ACTA PARCIAL 5									
1. BAJANTE 4"		3,80				1,00	3,80	M	**CORTE 5**
2. BAJANTE 2"		2,40				1,00	2,40	M	**CORTE 5**
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	6,20	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M	
PRESENTE ACTA	**6,20**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,20	0,00	**6,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

JARDÍN INFANTIL MARICHUELA

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA						
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES			
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4										

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027		11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027		22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
12. JARDÍN INFANTIL MARICHUELA													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1,3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	15,82	$ 18.707,00	$ 295.944,74	13,30	$ 248.803,10	-	$ -	13,30	$ 248.803,10	13,30	$ 248.803,10
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO) INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	-	$ 28.037,00	$ -	1,00	$ 28.037,00	1,00	$ 28.037,00	-	$ -	1,00	$ 28.037,00
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL	U	-	$ 24.637,00	$ -	17,97	$ 442.726,89	17,97	$ 442.726,89	-	$ -	17,97	$ 442.726,89
1.3.13	DESMONTE MANUAL DE CONCERTINA EXISTENTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE O DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO RELACIONADO. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA.	M	-	$ 24.637,00	$ -	69,24	$ 1.705.865,88	69,24	$ 1.705.865,88	-	$ -	69,24	$ 1.705.865,88
1,4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 22.597,00	$ -	4,50	$ 101.686,50	-	$ -	4,50	$ 101.686,50	4,50	$ 101.686,50
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.	M2	559,30	$ 72.169,00	$ 40.364.121,70	577,70	$ 41.692.031,30	-	$ -	577,70	$ 41.692.031,30	577,70	$ 41.692.031,30
1,5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	$ 10.912,00	$ -	91,14	$ 994.519,68	-	$ -	91,14	$ 994.519,68	91,14	$ 994.519,68
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 27.857,00	$ -	0,35	$ 9.749,95	0,35	$ 9.749,95	-	$ -	0,35	$ 9.749,95
1.5.8	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 18.435,00	$ -	2,56	$ 47.193,60	-	$ -	2,56	$ 47.193,60	2,56	$ 47.193,60
1,6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	45,00	$ 14.184,00	$ 638.280,00	49,00	$ 695.016,00	-	$ -	49,00	$ 695.016,00	49,00	$ 695.016,00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	45,00	$ 19.177,00	$ 862.965,00	49,00	$ 939.673,00	-	$ -	49,00	$ 939.673,00	49,00	$ 939.673,00
1.6.29	DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	-	$ 11.688,00	$ -	47,00	$ 549.336,00	-	$ -	47,00	$ 549.336,00	47,00	$ 549.336,00
1.6.30	RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS. INCLUYE ETIQUETAR CADA COMPONENTE DEL TABLERO, CABLES DE ENTRADA, BREAKERS, HERRAJES, MAMPOSTERIA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	UN	-	$ 101.542,00	$ -	2,00	$ 203.084,00	2,00	$ 203.084,00	-	$ -	2,00	$ 203.084,00
1,7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO FALSO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	140,91	$ 20.627,00	$ 2.906.550,57	155,33	$ 3.203.991,91	-	$ -	155,33	$ 3.203.991,91	155,33	$ 3.203.991,91
1,8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	$ 6.856,00	$ -	60,28	$ 413.279,68	7,40	$ 50.734,40	52,88	$ 362.545,28	60,28	$ 413.279,68
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	-	$ 10.686,00	$ -	0,68	$ 7.266,48	0,68	$ 7.266,48	-	$ -	0,68	$ 7.266,48
1.8.7	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), LINEAL A.<=50 CM, INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M	-	$ 27.849,00	$ -	0,68	$ 18.937,32	0,68	$ 18.937,32	-	$ -	0,68	$ 18.937,32
1.8.11	DESMONTE / DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO DE ESPESOR HASTA 10 MM, CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	10,48	$ 23.218,00	$ 243.324,64	5,12	$ 118.876,16	-	$ -	5,12	$ 118.876,16	5,12	$ 118.876,16
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 24.853,00	$ -	3,52	$ 87.482,56	-	$ -	3,52	$ 87.482,56	3,52	$ 87.482,56
1,10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M2	-	$ 6.474,00	$ -	45,07	$ 291.783,18	45,07	$ 291.783,18	-	$ -	45,07	$ 291.783,18
1,11	**OTROS PRELIMINARES.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA										
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES					
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4														

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
12. JARDÍN INFANTIL MARICHUELA													
1.11.4	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	M2	-	$ 6.420,00	$ -	21,70	$ 139.314,00	21,70	$ 139.314,00	-	$ -	21,70	$ 139.314,00
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	80,53	$ 6.605,00	$ 531.900,65	81,42	$ 537.779,10	-	$ -	81,42	$ 537.779,10	81,42	$ 537.779,10
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL**												
2,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M		$ 42.476,00	$ -	1,23	$ 52.245,48	1,23	$ 52.245,48	-	$ -	1,23	$ 52.245,48
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3		$ 97.563,00	$ -	0,05	$ 4.878,15	0,05	$ 4.878,15	-	$ -	0,05	$ 4.878,15
2,2	**CONCRETOS**												
2.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 116.827,00	$ -	17,62	$ 2.058.491,74	-	$ -	17,62	$ 2.058.491,74	17,62	$ 2.058.491,74
2,3	**VARIOS - CIMENTACIONES**												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN		$ 29.636,00	$ -	72,00	$ 2.133.792,00	-	$ -	72,00	$ 2.133.792,00	72,00	$ 2.133.792,00
2,5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG		$ 5.297,00	$ -	110,71	$ 586.430,87	-	$ -	110,71	$ 586.430,87	110,71	$ 586.430,87
2,6	**ESTRUCTURAS METALICAS**												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	5.611,10	$ 18.149,00	$ 101.835.853,90	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3,5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	-	$ 9.628,00	$ -	492,08	$ 4.737.746,24	-	$ -	492,08	$ 4.737.746,24	492,08	$ 4.737.746,24
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	6,06	$ 23.019,00	$ 139.495,14	5,31	$ 122.230,89	-	$ -	5,31	$ 122.230,89	5,31	$ 122.230,89
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5,1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+	UN	21,00	$ 199.311,00	$ 4.185.531,00	22,00	$ 4.384.842,00	7,00	$ 1.395.177,00	15,00	$ 2.989.665,00	22,00	$ 4.384.842,00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETO0RNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 218.382,00	$ 873.528,00	4,00	$ 873.528,00	-	$ -	4,00	$ 873.528,00	4,00	$ 873.528,00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE	UN	1,00	$ 216.629,00	$ 216.629,00	1,00	$ 216.629,00	-	$ -	1,00	$ 216.629,00	1,00	$ 216.629,00
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	UN	3,00	$ 45.512,00	$ 136.536,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	13,00	$ 49.640,00	$ 645.320,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA	UN	1,00	$ 350.787,00	$ 350.787,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X75A 50 KA	UN	-	$ 402.253,00	$ -	1,00	$ 402.253,00	1,00	$ 402.253,00	-	$ -	1,00	$ 402.253,00
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	-	$ 36.026,00	$ -	21,00	$ 756.546,00	21,00	$ 756.546,00	-	$ -	21,00	$ 756.546,00
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN	6,00	$ 35.893,00	$ 215.358,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO PARA INSTALACIÓN EN RIEL DIN (RIEL OMEGA) 2X40A 10KA	UN	-	$ 63.342,00	$ -	1,00	$ 63.342,00	1,00	$ 63.342,00	-	$ -	1,00	$ 63.342,00
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X20A 10 KA	UN	1,00	$ 101.875,00	$ 101.875,00	2,00	$ 203.750,00	2,00	$ 203.750,00	-	$ -	2,00	$ 203.750,00
5,2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 233.378,00	$ 233.378,00	27,00	$ 6.301.206,00	27,00	$ 6.301.206,00	-	$ -	27,00	$ 6.301.206,00
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 229.495,00	$ -	3,00	$ 688.485,00	3,00	$ 688.485,00	-	$ -	3,00	$ 688.485,00
5.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	UN	-	$ 140.675,00	$ -	5,00	$ 703.375,00	5,00	$ 703.375,00	-	$ -	5,00	$ 703.375,00
5.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 224.332,00	$ -	1,00	$ 224.332,00	1,00	$ 224.332,00	-	$ -	1,00	$ 224.332,00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	92,00	$ 234.104,00	$ 21.537.568,00	95,00	$ 22.239.880,00	8,00	$ 1.872.832,00	87,00	$ 20.367.048,00	95,00	$ 22.239.880,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 315.585,00	$ 2.524.680,00	16,00	$ 5.049.360,00	16,00	$ 5.049.360,00	-	$ -	16,00	$ 5.049.360,00
5,3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 717.870,00	$ 717.870,00	1,00	$ 717.870,00	1,00	$ 717.870,00	-	$ -	1,00	$ 717.870,00
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	-	$ 456.222,00	$ -	1,00	$ 456.222,00	1,00	$ 456.222,00	-	$ -	1,00	$ 456.222,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026		4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA											
2. ACTA No.	5				5. TIPO DE ACTA PARCIAL:							RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES			
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4																

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:		N/A			14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:		N/A			25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
12. JARDÍN INFANTIL MARICHUELA													
5.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	-	$ 57.862,00	$ -	3,00	$ 173.586,00	3,00	$ 173.586,00	-	$ -	3,00	$ 173.586,00
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	5,00	$ 57.862,00	$ 289.310,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	-	$ 1.004.419,00	$ -	1,00	$ 1.004.419,00	1,00	$ 1.004.419,00	-	$ -	1,00	$ 1.004.419,00
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	66,00	$ 60.035,00	$ 3.962.310,00	48,00	$ 2.881.680,00	48,00	$ 2.881.680,00	-	$ -	48,00	$ 2.881.680,00
5,4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF	M	-	$ 41.762,00	$ -	1,40	$ 58.466,80	1,40	$ 58.466,80	-	$ -	1,40	$ 58.466,80
5.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF	M	15,00	$ 65.644,00	$ 984.660,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	170,00	$ 60.587,00	$ 10.299.790,00	167,54	$ 10.150.745,98	167,54	$ 10.150.745,98	-	$ -	167,54	$ 10.150.745,98
5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	15,00	$ 92.434,00	$ 1.386.510,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5,5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES,	UN	8,00	$ 69.605,00	$ 556.840,00	16,00	$ 1.113.680,00	16,00	$ 1.113.680,00	-	$ -	16,00	$ 1.113.680,00
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	-	$ 30.029,00	$ -	6,00	$ 180.174,00	6,00	$ 180.174,00	-	$ -	6,00	$ 180.174,00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	20,00	$ 192.065,00	$ 3.841.300,00	20,00	$ 3.841.300,00	20,00	$ 3.841.300,00	-	$ -	20,00	$ 3.841.300,00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	46,00	$ 192.642,00	$ 8.861.532,00	46,00	$ 8.861.532,00	46,00	$ 8.861.532,00	-	$ -	46,00	$ 8.861.532,00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	7,00	$ 41.548,00	$ 290.836,00	2,00	$ 83.096,00	2,00	$ 83.096,00	-	$ -	2,00	$ 83.096,00
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	16,00	$ 70.135,00	$ 1.122.160,00	19,00	$ 1.332.565,00	19,00	$ 1.332.565,00	-	$ -	19,00	$ 1.332.565,00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3,00	$ 52.758,00	$ 158.274,00	2,00	$ 105.516,00	2,00	$ 105.516,00	-	$ -	2,00	$ 105.516,00
5,6	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	-	$ 41.486,00	$ -	10,32	$ 428.135,52	10,32	$ 428.135,52	-	$ -	10,32	$ 428.135,52
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN	-	$ 1.052.087,00	$ -	1,00	$ 1.052.087,00	1,00	$ 1.052.087,00	-	$ -	1,00	$ 1.052.087,00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6,1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	14,00	$ 220.619,00	$ 3.088.666,00	19,00	$ 4.191.761,00	19,00	$ 4.191.761,00	-	$ -	19,00	$ 4.191.761,00
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 263.215,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00	1,00	$ 263.215,00	-	$ -	1,00	$ 263.215,00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	3,00	$ 173.638,00	$ 520.914,00	3,00	$ 520.914,00	3,00	$ 520.914,00	-	$ -	3,00	$ 520.914,00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	3,00	$ 272.141,00	$ 816.423,00	3,00	$ 816.423,00	3,00	$ 816.423,00	-	$ -	3,00	$ 816.423,00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	3,00	$ 459.176,00	$ 1.377.528,00	3,00	$ 1.377.528,00	3,00	$ 1.377.528,00	-	$ -	3,00	$ 1.377.528,00
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1,00	$ 7.472.944,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	1,00	$ 7.472.944,00	-	$ -	1,00	$ 7.472.944,00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	190,00	$ 8.605,00	$ 1.634.950,00	255,99	$ 2.202.793,95	255,99	$ 2.202.793,95	-	$ -	255,99	$ 2.202.793,95
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7,1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	-	$ 26.040,00	$ -	2,91	$ 75.776,40	0,35	$ 9.114,00	2,56	$ 66.662,40	2,91	$ 75.776,40
7,2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.6	ACABADO DE PISO CON BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL VIBROPRENSADO 33X33 CM, BLANCO HUILA GRANO #5. INCLUYE MORTERO 1:3, BOQUILLA BLANCA, DESTRONQUE (#36), 3 PULIDAS (#60,120,220) Y BRILLO AL PLOMO.	M2	-	$ 155.474,00	$ -	0,35	$ 54.415,90	0,35	$ 54.415,90	-	$ -	0,35	$ 54.415,90
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	-	$ 127.357,00	$ -	2,56	$ 326.033,92	-	$ -	2,56	$ 326.033,92	2,56	$ 326.033,92
7,3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	-	$ 21.009,00	$ -	360,22	$ 7.567.861,98	360,22	$ 7.567.861,98	-	$ -	360,22	$ 7.567.861,98
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	-	$ 23.195,00	$ -	95,11	$ 2.206.076,45	3,97	$ 92.084,15	91,14	$ 2.113.992,30	95,11	$ 2.206.076,45
8	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERAMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	-	$ 113.182,00	$ -	1,00	$ 113.182,00	1,00	$ 113.182,00	-	$ -	1,00	$ 113.182,00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	-	$ 133.403,00	$ -	5,12	$ 683.023,36	-	$ -	5,12	$ 683.023,36	5,12	$ 683.023,36
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9,1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN))**												
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	-	$ 224.990,00	$ -	1,97	$ 443.230,30	1,97	$ 443.230,30	-	$ -	1,97	$ 443.230,30
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	-	$ 457.129,00	$ -	14,57	$ 6.660.369,53	14,57	$ 6.660.369,53	-	$ -	14,57	$ 6.660.369,53
9,2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA										
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES					
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4														

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025		7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
12. JARDÍN INFANTIL MARICHUELA													
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	10,48	$ 208.378,00	$ 2.183.801,44	7,96	$ 1.658.688,88	-	$ -	7,96	$ 1.658.688,88	7,96	$ 1.658.688,88
9,3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.3	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	-	$ 45.844,00	$ -	32,85	$ 1.505.975,40	32,85	$ 1.505.975,40	-	$ -	32,85	$ 1.505.975,40
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	-	$ 405.393,00	$ -	2,00	$ 810.786,00	2,00	$ 810.786,00	-	$ -	2,00	$ 810.786,00
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14,1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	140,91	$ 107.142,00	$ 15.097.379,22	205,38	$ 22.004.823,96	39,11	$ 4.190.323,62	166,27	$ 17.814.500,34	205,38	$ 22.004.823,96
14.1.2	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	-	$ 200.526,00	$ -	2,00	$ 401.052,00	-	$ -	2,00	$ 401.052,00	2,00	$ 401.052,00
14,2	**DIVISIONES**												
14.2.6	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	-	$ 151.105,00	$ -	0,93	$ 140.527,65	0,93	$ 140.527,65	-	$ -	0,93	$ 140.527,65
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15,1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	-	$ 75.515,00	$ -	2,00	$ 151.030,00	2,00	$ 151.030,00	-	$ -	2,00	$ 151.030,00
15,2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGUN TIPO.	M2	3,93	$ 152.990,00	$ 601.250,70	45,07	$ 6.895.259,30	45,07	$ 6.895.259,30	-	$ -	45,07	$ 6.895.259,30
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	-	$ 79.225,00	$ -	37,11	$ 2.940.039,75	37,11	$ 2.940.039,75	-	$ -	37,11	$ 2.940.039,75
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO, CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	-	$ 38.828,00	$ -	63,57	$ 2.468.295,96	63,57	$ 2.468.295,96	-	$ -	63,57	$ 2.468.295,96
16.10	CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 Ø=2,5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L=60MM A =25,4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24, CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GUÍA CON GUAYA DE ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA.	M	-	$ 60.209,00	$ -	34,62	$ 2.084.435,58	34,62	$ 2.084.435,58	-	$ -	34,62	$ 2.084.435,58
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.290,39	$ 4.546,00	$ 5.866.112,94	701,11	$ 3.187.246,06	701,11	$ 3.187.246,06	-	$ -	701,11	$ 3.187.246,06
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.10	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	-	$ 37.483,00	$ -	18,42	$ 690.436,86	18,42	$ 690.436,86	-	$ -	18,42	$ 690.436,86
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22,1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M2	-	$ 71.517,00	$ -	656,94	$ 46.982.377,98	233,43	$ 16.694.213,31	423,51	$ 30.288.164,67	656,94	$ 46.982.377,98
22.1.7	PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 13.689,00	$ -	817,22	$ 11.186.924,58	92,46	$ 1.265.684,94	724,76	$ 9.921.239,64	817,22	$ 11.186.924,58
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 48.456,00	$ -	94,35	$ 4.571.823,60	94,35	$ 4.571.823,60	-	$ -	94,35	$ 4.571.823,60
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	-	$ 12.878,00	$ -	771,52	$ 9.935.634,56	28,76	$ 370.371,28	742,76	$ 9.565.263,28	771,52	$ 9.935.634,56
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ALCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 29.936,00	$ -	592,50	$ 17.737.080,00	203,60	$ 6.094.969,60	388,90	$ 11.642.110,40	592,50	$ 17.737.080,00
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 16.676,00	$ -	388,49	$ 6.478.459,24	136,33	$ 2.273.439,08	252,16	$ 4.205.020,16	388,49	$ 6.478.459,24
22,3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	445,72	$ 37.231,00	$ 16.594.601,32	11,90	$ 443.048,90	-	$ -	11,90	$ 443.048,90	11,90	$ 443.048,90
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS >25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	-	$ 28.498,00	$ -	14,00	$ 398.972,00	14,00	$ 398.972,00	-	$ -	14,00	$ 398.972,00
22,4	**SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA						
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4										

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
12. JARDÍN INFANTIL MARICHUELA													
22.4.1	PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.	M2	-	$ 18.603,00	$ -	50,48	$ 939.079,44	-	$ -	50,48	$ 939.079,44	50,48	$ 939.079,44
22,6	**OTROS EN OBRAS INTERIORES.**												
22.6.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	-	$ 3.577,00	$ -	12,32	$ 44.068,64	-	$ -	12,32	$ 44.068,64	12,32	$ 44.068,64
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23,3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	65,23	$ 125.559,00	$ 8.190.213,57	45,99	$ 5.774.458,41	-	$ -	45,99	$ 5.774.458,41	45,99	$ 5.774.458,41
23,4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO.	M2	519,36	$ 253.100,00	$ 131.450.016,00	583,04	$ 147.567.424,00	-	$ -	583,04	$ 147.567.424,00	583,04	$ 147.567.424,00
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSION: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	14,76	$ 99.728,00	$ 1.471.985,28	20,33	$ 2.027.470,24	-	$ -	20,33	$ 2.027.470,24	20,33	$ 2.027.470,24
23.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	45,26	$ 148.455,00	$ 6.719.073,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	$ 214.934,00	$ -	1,64	$ 352.491,76	1,64	$ 352.491,76	-	$ -	1,64	$ 352.491,76
23,8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.=<25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	51,83	$ 53.788,00	$ 2.787.832,04	235,52	$ 12.668.149,76	17,00	$ 914.396,00	218,52	$ 11.753.753,76	235,52	$ 12.668.149,76
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	33,00	$ 45.109,00	$ 1.488.597,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	60,56	$ 41.955,00	$ 2.540.794,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 421.477.315,95		$ 483.742.461,26		$ 142.842.910,59		$ 340.899.550,67		$ 483.742.461,26
	35. DESCRIPCIÓN	%											
	ADMINISTRACIÓN	27,49%			$ 115.864.114,00		$ 132.980.802,60		$ 39.267.516,12		$ 93.713.286,48		$ 132.980.802,60
	IMPREVISTO	1,00%			$ 4.214.773,00		$ 4.837.424,61		$ 1.428.429,11		$ 3.408.995,51		$ 4.837.424,62
	UTILIDAD	4,00%			$ 16.859.093,00		$ 19.349.698,45		$ 5.713.716,42		$ 13.635.982,03		$ 19.349.698,45
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 136.937.980,00		$ 157.167.925,66		$ 46.409.661,65		$ 110.758.264,02		$ 157.167.925,67
	AJUSTE AL PESO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	ANTICIPO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 558.415.295,95		$ 640.910.386,92		$ 189.252.572,24		$ 451.657.814,69		$ 640.910.386,93

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	12	6	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA								
2. ACTA No.	5			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES			
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4												

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$	13.277.562.249	
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	**CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES**										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963.265	
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 12 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
12. JARDÍN INFANTIL MARICHUELA													

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

DESCRIPCION	37. No. INFORME MENSUAL	38. PERIODO	39. NOMBRE DEL ARCHIVO	40. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe Tecnico No 5_10676-2025_Parte 3	
INFORME SOCIAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Social No 5_10676-2025	
INFORME AMBIENTAL	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Ambiental No 5_10676-2025	
INFORME SST	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 1 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2 202604_Pago 4-Informe SST No 5_10676-2025_Parte 2	
INFORME DE SUPERVISION	6	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4-Informe Supervision No 5_10676-2025	
ACTA PARCIAL	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	202604_Pago 4 Corte General obra_Acta 4_10676-2025	
SOPORTE PAGO SDH	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FE 5 - PAGO HACIENDA RESERVA_ACTA 3 FE 6 - PAGO HACIENDA VIGENCIA_ACTA 3 FE 7 - PAGO HACIENDA ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FACTURA	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	FACTURA_FE 5_DISTRITO RESERVA_ACTA 3 FACTURA_FE 6_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 3 FACTURA_FE 7_ADULTO MAYOR_ACTA 3	
FORMATO MC 14	5	01 de mayo al 31 de mayo 2026	MC-14_DISTRITO_ACTA 3 MC-14_ADULTO MAYOR_ACTA 3	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 12 días del mes de Junio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7

Nombre: HAZBA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.485.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.3.3**	**DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**U**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
COMEDOR (UNA HOJA + MARCO) DEL PORTÓN LATERAL						1,00	1,00	U	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	1,00	U
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	U
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	U
PRESENTE ACTA	**1,00**	U

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.3.5**	**DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**U**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL No. 5									
PUERTAS DESMONTADAS PARA MANTENIMIENTO							-		
BAÑOS RECEPCIÓN	63,02%					2,00	1,26	U	CORTE 5
COMEDOR	63,02%					2,00	1,26	U	CORTE 5
COCINA	63,02%					1,00	0,63	U	CORTE 5
CUARTO ELECTRICO	63,02%					1,00	0,63	U	CORTE 5
CAMINADORES	63,02%					1,00	0,63	U	CORTE 5
LACTANCIA	63,02%					1,00	0,63	U	CORTE 5
PARVULOS A	63,02%					2,00	1,26	U	CORTE 5
PARVULOS B	63,02%					2,00	1,26	U	CORTE 5
PARVULOS C	63,02%					2,00	1,26	U	CORTE 5
PARVULOS D	63,02%					2,00	1,26	U	CORTE 5
PRE JARDIN A	63,02%					1,00	0,63	U	CORTE 5
PRE JARDIN B	63,02%					1,00	0,63	U	CORTE 5
BAÑO 2	63,02%					1,00	0,63	U	CORTE 5
PUERTAS DESMONTADAS PARA CAMBIO							-		
PORTÓN FACHADA LATERAL	100%					2,00	2,00	U	CORTE 5
PASILLO ENTRE PARVULOS Y PRE JARDIN	100%					1,00	1,00	U	CORTE 5
COMEDOR (3 HOJAS DEL PORTÓN LATERAL)	100%					3,00	3,00	U	CORTE 5
							-		

TOTAL EJECUTADO	17,97	U
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	U
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	U
PRESENTE ACTA	**17,97**	U

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
17,97	0,00	**17,97**

OBSERVACIONES: SE CONTEMPLA UN FACTOR DEL 63,02% SEGÚN APUS (NO SE PAGA LO RELACIONADO AL RETIRO Y AL VALOR DEL BOTADERO) PARA LAS PUERTAS QUE FUERON DESMONTADAS PARA MANTENIMIENTO.

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.3.13**	**DESMONTE MANUAL DE CONCERTINA EXISTENTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE O DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO RELACIONADO. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

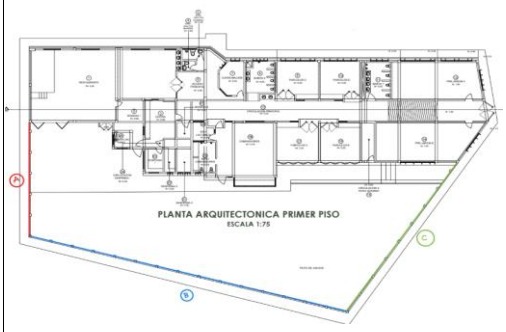





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
CERRAMIENTO POSTERIOR PERIMETRAL							-		
A			13,14				13,14	M	CORTE 5
B			37,70				37,70	M	CORTE 5
C			18,40				18,40	M	CORTE 5
							-		
							-		
							-	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.5.5**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
COMEDOR							-		
ZONA A		0,11	0,53			1,00	0,06	M2	CORTE 5
ZONA B		0,42	0,70			1,00	0,29	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	0,35	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**0,35**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0,35	0,00	**0,35**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.6.30**	**RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS. INCLUYE ETIQUETAR CADA COMPONENTE DEL TABLERO, CABLES DE ENTRADA, BREAKERS, HERRAJES, MAMPOSTERIA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
TABLERO ELECTRICO						2,00	2,00	UN	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**2,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	**2,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**



CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.8.1**	**CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 4									
	PREJARDIN A PUERTA			2,20			4,00	8,80	M	CORTE 4
	PREJARDIN B PUERTA			2,20			4,00	8,80	M	CORTE 4
	PREJARDIN B MURO			3,06			4,00	12,24	M	CORTE 4
	PREJARDIN B MURO			2,34			4,00	9,36	M	CORTE 4
	PREJARDIN B MURO			2,30			4,00	9,20	M	CORTE 4
	PARVULOS D			1,12			4,00	4,48	M	CORTE 4
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	60,28	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	52,88	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**7,40**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
7,40	52,88	**60,28**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ PINCAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.8.5** — **DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

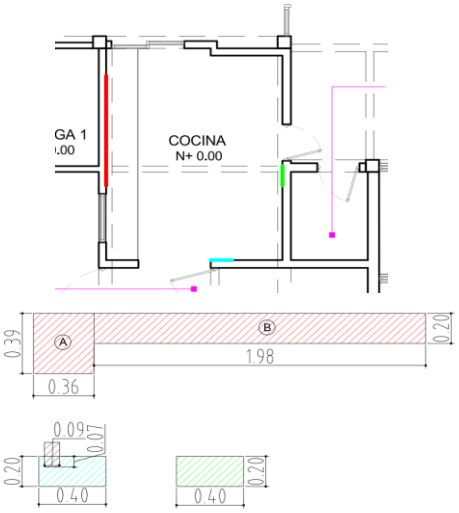



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
COCINA							-		
AREA SOBRE MESÓN A (ROJO)		0,36	0,39			1,00	0,14	M2	CORTE 5
AREA SOBRE MESÓN B (ROJO)		0,20	1,98			1,00	0,39	M2	CORTE 5
							-		
AREA DETRÁS DE LA ESTUFA (VERDE)		0,20	0,40			1,00	0,08	M2	CORTE 5
							-		
AREA MURO LATERAL ESTUFA (CYAN)		0,20	0,40			1,00	0,08	M2	CORTE 5
DESCUENTO		0,07	0,09			- 1,00	- 0,01	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.8.7**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), LINEAL A.<=50 CM, INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

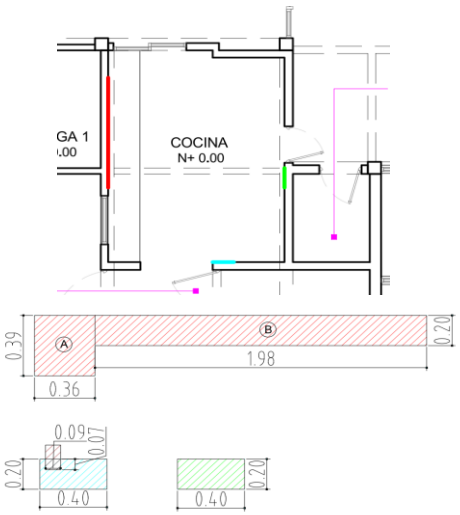



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
COCINA							-		
AREA SOBRE MESÓN A		0,36	0,39			1,00	0,14	M	CORTE 5
AREA SOBRE MESÓN B		0,20	1,98			1,00	0,39	M	CORTE 5
							-		
AREA DETRÁS DE LA ESTUFA		0,20	0,40			1,00	0,08	M	CORTE 5
							-		
AREA MURO LATERAL ESTUFA		0,20	0,40			1,00	0,08	M	CORTE 5
DESCUENTO		0,07	0,09			- 1,00	- 0,01	M	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	0,68	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**0,68**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0,68	0,00	**0,68**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.10.1**	**DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
LAVANDERIA							-		
VENTANA 1		0,55		0,46		2,00	0,50	M2	CORTE 5
VENTANA 2		0,56		0,46		1,00	0,25	M2	CORTE 5
		0,55		0,46		1,00	0,25	M2	CORTE 5
BAÑO CAMINADORES							-		
VIDRIO T1		0,42		0,99		2,00	0,83	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,42		0,48		2,00	0,40	M2	CORTE 5
AULA CAMINADORES							-		
VIDRIO T1		0,41		1,17		1,00	0,48	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,35		0,45		1,00	0,16	M2	CORTE 5
PARVULOS A							-		
VIDRIO T1		0,43		0,30		8,00	1,03	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,43		0,62		16,00	4,27	M2	CORTE 5
PARVULOS B							-		
VIDRIO T1		0,43		0,30		8,00	1,03	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,43		0,62		16,00	4,27	M2	CORTE 5
PUERTA PASILLO A JARDÍN INTERNO (VIDRIO SUPERIOR)		0,85		0,15		1,00	0,13	M2	CORTE 5
PRE JARDIN B									
FACHADA POSTERIOR VIDRIO T1		0,48		1,28		2,00	1,23	M2	CORTE 5
FACHADA POSTERIOR VIDRIO T2		0,79		1,28		3,00	3,03	M2	CORTE 5
FACHADA LATERAL		0,49		1,28		4,00	2,51	M2	CORTE 5
PORTON FACHADA LATERAL (VIDRIO SUPERIOR)		0,75		0,17		3,00	0,38	M2	CORTE 5
PRE JARDIN A							-		
FACHADA LATERAL		0,48		1,27		5,00	3,05	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL VIDRIO TIPO 1		0,42		1,27		2,00	1,07	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL VIDRIO TIPO 2		0,94		1,27		2,00	2,39	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL VIDRIO TIPO 3		0,46		1,27			0,58	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL VIDRIO TIPO 4		0,42		1,29		2,00	1,08	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL VIDRIO TIPO 5		1,00		1,29		2,00	2,58	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL VIDRIO TIPO 6		0,52		1,29		1,00	0,67	M2	CORTE 5
BAÑOS 1							-		
VIDRIO T1		0,46		0,10		9,00	0,41	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,50		0,70		3,00	1,05	M2	CORTE 5
PARVULOS D							-	M2	CORTE 5
VIDRIO T1		0,41		1,26		2,00	1,03	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,99		1,26		2,00	2,49	M2	CORTE 5
VIDRIO T3		0,45		1,26		1,00	0,57	M2	CORTE 5
PARVULOS C							-		
VIDRIO T1		0,39		1,27		1,00	0,50	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,99		1,27		2,00	2,51	M2	CORTE 5
VIDRIO T3		0,44		1,27		2,00	1,12	M2	CORTE 5
BAÑOS 2							-		
VIDRIO T1		0,36		0,10		12,00	0,43	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,40		0,50		4,00	0,80	M2	CORTE 5
COORDINACIÓN							-		
VIDRIO T1		0,40		1,27		1,00	0,51	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,44		1,27		1,00	0,56	M2	CORTE 5
ACCESO PRINCIPAL							-		
VIDRIO T1		0,74		0,90		1,00	0,67	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,28		0,90		1,00	0,25	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	45,07	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**45,07**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
45,07	0,00	**45,07**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**1.11.4**	**RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
COMEDOR							-		
PELICULA T1		1,30		0,40		1,00	0,52	M2	CORTE 5
PELICULA T2		0,32		1,08		7,00	2,42	M2	CORTE 5
PELICULA T3		0,72		1,14		1,00	0,82	M2	CORTE 5
PELICULA T4		1,10		1,14		3,00	3,76	M2	CORTE 5
							-		
AULA CAMINADORES (CYAN)							-		
PELICULA PUERTA		0,47		0,78		1,00	0,37	M2	CORTE 5
PELICULA T6		2,00		1,13		1,00	2,26	M2	CORTE 5
PELICULA T7		0,73		1,12		1,00	0,82	M2	CORTE 5
PORTON FACHADA LATERAL (MORADO)							-		
PELICULA T1		0,75		0,17		3,00	0,38	M2	CORTE 5
							-		
PRE JARDIN B (VERDE OSCURO)							-		
PELICULA PUERTA		0,44		0,78		1,00	0,34	M2	CORTE 5
							-		
PRE JARDIN A (AZUL REY)							-		
PELICULA PUERTA		0,45		0,78		1,00	0,35	M2	CORTE 5
							-		
BAÑOS 1 (AMARILLO)							-		
PELICULA PUERTA		0,44		0,78		1,00	0,34	M2	CORTE 5
							-		
PARVULOS A (VERDE CLARO)							-		
PELICULA T3		0,93		1,05		1,00	0,98	M2	CORTE 5
PELICULA PUERTA		0,47		0,78		2,00	0,73	M2	CORTE 5
							-		
PARVULOS B (NARANJA)							-		
PELICULA T3		0,92		1,07		1,00	0,98	M2	CORTE 5
PELICULA PUERTA		0,47		0,78		2,00	0,73	M2	CORTE 5
PARVULOS D (VERDE MENTA)							-		
PELICULA T4		0,92		1,02		1,00	0,94	M2	CORTE 5
PELICULA PUERTA		0,47		0,78		2,00	0,73	M2	CORTE 5
							-		
PARVULOS C (LILA)							-		
PELICULA T4		0,92		1,03		1,00	0,95	M2	CORTE 5
PELICULA PUERTA		0,47		0,78		2,00	0,73	M2	CORTE 5
							-		
ACCESO COMEDOR (GRIS)							-		
PELICULA T1		0,58		0,77		1,00	0,45	M2	CORTE 5
PELICULA T2		0,57		0,76		1,00	0,43	M2	CORTE 5
PELICULA T3		0,58		0,98		1,00	0,57	M2	CORTE 5
COORDINACIÓN (MAGENTA)							-		
PELICULA T3		0,43		1,28		2,00	1,10	M2	CORTE 5
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	21,70	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**21,70**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
21,70	0,00	**21,70**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**2.1.5**	**EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
COMEDOR							-		
ZONA A			0,53			1,00	0,53	M	CORTE 5
ZONA B			0,70			1,00	0,70	M	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	1,23	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**1,23**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,23	0,00	**1,23**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**2.1.9**	**RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.**	**UNIDAD**	**M3**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
ACTA PARCIAL No. 5									
COMEDOR							-		
ZONA A		0,11	0,53	0,15		1,00	0,01	M3	CORTE 5
ZONA B		0,42	0,70	0,15		1,00	0,04	M3	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	0,05	M3	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M3	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M3	
PRESENTE ACTA	**0,05**	M3	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0,05	0,00	**0,05**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2026

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.1.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 4									
	BAÑOS ENTRADA						2,00	2,00	UN	CORTE 4
	COORDINACION						1,00	1,00	UN	CORTE 4
	BAÑOS 2						1,00	1,00	UN	CORTE 4
	PARVULOS C						1,00	1,00	UN	CORTE 4
	PARVULOS D						1,00	1,00	UN	CORTE 4
	BAÑOS 1						1,00	1,00	UN	CORTE 4
	PREJARDIN A						1,00	1,00	UN	CORTE 4
	PREJARDIN B						1,00	1,00	UN	CORTE 4
	PASILLO PREJARDIN B - PARVULOS B						1,00	1,00	UN	CORTE 4
	PARVULOS B						1,00	1,00	UN	CORTE 4
	PARVULOS A						1,00	1,00	UN	CORTE 4
	CAMINADORES						1,00	1,00	UN	CORTE 4
	SALA DE LACTANCIA						1,00	1,00	UN	CORTE 4
	BAÑO CAMINADORES						1,00	1,00	UN	CORTE 4
								-		
								-		
								-		





							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	22,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	15,00	UN	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN	
PRESENTE ACTA	**7,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,00	15,00	**22,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA MUÑOZ / ING. ZULMA JULAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2026


CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.1.21**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X75A 50 KA**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Tablero TN en cuarto tecnico						1,00	1,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.1.24**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Tablero TN en cuarto tecnico						14,00	14,00	UN	CORTE 5
	Tablero TC en cuarto tecnico						7,00	7,00	UN	CORTE 5
 								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	21,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**21,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
21,00	0,00	**21,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.1.29**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO PARA INSTALACIÓN EN RIEL DIN (RIEL OMEGA) 2X40A 10KA**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Baño caminadores (Circuito calentador de agua)						1,00	1,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
										

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2026

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.1.30**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X20A 10 KA**	**UNIDAD**	**UN**

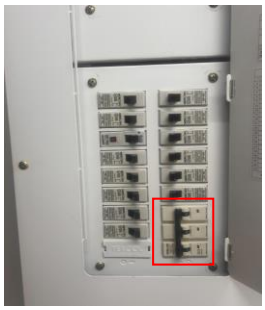ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Tablero TN en cuarto tecnico						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Tablero TN en cuarto tecnico						1,00	1,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 										

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN	
PRESENTE ACTA	**2,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,00	0,00	**2,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**




CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.2.2**	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Restaurante						3,00	3,00	UN	CORTE 5
	Lavanderia						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Despensa 1						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Despensa 2						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Despensa 3						2,00	2,00	UN	CORTE 5
	Cuarto tecnico						3,00	3,00	UN	CORTE 5
	Cocina						3,00	3,00	UN	CORTE 5
	Vigilancia circulación						2,00	2,00	UN	CORTE 5
 	Lacatancia						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Caimandores						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Parvulos A						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Parvulos B						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin B						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin A						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Parvulos C						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Parvulos D						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Circulación						3,00	3,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	27,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**27,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
27,00	0,00	**27,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**




CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.2.4**	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Cocina						3,00	3,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 										

TOTAL EJECUTADO	3,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**3,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.2.9**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Coordinación						5,00	5,00	M	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 										

TOTAL EJECUTADO	5,00	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**5,00**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,00	0,00	**5,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**


CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.2.12**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Acceso principal						1,00	1,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.2.16**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Restaurante						3,00	3,00	UN	CORTE 5
	Acceso principal						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Caminadores						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Parvulos A						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Parvulos B						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Circulación interno						5,00	5,00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin B						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin A						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Parvulos C						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Parvulos B						1,00	1,00	UN	CORTE 5
 								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	16,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**16,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
16,00	0,00	**16,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.3.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Cuarto tecnico						1,00	1,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
										

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.3.6**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Cuarto tecnico						1,00	1,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
										

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**



CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.3.8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Circulación interna						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Baño caminadores						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Cuarto electrico						1,00	1,00	UN	CORTE 5
 								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	3,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**3,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.3.11**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**GLB**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Circulación acceso principal						1,00	1,00	GLB	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
										

TOTAL EJECUTADO	1,00	GLB
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	GLB
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	GLB
PRESENTE ACTA	**1,00**	GLB

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.3.12**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Bodega 1						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Circulación principal						9,00	9,00	UN	CORTE 5
	Coordinación						2,00	2,00	UN	CORTE 5
	Parvulos C						4,00	4,00	UN	CORTE 5
	Parvulos D						4,00	4,00	UN	CORTE 5
	Prejardín A						6,00	6,00	UN	CORTE 5
	Prejardín B						7,00	7,00	UN	CORTE 5
	Circulacion patio interno						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Parvulos B						4,00	4,00	UN	CORTE 5
	Parvulos A						4,00	4,00	UN	CORTE 5
	Caminadores						6,00	6,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		



TOTAL EJECUTADO	48,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**48,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
48,00	0,00	**48,00**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2026

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.4.8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF**	**UNIDAD**	**M**

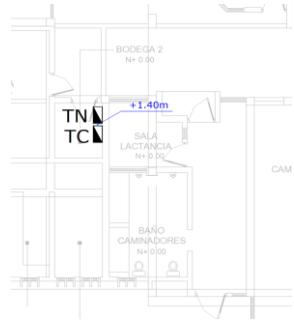ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
 	De tablero TN a tablero TC			1,40			1,00	1,40	M	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	1,40	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**1,40**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,40	0,00	**1,40**


OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2026

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.4.18**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	**SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO**									
	Cuarto tecnico a anunciador remoto vigilancia (Vertical)			0,85			1,00	0,85	M	CORTE 5
	Cuarto tecnico a anunciador remoto vigilancia			3,40			1,00	3,40	M	CORTE 5
	Cuarto tecnico a anunciador remoto vigilancia			1,00			1,00	1,00	M	CORTE 5
	Cuarto tecnico			0,71			1,00	0,71	M	CORTE 5
	Cuarto tecnico			1,60			1,00	1,60	M	CORTE 5
	Cuarto tecnico			0,48			1,00	0,48	M	CORTE 5
	Cuarto tecnico a lactancia			1,30			1,00	1,30	M	CORTE 5
	Cuarto tecnico a despensa			2,55			1,00	2,55	M	CORTE 5
	Despensa			3,00			1,00	3,00	M	CORTE 5
	Despensa			2,13			1,00	2,13	M	CORTE 5
	Cocina			5,30			1,00	5,30	M	CORTE 5
	Cocina a bodega			3,79			1,00	3,79	M	CORTE 5
	Bodega			1,20			1,00	1,20	M	CORTE 5
	Bodega			2,43			1,00	2,43	M	CORTE 5
	Lavanderia			1,10			1,00	1,10	M	CORTE 5
	Lavanderia			1,30			1,00	1,30	M	CORTE 5
	Lavanderia			1,00			1,00	1,00	M	CORTE 5
	Restaurante			5,72			1,00	5,72	M	CORTE 5
	Restaurante			2,30			1,00	2,30	M	CORTE 5
	Restaurante			2,36			1,00	2,36	M	CORTE 5
	Restaurante			1,00			1,00	1,00	M	CORTE 5
	Restaurante			4,76			1,00	4,76	M	CORTE 5
	Restaurante			11,10			1,00	11,10	M	CORTE 5
	Acceso principal			1,18			1,00	1,18	M	CORTE 5
	Acceso principal			1,18			1,00	1,18	M	CORTE 5
	Acceso principal			0,40			1,00	0,40	M	CORTE 5
	Acceso principal			0,40			1,00	0,40	M	CORTE 5
	Acceso principal			1,75			1,00	1,75	M	CORTE 5
	Coordinación y Parvulos			14,08			1,00	14,08	M	CORTE 5
	Coordinación			0,30			1,00	0,30	M	CORTE 5
	Parvulos C			0,80			1,00	0,80	M	CORTE 5
	Parvulos D			4,51			1,00	4,51	M	CORTE 5
	Parvulos D			0,55			1,00	0,55	M	CORTE 5
	Baños			2,55			1,00	2,55	M	CORTE 5
	Baños			0,78			1,00	0,78	M	CORTE 5
	Prejardin A			6,93			1,00	6,93	M	CORTE 5
	Prejardin A			0,50			1,00	0,50	M	CORTE 5
	Circulacón principal			1,79			1,00	1,79	M	CORTE 5
	Circulacón principal			1,76			1,00	1,76	M	CORTE 5
	Circulacón principal			0,80			1,00	0,80	M	CORTE 5
	Circulacón principal			2,32			1,00	2,32	M	CORTE 5
	Prejardin B			2,32			1,00	2,32	M	CORTE 5
	Prejardin B			6,58			1,00	6,58	M	CORTE 5
	Prejardin B			0,83			1,00	0,83	M	CORTE 5
	Prejardin B			1,48			1,00	1,48	M	CORTE 5
	Parvulos A			4,33			1,00	4,33	M	CORTE 5
	Parvulos A			4,33			1,00	4,33	M	CORTE 5
	Caminadores			1,17			1,00	1,17	M	CORTE 5
	Caminadores			2,79			1,00	2,79	M	CORTE 5
	Parvulos A			1,66			1,00	1,66	M	CORTE 5
	Parvulos A a Circulacion principal			4,44			1,00	4,44	M	CORTE 5
	Circulacion principal			11,48			1,00	11,48	M	CORTE 5
								-		
	CANALIZACIÓN SISTEMA DE CCTV							-		
	Circulación principal			0,80			1,00	0,80	M	CORTE 5







Circulación principal			1,25			1,00	1,25	M	CORTE 5
Circulación principal			2,54			1,00	2,54	M	CORTE 5
Circulación principal			2,58			1,00	2,58	M	CORTE 5
Circulación principal			1,35			1,00	1,35	M	CORTE 5
Baño caminadores			6,95			1,00	6,95	M	CORTE 5
Caminadores			7,70			1,00	7,70	M	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	167,54	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M	
PRESENTE ACTA	**167,54**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
167,54	0,00	**167,54**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.5.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Restaurante						3,00	3,00	UN	CORTE 5
	Acceso principal						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Caminadores						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Parvulos A						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Parvulos B						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Circulación interno						5,00	5,00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin B						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Pre Jardin A						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Parvulos C						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Parvulos B						1,00	1,00	UN	CORTE 5
 								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	16,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**16,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
16,00	0,00	**16,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.5.3**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Patio interior						5,00	5,00	UN	CORTE 5
	Acceso principal						1,00	1,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 										

TOTAL EJECUTADO	6,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**6,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	0,00	**6,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.5.4**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Restaurante						18,00	18,00	UN	CORTE 5
	Coordinación						2,00	2,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 										

TOTAL EJECUTADO	20,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**20,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
20,00	0,00	**20,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**


CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.5.8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Acceso principal						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Circulación principal						9,00	9,00	UN	CORTE 5
	Parvulos C						4,00	4,00	UN	CORTE 5
	Parvulos D						4,00	4,00	UN	CORTE 5
	Prejardin A						6,00	6,00	UN	CORTE 5
	Prejjardin B						7,00	7,00	UN	CORTE 5
	Circulación patio interno						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Parvulos B						4,00	4,00	UN	CORTE 5
 	Parvulos A						4,00	4,00	UN	CORTE 5
	Caminadores						6,00	6,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	46,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**46,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
46,00	0,00	**46,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.2.14**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**			**UNIDAD**	**UN**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA N°4									
	BAÑOS ENTRADA						2,00	2,00	UN	CORTE 4
	COORDINACION						2,00	2,00	UN	CORTE 4
	BAÑOS 2						2,00	2,00	UN	CORTE 4
	PARVULOS C						4,00	4,00	UN	CORTE 4
	PARVULOS D						4,00	4,00	UN	CORTE 4
	BAÑOS 1						2,00	2,00	UN	CORTE 4
	PREJARDIN A						6,00	6,00	UN	CORTE 4
	PREJARDIN B						7,00	7,00	UN	CORTE 4
	PASILLO PREJARDIN B - PARVULOS B						1,00	1,00	UN	CORTE 4
	PARVULOS B						4,00	4,00	UN	CORTE 4
	PARVULOS A						4,00	4,00	UN	CORTE 4
	CAMINADORES						6,00	6,00	UN	CORTE 4
	SALA DE LACTANCIA						2,00	2,00	UN	CORTE 4
	BAÑO CAMINADORES						2,00	2,00	UN	CORTE 4
	COMEDOR "RESTAURANTE"						18,00	18,00	UN	CORTE 4
	COCINA						4,00	4,00	UN	CORTE 4
	PASILLO PRINCIPAL						8,00	8,00	UN	CORTE 4
	ENTRADA						2,00	2,00	UN	CORTE 4
	DEPOSITOS						7,00	7,00	UN	CORTE 4
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		



								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	ACTA N°5									
	Circulación exterior a patio de juegos						7,00	7,00	UN	CORTE 5
	Acceso princip						1,00	1,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		







TOTAL EJECUTADO	95,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	87,00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**8,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8,00	87,00	**95,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA MUÑOZ / ING. ZULMA JULAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.5.9**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Patio interior						2,00	2,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 										

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**2,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	**2,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.5.10**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Baños 1						2,00	2,00	UN	CORTE 5
	Baños 2						2,00	2,00	UN	CORTE 5
	Bodega 1						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Lavanderia						2,00	2,00	UN	CORTE 5
	Cocina						4,00	4,00	UN	CORTE 5
	Despensa 1						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Despensa 2 y 3						2,00	2,00	UN	CORTE 5
	Cuarto tecnico						1,00	1,00	UN	CORTE 5
 	Lactancia						2,00	2,00	UN	CORTE 5
	Baño caminadores						2,00	2,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	19,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN	
PRESENTE ACTA	**19,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
19,00	0,00	**19,00**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.5.13**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

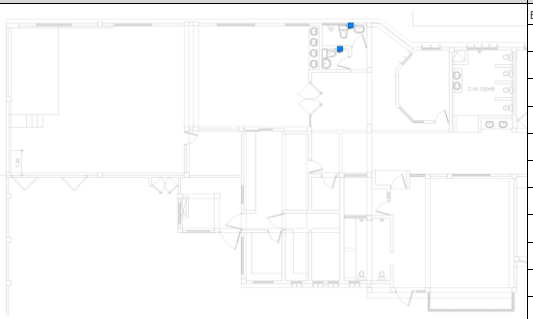ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Baños 1						2,00	2,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 										

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**2,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,00	0,00	**2,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**5.6.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION**	**UNIDAD**	**UN**

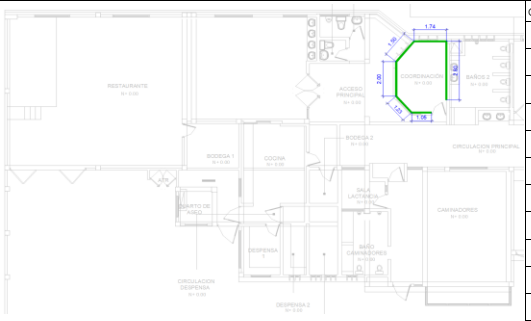ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Coordinación			2,80			1,00	2,80	UN	CORTE 5
				1,74			1,00	1,74	UN	CORTE 5
				1,50			1,00	1,50	UN	CORTE 5
				2,00			1,00	2,00	UN	CORTE 5
				1,23			1,00	1,23	UN	CORTE 5
				1,05			1,00	1,05	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 								-		

TOTAL EJECUTADO	10,32	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**10,32**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
10,32	0,00	**10,32**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**5.6.8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA**	**UNIDAD**	**UN**

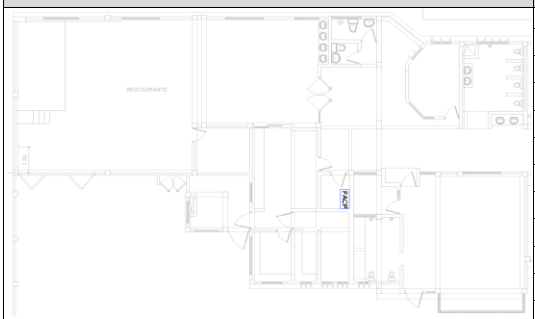ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Cuarto tecnico panel incendio						1,00	1,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
										

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**6.1.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Restaurante						2,00	2,00	UN	CORTE 5
	Lavanderia						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Bodega 1						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Coordinación						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Paarvulos C						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Paarvulos D						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Prejaridn A						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Prejaridn B						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Paarvulos B						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Paarvulos A						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Caminadores						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Lactancia						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Despensa 1						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Despensa 2						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Cuarto técnico						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Circulación						3,00	3,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		





TOTAL EJECUTADO	19,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**19,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
19,00	0,00	**19,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**6.1.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE**	**UNIDAD**	**UN**

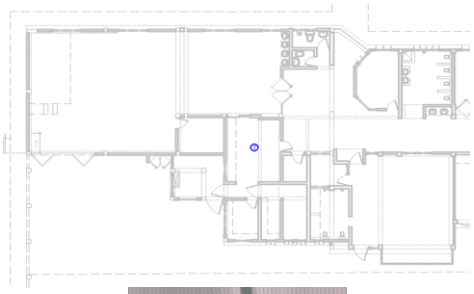ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Cocina						1,00	1,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
										

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN	
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**6.1.3**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Restaurante						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Circulación interna						2,00	2,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
										

TOTAL EJECUTADO	3,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN	
PRESENTE ACTA	**3,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**6.1.4**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Restaurante						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Circulación interna						2,00	2,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

TOTAL EJECUTADO	3,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**3,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**6.1.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Restaurante						1,00	1,00	UN	CORTE 5
	Circulación interna						2,00	2,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		







TOTAL EJECUTADO	3,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**3,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CAICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ÍTEM	**6.1.9**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 5									
	Cuarto tecnico						1,00	1,00	UN	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 										

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE O	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPI	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	CONTRAT	10676	FRENTE OBRA	012
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	CONTRAT	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			FECHA	12/06/2026

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	005
ÍTEM	6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA



CONVENCIONES

M: 1 CABLE
V: 1 CABLE
MV: 2 CABLES
2M: 2 CABLES
DP: 2 CABLES






LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Largo				
ACTA PARCIAL No. 5					
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO					
Cuarto tecnico a anunciador remoto vigilancia	0,85	2,00	1,70	M	CORTE 5
Cuarto tecnico a anunciador remoto vigilancia	3,40	2,00	6,80	M	CORTE 5
Cuarto tecnico a anunciador remoto vigilancia	1,00	2,00	2,00	M	CORTE 5
Cuarto tecnico	0,71	4,00	2,84	M	CORTE 5
Cuarto tecnico	1,60	4,00	6,40	M	CORTE 5
Cuarto tecnico	0,48	4,00	1,92	M	CORTE 5
Cuarto tecnico - Enrada panel	1,00	4,00	4,00	M	CORTE 5
Cuarto tecnico a lactancia	1,30	2,00	2,60	M	CORTE 5
Cuarto tecnico a despensa	2,55	2,00	5,10	M	CORTE 5
Despensa	3,00	2,00	6,00	M	CORTE 5
Despensa	2,13	2,00	4,26	M	CORTE 5
Cocina	5,30	2,00	10,60	M	CORTE 5
Cocina a bodega	3,79	2,00	7,58	M	CORTE 5
Bodega	1,20	2,00	2,40	M	CORTE 5
Bodega	2,43	2,00	4,86	M	CORTE 5
Lavanderia	1,10	2,00	2,20	M	CORTE 5
Lavanderia	1,30	2,00	2,60	M	CORTE 5
Lavanderia	1,00	2,00	2,00	M	CORTE 5
Restaurante	5,72	2,00	11,44	M	CORTE 5
Restaurante	2,30	2,00	4,60	M	CORTE 5
Restaurante	2,36	2,00	4,72	M	CORTE 5
Restaurante	1,00	2,00	2,00	M	CORTE 5
Restaurante	4,76	2,00	9,52	M	CORTE 5
Restaurante	11,10	2,00	22,20	M	CORTE 5
Acceso principal	1,18	2,00	2,36	M	CORTE 5
Acceso principal	1,18	2,00	2,36	M	CORTE 5
Acceso principal	0,40	2,00	0,80	M	CORTE 5
Acceso principal	0,40	2,00	0,80	M	CORTE 5
Acceso principal	1,75	2,00	3,50	M	CORTE 5
Coordinación y Parvulos	14,08	2,00	28,16	M	CORTE 5
Coordinación	0,30	2,00	0,60	M	CORTE 5
Parvulos C	0,80	2,00	1,60	M	CORTE 5
Parvulos D	4,51	2,00	9,02	M	CORTE 5
Parvulos D	0,55	2,00	1,10	M	CORTE 5
Baños	2,55	2,00	5,10	M	CORTE 5
Baños	0,78	2,00	1,56	M	CORTE 5
Prejardin A	6,93	2,00	13,86	M	CORTE 5
Prejardin A	0,50	2,00	1,00	M	CORTE 5
Circulacón principal	1,79	2,00	3,58	M	CORTE 5
Circulacón principal	1,76	1,00	1,76	M	CORTE 5
Circulacón principal	0,80	1,00	0,80	M	CORTE 5
Circulacón principal	2,32	1,00	2,32	M	CORTE 5

Prejardin B	2,32	1,00	2,32	M	CORTE 5
Prejardin B	6,58	1,00	6,58	M	CORTE 5
Prejardin B	0,83	1,00	0,83	M	CORTE 5
Prejardin B	1,48	1,00	1,48	M	CORTE 5
Parvulos A	4,33	1,00	4,33	M	CORTE 5
Parvulos A	4,33	1,00	4,33	M	CORTE 5
Caminadores	1,17	2,00	2,34	M	CORTE 5
Caminadores	2,79	2,00	5,58	M	CORTE 5
Parvulos A	1,66	1,00	1,66	M	CORTE 5
Parvulos A a Circulacion principal	4,44	1,00	4,44	M	CORTE 5
Circulacion principal	11,48	1,00	11,48	M	CORTE 5
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		
			-		

TOTAL EJECUTADO	255,99	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**255,99**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
255,99	0,00	**255,99**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / MARTIN RESTREPO ATUESTA	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**7.1.2**	**ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

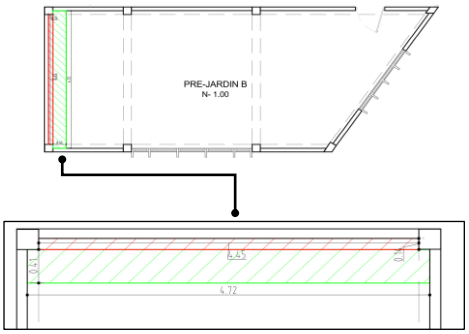







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 4									
PRE JARDIN B							-		
		4,45	0,14				0,62	M2	CORTE 4
		4,72	0,41				1,94	M2	CORTE 4
ACTA PARCIAL No. 5									
COMEDOR							-		
ZONA A		0,11	0,53			1,00	0,06	M2	CORTE 5
ZONA B		0,42	0,70			1,00	0,29	M2	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	2,91	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	2,56	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**0,35**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0,35	2,56	**2,91**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**7.2.6**	**ACABADO DE PISO CON BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL VIBROPRENSADO 33X33 CM, BLANCO HUILA GRANO #5. INCLUYE MORTERO 1:3, BOQUILLA BLANCA, DESTRONQUE (#36), 3 PULIDAS (#60,120,220) Y BRILLO AL PLOMO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
ACTA PARCIAL No. 5									
COMEDOR							-		
ZONA A		0,11	0,53			1,00	0,06	M2	CORTE 5
ZONA B		0,42	0,70			1,00	0,29	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	0,35	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**0,35**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0,35	0,00	**0,35**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	CONTRATO No.	10676	FRENTE OBRA	012
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	CONTRATO No:	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			FECHA	12/06/2026


CAPITULO		ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	ACTA No:	005
ÍTEM	7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

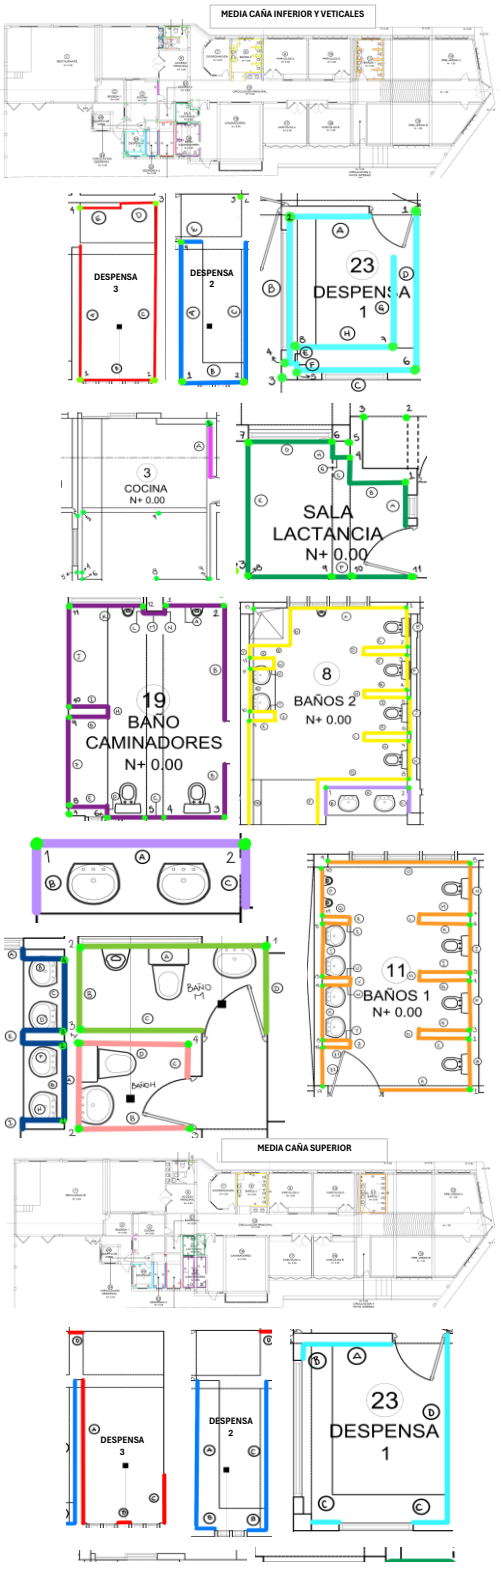



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
DESPENSA 3 (ROJO)							-		
INFERIOR							-		
A			2,46			1,00	2,46	M	CORTE 5
B			1,42			1,00	1,42	M	CORTE 5
C			2,87			1,00	2,87	M	CORTE 5
D			0,70			1,00	0,70	M	CORTE 5
E			0,74			1,00	0,74	M	CORTE 5
SUPERIOR							-		
A			2,52			1,00	2,52	M	CORTE 5
B			0,50			1,00	0,50	M	CORTE 5
C			1,34			1,00	1,34	M	CORTE 5
F			0,34			1,00	0,34	M	CORTE 5
SUPERIOR CIELO RASO							-		
A			5,48			1,00	5,48	M	CORTE 5
B			1,33			1,00	1,33	M	CORTE 5
C			5,42			1,00	5,42	M	CORTE 5
D			1,49			1,00	1,49	M	CORTE 5
VERTICALES							-		
V1			1,47			1,00	1,47	M	CORTE 5
V2			1,49			1,00	1,49	M	CORTE 5
V3			2,27			1,00	2,27	M	CORTE 5
V4			0,35			1,00	0,35	M	CORTE 5
DESPENSA 2 (AZUL)							-		
INFERIOR							-		
A			2,46			1,00	2,46	M	CORTE 5
B			1,21			1,00	1,21	M	CORTE 5
C			0,57			1,00	0,57	M	CORTE 5
E			0,45			1,00	0,45	M	CORTE 5
SUPERIOR							-		
A			2,70			1,00	2,70	M	CORTE 5
B			0,79			1,00	0,79	M	CORTE 5
C			2,70			1,00	2,70	M	CORTE 5
SUPERIOR CIELO RASO							-		
A			3,51			1,00	3,51	M	CORTE 5
B			1,12			1,00	1,12	M	CORTE 5
C			3,51			1,00	3,51	M	CORTE 5
D			0,99			1,00	0,99	M	CORTE 5
VERTICALES							-		
V1			2,13			1,00	2,13	M	CORTE 5
V2			2,13			1,00	2,13	M	CORTE 5
V3			0,25			1,00	0,25	M	CORTE 5
V4			0,70			1,00	0,70	M	CORTE 5
DESPENSA 1 (CYAN)							-		
INFERIOR							-		
A			1,07			1,00	1,07	M	CORTE 5
B			2,36			1,00	2,36	M	CORTE 5
C			1,71			1,00	1,71	M	CORTE 5
D			1,80			1,00	1,80	M	CORTE 5
E			0,13			1,00	0,13	M	CORTE 5
F			0,15			1,00	0,15	M	CORTE 5
G			1,24			1,00	1,24	M	CORTE 5
H			1,30			1,00	1,30	M	CORTE 5
SUPERIOR							-		
B			0,18			1,00	0,18	M	CORTE 5
C			0,70			1,00	0,70	M	CORTE 5
D			2,49			1,00	2,49	M	CORTE 5
SUPERIOR CIELO RASO							-		
A			1,68			1,00	1,68	M	CORTE 5
B			2,35			1,00	2,35	M	CORTE 5
C			1,65			1,00	1,65	M	CORTE 5
D			2,35			1,00	2,35	M	CORTE 5
VERTICALES							-		
V1			0,20			1,00	0,20	M	CORTE 5
V2			2,07			1,00	2,07	M	CORTE 5
V3			0,19			1,00	0,19	M	CORTE 5
V4			1,75			1,00	1,75	M	CORTE 5
V5			1,76			1,00	1,76	M	CORTE 5
V6			1,95			1,00	1,95	M	CORTE 5
V7			0,09			1,00	0,09	M	CORTE 5
V8			0,14			1,00	0,14	M	CORTE 5
COCINA (MAGENTA)							-		
INFERIOR							-		
A			0,80			1,00	0,80	M	CORTE 5
SUPERIOR							-		
C			1,20			1,00	1,20	M	CORTE 5
SUPERIOR CIELO RASO							-		
A			2,28			1,00	2,28	M	CORTE 5
B			4,67			1,00	4,67	M	CORTE 5



































C1			2,28			1,00	2,28	M	CORTE 5
C2			2,30			1,00	2,30	M	CORTE 5
G			4,67			1,00	4,67	M	CORTE 5
H			1,90			1,00	1,90	M	CORTE 5
I			1,90			1,00	1,90	M	CORTE 5
VERTICALES							-		
V1			1,12			1,00	1,12	M	CORTE 5
V2			2,15			1,00	2,15	M	CORTE 5
V3			0,90			1,00	0,90	M	CORTE 5
V4			0,27			1,00	0,27	M	CORTE 5
V5			1,53			1,00	1,53	M	CORTE 5
V6			1,55			1,00	1,55	M	CORTE 5
V7			1,35			1,00	1,35	M	CORTE 5
V8			0,84			1,00	0,84	M	CORTE 5
V9			1,12			1,00	1,12	M	CORTE 5
PASILLO ENTRE DESPENSAS (CAFÉ)							-		
A			0,74			1,00	0,74	M	CORTE 5
B			1,90			1,00	1,90	M	CORTE 5
C			0,79			1,00	0,79	M	CORTE 5
D			1,78			1,00	1,78	M	CORTE 5
LAVANDERIA Y CUARTO DE ASEO (GRIS)							-		
A			3,24			1,00	3,24	M	CORTE 5
C			2,18			1,00	2,18	M	CORTE 5
D			2,33			1,00	2,33	M	CORTE 5
F			3,00			1,00	3,00	M	CORTE 5
G			1,66			1,00	1,66	M	CORTE 5
H			1,69			1,00	1,69	M	CORTE 5
I			1,66			1,00	1,66	M	CORTE 5
J			1,69			1,00	1,69	M	CORTE 5
LACTANCIA (VERDE OSCURO)							-		
SUPERIOR							-		
A-C			0,90			2,00	1,80	M	CORTE 5
B-D			2,26			2,00	4,52	M	CORTE 5
E-G			1,33			2,00	2,66	M	CORTE 5
F-H			2,39			2,00	4,78	M	CORTE 5
INFERIOR							-		
A			0,82			1,00	0,82	M	CORTE 5
B			1,00			1,00	1,00	M	CORTE 5
C			0,44			1,00	0,44	M	CORTE 5
D			1,21			1,00	1,21	M	CORTE 5
E			2,15			1,00	2,15	M	CORTE 5
F			2,41			1,00	2,41	M	CORTE 5
G			0,11			1,00	0,11	M	CORTE 5
H			0,14			1,00	0,14	M	CORTE 5
VERTICALES							-		
V1			2,16			1,00	2,16	M	CORTE 5
V2			1,06			1,00	1,06	M	CORTE 5
V3			0,97			1,00	0,97	M	CORTE 5
V4			1,16			1,00	1,16	M	CORTE 5
V5			1,00			1,00	1,00	M	CORTE 5
V6			0,09			1,00	0,09	M	CORTE 5
V7			1,19			1,00	1,19	M	CORTE 5
V8			1,19			1,00	1,19	M	CORTE 5
V9			0,29			1,00	0,29	M	CORTE 5
V10			0,70			1,00	0,70	M	CORTE 5
V11			1,04			1,00	1,04	M	CORTE 5
BAÑO CAMINADORES (MORADO)							-		
SUPERIOR							-		
A			1,00			1,00	1,00	M	CORTE 5
B			2,86			1,00	2,86	M	CORTE 5
C			0,89			1,00	0,89	M	CORTE 5
D			3,55			1,00	3,55	M	CORTE 5
E			1,28			1,00	1,28	M	CORTE 5
F			3,02			1,00	3,02	M	CORTE 5
G			1,17			1,00	1,17	M	CORTE 5
H			3,44			1,00	3,44	M	CORTE 5
INFERIOR							-		
A			0,92			1,00	0,92	M	CORTE 5
B			2,74			1,00	2,74	M	CORTE 5
C			1,81			1,00	1,81	M	CORTE 5
D			0,13			1,00	0,13	M	CORTE 5
E			0,60			1,00	0,60	M	CORTE 5
F			1,49			1,00	1,49	M	CORTE 5
G			0,61			1,00	0,61	M	CORTE 5
H			0,24			1,00	0,24	M	CORTE 5
I			0,60			1,00	0,60	M	CORTE 5
J			1,60			1,00	1,60	M	CORTE 5
K			1,22			1,00	1,22	M	CORTE 5
L			0,20			1,00	0,20	M	CORTE 5
M			0,35			1,00	0,35	M	CORTE 5
N			0,25			1,00	0,25	M	CORTE 5
VERTICALES							-		
V1			2,62			1,00	2,62	M	CORTE 5
V2			2,99			1,00	2,99	M	CORTE 5
V3			2,27			1,00	2,27	M	CORTE 5
V4			0,28			1,00	0,28	M	CORTE 5
V5			0,31			1,00	0,31	M	CORTE 5
V6			0,70			1,00	0,70	M	CORTE 5
V7			1,46			1,00	1,46	M	CORTE 5
V8-9-10			0,69			3,00	2,07	M	CORTE 5
V-11			1,00			1,00	1,00	M	CORTE 5
V12			1,21			1,00	1,21	M	CORTE 5
BAÑOS 1 (NARANJA)							-		
INFERIOR							-		
A			1,56			1,00	1,56	M	CORTE 5
B			1,02			1,00	1,02	M	CORTE 5
C-E			1,02			2,00	2,04	M	CORTE 5










D			0,19			1,00	0,19	M	CORTE 5
F			0,96			1,00	0,96	M	CORTE 5
G-I-K-M			1,04			4,00	4,16	M	CORTE 5
H			0,20			1,00	0,20	M	CORTE 5
J			0,94			1,00	0,94	M	CORTE 5
L			0,19			1,00	0,19	M	CORTE 5
N			1,04			1,00	1,04	M	CORTE 5
O			2,43			1,00	2,43	M	CORTE 5
P			0,90			1,00	0,90	M	CORTE 5
Q			0,58			1,00	0,58	M	CORTE 5
R-V			0,20			2,00	0,40	M	CORTE 5
S-U-W-Y-Z1			0,57			5,00	2,85	M	CORTE 5
T-X			1,05			2,00	2,10	M	CORTE 5
Z			0,21			1,00	0,21	M	CORTE 5
Z2			0,78			1,00	0,78	M	CORTE 5
SUPERIOR							-		
A			1,56			1,00	1,56	M	CORTE 5
B			4,48			1,00	4,48	M	CORTE 5
C			0,67			1,00	0,67	M	CORTE 5
D			4,26			1,00	4,26	M	CORTE 5
*E-F-G			0,20			3,00	0,60	M	CORTE 5
VERTICALES							-		
V1			2,17			1,00	2,17	M	CORTE 5
V2-V3-V4-V5			1,03			4,00	4,12	M	CORTE 5
V6-V7			1,01			2,00	2,02	M	CORTE 5
V8			2,18			1,00	2,18	M	CORTE 5
V9-V10			2,21			2,00	4,42	M	CORTE 5
V11			0,58			1,00	0,58	M	CORTE 5
V12-V13-V14-V15			0,57			4,00	2,28	M	CORTE 5
V16			0,56			1,00	0,56	M	CORTE 5
V17			2,19			1,00	2,19	M	CORTE 5
BAÑOS 2 (AMARILLO)							-		
SUPERIOR							-		
A			2,66			1,00	2,66	M	CORTE 5
B			3,96			1,00	3,96	M	CORTE 5
C			2,68			1,00	2,68	M	CORTE 5
D			3,99			1,00	3,99	M	CORTE 5
*E-F-G			0,19			3,00	0,57	M	CORTE 5
INFERIOR							-		
A			2,10			1,00	2,10	M	CORTE 5
B			0,93			1,00	0,93	M	CORTE 5
C-E-G-I-K-M			1,04			6,00	6,24	M	CORTE 5
D-H-L			0,18			3,00	0,54	M	CORTE 5
F-J			0,84			2,00	1,68	M	CORTE 5
N			0,90			1,00	0,90	M	CORTE 5
O			1,73			1,00	1,73	M	CORTE 5
P			0,73			1,00	0,73	M	CORTE 5
Q			1,84			1,00	1,84	M	CORTE 5
R-T-V-X			0,58			4,00	2,32	M	CORTE 5
S-W			0,25			2,00	0,50	M	CORTE 5
U			1,48			1,00	1,48	M	CORTE 5
Y			0,33			1,00	0,33	M	CORTE 5
Z			0,63			1,00	0,63	M	CORTE 5
Z1			0,62			1,00	0,62	M	CORTE 5
VERTICALES							-		
V1			2,15			1,00	2,15	M	CORTE 5
V2-V3-V4-V5-V6-V7			1,03			6,00	6,18	M	CORTE 5
V8			2,18			1,00	2,18	M	CORTE 5
V9-V12			0,48			2,00	0,96	M	CORTE 5
V10			0,34			1,00	0,34	M	CORTE 5
V11			0,36			1,00	0,36	M	CORTE 5
V13			2,16			1,00	2,16	M	CORTE 5
LAVAMANOS PASILLO (MORADO)							-		
INFERIOR							-		
A			1,48			1,00	1,48	M	CORTE 5
B-C			0,54			2,00	1,08	M	CORTE 5
VERTICALES							-	M	CORTE 5
V1-V2			1,38			2,00	2,76	M	CORTE 5
BAÑO HOMBRES (ROSADO)							-		
INFERIOR							-		
A			1,07			1,00	1,07	M	CORTE 5
B			1,00			1,00	1,00	M	CORTE 5
C			0,52			1,00	0,52	M	CORTE 5
D			1,02			1,00	1,02	M	CORTE 5
VERTICALES							-		
V1-V2-V3			1,59			3,00	4,76	M	CORTE 5
BAÑO MUJERES (VERDE)							-		
SUPERIOR							-		
A			0,66			1,00	0,66	M	CORTE 5
INFERIOR							-		
A			1,88			1,00	1,88	M	CORTE 5
B			1,14			1,00	1,14	M	CORTE 5
C			1,20			1,00	1,20	M	CORTE 5
D			1,15			1,00	1,15	M	CORTE 5
VERTICALES							-		
V1-V3			2,13			2,00	4,26	M	CORTE 5
V2			2,35			1,00	2,35	M	CORTE 5
LAVAMANOS COMEDOR (AZUL OSCURO)							-		
INFERIOR							-		
A-I			0,19			2,00	0,38	M	CORTE 5
B			0,54			1,00	0,54	M	CORTE 5
C-G			1,00			2,00	2,00	M	CORTE 5
D-F-H			0,59			3,00	1,77	M	CORTE 5
E			0,24			1,00	0,24	M	CORTE 5
VERTICALES							-		
V1-V4			1,39			2,00	2,78	M	CORTE 5
V2-V3			0,40			2,00	0,80	M	CORTE 5

							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	360,22	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M
PRESENTE ACTA	**360,22**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
360,22	0,00	**360,22**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**


CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**7.3.12**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO**	**UNIDAD**	**M**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA













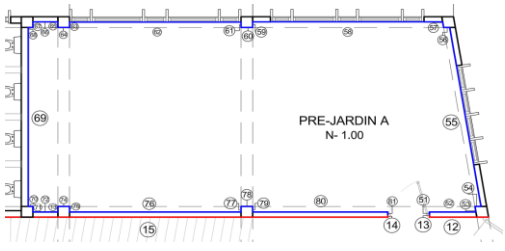

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 4									
PASILLO CENTRAL (ROJO)							-		
1			0,70				0,70	M	CORTE 4
2			0,27				0,27	M	CORTE 4
3			0,54				0,54	M	CORTE 4
4			4,42				4,42	M	CORTE 4
5			0,55				0,55	M	CORTE 4
6			0,12				0,12	M	CORTE 4
7			4,84				4,84	M	CORTE 4
8			9,20				9,20	M	CORTE 4
9			0,03				0,03	M	CORTE 4
10			0,03				0,03	M	CORTE 4
11			1,10				1,10	M	CORTE 4
12			1,18				1,18	M	CORTE 4
13			0,03				0,03	M	CORTE 4
14			0,03				0,03	M	CORTE 4
15			9,24				9,24	M	CORTE 4
16			0,03				0,03	M	CORTE 4
17			0,06				0,06	M	CORTE 4
18			0,80				0,80	M	CORTE 4
19			0,19				0,19	M	CORTE 4
PRE JARDIN B (VERDE)							-		
20			0,03				0,03	M	CORTE 4
21			2,44				2,44	M	CORTE 4
22			0,13				0,13	M	CORTE 4
23			0,28				0,28	M	CORTE 4
24			0,14				0,14	M	CORTE 4
25			3,73				3,73	M	CORTE 4
26			0,13				0,13	M	CORTE 4
27			0,28				0,28	M	CORTE 4
28			0,13				0,13	M	CORTE 4
29			2,10				2,10	M	CORTE 4
30			0,13				0,13	M	CORTE 4
31			0,13				0,13	M	CORTE 4
32			4,45				4,45	M	CORTE 4
33			0,17				0,17	M	CORTE 4
34			0,12				0,12	M	CORTE 4
35			2,04				2,04	M	CORTE 4
36			0,14				0,14	M	CORTE 4
37			0,30				0,30	M	CORTE 4
38			0,14				0,14	M	CORTE 4
39			3,75				3,75	M	CORTE 4
40			0,13				0,13	M	CORTE 4
41			0,27				0,27	M	CORTE 4
42			0,12				0,12	M	CORTE 4
43			1,81				1,81	M	CORTE 4
44			0,23				0,23	M	CORTE 4
45			0,15				0,15	M	CORTE 4
46			5,13				5,13	M	CORTE 4
47			0,15				0,15	M	CORTE 4
48			0,09				0,09	M	CORTE 4
49			0,98				0,98	M	CORTE 4
50			0,03				0,03	M	CORTE 4
PRE JARDIN A (AZUL)							-		
51			0,03				0,03	M	CORTE 4
52			1,04				1,04	M	CORTE 4
53			0,14				0,14	M	CORTE 4
54			0,14				0,14	M	CORTE 4
55			4,12				4,12	M	CORTE 4
56			0,14				0,14	M	CORTE 4
57			0,14				0,14	M	CORTE 4
58			4,30				4,30	M	CORTE 4
59			0,12				0,12	M	CORTE 4
60			0,27				0,27	M	CORTE 4
61			0,12				0,12	M	CORTE 4
62			3,72				3,72	M	CORTE 4
63			0,12				0,12	M	CORTE 4
64			0,27				0,27	M	CORTE 4
65			0,12				0,12	M	CORTE 4
66			0,58				0,58	M	CORTE 4
67			0,16				0,16	M	CORTE 4
68			0,12				0,12	M	CORTE 4
69			4,21				4,21	M	CORTE 4
70			0,10				0,10	M	CORTE 4



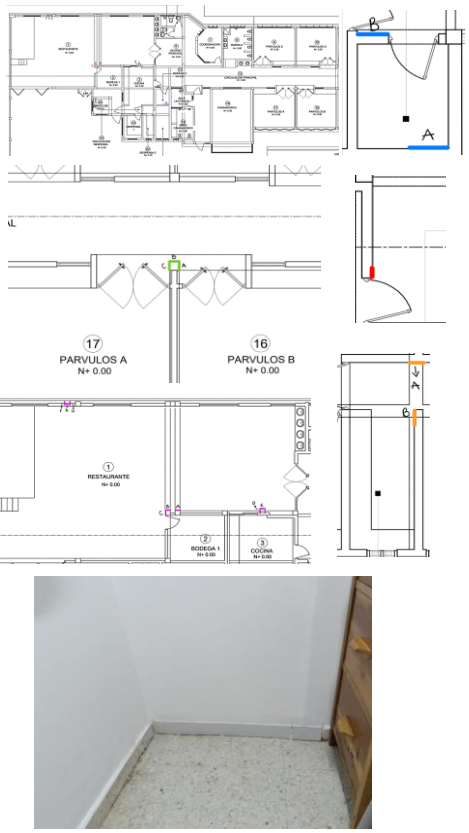


71			0,16				0,16	M	CORTE 4
72			0,60				0,60	M	CORTE 4
73			0,12				0,12	M	CORTE 4
74			0,27				0,27	M	CORTE 4
75			0,12				0,12	M	CORTE 4
76			3,73				3,73	M	CORTE 4
77			0,12				0,12	M	CORTE 4
78			0,27				0,27	M	CORTE 4
79			0,12				0,12	M	CORTE 4
80			2,43				2,43	M	CORTE 4
81			0,03				0,03	M	CORTE 4
							-		
							-		
							-		
ACTA PARCIAL No. 5									
COLUMNA DE PARVULOS (VERDE)							-		
A			0,24			1,00	0,24	M	CORTE 5
B			0,17			1,00	0,17	M	CORTE 5
C			0,16			1,00	0,16	M	CORTE 5
CUARTO ELECTRICO (AZUL)							-		
A			0,80			1,00	0,80	M	CORTE 5
B			0,38			1,00	0,38	M	CORTE 5
ZONA DE VIGILANCIA (ROJO)			0,12			1,00	0,12	M	CORTE 5
COMEDOR MAGENTA							-		
A			0,29			1,00	0,29	M	CORTE 5
B			0,25			1,00	0,25	M	CORTE 5
C			0,27			1,00	0,27	M	CORTE 5
D			0,27			1,00	0,27	M	CORTE 5
E			0,11			1,00	0,11	M	CORTE 5
F			0,11			1,00	0,11	M	CORTE 5
G			0,27			1,00	0,27	M	CORTE 5
H			0,11			1,00	0,11	M	CORTE 5
DESPENSA (NARANJA)							-		
A			0,15			1,00	0,15	M	CORTE 5
B			0,27			1,00	0,27	M	CORTE 5
							-		
							-		
							-	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**


CAPITULO	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**8,1**	**ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

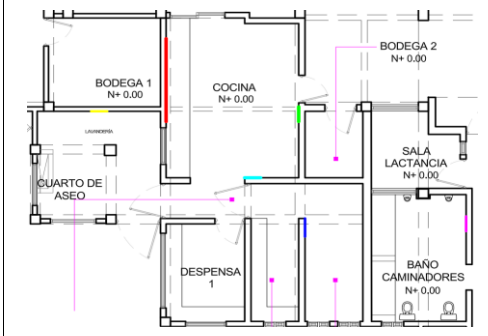









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
COCINA							-		
AREA SOBRE MESÓN A (ROJO)		0,36	0,39			1,00	0,14	M2	CORTE 5
AREA SOBRE MESÓN B (ROJO)		0,20	1,98			1,00	0,39	M2	CORTE 5
							-		
AREA DETRÁS DE LA ESTUFA (VERDE)		0,20	0,40			1,00	0,08	M2	CORTE 5
							-		
AREA MURO LATERAL ESTUFA (CYAN)		0,20	0,40			1,00	0,08	M2	CORTE 5
DESCUENTO		0,07	0,09			- 1,00	- 0,01	M2	CORTE 5
DESPENSA 3 (AZUL)		0,20	0,50			1,00	0,10	M2	CORTE 5
BAÑO CAMINADORES (MAGENTA)		0,20	0,40			1,00	0,08	M2	CORTE 5
LAVANDERIA (AMARILLO)							-		
AREA 2		0,34	0,40			1,00	0,14	M2	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	1,00	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**1,00**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**9.1.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
REJAS PORTON FACHADA LATERAL		1,06		0,93		2,00	1,97	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	1,97	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**1,97**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,97	0,00	**1,97**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**9.1.6**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
PORTON COMEDOR (ROJO)		3,98		2,08			8,26	M2	CORTE 5
PORTON FACHADA LATERAL (AZUL)		2,30		1,97			4,53	M2	CORTE 5
PUERTA PASILLO PREJARDIN Y PARVULOS (VERDE)		0,88		2,03			1,78	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**9.3.3**	**REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
PUERTAS									
BAÑO MUJERES (VERDE)		0,55		1,99		1,00	1,09	M2	CORTE 5
BAÑO HOMBRES (VERDE)		0,68		1,99		1,00	1,35	M2	CORTE 5
COMEDOR (ROJO)		0,87		1,98		2,00	3,45	M2	CORTE 5
COCINA (ROJO)		0,87		1,99		1,00	1,73	M2	CORTE 5
CUARTO ELECTRICO (ROJO)		0,75		1,99		1,00	1,49	M2	CORTE 5
CAMINADORES (ROJO)		0,79		1,98		1,00	1,56	M2	CORTE 5
LACTANCIA (ROJO)		0,69		1,99		1,00	1,37	M2	CORTE 5
PARVULOS A (ROJO)		0,84		1,95		2,00	3,28	M2	CORTE 5
PARVULOS B (ROJO)		0,87		1,99		2,00	3,46	M2	CORTE 5
PARVULOS C (ROJO)		0,87		1,99		2,00	3,46	M2	CORTE 5
PARVULOS D (ROJO)		0,87		1,99		2,00	3,46	M2	CORTE 5
PRE JARDIN A (ROJO)		0,91		2,00		1,00	1,82	M2	CORTE 5
PRE JARDIN B (ROJO)		0,92		2,00		1,00	1,84	M2	CORTE 5
BAÑO 1 (ROJO)		0,83		1,95		1,00	1,62	M2	CORTE 5
REJAS (AZUL)							-		
BAÑOS 2		1,99		0,94		1,00	1,87	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	32,85	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**32,85**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
32,85	0,00	**32,85**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**11,23**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL No. 5									
BAÑO PASILLO PRINCIPAL						1,00	1,00	UN	CORTE 5
BAÑOS 1						1,00	1,00	UN	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**2,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2026

CAPITULO	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**14.1.1**	**CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA


















LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL No. 3									
EN CIELO RASO DE AUDITORIO (Rojo)		8,38	9,20			1,00	77,10	M2	CORTE 3
EN CIELO RASO DE AUDITORIO (Rojo)		5,60	5,87			1,00	32,87	M2	CORTE 3
EN CIELO RASO DE RECEPCIÓN (Amarillo)		5,60	2,47			1,00	13,83	M2	CORTE 3
EN CIELO RASO DE MEZANINE (Azul)		2,20	1,34			1,00	2,95	M2	CORTE 3
EN CIELO RASO DE BAÑOS (Verde)		2,34	4,27			1,00	9,99	M2	CORTE 3
ACTA PARCIAL No. 4									
BAÑOS 2 (AZUL)		4,02	2,70			1,00	10,85	M2	CORTE 4
BAÑOS CAMINADORES (ROJO)		3,46	1,33			1,00	4,60	M2	CORTE 4
		3,56	1,04			1,00	3,70	M2	CORTE 4
LACTANCIA - CAMINADORES (CYAN)		2,30	0,91			1,00	2,09	M2	CORTE 4
		2,30	1,34			1,00	3,08	M2	CORTE 4
LAVANDERIA (AMARILLO)		3,40	0,82			1,00	2,79	M2	CORTE 4
LAVANDERIA (VERDE)		2,02	1,20			1,00	2,42	M2	CORTE 4









ACTA PARCIAL No. 5									
DEPENSA 3 (AMARILLO)		1,49	5,79			1,00	8,63	M2	CORTE 5
DESPENSA 2 (VERDE)		1,10	3,40			1,00	3,74	M2	CORTE 5
DESPENSA 1 (ROJO)		1,71	2,43			1,00	4,16	M2	CORTE 5
COCINA 1 (CYAN)		1,90	2,32			1,00	4,41	M2	CORTE 5
COCINA 2 (CYAN)		2,27	4,78			1,00	10,85	M2	CORTE 5
PASILLO ENTRE DESPENSAS (NARANJA)		0,79	1,90			1,00	1,50	M2	CORTE 5
ZONA DE ASEO (MAGENTA)		1,69	1,70			1,00	2,87	M2	CORTE 5
CUARTO ELECTRICO (GRIS)		1,34	2,20			1,00	2,95	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**14.2.6**	**MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
DRYWALL EN COCINA		1,22		0,76		1,00	0,93	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	0,93	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**0,93**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0,93	0,00	**0,93**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**15.1.3**	**CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
PRE JARDIN A						1,00	1,00	UN	CORTE 5
BAÑOS 1						1,00	1,00	UN	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	UN
PRESENTE ACTA	**2,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**15.2.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
LAVANDERIA (ROJO)							-		
VENTANA 1		0,55		0,46		2,00	0,50	M2	CORTE 5
VENTANA 2		0,56		0,46		1,00	0,25	M2	CORTE 5
		0,55		0,46		1,00	0,25	M2	CORTE 5
BAÑO CAMINADORES (AZUL)							-		
VIDRIO T1		0,42		0,99		2,00	0,83	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,42		0,48		2,00	0,40	M2	CORTE 5
AULA CAMINADORES (CYAN)							-		
VIDRIO T1		0,41		1,17		1,00	0,48	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,35		0,45		1,00	0,16	M2	CORTE 5
PARVULOS A (VERDE)							-		
VIDRIO T1		0,43		0,30		8,00	1,03	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,43		0,62		16,00	4,27	M2	CORTE 5
PARVULOS B (NARANJA)							-		
VIDRIO T1		0,43		0,30		8,00	1,03	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,43		0,62		16,00	4,27	M2	CORTE 5
PUERTA PASILLO A EXTERIOR (AZUL OSCURO)		0,85		0,15		1,00	0,13	M2	CORTE 5
PRE JARDIN B (VERDEOSCURO)							-		
FACHADA POSTERIOR VIDRIO T1		0,48		1,28		2,00	1,23	M2	CORTE 5
FACHADA POSTERIOR VIDRIO T2		0,79		1,28		3,00	3,03	M2	CORTE 5
FACHADA LATERAL		0,49		1,28		4,00	2,51	M2	CORTE 5
PORTON FACHADA LATERAL (MORADO)							-		
VIDRIO T1		0,75		0,17		3,00	0,38	M2	CORTE 5
							-		
PRE JARDIN A (AZUL REY)							-		
FACHADA LATERAL		0,48		1,27		5,00	3,05	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL VIDRIO TIPO 1		0,42		1,27		2,00	1,07	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL VIDRIO TIPO 2		0,94		1,27		2,00	2,39	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL VIDRIO TIPO 3		0,46		1,27		1,00	0,58	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL VIDRIO TIPO 4		0,42		1,29		2,00	1,08	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL VIDRIO TIPO 5		1,00		1,29		2,00	2,58	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL VIDRIO TIPO 6		0,52		1,29		1,00	0,67	M2	CORTE 5
BAÑOS 1 (AMARILLO)							-		
VIDRIO T1		0,46		0,10		9,00	0,41	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,50		0,70		3,00	1,05	M2	CORTE 5
PARVULOS D (VERDE MENTA)							-		
VIDRIO T1		0,41		1,26		2,00	1,03	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,99		1,26		2,00	2,49	M2	CORTE 5
VIDRIO T3		0,45		1,26		1,00	0,57	M2	CORTE 5
PARVULOS C (LILA)							-		
VIDRIO T1		0,39		1,27		1,00	0,50	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,99		1,27		2,00	2,51	M2	CORTE 5
VIDRIO T3		0,44		1,27		2,00	1,12	M2	CORTE 5
BAÑOS 2 (VERDE LIMON)							-		
VIDRIO T1		0,36		0,10		12,00	0,43	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,40		0,50		4,00	0,80	M2	CORTE 5
COORDINACIÓN (MAGENTA)							-		
VIDRIO T1		0,40		1,27		1,00	0,51	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,44		1,27		1,00	0,56	M2	CORTE 5
ACCESO PRINCIPAL (CAFÉ)							-		
VIDRIO T1		0,74		0,90		1,00	0,67	M2	CORTE 5
VIDRIO T2		0,28		0,90		1,00	0,25	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	45,07	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**45,07**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
45,07	0,00	**45,07**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**15.2.7**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA
















LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
AULA CAMINADORES (CYAN)							-		
PELICULA T1	50%	0,41		1,17		1,00	0,24	M2	CORTE 5
PELICULA T2	50%	0,35		0,45		1,00	0,08	M2	CORTE 5
PELICULA T3	50%	0,88		1,14		1,00	0,50	M2	CORTE 5
PELICULA T4	50%	1,00		1,11		4,00	2,22	M2	CORTE 5
PELICULA T5	50%	0,90		1,14		1,00	0,51	M2	CORTE 5
PELICULA PUERTA	50%	0,47		0,78		1,00	0,18	M2	CORTE 5
PELICULA T6	50%	2,00		1,13		1,00	1,13	M2	CORTE 5
PELICULA T7	50%	0,73		1,12		1,00	0,41	M2	CORTE 5
LACTANCIA (ROJO)							-		
PELICULA T1	50%	0,48		0,72		1,00	0,17	M2	CORTE 5
PELICULA PUERTA	50%	0,37		0,78		1,00	0,14	M2	CORTE 5
PARVULOS A (VERDE CLARO)							-		
PELICULA T1	50%	0,43		0,30		8,00	0,52	M2	CORTE 5
PELICULA T2	50%	0,43		0,62		16,00	2,13	M2	CORTE 5
PELICULA T3	50%	0,93		1,05		1,00	0,49	M2	CORTE 5
PELICULA PUERTA	50%	0,47		0,78		2,00	0,37	M2	CORTE 5
PARVULOS B (NARANJA)							-		
PELICULA T1	50%	0,43		0,30		8,00	0,52	M2	CORTE 5
PELICULA T2	50%	0,43		0,62		16,00	2,13	M2	CORTE 5
PELICULA T3	50%	0,92		1,07		1,00	0,49	M2	CORTE 5
PELICULA PUERTA	50%	0,47		0,78		2,00	0,37	M2	CORTE 5
PRE JARDIN B (VERDE OSCURO)									
FACHADA POSTERIOR PELICULA T1	50%	0,48		1,28		2,00	0,61	M2	CORTE 5
FACHADA POSTERIOR PELICULA T2	50%	0,79		1,28		3,00	1,52	M2	CORTE 5
FACHADA LATERAL	50%	0,49		1,28		4,00	1,25	M2	CORTE 5
PELICULA PUERTA	50%	0,44		0,78		1,00	0,17	M2	CORTE 5
PORTON FACHADA LATERAL (MORADO)							-		
PELICULA T1	50%	0,75		0,17		3,00	0,19	M2	CORTE 5
PELICULA T2	50%	0,98		0,84		2,00	0,82	M2	CORTE 5
PRE JARDIN A (AZUL REY)							-		
FACHADA LATERAL	50%	0,48		1,27		5,00	1,52	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL PELICULA TIPO 1	50%	0,42		1,27		2,00	0,53	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL PELICULA TIPO 2	50%	0,94		1,27		2,00	1,19	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL PELICULA TIPO 3	50%	0,46		1,27		1,00	0,29	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL PELICULA TIPO 4	50%	0,42		1,29		2,00	0,54	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL PELICULA TIPO 5	50%	1,00		1,29		2,00	1,29	M2	CORTE 5
FACHADA FRONTAL PELICULA TIPO 6	50%	0,52		1,29		1,00	0,34	M2	CORTE 5
PELICULA PUERTA	50%	0,45		0,78		1,00	0,18	M2	CORTE 5
BAÑOS 1 (AMARILLO)							-		
PELICULA T1	50%	0,46		0,10		9,00	0,21	M2	CORTE 5
PELICULA T2	50%	0,50		0,70		3,00	0,53	M2	CORTE 5
PELICULA PUERTA	50%	0,44		0,78		1,00	0,17	M2	CORTE 5
PARVULOS D (VERDE MENTA)							-		
PELICULA T1	50%	0,41		1,26		2,00	0,52	M2	CORTE 5
PELICULA T2	50%	0,99		1,26		2,00	1,25	M2	CORTE 5
PELICULA T3	50%	0,45		1,26		1,00	0,28	M2	CORTE 5
PELICULA T4	50%	0,92		1,02		1,00	0,47	M2	CORTE 5
PELICULA PUERTA	50%	0,47		0,78		2,00	0,37	M2	CORTE 5
PARVULOS C (LILA)							-		
PELICULA T1	50%	0,39		1,27		1,00	0,25	M2	CORTE 5
PELICULA T2	50%	0,99		1,27		2,00	1,26	M2	CORTE 5
PELICULA T3	50%	0,44		1,27		2,00	0,56	M2	CORTE 5
PELICULA T4	50%	0,92		1,03		1,00	0,47	M2	CORTE 5
PELICULA PUERTA	50%	0,47		0,78		2,00	0,37	M2	CORTE 5
BAÑOS 2 (VERDE LIMON)							-		
PELICULA T1	50%	0,36		0,10		12,00	0,22	M2	CORTE 5
PELICULA T2	50%	0,40		0,50		4,00	0,40	M2	CORTE 5
COORDINACIÓN (MAGENTA)							-		
PELICULA T1	50%	0,40		1,27		1,00	0,25	M2	CORTE 5
PELICULA T2	50%	0,44		1,27		1,00	0,28	M2	CORTE 5
PELICULA T3	50%	0,43		1,28		2,00	0,55	M2	CORTE 5
ACCESO PRINCIPAL (CAFÉ)							-		
PELICULA T1	50%	0,74		0,90		1,00	0,33	M2	CORTE 5
PELICULA T2	50%	0,28		0,90		1,00	0,13	M2	CORTE 5
COMEDOR (ROSADO)							-		
PELICULA T1	50%	1,30		0,40		1,00	0,26	M2	CORTE 5
PELICULA T2	50%	0,32		1,08		7,00	1,21	M2	CORTE 5
PELICULA T3	50%	0,72		1,14		1,00	0,41	M2	CORTE 5
PELICULA T4	50%	1,10		1,14		3,00	1,88	M2	CORTE 5
PORTON COMEDOR (ROSADO)	50%	0,83		0,87		2,00	0,72	M2	CORTE 5
ACCESO COMEDOR (GRIS)							-		
PELICULA T1	50%	0,58		0,77		1,00	0,22	M2	CORTE 5
PELICULA T2	50%	0,57		0,76		1,00	0,22	M2	CORTE 5
PELICULA T3	50%	0,58		0,98		1,00	0,28	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	37,11	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2	
PRESENTE ACTA	**37,11**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
37,11	0,00	**37,11**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO		**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**16,40**	**MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IJIADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

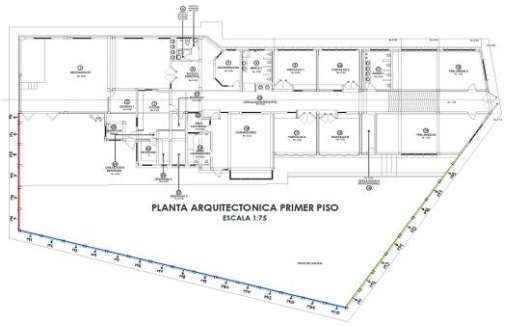





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
CERRAMIENTO FACHADA LATERAL DERECHA							-		
MODULO 1		0,89		1,05		1,00	0,93	M2	CORTE 5
MODULO 2		2,04		1,05		1,00	2,14	M2	CORTE 5
MODULO 3		2,17		1,05		1,00	2,28	M2	CORTE 5
MODULO 4		1,92		1,05		1,00	2,02	M2	CORTE 5
MODULO 5		2,04		1,05		1,00	2,14	M2	CORTE 5
MODULO 6		2,24		1,05		1,00	2,35	M2	CORTE 5
CERRAMIENTO FACHADA FRONTAL							-		
MODULO 1		2,16		1,05		1,00	2,27	M2	CORTE 5
MODULO 2		2,16		1,05		1,00	2,27	M2	CORTE 5
MODULO 3		2,16		1,05		1,00	2,27	M2	CORTE 5
MODULO 4		2,29		1,05		1,00	2,40	M2	CORTE 5
MODULO 5		2,16		1,05		1,00	2,27	M2	CORTE 5
MODULO 6		2,29		1,05		1,00	2,40	M2	CORTE 5
MODULO 7		2,16		1,05		1,00	2,27	M2	CORTE 5
MODULO 8		2,16		1,05		1,00	2,27	M2	CORTE 5
MODULO 9		2,30		1,05		1,00	2,42	M2	CORTE 5
MODULO 10		2,17		1,05		1,00	2,28	M2	CORTE 5
MODULO 11		2,27		1,05		1,00	2,38	M2	CORTE 5
MODULO 12		2,16		1,05		1,00	2,27	M2	CORTE 5
MODULO 13		2,16		1,05		1,00	2,27	M2	CORTE 5
MODULO 14		2,25		1,05		1,00	2,36	M2	CORTE 5
MODULO 15		2,25		1,05		1,00	2,36	M2	CORTE 5
CERRAMIENTO FACHADA LATERAL IZQUIERDA							-		
MODULO 1		2,12		1,05		1,00	2,23	M2	CORTE 5
MODULO 2		2,15		1,05		1,00	2,26	M2	CORTE 5
MODULO 3		2,16		1,05		1,00	2,27	M2	CORTE 5
MODULO 4		2,16		1,05		1,00	2,27	M2	CORTE 5
MODULO 5		2,16		1,05		1,00	2,27	M2	CORTE 5
MODULO 6		2,15		1,05		1,00	2,26	M2	CORTE 5
MODULO 7		2,16		1,05		1,00	2,27	M2	CORTE 5
MODULO 8		1,07		1,05		1,00	1,12	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	63,57	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**63,57**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
63,57	0,00	**63,57**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA

Version: 01


Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**19,10**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
PARVULOS C-D, BAÑOS 1 (VERDE OSCURO)		12,90	7,33			1,00	94,56	M2	CORTE 5
PARVULOS A-B (CYAN)		12,90	5,00			1,00	64,50	M2	CORTE 5
CAMINADORES, LACTANCIA, BAÑO CAMINADORES (AZUL OSCURO)		8,74	13,10			1,00	114,49	M2	CORTE 5
DESPENSA COCINA NARANJA		6,38	6,12			1,00	39,05	M2	CORTE 5
CIRCULACIÓN TRANSLUCIDA (AGUAMARINA)		7,45	1,45			1,00	10,80	M2	CORTE 5
BAÑO, COORDINACIÓN (LIMA)		7,60	5,00			1,00	38,00	M2	CORTE 5
ENTRADA TRIANGULO (MORADO)		1,24	1,05			1,00	1,30	M2	CORTE 5
CUARTO DE ASEO (ROSA)		1,20	3,65			1,00	4,38	M2	CORTE 5
		0,82	2,76			1,00	2,26	M2	CORTE 5
RESTAURANTE (ROJO)		8,50	18,70			1,00	158,95	M2	CORTE 5
PREJARDÍN A + PASILLO (GRIS)		7,00	8,94			1,00	62,58	M2	CORTE 5
PREJARDÍN B (AMARILLO)		5,00	5,92			1,00	29,60	M2	CORTE 5
		5,00	1,30			1,00	6,50	M2	CORTE 5
ZONA DE ASEO (LILA)		2,13	2,30			1,00	4,90	M2	CORTE 5
ZONAS EXTERIORES (1m x perímetro de cerramiento) (VERDE)		1,00	69,24			1,00	69,24	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**21.1.10**	**PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
ACTA PARCIAL No. 5									
VIGA CANAL ENTRADA (VERDE)							-		
ZONA 1			1,70			3,00	5,10	M	CORTE 5
ZONA 2			1,35			3,00	4,05	M	CORTE 5
COMEDOR							-		
MARCO PUERTA			8,13				8,13	M	CORTE 5
MURO MEDIA ALTURA			1,14				1,14	M	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	18,42 M
MENOS ACTAS ANTERIORES	- M
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	- M
PRESENTE ACTA	**18,42** M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
18,42	0,00	**18,42**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2026

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.1.4**	**ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA




ESTUCO










LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 3									
MURO EXTERIOR AULA CAMINADORES-PARVULOS A		7,87	2,30			1,00	18,10	M2	CORTE 3
		0,05	1,11			2,00	0,11	M2	CORTE 3
		0,05	0,74			2,00	0,07	M2	CORTE 3
		0,05	1,99			2,00	0,20	M2	CORTE 3
		0,05	1,13			2,00	0,11	M2	CORTE 3
		0,05	1,00			2,00	0,10	M2	CORTE 3
		0,05	1,13			2,00	0,11	M2	CORTE 3
DESCUENTO DE VENTANAS		0,74	1,11			- 1,00	- 0,82	M2	CORTE 3
		1,99	1,13			- 1,00	- 2,25	M2	CORTE 3
		1,00	1,13			- 1,00	- 1,13	M2	CORTE 3
MURO EXTERIOR AULA PARVULO C- D		4,56	3,26			1,00	14,87	M2	CORTE 3
		0,05	1,00			2,00	0,10	M2	CORTE 3
		0,05	1,11			2,00	0,11	M2	CORTE 3
		0,05	1,00			2,00	0,10	M2	CORTE 3
		0,05	1,07			2,00	0,11	M2	CORTE 3
VOLADIZOS DE ENTRADA A AULAS		0,14	2,09			4,00	1,17	M2	CORTE 3
		0,14	2,09			1,00	0,29	M2	CORTE 3
		1,80	0,87			1,00	1,57	M2	CORTE 3
		0,87	1,95			2,00	3,39	M2	CORTE 3
		2,09	1,11			1,00	2,32	M2	CORTE 3
		0,85	0,20			1,00	0,17	M2	CORTE 3
		0,36	2,09			1,00	0,75	M2	CORTE 3
		2,30	0,13			1,00	0,30	M2	CORTE 3
		1,80	0,15			1,00	0,27	M2	CORTE 3
		0,88	1,94			2,00	3,41	M2	CORTE 3
DESCUENTO DE VENTANAS		1,00	1,11			- 1,00	- 1,11	M2	CORTE 3
		1,00	1,07			- 1,00	- 1,07	M2	CORTE 3
VOLADIZO DE ENTRADA AULA PARVULO A - B		0,13	2,17			2,00	0,56	M2	CORTE 3
		0,13	2,11			2,00	0,55	M2	CORTE 3
		0,29	1,94			1,00	0,56	M2	CORTE 3
		0,87	1,94			2,00	3,38	M2	CORTE 3
		0,69	1,94			2,00	2,68	M2	CORTE 3
		3,88	0,16			1,00	0,62	M2	CORTE 3
		0,18	4,15			1,00	0,75	M2	CORTE 3
		0,85	1,80			2,00	3,06	M2	CORTE 3
		0,30	0,16			1,00	0,05	M2	CORTE 3
AULA PARVULOS C		3,11	1,57			1,00	4,88	M2	CORTE 3
		0,04	2,00			1,00	0,08	M2	CORTE 3
		0,70	2,00			1,00	1,40	M2	CORTE 3
		0,16	2,00			1,00	0,32	M2	CORTE 3
VIGA		0,08	3,97			2,00	0,64	M2	CORTE 3
VIGA		0,24	3,97			1,00	0,95	M2	CORTE 3
VIGA		0,07	1,38			2,00	0,19	M2	CORTE 3
VIGA		0,06	1,38			2,00	0,17	M2	CORTE 3
		0,05	1,38			8,00	0,55	M2	CORTE 3
		0,06	1,38			4,00	0,33	M2	CORTE 3
		4,20	0,44			1,00	1,85	M2	CORTE 3
		0,32	2,52			1,00	0,81	M2	CORTE 3
		0,05	2,52			1,00	0,13	M2	CORTE 3
		3,65	2,46			1,00	8,98	M2	CORTE 3
		0,65	2,00			1,00	1,30	M2	CORTE 3
						0,85	0,85	M2	CORTE 3
						0,85	0,85	M2	CORTE 3
		2,27	2,46			1,00	5,58	M2	CORTE 3

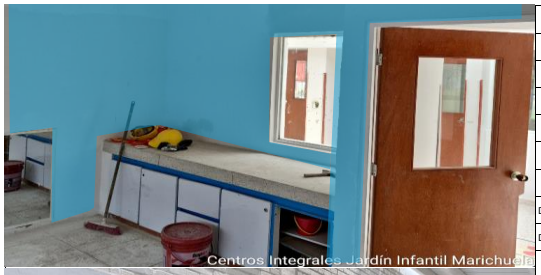












			0,06	1,00			2,00	0,12	M2	CORTE 3
			0,06	1,11			2,00	0,13	M2	CORTE 3
			0,59	1,35			1,00	0,80	M2	CORTE 3
			0,15	2,17			1,00	0,33	M2	CORTE 3
			0,15	1,79			1,00	0,27	M2	CORTE 3
			0,60	2,00			1,00	1,20	M2	CORTE 3
			2,06	1,12			1,00	2,31	M2	CORTE 3
DESCUENTO ESPEJO			0,45	0,93			- 1,00	- 0,42	M2	CORTE 3
DESCUENTO VENTANA			1,00	1,11			- 1,00	- 1,11	M2	CORTE 3
ACTA PARCIAL N°4										
ESTUCO PARVULOS B			3,95	2,14			1,00	8,45	M2	CORTE 4
			0,50	1,30			1,00	0,65	M2	CORTE 4
			4,45	0,11			2,00	0,98	M2	CORTE 4
			4,45	0,26			1,00	1,16	M2	CORTE 4
			4,45	1,28			0,50	2,85	M2	CORTE 4
COLUMNA VENTANA EXTERIOR			0,13	2,14			2,00	0,56	M2	CORTE 4
COLUMNA VENTANA INTERIOR			0,13	1,30			2,00	0,34	M2	CORTE 4
DESCUENTO DE VENTANA INTERIOR			1,00	1,13			- 1,00	- 1,13	M2	CORTE 4
VENTANA INTERIOR			0,04	1,00			2,00	0,08	M2	CORTE 4
			0,40	1,13			2,00	0,90	M2	CORTE 4
MODULO ENTRADA			0,60	1,36			1,00	0,82	M2	CORTE 4
			0,14	2,18			1,00	0,31	M2	CORTE 4
			0,09	2,18			1,00	0,20	M2	CORTE 4
			1,80	0,16			1,00	0,29	M2	CORTE 4
VIGA ENTRADA			4,19	0,24			1,00	1,01	M2	CORTE 4
			4,19	0,13			1,00	0,54	M2	CORTE 4
			1,80	0,16			1,00	0,29	M2	CORTE 4
VIGA ENTRADA			4,45	0,26			1,00	1,16	M2	CORTE 4
			4,45	0,07			1,00	0,31	M2	CORTE 4
			3,97	0,07			1,00	0,28	M2	CORTE 4
TABLERO			3,10	1,49			1,00	4,62	M2	CORTE 4
COLUMNA VENTANA EXTERIOR			0,13	2,14			1,00	0,28	M2	CORTE 4
			0,07	2,14			1,00	0,15	M2	CORTE 4
VIGA VENTANA EXTERIOR			4,18	0,30			1,00	1,25	M2	CORTE 4
			4,18	0,13			1,00	0,54	M2	CORTE 4
			4,18	0,13			1,00	0,54	M2	CORTE 4
			4,60	0,16			1,00	0,74	M2	CORTE 4
PARVULOS A			3,95	0,26			1,00	1,03	M2	CORTE 4
			3,95	2,06			1,00	8,14	M2	CORTE 4
			3,95	0,08			1,00	0,32	M2	CORTE 4
			3,95	0,08			1,00	0,32	M2	CORTE 4
			0,48	0,22			1,00	0,11	M2	CORTE 4
			0,48	0,08			1,00	0,04	M2	CORTE 4
			4,45	1,28			0,50	2,85	M2	CORTE 4
VIGA DE ENTRADA			1,96	0,22			1,00	0,43	M2	CORTE 4
			4,30	0,14			1,00	0,60	M2	CORTE 4
			2,34	0,11			1,00	0,26	M2	CORTE 4
VENTANA INTERIOR			2,34	1,30			1,00	3,04	M2	CORTE 4
DESCUENTO ENTRADA			1,00	1,13			- 1,00	- 1,13	M2	CORTE 4
VENTANA INTERIOR			0,04	1,00			1,00	0,04	M2	CORTE 4
			0,04	1,13			1,00	0,05	M2	CORTE 4
			4,45	0,26			1,00	1,16	M2	CORTE 4
ESTUCO VIGA			4,45	0,24			1,00	1,07	M2	CORTE 4
			0,14	1,13			1,00	0,16	M2	CORTE 4
			0,11	1,30			1,00	0,14	M2	CORTE 4









ESTUCO


TABLERO		3,10	1,35			1,00	4,19	M2	CORTE 4
VIGA EXTERIOR VENTANA		4,30	0,30			1,00	1,29	M2	CORTE 4
		4,30	0,12			1,00	0,52	M2	CORTE 4
		4,30	0,05			1,00	0,22	M2	CORTE 4
MODULO DE ENTRADA		0,14	2,18			1,00	0,31	M2	CORTE 4
		0,07	2,18			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		1,80	0,16			1,00	0,29	M2	CORTE 4
		0,11	2,14			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,05	2,14			1,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,15	0,70			2,00	0,21	M2	CORTE 4
		0,61	1,35			1,00	0,82	M2	CORTE 4
PARVULOS D		4,23	0,46			1,00	1,95	M2	CORTE 4
		0,05	1,26			16,00	1,01	M2	CORTE 4
		0,34	2,45			1,00	0,83	M2	CORTE 4
		0,09	1,91			1,00	0,17	M2	CORTE 4
		3,60	1,91			1,00	6,88	M2	CORTE 4
		0,26	0,09			1,00	0,02	M2	CORTE 4
		3,60	0,27			1,00	0,97	M2	CORTE 4
ESTUCO VIGA		3,60	0,08			2,00	0,58	M2	CORTE 4
MODULO ENTRADA		0,25	1,91			1,00	0,48	M2	CORTE 4
		0,27	0,17			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		1,80	0,17			1,00	0,31	M2	CORTE 4
		0,15	2,19			1,00	0,33	M2	CORTE 4
		0,60	1,37			1,00	0,82	M2	CORTE 4
		2,23	2,44			1,00	5,44	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		1,00	1,13			- 1,00	- 1,13	M2	CORTE 4
VENTANA		0,04	1,00			2,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,04	1,13			2,00	0,09	M2	CORTE 4
MUROS		0,13	1,10			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,03	1,10			1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,03	1,94			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,34	1,94			1,00	0,66	M2	CORTE 4
		2,11	1,06			1,00	2,24	M2	CORTE 4
		0,13	1,06			2,00	0,28	M2	CORTE 4
		4,54	0,53			1,00	2,41	M2	CORTE 4
		4,54	0,82			0,50	1,86	M2	CORTE 4
		4,07	0,37			1,00	1,51	M2	CORTE 4
		4,07	0,79			0,50	1,61	M2	CORTE 4
MURO EXTERIOR PARVULOS B		2,48	2,33			1,00	5,78	M2	CORTE 4
DECUENTO VENTANA		1,00	1,13			- 1,00	- 1,13	M2	CORTE 4
MURO EXTERIOR PARVULOS B		0,04	1,00			2,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,04	1,13			2,00	0,09	M2	CORTE 4
VIGA PASILLO PARVULOS D-B		0,26	2,25			1,00	0,59	M2	CORTE 4
		0,24	2,25			1,00	0,54	M2	CORTE 4
COLUMNA PASILLO		0,24	2,16			1,00	0,52	M2	CORTE 4
DESCUENTO VIGA		0,24	0,26			- 1,00	- 0,06	M2	CORTE 4
MURO LAVAMAOS		0,67	0,66			1,00	0,44	M2	CORTE 4
		0,53	1,15			1,00	0,61	M2	CORTE 4
		0,06	1,43			1,00	0,09	M2	CORTE 4
		1,50	1,80			1,00	2,70	M2	CORTE 4
		1,27	1,12			1,00	1,42	M2	CORTE 4
		0,67	0,66			1,00	0,44	M2	CORTE 4
		0,06	1,43			1,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,15	0,59			2,00	0,18	M2	CORTE 4
		0,08	1,50			2,00	0,24	M2	CORTE 4
BAÑO 2		1,11	0,15			1,00	0,17	M2	CORTE 4
		1,52	0,11			1,00	0,17	M2	CORTE 4
		4,87	0,41			1,00	2,00	M2	CORTE 4
		4,02	0,25			1,00	1,01	M2	CORTE 4
		4,02	0,07			2,00	0,56	M2	CORTE 4
		4,02	0,27			2,00	2,17	M2	CORTE 4
		4,02	0,70			0,50	1,41	M2	CORTE 4
		4,02	0,70			0,50	1,41	M2	CORTE 4
		4,02	0,26			1,00	1,05	M2	CORTE 4
		4,02	0,07			1,00	0,28	M2	CORTE 4
		3,73	0,06			1,00	0,22	M2	CORTE 4
		4,02	0,41			1,00	1,65	M2	CORTE 4
		0,05	0,41			1,00	0,02	M2	CORTE 4
		2,76	0,85			1,00	2,35	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		2,00	0,44			- 1,00	- 0,88	M2	CORTE 4


MURO		2,81	1,64			1,00	4,61	M2	CORTE 4
DESCUENTO VANO ENTRADA		1,11	0,42			- 1,00	- 0,47	M2	CORTE 4
MUROS		0,15	0,41			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,11	1,53			1,00	0,17	M2	CORTE 4
		0,70	0,41			1,00	0,29	M2	CORTE 4
COORDINACON EXTERIOR		0,16	0,58			1,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,85	1,51			1,00	1,28	M2	CORTE 4
		0,67	1,77			1,00	1,19	M2	CORTE 4
		1,93	1,21			1,00	2,34	M2	CORTE 4
		0,55	1,12			1,00	0,62	M2	CORTE 4
		1,14	0,84			1,00	0,96	M2	CORTE 4
		1,50	0,84			1,00	1,26	M2	CORTE 4
		1,34	0,84			1,00	1,13	M2	CORTE 4
		0,20	1,12			1,00	0,22	M2	CORTE 4
		0,27	1,12			1,00	0,30	M2	CORTE 4
		0,06	1,95			1,00	0,12	M2	CORTE 4
		1,52	1,16			1,00	1,76	M2	CORTE 4
		1,22	0,94			1,00	1,15	M2	CORTE 4
		0,12	0,14			1,00	0,02	M2	CORTE 4
		0,04	1,05			2,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,04	1,11			2,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,04	1,11			2,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,04	1,31			2,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,04	0,57			2,00	0,05	M2	CORTE 4
COORDINACION INTERIOR		3,93	1,94			1,00	7,62	M2	CORTE 4
		3,93	0,26			1,00	1,02	M2	CORTE 4
		3,93	0,06			2,00	0,47	M2	CORTE 4
		3,93	0,27			1,00	1,06	M2	CORTE 4
		3,93	0,69			0,50	1,36	M2	CORTE 4
		1,74	2,40			1,00	4,18	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,40	1,27			- 1,00	- 0,51	M2	CORTE 4
		0,42	1,27			- 1,00	- 0,53	M2	CORTE 4
VENTANAS		0,07	1,27			4,00	0,36	M2	CORTE 4
		0,41	0,09			4,00	0,15	M2	CORTE 4
MUROS		1,50	2,58			1,00	3,87	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,42	1,27			- 2,00	- 1,07	M2	CORTE 4
VENTANA		0,07	1,27			4,00	0,36	M2	CORTE 4
		0,42	0,09			4,00	0,15	M2	CORTE 4
MUROS		1,90	2,90			1,00	5,51	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		1,05	1,12			- 1,00	- 1,18	M2	CORTE 4
MUROS		0,09	1,05			2,00	0,19	M2	CORTE 4
		0,08	1,12			1,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,14	1,12			1,00	0,16	M2	CORTE 4
		0,04	0,84			1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,04	0,28			1,00	0,01	M2	CORTE 4
		1,31	1,14			1,00	1,49	M2	CORTE 4
		1,31	0,84			1,00	1,10	M2	CORTE 4
		0,04	1,31			2,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,04	1,11			1,00	0,04	M2	CORTE 4
		1,90	3,15			1,00	5,99	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,55	1,11			- 1,00	- 0,61	M2	CORTE 4
DESCUENTO PUERTA		0,80	2,03			- 1,00	- 1,62	M2	CORTE 4
MURO		0,04	0,55			2,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,04	1,11			1,00	0,04	M2	CORTE 4
ENTRADA		1,35	0,70			1,00	0,95	M2	CORTE 4
		1,35	0,12			1,00	0,16	M2	CORTE 4
		1,35	0,10			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,31	2,04			1,00	0,63	M2	CORTE 4
		0,25	2,45			1,00	0,61	M2	CORTE 4
		0,28	0,53			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,22	1,51			1,00	0,33	M2	CORTE 4
		2,95	1,04			1,00	3,07	M2	CORTE 4
		0,56	0,52			1,00	0,29	M2	CORTE 4
		0,50	1,51			1,00	0,76	M2	CORTE 4
		1,49	1,27			1,00	1,89	M2	CORTE 4
DESCUENTO VIGA		0,17	0,22			- 1,00	- 0,04	M2	CORTE 4
ENTRADA		0,22	2,30			2,00	1,01	M2	CORTE 4
		0,17	2,30			1,00	0,39	M2	CORTE 4
		2,28	1,50			1,00	3,42	M2	CORTE 4
		0,19	0,51			1,00	0,10	M2	CORTE 4


		0,12	1,50			1,00	0,18	M2	CORTE 4
		0,08	0,51			2,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,05	1,50			2,00	0,15	M2	CORTE 4
VENTANA EXTERIOR MURO LACTANCIA		1,28	2,30			1,00	2,94	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		1,19	1,12			- 1,00	- 1,33	M2	CORTE 4
MURO LACTANCIA		0,04	1,19			2,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,04	1,12			2,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,06	2,30			1,00	0,14	M2	CORTE 4
MURO EXTERIOR LACTANCIA		0,24	2,30			1,00	0,55	M2	CORTE 4
ENTRADA CAMINADORES		0,13	0,60			1,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,10	1,50			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,17	0,60			1,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,10	1,50			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,83	0,44			1,00	0,37	M2	CORTE 4
		0,80	1,50			1,00	1,20	M2	CORTE 4
		0,15	1,60			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,15	0,60			1,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,09	1,50			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,86	0,45			1,00	0,39	M2	CORTE 4
		0,82	1,50			1,00	1,23	M2	CORTE 4
		1,80	0,86			1,00	1,55	M2	CORTE 4
		0,81	0,44			1,00	0,36	M2	CORTE 4
		0,78	1,50			1,00	1,17	M2	CORTE 4
		0,17	2,30			1,00	0,39	M2	CORTE 4
		2,77	1,60			1,00	4,43	M2	CORTE 4
		0,19	1,95			1,00	0,37	M2	CORTE 4
COLUMNAS PASILLO CENTRAL		0,25	1,20			5,00	1,50	M2	CORTE 4
VIGA PASILLO		4,40	0,24			1,00	1,06	M2	CORTE 4
		4,40	0,24			1,00	1,06	M2	CORTE 4
		4,40	0,24			1,00	1,06	M2	CORTE 4
		0,27	2,30			4,00	2,48	M2	CORTE 4
		0,17	2,30			2,00	0,78	M2	CORTE 4
		7,30	0,20			1,00	1,46	M2	CORTE 4
		0,16	7,15			1,00	1,14	M2	CORTE 4
		7,15	0,15			1,00	1,07	M2	CORTE 4
ENTRADA COCINA		0,98	0,36			1,00	0,35	M2	CORTE 4
		0,35	2,03			1,00	0,71	M2	CORTE 4
		2,23	0,32			1,00	0,71	M2	CORTE 4
		2,23	0,11			1,00	0,25	M2	CORTE 4
		1,36	1,95			1,00	2,65	M2	CORTE 4
		0,07	1,95			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,15	1,95			1,00	0,29	M2	CORTE 4
		0,97	0,30			1,00	0,29	M2	CORTE 4
		0,15	2,47			1,00	0,37	M2	CORTE 4
		0,14	2,47			1,00	0,35	M2	CORTE 4
		0,04	2,47			1,00	0,10	M2	CORTE 4
ENTRADA BAÑOS ENTRADA		2,48	0,80			1,00	1,98	M2	CORTE 4
		0,55	2,05			1,00	1,13	M2	CORTE 4
		2,97	0,65			1,00	1,93	M2	CORTE 4
		1,80	2,20			1,00	3,96	M2	CORTE 4
		0,76	0,25			1,00	0,19	M2	CORTE 4
		0,28	0,26			1,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,51	0,26			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		2,97	0,78			1,00	2,32	M2	CORTE 4
		0,61	1,97			1,00	1,20	M2	CORTE 4
		2,97	0,15			1,00	0,45	M2	CORTE 4
		0,61	0,30			1,00	0,18	M2	CORTE 4
		0,61	0,05			1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,16	2,00			1,00	0,32	M2	CORTE 4
		0,07	2,00			7,00	0,98	M2	CORTE 4
		0,14	2,00			1,00	0,28	M2	CORTE 4
		0,20	2,03			1,00	0,41	M2	CORTE 4
		0,15	1,51			1,00	0,23	M2	CORTE 4
		1,40	0,42			1,00	0,59	M2	CORTE 4
BAÑO ENTRADA INTERIOR		1,16	0,11			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		1,20	0,55			2,00	1,32	M2	CORTE 4
		0,63	0,58			1,00	0,37	M2	CORTE 4
		1,32	0,18			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		1,22	0,56			1,00	0,68	M2	CORTE 4
		0,72	0,11			1,00	0,08	M2	CORTE 4


		0,72	0,10			1,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,72	6,00			1,00	4,32	M2	CORTE 4
		0,61	0,44			1,00	0,27	M2	CORTE 4
		1,15	0,11			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		1,15	0,13			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,55	0,44			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		1,07	0,57			1,00	0,61	M2	CORTE 4
		1,13	0,57			1,00	0,64	M2	CORTE 4
		1,07	0,57			1,00	0,61	M2	CORTE 4
CAMINADORES		2,02	6,20			1,00	12,52	M2	CORTE 4
COLUMNA		0,25	2,09			1,00	0,52	M2	CORTE 4
		0,12	2,09			1,00	0,25	M2	CORTE 4
VIGACANAL		4,20	0,32			1,00	1,34	M2	CORTE 4
		0,50	4,20			1,00	2,10	M2	CORTE 4
		0,26	4,20			1,00	1,09	M2	CORTE 4
COLUMNA		0,25	2,09			1,00	0,52	M2	CORTE 4
		0,20	0,77			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,25	2,09			1,00	0,52	M2	CORTE 4
		0,14	2,09			1,00	0,29	M2	CORTE 4
VIGA ENTRADA JARDIN		0,25	1,70			1,00	0,43	M2	CORTE 4
		0,14	1,52			1,00	0,21	M2	CORTE 4
COLUMNA PUERTA		0,14	1,27			1,00	0,18	M2	CORTE 4
		0,07	0,72			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,53	0,22			1,00	0,12	M2	CORTE 4
		0,06	1,78			1,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,17	2,02			1,00	0,34	M2	CORTE 4
MURO		1,32	2,51			1,00	3,31	M2	CORTE 4
		0,12	2,61			1,00	0,31	M2	CORTE 4
		0,92	0,60			1,00	0,55	M2	CORTE 4
		0,92	0,45			1,00	0,41	M2	CORTE 4
VIGA		0,30	6,20			1,00	1,86	M2	CORTE 4
DIVISION		0,12	6,20			1,00	0,74	M2	CORTE 4
		4,25	1,15			2,00	9,78	M2	CORTE 4
		0,11	4,25			1,00	0,47	M2	CORTE 4
		0,04	1,15			2,00	0,09	M2	CORTE 4
		1,18	1,15			1,00	1,36	M2	CORTE 4
		0,11	1,25			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,55	1,15			1,00	0,63	M2	CORTE 4
		0,52	1,15			1,00	0,60	M2	CORTE 4
COLUMNA VENTANA		0,12	2,09			1,00	0,25	M2	CORTE 4
		0,10	3,77			1,00	0,38	M2	CORTE 4
		0,12	1,40			1,00	0,17	M2	CORTE 4
MURO VENTANA		4,25	3,77			1,00	16,02	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		2,00	1,12			- 1,00	- 2,24	M2	CORTE 4
VENTANA		0,05	1,12			2,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,05	2,00			2,00	0,20	M2	CORTE 4
VIGA		0,22	6,32			1,00	1,39	M2	CORTE 4
		0,25	6,20			2,00	3,10	M2	CORTE 4
		0,22	6,20			1,00	1,36	M2	CORTE 4
COLUMNA		0,11	1,18			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,15	2,12			2,00	0,64	M2	CORTE 4
		0,17	0,61			1,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,10	1,42			1,00	0,14	M2	CORTE 4
MURO VENTANA ENTRADA		0,86	2,19			1,00	1,88	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,74	1,11			- 1,00	- 0,82	M2	CORTE 4
VENTANA		0,05	1,11			2,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,05	0,74			2,00	0,07	M2	CORTE 4
MODULO ENTRADA		0,57	2,09			1,00	1,19	M2	CORTE 4
		0,13	1,95			1,00	0,25	M2	CORTE 4
		0,97	0,14			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		1,65	2,08			1,00	3,43	M2	CORTE 4
		1,40	6,20			0,50	4,34	M2	CORTE 4
DECUENTO PUERTA		0,80	0,80			- 1,00	- 0,64	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,56	0,78			- 1,00	- 0,44	M2	CORTE 4
DESCUENTO VANO		0,54	0,42			- 1,00	- 0,23	M2	CORTE 4
MURO		0,21	1,85			1,00	0,39	M2	CORTE 4
		1,75	1,36			1,00	2,38	M2	CORTE 4
		0,05	1,30			2,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,05	1,75			2,00	0,18	M2	CORTE 4
		0,10	1,18			1,00	0,12	M2	CORTE 4






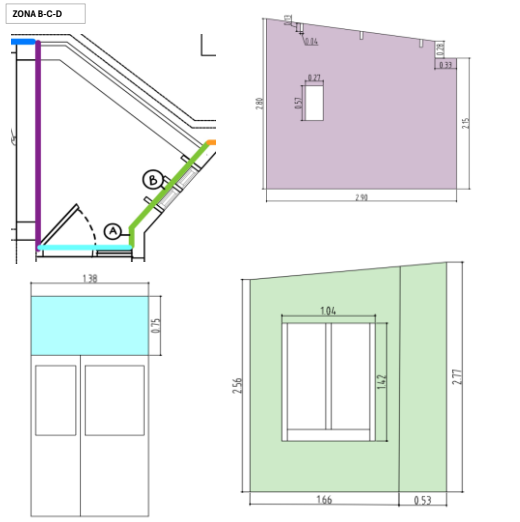






		2,22	1,50			1,00	3,33	M2	CORTE 4
		0,12	3,22			1,00	0,39	M2	CORTE 4
		2,00	3,07			1,00	6,14	M2	CORTE 4
BAÑO CAMINADORES		0,32	3,54			2,00	2,27	M2	CORTE 4
		0,30	3,30			1,00	0,99	M2	CORTE 4
		0,30	1,19			1,00	0,36	M2	CORTE 4
		0,28	3,54			1,00	0,99	M2	CORTE 4
		0,44	1,19			1,00	0,52	M2	CORTE 4
		3,17	0,92			1,50	4,37	M2	CORTE 4
		1,30	0,90			1,00	1,17	M2	CORTE 4
		0,06	3,54			1,00	0,21	M2	CORTE 4
PREJARDIN B		0,13	2,28			1,00	0,30	M2	CORTE 4
		0,21	2,28			1,00	0,48	M2	CORTE 4
		0,30	2,28			1,00	0,68	M2	CORTE 4
		0,15	2,30			1,00	0,35	M2	CORTE 4
		0,06	2,30			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,04	2,30			1,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,23	2,19			4,00	2,01	M2	CORTE 4
		0,01	2,19			4,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,22	2,22			4,00	1,95	M2	CORTE 4
		0,01	2,22			4,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,06	1,28			13,00	1,00	M2	CORTE 4
		0,17	2,33			1,00	0,40	M2	CORTE 4
		0,32	3,08			1,00	0,99	M2	CORTE 4
		0,12	2,30			1,00	0,28	M2	CORTE 4
	ACTA PARCIAL No. 5								
	FACHADA PRINCIPAL						-		
	ZONA A						-		
	A	2,40		2,13		1,00	5,11	M2	CORTE 5
	DESCUENTO VENTANA	1,30		0,40		- 1,00	- 0,52	M2	CORTE 5
	B	0,03		2,13		1,00	0,06	M2	CORTE 5
	C	2,01		2,13		1,00	4,28	M2	CORTE 5
	DESCUENTO VENTANA	1,20		1,20		- 1,00	- 1,44	M2	CORTE 5
	D	0,03		2,13		1,00	0,06	M2	CORTE 5
	E	0,25		2,13		1,00	0,53	M2	CORTE 5
	F	0,03		2,13		1,00	0,06	M2	CORTE 5
	G	4,23		2,13		1,00	9,01	M2	CORTE 5
	DESCUENTO VENTANA	2,00		1,20		- 1,00	- 2,40	M2	CORTE 5
	H	0,08		2,13		1,00	0,17	M2	CORTE 5
	I	0,75		2,13		1,00	1,60	M2	CORTE 5
	J	0,07		2,13		1,00	0,15	M2	CORTE 5
	K	4,27		2,13		1,00	9,10	M2	CORTE 5
	DESCUENTO VENTANA	2,00		1,20		- 1,00	- 2,40	M2	CORTE 5
	L	0,03		2,13		1,00	0,06	M2	CORTE 5
	M	0,26		2,13		1,00	0,55	M2	CORTE 5
	N	0,03		2,13		1,00	0,06	M2	CORTE 5
	O	4,60		2,13		1,00	9,80	M2	CORTE 5
	DESCUENTO VENTANA	2,00		1,20		- 1,00	- 2,40	M2	CORTE 5
	P	0,01		2,13		1,00	0,02	M2	CORTE 5
	Q	0,24		2,13		1,00	0,51	M2	CORTE 5
	ZONA B	2,90		2,80		1,00	8,12	M2	CORTE 5
	DESCUENTO VIGA	0,33		0,30		- 1,00	- 0,10	M2	CORTE 5
	DESCUENTO CONTADOR	0,27		0,57		- 1,00	- 0,15	M2	CORTE 5
	DESCUENTO CORREAS	0,04		0,13		- 3,00	- 0,02	M2	CORTE 5
	ZONA C PUERTA DE ACCESO	1,38		0,75		1,00	1,04	M2	CORTE 5
	CARTERA PUERTA	1,30		0,07		1,00	0,09	M2	CORTE 5
	ZONA D						-		
	MURO A	0,53		2,72		1,00	1,44	M2	CORTE 5
	MURO B	1,66		2,61		1,00	4,33	M2	CORTE 5
	DESCUENTO VENTANAS	0,43		1,28		- 2,00	- 1,10	M2	CORTE 5
	ELEMENTOS BORDE VENTANA	0,06		1,56		- 3,00	- 0,28	M2	CORTE 5
	DESCUENTO ALFAJIA	1,04		0,14		- 1,00	- 0,15	M2	CORTE 5
	ZONA E	14,03		2,36		1,00	33,11	M2	CORTE 5
	DESCUENTO VENTANA A	0,44		1,27		- 2,00	- 1,12	M2	CORTE 5
	ELEMENTOS BORDE VENTANA	0,06		1,60		- 3,00	- 0,29	M2	CORTE 5
	DESCUENTO ALFAJIA	1,03		0,10		- 1,00	- 0,10	M2	CORTE 5
	DESCUENTO VENTANA B	1,80		1,27		- 1,00	- 2,29	M2	CORTE 5
	ELEMENTOS BORDE VENTANA	0,06		1,16		- 5,00	- 0,35	M2	CORTE 5
	DESCUENTO ALFAJIA	2,12		0,14		- 1,00	- 0,30	M2	CORTE 5
	DESCUENTO VENTANA C TIPO 1	0,44		1,27		- 2,00	- 1,12	M2	CORTE 5
	DESCUENTO VENTANA C TIPO 2	0,99		1,27		- 2,00	- 2,51	M2	CORTE 5




ZONA G

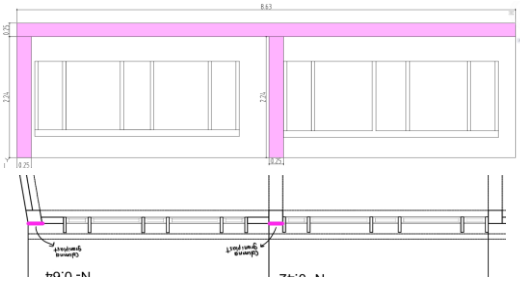


AREAS INTERNAS




COMEDOR

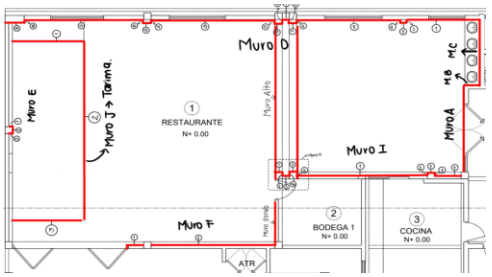











BODEGA







COCINA

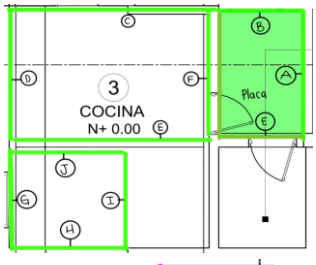





DESCUENTO VENTANA C TIPO 3		0,39		1,27		- 1,00	- 0,50	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA		0,06		1,56		- 6,00	- 0,56	M2	CORTE 5
DESCUENTO ALFAJIA		3,60		0,14		- 1,00	- 0,50	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA D TIPO 1		0,41		1,26		- 2,00	- 1,03	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA D TIPO 2		0,99		1,26		- 2,00	- 2,49	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA D TIPO 3		0,45		1,26		- 1,00	- 0,57	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA		0,06		1,56		- 6,00	- 0,56	M2	CORTE 5
DESCUENTO ALFAJIA		3,60		0,14		- 1,00	- 0,50	M2	CORTE 5
ZONA F							-		
CANAL		3,90		0,28		1,00	1,09	M2	CORTE 5
CANAL CARA INF		3,90		0,25		1,00	0,98	M2	CORTE 5
COLUMNA GRANIPLAST		0,23		2,33		1,00	0,54	M2	CORTE 5
ZONA G							-		
CANAL		8,63		0,25		1,00	2,16	M2	CORTE 5
CANAL CARA INF		8,63		0,30		1,00	2,59	M2	CORTE 5
COLUMNA GRANIPLAST		0,26		2,24		2,00	1,16	M2	CORTE 5
							-		
COMEDOR							-		
MURO A		3,31		2,72		1,00	8,99	M2	CORTE 5
DESCUENTO PUERTA PRINCIPAL		1,93		1,97		- 1,00	- 3,79	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA FIJA		0,59		1,67		- 1,00	- 0,99	M2	CORTE 5
MURO B		0,57		1,00		1,00	0,57	M2	CORTE 5
MURO C		2,49		0,82		1,00	2,03	M2	CORTE 5
MURO D							-		
MURO 1		2,00		2,05		1,00	4,10	M2	CORTE 5
DESCUENTO ENCHAPE		0,59		1,44		- 1,00	- 0,85	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		1,24		1,24		- 1,00	- 1,54	M2	CORTE 5
MURO 2		0,10		2,05		1,00	0,21	M2	CORTE 5
MURO 3		0,24		2,05		1,00	0,49	M2	CORTE 5
MURO 4		0,10		2,05		1,00	0,21	M2	CORTE 5
MURO 5		4,23		2,05		1,00	8,67	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		2,04		1,24		- 1,00	- 2,53	M2	CORTE 5
MURO 6		0,11		2,05		1,00	0,23	M2	CORTE 5
MURO 7		0,25		2,05		1,00	0,51	M2	CORTE 5
MURO 8		0,11		2,05		1,00	0,23	M2	CORTE 5
MURO 9		0,26		2,05		1,00	0,52	M2	CORTE 5
MURO 10		0,11		2,05		1,00	0,23	M2	CORTE 5
MURO 11		0,25		2,05		1,00	0,51	M2	CORTE 5
MURO 12		0,11		2,05		1,00	0,23	M2	CORTE 5
MURO 13		4,28		2,05		1,00	8,77	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		2,04		1,24		- 1,00	- 2,53	M2	CORTE 5
MURO 14		0,12		2,05		1,00	0,25	M2	CORTE 5
MURO 15		0,25		2,05		1,00	0,51	M2	CORTE 5
MURO 16		0,12		2,05		1,00	0,25	M2	CORTE 5
MURO 17		4,53		2,05		1,00	9,29	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		2,05		1,24		- 1,00	- 2,54	M2	CORTE 5
DESCUENTO ESCALERA		0,98		0,72		- 1,00	- 0,71	M2	CORTE 5
DESCUENTO ESCALERA		0,29		0,48		- 1,00	- 0,14	M2	CORTE 5
DESCUENTO ESCALERA		0,29		0,24		- 1,00	- 0,07	M2	CORTE 5
MURO 18		0,11		2,05		1,00	0,23	M2	CORTE 5
MURO 19		0,17		2,05		1,00	0,35	M2	CORTE 5
MURO E							-		
VIGA A							-		
CARA FRONTAL		3,92		0,24		1,00	0,94	M2	CORTE 5
CARA SUPERIOR		2,40		0,13		1,00	0,31	M2	CORTE 5
CARA INFERIOR		3,92		0,12		1,00	0,47	M2	CORTE 5
VIGA B							-		
CARA FRONTAL		3,93		0,24		1,00	0,94	M2	CORTE 5
CARA SUPERIOR		3,93		0,13		1,00	0,51	M2	CORTE 5
CARA INFERIOR		3,93		0,12		1,00	0,47	M2	CORTE 5
COLUMNA C							-		
LADO 1-3		0,14		2,19		2,00	0,61	M2	CORTE 5
LADO 2		0,25		2,19		1,00	0,55	M2	CORTE 5
MURO F							-		
VIGA A							-		
CARA FRONTAL		4,51		0,26		1,00	1,17	M2	CORTE 5
CARA INFERIOR		4,51		0,22		1,00	0,99	M2	CORTE 5
MURO ZOCALO							-		
MURO 1		0,50		1,14		1,00	0,57	M2	CORTE 5
MURO 2		4,22		1,14		1,00	4,81	M2	CORTE 5

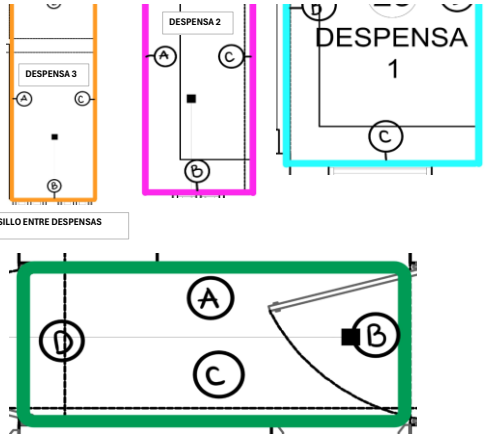



MURO G							-		
COLUMNA		0,13		1,10		1,00	0,14	M2	CORTE 5
MURO ZOCALO		1,65		1,14		1,00	1,88	M2	CORTE 5
MURO ALTO		5,55		0,53		2,00	5,83	M2	CORTE 5
MURO H							-		
MURO 1		0,25		2,06		1,00	0,52	M2	CORTE 5
MURO 2		0,13		2,06		1,00	0,27	M2	CORTE 5
MURO 3		0,27		2,06		1,00	0,56	M2	CORTE 5
MURO 4		0,13		2,06		1,00	0,27	M2	CORTE 5
MURO 5		0,25		2,06		1,00	0,52	M2	CORTE 5
MURO 6		0,12		2,06		1,00	0,25	M2	CORTE 5
MURO I							-		
MURO 1		4,23		2,06		1,00	8,71	M2	CORTE 5
MURO 2		0,11		2,06		1,00	0,23	M2	CORTE 5
MURO 3		0,25		2,06		1,00	0,52	M2	CORTE 5
MURO 4		0,10		2,06		1,00	0,21	M2	CORTE 5
MURO 5		1,43		2,06		1,00	2,94	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		1,74		1,31		- 1,00	- 2,28	M2	CORTE 5
DESCUENTO ALFAJIA		1,81		0,10		- 1,00	- 0,18	M2	CORTE 5
MURO ALTO		5,91		0,90		1,00	5,31	M2	CORTE 5
CARTERA MURO ALTO		5,91		0,10		1,00	0,59	M2	CORTE 5
MURO J TARIMA							-		
MURO 1-3		1,47		0,52		2,00	1,53	M2	CORTE 5
DESCUENTO		0,65		0,12		- 2,00	- 0,16	M2	CORTE 5
DESCUENTO		0,65		0,18		- 2,00	- 0,23	M2	CORTE 5
MURO 2		6,22		0,52		1,00	3,23	M2	CORTE 5
							-		
BODEGA							-		
MURO A		2,99		3,34		1,00	9,99	M2	CORTE 5
MURO B		2,31		3,48		1,00	8,04	M2	CORTE 5
							-		
COCINA							-		
MURO A		2,26		0,76		1,00	1,72	M2	CORTE 5
MURO B		1,22		0,76		1,00	0,93	M2	CORTE 5
PLACA		1,22	2,26			1,00	2,76	M2	CORTE 5
CARTERA PLACA		2,26		0,19		1,00	0,43	M2	CORTE 5
MURO C		1,69		1,18		1,00	1,99	M2	CORTE 5
MURO C		1,74		1,03		1,00	1,79	M2	CORTE 5
MURO D		2,27		1,08		1,00	2,45	M2	CORTE 5
MURO E		3,43		1,08		1,00	3,70	M2	CORTE 5
		1,22		0,76		1,00	0,93	M2	CORTE 5
MURO F		0,90		0,27		1,00	0,24	M2	CORTE 5
		1,26		0,31		1,00	0,39	M2	CORTE 5
BAJO PLACA		3,17		0,15		1,00	0,48	M2	CORTE 5
		2,22		0,26		1,00	0,58	M2	CORTE 5
MURO G		2,07		0,80		1,00	1,66	M2	CORTE 5
COLUMNA		0,08		1,00		1,00	0,08	M2	CORTE 5
COLUMNA		0,09		0,98		1,00	0,09	M2	CORTE 5
VIGA CARA SUPERIOR		2,07		0,15		1,00	0,31	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		2,07		0,25		1,00	0,52	M2	CORTE 5
MURO H		1,75		0,98		1,00	1,72	M2	CORTE 5
COLUMNA		0,09		0,98		1,00	0,09	M2	CORTE 5
MURO I		2,07		1,13		1,00	2,33	M2	CORTE 5
MURO J		1,79		0,86		1,00	1,54	M2	CORTE 5
COLUMNA		0,08		1,00		1,00	0,08	M2	CORTE 5
VIGA CARA SUPERIOR		1,79		0,15		1,00	0,27	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		1,79		0,31		1,00	0,55	M2	CORTE 5
							-		
DESPENSA 3							-		
MURO A		2,51		0,39		1,00	0,97	M2	CORTE 5
MURO ALTO		5,76		0,40		1,00	2,30	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		3,40		0,31		1,00	1,04	M2	CORTE 5
VIGA CARA SUP		3,40		0,03		1,00	0,10	M2	CORTE 5
MURO B		0,49		0,40		1,00	0,19	M2	CORTE 5
VIGA		1,34		0,31		1,00	0,41	M2	CORTE 5
MURO C		3,40		0,41		1,00	1,39	M2	CORTE 5
MURO ALTO		5,76		0,40		1,00	2,30	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		3,40		0,31		1,00	1,04	M2	CORTE 5
VIGA CARA SUP		3,40		0,03		1,00	0,10	M2	CORTE 5
MURO D							-		

MURO FONDO		1,49		1,00		1,00	1,49	M2	CORTE 5
SECCION 1		1,26		0,30		1,00	0,38	M2	CORTE 5
SECCION 2		0,73		1,24		1,00	0,91	M2	CORTE 5
SECCION 3		0,70		1,97		1,00	1,38	M2	CORTE 5
CARTERA		0,03		1,97		1,00	0,06	M2	CORTE 5
		0,03		0,70		1,00	0,02	M2	CORTE 5
CARTERA PUERTA		0,99		0,28		1,00	0,28	M2	CORTE 5
		0,14		2,02		1,00	0,27	M2	CORTE 5
DESPENSA 2							-		
MURO A		2,66		0,40		1,00	1,06	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		3,47		0,16		1,00	0,56	M2	CORTE 5
VIGA CARA INFERIOR		3,47		0,06		1,00	0,21	M2	CORTE 5
MURO B		1,01		0,37		1,00	0,37	M2	CORTE 5
DECUENTO VENTANA		0,44		0,37		- 1,00	- 0,16	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		1,01		0,21		1,00	0,21	M2	CORTE 5
MURO C		2,49		1,91		1,00	4,76	M2	CORTE 5
DESCUENTO ENCHAPE		0,55		1,52		- 1,00	- 0,84	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		3,33		0,16		1,00	0,53	M2	CORTE 5
VIGA CARA INFERIOR		3,33		0,06		1,00	0,20	M2	CORTE 5
MURO D		1,10		2,13		1,00	2,34	M2	CORTE 5
							-		
DESPENSA 1							-		
MURO A		1,05		0,44		1,00	0,46	M2	CORTE 5
		1,63		0,18		1,00	0,29	M2	CORTE 5
MURO B		0,15		0,40		1,00	0,06	M2	CORTE 5
		0,14		0,40		1,00	0,06	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		2,32		0,27		1,00	0,63	M2	CORTE 5
VIGA CARA INFERIOR		2,32		0,05		1,00	0,12	M2	CORTE 5
MURO C		0,33		0,36		2,00	0,24	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		1,62		0,17		1,00	0,27	M2	CORTE 5
VIGA CARA INFERIOR		1,62		0,13		1,00	0,21	M2	CORTE 5
MURO D		2,55		1,84		1,00	4,69	M2	CORTE 5
DESCUENTO ENCHAPE		0,56		1,45		- 1,00	- 0,81	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		2,35		0,17		1,00	0,40	M2	CORTE 5
VIGA CARA INFERIOR		2,35		0,05		1,00	0,12	M2	CORTE 5
PASILLO DESPENSAS							-		
MURO A		1,71		0,75		1,00	1,28	M2	CORTE 5
		0,65		1,94		1,00	1,26	M2	CORTE 5
COLUMNA		0,12		0,48		1,00	0,06	M2	CORTE 5
MURO B		0,78		0,75		1,00	0,59	M2	CORTE 5
CARTERA		0,78		0,12		1,00	0,09	M2	CORTE 5
MURO C		1,71		2,66		1,00	4,55	M2	CORTE 5
DESCUENTO PUERTA		0,83		1,95		1,00	1,62	M2	CORTE 5
MURO D		0,78		0,75		1,00	0,59	M2	CORTE 5
CARTERA		0,78		0,10		1,00	0,08	M2	CORTE 5
CARTERA PUERTA		0,25		1,29		1,00	0,32	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	656,94	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	423,51	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**233,43**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
233,43	423,51	**656,94**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2026

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA



PINTURA SOBRE ESTUCO
PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 4									
MURO EXTERIOR AULA CAMINADORES-PARVULOS A		7,87	2,30			1,00	18,10	M2	CORTE 4
		0,05	1,11			2,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,05	0,74			2,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,05	1,99			2,00	0,20	M2	CORTE 4
		0,05	1,13			2,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,05	1,00			2,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,05	1,13			2,00	0,11	M2	CORTE 4
DESCUENTO DE VENTANAS		0,74	1,11			- 1,00	- 0,82	M2	CORTE 4
		1,99	1,13			- 1,00	- 2,25	M2	CORTE 4
		1,00	1,13			- 1,00	- 1,13	M2	CORTE 4
MURO EXTERIOR AULA PARVULO C- D		4,56	3,26			1,00	14,87	M2	CORTE 4
		0,05	1,00			2,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,05	1,11			2,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,05	1,00			2,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,05	1,07			2,00	0,11	M2	CORTE 4
VOLADIZOS DE ENTRADA A AULAS		0,14	2,09			4,00	1,17	M2	CORTE 4
		0,14	2,09			1,00	0,29	M2	CORTE 4
		1,80	0,87			1,00	1,57	M2	CORTE 4
		0,87	1,95			2,00	3,39	M2	CORTE 4
		2,09	1,11			1,00	2,32	M2	CORTE 4
		0,85	0,20			1,00	0,17	M2	CORTE 4
		0,36	2,09			1,00	0,75	M2	CORTE 4
		2,30	0,13			1,00	0,30	M2	CORTE 4
		1,80	0,15			1,00	0,27	M2	CORTE 4
		0,88	1,94			2,00	3,41	M2	CORTE 4
DESCUENTO DE VENTANAS		1,00	1,11			- 1,00	- 1,11	M2	CORTE 4
		1,00	1,07			- 1,00	- 1,07	M2	CORTE 4
VOLADIZO DE ENTRADA AULA PARVULO A - B		0,13	2,17			2,00	0,56	M2	CORTE 4
		0,13	2,11			2,00	0,55	M2	CORTE 4
		0,29	1,94			1,00	0,56	M2	CORTE 4
		0,87	1,94			2,00	3,38	M2	CORTE 4
		0,69	1,94			2,00	2,68	M2	CORTE 4
		3,88	0,16			1,00	0,62	M2	CORTE 4
		0,18	4,15			1,00	0,75	M2	CORTE 4
		0,85	1,80			2,00	3,06	M2	CORTE 4
		0,30	0,16			1,00	0,05	M2	CORTE 4
AULA PARVULOS C		3,11	1,57			1,00	4,88	M2	CORTE 4
		0,04	2,00			1,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,70	2,00			1,00	1,40	M2	CORTE 4
		0,16	2,00			1,00	0,32	M2	CORTE 4
VIGA		0,08	3,97			2,00	0,64	M2	CORTE 4
VIGA		0,24	3,97			1,00	0,95	M2	CORTE 4
VIGA		0,07	1,38			2,00	0,19	M2	CORTE 4
VIGA		0,06	1,38			2,00	0,17	M2	CORTE 4
		0,05	1,38			8,00	0,55	M2	CORTE 4
		0,06	1,38			4,00	0,33	M2	CORTE 4
		4,20	0,44			1,00	1,85	M2	CORTE 4
		0,32	2,52			1,00	0,81	M2	CORTE 4
		0,05	2,52			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		3,65	2,46			1,00	8,98	M2	CORTE 4
		0,65	2,00			1,00	1,30	M2	CORTE 4
						0,85	0,85	M2	CORTE 4
						0,85	0,85	M2	CORTE 4
		2,27	2,46			1,00	5,58	M2	CORTE 4













		0,06	1,00			2,00	0,12	M2	CORTE 4
		0,06	1,11			2,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,59	1,35			1,00	0,80	M2	CORTE 4
		0,15	2,17			1,00	0,33	M2	CORTE 4
		0,15	1,79			1,00	0,27	M2	CORTE 4
		0,60	2,00			1,00	1,20	M2	CORTE 4
		2,06	1,12			1,00	2,31	M2	CORTE 4
DESCUENTO ESPEJO		0,45	0,93			- 1,00	- 0,42	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		1,00	1,11			- 1,00	- 1,11	M2	CORTE 4
ESTUCO PARVULOS B		3,95	2,14			1,00	8,45	M2	CORTE 4
		0,50	1,30			1,00	0,65	M2	CORTE 4
		4,45	0,11			2,00	0,98	M2	CORTE 4
		4,45	0,26			1,00	1,16	M2	CORTE 4
		4,45	1,28			0,50	2,85	M2	CORTE 4
COLUMNA VENTANA EXTERIOR		0,13	2,14			2,00	0,56	M2	CORTE 4
COLUMNA VENTANA INTERIOR		0,13	1,30			2,00	0,34	M2	CORTE 4
DESCUENTO DE VENTANA INTERIOR		1,00	1,13			- 1,00	- 1,13	M2	CORTE 4
VENTANA INTERIOR		0,04	1,00			2,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,40	1,13			2,00	0,90	M2	CORTE 4
MODULO ENTRADA		0,60	1,36			1,00	0,82	M2	CORTE 4
		0,14	2,18			1,00	0,31	M2	CORTE 4
		0,09	2,18			1,00	0,20	M2	CORTE 4
		1,08	0,16			1,00	0,17	M2	CORTE 4
VIGA ENTRADA		4,19	0,24			1,00	1,01	M2	CORTE 4
		4,19	0,13			1,00	0,54	M2	CORTE 4
		1,80	0,16			1,00	0,29	M2	CORTE 4
VIGA ENTRADA		4,45	0,26			1,00	1,16	M2	CORTE 4
		4,45	0,07			1,00	0,31	M2	CORTE 4
		3,97	0,07			1,00	0,28	M2	CORTE 4
TABLERO		3,10	1,49			1,00	4,62	M2	CORTE 4
COLUMNA VENTANA EXTERIOR		0,13	2,14			1,00	0,28	M2	CORTE 4
		0,07	2,14			1,00	0,15	M2	CORTE 4
VIGA VENTANA EXTERIOR		4,18	0,30			1,00	1,25	M2	CORTE 4
		4,18	0,13			1,00	0,54	M2	CORTE 4
		4,18	0,13			1,00	0,54	M2	CORTE 4
		4,60	0,16			1,00	0,74	M2	CORTE 4
PARVULOS A		3,95	0,26			1,00	1,03	M2	CORTE 4
		3,95	2,06			1,00	8,14	M2	CORTE 4
		3,95	0,08			1,00	0,32	M2	CORTE 4
		3,95	0,08			1,00	0,32	M2	CORTE 4
		0,48	0,22			1,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,48	0,08			1,00	0,04	M2	CORTE 4
		4,45	1,28			0,50	2,85	M2	CORTE 4
VIGA DE ENTRADA		1,96	0,22			1,00	0,43	M2	CORTE 4
		4,30	0,14			1,00	0,60	M2	CORTE 4
		2,34	0,11			1,00	0,26	M2	CORTE 4
VENTANA INTERIOR		2,34	1,30			1,00	3,04	M2	CORTE 4
DESCUENTO ENTRADA		1,00	1,13			- 1,00	- 1,13	M2	CORTE 4
VENTANA INTERIOR		0,04	1,00			1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,04	1,13			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		4,45	0,26			1,00	1,16	M2	CORTE 4
ESTUCO VIGA		4,45	0,24			1,00	1,07	M2	CORTE 4
		0,14	1,13			1,00	0,16	M2	CORTE 4
		0,11	1,30			1,00	0,14	M2	CORTE 4
TABLERO		3,10	1,35			1,00	4,19	M2	CORTE 4
VIGA EXTERIOR VENTANA		4,30	0,30			1,00	1,29	M2	CORTE 4
		4,30	0,12			1,00	0,52	M2	CORTE 4
		4,30	0,05			1,00	0,22	M2	CORTE 4
MODULO DE ENTRADA		0,14	2,18			1,00	0,31	M2	CORTE 4
		0,07	2,18			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		1,80	0,16			1,00	0,29	M2	CORTE 4
		0,11	2,14			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,05	2,14			1,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,15	0,70			2,00	0,21	M2	CORTE 4
		0,61	1,35			1,00	0,82	M2	CORTE 4
PARVULOS D		4,23	0,46			1,00	1,95	M2	CORTE 4
		0,05	1,26			16,00	1,01	M2	CORTE 4
		0,34	2,45			1,00	0,83	M2	CORTE 4
		0,09	1,91			1,00	0,17	M2	CORTE 4
		3,60	1,91			1,00	6,88	M2	CORTE 4











		0,26	0,09			1,00	0,02	M2	CORTE 4
		3,60	0,27			1,00	0,97	M2	CORTE 4
ESTUCO VIGA		3,60	0,08			2,00	0,58	M2	CORTE 4
MODULO ENTRADA		0,25	1,91			1,00	0,48	M2	CORTE 4
		0,27	0,17			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		1,80	0,17			1,00	0,31	M2	CORTE 4
		0,15	2,19			1,00	0,33	M2	CORTE 4
		0,60	1,37			1,00	0,82	M2	CORTE 4
		2,23	2,44			1,00	5,44	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		1,00	1,13			- 1,00	- 1,13	M2	CORTE 4
VENTANA		0,04	1,00			2,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,04	1,13			2,00	0,09	M2	CORTE 4
MUROS		0,13	1,10			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,03	1,10			1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,03	1,94			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,34	1,94			1,00	0,66	M2	CORTE 4
		2,11	1,06			1,00	2,24	M2	CORTE 4
		0,13	1,06			2,00	0,28	M2	CORTE 4
		4,54	0,53			1,00	2,41	M2	CORTE 4
		4,54	0,82			0,50	1,86	M2	CORTE 4
		4,07	0,37			1,00	1,51	M2	CORTE 4
		4,07	0,79			0,50	1,61	M2	CORTE 4
MURO EXTERIOR PARVULOS B		2,48	2,33			1,00	5,78	M2	CORTE 4
DECUENTO VENTANA		1,00	1,13			- 1,00	- 1,13	M2	CORTE 4
MURO EXTERIOR PARVULOS B		0,04	1,00			2,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,04	1,13			2,00	0,09	M2	CORTE 4
VIGA PASILLO PARVULOS D-B		0,26	2,25			1,00	0,59	M2	CORTE 4
		0,24	2,25			1,00	0,54	M2	CORTE 4
COLUMNA PASILLO		0,24	2,16			1,00	0,52	M2	CORTE 4
DESCUENTO VIGA		0,24	0,26			- 1,00	- 0,06	M2	CORTE 4
MURO LAVAMAOS		0,67	0,66			1,00	0,44	M2	CORTE 4
		0,53	1,15			1,00	0,61	M2	CORTE 4
		0,06	1,43			1,00	0,09	M2	CORTE 4
		1,50	1,80			1,00	2,70	M2	CORTE 4
		1,27	1,12			1,00	1,42	M2	CORTE 4
		0,67	0,66			1,00	0,44	M2	CORTE 4
		0,06	1,43			1,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,15	0,59			2,00	0,18	M2	CORTE 4
		0,08	1,50			2,00	0,24	M2	CORTE 4
BAÑO 2		1,11	0,15			1,00	0,17	M2	CORTE 4
		1,52	0,11			1,00	0,17	M2	CORTE 4
		4,87	0,41			1,00	2,00	M2	CORTE 4
		4,02	0,25			1,00	1,01	M2	CORTE 4
		4,02	0,07			2,00	0,56	M2	CORTE 4
		4,02	0,27			2,00	2,17	M2	CORTE 4
		4,02	0,70			0,50	1,41	M2	CORTE 4
		4,02	0,70			0,50	1,41	M2	CORTE 4
		4,02	0,26			1,00	1,05	M2	CORTE 4
		4,02	0,07			1,00	0,28	M2	CORTE 4
		3,73	0,06			1,00	0,22	M2	CORTE 4
		4,02	0,41			1,00	1,65	M2	CORTE 4
		0,05	0,41			1,00	0,02	M2	CORTE 4
		2,76	0,85			1,00	2,35	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		2,00	0,44			- 1,00	- 0,88	M2	CORTE 4
MURO		2,81	1,64			1,00	4,61	M2	CORTE 4
DESCUENTO VANO ENTRADA		1,11	0,42			- 1,00	- 0,47	M2	CORTE 4
MUROS		0,15	0,41			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,11	1,53			1,00	0,17	M2	CORTE 4
		0,70	0,41			1,00	0,29	M2	CORTE 4
COORDINACON EXTERIOR		0,16	0,58			1,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,85	1,51			1,00	1,28	M2	CORTE 4
		0,67	1,77			1,00	1,19	M2	CORTE 4
		1,93	1,21			1,00	2,34	M2	CORTE 4
		0,55	1,12			1,00	0,62	M2	CORTE 4
		1,14	0,84			1,00	0,96	M2	CORTE 4
		1,50	0,84			1,00	1,26	M2	CORTE 4
		1,34	0,84			1,00	1,13	M2	CORTE 4
		0,20	1,12			1,00	0,22	M2	CORTE 4
		0,27	1,12			1,00	0,30	M2	CORTE 4
		0,06	1,95			1,00	0,12	M2	CORTE 4

		1,52	1,16			1,00	1,76	M2	CORTE 4
		1,22	0,94			1,00	1,15	M2	CORTE 4
		0,12	0,14			1,00	0,02	M2	CORTE 4
		0,04	1,05			2,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,04	1,11			2,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,04	1,11			2,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,04	1,31			2,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,04	0,57			2,00	0,05	M2	CORTE 4
COORDINACION INTERIOR		3,93	1,94			1,00	7,62	M2	CORTE 4
		3,93	0,26			1,00	1,02	M2	CORTE 4
		3,93	0,06			2,00	0,47	M2	CORTE 4
		3,93	0,27			1,00	1,06	M2	CORTE 4
		3,93	0,69			0,50	1,36	M2	CORTE 4
		1,74	2,40			1,00	4,18	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,40	1,27			- 1,00	- 0,51	M2	CORTE 4
		0,42	1,27			- 1,00	- 0,53	M2	CORTE 4
VENTANAS		0,07	1,27			4,00	0,36	M2	CORTE 4
		0,41	0,09			4,00	0,15	M2	CORTE 4
MUROS		1,50	2,58			1,00	3,87	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,42	1,27			- 2,00	- 1,07	M2	CORTE 4
VENTANA		0,07	1,27			4,00	0,36	M2	CORTE 4
		0,42	0,09			4,00	0,15	M2	CORTE 4
MUROS		1,90	2,90			1,00	5,51	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		1,05	1,12			- 1,00	- 1,18	M2	CORTE 4
MUROS		0,09	1,05			2,00	0,19	M2	CORTE 4
		0,08	1,12			1,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,14	1,12			1,00	0,16	M2	CORTE 4
		0,04	0,84			1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,04	0,28			1,00	0,01	M2	CORTE 4
		1,31	1,14			1,00	1,49	M2	CORTE 4
		1,31	0,84			1,00	1,10	M2	CORTE 4
		0,04	1,31			2,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,04	1,11			1,00	0,04	M2	CORTE 4
		1,90	3,15			1,00	5,99	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,55	1,11			- 1,00	- 0,61	M2	CORTE 4
DESCUENTO PUERTA		0,80	2,03			- 1,00	- 1,62	M2	CORTE 4
MURO		0,04	0,55			2,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,04	1,11			1,00	0,04	M2	CORTE 4
ENTRADA		1,35	0,70			1,00	0,95	M2	CORTE 4
		1,35	0,12			1,00	0,16	M2	CORTE 4
		1,35	0,10			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,31	2,04			1,00	0,63	M2	CORTE 4
		0,25	2,45			1,00	0,61	M2	CORTE 4
		0,28	0,53			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,22	1,51			1,00	0,33	M2	CORTE 4
		2,95	1,04			1,00	3,07	M2	CORTE 4
		0,56	0,52			1,00	0,29	M2	CORTE 4
		0,50	1,51			1,00	0,76	M2	CORTE 4
		1,49	1,27			1,00	1,89	M2	CORTE 4
DESCUENTO VIGA		0,17	0,22			- 1,00	- 0,04	M2	CORTE 4
ENTRADA		0,22	2,30			2,00	1,01	M2	CORTE 4
		0,17	2,30			1,00	0,39	M2	CORTE 4
		2,28	1,50			1,00	3,42	M2	CORTE 4
		0,19	0,51			1,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,12	1,50			1,00	0,18	M2	CORTE 4
		0,08	0,51			2,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,05	1,50			2,00	0,15	M2	CORTE 4
VENTANA EXTERIOR MURO LACTANCIA		1,28	2,30			1,00	2,94	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		1,19	1,12			- 1,00	- 1,33	M2	CORTE 4
MURO LACTANCIA		0,04	1,19			2,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,04	1,12			2,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,06	2,30			1,00	0,14	M2	CORTE 4
MURO EXTERIOR LACTANCIA		0,24	2,30			1,00	0,55	M2	CORTE 4
ENTRADA CAMINADORES		0,13	0,60			1,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,10	1,50			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,17	0,60			1,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,10	1,50			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,83	0,44			1,00	0,37	M2	CORTE 4
		0,80	1,50			1,00	1,20	M2	CORTE 4
		0,15	1,60			1,00	0,24	M2	CORTE 4


		0,15	0,60			1,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,09	1,50			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,86	0,45			1,00	0,39	M2	CORTE 4
		0,82	1,50			1,00	1,23	M2	CORTE 4
		1,80	0,86			1,00	1,55	M2	CORTE 4
		0,81	0,44			1,00	0,36	M2	CORTE 4
		0,78	1,50			1,00	1,17	M2	CORTE 4
		0,17	2,30			1,00	0,39	M2	CORTE 4
		2,77	1,60			1,00	4,43	M2	CORTE 4
		0,19	1,95			1,00	0,37	M2	CORTE 4
COLUMNAS PASILLO CENTRAL		0,25	1,20			5,00	1,50	M2	CORTE 4
VIGA PASILLO		4,40	0,24			1,00	1,06	M2	CORTE 4
		4,40	0,24			1,00	1,06	M2	CORTE 4
		4,40	0,24			1,00	1,06	M2	CORTE 4
		0,27	2,30			4,00	2,48	M2	CORTE 4
		0,17	2,30			2,00	0,78	M2	CORTE 4
		7,30	0,20			1,00	1,46	M2	CORTE 4
		0,16	7,15			1,00	1,14	M2	CORTE 4
		7,15	0,15			1,00	1,07	M2	CORTE 4
ENTRADA COCINA		0,98	0,36			1,00	0,35	M2	CORTE 4
		0,35	2,03			1,00	0,71	M2	CORTE 4
		2,23	0,32			1,00	0,71	M2	CORTE 4
		2,23	0,11			1,00	0,25	M2	CORTE 4
		1,36	1,95			1,00	2,65	M2	CORTE 4
		0,07	1,95			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,15	1,95			1,00	0,29	M2	CORTE 4
		0,97	0,30			1,00	0,29	M2	CORTE 4
		0,15	2,47			1,00	0,37	M2	CORTE 4
		0,14	2,47			1,00	0,35	M2	CORTE 4
		0,04	2,47			1,00	0,10	M2	CORTE 4
ENTRADA BAÑOS ENTRADA		2,48	0,80			1,00	1,98	M2	CORTE 4
		0,55	2,05			1,00	1,13	M2	CORTE 4
		2,97	0,65			1,00	1,93	M2	CORTE 4
		1,80	2,20			1,00	3,96	M2	CORTE 4
		0,76	0,25			1,00	0,19	M2	CORTE 4
		0,28	0,26			1,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,51	0,26			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		2,97	0,78			1,00	2,32	M2	CORTE 4
		0,61	1,97			1,00	1,20	M2	CORTE 4
		2,97	0,15			1,00	0,45	M2	CORTE 4
		0,61	0,30			1,00	0,18	M2	CORTE 4
		0,61	0,05			1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,16	2,00			1,00	0,32	M2	CORTE 4
		0,07	2,00			7,00	0,98	M2	CORTE 4
		0,14	2,00			1,00	0,28	M2	CORTE 4
		0,20	2,03			1,00	0,41	M2	CORTE 4
		0,15	1,51			1,00	0,23	M2	CORTE 4
		1,40	0,42			1,00	0,59	M2	CORTE 4
BAÑO ENTRADA INTERIOR		1,16	0,11			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		1,20	0,55			2,00	1,32	M2	CORTE 4
		0,63	0,58			1,00	0,37	M2	CORTE 4
		1,32	0,18			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		1,22	0,56			1,00	0,68	M2	CORTE 4
		0,72	0,11			1,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,72	0,10			1,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,72	6,00			1,00	4,32	M2	CORTE 4
		0,61	0,44			1,00	0,27	M2	CORTE 4
		1,15	0,11			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		1,15	0,13			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,55	0,44			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		1,07	0,57			1,00	0,61	M2	CORTE 4
		1,13	0,57			1,00	0,64	M2	CORTE 4
		1,07	0,57			1,00	0,61	M2	CORTE 4
CAMINADORES		2,02	6,20			1,00	12,52	M2	CORTE 4
COLUMNA		0,25	2,09			1,00	0,52	M2	CORTE 4
		0,12	2,09			1,00	0,25	M2	CORTE 4
VIGACANAL		4,20	0,32			1,00	1,34	M2	CORTE 4
		0,50	4,20			1,00	2,10	M2	CORTE 4
		0,26	4,20			1,00	1,09	M2	CORTE 4
COLUMNA		0,25	2,09			1,00	0,52	M2	CORTE 4


		0,20	0,77			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,25	2,09			1,00	0,52	M2	CORTE 4
		0,14	2,09			1,00	0,29	M2	CORTE 4
VIGA ENTRADA JARDIN		0,25	1,70			1,00	0,43	M2	CORTE 4
		0,14	1,52			1,00	0,21	M2	CORTE 4
COLUMNA PUERTA		0,14	1,27			1,00	0,18	M2	CORTE 4
		0,07	0,72			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,53	0,22			1,00	0,12	M2	CORTE 4
		0,06	1,78			1,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,17	2,02			1,00	0,34	M2	CORTE 4
MURO		1,32	2,51			1,00	3,31	M2	CORTE 4
		0,12	2,61			1,00	0,31	M2	CORTE 4
		0,92	0,60			1,00	0,55	M2	CORTE 4
		0,92	0,45			1,00	0,41	M2	CORTE 4
VIGA		0,30	6,20			1,00	1,86	M2	CORTE 4
DIVISION		0,12	6,20			1,00	0,74	M2	CORTE 4
		4,25	1,15			2,00	9,78	M2	CORTE 4
		0,11	4,25			1,00	0,47	M2	CORTE 4
		0,04	1,15			2,00	0,09	M2	CORTE 4
		1,18	1,15			1,00	1,36	M2	CORTE 4
		0,11	1,25			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,55	1,15			1,00	0,63	M2	CORTE 4
		0,52	1,15			1,00	0,60	M2	CORTE 4
COLUMNA VENTANA		0,12	2,09			1,00	0,25	M2	CORTE 4
		0,10	3,77			1,00	0,38	M2	CORTE 4
		0,12	1,40			1,00	0,17	M2	CORTE 4
MURO VENTANA		4,25	3,77			1,00	16,02	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		2,00	1,12			- 1,00	- 2,24	M2	CORTE 4
VENTANA		0,05	1,12			2,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,05	2,00			2,00	0,20	M2	CORTE 4
VIGA		0,22	6,32			1,00	1,39	M2	CORTE 4
		0,25	6,20			2,00	3,10	M2	CORTE 4
		0,22	6,20			1,00	1,36	M2	CORTE 4
COLUMNA		0,11	1,18			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,15	2,12			2,00	0,64	M2	CORTE 4
		0,17	0,61			1,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,10	1,42			1,00	0,14	M2	CORTE 4
MURO VENTANA ENTRADA		0,86	2,19			1,00	1,88	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,74	1,11			- 1,00	- 0,82	M2	CORTE 4
VENTANA		0,05	1,11			2,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,05	0,74			2,00	0,07	M2	CORTE 4
MODULO ENTRADA		0,57	2,09			1,00	1,19	M2	CORTE 4
		0,13	1,95			1,00	0,25	M2	CORTE 4
		0,97	0,14			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		1,65	2,08			1,00	3,43	M2	CORTE 4
		1,40	6,20			0,50	4,34	M2	CORTE 4
DECUENTO PUERTA		0,80	0,80			- 1,00	- 0,64	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,56	0,78			- 1,00	- 0,44	M2	CORTE 4
DESCUENTO VANO		0,54	0,42			- 1,00	- 0,23	M2	CORTE 4
MURO		0,21	1,85			1,00	0,39	M2	CORTE 4
		1,75	1,36			1,00	2,38	M2	CORTE 4
		0,05	1,30			2,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,05	1,75			2,00	0,18	M2	CORTE 4
		0,10	1,18			1,00	0,12	M2	CORTE 4
		2,22	1,50			1,00	3,33	M2	CORTE 4
		0,12	3,22			1,00	0,39	M2	CORTE 4
		2,00	3,07			1,00	6,14	M2	CORTE 4
BAÑO CAMINADORES		0,32	3,54			2,00	2,27	M2	CORTE 4
		0,30	3,30			1,00	0,99	M2	CORTE 4
		0,30	1,19			1,00	0,36	M2	CORTE 4
		0,28	3,54			1,00	0,99	M2	CORTE 4
		0,44	1,19			1,00	0,52	M2	CORTE 4
		3,17	0,92			1,50	4,37	M2	CORTE 4
		1,30	0,90			1,00	1,17	M2	CORTE 4
		0,06	3,54			1,00	0,21	M2	CORTE 4
PREJARDIN B		0,13	2,28			1,00	0,30	M2	CORTE 4
		0,21	2,28			1,00	0,48	M2	CORTE 4
		0,30	2,28			1,00	0,68	M2	CORTE 4
		0,15	2,30			1,00	0,35	M2	CORTE 4
		0,06	2,30			1,00	0,14	M2	CORTE 4


		0,04	2,30			1,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,23	2,19			4,00	2,01	M2	CORTE 4
		0,01	2,19			4,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,22	2,22			4,00	1,95	M2	CORTE 4
		0,01	2,22			4,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,06	1,28			13,00	1,00	M2	CORTE 4
		0,17	2,33			1,00	0,40	M2	CORTE 4
		0,32	3,08			1,00	0,99	M2	CORTE 4
		0,12	2,30			1,00	0,28	M2	CORTE 4
MAMPOSTERIA A LA VISTA PREJARDIN A		1,05	1,02			1,00	1,07	M2	CORTE 4
		0,13	1,02			2,00	0,27	M2	CORTE 4
		1,06	1,02			1,00	1,08	M2	CORTE 4
		2,45	1,02			1,00	2,50	M2	CORTE 4
		0,13	1,02			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,24	1,02			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,13	1,02			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		3,75	1,02			1,00	3,83	M2	CORTE 4
		0,13	1,02			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,24	1,02			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,13	1,02			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,72	2,96			1,00	2,13	M2	CORTE 4
		4,53	2,14			1,00	9,69	M2	CORTE 4
		0,73	2,14			1,00	1,56	M2	CORTE 4
		0,72	0,13			2,00	0,19	M2	CORTE 4
		0,73	0,13			1,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,13	1,02			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,24	1,02			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,13	1,02			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,07	1,02			1,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,07	1,02			1,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,07	1,02			1,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,07	1,02			1,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,07	1,02			1,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,15	1,02			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,24	1,02			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,13	1,02			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,44	1,02			1,00	0,45	M2	CORTE 4
		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,07	1,02			1,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,04	1,02			1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,44	1,02			1,00	0,45	M2	CORTE 4
		0,14	1,02			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,14	1,02			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,90	1,02			1,00	0,92	M2	CORTE 4
		0,07	1,02			1,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,07	1,02			1,00	0,07	M2	CORTE 4

		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,07	1,02			1,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,07	1,02			1,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,05	1,02			1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,06	1,02			1,00	0,06	M2	CORTE 4
		4,40	0,13			1,00	0,57	M2	CORTE 4
		4,40	0,24			1,00	1,06	M2	CORTE 4
		4,40	0,13			1,00	0,57	M2	CORTE 4
		4,22	0,25			4,00	4,22	M2	CORTE 4
		3,75	0,13			2,00	0,98	M2	CORTE 4
		3,75	0,24			1,00	0,90	M2	CORTE 4
		4,40	0,83			1,00	3,65	M2	CORTE 4
		3,75	0,83			1,00	3,11	M2	CORTE 4
		4,22	0,83			0,50	1,75	M2	CORTE 4
		4,22	0,25			1,00	1,06	M2	CORTE 4
		4,22	0,12			1,00	0,51	M2	CORTE 4
		4,22	0,70			1,00	2,95	M2	CORTE 4
		4,22	1,00			1,00	4,22	M2	CORTE 4
		0,12	0,84			1,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,12	1,70			1,00	0,20	M2	CORTE 4
		3,75	0,15			1,00	0,56	M2	CORTE 4
		3,75	0,22			1,00	0,83	M2	CORTE 4
		4,31	0,15			1,00	0,65	M2	CORTE 4
		4,31	0,22			1,00	0,95	M2	CORTE 4
		4,15	0,15			2,00	1,25	M2	CORTE 4
		4,15	0,26			1,00	1,08	M2	CORTE 4
		4,15	0,83			0,50	1,72	M2	CORTE 4
PASILLO PREJARDIN A - B		1,06	2,11			1,00	2,24	M2	CORTE 4
		0,12	1,00			1,00	0,12	M2	CORTE 4
		0,15	0,86			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,89	1,09			1,00	0,97	M2	CORTE 4
		2,46	2,10			1,00	5,17	M2	CORTE 4
		0,27	1,00			1,00	0,27	M2	CORTE 4
		3,73	1,49			1,00	5,56	M2	CORTE 4
		3,73	0,61			0,50	1,14	M2	CORTE 4
		1,03	0,18			0,50	0,09	M2	CORTE 4
		1,04	2,22			1,00	2,31	M2	CORTE 4
		1,41	2,12			1,00	2,99	M2	CORTE 4
		0,89	1,07			1,00	0,95	M2	CORTE 4
		0,55	0,99			1,00	0,54	M2	CORTE 4
		0,55	0,99			1,00	0,54	M2	CORTE 4
		0,26	1,05			1,00	0,27	M2	CORTE 4
		0,24	1,05			1,00	0,25	M2	CORTE 4
		0,30	0,69			1,00	0,21	M2	CORTE 4
		4,45	1,06			1,00	4,72	M2	CORTE 4
		4,45	1,22			0,50	2,71	M2	CORTE 4
		1,05	0,55			1,00	0,58	M2	CORTE 4
		0,30	0,27			1,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,24	4,45			1,00	1,07	M2	CORTE 4
		4,45	1,43			1,00	6,36	M2	CORTE 4
		0,80	0,32			1,00	0,26	M2	CORTE 4
		0,10	0,10			1,00	0,01	M2	CORTE 4
		4,45	0,25			1,00	1,11	M2	CORTE 4
		4,45	0,10			1,00	0,45	M2	CORTE 4
		4,45	1,05			1,00	4,67	M2	CORTE 4
		0,80	0,23			1,00	0,18	M2	CORTE 4
		0,93	0,23			1,00	0,21	M2	CORTE 4
		0,20	1,05			1,00	0,21	M2	CORTE 4
		2,30	1,32			1,00	3,04	M2	CORTE 4
		3,30	1,31			1,00	4,32	M2	CORTE 4
		2,38	1,10			1,00	2,62	M2	CORTE 4
		1,02	0,15			0,50	0,08	M2	CORTE 4


ESQUEMA GENERAL

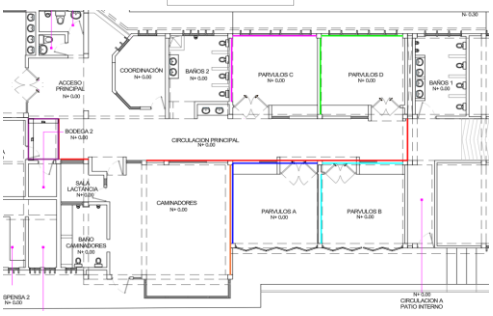





CUMBRERAS












MURO VENTANA


MURO ORIENTAL







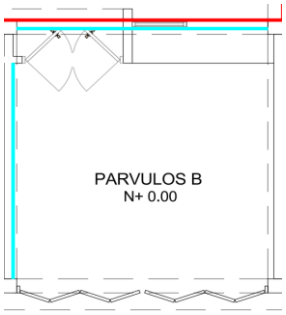








MURO ORIENTAL



MURO SOBRE PUERTA


MURO ORIENTAL










MURO ORIENTAL


MURO SOBRE PUERTA



MURO ORIENTAL










		2,30	1,32			1,00	3,04	M2	CORTE 4
		0,15	2,30			1,00	0,35	M2	CORTE 4
		0,24	2,30			2,00	1,10	M2	CORTE 4
		2,30	0,36			1,00	0,83	M2	CORTE 4
		3,75	0,62			1,00	2,33	M2	CORTE 4
		0,26	1,20			1,00	0,31	M2	CORTE 4
PASILLO PREJARDIN A - B		3,75	1,74			1,00	6,53	M2	CORTE 4
		2,30	0,96			1,00	2,21	M2	CORTE 4
		0,25	2,30			1,00	0,58	M2	CORTE 4
		2,30	0,96			1,00	2,21	M2	CORTE 4
		0,12	2,30			1,00	0,28	M2	CORTE 4
		0,26	1,00			1,00	0,26	M2	CORTE 4
		2,47	2,39			1,00	5,90	M2	CORTE 4
		0,89	1,37			1,00	1,22	M2	CORTE 4
		1,04	2,39			1,00	2,49	M2	CORTE 4
		0,15	1,00			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,15	1,02			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		2,30	1,12			1,00	2,58	M2	CORTE 4
		2,30	0,25			1,00	0,58	M2	CORTE 4
		2,30	0,12			1,00	0,28	M2	CORTE 4
		2,30	0,12			1,00	0,28	M2	CORTE 4
PREJARDIN B		4,53	0,25			4,00	4,53	M2	CORTE 4
		6,50	2,50			1,00	16,25	M2	CORTE 4
		0,96	2,50			1,00	2,40	M2	CORTE 4
		0,89	1,37			1,00	1,22	M2	CORTE 4
		5,32	0,13			2,00	1,38	M2	CORTE 4
		5,72	0,13			2,00	1,49	M2	CORTE 4
		3,22	2,26			1,00	7,28	M2	CORTE 4
		2,26	0,13			1,00	0,29	M2	CORTE 4
		4,70	2,18			1,00	10,25	M2	CORTE 4
		2,28	1,83			1,00	4,17	M2	CORTE 4
		2,28	0,19			1,00	0,43	M2	CORTE 4
		2,28	0,13			1,00	0,30	M2	CORTE 4
		4,51	1,18			1,00	5,32	M2	CORTE 4
		1,15	4,51			0,50	2,59	M2	CORTE 4
		0,13	1,09			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,13	1,08			1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,13	1,84			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,13	0,86			1,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,13	4,51			1,00	0,59	M2	CORTE 4
		0,24	4,51			1,00	1,08	M2	CORTE 4
		1,26	4,51			0,50	2,84	M2	CORTE 4
		0,25	4,51			1,00	1,13	M2	CORTE 4
		0,21	3,35			1,00	0,70	M2	CORTE 4
		0,27	3,35			1,00	0,90	M2	CORTE 4
		0,24	0,95			1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,14	0,95			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,14	0,95			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,14	0,95			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,13	0,95			1,00	0,12	M2	CORTE 4
		0,25	0,95			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,25	0,95			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,25	0,95			1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,13	0,95			1,00	0,12	M2	CORTE 4
		0,36	1,85			1,00	0,67	M2	CORTE 4
		1,85	0,93			1,00	1,72	M2	CORTE 4
		0,36	0,93			1,00	0,33	M2	CORTE 4
		1,42	0,93			1,00	1,32	M2	CORTE 4
		0,13	0,98			1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,16	0,98			1,00	0,16	M2	CORTE 4
		0,15	0,98			1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,17	0,98			1,00	0,17	M2	CORTE 4
		0,12	0,98			1,00	0,12	M2	CORTE 4
		1,40	0,98			1,00	1,37	M2	CORTE 4
		0,23	0,98			1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,16	5,12			1,00	0,82	M2	CORTE 4
		0,25	5,12			1,00	1,28	M2	CORTE 4
		0,13	5,12			1,00	0,67	M2	CORTE 4
		1,13	5,20			1,00	5,88	M2	CORTE 4
		0,23	1,07			1,00	0,25	M2	CORTE 4










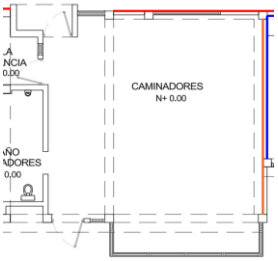













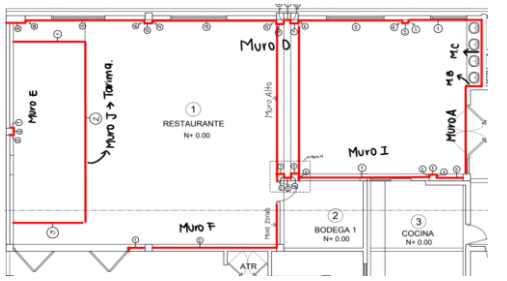











PINTURA SOBRE MAMPOTERIA (ROJO)							-	M2	CORTE 4
		2,30	1,00			1,00	2,30	M2	CORTE 4
		1,99	1,10			1,00	2,19	M2	CORTE 4
		2,03	1,10			1,00	2,23	M2	CORTE 4
		4,33	1,10			1,00	4,76	M2	CORTE 4
		3,10	1,10			1,00	3,41	M2	CORTE 4
		0,90	1,10			1,00	0,99	M2	CORTE 4
		1,27	1,10			1,00	1,40	M2	CORTE 4
CUMBRERA	0,50	2,30	0,60			1,00	0,69	M2	CORTE 4
PARVULOS D (VERDE)							-	M2	CORTE 4
		0,30	1,24			1,00	0,37	M2	CORTE 4
		0,33	1,24			1,00	0,41	M2	CORTE 4
		4,23	0,68			1,00	2,88	M2	CORTE 4
		3,44	1,94			1,00	6,67	M2	CORTE 4
		0,46	1,11			1,00	0,51	M2	CORTE 4
PARVULOS B (CYAN)							-	M2	CORTE 4
		3,96	2,13			1,00	8,43	M2	CORTE 4
DESCUENTO TABLERO		3,10	1,49			- 1,00	- 4,62	M2	CORTE 4
	0,50	4,43	1,02			1,00	2,26	M2	CORTE 4
		4,20	1,14			1,00	4,79	M2	CORTE 4
PARVULOS A (AZUL)							-	M2	CORTE 4
		4,05	2,05			1,00	8,30	M2	CORTE 4
DESCUENTO TABLERO		3,09	1,36			- 1,00	- 4,20	M2	CORTE 4
		0,50	1,31			1,00	0,66	M2	CORTE 4
		4,32	1,20			1,00	5,18	M2	CORTE 4
	0,50	4,45	1,14			1,00	2,54	M2	CORTE 4
PARVULOS C (MAGENTA)									
		0,31	1,26			1,00	0,39	M2	CORTE 4
		0,34	1,26			1,00	0,43	M2	CORTE 4
		4,27	0,70			1,00	2,99	M2	CORTE 4
		3,25	2,00			1,00	6,50	M2	CORTE 4
DESCUENTO TABLERO		3,11	1,57			- 1,00	- 4,88	M2	CORTE 4
CAMINADORES (NARANJA)							-	M2	CORTE 4
	0,50	6,08	1,16			2,00	7,05	M2	CORTE 4
BAJO PLACA ENTRADA PRINCIPAL (MORADO)							-	M2	CORTE 4
		2,25	0,96			1,00	2,16	M2	CORTE 4
ACTA PARCIAL No. 5									
COMEDOR							-		
MURO A		3,31		1,60		1,00	5,28	M2	CORTE 5
DESCUENTO PUERTA PRINCIPAL		1,93		0,85		- 1,00	- 1,64	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA FIJA		0,59		1,67		- 1,00	- 0,99	M2	CORTE 5
MURO B		0,57		1,00		1,00	0,57	M2	CORTE 5
MURO C		2,49		0,82		1,00	2,03	M2	CORTE 5
MURO D							-		
MURO 1		2,00		0,93		1,00	1,86	M2	CORTE 5
DESCUENTO ENCHAPE		0,59		1,44		- 1,00	- 0,85	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		1,24		1,24		- 1,00	- 1,54	M2	CORTE 5
MURO 2		0,10		0,93		1,00	0,09	M2	CORTE 5
MURO 3		0,24		0,93		1,00	0,22	M2	CORTE 5
MURO 4		0,10		0,93		1,00	0,09	M2	CORTE 5
MURO 5		4,23		0,93		1,00	3,93	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		2,04		1,24		- 1,00	- 2,53	M2	CORTE 5
MURO 6		0,11		0,93		1,00	0,10	M2	CORTE 5
MURO 7		0,25		0,93		1,00	0,23	M2	CORTE 5
MURO 8		0,11		0,93		1,00	0,10	M2	CORTE 5
MURO 9		0,26		0,93		1,00	0,24	M2	CORTE 5
MURO 10		0,11		0,93		1,00	0,10	M2	CORTE 5
MURO 11		0,25		0,93		1,00	0,23	M2	CORTE 5
MURO 12		0,11		0,93		1,00	0,10	M2	CORTE 5
MURO 13		4,28		0,93		1,00	3,98	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		2,04		1,24		- 1,00	- 2,53	M2	CORTE 5
MURO 14		0,12		0,93		1,00	0,11	M2	CORTE 5
MURO 15		0,25		0,93		1,00	0,23	M2	CORTE 5
MURO 16		0,12		0,93		1,00	0,11	M2	CORTE 5
MURO 17		4,53		0,93		1,00	4,21	M2	CORTE 5
MURO 18		0,11		0,93		1,00	0,10	M2	CORTE 5
MURO 19		0,17		0,93		1,00	0,16	M2	CORTE 5
MURO E							-		
MURO 1		0,83		0,47		1,00	0,39	M2	CORTE 5
MURO 2		3,10		0,33		1,00	1,02	M2	CORTE 5

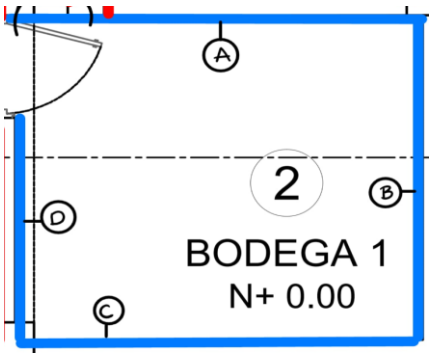

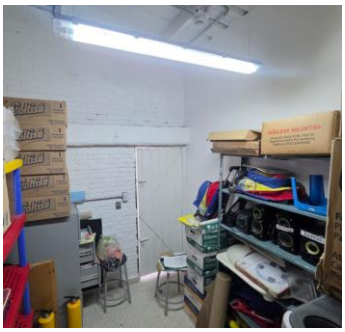



MURO 3		3,93		0,31		1,00	1,22	M2	CORTE 5
MURO CUCHILLA		2,40		0,22		1,00	0,52	M2	CORTE 5
MURO CUCHILLA		3,93		0,78		1,00	3,06	M2	CORTE 5
VIGA A							-		
CARA FRONTAL		3,92		0,24		1,00	0,94	M2	CORTE 5
CARA SUPERIOR		2,40		0,13		1,00	0,31	M2	CORTE 5
CARA INFERIOR		3,92		0,12		1,00	0,47	M2	CORTE 5
VIGA B							-		
CARA FRONTAL		3,93		0,24		1,00	0,94	M2	CORTE 5
CARA SUPERIOR		3,93		0,13		1,00	0,51	M2	CORTE 5
CARA INFERIOR		3,93		0,12		1,00	0,47	M2	CORTE 5
COLUMNA C							-		
LADO 1-3		0,14		1,07		2,00	0,30	M2	CORTE 5
LADO 2		0,25		1,07		1,00	0,27	M2	CORTE 5
MURO F							-		
COLUMNA 1		0,13		2,00		1,00	0,26	M2	CORTE 5
		0,19		2,00		1,00	0,38	M2	CORTE 5
MURO 1		4,51		1,10		1,00	4,96	M2	CORTE 5
MURO 2		0,50		0,92		1,00	0,46	M2	CORTE 5
MURO 3		4,22		1,10		1,00	4,64	M2	CORTE 5
MURO 4		4,22		0,92		1,00	3,88	M2	CORTE 5
CARTERA PUERTA		0,10		2,02		1,00	0,20	M2	CORTE 5
VIGA A							-		
CARA FRONTAL		4,51		0,26		1,00	1,17	M2	CORTE 5
CARA INFERIOR		4,51		0,22		1,00	0,99	M2	CORTE 5
VIGA B							-		
CARA FRONTAL		4,22		0,25		1,00	1,06	M2	CORTE 5
CARA INFERIOR		4,22		0,14		1,00	0,59	M2	CORTE 5
COLUMNA C							-		
CARA FRONTAL		0,25		2,36		1,00	0,59	M2	CORTE 5
CARA LATERALES		0,14		2,36		2,00	0,66	M2	CORTE 5
MURO G							-		
COLUMNA		0,13		1,10		1,00	0,14	M2	CORTE 5
MURO MAMPOSTERIA 1		2,44		0,95		1,00	2,32	M2	CORTE 5
MURO MAMPOSTERIA 2		2,44		0,25		1,00	0,61	M2	CORTE 5
MURO MAMPOSTERIA 3		1,65		0,92		1,00	1,52	M2	CORTE 5
MURO MAMPOSTERIA 4		0,25		0,94		1,00	0,24	M2	CORTE 5
MURO ALTO		5,55		0,53		2,00	5,83	M2	CORTE 5
CARA BAJA		5,55		0,76		1,00	4,22	M2	CORTE 5
MURO H							-		
MURO 1		0,25		0,94		1,00	0,24	M2	CORTE 5
MURO 2		0,13		0,94		1,00	0,12	M2	CORTE 5
MURO 3		0,27		0,94		1,00	0,25	M2	CORTE 5
MURO 4		0,13		0,94		1,00	0,12	M2	CORTE 5
MURO 5		0,25		0,94		1,00	0,24	M2	CORTE 5
MURO 6		0,12		0,94		1,00	0,11	M2	CORTE 5
MURO I							-		
MURO 1		4,23		0,94		1,00	3,98	M2	CORTE 5
MURO 2		0,11		0,94		1,00	0,10	M2	CORTE 5
MURO 3		0,25		0,94		1,00	0,24	M2	CORTE 5
MURO 4		0,10		0,94		1,00	0,09	M2	CORTE 5
MURO 5		1,43		0,94		1,00	1,34	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		1,74		1,31	-	1,00	- 2,28	M2	CORTE 5
DESCUENTO ALFAJIA		1,81		0,10	-	1,00	- 0,18	M2	CORTE 5
MURO ALTO		5,91		0,90		1,00	5,31	M2	CORTE 5
CARTERA MURO ALTO		5,91		0,10		1,00	0,59	M2	CORTE 5
							-		
BODEGA							-		
MURO A		2,99		1,22		1,00	3,65	M2	CORTE 5
MURO B		2,31		2,36		1,00	5,45	M2	CORTE 5
MURO C		2,99		0,88		1,00	2,63	M2	CORTE 5
VIGA		2,99		0,25		1,00	0,75	M2	CORTE 5
CARTERA VIGA		2,99		0,12		1,00	0,36	M2	CORTE 5
MURO ALTO		2,99		1,28		1,00	3,83	M2	CORTE 5
COLUMNA		0,12		2,16		2,00	0,52	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		1,09		0,54		1,00	0,59	M2	CORTE 5
CARTERA VENTANA		3,26		0,05		1,00	0,16	M2	CORTE 5
MURO D		1,52		0,88		1,00	1,34	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		2,31		0,25		1,00	0,58	M2	CORTE 5
VIGA CARA INFERIOR		2,31		0,14		1,00	0,32	M2	CORTE 5

MURO ALTO		2,31		1,25		1,00	2,88	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	817,22	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	724,76	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**92,46**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
92,46	724,76	**817,22**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	CONTRATO No.	10676	FRENTE OBRA	012
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	CONTRATO No:	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			FECHA	12/06/2026

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	ACTA No:	005
ÍTEM	22.1.10 PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No. 5									
BODEGA (AZUL)							-		
PUERTA		0,70		2,00		2,00	2,80	M2	CORTE 5
COMEDOR (GRIS)							-		
PUERTA		0,66		1,65		2,00	2,18	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		0,58		0,98		- 1,00	- 0,57	M2	CORTE 5
'COMEDOR (ROSADO)							-		
REJA 1		1,24		1,24		1,00	1,54	M2	CORTE 5
REJA 2-3		2,04		1,24		2,00	5,06	M2	CORTE 5
REJA 4		2,05		1,24		1,00	2,54	M2	CORTE 5
ACCESO (CAFÉ)							-		
PUERTA		1,30		1,95		2,00	5,07	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		0,74		0,90		- 1,00	- 0,67	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		0,28		0,90		- 1,00	- 0,25	M2	CORTE 5
BAÑOS 2 (VERDE LIMON)							-		
REJA		1,99		0,94		1,00	1,87	M2	CORTE 5
PARVULOS A (VERDE CLARO)							-		
PUERTA Y REJAS		4,20		2,04		2,00	17,14	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		0,43		1,56		- 8,00	- 5,37	M2	CORTE 5
PARVULOS B (NARANJA)							-		
PUERTA Y REJAS		4,32		2,04		2,00	17,63	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		0,43		1,56		- 8,00	- 5,37	M2	CORTE 5
CAMINADORES (CYAN)							-		
PUERTA		1,00		2,12		2,00	4,24	M2	CORTE 5
LAVANDERIA (ROJO)							-		
PUERTA 1		1,17		2,00		2,00	4,68	M2	CORTE 5
PUERTA 2		0,74		2,00		2,00	2,96	M2	CORTE 5
VENTANA PERSIANA		0,75		0,44		1,00	0,33	M2	CORTE 5
DESPENSA 1 (AMARILLO CLARO)							-		
PUERTA		0,73		2,00		2,00	2,92	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		0,09		0,36		- 2,00	- 0,06	M2	CORTE 5
DESPENSA 2 (AMARILLO CLARO)							-		
PUERTA		0,76		2,00		2,00	3,04	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		0,09		0,36		- 2,00	- 0,06	M2	CORTE 5
PORTON FACHADA LATERAL (MORADO)							-		
REJA		1,06		0,93		2,00	1,97	M2	CORTE 5
COORDINACIÓN (MAGENTA)							-		
REJA 1		0,91		1,36		1,00	1,24	M2	CORTE 5
REJA 2		0,91		1,38		1,00	1,26	M2	CORTE 5
PARVULOS C (LILA)							-		
REJA 1-3		0,44		1,27		2,00	1,12	M2	CORTE 5
REJA 2-4		0,99		1,27		2,00	2,51	M2	CORTE 5
REJA 5		0,39		1,27		1,00	0,50	M2	CORTE 5
PARVULOS D (VERDE MENTA)							-		
REJA 1		0,41		1,26		1,00	0,52	M2	CORTE 5
REJA 2-4		0,99		1,26		2,00	2,49	M2	CORTE 5
REJA 3-5		0,45		1,26		2,00	1,13	M2	CORTE 5
BAÑOS 1 (AMARILLO)							-		
REJA 1-3		0,54		1,09		2,00	1,18	M2	CORTE 5
REJA 2		0,53		1,09		1,00	0,58	M2	CORTE 5
PRE JARDIN A (AZUL REY)							-		
REJA 1-5		0,42		1,29		2,00	1,08	M2	CORTE 5
REJA 2-4		1,00		1,29		2,00	2,58	M2	CORTE 5
REJA 3		0,52		1,29		1,00	0,67	M2	CORTE 5
REJA 6-10		0,42		1,27		2,00	1,07	M2	CORTE 5
REJA 7-9		0,94		1,27		2,00	2,39	M2	CORTE 5
REJA 8		0,46		1,27		1,00	0,58	M2	CORTE 5
REJA 11-12-13-14-15		0,48		1,27		5,00	3,05	M2	CORTE 5
PRE JARDIN B (VERDE OSCURO)							-		
REJA 1-2-3-4-9		0,49		1,28		5,00	3,14	M2	CORTE 5
REJA 5		0,48		1,28		1,00	0,61	M2	CORTE 5
REJA 6-7-8		0,79		1,28		3,00	3,03	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	94,35	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**94,35**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
94,35	0,00	**94,35**


OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	NOMBRE	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2026

CAPITULO		**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.1.11**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M**

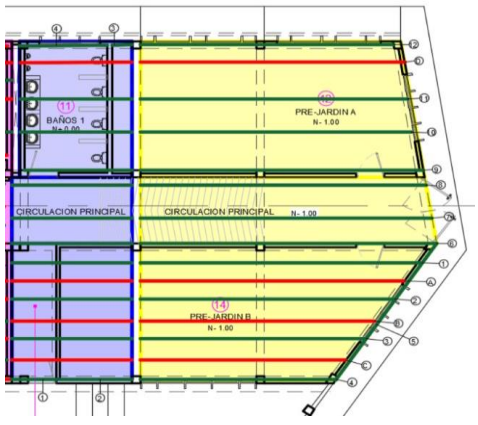
ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**ACTA PARCIAL No. 2**									
	PARVULOS B (NUEVO) (Rojo)			4,36			4,00	17,44	M	CORTE 2
	PARVULOS A (NUEVO) (Rojo)			4,36			4,00	17,44	M	CORTE 2
	PARVULOS D (NUEVO)(Rojo)			4,36			4,00	17,44	M	CORTE 2
	PARVULOS C (NUEVO)(Rojo)			4,36			4,00	17,44	M	CORTE 2
	BAÑOS 2 (NUEVO)(Rojo)			2,83			4,00	11,32	M	CORTE 2
	CAMINADORES (NUEVO)(Rojo)			7,36			5,00	36,80	M	CORTE 2
	COCINA (NUEVO)(Rojo)			4,60			1,00	4,60	M	CORTE 2
	COCINA (NUEVO)(Rojo)			1,95			2,00	3,90	M	CORTE 2
	COORDINACIÓN (NUEVO)(Rojo)			4,30			1,00	4,30	M	CORTE 2
	COORDINACIÓN (NUEVO)(Rojo)			2,00			1,00	2,00	M	CORTE 2
	ACCESO + RESTAURANTE (Rojo)			8,60			1,00	8,60	M	CORTE 2
	RESTAURANTE (NUEVO)(Rojo)			9,10			2,00	18,20	M	CORTE 2
	PARVULOS B (ANTIGUO)(Verde)			4,36			2,00	8,72	M	CORTE 2
	PARVULOS A (ANTIGUO)(Verde)			4,36			2,00	8,72	M	CORTE 2
	CAMINADORES (ANTIGUO)(Verde)			7,36			4,00	29,44	M	CORTE 2
	BAÑO CAMINADORES (ANTIGUO)(Verde)			1,32			2,00	2,64	M	CORTE 2
	DESPENSA 3 (ANTIGUO)(Verde)			3,00			2,00	6,00	M	CORTE 2
	DESPENSA 1 (ANTIGUO)(Verde)			2,00			2,00	4,00	M	CORTE 2
	COCINA (ANTIGUO)(Verde)			1,95			1,00	1,95	M	CORTE 2
	COCINA (ANTIGUO)(Verde)			4,60			1,00	4,60	M	CORTE 2
	CIRCULACIÓN PRINCIPAL (Rojo)			7,28			3,00	21,84	M	CORTE 2
	PRE JARDIN A (Verde)			12,80			7,00	89,60	M	CORTE 2
	PRE JARDIN B (Verde)			8,25			4,00	33,00	M	CORTE 2
	PRE JARDIN B (Verde)			7,65			1,00	7,65	M	CORTE 2
	PRE JARDIN B (Verde)			6,70			1,00	6,70	M	CORTE 2
	PRE JARDIN B (Verde)			5,70			1,00	5,70	M	CORTE 2
	PRE JARDIN B (Verde)			3,95			4,00	15,80	M	CORTE 2
	BAÑOS (Verde)			2,83			4,00	11,32	M	CORTE 2
	PARVULOS C Y D (Verde)			8,90			3,00	26,70	M	CORTE 2
	ACTA PARCIAL No. 3									
	**AREA AMARILLA**									
	PREJARDIN B #1 (VERDE)			8,60			1,00	8,60	M	CORTE 3
	PREJARDIN B #2(VERDE)			7,70			1,00	7,70	M	CORTE 3
	PREJARDIN B #3(VERDE)			6,80			1,00	6,80	M	CORTE 3
	PREJARDIN B #4(VERDE)			5,90			1,00	5,90	M	CORTE 3
	PREJARDIN B #5(VERDE)			5,40			1,00	5,40	M	CORTE 3
	PREJARDIN B A (ROJO)			8,00			1,00	8,00	M	CORTE 3
	PREJARDIN B B (ROJO)			7,25			1,00	7,25	M	CORTE 3
	PREJARDIN B C (ROJO)			6,20			1,00	6,20	M	CORTE 3
	PASILLO #6 (VERDE)			8,60			1,00	8,60	M	CORTE 3
	PASILLO #7 (VERDE)			8,58			1,00	8,58	M	CORTE 3
	PASILLO #8 (VERDE)			8,56			1,00	8,56	M	CORTE 3
	PRE JARDIN A #9 (VERDE)			8,66			1,00	8,66	M	CORTE 3
	PRE JARDIN A #10 (VERDE)			8,62			1,00	8,62	M	CORTE 3
	PRE JARDIN A #11 (VERDE)			8,58			1,00	8,58	M	CORTE 3
	PRE JARDIN A #12 (VERDE)			8,50			1,00	8,50	M	CORTE 3
	PRE JARDIN A D (ROJO)			8,14			1,00	8,14	M	CORTE 3
	**AREA AZUL OSCURO**									
	AREA ENTRE PREJARDIN B Y PARVULOS B (VERDE)			4,00			3,00	12,00	M	CORTE 3
	AREA ENTRE PREJARDIN B Y PARVULOS B #1 (VERDE)			0,85			1,00	0,85	M	CORTE 3
	AREA ENTRE PREJARDIN B Y PARVULOS B #2 (VERDE)			2,45			1,00	2,45	M	CORTE 3
	AREA ENTRE PREJARDIN B Y PARVULOS B (ROJO)			3,47			3,00	10,41	M	CORTE 3
	PASILLO (VERDE)			3,45			3,00	10,35	M	CORTE 3
	BAÑOS1 (VERDE)			3,17			3,00	9,51	M	CORTE 3
	BAÑOS 1 #3(VERDE)			0,85			1,00	0,85	M	CORTE 4

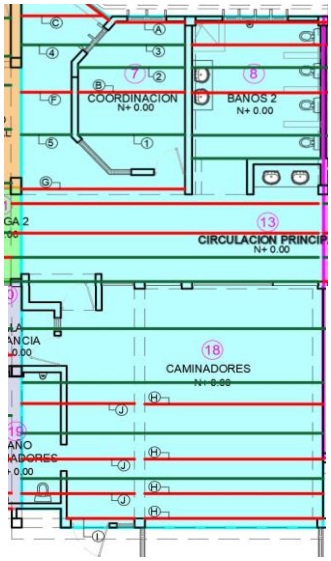


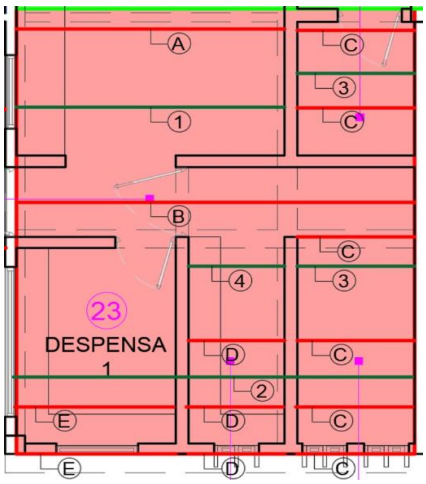






BAÑOS 1 #4(VERDE)			2,65			1,00	2,65	M	CORTE 5
BAÑOS 1 (ROJO)			3,17			1,00	3,17	M	CORTE 3
AREA MAGENTA									
PASILLO (VERDE)			8,20			2,00	16,40	M	CORTE 3
PASILLO (ROJO)			8,20			2,00	16,40	M	CORTE 3
PARVULOS D (VERDE)			4,37			2,00	8,74	M	CORTE 3
PARVULOS D (ROJO)			4,37			4,00	17,48	M	CORTE 3
PARVULOS C (VERDE)			4,37			2,00	8,74	M	CORTE 3
PARVULOS C (ROJO)			4,37			4,00	17,48	M	CORTE 3
PARVULOS B (VERDE)			4,37			2,00	8,74	M	CORTE 3
PARVULOS B (ROJO)			4,37			4,00	17,48	M	CORTE 3
PARVULOS A (VERDE)			4,37			2,00	8,74	M	CORTE 3
PARVULOS A (ROJO)			4,37			4,00	17,48	M	CORTE 3
AREA CYAN									
PASILLO (VERDE)			7,45			2,00	14,90	M	CORTE 3
PASILLO (ROJO)			7,45			2,00	14,90	M	CORTE 3
BAÑOS 2 (VERDE)			2,88			3,00	8,64	M	CORTE 3
BAÑOS 2 (ROJO)			2,88			3,00	8,64	M	CORTE 3
COORDINACIÓN #1(VERDE)			2,52			1,00	2,52	M	CORTE 3
COORDINACIÓN #2(VERDE)			2,80			1,00	2,80	M	CORTE 3
COORDINACIÓN #3 (VERDE)			2,23			1,00	2,23	M	CORTE 3
COORDINACION A (ROJO)			1,85			1,00	1,85	M	CORTE 3
COORDINACION B (ROJO)			2,80			1,00	2,80	M	CORTE 3
ACCESO #4 (VERDE)			1,90			1,00	1,90	M	CORTE 3
ACCESO #5(VERDE)			1,65			1,00	1,65	M	CORTE 3
ACCESO C (ROJO)			2,00			1,00	2,00	M	CORTE 3
ACCESO D (ROJO)			1,20			1,00	1,20	M	CORTE 3
ACCESO E(ROJO)			1,60			1,00	1,60	M	CORTE 3
ACCESO F (ROJO)			1,40			1,00	1,40	M	CORTE 3
ACCESO G (ROJO)			4,35			1,00	4,35	M	CORTE 3
CAMINADORES (VERDE)			7,47			4,00	29,88	M	CORTE 3
CAMINADORES H (ROJO)			4,40			4,00	17,60	M	CORTE 3
PASILLO CAMINADORES I (ROJO)			1,90			1,00	1,90	M	CORTE 3
PASILLO -BAÑOS CAMINADORES J (ROJO)			2,90			3,00	8,70	M	CORTE 3
AREA NARANJA									
ACCESO PRINCIPAL - RESTAURANTE CORREA TRANSVERSAL (VERDE)			5,65			1,00	5,65	M	CORTE 3
ACCESO PRINCIPAL - RESTAURANTE (VERDE)			9,00			5,00	45,00	M	CORTE 3
ACCESO PRINCIPAL - RESTAURANTE (ROJO)			9,00			1,00	9,00	M	CORTE 3
AREA MORADO									
RESTAURANTE (VERDE)			9,10			7,00	63,70	M	CORTE 3
RESTAURANTE CORREA TRANSVERSAL (VERDE)			8,55			1,00	8,55	M	CORTE 3
RESTAURANTE (ROJO)			9,10			2,00	18,20	M	CORTE 3
AREA AZUL CIELO									
BODEGA 1 (VERDE)			3,00			2,00	6,00	M	CORTE 3
BODEGA 1 (ROJO)			3,00			1,00	3,00	M	CORTE 3
AREA VERDE									
COCINA- BODEGA 2 (VERDE)			4,71			1,00	4,71	M	CORTE 3
COCINA- BODEGA 2 (ROJO)			4,71			1,00	4,71	M	CORTE 3
AREA LILA									
SALA DE LACTANCIA (VERDE)			1,35			1,00	1,35	M	CORTE 3
SALA DE LACTANCIA (ROJO)			1,30			1,00	1,30	M	CORTE 3
BAÑO CAMINADORES (VERDE)			1,35			1,00	1,35	M	CORTE 3
BAÑO CAMINADORES (ROJO)			1,30			3,00	3,90	M	CORTE 3
AREA ROJA									
COCINA A (ROJO)			1,90			1,00	1,90	M	CORTE 3
COCINA 1 (VERDE)			1,90			1,00	1,90	M	CORTE 3
COCINA B (ROJO)			5,00			1,00	5,00	M	CORTE 3
DESPENSA 1-2-3 #2 (VERDE)			5,00			1,00	5,00	M	CORTE 3
DESPENSA 3 C (ROJO)			1,55			6,00	9,30	M	CORTE 3
DESPENSA 3 #3 (VERDE)			1,55			2,00	3,10	M	CORTE 3
DESPENSA 2 #4 (VERDE)			1,45			1,00	1,45	M	CORTE 3
DESPENSA 2 D (ROJO)			1,45			3,00	4,35	M	CORTE 3
DESPENSA 1 E (ROJO)			1,90			2,00	3,80	M	CORTE 3
AREA GRIS									
CUBIERTA CUARTO DE ASEO (ROJO)			1,20			2,00	2,40	M	CORTE 3
CUBIERTA CUARTO DE ASEO (VERDE)			0,80			3,00	2,40	M	CORTE 3
CUBIERTA CUARTO DE ASEO (VERDE)			1,20			1,00	1,20	M	CORTE 3
							-		
							-		
DESCUENTO ACTA 2	443,86					- 1,00	- 443,86	M	CORTE 3











CAMINADORES








ACTA PARCIAL No. 4									
PINTURA MARCO DE PUERTA									
CAMINADORES			2,00			2,00	4,00	M	CORTE 4
			0,80			1,00	0,80	M	CORTE 4
COORDINACIÓN			2,01			2,00	4,02	M	CORTE 4
			0,76			1,00	0,76	M	CORTE 4
PARVULOS C			2,00			2,00	4,00	M	CORTE 4
			1,76			1,00	1,76	M	CORTE 4
PARVULOS D			2,00			2,00	4,00	M	CORTE 4
			1,76			1,00	1,76	M	CORTE 4
PARVULOS A			2,00			2,00	4,00	M	CORTE 4
			1,76			1,00	1,76	M	CORTE 4
PARVULOS B			2,00			2,00	4,00	M	CORTE 4
			1,76			1,00	1,76	M	CORTE 4
BAÑOS 2			2,20			2,00	4,40	M	CORTE 4
			0,85			2,00	1,70	M	CORTE 4
PRE JARDIN A			2,18			2,00	4,36	M	CORTE 4
			0,85			2,00	1,70	M	CORTE 4
PRE JARDIN B			2,18			2,00	4,36	M	CORTE 4
			0,81			2,00	1,62	M	CORTE 4
BODEGA 2			2,02			2,00	4,04	M	CORTE 4
			0,70			1,00	0,70	M	CORTE 4
COCINA			2,03			2,00	4,06	M	CORTE 4
			0,83			1,00	0,83	M	CORTE 4
RESTAURANTE			2,04			2,00	4,08	M	CORTE 4
			1,84			1,00	1,84	M	CORTE 4
			0,61			3,00	1,83	M	CORTE 4
			1,62			1,00	1,62	M	CORTE 4
BAÑO MUJERES			2,03			2,00	4,06	M	CORTE 4
			0,52			1,00	0,52	M	CORTE 4
BAÑO HOMBRES			2,04			2,00	4,08	M	CORTE 4
			0,65			1,00	0,65	M	CORTE 4
ACTA PARCIAL No. 5									
BAÑO CAMINADORES							-		
VENTANA			1,10			2,00	2,20	M	CORTE 5
			1,26			2,00	2,52	M	CORTE 5
			0,97			1,00	0,97	M	CORTE 5
LAVANDERIA			1,18			2,00	2,36	M	CORTE 5
			0,50			2,00	1,00	M	CORTE 5
			0,42			1,00	0,42	M	CORTE 5
CERRAMIENTO							-		
ELEMENTOS DE SOPORTE PARA ALAMBRE DE PUAS							-		
E1			0,76			1,00	0,76	M	CORTE 5
E2			0,71			1,00	0,71	M	CORTE 5
E3			0,76			1,00	0,76	M	CORTE 5
E4			0,75			1,00	0,75	M	CORTE 5
E5			0,79			1,00	0,79	M	CORTE 5
E6			0,73			1,00	0,73	M	CORTE 5
E7			0,74			1,00	0,74	M	CORTE 5
E8			0,81			1,00	0,81	M	CORTE 5
E9			0,74			1,00	0,74	M	CORTE 5
E10			0,76			1,00	0,76	M	CORTE 5
E11			0,72			1,00	0,72	M	CORTE 5
E12			0,77			1,00	0,77	M	CORTE 5
E13			0,66			1,00	0,66	M	CORTE 5
E14			0,70			1,00	0,70	M	CORTE 5
E15			0,70			1,00	0,70	M	CORTE 5
E16			0,64			1,00	0,64	M	CORTE 5
E17			0,70			1,00	0,70	M	CORTE 5
E18			0,70			1,00	0,70	M	CORTE 5
E19			0,70			1,00	0,70	M	CORTE 5
E20			0,73			1,00	0,73	M	CORTE 5
E21			0,67			1,00	0,67	M	CORTE 5
E22			0,67			1,00	0,67	M	CORTE 5
E23			0,66			1,00	0,66	M	CORTE 5
E24			0,71			1,00	0,71	M	CORTE 5
E25			0,66			1,00	0,66	M	CORTE 5
E26			0,67			1,00	0,67	M	CORTE 5
E27			0,68			1,00	0,68	M	CORTE 5

								-		

TOTAL EJECUTADO	771,52	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	742,76	M	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M	
PRESENTE ACTA	**28,76**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
28,76	742,76	**771,52**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO		**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.1.12**	**PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M2**

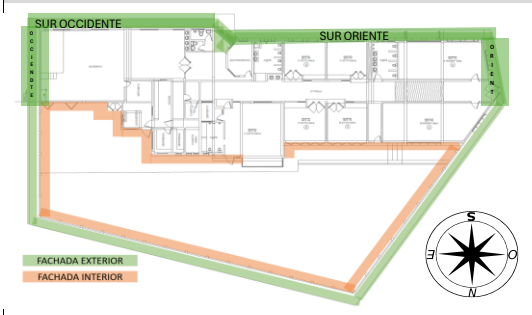ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 4									
	**MURO PERIMETRAL INTERIOR**		0,16		2,16		1,00	0,35	M2	CORTE 4
			0,12		0,92		1,00	0,11	M2	CORTE 4
			0,92		0,88		1,00	0,81	M2	CORTE 4
			0,20		1,16		2,00	0,46	M2	CORTE 4
			0,23		2,05		1,00	0,47	M2	CORTE 4
			0,05		0,88		2,00	0,09	M2	CORTE 4
			0,12		2,20		1,00	0,26	M2	CORTE 4
			2,20		0,91		1,00	2,00	M2	CORTE 4
			0,21		1,09		1,00	0,23	M2	CORTE 4
			0,91		0,05		1,00	0,05	M2	CORTE 4
			0,24		2,03		1,00	0,49	M2	CORTE 4
			0,21		1,29		1,00	0,27	M2	CORTE 4
			0,21		0,70		1,00	0,15	M2	CORTE 4
			0,21		0,11		1,00	0,02	M2	CORTE 4
			0,05		0,70		1,00	0,04	M2	CORTE 4
			0,05		0,65		2,00	0,07	M2	CORTE 4
			0,21		1,12		1,00	0,24	M2	CORTE 4
			0,23		1,79		1,00	0,41	M2	CORTE 4
			0,21		1,12		1,00	0,24	M2	CORTE 4
			0,12		2,06		1,00	0,25	M2	CORTE 4
			2,06		0,70		1,00	1,44	M2	CORTE 4
			0,21		1,08		1,00	0,23	M2	CORTE 4
			0,05		0,71		1,00	0,04	M2	CORTE 4
			0,24		1,97		1,00	0,47	M2	CORTE 4
			0,21		1,29		1,00	0,27	M2	CORTE 4
			0,05		0,60		1,00	0,03	M2	CORTE 4
			2,17		0,12		1,00	0,26	M2	CORTE 4
			2,17		0,84		1,00	1,82	M2	CORTE 4
			0,23		2,04		1,00	0,47	M2	CORTE 4
			0,05		0,88		1,00	0,04	M2	CORTE 4
			0,05		0,92		1,00	0,05	M2	CORTE 4
			0,12		2,27		1,00	0,27	M2	CORTE 4
			2,27		0,98		1,00	2,22	M2	CORTE 4
			0,21		1,09		1,00	0,23	M2	CORTE 4
			0,21		1,09		1,00	0,23	M2	CORTE 4
			0,20		1,96		1,00	0,39	M2	CORTE 4
			0,15		1,08		2,00	0,32	M2	CORTE 4
			0,12		2,24		1,00	0,27	M2	CORTE 4
			2,24		0,95		1,00	2,13	M2	CORTE 4
			0,23		2,04		1,00	0,47	M2	CORTE 4
			0,05		0,92		1,00	0,05	M2	CORTE 4
			0,21		1,08		1,00	0,23	M2	CORTE 4
			0,21		1,08		1,00	0,23	M2	CORTE 4
			0,05		0,90		1,00	0,05	M2	CORTE 4
			0,12		2,20		1,00	0,26	M2	CORTE 4
			2,20		0,90		1,00	1,98	M2	CORTE 4
			0,05		0,93		1,00	0,05	M2	CORTE 4
			0,23		2,06		1,00	0,47	M2	CORTE 4
			0,21		1,11		1,00	0,23	M2	CORTE 4
			0,21		1,12		1,00	0,24	M2	CORTE 4
			0,05		0,90		1,00	0,05	M2	CORTE 4
			0,12		2,29		1,00	0,27	M2	CORTE 4
			2,29		0,88		1,00	2,02	M2	CORTE 4
			0,05		0,88		1,00	0,04	M2	CORTE 4
			0,21		1,11		1,00	0,23	M2	CORTE 4













		0,21		1,12		1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,23		2,04		1,00	0,47	M2	CORTE 4
		0,05		0,87		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,12		2,33		1,00	0,28	M2	CORTE 4
		2,33		0,89		1,00	2,07	M2	CORTE 4
		0,05		0,95		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,21		1,11		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,21		1,12		1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,23		2,08		1,00	0,48	M2	CORTE 4
		0,05		0,98		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,12		2,20		1,00	0,26	M2	CORTE 4
		2,20		1,02		1,00	2,24	M2	CORTE 4
		0,05		1,00		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,21		1,09		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,23		2,11		1,00	0,49	M2	CORTE 4
		0,05		2,03		1,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,12		2,33		1,00	0,28	M2	CORTE 4
		2,33		1,05		1,00	2,45	M2	CORTE 4
		0,05		1,00		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,21		1,12		1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,21		1,11		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,23		2,20		1,00	0,51	M2	CORTE 4
		0,05		1,00		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,12		2,20		1,00	0,26	M2	CORTE 4
		2,20		1,05		1,00	2,31	M2	CORTE 4
		0,05		1,06		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,21		1,11		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,23		2,19		1,00	0,50	M2	CORTE 4
		0,05		1,03		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,12		2,17		1,00	0,26	M2	CORTE 4
		2,17		1,08		1,00	2,34	M2	CORTE 4
		0,05		1,07		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,21		1,12		1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,21		1,11		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,23		2,23		1,00	0,51	M2	CORTE 4
		0,05		1,09		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,12		2,35		1,00	0,28	M2	CORTE 4
		2,35		1,12		1,00	2,63	M2	CORTE 4
		0,05		1,11		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,21		1,58		1,00	0,33	M2	CORTE 4
		0,23		2,27		1,00	0,52	M2	CORTE 4
		0,05		0,65		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,12		2,23		1,00	0,27	M2	CORTE 4
		2,23		0,69		1,00	1,54	M2	CORTE 4
		0,05		0,70		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,21		1,11		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,23		1,81		1,00	0,42	M2	CORTE 4
		0,05		0,70		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,12		2,33		1,00	0,28	M2	CORTE 4
		2,33		0,86		1,00	2,00	M2	CORTE 4
		0,05		0,93		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,21		1,34		1,00	0,28	M2	CORTE 4
		0,23		2,03		1,00	0,47	M2	CORTE 4
		0,05		0,73		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,12		2,20		1,00	0,26	M2	CORTE 4
		2,20		0,75		1,00	1,65	M2	CORTE 4
		0,05		0,81		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,21		1,09		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,21		1,12		1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,23		1,90		1,00	0,44	M2	CORTE 4
		0,05		0,78		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,12		2,22		1,00	0,27	M2	CORTE 4
		2,22		0,80		1,00	1,78	M2	CORTE 4
		0,05		0,84		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4

		0,21		1,32		1,00	0,28	M2	CORTE 4
		0,23		1,95		1,00	0,45	M2	CORTE 4
		0,05		0,66		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,12		2,33		1,00	0,28	M2	CORTE 4
		2,33		0,66		1,00	1,54	M2	CORTE 4
		0,05		0,70		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		2,00	0,46	M2	CORTE 4
		0,23		1,84		1,00	0,42	M2	CORTE 4
		0,05		0,73		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,12		2,30		1,00	0,28	M2	CORTE 4
		2,30		0,73		1,00	1,68	M2	CORTE 4
		0,20		1,80		1,00	0,36	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		2,00	0,46	M2	CORTE 4
		0,12		2,20		1,00	0,26	M2	CORTE 4
		2,20		0,70		1,00	1,54	M2	CORTE 4
		0,05		0,68		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,23		1,74		1,00	0,40	M2	CORTE 4
		0,05		0,65		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,12		2,21		1,00	0,27	M2	CORTE 4
		2,21		0,65		1,00	1,44	M2	CORTE 4
		0,05		0,63		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,21		1,11		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,23		1,78		1,00	0,41	M2	CORTE 4
		0,05		0,64		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,05		2,21		1,00	0,11	M2	CORTE 4
		2,21		0,63		1,00	1,39	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,23		1,72		1,00	0,40	M2	CORTE 4
		0,05		0,57		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,12		2,22		1,00	0,27	M2	CORTE 4
		0,60		2,22		1,00	1,33	M2	CORTE 4
		0,05		0,58		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,23		1,70		1,00	0,39	M2	CORTE 4
		0,12		2,24		1,00	0,27	M2	CORTE 4
		2,24		0,53		1,00	1,19	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,23		1,68		1,00	0,39	M2	CORTE 4
		0,05		0,54		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,12		2,22		1,00	0,27	M2	CORTE 4
		2,22		0,50		1,00	1,11	M2	CORTE 4
		0,05		0,40		1,00	0,02	M2	CORTE 4
		0,21		1,40		1,00	0,29	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,23		1,76		1,00	0,40	M2	CORTE 4
		0,05		0,65		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,12		2,22		1,00	0,27	M2	CORTE 4
		2,22		0,70		1,00	1,55	M2	CORTE 4
		0,05		0,67		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,21		1,10		1,00	0,23	M2	CORTE 4
		0,23		1,77		1,00	0,41	M2	CORTE 4
		0,05		0,65		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,12		1,13		1,00	0,14	M2	CORTE 4
		1,13		0,64		1,00	0,72	M2	CORTE 4
MURO FACHADA TRASERA NORTE DE EDIFICIO		12,25		1,45		1,00	17,76	M2	CORTE 4
		8,75		0,25		1,00	2,19	M2	CORTE 4
		2,90		2,12		1,00	6,15	M2	CORTE 4
		1,60		0,29		1,00	0,46	M2	CORTE 4
		0,80		1,86		1,00	1,49	M2	CORTE 4
		0,12		1,86		1,00	0,22	M2	CORTE 4
		0,08		1,47		1,00	0,12	M2	CORTE 4
		2,35		2,51		1,00	5,90	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		1,20		0,52	-	1,00	- 0,62	M2	CORTE 4


		0,18		1,20		1,00	0,22	M2	CORTE 4
		0,09		1,20		1,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,88		0,12		1,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,05		0,52		2,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,08		1,20		1,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,30		2,20		16,00	10,56	M2	CORTE 4
		3,65		0,70		1,00	2,56	M2	CORTE 4
		0,70		2,70		0,50	0,95	M2	CORTE 4
		2,27		2,51		1,00	5,70	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		1,17		0,52		- 1,00	- 0,61	M2	CORTE 4
		0,18		1,17		1,00	0,21	M2	CORTE 4
		0,11		1,17		1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,12		0,12		2,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,05		0,52		2,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,07		1,17		1,00	0,08	M2	CORTE 4
		2,74		2,40		1,00	6,58	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		2,04		0,52		- 1,00	- 1,06	M2	CORTE 4
		0,05		0,52		2,00	0,05	M2	CORTE 4
		2,04		0,06		1,00	0,12	M2	CORTE 4
		2,04		0,11		1,00	0,22	M2	CORTE 4
		2,04		0,18		1,00	0,37	M2	CORTE 4
		0,12		0,12		2,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,25		0,25		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		6,55		2,13		1,00	13,95	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		1,03		0,52		- 1,00	- 0,54	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,20		0,84		- 8,00	- 1,34	M2	CORTE 4
		0,19		0,84		16,00	2,55	M2	CORTE 4
		0,12		1,20		8,00	1,15	M2	CORTE 4
		0,10		0,23		16,00	0,37	M2	CORTE 4
		0,21		0,20		8,00	0,34	M2	CORTE 4
		0,12		0,20		8,00	0,19	M2	CORTE 4
		0,30		6,55		1,00	1,97	M2	CORTE 4
		0,25		6,55		1,00	1,64	M2	CORTE 4
		0,52		2,13		1,00	1,11	M2	CORTE 4
		0,35		0,51		1,00	0,18	M2	CORTE 4
		0,05		2,13		1,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,25		2,13		1,00	0,53	M2	CORTE 4
		0,25		2,13		1,00	0,53	M2	CORTE 4
		0,26		2,33		1,00	0,61	M2	CORTE 4
		0,07		0,26		1,00	0,02	M2	CORTE 4
		0,07		2,13		1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,92		2,43		1,00	2,24	M2	CORTE 4
		0,24		2,40		1,00	0,58	M2	CORTE 4
		0,26		2,13		1,00	0,55	M2	CORTE 4
		0,03		2,13		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,25		2,13		1,00	0,53	M2	CORTE 4
		0,05		2,13		1,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,16		2,13		1,00	0,34	M2	CORTE 4
		0,19		1,80		1,00	0,34	M2	CORTE 4
		0,42		0,21		1,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,11		0,42		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,12		0,42		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,15		0,11		1,00	0,02	M2	CORTE 4
		0,20		0,25		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,19		1,27		1,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,30		0,25		1,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,30		0,20		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		1,85		2,15		1,00	3,98	M2	CORTE 4
		0,30		1,27		1,00	0,38	M2	CORTE 4
		0,44		1,85		0,50	0,41	M2	CORTE 4
		0,30		13,15		1,00	3,95	M2	CORTE 4
		0,25		13,15		1,00	3,29	M2	CORTE 4
		4,32		0,16		1,00	0,69	M2	CORTE 4
		0,25		2,20		1,00	0,55	M2	CORTE 4
		0,08		2,02		1,00	0,16	M2	CORTE 4
		0,08		2,02		1,00	0,16	M2	CORTE 4
		4,22		0,23		1,00	0,97	M2	CORTE 4
		0,81		2,28		1,00	1,85	M2	CORTE 4
		0,07		2,02		1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,06		2,26		1,00	0,14	M2	CORTE 4


		0,06		2,26		1,00	0,14	M2	CORTE 4
		2,43		2,70		1,00	6,56	M2	CORTE 4
		0,25		2,10		1,00	0,53	M2	CORTE 4
		0,25		0,65		1,00	0,16	M2	CORTE 4
		0,25		0,26		1,00	0,07	M2	CORTE 4
		6,20		0,25		2,00	3,10	M2	CORTE 4
		2,03		2,10		1,00	4,26	M2	CORTE 4
		3,76		2,10		1,00	7,90	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,48		1,28		- 1,00	- 0,61	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,80		1,28		- 1,00	- 1,02	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,78		1,28		- 1,00	- 1,00	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,78		1,28		- 1,00	- 1,00	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANA		0,49		1,28		- 1,00	- 0,63	M2	CORTE 4
		0,49		0,17		1,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,78		0,17		1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,78		0,17		1,00	0,13	M2	CORTE 4
		0,80		0,17		1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,48		0,17		1,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,14		1,28		12,00	2,15	M2	CORTE 4
		0,11		0,31		12,00	0,41	M2	CORTE 4
		0,12		0,12		2,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,12		0,48		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,12		0,80		1,00	0,10	M2	CORTE 4
		0,12		0,78		1,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,12		0,78		1,00	0,09	M2	CORTE 4
		0,12		0,48		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,65		0,25		1,00	0,16	M2	CORTE 4
		0,50		0,25		1,00	0,13	M2	CORTE 4
MURO EN MAMPOSTERIA		8,60		2,13		1,00	18,32	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANAS		0,42		1,27		- 1,00	- 0,53	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANAS		0,93		1,27		- 1,00	- 1,18	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANAS		0,46		1,27		- 1,00	- 0,58	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANAS		0,94		1,27		- 1,00	- 1,19	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANAS		0,42		1,27		- 1,00	- 0,53	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANAS		0,42		1,27		- 1,00	- 0,53	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANAS		0,98		1,27		- 1,00	- 1,24	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANAS		0,52		1,27		- 1,00	- 0,66	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANAS		0,99		1,27		- 1,00	- 1,26	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANAS		0,42		1,27		- 1,00	- 0,53	M2	CORTE 4
		0,42		0,15		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,93		0,15		1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,46		0,15		1,00	0,07	M2	CORTE 4
		0,94		0,15		1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,42		0,15		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,42		0,15		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,98		0,15		1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,52		0,15		1,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,99		0,15		1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,42		0,15		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,42		0,12		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,93		0,12		1,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,46		0,12		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,94		0,12		1,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,42		0,12		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,42		0,12		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,98		0,12		1,00	0,12	M2	CORTE 4
		0,52		0,12		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,99		0,12		1,00	0,12	M2	CORTE 4
		0,42		0,12		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,12		1,27		20,00	3,05	M2	CORTE 4
		0,10		0,32		20,00	0,64	M2	CORTE 4
		0,13		1,27		20,00	3,30	M2	CORTE 4
		0,12		1,70		4,00	0,82	M2	CORTE 4
		0,26		8,60		1,00	2,24	M2	CORTE 4
		0,25		8,60		1,00	2,15	M2	CORTE 4
								M2	CORTE 4
FACHADA LATERAL OCCIDENTE		7,00		2,50		1,00	17,50	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANAS		0,49		1,30		- 4,00	- 2,55	M2	CORTE 4
DESCUENTO PUERTAS		2,35		2,50		- 1,00	- 5,88	M2	CORTE 4
		7,00		1,33		0,50	4,66	M2	CORTE 4

		0,12		1,70		2,00	0,41	M2	CORTE 4
		0,13		1,28		8,00	1,33	M2	CORTE 4
		0,11		0,30		8,00	0,26	M2	CORTE 4
		0,16		0,49		4,00	0,31	M2	CORTE 4
		0,12		0,49		4,00	0,24	M2	CORTE 4
		5,65		2,66		1,00	15,03	M2	CORTE 4
		0,25		0,30		1,00	0,08	M2	CORTE 4
DESCUENTO VENTANAS		0,50		1,30		- 4,00	- 2,60	M2	CORTE 4
		0,50		0,16		4,00	0,32	M2	CORTE 4
		0,50		0,12		4,00	0,24	M2	CORTE 4
		0,13		1,30		8,00	1,35	M2	CORTE 4
		0,09		0,30		8,00	0,22	M2	CORTE 4
		0,12		1,70		2,00	0,41	M2	CORTE 4
		5,70		1,33		0,50	3,79	M2	CORTE 4
FACHADA ORIENTAL		8,65		2,37		1,00	20,50	M2	CORTE 4
		8,65		1,50		0,50	6,49	M2	CORTE 4
MURO EXTERIOR CERRAMIENTO OCCIDENTAL		1,15		0,98		1,00	1,13	M2	CORTE 4
		0,23		2,12		1,00	0,49	M2	CORTE 4
		0,05		0,98		2,00	0,10	M2	CORTE 4
		2,22		1,05		1,00	2,33	M2	CORTE 4
		0,05		1,08		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,23		2,19		1,00	0,50	M2	CORTE 4
		0,05		0,77		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		2,22		0,77		1,00	1,71	M2	CORTE 4
		0,05		0,80		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,23		1,92		1,00	0,44	M2	CORTE 4
		0,05		0,80		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		2,23		0,86		1,00	1,92	M2	CORTE 4
		0,05		0,89		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,23		2,02		1,00	0,46	M2	CORTE 4
		0,05		0,90		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		2,21		0,98		1,00	2,17	M2	CORTE 4
		0,05		0,98		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,23		2,11		1,00	0,49	M2	CORTE 4
		0,05		0,99		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		2,20		1,00		1,00	2,20	M2	CORTE 4
		0,05		1,00		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,23		2,17		1,00	0,50	M2	CORTE 4
		0,05		1,03		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		2,20		1,12		1,00	2,46	M2	CORTE 4
		0,05		1,13		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,23		2,26		1,00	0,52	M2	CORTE 4
		0,05		1,12		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,20		1,16		1,00	2,55	M2	CORTE 4
		0,05		1,18		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,23		2,28		2,00	1,05	M2	CORTE 4
FACHADA NORTE CERRAMIENTO		0,05		1,15		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,30		1,15		1,00	2,65	M2	CORTE 4
		0,05		1,01		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,23		2,13		1,00	0,49	M2	CORTE 4
		0,05		1,03		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		2,33		1,03		1,00	2,40	M2	CORTE 4
		0,05		0,98		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,23		2,29		1,00	0,53	M2	CORTE 4
		0,05		1,18		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,22		1,14		1,00	2,53	M2	CORTE 4
		0,05		1,05		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,23		2,16		1,00	0,50	M2	CORTE 4
		0,05		1,06		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		2,20		1,01		1,00	2,22	M2	CORTE 4
		0,05		0,95		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,23		2,26		1,00	0,52	M2	CORTE 4
		0,05		1,16		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,33		1,13		1,00	2,63	M2	CORTE 4
		0,50		1,05		1,00	0,53	M2	CORTE 4
		0,23		2,16		1,00	0,50	M2	CORTE 4
		0,05		1,00		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		2,23		1,02		1,00	2,27	M2	CORTE 4
		0,05		0,96		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,23		2,54		1,00	0,58	M2	CORTE 4


		0,05		1,24		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,35		1,24		1,00	2,91	M2	CORTE 4
		0,05		1,24		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,23		2,35		1,00	0,54	M2	CORTE 4
		0,05		1,25		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,17		1,25		1,00	2,71	M2	CORTE 4
		0,05		1,25		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,23		2,36		1,00	0,54	M2	CORTE 4
		0,05		1,25		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,20		1,25		1,00	2,75	M2	CORTE 4
		0,05		1,25		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,23		2,38		1,00	0,55	M2	CORTE 4
		0,05		1,25		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,33		1,25		1,00	2,91	M2	CORTE 4
		0,05		1,24		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,23		2,34		1,00	0,54	M2	CORTE 4
		0,05		1,25		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,19		1,25		1,00	2,74	M2	CORTE 4
		0,05		1,23		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,23		2,35		1,00	0,54	M2	CORTE 4
		0,05		1,25		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,34		1,26		1,00	2,95	M2	CORTE 4
		0,05		1,26		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,23		2,38		1,00	0,55	M2	CORTE 4
		0,05		1,26		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,28		1,25		1,00	2,85	M2	CORTE 4
		0,05		1,23		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,23		2,36		1,00	0,54	M2	CORTE 4
		0,05		1,26		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,20		1,26		1,00	2,77	M2	CORTE 4
		0,05		1,26		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,23		2,36		1,00	0,54	M2	CORTE 4
		0,05		1,25		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,23		1,26		1,00	2,81	M2	CORTE 4
		0,05		1,24		1,00	0,06	M2	CORTE 4
FACHADA EXTERIOR CERRAMIENTO ORIENTE		0,23		2,32		2,00	1,07	M2	CORTE 4
		0,05		1,25		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,27		1,20		1,00	2,72	M2	CORTE 4
		0,05		1,15		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,23		2,21		1,00	0,51	M2	CORTE 4
		0,05		1,11		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,17		1,08		1,00	2,34	M2	CORTE 4
		0,05		1,00		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,23		2,29		1,00	0,53	M2	CORTE 4
		0,05		1,20		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,07		1,17		1,00	2,42	M2	CORTE 4
		0,05		1,11		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,23		2,22		1,00	0,51	M2	CORTE 4
		0,05		1,09		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		2,20		1,05		1,00	2,31	M2	CORTE 4
		0,05		1,00		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,23		2,28		1,00	0,52	M2	CORTE 4
		0,05		1,20		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		2,20		1,17		1,00	2,57	M2	CORTE 4
		0,05		1,14		1,00	0,06	M2	CORTE 4
		0,23		1,29		1,00	0,30	M2	CORTE 4
		0,05		0,41		2,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,92		0,40		3,00	1,10	M2	CORTE 4
		0,35		0,59		4,00	0,83	M2	CORTE 4
		0,10		1,25		5,00	0,63	M2	CORTE 4
	ACTA PARCIAL No. 5								
	**FACHADA PRINCIPAL**						-		
	ZONA A						-		
	A	2,40		2,13		1,00	5,11	M2	CORTE 5
	DESCUENTO VENTANA	1,30		0,40		- 1,00	- 0,52	M2	CORTE 5
	B	0,03		2,13		1,00	0,06	M2	CORTE 5
	C	2,01		2,13		1,00	4,28	M2	CORTE 5
	DESCUENTO VENTANA	1,20		1,20		- 1,00	- 1,44	M2	CORTE 5
	D	0,03		2,13		1,00	0,06	M2	CORTE 5
	E	0,25		2,13		1,00	0,53	M2	CORTE 5


ZONA A







ZONA B-C-D

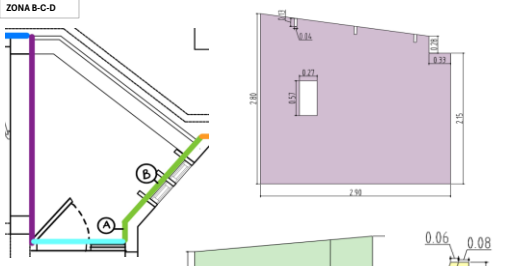

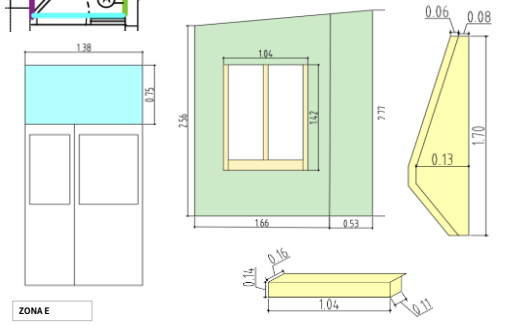



ZONA E






ZONA F

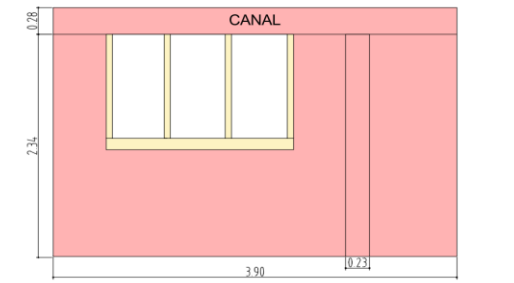




ZONA G






F		0,03		2,13		1,00	0,06	M2	CORTE 5
G		4,23		2,13		1,00	9,01	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		2,00		1,20	-	1,00	- 2,40	M2	CORTE 5
H		0,08		2,13		1,00	0,17	M2	CORTE 5
I		0,75		2,13		1,00	1,60	M2	CORTE 5
J		0,07		2,13		1,00	0,15	M2	CORTE 5
K		4,27		2,13		1,00	9,10	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		2,00		1,20	-	1,00	- 2,40	M2	CORTE 5
L		0,03		2,13		1,00	0,06	M2	CORTE 5
M		0,26		2,13		1,00	0,55	M2	CORTE 5
N		0,03		2,13		1,00	0,06	M2	CORTE 5
O		4,60		2,13		1,00	9,80	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA		2,00		1,20	-	1,00	- 2,40	M2	CORTE 5
P		0,01		2,13		1,00	0,02	M2	CORTE 5
Q		24,00		2,13		1,00	51,12	M2	CORTE 5
CANAL		19,00		0,27		1,00	5,13	M2	CORTE 5
CANAL CARA INF		19,00		0,23		1,00	4,37	M2	CORTE 5
CANAL ACCESO							-		
CARA FRONTAL		3,05		0,33		1,00	1,01	M2	CORTE 5
CARA INFERIOR		3,05		0,33		1,00	1,01	M2	CORTE 5
CARA INTERIOR A		1,70		0,18		1,00	0,31	M2	CORTE 5
CARA INTERIOR B		1,35		0,12		1,00	0,16	M2	CORTE 5
ZONA B		2,90		2,80		1,00	8,12	M2	CORTE 5
DESCUENTO VIGA		0,33		0,30	-	1,00	- 0,10	M2	CORTE 5
DESCUENTO CONTADOR		0,27		0,57	-	1,00	- 0,15	M2	CORTE 5
DESCUENTO CORREAS		0,04		0,13	-	3,00	- 0,02	M2	CORTE 5
ZONA C PUERTA DE ACCESO		1,38		0,75		1,00	1,04	M2	CORTE 5
CARTERA PUERTA		1,30		0,07		1,00	0,09	M2	CORTE 5
ZONA D							-		
MURO A		0,53		2,72		1,00	1,44	M2	CORTE 5
MURO B		1,66		2,61		1,00	4,33	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANAS		0,43		1,28	-	2,00	- 1,10	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA FRONTAL		0,06		1,56		3,00	0,28	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA LATERAL							-		
A		0,08		1,36		6,00	0,65	M2	CORTE 5
B		0,03		1,36		6,00	0,20	M2	CORTE 5
C		0,04		0,20		6,00	0,05	M2	CORTE 5
D		0,03		0,20		6,00	0,03	M2	CORTE 5
ALFAJIA FRONTAL		1,26		0,14		1,00	0,18	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA SUP		1,04		0,16		1,00	0,17	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA INF		1,04		0,11		1,00	0,11	M2	CORTE 5
ZONA E		14,03		2,36		1,00	33,11	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA A		0,44		1,27	-	2,00	- 1,12	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA FRONTAL		0,06		1,60		3,00	0,29	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA LATERAL							-		
A		0,03		1,40		6,00	0,25	M2	CORTE 5
B		0,05		1,40		6,00	0,42	M2	CORTE 5
C		0,04		0,20		6,00	0,05	M2	CORTE 5
D		0,05		0,20		6,00	0,06	M2	CORTE 5
ALFAJIA FRONTAL		1,27		0,10		1,00	0,13	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA SUP		1,03		0,17		1,00	0,18	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA INF		1,03		0,12		1,00	0,12	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA B		1,80		1,27	-	1,00	- 2,29	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA FRONTAL		0,06		1,16		5,00	0,35	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA LATERAL							-		
A		0,05		1,01		10,00	0,51	M2	CORTE 5
B		0,04		1,01		10,00	0,35	M2	CORTE 5
C		0,04		0,15		10,00	0,06	M2	CORTE 5
D		0,04		0,15		10,00	0,05	M2	CORTE 5
ALFAJIA FRONTAL		2,36		0,14		1,00	0,33	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA SUP		2,12		0,17		1,00	0,36	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA INF		2,12		0,12		1,00	0,25	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA C TIPO 1		0,44		1,27	-	2,00	- 1,12	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA C TIPO 2		0,99		1,27	-	2,00	- 2,51	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA C TIPO 3		0,39		1,27	-	1,00	- 0,50	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA FRONTAL		0,06		1,56		6,00	0,56	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA LATERAL							-		
A		0,05		1,36		12,00	0,82	M2	CORTE 5
B		0,05		1,36		12,00	0,73	M2	CORTE 5
C		0,04		0,20		12,00	0,10	M2	CORTE 5















D		0,05		0,20		12,00	0,11	M2	CORTE 5
ALFAJIA FORNTAL		3,84		0,14		1,00	0,54	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA SUP		3,60		0,17		1,00	0,61	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA INF		3,60		0,12		1,00	0,43	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA D TIPO 1		0,41		1,26		- 2,00	- 1,03	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA D TIPO 2		0,99		1,26		- 2,00	- 2,49	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA D TIPO 3		0,45		1,26		- 1,00	- 0,57	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA FRONTAL		0,06		1,56		6,00	0,56	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA LATERAL							-		
A		0,05		1,36		12,00	0,82	M2	CORTE 5
B		0,05		1,36		12,00	0,73	M2	CORTE 5
C		0,04		0,20		12,00	0,10	M2	CORTE 5
D		0,05		0,20		12,00	0,11	M2	CORTE 5
ALFAJIA FORNTAL		3,84		0,14		1,00	0,54	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA SUP		3,60		0,17		1,00	0,61	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA INF		3,60		0,12		1,00	0,43	M2	CORTE 5
ZONA F		3,90		2,33		1,00	9,09	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA TIPO 1		0,54		1,09		- 2,00	- 1,18	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA TIPO 2		0,53		10,90		1,00	5,78	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA FRONTAL		0,07		1,43		4,00	0,40	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA LATERAL							-		
A		0,07		1,23		8,00	0,69	M2	CORTE 5
B		0,05		1,23		8,00	0,49	M2	CORTE 5
C		0,06		0,20		8,00	0,10	M2	CORTE 5
D		0,05		0,20		8,00	0,08	M2	CORTE 5
ALFAJIA FRONTAL		2,10		0,12		1,00	0,25	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA SUP		1,82		0,19		1,00	0,35	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA INF		1,82		0,14		1,00	0,25	M2	CORTE 5
CANAL		3,90		0,28		1,00	1,09	M2	CORTE 5
CANAL CARA INF		3,90		0,25		1,00	0,98	M2	CORTE 5
ZONA G		8,63		2,24		1,00	19,33	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA A TIPO 1		0,42		1,29		- 2,00	- 1,08	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA A TIPO 2		1,00		1,29		- 2,00	- 2,58	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA A TIPO 3		0,52		1,29		- 1,00	- 0,67	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA FRONTAL		0,06		1,58		6,00	0,57	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA LATERAL							-		
A		0,10		1,38		12,00	1,66	M2	CORTE 5
B		0,02		1,38		12,00	0,25	M2	CORTE 5
C		0,06		0,20		12,00	0,14	M2	CORTE 5
D		0,02		0,20		12,00	0,04	M2	CORTE 5
ALFAJIA FRONTAL		3,81		0,12		1,00	0,46	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA SUP		3,72		0,14		1,00	0,52	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA INF		3,72		0,09		1,00	0,33	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA B TIPO 1		0,42		1,27		- 2,00	- 1,07	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA B TIPO 2		0,94		1,27		- 2,00	- 2,39	M2	CORTE 5
DESCUENTO VENTANA B TIPO 3		0,46		1,27		- 1,00	- 0,58	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA FRONTAL		0,07		1,58		6,00	0,66	M2	CORTE 5
ELEMENTOS BORDE VENTANA LATERAL							-		
A		0,10		1,38		12,00	1,66	M2	CORTE 5
B		0,02		1,38		12,00	0,33	M2	CORTE 5
C		0,06		0,20		12,00	0,14	M2	CORTE 5
D		0,02		0,20		12,00	0,05	M2	CORTE 5
ALFAJIA FRONTAL		3,82		0,12		1,00	0,46	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA SUP		3,72		0,15		1,00	0,56	M2	CORTE 5
ALFAJIA CARA INF		3,72		0,10		1,00	0,37	M2	CORTE 5
CANAL		8,63		0,25		1,00	2,16	M2	CORTE 5
CANAL CARA INF		8,63		0,30		1,00	2,59	M2	CORTE 5
PLACA TANQUES							-		
PLACA (ROJO)		3,22	3,24			1,00	10,43	M2	CORTE 5
DESCUENTO		0,60	0,60			- 1,00	- 0,36	M2	CORTE 5
CARTERAS		6,46		0,11		2,00	1,42	M2	CORTE 5
VIGAS CARA EXT (VERDE)		2,32		0,30		4,00	2,78	M2	CORTE 5
VIGAS CARA INT (AMARILLO)		1,72		0,30		4,00	2,06	M2	CORTE 5
VIGAS CARA INF (AMARILLO)		1,72		0,30		4,00	2,06	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	592,50	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	388,90	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**203,60**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
203,60	388,90	**592,50**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ PINCAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2026

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.1.16**	**PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**			**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ACTA PARCIAL No. 4									
	PREJARDIN A		1,05		1,11		1,00	1,17	M2	CORTE 4
			0,13		1,11		2,00	0,29	M2	CORTE 4
			1,06		1,11		1,00	1,18	M2	CORTE 4
			2,45		1,11		1,00	2,72	M2	CORTE 4
			0,13		1,11		1,00	0,14	M2	CORTE 4
			0,24		1,11		1,00	0,27	M2	CORTE 4
			0,13		1,11		1,00	0,14	M2	CORTE 4
			3,75		1,11		1,00	4,16	M2	CORTE 4
			0,13		1,11		1,00	0,14	M2	CORTE 4
			0,24		1,11		1,00	0,27	M2	CORTE 4
			0,13		1,11		1,00	0,14	M2	CORTE 4
			0,72		1,11		1,00	0,80	M2	CORTE 4
			0,16		0,76		1,00	0,12	M2	CORTE 4
			0,16		0,11		1,00	0,02	M2	CORTE 4
			4,53		1,11		1,00	5,03	M2	CORTE 4
			0,10		0,16		1,00	0,02	M2	CORTE 4
			0,71		0,16		1,00	0,11	M2	CORTE 4
			0,73		1,11		1,00	0,81	M2	CORTE 4
			0,13		1,11		1,00	0,14	M2	CORTE 4
			0,24		1,11		1,00	0,27	M2	CORTE 4
			0,13		1,11		1,00	0,14	M2	CORTE 4
			0,07		1,11		1,00	0,08	M2	CORTE 4
			0,42		0,92		1,00	0,39	M2	CORTE 4
			0,98		0,92		1,00	0,90	M2	CORTE 4
			0,19		0,23		1,00	0,04	M2	CORTE 4
			0,06		0,23		1,00	0,01	M2	CORTE 4
			0,18		0,23		1,00	0,04	M2	CORTE 4
			0,17		0,23		1,00	0,04	M2	CORTE 4
			0,18		0,23		1,00	0,04	M2	CORTE 4
			0,06		0,23		1,00	0,01	M2	CORTE 4
			0,52		0,92		1,00	0,48	M2	CORTE 4
			0,98		0,92		1,00	0,90	M2	CORTE 4
			0,42		0,92		1,00	0,39	M2	CORTE 4
			0,07		1,11		1,00	0,08	M2	CORTE 4
			0,14		1,11		1,00	0,16	M2	CORTE 4
			0,24		1,11		1,00	0,27	M2	CORTE 4
			0,13		1,11		1,00	0,14	M2	CORTE 4
			0,44		1,11		1,00	0,49	M2	CORTE 4
			0,05		0,23		1,00	0,01	M2	CORTE 4
			0,16		0,23		1,00	0,04	M2	CORTE 4
			0,17		0,23		1,00	0,04	M2	CORTE 4
			0,18		0,23		1,00	0,04	M2	CORTE 4
			0,18		0,23		1,00	0,04	M2	CORTE 4
			0,06		0,23		1,00	0,01	M2	CORTE 4
			3,43		0,85		1,00	2,92	M2	CORTE 4
			0,05		0,42		1,00	0,02	M2	CORTE 4
			0,05		0,93		1,00	0,05	M2	CORTE 4
			0,05		0,46		1,00	0,02	M2	CORTE 4
			0,05		0,94		1,00	0,05	M2	CORTE 4
			0,05		0,42		1,00	0,02	M2	CORTE 4
			0,44		1,11		1,00	0,49	M2	CORTE 4
			0,14		1,11		2,00	0,31	M2	CORTE 4
			0,97		1,11		1,00	1,08	M2	CORTE 4
			0,50		0,23		1,00	0,12	M2	CORTE 4
			0,16		0,23		1,00	0,04	M2	CORTE 4



		0,16		0,23		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,18		0,23		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,06		0,23		1,00	0,01	M2	CORTE 4
		2,13		0,83		1,00	1,77	M2	CORTE 4
		0,06		0,48		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,06		0,49		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,06		0,49		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,06		0,47		1,00	0,03	M2	CORTE 4
PASILLO PREJARDIN B - PREJARDIN A		1,18		1,13		1,00	1,33	M2	CORTE 4
		2,72		1,13		1,00	3,07	M2	CORTE 4
		5,10		1,13		1,00	5,76	M2	CORTE 4
PASILLO PREJARDIN B -PARVULOS B		1,41		1,13		1,00	1,59	M2	CORTE 4
		0,60		1,13		1,00	0,68	M2	CORTE 4
		0,27		1,13		1,00	0,31	M2	CORTE 4
		0,54		1,13		1,00	0,61	M2	CORTE 4
		4,44		1,13		1,00	5,02	M2	CORTE 4
		0,65		1,13		1,00	0,73	M2	CORTE 4
		4,84		1,13		1,00	5,47	M2	CORTE 4
		1,37		1,13		1,00	1,55	M2	CORTE 4
		5,05		1,13		1,00	5,71	M2	CORTE 4
		2,85		1,13		1,00	3,22	M2	CORTE 4
		1,18		1,13		1,00	1,33	M2	CORTE 4
PREJARDIN B		1,01		1,13		1,00	1,14	M2	CORTE 4
		0,10		1,13		1,00	0,11	M2	CORTE 4
		0,13		1,13		1,00	0,15	M2	CORTE 4
		1,39		1,13		1,00	1,57	M2	CORTE 4
		0,07		1,13		1,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,05		0,30		1,00	0,02	M2	CORTE 4
		0,17		0,30		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,15		0,30		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,16		0,30		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,05		0,30		1,00	0,02	M2	CORTE 4
		0,05		0,50		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,05		0,49		1,00	0,02	M2	CORTE 4
		0,05		0,49		1,00	0,02	M2	CORTE 4
		0,05		0,49		1,00	0,02	M2	CORTE 4
		2,17		0,89		1,00	1,93	M2	CORTE 4
		1,51		1,13		1,00	1,71	M2	CORTE 4
		0,13		1,13		1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,22		1,13		1,00	0,25	M2	CORTE 4
		1,82		1,13		1,00	2,06	M2	CORTE 4
		0,13		1,13		1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,24		1,13		1,00	0,27	M2	CORTE 4
		0,13		1,13		1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,07		1,13		1,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,33		0,05		1,00	0,02	M2	CORTE 4
		0,33		0,14		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,33		0,14		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,33		0,14		1,00	0,05	M2	CORTE 4
		0,33		0,13		1,00	0,04	M2	CORTE 4
		0,33		0,05		1,00	0,02	M2	CORTE 4
		0,04		0,50		1,00	0,02	M2	CORTE 4
		0,04		0,78		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,04		0,78		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,04		0,80		1,00	0,03	M2	CORTE 4
		0,04		0,48		1,00	0,02	M2	CORTE 4
		3,61		0,79		1,00	2,85	M2	CORTE 4
		0,07		1,13		1,00	0,08	M2	CORTE 4
		0,13		1,13		1,00	0,15	M2	CORTE 4
		0,24		1,13		1,00	0,27	M2	CORTE 4
		0,12		1,13		1,00	0,14	M2	CORTE 4
		2,29		1,13		1,00	2,59	M2	CORTE 4
		0,12		0,17		1,00	0,02	M2	CORTE 4
		4,73		1,13		1,00	5,34	M2	CORTE 4
		0,14		0,15		1,00	0,02	M2	CORTE 4
		2,26		1,13		1,00	2,55	M2	CORTE 4
		0,12		1,13		1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,24		1,13		1,00	0,27	M2	CORTE 4
		0,12		1,13		1,00	0,14	M2	CORTE 4
		3,76		1,13		1,00	4,25	M2	CORTE 4

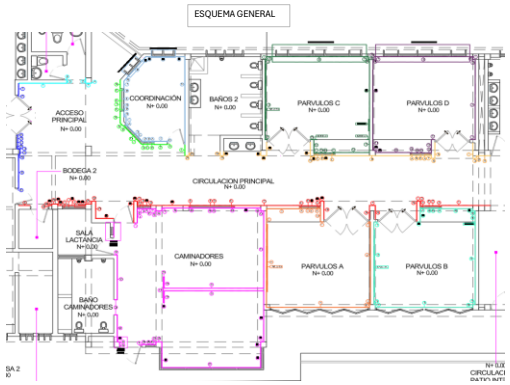






























		0,12		1,13		1,00	0,14	M2	CORTE 4
		0,24		1,13		1,00	0,27	M2	CORTE 4
		0,12		1,13		1,00	0,14	M2	CORTE 4
		2,47		1,13		1,00	2,79	M2	CORTE 4
PASILLO (ROJO)							-	M2	
PASILLO #1		1,47		1,12			1,65	M2	CORTE 4
PASILLO #2		1,01		0,81			0,82	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA A		0,03	1,01				0,03	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA B		0,03	0,30			2,00	0,02	M2	CORTE 4
PASILLO #3		0,15		1,12			0,17	M2	CORTE 4
PASILLO #4		0,08		1,12			0,09	M2	CORTE 4
PASILLO #5		0,85		1,12			0,95	M2	CORTE 4
PASILLO #6		0,66		1,12			0,74	M2	CORTE 4
PASILLO #7		0,22		1,12			0,25	M2	CORTE 4
PASILLO #8		0,65		1,12			0,73	M2	CORTE 4
PASILLO #9		0,84		1,12			0,94	M2	CORTE 4
PASILLO #10		0,08		1,12			0,09	M2	CORTE 4
PASILLO #11		0,13		1,12			0,15	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA C		0,30		0,03		2,00	0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA D		1,00		0,03			0,03	M2	CORTE 4
PASILLO #12		1,00		0,82			0,82	M2	CORTE 4
PASILLO #13		2,67		1,12			2,99	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA E		0,04		0,30		2,00	0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA F		2,00		0,04			0,08	M2	CORTE 4
PASILLO #14		2,00		0,82			1,64	M2	CORTE 4
PASILLO #15		1,46		1,12			1,64	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA G		0,05		0,30		2,00	0,03	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA H		0,74		0,05			0,04	M2	CORTE 4
PASILLO #16		0,74		0,84			0,62	M2	CORTE 4
PASILLO #17		0,15		1,12			0,17	M2	CORTE 4
PASILLO #18		0,09		1,12			0,10	M2	CORTE 4
PASILLO #19		0,83		1,12			0,93	M2	CORTE 4
PASILLO #20		0,79		1,12			0,88	M2	CORTE 4
PASILLO #21		0,80		1,12			0,90	M2	CORTE 4
PASILLO #22		0,10		1,12			0,11	M2	CORTE 4
PASILLO #23		0,09		1,12			0,10	M2	CORTE 4
PASILLO #24		0,24		1,12			0,27	M2	CORTE 4
PASILLO #25		0,06		1,12			0,07	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA I		0,04		0,30		2,00	0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA J		0,04		1,20			0,05	M2	CORTE 4
PASILLO #26		1,20		0,83			1,00	M2	CORTE 4
PASILLO #27		0,08		1,12			0,09	M2	CORTE 4
PASILLO #28		0,07		1,12			0,08	M2	CORTE 4
PASILLO #29		0,12		1,12			0,13	M2	CORTE 4
PASILLO #30		0,05		1,12			0,06	M2	CORTE 4
PASILLO #31		0,06		1,12			0,07	M2	CORTE 4
PASILLO #32		0,02		1,12			0,02	M2	CORTE 4
PASILLO #33		0,36		1,12			0,40	M2	CORTE 4
PASILLO COSTADO IZQ (AMARILLO)									
PASILLO #1		0,25		1,12			0,28	M2	CORTE 4
PASILLO #2		0,17		1,12			0,19	M2	CORTE 4
PASILLO #3		0,11		1,12			0,12	M2	CORTE 4
PASILLO #4		0,88		1,12			0,99	M2	CORTE 4
PASILLO #5		0,85		1,12			0,95	M2	CORTE 4
PASILLO #6		0,09		1,12			0,10	M2	CORTE 4
PASILLO #7		0,14		1,12			0,16	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA A		0,04		0,30		2,00	0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA B		1,00		0,04			0,04	M2	CORTE 4
PASILLO #8		1,00		0,87			0,87	M2	CORTE 4
PASILLO #9		2,56		1,12			2,87	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA C		0,04		0,30		2,00	0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA D		0,04		1,00			0,04	M2	CORTE 4
PASILLO #10		0,85		1,00			0,85	M2	CORTE 4
PASILLO #11		0,12		1,12			0,13	M2	CORTE 4
PASILLO #12		0,08		1,12			0,09	M2	CORTE 4
PASILLO #13		0,83		1,12			0,93	M2	CORTE 4
PASILLO #14		0,85		1,12			0,95	M2	CORTE 4
PASILLO #15		0,30		1,12			0,34	M2	CORTE 4
PASILLO #16		0,09		1,12			0,10	M2	CORTE 4
PASILLO #17		0,07		1,12			0,08	M2	CORTE 4











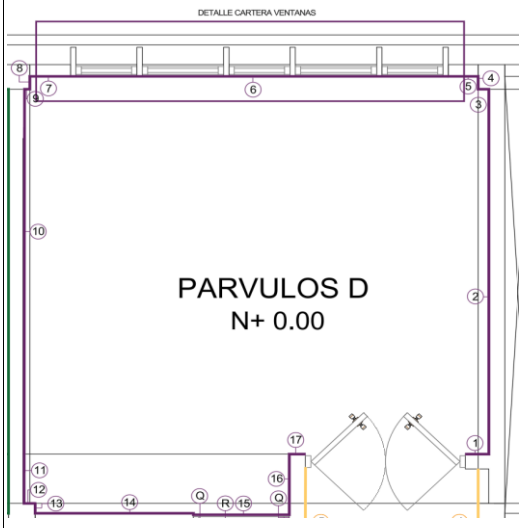



DETALLE CARTERA VENTANAS

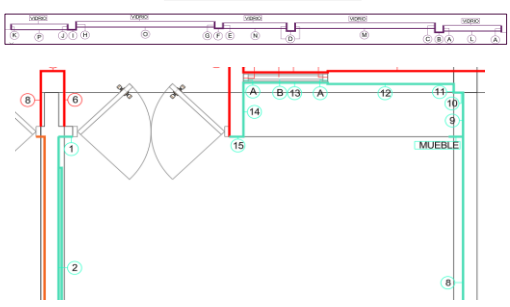



PASILLO #18		0,09		1,12			0,10	M2	CORTE 4
PASILLO #19		0,11		1,12			0,12	M2	CORTE 4
PASILLO #20		0,11		1,12			0,12	M2	CORTE 4
PASILLO #21		0,10		1,12			0,11	M2	CORTE 4
PASILLO COORDINACIÓN (VERDE CLARO)							-		
PASILLO COORD. #1		0,84		1,12			0,94	M2	CORTE 4
CARTERA PUERTA A		0,03		1,12			0,03	M2	CORTE 4
PASILLO COORD. #2		0,55		1,12			0,62	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA B		0,04		0,30		2,00	0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA C		0,04		0,58			0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA D		0,04		1,31			0,05	M2	CORTE 4
PASILLO COORD. #3		0,58		0,84			0,49	M2	CORTE 4
PASILLO COORD. #4		0,84		1,31			1,10	M2	CORTE 4
PASILLO COORD. #5		0,20		1,12			0,22	M2	CORTE 4
PASILLO COORD. #6		0,27		1,12			0,30	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA E		0,03		0,30		2,00	0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA F		0,03		1,05			0,03	M2	CORTE 4
PASILLO COORD. #7		1,05		0,84			0,88	M2	CORTE 4
PASILLO COORD. #8		0,06		1,12			0,07	M2	CORTE 4
INGRESO + BAÑO (CYAN)							-		
CARTERA PUERTA A		0,04		1,12			0,04	M2	CORTE 4
INGRESO #1		0,31		1,12			0,35	M2	CORTE 4
INGRESO #2		0,35		1,12			0,39	M2	CORTE 4
CARTERA PUERTA B		0,04		1,12			0,04	M2	CORTE 4
INGRESO #3		0,13		1,12			0,15	M2	CORTE 4
INGRESO #4		1,77		1,12			1,98	M2	CORTE 4
COMEDOR / COCINA (AZUL OSCURO)							-		
COMEDOR #1		0,61		11,12			6,78	M2	CORTE 4
CARTERA PUERTA A		0,05		1,12			0,06	M2	CORTE 4
COMEDOR #2		0,61		0,31			0,19	M2	CORTE 4
CARTERA PUERTA B		0,04		0,31			0,01	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA C		0,04		0,61			0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA D		0,04		0,84			0,03	M2	CORTE 4
COMEDOR #3		0,11		1,12			0,12	M2	CORTE 4
COMEDOR #4		0,13		1,12			0,15	M2	CORTE 4
COMEDOR #5		0,06		1,12			0,07	M2	CORTE 4
COMEDOR #6		1,36		1,12			1,52	M2	CORTE 4
CARTERA PUERTA E		0,02		1,12			0,02	M2	CORTE 4
PARVULOS D (MORADO)							-		
PARVULOS D #1		0,26		1,20			0,31	M2	CORTE 4
PARVULOS D #2		3,60		1,20			4,32	M2	CORTE 4
PARVULOS D #3		0,09		1,20			0,11	M2	CORTE 4
PARVULOS D #4		0,34		1,20			0,41	M2	CORTE 4
PARVULOS D #5		0,36		1,20			0,43	M2	CORTE 4
PARVULOS D #6		3,48		0,65			2,26	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA A		0,05		0,53		2,00	0,05	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA B		0,06		0,53			0,03	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA C		0,07		0,53			0,04	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA D		0,06		0,53		3,00	0,10	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA E		0,04		0,53			0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA F		0,06		0,53			0,03	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA G		0,05		0,53			0,03	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA H		0,06		0,53			0,03	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA I		0,06		0,53			0,03	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA J		0,04		0,53			0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA K		0,04		0,53			0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA L		0,04		0,40			0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA M		0,04		0,98			0,04	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA N		0,04		0,95			0,04	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA O		0,04		0,99			0,04	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA P		0,04		0,41			0,02	M2	CORTE 4
PARVULOS D #7		0,40		1,20			0,48	M2	CORTE 4
PARVULOS D #8		0,54		1,20			0,65	M2	CORTE 4
PARVULOS D #9		0,04		1,20			0,05	M2	CORTE 4
PARVULOS D #10		3,44		1,20			4,13	M2	CORTE 4
PARVULOS D #11		0,46		0,42			0,19	M2	CORTE 4
PARVULOS D #12		0,03		0,42			0,01	M2	CORTE 4
PARVULOS D #13		0,12		0,42			0,05	M2	CORTE 4
PARVULOS D #14		1,10		0,42			0,46	M2	CORTE 4
PARVULOS D #15		1,00		0,12			0,12	M2	CORTE 4





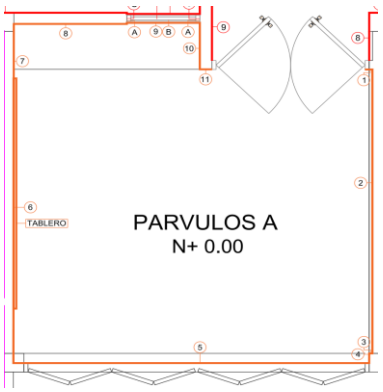




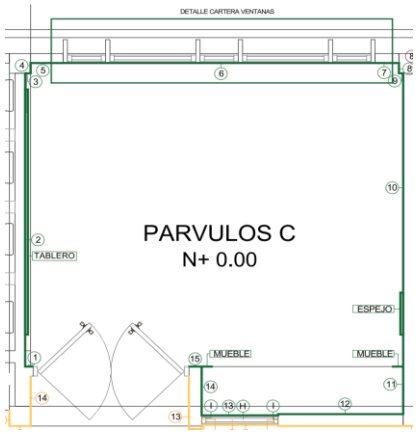



DETALLE CARTERA VENTANAS




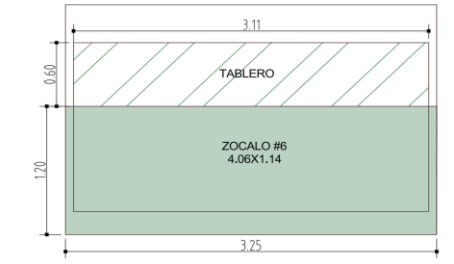

CARTERA VENTANA Q		0,04		0,30		2,00	0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA R		0,04		1,00			0,04	M2	CORTE 4
PARVULOS D #16		0,60		0,40			0,24	M2	CORTE 4
PARVULOS D #17		0,14		1,20			0,17	M2	CORTE 4
PARVULOS B (VERDE MENTA)							-		
PARVULOS B #1		0,09		1,20			0,11	M2	CORTE 4
PARVULOS B #2		3,95		1,20			4,74	M2	CORTE 4
TABLERO		3,10		0,56			1,74	M2	CORTE 4
PARVULOS B #3		0,06		1,20			0,07	M2	CORTE 4
PARVULOS B #4		0,13		1,20			0,16	M2	CORTE 4
PARVULOS B #5		4,19		0,13			0,54	M2	CORTE 4
PARVULOS B #6		0,13		1,20			0,16	M2	CORTE 4
PARVULOS B #7		0,12		1,20			0,14	M2	CORTE 4
PARVULOS B #8		3,96		1,20			4,75	M2	CORTE 4
MUEBLE		0,15		0,70			0,11	M2	CORTE 4
PARVULOS B #9		0,48		0,35			0,17	M2	CORTE 4
PARVULOS B #10		0,12		0,35			0,04	M2	CORTE 4
PARVULOS B #11		0,12		3,00			0,36	M2	CORTE 4
PARVULOS B #12		1,24		0,35			0,43	M2	CORTE 4
PARVULOS B #13		1,10		0,06			0,07	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA A		0,27		0,04		2,00	0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA B		0,04		1,10			0,04	M2	CORTE 4
PARVULOS B #14		0,60		0,35			0,21	M2	CORTE 4
PARVULOS B #15		0,14		1,20			0,17	M2	CORTE 4
PARVULOS A (NARANJA)									
PARVULOS A #1		0,07		1,20			0,08	M2	CORTE 4
PARVULOS A #2		3,95		1,14			4,50	M2	CORTE 4
PARVULOS A #3		0,06		1,20			0,07	M2	CORTE 4
PARVULOS A #4		0,11		1,20			0,13	M2	CORTE 4
PARVULOS A #5		4,31		0,08			0,34	M2	CORTE 4
PARVULOS A #6		4,06		1,14			4,63	M2	CORTE 4
TABLERO		3,10		0,53			1,64	M2	CORTE 4
PARVULOS A #7		0,60		0,40			0,24	M2	CORTE 4
PARVULOS A #8		1,34		0,40			0,54	M2	CORTE 4
PARVULOS A #9		1,00		0,07			0,07	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA A		0,04		1,00			0,04	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA B		0,04		0,32		2,00	0,03	M2	CORTE 4
PARVULOS A #10		0,60		0,40			0,24	M2	CORTE 4
PARVULOS A #11		0,15		1,20			0,18	M2	CORTE 4
PARVULOS C (VERDE OSCURO)							-		
PARVULOS C #1		0,15		1,20			0,18	M2	CORTE 4
PARVULOS C #2		3,25		1,20			3,90	M2	CORTE 4
TABLERO		3,11		0,60			1,87	M2	CORTE 4
PARVULOS C #3		0,03		1,20			0,04	M2	CORTE 4
PARVULOS C #4		0,70		1,20			0,84	M2	CORTE 4
PARVULOS C #5		0,41		0,49			0,20	M2	CORTE 4
PARVULOS C #6		4,26		0,70			2,98	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA A		0,05		0,49		10,00	0,25	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA B		0,06		0,49		4,00	0,12	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA C		0,04		0,43			0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA D		0,04		0,93			0,04	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA E		0,04		0,44			0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA F		0,04		0,97			0,04	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA G		0,04		0,39			0,02	M2	CORTE 4
PARVULOS C #7		0,38		0,49			0,19	M2	CORTE 4
PARVULOS C #8		0,29		1,20			0,35	M2	CORTE 4
PARVULOS C #9		0,03		1,20			0,04	M2	CORTE 4
PARVULOS C #10		3,65		1,20			4,38	M2	CORTE 4
DESCUENTO ESPEJO		0,45		0,94		- 1,00	- 0,42	M2	CORTE 4
MUEBLE		0,13		0,70		2,00	0,18	M2	CORTE 4
PARVULOS C #11		0,58		0,36			0,21	M2	CORTE 4
PARVULOS C #12		1,27		0,36			0,46	M2	CORTE 4
PARVULOS C #13		0,11		1,00			0,11	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA H		0,06		1,00			0,06	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA I		0,26		0,05		2,00	0,03	M2	CORTE 4
PARVULOS C #14		0,59		0,38			0,22	M2	CORTE 4
PARVULOS C #15		0,15		1,20			0,18	M2	CORTE 4
CAMINADORES (MAGENTA)							-		
CAMINADORES #1		0,11		1,11			0,12	M2	CORTE 4
CAMINADORES #2		0,54		1,11			0,60	M2	CORTE 4
CAMINADORES #3		0,86		0,84			0,72	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA A		0,06		0,74			0,04	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA B		0,06		0,27		2,00	0,03	M2	CORTE 4
CAMINADORES #4		0,11		0,27			0,03	M2	CORTE 4
CAMINADORES #5		1,11		0,13			0,14	M2	CORTE 4
CAMINADORES #6		0,11		1,11			0,12	M2	CORTE 4
CAMINADORES #7		0,14		1,11			0,16	M2	CORTE 4
CAMINADORES #8		1,17		0,29			0,34	M2	CORTE 4
CAMINADORES #9		4,24		0,82			3,48	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA C		0,05		2,00			0,10	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA D		0,05		0,29		2,00	0,03	M2	CORTE 4
CAMINADORES #10		1,07		0,29			0,31	M2	CORTE 4
CAMINADORES #11		0,10		1,11			0,11	M2	CORTE 4
CAMINADORES #12		0,11		1,11			0,12	M2	CORTE 4
CAMINADORES #13		3,58		1,11			3,97	M2	CORTE 4
CAMINADORES #14		4,24		1,11		2,00	9,41	M2	CORTE 4

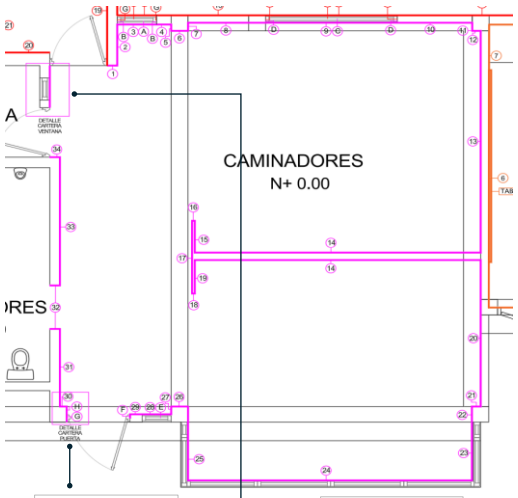


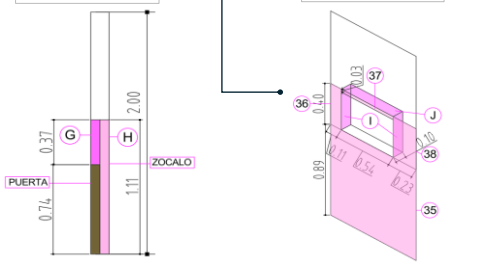

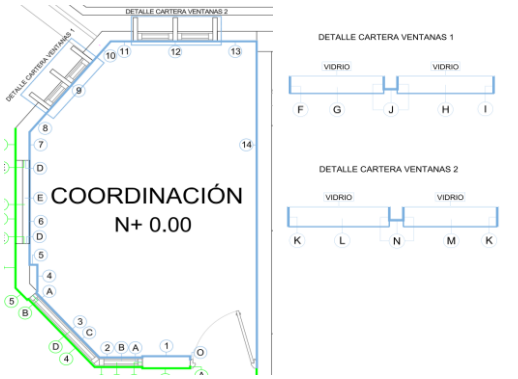















CAMINADORES #15		0,52		1,11			0,58	M2	CORTE 4
CAMINADORES #16		0,04		1,11			0,04	M2	CORTE 4
CAMINADORES #17		1,18		1,11			1,31	M2	CORTE 4
CAMINADORES #18		0,04		1,11			0,04	M2	CORTE 4
CAMINADORES #19		0,54		1,11			0,60	M2	CORTE 4
CAMINADORES #20		2,49		1,10			2,74	M2	CORTE 4
CAMINADORES #21		0,11		1,11			0,12	M2	CORTE 4
CAMINADORES #22		0,24		1,11			0,27	M2	CORTE 4
CAMINADORES #23		0,95		0,73			0,69	M2	CORTE 4
CAMINADORES #24		4,27		0,73			3,12	M2	CORTE 4
CAMINADORES #25		1,18		0,73			0,86	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA E		0,03		0,53			0,02	M2	CORTE 4
CAMINADORES #26		0,24		1,11			0,27	M2	CORTE 4
CAMINADORES #27		0,13		1,11			0,14	M2	CORTE 4
CAMINADORES #28		0,53		0,22			0,12	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA F		0,03		0,26			0,01	M2	CORTE 4
CAMINADORES #29		0,06		0,91			0,05	M2	CORTE 4
CARTERA PUERTA G		0,07		0,37			0,03	M2	CORTE 4
CARTERA PUERTA H		0,07		1,11			0,08	M2	CORTE 4
CAMINADORES #30		0,17		1,11			0,19	M2	CORTE 4
CAMINADORES #31		1,28		1,11			1,42	M2	CORTE 4
CAMINADORES #32		0,08		1,11		2,00	0,18	M2	CORTE 4
CAMINADORES #33		1,94		1,11			2,15	M2	CORTE 4
CAMINADORES #34		0,10		1,11			0,11	M2	CORTE 4
CAMINADORES #35		0,66		0,89			0,59	M2	CORTE 4
CAMINADORES #36		0,11		0,40			0,04	M2	CORTE 4
CAMINADORES #37		0,54		0,03			0,02	M2	CORTE 4
CARTERA I		0,10		0,54			0,05	M2	CORTE 4
CARTERA J		0,10		0,36		2,00	0,07	M2	CORTE 4
CAMINADORES #38		0,23		0,40			0,09	M2	CORTE 4
COORDINACIÓN INTERNA (AZUL)							-		
COOR. #1		0,55		1,11			0,61	M2	CORTE 4
COOR. #2		0,52		0,85			0,44	M2	CORTE 4
COOR. #3		1,25		0,85			1,06	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA A		0,04		0,27		2,00	0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA B		0,04		0,52			0,02	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA C		0,04		1,25			0,05	M2	CORTE 4
COOR. #4		0,33		1,11			0,37	M2	CORTE 4
COOR. #5		0,04		1,11			0,04	M2	CORTE 4
COOR. #6		1,63		0,85			1,39	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA D		0,08		0,28		2,00	0,04	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA E		0,09		1,04			0,09	M2	CORTE 4
COOR. #7		0,60		0,28			0,17	M2	CORTE 4
COOR. #8		0,35		1,11			0,39	M2	CORTE 4
COOR. #9		0,90		0,66			0,59	M2	CORTE 4
COOR. #10		0,25		1,11			0,28	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA F		0,08		0,46			0,04	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA G		0,08		0,41			0,03	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA H		0,08		0,42			0,03	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA I		0,08		0,45			0,04	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA J		0,06		0,45		3,00	0,08	M2	CORTE 4
COOR. #11		0,26		1,11			0,29	M2	CORTE 4
COOR. #12		0,89		0,65			0,58	M2	CORTE 4
COOR. #13		0,59		1,11			0,65	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA K		0,09		0,45		2,00	0,08	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA L		0,09		0,43			0,04	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA M		0,09		0,40			0,04	M2	CORTE 4
CARTERA VENTANA N		0,06		0,45		3,00	0,08	M2	CORTE 4
COOR. #14		3,94		1,11			4,37	M2	CORTE 4
CARTERA PUERTA O		0,05		1,11			0,06	M2	CORTE 4
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
ACTA PARCIAL No. 5									
COMEDOR							-		
MURO A		3,31		1,12		1,00	3,71	M2	CORTE 5
DESCUENTO PUERTA PRINCIPAL		1,93		1,12		- 1,00	- 2,16	M2	CORTE 5
MURO D						1,00	1,00		
MURO 1		2,00		1,12		1,00	2,24	M2	CORTE 5
DESCUENTO ENCHAPE		0,59		1,12		- 1,00	- 0,66	M2	CORTE 5
MURO 2		0,10		1,12		1,00	0,11	M2	CORTE 5
MURO 3		0,24		1,12		1,00	0,27	M2	CORTE 5
MURO 4		0,10		1,12		1,00	0,11	M2	CORTE 5

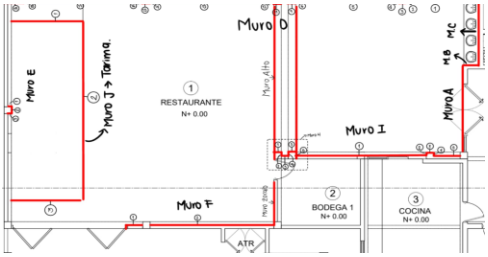




COCINA

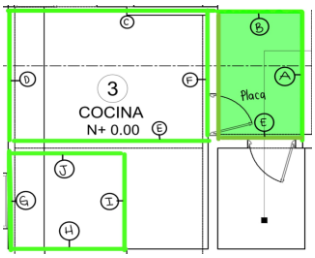


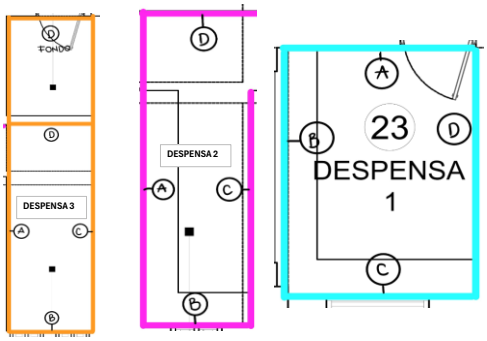

PASILLO ENTRE DESPENSAS













MURO 5		4,23		1,12		1,00	4,74	M2	CORTE 5
MURO 6		0,11		1,12		1,00	0,12	M2	CORTE 5
MURO 7		0,25		1,12		1,00	0,28	M2	CORTE 5
MURO 8		0,11		1,12		1,00	0,12	M2	CORTE 5
MURO 9		0,26		1,12		1,00	0,29	M2	CORTE 5
MURO 10		0,11		1,12		1,00	0,12	M2	CORTE 5
MURO 11		0,25		1,12		1,00	0,28	M2	CORTE 5
MURO 12		0,11		1,12		1,00	0,12	M2	CORTE 5
MURO 13		4,28		1,12		1,00	4,79	M2	CORTE 5
MURO 14		0,12		1,12		1,00	0,13	M2	CORTE 5
MURO 15		0,25		1,12		1,00	0,28	M2	CORTE 5
MURO 16		0,12		1,12		1,00	0,13	M2	CORTE 5
MURO 17		4,53		1,12		1,00	5,07	M2	CORTE 5
DESCUENTO ESCALERA		0,98		0,72		- 1,00	- 0,71	M2	CORTE 5
DESCUENTO ESCALERA		0,29		0,48		- 1,00	- 0,14	M2	CORTE 5
DESCUENTO ESCALERA		0,29		0,24		- 1,00	- 0,07	M2	CORTE 5
MURO 18		0,11		1,12		1,00	0,12	M2	CORTE 5
MURO 19		0,17		1,12		1,00	0,19	M2	CORTE 5
MURO E							-		
MURO 1		0,83		1,12		1,00	0,92	M2	CORTE 5
MURO 2		3,10		1,12		1,00	3,47	M2	CORTE 5
MURO 3		3,93		1,12		1,00	4,40	M2	CORTE 5
MURO 4		0,28		0,47		1,00	0,13	M2	CORTE 5
COLUMNA C							-		
LADO 1-3		0,14		1,12		2,00	0,31	M2	CORTE 5
LADO 2		0,25		1,12		1,00	0,28	M2	CORTE 5
MURO F							-		
COLUMNA 1		0,13		1,12		1,00	0,15	M2	CORTE 5
		0,19		1,12		1,00	0,21	M2	CORTE 5
CARTERA PUERTA		0,10		1,12		1,00	0,11	M2	CORTE 5
COLUMNA C							-		
CARA FRONTAL		0,25		1,12		1,00	0,28	M2	CORTE 5
CARA LATERALES		0,14		1,12		2,00	0,31	M2	CORTE 5
MURO ZOCALO							-		
MURO 1		0,50		1,14		1,00	0,57	M2	CORTE 5
MURO 2		4,22		1,14		1,00	4,81	M2	CORTE 5
MURO G							-		
MURO MAMPOSTERIA 4		0,25		1,12		1,00	0,28	M2	CORTE 5
MURO ZOCALO		1,65		1,14		1,00	1,88	M2	CORTE 5
MURO H							-		
MURO 1		0,25		1,12		1,00	0,28	M2	CORTE 5
MURO 2		0,13		1,12		1,00	0,15	M2	CORTE 5
MURO 3		0,27		1,12		1,00	0,30	M2	CORTE 5
MURO 4		0,13		1,12		1,00	0,15	M2	CORTE 5
MURO 5		0,25		1,12		1,00	0,28	M2	CORTE 5
MURO 6		0,12		1,12		1,00	0,13	M2	CORTE 5
MURO I							-		
MURO 1		4,23		1,12		1,00	4,74	M2	CORTE 5
MURO 2		0,11		1,12		1,00	0,12	M2	CORTE 5
MURO 3		0,25		1,12		1,00	0,28	M2	CORTE 5
MURO 4		0,10		1,12		1,00	0,11	M2	CORTE 5
MURO 5		1,43		1,12		1,00	1,60	M2	CORTE 5
MURO J TARIMA							-		
MURO 1-3		1,47		0,52		2,00	1,53	M2	CORTE 5
DESCUENTO		0,65		0,12		- 2,00	- 0,16	M2	CORTE 5
DESCUENTO		0,65		0,18		- 2,00	- 0,23	M2	CORTE 5
MURO 2		6,22		0,52		1,00	3,23	M2	CORTE 5
							-		
BODEGA							-		
MURO A		2,99		1,12		1,00	3,35	M2	CORTE 5
MURO B		2,31		1,12		1,00	2,59	M2	CORTE 5
MURO C		2,99		1,12		1,00	3,35	M2	CORTE 5
COLUMNA		0,12		1,12		2,00	0,27	M2	CORTE 5
MURO D		1,52		1,12		1,00	1,70	M2	CORTE 5
							-		
COCINA							-		
MURO A		2,26		0,76		1,00	1,72	M2	CORTE 5
MURO B		1,22		0,76		1,00	0,93	M2	CORTE 5
PLACA		1,22	2,26			1,00	2,76	M2	CORTE 5
CARTERA PLACA		2,26		0,19		1,00	0,43	M2	CORTE 5








MURO C		1,69		1,18		1,00	1,99	M2	CORTE 5
MURO C		1,74		1,03		1,00	1,79	M2	CORTE 5
MURO D		2,27		1,08		1,00	2,45	M2	CORTE 5
MURO E		3,43		1,08		1,00	3,70	M2	CORTE 5
		1,22		0,76		1,00	0,93	M2	CORTE 5
MURO F		0,90		0,27		1,00	0,24	M2	CORTE 5
		1,26		0,31		1,00	0,39	M2	CORTE 5
BAJO PLACA		3,17		0,15		1,00	0,48	M2	CORTE 5
		2,22		0,26		1,00	0,58	M2	CORTE 5
MURO G		2,07		0,80		1,00	1,66	M2	CORTE 5
COLUMNA		0,08		1,00		1,00	0,08	M2	CORTE 5
COLUMNA		0,09		0,98		1,00	0,09	M2	CORTE 5
VIGA CARA SUPERIOR		2,07		0,15		1,00	0,31	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		2,07		0,25		1,00	0,52	M2	CORTE 5
MURO H		1,75		0,98		1,00	1,72	M2	CORTE 5
COLUMNA		0,09		0,98		1,00	0,09	M2	CORTE 5
MURO I		2,07		1,13		1,00	2,33	M2	CORTE 5
MURO J		1,79		0,86		1,00	1,54	M2	CORTE 5
COLUMNA		0,08		1,00		1,00	0,08	M2	CORTE 5
VIGA CARA SUPERIOR		1,79		0,15		1,00	0,27	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		1,79		0,31		1,00	0,55	M2	CORTE 5
							-		
DESPENSA 3							-		
MURO A		2,51		0,39		1,00	0,97	M2	CORTE 5
MURO ALTO		5,76		0,40		1,00	2,30	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		3,40		0,31		1,00	1,04	M2	CORTE 5
VIGA CARA SUP		3,40		0,03		1,00	0,10	M2	CORTE 5
MURO B		0,49		0,40		1,00	0,19	M2	CORTE 5
VIGA		1,34		0,31		1,00	0,41	M2	CORTE 5
MURO C		3,40		0,41		1,00	1,39	M2	CORTE 5
MURO ALTO		5,76		0,40		1,00	2,30	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		3,40		0,31		1,00	1,04	M2	CORTE 5
VIGA CARA SUP		3,40		0,03		1,00	0,10	M2	CORTE 5
MURO D							-		
MURO FONDO		1,49		1,00		1,00	1,49	M2	CORTE 5
SECCION 1		1,26		0,30		1,00	0,38	M2	CORTE 5
SECCION 2		0,73		1,24		1,00	0,91	M2	CORTE 5
SECCION 3		0,70		1,97		1,00	1,38	M2	CORTE 5
CARTERA		0,03		1,97		1,00	0,06	M2	CORTE 5
		0,03		0,70		1,00	0,02	M2	CORTE 5
CARTERA PUERTA		0,99		0,28		1,00	0,28	M2	CORTE 5
		0,14		2,02		1,00	0,27	M2	CORTE 5
DESPENSA 2							-		
MURO A		2,66		0,40		1,00	1,06	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		3,47		0,16		1,00	0,56	M2	CORTE 5
VIGA CARA INFERIOR		3,47		0,06		1,00	0,21	M2	CORTE 5
MURO B		1,01		0,37		1,00	0,37	M2	CORTE 5
DECUENTO VENTANA		0,44		0,37	-	1,00	- 0,16	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		1,01		0,21		1,00	0,21	M2	CORTE 5
MURO C		2,49		1,91		1,00	4,76	M2	CORTE 5
DESCUENTO ENCHAPE		0,55		1,52	-	1,00	- 0,84	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		3,33		0,16		1,00	0,53	M2	CORTE 5
VIGA CARA INFERIOR		3,33		0,06		1,00	0,20	M2	CORTE 5
MURO D		1,10		2,13		1,00	2,34	M2	CORTE 5
							-		
DESPENSA 1							-		
MURO A		1,05		0,44		1,00	0,46	M2	CORTE 5
		1,63		0,18		1,00	0,29	M2	CORTE 5
MURO B		0,15		0,40		1,00	0,06	M2	CORTE 5
		0,14		0,40		1,00	0,06	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		2,32		0,27		1,00	0,63	M2	CORTE 5
VIGA CARA INFERIOR		2,32		0,05		1,00	0,12	M2	CORTE 5
MURO C		0,33		0,36		2,00	0,24	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		1,62		0,17		1,00	0,27	M2	CORTE 5
VIGA CARA INFERIOR		1,62		0,13		1,00	0,21	M2	CORTE 5
MURO D		2,55		1,84		1,00	4,69	M2	CORTE 5
DESCUENTO ENCHAPE		0,56		1,45	-	1,00	- 0,81	M2	CORTE 5
VIGA CARA FRONTAL		2,35		0,17		1,00	0,40	M2	CORTE 5
VIGA CARA INFERIOR		2,35		0,05		1,00	0,12	M2	CORTE 5

PASILLO DESPENSAS							-		
MURO A		1,71		0,75		1,00	1,28	M2	CORTE 5
		0,65		1,94		1,00	1,26	M2	CORTE 5
COLUMNA		0,12		0,48		1,00	0,06	M2	CORTE 5
MURO B		0,78		0,75		1,00	0,59	M2	CORTE 5
CARTERA		0,78		0,12		1,00	0,09	M2	CORTE 5
MURO C		1,71		2,66		1,00	4,55	M2	CORTE 5
DESCUENTO PUERTA		0,83		1,95		1,00	1,62	M2	CORTE 5
MURO D		0,78		0,75		1,00	0,59	M2	CORTE 5
CARTERA		0,78		0,10		1,00	0,08	M2	CORTE 5
CARTERA PUERTA		0,25		1,29		1,00	0,32	M2	CORTE 5
							-		
LAVANDERIA							-		
MURO A		3,10		0,18		1,00	0,56	M2	CORTE 5
MURO B		3,34		0,18		1,00	0,60	M2	CORTE 5
ELEMENTO BORDE VENTANA FRONTAL		0,06		1,73		1,00	0,10	M2	CORTE 5
ELEMENTO BORDE VENTANA LATERAL		0,06		1,40		6,00	0,50	M2	CORTE 5
		0,02		1,40		6,00	0,17	M2	CORTE 5
		0,06		0,20		6,00	0,07	M2	CORTE 5
		0,02		0,20		6,00	0,02	M2	CORTE 5
ALFAJIA FRONTAL		1,66		0,10		1,00	0,17	M2	CORTE 5
ALFAJIA SUP-INF		1,66		0,10		2,00	0,33	M2	CORTE 5
CARTERA VENTANAS		0,55		0,05		1,00	0,03	M2	CORTE 5
		0,55		0,06		1,00	0,03	M2	CORTE 5
CUARTO ASEO							-		
VIGA 1		1,63		0,39		1,00	0,64	M2	CORTE 5
		2,13		0,17		1,00	0,36	M2	CORTE 5
VIGA 2		1,66		0,21		1,00	0,35	M2	CORTE 5
VIGA 3		1,63		0,20		1,00	0,33	M2	CORTE 5
VIGA 4		1,63		0,39		1,00	0,64	M2	CORTE 5
		2,30		0,17		1,00	0,39	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	388,49	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	252,16	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**136,33**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
136,33	252,16	**388,49**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**



CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**22.3.6**	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**ACTA PARCIAL No. 5**									
	VIGA CANAL DE CUBIERTAS									
	PARVULOS D-C, BAÑOS 2- COORDINACIÓN (VERDE)			14,00			1,00	14,00	M	CORTE 5
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
 										

TOTAL EJECUTADO	14,00	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M	
PRESENTE ACTA	**14,00**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
14,00	0,00	**14,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	**12/06/2026**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**23.4.10**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA

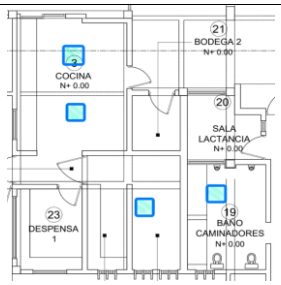









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL No. 5									
CLARABOYA							-		
COCINA		0,64	0,64			2,00	0,82	M2	CORTE 5
DESPENSA		0,64	0,64			1,00	0,41	M2	CORTE 5
BAÑO CAMINADORES		0,64	0,64			1,00	0,41	M2	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	1,64	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	-	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M2
PRESENTE ACTA	**1,64**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,64	0,00	**1,64**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA


Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ		
CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES	**CONTRATO No.**	10676	**FRENTE OBRA**	**012**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025	**CONTRATO No:**	11836		
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4			**FECHA**	12/06/2026


CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ÍTEM	**23.8.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.**			**UNIDAD**	**M**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA





















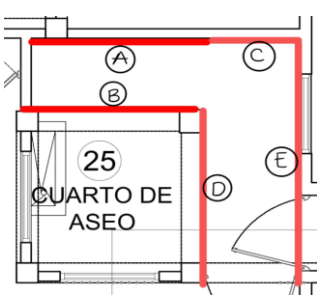




LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL NO. 4									
FLANCHE 1	1,40		8,80				12,32	M	CORTE 4
FLANCHE 2	1,40		12,20				17,08	M	CORTE 4
FLANCHE 3	2,40		6,25				15,00	M	CORTE 4
FLANCHE 4	3,20		6,10				19,52	M	CORTE 4
FLANCHE 5			2,30				2,30	M	CORTE 4
FLANCHE 6	2,72		8,80				23,94	M	CORTE 4
FLANCHE 7	1,32		7,70				10,16	M	CORTE 4
FLANCHE 8	3,04		12,70				38,61	M	CORTE 4
FLANCHE 9	2,48		6,15				15,25	M	CORTE 4
FLANCHE 10	2,48		3,87				9,60	M	CORTE 4
FLANCHE 11			12,50				12,50	M	CORTE 4
FLANCHE 12	2,40		7,40				17,76	M	CORTE 4
FLANCHE 13	2,00		5,78				11,56	M	CORTE 4
FLANCHE 14			3,70				3,70	M	CORTE 4
FLANCHE 15			3,70				3,70	M	CORTE 4
FLANCHE 16	1,40		2,30				3,22	M	CORTE 4
FLANCHE 17			2,30				2,30	M	CORTE 4
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
ACTA PARCIAL NO. 5									
LAVANDERIA							-		
FLANCHE A			2,6			1,00	2,60	M	CORTE 5
FLANCHE B	1,44		2,5			1,00	3,60	M	CORTE 5
FLANCHE C			1,2			1,00	1,20	M	CORTE 5
FLANCHE D	1,44		2,5			1,00	3,60	M	CORTE 5
FLANCHE E			3,6			1,00	3,60	M	CORTE 5
FLANCHE F			1,2			2,00	2,40	M	CORTE 5
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		









							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		
							-		

TOTAL EJECUTADO	235,52	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	218,52	M	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	-	M	
PRESENTE ACTA	17,00	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
17,00	218,52	**235,52**

OBSERVACIONES: SE CONTEMPLA UN FACTOR DE CONVERSIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANCHO (DESARROLLO) USADO EN OBRA ES SUPERIOR AL ESPECIFICADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM, CON LA FINALIDAD DE DAR GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; EN LA MEMORIA SE DEJA EL DETALLE DEL DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA CADA CASO

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ MARTIN RESTREPO ATUESTA	**NOMBRE**	ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO
FIRMA		**FIRMA**	
