INFORME FINAL

INFORME FINAL

PERIODO: 19 DE AGOSTO DE 2025 AL 22 DE MARZO DE 2026



CONTRATO DE OBRA No. SA-MC-OBRA-213-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRA-TIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUN-DINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUN-DINAMARCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ

MARZO 2026

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción de modificación	Folios
01	22 de marzo de 2026	Versión inicial informe Final	65

CONTRATISTA	
ELABORADO POR	**REVISADO POR**
	
Ing. Jorge García Residente de Obra	**Ing. Miguel Mauricio Cantor** Director de Obra

INTERVENTORIA	
REVISADO POR	**APROBADO POR**
	
Ing. Javier Humberto Martínez Director de Interventoría	**Ing. Mayra Alejandra Camargo** R.L. Consorcio Inter Plaza

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7
2. OBJETIVO 7
3. GENERALIDADES 8
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
5. LOCALIZACIÓN 10
5.1 PÓLIZAS DE AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA 12
5.2 ACTAS DE COMITÉ 14
5.3 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 15
6. PERSONAL VINCULADO 16
7. RESUMEN FINANCIERO 16
8. DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA 17
8.1 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 17
8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 21
8.3 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA 62
9. MATERIALES Y EQUIPOS 62
10. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 62
10.1 ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN 62
10.2 ENTREGA DE EPP 63
10.3 ACTAS DE VECINDAD 63
10.4 CHARLAS Y CAPACITACIONES 63
10.5 PERMISOS DE TRABAJO SEGURO 63
10.6 LIMPIEZA Y ASEO 64
10.7 PAZ Y SALVOS 64
11. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 64
12. ANEXOS 65

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización municipio de Sesquilé, Tomado de: “enciclopedia libre, Wikipedia”. 11
Ilustración 2. Localización cabecera municipal. 11
Ilustración 3. Localización predio del proyecto. 12
Ilustración 4. Localización quiosco y locales de comida. 18
Ilustración 5 cerca en tela verde locales de comida 21
Ilustración 6 Cerca en tela verde Quiosco 21
Ilustración 7 Demolición enchape muro. 21
Ilustración 8 Demolición enchape muro. 21
Ilustración 9 Demolición placa maciza 21
Ilustración 10 Desmonte marcos y puertas 22
Ilustración 11 Desmonte ventanas 22
Ilustración 12 Demolición adoquín Quiosco 23
Ilustración 13 Demolición adoquín urbanismo 23
Ilustración 14 Base granular 23
Ilustración 15 Excavación manual 24
Ilustración 16 Excavación manual 24
Ilustración 17 Caja de inspección 24
Ilustración 18 pañetes locales de comida 25

Ilustración 19 Pañete Quiosco 25
Ilustración 20 Teja de barro cubierta 25
Ilustración 21 Teja de barro nichos de gas 25
Ilustración 22 Cerradura entrada principal 26
Ilustración 23 Marco para puerta. 26
Ilustración 24 Marco para puerta 26
Ilustración 25 Marco para caja de inspección 27
Ilustración 26 Rampa vista lateral 27
Ilustración 27 rampa vista frontal 27
Ilustración 28 Adoquín en concreto 28
Ilustración 29 Impermeabilización fachada 29
Ilustración 30 Demolición placa locales de comida 29
Ilustración 31 Demolición placa mesón quiosco. 29
Ilustración 32 Desmonte lavaplatos 30
Ilustración 33 Lavaplatos desmontados 30
Ilustración 34 Desmonte aparatos sanitarios quiosco 30
Ilustración 35 Aparatos sanitarios desmontados 30
Ilustración 36 Tanque elevado 31
Ilustración 37 demolición muro en mampostería 31
Ilustración 38 Demolición baldosa de piso H= 0.04 M 32
Ilustración 39 Desmonte y retiro de puntos hidráulicos 32
Ilustración 40 Desmonte y retiro de puntos sanitarios 33
Ilustración 41 Retiro puntos eléctricos 33
Ilustración 42 Punto hidráulico PVC- P/PARAL1/2" 34
Ilustración 43 Salida sanitaria PVC S/PARAL 2" 34
Ilustración 44 Salida sanitaria PVC- S/SIFON 2" 35
Ilustración 45 Muro en bloque N5 35
Ilustración 46 Placa base en concreto 36
Ilustración 47 Alistado piso quiosco 36
Ilustración 48 Alistado piso locales 36
Ilustración 49 Muro ladrillo estructural 37
Ilustración 50 Columneta 37
Ilustración 51 Columneta locales de comida 37
Ilustración 52 Acero mesones 38
Ilustración 53 Acero columnetas 38
Ilustración 54 Malla quiosco 38
Ilustración 55 Malla cubierta 38
Ilustración 56 Dovelas quiosco 39
Ilustración 57 Dovela quiosco 39
Ilustración 58 vigueta de amarre 39
Ilustración 59 Vigueta amarre 0.20 * 0.20 40
Ilustración 60 Filos o dilataciones 40
Ilustración 61 Cielo raso PVC locales de comida 41
Ilustración 62 Cielo raso quiosco 41
Ilustración 63 Esmalte sobre lamina lineal 41
Ilustración 64 Esmalte sobre lamina llena 42
Ilustración 65 Suministro e instalación estuco 42
Ilustración 66 Vinilo locales de comida 43
Ilustración 67 Vinilo quiosco 43
Ilustración 68 Vinilo lineal 43
Ilustración 69 Baldosa cerámica pared cocina 44

Ilustración 70 Baldosa pared locales de comida 44
Ilustración 71 Suministro e instalaciones de piso porcelanato cocinas 44
Ilustración 72 Porcelanato locales de comida 44
Ilustración 73 Lavada de fachada 45
Ilustración 74 Anclaje 1/2 45
Ilustración 75 Anclaje 1/2 45
Ilustración 76 Tablero parcial 4 circuitos 46
Ilustración 77 Mantenimiento cubierta de barro 46
Ilustración 78 Elaboración de mesones en concreto 47
Ilustración 79 Acabado en microcemento mesón. 47
Ilustración 80 Cielo raso comedor quiosco 48
Ilustración 81 Liston exterior 48
Ilustración 82 Puerta ventana acceso 49
Ilustración 83 Ventana lateral 49
Ilustración 84 Ventana posterior 49
Ilustración 85 Vidrio laminado 49
Ilustración 86 Puerta quiosco 50
Ilustración 87 Pase muro 50
Ilustración 88 Adecuación estructura en madera 51
Ilustración 89 Refuerzo estructura en madera 51
Ilustración 90 Retiro manto asfaltico existente 51
Ilustración 91 Afinado impermeabilizado para teja de barro 52
Ilustración 92 Demolición cañuela 52
Ilustración 93 Carcamo para aguas 53
Ilustración 94 Rejilla metálica 53
Ilustración 95 Lavaplatos quiosco 54
Ilustración 96 Lavaplatos cocinas 54
Ilustración 97 Cañuela en concreto 2500 psi 55
Ilustración 0 18.17 muro en ladrillo estructural 0.15 m (lineal) 55
Ilustración 0 18.17 muro en ladrillo estructural 0.15 m (lineal) 55
Ilustración 0 18.18 pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm (lineal) 56
Ilustración 0 18.18 pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm (lineal) 56
Ilustración 0 18.30 suministro e instalacion de estuco acrilico sobre pañete (lineal) 56
Ilustración 0 18.30 suministro e instalacion de estuco acrilico sobre pañete (lineal) 56
Ilustración 0 18.34 baldosa cerámica pared calidad primera (lineal) 57
Ilustración 0 18.42 salida para tomacorriente monofasico doble con polo a tierra 120v incluye 3 metros de tubería conduit 1/2" y 3x#12 libre de halogenos 57
Ilustración 0 18.43 salida para tomacorriente monofásico doble gfci con polo a tierra 120v incluye 3 metros de tubería conduit 1/2" y 3x#12 libre de halogenos 58
Ilustración 0 18.44 salida para iluminacion incluye interruptor sencillo con polo a tierra 120v incluye 3 metros de tubería conduit 1/2" y 3x#12 libre de halogenos 58
Ilustración 0 18.44 salida para iluminacion incluye interruptor sencillo con polo a tierra 120v incluye 3 metros de tubería conduit 1/2" y 3x#12 libre de halogenos 58
Ilustración 0 18.45 suministro e instalación de led panel sq 24w 59
Ilustración 0 18.45 suministro e instalación de led panel sq 24w 59
Ilustración 0 18.46 suministro e instalación de led panel sq 40w 59
Ilustración 0 18.46 suministro e instalación de led panel sq 40w 59
Ilustración 0 18.57 suministro e instalacion de puerta metalica sistema retractil segun diseño arquitectónico inc. anticorrosivo 60
Ilustración 0 18.57 suministro e instalacion de puerta metalica sistema retractil segun diseño arquitectónico inc. anticorrosivo 60

Ilustración 0 18.58 suministro e instalacion de guardaescoba de piso porcelanato trafico pesado 60
Ilustración 0 18.58 suministro e instalacion de guardaescoba de piso porcelanato trafico pesado 60
Ilustración 0 18.59 suministro de medidor de agua potable 61
Ilustración 0 18.59 suministro de medidor de agua potable 61
Ilustración 0 18.65 suministro e instalacion de sifones en y 61
Ilustración 98 Gráfica de avance de obra. 62

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Generalidades Contrato de Obra. 8
Tabla 2. Generalidades Contrato de Interventoría 9
Tabla 3. Póliza de cumplimiento según suscripción del contrato - Anexo 0. 12
Tabla 4. Póliza de responsabilidad civil extracontractual según suscripción del contrato - Anexo 0. 12
Tabla 5. Póliza de cumplimiento según Acta de Inicio – Anexo 2. 13
Tabla 6. Póliza de responsabilidad civil extracontractual según Acta de Inicio – Anexo 2. 13
Tabla 7. Póliza de cumplimiento según Modificación y Adición No. 1 – Anexo 3. 13
Tabla 8. Póliza de cumplimiento según Acta de suspensión No.1, ampliación No. 1 a suspensión No. 1, Reinicio No. 1 y Modificatorio No. 1 y prórroga No. 1 – Anexo 4. 14
Tabla 9. Póliza de responsabilidad civil extracontractual según Acta de suspensión No.1, ampliación No. 1 a suspensión No. 1, Reinicio No. 1 y Modificatorio No. 1 y prórroga No. 1 – Anexo 3. 14
Tabla 10. Póliza de cumplimiento según Acta de Terminación– Anexo 5. 14
Tabla 11. Relación Actas de Comité. 15
Tabla 12 Personal vinculado. 16
Tabla 13. Resumen financiero. 16
Tabla 14 Actividades desarrolladas en el contrato 18
Tabla 15. Datos de seguimiento a la programación de obra. 62

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Obra N.° SA-MC-OBRA-213-2025, suscrito entre el Municipio de Sesquilé y el contratista el 09 de junio de 2025, cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuación de la Plaza de Mercado, en el marco del Convenio Interadministrativo N.° ICCU 623 de 2024", se presenta el informe final de actividades, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de agosto de 2025, fecha de inicio del contrato, y el 22 de marzo de 2026, fecha de terminación, conforme a la Prórroga No. 1 suscrita en desarrollo del mismo.

El presente informe constituye una herramienta de consolidación, seguimiento y cierre que permite verificar de manera integral el desarrollo técnico, administrativo y financiero del contrato, evidenciando la ejecución de las actividades, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada inversión de los recursos asignados al proyecto.

Durante la ejecución del contrato, y como resultado de las condiciones reales identificadas en campo, fue necesario adelantar ajustes técnicos y administrativos que permitieran garantizar la correcta continuidad y culminación de las obras. En este sentido, el 16 de diciembre de 2025 se suscribió la Modificación y Adición No. 1, mediante la cual se incorporaron ítems no previstos y se realizó el balance de obra correspondiente. Posteriormente, el 16 de enero de 2026 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1, la cual fue ampliada el 05 de febrero de 2026 por un término adicional de quince (15) días, con el fin de adelantar procesos de revisión técnica, evaluación en campo y estructuración de ajustes al alcance contractual.

Como resultado de dichas gestiones, el 20 de febrero de 2026 se suscribió el Acta de Reinicio No. 1, reanudándose las actividades de obra. De manera complementaria, se formalizó el Modificatorio No. 2 junto con la Prórroga No. 1, mediante los cuales se incorporaron nuevas actividades no previstas, se ajustaron las condiciones técnicas del proyecto y se amplió el plazo contractual hasta el 22 de marzo de 2026, garantizando la ejecución de las obras requeridas para la adecuada funcionalidad de la infraestructura.

En este contexto, el proyecto evolucionó de un alcance inicial de mantenimiento a una intervención integral de adecuación, que incluyó la ejecución de actividades en los componentes de urbanismo, redes hidrosanitarias, sistema eléctrico, manejo de aguas lluvias, estructura y acabados, permitiendo corregir deficiencias existentes y mejorar las condiciones de seguridad, salubridad, funcionalidad y durabilidad de la Plaza de Mercado.

En la presente entrega se incluye la consolidación de las actividades ejecutadas durante la totalidad del contrato, el balance del avance físico y financiero, la relación de las actuaciones administrativas y contractuales, así como el registro documental y fotográfico del proceso constructivo y las conclusiones del estado final del proyecto.

El presente documento tiene como finalidad proporcionar a la entidad contratante, la interventoría y demás interesados, información clara, detallada y verificable sobre el resultado final del proyecto, garantizando la trazabilidad de las decisiones adoptadas durante su ejecución y el cumplimiento del objeto contractual conforme a la normatividad vigente aplicable.

2. OBJETIVO

El objetivo del presente informe final es consolidar y documentar de manera técnica, ordenada y verificable el desarrollo integral del Contrato de Obra N.° SA-MC-OBRA-213-2025, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de agosto de 2025 y el 22 de marzo de 2026, abarcando la totalidad de las actividades ejecutadas hasta la culminación del proyecto.

Este informe tiene como finalidad presentar el balance final del contrato en sus componentes técnico, administrativo y financiero, mediante la recopilación y análisis de la información generada durante la ejecución de la obra, incluyendo las actividades desarrolladas, las modificaciones contractuales (adiciones, modificatorios, suspensión, reinicio y prórroga), y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas vigentes y condiciones contractuales establecidas.

Así mismo, busca verificar la conformidad de los procesos constructivos ejecutados frente a los criterios de calidad exigidos, evidenciar el cumplimiento del objeto contractual a partir de la intervención integral realizada en la Plaza de Mercado, y dejar soporte documental claro para los procesos de cierre, recibo y liquidación del contrato.

De igual manera, el presente informe se constituye como una herramienta de trazabilidad y control, que permite sustentar las decisiones técnicas adoptadas durante la ejecución del proyecto, así como proporcionar a la entidad contratante, la interventoría y demás interesados, información precisa y verificable sobre el estado final de la infraestructura y las condiciones en las que se realiza su entrega.

3. GENERALIDADES

Tabla 1. Generalidades Contrato de Obra.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SESQUILÉ
TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATO NO.	SA-MC-OBRA-213-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 DE JUNIO DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
NIT	901.951.235-2
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA
IDENTIFICACION	209.138 DE COTA
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRA-TIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($362.754.442,00) M/CTE.
VALOR ADICION No 1.	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000)
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($397.754.442)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES.
FECHA ACTA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2025.
MODIFICATORIO 1 Y ADICION No 1	INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTO Y BALANCE DE OBRA 16 DE DICIEMBRE 2025
SUSPENSIÓN No 1	16 DE ENERO DE 2026 POR VEINTE (20) DIAS

AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	5 DE FEBRERO DE 2026 POR QUINCE (15) DÍAS
ACTA DE REINICIO 1	DE FECHA DE 20 DE FEBRERO DE 2026
MODIFICATORIO No. 2	INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y BALANCE DE OBRA
PRORROGA NUMERO No. 1	POR EL TERMINO DE (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE MARZO DE 2026.

Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2026.

Tabla 2. Generalidades Contrato de Interventoría

CONTRATO NO.	MC-INT-212-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER PLAZA
NIT	901.953.296-0
REPRESENTANTE LEGAL	MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA
IDENTIFICACION	1.070.306.716 DE COGUA
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA

Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2025.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto corresponde a la ejecución del Contrato de Obra N.° SA-MC-OBRA-213-2025, suscrito el 09 de junio de 2025 entre el Municipio de Sesquilé y el contratista, cuyo objeto es el mantenimiento y adecuación de la Plaza de Mercado, en el marco del Convenio Interadministrativo N.° ICCU 623 de 2024, celebrado con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU.

El contrato inició el 19 de agosto de 2025 con un plazo inicial de ejecución de cinco (5) meses y un valor de $362.754.442. Durante su desarrollo, y como resultado de las condiciones reales identificadas en campo, fue necesario realizar ajustes al alcance contractual. En este sentido, el 16 de diciembre de 2025 se suscribió la Modificación y Adición No. 1, mediante la cual se incorporaron ítems no previstos y se adicionaron recursos por valor de $35.000.000, estableciendo un valor total del contrato de $397.754.442.

Posteriormente, el 16 de enero de 2026 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1, con el fin de adelantar revisiones técnicas y administrativas orientadas a evaluar las condiciones de la infraestructura existente y estructurar los ajustes requeridos para la correcta ejecución del proyecto. Dicha suspensión fue ampliada el 05 de febrero de 2026 por un término adicional de quince (15) días. Una vez finalizado este proceso, el 20 de febrero de 2026 se suscribió el Acta de Reinicio No. 1, reanudando las actividades de obra.

Como resultado de las evaluaciones técnicas realizadas durante el periodo de suspensión, se formalizó el Modificatorio No. 2 junto con la Prórroga No. 1, mediante los cuales se incorporaron nuevas actividades no previstas, se ajustó el balance de obra y se amplió el plazo contractual en un (1) mes, estableciendo como fecha de terminación el 22 de marzo de 2026.

Las modificaciones contractuales realizadas responden a la necesidad de intervenir condiciones no evidenciadas en la etapa inicial del proyecto, pero que resultaban indispensables para garantizar la funcionalidad integral de la infraestructura, la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de la normatividad vigente en materia estructural, sanitaria y eléctrica.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto contempló la ejecución de actividades orientadas al mejoramiento integral de la Plaza de Mercado, incluyendo:

- **Obras preliminares:** cerramiento, demoliciones, retiro de escombros y adecuación inicial de áreas.
- **Componente estructural y constructivo:** excavaciones, conformación de bases, construcción de elementos en concreto, levantamiento y adecuación de muros en mampostería.
- **Cubiertas:** mantenimiento, reparación y adecuación de estructuras en madera y teja de barro.
- **Redes hidrosanitarias:** instalación, reposición y ajuste de redes de abastecimiento y evacuación, así como implementación de elementos funcionales.
- **Redes eléctricas:** adecuación del sistema eléctrico, instalación de tableros, circuitos, salidas para tomacorrientes e iluminación, conforme a normatividad vigente.
- **Manejo de aguas lluvias:** construcción de cárcamos, cañuelas, rejillas y adecuación de sistemas de drenaje.
- **Urbanismo:** conformación de base granular, instalación de adoquines, construcción de rampas y adecuación de áreas de circulación.
- **Acabados y dotación:** instalación de pisos, enchapes, carpintería metálica, puertas, lavaplatos, guarda escobas y elementos complementarios.

En el marco del Modificatorio No. 2, se reforzó especialmente la intervención en los componentes de urbanismo, drenaje y redes, incorporando soluciones técnicas que permitieron mejorar las condiciones de accesibilidad, manejo de aguas, salubridad y funcionalidad de los espacios intervenidos.

En conjunto, las actividades ejecutadas permitieron transformar la infraestructura existente, pasando de un esquema de mantenimiento a una intervención integral de adecuación, orientada a garantizar condiciones óptimas de operación, seguridad, higiene y durabilidad para el desarrollo de las actividades comerciales en la Plaza de Mercado del municipio de Sesquilé.

El proyecto se enmarca en los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal **"**Gestión, Progreso y Buen Gobierno 2024–2027**"**, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local y al mejoramiento de las condiciones de servicio para comerciantes, productores y comunidad en general.

5. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el casco urbano del municipio de Sesquilé, específicamente en el predio ubicado en las coordenadas 5°02'47.0"N 73°47'51.9"W.



Ilustración 1. Localización municipio de Sesquilé, Tomado de: "enciclopedia libre, Wikipedia".
Fuente: Alcaldía de Sesquilé, Cundinamarca. (s. f.). Galería de mapas. Recuperado el 26 de septiembre de 2025, de https://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-mapas.aspx

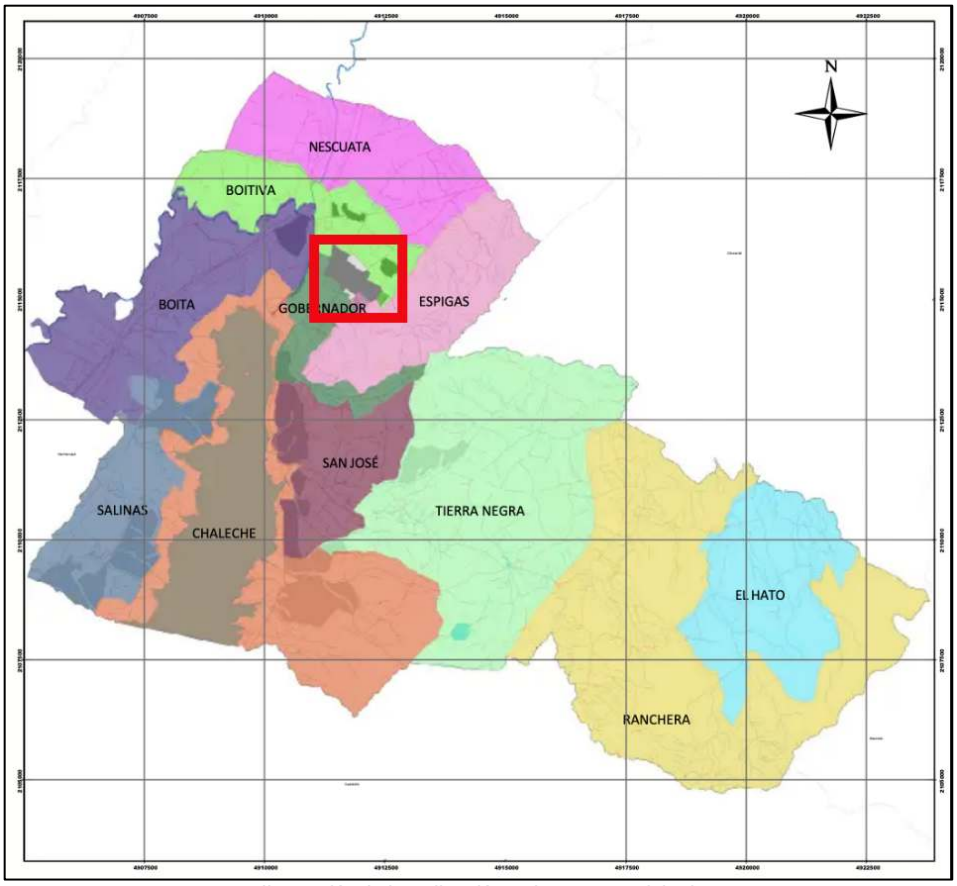


Ilustración 2. Localización cabecera municipal.
Fuente: Ramírez, J. C. (2019). División político administrativa [Mapa]. Scribd. Recuperado de https://es.scribd.com/document/852100971/13-DIVISION-POLITICO-ADMINISTRATIVA.

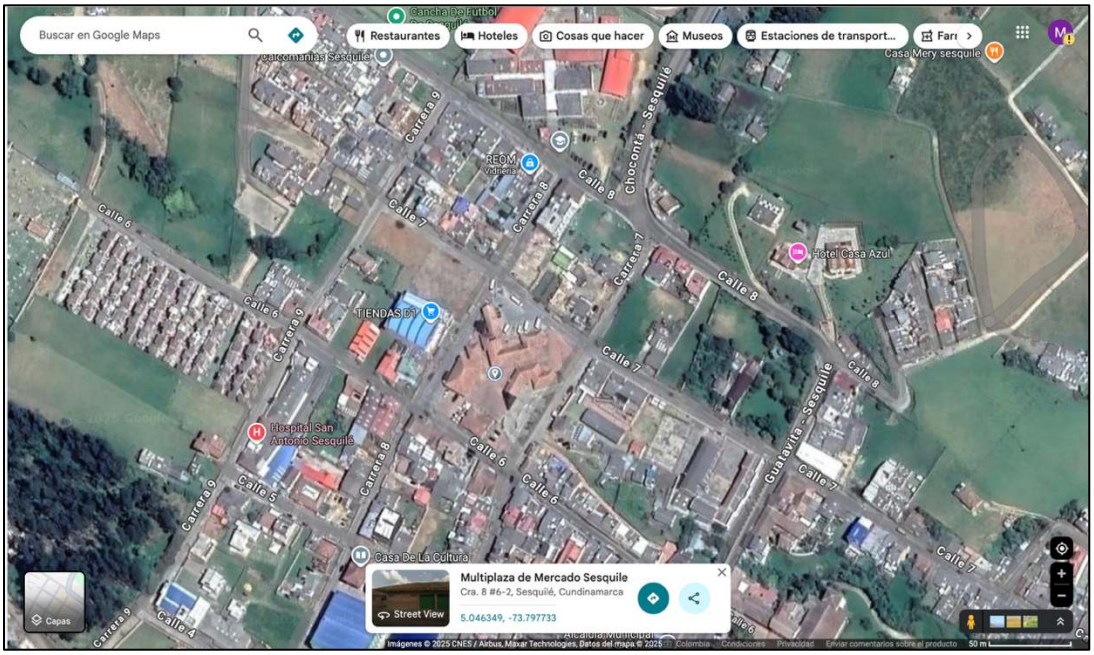


Ilustración 3. Localización predio del proyecto.
Fuente: Google. (s. f.). [Vista de mapa en Google Maps de las coordenadas 5.0466022, -73.7975969]. Recuperado el 26 de septiembre de 2025, de https://www.google.com/maps/@5.0466022,-73.7975969,429m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

5.1 PÓLIZAS DE AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 3. Póliza de cumplimiento según suscripción del contrato - Anexo 0.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
NO. DE POLIZA: CSU-100000980			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/06/2025	31/05/2026	$ 72.550.888,40
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2025	10/11/2028	$ 36.275.444,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/11/2025	10/11/2030	$ 108.826.332,60

Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2025.

Tabla 4. Póliza de responsabilidad civil extracontractual según suscripción del contrato - Anexo 0.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
NO. DE POLIZA: CSU-100000223			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**

AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES	06/06/2025	05/09/2025	$ 284.700.000,00
PATRONAL	06/06/2025	05/09/2025	$ 284.700.000,00
CONTRISTAS Y SUBCONTRATISTAS	06/06/2025	05/09/2025	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	06/06/2025	05/09/2025	$ 284.700.000,00

Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2025.

Tabla 5. Póliza de cumplimiento según Acta de Inicio – Anexo 2.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
NO. DE POLIZA: CSU-100000980			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/09/2025	23/07/2026	$ 72.550.888,40
PRESTACIONES SOCIALES	19/09/2025	23/01/2029	$ 36.275.444,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/09/2025	23/01/2029	$ 108.826.332,60

Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2025.

Tabla 6. Póliza de responsabilidad civil extracontractual según Acta de Inicio – Anexo 2.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
NO. DE POLIZA: CSU-100000223			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES	19/08/2025	18/01/2026	$ 284.700.000,00
PATRONAL	19/08/2025	18/01/2026	$ 284.700.000,00
CONTRISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/08/2025	18/01/2026	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/08/2025	18/01/2026	$ 284.700.000,00

Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2025.

Tabla 7. Póliza de cumplimiento según Modificación y Adición No. 1 – Anexo 3.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
NO. DE POLIZA: CSU-100000980			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/12/2025	23/07/2026	$ 79.550.888,40
PRESTACIONES SOCIALES	10/12/2025	23/01/2029	$ 39.775.444,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/12/2025	23/01/2029	$ 119.326.332,60

Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2025.

Tabla 8. Póliza de cumplimiento según Acta de suspensión No.1, ampliación No. 1 a suspensión No. 1, Reinicio No. 1 y Modificatorio No. 1 y prórroga No. 1 – Anexo 4.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
NO. DE POLIZA: CSU-100000980			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/01/2026	22/092026	$ 79.550.888,40
PRESTACIONES SOCIALES	16/01/2026	22/03/2029	$ 39.775.444,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/01/2026	22/03/2031	$ 119.326.332,60

Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2025.

Tabla 9. Póliza de responsabilidad civil extracontractual según Acta de suspensión No.1, ampliación No. 1 a suspensión No. 1, Reinicio No. 1 y Modificatorio No. 1 y prórroga No. 1 – Anexo 3.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
NO. DE POLIZA: CSU-100000223			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES	19/08/2025	22/03/2026	$ 350.181.000,00
PATRONAL	19/08/2025	22/03/2026	$ 350.181.000,00
CONTRISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/08/2025	22/03/2026	$ 350.181.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/08/2025	22/03/2026	$ 350.181.000,00

Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2026.

Tabla 10. Póliza de cumplimiento según Acta de Terminación– Anexo 5.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
NO. DE POLIZA: CSU-100000980			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/01/2026	22/092026	$ 79.550.888,40
PRESTACIONES SOCIALES	16/01/2026	22/03/2029	$ 39.775.444,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24/03/2026	24/03//2031	$ 119.326.332,60

Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2025.

5.2 ACTAS DE COMITÉ

Para el periodo del 19 de agosto de 2025 al 22 de marzo de 2026, se registran las siguientes actas de comité:

Tabla 11. Relación Actas de Comité.

ACTA NO.	FECHA
001	27 de agosto de 2025
002	03 de septiembre de 2025
003	10 de septiembre de 2025
004	17 de septiembre de 2025
005	24 de septiembre de 2025
006	01 de octubre de 2025
007	08 de octubre de 2025
008	15 de octubre de 2025
009	22 de octubre de 2025
010	29 de octubre de 2025
011	5 de noviembre de 2025
012	12 de noviembre de 2025
013	19 de noviembre de 2025
014	26 de noviembre de 2025
015	3 de diciembre de 2025
016	10 de diciembre de 2025
017	17 de diciembre de 2025
018	07 de enero de 2026
019	14 de enero de 2026
020	25 de febrero de 2026
021	4 de marzo de 2026
022	11 de marzo de 2026
023	18 de marzo de 2026

Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2025.

***Nota:** Las actas de comité reposan en los documentos de la entidad.*

5.3 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Durante el periodo comprendido entre el 19 de agosto de 2025 y el 22 de marzo de 2026, se generó la siguiente correspondencia relevante en el marco de la ejecución del contrato:

- **Oficio No. CPS25-0310-001**, mediante el cual el contratista solicita el Modificatorio No. 1 al contrato, con el fin de incluir ítems no previstos y realizar el ajuste al balance de obra, conforme a las necesidades identificadas durante la ejecución del proyecto.

- **Oficio No. CPS26-1401-001**, mediante el cual el contratista solicita la suspensión temporal del contrato, sustentada en consideraciones técnicas y administrativas asociadas a la necesidad de adelantar ajustes para la continuidad del proyecto.

- **Oficio No. No. CPS26-0502-001**, mediante el cual el contratista solicita la prórroga N 1 a la suspensión No 1 del contrato, sustentada en consideraciones técnicas y administrativas asociadas a la necesidad de adelantar ajustes para la formulación del modificatorio No 2

- ***Oficio No. CPS26 – 0202 – 001*** mediante el cual el contratista solicita a la interventoría la solicitud del modificatorio y prorroga No 1.

La correspondencia generada durante el periodo se encuentra debidamente radicada y hace parte integral del soporte documental del contrato, garantizando la trazabilidad de las decisiones adoptadas en el desarrollo del proyecto.

6. PERSONAL VINCULADO

Para la ejecución del Contrato de Obra No. **SA-MC-OBRA-213-2025**, el Consorcio plaza Sesquilé dispuso del personal técnico, administrativo y operativo requerido para el desarrollo de las actividades constructivas, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el cronograma de ejecución y los estándares de calidad exigidos por la entidad contratante.

A continuación, se presenta la relación del personal vinculado durante la ejecución del contrato, como soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales

Tabla 12 Personal vinculado

NOMBRE	CARGO PARA DESEMPEÑAR EN EL PROYECTO	PERIODO
MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY	DIRECTOR DE OBRA	19 de agosto de 2025 a 22 de marzo de 2026
JORGE LUIS GARCIA CRUZ	RESIDENTE DE OBRA	19 de agosto de 2025 a 22 de marzo de 2026
KEYLA MARGARITA MEZA CASTRO	PROFESIONAL SST	19 de agosto de 2025 a 22 de marzo de 2026
CESAR AUGUSTO CAMARGO FELICIANO	TECNICO ELECTRICISTA	19 de agosto de 2025 a 22 de marzo de 2026
CESAR TULIO CASTRO PIÑEROS	MAESTRO DE OBRA	19 de agosto de 2025 a 22 de marzo de 2026

Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2025.

7. RESUMEN FINANCIERO

Tabla 13. Resumen financiero.

VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 362.754.442,00) M/CTE.
VALOR ADICIÓN No 1	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000)
CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO	El Municipio de SESQUILE, cancelara al contratista el valor del contrato en los pagos parciales por los avances de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría y autorizadas por la supervisión de la siguiente Forma: pagos de avance de obra se harán así: hasta el Noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parcia-les de avance real de obra y previa aprobación por parte del supervisor asignado por el municipio al contrato de obra y aval de la interventoría. El último pago equivalente al diez por ciento (10%) del contrato estará sujeto a la presentación del acta de liquidación suscrita por las partes. En todo caso, esta última acta no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato previa presentación de un informe final como las cantidades realizadas y registro fotográfico, el cual será avalado por el interventor del contratista.

Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2025.

8. DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA

8.1 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

El desarrollo del Contrato de Obra No. SA-MC-OBRA-213-2025 se ejecutó conforme a las condiciones técnicas, administrativas y financieras establecidas contractualmente, abarcando el periodo comprendido entre el 19 de agosto de 2025 y el 22 de marzo de 2026.

Durante la ejecución del proyecto, las actividades constructivas se desarrollaron de manera progresiva y articulada, priorizando inicialmente las labores preliminares, demoliciones, adecuación de áreas y revisión de las condiciones existentes de la infraestructura. Posteriormente, se avanzó en la ejecución de los componentes estructurales, redes hidrosanitarias, sistema eléctrico, manejo de aguas lluvias, urbanismo y acabados, conforme a los ajustes derivados de las condiciones reales encontradas en campo.

Es importante señalar que, como resultado del proceso constructivo, se evidenciaron situaciones no previstas en la etapa de diseño, lo cual hizo necesario adelantar modificaciones contractuales orientadas a garantizar la funcionalidad integral del proyecto. En este sentido, se incorporaron actividades adicionales mediante los modificatorios suscritos, particularmente en lo relacionado con redes, drenajes, estructura y acabados, permitiendo dar solución a deficiencias existentes y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Las actividades se concentraron principalmente en las áreas del quiosco y los locales de comida, donde se realizaron intervenciones integrales que incluyeron desde la adecuación del terreno hasta la instalación de elementos funcionales y de dotación, mejorando significativamente las condiciones de operación de estos espacios.

De manera transversal, se realizó seguimiento permanente al avance de obra mediante controles técnicos, registro en bitácora, comités de obra y verificación por parte de la interventoría, garantizando la calidad de los procesos constructivos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

En términos generales, el desarrollo del contrato permitió la ejecución de una intervención integral que transformó las condiciones iniciales de la Plaza de Mercado, pasando de un alcance de mantenimiento a una adecuación completa de los espacios intervenidos, asegurando condiciones de seguridad, funcionalidad, salubridad y durabilidad acordes con el uso previsto de la infraestructura.

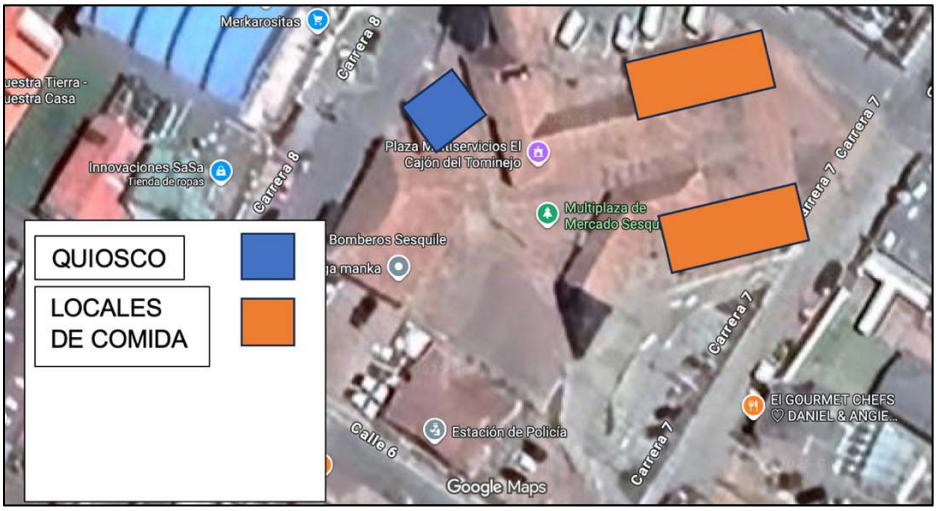


Ilustración 4. Localización quiosco y locales de comida.
Fuente: Google. (s. f.). [Vista de mapa en Google Maps de las coordenadas 5.0466022, -73.7975969]. Recuperado el 26 de septiembre de 2025, de https://www.google.com/maps/@5.0466022,-73.7975969,429m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Tabla 14 Actividades desarrolladas en el contrato

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1. PRELIMINAR			
1.1	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	140,00
1.2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	100,05
1.5	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	16,00
1.6	DESMONTE VENTANAS	M2	28,72
1.7	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	197,91
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS			
2.2	BASE GRANULAR BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	30,71
2.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	46,07
4. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS			
4.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	2,00
6. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS			
6.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	200,94
7. CUBIERTAS			
7.1	TEJA DE BARRO	M2	53,74
8. CARPINTERIA EN MADERA			
8.1	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	1,00
9. CARPINTERIA METALICA			
9.1	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,00
9.2	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	2,00
11. PISOS BASES			
11.1	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	5,63
12. PISOS Y ENCHAPES			
12.2	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	144,43
15. ACABADOS			
15.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	82,97
18. ITEMS NO PREVISTOS			
18.1	DEMOLICIÓN PLACA MESÓN	M2	29,82
18.2	DESMONTE DE LAVAPLATOS	UN	10,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
18.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4,00
18.4	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	UN	1,00
18.5	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	222,43
18.6	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	72,55
18.7	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS	UN	14,00
18.8	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS	UN	4,00
18.9	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	37,00
18.10	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	10,00
18.11	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	9,00
18.12	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 2"	UN	10,00
18.13	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M (LINEAL)	ML	22,30
18.14	PLACA BASE CONCRETO 0.10M 3000 PSI	M2	49,28
18.15	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	97,16
18.16	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 015 M	M2	42,78
18.17	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	42,61
18.18	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	225,44
18.19	COLUMNETA 0.10MX0.15M 3000 PSI	ML	23,20
18.20	ACERO FIGURADO 6000 PSI	KG	135,94
18.21	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	142,20
18.22	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	83,52
18.23	VIGUETA DE AMARRE DE 0.20M X 0.20M 3000 PSI	ML	94,80
18.24	VIGUETA AEREA 0.20M X 0.20M 3000 PSI	ML	16,34
18.25	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	242,69
18.26	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	78,75
18.27	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	5,64
18.28	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	2,32
18.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE	M2	180,02
18.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE (LINEAL)	ML	224,44
18.31	VINILO ANTISEPTICO, IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE	M2	175,82
18.32	VINILO ANTISEPTICO , IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE (LINEAL)	ML	224,44
18.33	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA	M2	27,96
18.34	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	5,04
18.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO	M2	96,41
18.36	LAVADA DE FACHADA	M2	86,51
18.37	ANCLAJE 1/2" L=15 cm	UN	90,00
18.38	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	9,00
18.39	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	M2	71,07
18.40	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO)	M2	9,83
18.41	ACABADO EN MICROCEMENTO PARA MESONES	M2	13,08
18.42	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	UN	20,00
18.43	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	UN	11,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
18.44	SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	UN	12,00
18.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL SQ 24W	UN	2,00
18.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL SQ 40W	UN	20,00
18.47	LISTON M.H. PINO ROMERON (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	21,91
18.48	LISTON M.H. PINO ROMERON LINEAL (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	ML	62,44
18.49	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	43,49
18.50	REMATES BOCEL WING ALUMINIO	ML	29,68
18.51	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	43,49
18.52	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,32
18.53	PASE MURO PARA CONEXION DE GAS	UN	8,00
18.54	RESTAURACION Y ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA	M2	26,33
18.55	RETIRO DE MANTO EN ASFALTO EXISTENTE	M2	26,33
18.56	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO CON MEMBRANA ASFALTICA	M2	50,61
18.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA SISTEMA RETRACTIL SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO INC. ANTICORROSIVO	M2	33,96
18.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA DE PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO	ML	128,27
18.59	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	UN	1,00
18.60	DEMOLICION DE CAÑUELA	ML	27,00
18.61	CÁRCAMO PARA AGUAS LLUVIAS	ML	17,00
18.62	REJILLA METALICA EN ANGULO DE 1" Y 1/8", CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" Y 1/8", Y CONTRA MARCO EN ANGULO DE 1/4" Y 1/8"	ML	11,38
18.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE TANQUE 100 X 51 ACERO INOXIDABLE PARA EL KIOSCO. INCLUYE REJILLA Y GRIFERIA.	UN	1,00
18.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE TANQUE 80X43 ACERO INOXIDABLE PARA LOCALES DE COMIDA. INCLUYE REJILLA Y GRIFERIA.	UN	8,00
18.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFONES EN Y	UN	9,00
18.66	CAÑUELA EN CONCRETO 2500 PSI 0.30 X 0.12	ML	10,00

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM	DESCRIPCION
1.1	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M



Ilustración 5 cerca en tela verde locales de comida



Ilustración 6 Cerca en tela verde Quiosco

1.2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO



Ilustración 7 Demolición enchape muro.



Ilustración 8 Demolición enchape muro.

1.4	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M



Ilustración 9 Demolición placa maciza

1.5	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS



Ilustración 10 Desmonte marcos y puertas

1.6	DESMONTE VENTANAS



Ilustración 11 Desmonte ventanas

1.7	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m



Ilustración 12 Demolición adoquín Quiosco



Ilustración 13 Demolición adoquín urbanismo

2.2	BASE GRANULAR BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)



Ilustración 14 Base granular

2.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)



Ilustración 15 Excavación manual



Ilustración 16 Excavación manual

4.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80



Ilustración 17 Caja de inspección

6.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM



Ilustración 18 pañetes locales de comida



Ilustración 19 Pañete Quiosco

7.1	TEJA DE BARRO



Ilustración 20 Teja de barro cubierta



Ilustración 21 Teja de barro nichos de gas

8.1	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL

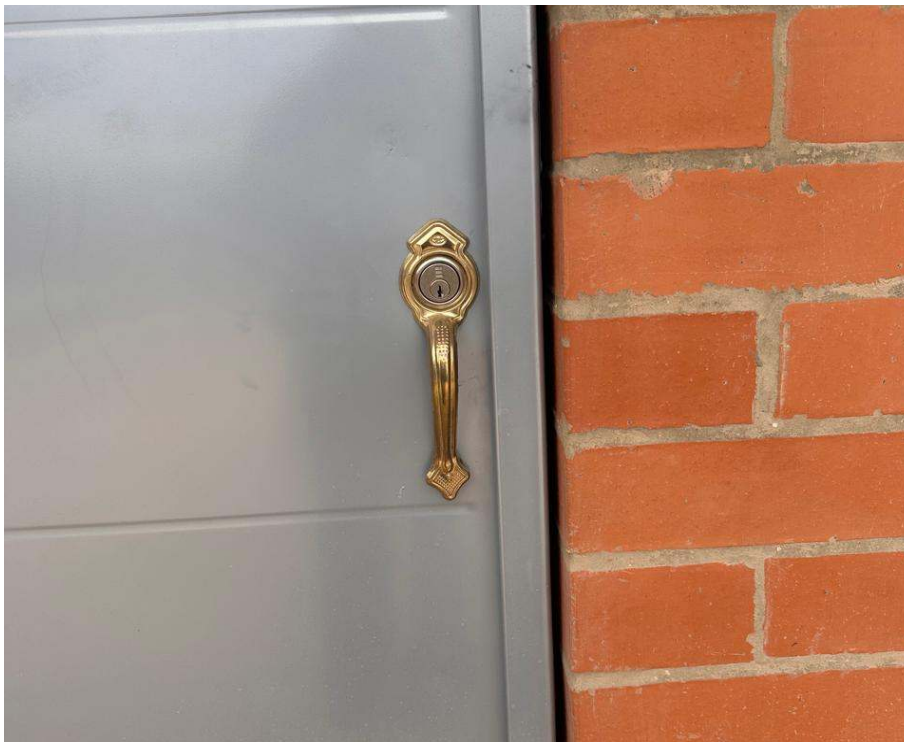


Ilustración 22 Cerradura entrada principal

9.1	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8



Ilustración 23 Marco para puerta.



Ilustración 24 Marco para puerta

9.2	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN



Ilustración 25 Marco para caja de inspección

11.1	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI



Ilustración 26 Rampa vista lateral



Ilustración 27 rampa vista frontal

12.2	ADOQUÍN CONCRETO 8CM



Ilustración 28 Adoquín en concreto

15.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR



Ilustración 29 Impermeabilización fachada

18.1	DEMOLICIÓN PLACA MESÓN



Ilustración 30 Demolición placa locales de comida



Ilustración 31 Demolición placa mesón quiosco.

18.2	DESMONTE DE LAVAPLATOS



Ilustración 32 Desmonte lavaplatos



Ilustración 33 Lavaplatos desmontados

18.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS



Ilustración 34 Desmonte aparatos sanitarios quiosco



Ilustración 35 Aparatos sanitarios desmontados

18.4	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO



Ilustración 36 Tanque elevado

18.5	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M



Ilustración 37 demolición muro en mampostería

18.6	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M

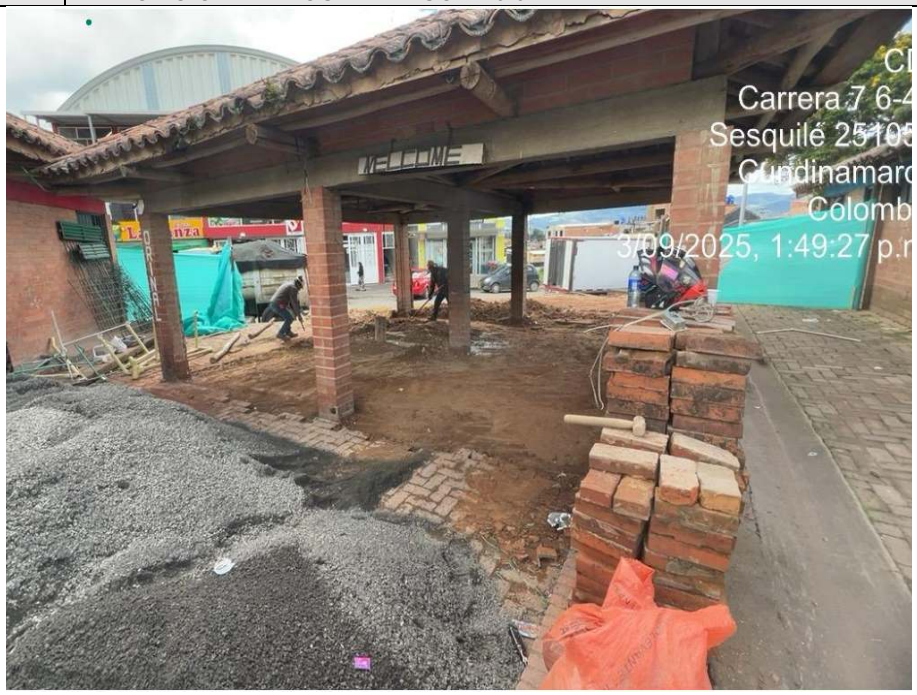


Ilustración 38 Demolición baldosa de piso H= 0.04 M

18.7	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS



Ilustración 39 Desmonte y retiro de puntos hidráulicos

18.8	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS



Ilustración 40 Desmonte y retiro de puntos sanitarios

18.9	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS



Ilustración 41 Retiro puntos eléctricos

18.10	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"



Ilustración 42 Punto hidráulico PVC- P/PARAL1/2"

18.11	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"



Ilustración 43 Salida sanitaria PVC S/PARAL 2"

18.12	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 2"

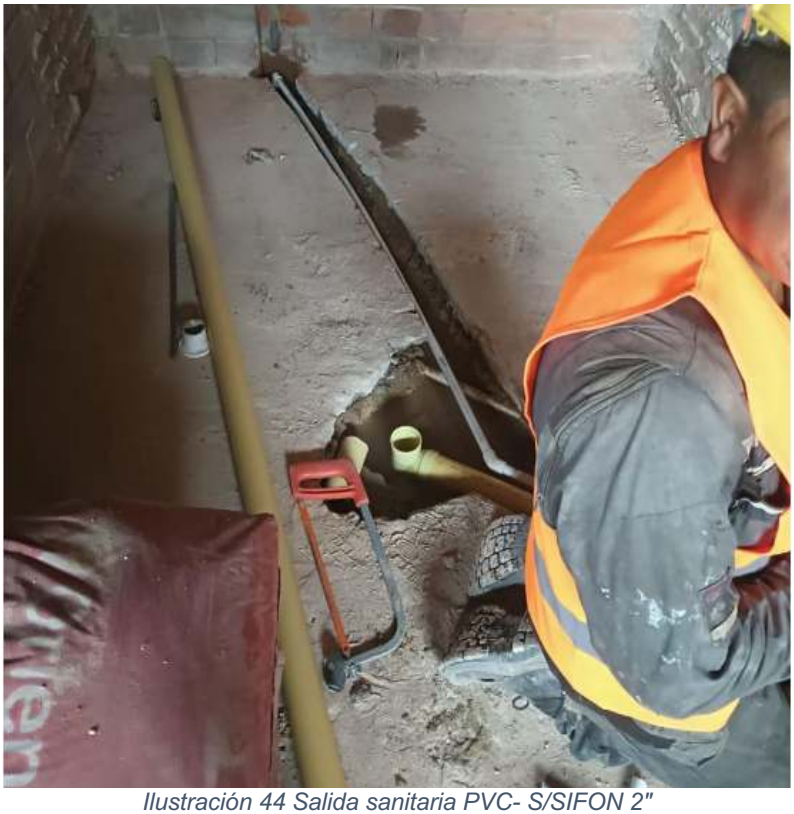


Ilustración 44 Salida sanitaria PVC- S/SIFON 2"

18.13	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M (LINEAL)



Ilustración 45 Muro en bloque N5

18.14	PLACA BASE CONCRETO 0.10M 3000 PSI



Ilustración 46 Placa base en concreto

18.15	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04



Ilustración 47 Alistado piso quiosco



Ilustración 48 Alistado piso locales

18.16	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 015 M



Ilustración 49 Muro ladrillo estructural

18.19	COLUMNETA 0.10MX0.15M 3000 PSI



Ilustración 50 Columneta



Ilustración 51 Columneta locales de comida

18.20	ACERO FIGURADO 6000 PSI



Ilustración 52 Acero mesones



Ilustración 53 Acero columnetas

18.21	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA



Ilustración 54 Malla quiosco



Ilustración 55 Malla cubierta

18.22	DOVELA, GROUTING 3000 PSI



Ilustración 56 Dovelas quiosco



Ilustración 57 Dovela quiosco

18.23	VIGUETA DE AMARRE DE 0.20M X 0.20M 3000 PSI



Ilustración 58 vigueta de amarre

18.24	VIGUETA AEREA 0.20M X 0.20M 3000 PSI



*Ilustración 59 Vigueta amarre 0.20 * 0.20*

18.25	FILOS O DILATACIONES S/MURO



Ilustración 60 Filos o dilataciones

18.26	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)

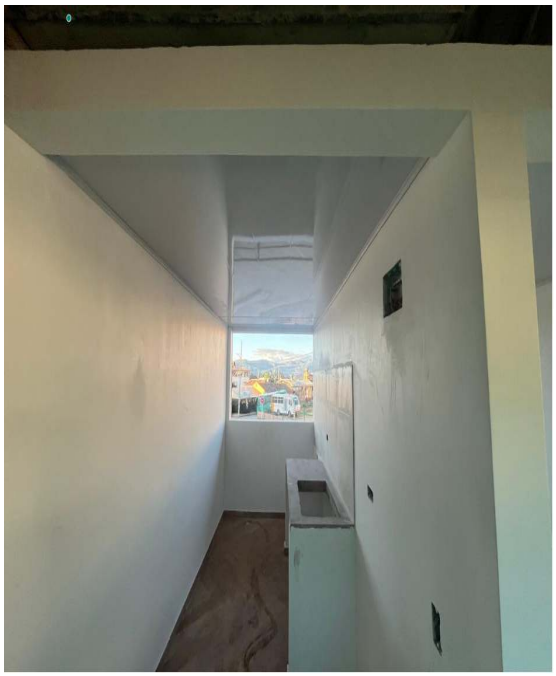


Ilustración 61 Cielo raso PVC locales de comida



Ilustración 62 Cielo raso quiosco

18.27	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL



Ilustración 63 Esmalte sobre lamina lineal

18.28	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA



Ilustración 64 Esmalte sobre lamina llena

18.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE



Ilustración 65 Suministro e instalación estuco

18.31	VINILO ANTISEPTICO, IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE



Ilustración 66 Vinilo locales de comida



Ilustración 67 Vinilo quiosco

18.32	VINILO ANTISEPTICO, IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE (LINEAL)



Ilustración 68 Vinilo lineal

18.33	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA

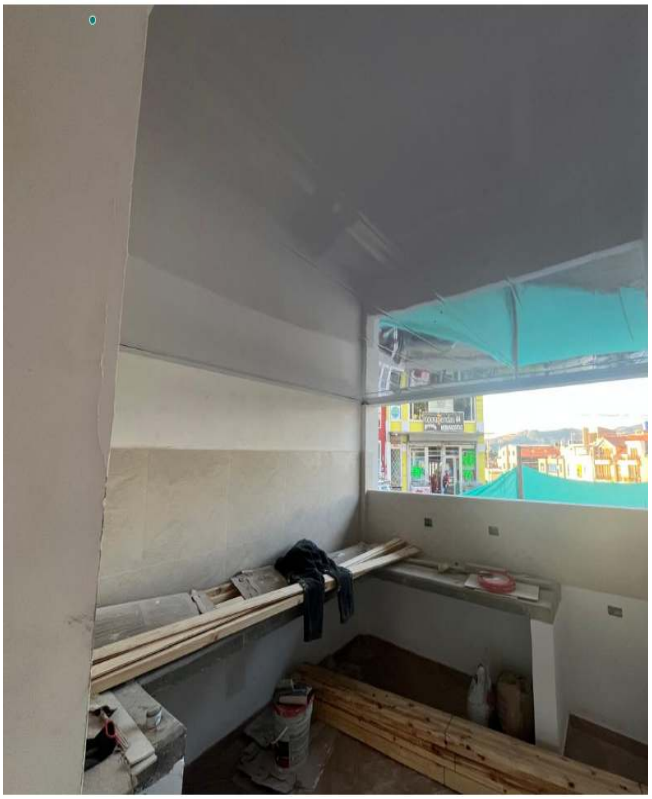


Ilustración 69 Baldosa cerámica pared cocina



Ilustración 70 Baldosa pared locales de comida

18.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO



Ilustración 71 Suministro e instalaciones de piso porcelanato cocinas



Ilustración 72 Porcelanato locales de comida

18.36	LAVADA DE FACHADA



Ilustración 73 Lavada de fachada

18.37	ANCLAJE 1/2" L=15 cm

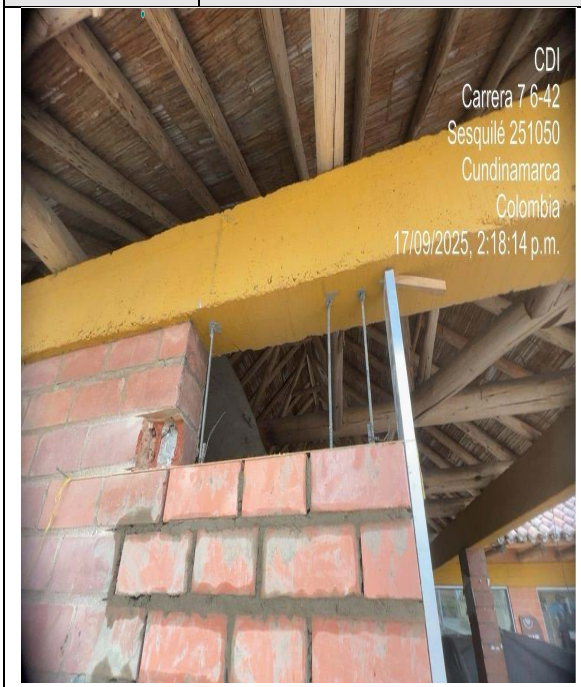


Ilustración 74 Anclaje 1/2

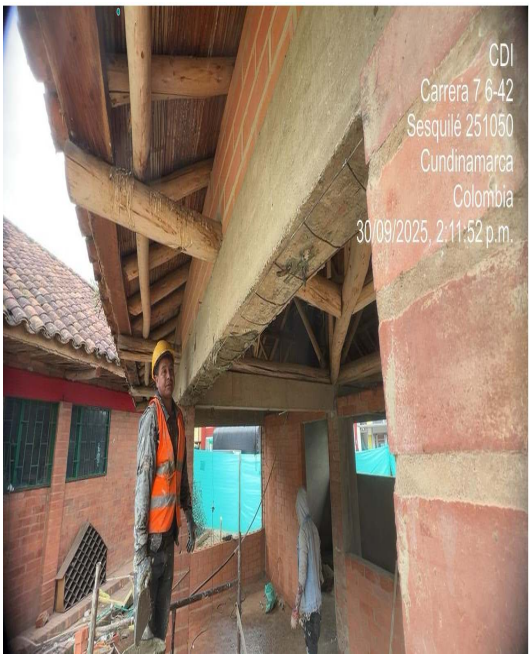


Ilustración 75 Anclaje 1/2

18.38	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS

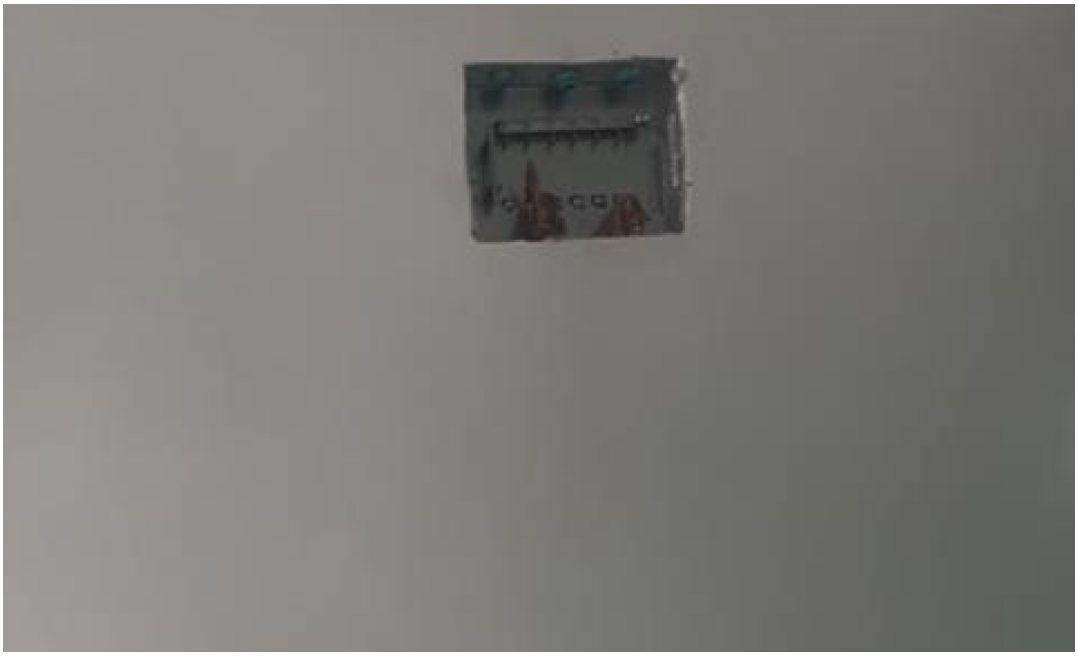


Ilustración 76 Tablero parcial 4 circuitos

18.39	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO



Ilustración 77 Mantenimiento cubierta de barro

18.40	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO)



Ilustración 78 Elaboración de mesones en concreto

18.41	ACABADO EN MICROCEMENTO PARA MESONES



Ilustración 79 Acabado en microcemento mesón.

18.47	LISTON M.H. PINO ROMERON (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)



Ilustración 80 Cielo raso comedor quiosco

18.48	LISTON M.H. PINO ROMERON LINEAL (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)



Ilustración 81 Liston exterior

18.49	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA



Ilustración 82 Puerta ventana acceso



Ilustración 83 Ventana lateral



Ilustración 84 Ventana posterior

18.51	VIDRIO LAMINADO 3+3



Ilustración 85 Vidrio laminado

18.52	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO



Ilustración 86 Puerta quiosco

18.53	PASE MURO PARA CONEXION DE GAS



Ilustración 87 Pase muro

18.54	RESTAURACION Y ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA



Ilustración 88 Adecuación estructura en madera



Ilustración 89 Refuerzo estructura en madera

18.55	RETIRO DE MANTO EN ASFALTO EXISTENTE



Ilustración 90 Retiro manto asfaltico existente

18.56	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO CON MEMBRANA ASFALTICA

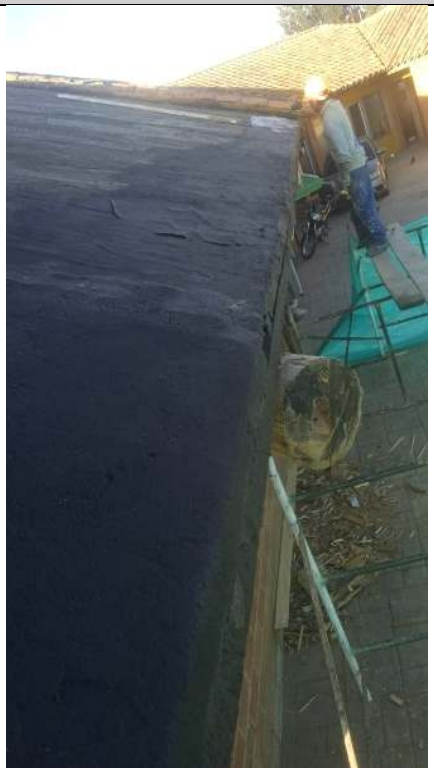


Ilustración 91 Afinado impermeabilizado para teja de barro

18.60	DEMOLICION DE CAÑUELA



Ilustración 92 Demolición cañuela

18.61	CÁRCAMO PARA AGUAS LLUVIAS



Ilustración 93 Carcamo para aguas

18.62	REJILLA METALICA EN ANGULO DE 1" Y 1/8", CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" Y 1/8", Y CONTRA MARCO EN ANGULO DE 1/4" Y 1/8"



Ilustración 94 Rejilla metálica

18.63	SUMINISTRO E INSTALA-CION DE LA-VAPLATOS PARA EMPO-TRAR DOBLE TANQUE 100 X 51 ACERO INOXIDABLE PARA EL KIOSCO. IN-CLUYE RE-JILLA Y GRIFERIA.



Ilustración 95 Lavaplatos quiosco

18.64	SUMINISTRO E INSTALA-CION DE LA-VAPLATOS PARA EMPO-TRAR DOBLE TANQUE 80X43 ACERO INOXIDABLE PARA LOCA-LES DE CO-MIDA. IN-CLUYE REJI-LLA Y GRIFE-RIA.



Ilustración 96 Lavaplatos cocinas

18.66	CAÑUELA EN CONCRETO 2500 PSI 0.30 X 0.12



Ilustración 97 Cañuela en concreto 2500 psi

18.17	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)



Ilustración 98 muro en ladrillo estructural 0.15 m (lineal)



Ilustración 99 muro en ladrillo estructural 0.15 m (lineal)

18.18	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)



Ilustración 100 pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm (lineal)



Ilustración 101 pañete impermeabilizado muros 1:3, e=1.5 cm (lineal)

18.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE (LINEAL)



Ilustración 102 suministro e instalacion de estuco acrilico sobre pañete (lineal)



Ilustración 103 suministro e instalacion de estuco acrilico sobre pañete (lineal)

18.34	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (LINEAL)



Ilustración 104 baldosa cerámica pared calidad primera (lineal)

18.42	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS

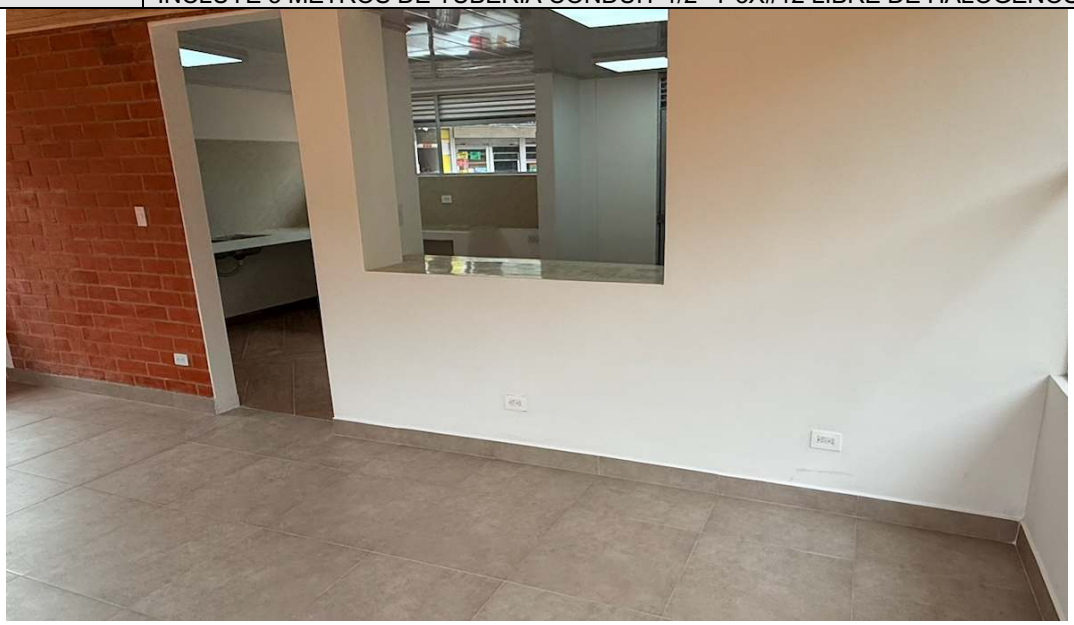


Ilustración 105 salida para tomacorriente monofasico doble con polo a tierra 120v incluye 3 metros de tubería conduit 1/2" y 3x#12 libre de halógenos

18.43	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS



Ilustración 106 salida para tomacorriente monofásico doble gfci con polo a tierra 120v incluye 3 metros de tubería conduit 1/2" y 3x#12 libre de halogenos

18.44	SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS



Ilustración 107 salida para iluminacion incluye interruptor sencillo con polo a tierra 120v incluye 3 metros de tubería conduit 1/2" y 3x#12 libre de halogenos



Ilustración 108 salida para iluminacion incluye interruptor sencillo con polo a tierra 120v incluye 3 metros de tubería conduit 1/2" y 3x#12 libre de halógenos

18.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL SQ 24W



Ilustración 109 suministro e instalación de led panel sq 24w



Ilustración 110 suministro e instalación de led panel sq 24w

18.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL SQ 40W



Ilustración 111 suministro e instalación de led panel sq 40w



Ilustración 112 suministro e instalación de led panel sq 40w

18.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA SISTEMA RETRACTIL SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO INC. ANTICORROSIVO



Ilustración 113 suministro e instalacion de puerta metalica sistema retractil segun diseño arquitectónico inc. anticorrosivo



Ilustración 114 suministro e instalacion de puerta metalica sistema retractil segun diseño arquitectónico inc. Anticorrosivo

18.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA DE PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO

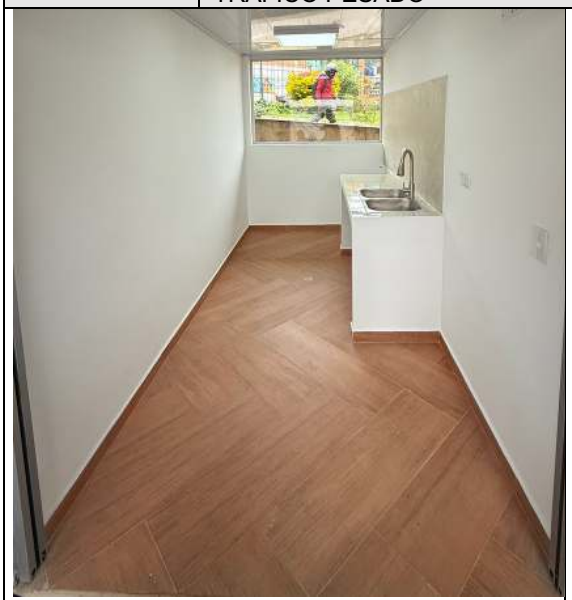


Ilustración 115 suministro e instalacion de guardaescoba de piso porcelanato trafico pesado



Ilustración 116 suministro e instalacion de guardaescoba de piso porcelanato trafico pesado

18.59	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE



Ilustración 117 suministro de medidor de agua potable



Ilustración 118 suministro de medidor de agua potable

18.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFONES EN Y



Ilustración 119 Suministro e instalación de sifones en y

8.3 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

Tabla 15. Datos de seguimiento a la programación de obra.

PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADA	100,00%
VALOR DE OBRA PROGRAMADA	$ 397.754.442,00
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA	100,00%
VALOR DE OBRA EJECUTADA	$397.754.442,00

Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2025.

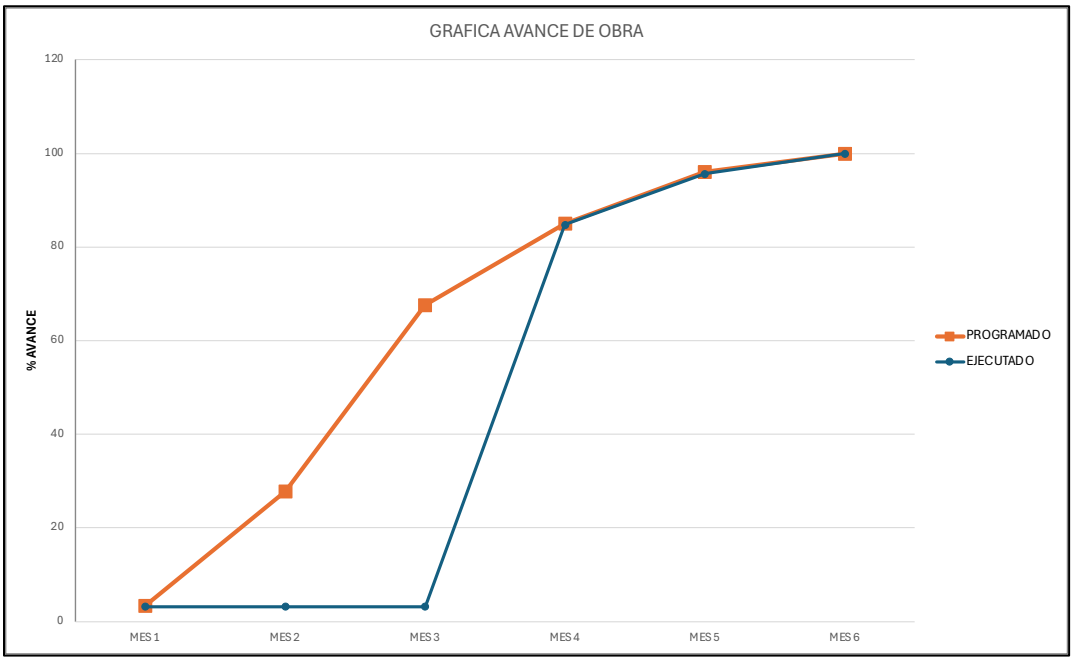


Ilustración 120 Gráfica de avance de obra.
Fuente: CONSORCIO PLAZA SESQUILE; 2025.

9. MATERIALES Y EQUIPOS

En el desarrollo del Contrato de Obra No. SA-MC-OBRA-213-2025 se emplearon materiales y equipos que cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en los documentos contractuales, las especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad vigente aplicable al sector de la construcción, garantizando la calidad, funcionalidad y durabilidad de las intervenciones ejecutadas.

Nota: *Las fichas relacionadas anteriormente se anexan al presente informe y se encuentran contenidas en el* ***Anexo No. 3 Fichas técnicas****, como soporte documental de las especificaciones técnicas y cumplimiento de los requerimientos de calidad establecidos para la ejecución del proyecto.*

10. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

10.1 ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN

Se realizó una inspección preventiva de las herramientas manuales, con el fin de verificar su correcto funcionamiento, estado físico y el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas para las

labores de demolición; posteriormente, y tras confirmar su aptitud, se desarrollaron las actividades programadas, las cuales comprendieron el asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad establecidos para la obra.

10.2 ENTREGA DE EPP

Se efectuó la entrega adecuada de los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para el desarrollo de las actividades programadas, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores, prevenir accidentes y dar cumplimiento a los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.

10.3 ACTAS DE VECINDAD

Se elaboran las actas de vecindad de inicio y de cierre con el fin de dejar constancia detallada del estado físico de las áreas a intervenir de la plaza. En estas actas se realiza un registro técnico del estado de los elementos constructivos tales como paredes, pisos, ventanas, cubiertas, bordes, zócalos y demás componentes visibles de la infraestructura.

En el acta de inicio, se documentan las condiciones previas a la ejecución de la obra, identificando fisuras, grietas, humedades, desprendimientos, filtraciones, deterioros o cualquier otra patología constructiva existente. Asimismo, se incluye un registro fotográfico detallado, el cual forma parte integral del acta, acompañado de la descripción técnica de cada hallazgo observado, especificando su ubicación y características.

Posteriormente, al finalizar los trabajos, se elabora el acta de cierre, en la cual se verifica y deja constancia del estado final de las áreas intervenidas. En esta también se adjunta registro fotográfico comparativo y la respectiva descripción de las condiciones evidenciadas al momento de la entrega.

Este procedimiento se realiza como medida preventiva, de control y respaldo documental, con el propósito de evitar reclamaciones por daños preexistentes, garantizar la transparencia del proceso constructivo y establecer responsabilidades en caso de presentarse afectaciones durante la ejecución de la obra.

10.4 CHARLAS Y CAPACITACIONES

Se realizan charlas y capacitaciones en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con el propósito de fortalecer la cultura preventiva y mantener informados a los trabajadores sobre los riesgos latentes a los que se encuentran expuestos en sus respectivos puestos de trabajo.

Estas actividades incluyen la identificación, evaluación y control de peligros, la promoción de prácticas seguras, el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), así como la socialización de procedimientos internos y protocolos de seguridad.

El objetivo principal es minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, garantizando condiciones de trabajo seguras y el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de SST.

10.5 PERMISOS DE TRABAJO SEGURO

Se gestionan y diligencian los Permisos de Trabajo Seguro para cada una de las actividades a ejecutar durante las jornadas laborales, garantizando la identificación previa de peligros, la evaluación y control de riesgos, así como la implementación de las medidas preventivas correspondientes. Estos permisos se verifican antes del inicio de las labores, asegurando el cumplimiento de los protocolos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la normatividad vigente.

10.6 LIMPIEZA Y ASEO

Todas las áreas intervenidas fueron debidamente aseadas, realizándose limpieza general y retiro de residuos producto de las actividades ejecutadas. Los espacios se entregaron en óptimas condiciones de orden y limpieza, garantizando un ambiente adecuado, seguro y en total estado de salubridad.

10.7 PAZ Y SALVOS

Se realizaron los respectivos paz y salvos a los trabajadores que prestaron sus servicios durante el período de ejecución comprendido entre el 20 de agosto de 2025 al 22 de marzo de 2026.

Se deja constancia de que todos los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social correspondientes a dicho período fueron cancelados en su totalidad, quedando el personal y la entidad contratante a paz y salvo por todo concepto laboral.

11. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El proyecto correspondiente a la adecuación de la Plaza de Mercado se ejecutó conforme a las condiciones técnicas, administrativas y contractuales definidas, incorporando durante su desarrollo los ajustes necesarios derivados de las condiciones reales identificadas en obra, los cuales fueron formalizados mediante los respectivos modificatorios, adiciones y prórrogas.

Durante la ejecución del contrato, fue necesaria la implementación de actividades no previstas, principalmente asociadas a demoliciones, adecuaciones constructivas, ajustes en redes y reconfiguración de espacios. Estas intervenciones permitieron garantizar la funcionalidad, seguridad y correcta articulación de los diferentes componentes del proyecto, en concordancia con el uso previsto de la infraestructura.

Desde el punto de vista técnico, se consolidaron de manera integral los componentes de obra civil, urbanismo, instalaciones hidrosanitarias, sistema de drenaje, instalaciones eléctricas y elementos arquitectónicos, cumpliendo con las especificaciones técnicas, normativas aplicables y criterios de calidad requeridos.

Las soluciones implementadas en cubiertas, sistemas de impermeabilización, redes de evacuación de aguas y acabados, permiten asegurar condiciones adecuadas de durabilidad, salubridad y comportamiento frente a agentes ambientales, minimizando riesgos asociados a filtraciones, deterioro prematuro o fallas funcionales.

En el componente de urbanismo y áreas exteriores, la ejecución de estructuras de circulación peatonal, rampas, superficies en adoquín y elementos de drenaje, garantiza condiciones de

accesibilidad, estabilidad y adecuada evacuación de aguas, contribuyendo al correcto funcionamiento del entorno intervenido.

Las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias fueron ejecutadas asegurando su correcta integración, operatividad y cumplimiento de condiciones de seguridad, incluyendo la implementación de elementos de protección y control acordes con la normativa vigente.

Desde el punto de vista contractual, la ejecución del proyecto requirió la implementación de modificaciones, adiciones, prórrogas y una suspensión temporal, las cuales obedecieron a la necesidad de ajustar el alcance y las condiciones iniciales del contrato frente a la realidad técnica del proyecto, garantizando su viabilidad y correcta terminación.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos, mediante la implementación de medidas de prevención, control de riesgos, capacitaciones y dotación de elementos de protección personal, asegurando condiciones adecuadas durante la ejecución de las actividades.

En términos generales, el proyecto se entrega con los componentes constructivos y funcionales debidamente ejecutados, cumpliendo con los requerimientos técnicos y permitiendo su adecuada operación, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de servicio, salubridad y funcionalidad de la Plaza de Mercado.

Como recomendación final, se sugiere garantizar la implementación de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos construidos, especialmente en cubiertas, sistemas de drenaje, instalaciones y acabados, con el fin de preservar las condiciones de servicio, prolongar la vida útil de la infraestructura y asegurar su adecuado funcionamiento en el tiempo.

12. ANEXOS

Anexo 1. Copia de Bitácora
Anexo 2. Anexos SG-SST
- Anexo 2.1. Planillas de seguridad social profesionales
- Anexo 2.2. Planillas Hg Solidez
- Anexo 2.3. Pas y salvos mano de obra
- Anexo 2.4. Actas de vecindad

Anexo 3. Fichas técnicas

ANEXO 1. COPIA BITÁCORA

CONTRATO DE OBRA No. SA-ME-OBRA-213-2025

Mantenimiento y adecuación de la plaza de mercado, en el marco del convenio interadministrativo No. ICCU 623 de 2024 suscrito entre el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU y el Municipio de Sesquilé Cundinamarca.

Bitácora de obra

Acta de inicio: 19 de agosto de 2025

Acta de Terminación: 22 de Marzo de 2025.

→ REGISTRO DE FIRMAS.

- Jorge Luis Gorán.
  Ing. Residente de obra.
- Miguel Mauricio Cantor
  Director de obra.

- Javier Humberto Martinez
  Ing. Director de Interventoría.
- Juan Jairo Monroy Suárez
  Ing. Residente de interventoría.

18 de Agosto de 2025

Se dio inicio a las actividades con una visita de campo, en la cual participaron el equipo de obra e interventoría. Durante la jornada se inspeccionaron las condiciones físicas actuales de la Plaza de Mercado, verificando y rectificando las medidas existentes frente a los planos proyectados. El objetivo de esta revisión fue garantizar la correspondencia entre el diseño y la realidad del espacio, identificando posibles ajustes necesario para evitar inconsistencias en la etapa constructiva. Esta actividad permitió validar los diseños proyectados como base para el inicio de la ejecución de la obra.

19 de Agosto de 2025.

Se genero el plan de Seguridad y Salud en el trabajo (SST), requisito fundamental para el inicio de actividad en obra. Como parte de este proceso se pactaron capacitaciones iniciales orientadas a: uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), identificación de riesgos y peligros de obra, y cumplimiento de protocolos de inducción para el personal nuevo en el ingreso a obra. Estas capacitaciones buscan garantizar condiciones seguras de operación y prevenir incidentes durante labores constructivas.

Agosto 20 de 2025

Se gestionó el trámite de levantamiento fotográfico del área de intervención, como parte de las actividades preliminares al inicio de obra. Esta documentación busca dejar constancia del estado físico y contextual del entorno antes de iniciar cualquier actividad constructiva. Las imágenes fueron tomadas frente a los lineamientos técnicos establecidos, incluyendo referencias espaciales, elementos existentes y posibles afectaciones.

Agosto 21 de 2025

Se realizó la socialización del proyecto de mantenimiento y adecuación de la plaza de mercado de Sesquilé, Cundinamarca, con participación activa de la comunidad, el equipo de supervisión, la interventoría y el contratista. En la reunión se expusieron los objetivos generales, alcances técnicos y fases de ejecución del proyecto. Se atendieron inquietudes y observaciones de la comunidad, enfatizando en el plan de manejo para minimizar afectaciones durante el desarrollo de los trabajos. El resultado fue una aceptación favorable de la comunidad, lo que permitió dar paso formal al inicio de las actividades constructivas.

Norma

22 de Agosto de 2025

Se consolidaron las actas correspondientes a la socialización con la comunidad, integrando las observaciones levantadas y los compromisos asumidos por el equipo técnico de obra. Estos documentos constituyen un soporte formal para la gestión del proyecto y su interacción con la ciudadanía.

25 de Agosto de 2025

Se llevaron a cabo actividades previas al inicio de obra relacionadas con la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entre ellas se destacan inspecciones a herramientas manuales para garantizar su adecuado estado operativo, verificación de permisos de trabajo seguro y realización de inspecciones locativas en las áreas destinadas a la intervención. El propósito fue asegurar condiciones de trabajo controladas y seguras antes de dar inicio a labores de desmonte y demolición.

JAVIER H M

Norma

26 de Agosto de 2025

Se efectuo la radicación oficial ante supervisión de las actas correspondientes a la jornada de socialización del proyecto desarrollada el 21 de agosto. Este trámite administrativo formalizó ante la entidad contratante y la supervisión el proceso de participación comunitaria y los compromisos adquiridos en la etapa previa de planeación.

27 de Agosto de 2025

Se adelantaron labores de gestion documental y logistica de personal, consistentes en la organización y verificación de la documentación de los trabajadores que ingresaron a obra. Adicionalmente, se registró y controló la entrega de elementos de protección personal (EPP) al personal operativo asegurando que cada trabajador contara con los implementos requeridos para el desarrollo de las actividades conforme a las normas de SST.

28 de Agosto de 2025

Se realizo la validación de los materiales requeridos para el inicio de obra. El equipo técnico de obra efectuó visitas a los establecimientos de comercio local con el fin de verificar la disponibilidad de insumos y recursos, buscando optimizar la logistica de adquisición y garantizar el abastecimiento oportuno de materiales básicos para el arranque del proyecto.

JAVIER H M

29 de Agosto de 2025

Se adquirieron y dispusieron en el sitio de obra los elementos principales para el inicio de actividades, tales como cerramiento y herramienta menor. Estos insumos fueron organizados en las áreas de trabajo para su inmediata utilización, asegurando que el proyecto contara con las condiciones iniciales necesarias para el desarrollo de las primeras labores constructivas.

Norma

01 de Septiembre 2025

Se da inicio a la ejecución de actividades según las especificaciones contractuales y los diseños socializados anteriormente primero a los profesionales de la secretaria de Obras públicas y posteriormente a la comunidad. Para no afectar a la comunidad las intervenciones presupuestadas se irán desarrollando puntualmente permitiendo que los personas que usan las instalaciones tengan el tiempo de desocuparlo, por lo cual se decide iniciar por lo que anteriormente se conocía como el restaurante ubicado en el Quiosco para posteriormente avanzar en las cocinas sin afectar el uso de los otros espacios que conforman la plaza.

Para el inicio de las actividades es necesario crear un espacio seguro tanto para la comunidad como para los trabajadores, por lo que se realiza la instalación de cerramiento con polisombra y parales de madera en el quiosco. Como se solicitó en la socialización del proyecto, se cierra totalmente el cruce por este sector para evitar el paso de personal ajeno a la obra y adicional se cuenta con el espacio suficiente para disponer escombro, elementos desmontados y material.

Con el cerramiento conformado se inicia los desmontes de los elementos de la carpintería metálica existentes tales como rejas, ventanas y puertas, elementos que se acopian para su disposición final o entrega por solicitud de la supervisión.

02 de Septiembre 2025

Con el desmonte de la carpintería metálica se procede en los baños del Quiosco al retiro del enchape de los muros, previo desmonte de los orinales los cuales igualmente se acopian para decidir junto con la supervisión si se entregan o se da su disposición final.

03 de Septiembre 2025

Simultáneamente se realiza el retiro del adoquín que se encuentra en la parte interna del quiosco, con el fin de reconformar una superficie que permita levantar los nuevos muros sobre una superficie estable y nivelada. Una vez desmontado el adoquín se encuentra una placa maciza de 0.15m la cual se procede a demoler.

JAVIER H M.

04 de Septiembre 2025

Según lo programado, se inician las actividades en las cocinas comenzando por las del costado sur, recordando que se solicitó no intervenirlas simultáneamente para que la comunidad que da uso al espacio no sufriera el impacto de tener tres frentes abiertos trabajando simultaneamente.

igualmente se inicia con la conformación del cerramiento con polisombra y parales en madera para conformar el espacio seguro de trabajo más teniendo en cuenta que contra las cocinas se concentra gran parte de las actividades de la plaza.

JAVIER H M

05 de septiembre. de 2025

se realiza el desmonte de puertas, ventanas y rejas de las cocinas del costado sur para conformar la nueva distribución de estos espacios según los diseños aprobados. Estos elementos se acopian para decidir junto con la supervisión si se entregan para su reutilización o se da disposición final.

Septiembre 06 de 2025

se continua con el desmonte de los elementos de carpintería metálica y organizando el espacio para los trabajos de demolición proyectados según los diseños aprobados, para lo cual se realiza jornada de orden y aseo acopiando los elementos hasta la fecha desmontados en un espacio seguro.

08 de septiembre de 2025.

En una de las cocinas que se encuentra aledaña a los baños, se observa una humedad en el muro que separa los espacios. Se realiza inspección dentro del baño para identificar una posible fuga pero no se encuentra ningún punto hidraulico cerca, por lo que continúa en seguimiento la situación.

09 de septiembre de 2025

Se inicia el aplique de mortero impermeabilizado sobre los muros en mampostería que se conservaron, pero antes se retira el enchape que conformaba el salpicadero contra los mesones y se limpian los muros para retirar las muestras de grasa causadas por el normal funcionamiento de las cocinas, pero que debe ser retirado para garantizar la adherencia del pañete.

JAVIER H M

10 de septiembre de 2025

Se continúa con el aplique de pañete impermeabilizado sobre muros de mampostería existentes en las cocinas del costado sur. se debe garantizar una superficie que

permita el aplique de acabados que soporten cambios de temperatura sin sufrir afectaciones.

Por parte de la empresa de servicios públicos se realiza la instalación del registro para cortar el suministro de agua a la plaza en general y poder a futuro realizar los trabajos en las redes hidráulicas

11 de septiembre de 2025

se avanza en la adecuación de las cocinas del costado sur, por lo que se solicita la autorización para iniciar los trabajos en las cocinas del costado norte los cuales no se han podido iniciar debido a que no se han desocupado todos los locales. Se espera iniciar actividades en los proximos días.

12 de septiembre de 2025


Continua la humedad en muro divisorio entre las cocinas del costado sur y el baño aledaño. Se revisa el baño, pero solo se encuentra el enchape sin boquilla. No hay puntos hidráulicos ni sanitarios cerca que causen la humedad, por lo que se solicita a la supervisión verificar la situación.

13 de septiembre de 2025

Teniendo desmontado toda la carpintería metálica se inicia la demolición de enchape piso de las cocinas del costado sur que por su normal uso ya se encontraba deteriorado. Todo este escombro se acopia para el retiro cuando se terminen las actividades de demolicion y desmonte en toda la plaza.

14 de septiembre de 2025.

Después de unos días de retraso por la no entrega del espacio, se inician los trabajos en las cocinas del costado norte realizando el mismo procedimiento. Se asegura el sector instalando perimetralmente el cerramiento en polisombra y parales en madera. En este caso, por el desnivel en que se encuentra el sector, el costado norte queda más descubierto pero asegurando el espacio para el acopio de escombro y material.

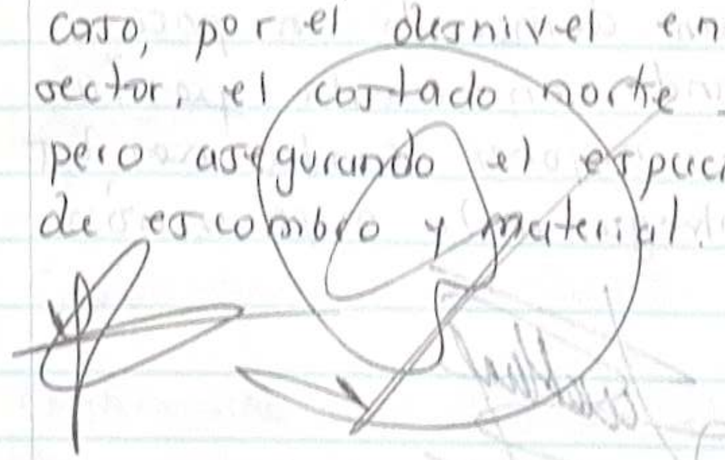

TAVICK H M

15 de septiembre de 2025

Con el espacio totalmente cercado se inicia el desmonte de ventanas y puertas metálicas de las cocinas del costado norte. Estos elementos desmontados igualmente se acopian para finalmente entregar los que se encuentren en buen estado según solicitud de la supervisión, con los elementos dañados se debe hacer la disposición final.

JAVIER H M

16 de septiembre de 2025

Se continúa con el desmonte de elementos de carpintería metálica para la reconformación de los espacios según diseño: dos elementos existentes son diferentes y de mayor tamaño a las cocinas del costado sur, por lo que su retiro y acopio se han demorado un poco más de tiempo, teniendo en cuenta que la idea es retirar en las mejores condiciones los elementos para su entrega a la supervisión.

17 de septiembre de 2025

Con la finalización del desmonte de la carpintería metálica se inicia de inmediato la demolición de enchapes de mano que conformaban el salpicadero del mesón existente.

JAVIER H M

18 de septiembre de 2025

por la cantidad de escombro generado se realiza jornada de orden y aseo para tener un espacio en el cual se pueda trabajar sin riesgos, dejando en un solo punto el escombro y en otro solo los elementos retirados. La supervisión solicita también la entrega del escombro generado el cual se debe transportar hasta un punto indicado el cual va a ser reutilizado. para realizar esta actividad se solicita la entrega de disposición en punto no autorizado.

Septiembre 19 de 2025

Continuando con las actividades en las cocinas del costado norte. se inicia el apligue del mortero impermeabilizado sobre muros en mampostería existentes los cual permitirá el apligue de los acabados en una superficie nivelada y resistente a los cambios de temperatura que se manejan en este espacio

22 de septiembre de 2025.

Los trabajos durante la jornada se concentraron en el apique de puntal sobre los muros de mampostería existente. Se aplica 'gatacreada' en los muros existentes para garantizar la adherencia del puntal, para lo cual primero se deben realizar las regatas necesarias para la reubicación de los puntos hidráulicos y eléctricos según el espacio.
En el quiosco se continua con la conformación del espacio según los nuevos diseños por lo que se continuan con las demoliciones, esto ya con el retiro del mesón en concreto para la atención al publico teniendo un gran tamaño lo que dificulta su demolición.

23 de septiembre de 2025.

Los trabajos durante la jornada se concentran en la limpieza y acopio de sobrantes de demoliciones para la prolongación de las redes hidrosanitarias según los cambios en la distribución del espacio aprobados en los diseños

24 de septiembre de 2025.

Con el espacio limpio se procede a realizar las regatas y excavaciones necesarias para trasladar y prolongar los puntos de las redes de suministro y desagües según los diseños aprobados y los puntos existentes.

25 de septiembre de 2025.

Se continua con las regatas y excavaciones manuales para el traslado de los puntos de suministro y desagües, utilizando los puntos existentes.
Se verifica que las cajas de inspección existentes tengan la capacidad para evacuar las aguas residuales.

26 de septiembre de 2025.

El traslado de los puntos de suministro de agua fría en el quiosco como en las cocinas se ve retrasado, ya que no se tiene la certeza de la ubicación de los registros en la zona para el corte del servicio. Hasta la visita del personal técnico de la empresa pública que presta el servicio se puede continuar con la actividad.

29 de septiembre de 2025.

Con la visita del personal de la empresa publica se evidencia la necesidad de la ubicación de los nuevos puntos para el corte del suministro de agua al sector, por lo que se retrasa la ejecución de las actividades.

30 de septiembre de 2025.

Se retoman los trabajos para la reubicación de puntos de suministro y desagüe tanto en el quiosco como en las cocinas. Con los puntos de control de suministro se puede cortar el servicio y retirar la tubería existente.

01 de Octubre de 2025.

Realizadas las regatas para la instalación de la tubería hidrosanitaria. se procede a rellenar con arena. de peño para conformar la cama de la tubería en pvc de presión y sanitaria.
En las cocinas se adiciona un punto para sifones y se reubican los puntos de suministro y desagües según la nueva ubicación de los mesones.
En el quiosco con el nuevo diseño de distribución del espacio se reubican tanto los puntos de suministro como de desagüe, según los diseños.

02 de Octubre de 2025.

Se inicia la instalación de tubería en pvc para la conformación de los nuevos redes de suministro y desagües.
Se extiende tubería de presión de 1/2" desde los puntos existentes hasta la nueva ubicación según el diseño para la conformación del punto nuevo del lavaplatos y la poceta para el punto de aseo.
Para la tubería de desague se extiende en 2" para conectar

Norma

a las dos cajas de inspección existente.

03 de Octubre de 2025.

Se continua con la instalación de tubería presión y sanitaria. en el quiosco junto con las salidas segun los diseños aprobados.

04 de Octubre de 2025.

Se inicia la instalación de redes hidrosanitarias en las cocinas del costado sur, igualmente extendiendo tubería de 1/2" para la red de presión desde el punt donde se encontraba anteriormente el lavaplatos hasta su nueva ubicación.
Igualmente la red de desagüe desde el punto existente se extiende en 2" y adicionando un tramo para conformar los sifones de cada local.

05 de Octubre de 2025.

Se continuan los trabajos de conformación de las redes hidrosanitarias de las 4 cocinas del costado sur. Con la instalación de la tubería de inmediato se un

Norma

Tapando las regatas tanto en placa de piso como en el muro de mampostería existente.

07 de Octubre de 2025.

Se inicia la instalación de redes hidrosanitarias en los cocinas del costado norte, igualmente con la conformación de la cama de arena de peña para la tubería.

08 de Octubre de 2025.

La distribución de los nuevos espacios de las cocinas del costado norte es igual por lo que la extendida de la tubería para conformar los puntos y salidas es el mismo de las cocinas del costado sur. De los puntos existentes tanto para la tubería de suministro y desagüe se trasladan los puntos para la nueva ubicación.

09 de Octubre de 2025.

Se continua con la instalación de tubería pvc en las cocinas del costado norte, instalando tubería de 1/2" para la red de suministro y en 2" para la red de desagüe. Segun los diseños aprobados.

Norma

10 de Octubre de 2025.

Se finaliza la instalación de tubería pvc para las redes de suministro y desagües, teniendo a la fecha, tanto en las cocinas como el quiosco conformados los nuevos puntos aprobados. Inmediatamente se inspecciona la tubería se recubre para evitar afectaciones.

14 de Octubre de 2025.

Se define la necesidad de realizar un reforzamiento en las 3 cocinas con las modificaciones propuestas y aprobadas.
El reforzamiento consiste en crear un pórtico en concreto que ayude a confinar los muros existentes y adicional en la prolongación de los muros en mampostería confinar con columnetas en concreto.

15 de Octubre de 2025.

En el quiosco verificando niveles de la estructura existente se observa que se necesita conformar una placa de contrapiso con un espesor promedio de 10 cm para tener una superficie nivelada que permita la instalación de acabados y carpintería metálica.

Norma

16 de Octubre de 2025

Se inicia el perfilamiento del terreno en el quiosco para poder conformar la placa de contrapiso en concreto. El terreno debajo de la placa que se dendió anteriormente no se encuentra optimo para fundir la placa.

17 de Octubre de 2025.

En las cocinas del costado sur se inicia la excavación manual para la viga de cimentación que conforma el pórtico para continuar la estructura existente. Se el quiosco se continua arreglando el terreno para fundir la placa de contrapiso.

20 de Octubre de 2025.

Se inicia la excavación manual para la conformación de la viga de cimentación del portico de confinamiento en las cocinas del costado norte. En el quiosco continuan los trabajos de conformación de la placa de contrapiso.

21 de Octubre de 2025.
Se inicia simultaneamente la instalación de acero

de refuerzo de la viga de cimentación de las cocinas del costado sur y la malla de refuerzo de la placa de contrapiso del quiosco.

22 de Octubre de 2025.

En el quiosco se continua con la instalación de malla de refuerzo para la placa de contrapiso, se verifica que la malla esté bien amarrada y traslapada, garantizando la continuidad del refuerzo. Igualmente se verifican los puntos de red hidrosanitaria. queden embebidos dentro del refuerzo.

23 de Octubre de 2025.

Se verifica el acero de refuerzo de la viga de cimentación del pórtico de confinamiento en las cocinas del costado sur, asegurando que el acero de refuerzo este instalado según las recomendaciones del especialista estructural.

24 de Octubre de 2025.

Se inicia la instalación del acero de refuerzo de la viga de cimentación del portico de confinamiento de las cocinas del costado sur, ádemás del acero longitudinal y los estribos, se

verifica la instalación del acero de los columnchos de confinamiento para la prolongación de los muros de mampostería.

27 de Octubre de 2025.

A la fecha ya se tiene instalado el acero de refuerzo de la placa de contrapiso la cual se verifica junto a interventoría: el diametro, el armado y que este totalmente toda el área con malla de refuerzo.
Para las cocinas igualmente se verifica que el acero instalado este segun las recomendaciones del especialista estructural, con los diametros y deparaciones exigidos, encontando todo el acero de refuerzo instalado correctamente.

28 de octubre de 2025.

Se realiza la fundida de la placa de contrapiso con concreto mezclado en obra con equipo mezclador tipo trompo, mezcla que se hizo para una resistencia a la compresión de 3000 PSI, de la cual se toman muestras para llevar al laboratorio, probando así su resistencia. Previo a la vaciada del concreto se verifica que la malla de refuerzo tenga el recubrimiento y sea humedecido para garantizar la adherencia del concreto.

29 de Octubre de 2025

Durante la jornada se realizo la fundida de la viga de cimentación del pórtico de confinamiento de las cocinas del costado sur. Se verifico que el acero este bien dicado y centrado en la excavación garantizando el recubrimiento, por ultimo se verifica que el acero de los columnetas tambien este debidamente alineado para realizar la vaciado. Igualmente el concreto mezclado en obra bajo la misma dosificación de la placa de contrapiso. Se vacio y vibro de forma continua para evitar hormigueo.

30 de Octubre de 2025.

Se realiza la fundida de la viga de cimentación del porticó de confinamiento de las cocinas del costado norte. Igualmente el concreto es mezclado en obra bajo la misma dosificación para los elementos fundidos anteriormente.

31 de octubre de 2025.

Mientras el concreto de la placa de contrapiso fragua y de las vigas de cimentación de las cocinas, se termina la instalación de las redes hidrosanitarias con la ubicación de registros tipo bola cada dos cocinas para cerrar el suministro unicamente a estos espacios para mantenimientos, sintener que dejar todo el sector sin suministro de agua.

04 de Noviembre de 2025.

En las cocinas del costado sur se inicia el armado de las columnetas de confinamiento y simultaneamente se prolongan los muros en mamposteria.
Los muros internos se levantan con bloque Nº5 debido a que el bloque existente no es comun y su despacho es demorado, por tal razón se toma la decisión de conformarlos con otro bloque ya que no esta a la vista.

05. de Noviembre de 2025.

Durante la jornada se realizo el armado de columnetas y prolongación de los muros de mamposteria de las cocinas del costado Norte. Igualmente los tramos intermedios se levantan en bloque Nº 5.

06 de Noviembre de 2025.

Los trabajos en el quiosco se han retrasado debido a que el bloque para levantar los muros en mamposteria no se ha podido conseguir, solo hay similares con dimensiones diferentes que al momento de instalar no va a modular correctamente notandose la diferencia entre el existente y el nuevo.
Mientras tanto se va cimbrando la ubicacion de cada muro para conformar el nuevo espacio.

Norma

07 de Noviembre de 2025.

Se realizo la fundida de las primeras columnetas de confinamiento para la prolongación de los muros de mamposteria en las cocinas del costado sur. La mezcla se realiza en obra con mezcladora tipo trompo bajo la dosificación utilizada para una resistencia a la compresión de 3000 PSI. Al ser un elemento vertical vaciado manualmente, se enfatiza en el vibrado para evitar hormigonco en el elemento.

10 de Noviembre de 2025.

Se conforman las columnetas de confinamiento para la mamposteria en las cocinas del costado norte. Se realiza el vaciado manual del concreto mezclado en obra bajo la misma dosificación de los otros elementos en concreto.

11 de Noviembre de 2025.

A inicios de la semana llega el ladrillo faltante para la conformación de los muros en el quiosco según diseño y de la prolongación de las existentes en las cocinas, respetando los espesores de las pegas y ~~se~~ modulación para no afectar la arquitectura existente.

Norma

12 de Noviembre de 2025.

Al tener el bloque para los muros del quiosco, se inicia la instalación de las dovelas para reforzamiento de estos muros. Se anclan a la placa y las vigas aéreas existentes el acero de ϕ 1/2" máximo con una separación, previamente empotradas con epoxico para garantizar su adherencia.

13 de Noviembre de 2025.

Se continua con los muros en mamposteria del quiosco según la distribución de los diseños arquitectonicos aprobados. A medida que se levantan los muros y la dovela queda dentro de una celda de ladrillo, se llena con mortero fundido para completar el refuerzo del elemento.

14 de Noviembre de 2025.

En las cocinas despues de que fraguo el concreto de las columnetas de confinamiento, se inicia el armado de acero de las vigas aereas de las cocinas del costado sur. El acero consta de 4 barras longitudinales Nº 4 sujetadas por estribos No 3 cada 0,20m. El acero se arma en la posición final de la viga.

18 de Noviembre de 2025.

Con el acero de la viga aérea de las cocinas del costado sur ya instalado y revisado junto a interventoria, se realiza el vaciado manual de concreto mezclado en obra con mezcladora tipo trompo con la dosificación utilizada para los elementos anteriormente fundidos. Al ser un elemento desalojado necesita más tiempo de fraguado, por lo cual los vigas del costado norte se fundiran más adelante.

19 de Noviembre de 2025.

En el quiosco se continua con la conformación de los muros en mamposteria según diseños aprobados, garantizando el llenado de las celdas con mortero fluido para el reforzamiento del elemento. Algunas de la vigas aereas no se encuentran nivelados, por lo que al terminar la modulación del muro quedan espacios no regulares.

20 de Noviembre de 2025.

Se realiza jornada de orden y aseo para acopiar los escombros en un solo punto y retirarlos en los proximos días. Se acopia en un punto indicado por la supervisión del contrato quien reutilizara el material y quien entregará el certificado de disposición final.

21 de Noviembre de 2025.

Se inicio con el armado de la viga aérea de las cocinas del costado norte para confinamiento de muros. Se realizo la instalación de la formaleta, quedando lista para fundida. Simultaneamente mientras se arman las vigas aéreas se aplica mortero impermeabilizado en los muros de mampostería el cual garantizará que los acabados aplicados no se vean afectados por los cambios de temperatura debidos al normal funcionamiento del espacio.

24 de Noviembre de 2025.

Despues de revisada la instalación del acero de refuerzo de la viga del costado norte junto con interventoria, se realiza el vaciado de concreto mezclado en obra bajo la dosificacion para un concreto de 3000 PSI de resistencia como los demás elementos fundidos con anterioridad. Vaciando este elemento se terminan los elementos estructurales para continuar los muros de mampostería existentes.

Terminando el pañete impermeabilizado de las cocinas, se inicia la aplicación en el quiosco, espacio en el cual se paretan parte de los muros confirmados y el resto se dejan con ladrillo a la vista para mantener la arquitectura existente.

Norma

25 de Noviembre de 2025.

Despues de una verificación con la interventoria y la supervisión del contrato se concluye que las vigas aéreas del quiosco necesitan recalzarse para poder confirmar los vanos de las ventanas del costado sur y el costado oriental. Este recalce necesito de anclajes para poder adherir el concreto al elemento existente y confirmar los vanos nivelados.
Se inicia la instalación de mochetas para los muros de las cocinas y el quiosco segun diseño arquitectonico. Simultaneamente se corta la malla electro soldada para el refuerzo de las placas en concreto de los muros.

26 de Noviembre de 2025.

Se realiza demolición manual en las cocinas para ajustar las medidas de los vanos a los nuevos ventanos aprobados en diseño.
Se realizo aseo general y limpieza para la confirmación del sobrepiso en mortero.

27 de Noviembre de 2025.

Se finalizan los primeros muros en concreto de las cocinas del costado sur, el concreto mezclado en obra se vacia manualmente y se detalla en el acabado final teniendo en cuenta que estos elementos

Norma

tendrán como acabado final nivelamiento por lo que se deben dejar bien terminados.

29 de Noviembre de 2025.

Se inicio en simultaneo el vaciado de mortero mezclado en obra en los ocho cocinas y el quiosco, para conformar el sobre piso, necesario para la instalacion del enchape.
Se cubren los puntos de desagüe de los sifones para no obstruirlos con el mortero.
Se realiza la fundida de los 4 mesones de las cocinas del costado norte realizando el mismo procedimiento para su conformación teniendo especial cuidado con el acabado y alineado del concreto.

01 de Diciembre de 2025.

Se inicio en las cocinas la instalación de la estructura para el cielo raso en pvc, previamente se realizo la extencion de cada uno de los espacios, para la tuberia conduit para salidas y puntos electricos.

En el quiosco se van conformando los mesones en concreto con su respectiva malla de refuerzo; se instala tuberia conduit para salidas y puntos electricos según diseño.

02 de Diciembe de 2025.

Se realiza la fundida de los mesones en concreto del quiosco. Segun distribución de los espacios. Se realiza vaciado manualmente dejando el curo del lavaplatos.
Se inicia instalacion de la estructura del cielo raso. en PVC.

03 de Diciembre de 2025.

Se inicio la aplicación del estuco plastico tanto en el quiosco como en las cocinas, para garantizar una superficie lisa y fina para la aplicación de la pintura posteriormente.

04 de Diciembre de 2025.

Se realiza la instalación de las láminas de PVC. del cielo raso. en la zona de la cocina del quiosco. igual que en atención. fue necesario la instalación de perfiles para las juntas.

05 de Diciembre de 2025.
Se realiza el retiro del escombro que aun estaba

acopiado en las cocinas, Este se dispone en el lugar indicado por la supervision del contrato quien cotificará el volumen retirado y acopiado.

09 de Diciembre de 2025.

Se aplica la primera mano de pintura tanto en las cocinas como el quiosco, Previamente se resanan las regatas realizadas para la instalacion de las cajas para los tomacorrientes e interruptores eléctricos.
La ultima mano de pintura se dará previo a la entrega de obra.

10 de Diciembre de 2025.

Según lo coordinado con la interventoria y supervisión del contrato se realizara el levantamiento de adoquín contiguo al quiosco para rediseñar el alineamiento. aprovechando que este no se encuentre en buen estado.
Se inicia la instalación de la estructura en madera para el machimbre en la sala de espera del quiosco.

11 de Diciembre de 2025.

En el bloque destinado para uso como oficina de turismo se inicia la instalación del cerramiento para poder realizar la intervención de la estructura en madera de la cubierta la cual se ve afectada por la humedad debido al desprendimiento de la Teja en barro.

12 de Diciembre de 2025

Se inician los trabajos de intervención de la cubierta de la oficina de turismo con el retiro de las zonas afectadas por humedad de las correas en madera.
Se retiran 20 cm de la correa para quitar totalmente la humedad y se realiza una extensión de la correa mediante un anclaje con tornillo rosado. entre la madera existente y el nuevo tramo.

15. Diciembre de 2025.

Retirado todo el adoquín aledaño al quiosco se verifica que el material granular utilizado para la estructura del adoquín no conserva los niveles iniciales. al encontrarse hundimientos por lo cual se decide realizar un mejoramiento de este material granular con cemento para garantizar la estabilidad del nuevo adoquín a instalar segun diseño. se inicia la escarificacion de la capa granular existente retirando 20 cm, material que se seleccionará y mezclará con el cemento para ser extendido y

compactado en todo el área a intervenir.
En la oficina de turismo se termina con el reforzamiento de la estructura en madera retirando las partes afectadas por la humedad y prolongando nuevos frames, debidamente anclados, anclaje que se opalta para no afectar la arquitectonica de la cubierta.

16 de Diciembre. de 2025.

Se inicia el extendido y compactación del material para el mejoramiento de la estructura del urbanismo existente. Se selecciona material excavado y mezclado con cemento y ya extendido en el espacio a intervenir se humedece y se compacta con equipo vibratorio tipo rana.
En la oficina del turismo terminada la intervención de la estructura de madera se procede a reemplazar la tela poliéster y el material que se habian desprendido

17 de Diciembre de 2025.

Despues de terminar la extendida del material para el mejoramiento de la estructura del urbanismo existente se inicia la instalación de adoquin por el costado norte quiosco segun los diseños aprobados.

Norma

Previamente se realiza la modulación con la ubicación de las cintas de confinamiento. y la concreto en concreto.

En la oficina de turismo se impermeabiliza todo el área de la cubierta que se intervino para garantizar que no se presenten nuevas filtraciones que puedan afectar su estructura. Se espera unos dias para iniciar la instalación de la teja.

18 de Diciembre de 2025.

Se realiza la instalación de la ventaneria del quiosco según los diseños aprobados. Para estos elementos de carpinteria metálica queda pendiente el embaquillado y sellamiento perimetral.

Después. de instalado el adoquin en el costado sur del quiosco, Se realiza la conformación de las cintas de confinamiento y concreto en concreto para ir rigidizando por paños la zona interventoria.

19 de Diciembre de 2025.

Se realiza la instalación de las ventanas en aluminio en las ocho cocinas, quedando igualmente pendiente el embaquillado y sellado perimetral. Esta actividad se espera realizar en los proximos dias.

Norma

Se continua en la instalación del adoquin para conformar el urbanismo aledaño al quiosco, se va modulando según el espacio a intervenir.

22. de Diciembre de 2025.

Despues de impermeabilizada la cubierta de la oficina de turismo permitiendo el secado del impermeabilizante, se realizo la instalacion de la malla electrosoldada de 8 mm a la cual irá soportada la teja de barro
En el quiosco se continúa con la instalación del adoquin. y se finaliza la rampla en concreto que da acceso al quiosco.

23 de Diciembre de 2025.

Instalada la malla electrosoldada, inmediatamente se inicia la instalación de la teja de barro. Según la modulación existente, teniendo en cuenta que existe una variación entre elementos lo cual a la vista se evidencia entre la antigua y la instalada.
En el quiosco se continúa con la conformación del urbanismo aledaño instalando Adoquin y conformando los cintos de confinamiento según el diseño. Se instala la cajilla plástica para dejar la conexion futura del medidor.
Se realiza el retiro de escombro que estaba pendiente, donde la disposición final en el lugar indicado por la supervisión.

24 de diciembre de 2025.

Por festividades se ejecutan actividades hasta el medio día, las cuales se concentran en conformar el urbanismo aledaño al quiosco continuando con la instalación del adoquin según los diseños. Se marcan los cintos de confinamiento y las cajas de inspección del alcantarillado para su conformación en los proximos días.
Simultaneamente se va conformando la rampa de acceso ubicada contra las instalaciones de bomberos, dando los niveles indicados en los diseños y la instalación de la malla electrosoldada de 3 mm como refuerzo para esfuerzos por temperatura.

25 de diciembre de 2025.

Dia festivo.

26. de diciembre de 2025.

Durante la jornada las actividades se concentran en fundir los cintos de confinamiento del adoquín y la rampa de acceso ubicada contra bomberos. La mezcla se realizo en obra con una dosificación para una resistencia de 3000 psi, como se ha realizado en el resto de elementos en concreto.

29 de Diciembre de 2025.

Se avanza con la instalación del adoquín alrededor del quiosco teniendo a la fecha el 60% del área intervenida según los diseños. Se realiza la instalación de la cajilla plástica para adecuar el espacio del medidor de agua, dejando la conexión lista con el respectivo registro de corte que permita su instalación

30 de Diciembre de 2025.

Se confirman las cintas de confinamiento simultáneamente se va avanzando con la instalación del adoquín garantizando la fijación de cada pieza evitando los desplazamientos y más teniendo en cuenta que se han presentado lluvias que pueden afectar su estabilidad al no estar aún enboquillado.
Las jornadas de lluvia han impedido continuar con la instalación de la teja de barro en bloque de la oficina de turismo ya que al ser un trabajo en alturas y por las características de la cubierta se debe garantizar un espacio totalmente seco.

31 de Diciembre de 2025.

Día No laborable.

1 de Enero de 2026.

Día no laborable.

02 de Enero de 2026.

Día no laborable.

05 de Enero de 2026.

Se retoman las actividades después de festividades de fin de año, continuando con la instalación de adoquín y conformación de cintas de confinamiento en concreto para ir finalizando el urbanismo contra el quiosco.

Simultáneamente se instala el machimbre en la parte externa del quiosco contra los aleros de la cubierta. Terminando estas zonas se finaliza esta actividad.

06 de Enero de 2026.

Teniendo gran parte del adoquín instalado en el urbanismo alrededor del quiosco, se inicia la extendida de arena de peña para enboquillar las piezas, arena que con las lluvias que se están presentando y el tránsito por la zona ayudan a su ingreso entre las juntas de las piezas, se continua instalación de machimbre.

07 de Enero de 2026.

Se inicia la demolición de los escalones que hacen

parte del urbanismo aledaño al quiosco para la conformación del espacio. Segun los diseños aprobados. Se espera en los próximos días demoler la cúnveta existente para reemplazarla por un cáramo prefabricado.
En el urbanismo aledaño al quiosco se continua con la conformación de cintas de confinamiento, las cañuelas para la evacuación del agua lluvia y la cerela de concreto del edificio de bomberos que se vio afectada por las demoliciones y la conformación de la rampa.

Se retoman trabajos de instalación de teja de barro. en el bloque de la oficina de turismo los cuales se detuvieron a las condiciones climaticas no permitieron ejecutar con continidad la actividad. Durante la jornada se termino el costado oriental y se espera que el día de mañana se pueda terminar costado occidental.

08 de enero de 2026.

Se continua con la instalación de la teja de barro en el bloque de la oficina de turismo terminando de instalar las piezas en el costado occidental.

En el quiosco se inicio la intervención de las escaleras ubicadas por el costado occidental para ajustar el espacio según el diseño aprobado. En este sector se encuentran muchas piezas de mamposteria sueltas y en mal estado por lo que se hace necesario su retiro y el aplique de mortero para la conformación del espacio.
Se realiza la instalación de las piezas de conformación de caballete de la cubierta del bloque de oficina de turismo

terminando asi la intervención de la cubierta para solucionar los problemas de filtración

09 de Enero de 2026.

Se realiza la intervención de las cajas de inspección del quiosco para poder conformar el adoquín contra esos elementos. con el marco y contramarco de las tapas ya en obra se revisan los niveles de estos, quedando asi su terminación con el adoquin.

En el quiosco despues de terminadas la instalación de machimbre y las ventanas, se inician los resanes y retoques de pintura sobre muros y columnas que se vieron afectados por la instalación de estos elementos.

10 de enero de 2026.

Se realiza la instalación de las puertas de las cocinas del costado sur dejando debidamente instalado el marco y la hoja, quedando pendiente el resane contra los muros y el aplique de pintura anticorrosiva.

Norma

12 de enero de 2026.

Se inicio la conformación de cintas de confinamiento para el adoquín instalado previamente, se inicio con remates de obra blanca. por el clima se debio suspender trabajos.

JAVIER H. M.

13 de enero de 2026.

Se continua con la conformación de cintas de confinamiento para el adoquín, tambien se realizo la fundida de tapas en concreto para las cajas de inspección y el embaquillo, adicionalmente se continuan con remates.

JAVIER H.M.

14 de enero de 2026.

Se continua con la conformación de cintas de confinamiento en concreto para el adoquin. y las cajas, se inicio la conformación de la escalera en el costado posterior del quiosco.

15 de enero de 2026.

Se continua con remates de obra blanca, se continua con la fundida de cintas de concreto de confinamiento

del adoquin. se continua con la conformación de la escalera.

JAVIER H. M

16 de enero de 2026 → Suscripción acta de suspension No. 1

20 de Febrero de 2026 → Suspipación acta de reinicio No 1

23 de febrero de 2026.

se retiro la formaleta de la cerca de concreto, se continua con la conformación de la escalera. Se inicio la instalacion de malla antipalomas en las cocinas del costado sur.


24 de febrero de 2026.

Se inicio con la realización de aseo a obra para continuar con la conformación de escaleras e instalación de malla antipalomas en las cocinas del costado norte, adicionalmente se continua con los remates de obra blanca.

25 de febrero de 2026.

Se continua con la conformación de cintas en concreto para confinamiento de adoquín, se instalaron las tapas de las cajas de inspeccion, se ponton.

trabajos por el clima.



26 de febrero de 2026.

Se retiro el cerramiento de la oficina de turismo en donde se cambio la teja de barro de la cubierta, se continua con la conformacion de la escalera posterior al quiosco. y se continua con la conformacion de cintas en concreto para confinamiento



27 de febrero de 2026.

Se termino la conformación de la escalera en concreto. se embaquillo el adoquin, poniendo arena de peña para darle mayor estabilidad al mismo. se retiro formaleta de las cintas de confinamiento.



28. de febrero de 2026

se inicio la demolición de la cuneta existente. se termino la conformación de cintas en concreto. se continua con la aplicación de arena de peña sobre el adoquin. y por ultimo se realizo aseo.

Norma

de de 2026.

Se continua con la demolición de la cuneta existente. se acopio en el lugar destinado para los escombros. se inicio con remates en el adoquin donde lo solicito interventoria.

03 de marzo de 2026.

Se termino demolición de la cuneta existente, se limpio el lugar y se inicio la conformación del cárcamo con unidades de mamposteria y malla electrosoldada en la placa de fondo.

04 de marzo de 2026.

Se continua con la conformación del cárcamo con unidades de mamposteria, se realizan actividades por fuera por capitaciones.

05 de marzo de 2026.

Se continua con la conformación del cárcamo con unidades de mamposteria, se realizo aseo.

ANEXO 2. ANEXOS SG-SST

ANEXO 2.1. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PROFESIONALES

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80664408		MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY	INDEPENDIENTE	Principal	cr 5 # 13 -15	COTA-CUNDINAMARCA	8640331	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1000000138	9491243864	I	2025/09/03	2025/09/30	BANCO DE BOGOTA	27	$869,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0			$855,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0			$855,000
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0			$855,000
1	CC	80664408	CANTOR MIGUEL									X								23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$855,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0			$855,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80664408		MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY	INDEPENDIENTE	Principal	cr 5 # 13 -15	COTA-CUNDINAMARCA	8640331	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1000000138	9491243864	I	2025/09/03	2025/09/30	BANCO DE BOGOTA	27	$869,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$8,200	$0	$488,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$8,200	$0	$488,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$6,400	$0	$381,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$6,400	$0	$381,400
TOTAL				**1**	**$855,000**	**$14,600**	**$0**	**$869,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80664408		MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY	INDEPENDIENTE	Principal	cr 5 # 13 -15	COTA-CUNDINAMARCA	8640331	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	9493551517	9493551517	I	2025/10/03	2025/11/07	BANCO DE BOGOTA	35	$856,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$2,940,000	$470,400			$2,940,000	$367,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$2,940,000	$470,400			$2,940,000	$367,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,940,000	$470,400			$2,940,000	$367,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 80664408	CANTOR MIGUEL	231001	30	$2,940,000	$470,400	EPS005	30	$2,940,000	$367,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,940,000	$470,400			$2,940,000	$367,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80664408		MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY	INDEPENDIENTE	Principal	cr 5 # 13 -15	COTA-CUNDINAMARCA	8640331	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	9493551517	9493551517	I	2025/10/03	2025/11/07	BANCO DE BOGOTA	35	$856,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$470,400	$10,200	$0	$480,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$470,400	$10,200	$0	$480,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$367,500	$8,000	$0	$375,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$367,500	$8,000	$0	$375,500
TOTAL				1	$837,900	$18,200	$0	$856,100

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY identificado(a) con CC 80664408 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: M C GROUP SAS NI 900464956

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494447208	94447208	E	2025-11-28	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494447208	94447208	E	2025-11-28	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494447208	94447208	E	2025-11-28	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494447208	94447208	E	2025-11-28	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492353953	9492353953	E	2025-11-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492353953	9492353953	E	2025-11-07	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492353953	9492353953	E	2025-11-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492353953	9492353953	E	2025-11-07	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	

APORTANTE: MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY CC 80664408

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494465711	94465711	I	2025-11-28	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								
9494465711	94465711	I	2025-11-28	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X								

Este certificado se expide el día 2025-12-11 a las 14:12.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80664408		MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY	INDEPENDIENTE	Principal	cr 5 # 13 -15	COTA-CUNDINAMARCA	8640331	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$855,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$855,000
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$855,000
1	CC	80664408	CANTOR MIGUEL									X								23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$855,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$855,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	9496665475	9496665475	I	2025/11/06	2025/12/22	BANCO AV VILLAS	22	$866,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$6,700	$0	$486,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$6,700	$0	$486,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$5,200	$0	$380,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$5,200	$0	$380,200
TOTAL				**1**	**$855,000**	**$11,900**	**$0**	**$866,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80664408		MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY	INDEPENDIENTE	Principal	cr 5 # 13 -15	COTA-CUNDINAMARCA	8640331	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	9498156907	9498156907	I	2026/01/06	2026/01/29	BANCO DE BOGOTA	23	$867,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$855,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$855,000
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$855,000
1	CC	80664408	CANTOR MIGUEL								X									23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$855,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$855,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$6,800	$0	$486,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$6,800	$0	$486,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$5,300	$0	$380,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$5,300	$0	$380,300
TOTAL				**1**	**$855,000**	**$12,100**	**$0**	**$867,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80664408		MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY	INDEPENDIENTE	Principal	cr 5 # 13 -15	COTA-CUNDINAMARCA	8640331	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	9499916871	9499916871	I	2026/02/04	2026/02/26	BANCO DE BOGOTA	22	$867,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																				$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0							**$855,000**
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																				$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0							**$855,000**
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																				$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0							**$855,000**
1	CC	80664408	CANTOR MIGUEL							X		X								23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$855,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0			$855,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$6,800	$0	$486,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$6,800	$0	$486,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$5,300	$0	$380,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$5,300	$0	$380,300
TOTAL				**1**	**$855,000**	**$12,100**	**$0**	**$867,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80664408		MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY	INDEPENDIENTE	Principal	cr 5 # 13 -15	COTA-CUNDINAMARCA	8640331	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	213020822	9502961641	I	2026/03/04	2026/04/10	BANCOLOMBIA	37	$867,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$2,970,000	$475,200			$2,970,000	$371,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$846,500
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$2,970,000	$475,200			$2,970,000	$371,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$846,500
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$2,970,000	$475,200			$2,970,000	$371,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$846,500
1	CC	80664408	CANTOR MIGUEL									X								23100 1	30	$2,970,000	$475,200	EPS005	30	$2,970,000	$371,300		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$846,500
Total	**Afiliados(1)**																					$2,970,000	$475,200			$2,970,000	$371,300			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$846,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$475,200	$11,500	$0	$486,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$475,200	$11,500	$0	$486,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$371,300	$9,000	$0	$380,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$371,300	$9,000	$0	$380,300
TOTAL				**1**	**$846,500**	**$20,500**	**$0**	**$867,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80664408		MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY	INDEPENDIENTE	Principal	cr 5 # 13 -15	COTA-CUNDINAMARCA	8640331	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	9502295883	9502295883	I	2026/04/07	2026/04/10	BANCO DE BOGOTA	3	$856,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$855,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$855,000
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$855,000
1	CC	80664408	CANTOR MIGUEL									X								23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$855,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$855,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$1,000	$0	$481,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$1,000	$0	$481,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$800	$0	$375,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$800	$0	$375,800
TOTAL				**1**	**$855,000**	**$1,800**	**$0**	**$856,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019021807		GARCIA CRUZ JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 72 bis No 81a 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5101366	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1671197722	9489886075	I	2025/09/02	2025/08/04	NEQUI	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
1	CC	1019021807 GARCIA JORGE									X								23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total		**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019021807		GARCIA CRUZ JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 72 bis No 81a 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5101366	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1671197722	9489886075	I	2025/09/02	2025/08/04	NEQUI	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019021807		GARCIA CRUZ JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 72 bis No 81a 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5101366	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1823909685	9492895577	I	2025/10/02	2025/10/03	NEQUI	1	$406,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$405,800**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$405,800**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$405,800**
1	CC	1019021807 GARCIA JORGE																X		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019021807		GARCIA CRUZ JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 72 bis No 81a 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5101366	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1823909685	9492895577	I	2025/10/02	2025/10/03	NEQUI	1	$406,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$200	$0	$228,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$400**	**$0**	**$406,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019021807		GARCIA CRUZ JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 72 bis No 81a 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5101366	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
1	CC	1019021807	GARCIA JORGE									X								230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1922206167	9494645391	I	2025/11/05	2025/11/12	NEQUI	7	$407,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$800	$0	$178,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$800	$0	$178,800
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$1,900**	**$0**	**$407,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019021807		GARCIA CRUZ JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 72 bis No 81a 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5101366	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
1	CC	1019021807	GARCIA JORGE									X								230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1980320337	9495996841	I	2025/12/02	2025/12/04	NEQUI	2	$406,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$300	$0	$228,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$300	$0	$228,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$300	$0	$178,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$300	$0	$178,300
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$600**	**$0**	**$406,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019021807		GARCIA CRUZ JORGE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 72 bis No 81a 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5101366	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2068026222	9497686104	I	2026/01/05	2026/01/08	NEQUI	3	$406,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
1	CC	1019021807 GARCIA JORGE									X									230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$500	$0	$228,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$500	$0	$228,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$400	$0	$178,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$400	$0	$178,400
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$900**	**$0**	**$406,700**

Certificado de Aportes

Se certifica que JORGE LUIS GARCIA CRUZ identificado(a) con CC 1019021807 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTERHOSPITAL NI 901742161

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9502927655	9502927655	Y	2026-04-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30		T															
9499915781	9499915781	Y	2026-02-26	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	

APORTANTE: GARCIA CRUZ JORGE LUIS CC 1019021807

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499798181	112039047	I	2026-03-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499798181	112039047	I	2026-03-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9498008646	38584031	I	2026-02-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9498008646	38584031	I	2026-02-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										

Este certificado se expide el día 2026-04-13 a las 12:04.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JORGE LUIS GARCIA CRUZ identificado(a) con CC 1019021807 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO INTERHOSPITAL NIT 901742161

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499911876	9499913625	Y	2026-04-26	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	

APORTANTE: GARCIA CRUZ JORGE LUIS CC 1019021807

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499796537	112032879	I	2026-04-04	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9499796537	1112032879	I	2026-04-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-13 a las 12:04.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que KEYLA M ARG ARITA M EZA CASTRO identificado(a) con CC 1082249538 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: KEYLA MARGARITA MEZA CASTRO CC 1082249538

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496451369	96451369	Y	2025-12-22	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496451369	96451369	Y	2025-12-22	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496451369	96451369	Y	2025-12-22	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9496451369	96451369	Y	2025-12-22	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9494447208	94447208	Y	2025-11-28	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494447208	94447208	Y	2025-11-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494447208	94447208	Y	2025-11-28	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9494447208	94447208	Y	2025-11-28	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																	
9492353953	9492353953	Y	2025-11-07	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492353953	9492353953	Y	2025-11-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492353953	9492353953	Y	2025-11-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9492353953	9492353953	Y	2025-11-07	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9491846513	9491846513	Y	2025-09-30	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9491846513	9491846513	Y	2025-09-30	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9491846513	9491846513	Y	2025-09-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9491846513	9491846513	Y	2025-09-30	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9490620289	9490620289	Y	2025-09-02	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9490620289	9490620289	Y	2025-09-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9490620289	9490620289	Y	2025-09-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	
9490620289	9490620289	Y	2025-09-02	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	

Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2025-12-22 a las 16:12.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que KEYLA M ARG ARITA M EZA CASTRO identificado(a) con CC 1082249538 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: KEYLA MARGARITA MEZA CASTRO CC 1082249538

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9502954434	9502954434	Y	2026-04-10	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9502954434	9502954434	Y	2026-04-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9502954434	9502954434	Y	2026-04-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9502954434	9502954434	Y	2026-04-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9501202360	9501202360	Y	2026-04-10	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9501202360	9501202360	Y	2026-04-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9501202360	9501202360	Y	2026-04-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9501202360	9501202360	Y	2026-04-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499912036	9499912036	Y	2026-02-26	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499912036	9499912036	Y	2026-02-26	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499912036	9499912036	Y	2026-02-26	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499912036	9499912036	Y	2026-02-26	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497561198	9497561198	Y	2026-01-29	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497561198	9497561198	Y	2026-01-29	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497561198	9497561198	Y	2026-01-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497561198	9497561198	Y	2026-01-29	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	

Este certificado se expide el día 2026-04-13 a las 12:04.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3210342		CAMARGO FELICIANO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 11 46	COGUA-CUNDINAMARCA	3045406806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1768325597	9491685175	N	2025/09/09	2025/09/11	BANCO DAVIVIENDA	2	$530,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,712,000	$274,000			$1,712,000	$214,000			$0	$0			$1,712,000	$41,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,712,000	$274,000			$1,712,000	$214,000			$0	$0			$1,712,000	$41,700		$0	$0
Ciudad: COGUA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,712,000	$274,000			$1,712,000	$214,000			$0	$0			$1,712,000	$41,700		$0	$0
1	CC	3210342	CAMARGO CESAR	25-14	30	($2,200,000)	($352,000)	EPS037	30	($2,200,000)	($275,000)		0	$0	$0	14-4	30	($2,200,000)	($53,600)	0	$0	$0
2	CC	3210342	CAMARGO CESAR	25-14	30	$3,912,000	$626,000	EPS037	30	$3,912,000	$489,000		0	$0	$0	14-4	30	$3,912,000	$95,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,712,000	$274,000			$1,712,000	$214,000			$0	$0			$1,712,000	$41,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3210342		CAMARGO FELICIANO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 11 46	COGUA-CUNDINAMARCA	3045406806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1768325597	9491685175	N	2025/09/09	2025/09/11	BANCO DAVIVIENDA	2	$530,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$274,000	$400	$0	$274,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$274,000	$400	$0	$274,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,700	$100	$0	$41,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$41,700	$100	$0	$41,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$214,000	$300	$0	$214,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$214,000	$300	$0	$214,300
TOTAL				1	$529,700	$800	$0	$530,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3210342		CAMARGO FELICIANO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 11 46	COGUA-CUNDINAMARCA	3045406806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1866027306	9493500458	N	2025/10/09	2025/10/20	BANCO DAVIVIENDA	11	$660,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000	$51,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000	$51,700		$0	$0
Ciudad: COGUA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000	$51,700		$0	$0
1	CC	3210342	CAMARGO CESAR	25-14	30	($2,200,000)	($352,000)	EPS037	30	($2,200,000)	($275,000)		0	$0	$0	14-4	30	($2,200,000)	($53,600)	0	$0	$0
2	CC	3210342	CAMARGO CESAR	25-14	30	$4,320,000	$691,200	EPS037	30	$4,320,000	$540,000		0	$0	$0	14-4	30	$4,320,000	$105,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,120,000	$339,200			$2,120,000	$265,000			$0	$0			$2,120,000	$51,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3210342		CAMARGO FELICIANO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 11 46	COGUA-CUNDINAMARCA	3045406806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1866027306	9493500458	N	2025/10/09	2025/10/20	BANCO DAVIVIENDA	11	$660,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$339,200	$2,300	$0	$341,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$339,200	$2,300	$0	$341,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,700	$400	$0	$52,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$51,700	$400	$0	$52,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$265,000	$1,800	$0	$266,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$265,000	$1,800	$0	$266,800
TOTAL				**1**	**$655,900**	**$4,500**	**$0**	**$660,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3210342		CAMARGO FELICIANO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 11 46	COGUA-CUNDINAMARCA	3045406806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1900273331	9493500321	I	2025/11/12	2025/11/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$668,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000		$52,700		$0	$0		$668,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000		$52,700		$0	$0		$668,300
Ciudad: COGUA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000		$52,700		$0	$0		$668,300
1	CC	3210342	CAMARGO CESAR																	25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS037	30	$2,160,000	$270,000		0	$0	$0	14-4	30	$2,160,000	2.436%	$52,700	0	$0	$0	No	$668,300
Total		**Afiliados(1)**																				$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000		$52,700		$0	$0		$668,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3210342		CAMARGO FELICIANO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 11 46	COGUA-CUNDINAMARCA	3045406806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1900273331	9493500321	I	2025/11/12	2025/11/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$668,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$345,600	$0	$0	$345,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$345,600	$0	$0	$345,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,700	$0	$0	$52,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$52,700	$0	$0	$52,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,000	$0	$0	$270,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$270,000	$0	$0	$270,000
TOTAL				1	$668,300	$0	$0	$668,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3210342		CAMARGO FELICIANO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 11 46	COGUA-CUNDINAMARCA	3045406806	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$2,160,000**	**$345,600**			**$2,160,000**	**$270,000**			**$0**	**$0**			**$2,160,000**		**$52,700**		**$0**	**$0**		**$668,300**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$2,160,000**	**$345,600**			**$2,160,000**	**$270,000**			**$0**	**$0**			**$2,160,000**		**$52,700**		**$0**	**$0**		**$668,300**
Ciudad: COGUA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					**$2,160,000**	**$345,600**			**$2,160,000**	**$270,000**			**$0**	**$0**			**$2,160,000**		**$52,700**		**$0**	**$0**		**$668,300**
1	CC	3210342	CAMARGO CESAR																	25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS037	30	$2,160,000	$270,000		0	$0	$0	14-4	30	$2,160,000	2.436%	$52,700	0	$0	$0	No	$668,300
Total	**Afiliados(1)**																					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000		$52,700		$0	$0		$668,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1977407186	9495194858	I	2025/12/10	2025/12/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$668,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$345,600	$0	$0	$345,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$345,600	$0	$0	$345,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,700	$0	$0	$52,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$52,700	$0	$0	$52,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,000	$0	$0	$270,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$270,000	$0	$0	$270,000
TOTAL				**1**	**$668,300**	**$0**	**$0**	**$668,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3210342		CAMARGO FELICIANO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 11 46	COGUA-CUNDINAMARCA	3045406806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2061755688	9497026496	I	2026/01/13	2026/01/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$668,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000		$52,700		$0	$0		$668,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000		$52,700		$0	$0		$668,300
Ciudad: COGUA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000		$52,700		$0	$0		$668,300
1	CC	3210342	CAMARGO CESAR																	25-14	30	$2,160,000	$345,600	EPS037	30	$2,160,000	$270,000		0	$0	$0	14-4	30	$2,160,000	2.436%	$52,700	0	$0	$0	No	$668,300
Total	**Afiliados(1)**																					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$0	$0			$2,160,000		$52,700		$0	$0		$668,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$345,600	$0	$0	$345,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$345,600	$0	$0	$345,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,700	$0	$0	$52,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$52,700	$0	$0	$52,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,000	$0	$0	$270,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$270,000	$0	$0	$270,000
TOTAL				**1**	**$668,300**	**$0**	**$0**	**$668,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3210342		CAMARGO FELICIANO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 11 46	COGUA-CUNDINAMARCA	3045406806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	39411340	9499175436	I	2026/02/10	2026/02/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,002,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,240,000	$518,400			$3,240,000	$405,000			$0	$0			$3,240,000		$79,000		$0	$0		$1,002,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,240,000	$518,400			$3,240,000	$405,000			$0	$0			$3,240,000		$79,000		$0	$0		$1,002,400
Ciudad: COGUA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$3,240,000	$518,400			$3,240,000	$405,000			$0	$0			$3,240,000		$79,000		$0	$0		$1,002,400
1	CC	3210342	CAMARGO CESAR								X									25-14	30	$3,240,000	$518,400	EPS037	30	$3,240,000	$405,000		0	$0	$0	14-4	30	$3,240,000	2.436%	$79,000	0	$0	$0	No	$1,002,400
Total	**Afiliados(1)**																					$3,240,000	$518,400			$3,240,000	$405,000			$0	$0			$3,240,000		$79,000		$0	$0		$1,002,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$518,400	$0	$0	$518,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$518,400	$0	$0	$518,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$79,000	$0	$0	$79,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$79,000	$0	$0	$79,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$405,000	$0	$0	$405,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$405,000	$0	$0	$405,000
TOTAL				**1**	**$1,002,400**	**$0**	**$0**	**$1,002,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3210342		CAMARGO FELICIANO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 11 46	COGUA-CUNDINAMARCA	3045406806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	124423315	9501196556	I	2026/03/10	2026/03/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,002,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,240,000	$518,400			$3,240,000	$405,000			$0	$0			$3,240,000		$79,000		$0	$0		$1,002,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,240,000	$518,400			$3,240,000	$405,000			$0	$0			$3,240,000		$79,000		$0	$0		$1,002,400
Ciudad: COGUA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$3,240,000	$518,400			$3,240,000	$405,000			$0	$0			$3,240,000		$79,000		$0	$0		$1,002,400
1	CC	3210342	CAMARGO CESAR																	25-14	30	$3,240,000	$518,400	EPS037	30	$3,240,000	$405,000		0	$0	$0	14-4	30	$3,240,000	2.436%	$79,000	0	$0	$0	No	$1,002,400
Total	**Afiliados(1)**																					$3,240,000	$518,400			$3,240,000	$405,000			$0	$0			$3,240,000		$79,000		$0	$0		$1,002,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$518,400	$0	$0	$518,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$518,400	$0	$0	$518,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$79,000	$0	$0	$79,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$79,000	$0	$0	$79,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$405,000	$0	$0	$405,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$405,000	$0	$0	$405,000
TOTAL				**1**	**$1,002,400**	**$0**	**$0**	**$1,002,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3210342		CAMARGO FELICIANO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 11 46	COGUA-CUNDINAMARCA	3045406806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	195267021	9501196553	I	2026/04/13	2026/04/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,002,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,240,000	$518,400			$3,240,000	$405,000			$0	$0			$3,240,000		$79,000		$0	$0		$1,002,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,240,000	$518,400			$3,240,000	$405,000			$0	$0			$3,240,000		$79,000		$0	$0		$1,002,400
Ciudad: COGUA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$3,240,000	$518,400			$3,240,000	$405,000			$0	$0			$3,240,000		$79,000		$0	$0		$1,002,400
1	CC	3210342	CAMARGO CESAR																	25-14	30	$3,240,000	$518,400	EPS037	30	$3,240,000	$405,000		0	$0	$0	14-4	30	$3,240,000	2.436%	$79,000	0	$0	$0	No	$1,002,400
Total	**Afiliados(1)**																					$3,240,000	$518,400			$3,240,000	$405,000			$0	$0			$3,240,000		$79,000		$0	$0		$1,002,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$518,400	$0	$0	$518,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$518,400	$0	$0	$518,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$79,000	$0	$0	$79,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$79,000	$0	$0	$79,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$405,000	$0	$0	$405,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$405,000	$0	$0	$405,000
TOTAL				**1**	**$1,002,400**	**$0**	**$0**	**$1,002,400**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CESAR TULIO CASTRO P IÑEROS identificado(a) con CC 17324122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CESAR TULIO CASTRO PIÑEROS CC 17324122

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494232162	1920971790	I	2025-11-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1		T															
9494232162	1920971790	I	2025-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1		T															
9494232162	1920971790	I	2025-11-11	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	1		T															
9493111062	1840255686	I	2025-10-09	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493111062	1840255686	I	2025-10-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9493111062	1840255686	I	2025-10-09	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																	
9491467296	1751408570	I	2025-09-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9491467296	1751408570	I	2025-09-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	
9491467296	1751408570	I	2025-09-04	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																	

Este certificado se expide el día 2025-12-22 a las 14:12.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CESAR TULIO CASTRO PIÑEROS identificado(a) con CC 17324122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CESAR TULIO CASTRO PIÑEROS CC 17324122

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499978941	94999113562	I	2026-01-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9499978941	94999113562	I	2026-01-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9499978941	94999113562	I	2026-01-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497562765	9497568234	I	2025-12-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9497562765	9497568234	I	2025-12-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9497562765	9497568234	I	2025-12-08	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	

Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2026-06-23 a las 14:06.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CESAR TULIO CASTRO PIÑEROS identificado(a) con CC 17324122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CESAR TULIO CASTRO PIÑEROS CC 17324122

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9501258756	9501251562	I	2026-04-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9501258756	9501251562	I	2026-04-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9501258756	9501251562	I	2026-04-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9499936875	94999113549	I	2026-03-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9499936875	94999113549	I	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499936875	94999113549	I	2026-03-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499936875	94999113549	I	2026-03-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9497563529	9497568592	I	2026-02-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9497563529	9497568592	I	2026-02-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497563529	9497568592	I	2026-02-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497563529	9497568592	I	2026-02-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	

Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2026-06-23 a las 14:06.

ANEXO 2.2. PLANILLAS HG SOLIDEZ

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS	CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	SESQUILE 001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	20/11/2025	91478246	$294.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	7.600	0		0		0	73	400	0	8.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.800	0		0		0	73	200	0	4.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	17.100	0		0		0	73	800	0	17.900	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	7.600	0		0		0	73	400	0	8.000	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.600	0	0	0	0	73	400	0	8.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	83.600	0	0	0	0	73	3.800	0	87.400	11
231001	Colfondos	800227940-6	38.000	0	0	0	0	73	1.800	0	39.800	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	15.200	0	0	0	0	73	700	0	15.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	64.600				64.600	73	3.000	67.600			646	67.600	19

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	36.100	73	1.700	37.800	19

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS		CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	SESQUILE	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	20/11/2025	91478246	$294.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	73	0	0	0
ICBF				
0	73	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	36.100	37.900
Pensión	4	144.400	151.100
Riesgos Laborales	1	64.600	67.600
CCF	1	36.100	37.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	281.200	294.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS		CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	SESQUILE	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					19	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	20/11/2025	91478246	$294.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000953246	VILLARRUEL MARTINEZ ANDERSSON	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
2	CC	1010230440	AVENDAÑO PEREZ JON HAROL	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
3	CC	1016068485	MAHECHA CAMACHO JHON OSWALDO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
4	CC	1019024317	GACHA GUEVARA WILMER ULISES	1	0			S		X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
5	CC	1030628352	FRANCO CARVAJAL DUMAR ANTONIO	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
6	CC	1031648012	PEÑALOZA CARO ALFONSO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
7	CC	1075689169	CONTRERAS VELASQUEZ JHON ANDERSON	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
8	CC	80186125	GACHA GUEVARA RAFAEL IGNACIO	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
9	CC	1050778874	TORREJANO VILLAFAÑES JOSE DAVID	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
10	CC	1072338246	BARBOSA NEIRA JOSE DIONEL	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
11	CC	1075658864	RODRIGUEZ JOSE FERNANDO	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
12	CC	1075676897	HERRERA SANCHEZ JAIRO ANDRES	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
13	CC	1075681504	MADRIGAL CRISTANCHO HECTOR STIVEN	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
14	PT	5960969	SANCHEZ RAMIREZ JAIRO JESUS	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
15	CC	10885751	PACHECO DIAZGRANADOS EDUAR MANUEL	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
16	CC	1100575	SUESCA RODRIGUEZ JOSE GRATINIANO	1	0			S		X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
17	CC	3027285	REYES JOSE GUILLERMO	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
18	CC	4179637	ORTEGA GARCIA LUIS EDISON	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
19	CC	79472076	MORENO RIVERA ARMANDO	1	0			S	X	X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS		CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	20/11/2025	91547485	$951.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	17.100	0		0		0	43	500	0	17.600	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	17.100	0		0		0	43	500	0	17.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	81.700	0		0		0	43	2.200	0	83.900	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	3.800	0		0		0	43	200	0	4.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	197.400	0	0	0	0	43	5.300	0	202.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	144.400	0	0	0	0	43	3.900	0	148.300	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	136.800	0	0	0	0	43	3.700	0	140.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	208.600				208.600	43	5.600	214.200			2.086	214.200	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	119.700	43	3.200	122.900	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	43	0	0	0
ICBF				
0	43	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	119.700	123.100
Pensión	3	478.600	491.500
Riesgos Laborales	1	208.600	214.200
CCF	1	119.700	122.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	926.600	951.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS		CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					7	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-10	2025-09	E	20/11/2025	91547485	$951.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1002307374	MORALES CABRERA JUAN CAMILO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
2	CC	1019024317	GACHA GUEVARA WILMER ULISES	1	0			S	X																25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
3	CC	1100575	SUESCA RODRIGUEZ JOSE GRATINIANO	1	0			S	X																25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
4	CC	3027285	REYES JOSE GUILLERMO	1	0			S	X																230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
5	CC	4179715	PACANCHIQUE VARGAS MAURICIO	1	0			S	X																230201	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS017	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	5	82.600	CCF24	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
6	CC	80186125	GACHA GUEVARA RAFAEL IGNACIO	1	0			S	X																230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS008	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
7	CC	8852372	CUESTA SALAZAR LUIS HORACIO	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS		CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	13/01/2026	5837918	$1.146.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	9.500	0		0		0	63	400	0	9.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	9.500	0		0		0	63	400	0	9.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	123.500	0		0		0	63	4.900	0	128.400	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	38.000	0	0	0	0	63	1.500	0	39.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	76.000	0	0	0	0	63	3.000	0	79.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	63	18.000	0	473.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	248.000				248.000	63	9.800	257.800			2.480	257.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	142.500	63	5.700	148.200	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	63	0	0	0
ICBF				
0	63	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	142.500	148.200
Pensión	3	569.600	592.100
Riesgos Laborales	1	248.000	257.800
CCF	1	142.500	148.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.102.600	1.146.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS		CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	13/01/2026	5837918	$1.146.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019024317	GACHA GUEVARA WILMER ULISES	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1100575	SUESCA RODRIGUEZ JOSE GRATINIANO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	3027285	REYES JOSE GUILLERMO	1	0			S	X																230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS002	237.250	9.500	14-11	237.250	5	16.600	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0
4	CC	4179715	PACANCHIQUE VARGAS MAURICIO	1	0			S	X																230201	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS017	237.250	9.500	14-11	237.250	5	16.600	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0
5	CC	80186125	GACHA GUEVARA RAFAEL IGNACIO	1	0			S	X																230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS008	237.250	9.500	14-11	237.250	5	16.600	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS		CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	13/01/2026	5840201	$969.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.800	0		0		0	35	100	0	3.900	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	115.900	0		0		0	35	2.600	0	118.500	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.900	0		0		0	35	100	0	2.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.900	0		0		0	35	100	0	2.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	22.800	0	0	0	0	35	500	0	23.300	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	463.200	0	0	0	0	35	10.100	0	473.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	215.200				215.200	35	4.700	219.900			2.152	219.900	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	123.500	35	2.700	126.200	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	35	0	0	0
ICBF				
0	35	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	123.500	126.400
Pensión	2	486.000	496.600
Riesgos Laborales	1	215.200	219.900
CCF	1	123.500	126.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	948.200	969.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS		CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					7	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-12	2025-11	E	13/01/2026	5840201	$969.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1014230717	MAZUERA SANCHEZ JORGE IVAN	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
2	CC	1019024317	GACHA GUEVARA WILMER ULISES	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1100575	SUESCA RODRIGUEZ JOSE GRATINIANO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1102576736	BUELVAS PEÑAFIEL JOSE LUIS	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
5	CC	11450044	MOYA BELTRAN JOAQUIN	1	3			S	X	X																0	0	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
6	CC	5398479	GAFARO JAIMES GUEILER OMAR	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
7	CC	8641721	ESCORCIA GOMEZ JUAN CARLOS	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-11	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS		CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	ABRIL	0001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y	13/02/2026	50503812	$86.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	29.700	0		0		0	35	700	0	30.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	38.000	0	0	0	0	35	900	0	38.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	16.600				16.600	35	400	17.000			166	17.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	35	0	0	0
ICBF				
0	35	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	29.700	30.400
Pensión	1	38.000	38.900
Riesgos Laborales	1	16.600	17.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	84.300	86.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS		CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	ABRIL	0001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y	13/02/2026	50503812	$86.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80186125	GACHA GUEVARA RAFAEL IGNACIO	59	0			N	X	T															230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS008	237.250	29.700	14-11	237.250	5	16.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS		CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	24/02/2026	56136200	$1.753.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	25.800	0		0		0	15	300	0	26.100	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	7.100	0		0		0	15	100	0	7.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	18.700	0		0		0	15	200	0	18.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	173.100	0		0		0	15	1.700	0	174.800	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	102.900	0	0	0	0	15	1.000	0	103.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	233.900	0	0	0	0	15	2.300	0	236.200	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	15	5.400	0	565.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	390.100				390.100	15	3.800	393.900			3.901	393.900	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	224.700	15	2.200	226.900	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	224.700	227.000
Pensión	3	897.200	905.900
Riesgos Laborales	1	390.100	393.900
CCF	1	224.700	226.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.736.700	1.753.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS		CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	24/02/2026	56136200	$1.753.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010020858	GACHA NUMPAQUE YEISON ESMID	1	0			S	X	X															230301	175.091	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	7.100	14-11	175.091	5	12.200	CCF24	175.091	7.100	0	0	0	0	0
2	CC	1019024317	GACHA GUEVARA WILMER ULISES	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
3	CC	1073525695	BOYACA AVILA CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X	X															230201	175.091	28.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	7.100	14-11	175.091	5	12.200	CCF24	175.091	7.100	0	0	0	0	0
4	CC	1100575	SUESCA RODRIGUEZ JOSE GRATINIANO	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
5	CC	1233889160	BAUTISTA BUITRAGO JEISON FERNANDO	1	0			S	X	X															230301	175.091	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.091	7.100	14-11	175.091	5	12.200	CCF24	175.091	7.100	0	0	0	0	0
6	CC	3027285	REYES JOSE GUILLERMO	1	0			S	X																230301	466.908	74.800	0	0	0	0	EPS002	466.908	18.700	14-11	466.908	5	32.500	CCF24	466.908	18.700	0	0	0	0	0
7	CC	4179715	PACANCHIQUE VARGAS MAURICIO	1	0			S	X																230201	466.908	74.800	0	0	0	0	EPS017	466.908	18.700	14-11	466.908	5	32.500	CCF24	466.908	18.700	0	0	0	0	0
8	CC	80186125	GACHA GUEVARA RAFAEL IGNACIO	1	0			S	X																230301	466.908	74.800	0	0	0	0	EPS008	466.908	18.700	14-11	466.908	5	32.500	CCF24	466.908	18.700	0	0	0	0	0
9	CC	80505257	GACHA GUEVARA JOSE BENEDICTO	1	0			S	X	X															230301	175.091	28.100	0	0	0	0	EPS017	175.091	7.100	14-11	175.091	5	12.200	CCF24	175.091	7.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS	CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73567261	07/04/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$7,528,892	$2.376.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	79.500	0		0		0	29	1.600	0	81.100	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	29	1.400	0	71.500	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	7.100	0		0		0	29	200	0	7.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	144.900	0		0		0	29	2.800	0	147.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	84.200	0	0	0	0	29	1.600	0	85.800	3
230301	Porvenir	800224808-8	560.400	0	0	0	0	29	10.600	0	571.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	29	10.600	0	571.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	524.300				524.300	29	9.900	534.200			5.243	534.200	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	301.600	29	5.700	307.300	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	29	0	0	0
ICBF				
0	29	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	301.600	307.600
Pensión	3	1.205.000	1.227.800
Riesgos Laborales	1	524.300	534.200
CCF	1	301.600	307.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.332.500	2.376.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS		CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73567261	07/04/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$7,528,892	$2.376.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1019024317	GACHA GUEVARA WILMER ULISES	1	0			S		X															25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1100575	SUESCA RODRIGUEZ JOSE GRATINIANO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 3027285	REYES JOSE GUILLERMO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 4179715	PACANCHIQUE VARGAS MAURICIO	1	0			S		X															230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS017	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	5	8.200	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
5	CC 79900848	AVENDAÑO TORREJANO NELSON DE JESUS	1	0			S	X	X															230201	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	9.400	14-11	233.454	4	5	16.300	CCF24	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
6	CC 80186125	GACHA GUEVARA RAFAEL IGNACIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 9237727	AVENDAÑO TORREJANO NILSON	1	0			S	X	X															230201	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS010	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	5	12.200	CCF24	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS	CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83131340		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$233,455	$75.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.400	0		0		0	33	100	0	2.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.400	0		0		0	33	100	0	2.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	4.700	0		0		0	33	200	0	4.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	18.800	0	0	0	0	33	500	0	19.300	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	18.700	0	0	0	0	33	500	0	19.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	16.400				16.400	33	400	16.800			164	16.800	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	9.500	33	300	9.800	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	33	0	0	0
ICBF				
0	33	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	9.500	9.900
Pensión	2	37.500	38.500
Riesgos Laborales	1	16.400	16.800
CCF	1	9.500	9.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	72.900	75.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901263935-8	HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCION SAS	CR 103 A 159 13	3124011729	andreamendez99@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83131340		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$233,455	$75.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1100575	SUESCA RODRIGUEZ JOSE GRATINIANO	1	0			S		X															25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS017	116.727	2	4.700	14-11	116.727	2	5	8.200	CCF24	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
2	CC 3027285	REYES JOSE GUILLERMO	1	0			S		X															230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
3	CC 80186125	GACHA GUEVARA RAFAEL IGNACIO	1	0			S		X															230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF24	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 2.3. PAZ Y SALVOS MANO DE OBRA

PAZ Y SALVO LABORAL

En Bogotá d.c a los días 22 del mes de Marzo Del año 2026, el contrato laboral celebrado se da por terminado entre el Empleador: ***HG SOLIDEZ&CONSTRUCCIONES S.A.S*** identificada con **NIT: 901263935-8** y el Trabajador Rafael Gacha Guevara mayor de edad, identificado con la CC 80186125

El trabajador suscribe en el presente documento, y sostiene que se encuentra a paz y salvo en lo que refiere a (pago por prestación de servicios) correspondientes a la labor prestada como **parte /operativa** de la empresa ***HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCIÓN,*** servicios que fueron prestados en las instalaciones de (Consorcio Plaza Sesquile) ubicado en Sesquile, Cundinamarca, relizando el MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRA-TIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUN-DINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUN-DINAMARCA. Del 20 de Agosto de 2025 al 22 de Marzo de 2026.

De igual manera se le notifica que cuenta con tres días hábiles para realizar el examen de egreso en el centro médico OLAYA ubicado en la Cra 21 #26-52 sur, Bogotá

TRABAJADOR

NOMBRE: Rafael Gacha Guevara

CEDULA: 80186125

FIRMA:

RAFAEL IGNACIO GACHA GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL

HG solidez y construcción S.A.S
Email: solidezhg@hotmail.com
Cel.: 312 401 17 29

Scanned with CamScanner

PAZ Y SALVO LABORAL

En Bogotá d.c a los días 22 del mes de Mar20 Del año 2026, el contrato laboral celebrado se da por terminado entre el Empleador: ***HG SOLIDEZ&CONSTRUCCIONES S.A.S*** identificada con **NIT: 901263935-8** y el Trabajador Wilmer Gacha Guevara mayor de edad, identificado con la CC 1019029317

El trabajador suscribe en el presente documento, y sostiene que se encuentra a paz y salvo en lo que refiere a (pago por prestación de servicios) correspondientes a la labor prestada como **parte /operativa** de la empresa ***HG SOLIDEZ Y CONSTRUCCIÓN,*** servicios que fueron prestados en las instalaciones de (Consorcio Plaza Sesquile) ubicado en Sesquile, Cundinamarca, relizando el MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRA-TIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUN-DINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUN-DINAMARCA. Del 20 de Agosto de 2025 al 22 de Marzo de 2026.

De igual manera se le notifica que cuenta con tres días hábiles para realizar el examen de egreso en el centro médico OLAYA ubicado en la Cra 21 #26-52 sur, Bogotá

TRABAJADOR

NOMBRE: Wilmer Gacha Guevara.

CEDULA: 1019029317

FIRMA: Wilmer Gacha Guevara.

RAFAEL IGNACIO GACHA GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL

HG solidez y construcción S.A.S
Email: solidezhg@hotmail.com
Cel.: 312 401 17 29

Scanned with CamScanner

ANEXO 2.4. ACTAS DE VECINDAD

Alcaldía Municipal de Sesquilé	GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA		
	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	GOP-FT-29-V1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No. :	SA-MC-OBRA-213-2025						
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA.						
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLAZA SESQUILE						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPLAZA						
REGISTRO No.	1	FECHA	19/08/24	ELABORÓ	Keyla Meza	REVISÓ	Mauricio Cantor

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN	plaza Mercado Sesquile.		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL	X	URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se evidencia el área correspondiente a los locales comerciales ubicados a los baños u oficinas de la Alcaldía Municipal de Sesquilé se observo que las paredes y pisos del baño se encuentran en buen estado, tiene algunas fisuras superficiales Se presenta un foco de humedad en la pared posterior a los finales del baño, no obstante dicha condición no presenta directa afectación a los espacios de los locales al momento de la inspección.

Firma
Nombre: Juan Acosta
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.070.304.259

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Ayra Camargo
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: S.O.P.
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal de Sesquilé	GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA		
	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	GOP-FT-29-V1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No. :	SA-MC-OBRA-213-2025						
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA.						
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLAZA SESQUILE						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPLAZA						
REGISTRO No.	2	FECHA	21/08/24	ELABORÓ	Keyla Meza	REVISÓ	Mauricio Cantor

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN	Plaza Mercado Sesquile		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL	X	URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se evidenciaron locales comerciales contiguos a unos baños, cuya parte posterior colinda con el parqueadero de rutas intermunicipales del municipio de Sesquile. Durante la inspección del área de los baños se observo presencia de humedad en algunos sectores y deficiencias locativas y de funcionamiento, ente ellas la falta de sistema de descargue en los orinales, la ausencia de tapa en la caja de tacos y la inexistencia de sifones, condiciones que podrian generar problemas de olores y manejo inadecuado de aguas.

Firma
Nombre: Juan Pacheco
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.070.304.751

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Laura Camargo
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: S.O.P.
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal de Sesquilé

GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	GOP-FT-29-V1
PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No. :	SA-MC-OBRA-213-2025						
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA.						
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLAZA SESQUILE						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPLAZA						
REGISTRO No.	3	FECHA	19/08/24	ELABORÓ	Keyla Mesa	REVISÓ	Mauricio Cantor

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN	Plaza Mercado Sesquile		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL	X	URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

En el área del Kiosko se evidencio un notable deterioro del adoquin de arcilla, con piezas fracturadas, desgaste superficial, perdida de material y crecimiento de vegetación devido al deslavado de las juntas. Asimismo, se identifico la falta de adoquines en algunos sectores y fisuras visibles en la escalera del Kiosko. Por lo anterior, se recomienda realizar mantenimiento correctivo, incluyendo reposición de piezas, resellado de juntas y revision estructural de la escalera para garantizar su seguridad y conservación del area.

Firma
Nombre: Juan Acosta
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 4.070.304.754

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Dayra Camargo
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: S.O.P.
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal de Sesquilé	GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA		
	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	GOP-FT-29-V1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No. :			SA-MC-OBRA-213-2025				
OBJETO:			MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA.				
CONTRATISTA:			CONSORCIO PLAZA SESQUILE				
INTERVENTOR:			CONSORCIO INTERPLAZA				
REGISTRO No.	1	FECHA	22/03/26	ELABORÓ	Keyla Meza	REVISÓ	Mauricio Cantor

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN	Plaza Mercado Sesquile.		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL	X	URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se evidencio que las condiciones registradas en el acta inicial. se mantienen sin variaciones, verificandose que las paredes y pisos continúan en buen estado y que la leve humedad identificada previamente en algunos sectores de los baños colindantes no presentó afectaciones adicionales durante la ejecución de las actividades, concluyendose que no se generarón impactos negativos en las áreas inspeccionadas.

Firma
Nombre: Juan Arteaga
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.070304759

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Dayra Camargo
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: S.O.P.
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal de Sesquilé

GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	GOP-FT-29-V1
PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No. :	SA-MC-OBRA-213-2025						
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA.						
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLAZA SESQUILE						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPLAZA						
REGISTRO No.	2	FECHA	22/03/26	ELABORÓ	Keyla Meza	REVISÓ	Mauricio Cantor

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN	plaza Mercado Sesquile.		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL	X	URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Se evidenció que los locales comerciales y los baños colindantes con el parqueadero de rutas intermunicipales del municipio de Sesquilé mantienen las mismas condiciones registradas en el acta inicial. Se verificó la persistencia de humedad y las deficiencias locativas previamente identificadas, como la ausencia del sistema push en los orinales, la falta de tapa en la caja de tacos y la inexistencia de sifones, sin evidenciarse afectaciones adicionales atribuibles a la ejecución del proyecto.

Firma
Nombre: Juan Angel A
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.010.204.254

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Mayra Camargo
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: S.O.P.
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal de Sesquilé	GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA		
	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	GOP-FT-29-V1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No. :			SA-MC-OBRA-213-2025				
OBJETO:			MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA.			
CONTRATISTA:			CONSORCIO PLAZA SESQUILE				
INTERVENTOR:			CONSORCIO INTERPLAZA				
REGISTRO No.	3	FECHA	22/06/26	ELABORÓ	Keyla Meza	REVISÓ	Mauricio Cantor.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO			
DIRECCIÓN	Plaza Mercado Sesquile.		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL	X	URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

En el área del Kiosko se realizo la instalación de nuevo adoquin de arcilla, confinado con bordillo perimetral y sello en arena de peña para garantizar la estabilidad de la superficie - Asimismo, se construyo la escalera posterior del Kiosko y un cárcamo en concreto con rejilla metalica para la adecuada canalización de aguas lluvias y prevención de empozamientos.
Adicionalmente, se ejecuto una rampa de acceso para personas con movilidad reducida, mejorando las condiciones de accesibilidad y circulación en el sector.

Firma
Nombre: Juan Acosta
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1070.004.756

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: Dayra Camargo
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: S.O.P.
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Scanned with CamScanner

ANEXO 3. FICHAS TECNICAS

FICHA TÉCNICA


CÓDIGO SAP	225019959
NOMBRE DE LA REFERENCIA	MYSTIC GRIS ESTRUCTU 30.5X60 -1
TAMAÑO NOMINAL(cm) NO MODULAR	30,5X60
GRUPO DE ABSORCIÓN	BIIb/ anexo K
USO	PARED
TRAFICO	PARED
ESPESOR FABRICACIÓN (mm)	8,4
m^2 POR CAJA	1,28
UNIDADES	7
CARAS - DISEÑOS	6
VARIACIÓN DE TONO SEGÚN NORMA ANSI A137-1-2017	V2



El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	ALFAGRES
ANCHO Y LARGO		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm
ESPESOR		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 5% ±0,5 mm	± 5% ±0,5 mm
RECTITUD DE LOS LADOS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
ORTOGONALIDAD		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm	± 0,5 % ±2,0mm
	Curvatura del lado	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm	± 0,5 % ±2,0mm
	Alabeo	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm	± 0,5 % ±2,0mm
DEFECTOS SUPERFICIALES		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Minimo 95% libre de defectos	Minimo 95% libre de defectos
ABSORCIÓN DE AGUA		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	6 % < E 10 %, Valor Individual.Máx. 11%	6 % < E 10 %, Valor Individual.Máx. 11%
RESISTENCIA A LA ROTURA POR FLEXIÓN		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Espesores ≥7,5 Mínimo 800 N	> 800 N
MÓDULO DE ROTURA		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mín. 18 N/mm2, Mín. individual 16 N/mm2	Mín. 18 N/mm2, Mín. individual 16 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL DE BALDOSAS ESMALTADAS A SER EMPLEADAS EN PISO		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe cumplimiento de la clase de abrasión	PARED
RESISTENCIA AL CUARTEO		NTC 4321 - 11 ISO 10545 - 11	Requerido	Resistente
RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO		NTC 4321 - 12 ISO 10545 - 12	Método de prueba disponible	No Aplica
RESISTENCIA AL MANCHADO		NTC 4321 - 14 ISO 10545 - 14	Mínimo clase 3	clase 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS		NTC 4321 - 13 ISO 10545 - 13	Resistencia a productos químicos domésticos y sales de piscina. Mínimo B	Clase A
			Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. El fabricante establece la clasificación	Clase B

COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	ANSI A 137.1		NO APLICA
DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN LA ESCALA DE MOHS.	UNE-EN 15771:2011		5



Apariencia Muy uniforme | Apariencia Uniforme | **Variación Ligera** | Variación Moderada | Variación Sustancial

Nota:

1 Para mayor información acerca de este producto, comuniquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 331 1531, nacional 018000914900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co
2 Para areas donde requiera mayor resistencia al deslizamiento, utilice productos con DCOF CLASE 2
3 El contenido de las cajas de este producto puede variar en diseño y tonalidad. Verifique e instale las baldosa en forma aleatoria.
4 Fabricado por ALFAGRES S.A En Colombia.
5 Calidad Primera
6 Superficie esmaltada.
7 Señor consumidor por favor revise cuidadosamente la identificación del material, el lote y la fecha de producción se encuentran en el empaque del producto en físico.
8 Consulte el manual de instalación y mantenimiento para su correcto uso¨"
9 Especificación según Norma ISO 13006 - NTC 919 (Norma Técnica Colombiana)

Información publicada en Mayo 2021- Versión 2

FICHA TÉCNICA


CÓDIGO SAP	225019956
NOMBRE DE LA REFERENCIA	MYSTIC BEIGE ESTRUCT 30.5X60 -1
TAMAÑO NOMINAL(cm) NO MODULAR	30,5X60
GRUPO DE ABSORCIÓN	BIIb/ anexo K
USO	PARED
TRAFICO	PARED
ESPESOR FABRICACIÓN (mm)	8,4
m^2 POR CAJA	1,28
UNIDADES	7
CARAS - DISEÑOS	6
VARIACIÓN DE TONO SEGÚN NORMA ANSI A137-1-2017	V2



El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	ALFAGRES
ANCHO Y LARGO		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm
ESPESOR		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 5% ±0,5 mm	± 5% ±0,5 mm
RECTITUD DE LOS LADOS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
ORTOGONALIDAD		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm	± 0,5 % ±2,0mm
	Curvatura del lado	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm	± 0,5 % ±2,0mm
	Alabeo	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm	± 0,5 % ±2,0mm
DEFECTOS SUPERFICIALES		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Minimo 95% libre de defectos	Minimo 95% libre de defectos
ABSORCIÓN DE AGUA		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	6 % < E 10 %, Valor Individual.Máx. 11%	6 % < E 10 %, Valor Individual.Máx. 11%
RESISTENCIA A LA ROTURA POR FLEXIÓN		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Espesores ≥7,5 Mínimo 800 N	> 800 N
MÓDULO DE ROTURA		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mín. 18 N/mm2, Mín. individual 16 N/mm2	Mín. 18 N/mm2, Mín. individual 16 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL DE BALDOSAS ESMALTADAS A SER EMPLEADAS EN PISO		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe cumplimiento de la clase de abrasión	PARED
RESISTENCIA AL CUARTEO		NTC 4321 - 11 ISO 10545 - 11	Requerido	Resistente
RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO		NTC 4321 - 12 ISO 10545 - 12	Método de prueba disponible	No Aplica
RESISTENCIA AL MANCHADO		NTC 4321 - 14 ISO 10545 - 14	Mínimo clase 3	clase 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS		NTC 4321 - 13 ISO 10545 - 13	Resistencia a productos químicos domésticos y sales de piscina. Mínimo B	Clase A
			Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. El fabricante establece la clasificación	Clase B

COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	ANSI A 137.1		NO APLICA
DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN LA ESCALA DE MOHS.	UNE-EN 15771:2011		5



Apariencia Muy uniforme | Apariencia Uniforme | **Variación Ligera** | Variación Moderada | Variación Sustancial

Nota:

1 Para mayor información acerca de este producto, comuniquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 331 1531, nacional 018000914900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co
2 Para areas donde requiera mayor resistencia al deslizamiento, utilice productos con DCOF CLASE 2
3 El contenido de las cajas de este producto puede variar en diseño y tonalidad. Verifique e instale las baldosa en forma aleatoria.
4 Fabricado por ALFAGRES S.A En Colombia.
5 Calidad Primera
6 Superficie esmaltada.
7 Señor consumidor por favor revise cuidadosamente la identificación del material, el lote y la fecha de producción se encuentran en el empaque del producto en físico.
8 Consulte el manual de instalación y mantenimiento para su correcto uso¨"
9 Especificación según Norma ISO 13006 - NTC 919 (Norma Técnica Colombiana)

Información publicada en Mayo 2021- Versión 2

FICHA TÉCNICA


CÓDIGO SAP	225019958
NOMBRE DE LA REFERENCIA	MYSTIC GRIS 30.5X60 -1
TAMAÑO NOMINAL(cm) NO MODULAR	30,5X60
GRUPO DE ABSORCIÓN	BIIb/ anexo K
USO	PISO/PARED
TRAFICO	COMERCIAL ALTO
ESPESOR FABRICACIÓN (mm)	8,4
m^2 POR CAJA	1,28
UNIDADES	7
CARAS - DISEÑOS	6
VARIACIÓN DE TONO SEGÚN NORMA ANSI A137-1-2017	V2



El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	ALFAGRES
ANCHO Y LARGO		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm
ESPESOR		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 5% ±0,5 mm	± 5% ±0,5 mm
RECTITUD DE LOS LADOS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
ORTOGONALIDAD		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm	± 0,5 % ±2,0mm
	Curvatura del lado	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm	± 0,5 % ±2,0mm
	Alabeo	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm	± 0,5 % ±2,0mm
DEFECTOS SUPERFICIALES		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Minimo 95% libre de defectos	Minimo 95% libre de defectos
ABSORCIÓN DE AGUA		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	6 % < E 10 %, Valor Individual.Máx. 11%	6 % < E 10 %, Valor Individual.Máx. 11%
RESISTENCIA A LA ROTURA POR FLEXIÓN		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Espesores ≥7,5 Mínimo 800 N	> 800 N
MÓDULO DE ROTURA		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mín. 18 N/mm2, Mín. individual 16 N/mm2	Mín. 18 N/mm2, Mín. individual 16 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL DE BALDOSAS ESMALTADAS A SER EMPLEADAS EN PISO		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe cumplimiento de la clase de abrasión	3
RESISTENCIA AL CUARTEO		NTC 4321 - 11 ISO 10545 - 11	Requerido	Resistente
RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO		NTC 4321 - 12 ISO 10545 - 12	Método de prueba disponible	No Aplica
RESISTENCIA AL MANCHADO		NTC 4321 - 14 ISO 10545 - 14	Mínimo clase 3	clase 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS		NTC 4321 - 13 ISO 10545 - 13	Resistencia a productos químicos domésticos y sales de piscina. Mínimo B	Clase A
			Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. El fabricante establece la clasificación	Clase B

COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	ANSI A 137.1		CLASE 2
DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN LA ESCALA DE MOHS.	UNE-EN 15771:2011		5



Apariencia Muy uniforme | Apariencia Uniforme | **Variación Ligera** | Variación Moderada | Variación Sustancial

Nota:

1 Para mayor información acerca de este producto, comuniquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 331 1531, nacional 018000914900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co
2 Para areas donde requiera mayor resistencia al deslizamiento, utilice productos con DCOF CLASE 2
3 El contenido de las cajas de este producto puede variar en diseño y tonalidad. Verifique e instale las baldosa en forma aleatoria.
4 Fabricado por ALFAGRES S.A En Colombia.
5 Calidad Primera
6 Superficie esmaltada.
7 Señor consumidor por favor revise cuidadosamente la identificación del material, el lote y la fecha de producción se encuentran en el empaque del producto en físico.
8 Consulte el manual de instalación y mantenimiento para su correcto uso¨"
9 Especificación según Norma ISO 13006 - NTC 919 (Norma Técnica Colombiana)

Información publicada en Mayo 2021- Versión 2

FICHA TÉCNICA


CÓDIGO SAP	225019955
NOMBRE DE LA REFERENCIA	MYSTIC BEIGE 30.5X60 -1
TAMAÑO NOMINAL(cm) NO MODULAR	30,5X60
GRUPO DE ABSORCIÓN	BIIb/ anexo K
USO	PISO/PARED
TRAFICO	COMERCIAL ALTO
ESPESOR FABRICACIÓN (mm)	8,4
m^2 POR CAJA	1,28
UNIDADES	7
CARAS - DISEÑOS	6
VARIACIÓN DE TONO SEGÚN NORMA ANSI A137-1-2017	V2



El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	ALFAGRES
ANCHO Y LARGO		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm
ESPESOR		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 5% ±0,5 mm	± 5% ±0,5 mm
RECTITUD DE LOS LADOS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
ORTOGONALIDAD		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm	± 0,5 % ±2,0mm
	Curvatura del lado	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm	± 0,5 % ±2,0mm
	Alabeo	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ±2,0mm	± 0,5 % ±2,0mm
DEFECTOS SUPERFICIALES		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Minimo 95% libre de defectos	Minimo 95% libre de defectos
ABSORCIÓN DE AGUA		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	6 % < E 10 %, Valor Individual.Máx. 11%	6 % < E 10 %, Valor Individual.Máx. 11%
RESISTENCIA A LA ROTURA POR FLEXIÓN		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Espesores ≥7,5 Mínimo 800 N	> 800 N
MÓDULO DE ROTURA		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mín. 18 N/mm2, Mín. individual 16 N/mm2	Mín. 18 N/mm2, Mín. individual 16 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL DE BALDOSAS ESMALTADAS A SER EMPLEADAS EN PISO		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe cumplimiento de la clase de abrasión	3
RESISTENCIA AL CUARTEO		NTC 4321 - 11 ISO 10545 - 11	Requerido	Resistente
RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO		NTC 4321 - 12 ISO 10545 - 12	Método de prueba disponible	No Aplica
RESISTENCIA AL MANCHADO		NTC 4321 - 14 ISO 10545 - 14	Mínimo clase 3	clase 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS		NTC 4321 - 13 ISO 10545 - 13	Resistencia a productos químicos domésticos y sales de piscina. Mínimo B	Clase A
			Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. El fabricante establece la clasificación	Clase B

COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	ANSI A 137.1		CLASE 2
DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN LA ESCALA DE MOHS.	UNE-EN 15771:2011		5



Apariencia Muy uniforme | Apariencia Uniforme | **Variación Ligera** | Variación Moderada | Variación Sustancial

Nota:

1 Para mayor información acerca de este producto, comuniquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 331 1531, nacional 018000914900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co
2 Para areas donde requiera mayor resistencia al deslizamiento, utilice productos con DCOF CLASE 2
3 El contenido de las cajas de este producto puede variar en diseño y tonalidad. Verifique e instale las baldosa en forma aleatoria.
4 Fabricado por ALFAGRES S.A En Colombia.
5 Calidad Primera
6 Superficie esmaltada.
7 Señor consumidor por favor revise cuidadosamente la identificación del material, el lote y la fecha de producción se encuentran en el empaque del producto en físico.
8 Consulte el manual de instalación y mantenimiento para su correcto uso¨"
9 Especificación según Norma ISO 13006 - NTC 919 (Norma Técnica Colombiana)

Información publicada en Mayo 2021- Versión 2

PISOS CORONA

Piso PORCELANATO REC Quarx Estr Gris MT

Referencia: 608602501
Formato: 60X60 cm
Color: GRIS\GRAY



TRÁFICO | TRAFFIC	Comercial General / General Commercial
ACABADO |FINISH	Mate / Matte
ASPECTO	MT / Multitono
M2 POR CAJA SQ FT APPROX	1,8 19,38
UNIDADES | PIECES	5
PESO BRUTO CAJA kg WEIGTH LB APPROX	33,3 73,41
ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	8,2 ± 0,3
CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET	60
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS	0

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

TRÁFICO COMERCIAL GENERAL
Pisos para uso en zonas comerciales e institucionales con un tráfico inferior a 5.000 personas diarias promedio. Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Importante: No usar para pisos de aeropuertos, terminales de transporte, industrias que utilizan maquinaria pesada, súper e hipermercados.
Precaución: A excepción de los productos Corona ARD® y ARD® PRO, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

La serie Quarx, inspirada en la estética natural de la cuarcita, exhibe una gama de tonos ocres, beige y crema en sus doce caras diferenciadas, creando un efecto de múltiples tonalidades. Su realismo y autenticidad se ven realzados por una sutil textura que recorre su superficie. Presentado en un formato de 60x60 cm y con un acabado mate, el piso de porcelanato rectificado Quarx Gris es especialmente adecuado para aplicaciones comerciales gracias a su resistencia excepcional a golpes, rayones, manchas y humedad.

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: Garantía de por vida/Lifetime warranty

Este producto cumple con las siguientes normas:
Norma Técnica Colombiana NTC - 919 Versión 2022 anexo K
Norma Técnica Internacional ISO 13006 Anexo K

Mayor información de garantía consulte www.corona.co/garantias

PORCELANATO®

Orchid Ceramics®

ADHESIÓN GARANTIZADA DE POR VIDA PARA REVESTIMIENTOS CORONA INSTALADOS CON PEGACOR® VÁLIDO SÓLO PARA COLOMBIA

corona

Piso PORCELANATO REC Quarx Estr Gris MT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		ENSAYO |TEST	ESPECIFICACIÓN SPECIFITACION NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS
ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm
PLANIRADIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	**Curvatura Central** Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.40% de la diagonal del tamaño de fabricación, hasta máximo 1,8 mm	(±) 0.40% de la diagonal del tamaño de fabricación, hasta máximo 1,8 mm
	Curvatura del lado Edge Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.40% de la diagonal del tamaño de fabricación, hasta máximo 1,8 mm	(±) 0.40% de la diagonal del tamaño de fabricación, hasta máximo 1,8 mm
	Ortogonalidad Warpage	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.40% de la diagonal del tamaño de fabricación, hasta máximo 1,8 mm	(±) 0.40% de la diagonal del tamaño de fabricación, hasta máximo 1,8 mm
DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Minimo 95% libre de defectos/ Minimun 95% without deffects	Minimo 95% libre de defectos/ Minimun 95% without deffects
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	0,5% > Ev ≥ 3%	0,5% > Ev ≥ 3%
RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGHT		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 1100 N / Minimum 1100 N	Mínimo 1200 N / Minimum 1200 N
MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 30 N/mm2 / Mínimum 30 N/mm2	Mínimo 30 N/mm2 / Mínimum 30 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe de cumplimiento de la clase de abrasión y los ciclos	Clase 4/ Class 4
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION		NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible	Clase 2 / Class 2
RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING		NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Mínimo clase 4 / Minimum class 4
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTACE TO CHEMICALS		NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13	Mínimo clase B / Mimimum B class	Mínimo Clase A / Mimimun A Class
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE		NTC 4321-2 - 9 NTC 4321 - 9	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase BA / Mimimum BA class
RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO FROST RESISTANCE		NTC 4321 - 12 ISO 10545 - 12	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Cumple/Complies

Descargar recomendaciones de uso en: https://corona.co/instructivos

Este producto es elaborado en Colombia, en el Parque Industrial de Sopó, Cundinamarca.

FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puede encontrarlo aquí: http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible

Colombia

PORCELANATO®

Orchid Ceramics®

ADHESIÓN GARANTIZADA DE POR VIDA PARA REVESTIMIENTOS CORONA INSTALADOS CON PEGACOR® VÁLIDO SÓLO PARA COLOMBIA

corona

LADRILLERA Santafé

FICHA TECNICA

ADOQUIN ESPAÑOL DE 8 CM - TRAFICO VEHICULAR PESADO



Isométrico



Aplicación




Aparejo Espina de Pez

Dimensiones en cm.


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones	**Largo**	**Ancho**	**Alto**
	20,0 cm	10,0 cm	8,0 cm
Tolerancia dimensional (Máximo)	± 4 mm	± 2 mm	± 1,6 mm
Color	**TERRACOTA (Según muestras)**	**El color varía dentro una gama similar a la que se observa en la foto de aplicación.**	
Textura	LAS DOS (2) CARAS PRINCIPALES (10X20CM) **RUGOSAS.** Las demás caras lisas		
Aplicación	Adoquinados (Pavimentos articulados) destinados a soportar **Tráfico Vehicular Pesado** *(Vehículos con 3 o más ejes de carga, ejes equivalentes mayores que 8,1 Ton. y volumen de tráfico por encima de 251 ejes equivalentes diarios).*		
Tipo - Aplicación	Tipo F - Aplicación PX	**Instalación: Aparejos recomendados**	
Peso / Unidad	**3,4 kg.**		
Peso / m2	170,0 Kg/m^2		
Rendimiento	**50 Un/m²** Instalado a tope		
Absorción de Agua (Máxima)			
Promedio 5 Unidades	6%		
Individual	7%		
Resistencia a la compresión (Mínima)			
Promedio 5 Unidades	69 MPa (10.000 PSI)		
Individual	61 MPa (8.800 PSI)		
Módulo de Rotura (Mínima)			
Promedio 5 Unidades	10 MPa (1.500 PSI)		
Individual	9 MPa (1.275 PSI)		
Indice de Abrasión	0,11		
Pérdida de volumen por Abrasión	1,7 cm^3/cm^2		
Normas Aplicadas	**ICONTEC**	**NTC 5282 y NTC 4017**	
	ASTM	**C 1272, C 67 y C 418**	

Espina de Pez a 90°



Espina de Pez a 45°



Recomendaciones de Almacenamiento:

Se recomienda que las piezas se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.

Recomendaciones de Instalación:

Las piezas se deben colocar sobre una base adecuada, asentadas bien sea sobre una capa de arena o sobre mortero, según la recomendación del diseñador. Se pueden disponer siguiendo los diferentes aparejos que se conocen: hilera, canasto, diagonal, espina de pez, etc. para el tráfico Peatonal y en espina de pez para el Tráfico Vehicular.

Durante la construcción del adoquinado se tendrá cuidado de no manchar las piezas con la ejecución de otras actividades de la obra. Esto facilitará la limpieza posterior.

Se recomienda seguir las indicaciones del manual de instalación de adoquines de Ladrillera Santafé (correcto manejo de las pendientes, los confinamientos y la calidad de las arenas de asiento del adoquín y de sello).

El buen desempeño del adoquinado depende del correcto diseño de la estructura (considera el tipo de terreno y el volumen de tráfico), la mano de obra y todo cuanto participe en la calidad final de sus componentes.

Recomendaciones de Limpieza:

Seguir las *Recomendaciones de Instalación,* lleva a que sea suficiente un lavado con agua y eventualmente cepillo, si es el caso.

Se podrá aplicar un fungicida que impida la proliferación de microorganismos entre las juntas de los adoquines.

	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Area Técnica Comercial **REVISO:** Area Comercial **FECHA**: Enero de 2.017			

VERSACRETE

FICHA TÉCNICA: MICROCEMENTO FINO

Preparación de superficies – *Componente A* (en polvo).

MICROCEMENTO FINO es el *componente A*. Es un recubrimiento de dos componentes, formulado con una base de cemento, áridos finos clasificados y tamizados, y aditivos.

Es un revestimiento para dar acabados suaves y decorativos con una textura fina. Está diseñado para ser aplicado sobre el MICROCEMENTO MEDIO de VERSACRETE, como parte de un sistema de revestimiento decorativo integral.

Debe ser mezclado previamente con la resina RESINOVA (*Componente B*) de VERSACRETE, manteniendo las proporciones indicadas, para garantizar las propiedades del recubrimiento.

Especificaciones

Ítem	**Microcemento Fino (COMPONENTE A)**
Aspecto	Polvo blanco Fino
Densidad (g/cm^3)	1.0054 ± 0.0301
Densidad compactada (g/cm^3)	1.4786 ± 0.0443
pH (10% p/p, 25 °C)	12.0 – 12.5
Tamaño máximo de árido (mm)	< 0.3
Estabilidad al almacenamiento	12 meses (en recipientes totalmente cerrados)

Rendimiento

El microcemento base tiene un rendimiento de 2.2 m^2/kg, sin embargo estos valores pueden variar dependiendo de la superficie, la textura deseada y la mano de obra del aplicador.

Propiedades

- Aplicable sobre cualquier tipo de soporte:
  - Hormigón
  - Mortero de cemento
  - Baldosa
  - Cerámica lisa
  - Metal
  - Panel de yeso (*drywall*)
  - MDF
- Gran resistencia a la abrasión (muy superior a la del hormigón convencional)
- Presenta aplicación continua sin el uso de juntas
- Aplicación sobre paredes

- Alta adherencia al soporte
- Alta resistencia mecánica
- No presenta retracción
- Transpirable (permeable al vapor de agua)
- Resistente al fuego
- Estable a la luz UV
- Refleja la radiación térmica
- Fácil y rápida aplicación
- Aséptico
- Antiestático
- Puede ser tinturado para dar diferentes tonalidades de color
- Alta facilidad de limpieza y mantenimiento

Preparación de superficie

Antes de aplicar el MICROCEMENTO FINO es necesario preparar la superficie de acuerdo a las condiciones del soporte de aplicación.

- El sustrato debe estar limpio, libre de grasas y aceites
- Hay que tener mucho cuidado con los sustratos que parecen estar limpios, pero que contienen ceras o siliconas

El MICROCEMENTO FINO está diseñado para ser aplicado sobre el MICROCEMENTO MEDIO.

El MICROCEMENTO FINO, por su granulometría pequeña, no está diseñado para la nivelación de superficies. La nivelación o alisado de las superficies, se consigue con la aplicación de dos manos de MICROCEMENTO BASE o MICROCEMENTO MEDIO y una lijada posterior, antes de la aplicación del MICROCEMENTO FINO.

Cuando se aplica el MICROCEMENTO FINO directamente sobre superficies lisas como panel de yeso (drywall), estuco, pinturas de tipo látex y en general sobre aquellos soportes en los que se desconfía de su estado, se recomienda utilizar un promotor de adherencia como el PRIMECRETE, para asegurar una excelente adherencia en todas las superficies.

Sobre la superficie de morteros, el PRIMECRETE permite una aplicación más suave del MICROCEMENTO FINO, evitando la deshidratación acelerada de este, la cual es ocasionada por la absorción de agua desde el mortero.

Es recomendable seguir siempre las instrucciones de nuestro personal técnico, antes de comenzar el proyecto.

Preparación del producto

MICROCEMENTO FINO está formulado en dos componentes:

- MICROCEMENTO FINO *Componente A* - en polvo
- RESINOVA *Componente B* - líquido

La relación de mezcla en peso es 2.5/1.0, y está dada por 2.5 partes de Componente A en peso (kg.), por 1 parte de Componente B en volumen (litros).

COMPONENTE A	**Cantidad**	***COMPONENTE B***	**Cantidad**
MICROCEMENTO FINO	20 kg	RESINOVA	8 L
MICROCEMENTO FINO	10 kg	RESINOVA	4 L
MICROCEMENTO FINO	5 kg	RESINOVA	2 L

Estos componentes se deben mezclar homogéneamente, de la siguiente manera:

1. Agregar una parte del *Componente A*, en un recipiente limpio
2. Verter lentamente una parte del *Componente B*, mientras se homogeneiza el producto con un agitador mecánico (helicoidal) a bajas revoluciones
3. Mezclar hasta homogeneizar completamente
4. Repetir pasos 1, 2 y 3 hasta usar todo el producto
5. Mezclar finalmente, durante al menos 2–3 minutos, hasta obtener una mezcla suave y sin grumos

Aplicación

Aplique una o dos manos del MICROCEMENTO FINO, dependiendo del tipo de acabado que se desea obtener, con la ayuda de una llana de acero inoxidable.

Si la superficie está en buen estado y completamente plana se puede aplicar directamente el microcemento. Si existen rebabas, grumos o ligeros desniveles, se recomienda lijar con un abrasivo adecuado, ya que el MICROCEMENTO FINO no está diseñado para nivelar la superficie. El número de papel de lija debe elegirse por el aplicador y depende del tipo de acabado requerido.

No se debe aplicar un espesor superior a 1 mm por mano.

El tiempo útil de trabajo de la mezcla es hasta de 6 horas en condiciones ambientales estándar de 20°C y 65% de humedad relativa.

Datos Técnicos

Componente A (Polvo)	MICROCEMENTO FINO
Componente B (Líquido)	RESINOVA
Relación de mezcla (kg/litro)	2.5 / 1.0 (*Componente A / Componente B)*
Espesor de película por mano (mm)	1
Espesor total de película (mm, 2 manos)	2
Tiempo de trabajo mezcla (horas, 20 °C)	< 6
Resistencia mecánica (28 días, compresión, kg/cm^2)	> 225
Adherencia al concreto (28 días, kg/cm^2)	> 15

Sellado

El MICROCEMENTO FINO debe recubrirse una vez endurecido, entre las 24 y 48 horas siguientes a su aplicación, según el tipo de sellador elegido.

Se recomienda el uso de SELLACRETE de VERSACRETE para aumentar la resistencia y belleza del revestimiento y prolongar su vida útil.
Se recomienda aplicar dos manos cruzadas.

Ver la Ficha Técnica del SELLACRETE para su uso y aplicación.

Limpieza de herramientas

Las herramientas deben lavarse con agua inmediatamente después de su uso.
Una vez endurecido el material, sólo se puede eliminar por medios mecánicos.

Seguridad

Este producto contiene cemento y arenas de sílice

- Se recomienda el uso de mascarilla de polvos y gafas protectoras de ojos
- Es un producto alcalino, por lo que se recomienda el uso de guantes plásticos
- En caso de contacto con la piel, enjuagar con agua limpia
- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia durante 10 minutos mínimo. Si la molestia persiste, consultar con un médico
- Se deben mantener bien cerrados los recipientes mientras no estén en uso
- Por favor consulte la hoja de seguridad del producto

Nota: Esta información se da como una orientación, sin garantía, ya que la aplicación, procesamiento y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control directo. Los datos consignados en este documento corresponden a nuestro conocimiento y están conformes con los resultados de las pruebas realizadas en nuestra planta. Por eso le sugerimos al cliente que efectúe sus propios ensayos para encontrar las condiciones más adecuadas de aplicación.

1. DESCRIPCIÓN

El Vinilo Fino Tipo 1 blanco y color es un producto a base de dispersión acuosa estable de un homopolímero o de un copolímero vinil acrílico con acabado mate y terso, diluible en agua, rendidor y buen secado.

Pintura base agua, tipo emulsión, de uso arquitectónico.
Cumple con la resolución 1154 del 22 de junio de 2016
Cumple con la NTC 1335

Contenido de VOC

- Vinilo fino Tipo 1 blanco 0 g/L
- Vinilo fino tipo 1 color ≤8 g/L

Acorde Norma SCAQMD Rule 1113 – Método EPA 24
Contenido de metales pesados Cr,Cd,Hg,Pb,As Blanco ≤ 15 ppm // Color ≤ 65 ppm

2. PROPIEDADES

- ✓ Diluible con agua.
- ✓ Alto poder cubriente
- ✓ Proporciona acabado mate.
- ✓ Buen secado y adherencia.
- ✓ Buen contenido de sólidos.
- ✓ Bajo salpique.
- ✓ Uso interior y exterior cubierto.
- ✓ Bajo olor.

3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Cumple con criterios de calidad establecidos por pinturas Tito Pabón, El Vinilo fino tipo 1 blanco y color cumple con los siguientes parámetros de calidad:

Parámetro de Calidad	Especificación Técnica	Instructivo
Brillo Especular 60° y 85°	≤ 10 mate	NTC 592-1
Viscosidad	Mínimo 125 KU	NTC 559 (ASTM D562)
Determinación de la finura de la dispersión (Unidades Hegman)	4+	NTC 557 (ASTM D1210)
Determinación del Poder de Cubrimiento, relación de contraste-opacidad	Blanco ≥96% y Colores Amarillo Rojo y mandarino ≥ 70 % Magenta Colores intensos ≥ 86%	NTC 4974
Determinación del volumen de material no volátil en recubrimientos claros o pigmentados	≥ 35%	NTC 1786 (ASTM D2697)
pH	8.5 – 9.5	N/A
Grado de Entizamiento	No Presenta	NTC 1457-6
Remoción de manchas (Lavabilidad)	≥ 80%	NTC 799
Resistencia a la Abrasión húmeda	≥ 400 Ciclos	NTC 966 (ASTM D2486)
Determinación del Cuarteamiento aplicando un alto espesor	No presenta	NTC 5032
Determinación de los tiempos de secamiento	≤ 4 Horas	NTC 598 (ASTM D1640)
Determinación del efecto de la sustancias	No presenta cambios notorios	NTC 1114 (ASTM D1308)

químicas domésticas		
Estabilidad al almacenamiento	No presenta cambios (grumos, gel)	NTC 6108
Solvente	Agua	N/A
Fecha de vencimiento	24 meses posterior a la fecha de fabricación	N/A

4. USOS

El Vinilo Fino Tipo 1 es ideal para decorar y proteger superficies interiores y exteriores cubierto como: estuco, cemento, concreto, yeso y madera.

5. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas. Antes de pintar resane con cemento y arena las grietas y otros defectos que puedan afectar el acabado. Los acabados deteriorados como cales, carburos y humedades se deben eliminar completamente.
Sobre las superficies muy alcalinas (en pH>10) es recomendable neutralizar con una solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua, dejar actuar 10 minutos, frotar con cepillo de cerdas duras, enjuagar con abundante agua y dejar secar.
Las superficies en buen estado se deben limpiar con una escoba en seco retirando residuos ligeros.

NOTA: Durante el secado del producto se debe asegurar una buena Ventilación.

6. PREPARACIÓN Y DILUCIÓN

Agite muy bien el producto con una espátula limpia hasta lograr uniformidad completa. Diluya únicamente la cantidad a aplicar de acuerdo a los siguientes parámetros:

Dilución para	Preparación	N° de	Tiempo de

acabado con:	Vinilo Fino Tipo 1 blanco y Colores	Agua	manos	secado
Brocha o Rodillo	1 Galón	1° Mano: 10% -15% 2° Mano: 5% - 10%	Mínimo 2 Manos	Deje transcurrir 1 hora de secado para aplicar la segunda mano.
Pistola Convencional	1 Galón	20% - 25%		
Pistola Airless	1 Galón	7% - 10%		

Nota: Después de uso lave los equipos de aplicación con agua sin dejar secar la pintura. Tener en cuenta en el lavado de los equipos de aplicación el uso responsable del agua.

Después de diluida la pintura con agua se debe utilizar en el menor tiempo posible para evitar proliferación de microrganismos y mal olor.

7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de evitar evaporaciones. Dejar reposar el envase preferiblemente sobre una plataforma de madera. Almacenar bajo techo a temperatura entre 4°C y 35°C por periodo no superior a 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

8. RENDIMIENTO

Rendimientos Aproximados:	
En obra nueva sobre revoque	8 a 10 m² por galón a una mano
En repinte sobre color diferente	20 a 25 m² por galón a una mano.
En repinte sobre color igual o similar	30 a 35 m² por galón a una mano.

Nota: Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de la pintura durante la mezcla y aplicación.

9. SEGURIDAD

Evite todo contacto con la piel o los ojos usando equipos de seguridad adecuados, se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto, Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de salpicadura del producto en los ojos, lavar con agua corriente mínimo por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón de tocador, en caso de ingestión no administrar ninguna sustancia, no inducir al vómito y buscar asesoría médica. En caso de escape o derrame recoja el producto con material absorbente (arena) para evitar la contaminación en fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.

10. PRESENTACIÓN

Presentación Vinilo fino tipo 1 blanco y color	
Tambor	189.25 Litros
Cuñete	18.925 Litros
Balde	9.462 Litros
Galón	3.785 Litros
Bolsa PACXPERT GALON	3.785 Litros
Cuarto	0.946 Litros

El no seguir las instrucciones de aplicación exime a pinturas Tito Pabón de todas las responsabilidades sobre el producto en condiciones de almacenamiento y aplicación recomendadas, debe conservar su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumplir con los objetivos para los cuales fue elaborado.

Estas especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Producto Fabricado en Colombia por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.
Distribuido por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.
Comercializado por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.
PUNTO DE VENTA

Carrera 27 N°78-44
PLANTA DE FABRICACIÓN
Autopista Medellín Vereda La Punta Kilómetro 6 + 300 metros Parque industrial Siberia
Etapa 3, Tenjo Cundinamarca, Colombia
Servicio al cliente:
Tel: (571)6606631
Cel: (571) 3102768579
Para mayor información del producto Fichas técnicas/Hojas De Seguridad consulte:
www.pinturastitopabon.com / info@pinturastitopabon.com

Versión	Fecha	Descripción de modificación	Revisión	Aprobación
03	27/02/2014	Actualización de la información del producto (adición de más ítems y complemento del rombo NFPA 704)	Coordinador I+D+I	Gerencia General
04	03/04/2019	Modificación de criterios de aceptación, contenido de VOC y metales pesados	Coordinador I+D+I	Gerencia General
05	23/04/2019	Modificación de encabezado y codificación debido a unificación de códigos en el procedimiento.	Coordinador I+D+I	Gerencia General
06	12/07/2019	Eliminación de rombo NFPA	Coordinador I+D+I	Gerencia General
07	27/02/2020	Cambio de 10 a 17 ppm de contenido de metales pesados y VOC de blancos de 35g/L a 0 y color de 30g/L a 10g/L	Coordinador I+D+I	Gerencia General

08	27/05/2020	Cambio de 17 ppm de contenido de metales pesados a Contenido de metales pesados Blanco ≤ 15 ppm // Color ≤ 65 ppm y VOC de blancos de 35g/L a 0 y color de 10g/L a 8g/L	Coordinador I+D+I	Gerencia General
09	09/11/2020	Cambio de incluir empaqué bolsa PACXPERT GALON TRANSPARENTE	Coordinador I+D+I	Gerencia General



Teja Villa

Es una teja de barro 100% natural, prensada y cocida a 1000 °C lo que aumenta su resistencia. Se fabrica en medidas de 24.50 x 40.20 cm, es ligera, con solo 2 kilos por pieza. Gracias a su material son amigables con el medio ambiente.

Colores





Café*





Terracota*

Accesorios




Remate



Cumbrera



Lateral



Dos vías



Tres vías



Cuatro vías

*Disponible bajo pedido

Teja Villa

Video de instalación

Guía de instalación

Materiales y Herramientas

- Cuchara de albañil
- Hilo
- Flexómetro
- Pulidor
- Taladro
- Tejas
- Alambre galvanizado calibre 16
- Pijas de 2”
- Goterón de lámina galvanizada calibre 24
- Cemento





Preparación previa

a) Nivelación; nivele con mortero la superficie donde se va a colocar la teja, enrasando a nivel del hilo.

b) Goterón de lámina; instale el goterón de lámina galvanizada calibre No. 24, con el objeto de evitar manchas en la moldura de la losa.

c) Impermeabilización; impermeabilice toda la losa incluyendo la lámina galvanizada.









Instalación

2. Mortero Nivelador; la primera teja en el límite inferior de la losa requiere del mortero nivelador. Aplique el mortero en toda la orilla de la losa. Si se instala con el accesorio “Tapa pájaros” no es necesario nivelar con mortero.

3. Hilo Nivelador; instale el hilo nivelador desde el parteaguas hasta el límite inferior de la losa para tener una referencia y poder alinear las tejas en sentido longitudinal.

4. Secuencia de Instalación; la teja se instala de derecha a izquierda. Inicie instalando la primera columna vertical de la parte más baja a la más alta de la losa. La teja se fija con alambre galvanizado calibre 16 o clavo de 2”.

5. Coloque la primera teja en la esquina inferior derecha del área a instalar. Continuar hasta completar la primera columna en su totalidad y repetir en las columnas siguientes.





6. Para garantizar una correcta instalación haga coincidir el interlocking de cada pieza tanto en sentido horizontal como vertical.

7. El hilado de la teja se realiza por columnas verticales y se avanza sujetando entre si cada 3 piezas y se sujetan a la losa mediante un clavo para concreto o taquete y tornillo.

8. Cubra la totalidad del área e instale los accesorios necesarios.

Recomendaciones

Recomendamos la instalación de la teja con mínimo 25° de inclinación para mejor lucimiento de la misma. Los cortes que se requieran deben de hacerse en la obra con cortadora de disco. Una teja bien instalada nunca requerirá de mantenimiento, pero debe seguir las siguientes observaciones:

En el tejado evite instalaciones de antenas, domos, climas, etc. ya que el mantenimiento de las mismas daña las tejas. Es recomendable hacer esas instalaciones en muros, suelo o con preparaciones especiales para evitar filtraciones de agua.

Evite caminar sobre la teja, ya que podrían provocarse fracturas o deslizamientos que afectarían la instalación.

Se recomienda usar alambre y no mortero para la fijación de la teja, en caso de usar mortero en la instalación de los accesorios como cumbrera y laterales evite manchar la teja para conservar su apariencia y evitar trabajos de limpieza posteriores.

Al seguir estas recomendaciones su teja lucirá una mejor apariencia.

Datos técnicos

Dimensiones *(cm)*	***Teja Villa***
Ancho	24.50
Alto	40.20
Espesor	1.20
Piezas por m²	13.80
Peso nominal *(kg)*	2.00
Peso por m² *(kg)*	29.11
Absorción de agua *(%)*	<13
Índice de reflectancia solar	52
Empaque *(piezas/tarima)*	304

Producto certificado:
Barro Natural

ESTE PRODUCTO PUEDE APLICAR PARA SUMAR PUNTOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS LEED

Sustainable Sites	
Heat Island effect -non roof-	**Crédito 7.1**
Heat Island effect -roof-	**Crédito 7.2**
Energy and Atmosphere	
Minimum energy performance	**Pre-requisito 2**
Optimize energy performance	**Crédito 1**
Materials and Resources	
Building reuse	**Crédito 1**
Construction waste managements	**Crédito 2**
Materials reuse	**Crédito 3**
Regional materials: manufactured regionally	**Crédito 5.1**
Regional materials: extracted regionally	**Crédito 5.2**

Ladrillera Mecanizada

ladrilleramecanizada.com

Ficha Técnica. Versión 1. Junio 2019.

ARENA PARA PAÑETE



ARGOS

CONÓCELA:

Agregado fino de tamaño máximo N°8 (2,36mm), el cual permite aplicación ideal para morteros.

APLÍCALO EN:

Elaboración de mortero de pañete para acabado sobre las superficies de mampostería y concreto.

ENTÉRATE DE LOS BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Alternativas para la producción y procesos de colocación de morteros.

Rangos de especificación parametrizados que permiten control, optimización de los procesos productivos y poca variabilidad en el comportamiento del producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICA	NORMA DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN ACORDADA	
		LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR
DENSIDAD APARENTE (kg/m³)	NTC 237	2300	2650
MASA UNITARIA SUELTA (kg/m³)	NTC 92	1200	1750
MÓDULO DE FINURA	NTC 77	1,1	2,9
ABSORCIÓN (%)	NTC 237	0	2,0
MATERIAL QUE PASA TAMIZ #200 (%)	NTC 78 E-214	0	6,0
MATERIA ORGÁNICA (ESCALA COLORIMÉTRICA DE GARDNER)	NTC 127	0	3
EQUIVALENTE DE ARENA	INV E-133	60	-

NOTA: Estos valores corresponden a un análisis estadístico del comportamiento histórico del material medido en laboratorio y registrado en una base de datos los cuales son revisados bajo la normativa aplicable vigente.

PRESENTACIÓN:

- Disponible en sacos de 40 kg.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda usar exclusivamente para elaboración de mortero de pañete.
- Adicionar los demás componentes del mortero en las proporciones establecidas en el diseño de mezcla.
- Se recomienda seguir lo estipulado en la normatividad vigente para mezclas de mortero (NTC).
- Evitar que el material permanezca mucho tiempo almacenado ya que los factores climáticos pueden alterar sus condiciones.
- Almacenar el material en un lugar cubierto para que no sea afectado por lluvias u otros agentes externos, o en su defecto cubrir con algún elemento protector.
- Los sacos deben almacenarse teniendo cuidado de que no se contaminen con ningún otro material y que no tengan riesgo de ser pisados por maquinaria pesada.

MÁS VALOR PARA TI CON AGREGADOS ARGOS:

Materias primas extraídas y procesadas con los más altos estándares de calidad.	Implementación de las mejores prácticas ambientales y de minería responsable.

CONTÁCTANOS:

- Si deseas más información acerca de este producto o realizar una solicitud de pedido contáctate con la **Línea de Servicio 01 8000 527 467**, marcando desde tu celular **#250 - Opción 5** o escribiendo al correo **agregados@argos.com.co**



ARGOS

Ficha Técnica

MALLAS ELECTROSOLDADA



Normatividad

NTC 5806, ASTM 1064 Resolución 1019:2024

Aplicaciones

Refuerzo de acero en forma de panel, formados por alambres de aceros grafilados longitudinales y transversales, electrosoldados en todos los puntos de encuentro. Proporcionan refuerzo estructural necesario en: losas de concreto, losas de cimentación, entrepisos, pavimentos rígidos, bóvedas, túneles, canales, muros divisorios, etc.

Característica Dimensionales y Presentación

Mallas Electrosoldadas											
Designación	Referencia	No. de barras por malla		Diámetro		Separación		Longitud pelos		Peso (Kg)	Cuantía principal Nominal
		Long.(6m)	Transv.(2.35m)	Long.(mm)	Transv.(mm)	Long.(mm)	Transv.(mm)	Long.(mm)	Transv.(mm)		cm² /m-lineal
Mallas electrosoldadas Diaco con refuerzo principal en dos direcciones (Panel 6,00 x 2,35m)											
XX-050	M-050	10	24	4,0	4,0	250	250	125	50	11,5	0,50
XX-063	M-063	12	30	4,0	4,0	200	200	100	75	14,1	0,63
XX-084	M-084	16	40	4,0	4,0	150	150	75	50	18,8	0,84
XX-106	M-106	16	40	4,5	4,5	150	150	75	50	23,8	1,06
XX-131	M-131	16	40	5,0	5,0	150	150	75	50	29,3	1,31
XX-158	M-158	16	40	5,5	5,5	150	150	75	50	35,5	1,58
XX-188	M-188	16	40	6,0	6,0	150	150	75	50	42,2	1,88
XX-221	M-221	16	40	6,5	6,5	150	150	75	50	49,6	2,21
XX-257	M-257	16	40	7,0	7,0	150	150	75	50	57,4	2,57
XX-295	M-295	16	40	7,5	7,5	150	150	75	50	65,9	2,95
XX-335	M-335	16	40	8,0	8,0	150	150	75	50	75,1	3,35
XX-378	M-378	16	40	8,5	8,5	150	150	75	50	84,7	3,78
Mallas electrosoldadas Diaco con refuerzo principal en una dirección (Panel 6,00 x 2,35m)											
XY-084	H-084	16	24	4,0	4,0	150	250	125	50	15,1	0,84
XY-106	H-106	16	24	4,5	4,0	150	250	125	50	17,6	1,06
XY-131	H-131	16	24	5,0	4,0	150	250	125	50	20,4	1,31
XY-158	H-158	16	24	5,5	4,0	150	250	125	50	23,5	1,58
XY-221	H-221	16	24	6,5	4,0	150	250	125	50	30,6	2,21
XY-257	H-257	16	24	7,0	5,0	150	250	125	50	37,7	2,57
XY-335	H-335	16	24	8,0	5,0	150	250	125	50	46,6	3,35
XY-378	H-378	16	24	8,5	5,0	150	250	125	50	51,5	3,78

Propiedades Mecánicas

Propiedades Mecánicas		NTC 5806
Resistencia a la tracción	Min	550 MPa
Resistencia a la fluencia	Max	485 Mpa
Esfuerzo cortante a la soldadura (Min)	grafil < 5,5 mm	0,26 x Área de Grafil
	grafil ≥ 5,5 mm	241 N x Área de Grafil

Marcación Producto

Los grafiles poseen marcación en alto relieve de acuerdo con la Norma NTC 5806, incluyendo nombre y número de designación.



Reportes de Ensayos

El reporte de ensayos se emite para cada lote despachado e incluye los resultados de composición química, propiedades mecánicas y de doblado, masa y dimensiones de los resaltes.

Etiqueta de Identificación

La etiqueta de identificación para malla electrosoldada contiene la siguiente información:

-Nombre del fabricante
-Norma Técnica
-Medida (designación-diámetro nomina
-Número de Colada o Lote
- Longitud
-Número del paquete
-Unidades por Paquete
-Fecha de fabricación
- Peso
-Sello Norma de Calidad NTC 5806



Recomendaciones de medio ambiente, calidad, salud y seguridad

Medio Ambiente	· Los residuos metálicos (despuntes, ganchos, amarres) deben disponerse como material ferroso (reciclable). · La etiqueta se debe destruir y disponer como material reciclable.
Calidad	· Mantener la etiqueta de identificación hasta que se realice la comercialización o el uso del último ángulo del paquete. · La oxidación en el acero no debe ser motivo de rechazo, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la norma. · Ubicar el acero burros o soportes elevados preferiblemente cubiertos y ventilados. Evitar almacenarlo en zonas de alta humedad. · Evitar que el acero esté expuesto al contacto con aceites, químicos, pinturas o ACPM.

Salud y seguridad	· Manipule el material metálico con guantes para evitar riesgos de cortadura. · No supere la carga de 25 kg por persona para prevenir riesgos ergonómicos. · Los paquetes de mallas deben manejarse y manipularse con el equipo apropiado (puentes, grúas, eslingas y cables certificados para el izaje de los paquetes). · Las pilas de productos deben conformarse de forma segura, garantizando estabilidad sin presentar riesgos de volcamiento. · No debe izarse los atados o paquetes de productos tomando como apoyo los amarres de fijación.

Qué hacer en caso de reclamación por faltante o calidad del Producto

· En caso de faltante, se debe realizar el registro en la remisión que se lleva el conductor, incluyendo la firma de la persona que recibe el producto.

· En caso de reclamo por calidad del producto, Informar al Asesor Comercial y a Asistencia Técnica.

· En cualquier caso, se debe enviar un correo a miexperiencia@diaco.com.co, adjuntando remisión, etiquetas y la información que considere relevante para realizar análisis de cada caso.

Gerfor
Tubosistemas



Ficha Técnica Tubería Presión Extremo Liso

Tuberías y Accesorios en PVC
Presión Extrema Liso

Aspectos generales

Las tuberías y accesorios de presión extremo liso fabricadas por ***P.V.C. GERFOR S.A.*** cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución ***número 1166 del 20 de Junio de 2006***, por la ***cual se expide el Reglamento Técnico que señala los requisitos técnicos que deben cumplir los tubos de acueducto, alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias y sus accesorios que adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, la Resolución número 1127 de 2007, por la cual se modifican algunas disposiciones de la Resoluci6n 1166 del 20 de Junio de 2006; y la Resoluci6n 2115 del 22 de Junio del 2007, en su artículo 5' "Características químicas de sustancias que tienen reconocido efecto adverso en la salud humana"*** Todas emanadas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, lo cual se evidencia mediante el certificado de conformidad expedido por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC como organismo de certificación acreditado.

Igualmente, las tuberías presi6n extremo liso fabricadas por ***P.V.C. GERFOR S.A.*** cumplen con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana ***NTC 382 (Antecedente ASTM D 2241) - PLÁSTICOS. TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN (SERIE RDE), y los accesorios presi6n extremo liso cumplen con los requisitos establecidos en la Norma T6cnica Colombiana NTC 1339 (Antecedente ASTM D 2466) -PLÁSTICOS. ACCESORIO DE POLI (CLORURO DE VINILO)*** (PVC) SCHEDULE 40, lo cual se evidencia mediante las certificaciones de producto expedidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC.

Contenido

Descripción del producto.....04
Descripción de juntas y accesorios.....12
Manejo.....14
Almacenamiento.....15
Transporte.....16
Instalación.....17
Recomendaciones cemento solvente y limpiador.....22
Comportamiento hidráulico.....23
Mantenimiento preventivo y correctivo.....25
Rotulado.....26
Índice te tablas.....27

Tipo de material.

El compuesto a partir del cual las tuberías y accesorios presión con campana son fabricadas por ***P.V.C. GERFOR S.A.,*** consiste substancialmente de ***poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido.***

Los elementos, compuestos químicos y mezclas de compuestos químicos que ***P.V.C. GERFOR S.A.*** está controlando a lo largo del proceso productivo, por ser nocivas para la salud, de acuerdo con el Decreto ***2115 del 2007, están*** en la Tabla No.1.

Tabla 1		
Características de reconocido efectivo adverso en la salud humana		
Elementos, compuestos químicos y mezclas de compuestos químicos diferentes a plaguicidas y otras sustancias.	*Expresados como*	*Valor máximo estable (mg/l)*
Antimonio	Sb	0,020
Arsénico	As	0,010
Bario	Ba	0,700
Cadmio	Cd	0,003
Cianuro libre y disociable	CN-	0,050
Cobre	Cu	1,000
Cromo total	Cr	0,050
Mercurio	Hg	0,001
Níquel	Ni	0,020
Plomo	Pb	0,010
Selenio	Se	0,010
Trihalometanos Totales	THMs	0,200
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)	HAP	0,010

Dimensiones (diámetro nominal, diámetro externo, espesor de pared)

Tubería

Longitud: 6 metros, para todas la presentaciones, ver la Tabla No. 2.


Tabla N° 2


Espesores de pared y tolerancias, para los tubos plásticos de PVC con diámetros exteriores IPS


Tamaño Nominal del tubo, pulgadas	Diámetro exterior nominal mm	Tolerancias del diámetro en mm (pulgadas)	Espesor de Pared, mm													
			RDE41		RDE32.5		RDE26		RDE21		RDE13.5		RDE11		RDE9	
			Mín	Tol	Mín	Tol	Mín	Tol	Mín	Tol	Mía	Tol	Mín	Tol	Mín	Tol
1/2	21	+0,10 (0,004)									1,57	+0,51	1,93	+0,51	2,36	+0,51
3/4	26	+0,10 (0,004)							1,52	+0,51	1,98	+0,51	2,41	+0,51	2,97	+0,51
1	33	+0,13 (0,005)					1,52	+0,51	1,60	+0,51	2,46	+0,51	3,05	+0,51	3,71	+0,51
1 1/4	42	+0,13 (0,005)			1,52	+0,51	1,63	+0,51	2,01	+0,51	3,12	+0,51	3,84	+0,51	4,67	+0,51
1 1/2	48	+0,15 (0,006)			1,52	+0,51	1,85	+0,51	2,29	+0,51	3,58	+0,51	4,39	+0,51	5,36	+0,51
2	60	+0,15 (Q006)	1,52	+0,51	1,85	+0,51	2,31	+0,51	2,87	+0,51	4,47	+0,51	5,48	+0,51	6,70	+0,80
2 1/2	73	+0,18 (0,007)	1,78	+0,51	2,24	+0,51	2,79	+0,51	3,48	+0,51	5,41	+0,66	6,64	+0,80	8,11	+0,97
3	88	+0,20(0,008)	2.16	+0,51	2,74	+0,51	3,43	+0,51	4,24	+0,51	6,58	+0,79	8,08	+0,97	9,88	+1,19
4	114	+0,23 (0,009)	2,79	+0,51	3,51	+0,51	4,39	+0,51	5,44	+0,66	8,46	+1,02	10,39	+1,02	12,70	+1,52

Tabla N° 3

Dimensiones de la campana cónica y tolerancias para accesorios schedule 40








Tamaño Nominal	Diámetro Externo nominal	A Diámetro de entrada		B Diámetro en el fondo		C Longitud mínima de campana mm	Diámetro IV (máximo) para accesorios rosca macho mm	Diámetro D (máximo) para accesorios rosca macho mm	M Diámetro externo mínimo mm	Espesor mínimo de pared en mm		Entrada mínima	
Pulgadas	mm	Diámetro mm	Tolerancia mm	Diámetro mm	Tolerancia mm					E	F	Ew(3)	EX, EZ(3)
y;	21	21,54	±0,10	21,23	±0,10	17,48	13,98	13,87	25,35	2,77	3,45	1/32	1/32
3/4	26	26,87	±0,10	26,57	±0,10	18,26	18,95	18,85	31,01	2,87	3,58	1/32	1/32
1	33	33,66	± 0,13	33,27	± 0,13	22,23	24,43	24,31	38,20	3,38	4,22	1/16	1/16
1 1/4	42	42,42	± 0,13	42,04	± 0,13	23,83	32,59	32,46	47,52	3,56	4,45	1/16	1/16
1 1/2	48	48,56	± 0,15	48,11	± 0,15	27,79	38,25	38,10	54,03	3,68	4,60	1/16	1/16
2	60	60,63	± 0,15	60,17	± 0,15	29,36	49,39	49,25	66,90	3,91	4,90	1/16	1/16
2 1/2	73	73,38	± 0,18	72,85	± 0,18	44,45	59,18	59,00	80,52	5,16	6,45	3/32	1/8
3	88	89,31	± 0,20	88,70	± 0,20	50,80	73,86	73,66	97,56	5,49	6,86	3/32	1/8
4	114	114,76	± 0,23	114,07	± 0,23		97,41	97,18	124,63	6,02	7,52	3/32	1/8

Tabla N° 4

Dimensiones de los bujes de reducción, accesorios tipo campana de PVC Schelude 40A,B

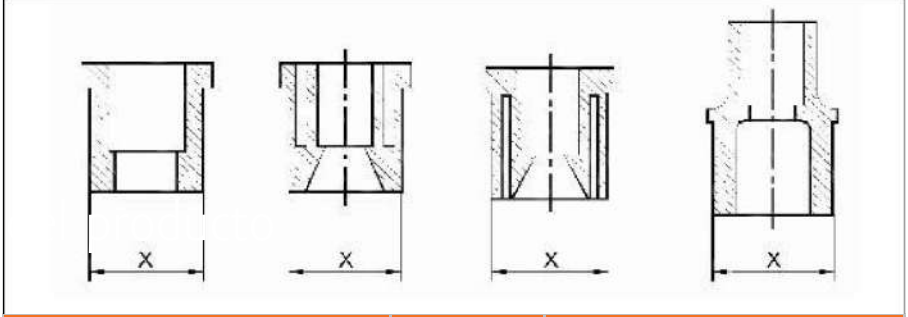

Tamaño nominal		Diámetro exterior, X Promedio	Tolerancia en el diámetro exterior (incluye ovalamiento)
mm	pulgadas	mm	mm
21 por 17	1/2 por 3/8	21,34	± 0,20
26 por 14	3/4 por 1/4	26,67	± 0,25
26 por 17	3/4 por 3/8	26,67	± 0,25
26 por 21	3/4 por 1/2	26,67	± 0,25
33 por 21	1 por 1/2	33,40	± 0,25
33 por 26	1 por 3/4	33,40	± 0,25
42 por 21	1 1/4 por 1/2	42,16	± 0,30
42 por 26	1 1/4 por 3/4	42,16	± 0,30
42 por 33	1 1/4 por 1	42,16	± 0,30
48 por 21	1 1/2 por 1/2	48,26	± 0,30
48 por 26	1 1/2 por 3/4	48,26	± 0,30
48 por 33	11/2 por 1	48,26	± 0,30
48 por 42	1 1/2 por 1 1/4	48,26	± 0,30
60 por 21	2 por 1/2	60,33	± 0,30
60 por 26	2 por 3/4	60,33	± 0,30
60 por 33	2 por 1	60,33	± 0,30
60 por 42	2 por 1 1/4	60,33	± 0,30
60 por 48	2 por 1 1/2	60,33	± 0,30
73 por 60	2 1/2 por 2	73,03	± 0,38
88 por 60	3 por 2	88,90	± 0,38
88 por 73	3 por 2 1/2	88,90	± 0,38
114 por 60	4 por 2	114,30	± 0,38
114 por 73	4 por 2 1/2	114,30	± 0,38
114 por 88	4 por 3	114,30	± 0,38

Presiones de trabajo

Tabla Nº 5 Relaciones dimensionales estándar para tubos termoplásticos (RDE) y presiones de trabajo de agua (PT) a 23 °C (73 °F) para tubos de plástico de PVC no roscados			
RDE	Presiones de trabajo de materiales para tubos de PVC PVC 1120 PVC 1220 PVC 2120		
	Psi	Mpa	bar
9	500	3,50	35,0
11	400	2,80	28,0
13,5	315	2,17	21,7
21	200	1,38	13,8
26	160	1,10	11,0
32,5	125	0,86	8,6
41	100	0,69	6,9

Accesorios

Los accesorios presión extremo liso fabricados por ***P.V.C. GERFOR*** S.A., son Schedule 40. Esta es un sistema de identiffcación del calibre de los tubos y/o accesorios (diámetro exterior y espesor de pared) originado en la industria de tubería de hierro.

Las presiones de trabajo para los accesorios Schedule 40 se encuentran en la tabla No.6.

Tabla Nº 6 *Presiones máximas de trabajo para accesorios Schedule 40*	
Diámetro Nominal	*Máxima presión de trabajo a 23°C (PSI)*
1/2"	600
3/4"	480
1"	450
1 1/4"	370
1 1/2"	330
2"	280
2 1/2"	300
3"	260
4"	220

Comportamiento frente a condiciones extremas

Presiones de trabajo

Son aquellas condiciones a las cuales pueden llegar a ser sometidas las tuberías y accesorios y que pueden afectar la funcionalidad de los mismos, debido a que sobrepasan los valores máximos de trabajo para los cuales han sido fabricados, tales como:

Altas temperaturas del fluido:

La temperatura de trabajo para las tuberías y accesorios presión con campana fabricadas por ***P.V.C. GERFOR S.A.*** es de 23 °C, para su uso con temperaturas mayores a las indicadas, favor comunicarse con el departamento de Asistencia Técnica

Exposición del producto a temperaturas bajo cero:

El comportamiento de tuberías y accesorios presión con campana fabricados por ***P.V.C. GERFOR S.A.*** a temperaturas bajo cero se fundamenta en la disminución de su resistencia a impactos debido a la cristalización de las mismas. Adicionalmente las características físicas del fluido a transporta se modifican por lo cual debe consultar con el departamento de Asistencia Técnica antes de realizar la instalación.

Exposición del producto a altas temperaturas externas:

Las tuberías y accesorios presión con campana fabricados por ***P.V.C. GERFOR S.A.*** son productos plásticos, por lo cual la exposición a altas temperaturas externas puede afectar sus características de funcionalidad. En el caso en el que sean instaladas en condiciones de temperatura por encima del ambiente, contacte al departamento de asistencia técnica. La separación entre diferentes sistemas (agua fría – agua caliente, agua fría - sanitaria, etc.) se encuentra en la norma NTC 1500 "Código Colombiano de fontanería"

Exposición de los productos a los rayos U.V.

Las tuberías y accesorios presión con campana fabricadas por ***P.V.C. GERFOR S.A.*** no deben ser instaladas a la intemperie ya que los agentes ultravioleta debilitan las paredes de la misma disminuyendo los valores de resistencia al impacto y a la presión hidrostática. En el caso de realizar instalaciones de dichos productos a la intemperie favor consultar con el departamento de Asistencia Técnica.

Flexión:

La flexión del sistema puede generar cambios en la sección trasversal de la tubería, originando presiones por encima del diseño. Esta condición se puede controlar mediante la adecuada instalación de soportería.

Vida útil


Para estimar la vida útil de las tuberías de ***PVC GERFOR*** utilice el método de ensayo establecido en la norma NTC 3257 DETERMINACIÓN DE LA BASE DE DISEÑO HIDROSTÁTICO (HDB) PARA TUBERÍAS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO, el cual es idéntico a su antecedente ASTM 02837 Standard Test Method for Obtaining Hydrostatic Design Basis for Thermoplastic Pipe Materials.

Este método está basado en la resistencia hidrostática a largo plazo del material (LTHS), la cual se determina mediante el análisis de los datos de ensayos "Esfuerzo vs tiempo de rotura" que se derivan de ensayos de presión sostenida de tubería fabricada con resina de PVC.


Los datos son analizados por regresión lineal para obtener la ecuación de una línea recta del logaritmo del esfuerzo contra el logaritmo del tiempo de falla y extrapolando el valor del LTHS a las 100.000 horas (11,57 años).

Resistencia hidrostática a largo plazo (LTHS): Esfuerzo de tensión estimado en la pared del tubo en sentido circular que aplicado continuamente causará falla de la tubería a 100.000 horas. Este valor es dado por la intersección de la recta de regresión del esfuerzo con la coordenada de 100.000 horas.

Gráfica Nº 1
Esfuerzo hidrostático a argo plazo vs. Tiempo

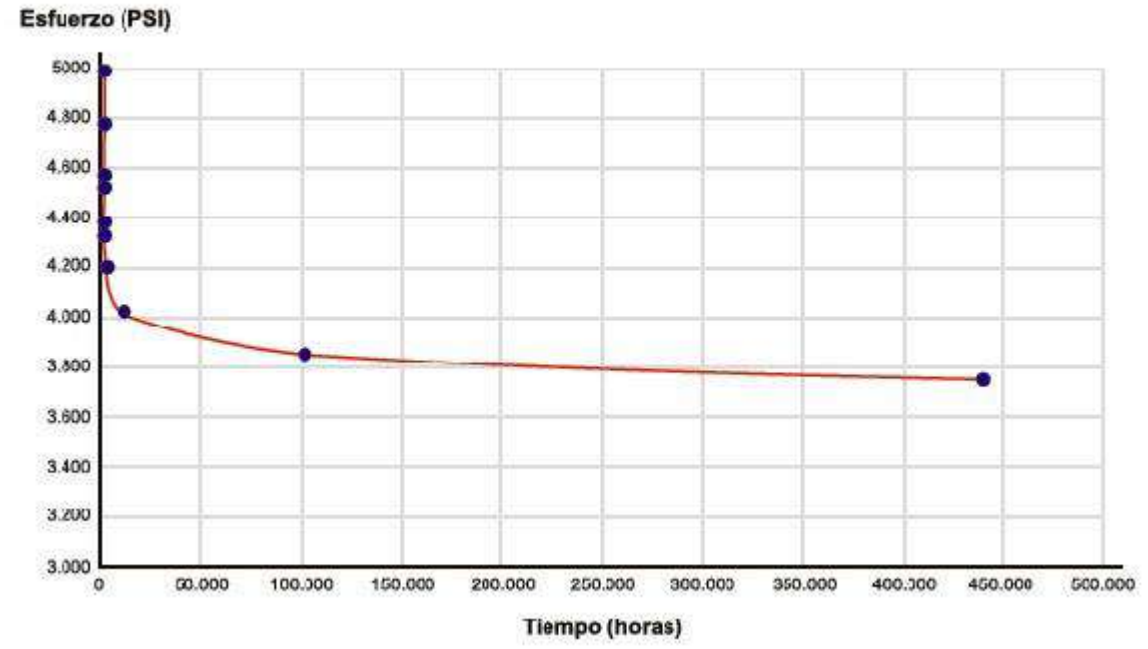

Gráfica Nº 2
Logaritno y esfuerzo hidrostático a largo plazo

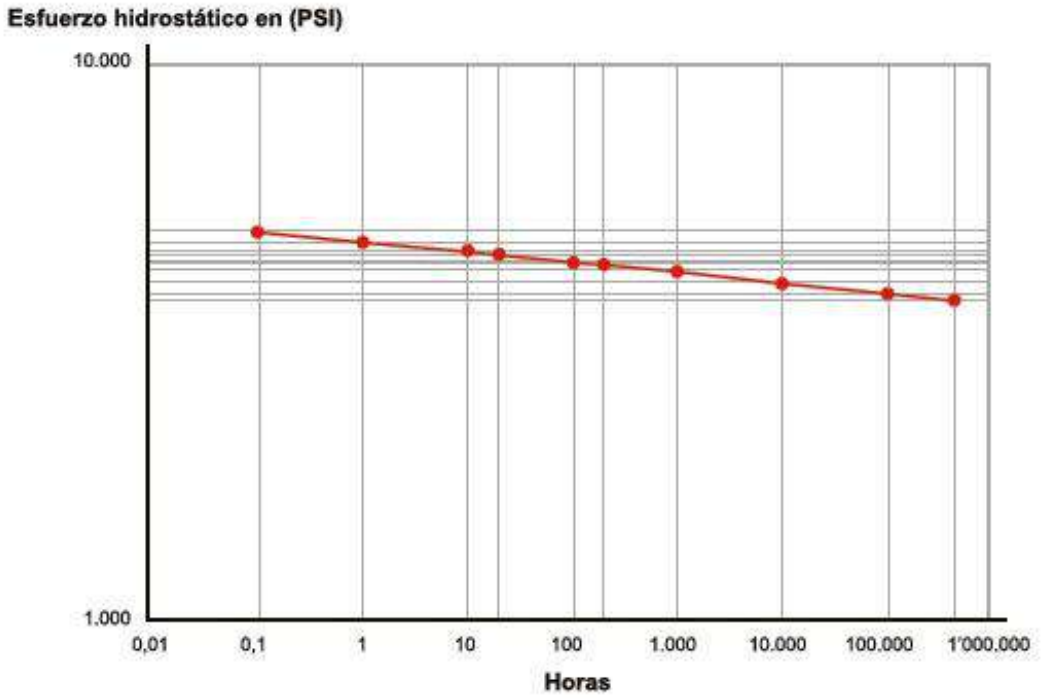

Por ejemplo: Para una tubería ROE 13,5 teniendo en cuenta la ecuación ISO: Por ejemplo: Para una tubería ROE 13,5 teniendo en cuenta la ecuación ISO:

$$\frac{2\ \text{Esfuerzo}}{\text{Presión de trabajo}} = \text{RED} - 1$$

$$\text{Esfuerzo} = \frac{[(\text{RED} - 1) \times \text{Presión de Trabajo}]}{2}$$

$$\text{Esfuerzo} = \frac{[(13{,}5 - 1) \times 315]}{2} = 1.969$$

Lo cual se cumple para compuestos con celdas de clasificación 12454 de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 369 (ASTM D 1784) que los compuestos están diseñados para LTHS de 2.000 psi.

Reemplazando en la ecuación logarítmica:

Log horas = Log esfuerzo x (-53,47) + 196,80
Log horas = Log 2.000 x (-53,47) + 196,80
Log horas = 20,29
Horas = 1.97 x 1020

Uso Recomendado:

Las tuberías y accesorios presión extremo liso fabricadas por ***P.V.C. GERFOR*** S.A. Se utilizan en instalaciones hidráulicas para suministro, conducción y distribución de agua potable, en edificaciones de tipo residencial, comercial e institucional.

Las tuberías presión extreme liso fabricadas por P.V.C. GERFOR S.A. son ensambladas a los accesorios, por medio del uso de limpiador GERFOR y cemento solvente GERFOR.

Tuberías

El manejo de las tuberías presión extremo liso fabricadas por P.V.C. GERFOR S.A. se puede realizar de dos maneras: manual o con equipos. Se debe manipular el producto de tal manera que no sea golpeado con ningún elemento.

No lance ni deje caer las tuberías, de una altura mayor a 30 cm

Imagen N°1
Incorrecta manipulación de la tubería



Al trasladar los tubos de PVC se llevarán sin arrastrarlos por el suelo, entre dos personas, si su peso lo requiere, y por medios mecánicos si su peso es superior (Grúa, carretilla elevadora, pala mecánica) evitando con ello deterioro e incidentes posteriores.

Imagen N°2
Correcta manipulación de la tubería



Antes de hacer cualquier tipo de manipulación de producto se hará una verificación en su interior, el cual deber estar completamente vacío.

En ningún caso se permite descargar tuberías mediante caídas no controladas, por lo cual debe asegurarse la estabilidad de cada elemento en todo momento.

Accesorios

No lance ni deje caer las tuberías, de una altura mayor a 30 cm.

No arrastre los accesorios por el piso, esta práctica puede causar deformaciones, agrietamientos y daños generales en el producto.

Imagen N°3
Incorrecta manipulación de accesorios



Imagen N°4
Correcta manipulación de accesorios



Almacenamiento

Almacenamiento:

El almacenamiento de tubería se hace en bodegas cubiertas. Las tuberías presión extremo liso fabricadas por ***P.V.C. GERFOR S.A.*** se almacenan colocando Una plancha o lío de tubería teniendo en cuenta que no sea golpeada en las puntas.

La tubería se debe acomodar levantando los tubos o deslizándolos en forma lenta para evitar maltrato del producto.

- ✓ No se debe almacenar tuberías a la intemperie por más de tres meses. De ser necesario se utilizarán cubrimientos que permitan la circulación del aire al interior
- ✓ Las tuberías se almacenaran debidamente soportadas sobre toda su extensión.
- ✓ La superficie de apoyo debe estar libre de incrustaciones y elementos que puedan llegar a rayar o fracturar la tubería.
- ✓ La tubería de PVC es susceptible de daño si se almacena cerca de fuentes de calor.
- ✓ La altura máxima permitida en el almacenamiento de tuberías, es de 2 m.

Imagen N°5
Correcto almacenamiento de la tubería



Imagen N°6
Altura máxima de apilamiento



Transporte

En el transporte, los tubos deben descansar por completo en la superficie de apoyo. Si la plataforma del vehículo no es bien plana a causa de salientes, conviene colocar listones de madera u otro material similar, para compensar dichos salientes.

Se recomienda proteger la parte más expuesta, que es el extremo del tubo, en los casos en que exista la posibilidad de ser perjudicada.

Se debe evitar que los tubos rueden y reciban impactos. Es aconsejable sujetarlos con cordel o cuerda. No utilizar cables ni alambres.

Debido a la flexibilidad de los tubos, se procurará que no sobresalgan de la parte posterior del vehículo en una longitud que permita el balanceo de los mismos.

Como sea que por el ligero peso de los tubos el camión lleno en volumen puede admitir todavía más peso, si el tubo a transportar lo permite, se pueden colocar dentro de los de mayor diámetro, otros de menor.

Durante el transporte no colocar peso encima de los tubos, que puedan producirles aplastamiento.

Asimismo debe evitarse que otros cuerpos, principalmente si tienen aristas vivas, golpeen o queden en contacto con ellos.

La carga en los camiones u otro medio de transporte se debe efectuar de forma que los tubos y accesorios no sufran deterioro ni transformación.

Recomendaciones básicas

Las tuberías de PVC están diseñadas para soportar la presión nominal a una temperatura máxima de 23°C. Valores por encima de los indicados no garantizan la durabilidad y el buen funcionamiento de la tubería.

No use los productos de PVC para conducir o almacenar aire o gases comprimidos. El uso inadecuado de estos productos puede causar fallas en los mismos.

La resistencia a la presión hidrostática de la tubería está directamente relacionada con el espesor de pared, por tal motivo, la indebida manipulación de tuberías y accesorios tales como golpes, rayones o fisuras afectan dicho condición.


Cuando vaya a realizar transiciones entre materiales, tenga en cuenta las diferencias existentes en las dimensiones de los mismos. Las dimensiones de las tuberías y accesorios de PVC presión son del tipo IPS (Iron Pipe Size), adicionalmente, las cavidades de los accesorios son cónicas, de acuerdo al sistema NPT (National Pipe Thread).

Suministro de agua a edificaciones

Acometidas

Las instalaciones domiciliarias se alimentan de las derivaciones de las redes de acueducto (red pública de suministro). La conexión típica y recomendada a un punto de la red pública de suministro se muestra en el diagrama a continuación:

Imagen N° 8
Esquema de conexión de acometida domiciliaria

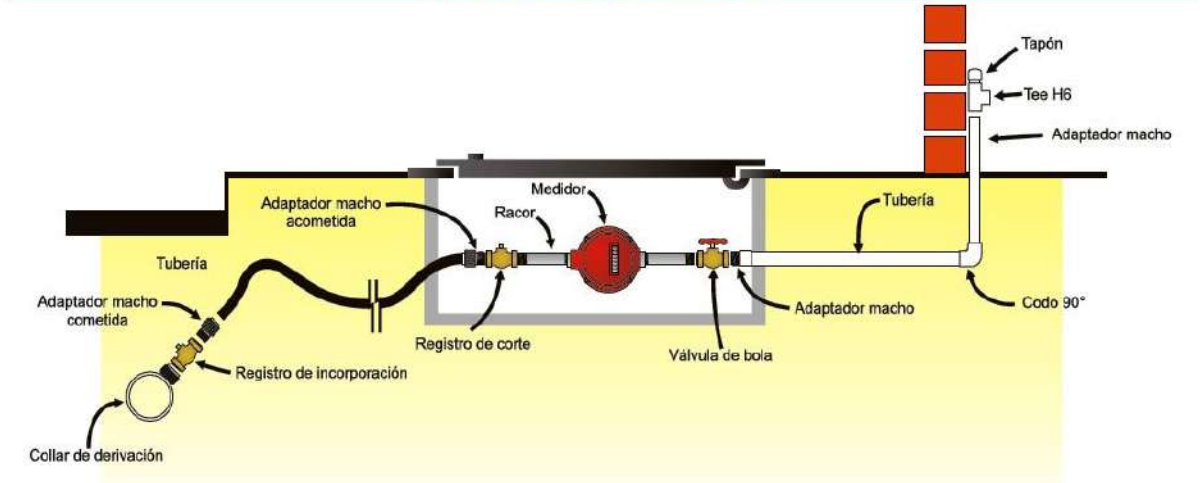

Sistemas de alimentación en edificaciones

El sistema de alimentación hacia una edificación depende de las características de la última, y de la capacidad de suministro del sistema, en cuanto a poder suplir los requerimientos de presión de los puntos hidráulicos.


De acuerdo con ello, y teniendo en cuenta que la presión de servicio mínima en la red de suministro debe ser mayor a 20 psi, la presión mínima requerida por cada uno de los aparatos sanitarios no excede los 12 psi, y teniendo en cuenta la posición en cuanto a la altura de cada uno de los puntos hidráulicos; se puede utilizar un sistema de alimentación directa, o indirecta.

Es importante mencionar que según el código colombiano de fontanería (NTC 1500), la presión máxima a la entrada de una edificación no debe exceder los 79,8 psi. En la tabla No.7 se muestran las presiones recomendadas y mínimas para los aparatos sanitarios utilizados en edificaciones.

Sistema de alimentación directa

Se utiliza cuando la red pública de suministro que surte una edificación tiene una presión que supera o iguala los requerimientos de alimentación de los aparatos de la misma. En este caso la edificación puede ser surtida directamente de la red de acueducto.

Imagen Nº 9
Diagrama de alimentación directa

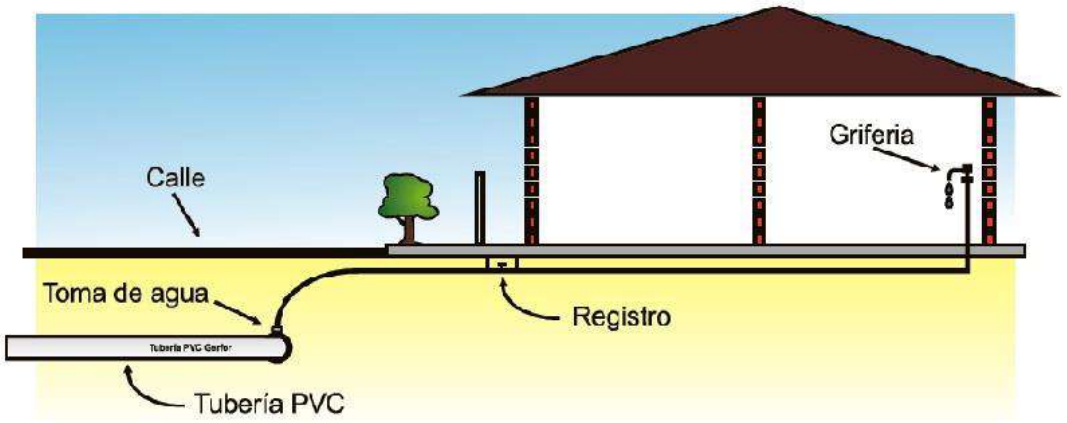

Sistemas de alimentación indirecta

Se utiliza cuando la edificación no es alimentada directamente, ya sea porque la red pública de suministro no suple los requerimientos de presión de la edificación o por el uso de tanques de almacenamiento de agua.

Existen varios tipos de instalaciones indirectas, dentro


Tanque alto

Tanque bajo y alto

Tanque bajo (Equipo hidroneumático de presión)

Tanque bajo (Equipo hidroneumático de presión), con tanque alto alterativo.

Imagen N° 10
Diagrama de la prueba hidráulica de la línea de tubería instalada

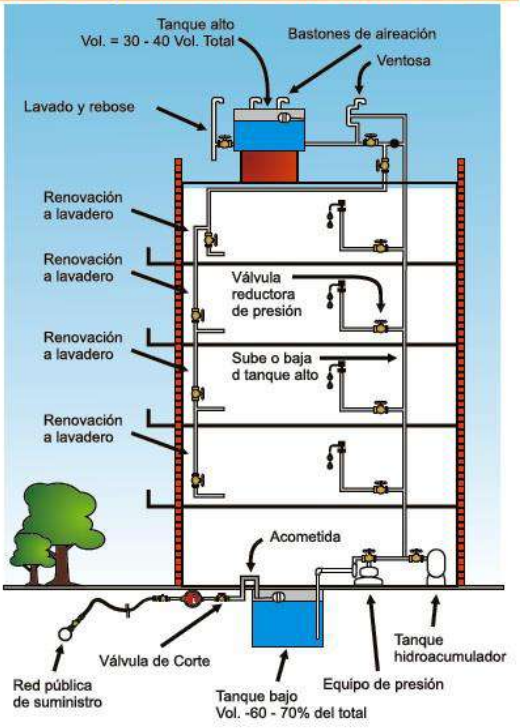

El sistema de suministro más utilizado en la actualidad y recomendado por las normas sismo resistentes es el de Tanque bajo con equipo hidroneumático de presión. Este sistema consiste en un tanque bajo, el cual es alimentado por la red pública de suministro, éste a su vez, alimenta a un equipo de bombeo que consta de un número determinado de motobombas, las cuales están conectadas a un equipo hidroneumático cuyo trabajo es mantener la presión dentro de un rango establecido, y de allí el flujo es dirigido a los puntos hidráulicos. Este sistema garantiza una presión mínima de servicio en la red, al igual que una reserva en el caso de corte en el suministro de la red pública.

Es de suma importancia el cuidadoso diseño e instalación de estos sistemas, de manera que se reduzca al mínimo el efecto del golpe de ariete generado por el encendido y apagado continuo de equipos de bombeo. En este caso son de gran importancia: el tiempo de ciclo del sistema de bombeo (tiempo entre encendido y apagado del equipo y tiempo entre encendido y encendido de equipo de bombeo); rango de presión del equipo (presión de encendido y presión de apagado del equipo); y presión de calibración del equipo hidroneumático. En muchos casos es necesario el uso de válvulas de regulación de presión.

Pruebas hidráulicas

Una vez realizada una instalación hidráulica, ésta debe ser probada, para asegurarse que no hayan quedado fugas. En las pruebas se debe tener en cuenta lo siguiente:

Las tuberías de PVC deben ser probadas hidrostáticamente (agua). No se recomienda realizar pruebas con aire o gas, ya que esta práctica de manera indebida puede causar accidentes.


La máxima presión de pruebas debe ser 1,5 veces la presión de servicio, pero nunca debe superar la presión nominal de la tubería.

Procedimiento para prueba hidráulica de la línea de tubería instalada

Tenga en cuenta los siguientes pasos a la hora de realizar la prueba hidráulica de la línea de tubería instalada:

- ✓ Asegúrese de que todos los empalme estén bien hechos.
- ✓ No realice pruebas de presión antes de 2 hora después de realizado el último pegue.
- ✓ Abra los registros para la respectiva purg de la línea de conducción.
- ✓ Deje entrar de manera lenta el agua a la re instalada, (la velocidad con que debe transitar e fluido dentro del sistema no debe ser superior los 0,6 mls).
- ✓ Cierre todos los registros y válvulas y observ que no se presente ningún tipo de fugas en e sistema.
- ✓ Conecte la bomba manual al registro de entrad (preferiblemente a la parte más baja de la re para con esto ayudar a la salida del aire).
- ✓ Escoja un manómetro de acuerdo a lo siguiente: Rango del Manómetro = Presión del diseño de la tubería + 50%.
- ✓ Abra el registro de entrada y bombee agua hasta 1,5 veces la presión de servicio; recuerde que la presión de prueba nunca debe superar la presión de diseño de la tubería. La variación de la presión de prueba puede variar entre más o menos 5 psi.
- ✓ En algún caso en que la presión llegase a bajar, deben revisarse los registros y las uniones para ubicar el escape, se debe remplazar o reparar los elementos y realizar una nueva verificación del correcto funcionamiento de la red instalada.

Imagen N° 11
Diagrama de la prueba hidráulica de la línea de tubería instalada

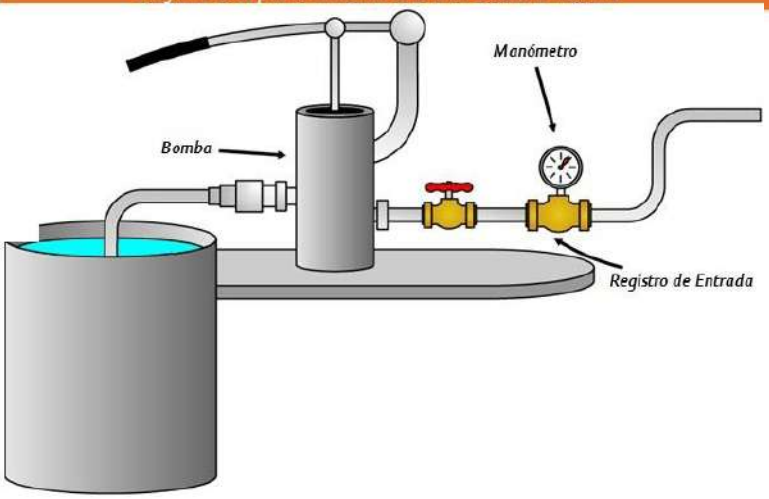

Soportes y espaciamiento

La distancia entre soportes para tuberías de PVC está en función del tamaño, temperatura de operación y de la ubicación de las válvulas. Los soportes no deben comprimir, distorsionar, cortar o desgastar la tubería. Su función es mantener la correcta alineación de la tubería y prevenir el pandeo o inversión de esfuerzos, pero en ningún caso deben impedir los movimientos generados de expansión o contracción por cambios de temperatura

- ✓ Las tuberías se deben soportar al final de todas las ramificaciones y en cualquier cambio de dirección.
- ✓ Los sistemas de tuberías de PVC no deben alinearse con tuberías de vapor u otros sistemas de alta temperatura, o cualquier fuente de calor.
- ✓ Salvo las uniones, todos los accesorios debe estar debidamente soportados y las válvulas deben anclarse para impedir esfuerzos adicionales de torque.

Recomendaciones cemento solvente y limpiador

La eficiencia en las obras de construcción e infraestructura, está dada por la seguridad en la hermeticidad de los ensambles y acoples del sistema. El cemento solvente y Limpiador GERFOR, son una garantía de manejo en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, proporcionando uniones más ágiles, seguras y resistentes que las roscadas.

Recomendaciones básicas

Antes de realizar uniones soldadas se deben revisar los extremos de la tubería a unir, con el propósito de detectar golpes o fisuras. En caso de que esto suceda, se debe proceder a cortar el tramo dado antes de realizar la unión con el accesorio.

Las tuberías PVC presión extremo liso no deben roscarse, esto disminuye los espesores de pared reduciendo su resistencia nominal a la presión. El tipo de unión adecuado es mediante el uso de Limpiador y cemento solvente PVC GERFOR.

Productos. Cemento solvente

El cemento solvente, es una solución de resina de PVC o CPVC, especialmente formulado para realizar las uniones entre tuberías y accesorios de Poli cloruro de Vinilo, debe fluir libremente y no contener partículas no disueltas o cualquier materia extraña, que afecte la resistencia final de la unión, o la resistencia química del cemento, no debe mostrar gelificación o separación

El cemento solvente fabricado por ***P.V.C. GERFOR S.A.*** cumple con los requisitos técnicos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 576 (Cemento Solvente para sistemas de tubos de PVC).

Limpiador

El limpiador GERFOR, es un producto esencial para el cuidado y preparación de una unión segura y garantizada. La función principal de este producto es limpiar y preparar la superficie a soldar, ya que su composición especializada garantiza la remoción de grasas e impurezas, y permite alistar la superficie mediante la formación de poros en el PVC para recibir la soldadura y facilitar la adherencia, logrando la firmeza del ensamble.

La siguiente tabla muestra los rendimientos de la soldadura GERFOR para diferentes tipos de ensambles, teniendo en cuenta la cantidad correcta para una adecuada unión y que no deje excesos que pueden alterar la tubería.

Recomendaciones cemento solvente y limpiador

Instrucciones de aplicación

Para una correcta uni6n con cemento solvente fabricado por ***P.V.C. GERFOR S.A.*** se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones:

1.Seleccione el tipo de cemento solvente (PVC o CPVC) de acuerdo a la tubería utilizada. Tonga en cuenta la fecha de vencimiento.

2.Antes de aplicar el cemento solvente verifique que el tubo haga contacto con la campana de accesorio, aproximadamente entre 1/3 y 2/3 de su profundidad.
En caso de quedar flojo el tubo dentro del accesorio Gamble el tubo o el accesorio y verifique de nuevo.

3.Corte el tubo de PVC o CPVC a la longitud deseada. Utilice una caja guía para asegurar que el corte del tubo sea a escuadra (900), es decir, que conserve la longitud en cualquiera de sus lados.

4.Elimine las rebabas internas y externas sobrantes del corte con una lima o lija de papel, ya que éstas pueden rayar el interior del accesorio o remover el material reblandecido de la campana, lo que puede producir una unión con goteo.

5.Verifique que los extremos a unir están totalmente secos.

6.Vierta un poco de Limpiador GERFOR sobre un trapo o estopa totalmente limpia y seca, frotando el extremo del tubo y el interior de la campana del accesorio a pegar. (Aunque las partes a unir están aparentemente limpias, el uso del Limpiador es indispensable para la óptima adherencia entre las superficies).

7. Agite el recipiente del Cemento Solvente GERFOR antes de usar.

7.Utilice una brocha o estopa limpia para aplicar el cemento solvente GERFOR sobre la tubería y los accesorios. El ancho de la brocha deberá ser igual a la mitad del diámetro del tubo para garantizar una cantidad de cemento solvente adecuada.

8.Aplique cemento solvente GERFOR, sobre toda la parte superficial del extreme del tubo a la profundidad aproximada de la cavidad del accesorio y sobre el interior de la campana del accesorio en menor cantidad.

9.Introduzca el tubo en la cavidad del accesorio y cuando haga contacto con el tope de la campana del accesorio realice un giro de 1/4 de vuelta para distribuir el cemento solvente GERFOR de una manera uniforme, garantizando la hermeticidad. Esto le permitirá eliminar los posibles espacios vacíos entre el accesorio y el tuba.

10. Después de realizar el pegue retire de inmediato los excesos de Soldadura con un trapo.

11. Lave la brocha utilizando Limpiador GERFOR.

Comportamiento hidráulico:

Para evaluar el comportamiento hidráulico de las tuberías de presión, P.V.C. GERFOR S.A. utilizó métodos de ensayo normalizados que están claramente descritos en las normas técnicas Colombianas NTC 3578 Tuberías termoplásticas para la conducción de fluidos. Resistencia a la presión interna. Métodos de ensayo y NTC 3579 Plásticos. Determinación a la presión hidráulica de rotura a corto plazo en tubos y accesorios de plástico.

Mantenimiento preventivo y correctivo:

Mantenimiento preventivo

Las tuberías presión extremo liso, al encontrarse instaladas, en la mayoría de los casos, embebidas en el concreto, y en otros dentro de los ductos construidos para la disposición de la misma, se imposibilita la realización de mantenimientos preventivos sobre la red.

Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo en redes de presión en edificaciones se realiza cuando el sistema ha sufrido daño alguno en un punto. Este daño se refiere a taponamientos del sistema, fracturas o roturas de la línea de tubería.

Fracturas o roturas

En el caso de presentarse fracturas o roturas, se debe encontrar el punto de fractura o perforación del sistema, posteriormente se demarca la sección a cortar, teniendo en cuenta que los extremes queden libres de agrietamientos o rayas. Se realiza un corte transversal de la sección y dependiendo de la longitud de la misma se puede utilizar 2 uniones presión y un niple de tubería del diámetro de la misma, o una unión pasante presión del diámetro de la misma.

Rotulado

Las características de rotulado de las tuberías presión extremo liso fabricadas por P.V.C. GERFOR S.A. cumplen con los lineamientos de la norma técnica colombiana NTC 382.

Índice de tablas

Tabla No.1
Características químicas de reconocido efecto adverso en la salud humanas. Pág. 2

Tabla No. 2
Espesores de pared y tolerancias, para los tubos plásticos de PVC con diámetros exteriores IPS. Pág. 3

Tabla No. 3
Dimensiones de la campana cónica y tolerancias para accesorios schedule 40. Pág. 4

Tabla No.4
Dimensiones de los bujes de reducción, accesorios tipo campana de PVC Schedule 40A,B Pág. 5

Tabla No. 5
Relaciones dimensionales estándar para tubos termoplásticos (ROE) y presiones de trabajo de agua (PT) a 23 'C (73 'F) para tubos de plástico de PVC no roscados. Pág. 6

Tabla No.6
Presiones máximas de trabajo para accesorios Schedule 40. Pág. 6

Tabla No. 7
Resultados de prueba de regresión acelerada a la presión de trabajo en PSI, para tuberías presión extremo liso fabricadas por ***P.V.C. GERFOR S.A.*** de 1/2" y 1" de diámetro nominal. Pág. 9

Tabla No. 8
Presiones recomendadas y mínimas por aparato sanitario (Diseño de instalaciones hidro sanitarias y de gas para edificaciones -Rafael Perez Carmona- ECOE Ediciones). Pág. 15

Tabla No. 9
Distancia recomendada entre soportes para tuberías presión extremo liso. Pág. 18

Tabla No. 10
Rendimiento de Cemento Solvente, 114 de Galón para PVC. Pág. 19

Tabla No. 11
Rotulado de tubería presión extremo liso fabricada por ***P.V.C GERFOR S.A.*** Pág. 23

Gerfor
Tubosistemas

Colombia corre por nuestras venas

Autopista Medellín Km 2 – 600 m
Entrada vía Parcelas de Cota
Cundinamarca - Colombia
asistencia.tecnica@gerfor.com
PBX: 57. 1 8776800
www.gerfor.com

ACERO FIGURADO PARA REFUERZO DE CONCRETO

FICHA TÉCNICA:
CÓDIGO: GI-F-032
FECHA: 2024 - 04- 04
VERSIÓN 05

DEFINICIÓN Son elementos que se conforman a partir de barras de acero corrugadas para refuerzo de concreto que permiten Ensamblar armaduras estructurales para la construcción de obras en concreto reforzado.

USOS GENERALES

Construcción

Infraestructura

ASPECTOS TÉCNICOS

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN QUÍMICA

	CARBONO C	MANGANESO Mn	FOSFORO P	AZUFRE S	SILICIO Si
PDR-60	0,30 Máx.	1,50 Máx.	0,035Máx.	0,045Máx.	0,50Máx.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

DENOMINACIÓN	LIMITE DE FLUENCIA	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Mínima	% ELONGACIÓN en 200mm Min.		REQUISITO ENSAYO DE DOBLADO	
PDR-60	kG/MM2 Psi. Mpa.	kG/MM2 Psi. Mpa.	No. Octavos de Pulg.	%	No. Octavos de Pulg.	D
Sismo Resistente	42/56 60.000/78.000 420/540	56,00 Min. 80.000 Min. 550 Min.	2-3-4-5-6 7-8-9-10-11 14-18	14% 12% 10%	3-4-5 6-7-8 9-10-11 14-18	3d** 4d 6d 8d

** d Diámetro de la Barra

EL ACERO FIGURADO SE COMPONE DE:

Refuerzo longitudinal: Barras corrugadas de acero rectas o dobladas que absorbe los esfuerzos de tracción y comprensión.

Fleje o Estribo: El elemento utilizado para generar confinamiento, evitar el pandeo del refuerzo principal y resistir esfuerzo de torsión y cortantes.

REQUISITOS DIMENSIONALES PARA LA BARRA CORRUGADA DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUMERO DE OCTAVOS DE PULGADA.	DIÁMETRO NOMINAL mm	Pulg.	ÁREA SECC. - TRANSV. (mm2)	PESO MINIMO (kg/m)	PESO NOMINAL (kg/m)
2	6,35	1/4	3	0,234	0,249
3	9,52	3/8	71	0,526	0,560
4	12,70	1/2	127	0,934	0,994
5	15,88	5/8	198	1,458	1,552
6	19,05	3/4	285	2,103	2,235
7	10,02	7/8	388	2,862	3,042
8	25,40	1	507	3,738	3,973
9	28,58	1 1/8	642	4,764	5,060
10	31,75	1 1/4	792	6,025	6,404

NOTA:

Las barras corrugadas de nuestros productos dan cumplimiento a la última versión de la NTC 2289 y el reglamento técnico 1856.

IDENTIFICACIÓN TRAZABILIDAD



Etiqueta ubicada en un lugar visible del producto, se debe conservar en el flujo del proceso.

Acorde con lo establecido en la resolución 2003 de 2022 numeral 6.1 requisitos mínimos de etiquetado.



VENTAS BOGOTÁ
CRA 68D No. 39F-58 sur Bogotá
310 762 1979
MERCADEO@ALMASA.COM.CO
ALMASA.COM.CO

ACERO FIGURADO PARA REFUERZO DE CONCRETO

FICHA TÉCNICA:
CÓDIGO: GI-F-032
FECHA:
2024 - 04- 04
VERSIÓN 05

PRODUCTO


PRESENTACIÓN	Acero Recto y Figurado.
ANGULO RESALTES	Entre 45° (mínimo) y 70° (máximo) con respecto a la barra
LINEAS DE RESALTE	Dos o Mas lineas de resaltes. (Tras Lineas)
ESPACIAMIENTO ENTRE RESALTES	No debe exceder de 7/10 del ∅ nominal de la barra.

ALTURA PROMEDIO DE LOS RESALTES

Numero Barra	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Altura	0,25	0,38	0,51	0,71	0,97	1,12	1,27	1,42	1,63

LONGITUD DE RESALTES	No debe exceder 12,5% del perímetro nominal de la barra.
SUMATORIA DE LAS DISTANCIAS DE SEPARACIÓN	No debe exceder 25% del perímetro nominal de la barra.
VARIACIÓN PERMISIBLE EN PESO	+/- 6% de su Peso Nominal.

PRINCIPALES FIGURAS MANEJADAS EN LA ESTRUCTURA DE ACERO

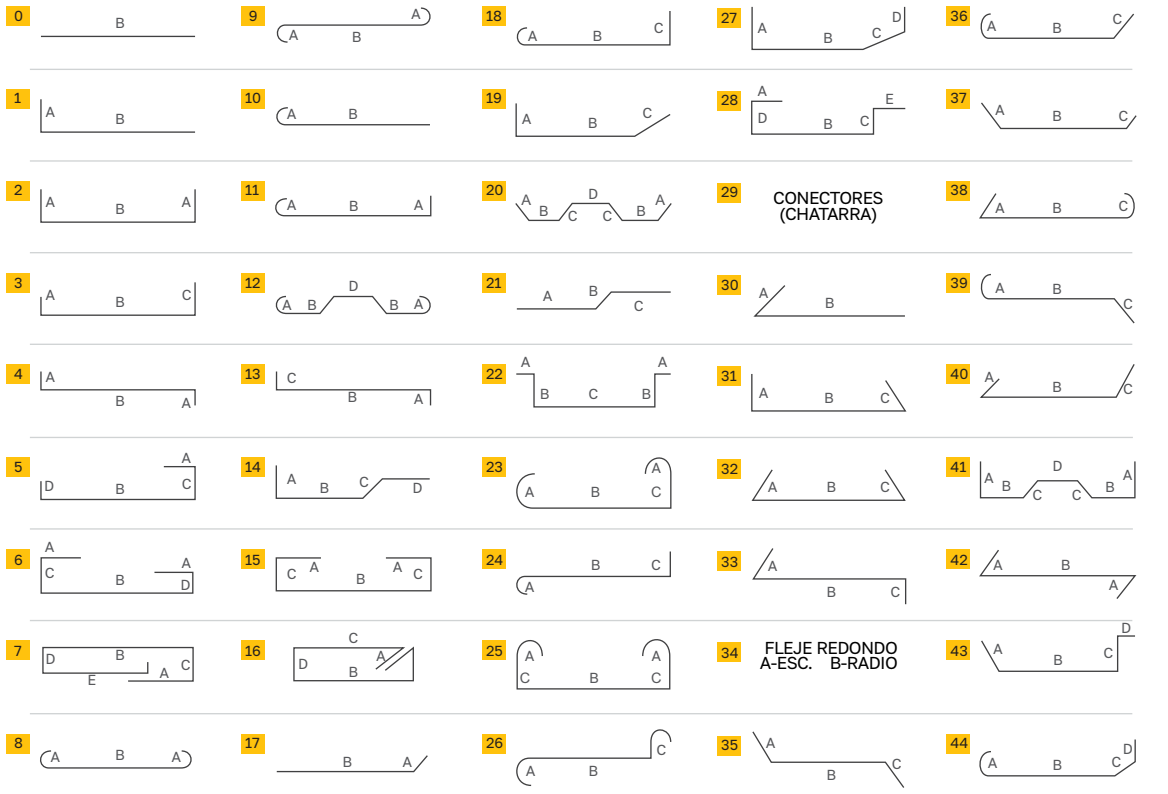

BASE GRANULAR INVIAS



Especificaciones técnicas:

- Norma Invias 2013 (NT1, NT2, NT3).
- Norma Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA). Año 1994.

USOS

Se emplean para la conformación de:

- Estructuras granulares para diferentes tipos de pavimentos
- Mejoramiento de vías secundarias y terciarias
- Rellenos para cimentaciones
- Soporte de sardineles y bordillos

Centro de producción Belén Los Alpes
PBX: (57) (4) 256 64 26
imt@canterasantarita.com
www.canterasantarita.com

BASE GRANULAR INVIAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASE GRANULAR (INVIAS -2013)

CARACTERISTICA	VALOR PROMEDIO	ESPECIFICACIÓN 330-13 INVIAS		
Dureza		**Clase C**	**Clase B**	**Clase A**
Desgaste en la máquina de los Ángeles máximo (%) -500 revoluciones -100 revoluciones	27 6	40 8	40 8	35 7
Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval máximo (%)	15	-	30	25
Evaluación de la resistencia mecánica por el método del 10 % de finos -Valor en seco, mínimo (KN) -Relación húmedo/seco (%)	160 78	- -	70 75	90 75
Durabilidad				
Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) -Sulfato de sodio -Sulfato de magnesio	8 16	12 18	12 18	12 18
Limpieza				
Limite líquido, máximo (%)	N.L	25	-	-
Índice de plasticidad, máximo (%)	0	3	0	0
Equivalente de arena (%)	33	30	30	30
Valor de azul de metileno*	-	10	10	10
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables, máximo (%)	0,9	2	2	2
Geometría de las partículas				
Índice de alargamiento, máximo (%)	35	35	35	35
Índice de aplanamiento, máximo (%)	34	35	35	35
Caras fracturadas (%) -Una cara -Dos caras	100 100	50 -	70 50	100 70
Angularidad de la fracción fina, mínimo (%)	40	-	35	35
Resistencia del material				
CBR ,mínimo (%)	>100	$\geq$ 80	$\geq$ 80	$\geq$ 80

Centro de producción Belén Los Alpes
PBX: (57) (4) 256 64 26
imt@canterasantarita.com
www.canterasantarita.com


BASE GRANULAR INVIAS

FICHA TÉCNICA
VERSIÓN 1.
SEPTIEMBRE DE 2020

Granulometría				
Franja granulométrica BG-38 (Gradación fina) Franja granulométrica BG-40 (Gradación gruesa)	Ver gradación típica Ver gradación típica			

*El ensayo de valor de azul de metileno solo será exigido cuando el equivalente de arena del material de base granular sea inferior a treinta (30), pero igual o superior a veinticinco (25).


TIPO DE GRADACIÓN	**% Pasa**							
	1 ½"	**1"**	**¾"**	**3/8"**	**No.4**	**No.10**	**No.40**	**No.200**
BG-38	100	70-100	60-90	45-75	30-60	20-45	10-30	5-15
Gradación típica	100	83	72	52	41	32	21	10

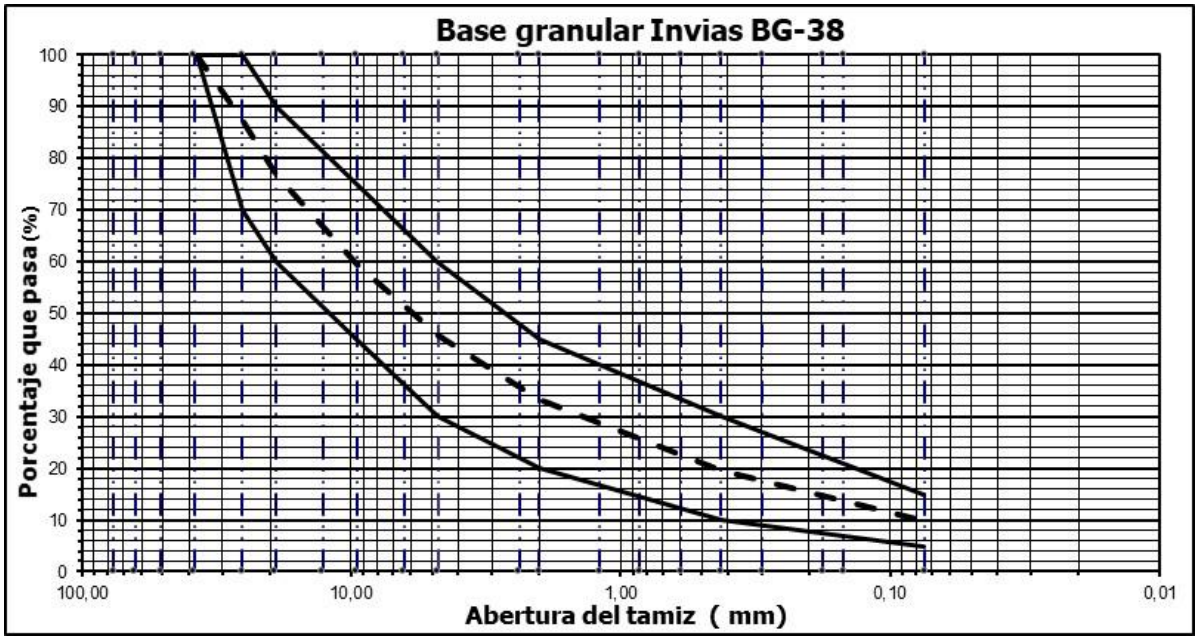

Centro de producción Belén Los Alpes
PBX: (57) (4) 256 64 26
imt@canterasantarita.com
www.canterasantarita.com

BASE GRANULAR INVIAS

TIPO DE GRADACIÓN	% Pasa							
	1 ½"	1"	¾"	3/8"	No.4	No.10	No.40	No.200
BG-40	100	75-100	65-90	45-68	30-50	12-32	7-20	0-9
Gradación típica	100	84	73	49	36	27	17	8

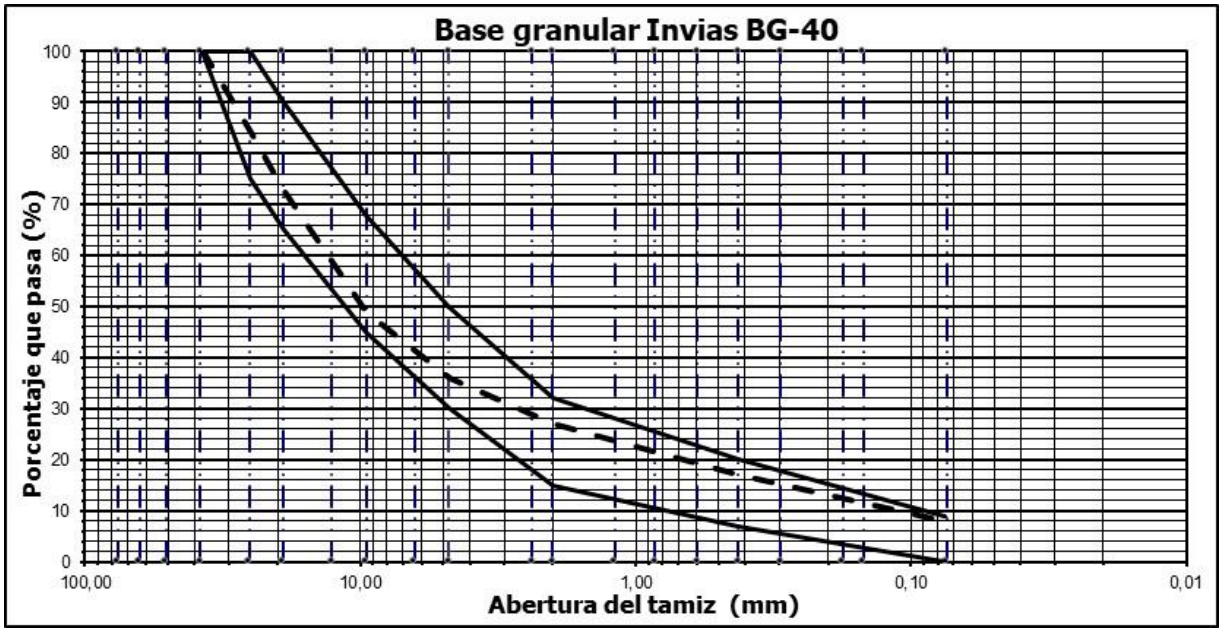

Centro de producción Belén Los Alpes
PBX: (57) (4) 256 64 26
imt@canterasantarita.com
www.canterasantarita.com

CERROJOS QUADRA

Cerrojos Grado 3



Acabados

Níquel Satinado



Acero Inoxidable



Negro Mate



*Backset es la distancia desde el centro del cilindro al canto / borde de la puerta.

Principales Características


- Cerrojos con pestillo fijo anticizalla.
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor.
- Backset* ajustable de 60mm o 70mm.
- Cilindros de 5 pines / guardas.
- Cumple norma ANSI / BHMA A156.36 Grado 3 de alta seguridad y desempeño (Más de 100.000 ciclos de apertura y cierre desde la llave).
- Fácil y rápida instalación.
- Incluye 2 llaves.

GRADO 3 ANSI A-156.36

FÁCIL INSTALACIÓN


GARANTÍA DE 25 AÑOS

Funciones

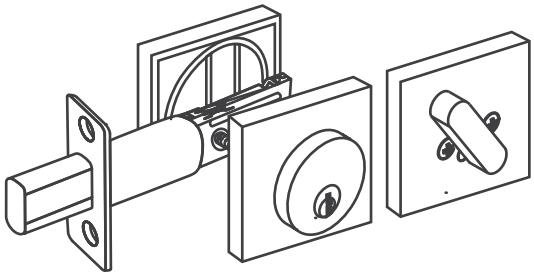

B360

- Cilindro y volteador.
- Pestillo fijo anticizalla.

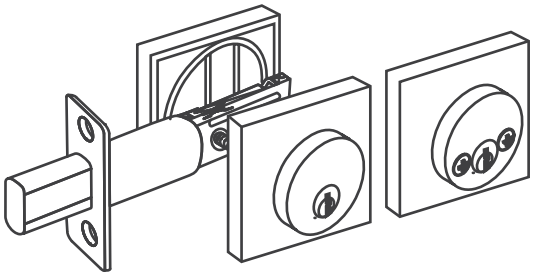


B362


- Doble Cilindro.
- Pestillo fijo anticizalla.

Dimensiones

CERROJO QUADRA B360

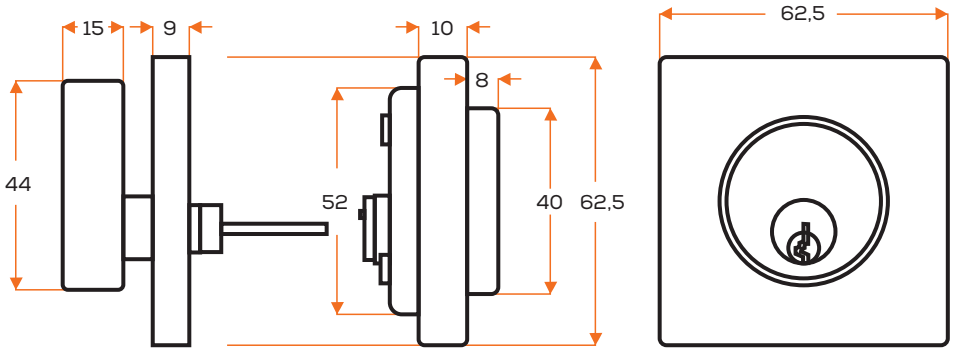

CERROJO QUADRA B362

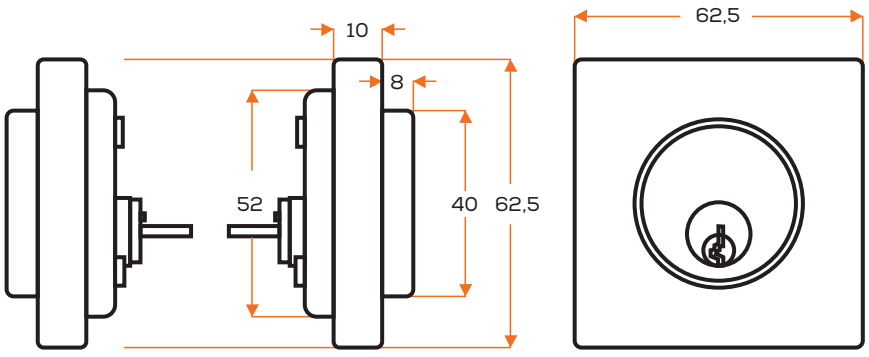

*Medidas en milímetros

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECANICAS DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS

CÁMARA SALINA
■ 200 HORAS (recubrimientos inorgánicos) ■ 96 HORAS (recubrimientos orgánicos)

■ **CÁMARA SALINA:** Con este ensayo se garantiza la resistencia de las cerraduras y productos de seguridad a la oxidación tanto de sus accesorios decorativos como de sus piezas interiores al estar expuestas a ambientes húmedos o salinos.

La Certificación efectuada sobre el producto, garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas en este informe.

Los ensayos realizados al producto, simulan las condiciones normales de uso.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Seguir las reconendaciones y secuencia de instalación según indica el empaque.

RECOMENDACIONES

- Para instalación en puertas de madera, el contenido de la humedad de la puer ta no debe ser superior al 14% (Norma ICONTEC 2500) de lo contrario se perderá la garantía.
- Pinte o laque la puerta antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja las caperuzas con papel. No pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda con agua.
- No deben emplearse disolventes, abrasivos u objetos afilados, ya que estos destruyen la capa protectora de las cerraduras.
- En puertas de cedro se recomienda abrir los huecos y dejar transcurrir un tiempo no inferior a 10 días antes de realizar la instalación por tratarse de madera que guarda bastante humedad.
- Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, que varia entre 110cm mínimo y 130cm máximo.
- Siempre utilice grafito cuando requiera suavizar el funcionamiento tanto de las guardas como de las llaves, para lubricar los pestillos aplique aceite.
- Instale siempre un tope en la puerta para protegerla, a la cerradura y a la pared.

SEGUREX LATAM S.A.S.
Calle 25D N° 95 - 45
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: (57-1) 371 3766
ventas@segurex.com
www.segurex.com
/Segurex-Schlage



Ficha Técnica

CIELO RASO PVC

Características

Largo:	5.95 m
Ancho:	30 cm
Grosor:	9 mm
Área:	1.785 m²
Peso por Paquete:	38 kg
% de PVC:	55%
% de Protección UV:	25%
Peso:	3.5 + 2 Kg
Vida Útil:	10 años aprox.



Blanco Brillante



Blanco Mate

-Resistente a la humedad y plagas.
-Contiene protección uv.
-No requiere pintura.
-Fácil instalación.
-No genera polvo.
-Aislante termoacústico.
-No propaga el fuego.
-Es un material liviano en comparación a otros acabados de construcción.
-Amigable con el medio ambiente.

Resina de pvc	55%
Cac03	40%
Estabilizadores	1.89%
Tio2	1.9%
Ácidos esteárico	0.33%
Plastificante	0.69%
Abrillantador	0.08%

Garantía
90 días contra defectos de fabricación.



Encuentre este producto en todas las salas de venta Multiobras a nivel nacional. Para más información comunícate con tu asesor multiobras de confianza o escríbenos a servicioalcliente@multiobras.com o llamanos al PBX:601 6330101


Producto distribuido por

MULTIOBRAS® SISTEMA DRYWALL
multiobras.com


LADRILLERA Santafé

FICHA TECNICA

BLOQUE # 5 PV



SECCION



ISOMETRICO



***A celda** (aprox.) = 96,92 cm2/Un*

Dimensiones en cm.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones	**Largo**	**Ancho**	**Alto**
	33,0 cm	11,5 cm	23,0 cm
Tolerancia Dimensional	± 6 mm	± 3 mm	± 4 mm
Color	**TERRACOTA CLARO (Según muestras)**	El color varia dentro de una gama similar a la que se observa en la foto	
Textura	ESTRIADO POR SUS CUATRO (4) CARAS		
Paredes	± 9,0 mm	**Tabiques**	± 8,0 mm
Peso / Unidad	**5,6 kg.** Podrá tener una variación hasta de ± 0,28 Kg		
Rendimiento con dilatación de 1cm	**12,25 Unidades/m2**		
Peso / m2 (promedio)	68,6 Kg/m2 de muro		
Aplicación	**Muros Divisorios**		
Clasificación	Tipo **PV NE**	Unidad de Mampostería No Estructural de Perforación Vertical	
	Promedio 5 Unidades	Individual	
Resistencia a la compresión (Mínima)	14,0 MPa (140 Kgf/cm2)	10,0 MPa (100 Kgf/cm2)	
Absorción de Agua (Máxima)	13%	14%	
Normas Aplicadas	ICONTEC	**NTC 4205-2**	
	AIS	**NSR 10**	
	ASTM	C56, C212, C216	

Recomendaciones de Almacenamiento:
Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.

Recomendaciones de Diseño e Instalación:
En la aplicacipon como muros divisorios se deben cumplir los requisitos de la ***NSR10 Capitulo A.9 Elementos No Estructurales,*** en su diseño y anclaje a la estructura.
El diseño comprende dovelas y viguetas. Seguir recomendaciones del "*Manual de Diseño - Muros divisorios y de fachada en mampostería según normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente*" de Santafé.
La perforación vertical permitirá disponer las instalaciones de servicios (elimina regatas en el muro) y la colocación del refuerzo vertical sin necesidad utilizar formaleta para conformar la columneta.
Durante la construcción se procurará mantener el muro lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior.
Para una correcta y eficiente aplicación seguir las instrucciones de *SANTAFE.*

Recomendaciones de lavado:
Generalmente los muros divisorios construidos con estas piezas llevan algún tipo de acabado, por lo que no se acostumbra el lavado. De ser necesario se deben seguir las recomendaciones del *Manual de Lavado de SANTAFE.*
Para el lavado, el muro deberá estar seco. **No usar Acido Muriático**. Para la aplicación de la solución de lavado, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y **pre humedecer el muro** (esto evita la penetración del ácido en la pieza de arcilla). Después de refregar el muro con la solución de lavado, esta se debe retirar con abundante agua.

	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARÓ: Vicepresidencia de Ingeniería **REVISÓ:** **FECHA**: Junio de 2.018			

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 2

CEMENTO GRIS DE USO GENERAL

CEMENTO VERDE

AMIGABLE CON EL PLANETA



Fabricación: Plantas Rioclaro y Sogamoso - Colombia

SOLUCIONES VERDES
Innovación Consciente

ARGOS

CEMENTO GRIS DE USO GENERAL

CEMENTO VERDE
AMIGABLE CON EL PLANETA

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados para la construcción en general.

Las especificaciones del Cemento Verde Tipo Uso General cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG).

USOS:

- Morteros para pisos, nivelaciones, lechadas y emboquillados.
- Reparaciones, remodelaciones, pequeñas obras y diversas aplicaciones domésticas.
- Producción de elementos prefabricados de pequeño y mediano formato.
- Morteros para mampostería, pega de cerámicos, enchapes, acabados, recubrimientos interiores y para fachadas.
- Todo tipo de elementos de concreto que no requieran características especiales.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- Es un producto versátil, con muchas posibilidades de aplicación.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

Al utilizar el “Cemento Gris de Uso General Plantas Rioclaro y Sogamoso” de Argos, se garantiza el uso de un producto suministrado por una empresa responsable en materia ambiental, social y económica, y transparente con sus grupos de interés, tal y como se evidencia en el reporte de sostenibilidad corporativo “Reporte Integrado” que Argos realiza anualmente con base en el Global Reporting Initiative (GRI), en el cual presenta los resultados de su desempeño y sus planes de acción, en relación a cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y sus grupos de interés. Este reporte se puede encontrar en la página web de la compañía (https://argos.co/), en la sección “Sostenibilidad”.

Dentro de las características de sostenibilidad generales del “Cemento Gris de Uso General Plantas Rioclaro y Sogamoso”, se destacan:

Cemento Verde Amigable con el Planeta, hace referencia al Cemento Gris de Uso General con adición de materiales cementantes suplementarios, fabricado a través de un proceso que logra la reducción de emisiones de CO_2 y de consumo de energía en más de un 35%, en comparación con la información promedio reportada en las Declaraciones Ambientales de Producto del Cemento Portland Tipo I del mercado norteamericano, de la Portland Cement Association. Para más información favor consultar en colombia.argos.co

Material con Análisis de Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés) y Auto-Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés).

Producto fabricado en la región: a 160 km o menos de distancia del punto de venta o de la obra.
Nota: Esta distancia puede variar dependiendo de la ubicación geográfica de la obra.

Se cuenta con diferentes alternativas amigables con el ambiente para el transporte de este producto, incluyendo vehículos eléctricos y vehículos a gas.

Producto de bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles, lo que contribuye a una mejor calidad ambiental de los interiores.

El empaque de este producto podrá ser devuelto a la compañía para aprovechamiento del material, de acuerdo a las condiciones específicas del programa Sacos Verdes y la ubicación de la obra.

Teniendo en cuenta lo anterior, este producto, combinado con las estrategias de diseño y construcción puede contribuir a obtener puntos en las siguientes certificaciones de construcción sostenible:

CERTIFICACIÓN	LEED® V4.1	CASA COLOMBIA V2.1
CRITERIO	**Materiales y Recursos:** · Transparencia y optimización de productos de construcción - EPD. · Reducción del impacto en el ciclo de vida de la edificación - LCA de la edificación. **Calidad Ambiental Interiores:** · Materiales de baja emisión. (Hasta 8 puntos)	**Sostenibilidad en obra:** · Manejo de residuos de construcción. **Eficiencia en materiales:** · Origen de los materiales y productos. · Productos con atributos múltiples de sostenibilidad. · Productos y materiales con LCA. (Hasta 6.5 puntos)

Para conocer las características de sostenibilidad específicas del cemento suministrado a tu proyecto y los detalles de la contribución a la obtención de las certificaciones mencionadas anteriormente, puedes solicitar el certificado correspondiente a través de nuestros canales de atención.

PRESENTACIÓN:

- Sacos de: 50 kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PARÁMETROS FÍSICOS		NORMA DE ENSAYO	NTC 121 TIPO UG
Finura	Blaine, min. (cm^2/gr)	NTC 33	A
	Retenido Tamiz 45 µm (%)	NTC 294	A
Cambio de longitud por autoclave, expansión, máx. (%)		NTC 107	0.80
Tiempo de fraguado, Ensayo de Vicat[B]	No menos de, minutos	NTC 118	45
	No mas de, minutos	NTC 118	420
Contenido de Aire en Volumen de mortero, máx. (%)		NTC 224	12
Expansión de barras de mortero a 14 días, máx.		NTC 4927	0.020
RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN (MPa)			
3 días		NTC 220	8.0
7 días		NTC 220	15.0
28 días		NTC 220	24.0

A: Los resultados de estos ensayos deben ser informados en todos los reportes que sean solicitados.
B: El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTC 118.

RECOMENDACIONES:

- En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y norma sismo resistente colombiana vigente; requisitos de producción, calidad y durabilidad.
- Almacenar el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.
- Conservar el cemento sobre estibas y no sobre el suelo.
- Una vez abierto el saco se debe consumir de manera inmediata.

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO:

- El Cemento Gris de Uso General, Cemento Verde amigable con el planeta solo se encuentra disponible en los departamentos de Antioquia, Caldas, Tolima, Huila, Norte de Santander, Santander y Cundinamarca*.
  * Para verificar la disponibilidad del producto, por favor contactar a tu asesor comercial.

ESTAMOS PARA AYUDAR

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:

DESDE TELÉFONO FIJO: **018000527467**

DESDE CELULAR: **#250**

Asesoría técnica:
ASESORVIRTUAL@ARGOS.COM.CO

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a:
WWW.360ENCONCRETO.COM

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web: **COLOMBIA.ARGOS.CO**




ARGOS

Empresa de cemento del GRUPO ARGOS

LADRILLERA Santafé

FICHA TECNICA

LADRILLO ESTRUCTURAL PERFORACION VERTICAL - R.E




PLANTA



Traba de muros en esquina o en"L"

APLICACION

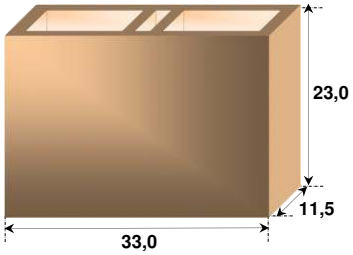

Isométrico



PIEZA ENTERA - LEPV RE



PIEZA MEDIA DE TRABA - LEPVM RE
A colocar en el extremo de un muro



PIEZA CONECTORA - LEPVC
Para trabar los muros en "L"

Acelda = 96,17cm2/Un

Dimensiones en cm.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones	**Largo**	**Ancho**	**Alto**
	33,0 cm	11,5 cm	23,0 cm
Tolerancia Dimensional	± 4 mm	± 3 mm	± 4 mm
Color	**TERRACOTA CLARO (Según muestras)**	**El color varía dentro una gama similar a la que se observa en la foto de aplicación.**	
Textura	**LISA** POR SUS CUATRO (4) CARAS, CON UNA CARA PRINCIPAL Y UNA CARA LATERAL A LA VISTA		
Paredes (Mínimo)	18,0 mm	**Tabiques** (Mínimo)	15,0 mm
Peso/Unidad	**7,8 Kg/Un.**		
Peso/m2	95,55 Kg/m2		
Rendimiento con dilatación de 1 cm.	**12,25 Un/m2**		
Aplicación	**MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL** - Muros de Mamposteria Reforzada - Muros divisorios - Muros a la vista		
Clasificación	**Tipo PV**	Unidad de Mampostería de Perforación Vertical	
Resistencia a la compresión (Mínima)	40 MPa (400 Kgf/cm^2)		

	Promedio 5 Unidades	Individual
Absorción de Agua -Máxima	12%	14%
Normas Aplicadas	**AIS**	**NSR 10 Titulo D - R.E. 0012 DE 20 ABR. 2012 (Régimen de Excepción)**
	ICONTEC	**NTC 4205-1**, NTC 4205-3
	ASTM	C56, C212, C216

Aislamiento Acústico - Valor STC (de acuerdo a composición de la pared).

Composición de la pared	STC	Perdida de transmisión a la frecuencia [Db]							
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 Khz	2 Khz	4 Khz	8 Khz	16 Khz
Sencilla	**51**	42	47	49	55	52	63	66	67


Recomendaciones de Almacenamiento:
Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.


Recomendaciones de Instalación:
En los muros de fachada y divisorios se deben cumplir los requisitos de la ***NSR10 Capitulo A.9 Elementos No Estructurales***, en su diseño y anclaje a la estructura.
La solución comprende columnetas y viguetas, enchapadas con la pieza utilizada, o disponiendo el refuerzo vertical a través de las celdas. Para el diseño se pueden seguir las recomendaciones del "*Manual de Diseño - Muros divisorios y de fachada en mampostería según normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente" de SANTAFE.*
En los muros de mampostería estructural o muros portantes, se deben cumplir los requisitos de la ***NSR 10 TITULO D - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL.***
ES NATURAL QUE EL TONO GENERAL DEL LADRILLO VARIE LIGERAMENTE ENTRE DIFERENTES LOTES DE PRODUCCIÓN.
Para obtener una mayor homogeneidad de tono de un lote en la fachada, se recomienda tomar las piezas para el muro de diferentes estibas a la vez, 3 o 4, para conseguir la mezcla del producto.
Durante la construcción se procurará mantener el muro lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior.
Para una correcta y eficiente aplicación seguir las instrucciones de *SANTAFE.*
ES NATURAL QUE AL CONSTRUIR EL MURO SE PRESENTEN EFLORESCENCIAS EN LAS PIEZAS DE ARCILLA PRODUCTO DE LA HUMEDAD PROPIA DE LOS MATERIALES DE INSTALACION Y DEL ENTORNO. PARA SU ELIMINACION SE SEGUIRAN LAS RECOMENDACIONES DE LAVADO DE SANTAFE.

Recomendaciones de lavado:
Se deben seguir las recomendaciones del *Manual de Lavado de SANTAFE.*
El muro deberá estar seco. En la soluciones de lavado **NO USAR ACIDO MURIÁTICO NI ÁCIDOS FUERTES, se deben utilizar acidos débiles como el ácido nítrico, NO pueden estar compuestas con altas concentraciones del ácido recomendado,** para su aplicación, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y **pre humedecer el muro** (asi se reduce la penetración del ácido de la solución de lavado en la pieza de arcilla). Después de refregar el muro con la solución de lavado, esta se debe retirar con abundante agua.
Siempre se debe verificar con ensayos previos la efectividad de la solución de lavado.

ACCESORIOS - Piezas complementarias.


LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL MEDIO - LEPVM RE






Dimensiones: 16x11,5x23 cms
Peso: 3,5 Kg
Rendimiento: 2,08 Un/ml
Acelda = 97,75 cm2

LADRILLO ESTRUCTURAL PERFORACION VERTICAL CONECTOR - LEPVC





Dimensiones: 28,5x11,5x23 cms
Peso: 8,8 Kg
Rendimiento: 4,17 Un/ml
Acelda = 62,27 cm2/un
Resistencia a la Compresión (mínima):
Promedio: 28 MPa (280 Kgf/cm2)
Individual: 23,2 MPa (232 Kgf/cm2)

Notas:
- Ver anexo con los detalles de aplicación.

	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Area Técnica Comercial **REVISO:** **FECHA**: Enero de 2.017			


LADRILLERA Santafé

FICHA TECNICA

LADRILLO ESTRUCTURAL PERFORACION VERTICAL - R.E

APLICACIONES

APLICACION TIPICA

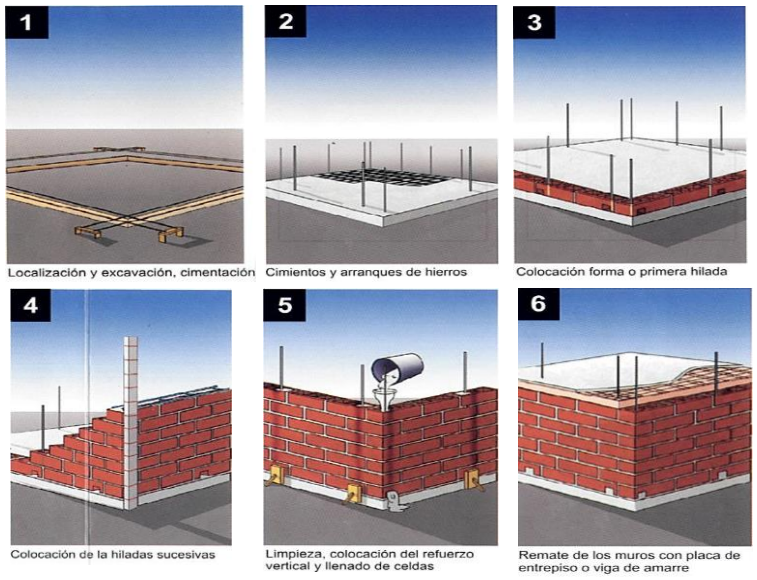

MUROS ESTRUCTURALES UNO Y DOS PISOS



(NSR 10 D.3.6.5.)

Arranque de la Mampostería




PIEZAS COMPLEMENTARIAS

BL5L




Dimensiones: 33x11,5x23 cms
Peso: 6,7 Kg
Rendimiento: 12,25 Un/m2

BL5



Dimensiones: 33x11,5x23 cms
Peso: 6,2 Kg
Rendimiento: 12,25 Un/m2


Bloque 5 Canaleta - **BL5CL**



Dimensiones: 33x11,5x23 cms
Peso: 8,2 Kg
Rendimiento: 2,94 Un /ml




Bloque sin la Tapa superior

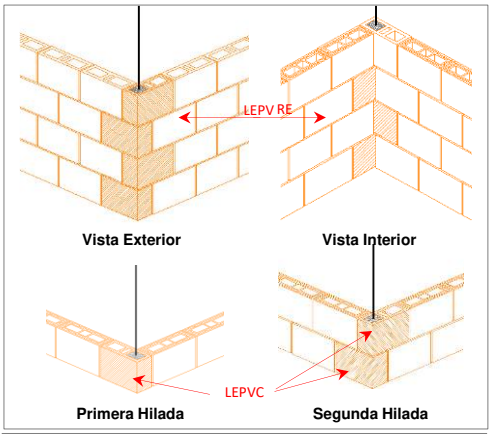


APLICACIÓN MURO ACOPLADO CON PIEZAS LEPV - Pega 1cm

MUROS DIVISORIOS DOBLE ALTURA TÍPICA - MAS DE 3M

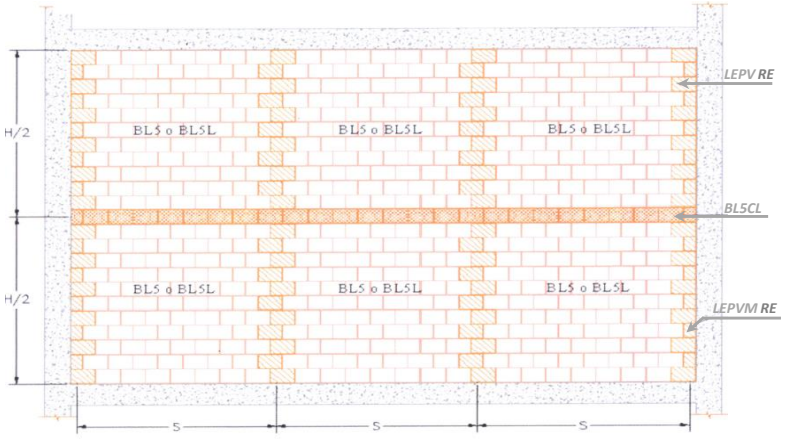

MUROS DIVISORIOS ALTURA TÍPICA - HASTA 3M

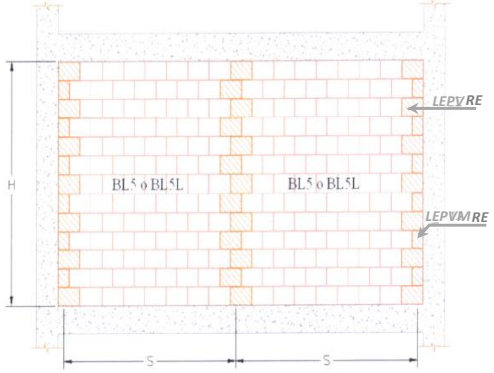


	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Area Técnica Comercial **REVISO:** **FECHA:** Enero de 2.017			

LADRILLERA Santafé


FICHA TECNICA

LADRILLO ESTRUCTURAL DE PERFORACION VERTICAL


APLICACIONES GENERALES CON PIEZA CONECTORA - MUROS ACOPLADOS

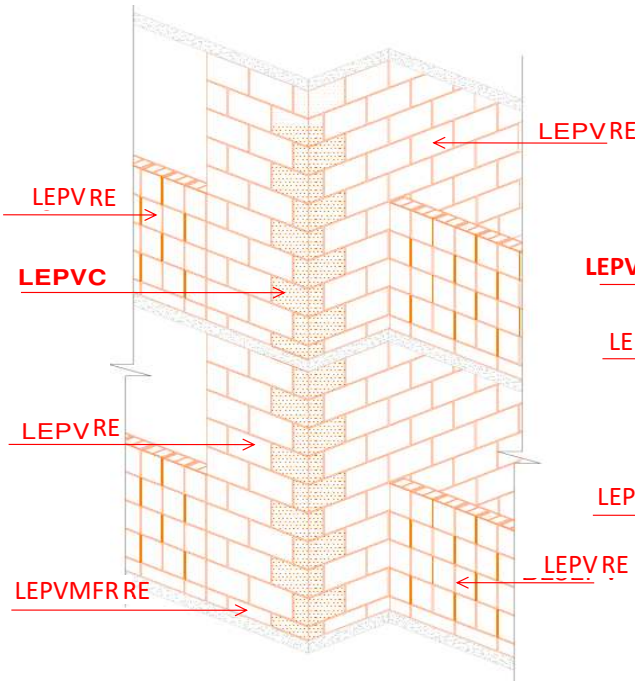

MUROS ACOPLADOS h=2,28m
LEPV Muros Interiores y de Fachada
Una hilada de LEPVMFR de arranque

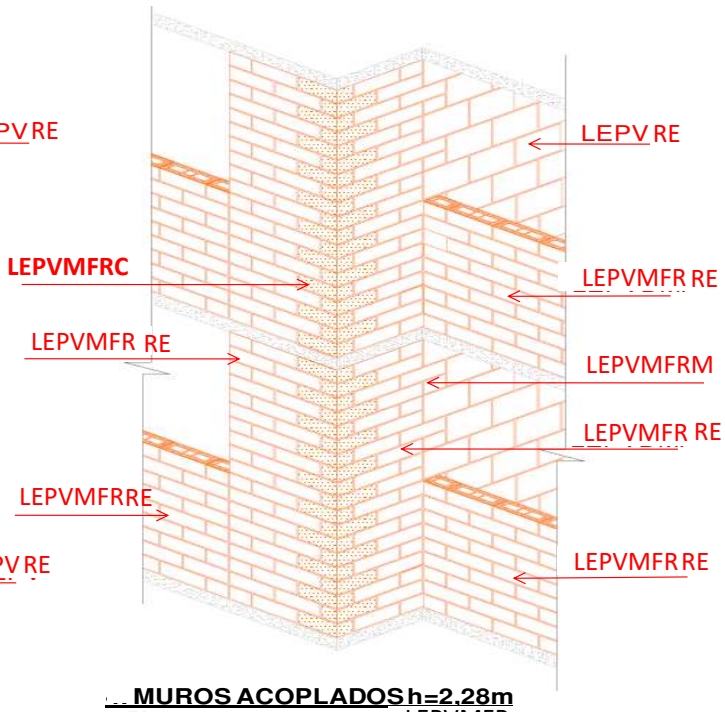

MUROS ACOPLADOS h=2,28m
LEPV Muros Interiores - LEPVMFR
Muros de Fachada

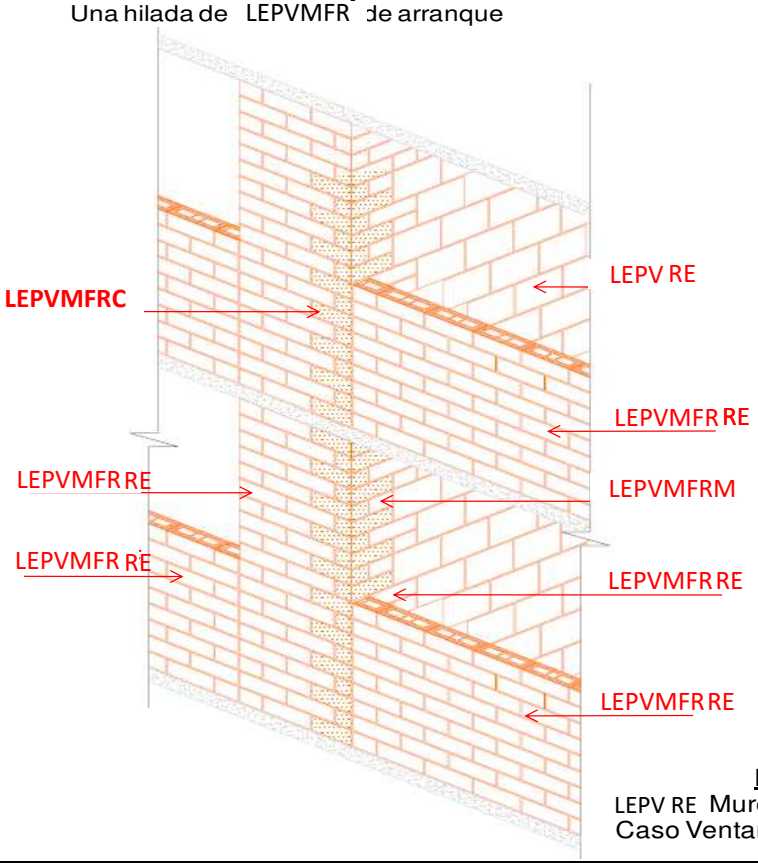

PIEZAS SANTAFE
LEPV RE: Ladrillo Estructural Perforacion Vertical Regimen de Excepción
LEPVM RE: Ladrillo Estructural Perforacion Vertical Medio Régimen de Excepción
LEPVMFR RE: Ladrillo Estructural Perforacion Vertical Medio Fachada Rojo Régimen de Excepción
LEPVMFRM: Ladrillo Estructural Perforacion Vertical Medio Fachada Rojo Medio
LEPVC: Ladrillo Estructural Perforacion Vertical Conector
LEPVMFRC: Ladrillo Estructural Perforacion Vertical 5H Medio Fachada Rojo Conector

MUROS ACOPLADOS h=2,28m
LEPV RE Muros Interiores - LEPVMFR RE Muros de Fachada
Caso Ventana a hilo con los demás muros de Fachada

	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Area Técnica Comercial **REVISO:** **FECHA:** Enero de 2.017			

molduras

PRODUCTO:	**LISTONES PINO , MOD. 900**
Descripción:	Piezas de madera de Pino cepilladas, con escuadrías definidas para carpintería interior
Características técnicas:	Madera de Pino. Calidad V ó CC+V. Densidad 450 kg/m^3 Humedad de servicio: 14 $\pm$ 3%
Acabados:	NATURAL
Formatos:	Dimensiones (mm)., Anchos : de 22 a 150 mm: gruesos: de 13 a 75 mm. Largos: de 2,40 a 4,50 m.
Modelos:	900
Embalaje y Etiqueta	Paquetes con film retráctil.
Instalación:	mediante clavos
Gestión Sostenible	Empresa con Gestión Ambiental certificada. Productos respetuosos con el medio Ambiente. Cadena de Custodia PEFC y FSC
Mantenimiento	El producto no necesita mantenimiento.
Certificados	Empresa: **ISO 9001** (ER-0011/1991); **ISO 14001** (GA-2000/0025); **PEFC** (14-35-00063); **FSC** (AEN-COC-000210)

CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Transparente-10

REPELENTE DE AGUA PARA FACHADAS DE GRAN DURABILIDAD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Transparente-10 es un líquido incoloro con base en siliconas, que protege las fachadas y culatas de las edificaciones contra la penetración del agua lluvia.

USOS

Como repelente de agua sobre bases minerales, tales como: ladrillo, piedra, mármol, concreto o culatas terminadas con pañete u otros materiales porosos.
Como recubrimiento antimusgo en tejas de barro.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- De gran durabilidad (7 a 10 años) y listo para usar.
- Impide que los muros absorban agua lluvia.
- No forma película y permite que la superficie respire.
- No altera la apariencia del material sobre el cual se aplica.
- Controla la absorción en muros de piedra, mármol, concreto, pañete, yeso, ladrillo y otros materiales absorbentes.
- Protege las fachadas de la suciedad, polvo, hollín, disminuyendo costos de mantenimiento por más tiempo.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	1 gl, 5 gl, 55 gl.
Apariencia / Color	Incoloro
Vida útil en el recipiente	Un (1) año desde su producción.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones nor-males para productos químicos inflamables.
Densidad	0.77 kg/l ± 0,02 kg/l
Coeficiente de la tasa de secado	1 hora a 20°C - 65% Humedad Relativa.
Consumo	20 m^2 / gl/ capa (mínimo 2 capas) Consumo verificado bajo ensayo realizado en laboratorio en condicionos normales. La porosidad del sustrato puede variar por lo cual se recomienda realizar pruebas de rendimiento para verificar el consumo en el sustrato de la obra.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

Sika® Transparente-10 es inflamable, por lo tanto no se debe fumar cerca, ni exponer el producto a las chispas o al fuego directo.
No se debe aplicar bajo sol directo. Proteger de la lluvia 2 a 3 horas después de aplicado.
Proteger vidrios, pisos, jardines, vehiculos, etc, durante la aplicación para evitar manchas en estas superficies.
Sika® Transparente-10, tiene una durabilidad aproximada de 7 a 10 años, si se aplica en la forma indicada en esta hoja técnica y se aplica la cantidad de producto requerida para impermeabilizar el sustrato a tratar, esta cantidad de producto requerida se debe validar mediante ensayos en la obra. Esta estimación está basada en nuestros conocimientos actuales de **Sika® Transparente-10,** en condiciones adecuadas de almacenamiento, aplicación y mantenimiento. Sin embargo, debido a que las condiciones reales y su empleo pueden variar considerablemente, esta estimación es sólo indicativa y la duración de vida real podría ser más corta o prolongarse mas allá de lo enunciado anteriormente. Las condiciones de los sustratos deben cumplir con los requerimientos previos a la aplicación del **Sika® Transparente-10** y se deben cumplir las normas de construcción vigentes en Colombia.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

- Si el sustrato conserva humedad antes de la aplicación del **Sika® Transparente-10** es posible que el agua atrapada genere manchas. En este caso retire la mancha con **Sikalimpiador Rinse** y una lija, deje secar y proteja nuevamente con **Sika® Transparente-10**
- El efecto perlado es una prueba inicial de verificación de la aplicación del **Sika® Transparente-10**, sin embargo este efecto se pierde con el tiempo (6 meses aprox.) por lo que la forma de verificar la eficiencia del producto es con la prueba de penetración con pipetas de Karsten.
- Pueden existir variaciones del color y el olor del producto entre lotes, debido a la materia prima solvente, lo que no ocasiona cambios en el desempeño o aplicabilidad del producto.
- Usar guantes de caucho y gafas protectoras para su manipulación, elementos de agarre para trabajos en altura ó al aire. Consultar hoja de seguridad del producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

Preparación de la superficie:
La base debe estar seca, sana y limpia lavar la superficie con el **SikaLimpiador Rinse.** El producto usado para lavar la superficie debe lavarse y retirarse totalmente, asegurando que no queden residuos sobre la superficie. Estos residuos pueden generar futuras manchas blancas después de aplicado el hidrofugo. Dejar secar mínimo tres (3) días después de lavada la superficie.
Si existen grietas o fisuras, éstas deben ser reparadas, dejando transcurrir cuatro (4) días por lo menos antes de aplicar el **Sika® Transparente-10** para permitir completo fraguado y secado del mortero utilizado en las reparaciones.

APLICACIÓN

La aplicación **Sika® Transparente-10** puede hacerse con pistola, fumigadora, rodillo o brocha, mínimo tres (3) días después de lavada la superficie (sin lluvia), colocando el número de capas necesario para saturar completamente la superficie teniendo un tiempo entre capas de aproximadamente una (1) hora a 20°C. Lave las herramientas con solvente convencional, cuando el producto todavía esté fresco.
Observación: Se recomienda hacer ensayos de campo para determinar la cantidad de capas o de producto requerido por metro cuadrado, lo cual depende del tipo de superficie y su absorción. Los ensayos consisten aplicar **Sika® Transparente-10** en fachadas en varias capas (2 capas, 3 capas, etc). Posteriormente revisar la impermeabilidad óptima midiendo la penetración del agua con pipetas Karsten.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaFill® 09 Negro

IMPERMEABILIZANTE ASFALTO-ACRÍLICO 400% DE ELONGACIÓN PARA CUBIERTAS TECHOS Y TERRAZAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaFill® 09 Negro es una membrana líquida impermeable monocomponente asfalto-acrílica, tixotrópica en dispersión acuosa, con alto potencial elástico (≥ 400%) para techos, cubiertas y terrazas tanto en obra nueva como para mantenimiento. Permite puentear fisuras nuevas hasta 6mm sin refuerzo y 9mm con refuerzo **SikaFelt® FPP30**.

USOS

- Se emplea para impermeabilizar cubiertas techos y terrazas no transitables o con tráfico peatonal leve y esporádico únicamente para mantenimiento
- Se puede aplicar como membrana liquida protectora sobre mortero, concreto y fibrocemento. Para aplicaciones sobre otro tipo de superficies se recomienda hacer pruebas previas en un área de 1m x 1m para verificar que exista una adecuada adherencia.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Alta elongación (≥ 400%)
- Alta capacidad de puenteo de fisuras
- Buena adherencia con la mayoría de los materiales de construcción.
- Compatible con varios recubrimientos acrílicos.
- Amigable con el ambiente (base agua).
- Fácil y rápido de aplicar

CERTIFICADOS / NORMAS

Clasificación USGBC LEED:
SikaFill® 09 Negro se ajusta a los requisitos de LEED - EQ. Crédito 4.2: Materiales de baja emisión Pinturas & Recubrimientos: VOC

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	▪ Galón: 3.5 kg ▪ Cuñete: 22 kg
Color	Negro
Vida útil en el recipiente	12 meses desde su fecha de producción, si se ha almacenado adecuadamente y en su recipiente original
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en su envase original, bien cerrado en lugar fresco, seco y bajo techo a una temperatura mayor a 5°C y menor a 35°C. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
Densidad	1.21 +/-0.03
Contenido en Sólidos	65% +/-3

Viscosidad	11000 - 14000 cP a 20 °C

INFORMACION DE APLICACIÓN

Tiempo de secado al tacto	30 min
Tiempo de Formación de Piel / Tiempo entre capas	3 horas (20°C y 65% HR)

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

Sistema Expuesto	Consumo* aprox. (kg/m²)
Imprimación (Dilución con agua potable 1:1)	0.12
1er capa pura **SikaFill® 09 Negro**	1
Refuerzo. SikaFelt FPP - 30	
1ra Capa Final **SikaFill® 100 Súper**	0.35
2da Capa Final **SikaFill® 100 Súper**	0.35
Consumo Total	1.82

Rendimiento **SikaFill® 09 Negro** para el sistema expuesto de alta elongación: Un cuñete de 22kg rinde para 20 m² aprox., dependiendo de la rugosidad de la superficie.
Aplicando estos consumos de la tabla asegura una película seca de 0.89 mm de espesor para el sistema expuesto.

Sistema con Acabado Duro	Consumo* aprox. (kg/m²)
Imprimación (Dilución con agua potable 1:1)	0.12
1er capa pura **SikaFill® 09 Negro**	1
Refuerzo. SikaFelt FPP - 30	
2da capa pura **SikaFill® 09 Negro**	0.8
Consumo Total	1.92

Rendimiento **SikaFill® 09 Negro** para el sistema con acabado duro de alta elongación: Un cuñete de 22kg rinde para 11 m² aprox., dependiendo de la rugosidad de la superficie.
Aplicando estos consumos de la tabla asegura una película seca de 1 mm de espesor para el sistema de acabado duro.

*Estos consumos son una aproximación teórica que puede variar dependiendo del tipo de sustrato, la rugosidad de la superficie y los métodos de aplicación.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- **SikaFill® 09 Negro** se debe mezclar antes de utilizarlo.
- No aplicar este producto a temperaturas del sustrato menores de 5°C ni mayores de a 35°C.
- En caso de aplicar sobre una impermeabilización existente, esta se deberá remover completamente.
- No se debe aplicar en superficies con encharcamiento.
- Para aplicación en superficies húmedas emplee como imprimación **SikaFill®- Primer** antes de aplicar el sistema **SikaFill® 09 Negro**
- No aplicar sobre superficies saturadas de agua o sujetas a humedad ascendente.
- Solo se puede aplicar con humedades relativas del sustrato por debajo del 4%.
- No exponga el producto que no se haya secado por completo a las heladas o la lluvia.
- Es preferible que los sustratos cementosos hayan curado al menos 28 días.
- Evite objetos sobre la película seca, que puedan generar punzonamiento y dañarla.

- Este producto no es transitable
- No compatible con PVC/TPO.
- El sistema expuesto **SikaFill® 09 Negro** requiere un Top Coat tipo **SikaFill® 100 Súper**.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACION DEL SUSTRATO

La superficie debe estar sana y limpia, libre de polvo, lechadas de cemento o mortero, grasa o material que impida la adherencia del producto. El sustrato debe tener la pendiente adecuada y estar sin depresiones que den lugar a empozamientos de agua prolongados o permanentes.

APLICACIÓN

SikaFill® 09 Negro puede puentear fisuras nuevas de hasta 6 mm de espesor sin refuerzo y 9mm de espesor con refuerzo. Las juntas de dilatación, construcción y fisuras que existan deben sellarse con un material de poliuretano flexible tipo **Sikaflex®**. El procedimiento consiste en abrir la grieta con pulidora y disco de corte, retirar el polvo y secar muy bien el sustrato antes de aplicar el sello de poliuretano.

Nota:
- Tenga la precaución al instalar la tela de refuerzo **SikaFelt® FPP-30**, que quede totalmente adherida a la superficie.
- Se debe usar la tela de refuerzo **SikaFeltFPP®-30** en zonas críticas como: detalles, bajantes, juntas constructivas, fisuras y cambios de dirección. Usar la tela de refuerzo también en lugares donde se prevean altos movimientos.

Imprimación: Diluir el producto **SikaFill® 09 Negro** en agua potable en una relación 1:1 en volumen y aplicar con rodillo, escoba o brocha sobre la superficie, garantizando que penetre bien en todas las porosidades del sustrato.

Acabado: Para acabado expuesto, aplicar el producto puro en 1 capa sin presionar el rodillo o la brocha contra la superficie para permitir que se aplique la cantidad de producto requerida . Estando fresca la primera capa, instale el refuerzo **SikaFelt® FPP-30**. Deje secar y proceda a aplicar como acabado en dos capas el Top Coat **SikaFill® 100 Súper** sin presionar el rodillo o la brocha contra la superficie para permitir que se aplique la cantidad de producto requerida. Dejar secar completamente entre capas (Aproximadamente 3 horas a 20°C y 65% Humedad relativa) y aplicar las capas en sentido cruzado una con respecto a la anterior, hasta obtener un espesor de película seca de 0.89 mm.

Esta impermeabilización no es transitable. En el caso de requerirse tránsito sobre ella o acabado duro, se realizará la imprimación como se mencionó anteriormente, luego se aplicará la primera capa pura con **SikaFill® 09 Negro**, seguida de la tela de refuerzo **SikaFelt® FPP-30** estando fresca la primera capa y finalmente aplicar la segunda capa pura con **SikaFill® 09 Negro** hasta obtener un espesor de película seca de 1mm, deje secar e instale una capa separadora o geotextil para recibir el mortero mínimo de 5cm como acabado duro.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento para el sistema expuesto consiste en aplicar una capa del acabado final **SikaFill®-100 Super CO** para renovar el sistema de impermeabilización y extender su durabilidad. Para hacer el mantenimiento se debe hacer una limpieza adecuada, en la que se eliminan todas las sustancias que impidan la adherencia del producto, tales como polvo, grasas, contaminación, etc. Se deben reparar las zonas de producto que están deterioradas por punzonamiento, fisuración del sustrato, fallas por adherencia (por falla del sustrato) o ampollamientos de la película impermeable (por empozamiento de agua). Las grietas que se identifiquen se deben sellar con poliuretano flexible tipo **Sikaflex®**.

Inspecciones periódicas: Se recomienda realizar inspecciones periódicas anuales, las cuales consisten en la revisión visual del sistema de cubierta, para verificar su estado y ejecutar actividades de limpieza y reparaciones puntuales de ser requeridas: Verificar la integridad de la película impermeable y repararla puntualmente en las zonas donde se identifiquen roturas, fallas por adherencia, punzonamiento, rasgado, ampollamiento o fisuración (causada por tráfico, empozamiento etc).

1. Hacer limpieza a la cubierta para retirar elementos cortopunzantes como piedras, vidrios, tornillos, puntillas, palos de madera, varillas metálicas, etc. que pueden causar roturas al sistema impermeable.

2. Revisar y limpiar los sifones para evitar taponamiento de estos y por ende empozamientos de agua lluvia.

3. Identificar zonas con empozamientos de agua temporales o continuos y repararlas de ser necesario, aplicando capas adicionales de producto.

En las inspecciones anuales realizar un adecuado mantenimiento al acabado final al identificar perdida en el espesor de la capa final.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tela de Cerramiento

La Tela de cerramiento, es un material ideal para el cerramiento de obras de construcción vial y la construcción en general, permite aislar áreas de trabajo que generen peligro para los trabajadores, peatones, vehículos y público en general, gracias a sus distintivos colores blanco y verde este material posee mucha visibilidad y no pasa desapercibido ya sea desde lejos o en distancias reducidas.



PAVCO wavin

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alta duración gracias a su mayor gramaje.
- Alta resistencia permite más cantidad de re-usos.
- Color blanco o verde que le proporciona mayor visibilidad.
- Protección UV, para minimizar su degradación con la exposición a la intemperie.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Cerramiento de obras de construcción.

FUNCIONES

Protección



PROPIEDADES FÍSICAS	
Dimensiones	Ancho: 210 cm +/-2cm Largo: 101 m +/- 1 m
Peso	65 g/m^2 +/-5%
Presentación	Tela doblada a 105 cm Rollos 100m en tubo de PVC de 3.5” de diámetro.
Color	Urdimbre: Blanco - Verde. Trama: Blanco - Verde.
Duración protección ultravioleta	6 meses.
Resistencia a rayos ultravioleta	Posee aditivos para la protección a la luz ultravioleta. No se recomienda en ningún caso almacenar a la intemperie. La vida útil de la tela dependerá de las condiciones de manipulación y almacenamiento. Si la tela recibe luz indirecta del sol, debe cubrirse para evitar la fotodegradación del polímero.

PROPIEDADES QUÍMICAS	
Positiva a:	Ácidos fuertes (sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico, Fórmico, Fluorhí-drico). Bases (soda cáustica, Hidróxido de potasio, Carbonato de Sodio, Hidróxido de amonio). Además detergentes, Alcoholes, Sales, Aceites, Peróxido de hidrógeno.
Negativa a:	Cloroformo, Xileno, Tolueno, Tricloroetileno.
Temperatura de uso	Mantiene estables sus propiedades mecánicas en un rango entre 9 y 100 grados centígrados.

Nota:

No se asume responsabilidad en relación al uso final de esta información por parte del comprador. Este documento no debe ser interpretado como una recomendación de ingeniería. Las recomendaciones para el manejo seguro de este producto las puede solicitar a nuestro departamento de Servicio al Cliente o consultarlas en nuestra página web www.wavin.com/es-co

CONVENCIONES:

ASTM: American Society for Testing and Materials. • **N. A.:** No aplica.

Operamos bajo sistemas internacionales de control de calidad; Contamos con la acreditación **GAI LAP (The Geosynthetic Institute).**

La presente ficha técnica está vigente a partir de mayo de 2021. Nos reservamos el derecho de introducir las modificaciones de especificaciones que considere necesarias para garantizar la óptima calidad y funcionalidad de sus productos sin previo aviso. La información aquí contenida se ofrece gratis, es cierta y exacta a nuestro leal saber y entender; no obstante, todas las recomendaciones y sugerencias están hechas sin garantía, puesto que las condiciones de uso están fuera de nuestro control y es responsabilidad exclusiva del usuario. Por favor verificar los datos de esta especificación con el Departamento de Ingenieria para confirmar que la información esta vigente.

COLOMBIA: • Tel.: (571) 782 5000 Exts: 1518
• ingenieriageosinteticos@wavin.com • www.wavin.com/es-co
PERÚ: • Tels.: (511) 6276038 / 6276039 • geosperu@wavin.com • www.wavin.com/es-pe

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO. 4

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	#CONSORCIOPLAZASESQUILE CONSORCIO INTER PLAZA
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO. 4	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y				
	CONDICIONES CONTRACTUALES:				
CONTRATO DE OBRA No.:	SA-MC-OBRA-213-2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 362.754.442,00	FECHA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2025
		VALOR ADICIÓN No. 1	$ 35.000.000,00	DURACIÓN INICIAL	5 MESES
		VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 397.754.442,00	PRORROGA	N.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLAZA SESQUILE			FECHA SUSPENSION NO. 1	15 DE ENERO DE 2026
				TERMINO SUSPENSION NO. 1	20 DIAS CALENDARIO
				FECHA DE REINICIO NO. 1	5 DE FEBRERO DE 2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPLAZA			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	7 DE FEBRERO DE 2026
SUPERVISOR:	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS			FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE FEBRERO DE 2026

En el Municipio de Sesquilé, a los veintidos (22) días del mes de diciembre del Año DOS MIL VEINTICINCO (2025), se reunieron las siguientes personas: MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA, Representante Legal del CONSORCIO INSTALACIONES SESQUILE; en calidad de Contratista, MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY, Director de obra, la ING. MAYRA

ITEM	REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO.3			MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO.4			
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL
1. PRELIMINAR										
1.1	1.1	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	140,00	$ 29.110,00	$ 4.075.400,00			140,00	$ 4.075.400,00
1.2	1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	115,05	$ 10.687,00	$ 1.229.539,35		15,00	100,05	$ 1.069.234,35
1.3	1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M	M2	0,00	$ 26.795,00	$ -			0,00	$ -
1.4	1,21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	19,42	$ 59.628,00	$ 1.157.975,76		19,42	0,00	$ -
1.5	1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	16,00	$ 19.531,00	$ 312.496,00			16,00	$ 312.496,00
1.6	1,39	DESMONTE VENTANAS	M2	28,72	$ 16.955,00	$ 486.947,60	0,004		28,72	$ 487.020,51
1.7	1,15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	49,28	$ 13.559,00	$ 668.187,52	148,63		197,91	$ 2.683.461,69
1.8	1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	68,43	$ 10.865,00	$ 743.491,95		68,43	0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 8.674.038,18**				**$ 8.627.612,55**
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2.1	16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	$ 20.798,00	$ -			0,00	$ -
2.2	16,13	BASE GRANULAR BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	30,00	$ 260.076,00	$ 7.802.280,00	0,71		30,71	$ 7.986.933,96
2.3	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	50,00	$ 64.561,00	$ 3.228.050,00		3,93	46,07	$ 2.974.325,27
		SUBTOTAL				**$ 11.030.330,00**				**$ 10.961.259,23**
3. CIMIENTOS										
3.1	2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	0,00	$ 247.037,00	$ -			0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ -**				**$ -**
4. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS										
4.1	3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	5,00	$ 470.849,00	$ 2.354.245,00		3,00	2,00	$ 941.698,00
		SUBTOTAL				**$ 2.354.245,00**				**$ 941.698,00**
5. MAMPOSTERIA										
5.1	5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	0,00	$ 204.916,00	$ -			0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ -**				**$ -**
6. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS										
6.1	6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	0,00	$ 25.620,00	$ -			0,00	$ -
6.2	6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	183,63	$ 31.122,00	$ 5.714.932,86	17,31		200,94	$ 6.253.579,99
		SUBTOTAL				**$ 5.714.932,86**				**$ 6.253.579,99**
7. CUBIERTAS										
7.1	7,19	TEJA DE BARRO	M2	51,33	$ 85.195,00	$ 4.373.059,35	2,41		53,74	$ 4.578.379,30
7.2	7,3	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	0,00	$ 63.698,00	$ -			0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 4.373.059,35**				**$ 4.578.379,30**
8. CARPINTERIA EN MADERA										
8.1	9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	1,00	$ 158.037,00	$ 158.037,00			1,00	$ 158.037,00
8.2	9,27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	0,00	$ 467.284,00	$ -			0,00	$ -
8.3	9,3	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	0,00	$ 60.050,00	$ -			0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 158.037,00**				**$ 158.037,00**
9. CARPINTERIA METALICA										
9.1	10,4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,00	$ 214.426,00	$ 214.426,00			1,00	$ 214.426,00
9.2	10,5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	2,00	$ 239.524,00	$ 479.048,00			2,00	$ 479.048,00
9.3	10,8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,00	$ 156.984,00	$ -			0,00	$ -
9.4	10.27	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,00	$ 180.962,00	$ -			0,00	$ -
9.5	10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	0,00	$ 125.119,00	$ -			0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 693.474,00**				**$ 693.474,00**
10. INSTALACIONES ELECTRICAS										
10.1	12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	0,00	$ 78.286,00	$ -			0,00	$ -
10.2	12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	0,00	$ 75.725,00	$ -			0,00	$ -
10.3	12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	0,00	$ 566.060,00	$ -			0,00	$ -
10.4	12,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	0,00	$ 4.874,00	$ -			0,00	$ -
10.5	12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	0,00	$ 370.755,00	$ -			0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ -**				**$ -**
11. PISOS BASES										

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILE / CONSORCIO INTER PLAZA
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO. 4	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y					
	CONDICIONES CONTRACTUALES:					
CONTRATO DE OBRA No.:	SA-MC-OBRA-213-2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 362.754.442,00	FECHA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2025	
		VALOR ADICIÓN No. 1	$ 35.000.000,00	DURACIÓN INICIAL	5 MESES	
		VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 397.754.442,00	PRORROGA	N.A.	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLAZA SESQUILE			FECHA SUSPENSION NO. 1	15 DE ENERO DE 2026	
				TERMINO SUSPENSION NO. 1	20 DIAS CALENDARIO	
				FECHA DE REINICIO NO. 1	5 DE FEBRERO DE 2026	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPLAZA			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	7 DE FEBRERO DE 2026	
SUPERVISOR:	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS			FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE FEBRERO DE 2026	

En el Municipio de Sesquilé, a los veintidos (22) días del mes de diciembre del Año DOS MIL VEINTICINCO (2025), se reunieron las siguientes personas: MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA, Representante Legal del CONSORCIO INSTALACIONES SESQUILE; en calidad de Contratista, MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY, Director de obra, la ING. MAYRA

ITEM	REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO.3			MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO.4			
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL
11.1	12,8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	10,00	$ 104.214,00	$ 1.042.140,00		4,37	5,63	$ 586.724,82
		SUBTOTAL				$ 1.042.140,00				$ 586.724,82
12. PISOS Y ENCHAPES										
12.1	14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	0,00	$ 80.461,00	$ -			0,00	$ -
12.2	14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	161,26	$ 97.377,00	$ 15.703.015,02		16,83	144,43	$ 14.064.160,11
12.3	14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	0,00	$ 89.235,00	$ -			0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 15.703.015,02				$ 14.064.160,11
13. CIELO RASO										
13.1	15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	0,00	$ 72.828,00	$ -			0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ -				$ -
14. APARATOS SANITARIOS										
14.1	17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 490.355,00	$ 490.355,00		1,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 490.355,00				$ -
15. ACABADOS										
15.1	18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	80,62	$ 12.558,00	$ 1.012.425,96	2,35		82,97	$ 1.041.914,66
15.2	18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	$ 23.703,00	$ -			0,00	$ -
15.3	18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	0,00	$ 19.667,00	$ -			0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 1.012.425,96				$ 1.041.914,66
16. INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS										
16.1	21,35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	0,00	$ 65.003,00	$ -			0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ -				$ -
17. OBRAS EXTERIORES										
17.1	6,4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	0,00	$ 218.711,00	$ -			0,00	$ -
17.2	6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	0,00	$ 1.073.172,00	$ -			0,00	$ -
17.3	6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	0,00	$ 827.960,00	$ -			0,00	$ -
17.4	6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	0,00	$ 693.927,00	$ -			0,00	$ -
17.5	6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	0,00	$ 740.433,00	$ -			0,00	$ -
17.6	6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	0,00	$ 8.206.890,00	$ -			0,00	$ -
17.7	6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	0,00	$ 269.056,00	$ -			0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ -				$ -
18. ITEMS NO PREVISTOS										
18.1	APU 1	DEMOLICIÓN PLACA MESÓN	M2	31,95	$ 27.797,00	$ 888.114,15		2,13	29,82	$ 828.906,54
18.2	APU 2	DESMONTE DE LAVAPLATOS	UN	10,00	$ 38.982,00	$ 389.820,00			10,00	$ 389.820,00
18.3	ICCU C 1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4,00	$ 35.121,00	$ 140.484,00			4,00	$ 140.484,00
18.4	APU 3	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	UN	1,00	$ 209.415,00	$ 209.415,00			1,00	$ 209.415,00
18.5	ICCU C 1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	223,62	$ 22.788,00	$ 5.095.852,56		1,19	222,43	$ 5.068.680,15
18.6	ICCU C 1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	112,55	$ 15.877,00	$ 1.786.956,35		40,00	72,55	$ 1.151.876,35
18.7	APU 4	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS	UN	14,00	$ 82.356,00	$ 1.152.984,00			14,00	$ 1.152.984,00
18.8	APU 5	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS	UN	4,00	$ 91.506,00	$ 366.024,00			4,00	$ 366.024,00
18.9	APU 6	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	37,00	$ 30.978,00	$ 1.146.186,00			37,00	$ 1.146.186,00
18.10	CCU C 11.1	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	10,00	$ 103.925,00	$ 1.039.250,00			10,00	$ 1.039.250,00
18.11	CCU C 11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	9,00	$ 108.407,00	$ 975.663,00			9,00	$ 975.663,00
18.12	APU 7	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 2"	UN	10,00	$ 91.845,00	$ 918.450,00			10,00	$ 918.450,00
18.13	CCU C 5.18	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M (LINEAL)	ML	22,30	$ 38.305,00	$ 854.201,50			22,30	$ 854.201,50
18.14	APU 8	PLACA BASE CONCRETO 0.10M 3000 PSI	M2	49,28	$ 101.402,00	$ 4.997.090,56			49,28	$ 4.997.090,56
18.15	ICCU C 13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	97,16	$ 38.771,00	$ 3.766.990,36			97,16	$ 3.766.990,36
18.16	CCU C 5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 015 M	M2	45,62	$ 124.482,00	$ 5.678.868,84		2,84	42,78	$ 5.325.339,96
18.17	CCU C 5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	32,50	$ 79.257,00	$ 2.575.852,50	10,11		42,61	$ 3.377.140,77
18.18	CCU C 6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	97,50	$ 20.855,00	$ 2.033.362,50	127,94		225,44	$ 4.701.551,20
18.19	APU 9	COLUMNETA 0.10MX0.15M 3000 PSI	ML	23,20	$ 113.474,00	$ 2.632.596,80			23,20	$ 2.632.596,80
18.20	ICCU C 4.22	ACERO FIGURADO 6000 PSI	KG	139,05	$ 7.950,00	$ 1.105.447,50		3,11	135,94	$ 1.080.723,00
18.21	ICCU C 4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	136,04	$ 10.461,00	$ 1.423.114,44	6,16		142,20	$ 1.487.554,20
18.22	ICCU C 5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	86,00	$ 7.228,00	$ 621.608,00		2,48	83,52	$ 603.682,56

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO INTER PLAZA
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO. 4	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y				
	CONDICIONES CONTRACTUALES:				
CONTRATO DE OBRA No.:	SA-MC-OBRA-213-2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 362.754.442,00	FECHA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2025
		VALOR ADICIÓN No. 1	$ 35.000.000,00	DURACIÓN INICIAL	5 MESES
		VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 397.754.442,00	PRORROGA	N.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLAZA SESQUILE			FECHA SUSPENSION NO. 1	15 DE ENERO DE 2026
				TERMINO SUSPENSION NO. 1	20 DIAS CALENDARIO
				FECHA DE REINICIO NO. 1	5 DE FEBRERO DE 2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPLAZA			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	7 DE FEBRERO DE 2026
SUPERVISOR:	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS			FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE FEBRERO DE 2026

En el Municipio de Sesquilé, a los veintidos (22) días del mes de diciembre del Año DOS MIL VEINTICINCO (2025), se reunieron las siguientes personas: MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA, Representante Legal del CONSORCIO INSTALACIONES SESQUILE; en calidad de Contratista, MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY, Director de obra, la ING. MAYRA

ITEM	REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO.3			MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO.4			
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL
18.23	APU 10	VIGUETA DE AMARRE DE 0.20M X 0.20M 3000 PSI	ML	96,34	$ 87.390,00	$ 8.419.152,60		1,54	94,80	$ 8.284.572,00
18.24	APU 11	VIGUETA AEREA 0.20M X 0.20M 3000 PSI	ML	16,34	$ 123.080,00	$ 2.011.127,20			16,34	$ 2.011.127,20
18.25	ICCU C 6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	239,68	$ 11.672,00	$ 2.797.544,96	3,01		242,69	$ 2.832.677,68
18.26	CCU C 15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	82,09	$ 83.996,00	$ 6.895.231,64		3,34	78,75	$ 6.614.685,00
18.27	CCU C 18.8	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	5,64	$ 4.390,00	$ 24.759,60			5,64	$ 24.759,60
18.28	CCU C 18.9	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	2,32	$ 22.708,00	$ 52.682,56			2,32	$ 52.682,56
18.29	APU 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE	M2	181,61	$ 27.848,00	$ 5.057.475,28		1,59	180,02	$ 5.013.196,96
18.30	APU 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE (LINEAL)	ML	65,00	$ 18.830,00	$ 1.223.950,00	159,44		224,44	$ 4.226.205,20
18.31	APU 14	VINILO ANTISEPTICO, IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE	M2	176,61	$ 28.321,00	$ 5.001.771,81		0,79	175,82	$ 4.979.398,22
18.32	APU 15	VINILO ANTISEPTICO , IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE (LINEAL)	ML	65,00	$ 20.212,00	$ 1.313.780,00	159,44		224,44	$ 4.536.381,28
18.33	APU 16	BALDOSA CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA	M2	31,21	$ 135.831,00	$ 4.239.285,51		3,25	27,96	$ 3.797.834,76
18.34	APU 17	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	3,16	$ 76.968,00	$ 243.218,88	1,88		5,04	$ 387.918,72
18.35	APU 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO	M2	97,00	$ 190.705,00	$ 18.498.385,00		0,59	96,41	$ 18.385.869,05
18.36	CCU C 5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	145,68	$ 9.609,00	$ 1.399.839,12		59,17	86,51	$ 831.257,29
18.37	APU 19	ANCLAJE 1/2" L=15 cm	UN	91,00	$ 21.766,00	$ 1.980.706,00		1,00	90,00	$ 1.958.940,00
18.38	CCU C 12.1	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	1,00	$ 138.762,00	$ 138.762,00	8,00		9,00	$ 1.248.858,00
18.39	APU 20	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	M2	71,00	$ 58.524,00	$ 4.155.204,00	0,07		71,07	$ 4.159.300,68
18.40	ICCU C 5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO)	M2	11,16	$ 142.553,00	$ 1.590.891,48		1,33	9,83	$ 1.401.295,99
18.41	APU 21	ACABADO EN MICROCEMENTO PARA MESONES	M2	11,16	$ 194.941,00	$ 2.175.541,56	1,92		13,08	$ 2.549.828,28
18.42	APU 22	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	UN	20,00	$ 114.127,00	$ 2.282.540,00			20,00	$ 2.282.540,00
18.43	APU 23	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	UN	11,00	$ 146.568,00	$ 1.612.248,00			11,00	$ 1.612.248,00
18.44	APU 24	SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	UN	12,00	$ 104.520,00	$ 1.254.240,00			12,00	$ 1.254.240,00
18.45	APU 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL SQ 24W	UN	2,00	$ 79.884,00	$ 159.768,00			2,00	$ 159.768,00
18.46	APU 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL SQ 40W	UN	12,00	$ 121.700,00	$ 1.460.400,00	8,00		20,00	$ 2.434.000,00
18.47	ICCU C 15.8	LISTON M.H. PINO ROMERON (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	25,26	$ 150.352,00	$ 3.797.891,52		3,35	21,91	$ 3.294.212,32
18.48	APU 27	LISTON M.H. PINO ROMERON LINEAL (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	ML	33,10	$ 99.668,00	$ 3.299.010,80	29,34		62,44	$ 6.223.269,92
18.49	CCU C 10.1	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	44,13	$ 382.133,00	$ 16.863.529,29		0,64	43,49	$ 16.618.964,17
18.50	CCU C 14.3	REMATES BOCEL WING ALUMINIO	ML	46,45	$ 14.795,00	$ 687.227,75		16,77	29,68	$ 439.115,60
18.51	APU 30	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	60,70	$ 341.627,00	$ 20.736.758,90		17,21	43,49	$ 14.857.358,23
18.52	CCU C 10.1	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,32	$ 222.260,00	$ 515.643,20			2,32	$ 515.643,20
18.53	APU 32	PASE MURO PARA CONEXION DE GAS	UN	8,00	$ 56.659,00	$ 453.272,00			8,00	$ 453.272,00
18.54	APU 33	RESTAURACION Y ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA	M2	26,33	$ 118.027,00	$ 3.107.650,91			26,33	$ 3.107.650,91
18.55	APU 34	RETIRO DE MANTO EN ASFALTO EXISTENTE	M2	26,33	$ 85.681,00	$ 2.255.980,73			26,33	$ 2.255.980,73
18.56	APU 35	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO CON MEMBRANA ASFALTICA	M2	51,33	$ 180.802,00	$ 9.280.566,66		0,72	50,61	$ 9.150.389,22
18.57	APU 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA SISTEMA RETRACTIL SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO INC. ANTICORROSIVO	M2	35,72	$ 1.360.357,00	$ 48.586.919,45		1,76	33,96	$ 46.197.723,72
18.58	APU 37	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA DE PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO	ML	123,30	$ 60.308,00	$ 7.435.976,40	4,97		128,27	$ 7.735.707,16
18.59	APU 38	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 134.504,00	$ 134.504,00			1,00	$ 134.504,00
18.60	APU 39	DEMOLICION DE CAÑUELA	ML	10,00	$ 40.695,00	$ 406.950,00	17,00		27,00	$ 1.098.765,00
18.61	APU 40	CÁRCAMO PARA AGUAS LLUVIAS	ML	17,00	$ 261.683,00	$ 4.448.611,00			17,00	$ 4.448.611,00
18.62	APU 41	REJILLA METALICA EN ANGULO DE 1" Y 1/8", CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" Y 1/8", Y CONTRA MARCO EN ANGULO DE 1/4" Y 1/8"	ML	17,00	$ 248.017,00	$ 4.216.289,00			11,38	$ 2.823.309,97
18.63	APU 42	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE TANQUE 100 X 51 ACERO INOXIDABLE PARA EL KIOSCO. INCLUYE REJILLA Y GRIFERIA.	UN	1,00	$ 946.212,00	$ 946.212,00			1,00	$ 946.212,00
18.64	APU 43	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE TANQUE 80X43 ACERO INOXIDABLE PARA LOCALES DE COMIDA. INCLUYE REJILLA Y GRIFERIA.	UN	8,00	$ 762.612,00	$ 6.100.896,00			8,00	$ 6.100.896,00
18.65	APU 44	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFONES EN Y	UN	9,00	$ 84.079,00	$ 756.711,00			9,00	$ 756.711,00
18.66	APU 45	CAÑUELA EN CONCRETO 2500 PSI 0.30 X 0.12	ML	10,00	$ 74.416,00	$ 744.160,00			10,00	$ 744.160,00
		SUBTOTAL				$ 247.817.437,87				$ 251.156.650,58

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILE / CONSORCIO INTER PLAZA
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO. 4	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y					
	CONDICIONES CONTRACTUALES:					
CONTRATO DE OBRA No.:	SA-MC-OBRA-213-2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 362.754.442,00	FECHA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2025	
		VALOR ADICIÓN No. 1	$ 35.000.000,00	DURACIÓN INICIAL	5 MESES	
		VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 397.754.442,00	PRORROGA	N.A.	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLAZA SESQUILE			FECHA SUSPENSION NO. 1	15 DE ENERO DE 2026	
				TERMINO SUSPENSION NO. 1	20 DIAS CALENDARIO	
				FECHA DE REINICIO NO. 1	5 DE FEBRERO DE 2026	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPLAZA			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	7 DE FEBRERO DE 2026	
SUPERVISOR:	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS			FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE FEBRERO DE 2026	

En el Municipio de Sesquilé, a los veintidos (22) días del mes de diciembre del Año DOS MIL VEINTICINCO (2025), se reunieron las siguientes personas: MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA, Representante Legal del CONSORCIO INSTALACIONES SESQUILE; en calidad de Contratista, MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY, Director de obra, la ING. MAYRA

ITEM	REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO.3			MAYORES Y MENORES CANTIDADES NO.4			
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MAYOR	CANTIDAD MENOR	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL
		COSTOS DIRECTOS				$ 299.063.490,23				$ 299.063.490,24
ADMINISTRACION			27%			$ 80.747.142,36				$ 80.747.142,36
IMPREVISTOS			1%			$ 2.990.634,90				$ 2.990.634,90
UTILIDAD			5%			$ 14.953.174,51				$ 14.953.174,51
		COSTOS INDIRECTOS				$ 98.690.951,77				$ 98.690.951,77
		AJUSTE AL PESO								$ -0,01
TOTAL COSTOS OBRA						$ 397.754.442,00				$ 397.754.442,00

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY	~~MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA~~	JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA	MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS
DIRECTOR DE OBRA	R.L. CONSORCIO INSTALACIONES SESQUILÉ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	R.L. CONSORCIO INTER PLAZA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR

ACTA FINAL

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILE — CONSORCIO INTER PLAZA
	ACTA FINAL	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA				
CONDICIONES CONTRACTUALES:					
CONTRATO DE OBRA No.:	SA-MC-OBRA-213-2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 362.754.442,00	FECHA DE INICIACIÓN	19 DE AGOSTO DE 2025
		VALOR ADICIÓN No. 1	$ 35.000.000,00	DURACIÓN INICIAL	5 MESES
		VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 397.754.442,00	PRORROGA	1 MES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLAZA SESQUILE			DURACIÓN ACTUAL	6 MESES
				SUSPENSION NO. 1	16 DE ENERO DE 2026 - VEINTE (20) DIAS
				AMPLIACION NO. 1 A SUSPENSION NO. 1	05 DE FEBRERO DE 2026 - QUINCE (15) DIAS
				REINICIO NO. 1	20 DE FEBRERO DE 2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPLAZA			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22 DE MARZO DE 2026
SUPERVISOR:	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS			FECHA DE LA PRESENTE ACTA	22 DE MARZO DE 2026

En el Municipio de Sesquilé, a los veintidos (22) días del mes de marzo del Año DOS MIL VEINTISEIS (2026), se reunieron las siguientes personas: MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA, Representante Legal del CONSORCIO INSTALACIONES SESQUILE; en calidad de Contratista, MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY, Director de obra, la ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURICA, Representante Legal del CONSORCIO INTER PLAZA; en calidad de Interventoría, JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA, Director de interventoría y el ingeniero NESTOR FABIAN ACERO VARGAS, Secretario de Infraestructura, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta Parcial No. 1, de acuerdo con las revisiones elaboradas por el CONTRATISTA de obra y avaladas por la INTERVENTORIA Y SUPERVISION las cuales se detallan a continuación:

ITEM	REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 4			ACTA PARCIAL NO. 1		ACTA FINAL		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	V/TOTAL
1. PRELIMINAR														
1.1	1.1	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	140,00	$ 29.110,00	$ 4.075.400,00	140,00	$ 4.075.400,00			140,00	$ 4.075.400,00	0,00	$ -
1.2	1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	100,05	$ 10.687,00	$ 1.069.234,35	100,05	$ 1.069.234,35			100,05	$ 1.069.234,35	0,00	$ -
1.3	1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M	M2	0,00	$ 26.795,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
1.4	1,21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	0,00	$ 59.628,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
1.5	1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	16,00	$ 19.531,00	$ 312.496,00	16,00	$ 312.496,00			16,00	$ 312.496,00	0,00	$ -
1.6	1,39	DESMONTE VENTANAS	M2	28,72	$ 16.955,00	$ 487.020,51	28,72	$ 487.020,51			28,72	$ 487.020,51	0,00	$ -
1.7	1,15	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	M2	197,91	$ 13.559,00	$ 2.683.461,69	48,47	$ 657.204,73	149,44	$ 2.026.256,96	197,91	$ 2.683.461,69	0,00	$ -
1.8	1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	$ 10.865,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 8.627.612,55		$ 6.601.355,59		$ 2.026.256,96		$ 8.627.612,55		$ -
2. EXCAVACIONES Y RELLENOS														
2.1	16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,00	$ 20.798,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
2.2	16,13	BASE GRANULAR BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	30,71	$ 260.076,00	$ 7.986.933,96	27,49	$ 7.149.489,24	3,22	$ 837.444,72	30,71	$ 7.986.933,96	0,00	$ -
2.3	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	46,07	$ 64.561,00	$ 2.974.325,27	41,23	$ 2.661.850,03	4,84	$ 312.475,24	46,07	$ 2.974.325,27	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 10.961.259,23		$ 9.811.339,27		$ 1.149.919,96		$ 10.961.259,23		$ -
3. CIMIENTOS														
3.1	2,2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	0,00	$ 247.037,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
4. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS														
4.1	3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	2,00	$ 470.849,00	$ 941.698,00	2,00	$ 941.698,00			2,00	$ 941.698,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 941.698,00		$ 941.698,00		$ -		$ 941.698,00		$ -
5. MAMPOSTERIA														
5.1	5,45	MURO LADRILLO REJILLA 0.25 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	0,00	$ 204.916,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS														
6.1	6,1	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	M2	0,00	$ 25.620,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
6.2	6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	200,94	$ 31.122,00	$ 6.253.579,99	181,77	$ 5.657.033,49	19,17	$ 596.546,50	200,94	$ 6.253.579,99	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 6.253.579,99		$ 5.657.033,49		$ 596.546,50		$ 6.253.579,99		$ -
7. CUBIERTAS														
7.1	7,19	TEJA DE BARRO	M2	53,74	$ 85.195,00	$ 4.578.379,30	50,61	$ 4.311.718,95	3,13	$ 266.660,35	53,74	$ 4.578.379,30	0,00	$ -
7.2	7,3	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO	M2	0,00	$ 83.698,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 4.578.379,30		$ 4.311.718,95		$ 266.660,35		$ 4.578.379,30		$ -
8. CARPINTERIA EN MADERA														
8.1	9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	1,00	$ 158.037,00	$ 158.037,00		$ -	1,00	$ 158.037,00	1,00	$ 158.037,00	0,00	$ -
8.2	9,27	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM	M2	0,00	$ 467.284,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
8.3	9,3	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	0,00	$ 60.050,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 158.037,00		$ -		$ 158.037,00		$ 158.037,00		$ -
9. CARPINTERIA METALICA														
9.1	10,4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,00	$ 214.426,00	$ 214.426,00		$ -	1,00	$ 214.426,00	1,00	$ 214.426,00	0,00	$ -
9.2	10,5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	2,00	$ 239.524,00	$ 479.048,00		$ -	2,00	$ 479.048,00	2,00	$ 479.048,00	0,00	$ -
9.3	10,8	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,00	$ 156.984,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
9.4	10.27	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,00	$ 180.962,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
9.5	10.22	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	UN	0,00	$ 125.119,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 693.474,00		$ -		$ 693.474,00		$ 693.474,00		$ -
10. INSTALACIONES ELECTRICAS														

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA				
CONDICIONES CONTRACTUALES:					
CONTRATO DE OBRA No.:	SA-MC-OBRA-213-2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 362.754.442,00	FECHA DE INICIACIÓN	19 DE AGOSTO DE 2025
		VALOR ADICIÓN No. 1	$ 35.000.000,00	DURACIÓN INICIAL	5 MESES
		VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 397.754.442,00	PRORROGA	1 MES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLAZA SESQUILE			DURACIÓN ACTUAL	6 MESES
				SUSPENSION NO. 1	16 DE ENERO DE 2026 - VEINTE (20) DIAS
				AMPLIACION NO. 1 A SUSPENSION NO. 1	05 DE FEBRERO DE 2026 - QUINCE (15) DIAS
				REINICIO NO. 1	20 DE FEBRERO DE 2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPLAZA			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22 DE MARZO DE 2026
SUPERVISOR:	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS			FECHA DE LA PRESENTE ACTA	22 DE MARZO DE 2026

En el Municipio de Sesquilé, a los veintidos (22) días del mes de marzo del Año DOS MIL VEINTISEIS (2026), se reunieron las siguientes personas: MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA, Representante Legal del CONSORCIO INSTALACIONES SESQUILE; en calidad de Contratista, MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY, Director de obra, la ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURICA, Representante Legal del CONSORCIO INTER PLAZA; en calidad de Interventoría, JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA, Director de interventoría y el ingeniero NESTOR FABIAN ACERO VARGAS, Secretario de Infraestructura, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta Parcial No. 1, de acuerdo con las revisiones elaboradas por el CONTRATISTA de obra y avaladas por la INTERVENTORIA Y SUPERVISION las cuales se detallan a continuación:

ITEM	REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 4			ACTA PARCIAL NO. 1		ACTA FINAL		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	V/TOTAL
10.1	12.2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	0,00	$ 78.286,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
10.2	12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	0,00	$ 75.725,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
10.3	12.14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	0,00	$ 566.060,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
10.4	12.16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	0,00	$ 4.874,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
10.5	12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	0,00	$ 370.755,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		11. PISOS BASES												
11.1	12.8	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	5,63	$ 104.214,00	$ 586.724,82	5,63	$ 586.724,82			5,63	$ 586.724,82	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 586.724,82		$ 586.724,82		$ -		$ 586.724,82		$ -
		12. PISOS Y ENCHAPES												
12.1	14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	0,00	$ 80.461,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
12.2	14.4	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	M2	144,43	$ 97.377,00	$ 14.064.160,11	128,31	$ 12.494.442,87	16,12	$ 1.569.717,24	144,43	$ 14.064.160,11	0,00	$ -
12.3	14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	0,00	$ 89.235,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 14.064.160,11		$ 12.494.442,87		$ 1.569.717,24		$ 14.064.160,11		$ -
		13. CIELO RASO												
13.1	15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	0,00	$ 72.828,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		14. APARATOS SANITARIOS												
14.1	17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	0,00	$ 490.355,00	$ -		$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		15. ACABADOS												
15.1	18.1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	82,97	$ 12.558,00	$ 1.041.914,66	75,71	$ 950.743,58	7,26	$ 91.171,08	82,97	$ 1.041.914,66	0,00	$ -
15.2	18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	$ 23.703,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
15.3	18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	0,00	$ 19.667,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 1.041.914,66		$ 950.743,58		$ 91.171,08		$ 1.041.914,66		$ -
		16. INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS												
16.1	21,35	CANALETA PLÁSTICA 40X60 MM	ML	0,00	$ 65.003,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		17. OBRAS EXTERIORES												
17.1	6.4	BOLARDO M-60 CONCRETO	UN	0,00	$ 218.711,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
17.2	6.10	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	0,00	$ 1.073.172,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
17.3	6.14	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	UN	0,00	$ 827.960,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
17.4	6.15	BANCA EN MADERA M-50	UN	0,00	$ 693.927,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
17.5	6.16	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-90	UN	0,00	$ 740.433,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
17.6	6.18	POSTE HISTÓRICO M-131	UN	0,00	$ 8.206.890,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
17.7	6.1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	0,00	$ 269.056,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		18. ITEMS NO PREVISTOS												
18.1	APU 1	DEMOLICIÓN PLACA MESÓN	M2	29,82	$ 27.797,00	$ 828.906,54	29,82	$ 828.906,54			29,82	$ 828.906,54	0,00	$ -
18.2	APU 2	DESMONTE DE LAVAPLATOS	UN	10,00	$ 38.982,00	$ 389.820,00	10,00	$ 389.820,00			10,00	$ 389.820,00	0,00	$ -
18.3	ICCU C 1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4,00	$ 35.121,00	$ 140.484,00	4,00	$ 140.484,00			4,00	$ 140.484,00	0,00	$ -
18.4	APU 3	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	UN	1,00	$ 209.415,00	$ 209.415,00	1,00	$ 209.415,00			1,00	$ 209.415,00	0,00	$ -
18.5	ICCU C 1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	222,43	$ 22.788,00	$ 5.068.680,15	222,43	$ 5.068.680,15			222,43	$ 5.068.680,15	0,00	$ -
18.6	ICCU C 1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	72,55	$ 15.877,00	$ 1.151.876,35	72,55	$ 1.151.876,35			72,55	$ 1.151.876,35	0,00	$ -

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA FINAL	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ CONSORCIO INTER PLAZA

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA**						
	CONDICIONES CONTRACTUALES:						
CONTRATO DE OBRA No.:	**SA-MC-OBRA-213-2025**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**$**	**362.754.442,00**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**19 DE AGOSTO DE 2025**	
		VALOR ADICIÓN No. 1	**$**	**35.000.000,00**	**DURACIÓN INICIAL**	**5 MESES**	
		VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**	**397.754.442,00**	**PRORROGA**	**1 MES**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PLAZA SESQUILE**				**DURACIÓN ACTUAL**	**6 MESES**	
					SUSPENSION NO. 1	**16 DE ENERO DE 2026 - VEINTE (20) DIAS**	
					AMPLIACION NO. 1 A SUSPENSION NO. 1	**05 DE FEBRERO DE 2026 - QUINCE (15) DIAS**	
					REINICIO NO. 1	**20 DE FEBRERO DE 2026**	
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERPLAZA**				**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL**	**22 DE MARZO DE 2026**	
SUPERVISOR:	**ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS**				**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**	**22 DE MARZO DE 2026**	

En el Municipio de Sesquilé, a los veintidos (22) días del mes de marzo del Año DOS MIL VEINTISEIS (2026), se reunieron las siguientes personas: MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA, Representante Legal del CONSORCIO INSTALACIONES SESQUILE; en calidad de Contratista, MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY, Director de obra, la ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURICA, Representante Legal del CONSORCIO INTER PLAZA; en calidad de Interventoría, JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA, Director de interventoría y el ingeniero NESTOR FABIAN ACERO VARGAS, Secretario de Infraestructura, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta Parcial No. 1, de acuerdo con las revisiones elaboradas por el CONTRATISTA de obra y avaladas por la INTERVENTORIA Y SUPERVISION las cuales se detallan a continuación:

ITEM	REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 4			ACTA PARCIAL NO. 1		ACTA FINAL		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	V/TOTAL
18.7	APU 4	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS	UN	14,00	$ 82.356,00	$ 1.152.984,00	14,00	$ 1.152.984,00			14,00	$ 1.152.984,00	0,00	$ -
18.8	APU 5	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS	UN	4,00	$ 91.506,00	$ 366.024,00	4,00	$ 366.024,00			4,00	$ 366.024,00	0,00	$ -
18.9	APU 6	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	37,00	$ 30.978,00	$ 1.146.186,00	37,00	$ 1.146.186,00			37,00	$ 1.146.186,00	0,00	$ -
18.10	ICCU C 11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	10,00	$ 103.925,00	$ 1.039.250,00	10,00	$ 1.039.250,00			10,00	$ 1.039.250,00	0,00	$ -
18.11	ICCU C 11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	9,00	$ 108.407,00	$ 975.663,00	9,00	$ 975.663,00			9,00	$ 975.663,00	0,00	$ -
18.12	APU 7	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 2"	UN	10,00	$ 91.845,00	$ 918.450,00	10,00	$ 918.450,00			10,00	$ 918.450,00	0,00	$ -
18.13	ICCU C 5.18	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M (LINEAL)	ML	22,30	$ 38.305,00	$ 854.201,50	22,30	$ 854.201,50			22,30	$ 854.201,50	0,00	$ -
18.14	APU 8	PLACA BASE CONCRETO 0.10M 3000 PSI	M2	49,28	$ 101.402,00	$ 4.997.090,56	49,28	$ 4.997.090,56			49,28	$ 4.997.090,56	0,00	$ -
18.15	ICCU C 13.4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	97,16	$ 38.771,00	$ 3.766.990,36	97,16	$ 3.766.990,36			97,16	$ 3.766.990,36	0,00	$ -
18.16	ICCU C 5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 015 M	M2	42,78	$ 124.482,00	$ 5.325.339,96	42,78	$ 5.325.339,96			42,78	$ 5.325.339,96	0,00	$ -
18.17	ICCU C 5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	42,61	$ 79.257,00	$ 3.377.140,77	12,05	$ 955.046,85	30,56	$ 2.422.093,92	42,61	$ 3.377.140,77	0,00	$ -
18.18	ICCU C 6.16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	225,44	$ 20.855,00	$ 4.701.551,20	96,35	$ 2.009.379,25	129,09	$ 2.692.171,95	225,44	$ 4.701.551,20	0,00	$ -
18.19	APU 9	COLUMNETA 0.10MX0.15M 3000 PSI	ML	23,20	$ 113.474,00	$ 2.632.596,80	23,20	$ 2.632.596,80			23,20	$ 2.632.596,80	0,00	$ -
18.20	ICCU C 4.22	ACERO FIGURADO 6000 PSI	KG	135,94	$ 7.950,00	$ 1.080.723,00	135,94	$ 1.080.723,00			135,94	$ 1.080.723,00	0,00	$ -
18.21	ICCU C 4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	142,20	$ 10.461,00	$ 1.487.554,20	134,66	$ 1.408.678,26	7,54	$ 78.875,94	142,20	$ 1.487.554,20	0,00	$ -
18.22	ICCU C 5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	83,52	$ 7.228,00	$ 603.682,56	83,52	$ 603.682,56			83,52	$ 603.682,56	0,00	$ -
18.23	APU 10	VIGUETA DE AMARRE DE 0.20M X 0.20M 3000 PSI	ML	94,80	$ 87.390,00	$ 8.284.572,00	94,80	$ 8.284.572,00			94,80	$ 8.284.572,00	0,00	$ -
18.24	APU 11	VIGUETA AEREA 0.20M X 0.20M 3000 PSI	ML	16,34	$ 123.080,00	$ 2.011.127,20	16,34	$ 2.011.127,20			16,34	$ 2.011.127,20	0,00	$ -
18.25	ICCU C 6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	242,69	$ 11.672,00	$ 2.832.677,68	238,20	$ 2.780.270,40	4,49	$ 52.407,28	242,69	$ 2.832.677,68	0,00	$ -
18.26	ICCU C 15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	78,75	$ 83.996,00	$ 6.614.685,00	78,75	$ 6.614.685,00			78,75	$ 6.614.685,00	0,00	$ -
18.27	ICCU C 18.8	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	5,64	$ 4.390,00	$ 24.759,60		$ -	5,64	$ 24.759,60	5,64	$ 24.759,60	0,00	$ -
18.28	ICCU C 18.9	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	2,32	$ 22.708,00	$ 52.682,56		$ -	2,32	$ 52.682,56	2,32	$ 52.682,56	0,00	$ -
18.29	APU 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE	M2	180,02	$ 27.848,00	$ 5.013.196,96	180,02	$ 5.013.196,96			180,02	$ 5.013.196,96	0,00	$ -
18.30	APU 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE (LINEAL)	ML	224,44	$ 18.830,00	$ 4.226.205,20	63,08	$ 1.187.796,40	161,36	$ 3.038.408,80	224,44	$ 4.226.205,20	0,00	$ -
18.31	APU 14	VINILO ANTISEPTICO, IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE	M2	175,82	$ 28.321,00	$ 4.979.398,22	175,82	$ 4.979.398,22			175,82	$ 4.979.398,22	0,00	$ -
18.32	APU 15	VINILO ANTISEPTICO , IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE (LINEAL)	ML	224,44	$ 20.212,00	$ 4.536.381,28	63,08	$ 1.274.972,96	161,36	$ 3.261.408,32	224,44	$ 4.536.381,28	0,00	$ -
18.33	APU 16	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA	M2	27,96	$ 135.831,00	$ 3.797.834,76	27,96	$ 3.797.834,76			27,96	$ 3.797.834,76	0,00	$ -
18.34	APU 17	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	5,04	$ 76.968,00	$ 387.918,72	1,72	$ 132.384,96	3,32	$ 255.533,76	5,04	$ 387.918,72	0,00	$ -
18.35	APU 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO	M2	96,41	$ 190.705,00	$ 18.385.869,05	96,41	$ 18.385.869,05			96,41	$ 18.385.869,05	0,00	$ -
18.36	ICCU C 5.50	LAVADA DE FACHADA	M2	86,51	$ 9.609,00	$ 831.257,29	75,71	$ 727.480,09	10,80	$ 103.777,20	86,51	$ 831.257,29	0,00	$ -
18.37	APU 19	ANCLAJE 1/2" L=15 cm	UN	90,00	$ 21.766,00	$ 1.958.940,00	90,00	$ 1.958.940,00			90,00	$ 1.958.940,00	0,00	$ -
18.38	ICCU C 12.13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	9,00	$ 138.762,00	$ 1.248.858,00	1,00	$ 138.762,00	8,00	$ 1.110.096,00	9,00	$ 1.248.858,00	0,00	$ -
18.39	APU 20	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	M2	71,07	$ 58.524,00	$ 4.159.300,68	71,07	$ 4.159.300,68			71,07	$ 4.159.300,68	0,00	$ -
18.40	ICCU C 5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO)	M2	9,83	$ 142.553,00	$ 1.401.295,99	9,83	$ 1.401.295,99			9,83	$ 1.401.295,99	0,00	$ -
18.41	APU 21	ACABADO EN MICROCEMENTO PARA MESONES	M2	13,08	$ 194.941,00	$ 2.549.828,28			13,08	$ 2.549.828,28	13,08	$ 2.549.828,28	0,00	$ -
18.42	APU 22	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	UN	20,00	$ 114.127,00	$ 2.282.540,00			20,00	$ 2.282.540,00	20,00	$ 2.282.540,00	0,00	$ -

Alcaldia Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILE / CONSORCIO INTER PLAZA
	ACTA FINAL	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA					
	CONDICIONES CONTRACTUALES:					
CONTRATO DE OBRA No.:	SA-MC-OBRA-213-2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	362.754.442,00	FECHA DE INICIACIÓN	19 DE AGOSTO DE 2025
		VALOR ADICIÓN No. 1	$	35.000.000,00	DURACIÓN INICIAL	5 MESES
		VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	397.754.442,00	PRORROGA	1 MES
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLAZA SESQUILE				DURACIÓN ACTUAL	6 MESES
					SUSPENSION NO. 1	16 DE ENERO DE 2026 - VEINTE (20) DIAS
					AMPLIACION NO. 1 A SUSPENSION NO. 1	05 DE FEBRERO DE 2026 - QUINCE (15) DIAS
					REINICIO NO. 1	20 DE FEBRERO DE 2026
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPLAZA				FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22 DE MARZO DE 2026
SUPERVISOR:	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS				FECHA DE LA PRESENTE ACTA	22 DE MARZO DE 2026

En el Municipio de Sesquilé, a los veintidos (22) días del mes de marzo del Año DOS MIL VEINTISEIS (2026), se reunieron las siguientes personas: MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA, Representante Legal del CONSORCIO INSTALACIONES SESQUILE; en calidad de Contratista, MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY, Director de obra, la ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURICA, Representante Legal del CONSORCIO INTER PLAZA; en calidad de Interventoría, JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA, Director de interventoría y el ingeniero NESTOR FABIAN ACERO VARGAS, Secretario de Infraestructura, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta Parcial No. 1, de acuerdo con las revisiones elaboradas por el CONTRATISTA de obra y avaladas por la INTERVENTORIA Y SUPERVISION las cuales se detallan a continuación:

ITEM	REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 4			ACTA PARCIAL NO. 1		ACTA FINAL		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	V/TOTAL
18.43	APU 23	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	UN	11,00	$ 146.568,00	$ 1.612.248,00			11,00	$ 1.612.248,00	11,00	$ 1.612.248,00	0,00	$ -
18.44	APU 24	SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	UN	12,00	$ 104.520,00	$ 1.254.240,00			12,00	$ 1.254.240,00	12,00	$ 1.254.240,00	0,00	$ -
18.45	APU 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL SQ 24W	UN	2,00	$ 79.884,00	$ 159.768,00			2,00	$ 159.768,00	2,00	$ 159.768,00	0,00	$ -
18.46	APU 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL SQ 40W	UN	20,00	$ 121.700,00	$ 2.434.000,00			20,00	$ 2.434.000,00	20,00	$ 2.434.000,00	0,00	$ -
18.47	ICCU C 15.8	LISTON M.H. PINO ROMERON (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	21,91	$ 150.352,00	$ 3.294.212,32	21,91	$ 3.294.212,32			21,91	$ 3.294.212,32	0,00	$ -
18.48	APU 27	LISTON M.H. PINO ROMERON LINEAL (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	ML	62,44	$ 99.668,00	$ 6.223.269,92	31,22	$ 3.111.634,96	31,22	$ 3.111.634,96	62,44	$ 6.223.269,92	0,00	$ -
18.49	ICCU C 10.19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	43,49	$ 382.133,00	$ 16.618.964,17	43,49	$ 16.618.964,17			43,49	$ 16.618.964,17	0,00	$ -
18.50	ICCU C 14.35	REMATES BOCEL WING ALUMINIO	ML	29,68	$ 14.795,00	$ 439.115,60		$ -	29,68	$ 439.115,60	29,68	$ 439.115,60	0,00	$ -
18.51	APU 30	VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	43,49	$ 341.627,00	$ 14.857.358,23	43,49	$ 14.857.358,23			43,49	$ 14.857.358,23	0,00	$ -
18.52	ICCU C 10.16	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,32	$ 222.260,00	$ 515.643,20		$ -	2,32	$ 515.643,20	2,32	$ 515.643,20	0,00	$ -
18.53	APU 32	PASE MURO PARA CONEXION DE GAS	UN	8,00	$ 56.659,00	$ 453.272,00	4,00	$ 226.636,00	4,00	$ 226.636,00	8,00	$ 453.272,00	0,00	$ -
18.54	APU 33	RESTAURACION Y ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA	M2	26,33	$ 118.027,00	$ 3.107.650,91	26,33	$ 3.107.650,91			26,33	$ 3.107.650,91	0,00	$ -
18.55	APU 34	RETRO DE MANTO EN ASFALTO EXISTENTE	M2	26,33	$ 85.681,00	$ 2.255.980,73	26,33	$ 2.255.980,73			26,33	$ 2.255.980,73	0,00	$ -
18.56	APU 35	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO CON MEMBRANA ASFALTICA	M2	50,61	$ 180.802,00	$ 9.150.389,22	50,61	$ 9.150.389,22			50,61	$ 9.150.389,22	0,00	$ -
18.57	APU 36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA SISTEMA RETRACTIL SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO INC. ANTICORROSIVO	M2	33,96	$ 1.360.357,00	$ 46.197.723,72	33,96	$ 46.197.723,72			33,96	$ 46.197.723,72	0,00	$ -
18.58	APU 37	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA DE PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO	ML	128,27	$ 60.308,00	$ 7.735.707,16			128,27	$ 7.735.707,16	128,27	$ 7.735.707,16	0,00	$ -
18.59	APU 38	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	UN	1,00	$ 134.504,00	$ 134.504,00			1,00	$ 134.504,00	1,00	$ 134.504,00	0,00	$ -
18.60	APU 39	DEMOLICION DE CAÑUELA	ML	27,00	$ 40.695,00	$ 1.098.765,00			27,00	$ 1.098.765,00	27,00	$ 1.098.765,00	0,00	$ -
18.61	APU 40	CÁRCAMO PARA AGUAS LLUVIAS	ML	17,00	$ 261.683,00	$ 4.448.611,00			17,00	$ 4.448.611,00	17,00	$ 4.448.611,00	0,00	$ -
18.62	APU 41	REJILLA METALICA EN ANGULO DE 1" Y 1/8", CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" Y 1/8", Y CONTRA MARCO EN ANGULO DE 1/4" Y 1/8"	ML	11,38	$ 248.017,00	$ 2.823.309,97			11,38	$ 2.823.309,97	11,38	$ 2.823.309,97	0,00	$ -
18.63	APU 42	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE TANQUE 100 X 51 ACERO INOXIDABLE PARA EL KIOSCO. INCLUYE REJILLA Y GRIFERIA.	UN	1,00	$ 946.212,00	$ 946.212,00			1,00	$ 946.212,00	1,00	$ 946.212,00	0,00	$ -
18.64	APU 43	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE TANQUE 80X43 ACERO INOXIDABLE PARA LOCALES DE COMIDA. INCLUYE REJILLA Y GRIFERIA.	UN	8,00	$ 762.612,00	$ 6.100.896,00			8,00	$ 6.100.896,00	8,00	$ 6.100.896,00	0,00	$ -
18.65	APU 44	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFONES EN Y	UN	9,00	$ 84.079,00	$ 756.711,00			9,00	$ 756.711,00	9,00	$ 756.711,00	0,00	$ -
18.66	APU 45	CAÑUELA EN CONCRETO 2500 PSI 0.30 X 0.12	ML	10,00	$ 74.416,00	$ 744.160,00			10,00	$ 744.160,00	10,00	$ 744.160,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 251.156.650,58		$ 198.689.905,07		$ 52.466.745,50		$ 251.156.650,58		$ -
		COSTOS DIRECTOS				$ 299.063.490,23		$ 240.044.961,64		$ 59.018.528,59		$ 299.063.490,24		$ -

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILE / CONSORCIO INTER PLAZA
	ACTA FINAL	

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA					
	CONDICIONES CONTRACTUALES:					
CONTRATO DE OBRA No.:	SA-MC-OBRA-213-2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 362.754.442,00	FECHA DE INICIACIÓN	19 DE AGOSTO DE 2025	
		VALOR ADICIÓN No. 1	$ 35.000.000,00	DURACIÓN INICIAL	5 MESES	
		VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 397.754.442,00	PRORROGA	1 MES	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLAZA SESQUILE			DURACIÓN ACTUAL	6 MESES	
				SUSPENSION NO. 1	16 DE ENERO DE 2026 - VEINTE (20) DIAS	
				AMPLIACION NO. 1 A SUSPENSION NO. 1	05 DE FEBRERO DE 2026 - QUINCE (15) DIAS	
				REINICIO NO. 1	20 DE FEBRERO DE 2026	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERPLAZA			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22 DE MARZO DE 2026	
SUPERVISOR:	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS			FECHA DE LA PRESENTE ACTA	22 DE MARZO DE 2026	

En el Municipio de Sesquilé, a los veintidos (22) días del mes de marzo del Año DOS MIL VEINTISEIS (2026), se reunieron las siguientes personas: MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA, Representante Legal del CONSORCIO INSTALACIONES SESQUILE; en calidad de Contratista, MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY, Director de obra, la ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURICA, Representante Legal del CONSORCIO INTER PLAZA; en calidad de Interventoría, JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA, Director de interventoría y el ingeniero NESTOR FABIAN ACERO VARGAS, Secretario de Infraestructura, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta Parcial No. 1, de acuerdo con las revisiones elaboradas por el CONTRATISTA de obra y avaladas por la INTERVENTORIA Y SUPERVISION las cuales se detallan a continuación:

ITEM	REF.	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 4			ACTA PARCIAL NO. 1		ACTA FINAL		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
				CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	V/TOTAL
ADMINISTRACION			27%			$ 80.747.142,36		$ 64.812.139,64		$ 15.935.002,72		$ 80.747.142,36		$ -
IMPREV ISTOS			1%			$ 2.990.634,90		$ 2.400.449,62		$ 590.185,29		$ 2.990.634,90		$ -
UTILIDAD			5%			$ 14.953.174,51		$ 12.002.248,08		$ 2.950.926,43		$ 14.953.174,51		$ -
		COSTOS INDIRECTOS				$ 98.690.951,77		$ 79.214.837,34		$ 19.476.114,44		$ 98.690.951,77		$ -
		AJUSTE AL PESO						$ 0,02		$ -0,03		$ 0,01		
TOTAL COSTOS OBRA						$ 397.754.442,00		$ 319.259.799,00		$ 78.494.643,00		$ 397.754.442,00		$ -

MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY	MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA	JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA	MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS
DIRECTOR DE OBRA	R.L. CONSORCIO INSTALACIONES SESQUILÉ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	R.L. CONSORCIO INTER PLAZA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	1.1	**DESCRIPCION**	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	**UNIDAD**	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO






LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO	44,00			1,00	44,00
LOCALES DE COMIDA	33,00			1,00	33,00
OFICINA DE TURISMO	63,00			1,00	63,00
TOTAL					140,00

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			CONSORCIO INTER PLAZA
CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE	
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA	
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA			
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**			
ITEM	1.1	**DESCRIPCION**	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	**UNIDAD** ML
PLANO DESCRIPTIVO				

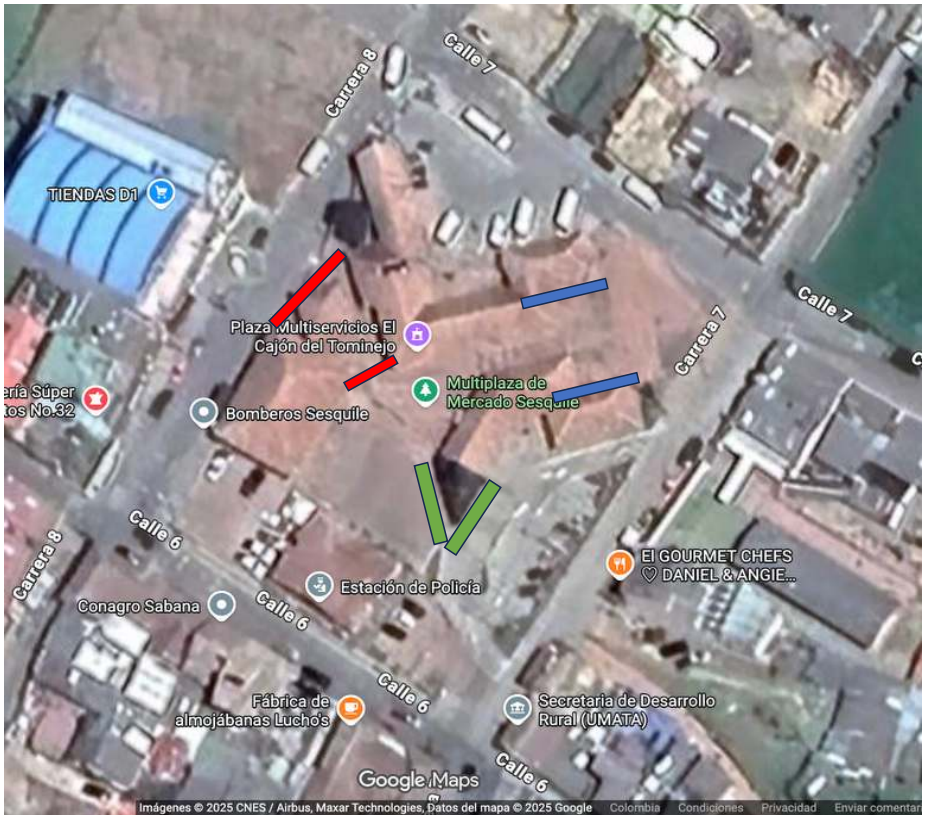

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	1.2	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**AREA**		
QUIOSCO					
MESON			7,39	1,00	7,39
DESCUENTO COLUMNA	0,30	0,30	0,09	1,00	-0,09
DESCUENTO LAVAPLATOS	0,50	0,35	0,18	1,00	-0,18
SUBTOTAL HOJA 1					7,13


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		

CAPITULO			**1. PRELIMINARES**		
ITEM	1.2	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

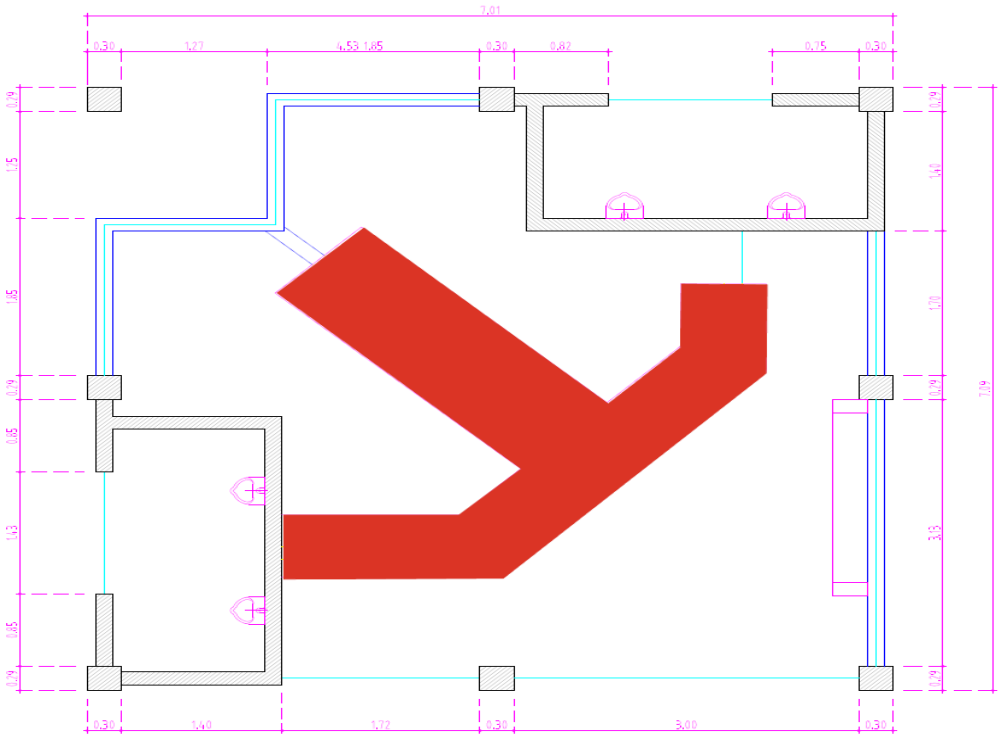

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		

CAPITULO			**1. PRELIMINARES**		
ITEM	1.2	**DESCRIPCION**	#REF!	**UNIDAD**	#REF!

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**AREA**		
PUESTOS DE COMIDA					
MESON EXISTENTE FONDO	0,60	1,85	7,39	8,00	59,12
	0,60	1,00	0,60	16,00	9,60
	1,85	1,00	1,85	8,00	14,80
	0,10	1,85	0,19	8,00	1,48
DESCUENTO LAVAPLATOS	0,50	0,35	0,18	8,00	-1,40
MESON EXISTENTE FRONTAL	1,85	0,63	1,17	8,00	9,32
SUBTOTAL HOJA 3					92,92
SUBTOTAL HOJA 1					7,13
SUBTOTAL					100,05


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	1.2	**DESCRIPCION**	#REF!	**UNIDAD**	#REF!

PLANO DESCRIPTIVO

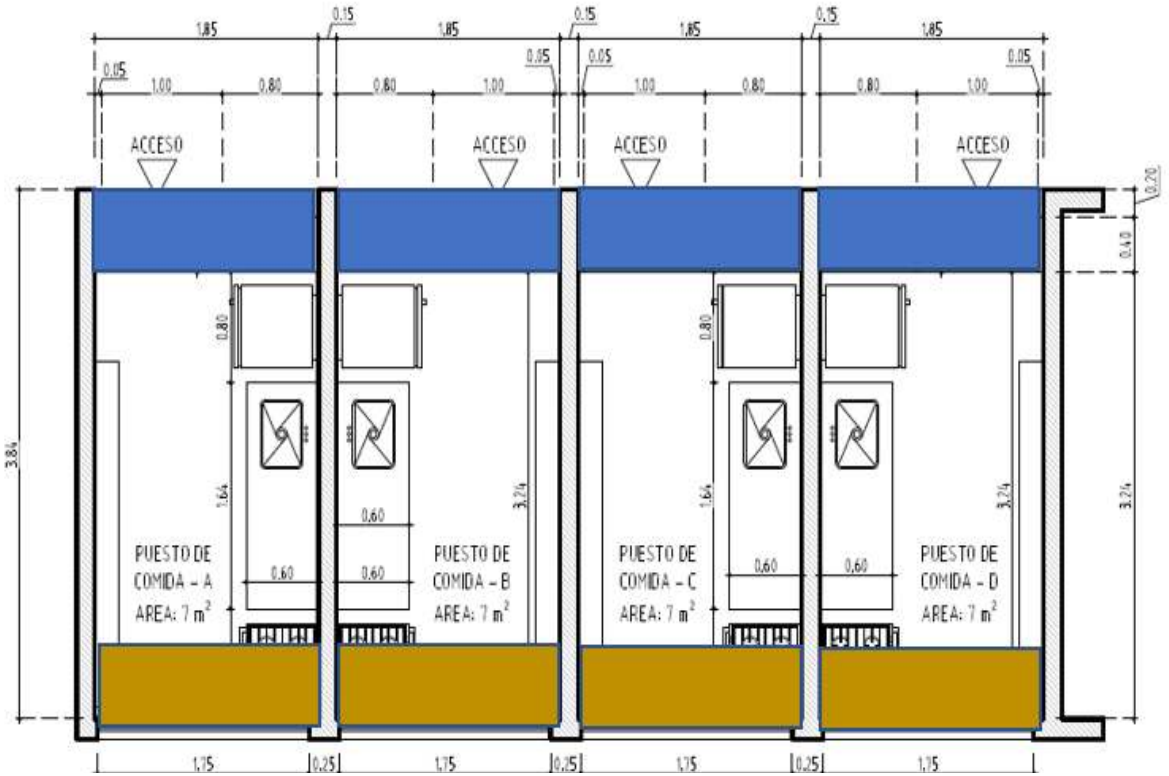

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	1.5	**DESCRIPCION**	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
LOCALES DE COMIDA				16,00	16,00
TOTAL					16,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	1.5	**DESCRIPCION**	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO

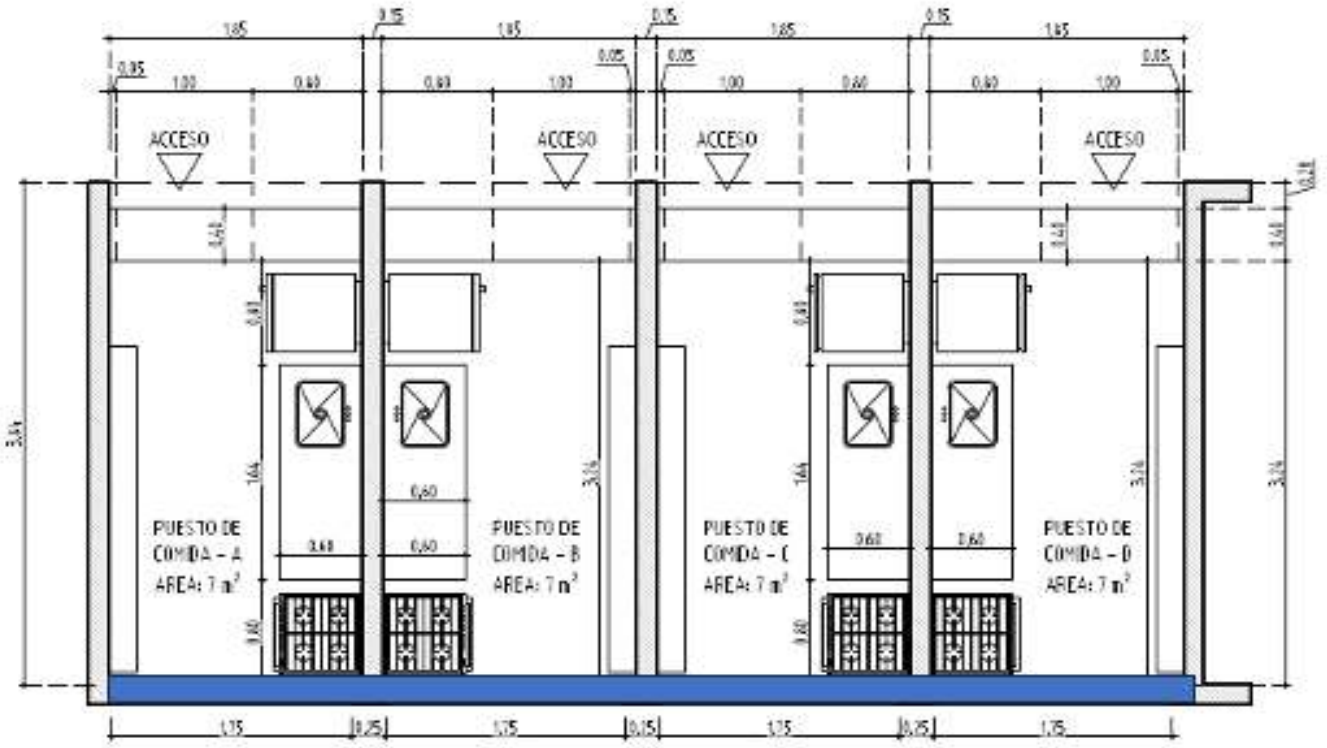

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	1.6	**DESCRIPCION**	DESMONTE VENTANAS	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**AREA**		
QUIOSCO					
1	1,85	0,85	1,57	1,00	**1,57**
2	1,32	0,85	1,12	1,00	**1,12**
3	1,49	0,85	1,27	1,00	**1,27**
4	1,85	0,85	1,57	1,00	**1,57**
5	1,70	1,56	2,65	1,00	**2,65**
6	3,13	1,56	4,88	1,00	**4,88**
7	3,00	2,30	6,90	1,00	**6,90**
8	1,72	2,30	3,96	1,00	**3,96**
LOCALES DE COMIDA					
PUESTO A	0,50	0,60	0,30	2,00	**0,60**
PUESTO B	0,50	0,60	0,30	2,00	**0,60**
PUESTO C	0,50	0,60	0,30	2,00	**0,60**
PUESTO D	0,50	0,60	0,30	2,00	**0,60**
PUESTO E	0,50	0,60	0,30	2,00	**0,60**
PUESTO F	0,50	0,60	0,30	2,00	**0,60**
PUESTO G	0,50	0,60	0,30	2,00	**0,60**
PUESTO H	0,50	0,60	0,30	2,00	**0,60**
TOTAL					28,72


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		

CAPITULO			**1. PRELIMINARES**		
ITEM	1.6	**DESCRIPCION**	DESMONTE VENTANAS	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

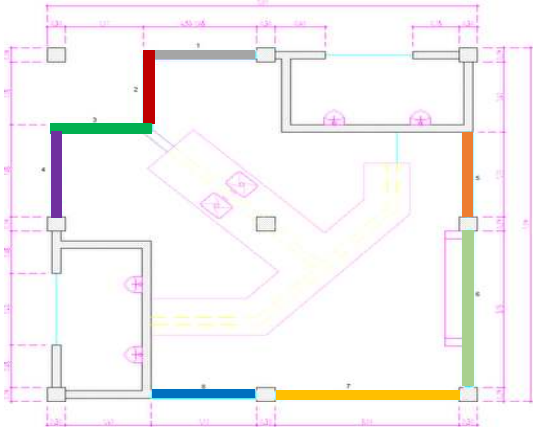



Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	1.5	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO					
	7,03		7,01	1,00	**49,28**
Descuento	0,30	0,30		9,00	**-0,81**
TOTAL					48,47


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	1.7	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

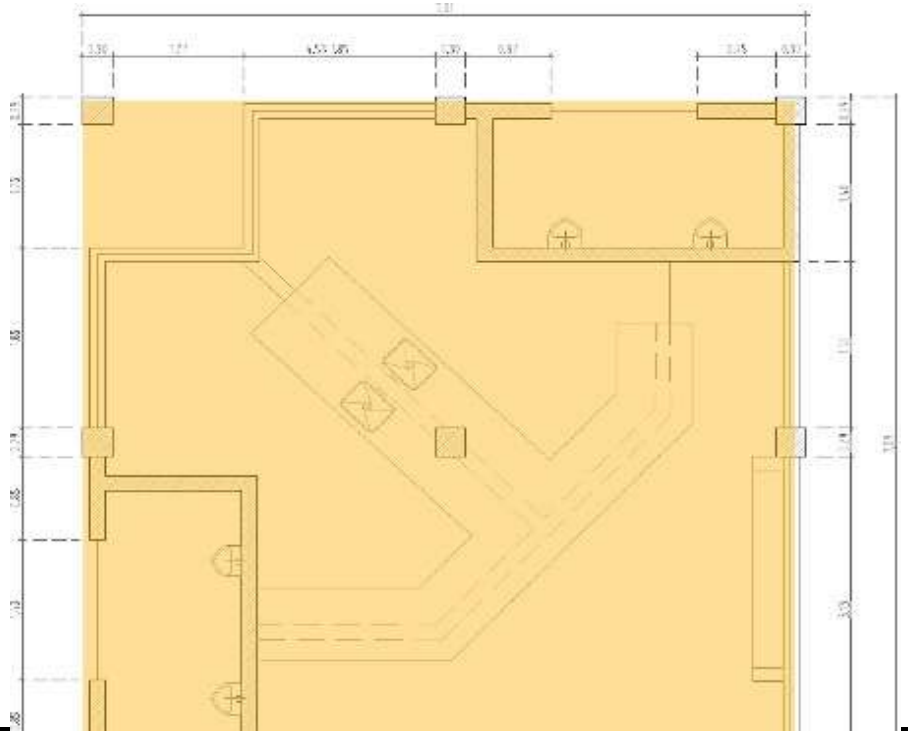

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	1.5	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
URBANISMO					
			149,44	1,00	149,44
TOTAL					149,44


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	1.7	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

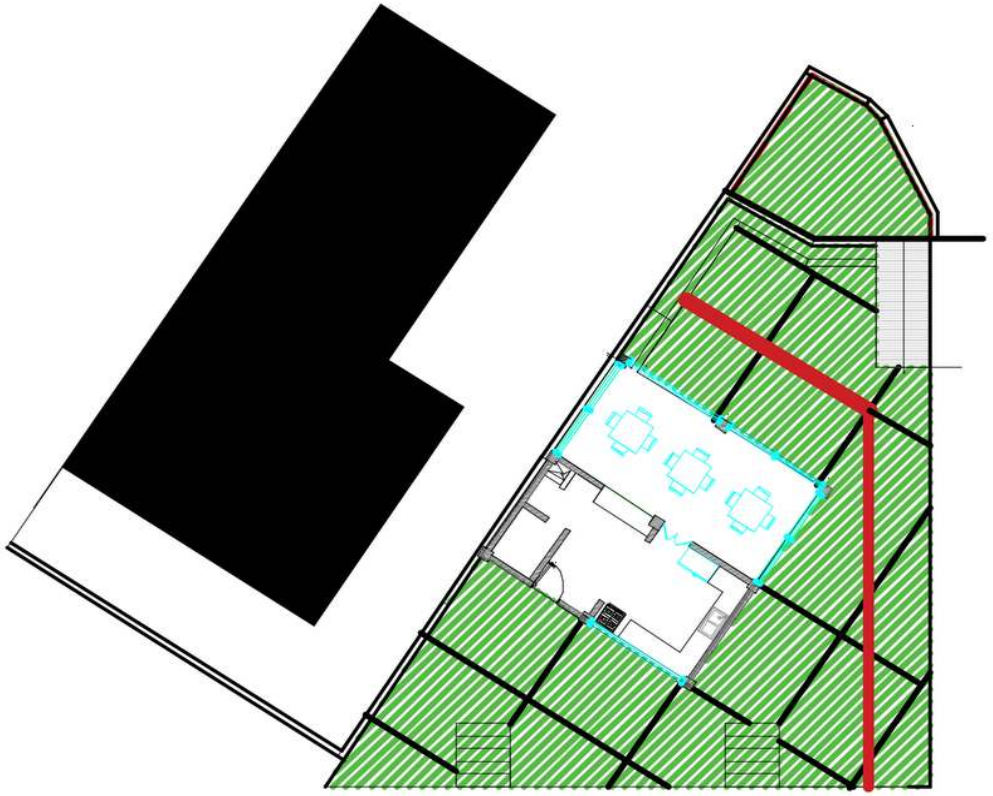



Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**2. EXCAVACIONES Y RELLENOS**		

ITEM	2.2	**DESCRIPCION**	BASE GRANULAR BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	**UNIDAD**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	AREA	**PROFUNDIDAD**			
	137,43	0,20	27,49	1,00	27,49
			TOTAL		27,49

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**2. EXCAVACIONES Y RELLENOS**		

ITEM	2.1	**DESCRIPCION**	BASE GRANULAR BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	**UNIDAD**	M3

PLANO DESCRIPTIVO



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**2. EXCAVACIONES Y RELLENOS**		

ITEM	2.2	**DESCRIPCION**	BASE GRANULAR BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	**UNIDAD**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	AREA	**PROFUNDIDAD**	**VOLUMEN**		
	16,12	0,20	3,22	1,00	3,22
TOTAL					3,22

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**2. EXCAVACIONES Y RELLENOS**		

ITEM	2.1	**DESCRIPCION**	BASE GRANULAR BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	**UNIDAD**	M3

PLANO DESCRIPTIVO



Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**2. EXCAVACIONES Y RELLENOS**		

ITEM	2.3	**DESCRIPCION**	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**UNIDAD**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	AREA	**PROFUNDIDAD**			
	137,43	0,30	41,23	1,00	41,23
			TOTAL		41,23

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ	
	ACTA PARCIAL No. 1 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				CONSORCIO INTER PLAZA	
CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025		**CONTRATISTA**		CONSORCIO PLAZA SESQUILE	
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025		**INTERVENTORIA**		CONSORCIO INTERPLAZA	
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA					
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA					
CAPITULO	**2. EXCAVACIONES Y RELLENOS**					
ITEM	2.3	**DESCRIPCION**	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)		**UNIDAD**	M3
PLANO DESCRIPTIVO						



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**2. EXCAVACIONES Y RELLENOS**		

ITEM	2.3	**DESCRIPCION**	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**UNIDAD**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	AREA	PROFUNDIDAD	VOLUMEN		
	16,12	0,30	4,84	1,00	4,84

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**2. EXCAVACIONES Y RELLENOS**		

ITEM	2.3	**DESCRIPCION**	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	**UNIDAD**	M3

PLANO DESCRIPTIVO



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**4. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**		

ITEM	4,1	**DESCRIPCION**	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	**UNIDAD**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	**LOCALIZACION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**AREA**		
					2,00	2,00
	TOTAL					2,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**4. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**		

ITEM	4,1	**DESCRIPCION**	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

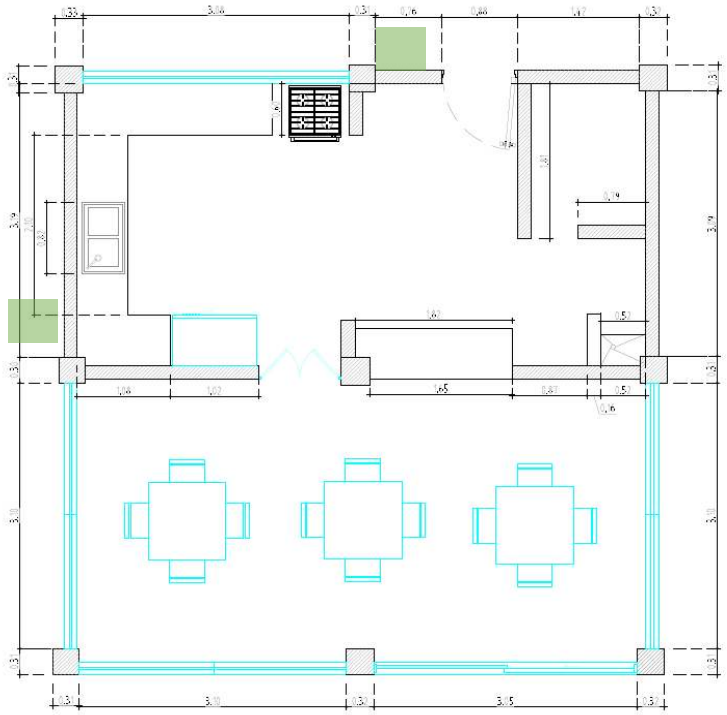

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**		

ITEM	6.2	**DESCRIPCION**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**AREA**		
QUIOSCO					
A	3,12		1,45	1,00	**4,52**
B	3,10		2,32	1,00	**7,19**
ENCHAPE	-3,10		1,00	1,00	**-3,10**
C	2,19		2,32	1,00	**5,08**
ENCHAPE	-2,19		2,32	1,00	**-5,08**
D	1,88		2,32	1,00	**4,36**
ENCHAPE	-0,60		1,00	1,00	**-0,60**
E	1,88		2,32	2,00	**8,72**
F	1,59		2,32	1,00	**3,69**
H	1,50		2,00	1,00	**3,00**
I	1,65		0,60	1,00	**0,99**
I	1,65		0,60	1,00	**0,99**
ENCHAPE	-0,60		1,00	1,00	**-0,60**
SUBTOTAL HOJA 1					29,17


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	6.2	**DESCRIPCION**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

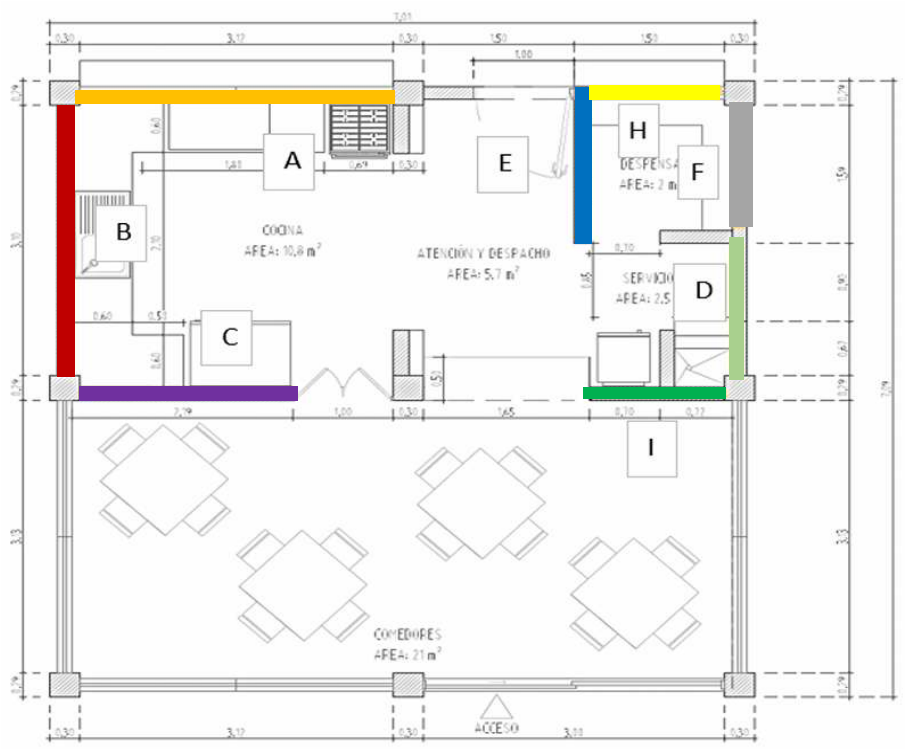

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	6.2	**DESCRIPCION**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**AREA**		
PUESTOS DE COMIDA					
LOCALES DE COMIDA					
PAREDES LATERALES	3,84	2,50		16,00	**153,60**
ENCHAPE	-3,24	1,00		8,00	**-25,92**
PAREDES POSTERIORES	1,75	2,50		8,00	**35,00**
VENTANA	-1,40	0,90		8,00	**-10,08**
SUBTOTAL HOJA 1					29,17
TOTAL					181,77


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	6.2	**DESCRIPCION**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

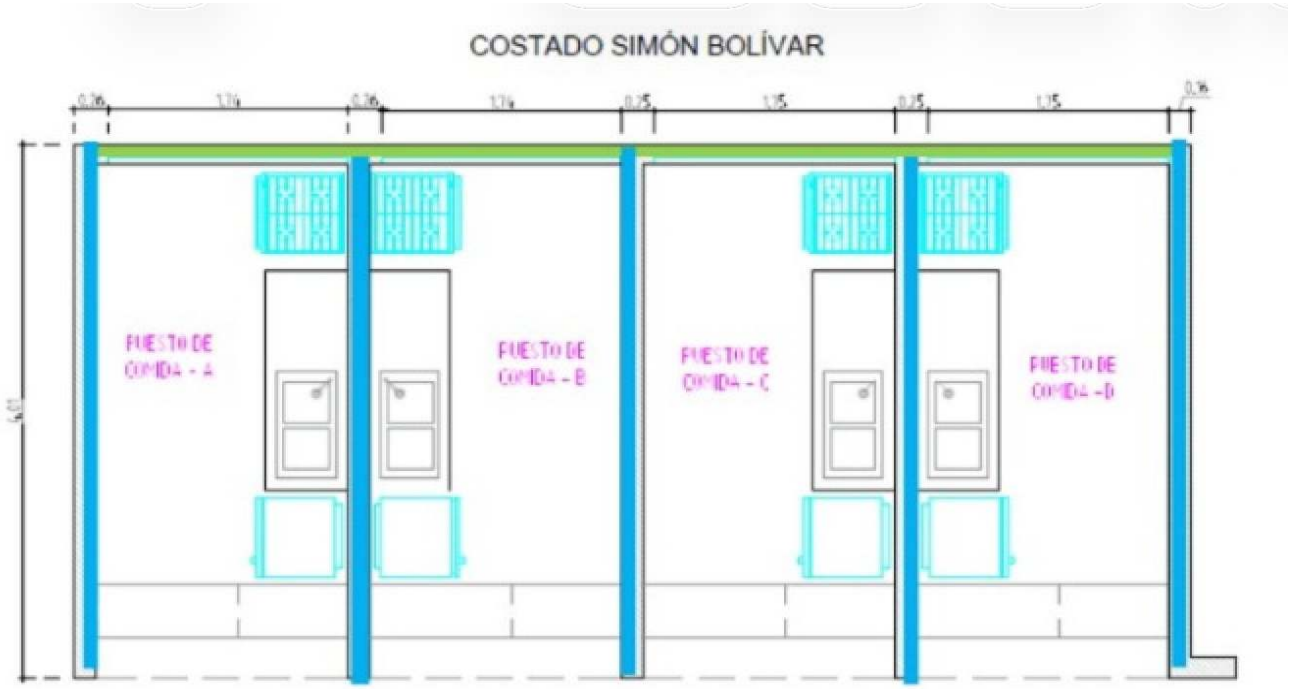

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**		

ITEM	6.2	**DESCRIPCION**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ALTO**	**AREA**		
QUIOSCO					
A	3,08	1,45	4,47	1	4,47
B	3,19	2,32	7,40	1	7,40
C	2,01	2,32	4,66	1	4,66
D	1,37	2,32	3,18	1	3,18
E	1,56	2,32	3,62	1	3,62
F	1,42	1,88	2,67	1	2,67
G	1,81	2,32	4,20	2	8,40
H	1,65	0,9	1,49	1	1,49
I	1,49	2,32	3,46	1	3,46
SUBTOTAL HOJA 1					39,34


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	6.2	**DESCRIPCION**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

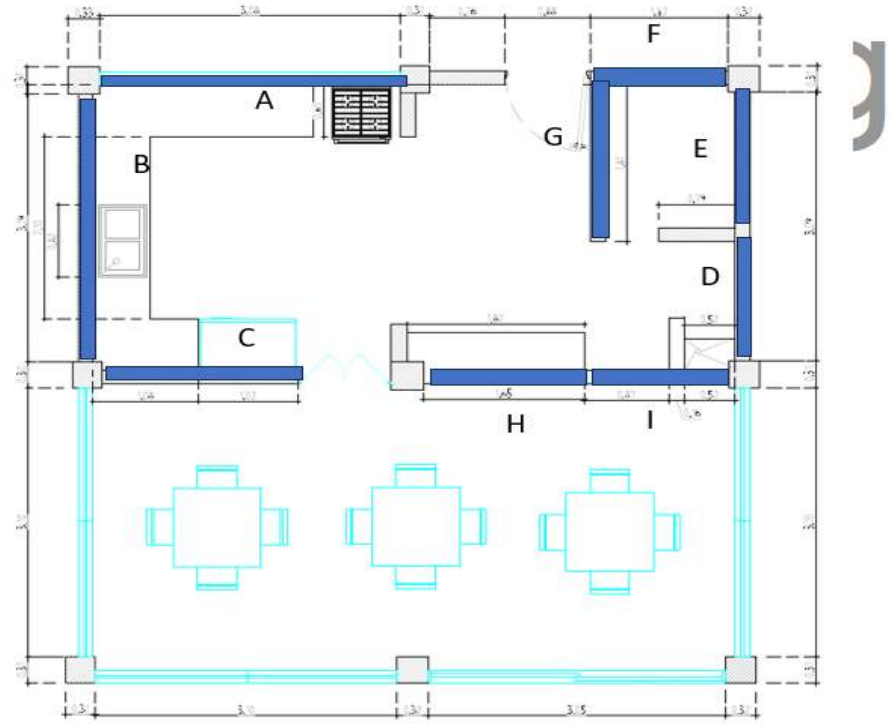

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	6.2	**DESCRIPCION**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**AREA**		
PUESTOS DE COMIDA					
LOCALES DE COMIDA					
PAREDES LATERALES	3,86	2,32	8,96	16,00	143,28
PAREDES POSTERIORES	1,84	2,32	4,27	5,00	21,34
PAREDES POSTERIORES	1,85	2,32	4,29	3,00	12,88
VENTANA TIPO A	-1,74	1,14	-1,98	5,00	-9,92
VENTANA IPO B	-1,75	1,14	-2,00	3,00	-5,99
SUBTOTAL					161,60
SUBTOTAL HOJA 1					39,34
ACTA PARCIAL NO. 1					181,77
TOTAL					19,17


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	6.2	**DESCRIPCION**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

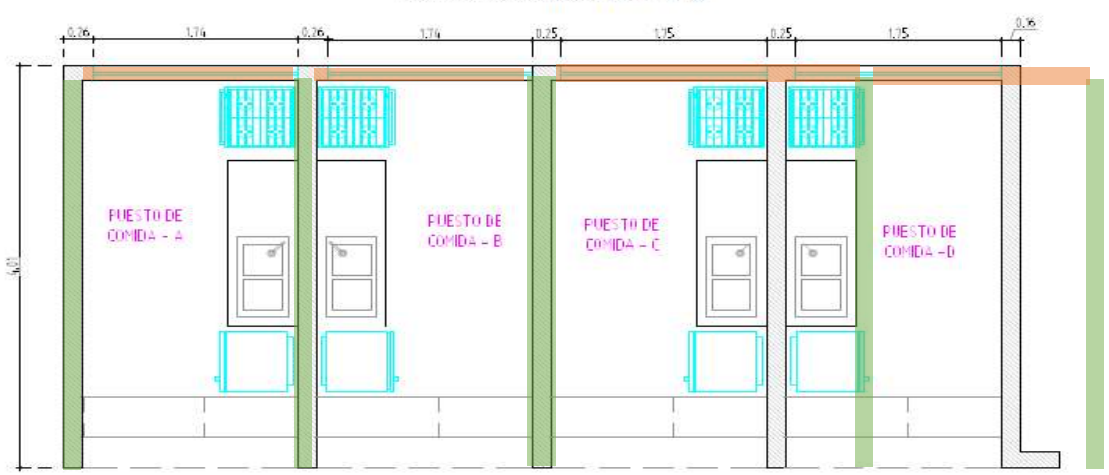

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**7. CUBIERTAS**		

ITEM	7.1	**DESCRIPCION**	TEJA DE BARRO	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
OFICINA DE TURISMO					
Area 1				20,81	**20,81**
Area 2				25,20	**25,20**
Area 3				1,84	**1,84**
Area 4				2,76	**2,76**
TOTAL					50,61


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	7.1	**DESCRIPCION**	TEJA DE BARRO	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

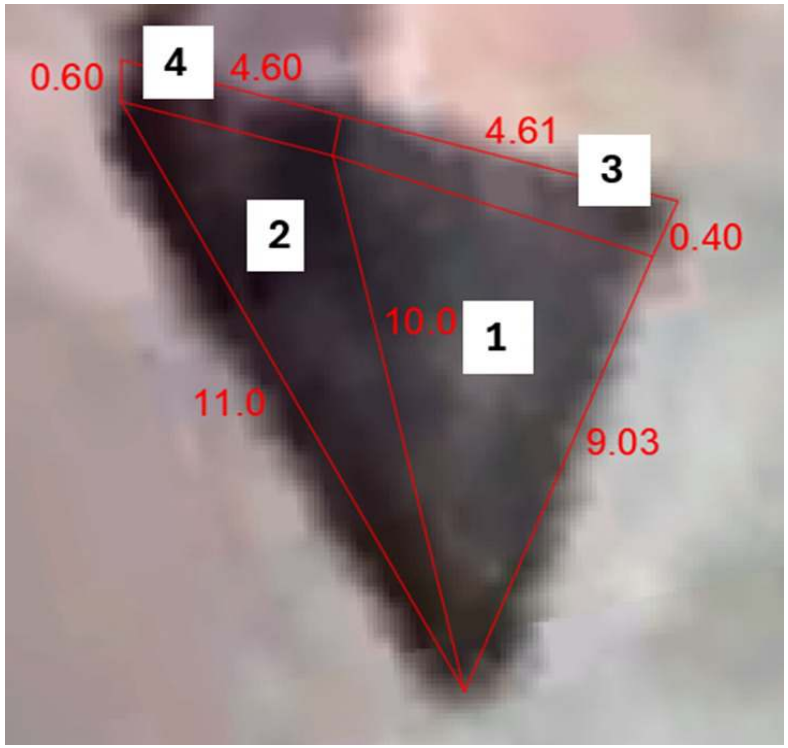

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**7. CUBIERTAS**		

ITEM	7.1	**DESCRIPCION**	TEJA DE BARRO	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
NICHOS DE GAS					
NICHO DOBLE	1,74	0,45	0,78	4,00	**3,13**
TOTAL					3,13

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	7.1	**DESCRIPCION**	TEJA DE BARRO	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**8. CARPINTERIA EN MADERA**		

ITEM	8.1	**DESCRIPCION**	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

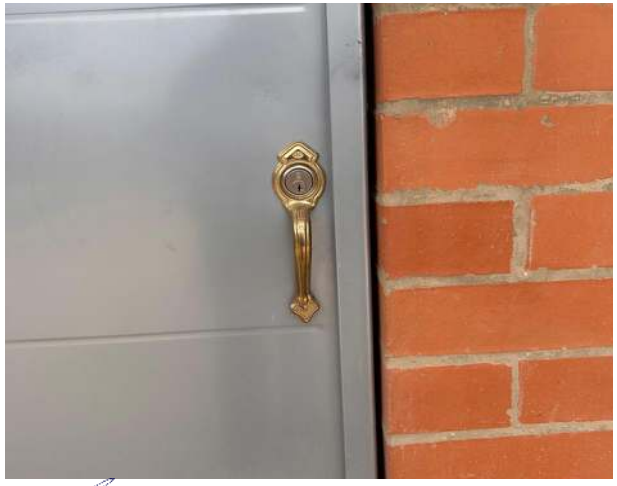

LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO					
ENTRADA A LA COCINA				1,00	1,00
TOTAL					1,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**8. CARPINTERIA EN MADERA**		

ITEM	8.1	**DESCRIPCION**	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

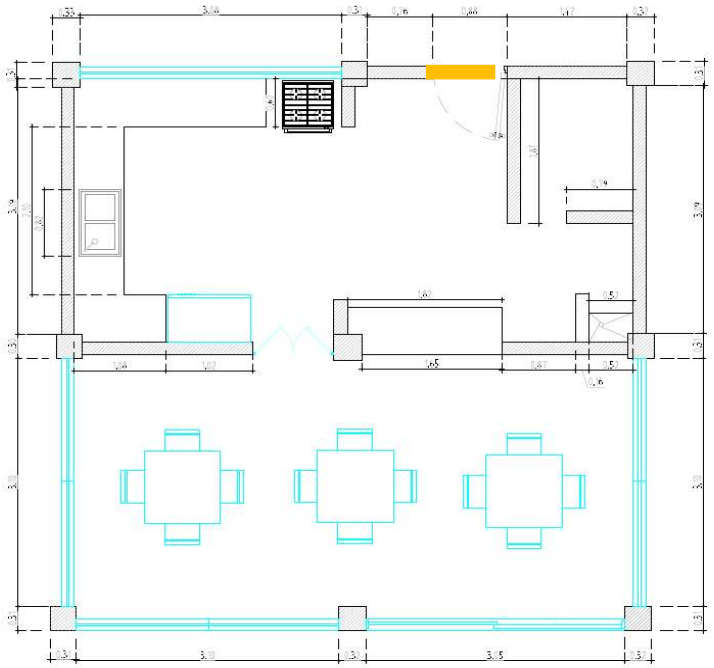



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**9. CARPINTERIA METALICA**		

ITEM	9.1	**DESCRIPCION**	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO					
ENTRADA A LA COCINA				1,00	1,00
TOTAL					1,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**9. CARPINTERIA METALICA**		

ITEM	9.1	**DESCRIPCION**	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

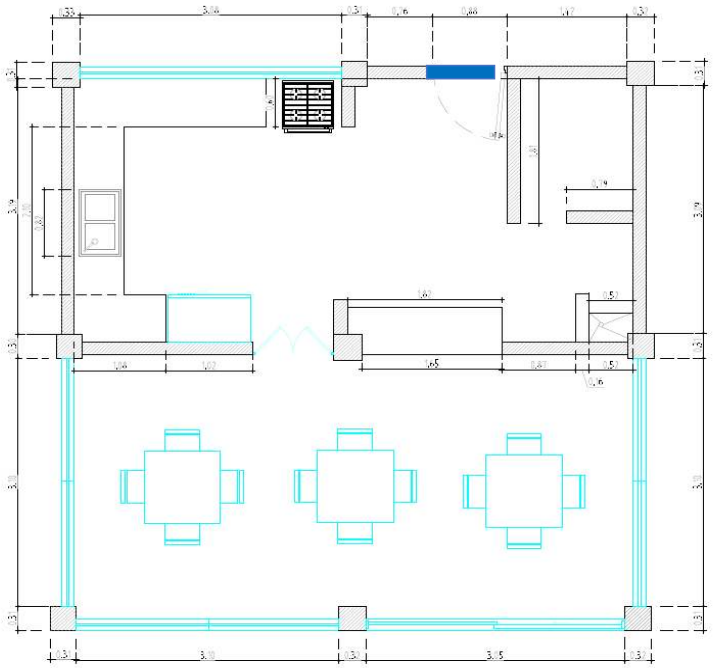

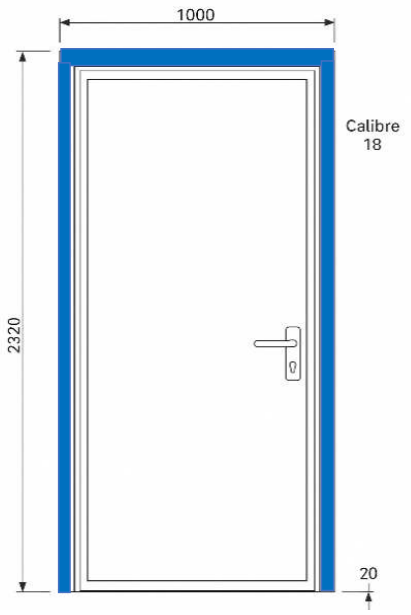

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**9. CARPINTERIA METALICA**		

ITEM	9,2	**DESCRIPCION**	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	**UNIDAD**	UND

REGISTRO FOTOGRAFICO	**LOCALIZACION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**AREA**		
					2,00	2,00
	TOTAL					2,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**9. CARPINTERIA METALICA**		

ITEM	4,1	**DESCRIPCION**	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	**UNIDAD**	UND


PLANO DESCRIPTIVO

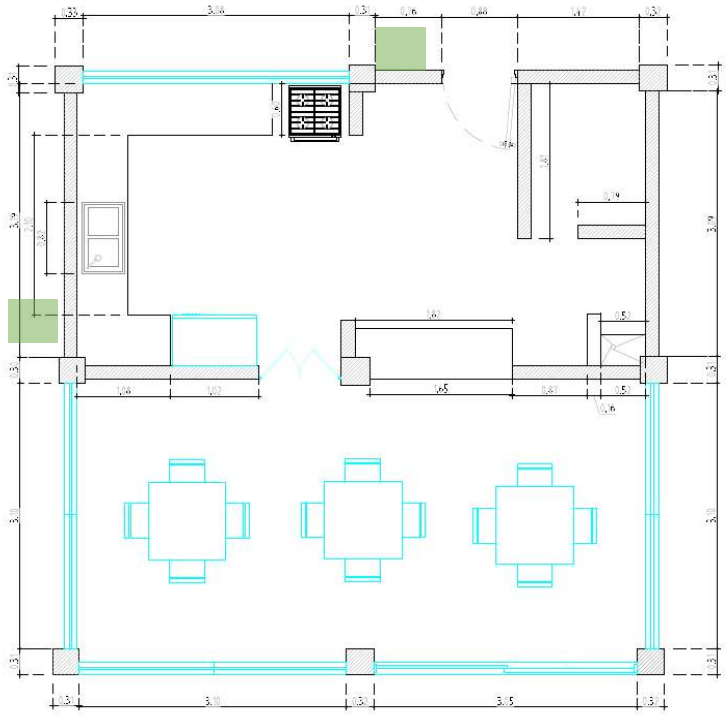

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**11. PISOS BASES**		

ITEM	11,1	**DESCRIPCION**	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	**UNIDAD**	M2

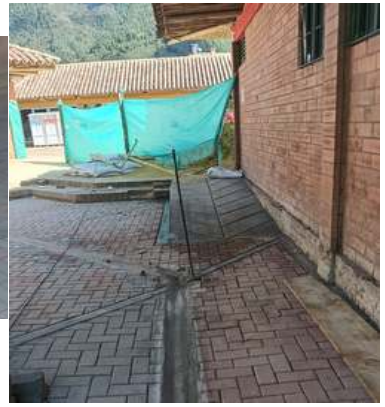REGISTRO FOTOGRAFICO	**LOCALIZACION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**AREA**		
 		3,75	1,50	5,63	1,00	5,63
	TOTAL					5,63


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**11. PISOS BASES**		

ITEM	11.1	**DESCRIPCION**	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

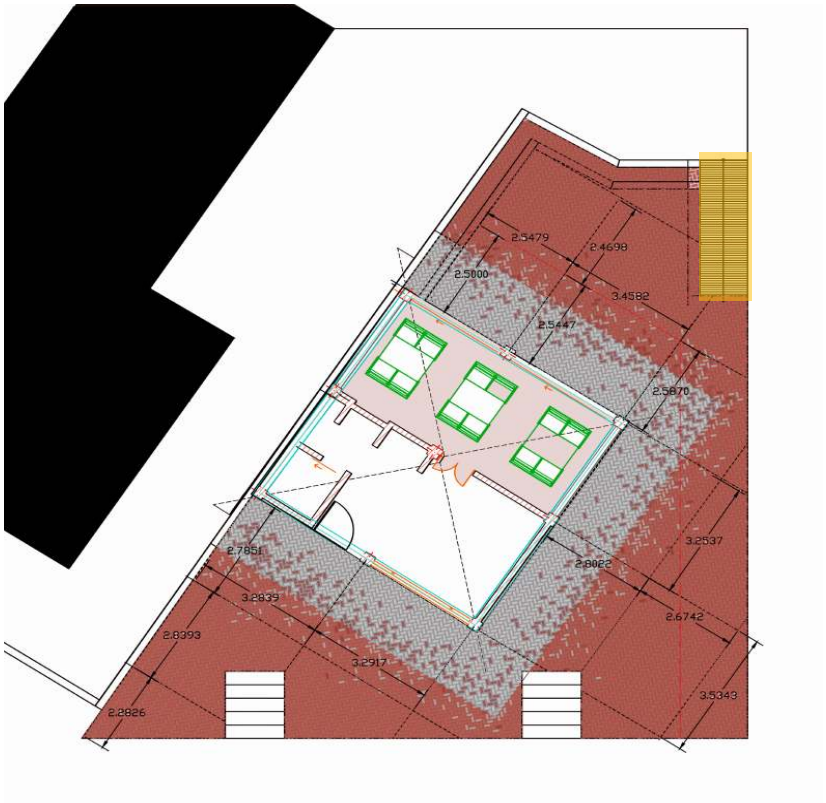

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	#CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**12. PISOS Y ENCHAPES**		

ITEM	12.2	**DESCRIPCION**	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
LOCALES DE COMIDA					
			137,43	1	137,43
DESCUENTO CINTAS	0,10	91,20	9,12	1	-9,12
			TOTAL		128,31


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**12. PISOS Y ENCHAPES**		

ITEM	12.2	**DESCRIPCION**	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

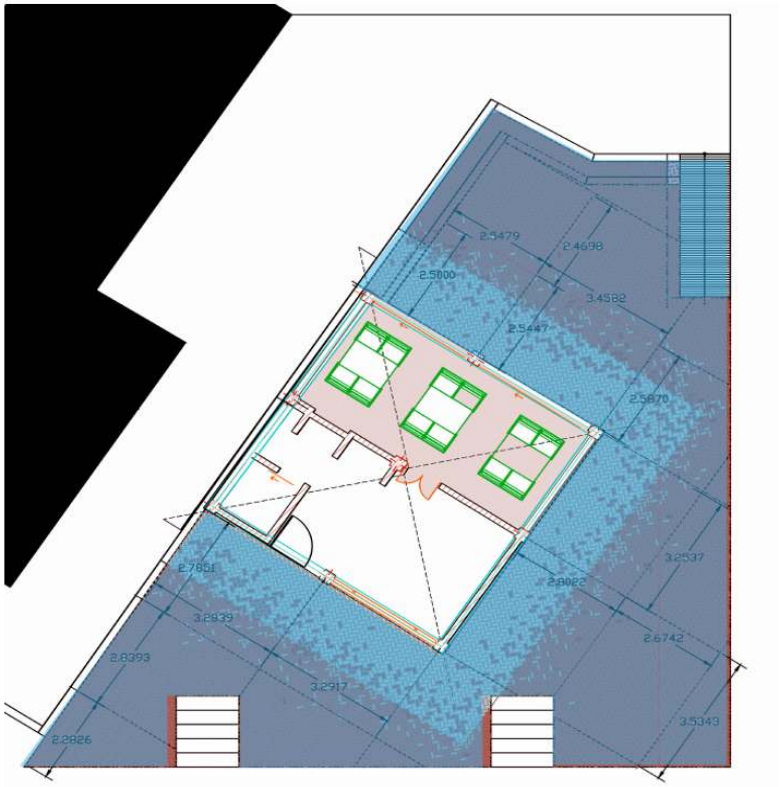

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**12. PISOS Y ENCHAPES**		

ITEM	12.2	**DESCRIPCION**	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	**UNIDAD**	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO	**LOCALIZACION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
		AREA	**PROFUNDIDAD**	**VOLUMEN**		
		16,12			1,00	16,12
	TOTAL					16,12

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**12. PISOS Y ENCHAPES**		

ITEM	2.3	**DESCRIPCION**	ADOQUÍN CONCRETO 8CM	**UNIDAD**	M3

PLANO DESCRIPTIVO



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**15. ACABADOS**		

ITEM	15.1	**DESCRIPCION**	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	ANCHO	**LARGO**	**AREA**		
QUIOSCO					
FACHADA A	7,01	2,32	16,26	1,00	16,26
VENTANA A-1	3,10	2,32	2,50	-1,00	-7,75
VENTANA A-2	3,05	2,32	2,50	-1,00	-7,63
FACHADA B	7,03	2,32	2,50	1,00	17,58
VENTANA B-1	3,10	1,76	1,76	-1,00	-5,46
FACHADA C	7,03	2,32	2,50	1,00	17,58
VENTANA C1	1,26	0,45	0,45	-1,00	-0,57
VENTANA C2	3,08	1,05	1,05	-1,00	-3,23
PUERTA C	0,88	2,32	2,32	-1,00	-2,04
FACHADA D	7,01	2,32	2,50	1,00	17,53
VENTANA D	3,10	1,76	1,76	-1,00	-5,46
LOCALES DE COMIDA					
LATERAL	3,24	2,32	2,32	2,00	15,03
FACHADA POSTERIOR	8,15	2,32	2,32	2,00	37,82
VENTANAS POSTERIORES	1,75	1,14	1,00	3,00	-5,25
VENTANAS POSTERIORES	1,74	1,14	1,00	5,00	-8,70
SUBTOTAL					75,71

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Icaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**15. ACABADOS**		


ITEM	15.1	**DESCRIPCION**	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO QUIOSCO


FACHADA FRONTAL




FACHADA POSTERIOR



FACHADA LATERAL B




FACHADA LATERAL A

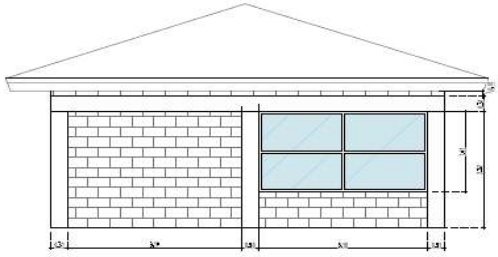


Alcaldía Municipal de Sesquilé			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
			ACTA PARCIAL No. 1 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			CONSORCIO INTER PLAZA
CONTRATO DE OBRA No.			SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**		CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:			MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.			MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**		CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:			INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA			
SUPERVISOR				ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO				**1. PRELIMINARES**		
ITEM	15.1	**DESCRIPCION**	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR		**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO LOCALES DE COMIDA


FACHADA PRINCIPAL LOCALES DE COMIDA COSTADO SIMON BOLIVAR




FACHADA POSTERIOR LOCALES DE COMIDA COSTADO SIMON BOLIVAR



FACHADA PRINCIPAL LOCALES DE COMIDA COSTADO TERMINAL



FACHADA POSTERIOR LOCALES DE COMIDA COSTADO TERMINAL



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**15. ACABADOS**		

ITEM	15.1	**DESCRIPCION**	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	ANCHO	**LARGO**	**AREA**		
QUIOSCO					
FACHADA FRONTAL	7,10	2,32	16,47	0,00	0,00
VENTANA A-1	3,10	2,32	7,19	0,00	0,00
VENTANA A-2	3,05	2,32	7,08	0,00	0,00
FACHADA LAT B	7,12	1,98	14,10	1,00	14,10
VENTANA B-1	3,10	1,61	4,99	-1,00	-4,99
FACHADA POSTERIOR	7,10	2,30	16,33	1,00	16,33
VENTANA C1	1,42	0,42	0,60	-1,00	-0,60
VENTANA C2	3,08	0,89	2,74	-1,00	-2,74
PUERTA C	0,88	2,30	2,02	-1,00	-2,02
FACHADA A	7,12	2,32	16,52	1,00	16,52
VENTANA D	3,10	1,61	4,99	-1,00	-4,99
LOCALES DE COMIDA					
LATERAL	4,01	2,32	9,30	2,00	18,61
FACHADA POSTERIOR	8,16	2,32	18,93	2,00	37,86
VENTANAS POSTERIORES	1,75	1,14	2,00	-3,00	-5,99
VENTANAS POSTERIORES	1,74	1,14	1,98	-5,00	-9,92
MUROS NICHOS GAS	0,45	1,00	0,45	24,00	10,80
SUBTOTAL					82,97
ACTA PARCIAL NO. 1					75,71
SUBTOTAL					7,26

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Icaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**15. ACABADOS**		


ITEM	15.1	**DESCRIPCION**	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO QUIOSCO


FACHADA FRONTAL




FACHADA POSTERIOR



FACHADA LATERAL B




FACHADA LATERAL A

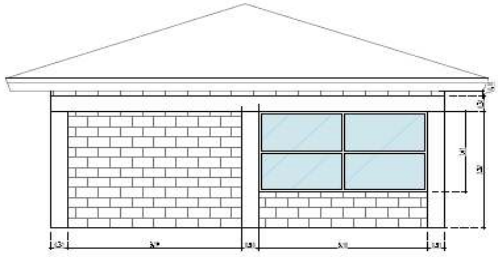


Alcaldía Municipal de Sesquilé			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
			MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA			CONSORCIO INTER PLAZA
CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025		**CONTRATISTA**		CONSORCIO PLAZA SESQUILE	
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025		**INTERVENTORIA**		CONSORCIO INTERPLAZA	
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA					
SUPERVISOR			ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
CAPITULO			**1. PRELIMINARES**			
ITEM	15.1	**DESCRIPCION**	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR		**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO LOCALES DE COMIDA


FACHADA PRINCIPAL LOCALES DE COMIDA COSTADO SIMON BOLIVAR




FACHADA POSTERIOR LOCALES DE COMIDA COSTADO SIMON BOLIVAR



FACHADA PRINCIPAL LOCALES DE COMIDA COSTADO TERMINAL



FACHADA POSTERIOR LOCALES DE COMIDA COSTADO TERMINAL



Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.1	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN PLACA MESÓN	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO					
			7,39	1,00	7,39
Descuento columna	0,3	0,30	0,09	1,00	-0,09
Lavaplatos	0,36	0,50	0,18	2,00	-0,35
LOCALES DE COMIDA					
Mesones del fondo	0,64	1,85	1,184	8	9,472
Lavaplatos (-)	0,35	0,5	0,175	-8	-1,4
Meson frontal	1	1,85	1,85	8	14,8
TOTAL					29,82

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.1	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN PLACA MESÓN	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

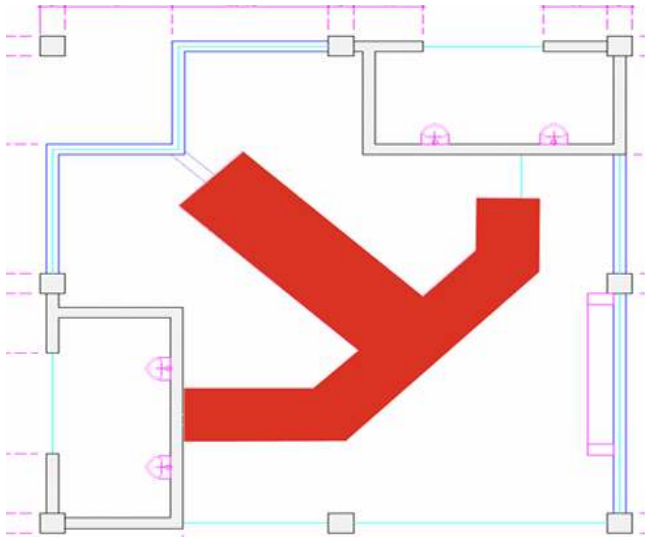

LOCALES DE COMIDA

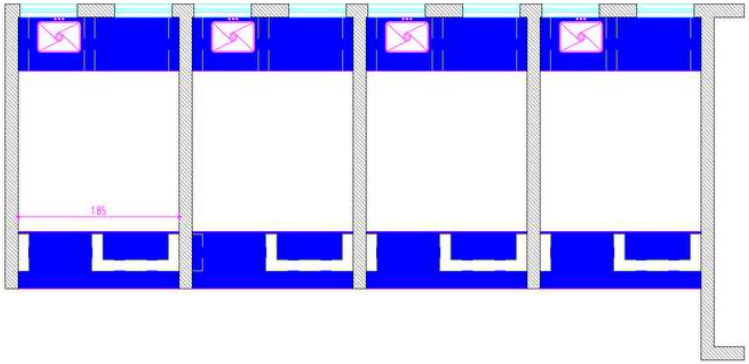

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.2	**DESCRIPCION**	DESMONTE DE LAVAPLATOS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO					
Meson				2,00	2,00
COCINAS					
Mesones del fondo				8,00	8,00
TOTAL					10,00

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.1	**DESCRIPCION**	DESMONTE DE LAVAPLATOS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

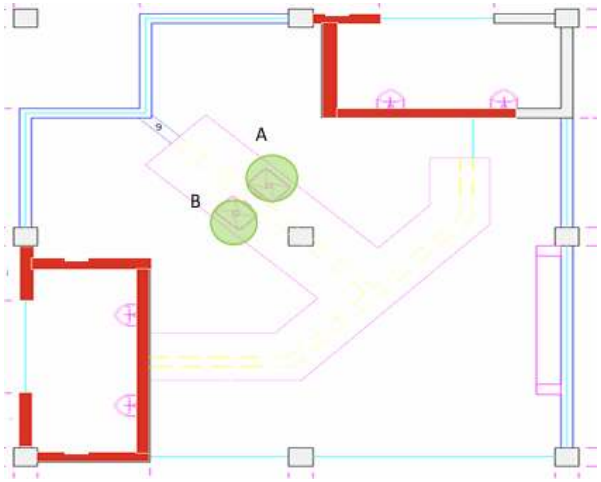

LOCALES DE COMIDA

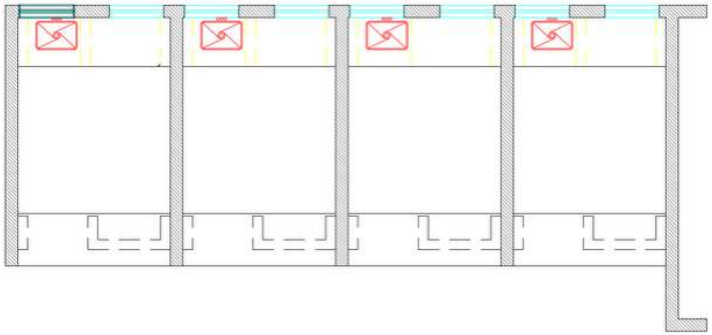

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.3	**DESCRIPCION**	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO					
A				1,00	1,00
B				1,00	1,00
C				1,00	1,00
D				1,00	1,00
TOTAL					4,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.3	**DESCRIPCION**	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO

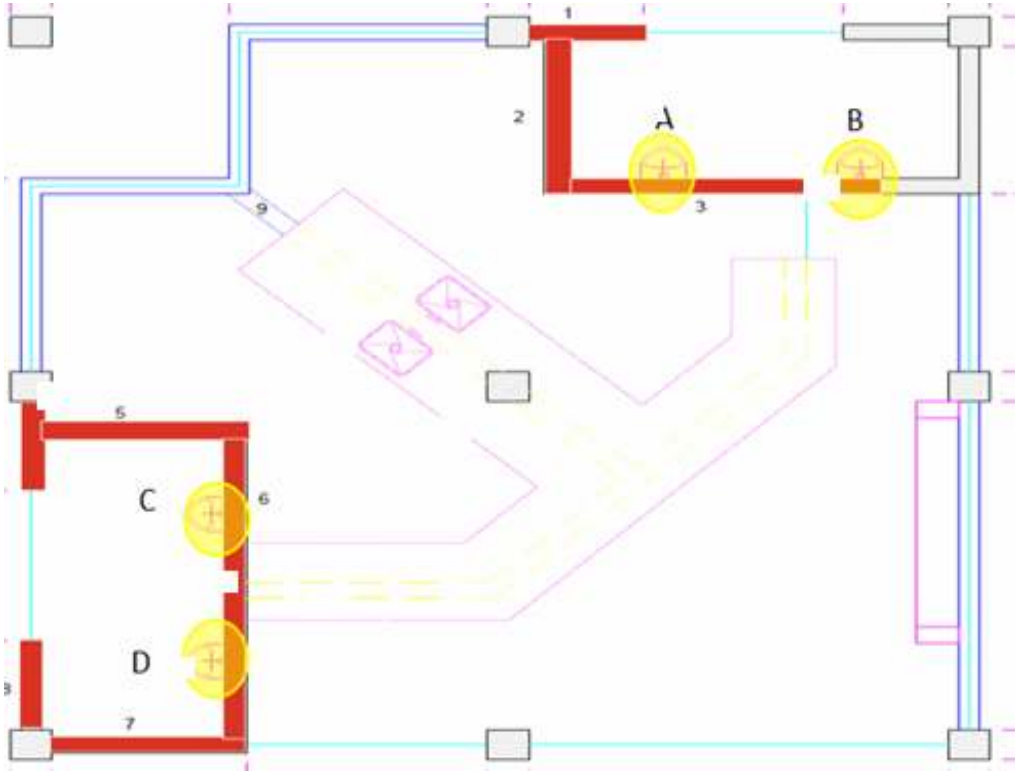

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	#CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.4	**DESCRIPCION**	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO					
A				1,00	1,00
TOTAL					1,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.4	**DESCRIPCION**	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO

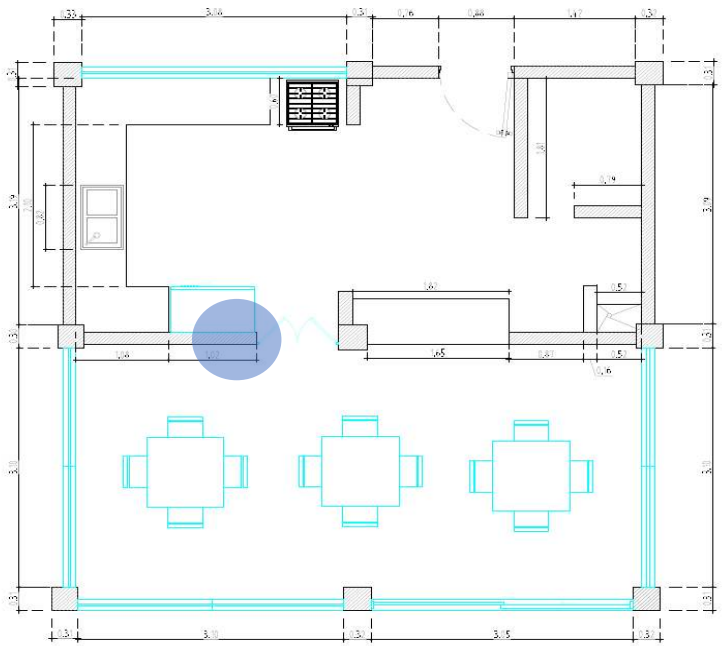

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	18.5	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA		
QUIOSCO					
MUROS					
1	0,82	2,50	2,05	1,00	2,05
2	1,25	2,50	3,13	1,00	3,13
3	3,11	2,50	7,78	1,00	7,78
4	0,85	2,50	2,13	1,00	2,13
5	1,32	2,50	3,30	1,00	3,30
6	3,15	2,50	7,88	1,00	7,88
7	1,32	2,50	3,30	1,00	3,30
8	0,85	2,50	2,13	1,00	2,13
9	0,75	2,50	1,88	1,00	1,88
10	1,25	2,50	3,13	1,00	3,13
ANTEPECHOS					
A	4,53	1,45	6,57	1,00	6,57
B	1,25	1,45	1,81	1,00	1,81
C	1,50	1,45	2,18	1,00	2,18
D	1,85	1,45	2,68	1,00	2,68
E	1,70	1,15	1,96	1,00	1,96
F	3,13	1,15	3,60	1,00	3,60
MESON					
0,1	3,35	0,74	2,48	1,00	2,48
0,2	3,07	0,74	2,27	1,00	2,27
0,3	1,78	0,74	1,32	1,00	1,32
0,4	0,95	0,74	0,70	1,00	0,70
SUBTOTAL HOJA 1					62,24


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		

ITEM	18.5	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

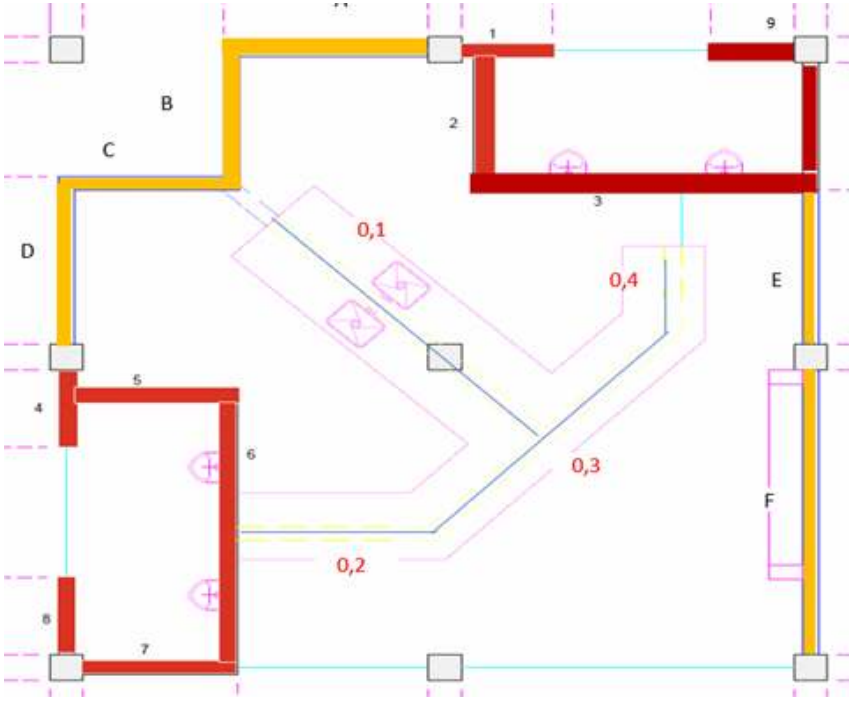

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.5	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	**UNIDAD**	#N/D

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA		
LOCALES DE COMIDA					
	0,60	2,32	1,39	3	4,18
	0,60	1,20	0,72	24	17,28
	1,00	1,20	1,20	8	9,60
QUIOSCO					
A	0,75	2,32	1,74	3	5,22
B	0,82	2,32	1,90	3	5,71
C	1,47	2,32	3,41	3	10,23
D	1,47	2,32	3,41	3	10,23
E	2,81	2,32	6,52	3	19,56
F	1,47	2,32	3,41	3	10,23
G	2,85	2,32	6,61	3	19,84
H	1,47	2,32	3,41	3	10,23
I	0,85	2,32	1,97	3	5,92
J	0,85	2,32	1,97	3	5,92
	3,92	0,90	3,53	3	10,58
	3,01	0,90	2,71	3	8,13
	0,94	0,90	0,85	3	2,54
	1,78	0,90	1,60	3	4,81
SUBTOTAL HOJA 1					62,24
SUBTOTAL					222,43


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.5	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

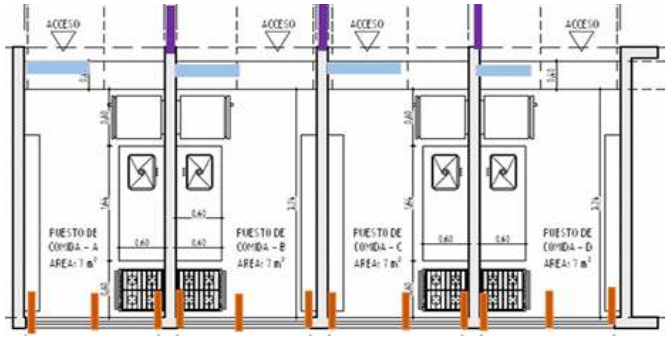

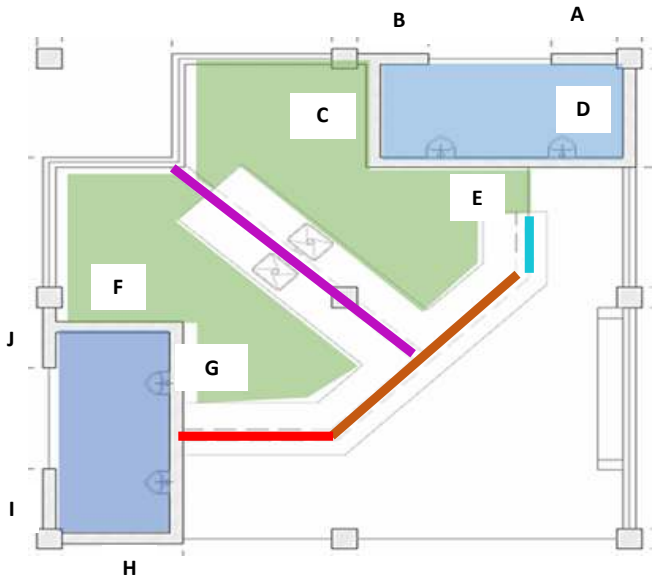

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.6	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO					
	3,84	1,85	7,10	2,00	14,21
			12,98	1,00	12,98
LOCALES DE COMIDA					
	1,75	3,24	5,67	8,00	45,36
TOTAL					72,55

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.6	**DESCRIPCION**	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

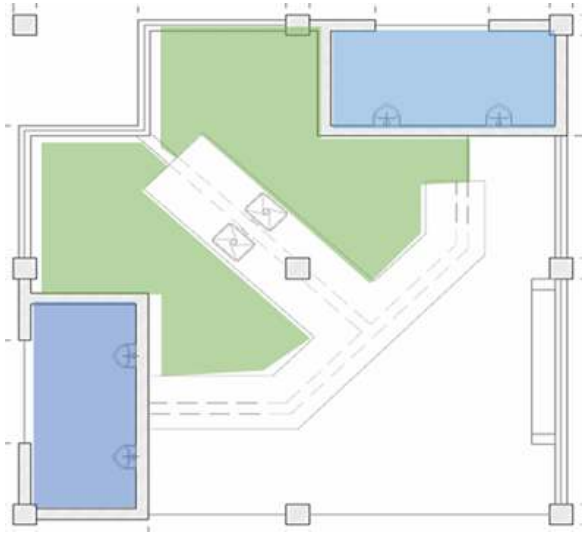

LOCALES DE COMIDA

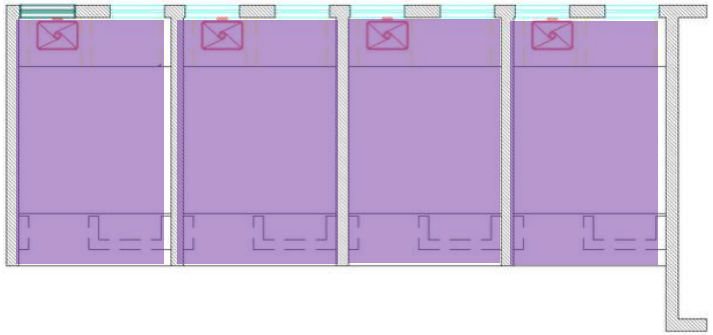

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.7	**DESCRIPCION**	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO					
A				1,00	1,00
B				1,00	1,00
C				1,00	1,00
D				1,00	1,00
E				1,00	1,00
F				1,00	1,00
LOCALES DE COMIDA					
LOCALES DE COMIDA A,B,C,D,E,F,G,H				8,00	8,00
TOTAL					14,00

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.7	**DESCRIPCION**	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

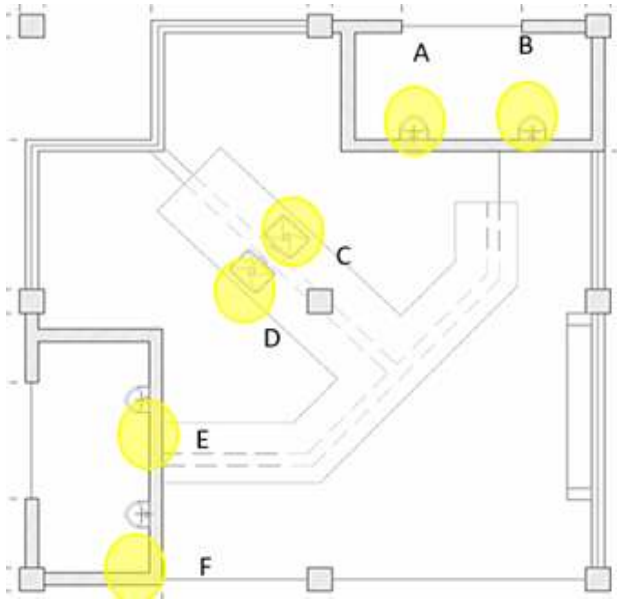

LOCALES DE COMIDA

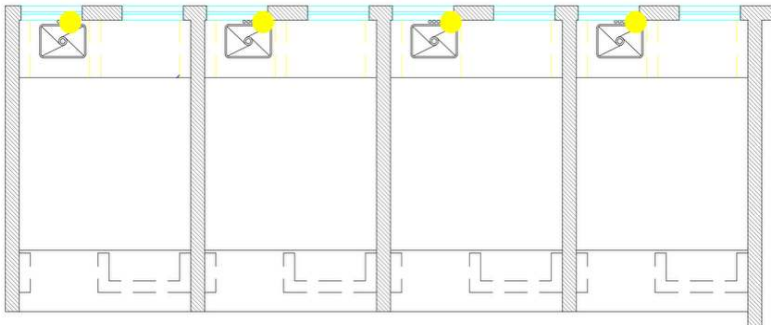

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.8	**DESCRIPCION**	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO					
			1,00	1,00	1,00
B			1,00	1,00	1,00
E			1,00	1,00	1,00
F			1,00	1,00	1,00
TOTAL					4,00

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.8	**DESCRIPCION**	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.9	**DESCRIPCION**	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO					
ILUMINACION				6,00	6,00
INTERRUMPOR				4,00	4,00
TOMA CORRIENTE				3,00	3,00
LOCALES DE COMIDA					
ILUMINACION				8,00	8,00
INTERRUMPOR				8,00	8,00
TOMA CORRIENTE				8,00	8,00
TOTAL					37,00

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.9	**DESCRIPCION**	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS	**UNIDAD**	UND


PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO



LOCALES DE COMIDA

COSTADO SIMÓN BOLÍVAR

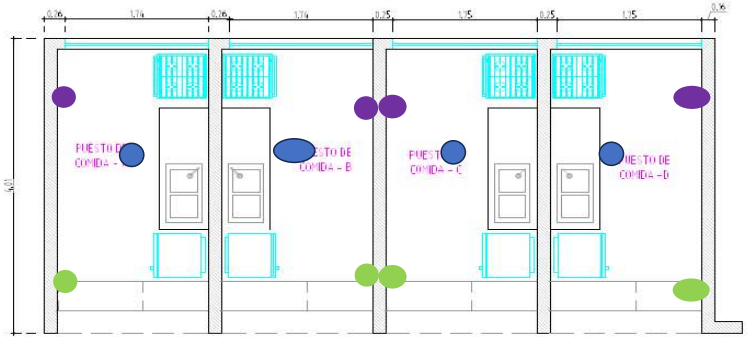

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.10	**DESCRIPCION**	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO					
				2,00	2,00
LOCALES DE COMIDA					
				8,00	8,00
TOTAL					10,00

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.10	**DESCRIPCION**	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

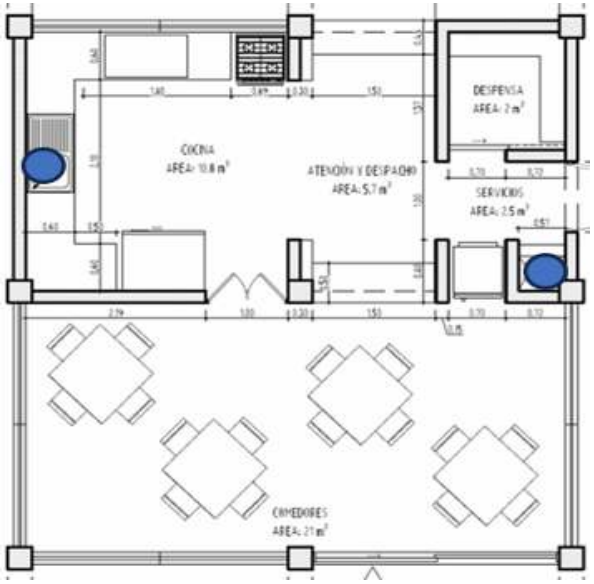

LOCALES DE COMIDA

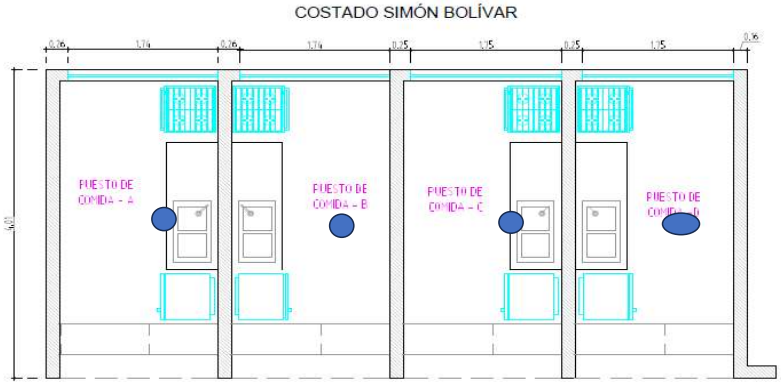

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.11	**DESCRIPCION**	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
RESTAURANTE			1,00	1,00	1,00
PUESTOS DE COMIDA			8,00	8,00	8,00
TOTAL					9,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**			CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**			CONSORCIO INTER PLAZA
CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE	
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA	
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA			
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**			


ITEM	18.11	**DESCRIPCION**	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

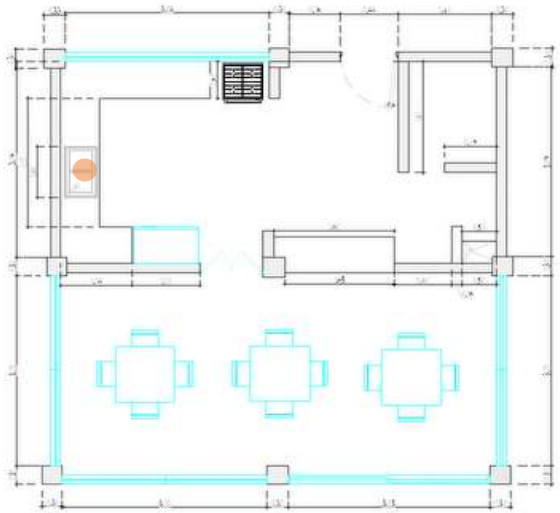

LOCALES DE COMIDA

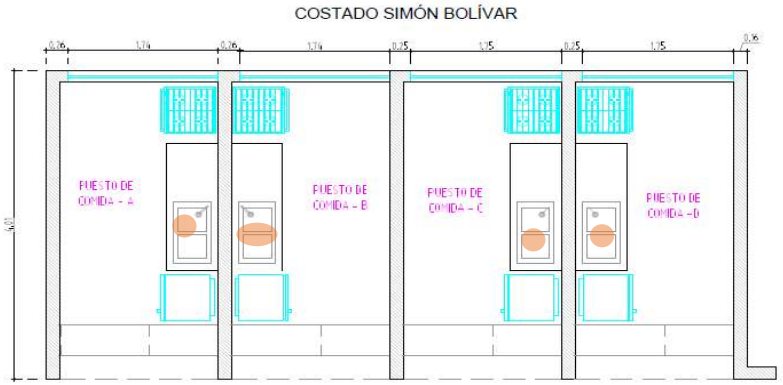

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.12	**DESCRIPCION**	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 2"	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO	**LOCALIZACION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
	Quiosco				2,0	2,0
	Cocinas				8,0	8,0
	TOTAL					10,00

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.12	**DESCRIPCION**	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 2"	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

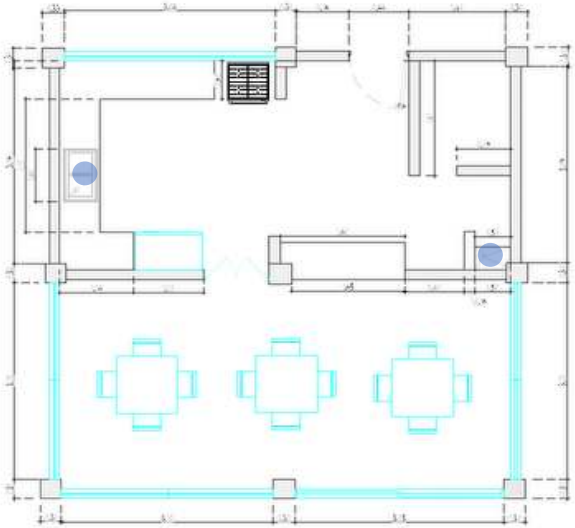

LOCALES DE COMIDA

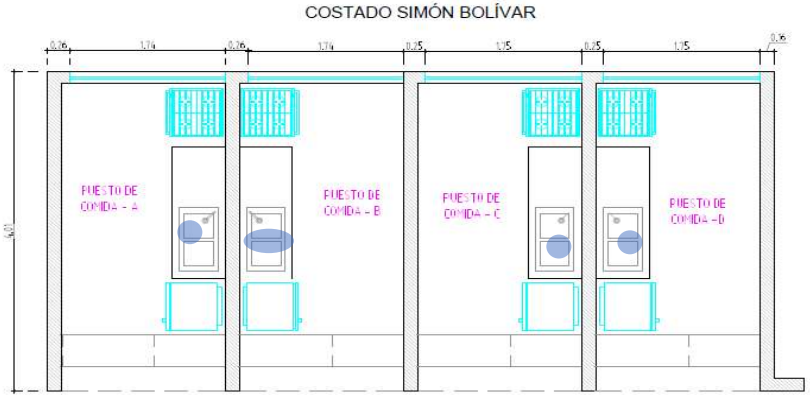

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.13	**DESCRIPCION**	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO	**LOCALIZACION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
	Cocinas		2,23		10,0	22,3
	TOTAL					22,30


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.13	**DESCRIPCION**	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M (LINEAL)	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

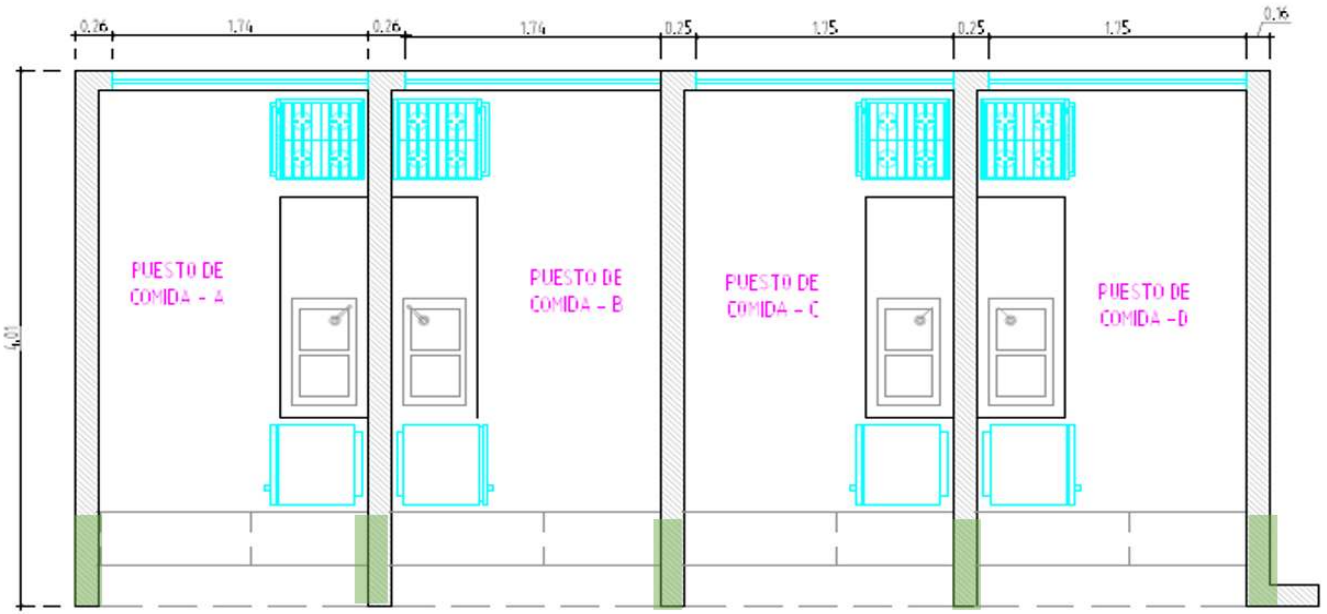

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.14	**DESCRIPCION**	PLACA BASE CONCRETO 0.10M 3000 PSI	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO	**LOCALIZACION**	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
	Quiosco	7,01	7,03		1,0	49,3
	TOTAL					49,28


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.14	**DESCRIPCION**	PLACA BASE CONCRETO 0.10M 3000 PSI	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

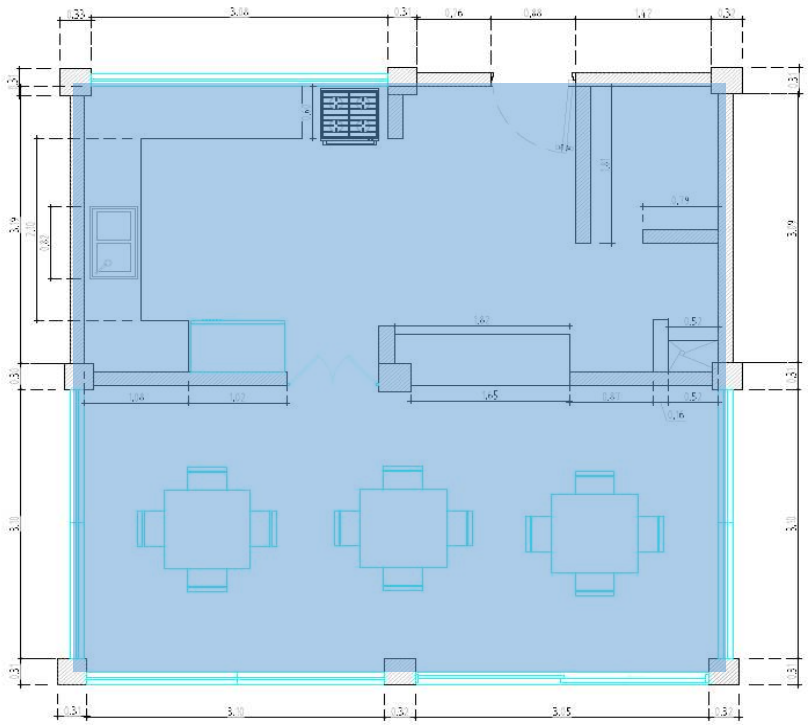

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.15	**DESCRIPCION**	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
Quiosco	7,01	7,03	49,28	1,00	49,21
Cocinas	1,85	3,24	5,99	8,00	47,95
TOTAL					97,16


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.15	**DESCRIPCION**	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

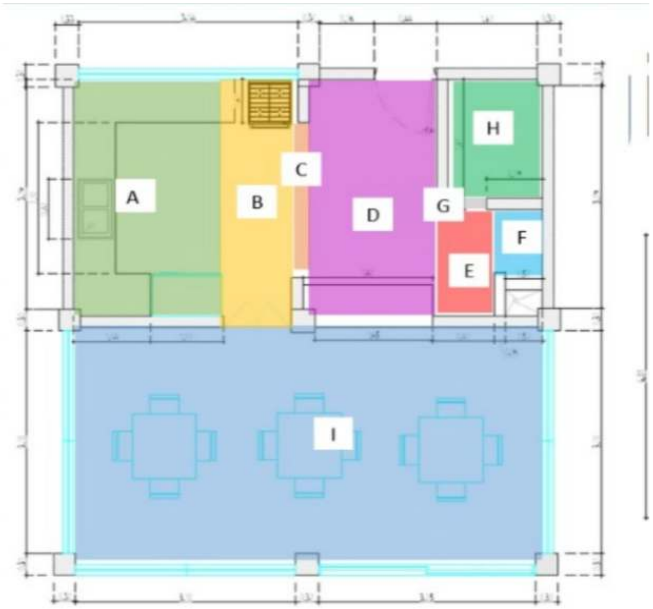

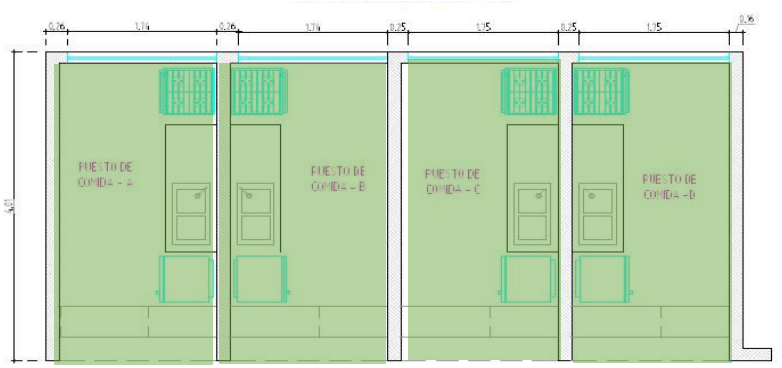

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	#CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.16	**DESCRIPCION**	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 015 M	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTO		
1	3,19	2,32	7,40	1,00	7,40
2	2,01	2,32	4,66	1,00	4,66
3	3,08	2,32	7,15	1,00	7,15
4	3,10	0,74	2,29	1,00	2,29
5	1,42	1,88	2,67	1,00	2,67
6	3,09	2,32	7,17	1,00	7,17
7	1,81	2,32	4,20	1,00	4,20
8	3,10	0,74	2,29	1,00	2,29
9	1,49	2,32	3,46	1,00	3,46
10	1,65	0,90	1,49	1,00	1,49
TOTAL					42,78


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.16	**DESCRIPCION**	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 015 M	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

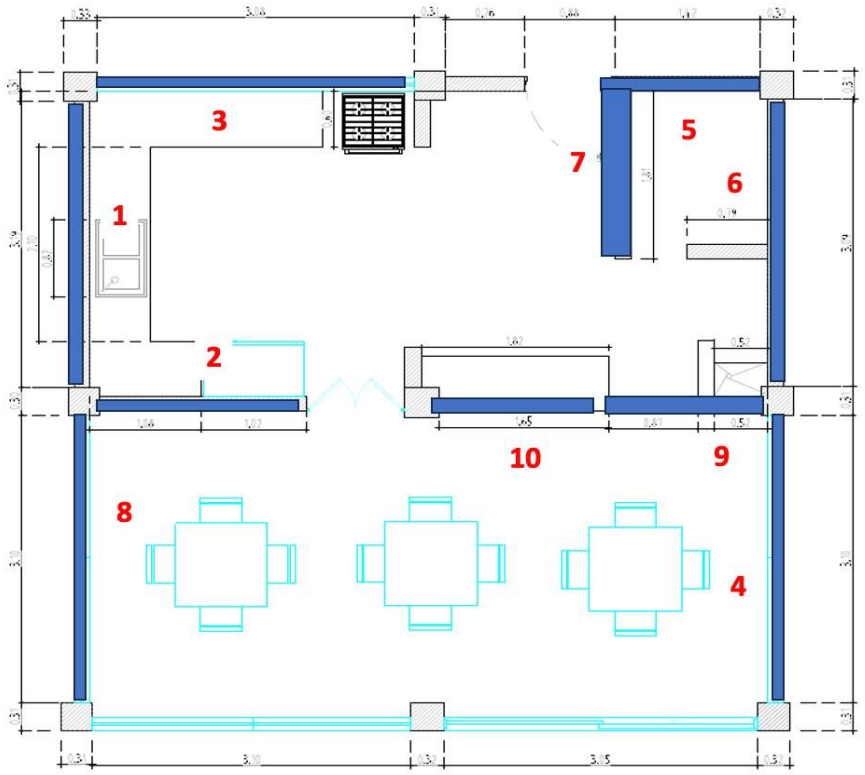

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		

CAPITULO		**1. ITEMS NO PREVISTOS**	
ITEM	18.17	**DESCRIPCION**	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)
UNIDAD	ML		

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO		
	QUIOSCO				
1			2,32	1,00	2,32
2			2,32	1,00	2,32
3			2,32	1,00	2,32
4			2,32	1,00	2,32
5			2,32	1,00	2,32
6			0,45	1,00	0,45
TOTAL					12,05


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.17	**DESCRIPCION**	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

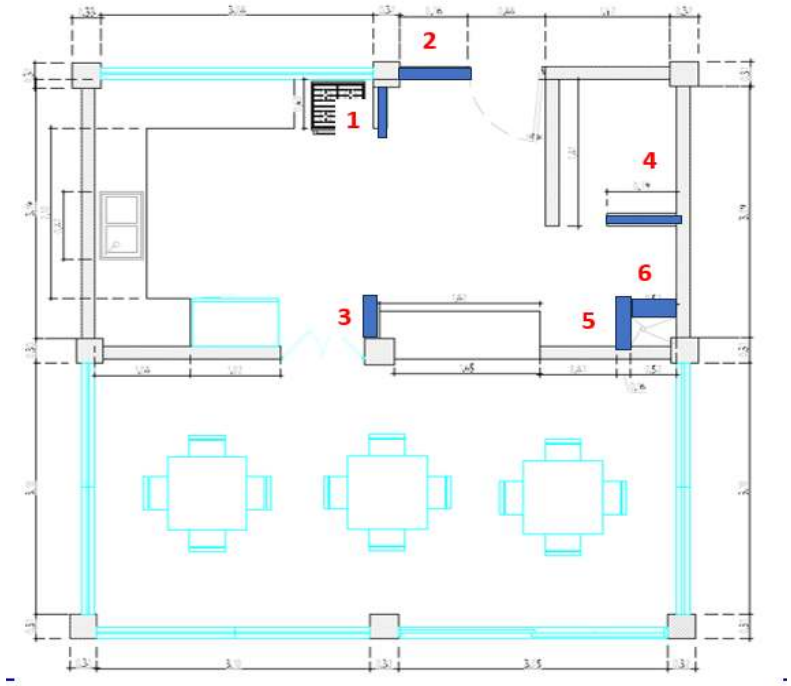

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.17	**DESCRIPCION**	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO					
MUROS NICHOS DE GAS			1,00	12,00	12,00
LOCALES DE COMIDA			2,32	8,00	18,56
TOTAL					30,56


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.17	**DESCRIPCION**	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

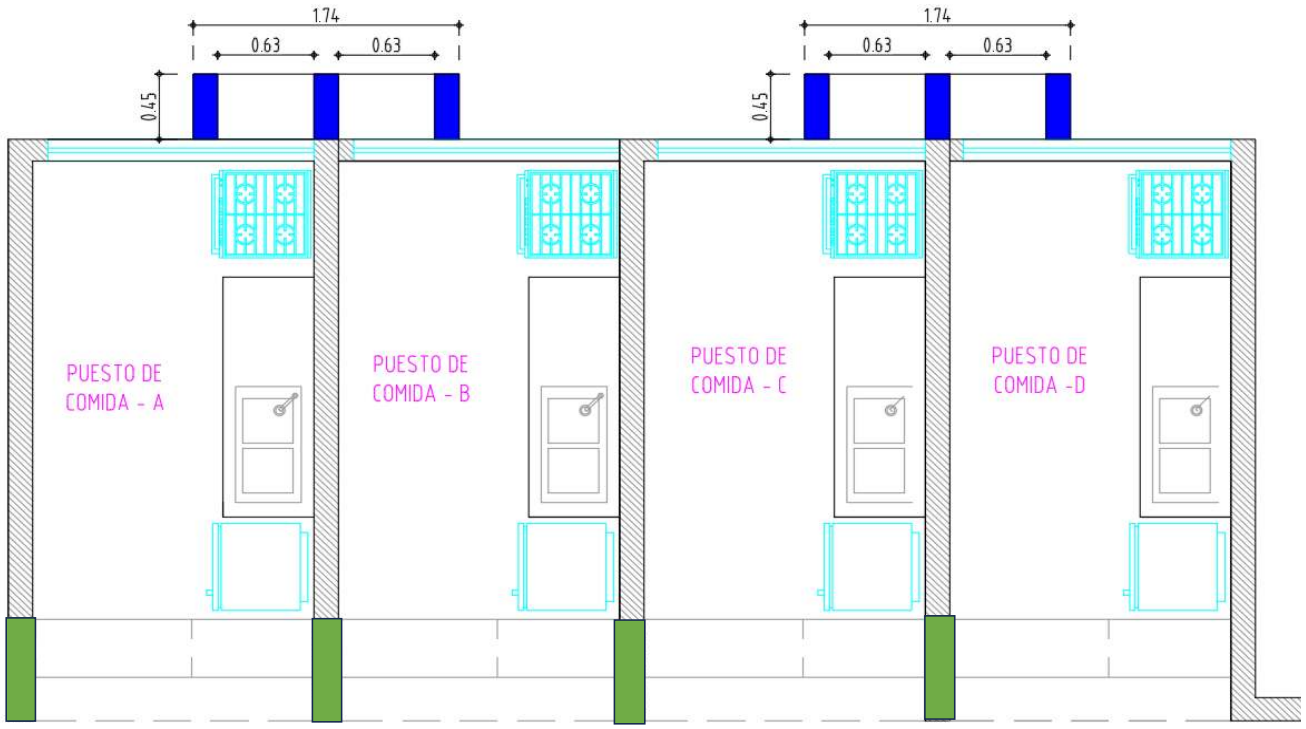

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.18	**DESCRIPCION**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
QUIOSCO					
1			2,50	3,00	7,50
2			2,50	2,00	5,00
3			2,50	3,00	7,50
4			2,50	3,00	7,50
5			2,50	3,00	7,50
6			0,45	3,00	1,35
LOCALES DE COMIDA					
			2,50	24,00	60,00
TOTAL					96,35


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.18	**DESCRIPCION**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

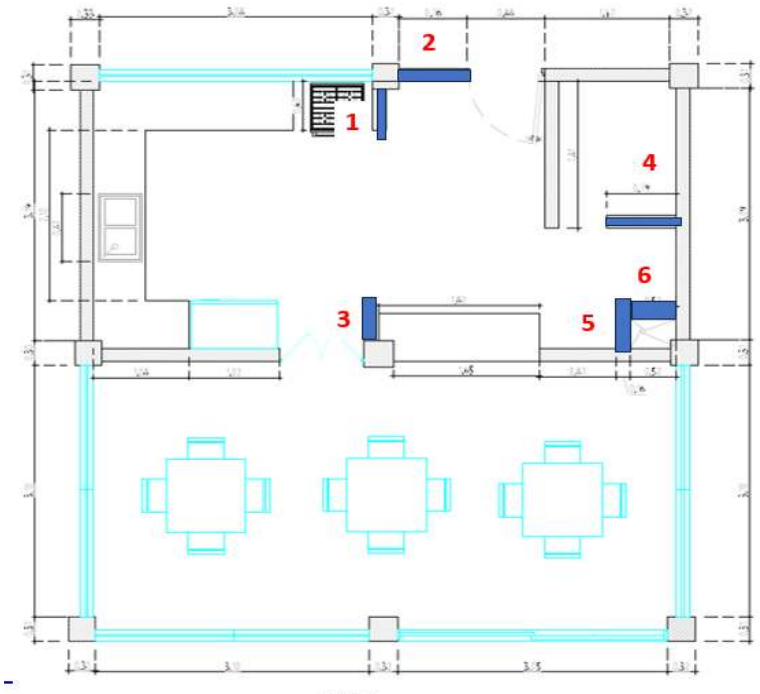

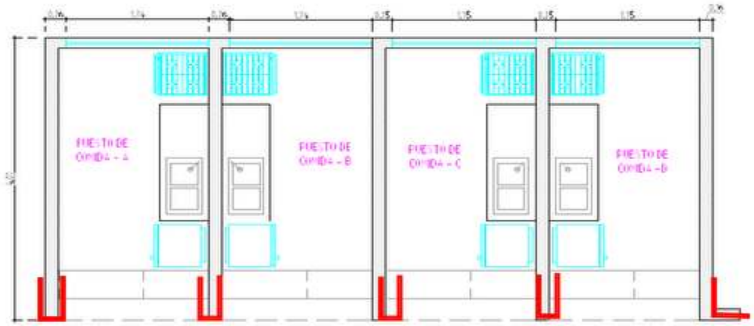

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.18	**DESCRIPCION**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO







LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**LONGITUD**		
QUIOSCO					
A			2,32	1,00	2,32
B			0,90	1,00	0,90
C			2,32	1,00	2,32
D			2,32	1,00	2,32
E			2,32	1,00	2,32
F			2,32	1,00	2,32
G			2,32	1,00	2,32
			2,32	6,00	13,92
VIGA SUPERIOR			28,44	1,00	28,44
COLUMNAS A			2,32	9,00	20,88
COLUMNAS B			1,98	3,00	5,94
LATERALES COLUMNA A			2,32	8,00	18,56
LATERALES COLUMNA B			1,98	4,00	7,92
LOCALES DE COMIDA					
			2,32	28,00	64,96
PAÑETE VIGA PARED BOMBEROS					
			15,66	1,00	15,66
LOCALES DE COMIDA					
			2,32	8,00	18,56
			7,89	2,00	15,78
SUBTOTAL					225,44
ACTA PARCIAL No. 1					96,35
TOTAL					129,09

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.18	**DESCRIPCION**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

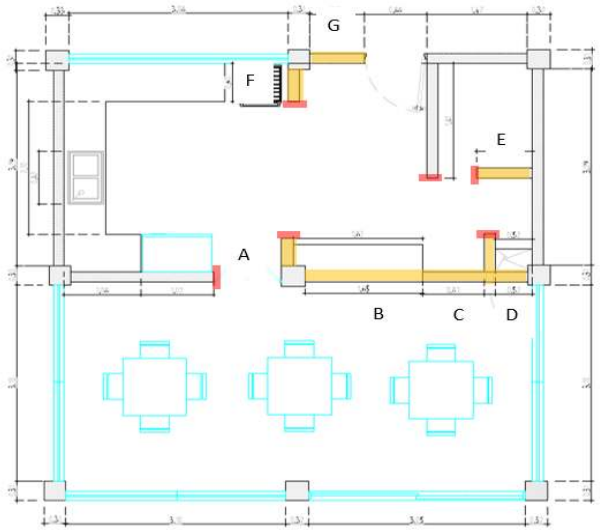


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		


ITEM	18.18	**DESCRIPCION**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO QUIOSCO


FACHADA FRONTAL

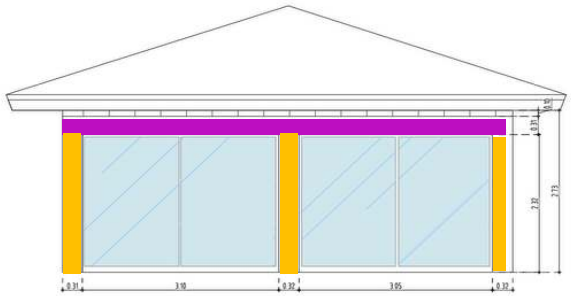


FACHADA POSTERIOR

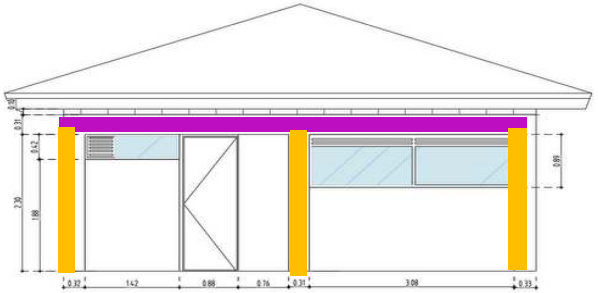

FACHADA LATERAL B

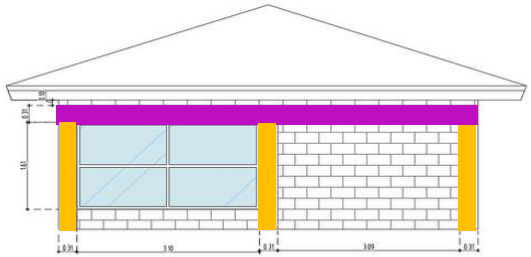

FACHADA LATERAL A

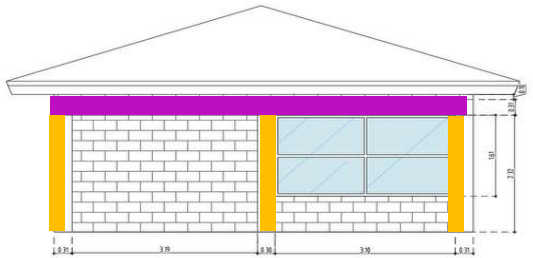


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ CONSORCIO INTER PLAZA


CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR		ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS	
CAPITULO		**1. ITEMS NO PREVISTOS**	

ITEM	18.18	**DESCRIPCION**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



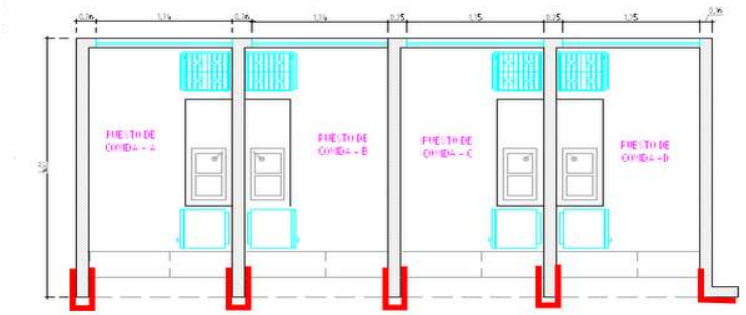

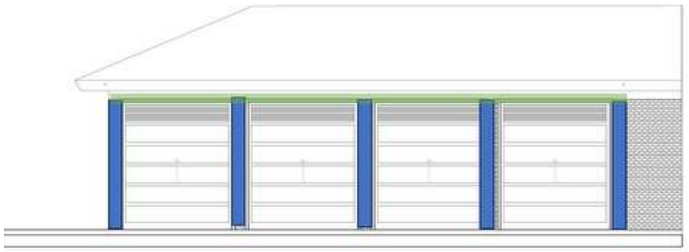

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.19	**DESCRIPCION**	COLUMNETA 0.10MX0.15M 3000 PSI	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO





LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**		
LOCALES DE COMIDA					
			2,32	10,00	23,20
TOTAL					23,20


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.19	**DESCRIPCION**	COLUMNETA 0.10MX0.15M 3000 PSI	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

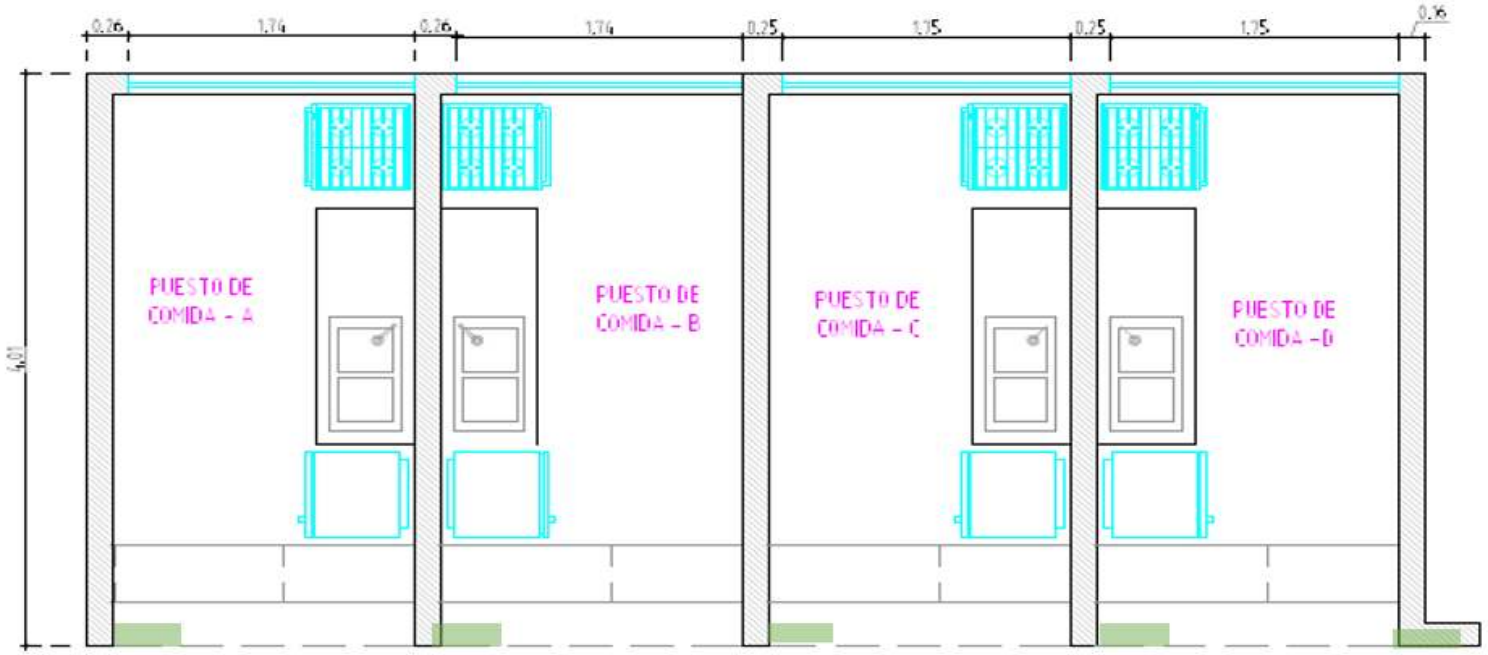

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.20	**DESCRIPCION**	ACERO FIGURADO 6000 PSI	**UNIDAD**	KG

PLANO DESCRIPTIVO





Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Peso		
PUESTOS DE COMIDA A-B-C-D					
CIMENTACION	5,00	4,00	0,99	4,95	24,75
	2,50	4,00	0,99	2,47	6,17
	0,76	3,00	0,57	0,43	0,33
	0,26	3,00	0,57	0,15	0,04
AREA	5,00	4,00	0,99	4,95	24,75
	2,50	4,00	0,99	2,47	6,17
	0,76	3,00	0,57	0,43	0,33
	0,26	3,00	0,57	0,15	0,04
PUESTOS DE COMIDA E-F-G-H					
CIMENTACION	5,00	4,00	0,99	4,95	24,75
	2,50	4,00	0,99	2,47	6,17
	0,76	3,00	0,57	0,43	0,33
	0,26	3,00	0,57	0,15	0,04
AREA	5,00	4,00	0,99	4,95	24,75
	2,50	4,00	0,99	2,47	6,17
	0,76	3,00	0,57	0,43	0,33
	0,26	3,00	0,57	0,15	0,04
SUBTOTAL					125,14


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.20	**DESCRIPCION**	ACERO FIGURADO 6000 PSI	**UNIDAD**	Kg

PLANO DESCRIPTIVO

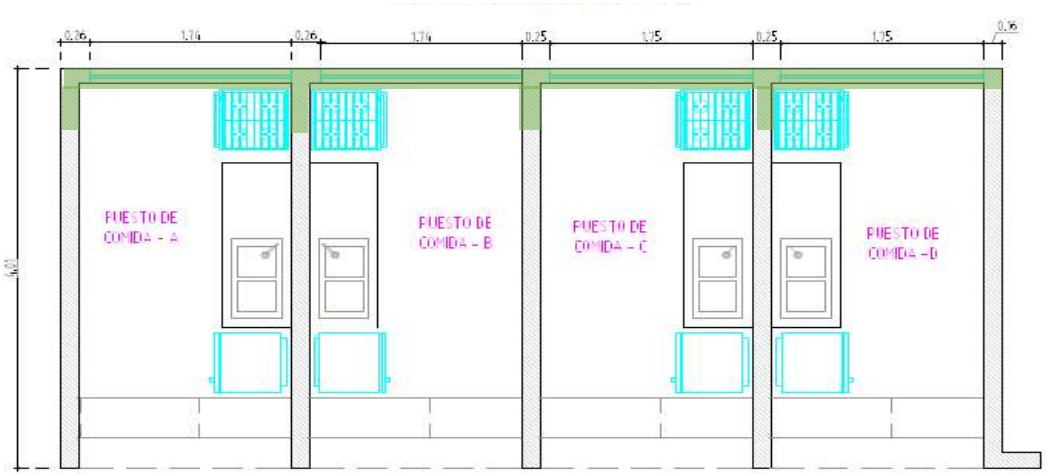



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.20	**DESCRIPCION**	ACERO FIGURADO 6000 PSI	**UNIDAD**	Kg

PLANO DESCRIPTIVO





Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Area	Peso		
QUIOSCO					
		1,36	0,99	1,00	0,99
		1,26	0,90	1,00	0,90
Vano lavaplatos (-)		0,34	0,99	-1	0,00
		0,65	0,99	1,00	0,99
LOCALES DE COMIDA					
		1,00	0,99	8,00	7,92
Vano lavaplatos (-)		0,34	0,99	-8,00	0,00
SUBTOTAL HOJA 1					125,14
TOTAL					135,94


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA**	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA**	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA**
CONSORCIO PLAZA SESQUILE		**CONSORCIO INTERPLAZA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.20	**DESCRIPCION**	ACERO FIGURADO 6000 PSI	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

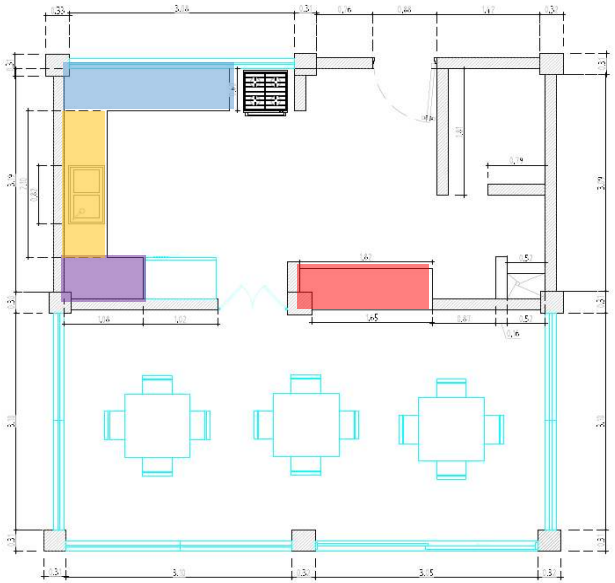

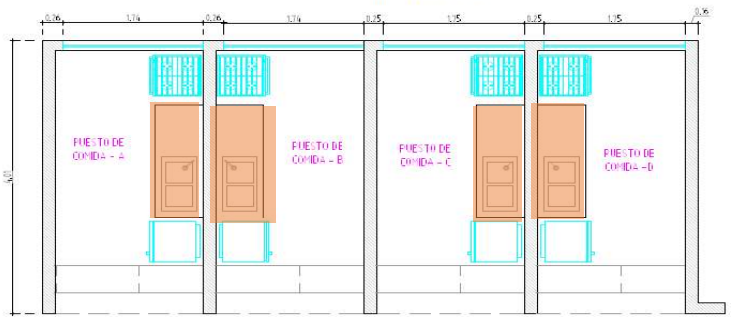

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.21	**DESCRIPCION**	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	**UNIDAD**	KG

REGISTRO FOTOGRAFICO




Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Peso		
	RAMPA URBANISMO				
	1,5	3,75	1,34	1,00	7,54

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**11. PISOS BASES**		

ITEM	2.3	**DESCRIPCION**	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	**UNIDAD**	KG

PLANO DESCRIPTIVO

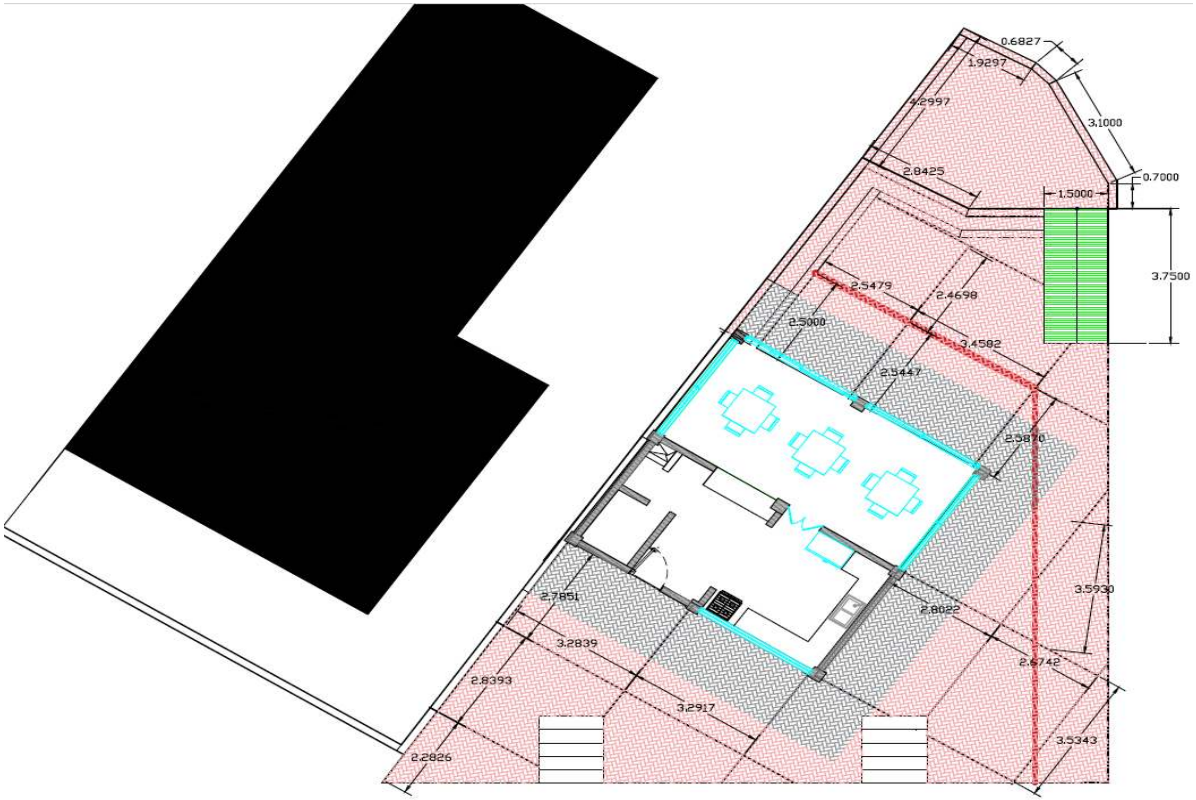

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.21	**DESCRIPCION**	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	**UNIDAD**	KG

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Peso		
QUIOSCO					
	7,01	7,03	1,34	1,00	66,04
CUBIERTA OFICINA					
AREA 1		20,81	1,34	1,00	27,89
AREA 2		25,80	1,34	1,00	34,57
AREA 3		1,84	1,34	1,00	2,47
AREA 4		2,76	1,34	1,00	3,70
TOTAL					134,66


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**11. PISOS BASES**		

ITEM	2.3	**DESCRIPCION**	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	**UNIDAD**	KG

PLANO DESCRIPTIVO

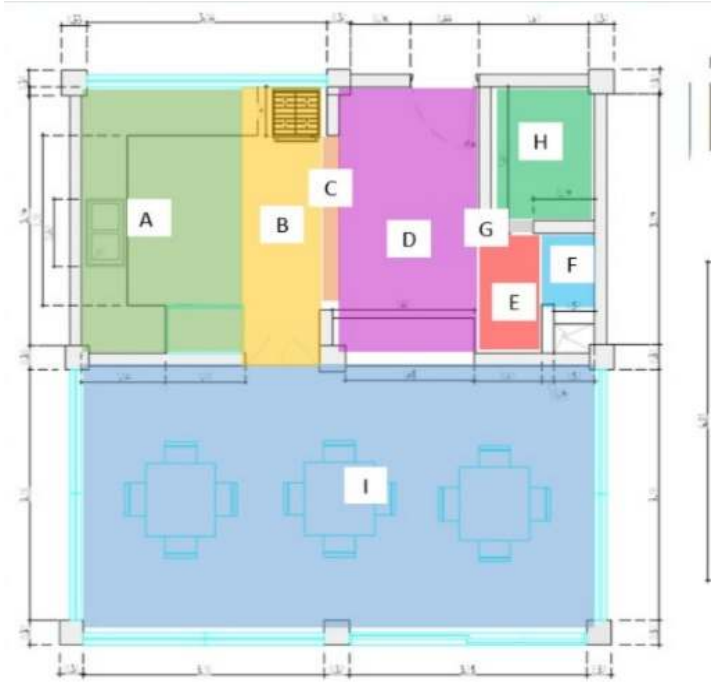

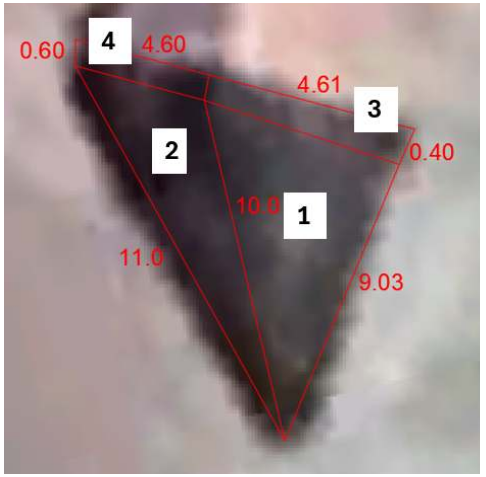

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.22	**DESCRIPCION**	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO





Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Area		
QUIOSCO		2,32		30,00	69,60
COCINA		2,32		6,00	13,92
TOTAL					83,52


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.22	**DESCRIPCION**	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

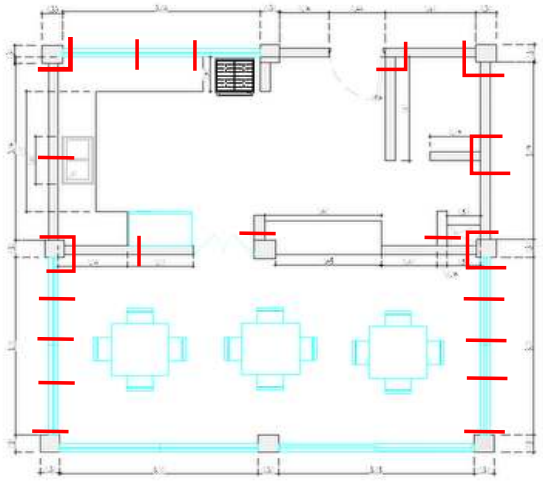

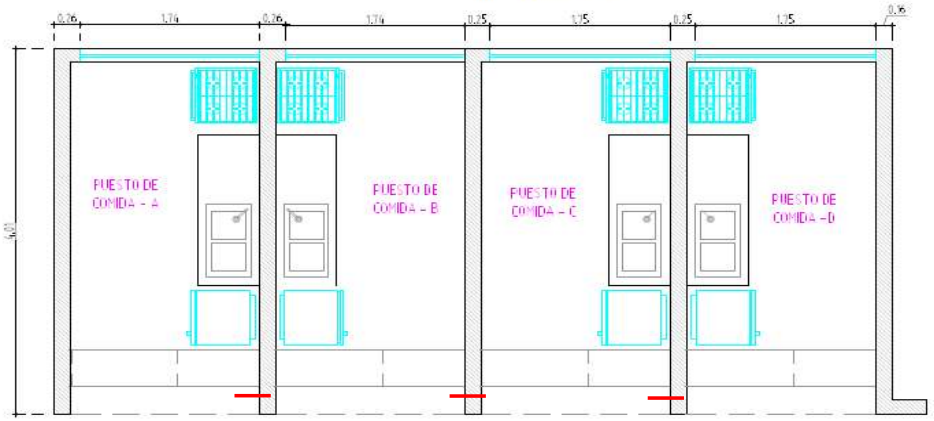

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.23	**DESCRIPCION**	VIGUETA DE AMARRE DE 0.20M X 0.20M 3000 PSI	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Largo		
LOCALES DE COCINAS					
COSTADO NORTE			8,17	1,00	8,17
COSTADO SUR			8,17	1,00	8,17
CINTA ADOQUIN QUIOSCO					
			78,46	1,00	78,46
TOTAL					94,80


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.23	**DESCRIPCION**	VIGUETA DE AMARRE DE 0.20M X 0.20M 3000 PSI	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

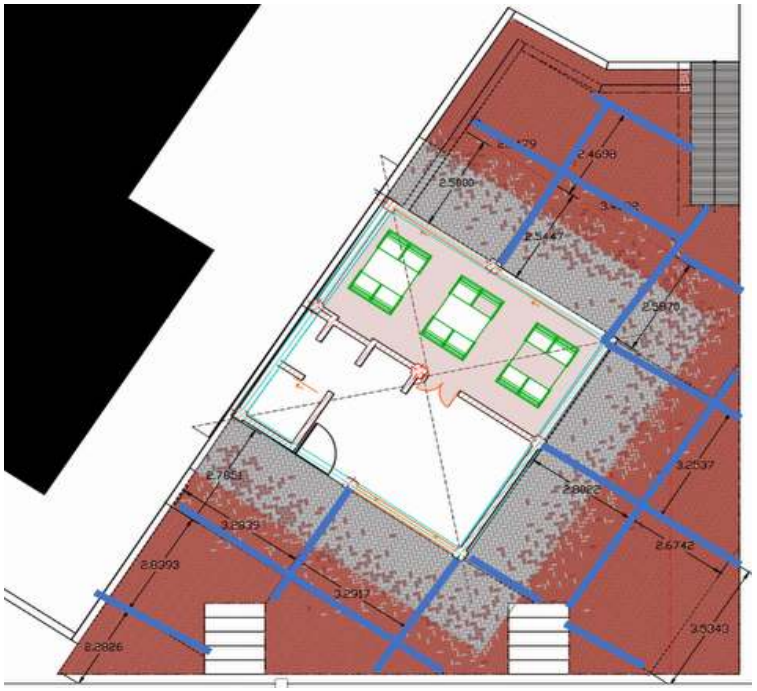

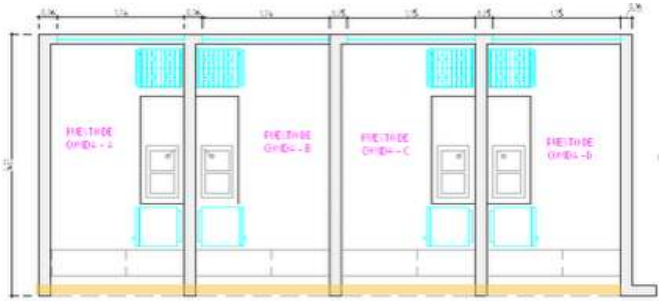

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.24	**DESCRIPCION**	VIGUETA AEREA 0.20M X 0.20M 3000 PSI	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Largo		
LOCALES DE COCINAS					
COSTADO NORTE			8,17	1,00	8,17
COSTADO SUR			8,17	1,00	8,17
TOTAL					16,34


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.24	**DESCRIPCION**	VIGUETA AEREA 0.20M X 0.20M 3000 PSI	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

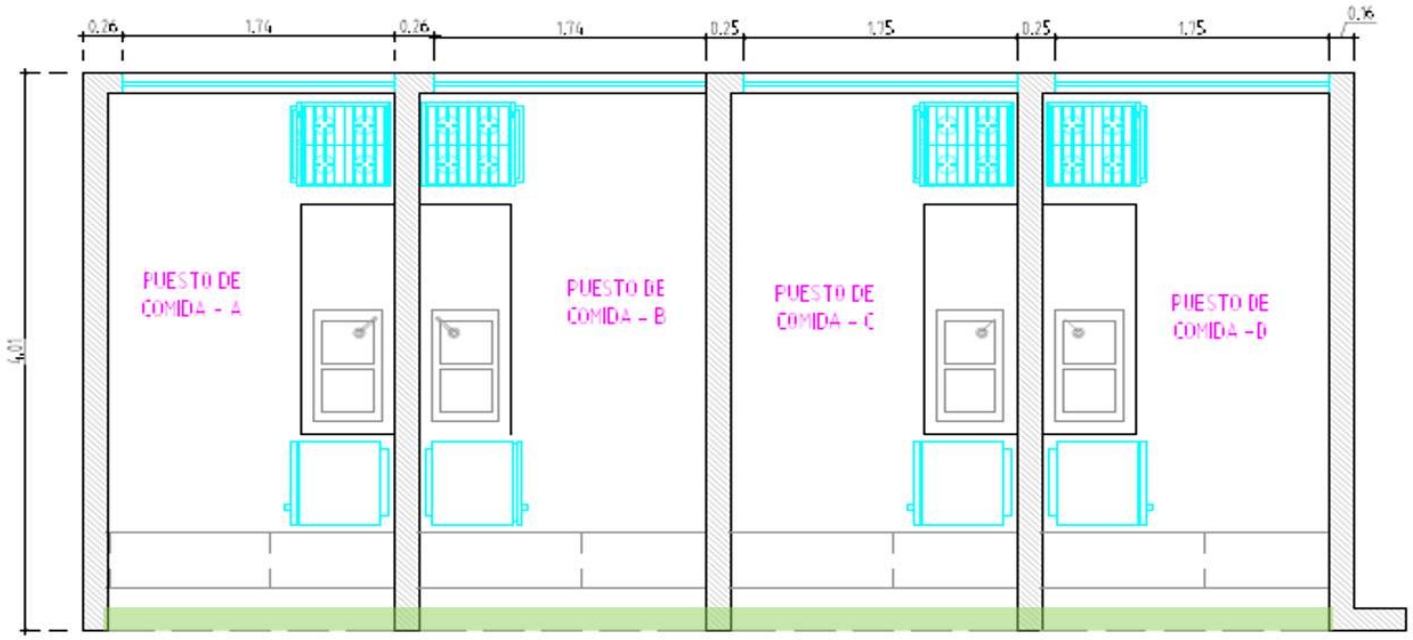

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.25	**DESCRIPCION**	FILOS O DILATACIONES S/MURO	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Largo		
QUIOSCO					
A			7,94	2,00	15,88
B			8,91	2,00	17,82
C			8,91	2,00	17,82
D			3,68	2,00	7,36
PUERTA 1			5,48	2,00	10,96
PUERTA 2			5,56	2,00	11,12
			2,32	10,00	23,20
LOCALES DE COMIDA					
			5,76	10,00	57,60
			5,78	6,00	34,68
			2,32	18,00	41,76
TOTAL					238,20


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.25	**DESCRIPCION**	FILOS O DILATACIONES S/MURO	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

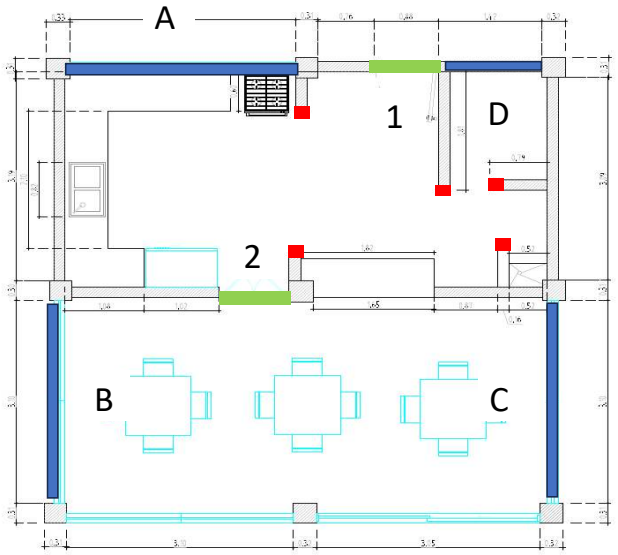

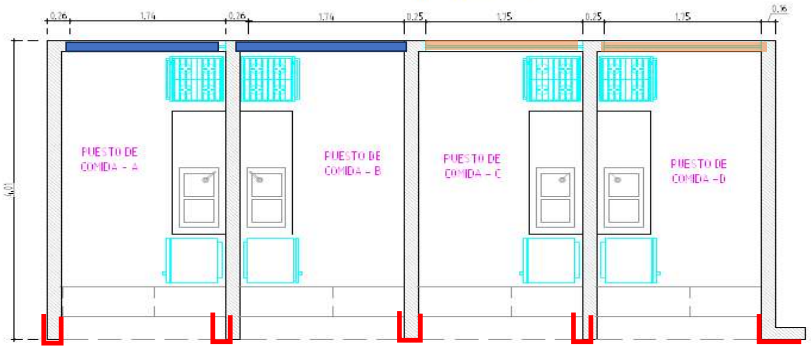

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.25	**DESCRIPCION**	FILOS O DILATACIONES S/MURO	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Largo		
QUIOSCO					
VANO MESON			4,49	1,00	4,49
TOTAL					4,49


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.25	**DESCRIPCION**	FILOS O DILATACIONES S/MURO	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

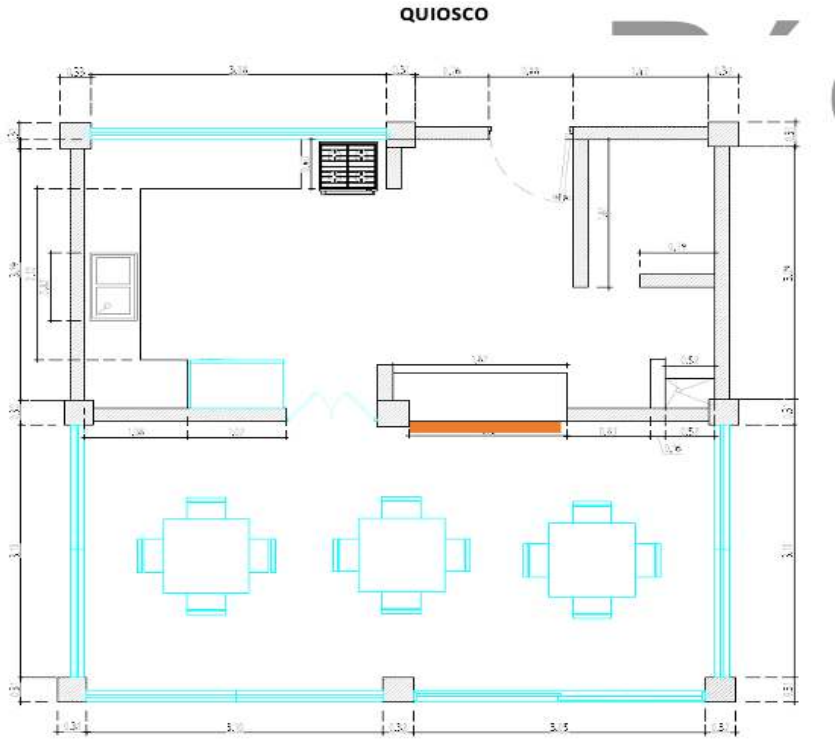

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.26	**DESCRIPCION**	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO





Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Area		
	QUIOSCO				
	3,30	6,6	21,78	1	21,78
	LOCALES DE COMIDA				
	3,86	1,84	7,10	4,00	28,41
	3,86	1,85	7,14	4,00	28,56
			TOTAL		78,75


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.26	**DESCRIPCION**	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

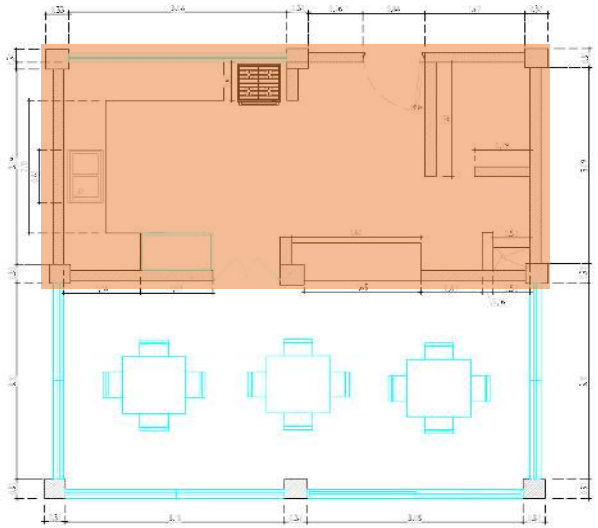



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.27	**DESCRIPCION**	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO





Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud		
QUIOSCO					
			5,64	1	5,64
TOTAL					5,64

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**			CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ	
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**			CONSORCIO INTER PLAZA	
CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**		CONSORCIO PLAZA SESQUILE	
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**		CONSORCIO INTERPLAZA	
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA				
SUPERVISOR			ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO			**1. ITEMS NO PREVISTOS**		
ITEM	18.27	**DESCRIPCION**	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

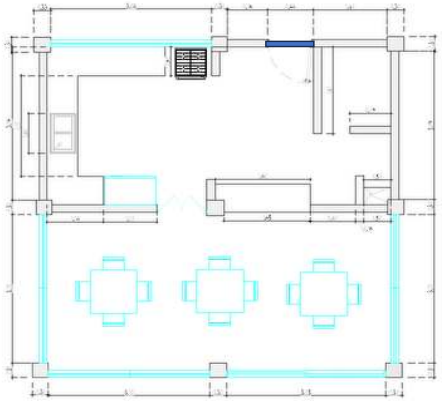

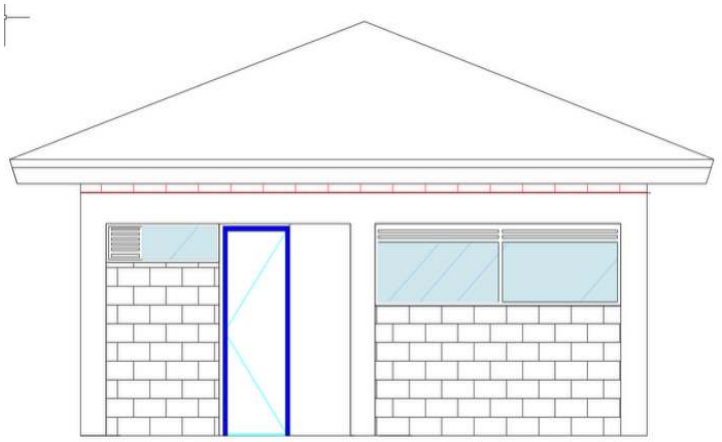

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.28	**DESCRIPCION**	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Area		
QUIOSCO					
	1,00	2,32	2,32	1	2,32
TOTAL					2,32


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.28	**DESCRIPCION**	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

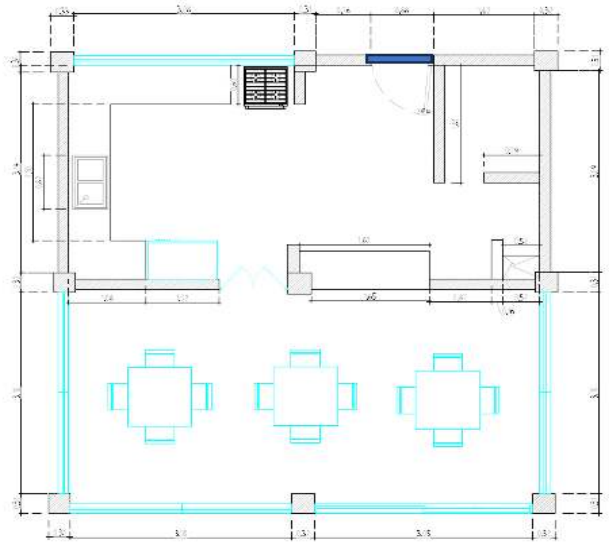

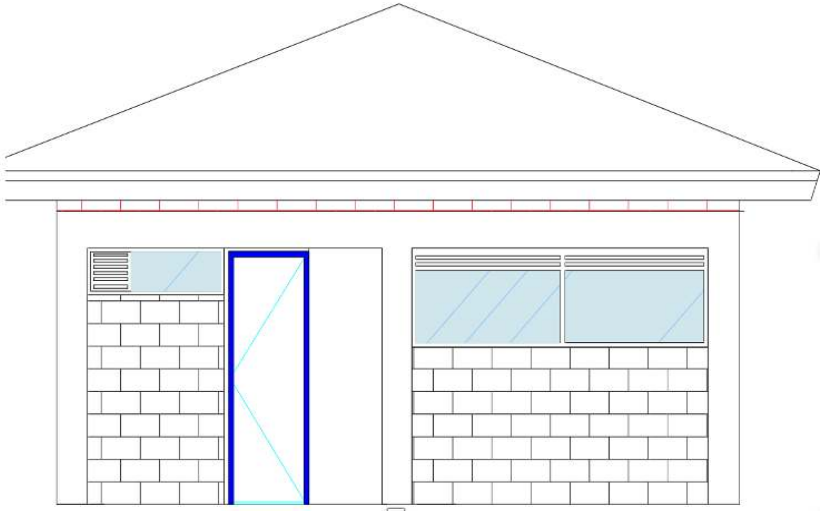

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.29	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Area		
QUIOSCO					
A	3,08	2,32	7,15	1	7,15
ENCHAPE	3,08	0,5	1,54	-1	-1,54
B	3,19	2,32	7,40	1	7,40
ENCHAOE	3,19	1	3,19	-1	-3,19
C	2,01	2,32	4,66	1	4,66
ENCHAPE	2,01	1,00	2,01	1	2,01
D	1,37	2,32	3,18	1	3,18
ENCHAPE	0,6	1	0,60	-1	-0,60
E	1,56	2,32	3,62	1	3,62
F	1,42	1,88	2,67	1	2,67
G	1,81	2,32	4,20	2	8,40
H	1,65	0,9	1,49	1	1,49
I	1,49	2,32	3,46	1	3,46
ENCHAPE	0,6	1	0,60	-1	-0,60
LOCALES DE COMIDA					
	3,86	2,32	8,96	16,00	143,28
ENCHAPE	2,46	1,00	2,46	8,00	-19,68
	1,84	2,32	4,27	5,00	21,34
	1,85	2,32	4,29	3,00	12,88
VENTANA	1,74	1,14	1,98	5,00	-9,92
VENTANA	1,75	1,14	2,00	3,00	-5,99
TOTAL					180,02


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.29	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

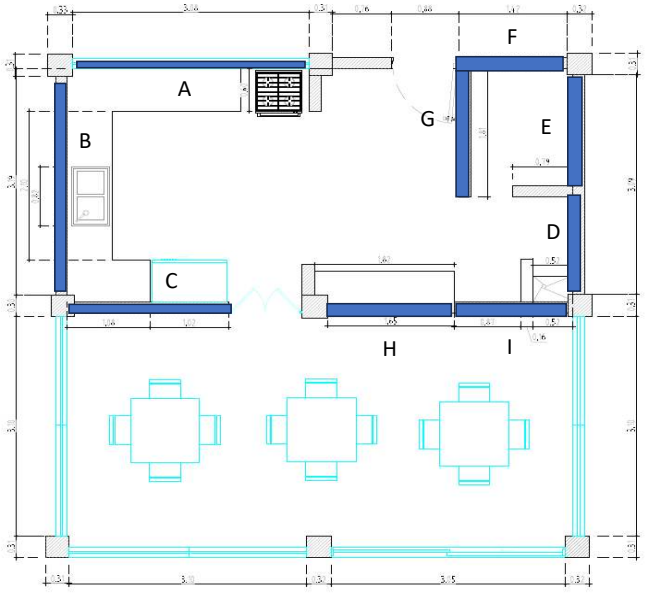

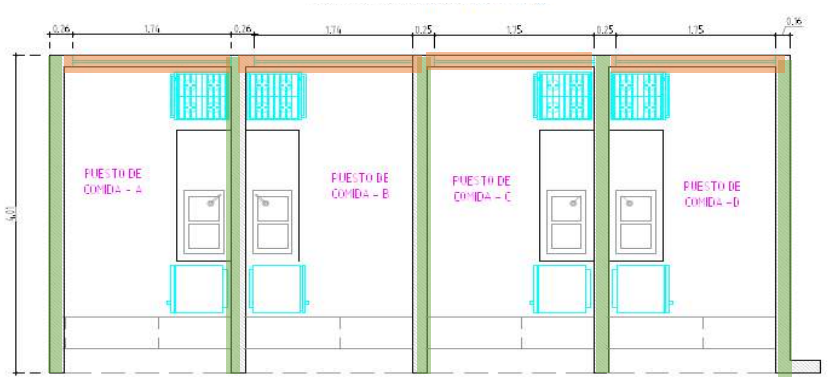

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.30	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud		
QUIOSCO					
A			2,32	1	2,32
B			0,90	1	0,90
C			2,32	1	2,32
D			2,32	1	2,32
E			2,32	1	2,32
F			2,32	1	2,32
G			2,32	1	2,32
			2,32	6	13,92
LOCALES DE COMIDA					
			2,32	8,00	18,56
			7,89	2,00	15,78
TOTAL					63,08


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.30	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE (LINEAL)	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

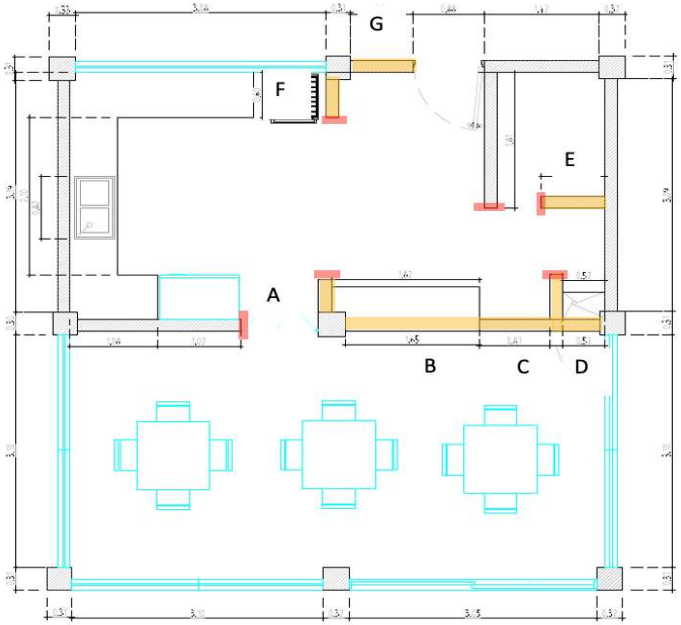

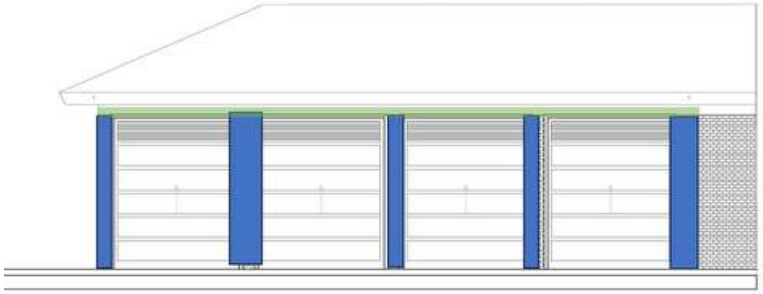

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.30	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**LONGITUD**		
QUIOSCO					
A			2,32	1	2,32
B			0,90	1	0,90
C			2,32	1	2,32
D			2,32	1	2,32
E			2,32	1	2,32
F			2,32	1	2,32
ENCHAPE			-1,00	1	-1,00
G			2,32	1	2,32
			2,32	6	13,92
VIGA SUPERIOR			28,44	1,00	28,44
COLUMNAS A			2,32	9,00	20,88
COLUMNAS B			1,98	3,00	5,94
LATERALES COLUMNA A			2,32	8,00	18,56
LATERALES COLUMNA B			1,98	4,00	7,92
LOCALES DE COMIDA					
			2,32	28,00	64,96
PAÑETE VIGA PARED BOMBEROS					
			15,66	1,00	15,66
LOCALES DE COMIDA					
			2,32	8,00	18,56
			7,89	2,00	15,78
SUBTOTAL					224,44
ACTA PARCIAL No. 1					63,08
					161,36

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.30	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

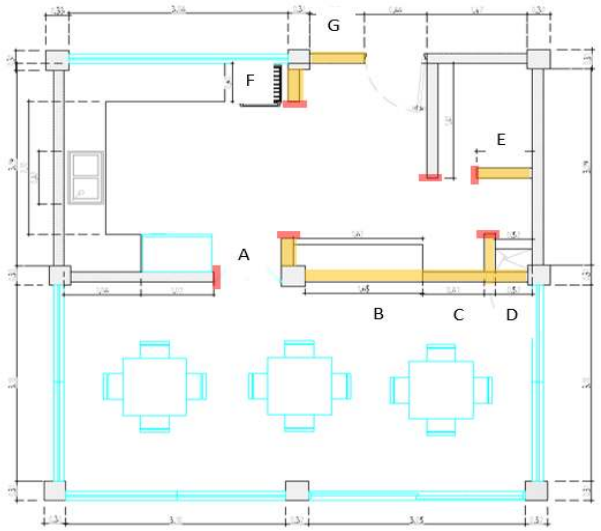


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		


ITEM	18.30	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO QUIOSCO


FACHADA FRONTAL

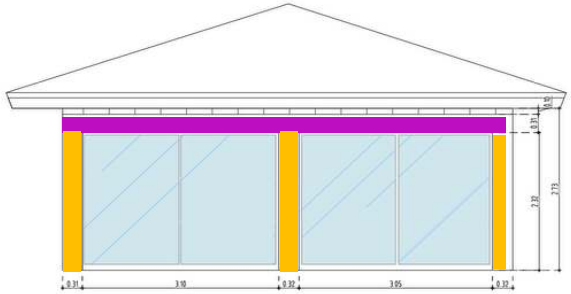


FACHADA POSTERIOR

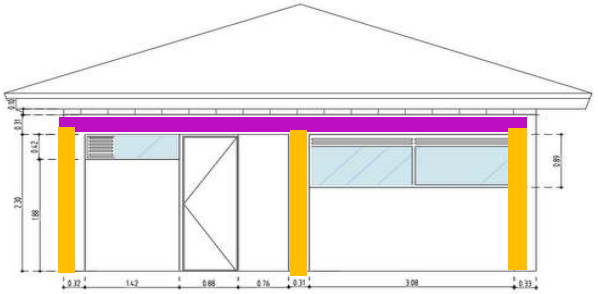

FACHADA LATERAL B

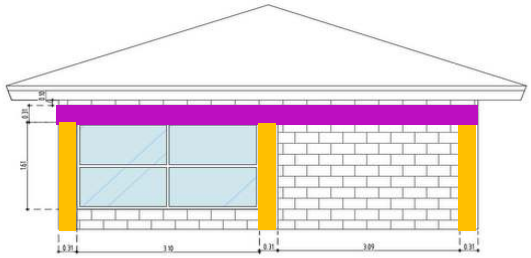

FACHADA LATERAL A

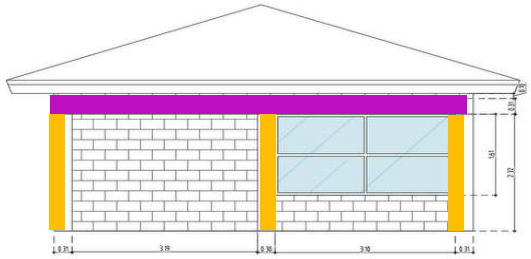

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.30	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO SOBRE PAÑETE (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO


VIGA PARED BOMBEROS



LOCALES DE COMIDA

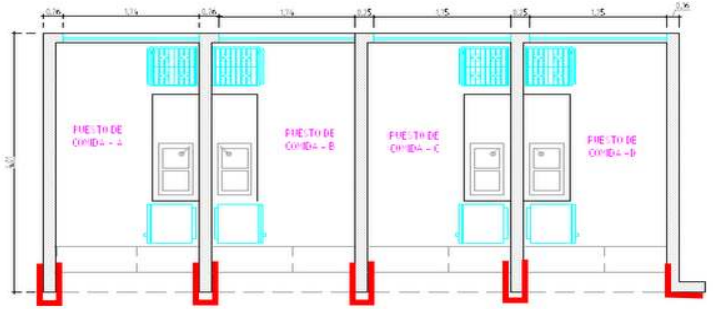

FACHADA LOCALES DE COMIDA

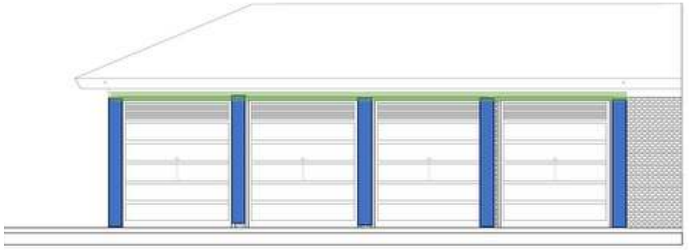

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.31	**DESCRIPCION**	VINILO ANTISEPTICO, IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO





Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Area		
QUIOSCO					
A	3,08	2,32	7,15	1	7,15
ENCHAPE	3,08	0,5	1,54	-1	-1,54
B	3,19	2,32	7,40	1	7,40
ENCHAOE	3,19	1	3,19	-1	-3,19
C	2,01	2,32	4,66	1	4,66
ENCHAPE	2,01	1,00	2,01	1	2,01
D	1,37	2,32	3,18	1	3,18
ENCHAPE	0,6	1	0,60	-1	-0,60
E	1,56	2,32	3,62	1	3,62
F	1,42	1,88	2,67	1	2,67
G	1,81	2,32	4,20	1	4,20
H	1,65	0,9	1,49	1	1,49
I	1,49	2,32	3,46	1	3,46
ENCHAPE	0,6	1	0,60	-1	-0,60
LOCALES DE COMIDA					
	3,86	2,32	8,96	16,00	143,28
ENCHAPE	2,46	1,00	2,46	8,00	-19,68
	1,84	2,32	4,27	5,00	21,34
	1,85	2,32	4,29	3,00	12,88
VENTANA	1,74	1,14	1,98	5,00	-9,92
VENTANA	1,75	1,14	2,00	3,00	-5,99
TOTAL					175,82


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ / CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.31	**DESCRIPCION**	VINILO ANTISEPTICO, IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

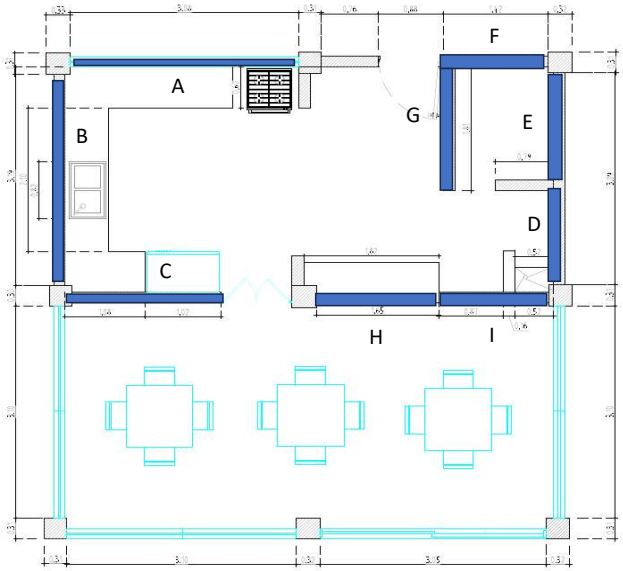



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.32	**DESCRIPCION**	VINILO ANTISEPTICO , IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud		
QUIOSCO					
A			2,32	1	2,32
B			0,90	1	0,90
C			2,32	1	2,32
D			2,32	1	2,32
E			2,32	1	2,32
F			2,32	1	2,32
G			2,32	1	2,32
			2,32	6	13,92
LOCALES DE COMIDA					
			2,32	8,00	18,56
			7,89	2,00	15,78
TOTAL					63,08


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
		CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.32	**DESCRIPCION**	VINILO ANTISEPTICO , IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE (LINEAL)	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

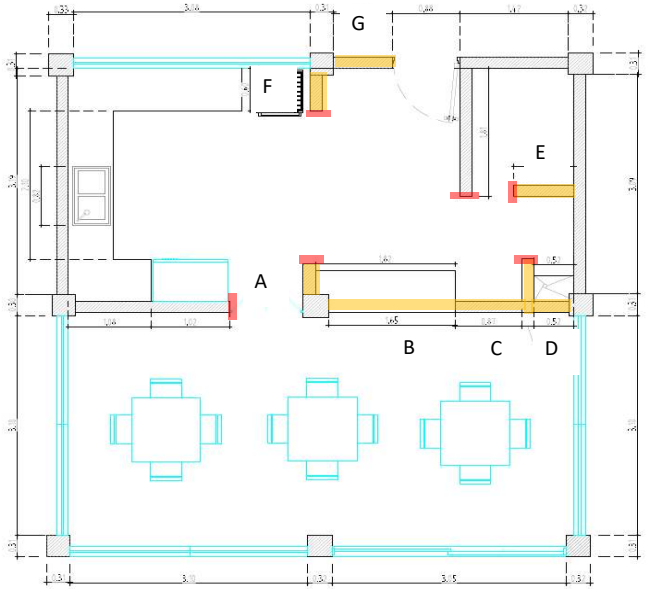

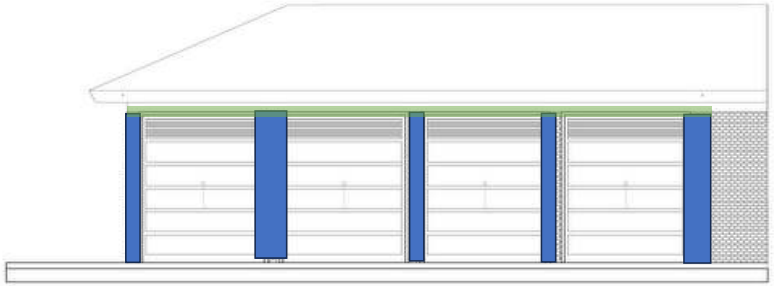



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.32	**DESCRIPCION**	VINILO ANTISEPTICO , IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**LONGITUD**		
QUIOSCO					
A			2,32	1	2,32
B			0,90	1	0,90
C			2,32	1	2,32
D			2,32	1	2,32
E			2,32	1	2,32
F			2,32	1	2,32
ENCHAPE			-1,00	1	-1,00
G			2,32	1	2,32
			2,32	6	13,92
VIGA SUPERIOR			28,44	1,00	28,44
COLUMNAS A			2,32	9,00	20,88
COLUMNAS B			1,98	3,00	5,94
LATERALES COLUMNA A			2,32	8,00	18,56
LATERALES COLUMNA B			1,98	4,00	7,92
LOCALES DE COMIDA					
			2,32	28,00	64,96
PAÑETE VIGA PARED BOMBEROS					
			15,66	1,00	15,66
LOCALES DE COMIDA					
			2,32	8,00	18,56
			7,89	2,00	15,78
SUBTOTAL					224,44
ACTA PARCIAL No. 1					63,08
SUBTOTAL					161,36

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.32	**DESCRIPCION**	VINILO ANTISEPTICO , IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

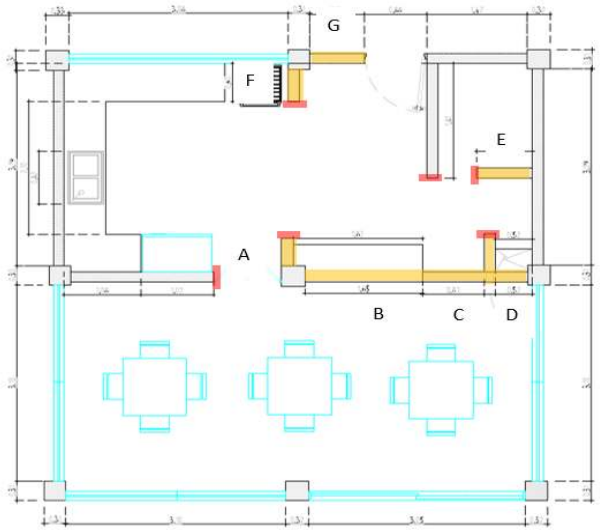


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		


ITEM	18.32	**DESCRIPCION**	VINILO ANTISEPTICO , IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO QUIOSCO


FACHADA FRONTAL

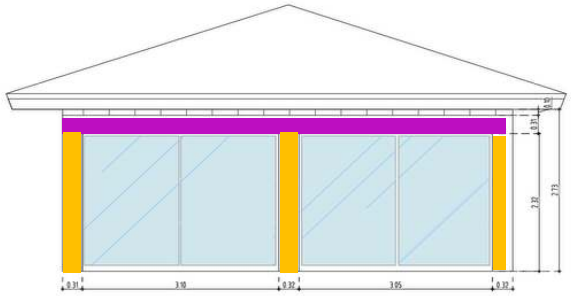


FACHADA POSTERIOR

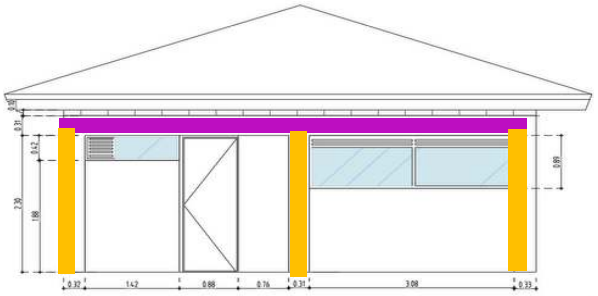

FACHADA LATERAL B

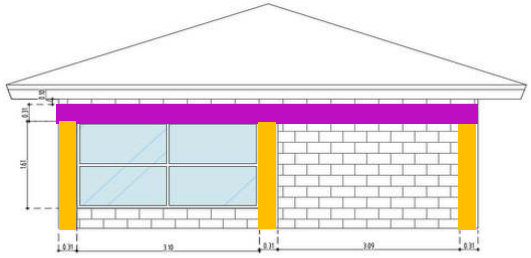

FACHADA LATERAL A

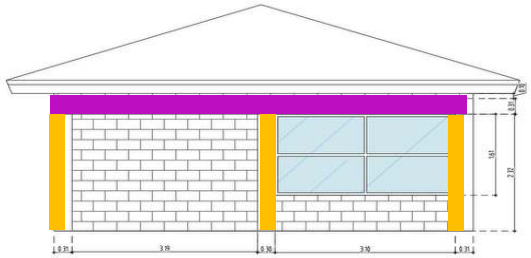

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.32	**DESCRIPCION**	VINILO ANTISEPTICO , IMPERMEABLE, PLASTICO Y LAVABLE (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO


VIGA PARED BOMBEROS



LOCALES DE COMIDA

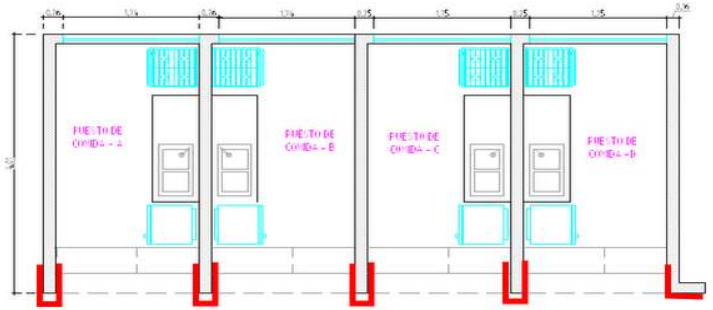

FACHADA LOCALES DE COMIDA

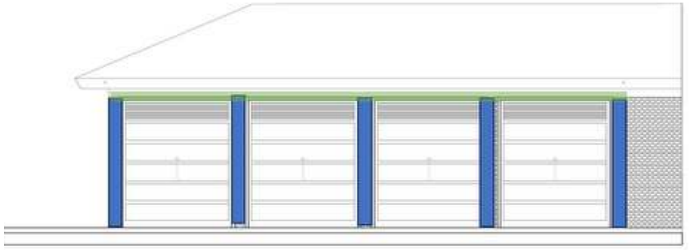

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.33	**DESCRIPCION**	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO





Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Area		
QUIOSCO					
A	3,19	1,00	3,19	1,00	3,19
B	2,01	1,00	2,01	1,00	2,01
C	3,08	1,00	3,08	1,00	3,08
LOCALES DE COMIDA					
	2,46	1,00	2,46	8,00	19,68
TOTAL					27,96


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.33	**DESCRIPCION**	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

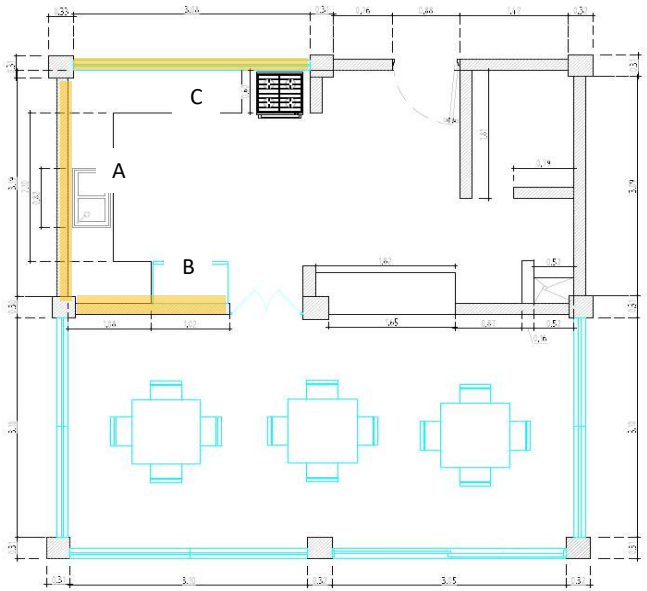





Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.34	**DESCRIPCION**	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Alto	Longitud		
QUIOSCO					
A			0,52	1,00	0,52
B			0,60	1,00	0,60
C			0,60	1,00	0,60
TOTAL					1,72


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.34	**DESCRIPCION**	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

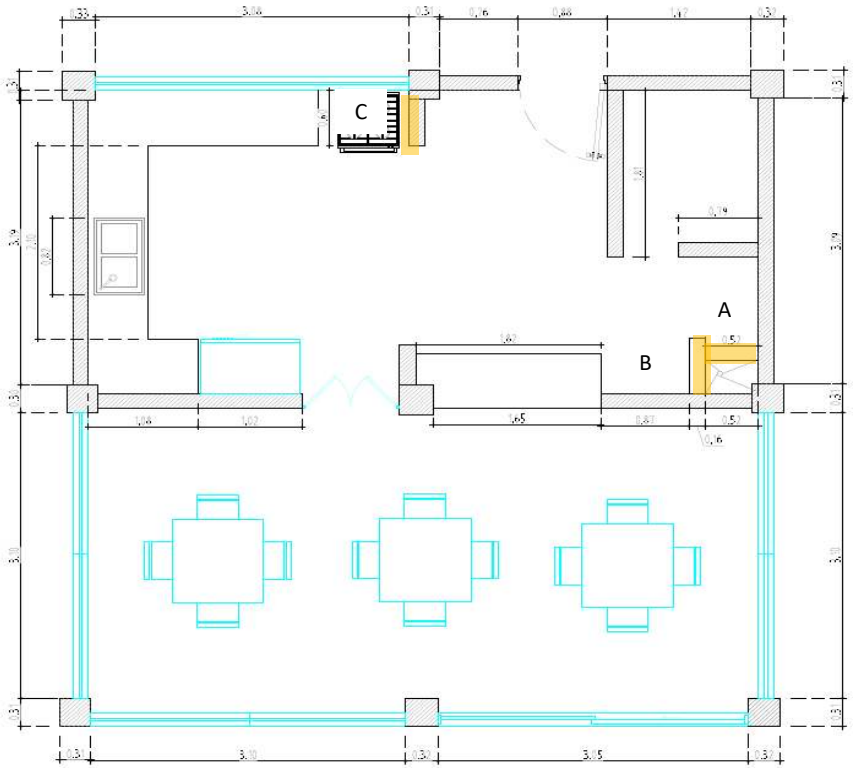

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.34	**DESCRIPCION**	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Alto	Longitud		
		QUIOSCO			
A			0,52	2,00	1,04
B			0,60	1,00	0,60
C			1,00	1,00	1,00
D			0,60	1,00	0,60
E			0,60	1,00	0,60
COLUMNA			0,60	2,00	1,20
SUBTOTAL					5,04
ACTA PARCIAL No. 1					1,72
TOTAL					3,32


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.34	**DESCRIPCION**	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

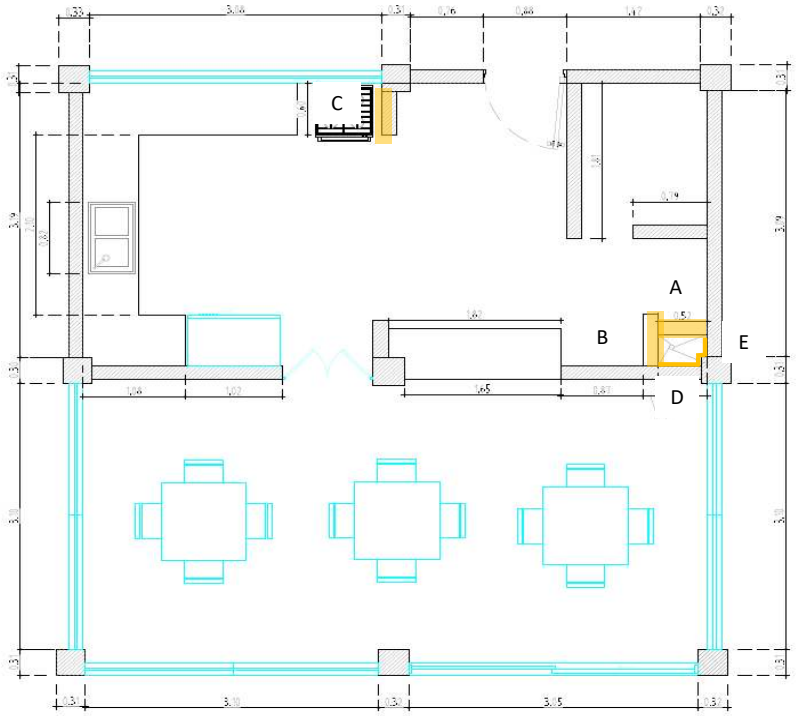

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.35	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

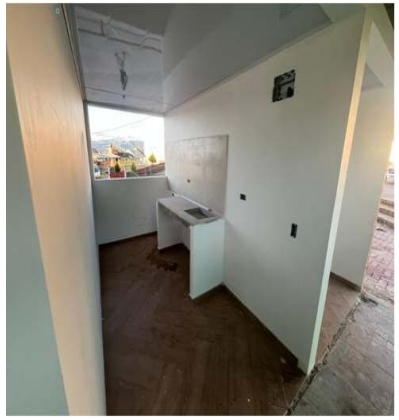



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Alto	Longitud		
QUIOSCO					
A	3,29	2,11	6,94	1,00	6,94
B	3,29	0,96	3,16	1,00	3,16
C	2,15	0,16	0,34	1,00	0,34
D	3,29	1,82	5,99	1,00	5,99
E	1,64	0,87	1,43	1,00	1,43
F	0,95	0,68	0,65	1,00	0,65
G	0,55	0,16	0,09	1,00	0,09
H	1,65	1,33	2,19	1,00	2,19
I	6,60	3,3	21,78	1,00	21,78
LOCALES DE COMIDA					
	3,86	1,74	6,72	5,00	33,58
	3,86	1,75	6,76	3,00	20,27
TOTAL					96,41


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.35	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

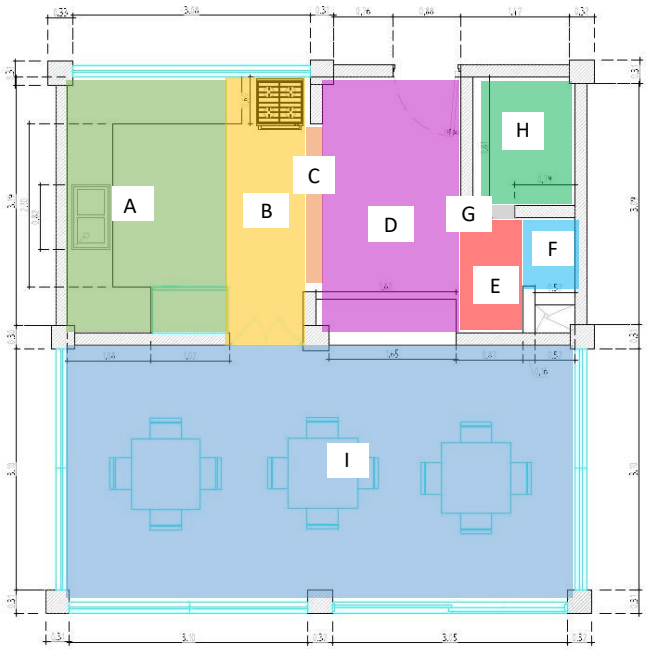

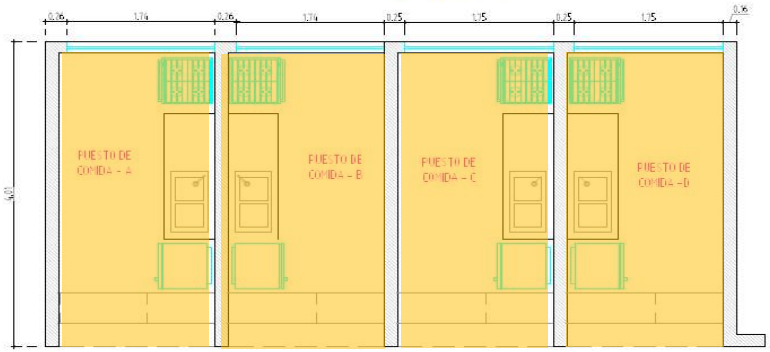

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.36	**DESCRIPCION**	LAVADA DE FACHADA	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	ANCHO	**LARGO**	**AREA**		
QUIOSCO					
FACHADA A	7,01	2,32	16,26	1,00	16,26
VENTANA A-1	3,10	2,32	2,50	-1,00	-7,75
VENTANA A-2	3,05	2,32	2,50	-1,00	-7,63
FACHADA B	7,03	2,32	2,50	1,00	17,58
VENTANA B-1	3,10	1,76	1,76	-1,00	-5,46
FACHADA C	7,03	2,32	2,50	1,00	17,58
VENTANA C1	1,26	0,45	0,45	-1,00	-0,57
VENTANA C2	3,08	1,05	1,05	-1,00	-3,23
PUERTA C	0,88	2,32	2,32	-1,00	-2,04
FACHADA D	7,01	2,32	2,50	1,00	17,53
VENTANA D	3,10	1,76	1,76	-1,00	-5,46
LOCALES DE COMIDA					
LATERAL	3,24	2,32	2,32	2,00	15,03
FACHADA POSTERIOR	8,15	2,32	2,32	2,00	37,82
VENTANAS POSTERIORES	1,75	1,14	1,00	3,00	-5,25
VENTANAS POSTERIORES	1,74	1,14	1,00	5,00	-8,70
SUBTOTAL HOJA 1					75,71

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.36	**DESCRIPCION**	LAVADA DE FACHADA	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO QUIOSCO


FACHADA FRONTAL

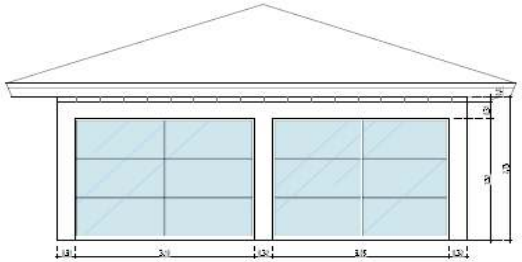


FACHADA POSTERIOR

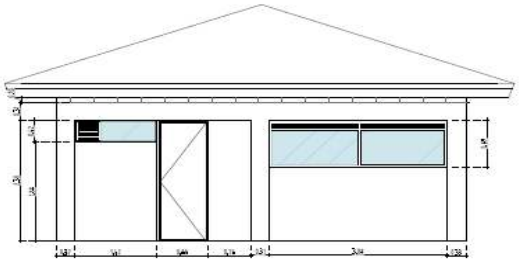

FACHADA LATERAL B

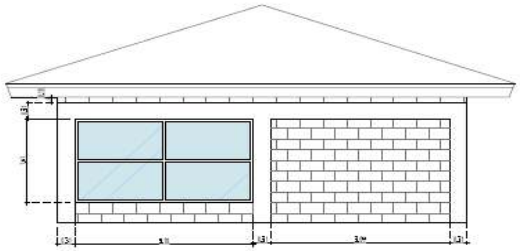


FACHADA LATERAL A

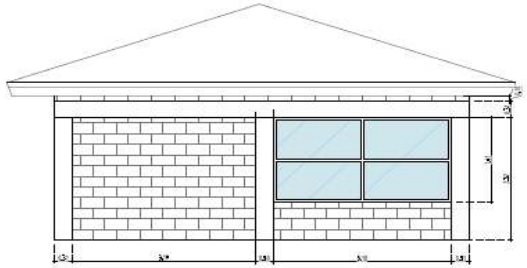


Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ	
	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				CONSORCIO INTER PLAZA	
CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025		**CONTRATISTA**		CONSORCIO PLAZA SESQUILE	
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025		**INTERVENTORIA**		CONSORCIO INTERPLAZA	
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA					
SUPERVISOR			ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
CAPITULO			**1. PRELIMINARES**			
ITEM	15.1	**DESCRIPCION**	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR		**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO LOCALES DE COMIDA


FACHADA PRINCIPAL LOCALES DE COMIDA COSTADO SIMON BOLIVAR




FACHADA POSTERIOR LOCALES DE COMIDA COSTADO SIMON BOLIVAR



FACHADA PRINCIPAL LOCALES DE COMIDA COSTADO TERMINAL



FACHADA POSTERIOR LOCALES DE COMIDA COSTADO TERMINAL





Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.36	**DESCRIPCION**	LAVADA DE FACHADA	**UNIDAD**	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
	ANCHO	**LARGO**	**AREA**		
LOCALES DE COMIDA					
MUROS NICHOS GAS	0,45	1,00	0,45	24,00	10,80
SUBTOTAL HOJA 1					10,80

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.36	**DESCRIPCION**	LAVADA DE FACHADA	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO QUIOSCO


FACHADA FRONTAL

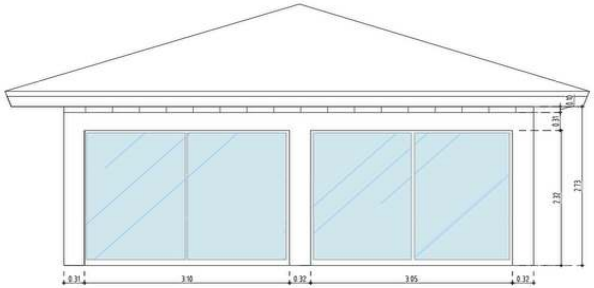


FACHADA POSTERIOR

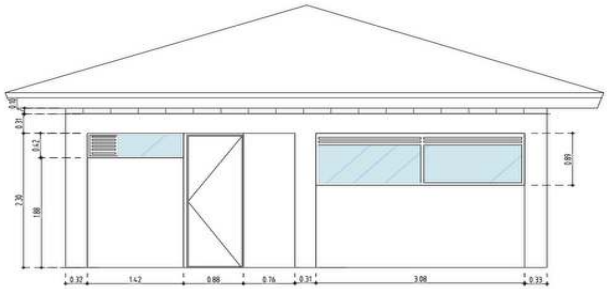

FACHADA LATERAL B

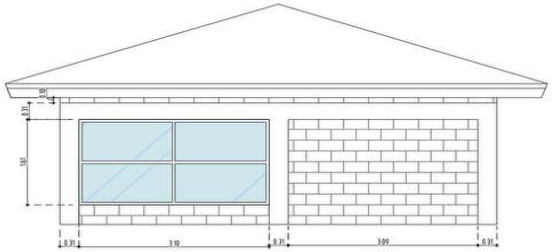

FACHADA LATERAL A

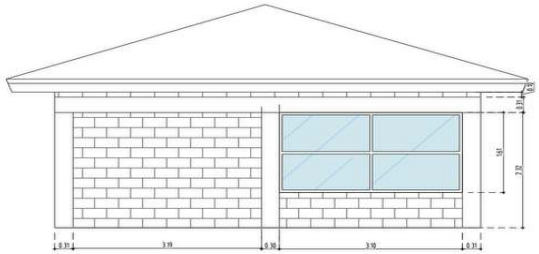


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. PRELIMINARES**		


ITEM	15.1	**DESCRIPCION**	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO LOCALES DE COMIDA


FACHADA PRINCIPAL LOCALES DE COMIDA COSTADO SIMON BOLIVAR




FACHADA POSTERIOR LOCALES DE COMIDA COSTADO SIMON BOLIVAR



FACHADA PRINCIPAL LOCALES DE COMIDA COSTADO TERMINAL



FACHADA POSTERIOR LOCALES DE COMIDA COSTADO TERMINAL



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.37	**DESCRIPCION**	ANCLAJE 1/2" L=15 cm	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO





Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Alto	Longitud		
QUIOSCO					
Muros mamposteria				60	60
Vigas concreto				24	24
LOCALES DE COMIDA					
Cocinas costado norte				3	3
Cocinas costado sur				3	3
TOTAL					90,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.37	**DESCRIPCION**	ANCLAJE 1/2" L=15 cm	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

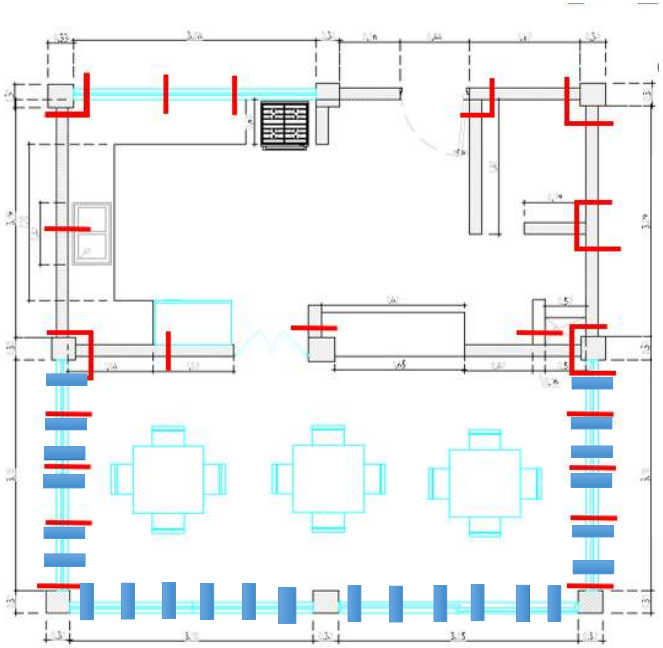

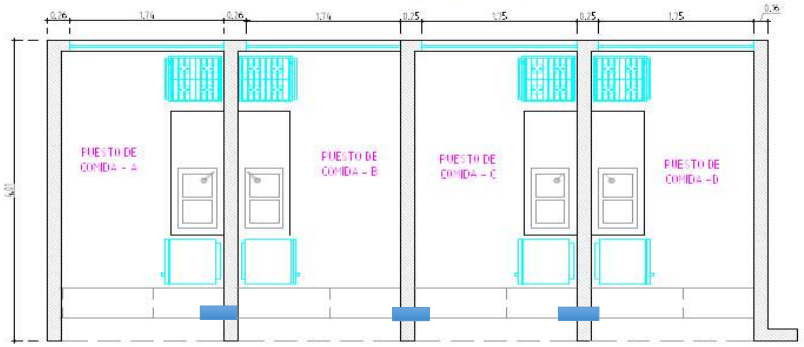

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.38	**DESCRIPCION**	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO




Localización	Dimensiones			Cantidad	Total
	Ancho	Alto	Longitud		
				1,00	1,00

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.38	**DESCRIPCION**	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

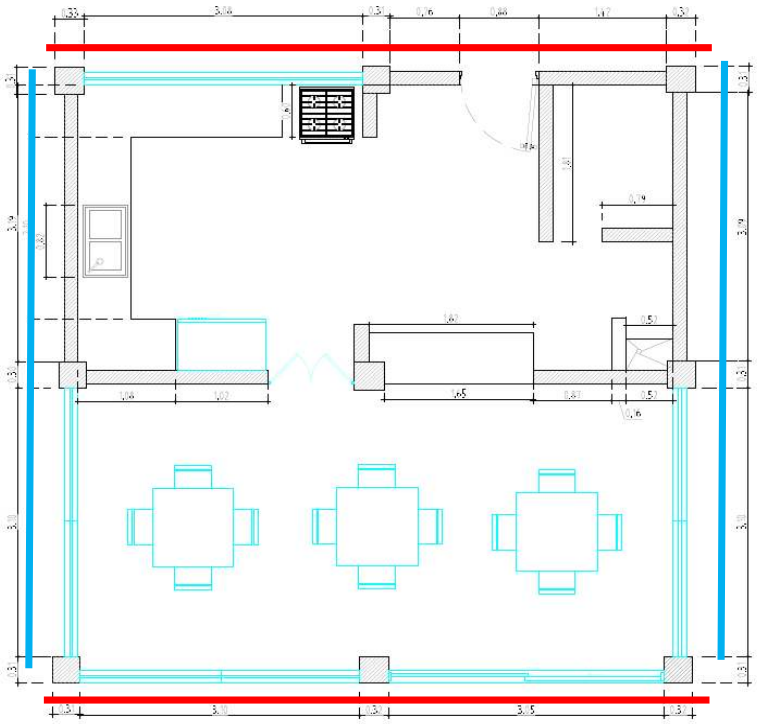



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.38	**DESCRIPCION**	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO






Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Alto	Longitud		
LOCALES DE COMIDA				8,00	8,00

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.38	**DESCRIPCION**	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

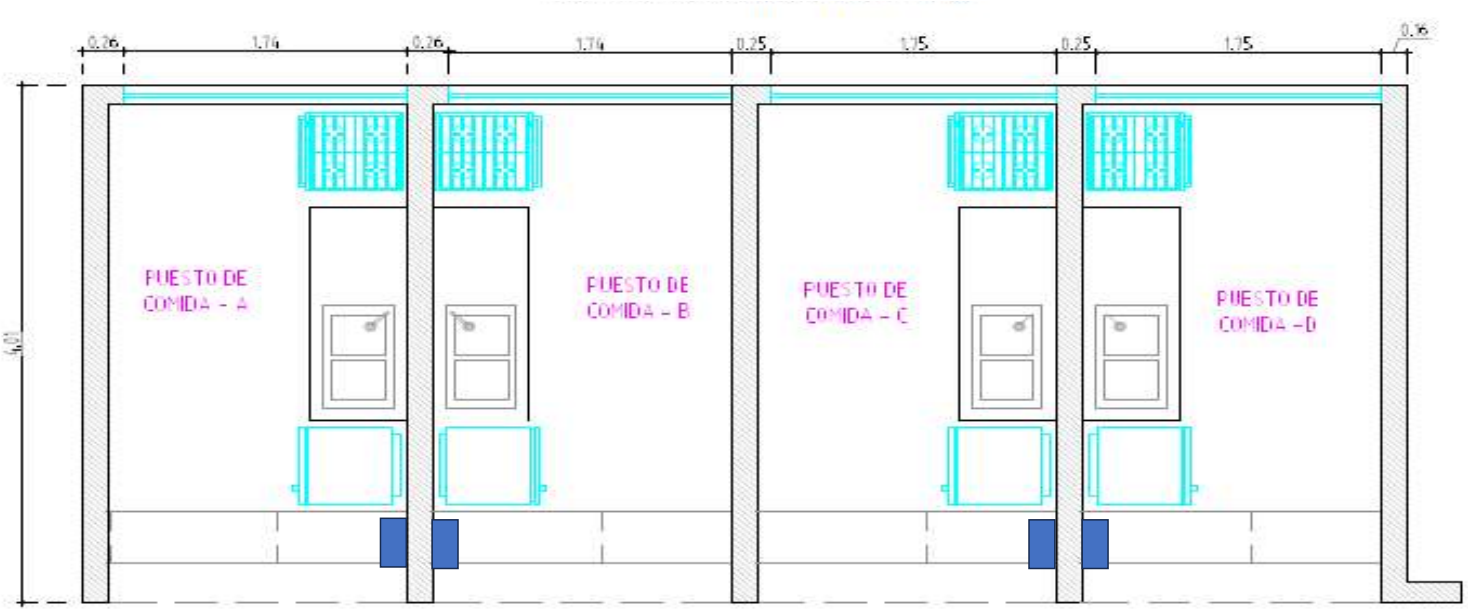

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	#CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.39	**DESCRIPCION**	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Alto	Area		
1	2,01	8,84	17,77	1,00	17,77
2	2,01	8,84	17,77	1,00	17,77
3	2,01	8,84	17,77	1,00	17,77
4	2,01	8,84	17,77	1,00	17,77
TOTAL					71,07


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.39	**DESCRIPCION**	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

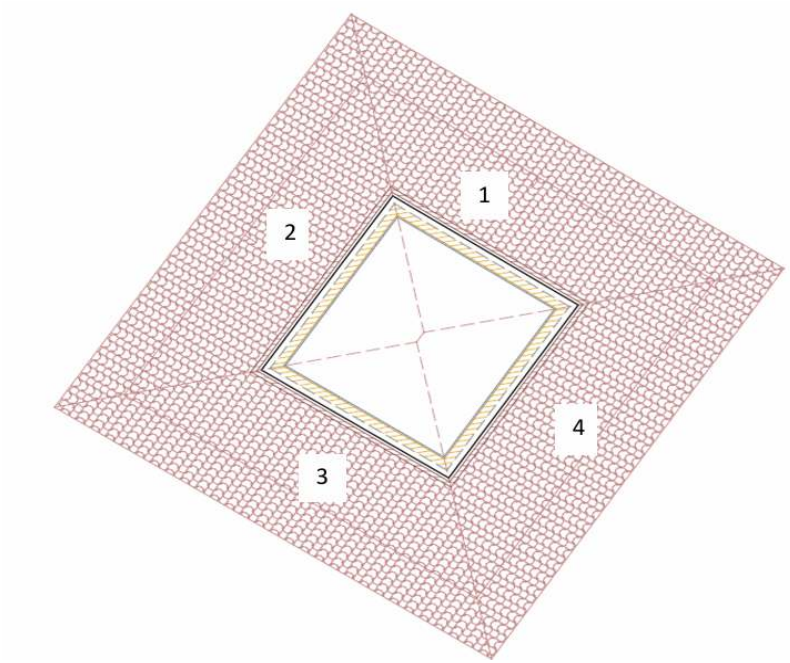

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.40	**DESCRIPCION**	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO)	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO





Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
QUIOSCO					
	0,60	2,27	1,36	1,00	1,36
	0,60	2,10	1,26	1,00	1,26
Vano lavaplatos (-)	0,46	0,74	0,34	-1	-0,16
	0,60	1,08	0,65	1,00	0,65
LOCALES DE COMIDA					
	0,60	1,66	1,00	8,00	7,97
Vano lavaplatos (-)	0,46	0,74	0,34	-8,00	-1,25
TOTAL					9,83


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.40	**DESCRIPCION**	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO)	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

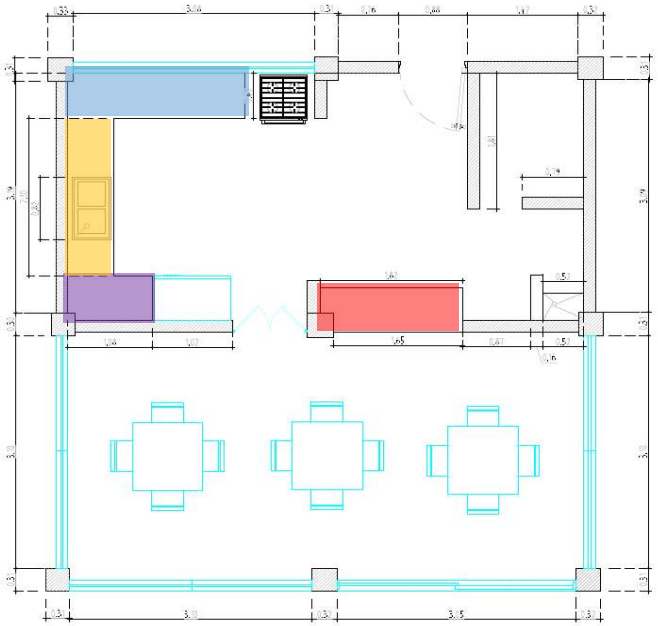

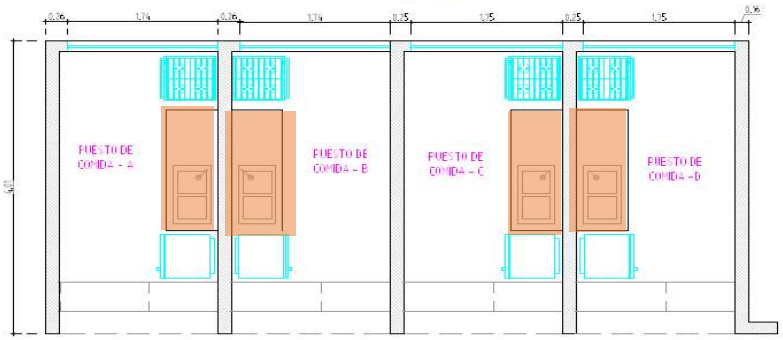



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.41	**DESCRIPCION**	ACABADO EN MICROCEMENTO PARA MESONES	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
QUIOSCO					
	0,60	2,27	1,36	1,00	1,36
	0,60	2,10	1,26	1,00	1,26
Vano lavaplatos (-)	0,46	0,74	0,34	-1	-0,16
	0,60	1,08	0,65	1,00	0,65
Profundidad	0,12	4,21	0,51	1,00	0,51
LOCALES DE COMIDA					
	0,60	1,66	1,00	8,00	7,97
Vano lavaplatos (-)	0,46	0,74	0,34	-8,00	-1,25
Profundidad	0,12	2,86	0,34	8,00	2,75
TOTAL					13,08

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.41	**DESCRIPCION**	ACABADO EN MICROCEMENTO PARA MESONES	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

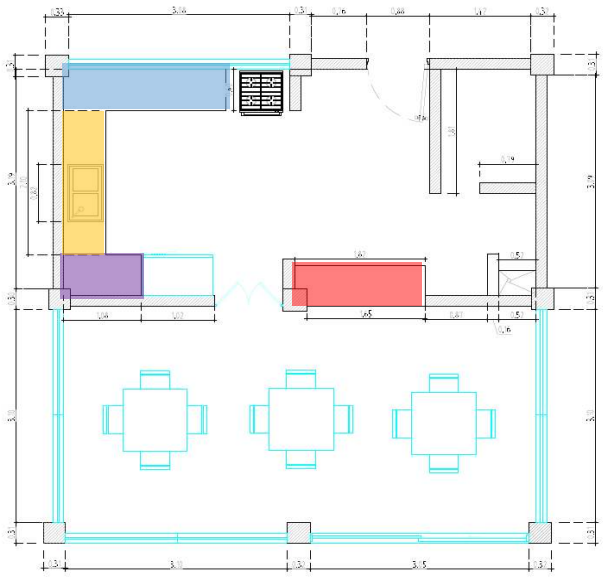

LOCALES DE COMIDA

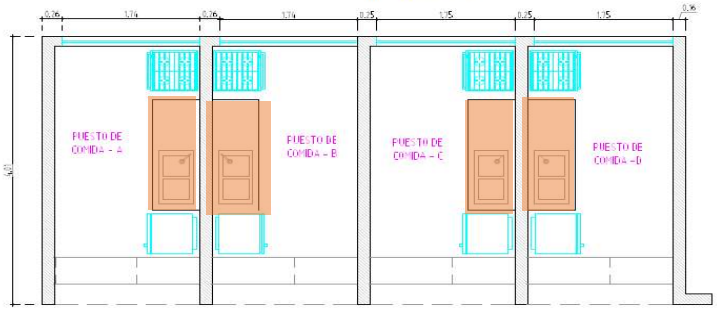

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.42	**DESCRIPCION**	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
QUIOSCO					
				4,00	4,00
LOCALES DE COMIDA					
				16,00	16,00
TOTAL					20,00

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.42	**DESCRIPCION**	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

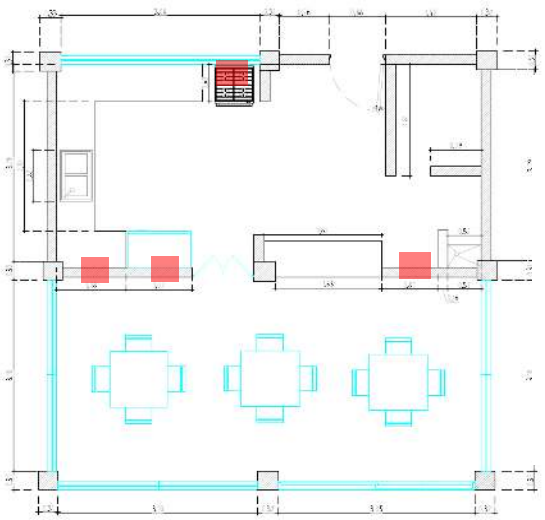

LOCALES DE COMIDA

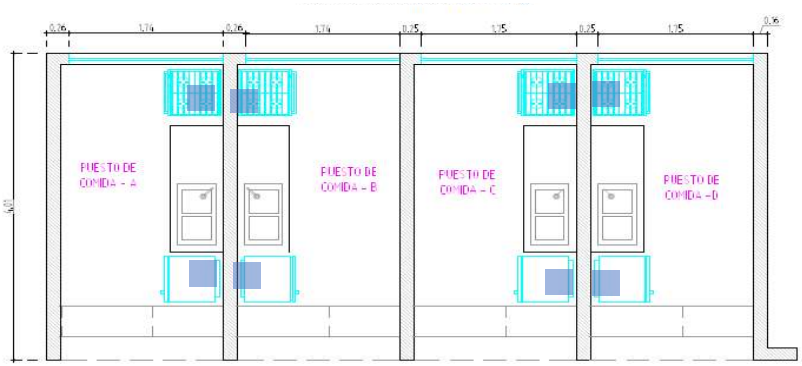

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.43	**DESCRIPCION**	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
QUIOSCO					
				3,00	3,00
LOCALES DE COMIDA					
				8,00	8,00
TOTAL					11,00

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.43	**DESCRIPCION**	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

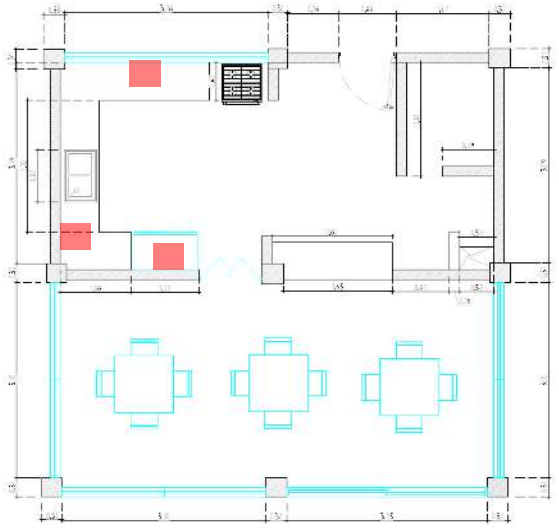

LOCALES DE COMIDA

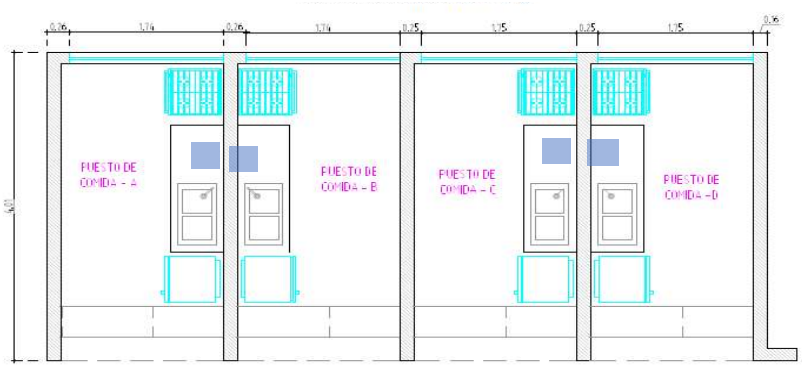

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		

CAPITULO			**1. ITEMS NO PREVISTOS**			
ITEM	18.44	**DESCRIPCION**	SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	**UNIDAD**	UN	

PLANO DESCRIPTIVO





Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
QUIOSCO					
				4,00	4,00
LOCALES DE COMIDA					
				8,00	8,00
TOTAL					12,00

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.44	**DESCRIPCION**	SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

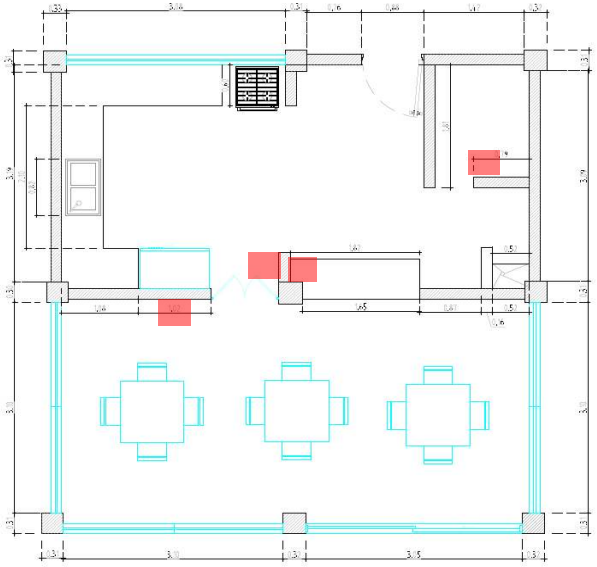

LOCALES DE COMIDA

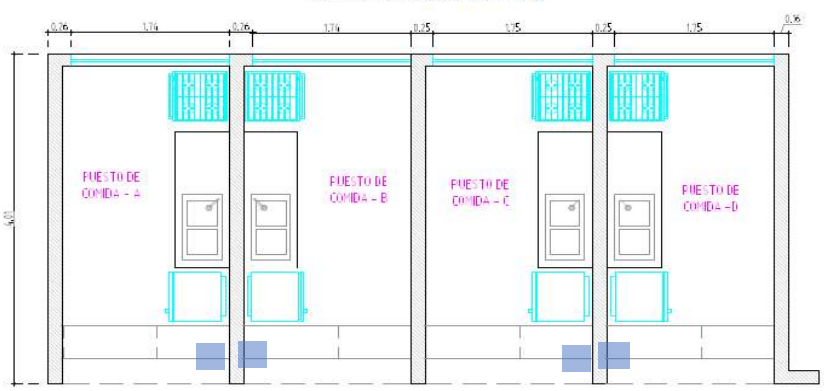

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.45	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL SQ 24W	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO

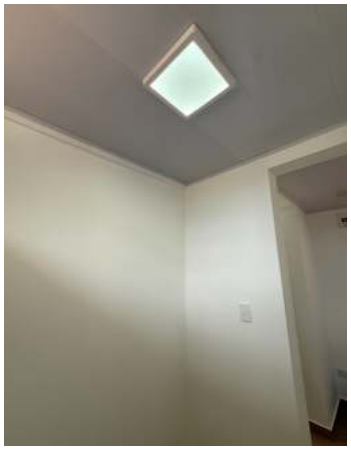

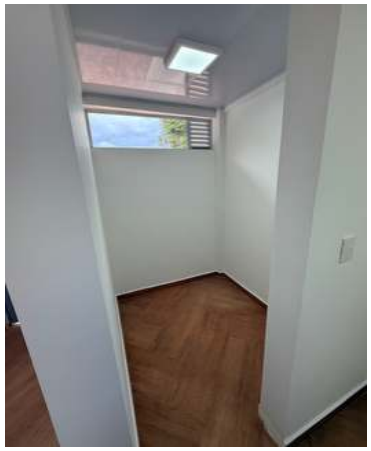

Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
QUIOSCO					
				2,00	2,00
TOTAL					2,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.45	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL SQ 24W	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

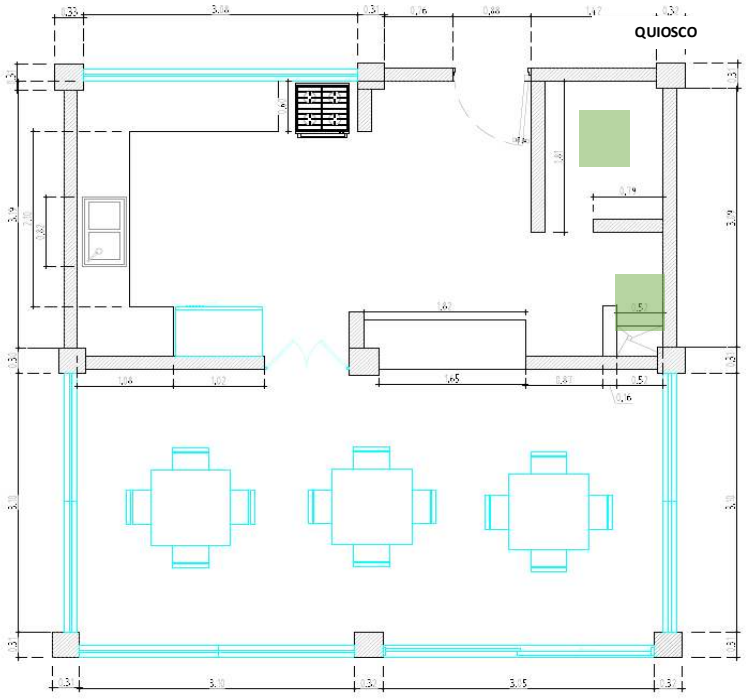

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.46	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL SQ 40W	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO





Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
QUIOSCO					
				4,00	4,00
LOCALES DE COMIDA					
				16,00	16,00
TOTAL					20,00

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.46	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL SQ 40W	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

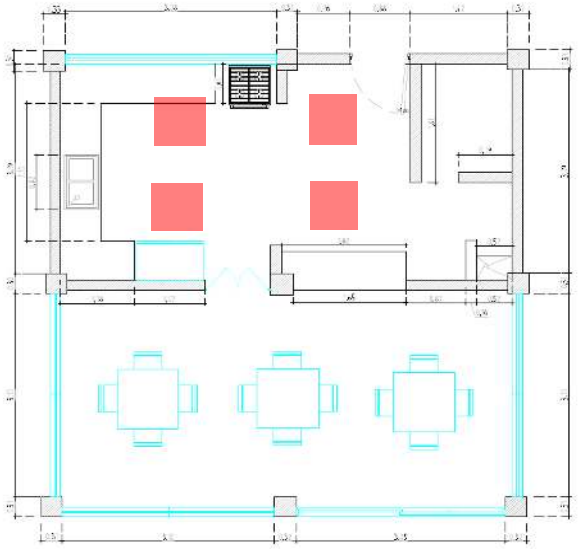

LOCALES DE COMIDA

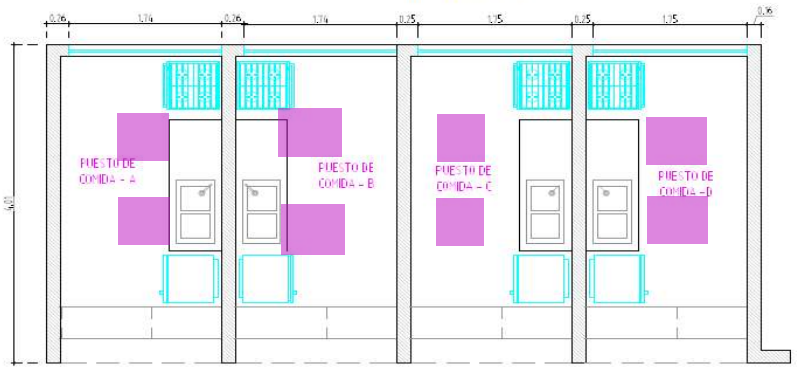

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.47	**DESCRIPCION**	LISTON M.H. PINO ROMERON (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO




Localización	**Dimensiones**			**Cantidad**	
	Ancho	**Largo**	**Area**		
QUIOSCO					
	3,32	6,60	21,91	1,00	21,91

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.47	**DESCRIPCION**	LISTON M.H. PINO ROMERON (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

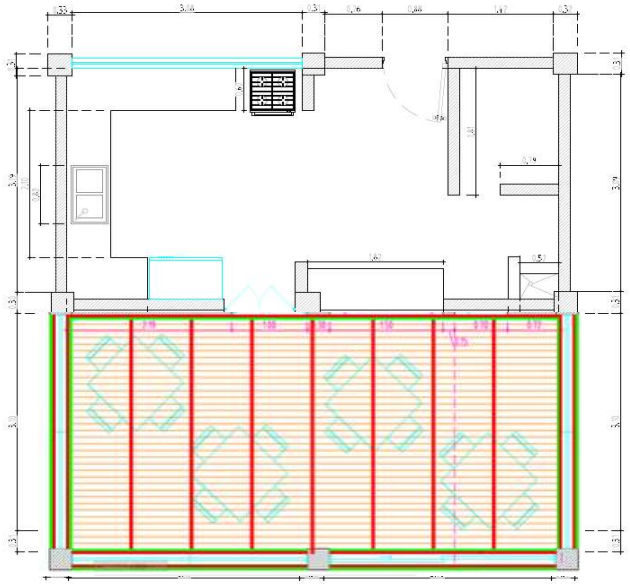

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.48	**DESCRIPCION**	LISTON M.H. PINO ROMERON LINEAL (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	**Dimensiones**			**Cantidad**	
	Ancho	**Largo**	**Area**		
QUIOSCO					
A			7,81	2,00	15,62
B			7,80	2,00	15,60
TOTAL					31,22


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.48	**DESCRIPCION**	LISTON M.H. PINO ROMERON LINEAL (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

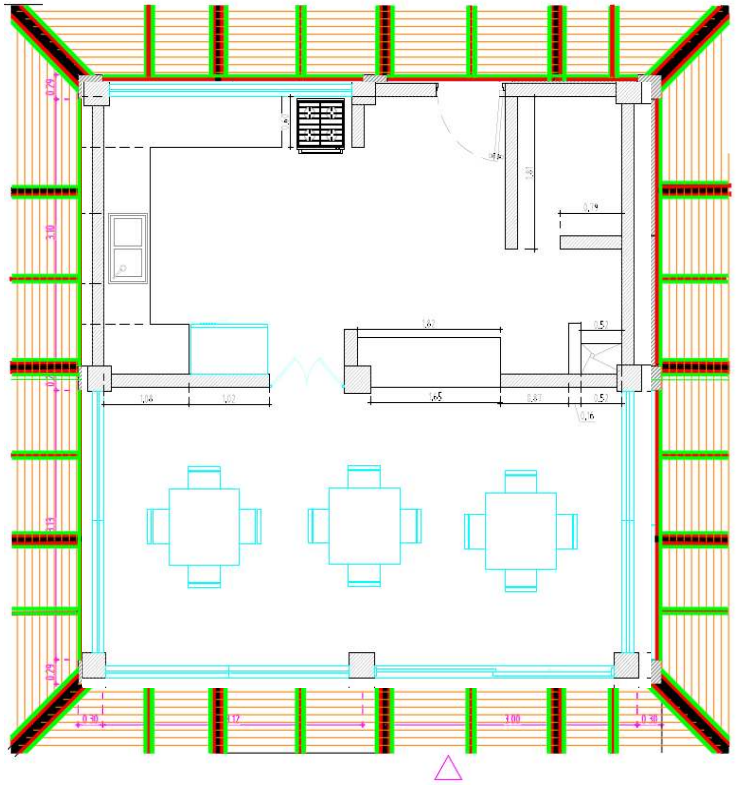



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.48	**DESCRIPCION**	LISTON M.H. PINO ROMERON LINEAL (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
	QUIOSCO				
LATERAL CAJON A			7,81	2	15,62
LATERAL CAJON B			7,8	2	15,6
TOTAL					31,22


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.48	**DESCRIPCION**	LISTON M.H. PINO ROMERON LINEAL (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

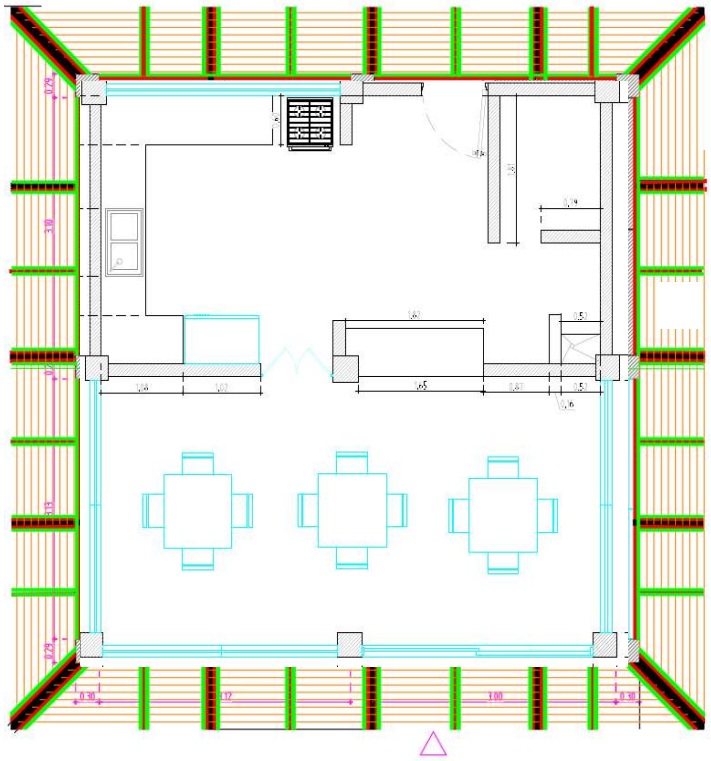

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.49	**DESCRIPCION**	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO







Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
	QUIOSCO				
1	3,1	2,32	7,19	1	7,19
2	3,05	2,32	7,08	1	7,08
3	3,1	1,61	4,99	1	4,99
4	3,1	1,61	4,99	1	4,99
5	3,08	0,89	2,74	1	2,74
6	1,42	0,42	0,60	1	0,60
	COCINAS				
	1,74	1,14	1,98	5,00	9,92
	1,75	**1,14**	2,00	**3,00**	**5,99**
TOTAL					43,49


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.49	**DESCRIPCION**	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

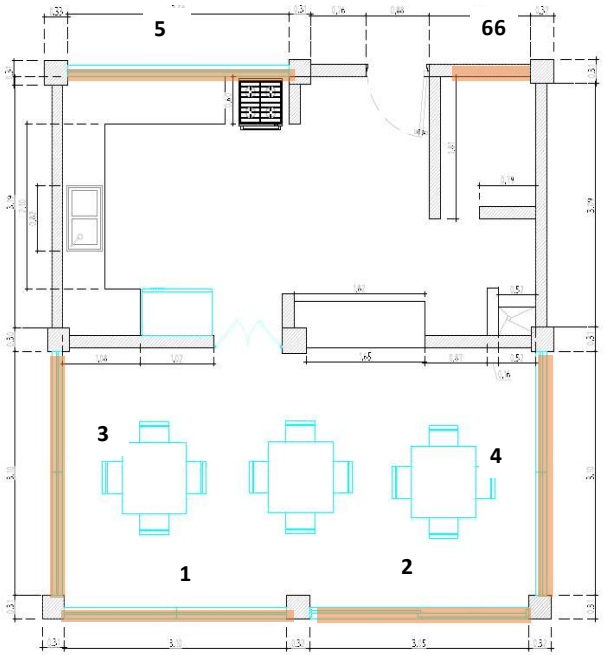

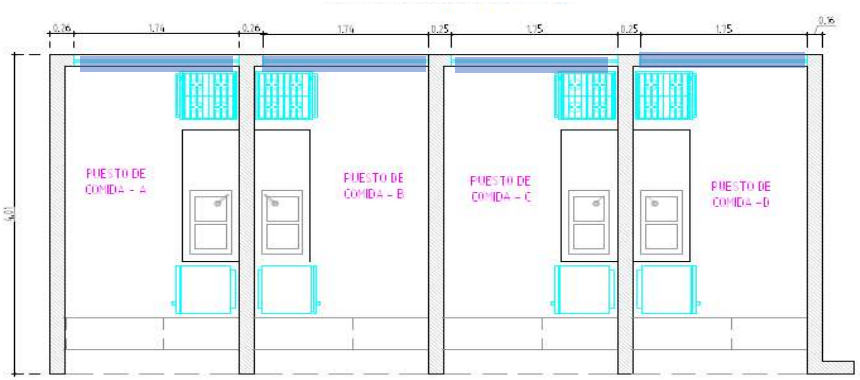

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.50	**DESCRIPCION**	REMATES BOCEL WING ALUMINIO	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

Localización	Dimensiones			Cantidad	TOTAL
	Ancho	Alto	Area		
QUIOSCO					
A	3,19			1,00	3,19
B	2,01			1,00	2,01
C	3,08			1,00	3,08
D	0,6			1,00	0,60
POCETA	0,6			1,00	0,60
POCETA	0,52			1,00	0,52
LOCALES DE COMIDA					
	2,46			8,00	19,68
TOTAL					29,68

ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	


Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.50	**DESCRIPCION**	REMATES BOCEL WING ALUMINIO	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

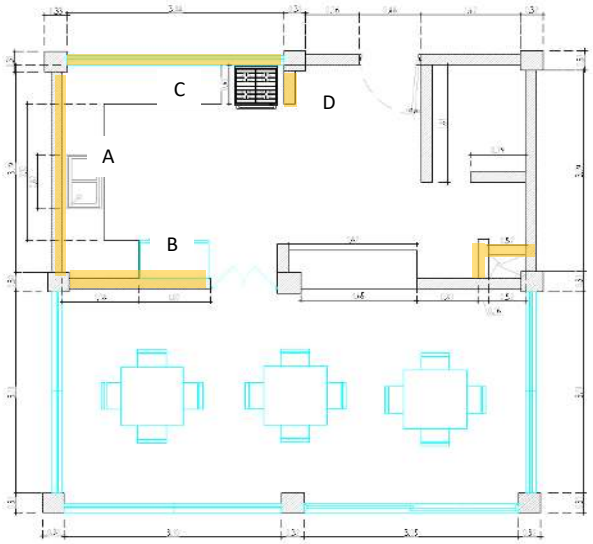

LOCALES DE COMIDA



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.51	**DESCRIPCION**	VIDRIO LAMINADO 3+3	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO





Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
QUIOSCO					
1	3,1	2,32	7,19	1	7,19
2	3,05	2,32	7,08	1	7,08
3	3,1	1,61	4,99	1	4,99
4	3,1	1,61	4,99	1	4,99
5	3,08	0,89	2,74	1	2,74
6	1,42	0,42	0,60	1	0,60
COCINAS					
	1,74	1,14	1,98	5,00	9,92
	1,75	1,14	2,00	3,00	5,99
TOTAL					43,49


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.51	**DESCRIPCION**	VIDRIO LAMINADO 3+3	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

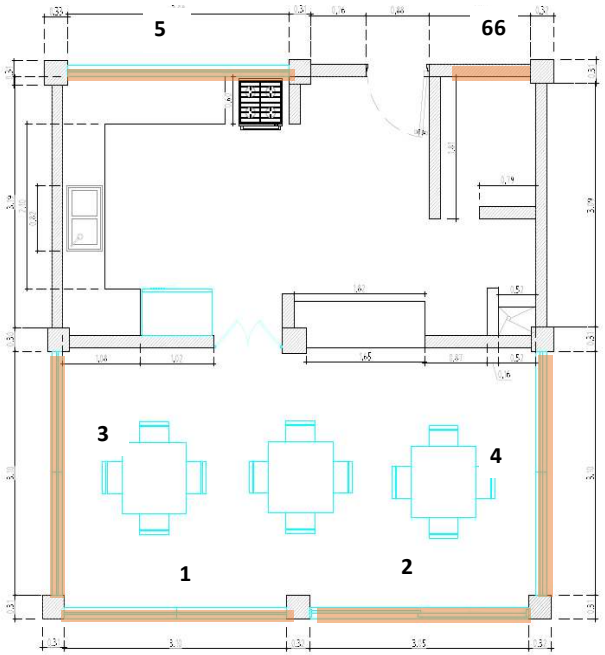



Alcaldia Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.52	**DESCRIPCION**	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
	QUIOSCO				
	1,00	2,32	2,32	1,00	2,32


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA


CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.52	**DESCRIPCION**	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

QUIOSCO

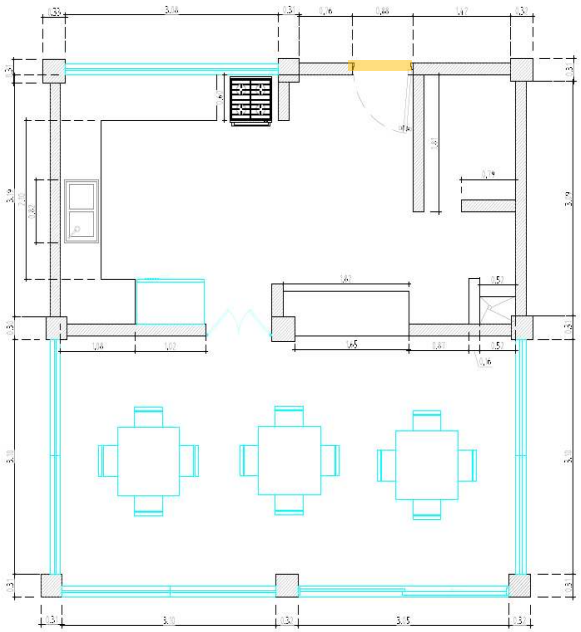

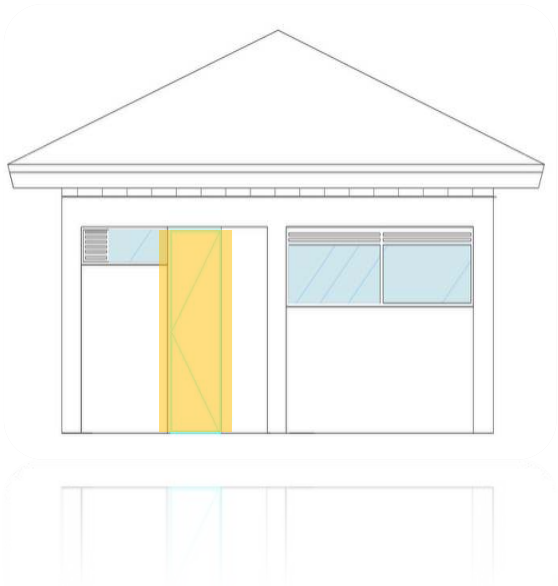

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.53	**DESCRIPCION**	PASE MURO PARA CONEXION DE GAS	**UNIDAD**	UN

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
LOCALES DE COMIDA					
				4,00	4,00
TOTAL					4,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.53	**DESCRIPCION**	PASE MURO PARA CONEXION DE GAS	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

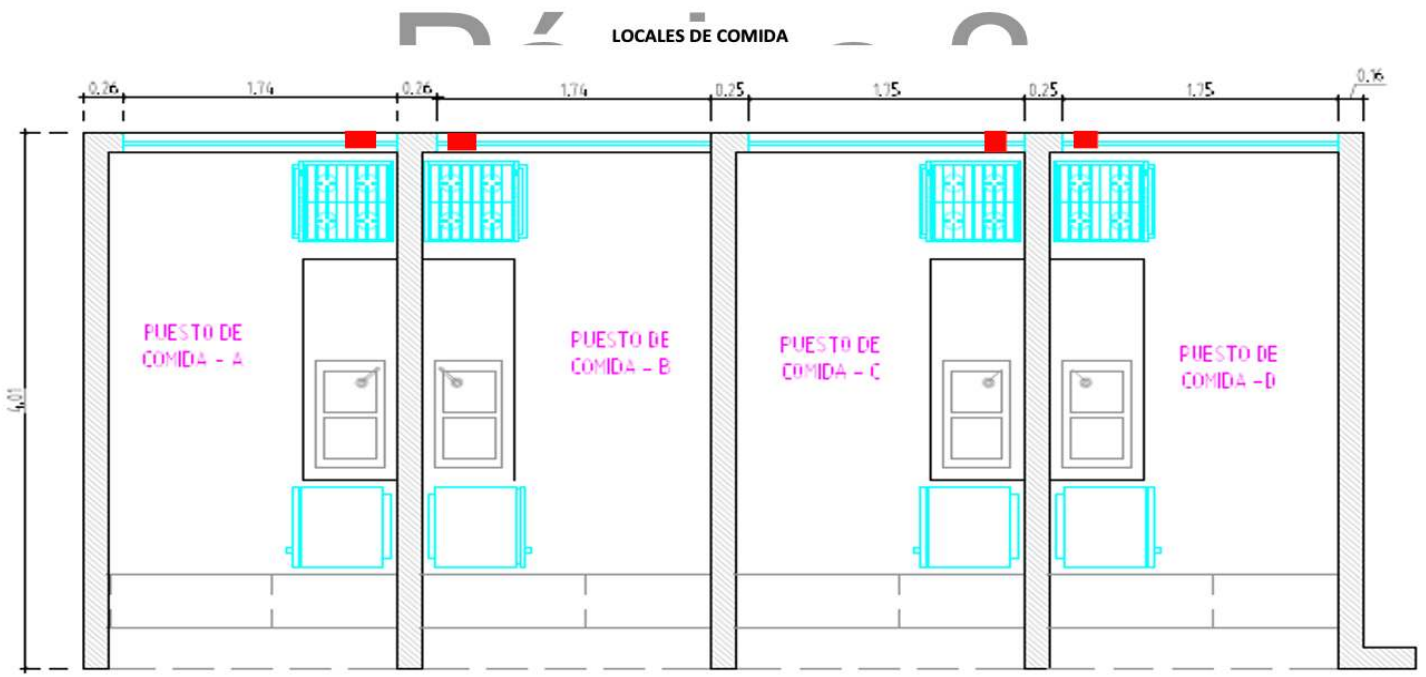


Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.54	**DESCRIPCION**	RESTAURACION Y ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

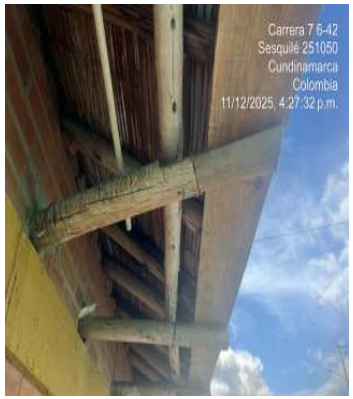




Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
OFICINA DE TURISMO					
			26,33	1	26,33

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.54	**DESCRIPCION**	RESTAURACION Y ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

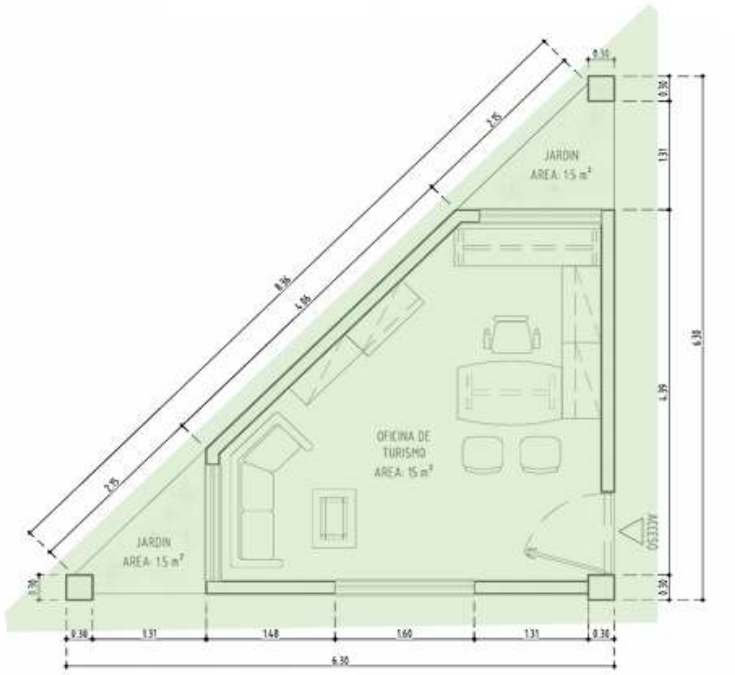

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL No. 1
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.55	**DESCRIPCION**	RETIRO DE MANTO EN ASFALTO EXISTENTE	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
LOCALES DE COMIDA					
			26,33	**1**	**26,33**
TOTAL					26,33


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.55	**DESCRIPCION**	RETIRO DE MANTO EN ASFALTO EXISTENTE	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

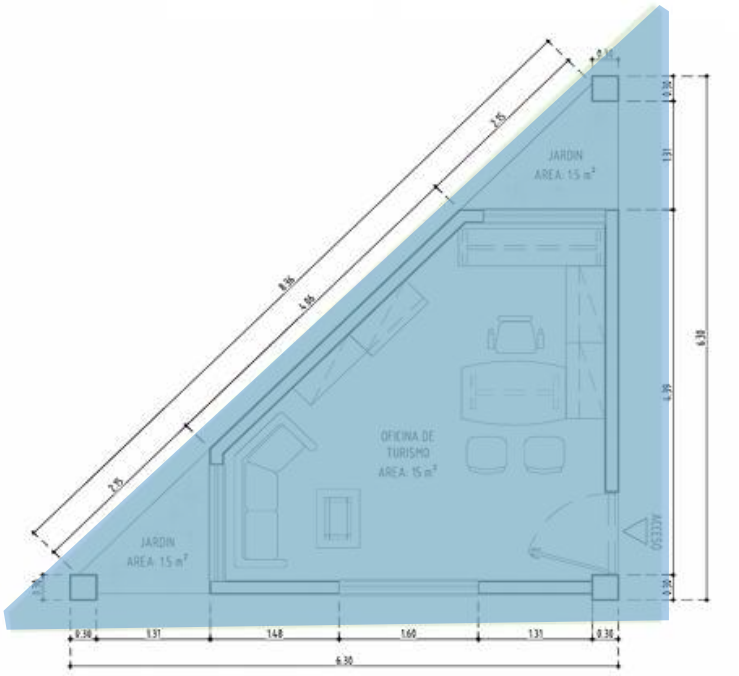

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.56	**DESCRIPCION**	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO CON MEMBRANA ASFALTICA	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
LOCALES DE COMIDA					
Area 1				20,81	**20,81**
Area 2				25,20	**25,20**
Area 3				1,84	**1,84**
Area 4				2,76	**2,76**
TOTAL					50,61


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.56	**DESCRIPCION**	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO CON MEMBRANA ASFALTICA	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

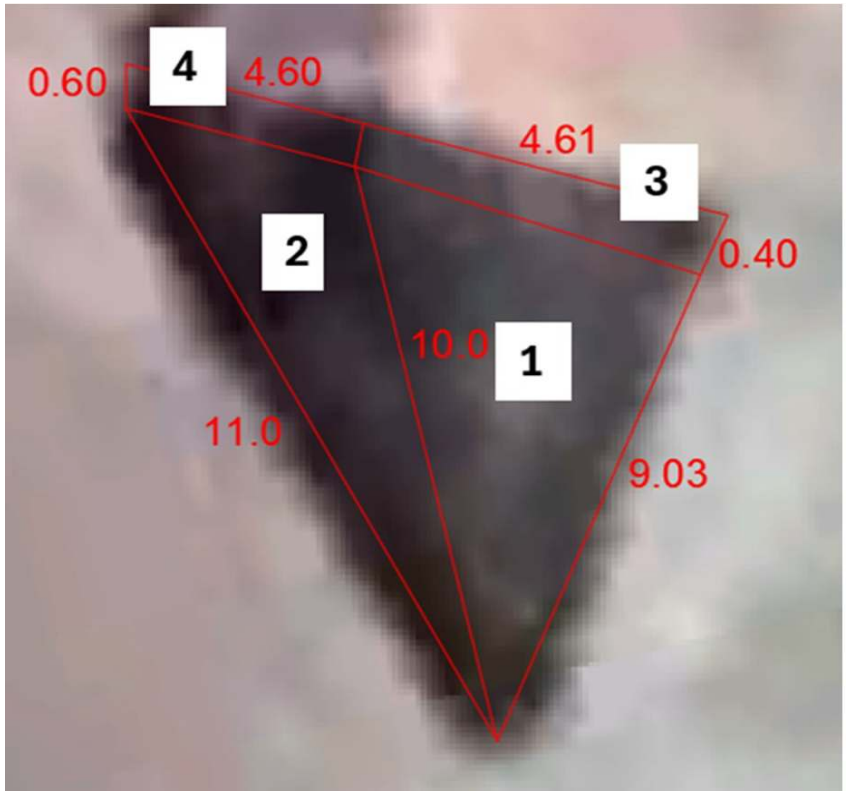

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.57	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA SISTEMA RETRACTIL SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO INC. ANTICORROSIVO	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO






Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
	LOCALES DE COMIDA				
	1,83	2,32	4,2456	8	33,9648

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA PARCIAL No. 1 **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA


CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.57	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA SISTEMA RETRACTIL SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO INC. ANTICORROSIVO	**UNIDAD**	M2

PLANO DESCRIPTIVO

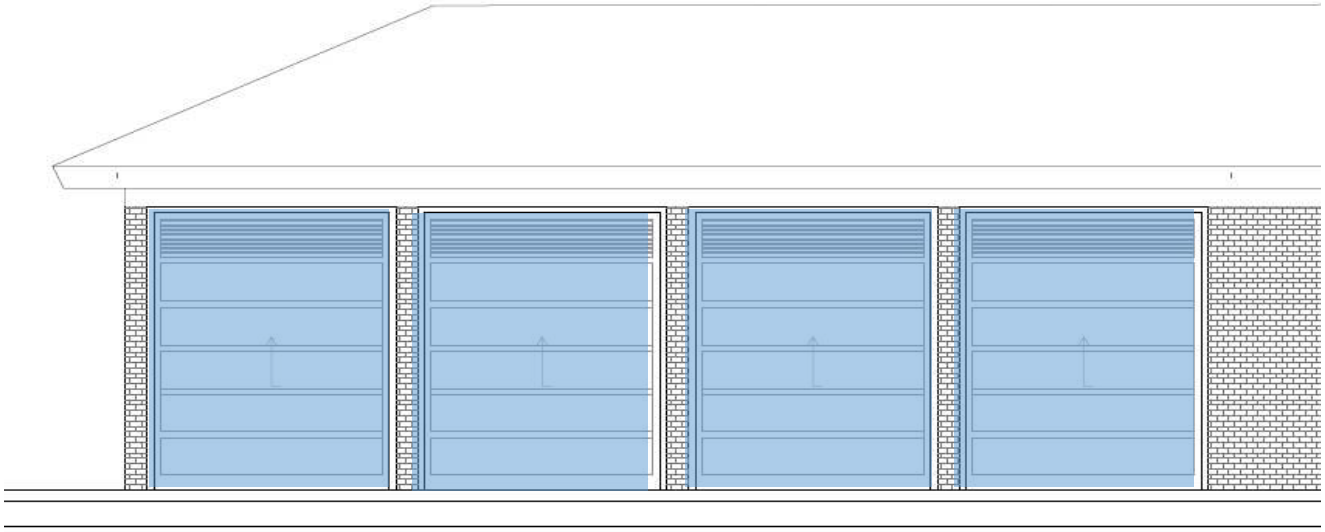









Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.59	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO





Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
KIOSCO					
				1,00	1,00
TOTAL					1,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	@CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.59	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

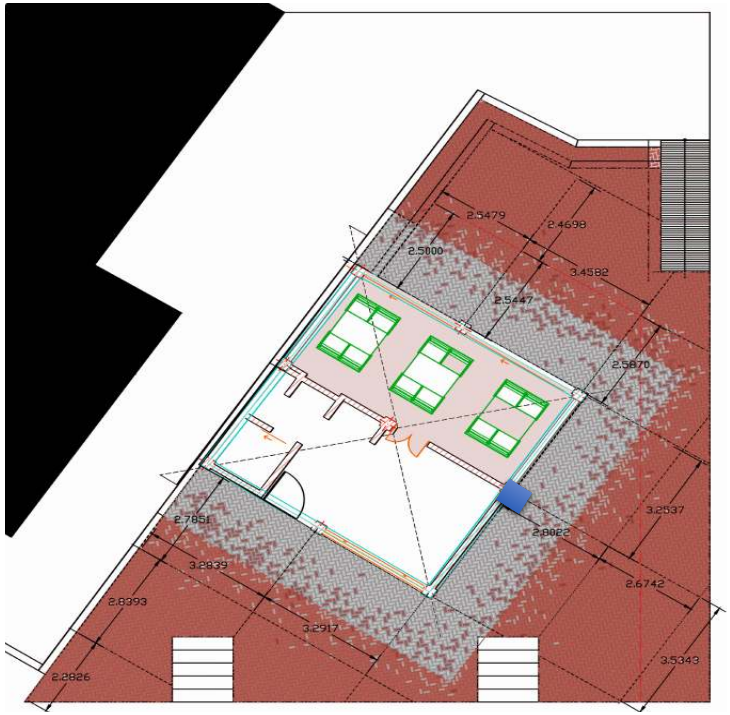

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.60	**DESCRIPCION**	DEMOLICION DE CAÑUELA	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
URBANISMO KIOSCO					
		27,00		27	27
TOTAL					27,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.60	**DESCRIPCION**	DEMOLICION DE CAÑUELA	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

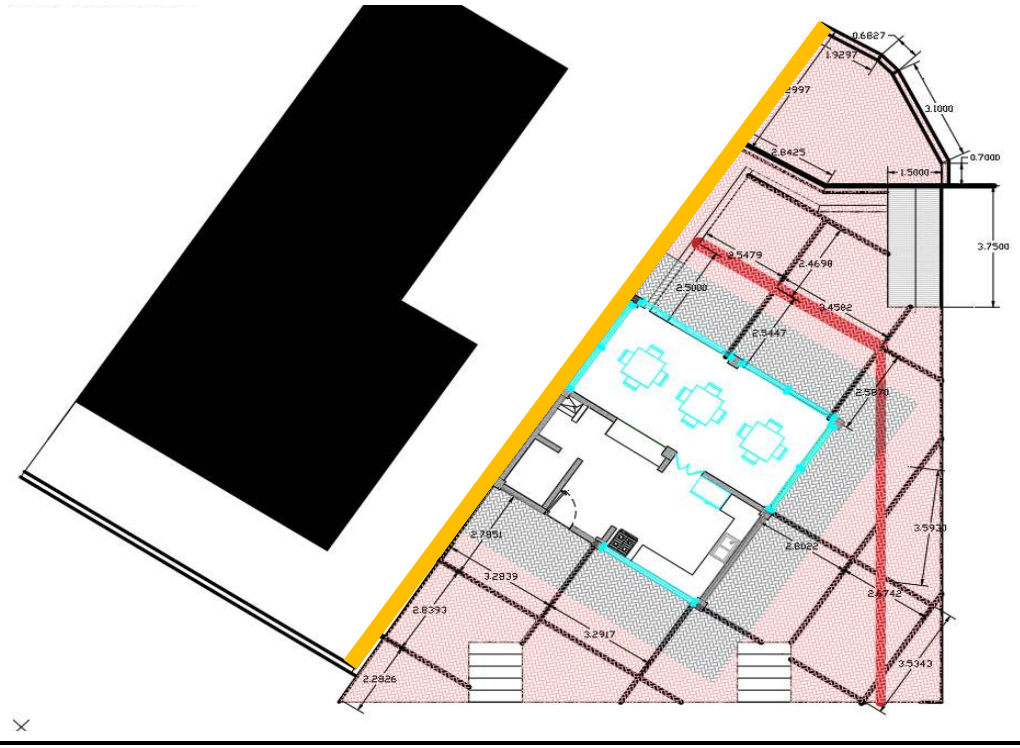

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.61	**DESCRIPCION**	CÁRCAMO PARA AGUAS LLUVIAS	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
URBANISMO KIOSCO					
		17,00		17	17
TOTAL					17,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.61	**DESCRIPCION**	CÁRCAMO PARA AGUAS LLUVIAS	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

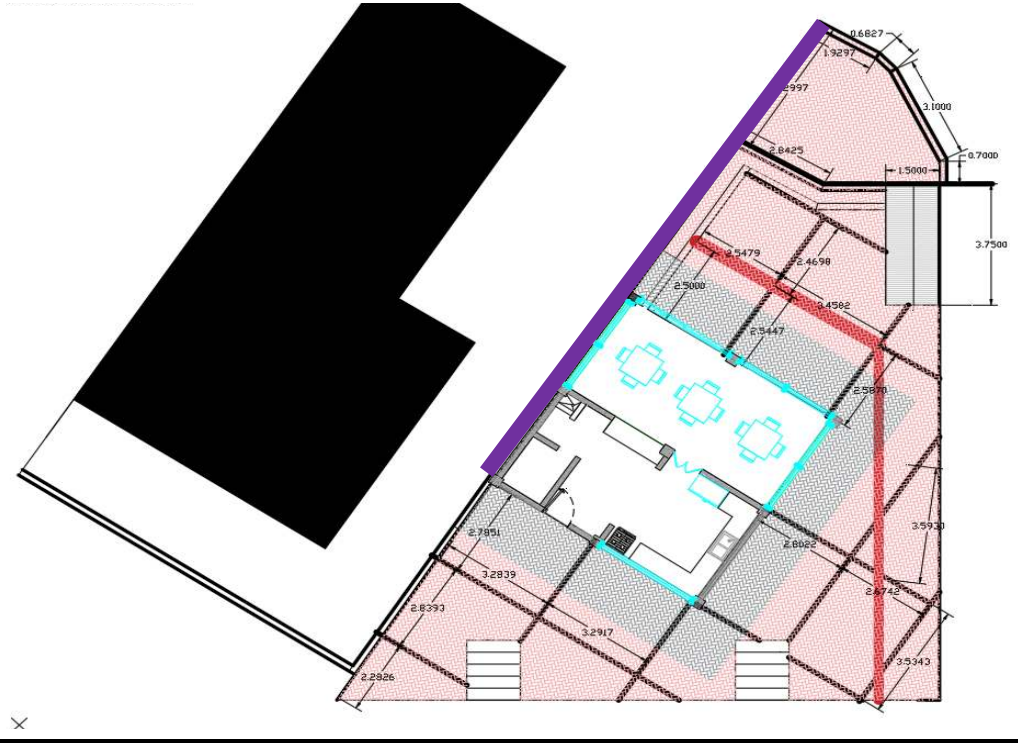

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		

CAPITULO			**1. ITEMS NO PREVISTOS**		
ITEM	18.62	**DESCRIPCION**	REJILLA METALICA EN ANGULO DE 1" Y 1/8", CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" Y 1/8", Y CONTRA MARCO EN ANGULO DE 1/4" Y 1/8"	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO





Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
URBANISMO KIOSCO					
		17,00		17	17

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.62	**DESCRIPCION**	REJILLA METALICA EN ANGULO DE 1" Y 1/8", CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" Y 1/8", Y CONTRA MARCO EN ANGULO DE 1/4" Y 1/8"	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO



Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.63	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE TANQUE 100 X 51 ACERO INOXIDABLE PARA EL KIOSCO. INCLUYE REJILLA Y GRIFERIA.	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO




Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
	KIOSCO				
				1	1

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	0	**DESCRIPCION**	0	**UNIDAD**	0,00

PLANO DESCRIPTIVO

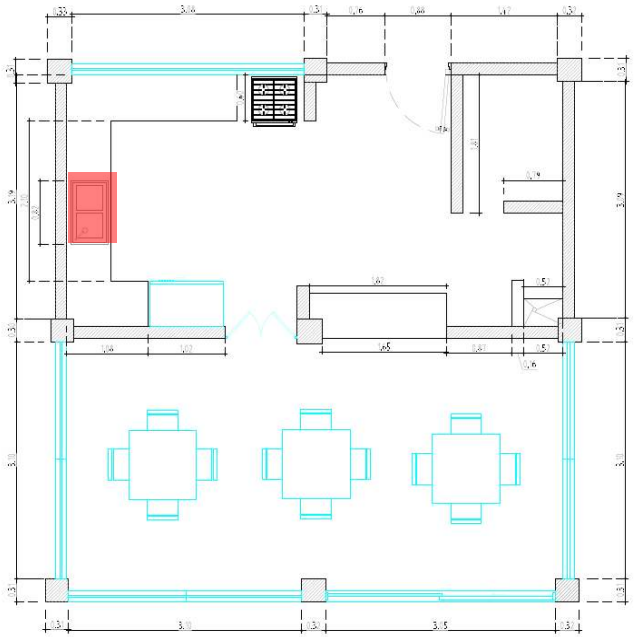

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.64	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE TANQUE 80X43 ACERO INOXIDABLE PARA LOCALES DE COMIDA. INCLUYE REJILLA Y GRIFERIA.	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO



Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
LOCALES DE COMIDA					
				8	8
TOTAL					8,00


ING. MIGUEL MAURICIO CANTOR MONROY DIRECTOR DE OBRA	**MIGUEL ANTONIO CANTOR CABRERA** REPRESENTANTE LEGAL	**ING. JAVIER HUMBERTO MARTINEZ FALLA** DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**ING. MAYRA ALEJANDRA CAMARGO MURCIA** REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAZA SESQUILE **CONTRATISTA**		**CONSORCIO INTERPLAZA** **INTERVENTORIA**	

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA


CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.64	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE TANQUE 80X43 ACERO INOXIDABLE PARA LOCALES DE COMIDA. INCLUYE REJILLA Y GRIFERIA.	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO

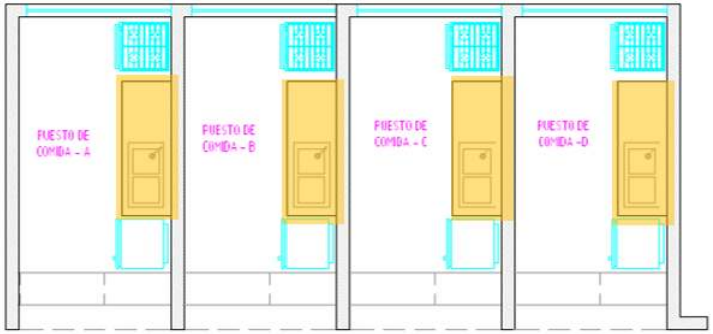

COSTADO SIMON BOLIVAR

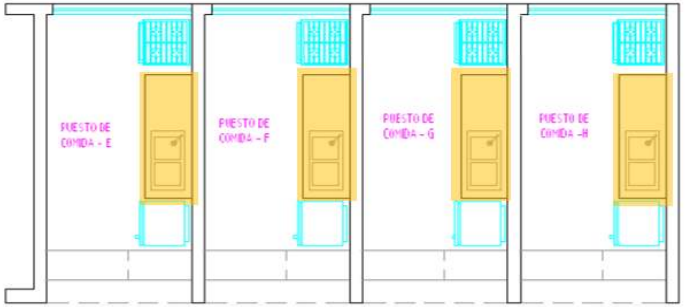

COSTADO TERMIINAL

Alcaldía Municipal de Sesquilé	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	#CONSORCIOPLAZASESQUILÉ
	ACTA FINAL MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.65	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFONES EN Y	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO KIOSCO




Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
	QUIOSCO Y LOCALES DE COMIDA				
				9	9

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.65	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFONES EN Y	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO - QUIOSCO

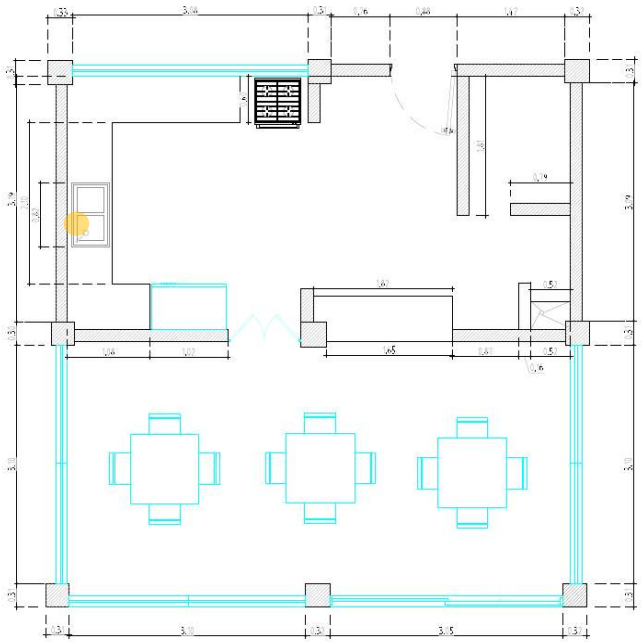


Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**		CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ / CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		


ITEM	18.65	**DESCRIPCION**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFONES EN Y	**UNIDAD**	UND

PLANO DESCRIPTIVO - LOCALES DE COMIDA

COSTADO TERMINAL

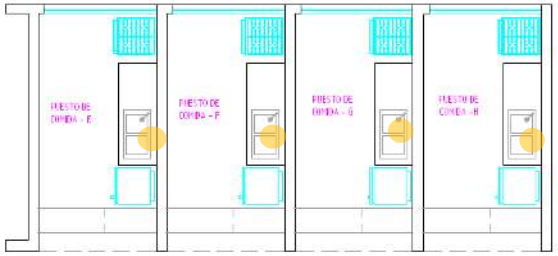

COSTADO SIMÓN BOLÍVAR

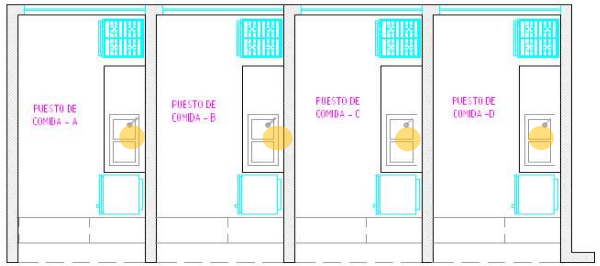

Alcaldía Municipal de Sesquilé

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.66	**DESCRIPCION**	CAÑUELA EN CONCRETO 2500 PSI 0.30 X 0.12	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO




Localización	Dimensiones			Cantidad	
	Ancho	Largo	Area		
URBANISMO KIOSCO					
		10,00		1	10

Alcaldía Municipal de Sesquilé	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
	ACTA FINAL **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**	CONSORCIO INTER PLAZA

CONTRATO DE OBRA No.	SA-MC-OBRA-213-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO PLAZA SESQUILE
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILE CUNDINAMARCA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	MC-INT-212-2025	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO INTERPLAZA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
SUPERVISOR	ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAPITULO	**1. ITEMS NO PREVISTOS**		

ITEM	18.66	**DESCRIPCION**	CAÑUELA EN CONCRETO 2500 PSI 0.30 X 0.12	**UNIDAD**	ML

PLANO DESCRIPTIVO

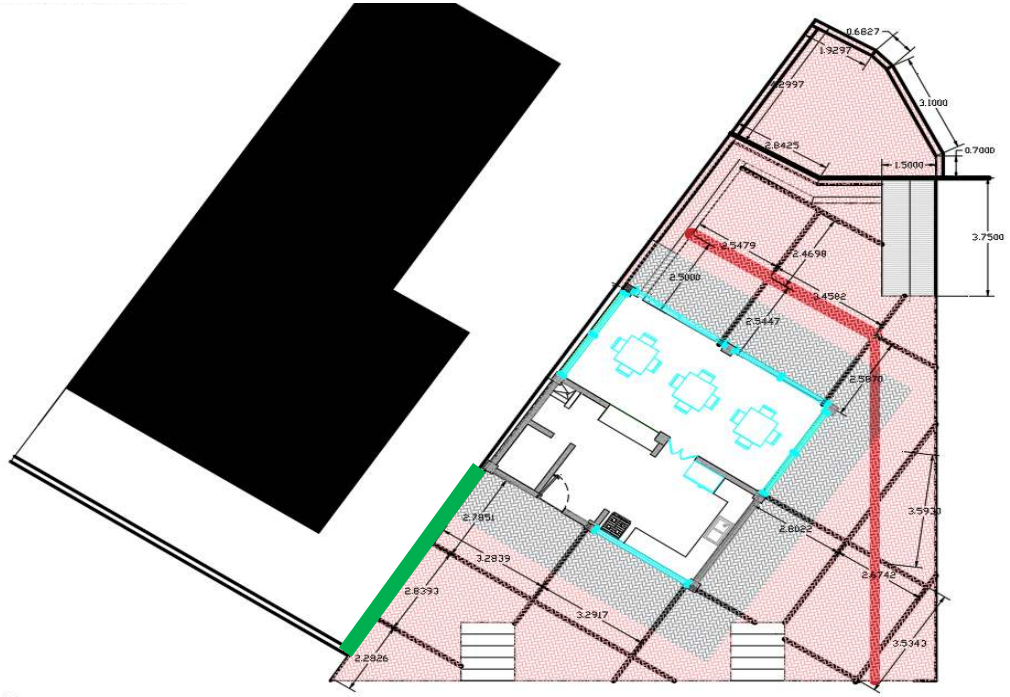



CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO

Municipio de Sesquilé — Cundinamarca

En el marco del Convenio Interadministrativo No. ICCU 623 de 2024
suscrito entre el ICCU y el Municipio de Sesquilé

Contrato de Obra SA-MC-OBRA-213-2025
Año 2026

CONTENIDO

CONTENIDO 2
1. INTRODUCCIÓN 4
1.1. Objetivo 4
1.2. Alcance 4
1.3. Responsables y sus funciones 5
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
PARTE I. RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y LOS USUARIOS 7
3. BUEN USO DE LAS INSTALACIONES 7
3.1. Recomendaciones generales 7
3.2. Locales de comida y zonas húmedas 7
4. RUTINAS DE LIMPIEZA (USO PÚBLICO) 8
PARTE II. MANUAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 10
5. MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y MUROS 10
5.1. Descripción de lo instalado 10
5.2. Daños típicos 10
5.3. Procedimiento de mantenimiento 10
5.4. Frecuencias 11
6. PISOS Y ENCHAPES 12
6.1. Descripción de lo instalado 12
6.2. Daños típicos 12
6.3. Procedimiento de mantenimiento 12
6.4. Frecuencias 13
7. CUBIERTA Y CIELO RASO 14
7.1. Descripción de lo instalado 14
7.2. Daños típicos 14
7.3. Procedimiento de mantenimiento 14
7.4. Frecuencias 15
8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 16
8.1. Descripción de lo instalado 16
8.2. Daños típicos 16
8.3. Procedimiento de mantenimiento 16
8.4. Frecuencias 17
9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN 18
9.1. Descripción de lo instalado 18
9.2. Daños típicos 18
9.3. Procedimiento de mantenimiento 18
9.4. Frecuencias 19
10. CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA 20
10.1. Descripción de lo instalado 20
10.2. Daños típicos 20
10.3. Procedimiento de mantenimiento 20
10.4. Frecuencias 21
11. ACABADOS: ESTUCO, VINILO, MICROCEMENTO Y FACHADA 22
11.1. Descripción de lo instalado 22

11.2. Daños típicos 22
11.3. Procedimiento de mantenimiento 22
11.4. Frecuencias 23
12. PROGRAMA RESUMEN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO 24
12.1. Rutinas diarias 24
12.2. Rutinas semanales 24
12.3. Rutinas quincenales y mensuales 24
12.4. Rutinas trimestrales, semestrales y anuales 24
13. RECOMENDACIONES FINALES Y REGISTRO 25
13.1. Recomendaciones generales 25
13.2. Formato sugerido de bitácora de mantenimiento 25

1. INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Uso y Mantenimiento es el documento de referencia para la conservación de la infraestructura intervenida en la Plaza de Mercado del Municipio de Sesquilé, Cundinamarca, ejecutada en el marco del Contrato de Obra SA-MC-OBRA-213-2025. Su propósito es que la administración de la plaza, el personal de mantenimiento y los usuarios cuenten con instrucciones claras, completas y aplicables para preservar en óptimas condiciones cada uno de los sistemas constructivos entregados, prolongar su vida útil y garantizar la seguridad de quienes utilizan el equipamiento.

Una plaza de mercado es, por naturaleza, una edificación de uso público intensivo. A diario circulan por ella comerciantes, compradores, proveedores y visitantes; se transportan cargas, se manipulan alimentos, se generan residuos y se utilizan de forma continua los baños, los puntos de agua y la energía eléctrica. Esta intensidad de uso produce un desgaste acelerado que no se presenta en una edificación de uso privado: los pisos se rayan y se desgastan, las juntas se ensucian, los desagües se taponan con grasas y sólidos, los muros reciben golpes de carretillas y estibas, y los acabados se manchan con mayor rapidez. Por esta razón, el presente manual adopta un enfoque de mantenimiento preventivo con periodicidad corta, en el cual las labores más sensibles se realizan de manera diaria o semanal, evitando que pequeños deterioros se conviertan en daños mayores y costosos.

El manual está redactado de forma que pueda ser comprendido tanto por personal sin formación técnica como por personal especializado. Para ello se divide en dos partes complementarias: la Parte I, dirigida a la administración y a los usuarios, centrada en el buen uso y la limpieza cotidiana; y la Parte II, de carácter técnico, dirigida al personal de mantenimiento, que desarrolla en detalle cada sistema constructivo, sus daños típicos, los procedimientos de conservación paso a paso, los productos y herramientas recomendados, las precauciones de seguridad y la frecuencia con la que debe ejecutarse cada actividad.

1.1. Objetivo

Establecer las directrices, rutinas, procedimientos y responsabilidades necesarias para el uso adecuado y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la Plaza de Mercado de Sesquilé, de manera que se conserven sus condiciones de funcionalidad, seguridad y presentación durante toda su vida útil.

1.2. Alcance

Las recomendaciones de este manual aplican a los componentes efectivamente intervenidos y entregados en la obra. A continuación se relacionan los sistemas constructivos cubiertos:

- **Preliminares y estructura:** demoliciones, placas base en concreto, columnetas, dovelas, vigas de amarre y aéreas, refuerzo y acero figurado.
- **Mampostería y pañetes:** muros en ladrillo y bloque estructural, pañetes impermeabilizados, filos y dilataciones.

- **Pisos y enchapes:** alistados, adoquín en concreto, piso porcelanato, baldosa cerámica de pared y guardaescobas.
- **Cubierta y cielo raso:** teja de barro, afinado impermeabilizado, mantenimiento de cubierta y cielo raso en PVC.
- **Instalaciones hidrosanitarias:** puntos hidráulicos y sanitarios en PVC, aparatos sanitarios, lavaplatos, medidor de agua potable, sifones, cárcamos y cañuelas.
- **Instalaciones eléctricas:** salidas para tomacorrientes (incluido GFCI), salidas de iluminación con interruptor, tableros de circuitos y paneles LED.
- **Carpintería metálica y en madera:** puertas metálicas tipo cortina/retráctil con anticorrosivo, ventanería en aluminio, vidrio laminado y listones en madera.
- **Acabados:** estuco acrílico, vinilo impermeable, microcemento en mesones, esmalte sobre lámina, impermeabilización y lavado de fachada.

1.3. Responsables y sus funciones

La correcta aplicación del manual involucra a tres actores. Es fundamental que cada uno conozca y asuma sus funciones:

Administración de la Plaza

Es la responsable de planear, programar y supervisar el mantenimiento. Debe llevar la bitácora de actividades, gestionar los recursos y contratistas necesarios, custodiar las garantías y fichas técnicas, atender los reportes de los usuarios y verificar que las rutinas se cumplan en las frecuencias establecidas.

Personal de aseo y mantenimiento

Ejecuta directamente las labores de limpieza y las rutinas de conservación. Debe conocer los procedimientos descritos en este manual, utilizar los productos y herramientas adecuados, y reportar a la administración cualquier daño o anomalía que detecte durante su trabajo.

Usuarios y comerciantes

Son corresponsables del buen estado de la plaza. Deben hacer un uso adecuado de los espacios y de las instalaciones, mantener limpios sus puestos, no sobrecargar ni alterar la infraestructura, y reportar oportunamente a la administración cualquier daño o falla que observen.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A continuación se resumen los datos generales de la obra a la cual corresponde este manual. Esta información debe conservarse actualizada y disponible para consulta de la administración y de los entes de control.

Objeto	Mantenimiento y adecuación de la Plaza de Mercado de Sesquilé, en el marco del Convenio Interadministrativo No. ICCU 623 de 2024.
Municipio	Sesquilé — Cundinamarca
Contrato de obra	SA-MC-OBRA-213-2025
Contratista	CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ — NIT 901.951.235-2
Interventoría	CONSORCIO INTERPLAZA — NIT 901.953.296-0 (Contrato MC-INT-212-2025)
Valor total ejecutado	$397.754.442 (ejecución del 100%)
Fecha de terminación	22 de marzo de 2026

Documentación complementaria: Este manual debe conservarse junto con los planos récord, las fichas técnicas de los materiales instalados y las garantías de los equipos y productos suministrados, los cuales hacen parte integral de la documentación de la obra y son indispensables para un mantenimiento correcto.

PARTE I. RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y LOS USUARIOS

Esta primera parte está dirigida a quienes usan y administran la plaza día a día. No requiere conocimientos técnicos. Su objetivo es promover el buen uso de los espacios y una limpieza frecuente que, por sí sola, evita una gran proporción de los daños que sufre una edificación de uso público. Un usuario que cuida y reporta, y una administración que limpia y atiende a tiempo, reducen enormemente los costos de mantenimiento correctivo.

3. BUEN USO DE LAS INSTALACIONES

El buen uso es la primera forma de mantenimiento. La mayoría de los deterioros prematuros en una plaza de mercado no provienen de fallas constructivas, sino del uso inadecuado: golpes, sobrecargas, vertimientos indebidos y modificaciones no autorizadas. Las siguientes recomendaciones buscan prevenir ese deterioro.

3.1. Recomendaciones generales

- **Cargas y golpes.** No sobrecargar muros, mesones ni estructuras con pesos superiores a los de un uso comercial normal. Evitar golpear muros, esquinas, puertas metálicas y enchapes con carretillas, estibas o carga pesada; estos impactos desportillan los acabados y, con el tiempo, comprometen los elementos.
- **Modificaciones.** No realizar perforaciones, anclajes ni instalaciones eléctricas o hidráulicas adicionales sin autorización de la administración. Una perforación mal ubicada puede dañar una tubería embebida o un circuito eléctrico, y anula además las garantías de la obra.
- **Evacuación de aguas.** Mantener siempre despejadas las rejillas, cárcamos y canaletas de aguas lluvias. Su obstrucción produce encharcamientos, filtraciones y riesgo de caídas.
- **Reporte oportuno.** Reportar de inmediato a la administración cualquier fuga, grieta, vidrio roto, luminaria dañada, toma eléctrica suelta o pieza desprendida. Un daño pequeño atendido a tiempo evita una reparación mayor.
- **Residuos.** Depositar los residuos en los puntos dispuestos y nunca arrojar grasas, aceites ni sólidos por los sifones y desagües, pues son la principal causa de taponamiento de las redes sanitarias.

3.2. Locales de comida y zonas húmedas

Los locales de comida son las zonas de mayor exigencia: combinan agua, grasas, calor y manipulación de alimentos. Requieren un cuidado especial por parte de los comerciantes.

- Limpiar diariamente mesones, lavaplatos y todas las superficies en contacto con alimentos, con detergente neutro.

- Usar siempre rejillas o coladores en los sifones para retener residuos sólidos y evitar taponamientos.
- No verter aceites ni grasas calientes directamente en el desagüe; recogerlos en recipientes para su disposición adecuada.
- Verificar que las llaves y griferías queden completamente cerradas al finalizar la jornada, para evitar desperdicio de agua y humedades.
- Secar las superficies de microcemento y los mesones después de usarlos, para evitar manchas y prolongar el sellado.

4. RUTINAS DE LIMPIEZA (USO PÚBLICO)

Dada la alta afluencia de público, la limpieza debe realizarse con periodicidad corta. La limpieza frecuente no solo mantiene la presentación de la plaza, sino que es en sí misma una labor de mantenimiento preventivo: retira los agentes que deterioran los materiales (grasas, sedimentos, humedad acumulada) y permite detectar tempranamente daños incipientes. La siguiente tabla resume las rutinas mínimas recomendadas, que se desarrollan en detalle en la Parte II.

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Barrido y trapeado de pisos (porcelanato, baldosa, adoquín)	Diaria	Personal de aseo	Mínimo al inicio y cierre de jornada; trapeador húmedo bien escurrido, sin encharcar.
Limpieza de mesones y lavaplatos	Diaria	Comerciantes / aseo	Detergente neutro; secar para evitar manchas de cal y humedad.
Recolección de residuos y limpieza de canecas	Diaria	Personal de aseo	Separar residuos; no dejar bolsas sobre rejillas ni cárcamos.
Limpieza y desinfección de baños y aparatos sanitarios	Diaria (2 veces)	Personal de aseo	Desinfectante; revisar funcionamiento de llaves y descargas.
Limpieza de vidrios y ventanería en aluminio	Semanal	Personal de aseo	Limpiavidrios y paño suave; no usar abrasivos.
Limpieza de rejillas, cárcamos y canaletas	Semanal	Personal de aseo	Retirar hojas y sedimentos; verificar libre escurrimiento.
Limpieza de puertas metálicas (cortinas/retráctiles)	Semanal	Mantenimiento	Paño seco; verificar deslizamiento suave.
Lavado general de pisos	Semanal	Personal de aseo	Jabón neutro; enjuague y secado para evitar resbalones.

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Limpieza de muros pintados (vinilo) y manchas puntuales	Quincenal	Personal de aseo	Esponja húmeda suave; no frotar con fuerza ni usar abrasivos.

PARTE II. MANUAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

Esta segunda parte está dirigida al personal de mantenimiento de la plaza. Para cada sistema constructivo intervenido en la obra se desarrolla: una descripción de lo instalado, los daños típicos que sufre en condiciones de uso público intensivo, los procedimientos de mantenimiento paso a paso, los productos y herramientas recomendados, las precauciones de seguridad y, finalmente, una tabla resumen con las frecuencias. Las frecuencias se han fijado en rangos cortos por tratarse de un equipamiento de uso intensivo, donde el mantenimiento preventivo resulta siempre más económico que el correctivo.

5. MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y MUROS

5.1. Descripción de lo instalado

El sistema comprende muros en ladrillo y en bloque estructural No. 5, columnetas, dovelas con grouting, vigas de amarre y aéreas, pañetes (revoques) impermeabilizados con mortero en proporción 1:3, filos y dilataciones. Los muros cumplen funciones de cerramiento y división de los puestos de comercio, y en algunos casos colaboran con la estructura. Los pañetes impermeabilizados protegen la mampostería de la humedad y sirven de base para los acabados de pintura.

5.2. Daños típicos

- **Fisuras:** aparecen por asentamientos, vibraciones o cambios térmicos. Las fisuras finas (capilares) suelen ser superficiales; las que superan 1 mm o crecen en el tiempo requieren evaluación.
- **Desportillado por golpes:** el tránsito de carretillas y carga golpea esquinas y filos, desprendiendo el pañete y dejando el ladrillo expuesto.
- **Humedades y eflorescencias:** manchas y polvo blanco (salitre) por filtración o ascenso capilar de agua, que degradan el pañete y la pintura.
- **Desprendimiento de pañete:** el revoque se abomba y se cae cuando pierde adherencia, generalmente por humedad persistente.

5.3. Procedimiento de mantenimiento

Inspección y monitoreo de fisuras

1. Recorrer los muros e identificar fisuras, marcando con lápiz sus extremos y la fecha.
2. Medir el ancho con un fisurómetro o regla. Registrar en la bitácora.
3. Si la fisura es capilar y estable, resanar con masilla o estuco al hacer el siguiente repintado.
4. Si supera 1 mm o crece entre inspecciones, reportar a la administración para evaluación de un profesional, pues puede indicar un problema estructural.

Resane de pañete desprendido

5. Retirar todo el pañete suelto o abombado hasta encontrar material firme y adherido.
6. Humedecer la superficie de la mampostería para mejorar la adherencia del nuevo mortero.
7. Aplicar mortero 1:3 (una parte de cemento por tres de arena), compatible con el existente; en zonas húmedas incorporar impermeabilizante integral.
8. Nivelar con llana, dejar fraguar y curar manteniendo la humedad uno o dos días antes de pintar.

Productos y herramientas
• Mortero de pega/revoque (cemento gris y arena lavada cernida), proporción 1:3. • Impermeabilizante integral para morteros en zonas húmedas. • Masilla o estuco para resane de fisuras finas. • Llana, palustre, cincel, fisurómetro o regla, balde, brocha y esponja.

Precaución: No tapar una fisura activa sin entender su causa. Resanar por encima de un problema estructural o de humedad solo oculta el síntoma; el daño reaparecerá y puede agravarse.

5.4. Frecuencias

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Inspección visual de fisuras en muros y pañetes	Mensual	Mantenimiento	Marcar y monitorear; reportar si superan 1 mm o crecen.
Revisión de humedades y eflorescencias	Mensual	Mantenimiento	Identificar el origen (filtración/capilaridad) antes de resanar.
Resane y retoque de pañetes desprendidos	Según hallazgo	Mantenimiento	Mortero 1:3 compatible; impermeabilizar zonas húmedas.
Revisión de filos y dilataciones	Trimestral	Mantenimiento	Reponer filos golpeados; mantener juntas limpias.

6. PISOS Y ENCHAPES

6.1. Descripción de lo instalado

Incluye placa base en concreto, alistados de piso, adoquín en concreto en zonas de circulación, piso en porcelanato, baldosa cerámica de pared de primera calidad y guardaescobas. Es el sistema sometido al mayor desgaste de toda la edificación, por el tránsito permanente de personas y de carga rodante. La calidad de su mantenimiento determina en gran medida la presentación general de la plaza y la seguridad de los usuarios frente a caídas.

6.2. Daños típicos

- **Piezas flojas, fisuradas o desprendidas:** por impactos, vibración o fallas en el pegado; representan riesgo de tropiezo y permiten la filtración de agua hacia la base.
- **Pérdida de boquilla (lechada de juntas):** las juntas se vacían con el tránsito y la limpieza, dejando entrar humedad y suciedad bajo las piezas.
- **Hundimiento del adoquín:** por pérdida de arena de sello o de la base, generando desniveles y encharcamientos.
- **Desgaste y pulido por tránsito:** vuelve la superficie resbalosa, especialmente cuando está mojada, aumentando el riesgo de caídas.
- **Manchas:** grasas y líquidos que penetran en juntas y piezas porosas si no se limpian a tiempo.

6.3. Procedimiento de mantenimiento

Limpieza correcta (preventiva)

9. Barrer en seco para retirar arena y partículas que rayan el piso.
10. Trapear con agua y jabón neutro, con el trapeador bien escurrido; evitar exceso de agua que penetre en las juntas.
11. No usar ácidos, ni abrasivos, ni cepillos metálicos que rayen o deterioren el esmalte del porcelanato y la cerámica.
12. Señalizar siempre el piso mojado con avisos para prevenir caídas.

Reposición de pieza desprendida o fisurada

13. Retirar la pieza dañada y picar el mortero viejo de la base sin afectar las piezas vecinas.
14. Limpiar el sitio, aplicar pegante para enchape (mortero adhesivo) y asentar una pieza nueva del mismo tipo y formato, dejando la junta uniforme.
15. Una vez fraguado el pegante, aplicar boquilla del mismo color, limpiar el excedente y dejar curar.

Reposición de boquilla y mantenimiento de adoquín

16. Retirar la boquilla suelta o faltante, limpiar la junta y aplicar boquilla nueva con espátula de caucho.

17. En el adoquín, reasentar las piezas hundidas, nivelar la base y rellenar las juntas con arena fina, compactando.

Productos y herramientas

- Jabón o detergente neutro (pH neutro), nunca ácidos ni abrasivos.
- Mortero adhesivo (pegacor/pegante para enchape) para reposición de piezas.
- Boquilla/lechada del color existente; arena fina de sello para adoquín.
- Espátula de caucho, llana dentada, cincel, mazo de goma, esponja y avisos de piso mojado.

Seguridad: El piso mojado o una pieza floja son las principales causas de caídas en una plaza. Señalice siempre las zonas húmedas y reponga de inmediato cualquier pieza suelta.

6.4. Frecuencias

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Inspección de piezas flojas, fisuradas o desprendidas	Quincenal	Mantenimiento	Reemplazar de inmediato para evitar accidentes y filtraciones.
Revisión de juntas y boquilla (porcelanato/cerámica)	Mensual	Mantenimiento	Reponer boquilla faltante; sellar para evitar humedad.
Revisión de adoquín y nivelación	Mensual	Mantenimiento	Reasentar adoquines hundidos; rellenar juntas con arena.
Sellado de juntas en zonas húmedas	Trimestral	Mantenimiento	Aplicar sellante; revisar guardaescobas y encuentros piso-muro.
Revisión de condición antideslizante	Trimestral	Mantenimiento	Señalizar pisos mojados; evitar superficies resbalosas.

7. CUBIERTA Y CIELO RASO

7.1. Descripción de lo instalado

Comprende cubierta en teja de barro, afinado impermeabilizado, labores de mantenimiento y limpieza de cubierta, y cielo raso en PVC. La cubierta es el principal elemento de protección de toda la edificación frente a la lluvia; cualquier falla en ella se traduce en filtraciones que afectan cielos rasos, muros, instalaciones eléctricas y acabados. El cielo raso en PVC, además de su función estética, actúa como testigo: las manchas en su superficie suelen ser la primera señal visible de una filtración en la cubierta.

7.2. Daños típicos

- **Tejas desplazadas, rotas o sueltas:** por viento, aves o tránsito de personas sobre la cubierta; abren paso al agua.
- **Obstrucción de la cubierta y sus pendientes:** hojas y sedimentos represan el agua, que termina filtrándose.
- **Pérdida de impermeabilización del afinado:** el material impermeable se agrieta o desgasta con el tiempo y la exposición solar.
- **Manchas y deformación del cielo raso en PVC:** indican humedad proveniente de una filtración superior.

7.3. Procedimiento de mantenimiento

Limpieza e inspección de cubierta

18. Programar la labor preferiblemente antes de la temporada de lluvias y con clima seco.
19. Retirar hojas, sedimentos y cualquier obstrucción de la superficie y de las líneas de evacuación de agua.
20. Inspeccionar visualmente tejas sueltas, rotas o desplazadas y reponerlas o reacomodarlas de inmediato.
21. Verificar que las pendientes conduzcan el agua correctamente, sin zonas de represamiento.

Revisión de impermeabilización y cielo raso

22. Revisar el afinado impermeabilizado y resellar los puntos críticos (encuentros, remates) donde se observe agrietamiento.
23. Inspeccionar el cielo raso en PVC desde el interior; ante cualquier mancha de humedad, rastrear y corregir la filtración en la cubierta antes de reparar el cielo.
24. Limpiar el cielo raso en PVC con paño húmedo y detergente neutro, sin solventes que lo deterioren.

Productos y herramientas
• Manto o pintura impermeabilizante para resellado del afinado.

- Tejas de barro de repuesto del mismo tipo.
- Detergente neutro para el cielo raso en PVC; nunca solventes.
- Escalera o andamio certificado, arnés y línea de vida, guantes, cepillo y recogedor.

Seguridad en alturas: Todo trabajo sobre la cubierta debe realizarse con arnés, línea de vida y puntos de anclaje seguros, por personal capacitado para trabajo en alturas. No transitar directamente sobre las tejas de barro: usar tablones de apoyo para distribuir el peso.

7.4. Frecuencias

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Limpieza de cubierta (hojas, sedimentos, obstrucciones)	Mensual	Mantenimiento	Especial atención antes y durante la temporada de lluvias.
Inspección de tejas sueltas, rotas o desplazadas	Mensual	Mantenimiento	Reponer de inmediato para evitar filtraciones.
Revisión de impermeabilización y afinado	Semestral	Mantenimiento	Resellar puntos críticos; verificar pendientes.
Inspección de cielo raso en PVC (manchas/humedad)	Mensual	Mantenimiento	Las manchas indican filtración; rastrear el origen.
Limpieza de cielo raso en PVC	Trimestral	Personal de aseo	Paño húmedo con detergente neutro; no usar solventes.

8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

8.1. Descripción de lo instalado

Incluye puntos hidráulicos y salidas sanitarias en PVC, aparatos sanitarios, lavaplatos, medidor de agua potable, sifones, cárcamos y cañuelas para la conducción de aguas lluvias. En una plaza de mercado, y en especial en los locales de comida y en los baños públicos, este sistema trabaja de forma intensiva y es particularmente propenso a fugas y taponamientos. Su mantenimiento frecuente evita desperdicio de agua, malos olores, humedades y problemas sanitarios.

8.2. Daños típicos

- **Fugas en llaves, griferías y uniones:** el goteo continuo desperdicia agua y genera humedades que dañan muros y pisos.
- **Taponamiento de sifones y redes:** por acumulación de grasas, residuos de comida y sólidos; produce reflujos y malos olores.
- **Obstrucción de cárcamos y cañuelas:** impide la evacuación de aguas lluvias y provoca encharcamientos e inundaciones localizadas.
- **Fallas en aparatos sanitarios:** descargas deficientes, fugas en el tanque o piezas flojas por el uso intensivo.
- **Consumos anómalos:** un aumento inexplicable en el medidor suele indicar una fuga oculta en la red.

8.3. Procedimiento de mantenimiento

Detección y corrección de fugas

25. Revisar semanalmente llaves, griferías y uniones visibles en busca de goteos o humedad.
26. Ante una fuga en una unión, cerrar el paso de agua, desmontar, reemplazar la cinta de teflón o el empaque y reapretar sin forzar.
27. Si la fuga persiste o está en una tubería embebida, reportar para intervención de un plomero.

Limpieza de sifones, cárcamos y prevención de taponamientos

28. Retirar y limpiar las rejillas y coladores de los sifones, eliminando residuos sólidos y grasas.
29. Limpiar cárcamos y cañuelas retirando sedimentos y verificando el libre escurrimiento del agua.
30. De forma periódica, aplicar agua caliente con bicarbonato en los desagües de cocina para disolver grasas; evitar productos altamente corrosivos que dañen el PVC.
31. Realizar un sondeo preventivo de las redes sanitarias para prevenir taponamientos mayores.

Revisión de aparatos y lectura del medidor

32. Verificar la descarga, la ausencia de fugas y la correcta fijación de los aparatos sanitarios.
33. Tomar y registrar la lectura del medidor de agua; comparar con periodos anteriores para detectar consumos anómalos. Una prueba útil: cerrar todas las llaves y verificar que el medidor no siga girando.

Productos y herramientas
• Cinta de teflón, empaques y siliconas sanitarias para uniones. • Bicarbonato y agua caliente para limpieza de grasas; evitar ácidos fuertes sobre PVC. • Sonda o guaya de plomería para destaponamiento. • Llave de tubo, llave inglesa, ventosa (chupa), guantes y baldes.

Importante: La mayoría de los taponamientos en plazas provienen de grasas y sólidos arrojados por los desagües de los locales de comida. La prevención (coladores, no verter grasas) es mucho más eficaz y económica que el destaponamiento.

8.4. Frecuencias

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Revisión de fugas en llaves, griferías y uniones	Semanal	Mantenimiento	Corregir de inmediato; una fuga pequeña genera daño y desperdicio.
Limpieza de sifones y rejillas de piso	Semanal	Personal de aseo	Retirar residuos; evitar taponamientos en locales de comida.
Revisión de funcionamiento de aparatos sanitarios	Semanal	Mantenimiento	Verificar descarga, ausencia de fugas y fijación.
Limpieza de cárcamos y cañuelas de aguas lluvias	Quincenal	Mantenimiento	Mantener libre escurrimiento; clave en temporada de lluvias.
Lectura y revisión del medidor de agua potable	Mensual	Administración	Detectar consumos anómalos que indiquen fugas ocultas.
Sondeo preventivo de redes sanitarias	Semestral	Mantenimiento	Prevenir taponamientos por grasas y sólidos.

9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

9.1. Descripción de lo instalado

Comprende salidas para tomacorrientes monofásicos, salidas para tomacorriente con protección GFCI (interruptor de falla a tierra) y polo a tierra, salidas de iluminación con interruptor, tableros parciales de circuitos, anclajes y paneles LED tipo SQ. La seguridad eléctrica es prioritaria en un espacio de pública concurrencia: una instalación mal mantenida puede causar incendios o accidentes por choque eléctrico. Por ello, gran parte de las labores de este sistema deben ser realizadas por personal eléctrico calificado.

9.2. Daños típicos

- **Tomas e interruptores flojos o quemados:** por uso intensivo o sobrecarga; pueden presentar calentamiento, chispas u olor a quemado.
- **Falla de la protección GFCI:** si no dispara correctamente, deja de proteger contra choque eléctrico, lo cual es crítico en zonas húmedas.
- **Sobrecarga de circuitos:** la conexión de demasiados equipos en un mismo circuito hace saltar los breakers o sobrecalienta el cableado.
- **Paneles LED fundidos o parpadeantes:** por fin de vida útil o problemas en la conexión.

9.3. Procedimiento de mantenimiento

Revisiones de uso (personal de mantenimiento)

34. Inspeccionar visualmente tomas e interruptores: que estén bien fijos, sin grietas, sin signos de calentamiento ni manchas de quemado.
35. Probar las tomas GFCI mensualmente: pulsar el botón TEST (debe cortar la energía) y luego RESET (debe restablecerla). Si no responde, reportar para reemplazo.
36. Verificar que las luminarias y paneles LED enciendan correctamente; limpiar los difusores con paño seco y reemplazar los fundidos.
37. Revisar el tablero: que los breakers no estén disparados de forma recurrente y que el rotulado de circuitos sea legible.

Intervenciones especializadas (personal calificado)

38. Reapretar conexiones y borneras del tablero, siempre con el sistema desenergizado.
39. Verificar el sistema de puesta a tierra mediante medición de continuidad y resistencia.
40. Atender cualquier reparación de circuitos, cableado o tablero conforme a la norma RETIE.

Productos y herramientas
• Paneles LED SQ de repuesto del mismo tipo y potencia. • Tomas, interruptores y breakers de reemplazo según especificación original. • Destornilladores aislados, probador de voltaje, pinza amperimétrica.

- Elementos de protección personal dieléctricos (guantes, calzado).

Advertencia de seguridad eléctrica: Toda intervención sobre tableros, conexiones, cableado o circuitos debe ser realizada únicamente por personal eléctrico calificado y certificado, con el sistema desenergizado y siguiendo la norma RETIE. El personal de aseo y mantenimiento general solo debe realizar inspecciones visuales y la prueba TEST/RESET de los GFCI. Nunca improvisar reparaciones eléctricas.

9.4. Frecuencias

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Revisión de tomacorrientes e interruptores	Mensual	Mantenimiento (eléctrico)	Verificar fijación, ausencia de calentamiento o chispas.
Prueba de tomas GFCI (polo a tierra)	Mensual	Mantenimiento (eléctrico)	Pulsar TEST/RESET; garantiza protección contra choque.
Inspección de tablero de circuitos	Mensual	Mantenimiento (eléctrico)	Revisar breakers, rotulado y ausencia de sobrecargas.
Revisión de luminarias / paneles LED	Mensual	Mantenimiento	Reemplazar paneles fundidos; limpiar difusores.
Reapriete de conexiones y borneras	Semestral	Personal calificado	Desenergizar antes; solo personal certificado.
Verificación del sistema de puesta a tierra	Anual	Personal calificado	Medición de continuidad y resistencia.

10. CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA

10.1. Descripción de lo instalado

Incluye puertas metálicas tipo cortina o retráctil con tratamiento anticorrosivo, marcos y remates en lámina, ventanería en aluminio, vidrio laminado, listones en madera (tipo pino romerón) y cerraduras y herrajes. Estos elementos garantizan el cierre, la seguridad y la ventilación de los locales. En un ambiente de plaza, con humedad y manipulación constante, son especialmente susceptibles a la corrosión y al desajuste mecánico.

10.2. Daños típicos

- **Corrosión (óxido):** aparece en puntos donde se pierde el anticorrosivo o la pintura, sobre todo en zonas húmedas; si no se trata, avanza y debilita el elemento.
- **Dificultad de deslizamiento:** las puertas tipo cortina se atascan por falta de lubricación, suciedad en los rieles o desajuste.
- **Cerraduras y herrajes dañados:** por uso intensivo, falta de lubricación o tornillería floja.
- **Vidrios fisurados y sellos deteriorados:** riesgo de seguridad y de filtración de agua y polvo.
- **Deterioro de la madera:** humedad, hongos o ataque de insectos (polilla) si pierde su protección.

10.3. Procedimiento de mantenimiento

Puertas metálicas, cerraduras y herrajes

41. Limpiar los rieles y mecanismos, retirando polvo y residuos que impidan el deslizamiento.
42. Lubricar rieles, rodamientos, bisagras y cerraduras con lubricante adecuado para mecanismos.
43. Ajustar la tornillería suelta de herrajes y cerraduras; reemplazar las piezas dañadas.

Control de corrosión

44. Inspeccionar trimestralmente los elementos metálicos en busca de puntos de óxido.
45. Lijar el punto oxidado hasta retirar todo el óxido y dejar el metal limpio.
46. Aplicar anticorrosivo y, una vez seco, el acabado (esmalte) del color correspondiente.

Vidrios y madera

47. Revisar vidrios laminados y reemplazar los fisurados; reponer la silicona o los sellos deteriorados.
48. Limpiar la ventanería en aluminio sin abrasivos y mantener despejados los drenajes del perfil.
49. Revisar los listones de madera; ante humedad o señales de polilla, aplicar protector/inmunizante para madera.

Productos y herramientas
• Lubricante para mecanismos (tipo aceite penetrante o grasa ligera). • Anticorrosivo y esmalte del color existente. • Silicona para vidrios; protector/inmunizante para madera. • Lija, espátula, brocha, destornilladores y llaves para herrajes.

> **Recomendación:** Atender un punto de óxido apenas aparece evita que la corrosión avance y obligue a reemplazar todo el elemento. La lubricación periódica de las puertas tipo cortina prolonga notablemente la vida de sus mecanismos.

10.4. Frecuencias

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Lubricación de puertas metálicas y rieles	Mensual	Mantenimiento	Verificar deslizamiento suave; limpiar rieles antes de lubricar.
Revisión de cerraduras y herrajes	Mensual	Mantenimiento	Lubricar y ajustar tornillería suelta.
Inspección de óxido en elementos metálicos	Trimestral	Mantenimiento	Lijar y reaplicar anticorrosivo + acabado.
Revisión de vidrios laminados y sellos	Trimestral	Mantenimiento	Reemplazar vidrios fisurados; reponer silicona.
Revisión de listones en madera	Semestral	Mantenimiento	Verificar humedad/polilla; aplicar protector.
Limpieza de ventanería en aluminio	Mensual	Personal de aseo	No usar abrasivos; revisar drenajes del perfil.

11. ACABADOS: ESTUCO, VINILO, MICROCEMENTO Y FACHADA

11.1. Descripción de lo instalado

Comprende estuco acrílico, vinilo antiséptico impermeable sobre muros, acabado en microcemento para mesones, esmalte sobre lámina, impermeabilización de fachada con producto tipo Sika transparente y lavado de fachada. Los acabados cumplen una doble función: protegen los materiales base de la humedad y el desgaste, y dan a la plaza su presentación. En zonas de uso público se ensucian y desgastan con rapidez, por lo que requieren retoques y limpieza frecuentes.

11.2. Daños típicos

- **Manchas y desgaste del vinilo:** por roce, golpes y suciedad; más acentuado a la altura de circulación y manipulación.
- **Desprendimiento de pintura en zonas húmedas:** cuando la humedad supera la capacidad impermeable del acabado.
- **Fisuras o pérdida de sellado del microcemento:** en los mesones, permite que penetren agua y grasas, manchando y deteriorando la superficie.
- **Pérdida de impermeabilización de fachada:** el producto transparente se desgasta con la exposición solar y la lluvia, dejando el muro vulnerable.
- **Corrosión bajo el esmalte:** cuando el esmalte sobre lámina se daña y deja el metal expuesto.

11.3. Procedimiento de mantenimiento

Pintura y vinilo

50. Limpiar las manchas con esponja húmeda y detergente neutro, sin frotar con fuerza ni usar abrasivos.
51. Retocar las zonas desgastadas o manchadas con el mismo tipo y color de vinilo; en zonas húmedas usar pintura impermeable.
52. Antes de repintar, resanar fisuras y asegurar que la superficie esté seca y libre de humedad activa.

Microcemento en mesones

53. Revisar trimestralmente el estado del sellado y la aparición de fisuras.
54. Reaplicar el sellador del microcemento para mantener su impermeabilidad y facilidad de limpieza.
55. Limpiar a diario con detergente neutro y secar; evitar ácidos y abrasivos que dañan la superficie.

Fachada

56. Lavar la fachada con agua a baja presión y jabón neutro; no usar ácidos que manchen o deterioren el material.

57. Revisar anualmente la impermeabilización transparente y reaplicarla en las zonas expuestas según su desgaste.
58. Retocar el esmalte sobre elementos metálicos para prevenir la corrosión.

Productos y herramientas
• Vinilo del color existente y pintura impermeable para zonas húmedas. • Sellador para microcemento; esmalte y anticorrosivo para metal. • Impermeabilizante transparente para fachada (tipo Sika). • Rodillo, brocha, esponja, espátula, hidrolavadora a baja presión y detergente neutro.

Recomendación: Programe el lavado y la reimpermeabilización de fachada, así como los trabajos de cubierta, antes de las temporadas de lluvia. Mantener el sellado del microcemento al día evita manchas permanentes en los mesones de los locales de comida.

11.4. Frecuencias

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Revisión de manchas, desprendimientos y desgaste de pintura	Mensual	Mantenimiento	Retocar vinilo; en zonas húmedas usar pintura impermeable.
Revisión de microcemento en mesones (fisuras/sellado)	Trimestral	Mantenimiento	Resellar para mantener impermeabilidad y limpieza.
Lavado de fachada	Semestral	Mantenimiento	Agua a baja presión y jabón neutro; no usar ácidos.
Revisión de impermeabilización de fachada (Sika)	Anual	Mantenimiento	Reaplicar en zonas expuestas según desgaste.
Retoque de esmalte sobre elementos metálicos	Semestral	Mantenimiento	Prevenir corrosión en láminas y remates.

12. PROGRAMA RESUMEN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

La siguiente matriz consolida las principales rutinas según su frecuencia, como herramienta rápida de programación para la administración de la plaza. El detalle de cada actividad se encuentra en las secciones correspondientes de la Parte II.

12.1. Rutinas diarias

- Barrido y trapeado de todos los pisos, al inicio y al cierre de la jornada.
- Limpieza de mesones, lavaplatos y superficies en contacto con alimentos.
- Limpieza y desinfección de baños y aparatos sanitarios (dos veces al día).
- Recolección de residuos y limpieza de canecas.
- Verificación del cierre de llaves y griferías al finalizar la jornada.

12.2. Rutinas semanales

- Limpieza de vidrios, ventanería, rejillas, cárcamos y puertas metálicas.
- Lavado general de pisos.
- Revisión de fugas hidrosanitarias y limpieza de sifones y rejillas.
- Revisión del funcionamiento de los aparatos sanitarios.

12.3. Rutinas quincenales y mensuales

- Inspección de piezas de piso flojas o fisuradas (quincenal).
- Limpieza de cárcamos y cañuelas de aguas lluvias (quincenal).
- Inspección de fisuras, humedades, cubierta y cielo raso (mensual).
- Revisión eléctrica: tomas, prueba GFCI, tablero y luminarias LED (mensual).
- Lubricación de puertas metálicas y revisión de cerraduras (mensual).
- Lectura del medidor de agua potable y revisión de pintura/vinilo (mensual).

12.4. Rutinas trimestrales, semestrales y anuales

- Sellado de juntas, revisión de microcemento, óxido y vidrios laminados (trimestral).
- Limpieza de cubierta, lavado de fachada, sondeo de redes y reapriete eléctrico (semestral).
- Impermeabilización de fachada y verificación de puesta a tierra (anual).

13. RECOMENDACIONES FINALES Y REGISTRO

13.1. Recomendaciones generales

Para que el mantenimiento sea efectivo y sostenible en el tiempo, se recomienda a la administración de la plaza adoptar las siguientes prácticas:

59. Llevar una bitácora de mantenimiento donde se registre cada actividad realizada, su fecha y el responsable, de modo que exista trazabilidad y se puedan programar las siguientes labores.
60. Conservar las garantías y fichas técnicas de materiales y equipos, y respetar sus condiciones de uso para no anularlas.
61. Atender de forma inmediata los reportes de fugas, fallas eléctricas, vidrios rotos o piezas sueltas que representen riesgo para los usuarios.
62. Contratar siempre personal calificado y certificado para las intervenciones eléctricas, estructurales, de redes y de trabajo en alturas.
63. Priorizar el mantenimiento preventivo sobre el correctivo: es más económico, menos disruptivo y prolonga la vida útil de la obra.
64. Programar las labores de cubierta, fachada e impermeabilización antes de las temporadas de lluvia.
65. Mantener un inventario mínimo de repuestos de uso frecuente (piezas de enchape, boquilla, paneles LED, tomas, empaques) para responder con rapidez.

13.2. Formato sugerido de bitácora de mantenimiento

Se recomienda diligenciar un registro como el siguiente por cada intervención realizada. La bitácora es la herramienta que permite demostrar el cumplimiento del mantenimiento y planificar las labores futuras.

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	SISTEMA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Elaborado por: CONSORCIO PLAZA SESQUILÉ
En cumplimiento del Contrato SA-MC-OBRA-213-2025 — Convenio ICCU 623 de 2024.
