Bogotá, D.C., Marzo 31 de 2026

CERTIFICACIÓN DE APORTES

Yo **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** identificado cédula de ciudadanía No. 19.055.241 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal e HILDA LEONOR VELANDIA MUÑOZ identificada con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 20.652.191 de GUATAVITA (CUNDINAMARCA) y Tarjeta Profesional No. 219966-T en calidad de CONTADOR del **CONSORCIO FP** identificado con Nit No. 901.899.122-7, CERTIFICAMOS, que el consorcio ha efectuado el pago por concepto aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar cuando a ello hubo lugar y durante el periodo del presente informe (01 de marzo de 2026 a 31 de marzo de 2026). De igual forma, CERTIFICO, que el consorcio de acuerdo con lo señalado en el artículo 114-1 del estatuto tributario se encuentra exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del SENA (FIC), ICBF, dado que en la nómina no tiene personal que devengue más de 10 SMLV (diez salarios mínimos legales vigentes).

Se expide la presente, a los treinta y un (31) días del mes de marzo (03) de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,




GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal



HILDA LEONOR VELANDIA MUÑOZ
Contador
CC No 20652191 de GUATAVITA (CUNDINAMARCA)
Tarjeta Profesional No 219966-T

Elaboró: JETG
C.C.// Archivo

Objetivo: Comité de Seguimiento Técnico al Contrato de Obra 4335-2024 – Etapa de Obra		
Responsable: Interventoría	Dependencia: MinCultura	Lugar y Fecha: 04/03/2026 10:30 am Reunión Virtual

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
REPRESENTANTES						
1	María Fernanda Martínez	Apoyo a la Supervisora Contrato	Ministerio de Cultura	3203446422	mmartinezp@mincultura.gov.co	
2	German Antonio Parra Rincón	Dir. de interventoría	Interventoría / Consultores de Occidente	3132931257	Interbuenaventura2025@hotmail.com	
3	Nidia Pabón Triana	Director de obra	Contratista / Consorcio FP			
PARTICIPANTES						
4	Jaime José Bastidas	Residente Interventoría	Interventoría / Consultores de Occidente	3225690750	Interbuenaventura2025@hotmail.com	NA
5	Luis Alberto Pasmiño	Inspector de Interventoría	Interventoría / Consultores de Occidente	3175599139	Interbuenaventura2025@hotmail.com	NA
6	Yenny Rentería	Profesional SISOMA Interventoría	Interventoría / Consultores de Occidente			NA
7	Yazmin Angulo	Residente SSTMA	Contratista / Consorcio FP			NA
8	Galdino Najera	Residente de obra	Contratista / Consorcio FP			NA
9	Luis Díaz	Arquitecto	Contratista / Consorcio FP			NA
10	Juan David Hurtado	Estructural Ministerio	Ministerio de Cultura			NA

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Inicio de comité 10:30 AM
2	Orden del día: 1. Presentación del personal. 2. Aprobación acta de comité anterior. 3. Socialización Área Social. 4. Socialización Área SISOMA


Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

5. AREA TECNICA - Avance de obra (Contratista - Interventoría).
6. Varios.
7. Cierre de comité.

Se informa que el acta de comité anterior ya se encuentra aprobada y firmada.
Se realiza la presentación de los avances de obra reportando un avance programado de 3.59% y un avance ejecutado de 5.51%, teniendo un adelanto del 1.92%, así mismo se informan todas las actividades realizadas durante el período tales como la vista de la Contraloría a la obra y el desarrollo de la misma, por otra parte se listan todas las actividades desarrolladas en sitio, incluyendo los avances relacionados con la cimentación con base en el plano siguiente:

CONSTRUCCION FASE III CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO – BUENAVENTURA

AVANCE ACTIVIDADES CAISSON

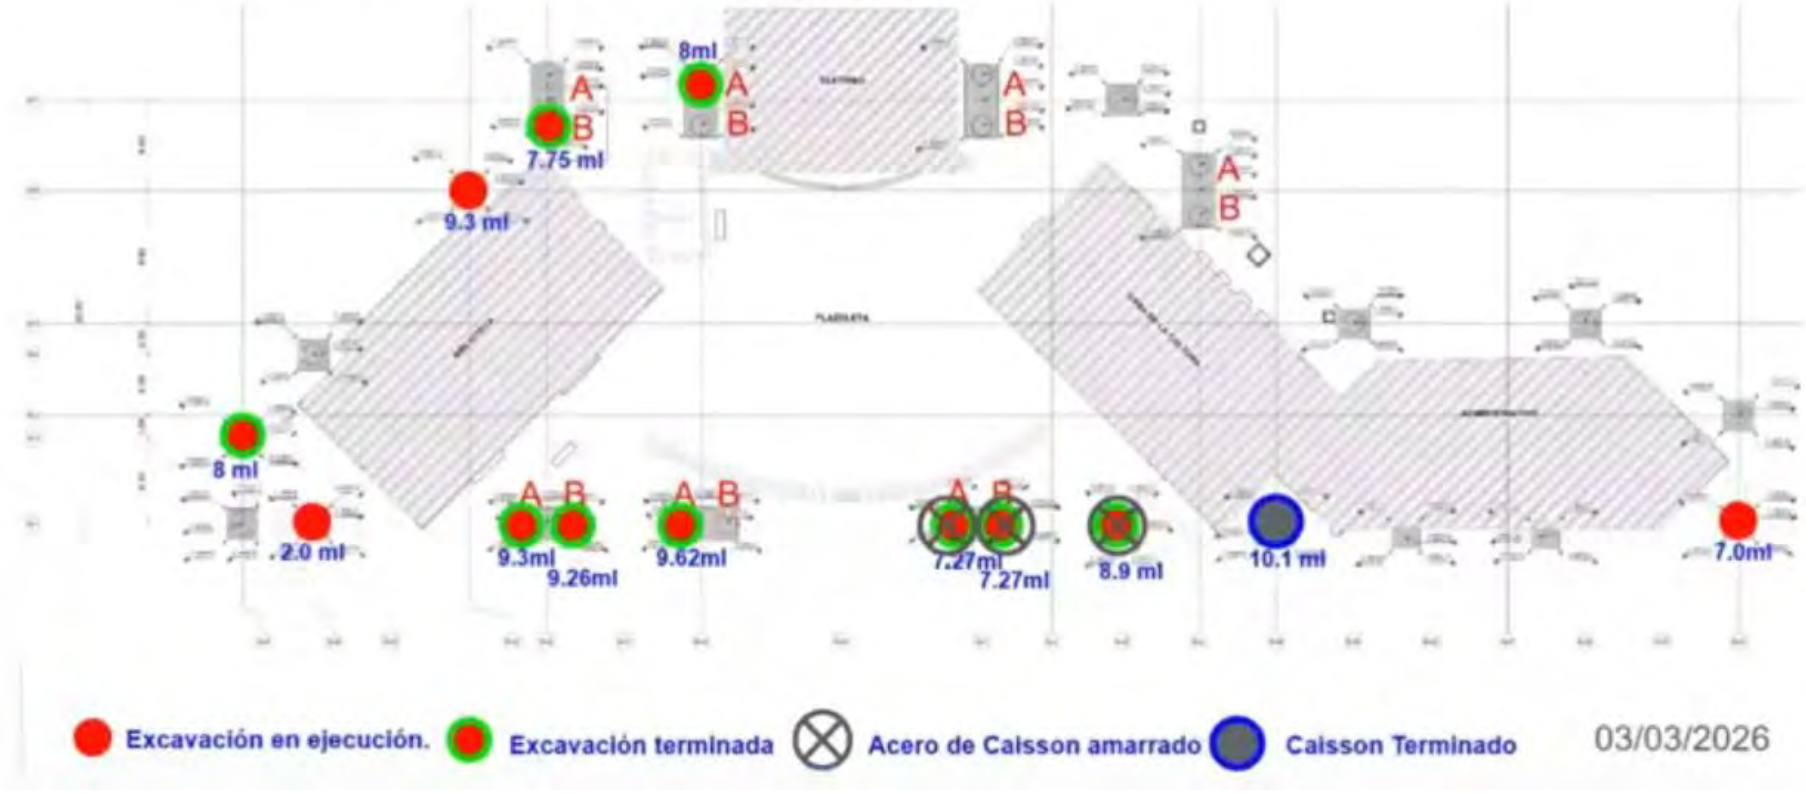

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Componente social	
	- Se ha dado continuidad los viernes y no se ha presentado personas para atención al público. - Está a la espera del acta de vecindad del andén del complejo Casa de la Cultura. - Se realizó Charla a personal el día 27 de febrero sobre trabajo en equipo. - Se ha realizado actualización de registro fotográfico pendiente para la actualización de actas de vecindad. - Actualización de valla informativa.
Componente SSTMA	
	Por parte de la Interventoría indica: - Se han cumplido los compromisos adquiridos por parte del Contratista con referencia a la verificación de la documentación, recorridos, verificación de señalización, reubicación de punto ecológico y en general de todo lo requerido. - ha reubicado el punto de primeros auxilios y extintor que estaba expuesto al clima externo. - Se ha reorganizado la entrega de información de personal que ingresa a la obra. - Se están realizando capacitaciones.
Área Técnica	
	Se informa la situación presentada por el cierre de vía en el sector del Gallinero que ha generado la pérdida de días para la fundición de concretos, en la primera fundida del día anterior uno de los caissons no puso ser fundido en su totalidad debido a que con el cierre de la vía, de los tres carros de transporte de concreto uno de ellos no pudo llegar, razón por la cual se deberá tener en cuenta la inclusión de puente de adherencia en atención a que se deberá fundir tan pronto se pueda solucionar el tema de circulación de vehículos. Lo anterior se considera situación imprevisible y que se sale del control del Contratista y que representa atrasos en las actividades programadas en obra, ya que el día de hoy sigue el cierre y no se sabe cuando se hará la apertura de la vía.
	La entidad solicita que dentro del informe semanal de interventoría se dejen reportados todas las situaciones que se han tenido en obra por factores externos. El Contratista informa que radicó oficio informando la situación que se ha presentado por cierre de vía y sus implicaciones. Así mismo dentro de bitácora se ha registrado dicha situación.
	Se informa que ya se dio inicio a realizar la instalación de tubería en la casa de la cultura, se desarrolla también la limpieza de la estructura metálica con todo lo requerido de acuerdo al ítem, así mismo se revisó el edifico administrativo ya que se tienen inundaciones continúas y se ha evidenciado que las mismas se producen por la zona de terraza y afectan el edificio, ya se ha realizado en varias oportunidades la limpieza del edificio, por lo que se deberán tener en cuenta para la toma de decisiones.
	Se informa de la visita por parte del especialista Juan David Hurtado por parte del Ministerio, posteriormente visita por parte del geotecnista por parte del Contratista, el día de la visita por parte del especialista Juan David hace apreciaciones con respecto a la viabilidad para realizar el terraceo, sin embargo se considera importante revisar la propuesta.
	Por parte del contratista el residente de obra, el Ing. Galdino, habla sobre las recomendaciones que hizo el Especialista de Geotecnia, sobre el talud de la parte posterior del edificio. Se habla especialmente del Caisson 19 para el manejo del respectivo y por otro lado se recomendó la ejecución de los anillos para protección de las excavaciones para la seguridad de los trabajadores, se realizaron recomendaciones adicionales que fueron transmitidas a la interventoría junto con los perfiles transversales elaborados por el Contratista para su respectivo análisis. Por parte de la interventoría si se recibieron y se manifiesta que dentro de las recomendaciones esta la proyección de un muro de contención, así mismo se informa que se estuvo de acuerdo con la ejecución de los anillos "falsos" por temas de seguridad, para lo demás se están analizando con los especialistas y contemplando para dar continuidad con la excavación de los Caissons de la parte posterior de la casa de la cultura, y se lleve el terraceo respectivo de la parte posterior de la casa de la cultura.
	El Contratista solicita dar prioridad a la toma de decisiones para la ejecución de las actividades en esta zona, toda vez que la maquinaria dispuesta para esa actividad no tiene otras actividades programadas y eso significaría detener las actividades esperando la definición, así mismo el personal dispuesto para excavación de caissons es independiente del personal de armado de acero y en este momento ya prácticamente se finalizaron las actividades de los demás caissons.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co


	El Ing. Juan David, indica hacer un terraceo y excavaciones a 45° - Indica que evidencia una gran longitud de muro que no estaba contemplada, y ver posibilidades soluciones que alteren la cronología del proyecto, es importante revisar entre los especialistas.
	En atención a lo anterior, se coordina reunión entre especialistas de Geotecnia y estructurales para la toma de decisión con respecto al terraceo y muro a plantear en parte posterior de la edificación, para hoy en horas de la tarde, entre especialista de la supervisión, contratista e interventoría y el día de mañana con la Arquitecta Juliana Ramírez supervisora del Contrato para finalizar la toma de decisiones y se solicita por parte del Ministerio no avanzar en temas de terraceo hasta después de dicha reunión.
	Por parte de Análisis de precios unitarios de los Nuevos NPs, el Contratista solicita que se haga la revisión de los APU´s remitidos ya que en los mismos se encuentran los contemplados al tema eléctrico los cuales se consideran de manera prioritaria y sobre las filtraciones del edificio administrativo para subsanar dicha situación los nuevos NPs para este sector. Con referencia a las intervenciones del edificio administrativo en terraza se propone por parte del Ministerio realizarlos para el día 11 de marzo de 2026 en sitio con base en la citación que probablemente la Contraloría va a realizar para esa fecha al sitio.
	Se informa por parte de la Interventoría que es posible que el cielo falso por el tema de las filtraciones de agua, se este viendo afectada por las lluvias de para verificar el estado. Adicionalmente en el edificio de danza, se adelanta la estructura para el cielo falso, solo la estructura.
	La interventoría solicita informar cómo van las muestras y resultados de cilindros de concreto, y con referencia de calidad de materiales, el Contratista informa que los mismos ya se remitieron dentro de los informes semanales (Acero, Gravilla, otros).
	Por parte de la Arq. María Fernanda, indica que se realice los muestreos que deben tomar por parte de la interventoría.
Varios	
	Por parte del Contratista indica que, ya se remitió el corte de cantidades y actividades para el corte para revisión, y se consulta como incluir dentro del corte el pago del (PMT) y se consulta por el pago de la optimización de la etapa de la ingeniería de detalle y del anticipo de la adición. El Ministerio manifiesta que a la fecha no se ha aprobado PAC para el pago de dichas cuentas, así mismo revisar el concepto de interventoría como se realizará el cobro del ítem.
	Varios.

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Revisión de NPs por parte de interventoría.	Interventoría	06-Mar-2026
2	Remisión de acta de vecindad de andén por parte del Contratista.	Contratista	
10:30am a 11:40am reunión			Mañana

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Culturas	ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA	Página 1 de 3
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-OPL-014 Versión: 7 Fecha: 06/Oct/2022

Objetivo: Comité de Seguimiento Técnico al Contrato de Obra 4335-2024 – Etapa de Obra		
Responsable: Interventoría	Dependencia: MinCultura	Lugar y Fecha: 19/03/2026 3:40pm Reunión Virtual

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
REPRESENTANTES						
1	María Fernanda Martínez	Apoyo a la Supervisora Contrato	Ministerio de Cultura	3203446422	mmartinezp@mincultura.gov.co	
2	Juliana Ramírez	Coordinadora supervisión de contrato	Ministerio de Cultura			
3	Angélica Perdomo	Representante Legal	Interventoría / Consultores de Occidente			
4	Germán Antonio Parra Rincón	Dir. de interventoría	Interventoría / Consultores de Occidente	3132931257	Interbuenaventura2025@hotmail.com	
5	Gustavo Palacios	Representante Legal	Contratista / Consorcio FP			
6	Nidia Pabón	Director de obra	Contratista / Consorcio FP			
PARTICIPANTES						
7	Jaime José Bastidas	Residente Interventoría	Interventoría / Consultores de Occidente	3225690750	Interbuenaventura2025@hotmail.com	NA
8	Luis Alberto Pasmiño	Inspector de Interventoría	Interventoría / Consultores de Occidente	3175599139	Interbuenaventura2025@hotmail.com	NA
9	Alejandra Reyes	Ministerio de Cultura	Ministerio de Cultura			
10	Mauricio Botón	Profesional de Obra	Contratista / Consorcio FP			
11	Galdino Najera Cera	Residente de obra	Contratista / Consorcio FP	3222364325	proyectos@arqingco.com	NA

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Inicio de comité 03:40 PM
2	Orden del día: 1. Presentación del personal. 2. Solicitud del consorcio por el tema presentado desde el día lunes 16 de marzo en el complejo Casa de la Cultura.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

	3. Varios. 4. Cierre de comité.
COMPONENTE TÉCNICO	
3	Se informa que el día de hoy se presentó una persona realizando registro fotográfico, el cual indicaba que era Periodista, al momento de pedir identificación no accedió a entregar información a que entidad de periodismo pertenece
4	Con base en la alteración del orden público ocurrida el pasado lunes en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Ante estos hechos, esa misma noche se llevó a cabo un comité extraordinario para analizar el ingreso de personas ajenas a la institución. En este contexto, se evaluó la solicitud de suspensión enviada por el contratista. Actualmente, se analizan los diversos factores jurídicos y técnicos necesarios para tomar una decisión al respecto. Cabe resaltar que la ejecución del proyecto se encuentra en un 10% de avance, cifra que supera el cronograma programado originalmente. No obstante, persiste la preocupación manifestada por el personal que se encuentra presente en el territorio y se evidencia luego del hecho menor rendimiento, empezando por la inactividad de la maquinaria.
5	Durante la intervención de la Ing. Nidia, se expuso que en el Consejo de Seguridad se manifestó por las entidades que no pueden garantizar protección total en el sitio, persistiendo el riesgo de nuevos sucesos. La suspensión solicitada es una medida preventiva para gestionar esta crisis sin perjudicar el cumplimiento contractual. Se rechazó lo manifestado por los representantes de la policía en el consejo de seguridad respecto a la percepción de "falta de disposición" por parte del contratista, ya que el cumplimiento de las obligaciones ha sido una muestra total durante toda la ejecución. Una dificultad en el proceso jurídico es que, pese a que se pidió ampliar la denuncia, los involucrados han manifestado su negativa rotunda por temor a su integridad física, lo que representa un hecho real y que el Consorcio no puede obligarles. Se requiere una intervención integral ante las actuaciones de estos grupos.
6	Debido a los recientes incidentes —incluyendo el robo de llaves de la maquinaria y la falta de garantías de seguridad—, el ritmo de la obra se ha visto afectado desde el suceso y en los próximos días. El personal técnico y administrativo ha expresado temor de permanecer en el sitio, por lo que adelantarán sus funciones bajo la modalidad de trabajo en casa en la medida de lo posible. El objetivo es resguardar la seguridad del equipo humano, limitando la presencia en obra solo a lo estrictamente indispensable hasta que se normalicen las condiciones.
7	La interventoría abordó el punto referente a la suspensión temporal solicitada en el oficio, señalando que las entidades de seguridad han limitado su compromiso al acompañamiento mediante rondas diarias. Al respecto, la Ing. Nidia aclaró que dicha medida no garantiza la presencia permanente (24/7) de la fuerza pública en las instalaciones, lo que subraya la vulnerabilidad persistente en el sitio de obra.
8	El contratista manifiesta: ¿Quién asume el riesgo que un momento se presente una situación furtiva?
9	Por parte de la Arq. María Fernanda, queda expreso que ellos van a brindar las solicitudes de seguridad ante los entes pertinentes, sin embargo, El Ministerio no tiene las competencias para que exigir a las entidades competentes de seguridad su permanencia en cada proyecto.
10	El contratista manifiesta que además de hablar de un plazo de suspensión de unos días, es entender que, a la fecha de hoy, ya se nos va a presentar una afectación de 8 días en los que hubo una disminución del rendimiento y que a futuro puede afectar la programación. Ninguna de las partes (interventoría y entidad) está de acuerdo con una suspensión a la fecha, pero si se retoman actividades, y pasan unos días, y posteriormente se repita dicha situación, ¿Qué medidas se van a tomar?
11	La Arq. Juliana Ramírez, manifiesta que todas las partes interesadas están preocupadas e interesadas como las personas que están en obra. Este tema se ha hablado desde las diferentes áreas, en la cual han indicado que las obras de este tipo no se pueden ver afectadas, por eso desde los organismos de articulación ya hay manifestación que esta obra no va a tener afectación y que no se vulnere o se vuelvan a presentar este tipo de situaciones. Manifiesta:
12	Si, se debe gestionar, unas rondas fijas constantes a la casa de la cultura de los diferentes sectores que puedan generar seguridad. Se indiquen los atrasos medidos, de lo que representa en la ejecución de la obra. Se deben reforzar las medidas que estén en la obra, como cámaras alrededor de la fachada, la puerta, asegurar un elemento de seguridad, que la interventoría indique otras medidas que sean necesarias y se remitan las respectivas cotizaciones para el respectivo análisis para la incorporación al contrato.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

	Alejandra Reyes Díaz Abogada de la entidad, manifiesta que dentro de la matriz de riesgo se pueden considerar la adopción de planes de contingencia, como lo hizo el Ministerio informando a las partes para generar la articulación de minimizar este riesgo.
13	El Ing. Galdino, indica que, si se ha generado una reacción inmediata, pero en el tiempo de la inmediatez de un suceso que se puede presentar como lo de la mañana mientras llegan los organismos el suceso ya ha pasado, El Arq. Luis Pasmiño, indica que los medios de seguridad en el día de ayer indicaron que al menos aseguraran una vez al día un recorrido, entonces estos, Se evidencia menos movimiento y que si se ha generado cierta renuencia por las entidades de seguridad.
14	La entidad gestionará nuevamente acompañamiento por parte de las entidades responsables de la seguridad en el Municipio y en el evento de generarse algún suceso adicional que comprometa la integridad de las personas o de bien material se volverá a revisar el tema para evaluar la pertinencia de la solicitud de suspensión al contrato hasta tanto se garantice las condiciones de seguridad para desarrollar el proyecto. Así mismo una vez se vayan a encender nuevamente las máquinas se solicitará un acompañamiento en la jornada.
VARIOS	
	Revisar componente de los atrasos y cuantificar.

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1			
2			
3:30 Pm a 5:10 Pm reunión			Tarde

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Objetivo: Comité de Seguimiento Técnico al Contrato de Obra 4335-2024 – Etapa de Obra		
Responsable: Interventoría	Dependencia: MinCultura	Lugar y Fecha: 27/03/2026 12:30pm Reunión Virtual

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
REPRESENTANTES						
1	María Fernanda Martínez	Apoyo a la Supervisora Contrato	Ministerio de Cultura	3203446422	mmartinezp@mincultura.gov.co	
2	Juliana Ramírez Rodriguez	Coordinadora Supervisión de contrato	Ministerio de Cultura			
3	German Antonio Parra Rincón	Dir. de interventoría	Interventoría / Consultores de Occidente	3132931257	Interbuenaventura2025@hotmail.com	
4	Nidia Pabón Triana	Director de obra	Contratista / Consorcio FP			
PARTICIPANTES						
5	Jaime José Bastidas	Residente Interventoría	Interventoría / Consultores de Occidente	3225690750	Interbuenaventura2025@hotmail.com	NA
6	Luis Alberto Pasmiño	Inspector de Interventoría	Interventoría / Consultores de Occidente	3175599139	Interbuenaventura2025@hotmail.com	NA
7	Galdino Nájera Cera	Residente de obra	Contratista / Consorcio FP	3222364325	proyectos@arqingco.com	NA

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Inicio de comité 12:30 PM
2	Orden del día: 1. Presentación del personal. 2. Información y decisiones de recorrido de obra
Componente Técnico	
3	La Arquitecta María Fernanda da inicio al comité de obra, indica que en sitio se encuentra ella, en compañía de la Arq. Julián Ramírez coordinadora del proyecto, la interventoría y el contratista. Se da inicio indicando que en el recorrido por toda la obra realizado se evidencio que el estado del edificio administrativo se encuentra en un alto desaseo del cual se deben tomar medidas para que el espacio laboral esté en las condiciones de aseo sea óptimas y tomar alguna medida con el perro que se encuentra en el edificio, porque no se puede seguir generando residuos por la alimentación de dicho animal. Se informa que fue el que dejó la empresa de vigilancia anterior.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

4	Se evidencio que todas las alturas de las gradas del edificio administrativo están quedando a diferentes alturas, las cuales deben ser ajustadas por parte del contratista, observando en temas relacionados a la escalera, se evidencio también el tema de la planta elevadora lateral por muro y no aplicaría para esta escalera. El foso indica que más o menos es de 1,80mts y se debe verificar si esta altura es suficiente para garantizar la plataforma elevadora. Porque se estaría proponiendo también un rodaescalera. En relación con la terraza del edificio Administrativo se concertó realizar un enchape, se nivele y se generen los drenajes necesarios y dejar las bajantes por la fachada y construir un poyo para evitar el ingreso del agua el interior del edificio. Otro punto a identificar es la altura libre que hay entre cielo raso y cubierta el cual la idea es reforzar ese perímetro, para evitar que puedan ingresar por esa zona y evitar hasta el ingreso de especies animales. Las condensadoras de los aires que se van a instalar, se propone su instalación en las cuñas de la fachada posterior, y se puedan instalar de una manera lineal y que queden a nivel de piso, el Ministerio va a revisar que los aires se puedan optimizar de acuerdo con la propuesta del diseño para balancear. El tema de los enchapes de los baños se informa que ya no se consigue el mismo color y medidas, se está proponiendo que el formato sea similar y pueda que cambie el color, un color manifestado fue un gris basalto, sin embargo, se revisará en obra junto con Interventoría.
5	Otro punto tratado es que con referencia a lo propuesto de la reunión presencial referente al punto del apoyo 19, el topógrafo de la Alcaldía entregó un informe al Secretario de Planeación, y manifiestan que aún no están con toda la información al interior de la entidad para poder entregar un concepto o una aprobación debido a que el predio ya fue entregado a los delegados del Centro de Memoria Histórica, para un proyecto que se va a realizar en dicho sector del cual se tiene entendido que tiene una cuña en ese sector la cual va ser como una zona en plazoleta o zona de urbanismo. De acuerdo con lo anterior, va a programarse una reunión para el 30 o 31 de marzo con los delegados del Centro de Memoria Histórica, una vez haya claridad se nos informará.
6	En el edificio de la Casa de la Cultura no hubo mayores decisiones por tomar, se identifica que el muro que está en la parte posterior de la Casa de la Cultura, como las cantidades de las demoliciones no están contractualmente, se está de acuerdo que se realice un corte de sección, ampliar un poco para que quede un paso que quede alineado a la puerta que da contra esta área. Y posteriormente que sirva como para sobre éste poder hacer alguna expresión artística. También el Ministerio informa que está trabajando a ver cómo va a quedar el tema del urbanismo.
7	Para el Talud se está pendiente de realizar la nivelación del otro sector, hacia el andén de la casa de la cultura y se solicita que tenga una forma más orgánica, la idea es que posterior al terraceo está pensado dar tratamiento vegetal para cobertura tal como sembrar un maní forrajero, como cubre suelo.
8	La parte posterior del teatrino, donde actualmente hay un filtro, se construya un andén para no generar que crezca vegetación y evite humedad sobre el teatrino y ayude al tema del urbanismo.
9	Para el edificio Biblioteca, se tomaron decisiones en la doble altura, que los antepechos del segundo piso, referente a tema de colores para que queden en gris basalto, para que no se genere tanto el contacto con las personas que dan uso. El Arquitecto Luis Pasmiño de la interventoría hace una intervención del recorrido biblioteca en relación al reparcheo del manto asfaltico en la terraza, el Contratista solicita que sea revisado en cubierta para garantizar que esa intervención sea funcional, el Ministerio menciona que a futuro dicha edificación lleva la cubierta de geomembrana la cual no se seguiría presentando o proyectando afectaciones por filtraciones de lluvia. Se va a revisar si sólo con el reparcheo en las secciones que estén generando filtración se puede intervenir. Retoma la palabra la Arq. María Fernanda, indicando que el cuarto el cual tienen más adelantado, tiene unas ventanas, unas alfajías, el cual tiene una estructura metálica, a la cual le pegaron un dry wall, se solicita se descubra toda la estructura, para que queden unos nichos hacia el interior y quede a la vista. La placa debajo de las escaleras iría en color amarillo y el muro hacia la parte de atrás de la escalera en color gris basalto, en la cubierta del espacio a doble altura se pinte una vez realizada la intervención en cubierta. Adjunto a la presente acta se tiene el plano especificando los colores definidos en los diferentes sectores. Para el auditorio se va a pintar de color gris noche estrellada, y un gris basalto, con referencia al condicionamiento acústico y lo solicitado por el Contratista se va a cambiar la propuesta para que se recubran ciertas zonas, como un concepto modular para el aislamiento acústico de las paredes y el techo si va a quedar cuadrado y con la Ing. Electricista de la entidad se está definiendo el tema de las luminarias a implementar, el cual quieren que sean unas luminarias más ambientales y no como unas luminarias de techo.
10	Con referencia a la subestación la idea es revisar la necesidad de cerrar esas puertas que actualmente se tienen, las de tipo celosía, pero la idea es que la puerta existente se modifique sin embargo, es de revisar si es viable hacerlo de esta forma para el tema de la certificación. Con referencia al tema del transformador están en averiguaciones si la Alcaldía requiere el transformador de 45KVA en algún otro proyecto para lo hablado anteriormente de instalar de una vez el de 75KVA.
Varios	
11	Tema de trasformador de la alcaldía, y los componentes que se trabajaron en la visita de la ingeniería Estela por parte de la entidad supervisora.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

12	El tema del cerramiento, lo está revisando la entidad para que se genere un cerramiento por el área de biblioteca siendo un punto a definir por el Ministerio.

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Se informa que se realizará visita desde el 8 al 10 de Abril de 2026 por parte de la contraloría de la nación	Partes	8 al 10 de abril
2	Se informa que está programado Visita contraloría departamental	Partes	24 de abril
12:30 Pm a 01:10 Pm reunión			Tarde

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Objetivo: Comité Mesa Técnica Definición Apoyo Caisson No. 19		
Responsable: Interventoría	Dependencia: MinCultura	Lugar y Fecha: 31 /03 /2026 3:00pm Reunión Virtual

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
REPRESENTANTES						
1	María Fernanda Martínez	Apoyo a la Supervisora Contrato	Ministerio de Cultura	3203446422	mmartinezp@mincultura.gov.co	
2	German Antonio Parra Rincón	Dir. de interventoría	Interventoría / Consultores de Occidente	3132931257	Interbuenaventura2025@hotmail.com	
3	Nidia Pabón Triana	Director de obra	Contratista / Consorcio FP	3204961371	proyectos@arqingco.com	
PARTICIPANTES						
4	Jaime José Bastidas	Residente Interventoría	Interventoría / Consultores de Occidente	3225690750	Interbuenaventura2025@hotmail.com	NA
5	Galdino Najera	Residente de obra	Contratista / Consorcio FP	3222364325	proyectos@arqingco.com	NA
6	Laura Ines Pelaez	Ministerio de Culta	Viceministra Encargada de Patrimonios			NA
7	Roberto López Mosquera	Representante Legal	Consorcio Memoria Histórica del Pacífico			NA
8	Víctor Leonardo Trujillo	Líder de proyectos	FonBuenaventura			NA
9	Daniel Torres	Arq. Asistente de dirección	FonBuenaventura			NA
10	Cesar Augusto Hurtado		Consorcio Memoria Histórica del Pacífico			NA
11	Adriana Zamora Manyoma	Arquitecta	Alcaldía de Buenaventura-Dirección Técnica de Cultura			NA

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Inicio de comité 03:20 PM
2	Orden del día: 1. Presentación del personal. 2. Socialización del interés de la reunión.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

	Componente membrana Arquitectónica.
3	Se inicia la reunión con la presentación por parte de todos los asistentes.
4	La Arq. María Fernanda manifiesta que se han realizado las siguientes actuaciones: • Gestiones realizadas: Se informó sobre la articulación con la Alcaldía Distrital de Buenaventura para solicitar la intervención de una sección del predio colindante. El objetivo es realizar el perfilamiento del talud, disminuir la presión sobre las estructuras de contención y optimizar los recursos asignados al contrato actual. • Antecedentes: Tras una mesa de trabajo virtual (24 de marzo) con las áreas de Planeación, Cultura y el Despacho de la Alcaldesa, se programó una visita técnica el 27 de marzo para analizar los levantamientos topográficos realizados por el ente territorial. • Estado actual: La Alcaldía condicionó la autorización de la intervención a una coordinación previa con los responsables del proyecto Centro/Archivo de Memoria (derivado de los acuerdos del Paro Cívico) y Fonbuenaventura. • Compromiso: Se establece este espacio de concertación para verificar que el perfilamiento del talud no interfiera con los diseños del nuevo proyecto y así obtener el aval definitivo de la administración distrital.
5	La Arq. Laura Ines Pelaez realiza intervención informando el proceso que se ha llevado y las gestiones realizadas ante el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) • Consulta previa: Se informó sobre el acercamiento realizado con el Centro Nacional de Memoria en el marco de la Mesa SEIDE. • Concepto emitido: El CNMH manifestó que no existe impedimento por su parte para la intervención, aclarando que su rol en el proyecto se centra en el desarrollo de contenidos y memoria, mas no en la ejecución de la obra física. • Competencia técnica: El Centro Nacional de Memoria ratificó que la responsabilidad integral de la obra civil del proyecto (Centro/Archivo de Memoria) recae exclusivamente en Fonbuenaventura. • Conclusión: Con este antecedente, se valida que la coordinación técnica y la obtención del aval para el perfilamiento del talud deben gestionarse directamente con dicha entidad (Fonbuenaventura).
6	La Arquitecta María Fernanda Se cedió la palabra a la Ing. Nidia (Directora de Obra) para exponer los detalles puntuales de la intervención solicitada por el Ministerio. • Análisis de interferencias: El objetivo de la exposición es validar con el equipo de Fonbuenaventura si la propuesta del Ministerio genera algún conflicto con el proyecto del Centro/Archivo de Memoria. • Estado del proyecto Fonbuenaventura: Se precisó por parte de FonBuenaventura que dicho proyecto se encuentra actualmente en una fase inicial de planteamiento para la contratación de la consultoría, lo que permite una coordinación oportuna para evitar dificultades técnicas futuras.
7	La Ing. Nidia inicia indicando el proceso constructivo de la Tensoestructura, muestra un plano en planta donde se ubian las edificaciones existentes que serán cubiertas con la tensoestructura y los capítulos más representativos de dicha obra, informa que el trabajo que ya se ha realizado corresponde a la construcción de los Caisson como cimentación. Indica que sobre los mismos se construirán los dados que se observan en el modelo en pantalla e indica que los apoyos deben ir al mismo nivel ya que conforman pórticos que incluye unos arrostramiento en algunos puntos específicos como lo es el caso del Caisson 1 y Caisson 19, actualmente presentan una diferencia de nivel entre los dos apoyos de aproximadamente 2m y se necesita contemplar unas estructuras de contención que la idea es que sea optimizado logrando las mínimas posibles para reducir el impacto presupuestal al proyecto por lo que se ha considerado bajo la asesoría de los profesionales en geotecnia, se pueda manejar un perfilado de taludes a 45° para que las dimensiones de la pendiente, sean las mínimas posibles, por lo cual, se propone un perfilado de 6 ml lineales y una altura de 5 metros, aproximadamente, por lo cual este talud tendría que abarcar parte del predio contiguo al apoyo, es decir por dentro del predio inmediato, a pesar que tanto el apoyo como la contención se ubicarían dentro del predio de la Casa de la Cultura según línea de paramento entregada por la Alcaldía de Buenaventura.
8	Adicionalmente se solicita evaluar la posibilidad de demolición de unas estructuras que se identificaron como construcciones sin uso aparente en el sector del talud del predio contiguo. Se solicita evaluar su demolición, argumentando que estas estructuras generan una carga de peso innecesaria ya que no se observa ningún uso de estas y afectan la estabilidad de la zona, lo anterior siempre y cuando no existan restricciones legales o técnicas adicionales.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co


9	El señor Víctor Trujillo informó sobre la existencia de un anteproyecto arquitectónico del Centro de Memoria Histórica, producto de un proceso de construcción social. Considera que es necesario verificar si dicho diseño contempla las terrazas actuales y si el perfilamiento solicitado interfiere con la propuesta original. Propone realizar una reunión de seguimiento el próximo lunes con la participación del contratista de consultoría (representado por el Sr. Roberto), el contratista de obra de la Casa de la Cultura y el equipo del Fondo. El objetivo es revisar planos y la información preliminar disponible. Se considera que la decisión final debe tomarse tras una visita al terreno, ya que la consultoría aún no ha iniciado formalmente la etapa de revisión de información y sensibilización con los actores. El contratista deberá evaluar si el perfilamiento del talud requerido por la obra contigua afecta la viabilidad del anteproyecto dispuesto para el Centro de Memoria Histórica.
10	El señor Roberto López manifiesta que se identificó que la ficha catastral (lote de 20x20 metros) no coincide con las áreas concertadas previamente con las comunidades y actores sociales durante la etapa precontractual, pero al no haberse realizado aún el trabajo de campo, no hay claridad sobre los linderos legales cedidos por Planeación Municipal, lo que genera incertidumbre sobre posibles traslapes con la obra de la Casa de la Cultura. Se requiere una verificación técnica en sitio, "documentos en mano" y mediante coordenadas, para determinar si es necesario ajustar la ubicación del proyecto sin invadir predios no adjudicados. Cualquier ajuste o acuerdo sobre la ubicación definitiva deberá ser validado y autorizado por la Administración Municipal.
11	Se realice las validaciones por los profesionales de los diferentes participantes para realizar la reunión del día lunes en sitio, 2:30pm, se confirman por las partes y se acuerda realizar las verificaciones para esa fecha en sitio.
Varios	

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	LUNES VISITA EN SITIO PARA REVISIÓN DE APOYO A LAS 2:30 PM	FonBuenaventura – Interventoría - Contratista	06/04/2026 a las 2:30PM
3:20 pm a 4:00 pm reunión			Tarde

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

AYUDA DE MEMORIA
MESA DE TRABAJO TÉCNICA VIRTUAL
APOYO 19 DE LA MEMBRANA ARQUITECTÓNICA
24 DE MARZO DE 2026

El 24 de marzo de 2026 se adelantó reunión virtual convocada por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el fin de exponer la solicitud elevada a la Administración Distrital el 11 de marzo de 2026, como consta en la siguiente imagen:

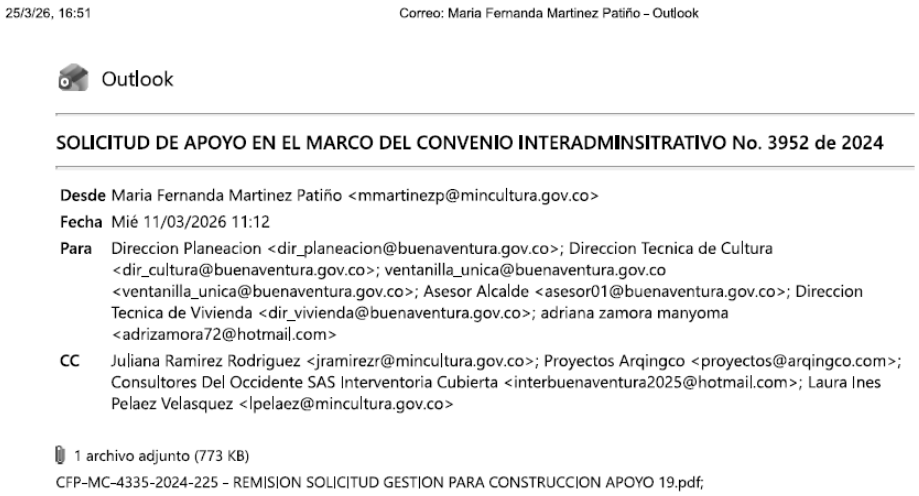

25/3/26, 16:51 Correo: Maria Fernanda Martinez Patiño – Outlook

Outlook

SOLICITUD DE APOYO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO No. 3952 de 2024

Desde Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co>
Fecha Mié 11/03/2026 11:12
Para Direccion Planeacion <dir_planeacion@buenaventura.gov.co>; Direccion Tecnica de Cultura <dir_cultura@buenaventura.gov.co>; ventanilla_unica@buenaventura.gov.co <ventanilla_unica@buenaventura.gov.co>; Asesor Alcalde <asesor01@buenaventura.gov.co>; Direccion Tecnica de Vivienda <dir_vivienda@buenaventura.gov.co>; adriana zamora manyoma <adrizamora72@hotmail.com>
CC Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>; Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>; Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>; Laura Ines Pelaez Velasquez <lpelaez@mincultura.gov.co>

1 archivo adjunto (773 KB)
CFP-MC-4335-2024-225 – REMISION SOLICITUD GESTION PARA CONSTRUCCION APOYO 19.pdf;

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento en el marco del convenio del asunto, este ministerio adelantó la contratación de las actividades relacionadas con la construcción de la membrana arquitectónica de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado. Es así como en el marco de la ejecución del contrato de obra No. 4335 de 2024, suscrito por este Ministerio, se adelantan actualmente las actividades de construcción de la cimentación que soportará la membrana arquitectónica.

De acuerdo con lo anterior, se presenta situación que dificulta la construcción de uno de los caisson, por lo que de manera atenta solicitamos evaluar la posibilidad de autorizar intervención en el previo contiguo, de acuerdo con lo descrito en el oficio adjunto.

Es así como remitimos el oficio, y solicitamos adelantar mesa de trabajo virtual (podría ser el día viernes), para las aclaraciones que se requieran, de acuerdo con la información enviada.


Así mismo, con el fin de que se presentaras las observaciones y/o solicitudes de aclaración por parte del Distrito de Buenaventura, para la verificación frente a la solicitud elevada por el Ministerio, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 3952 de 2024, que tiene por objeto: *"Aunar esfuerzos, administrativos, técnicos, logísticos, jurídicos y financieros para llevar a cabo las obras de adecuación, mantenimiento y terminación (fase III) para la puesta en funcionamiento la Casa de la Cultura Margarita Hurtado en el distrito de Buenaventura, del departamento del Valle del Cauca"*.

Partes convocadas:

1. Representantes del Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
2. Dirección Técnica de Cultura de la Alcaldía Distrital de Buenaventura
3. Dirección Técnica de Vivienda de la Alcaldía Distrital de Buenaventura
4. Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía Distrital de Buenaventura
5. Asesor Despacho de la señora Alcaldesa
6. Consorcio FP, contratista de obra a cargo de la ejecución del contrato de obra No. 4335 de 2024
7. Consultores del Occidente SAS, interventor a cargo de realizar seguimiento y control al contrato de obra No. 4335 de 2024

Asistentes:

Culturas

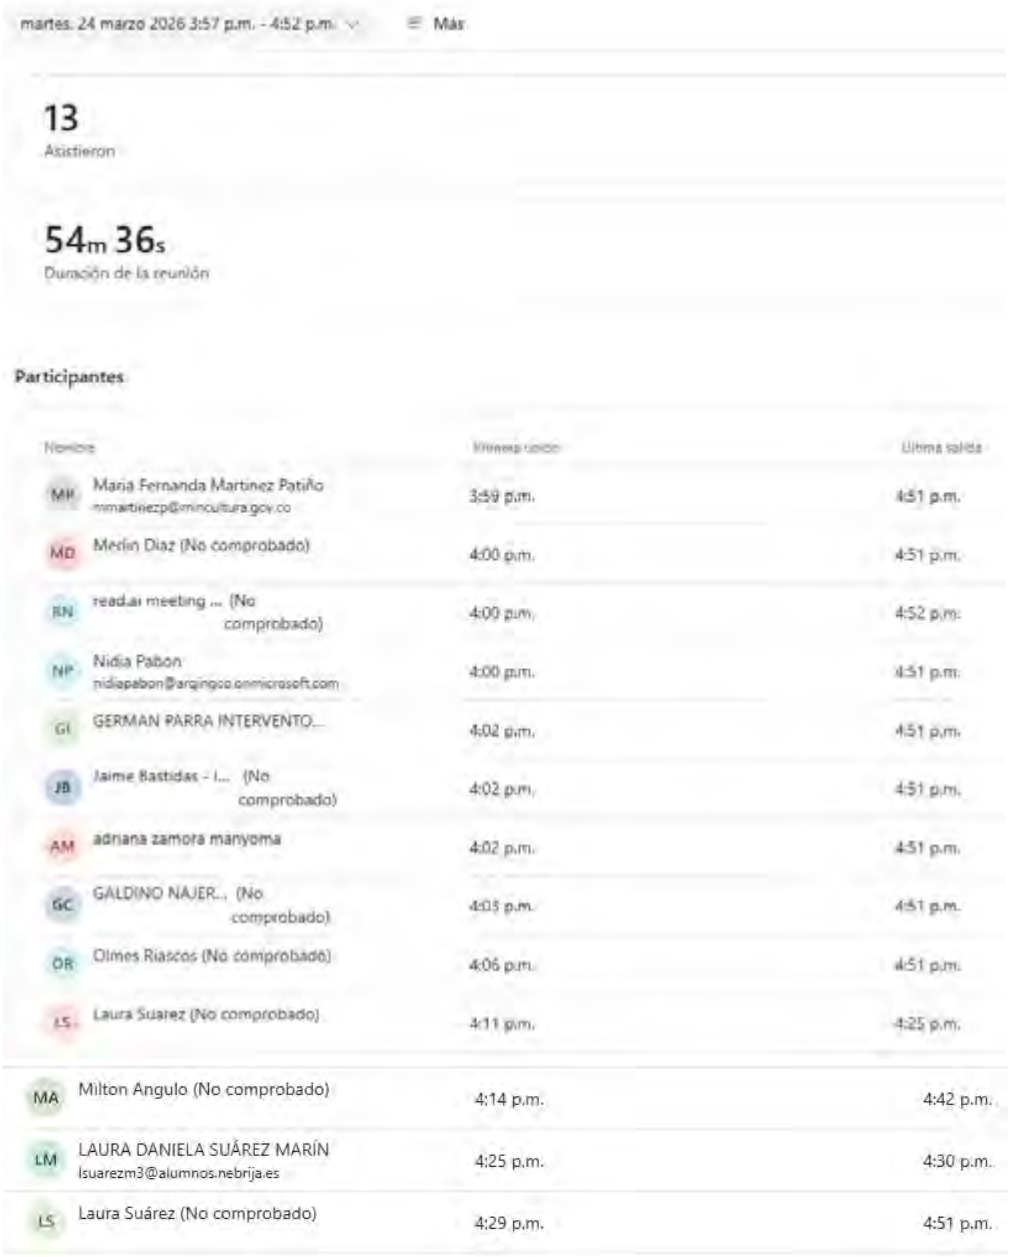
martes, 24 marzo 2026 3:57 p.m. - 4:52 p.m. Más

13
Asistieron

54m 36s
Duración de la reunión

Participantes


Nombre	Primera unión	Última salida
María Fernanda Martínez Patiño mmartinezp@mincultura.gov.co	3:59 p.m.	4:51 p.m.
Merlin Diaz (No comprobado)	4:00 p.m.	4:51 p.m.
readai meeting ... (No comprobado)	4:00 p.m.	4:52 p.m.
Nidia Pabon nidiapabon@arqingco.onmicrosoft.com	4:00 p.m.	4:51 p.m.
GERMAN PARRA INTERVENTO...	4:02 p.m.	4:51 p.m.
Jaime Bastidas - I... (No comprobado)	4:02 p.m.	4:51 p.m.
adriana zamora manyoma	4:02 p.m.	4:51 p.m.
GALDINO NAJER... (No comprobado)	4:03 p.m.	4:51 p.m.
Olmes Riascos (No comprobado)	4:06 p.m.	4:51 p.m.
Laura Suarez (No comprobado)	4:11 p.m.	4:25 p.m.
Milton Angulo (No comprobado)	4:14 p.m.	4:42 p.m.
LAURA DANIELA SUÁREZ MARÍN lsuarezm3@alumnos.nebrija.es	4:25 p.m.	4:30 p.m.
Laura Suárez (No comprobado)	4:29 p.m.	4:51 p.m.

Temas tratados:


1. Inicia intervención el Ministerio de las Culturas, señalando que la fase de construcción del proyecto de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado inició en el mes de febrero de 2026, encontrándose actualmente en ejecución las actividades de cimentación de la membrana arquitectónica que cubre

las edificaciones que componen el complejo cultural, acorde con la licencia de construcción tramitada.


2. Se recuerda a las partes, que en el marco del contrato de obra No. 4335 de 2024, suscrito por el Ministerio, en el marco de los compromisos establecidos en el Convenio Interadministrativo No. 3952 de 2024, se estableció como parte del alcance la ejecución de una ingeniería de detalle a los diseños de la membrana arquitectónica, con el fin de realizar las definiciones, ajustes y complementos requeridos previo a la construcción de la misma.
3. Derivado del ejercicio anterior, además se realizó una optimización de la ingeniería de detalle incluyendo un arriostramiento a la estructura en aras de bajar los pesos y dimensiones del sistema estructural, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80, toda vez que el cierre presupuestal era superior al valor máximo permitido para realizar la adición.
4. Producto del ejercicio de optimización, se obtuvo el balance presupuestal con las actividades y cantidades requeridas no solo para la construcción de la membrana arquitectónica, si no también para la ejecución de las reparaciones locativas requeridas para el correcto funcionamiento de las edificaciones que componen el complejo cultural, de acuerdo con el diagnóstico e ingeniería de detalle adelantada.
5. De acuerdo con lo anterior, el contratista de obra realizo el replanteo y localización de la estructura, derivado de lo cual se remitió el 11 de marzo de 2026 vía correo electrónico, solicitud a la Dirección Técnica de Cultura, a la Oficina de Planeación y al despacho de la señora alcaldesa, de autorización para realizar perfilado en el predio vecino (propiedad de la Alcaldía Distrital) que permita reducir el nivel actual del sector contiguo al apoyo 19 y en este sentido reducir los costos que se requerirían para la construcción de un muro de contención de mayores dimensiones, en el marco del objeto del precitado convenio, por medio del cual este Ministerio y la Alcaldía Distrital aúnan esfuerzos para la culminación de este proyecto.
6. Es así como se concede el uso de la palabra a la Directora de Obra, para que realice la explicación técnica, de la autorización que se esta solicitando, quien inicia su intervención explicando como esta conformada la estructura de la membrana arquitectónica y la localización del apoyo 19, objeto de revisión en la presente mesa de trabajo, el cual se encuentra resaltado en color rojo en la imagen proyectada:

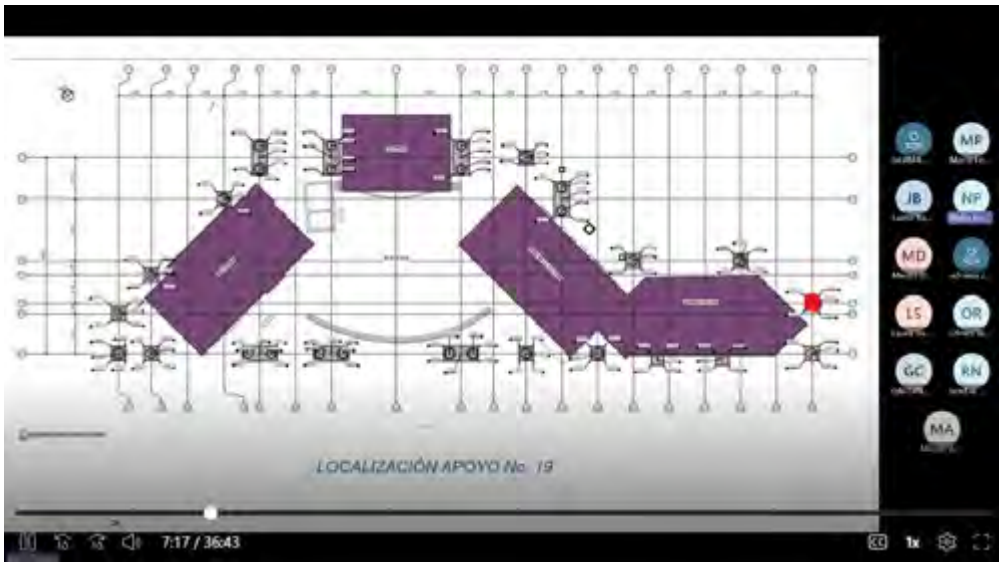


7. Indica que el residente de obra notificó que se adelantó visita el día de hoy por parte de la comisión topográfica de la alcaldía, con el objetivo de verificar en sitio la solicitud puntual que se está realizando por parte del Consorcio FP.
8. Continúa señalando que como se indicó previamente por parte del Ministerio, la estructura cuenta con un arriostramiento, para lo cual se requiere que el apoyo 19 se encuentre al mismo nivel del apoyo 1, como se muestra a continuación:

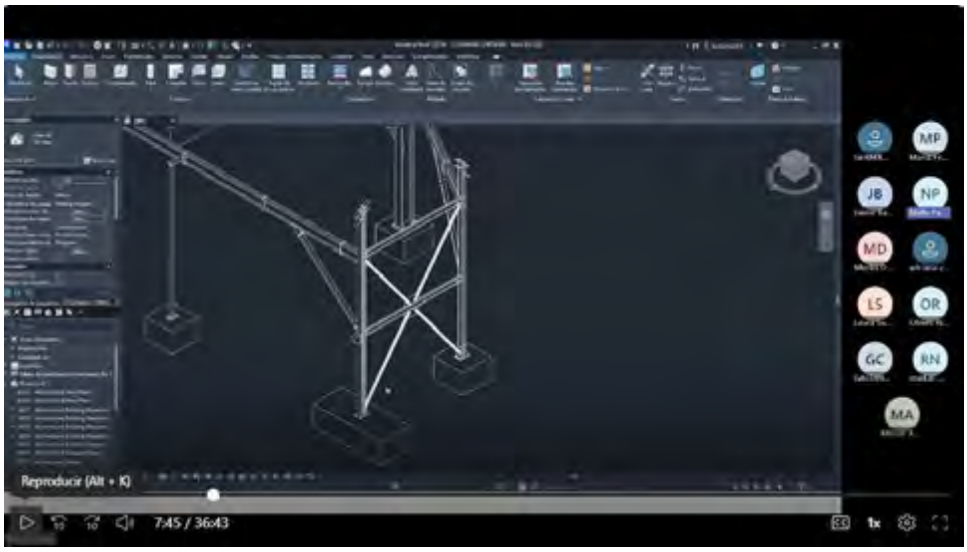


9. Actualmente la diferencia de nivel de terreno entre estos dos apoyos es de aproximadamente 2 metros, por lo cual se requiere intervención para bajar el nivel y para que la estructura metálica no quede enterrada, lo cual no es conveniente para la vida útil del elemento estructural.
10. Es así como en la búsqueda de las alternativas de solución para este apoyo, se hizo el levantamiento de los perfiles topográficos y la definición de polígono de intervención, de acuerdo con la línea de paramento que fue suministrada por la Alcaldía Distrital, la cual se puede evidenciar en color azul en la siguiente imagen:

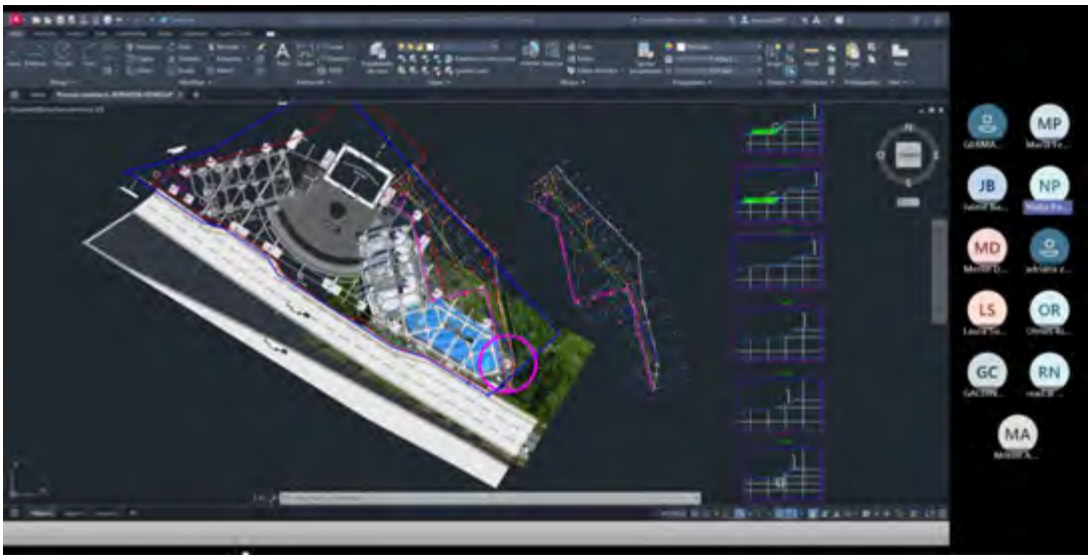

11. Si bien, el apoyo 19 tiene un área aferente que estaría dentro del polígono de intervención del predio de la Casa de la Cultura, hay un área que se encuentra en el predio contiguo sobre la cual se requeriría una intervención para realizar perfilamiento a 45°, de acuerdo con las recomendaciones del estudio de suelos, lo que significa que se requiere realizar una excavación para remover todo este material, con el fin de llegar al nivel que se necesita para la construcción del apoyo 19, como se evidencia en la siguiente imagen:

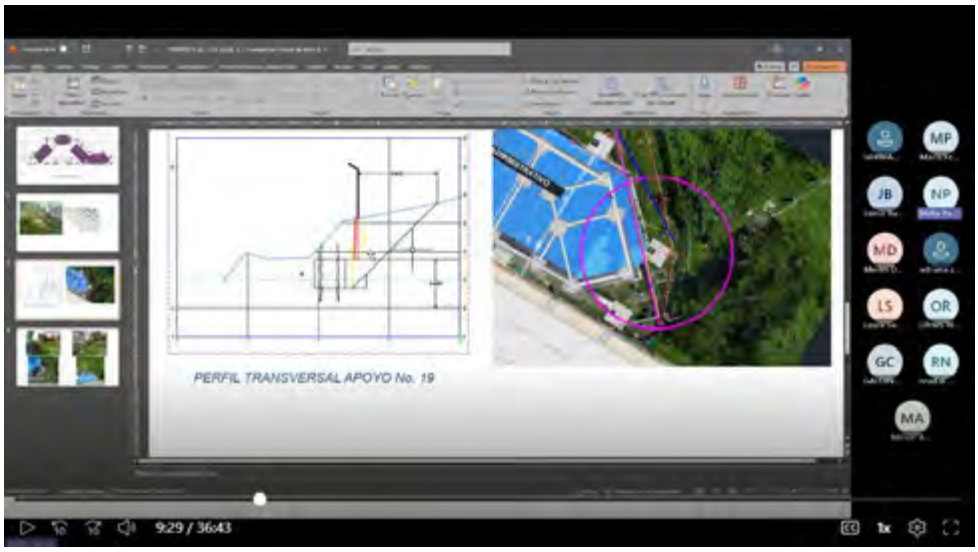

12. Lo anterior se plantea con el propósito de poder optimizar costos en el proyecto, ya que como se indicó por parte del Ministerio, el tema presupuestal es bastante limitado actualmente, por lo cual a través de esta alternativa se podrían reducir las dimensiones de la contención requerida.
13. Como se puede ver se requiere una intervención desde el actual cerramiento de aproximadamente 6 metros. Añade la Directora de obra que contiguo al cerramiento, existen unas estructuras cuyo origen no es conocido.

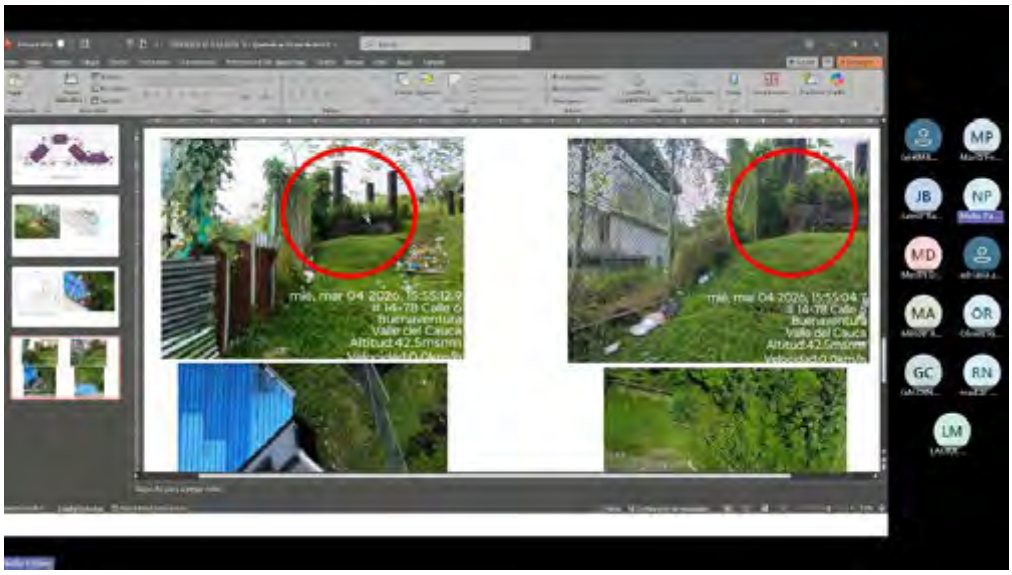

14. Por lo anterior, señala que sería bueno considerar la demolición de estas estructuras, toda vez que actualmente no se les esta dando ningún uso, pero generan carga al talud.
15. Por último, indica que, si bien a la fecha ya se encuentra construido el caissons del apoyo 19, las definiciones que se requieren en desarrollo de esta mesa de trabajo son requeridas para la construcción del dado.
16. Pide el uso de la palabra el jefe de la Oficina de Planeación del Distrito, quien indica que solicitará el informe al equipo de topografía que estuvo en el predio el día de hoy, de acuerdo con lo informado por el contratista de obra, en aras de contar con toda la información requerida para la toma de decisiones por parte del Distrito. Recalca que en el marco de las situaciones que se han presentado en desarrollo de este proyecto, desde el Distrito se ha hecho que técnicamente ha sido necesario para garantizar las condiciones de viabilidad del proyecto.
17. Informa que los predios colindantes a la fecha se encuentran comprometidos por parte del Distrito para el desarrollo de otros proyectos, por lo cual es requerido verificar la información que se entregue por parte del equipo de topografía para que no se presenten interferencias con las proyecciones actuales.
18. Culmina la intervención el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, indicando que por motivos de agenda, espera poder revisar el informe que se presente por los topógrafos el día jueves 26 de marzo de 2026, y posteriormente se comunicará el análisis al Ministerio, como respuesta al requerimiento del 11 de marzo de 2026.

19. De acuerdo con lo anterior, desde el Ministerio se informa que el 26 y 27 de marzo de 2026 se desarrollará comisión a Buenaventura, para seguimiento a este proyecto, por lo cual se propone adelantar mesa de trabajo el viernes en la mañana, en aras de que se adelanten las verificaciones necesarias.

Compromisos:

1. Adelantar mesa de trabajo presencial el 27 de marzo de 2026, para que se realice revisión previa por parte de la Oficina Asesora de Planeación del Distrito.

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-213 - REMISION CONCEPTO GEOTECNICO VISITA

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 2 de marzo de 2026 a las 19:07
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>
Cc: Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Buen día,

Nos permtimos remitir la información en asunto para los fines pertinentes.

Att CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

4 adjuntos

- **CFP-MC-4335-2024-213 - REMISION CONCEPTO GEOTECNICO VISITA.pdf** 246K
- **Proceso constructivo posterior Casa_2 de 2.pdf** 306K
- **Oficio 027-2026 Consorcio FP, Gustavo Palacios - Scala (Concepto Visita al Proyecto Buenaventura) v1.pdf** 1174K
- **Proceso constructivo posterior Casa_1 de 2.pdf** 1233K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-214 - REMISION CUENTA No. 3 OBRA No. 1

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 2 de marzo de 2026 a las 19:27
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>

Buen día,

Nos permtimos remitir la información en asunto para los fines pertinentes.

Att CONSORCIO FP

CUENTA No. 3 OBRA 1.pdf

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

CFP-MC-4335-2024-214 - REMISION CUENTA No. 3 OBRA No. 1.pdf
247K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-215 - REMISION INFORME DE INSPECCION PRELIMINAR ANTES DE INICIO DE OBRA

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 2 de marzo de 2026 a las 19:54
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Buen día,

Nos permtimos remitir la información en asunto para los fines pertinentes.

Att CONSORCIO FP

REG FOTOGRAFICO.zip

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

6 adjuntos

EDIFICIO CASA CULTURA.pdf
281K

EDIFICIO ADMINISTRATIVO.pdf
301K

EDIFICIO TEATRINO.pdf
359K

EDIFICIO BIBLIOTECA.pdf
593K

EXTERIORES.pdf
485K

CFP-MC-4335-2024-215 - REMISION INFORME DE INSPECCION PRELIMINAR ANTES DE INICIO DE OBRA.pdf
243K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-216 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 3 de marzo de 2026 a las 15:04
Para: jasminangulo3@yahoo.es, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, sisosimonbolivar@gmail.com

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

3 adjuntos

- **CFP-MC-4335-2024-216 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL.pdf** 255K
- **DOCUMENTOS DANIEL SALAZAR CORTES.pdf** 1369K
- **DOCUMENTOS COMPLETOS VICTOR RUBIANO IMBACHI.pdf** 1685K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-216 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL

Yenny Renteria Landazuri <sisosimonbolivar@gmail.com> 4 de marzo de 2026 a las 9:29
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Buen dia. Verificando la documentación enviada del personal que ingresa por la empresa Ferroconstrucciones,.S.A.S., se verifica que falta el certificado de pensión del señor Daniel Salazar Cortes. Adjuntar este documento.

Atentamente,

YENNY RENTERIA LANDAZURI
SISOMA Interventoria.

El mar, 3 mar 2026 a las 15:05, Proyectos Arqingco (<proyectos@arqingco.com>) escribió:

> Buen día
>
> Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.
>
> CONSORCIO FP
>
> --

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-217 - REMISION ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 3 de marzo de 2026 a las 16:18
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>

Buen día,

Nos permtimos remitir la información en asunto para los fines pertinentes.

Att CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

2 adjuntos

NP-C4335-2024-MINCULTURA-TENSO-OBRA-V1.xlsx
1042K

CFP-MC-4335-2024-217 - REMISION ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS.pdf
247K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-218- REMISION INFORME SEMANAL 34

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 3 de marzo de 2026 a las 19:13
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

2 adjuntos

CFP-MC-4335-2024-218- REMISION INFORME SEMANAL 34 23-28 FEB 2026.pdf
249K

INFORME SEMANAL NUMERO 34 DEL 23 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO.pdf
9902K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-219- INCONVENIENTES EN EJECUCIÓN DE OBRA POR CIERRE DE VIA

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 4 de marzo de 2026 a las 9:42
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

CFP-MC-4335-2024-219- INCONVENIENTES EN EJECUCIÓN DE OBRA POR CIERRE DE VIA.pdf
691K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-220 - REMISION RESULTADOS ENSAYOS DE COMPRESION

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 4 de marzo de 2026 a las 12:09
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Buen día,

Nos permtimos remitir la información en asunto para los fines pertinentes.

Att CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

2 adjuntos

CFP-MC-4335-2024-220 - REMISION RESULTADOS ENSAYOS DE COMPRESION.pdf
247K

1 - 27903.pdf
188K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-221 - REMISION DOCUMENTOS VOLQUETA

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 4 de marzo de 2026 a las 17:29
Para: jasminangulo3@yahoo.es, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, sisosimonbolivar@gmail.com

Buen día,

Nos permtimos remitir la información en asunto para los fines pertinentes.

Att CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

2 adjuntos

CFP-MC-4335-2024-221 - REMISION DOCUMENTOS VOLQUETA.pdf
256K

VOLQUETA.zip
789K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-221 - REMISION DOCUMENTOS VOLQUETAS

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 4 de marzo de 2026 a las 17:18
Para: jasminangulo3@yahoo.es, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, sisosimonbolivar@gmail.com

Buen día,

Nos permtimos remitir la información en asunto para los fines pertinentes.

Att CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

2 adjuntos

VOLQUETAS.zip
1263K

CFP-MC-4335-2024-221 - REMISION DOCUMENTOS VOLQUETAS.pdf
259K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

MESA DE TRABAJO MH

1 mensaje

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 4 de marzo de 2026 a las 11:12
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Juan David Hurtado Bernal <jhurtado@mincultura.gov.co>, Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/24892856999977?p=P2anWRBegqrNbsJgei

Id. de reunión: 248 928 569 999 77

Código de acceso: S8rS3t6B

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

invite.ics
5K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-213 - REMISION CONCEPTO GEOTECNICO VISITA

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 5 de marzo de 2026 a las 14:13
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>
Cc: Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Buen día

Con base en las reuniones del 4 de marzo con los especialistas de geotecnia y estructura de las partes y la reunión del 5 de marzo con la supervisión, adjuntamos las secciones transversales propuestas para la zona posterior de la casa de la cultura.

Quedamos atentos.

CONSORCIO FP

El lun, 2 mar 2026 a las 19:07, Proyectos Arqingco (<proyectos@arqingco.com>) escribió:

> Buen día,
>
> Nos permtimos remitir la información en asunto para los fines pertinentes.
>
> Att CONSORCIO FP
>
> --

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

Proceso constructivo posterior Casa - PROPUESTA 20260304.dwg
1252K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-214 - REMISION CUENTA No. 3 OBRA No. 1

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 5 de marzo de 2026 a las 20:41
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>

Buen día

Adjunto el corte de obra, con las observaciones realizadas, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

CUENTA No. 3 OBRA 1 v1.pdf

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

[El texto citado está oculto]

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-222 - REMISION INFORME MENSUAL No. 3

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 5 de marzo de 2026 a las 20:41
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

ANEXOS SSTMA.zip

ANEXOS.zip

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

4 adjuntos

CFP-MC-4335-2024-222 - REMISION INFORME MENSUAL No. 3.pdf
257K

CFP-MC-4335_INFORME MENSUAL_SSTMA_ MES DE FEBRERO.pdf
2243K

INFORME MENSUAL SOCIAL No. 1 - DEL 2 DEL FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 111.pdf
1036K

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 8 (01 Febrero_28 Febrero)_V0.pdf
12475K

Bogotá D.C., 6 de marzo de 2026

Señores
CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S
Profesional Yenny Rentería
Profesional SST
Interventor
Bogotá D. C.

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No. 4335-2024**
"EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD DOCUMENTOS SEGÚN CORREO DEL 4 DE MARZO DE 2026

Cordial saludo:

En atención a la solicitud realizada por la interventoría, me permito informar que la información correspondiente a los protocolos de seguridad industrial aplicados en la obra, se encuentran contenidos dentro del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se encuentra entregado y aprobado por la Interventoría.

Los protocolos de seguridad industrial aplicados en la obra se refieren al conjunto de normas, procedimientos y medidas preventivas que se implementan en el proyecto de construcción con el fin de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, visitantes y del entorno durante la ejecución de las diferentes actividades.

Estos protocolos hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y tienen como objetivo prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y situaciones de emergencia que puedan presentarse durante el desarrollo de la obra.

Dentro de los principales protocolos implementados se encuentran los siguientes:

1. **Uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP):**
Utilización de casco, botas de seguridad, guantes, gafas de protección, chaleco reflectivo, entre otros, de acuerdo con la actividad desarrollada.

2. **Protocolos de ingreso a obra:**
Verificación de afiliación al sistema de seguridad social, inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y registro de ingreso del personal.

3. **Señalización y demarcación de áreas:**
Identificación de zonas de riesgo, rutas de evacuación, áreas restringidas y señalización preventiva dentro del área de trabajo.

Recibido Yenny 6/3/26 Hora: 11:53 am.

Powered by CamScanner

4. **Trabajo seguro en actividades de alto riesgo:**
Aplicación de procedimientos para labores como trabajo en alturas, manejo de herramientas eléctricas, excavaciones e izaje de cargas.

5. **Plan de emergencias y brigadas de emergencia:**
Protocolos de actuación en caso de incendios, accidentes, sismos u otras situaciones de emergencia que puedan presentarse en la obra.

6. **Inspecciones de seguridad:**
Revisión periódica de equipos, herramientas, extintores, botiquines y condiciones generales del sitio de trabajo.

7. **Charlas de seguridad y capacitaciones:**
Espacios de sensibilización dirigidos al personal de obra con el fin de fortalecer el conocimiento de los riesgos y las medidas de prevención.

En términos generales, estos protocolos corresponden a las reglas y procedimientos de seguridad que se están implementando en la obra, y que deben cumplir todas las personas que ingresan a la obra, con el propósito de garantizar un ambiente de trabajo seguro y prevenir la ocurrencia de accidentes, de los cuales se presenta la evidencia dentro del respectivo informe SST, ya remitido previamente.

Con referencia al segundo punto, me permito informar que el manejo de escombros, residuos y aspectos ambientales en la obra, están contenidos dentro del Plan de Manejo Ambiental y RCD´s el cuál se encuentra debidamente aprobado y se viene realizando conforme a la normativa vigente y a los lineamientos establecidos para este tipo de proyectos.

Así mismo, se informa que las evidencias y soportes correspondientes a estas actividades ya fueron en el informe mensual para su revisión, donde se incluye el manejo adecuado de los residuos de construcción, la disposición de escombros se realiza en sitios autorizados por el EPA mediante PIN asignado a la obra, y las acciones implementadas para la protección del entorno y el cumplimiento de las medidas ambientales.

En el punto tercero donde solicitan la relación de las maquinarias, equipos y personal en obra, se adjunta el documento, sin embargo se aclara que dicha documentación ya ha sido remitida previamente.

Al igual que el último punto de las evidencias de las inspecciones de seguridad realizadas en la obra, se adjuntan.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

JAZMIN ANGULO LANDAZURI
Profesional SST
Adjunto: Lo mencionado en Un (01) volumen
c.c. Archivo
JETG

Powered by CamScanner

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-214 - REMISION CUENTA No. 3 OBRA No. 1

Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com> 6 de marzo de 2026 a las 19:33
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo
Una vez revisado el corte de obra por parte de los profesionales de campo y verificada en oficina admón. , se da aprobación para su gestión frente a la entidad.

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
INTERVENTORIA

De: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Enviado: jueves, 5 de marzo de 2026 20:41
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>
Asunto: Re: CFP-MC-4335-2024-214 - REMISION CUENTA No. 3 OBRA No. 1

Buen día

Adjunto el corte de obra, con las observaciones realizadas, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

CUENTA No. 3 OBRA 1 v1.pdf

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

El lun, 2 mar 2026 a las 19:27, Proyectos Arqingco (<proyectos@arqingco.com>) escribió:

Buen día,

Nos permtimos remitir la información en asunto para los fines pertinentes.

Att CONSORCIO FP

CUENTA No. 3 OBRA 1.pdf

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

CUENTA No. 3 OBRA 1 v1 (1).pdf
22509K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-224 - REMISION PROGRAMAS ACTUALIZADOS

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 6 de marzo de 2026 a las 14:46
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

6 adjuntos

- **Plan de Manejo Ambiental V2.pdf** 1750K
- **ANEXOS PMA.zip** 2212K
- **PROGRAMA DE COMPRAS POR ITEMS.pdf** 867K
- **PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS POR ITEMS.pdf** 253K
- **PROGRAMA DE PERSONAL POR ITEMS.pdf** 233K

CFP-MC-4335-2024-224 - REMISION PROGRAMAS ACTUALIZADOS.pdf
251K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-216 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 9 de marzo de 2026 a las 10:49
Para: Yenny Renteria Landazuri <sisosimonbolivar@gmail.com>, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, jasminangulo3@yahoo.es

Buen día

En respuesta a su observación, se adjunta certificado de pensión del señor Daniel Salazar, así mismo se adjunta los certificados de cursos de alturas de los señores Daniel Salazar Cortés y Víctor Rubiano Imbachi.

Quedamos atentos y muchas gracias.

CONSORCIO FP

El mié, 4 mar 2026 a las 9:28, Yenny Renteria Landazuri (<sisosimonbolivar@gmail.com>) escribió:
> Buen dia. Verificando la documentación enviada del personal que ingresa por la empresa Ferroconstrucciones,.S.A.S., se verifica que falta el certificado de pensión del señor Daniel Salazar Cortes. Adjuntar este documento.
>
> Atentamente,
>
> YENNY RENTERIA LANDAZURI
> SISOMA Interventoria.
>
> El mar, 3 mar 2026 a las 15:05, Proyectos Arqingco (<proyectos@arqingco.com>) escribió:
> > Buen día
> >
> > Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.
> >
> > CONSORCIO FP
> >
> > --

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración

de proyectos@arqingco.com.

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración
de proyectos@arqingco.com.

5 adjuntos

- **Constancia_Formacion_Vocacional TA VICTOR IMBACHI.pdf** 44K
- **AFILIACION PORVENIR DANIEL SALAZAR CORTES.pdf** 60K
- **SC065444 VICTOR IMBACHI CA.pdf** 546K
- **Constancia_Formacion_Vocacional TA DANIEL SALAZAR.pdf** 44K
- **SC065445 DANIEL SALAZAR CA.pdf** 556K

Buga, Valle del Cauca, 09 de marzo de 2026

CORRESPONDENCIA ENVIADA
Radicado: S-06-2026030900829
Fecha: 09/03/2026 03:27:53 p. m.
Usuario: fapenaranda
PROYECTO: CONCESIONARIA UNION VIAL CAMINO DEL PACIFICO
DESCRIPCION DE ANEXOS: N/A

Gustavo Palacio Rubiano
Representante Legal
CONSORCIO FP
Consorciofp2025@gmail.com
Carrera 15a No.124 – 60 Oficina 102
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Concesión bajo esquema APP No. 004 de 29 de agosto de 2022 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Unión Vial Camino del Pacífico S.A.S. (el "Contrato de Concesión").

Asunto: Respuesta a la comunicación radicado interno R-06-2026022000816 del 20-02-2026, de asunto: "Invitación para la realización del acta de vecindad de la vía sentido continente isla sector casa de la cultura Margarita Hurtado."

Respetado señor Palacios, reciba un cordial saludo por parte de la sociedad Unión Vial Camino del Pacífico S.A.S. (en adelante "la Concesionaria" o la "UVCP").

En primer lugar, la Concesionaria le agradece por comunicarse para aclarar cualquier situación relacionada con el Proyecto denominado Nueva Malla Vial del Corredor: Buenaventura – Loboguerrero – Buga (el "Proyecto"). Es importante destacar que la Concesionaria está a su disposición para responder peticiones, quejas, reclamos o sugerencias ("PQRS").

Ahora, con respecto a la PQRS mencionada en el asunto, el Consorcio FP (en adelante el "Peticionario") manifiesta que:

> *"De manera muy respetuosa, el Consorcio FP se permite informar que, debido a la continuidad de los trabajos correspondientes a la Fase III en la Casa de la Cultura Margarita Hurtado, se está extendiendo una cordial invitación para hacer parte del proceso de verificación del estado de la vía y la realización del acta correspondiente.*
>
> *Esta actividad se realizará el día 26 de febrero de 2026, a las 10:00 am en las instalaciones del proyecto mencionado."*

De manera atenta, el Concesionario se permite informar que, debido a la agenda de los profesionales encargados de atender este tipo de eventos, no fue posible realizar la reunión en la fecha inicialmente propuesta. No obstante, proponemos realizar la visita de verificación para el día 17 de marzo de 2026 a las 10:00 am.

Para los efectos de coordinar la actividad, a continuación, relacionamos los datos del personal designado para este proceso:

Nombre: Gerardo Antonio Avila Barón
Teléfono: 310 2679896
Correo: gaavila@sacyr.com

Sin otro particular, agradecemos su atención

Cordialmente,

Miguel Ángel Acosta Osio
Representante Legal
UNIÓN VIAL CAMINO DEL PACÍFICO S.A.S.

Anexos: N/A
Elaboró: A. Vasquez / G. Avila
Revisó: R. Rodiguez
Aprobó: R. Rodiguez

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-225 - REMISION SOLICITUD GESTION PARA CONSTRUCCION APOYO 19

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 10 de marzo de 2026 a las 16:28
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

CFP-MC-4335-2024-225 - REMISION SOLICITUD GESTION PARA CONSTRUCCION APOYO 19.pdf
773K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-225 - REMISION SOLICITUD GESTION PARA CONSTRUCCION APOYO 19

Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com> 10 de marzo de 2026 a las 20:00
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo
La información fue recibida y revisada por parte de la Interventoria .
Agradecemos la gestión ante la Alcaldía de Buenaventura-

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
INTERVENTORIA

De: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Enviado: martes, 10 de marzo de 2026 16:28
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>; Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>; Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>
Asunto: CFP-MC-4335-2024-225 - REMISION SOLICITUD GESTION PARA CONSTRUCCION APOYO 19

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-226- REMISION INFORME SEMANAL 35

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 10 de marzo de 2026 a las 14:12
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

3 adjuntos

- **RESULTADOS.zip** 518K
- **CFP-MC-4335-2024-226- REMISION INFORME SEMANAL 35 02-07 MZ 2026.pdf** 248K
- **INFORME SEMANAL CONSORCIO FP NUMERO 35 DEL 02 DE MARZO AL 07 DE MARZO.pdf** 14561K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-227 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 15

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 10 de marzo de 2026 a las 12:34
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, consultoresdeloccidentesas@hotmail.com, guspalr2026@gmail.com

Buen dia,

Nos permitimos remitir la información en asunto.

Att CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

3 adjuntos

- **CFP-MC-4335-2024-227 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 15.pdf** 268K
- **15AVA CIDELSA.zip** 1938K
- **LISTADO ORDENES CONSORCIO FP - BUENAVENTURA FINAL.xlsb.pdf** 52K

Outlook

RE: SOLICITUD RESPUESTA OFICIO - Remisión de orden de pago y certificado de ingresos y retenciones vigencia 2025

Desde Olga Carolina Sarmiento Vanegas <osarmiento@mincultura.gov.co>

Fecha Mar 10/03/2026 10:57

Para contador@arqingco.com <contador@arqingco.com>; nidiapabon@arqingo.com <nidiapabon@arqingo.com>; proyectos@arqinco.com <proyectos@arqinco.com>

CC Merlyn Vargas Montenegro <mvargasm1@mincultura.gov.co>; Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co>; Jhuli Paola Ramirez Lozano <jramirezl@mincultura.gov.co>; Luisa Fernanda Lozada Ramirez <llozada@mincultura.gov.co>; Yury Andrea Cardenas Rojas (Invitado) <ycardenas@mincultura.gov.co>; Alejandra María Montaño Gómez <ammontano@mincultura.gov.co>; Alejandra María Montaño Gómez <ammontano@mincultura.gov.co>; Lady Liliana Bolaños Bolaños <lbolanos@mincultura.gov.co>; Luisa Fernanda Lozada Ramirez <llozada@mincultura.gov.co>; Nixon Gabriel Enciso Velasquez <nenciso@mincultura.gov.co>; Yury Andrea Cardenas Rojas (Invitado) <ycardenas@mincultura.gov.co>; Harry Penagos <hpenagos@mincultura.gov.co>

2 archivos adjuntos (369 KB)

2025_12_29_OP NO PRE_538296125_CTTO_4335-2024_DEV RETEFUENTE_PAGADA.pdf; CONSORCIO FP 2025 CONSOLIDADO.pdf;

Buenos días, señores:
Cordial saludo.
Por medio de la presente, adjuntamos la orden de pago no presupuestal en estado **"Pagado"**, en la cual se evidencia que el pasado **29 de diciembre de 2025** se realizó la devolución por valor de **$10.327.278**, correspondiente al mayor valor retenido por porcentaje de tarifa en el pago.
De igual manera, se adjunta el **certificado de ingresos y retenciones correspondiente a la vigencia 2025**, en el cual podrá validarse el efecto cero por valor de **$22.720.012**, cuya retención correcta corresponde al valor de **$12.392.734**, por favor tener en cuenta que el valor total retenido por todas las deducciones aplicadas durante la vigencia 2025 fue **$24.992.014.**

	UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	206.545.562,00	11,00	22.720.012,00
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	206.545.562,00	6,00	12.392.734,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS				47.712.026,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	206.545.562,00	11,00	22.720.012,00
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES				22.720.012,00

Quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.
Cordialmente,

Culturas

Olga Carolina Sarmiento Vanegas
Contratista Profesional
Grupo de Gestión Financiera y Contable
Email: osarmiento@mincultura.gov.co
Teléfono: (571) 3424100
Direccion Calle 9 No. 8-31 -Bogotá DC - Colombia
www.mincultura.gov.co

De: Alejandra María Montaño Gómez <ammontano@mincultura.gov.co>
Enviado el: martes, 10 de marzo de 2026 10:03 a. m.
Para: Jhuli Paola Ramirez Lozano <jramirezl@mincultura.gov.co>; Olga Carolina Sarmiento Vanegas <osarmiento@mincultura.gov.co>; Luisa Fernanda Lozada Ramirez <llozada@mincultura.gov.co>; Yury Andrea Cardenas Rojas (Invitado) <ycardenas@mincultura.gov.co>
CC: Merlyn Vargas Montenegro <mvargasm1@mincultura.gov.co>; Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD RESPUESTA OFICIO

Hola Compañeras,

Por favor me colaboran validando si puedo realizar este reintegro de retenciones solicitado

gracias

Culturas

Alejandra Maria Montaño Gómez
Central de Cuentas / Grupo de Gestión Financiera y Contable
mail: ammontano@mincultura.gov.co
Teléfono: 3424100
Teams: ammontano@mincultura.gov.co
Dirección: Cra 9 No. 8-31 Bogotá, Colombia
www.mincultura.gov.co

De: Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co>
Enviado: martes, 10 de marzo de 2026 09:22
Para: Alejandra María Montaño Gómez <ammontano@mincultura.gov.co>
Cc: Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>; Jorge Antonio Gonzalez Duarte <jgonzalezd@mincultura.gov.co>
Asunto: SOLICITUD RESPUESTA OFICIO

Cordial saludo Alejandra,

Desde el Consorcio FP nos están solicitando dar respuesta a oficio CFP-MC-4335-2024-152, remitido el 22 de diciembre a tu correo. Adjunto documento en el cual se evidencia el correo en comento.

Agradezco que me puedas indicar como podemos proceder con este tema.

Muchas gracias.

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario. Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.
Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario. Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.
Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario. Si la solicitud contenida en el presente

mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-228 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 11 de marzo de 2026 a las 12:33
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, consultoresdeloccidentesas@hotmail.com
Cc: guspalr2026@gmail.com

Buen dia,

Nos permitimos remitir la información en asunto.

Att. CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

3 adjuntos

- **CFP-MC-4335-2024-228 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL.pdf** 260K
- **BENJAMIN ESTAIZA OBANDO.pdf** 1917K
- **KEVIN ORTEGA BENACHI.pdf** 1156K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

SOLICITUD DE APOYO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO No. 3952 de 2024

1 mensaje

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 11 de marzo de 2026 a las 11:12
Para: Direccion Planeacion <dir_planeacion@buenaventura.gov.co>, Direccion Tecnica de Cultura <dir_cultura@buenaventura.gov.co>, "ventanilla_unica@buenaventura.gov.co" <ventanilla_unica@buenaventura.gov.co>, Asesor Alcalde <asesor01@buenaventura.gov.co>, Direccion Tecnica de Vivienda <dir_vivienda@buenaventura.gov.co>, adriana zamora manyoma <adrizamora72@hotmail.com>
Cc: Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>, Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Laura Ines Pelaez Velasquez <lpelaez@mincultura.gov.co>

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento en el marco del convenio del asunto, este ministerio adelantó la contratación de las actividades relacionadas con la construcción de la membrana arquitectónica de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado. Es así como en el marco de la ejecución del contrato de obra No. 4335 de 2024, suscrito por este Ministerio, se adelantan actualmente las actividades de construcción de la cimentación que soportará la membrana arquitectónica.

De acuerdo con lo anterior, se presenta situación que dificulta la construcción de uno de los caisson, por lo que de manera atenta solicitamos evaluar la posibilidad de autorizar intervención en el previo contiguo, de acuerdo con lo descrito en el oficio adjunto.

Es así como remitimos el oficio, y solicitamos adelantar mesa de trabajo virtual (podría ser el día viernes), para las aclaraciones que se requieran, de acuerdo con la información enviada.
Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

CFP-MC-4335-2024-225 - REMISION SOLICITUD GESTION PARA CONSTRUCCION APOYO 19.pdf
773K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

URG: SOLICITUD DE CARGUE EN SECOP

1 mensaje

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 11 de marzo de 2026 a las 9:24
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Cc: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta solicitamos el cargue de los pagos adjuntos en la plataforma secop.
Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

2 adjuntos

Pago4Ctto4335-2024.pdf
5732K

Pago3Ctto4335-2024.pdf
7449K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-230 - REMISION ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS V1

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 12 de marzo de 2026 a las 16:37
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

2 adjuntos

CFP-MC-4335-2024-230 - REMISION ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS V1.pdf
246K

20260312 NP-C4335-2024-MINCULTURA-TENSO-OBRA-V2.xlsx
2306K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Envio Giros gestionados

1 mensaje

Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta 12 de marzo de 2026 a las 15:51
<Interbuenaventura2025@hotmail.com>
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo
Nos permitimos enviar los documentos relacionados con las ordenes de giros suscritas desde la 4 a la 15 hasta el dia de hoy

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
INTERVENTORIA

12 adjuntos

- **ORDEN 15 Modelo de Orden de giro FID - 319275 FR.pdf** 237K
- **CONSOLIDADO ORDEN No.11 fr.pdf** 1755K
- **ORDEN 4 Modelo de Orden de giro FID - 319275 (4).pdf** 248K
- **ORDEN 5 Modelo de Orden de giro FID - 319275 (2).pdf** 242K
- **ORDEN 6 Modelo de Orden de giro FID - 319275 (2).pdf** 237K
- **ORDEN 7 Modelo de Orden de giro FID - 319275 (2).pdf** 246K
- **ORDEN 8 Modelo de Orden de giro FID - 319275 (2).pdf** 245K
- **ORDEN 9 Modelo de Orden de giro FID - 319275 (2).pdf** 245K
- **ORDEN 10 Modelo de Orden de giro FID - 319275 fr.pdf** 242K
- **ORDEN 12 Modelo de Orden de giro FID - 319275 fr.pdf** 227K
- **ORDEN 13 Modelo de Orden de giro FID - 319275 fr.pdf** 233K
- **ORDEN 14 Modelo de Orden de giro FID - 319275 fr.pdf** 233K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CONVOCATORIA COMITÉ PRESENCIAL EN OBRA

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 13 de marzo de 2026 a las 17:38
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Cc: Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>

Cordial saludo,

Para el próximo **27 de marzo de 2026** se tiene programada comisión de la Coordinadora del GIC a Buenaventura, por lo cual se realiza convocatoria para que los Directores de Obra e Interventoría estén en el proyecto, con el fin de realizar comité presencial, en la **jornada de la mañana**.

Agradezco que se tengan identificados puntos donde se requiera toma de decisión para que se verifiquen en obra y se adelanten los análisis requeridos en la visita prevista.

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
NIT. 900.457.115-5

Bogotá D.C., 03 de marzo De 2026

ARQUIECTA
JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA
MINCULTURA
jramirezr@mincultura.gov.co
Ciudad

CON-092-MINCUL-2025

REF.: Contrato de interventoría No 4340-2024 cuyo objeto es " Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto, efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del **Valle Del Cauca"**

ASUNTO: Comunicación de ocurrencia de fuerza mayor por graves motivos de seguridad y orden público

Respetada Arquitecta

En el día de hoy hacia las horas de la tarde recibimos comunicación formal por parte del CONSORCIO FP oficio FP-MC-4335-2024-233 de fecha 16 de marzo de 2026, sobre la situación de Fuerza Mayor y Caso Fortuito ocurrida en el proyecto del Complejo Margarita Hurtado en Buenaventura.

Dada la gravedad de los hechos se remite a la entidad dicho documento con el fin de seguir el debido protocolo de seguridad y validación jurídica, por consiguiente, para avanzar con el trámite administrativo por parte de la entidad se hace necesario coordinar los siguientes pasos:


1. El contratista de obra deberá realizar la respectiva denuncia penal en donde se adjunte copia de la denuncia instaurada ante la fiscalía general de la Nación o autoridad competente por las amenazas y el robo de activos.

2. Emitir informe técnico en donde se evidencie la imposibilidad física de continuar con la obra bajo estas condiciones de orden público , en donde el hurto de las llaves de la maquinaria amarilla imposibilita el movimiento de materiales y la construcción de taludes de protección para la estructura de la membrana y que se configuran como actividades críticas de la ruta técnica, se constate el cese total de actividades debido a la imposibilidad de garantizar la permanencia del equipo profesional y operativo en la zona de ejecución.

3. Solicitar acompañamiento o presencia de la Fuerza Pública (Policía/Ejército) para evaluar si es posible retomar labores bajo un esquema de seguridad especial en el futuro.

4. Solicitar se gestione una reunión entre las partes e interesados en la realización de las obras objeto del contrato a fin de buscar una salida que no impacte la ejecución de las obras por su impacto y trascendencia a nivel regional y nacional.

Por su atención estamos atentos a cualquier requerimiento.



ANGELICA PERDOMO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

CC. María Fernanda Martínez Patiño - apoyo a la supervisión - mmartinezp@mincultura.gov.co

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-228 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 16 de marzo de 2026 a las 15:19
Para: Yenny Renteria Landazuri <sisosimonbolivar@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Proyectos Arqingco** <proyectos@arqingco.com>
Date: mié, 11 mar 2026 a las 12:33
Subject: CFP-MC-4335-2024-228 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL
To: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, <consultoresdeloccidentesas@hotmail.com>
Cc: <guspalr2026@gmail.com>

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

CFP-MC-4335-2024-228 - REMISION DOCUMENTACION PERSONAL.pdf
260K

BENJAMIN ESTAIZA OBANDO.pdf
1917K

KEVIN ORTEGA BENACHI.pdf
1156K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-232 - REMISION COMPROBANTE REND FINANCIEROS FEBRERO 2026

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 16 de marzo de 2026 a las 10:20
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, consultoresdeloccidentesas@hotmail.com, guspalr2026@gmail.com

Buen día,

Nos permitimos remitir la información en asunto.

Att, CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

7 adjuntos

- **CFP-MC-4335-2024-232 - REMISION COMPROBANTE REND FINANCIEROS FEBRERO 2026.pdf** 252K
- **319275.pdf** 14K
- **319275 - Extracto_FIC.pdf** 221K
- **_319275-1 - 202602 - Informe Mensual.pdf** 250K
- **319275 - Pagos.pdf** 49K

319275 - Extracto_cuenta_1.pdf
96K

319275 - PMA.pdf
128K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-233 - SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE OBRA

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 16 de marzo de 2026 a las 17:04
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>
Cc: Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

CFP-MC-4335-2024-233 - SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE OBRA.pdf
269K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-233 - SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE OBRA

Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta 16 de marzo de 2026 a las 19:55
<Interbuenaventura2025@hotmail.com>
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Cc: Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>

Cordial saludo
En relación a su solicitud , la interventoría da contestación y requiere se soporte la presente para poder proceder a proceder al aval por parte de la entidad

Atentamente
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
Interventoria

De: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 17:04
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>
Cc: Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>; Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>
Asunto: CFP-MC-4335-2024-233 - SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE OBRA

[El texto citado está oculto]

CON-092-MINCUL-2025informacion fuerza mayor y caso fortuito.pdf
84K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Reporte de situación de seguridad

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 16 de marzo de 2026 a las 18:37
Para: PARA VIVIR CON DIGNIDAD EN EL TERRITORIO <parocivicobuenaventura@gmail.com>, Mesade Cultura <mesadeculturaparocivico@gmail.com>, Asesor Alcalde <asesor01@buenaventura.gov.co>, Ligia del Carmen Cordoba <alcaldesa@buenaventura.gov.co>, Direccion Tecnica de Cultura <dir_cultura@buenaventura.gov.co>
Cc: Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>, Laura Ines Pelaez Velasquez <lpelaez@mincultura.gov.co>, Juan Guillermo Guarnizo Ramírez <juanguarnizo@presidencia.gov.co>, Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Jenny Alejandra Reyes Diaz <jreyesd@mincultura.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta remito oficio enviado por el Consorcio FP a cargo de la ejecución de las actividades de culminación del proyecto de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado.

En el mismo se expone situación de seguridad presentada el día de hoy en el proyecto, que llevó a que se llevaran las llaves de la maquinaria dispuesta para la ejecución de actividades de la cimentación de la membrana.

Con base en lo sucedido se solicita por parte del consorcio la suspensión de las actividades en obra, hasta tanto se superen estas situaciones.

Teniendo en cuenta la importancia de este proyecto y el avance que se ha tenido a la fecha, desde el Ministerio solicitamos coordinación de espacio virtual, en el cual se puedan identificar acciones que permitan la reactivación del proyecto y que garanticen la seguridad de los profesionales y trabajadores a cargo de la ejecución de la obra.

Con base en lo anterior, quedamos atentos a disponibilidad para adelantar este espacio, para lo cual se realizan las gestiones con los enlaces correspondientes.

Enviado desde Outlook para iOS

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

CFP-MC-4335-2024-233 - SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE OBRA.pdf
269K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-231 - REMISION ANALISIS DE COBERTURAS DE ESTABILIDAD

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 17 de marzo de 2026 a las 12:34
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

CFP-MC-4335-2024-231 - REMISION ANALISIS DE COBERTURAS DE ESTABILIDAD.pdf
306K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-233 - SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE OBRA

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 17 de marzo de 2026 a las 14:11
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com>
Cc: Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>

Buen día

Con base en lo establecido el día de ayer en reunión de horas de la noche con las entidades del Distrito de Buenaventura y el Ministerio de Cultura, adjunto remitimos radicado de la denuncia y copia de la minuta de la empresa de vigilancia del proyecto de los hechos ocurrido el día de ayer en la obra.

CONSORCIO FP

El lun, 16 mar 2026 a las 19:55, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta (<Interbuenaventura2025@hotmail.com>) escribió:

> Cordial saludo
> En relación a su solicitud , la interventoría da contestación y requiere se soporte la presente para poder proceder a proceder al aval por parte de la entidad
>
> Atentamente
> CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
> Interventoria
>
> ---
>
> **De:** Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
> **Enviado:** lunes, 16 de marzo de 2026 17:04
> **Para:** Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>
> **Cc:** Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>; Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>
> **Asunto:** CFP-MC-4335-2024-233 - SUSPENSION INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE OBRA
>
> Buen día
>
> Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.
>
> CONSORCIO FP
>
> --

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:

La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

2 adjuntos

Denuncia Radicada.pdf
107K

minuta 16-03-2026.pdf
188K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-234- REMISION INFORME SEMANAL 36

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 17 de marzo de 2026 a las 15:19
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

2 adjuntos

CFP-MC-4335-2024-234- REMISION INFORME SEMANAL 36 09-14 MAR 2026.pdf
249K

INFORME SEMANAL CONSORCIO FP NUMERO 36 DEL 09 DE MARZO AL 14 DE MARZO.pdf
16190K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Fw: solicitud de acompañamiento y presencia permanente de unidad policial

1 mensaje

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 17 de marzo de 2026 a las 7:22
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>
Cc: Laura Ines Pelaez Velasquez <lpelaez@mincultura.gov.co>, Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta remito para conocimiento.

Cualquier novedad les informaré.

Enviado desde Outlook para iOS

De: Direccion Tecnica de Cultura <dir_cultura@buenaventura.gov.co>
Enviado: Monday, March 16, 2026 10:18:11 PM
Para: DEVAL DIEBU-COMAN <deval.diebu-com@policia.gov.co>; Gabinete Gabinete <gabinete@buenaventura.gov.co>; Ligia del Carmen Cordoba <alcaldesa@buenaventura.gov.co>; Asesor Alcalde <asesor01@buenaventura.gov.co>; Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co>
Asunto: solicitud de acompañamiento y presencia permanente de unidad policial

Buenas noches,

Teniente Coronel
GUSTAVO ADOLFO CHAPARRO GUERRERO
Comandante
Policía Nacional de Colombia
Distrito Especial de Policía Buenaventura
Ciudad

Cordial saludo,

Adjunto enviamos oficio DTC-0340-018-0071, donde respetuosamente solicitamos el asunto de la referencia para la obra en construcción Casa de la Cultura Margarita Hurtado.

Atentamente,

José Luis Moreno Sinisterra
Director Técnico de Cultura
dir_cultura@buenaventura.gov.co
Carrera 3A No. 2-13 Edificio Antiguo Bazar Inglés - Piso 3
Buenaventura, Valle del Cauca
www.buenaventura.gov.co
Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.
Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

DTC-0340-018-0071 GUSTAVO ADOLFO CHAPARRO(2).pdf
306K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Reporte de situación de seguridad

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 17 de marzo de 2026 a las 15:14
Para: PARA VIVIR CON DIGNIDAD EN EL TERRITORIO <parocivicobuenaventura@gmail.com>, Mesade Cultura <mesadeculturaparocivico@gmail.com>, Asesor Alcalde <asesor01@buenaventura.gov.co>, Ligia del Carmen Cordoba <alcaldesa@buenaventura.gov.co>, Direccion Tecnica de Cultura <dir_cultura@buenaventura.gov.co>
Cc: Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>, Laura Ines Pelaez Velasquez <lpelaez@mincultura.gov.co>, Juan Guillermo Guarnizo Ramírez <juanguarnizo@presidencia.gov.co>, Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Jenny Alejandra Reyes Diaz <jreyesd@mincultura.gov.co>

Cordial saludo,

De conformidad con la llamada sostenida el día de ayer, de manera atenta remitimos copia de la denuncia.

Agradecemos el apoyo que se pueda brindar por parte del distrito para dar celeridad al asunto.

De: Maria Fernanda Martinez Patiño
Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 18:37
Para: PARA VIVIR CON DIGNIDAD EN EL TERRITORIO <parocivicobuenaventura@gmail.com>; Mesade Cultura <mesadeculturaparocivico@gmail.com>; Asesor Alcalde <asesor01@buenaventura.gov.co>; Ligia del Carmen Cordoba <alcaldesa@buenaventura.gov.co>; Direccion Tecnica de Cultura <dir_cultura@buenaventura.gov.co>
Cc: Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>; Laura Ines Pelaez Velasquez <lpelaez@mincultura.gov.co>; Juan Guillermo Guarnizo Ramírez <juanguarnizo@presidencia.gov.co>; Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>; Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>; Jenny Alejandra Reyes Diaz <jreyesd@mincultura.gov.co>
Asunto: Reporte de situación de seguridad

Cordial saludo,

De manera atenta remito oficio enviado por el Consorcio FP a cargo de la ejecución de las actividades de culminación del proyecto de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado.

En el mismo se expone situación de seguridad presentada el día de hoy en el proyecto, que llevó a que se llevaran las llaves de la maquinaria dispuesta para la ejecución de actividades de la cimentación de la membrana.

Con base en lo sucedido se solicita por parte del consorcio la suspensión de las actividades en obra, hasta tanto se superen estas situaciones.

Teniendo en cuenta la importancia de este proyecto y el avance que se ha tenido a la fecha, desde el Ministerio solicitamos coordinación de espacio virtual, en el cual se puedan identificar acciones que permitan la reactivación del proyecto y que garanticen la seguridad de los profesionales y trabajadores a cargo de la ejecución de la obra.

Con base en lo anterior, quedamos atentos a disponibilidad para adelantar este espacio, para lo cual se realizan las gestiones con los enlaces correspondientes.

Enviado desde Outlook para iOS

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

2 adjuntos

Denuncia Radicada.pdf
107K

minuta 16-03-2026.pdf
188K

DTC-0340-018-0071
Buenaventura, 16 de marzo de 2026

Teniente Coronel
GUSTAVO ADOLFO CHAPARRO GUERRERO
Comandante
Policía Nacional de Colombia
Distrito Especial de Policía Buenaventura
Ciudad

ASUNTO**:** Solicitud de acompañamiento y presencia permanente de unidad policial.

Cordial Saludo,

Desde la Dirección Técnica de Cultura del Distrito de Buenaventura, nos permitimos solicitar muy respetuosamente el acompañamiento y la presencia permanente de una unidad de la Policía Nacional en el punto donde actualmente se adelantan los trabajos de construcción de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado.

Entendemos que existen diversas demandas de seguridad en otros sectores de la ciudad; sin embargo, esta obra hace parte de un proyecto importante para el Distrito y esperamos poder llevarlo a feliz término en beneficio de la comunidad.

En ese sentido, y teniendo en cuenta la situación de inseguridad y de orden público que se presenta en la ciudad de Buenaventura, se hace necesario contar con el acompañamiento permanente de la Policía Nacional, con el fin de salvaguardar la seguridad de los trabajadores, así como de la maquinaria y los equipos que se están utilizando para la ejecución de esta obra.

Agradecemos de antemano su atención y el apoyo que desde la institución que usted representa pueda brindarse para garantizar el desarrollo normal de este proyecto cultural.

Atentamente,

JOSÉ LUIS MORENO SINISTERRA
Director Técnico de Cultura

Copia: Ligia del Carmen Córdoba Martínez – Alcaldesa
Liliana Vivas Paz – Secretaria de Gobierno
Deifa Janise Audivert Hurtado – Secretaria de Gabinete
Laura Daniela Suárez Marín – Asesora de Despacho

Elaboró: Marled Bermúdez Perea – Secretaria Ejecutiva
Revisó: José Luis Moreno Sinisterra – Director Técnico de Cultura

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-236 - RESPUESTA Y REQUERIMIENTO SOBRE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN INMEDIATA – COMUNICACIÓN CFP-MC-4335-2024-233

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 18 de marzo de 2026 a las 18:21
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>
Cc: Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

CFP-MC-4335-2024-236 - RESPUESTA Y REQUERIMIENTO SOBRE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN INMEDIATA – COMUNICACIÓN CFP-MC-4335-2024-233.pdf
341K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Acciones de seguridad y solicitud de reanudación de la obra - Casa de la Cultura Margarita Hurtado

1 mensaje

Direccion Tecnica de Cultura <dir_cultura@buenaventura.gov.co> 19 de marzo de 2026 a las 10:59
Para: Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co>, interbuenaventura2025@hotmail.com, "proyectos@arqingco.com" <proyectos@arqingco.com>, Gabinete Gabinete <gabinete@buenaventura.gov.co>, Ligia del Carmen Cordoba <alcaldesa@buenaventura.gov.co>, Asesor Alcalde <asesor01@buenaventura.gov.co>, Secretaria de Gobierno <secretario_gobierno@buenaventura.gov.co>, DEVAL DIEBU-COMAN <deval.diebu-com@policia.gov.co>

Buenos días,

Nos permitimos informar que se adjunta para su conocimiento y fines pertinentes el oficio DTC-0340-018-0073, cuyo asunto corresponde a " Acciones de seguridad y solicitud de reanudación de la obra - Casa de la Cultura Margarita Hurtado"

José Luis Moreno Sinisterra
Director Técnico de Cultura
dir_cultura@buenaventura.gov.co
Carrera 3A No. 2-13 Edificio Antiguo Bazar Inglés - Piso 3
Buenaventura, Valle del Cauca
www.buenaventura.gov.co

DTC-0340-018-0073 MINISTERIO DELAS CULTURAS (2).pdf
516K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-230 - REMISION ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS V1

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 19 de marzo de 2026 a las 13:15
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>

Adjunto para revisión con ajustes!!

El jue, 12 mar 2026 a las 16:37, Proyectos Arqingco (<proyectos@arqingco.com>) escribió:

> Buen día
>
> Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.
>
> CONSORCIO FP
>
> --

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

NP-C4335-2024-MINCULTURA-TENSO-OBRA-V3.xlsx
4602K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-237 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 16 - 17

Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com> 19 de marzo de 2026 a las 21:17
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo
Envió ordenes de giro 16 y 17 para su gestión posterior a la respectiva revisión.

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
INTERVENTORIA

De: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Enviado: jueves, 19 de marzo de 2026 16:25
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>; consultoresdeloccidentesas@hotmail.com <consultoresdeloccidentesas@hotmail.com>; guspalr2026@gmail.com <guspalr2026@gmail.com>
Asunto: CFP-MC-4335-2024-237 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 16 - 17

Buen día,

Nos permitimos remitir la información en asunto.

Att CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

2 adjuntos

ORDEN 16 Modelo de Orden de giro FID - 319275 fr.pdf
236K

ORDEN 17 Modelo de Orden de giro FID - 319275 fr.pdf
234K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-237 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 16 - 17

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 19 de marzo de 2026 a las 16:25
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, consultoresdeloccidentesas@hotmail.com, guspalr2026@gmail.com

Buen día,

Nos permitimos remitir la información en asunto.

Att CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

3 adjuntos

- **CFP-MC-4335-2024-237 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 16 - 17.pdf** 269K
- **16 AVA FERROCONSTRUCCIONES ROSAS.zip** 1827K
- **17 AVA ORDEN COAGREGADOS CONCRETO.zip** 2079K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Convocatoria comite tecnico de obra

1 mensaje

Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com> 19 de marzo de 2026 a las 7:59

Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Germán Adolfo Perdomo Pachón <consorciogap@hotmail.com>

Cordial saludo
Nos permitimos convocar a comité de obra a las 3 :30 pm del día de hoy con carácter prioritario a fin de tratar de alta importancia para el desarrollo de las obras que se adelantan con motivo del contrato de obra No 4335 -2024 y específicamente lo relacionado con la solicitud de suspensión temporal de actividades con ocasión de los hechos de ingreso violento de delincuencia al lugar en donde se desarrollan la obras.

Agradecemos su asistencia y confirmación.

En el transcurso de la mañana enviaremos el link de la reunion.

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
Interventoria

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Reporte de situación de seguridad

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 19 de marzo de 2026 a las 17:34
Para: PARA VIVIR CON DIGNIDAD EN EL TERRITORIO <parocivicobuenaventura@gmail.com>, Mesade Cultura <mesadeculturaparocivico@gmail.com>, Asesor Alcalde <asesor01@buenaventura.gov.co>, Ligia del Carmen Cordoba <alcaldesa@buenaventura.gov.co>, Direccion Tecnica de Cultura <dir_cultura@buenaventura.gov.co>
Cc: Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>, Laura Ines Pelaez Velasquez <lpelaez@mincultura.gov.co>, Juan Guillermo Guarnizo Ramírez <juanguarnizo@presidencia.gov.co>, Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Jenny Alejandra Reyes Diaz <jreyesd@mincultura.gov.co>

Cordial saludo,

De acuerdo con lo informado por el contratista de obra, el día de hoy 19 de marzo de 2026 se presentó situación inusual, en la cual un sujeto que siempre portó un casco de moto se acercó a la obra para tomar fotografias al interior de la obra, a los trabajadores y a la maquinaria que se encontraba en sitio.

Se indagó por parte del personal del contratista la identidad del sujeto, quien no quiso revelar la misma, manifestando ser un periodista, que no contaban con ningún tipo de identificación.

Esta situación fue puesta en conocimiento de manera inmediara a la Polícia quienes hicieron presencia 5 minutos despues, cuando desafortunadamente el sujeto ya no se encontraba en inmediaciones del proyecto.

Teniendo en cuenta la mesa de seguridad adelantada el día de ayer, se indicó que se iba a reforzar las rondas al proyecto. Sin embargo nos notifican que el día de hoy solo se realizó una ronda por la llamada efectuada.

Agradecemos que desde el Distrito nos apoyen ratificando los compromisos asumidos dada la necesidad de contar con mayor presencial en el proyecto, que permita dar un aire de seguridad a los trabajadores, que hoy se encuentran es situación zozobra.

De igual manera, consideramos importante que se realice una jornada de sensibilizació con los trabajadores, para que se les indiquen las acciones que se estan adoptando desde el órgano ejecutivo y la policía en procura de la seguridad de los mismos.

Muchas gracias.

De: Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co>
Enviado: martes, 17 de marzo de 2026 15:14
Para: PARA VIVIR CON DIGNIDAD EN EL TERRITORIO <parocivicobuenaventura@gmail.com>; Mesade Cultura <mesadeculturaparocivico@gmail.com>; Asesor Alcalde <asesor01@buenaventura.gov.co>; Ligia del Carmen Cordoba <alcaldesa@buenaventura.gov.co>; Direccion Tecnica de Cultura <dir_cultura@buenaventura.gov.co>
Cc: Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>; Laura Ines Pelaez Velasquez <lpelaez@mincultura.gov.co>; Juan Guillermo Guarnizo Ramírez <juanguarnizo@presidencia.gov.co>; Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>; Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>; Jenny Alejandra Reyes Diaz <jreyesd@mincultura.gov.co>
Asunto: RE: Reporte de situación de seguridad

Cordial saludo,

De conformidad con la llamada sostenida el día de ayer, de manera atenta remitimos copia de la denuncia.

Agradecemos el apoyo que se pueda brindar por parte del distrito para dar celeridad al asunto.

De: Maria Fernanda Martinez Patiño
Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 18:37
Para: PARA VIVIR CON DIGNIDAD EN EL TERRITORIO <parocivicobuenaventura@gmail.com>; Mesade Cultura <mesadeculturaparocivico@gmail.com>; Asesor Alcalde <asesor01@buenaventura.gov.co>; Ligia del Carmen Cordoba <alcaldesa@buenaventura.gov.co>; Direccion Tecnica de Cultura <dir_cultura@buenaventura.gov.co>
Cc: Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>; Laura Ines Pelaez Velasquez <lpelaez@mincultura.gov.co>; Juan Guillermo Guarnizo Ramírez <juanguarnizo@presidencia.gov.co>; Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>; Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>; Jenny Alejandra Reyes Diaz <jreyesd@mincultura.gov.co>
Asunto: Reporte de situación de seguridad

Cordial saludo,

De manera atenta remito oficio enviado por el Consorcio FP a cargo de la ejecución de las actividades de culminación del proyecto de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado.

En el mismo se expone situación de seguridad presentada el día de hoy en el proyecto, que llevó a que se llevaran las llaves de la maquinaria dispuesta para la ejecución de actividades de la cimentación de la membrana.

Con base en lo sucedido se solicita por parte del consorcio la suspensión de las actividades en obra, hasta tanto se superen estas situaciones.

Teniendo en cuenta la importancia de este proyecto y el avance que se ha tenido a la fecha, desde el Ministerio solicitamos coordinación de espacio virtual, en el cual se puedan identificar acciones que permitan la reactivación del proyecto y que garanticen la seguridad de los profesionales y trabajadores a cargo de la ejecución de la obra.

Con base en lo anterior, quedamos atentos a disponibilidad para adelantar este espacio, para lo cual se realizan las gestiones con los enlaces correspondientes.

Enviado desde Outlook para iOS
Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

DTC-0340-018-0073
Buenaventura, 18 de marzo de 2026

Respetados Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S – Interventoría
ARQINGCO – Contratista
Bogotá

ASUNTO: Acciones de seguridad y solicitud de reanudación de la obra – Casa de la Cultura Margarita Hurtado.

Cordial Saludo,

En atención al oficio remitido a través del correo de Ministerio, mediante el cual se nos dio traslado de la comunicación enviada por el consorcio contratista, en la que se informa la suspensión del proyecto de construcción de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para la ejecución del proyecto y propiciar la reanudación y continuidad de los trabajos de obra, esta administración ha adelantado diversas acciones en materia de seguridad y articulación institucional.

En ese sentido, el día 16 de marzo del presente año se remitió el oficio No. DTC-0340-018-0071 al Teniente Coronel, Comandante de la Policía, mediante el cual se solicitó el acompañamiento institucional y la presencia permanente de una unidad policial en el sector donde se ejecuta el proyecto, como medida preventiva y de control.

Adicionalmente, a través del GAULA de la Policía Nacional, se brindó orientación directa al contratista para la interposición de la respectiva denuncia, fortaleciendo así las acciones legales frente a los hechos que han afectado el normal desarrollo de la obra.

De igual manera, por intermedio de la Secretaría de Gobierno Distrital, se convocó y desarrolló una mesa de seguridad con las autoridades competentes, en la cual se analizaron las situaciones presentadas y se definieron acciones concretas orientadas a mitigar riesgos y garantizar las condiciones necesarias para la ejecución del proyecto.

En este contexto, y considerando las medidas adoptadas y el acompañamiento institucional dispuesto, esta administración solicita respetuosamente se adelante la reanudación de las actividades de construcción, en condiciones de seguridad reforzadas y bajo el cumplimiento estricto de las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.

Así mismo, se realizará seguimiento permanente a las acciones concertadas, y se requerirá al contratista dar estricto cumplimiento a los lineamientos de seguridad establecidos, con el fin de asegurar la correcta ejecución y culminación de la obra.

Reiteramos nuestro compromiso con la ejecución de este proyecto estratégico para la comunidad y agradecemos el acompañamiento del Ministerio en este proceso.

Atentamente,

JOSÉ LUIS MORENO SINISTERRA
Director Técnico de Cultura

Copia: Ligia del Carmen Córdoba Martínez – Alcaldesa
María Liliana Vivas Paz – Secretaria de Gobierno
Deifa Janise Audivert Hurtado – Secretaria de Gabinete
Laura Daniela Suárez Marín – Asesora de Despacho

Elaboró: Marled Bermúdez Perea – Secretaria Ejecutiva.
Revisó y aprobó Dr. José Luis Moreno Sinisterra – Director Técnico de Cultura

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
NIT. 900.457.115-5

Bogotá D.C., 20 de marzo De 2026

ARQUIECTA
JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA
MINCULTURA
jramirezr@mincultura.gov.co
Ciudad

CON-093-MINCUL-2025

REF.: Contrato de interventoría No 4340-2024 cuyo objeto es " Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto, efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del **Valle Del Cauca**"

ASUNTO: Comunicación de ocurrencia de fuerza mayor por graves motivos de seguridad y orden público

Respetada Arquitecto

Respecto a la solicitud realizada con oficio CFP-MC-4335-2024-233 de fecha 16 de marzo de 2026 , sobre la situación de Fuerza Mayor y Caso Fortuito ocurrida en el proyecto del Complejo Margarita Hurtado en Buenaventura y frente al oficio No CFP-MC-4335-2024-236 realizado el pasado 18 de marzo de 2026 en requerimiento a respuesta frente a la solicitud de suspensión temporal elevamos ante ustedes la presente respuesta formal bajo los siguientes fundamentos jurídicos y técnicos:

A efecto de dar una respuesta conjunta con la Entidad Contratante, Ministerio de Cultura nos permitimos indicar bajos los siguientes términos lo siguiente:

Con fundamento en los hechos reportados el 16 de marzo de 2026, se tiene que en el predio del proyecto se presentó un incidente de seguridad consistente en el ingreso de particulares que, mediante amedrentamiento, hurtaron las llaves

de maquinaria y preguntaron por el residente de obra. El contratista informó oportunamente a la interventoría y radicó la denuncia ante la Fiscalía, activándose una mesa interinstitucional con la Alcaldía, la Policía, el contratista, la interventoría y este Ministerio. Como resultado, la Policía se comprometió a disponer de cuadrillas y patrullajes en distintos horarios para fortalecer la seguridad perimetral. Desde ese momento no se han registrado nuevos hechos ni amenazas adicionales contra el personal o los bienes del proyecto. Estos elementos muestran que el evento, aunque grave, fue puntual, y que actualmente existe un plan de contingencia público en ejecución con presencia policial activa en el entorno de la obra , como fue comunicado en el comité de obra de tipo administrativo convocado por la interventoría y desarrollado el día 19 de Marzo hacia las 3:30 pm vía virtual y que tuvo la presencia de la supervisión, la abogada de la entidad , los representantes legales, Directores de obra e interventoría , residentes de obra e interventoría.

De cara a la Matriz de Riesgos CCE-EICP-FM-118 aplicable al contrato, el evento se ubica en el Riesgo No. 12 (Ejecución — ambientales/sociales), que contempla expresamente "amenazas externas asociadas a factores antrópicos (alteraciones del orden público, atentados, etc.)" y prevé como tratamientos la implementación de planes de contingencia o, subsidiariamente, la suspensión contractual cuando la afectación impida la ejecución. La propia matriz asigna el riesgo a Entidad—Contratista y dispone que el monitoreo sea diario en caso de plan de contingencia, o previo al reinicio cuando exista suspensión.

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)	Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles A Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona Responsable por Implementar El Tratamiento	Fecha (Inicio del Tratamiento)	Fecha (Tratamiento Completo)	Monitoreo Y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo Se Realiza El Monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
12	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	Ambientales - Sociales	Afectación a la ejecución de actividades por amenazas externas asociadas a factores naturales (fenómenos climáticos y geológicos) y factores antrópicos (Alteraciones en el orden público, atentados, etc.)	Retrasa la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales y puede afectar el presupuesto del contrato	4	4	8	Alto	Entidad - Contratista	Se generan planes de contingencia estratégicos que permitan ejecutar las actividades establecidas en los plazos pactados o suspensión contractual	3	3	6	Medio	SI	Contratista-interventor-entidad	Al momento de requerirse	A la terminación del plazo contractual	Verificación de la implementación de los planes de contingencia o las causales que dan origen a la suspensión	Diario en caso de planes de contingencia o previo al reinicio de ejecución contractual en caso de suspensiones.

En el caso concreto, la autoridad de policía ya implementó medidas de patrullaje y presencia, y no hay reiteración de hechos; por tanto, el tratamiento primario aplicable es mantener y reforzar el plan de contingencia con seguimiento de la interventoría, y solo acudir a la suspensión si el riesgo persiste o se agrava al punto de tornar imposible la ejecución. En consecuencia, no se

configura hoy una imposibilidad actual que justifique la suspensión inmediata por 15 días solicitada por el contratista.

Desde el punto de vista jurídico, la suspensión del contrato es una medida excepcional y temporal por la cual se detiene la ejecución cuando existen circunstancias que la impiden o dificultan gravemente por motivos técnicos, jurídicos, económicos o de fuerza mayor/caso fortuito, y tiene efectos claros: subsiste el vínculo, no corren los plazos de ejecución y no son exigibles las obligaciones suspendidas mientras dura la medida. La doctrina administrativa de Colombia Compra Eficiente (Concepto C-500 de 2024!, y C-458 de 20252) precisa que, por regla general, la suspensión se acuerda entre las partes (no es unilateral), exige motivos fundados y puede derivar de facto cuando hechos irresistibles imposibilitan continuar, caso en el que deben dejarse constancias escritas; asimismo reitera que durante la suspensión "el tiempo se detiene" y no se contabiliza para el plazo. Estos criterios han sido acogidos en la relatoría oficial y sistematizan los requisitos mínimos: (i) que la naturaleza del contrato admita suspensión; (ii) que no haya prohibición legal; (iii) que la medida procure el interés general; y (iv) que se demuestre fuerza mayor/caso fortuito o causa suficiente.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado que la suspensión no extingue el contrato, solo afecta temporalmente las obligaciones que resultan imposibles de cumplir, pudiendo ser total o parcial según la magnitud de la causa. También ha advertido que puede acordarse por cláusula o por acta "por razones de interés público", y que en los supuestos de fuerza mayor puede configurarse una suspensión de facto que debe constar documentalmente.

Este entendimiento distingue entre la imposibilidad actual (que habilita suspender) y las dificultades manejables con contingencias (que exigen continuidad con mayores controles). (Alcance, carácter y modalidades de la suspensión en ejecución).

Aplicando esos criterios al caso, la presencia de la Policía y la ausencia de nuevos hechos indican que la contingencia inicial fue atendida y que el riesgo, si bien no desaparece, se encuentra mitigado al punto de permitir la continuidad de la obra bajo un esquema reforzado de seguridad y monitoreo. En ese escenario, la suspensión se tornaría desproporcionada frente al principio de continuidad y a la finalidad pública de la obra, máxime cuando la propia

matriz prevé como primera línea los planes de contingencia y reserva la suspensión para cuando la afectación impida ejecutar. En términos otros términos, hoy no se acredita una imposibilidad objetiva y actual; más bien, se constata una dificultad que está siendo gestionada interinstitucionalmente.
Con todo, debe dejarse constancia formal de que el evento del 16 de marzo sí activó el Riesgo 12 y que este Ministerio mantiene un seguimiento reforzado. En coherencia con la doctrina y la jurisprudencia citadas, se recomienda no acceder, por ahora, a la suspensión de 15 días y, en su lugar, ordenar la continuidad condicionada a: i) verificación periódica de las rondas policiales y registro en actas; ii) control diario de acceso y custodia de activos;

ii!) coordinación de horarios de trabajo con los patrullajes; y iv) reporte inmediato si reaparecen hechos de amenaza o coacción. Si llegare a reiterarse el evento o se agravan las condiciones de orden público de manera tal que la ejecución devenga imposible, la suspensión podría decretarse por acuerdo de partes, con sustento en la Matriz de Riesgos y en los criterios de CCE y del Consejo de Estado antes referidos.

A la fecha, con plan policial activo y sin nuevos incidentes, no se configura una imposibilidad actual que habilite la suspensión; en cambio, procede continuar con contingencias reforzadas y monitoreo estrecho. La suspensión debe quedar condicionada a la reiteración o agravamiento del riesgo, caso en el cual podría adoptarse por acuerdo de partes con base en la Matriz de Riesgos (Riesgo 12) y los criterios CCE/Consejo de Estado sobre suspensión y fuerza mayor.

Por su atención estamos atentos a cualquier situación que afecte el transcurso de las actividades de manera grave o se reitere incidentes en contra de la seguridad del personal administrativo y operativo.

ANGELICA PERDOMO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

CC. María Fernanda Martínez Patiño - apoyo a la supervisión - mmartinezp@mincultura.gov.co

1 https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-500-de-2024/
2 https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-458-de-2025/

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-236 - RESPUESTA Y REQUERIMIENTO SOBRE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN INMEDIATA – COMUNICACIÓN CFP-MC-4335-2024-233

Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com> 20 de marzo de 2026 a las 18:46
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Cc: Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Cordial saludo
En atención la solicitud realizada frente a la suspensión temporal del contrato por causales de caso Fortuito nos permitimos emitir respuesta .

Atentamente
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
INTERVENTORIA

De: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Enviado: miércoles, 18 de marzo de 2026 18:21
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>
Cc: Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>; Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>
Asunto: CFP-MC-4335-2024-236 - RESPUESTA Y REQUERIMIENTO SOBRE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN INMEDIATA – COMUNICACIÓN CFP-MC-4335-2024-233

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.

Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

CON-093-MINCUL-2025 Respuesta frente a solicitud de suspension.pdf
159K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-236 - RESPUESTA Y REQUERIMIENTO SOBRE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN INMEDIATA – COMUNICACIÓN CFP-MC-4335-2024-233

Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com> 20 de marzo de 2026 a las 18:46
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Cc: Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Cordial saludo
En atención la solicitud realizada frente a la suspensión temporal del contrato por causales de caso Fortuito nos permitimos emitir respuesta .

Atentamente
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
INTERVENTORIA

De: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Enviado: miércoles, 18 de marzo de 2026 18:21
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>
Cc: Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>; Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>
Asunto: CFP-MC-4335-2024-236 - RESPUESTA Y REQUERIMIENTO SOBRE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN INMEDIATA – COMUNICACIÓN CFP-MC-4335-2024-233

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.

Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

CON-093-MINCUL-2025 Respuesta frente a solicitud de suspension.pdf
159K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-239 - REMISIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO No. 18

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 20 de marzo de 2026 a las 12:45
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, consultoresdeloccidentesas@hotmail.com, guspalr2026@gmail.com

Buen dia,

Nos permitimos remitir la información en asunto.

Att CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

2 adjuntos

CFP-MC-4335-2024-239 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 18.pdf
269K

18 AVA ORDEN MAQUINARIA ARQINGCOSAS.zip
2333K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-243 - REMISIÓN PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y HOJA DE VIDA PROFESIONAL GERENCIA DE PROYECTOS

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 20 de marzo de 2026 a las 17:44
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, consultoresdeloccidentesas@hotmail.com, guspalr2026@gmail.com

Buenos días,

Nos permitimos remitir la información en asunto para los fines pertinentes.

Att CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

3 adjuntos

- **CFP-MC-4335-2024-243 - REMISION HOJA DE VIDA PROFESIONAL GERENCIA DE PROYECTOS.pdf** 253K
- **PLAN DE GERENCIA V2.pdf** 2824K
- **11. PROFESIONAL GERENCIA DE PROYECTOS.zip** 3639K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

ESPECIFICACIÓN AISLAMIENTO ACÚSTICO

1 mensaje

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 20 de marzo de 2026 a las 10:46
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>
Cc: Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>

Cordial saludo,

Remito documento de especificaciones donde aparece el detalle del aislamiento acústico previsto junto con el plano.

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

2 adjuntos

2024-11-13 ESPECIFICACIONES MARGARITA HURTADO.pdf
4826K

CCBV Ajustes ARQ Rev10 09-11-2019-A-21 (2).pdf
1074K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

REUNIÓN DEFINICIÓN APOYO 19 CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 20 de marzo de 2026 a las 13:42
Para: "dir_planeacion@buenaventura.gov.co" <dir_planeacion@buenaventura.gov.co>, "dir_vivienda@buenaventura.gov.co" <dir_vivienda@buenaventura.gov.co>, "dir_cultura@buenaventura.gov.co" <dir_cultura@buenaventura.gov.co>, "infraestructura@buenaventura.gov.co" <infraestructura@buenaventura.gov.co>, "asesor01@buenaventura.gov.co" <asesor01@buenaventura.gov.co>, "alcaldesa@buenaventura.gov.co" <alcaldesa@buenaventura.gov.co>, Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>, adriana zamora manyoma <adrizamora72@hotmail.com>

Cordial saludo,

De manera atenta remito link para mesa de trabajo virtual a desarrollar el próximo 24 de marzo a las 4:00 pm, en aras de realizar las definiciones requeridas para el apoyo 19 de la membrana arquitectónica a construir en la Casa de la Cultura Margarita Hurtado.

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/2231092729799?p=QNNr3WNl8rVLYM0Vb0

Id. de reunión: 223 109 272 979 9

Código de acceso: 9Km7DS7Z

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

invite.ics
6K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

REUNIÓN DEFINICIÓN APOYO 19 CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 20 de marzo de 2026 a las 13:42
Para: "dir_planeacion@buenaventura.gov.co" <dir_planeacion@buenaventura.gov.co>, "dir_vivienda@buenaventura.gov.co" <dir_vivienda@buenaventura.gov.co>, "dir_cultura@buenaventura.gov.co" <dir_cultura@buenaventura.gov.co>, "infraestructura@buenaventura.gov.co" <infraestructura@buenaventura.gov.co>, "asesor01@buenaventura.gov.co" <asesor01@buenaventura.gov.co>, "alcaldesa@buenaventura.gov.co" <alcaldesa@buenaventura.gov.co>, Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>, adriana zamora manyoma <adrizamora72@hotmail.com>

Cordial saludo,

De manera atenta remito link para mesa de trabajo virtual a desarrollar el próximo 24 de marzo a las 4:00 pm, en aras de realizar las definiciones requeridas para el apoyo 19 de la membrana arquitectónica a construir en la Casa de la Cultura Margarita Hurtado.

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/2231092729799?p=QNNr3WNl8rVLYM0Vb0

Id. de reunión: 223 109 272 979 9

Código de acceso: 9Km7DS7Z

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

invite.ics
6K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

SOLICITUD DE APOYO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINSITRATIVO No. 3952 de 2024

Asesor Alcalde <asesor01@buenaventura.gov.co> 20 de marzo de 2026 a las 8:43
Para: Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co>
Cc: Direccion Planeacion <dir_planeacion@buenaventura.gov.co>, Direccion Tecnica de Cultura <dir_cultura@buenaventura.gov.co>, Ventanilla Unica <ventanilla_unica@buenaventura.gov.co>, Direccion Tecnica de Vivienda <dir_vivienda@buenaventura.gov.co>, adriana zamora manyoma <adrizamora72@hotmail.com>, Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>, Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Laura Ines Pelaez Velasquez <lpelaez@mincultura.gov.co>, Direccion de Infraestructural Vial <infraestructura@buenaventura.gov.co>

Cordial saludo,

De conformidad a la solicitud presentada, se genera espacio para el día martes 24 de marzo a las 4pm.

Quedamos atentos al enlace de conexión.

NUESTRA RIQUEZA NOS VIENE DEL MAR

Laura D. Suárez Marín
Asesora del despacho
Abogada y Economista
Esp. Proyectos de Desarrollo
Mag. DH, DIH y transformaciones sociales para la paz
Est Mag. Relaciones Internacionales
asesor01@buenaventura.gov.co
Edificio CAD Calle 2 Cra 3 Centro
Buenaventura, Valle Del Cauca
www.buenaventura.gov.co

On Wed, Mar 11, 2026, 11:12 AM Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> wrote:

> Cordial saludo,
>
> Como es de su conocimiento en el marco del convenio del asunto, este ministerio adelantó la contratación de las actividades relacionadas con la construcción de la membrana arquitectónica de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado. Es así como en el marco de la ejecución del contrato de obra No. 4335 de 2024, suscrito por este Ministerio, se adelantan actualmente las actividades de construcción de la cimentación que soportará la membrana arquitectónica.
>
> De acuerdo con lo anterior, se presenta situación que dificulta la construcción de uno de los caisson, por lo que de manera atenta solicitamos evaluar la posibilidad de autorizar intervención en el previo contiguo, de acuerdo con lo descrito en el oficio adjunto.
>
> Es así como remitimos el oficio, y solicitamos adelantar mesa de trabajo virtual (podría ser el día viernes), para las aclaraciones que se requieran, de acuerdo con la información enviada.
> ***Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.***

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
NIT. 900.457.115-5

Bogotá D.C., 20 de marzo De 2026

ARQUIECTA
JULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ
SUPERVISORA INTERVENTORIA
MINCULTURA
jramirezr@mincultura.gov.co
Ciudad

CON-094-MINCUL-2025

REF.: Contrato de interventoría No 4340-2024 cuyo objeto es " Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto, efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del **Valle Del Cauca**"

ASUNTO: Aval a hoja de vida profesional gerencia de proyectos

Respetada Arquitecto

Respecto a la solicitud realizada con oficio CFP-MC-4335-2024-243 de fecha 20 de marzo de 2026, nos permitimos dar nuestro aval después de revisada la hoja de vida.

Atentos a cualquier solicitud.



ANGELICA PERDOMO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

CC. María Fernanda Martínez Patiño - apoyo a la supervisión - mmartinezp@mincultura.gov.co

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-243 - REMISIÓN PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y HOJA DE VIDA PROFESIONAL GERENCIA DE PROYECTOS

Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com>
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

21 de marzo de 2026 a las 8:04

Cordial saludo
Nos permitimos dar aval a la hoja de vida de la profesional propuesta y de igual manera al plan de gerencia , por ende solicitamos se nos envié el primer informe correspondiente al mes de febrero en relación
Al plan de gerencia luego del inicio de ejecución de obra en la casa de la cultura.
Agradecemos su gestión a fin de dar cumplimiento a lo definido contractualmente.

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
INTEREVENTORIA

De: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Enviado: viernes, 20 de marzo de 2026 17:44
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>; consultoresdeloccidentesas@hotmail.com <consultoresdeloccidentesas@hotmail.com>; guspalr2026@gmail.com <guspalr2026@gmail.com>
Asunto: CFP-MC-4335-2024-243 - REMISIÓN PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y HOJA DE VIDA PROFESIONAL GERENCIA DE PROYECTOS

[El texto citado está oculto]

CON-094-MINCUL-2025 aval hoja de vida gerente proyectos.pdf
76K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-230 - REMISION ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS V1

Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com> 24 de marzo de 2026 a las 9:37
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Cc: Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>

Cordial saludo
Luego de realizar las respectivas revisiones al archivo en Excel correspondientes a los apus no previstos, podemos indicar:
1.Se debe revisar la mano de obra porque se esta incluyendo cuadrillas de mas para la actividad y que en realidad no se necesitan.
2.Se debe revisar los rendimientos de la mano de obra porque no son acordes a la actividad.
3 el porcentaje de la herramienta menor esta establecida en los apus contractuales em el 5% de la mano de obra .
4 Hay una actividad que la unidad de medida deber ser ML
5.En la revision del mercado caso especifico precios ICCU de referencia la actividad define un menor precio al considerado.

Por consiguiente se debe revisar y ajustar los apus entregados.
Atentamente
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
INTERVENTORIA

De: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Enviado: jueves, 19 de marzo de 2026 13:15
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>
Asunto: Re: CFP-MC-4335-2024-230 - REMISION ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS V1

Adjunto para revisión con ajustes!!

El jue, 12 mar 2026 a las 16:37, Proyectos Arqingco (<proyectos@arqingco.com>) escribió:

> Buen día
>
> Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.
>
> CONSORCIO FP
>
> --

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:

La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

NP-C4335-2024-MINCULTURA-TENSO-OBRA-V3 RV INT V1.xlsx
4616K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-230 - REMISION ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS V1

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 24 de marzo de 2026 a las 12:54
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com>

Cordial saludo,

Adjunto archivo con los ajustes solicitados en el marco del análisis de cada una de las observaciones.

at CONSORCIO FP

El mar, 24 mar 2026 a las 9:38, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta (<Interbuenaventura2025@hotmail.com>) escribió:

> Cordial saludo
> Luego de realizar las respectivas revisiones al archivo en Excel correspondientes a los apus no previstos, podemos indicar:
> 1.Se debe revisar la mano de obra porque se esta incluyendo cuadrillas de mas para la actividad y que en realidad no se necesitan.
> 2.Se debe revisar los rendimientos de la mano de obra porque no son acordes a la actividad.
> 3 el porcentaje de la herramienta menor esta establecida en los apus contractuales em el 5% de la mano de obra .
> 4 Hay una actividad que la unidad de medida deber ser ML
> 5.En la revision del mercado caso especifico precios ICCU de referencia la actividad define un menor precio al considerado.
>
> Por consiguiente se debe revisar y ajustar los apus entregados.
> Atentamente
> CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
> INTERVENTORIA
>
> ---
>
> **De:** Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
> **Enviado:** jueves, 19 de marzo de 2026 13:15
> **Para:** Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>
> **Asunto:** Re: CFP-MC-4335-2024-230 - REMISION ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS V1
>
> Adjunto para revisión con ajustes!!
>
> El jue, 12 mar 2026 a las 16:37, Proyectos Arqingco (<proyectos@arqingco.com>) escribió:
>
> > Buen día
> >
> > Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.
> >
> > CONSORCIO FP
> >
> > --
>
> ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
> Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
> (57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
> contactenos@arqingco.com
>
> Recuerda:
> Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
> Recicla y reduce el consumo de hojas.
>
> Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

NP-C4335-2024-MINCULTURA-TENSO-OBRA-V4.xlsx
4548K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

REUNIÓN DEFINICIÓN APOYO 19 CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO

1 mensaje

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 24 de marzo de 2026 a las 15:44
Para: "dir_planeacion@buenaventura.gov.co" <dir_planeacion@buenaventura.gov.co>, "dir_vivienda@buenaventura.gov.co" <dir_vivienda@buenaventura.gov.co>, "dir_cultura@buenaventura.gov.co" <dir_cultura@buenaventura.gov.co>, "infraestructura@buenaventura.gov.co" <infraestructura@buenaventura.gov.co>, "asesor01@buenaventura.gov.co" <asesor01@buenaventura.gov.co>, "alcaldesa@buenaventura.gov.co" <alcaldesa@buenaventura.gov.co>, Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>, adriana zamora manyoma <adrizamora72@hotmail.com>

Cordial saludo,

De manera atenta remito link para mesa de trabajo virtual a desarrollar el próximo 24 de marzo a las 4:00 pm, en aras de realizar las definiciones requeridas para el apoyo 19 de la membrana arquitectónica a construir en la Casa de la Cultura Margarita Hurtado.

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/2231092729799?p=QNNr3WNl8rVLYM0Vb0

Id. de reunión: 223 109 272 979 9

Código de acceso: 9Km7DS7Z

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

invite.ics
6K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-240 - REMISION CITACION DE VISITA A TALLER

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 25 de marzo de 2026 a las 7:43
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

CFP-MC-4335-2024-240 - REMISION CITACION DE VISITA A TALLER.pdf
259K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-244- REMISION INFORME SEMANAL 37

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 25 de marzo de 2026 a las 10:53
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

3 adjuntos

- **CFP-MC-4335-2024-244- REMISION INFORME SEMANAL 37 16-21 MAR 2026.pdf** 248K
- **ANEXOS INFORME 37.zip** 5030K
- **INFORME SEMANAL CONSORCIO FP NUMERO 37 DEL 16 DE MARZO AL 21 DE MARZO.pdf** 14975K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-245 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 19|

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 25 de marzo de 2026 a las 9:21
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, consultoresdeloccidentesas@hotmail.com, guspalr2026@gmail.com

Buen día,

Nos permitimos remitir la información en asunto.

Att CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

3 adjuntos

- **CFP-MC-4335-2024-245 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 19.pdf**
  259K
- **19 ORDEN ING CALIDAD DM - CORTE 2.zip**
  2803K
- **LISTADO ORDENES CONSORCIO FP + ADICION - BUENAVENTURA FINAL.xlsb.pdf**
  56K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-245 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 19|

Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com> 25 de marzo de 2026 a las 10:53
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo
Envio el giro firmado para tramite respectivo

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
INTERVENTORIA

De: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Enviado: miércoles, 25 de marzo de 2026 9:21
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>; consultoresdeloccidentesas@hotmail.com <consultoresdeloccidentesas@hotmail.com>; guspalr2026@gmail.com <guspalr2026@gmail.com>
Asunto: CFP-MC-4335-2024-245 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 19|

Buen día,

Nos permitimos remitir la información en asunto.

Att CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

ORDEN 19 Modelo de Orden de giro FID - 319275 fr.pdf
233K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-245 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 19|

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 25 de marzo de 2026 a las 15:56
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com>

Buen dia,

Nos permitimos remitir la orden ajustada de acuerdo a la solicitud de la Fiducia.



Att CONSORCIO FP
[El texto citado está oculto]

19 AVA ORDEN ING CALIDAD DM - CORTE 2 PARTE 1.zip
2802K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-246 - REMISIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ADICIÓN v1

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 25 de marzo de 2026 a las 12:03
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, consultoresdeloccidentesas@hotmail.com
Cc: guspalr2026@gmail.com

Buen dia,

Nos permitimos remitir el plan de inversión del anticipo de la adición para su respectiva revisión y firma.

Agradecemos la atención prestada

Att CONSORCIO FP
--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

2 adjuntos

CFP-MC-4335-2024-246 - REMISION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO ADICION v1.pdf
258K

Plan_Inversion_Anticipo No. 002 v1 - Adicion.pdf
158K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-246 - REMISIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ADICIÓN v1

Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com> 25 de marzo de 2026 a las 12:12
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo
Nos permitimos remitir el plan de inversión del anticipo con el adicional debidamente suscrito para fines pertinentes.

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
INTERVENTORIA

De: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Enviado: miércoles, 25 de marzo de 2026 12:03
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>; consultoresdeloccidentesas@hotmail.com <consultoresdeloccidentesas@hotmail.com>
Cc: guspalr2026@gmail.com <guspalr2026@gmail.com>
Asunto: CFP-MC-4335-2024-246 - REMISIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ADICIÓN v1

Buen dia,

Nos permitimos remitir el plan de inversión del anticipo de la adición para su respectiva revisión y firma.

Agradecemos la atención prestada

Att CONSORCIO FP
--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

Plan_Inversion_Anticipo No. 002 v1 - Adicion FR.pdf
192K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-248 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 01 ADC

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 25 de marzo de 2026 a las 16:06
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, consultoresdeloccidentesas@hotmail.com, guspalr2026@gmail.com

Buen día,

Nos permitimos remitir la información en asunto.

Att CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia

(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923

contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

2 adjuntos

CFP-MC-4335-2024-248 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 01 ADC.pdf
259K

01 ADC - ORDEN ING CALIDAD DM - CORTE 2 PARTE 1.zip
2804K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-248 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 01 ADC

Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com> 26 de marzo de 2026 a las 7:48
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo
Envio orden de giro 19 parte 1 y 1 parte 1 firmadas para su gestion

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
INTERVENTORIA

De: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Enviado: miércoles, 25 de marzo de 2026 16:06
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>; consultoresdeloccidentesas@hotmail.com <consultoresdeloccidentesas@hotmail.com>; guspalr2026@gmail.com <guspalr2026@gmail.com>
Asunto: CFP-MC-4335-2024-248 - REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO No. 01 ADC

Buen día,

Nos permitimos remitir la información en asunto.

Att CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

2 adjuntos

ORDEN 01 ADC Modelo de Orden de giro FID - 319275 FR.pdf
234K

ORDEN 19 Modelo de Orden de giro FID - 319275 FR.pdf
231K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Fw: Editables bibliotec y urbanismo

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 26 de marzo de 2026 a las 19:31
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Cc: Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>, Lilia Estela Rincon Torres <lrincon@mincultura.gov.co>

Cordial saludo,

Remito planos del asunto, de acuerdo con compromiso.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Enviado desde Outlook para iOS

De: Lilia Estela Rincon Torres <lrincon@mincultura.gov.co>
Enviado: Thursday, March 26, 2026 3:01:47 PM
Para: Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co>
Asunto: Editables bibliotec y urbanismo

Cordial saludo, Mafe:

Mediante el presente remito.

1. Editable dialux del edificio la biblioteca
2. Editable dialux del urbanismo

Cordialmente,
Urbanismo buenaventura opcion luminaria sin brazo 1.evo

Culturas

Lilia Estela Rincón Torres
Contratista - Grupo de Infraestructura Cultural.
Email: lrincon@mincultura.gov.co
Teléfono: 3424100 ext. 1250
Dirección: Calle 9 No. 8-51 Bogotá D.C. Colombia
www.mincultura.gov.co

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario. Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario. Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

Biblioteca auditorio.evo
23056K

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS
NIT. 900.457.115-5

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2026

Señor.
GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
R/L CONSORCIO FP
CARRERA 15A No.124 – 60 OFICINA 102
CORREO: proyectos@arqingco.com

Ciudad CON-095-MINCUL-2025

REF.: Contrato de interventoría No 4340-2024 cuyo objeto es " Adelantar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto, efectuar los diseños de ingeniería de detalle y las actividades requeridas para el suministro y la instalación de la Cubierta en tela tipo membrana, incluyendo la estructura metálica del complejo Margarita Hurtado en la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle Del Cauca"

ASUNTO: Llamado de atención formal por incumplimiento de directrices de la interventoría, conductas reiteradas y requerimiento de acciones correctivas

Respetado Arquitecto

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y verificación a cargo de la interventoría del contrato de la referencia, nos permitimos emitir el presente llamado de atención formal, en razón a situaciones reiteradas evidenciadas en campo que afectan la adecuada ejecución del proyecto y la correcta articulación entre las partes.

Se ha identificado de manera recurrente:

La inobservancia de las directrices técnicas, sociales y procedimentales impartidas por la interventoría, dentro del marco de sus competencias contractuales.
La actitud reiterada de negativa por parte del residente de obra frente a solicitudes técnicas y lineamientos de ejecución, lo cual en múltiples ocasiones se traduce en omisiones, dilaciones o en la adopción de decisiones unilaterales contrarias a lo indicado por la interventoría.

Comportamientos inapropiados por parte de profesionales del contratista en obra, incluyendo actitudes irrespetuosas, uso de lenguaje inadecuado y desconocimiento de los canales institucionales de comunicación y coordinación.

Es preciso señalar que, previo a la emisión del presente oficio, se han realizado múltiples llamados de atención y acercamientos verbales en campo entre los equipos profesionales, con el propósito de corregir estas situaciones. No obstante, las conductas persisten, lo que obliga a esta interventoría a dejar constancia formal de lo ocurrido.

En particular, se destacan los hechos presentados durante la reunión sostenida entre el equipo social de la interventoría y del contratista, en la cual:

La interventoría solicitó gestionar un acercamiento institucional con la Defensoría del Pueblo y la Personería, como parte de las estrategias de acompañamiento social del proyecto.
El ingeniero residente, señor Galdino, intervino de manera alterada, elevando el tono de voz y desestimando la solicitud sin el debido análisis técnico.
Interrumpió de forma inapropiada la intervención del profesional social de la interventoría, Exigiendo en un tono fuera de lugar guardar silencio y descalificando la recomendación emitida.
Utilizó lenguaje inadecuado y manifestó de manera tajante su negativa, ordenando a la profesional social del contratista no dar trámite a la solicitud de la interventoría.
Como consecuencia, no se atendió la recomendación técnica, situación que fue consignada en acta.
Lo anterior evidencia no solo un desconocimiento del rol de la interventoría como instancia de control y seguimiento, sino también una afectación directa a los principios de coordinación, respeto institucional y adecuada ejecución contractual.
En este sentido, se reitera que las instrucciones y recomendaciones emitidas por la interventoría no son de carácter opcional, en la medida en que responden a criterios técnicos, contractuales y normativos orientados a garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

}

En virtud de lo anterior, esta interventoría requiere de manera inmediata:

Garantizar que el personal del contratista en obra actúe bajo principios de respeto, profesionalismo y adecuada comunicación.
Asegurar el acatamiento efectivo de las directrices impartidas por la interventoría, evitando decisiones unilaterales o contrarias a lo indicado.
Adoptar las medidas correctivas internas necesarias para prevenir la reiteración de estas conductas.

Finalmente, se advierte que, de persistir estas situaciones, la interventoría procederá a escalar formalmente el caso a las instancias contractuales correspondientes, incluyendo la solicitud expresa de cambio del personal que resulte necesario (incluido el residente de obra u otros profesionales en sitio), con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones establecidas, así como el debido acatamiento de las directrices de la interventoría.

Agradecemos se sirvan informar, a la mayor brevedad, las acciones correctivas adoptadas frente a lo aquí expuesto.


Adjuntamos foto de bitacora.

Cordialmente;



ANGELICA PERDOMO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Elaboró: German Parra - Director de Interventoría
CC. Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión - mmartinezp@mincultura.gov.co
Fabio Florez Montesino - apoyo técnico a la supervisión - fflorez@mincultura.gov.co

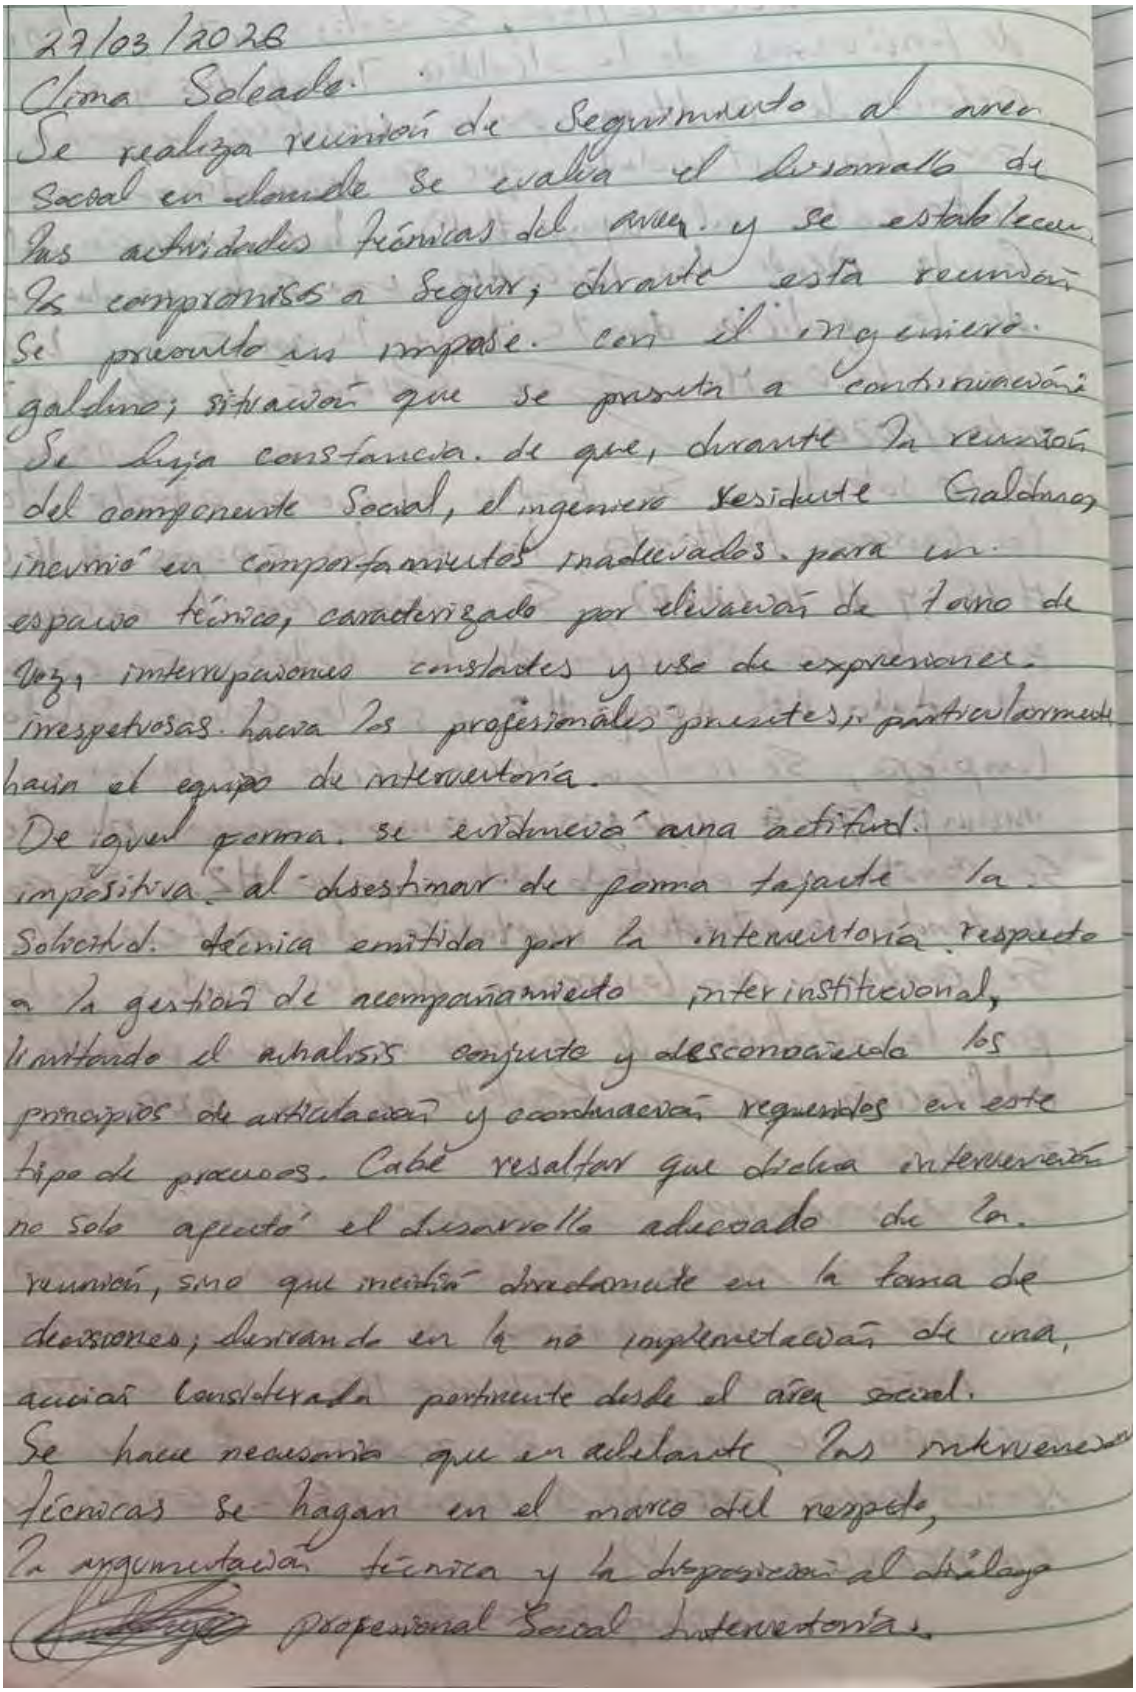

27/03/2026
Cima Soledad.
Se realiza reunión de Seguimiento al área Social en donde se evalúa el desarrollo de las actividades técnicas del área. y se establecen los compromisos a seguir; durante esta reunión se presento un impase. con el ingeniero Galdino; situación que se presta a controversia. Se deja constancia. de que, durante la reunión del componente Social, el ingeniero residente Galdino, incurrió en comportamientos inadecuados. para un espacio técnico, caracterizado por elevación de tono de voz, interrupciones constantes y uso de expresiones irrespetuosas hacia los profesionales presentes, particularmente hacia el equipo de interventoría.
De igual forma. se evidencia una actitud impositiva. al desestimar de forma tajante la. Solicitud. técnica emitida por la interventoría respecto a la gestión de acompañamiento interinstitucional, omitiendo el análisis conjunto y desconociendo los principios de articulación y coordinación vigentes en este tipo de procesos. Cabe resaltar que dicha intervención no solo afectó el desarrollo adecuado de la. reunión, sino que incidió directamente en la toma de decisiones; derivando en la no implementación de una acción considerada pertinente desde el área social.
Se hace necesario que en adelante las intervenciones técnicas se hagan en el marco del respeto, la argumentación técnica y la disposición al diálogo profesional Social Interventoría.

Objetivo: SEGUIMIENTO AL AREA SOCIAL		
Responsable: Interventoría	**Dependencia: MinCultura**	**Lugar y Fecha: 24/02/2026 Reunión Virtual**

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Entidad/Dependencia	Celular Teléfono Fijo	Correo electrónico	Firma
REPRESENTANTES						
1						
2						
3						
PARTICIPANTES						
4	MARLYNG VALLEJO	PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA	Contratista / Consorcio FP			
5	SANTIAGO PASMIÑO	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	Interventoría / Consultores de Occidente			
6						
7						

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Inicio de comité 05:00 PM 20 DE FEBRERO 2026
Componente social	
	ORDEN DEL DÍA 1. Seguimiento a actividades del área social. • La Valla informativa ya fue instalada. • Las actas de vecindad no están terminadas, debido a la alteración del orden público y se toma su realización el día 27 de marzo. Se encuentran al 80% de su realización. • El acta de los andenes se encuentra pendiente de presentarse, se encuentra el registro fotográfico y está pendiente de transcripción y revisión. • La unión vial no asistió a la realización del acta, se había aplazado dicha acta hasta el día 27 por solicitud de la unión vial, pero a la fecha no manifestaron nada, ni se presentaron.

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

	• El acta anterior fue realizada por interventoría y enviada a el consorcio FP, quienes ya la revisaron, firmaron y devolvieron. • NOTA: Los retrasos en las actividades pendientes, se deben principalmente a los problemas de orden público y las amenazas sobre el personal de obra. 2. Recomendaciones y observaciones • Se hace solicitud por parte de la interventoría al área social del contratista, de hacer acercamiento a la personería y la defensoría del pueblo para solicitar acompañamiento con relación a los problemas de seguridad que se han venido presentando en la obra. • Por parte del ingeniero Galdino se levanta prohibición de seguir la solicitud hecha por la interventoría, aclarando que durante la reunión se le solicitó una aclaración técnica y él simplemente se dedicó a gritar su opinión, argumentando que al tener la denunciar en vigencia, el no acepta que se realice ningún otro comunicado o relación con entidades territoriales. 3. Acuerdos y compromisos • Se acuerda la entrega de las actas de vecindad para el día 10 de abril del 2026. Actas al 100% para su revisión por parte de interventoría. • Se acuerda que la interventoría dará revisión y respuesta de las actas de vecindad el día 17 de abril del 2026, para que se proceda a firmarlas por parte de los propietarios de los predios colindantes. Para posterior firma y aprobación final de por parte de interventoría. • Actas de andenes y vías, se presentarían el día lunes 30 de marzo del 2026, se revisarán por parte de la interventoría y se regresarán con las respectivas observaciones o en su defecto, con la aprobación el día martes 7 de abril del 2026. • Cartel informativo de la atención al publico por parte de los sociales, se estaría presentando el día viernes 9 de abril del 2026.
	Nota: El acta no está firmada por la profesional social de contratista debido a que se nego a firmarla antes de ser enviada por correo electrónico.
	-

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	ENTREGA DE ACTA	INTERVENTORIA	11/03/2026
4:10 Pm a 5:10 Pm reunión			**Tarde**

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CON-095 Llamado de atención formal

1 mensaje

Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <Interbuenaventura2025@hotmail.com>
27 de marzo de 2026 a las 17:12
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Cc: Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Fabio Enrique Florez Montesino <fflorez@mincultura.gov.co>

Buenas tardes.

Nos permitimos enviar oficio referenciado en el asunto.

CON-095-MINCUL-26032026.pdf
409K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Fw: RECORDATORIO: CONSULTA DE PAGOS - CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

1 mensaje

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 27 de marzo de 2026 a las 6:08
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>
Cc: Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>

Cordial saludo,

Remito para su conocimiento.

Enviado desde Outlook para iOS

De: Grupo de Gestion Financiera <grupogestionfinanciera@mincultura.gov.co>
Enviado: Thursday, March 26, 2026 5:32:32 PM
Para: Grupo de Gestion Financiera <GrupodeGestionFinanciera@mincultura.gov.co>
Asunto: RECORDATORIO: CONSULTA DE PAGOS - CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Buen día Proveedores y Contratistas.


Recordatorio: Esta disponible la Consulta de pagos y certificados de ingresos y retenciones para contratistas y proveedores del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el fin de que tengan acceso directo a la información desde el aplicativo SIIF Nación, esto de acuerdo a la guía adjunta.

De la misma manera, por medio del presente se adjunta la pieza informativa y el link https://www.minhacienda.gov.co/siif/acceso-consulta-de-pagos donde podrá encontrar el proceso para descargar su certificado de ingresos y retenciones y/o de la misma manera consultar la relación de pagos realizados a su nombre o nombre de la entidad, de la vigencia que deseen y tengan o hayan tenido algún tipo de relación contractual con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Este link no aplica para funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

En caso de no ser la persona pertinente para esta comunicación por favor remitir a los terceros interesados como Contratistas y/o Proveedores.

Importante: Debe realizar la consulta a nombre de la persona/entidad que se le realizó el pago y debe coincidir con el No. de cuenta bancaria del titular.

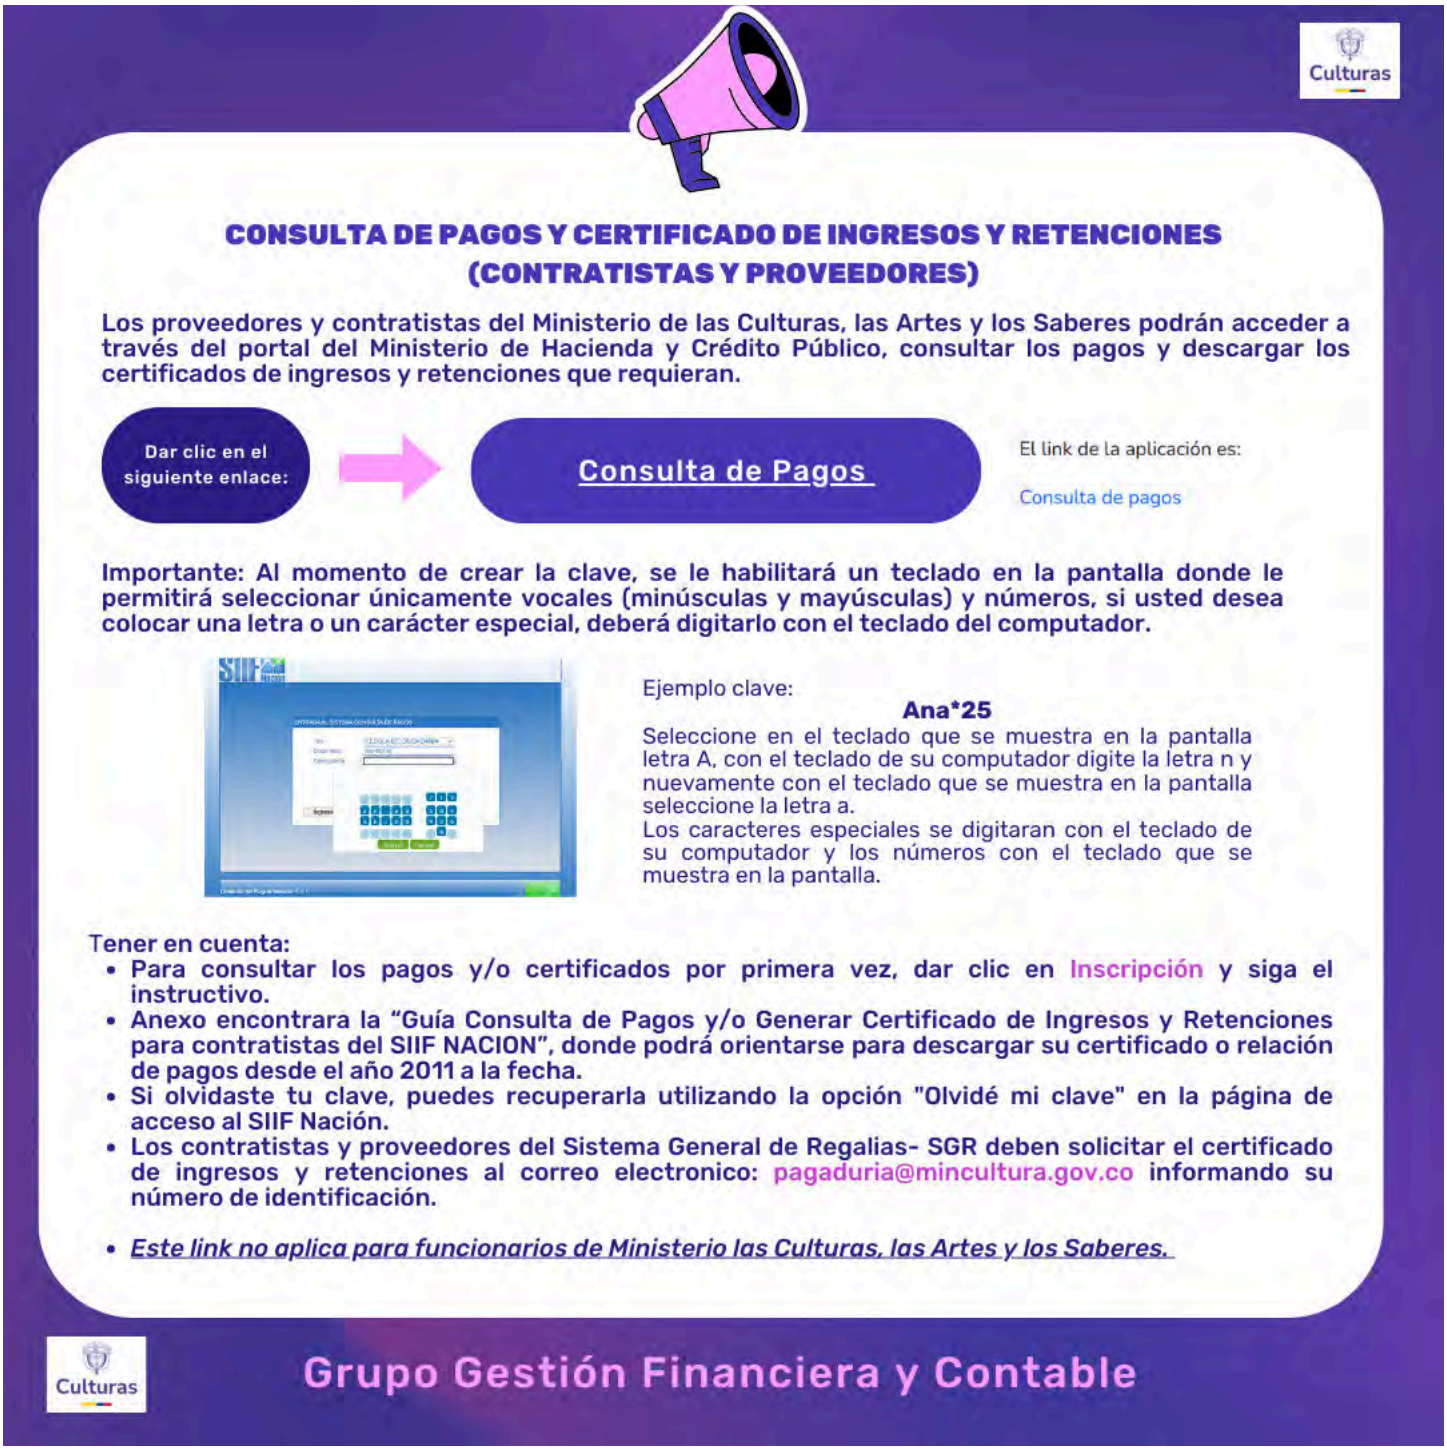

https://www.minhacienda.gov.co/siif/acceso-consulta-de-pagos

Cordialmente,

Grupo de Gestión Financiera y Contable

Culturas

Teléfono: 3424100 ext. 1131
Dirección: Casa Abadía, Calle 8 #8a-31.Bogotá, Colombia
www.mincultura.gov.co

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario. Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.
Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario. Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.
Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario. Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.
Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

Guía Consulta de Pagos y_o Generar Certificado de Ingresos y Retenciones para Contratista del SIIF NACION.pdf
1646K



Hacienda

Guía Consulta de Pagos y/o Generar Certificado de Ingresos y Retenciones para contratistas del SIIF NACION

Versión 1

17 de marzo de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. Como Ingresar 4
3. Entrada al Sistema 5
3.1 Inscripción de Personas 5
4. Consulta de Movimientos 8
4.1 Consulta de Pagos 8
4.2 Consultar Certificado 13
5. CASOS ESPECIALES 16
5.1 Quiero cambiar mi clave y/o mi correo electrónico 16
5.2 Olvidé mi clave 16

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

1. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público continuando con su política de desarrollo de sistemas de información que faciliten la gestión financiera pública, ha diseñado un sistema que le permite al proveedor o contratista consultar los pagos que le ha realizado alguna de las entidades usuarias de SIIF NACION, producto de la suscripción de un contrato o acto administrativo donde se ordena un pago a favor de una persona jurídica o personal natural (beneficiario final).

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR A LA CONSULTA DE PAGOS

2. COMO INGRESAR

Ingresar a www.minhacienda.gov.co


Dar clic en vínculo SIIF NACION o ingrese directamente en el link siguiente:

https://www.minhacienda.gov.co/siif



Dar clic en vínculo Consulta de Pagos

https://www.minhacienda.gov.co/siif/acceso-consulta-de-pagos




© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

3. ENTRADA AL SISTEMA

El sistema presenta la pantalla ‘’ENTRADA AL SISTEMA CONSULTA DE PAGOS’’.

Para consultar los pagos por primera vez, dar clic en *Inscripción*
Cuando ya está inscrito, seleccionar tipo de documento, registrar número de documento de identificación, clave asignada y oprima “Ingresar”.

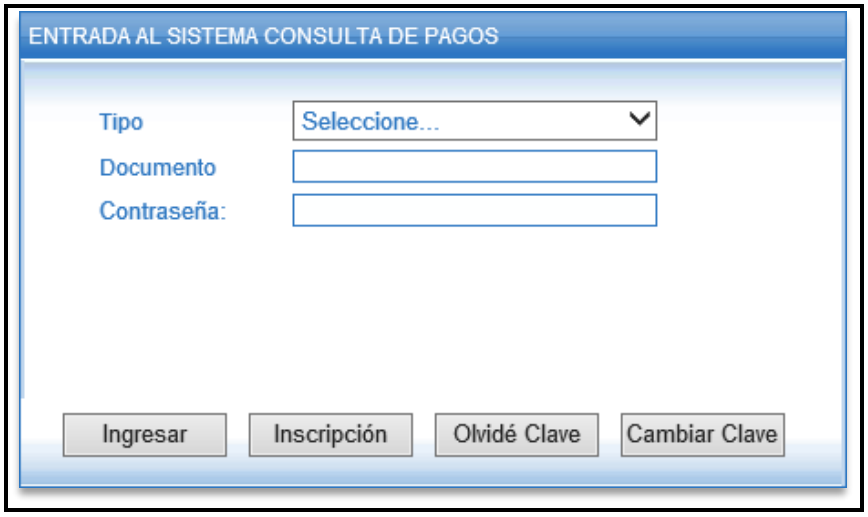

3.1 Inscripción de Personas

El sistema presenta la pantalla ‘’INSCRIPCION DE PERSONAS’’, el usuario, proveedor o contratista debe registrar sus datos personales así:

Tipo de Documento: Seleccione su tipo de documento de la lista que le presenta el sistema,

Documento: Registre su número de identificación de acuerdo con tipo seleccionado anteriormente,


Banco: Seleccione el nombre del banco donde tiene su cuenta bancaria y que la entidad contratante ha registrado previamente en el SIIF Nación.

Tipo de Cuenta: Seleccione el tipo de cuenta de la lista que le presenta el sistema,


© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Número de Cuenta: Registre el número de su cuenta bancaria (El número de cuenta bancaria, debe corresponder a una cuenta donde haya recibido pagos del SIF NACIÓN)

Después de registrar los datos dar clic en *Consultar*.

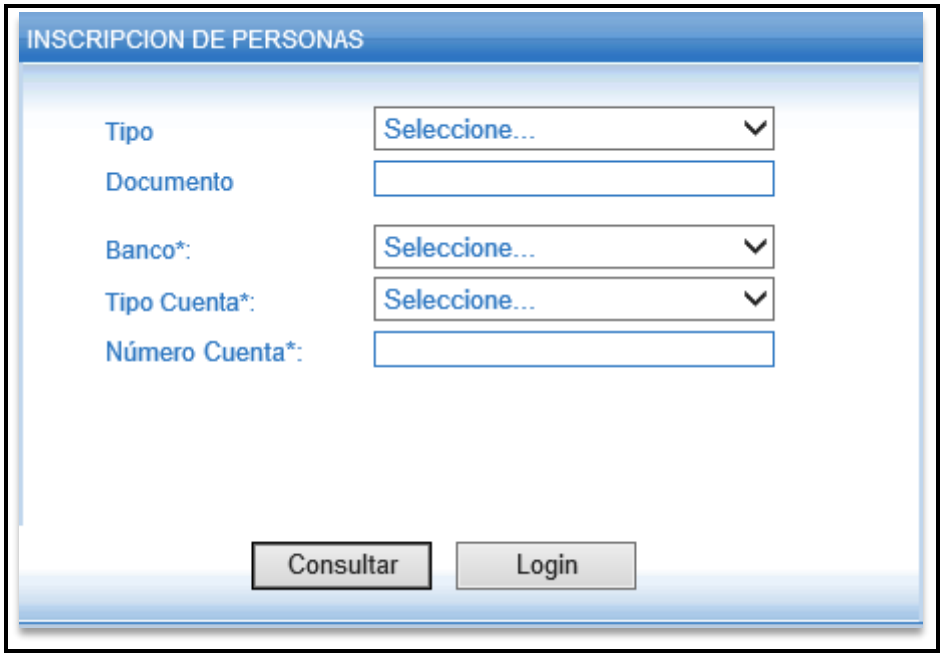


Cuando los datos registrados no son validados el sistema informa:



Si los datos registrados en la pantalla anterior son correctos y coinciden con los registrados en SIIF Nación, el sistema presentará un recuadro donde el usuario debe digitar un correo electrónico válido, luego dar clic en *Salvar*; con esta operación, el sistema le enviará una clave para ingresar a consultar los pagos


© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.





El sistema le envía al correo registrado la clave para ingresar por primera vez.

Una vez se recibe la clave para el ingreso, se repite la acción del punto 2, se registran los datos y la clave de ingreso.

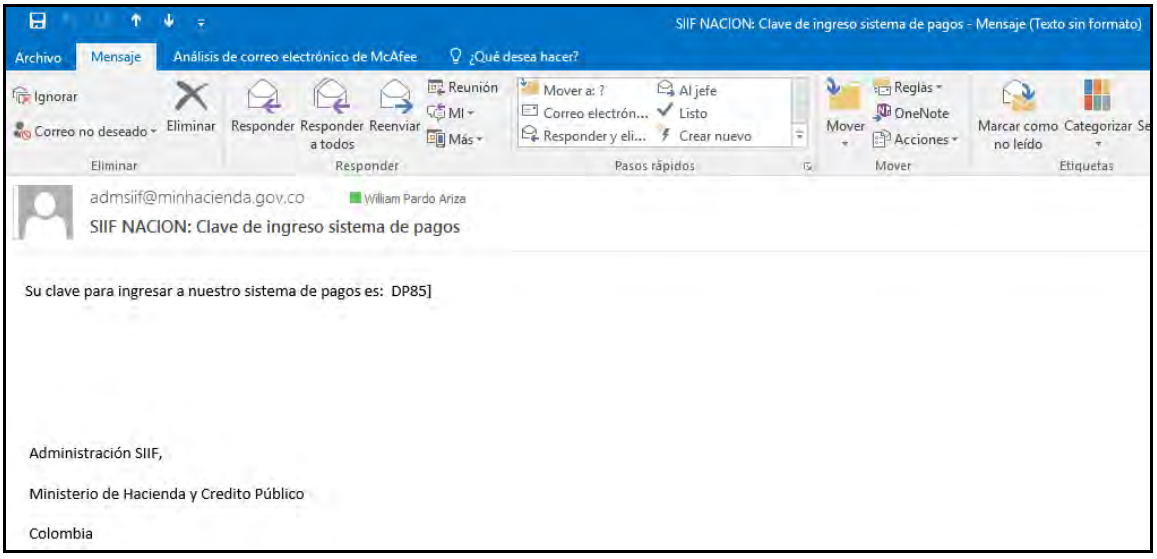

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

IMPORTANTE: Si en la bandeja principal no encuentra el correo, por favor buscarlo en la de no deseados.



IMPORTANTE: En el registro de la clave, se debe usar el teclado que el sistema dispone para digitar vocales mayúsculas, minúsculas y números.

4. CONSULTA DE MOVIMIENTOS


Si los datos son correctos, el sistema presenta la siguiente pantalla para:

4.1 Consulta de Pagos

Consultar el listado de pagos en un rango de fecha determinado.

Oprima el botón "Consulta Pagos".

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

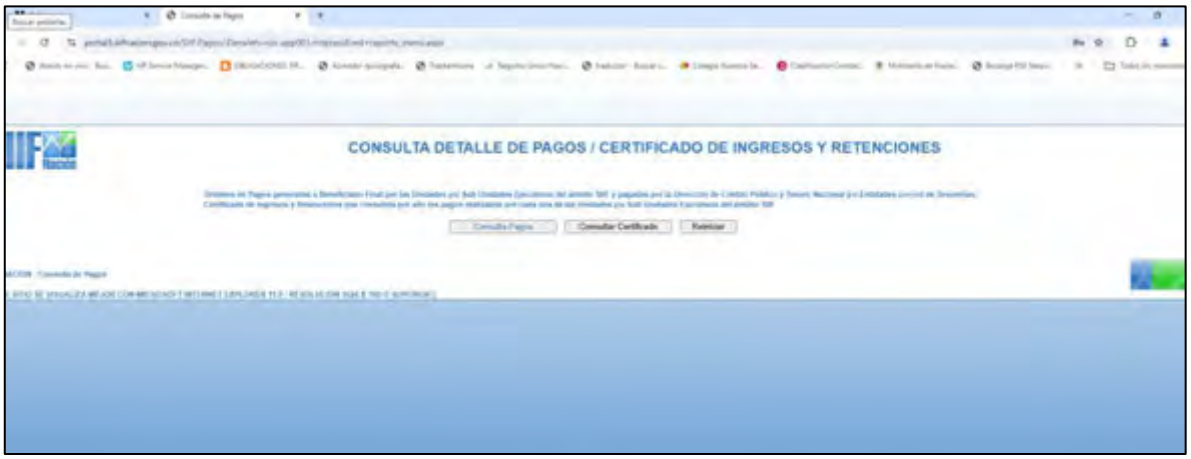

Si se seleccionó Consulta Pagos, el sistema presenta la siguiente pantalla para digitar fecha inicial y la fecha final, luego dar clic en *Consultar*, para volver al inicio dar clic en *Reiniciar.*




© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.




En la parte inferior derecha se presenta las páginas según la cantidad de información; para pasar de página dar clic en



Para consultar las deducciones aplicadas a un pago, dar clic en el hipervínculo del número de la Orden de Pago, el sistema muestra las deducciones aplicadas al pago así:




© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

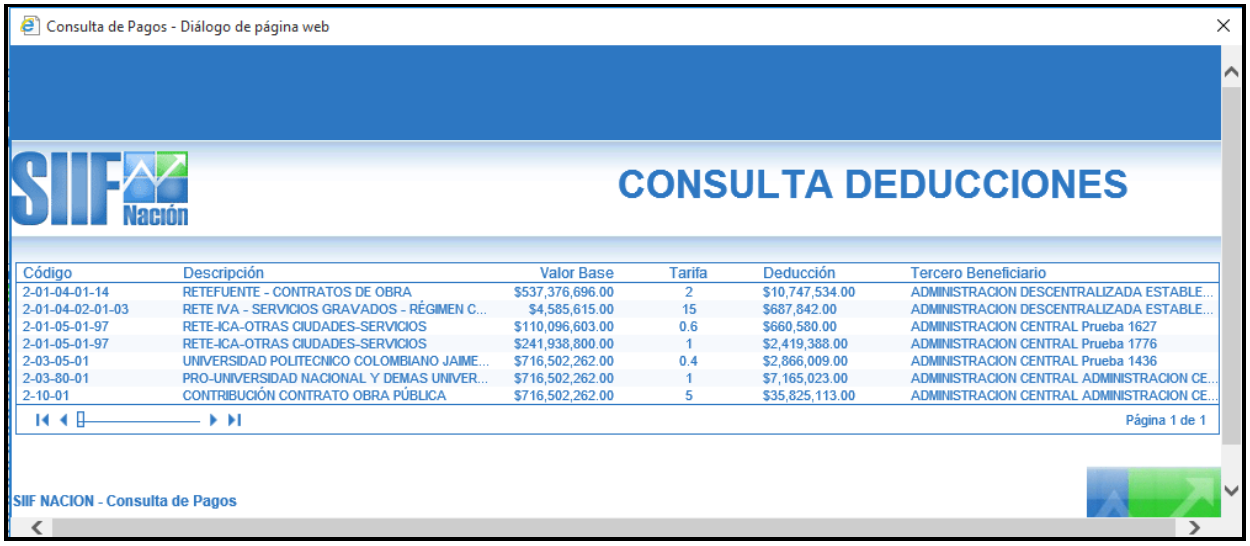

Código	Descripción	Valor Base	Tarifa	Deducción	Tercero Beneficiario
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	$537,376,696.00	2	$10,747,534.00	ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA ESTABLE...
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN C...	$4,585,615.00	15	$687,842.00	ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA ESTABLE...
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	$110,096,603.00	0.6	$660,580.00	ADMINISTRACION CENTRAL Prueba 1627
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	$241,938,800.00	1	$2,419,388.00	ADMINISTRACION CENTRAL Prueba 1776
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME...	$716,502,262.00	0.4	$2,866,009.00	ADMINISTRACION CENTRAL Prueba 1436
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVER...	$716,502,262.00	1	$7,165,023.00	ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION CE...
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	$716,502,262.00	5	$35,825,113.00	ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION CE...

El reporte muestra la información de todos los pagos recibidos por el proveedor o contratista en el intervalo de fechas digitadas, a las cuentas bancarias que reportó a la Unidad Ejecutora.

Este informe se puede copiar a Excel, solamente con sombrear el área deseada y dar el comando de copiar.



LA INFORMACIÓN SE MUESTRA CON LOS PAGOS REALIZADOS EN EL SIIF NACIÓN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2011 Y SE ENCUENTRA ORDENADA POR ENTIDAD GENERADORA DEL PAGO, FECHA DE PAGO Y CUENTA BANCARIA.

ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y EN NINGÚN CASO REEMPLAZA LA CERTIFICACIÓN DE PAGOS EXPEDIDA POR CADA UNA DE LAS PAGADURIAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS O DEPENDENCIAS USUARIAS DE SIIF””

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

CONVENCIONES DEL REPORTE

FECHA PAGO: Corresponde a la fecha en la cual la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o entidad pagadora realizó el pago.

ENTIDAD GENERADORA: Corresponde al nombre de la Unidad Ejecutora o Dependencia que ordenó el pago.

ENTIDAD PAGADORA: Corresponde al nombre de la Unidad Ejecutora que realizó el pago.

NÚMERO ORDEN DE PAGO: Corresponde al número de documento que genera el SIIF cuando la Unidad Ejecutora o Dependencia ordena el pago, es un número único.

NÚMERO COMPROMISO: Corresponde al numero de compromiso presupuestal que genera el SIIF, cuando la Unidad Ejecutora o Dependencia registra el Contrato o acto administrativo que ordena el gasto.

DOCUMENTO SOPORTE

TIPO: Corresponde al tipo de documento que selecciona la Unidad Ejecutora o Dependencia cuando registra el Contrato o Acto Administrativo que ordena el gasto.

NÚMERO: Corresponde al número de Contrato o Acto Administrativo que ordena el gasto y que registra la Unidad Ejecutora o Dependencia en el Compromiso Presupuestal.

VALOR: Corresponde al valor neto girado y consignado en la cuenta bancaria del beneficiario del pago.

BANCO Y CUENTA BANCARIA: Corresponde al banco y número de cuenta bancaria del beneficiario del pago donde fueron consignados los recursos.

CONCEPTO: Correponde al concepto que genera el pago.

ORDEN DE PAGO:

ESTADO: Corresponde al estado de la Orden de Pago; Pagada o Reportada con incidencia (no pagada)

CAUSAL DE RECHAZO: Cuando la orden de pago esta en estado Reportada con incidencia, se muestra la causal por la cual el banco no abonó los recursos.

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

4.2 Consultar Certificado

Se podrá descargar el certificado de ingresos y retenciones para un año o para un mes determinado.

El sistema presenta la siguiente pantalla para:



Seleccionar año fiscal,

Tipo de reporte:

Acumulado: El sistema presentara por cada entidad pública, los certificados de ingresos y retenciones de los pagos efectuados en el *año* seleccionado.

Especifico: El sistema presentara por cada entidad pública, los certificados de ingresos y retenciones de los pagos efectuados en el *mes* seleccionado

Si se seleccionó especifico, se debe seleccionar el mes requerido.

Tipo de Ejecución:

Acumulado: Muestra los totales de pagos y de descuentos según el tipo de reporte

Detallado: Muestra la relación de órdenes de pago y la relación de descuentos según el tipo de reporte.

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.





SIIF Nación

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

899999162

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Consorcio Union Temporal Prueba 6501

CC O NIT: 900807200

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2016 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2016-02-03	17439616	2,671,704,051.00	32,417,162.00	2,347,532,431.00	OP_EPG	Beneficiario final
2016-06-03	145037116	50,159,166.00	6,086,070.00	44,073,096.00	OP_EPG	Beneficiario final
2016-06-14	154774816	1,232,846,926.00	149,587,669.00	1,083,259,257.00	OP_EPG	Beneficiario final
2016-10-06	277318916	755,206,090.00	98,282,046.00	656,924,044.00	OP_EPG	Beneficiario final
2016-10-06	277339016	54,798,629.00	0.00	54,798,629.00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		4,764,714,862.00	286,372,947.00	4,186,587,457.00		
VALOR TOTAL INGRESOS			4,764,714,862.00			

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2016-06-03	145037116	2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN. CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	62,500,445.00	69.00	431,253.00
2016-06-03	145037116	2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	62,500,445.00	5.00	3,125,022.00
2016-06-03	145037116	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	62,500,445.00	2.00	1,250,009.00
2016-06-14	154774616	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1,536,179,477.00	2.00	30,723,590.00
2016-06-14	154774616	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	4,879,180.00	15.00	731,877.00
2016-06-14	154774616	2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN. CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	1,536,179,477.00	69.00	10,599,638.00
2016-06-14	154774616	2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	1,536,179,477.00	5.00	76,808,974.00
2016-06-14	154774616	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	1,536,179,477.00	2.00	30,723,590.00
2016-10-06	277318916	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1,009,300,181.00	2.00	20,186,004.00
2016-10-06	277318916	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	3,205,718.00	15.00	480,858.00
2016-10-06	277318916	2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN. CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	1,009,300,181.00	69.00	6,964,171.00
2016-10-06	277318916	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1,009,300,181.00	5.00	50,465,009.00
2016-10-06	277318916	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	1,009,300,181.00	2.00	20,186,004.00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						286,372,947.00

IMPORTANTE:

Si el contratista detecta alguna diferencia en el reporte del certificado de ingresos y retenciones debe comunicarse con el pagador de la entidad que ordeno los pagos.

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

5. CASOS ESPECIALES

5.1 Quiero cambiar mi clave y/o mi correo electrónico

Ingresar a www.minhacienda.gov.co, clic en el link SIIF Nación Consulta de Pagos, estando en la pantalla, dar clic en "*Cambiar Clave y/o Correo*".




El sistema presenta la pantalla para ingresar los datos personales, si se quiere cambiar la clave, adicional a los datos de identificación, se digita la Clave Actual, la Clave Nueva y la Confirmación Clave, si solo se requiere cambiar la dirección de correo, adicional a los datos personales se digita la Clave Actual y la nueva dirección de correo luego clic en *Cambiar*.

5.2 Olvidé mi clave


Ingresar a www.minhacienda.gov.co, clic en SIIF Nación, Consulta de Pagos, estando en la pantalla, dar clic en *Olvidé mi clave*

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

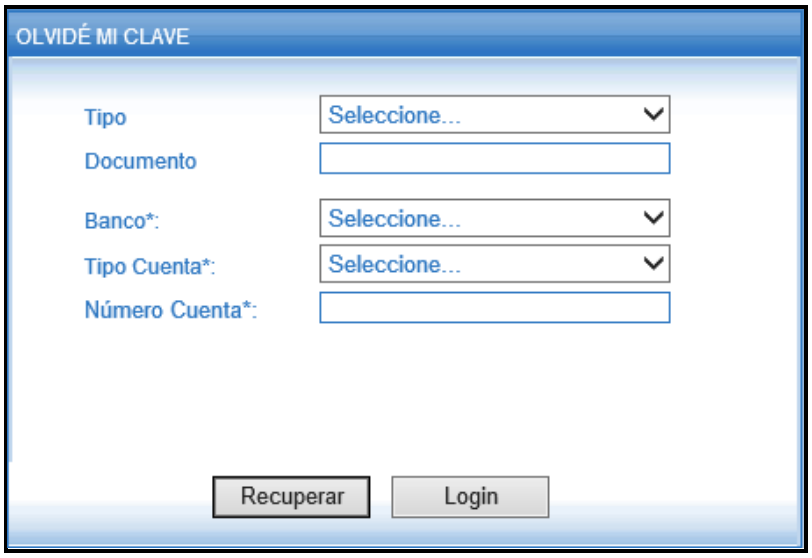

El sistema presenta la pantalla para registrar los datos personales que se digitaron inicialmente cuando se solicitó la clave por primera vez.

Se registran los datos y clic en *Recuperar*, el sistema informa:



© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

BASE LEGAL:

Decreto 1068 de 2015 parte 9. Mediante el cual se reglamenta el SIIF Nación.

RECUERDE:

En caso de requerir soporte adicional o cualquier información sobre el uso del aplicativo, la Administración de SIIF NACIÓN tiene habilitado la línea soporte (601) 6021270 en Bogotá.

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6C−38, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071
Correo: relacionciudadano@minhacienda.gov.co

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

COORDINACIÓN CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO

2 mensajes

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 30 de marzo de 2026 a las 15:37
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Asesor Alcalde <asesor01@buenaventura.gov.co>, Direccion Tecnica de Cultura <dir_cultura@buenaventura.gov.co>, Direccion Planeacion <dir_planeacion@buenaventura.gov.co>, adriana zamora manyoma <adrizamora72@hotmail.com>, "victor.trujillo@gestiondelriesgo.gov.co" <victor.trujillo@gestiondelriesgo.gov.co>, PARA VIVIR CON DIGNIDAD EN EL TERRITORIO <parocivicobuenaventura@gmail.com>

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/24258423232827?p=XaEn1tTppsS0LyEuOs

Id. de reunión: 242 584 232 328 27

Código de acceso: uw3K6Ns6

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

invite.ics
5K

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 30 de marzo de 2026 a las 15:38
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Asesor Alcalde <asesor01@buenaventura.gov.co>, Direccion Tecnica de Cultura <dir_cultura@buenaventura.gov.co>, Direccion Planeacion <dir_planeacion@buenaventura.gov.co>, adriana zamora manyoma <adrizamora72@hotmail.com>, "victor.trujillo@gestiondelriesgo.gov.co" <victor.trujillo@gestiondelriesgo.gov.co>, PARA VIVIR CON DIGNIDAD EN EL TERRITORIO <parocivicobuenaventura@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

invite.ics
5K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-251 - REMISION RESPUESTA OFICIO 095

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 31 de marzo de 2026 a las 12:56
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>, Fabio Florez Montesino - apoyo técnico a la supervisión <fflorez@mincultura.gov.co>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva información y fines pertinentes.

CONSORCIO FP

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

2 adjuntos

CFP-MC-4335-2024-251 - REMISION RESPUESTA OFICIO 095.pdf
328K

20260330 ANEXO OFICIO 251.pdf
866K

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

CFP-MC-4335-2024-252 - REMISION INFORME GERENCIA DE PROYECTOS

1 mensaje

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 31 de marzo de 2026 a las 13:02
Para: Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Maria Fernanda Martinez Patiño - apoyo a la supervisión <mmartinezp@mincultura.gov.co>, Juliana Ramírez Rodríguez - supervisora mincultura <jramirezr@mincultura.gov.co>

Buen día

Adjunto lo referido en el asunto, para su respectiva revisión y trámites pertinentes.

CONSORCIO FP

INFORME GERENCIA 1 v1.pdf

--

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

CFP-MC-4335-2024-252 - REMISION INFORME FEBRERO GERENCIA DE PROYECTOS.pdf
812K


Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Fw: Editables bibliotec y urbanismo

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com> 31 de marzo de 2026 a las 14:18
Para: Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co>

Buen día

Con base en la información adjunta, es preciso solicitar adjuntar el archivo que se muestra a continuación:



Ya que no ha sido posible su descarga. como se muestra en la imagen.



Quedamos atentos.

CONSORCIO FP

El jue, 26 mar 2026 a las 19:32, Maria Fernanda Martinez Patiño (<mmartinezp@mincultura.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo,
>
> Remito planos del asunto, de acuerdo con compromiso.
>
> Quedamos atentos a cualquier inquietud.
>
> Enviado desde Outlook para iOS
>
> ---
>
> **De:** Lilia Estela Rincon Torres <lrincon@mincultura.gov.co>
> **Enviado:** Thursday, March 26, 2026 3:01:47 PM
> **Para:** Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co>
> **Asunto:** Editables bibliotec y urbanismo

Cordial saludo, Mafe:

Mediante el presente remito.

1. Editable dialux del edificio la biblioteca
2. Editable dialux del urbanismo

Cordialmente,
Urbanismo buenaventura opcion luminaria sin brazo 1.evo

Culturas

Lilia Estela Rincón Torres
Contratista - Grupo de Infraestructura Cultural.
Email: lrincon@mincultura.gov.co
Teléfono: 3424100 ext. 1250
Dirección: Calle 9 No. 8-51 Bogotá D.C. Colombia
www.mincultura.gov.co

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario. Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.
Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

--

arqingco

ARQING CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Carrera 15A # 124 – 60 Oficina 102 – Bogotá D.C. – Colombia
(57) (1) 310 6560 - (57) 311 448 9923
contactenos@arqingco.com

Recuerda:
Antes de imprimir este mensaje, comprueba si es necesario hacerlo.
Recicla y reduce el consumo de hojas.

Bogotá- Colombia

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por proyectos@arqingco.com ; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.

Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración de proyectos@arqingco.com.

Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

REUNIÓN DEFINICIÓN APOYO 19 CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO

Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co> 31 de marzo de 2026 a las 14:38
Para: "dir_planeacion@buenaventura.gov.co" <dir_planeacion@buenaventura.gov.co>, "dir_vivienda@buenaventura.gov.co" <dir_vivienda@buenaventura.gov.co>, "dir_cultura@buenaventura.gov.co" <dir_cultura@buenaventura.gov.co>, "infraestructura@buenaventura.gov.co" <infraestructura@buenaventura.gov.co>, "asesor01@buenaventura.gov.co" <asesor01@buenaventura.gov.co>, "alcaldesa@buenaventura.gov.co" <alcaldesa@buenaventura.gov.co>, Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>, Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>, adriana zamora manyoma <adrizamora72@hotmail.com>
Cc: Laura Ines Pelaez Velasquez <lpelaez@mincultura.gov.co>

Cordial saludo,

En el marco de la mesa de trabajo adelantada el 24 de marzo de 2026, remito ayuda de memoria.

De: Maria Fernanda Martinez Patiño <mmartinezp@mincultura.gov.co>
Enviado: martes, 24 de marzo de 2026 15:44
Para: dir_planeacion@buenaventura.gov.co <dir_planeacion@buenaventura.gov.co>; dir_vivienda@buenaventura.gov.co <dir_vivienda@buenaventura.gov.co>; dir_cultura@buenaventura.gov.co <dir_cultura@buenaventura.gov.co>; infraestructura@buenaventura.gov.co <infraestructura@buenaventura.gov.co>; asesor01@buenaventura.gov.co <asesor01@buenaventura.gov.co>; alcaldesa@buenaventura.gov.co <alcaldesa@buenaventura.gov.co>; Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>; Consultores Del Occidente SAS Interventoria Cubierta <interbuenaventura2025@hotmail.com>; Juliana Ramirez Rodriguez <jramirezr@mincultura.gov.co>; adriana zamora manyoma <adrizamora72@hotmail.com>
Asunto: REUNIÓN DEFINICIÓN APOYO 19 CASA DE LA CULTURA MARGARITA HURTADO
Cuándo: martes, 24 de marzo de 2026 16:00-17:30.
Dónde: Reunión de Microsoft Teams

Cordial saludo,

De manera atenta remito link para mesa de trabajo virtual a desarrollar el próximo 24 de marzo a las 4:00 pm, en aras de realizar las definiciones requeridas para el apoyo 19 de la membrana arquitectónica a construir en la Casa de la Cultura Margarita Hurtado.

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/2231092729799?p=QNNr3WNl8rVLYM0Vb0

Id. de reunión: 223 109 272 979 9

Código de acceso: 9Km7DS7Z

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

AYUDA DE MEMORIA MESA DE TRABAJO MH 24032026 NP.pdf
633K

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 534-00958-4
FECHA DE CORTE: 28/02/2025

PA 319275 CONSORCIO FP
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG058572

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	.00
+ 0 CREDITOS	.00
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	.00
SALDO PROMEDIO	.00

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Transacciones Realizadas

Empresa: SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Ahorros	AHO9584
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****9584	2025/04/07	2025/04/07
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9584
Nro. Producto	*****9584
Valor a Pagar	$265,983.00
Factura	100858
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2025/04/07
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - RENDIMIENTOS CON CORTE A

	MARZO DE 2025
Número de Autorización	985703
Estado	Exitosa
Usuario Crea	JENNIFER ALEJANDRA SIERRA OVALLE
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 534-00958-4
FECHA DE CORTE: 30/04/2025

PA 319275 CONSORCIO FP
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG057600

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	
De $5.000.001	a	$20.000.000	
De $20.000.001	a	$50.000.000	
De $50.000.001	a	$100.000.000	
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Abril del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,672,294,815.82
+ 31 CREDITOS	2,299,864.96
- 6 DEBITOS	47,647,564.93
SALDO ACTUAL	3,626,947,115.85
SALDO PROMEDIO	3,648,350,983.15

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 23 de mayo correspondiente al segundo bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,061.08	3,672,304,876.90
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,061.11	3,672,314,938.01
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,061.14	3,672,324,999.15
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A050690	265,983.00	0.00	3,672,059,016.15
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,061.16	3,672,069,077.31
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,061.19	3,672,079,138.50
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,061.22	3,672,089,199.72
07	GMF	0000000	1,063.93	0.00	3,672,088,135.79
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,060.52	3,672,098,196.31
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,060.54	3,672,108,256.85
10	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A662485	0.00	2,000,000.00	3,674,108,256.85
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,060.57	3,674,118,317.42
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,066.08	3,674,128,383.50
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,066.11	3,674,138,449.61
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,066.13	3,674,148,515.74
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,066.16	3,674,158,581.90
15	PAGO TERCERO ACH	A712345	47,182,350.00	0.00	3,626,976,231.90
15	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A711168	7,900.00	0.00	3,626,968,331.90
15	IVA COBRADO	A711188	1,501.00	0.00	3,626,966,830.90
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	10,066.19	3,626,976,897.09
15	GMF	0000000	188,767.00	0.00	3,626,788,130.09
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.41	3,626,798,066.50
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.43	3,626,808,002.93
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.46	3,626,817,939.39
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.49	3,626,827,875.88
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.51	3,626,837,812.39
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.54	3,626,847,748.93
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.57	3,626,857,685.50
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.60	3,626,867,622.10
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.62	3,626,877,558.72
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.65	3,626,887,495.37
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.68	3,626,897,432.05
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.71	3,626,907,368.76
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.73	3,626,917,305.49
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.76	3,626,927,242.25
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.79	3,626,937,179.04
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.81	3,626,947,115.85

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Ahorros	AHO9584
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****9584	2025/05/02	2025/05/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9584
Nro. Producto	*****9584
Valor a Pagar	$299,865.00
Factura	84340
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2025/05/08
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - REINTEGRO DEDUCCIONES

	FACTURACION CORRESPONDIENTE
Número de Autorización	525423
Estado	Exitosa
Usuario Crea	WILMAR YESID MORA GONZALEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319275 CONSORCIO FP
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG018833

CUENTA No. 534-00958-4
FECHA DE CORTE: 31/05/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,626,947,115.85
+ 31 CREDITOS	308,034.94
+ 2 DEBITOS	301,064.46
SALDO ACTUAL	3,626,954,086.33
SALDO PROMEDIO	3,626,860,198.13

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 13 de junio para régimen común menor a 391 UVT correspondiente al segundo bimestre año gravable 2025. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en Bogotá o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.84	3,626,957,052.69
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.87	3,626,966,989.56
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.90	3,626,976,926.46
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.92	3,626,986,863.38
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.95	3,626,996,800.33
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.98	3,627,006,737.31
08	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A537697	299,865.00	0.00	3,626,706,872.31
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.00	3,626,716,809.31
08	GMF	0000000	1,199.46	0.00	3,626,715,609.85
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.21	3,626,725,546.06
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.23	3,626,735,482.29
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.26	3,626,745,418.55
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.29	3,626,755,354.84
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.32	3,626,765,291.16
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.34	3,626,775,227.50
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.37	3,626,785,163.87
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.40	3,626,795,100.27
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.42	3,626,805,036.69
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.45	3,626,814,973.14
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.48	3,626,824,909.62
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.51	3,626,834,846.13
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.53	3,626,844,782.66
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.56	3,626,854,719.22
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.59	3,626,864,655.81
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.62	3,626,874,592.43
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.64	3,626,884,529.07
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.67	3,626,894,465.74
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.70	3,626,904,402.44
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.72	3,626,914,339.16
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.75	3,626,924,275.91
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.78	3,626,934,212.69
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.81	3,626,944,149.50
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.83	3,626,954,086.33

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Transacciones Realizadas

Empresa: SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Ahorros	AHO9584
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****9584	2025/06/03	2025/06/09
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9584
Nro. Producto	*****9584
Valor a Pagar	$308,035.00
Factura	109950
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2025/06/09
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - RENDIMIENTOS CON CORTE A

	MAYO DE 2025
Número de Autorización	546036
Estado	Exitosa
Usuario Crea	WILMAR YESID MORA GONZALEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319275 CONSORCIO FP
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG070537

CUENTA No. 534-00958-4
FECHA DE CORTE: 30/06/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Junio del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,626,954,086.33
+ 30 CREDITOS	298,099.01
+ 2 DEBITOS	309,267.14
SALDO ACTUAL	3,626,942,918.20
SALDO PROMEDIO	3,626,870,378.44

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 18 de julio correspondiente al tercer bimestre. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.86	3,626,964,023.19
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.89	3,626,973,960.08
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.91	3,626,983,896.99
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.94	3,626,993,833.93
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.97	3,627,003,770.90
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A385622	308,035.00	0.00	3,626,695,735.90
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.00	3,626,705,672.90
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.02	3,626,715,609.92
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.05	3,626,725,546.97
09	GMF	0000000	1,232.14	0.00	3,626,724,314.83
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.23	3,626,734,251.06
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.26	3,626,744,187.32
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.29	3,626,754,123.61
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.31	3,626,764,059.92
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.34	3,626,773,996.26
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.37	3,626,783,932.63
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.39	3,626,793,869.02
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.42	3,626,803,805.44
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.45	3,626,813,741.89
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.48	3,626,823,678.37
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.50	3,626,833,614.87
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.53	3,626,843,551.40
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.56	3,626,853,487.96
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.58	3,626,863,424.54
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.61	3,626,873,361.15
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.64	3,626,883,297.79
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.67	3,626,893,234.46
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.69	3,626,903,171.15
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.72	3,626,913,107.87
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.75	3,626,923,044.62
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.78	3,626,932,981.40
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.80	3,626,942,918.20

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Transacciones Realizadas

Empresa: SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Ahorros	AHO9584
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****9584	2025/07/07	2025/07/07
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9584
Nro. Producto	*****9584
Valor a Pagar	$298,099.00
Factura	114901
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2025/07/07
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - RENDIMIENTOS CON CORTE A

	JUNIO DE 2025
Número de Autorización	132498
Estado	Exitosa
Usuario Crea	WILMAR YESID MORA GONZALEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319275 CONSORCIO FP
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG073808

CUENTA No. 534-00958-4
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,626,942,918.20
+ 31 CREDITOS	308,033.88
- 2 DEBITOS	299,291.40
SALDO ACTUAL	3,626,951,660.68
SALDO PROMEDIO	3,626,847,076.75

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 15 de agosto para régimen común mayor a 391 UVT correspondiente al tercer bimestre año gravable 2025. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.83	3,626,952,855.03
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.86	3,626,962,791.89
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.88	3,626,972,728.77
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A355187	298,099.00	0.00	3,626,674,629.77
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.91	3,626,684,566.68
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.94	3,626,694,503.62
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.97	3,626,704,440.59
07	GMF	0000000	1,192.40	0.00	3,626,703,248.19
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.17	3,626,713,184.36
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.20	3,626,723,120.56
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.23	3,626,733,056.79
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.25	3,626,742,993.04
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.28	3,626,752,929.32
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.31	3,626,762,865.63
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.34	3,626,772,801.97
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.36	3,626,782,738.33
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.39	3,626,792,674.72
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.42	3,626,802,611.14
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.45	3,626,812,547.59
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.47	3,626,822,484.06
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.50	3,626,832,420.56
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.53	3,626,842,357.09
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.55	3,626,852,293.64
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.58	3,626,862,230.22
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.61	3,626,872,166.83
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.64	3,626,882,103.47
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.66	3,626,892,040.13
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.69	3,626,901,976.82
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.72	3,626,911,913.54
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.74	3,626,921,850.28
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.77	3,626,931,787.05
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.80	3,626,941,723.85
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.83	3,626,951,660.68

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Transacciones Realizadas

Empresa: SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Ahorros	AHO9584
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****9584	2025/08/04	2025/08/10
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9584
Nro. Producto	*****9584
Valor a Pagar	$308,034.00
Factura	122368
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2025/08/08
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - RENDIMIENTOS CON CORTE A JULIO DE 2025-
Número de Autorización	050177
Estado	Exitosa
Usuario Crea	WILMAR YESID MORA GONZALEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319275 CONSORCIO FP
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG073808

CUENTA No. 534-00958-4
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,626,942,918.20
+ 31 CREDITOS	308,033.88
- 2 DEBITOS	299,291.40
SALDO ACTUAL	3,626,951,660.68
SALDO PROMEDIO	3,626,847,076.75

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 15 de agosto para régimen común mayor a 391 UVT correspondiente al tercer bimestre año gravable 2025. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.83	3,626,952,855.03
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.86	3,626,962,791.89
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.88	3,626,972,728.77
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A355187	298,099.00	0.00	3,626,674,629.77
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.91	3,626,684,566.68
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.94	3,626,694,503.62
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.97	3,626,704,440.59
07	GMF	0000000	1,192.40	0.00	3,626,703,248.19
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.17	3,626,713,184.36
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.20	3,626,723,120.56
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.23	3,626,733,056.79
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.25	3,626,742,993.04
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.28	3,626,752,929.32
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.31	3,626,762,865.63
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.34	3,626,772,801.97
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.36	3,626,782,738.33
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.39	3,626,792,674.72
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.42	3,626,802,611.14
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.45	3,626,812,547.59
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.47	3,626,822,484.06
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.50	3,626,832,420.56
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.53	3,626,842,357.09
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.55	3,626,852,293.64
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.58	3,626,862,230.22
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.61	3,626,872,166.83
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.64	3,626,882,103.47
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.66	3,626,892,040.13
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.69	3,626,901,976.82
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.72	3,626,911,913.54
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.74	3,626,921,850.28
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.77	3,626,931,787.05
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.80	3,626,941,723.85
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.83	3,626,951,660.68

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Transacciones Realizadas

Empresa: SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157

Generado por: JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	AHO9584
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****9584	2025/09/03	2025/09/09
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9584
Nro. Producto	*****9584
Valor a Pagar	$308,035.00
Factura	128875
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2025/09/09
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - RENDIMIENTOS CON CORTE A

	AGOSTO DE 2025-
Número de Autorización	249526
Estado	Exitosa
Usuario Crea	WILMAR YESID MORA GONZALEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319275 CONSORCIO FP
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG073808

CUENTA No. 534-00958-4
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,626,942,918.20
+ 31 CREDITOS	308,033.88
- 2 DEBITOS	299,291.40
SALDO ACTUAL	3,626,951,660.68
SALDO PROMEDIO	3,626,847,076.75

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 15 de agosto para régimen común mayor a 391 UVT correspondiente al tercer bimestre año gravable 2025. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.83	3,626,952,855.03
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.86	3,626,962,791.89
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.88	3,626,972,728.77
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A355187	298,099.00	0.00	3,626,674,629.77
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.91	3,626,684,566.68
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.94	3,626,694,503.62
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.97	3,626,704,440.59
07	GMF	0000000	1,192.40	0.00	3,626,703,248.19
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.17	3,626,713,184.36
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.20	3,626,723,120.56
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.23	3,626,733,056.79
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.25	3,626,742,993.04
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.28	3,626,752,929.32
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.31	3,626,762,865.63
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.34	3,626,772,801.97
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.36	3,626,782,738.33
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.39	3,626,792,674.72
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.42	3,626,802,611.14
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.45	3,626,812,547.59
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.47	3,626,822,484.06
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.50	3,626,832,420.56
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.53	3,626,842,357.09
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.55	3,626,852,293.64
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.58	3,626,862,230.22
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.61	3,626,872,166.83
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.64	3,626,882,103.47
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.66	3,626,892,040.13
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.69	3,626,901,976.82
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.72	3,626,911,913.54
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.74	3,626,921,850.28
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.77	3,626,931,787.05
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.80	3,626,941,723.85
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.83	3,626,951,660.68

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Transacciones Realizadas

Empresa: SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/10/08	2025/10/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9584
Nro. Producto	*****9584
Valor a Pagar	$298,099.00
Factura	135128
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2025/10/08
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - RENDIMIENTOS CON CORTE A

	SEPTIEMBRE DE 2025
Número de Autorización	025976
Estado	Exitosa
Usuario Crea	WILMAR YESID MORA GONZALEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319275 CONSORCIO FP
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG073808

CUENTA No. 534-00958-4
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,626,942,918.20
+ 31 CREDITOS	308,033.88
- 2 DEBITOS	299,291.40
SALDO ACTUAL	3,626,951,660.68
SALDO PROMEDIO	3,626,847,076.75

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 15 de agosto para régimen común mayor a 391 UVT correspondiente al tercer bimestre año gravable 2025. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.83	3,626,952,855.03
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.86	3,626,962,791.89
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.88	3,626,972,728.77
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A355187	298,099.00	0.00	3,626,674,629.77
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.91	3,626,684,566.68
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.94	3,626,694,503.62
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.97	3,626,704,440.59
07	GMF	0000000	1,192.40	0.00	3,626,703,248.19
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.17	3,626,713,184.36
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.20	3,626,723,120.56
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.23	3,626,733,056.79
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.25	3,626,742,993.04
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.28	3,626,752,929.32
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.31	3,626,762,865.63
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.34	3,626,772,801.97
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.36	3,626,782,738.33
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.39	3,626,792,674.72
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.42	3,626,802,611.14
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.45	3,626,812,547.59
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.47	3,626,822,484.06
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.50	3,626,832,420.56
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.53	3,626,842,357.09
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.55	3,626,852,293.64
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.58	3,626,862,230.22
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.61	3,626,872,166.83
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.64	3,626,882,103.47
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.66	3,626,892,040.13
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.69	3,626,901,976.82
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.72	3,626,911,913.54
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.74	3,626,921,850.28
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.77	3,626,931,787.05
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.80	3,626,941,723.85
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.83	3,626,951,660.68

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Transacciones Realizadas

Empresa: SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/11/12	2025/11/12
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9584
Nro. Producto	*****9584
Valor a Pagar	$308,034.39
Factura	143852
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2025/11/12
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - Reintegro Rendimientos Financieros

Número de Autorización	517968
Estado	Exitosa
Usuario Crea	WILMAR YESID MORA GONZALEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319275 CONSORCIO FP
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG073808

CUENTA No. 534-00958-4
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,626,942,918.20
+ 31 CREDITOS	308,033.88
- 2 DEBITOS	299,291.40
SALDO ACTUAL	3,626,951,660.68
SALDO PROMEDIO	3,626,847,076.75

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 15 de agosto para régimen común mayor a 391 UVT correspondiente al tercer bimestre año gravable 2025. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.83	3,626,952,855.03
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.86	3,626,962,791.89
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.88	3,626,972,728.77
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A355187	298,099.00	0.00	3,626,674,629.77
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.91	3,626,684,566.68
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.94	3,626,694,503.62
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.97	3,626,704,440.59
07	GMF	0000000	1,192.40	0.00	3,626,703,248.19
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.17	3,626,713,184.36
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.20	3,626,723,120.56
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.23	3,626,733,056.79
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.25	3,626,742,993.04
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.28	3,626,752,929.32
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.31	3,626,762,865.63
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.34	3,626,772,801.97
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.36	3,626,782,738.33
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.39	3,626,792,674.72
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.42	3,626,802,611.14
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.45	3,626,812,547.59
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.47	3,626,822,484.06
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.50	3,626,832,420.56
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.53	3,626,842,357.09
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.55	3,626,852,293.64
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.58	3,626,862,230.22
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.61	3,626,872,166.83
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.64	3,626,882,103.47
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.66	3,626,892,040.13
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.69	3,626,901,976.82
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.72	3,626,911,913.54
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.74	3,626,921,850.28
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.77	3,626,931,787.05
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.80	3,626,941,723.85
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.83	3,626,951,660.68

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Transacciones Realizadas

Empresa: SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Ahorros	AHO9584
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****9584	2025/12/03	2025/12/09
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9584
Nro. Producto	*****9584
Valor a Pagar	$298,101.06
Factura	149576
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2025/12/09
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - RENDIMIENTOS CON CORTE A

	Noviembre DE 2025
Número de Autorización	875529
Estado	Exitosa
Usuario Crea	WILMAR YESID MORA GONZALEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319275 CONSORCIO FP
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG073808

CUENTA No. 534-00958-4
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,626,942,918.20
+ 31 CREDITOS	308,033.88
- 2 DEBITOS	299,291.40
SALDO ACTUAL	3,626,951,660.68
SALDO PROMEDIO	3,626,847,076.75

Señor contribuyente de Bogotá, le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 15 de agosto para régimen común mayor a 391 UVT correspondiente al tercer bimestre año gravable 2025. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco en la ciudad de Bogotá.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.83	3,626,952,855.03
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.86	3,626,962,791.89
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.88	3,626,972,728.77
07	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A355187	298,099.00	0.00	3,626,674,629.77
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.91	3,626,684,566.68
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.94	3,626,694,503.62
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.97	3,626,704,440.59
07	GMF	0000000	1,192.40	0.00	3,626,703,248.19
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.17	3,626,713,184.36
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.20	3,626,723,120.56
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.23	3,626,733,056.79
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.25	3,626,742,993.04
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.28	3,626,752,929.32
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.31	3,626,762,865.63
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.34	3,626,772,801.97
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.36	3,626,782,738.33
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.39	3,626,792,674.72
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.42	3,626,802,611.14
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.45	3,626,812,547.59
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.47	3,626,822,484.06
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.50	3,626,832,420.56
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.53	3,626,842,357.09
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.55	3,626,852,293.64
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.58	3,626,862,230.22
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.61	3,626,872,166.83
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.64	3,626,882,103.47
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.66	3,626,892,040.13
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.69	3,626,901,976.82
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.72	3,626,911,913.54
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.74	3,626,921,850.28
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.77	3,626,931,787.05
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.80	3,626,941,723.85
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.83	3,626,951,660.68

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Transacciones Realizadas

Empresa: **Aval Fiduciaria S.A.**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800140887**

Generado por: **JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/01/14	2026/01/14
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9584
Nro. Producto	*****9584
Valor a Pagar	$308,035.00
Factura	156158
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2026/01/14
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - RENDIMIENTOS CON CORTE A DICIEMBRE DE 2025
Número de Autorización	393745
Estado	Exitosa
Usuario Crea	WILMAR YESID MORA GONZALEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319275 CONSORCIO FP
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG072106

CUENTA No. 534-00958-4
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,626,945,579.96
+ 31 CREDITOS	308,039.05
- 4 DEBITOS	318,026.12
SALDO ACTUAL	3,626,935,592.89
SALDO PROMEDIO	3,626,907,538.13

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.84	3,626,955,516.80
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.86	3,626,965,453.66
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.89	3,626,975,390.55
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.92	3,626,985,327.47
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.95	3,626,995,264.42
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.97	3,627,005,201.39
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.00	3,627,015,138.39
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.03	3,627,025,075.42
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.06	3,627,035,012.48
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.08	3,627,044,949.56
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.11	3,627,054,886.67
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.14	3,627,064,823.81
14	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A357070	308,035.00	0.00	3,626,756,788.81
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.16	3,626,766,725.97
14	GMF	0000000	1,232.14	0.00	3,626,765,493.83
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.34	3,626,775,430.17
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.37	3,626,785,366.54
19	CARGO POR TRANSACCIONES VARIAS	M256668	8,724.08	0.00	3,626,776,642.46
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.40	3,626,786,578.86
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.43	3,626,796,515.29
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.45	3,626,806,451.74
19	GMF	0000000	34.90	0.00	3,626,806,416.84
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.46	3,626,816,353.30
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.48	3,626,826,289.78
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.51	3,626,836,226.29
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.54	3,626,846,162.83
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.56	3,626,856,099.39
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.59	3,626,866,035.98
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.62	3,626,875,972.60
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.65	3,626,885,909.25
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.67	3,626,895,845.92
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.70	3,626,905,782.62
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.73	3,626,915,719.35
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.76	3,626,925,656.11
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.78	3,626,935,592.89

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Transacciones Realizadas

Empresa: **Aval Fiduciaria S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800140887**
Generado por: **JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/02/10	2026/02/11
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9584
Nro. Producto	*****9584
Valor a Pagar	$308,039.00
Factura	161239
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2026/02/10
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - RENDIMIENTOS CON CORTE A ENERO DE 2026
Número de Autorización	126646
Estado	Exitosa
Usuario Crea	JENNIFER ALEJANDRA SIERRA OVALLE
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319275 CONSORCIO FP
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG223734

CUENTA No. 534-00958-4
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,626,935,592.89
+ 31 CREDITOS	13,735,837.28
- 37 DEBITOS	3,072,323,951.95
SALDO ACTUAL	568,347,478.22
SALDO PROMEDIO	3,074,304,891.81

"Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA, correspondiente a los meses de enero y febrero, este deberá efectuarse hasta el 20 de marzo. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional."

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.81	3,626,945,529.70
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.84	3,626,955,466.54
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.86	3,626,965,403.40
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.89	3,626,975,340.29
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.92	3,626,985,277.21
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.95	3,626,995,214.16
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,936.97	3,627,005,151.13
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.00	3,627,015,088.13
10	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A026021	0.00	2,500,000.00	3,629,515,088.13
10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A026376	308,039.00	0.00	3,629,207,049.13
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,937.03	3,629,216,986.16
10	GMF	0000000	1,232.16	0.00	3,629,215,754.00
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,943.06	3,629,225,697.06
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,943.08	3,629,235,640.14
13	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A458287	0.00	1,000,000.00	3,630,235,640.14
13	PAGO TERCERO ACH	A456944	222,486,540.00	0.00	3,407,749,100.14
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A454560	8,200.00	0.00	3,407,740,900.14
13	IVA COBRADO	A455780	1,558.00	0.00	3,407,739,342.14
13	PAGO TERCERO ACH	A456950	19,242,097.00	0.00	3,388,497,245.14
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A454563	8,200.00	0.00	3,388,489,045.14
13	IVA COBRADO	A455782	1,558.00	0.00	3,388,487,487.14
13	PAGO TERCERO ACH	A456955	100,000,000.00	0.00	3,288,487,487.14
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A454567	8,200.00	0.00	3,288,479,287.14
13	IVA COBRADO	A455784	1,558.00	0.00	3,288,477,729.14
13	PAGO A TERCEROS AVAL	A459297	235,958,993.00	0.00	3,052,518,736.14
13	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		4,050.00	0.00	3,052,514,686.14
13	IVA COBRADO		769.50	0.00	3,052,513,916.64
13	PAGO TERCERO ACH	A456960	39,576,800.00	0.00	3,012,937,116.64
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A455743	8,200.00	0.00	3,012,928,916.64
13	IVA COBRADO	A455764	1,558.00	0.00	3,012,927,358.64
13	PAGO TERCERO ACH	A456966	39,995,241.00	0.00	2,972,932,117.64
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A454555	8,200.00	0.00	2,972,923,917.64
13	IVA COBRADO	A455778	1,558.00	0.00	2,972,922,359.64
13	PAGO TERCERO ACH	A456970	13,615,355.00	0.00	2,959,307,004.64
13	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A454543	8,200.00	0.00	2,959,298,804.64
13	IVA COBRADO	A455790	1,558.00	0.00	2,959,297,246.64
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	9,943.11	2,959,307,189.75
13	GMF	0000000	2,683,753.56	0.00	2,956,623,436.19
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,100.34	2,956,631,536.53
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,100.36	2,956,639,636.89
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,100.38	2,956,647,737.27
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,100.40	2,956,655,837.67

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG223734 167227 1/1

CUENTA No. 534-00958-4
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,100.43	2,956,663,938.10
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,100.45	2,956,672,038.55
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,100.47	2,956,680,139.02
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,100.49	2,956,688,239.51
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,100.52	2,956,696,340.03
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,100.54	2,956,704,440.57
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,100.56	2,956,712,541.13
25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A082743	0.00	10,000,000.00	2,966,712,541.13
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,100.58	2,966,720,641.71
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,128.00	2,966,728,769.71
27	PAGO TERCERO ACH	A674159	200,000,000.00	0.00	2,766,728,769.71
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A658749	8,200.00	0.00	2,766,720,569.71
27	IVA COBRADO	A662945	1,558.00	0.00	2,766,719,011.71
27	PAGO TERCERO ACH	A674161	424,488,236.00	0.00	2,342,230,775.71
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A657945	8,200.00	0.00	2,342,222,575.71
27	IVA COBRADO	A663018	1,558.00	0.00	2,342,221,017.71
27	PAGO TERCERO ACH	A674163	52,809,917.00	0.00	2,289,411,100.71
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A658585	8,200.00	0.00	2,289,402,900.71
27	IVA COBRADO	A658660	1,558.00	0.00	2,289,401,342.71
27	PAGO TERCERO ACH	A674353	1,711,500,000.00	0.00	577,901,342.71
27	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A657040	8,200.00	0.00	577,893,142.71
27	IVA COBRADO	A657977	1,558.00	0.00	577,891,584.71
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,128.02	577,899,712.73
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,557.11	577,901,269.84
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	1,557.11	577,902,826.95
27	GMF	0000000	9,555,348.73	0.00	568,347,478.22

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Transacciones Realizadas

Empresa: **Aval Fiduciaria S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800140887**
Generado por: **JHOJAN STIVEN PALACIOS BURGOS**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos Virtuales PSE	Cuenta Ahorros	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/03/09	2026/03/09
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9584
Nro. Producto	*****9584
Valor a Pagar	$235,837.00
Factura	166172
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2026/03/09
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - RENDIMIENTOS CON CORTE A FEBRERO DE 2026-
Número de Autorización	145902
Estado	Exitosa
Usuario Crea	WILMAR YESID MORA GONZALEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

CUADRO CONTROL GIROS ANTICIPO No. 001

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**7.471.864.227**	
COSTO DIRECTO	**$**	**5.547.543.490**	
VALOR AIU	**$**	**1.625.829.855**	
U% 5% - IVA	**$**	**52.701.663**	
INGENIERIA DEL DETALLE	**$**	**206.545.562**	
IVA ING DETALLE	**$**	**39.243.657**	
VALOR ANTICIPO	**$**	**3.735.932.113,00**	**50%**

DISTRIBUCIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONCEPTO	VALOR		PORCENTAJE
INGENIERIA DE DETALLE	$	112.077.963	3,00%
PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA DEL PROYECTO	$	859.264.386	23,00%
COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	$	186.796.606	5,00%
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$	2.577.793.158	69,00%
TOTAL	**$**	**3.735.932.113**	**100,00%**

LISTADO ORDENES COP 3330- 2022

ORDEN No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR PARA PAGAR	
1	METRIC IOC SAS	INGENIERIA DE DETALLE	31/03/2025	$	19.284.120
2	CIDELSA COLOMBIA SAS	INGENIERIA DE DETALLE	31/03/2025	$	45.341.779
3	REEMBOLSO CONSORCIO FP	INGENIERIA DE DETALLE	15/04/2025	$	47.182.350
4	COAGREGADOS S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	13/02/2026	$	205.545.000
4	COAGREGADOS S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	13/02/2026	$	16.941.540
5	CEMENTO ARGOS S.A.	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	13/02/2026	$	19.242.097
6	ARQINGCO SAS	COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	13/02/2026	$	100.000.000
7	INGENIERIAS DE CALIDAD DM SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	13/02/2026	$	39.576.800
8	FERRETERIA GYC SA	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	13/02/2026	$	235.958.993
9	FERROCONSTRUCCIONES ROSAS SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	13/02/2026	$	39.995.241
10	FERREZZ SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	13/02/2026	$	13.615.355
11	AOO INGENIERIA SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	27/02/2026	$	1.711.500.000
12	ARQINGCO SAS	COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	27/02/2026	$	200.000.000
13	CIDELSA COLOMBIA SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	27/02/2026	$	424.488.236
14	INGENIERIAS DE CALIDAD DM SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	27/02/2026	$	52.809.917
15	CIDELSA COLOMBIA SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	16/03/2026	$	66.876.935
16	FERROCONSTRUCCIONES ROSAS SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	25/03/2026	$	13.410.652
17	COMPAÑÍA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.S.- COAGREGADOS S.A.S.	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	25/03/2026	$	234.321.300
18	ARQINGCO SAS	COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	25/03/2026	$	150.000.000
19	INGENIERIAS DE CALIDAD DM SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	30/03/2026	$	99.841.798
		TOTAL		$	3.735.932.113

CUADRO CONTROL GIROS ANTICIPO No. 002

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**4.048.290.220**	
COSTO DIRECTO	**$**	**3.107.920.418**	
VALOR AIU	**$**	**910.844.558**	
U% 5% - IVA	**$**	**29.525.244**	
VALOR ANTICIPO	**$**	**2.024.145.110,00**	**50%**

DISTRIBUCIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONCEPTO	VALOR		PORCENTAJE
COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	$	202.414.511	10,00%
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$	1.821.730.599	90,00%
TOTAL	**$**	**2.024.145.110**	**100,00%**

LISTADO ORDENES COP 3330- 2022

ORDEN No.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR PARA PAGAR	
1 ADC	INGENIERIAS DE CALIDAD DM SAS	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	31/03/2025	$	87.415.682
		TOTAL		**$**	**87.415.682**

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	03 ADC
Fecha	25/03/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 87.415.682,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NUMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.867.436-7	INGENIERIAS DE CALIDAD DIM SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 87.415.682	83800008111	CTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA
0				$ 87.415.682,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			Cod. Negocio:	319275	Consecutivo Orden de Desembolso	1
Fecha	19/03/2025	N° Desembolsos	1	Vr. Total Desembolsos	$ 19.284.120,00		Patrimonio Autónomo

Patrimonio Autónomo ☑

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.465.129-1	METRIC IDC SAS	1 - INGENIERIA DE DETALLE	DESEMBOLSO	MT127	$ 19.284.120	007069996416	CTA CTE	DAVIVIENDA

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO suscribieron con Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR

CONFIRMACIÓN

Bogotá, 10 de Marzo de 2025

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal del CONSORCIO FP (FIDEICOMITENTE) certifico que he efectuado o efectuaré el abono en cuenta de la obligación a mi cargo y estoy cumpliendo con la liquidación, declaración, presentación y pago de los impuestos, tasas y contribuciones derivado(s) de la ejecución del ANTICIPO que hacen parte del DESEMBOLSO solicitado en la orden de operación No. 01 por valor de $ 19.284.120 del Fideicomiso No. 3-1-9275:

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.465.129-1	METRIC IOC SAS	1- Pago de mano de obra no calificada del proyecto	DESEMBOLSO	MT127	$ 19.284.120	007069996416	CTA CTE	DAVIVIENDA

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

Bogotá, 10 de Marzo de 2025

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal de CONSORCIO FP certifico que me hago RESPONSABLE DE CONTROLAR Y LEGALIZAR EL ANTICIPO que hacen parte de la orden No. 01

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

METRIC IOC S.A.S.
NIT 900465129-1
Cll 57#7-40 apto 401, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3123722161
gerencia@metricioc.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. MT127
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO FP			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 15 A # 124 - 60 OF 102, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			07/03/2025
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3106560	**NIT**	901899122-7	07/03/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONSULTORÍA PROFESIONAL(PRIMER PAGO DEL 50% CONTRATO No.002 CONSULTORIA PARA REVISION Y AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION DEL DISENO ESTRUCTURAL, DISENO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Y PLANOS DE TALLER PARA LA ESTRUCTURA METALICA DE LA TENSOESTRUCTURA PARA LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA PARA EL COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA)	Servicio	$18.000.000	1		$18.000.000

Moneda: COP
Generado: 2025-03-07 14:30:17-05:00
Validación DIAN: 2025-03-07 14:31:17-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: ea0e29a165c1ba2489c0fd9b877ce49832d6be4b313c867d3c4a514f1e645c4dda4cdb0aceeab24eb9e85d973d53aa84

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$18.000.000
IVA (19.00%)	$3.420.000
Total	$21.420.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087404012 de 2025-01-20 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MT122 hasta MT1000 con vigencia hasta 2026-01-20

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Bogotá, 10 de marzo de 2025

Señores
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
Ciudad.

YO HILDA LEONO R VELANDIA MUÑOZ Identificada con C.C. No. 20.652.191 expedida en la ciudad de Guatavita (Cund), en mi condición de contador Público del CONSORCIO FP certifico que las retenciones relacionadas a continuación son las correctas para la FACTURA MT127.

METRIC MT 127

VALOR BASICO	**$**	**18.000.000**
IVA	**$**	**3.420.000**
VALOR TOTAL A FACTURAR	**$**	**21.420.000**
11,0000%	**$**	**1.980.000**
0,8660%	**$**	**155.880**
VALOR TOTAL	**$**	**19.284.120**

Cordialmente



HILDA LEONOR VELANDIA MUÑOZ
Contador Publico
CONSORCIO FP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141140566021

(415)7707212489984(8020) 000014114056602 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 5 1 2 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
METRIC IOC S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 57 7 40 AP 401

42. Correo electrónico metricioc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 8 4 0 3 2 0	3 1 2 3 7 2 2 1 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 1 0 9 0 9	4 2 9 0	2 0 1 1 0 9 0 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VERGARA GONZALEZ IVAN FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140566021

(415)7707212489984(8020) **000014114056602 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 5 1 2 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 1 1 0 9 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 9 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 1 4 1 4 7 7	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 1 0 9 0 9	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141140566021

(415)7707212489984(8020) **000014114056602 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 5 1 2 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 9 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 4 3 7 9 1 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VERGARA	GONZALEZ	IVAN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 1 0 9 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 2 1 7 3 4 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VERGARA	CALDERON	EFRAIN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141140566021

(415)7707212489984(8020) **000014114056602 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 6 5 1 2 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 4 3 7 9 1 6 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VERGARA	GONZALEZ	IVAN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 1 0 9 1 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 2 1 7 3 4 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VERGARA	CALDERON	EFRAIN	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 1 0 9 1 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : METRIC IOC SAS
N.I.T. : 900.465.129-1
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02141477 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2024
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
ACTIVO TOTAL : 137,067,082
TAMAÑO EMPRESA : MICROEMPRESA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE57N7-40 APTO401
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : METRICIOC@GMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CALLE57N7-40 APTO401
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : METRICIOC@GMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01513003 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA METRIC IOC SAS.

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: METRIC IOC ES UNA ORGANIZACIÓN CUYO OBJETO PRINCIPAL ES PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA Y CONSULTORIA EN TODAS LAS ÁREAS DE INGENIERÍA CIVIL, (DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y METÁLICAS, DISEÑO DE SISTEMAS HIDROSANITARIOS, DISEÑO VIAL Y ESTUDIOS GEOTECNICOS), EJECUTARA SUMINISTROS Y REALIZARA INTERVENTORÍAS TÉCNICAS, EJECUTARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE INFRAESCTRUCTURA A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL ORDEN LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. PRESTA SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL. LA SOCIEDAD PUEDE REALIZAR, EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA, COMERCIAL O CIVIL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : $10,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 10,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : $6,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 6,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : $6,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 6,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYO SUPLENTE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01513003 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
VERGARA GONZALEZ IVAN FERNANDO	C.C. 000000074379160
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
VERGARA CALDERON EFRAIN	C.C. 000000007217344

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL PUEDE CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE

2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 25 DE ABRIL DE 2024

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $128,830,703

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4290

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 11,600

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 74.379.160

VERGARA GONZALEZ
APELLIDOS

IVAN FERNANDO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-JUL-1983
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

12-JUL-2001 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-0707900-34148921-M-0074379160-20060526 04759 00146A 02 185746304

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764087404012

(415)7707212489984(8020) 001876408740401 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 6 5 1 2 9	1				

11. Razón social
METRIC IOC S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 57 7 40 AP 401

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-01-20 / 11:39:26 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres VERGARA GONZALEZ IVAN FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 74379160 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización METRIC IOC S.A.S.

997. Fecha formalización 2025-01-20/11:39:26

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764087404012

(415)7707212489984(8020) 001876408740401 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900465129	1				

11. Razón social

METRIC IOC S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	METRIC IOC S.A.S. CL 57 7 40 AP 401	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	MT	122	1,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 10/03/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **METRIC IOC SAS** con NIT **900.465.129-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 007069996416

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			Cod. Negocio:	319275	Consecutivo Orden de Desembolso	2
Fecha	19/03/2025	N° Desembolsos	1	Vr. Total Desembolsos	$ 45.341.779,00		Patrimonio Autónomo

Patrimonio Autónomo ☑

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.220.108-0	CIDELSA COLOMBIA SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	CD - 51	$ 45.341.779	0019005065	CTA CTE	BBVA COLOMBIA

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO suscribieron con Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR

CONFIRMACIÓN

Bogotá, 18 de Marzo de 2025

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal del CONSORCIO FP (FIDEICOMITENTE) certifico que he efectuado o efectuaré el abono en cuenta de la obligación a mi cargo y estoy cumpliendo con la liquidación, declaración, presentación y pago de los impuestos, tasas y contribuciones derivado(s) de la ejecución del ANTICIPO que hacen parte del DESEMBOLSO solicitado en la orden de operación No. 02 por valor de $ 45.341.779 del Fideicomiso No. 3-1-9275:

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.220.106-0	CIDELSA COLOMBIA SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	CD - 51	$ 45.341.779	0019005065	CTA CTE	BBVA COLOMBIA

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

Bogotá, 18 de Marzo de 2025

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal de CONSORCIO FP certifico que me hago RESPONSABLE DE CONTROLAR Y LEGALIZAR EL ANTICIPO que hacen parte de la orden No. 02

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
186ad4f974b8b14d68746c65901673d2dcf55cc36a1a5c99b74255aedef3363177e24103ba42fd204fdaf92d55bde562

Número de Factura: CD-52
Fecha de Emisión: 19/03/2025
Fecha de Vencimiento: 19/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIDELSA COLOMBIA SAS
Nombre Comercial: CIDELSA COLOMBIA SAS
Nit del Emisor: 900220106
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 63 100 48 OF 201
Teléfono / Móvil: 3112828361
Correo: gonzalovegar@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO FP
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901899122
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 15A # 124-60 OF 102
Teléfono / Móvil: 6013106560
Correo: licitaciones@arqingco.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	7112	ANTICIPO DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO DE CUBIERTA TEXTIL PARA EL CENTRO DE CULTURA MARGARITA HURTADO DE BUENVENTURA	SÍ	1,00	$ 39.558.901,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.558.901,00
2	7112	ADMINISTRACION 9 POR CIENTO	HUR	1,00	$ 3.560.301,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.560.301,00
3	7112	IMPREVISTOS 2 POR CIENTO	HUR	1,00	$ 791.178,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 791.178,00
4	7112	UTILIDAD 5 POR CIENTO	HUR	1,00	$ 1.977.945,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 375.809,55	19.00			$ 1.977.945,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/03/2025 10:54:28
Documento validado por la DIAN:
19/03/2025 10:54:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	45888325
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	45888325
IVA	375809.55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	375809.55
Total neto factura (=)	46264134.55
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 46264134.55

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	45.888.325,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	45.888.325,00
IVA	375.809,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	375.809,55
Total neto factura (=)	46.264.134,55
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 46.264.134,55

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082051590 Rango desde: 51 Rango hasta: 80 Vigencia: 2026-10-23

Bogotá, 18 de marzo de 2025

Señores
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
Ciudad.

YO HILDA LEONOR VELANDIA MUÑOZ Identificada con C.C. No. 20.652.191 expedida en la ciudad de Guatavita (Cund), en mi condición de contador Público del CONSORCIO FP certifico que las retenciones relacionadas a continuación son las correctas para la FACTURA CD-51.

CIDELSA - CD 51

VALOR BASE	**$**	**39.558.901**
ADMINISTRACIÓN 9%	**$**	**3.560.301**
IMPREVISTOS 2%	**$**	**791.178**
UTILIDAD 5%	**$**	**1.977.945**
IVA	**$**	**375.810**
VALOR TOTAL A FACTURAR	**$**	**46.264.135**
2,0000%	**$**	**917.767**
0,0100%	**$**	**4.589**
VALOR TOTAL	**$**	**45.341.779**

Cordialmente

HILDA LEONOR VELANDIA MUÑOZ
Contador Publico
CONSORCIO FP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141162644221

(415)7707212489984(8020) 000014116264422 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 0 1 0 6	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CIDELSA COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 63 100 48 OF 201

42. Correo electrónico gonzalovegar@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 8 2 8 3 6 1	6 0 1 4 5 7 1 9 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 8 0 5 2 0						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ FAVERON ALDO GUSTAV

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141162644221

(415)7707212489984(8020) **000014116264422 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 0 1 0 6	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	0 1 5 8 9	
73. Fecha	2 0 0 8 0 3 2 9	
74. Número de notaría	4 8	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 5 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 8 0 3 6 9 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 0 3 2 9	
81. Hasta	2 1 0 0 0 4 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional	6 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	9 4 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141162644221

(415)7707212489984(8020) **000014116264422 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 0 1 0 6	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 6 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	1 0 4 8 9 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	FAVERON	ALDO	GUSTAVO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 6 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 7 5 9 1 6 5 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LEGUIZAMON	SANCHEZ	ANGEL	ERNESTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141162644221

(415)7707212489984(8020) **000014116264422 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 0 1 0 6	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	1 1 9 1 2 8 1 9 6		PERU 5 8 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RODRIGUEZ	ALVAREZ	FERNANDO	FEDERICO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 5 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	1 1 7 1 7 7 3 1 3		PERU 5 8 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RODRIGUEZ	FAVERON	FERNANDO	ENRIQUE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 5 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	7 0 0 2 7 1 9 8 1	1	PERU 5 8 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RODRIGUEZ	FAVERON	ALDO	GUSTAV

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 5 2 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	1 2 0 1 2 3 0 2 8		PERU 5 8 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RODRIGUEZ	FAVERON	CARLOS	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 5 2 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	1 1 6 7 8 0 6 4 8		PERU 5 8 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RODRIGUEZ	FAVERON	GERMAN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 5 2 0	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141162644221

(415)7707212489984(8020) **000014116264422 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 0 1 0 6	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	3 0 2 8 4 3 3		PERU 5 8 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RODRIGUEZ	FAVERON	PAOLA	ERIKA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 8 0 5 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141162644221

(415)7707212489984(8020) **000014116264422 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 0 1 0 6	0	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 4 2 1 5 1 9 5		5 6 4 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VEGA	RESTREPO	GONZALO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 0 8 0 3 0 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 4 2 3 5 7		5 6 4 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARCIA	DEVIA	GABRIEL	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 5 2 6

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de febrero de 2025 Hora: 11:07:19
Recibo No. AA25258116
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25258116BB6F9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CIDELSA COLOMBIA SAS
Nit: 900.220.106-0
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01803694
Fecha de matrícula: 20 de mayo de 2008
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 21 de noviembre de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 8A 97-07 Oficina 504
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: prodriguez@cidelsa.com
Teléfono comercial 1: 4571996
Teléfono comercial 2: 3112828361
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 8A 97-07 Oficina 504
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: prodriguez@cidelsa.com
Teléfono para notificación 1: 6014571996
Teléfono para notificación 2: 3112828361
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de febrero de 2025 Hora: 11:07:19
Recibo No. AA25258116
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25258116BB6F9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0001589 del 29 de marzo de 2008 de Notaría 48 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2008, con el No. 01215033 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CIDELSA COLOMBIA S A.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2021-04 del 26 de mayo de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 3 de junio de 2021, con el No. 02712460 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CIDELSA COLOMBIA S A a CIDELSA COLOMBIA SAS.

Por Acta No. 2021-04 del 26 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de Junio de 2021 , con el No. 02712460 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad Anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: CIDELSA COLOMBIA SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá como objeto principal la comercialización e instalación de geosintéticos y productos confeccionados con laminados flexibles sintéticos para aplicaciones industriales, la fabricación, importación, exportación y comercialización de toldos, carpas, albergues, coberturas tensionadas, tanques flexibles, ductos de ventilación, ropa impermeable, albergues, módulos promocionales y otros relacionados a la industria de laminados sintéticos, así como la representación de empresas nacionales o extranjeras dedicadas a la comercialización de los productos mencionados afines. Así mismo, la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de febrero de 2025 Hora: 11:07:19
Recibo No. AA25258116
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25258116BB6F9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Compañía podrá dedicarse a las siguientes actividades: construcción civil, fabricación de estructuras metálicas, construcción de pozas, canales, lagunas, tanques, carreteras, bases, muros, columnas, techos, cualquier clase de obras de construcción civil y la comercialización de bienes muebles. Igualmente, la Sociedad podrá realizar cualquier otra actividad comercial o económica lícita en Colombia y en el exterior. En general, la Sociedad podrá celebrar, desarrollar y ejecutar todos los actos, contratos y operaciones de cualquier naturaleza que guarden relación de medio a fin con el objeto social anteriormente descrito. Parágrafo: La Sociedad no podrá afianzar o garantizar obligaciones de terceros, ni podrá participar en sociedades colectivas o como gestor de sociedades comanditarias, salvo autorización expresa que para cada caso imparta la Asamblea General de Accionistas, mediante el voto favorable de un número singular o plural de personas que represente por lo menos el ochenta por ciento (80%) de las acciones suscritas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $2.000.000.000,00
No. de acciones : 2.000.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $909.135.000,00
No. de acciones : 909.135,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $909.135.000,00
No. de acciones : 909.135,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La Sociedad tendrá un Gerente, quien podrá ser una persona natural o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de febrero de 2025 Hora: 11:07:19
Recibo No. AA25258116
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25258116BB6F9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

jurídica, y será ejecutor y gestor de los negocios y asuntos sociales y ejercerá la representación legal, - judicial y extrajudicial - de la Sociedad. La Sociedad podrá tener uno (1) o más suplentes del Gerente, quienes reemplazarán al Gerente en sus faltas temporales y definitivas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente tendrá las siguientes facultades: (a) Realizar sin limitación alguna todos los actos comprendidos dentro del objeto social y autorizar con su firma los actos y contratos en que intervenga. (b) Ejercer plena e ilimitadamente la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad ante los accionistas, terneros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas. (c) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a las reuniones ordinarias o extraordinarias cuando sea necesario o lo estime conveniente. (d) Constituir apoderados y mandatarios generales o especiales que representen a la Sociedad en negocios o gestiones judiciales, administrativas o con particulares. (e) Nombrar y remover libremente a todos los empleados de la Sociedad. (f) Celebrar toda clase de operaciones bancarias y con títulos valores sin límite de cuantía alguna. (g) Recibir, transigir, comprometer, adquirir, abrir cuentas corrientes, girar y aceptar cheques y toda clase de títulos valores. (h) Transigir y comprometer los negocios sociales, siempre que se limiten a su giro ordinario. (i) Cuidar el recaudo e inversión de los fondos de la Sociedad. (j) Velar porque los libros y papeles sociales se lleven ordenada y oportunamente, conservándose en forma adecuada. (k) Presentar a la Asamblea General de Accionistas las cuentas, estados financieros, inventarios e informes, proponiendo a la vez la distribución de utilidades en los términos establecidos en la ley. (l) Elaborar los reglamentos de suscripción y colocación de acciones con sujeción a los términos y condiciones que previamente apruebe la Asamblea General de Accionistas. (m) En general, realizar todos los actos y celebrar todos los contratos comprendidos dentro del objeto social y sin limitación alguna. (n) Las demás que le asignen estos Estatutos Sociales o le delegue la Asamblea General de Accionistas.

NOMBRAMIENTOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de febrero de 2025 Hora: 11:07:19
Recibo No. AA25258116
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25258116BB6F9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 2025-01 del 21 de febrero de 2025, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 2025 con el No. 03211348 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Paola Erika Rodriguez Faveron	P.P. No. 123644734

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Carlos Fernando Rodriguez Faveron	P.P. No. 120123028
Segundo Suplente Del Gerente	German Fernando Rodriguez Faveron	P.P. No. 122007174
Tercer Suplente Del Gerente	Fernando Enrique Rodriguez Faveron	P.P. No. 122481000
Cuarto Suplente Del Gerente	Angel Ernesto Leguizamon Sanchez	C.C. No. 1057591658

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 2021-03 del 3 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02706307 del 18 de mayo de 2021 del Libro IX
Acta No. 2021-04 del 26 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02712460 del 3 de junio de 2021 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de febrero de 2025 Hora: 11:07:19
Recibo No. AA25258116
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25258116BB6F9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7111

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.837.187.714
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7111

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de febrero de 2025 Hora: 11:07:19
Recibo No. AA25258116
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25258116BB6F9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 29 de octubre de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 21 de noviembre de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 25 de febrero de 2025 Hora: 11:07:19
Recibo No. AA25258116
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25258116BB6F9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



PASAPORTE
PASSPORT

REPÚBLICA DEL PERÚ

D15600417



TIPO / TYPE
P

CODIGO PAIS / COUNTRY CODE
PER

PASAPORTE No. / PASSPORT NO.
123644734

APELLIDOS / SURNAMES
RODRIGUEZ FAVERON

NOMBRES / GIVEN NAMES
PAOLA ERIKA

NACIONALIDAD / NATIONALITY
PERUANA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
02 NOV/NOV 1969

DNI No. / National ID No.
09533927

SEXO / SEX
F

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
LIMA

FECHA DE EMISION / DATE OF ISSUE
02 OCT/OCT 2023

FIRMA DEL TITULAR / HOLDER'S SIGNATURE

FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY
02 OCT/OCT 2028

P<PERRODRIGUEZ<FAVERON<<PAOLA<ERIKA<<<<<<<<<<

123644734 6PER6911029F2810021<<<<<<<<<<<<<<04

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764082051590

(415)7707212489984(8020) 001876408205159 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 2 2 0 1 0 6	0				

11. Razón social
CIDELSA COLOMBIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 8 A 97 07 OF 504

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-10-23 / 03:38:03 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RODRIGUEZ FAVERON ALDO GUSTAV
1002. Tipo documento Cédula de Extranjería
1003. No. Identiflcación 1048908 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CIDELSA COLOMBIA SAS

997. Fecha formalización 2024-10-23/15:38:03

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764082051590

(415)7707212489984(8020) 001876408205159 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900220106	0				

11. Razón social

CIDELSA COLOMBIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CIDELSA COLOMBIA SAS CR 8 A 97 07 OF 504	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CD	51	80	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CIDELSA COLOMBIA SAS** identificado(a) con **número 900.220.106** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130019000100005065** aperturada el **01 de julio de 2008**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **019005065**
10 dígitos: **0019005065**
16 dígitos: **0019000100005065**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **20** de **marzo** de **2025** a las **10:40**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

5675-T



GONZALO
VEGA RESTREPO
C.C. 14215195
RESOLUCION INSCRIPCION 376 FECHA 1981/04/09
UNIVERSIDAD NACIONAL

PRESIDENTE

ELGA INES SANCHEZ CORTES

12995

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

000665

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

PUBLICADO

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP				Cod. Negocio:	319275	Consecutivo Orden de Desembolso: 3
Fecha	08/04/2025	N° Desembolsos	1	Vr. Total Desembolsos	$ 47.182.350,00		Patrimonio Autónomo

Patrimonio Autónomo ☑

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.899.122-7	CONSORCIO FP	1 - INGENIERIA DE DETALLE	REEMBOLSO	CXC2	$ 47.182.350	24143029391	CTA AHORROS	BANCO CAJA SOCIAL

OBSERVACIONES GENERALES

Con la susrcipión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO suscribieron con Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275-CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	4
Fecha	11/02/2026	**N° Desembolsos**	2	**Vr. Total Desembolsos**	$ 222.486.540,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900336153	COMPAÑÍA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.S. - COAGREGADOS S.A.S.	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 205.545.000,00	84269013676	CTA CTE	BANCOLOMBIA
900336153	COMPAÑÍA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.S. - COAGREGADOS S.A.S.	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 16.941.540,00	84269013676	CTA CTE	BANCOLOMBIA
1800672306				$ 222.486.540,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Bogotá, 05 de febrero de 2026

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal del CONSORCIO FP (FIDEICOMITENTE) certifico que he efectuado o efectuaré el abono en cuenta de la obligación a mi cargo y estoy cumpliendo con la liquidación, declaración, presentación y pago de los impuestos, tasas y contribuciones derivado(s) de la ejecución del ANTICIPO que hacen parte del DESEMBOLSO solicitado en la orden de operación No. 04 por valor de $ 222.486.540 del Fideicomiso No. 3-1-9275.

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900336153	COMPAÑÍA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.S.-	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 205.545.000,00	84269013676	CTA CTE	BANCOLOMBIA
900336153	COMPAÑÍA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.S.-	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 16.941.540,00	84269013676	CTA CTE	BANCOLOMBIA

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

Bogotá, 05 de febrero de 2026

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal de CONSORCIO FP certifico que me hago RESPONSABLE DE CONTROLAR Y LEGALIZAR EL ANTICIPO que hacen parte de la orden No. 04

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141138541795

(415)7707212489984(8020) 000014113854179 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 6 1 5 3	6	Impuestos y Aduanas de Buenaventura 3 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMPAÑIA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COAGREGADOS SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Buenaventura 1 0 9

41. Dirección principal
CL 3 1 A 57 OF 302 303

42. Correo electrónico tesoreriacrp@constructoracrp.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 4 5 0 1	6 0 2 2 4 0 9 3 4 5	3 1 8 7 3 4 3 2 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
2 3 9 5	2 0 1 3 0 9 0 1	0 8 1 1	2 0 1 3 0 9 0 1		4 1 1 1	4 9 2 3

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RUIZ PEREA CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141138541795

(415)7707212489984(8020) **000014113854179 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 6 1 5 3	6	Impuestos y Aduanas de Buenaventura	3 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 7
73. Fecha	2 0 1 0 0 1 2 1	2 0 1 7 0 6 0 9
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 1 2 6	2 0 1 7 0 6 1 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 5 9 3 9 7	R M 0 9 - 1 4 0 8
78. Departamento	7 6	7 6
79. Ciudad/Municipio	1 0 9	6

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 0 1 2 1
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141138541795

(415)7707212489984(8020) **000014113854179 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 6 1 5 3	6	Impuestos y Aduanas de Buenaventura 3 5	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 1 1 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 6 6 9 3 6 2 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RUIZ	PEREA	CESAR	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 0 5 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 1 3 8 6 4 7 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALZATE	GUZMAN	MARIA	EUGENIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141138541795

(415)7707212489984(8020) **000014113854179 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 6 1 5 3	6	Impuestos y Aduanas de Buenaventura	3 5	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 4 4 1 8 2 6 6	1	1 3 2 8 3 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ANDRADE	RADA	HECTOR	FABIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 1 0 1 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 8 4 6 7 0 9 1	3	2 2 5 0 4 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CAMPO	PEREA	MAIRA	YECENIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 1 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141138541795

(415)7707212489984(8020) **000014113854179 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 3 6 1 5 3	6	Impuestos y Aduanas de Buenaventura 3 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 0 8 1 1

162. Nombre del establecimiento: COMPAÑIA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGRGADOS SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Buenaventura 1 0 9

165. Dirección: CL 3 1 A 57 OF 301 302 303

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 0 5 9 3 9 8	2 0 1 0 0 1 2 6
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 8 7 3 4 3 2 8 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado Bancario

Martes, 20 de enero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMPAÑIA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREG identificado(a) con NIT 900336153, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	84269013676	2011/04/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	5
Fecha	11/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 19.242.097,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NUMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
890.100.251-0	CEMENTO ARGOS S.A	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 19.242.097,00	00524102918	CTA CTE	BANCOLOMBIA
0				$ 19.242.097,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2014, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ejecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Bogotá, 06 de Febrero de 2026

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal del CONSORCIO FP certifico que he efectuado o efectuaré el abono en cuenta de la obligación a mi cargo y estoy cumpliendo con la liquidación, declaración, presentación y pago de los impuestos, tasas y contribuciones derivado(s) de la ejecución del ANTICIPO que hacen parte del DESEMBOLSO solicitado en la orden de operación No. 05 por valor de $ 19.242.097 del Fideicomiso No. 3-1-9275:

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
890.100.251-0	CEMENTO ARGOS S.A	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 19.242.097,00	00524202918	CTA CTE	BANCOLOMBIA

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

Bogotá, 09 de Febrero de 2026

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal de CONSORCIO FP certifico que me hago RESPONSABLE DE CONTROLAR Y LEGALIZAR EL ANTICIPO que hacen parte de la orden No. 05

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141225298628

(415)7707212489984(8020) **000014122529862 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 0 0 2 5 1	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CEMENTOS ARGOS S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
ARGOS S.A.	ARGOS S.A

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CR 53 106 280 CENTRO EMPRESARIAL BUENA VISTA PISO 17

42. Correo electrónico correonotificaciones@argos.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 1 9 8 7 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 3 9 4	1 9 4 4 0 8 1 4	4 6 6 3	1 9 4 4 0 8 1 4	7 0 2 0				1 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	1 9	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9								

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3	4 4							

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	2	4	
58. CPC	8 3	8 3	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ PEREZ INDIRA MELISSA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141225298628

(415)7707212489984(8020) **000014122529862 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 0 0 2 5 1	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 2 9 9	2 5 6 0
73. Fecha	1 9 4 4 0 8 1 4	2 0 1 9 0 5 1 4
74. Número de notaría	2	3
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 4 4 0 8 1 9	2 0 1 9 0 5 1 4
77. No. Matrícula mercantil	3 6 4 6	3 6 4 6
78. Departamento	0 8	0 8
79. Ciudad/Municipio	3	3
Vigencia		
80. Desde	1 9 4 4 0 8 1 4	1 9 4 4 0 8 1 4
81. Hasta	2 0 6 0 0 8 1 4	2 0 6 0 0 8 1 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 2 1 2 2 8		-
2	2 0	2 0 0 5 1 2 2 8	8 9 0 4 0 0 0 8 3	- 7
3	2 1	2 0 1 2 0 5 2 8		-
4	6 2	2 0 2 0 0 8 2 4		-
5	1 0 6	2 0 2 5 1 0 2 7		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	GRUPO ARGOS	8 9 0 9 0 0 2 6 6	3

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: GRUPO ARGOS S.A.

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141225298628

(415)7707212489984(8020) **000014122529862 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 0 0 2 5 1		Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 3 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 5 6 6 0 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CALLE	RESTREPO	JUAN	ESTEBAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 8 0 8 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 6 2 6 4 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ECHEVERRI	CARVAJAL	MARIA	ISABEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 7 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 6 3 6 6 6 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
YUSTY	CALERO	CARLOS	HORACIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 9 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 8 7 6 3 8 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARISTIZABAL	RESTREPO	FELIPE	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 7 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 8 7 6 7 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RESTREPO	PEREZ	TOMAS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141225298628

(415)7707212489984(8020) **000014122529862 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 0 0 2 5 1		Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 5 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 5 7 7 6 2 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	PEREZ	INDIRA	MELISSA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 7 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 7 9 9 4 7 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JARAMILLO	BOTERO	SANTIAGO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 3 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 2 5 9 9 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MATALLANA	CORREA	JULIANA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 2 4 6 6 6 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OYAGA	RUMIE	MARIA	MARGARITA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 5 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudada 1 3	6 6 9 2 6 3 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CABAL	PARRA	MARIA	XIMENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141225298628

(415)7707212489984(8020) **000014122529862 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 0 0 2 5 1		Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 0 5 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 2 2 9 6 7 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RESTREPO	SIERRA	JULY	PAULIN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 0 5 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 2 1 4 6 7 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RINCON	LUQUE	GUSTAVO	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 0 5 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 1 8 0 2 8 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VANEGAS	URIBE	LUZDARY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 5 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 0 0 4 7 6 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTELBLANCO	CONTRERAS	ANDREA	DEL PILAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 0 5 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudada 1 3	4 6 6 6 8 4 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OCAMPO	ALVAREZ	INGRID	MAGALY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141225298628

(415)7707212489984(8020) **000014122529862 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 0 0 2 5 1	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 8 5 6 2 3 6 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PIEDRAHITA	BORRERO	ALEJANDRO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 4 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 4 3 3 9 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
OLIVELLA	VIVES	RAFAEL	JOSE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 4 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 1 1 1 1 3 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARRIETA	PADILLA	CARLOS	GUSTAVO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 4 2 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 0 4 5 1 7 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SOTO	LOSADA	CAROLINA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 4 2 8	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 4 9 9 1 6 3 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TEICHER	GRAUMAN	LEON	ELIAS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 4 2 8	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141225298628

(415)7707212489984(8020) **000014122529862 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 0 0 2 5 1	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 2 6 8 2 0 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RODRIGUEZ	GONZALEZ RUBIO	CECILIA	PIEDAD

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 4 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 4 2 9 5 9 9 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PIEDRAHITA	URIBE	ESTEBAN	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 2 0 5 0 7	2 0 2 3 0 4 2 7

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 0 5 5 1 1 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VELASQUEZ	JARAMILLO	JORGE	MARIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 4 2 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141225298628

(415)7707212489984(8020) **000014122529862 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 0 0 2 5 1	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 8 5 4 2 8 1 8		4 3 6 6 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
OCHOA	RUIZ	GONZALO	ALONSO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 6 0 0 0 0 0 8 4 6	4	KPMG S A S

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 1 0 0 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 0 8 7 4 0 6 4		3 0 4 3 9 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PALIS	RUIZ	MAYRA	LISNEIDY

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 5 2 3

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 4 8 2 3 4 2		4 7 2 0 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RUBIO	CORTES	OSCAR	RODRIGO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 0 8 0 5 2 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141225298628

(415)7707212489984(8020) **000014122529862 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 0 0 2 5 1	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Centro de explotación de tr 0 6	Fabricación de cemento, cal y yeso 2 3 9 4	

162. Nombre del establecimiento
PLANTA ARGOS TOLUVIEJO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Sucre 7 0	Toluviejo 8 2 3	

165. Dirección
KM 26 VIA SINCELEJO TOLU

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Centro de explotación de tr 0 6	Fabricación de cemento, cal y yeso 2 3 9 4	

162. Nombre del establecimiento
PLANTA ARGOS SOGAMOSO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Boyacá 1 5	Sogamoso 7 5 9	

165. Dirección
KM 6 VIA SOGAMOSO - CORRALES

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Centro de explotación de tr 0 6	Fabricación de cemento, cal y yeso 2 3 9 4	

162. Nombre del establecimiento:
PLANTA ARGOS RIOCLARO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Sonson 7 5 6	

165. Dirección
KM 163 AUT MEDELLIN - BOGOTA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141225298628

(415)7707212489984(8020) **000014122529862 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 0 0 2 5 1	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Centro de explotación de tr 0 6	Fabricación de cemento, cal y yeso 2 3 9 4

162. Nombre del establecimiento: PLANTA ARGOS NARE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Puerto Nare 5 8 5

165. Dirección: CORR LA SIERRA PUERTO NARE

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Centro de explotación de tr 0 6	Fabricación de cemento, cal y yeso 2 3 9 4

162. Nombre del establecimiento: PLANTA ARGOS YUMBO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Yumbo 8 9 2

165. Dirección: CR 19 12 132 VIA CALI

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
	1 9 4 4 1 2 0 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Fabricación de cemento, cal y yeso 2 3 9 4

162. Nombre del establecimiento: OFICINA SANTILLANA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

165. Dirección: CR 43 A 1 A SUR 143

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 1 0 6 3 0 2	2 0 2 4 1 1 2 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141225298628

(415)7707212489984(8020) **000014122529862 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 0 0 2 5 1	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Fabricación de cemento, cal y yeso 2 3 9 4

162. Nombre del establecimiento: CDM - ARGOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

165. Dirección: CR 50 CL 14 285

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
6 0 4 3 1 9 8 7 0 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Fabricación de cemento, cal y yeso 2 3 9 4

162. Nombre del establecimiento: CENTRO ARGOS PARA LA INNOVACION - UNIVERSIDAD EAFIT

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

165. Dirección: CR 49 CL 7 SUR 50 IN 1

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
6 0 4 3 1 9 8 7 0 0	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Centro de explotación de tr 0 6	Fabricación de cemento, cal y yeso 2 3 9 4

162. Nombre del establecimiento: CEMENTOS ARGOS - PLANTA CALERA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Yumbo 8 9 2

165. Dirección: KM 10 VIA YUMBO MULALO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141225298628

(415)7707212489984(8020) **000014122529862 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 0 0 2 5 1	0	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Centro de explotación de tr 0 6	Fabricación de cemento, cal y yeso 2 3 9 4	

162. Nombre del establecimiento: CEMENTOS ARGOS - PLANTA CANTERAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1	

165. Dirección: ZN INDUSTRIAL MAMONAL KM 7

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Viernes, 2 de enero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CEMENTOS ARGOS S.A identificado(a) con NIT 890100251, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	00524202918	2005/11/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	6
Fecha	11/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 100.000.000,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.665.600-8	ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	3 - COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	DESEMBOLSO	$ 100.000.000,00	21003279439	CTA CTE	BANCO CAJA SOCIAL
0				$ 100.000.000,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Bogotá, 06 de Febrero de 2026

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal del CONSORCIO FP certifico que he efectuado o efectuaré el abono en cuenta de la obligación a mi cargo y estoy cumpliendo con la liquidación, declaración, presentación y pago de los impuestos, tasas y contribuciones derivado(s) de la ejecución del ANTICIPO que hacen parte del DESEMBOLSO solicitado en la orden de operación No. 06 por valor de $ 100.000.000 del Fideicomiso No. 3-1-9275:

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.665.600-8	ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 100.000.000,00	21003279439	CTA CTE	BANCO CAJA SOCIAL

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

Bogotá, 09 de Febrero de 2026

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal de CONSORCIO FP certifico que me hago RESPONSABLE DE CONTROLAR Y LEGALIZAR EL ANTICIPO que hacen parte de la orden No. 06.

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14896601891

(415)7707212489984(8020) 000001489660189 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 5 6 0 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ARQINGCO

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 A 124 60 OF 102

42. Correo electrónico arqingconsultoria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 6 5 6 0	3 1 2 5 8 8 0 8 9 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 1 0 1 7	7 1 1 2	2 0 1 3 1 0 1 7		4 2 2 0	7 8 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BOTON GOMEZ CARLOS MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14896601891

(415)7707212489984(8020) **000001489660189 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 5 6 0 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 3 1 0 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 1 0 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 3 7 7 9 2 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 1 0 1 7	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 1 2 3 1		-
2	2 0	2 0 2 2 0 1 0 7	9 0 0 3 5 7 9 8 7	- 1
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14896601891

(415)7707212489984(8020) **000001489660189 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 5 6 0 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 1 0 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 7 2 4 1 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BOTON	GOMEZ	CARLOS	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 3 1 0 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 0 5 5 2 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PALACIOS	RUBIANO	GUSTAVO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14896601891

(415)7707212489984(8020) **000001489660189 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 6 5 6 0 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 5 3 7 0 5 6		1 2 8 2 1 8

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
QUINTANA	PABON	JENNY	MARCELA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 1 2 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 6 5 2 1 9 1		2 1 9 9 6 6

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VELANDIA	MUÑOZ	HILDA	LEONOR

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 8 3 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Caja Social
Su banco amigo

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS — Identificado con NI 9006656008

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina TELEPORT, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003279439
Fecha de apertura:	2 de Marzo de 2016
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a quien interese, realizada en la Oficina 0640 TELEPORT de la ciudad de BOGOTA, el día Viernes, 28 de Noviembre de 2025.

Banco Caja Social
28 NOV 2025
TRAMITADO

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	7
Fecha	11/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 39.576.800,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.867.436-7	INGENIERIAS DE CALIDAD DMI SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 39.576.800,00	83800008111	CTA AHORROS	BANCOLOMBIA
0				$ 39.576.800,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ejecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015..

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Bogotá, 07 de febrero de 2026

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal del CONSORCIO FP certifico que he efectuado o efectuaré el abono en cuenta de la obligación a mi cargo y estoy cumpliendo con la liquidación, declaración, presentación y pago de los impuestos, tasas y contribuciones derivado(s) de la ejecución del ANTICIPO que hacen parte del DESEMBOLSO solicitado en la orden de operación No. 07 por valor de $ 39.579.800 del Fideicomiso No. 3-1-9275:

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.867.436-7	INGENIERIAS DE CALIDAD DM SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 39.576.800,00	83800008111	CTA AHORROS	BANCOLOMBIA

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

Bogotá, 07 de febrero de 2026

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal de CONSORCIO FP certifico que me hago RESPONSABLE DE CONTROLAR Y LEGALIZAR EL ANTICIPO que hacen parte de la orden No. 07

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141169955310

(415)7707212489984(8020) 000014116995531 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 7 4 3 6	7	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIAS DE CALIDAD DM S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Santander de Quilichao 6 9 8

41. Dirección principal
CR 3 BIS NRO 17-07

42. Correo electrónico DYENIFERCHATEz@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 3 3 0 6 6 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 0 9 0 4	4 2 2 0	2 0 2 4 0 9 0 4		4 2 9 0	7 4 9 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141169955310

(415)7707212489984(8020) **000014116995531 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 7 4 3 6	7	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 4 0 9 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 9 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 4 6 1 7 5	
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	6 9 8	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 9 0 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 9 0 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141169955310

(415)7707212489984(8020) **000014116995531 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 6 7 4 3 6	7	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 9 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 8 1 5 9 3 1 9 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORDOÑEZ	MELO	DARIO	ALEXANDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Viernes, 23 de enero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIERIAS DE CALIDAD DM S.A.S identificado(a) con NIT 901867436, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado	Saldo
CUENTA DE AHORROS	83800008111	2024/09/17	ACTIVA	

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Scanned with CamScanner

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	8
Fecha	11/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 235.958.993,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
800.130.426-3	GYJ FERRETERIA SA	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 235.958.993,00	146580246	CTA CTE	BANCO DE BOGOTA
0				$ 235.958.993,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Bogotá, 09 de Febrero de 2026

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal del CONSORCIO FP certifico que he efectuado o efectuaré el abono en cuenta de la obligación a mi cargo y estoy cumpliendo con la liquidación, declaración, presentación y pago de los impuestos, tasas y contribuciones derivado(s) de la ejecución del ANTICIPO que hacen parte del DESEMBOLSO solicitado en la orden de operación No. 08 por valor de $ 235.958.993 del Fideicomiso No. 3-1-9275:

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
800.130.426-3	GYJ FERRETERIA SA	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 235.958.993,00	146580246	CTA CTE	BANCO DE BOGOTA

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

Bogotá, 09 de febrero de 2026

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal de CONSORCIO FP certifico que me hago RESPONSABLE DE CONTROLAR Y LEGALIZAR EL ANTICIPO que hacen parte de la orden No. 08

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141182376551

(415)7707212489984(8020) 000014118237655 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 3 0 4 2 6	3	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
G Y J FERRETERIAS S A

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 62 12 78 LC 1 CC PUENTE ARANDA

42. Correo electrónico impuestos@gyj.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 6 1 1	6 0 1 2 6 0 0 7 8 3	6 0 1 2 9 0 6 9 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	1 9 9 3 1 2 2 9	4 7 5 2	2 0 2 0 0 5 1 4		4 2 9 0	2 4 1 0		60

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	1 9	2 6	4 2	4 8	5 2	5 5										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ACEVEDO JAIME HERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa G Y J FERRETERIAS S.A. identificado(a) con NIT 8001304263 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 146580246 desde el 2 de Agosto de 1993, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 30 de Enero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



_____
OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	9
Fecha	11/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 39.995.241,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.794.177-1	FERROCONSTRUCCIONES ROSAS S.A.S.	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 39.995.241,00	75000007587	CTA AHORRO	BANCOLOMBIA
0				$ 39.995.241,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ejecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Bogotá, 11 de febrero de 2026

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal del CONSORCIO FP certifico que he efectuado o efectuaré el abono en cuenta de la obligación a mi cargo y estoy cumpliendo con la liquidación, declaración, presentación y pago de los impuestos, tasas y contribuciones derivado(s) de la ejecución del ANTICIPO que hacen parte del DESEMBOLSO solicitado en la orden de operación No. 09 por valor de $ 39.995.241 del Fideicomiso No. 3-1-9275:

DATOS PARA DESEMBOLSO							
NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.794.177-1	FERROCONSTRUCCIONES ROSAS S.A.S.	3 - COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	DESEMBOLSO	$ 39.995.241,00	75000007587	CTA AHORRO	BANCOLOMBIA

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

Bogotá, 11 de febrero de 2026

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal de CONSORCIO FP certifico que me hago RESPONSABLE DE CONTROLAR Y LEGALIZAR EL ANTICIPO que hacen parte de la orden No. 09

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141212384077

(415)7707212489984(8020) **000014121238407 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 4 1 7 7	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FERROCONSTRUCCIONES ROSAS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 113 27 142

42. Correo electrónico ferroconstruccionesrosas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 7 0 9 0 6 9 2	3 2 1 8 7 2 3 3 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 2 4 0 1 1 7	4 6 6 3	2 0 2 4 0 1 1 7		4 2 9 0	4 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	8	5	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212384077

(415)7707212489984(8020) **000014121238407 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 4 1 7 7	1	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 1 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 2 0 8 8 2 6	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 1 2 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212384077

(415)7707212489984(8020) **000014121238407 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 4 1 7 7	1	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 8 1 5 9 4 6 4 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROSAS	GUERRERO	MILTON	YAMID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212384077

(415)7707212489984(8020) **000014121238407 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 4 1 7 7	1	Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de edificios residenciales 4 1 1 1

162. Nombre del establecimiento: FERROCONSTRUCCIONES ROSAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

165. Dirección: CL 113 # 27 - 142

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 1 0 4 1 8 5 4	2 0 1 9 0 2 1 9
168. Teléfono: 6 0 2 3 9 0 4 1 3 6	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Martes, 10 de febrero de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **FERROCONSTRUCCIONES ROSAS SAS** identificado(a) con NIT. **901794177** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	750-000075-87	2024/06/18	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

VIGILADO

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	10
Fecha	11/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 13.615.355,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.245.674-4	FERREZ Z S.A.S	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 13.615.355,00	84200012159	CTA CTE	BANCOLOMBIA
1				$ 13.615.355,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Bogotá, 11 de Febrero de 2026

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal del CONSORCIO FP certifico que he efectuado o efectuaré el abono en cuenta de la obligación a mi cargo y estoy cumpliendo con la liquidación, declaración, presentación y pago de los impuestos, tasas y contribuciones derivado(s) de la ejecución del ANTICIPO que hacen parte del DESEMBOLSO solicitado en la orden de operación No. 10 por valor de $ 13.615.355 del Fideicomiso No. 3-1-9275:

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.245.674-4	FERREZ Z S.A.S	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 13.615.355,00	84200012159	CTA CTE	BANCOLOMBIA

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

Bogotá, 11 de febrero de 2026

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

YO **GUSTAVO PALACIOS RUBIANO** Identificado con C.C. No. 19.055.241 expedida en la ciudad de BOGOTÁ, en mi condición de representante legal de CONSORCIO FP certifico que me hago RESPONSABLE DE CONTROLAR Y LEGALIZAR EL ANTICIPO que hacen parte de la orden No. 10

Cordialmente,

GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Representante Legal
CONSORCIO FP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141166652256

(415)7707212489984(8020) 000014116665225 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 5 6 7 4	4	Impuestos y Aduanas de Buenaventura 3 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FERREZ Z S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	FERREZSAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Buenaventura 1 0 9

41. Dirección principal
CL 5 7 01 BRR PUEBLO NUEVO

42. Correo electrónico ferrez5811@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 4 4 2 0 1 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 1 9 0 1 1 1						1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ZAPATA CADAVID LUIS FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166652256

(415)7707212489984(8020) **000014116665225 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 5 6 7 4	4	Impuestos y Aduanas de Buenaventura	3 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 9 0 1 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 1 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 8 3 7 7 6	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	1 0 9	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 1 1 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 1 1 7		-
2	8 1	2 0 1 9 0 1 2 8		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166652256

(415)7707212489984(8020) **000014116665225 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 5 6 7 4	4	Impuestos y Aduanas de Buenaventura 3 5	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 1 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 1 2 2 1 1 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ZAPATA	CADAVID	LUIS	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166652256

(415)7707212489984(8020) **000014116665225 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 5 6 7 4	4	Impuestos y Aduanas de Buenaventura	3 5	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 1 7 7 6 0 7 2	4	2 4 4 3 9 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MENDOZA	MOSQUERA	SANDRA	MILEISY

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 7 4 0 8 2 7 2		3 2 8 9 7 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
DIAZ	DIAZ	NICOLAS	ENRIQUE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166652256

(415)7707212489984(8020) **000014116665225 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 5 6 7 4	4	Impuestos y Aduanas de Buenaventura 3 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERREZ Z S.A.S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Buenaventura 1 0 9

165. Dirección: CL 5 7 01 BRR PUEBLO NUEVO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 1 8 3 7 7 7	2 0 1 9 0 1 1 7
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 0 4 4 4 2 0 1 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Viernes, 16 de enero de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que FERRE Z SAS FERRE Z SAS identificado(a) con NIT 901245674, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Corriente	84200012159	2019-02-26	ACTIVO	*****

*__Importante:__ Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	11
Fecha	19/02/2026	**N° Desembolsos**	**1**	**Vr. Total Desembolsos**	$ 1.711.500.000,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
830.033.639-9	AOO INGENIERIA SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 1.711.500.000,00	90917653430	CTA CTE	BANCOLOMBIA
0				**$ 1.711.500.000,00**			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.



FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	12
Fecha	20/02/2026	**N° Desembolsos**	**1**	**Vr. Total Desembolsos**	$ 200.000.000,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.665.600-8	ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	3 - COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	DESEMBOLSO	$ 200.000.000,00	21003279439	CTA CTE	BANCO CAJA SOCIAL
0				**$ 200.000.000,00**			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.



FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE | **FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** | **CONFIRMACIÓN**

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	13
Fecha	24/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 424.488.236,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.220.106-0	CIDELSA COLOMBIA SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 424.488.236,00	0019005065	CTA CTE	BBVA COLOMBIA
0				**$ 424.488.236,00**			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.



FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE | **FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** | **CONFIRMACIÓN**

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	14
Fecha	24/02/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 52.809.917,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.867.436-7	INGENIERIAS DE CALIDAD DM SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 52.809.917	83800008111	CTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA
0				**$ 52.809.917,00**			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.



FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	15
Fecha	10/03/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 66.876.935,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.220.106-0	CIDELSA COLOMBIA SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 66.876.935,00	001900S065	CTA CTE	BBVA COLOMBIA
1				$ 66.876.935,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: i) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y ii) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal i) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	16
Fecha	19/03/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 13.410.652,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.794.177 - 1	FERROCONSTRUCCIONES ROSAS SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 13.410.652,00	75000007587	CTA AHORROS	BANCOLOMBIA
0				$ 13.410.652,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **i)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **ii)** que durante la ejecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal i) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	17
Fecha	19/03/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 234.321.300,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900336153	COMPAÑÍA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS S.A.S.- COAGREGADOS S.A.S.	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 234.321.300,00	842690136?6	CTA CTE	BANCOLOMBIA
900336153				$ 234.321.300,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: **i)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y **ii)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal i) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	18
Fecha	20/03/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 150.000.000,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900.665.600-8	ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	3 - COMPRA O ARRIENDO DE EQUIPOS Y REPUESTOS	DESEMBOLSO	$ 150.000.000,00	21003279439	CTA CTE	BANCO CAJA SOCIAL
0				$ 150.000.000,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	FID 319275 CONSORCIO FP			**Cod. Negocio:**	319275	**Consecutivo Orden de Desembolso**	19
Fecha	25/03/2026	**N° Desembolsos**	1	**Vr. Total Desembolsos**	$ 99.841.798,00	**Patrimonio Autónomo**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.867.436-7	INGENIERIAS DE CALIDAD DM SAS	4 - COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DESEMBOLSO	$ 99.841.798	83800008111	CTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA
1				$ 99.841.798,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319275 y el Interventor del contrato estatal No. 4335 de 2024, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre PROYECTO DE INGENIERIA PBS S.A.S, GUSTAVO PALACIO RUBIANO y ALVARO FONNEGRA JARAMILLO y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ejecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

PROGRAMACIÓN INICIAL ☐ REPROGRAMACIÓN ☑

FECHA DE ELABORACION O REPROGRAMACION: lunes 23 de febrero de 2026 VERSION N°: 001

OBJETO CONTRACTUAL: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES RE-QUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TIPO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MAR-GARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VA-LLE DEL CAUCA".

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO FP

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

CONTRATO OBRA No: 4335 de 2024

CONTRATO INTERVENTORIA No: 4340 de 2024

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: ONCE (11) MESES

PLAZO PLANEADO PARA LA INVERSION DEL ANTICIPO: CUATRO (4) MESES

VALOR CONTRACTUAL										
COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	%IJ	IVA / U (19%)	IND. DETALLE	IVA	SUBTOTAL IND DETALLE	Vr. TOTAL DEL CONTRATO	% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO
$ 8.655.463.908	29,31%	$ 2.536.674.413,32	5%	$ 82.229.907,13	$ 309.818.343,00	$ 58.865.485,00	$ 368.683.828,00	$ 11.543.049.056,00	50%	$ 3.735.932.113,00

PLAN DE INVERSION												
ITEM (Cuenta)	DESCRIPCION	VALOR PLANEADO	% DE ANTICIPO	FLUJO DE INVERSION								OBSERVACIONES
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5				
1	Ingeniería de Detalle	$ 111.806.349,00	2,99%	100%								
2	Compra o arriendo de equipos y repuestos	$ 450.000.000,00	12,05%		47%	25%	4%					
3	Compra de materiales y accesorios	$ 3.174.123.864,00	84,96%		78%	10%	15%					
	TOTAL ($) PLANEADO:	$ 3.735.932.113,00	100,00%									

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

b) Solo se permite un máximo de diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos.

c) Los valores estimados están sujetos de actualización y/o ajuste de acuerdo al presupuesto acordado en la etapa preliminar de ejecución

El flujo de inversión está sujeto de verificación en atención a las observaciones que se puedan sucitar a los presupuestos de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma el Veintitres (Letras) 23 (Numero) días del mes de FEBRERO (Letras) de 2026 (Año)

PRESENTADO POR:

Firma:

Nombre: GUSTAVO PALACIOS RUBIANO

Cargo: Representante Legal

CONTRATISTA

APROBADO POR:

Firma:

Nombre: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON

Cargo: Representante Legal

INTERVENTORIA

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

PROGRAMACIÓN INICIAL ☑ REPROGRAMACIÓN ☐

FECHA DE ELABORACION O REPROGRAMACION: miércoles 4 de febrero de 2026 VERSION N° 001

OBJETO CONTRACTUAL: "EFECTUAR LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE Y LAS ACTIVIDADES RE-QUERIDAS PARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN TELA TI-PO MEMBRANA, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL COMPLEJO MAR-GARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VA-LLE DEL CAUCA".

CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO FP CONTRATO OBRA No: 4335 de 2024

INTERVENTORIA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS CONTRATO INTERVENTORIA No: 4340 de 2024

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: DIECISIETE (17) MESES PLAZO PLANEADO PARA LA INVERSION DEL ANTICIPO: CUATRO (4) MESES

VALOR CONTRACTUAL										
COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	%U	IVA / U (19%)	ING. DETALLE	IVA	SUBTOTAL ING DETALLE	Vr. TOTAL DEL CONTRATO	% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO
$ 3.107.920.418	29,31%	$ 910.844.558,49	5%	$ 29.525.243,97		$ -	$ -	$ 4.048.290.220,00	50%	$ 2.024.145.110,00

PLAN DE INVERSION											
ITEM (Cuenta)	DESCRIPCION	VALOR PLANEADO	% DE ANTICIPO	FLUJO DE INVERSION							OBSERVACIONES
				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5			
1	Compra o arriendo de equipos y repuestos	$ 202.414.511,00	10,00%		25%	25%	25%	25%			
2	Compra de materiales y accesorios	$ 1.821.730.599,00	90,00%	50%	20%	30%					
	TOTAL ($) PLANEADO:	$ 2.024.145.110,00	100,00%								

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
b) Sólo se permite un máximo de diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos.
c) Los valores estimados están sujetos de actualización y/o ajuste de acuerdo al presupuesto acordado en la etapa preliminar de ejecución
El flujo de inversión esta sujeto de verificación en atención a las observaciones que se puedan sucitar a los presupuestos de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma el CUATRO (Letras) 4 (Números) días del mes de FEBRERO (Letras) de 2026 (Año)

PRESENTADO POR:
(Firma)
Nombre: GUSTAVO PALACIOS RUBIANO
Cargo: Representante Legal
CONTRATISTA

APROBADO POR:
(Firma)
Nombre: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN
Cargo: Representante Legal
INTERVENTORIA

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Valle 04 de Marzo de 2026

Estimado (a)
GALDINO OSMAR NÁJERA CERA

CONSORCIO FP
OBRA: PROYECTO BUENAVENTURA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-7975026-CALI_CON-1 con referencia: 01 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,



Claudia Ximena Arturo Bonilla
JEFE DE SUCURSAL VALLE
concrelab.valle@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-7975026-CALI_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-04
REFERENCIA: 01 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-2604	1	No especificado	Concreto	Anillos para caisson eje (N1-NK).(N1-NI(a) y (N1-NG(b))	2026-02-17	2026-02-26	2026-02-24	7	101	8.012	21,0	142,4	181,5	17,8	84,8	2-Cónica y dividida	
RT-2604	1	No especificado	Concreto	Anillos para caisson eje (N1-NK).(N1-NI(a) y (N1-NG(b))	2026-02-17	2026-02-26	2026-02-24	7	100	7.854	21,0	138,3	179,5	17,6	83,8	2-Cónica y dividida	
RT-2604	1	No especificado	Concreto	Anillos para caisson eje (N1-NK).(N1-NI(a) y (N1-NG(b))	2026-02-17	2026-02-26	2026-03-03	14	100	7.854	21,0	189,0	245,8	24,1	114,8	2-Cónica y dividida	
RT-2604	1	No especificado	Concreto	Anillos para caisson eje (N1-NK).(N1-NI(a) y (N1-NG(b))	2026-02-17	2026-02-26	2026-03-03	14	100	7.854	21,0	176,3	228,4	22,4	106,7	2-Cónica y dividida	
RT-2604	2	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NK),(NT-NE(a)),(N1-NG(b)).(N7-NE(a)) Y (N7-NG(a))	2026-02-18	2026-02-26	2026-02-25	7	101	8.012	21,0	195,6	248,8	24,4	116,2	2-Cónica y dividida	
RT-2604	2	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NK),(NT-NE(a)),(N1-NG(b)).(N7-NE(a)) Y (N7-NG(a))	2026-02-18	2026-02-26	2026-02-25	7	101	8.012	21,0	202,2	257,0	25,2	120,0	2-Cónica y dividida	
RT-2604	3	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NI),(N1-NE(a)),(N1-NM),(N7-NE(b)) Y (N7-NG(b))	2026-02-20	2026-02-26	2026-02-27	7	100	7.854	21,0	227,0	294,7	28,9	137,6	2-Cónica y dividida	
RT-2604	3	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NI),(N1-NE(a)),(N1-NM),(N7-NE(b)) Y (N7-NG(b))	2026-02-20	2026-02-26	2026-02-27	7	100	7.854	21,0	232,1	301,8	29,6	141,0	2-Cónica y dividida	
RT-2604	4	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NM),(N1-NI(a)),(N1-NG(b)),(N1-NE(a)),(N2-NA),(N7-NE(b)) Y (N7-NG(b))	2026-02-23	2026-02-26	2026-03-02	7	101	8.012	21,0	248,1	316,1	31,0	147,6	2-Cónica y dividida	
RT-2604	4	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NM),(N1-NI(a)),(N1-NG(b)),(N1-NE(a)),(N2-NA),(N7-NE(b)) Y (N7-NG(b))	2026-02-23	2026-02-26	2026-03-02	7	100	7.854	21,0	254,5	330,4	32,4	154,3	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Valle 05 de Marzo de 2026

Estimado (a)
GALDINO OSMAR NÁJERA CERA

CONSORCIO FP
OBRA: PROYECTO BUENAVENTURA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8041226-CALI_CON-1 con referencia: 02 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab



Claudia Ximena Arturo Bonilla
JEFE DE SUCURSAL VALLE
concrelab.valle@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8041226-CALI_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-05
REFERENCIA: 02 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-2604	2	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NK),(NT-NE(a)),(N1-NG(b)).(N7-NE(a)) Y (N7-NG(a))	2026-02-18	2026-02-26	2026-03-04	14	100	7.854	21,0	216,8	281,4	27,6	131,4	2-Cónica y dividida	
RT-2604	2	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NK),(NT-NE(a)),(N1-NG(b)).(N7-NE(a)) Y (N7-NG(a))	2026-02-18	2026-02-26	2026-03-04	14	100	7.854	21,0	211,5	274,3	26,9	128,1	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Valle 06 de Marzo de 2026

Estimado (a)
GALDINO OSMAR NÁJERA CERA

CONSORCIO FP
OBRA: PROYECTO BUENAVENTURA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8100226-CALI_CON-1 con referencia: 03 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab



Claudia Ximena Arturo Bonilla
JEFE DE SUCURSAL VALLE
concrelab.valle@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8100226-CALI_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-06
REFERENCIA: 03 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-2604	3	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NI),(N1-NE(a)), (N1-NM),(N7-NE(b)) Y (N7-NG(b))	2026-02-20	2026-02-26	2026-03-06	14	101	8.012	21,0	258,0	328,3	32,2	153,3	2-Cónica y dividida	
RT-2604	3	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NI),(N1-NE(a)), (N1-NM),(N7-NE(b)) Y (N7-NG(b))	2026-02-20	2026-02-26	2026-03-06	14	100	7.854	21,0	268,3	348,7	34,2	162,9	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Valle 10 de Marzo de 2026

Estimado (a)
GALDINO OSMAR NÁJERA CERA

CONSORCIO FP
OBRA: PROYECTO BUENAVENTURA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8206126-CALI_CON-1 con referencia: 04 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

Claudia Ximena Arturo Bonilla
JEFE DE SUCURSAL VALLE
concrelab.valle@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8206126-CALI_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-10
REFERENCIA: 04 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-2604	4	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NM),(N1-NI(a)),(N1-NG(b)),(N1-NE(a)),(N2-NA),(N7-NE(b)) Y (N7-NG(b))	2026-02-23	2026-02-26	2026-03-09	14	101	8.012	21,0	276,0	350,8	34,4	163,8	2-Cónica y dividida	
RT-2604	4	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NM),(N1-NI(a)),(N1-NG(b)),(N1-NE(a)),(N2-NA),(N7-NE(b)) Y (N7-NG(b))	2026-02-23	2026-02-26	2026-03-09	14	100	7.854	21,0	279,1	362,0	35,5	169,0	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Valle 19 de Marzo de 2026

Estimado (a)
GALDINO OSMAR NÁJERA CERA

CONSORCIO FP
OBRA: PROYECTO BUENAVENTURA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8563126-CALI_CON-1 con referencia: 05 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab



Claudia Ximena Arturo Bonilla
JEFE DE SUCURSAL VALLE
concrelab.valle@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8563126-CALI_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-19
REFERENCIA: 05 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-2604	1	No especificado	Concreto	Anillos para caisson eje (N1-NK).(N1-NI(a) y (N1-NG(b))	2026-02-17	2026-02-26	2026-03-17	28	101	8.012	21,0	204,8	261,0	25,6	121,9	2-Cónica y dividida	
RT-2604	1	No especificado	Concreto	Anillos para caisson eje (N1-NK).(N1-NI(a) y (N1-NG(b))	2026-02-17	2026-02-26	2026-03-17	28	100	7.854	21,0	206,4	268,2	26,3	125,2	2-Cónica y dividida	
RT-2604	2	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NK),(NT-NE(a)),(N1-NG(b)).(N7-NE(a)) Y (N7-NG(a))	2026-02-18	2026-02-26	2026-03-18	28	101	8.012	21,0	242,3	308,0	30,2	143,8	2-Cónica y dividida	
RT-2604	2	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NK),(NT-NE(a)),(N1-NG(b)).(N7-NE(a)) Y (N7-NG(a))	2026-02-18	2026-02-26	2026-03-18	28	100	7.854	21,0	243,0	315,1	30,9	147,1	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Valle 24 de Marzo de 2026

Estimado (a)
GALDINO OSMAR NÁJERA CERA

CONSORCIO FP
OBRA: PROYECTO BUENAVENTURA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8665926-CALI_CON-1 con referencia: 06 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

Claudia Ximena Arturo Bonilla
JEFE DE SUCURSAL VALLE
concrelab.valle@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8665926-CALI_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-24
REFERENCIA: 06 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-2604	3	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NI),(N1-NE(a)), (N1-NM),(N7-NE(b)) Y (N7-NG(b))	2026-02-20	2026-02-26	2026-03-20	28	100	7.854	21,0	301,2	390,6	38,3	182,4	2-Cónica y dividida	
RT-2604	3	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NI),(N1-NE(a)), (N1-NM),(N7-NE(b)) Y (N7-NG(b))	2026-02-20	2026-02-26	2026-03-20	28	100	7.854	21,0	309,6	401,8	39,4	187,6	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Valle 26 de Marzo de 2026

Estimado (a)
GALDINO OSMAR NÁJERA CERA

CONSORCIO FP
OBRA: PROYECTO BUENAVENTURA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8796326-CALI_CON-1 con referencia: 07 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab



Claudia Ximena Arturo Bonilla
JEFE DE SUCURSAL VALLE
concrelab.valle@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8796326-CALI_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-26
REFERENCIA: 07 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-2604	4	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NM),(N1-NI(a)),(N1-NG(b)),(N1-NE(a)),(N2-NA),(N7-NE(b)) Y (N7-NG(b))	2026-02-23	2026-02-26	2026-03-23	28	101	8.012	21,0	302,5	385,5	37,8	180,0	2-Cónica y dividida	
RT-2604	4	No especificado	Concreto	Anillos para caisson ejes (N1-NM),(N1-NI(a)),(N1-NG(b)),(N1-NE(a)),(N2-NA),(N7-NE(b)) Y (N7-NG(b))	2026-02-23	2026-02-26	2026-03-23	28	100	7.854	21,0	290,7	377,3	37,0	176,2	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Valle 27 de Marzo de 2026

Estimado (a)
GALDINO OSMAR NÁJERA CERA

CONSORCIO FP
OBRA: PROYECTO BUENAVENTURA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8817226-CALI_CON-1 con referencia: 08 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab



Claudia Ximena Arturo Bonilla
JEFE DE SUCURSAL VALLE
concrelab.valle@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-27
REFERENCIA: 08 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-2677	5	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NI(b)) , (N1-NG(b)), (N2-NA) Y (N7-NE(a))	2026-02-25	2026-03-25	2026-03-04	7	101	8.012	21,0	271,7	345,7	33,9	161,4	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	5	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NI(b)) , (N1-NG(b)), (N2-NA) Y (N7-NE(a))	2026-02-25	2026-03-25	2026-03-04	7	100	7.854	21,0	273,9	355,9	34,9	166,2	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	5	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NI(b)) , (N1-NG(b)), (N2-NA) Y (N7-NE(a))	2026-02-25	2026-03-25	2026-03-11	14	101	8.012	21,0	276,3	351,8	34,5	164,3	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	5	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NI(b)) , (N1-NG(b)), (N2-NA) Y (N7-NE(a))	2026-02-25	2026-03-25	2026-03-11	14	101	8.012	21,0	269,8	343,6	33,7	160,5	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	5	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NI(b)) , (N1-NG(b)), (N2-NA) Y (N7-NE(a))	2026-02-25	2026-03-25	2026-03-25	28	101	8.012	21,0	282,7	360,0	35,3	168,1	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	5	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NI(b)) , (N1-NG(b)), (N2-NA) Y (N7-NE(a))	2026-02-25	2026-03-25	2026-03-25	28	100	7.854	21,0	273,9	355,9	34,9	166,2	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	6	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NI(b)) , (N1-NE(b)), (N1-NS) Y (N6-ND)	2026-02-27	2026-03-25	2026-03-06	7	101	8.012	21,0	116,5	147,9	14,5	69,0	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	6	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NI(b)) , (N1-NE(b)), (N1-NS) Y (N6-ND)	2026-02-27	2026-03-25	2026-03-06	7	100	7.854	21,0	119,8	156,0	15,3	72,9	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	6	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NI(b)) , (N1-NE(b)), (N1-NS) Y (N6-ND)	2026-02-27	2026-03-25	2026-03-13	14	101	8.012	21,0	119,9	153,0	15,0	71,4	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	6	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NI(b)) , (N1-NE(b)), (N1-NS) Y (N6-ND)	2026-02-27	2026-03-25	2026-03-13	14	101	8.012	21,0	121,2	154,0	15,1	71,9	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	7	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NM) y (N1-Nk)	2026-03-03	2026-03-25	2026-03-10	7	101	8.012	28,0	218,4	278,4	27,3	97,5	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	7	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NM) y (N1-Nk)	2026-03-03	2026-03-25	2026-03-10	7	100	7.854	28,0	220,8	286,5	28,1	100,4	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

Concretos y Prefabricados

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-27
REFERENCIA: 08 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
																	coagregados SAS
RT-2677	7	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NM) y (N1-Nk)	2026-03-03	2026-03-25	2026-03-17	14	101	8.012	28,0	218,4	278,4	27,3	97,5	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	7	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NM) y (N1-Nk)	2026-03-03	2026-03-25	2026-03-17	14	100	7.854	28,0	220,8	286,5	28,1	100,4	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	8	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-Nk), (N1-NI(a)) y (N1-NI(b))	2026-03-04	2026-03-25	2026-03-11	7	100	7.854	28,0	148,9	193,7	19,0	67,9	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	8	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-Nk), (N1-NI(a)) y (N1-NI(b))	2026-03-04	2026-03-25	2026-03-11	7	101	8.012	28,0	152,3	193,7	19,0	67,9	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	8	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-Nk), (N1-NI(a)) y (N1-NI(b))	2026-03-04	2026-03-25	2026-03-18	14	101	8.012	28,0	157,8	200,9	19,7	70,4	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	8	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-Nk), (N1-NI(a)) y (N1-NI(b))	2026-03-04	2026-03-25	2026-03-18	14	100	7.854	28,0	153,1	198,8	19,5	69,6	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	9	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NG(b)) y (N1-NE(a))	2026-03-05	2026-03-25	2026-03-12	7	101	8.012	28,0	246,7	314,1	30,8	110,0		

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-27
REFERENCIA: 08 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
																2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	9	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NG(b)) y (N1-NE(a))	2026-03-05	2026-03-25	2026-03-12	7	100	7.854	28,0	247,7	321,2	31,5	112,5	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	9	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NG(b)) y (N1-NE(a))	2026-03-05	2026-03-25	2026-03-19	14	101	8.012	28,0	255,3	325,3	31,9	113,9	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	9	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NG(b)) y (N1-NE(a))	2026-03-05	2026-03-25	2026-03-19	14	100	7.854	28,0	251,0	326,3	32,0	114,3	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	10	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N2-NA)	2026-03-06	2026-03-25	2026-03-13	7	100	7.854	28,0	277,9	361,0	35,4	126,4	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	10	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N2-NA)	2026-03-06	2026-03-25	2026-03-13	7	101	8.012	28,0	281,9	358,9	35,2	125,7	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	10	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N2-NA)	2026-03-06	2026-03-25	2026-03-20	14	101	8.012	28,0	282,2	358,9	35,2	125,7	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:



Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-27
REFERENCIA: 08 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
																	coagregados SAS
RT-2677	10	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N2-NA)	2026-03-06	2026-03-25	2026-03-20	14	100	7.854	28,0	286,0	371,2	36,4	130,0	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	12	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N7-NG(a)) , (N7-NE(b)), (N1-NB) Y (N4-NB)	2026-03-07	2026-03-25	2026-03-14	7	101	8.012	21,0	244,0	311,0	30,5	145,2	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	12	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N7-NG(a)) , (N7-NE(b)), (N1-NB) Y (N4-NB)	2026-03-07	2026-03-25	2026-03-14	7	101	8.012	21,0	249,7	318,2	31,2	148,6	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	12	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N7-NG(a)) , (N7-NE(b)), (N1-NB) Y (N4-NB)	2026-03-07	2026-03-25	2026-03-21	14	101	8.012	21,0	254,2	323,3	31,7	151,0	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	12	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N7-NG(a)) , (N7-NE(b)), (N1-NB) Y (N4-NB)	2026-03-07	2026-03-25	2026-03-21	14	100	7.854	21,0	251,3	326,3	32,0	152,4	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	11	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NS)	2026-03-09	2026-03-25	2026-03-16	7	101	8.012	28,0	170,4	217,2	21,3	76,1	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	11	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NS)	2026-03-09	2026-03-25	2026-03-23	14	101	8.012	28,0	170,4	217,2	21,3	76,1		

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:



Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-27
REFERENCIA: 08 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
																2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	11	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NS)	2026-03-09	2026-03-25	2026-03-23	14	100	7.854	28,0	184,8	239,6	23,5	83,9	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	12A	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NG(a)) , (N1-NA), (N5-NN) Y (N5-NQ)	2026-03-10	2026-03-25	2026-03-17	7	101	8.012	21,0	161,8	206,0	20,2	96,2	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	12A	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NG(a)) , (N1-NA), (N5-NN) Y (N5-NQ)	2026-03-10	2026-03-25	2026-03-17	7	100	7.854	21,0	164,9	214,1	21,0	100,0	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	12A	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NG(a)) , (N1-NA), (N5-NN) Y (N5-NQ)	2026-03-10	2026-03-25	2026-03-24	14	101	8.012	21,0	161,8	206,0	20,2	96,2	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	12A	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NG(a)) , (N1-NA), (N5-NN) Y (N5-NQ)	2026-03-10	2026-03-25	2026-03-24	14	100	7.854	21,0	164,9	214,1	21,0	100,0	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	13	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NE(a)) y (N1-NB)	2026-03-11	2026-03-25	2026-03-18	7	101	8.012	28,0	157,5	200,9	19,7	70,4	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-27
REFERENCIA: 08 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
																	coagregados SAS
RT-2677	13	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NE(a)) y (N1-NB)	2026-03-11	2026-03-25	2026-03-18	7	100	7.854	28,0	148,4	192,7	18,9	67,5	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	13	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NE(a)) y (N1-NB)	2026-03-11	2026-03-25	2026-03-25	14	101	8.012	28,0	165,3	210,1	20,6	73,6	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	13	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NE(a)) y (N1-NB)	2026-03-11	2026-03-25	2026-03-25	14	100	7.854	28,0	167,4	217,2	21,3	76,1	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	14	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N6-ND), (N7-NE(a y b)) y (N7-NG(a y b))	2026-03-12	2026-03-25	2026-03-19	7	101	8.012	28,0	162,4	207,0	20,3	72,5	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	14	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N6-ND), (N7-NE(a y b)) y (N7-NG(a y b))	2026-03-12	2026-03-25	2026-03-19	7	100	7.854	28,0	163,8	213,1	20,9	74,6	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	14	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N6-ND), (N7-NE(a y b)) y (N7-NG(a y b))	2026-03-12	2026-03-25	2026-03-26	14	100	7.854	28,0	169,1	219,2	21,5	76,8	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	14	No especificado	Concreto		2026-03-12	2026-03-25	2026-03-26	14	100	7.854	28,0	172,7	224,3	22,0	78,6		

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:



Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-27
REFERENCIA: 08 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
				CAISSON EJES (N6-ND), (N7-NE(a y b)) y (N7-NG(a y b))												2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	15	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NA)	2026-03-13	2026-03-25	2026-03-20	7	101	8.012	28,0	158,3	201,9	19,8	70,7	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	15	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NA)	2026-03-13	2026-03-25	2026-03-20	7	101	8.012	28,0	172,5	219,2	21,5	76,8	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	16	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NG(b)) Y (N4-NB)	2026-03-14	2026-03-25	2026-03-21	7	101	8.012	28,0	115,8	147,9	14,5	51,8	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	16	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NG(b)) Y (N4-NB)	2026-03-14	2026-03-25	2026-03-21	7	101	8.012	28,0	118,1	149,9	14,7	52,5	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	17	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N5-NQ) , (N3-NS), (N5-NN) Y N6-NL (b))	2026-03-16	2026-03-25	2026-03-23	7	101	8.012	21,0	107,9	137,7	13,5	64,3	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	17	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N5-NQ) , (N3-NS), (N5-NN) Y N6-NL (b))	2026-03-16	2026-03-25	2026-03-23	7	100	7.854	21,0	135,7	176,4	17,3	82,4	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	18	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N3-NS), (N5-NN), N6-NL (a y b)), (N7-NK) y (N7-NI(b))	2026-03-18	2026-03-25	2026-03-25	7	100	7.854	21,0	109,4	141,7	13,9	66,2	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

N° DE INFORME: DCP1-8817226-CALI_CON-1
PÁGINA: 8 DE 8

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-27
REFERENCIA: 08 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-2677	18	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N3-NS), (N5-NN), N6-NL (a y b)), (N7-NK) y (N7-NI(b))	2026-03-18	2026-03-25	2026-03-25	7	100	7.854	21,0	107,6	139,7	13,7	65,2	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	19	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N6-NL (a)), (N7-NK) y (N7-NI(a y b))	2026-03-19	2026-03-25	2026-03-26	7	101	8.012	21,0	89,0	113,2	11,1	52,9	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	19	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N6-NL (a)), (N7-NK) y (N7-NI(a y b))	2026-03-19	2026-03-25	2026-03-26	7	101	8.012	21,0	92,1	117,3	11,5	54,8	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Valle 28 de Marzo de 2026

Estimado (a)
GALDINO OSMAR NÁJERA CERA

CONSORCIO FP
OBRA: PROYECTO BUENAVENTURA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8865226-CALI_CON-1 con referencia: 09 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab



Claudia Ximena Arturo Bonilla
JEFE DE SUCURSAL VALLE
concrelab.valle@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8865226-CALI_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-28
REFERENCIA: 09 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-2677	6	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NI(b)) , (N1-NE(b)), (N1-NS) Y (N6-ND)	2026-02-27	2026-03-25	2026-03-27	28	100	7.854	21,0	165,7	215,2	21,1	100,5	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	6	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N1-NI(b)) , (N1-NE(b)), (N1-NS) Y (N6-ND)	2026-02-27	2026-03-25	2026-03-27	28	100	7.854	21,0	169,8	220,3	21,6	102,9	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	15	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NA)	2026-03-13	2026-03-25	2026-03-27	14	101	8.012	28,0	198,0	251,9	24,7	88,2	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	15	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NA)	2026-03-13	2026-03-25	2026-03-27	14	101	8.012	28,0	196,1	249,8	24,5	87,5	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	20	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N3-NS), (N5-NQ) y (N5-NN)	2026-03-20	2026-03-25	2026-03-27	7	101	8.012	28,0	233,3	296,7	29,1	103,9	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados sas
RT-2677	20	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N3-NS), (N5-NQ) y (N5-NN)	2026-03-20	2026-03-25	2026-03-27	7	100	7.854	28,0	235,7	305,9	30,0	107,1	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados sas

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Valle 30 de Marzo de 2026

Estimado (a)
GALDINO OSMAR NÁJERA CERA

CONSORCIO FP
OBRA: PROYECTO BUENAVENTURA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8903026-CALI_CON-1 con referencia: 10 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

Claudia Ximena Arturo Bonilla
JEFE DE SUCURSAL VALLE
concrelab.valle@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8903026-CALI_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-30
REFERENCIA: 10 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-2677	16	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NG(b)) Y (N4-NB)	2026-03-14	2026-03-25	2026-03-28	14	101	8.012	28,0	138,7	176,4	17,3	61,8	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS
RT-2677	16	No especificado	Concreto	CAISSON EJES (N1-NG(b)) Y (N4-NB)	2026-03-14	2026-03-25	2026-03-28	14	100	7.854	28,0	140,8	182,5	17,9	63,9	2-Cónica y dividida	Concreto premezclado coagregados SAS

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Valle 31 de Marzo de 2026

Estimado (a)
GALDINO OSMAR NÁJERA CERA

CONSORCIO FP
OBRA: PROYECTO BUENAVENTURA

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio

De manera atenta nos permitimos entregar el informe No. DCP1-8935426-CALI_CON-1 con referencia: 11 en el cual se presentan los resultados de ensayos:

– Ensayo de Compresión

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

Concrelab

Claudia Ximena Arturo Bonilla
JEFE DE SUCURSAL VALLE
concrelab.valle@concrelab.com

CONCRELAB AUTHENTICITY QR CODE
Acceda al informe de resultados digital con este código

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-8935426-CALI_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO FP
***OBRA:** PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRIGIDO A:** GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
***DIRECCIÓN:** BUENAVENTURA

FECHA DE EMISIÓN: 2026-03-31
REFERENCIA: 11 - 27903
DIGITÓ: LEIDY LAURA TORO FAJARDO
LABORATORISTA: CERON EVER

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm^2 a lbf/in^2, multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm^2, multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
RT-2677	17	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N5-NQ) , (N3-NS), (N5-NN) Y N6-NL (b))	2026-03-16	2026-03-25	2026-03-30	14	100	7.854	21,0	150,0	194,8	19,1	91,0	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra
RT-2677	17	No especificado	Concreto	ANILLOS PARA CAISSON EJES (N5-NQ) , (N3-NS), (N5-NN) Y N6-NL (b))	2026-03-16	2026-03-25	2026-03-30	14	101	8.012	21,0	151,0	191,7	18,8	89,5	2-Cónica y dividida	Mezclado en obra

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

Claudia Ximena Arturo Bonilla
Jefe de Sucursal Valle


Reporte de calidad

1/12/2025 — 31/12/2025 | Planta Yumbo | Cemento Estructural Max

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine	Retenido 325	Fraguado inicial	Fraguado final
4653 cm2/g	0.5 %	161 min	261 min

Resistencia 1 día	Resistencia 3 días	Resistencia 7 días	Resistencia 28 días
17.5 MPa	33.8 MPa	41.6 MPa	50.9 MPa

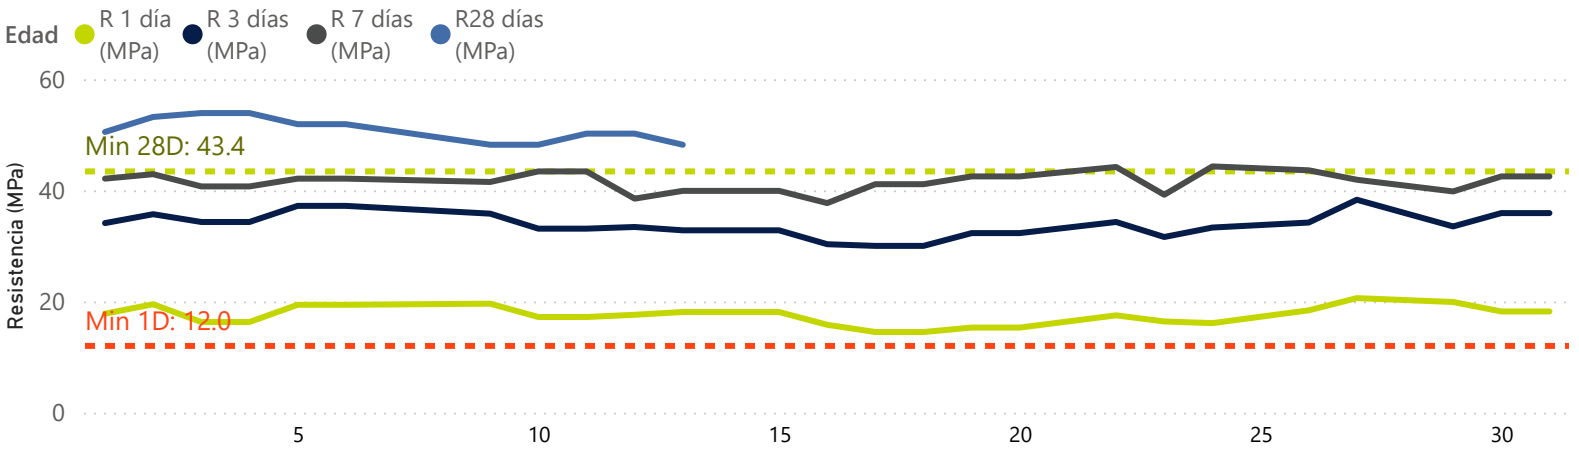

* Este cemento cumple con la especificación de la ficha técnica Argos para cemento Estructural Max.


* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221	Contenido de Aire NTC 224	Expansión en autoclave NTC 107	Expansión barras de mortero NTC 4927
3,10 g/cm3	4,0 %	-0,067 %	0,004 %

PARÁMETROS QUÍMICOS

Fases minerológicas (Bogué)

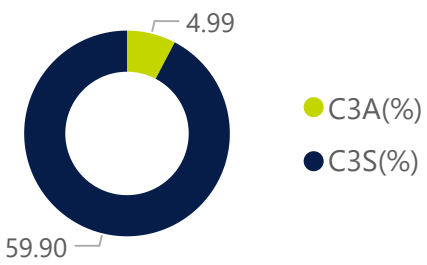

SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO
21.12 %	4.80 %	4.20 %	61.37 %

SO3	Perdidas por ignición	Equivalente alcalino
3.02 %	3.66 %	0.34 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
1/12/2025	4410	0.3	157	255	17.8	34.1	42.1	50.5
2/12/2025	4630	0.4	148	255	19.5	35.7	42.9	53.2
3/12/2025	4930	0.4	158	255	16.3	34.3	40.7	53.9
4/12/2025	4760	0.3	147	240	16.3	34.3	40.7	53.9
5/12/2025	4530	0.3	150	255	19.4	37.2	42.1	51.9
6/12/2025	4590	0.3	149	255	19.4	37.2	42.1	51.9
9/12/2025	4800	0.4	172	270	19.6	35.8	41.5	48.2
10/12/2025	4780	0.4	160	255	17.2	33.1	43.4	48.2
11/12/2025	4660	0.5	168	270	17.2	33.1	43.4	50.2
12/12/2025	4650	0.6	168	270	17.6	33.4	38.5	50.2
13/12/2025	4490	0.7	150	255	18.1	32.8	39.9	48.2
15/12/2025	4510	0.6	163	270	18.1	32.8	39.9	
16/12/2025	4550	0.8	162	270	15.8	30.3	37.7	
17/12/2025	4530	0.6	159	255	14.5	30.0	41.1	
18/12/2025	4690	0.6	157	255	14.5	30.0	41.1	
19/12/2025	4650	0.6	167	270	15.3	32.3	42.5	
20/12/2025	4730	0.7	154	250	15.3	32.3	42.5	
22/12/2025	4810	0.7	153	255	17.5	34.3	44.2	
23/12/2025	4580	0.6	156	255	16.4	31.6	39.2	
24/12/2025	4410	0.8	170	270	16.1	33.3	44.3	
26/12/2025	4710	0.6	145	240	18.4	34.2	43.6	
27/12/2025	4860	0.5	180	285	20.6	38.3	41.9	
29/12/2025	4430	0.5	160	255	19.9	33.5	39.8	
30/12/2025	4860	0.6	180	285	18.2	35.9	42.5	
31/12/2025	4780	0.6	180	285	18.2	35.9	42.5	

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

* Las especificaciones del Cemento Estructural Max cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo ART) y la Norma ASTM C1157 (Type HE).

Analquímicos
Laboratorio Químico Analítico

NIT: 890.920.400-1

Resultado de Análisis

Informe No: *53.092-2* ***FRE 03***

Muestra de: Agregados

Interesado: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Direccion: CL. 35 AN No. 3N-131
Teléfono: 661 6621
Procedencia CALI
Contacto que Envia: D.T. Alexandra Barragan

Fecha de Recibo: 26/09/2025
Identificacion: Grava de 1/2" Planta Coagregados

Registro Laboratorio: 26673

Análisis y Expresiones	Resultado	Unidad	Método
Partículas Livianas	0,0137	%	INV-E-221

NOTA: Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

Aprobada por: Omar Diaz
6/10/2025

Calle 49 B No. 68-64 Barrio Suramericana Tel: 444 85 17 Cel: 301 317 17 34
E-mail: analquimicos@hotmail.com Medellín-Colombia

Analquímicos
Laboratorio Químico Analítico

NIT: 890.920.400-1

Resultado de Análisis

Informe No: *53.092-2* ***FRE 03***

Muestra de: Agregados

Interesado: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Direccion: CL. 35 AN No. 3N-131
Teléfono: 661 6621
Procedencia CALI
Contacto que Envia: D.T. Alexandra Barragan

Fecha de Recibo: 26/09/2025
Identificacion: Grava de 1/2" Planta Coagregados

Registro Laboratorio: 26673

Análisis y Expresiones	Resultado	Unidad	Método
Partículas Livianas	0,0137	%	INV-E-221

NOTA: Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

Aprobada por: Omar Diaz
6/10/2025

Calle 49 B No. 68-64 Barrio Suramericana Tel: 444 85 17 Cel: 301 317 17 34
E-mail: analquimicos@hotmail.com Medellín-Colombia

Analquímicos
Laboratorio Químico Analítico

NIT: 890.920.400-1

Resultado de Análisis

Informe No: *53.092-3* ***FRE 03***

Muestra de: Agregados
Interesado: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Direccion: CL. 35 AN No. 3N-131
Teléfono: 661 6621
Procedencia CALI
Contacto que Envia: D.T. Alexandra Barragan

Fecha de Recibo: 26/09/2025
Identificacion: Arena de Danubio

Registro Laboratorio: 26674

Análisis y Expresiones	Resultado	Unidad	Método
Partículas Livianas	0,0286	%	INV-E-221

NOTA: Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

Aprobada por: Omar Diaz
3/10/2025

Calle 49 B No. 68-64 Barrio Suramericana Tel: 444 85 17 Cel: 301 317 17 34
E-mail: analquimicos@hotmail.com Medellín-Colombia

Analquímicos
Laboratorio Químico Analítico

NIT: 890.920.400-1

Resultado de Análisis

Informe No: *53.092-3* ***FRE 03***

Muestra de: Agregados
Interesado: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Direccion: CL. 35 AN No. 3N-131
Teléfono: 661 6621
Procedencia CALI
Contacto que Envia: D.T. Alexandra Barragan

Fecha de Recibo: 26/09/2025
Identificacion: Arena de Danubio

Registro Laboratorio: 26674

Análisis y Expresiones	Resultado	Unidad	Método
Partículas Livianas	0,0286	%	INV-E-221

NOTA: Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

Aprobada por: Omar Diaz
3/10/2025

Calle 49 B No. 68-64 Barrio Suramericana Tel: 444 85 17 Cel: 301 317 17 34
E-mail: analquimicos@hotmail.com Medellín-Colombia

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA YUMBO**	Fecha Impresión	**25/07/02**	Informe N°:	**98960**
Dirección:	**CR 36 10-355 YUMBO**	No. Remisión:	**187190408**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**4190364**	Página:	**1 de 7**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% Mo
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121Z	2,061.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.26	0.98	0.22	0.014	0.021	0.233	0.070	0.20	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01122C	2,081.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.26	0.98	0.22	0.014	0.021	0.233	0.070	0.20	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121K	2,069.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.26	0.98	0.22	0.014	0.021	0.233	0.070	0.20	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121N	2,070.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.26	0.98	0.22	0.014	0.021	0.233	0.070	0.20	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121E	2,085.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.26	0.98	0.22	0.014	0.021	0.233	0.070	0.20	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121H	2,076.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.26	0.98	0.22	0.014	0.021	0.233	0.070	0.20	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ011298	2,082.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.26	0.98	0.22	0.014	0.021	0.233	0.070	0.20	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121B	2,070.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.26	0.98	0.22	0.014	0.021	0.233	0.070	0.20	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011329	2,071.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.95	0.22	0.021	0.024	0.250	0.070	0.21	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011366	2,071.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.95	0.22	0.021	0.024	0.250	0.070	0.21	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011361	2,064.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.95	0.22	0.021	0.024	0.250	0.070	0.21	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011363	2,067.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.95	0.22	0.021	0.024	0.250	0.070	0.21	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011357	2,067.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.95	0.22	0.021	0.024	0.250	0.070	0.21	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011359	2,069.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.95	0.22	0.021	0.024	0.250	0.070	0.21	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011351	2,062.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.95	0.22	0.021	0.024	0.250	0.070	0.21	0.003	0.012
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011324	2,077.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.95	0.22	0.021	0.024	0.250	0.070	0.21	0.003	0.012

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio.

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA YUMBO**	Fecha Impresión	**25/07/02**	Informe N°:	**98960**
Dirección:	**CR 36 10-355 YUMBO**	No. Remisión:	**187190408**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**4190364**	Página:	**2 de 7**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	% CE
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121Z	2,061.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.45
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01122C	2,081.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.45
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121K	2,069.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.45
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121N	2,070.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.45
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121E	2,085.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.45
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121H	2,076.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.45
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ011298	2,082.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.45
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121B	2,070.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.45
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011329	2,071.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011366	2,071.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011361	2,064.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011363	2,067.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011357	2,067.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011359	2,069.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011351	2,062.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011324	2,077.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.46

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA YUMBO**	Fecha Impresión	**25/07/02**	Informe N°:	**98960**
Dirección:	**CR 36 10-355 YUMBO**	No. Remisión:	**187190408**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**4190364**	Página:	**3 de 7**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS					
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121Z	2,061.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	486	719	15.17	SinGrieta	1.48	20250620
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01122C	2,081.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	486	719	15.17	SinGrieta	1.48	20250620
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121K	2,069.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	486	719	15.17	SinGrieta	1.48	20250620
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121N	2,070.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	486	719	15.17	SinGrieta	1.48	20250620
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121E	2,085.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	486	719	15.17	SinGrieta	1.48	20250620
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121H	2,076.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	486	719	15.17	SinGrieta	1.48	20250620
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ011298	2,082.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	486	719	15.17	SinGrieta	1.48	20250620
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121B	2,070.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	486	719	15.17	SinGrieta	1.48	20250620
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011329	2,071.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	477	707	15.15	SinGrieta	1.48	20250621
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011366	2,071.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	477	707	15.15	SinGrieta	1.48	20250621
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011361	2,064.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	477	707	15.15	SinGrieta	1.48	20250621
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011363	2,067.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	477	707	15.15	SinGrieta	1.48	20250621
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011357	2,067.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	477	707	15.15	SinGrieta	1.48	20250621
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011359	2,069.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	477	707	15.15	SinGrieta	1.48	20250621
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011351	2,062.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	477	707	15.15	SinGrieta	1.48	20250621

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA YUMBO**	Fecha Impresión	**25/07/02**	Informe N°:	**98960**
Dirección:	**CR 36 10-355 YUMBO**	No. Remisión:	**187190408**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**4190364**	Página:	**4 de 7**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES / **PROPIEDADES FISICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011324	2,077.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	477	707	15.15	SinGrieta	1.48	20250621

DATOS GENERALES / **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121Z	2,061.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.544	0.98	3.8
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01122C	2,081.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.544	0.98	3.8
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121K	2,069.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.544	0.98	3.8
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121N	2,070.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.544	0.98	3.8
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121E	2,085.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.544	0.98	3.8
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121H	2,076.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.544	0.98	3.8
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ011298	2,082.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.544	0.98	3.8
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121B	2,070.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.544	0.98	3.8
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011329	2,071.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.545	0.93	3.7
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011366	2,071.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.545	0.93	3.7

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio.

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA YUMBO**	Fecha Impresión	**25/07/02**	Informe N°:	**98960**
Dirección:	**CR 36 10-355 YUMBO**	No. Remisión:	**187190408**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**4190364**	Página:	**5 de 7**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos
						mm	Kg/m	mm	mm
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011361	2,064.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.545	0.93	3.7
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011363	2,067.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.545	0.93	3.7
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011357	2,067.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.545	0.93	3.7
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011359	2,069.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.545	0.93	3.7
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011351	2,062.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.545	0.93	3.7
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011324	2,077.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	10.5	1.545	0.93	3.7

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA YUMBO**	Fecha Impresión	**25/07/02**	Informe N°:	**98960**
Dirección:	**CR 36 10-355 YUMBO**	No. Remisión:	**187190408**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**4190364**	Página:	**6 de 7**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte °
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121Z	2,061.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01122C	2,081.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121K	2,069.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121N	2,070.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121E	2,085.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121H	2,076.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ011298	2,082.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSJ01121B	2,070.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011329	2,071.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011366	2,071.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011361	2,064.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011363	2,067.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011357	2,067.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011359	2,069.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011351	2,062.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50
C9005638	ROLLO COMPACTO COR 5/8" NTC2289/G60	BNSM011324	2,077.00	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	50

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio.

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA YUMBO**	Fecha Impresión	**25/07/02**	Informe N°:	**98960**
Dirección:	**CR 36 10-355 YUMBO**	No. Remisión:	**187190408**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**4190364**	Página:	**7 de 7**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 5.06 MPA
Resistencia a la Tracción	± 5.06 MPA
Alargamiento	± 0.59 %
Altura Resalte	± 2.00 %
Separación entre extremos	± 1.00 %
Espaciamiento	± 0.16 %
Angulo de Resalte	± 0.13 °
Peso metro (masa)	± 0.22 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

COAGREGADOS S.A.S

CODIGO: LAB-002
4 12-2015 VERSION
:001

COMPAÑÍA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS SAS

NIT: 900.336.153-6

ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS
INV E230-2013

Obra: ***PLANTA COAGREGADOS SAS*** *Fecha muestreo:* ***1-nov-25*** *Ensayo No.:*

Material: ***GRAVA TRITURADA 3/4"***

MUESTRA INICIAL						ALARGAMIENTO			APLANAMIENTO		
TAMIZ		GRADACIÓN MUESTRA DE ENSAYO (% RETENIDO)		PESO MUESTRA		PESO MATERIAL RETENIDO CALIBRADOR, g	PORCENTAJE RETENIDO CALIBRADOR	ÍNDICE TOTAL DE ALARGAMIENTO A*D / Σ(A)	PESO MATERIAL PASA CALIBRADOR, g	PORCENTAJE PASA CALIBRADOR	ÍNDICE TOTAL DE APLANAMIENTO A*D / Σ(A)
		Original (g)	Corregida (g)	Original (g)	Corregida (g)						
PASA	RETENIDO	A		B		C	D = 100 C/B		C	D = 100 C/B	
2½"	2"					-	-	-			
2"	1½"										
1½"	1"										
1"	¾"										
¾"	½"	56,3	60,8	2438,0	2438,0	510,0	20,9	**13**	556,0	22,8	**14**
½"	3/8"	35,1	39,2	1570,0	1570,0	394,0	25,1	**10**	310,0	19,7	**8**
3/8"	¼"										
TOTAL		**91,4**	**100,0**	**4008,0**	**4008,0**	**904,0**	**46,0**		**866,0**	**42,6**	
ÍNDICES DE FORMA OBTENIDOS:							**23,0 %**			**22 %**	
ESPECIFICACIÓN: MÁXIMO PORCENTAJE =				**25**			**Cumple**			**Cumple**	

Cumplimiento: **Cumple índice de aplanamiento**

Cumple índice de alargamiento

Observaciones: **EL VALOR MÁXIMO ESPECIFICADO (%) CORRESPONDE A LAS ESPECIFICACIONES INVÍAS 2013:**

Base granular	*35*
Agregados para concretos	*25*
Agregados asfalto espumado	*35*

Ejecutó	*Aprobó*	*Notas*
 *LABORATORISTA* *Firma*	*DIRECTOR DE PLANTAS* *Firma*	Estas propiedades índice dependen de la formación, la producción y las características intrínsecas del material
Fecha	*Fecha*	Para el cálculo de los índices, la fracción que por granulometría sea menor del 5% se descarta y se corrigen los pesos
		En el índice de aplanamiento se descartan las partículas retenidas en el tamiz de 2½" y las que pasan el tamiz ¼"; en el índice de aplanamiento se descartan las partículas retenidas en el tamiz de 2" y las que pasan el tamiz ¼"

Sidoc

REPORTE DE CALIDAD
MALLA ELECTROSOLDADA

Icontec Sello de Calidad — NTC-5806 2019 MALLA ELECTROSOLDADA
Icontec Sello con Reglamento Técnico — RESOLUCIÓN 1019 2024 MALLA ELECTROSOLDADA
Icontec ISO 9001 — CERTIFICADO N° SC-446-1

F. IMPRESIÓN: 28/nov./25 3:33:53p. m. **LOTE:** M02309 Malla ϕ 5
CLIENTE: G Y J FERRETERIAS SA
DIRECCIÓN:
PRODUCTO: XX-131 **DIMENSIONES:** 6.00 m X 2.35 m

N° REPORTE: 248962

ENSAYO DE GRAFIL

REQUISITO NTC 5806 2019-06-19

	Longitudinal		Transversal			
	Colada	N° Rollo	Colada	N° Rollo		
	45424	24	45449	42		
Propiedades Físicas						
Número Registro	136225		138338			
Requisito	Nominal	Real	Nominal	Real		
Diámetro (mm)	5,00	5,22	5,00	5,32	Numeral 7.2.7	CUMPLE
Peso (g/m)	154	148	154	153		
Tolerancia (+/- 6 %)	-4		-1			
	Especificado	Obtenido	Especificado	Obtenido		
Altura Prom.Resalte (mm)	0,20	0,37	0,20	0,37	Numeral 7.2.4.4.	CUMPLE
Esp. Promedio de Resalte (mm)	4,62 a 7,24	5,32	4,62 a 7,24	5,32	Numeral 7.2.1. Tabla 6 Lit. F	CUMPLE
Esp. Longitudinal de los Resaltes (No. resaltes)	3,50 a 5,50	5,00	3,50 a 5,50	5,00	Numeral 7.2.4.3.	CUMPLE
Ángulo Resalte. (°)	45° - 70°	52	45° - 70°	52	Numeral 7.2.4.5.	CUMPLE
Área superf. Total grafilada(%).	25%	31	25%	31	Numeral 7.2.4.1.	CUMPLE
Líneas de resalte.	2	3	2	3	Numeral 7.2.4.2.	CUMPLE

Propiedades Mecánicas

Requisito	Unidades	Longitudinal		Transversal		Ensayo de Doblado 90°	
		Mínimo Especificado	Obtenido	Mínimo Especificado	Obtenido	Sin Agrietamiento	
Resistencia a la Tracción	MPa	585	740	585	738	Numeral 7.2.5.1 Tabla 8	CUMPLE
Fluencia	MPa	515	717	515	716	Numeral 7.2.5.1 Tabla 8	CUMPLE

ENSAYO DE MALLA ELECTROSOLDADA

F.Recepción y Ensayo: 28/nov./25 **Número Registro:** 138462

Propiedades Físicas y Mecánicas

REQUISITO NTC 5806 2019-06-19

Requisito	Unidades	Longitudinal		Transversal			
		Mínimo Especificado	Obtenido	Mínimo Especificado	Obtenido		
Resistencia a la Tracción	MPa	550	758	550	751	Numeral 7.2.5.3 Tabla 9	CUMPLE
Fluencia	MPa	485	711	485	705	Numeral 7.2.5.3 Tabla 9	CUMPLE
Resistencia al Corte en la Soldadura	N	Promedio Mínimo Especificado		Promedio Obtenido		Numeral 8.3	CUMPLE
		2,377		10,765			
Separación Grafiles (Tolerancia +/- 0,63 cm)	cm	Especificado	Obtenido	Especificado	Obtenido	Numeral 10.6	CUMPLE
		15,00	15,10	15,00	15,00		
Longitud de pelos (Tolerancia +/- 1.3 cm)	cm	Especificado	Obtenido	Especificado	Obtenido	Numeral 10.3	CUMPLE
		7,50	7,60	5,00	5,20		
Ensayo de Doblado (90°)	(°)	Sin Agrietamiento		Sin Agrietamiento		Numeral 8.2	CUMPLE
		SI		SI			

Observaciones: Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas NTC-3353, NTC-5806, NTC-2, NTC-1, NTC-330. El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentra en la MAT-035 "Plan de inspección y ensayo grafil y malla". SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 0277 "Alambre de acero le grafilado y mallas electrosoldadas para refuerzo de concreto". Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con autorización previa por parte de la jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S.

FIN DEL REPORTE

Elaboró: VICTOR ORDOÑEZ LEON
Analista de Laboratorio Físico Mallas

Revisó: Ing. EFREN RABON
Jefe Técnico

Powered by CamScanner

HASÇELİK

ISO / TS 16949
ISO 9001 / 2008
OHSAS18001

HASCELIK SANAYI VE TICARET A.S.

KALITE BELGESI / MILL TEST CERTIFICATE

Musteri Adi / Customer Name:		Tarih / Date Of Issue:	21.8.2024
Urun Adi / Product Name:	COLD DRAWN ROUND BAR	Kesit / Size (mm):	19,05
Stok Adi / Stock Code:	Y019.99X000.00 HPR (A55/AISI1045) M 00 CO/EN 10823 h13/SC P78	Kalite / Grade material:	ASTM F1554 G55
Irsaliye No / Waybill No:		Döküm No / Heat No:	1703477
Standart / Material Norm:	EN 10300 h8	Agirlik / Net-Gross Weight (Kgs)	3993
Siparis No / Order No:			
Evrak No / Certificate No:	HPR-2024-08-5783		

Celik Yapim Metodu / Steel Making Method: Elektrik Ark Ocagi / Electric Arc Furnace

KIMYASAL KOMPOZISYON / CHEMICAL COMPOSITION IN PRODUCT

C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Mo%	Ni%	Cu%	AL%	N%	Pb%	V%	Ti%	B%	Sn%
0,45	0,30	0,70	0,04	0,05	0,10	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-

MEKANIK ÖZELLIKLER / MECHANICAL PROPERTIES

	Akma N/mm2 Tensile strength (KSI)	Çekme N/mm2 Proof load (KSI)	Uzama (%) Elongation (%)	Sertlik HR Rokwell Hardness	Alan küçültme (%) Reduction of Area min (%)
Standar Min - Max	75 - 95	55 - 65	21	C19 - C 34	30
Test Result	84	60	21	C28	32

Görsel Muayene: Uygun
Vakum Durumu: (M) Vakumsuz
Yüzey Çatlak Testi: Test Yapilmadi
Ultrasonik Test: Test Yapilmadi
Parlak Malzeme Yüzay Çatlak Testi: Test Yapilmadi
Radyoaktivite Yoktur

Visual control: OK
Vacuum Condition: None Vacuum Degassed
Surface Crack Test: None Tested
Ultrasonic Test: None Tested
Surface Crack Test Of Bright Products: None Tested
Radioactivity Free

Bu belge yukarida tasnisi yapilan malzeme için islak imzali olarak düzenlenmistir . Çogaltilmis kopyalarin güvenliginden HASÇELIK Sorumlu degildir. Malzemelerin test edildigi ve sipans sartlarina uygun oldugu onaylanir . Kuskiu durumunda geçerli belge olarak HASÇELIK teki kaynak kopyaya basvurulmalidir. Bu malzeme AI900-4400 Cihazi ile % 100 radyoaktif testten geçirilmis hammadde ile üretilmistir. Hasçelik San , vi Tic. A.S. Vakumlu/UT Kontrolü/Yüzey Çatlak Kontrolü/Tamamlamali ürünlere kimyasal kompozisyon garantisi ile birlikte tedarikçilerin HASÇELIK e verdigi garanti kapsamindaki garanti sartlarini müsterilerine sunmaktadir. VAkumSuz/Vakumlu ürünler için kimyasal kompozisyon disinda herhangi bir garanti verilmemektedir Olusabilecek herhangi bir kalite sorununda HASÇELIK sadece malzeme bedeli kadar sorumludur. Garanti Sartlari disinda müSteride veya sonraki proseslerde ortaya çikan olumsuz durumlarda boy kesilmemis/islenmemis malzemenin teknik/ticari olarak iade alinmasi disinda HASÇELIK San , vi Tic. A.S. herhangi bir konuda yükümlü tutulmaz

QUALITY CERTIFICATE

NINGBO SUNSHINE IMPORT & EXPORT CO., LTD.

24TH FLOOR, BLOCK B, JIAHENG PLAZA, NO.1888 ZHONGSHAN EAST ROAD, NINGBO, CHINA, 315040

Customer:

DESCRIPTION: HEAVY HEX NUT

Class: 2H

SIZE 3/4-10

Quantity: 100.686PCS

Marking: F 2H

Invoice No: 18TYP0653

SC NO. 17TYP617

CODE 37653

LOT NO. 112617

IMPO 762-11(A)

DIMENSIONS OF SPEC

Inspection Items	Standard	Result
VISUAL APPEARANCE	———	OK
WIDTH ACROSS FLATS	30.78-31.75	30.33-31.45
WIDTH ACROSS Corners	35.10-36.65	35.2-35.66
HEIGHT	18.03-19.25	19.2-19.65
MECHANICAL PROPERTIES		
CHARACTERISTICS	Standard	Result
HARDNESS [HRC]	24-35	27-33
PROOF LOAD [LBF]	min 58450	60145
MAGNETIC PARTICLE TESTING		100%OK
CHEMICAL COMPOSITION(%)		

MILL HEAT	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	B
G731101025	0.43	0.18	0.64	0.01	0.015					

Surface Coating: HDG

The information on chemical composition is based on the test certificate received from the steel mill or supplier

Material described in this document has been inspected under the parameters set forth and found to be in conformance with the physical requirement

We certify the above product meets specific requirement

宁波荣正进出口有限公司
NINGBO SUNSHINE IMPORT & EXPORT CO.,LTD.

Quality Control Supervisor 高育良

Quality Control Manager 李达康

SHANGHAI PRIME MACHINERY CO.,LTD.
15TH FLOOR 600 HENGFENG ROAD 200070 SHANGHAI
FAX: 86-21-63177538/63178909

QUALITY CERTIFICATE

CONSIGNOR: SHANGHAI PRIME MACHINERY CO.,LTD.

CONSIGNEE:

CONTRACTNO: 70018176

INVOICE NO. : 10015652

COMMODITY: F436 H.D.G. BULK

SIZE: 3/8、5/8、1/2、3/4、7/8、1、1-1/8、1-1/4、1-1/2、1-5/8、1-3/4、2、2-1/4、2-1/2、2-3/4、3

QUANTITY: X1000PCS 104.400、300.000、100.300、52.800、50.400、20.160、30.060、5.000、3.040、2.000、2.000、1.170

RESULT OF TESTING:

MATERIAL: 45#

C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Mo	Ti	B
0.450	0.190	0.610	0.008	0.016					

MECHANICAL PROPERTIES:

Hardness	HR	HRC	26-45

SAMPLES DRAWN FROM EACH SPECIFICATION OF THE ABOVE MENTIONED GOODS AT RANDOM WERE TESTED AND IT WAS FOUND THE MATERIAL AND DIMENSION WERE UP TO THE EQUIREMENT OF RELATIVE STANDARD.

INSPECTED BY: GU WEIHUA SURVEYOR TO: YAO JIHUA

QUALITY CONTROL DEPARTMENT:

SHANGHAI PRIME MACHINERY CO.,LTD.

HASÇELİK

HASCELIK SANAYI VE TICARET A.S.

KALITE BELGESI / MILL TEST CERTIFICATE

ISO / TS 16949
ISO 9001 / 2008
OHSAS18001

Musteri Adi / Customer Name:		Tarih / Date Of Issue:	14.09.2024
Urun Adi / Product Name:	COLD DRAWN ROUND BAR	Kesit / Size (mm):	22.225
Stok Adi / Stock Code:	Y017.47X000.00 HPR (A55) M 00 CD/EN 10394 h9/SC P19	Kalite / Grade material:	ASTM F1554 G55
Irsaliye No / Waybill No:		Döküm No / Heat No:	1704552
Standart / Material Norm:	EN 10343 h9	Agirlik / Net-Gross Weight (Kgs)	3995
Siparis No / Order No:			
Evrak No / Certificate No:	HPR-2024-09-5255	Celik Yapim Metodu / Steel Making Method:	Elektrik Ark Ocagi / Electric Arc Furnace

KIMYASAL KOMPOZISYON / CHEMICAL COMPOSITION IN PRODUCT

C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Mo%	Ni%	Cu%	AL%	N%	Pb%	V%	Ti%	B%	Sn%
0,45	0,30	0,70	0,04	0,05	0,10	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-

MEKANIK ÖZELLIKLER / MECHANICAL PROPERTIES

	Akma N/mm2 Tensile strength (KSI)	Çekme N/mm2 Proof load (KSI)	Uzama (%) Elongation (%)	Sertlik HB Rokwell Hardness	Alan küçültme (%) Reduction of Area min (%)
Standar Min - Max	75 - 95	55 - 65	21	C19 - C 34	30
Test Result	82	61	21	C26	32

Görsel Muayene: Uygun
Vakum Durumu: (M) Vakumsuz
[illegible]
Ultrasonik Test: Test Yapilmadi
Parlak Malzeme Yüzay Çatlak Testi: Test Yapilmadi
Radyoaktivite Yoktur

Visual control: OK
Vacuum Condition: None Vacuum Degassed
Surface Crack Test: None Tested
Ultrasonic Test: None Tested
Surface Crack Test Of Bright Products: None Tested
Radioactivity Free

Bu belge yukarda tanimi yapilan malzeme için isiak imzali olarak düzenlenmistir . Çogaltilmis kopyalarin güvenliginden HASÇELIK Sorumlu degildir. Malzemelerin test edildigi ve siparis sartlarina uygun oldugu onaylarsir . Kuskü durumunda geçerli belge olarak HASÇELIK isiky kaynak kopyaya basvurulmalidir. Bu malzeme AT900-8400 Cihazi ile % 100 radyoaktif testten geçirilmis hammadde ile üretilmistir. Hasçelik San , vi Tic. A.S. Vakumlu/UT Kontrollü/Yüzey Çatlak Kontrollü/Damgalamali ürünlere kimyasal kompozisyon garantisi ile birlikte tedarikçilerin HASÇELIK e verdigi garanti kapsamindaki garanti sartlarini müsterilerine sunmaktadir, VAkumSuz/Vakumlu ürünler için kimyasal kompozisyon disinda herhangi bir garanti verilmemektedir Otosabilecek herhangi bir kalite sorununda HASÇELIK sadece malzeme bedeli kadar sorumludur. Garanti Sartlari disinda müsteride veya sonraki proseslerde ortaya Çikan olumsuz durumlarda boy kesilmemis/bilemmemis malzemenin lekelik/ticari olarak iade alinmasi disinda HASÇELIK San , vi Tic. A.S. herhang bir konuda yukümlü tutulamaz.

LEFA INTERNATIONAL LIMITED
QUALITY CERTIFICATE

Tel: 0086-13777022789 Fax: 0086-574-87838429 Email: LORA@LEFASTENER.COM

Customer:

Marking: F 2H

Class: 2H

Quantity: 5,791PCS

DESCRIPTION: 7/8-9UN

SC No.: 17TYP030

Invoice No: 18TYP0416

CODE. 37530

IMPO. I12-17(B)

LOT NO 617030

DIMENSIONS OF SPEC

Inspection Items	Standard	Result
VISUAL APPEARANCE	———	OK
WIDTH ACROSS FLATS	69.85-67.62	63.4-64.8
WIDTH ACROSS Corners	80.64-77.09	72.3-73.2
HEIGHT	44.67-42.65	40.2-40.9

MECHANICAL PROPERTIES

CHARACTERISTICS	Standard	Result
HARDNESS [HRC]	24-35	27-33
PROOF LOAD [kN]	min 364000	366870

MACRO ETCH

Division	Surface Condition	Random Condition	Center Segregation	Spec. Of test method
Spec.	S4	R4	C4	ASTM E381-94
Results	S2	R2	C2	

CHEMICAL COMPOSITION(%)

MILL HEAT	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	B
F4070765	0.45	0.23	0.62	0.021	0.004					
Surface Coating:	HDG									

The information on chemical composition is based on the test certificate received from the steel mill or supplier

Material described in this document has been inspected under the parameters set forth and found to be in conformance with the physical requirement

We certify the above product meets specific requirement

For and on behalf of LEFA INTERNATIONAL LIMITED

Authorized Signature(s)

Quality Control Supervisor 高丽丽

Quality Control Manager 王思聪

SHANGHAI PRIME MACHINERY CO.,LTD.
15TH FLOOR 600 HENGFENG ROAD 200070 SHANGHAI
FAX: 86-21-63177538/63178909

QUALITY CERTIFICATE

CONSIGNOR: SHANGHAI PRIME MACHINERY CO.,LTD.

CONSIGNEE:

CONTRACTNO: 70018176

INVOICE NO.: 10015652

COMMODITY: F436 H.D.G. BULK

SIZE: 3/8、5/8、1/2、3/4、7/8、1、1-1/8、1-1/4、1-1/2、1-5/8、1-3/4、2、2-1/4、2-1/2、2-3/4、3

QUANTITY: X1000PCS 104.400、300.000、100.300、52.800、50.400、20.160、30.060、5.000、3.040、2.000、2.000、1.170

RESULT OF TESTING:

MATERIAL: 45#

C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Mo	Ti	B
0.450	0.190	0.610	0.008	0.016					

MECHANICAL PROPERTIES:

Hardness	HR	HRC	26-45

SAMPLES DRAWN FROM EACH SPECIFICATION OF THE ABOVE MENTIONED GOODS AT RANDOM WERE TESTED AND IT WAS FOUND THE MATERIAL AND DIMENSION WERE UP TO THE EQUIREMENT OF RELATIVE STANDARD.

INSPECTED BY: GU WEIHUA SURVEYOR TO: YAO JIHUA

QUALITY CONTROL DEPARTMENT:



HASÇELİK

ISO / TS 16949
ISO 9001 / 2008
OHSAS18001

HASCELIK SANAYI VE TICARET A.S.

KALITE BELGESI / MILL TEST CERTIFICATE

Musteri Adi / Customer Name:		Tarih / Date Of issue:	11.10.2024
Urun Adi / Product Name:	COLD DRAWN ROUND BAR	Kesit / Size (mm):	31,75
Stok Adi / Stock Code:	Y017.74X000.00 HPR (A55/AISI1045) M 00 CO/EN 10775 h9/SC P3	Kalite / Grade material:	ASTM F1554 G55
Irsaliye No / Waybill No:		Dökûm No / Heat No:	1701737
Standart / Material Norm:	EN 10278 h9	Agirlik / Net-Gross Weight (Kgs)	3993
Siparis No / Order No:			
Evrak No / Certificate No:	HPR-2024-10-3967		

Celik Yapim Metodu / Steel Making Method: Elektrik Ark Ocagi / Electric Arc Furnace

KIMYASAL KOMPOZISYON / CHEMICAL COMPOSITION IN PRODUCT

C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Mo%	Ni%	Cu%	AL%	N%	Pb%	V%	Ti%	B%	Sn%
0,45	0,30	0,70	0,04	0,05	0,10	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-

MEKANIK ÖZELLIKLER / MECHANICAL PROPERTIES

	Akma N/mm2 Tensile strength (KSI)	Çekme N/mm2 Proof load (KSI)	Uzama (%) Elongation (%)	Sertlik HB Rokwell Hardness	Alan küçültme (%) Reduction of Area min (%)
Standar Min - Max	75 - 95	55 - 65	21	C19 - C 34	30
Test Result	82	58	21	C26	24

Görsel Muayene: Uygun
Vakum Durumu: (M) Vakumsuz
Yüzey Çatlak Testi: Test Yapilmadi
Ultrasonik Test: Test Yapilmadi
Parlak Malzeme Yüzey Çatlak Testi: Test Yapilmadi
Radyoaktivite Yoktur

Visual control: OK
Vacuum Condition: None Vacuum Degassed
Surface Crack Test: None Tested
Ultrasonic Test: None Tested
Surface Crack Test Of Bright Products: None Tested
Radioactivity Free

Bu belge yukarida tanimi yapilan malzeme için ekak imzali olarak düzenlenmistir . Çogaltilmis kopyalarin güvenliginden HASÇELIK Sorumlu degildir. Malzemelerin test edildigi ve siparis sartlarina uygun oldugu onaylanir . Kusku durumunda geçerli belge olarak HASÇELIK bünyesinde kayitli kopyaya basvurulmalidir. Bu malzeme AT900-6400 Cinsi ile % 100 radyoaktif testten geçirilmis hammadde ile üretilmistir. Hasçelik San , vi Tic. A.S. Vakumlu/UT Kontrollü/Yüzey Çatlak Kontrollü/Tanimlanmali ürünlere kimyasal kompozisyon garantisi ile birlikte tedarikçilerin HASÇELIK e verdigi garanti kapsamindaki garanti sartlarini müsterilerine sunmaktadir. VAkumSuz/Vakumlu ürünler için kimyasal kompozisyon disinda herhangi bir garanti verilmemektedir. Olusabilecek herhangi bir kalite sorununda HASÇELIK sadece malzeme bedeli kadar sorumludur. Garanti Şartlari disinda müşteride veya sonraki proseslerde ortaya çikan olumsuz durumlarda Iviy kesilmemis/islenmemis malzemenin teknik/ticari olarak iade alinmasi disinda HASÇELIK San , vi Tic. A.S. herhang bir konuda yükümlü tutulamaz

LEFA INTERNATIONAL LIMITED
QUALITY CERTIFICATE

Tel: 0086-13777022789 Fax: 0086-574-87838429 Email: LORA@LEFASTENER.COM

Customer:

DESCRIPTION: HEX HEAVY NUT

Class: 2H

SIZE 1.1/4-8UNC

Quantity: 32,400MPCS

Marking: F 2H

Invoice No: 18TYP0710

SC NO. 17TYP030

CODE 37651

LOT NO. 617030

INFO 112C-17

DIMENSIONS OF SPEC

Inspection Items	Standard	Result
VISUAL APPEARANCE		OK
WIDTH ACROSS FLATS	21.59-22.22	21.65-21.86
WIDTH ACROSS Corners	24.62-25.65	25.2-25.6
HEIGHT	11.79-12.8	12.2-12.6

MECHANICAL PROPERTIES

CHARACTERISTICS	Standard	Result
HARDNESS [HRC]	24-35	30-32
PROOF LOAD [LBF]	min 24830	27013

MACRO ETCH

Division	Surface Condition	Random Condition	Center Segregation	Spec.Of test method
Spec.	S1	R1	C1	ASTM E381-94
Results	S2	R2	C2	

CHEMICAL COMPOSITION(%)

MILL HEAT	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	B
F21506613	0.44	0.18	0.71	0.013						
Surface Coating:	HDG									

The information on chemical composition is based on the test certificate received from the steel mill or supplier

Material described in this document has been inspected under the parameters set forth and found to be in conformance with the physical requirement

We certify the above product meets specific requirement

For and on behalf of LEFA INTERNATIONAL LIMITED

Authorized Signature

Quality Control Supervisor 严大旭

Quality Control Manager庞马宋

SHANGHAI PRIME MACHINERY CO.,LTD.
15TH FLOOR 600 HENGFENG ROAD 200070 SHANGHAI
FAX: 86-21-63177538/63178909

QUALITY CERTIFICATE

CONSIGNOR: SHANGHAI PRIME MACHINERY CO.,LTD.

CONSIGNEE:

CONTRACTNO: 70018176

INVOICE NO.: 10015652

COMMODITY: F436 H.D.G. BULK

SIZE: 3/8、5/8、1/2、3/4、7/8、1、1-1/8、1-1/4、1-1/2、1-5/8、1-3/4、2、2-1/4、2-1/2、2-3/4、3

QUANTITY: X1000PCS 104.400、300.000、100.300、52.800、50.400、20.160、30.060、5.000、3.040、2.000、2.000、1.170

RESULT OF TESTING:

MATERIAL: 45#

C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Mo	Ti	B
0.450	0.190	0.610	0.008	0.016					

MECHANICAL PROPERTIES:

Hardness	HR	HRC	26-45

SAMPLES DRAWN FROM EACH SPECIFICATION OF THE ABOVE MENTIONED GOODS AT RANDOM WERE TESTED AND IT WAS FOUND THE MATERIAL AND DIMENSION WERE UP TO THE EQUIREMENT OF RELATIVE STANDARD.

INSPECTED BY: GU WEIHUA SURVEYOR TO: YAO JIHUA

QUALITY CONTROL DEPARTMENT:

HASÇELİK

ISO / TS 16949
ISO 9001 / 2008
OHSAS18001

HASCELIK SANAYI VE TICARET A.S.

KALITE BELGESI / MILL TEST CERTIFICATE

Musteri Adi / Customer Name:		Tarih / Date Of Issue:	28.11.2024
Urun Adi / Product Name:	COLD DRAWN ROUND BAR	Kesit / Size (mm):	38,10
Stok Adi / Stock Code:	Y025.490X000.00 HPR (AS5/AISI1045) M 00 CO/EN 10993 b4/SC P3	Kalite / Grade material:	ASTM F1554 G55
Irsaliye No / Waybill No:		Döküm No / Heat No:	1704981
Standart / Material Norm:	EN 10300 b4	Agirlik / Net-Gross Weights (Kgs)	3990
Siparis No / Order No:			
Evrak No / Certificate No:	HPR-2024-11-5319		

Celik Yapim Metodu / Steel Making Method: Elektrik Ark Ocagi / Electric Arc Furnace

KIMYASAL KOMPOZISYON / CHEMICAL COMPOSITION IN PRODUCT

C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Mo%	Ni%	Cu%	AL%	N%	Pb%	V%	Ti%	B%	Sn%
0,45	0,30	0,70	0,04	0,05	0,10	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-

MEKANIK ÖZELLIKLER / MECHANICAL PROPERTIES

	Akma N/mm2 Tensile strength (KSi)	Çekme N/mm2 Proof load (KSi)	Uzama (%) Elongation (%)	Sertlik HB Rokwell Hardness	Alan küçültme (%) Reduction of Area min (%)
Standar Min - Max	75 - 95	55 - 66	21	C19 - C 34	30
Test Result	82	58	21	C26	24

Görsel Muayene: Uygun
Vakum Durumu: (M) Vakumsuz
Yüzey Çatlak Testi: Test Yapilmadi
Ultrasonik Test: Test Yapilmadi
Parlak Malzeme Yüzay Çatlak Testi: Test Yapilmadi
Radyoaktivite Yoktur

Visual control: OK
Vacuum Condition: None Vacuum Degassed
Surface Crack Test: None Tested
Ultrasonic Test: None Tested
Surface Crack Test Of Bright Products: None Tested
Radioactivity Free

Bu belge yukarida tanimi yapilan malzeme için imzali olarak düzenlenmistir . Çogaltilmis kopyalarin güvenliginden HASÇELIK Sorumlu degildir. Malzemelerin test edildigi ve sipata sartlarina uygun oldugu onaylanir . Kuskulu durumunda geçerli belge olarak HASÇELIK'teki kaynak kopyaya basvurulmalidir. Bu malzeme AT900-4400 Cihazi ile % 100 radyoaktif testten geçirilmis hammadde ile üretilmistir. Hasçelik San , vi Tic. A.S. Vakumlu/UT Kontrollü/Yüzey Çatlak Kontrollü/Tanimlamali ürünlere kimyasal kompozisyon garantisi ile birlikte teslim edilmektedir. HASÇELIK e verdigi garanti kapsamindaki garanti sartlarini müsterilerine sunmaktadir. VAkumSuz/Vakumlu üretilen ürünler için kimyasal kompozisyon disinda herhangi bir garanti verilmemektedir. Olusabilecek herhangi bir kalite sorununda HASÇELIK sadece malzeme bedeli kadar sorumludur. Garanti Sartlari disinda müsteride veya sonraki proseslerde ortaya çikan olumsuz durumlarda boy kesilmemis/islenmemis malzemenin teknik/ticari olarak iade edilmesi disinda HASÇELIK San , vi Tic. A.S. herhangi bir konuda yükümlü tutulamaz

LEFA INTERNATIONAL LIMITED
QUALITY CERTIFICATE

Tel: 0086-13777022789 Fax: 0086-574-87838429 Email: LORA@LEFASTENER.COM

Customer:

DESCRIPTION: HEX HEAVY NUT

Class: 2H

SIZE 1.1/2-8UNC.

Quantity: 32.400MPCS

Marking: F 2H

Invoice No: 18TYP0710

SC NO. 17TYP030

CODE 37651

LOT NO. 617030

IMPO 112C-17

DIMENSIONS OF SPEC

Inspection Items	Standard	Result
VISUAL APPEARANCE		OK
WIDTH ACROSS FLATS	21.59-22.22	21.65-21.86
WIDTH ACROSS Corners	24.62-25.65	25.2-25.6
HEIGHT	11.79-12.8	12.2-12.6

MECHANICAL PROPERTIES

CHARACTERISTICS	Standard	Result
HARDNESS [HRC]	24-35	30-32
PROOF LOAD [IBF]	min 24830	27013

MACRO ETCH

Division	Surface Condition	Random Condition	Center Segregation	Spec. Of test method
Spec.	S4	R4	C4	ASTM E381-94
Results	S2	R2	C2	

CHEMICAL COMPOSITION(%)

MILL HEAT	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	B
E21506613	0.44	0.18	0.71	0.01						
Surface Coating:	HDG									

For and on Behalf of LEFA INTERNATIONAL LIMITED

Authorized Signature

The information on chemical composition is based on the test certificate received from the steel mill or supplier

Material described in this document has been inspected under the parameters set forth and found to be in conformance with the physical requirement

We certify the above product meets specific requirement

Quality Control Supervisor 严大炮

Quality Control Manager庞莺朱

SHANGHAI PRIME MACHINERY CO.,LTD.
15TH FLOOR 600 HENGFENG ROAD 200070 SHANGHAI
FAX: 86-21-63177538/63178909

QUALITY CERTIFICATE

CONSIGNOR: SHANGHAI PRIME MACHINERY CO.,LTD.

CONSIGNEE:

CONTRACTNO: 70018176

INVOICE NO.: 10015652

COMMODITY: F436 H.D.G. BULK

SIZE: 3/8、5/8、1/2、3/4、7/8、1、1-1/8、1-1/4、1-1/2、1-5/8、1-3/4、2、2-1/4、2-1/2、2-3/4、3

QUANTITY: X1000PCS 104.400、300.000、100.300、52.800、50.400、20.160、30.060、5.000、3.040、2.000、2.000、1.170

RESULT OF TESTING:

MATERIAL: 45#

C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Mo	Ti	B
0.450	0.190	0.610	0.008	0.016					

MECHANICAL PROPERTIES:

Hardness	HR	HRC	26-45

SAMPLES DRAWN FROM EACH SPECIFICATION OF THE ABOVE MENTIONED GOODS AT RANDOM WERE TESTED AND IT WAS FOUND THE MATERIAL AND DIMENSION WERE UP TO THE EQUIREMENT OF RELATIVE STANDARD.

INSPECTED BY: GU WEIHUA SURVEYOR TO: YAO JIHUA

QUALITY CONTROL DEPARTMENT:



HASÇELİK

HASCELIK SANAYI VE TICARET A.S.

KALITE BELGESI / MILL TEST CERTIFICATE

ISO / TS 16949
ISO 9001 / 2008
OHSAS18001

Musteri Adi / Customer Name:		Tarih / Date Of Issue:	29.11.2024
Urun Adi / Product Name:	COLD DRAWN ROUND BAR	Kesit / Size (mm):	28,575
Stok Adi / Stock Code:	Y088.66X000.00 HPR (A55/AISI1045) M 00 CO/EN 10992 h8/SC P11	Kalite / Grade material:	ASTM F1554 G55
Irsaliye No / Waybill No:		Dökürn No / Heat No: 1704877	
Standart / Material Norm:	EN 10300 h4	Agirlik / Net-Gross Weight (Kgs) 3992	
Siparis No / Order No:			
Evrak No / Certificate No:	HPR-2024-11-5780		

Celik Yapim Metodu / Steel Making Method: Elektrik Ark Ocagi / Electric Arc Furnace

KIMYASAL KOMPOZISYON / CHEMICAL COMPOSITION IN PRODUCT

C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Mo%	Ni%	Cu%	Al%	N%	Pb%	V%	Ti%	B%	Sn%
0,45	0,30	0,70	0,04	0,05	0,10	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-

MEKANIK ÖZELLIKLER / MECHANICAL PROPERTIES

	Akma N/mm2 Tensile strength (KSI)	Cekme N/mm2 Proof load (KSI)	Uzama (%) Elongation (%)	Sertlik HB Rokwell Hardness	Alan küçülme (%) Reduction of Area min (%)
Standar Min - Max	75 - 95	55 - 65	21	C19 - C 34	30
Test Result	82	60	21	C26	32

Görsel Muayene: Uygun
Vakum Durumu: (M) Vakumsuz
Yüzey Çatlak Testi: Test Yapilmadi
Ultrasonik Test: Test Yapilmadi
Parlak Malzeme Yüzey Çatlak Testi: Test Yapilmadi
Radyoaktivite Yoktur

Visual control: OK
Vacuum Condition: None Vacuum Degassed
Surface Crack Test: None Tested
Ultrasonic Test: None Tested
Surface Crack Test Of Bright Products: None Tested
Radioactivity Free

Bu belge yukarida tanimi yapilan malzeme için imalat örnegi olarak düzenlenmistir . Çogaltilmis kopyalarin guvenliginden HASÇELIK Sorumlu degildir. Malzemelerin test edildigi ve siparis sartlarina uygun oldugu onaylanir . Kusku durumunda geçerli belge olarak HASÇELIK imlu kaynak kopyaya basvurulmalidir. Bu malzeme AI'900-4400 Ohasi ile % 100 radyoaktif testten geçirilmis hammadde ile üretilmistir. Hasçelik San , vi Tic. A.S. Vakumlu/UT Kontrollü/Yüzey Çatlak Kontrollü/Tamamlamali ürünlere kimyasal kompozisyon garantisi ile birlikte tedarikçilerin HASÇELIK e verdigi garanti kapsamindaki garanti sartlarini müsterilerine sunmaktadir. VAkumsüz/Vakumlu ürünler için kimyasal kompozisyon disinda herhangi bir garanti verilmemektedir Olusabilecek herhangi bir kalite sorununda HASÇELIK sadece malzeme bedeli kadar sorumludur. Garanti Sartlari disinda müsteride veya sonraki proseslerde ortaya çikan olumsuz durumlarda boy kesilmemis/islenmemis malzemenin teknik/ticari olarak iade alinmasi disinda HASÇELIK San , vi Tic. A.S. herhang bir konuda yükümlü tutulamaz

No. 4086

VERIFICACIÓN DE EQUIPO

Instrumento: ESTACION TOTAL **Marca:** TOPCON

Modelo: GTS-245NW **Número de Serie:** V10189

Cliente: FRANKLIN KLINGER

Fecha de expedición: 13 de Enero de 2026

Recomendamos ajustar: 13 de Julio de 2026

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de CCV&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo Utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 19/12/2018

Patrones Utilizados:

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 03/07/2023
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 03/07/2023

Elaboró:

Gabriel Martinez
Técnico de Laboratorio
CCV&O S.A.S.
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali.

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.
TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA
CALLE 3D N° 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 602 485 0256 CELS.: 321 802 1096 - 311 308 4562
Cali-Colombia

No. 4086

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

Aumentos del telescopio	30X	Alcance sin reflector	---------...
Precisión angular (DIN 18723)	5"	Alcance con dianas reflectivas	---------
Precisión en distancia	± 3mm+2ppmxd	Alcance con un prisma	4000M

AJUSTES EFECTUADOS

CÓDIGOS **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

	1	2	3	4		1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐	Ajuste del nivel circular	☐	☑	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐	Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☐	☑	☐	☐	Ajuste del retículo	☐	☑	☐	☐
Prensa horizontal y vertical	☑	☐	☐	☐	Ajuste de la verticalidad	☑	☐	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H y/o V	☑	☐	☐	☐	Ajuste de colimación	☐	☑	☐	☐
Chequeo del teclado	☐	☑	☐	☐	Ajuste de plomada óptica o láser	☑	☐	☐	☐
Ajuste del compensador	☑	☐	☐	☐	Ajuste de las mirillas de puntería	☑	☐	☐	☐
Ajuste del nivel tubular	☑	☐	☐	☐	Ajuste del distanciómetro	☑	☐	☐	☐

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR
Punto 0 compensador	<10"	<10"	Colimación vertical	<5"	<2"
Nivel tubular	<15"	<15"	Verticalidad	-<20"	<10"
Nivel circular	<5'	<5'	Plomada óptica o láser	<1mm	<,5mm
Colimación horizontal	<5"	<2"			

AJUSTE CON LÍNEA BASE

Constante de Prisma: -30mm PPM: 14

DISTANCIA (mm)	PROMEDIO (10 Medidas)	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	INCERTIDUMBRE (mm)	TOLERANCIA (mm)	Error (mm)
49805,66	49805,1	0,32	0,10	± 2	-0,56

Fin de este documento.

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.

TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 602 485 0256 CELS.: 321 802 1096 - 311 308 4562
Cali-Colombia

TYM TREFILADOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYOS MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE CONCRETO, PROCEDIMIENTO SEGÚN NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5806 (2019-06-19)	Fecha de emisión: Febrero 2019
	GC-F-28	VERSION 3

CLIENTE:	TYM	**LUGAR:**	LABORATORIO DE ENSAYOS TYM COLOMBIA
OBRA:	PLANTA TREFILADOS Y MALLAS	**FECHA DE RECEPCIÓN DE ENSAYO:**	06/06/2025
CIUDAD:	YUMBO, VALLE DEL CAUCA	**FECHA DE EJECUCIÓN ENSAYO:**	06/06/2025
PRODUCTO:	MALLA Electrosoldada	**FECHA DE ELABORACIÓN INFORME:**	06/06/2025
REFERENCIA:	XX-221	**LABORATORISTA:**	VANESSA AGUDELO
COD.INFORME :	06.CAL.059	**No. DE LOTE LONGITUDINAL:**	MG 3103812-250606 E 1 1
		No. DE LOTE TRANSVERSAL:	MG 3103812-250606 E 1 1
	Ø 6,5	**No. DE COLADA LONGITUDINAL:**	-
		No. DE COLADA TRANSVERSAL:	-
		No DE PROBETA:	2
TEMPERATURA(°C) ENSAYO:	24.0	**No DE INFORME:**	16371
HUMEDAD(%)DE ENSAYO:	45	**METODO DE ENSAYO:**	NTC 5806 2019-06-19

DIMENSIONES Y VARIACIONES PERMISIBLES PARA MALLA ELECTROSOLDADA (NTC 5806 2019-06-19)

Longitud total de malla 6.00 m ± 25 mm	6.00	Pelos longitudinales 75mm ± 25mm	75	Cuantia Principal Nominal cm2/ml	2.21
Ancho total de malla 2.35 m ± 25 mm	2.35	Pelos transversales 50mm ± 13mm	50	Numeral 10 Tabla 11	
Número de barras longitudinal por malla	16	Separaciones de la malla 150x150 mm ± 6.35 mm	150x150		
Número de barras transversal por malla	40	Peso nominal kg	49.60		


PARÁMETROS DE NORMA GRAFIL EN MALLA (NTC 5806 2019-06-19)

Diametro de grafil		Area nominal		Tracción - Fluencia		
Longitudinal	6.50	33.183	mm	550	MPa Esfuerzo mínimo tracción	Numeral 7.2.5 Tabla 9
Transversal	6.50	33.183	mm	485	MPa Esfuerzo mínimo fluencia	
Mínimo un 25% del área nominal del grafil medible (%)			33.1	CUMPLE:SI		Numeral 7.2.4.1

ENSAYO DE TRACCIÓN GRAFIL EN MALLA

Esfuerzo máximo de tracción MPa	642.43		Esfuerzo máximo fluencia MPa	642.043	
Incertidumbre expandida MPa	1.933		Incertidumbre expandida MPa	1.933	

GRÁFICA DE ESFUERZO VS DEFORMACIÓN

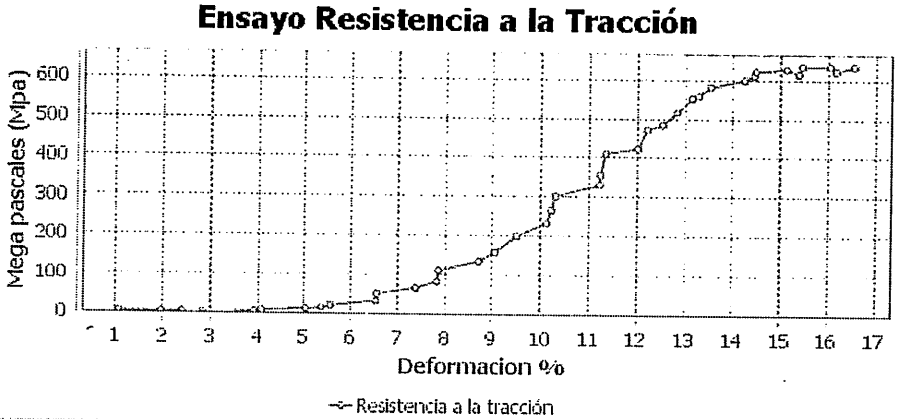

ENSAYO RESISTENCIA AL CORTE DE SOLDADURA

Requisito Norma Resistencia al corte	8001.2 N	CUMPLE:SI

Carga (N)
10010.602
10857.91
10716.692
10382.904
Promedio: 10492.027
Incertidumbre Expandida: 327.117

Caroll Galvis

RESPONSABLE
CAROLL GALVIS
ENCARGADO DE CALIDAD Y LABORATORIO

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACION DE TREFILADOS Y MALLAS DE COLOMBIA S.A.S

FIN DEL INFORME

TYM TREFILADOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYOS MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE CONCRETO, PROCEDIMIENTO SEGÚN NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5806 (2019-06-19)	Fecha de emisión: Febrero 2019
	GC-F-28	VERSION 3

CLIENTE:	TYM	**LUGAR:**	LABORATORIO DE ENSAYOS TYM COLOMBIA
OBRA:	PLANTA TREFILADOS Y MALLAS	**FECHA DE RECEPCIÓN DE ENSAYO:**	06/06/2025
CIUDAD:	YUMBO, VALLE DEL CAUCA	**FECHA DE EJECUCIÓN ENSAYO:**	06/06/2025
PRODUCTO:	MALLA Electrosoldada	**FECHA DE ELABORACIÓN INFORME:**	06/06/2025
REFERENCIA:	XX-221	**LABORATORISTA:**	VANESSA AGUDELO
COD.INFORME :	06.CAL.059	**No. DE LOTE LONGITUDINAL:**	MG 3103812-250606 E 1 1
		No. DE LOTE TRANSVERSAL:	MG 3103812-250606 E 1 1
	Ø 6,5	**No. DE COLADA LONGITUDINAL:**	-
		No. DE COLADA TRANSVERSAL:	-
		No DE PROBETA:	2
TEMPERATURA(°C) ENSAYO:	24.0	**No DE INFORME:**	16371
HUMEDAD(%)DE ENSAYO:	45	**METODO DE ENSAYO:**	NTC 5806 2019-06-19

DIMENSIONES Y VARIACIONES PERMISIBLES PARA MALLA ELECTROSOLDADA (NTC 5806 2019-06-19)

Longitud total de malla 6.00 m ± 25 mm	6.00	Pelos longitudinales 75mm ± 25mm	75	Cuantia Principal Nominal cm2/ml	2.21
Ancho total de malla 2.35 m ± 25 mm	2.35	Pelos transversales 50mm ± 13mm	50	Numeral 10 Tabla 11	
Número de barras longitudinal por malla	16	Separaciones de la malla 150x150 mm ± 6.35 mm	150x150		
Número de barras transversal por malla	40	Peso nominal kg	49.60		


PARÁMETROS DE NORMA GRAFIL EN MALLA (NTC 5806 2019-06-19)

Diametro de grafil		Area nominal		Tracción - Fluencia		
Longitudinal	6.50	33.183	mm	550	MPa Esfuerzo mínimo tracción	Numeral 7.2.5 Tabla 9
Transversal	6.50	33.183	mm	485	MPa Esfuerzo mínimo fluencia	
Mínimo un 25% del área nominal del grafil medible (%)			33.1	CUMPLE:SI		Numeral 7.2.4.1

ENSAYO DE TRACCIÓN GRAFIL EN MALLA

Esfuerzo máximo de tracción MPa	642.43		Esfuerzo máximo fluencia MPa	642.043	
Incertidumbre expandida MPa	1.933		Incertidumbre expandida MPa	1.933	

GRÁFICA DE ESFUERZO VS DEFORMACIÓN

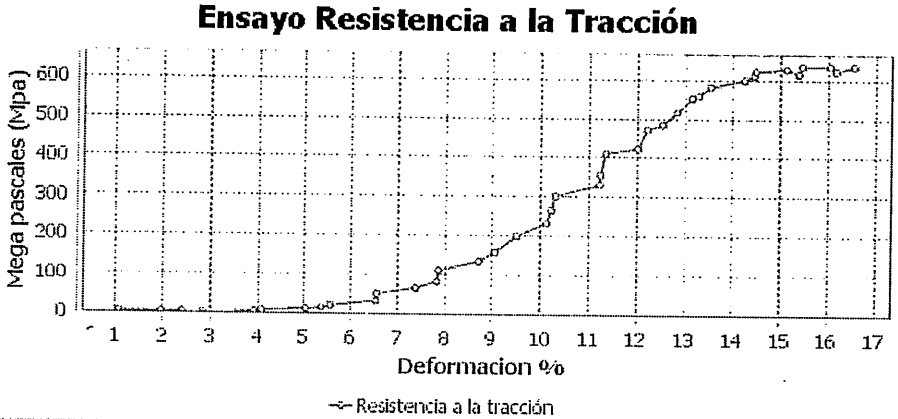

ENSAYO RESISTENCIA AL CORTE DE SOLDADURA

Requisito Norma Resistencia al corte	8001.2 N	CUMPLE:SI

Carga (N)
10010.602
10857.91
10716.692
10382.904
Promedio: 10492.027
Incertidumbre Expandida: 327.117

Caroll Galvis

RESPONSABLE
CAROLL GALVIS
ENCARGADO DE CALIDAD Y LABORATORIO

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACION DE TREFILADOS Y MALLAS DE COLOMBIA S.A.S

FIN DEL INFORME

日钢营口中板有限公司
RIZHAO STEEL YINGKOU MEDIUM PLATE CO.,LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet,Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning,P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位 PURCHASER	CUMIC STEEL USA INC	产品名称 PRODUCT	普通耐候结构钢 General atmospheric corrosion resisting steel
收货单位 CONSIGNEE	CUMIC STEEL USA INC	合同编号 CONTRACT NO.	YGR1ZANN230585006-02
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A709/A709M-2021；A709 Gr.50WT-Z2-B	交货状态 DELIVERY CONDITION	热轧
		签发日期 DATE OF ISSUE	20230719
		证明书编号 CERTIFICATE NO.	230719Z00431
车 号 TRAIN NO.			

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 (MM) DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 AA	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Cu	V	Mo	Nb	I	Als	B0A01 屈服强度 MPa Rp0.2	B0A02 抗拉强度 MPa Rm	B0A03 断后伸长率 % B5	A0C01 冲击单值A J	A0C012 冲击单值B J	A0C013 冲击单值C J	A0C02 冲击均值Ave J
							×10⁻³	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻⁴	×10⁻⁴	×10⁻⁴	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻⁴	×10⁻⁴	×10⁻⁶	×10⁻³							
23109489D	S37170236	S3717432101	19.05x2440x12192	1	4,449	L	138	329	1350	250	44	1450	482	268	23	30	30	6	35	360	567	24	226	183	214	208
23109489D	S37170236	S3717432201	19.05x2440x12192	1	4,449	L	138	329	1350	250	44	1450	482	268	23	30	30	6	35	360	567	24	226	183	214	208
23109489D	S37170236	S3717432301	19.05x2440x12192	1	4,449	L	138	329	1350	250	44	1450	482	268	23	30	30	6	35	360	567	24	226	183	214	208
			合计(TOTAL):	3	13,347																					

注释 NOTES

L：熔炼成分SMELTING COMPOSITION
拉伸标距(GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0C冲击试验IMPACTTEST：4℃，纵向LONGITUDINAL，近表 CLOSE TO SURFACE，尺寸SIZE10*10*55
B0A01=YIELD STRENGTH
B0A02=TENSILE STRENGTH
B0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

A0C01=IMPACT TEST A
A0C012=IMPACT TEST B
A0C013=IMPACT TEST C
A0C02=IMPACT AVERAGE

According to EN 10204 3.1

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION

野牛

冶金技术处处长
DIRECTOR OF METALLURGICAL DEPARTMENT

敬业（营口）中板有限公司
JINGYE (YINGKOU) MEDIUM PLATE CO.LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet, Laobiandistrict, Yingkou, Liaoning, P.R. China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位 PURCHASER	SHARPMAXINTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	产品名称 PRODUCT	低合金高强度结构钢 High strength low alloy structural steel		
收货单位 CONSIGNEE	SHARPMAXINTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	合同编号 CONTRACT NO.	YGCAZANN250785013-01		
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A572/A572M-2021 ; A572 Gr.50	交货状态 DELIVERY CONDITION	热轧(AR)	签发日期 DATE OF ISSUE	20250914
		证明书编号 CERTFICATE NO.	250914Z00250	是否保性能 GUARANTEE OR NOT	是 YES
车 号 TRAIN NO.					

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 (MM) DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 AA	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C ×10⁻²	Si ×10⁻²	Mn ×10⁻²	P ×10⁻³	S ×10⁻¹	Nb ×10⁻³	Als ×10⁻³	CEV ×10⁻²	Cu ×10⁻³	Ni ×10⁻¹	Cr ×10⁻³	Mo ×10⁻¹	V ×10⁻³	Ti ×10⁻¹	A0A01 屈服强度 MPa RpO.2	A0A02 抗拉强度 MPa Rm	A0A03 断后伸长率 % B5
25117467A	S59130047	S5913047101	6x2440x6096	1	701	L	16	18	137	24	88	12	33	41	18	310	99	30	2	150	415	567	24.5
25117467A	S59130047	S5913047102	6x2440x6096	1	701	L	16	18	137	24	88	12	33	41	18	310	99	30	2	150	415	567	24.5
25117467A	S59130047	S5913047201	6x2440x6096	1	701	L	16	18	137	24	88	12	33	41	18	310	99	30	2	150	415	567	24.5
25117467A	S59130047	S5913047202	6x2440x6096	1	701	L	16	18	137	24	88	12	33	41	18	310	99	30	2	150	415	567	24.5
25117467A	S59130047	S5913047301	6x2440x6096	1	701	L	16	18	137	24	88	12	33	41	18	310	99	30	2	150	415	567	24.5
25117467A	S59130047	S5913047302	6x2440x6096	1	701	L	16	18	137	24	88	12	33	41	18	310	99	30	2	150	415	567	24.5
25117467A	S59130047	S5913049101	6x2440x6096	1	701	L	16	18	137	24	88	12	33	41	18	310	99	30	2	150	415	567	24.5
25117467A	S59130047	S5913049102	6x2440x6096	1	701	L	16	18	137	24	88	12	33	41	18	310	99	30	2	150	415	567	24.5
25117467A	S59130047	S5913049201	6x2440x6096	1	701	L	16	18	137	24	88	12	33	41	18	310	99	30	2	150	415	567	24.5
25117467A	S59130047	S5913049202	6x2440x6096	1	701	L	16	18	137	24	88	12	33	41	18	310	99	30	2	150	415	567	24.5
25117467A	S59130047	S5913050101	6x2440x6096	1	701	L	16	18	137	24	88	12	33	41	18	310	99	30	2	150	415	567	24.5
25117467A	S59130047	S5913050102	6x2440x6096	1	701	L	16	18	137	24	88	12	33	41	18	310	99	30	2	150	415	567	24.5
			合计(TOTAL):	12	8.412																		

注释 NOTES

L：熔炼成分SMELTING COMPOSITION
拉伸标距(GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0A01=YIELD STRENGTH
A0A02=TENSILE STRENGTH
A0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

According to EN 10204 3.1

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，目视及尺寸检验均符合标准要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIR EMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION Both BOTH VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION MEET THE STANDARD REQUIREMENTS

技术中心
Technology Center

敬业（营口）中板有限公司
JINGYE (YINGKOU) MEDIUM PLATE CO.LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet,Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning,P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

质量专用章

订货单位 PURCHASER	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	产品名称 PRODUCT	低合金高强度结构钢 High strength low alloy structural steel		
收货单位 CONSIGNEE	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	合同编号 CONTRACT NO.	YGCAZANN250785013-01		
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A572/A572M-2021；A572 Gr.50	交货状态 DELIVERY CONDITION	热轧(AR)	签发日期 DATE OF ISSUE	20250828
		证明书编号 CERTFICATE NO.	250828Z00586	是否保性能 GUARANTEE OR NOT	是 YES
车 号 TRAIN NO.					

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 (MM) DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 AA	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C	Si	Mn	P	S	Nb	Als	Cr	Ni	Cu	Mo	V	CEV	Ti	A0A01 屈服强度 MPa Rp0.2	A0A02 抗拉强度 MPa Rm	A0A03 断后伸长率 % B2
							$\times10^{-2}$	$\times10^{-2}$	$\times10^{-2}$	$\times10^{-3}$	$\times10^{-4}$	$\times10^{-3}$	$\times10^{-3}$	$\times10^{-3}$	$\times10^{-4}$	$\times10^{-3}$	$\times10^{-4}$	$\times10^{-3}$	$\times10^{-2}$	$\times10^{-4}$			
25208143C	S58250242	S5825172101	50x2440x6096	1	5,838	L	16	19	140	18	94	14	33	96	340	18	40	2	42	150	484	629	28
25208143C	S58250242	S5825172102	50x2440x6096	1	5,838	L	16	19	140	18	94	14	33	96	340	18	40	2	42	150	484	629	28
			合计 (TOTAL):	2	11.676																		

注释 NOTES

L：熔炼成分 SMELTING COMPOSITION
拉伸标距(GAUGE LENGTH) Lo=50 mm
A0A01=YIELD STRENGTH
A0A02=TENSILE STRENGTH
A0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

According to EN 10204 3.1

野牛

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，目视及尺寸检验均符合标准要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIR EMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION Both BOTH VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION MEET THE STANDARD REQUIREMENTS

冶金技术处处长
DIRECTOR OF METALLURGICAL DEPARTMENT

日钢营口中板有限公司
RIZHAO STEEL YINGKOU MEDIUM PLATE CO.,LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet,Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning,P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位 PURCHASER	CYRGOS.A.S	产品名称 PRODUCT	普通耐候结构钢 General atmospheric corrosion resisting steel		
收货单位 CONSIGNEE	CYRGOS.A.S	合同编号 CONTRACT NO.	YGCAZANN250483007/YKSG253154D-04		
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A709/A709M;A709 Gr.50WT-Z2-B	交货状态 DELIVERY CONDITION	控制轧制(CR)	签发日期 DATE OF ISSUE	20250623
		证明书编号 CERTIFICATE NO.	250623Z01255	是否保性能 GUARANTEE OR NOT	是 YES
车 号 TRAIN NO.					

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 (MM) DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 AA	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C ×10⁻³	Si ×10⁻³	Mn ×10⁻³	P ×10⁻⁴	S ×10⁻⁴	Ni ×10⁻⁴	Cr ×10⁻³	Cu ×10⁻³	V ×10⁻³	Mo ×10⁻⁴	Nb ×10⁻⁴	I ×10⁻⁶	Als ×10⁻³	B 0A01 屈服强度 MPa Rp0.2	B 0A02 抗拉强度 MPa Rm	B 0A03 断后伸长率 % B5	A 0C01 冲击单值 A J	A 0C012 冲击单值 B J	A 0C013 冲击单值 C J	A 0C02 冲击均值 Ave J
25205820A	S56220226	S5622399101	9.52x2440x12192	1	2,223	L	144	333	1300	250	89	3240	463	273	23	60	50	7	24	358	611	20.5	53	53	50	52
25205820A	S56220226	S5622399201	9.52x2440x12192	1	2,223	L	144	333	1300	250	89	3240	463	273	23	60	50	7	24	358	611	20.5	53	53	50	52
25205820A	S56220226	S5622399301	9.52x2440x12192	1	2,223	L	144	333	1300	250	89	3240	463	273	23	60	50	7	24	358	611	20.5	53	53	50	52
25205820A	S56220226	S5622400101	9.52x2440x12192	1	2,223	L	144	333	1300	250	89	3240	463	273	23	60	50	7	24	358	611	20.5	53	53	50	52
25205820A	S56220226	S5622400201	9.52x2440x12192	1	2,223	L	144	333	1300	250	89	3240	463	273	23	60	50	7	24	358	611	20.5	53	53	50	52
25205820A	S56220226	S5622400301	9.52x2440x12192	1	2,223	L	144	333	1300	250	89	3240	463	273	23	60	50	7	24	358	611	20.5	53	53	50	52
25205820A	S56220226	S5622401101	9.52x2440x12192	1	2,223	L	144	333	1300	250	89	3240	463	273	23	60	50	7	24	358	611	20.5	53	53	50	52
25205820A	S56220226	S5622401201	9.52x2440x12192	1	2,223	L	144	333	1300	250	89	3240	463	273	23	60	50	7	24	358	611	20.5	53	53	50	52
25205820A	S56220226	S5622401301	9.52x2440x12192	1	2,223	L	144	333	1300	250	89	3240	463	273	23	60	50	7	24	358	611	20.5	53	53	50	52
			合计(TOTAL):	9	20,007																					

注释 NOTES

L：熔炼成分SMELTING COMPOSITION
拉伸标距(GAUGELENGTH) Lo=200mm
A0C冲击试验IMPACTTEST：4℃，纵向LONGITUDINAL，近表CLOSE TO SURFACE，尺寸SIZE10*7.5*55
B0A01=YIELD STRENGTH
B0A02=TENSILE STRENGTH
B0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

A0C01=IMPACT TEST A
A0C012=IMPACT TEST B
A0C013=IMPACT TEST C
A0C02=IMPACT AVERAGE

According to EN 10204 3.1

野牛

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，目视及尺寸检验均符合标准要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION Both BOTH VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION MEET THE STANDARD REQUIREMENTS

冶金技术处处长
DIRECTOR OF METALLURGICAL DEPARTMENT

敬业（营口）中板有限公司
JINGYE (YINGKOU) MEDIUM PLATE CO.LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet,Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning,P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位 PURCHASER	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	产品名称 PRODUCT	低合金高强度结构钢 High strength low alloy structural steel		
收货单位 CONSIGNEE	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	合同编号 CONTRACT NO.	YGCAZANN250685013-01		
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A572/A572M-2021 ; A572 Gr.50	交货状态 DELIVERY CONDITION	热轧(AR)	签发日期 DATE OF ISSUE	20250711
		证明书编号 CERTFICATE NO.	250711Z00417	是否保性能 GUARANTEE OR NOT	是 YES
车 号 TRAIN NO.					

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 (MM) DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 AA	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C	Si	Mn	P	S	Nb	Als	CEV	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Ti	AOA01 屈服强度 MPa Rp0.2	AOA02 抗拉强度 MPa Rm	AOA03 断后伸长率 % B5
							×10⁻²	×10⁻²	×10⁻²	×10⁻³	×10⁻¹	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻²	×10⁻³	×10⁻¹	×10⁻³	×10⁻¹	×10⁻³	×10⁻¹			
25112800D	2572052	25G2912005	19x2440x6096	1	2,218	L	17	27	148	24	69	14	31	43	22	220	80	40	1	130	391	577	24
25112800D	2572052	25G2912006	19x2440x6096	1	2,218	L	17	27	148	24	69	14	31	43	22	220	80	40	1	130	391	577	24
25112800D	2572052	25G2912007	19x2440x6096	1	2,218	L	17	27	148	24	69	14	31	43	22	220	80	40	1	130	391	577	24
25112800D	2572053	25G2912014	19x2440x6096	1	2,218	L	17	27	148	24	69	14	31	43	22	220	80	40	1	130	409	586	24.5
25112800D	2572053	25G2912015	19x2440x6096	1	2,218	L	17	27	148	24	69	14	31	43	22	220	80	40	1	130	409	586	24.5
			合计 (TOTAL):	5	11,090																		

注释 NOTES

L：熔炼成分SMELTING COMPOSITION
拉伸标距(GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0A01=YIELD STRENGTH
A0A02=TENSILE STRENGTH
A0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

According to EN 10204 3.1

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，目视及尺寸检验均符合标准要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIR EMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION Both BOTH VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION MEET THE STANDARD REQUIREMENTS

05-05-2026

冶金技术处处长
DIRECTOR OF METALLURGICAL DEPARTMENT

敬业（营口）中板有限公司
JINGYE (YINGKOU) MEDIUM PLATE CO.LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet,Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning,P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

质量专用章

订货单位 PURCHASER	SHARPMAXINTERNATIONAL(HONGKONG)CO.,LIMITED	产品名称 PRODUCT	低合金高强度结构钢 High strength low alloy structural steel		
收货单位 CONSIGNEE	SHARPMAXINTERNATIONAL(HONGKONG)CO.,LIMITED	合同编号 CONTRACT NO.	YGCAZANN250685013-01		
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A572/A572M-2021；A572 Gr.50	交货状态 DELIVERY CONDITION	热轧(AR)	签发日期 DATE OF ISSUE	20250711
		证明书编号 CERTFICATE NO.	250711Z00413	是否保性能 GUARANTEE OR NOT	是 YES
车 号 TRAIN NO.					

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 (MM) DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 AA	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C	Si	Mn	P	S	Nb	Als	CEV	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Ti	A0A01 屈服强度 MPa Rp0.2	A0A02 抗拉强度 MPa Rm	A0A03 断后伸长率 % B5
							$\times10^{-2}$	$\times10^{-2}$	$\times10^{-2}$	$\times10^{-3}$	$\times10^{-4}$	$\times10^{-3}$	$\times10^{-3}$	$\times10^{-2}$	$\times10^{-3}$	$\times10^{-4}$	$\times10^{-3}$	$\times10^{-4}$	$\times10^{-3}$	$\times10^{-4}$			
25112800D	2572052	25G2913012	19x2440x6096	1	2,218	L	17	27	148	24	69	14	31	43	22	220	80	40	1	130	391	577	24
25112800D	2572052	25G2913014	19x2440x6096	1	2,218	L	17	27	148	24	69	14	31	43	22	220	80	40	1	130	391	577	24
25112800D	2572052	25G2913015	19x2440x6096	1	2,218	L	17	27	148	24	69	14	31	43	22	220	80	40	1	130	391	577	24
25112800D	2572052	25G2913017	19x2440x6096	1	2,218	L	17	27	148	24	69	14	31	43	22	220	80	40	1	130	391	577	24
25112800D	2572052	25G2913018	19x2440x6096	1	2,218	L	17	27	148	24	69	14	31	43	22	220	80	40	1	130	391	577	24
25112800D	2572052	25G2913019	19x2440x6096	1	2,218	L	17	27	148	24	69	14	31	43	22	220	80	40	1	130	391	577	24
25112800D	2572052	25G2913020	19x2440x6096	1	2,218	L	17	27	148	24	69	14	31	43	22	220	80	40	1	130	391	577	24
			合计(TOTAL):	7	15.526																		

注释 NOTES

L：熔炼成分SMELTING COMPOSITION
拉伸标距(GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0A01=YIELD STRENGTH
A0A02=TENSILE STRENGTH
A0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

According to EN 10204 3.1

野牛

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，目视及尺寸检验均符合标准要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIR EMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION Both BOTH VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION MEET THE STANDARD REQUIREMENTS

冶金技术处处长
DIRECTOR OF METALLURGICAL DEPARTMENT

CYRGO
RESISTENTES DESDE 1965

Cliente:	A OO INGENIERIA SAS
Nit:	8300336399
Dirección:	AUTOPISTA MEDELLIN KM 19 VEREDA SAN
Teléfono:	8288584-
Asesor:	VELEZ OTTO
Municipio:	EL ROSAL
Centro:	3000 CO-CY Fontibon

REMISIÓN:	8131700872
FAC DIAN:	FB-0000531040
FAC SAP:	9007771906
FECHA:	04/03/2026

Cantidad	Material	Cód. Material	Peso	Lote
3	LAM HR A709 G50WBT2 12,7mm2,44x12,192m	119302472	8.897,10	25113676D
2	LAM HR A709 G50WBT2 12,7mm2,44x12,192m	119302472	5.931,40	25114005D
2	LAM HR A709 G50WBT2 12,7mm2,44x12,192m	119302472	5.931,40	25116555A
1	LAM HR A709 G50WBT2 12,7mm2,44x12,192m	119302472	2.965,70	25308435C
1	LAM HR A709 G50WBT2 25,4mm2,44x12,192m	119302479	5.931,50	25308435C
	Total Peso:		29.657,10	

CYRGO S.A.S Sucursal Fontibon
04 MAR 2026
No. Transporte

CYRGO SUCURSAL FONTIBON
RESISTENTES DESDE 1965
ENTREGA DE CERTIFICADOS EN FÍSICO

04-03-2026

Observaciones:
*** ENTREGAR MATERIAL CON CERTIFICADO DE CALIDAD**

Cod.Exp: Despacho

N° Transporte: 14955267 **Transportadora:** TRANSPORTADORA DE **N° Placa:** GSM276

Conductor: DIEGO RODRIGUEZ **Firma:**

Declaro que recibí a conformidad los productos detallados en el presente documento, los cuales verifiqué y revisé en sus cantidades y condiciones.
CYRGO S.A.S no reponde por faltantes o daños ocurridos posterior a la aceptación del presente documento.

La garantía de los productos indicados en el presente documento sera de (30) treinta dias calendario contados a partir de la entrega de los mismos y abarcará todos los productos, equipos, componentes, piezas y materiales, con excepción del desgaste que se presente por el uso y goce normal de los mismos o por la acción negligente o inapropiada por parte del comprador

Las recomendaciones, sugerencias y/o remplazos de perfiles emitidas por el Dpto. Técnico comercial de CYRGO S.A.S; son de carácter informativo, razón por la cual CYRGO S.A.S no asúme ningún tipo de responsabilidad al respecto. En consecuencia de lo anterior sobre las recomendaciones, sugerencias y/o remplazos de perfiles deben ser revisados, avaladas y aprobadas por el Ing. Calculista de la obra y modificados los planos de diseño estructural del proyecto en ejecución según el código NSR vigente.

Nombre quien Entrega

Nombre quien Recibe

Nombre quien Verifica

Cédula quien Recibe

Firma quien Recibe
Recibido a conformidad el material.
Para materiales tipo estructural se entrega con su respectiva etiqueta y reporte de ensayos de calidad.

敬业（营口）中板有限公司
JINGYE (YINGKOU) MEDIUM PLATE CO. LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet, Laobiandistrict, Yingkou, Liaoning, P. R. China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

质量专用章

订货单位 PURCHASER	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	产品名称 PRODUCT	普通耐候结构钢 General atmospheric corrosion resisting steel		
收货单位 CONSIGNEE	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	合同编号 CONTRACT NO.	YGCAZANN250785013-01		
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A709/A709M ; A709 Gr. 50WT-Z1-B	交货状态 DELIVERY CONDITION	控制轧制(CR)	签发日期 DATE OF ISSUE	20250927
		证明书编号 CERTFICATE NO.	250927Z00960	是否保性能 GUARANTEE OR NOT	是 YES
车 号 TRAIN NO.					

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 (MM) DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 A.A	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	V	I	Mo	Ti	Nb	B 0A01 屈服强度 MPa Rp0.2	B 0A02 抗拉强度 MPa Rm	B 0A03 断后伸长率 % B5	A 0C01 冲击单值 A J	A 0C012 冲击单值 B J	A 0C013 冲击单值 C J	A 0C02 冲击均值 Ave J
							×10⁻²	×10⁻²	×10⁻²	×10⁻²	×10⁻²	×10⁻²	×10⁻²	×10⁻²	×10⁻²	×10⁻²	×10⁻²	×10⁻⁴	×10⁻⁴	×10⁻⁴							
25308435C	S59220278	S5922390101	25.4x2440x12192	1	5,932	L	142	311	1310	210	51	287	2750	461	26	6533	50	40	40	439	579	25	249	294	251	265
			合计 (TOTAL):	1	5,932																					

注释 NOTES

L：熔炼成分 SMELTING COMPOSITION
拉伸标距(GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0C冲击试验IMPACTTEST：20℃，纵向LONGITUDINAL，近表 CLOSE TO SURFACE，尺寸SIZE10*10*55
B0A01=YIELD STRENGTH
B0A02=TENSILE STRENGTH
B0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

A0C01=IMPACT TEST A
A0C012=IMPACT TEST B
A0C013=IMPACT TEST C
A0C02=IMPACT AVERAGE

According to EN 10204 3.1

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，目视及尺寸检验均符合标准要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIR EMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION Both BOTH VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION MEET THE STANDARD REQUIREMENTS

05-03-2026

技术中心 Technology Center

野牛

敬业（营口）中板有限公司
JINGYE (YINGKOU) MEDIUM PLATE CO. LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet, Laobiandistrict, Yingkou, Liaoning, P. R. China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO. :DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位 PURCHASER	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	产品名称 PRODUCT		普通耐候结构钢 General atmospheric corrosion resisting steel	
收货单位 CONSIGNEE	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	合同编号 CONTRACT NO.		YGCAZANN250785013-01	
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A709/A709M ; A709 Gr. 50WT-Z1-B	交货状态 DELIVERY CONDITION	控制轧制(CR)	签发日期 DATE OF ISSUE	20250807
		证书编号 CERTFICATE NO.	250807Z00399	是否保性能 GUARANTEE OR NOT	是 YES
车 号 TRAIN NO.					

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 (MM) DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 A.A	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C ×10⁻²	Si ×10⁻²	Mn ×10⁻²	P ×10⁻⁴	S ×10⁻⁴	Cu ×10⁻²	Ni ×10⁻²	Cr ×10⁻²	V ×10⁻⁴	Ti ×10⁻⁴	Mo ×10⁻⁴	Ti ×10⁻⁴	Nb ×10⁻⁴	B0A01 屈服强度 MPa Rp0.2	B0A02 抗拉强度 MPa Rm	B0A03 断后伸长率 % A5	A0C01 冲击单值A J	A0C012 冲击单值B J	A0C013 冲击单值C J	A0C02 冲击均值Ave J
26113676D	S58030241	S5803418101	12.7x2440x12192	1	2,966	L	140	327	1340	240	30	312	2630	483	22	6711	50	40	50	362	565	23	70	80	133	94
26113676D	S58030241	S5803418201	12.7x2440x12192	1	2,966	L	140	327	1340	240	30	312	2630	483	22	6711	50	40	50	362	565	23	70	80	133	94
26113676D	S58030241	S5803418301	12.7x2440x12192	1	2,966	L	140	327	1340	240	30	312	2630	483	22	6711	50	40	50	362	565	23	70	80	133	94
26114005D	S58030242	S5803419101	12.7x2440x12192	1	2,966	L	148	340	1330	180	71	398	2760	478	26	6679	60	40	40	367	578	23	74	70	76	73
26114005D	S58030242	S5803419201	12.7x2440x12192	1	2,966	L	148	340	1330	180	71	398	2760	478	26	6679	60	40	40	367	578	23	74	70	76	73
			合计 (TOTAL):	5	14,830																					

注释 NOTES

L：熔炼成分 SMELTING COMPOSITION
拉伸标距(GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0C冲击试验IMPACTTEST：20℃，纵向LONGITUDINAL，
近表 CLOSE TO SURFACE，尺寸SIZE10*10*55
B0A01=YIELD STRENGTH
B0A02=TENSILE STRENGTH
B0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

A0C01=IMPACT TEST A
A0C012=IMPACT TEST B
A0C013=IMPACT TEST C
A0C02=IMPACT AVERAGE

According to EN 10204 3.1

野牛

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，目视及尺寸检验均符合标准要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIR EMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION Both BOTH VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION MEET THE STANDARD REQUIREMENTS

冶金技术处处长
DIRECTOR OF METALLURGICAL DEPARTMENT
甄彩刚

05-05-2025

敬业（营口）中板有限公司
JINGYE (YINGKOU) MEDIUM PLATE CO.LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet,Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning,P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

质量专用章

订货单位 PURCHASER	SHARPMAXINTERNATIONAL(HONGKONG)CO.,LIMITED	产品名称 PRODUCT	普通耐候结构钢 General atmospheric corrosion resisting steel		
收货单位 CONSIGNEE	SHARPMAXINTERNATIONAL(HONGKONG)CO.,LIMITED	合同编号 CONTRACT NO.	YGCAZANN250785013-01		
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A709/A709M ; A709 Gr.50 WT-Z1-B	交货状态 DELIVERY CONDITION	控制轧制(CR)	签发日期 DATE OF ISSUE	20250927
		证明书编号 CERTIFICATE NO.	250927Z00071	是否保性能 GUARANTEE OR NOT	是 YES
车 号 TRAIN NO.					

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 (MM) DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 AA	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	V	I	Mo	Ti	Nb	B 0A01 屈服强度 MPa Rp0.2	B 0A02 抗拉强度 MPa Rm	B 0A03 断后伸长率 % B5	A 0C01 冲击单值 A J	A 0C012 冲击单值 B J	A 0C013 冲击单值 C J	A 0C02 冲击均值 Ave J
							×10⁻³	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻⁴	×10⁻⁴	×10⁻³	×10⁻⁴	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻³	×10⁻⁴	×10⁻⁴	×10⁻⁴							
25308435C	S59220279	S5922391101	12.7x2440x12192	1	2,966	L	142	311	1310	210	51	287	2750	461	26	6533	50	40	40	392	575	25.5	120	122	123	122
25308435C	S59220279	S5922391201	12.7x2440x12192	1	2,966	L	142	311	1310	210	51	287	2750	461	26	6533	50	40	40	392	575	25.5	120	122	123	122
			合计(TOTAL):	2	5,932																				

注释 NOTES

L：熔炼成分SMELTING COMPOSITION
拉伸标距(GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0C冲击试验IMPACTTEST：20℃，纵向LONGITUDINAL，近表 CLOSE TO SURFACE，尺寸SIZE10*10*55
B0A01=YIELD STRENGTH
B0A02=TENSILE STRENGTH
B0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

A0C01=IMPACT TEST A
A0C012=IMPACT TEST B
A0C013=IMPACT TEST C
A0C02=IMPACT AVERAGE

According to EN 10204 3.1

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，目视及尺寸检验均符合标准要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION Both BOTH VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION MEET THE STANDARD REQUIREMENTS

05-03-2026

技术中心
Technology Center

野牛

敬业（营口）中板有限公司
JINGYE (YINGKOU) MEDIUM PLATE CO.LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet.Laobiandistrict,Yingkou,Liaoning.P.R.China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位 PURCHASER	SHARPMAXINTERNATIONAL(HONGKONG)CO.,LIMITED	产品名称 PRODUCT	普通耐候结构钢 General atmospheric corrosion resisting steel		
收货单位 CONSIGNEE	SHARPMAXINTERNATIONAL(HONGKONG)CO.,LIMITED	合同编号 CONTRACT NO.	YGCAZANN250785013-01		
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A709/A709M ; A709 Gr.50W T-Z1-B	交货状态 DELIVERY CONDITION	控制轧制(CR)	签发日期 DATE OF ISSUE	20250831
		证明书编号 CERTFICATE NO.	250831Z01035	是否保性能 GUARANTEE OR NOT	是 YES
车 号 TRAIN NO.					

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 (MM) DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 AA	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C ×10⁻³	Si ×10⁻³	Mn ×10⁻³	P ×10⁻⁴	S ×10⁻⁴	Cu ×10⁻³	Ni ×10⁻⁴	Cr ×10⁻³	V ×10⁻³	I ×10⁻³	Mo ×10⁻⁴	Ti ×10⁻⁴	Nb ×10⁻⁴	B0A01 屈服强度 MPa Rp0.2	B0A02 抗拉强度 MPa Rm	B0A03 断后伸长率 % B5	A0C01 冲击单值 A J	A0C012 冲击单值 B J	A0C013 冲击单值 C J	A0C02 冲击均值 Ave J
25116555A	S58300241	S5830326101	12.7x2440x12192	1	2,966	L	136	312	1300	200	55	278	2960	469	23	6518	50	40	50	381	573	25	87	77	88	84
25116555A	S58300241	S5830326201	12.7x2440x12192	1	2,966	L	136	312	1300	200	55	278	2960	469	23	6518	50	40	50	381	573	25	87	77	88	84
			合计(TOTAL):	2	5.932																					

注释 NOTES

L：熔炼成分SMELTING COMPOSITION
拉伸标距(GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0C冲击试验IMPACTTEST：20℃，纵向LONGITUDINAL，
近表 CLOSE TO SURFACE，尺寸SIZE10*10*55
B0A01=YIELD STRENGTH
B0A02=TENSILE STRENGTH
B0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

A0C01=IMPACT TEST A
A0C012=IMPACT TEST B
A0C013=IMPACT TEST C
A0C02=IMPACT AVERAGE

According to EN 10204 3.1

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，目视及尺寸检验均符合标准要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIR EMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION Both BOTH VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION MEET THE STANDARD REQUIREMENTS

冶金技术处处长
DIRECTOR OF METALLURGICAL DEPARTMENT

敬业（营口）中板有限公司
JINGYE (YINGKOU) MEDIUM PLATE CO.LTD.
辽宁省营口市老边区冶金街/115005
Yejinstreet, Laobiandistrict, Yingkou, Liaoning, P.R. China/115005
TEL:0417-3256081 FAX:0417-3256057 NO.:DT2101501/A

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位 PURCHASER	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	产品名称 PRODUCT	普通耐候结构钢 General atmospheric corrosion resisting steel		
收货单位 CONSIGNEE	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED	合同编号 CONTRACT NO.	YGCAZANN250785013-01		
技术标准/牌号 SPEC/GRADE	ASTM A709/A709M ; A709 Gr.50W T-Z1-B	交货状态 DELIVERY CONDITION	控制轧制(CR)	签发日期 DATE OF ISSUE	20250807
		证明书编号 CERTFICATE NO.	250807Z00399	是否保性能 GUARANTEE OR NOT	是 YES
车 号 TRAIN NO.					

炉号 HEAT NO.	批号 LOT NO.	钢板号 PLATE NO.	规格 (MM) DIMENSION	数量 QTY	重量 WEIGHT kg	分析区域 AA	化学成分 CHEMICAL ANALYSIS % C ×10⁻³	Si ×10⁻³	Mn ×10⁻³	P ×10⁻⁴	S ×10⁻⁴	Cu ×10⁻³	Ni ×10⁻⁴	Cr ×10⁻³	V ×10⁻³	Ti ×10⁻³	Mo ×10⁻⁴	Ti ×10⁻⁴	Nb ×10⁻⁴	B0A01 屈服强度 MPa Rp0.2	B0A02 抗拉强度 MPa Rm	B0A03 断后伸长率 % B5	A0C01 冲击单值A J	A0C012 冲击单值B J	A0C013 冲击单值C J	A0C02 冲击均值Ave J
25113676D	S58030241	S5803418101	12.7x2440x12192	1	2,966	L	140	327	1340	240	30	312	2630	483	22	6711	50	40	50	362	565	23	70	80	133	94
25113676D	S58030241	S5803418201	12.7x2440x12192	1	2,966	L	140	327	1340	240	30	312	2630	483	22	6711	50	40	50	362	565	23	70	80	133	94
25113676D	S58030241	S5803418301	12.7x2440x12192	1	2,966	L	140	327	1340	240	30	312	2630	483	22	6711	50	40	50	362	565	23	70	80	133	94
25114005D	S58030242	S5803419101	12.7x2440x12192	1	2,966	L	148	340	1330	180	71	398	2760	478	26	6679	60	40	40	367	578	23	74	70	76	73
25114005D	S58030242	S5803419201	12.7x2440x12192	1	2,966	L	148	340	1330	180	71	398	2760	478	26	6679	60	40	40	367	578	23	74	70	76	73
			合计 (TOTAL):	5	14,830																					

注释 NOTES

L：熔炼成分 SMELTING COMPOSITION
拉伸标距(GAUGE LENGTH) Lo=200 mm
A0C冲击试验IMPACT TEST：20℃，纵向LONGITUDINAL，
近表 CLOSE TO SURFACE，尺寸SIZE10*10*55
B0A01=YIELD STRENGTH
B0A02=TENSILE STRENGTH
B0A03=PRECENTAGE ELONGATION AFTER FRACTURE

A0C01=IMPACT TEST A
A0C012=IMPACT TEST B
A0C013=IMPACT TEST C
A0C02=IMPACT AVERAGE

According to EN 10204 3.1

本产品已按照标准要求进行制造和检验，其结果符合要求，目视及尺寸检验均符合标准要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIR EMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION Both BOTH VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION MEET THE STANDARD REQUIREMENTS

冶金技术处处长
DIRECTOR OF METALLURGICAL DEPARTMENT

Dirección: Edificio Cosmos Pacifico Calle 3 Nª 1A-57 Oficina 302
Teléfono: 2425526
Cel.: 3187343289

COAGREGADOS

Buenaventura, febrero- 2026.

Señores:

CONSORCIO FP
INGENIERO: GALDINO NAJERA

Buenaventura - Valle del Cauca.

Ingeniero.

Atendiendo su cordial solicitud y con base en el resultado de los análisis realizados a los materiales de Coagregados en nuestro laboratorio, a continuación, estamos informándoles las proporciones correspondientes a la siguiente dosificación de mezcla, elaborado teniendo en cuenta el reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR -10 C. 5.3; así:

A. Cemento.
B. Análisis de agregados.
C. Dosificación de mezcla para concreto tremie de 280 kg/cm² a los 28 días.
D. Recomendaciones generales.

A. CEMENTO.

El cemento es de Argos estructural a granel
.

B. ANALISIS DE AGREGADOS

Los agregados utilizados son de la planta trituradora de Coagregados en el sector de Puerta Roja en el corregimiento de Córdoba – Buenaventura.

Dirección: Edificio Cosmos Pacifico Calle 3 Nª 1A-57 Oficina 302
Teléfono: 2425526
Cel.: 3187343289

COAGREGADOS

Arena

1.1. Granulometría promedio (NTC77) (arena gruesa de Coagregados)

Tamiz No	1/2"	3/8"	No.4	No.8	No.16	No.30	No.50	No.100	No.200
% pasa	100	98.1	86.1	66.9	51.6	38.1	20.8	10.0	5.1

- Masa unitaria suelta ……= 1.582 ton/m³
- Masa unitaria compacta……= 1.822 ton/m³

1.5 Densidad y Absorción de Agregados Fino (NTC 237)

- Densidad nominal …… = 2.642 ton/m³
- Densidad aparente seca…….. = 2.798 ton/m³
- Densidad aparente SSS …… = 2.698 ton/m³
- Absorción…….. = 2.1%

2. GRAVA 12.5mm (grava triturada de Coagregados)

2.1. Granulometría promedio (NTC – 77)

Tamiz	3/4 "	1/2 "	3/8 "	No. 4	No. 8	No.16	No.30	No.50	No.100	No.200
% pasa	100	99.3	85.8	21.6	10.4	8.4	7.4	6.4	5.5	4.6

2.3. Masa unitaria seca (NTC – 92)

- Masa unitaria suelta ……= 1.663 ton/m³
- Masa unitaria compacta……= 1.751 ton/m³

2.4. Densidad y Absorción de Agregados Grueso (NTC 176)

- Densidad nominal ……= 2.981 ton/m³
- Densidad aparente seca……= 2.883 ton/m³
- Densidad aparente SSS ……= 2.915 ton/m³
- Absorción……= 1.14 %

Dirección: Edificio Cosmos Pacifico Calle 3 Nª 1A-57 Oficina 302
Teléfono: 2425526
Cel.: 3187343289

COAGREGADOS

C. DOSIFICACION DE MEZCLA PARA CONCRETO TREMIE DE 280 Kg/cm² A LOS 28 DIAS DE EDAD.

1. Dosificación en peso de agregados secos para un metro cubico de concreto.


MATERIALES	PROPORCIONES EN PESO POR m3
Cemento Argos Estructural granel	380 kg / m³
Arena gruesa 3/8" de Coagregados	1078 kg / m³ (56% en peso)
Grava 1/2" triturada Coagregados	847 kg / m³ (44% en peso)
Plastol HR S-100	1.9 Kg / m³
Eucon RD-15	2.28 Kg / m³
Agua acueducto	190 L/ m³
Asentamiento	8" ± 1"
A/C	0,5

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Se deberán tomar muestras en la obra en los 15 minutos después de llegado el camión transportador si se requiere comparar con los resultados de la planta y es responsabilidad de la obra por el concreto pasado de los tiempos recomendados para la colocación.

2. Por efecto de las variaciones normales en la calidad del cemento o de los materiales utilizados, se tomaran 1 muestra cada 40 m³, cilindros normales de 4" de diámetro por 8" de altura para ensayar a edades de 7 días, 14 días, y 28 días.

Atentamente



EDWIN MOSQUERA
TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
Celular 3162827840

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Cali, Valle del Cauca 19 de febrero de 2026

Ingeniero (a):
GALDINO OSMAR NÁJERA CERA
CONSORCIO FP
OBRA: CONSRUCCION TENSOESTRUCTURA DE COMPLEJO MARGARITA HURTADO EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA
Código de Obra: 27903
Cali, Valle del Cauca

Asunto: Diseños de mezcla de concreto

Apreciado (a) Ingeniero (a):

De manera atenta nos permitimos entregar los informes de laboratorio para la caracterización física de muestras de agregado procedentes de la obra PROYECTO BUENAVENTURA. Los informes están identificados con las referencias DPDC 0070-26-1 hasta DPDC 0070-26-7. A partir de los resultados obtenidos se dosificaron dichos materiales para una mezcla de concreto para y 210 kg/cm2 (21 MPa) y una mezcla adicional para 280 kg/cm2 (28 MPa) con un asentamiento de 100 mm (4").

La caracterización física de los agregados fue suministrada por el cliente.

RESULTADOS

1. MATERIALES EMPLEADOS

- Cemento Argos Uso General
- Arena de rio
- Grava Triturada 3/4"
- Agua

1.1. CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LOS AGREGADOS

1.1.1. Granulometría: Ver gráficos anexos.

	Arena	Grava
1.1.2. Módulo de finura:	3.45	-----
1.1.3. Tamaño máximo mm:	-----	25
1.1.4. Tamaño máximo nominal mm:	-----	19
1.1.5. Contenido de materia orgánica (ensayo colorimétrico):	1	-----
1.1.6. Absorción %:	1.8	1.1
1.1.7. Densidad aparente (g/cm3):	2,68	3.01
1.1.8. Densidad sss (g/cm3):	2,73	3.04
1.1.9. Densidad nominal (g/cm3):	2,81	3.11
1.1.10. Masa unitaria suelta sss (kg/m3):	1750	1650
1.1.11. Masa unitaria apisonada sss (kg/m3):	1880	1760
1.1.12. Vacíos en agregado suelto %:	39	48
1.1.13. Vacíos en agregado compacto %:	34	44

1.2. CARACTERISTICAS FISICAS DEL CEMENTO ARGOS USO GENERAL

1.2.1. Densidad (g/cm^3): 2,983
1.2.2. Finura Blaine (cm^2/g): 3896

2. DISEÑO PARA 210 kg/cm2 (21 MPa)

2.1. RESISTENCIA DE DISEÑO

Los proporcionamientos para el diseño de mezcla se hicieron según los requerimientos descritos en el capítulo C5, tabla C.5.3.2.2 NSR-10 (NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMORESISTENTE).

Resistencia promedio requerida a la compresión cuando no hay datos que permitan determinar la desviación estándar.

NSR-10 TABLA C.5.3.2.2 - RESISTENCIA PROMEDIO A LA COMPRESIÓN REQUERIDA CUANDO NO HAY DATOS DISPONIBLES PARA ESTABLECER UNA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA MUESTRA

Resistencia especificada a la compresión, MPa	Resistencia promedio requerida a la compresión, MPa
$f'c < 21$	$f'cr = f'c + 7.0$
$21 \le f'c \le 35$	$f'cr = f'c + 8.3$
$f'c > 35$	$f'cr = 1.10f'c + 5.0$

Concrelab

2.2. PROPORCIONES DE LOS MATERIALES EN CONDICION SSS

2.2.1. Por metro cúbico de concreto

DOSIFICACION DE LA MEZCLA DE CONCRETO			
MUESTRA	PROCEDENCIA	PESO SECO Para 1 m³	DOSIFICACION POR Peso por bachada de 1 m³
Agua		175 kg	175 kg
Cemento	Argos	350 kg	350 kg
Arena de Rio	COAGREGADOS	719 kg	718,6 kg
Grava 3/4"	COAGREGADOS	1335 kg	1334,5 kg

2.2.2. Por bulto de cemento de 50 kg

DOSIFICACION DE LA MEZCLA DE CONCRETO			
MUESTRA	PROCEDENCIA	PESO SECO Para 1 m³	DOSIFICACION POR Volumen
Agua		175 kg	175 Litros
Cemento	Argos	350 kg	7 Sacos
Arena de Rio	COAGREGADOS	719 kg	0,411 m³
Grava 3/4"	COAGREGADOS	1335 kg	0,809 m³

2.2.3. Proporciones en masa: 1 : 2 : 3.5

En caso de que se decida producir el concreto dosificado en volumen, para medir las cantidades de material se podrán utilizar cajones de madera con las siguientes medidas interiores:

Arena: 33,0 X 33,0 X 33,0 cm (2 veces)
Grava: 33,0 X 33,0 X 33,0 cm (3.5 veces)

Se mezclará un bulto de cemento Argos UG de 50,0 kg, dos (2) cajones llenos rasos de arena, tres y medio (3.5) cajones llenos rasos de grava, aproximadamente 25,0 litros de agua.

3. DISEÑO ADICIONAL PARA 280 kg/cm2 (28 MPa)

3.1. RESISTENCIA DE DISEÑO

Los proporcionamientos para el diseño de mezcla se hicieron según los requerimientos descritos en el capitulo C5, tabla C.5.3.2.2 NSR-10 (NORMAS COLOMBIANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMORESISTENTE).
Resistencia promedio requerida a la compresión cuando no hay datos que permitan determinar la desviación estándar.

3.2.1. Por metro cúbico de concreto

DOSIFICACION DE LA MEZCLA DE CONCRETO			
MUESTRA	PROCEDENCIA	PESO SECO Para 1 m³	DOSIFICACION POR Peso por bachada de 1 m³
Agua		191 kg	191,3 kg
Cemento	Argos	425 kg	425 kg
Arena de Rio	COAGREGADOS	850 kg	850,3 kg
Grava 3/4"	COAGREGADOS	1039 kg	1039,2 kg

3.2.2. Por bulto de cemento de 50,0 kg

MUESTRA	PROCEDENCIA	PESO SECO Para 1 m³	DOSIFICACION POR Volumen
Agua		191 kg	191,3 Litros
Cemento	Argos	425 kg	8,5 Sacos
Arena de Rio	COAGREGADOS	850 kg	0,486 m³
Grava 3/4"	COAGREGADOS	1039 kg	0,63 m³

Concrelab

3.2.3. Proporciones en masa: 1 : 2 : 2.5

En caso de que se decida producir el concreto dosificado en volumen, para medir las cantidades de material se podrán utilizar cajones de madera con las siguientes medidas interiores:

Arena: 33,0 X 33,0 X 33,0 cm (2 veces)
Grava: 33,0 X 33,0 X 33,0 cm (2.5 veces)

Se mezclará un bulto de cemento Argos UG de 50,0 kg, dos (2) cajones llenos rasos de arena, tres y medio (2.5) cajones llenos rasos de grava, aproximadamente 25,0 litros de agua.

NOTAS:

1. Se deben elaborar cilindros de prueba para establecer el grado de control en la producción del concreto y dosificación del aditivo en obra.

2. Ajustes al agua de mezclado:

   Teniendo en cuenta que la humedad de absorción no hace parte del agua de mezclado se deben realizar los siguientes ajustes:

   2.1. Cuando la humedad natural es mayor que la absorción (Agua libre).

   El agua de mezclado se debe disminuir en una cantidad igual al agua libre que contengan los agregados.

   2.2. Cuando la humedad natural es menor que la absorción.

   El agua de mezclado se debe incrementar en una cantidad igual a la diferencia entre la humedad natural y la absorción.

Concrelab

3. Ajuste a la masa de los agregados:

   Como la condición de diseño considera la masa de los agregados en estado sss, se deben realizar los ajustes para una condición de humedad diferente así:

   3.1. Cuando la humedad natural es mayor que la absorción (Agua libre).

   La masa de los agregados se debe incrementar en una cantidad igual a la masa del agua libre.

   3.2. Cuando la humedad natural es menor que la absorción.

   La masa del agregado se debe disminuir en una cantidad igual a la diferencia entre la absorción y la humedad natural.

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en las normas: NTC 33, NTC 221, NTC 3674, NTC 77, NTC 78, NTC 176, NTC 237, NTC 92 y NTC 127 respectivamente.

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de las muestras ensayadas.

Cordialmente,

GEOT. CLAUDIA XIMENA ARTURO
Jefe de Sucursal – Sede Cali
concrelab.valle@concrelab.com
O.T. No. 73271 OV 197407 199029
Digitó J.Díaz

Concrelab

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA EL ANÁLISIS POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS NTC 77:2018
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR POR LAVADO EL MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ 75 µM (No.200) EN AGREGADOS MINERALES. NTC 78:2019

NÚMERO DE INFORME: **DPDC -0070-26-1**
PÁGINAS: **1 DE 2**

***CLIENTE:**	CONSORCIO FP
***CÓDIGO DE OBRA:**	27903
***OBRA:**	PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA DE RÍO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: ARENA DE RÍO, COLOR GRIS
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M1
***PROCEDENCIA:**	PLANTA COAGREGADOS
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	ACOPIO EN PLANTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2026-02-09
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2026-02-12
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2026-02-19
ENSAYO EJECUTADO POR:	E.CERON
ORDEN DE TRABAJO N°:	73271
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente. El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



Jefe de Surcursal
GEOT. CLAUDIA XIMENA ARTURO BONILLA
concrelab.valle@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO


MÉTODO DE ENSAYO PARA EL ANÁLISIS POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS NTC 77:2018
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR POR LAVADO EL MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ 75 µM (No.200) EN AGREGADOS MINERALES. NTC 78:2019

NÚMERO DE INFORME: DPDC -0070-26-1
PÁGINAS: 2 DE 2

Masa inicial seca (g)		Masa seca después de Lavado (g)		Masa final (g)		* Límite Superior (%)	* Límite Inferior (%)
1440,5		1439,0		1439,0			
Tamiz	mm.	Masa retenida (g)	% Retenido	% Acumulado	% Que pasa		
4"	101,60	0,0	0	0	100		
3 ½"	88,90	0,0	0	0	100		
3"	76,20	0,0	0	0	100		
2 ½"	64,00	0,0	0	0	100		
2"	50,00	0,0	0	0	100		
1 ½"	37,50	0,0	0	0	100		
1"	25,00	0,0	0	0	100		
3/4"	19,00	0,0	0	0	100		
1/2"	12,50	0,0	0	0	100		
3/8"	9,51	0,0	0	0	100	100	100
No. 4	4,75	82,0	6	6	94	95	100
No. 8	2,36	409,5	28	34	66	80	100
No. 16	1,18	248,5	17	51	49	50	85
No. 30	0,60	266,0	18	70	30	25	60
No. 50	0,30	254,5	18	88	12	5	30
No. 100	0,15	132,5	9	97	3		10
No. 200	0,075	46,0	3	100	0,1	0	7
Fondo	N/A	1,5	0,1				

MÓDULO DE FINURA	**3,45**
% MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ No. 200 (75 µm)	0,1

* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

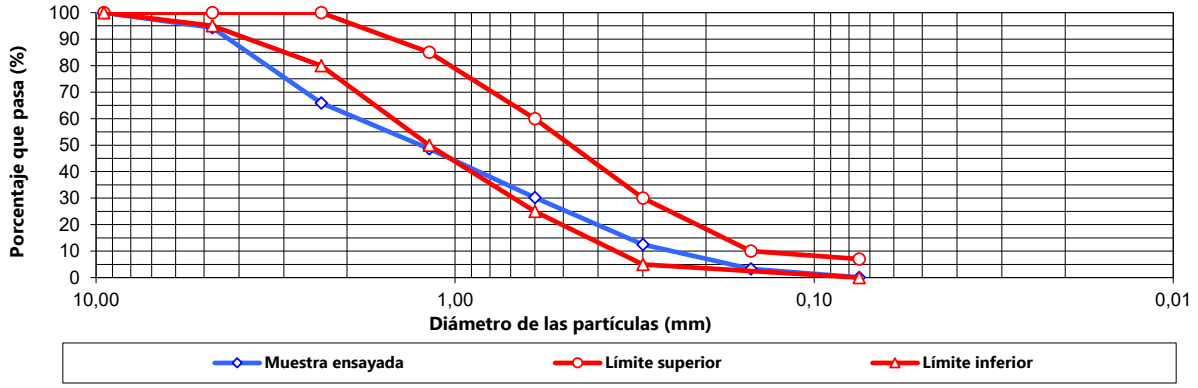

OBSERVACIONES:

para la norma NTC 78:2019, Método de ensayo para determinar por lavado el material que pasa el tamiz 75µm en agregados minerales se usa el procedimiento A: Lavado con agua potable.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

INFORME DE ENSAYO


MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LAS IMPUREZAS ORGÁNICAS EN AGREGADO FINO PARA CONCRETO NTC 127:2024 (Excepto el numerla 6.2)

NÚMERO DE INFORME: **DPDC -0070-26-2**
PÁGINAS: **1 DE 2**

***CLIENTE:**	CONSORCIO FP
***CÓDIGO DE OBRA:**	27903
***OBRA:**	PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA DE RÍO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: ARENA DE RÍO, COLOR GRIS
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M1
***PROCEDENCIA:**	PLANTA COAGREGADOS
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	ACOPIO EN PLANTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2026-02-09
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2026-02-17
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2026-02-19
ENSAYO EJECUTADO POR:	E.CERON
ORDEN DE TRABAJO N°:	73271
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente. El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



Jefe de sucursal
concrelab.valle@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LAS IMPUREZAS ORGÁNICAS EN AGREGADO FINO PARA CONCRETO NTC 127:2024 (Excepto numeral 6.2)

NÚMERO DE INFORME: DPDC -0070-26-2

PROCEDIMIENTO SOLUCIÓN DE COLOR ESTÁNDAR	**X**
PROCEDIMIENTO DEL VIDRIO DE COLOR ESTÁNDAR	**0**

ESTÁNDARES DE COLOR PARA EVALUAR EL COLOR DEL LIQUIDO SOBRENADANTE (Tabla No.1-NTC127:2024)	
Número estándar de color de Gardner	**Número de placa organica**
8	1

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y LA ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO.


NTC 237:2020

NÚMERO DE INFORME: DPDC -0070-26-3
PÁGINAS: 1 DE 2

***CLIENTE:**	CONSORCIO FP
***CÓDIGO DE OBRA:**	27903
***OBRA:**	PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA DE RÍO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: ARENA DE RÍO, COLOR GRIS
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M1
***PROCEDENCIA:**	PLANTA COAGREGADOS
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	ACOPIO EN PLANTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2026-02-09
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2026-02-12
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2026-02-19
ENSAYO EJECUTADO POR:	E.CERON
ORDEN DE TRABAJO N°:	73271
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



GEOT. CLAUDIA XIMENA ARTURO BONILLA

concrelab.valle@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y LA ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO.
NTC 237:2020

SECADO PREVIO ANTES DEL PERÍODO DE INMERSIÓN	**SI**
PROCEDIMIENTO	**SECO**

DENSIDAD RELATIVA Y ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO		
Masa del material en estado SSS.	**(g)**	500,0
Masa del frasco + agua hasta la marca de calibración.	**(g)**	672,0
Masa frasco + agua + material hasta la marca de calibración.	**(g)**	988,8
Masa del material seco.	**(g)**	491,4
Densidad relativa (gravedad específica) SH		2,68
Densidad relativa (gravedad específica) SSS		2,73
Densidad relativa (gravedad específica) Aparente		2,81
Absorción.	**(%)**	1,8

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD VOLUMÉTRICA (MASA UNITARIA) Y VACÍOS EN AGREGADOS.

NTC 92:2019

NUMERO DE INFORME: **DPDC -0070-26-4**
PÁGINAS: **1 DE 2**

***CLIENTE:**	CONSORCIO FP
***CÓDIGO DE OBRA:**	27903
***OBRA:**	PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	ARENA DE RÍO
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: ARENA DE RÍO, COLOR GRIS
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M1
***PROCEDENCIA:**	PLANTA COAGREGADOS
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	ACOPIO EN PLANTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2026-02-09
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2026-02-14
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2026-02-19
ENSAYO EJECUTADO POR:	E.CERON
ORDEN DE TRABAJO N°:	73271
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



GEOT. CLAUDIA XIMENA ARTURO BONILLA
Jefe sucursal
concrelab.valle@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD VOLUMÉTRICA (MASA UNITARIA) Y VACÍOS EN AGREGADOS.

NTC 92:2019

MASA DEL MOLDE (kg) 1,81 **VOLUMEN DEL MOLDE (m^3)** 0,0029370

MASA UNITARIA Y VACÍOS ENTRE PARTÍCULAS DE AGREGADOS			
MASA UNITARIA SUELTA		**MASA UNITARIA APISONADA**	
DETERMINACIÓN N°	**MASA (kg)**	**DETERMINACIÓN N°**	**MASA (kg)**
1	5,064	**1**	5,371
2	5,037	**2**	5,412
3	5,089	**3**	5,466
PROMEDIO	**5,063**	**PROMEDIO**	**5,416**

Densidad volumétrica suelta SSS	**(kg/m^3)**	1750	**Vacíos en agregado suelto**	**(%)**	39
Densidad volumétrica apisonada SSS	**(kg/m^3)**	1880	**Vacíos en agregado apisonado**	**(%)**	34

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA EL ANÁLISIS POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS NTC 77:2018
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR POR LAVADO EL MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ 75 µM (No.200) EN AGREGADOS MINERALES. NTC 78:2019

NÚMERO DE INFORME: **DPDC -0070-26-5**
PÁGINAS: **1 DE 2**

***CLIENTE:**	CONSORCIO FP
***CÓDIGO DE OBRA:**	27903
***OBRA:**	PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	GRAVA
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: GRAVA DE TRITURACIÓN
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M2
***PROCEDENCIA:**	PLANTA ARGOS
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	ACOPIO EN PLANTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2026-02-09
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2026-02-12
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2026-02-19
ENSAYO EJECUTADO POR:	E.CERON
ORDEN DE TRABAJO N°:	73271
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente. El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



Jefe de Surcursal
GEOT. CLAUDIA XIMENA ARTURO BONILLA
concrelab.valle@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO


MÉTODO DE ENSAYO PARA EL ANÁLISIS POR TAMIZADO DE LOS AGREGADOS FINOS Y GRUESOS NTC 77:2018
MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR POR LAVADO EL MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ 75 µM (No.200) EN AGREGADOS MINERALES. NTC 78:2019

NÚMERO DE INFORME: DPDC -0070-26-5
PÁGINAS: 2 DE 2

Masa inicial seca (g)		Masa seca después de Lavado (g)		Masa final (g)		* Límite Superior (%)	* Límite Inferior (%)
5061,0		5014,5		5014,5			
Tamiz	mm.	Masa retenida (g)	% Retenido	% Acumulado	% Que pasa		
4"	101,60	0,0	0	0	100		
3 ½"	88,90	0,0	0	0	100		
3"	76,20	0,0	0	0	100		
2 ½"	64,00	0,0	0	0	100		
2"	50,00	0,0	0	0	100		
1 ½"	37,50	0,0	0	0	100	100	100
1"	25,00	0,0	0	0	100	90	100
3/4"	19,00	24,5	0	0	100	40	85
1/2"	12,50	2996,0	59	60	40	10	40
3/8"	9,51	1032,0	20	80	20	0	15
No. 4	4,75	922,8	18	98	2	0	5
No. 8	2,36	0,0	0	98	2		
No. 16	1,18	0,0	0	98	2		
No. 30	0,60	0,0	0	98	2		
No. 50	0,30	0,0	0	98	2		
No. 100	0,15	0,0	0	98	2		
No. 200	0,075	0,0	0	98	1,7		
Fondo	N/A	85,7	1,7				

MÓDULO DE FINURA	NO APLICA
% MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ No. 200 (75 µm)	1,7

* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

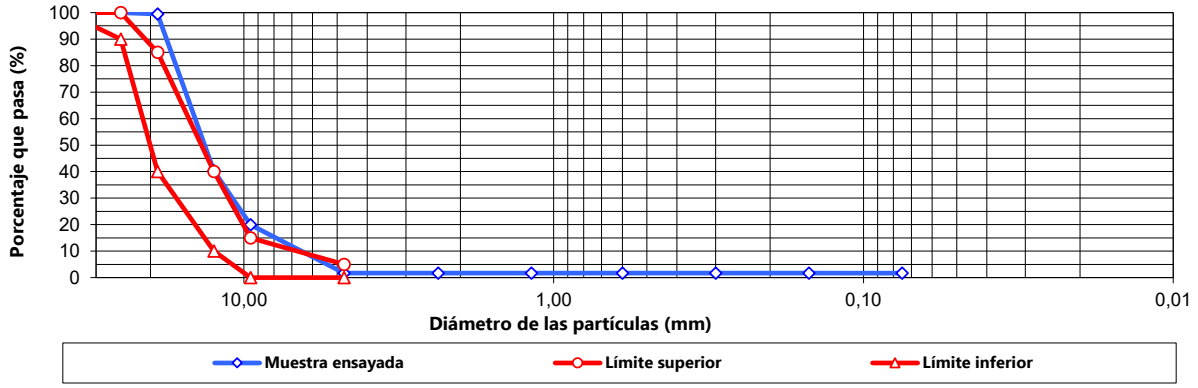

OBSERVACIONES:

para la norma NTC 78:2019, Método de ensayo para determinar por lavado el material que pasa el tamiz 75µm en agregados minerales se usa el procedimiento A: Lavado con agua potable.

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y LA ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO.

NTC 176:2019

NÚMERO DE INFORME: **DPDC -0070-26-6**
PÁGINAS: **1 DE 2**

***CLIENTE:**	CONSORCIO FP
***CÓDIGO DE OBRA:**	27903
***OBRA:**	PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	GRAVA
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: GRAVA DE TRITURACIÓN
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M2
***PROCEDENCIA:**	PLANTA ARGOS
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	ACOPIO EN PLANTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2026-02-09
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2026-02-12
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2026-02-19
ENSAYO EJECUTADO POR:	E.CERON
ORDEN DE TRABAJO N°:	73271
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la

AUTORIZADO POR:



Jefe de Sucursal
concrelab.valle@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y LA ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO.

NTC 176:2019

NÚMERO DE INFORME: **DPDC -0070-26-6**
PÁGINAS: **2 DE 2**

SECADO PREVIO ANTES DEL PERÍODO DE INMERSIÓN	

DENSIDAD Y ABSORCIÓN	
Masa en el aire de la muestra seca. (g)	3585,0
Masa en el aire de la muestra en estado SSS. (g)	3622,8
Masa sumergida en agua de la muestra en estado SSS. (g)	2432,0
Densidad relativa (Gravedad específica) (SH)	3,01
Densidad relativa (Gravedad específica) (SSS)	3,04
Densidad relativa (Gravedad específica) (Aparente)	3,11
Absorción. (%)	1,1

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD VOLUMÉTRICA (MASA UNITARIA) Y VACÍOS EN AGREGADOS.

NTC 92:2019

NUMERO DE INFORME: **DPDC -0070-26-7**
PÁGINAS: **1 DE 2**

***CLIENTE:**	CONSORCIO FP
***CÓDIGO DE OBRA:**	27903
***OBRA:**	PROYECTO BUENAVENTURA
***DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:**	BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
***DESCRIPCIÓN CLIENTE:**	GRAVA
DESCRIPCIÓN LABORATORIO:	VISUAL: GRAVA DE TRITURACIÓN
***NÚMERO DE LA MUESTRA:**	M2
***PROCEDENCIA:**	PLANTA ARGOS
***LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:**	ACOPIO EN PLANTA
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS (PATOLOGÍA Y DISEÑOS)
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2026-02-09
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2026-02-12
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2026-02-19
ENSAYO EJECUTADO POR:	E.CERON
ORDEN DE TRABAJO N°:	73271
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
* La información registrada en los campos identificados con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

AUTORIZADO POR:



GEOT. CLAUDIA XIMENA ARTURO BONILLA
Jefe sucursal
concrelab.valle@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

INFORME DE ENSAYO

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD VOLUMÉTRICA (MASA UNITARIA) Y VACÍOS EN AGREGADOS.

NTC 92:2019

MASA DEL MOLDE (kg) 3,986 **VOLUMEN DEL MOLDE (m^3)** 0,0104273

MASA UNITARIA Y VACÍOS ENTRE PARTÍCULAS DE AGREGADOS			
MASA UNITARIA SUELTA		**MASA UNITARIA APISONADA**	
DETERMINACIÓN N°	**MASA (kg)**	**DETERMINACIÓN N°**	**MASA (kg)**
1	17,000	**1**	18,238
2	16,966	**2**	18,156
3	17,012	**3**	18,136
PROMEDIO	**16,993**	**PROMEDIO**	**18,177**

Densidad volumétrica suelta SSS	**(kg/m^3)**	1650	**Vacíos en agregado suelto**	**(%)**	48
Densidad volumétrica apisonada SSS	**(kg/m^3)**	1760	**Vacíos en agregado apisonado**	**(%)**	44

OBSERVACIONES:

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

COAGREGADOS S.A.S

COMPAÑÍA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS SAS

NIT: 900.336.153-6

CODIGO:LAB-015
06-01-2016
VERSION: 001

GRANULOMETRIA DE TRITURADO PARA CONCRETO

FECHA: 1-nov-25

Localización: *PLANTA 1*

Descripción: *GRAVA DE RIO TRITURADA DE COLOR GRIS CLARO* 3/4"

P1 = 5488,0 g

Tamiz US	Tamiz mm	Masa Retenida (g)	(%) Retenido	(%) Ret. Acumul.	(%) que pasa
-	-				-
-	-				-
-	-				-
-	-				-
-	-				-
-	-				-
-	-				-
1 1/2"	**37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**
1"	25,4	0,0	0,0	0,0	**100,0**
3/4"	19	96,0	1,7	1,7	**98,3**
1/2"	12,5	3212,0	58,5	60,3	**39,7**
3/8"	9,5	1224,0	22,3	82,6	**17,4**
No 4	4,75	850,0	15,5	98,1	**1,9**
No 8	2,4	4,7	0,1	98,2	**1,8**
No 16	1,18	8,0	0,1	98,3	**1,7**
No 30	0,60	1,4	0,0	98,3	**1,7**
No 50	0,30	4,4	0,1	98,4	**1,6**
No 100	0,149	8,7	0,2	98,6	**1,4**
No 200	0,074	13,0	0,2	98,8	**1,2**
Fondo		65,8			
Total		**5488,0**			

LÍMITES DE CONSISTENCIA, HUMEDAD Y MATERIA ORGÁNICA

LL (%)= 0 — 0

LP (%)= 0 — IP (%) — No plástico

FALSO — *FALSO*

HUMEDAD (%)=

(opcional)

MATERIA ORGÁNICA =

Cumple

(# Gardner - colorimetría <= 3)

IP = 0 → No plástico
1 ≤ IP ≤ 5 → Ligeramente plástico
6 < IP ≤ 10 → Plasticidad baja
11 < IP ≤ 20 → Plasticidad media

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑOS

Bloques % = Cantos % =

Grava % = Arena % =

Finos % = Clasificación finos: **0,0**

%Grava / % Arena = %Arena / % Finos =

%Grava / % Finos = % Retenido en No. 200 =

%Pasa tamiz 19 mm (¾") =

[%Grava + % Arena] / % Finos =


% Masa retenida tamiz de 19 mm (¾") =

% Humedad del retenido tamiz de 19 mm (¾") =

Clasificación parcial material retenido en tamiz No. 200: **FALSO**

Clasificación según AASHTO = () *solo para referencia)*

Cumplimiento granulométrico:

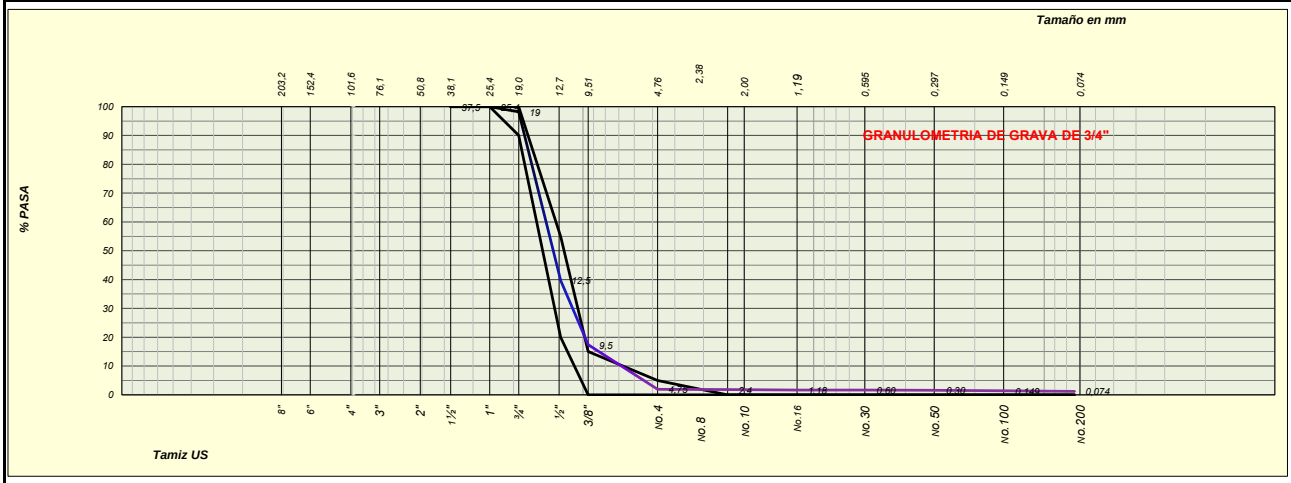

OBSERVACIONES:

Ejecutó	*Revisó*	
LABORATORISTA *Firma*	JEFE PLANTA *Firma*	
Fecha:	*Fecha:*	

EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Certificado de Calidad 30000753611

Centro: CO2A

Material: LADRAM200885
PLASTOL HR-S 100 GRANEL
Grupo Art: ADMIXTURE
Fecha de fabricación: 11/09/2025
Lote: 2509072978

Toxement S.A por medio de este documento da constancia de conformidad al lote de fabricación referenciado, de acuerdo con los resultados obtenidos bajo procedimientos estandarizados del laboratorio. Así mismo, los datos registrados dan cumplimiento a los parámetros citados en la hoja técnica del producto.

Caracteristica	Método	Especificación	Resultado
APARIENCIA	IM001		Aprobado
DENSIDAD	TX32E001	1.07 - 1.11 g/ml	1.07
PH	TX32E004	4.00 - 6.00	4.00
SOLIDOS	TX32E002	41.00 - 45.00 %	42.50

EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Certificado de Calidad 30000750175

Centro: CO2A

Material: LADRAM200885
PLASTOL HR-S 100 GRANEL
Grupo Art: ADMIXTURE
Fecha de fabricación: 01/09/2025
Lote: 2508060108

Toxement S.A por medio de este documento da constancia de conformidad al lote de fabricación referenciado, de acuerdo con los resultados obtenidos bajo procedimientos estandarizados del laboratorio. Así mismo, los datos registrados dan cumplimiento a los parámetros citados en la hoja técnica del producto.

Característica	Método	Especificación	Resultado
APARIENCIA	IM001		Aprobado
DENSIDAD	TX32E001	1.07 - 1.11 g/ml	1.08
PH	TX32E004	4.00 - 6.00	4.00
SOLIDOS	TX32E002	41.00 - 45.00 %	43.06

EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Certificado de Calidad 30000749292

Centro: CO2A

Material: LADRRM105392
EUCON WR 66 GRANEL
Grupo Art: ADMIXTURE
Fecha de fabricación: 28/08/2025
Lote: 2508060118

Toxement S.A por medio de este documento da constancia de conformidad al lote de fabricación referenciado, de acuerdo con los resultados obtenidos bajo procedimientos estandarizados del laboratorio. Así mismo, los datos registrados dan cumplimiento a los parámetros citados en la hoja técnica del producto.

Característica	Método	Especificación	Resultado
APARIENCIA	IM001		Aprobado
DENSIDAD	TX32E001	1.14 - 1.18 g/ml	1.16
PH	TX32E004	8.00 - 10.00	9.10
SOLIDOS	TX32E002	28.00 - 32.00 %	29.79

	INFORME DE ENSAYO	CÓDIGO:	R-4-218
GEOZAM	RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm (1 1/2") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES INV E-218:2013	VERSIÓN:	009
		FECHA:	27/09/2022
		PAGINA: 1 DE: 1	

NOMBRE CLIENTE:	COAGREGADOS S.A.S.	INFORME No. :	GZ-105E-012
OBRA/PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN MUESTRA :	23-ene-2024
PROCEDENCIA:	COAGREGADOS S.A.S.	FECHA DE ENSAYO :	07-feb-2024
LOCALIZACIÓN:	PLANTA 1 MUESTRA TOMADA Y TRANSPORTADA POR EL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN :	09-feb-2024
MÉTODO DE ENSAYO :	ÚNICO	MUESTRA No.:	105E-003
DESCRIPCIÓN MUESTRA :	GRAVA TRITURADA DE TM 3/4" DE COLOR GRIS - ORIGEN NATURAL DE RÍO		

PRUEBA	1	2
Granulometría usada en el Ensayo	A	A
Tamaño Máximo Nominal (mm)	3/4 "	3/4 "
Estado de la Muestra	SECA	SECA
No DE REVOLUCIONES	100	500
PESO MUESTRA SECA ANTES DEL ENSAYO (P_1) g	5001,4	5001,4
PESO MUESTRA SECA DESPUÉS DEL ENSAYO (P_2) g	4826,9	4136,7
PERDIDA (P_1 - P_2) g.	174,5	864,7
% DE DESGASTE (P_1 - P_2)x100 / P_1	3,5	17,3

GRANULOMETRÍAS DE LA MUESTRA DE ENSAYO, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES

TAMAÑOS DE TAMIZ		MASA DE LAS DIFERENTES FRACCIONES g.			
		GRANULOMETRÍAS			
PASA TAMIZ	RETENIDO EN TAMIZ	A	B	C	D
37.5mm (1 1/2")	25mm (1")				
25mm (1")	19mm (3/4")	1250±25			
19mm (3/4")	12.5mm (1/2")	1250±25			
12.5mm (1/2")	9.5mm (3/8")	1250±10	2500±10		
9.5mm (3/8")	6.3mm (1/4")	1250±10	2500±10	2500±10	
6.3mm (1/4")	4.75mm (# 4)			2500±10	
4.75mm (# 4)	2.36mm (# 8)				5000±10
TOTAL		5000±10	5000±10	5000±10	5000±10
No DE ESFERAS		12	11	8	6
No DE REVOLUCIONES		500	500	500	500

PARAMETRO DE CUMPLIMIENTO

MATERIAL ENSAYADO	CONCRETO ESTRUCTURAL
ESPECIFICACIÓN A APLICAR	ART 630 INV - 2022
DESGASTE EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES ,MÁXIMO (%)	≤ 8 - 100 Rev. ≤ 40 - 500 Rev.
CUMPLE (SI/NO)	SI

OBSERVACIONES:

Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.

REVISÓ	APROBÓ
CAROLINA VALDERRAMA B. JEFE DE LABORATORIO	**VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ** GERENTE

FIN DEL INFORME

	INFORME DE ENSAYO	CÓDIGO:	R-4-220
GEOZAM	SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO. INV E 220 - 13	VERSIÓN:	010
		FECHA:	27/09/2022
		PAGINA: 1 DE :1	

NOMBRE CLIENTE:	COAGREGADOS S.A.S.	INFORME No. :	GZ-105E-013
OBRA/PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN MUESTRA :	23-ene-2024
PROCEDENCIA:	COAGREGADOS S.A.S.	FECHA DE ENSAYO:	07-feb-2024
LOCALIZACIÓN:	PLANTA 1 MUESTRA TOMADA Y TRANSPORTADA POR EL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN :	09-feb-2024
MÉTODO DE ENSAYO :	ÚNICO	MUESTRA No. :	105E-003
DESCRIPCIÓN MUESTRA :	GRAVA TRITURADA DE TM 3/4" DE COLOR GRIS - ORIGEN NATURAL DE RÍO		

SOLUCIÓN UTILIZADA:	Sulfato de Sodio

GRAVEDAD ESPECIFICA DE LA SOLUCIÓN:	1,16

FRACCIÓN GRUESA - Análisis Cuantitativo

TAMIZ				Gradación (%)		Masa de las fracciones (g)		% pasa después del ensayo (%Pérdida)	% Pérdida ponderada
PASA		RETIENE		Original	Corregida	Antes del ensayo	Después del ensayo		
21/2"	63mm	2"	50mm						
2"	50mm	11/2"	37.5mm						
11/2"	37.5mm	1"	25.4mm						
1"	25.4mm	3/4"	19mm						
3/4"	19,00mm	1/2"	12.7mm	86,54	91,16	1000,5	997,7	0,3	**0,26**
1/2"	12.7mm	3/8"	9.5mm						
3/8"	9,5mm	No. 4	4.75mm	8,39	8,84	300,4	296,1	1,4	**0,13**
% PASANTE No. 4 < 10%									
			Total	94,93	100,0	**Perdida por Solidez Fracción Gruesa (%)**			**0,38**

Se considera todo el grupo de tamaños. Si existe menos del %5 de la muestra en una fracción, tiene una perdida igual al promedio de las pérdidas de los tamaños menores y mayores proximos, o si alguno de estos tamaños no existe, se considera la misma pérdida del tamaño mayor o menor más próximo

FRACCIÓN GRUESA - Análisis Cualitativo

TAMIZ		No partículas	Desintegradas		fracturadas		Fisuradas		Exfoliadas	
PASA	RETIENE		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
2"	1 1/2"									
1 1/2"	3/4"	34	0	0	0	0	1	3	0	0

FRACCIÓN FINA - Análisis Cuantitativo

TAMIZ				Gradación (%)		Masa de las fracciones (g)		% pasa después del ensayo (%Pérdida)	% Pérdida ponderada
PASA		RETIENE		Original	Corregida	Antes del ensayo	Después del ensayo		
Con menos de 10% mayor de 3/8"									
3/8"	9.5 mm	No. 4	4.75mm						
No. 4	4.75mm	No.8	2.36mm						
No. 8	2.36 mm	No. 16	1.18mm						
No. 16	1.18mm	No. 30	600µm						
No. 30	600µm	No. 50	300µm						
			Total			**Perdida por Solidez Fracción Fina (%)**			

PARAMETRO DE CUMPLIMIENTO	
MATERIAL ENSAYADO	CONCRETO ESTRUCTURAL (SULFATO DE SODIO)
ESPECIFICACIÓN A APLICAR	ART 630 INV - 2022
PÉRDIDA EN ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATOS, MÁXIMO (%)	≤ 10 AGREGADO FINO - ≤ 12 AGREGADO GRUESO
CUMPLE (SI/NO)	SI

OBSERVACIONES:

Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.

REVISÓ	APROBÓ
CAROLINA VALDERRAMA B.	**VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ**
JEFE DE LABORATORIO	GERENTE

FIN DEL INFORME

	INFORME DE ENSAYO	Código	R-4-211
GEOZAM		Versión	´008
	DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS INV E -211 -13	Fecha	27/09/2022
		Pagina 1 de 1	

NOMBRE CLIENTE:	**COAGREGADOS S.A.S.**	INFORME No. :	**GZ-105E-014**
OBRA/PROYECTO:	**CONTROL DE CALIDAD**	FECHA DE RECEPCIÓN MUESTRA :	**23/01/2024**
PROCEDENCIA:	**COAGREGADOS S.A.S.**	FECHA DE ENSAYO :	**07/02/2024**
LOCALIZACIÓN:	**PLANTA 1 MUESTRA TOMADA Y TRANSPORTADA POR EL CLIENTE**	FECHA DE EMISIÓN :	**09/02/2024**
MÉTODO DE ENSAYO :	**ÚNICO**	MUESTRA No. :	**105E-003**
DESCRIPCIÓN MUESTRA :	**GRAVA TRITURADA DE TM 3/4" DE COLOR GRIS - ORIGEN NATURAL DE RÍO**		

FRACCIÓN GRUESA

Tamaño de las Particulas entre los tamices Tamiz Nº		% Retenido Gradación Original	% Retenido Gradación Corregida	Masa de la Muestra de Ensayo (M), g	Masa de la Muestra de Ensayo (R), g	Terrones de arcilla y de partículas deleznables (P), %	Terrones de arcilla y de partículas deleznables Ponderado, %
Pasa	Retiene						
Mayor de 1 ½" (37,5 mm)							
1 ½" (37,5 mm)	3/4" (19,0 mm)						
3/4" (19,0 mm)	3/8" (9,5 mm)	86,54	91,16	2000,5	2000,3	0,01	0,009
3/8" (9,5 mm)	No 4 (4,75 mm)	8,39	8,84	1000,7	1000,4	0,03	0,003
TOTAL		94,93	100,00	TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES, %			0,006

Si el agregado contiene menos del 5% de cualquiera de los tamaños especificados, no se deberá ensayar dicho tamaño sino que, para fines de cálculo del promedio ponderado, se deberá considerar que contiene el mismo porcentaje de terrones de arcilla y de partículas deleznables que el tamaño inmediatamente mayor o menor, cualquiera de ellos que se halle presente

FRACCIÓN FINA

Tamaño de las Particulas entre los tamices Tamiz Nº		% Retenido Gradación Original	% Retenido Gradación Corregida	Masa de la Muestra de Ensayo (M), g	Masa de la Muestra de Ensayo (R), g	Terrones de arcilla y de partículas deleznables (P), %	Terrones de arcilla y de partículas deleznables Ponderado, %
Pasa	Retiene						
No 4 (4,75 mm)	No 16 (1,18 mm)						
				TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES, %			

PARAMETRO DE CUMPLIMIENTO	
MATERIAL ENSAYADO	CONCRETO ESTRUCTURAL: AGREGADO FINO Y GRUESO
ESPECIFICACIÓN A APLICAR	ART 630 INV - 13
TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES, % MAXIMO	AGREGADO FINO ≤ 3%; AGREGADO GRUESO ≤3%
CUMPLE SI/NO	**SI**

OBSERVACIONES:

Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.

REVISÓ	APROBÓ
CAROLINA VALDERRAMA B. JEFE DE LABORATORIO	**VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ** GERENTE

FIN DEL INFORME

	INFORME DE ENSAYO	Código	R-4-214
GEOZAM	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO / DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (No. 200) EN LOS AGREGADOS PÉTREOS MEDIANTE LAVAD INV E – 213 / INV E – 214:2013	Versión	008
		Fecha	27/09/2022
		Página 1 de 1	


NOMBRE CLIENTE :	COAGREGADOS S.A.S.	INFORME No.:	GZ-105E-022
OBRA/PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN :	13-sep-2025
PROCEDENCIA:	EL DANUBIO	FECHA DE ENSAYO :	22-sep-2025
LOCALIZACIÓN:	MUESTRA TOMADA Y TRANSPORTADA POR EL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN :	25-sep-2025
MÉTODO DE ENSAYO :	SEÑOR EDWIN MOSQUERA	MUESTRA No.:	105E -006
DESCRIPCIÓN MUESTRA :	ARENA LIMOSAS CON MODULO DE FINURA DE 3.01, COLOR CAFÉ - ORIGEN NATURAL DE RÍO		

GRANULOMETRIA

Masa total antes del lavado (g) =	1726,8	Masa seca lavada sobre el tamiz No. 200 (g)	1422,4

Tamiz		Peso Ret (g)	% Retenido	% Retenido Acumulado	% Pasa	ESPECIFICACIÓN	
U.S Standard	mm					Límite Inferior	Límite superior
3/8"	9,50	0,0	0,0	0	**100,0**	100	100
#4	4,75	172,7	10,0	10	**90,0**	95	100
#8	2,36	357,6	20,7	31	**69,3**	80	100
#16	1,18	241,8	14,0	45	**55,3**	50	85
#30	0,60	258,2	15,0	60	**40,3**	25	60
#50	0,30	249,7	14,5	74	**25,9**	10	30
#100	0,15	140,4	8,1	82	**17,7**	2	10
PASA #100		306,4	17,7				
TOTAL TAMIZADO (g)		**1420,4**					

INVIAS ART 630 / NTC 174.
AGREGADO FINO
GRADACIÓN ÚNICA

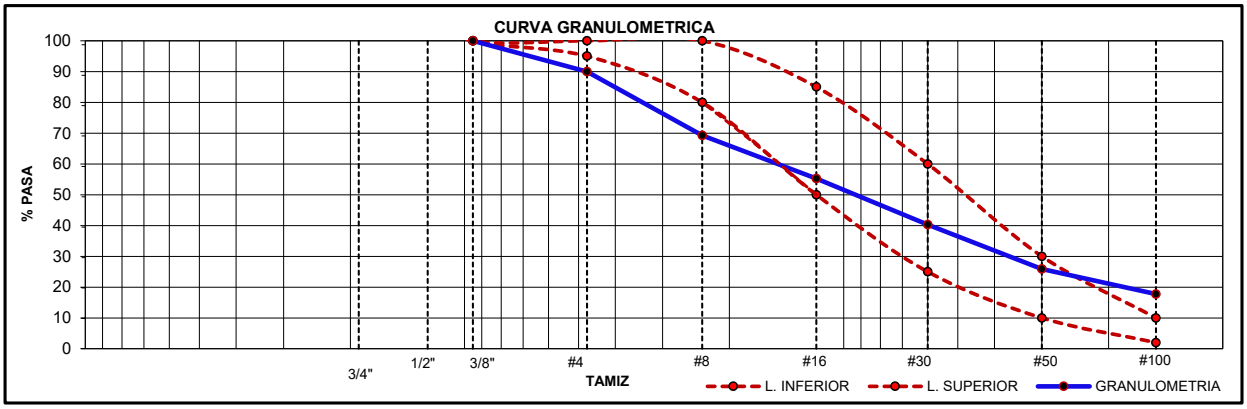

OBSERVACIONES:

- La información registrada en los campos de datos identificadas con (*) fué suministrada por el cliente. El laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.
- Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra tomada y/o entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
- Los resultados descritos en este informe corresponden a ensayos realizados en las instalaciones permanentes de GEOZAM LA BORATORIO INGENIROS CONSULTORES S.A.S. Su reproducción total o parcial está prohibida sin la autorización expresa de la empresa

REVISÓ	APROBÓ
LILIANA ZAMBRANO PAZ ASISTENTE DE LABORATORIO	**ALEXANDRA BARRAGAN P,** DIRECTORA TECNICA Y DE GESTIÓN

	INFORME DE ENSAYO	Código	R-4-214
GEOZAM	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO / DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (No. 200) EN LOS AGREGADOS PÉTREOS MEDIANTE LAVAD INV E – 213 / INV E – 214:2013	Versión	008
		Fecha	27/09/2022
		Página 1 de 1	


NOMBRE CLIENTE :	COAGREGADOS S.A.S.	INFORME No.:	GZ-105E-022
OBRA/PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN :	13-sep-2025
PROCEDENCIA:	EL DANUBIO	FECHA DE ENSAYO :	22-sep-2025
LOCALIZACIÓN:	MUESTRA TOMADA Y TRANSPORTADA POR EL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN :	25-sep-2025
MÉTODO DE ENSAYO :	SEÑOR EDWIN MOSQUERA	MUESTRA No.:	105E -006
DESCRIPCIÓN MUESTRA :	ARENA LIMOSAS CON MODULO DE FINURA DE 3.01, COLOR CAFÉ - ORIGEN NATURAL DE RÍO		

GRANULOMETRIA

Masa total antes del lavado (g) =	1726,8	Masa seca lavada sobre el tamiz No. 200 (g)	1422,4

Tamiz		Peso Ret (g)	% Retenido	% Retenido Acumulado	% Pasa	ESPECIFICACIÓN	
U.S Standard	mm					Límite Inferior	Límite superior
3/8"	9,50	0,0	0,0	0	**100,0**	100	100
#4	4,75	172,7	10,0	10	**90,0**	95	100
#8	2,36	357,6	20,7	31	**69,3**	80	100
#16	1,18	241,8	14,0	45	**55,3**	50	85
#30	0,60	258,2	15,0	60	**40,3**	25	60
#50	0,30	249,7	14,5	74	**25,9**	10	30
#100	0,15	140,4	8,1	82	**17,7**	2	10
PASA #100		306,4	17,7				
TOTAL TAMIZADO (g)		**1420,4**					

INVIAS ART 630 / NTC 174.
AGREGADO FINO
GRADACIÓN ÚNICA

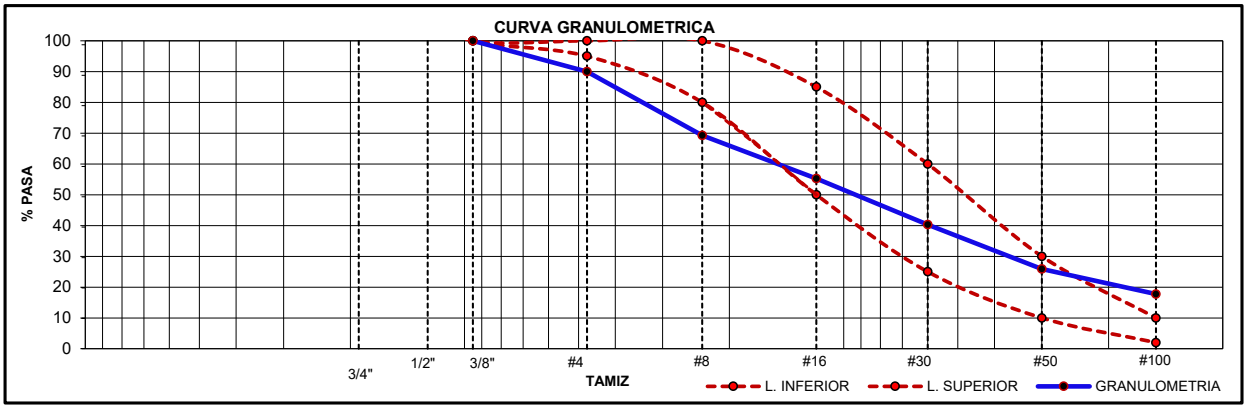

OBSERVACIONES:

- La información registrada en los campos de datos identificadas con (*) fué suministrada por el cliente. El laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.
- Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra tomada y/o entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
- Los resultados descritos en este informe corresponden a ensayos realizados en las instalaciones permanentes de GEOZAM LA BORATORIO INGENIROS CONSULTORES S.A.S. Su reproducción total o parcial está prohibida sin la autorización expresa de la empresa

REVISÓ	APROBÓ
LILIANA ZAMBRANO PAZ ASISTENTE DE LABORATORIO	**ALEXANDRA BARRAGAN P,** DIRECTORA TECNICA Y DE GESTIÓN

	INFORME DE ENSAYO	CÓDIGO:	R-4-220,1
GEOZAM	SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO. INV E 220 - 13	VERSIÓN:	001
		FECHA:	15/01/2025
		PAGINA: 1 DE :1	

*NOMBRE CLIENTE:	COAGREGADOS S.A.S.	INFORME No. :	GZ-105E-024
*OBRA/PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN MUESTRA :	13-sep-2025
*PROCEDENCIA:	EL DANUBIO	FECHA DE ENSAYO:	27-sep-2025
*LOCALIZACIÓN:	MUESTRA TOMADA Y TRANSPORTADA POR EL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN :	29-sep-2025
DIRIGIDO A :	SEÑOR EDWIN MOSQUERA	MUESTRA No. :	105E- 006
DESCRIPCIÓN MUESTRA :	ARENA LIMOSAS CON MODULO DE FINURA DE 3.01, COLOR CAFÉ - ORIGEN NATURAL DE RÍO		

SOLUCIÓN UTILIZADA:	Sulfato de Magnesio

GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LA SOLUCIÓN:	1,30

FRACCIÓN FINA - Análisis Cuantitativo

TAMIZ				Gradación (%)		Masa de las fracciones (g)		% pasa después del ensayo (%Pérdida)	% Pérdida ponderada
PASA		RETIENE		Original	Corregida	Antes del ensayo	Después del ensayo		
Con menos de 10% mayor de 3/8"									
3/8"	9.5 mm	No. 4	4.75mm	10,00	13,48	100,3	98,0	2,3	0,3
No. 4	4.75mm	No.8	2.36mm	20,70	27,90	100,8	99,2	1,6	0,4
No. 8	2.36 mm	No. 16	1.18mm	14,00	18,87	100,9	98,0	2,9	0,5
No. 16	1.18mm	No. 30	600µm	15,00	20,22	100,7	98,3	2,4	0,5
No. 30	600µm	No. 50	300µm	14,50	19,54	100,7	98,8	1,9	0,4
			Total	74,20	100,0	Perdida por Solidez Fracción Fina (%)			2,1

Se considera todo el grupo de tamaños. Si existe menos del %5 de la muestra en una fracción, tiene una perdida igual al promedio de las pérdidas de los tamaños menores y mayores proximos, o si alguno de estos tamaños no existe, se considera la misma pérdida del tamaño mayor o menor más próximo

MATERIAL ENSAYADO	CONCRETO ESTRUCTURAL (SULFATO DE MAGNESIO)
ESPECIFICACIÓN A APLICAR	ART 630 INV - 22
PÉRDIDA EN ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATOS, MÁXIMO (%)	≤ 15 AGREGADO FINO - ≤ 18 AGREGADO GRUESO
CUMPLE (SI/NO)	SI

OBSERVACIONES:

La información registrada en los campos de datos identificadas con (*) fué suministrada por el cliente.
El laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados. Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra tomada y/o entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni parcial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.

REVISÓ	APROBÓ
ALEXANDRA BARRAGAN P.	VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
DIRECTORA TECNICA Y DE GESTIÓN	GERENTE

FIN DEL INFORME

	INFORME DE ENSAYO	CÓDIGO:	R-4-220,1
GEOZAM	SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO. INV E 220 - 13	VERSIÓN:	001
		FECHA:	15/01/2025
		PAGINA: 1 DE :1	

*NOMBRE CLIENTE:	COAGREGADOS S.A.S.	INFORME No. :	GZ-105E-024
*OBRA/PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN MUESTRA :	13-sep-2025
*PROCEDENCIA:	EL DANUBIO	FECHA DE ENSAYO:	27-sep-2025
*LOCALIZACIÓN:	MUESTRA TOMADA Y TRANSPORTADA POR EL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN :	29-sep-2025
DIRIGIDO A :	SEÑOR EDWIN MOSQUERA	MUESTRA No. :	105E- 006
DESCRIPCIÓN MUESTRA :	ARENA LIMOSAS CON MODULO DE FINURA DE 3.01, COLOR CAFÉ - ORIGEN NATURAL DE RÍO		

SOLUCIÓN UTILIZADA:	Sulfato de Magnesio

GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LA SOLUCIÓN:	1,30

FRACCIÓN FINA - Análisis Cuantitativo

TAMIZ				Gradación (%)		Masa de las fracciones (g)		% pasa después del ensayo (%Pérdida)	% Pérdida ponderada
PASA		RETIENE		Original	Corregida	Antes del ensayo	Después del ensayo		
Con menos de 10% mayor de 3/8"									
3/8"	9.5 mm	No. 4	4.75mm	10,00	13,48	100,3	98,0	2,3	0,3
No. 4	4.75mm	No.8	2.36mm	20,70	27,90	100,8	99,2	1,6	0,4
No. 8	2.36 mm	No. 16	1.18mm	14,00	18,87	100,9	98,0	2,9	0,5
No. 16	1.18mm	No. 30	600µm	15,00	20,22	100,7	98,3	2,4	0,5
No. 30	600µm	No. 50	300µm	14,50	19,54	100,7	98,8	1,9	0,4
			Total	74,20	100,0	Perdida por Solidez Fracción Fina (%)			2,1

Se considera todo el grupo de tamaños. Si existe menos del %5 de la muestra en una fracción, tiene una perdida igual al promedio de las pérdidas de los tamaños menores y mayores proximos, o si alguno de estos tamaños no existe, se considera la misma pérdida del tamaño mayor o menor más próximo

MATERIAL ENSAYADO	CONCRETO ESTRUCTURAL (SULFATO DE MAGNESIO)
ESPECIFICACIÓN A APLICAR	ART 630 INV - 22
PÉRDIDA EN ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATOS, MÁXIMO (%)	≤ 15 AGREGADO FINO - ≤ 18 AGREGADO GRUESO
CUMPLE (SI/NO)	SI

OBSERVACIONES:

La información registrada en los campos de datos identificadas con (*) fué suministrada por el cliente.
El laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados. Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra tomada y/o entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni parcial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.

REVISÓ	APROBÓ
ALEXANDRA BARRAGAN P.	VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
DIRECTORA TECNICA Y DE GESTIÓN	GERENTE

FIN DEL INFORME

	INFORME DE ENSAYO	CÓDIGO:	R-4-220,1
GEOZAM	SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCIÓN DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO. INV E 220 - 13	VERSIÓN:	001
		FECHA:	15/01/2025
		PAGINA: 1 DE :1	

*NOMBRE CLIENTE:	COAGREGADOS S.A.S.	INFORME No. :	GZ-105E-023
*OBRA/PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN MUESTRA :	13-sep-2025
*PROCEDENCIA:	EL DANUBIO	FECHA DE ENSAYO:	27-sep-2025
*LOCALIZACIÓN:	MUESTRA TOMADA Y TRANSPORTADA POR EL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN :	29-sep-2025
DIRIGIDO A :	SEÑOR EDWIN MOSQUERA	MUESTRA No. :	105E- 006
DESCRIPCIÓN MUESTRA :	ARENA LIMOSAS CON MODULO DE FINURA DE 3.01, COLOR CAFÉ - ORIGEN NATURAL DE RÍO		

SOLUCIÓN UTILIZADA:	Sulfato de Sodio

GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LA SOLUCIÓN:	1,16

FRACCIÓN FINA - Análisis Cuantitativo

TAMIZ				Gradación (%)		Masa de las fracciones (g)		% pasa después del ensayo (%Pérdida)	% Pérdida ponderada
PASA		RETIENE		Original	Corregida	Antes del ensayo	Después del ensayo		
Con menos de 10% mayor de 3/8"									
3/8"	9.5 mm	No. 4	4.75mm	10,00	13,48	100,4	98,0	2,4	0,3
No. 4	4.75mm	No.8	2.36mm	20,70	27,90	100,1	98,9	1,2	0,3
No. 8	2.36 mm	No. 16	1.18mm	14,00	18,87	100,3	97,8	2,5	0,5
No. 16	1.18mm	No. 30	600µm	15,00	20,22	100,4	99,1	1,3	0,3
No. 30	600µm	No. 50	300µm	14,50	19,54	100,6	99,3	1,3	0,3
			Total	74,20	100,0	Perdida por Solidez Fracción Fina (%)			1,6

Se considera todo el grupo de tamaños. Si existe menos del %5 de la muestra en una fracción, tiene una perdida igual al promedio de las pérdidas de los tamaños menores y mayores proximos, o si alguno de estos tamaños no existe, se considera la misma pérdida del tamaño mayor o menor más próximo

MATERIAL ENSAYADO	CONCRETO ESTRUCTURAL (SULFATO DE SODIO)
ESPECIFICACIÓN A APLICAR	ART 630 INV - 22
PÉRDIDA EN ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATOS, MÁXIMO (%)	≤ 10 AGREGADO FINO - ≤ 12 AGREGADO GRUESO
CUMPLE (SI/NO)	SI

OBSERVACIONES:

La información registrada en los campos de datos identificadas con (*) fué suministrada por el cliente.
El laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados. Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra tomada y/o entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni parcial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.

REVISÓ	APROBÓ
ALEXANDRA BARRAGAN P.	VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
DIRECTORA TECNICA Y DE GESTIÓN	GERENTE

FIN DEL INFORME

	INFORME DE ENSAYO	Código	R-4-211
GEOZAM	DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS INV E -211 -13	Versión	´008
		Fecha	27/09/2022
		Pagina 1 de 1	

NOMBRE CLIENTE:	COAGREGADOS S.A.S.	INFORME No. :	GZ-105E-025
OBRA/PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN MUESTRA :	13/09/2025
PROCEDENCIA:	EL DANUBIO	FECHA DE ENSAYO :	22/09/2025
LOCALIZACIÓN:	MUESTRA TOMADA Y TRANSPORTADA POR EL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN :	25/09/2025
DIRIGIDO A:	SEÑOR EDWIN MOSQUERA	MUESTRA No. :	105E-006
DESCRIPCIÓN MUESTRA :	ARENA LIMOSA DE MODULO DE FINURA DE 3.01, COLOR CAFÉ - ORIGEN NATURAL DE RÍO		

FRACCIÓN GRUESA

Tamaño de las Particulas entre los tamices Tamiz Nº		% Retenido Gradación Original	% Retenido Gradación Corregida	Masa de la Muestra de Ensayo (M), g	Masa de la Muestra de Ensayo (R), g	Terrones de arcilla y de partículas deleznables (P), %	Terrones de arcilla y de partículas deleznables Ponderado, %
Pasa	Retiene						
Mayor de 1 ½" (37,5 mm)							
1 ½" (37,5 mm)	3/4" (19,0 mm)						
3/4" (19,0 mm)	3/8" (9,5 mm)						
3/8" (9,5 mm)	No 4 (4,75 mm)						
TOTAL				TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES, %			

Si el agregado contiene menos del 5% de cualquiera de los tamaños especificados, no se deberá ensayar dicho tamaño sino que, para fines de cálculo del promedio ponderado, se deberá considerar que contiene el mismo porcentaje de terrones de arcilla y de partículas deleznables que el tamaño inmediatamente mayor o menor, cualquiera de ellos que se halle presente

FRACCIÓN FINA

Tamaño de las Particulas entre los tamices Tamiz Nº		% Retenido Gradación Original	% Retenido Gradación Corregida	Masa de la Muestra de Ensayo (M), g	Masa de la Muestra de Ensayo (R), g	Terrones de arcilla y de partículas deleznables (P), %	Terrones de arcilla y de partículas deleznables Ponderado, %
Pasa	Retiene						
No 4 (4,75 mm)	No 16 (1,18 mm)	34,71	100,0	39,4	38,7	1,78	**1,78**
				TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES, %			**1,78**

PARAMETRO DE CUMPLIMIENTO	
MATERIAL ENSAYADO	CONCRETO ESTRUCTURAL: AGREGADO FINO Y GRUESO
ESPECIFICACIÓN A APLICAR	ART 630 INV - 22
TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES, % MAXIMO	AGREGADO FINO ≤ 3%; AGREGADO GRUESO ≤3%
CUMPLE SI/NO	**SI**

OBSERVACIONES:

Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.

REVISÓ	APROBÓ
ALEXANDRA BARRAGAN P. DIRECTORA TECNICA Y DE GESTIÓN	**VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ** GERENTE


FIN DEL INFORME

GEOZAM	**INFORME DE ENSAYO**	**Código**	R-4-212
	PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGÁNICAS EN ARENAS USADAS PARA LA PREPARACIÓN DE MORTEROS O CONCRETOS INV-212:2013	**Versión**	009
		Fecha	14/01/2025
		Página 1 de 1	

*NOMBRE CLIENTE:	COAGREGADOS S.A.S.	INFORME No. :	GZ-105E-026
*OBRA/PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN MUESTRA :	13-sep-2025
*PROCEDENCIA:	EL DANUBIO	FECHA DE ENSAYO :	23-sep-2025
*LOCALIZACIÓN:	MUESTRA TOMADA Y TRANSPORTADA POR EL CLEINTE	FECHA DE EMISIÓN :	25-sep-2025
DIRIGIDO A :	SEÑOR EDWIN MOSQUERA	MUESTRA No. :	105E -006
DESCRIPCIÓN MUESTRA :	ARENA LIMOSAS CON MODULO DE FINURA DE 3.01, COLOR CAFÉ - ORIGEN NATURAL DE RÍO		

MÉTODO UTILIZADO	Método de los vidrios de colores de referencia	
REACTIVO UTILIZADO:	Hidróxido de Sodio	**NaOH al 3%**

RESULTADO DE ENSAYO		
MUESTRA No	**NUMERO DE REFERENCIA ORGÁNICA OBSERVADO**	
	PRUEBA No 1	**PRUEBA No 2**
1	**3**	**3**

ESCALA DE VIDRIOS DE COLORES DE REFERENCIA				
COLOR GARDNER DE REFERENCIA No.				
5	**8**	**11**	**14**	**16**
PLACA ORGÁNICA No.				
				
1	**2**	**3**	**4**	**5**

OBSERVACIONES:

La información registrada en los campos de datos identificadas con (*) fué suministrada por el cliente.
El laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados. Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra tomada y/o entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni parcial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.

REVISÓ	APROBÓ
ALEXANDRA BARRAGAN P.	**VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ**
DIRECTORA TECNICA Y DE GESTIÓN	GERENTE

FIN DEL INFORME


	INFORME DE ENSAYO	Código	R-4-213,6
	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO INV E – 213	Versión	001
		Fecha	27/02/2023
		Página 1 de 1	

*NOMBRE CLIENTE :	COAGREGADOS S.A.S.	INFORME No.:	GZ-105E-028
*OBRA/PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN :	13-sep-2025
*PROCEDENCIA:	PLANTA COAGREGADOS	FECHA DE ENSAYO :	22-sep-2025
*LOCALIZACIÓN:	MUESTRA TOMADA Y TRANSPORTADA POR EL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN :	25-sep-2025
DIRIGIDO A:	SEÑOR EDWIN MOSQUERA	MUESTRA No.:	105E -007
DESCRIPCIÓN MUESTRA :	GRAVAS TRITURADAS DE TMN 1/2" DE COLOR GRIS - ORIGEN NATURAL DE RÍO		

GRANULOMETRIA

Masa Muestra seca (g)	2402,7	Masa lavada y seca retenida en tamiz No. 200 (g)	2141,1

Tamiz		Peso Ret (g)	% Retenido	% Retenido Acumulado	% Pasa	ESPECIFICACIÓN	
U.S Standard	mm					Límite Inferior	Límite superior
3/4"	19,00	0,0	0	0	**100**	100	100
1/2"	12,50	108,3	5	5	**95**	90	100
3/8"	9,50	243,2	10	15	**85**	40	70
#4	4,75	1778,4	74	89	**11**	0	15
#8	2,36	9,2	0,4	89	**11**	0	5
PASA #8		263,6	11				
TOTAL TAMIZADO (g)		**2139,1**					

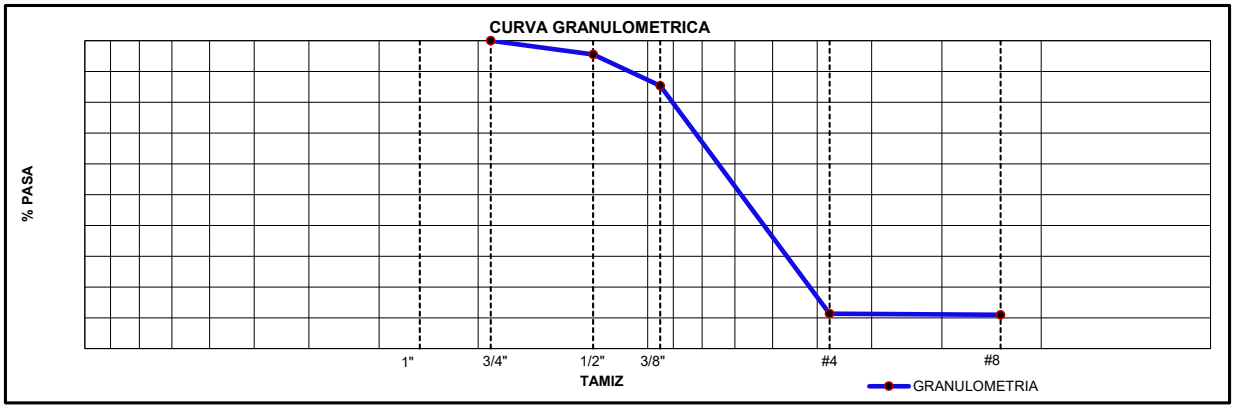

OBSERVACIONES:

- La información registrada en los campos de datos identificadas con (*) fué suministrada por el cliente. El laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.
- Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra tomada y/o entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
- Los resultados descritos en este informe corresponden a ensayos realizados en las instalaciones permanentes de GEOZAM LA BORATORIO INGENIROS CONSULTORES S.A.S. Su reproducción total o parcial está prohibida sin la autorización expresa de la empresa

ELABORÓ	REVISO / AUTORIZÓ
LILIANA ZAMBRANO PAZ ASISTENTE DE LABORATORIO	**ALEXANDRA BARRAGAN P,** DIRECTORA TECNICA Y DE GESTIÓN

	INFORME DE ENSAYO	CÓDIGO:	R-4-218
GEOZAM	RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm (1 1/2") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES INV E-218:2013	VERSIÓN:	010
		FECHA:	14/01/2025
		PAGINA: 1 DE: 1	

*NOMBRE CLIENTE:	COAGREGADOS S.A.S.	INFORME No. :	GZ-105E-028
*OBRA/PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN MUESTRA :	13-sep-2025
*PROCEDENCIA:	PLANTA COAGREGADOS	FECHA DE ENSAYO :	23-sep-2025
*LOCALIZACIÓN:	MUESTRA TOMADA Y TRANSPORTADA POR EL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN :	25-sep-2025
DIRIGIDO A :	SEÑOR EDWIN MOSQUERA	MUESTRA No.:	105E -007
DESCRIPCIÓN MUESTRA :	GRAVAS TRITURADAS DE TMN 1/2" DE COLOR GRIS - ORIGEN NATURAL DE RÍO		

PRUEBA	1	2
Granulometría usada en el Ensayo	**C**	**C**
Tamaño Máximo Nominal (mm)	**12,5**	**12,5**
Estado de la Muestra	**SECA**	**SECA**
No DE REVOLUCIONES	**100**	**500**
PESO MUESTRA SECA ANTES DEL ENSAYO (P_1) g	5003,0	5003,0
PESO MUESTRA SECA DESPUÉS DEL ENSAYO (P_2) g	4812,2	4231,4
PERDIDA (P_1 - P_2) g.	190,8	771,6
% DE DESGASTE (P_1 - P_2)x100 / P_1	**3,8**	**15,4**

GRANULOMETRÍAS DE LA MUESTRA DE ENSAYO, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES

TAMAÑOS DE TAMIZ		MASA DE LAS DIFERENTES FRACCIONES g.			
		GRANULOMETRÍAS			
PASA TAMIZ	RETENIDO EN TAMIZ	A	B	C	D
37.5mm (1 1/2")	25mm (1")				
25mm (1")	19mm (3/4")	1250±25			
19mm (3/4")	12.5mm (1/2")	1250±25			
12.5mm (1/2")	9.5mm (3/8")	1250±10	2500±10		
9.5mm (3/8")	6.3mm (1/4")	1250±10	2500±10	2500±10	
6.3mm (1/4")	4.75mm (# 4)			2500±10	
4.75mm (# 4)	2.36mm (# 8)				5000±10
TOTAL		5000±10	5000±10	5000±10	5000±10
No DE ESFERAS		12	11	8	6
No DE REVOLUCIONES		500	500	500	500

PARAMETRO DE CUMPLIMIENTO	
MATERIAL ENSAYADO	**CONCRETO ESTRUCTURAL**
ESPECIFICACIÓN A APLICAR	ART 630 INV - 2022
DESGASTE EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES ,MÁXIMO (%)	≤ 8 - 100 Rev. ≤ 40 - 500 Rev.
CUMPLE (SI/NO)	**SI**

OBSERVACIONES:

La información registrada en los campos de datos identificadas con (*) fué suministrada por el cliente.
El laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados. Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra tomada y/o entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni parcial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.

REVISÓ	APROBÓ
ALEXANDRA BARRAGAN P. DIRECTORA TECNICA Y DE GESTIÓN	**VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ** GERENTE

FIN DEL INFORME

	INFORME DE ENSAYO	Código	R-4-211
GEOZAM	DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS INV E -211 -13	Versión	´008
		Fecha	27/09/2022
		Pagìna 1 de 1	

NOMBRE CLIENTE:	COAGREGADOS S.A.S.	INFORME No. :	GZ-105E-030
OBRA/PROYECTO:	CONTROL DE CALIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN MUESTRA :	13/09/2025
PROCEDENCIA:	PLANTAS COAGREGADOS	FECHA DE ENSAYO :	22/09/2025
LOCALIZACIÓN:	MUESTRA TOMADA Y TRANSPORTADA POR EL CLIENTE	FECHA DE EMISIÓN :	25/09/2025
DIRIGIDO A:	SEÑOR EDWIN MOSQUERA	MUESTRA No. :	105E-007
DESCRIPCIÓN MUESTRA :	GRAVAS TRITURADAS DE TMN 1/2" DE COLOR GRIS - ORIGEN NATURAL DE RÍO		

FRACCIÓN GRUESA

Tamaño de las Particulas entre los tamices Tamiz Nº		% Retenido Gradación Original	% Retenido Gradación Corregida	Masa de la Muestra de Ensayo (M), g	Masa de la Muestra de Ensayo (R), g	Terrones de arcilla y de partículas deleznables (P), %	Terrones de arcilla y de partículas deleznables Ponderado, %
Pasa	Retiene						
Mayor de 1 ½" (37,5 mm)							
1 ½" (37,5 mm)	3/4" (19,0 mm)						
3/4" (19,0 mm)	3/8" (9,5 mm)	14,63	16,50	2000,8	2000,1	0,03	0,01
3/8" (9,5 mm)	No 4 (4,75 mm)	74,02	83,50	1000,7	1000	0,07	0,06
TOTAL		88,65	100,00	TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES, %			0,06

Si el agregado contiene menos del 5% de cualquiera de los tamaños especificados, no se deberá ensayar dicho tamaño sino que, para fines de cálculo del promedio ponderado, se deberá considerar que contiene el mismo porcentaje de terrones de arcilla y de partículas deleznables que el tamaño inmediatamente mayor o menor, cualquiera de ellos que se halle presente

FRACCIÓN FINA

Tamaño de las Particulas entre los tamices Tamiz Nº		% Retenido Gradación Original	% Retenido Gradación Corregida	Masa de la Muestra de Ensayo (M), g	Masa de la Muestra de Ensayo (R), g	Terrones de arcilla y de partículas deleznables (P), %	Terrones de arcilla y de partículas deleznables Ponderado, %
Pasa	Retiene						
No 4 (4,75 mm)	No 16 (1,18 mm)						
				TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES, %			

PARAMETRO DE CUMPLIMIENTO	
MATERIAL ENSAYADO	CONCRETO ESTRUCTURAL: AGREGADO FINO Y GRUESO
ESPECIFICACIÓN A APLICAR	ART 630 INV - 22
TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES, % MAXIMO	AGREGADO FINO ≤ 3%; AGREGADO GRUESO ≤3%
CUMPLE SI/NO	**SI**

OBSERVACIONES:

Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra entregada al laboratorio y sometida a ensayo.
Esta muestra no es reproducible ni total ni pacial sin la autorizacion de Geozam S.A.S.

REVISÓ	APROBÓ
ALEXANDRA BARRAGAN P. DIRECTORA TECNICA Y DE GESTIÓN	**VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ** GERENTE

FIN DEL INFORME

REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Sidoc

Cliente:	G Y J FERRETERIAS SA	CDP#:	230912
Sucursal:		Placa:	ESZ771
Ciudad:	Yumbo	Tiquete:	174.831
Dirección:		Despacho:	155.334
Remisiones:	466310,	Tren:	POMINI

Fecha Impresión: viernes, 14 de noviembre de 2025

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Resolución 2003: 2022 Barras corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto..que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

icontec ISO 9001 — Certificado No. SC-446-1

Chipa 1/2"

Producto: Rollo Corrugado de [1/2] 12.7 mm — **Area Nom. (mm2)** 129,00 — **Marcado:** COL SO 4 W 60 — **Designación:** 4 — **Grado:** 60 (420) — **Norma** NTC-2289

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS											
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
30/08/2025	134862	46550	431	623	1,45	17,00	Sin grieta	0,951	0,70	8,30	59	3,13	319.940	0,274	1,050	0,010	0,027	0,150	0,002	0,190	0,060	0,090	0,011	0,036	0,462
30/08/2025	134864	46558	444	618	1,39	17,50	Sin grieta	0,951	0,72	8,30	59	3,18	319.973	0,282	1,040	0,009	0,031	0,170	0,002	0,150	0,070	0,120	0,011	0,035	0,471
Especificaciones del Producto	Mínimos	420	550	1,25	14	Sin grieta	0,934	0,51		45			-	-	-	-	-								
	Maximos	540				Con grieta			8,90	70	4,90		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500								0,550
	Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK								OK

Observaciones:
Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos" NTC-2 "Ensayo de tracción" NTC-1"Métodos ensayo doblado", NTC 5192 "Métodos análisis químico", NTC -2289 - NTC-161"Requisitos dimensionales, peso". El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentra en la MAT-030 "Plan de inspección y ensayo".
SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 2003 de 2022 "barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes". Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico y químico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con autorización previa por parte de la jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S

FIN DEL REPORTE

NEIR ARLEX MOSQUERA
Analísta Físico:

Henry Bonilla
HENRY BONILLA LOPEZ
Analísta Químico:

Ing. EFREN RABON
Jefe Técnico Control Calidad
Aprobado Por:

Cra 37 N° 12 A - 63 Urb. Acopi Yumbo - Valle - www.sidocsa.com

REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: G Y J FERRETERIAS SA
Sucursal:
Ciudad: Yumbo
Dirección:
Remisiones: 467568,467569,

CDP#: 241520
Placa: GVS663
Tiquete: 175.376
Despacho: 155.799
Tren: POMINI

Fecha Impresión: lunes, 24 de noviembre de 2025

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Resolución 2003: 2022 Barras corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto..que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

icontec ISO 9001 — Certificado No. SC-446-1

1 x 14

Producto: Redondo Corrugado de [1] 25.4 mm

Area Nom. (mm2) 510,00 — Designación: 8 — Norma NTC-2289
Marcado: COL SO 8 W 60 — Grado: 60 (420)

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS										
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
20/11/2025	138098	47678	453	647	1,43	16,00	Sin grieta	3,917	1,58	14,80	60	6,09	324.933	0,270	1,260	0,016	0,034	0,190	0,003	0,180	0,070	0,160	0,011	0,023	0,501
Especificaciones del Producto		Minimos	420	550	1,25	12	Sin grieta	3,735	1,27		45			-	-	-	-	-							
		Maximos	540				Con grieta			17,80	70	9,70		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
		Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Producto: Redondo Corrugado de [5/8] 15.87 mm

Area Nom. (mm2) 199,00 — Designación: 5 — Norma NTC-2289
Marcado: COL SO 5 W 60 — Grado: 60 (420)

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS										
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
15/11/2025	137925	47641	464	631	1,36	17,00	Sin grieta	1,503	1,12	10,50	58	3,17	324.775	0,295	1,230	0,013	0,027	0,230	0,001	0,170	0,060	0,110	0,022	0,024	0,515
15/11/2025	137927	47642	441	600	1,36	18,00	Sin grieta	1,497	1,05	10,50	58	3,12	324.779	0,286	1,240	0,013	0,029	0,220	0,001	0,170	0,080	0,130	0,031	0,024	0,511
Especificaciones del Producto		Minimos	420	550	1,25	14	Sin grieta	1,459	0,71		45			-	-	-	-	-							
		Maximos	540				Con grieta			11,10	70	6,10		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
		Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Observaciones:
Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos" NTC-2 "Ensayo de tracción" NTC-1"Métodos ensayo doblado", NTC 5192 "Métodos análisis químico", NTC -2289 - NTC-161"Requisitos dimensionales, peso". El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentra en la MAT-030 "Plan de inspección y ensayo".
SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 2003 de 2022 "barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes". Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico y químico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con autorización previa por parte de la jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S

FIN DEL REPORTE

JASON EDUARDO GONZALEZ
Analista Físico:

JUAN DIEGO SANCLEMENTE
Analista Químico:

Ing. EFREN RABON
Jefe Técnico Control Calidad
Aprobado Por:

Cra 37 N° 12 A - 63 Urb. Acopi Yumbo - Valle - www.sidocsa.com

REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: G Y J FERRETERIAS SA
Sucursal:
Ciudad: Yumbo
Dirección:
Remisiones: 469581,

CDP#: 254149
Placa: GVU153
Tiquete: 176.118
Despacho: 156.414
Tren: POMINI

Fecha Impresión: jueves, 04 de diciembre de 2025

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Resolución 2003: 2022 Barras corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto..que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

icontec ISO 9001 — Certificado No. SC-446-1

1 X 14

Producto: Redondo Corrugado de [1] 25.4 mm

Area Nom. (mm2) 510,00 — Marcado: COL SO 8 W 60 — Designación: 8 — Grado: 60 (420) — Norma NTC-2289

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS											
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
19/11/2025	138090	47679	452	645	1,43	14,00	Sin grieta	3,885	1,61	14,80	60	5,96	324.942	0,276	1,240	0,015	0,035	0,190	0,002	0,180	0,070	0,160	0,011	0,024	0,504
Especificaciones del Producto	Minimos	420	550	1,25	12	Sin grieta	3,735	1,27		45			-	-	-	-	-								
	Maximos	540				Con grieta			17,80	70	9,70		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500								0,550
	Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK								OK

Producto: Redondo Corrugado de [5/8] 15.87 mm

5/8 X 14

Area Nom. (mm2) 199,00 — Marcado: COL SO 5 W 60 — Designación: 5 — Grado: 60 (420) — Norma NTC-2289

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS											
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
4/12/2025	138717	47938	453	634	1,40	16,00	Sin grieta	1,493	1,22	10,50	58	3,33	326.036	0,274	1,240	0,013	0,030	0,150	0,003	0,190	0,070	0,120	0,013	0,024	0,498
Especificaciones del Producto	Minimos	420	550	1,25	14	Sin grieta	1,459	0,71		45			-	-	-	-	-								
	Maximos	540				Con grieta			11,10	70	6,10		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500								0,550
	Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK								OK

Producto: Redondo Corrugado de [7/8] 22.2 mm

7/8 X 12

Area Nom. (mm2) 387,00 — Marcado: COL SO 7 W 60 — Designación: 7 — Grado: 60 (420) — Norma NTC-2289

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS											
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
20/11/2025	138145	47694	462	652	1,41	16,00	Sin grieta	2,957	1,43	13,30	58	5,06	324.999	0,271	1,240	0,016	0,030	0,200	0,002	0,180	0,070	0,110	0,011	0,024	0,494
Especificaciones del Producto	Minimos	420	550	1,25	12	Sin grieta	2,860	1,12		45			-	-	-	-	-								
	Maximos	540				Con grieta			15,50	70	8,50		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500								0,550
	Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK								OK

Cra 37 N° 12 A - 63 Urb. Acopi Yumbo - Valle - www.sidocsa.com

REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: G Y J FERRETERIAS SA
Sucursal:
Ciudad: Yumbo
Dirección:
Remisiones: 468446,

CDP#: 247317
Placa: LFL345
Tiquete: 175.673
Despacho: 156.083
Tren: POMINI

Fecha Impresión: jueves, 27 de noviembre de 2025

3/4 x 12
3/4 x 14

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Resolución 2003: 2022 Barras corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto..que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

icontec ISO 9001 — Certificado No. SC-446-1

Producto: Redondo Corrugado de [3/4] 19.1 mm

Area Nom. (mm2) 284,00 | Marcado: COL SO 6 W 60 | Designación: 6 | Grado: 60 (420) | Norma NTC-2289

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS											
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
26/11/2025	138401	47788	441	622	1,41	19,00	Sin grieta	2,162	1,36	12,30	57	4,69	325.402	0,268	1,250	0,014	0,031	0,190	0,002	0,180	0,070	0,120	0,012	0,023	0,494
26/11/2025	138406	47790	458	648	1,42	17,00	Sin grieta	2,138	1,27	12,30	57	4,72	325.409	0,281	1,270	0,015	0,033	0,240	0,002	0,220	0,100	0,140	0,011	0,023	0,515
26/11/2025	138397	47795	444	627	1,41	17,50	Sin grieta	2,145	1,31	12,30	57	4,71	325.428	0,277	1,250	0,015	0,036	0,230	0,002	0,210	0,090	0,110	0,012	0,024	0,503
26/11/2025	138394	47798	453	639	1,41	16,50	Sin grieta	2,138	1,32	12,30	57	4,65	325.440	0,285	1,260	0,014	0,031	0,210	0,002	0,180	0,080	0,110	0,011	0,023	0,512
Especificaciones del Producto	Minimos		420	550	1,25	14	Sin grieta	2,101	0,97		45			-	-	-	-	-							
	Maximos		540				Con grieta			13,30	70	7,30		-	-	-	-	-							0,550
	Validaciones		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		NO	NO	NO	NO	NO							OK

Observaciones:
Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos" NTC-2 "Ensayo de tracción" NTC-1"Métodos ensayo doblado", NTC 5192 "Métodos análisis químico", NTC -2289 - NTC-161"Requisitos dimensionales, peso". El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentra en la MAT-030 "Plan de inspección y ensayo". SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 2003 de 2022 "barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes". Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico y químico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con autorización previa por parte de la jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S

FIN DEL REPORTE

NEIR ARLEX MOSQUERA
Analísta Físico:

Henry Bonilla
HENRY BONILLA LOPEZ
Analísta Químico:

Ing. EFREN RABON
Jefe Técnico Control Calidad
Aprobado Por:

Cra 37 N° 12 A - 63 Urb. Acopi Yumbo - Valle - www.sidocsa.com

REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: G Y J FERRETERIAS SA
Sucursal:
Ciudad: Yumbo
Dirección:
Remisiones: 466287,

CDP#: 230850
Placa: ESZ770
Tiquete: 174.824
Despacho: 155.329
Tren: POMINI

Fecha Impresión: viernes, 14 de noviembre de 2025

Chipa 3/8 11

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Resolución 2003: 2022 Barras corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto..que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

icontec ISO 9001 — Certificado No. SC-446-1

Producto: Rollo Corrugado de [3/8] 9.52 mm

Area Nom. (mm2) 71,00 **Designación:** 3 **Norma** NTC-2289
Marcado: COL SO 3 W 60 **Grado:** 60 (420)

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS										
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
10/11/2025	137734	47459	441	606	1,37	17,00	Sin grieta	0,546	0,71	6,30	55	1,32	324.010	0,274	0,880	0,012	0,028	0,180	0,002	0,160	0,070	0,140	0,013	0,025	0,439
11/11/2025	137738	47561	439	603	1,37	19,60	Sin grieta	0,548	0,69	6,30	55	1,52	324.438	0,261	0,910	0,014	0,037	0,180	0,002	0,230	0,080	0,150	0,015	0,026	0,435
Especificaciones del Producto	Minimos	420	550	1,25	14	Sin grieta	0,526	0,38		45			-	-	-	-	-								
	Maximos	540				Con grieta			6,70	70	3,60		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500								0,550
	Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK								OK

Observaciones:
Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos" NTC-2 "Ensayo de tracción" NTC-1"Métodos ensayo doblado", NTC 5192 "Métodos análisis químico", NTC -2289 - NTC-161"Requisitos dimensionales, peso". El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentra en la MAT-030 "Plan de inspección y ensayo".
SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 2003 de 2022 "barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes". Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico y químico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con autorización previa por parte de la jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S

FIN DEL REPORTE

Giovanny Arias
GIOVANNY ANDRES ARIAS
Analísta Físico:

MARCELO DUARTE AZCARATE
Analísta Químico:

Ing. EFREN RABON
Jefe Técnico Control Calidad
Aprobado Por:

Cra 37 N° 12 A - 63 Urb. Acopi Yumbo - Valle - www.sidocsa.com

Analquímicos
Laboratorio Químico Analítico
50 AÑOS
NIT: 890.920.400-1

Resultado de Análisis

Informe No: *52.220-2* ***FRE 03***

Muestra de: Agregados

Interesado: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Direccion: CL. 35 AN No. 3N-131

Teléfono: 661 6621

Procedencia COAGREGADOS S.A.S

Contacto que Envia:

Fecha de Recibo: 26/01/2024

Identificacion: Grava Triturada de rio 3/4

Registro Laboratorio: 23647

Análisis y Expresiones		Resultado	Unidad	Método
Partículas Livianas		0,024	%	INV-E-221
Sulfatos	SO_4	0,250	%	INV-E 233

NOTA: Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

Aprobada por: Carolina Restrepo
02/02/2024

Calle 49 B No. 68-64 Barrio Suramericana Tel: 444 85 17 Cel: 301 317 17 34
E-mail: analquimicos@hotmail.com Medellín-Colombia

Analquímicos
Laboratorio Químico Analítico

NIT: 890.920.400-1

Resultado de Análisis

Informe No: *52.220-1* ***FRE 03***

Muestra de: Aguas

Interesado: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Direccion: CL. 35 AN No. 3N-131

Teléfono: 661 6621

Procedencia COAGREGADOS S.A.S

Contacto que Envia:

Fecha de Recibo: 26/01/2024

Identificacion:

Registro Laboratorio: 23646

Análisis y Expresiones	Resultado	Unidad	Método
pH	7,28		STANDARD METHODS ED 23

NOTA: Los resultados corresponden a la muestra enviada por el interesado

Aprobada por: Carolina Restrepo
30/01/2024

Calle 49 B No. 68-64 Barrio Suramericana Tel: 444 85 17 Cel: 301 317 17 34
E-mail: analquimicos@hotmail.com Medellín-Colombia

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Bogotá D.C., 02 de julio de 2023

Señor(a):

Edwin Mosquera
COMPAÑIA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS SAS
OBRA: PLANTA DE CONCRETO
Ciudad, Buenaventura

Asunto: Entrega de informes de ensayos de laboratorio.

Apreciado Señor(a):


Atentamente nos permitimos entregar el informe **DEQ 296-22-1**, en el cual se presentan los resultados del ensayo de ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETO para la muestra enviada a nuestro laboratorio.

Concrelab

Los ensayos se realizaron conforme a los procedimientos establecidos en la norma: NTC 3459:2001.

Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las características de la muestra ensayada.

Atentamente,



DIANA PAOLA REYES MURCIA
2023.07.02 13:20:10 -05'00'

Geól. Diana P. Reyes M.
investigacionydesarrollo@concrelab.com
O.V. 73077 – OT. 55479
Cód. Obra: 20395
Ref. Muestra: M1 AGUA PARA CONCRETO – PLANTA DE CONCRETO ACUEDUCTO.
D. REYES

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

INFORME DE ENSAYO

ANÁLISIS QUÍMICOS DEL AGUA PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETO
NTC 3459:2001 - INV E 417-13


NÚMERO DE INFORME: **DEQ-296-22-1**
PÁGINAS: **1 DE 2**

CLIENTE:	COMPAÑIA PRODUCTORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS SAS
CÓDIGO DE OBRA:	20395
OBRA:	PLANTA DE CONCRETO
DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:	CL. 3 # 1A 57 HOTEL COSMOS PACÍFICO, BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:	AGUA PARA CONCRETO
NÚMERO DE LA MUESTRA:	M1
PROCEDENCIA:	ACUEDUCTO
LOCALIZACIÓN TOMA DE MUESTRA:	PLANTA DE CONCRETO
SITIO DE ENSAYO:	LABORATORIO DE ENSAYOS QUÍMICOS
FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	2023-06-25
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	26-06-2023 HASTA 01-07- 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:	2023-07-02
ENSAYO EJECUTADO POR:	I.Q. L. HUMANEZ
ORDEN DE TRABAJO N°:	55479 - O.V. 73077
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (2)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.

Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita por parte de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo no se saquen de contexto.

AUTORIZADO POR:



GEOL. DIANA REYES
Jefe de Investigación y desarrollo
investigacionydesarrollo@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

INFORME DE ENSAYO

ANÁLISIS QUÍMICOS DEL AGUA PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETO
NTC 3459:2001 - INV E 417-13

NÚMERO DE INFORME: DEQ-296-22-1
PÁGINAS: 2 DE 2

HOLCIM COLOMBIA S

INFORMACIÓN GENERAL

Análisis de requisitos químicos según normas Standard Methods **referenciadas en:**
-NTC 3459:2001
-INVIAS E 417-13
-AASHTO T 26
-ASTM D 512 y ASTM D 516

PARÁMETRO DETERMINADO

COLOR APARENTE	**12**	**PCU**
COLOR REAL	**12,00**	**PCU**
SÓLIDOS TOTALES	**0,04**	**mg/L**
CALCIO	**85**	**mg/L** Ca^{22+}
MAGNESIO	**6**	**mg/L** Mg^{22+}
POTASIO	**<0,1**	**mg/L** Mg^{22+}
SULFATO	**<1**	**mg/L** SO_4
CLORURO	**1,1**	**mg/L** Cl^-
ALCALINIDAD	**9**	**mg/L** $CaCO_{33}$
pH	**7,14**	**pH**
NITRATOS	**<0,1**	**mg/L** $N - NO_{33}$

OBSERVACIONES:

Materia orgánica en grandes cantidades puede impedir la precipitación del sulfato de Bario, infertiriendo con la determinación del contenido de sulfatos.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

VECINAL DE TODA EXTENSION DEL TERRENO, SE TOMA MUESTRA DE CONCRETO Y SE REALIZA CHARLA CONSTRUCTO SOCIAL A LOS TRABAJADORES SOBRE LA 1 PTA.

Residente de obra CFP — Los Interventores

28/02/2026

CLIMA = NUBLADO

PERSONAL DE OBRA: MANO DE OBRA, CONTRATISTA E INTERVENTORIA

- LOS SST HACEN VERIFICACION DE PASO A PASO DE ACTIVIDADES DE CAISSON.
- SE DEFINE PUNTOS DE RECORRIDOS DE RED DE PVCP. ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y PERSONAL QUE EJECUTARA ACTIVIDAD EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO.
- SE CONTINUA EXCAVACION DE CAISSON 1, 4(A), 6(A) y 11 Y SU RESPECTIVO FUNDICION DE ANILLO.

Descarga acero para el cuerpo de los caisson (Espirales y bastones) — Residente de obra CFP

Interventoria.

03/03/2026. Dia lluvioso.

- Se Comienza vaciando el Caisson eje NM-N1 sin problemas, llegando al nivel de dado.
- Se Comienza vaciando el Caisson eje NK-N1, despues de vaciar una mixer nos llega la información del cierre vial en el sector conocido como gallinero, razón por la cual no fue posible terminar de vaciar el concreto, todo esto se dió alrededor de las 10:00 Am. En vista de la situación, la interventoria solicito la limpieza de la superficie y la aplicación de producto epoxico de Adherencia recomendando Sikadur32 ya que, despues de 2 a 4 horas de vaciado un concreto no tendra adherencia de forma natural con otro concreto nuevo. Se dió la explicación técnica al residente de Obra del contratista y se elevó la solicitud antes mencionada.

Interventoria.

Se continua con la limpieza de la estructura metalica en el edficio biblioteca, se esta colocando la estructura para el cielo raso en el edficio administrativo.

El cierre en la via no permite la circulacion de

los vehículos y por ende el concreto programado no llego a la obra esto ocasiona retrasos en la ejecución de las actividades y genera mayores costos debido a que hay que utilizar productos químicos y/o aditivos para unir concreto viejo con concreto nuevo lo cual no se tenia previsto.

Residente de obra CFP
Cristian Mayen Cen

02-03/2026
Clima lluvias desde las 10:00 AM a 1:30 PM.
Se continua con la excavación del caisson eje N1-N5 se excava un metro; se excava la pate de elefante del caisson N4-NH al igual que la del eje N1-N1 (A y B), se continua con la excavación del caisson EJE N1-N6 (B) y el caisson EJE N6-N0. Se escava y Funde un metro lineal. Se inicia con la demolición de piso y zapata del apoyo eje N1-NB.
Se continua con el cargue y transporte del material proveniente de la excavación de los caisson y de las demoliciones ejecutadas, Se hace descarga de acero para las zapatas (Dados) y los caisson (Cuerpo)

Ing. Cristian Mayen Cen Residente de obra CFP

04/03/2026
→ Clima soleado.
→ Se desarrolla Comité técnico donde se demuestran todos los avances de obra y se firman las Consideraciones que quedaran consignadas en el acta.
→ Siendo las 11:40 am llega mixer para fundición de Caisson, interventoria solicita aplicación de epoxico y limpieza de acero de refuerzo para Campeon adherencia, el ingeniero residente de Obra se niega a realizar limpieza de acero saltando hasta la recomendación técnica de la interventoria, Posteriormente decide acatar la recomendación y hacer la limpieza del acero a través de golpes con martillo, Cumpliendose

la recomendación dada por la Interventoria. Interventoria.
Se acatan las recomendaciones de la interventoria, el horario de llegada del concreto obedece a que la via en horas de la mañana se encontraba cerrada por protestas de la comunidad, en el sector conocido como Gallinero y a la entrada hacia agua dolce. Se termina de fundir el caisson del apoyo EJE N1-N1, se le aplica Sika Dur 32 al concreto fundido el dia de ayer 03/03/2026. Se funden los Caisson del apoyo EJE N1-N1 (A y B). Se Continua con la excavacion del Caisson Apoyo EJE N1-NB, Apoyo EJE N7-N6 (A), Se inicia con la EXCAVACION del caisson (B) EJE N7-NE, Se desmonta un tramo de cerramiento para la ejecucion de este (apoyo) caisson Se excavan los pistas de defuste de los caisson eje N1-N6 (B), N1-NE (A y B).
Inc. Edelmo Mayen Cova Residente obra C.F.P.
05-03/2026
Clima Soleado.
Se funden los caisos de los apoyos EJE N1-N6 (B) y N1-NE (A), Se continua con la excavacion de los caisson Apoyos EJE N1-NB ; N7-NE (B) y N7-N6 (A) y se funden anillos. Se inicia con demolicion de columnas y viga en el apoyo Caisson eje N4-N3, Se Continua con el cargue y transporte de material proveniente de la excavacion a sitios autorizado; Se Coloca acero en los caisson N1-NE (B) y N2-NA. Se realiza replanteo en el terreno para plasmar lo propuesto en la ejecucion de los taludes y la excavacion que se realizara en la parte posterior del edificio Casa de la Cultura.
Inc Edelmo Mayen Cova Residente obra C.F.P.
Se continua con los regatas para la instalacion de la tubera de agua potable en los edificios Administrativo y Biblioteca.

06/03/2026
Clima Soleado.
Profesionales Sociales realizan presencia en el espacio con la finalidad de brindar atención al público, pero no se presentaron Solicitudes por parte de la ciudadanía. Razón por la cual se aprovecha el espacio para trabajar en cronogramas, planes de trabajo y en la realización y actualización de informes técnicos. Profesional Social Interventoría.
-SE EVIDENCIA LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN PROGRAMANDO EN LAS EDIFICACIONES LAS CUALES DEBEN LLEVAR UN CONTROL POR PARTE DEL SISO O PROFESIONAL SST. CORRESPONDIENTE A ESTE FRENTE DE TRABAJO COMO LO ES SEÑALIZACION EN PUNTOS CRITICOS Y OTROS NECESARIOS, TRABAJO Y COORDINACION EN ALTURA PARA LA BIBLIOTECA.
-SE INICIA MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA TALUD POSTERIOR Y NIVEL NECESARIOS PARA CASSON 16, 17, 18. CONTRATISTA ESTA ACTIVIDAD DE DEBE O LA DEBE LLEVAR A CABO BUSCANDO OPTIMIZACION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS.
-SE UBICA EL AREA QUE ESTA GENERANDO FILTRACION AL INTERIOR DE EDIFICIO BIBLIOTECA CORRESPONDE A UNA ALBERCA FRACTURADA LA CUAL RECOGE EL AGUA POR SATURACION Y UNA MALLA EN CUAL ESTA DETENIDA. SE NOTIFICA Y SE ENVIA PARA SOLUCIONAR SOLICITAR LUEGO HP.
-FUNDICION DE CASSON ESE LOA-02.
Residente de obra.
RESI. INTERVENTORIA

12-03/2026.
→ Una vez mas se le hace el llamado al contratista de llevar la Bitácora al día
→ La Interventoria en repetidas ocasiones ha solicitado al residente de ~~obra~~ Contratista no disponer de ningún

recurso de la obra sin hacer la previa consulta con la interventoria para realizar el tratamiento correcto, al decir recursos nos referimos a lamparas, postes, equipos, herramientas, elemento estructurales, artefactos, aparatos sanitarios o cualquier elemento que represente un valor. interventoria. Recorrido de obra electrico por especialistas los acuerdos se registran en acta suscritas por las partes.

Min Cultura. Contratista Interventoria

Se le recuerda a la interventoria que la bitacora es para la escritura de el contratista y de la interventoria, el compromiso o la obligacion es de los dos y no de un solo ente, por lo tanto lo solicitado aplica para los dos. Ing. Residente de obra Baldino Najera Cera. CFP

Clima Lluvias desde las 6:00 AM Hasta las 3:00PM. Se fundieron en concreto Tremix de 4:000 PSi los caisos de los Apoyos # 11, 12, y 13. en total fueron 5 caisson Se continua con la pintura de la estructura metalica en la edificacion biblioteca, Se continua con la instalacion de la tuberia de agua potable. en el edificio administrativo. Ing. Residente de obra C.F.P.

13-03/2026

Clima Soleado. Se continua con la excavacion del apoyo # 19 (Caisson), # 18, # 17. y se inicia la excavacion del caisson B del apoyo # 16. Se continua con la excavacion detras del edificio casa de la cultura y se perfila el talud. Se retira material de excavacion, se funde el caisson del apoyo # 8. Se realiza prueba de presion en el tramo de tuberia correspondiente al edificio casa de la cultura. En inspeccion ocular en la placa parte superior del cuarto de maquinas se evidencio el vandalismo causado a

los condensadores de los Aires correspondientes al edificio Biblioteca (Fueron hurtados) al igual que el cableado de estos. Esto ocurrió antes de nuestro reinicio de obra.

S-C Residente de obra CFP.

- SE REALIZA PRUEBA DE PRESION A LA RED TUBERIAS PVCPRESION, LA CUAL SU PRIMER PRUEBA PRESENTA UNA FUGA EN UNA ROSCA LA CUAL SE SUBSANA, SE INICIA NUEVAMENTE PRUEBA A LAS 4:00 PM Y SE DEJA HASTA EL DIA DE MAÑANA.
- SE REALIZA COMITE DE OBRA ELECTRICO EL CUAL SE LEVANTA ACTA Y SE TOCAN LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES A CADA DISCIPLINA.

RES INTERVENTORIA

14032026

- CLIMA NUBLADO
- SE INICIA CON CHARLA SST ENTRE INTERVENTORIA CONTRATISTA Y TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.
- SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS HASTA EL PUNTO DE GENERAR INUNDACIONES DENTRO DE LAS EDIFICACIONES ENTRE LAS 8:30 AM HASTA LAS 10:30 AM., CAISSON 18, 17, 16 REGISTRAN EXCAVACION DE AGUA HASTA LAS 11:00 AM.
- SE CONTINUA CON EXCAVACION DE CAISSON.
- ENTRE 8:00 AM A 9:00 AM REALIZARON VACIADO DE CAISSON 8.
- SE INICIA PRUEBA DE PRESION DE AGUA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO.
- SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA REALIZAR RETIRO DE VEGETACION Y MATERIAL PARTICULADO EN PARTE POSTERIOR EDIFICIO CULTURAL PARA EVITAR UN FUTURO ACCESO DE AGUA POR ESTA SECCION AL EDIFICIO

S-C Residente Obra CFP

RES INTERVENTORIA

16 Marzo 2026.
Dia Soleado.
→ Se continua actividad de excavaciones de Caisson. Sin mayor novedad, Armado de Acero para fundicion de Caisson.
→ Se Comienza demolición muro de contención parte posterior Casa de la Cultura, la Interventoria solicita que dicha demolición sea puntual para el Caisson y la zapata
→ Se reporta personal de Obra Administrativo y operativo, personal operativo en Caisson y Edificio de Biblioteca.
→ Se realiza prueba de presión para Bajos de primer piso en Biblioteca.
→ Se Solicita Verificacion de limpieza en cielo falso, de doble altura (Parte inferior de láminas de Cubierta) ya que a Criterio de Interventoria parece sucio y solo se ven limpios 4 modulos.
→ Interventoria Solicita Verificar pintura de elementos metálicos ya que se notan aún los desperfectos en pintura
17 Marzo /2026.
Dia Soleado.
→ Se adelanta actividad de excavación Caisson.
→ Continua mantenimiento. edificio Biblioteca, Componentes metálicos
→ Avanzan pruebas de presión hasta antes de los aparatos Sanitarios
→ Las actividades en obra Continuan
18 Marzo /2026.
Dia Soleado.
→ Siendo las 10:00 Am se adelanta reunion interinstitucional y todos los actores vinculados ala Obra para Solicitar presencia permanente de Policia o fuerza Publica en Sitio, las instituciones de fuerza Publica se Comprometen a duplicar refuerzos y hacer presencia en sitio con mas frecuencia, Alcaldia Solicita no hacer Suspension de Contrato y la Interventoria en Cabeza del director Concluye que no es necesario Suspender Contrato.
→ Actividades hidraulicas Continuan, la Interventoria Solicita realizar pruebas de Presion con los aparatos instalados

(fluxometros) Para garantizar que toda la red funciona de forma normal. (se debe hacer antes de dejar registros)
→ Actividad Cuasi Continua. Ing. Residente de obra CEP
16/03/2026
Siendo las 4:00PM incursionaron dos individuos al parecer pertenecientes a grupos al margen de la ley, los cuales coaccionaron al guarda de vigilancia, posteriormente intimidaron a los operadores de las maquinas quitandoles las llaves de estas. Se solicito apoyo del Gaula y la policia, llegando minutos mas tarde pero los individuos se habian marchado. Esto ocasiono la parolisis de las obras correspondientes a las excavaciones y cargue y retiro del material excavado. En lo referente a la nota de verificacion de limpieza del cielo raso en el edificio Biblioteca Saber Ludoteca y Artes plasticas, se le informa que se realizo la verificacion y el cielo raso esta limpio. Se evidencia que esta parte no tiene Tejas las que tiene es Superboard cubierta con manto asfaltico y al parecer hay filtraciones lo que ocasiona que el lado del cielo raso que da hacia la lamina Superboard se manche y presente ese color que tiene a hora. Se han realizado las verificaciones de la pintura a la estructura metalica y se les esta colocando la tercera mano de pintura y corregir los desperfectos. Ing. Residente de obra CEP
17/03/2026
Referente a las pruebas Solicitadas en lo referente a la parte hidraulica. Se le informa a la interventoria que las pruebas se realizaron a la tuberia instalada, a los fulsometros no se les ha realizado la prueba debido a que no Son Suministrado por nosotros y no sabemos su estado, estas pruebas serian adicionales y seran ejecutadas una vez Sean autorizadas. Ing. Residente de obra

Las actividades de excavacion, Cargue y Transporte de material Continuan Suspendidas por problemas de Seguridad. Jrc Residente de obra C.F.P.
18/03/2026
Olima Soleado. Se Continua con la excavacion manual para la construcion de los caisson y la Construccion de anillos en concreto reforzado para la camisa del Fuste o cuerpo del caisson. Se Continua con la pintura de la estructura metalica del edficio Biblioteca. Las actividades de excavacion, Cargue y Transporte del material excavado Siguen Suspendidas por problemas de seguridad en la obra o sitio de ejecucion del proyecto. a razon de lo acdmtdo en dia 16/03/2026. Jrc. Residente obra CFP.
19/03/2026
Olima Soleado. Se continua con la excavacion para los caisson y la construccion de anillos en concreto reforzado para la camisa del fuste o cuerpo del caisson. Se coloca acero para el fuste o cuerpo del caisson en los apoyos 19, 18 y 17. Se realiza resane de los regatos realizados para la instalacion de las tuberias de agua potable en las edificaciones Biblioteca, Casa de la cultura, y Administrativa. Sobre las 10:00 Am hace presencia la policia con dos agentes. realizaron una sola ronda todo el dia. Sigue suspendida. la actividad de excavacion, cargue y transporte de material excavado. por problemas de seguridad en S.T.O de ejecucion del proyecto.
Jrc Residente de obra CFP
20/03/2026
Olima Soleado. Se continua con la excavacion para los Caisson y la construccion de anillos en concreto reforzado para la camisa del fuste o cuerpo del caisson, Se funden en concreto Tremix los caisson de los apoyos 19, 18 y 17. Se continua con el resane de los regatos no hay presencia de la policia durante todo el dia →

Las actividades de excavación, Cargue y Transporte de material excavado Siguen Suspendidas por problemas de Seguridad en el sitio de ejecución del proyecto.
Ing. Residente de obra CFP. Interventoría
21/03/2026 Residente de obra.
Liliana Salcedo

Se continua con la excavación para los Caissons y la construcción de anillos en concreto reforzado para la camisa del caisson (Fuste o cuerpo).
Se realiza regata en piso Salon de danza y en muro para impermeabilizar el salon y evitar las filtraciones. Se coloca mortero impermeabilizado en piso de este Salon (edificio costado la cultura) no hay presencia de la policia en el sitio de Trabajo o de la obra. Los actividades de excavación, Cargue y Transporte de material excavado Siguen Suspendidas por problemas de seguridad en el sitio de ejecución del proyecto. Ing Residente de obra CFP
25-03/2026. Res Interventoría
Liliana Salcedo

Se continua actividad de excavación mecanica para zapatas, en el curso de esta excavación queda expuesta fibra que contiene Cableado de acometida de 5 lineas. El cual en visita electrica se tomó la decisión de retirar y realizar pruebas para usarlo como acometida definitiva. — La Interventoría solicita al Residente de Obra realizar retiro de este Cable para evitar accidentes y/o daños del mismo ó en su defecto en posible hurto, el retiro de este cable y colocar bajo custodia es una solicitud de la Interventoria.
Interventoría. Res Interventoría Ing. Residente de obra CFP

24/03/2026
Clima soleado. Se reinician las actividades de Cargue y Transporte del material excavado, Se coloca acero para el fuste o cuerpo del caisson. en los apoyos # 16(A y B), # 15. y # 14 (A y B) Se coloca mortero impermeabligado en el salon de danzas edificio casa de la cultura, Se realizo visita por parte de funcionarios de la alcaldia Topografos y Secretaria de Cultura para verificar y analizar los actividades que se acometeran en lo referente al apoyo # 19. hubo presencia del Ejercito desde las 10:00 AM una sola ronda, y de la policia durante toda la mañana hasta las 12:00 M. Gac Residente de obra C.F.P

25/03/2026
clima soleado. Se Funden el cuerpo o fustes de los caisson faltantes, los de los apoyos # 16 (A y B), # 15 y # 14 (A y B). Se inicia con la excavacion para la construccion de los dados, se excava el dado del Apoyo # 3 y se le coloca Solado de limpieza, Se realiza demolicion de muros en mamposteria y vigas de amarre cerca donde Se construira el dado del apoyo # 2., Se continua pintando la estructura metalica del edificio biblioteca. Se continua con los resane de los regatas realizada para la instalacion de la tuberia de agua potable en esta edificacion. Gac Residente de obra C.F.P

26/03/2026
CLIMA SOLEADO. SE REALIZA RECORRIDO CON SUPERVISOR APOYO, INTERVENTORIA, CONTRATISTAS REALIZANDO RECORRIDO DE LAS CORRESPONDIENTES Y DEFINIENDO ACTIVIDADES. SE CONTINUA CON FIGURADO DE HIERRO DE ZAPATAS # 3 y # 4. ACTIVIDADES EDIFICIO BIBLIOTECA. GRUESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Residente obra C.F.P

→ La interventoría solicita que el acero de cimentación sea limpiado con grata antes de realizar fundición de dados de cimentación ó zapatas según acta de la solicitud la realizo inicialmente el Ministerio de las Culturas y solicitó que se tomaran fotos antes de la fundición.

Ing. Residente Obra CTP

27/03/2026

Clima Soleado.

Se realiza reunión de Seguimiento al area Social en donde se evalua el desarrollo de las actividades técnicas del area. y se establecen los compromisos a seguir; durante esta reunión se presento un impase. con el ingeniero Galdino; situación que se presta a confrontación. Se deja constancia. de que, durante la reunión del componente Social, el ingeniero residente Galdinez incurrió en comportamientos inadecuados. para un espacio técnico, caracterizado por elevación de tono de voz, interrupciones constantes y uso de expresiones irrespetuosas. hacia los profesionales presentes; particularmente hacia el equipo de interventoría.

De igual forma. se evidencia una actitud impositiva al desestimar de forma tajante la Solicitud. técnica emitida por la interventoría respecto a la gestión de acompañamiento interinstitucional, limitando el analisis conjunto y desconociendo los principios de articulación y coordinación requeridos en este tipo de procesos. Cabe resaltar que dicha intervención no solo afectó el desarrollo adecuado de la reunión, sino que incidió directamente en la toma de decisiones; derivando en la no implementación de una acción considerada pertinente desde el área social.

Se hace necesario que en adelante las intervenciones técnicas se hagan en el marco del respeto, la argumentación técnica y la disposición al diálogo

Profesional Social Interventoría.

27/03/2026.
Clima: Cielo nublado. Llovizna desde las 7:30 AM. hasta las 9:00 am. Se continua con el armado del acero del dado del apoyo #3 y Apoyo #4. Se forma dado del apoyo #3, Se Continúa con el cargue y transporte de material proveniente de la excavación. Se pintan los muros del salon de audio visuales, en el interior de este, del edificio Biblioteca, Se coloca fraguo de cielo raso en los areas donde se desmonto para la colocacion de la tuberia de agua potable.
En lo referente a la nota dejada por el profecional Social de la interventoria. mi participacion en el espacio obedecio a la solicitud de la profecional social del contratista. y mi tono de voz siempre ha sido asi en mis 56 años que tengo y eso no lo he podido cambiar ni va a suceder, en ningun momento le falte el respeto. En mi intervencion nunca use palabras o expresiones irrespetuosas. Desconozco el tipo de sencibilidad del profecional de social de la interventoria y en ningun momento habia equipo de interventoria. Solamente estaba él. y su presencia en lo que en mi respecta es cada quince(dias (15) que se presenta a la obra y solo alcanza (2) horas (dos) en el Sitio. Por otra parte mi intervencion obedecio a la consulta de escalar el tema que sucedio el dia 16/03/2026. en la cual el solicita que elevemos estos acontecimientos a los entes territoriales, y la respuesta fue que no lo haríamos debido a que ya existe la denuncia. y que durante la reunion que se efectuo en la alcaldia el dia 18/03/2026 en las cuales se encontraban las entidades territoriales y de eso se levanto un acta. las cuales se entregaron

Copias a los diferentes entidades que asistieron a la reunion. es de aclarar que el residente de apoyo Social de la interventoria desconoce las situaciones de sobre que se viue en estos momentos en la obra y que dicho procedimiento de lo acontecido lo llevan las autoridades competentes. Jc Residente de Obra. CFP
28-03-2026
Clima Soleado. Se continua con la formaleteada del dado del apoyo #3. y se continua con la colocacion del acero del dado del apoyo #4. Se realiza excavacion para destapar la tuberia que contiene los cables principales que alimentan las edificaciones, se recoge el cable y se pone a disposicion del guarda vigilante, Se inicia la excavacion del dado o para construccion del dado apoyo #6. Se realiza inspeccion del canal de recoleccion de aguas lluvias del edificio biblioteca y esta totalmente colmatada, Se le solicita a la interventoria que autorice la limpieza de esta para poder evitar que las aguas lluvias sigan filtrandose en esta edificacion.
Jc. Residente de Obra C.F.P
Nota: Con Referencia a lo mencionado por residente de Obra frente a situacion presentada por el profesional social de interventoria el dia 27/03/2026. me permito realizar las siguientes precisiones: Nuestro profesional social no se presenta en obra Cada 15 dias, lo hace semanalmente y obedece internamente a la dedicacion otorgada por la interventoria la cual en ningun momento debe ser de conocimiento o resorte del contratista, la semana anterior al 27 de marzo no pudo asistir al espacio y contaba con permiso del

director de obra quien es el unico que tiene autridad para otorgar permisos o exigirle algo al personal de interventoria en sitio. Adicionalmente se le hace el llamado al residente de obra a manejar los espacios y los tonos, no se trata de sensibilidades, se trata de profesionalismo y Respeto y se le exige que tenga en cuenta lo anterior, no es de nuestro interés su caracter personal, en sitio el trato entre profesionales debe estar marcado por el respeto. Tambien se aclara que internamente la interventoria realiza reuniones o comités y en estas se tratan todos los temas del proyecto, razón por la cual nuestros profesionales si conocen lo tratado en reunión de entes territoriales sin embargo el acompañamiento de personeria y defensoria del pueblo fueron una solicitud de esta interventoria y de pleno conocimiento del director de la misma y no va en contravia de las investigaciones legales de las autoridades competentes, para finalizar se hace solicitud expresa de acoger los llamados y solicitudes del personal de interventoria interventoria.

30/03/2026.

Clima soleado.

Se continua formaleta del dado del apoyo #3, continua amarre de acero del dado del apoyo #4 y continua excavación del apoyo #6, Continua mantenimiento de edificio biblioteca, se evidencia pintura en muros, limpieza de canal, tambien se evidencia limpieza de obra en edificio Administrativo, sin embargo la terraza continua sin limpieza, la interventoria solicita al contratista realizar la limpieza de terraza, interventoria inspecciono terraza de edificio biblioteca en la cual se está realizando mantenimiento de canal de aguas lluvias. Al rededor de las 13:00 hrs el residente de obra informa ala interventoria sobre sujeto merodeando las afueras de la obra, al parecer es el mismo sujeto que ingresó en días pasados.

Residente obra CFP

31/03/2026.

-CLIMA SOLEADO, PRESENTA CIERRE VIAL POR APIQUE

ANTROPOLOGICOS, EL CUAL NO AFECTA A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL COLINDANTE.

- COLINDANTE RESIDENTE FUNDICIONES DE ZAPATA #3 ENTRE LAS 7:00 AM Y 10:00 AM.
- SE REALIZA PRUEBA DE PRESION A FLUXOMETROS EN LOS 3 EDIFICIOS LOS CUALES DE LOS 13 ENSAYOS REALIZADOS 9 SE ENCUENTRAN FALLADOS Y 4 ADECUADAMENTE.

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EN ANALISIS CON DIRECTOR DE INTERVENTORIA SE LE INDICA AL COLINDANTE MIRAR SI SE PUEDE LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE ESTOS FLUXOMETROS O INCLUIRLOS EN MEDIDAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO.

POR OTRA PARTE SI SE SOLICITO DE FUERA REALIZAR EL DESMONTE DE LOS FLUXOMETROS SIN FUNCIONAMIENTO

- SE CONTINUO CON LA ~~EXCAVACION~~ EXCAVACION DE ZAPATA APOYO #6 Y FORTALEZA ZAPATA APOYO 5.
- SE INICIA EXCAVACION SOBRE SALON DE DANZAS COSTADO CULTURAL.

"LAS INTERVENTORIAS

Jc Rendeje Cons C.E.D
