
E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL

ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD CORREGIMIENTO DE PUERTO UMBRÍA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Id	Item	Nombre de tarea	Duración
0		**PROGRAMACIÓN DE OBRA - PTO UMBRIA**	**90 días**
1	**1**	**PRELIMINARES**	**12 días**
2	1.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MURO EXISTENTE	2 días
3	1.2	DESMONTE Y TRANSPORTE DE CUBIERTA EXISTENTE	7 días
4	1.3	DESMONTE DE VENTANA, INCLUYE RESANE Y ACABADO DE VANOS (area de residuos).	1 día
5	1.4	DESMONTE DE PUERTAS, INCLUYE RESANE Y ACABADO DE VANOS (baño discapacitados y sala de espera vacunación)	1 día
6	1.5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	1 día
7	**2**	**EXCAVACIONES**	**3 días**
8	2.1	EXCAVACIÓN MANUAL	3 días
9	**3**	**CONCRETOS**	**10 días**
10	3.1	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI ESP:0,15M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm.	2 días
11	3.2	CAÑUELA PERIMETRAL. ANCHO 30CM x ALTURA 20CM	10 días
12	**4**	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS DE MUROS**	**30 días**
13	4.1	MURO EN BLOQUE No 4	2 días
14	4.2	PAÑETE EN MORTERO 1:3 PARA MUROS INTERIORES	2 días
15	4.3	PAÑETE EN MORTERO 1: 3 IMPERMEABILIZADO PARA MUROS EXTERIORES	2 días
16	4.4	ESTUCO PARA INTERIORES MUROS TIPO I	10 días
17	4.5	ESTUCO ACRILICO PARA EXTERIORES	7 días
18	4.6	INSTALACION MEDIA CAÑA EN POLIURETANO PARA JUNTAS DE PAREDES Y PISOS	7 días
19	**5**	**CUBIERTA Y CIELO RASO**	**31 días**
20	5.1	SUMIN. E INSTAL. ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN TUBO ESTRUCTURAL Y CORREAS METALICAS EN PERFIL SOLDADO, INCLUYE PINTURA DE TODOS LOS ELEMENTOS	5 días
21	5.2	CUBIERTA STANDING SEAM CAL. 24 x 1.5" TIPO SANWICH CON AISLAMIENTO EN POLIURETANO	7 días
22	5.3	TEJA TERMOACUSTICA UPVC. o similar según diseño. color. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios necesarios para el correcto montaje.)	4 días
23	5.4	SUMINITRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM (incluye estuco y pintura)	10 días
24	5.5	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 PARA DESAGUES	1 día
25	**6**	**CARPINTERIA METÁLICA**	**70 días**
26	6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA DE SEGURIDAD PARA RAMPA DE ACCESO	3 días
27	6,2	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO	1 día
28	6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS CON PARALES EN TUBERÍA REDONDA DE 1-1/2" Y RODA MANOS O BOLILLO EN TUBERÍA REDONDA DE 2", 2 HILOS EN TUBERÍA REDONDA DE	1 día
29	6.4	REJILLA PARA CUNETA DIMENSIONES / 0.40 X 0.75 X 0.03 m	5 días
30	**7**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**4 días**
31	7.1	LUMINARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYE CABLE, TUBERIAS (tubo Conduit Sch40 1/2 X 3M), INTERRUPTOR Y DEMAS ACCESORIOS	4 días
32	**8**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**	**2 días**
33	8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE BAÑO (Incluye sanitario y lavamanos)	1 día
34	8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS (incluye barras de seguridad.)	1 día
35	8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO PARA CUARTO DE RESIDUOS.	1 día
36	**9**	**PINTURA**	**12 días**
37	9.1	PINTURA ESMALTE SUPERLAVABLE DE REJA Y PORTON METÁLICOS EXTERIORES (EXISTENTES)	2 días
38	9.2	PINTURA ACRILICA DE ALTA CALIDAD TIPO KORAZA PARA EXTERIORES 3 MANOS	4 días
39	9.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 PARA ESPACIOS INTERIORES 3 MANOS ACABADO MATE	6 días
40	**10**	**SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA**	**30 días**
41	10.1	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EXTERIOR CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	1 día
42	10.2	EXVACACIÓN MANUAL	1 día
43	10.3	RETIRO DE REJA DE SEGURIDAD METALICA PERIMETRAL	2 días
44	10.4	MURO EN BLOQUE MACIZO (laterales de tanque)	4 días
45	10.5	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	1 día
46	10.6	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI ESP:0,20M	1 día
47	10.7	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI ESP:0,00M INCLUYE VARILLA DE 1/2 @ 10CM	2 días
48	10.8	TAPA METALICA INOXIDABLE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50X50CM	1 día
49	10.9	ENCHAPE PAREDES EN TABLETA CERÁMICA, INCLUYE INSTALACIÓN, CORTE Y MATERIALES DE PEGA	2 días
50	10.10	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, PARED LADO EXTERIOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	2 días
51	10.11	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN TUBO ESTRUCTURAL Y CORREAS METALICAS EN PERFIL SOLDADO, INCLUYE PINTURA DE TODOS LOS ELEMENTOS	4 días
52	10.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	4 días
53	10.13	REJA METALICA DE SEGURIDAD PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	2 días
54	10.14	ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE HYDROFLOW Y BOMBA SUMERGIBLE, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL	3 días
55	10.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 1000LTS, TAPA, Y ACCESORIOS PVC PARA LA CORRECTA CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN	1 día
56		**SUMINISTRO DE DOTACION Y MOBILIARIO**	**65 días**
57		**DOTACION Y MOBILIARIO**	**1 día**
58		CONTENEDOR PARA BASURAS DE TRES PUESTOS CANECA DE 120 LITROS CON RUEDAS. COLORES ROJO, NEGRO Y BLANCO	1 día
59		CANECA PLASTICA CON PEDAL CAPACIDAD 12 LTRS	1 día
60		SUMINISTRO ESCRITORIO METALICO INCLUYE SILLA ERGONOMICA	1 día

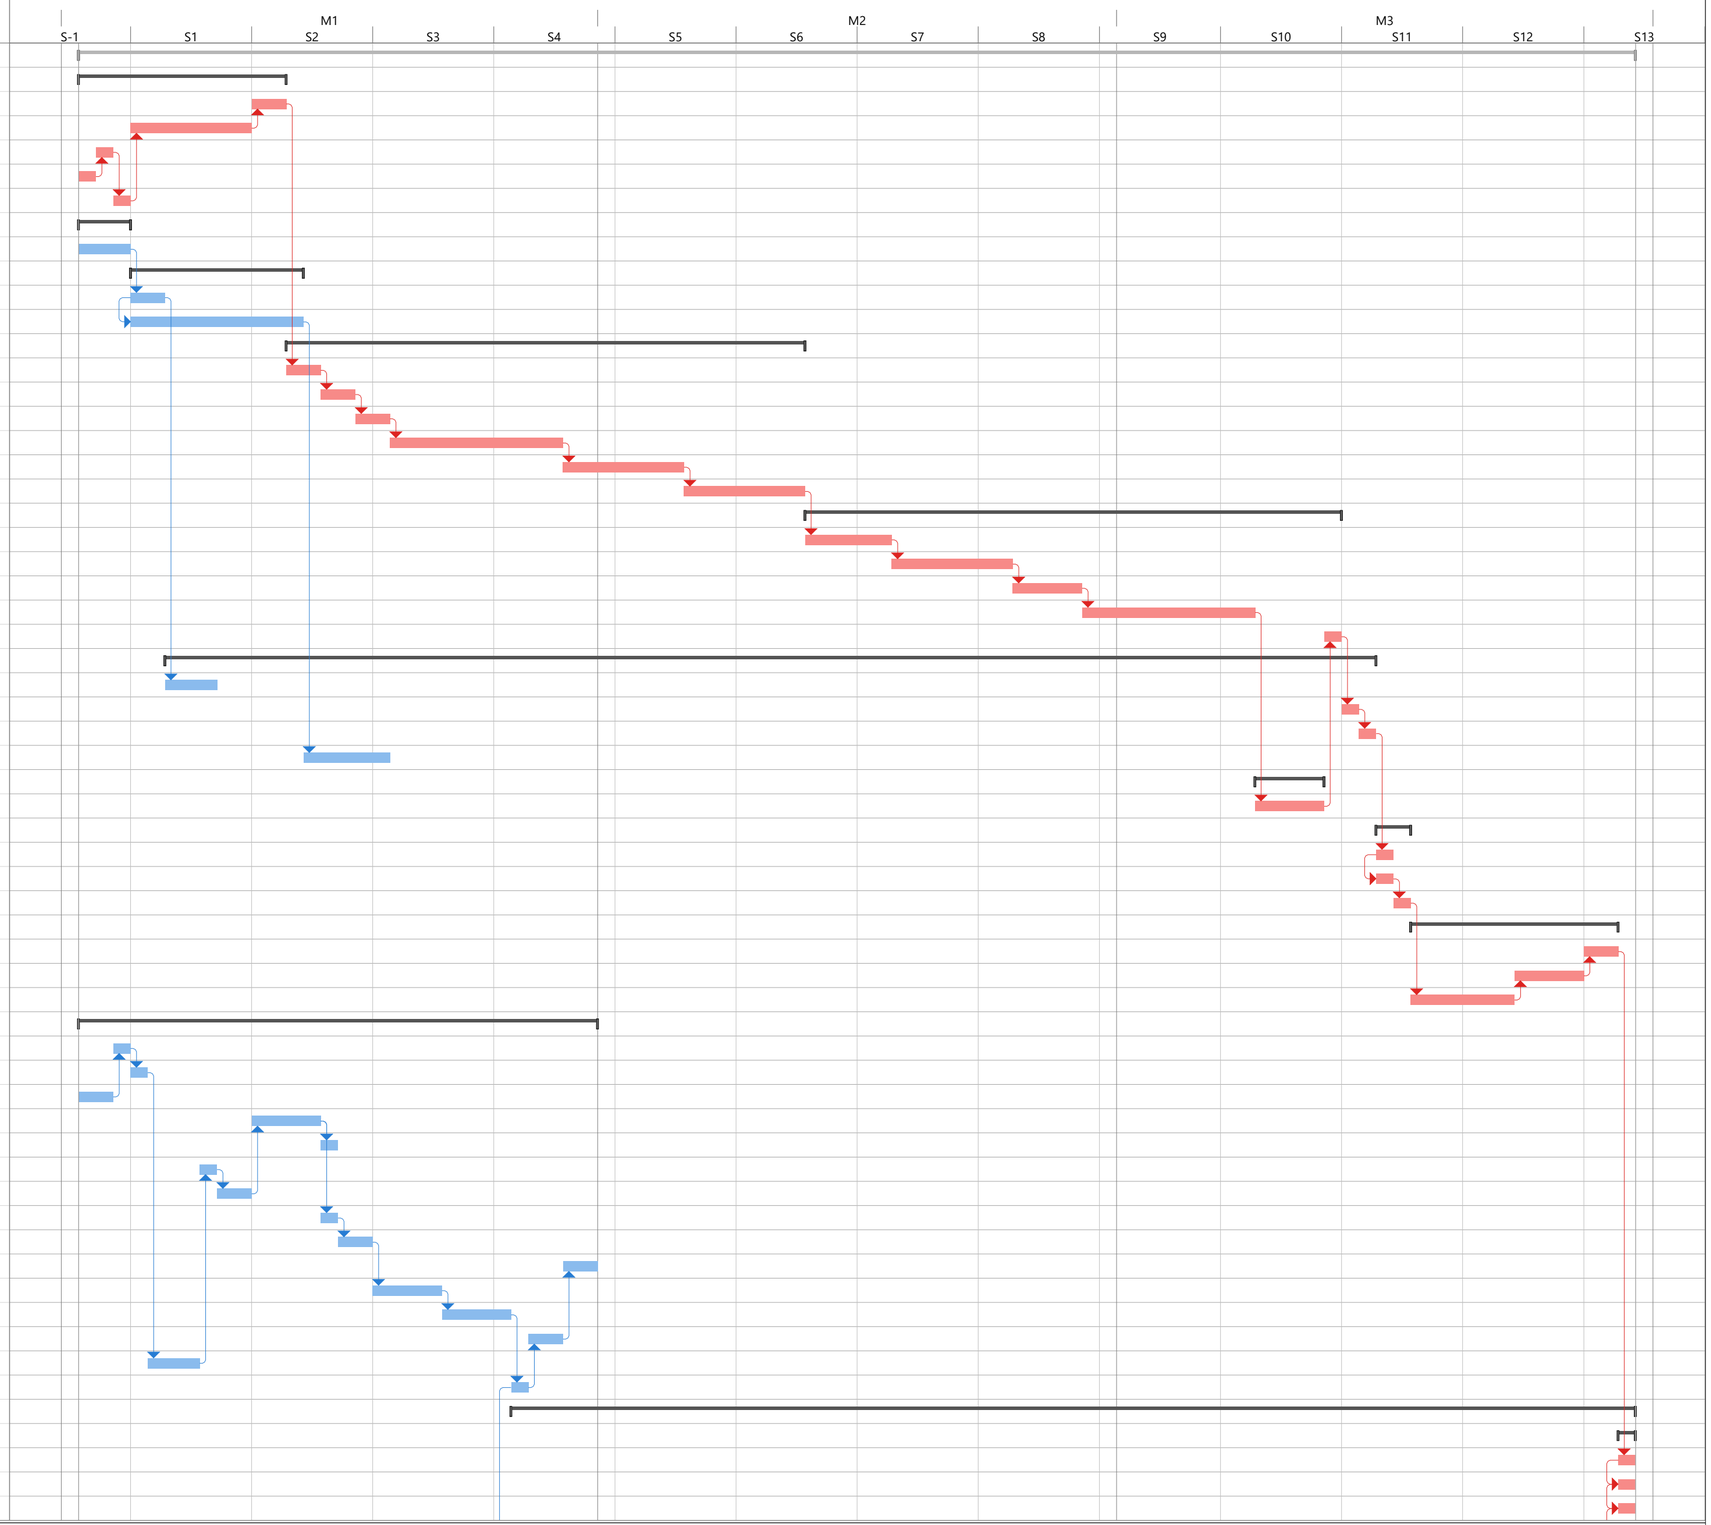

PROGRAMACIÓN DE OBRA

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

ING. LEIDY VANESSA DIAZ LOPEZ
Matrícula No. 111037-0731909 NRÑ

E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL

ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD CORREGIMIENTO DE PUERTO UMBRÍA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Id	Item	Nombre de tarea	Duración
61		SUMINISTRO SILLAS TANDEM TRES PUESTOS PARA SALA DE ESPERA	1 día
62		ESTANTE METALICO INDUSTRIAL PARA ARCHIVO	1 día
63		**EQUIPOS FIJOS**	**1 día**
64		BOMBA SUMERGIBLE	1 día
65		HYDROFLOW	1 día

