1. FECHA ELABORACIÓN:	31	5	5	TIPO DE CONTRATO	OBRA			
2. ACTA No.	5			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:	X	RECIBO PARCIAL DE OBRA		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL YANACONA							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10675-2025		7. FECHA CONTRATO:	19/11/2025		8. VALOR CONTRATO:	$	12,017,556,820
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2027	11. PLAZO:	23 MESES 21 DIAS	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A		14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11835-2025		18. FECHA CONTRATO:	20/11/2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2027	22. PLAZO:	24 MESES 21 DIAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A		25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL							
27. SUPERVISOR SDIS:	ARQ JONNY EDUARD PADILLA							

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 (CINCO) días del mes de JUNIO del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA Obray/o Modificaciones
del mes de MAYO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM		29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1		PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.1		ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.3		CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	30.00	$ 40,931.00	$ 1,227,930.00	23.75	$ 972,111.25		$ -	23.75	$ 972,111.25	23.75	$ 972,111.25
1.4		DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
1.4.9		DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	137.06	$ 20,561.00	$ 2,818,091.00	100.62	$ 2,068,847.82		$ -	100.62	$ 2,068,847.82	100.62	$ 2,068,847.82
1.8		DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
1.8.11		DESMONTE / DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO DE ESPESOR HASTA 10 MM, CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 24,624.00	$ -	4.56	$ 112,285.44		$ -	4.56	$ 112,285.44	4.56	$ 112,285.44
2		MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
2.1		EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS					-	$ -		$ -		$ -		$ -
2.1.1		DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	8.85	$ 17,818.00	$ 157,689.00	39.61	$ 705,770.98		$ -	39.61	$ 705,770.98	39.61	$ 705,770.98
2.1.4		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	-	$ 68,128.00	$ -	14.33	$ 976,274.24		$ -	14.33	$ 976,274.24	14.33	$ 976,274.24
2.1.9		RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	8.85	$ 103,471.00	$ 915,718.00	3.90	$ 403,536.90		$ -	3.90	$ 403,536.90	3.90	$ 403,536.90

2.1.13	TRASIEGO MANUAL DE MATERIAL SOBRANTE Y DE MOVIMIENTO DE MATERIAL GRANULAR A DISTANCIA MAYORES A LAS DEL TRASIEGO ORDINARIO, CONTEMPLANDO RECORRIDOS >50<=150 M ENTRE EL SITIO DE ORIGEN HASTA EL PUNTO DE ACOPIO PARA CARGUE DEL MISMO.	M3		$ 28,029.00	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	-	$ 128,565.00	$ -	50.30	$ 6,466,819.50		$ -	50.30	$ 6,466,819.50	50.30	$ 6,466,819.50
2.2	CONCRETOS					-	$ -		$ -		$ -		$ -
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	8.85	$ 348,477.00	3,084,021.00	19.69	$ 6,861,512.13		$ -	19.69	$ 6,861,512.13	19.69	$ 6,861,512.13
2.2.17	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M		$ 323,585.00	0.00	7.00	$ 2,265,095.00		$ -	7.00	$ 2,265,095.00	7.00	$ 2,265,095.00
2.5	ESTRUCTURAS METALICAS					-	$ -		$ -		$ -		$ -
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	-	$ 5,206.00	0.00	55.38	$ 288,308.28		$ -	55.38	$ 288,308.28	55.38	$ 288,308.28
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	-	$ 5,618.00	0.00	64.75	$ 363,765.50		$ -	64.75	$ 363,765.50	64.75	$ 363,765.50
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS					-	$ -		$ -		$ -		$ -
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA).	KG	-	$ 19,248.00	0.00	1,300.65	$ 25,034,911.20		$ -	1,300.65	$ 25,034,911.20	1,300.65	$ 25,034,911.20
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
3.1.3	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	-	$ 205,471.00		1.12	$ 230,127.52		$ -	1.12	$ 230,127.52	1.12	$ 230,127.52
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	-	$ 24,413.00		22.06	$ 538,550.78		$ -	22.06	$ 538,550.78	22.06	$ 538,550.78
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -		$ -		$ -		$ -
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES					-	$ -		$ -		$ -		$ -
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	3.00	$ 211,381.00	$ 634,143.00	15.00	$ 3,170,715.00	1.00	$ 211,381.00	14.00	$ 2,959,334.00	15.00	$ 3,170,715.00
5.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A 50 KA	UN		$ 372,030.00		6.00	$ 2,232,180.00	6.00	$ 2,232,180.00	-	$ -	6.00	$ 2,232,180.00
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X75A 50 KA	UN		$ 426,613.00		1.00	$ 426,613.00		$ -	1.00	$ 426,613.00	1.00	$ 426,613.00
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X20A 10 KA	UN		$ 42,747.00		19.00	$ 812,193.00	- 6.00	-$ 256,482.00	25.00	$ 1,068,675.00	19.00	$ 812,193.00
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN	10.00	$ 38,067.00	$ 380,670.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X20A 10 KA	UN	7.00	$ 69,363.00	$ 485,541.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.2	SALIDAS					-	$ -		$ -		$ -		$ -
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 247,511.00		34.00	$ 8,415,374.00		$ -	34.00	$ 8,415,374.00	34.00	$ 8,415,374.00
5.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X20A 10 KA	UN		$ 243,393.00		10.00	$ 2,433,930.00		$ -	10.00	$ 2,433,930.00	10.00	$ 2,433,930.00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10.00	$ 248,280.00	2,482,800.00	50.00	$ 12,414,000.00		$ -	50.00	$ 12,414,000.00	50.00	$ 12,414,000.00
5.3	TABLEROS Y OTROS					-	$ -		$ -		$ -		$ -
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 761,342.00		1.00	$ 761,342.00		$ -	1.00	$ 761,342.00	1.00	$ 761,342.00
5.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	$ 788,234.00	$ 788,234.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN		$ 63,670.00		11.00	$ 700,370.00		$ -	11.00	$ 700,370.00	11.00	$ 700,370.00
5.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X20A 10 KA	UN		$ 376,986.00		1.00	$ 376,986.00		$ -	1.00	$ 376,986.00	1.00	$ 376,986.00
5.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.44 M	UN		$ 548,699.00		1.00	$ 548,699.00		$ -	1.00	$ 548,699.00	1.00	$ 548,699.00
5.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X20A 10 KA	UN		$ 248,401.00		1.00	$ 248,401.00		$ -	1.00	$ 248,401.00	1.00	$ 248,401.00
5.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 8 -T-REG INCLUYE PEINADO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES	UN		$ 337,427.00		4.00	$ 1,349,708.00	4.00	$ 1,349,708.00	-	$ -	4.00	$ 1,349,708.00
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M		$ 17,026.00		429.09	$ 7,305,686.34		$ -	429.09	$ 7,305,686.34	429.09	$ 7,305,686.34
5.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF	M	65.00	$ 25,729.00	$ 1,672,385.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF	M	25.00	$ 44,291.00	$ 1,107,275.00	75.59	$ 3,347,956.69		$ -	75.59	$ 3,347,956.69	75.59	$ 3,347,956.69
5.4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°2 (F) + 1N°2 (N) + 1N°4 (T) AWG LSFH	M		$ 144,096.00		33.20	$ 4,783,987.20		$ -	33.20	$ 4,783,987.20	33.20	$ 4,783,987.20
5.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE Nº 2/0 AWG	M		$ 67,154.00		4.50	$ 302,193.00		$ -	4.50	$ 302,193.00	4.50	$ 302,193.00
5.4.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	M		$ 30,924.00		4.50	$ 139,158.00		$ -	4.50	$ 139,158.00	4.50	$ 139,158.00
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	39.80	$ 64,256.00	2,557,389.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	90.00	$ 59,630.00	$ 5,366,700.00	63.39	$ 3,779,945.70		$ -	63.39	$ 3,779,945.70	63.39	$ 3,779,945.70
5.4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 59,222.00		75.59	$ 4,476,590.98		$ -	75.59	$ 4,476,590.98	75.59	$ 4,476,590.98
.5.4.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC CONDUIT 2" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M		$ 146,060.00		33.20	$ 4,849,192.00		$ -	33.20	$ 4,849,192.00	33.20	$ 4,849,192.00
5.5	ILUMINACIÓN.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10.00	$ 204,308.00	2,043,080.00	16.00	$ 3,268,928.00		$ -	16.00	$ 3,268,928.00	16.00	$ 3,268,928.00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 44,064.00	$ -	2.00	$ 88,128.00		$ -	2.00	$ 88,128.00	2.00	$ 88,128.00
5.5.16	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 21,707.00		32.00	$ 694,624.00		$ -	32.00	$ 694,624.00	32.00	$ 694,624.00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -		$ -		$ -		$ -
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -		$ -		$ -		$ -
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.12	$ 238,615.00	$ 1,221,709.00	5.12	$ 1,221,708.80		$ -	5.12	$ 1,221,708.80	5.12	$ 1,221,708.80
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -		$ -		$ -		$ -
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	5.39	$ 660,234.00	$ 3,558,661.00	5.33	$ 3,519,047.22		$ -	5.33	$ 3,519,047.22	5.33	$ 3,519,047.22
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).					-	$ -		$ -		$ -		$ -
14.2	DIVISIONES.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
14.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M	66.16	$ 90,264.00	$ 5,971,866.00	63.20	$ 5,704,684.80		$ -	63.20	$ 5,704,684.80	63.20	$ 5,704,684.80
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -		$ -		$ -		$ -
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -		$ -		$ -		$ -

15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2		$ 186,264.00	$ -	1.85	$ 344,588.40		$ -	1.85	$ 344,588.40	1.85	$ 344,588.40
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -		$ -		$ -		$ -
16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø.=2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL./BWG.10 HUECO 2,1/4"X2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	3.45	$ 108,173.00	$ 373,197.00	5.10	$ 551,682.30	5.10	$ 551,682.30	-	$ -	5.10	$ 551,682.30
16.14	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2	-	$ 17,328.00	$ -	25.15	$ 435,799.20		$ -	25.15	$ 435,799.20	25.15	$ 435,799.20
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					-	$ -		$ -		$ -		$ -
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	283.43	$ 4,821.00	$ 1,366,416.00	771.98	$ 3,721,715.58		$ -	771.98	$ 3,721,715.58	771.98	$ 3,721,715.58
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	22.05	$ 21,401.00	$ 471,892.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	-	$ 75,848.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	22.05	$ 14,518.00	$ 320,122.00	89.33	$ 1,296,892.94		$ -	89.33	$ 1,296,892.94	89.33	$ 1,296,892.94
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 51,391.00	$ -	283.35	$ 14,561,639.85		$ -	283.35	$ 14,561,639.85	283.35	$ 14,561,639.85
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	-	$ 13,658.00	$ -	459.22	$ 6,272,026.76		$ -	459.22	$ 6,272,026.76	459.22	$ 6,272,026.76
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	44.63	$ 30,224.00	$ 1,348,897.00	47.30	$ 1,429,595.20		$ -	47.30	$ 1,429,595.20	47.30	$ 1,429,595.20
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -		$ -		$ -		$ -
23.1	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
23.1.5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	283.43	$ 121,703.00	$ 34,494,281.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS					-	$ -		$ -		$ -		$ -
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	146.37	$ 268,427.00	$ 39,289,660.00	157.18	$ 42,191,355.86		$ -	157.18	$ 42,191,355.86	157.18	$ 42,191,355.86
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	20.33	$ 105,767.00	$ 2,150,243.00	18.50	$ 1,956,689.50		$ -	18.50	$ 1,956,689.50	18.50	$ 1,956,689.50
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	137.06	$ 227,950.00	$ 31,242,827.00	120.37	$ 27,438,341.50		$ -	120.37	$ 27,438,341.50	120.37	$ 27,438,341.50
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.					-	$ -		$ -		$ -		$ -
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	62.30	$ 87,159.00	$ 5,430,006.00	47.30	$ 4,122,620.70		$ -	47.30	$ 4,122,620.70	47.30	$ 4,122,620.70
23.8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC EXTREMOS LISOS SECCIÓN 61X65 MM. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CODOS ADAPTADORES Y DEMÁS ACCESORIOS, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	25.00	$ 54,508.00	$ 1,362,700.00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS								$ -				

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	YANACONA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO		**INTERRUPTORES Y SENSORES**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**5.1.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

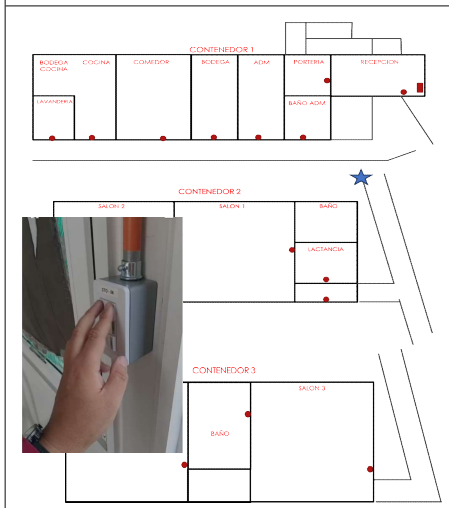

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CONTENEDOR 1									
RECEPCION						1,00	1,00	UN	CORTE 4
PORTERIA						1,00	1,00	UN	CORTE 4
BAÑO ADM						1,00	1,00	UN	CORTE 4
ADMINISTRACION						1,00	1,00	UN	CORTE 4
BODEGA						1,00	1,00	UN	CORTE 4
COMEDOR						1,00	1,00	UN	CORTE 4
COCINA						1,00	1,00	UN	CORTE 4
LAVANDERIA						1,00	1,00	UN	CORTE 4
CONTENEDOR 2									
LACTANCIA						1,00	1,00	UN	CORTE 4
SALON 1						1,00	1,00	UN	CORTE 4
SALON 2						1,00	1,00	UN	CORTE 4
CONTENEDOR 3									
SALON 3						1,00	1,00	UN	CORTE 4
BAÑO						1,00	1,00	UN	CORTE 4
SALON 4						1,00	1,00	UN	CORTE 4
CORTE 5									
pasicontenendores									
reflectores						1,00	1,00	UN	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	15,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	14,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	14,00	**15,00**

OBSERVACIONES:


RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL	
NOMBRE	ING. ROINER RIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**	
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCA[illegible]
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	YANACONA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO	**INTERRUPTORES Y SENSORES**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**5.1.18**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A 50 KA**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
TABLERO PRINCIPAL						4,00	4,00	UN	CORTE 4
					CORTE 5				
TABLERO CONTENEDOR 2						2,00	2,00	UN	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	6,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**6,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6,00	0,00	**6,00**

OBSERVACIONES:

	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. ROINER RIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONC
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	YANACONA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO	**INTERRUPTORES Y SENSORES**	**ACTA No:**	**005**	
ITEM	**5.1.25**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO PARA INSTALACIÓN EN RIEL DIN (RIEL OMEGA) HASTA 1X50A 10KA**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

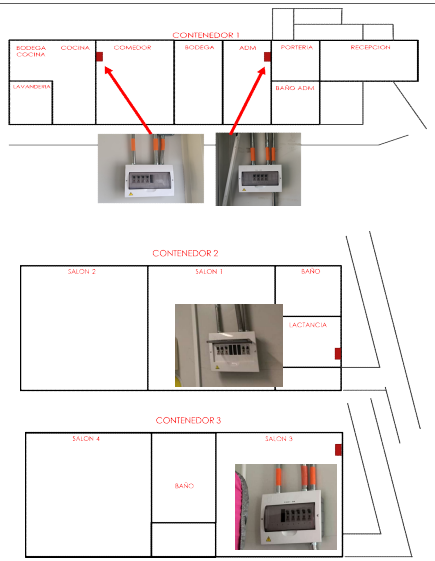

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TABLERO GENERAL						7,00	7,00	UN	CORTE 4
TABLERO ADM						4,00	4,00	UN	CORTE 4
TABLERO COMEDOR						4,00	4,00	UN	CORTE 4
TAMBLERO CONTENEDOR 2						5,00	5,00	UN	CORTE 4
TABLERO CONTENDOR 3						5,00	5,00	UN	CORTE 4
				CORTE 5					
TABLERO GENERAL						-6,00	-6,00	UN	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	19,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	25,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**-6,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
-6,00	25,00	**19,00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. ROINER RIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	YANACONA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO		**TABLEROS Y OTROS**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**5,3,18**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 8 -T-REG INCLUYE PEINADO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

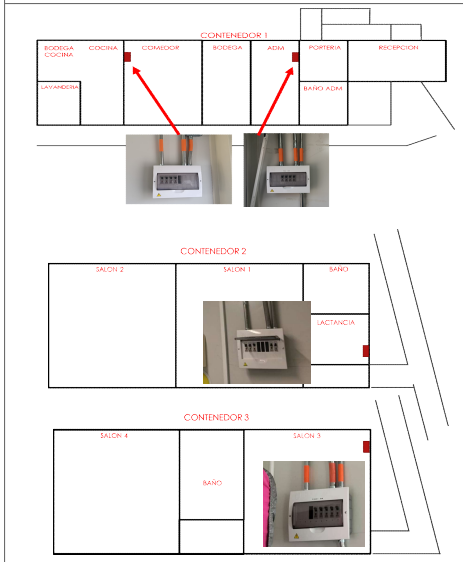

LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR		**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
				CORTE 5						
TABLERO ADM							1,00	1,00	UN	CORTE 5
TABLERO COMEDOR							1,00	1,00	UN	CORTE 5
TAMBLERO CONTENEDOR 2							1,00	1,00	UN	CORTE 5
TABLERO CONTENDOR 3							1,00	1,00	UN	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	4,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**4,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4,00	0,00	**4,00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. ROINER RIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	YANACONA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO	**INTERRUPTORES Y SENSORES**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**16.3**	**CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø.=2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL./BWG.10 HUECO 2,1/4"X2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

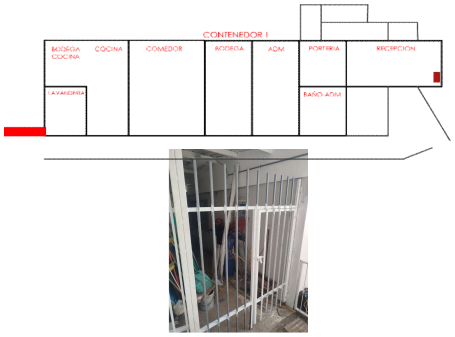

LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR		Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 5									
TABLERO CONTENEDOR 2			0,46		2,3		1,00	1,06	M2	CORTE 5
			2,05		1,97		1,00	4,04	M2	CORTE 5

TOTAL EJECUTADO	5,10	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**5,10**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,10	0,00	**5,10**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL**	
NOMBRE	ING. ROLNER OVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**	
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MON
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 5

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024	
Página: 1 de 1	

1. FECHA ELABORACIÓN:	31	5	2026	TIPO DE CONTRATO	OBRA				
2. ACTA No.	5			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:	X	RECIBO PARCIAL DE OBRA			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SUBDIRECION LOCAL DE INTEGRACION LOCAL CIUDAD BOLIVAR								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	Santa Isabel – 011 – 2026			7. FECHA CONTRATO:	15/1/2026		8. VALOR CONTRATO:	$	143,290,465
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30/4/2026		11. PLAZO:	3.5 MESES CALENDARIO	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A		14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11835-2025			18. FECHA CONTRATO:	20/11/2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2027		22. PLAZO:	24 MESES 21 DIAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A	$ 0.47	25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL								
27. SUPERVISOR SDIS:	ARQ JONNY EDUARD PADILLA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

28. ÍTEM No.		29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.1	1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.1	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).	M2	36.15	$ 6,042.00	$ 218,418.30	36.15	$ 218,418.30		$ -	36.15	$ 218,418.30	36.15	$ 218,418.30
1.1.4	1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1500 PSI	M	14.10	$ 105,370.00	$ 1,485,717.00	14.10	$ 1,485,717.00		$ -	14.10	$ 1,485,717.00	14.10	$ 1,485,717.00
1.3	1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.8	1.3.8	DESMONTE MANUAL DE BARANDAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO), CONTEMPLANDO SUS PASAMANOS, APOYOS VERTICALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN PLANTA. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M	3.06	$ 12,457.00	$ 38,118.42	3.06	$ 38,118.42		$ -	3.06	$ 38,118.42	3.06	$ 38,118.42
1.6	1,6	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.												
	1.6.27	DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELÉCTRICAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA, CABELADO Y APARATOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO,	UN		$ 22,551.00		**1.00**	$ 22,551.00	1.00	$ 22,551.00			1.00	$ 22,551.00
2	2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2.2	2.2	CONCRETOS												
2.2.8	2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	16.63	$ 348,477.00	$ 5,795,172.51	16.63	$ 5,795,172.51		$ -	16.63	$ 5,795,172.51	16.63	$ 5,795,172.51
2.4	2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO												
2.4.14	2.4.14	RAMPA EN CONCRETO E = 0.12 M 3000 PSI	M2	2.46	$ 123,004.00	$ 302,589.84	2.46	$ 302,589.84		$ -	2.46	$ 302,589.84	2.46	$ 302,589.84
2.5	2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.1	2,5,1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	44.89	$ 5,206.00	$ 233,697.34	44.89	$ 233,697.34		$ -	44.89	$ 233,697.34	44.89	$ 233,697.34
2.6	2.6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.2	2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,029.60	$ 19,248.00	$ 19,817,740.80	1,029.60	$ 19,817,740.80		$ -	1,029.60	$ 19,817,740.80	1,029.60	$ 19,817,740.80
3	3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3.5	3,5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3,5,2	3,5,2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	$ 21,945.00	$ -	11.56	$ 253,684.20	11.56	$ 253,684.20			11.56	$ 253,684.20
5	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.2	5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.2.2	5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	2.00	$ 52,645.00	$ 105,290.00	-	$ -	-	$ -			-	$ -
5.2	5.2	SALIDAS												
5.2.2	5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 247,511.00	$ 247,511.00	1.00	$ 247,511.00	1.00	$ 247,511.00			1.00	$ 247,511.00
5.2	5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.												
5.2.2	5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	50.00	$ 17,026.00	$ 851,300.00	-	$ -	-	$ -			-	$ -
5.2.2	5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	20.00	$ 59,630.00	$ 1,192,600.00	-	$ -	-	$ -			-	$ -
7	7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7.3	7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.												
7.3.8	7.3.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	17.84	$ 46,400.00	$ 827,776.00	-	$ -	-	$ -			-	$ -
7.4	7.4	OTROS												
7.4.2	7.4.2	PASO PARA ESCALERA EN GRAVILLA LAVADA MONA.	M	-	$ 116,907.00	$ -	38.62	$ 4,514,948.34	38.62	$ 4,514,948.34			38.62	$ 4,514,948.34
7.4.5	7.4.5	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	36.00	$ 3,665.00	$ 131,940.00	-	$ -	-	$ -			-	$ -
7.4.6	7.4.6	ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E=6CM 26X6X6, INSTALADO Y PEGADO CON MORTERO 1:3, SEGÚN FIGURAS EXISTENTES, CONSERVANDO EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO ORIGINAL	M2	19.08	$ 257,795.00	$ 4,918,728.60	15.94	$ 4,109,252.30	15.94	$ 4,109,252.30			15.94	$ 4,109,252.30
9	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1	9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1.20	9.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1 ½" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS	M	21.64	$ 90,047.00	$ 1,948,617.08	15.60	$ 1,404,733.20	15.60	$ 1,404,733.20			15.60	$ 1,404,733.20
12	12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.13	12.13	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M	24.61	$ 396,446.00	$ 9,756,536.06	17.89	$ 7,092,418.94	17.89	$ 7,092,418.94			17.89	$ 7,092,418.94
14	14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14.2	14.2	DIVISIONES.												
14.2.7	14.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M	16.15	$ 90,264.00	$ 1,457,763.60	13.98	$ 1,261,890.72	13.98	$ 1,261,890.72			13.98	$ 1,261,890.72
14.3	14.3	ENTREPISOS.												
14.3.1	14.3.1	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SOBREPISO EN PANELERÍA LIVIANA ACABADO UNA (1) CARA FABRICADO CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO E.=17 MM, CON PERFILERÍA TUBULAR CUADRADA 1"X1" CAL.19 (E.=1,1 MM) ACERO NEGRO CR. ASTM A-1008 FY=33417 PSI FORMANDO UNA RETÍCULA DE 41X41 CM (ENTRE EJES), ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE PERFILERÍA Y ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LÁMINAS, TAPAS LATERALES DE TERMINACIÓN CUANDO SE REQUIERA, FIBRA AISLANTE, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO. NO INCLUYE LIJADO, NI PINTADO DE LA SUPERFICIE.	M2	19.08	$ 91,516.00	$ 1,746,125.28	16.63	$ 1,521,911.08	16.63	$ 1,521,911.08			16.63	$ 1,521,911.08
19	19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	36.15	$ 4,821.00	$ 174,279.15	36.15	$ 174,279.15	36.15	$ 174,279.15			36.15	$ 174,279.15
22	22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22.1	22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
	22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS CAPAS LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	45.25	$ 13,658.00	$ 618,024.50	-	$ -	-	$ -			-	$ -
22.1.13	22.1.13	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, LINEAL A.<=50 CM. CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	16.15	$ 11,820.00	$ 190,893.00	13.98	$ 165,243.60	13.98	$ 165,243.60			13.98	$ 165,243.60
		VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS											-	$ -
		34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 52,058,838.48**		**$ 48,659,877.74**		**$ 20,768,423.53**		**$ 27,891,454.21**		**$ 48,659,877.74**
		35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**			$ 52,058,838.48		$ 48,659,877.74		$ 20,768,423.53		$ 27,891,454.21		$ 48,659,877.74
		ADMINISTRACIÓN	29.00%			$ 15,097,063.16		$ 14,111,364.54		$ 6,022,842.82		$ 8,088,521.72		$ 14,111,364.54
		IMPREVISTO	1%			$ 520,588.38		$ 486,598.78		$ 207,684.24		$ 278,914.54		$ 486,598.78
		UTILIDAD	4%			$ 2,082,353.54		$ 1,946,395.11		$ 830,736.94		$ 1,115,658.17		$ 1,946,395.11
		SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				**$ 17,700,005.08**		**$ 16,544,358.43**		**$ 7,061,264.00**		**$ 9,483,094.43**		**$ 16,544,358.43**
		AJUSTE AL PESO				$ 0.44		-$ 0.17		$ 0.47		$ 0.36		$ 0.83
		ANTICIPO	0%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
		37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				**$ 69,758,844.00**		**$ 65,204,236.00**		**$ 27,829,688.00**		**$ 37,374,549.00**		**$ 65,204,237.00**
														100.00%

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	5	ABRIL 2026		
INFORME SOCIAL	5	ABRIL 2026		
INFORME AMBIENTAL	5	ABRIL 2026		
INFORME SST	5	ABRIL 2026		
INFORME DE SUPERVISION	5	ABRIL 2026		
ACTA PARCIAL	5	MAYO 2026		
SOPORTE PAGO SDH	5	MAYO 2026		
FACTURA	5	MAYO 2026		
FORMATO MC 14	5	MAYO 2026		

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los _05 días del mes de JUNIO_del año _2026_

Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO
C.C. 79.905,718
Rep Legal. CONCORCIO SANTA ISABEL
Nit. 902,0003,595-6

Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
C.C. No. 1,062,398,686
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL
902,007,033-7

Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SUBDIRECION LOCAL DE INTEGRACION LOCAL CIUDAD
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de mayo de 2026**

CAPITULO	**SALIDAS**	**ACTA No:**	**002**
ITEM	**1,6,27**	**DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELÉCTRICAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA, CABELADO Y APARATOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



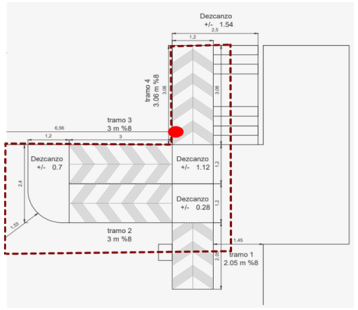

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 2									
MURO RAMPA						1,00	1,00	UN	CORTE No 2

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL**	
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**	
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01


Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SUBDIRECION LOCAL DE INTEGRACION LOCAL CIUDAD
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de mayo de 2026**

CAPITULO	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**			**ACTA No:**	**002**
ITEM	**3,5,2**	**LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





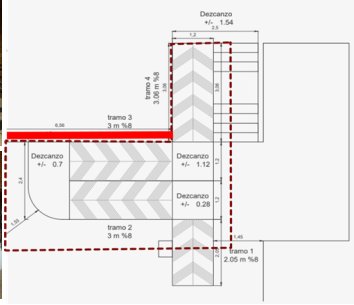

LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CORTE 2									
MURO RAMPA		5,78		2		1,00	11,56	M2	CORTE No 2

TOTAL EJECUTADO	11,56	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**11,56**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
11,56	0,00	**11,56**

OBSERVACIONES:


RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SUBDIRECION LOCAL DE INTEGRACION LOCAL CIUDAD
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de mayo de 2026**

CAPITULO	**SALIDAS**	**ACTA No:**	**002**
ITEM	**5,2,2**	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





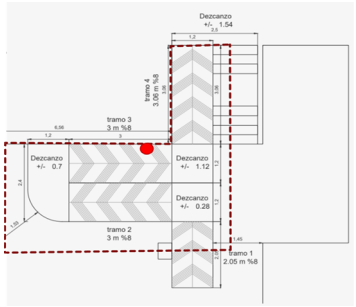

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
				CORTE 2					
MURO RAMPA						1,00	1,00	UN	CORTE No 2

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL**	
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**	
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01


Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SUBDIRECION LOCAL DE INTEGRACION LOCAL CIUDAD
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de mayo de 2026**

CAPITULO	**OTROS**			**ACTA No:**	**002**
ITEM	**7,4,2**	**PASO PARA ESCALERA EN GRAVILLA LAVADA MONA.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

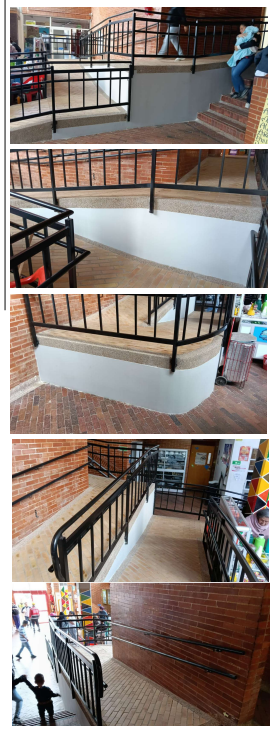

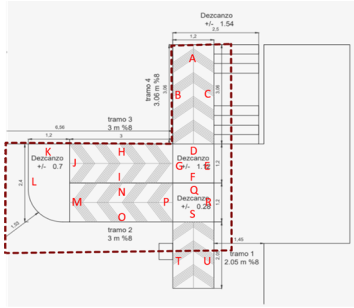



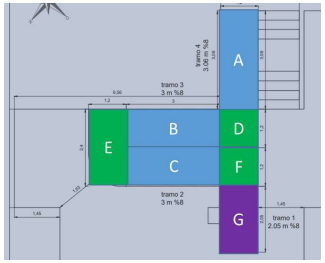


LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CORTE 2									
MURO RAMPA									
TRAMO A									
A			1,2			1,00	1,20	M	CORTE No 2
B			3,06			1,00	3,06	M	CORTE No 2
C			3,06			1,00	3,06	M	CORTE No 2
DESCANZO D									
D			1,2			1,00	1,20	M	CORTE No 2
E			1,2			1,00	1,20	M	CORTE No 2
F			1,2			1,00	1,20	M	CORTE No 2
G			1,2			1,00	1,20	M	CORTE No 2
TRAMO B									
H			3			1,00	3,00	M	CORTE No 2
I			3			1,00	3,00	M	CORTE No 2
J			1,2			1,00	1,20	M	CORTE No 2
DESCANZO E									
K			1,2			1,00	1,20	M	CORTE No 2
L			2,1			1,00	2,10	M	CORTE No 2
TRAMO C									
M			1,2			1,00	1,20	M	CORTE No 2
N			3			1,00	3,00	M	CORTE No 2
O			3			1,00	3,00	M	CORTE No 2
P			1,2			1,00	1,20	M	CORTE No 2
DESCANZO F									
Q			1,2			1,00	1,20	M	CORTE No 2
R			1,2			1,00	1,20	M	CORTE No 2
S			1,2			1,00	1,20	M	CORTE No 2
TRAMO G									
T			2			1,00	2,00	M	CORTE No 2
U			2			1,00	2,00	M	CORTE No 2

TOTAL EJECUTADO	38,62	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**38,62**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
38,62	0,00	**38,62**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA			RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de mayo de 2026**

CAPITULO		**OTROS**		**ACTA No:**	**002**
ITEM	**7,4,6**	**ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E=6CM 26X6X6, INSTALADO Y PEGADO CON MORTERO 1:3, SEGÚN FIGURAS EXISTENTES, CONSERVANDO EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO ORIGINAL**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



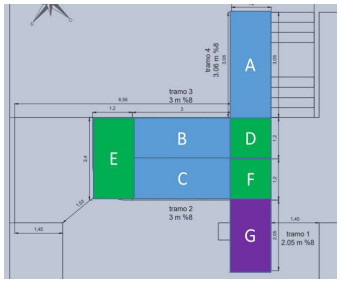

LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
A		1,00	3,06			1,00	3,06	M2	CORTE No 2
D		1,10	1,1			1,00	1,21	M2	CORTE No 2
B		1,00	3			1,00	3,00	M2	CORTE No 2
E		1,00	2,4			1,00	2,40	M2	CORTE No 2
C		1,00	3			1,00	3,00	M2	CORTE No 2
F		1,10	1,1			1,00	1,21	M2	CORTE No 2
G		1,00	2,06			1,00	2,06	M2	CORTE No 2

TOTAL EJECUTADO	15,94	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**15,94**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
15,94	0,00	**15,94**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL**	
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**	
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01


Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SUBDIRECION LOCAL DE INTEGRACION LOCAL CIUDAD
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de mayo de 2026**

CAPITULO		**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**002**
ITEM	**9,1,20**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA DE 1 ¼" PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR CON SOPORTES PLÁSTICO. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





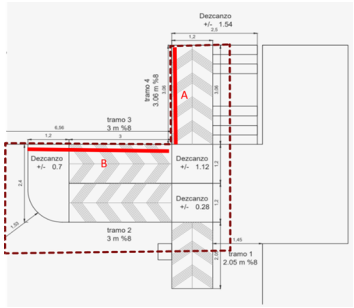

LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CORTE 2									
MURO RAMPA									
TRAMO A									
A			3,6			2,00	7,20	M	CORTE No 2
TRAMO B									
B			4,2			2,00	8,40	0	CORTE No 2

TOTAL EJECUTADO	15,60	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**15,60**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
15,60	0,00	**15,60**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SUBDIRECION LOCAL DE INTEGRACION LOCAL CIUDAD
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de mayo de 2026**

CAPITULO	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**002**
ITEM	**12,13** — **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





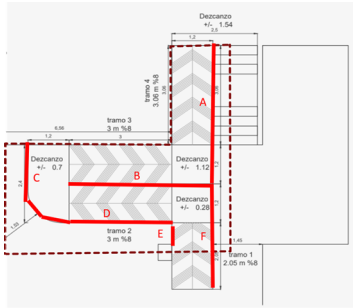

LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CORTE 2									
MURO RAMPA									
A			4,2			1,00	4,20	M	CORTE No 2
B			4			1,00	4,00	M	CORTE No 2
C			2,1			1,00	2,10	M	CORTE No 2
D			4,25			1,00	4,25	M	CORTE No 2
E			0,64			1,00	0,64	M	CORTE No 2
F			2,7			1,00	2,70	M	CORTE No 2

TOTAL EJECUTADO	17,89	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**17,89**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
17,89	0,00	**17,89**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL**	
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**	
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SUBDIRECION LOCAL DE INTEGRACION LOCAL CIUDAD
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de mayo de 2026**

CAPITULO	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**002**
ITEM	**14,2,7** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





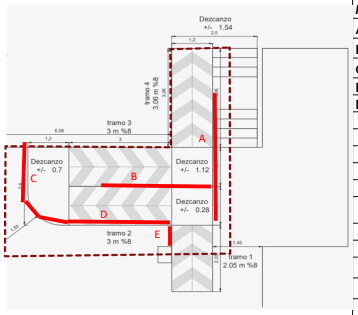

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
MURO RAMPA									
A			3,5			1,00	3,50	M	CORTE No 2
B			3,5			1,00	3,50	M	CORTE No 2
C			2,1			1,00	2,10	M	CORTE No 2
D			4,24			1,00	4,24	M	CORTE No 2
E			0,64			1,00	0,64	M	CORTE No 2

TOTAL EJECUTADO	13,98	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**13,98**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13,98	0,00	**13,98**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SUBDIRECION LOCAL DE INTEGRACION LOCAL CIUDAD
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de mayo de 2026**

CAPITULO	**ENTREPISOS.**		**ACTA No:**	**002**
ITEM	**14,3,1**	**SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SOBREPISO EN PANELERÍA LIVIANA ACABADO UNA (1) CARA FABRICADO CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO E.=17 MM, CON PERFILERÍA TUBULAR CUADRADA 1"X1" CAL.19 (E.=1,1 MM) ACERO NEGRO CR. ASTM A-1008 FY=33417 PSI FORMANDO UNA RETÍCULA DE 41X41 CM (ENTRE EJES), ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE PERFILERÍA Y ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LÁMINAS, TAPAS LATERALES DE TERMINACIÓN CUANDO SE REQUIERA, FIBRA AISLANTE, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO. NO INCLUYE LIJADO, NI PINTADO DE LA SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



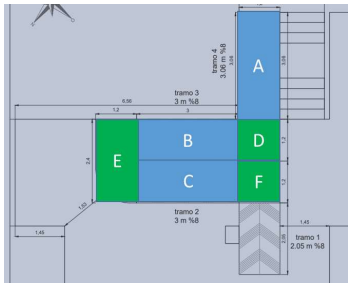

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
TRAMO 1 A		1,20	3,06			1,00	3,67	M2	CORTE No 2
DESCANZO 1 D		1,20	1,20			1,00	1,44	M2	CORTE No 2
TRAMO 2 B		1,20	3,00			1,00	3,60	M2	CORTE No 2
DESCANZO 2 E		1,20	2,40			1,00	2,88	M2	CORTE No 2
TRAMO 3 C		1,20	3,00			1,00	3,60	M2	CORTE No 2
DESCANZO 3 F		1,20	1,20			1,00	1,44	M2	CORTE No 2

TOTAL EJECUTADO	16,63	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**16,63**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
16,63	0,00	**16,63**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SUBDIRECION LOCAL DE INTEGRACION LOCAL CIUDAD
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de mayo de 2026**

CAPITULO		**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		**ACTA No:**	**002**
ITEM	**19,1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



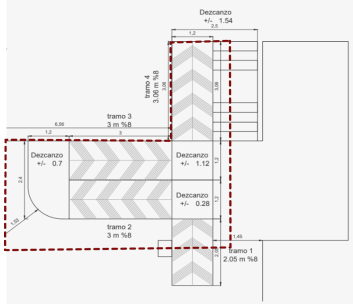

LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
			CORTE 2						
ZONA RAMPA		2,50	3,06			1,00	7,65	M2	CORTE No 2
ZONA RAMPA		6,40	4,453			1,00	28,50	M2	CORTE No 2

TOTAL EJECUTADO	36,15	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**36,15**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
36,15	0,00	**36,15**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SUBDIRECION LOCAL DE INTEGRACION LOCAL CIUDAD
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de mayo de 2026**

CAPITULO	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**			**ACTA No:**	**002**
ITEM	**22,1,13**	**PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, LINEAL A.<=50 CM, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**			**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





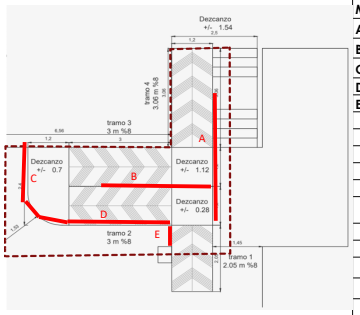

LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR		Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
MURO RAMPA									
A				3,5			1,00	3,50	M	CORTE No 2
B				3,5			1,00	3,50	M	CORTE No 2
C				2,1			1,00	2,10	M	CORTE No 2
D				4,24			1,00	4,24	M	CORTE No 2
E				0,64			1,00	0,64	M	CORTE No 2

TOTAL EJECUTADO	13,98	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**13,98**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13,98	0,00	**13,98**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA **FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 5**	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	31	5	2026	TIPO DE CONTRATO	OBRA			
2. ACTA No.	**5**			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN SOCIAL GRANCOLOMBIANO							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10675-2025	7. FECHA CONTRATO:	11/19/2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 12,017,556,820		
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	11/30/2027	11. PLAZO:	23 MESES 21 DIAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A	14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11835-2025	18. FECHA CONTRATO:	11/20/2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265		
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	12/30/2027	22. PLAZO:	24 MESES 21 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A	25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL						
27. SUPERVISOR SDIS:	ARQ JONNY EDUARD PADILLA						

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 (CINCO) días del mes de JUNIO del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA Obray/o Modificaciones
del mes de ABRIL según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT ACTU		CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**												
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).	M2	-	$ 6,042.00	$ -	334.80	$ 2,022,861.60		$ -	334.80	$ 2,022,861.60	334.80	$ 2,022,861.60
1.1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	M	45.00	$ 40,931.00	$ 1,841,895.00	77.43	$ 3,169,287.33		$ -	77.43	$ 3,169,287.33	77.43	$ 3,169,287.33
1.3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**						$ -		$ -		$ -		
1.3.12	DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	-	$ 26,129.00	$ -	25.92	$ 677,263.68		$ -	25.92	$ 677,263.68	25.92	$ 677,263.68
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**						$ -		$ -		$ -		
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	75.00	$ 13,685.00	$ 1,026,375.00	45.74	$ 625,951.90		$ -	45.74	$ 625,951.90	45.74	$ 625,951.90
1.4.3	DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	24.10	$ 13,685.00	$ 329,809.00	12.10	$ 165,588.50		$ -	12.10	$ 165,588.50	12.10	$ 165,588.50
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	121.32	$ 20,561.00	$ 2,494,461.00	320.52	$ 6,590,211.72	23.50	$ 483,183.50	297.02	$ 6,107,028.22	320.52	$ 6,590,211.72
1.5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**						$ -		$ -		$ -		
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 29,545.00	$ -	37.52	$ 1,108,528.40		$ -	37.52	$ 1,108,528.40	37.52	$ 1,108,528.40
1.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**						$ -		$ -		$ -		
1.8.4	PICADA Y RAYADA DE MURO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR Y PULIDORA CON DISCO DIAMANTADO GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	37.68	$ 12,313.00	$ 463,954.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	24.89	$ 26,358.00	$ 656,051.00	30.92	$ 814,989.36		$ -	30.92	$ 814,989.36	30.92	$ 814,989.36

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT ACTU		CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**						$ -		$ -		$ -		
1.9.8	DEMOLICION DE CONCRETOS ENTERRADOS (PROVISION). INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M3	0.95	$ 223,164.00	$ 212,006.00	0.95	$ 212,005.80		$ -	0.95	$ 212,005.80	0.95	$ 212,005.80
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	60.48	$ 56,838.00	$ 3,437,562.00	59.36	$ 3,373,903.68		$ -	59.36	$ 3,373,903.68	59.36	$ 3,373,903.68
1.9.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	$ 16,589.00	$ -	2.80	$ 46,449.20		$ -	2.80	$ 46,449.20	2.80	$ 46,449.20
1.10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**						$ -		$ -		$ -		
1.10.10	DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	6.75	$ 23,973.00	$ 161,818.00	6.75	$ 161,817.75		$ -	6.75	$ 161,817.75	6.75	$ 161,817.75
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**						$ -		$ -		$ -		
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**						$ -		$ -		$ -		
2.1.3	EXCAVACION MECANICA. DESCAPOTE Y MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M3	67.62	$ 68,193.00	$ 4,611,211.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.6	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3	-	$ 80,537.00	$ -	79.34	$ 6,389,805.58		$ -	79.34	$ 6,389,805.58	79.34	$ 6,389,805.58
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	-	$ 103,471.00	$ -	32.14	$ 3,325,557.94		$ -	32.14	$ 3,325,557.94	32.14	$ 3,325,557.94
2.1.11	COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	104.58	$ 2,678.00	$ 280,065.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.2	**CONCRETOS**						$ -		$ -		$ -		
2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	M2	104.58	$ 27,998.00	$ 2,928,031.00	10.80	$ 302,378.40		$ -	10.80	$ 302,378.40	10.80	$ 302,378.40
2.2.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>6,1<=8,0 CM F'C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	86.52	$ 294,656.00	$ 25,493,637.00	0.81	$ 238,671.36		$ -	0.81	$ 238,671.36	0.81	$ 238,671.36
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2		$ 348,477.00	$ -	60.13	$ 20,953,922.01		$ -	60.13	$ 20,953,922.01	60.13	$ 20,953,922.01
2.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 5/8" PROFUNDIDADES ENTRE 3 Y 5 CM	UN	-	$ 23,555.00	$ -	116.00	$ 2,732,380.00		$ -	116.00	$ 2,732,380.00	116.00	$ 2,732,380.00
2.3	**VARIOS - CIMENTACIONES**						$ -		$ -		$ -		
2.3.1	IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE CONTENCION CON PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABLE + UNA CAPA DE POLIETILENO 5 MICRAS. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE CON MORTERO DE PAÑETE.	M2		$ 56,462.00	$ -	8.23	$ 464,682.26		$ -	8.23	$ 464,682.26	8.23	$ 464,682.26
2.4	**ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO**						$ -		$ -		$ -		
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	104.58	$ 364,446.00	$ 38,113,763.00	36.00	$ 13,120,056.00		$ -	36.00	$ 13,120,056.00	36.00	$ 13,120,056.00
2.5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**						$ -		$ -		$ -		
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	310.43	$ 5,206.00	$ 1,616,099.00	291.10	$ 1,515,466.60		$ -	291.10	$ 1,515,466.60	291.10	$ 1,515,466.60
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	464.17	$ 5,618.00	$ 2,607,707.00	181.78	$ 1,021,240.04		$ -	181.78	$ 1,021,240.04	181.78	$ 1,021,240.04
2.6	**ESTRUCTURAS METALICAS**						$ -		$ -		$ -		
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	-	$ 19,248.00	$ -	119.36	$ 2,297,441.28		$ -	119.36	$ 2,297,441.28	119.36	$ 2,297,441.28
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**						$ -		$ -		$ -		
3.1	**MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.**						$ -		$ -		$ -		
3.1.3	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	24.89	$ 205,471.00	$ 5,114,173.00	25.06	$ 5,149,103.26		$ -	25.06	$ 5,149,103.26	25.06	$ 5,149,103.26
3.1.6	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0.15 M (A LA VISTA DOS CARAS)	M2	-	$ 171,912.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3.3	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.**						$ -		$ -		$ -		
3.3.2	VIGA CINTA DE REMATE / CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL H.>10,0<=12,5 CM A.>10,0<=12,5 CM EN CONCRETO F'C=3000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE EN LA MEZCLA, FORMALETA CORRIENTE CON ACABADO NO VISTO. INCLUYE DESMOLDANTE, CURADOR DE CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M	32.13	$ 148,807.00	$ 4,781,169.00	141.71	$ 21,087,439.97		$ -	141.71	$ 21,087,439.97	141.71	$ 21,087,439.97
3.5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**						$ -		$ -		$ -		
3.5.2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	$ 21,945.00	$ -	50.08	$ 1,099,005.60		$ -	50.08	$ 1,099,005.60	50.08	$ 1,099,005.60
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	38.71	$ 24,413.00	$ 945,027.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**						$ -		$ -		$ -		
7.	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**						$ -		$ -		$ -		
7.1.1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 H.= 2 CM, SIN PENDIENTE.	M2		$ 26,137.00	$ -	34.25	$ 895,192.25	34.25	$ 895,192.25		$ -	34.25	$ 895,192.25
7.2	**ACABADO DE PISOS.**						$ -		$ -		$ -		
7.2.15	PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	35.88	$ 73,009.00	$ 2,619,563.00	34.25	$ 2,500,558.25		$ -	34.25	$ 2,500,558.25	34.25	$ 2,500,558.25
7.3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**						$ -		$ -		$ -		
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	-	$ 16,069.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.9	GUARDA ESCOBA EN PVC	M	-	$ 51,750.00	$ -	21.35	$ 1,104,862.50		$ -	21.35	$ 1,104,862.50	21.35	$ 1,104,862.50

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT ACTU		CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.4	**OTROS**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
7.4.6	ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E=6CM 26X6X6, INSTALADO Y PEGADO CON MORTERO 1:3, SEGÚN FIGURAS EXISTENTES, CONSERVANDO EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO ORIGINAL	M2	6.75	$ 257,795.00	$ 1,740,116.00	30.08	$ 7,754,473.60		$ -	30.08	$ 7,754,473.60	30.08	$ 7,754,473.60
7.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	-	$ 161,990.00	$ -	60.13	$ 9,740,458.70		$ -	60.13	$ 9,740,458.70	60.13	$ 9,740,458.70
8	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UND		$ 76,983.00	$ -	33.00	$ 2,540,439.00		$ -	33.00	$ 2,540,439.00	33.00	$ 2,540,439.00
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
9.2	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
9.2.8	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 43,597.00	$ -	1.00	$ 43,597.00	1.00	$ 43,597.00		$ -	1.00	$ 43,597.00
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	-	$ 159,134.00	$ -	48.27	$ 7,681,398.18		$ -	48.27	$ 7,681,398.18	48.27	$ 7,681,398.18
9.3.3	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	-	$ 48,620.00	$ -	25.92	$ 1,260,230.40		$ -	25.92	$ 1,260,230.40	25.92	$ 1,260,230.40
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
11.47	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UND		$ 189,064.00	$ -	2.00	$ 378,128.00		$ -	2.00	$ 378,128.00	2.00	$ 378,128.00
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø.=2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL./BWG.10 HUECO 2,1/4"X2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	27.00	$ 108,173.00	$ 2,920,671.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	-	$ 41,179.00	$ -	25.92	$ 1,067,359.68		$ -	25.92	$ 1,067,359.68	25.92	$ 1,067,359.68
16.11	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	-	$ 162,890.00	$ -	23.50	$ 3,827,915.00		$ -	23.50	$ 3,827,915.00	23.50	$ 3,827,915.00
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	442.27	$ 4,821.00	$ 2,132,184.00	562.82	$ 2,713,355.22		$ -	562.82	$ 2,713,355.22	562.82	$ 2,713,355.22
20	**AMBIENTALES**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
20.14	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	169.05	$ 18,041.00	$ 3,049,831.00	244.59	$ 4,412,648.19		$ -	244.59	$ 4,412,648.19	244.59	$ 4,412,648.19
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
21.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
21.1.11	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	37.68	$ 84,039.00	$ 3,166,590.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
22.1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2		$ 14,518.00	$ -	7.35	$ 106,707.30	7.35	$ 106,707.30		$ -	7.35	$ 106,707.30
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2		$ 51,391.00	$ -	40.28	$ 2,070,029.48		$ -	40.28	$ 2,070,029.48	40.28	$ 2,070,029.48
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	76.40	$ 31,749.00	$ 2,425,624.00	43.92	$ 1,394,416.08		$ -	43.92	$ 1,394,416.08	43.92	$ 1,394,416.08
22.1.13	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, LINEAL A.<=50 CM, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M		$ 11,820.00	$ -	96.28	$ 1,138,029.60		$ -	96.28	$ 1,138,029.60	96.28	$ 1,138,029.60

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT ACTU		CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	-	$ 30,224.00	$ -	161.59	$ 4,883,896.16	45.74	$ 1,382,445.76	115.85	$ 3,501,450.40	161.59	$ 4,883,896.16
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
23.1	**ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
23.1.5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	81.12	$ 121,703.00	$ 9,872,547.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	50.70	$ 45,084.00	$ 2,285,759.00	197.40	$ 8,899,581.60		$ -	197.40	$ 8,899,581.60	197.40	$ 8,899,581.60

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT ACTU		CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
23.4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	81.12	$ 227,950.00	$ 18,491,304.00	98.67	$ 22,491,826.50		$ -	98.67	$ 22,491,826.50	98.67	$ 22,491,826.50
23.8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	72.40	$ 57,044.00	$ 4,129,986.00	56.32	$ 3,212,718.08		$ -	56.32	$ 3,212,718.08	56.32	$ 3,212,718.08
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	75.00	$ 87,159.00	$ 6,536,925.00	45.74	$ 3,986,652.66		$ -	45.74	$ 3,986,652.66	45.74	$ 3,986,652.66
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	24.10	$ 47,840.00	$ 1,152,944.00	7.11	$ 340,142.40		$ -	7.11	$ 340,142.40	7.11	$ 340,142.40
	VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS												

34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**$ 157,638,857.00**	**$ 193,110,625.05**	**$ 2,911,125.81**	**$ 190,199,499.24**	**$ 193,110,625.05**
35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**	$ 157,638,857.00	$ 167,662,134.25	$ 2,911,125.81	$ 190,199,499.24	$ 193,110,625.05
ADMINISTRACIÓN	29.00%	$ 45,715,268.53	$ 56,002,081.26	$ 844,226.48	$ 55,157,854.78	$ 56,002,081.26
IMPREVISTO	1%	$ 1,576,388.57	$ 1,931,106.25	$ 29,111.26	$ 1,901,994.99	$ 1,931,106.25
UTILIDAD	4%	$ 6,305,554.28	$ 7,724,425.00	$ 116,445.03	$ 7,607,979.97	$ 7,724,425.00
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		**$ 53,597,211.38**	**$ 65,657,612.51**	**$ 989,782.77**	**$ 64,667,829.74**	**$ 65,657,612.51**
AJUSTE AL PESO		-$ 0.38	$ 0.44	$ 0.42	$ 0.02	$ 0.44
ANTICIPO	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		**$ 211,236,068.00**	**$ 258,768,238.00**	**$ 3,900,909.00**	**$ 254,867,329.00**	**$ 258,768,238.00**
						100.00%

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO		40. NOMBRE DEL ARCHIVO		42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	4	ABRIL 2026				
INFORME SOCIAL	4	ABRIL 2026				
INFORME AMBIENTAL	4	ABRIL 2026				
INFORME SST	4	ABRIL 2026				
INFORME DE SUPERVISION	4	ABRIL 2026				
ACTA PARCIAL	4	MAYO 2026				
SOPORTE PAGO SDH	4	MAYO 2026				
FACTURA	4	MAYO 2026				
FORMATO MC 14	4	MAYO 2026				

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de JUNIO del año 2026

Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO
C.C. 79,905,718
Rep Legal. CONCORCIO SANTA ISABEL
Nit. 902,0003,595-6

Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
C.C. No. 1,062,398,686
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL
902,007,033-7

Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	GRAN COLOMBIANO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.4.9**	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**			**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

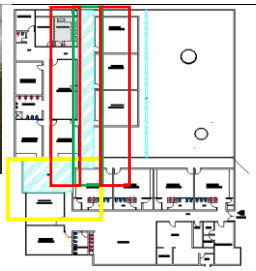


LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTA PASILLO (Verde)		2,38	23,50			1,00	55,93	M2	CORTE No 1
PASILLO CUBIERTA (DESMONTE FLANCHE)		0,50	23,50			2,00	23,50	M2	CORTE No 1
DESMONTE TEJAS									
CUBIERTA AULAS (rojo)		2,00	23,5			2,00	94,00	M2	CORTE No 2
CORTE No 3									
SOLARIO (amarillo)		5,40	8,09			1,00	43,69	M2	CORTE No 3
CORTE No 4									
Pendiente por cobrar retiro de tejas aulas existentes en cubierta pasilo		1,10	23,5			1,00	25,85	M2	
		2,30	23,5			1,00	54,05	M2	
CORTE No 5									
Pendiente por cobrar retiro de tejas aulas existentes en cubierta pasillo Costado L=5,30.		1,00	23,5			1,00	23,50	M2	

TOTAL EJECUTADO	320,52	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	297,02	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**23,50**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
23,50	297,02	**320,52**

OBSERVACIONES:
Se deja claridad que la cantidad pendiente por cobrar, corresponde al desmonte d ela teja sobre aulas, hasta el caballete para poder trabajar adecuadamente la instalacion de las canales. Ala 1 Ancho: 3,10 y Ala 2 A=5,30

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE		**NOMBRE**	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	GRAN COLOMBIANO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**ACABADO DE PISOS.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**7.1.1**	**ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 H.= 2 CM, SIN PENDIENTE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

JARDÍN SOCIAL GRAN COLOMBIANO







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALON SOLARIO		5,00	6,85			1,00	34,25	M2	

TOTAL EJECUTADO	34,25	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**34,25**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
34,25	0,00	**34,25**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATIS[illegible]**	
NOMBRE		**NOMBRE**	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINLLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	GRAN COLOMBIANO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**9.2.8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
REJILLA ANTIRATONES						1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	GRAN COLOMBIANO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

JARDÍN SOCIAL GRAN COLOMBIANO





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MURO PASILLO SALON CAMPAMENTO		1,64		2,20		1,00	3,61	M2	
		4,68		0,80		1,00	3,74	M2	

TOTAL EJECUTADO	7,35	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**7,35**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,35	0,00	**7,35**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE		**NOMBRE**	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	GRAN COLOMBIANO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO		**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**22.3.6**	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**		**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









JARDÍN SOCIAL GRAN COLOMBIAN





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PASILLO CUBIERTA			22,87			2,00	45,74	ML	
BAJANTES									
PASILLO CUBIERTA			2,60			4,00	10,40	ML	
PERFILES VERTICALES CERRAMIENTO			2,3			10,00	23,00	ML	
CORTE No 4									
CANAL									
CUBIERTA PERIMETRAL PATIO			23,21			1,00	23,21	ML	
CANAL									
BAJANTES			2,30			3,00	6,90	ML	
REFUERZO BAJANTES PATIO			2,20			3,00	6,60	ML	
CORTE No 5									
PINTURA FLANCHE PASILLO POLICARBONATO			22,87			2,00	45,74	ML	

TOTAL EJECUTADO	161,59	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	115,85	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML	
PRESENTE ACTA	**45,74**	ML	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
45,74	115,85	**161,59**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE		**NOMBRE**	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 5

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024	
Página: 1 de 1	

1. FECHA ELABORACIÓN:	31	5	2026	TIPO DE CONTRATO	OBRA			
2. ACTA No.	**5**			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN SOCIAL TINTALITO							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10675-2025	7. FECHA CONTRATO:	19/11/2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 12,017,556,820		
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2027	11. PLAZO:	23 MESES 21 DIAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A	14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11835-2025	18. FECHA CONTRATO:	20/11/2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265		
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2027	22. PLAZO:	24 MESES 21 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A	25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL						
27. SUPERVISOR SDIS:	ARQ JONNY EDUARD PADILLA						

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 (CINCO) días del mes de JUNIO del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA Obray/o Modificaciones
del mes de ABRIL según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**					-							
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.					-							
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	105.15	$ 40,931.00	4,303,895.00	148.59	$ 6,081,937.29		$ -	148.59	$ 6,081,937.29	148.59	$ 6,081,937.29
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.					-	$ -		$ -				
1.3.11	DESMONTE MANUAL DE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO, PULIENDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA DE SOPORTE EXISTENTES QUE AMARRAN LA MALLA AL MARCO EN ÁNGULO Y RETIRANDO LA MISMA, GARANTIZANDO QUE EL MARCO Y SU ESTRUCTURA DE SOPORTE PERMANEZCAN INMODIFICABLES. NO INCLUYE EL RETIRO DE NINGÚN OTRO ELEMENTO. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	275.12	$ 18,109.00	4,982,148.00	249.00	$ 4,509,141.00		$ -	249.00	$ 4,509,141.00	249.00	$ 4,509,141.00
1.3.12	DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2		$ 26,129.00	0.00	237.58	$ 6,207,727.82		$ -	237.58	$ 6,207,727.82	237.58	$ 6,207,727.82
1.3.13	DESMONTE MANUAL DE CONCERTINA EXISTENTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE O DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO RELACIONADO. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA.	M2		$ 26,129.00	0.00	123.29	$ 3,221,444.41		$ -	123.29	$ 3,221,444.41	123.29	$ 3,221,444.41

1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.					-	$ -		$ -					
1.4.1	PROTECCIÓN DEL CIELO RASO EXISTENTE DEJADO EXPUESTO POSTERIOR AL DESMONTE DE LA CUBIERTA, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE POLIETILENO NEGRO CAL.4 EN CAPA SENCILLA. INCLUYE AMARRES Y DEMÁS REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN. NO INCLUYE ANDAMIAJE POR SER ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA AL DESMONTE DE CUBIERTA.	M2	71.85	$ 6,876.00	494,041.00	44.10	$ 303,231.60		$ -	44.10	$ 303,231.60	44.10	$ 303,231.60
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	26.20	$ 13,685.00	358,547.00	7.30	$ 99,900.50		$ -	7.30	$ 99,900.50	7.30	$ 99,900.50
1.4.3	DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	30.40	$ 13,685.00	416,024.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	-	$ 21,234.00	0.00	205.63	$ 4,366,347.42		$ -	205.63	$ 4,366,347.42	205.63	$ 4,366,347.42
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	140.33	$ 23,966.00	3,363,149.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,087.80	$ 38,100.00	41,445,180.00	1,121.48	$ 42,728,388.00		$ -	1,121.48	$ 42,728,388.00	1,121.48	$ 42,728,388.00
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLASTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO	M2	120.87	$ 20,561.00	2,485,208.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.					-	$ -		$ -				
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	6.35	$ 29,545.00	187,611.00	6.33	$ 187,019.85		$ -	6.33	$ 187,019.85	6.33	$ 187,019.85
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.					-	$ -		$ -				
1.6.21	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERAMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO	UN	2.00	$ 29,734.00	59,468.00	2.00	$ 59,468.00		$ -	2.00	$ 59,468.00	2.00	$ 59,468.00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	99.00	$ 15,043.00	1,489,257.00	113.00	$ 1,699,859.00	10.00	$ 150,430.00	103.00	$ 1,549,429.00	113.00	$ 1,699,859.00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	99.00	$ 20,337.00	2,013,363.00	103.00	$ 2,094,711.00		$ -	103.00	$ 2,094,711.00	103.00	$ 2,094,711.00
1.6.29	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	52.00	$ 12,396.00	644,592.00	40.00	$ 495,840.00		$ -	40.00	$ 495,840.00	40.00	$ 495,840.00
1.6.30	RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS. INCLUYE ETIQUETAR CADA COMPONENTE DEL TABLERO, CABLES DE ENTRADA, BREAKERS, HERRAJES, MAMPOSTERIA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	UN	1.00	$ 107,691.00	107,691.00	2.00	$ 215,382.00		$ -	2.00	$ 215,382.00	2.00	$ 215,382.00
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.					-	$ -		$ -				
1.9.9	DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE BORDILLOS), CONCRETO ASFÁLTICO, ESCALAS SOBRE TERRENO Y PISOS DE EDIFICACIONES (INCLUYE ACABADO) EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M2	5.16	$ 21,133.00	109,046.00	4.17	$ 88,124.61		$ -	4.17	$ 88,124.61	4.17	$ 88,124.61

1.9.14	CORTE Y DEMOLICIÓN CABEZAS, COLUMNETAS, VIGAS Y BORDILLOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN		$ 19,564.00	0.00	45.00	$ 880,380.00		$ -	45.00	$ 880,380.00	45.00	$ 880,380.00
1.11	OTROS PRELIMINARES.					-	$ -		$ -				
1.11.4	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	M2	101.09	$ 6,808.00	688,221.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.					-	$ -		$ -				
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS					-	$ -		$ -				
2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	134.54	$ 17,818.00	2,397,234.00	-	$ -		$ -				$ -
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	92.78	$ 45,048.00	4,179,553.00	116.02	$ 5,226,468.96	6.90	$ 310,831.20	109.12	$ 4,915,637.76	116.02	$ 5,226,468.96
2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	69.08	$ 38,240.00	2,641,619.00	1.46	$ 55,830.40		$ -	1.46	$ 55,830.40	1.46	$ 55,830.40
2.1.11	COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	5.16	$ 2,678.00	13,818.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.2	CONCRETOS					-	$ -		$ -				
2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	M2	5.16	$ 27,998.00	144,470.00	32.75	$ 916,934.50		$ -	32.75	$ 916,934.50	32.75	$ 916,934.50
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	5.16	$ 348,477.00	1,798,141.00	4.17	$ 1,453,149.09		$ -	4.17	$ 1,453,149.09	4.17	$ 1,453,149.09
2.2.17	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	92.78	$ 323,585.00	30,022,216.00	117.75	$ 38,102,133.75		$ -	117.75	$ 38,102,133.75	117.75	$ 38,102,133.75
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA					-	$ -		$ -				
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	15.43	$ 5,206.00	80,329.00	12.46	$ 64,866.76		$ -	12.46	$ 64,866.76	12.46	$ 64,866.76
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	603.07	$ 5,618.00	3,388,047.00	991.63	$ 5,570,977.34		$ -	991.63	$ 5,570,977.34	991.63	$ 5,570,977.34
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS					-	$ -		$ -				
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 19,248.00	0.00	56.25	$ 1,082,700.00	56.25	$ 1,082,700.00	-	$ -	56.25	$ 1,082,700.00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.					-	$ -		$ -				
3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.					-	$ -		$ -				
3.3.2	VIGA CINTA DE REMATE / CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL H.>10,0<=12,5 CM A.>10,0<=12,5 CM EN CONCRETO F'C=3000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE EN LA MEZCLA, FORMALETA CORRIENTE CON ACABADO NO VISTO. INCLUYE DESMOLDANTE, CURADOR DE CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M		$ 148,807.00	0.00	16.06	$ 2,389,840.42		$ -	16.06	$ 2,389,840.42	16.06	$ 2,389,840.42
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.					-	$ -		$ -				
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2		$ 24,413.00	0.00	2.62	$ 63,962.06		$ -	2.62	$ 63,962.06	2.62	$ 63,962.06
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -		$ -				
5.1	SALIDAS					-	$ -		$ -				
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 211,381.00	0.00	31.00	$ 6,552,811.00		$ -	31.00	$ 6,552,811.00	31.00	$ 6,552,811.00

5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 229,747.00	0.00	7.00	$ 1,608,229.00		$ -	7.00	$ 1,608,229.00	7.00	$ 1,608,229.00
5.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12(FASE+ RETORNO+RETORNO +RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 245,132.00	0.00	2.00	$ 490,264.00		$ -	2.00	$ 490,264.00	2.00	$ 490,264.00
5.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA	UN		$ 372,030.00	0.00	1.00	$ 372,030.00		$ -	1.00	$ 372,030.00	1.00	$ 372,030.00
5.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X63A 50 KA	UN		$ 426,613.00	0.00	2.00	$ 853,226.00		$ -	2.00	$ 853,226.00	2.00	$ 853,226.00
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 38,208.00	0.00	48.00	$ 1,833,984.00		$ -	48.00	$ 1,833,984.00	48.00	$ 1,833,984.00
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN		$ 38,067.00	0.00	4.00	$ 152,268.00		$ -	4.00	$ 152,268.00	4.00	$ 152,268.00
5.2	SALIDAS					-	**$ -**		**$ -**				
5,2,4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 243,393.00	0.00	6.00	$ 1,460,358.00		$ -	6.00	$ 1,460,358.00	6.00	$ 1,460,358.00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	99.00	$ 248,280.00	24,579,720.00	103.00	$ 25,572,840.00		$ -	103.00	$ 25,572,840.00	103.00	$ 25,572,840.00
5.3	TABLEROS Y OTROS					-	**$ -**		**$ -**				
5.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 788,234.00	0.00	3.00	$ 2,364,702.00		$ -	2.00	$ 1,576,468.00	2.00	$ 1,576,468.00
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN		$ 61,366.00	0.00	2.00	$ 122,732.00		$ -	2.00	$ 122,732.00	2.00	$ 122,732.00
5.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN		$ 98,287.00	0.00	2.00	$ 196,574.00		$ -	2.00	$ 196,574.00	2.00	$ 196,574.00
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN		$ 63,670.00	0.00	69.00	$ 4,393,230.00		$ -	69.00	$ 4,393,230.00	69.00	$ 4,393,230.00
5.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 0,3X0,3 M, INCLUYE MARCO Y TAPA	UN		$ 376,986.00	0.00	3.00	$ 1,130,958.00		$ -	3.00	$ 1,130,958.00	3.00	$ 1,130,958.00
5.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.44 M	UN		$ 548,699.00	0.00	3.00	$ 1,646,097.00		$ -	3.00	$ 1,646,097.00	3.00	$ 1,646,097.00
5.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G	UN		$ 248,401.00	0.00	3.00	$ 745,203.00		$ -	3.00	$ 745,203.00	3.00	$ 745,203.00
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.					-	$ -		$ -				
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	58.00	$ 17,026.00	987,508.00	264.00	$ 4,494,864.00		$ -	264.00	$ 4,494,864.00	264.00	$ 4,494,864.00
5.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF	M		$ 44,291.00	0.00	25.00	$ 1,107,275.00	25.00	$ 1,107,275.00	-	$ -	25.00	$ 1,107,275.00
5.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE Nº 2/0 AWG	M		$ 67,154.00	0.00	16.90	$ 1,134,902.60	16.90	$ 1,134,902.60	-	$ -	16.90	$ 1,134,902.60
5.4.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	M		$ 30,924.00	0.00	6.00	$ 185,544.00	6.00	$ 185,544.00	-	$ -	6.00	$ 185,544.00
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	58.00	$ 59,630.00	3,458,540.00	279.00	$ 16,636,770.00		$ -	279.00	$ 16,636,770.00	279.00	$ 16,636,770.00
5.5	ILUMINACIÓN.					-	**$ -**		**$ -**				
5.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA TIPO LED DE 60 W. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	36.00	$ 80,893.00	2,912,148.00	38.00	$ 3,073,934.00		$ -	38.00	$ 3,073,934.00	38.00	$ 3,073,934.00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	46.00	$ 203,696.00	9,370,016.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 204,308.00	0.00	40.00	$ 8,172,320.00		$ -	40.00	$ 8,172,320.00	40.00	$ 8,172,320.00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 44,064.00	0.00	10.00	$ 440,640.00	10.00	$ 440,640.00	-	$ -	10.00	$ 440,640.00
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	17.00	$ 42,935.00	729,895.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.16	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 21,707.00	0.00	25.00	$ 542,675.00		$ -	25.00	$ 542,675.00	25.00	$ 542,675.00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.					-	$ -		$ -				
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.					-	**$** -		**$** -				
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	146.68	$ 52,523.00	7,704,074.00	6.33	$ 332,470.59		$ -	6.33	$ 332,470.59	6.33	$ 332,470.59
7.2	ACABADO DE PISOS.					-	**$** -		**$** -				
7.2.7	ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM COLOR BLANCO PARA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y RETICULADO, IMPERMEABLE, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, TRÁFICO COMERCIAL MODERADO, TIPO BALDOSA ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS Y PISCINA REF.135026583 DE ALFA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.	M2	6.35	$ 89,382.00	567,343.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	-	$ 135,070.00	0.00	6.33	$ 854,993.10		$ -	6.33	$ 854,993.10	6.33	$ 854,993.10
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.					-	$ -		$ -				
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	-	$ 28,261.00	0.00	10.98	$ 310,305.78		$ -	10.98	$ 310,305.78	10.98	$ 310,305.78
7.3.6	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	9.46	$ 53,052.00	501,872.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.4	OTROS					-	$ -		$ -				
7.4.5	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	108.00	$ 3,665.00	395,820.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	**$** -		**$** -				
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	**$** -		**$** -				
9.3.3	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2		$ 48,620.00	0.00	237.58	$ 11,551,139.60		$ -	237.58	$ 11,551,139.60	237.58	$ 11,551,139.60
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -		$ -				
11.1	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	2.00	$ 106,372.00	212,744.00	2.00	$ 212,744.00		$ -	2.00	$ 212,744.00	2.00	$ 212,744.00
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	-	$ 918,403.00	0.00	2.00	$ 1,836,806.00		$ -	-	$ -	-	$ -
11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	1.00	$ 31,543.00	31,543.00	1.00	$ 31,543.00		$ -	1.00	$ 31,543.00	1.00	$ 31,543.00
11.47	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	3.00	$ 189,064.00	567,192.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	**$** -		**$** -				
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -		$ -				
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	101.09	$ 108,119.00	10,929,750.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	**$** -		**$** -				
16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø.=2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL./BWG.10 HUECO 2,1/4"X2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	275.12	$ 108,173.00	29,760,556.00	253.30	$ 27,400,220.90		$ -	253.30	$ 27,400,220.90	253.30	$ 27,400,220.90

16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	312.96	$ 41,179.00	12,887,380.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					-	$ -		$ -				
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,184.96	$ 4,821.00	5,712,692.00	1,385.52	$ 6,679,591.92		$ -	1,385.52	$ 6,679,591.92	1,385.52	$ 6,679,591.92
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.					-	$ -		$ -				
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.					-	$ -		$ -				
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2		$ 14,518.00	0.00	2.62	$ 38,037.16		$ -	2.62	$ 38,037.16	2.62	$ 38,037.16
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2		$ 51,391.00	0.00	506.62	$ 26,035,708.42	31.46	$ 1,616,760.86	475.16	$ 24,418,947.56	506.62	$ 26,035,708.42
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.					-	$ -		$ -				
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	651.73	$ 39,486.00	25,734,211.00	2,456.94	$ 97,014,732.84		$ -	2,456.94	$ 97,014,732.84	2,456.94	$ 97,014,732.84
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	26.20	$ 30,224.00	791,869.00	36.23	$ 1,095,015.52		$ -	36.23	$ 1,095,015.52	36.23	$ 1,095,015.52
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					-	$ -		$ -				
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.					-	$ -		$ -				
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	140.33	$ 133,163.00	18,686,764.00	189.20	$ 25,194,439.60		$ -	189.20	$ 25,194,439.60	189.20	$ 25,194,439.60
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS					-	$ -		$ -				
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,087.80	$ 268,427.00	291,994,891.00	1,121.48	$ 301,035,511.96		$ -	1,121.48	$ 301,035,511.96	1,121.48	$ 301,035,511.96
23.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF TRASLUCIDA OPAL PC 37	M2	120.87	$ 13,031.00	1,575,057.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.					-	$ -		$ -				
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	95.96	$ 57,044.00	5,473,942.00	164.51	$ 9,384,308.44		$ -	164.51	$ 9,384,308.44	164.51	$ 9,384,308.44
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	26.20	$ 87,159.00	2,283,566.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	30.40	$ 47,840.00	1,454,336.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	149.06	$ 26,948.00	4,016,869.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS												

34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 571,133,166.00	$ 722,457,765.21	$ 6,029,083.66	$ 713,803,641.55	$ 719,832,725.21
35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**	$ 571,133,166.00	$ 722,457,765.21	$ 6,029,083.66	$ 713,803,641.55	$ 719,832,725.21
ADMINISTRACIÓN	29.00%	$ 165,628,618.14	$ 209,512,751.91	$ 1,748,434.26	$ 207,003,056.05	$ 208,751,490.31
IMPREVISTO	1%	$ 5,711,331.66	$ 7,224,577.65	$ 60,290.84	$ 7,138,036.42	$ 7,198,327.26
UTILIDAD	4%	$ 22,845,326.64	$ 28,898,310.61	$ 241,163.35	$ 28,552,145.66	$ 28,793,309.01
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		**$ 194,185,276.44**	**$ 245,635,640.17**	**$ 2,049,888.45**	**$ 242,693,238.13**	**$ 244,743,126.58**
AJUSTE AL PESO		-$ 0.44	-$ 0.38	-$ 0.11	-$ 0.68	-$ 0.79
ANTICIPO	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		**$ 765,318,442.00**	**$ 968,093,405.00**	**$ 8,078,972.00**	**$ 956,496,879.00**	**$ 964,575,851.00**
						99.64%

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO		40. NOMBRE DEL ARCHIVO		42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	5	ABRIL 2026				
INFORME SOCIAL	5	ABRIL 2026				
INFORME AMBIENTAL	5	ABRIL 2026				
INFORME SST	5	ABRIL 2026				
INFORME DE SUPERVISION	5	ABRIL 2026				
ACTA PARCIAL	5	MAYO 2026				
SOPORTE PAGO SDH	5	MAYO 2026				
FACTURA	5	MAYO 2026				
FORMATO MC 14	5	MAYO 2026				

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de JUNIO del año _2026_

Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO
C.C. 79,905,718
Rep Legal. CONCORCIO SANTA ISABEL
Nit. 902,0003,595-6

Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
C.C. No. 1,062,398,686
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL
902,007,033-7


Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K2 JS TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.6.26**	**DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA















LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COCINA						6,00	6,00	UN	CORTE No 1
BAÑOS Y ALACENAS						8,00	8,00	UN	CORTE No 1
LAVANDERIA						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
COMEDOR						6,00	6,00	UN	CORTE No 1
CIRCULACION						2,00	2,00	UN	CORTE No 1
BATERIA SANITARIA						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
MATERNOS						2,00	2,00	UN	CORTE No 1
CAMINADORES 1 Y 2						4,00	4,00	UN	CORTE No 1
LAVACOLAS						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
DEPOSITO 1						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
CIRCULACION						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
PREJARDIN 1						2,00	2,00	UN	CORTE No 1
BAÑO CAMINADORES						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
CIRCULACION ZONA F						3,00	3,00	UN	CORTE No 1
ACCESO						4,00	4,00	UN	CORTE No 1
SALA CURVA P1 Y P2						6,00	6,00	UN	CORTE No 1
SECRETARIA						2,00	2,00	UN	CORTE No 1
ARCHIVO						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
PRIMEROS AUXILIOS						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
BAÑO P.A.						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
CIRCULACION						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
COORDINACION						2,00	2,00	UN	CORTE No 1
BAÑO COORDINACION						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
SALA DE PROFESORES						2,00	2,00	UN	CORTE No 1
BAÑO SALA PROFESORES						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
COCINETA						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
BAÑO PUBLICO						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
CUARTO SUM ASEO						1,00	1,00	UN	CORTE No 1
AULAS SON 8						32,00	32,00	UN	
BATERIAS SANITARIAS						4,00	4,00	UN	
PASILLO ZONA B						3,00	3,00	UN	
CORTE No 5									
REFLECTORES PERIMETRALES						10,00	10,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	113,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	103,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**10,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,00	103,00	**113,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K2 JS TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**2.1.5**	**EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN / **LUGAR**	**DIMENSIÓN** Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
CIMIENTO CERRAMIENTO									
CORTE 4									
POR CARRERRA 88 A			0,43			1,00	0,43	M	
			60,24			1,00	60,24	M	
			0,50			1,00	0,50	M	
POR AV VILLAVICENCIO			5,60			1,00	5,60	M	
			34,23			1,00	34,23	M	
			8,12			1,00	8,12	M	
CORTE No 5									
EXCAVACION CAJAS PUESTA A TIERRA			2,00			3,00	6,00	M	
			0,30			3,00	0,90	M	

TOTAL EJECUTADO	116,02	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	109,12	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**6,90**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6,90	109,12	**116,02**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DE LOS ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLADIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K2 JS TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**2.6.2** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)**	**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



Tabla de Espesores

Calibre	Milímetros	DIÁMETRO NOMINAL - *(DIÁMETRO REAL)*							
		1/2" *(20,7mm)*	3/4" *(26,11mm)*	1" *(33,50mm)*	1 1/4" *(42,24mm)*	1 1/2" *(48,26mm)*	2" *(59,94mm)*	2 1/2" *(73,02mm)*	3" *(88,90mm)*
18	1,20	3,40kg	4,34kg	5,60kg	7,24kg	8,30kg	10,37kg	-	-
16	1,40	-	5,47kg	6,78kg	8,76kg	9,60kg	12,73kg	-	-
16	1,45	-	-	7,00kg	-	-	12,94kg	-	-
16	1,50	4,45kg	5,65kg	7,27kg	9,02kg	10,36kg	13,07kg	16,81kg	-
14	1,90	5,29kg	6,81kg	9,12kg	11,36kg	13,05kg	16,55kg	19,85kg	24,15kg

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
					KG/M2				
COMPLEMENTO TUBULARES FUTURA CONCERTINA O CERCA									
CARRERA 88A									
DIAMETRO 2"			0,50		1,73	22,00	19,03	KG	
DIAMETRO 3"			0,98		4,03	1,00	3,95	KG	
			0,81		4,03	2,00	6,53	KG	
			0,84		4,03	1,00	3,39	KG	
AV VILLAVICENCIO									
DIAMETRO 2"			0,54		1,73	25,00	23,36	KG	

TOTAL EJECUTADO	56,25	KG
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	KG
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	KG
PRESENTE ACTA	**56,25**	KG

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
56,25	0,00	**56,25**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K2 JS TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**5.4.8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

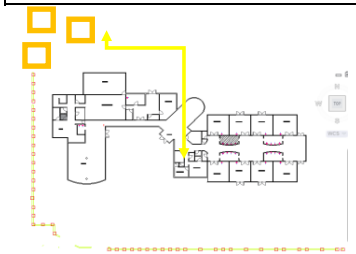



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CONEXION TABLERO ADMINISTRATIVO A TABLERO GENREAL PUESTA A TIERRA						25,00	25,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	25,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**25,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
25,00	0,00	**25,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RÉSIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLADIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	MUNICIPIO	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	CONTRATO No.	10675-2025	FRENTE OBRA	K2 JS TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	CONTRATO No:			
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	30 de mayo de 2026

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	005
ITEM	5.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE Nº 2/0 AWG	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

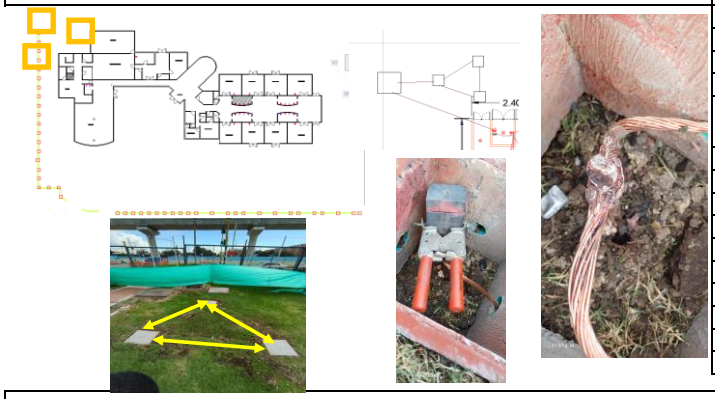

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PUESTA A TIERRA						16,90	16,90	UN	

TOTAL EJECUTADO	16,90	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**16,90**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
16,90	0,00	**16,90**

OBSERVACIONES:




FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RÉSIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	NOMBRE	ING. CLADIA MONCADA FONSECA
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	MUNICIPIO	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	CONTRATO No.	10675-2025	FRENTE OBRA	K2 JS TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	CONTRATO No:			
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	30 de mayo de 2026

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	005
ITEM	5.4.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CONEXIÓN ENTRE CAJAS						6,00	6,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	6,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**6,00**	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	0,00	**6,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RÉSIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	NOMBRE	ING. CLADIA MONCADA FONSECA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K2 JS TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**5.5.9**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
REFLECTOR 50W									
FACHADA PPAL						5,00	4,00	UN	
FACHADA ORIENTAL						1,00	1,00	UN	
FACADA POSTERIOR						4,00	4,00	UN	
FACHADA OCCIDENTAL						1,00	**1,00**	UN	

TOTAL EJECUTADO	10,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**10,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
10,00	0,00	**10,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K2 JS TINTALITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**22.1.10**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
			CORTE 4						
POR CARRERRA 88 A	2,00		0,43	2,00		1,00	1,72	M2	
	2,00		60,24	2,00		1,00	240,96	M2	
	2,00		0,50	2,00		1,00	2,00	M2	
	2,00		3,32	2,00		1,00	13,28	M2	
	2,00		1,10	2,00		1,00	4,40	M2	
POR AV VILLAVICENCIO	2,00		1,77	2,00		1,00	7,08	M2	
	2,00		2,44	2,00		1,00	9,76	M2	
	2,00		5,60	2,00		1,00	22,40	M2	
	2,00		34,23	2,00		1,00	136,92	M2	
	2,00		9,16	2,00		1,00	36,64	M2	
			CORTE No 5						
MALLA PUERTA PARQUEDERO	2,00		0,92	1,57		4,00	11,56	M2	
MONTANTE PUERTA PARQUEADERO	2,00		3,40	0,40		1,00	2,72	M2	
PUERTA SENCILLA NORTE	2,00		0,93	0,86		2,00	3,20	M2	
MONTANTE PTA SENCILLA NORTE	2,00		1,10	0,40		1,00	0,88	M2	
PUERTA PEATONAL PPAL	2,00		0,92	0,77		4,00	5,67	M2	
MONTANTE PUERTA PPAL	2,00		2,02	0,60		1,00	2,43	M2	
PUERTA SENCILLA SUR	2,00		1,04	2,40		1,00	5,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	506,62	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	475,16	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**31,46**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
31,46	475,16	**506,62**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIUEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLADIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA **FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 5**	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	31	5	2026	TIPO DE CONTRATO	OBRA				
2. ACTA No.	**5**			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN SOCIAL BELLA VISTA								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10675-2025			7. FECHA CONTRATO:	11/19/2025		8. VALOR CONTRATO:	$	12,017,556,820
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	11/30/2027		11. PLAZO:	23 MESES 21 DIAS	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A		14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11835-2025			18. FECHA CONTRATO:	11/20/2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	12/30/2027		22. PLAZO:	24 MESES 21 DIAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A		25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL								
27. SUPERVISOR SDIS:	ARQ JONNY EDUARD PADILLA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 (CINCO) días del mes de JUNIO del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA Obray/o Modificaciones
del mes de MAYO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.1	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO/TRIPLEX Y VIDRIO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	128.80	$ 20,561.00	$ 2,648,257.00	47.58	$ 978,292.38		$ -	47.58	$ 978,292.38	47.58	$ 978,292.38
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	2.00	$ 26,129.00	$ 52,258.00	2.00	$ 52,258.00	1.00	$ 26,129.00	1.00	$ 26,129.00	2.00	$ 52,258.00
1.3.14	DESMONTE MANUAL DE COMPUERTA / TAPA DE ACCESO A CUBIERTA Y/O TANQUE (INDIFERENTE DEL MATERIAL), CON MEDIDAS DESDE 60X60 CM HASTA 1,20X1,20 CM. INCLUYE LA HOJA Y SU MARCO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1.00	$ 26,129.00	$ 26,129.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.						$ -		$ -				
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	9.19	$ 13,685.00	$ 125,765.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	-	$ 21,234.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 20,561.00	$ -	49.90	$ 1,025,993.90		$ -	49.90	$ 1,025,993.90	49.90	$ 1,025,993.90
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.						$ -		$ -				

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	36.66	$ 11,573.00	$ 424,266.00	57.64	$ 667,067.72		$ -	57.64	$ 667,067.72	57.64	$ 667,067.72
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	48.59	$ 29,545.00	$ 1,435,592.00	94.73	$ 2,798,797.85		$ -	94.73	$ 2,798,797.85	94.73	$ 2,798,797.85
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.						$ -		$ -				
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	40.00	$ 15,043.00	$ 601,720.00	32.00	$ 481,376.00	11.00	$ 165,473.00	21.00	$ 315,903.00	32.00	$ 481,376.00
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.						$ -		$ -				
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	38.89	$ 21,876.00	$ 850,758.00	79.65	$ 1,742,423.40	24.75	$ 541,431.00	54.90	$ 1,200,992.40	79.65	$ 1,742,423.40
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.						$ -		$ -				
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	16.32	$ 11,333.00	$ 184,955.00	2.93	$ 33,205.69		$ -	2.93	$ 33,205.69	2.93	$ 33,205.69
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERIA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.73	$ 26,358.00	$ 45,599.00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.10	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.						$ -		$ -				
1.10.10	DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.		-	$ 23,973.00	$ -	6.16	$ 147,673.68		$ -	6.16	$ 147,673.68	6.16	$ 147,673.68
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.						$ -		$ -				
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS						$ -		$ -				
2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.13	$ 17,818.00	$ 20,134.00	18.68	$ 332,840.24		$ -	18.68	$ 332,840.24	18.68	$ 332,840.24
2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1.13	$ 38,240.00	$ 43,211.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.11	COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	2.76	$ 2,678.00	$ 7,391.00	13.63	$ 36,501.14		$ -	13.63	$ 36,501.14	13.63	$ 36,501.14
2.2	CONCRETOS						$ -		$ -				
2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	M2	2.76	$ 27,998.00	$ 77,274.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	2.76	$ 348,477.00	$ 961,797.00	16.12	$ 5,617,449.24		$ -	16.12	$ 5,617,449.24	16.12	$ 5,617,449.24
2.4	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -		$ -				
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	m	-	$ 364,446.00	$ -	3.20	$ 1,166,227.20	3.20	$ 1,166,227.20		$ -	3.20	$ 1,166,227.20
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -		$ -				
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	15.00	$ 5,206.00	$ 78,090.00	25.93	$ 134,991.58		$ -	25.93	$ 134,991.58	25.93	$ 134,991.58
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.						$ -		$ -	-			
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.						$ -		$ -	-			

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.1.3	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1.73	$ 205,471.00	$ 355,465.00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.1.7	RECUPERACIÓN DE MAMPOSTERÍAS EN LADRILLO TOLETE MACIZO 24,5X12X6 CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA, MORTERO PARA HOMOGENIZAR LA SUPERFICIE CON EL PAÑETE DE MUROS EXISTENTES, INTERVENCIÓN EN LA TOTALIDAD DE LOS HUECOS DE MUROS POR CELDA Y MURO POSTERIOR CON CARA AL TÚNEL. EL PAGO SE REALIZARA POR UNIDAD (U) DE CELDA INTERVENIDA.	UN	50.00	$ 14,202.00	$ 710,100.00	122.00	$ 1,732,644.00	122.00	$ 1,732,644.00		$ -	122.00	$ 1,732,644.00
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.						$ -		$ -				
3.5.2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	550.57	$ 21,945.00	$ 12,082,259.00	635.16	$ 13,938,586.20		$ -	635.16	$ 13,938,586.20	635.16	$ 13,938,586.20
3.5.4	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	550.57	$ 29,291.00	$ 16,126,746.00	635.16	$ 18,604,471.56		$ -	635.16	$ 18,604,471.56	635.16	$ 18,604,471.56
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).						$ -		$ -				
4.2	VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.						$ -		$ -				
4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 1/2"	UN	1.00	$ 72,110.00	$ 72,110.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN	1.00	$ 43,128.00	$ 43,128.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ -				
5.5	ILUMINACIÓN.						$ -		$ -				
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	20.00	$ 203,696.00	$ 4,073,920.00	7.00	$ 1,425,872.00		$ -	7.00	$ 1,425,872.00	7.00	$ 1,425,872.00
5.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00	$ 38,142.00	$ 190,710.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE 24 W. 11" SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00	$ 31,902.00	$ 159,510.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00	$ 204,308.00	$ 1,021,540.00	6.00	$ 1,225,848.00	1.00	$ 204,308.00	5.00	$ 1,021,540.00	6.00	$ 1,225,848.00
5.5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00	$ 133,915.00	$ 669,575.00	19.00	$ 2,544,385.00	10.00	$ 1,339,150.00	9.00	$ 1,205,235.00	19.00	$ 2,544,385.00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.						$ -		$ -				
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.						$ -		$ -				
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	48.59	$ 52,523.00	$ 2,552,093.00	181.79	$ 9,548,156.17		$ -	181.79	$ 9,548,156.17	181.79	$ 9,548,156.17
7.2	ACABADO DE PISOS.						$ -		$ -				
7.2.4	ACABADO DE PISO CON TABLÓN DE 33 X 33. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3.	M2	-	$ 94,354.00	$ -	83.61	$ 7,888,937.94		$ -	83.61	$ 7,888,937.94	83.61	$ 7,888,937.94
7.2.7	ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM COLOR BLANCO PARA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y RETICULADO, IMPERMEABLE, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, TRÁFICO COMERCIAL MODERADO, TIPO BALDOSA ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS Y PISCINA REF.135026583 DE ALFA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.	M2		$ 89,382.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.15	PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	3.27	$ 73,009.00	$ 238,739.00	7.67	$ 559,979.03		$ -	7.67	$ 559,979.03	7.67	$ 559,979.03
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	3.27	$ 135,070.00	$ 441,679.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.						$ -		$ -				
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	-	$ 16,069.00	$ -	56.64	$ 910,148.16		$ -	56.64	$ 910,148.16	56.64	$ 910,148.16
7.3.6	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	36.55	$ 53,052.00	$ 1,939,051.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	-	$ 46,400.00	$ -	73.68	$ 3,418,752.00		$ -	73.68	$ 3,418,752.00	73.68	$ 3,418,752.00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.3.11	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	-	$ 19,761.00	$ -	6.70	$ 132,398.70		$ -	6.70	$ 132,398.70	6.70	$ 132,398.70
7.4	OTROS						$ -		$ -				
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	-	$ 68,589.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.5	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	73.08	$ 3,665.00	$ 267,838.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.16	WIN DE ALUMINIO	M	-	$ 25,376.00	$ -	6.70	$ 170,019.20		$ -	6.70	$ 170,019.20	6.70	$ 170,019.20
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ -				
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	16.32	$ 120,035.00	$ 1,958,971.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	2.04	$ 134,395.00	$ 274,166.00	2.93	$ 393,777.35		$ -	2.93	$ 393,777.35	2.93	$ 393,777.35
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	35.00	$ 76,983.00	$ 2,694,405.00	35.00	$ 2,694,405.00	35.00	$ 2,694,405.00	-	$ -	35.00	$ 2,694,405.00
9.00	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)			$ 660,234.00		1.58	$ 1,043,169.72		$ -	1.58	$ 1,043,169.72	1.58	$ 1,043,169.72
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA			$ 159,134.00		5.25	$ 835,453.50		$ -	5.25	$ 835,453.50	5.25	$ 835,453.50
10	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ -				
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 284,799.00	$ -	1.68	$ 478,462.32	1.68	$ 478,462.32	-	$ -	1.68	$ 478,462.32
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO, ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2.00	$ 188,087.00	$ 376,174.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ -				
11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	5.00	$ 26,036.00	$ 130,180.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.47	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1.00	$ 189,064.00	$ 189,064.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ -				
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	11.20	$ 800,576.00	$ 8,966,451.00	4.55	$ 3,642,620.80		$ -	4.55	$ 3,642,620.80	4.55	$ 3,642,620.80
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).						$ -		$ -				
14.1	CIELOS RASOS.						$ -		$ -				
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	46.24	$ 113,630.00	$ 5,254,251.00	79.65	$ 9,050,629.50	24.75	$ 2,812,342.50	54.90	$ 6,238,287.00	79.65	$ 9,050,629.50

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
14.1.4	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	5.36	$ 100,232.00	$ 537,244.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
14.2	DIVISIONES.						$ -		$ -				
14.2.1	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DIVISIONES EN PANELERÍA LIVIANA ACABADO DOS (2) CARAS FABRICADAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO E.=6 MM, SIN FRESCASA, PERFILERÍA GALVANIZADA CR. BASE 9 CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE TAPAS LATERALES DE TERMINACIÓN CUANDO SE REQUIERA, PERFILERÍA, LÁMINAS, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	6.00	$ 192,392.00	$ 1,154,352.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ -				
16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø.=2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL./BWG.10 HUECO 2,1/4"X2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	14.43	$ 108,173.00	$ 1,560,936.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	132.18	$ 41,179.00	$ 5,443,040.00	116.89	$ 4,813,413.31		$ -	116.89	$ 4,813,413.31	116.89	$ 4,813,413.31
16.5	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA PREONDULADA; POSTES PRINCIPALES EN TUBULAR REDONDO DE ACERO AGUA NEGRA GALVANIZADO Ø.=2" E.=2,49 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; MARCO EN ÁNGULO DE ACERO DE 1,1/4"X3/16" CONFORMANDO MÓDULOS DE TAMAÑO MÁXIMO 2,00X2,00 M C/U (SE PUEDEN PACHAR MÓDULOS ENTRE SI); PISAMALLA EN ÁNGULO DE ACERO DE 3/4"X3/16"; PLATINAS DE AMARRE DEL MARCO AL TUBULAR DE 1"X2" (A X H) E.=3/16" SOLDADAS CON CORDONES CORRIDOS; PAÑO CON MALLA PREONDULADA EN ALAMBRE GALVANIZADO CAL./BWG.12 FORMANDO HUECOS DE 1"X1". INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS. NO INCLUYE PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M	-	$ 201,041.00	$ -	19.21	$ 3,861,997.61		$ -	19.21	$ 3,861,997.61	19.21	$ 3,861,997.61
16.6	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2” Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2”X 2”	M2	4.61	$ 95,997.00	$ 442,546.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL						$ -		$ -				
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	850.00	$ 4,821.00	$ 4,097,850.00	363.53	$ 1,752,578.13		$ -	363.53	$ 1,752,578.13	363.53	$ 1,752,578.13
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.						$ -		$ -				
21.2	BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.						$ -		$ -				
21.2.4	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	32.79	$ 47,568.00	$ 1,559,755.00	5.16	$ 245,450.88		$ -	5.16	$ 245,450.88	5.16	$ 245,450.88
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 51,391.00	$ -	58.61	$ 3,012,026.51		$ -	58.61	$ 3,012,026.51	58.61	$ 3,012,026.51
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	-	$ 13,658.00	$ -	138.18	$ 1,887,262.44		$ -	138.18	$ 1,887,262.44	138.18	$ 1,887,262.44

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.4	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	-	$ 42,697.00	$ -	8.90	$ 380,003.30		$ -	8.90	$ 380,003.30	8.90	$ 380,003.30
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
23.1	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.						$ -		$ -				
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	51.24	$ 45,084.00	$ 2,310,104.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.						$ -		$ -				
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	-	$ 133,163.00	$ -	87.06	$ 11,593,170.78		$ -	87.06	$ 11,593,170.78	87.06	$ 11,593,170.78
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS						$ -		$ -				
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	128.80	$ 227,950.00	$ 29,359,960.00	97.48	$ 22,220,566.00		$ -	97.48	$ 22,220,566.00	97.48	$ 22,220,566.00
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.						$ -		$ -				
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	12.00	$ 57,044.00	$ 684,528.00	29.88	$ 1,704,474.72		$ -	29.88	$ 1,704,474.72	29.88	$ 1,704,474.72
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	9.19	$ 87,159.00	$ 800,991.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1.84	$ 44,496.00	$ 81,873.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	441.70	$ 26,948.00	$ 11,902,932.00	124.06	$ 3,343,168.88		$ -	124.06	$ 3,343,168.88	124.06	$ 3,343,168.88
25.00	OTRAS ACTIVIDADES						$ -		$ -				
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	-	$ 439,876.00	$ -	15.00	$ 6,598,140.00		$ -	15.00	$ 6,598,140.00	15.00	$ 6,598,140.00
	VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 128,307,432.00**		**$ 156,866,066.73**		**$ 11,160,572.02**		**$ 145,705,494.71**		**$ 156,866,066.73**
35. DESCRIPCIÓN			**36. VALOR CONTRACTUAL**		$ 128,307,432.00		$ 156,866,066.73		$ 11,160,572.02		$ 145,705,494.71		$ 156,866,066.73
ADMINISTRACIÓN			29.00%		$ 37,209,155.28		$ 45,491,159.35		$ 3,236,565.89		$ 42,254,593.47		$ 45,491,159.35
IMPREVISTO			1%		$ 1,283,074.32		$ 1,568,660.67		$ 111,605.72		$ 1,457,054.95		$ 1,568,660.67
UTILIDAD			4%		$ 5,132,297.28		$ 6,274,642.67		$ 446,422.88		$ 5,828,219.79		$ 6,274,642.67
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					**$ 43,624,526.88**		**$ 53,334,462.69**		**$ 3,794,594.49**		**$ 49,539,868.21**		**$ 53,334,462.69**
AJUSTE AL PESO					$ 0.12		-$ 0.42		$ 0.49		$ 0.08		$ 0.58
ANTICIPO			0%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					**$ 171,931,959.00**		**$ 210,200,529.00**		**$ 14,955,167.00**		**$ 195,245,363.00**		**$ 210,200,530.00**
													100.000%

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO		40. NOMBRE DEL ARCHIVO		42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	5	ABRIL 2026				
INFORME SOCIAL	5	ABRIL 2026				
INFORME AMBIENTAL	5	ABRIL 2026				
INFORME SST	5	ABRIL 2026				
INFORME DE SUPERVISION	5	ABRIL 2026				
ACTA PARCIAL	5	MAYO 2026				
SOPORTE PAGO SDH	5	MAYO 2026				
FACTURA	5	MAYO 2026				
FORMATO MC 14	5	MAYO 2026				

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 6 días del mes de JUNIO del año 2026

Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO
C.C. 79,905,718
Rep Legal. CONCORCIO SANTA ISABEL
Nit. 902,0003,595-6

Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
C.C. No. 1,062,398,686
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL
902,007,033-7

Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K3 JS BELLA VISTA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.3.5**	**DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PUERTA COORDINACIÓN						1,00	1,00	UN	
PUERTA ACCESO A SALA MATERNA						1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	1,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	1,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K3 JS BELLA VISTA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.6.26**	**DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

















LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PISO 1									
COMEDOR						2,00	2,00	UN	
LAVANDERIA						1,00	1,00	UN	
PASILLO ACCESO LAVANDERIA						2,00	2,00	UN	
SALA MATERNA						2,00	2,00	UN	
PISO 2									
CORREDOR COORDINACIÓN						4,00	4,00	UN	
AULAS						5,00	5,00	UN	
PASILLO AULAS						5,00	5,00	UN	
CORTE No 5- VALIDACION LOCALIZACION Y CANTIDADES									
PISO 1									
COMEDOR						2,00	2,00	UN	
LAVANDERIA						1,00	1,00	UN	
SALA MATERNA						3,00	3,00	UN	
PASILLO INGRESO						6,00	6,00	UN	
PISO 2									
SALON 1 LADO						3,00	3,00	UN	
PASILLO P2						4,00	4,00	UN	
PASILLO COORDINACION						6,00	6,00	UN	
PASILLO AULAS P2						3,00	3,00	UN	
PISO 2									
PASILLO AULAS ARREGLO CIELO RASO						4,00	4,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	32,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	21,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**11,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
11,00	21,00	**32,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DE[illegible]ELASQUEZ
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K3 JS BELLA VISTA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.7.5**	**DESMONTE CIELO RASO**	**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

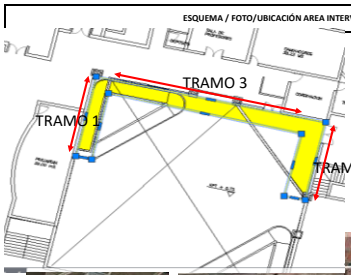









LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
SALON PRINCIPAL									
TRAMO 1		1,47	7,62			1,00	11,21	M2	
TRAMO 2		2,05	7,50			1,00	15,38	M2	
TRAMO 3		1,53	18,50			1,00	28,31	M2	
CORTE No 5									
PASILLO SALONES PISO 2		0,50	1,77			1,00	0,89	M2	
		0,50	1,03			1,00	0,52	M2	
		2,81	5,50			1,00	15,46	M2	
		0,50	2,00			1,00	1,00	M2	
		0,50	0,68			1,00	0,34	M2	
		3,70	1,48			1,00	5,48	M2	
		1,23	0,86			1,00	1,06	M2	

TOTAL EJECUTADO	79,65	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	54,90	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**24,75**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
24,75	54,90	**79,65**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K3 JS BELLA VISTA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**2.4.2**			**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PISO 3									
TERRAZA									
CARCAMO CON REJILLA			3,20			1,00	3,20	ML	

TOTAL EJECUTADO	3,20	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**3,20**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,20	0,00	**3,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHAN[illegible] ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K3 JS BELLA VISTA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**3.1.7**	**RECUPERACIÓN DE MAMPOSTERÍAS EN LADRILLO TOLETE MACIZO 24,5X12X6 CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA, MORTERO PARA HOMOGENIZAR LA SUPERFICIE CON EL PAÑETE DE MUROS EXISTENTES, INTERVENCIÓN EN LA TOTALIDAD DE LOS HUECOS DE MUROS POR CELDA Y MURO POSTERIOR CON CARA AL TÚNEL. EL PAGO SE REALIZARA POR UNIDAD (U) DE CELDA INTERVENIDA.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA






LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MURO BAÑOS						122,00	122,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	122,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**122,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
122,00	0,00	**122,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K3 JS BELLA VISTA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**5.5.8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

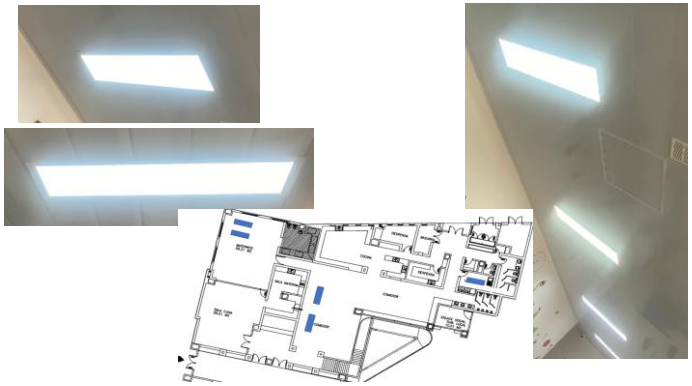

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PISO 1									
LUMINARIAS COMEDOR						2,00	2,00	UN	
LAVANDERIA						1,00	1,00	UN	
SALA MATERNA						2,00	2,00	UN	
CORTE No 5									
SALA MATERNA						1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	6,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	5,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	5,00	**6,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K3 JS BELLA VISTA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**	
ITEM	**5.5.14**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PISO 2									
PASILLO COORDINACION						6,00	6,00	UN	
PASILLO AULAS PISO 2						3,00	3,00	UN	
CORTE No 5									
PASILLO INGRESO P1						6,00	6,00	UN	
CAMBIO DE CIELO RASO P2						4,00	4,00	un	

TOTAL EJECUTADO	19,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	9,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**10,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
10,00	9,00	**19,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

TIPO	5.5.4	5.5.8	5.5.14	1.6.26
ESPACIO	**60X60**	**120X30**	**24W**	**DESMONTES**
PISO 1				
COMEDOR		2		2
LAVANDERIA		1		1
SALA MATERNA		2		2
PASILLO INGRESO			6	6
PISO 2				
SALON 1 LADO COORDINACION	3			3
PASILLO P2	4			4
PASILLO COORDINACION			6	6
PASILLO AULAS P2			3	3
ADICIONALES AL RECIBO				
ARREGLO CIELO RASO			4	4
SALA MATERNA		1		1
TOTALES	**7**	**6**	**19**	**32**
	32			0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K3 JS BELLA VISTA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**8.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ESQUINEROS									
PISO 1						13,00	13,00	UN	
PISO 2						22,00	22,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	35,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**35,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
35,00	0,00	**35,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PIÑILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K3 JS BELLA VISTA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**10.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

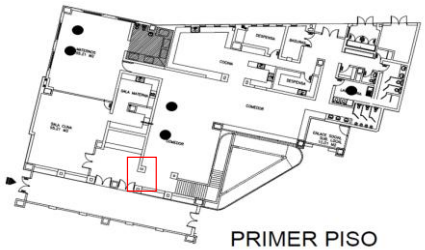



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PUERTA ACCESO ZONA SALA MATERNA		0,80		2,1		1,00	1,68	M2	

TOTAL EJECUTADO	1,68	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**1,68**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,68	0,00	**1,68**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	K3 JS BELLA VISTA
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**14.1.1**	**CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

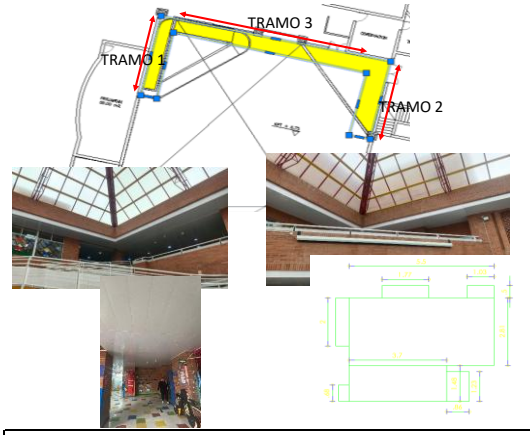

LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALON PRINCIPAL									
SALON PRINCIPAL									
TRAMO 1		1,47	7,62			1,00	11,21	M2	
TRAMO 2		2,05	7,50			1,00	15,38	M2	
TRAMO 3		1,53	18,50			1,00	28,31	M2	
CORTE No 5									
PASILLO SALONES PISO 2		0,50	1,77			1,00	0,89	M2	
		0,50	1,03			1,00	0,52	M2	
		2,81	5,50			1,00	15,46	M2	
		0,50	2,00			1,00	1,00	M2	
		0,50	0,68			1,00	0,34	M2	
		3,70	1,48			1,00	5,48	M2	
		1,23	0,86			1,00	1,06	M2	

TOTAL EJECUTADO	79,65	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	54,90	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**24,75**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
24,75	54,90	**79,65**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 5

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024	
Página: 1 de 1	

1. FECHA ELABORACIÓN:	31	5	2026	TIPO DE CONTRATO	OBRA		
2. ACTA No.	5			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:	X	RECIBO PARCIAL DE OBRA	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10675-2025	7. FECHA CONTRATO:	19/11/2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 12.017.556.820		
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2027	11. PLAZO:	23 MESES 21 DIAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A	14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11835-2025	18. FECHA CONTRATO:	20/11/2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265		
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2027	22. PLAZO:	24 MESES 21 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A	25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL						
27. SUPERVISOR SDIS:	ARQ JONNY EDUARD PADILLA						

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 (CINCO) días del mes de JUNIO del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA Obray/o Modificaciones
del mes de MAYO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).	M2	156,76	$ 6.042,00	$ 947.144,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	40,50	$ 40.931,00	$ 1.657.706,00	259,74	$ 10.631.417,94	8,75	$ 358.146,25	250,99	$ 10.273.271,69	259,74	$ 10.631.417,94
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.						$ -				$ -		
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	23,46	$ 19.840,00	$ 465.446,00	29,07	$ 576.748,80		$ -	29,07	$ 576.748,80	29,07	$ 576.748,80
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	29,00	$ 26.129,00	$ 757.741,00	29,00	$ 757.741,00	20,00	$ 522.580,00	-	$ -	20,00	$ 522.580,00
1.3.16	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PORTÓN (DOS HOJAS SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1,00	$ 26.129,00	$ 26.129,00	1,00	$ 26.129,00		$ -	1,00	$ 26.129,00	1,00	$ 26.129,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.						$ -				$ -		
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	156,76	$ 21.234,00	$ 3.328.642,00	127,73	$ 2.712.218,82		$ -	127,73	$ 2.712.218,82	127,73	$ 2.712.218,82
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.						$ -				$ -		

1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	77,79	$ 11.573,00	$ 900.264,00	102,34	$ 1.184.380,82		$ -	102,34	$ 1.184.380,82	102,34	$ 1.184.380,82
1.5.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.	M2	156,76	$ 29.545,00	$ 4.631.474,00	9,59	$ 283.336,55		$ -	9,59	$ 283.336,55	9,59	$ 283.336,55
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	156,76	$ 29.545,00	$ 4.631.474,00	159,70	$ 4.718.336,50		$ -	159,70	$ 4.718.336,50	159,70	$ 4.718.336,50
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.						$ -				$ -		
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	16,00	$ 15.043,00	$ 240.688,00	127,00	$ 1.910.461,00	3,00	$ 45.129,00	124,00	$ 1.865.332,00	127,00	$ 1.910.461,00
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.						$ -				$ -		
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	123,80	$ 21.876,00	$ 2.708.249,00	109,10	$ 2.386.671,60		$ -	109,10	$ 2.386.671,60	109,10	$ 2.386.671,60
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.						$ -				$ -		
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	605,10	$ 7.498,00	$ 4.537.040,00	141,39	$ 1.060.142,22		$ -	141,39	$ 1.060.142,22	141,39	$ 1.060.142,22
1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	211,79	$ 9.560,00	$ 2.024.712,00	7,57	$ 72.369,20		$ -	7,57	$ 72.369,20	7,57	$ 72.369,20
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	38,99	$ 26.358,00	$ 1.027.698,00	7,38	$ 194.522,04		$ -	7,38	$ 194.522,04	7,38	$ 194.522,04
1.8.13	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE CONCRETO E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	-	$ 28.029,00	$ -	39,17	$ 1.097.895,93		$ -	39,17	$ 1.097.895,93	39,17	$ 1.097.895,93
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.9.11	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	-	$ 46.847,00	$ -	4,96	$ 232.361,12		$ -	4,96	$ 232.361,12	4,96	$ 232.361,12
1.9.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M		$ 16.589,00		18,74	$ 310.877,86	13,94	$ 231.250,66	4,80	$ 79.627,20	18,74	$ 310.877,86
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.						$ -				$ -		
2.2	CONCRETOS						$ -				$ -		
2.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 5/8" PROFUNDIDADES ENTRE 3 Y 5 CM	Un	40,00	$ 23.555,00	$ 942.200,00	100,00	$ 2.355.500,00		$ -	100,00	$ 2.355.500,00	100,00	$ 2.355.500,00
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO						$ -				$ -		
2.4.7	ALFAJÍA EN CONCRETO 2500 PSI 0.25 M (INCLUYE ACERO)	M	33,90	$ 83.103,00	$ 2.817.192,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -				$ -		
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	209,41	$ 5.618,00	$ 1.176.465,00	111,66	$ 627.305,88		$ -	111,66	$ 627.305,88	111,66	$ 627.305,88
2,6	ESTRUCTURAS METALICAS						$ -				$ -		
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	909,60	$ 19.248,00	$ 17.507.981,00	909,60	$ 17.507.980,80		$ -	469,96	$ 9.045.790,08	469,96	$ 9.045.790,08
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.						$ -				$ -		
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.						$ -				$ -		
3.1.1	MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	38,99	$ 50.520,00	$ 1.969.775,00	36,00	$ 1.818.720,00		$ -	36,00	$ 1.818.720,00	36,00	$ 1.818.720,00

3.1.3	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2		$ 205.471,00		10,31	$ 2.118.406,01		$ -	10,31	$ 2.118.406,01	10,31	$ 2.118.406,01
3.2	OTROS MAMPUESTOS.						$ -				$ -		
3.2.3	POYOS E = 0,10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60 M (INCLUYE MAMPOSTERÍA, PAÑETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO)	M		$ 52.420,00	$ -	2,27	$ 118.993,40	2,27	$ 118.993,40		$ -	2,27	$ 118.993,40
3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.						$ -				$ -		
3.3.2	VIGA CINTA DE REMATE / CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL H.>10,0<=12,5 CM A.>10,0<=12,5 CM EN CONCRETO F'C=3000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE EN LA MEZCLA, FORMALETA CORRIENTE CON ACABADO NO VISTO. INCLUYE DESMOLDANTE, CURADOR DE CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M	54,60	$ 148.807,00	$ 8.124.862,00	60,51	$ 9.004.311,57		$ -	60,51	$ 9.004.311,57	60,51	$ 9.004.311,57
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.						$ -				$ -		
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	2.128,48	$ 24.413,00	$ 51.962.582,00	1.668,59	$ 40.735.287,67		$ -	1.668,59	$ 40.735.287,67	1.668,59	$ 40.735.287,67
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -				$ -		
5.3	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.						**$ -**				**$ -**		
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN		$ 63.670,00	$ -	48,00	$ 3.056.160,00		$ -	48,00	$ 3.056.160,00	48,00	$ 3.056.160,00
5.4	TABLEROS Y OTROS						**$ -**				**$ -**		
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	180,00	$ 17.026,00	$ 3.064.680,00	180,00	$ 3.064.680,00		$ -	-	$ -	-	$ -
5.5	ILUMINACIÓN.						$ -				$ -		
5.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA TIPO LED DE 60 W. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 80.893,00	$ 323.572,00	20,00	$ 1.617.860,00		$ -	20,00	$ 1.617.860,00	20,00	$ 1.617.860,00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	12,00	$ 203.696,00	$ 2.444.352,00	13,00	$ 2.648.048,00		$ -	13,00	$ 2.648.048,00	13,00	$ 2.648.048,00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 204.308,00	$ -	56,00	$ 11.441.248,00		$ -	56,00	$ 11.441.248,00	56,00	$ 11.441.248,00
5.5.16	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 21.707,00	$ -	3,00	$ 65.121,00	3,00	$ 65.121,00	-	$ -	3,00	$ 65.121,00
6	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -				$ -		
6.1	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -				$ -		
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	2,00	$ 279.155,00	$ 558.310,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.						$ -				$ -		
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.						$ -				$ -		
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	156,76	$ 52.523,00	$ 8.233.505,00	418,26	$ 21.968.269,98	31,97	$ 1.679.160,31	386,29	$ 20.289.109,67	418,26	$ 21.968.269,98
7.2	ACABADO DE PISOS.						$ -				$ -		
7.2.4	ACABADO DE PISO CON TABLÓN DE 33 X 33. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3.	M2	156,76	$ 94.354,00	$ 14.790.933,00	159,71	$ 15.069.277,34		$ -	159,71	$ 15.069.277,34	159,71	$ 15.069.277,34
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.						$ -				$ -		
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	49,39	$ 16.069,00	$ 793.648,00	102,48	$ 1.646.751,12		$ -	102,48	$ 1.646.751,12	102,48	$ 1.646.751,12
7.3.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	28,40	$ 46.400,00	$ 1.317.760,00	90,98	$ 4.221.472,00		$ -	90,98	$ 4.221.472,00	90,98	$ 4.221.472,00
7.4	OTROS						$ -				$ -		
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	2,20	$ 68.589,00	$ 150.896,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.5	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	135,60	$ 3.665,00	$ 496.974,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -				$ -		
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	UN	39,00	$ 76.983,00	$ 3.002.337,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -				$ -		
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -				$ -		
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5,30	$ 577.765,00	$ 3.062.155,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 718.795,00	$ -	8,80	$ 6.325.396,00		$ -	8,80	$ 6.325.396,00	8,80	$ 6.325.396,00
9.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SIN BATIENTES, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	M2	3,28	$ 399.255,00	$ 1.307.959,00	3,13	$ 1.249.668,15		$ -	3,13	$ 1.249.668,15	3,13	$ 1.249.668,15
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -				$ -		
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	18,20	$ 660.234,00	$ 12.016.259,00	18,64	$ 12.306.761,76		$ -	18,64	$ 12.306.761,76	18,64	$ 12.306.761,76
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -				$ -		
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	2,34	$ 159.134,00	$ 372.374,00	2,94	$ 467.853,96		$ -	2,94	$ 467.853,96	2,94	$ 467.853,96
9.3.3	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	144,00	$ 48.620,00	$ 7.001.280,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
10	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -				$ -		
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	47,04	$ 284.799,00	$ 13.396.945,00	47,04	$ 13.396.944,96	26,46	$ 7.535.781,54	-	$ -	26,46	$ 7.535.781,54
10.2	PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1,20 M) MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 230.420,00	$ -	2,92	$ 672.826,40	2,92	$ 672.826,40	-	$ -	2,92	$ 672.826,40
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -				$ -		
11.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 31.543,00	$ -	3,00	$ 94.629,00	3,00	$ 94.629,00	-	$ -	3,00	$ 94.629,00
11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	5,00	$ 31.543,00	$ 157.715,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 67.030,00	$ -	1,00	$ 67.030,00	1,00	$ 67.030,00	-	$ -	1,00	$ 67.030,00
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).						$ -				$ -		
14.1	CIELOS RASOS.						$ -				$ -		
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	51,80	$ 113.630,00	$ 5.886.034,00	101,99	$ 11.589.123,70		$ -	101,99	$ 11.589.123,70	101,99	$ 11.589.123,70
14.1.2	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	72,00	$ 212.669,00	$ 15.312.168,00	50,11	$ 10.656.843,59		$ -	50,11	$ 10.656.843,59	50,11	$ 10.656.843,59
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -				$ -		
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -				$ -		

15.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO E.=6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1,60	$ 256.318,00	$ 410.109,00	5,65	$ 1.448.196,70		$ -	5,65	$ 1.448.196,70	5,65	$ 1.448.196,70
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2		$ 108.119,00	$ -	4,19	$ 453.018,61	4,19	$ 453.018,61	-	$ -	4,19	$ 453.018,61
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL						$ -				$ -		
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.938,87	$ 4.821,00	$ 9.347.292,00	2.024,03	$ 9.757.848,63		$ -	2.024,03	$ 9.757.848,63	2.024,03	$ 9.757.848,63
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.						$ -				$ -		
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.						$ -				$ -		
21.1.9	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	81,36	$ 81.464,00	$ 6.627.911,00	121,89	$ 9.929.646,96		$ -	121,89	$ 9.929.646,96	121,89	$ 9.929.646,96
21.1.11	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	605,10	$ 84.039,00	$ 50.851.999,00	850,31	$ 71.459.202,09		$ -	850,31	$ 71.459.202,09	850,31	$ 71.459.202,09
21.1.12	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M		$ 31.790,00	$ -	1.034,02	$ 32.871.495,80		$ -	1.034,02	$ 32.871.495,80	1.034,02	$ 32.871.495,80
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.						$ -				$ -		
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.						$ -				$ -		
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	605,10	$ 75.848,00	$ 45.895.625,00	69,52	$ 5.272.952,96		$ -	69,52	$ 5.272.952,96	69,52	$ 5.272.952,96
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	3.040,69	$ 14.518,00	$ 44.144.737,00	3.173,21	$ 46.068.662,78	112,50	$ 1.633.275,00	3.060,71	$ 44.435.387,78	3.173,21	$ 46.068.662,78
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.845,84	$ 51.391,00	$ 94.859.563,00	1.397,66	$ 71.827.145,06	28,18	$ 1.448.198,38	1.369,48	$ 70.378.946,68	1.397,66	$ 71.827.145,06
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	-	$ 13.658,00	$ -	1.067,61	$ 14.581.417,38	30,46	$ 416.022,68	1.037,15	$ 14.165.394,70	1.067,61	$ 14.581.417,38
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	605,10	$ 31.749,00	$ 19.211.320,00	1.187,70	$ 37.708.287,30		$ -	1.187,70	$ 37.708.287,30	1.187,70	$ 37.708.287,30
22.1.13	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, LINEAL A.<=50 CM, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	395,10	$ 11.820,00	$ 4.670.082,00	1.027,47	$ 12.144.695,40		$ -	1.027,47	$ 12.144.695,40	1.027,47	$ 12.144.695,40
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -				$ -		
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.						$ -				$ -		
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	156,76	$ 133.163,00	$ 20.874.632,00	159,71	$ 21.267.462,73		$ -	159,71	$ 21.267.462,73	159,71	$ 21.267.462,73
23,4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS						$ -				$ -		
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	41,28	$ 227.950,00	$ 9.409.776,00	35,05	$ 7.989.647,50		$ -	35,05	$ 7.989.647,50	35,05	$ 7.989.647,50
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.						$ -				$ -		
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	15,85	$ 57.044,00	$ 904.147,00	1,20	$ 68.452,80	1,20	$ 68.452,80	-	$ -	1,20	$ 68.452,80
23.8.14	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 64.371,00	$ -	59,93	$ 3.857.754,03		$ -	59,93	$ 3.857.754,03	59,93	$ 3.857.754,03
	VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS								$ -				

34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**$ 513.282.513,00**	**$ 570.773.967,42**	**$ 15.409.615,03**	**$ 537.741.157,25**	**$ 553.150.772,28**
35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**	$ 513.282.513,00	$ 570.773.967,42	$ 15.409.615,03	$ 537.741.157,25	$ 553.150.772,28
ADMINISTRACIÓN	29,00%	$ 148.851.928,77	$ 165.524.450,55	$ 4.468.788,36	$ 155.944.935,60	$ 160.413.723,96
IMPREVISTO	1%	$ 5.132.825,13	$ 5.707.739,67	$ 154.096,15	$ 5.377.411,57	$ 5.531.507,72
UTILIDAD	4%	$ 20.531.300,52	$ 22.830.958,70	$ 616.384,60	$ 21.509.646,29	$ 22.126.030,89

SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		**$ 174.516.054,42**	**$ 194.063.148,92**	**$ 5.239.269,11**	**$ 182.831.993,46**	**$ 188.071.262,57**
AJUSTE AL PESO		-$ 0,42	-$ 0,34	-$ 0,14	-$ 0,71	-$ 0,85
ANTICIPO	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		**$ 687.798.567,00**	**$ 764.837.116,00**	**$ 20.648.884,00**	**$ 720.573.150,00**	**$ 741.222.034,00**
			$ 764.837.116,34		**$ 720.573.150,00**	**96,91%**

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO		40. NOMBRE DEL ARCHIVO		42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	5	ABRIL 2026				
INFORME SOCIAL	5	ABRIL 2026				
INFORME AMBIENTAL	5	ABRIL 2026				
INFORME SST	5	ABRIL 2026				
INFORME DE SUPERVISION	5	ABRIL 2026				
ACTA PARCIAL	5	MAYO 2026				
SOPORTE PAGO SDH	5	MAYO 2026				
FACTURA	5	MAYO 2026				
FORMATO MC 14	5	MAYO 2026				

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 06 días del mes de JUNIO del año _2026_

Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO
C.C. 79,905,718
Rep Legal. CONCORCIO SANTA ISABEL
Nit. 902,0003,595-6

Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
C.C. No. 1,062,398,686
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL
902,007,033-7

Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**	11835-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO		**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.1.3.**	**CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



























LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CERRAMIENTOS ZONAS INTERVENIDAS Y BAJO RAMPA			12,00			1,00	12,00	M	CORTE No 1
			8,90			1,00	8,90	M	CORTE No 1
			7,50			1,00	7,50	M	CORTE No 1
AREA TERRAZA SOBRE COMEDOR									
TRAMO 1			14,00			1,00	14,00	M	
TRAMO 2			16,50			1,00	16,50	M	
TRAMO 3			10,00			1,00	10,00	M	
CERRAMIENTO COMEDOR			2,00			1,00	2,00	M	
corredor 1			8,70			1,00	8,70	M	
corredor 2			7,60			1,00	7,60	M	
puerta terraza			2,29			1,00	2,29	M	
lateral parqueadero			4,42			1,00	4,42	M	
lateral izquierda andamio			4,49			1,00	4,49	M	
lateral derecha andamio			4,49			1,00	4,49	M	
laderar superior parqueadero			5,41			1,00	5,41	M	
parqueadero			18,17			1,00	18,17	M	
puerta escaleras			1,36			1,00	1,36	M	
barandas			11,50			1,00	11,50	M	
CERRAMIENTOS PISO 2									
Pasillo aulas			3,70			1,00	3,70	M	
			12,84			1,00	12,84	M	
			16,80			1,00	16,80	M	
			1,87			1,00	1,87	M	
			7,44			1,00	7,44	M	
			1,83			1,00	1,83	M	
			3,98			1,00	3,98	M	
			3,20			1,00	3,20	M	
CORTE No 4									
CERRAMIENTO PATIO INTERIOR			60,00			1,00	60,00	M	
CORTE No 5									
CERRAMIENTO ACTIVIDAD TUBERIA HIDRAULICA			2,85			1,00	2,85	M	
			5,90			1,00	5,90	M	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.3.5**	**DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**U**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



PLANTA PRIMER PISO





PLANTA SEGUNDO PISO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO								UN	
SALON 5						2,00	2,00	UN	
ESCALERA						1,00	1,00	UN	
SEGUNDO PISO									
SALON 1						2,00	2,00	UN	
SALON 2						2,00	2,00	UN	
SALON 3						2,00	2,00	UN	
SALON 4						2,00	2,00	UN	
SALON 5						2,00	2,00	UN	
SALON 6						2,00	2,00	UN	
SALON 7						2,00	2,00	UN	
BODEGA						2,00	2,00	UN	
ESCALERA						1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	20,00	U	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	U	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	U	
PRESENTE ACTA	**20,00**	U	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
20,00	0,00	**20,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR [illegible] VELASQUEZ
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**	11835-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO		**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.6.26**	**DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**UN**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

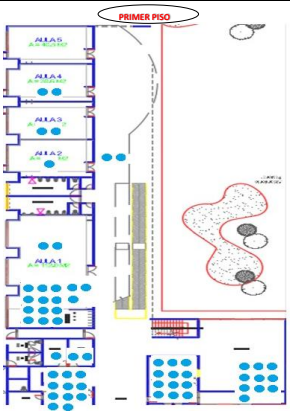
















LOCALIZACIÓN / **LUGAR**	**DIMENSIÓN** Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
ZONAS HÚMEDAS									
BAÑOS PRIMER NIVEL						11,00	11,00	UN	
BAÑOS SEGUNDO NIVEL						7,00	7,00	UN	
LAVANDERIA						10,00	10,00	UN	
NIVEL 1									
CORREDOR OFICINAS ADMINISTRATIVAS						1,00	1,00	UN	
OFICINA ADMINISTRATIVA 2						2,00	2,00	UN	
CORREDOR						2,00	2,00	UN	
AULA 1						2,00	2,00	UN	
AULA 2						1,00	1,00	UN	
AULA 3						2,00	2,00	UN	
AULA 4						2,00	2,00	UN	
NIVEL 2									
AULA 1						4,00	4,00	UN	
AULA 2						5,00	5,00	UN	
AULA 3						4,00	4,00	UN	
AULA 4						3,00	3,00	UN	
AULA 5						3,00	3,00	UN	
AULA 6						3,00	3,00	UN	
AULA 7						7,00	7,00	UN	
AULA 8						1,00	1,00	UN	
CORREDOR						25,00	25,00	UN	
CORREDOR ACCESO TERRAZA						2,00	2,00	UN	
COMEDOR						12,00	12,00	UN	
COORDINACIÓN-LÚDICAS						15,00	15,00	UN	
CORTE No 5									
DESMONTE REFLECTORES MURO ANTEPECHO FACHADA						3,00	3,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	127,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	124,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**3,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,00	124,00	**127,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE		**NOMBRE**	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**	11835-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.9.15**	**CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**		**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA








LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PISO 1									
BATERIA BAÑOS NIÑOS		0,60	0,60			1,00	2,40	ML	
COORDINACION-LUDICAS PISO 2									
TRATAMIENTO FISURA VERTICAL				2,40		1,00	2,40	ML	
CORTE No 5									
CORTE PLACA ANDEN Y PARQUEADERO			13,94			1,00	13,94	ML	

TOTAL EJECUTADO	18,74	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	4,80	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**13,94**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
13,94	4,80	**18,74**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHA[illegible]O AUSTES VELASQUEZ
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**	11835-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**3.2.3**	**POYO DUCHA**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TERRAZA PISO 2									
SALIDA TERRAZA			2,27			1,00	2,27	ML	

TOTAL EJECUTADO	2,27	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**2,27**	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,27	0,00	**2,27**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RÉSIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOH ES VELASQUEZ
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**5.5.16**	**REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

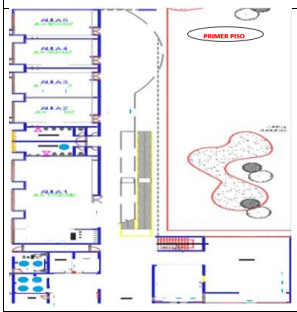



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MURO ANTEPECHO FACHADA PARQUEDERO									
REFLECTORES						3,00	3,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	3,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**3,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**	11835-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABAODS DE PISOS.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**7.1.5**	**ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TERRAZA 2	1,00	11,50	2,78			31,97	31,97	M2	
TERRAZA 1	1,00	9,43	15,28			1,00	144,09	M2	
CUPULAS	diametro	3,20				-1,00	-8,04	M2	
	diametro	2,30				-2,00	-8,31	M2	
SEGUNDO ALISTADO S/MANTO									
TERRAZA 2	1,00	11,50	2,78			31,97	31,97	M2	
TERRAZA 1	1,00	9,43	15,28			1,00	144,09	M2	
CUPULAS	diametro	3,20				-1,00	-8,04	M2	
	diametro	2,30				-2,00	-8,31	M2	
SOBREALISTADO MANEJO DE PENDIENTES		9,43	2,00			2,00	37,72	M2	
		15,28	2,00			2,00	61,12	M2	

TOTAL EJECUTADO	418,26	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	386,29	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**31,97**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
31,97	386,29	**418,26**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE		**NOMBRE**	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**10.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.**			**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
SALON 5		0,70		2,10		2,00	2,94	M2	
SEGUNDO PISO									
SALON 1		0,70		2,10		2,00	2,94	M2	
SALON 2		0,70		2,10		2,00	2,94	M2	
SALON 3		0,70		2,10		2,00	2,94	M2	
SALON 4		0,70		2,10		2,00	2,94	M2	
SALON 5		0,70		2,10		2,00	2,94	M2	
SALON 6		0,70		2,10		2,00	2,94	M2	
SALON 7		0,70		2,10		2,00	2,94	M2	
BODEGA		0,70		2,10		2,00	2,94	M2	

TOTAL EJECUTADO	26,46	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**26,46**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
26,46	0,00	**26,46**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR [illegible] VELASQUEZ
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PIMILLA	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**10.2**	**PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1,20 M) MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO									
ESCALERA		1,19		1,21		1,00	1,44	M2	
SEGUNDO PISO									
ESCALERA		1,20		1,23		1,00	1,48	M2	

TOTAL EJECUTADO	2,92	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**2,92**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,92	0,00	**2,92**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR [illegible] VELASQUEZ
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**11.29**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

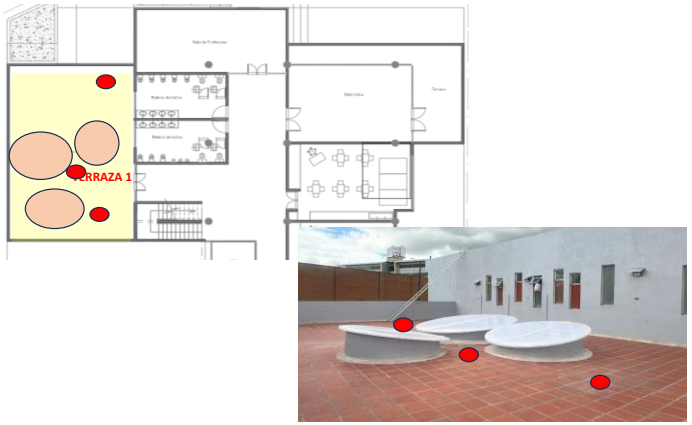

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TERRAZA 1						3,00	3,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	3,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**3,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE		**NOMBRE**	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**11.31**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CÚPULA**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TERRAZA 2						1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE		**NOMBRE**	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**15.2.6**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PUERTA VENTANA SALIDA TERRZA									
		0,66		1,98		2,00	2,61	M2	
		0,86		1,83		1,00	1,57	M2	
								M2	

TOTAL EJECUTADO	4,19	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**4,19**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4,19	0,00	**4,19**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**	11835-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CORTE No 1									
PRIMER PISO									
AULA 1									
muro 1			0,98	2,61		1,00	2,56	M2	CORTE No 1
muro 2			7,82	2,61		1,00	20,42	M2	CORTE No 1
Ventana			4,42	-0,59		1,00	-2,61	M2	CORTE No 1
Ventana			1,62	-0,59		1,00	-0,96	M2	CORTE No 1
muro 3			7,56	2,61		1,00	19,74	M2	CORTE No 1
muro 4			6,86	2,61		1,00	17,91	M2	CORTE No 1
Ventana			4,03	-1,8		1,00	-7,26	M2	CORTE No 1
muro 5			0,49	11,66		1,00	5,72	M2	CORTE No 1
muro 6			1,52	2,61		1,00	3,97	M2	CORTE No 1
muro 7			7,97	2,61		1,00	20,81	M2	CORTE No 1
Puerta			3,97	-2,21		1,00	-8,78	M2	CORTE No 1
muro 8			0,50	8,39		1,00	4,20	M2	CORTE No 1
Ventana			1,97	-1,8		1,00	-3,55	M2	CORTE No 1
muro 9			0,49	5,74		1,00	2,82	M2	CORTE No 1
muro 10			1,38	2,61		1,00	3,61	M2	CORTE No 1
muro 11			3,17	0,71		1,00	2,26	M2	CORTE No 1
muro 12			0,18	0,61		1,00	0,11	M2	CORTE No 1
muro 13			4,11	2,61		1,00	10,73	M2	CORTE No 1
Ventana			2,68	-0,59		1,00	-1,59	M2	CORTE No 1
muro 14			1,72	2,61		1,00	4,49	M2	CORTE No 1
Vano			0,96	-1,07		1,00	-1,03	M2	CORTE No 1
Vano			0,96	-0,83		1,00	-0,80	M2	CORTE No 1
muro 15			2,57	0,83		1,00	2,14	M2	CORTE No 1
muro 16			2,55	0,20		1,00	0,51	M2	CORTE No 1
Columna sala amiga			0,43	2,57		1,00	1,11	M2	CORTE No 1
Pintura bajo Techo		7,54	14,83			1,00	111,82	M2	CORTE No 1
AULA 2									
muro 1			0,18	2,61		1,00	0,47	M2	CORTE No 1
muro 2			0,65	2,61		1,00	1,70	M2	CORTE No 1
muro 3			2,92	2,61		1,00	7,63	M2	CORTE No 1
muro 4			0,65	2,61		1,00	1,70	M2	CORTE No 1
muro 5			0,69	2,61		1,00	1,81	M2	CORTE No 1
muro 6			6,80	2,61		1,00	17,75	M2	CORTE No 1
muro 7			6,04	2,61		1,00	15,77	M2	CORTE No 1
Puerta			0,86	-2,19		1,00	-1,89	M2	CORTE No 1
muro 8			3,00	-1,8		1,00	-5,40	M2	CORTE No 1
muro 9			0,48	9,6		1,00	4,61	M2	CORTE No 1
muro 10			7,48	2,61		1,00	19,53	M2	CORTE No 1

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.							ACTA No:		005	
ITEM	22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.								UNIDAD	M2







Ventana			1,87	-0,97		1,00	-1,82	M2	CORTE No 1
muro 11			0,67	2,61		1,00	1,75	M2	CORTE No 1
muro 12			0,65	2,61		1,00	1,70	M2	CORTE No 1
muro 13			0,18	2,61		1,00	0,47	M2	CORTE No 1
muro 14			0,60	0,78		1,00	0,47	M2	CORTE No 1
muro 15			3,06	0,78		1,00	2,39	M2	CORTE No 1
Pintura bajo Techo		5,85	7,48			1,00	43,76	M2	CORTE No 1
AULA 3									
muro 1			0,18	2,61		1,00	0,47	M2	CORTE No 1
muro 2			0,65	2,61		1,00	1,70	M2	CORTE No 1
muro 3			0,65	2,61		1,00	1,70	M2	CORTE No 1
muro 4			7,48	2,61		1,00	19,53	M2	CORTE No 1
muro 5			5,85	2,61		1,00	15,27	M2	CORTE No 1
Puerta			0,86	-2,19		1,00	-1,89	M2	CORTE No 1
Ventana			3,00	-1,8		1,00	-5,40	M2	CORTE No 1
muro 6			0,50	9,6		1,00	4,80	M2	CORTE No 1
muro 7			7,48	2,61		1,00	19,53	M2	CORTE No 1
muro 8			3,42	2,61		1,00	8,93	M2	CORTE No 1
muro 9			0,65	2,61		1,00	1,70	M2	CORTE No 1
muro 10			0,18	2,61		1,00	0,47	M2	CORTE No 1
muro 11			0,60	0,78		1,00	0,47	M2	CORTE No 1
muro 12			3,06	0,78		1,00	2,39	M2	CORTE No 1
Ventana			1,87	-0,8		1,00	-1,50	M2	CORTE No 1
Pintura bajo Techo		5,85	7,48			1,00	43,76	M2	CORTE No 1
AULA 4									
muro 1			0,18	2,61		1,00	0,47	M2	CORTE No 1
muro 2			0,65	2,61		1,00	1,70	M2	CORTE No 1
muro 3			0,65	2,61		1,00	1,70	M2	CORTE No 1
muro 4			7,48	2,61		1,00	19,53	M2	CORTE No 1
muro 5			5,85	2,61		1,00	15,27	M2	CORTE No 1
Puerta			0,86	-2,19		1,00	-1,89	M2	CORTE No 1
Ventana			3,00	-1,8		1,00	-5,40	M2	CORTE No 1
muro 6			0,50	9,6		1,00	4,80	M2	CORTE No 1
muro 7			7,48	2,61		1,00	19,53	M2	CORTE No 1
muro 8			3,42	2,61		1,00	8,93	M2	CORTE No 1
muro 9			0,65	2,61		1,00	1,70	M2	CORTE No 1
muro 10			0,18	2,61		1,00	0,47	M2	CORTE No 1
muro 11			0,60	0,78		1,00	0,47	M2	CORTE No 1
muro 12			3,06	0,78		1,00	2,39	M2	CORTE No 1
Ventana			1,87	-0,8		1,00	-1,50	M2	CORTE No 1
Pintura bajo Techo		5,85	7,48			1,00	43,76	M2	CORTE No 1
AULA 5									
muro 1			0,18	2,61		1,00	0,47	M2	CORTE No 1
muro 2			0,65	2,61		1,00	1,70	M2	CORTE No 1
muro 3			2,92	2,61		1,00	7,63	M2	CORTE No 1
muro 4			0,65	2,61		1,00	1,70	M2	CORTE No 1
muro 5			0,69	2,61		1,00	1,81	M2	CORTE No 1
muro 6			6,80	2,61		1,00	17,75	M2	CORTE No 1
muro 7			6,04	2,61		1,00	15,77	M2	CORTE No 1
Puerta			0,86	-2,19		1,00	-1,89	M2	CORTE No 1

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.						ACTA No:		005	
ITEM	22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.							UNIDAD	M2
muro 8			3,00	-1,8		1,00	-5,40	M2	CORTE No 1	
muro 9			0,48	9,6		1,00	4,61	M2	CORTE No 1	
muro 10			7,48	2,61		1,00	19,53	M2	CORTE No 1	
Ventana			1,87	-0,97		1,00	-1,82	M2	CORTE No 1	
muro 11			0,67	2,61		1,00	1,75	M2	CORTE No 1	
muro 12			0,65	2,61		1,00	1,70	M2	CORTE No 1	
muro 13			0,18	2,61		1,00	0,47	M2	CORTE No 1	
muro 14			0,60	0,78		1,00	0,47	M2	CORTE No 1	
muro 15			3,06	0,78		1,00	2,39	M2	CORTE No 1	
Pintura bajo Techo		6,04	7,48			1,00	45,18	M2	CORTE No 1	
SEGUNDO PISO										
AULA 1										
muro 1			0,16	2,53		1,00	0,41	M2	CORTE No 1	
muro 2			0,60	2,53		1,00	1,52	M2	CORTE No 1	
muro 3			3,32	2,53		1,00	8,40	M2	CORTE No 1	
muro 4			7,06	2,87		1,00	20,27	M2	CORTE No 1	
muro 5			0,70	3,15		1,00	2,21	M2	CORTE No 1	
muro 6			1,00	3,15		1,00	3,15	M2	CORTE No 1	
muro 7			4,99	3,15		1,00	15,72	M2	CORTE No 1	
Puerta			-1,70	4,16		1,00	-7,08	M2	CORTE No 1	
muro 8			8,49	2,87		1,00	24,37	M2	CORTE No 1	
Ventana			-1,90	0,92		1,00	-1,75	M2	CORTE No 1	
muro 9			0,46	2,53		1,00	1,17	M2	CORTE No 1	
muro 10			0,59	2,53		1,00	1,50	M2	CORTE No 1	
muro 11			0,17	2,53		1,00	0,44	M2	CORTE No 1	
muro 12			5,00	2,27		1,00	11,35	M2	CORTE No 1	
muro 13			0,48	6,4		1,00	3,08	M2	CORTE No 1	
muro 14			0,48	4,99		1,00	2,40	M2	CORTE No 1	
muro 15			0,48	6,25		1,00	3,00	M2	CORTE No 1	
muro 16			1,12	5,8		1,00	6,50	M2	CORTE No 1	
muro 17			0,42	3,15		1,00	1,33	M2	CORTE No 1	
muro 18			0,66	1,7		1,00	1,13	M2	CORTE No 1	
muro 19			0,20	1,62		2,00	0,65	M2	CORTE No 1	
AULA 2									CORTE No 1	
muro 1			0,16	2,53		1,00	0,41	M2	CORTE No 1	
muro 2			0,78	2,53		1,00	1,98	M2	CORTE No 1	
muro 3			0,62	2,53		1,00	1,57	M2	CORTE No 1	
muro 4			7,53	2,87		1,00	21,62	M2	CORTE No 1	
Puerta			-1,90	0,92		1,00	-1,75	M2	CORTE No 1	
muro 5			0,88	3,15		1,00	2,78	M2	CORTE No 1	
muro 6			1,03	3,15		1,00	3,25	M2	CORTE No 1	
muro 7			3,94	2,15		1,00	8,48	M2	CORTE No 1	
Ventana			-3,94	1,65		1,00	-6,51	M2	CORTE No 1	
muro 8			0,98	3,15		1,00	3,09	M2	CORTE No 1	
muro 9			0,77	3,15		1,00	2,43	M2	CORTE No 1	
muro 10			4,44	2,25		1,00	9,99	M2	CORTE No 1	
muro 11			7,60	2,87		1,00	21,82	M2	CORTE No 1	
muro 12			1,36	2,53		1,00	3,45	M2	CORTE No 1	
muro 13			0,63	2,53		1,00	1,60	M2	CORTE No 1	
muro 14			0,14	0,81		3,00	0,35	M2	CORTE No 1	
muro 15			0,53	0,81		4,00	1,72	M2	CORTE No 1	
muro 16			0,72	2,53		1,00	1,83	M2	CORTE No 1	
muro 17			0,62	2,53		1,00	1,57	M2	CORTE No 1	



CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.								ACTA No:	005	
ITEM	22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.								UNIDAD	M2





muro 18			1,36	2,53		1,00	3,45	M2	CORTE No 1
muro 19			0,61	2,53		1,00	1,55	M2	CORTE No 1
muro 20			0,16	2,53		1,00	0,41	M2	CORTE No 1
AULA 3									
muro 1			0,18	2,53		1,00	0,46	M2	CORTE No 1
muro 2			0,61	2,53		1,00	1,55	M2	CORTE No 1
muro 3			3,31	2,53		1,00	8,38	M2	CORTE No 1
muro 4			7,63	2,87		1,00	21,90	M2	CORTE No 1
Puerta			0,86	3,15		1,00	2,71	M2	CORTE No 1
muro 5			1,06	3,15		1,00	3,34	M2	CORTE No 1
Ventana			-4,03	1,65		1,00	-6,65	M2	CORTE No 1
muro 7			4,03	2,15		1,00	8,67	M2	CORTE No 1
Ventana			2,27	4,35		1,00	9,88	M2	CORTE No 1
muro 8			1,04	3,15		1,00	3,28	M2	CORTE No 1
muro 9			0,76	3,15		1,00	2,40	M2	CORTE No 1
muro 10			7,56	2,87		1,00	21,70	M2	CORTE No 1
muro 11			0,14	0,81		4,00	0,46	M2	CORTE No 1
muro 12			0,53	0,81		6,00	2,58	M2	CORTE No 1
muro 13			0,77	2,53		1,00	1,95	M2	CORTE No 1
muro 14			0,62	2,53		1,00	1,57	M2	CORTE No 1
muro 15			0,18	2,53		1,00	0,46	M2	CORTE No 1
AULA 4									
muro 1			0,18	2,53		1,00	0,46	M2	CORTE No 1
muro 2			0,65	2,53		2,00	3,29	M2	CORTE No 1
muro 3			8,60	2,87		1,00	24,69	M2	CORTE No 1
muro 4			-1,90	0,92		1,00	-1,75	M3	CORTE No 1
Ventana			-2,98	1,65		1,00	-4,92	M4	CORTE No 1
muro 5			2,98	2,15		1,00	6,41	M2	CORTE No 1
muro 6			2,34	3,07		1,00	7,19	M2	CORTE No 1
muro 7			1,06	3,15		1,00	3,34	M2	CORTE No 1
muro 8			2,71	3,15		1,00	8,54	M2	CORTE No 1
muro 9			6,86	2,87		1,00	19,69	M2	CORTE No 1
muro 10			0,63	2,53		1,00	1,60	M2	CORTE No 1
muro 11			0,65	2,53		1,00	1,65	M2	CORTE No 1
muro 12			2,80	2,53		1,00	7,09	M2	CORTE No 1
Ventana			-0,60	2,56		1,00	-1,54	M2	CORTE No 1
muro 13			0,65	2,53		1,00	1,65	M2	CORTE No 1
muro 14			0,80	2,53		1,00	2,03	M2	CORTE No 1
AULA 5									
muro 1			0,18	2,53		1,00	0,46	M2	CORTE No 1
muro 2			0,65	2,53		1,00	1,65	M2	CORTE No 1
muro 3			3,47	2,53		1,00	8,78	M2	CORTE No 1
Ventana			-0,60	2,62		1,00	-1,58	M2	CORTE No 1
muro 4			7,59	2,87		1,00	21,79	M2	CORTE No 1
Ventana			2,73	3,15		1,00	8,60	M2	CORTE No 1
muro 5			1,06	3,15		1,00	3,34	M2	CORTE No 1
muro 6			3,00	2,15		1,00	6,45	M2	CORTE No 1
Ventana			-1,65	3,00		1,00	-4,95	M2	CORTE No 1
muro 7			1,25	3,15		1,00	3,94	M2	CORTE No 1
muro 8			2,30	3,00		1,00	6,90	M2	CORTE No 1
muro 9			8,64	2,87		1,00	24,80	M2	CORTE No 1
Puerta			-1,90	0,92		1,00	-1,75	M2	CORTE No 1
muro 10			0,63	2,53		1,00	1,60	M2	CORTE No 1
Ventana			0,64	2,53		1,00	1,62	M2	CORTE No 1
muro 11			0,17	2,53		1,00	0,44	M2	CORTE No 1

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.		ACTA No:	005
ITEM	22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	UNIDAD	M2









AULA 6									
muro 1			0,17	2,53		1,00	0,44	M2	CORTE No 1
muro 2			0,65	2,53		1,00	1,65	M2	CORTE No 1
muro 3			0,65	2,53		1,00	1,65	M2	CORTE No 1
muro 4			7,53	2,87		1,00	21,62	M2	CORTE No 1
Puerta			-1,90	0,92		1,00	-1,75	M2	CORTE No 1
muro 6			0,72	3,15		1,00	2,27	M2	CORTE No 1
muro 7			0,96	3,15		1,00	3,03	M2	CORTE No 1
muro 8			5,02	2,15		1,00	10,80	M2	CORTE No 1
Ventana			-1,65	4,00		1,00	-6,60	M2	CORTE No 1
muro 10			8,56	2,87		1,00	24,57	M2	CORTE No 1
muro 11			3,47	2,53		1,00	8,78	M2	CORTE No 1
muro 12			-0,60	2,6		1,00	-1,56	M2	CORTE No 1
muro 13			0,64	2,53		1,00	1,62	M2	CORTE No 1
muro 14			0,17	2,53		1,00	0,44	M2	CORTE No 1
muro 15			5,00	2,29		1,00	11,45	M2	CORTE No 1
muro 16									
AULA 7									
muro 1			0,17	2,53		1,00	0,44	M2	CORTE No 1
muro 2			0,65	2,53		2,00	3,29	M2	CORTE No 1
muro 3			2,90	2,53		1,00	7,34	M2	CORTE No 1
Ventana			-0,60	2,65		1,00	-1,59	M2	CORTE No 1
muro 4			0,72	2,53		1,00	1,83	M2	CORTE No 1
Ventana			7,27	2,87		1,00	20,87	M2	CORTE No 1
muro 5			0,41	3,15		1,00	1,30	M2	CORTE No 1
muro 6			0,97	3,15		1,00	3,06	M2	CORTE No 1
Ventana			5,29	2,15		1,00	11,38	M2	CORTE No 1
muro 7			-1,65	3,95		1,00	-6,52	M2	CORTE No 1
muro 8			5,20	2,22		1,00	11,55	M2	CORTE No 1
muro 9			8,51	2,87		1,00	24,43	M2	CORTE No 1
Puerta			-1,90	0,92		1,00	-1,75	M2	CORTE No 1
muro 10			0,68	2,53		1,00	1,73	M2	CORTE No 1
Ventana			0,65	2,53		1,00	1,65	M2	CORTE No 1
			0,17	2,53		1,00	0,44	M2	CORTE No 1
				CORTE No 2					
PISO 1									
COMEDOR									
PASILLO			5,43	2,60		1,00	14,12	M2	CORTE No 2
TECHO PASILLO		2,60	5,43			1,00	14,12	M2	CORTE No 2
COMEDOR INTERNO			9,48	2,61		1,00	24,74	M2	CORTE No 2
			0,23	2,61		1,00	0,60	M2	CORTE No 2
			9,30	2,61		1,00	24,27	M2	CORTE No 2
			11,93	2,61		1,00	31,14	M2	CORTE No 2
VENTANAS			0,94	1,10		-1,00	-1,03	M2	CORTE No 2
			0,81	1,10		-1,00	-0,89	M2	CORTE No 2
ESCALERA			4,87	4,50		1,00	21,92	M2	CORTE No 2
			2,88	4,96		1,00	14,28	M2	CORTE No 2
			5,15	3,20		1,00	16,48	M2	CORTE No 2
			3,15	1,00		1,00	3,15	M2	CORTE No 2
			3,15	2,50		1,00	7,88	M2	CORTE No 2
			0,18	1,20		1,00	0,22	M2	CORTE No 2
PISO 2									
COORDINACION			9,73	3,16		2,00	61,49	M2	CORTE No 2
			5,00	2,46		2,00	24,60	M2	CORTE No 2

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.						ACTA No:		005	
ITEM	22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.							UNIDAD	M2

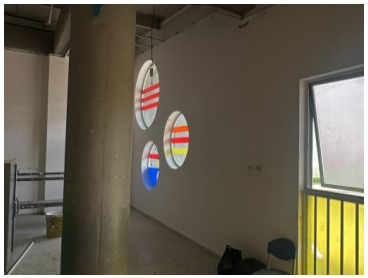



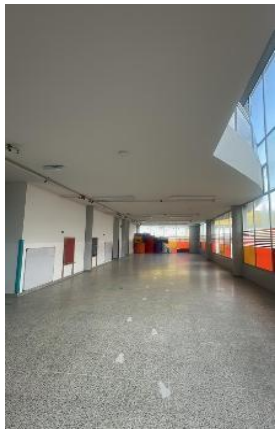




VENTANAS									CORTE No 2
CIRCULARES		DIAMETRO	1,00			-1,00	-0,79	M2	CORTE No 2
		DIAMETRO	1,00			1,00	0,79	M2	CORTE No 2
		DIAMETRO	1,45			1,00	1,65	M2	CORTE No 2
RECTANGULARES		4,51		2,10		-1,00	-9,47	M2	CORTE No 2
		5,00		1,75		-1,00	-8,75	M2	CORTE No 2
CIRCULACIONES									
PASILLO			26,90	3,06		1,00	82,31	M2	CORTE No 2
MUROS			0,61	2,61		8,00	1,17	M2	CORTE No 2
			0,71	2,61		2,00	1,58	M2	CORTE No 2
			5,01	1,37		3,00	78,85	M2	CORTE No 2
COLUMNAS			0,70	1,40		3,00	1,54	M2	CORTE No 2
MUROS BAÑOS			7,04	3,49		1,00	24,57	M2	CORTE No 2
			0,69	2,07		-1,00	-1,43	M2	CORTE No 2
			1,09	2,07		-1,00	-2,26	M2	CORTE No 2
			0,70	2,07		-1,00	-1,45	M2	CORTE No 2
COLUMNA ESCALERA			0,53	3,000		1,00	1,59	M2	CORTE No 2
MURO ESCALERA			5,88	1,07		1,00	6,29	M2	CORTE No 2
BAÑO 1			1,85	6,29		1,00	11,64	M2	CORTE No 2
			1,75	1,23		1,00	2,15	M2	CORTE No 2
			0,30	0,55		4,00	0,66	M2	CORTE No 2
			4,47	2,04		1,00	9,12	M2	CORTE No 2
MARCO PUERTA			0,20	4,80		-1,00	-0,96	M2	CORTE No 2
VIGAS EN CONCRETO			14,94	1,00		3,00	44,82	M2	CORTE No 2
			15,18	1,00		12,00	182,16	M2	CORTE No 2
			13,41	1,00		2,00	26,82	M2	CORTE No 2
			16,11	1,00		7,00	112,77	M2	CORTE No 2
COMEDOR PISO 2			36,53	2,52		1,00	92,06	M2	CORTE No 2
COLUMNA			1,60	2,52		1,00	4,03	M2	CORTE No 2
DESCUENTO VENTANA			4,49	1,65		-1,00	-7,41	M2	CORTE No 2
MUROS VENTANA			4,49	0,10		4,00	1,80	M2	CORTE No 2
PUERTA			1,78	2,07		-1,00	-3,68	M2	CORTE No 2
MUROS			7,20	1,6		1,00	11,52	M2	CORTE No 2
			8,90	1,26		1,00	11,21	M2	CORTE No 2
			7,20	1,02		1,00	7,34	M2	CORTE No 2
CORTE No 3 (NUESTRO)									
PISO 1									
TECHOS									
		17,00		5,4		1,00	91,80	M2	
		5,40		3,58		1,00	19,33	M2	
		22,60		2,3		1,00	51,98	M2	
		4,54		6,2		1,00	28,15	M2	
		6,87		1,49		1,00	10,24	M2	
		0,83		1,83		1,00	1,52	M2	
		0,65		1,4		4,00	3,64	M2	
		11,00		1,15		1,00	12,65	M2	
		2,10		1,6		-1,00	-3,36	M2	
		1,00		1		-1,00	-1,00	M2	
BAÑO ADULTO			3,60	2,91		1,00	10,48	M2	
			1,00	2,01		-1,00	-2,01	M2	
			2,03	0,6		-1,00	-1,22	M2	
RAMPA									
COLUMNAS			1,25	1,64		8,00	16,40	M2	
VIGA			2,17	21,1		1,00	45,79	M2	
			2,11	21,1		1,00	44,52	M2	
PASILLO			4,42	2,61		1,00	11,54	M2	
			3,31	2,61		1,00	8,64	M2	
			8,86	2,61		1,00	23,12	M2	
			3,33	2,61		1,00	8,69	M2	
			5,18	2,61		1,00	13,52	M2	
			9,80	2,61		1,00	25,58	M2	


CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.						ACTA No:		005	
ITEM	22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.							UNIDAD	M2









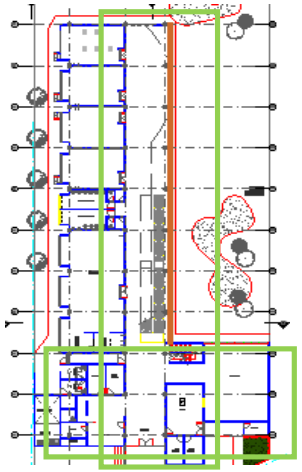


		2,66	2,61		1,00	6,94	M2	
		6,18	2,61		1,00	16,13	M2	
		7,57	2,61		1,00	19,76	M2	
		7,15	2,61		1,00	18,66	M2	
		1,62	0,6		-1,00	-0,97	M2	
		4,44	0,6		-1,00	-2,66	M2	
		0,96	0,96		-1,00	-0,92	M2	
		2,04	0,6		-1,00	-1,22	M2	
		3,28	0,6		-1,00	-1,97	M2	
		1,60	0,6		-1,00	-0,96	M2	
		2,27	0,6		-1,00	-1,36	M2	
		2,40	0,6		-1,00	-1,44	M2	
BAÑO NIÑOS		3,38	2,61		2,00	17,64	M2	
		2,81	2,61		2,00	14,67	M2	
		0,80	2,01		-1,00	-1,61	M2	
		1,87	0,6		-1,00	-1,12	M2	
OFICINA COORDINADORA		13,97	2,57		1,00	35,90	M2	
		2,40	0,60		-1,00	-1,44	M2	
		0,89	2,57		-1,00	-2,29	M2	
COORDINADORA		16,42	2,57		1,00	42,20	M2	
		0,84	1,94		-1,00	-1,63	M2	
		0,49	1,49		-5,00	-3,65	M2	
TECHOS	3,27		4,91		1,00	16,06	M2	
	1,00		1		1,00	1,00	M2	
	2,42		4,3		1,00	10,41	M2	
PISO 2								
BAÑO ADULTOS		2,66	2,51		1,00	6,68	M2	
BAÑO NIÑOS		2,41	3,37		2,00	16,24	M2	
		2,98	3,37		2,00	20,09	M2	
LAVATRAPEROS		4,42	1,48		1,00	6,54	M2	
PUERTA		AREA	2,79		-1,00	-2,79	M2	
TECHO	5,85		1,37		1,00	8,01	M2	
PORTERIA		4,36	2,58		1,00	11,25	M2	
		5,43	2,58		1,00	14,01	M2	
		6,34	2,58		1,00	16,36	M2	
		2,07	2,58		1,00	5,34	M2	
		4,25	2,58		1,00	10,97	M2	
		4,12	2,58		1,00	10,63	M2	
		6,47	2,58		1,00	16,69	M2	
		0,86	2,58		-2,00	-4,44	M2	
		0,87	2,58		-1,00	-2,24	M2	
		0,92	1,9		-1,00	-1,75	M2	
		0,60	1,95		-2,00	-2,34	M2	
		0,99	0,77		-1,00	-0,76	M2	
PISO 1							M2	
BODEGAS ARCHIVO		13,97	2,57		2,00	71,81	M2	
		2,40	0,60		2,00	2,88	M2	
		0,89	2,57		-2,00	-4,57	M2	
PISO 2								
BODEGA		0,17	2,53		1,00	0,43	M2	
		0,65	2,53		2,00	3,29	M2	
		2,90	2,53		1,00	7,34	M2	
		-0,60	2,65		1,00	-1,59	M2	
		0,72	2,53		1,00	1,82	M2	
		7,27	2,87		1,00	20,86	M2	
		0,41	3,15		1,00	1,29	M2	

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.							ACTA No:	005
ITEM	22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.						UNIDAD	M2





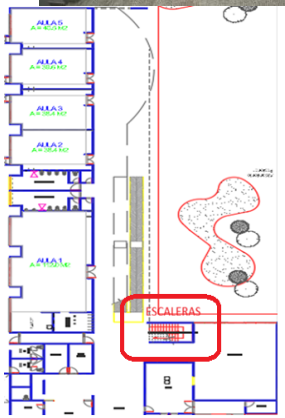







			0,97	3,15		1,00	3,06	M2	
			5,29	2,15		1,00	11,37	M2	
			-1,65	3,95		1,00	-6,52	M2	
			5,20	2,22		1,00	11,54	M2	
			8,51	2,87		1,00	24,42	M2	
			-1,90	0,92		1,00	-1,75	M2	
			0,68	2,53		1,00	1,72	M2	
			0,65	2,53		1,00	1,64	M2	
			0,17	2,53		1,00	0,43	M2	
CORTE No 5									
ESCALERAS PUNTO FIJO									
DEBAJO DE ESCALERA		3,80		2,21		1,00	8,40	M2	
DEBAJO DE ESCALERA		2,79		2,00		1,00	5,58	M2	
DEBAJO DE ESCALERA		2,90		1,27		1,00	3,69	M2	
DEBAJO DE ESCALERA		1,34		1,27		1,00	1,71	M2	
DEBAJO DE ESCALERA		1,60		1,27		1,00	2,04	M2	
DEBAJO DE ESCALERA		1,40		1,27		1,00	1,78	M2	
TECHO DEBAJO DE ESCALERA		1,35		2,95		1,00	3,99	M2	
SEGUNDO NIVEL		4,90		5,1		1,00	24,99	M2	
INTERMEDIO PRIMER A SEGUNDO NIVEL		3,88		3,17		1,00	12,30	M2	
INTERMEDIO PRIMER A SEGUNDO NIVEL		1,73		1,35		1,00	2,34	M2	
INTERMEDIO PRIMER A SEGUNDO NIVEL		5,20		3,2		1,00	16,64	M2	
PRIMER NIVEL		2,88		5,02		1,00	14,46	M2	
CLARABOYA 1		10,20		0,6		1,00	6,12	M2	
CLARABOYA 2		7,30		0,6		1,00	4,38	M2	
CLARABOYA 3		6,80		0,6		1,00	4,08	M2	

TOTAL EJECUTADO	3.173,21	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	3.060,71	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**112,50**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
112,50	3060,71	**3173,21**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	FIRMA	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**	11835-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**22.1.10**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

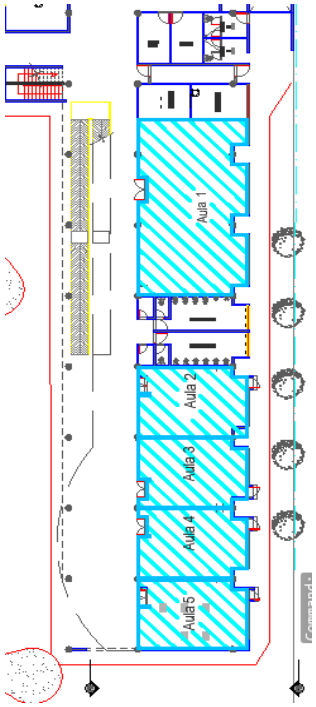

LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CORTE No 1									
PRIMER PISO									
AULA 1									
	1,00		0,98	1,20		1,18	1,18	M2	CORTE No 1
	1,00		7,82	1,20		9,38	9,38	M2	CORTE No 1
	1,00		7,56	1,20		9,07	9,07	M2	CORTE No 1
	1,00		6,86	1,20		8,23	8,23	M2	CORTE No 1
	1,00		4,03	-0,80		-3,22	-3,22	M2	CORTE No 1
	1,00		0,49	11,66		5,71	5,71	M2	CORTE No 1
	1,00		1,52	1,20		1,82	1,82	M2	CORTE No 1
	1,00		7,97	1,20		9,56	9,56	M2	CORTE No 1
Ventana	1,00		3,97	-1,20		-4,76	-4,76	M2	CORTE No 1
	1,00		0,50	8,39		4,20	4,20	M2	CORTE No 1
Puerta	1,00		1,97	-0,80		-1,58	-1,58	M2	CORTE No 1
	1,00		0,49	4,74		2,32	2,32	M2	CORTE No 1
	1,00		1,38	1,20		1,66	1,66	M2	CORTE No 1
	1,00		3,17	0,71		2,25	2,25	M2	CORTE No 1
	1,00		4,11	1,20		4,93	4,93	M2	CORTE No 1
	1,00		1,72	1,20		2,06	2,06	M2	CORTE No 1
	1,00		2,57	0,83		2,13	2,13	M2	CORTE No 1
BAÑO AULA 1	1,00		3,14	0,71		2,23	2,23	M2	CORTE No 1
	1,00		0,62	0,71		0,44	0,44	M2	CORTE No 1
	1,00		0,58	0,71		0,41	0,41	M2	CORTE No 1
	1,00		7,63	0,71		5,42	5,42	M2	CORTE No 1
	1,00		0,17	2,03		0,35	0,35	M2	CORTE No 1
	1,00		2,55	0,20		0,51	0,51	M2	CORTE No 1
	1,00		1,67	-0,61		-1,02	-1,02	M2	CORTE No 1
	1,00		2,18	4,89		10,66	10,66	M2	CORTE No 1
SALA AMIGA	1,00		0,18	2,61		0,47	0,47	M2	CORTE No 1
	1,00		6,14	0,72		4,42	4,42	M2	CORTE No 1
	1,00		0,43	1,20		0,52	0,52	M2	CORTE No 1
	1,00		2,87	2,61		7,49	7,49	M2	CORTE No 1
	1,00		2,20	-1,80		-3,96	-3,96	M2	CORTE No 1
	1,00		0,49	6,20		3,04	3,04	M2	CORTE No 1

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.		ACTA No:	005
ITEM	22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA










LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
AULA 2									
muro 1	1,00		0,18	1,20		0,22	0,22	M2	CORTE No 1
muro 2	1,00		0,65	1,20		0,78	0,78	M2	CORTE No 1
muro 3	1,00		0,65	1,20		0,78	0,78	M2	CORTE No 1
muro 4	1,00		0,69	1,20		0,83	0,83	M2	CORTE No 1
muro 5	1,00		6,80	1,20		8,16	8,16	M2	CORTE No 1
muro 6	1,00		6,04	1,20		7,25	7,25	M2	CORTE No 1
Puerta	1,00		0,86	-1,20		-1,03	-1,03	M2	CORTE No 1
muro 8	1,00		3,00	-0,80		-2,40	-2,40	M2	CORTE No 1
muro 9	1,00		0,48	7,60		3,65	3,65	M2	CORTE No 1
muro 10	1,00		7,48	1,20		8,98	8,98	M2	CORTE No 1
muro 11	1,00		0,67	1,20		0,80	0,80	M2	CORTE No 1
muro 12	1,00		0,65	1,20		0,78	0,78	M2	CORTE No 1
muro 13	1,00		0,18	1,20		0,22	0,22	M2	CORTE No 1
AULA 3									
muro 1	1,00		0,18	1,20		0,22	0,22	M2	CORTE No 1
muro 2	1,00		0,65	1,20		0,78	0,78	M2	CORTE No 1
muro 3	1,00		0,65	1,20		0,78	0,78	M2	CORTE No 1
muro 4	1,00		7,48	1,20		8,98	8,98	M2	CORTE No 1
muro 5	1,00		5,85	1,20		7,02	7,02	M2	CORTE No 1
muro 6	1,00		0,86	-1,20		-1,03	-1,03	M2	CORTE No 1
muro 7	1,00		3,00	-0,80		-2,40	-2,40	M2	CORTE No 1
muro 8	1,00		0,50	7,60		3,80	3,80	M2	CORTE No 1
muro 9	1,00		7,48	1,20		8,98	8,98	M2	CORTE No 1
muro 10	1,00		0,65	1,20		0,78	0,78	M2	CORTE No 1
muro 11	1,00		0,18	1,20		0,22	0,22	M2	CORTE No 1
AULA 4									
muro 1	1,00		0,18	1,20		0,22	0,22	M2	CORTE No 1
muro 2	1,00		0,65	1,20		0,78	0,78	M2	CORTE No 1
muro 3	1,00		0,65	1,20		0,78	0,78	M2	CORTE No 1
muro 4	1,00		7,48	1,20		8,98	8,98	M2	CORTE No 1
muro 5	1,00		5,85	1,20		7,02	7,02	M2	CORTE No 1
Puerta	1,00		0,86	-1,20		-1,03	-1,03	M2	CORTE No 1
muro 7	1,00		3,00	-0,80		-2,40	-2,40	M2	CORTE No 1
muro 8	1,00		0,50	7,60		3,80	3,80	M2	CORTE No 1
muro 9	1,00		7,48	1,20		8,98	8,98	M2	CORTE No 1
muro 10	1,00		0,65	1,20		0,78	0,78	M2	CORTE No 1
muro 11	1,00		0,18	1,20		0,22	0,22	M2	CORTE No 1
AULA 5									
muro 1	1,00		0,18	1,20		0,22	0,22	M2	CORTE No 1
muro 2	1,00		0,65	1,20		0,78	0,78	M2	CORTE No 1
muro 3	1,00		0,65	1,20		0,78	0,78	M2	CORTE No 1
muro 4	1,00		0,69	1,20		0,83	0,83	M2	CORTE No 1
muro 5	1,00		6,80	1,20		8,16	8,16	M2	CORTE No 1
muro 6	1,00		6,04	1,20		7,25	7,25	M2	CORTE No 1
Puerta	1,00		0,86	-1,20		-1,03	-1,03	M2	CORTE No 1
muro 8	1,00		3,00	-0,80		-2,40	-2,40	M2	CORTE No 1
muro 9	1,00		0,48	7,60		3,65	3,65	M2	CORTE No 1
muro 10	1,00		7,48	1,20		8,98	8,98	M2	CORTE No 1
muro 11	1,00		0,67	1,20		0,80	0,80	M2	CORTE No 1

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.		ACTA No:	005
ITEM	22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

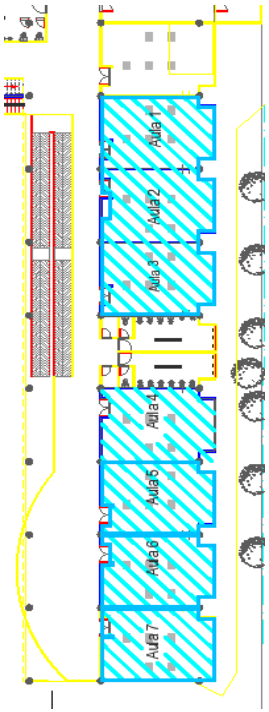



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
muro 12	1,00		0,65	1,20		0,78	0,78	M2	CORTE No 1
muro 13	1,00		0,18	1,20		0,22	0,22	M2	CORTE No 1
AULA 1									
muro 1			0,16	1,20		1,00	0,20	M2	CORTE No 1
muro 2			0,60	1,20		1,00	0,72	M2	CORTE No 1
muro 3			0,14	0,81		4,00	0,46	M2	CORTE No 1
muro 4			7,06	1,20		1,00	8,48	M2	CORTE No 1
muro 5			0,70	1,20		1,00	0,84	M2	CORTE No 1
muro 6			1,00	1,20		1,00	1,20	M2	CORTE No 1
muro 7			4,99	1,20		1,00	5,99	M2	CORTE No 1
Puerta			-4,16	0,85		1,00	-3,54	M2	CORTE No 1
muro 8			0,53	0,81		6,00	2,58	M2	CORTE No 1
muro 9			0,46	1,20		1,00	0,56	M2	CORTE No 1
muro 10			0,59	1,20		1,00	0,71	M2	CORTE No 1
muro 11			0,17	1,20		1,00	0,21	M2	CORTE No 1
muro 12			5,00	1,20		1,00	6,00	M2	CORTE No 1
muro 13			0,48	1,20		1,00	0,58	M2	CORTE No 1
muro 14			0,48	1,20		1,00	0,58	M2	CORTE No 1
muro 15			0,48	1,20		1,00	0,58	M2	CORTE No 1
muro 16			1,12	1,20		1,00	1,35	M2	CORTE No 1
muro 17			0,42	1,20		1,00	0,51	M2	CORTE No 1
muro 18			0,66	1,20		1,00	0,80	M2	CORTE No 1
muro 19			0,20	1,20		2,00	0,48	M2	CORTE No 1
AULA 2									
muro 1			0,16	1,20		1,00	0,20	M2	CORTE No 1
muro 2			0,78	1,20		1,00	0,94	M2	CORTE No 1
muro 3			0,62	1,20		1,00	0,75	M2	CORTE No 1
muro 4							0,00	M2	CORTE No 1
Puerta									
muro 5			0,88	1,20		1,00	1,06	M2	CORTE No 1
muro 6			1,03	1,20		1,00	1,24	M2	CORTE No 1
muro 7			3,94	1,20		1,00	4,73	M2	CORTE No 1
Ventana			-3,94	0,45		1,00	-1,78	M2	CORTE No 1
muro 8			0,98	1,20		1,00	1,18	M2	CORTE No 1
muro 9			0,77	1,20		1,00	0,93	M2	CORTE No 1
muro 10			4,44	1,20		1,00	5,33	M2	CORTE No 1
muro 11			7,60	1,20		1,00	9,12	M2	CORTE No 1
muro 12									
muro 13			0,63	1,20		1,00	0,76	M2	CORTE No 1
muro 14			0,14	0,81		3,00	0,35	M2	CORTE No 1
muro 15			0,53	0,81		4,00	1,72	M2	CORTE No 1
muro 16			0,72	1,20		1,00	0,87	M2	CORTE No 1
muro 17			0,62	1,20		1,00	0,75	M2	CORTE No 1
muro 18									
muro 19			0,61	1,20		1,00	0,74	M2	CORTE No 1
muro 20			0,16	1,20		1,00	0,20	M2	CORTE No 1
AULA 3									
muro 1			0,18	1,20		1,00	0,22	M2	CORTE No 1
muro 2			0,61	1,20		1,00	0,74	M2	CORTE No 1
muro 3									
muro 4			7,63	1,20		1,00	9,16	M2	CORTE No 1
Puerta			0,86	1,20		1,00	1,04	M2	CORTE No 1

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.		ACTA No:	005
ITEM	22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA








LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
muro 5			1,06	1,20		1,00	1,28	M2	CORTE No 1
Ventana			-4,03	0,45		1,00	-1,82	M2	CORTE No 1
muro 7			4,03	1,20		1,00	4,84	M2	CORTE No 1
Ventana			2,27	1,20		1,00	2,73	M2	CORTE No 1
muro 8			1,04	1,20		1,00	1,25	M2	CORTE No 1
muro 9			0,76	1,20		1,00	0,92	M2	CORTE No 1
muro 10									
muro 11			0,14	0,81		4,00	0,46	M2	CORTE No 1
muro 12			0,53	0,81		6,00	2,58	M2	CORTE No 1
muro 13			0,77	1,20		1,00	0,93	M2	CORTE No 1
muro 14			0,62	1,20		1,00	0,75	M2	CORTE No 1
muro 15			0,18	1,20		1,00	0,22	M2	CORTE No 1
AULA 4									
muro 1			0,18	1,20		1,00	0,22	M2	CORTE No 1
muro 2			0,65	1,20		2,00	1,56	M2	CORTE No 1
muro 3							0,00	M2	CORTE No 1
Ventana			-2,98	0,45		1,00	-1,35	M4	CORTE No 1
muro 5			2,98	1,20		1,00	3,58	M2	CORTE No 1
muro 6			2,34	1,20		1,00	2,81	M2	CORTE No 1
muro 7			1,06	1,20		1,00	1,28	M2	CORTE No 1
muro 8			2,71	1,20		1,00	3,26	M2	CORTE No 1
muro 9			6,86	1,20		1,00	8,24	M2	CORTE No 1
muro 10			0,63	1,20		1,00	0,76	M2	CORTE No 1
muro 11			0,65	1,20		1,00	0,78	M2	CORTE No 1
muro 13			0,65	1,20		1,00	0,78	M2	CORTE No 1
muro 14			0,80	1,20		1,00	0,96	M2	CORTE No 1
muro 15			0,14	0,81		4,00	0,46	M2	CORTE No 1
muro 16			0,53	0,81		6,00	2,58	M2	CORTE No 1
AULA 5									
muro 1			0,18	1,20		1,00	0,22	M2	CORTE No 1
muro 2			0,65	1,20		1,00	0,78	M2	CORTE No 1
muro 3									
muro 4			7,59	1,20		1,00	9,11	M2	CORTE No 1
Ventana			2,73	1,20		1,00	3,28	M2	CORTE No 1
muro 5			1,06	1,20		1,00	1,28	M2	CORTE No 1
muro 6			3,00	1,20		1,00	3,60	M2	CORTE No 1
Ventana			-3,00	0,45		1,00	-1,35	M2	CORTE No 1
muro 7			1,25	1,20		1,00	1,50	M2	CORTE No 1
muro 8			2,30	1,20		1,00	2,76	M2	CORTE No 1
muro 9							0,00	M2	CORTE No 1
muro 10			0,63	1,20		1,00	0,76	M2	CORTE No 1
Ventana			0,64	1,20		1,00	0,77	M2	CORTE No 1
muro 11			0,17	1,20		1,00	0,21	M2	CORTE No 1
muro 12			0,14	0,81		4,00	0,46	M2	CORTE No 1
muro 13			0,53	0,81		6,00	2,58	M2	CORTE No 1
AULA 6									
muro 1			0,17	1,20		1,00	0,21	M2	CORTE No 1
muro 2			0,65	1,20		1,00	0,78	M2	CORTE No 1
muro 3			0,65	1,20		1,00	0,78	M2	CORTE No 1
muro 4							0,00	M2	CORTE No 1

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.		ACTA No:	005
ITEM	22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
muro 6			0,72	1,20		1,00	0,87	M2	CORTE No 1
muro 7			0,96	1,20		1,00	1,16	M2	CORTE No 1
muro 8			5,02	1,20		1,00	6,03	M2	CORTE No 1
Ventana			-4,00	0,45		1,00	-1,80	M2	CORTE No 1
muro 10			8,56	1,20		1,00	10,28	M2	CORTE No 1
muro 11									
muro 13			0,64	1,20		1,00	0,77	M2	CORTE No 1
muro 14			0,17	1,20		1,00	0,21	M2	CORTE No 1
muro 15			5,00	1,20		1,00	6,00	M2	CORTE No 1
muro 16			0,14	0,81		4,00	0,46	M2	CORTE No 1
muro 17			0,53	0,81		6,00	2,58	M2	CORTE No 1
AULA 7									
muro 1			0,17	1,20		1,00	0,21	M2	CORTE No 1
muro 2			0,65	1,20		2,00	1,56	M2	CORTE No 1
muro 3									
muro 4			0,72	1,20		1,00	0,87	M2	CORTE No 1
Ventana			7,27	1,20		1,00	8,73	M2	CORTE No 1
muro 5			0,41	1,20		1,00	0,50	M2	CORTE No 1
muro 6			0,97	1,20		1,00	1,17	M2	CORTE No 1
Ventana			5,29	1,20		1,00	6,35	M2	CORTE No 1
muro 7			-3,95	0,45		1,00	-1,78	M2	CORTE No 1
muro 8			5,20	1,20		1,00	6,24	M2	CORTE No 1
muro 9									
muro 10			0,68	1,20		1,00	0,82	M2	CORTE No 1
Ventana			0,65	1,20		1,00	0,78	M2	CORTE No 1
			0,17	1,20		1,00	0,21	M2	CORTE No 1
muro 16			0,14	0,81		4,00	0,46	M2	CORTE No 1
muro 17			0,53	0,81		6,00	2,58	M2	CORTE No 1
CORTE No 2 (NUESTRO)									
PISO 1									
								M2	CORTE No 2
COMEDOR INTERNO			9,48	1,57		1,00	14,88	M2	CORTE No 2
			0,23	1,57		1,00	0,36	M2	CORTE No 2
			9,30	1,57		1,00	14,60	M2	CORTE No 2
			11,93	1,57		1,00	18,73	M2	CORTE No 2
								M2	CORTE No 2
VENTANAS			0,94	0,57		-1,00	-0,54	M2	CORTE No 2
			0,81	1,10		-1,00	-0,89	M2	CORTE No 2
								M2	CORTE No 2
ESCALERA			4,87	0,90		1,00	4,38	M2	CORTE No 2
			2,88	0,90		1,00	2,59	M2	CORTE No 2
			5,15	0,90		1,00	4,64	M2	CORTE No 2
			3,15	0,90		1,00	2,84	M2	CORTE No 2
			3,15	0,90		1,00	2,84	M2	CORTE No 2
			0,18	0,90		1,00	0,16	M2	CORTE No 2
PISO 2									
COORDINACION			9,73	1,2		2,00	23,35	M2	CORTE No 2
			5,00	1,2		2,00	12,00	M2	CORTE No 2
VENTANAS CIRCULARES		DIAMETRO	1,00			-1,00	-0,79	M2	CORTE No 2
									CORTE No 2
RECTANGULARES		4,51		0,50		-1,00	-2,26	M2	CORTE No 2

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.		ACTA No:	005
ITEM	22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
		5,00		1,50		-1,00	-7,50	M2	CORTE No 2
									CORTE No 2
BAÑO PISO 2			22,87	2,05		1,00	46,88	M2	CORTE No 2
									CORTE No 2
									CORTE No 2
RAMPA-BARANDAS			21,58	0,62		3,00	40,14	M2	CORTE No 2
			3,02	0,62		1,00	1,87	M2	CORTE No 2
			0,35	0,62		5,00	1,09	M2	CORTE No 2
			0,66	0,62		1,00	0,41	M2	CORTE No 2
			2,55	0,62		1,00	1,58	M2	CORTE No 2
			19,88	0,62		2,00	24,65	M2	CORTE No 2
			8,77	0,62		1,00	5,44	M2	CORTE No 2
									CORTE No 2
COMEDOR			36,53	1,20		1,00	43,84	M2	CORTE No 2
COLUMNA			1,60	1,20		1,00	1,92	M2	CORTE No 2
DESCUENTO VENTANA			4,49	1,20		-1,00	-5,39	M2	CORTE No 2
MUROS VENTANA			4,49	0,10		4,00	1,80	M2	CORTE No 2
PUERTA			1,78	1,20		1,00	2,14	M2	CORTE No 2
									CORTE No 2
									CORTE No 2
BAÑO NIÑOS 1			6,20	1,85		1,00	11,47	M2	CORTE No 2
			1,75	1,23		1,00	2,15	M2	CORTE No 2
			0,30	0,55		4,00	0,66	M2	CORTE No 2
			4,47	2,04		1,00	9,12	M2	CORTE No 2
marco puerta			4,80	0,2		1,00	0,96	M2	CORTE No 2
BAÑO NIÑOS 2			22,87	2,05		1,00	46,88	M2	CORTE No 2
									CORTE No 2
CIRCULACIONES									CORTE No 2
PASILLO			26,90	1,2		1,00	32,28	M2	CORTE No 2
MUROS			0,61	1,2		8,00	1,17	M2	CORTE No 2
			0,71	1,2		2,00	1,58	M2	CORTE No 2
			5,01	1,2		1,00	78,85	M2	CORTE No 2
COLUMNAS			0,70	1,20		3,00	1,54	M2	CORTE No 2
								M2	CORTE No 2
MUROS BAÑOS			7,04	1,20		1,00	8,45	M2	CORTE No 2
			0,69	1,20		-1,00	-0,83	M2	CORTE No 2
			1,09	1,20		-1,00	-1,31	M2	CORTE No 2
			0,70	1,20		-1,00	-0,84	M2	CORTE No 2
COLUMNA ESCALERA			0,53	1,20		1,00	0,64	M2	CORTE No 2
MURO ESCALERA			5,88	1,20		1,00	7,06	M2	CORTE No 2
BAÑO 1			1,85	1,20		1,00	2,22	M2	CORTE No 2
			1,75	1,20		1,00	2,10	M2	CORTE No 2

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.		ACTA No:	005
ITEM	22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	UNIDAD	M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA












LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
			0,30	1,20		4,00	1,44	M2	CORTE No 2
			4,47	1,20		1,00	5,36	M2	CORTE No 2
MARCO PUERTA			0,20	1,20		1,00	0,24	M2	CORTE No 2
CORTE No 3 NUESTRO									
PISO 1									
BAÑOS			4,00	3,00		1,00	12,00	M2	
			4,00	2,71		1,00	10,84	M2	
			2,03	2,43		1,00	4,93	M2	
			1,22	1,84		1,00	2,24	M2	
BAÑO ADULTO			6,84	0,75		1,00	5,13	M2	
			3,60	1,20		1,00	4,32	M2	
			1,00	1,20		-1,00	-1,20	M2	
								M2	
PASILLO			4,42	1,20		1,00	5,30	M2	
			3,31	1,20		1,00	3,97	M2	
			8,86	1,20		1,00	10,63	M2	
			3,33	1,20		1,00	4,00	M2	
			5,18	1,20		1,00	6,22	M2	
			9,80	1,20		1,00	11,76	M2	
			2,60	1,20		1,00	3,12	M2	
			6,18	1,20		1,00	7,42	M2	
			7,57	1,20		1,00	9,08	M2	
			7,15	1,20		1,00	8,58	M2	
BAÑO NIÑOS			3,38	1,20		2,00	8,11	M2	
			2,81	1,20		2,00	6,74	M2	
			0,80	1,20		-1,00	-0,96	M2	
			1,87	0,60		-1,00	-1,12	M2	
			16,72	0,73		2,00	24,41	M2	
			5,02	0,73		1,00	3,66	M2	
LAVANDERIA			8,92	2,56		1,00	22,84	M2	
VENTANAS		DIAMETRO	1,00			-4,00	-3,15	M2	
			7,56	2,56		1,00	19,35	M2	
			0,79	0,54		-2,00	-0,85	M2	
			0,80	2,56		-1,00	-2,05	M2	
			3,82	0,54		-1,00	-2,06	M2	
			9,55	0,68		1,00	6,49	M2	
			11,80	2,69		1,00	31,74	M2	
BAÑO 1			11,54	0,68		1,00	7,85	M2	
TECHO		3,63	2,03			1,00	7,37	M2	
BAÑO 2			11,54	0,68		1,00	7,85	M2	

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.		ACTA No:	005
ITEM	22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





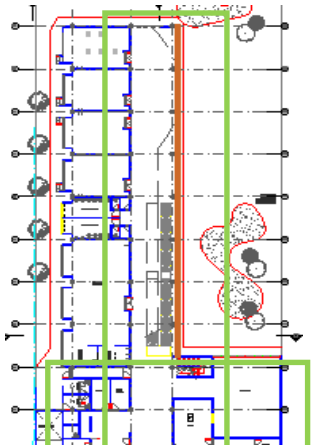




LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
			0,79	0,54		-2,00	-0,85	M2	
			0,80	0,68		1,00	0,54	M2	
TECHO		3,63	2,03			1,00	7,37	M2	
OFICINA COODINADORA			13,97	1,20		-1,00	-16,76	M2	
			0,89	1,20		-1,00	-1,07	M2	
COORDINACIÓN			16,42	1,20		1,00	19,70	M2	
			0,84	0,70		-1,00	-0,59	M2	
			0,49	0,70		-5,00	-1,72	M2	
TECHOS		3,81	3,44			1,00	13,11	M2	
BAÑOS OFICINA			8,95	0,72		1,00	6,44	M2	
			0,18	2,57		2,00	0,93	M2	
PISO 2									
BAÑO ADULTOS			8,12	1,48		1,00	12,02	M2	
			0,66	0,99		-1,00	-0,65	M2	
			2,66	1,20		1,00	3,19	M2	
BAÑO NIÑOS			4,03	1,54		2,00	12,41	M2	
			6,84	0,59		2,00	8,07	M2	
			1,60	1,57		2,00	5,02	M2	
			2,84	2,95		2,00	16,76	M2	
			0,57	2,13		2,00	2,43	M2	
			2,41	1,20		2,00	5,78	M2	
			2,48	1,20		2,00	5,95	M2	
LAVATRAPEROS			4,42	1,48		1,00	6,54	M2	
PUERTA		AREA	2,79			-1,00	-2,79	M2	
VIGAS RAMPA NIVEL PISO 2			21,48	0,60		1,00	12,89	M2	
PUERTAS RAMPA			0,90		1,00	2,00	1,80	M2	
LAMINA PERFORADA RAMPA			19,88	0,62		2,00	24,65	M2	
PORTERIA			4,36	1,20		1,00	5,23	M2	
			5,43	1,20		1,00	6,52	M2	
			6,34	1,20		1,00	7,61	M2	
			2,07	1,20		1,00	2,48	M2	
			4,25	1,20		1,00	5,10	M2	
			4,12	1,20		1,00	4,94	M2	
			6,47	1,20		1,00	7,76	M2	
			0,86	1,20		-2,00	-2,06	M2	
			0,87	1,20		-1,00	-1,04	M2	
			0,92	1,90		-1,00	-1,75	M2	
			0,60	1,20		-2,00	-1,44	M2	
			0,99	0,77		-1,00	-0,76	M2	
PISO 1									
BODEGAS ARCHIVO			13,97	1,20		2,00	33,53	M2	
			0,89	1,20		-2,00	-2,14	M2	

CAPITULO		PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	ACTA No:	005
ITEM	22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



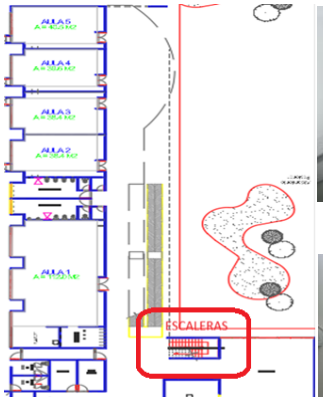





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PISO 2									
BODEGA			0,17	1,20		1,00	0,20	M2	
			0,65	1,20		2,00	1,56	M2	
			2,90	1,20		1,00	3,48	M2	
			-0,60	1,20		1,00	-0,72	M2	
			0,72	1,20		1,00	0,86	M2	
			7,27	1,20		1,00	8,72	M2	
			0,41	1,20		1,00	0,49	M2	
			0,97	1,20		1,00	1,16	M2	
			5,29	1,20		1,00	6,35	M2	
			-1,65	1,20		1,00	-1,98	M2	
			5,20	1,20		1,00	6,24	M2	
			8,51	1,20		1,00	10,21	M2	
			-1,90	0,92		1,00	-1,75	M2	
			0,68	1,20		1,00	0,82	M2	
			0,65	1,20		1,00	0,78	M2	
			0,17	1,20		1,00	0,20	M2	
BAÑO PRIMER PISO		3,90		2,95		1,00	11,51	M2	
		2,67		0,72		1,00	1,93	M2	
		2,03		2,44		1,00	4,96	M2	
TECHO		2,44		0,72		2,00	3,52	M2	
		2,03		0,72		1,00	1,47	M2	
CORTE No 5									
ESCALERAS PUNTO FIJO									
ESCALERA PRIMER A SEGUNDO NIVEL		4,34		1,30		1,00	5,65	M2	
		3,10		1,30		1,00	4,03	M2	
		2,87		1,30		1,00	3,74	M2	
		5,43		1,30		1,00	7,06	M2	
		3,04		1,30		1,00	3,96	M2	
		2,87		1,30		1,00	3,74	M2	

CAPITULO	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.		ACTA No:	005
ITEM	22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
										

TOTAL EJECUTADO	1.397,66	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	1.369,48	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**28,18**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
28,18	1369,48	**1397,66**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	FIRMA	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**	11835-2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**22.1.11**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

























LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE No 2									
RAMPA-BARANDAS TUBULAR	2,00		21,58			3,00	129,48	M	
	2,00		3,02			1,00	6,04	M	
	2,00		8,77			1,00	17,54	M	
	2,00		0,35			2,00	1,40	M	
	2,00		19,88			2,00	79,52	M	
	2,00		0,66			1,00	1,32	M	
	2,00		2,55			1,00	5,10	M	
BORDILLO- TRES CARAS	3,00		21,58			3,00	194,22	M	
	3,00		3,02			1,00	9,06	M	
	3,00		8,77			1,00	26,31	M	
	3,00		0,35			2,00	2,10	M	
	3,00		19,88			2,00	119,28	M	
	3,00		0,66			1,00	1,98	M	
	3,00		2,55			1,00	7,65	M	
CORRECCION MEDIDAS - CORTE No 3									
RAMPA-BARANDAS TUBULAR	2,00		21,48			8,00	343,68	M	
	2,00		3,02			1,00	6,04	M	
	2,00		8,77			1,00	17,54	M	
	2,00		0,35			2,00	1,40	M	
	2,00		19,88			9,00	357,84	M	
	2,00		0,66			1,00	1,32	M	
	2,00		2,55			1,00	5,10	M	
BORDILLO- DOS CARAS	2,00		21,48			2,00	85,92	M	
	2,00		3,02			1,00	6,04	M	
	2,00		8,77			1,00	17,54	M	
	2,00		0,35			2,00	1,40	M	
	2,00		19,88			2,00	79,52	M	
	2,00		0,66			1,00	1,32	M	
	2,00		2,55			1,00	5,10	M	
CORTE No 4									
PERFIL METALICO CUBIERTA-patio			46,50			1,00	46,50	M	
CORTE No 5									
PINTURA ESTRUCTURA CLARABOYAS									
CLARABOYA 1			18,19			1,00	18,19	M	
CLARABOYA 2			13,77			1,00	13,77	M	
CLARABOYA 3			13,01			1,00	13,01	M	
VERTICALES DE APOYO			0,48			12,00	5,76	M	
							0,00	M	
ESTRUCTURA TERRZA PEQUEÑA			2,64			2,00	5,28	M	
			0,84			2,00	1,68	M	
			0,90			3,00	2,70	M	
			0,25			2,00	0,50	M	
ESCALERAS PUNTO FIJO									
ESCALERA NIVEL INTERMEDIO A SEGUNDO NIVEL			4,33			2,00	8,66	M	
ESCALERA NIVEL INTERMEDIO A PRIMER NIVEL			4,70			2,00	9,40	M	
ESCALERA NIVEL INTERMEDIO A PRIMER NIVEL			3,10			4,00	12,40	M	





TOTAL EJECUTADO	1.067,61	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	1.037,15	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**30,46**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
30,46	1037,15	**1067,61**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE		**NOMBRE**	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SABANA GRANDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**23.8.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.**			**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

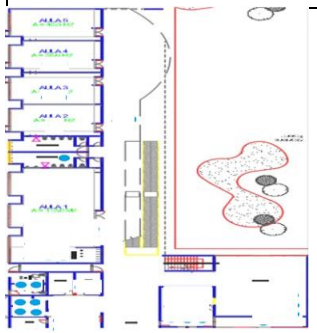



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
FLANCHES									
MURO ANTEPECHO FACHADA PARQUEDERO			0,40			3,00	1,20	M	

TOTAL EJECUTADO	1,20	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**1,20**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,20	0,00	**1,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS CARRERA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE		**NOMBRE**	
FIRMA	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**FIRMA**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA **FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 5**	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	31	5	2026	TIPO DE CONTRATO	OBRA				
2. ACTA No.	**5**			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL RAFAEL POMBO								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10675-2025	7. FECHA CONTRATO:	11/19/2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 12,017,556,820		
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	11/30/2027	11. PLAZO:	23 MESES 21 DIAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A	14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11835-2025	18. FECHA CONTRATO:	11/20/2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265		
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	12/30/2027	22. PLAZO:	24 MESES 21 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A	25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL						
27. SUPERVISOR SDIS:	ARQ JONNY EDUARD PADILLA						

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 (CINCO) días del mes de JUNIO del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA Obray/o Modificaciones
del mes de MAYO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.1	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).	M2		$ 6,042.00	$ -	162.23	$ 980,193.66		$ -	162.23	$ 980,193.66	162.23	$ 980,193.66
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M		$ 40,931.00	$ -	49.76	$ 2,036,726.56		$ -	49.76	$ 2,036,726.56	49.76	$ 2,036,726.56
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1.00	$ 26,129.00	$ 26,129.00	1.00	$ 26,129.00		$ -	1.00	$ 26,129.00	1.00	$ 26,129.00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.						$ -		$ -				
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	21.70	$ 13,685.00	$ 296,965.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	641.34	$ 21,234.00	$ 13,618,214.00	1,148.05	$ 24,377,693.70		$ -	1,148.05	$ 24,377,693.70	1,148.05	$ 24,377,693.70

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	272.92	$ 20,561.00	$ 5,611,590.00	267.87	$ 5,507,675.07		$ -	267.87	$ 5,507,675.07	267.87	$ 5,507,675.07
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.						$ -		$ -				
1.5.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.	M2	641.34	$ 29,545.00	$ 18,948,390.00	714.13	$ 21,098,970.85		$ -	714.13	$ 21,098,970.85	714.13	$ 21,098,970.85
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	202.74	$ 29,545.00	$ 5,989,953.00	47.06	$ 1,390,387.70		$ -	47.06	$ 1,390,387.70	47.06	$ 1,390,387.70
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.						$ -		$ -				
1.6.3	SELLADO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES DE 1/2" A 1,1/2" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN EN EL ÁREA AFERENTE A LA SALIDA DEL PUNTO, EL CORTE DE LA TUBERÍA PARA GARANTIZAR QUE NO SOBRESALGA POSTERIOR AL SELLADO, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'C=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	U	2.00	$ 20,843.00	$ 41,686.00	2.00	$ 41,686.00		$ -	2.00	$ 41,686.00	2.00	$ 41,686.00
1.6.4	SELLADO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES DE 2" A 4" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN EN EL ÁREA AFERENTE A LA SALIDA DEL PUNTO, EL CORTE DE LA TUBERÍA PARA GARANTIZAR QUE NO SOBRESALGA POSTERIOR AL SELLADO, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'C=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	U	2.00	$ 26,016.00	$ 52,032.00	2.00	$ 52,032.00		$ -	2.00	$ 52,032.00	2.00	$ 52,032.00
1.6.22	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO ANTIVANDÁLICO INOXIDABLE (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.	UN	2.00	$ 29,734.00	$ 59,468.00	2.00	$ 59,468.00		$ -	2.00	$ 59,468.00	2.00	$ 59,468.00
1.6.24	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS / ORINAL / DUCHA DE EMPOTRAR EN MURO, EJECUTANDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA, DESMONTE DEL FLUXÓMETRO ACTUAL Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 46,666.00	$ 46,666.00	1.00	$ 46,666.00		$ -	1.00	$ 46,666.00	1.00	$ 46,666.00
1.6.25	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE DUCHA (INDIFERENTE DE TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EJECUTANDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA, DESMONTE DEL GRIFO ACTUAL Y TODAS SUS PIEZAS INCLUYENDO EL POMO DE LA DUCHA. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	1.00	$ 34,981.00	$ 34,981.00	1.00	$ 34,981.00	1.00	$ 34,981.00	-	$ -	1.00	$ 34,981.00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	83.00	$ 15,043.00	$ 1,248,569.00	94.00	$ 1,414,042.00	3.00	$ 45,129.00	91.00	$ 1,368,913.00	94.00	$ 1,414,042.00
1.6.29	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	-	$ 12,396.00	$ -	1.00	$ 12,396.00	1.00	$ 12,396.00	-	$ -	1.00	$ 12,396.00
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.						$ -		$ -				
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	113.47	$ 21,876.00	$ 2,482,270.00	214.87	$ 4,700,496.12		$ -	214.87	$ 4,700,496.12	214.87	$ 4,700,496.12
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.						$ -		$ -				
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	227.25	$ 7,498.00	$ 1,703,921.00	246.75	$ 1,850,131.50		$ -	246.75	$ 1,850,131.50	246.75	$ 1,850,131.50
1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	227.25	$ 9,560.00	$ 2,172,510.00	246.75	$ 2,358,930.00		$ -	246.75	$ 2,358,930.00	246.75	$ 2,358,930.00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	7.03	$ 11,333.00	$ 79,671.00	1.46	$ 16,546.18		$ -	1.46	$ 16,546.18	1.46	$ 16,546.18
1.10	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.						$ -		$ -				
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M2	4.58	$ 6,866.00	$ 31,446.00	6.29	$ 43,187.14	3.60	$ 24,717.60	2.69	$ 18,469.54	6.29	$ 43,187.14
1.10.10	DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	25.48	$ 23,973.00	$ 610,832.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
1.11	OTROS PRELIMINARES.						$ -		$ -				
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	19.80	$ 7,005.00	$ 138,699.00	19.08	$ 133,655.40	19.08	$ 133,655.40	-	$ -	19.08	$ 133,655.40
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**						$ -		$ -				
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.						$ -		$ -				
3.1.1	MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1.26	$ 50,520.00	$ 63,655.00	1.17	$ 59,108.40		$ -	1.17	$ 59,108.40	1.17	$ 59,108.40
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.						$ -		$ -				
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	253.34	$ 24,413.00	$ 6,184,789.00	139.23	$ 3,399,021.99	52.87	$ 1,290,715.31	86.36	$ 2,108,306.68	139.23	$ 3,399,021.99
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**						$ -		$ -				
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS						$ -		$ -				
4.1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	0.50	$ 12,967.00	$ 6,484.00	0.50	$ 6,483.50	0.50	$ 6,483.50	-	$ -	0.50	$ 6,483.50
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	-	$ 74,815.00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1.50	$ 63,462.00	$ 95,193.00	1.50	$ 95,193.00	1.50	$ 95,193.00	-	$ -	1.50	$ 95,193.00
4.1.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 3"	UN	1.00	$ 56,349.00	$ 56,349.00	5.00	$ 281,745.00	1.00	$ 56,349.00	4.00	$ 225,396.00	5.00	$ 281,745.00
4.1.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1.00	$ 110,248.00	$ 110,248.00	1.00	$ 110,248.00	1.00	$ 110,248.00	-	$ -	1.00	$ 110,248.00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						$ -		$ -				
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES						$ -		$ -				
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 149,651.00	$ -	1.00	$ 149,651.00	1.00	$ 149,651.00	-	$ -	1.00	$ 149,651.00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00	$ 229,747.00	$ 918,988.00	1.00	$ 229,747.00	1.00	$ 229,747.00	-	$ -	1.00	$ 229,747.00
5.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN		$ 143,076.00	$ -	1.00	$ 143,076.00	1.00	$ 143,076.00	-	$ -	1.00	$ 143,076.00
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN		$ 38,067.00	$ -	1.00	$ 38,067.00	1.00	$ 38,067.00	-	$ -	1.00	$ 38,067.00
5.2	SALIDAS						$ -		$ -				
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9.00	$ 248,280.00	$ 2,234,520.00	9.00	$ 2,234,520.00		$ -	9.00	$ 2,234,520.00	9.00	$ 2,234,520.00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.3	TABLEROS Y OTROS						$ -		$ -				
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UND		$ 63,670.00	$ -	4.00	$ 254,680.00		$ -	4.00	$ 254,680.00	4.00	$ 254,680.00
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.						$ -		$ -				
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	10.00	$ 17,026.00	$ 170,260.00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	10.00	$ 59,630.00	$ 596,300.00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.5	ILUMINACIÓN.						$ -		$ -				
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	49.00	$ 203,696.00	$ 9,981,104.00	49.00	$ 9,981,104.00		$ -	49.00	$ 9,981,104.00	49.00	$ 9,981,104.00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 204,308.00	$ -	4.00	$ 817,232.00		$ -	4.00	$ 817,232.00	4.00	$ 817,232.00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9.00	$ 44,064.00	$ 396,576.00	9.00	$ 396,576.00		$ -	9.00	$ 396,576.00	9.00	$ 396,576.00
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	34.00	$ 42,935.00	$ 1,459,790.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 133,915.00		33.00	$ 4,419,195.00	3.00	$ 401,745.00	30.00	$ 4,017,450.00	33.00	$ 4,419,195.00
5.5.16	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	-	$ 21,707.00	$ -	8.00	$ 173,656.00		$ -	8.00	$ 173,656.00	8.00	$ 173,656.00
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**						$ -		$ -				
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.						$ -		$ -				
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	753.39	$ 52,523.00	$ 39,570,303.00	797.17	$ 41,869,759.91		$ -	797.17	$ 41,869,759.91	797.17	$ 41,869,759.91
7.1.8	CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO H.=1/3 ESPESOR DE LA PLACA DE CONTRAPISO / ENTREPISO PF.>4,1<=7,0 CM (VER ADICIONAL EL ÍTEM DE SELLANTE).	M	9.10	$ 12,808.00	$ 116,553.00	8.16	$ 104,513.28		$ -	8.16	$ 104,513.28	8.16	$ 104,513.28
7.2	ACABADO DE PISOS.						$ -		$ -				
7.2.8	ACABADO DE PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 51 X 51 CM COLOR MATE. INCLUYE PEGA CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.	M2		$ 117,767.00	$ -	42.42	$ 4,995,676.14		$ -	42.42	$ 4,995,676.14	42.42	$ 4,995,676.14
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	37.17	$ 135,070.00	$ 5,020,552.00	4.64	$ 626,724.80		$ -	4.64	$ 626,724.80	4.64	$ 626,724.80
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.						$ -		$ -				
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	290.85	$ 16,069.00	$ 4,673,669.00	389.24	$ 6,254,697.56		$ -	389.24	$ 6,254,697.56	389.24	$ 6,254,697.56
7.3.6	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	12.02	$ 53,052.00	$ 637,685.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	33.86	$ 46,400.00	$ 1,571,104.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.9	GUARDA ESCOBA EN PVC	M		$ 51,750.00	$ -	18.94	$ 980,145.00	18.94	$ 980,145.00	-	$ -	18.94	$ 980,145.00
7.3.11	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M		$ 19,761.00	$ -	39.78	$ 786,092.58		$ -	39.78	$ 786,092.58	39.78	$ 786,092.58
7.4	OTROS						$ -		$ -				
7.4.5	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	51.58	$ 3,665.00	$ 189,041.00	33.06	$ 121,164.90	33.06	$ 121,164.90	-	$ -	33.06	$ 121,164.90
7.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	162.18	$ 161,990.00	$ 26,271,538.00	162.23	$ 26,279,637.70		$ -	162.23	$ 26,279,637.70	162.23	$ 26,279,637.70
7.4.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	279.38	$ 28,613.00	$ 7,993,900.00	57.02	$ 1,631,513.26	57.02	$ 1,631,513.26	-	$ -	57.02	$ 1,631,513.26
7.4.16	WIN DE ALUMINIO	M		$ 25,376.00	$ -	8.16	$ 207,068.16		$ -	8.16	$ 207,068.16	8.16	$ 207,068.16
8	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						$ -		$ -				
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	7.03	$ 134,395.00	$ 944,797.00	3.98	$ 534,892.10		$ -	3.98	$ 534,892.10	3.98	$ 534,892.10
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						$ -		$ -				
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ -				

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2.04	$ 484,812.00	$ 989,016.00	2.04	$ 989,016.48	2.04	$ 989,016.48	-	$ -	2.04	$ 989,016.48
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						$ -		$ -				
11.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	1.00	$ 106,459.00	$ 106,459.00	1.00	$ 106,459.00	1.00	$ 106,459.00	-	$ -	1.00	$ 106,459.00
11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	6.00	$ 26,036.00	$ 156,216.00	6.00	$ 156,216.00	6.00	$ 156,216.00	-	$ -	6.00	$ 156,216.00
11.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN		$ 31,543.00	$ -	4.00	$ 126,172.00		$ -	4.00	$ 126,172.00	4.00	$ 126,172.00
11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	1.00	$ 31,543.00	$ 31,543.00	1.00	$ 31,543.00		$ -	1.00	$ 31,543.00	1.00	$ 31,543.00
11.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UN		$ 67,030.00	$ -	17.00	$ 1,139,510.00	17.00	$ 1,139,510.00	-	$ -	17.00	$ 1,139,510.00
11.47	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	6.00	$ 189,064.00	$ 1,134,384.00	3.00	$ 567,192.00		$ -	3.00	$ 567,192.00	3.00	$ 567,192.00
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						$ -		$ -				
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	12.16	$ 800,576.00	$ 9,735,004.00	13.68	$ 10,951,879.68		$ -	13.68	$ 10,951,879.68	13.68	$ 10,951,879.68
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**						$ -		$ -				
14.1	CIELOS RASOS.						$ -		$ -				
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	106.48	$ 113,630.00	$ 12,099,322.00	139.03	$ 15,797,978.90		$ -	139.03	$ 15,797,978.90	139.03	$ 15,797,978.90
14.1.2	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	6.99	$ 212,669.00	$ 1,486,556.00	5.15	$ 1,095,245.35		$ -	5.15	$ 1,095,245.35	5.15	$ 1,095,245.35
14.1.4	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2		$ 100,232.00	$ -	70.69	$ 7,085,400.08	70.69	$ 7,085,400.08	-	$ -	70.69	$ 7,085,400.08
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						$ -		$ -				
15.10	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ -				
15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN		$ 80,089.00	$ -	1.00	$ 80,089.00	1.00	$ 80,089.00	-	$ -	1.00	$ 80,089.00
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ -				
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	4.58	$ 186,264.00	$ 853,089.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
15.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO E.=6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2		$ 256,318.00	$ -	6.29	$ 1,612,240.22	3.60	$ 922,744.80	2.69	$ 689,495.42	6.29	$ 1,612,240.22
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	65.52	$ 108,119.00	$ 7,083,957.00	3.37	$ 364,361.03	3.37	$ 364,361.03	-	$ -	3.37	$ 364,361.03
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**						$ -		$ -				
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,696.37	$ 4,821.00	$ 8,178,200.00	732.60	$ 3,531,864.60		$ -	732.60	$ 3,531,864.60	732.60	$ 3,531,864.60

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**						$ -		$ -				
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.						$ -		$ -				
21.1.11	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	236.80	$ 84,039.00	$ 19,900,435.00	907.67	$ 76,279,679.13		$ -	907.67	$ 76,279,679.13	907.67	$ 76,279,679.13
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**						$ -		$ -				
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.						$ -		$ -				
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	227.25	$ 75,848.00	$ 17,236,458.00	35.67	$ 2,705,498.16		$ -	35.67	$ 2,705,498.16	35.67	$ 2,705,498.16
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	361.92	$ 14,518.00	$ 5,254,355.00	449.66	$ 6,528,163.88	80.00	$ 1,161,440.00	369.66	$ 5,366,723.88	449.66	$ 6,528,163.88
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	180.96	$ 51,391.00	$ 9,299,715.00	387.67	$ 19,922,748.97	6.21	$ 319,138.11	381.46	$ 19,603,610.86	387.67	$ 19,922,748.97
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M		$ 13,658.00	$ -	24.28	$ 331,616.24	8.08	$ 110,356.64	16.20	$ 221,259.60	24.28	$ 331,616.24
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	358.09	$ 31,749.00	$ 11,368,999.00	993.16	$ 31,531,836.84		$ -	993.16	$ 31,531,836.84	993.16	$ 31,531,836.84
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.						$ -		$ -				
22.3.4	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2		$ 42,697.00	$ -	72.10	$ 3,078,453.70	72.10	$ 3,078,453.70	-	$ -	72.10	$ 3,078,453.70
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	318.28	$ 39,486.00	$ 12,567,604.00	896.15	$ 35,385,378.90		$ -	896.15	$ 35,385,378.90	896.15	$ 35,385,378.90
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	21.70	$ 30,224.00	$ 655,861.00	51.70	$ 1,562,580.80		$ -	51.70	$ 1,562,580.80	51.70	$ 1,562,580.80
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**						$ -		$ -				
23.1	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.						$ -		$ -				
23.1.5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	24.80	$ 121,703.00	$ 3,018,234.00	24.80	$ 3,018,234.40		$ -	24.80	$ 3,018,234.40	24.80	$ 3,018,234.40
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.						$ -		$ -				
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	675.71	$ 133,163.00	$ 89,979,571.00	782.49	$ 104,198,715.87	86.32	$ 11,494,630.16	696.17	$ 92,704,085.71	782.49	$ 104,198,715.87
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS						$ -		$ -				
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	297.73	$ 227,950.00	$ 67,867,554.00	294.19	$ 67,060,610.50		$ -	294.19	$ 67,060,610.50	294.19	$ 67,060,610.50
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.						$ -		$ -				
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	46.97	$ 57,044.00	$ 2,679,357.00	51.95	$ 2,963,435.80		$ -	51.95	$ 2,963,435.80	51.95	$ 2,963,435.80
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	21.70	$ 87,159.00	$ 1,891,350.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	47.50	$ 47,840.00	$ 2,272,400.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
23.8.14	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	161.14	$ 64,371.00	$ 10,372,743.00	219.91	$ 14,155,826.61		$ -	219.91	$ 14,155,826.61	219.91	$ 14,155,826.61
	VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD				CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 458,675,772.00**		**$ 585,721,130.30**		**$ 32,512,791.97**		**$ 553,208,338.33**		**$ 585,721,130.30**
	35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**			$ 458,675,772.00		$ 585,721,130.30		$ 32,512,791.97		$ 553,208,338.33		$ 585,721,130.30
	ADMINISTRACIÓN	29.00%			$ 133,015,973.88		$ 169,859,127.79		$ 9,428,709.67		$ 160,430,418.12		$ 169,859,127.79
	IMPREVISTO	1%			$ 4,586,757.72		$ 5,857,211.30		$ 325,127.92		$ 5,532,083.38		$ 5,857,211.30
	UTILIDAD	4%			$ 18,347,030.88		$ 23,428,845.21		$ 1,300,511.68		$ 22,128,333.53		$ 23,428,845.21
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				**$ 155,949,762.48**		**$ 199,145,184.30**		**$ 11,054,349.27**		**$ 188,090,835.03**		**$ 199,145,184.30**
	AJUSTE AL PESO				-$ 0.48		$ 0.40		-$ 0.24		$ 0.64		$ 0.40
	ANTICIPO	0%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				**$ 614,625,534.00**		**$ 784,866,315.00**		**$ 43,567,141.00**		**$ 741,299,174.00**		**$ 784,866,315.00**
													100.00%

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO		40. NOMBRE DEL ARCHIVO		42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	4	ABRIL 2026				
INFORME SOCIAL	4	ABRIL 2026				
INFORME AMBIENTAL	4	ABRIL 2026				
INFORME SST	4	ABRIL 2026				
INFORME DE SUPERVISION	4	ABRIL 2026				
ACTA PARCIAL	4	MAYO 2026				
SOPORTE PAGO SDH	4	MAYO 2026				
FACTURA	4	MAYO 2026				
FORMATO MC 14	4	MAYO 2026				

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 06 días del mes de JUNIO del año _2026_

Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO
C.C. 79,905,718
Rep Legal. CONCORCIO SANTA ISABEL
Nit. 902,0003,595-6

Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
C.C. No. 1,062,398,686
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL
902,007,033-7


Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	MUNICIPIO	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	CONTRATO No.	10675-2025	FRENTE OBRA	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	CONTRATO No:			
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	30 de mayo de 2026

CAPITULO	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.	ACTA No:	005
ITEM	1.6.25	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE DUCHA (INDIFERENTE DE TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EJECUTANDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA, DESMONTE DEL GRIFO ACTUAL Y TODAS SUS PIEZAS INCLUYENDO EL POMO DE LA DUCHA. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	UNIDAD: UND

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

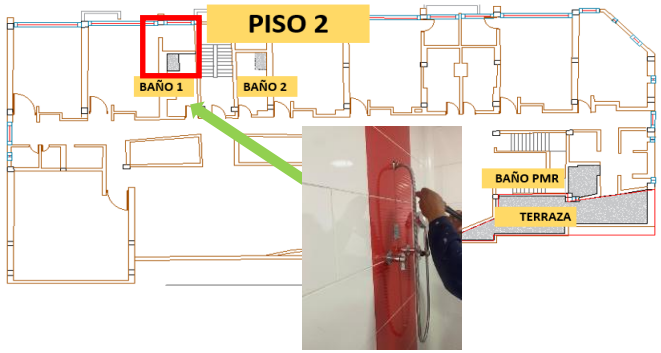

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BAÑO NIÑOS									
BAÑO 1									
DUCHA						1,00	1,00	UND	PRESUPUESTO INICIAL

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND	
PRESENTE ACTA	1,00	UND	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	1,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	FIRMA	ING. JOHANNA [illegible] ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.6.26**	**DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PISO 1:									
LED 60X60									
COMEDOR						22,00	22,00	UND	CORTE No 1
DESMONTE LAM EMERGENCIA						4,00	4,00	UND	CORTE No 1
DESMONTE AVISOS EMERGENCIA						4,00	4,00	UND	CORTE No 1
PISO 2:									
LUDOTECA						19,00	19,00	UND	
PASILLO LUDOTECA						1,00	1,00	UND	
CORTE No 4									
PASILLO SEGUNDO PISO									
HERMETICAS						4,00	4,00	UND	
AULAS 60X60						7,00	7,00	UND	
BALAS CIRCULARES									
PISO 1									
ENTRADA PPAL						4,00	4,00	UND	
BAÑOS Y DEPOSITOS						2,00	2,00	UND	
ESCALERAS Y P FIJO						13,00	13,00	UND	
CORREDOR						2,00	2,00	UND	
PISO 2									
BAÑOS Y DEPOSITOS						8,00	8,00	UND	
CORREDOR LUDOTECA						1,00	1,00	UND	
CORTE No 5									
PISO 1									
BAÑO COMEDOR						3,00	3,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	94,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	91,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**3,00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,00	91,00	**94,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.10.1**	**DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA




LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COMDEDOR AUXILIAR		1,21		2,22		1,00	2,69	M2	
CORTE No 5									
PISO 1									
COMEDOR		1,23		2,50		1,00	3,08	M2	
PISO 2									
LUDOTECA		0,98		0,53		1,00	0,52	M2	

TOTAL EJECUTADO	6,29	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	2,69	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**3,60**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,60	2,69	**6,29**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.6.29**			**UNIDAD**	**UND**



RVENIDA



LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CORTE No 5									
BAÑO COMEDOR									
INTERRUPTOR DOBLE						1,00	1,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND	
PRESENTE ACTA	**1,00**	UND	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.11.10**	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO**		**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PATIO/ COMEDOR									
MURO VERDE			19,08			1,00	19,08	ML	

TOTAL EJECUTADO	19,08	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**19,08**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
19,08	0,00	**19,08**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIUEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLADIA MONCADA FC
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de enero de 2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**3.5.5**	**RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
SEGUNDO PISO									
AULA 1	50%		7,68	2,45		1,00	9,41	M2	
	50%		4,60	2,45		1,00	5,64	M2	
	50%		6,44	2,45		1,00	7,89	M2	
AULA 2	50%		6,27	2,45		1,00	7,68	M2	
	50%		5,23	2,45		1,00	6,41	M2	
	50%		5,52	2,45		1,00	6,76	M2	
AULA 3	50%		6,82	2,45		1,00	8,35	M2	
	50%		4,87	2,45		1,00	5,97	M2	
	50%		5,44	2,45		1,00	6,66	M2	
AULA 4	50%		6,03	2,45		1,00	7,39	M2	
	50%		5,24	2,45		1,00	6,42	M2	
	50%		6,36	2,45		1,00	7,79	M2	
CORTE No 5									
VACIOS PISO 2								M2	
	70%		3,90	1,50		1,00	4,10	M2	
	70%		2,00	1,50		1,00	2,10	M2	
	70%		3,90	1,50		1,00	4,10	M2	
	70%		2,20	1,50		1,00	2,31	M2	
	70%							M2	
	70%		2,00	1,50		1,00	2,10	M2	
	70%		7,47	1,50		1,00	7,84	M2	
	70%		2,27	1,50		1,00	2,38	M2	
	70%		7,33	1,50		1,00	7,70	M2	
	70%							M2	
	70%		2,25	1,50		1,00	2,36	M2	
	70%		5,37	1,50		1,00	5,64	M2	
	70%		1,79	1,50		1,00	1,88	M2	
	70%		5,22	1,50		1,00	5,48	M2	
CUCHILLA	70%		4,65	1,50		1,00	4,88	M2	

TOTAL EJECUTADO	139,23	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	86,36	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**52,87**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
52,87	86,36	**139,23**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIUEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLADIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	MUNICIPIO	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	CONTRATO No.	10675-2025	FRENTE OBRA	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	CONTRATO No:			
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	30 de mayo de 2026

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).		ACTA No:	005
ITEM	4.1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

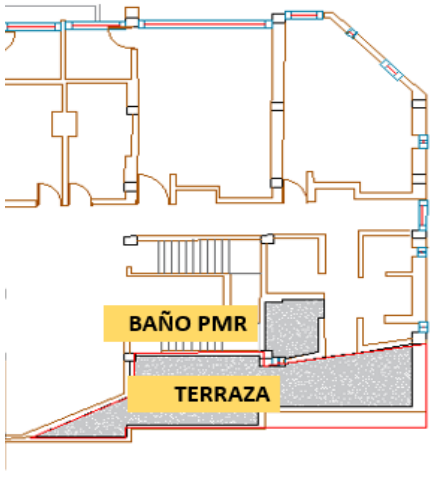



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PISO 2									
BAÑO PMR-ASEO			0,5			1,00	0,50	ML	

TOTAL EJECUTADO	0,50	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**0,50**	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0,50	0,00	**0,50**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FREDY DANIUEL PINILLA MONROY	NOMBRE	ING. CLADIA MO...
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	MUNICIPIO	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	CONTRATO No.	10675-2025	FRENTE OBRA	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	CONTRATO No:			
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	30 de mayo de 2026

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).	ACTA No:	005
ITEM	4.1.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

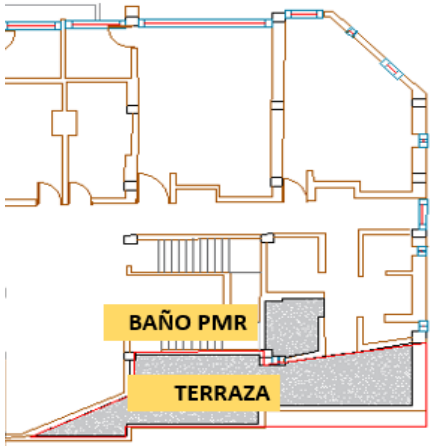





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PISO 2									
BAÑO PMR-ASEO			1,5			1,00	1,50	ML	

TOTAL EJECUTADO	1,50	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	1,50	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,50	0,00	1,50

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FREDY DANIUEL PINILLA MONROY	NOMBRE	ING. CLADIA MONCADA FONSECA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**4.1.48**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 3"**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PISO 2									
DUCHA BAÑOS									
BAÑO 1						1,00	1,00	UN	
BAÑO 2						1,00	1,00	UN	
BAÑO 3						1,00	1,00	UN	
BAÑO 4						1,00	1,00	UN	
CORTE No 5									
POCETA DE ASEO						1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	5,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	4,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**1,00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	4,00	**5,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIUEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLADIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**4.1.58**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE MANGUERA 1/2"**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

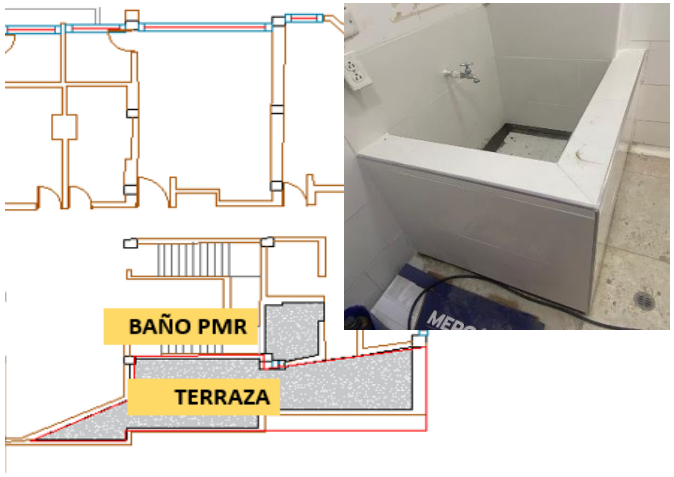

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PISO 2									
BAÑO PMR-ASEO						1,00	1,00	UND	PRESUPUESTO INICIAL

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**1,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIUEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLADIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**5.1.3**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC CONDUIT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



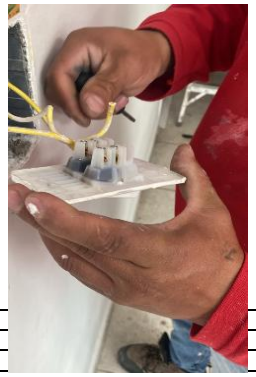

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PISO 1									
BAÑO COMEDOR						1,00	1,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**1,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA [illegible] FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**5.1.7**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD** / **UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PISO 2									
ZONA AULAS						1,00	1,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**1,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA [illegible] FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**5.1.9**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

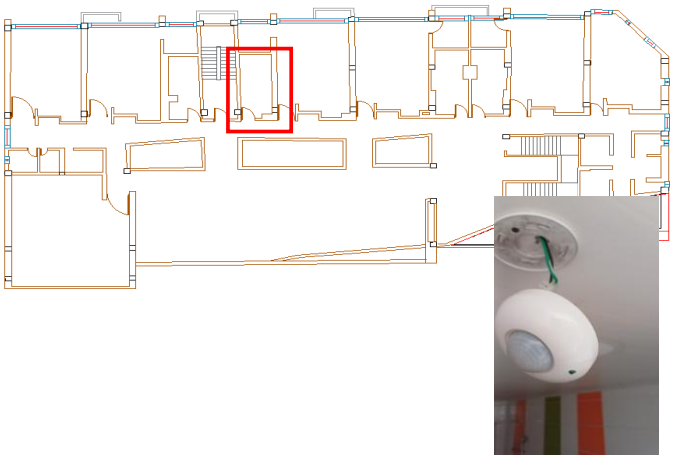

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PISO 2									
BAÑO NIÑOS AULAS P2						1,00	1,00	UND	PRESUPUESTO INICIAL

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**1,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA [illegible] FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**005**	
ITEM	**5.1.26**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

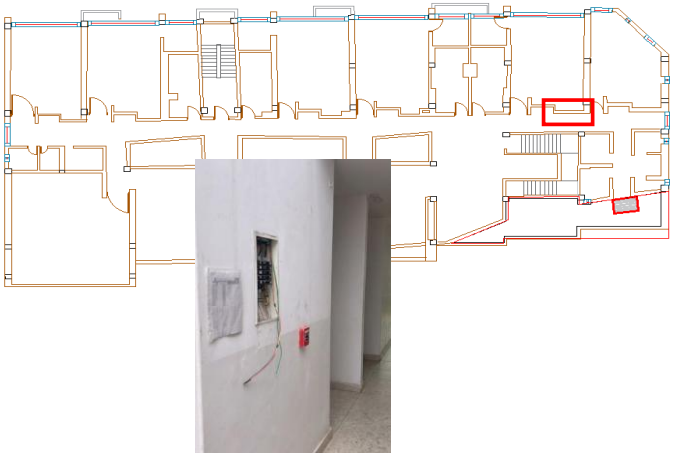

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PISO 2									
CIRCUITO REFLECTORES						1,00	1,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**1,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA [illegible] FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**


CAPITULO		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**5.5.14**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA
















LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
PISO 1									
BALAS CIRCULARES									
ENTRADA PPAL						4,00	4,00	UND	
BAÑOS Y DEPOSITOS						2,00	2,00	UND	
ESCALERAS Y P FIJO						13,00	13,00	UND	
CORREDOR						2,00	2,00	UND	
PISO 2									
BALAS CIRCULARES									
PISO 2									
BAÑOS						8,00	8,00	UND	
CORREDOR LUDOTECA						1,00	1,00	UND	
CORTE No 5									
PISO 1									
BAÑO COMEDOR						3,00	3,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	33,00	UND	
MENOS ACTAS ANTERIORES	30,00	UND	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND	
PRESENTE ACTA	**3,00**	UND	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,00	30,00	**33,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS**	**ACTA No:**	**005**
ITEM	**7.3.9** **GUARDAESCOBA EN PVC 10 CM**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ZONA LUDICA			13,94			1,00	13,94	ML	
LUDOTECA			5			1,00	5,00	ML	

TOTAL EJECUTADO	18,94	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**18,94**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
18,94	0,00	**18,94**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLÁUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**7.4.5**	**CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

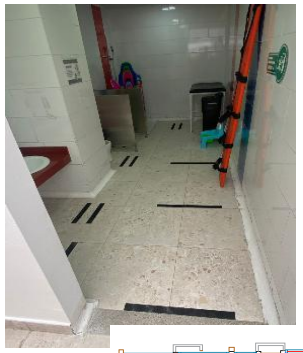





LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CINTA ANTIDESLIZANTE									
BAÑOS PISO 2									
BAÑO 1			0,63			1,00	0,63	M	
			0,40			8,00	3,20	M	
			0,45			3,00	1,35	M	
			0,50			2,00	1,00	M	
BAÑO 2			0,63			1,00	0,63	M	
			0,40			8,00	3,20	M	
			0,45			3,00	1,35	M	
			0,50			2,00	1,00	M	
BAÑO 3			0,63			5,00	3,15	M	
			0,40			8,00	3,20	M	
BAÑO 4			0,63			5,00	3,15	M	
			0,40			8,00	3,20	M	
CUARTO DE ASEO			0,80			3,00	2,40	M	
			0,60			3,00	1,80	M	
BAÑOS NIÑOS			0,40			6,00	2,40	M	
			0,70			2,00	1,40	M	

TOTAL EJECUTADO	33,06	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**33,06**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
33,06	0,00	**33,06**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIUEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLADIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**20 de mayo de 2026**

CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS**			**ACTA No:**	**004**
ITEM	**7.4.15**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.**		**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PISO 1									
VENTANERIA									
ZONA LACTANCIA		5,15		2,56		1,00	15,42	ML	
PISO 2									
VENTANERIA									
VENTANA LUDOTECA		8,70		3,75		1,00	24,90	ML	
SALON 1		4,98		3,37		1,00	16,70	ML	

TOTAL EJECUTADO	57,02	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**57,02**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
57,02	0,00	**57,02**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIUEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**9.1.6**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BAÑO PMR									
CAMBIO PUERTA		0,84		2,42		1,00	2,04	M2	

TOTAL EJECUTADO	2,04	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**2,04**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,04	0,00	**2,04**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**11.20**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BAÑO NIÑOS									
BAÑO 1									
DUCHA						1,00	1,00	UND	PRESUPUESTO INICIAL

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**1,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**11.28**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA
















LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
SEGUNDO PISO									
BAÑO 1						1,00	1,00	UND	
BAÑO 2						1,00	1,00	UND	
BAÑO PMR						1,00	1,00	UND	
PRIMER PISO									
BAÑO SALA MATERNA						1,00	1,00	UND	
BAÑO 2						1,00	1,00	UND	
BAÑO COMEDOR						1,00	1,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	6,00	UND	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND	
PRESENTE ACTA	**6,00**	UND	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	0,00	**6,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIUEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLADIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**11.31**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

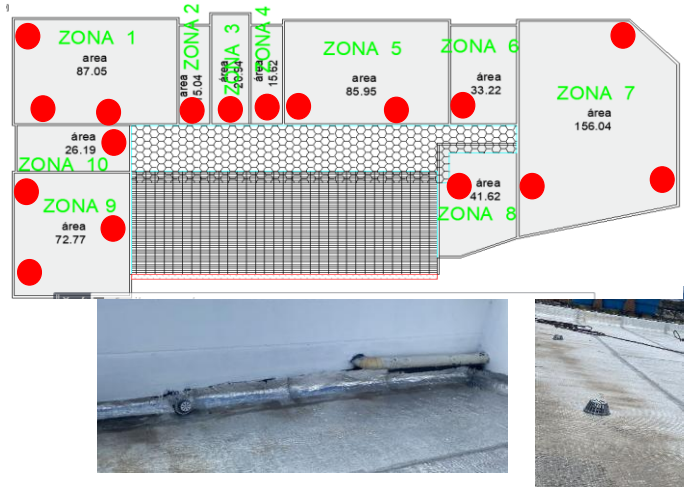

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTAS									
ZONA 1						3,00	3,00	UND	
ZONA 2						1,00	1,00	UND	
ZONA 3						1,00	1,00	UND	
ZONA 4						1,00	1,00	UND	
ZONA 5						2,00	2,00	UND	
ZONA 6						1,00	1,00	UND	
ZONA 7						3,00	3,00	UND	
ZONA 8						1,00	1,00	UND	
ZONA 9						3,00	3,00	UND	
ZONA 10						1,00	1,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	17,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**17,00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
17,00	0,00	**17,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**14.1.4**	**CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.**			**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
LUDOTECA		6,70	1,60			1,00	10,72	M2	
		8,44	5,55			1,00	46,84	M2	
		1,50	7,12			1,00	10,68	M2	
		0,14	1,98			-1,00	-0,28	M2	
ACCESO a LUDOTECA		1,44	1,89			1,00	2,73	M2	

TOTAL EJECUTADO	70,69	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**70,69**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
70,69	0,00	**70,69**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**15.1.3**	**CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CORTE No 5									
TERRAZA P2									
PUERTA CERRADURA						1,00	1,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND	
PRESENTE ACTA	**1,00**	UND	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIUEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLADIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**15.2.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO E.=6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COMEDOR AUXILIAR		1,21		2,22		1,00	2,69	M2	
CORTE No 5									
PISO 1									
COMEDOR		1,23		2,50		1,00	3,08	M2	
PISO 2									
LUDOTECA		0,98		0,53		1,00	0,52	M2	

TOTAL EJECUTADO	6,29	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	2,69	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**3,60**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,60	2,69	**6,29**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIUEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLADIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**15.2.6**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PISO 1									
COMEDOR		1,23		1,13		1,00	1,39	M2	
PISO 2									
LUDOTECA		0,98		0,53		1,00	0,52	M2	
COMDEDOR AUXILIAR		1,21		1,20		1,00	1,46	M2	

TOTAL EJECUTADO	3,37	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**3,37**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,37	0,00	**3,37**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FREDY DANIUEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de abril de 2026**


CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**			**ACTA No:**	**004**
ITEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
SEGUNDO PISO									
AULA 1			7,68	2,45		1,00	18,82	M2	
			4,60	2,45		1,00	11,27	M2	
			6,44	2,45		1,00	15,78	M2	
AULA 2			6,27	2,45		1,00	15,36	M2	
			5,23	2,45		1,00	12,81	M2	
			5,52	2,45		1,00	13,52	M2	
AULA 3			6,82	2,45		1,00	16,71	M2	
			4,87	2,45		1,00	11,93	M2	
			5,44	2,45		1,00	13,33	M2	
AULA 4			6,03	2,45		1,00	14,77	M2	
			5,24	2,45		1,00	12,84	M2	
			6,36	2,45		1,00	15,58	M2	
CORTE No 4									
PISO 2									
LUDOTECA		6,40		2,47		1,00	15,81	M2	
		8,04		2,47		1,00	19,86	M2	
		7,80		2,47		1,00	19,27	M2	
ZONA LUDICA									
MURO OCCIDENTAL		6,35		2,57		1,00	16,32	M2	
		0,62		2,57		1,00	1,59	M2	
		1,22		2,57		1,00	3,14	M2	
VENTANA		2,45		2,20		-1,00	-5,39	M2	
MURO ORIENTAL		7,27		2,84		1,00	20,61	M2	
VANO		1,40		2,00		-1,00	-2,80	M2	
PASILLO PISO 2		26,27		4,21		1,00	110,60	M2	
		0,55		1,06		2,00	1,17	M2	
		0,55		1,67		2,00	1,84	M2	
		1,06		2,52		4,00	10,68	M2	
ENTRADA BAÑOS		1,00		2,30		-4,00	-9,20	M2	
PTA PUNTO FIJO		1,30		2,52		-2,00	-6,55	M2	
CORTE No 5									
VACIOS PISO 2								M2	
			3,90	1,50		1,00	5,85	M2	
			2,00	1,50		1,00	3,00	M2	
			3,90	1,50		1,00	5,85	M2	
			2,20	1,50		1,00	3,30	M2	
							0,00	M2	
			2,00	1,50		1,00	3,00	M2	
			7,47	1,50		1,00	11,21	M2	
			2,27	1,50		1,00	3,41	M2	
			7,33	1,50		1,00	11,00	M2	
							0,00	M2	
			2,25	1,50		1,00	3,38	M2	
			5,37	1,50		1,00	8,06	M2	
			1,79	1,50		1,00	2,69	M2	
			5,22	1,50		1,00	7,83	M2	
CUCHILLA			4,65	1,50		1,00	6,98	M2	
MURO PISO 1			1,79	2,50		1,00	4,48	M2	

TOTAL EJECUTADO	449,66	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	369,66	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**80,00**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
80,00	369,66	**449,66**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FREDY DANIUEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLADIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

3,9
2
3,9
2,2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de abril de 2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**		**004**
ITEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M2**


	2
	7,47
	2,27
	7,33
	2,25
	5,37
	1,79
	5,22
	4,65


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de abril de 2026**


CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**			**ACTA No:**	**004**
ITEM	**22.1.10**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



















LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
SEGUNDO PISO									
AULA 1			7,68	1,20		1,00	9,22	M2	
			4,60	1,20		1,00	5,52	M2	
			6,44	1,20		1,00	7,73	M2	
AULA 2			6,27	1,20		1,00	7,52	M2	
			5,23	1,20		1,00	6,28	M2	
			5,52	1,20		1,00	6,62	M2	
AULA 3			6,82	1,20		1,00	8,18	M2	
			4,87	1,20		1,00	5,84	M2	
			5,44	1,20		1,00	6,53	M2	
AULA 4			6,03	1,20		1,00	7,24	M2	
			5,24	1,20		1,00	6,29	M2	
			6,36	1,20		1,00	7,63	M2	
PRIMER PISO									
COMEDOR			0,49	3,32		1,00	1,63	M2	
			5,66	2,50		1,00	14,15	M2	
			-0,70	1,66		2,00	-2,32	M2	
			0,67	2,52		1,00	1,69	M2	
			3,53	2,52		1,00	8,90	M2	
			1,13	2,52		1,00	2,85	M2	
			2,12	2,52		1,00	5,34	M2	
			0,96	2,52		1,00	2,42	M2	
			2,15	2,52		2,00	10,84	M2	
			-0,68	2,52		1,00	-1,71	M2	
CORTE No 4									
PISO 2									
LUDOTECA		6,40		1,20		1,00	7,68	M2	
		8,04		1,20		1,00	9,65	M2	
		7,80		1,20		1,00	9,36	M2	
ZONA LUDICA									
MURO OCCIDENTAL		6,35		1,20		1,00	7,62	M2	
		0,62		1,20		1,00	0,74	M2	
		1,22		1,20		1,00	1,46	M2	
VENTANA		2,45		1,20		-1,00	-2,94	M2	
MURO ORIENTAL		7,27		1,20		1,00	8,72	M2	
VANO		1,40		1,20		-1,00	-1,68	M2	
PASILLO PISO 2		26,27		1,20		1,00	31,52	M2	
		0,55		1,20		2,00	1,32	M2	
		0,55		1,20		2,00	1,32	M2	
		1,06		1,20		4,00	5,09	M2	
ENTRADA BAÑOS		1,00		1,20		-4,00	-4,80	M2	
PTA PUNTO FIJO		1,30		1,20		-2,00	-3,12	M2	
BARANDAS ZONA LUDICA		21,38		1,50		2,00	64,14	M2	
BARANDAS TERRAZA PISO 2		2,92		1,50		2,00	8,76	M2	
BARANDAS VACIOS									
VACIO 1		13,06		1,50		2,00	39,18	M2	
VACIO 2		12,40		1,50		2,00	37,20	M2	
VACIO 3		10,62		1,50		2,00	31,86	M2	
CORTE No 5									
BARANDAS ACCESO PPAL		2,70		1,15		2,00	6,21	M2	

TOTAL EJECUTADO	387,67	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	381,46	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**6,21**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6,21	381,46	**387,67**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**22.1.11**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

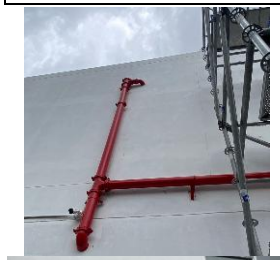







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
FACHADA NORTE									
TUBERIA RCI			2,70			1,00	2,70	ML	
			2,00			1,00	2,00	ML	
			6,00			1,00	6,00	ML	
			1,00			1,00	1,00	ML	
			4,50			1,00	4,50	ML	
CORTE No 5									
ACCESO CUARTO ELECTRICO			0,39			13,00	5,07	ML	
			2,65			1,00	2,65	ML	
			0,36			1,00	0,36	ML	

TOTAL EJECUTADO	24,28	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	16,20	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**8,08**	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8,08	16,20	**24,28**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de abril de 2026**

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**			**ACTA No:**	**004**
ITEM	**22.3.4**	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
BAÑO PMR									
PUERTA TERRAZA		1,30		3,4		2,00	8,84	M2	
VENTANAS		0,37		2,47		-1,00	-0,92	M2	
VENTANAS		0,37		0,9		-1,00	-0,34	M2	
FACHADA ORIENTAL									
PUERTA MODULO VERDE		2,33		2,44		2,00	11,37	M2	
PUERTA MODULO DURAZNO		3,42		1,80		2,00	12,31	M2	
		3,40		2,63		2,00	17,88	M2	
PUERTA PARQUEADERO		4,59		2,50		2,00	22,95	M2	

TOTAL EJECUTADO	72,10	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**72,10**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
72,10	0,00	**72,10**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSEC
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	F2 JI RAFAEL POMBO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**30 de mayo de 2026**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**23.3.4**	**MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PLACAS DE CUBIERTA									
ZONA 1		8,60	11,78			1,00	101,31	M2	
ZONA 2		8,05	8,81			1,00	70,92	M2	
ZONA 3		3,37	9,04			1,00	30,46	M2	
ZONA 4		2,97	7,86			1,00	23,34	M2	
ZONA 5		8,44	11,96			1,00	100,94	M2	
ZONA 6		7,99	5,07			1,00	40,51	M2	
ZONA 7		9,76	3,8			1,00	37,07	M2	
		12,63	11,59			1,00	146,32	M2	
ZONA 9		9,95	10,6			1,00	105,47	M2	
ZONA 10		8,72	4,07			1,00	35,49	M2	
MURO ZONA 7		2,67	1,62			1,00	4,33	M2	
CORTE No 5									
ZONA 8		8,34	6,04			1,00	50,34	M2	
terraza piso 2		35,98				1,00	35,98	M2	

TOTAL EJECUTADO	782,49	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	696,17	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**86,32**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
86,32	696,17	**782,49**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. ROYNER VIVAS	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA MONROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ACTA DE PARCIAL No. 5

Código: FOR-GIF-020	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024	
Página: 1 de 1	

1. FECHA ELABORACIÓN:	31	5	2026	TIPO DE CONTRATO	OBRA		
2. ACTA No.	5			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:	X	RECIBO PARCIAL DE OBRA	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL SAN BENITO						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10675-2025	7. FECHA CONTRATO:	19/11/2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 12,017,556,820		
9. FECHA ACTA INICIO:	9/12/2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2027	11. PLAZO:	23 MESES 21 DIAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	N/A	13. SUSPENSIONES:	N/A	14. ADICIONES:	N/A		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11835-2025	18. FECHA CONTRATO:	20/11/2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265		
20. FECHA ACTA INICIO:	9/12/2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2027	22. PLAZO:	24 MESES 21 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	N/A	24. SUSPENSIONES:	N/A	25. ADICIONES:	N/A		
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL						
27. SUPERVISOR SDIS:	ARQ JONNY EDUARD PADILLA						

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 (CINCO) días del mes de MAYO del año 2026 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO, representante legal del CONSORCIO SANTA ISABEL
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de OBRA Obray/o Modificaciones
del mes de ABRIL según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM		29. CONDICIONES CONTRACTUALES DIAGSNOTICOS INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1		**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.1		ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).	M2	261.89	$ 6,042.00	$ 1,582,339.00	279.57	$ 1,689,161.94		$ -	279.57	$ 1,689,161.94	279.57	$ 1,689,161.94
1.1.3		CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	8.66	$ 40,931.00	$ 354,462.00	43.02	$ 1,760,851.62		$ -	43.02	$ 1,760,851.62	43.02	$ 1,760,851.62
1.3		DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
1.3.4		DESMONTE MANUAL DE MARCO DE PUERTAS DE UNA HOJA (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	9.00	$ 23,245.00	$ 209,205.00	9.00	$ 209,205.00		$ -	9.00	$ 209,205.00	9.00	$ 209,205.00
1.3.5		DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	13.00	$ 26,129.00	$ 339,677.00	10.00	$ 261,290.00		$ -	10.00	$ 261,290.00	10.00	$ 261,290.00
1.3.16		DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PORTÓN (DOS HOJAS SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1.00	$ 26,129.00	$ 26,129.00	1.00	$ 26,129.00		$ -	1.00	$ 26,129.00	1.00	$ 26,129.00
1.4		DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
1.4.2		DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	95.67	$ 13,685.00	$ 1,309,244.00	75.98	$ 1,039,786.30		$ -	75.98	$ 1,039,786.30	75.98	$ 1,039,786.30

1.4.3	DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	26.60	$ 13,685.00	$ 364,021.00	13.00	$ 177,905.00		$ -	13.00	$ 177,905.00	13.00	$ 177,905.00
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	163.60	$ 20,561.00	$ 3,363,780.00	678.67	$ 13,954,133.87		$ -	678.67	$ 13,954,133.87	678.67	$ 13,954,133.87
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	19.99	$ 29,545.00	$ 590,605.00	17.45	$ 515,560.25		$ -	17.45	$ 515,560.25	17.45	$ 515,560.25
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.	**0**	**-**	**$ -**		**-**	**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
1.6.1	SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA HIDRÁULICA AL INGRESO DEL EDIFICIO Y POSTERIOR AL MEDIDOR, MEDIANTE CORTE DE LA RED E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGISTRO TIPO CORTINA 1", GARANTIZANDO QUE LA RED CON SERVICIO NO ENTORPEZCA LAS LABORES POSTERIORES DE INTERVENCIÓN. NO INCLUYE DESMONTE O DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES.	UN		$ 131,306.00	$ -	1.00	$ 131,306.00	1.00	$ 131,306.00		$ -	1.00	$ 131,306.00
1.6.21	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.	UN	10.00	$ 29,734.00	$ 297,340.00	10.00	$ 297,340.00		$ -	10.00	$ 297,340.00	10.00	$ 297,340.00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	4.00	$ 15,043.00	60,172.00	32.00	$ 481,376.00		$ -	32.00	$ 481,376.00	32.00	$ 481,376.00
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
1.7.4	DESMONTE MANUAL DE CIELO RASO EN MADERA, CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	19.99	$ 20,455.00	408,895.00	13.79	$ 282,074.45		$ -	13.79	$ 282,074.45	13.79	$ 282,074.45
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	67.10	$ 21,876.00	$ 1,467,880.00	89.95	$ 1,967,746.20		$ -	89.95	$ 1,967,746.20	89.95	$ 1,967,746.20
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	264.34	$ 7,498.00	$ 1,982,021.00	152.41	$ 1,142,770.18		$ -	152.41	$ 1,142,770.18	152.41	$ 1,142,770.18
1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	158.59	$ 9,560.00	$ 1,516,120.00	34.94	$ 334,026.40	1.79	$ 17,112.40	33.15	$ 316,914.00	34.94	$ 334,026.40
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	53.21	$ 11,333.00	603,029.00	68.13	$ 772,117.29	1.79	$ 20,286.07	66.34	$ 751,831.22	68.13	$ 772,117.29
1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	53.21	$ 11,631.00	$ 618,886.00	66.34	$ 771,600.54		$ -	66.34	$ 771,600.54	66.34	$ 771,600.54
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.45	$ 56,838.00	$ 139,253.00	1.94	$ 110,265.72		$ -	1.94	$ 110,265.72	1.94	$ 110,265.72
1.11	OTROS PRELIMINARES.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -

1.11.4	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	M2	3.36	$ 6,808.00	$ 22,875.00	3.08	$ 20,968.64		$ -	3.08	$ 20,968.64	3.08	$ 20,968.64
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	20.88	$ 17,818.00	$ 372,040.00	17.41	$ 310,211.38		$ -	17.41	$ 310,211.38	17.41	$ 310,211.38
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	34.80	$ 45,048.00	1,567,670.00	39.81	$ 1,793,360.88	5.00	$ 225,240.00	34.81	$ 1,568,120.88	39.81	$ 1,793,360.88
2.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 128,565.00	0.00	34.81	$ 4,475,347.65		$ -	34.81	$ 4,475,347.65	34.81	$ 4,475,347.65
2.2	CONCRETOS	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
2.2.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E:>6,1<=8,0 CM F'C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO	M2	2.45	$ 294,656.00	$ 721,907.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
2.4.2	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	2.45	$ 364,446.00	$ 892,893.00	2.60	$ 947,559.60		$ -	2.60	$ 947,559.60	2.60	$ 947,559.60
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	7.33	$ 5,206.00	$ 38,160.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	24.65	$ 5,618.00	138,484.00	-	$ -		**$ -**	**-**	**$ -**	-	$ -
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	310.38	$ 24,413.00	$ 7,577,307.00	673.57	$ 16,443,864.41		$ -	673.57	$ 16,443,864.41	673.57	$ 16,443,864.41
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
4.1.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1.50	$ 63,462.00	$ 95,193.00	0.70	$ 44,423.40		$ -	0.70	$ 44,423.40	0.70	$ 44,423.40
4.2	TUBERIAS Y ACCESORIOS	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 1-1/4"	U		$ 331,417.00	$ -	1.00	$ 331,417.00	1.00	$ 331,417.00		$ -	1.00	$ 331,417.00
4.4	FILTROS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
4.4.1	SUMINISTRO Y EJECUCION DE FILTRO FRANCES DE DIMENSIONES 0,30X0,60 M. INCLUYE MATERIAL GRANULAR DRENANTE EN GRAVA 1/4", RECUBRIMIENTO TOTAL CON GEOTEXTIL NO TEJIDO NT1600, TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PERFORADA CON FILTRO Ø.=100 MM. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS	M	34.80	$ 67,671.00	$ 2,354,951.00	39.81	$ 2,693,982.51	5.00	$ 338,355.00	34.81	$ 2,355,627.51	39.81	$ 2,693,982.51
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
5.2	SALIDAS	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE	UN	6.00	$ 248,280.00	$ 1,489,680.00	7.00	$ 1,737,960.00	1.00	$ 248,280.00	6.00	$ 1,489,680.00	7.00	$ 1,737,960.00
5.5	ILUMINACIÓN.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
5.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 80,893.00	$ -	27.00	$ 2,184,111.00	1.00	$ 80,893.00	26.00	$ 2,103,218.00	27.00	$ 2,184,111.00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 203,696.00	$ -	4.00	$ 814,784.00		$ -	4.00	$ 814,784.00	4.00	$ 814,784.00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00	$ 204,308.00	$ 817,232.00	1.00	$ 204,308.00		$ -	1.00	$ 204,308.00	1.00	$ 204,308.00

5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6.00	$ 44,064.00	$ 264,384.00	6.00	$ 264,384.00		$ -	6.00	$ 264,384.00	6.00	$ 264,384.00
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN		$ 42,935.00	$ -	1.00	$ 42,935.00		$ -	1.00	$ 42,935.00	1.00	$ 42,935.00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	19.99	$ 52,523.00	$ 1,049,935.00	17.45	$ 916,526.35		$ -	17.45	$ 916,526.35	17.45	$ 916,526.35
7.2	ACABADO DE PISOS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	19.99	$ 135,070.00	$ 2,700,049.00	18.67	$ 2,521,756.90		$ -	18.67	$ 2,521,756.90	18.67	$ 2,521,756.90
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	78.56	$ 28,261.00	$ 2,220,184.00	78.62	$ 2,221,879.82		$ -	78.62	$ 2,221,879.82	78.62	$ 2,221,879.82
7.3.6	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	27.16	$ 53,052.00	$ 1,440,892.00	32.46	$ 1,722,067.92		$ -	32.46	$ 1,722,067.92	32.46	$ 1,722,067.92
7.40	OTROS	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
7.4.5	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	43.20	$ 3,665.00	$ 158,328.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	53.21	$ 134,395.00	$ 7,151,158.00	67.81	$ 9,113,324.95	0.40	$ 53,758.00	67.41	$ 9,059,566.95	67.81	$ 9,113,324.95
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	4.62	$ 561,874.00	$ 2,595,858.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2.00	$ 484,812.00	$ 969,624.00	2.00	$ 969,624.00		$ -	2.00	$ 969,624.00	2.00	$ 969,624.00
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	8.32	$ 577,765.00	$ 4,807,005.00	8.33	$ 4,812,782.45		$ -	8.33	$ 4,812,782.45	8.33	$ 4,812,782.45
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	-	$ 389,911.00	$ -	10.00	$ 3,899,110.00		$ -	10.00	$ 3,899,110.00	10.00	$ 3,899,110.00
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE POMO METÁLICA, TERMINADA CON	M	3.55	$ 550,068.00	$ 1,952,741.00	3.49	$ 1,919,737.32		$ -	3.49	$ 1,919,737.32	3.49	$ 1,919,737.32
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	3.78	$ 399,255.00	$ 1,509,184.00	4.06	$ 1,620,975.30	1.00	$ 399,255.00	3.06	$ 1,221,720.30	4.06	$ 1,620,975.30

9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE	M2	2.42	$ 660,234.00	$ 1,597,766.00	2.30	$ 1,518,538.20		$ -	2.30	$ 1,518,538.20	2.30	$ 1,518,538.20
10	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
10.2	PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1,20 M) MARCO EN LAMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y	M2	9.35	$ 230,420.00	$ 2,154,427.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
11.4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	8.00	$ 918,403.00	$ 7,347,224.00	8.00	$ 7,347,224.00		$ -	8.00	$ 7,347,224.00	8.00	$ 7,347,224.00
11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	$ 31,543.00	$ 63,086.00	2.00	$ 63,086.00		$ -	2.00	$ 63,086.00	2.00	$ 63,086.00
11.47	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		$ 189,064.00	$ -	51.00	$ 9,642,264.00	51.00	$ 9,642,264.00		$ -	51.00	$ 9,642,264.00
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
14.1	CIELOS RASOS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	87.09	$ 113,630.00	$ 9,896,037.00	103.74	$ 11,787,976.20		$ -	103.74	$ 11,787,976.20	103.74	$ 11,787,976.20
14.1.2	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2		$ 212,669.00	$ -	45.36	$ 9,646,665.84		$ -	45.36	$ 9,646,665.84	45.36	$ 9,646,665.84
14.2	DIVISIONES.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
14.2.1	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DIVISIONES EN PANELERÍA LIVIANA ACABADO DOS (2) CARAS FABRICADAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO E.=6 MM, SIN FRESCASA, PERFILERÍA GALVANIZADA CR. BASE 9 CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE TAPAS LATERALES DE TERMINACIÓN CUANDO SE REQUIERA, PERFILERÍA, LÁMINAS, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	21.88	$ 192,392.00	$ 4,209,537.00	42.70	$ 8,215,138.40		$ -	42.70	$ 8,215,138.40	42.70	$ 8,215,138.40
14.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M		$ 90,264.00	$ -	133.00	$ 12,005,112.00		$ -	133.00	$ 12,005,112.00	133.00	$ 12,005,112.00
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	3.36	$ 108,119.00	$ 363,280.00	3.08	$ 333,006.52		$ -	3.08	$ 333,006.52	3.08	$ 333,006.52
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	893.14	$ 4,821.00	$ 4,305,828.00	1,075.04	$ 5,182,767.84		$ -	1,075.04	$ 5,182,767.84	1,075.04	$ 5,182,767.84
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1,034.32	$ 21,401.00	$ 22,135,482.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
21.1.11	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	317.55	$ 84,039.00	$ 26,686,584.00	100.57	$ 8,451,802.23		$ -	100.57	$ 8,451,802.23	100.57	$ 8,451,802.23
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.	0	-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -

22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	264.34	$ 75,848.00	$ 20,049,660.00	41.92	$ 3,179,548.16		$ -	41.92	$ 3,179,548.16	41.92	$ 3,179,548.16
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,034.32	$ 14,518.00	$ 15,016,258.00	959.05	$ 13,923,487.90		$ -	959.05	$ 13,923,487.90	959.05	$ 13,923,487.90
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	481.77	$ 51,391.00	$ 24,758,642.00	564.08	$ 28,988,635.28		$ -	564.08	$ 28,988,635.28	564.08	$ 28,988,635.28
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD	M2	264.34	$ 31,749.00	$ 8,392,531.00	163.47	$ 5,190,009.03		$ -	163.47	$ 5,190,009.03	163.47	$ 5,190,009.03
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.		-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	257.17	$ 39,486.00	$ 10,154,615.00	300.81	$ 11,877,783.66		$ -	300.81	$ 11,877,783.66	300.81	$ 11,877,783.66
22.4	SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA.		-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
22.4.1	PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.	M2		$ 19,730.00	$ -	42.71	$ 842,668.30		$ -	42.71	$ 842,668.30	42.71	$ 842,668.30
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
23.1	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.		-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	430.93	$ 45,084.00	$ 19,428,048.00	687.34	$ 30,988,036.56		$ -	687.34	$ 30,988,036.56	687.34	$ 30,988,036.56
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS		-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y	M2	25.94	$ 268,427.00	$ 6,962,996.00	120.27	$ 32,283,715.29		$ -	120.27	$ 32,283,715.29	120.27	$ 32,283,715.29
23.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF TRASLUCIDA OPAL PC 37	M2	43.11	$ 13,031.00	$ 561,766.00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	120.49	$ 227,950.00	$ 27,465,696.00	123.11	$ 28,062,924.50		$ -	123.11	$ 28,062,924.50	123.11	$ 28,062,924.50
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.		-	$ -		-	$ -		$ -		$ -		$ -
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA,	M	150.62	$ 57,044.00	$ 8,591,967.00	156.81	$ 8,945,069.64		$ -	156.81	$ 8,945,069.64	156.81	$ 8,945,069.64
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	92.05	$ 87,159.00	$ 8,022,986.00	72.42	$ 6,312,054.78		$ -	72.42	$ 6,312,054.78	72.42	$ 6,312,054.78
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN TUBERIA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10.00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS	M	22.80	$ 47,840.00	$ 1,090,752.00	10.80	$ 516,672.00		$ -	10.80	$ 516,672.00	10.80	$ 516,672.00
	VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS V/PRESUPUESTOS												

34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**$ 287,395,960.00**	**$ 333,256,234.57**	**$ 11,488,166.47**	**$ 321,768,068.10**	**$ 333,256,234.57**
35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**	$ 287,395,960.00	$ 333,256,234.57	$ 11,488,166.47	$ 321,768,068.10	$ 333,256,234.57
ADMINISTRACIÓN	29.00%	$ 83,344,828.40	$ 96,644,308.03	$ 3,331,568.28	$ 93,312,739.75	$ 96,644,308.03
IMPREVISTO	1%	$ 2,873,959.60	$ 3,332,562.35	$ 114,881.66	$ 3,217,680.68	$ 3,332,562.34
UTILIDAD	4%	$ 11,495,838.40	$ 13,330,249.38	$ 459,526.66	$ 12,870,722.72	$ 13,330,249.38
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		**$ 97,714,626.40**	**$ 113,307,119.76**	**$ 3,905,976.60**	**$ 109,401,143.15**	**$ 113,307,119.75**
AJUSTE AL PESO		-$ 0.40	-$ 0.33	-$ 0.07	$ 0.75	$ 0.68
ANTICIPO	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		**$ 385,110,586.00**	**$ 446,563,354.00**	**$ 15,394,143.00**	**$ 431,169,212.00**	**$ 446,563,355.00**
						100.00%

C. OBSERVACIONES

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO		40. NOMBRE DEL ARCHIVO		42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	5	ABRIL 2026				
INFORME SOCIAL	5	ABRIL 2026				
INFORME AMBIENTAL	5	ABRIL 2026				
INFORME SST	5	ABRIL 2026				
INFORME DE SUPERVISION	5	ABRIL 2026				
ACTA PARCIAL	5	MAYO 2026				
SOPORTE PAGO SDH	5	MAYO 2026				
FACTURA	5	MAYO 2026				
FORMATO MC 14	5	MAYO 2026				

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los 05 que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los _06_ días del mes de MAYO_del año _2026_

Nombre: TELMO ALEXANDER CASTILLO FAJARDO
C.C. 79,905,718
Rep Legal. CONCORCIO SANTA ISABEL
Nit. 902,0003,595-6

Nombre: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
C.C. No. 1,062,398,686
Rep legal CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL
902,007,033-7

Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	T3 JI SAN BENITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	
ITEM	**1.6.1**	**SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA HIDRÁULICA AL INGRESO DEL EDIFICIO Y POSTERIOR AL MEDIDOR, MEDIANTE CORTE DE LA RED E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGISTRO TIPO CORTINA 1", GARANTIZANDO QUE LA RED CON SERVICIO NO ENTORPEZCA LAS LABORES POSTERIORES DE INTERVENCIÓN. NO INCLUYE DESMONTE O DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES.**	**UNIDAD**	**U**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 5									
RECGISTRO PRINCIPAL						1.00	1.00	U	CORTE No.5

TOTAL EJECUTADO	1.00	U
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	U
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	U
PRESENTE ACTA	**1.00**	U

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.00	0.00	**1.00**

OBSERVACIONES:

	RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	MUNICIPIO	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	CONTRATO No.	10675-2025	FRENTE OBRA	T3 JI SAN BENITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	CONTRATO No:			
OBJETO:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 DE MAYO

CAPITULO	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.	ACTA No:	005
ITEM 1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UNIDAD	M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CORTE 3									
FACHADA EXTERIOR A	30%		16.94	3.2		1.00	16.26		CORTE 3
FACHADA EXTERIOR B	30%		0.55	3.2		1.00	0.53		CORTE 3
DESCUENTO CONTADOR	30%		0.32	0.68		-1.00	-0.07		CORTE 3
DESCUENTO VENTA BAÑOS	30%		0.47	0.45		-3.00	-0.19		CORTE 3
DESCUENTO VENTANA 1	30%		1.5	0.46		-1.00	-0.21		CORTE 3
DESCUENTO VENTANA 2	30%		1	0.46		-1.00	-0.14		CORTE 3
DESCUENTO PUERTA 1	30%		1.64	2.4		-1.00	-1.18		CORTE 3
DESCUENTO VENTANA 3	30%		0.99	0.46		-1.00	-0.14		CORTE 3
DESCUENTO PUERTA 2	30%		1.97	2.4		-1.00	-1.42		CORTE 3
DESCUENTO VENTANA 4	30%		0.98	0.48		-1.00	-0.14		CORTE 3
FACHADA EXTERIOR C	30%		2	3.2		1.00	1.92		CORTE 3
FACHADA EXTERIOR D	30%		14.71	4.3		1.00	18.98		CORTE 3
DESCUENTO PUERTA 3	30%		2.06	2		-1.00	-1.24		CORTE 3
DESCUENTO CONTADOR	30%		0.32	0.67		-1.00	-0.06		CORTE 3
DESCUENTO VENTANA 5	30%		0.5	0.87		-1.00	-0.13		CORTE 3
DESCUENTO VENTANA 6	30%		1.35	1.37		-1.00	-0.55		CORTE 3
ALERO INGRESO PRINCIPAL	30%		2	1.54		1.00	0.92		CORTE 3
CORTE 5									
BAÑO 1 CAMINADORES									
D			1.74	1.03		1.00	1.79	M2	CORTE No.5

TOTAL EJECUTADO	34.94	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	33.15	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**1.79**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.79	33.15	**34.94**

OBSERVACIONES:

	RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS	NOMBRE	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		FIRMA	
	DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA	NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	T3 JI SAN BENITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**1.8.5**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
BAÑO 1 CAMINADORES									
A			4.1	1.8		2.00	14.76	M2	
C			2	1.8		1.00	3.60	M2	
B			2.80	1.8		1.00	5.04	M2	
D			1.74	1.8		1.00	3.13	M2	
D			0.16	1.13		1.00	0.18	M2	
E			0.14	1.67		3.00	0.70	M2	
E			0.7	2		6.00	8.40	M2	
BAÑO 2									
A			2.85	1.8		1.00	5.13	M2	
C			2.68	1.8		1.00	4.82	M2	
B			2.84	1.8		1.00	5.11	M2	
D			2.49	1.89		1.00	4.71	M2	
E			1.7	1.00		1.00	1.70	M2	
E			1	0.16		1.00	0.16	M2	
E			0.55	0.48		5.00	1.32	M2	
E			0.7	1.7		1.00	1.19	M2	
E			0.48	2.09		1.00	1.00	M2	
F			0.9	0.55		6.00	2.97	M2	
F			0.5	0.3		6.00	0.90	M2	
F			0.3	0.4		6.00	0.72	M2	
F			1.65	0.16		3.00	0.79	M2	
CORTE 5									
BAÑO 1 CAMINADORES									
D			1.74	1.03		1.00	1.79	M2	CORTE No.5

TOTAL EJECUTADO	68.13	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	66.34	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
PRESENTE ACTA	**1.79**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1.79	66.34	**68.13**

OBSERVACIONES:

	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA [illegible] ONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	T3 JI SAN BENITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**2.1.5**	**EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR		Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
SECCION LINEAL									
A				2			1.00	2.00		CORTE 2
B				13.31			1.00	13.31		CORTE 2
C				2.10			1.00	2.10		CORTE 2
D				5.6			1.00	5.60		CORTE 2
E				5			1.00	5.00		CORTE 2
F				3			1.00	3.00		CORTE 2
G				3.8			1.00	3.80		CORTE 2
CORTE 5									
H				5			1.00	5.00		CORTE No.5

TOTAL EJECUTADO	39.81	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	34.81	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M	
PRESENTE ACTA	**5.00**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5.00	34.81	**39.81**

OBSERVACIONES:

	RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING DANIL PINILLA MONRROY	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	T3 JI SAN BENITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**		**ACTA No:**	
ITEM	**4.2.6**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 1-1/4"**	**UNIDAD**	**U**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 5									
RECGISTRO PRINCIPAL						1.00	1.00	U	CORTE No.5

TOTAL EJECUTADO	1.00	U	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	U	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	U	
PRESENTE ACTA	**1.00**	U	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1.00	0.00	**1.00**

OBSERVACIONES:

	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	T3 JI SAN BENITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO	**FILTROS.**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**4,4,1**	**SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE FILTRO FRANCÉS DE DIMENSIONES 0,30X0,60 M. INCLUYE MATERIAL GRANULAR DRENANTE EN GRAVA 1/4", RECUBRIMIENTO TOTAL CON GEOTEXTIL NO TEJIDO NT1600, TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA PERFORADA CON FILTRO Ø.=100 MM. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS DIFERENTES AL MENCIONADO.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 2									
SECCION LINEAL									
A			2			1.00	2.00		CORTE 2
B			13.31			1.00	13.31		CORTE 2
C			2.10			1.00	2.10		CORTE 2
D			5.6			1.00	5.60		CORTE 2
E			5			1.00	5.00		CORTE 2
F			3			1.00	3.00		CORTE 2
G			3.8			1.00	3.80		CORTE 2
CORTE 5									
H			5			1.00	5.00		CORTE No.5

TOTAL EJECUTADO	39.81	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	34.81	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M	
PRESENTE ACTA	**5.00**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
5.00	34.81	**39.81**

OBSERVACIONES:

	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	T3 JI SAN BENITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**		**005**
ITEM	**5.2.14**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**			**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 4									
REFELCTORES									
FACHADA EXTERIOR						3.00	3.00	UN	CORTE No.4
FACHADA INTERIOR						3.00	3.00	UN	CORTE No.4
CORTE 5									
COMEDOR						1.00	1.00	UN	CORTE No.5

TOTAL EJECUTADO	7.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	6.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**1.00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.00	6.00	**7.00**

OBSERVACIONES:


	RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA M[illegible]ONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	T3 JI SAN BENITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**5.5.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA TIPO LED DE 60 W. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA








LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 3									
BAÑO 1						1.00	1.00	UND	CORTE 3
BAÑO 2						1.00	1.00	UND	CORTE 3
BAÑO 3						1.00	1.00	UND	CORTE 3
BAÑO 4						1.00	1.00	UND	CORTE 3
BAÑO ADM						1.00	1.00	UND	CORTE 3
COMEDOR						8.00	8.00	UND	CORTE 3
COCINA						2.00	2.00	UND	CORTE 3
CORTE 4									
PASILLO PARVULOS						2.00	2.00	UND	CORTE No.4
BAÑO MUJERES						1.00	1.00	UND	CORTE No.4
COMEDOR NIÑOS						5.00	5.00	UND	CORTE No.4
CUARTO FRIO						2.00	2.00	UND	CORTE No.4
SHUT						1.00	1.00	UND	CORTE No.4
CORTE 5									
PARBULOS						1.00	1.00	UND	CORTE No.4
						TOTAL EJECUTADO	27.00	UND	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	26.00	UND	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UND	
						PRESENTE ACTA	**1.00**	UND	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1.00	26.00	**27.00**

OBSERVACIONES:

	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCA[illegible]ECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	T3 JI SAN BENITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**8.2**	**ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 1									
BAÑO 1 CAMINADORES			4.1	1.8		2.00	14.76	M2	CORTE No 1
			2	1.8		1.00	3.60	M2	CORTE No 1
			2.80	1.8		1.00	5.04	M2	CORTE No 1
			1.74	1.8		1.00	3.13	M2	CORTE No 1
			0.16	1.13		1.00	0.18	M2	CORTE No 1
			0.14	1.67		3.00	0.70	M2	CORTE No 1
			0.7	2		5.00	7.00	M2	CORTE No 1
CORTE 2									
BAÑO 2			2.95	1.8		1.00	5.31	M2	CORTE No 2
			2.50	1.8		1.00	4.50	M2	CORTE No 2
			2.96	1.8		1.00	5.33	M2	CORTE No 2
			2.40	1.8		1.00	4.32	M2	CORTE No 2
			1.7	1.70		1.00	2.89	M2	CORTE No 2
			1.09	0.14		1.00	0.15	M2	CORTE No 2
			0.7	2		6.00	8.40	M2	CORTE No 2
			1.67	0.14		3.00	0.70	M2	CORTE No 2
CORTE 5									
BAÑO 1 CAMINADORES									
D			1.74	1.03		1.00	1.79	M2	CORTE No.5
							67.81	M2	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	67.41	M2	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
						PRESENTE ACTA	**0.40**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0.40	67.41	**67.81**

OBSERVACIONES:

	RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SAN BENITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**005**
ITEM	**9.2.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MURO COMEDOR									
		0.60		1.70		3.00	3.06	M2	CORTE No 2
CORTE 5									
BAÑO 1 CAMINADORES									
D		0.50		1.00		2.00	1.00	M2	CORTE No.5

TOTAL EJECUTADO	4.06	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	3.06	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**1.00**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.00	3.06	**4.06**

OBSERVACIONES:

	RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA M[illegible]NSECA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Optimización, mantenimiento, adecuación y reparaciones locativas en los inmuebles administrados por la SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL -SDIS	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ISABEL	**CONTRATO No.**	10675-2025	**FRENTE OBRA**	SAN BENITO
INTERVENTOR:	CONSORCIO OPTIMIZACION SOCIAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 DE MAYO**

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**005**
ITEM	**9.2.2**	**SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS**	**UNIDAD**	**U**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

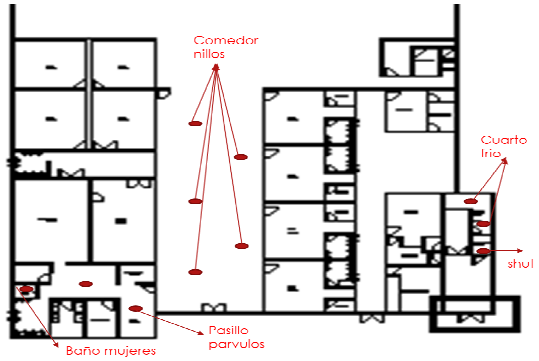

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MODULO 1									
BAÑO 1						7.00	7.00	U	CORTE No.5
BAÑO 2						2.00	2.00	U	CORTE No.5
LAVACOLAS						3.00	3.00	U	CORTE No.5
BAÑO 3						7.00	7.00	U	CORTE No.5
MODULO 2									
BAÑO SALON 1						5.00	5.00	U	CORTE No.5
BAÑO SALON 2						5.00	5.00	U	CORTE No.5
BAÑO SALON 3						5.00	5.00	U	CORTE No.5
BAÑO SALON 4						5.00	5.00	U	CORTE No.5
BAÑO ADM						2.00	2.00	U	CORTE No.5
COCINA						3.00	3.00	U	CORTE No.5
BAÑO PROF						3.00	3.00	U	CORTE No.5
ZONA LAVANDERIA						4.00	4.00	U	CORTE No.5

TOTAL EJECUTADO	51.00	U	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	U	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	U	
PRESENTE ACTA	**51.00**	U	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
51.00	0.00	**51.00**

OBSERVACIONES:

	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. ROINER VIVAS	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
FIRMA		**FIRMA**	
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE PROYECTO. CONSORCIO SANTA ISABEL**
NOMBRE	ING. FREDY DANIEL PINILLA	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
FIRMA		**FIRMA**	
