Montería, 30 de Mayo de 2026

Señores
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Área Administrativa
Calle 22 Nº 16-40 Torre B piso 1
Sincelejo – Sucre

REFERENCIA: CONTRATO No. 032 – 2025

ASUNTO : INFORME ACTIVIDADES No.002

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
1	Suministro e instalación de Celdas de remonte de cables y seccionador en SF6 con base porta fusibles HH de 15 kV	1,00	UND



ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
2	**Suministro e instalación de fusibles tipo HH de 30 A**	**6,00**	**UND**


Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778
Email ventas.multifuncional@hotmail.com
construmaq.sas@hotmail.com
Montería Córdoba





ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
3	**Suministro e instalación de tablero bypass con enclavamiento de 250 A, una entrada para la red y otra para la señal regulada. El tablero debe tener testigos en la puerta indicando en que posición esta, además un indicador de los parámetros de tensión y corriente. Las conexiones del cableado debe venir dispuesta para instalación del cableado cumpliendo normativa.**	**1,00**	**UND**



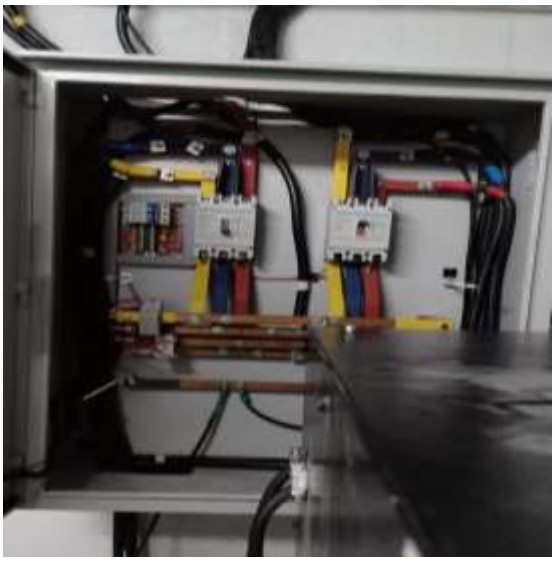

Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778
Email ventas.multifuncional@hotmail.com
construmaq.sas@hotmail.com
Montería Córdoba





ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
4	**Suministro e instalación de puerta metálica, con ventana y cerradura antipánico incluye marco y adecuaciones para su correcta instalación. La puerta debe ser de dos hojas y mínimo de 2,2 m de ancho x 2 m de alto.**	1,00	UND













ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
7	**Suministro e instalación de Tablero de Distribución Subestación Torre Gentium. Consta de Totalizador, 20 breaker tipo industrial, barrajes de fases, neutro y tierra identificados con su color, DPS y analizador de red. El diseño final debe ser aprobado por el supervisor del contrato para garantizar al distribución requerida, capacidad y cumplimiento de noma RETIE vigente.**	**1,00**	**UND**

TABLERO EXISTENTE





TABLERO NUEVO INSTALADO

Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778
Email ventas.multifuncional@hotmail.com
construmaq.sas@hotmail.com
Montería Córdoba

CONSTRUMAQ

NIT 900.788 908-1















Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778
Email ventas.multifuncional@hotmail.com
construmaq.sas@hotmail.com
Montería Córdoba








ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
11	Desmonte y entrega de equipos a la entidad en el punto donde disponga el supervisor del contrato. Incluye cargue, transporte y descargue de tableros, gabinetes y sus elementos.	1,00	UND



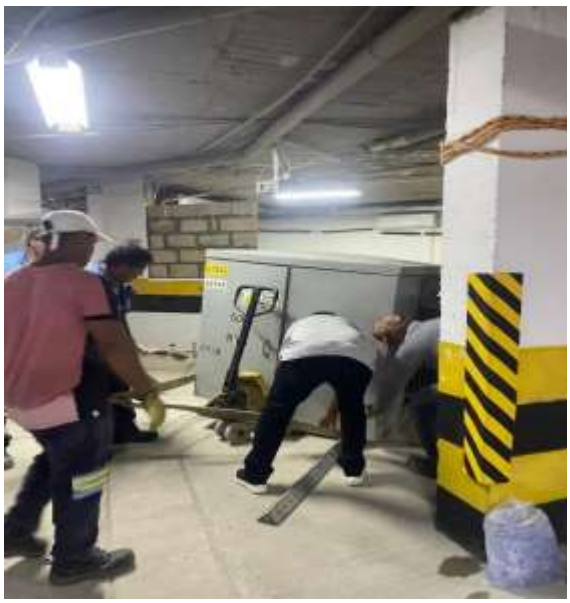

Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778
Email ventas.multifuncional@hotmail.com
construmaq.sas@hotmail.com
Montería Córdoba

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
NP 01	Mantenimiento general consistente en la Instalación de Cable XLPE #2 AWG de 15 kV al 133% en la subestación de la Torre C	m	33





ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
NP 02	Mantenimiento a todo costo de Terminal Premoldeada 15kV (Interior o Exterior) 2 AWG - 250 KCMIL Juego x 3 en la subestación de la Torre C	Und	4




Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778
Email ventas.multifuncional@hotmail.com
construmaq.sas@hotmail.com
Montería Córdoba







ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
NP 03	Mantenimiento a todo costo de terminal ponchable de cable 4/0 AWG	und	20





ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
NP 04	Bandeja tipo malla para el cable XLPE. Incluye elementos para anclaje, soportes y demás elementos necesarios para su correcta instalación con el cumplimiento de norma. En la subestación de la Torre C	m	15



Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778
Email ventas.multifuncional@hotmail.com
construmaq.sas@hotmail.com
Montería Córdoba







ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
NP 05	Pruebas y verificación de equipotencialización de barrajes y puestas a tierras con equipo certificado. Las pruebas se deben hacer con todas las tierras de cada uno de los tableros y la puesta a tierra de la subestación.	und	2




ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
NP 06	Medición de continuidad en las parte metálicas (Carcazas, tableros, bandejas, y demás partes metálicas de la subestación y cuarto de UPS).	und	4



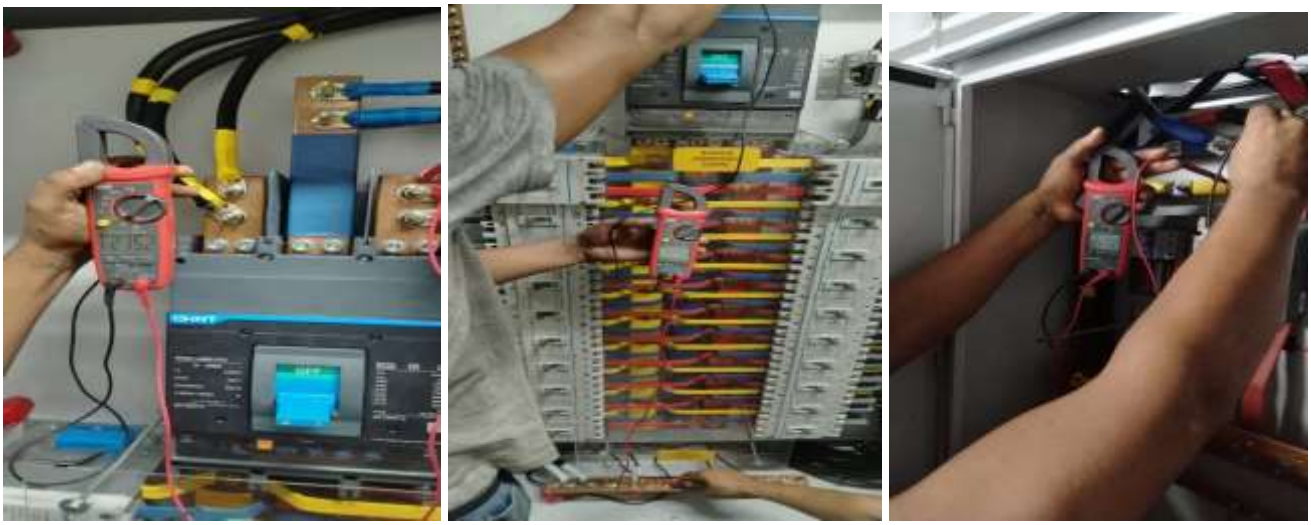

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
NP 07	Inspección de estructuras metálicas, soportes y herrajes. Limpieza externa y ajuste de conexiones.	und	2



ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
NP 08	Mantenimiento de cárcamos de alimentadores. Remplazo de tapas de concreto por rejillas de 40 cm x 80 cm en la subestación de la Torre C	und	4



Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778
Email ventas.multifuncional@hotmail.com
construmaq.sas@hotmail.com
Montería Córdoba











ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
NP 09	Mantenimiento de registro. Remplazo de tapas de concreto por tapa deble en lamina de alfajor de 70 cm x 60 cm en la subestación de la Torre C (total del tamaño de la tapa 70 cm x 120 cm).	und	2



Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778
Email ventas.multifuncional@hotmail.com
construmaq.sas@hotmail.com
Montería Córdoba

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
NP 10	Mantenimiento, mediciones y pruebas de aislamiento del cableado desde el transformador hasta el breaker principal en la subestación del edificio Torre Gentium.	und	20




ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
NP 11	Mantenimiento, mediciones y pruebas de aislamiento del cableado de los cables desde el transformador hasta el breaker principal en la subestación del edificio Torre C.	und	20

MEDIDA FASES TIERRA






Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778
Email ventas.multifuncional@hotmail.com
construmaq.sas@hotmail.com
Montería Córdoba







ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
NP 12	Mantenimiento a todo costo consistente en el Conexionado y cableado desde la transferencia automática de la torre Gentium hasta el nuevo tablero de distribución. Incluye ponchado y tendido	m	7





Atentamente ;

CARLOS MAURICIO RIOS GOMEZ
CC 14.249.984 de Melgar
Representante Legal

Calle 10 No. 25 – 105 Local C.C Suricentro Teléfono 3118258778
Email ventas.multifuncional@hotmail.com
construmaq.sas@hotmail.com
Montería Córdoba
