Outlook

RV: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Desde MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Fecha Vie 03/07/2026 12:05
Para NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
CC CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>

Cordial Saludo

Sigo atenta al VB del apoyo jurídico del acta de cronograma modificada del contrato PRONE 1208 de 2023 con el fin de continuar con el flujo para la firma del supervisor.

Atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Martha Rincon

De: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Enviado: jueves, 2 de julio de 2026 8:03
Para: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Cc: CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; LUIS CARLOS MARTINEZ PRADA <lcmartinez@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Cordial saludo, doctora Neila:

Solicito su apoyo para validar el acta del asunto, teniendo en cuenta las observaciones realizadas sobre las fechas allí consignadas.

La ingeniera Martha ha reiterado, mediante los correos del 30 de junio y 1 de julio, que las fechas registradas son las correctas. Al tratarse de información de carácter técnico, su validación y, de ser necesario, su ajuste, corresponde a la ingeniera responsable.

Así mismo, aunque se ha indicado que el trámite vencía el 18 de junio, es importante señalar que el acta ha sido devuelta en varias oportunidades para la incorporación de ajustes solicitados, los cuales debían ser atendidos por la ingeniera.

Pilar Liliana Acosta Clavijo
Abogada Contratista
Dirección de Energía Eléctrica

placosta@minenergía.gov.co
Calle 43 No 57 -31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minergía.gov.co

De: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Enviado: martes, 30 de junio de 2026 15:01
Para: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Cc: CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; LUIS CARLOS MARTINEZ PRADA <lcmartinez@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Cordial Saludo Pilar

Una vez revisada el acta la prórroga en días se encuentra correcta de acuerdo a la solicitud del Operador de Red, por tanto, solicito al apoyo jurídico revisar y validar para continuar con el trámite del acta, teniendo en cuenta que la misma ya fue remitida con firmas por parte del OR e Interventoría, al igual que contiene el VB del apoyo jurídico del contrato.

Atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Martha Rincon

De: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Enviado: martes, 30 de junio de 2026 7:59
Para: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Cc: CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>; LUIS CARLOS MARTINEZ PRADA <lcmartinez@minenergia.gov.co>
Asunto: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Cordial saludo.

Revisada el acta se tienen las siguientes observaciones, verificar los días que se reducen a las actividades, dado que se esta restando un numero mayor al que se prórroga, lo cual afectaría al OR.

Como se observa en la imagen se esta prorrogando 37 días entre 2 actividades (resaltado en amarillo) y para esto se esta reduciendo 39 días en 2 actividades (resaltado en rojo) , es decir que se esta reduciendo 2 días de mas a las actividades del cronograma.

Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de las funciones asignadas a la supervisión del contrato PRONE GGC 1208 de 2023, las partes, de manera libre y voluntaria, acuerdan la actualización de las fechas de las siguientes actividades de: **a) Etapa 2** Actividades de Suministro y Construcción de Obra; **(i)** Acta de recibo de obras prorrogando su plazo en treinta y seis (36) días adicionales, quedando su plazo en ciento treinta y dos (132) días, y **(ii)** Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra reduciendo su plazo en once (11) días, quedando su plazo en treinta y un (30) días; **b) Etapa 3** Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura; **(ii)** Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor reduciendo su plazo en veintiocho (28) días, quedando su plazo en seis (5) días, y iv) Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación. Prorrogando su plazo en un (1) día, quedando su plazo en cuarenta y cinco (45) días. De acuerdo con lo anterior el cronograma quedará en los siguientes términos:

Cordialmente,

Neila Baleta

De: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 29 de junio de 2026 21:01
Para: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Cc: CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Cordial Saludo Dra. Neila

Remito acta de modificacion del cronograma del contrato PRONE 1208 de 2023 para su VB.

Atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Martha Rincon

De: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 29 de junio de 2026 17:31
Para: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Cc: CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Cordial saludo

Se adjunta acta con VB .

Pilar Liliana Acosta Clavijo
Abogada Contratista
Dirección de Energía Eléctrica

placosta@minenergía.gov.co
Calle 43 No 57 -31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minergía.gov.co

De: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 29 de junio de 2026 13:17
Para: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Cc: CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Cordial saludo Pilar

Agradezco remitir acta con VB por parte del apoyo jurídico con el fin de continuar con el trámite de firma del Supervisor del contrato.

Atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Martha Rincon
Apoyo Técnico Supervisión

De: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de junio de 2026 19:28
Para: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Cc: CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Buenas tardes,

Se validan los ajustes realizados al cronograma, se adjunta el documento en control de cambios con las respuestas a los comentarios y la versión en limpio para que se valide y si está de acuerdo se remita al operador para que la firme y posteriormente se tomen vistos buenos del ministerio para la firma del Director.

Con este modelo se procede a revisar las demás actas.

Cordialmente,

Pilar Liliana Acosta Clavijo
Abogada Contratista
Dirección de Energía Eléctrica

placosta@minenergía.gov.co
Calle 43 No 57 -31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minergía.gov.co

De: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de junio de 2026 15:23
Para: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Cc: CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Cordial Saludo

Se adjunta proyecto de acta modificada acorde a comentarios, sin embargo, es necesario precisar que se aceptaron el control de cambios excepto los relacionados con los días de ejecución del cronograma, toda vez, que se considera se deben respetar los días establecidos por el OR y se ajustaron las fechas de inicio y finalización.

Atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Martha Rincon

De: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de junio de 2026 8:24
Para: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Cc: CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Martha buenos días,

Remito el modelo aprobado por la Dra Neila para poder adelantar las demás actas, se debe validar los días y ajustar de manera que corresponda la solicitud con el cronograma propuesto teniendo en cuenta que se deben contabilizar en días calendario.

Quedo atenta, se remita ajustado para comenzar el proceso de vistos buenos.

Cordialmente,

Pilar Liliana Acosta Clavijo
Abogada Contratista
Dirección de Energía Eléctrica

placosta@minenergía.gov.co
Calle 43 No 57 -31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minergía.gov.co

De: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Enviado: Lunes, 22 de Junio de 2026 7:41
Para: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
CC: CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ <cmcholes@minenergia.gov.co>; MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>
Asunto: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Cordialmente,

Se remite con observaciones el acta de cronograma y seguimiento del contrato PRONE 1208-2023.

Cordialmente,

Neila Baleta

De: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Enviado: viernes, 19 de junio de 2026 7:39
Para: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Cc: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ <cmcholes@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Dra Neila buenos días,

Se remite el acta con los ajustes solicitados y se remite adjunta el alcance de la solicitud del operador y el aval de la interventoría ajustado para su aprobación y poder continuar con el trámite.

Quedo atenta,

Pilar Liliana Acosta Clavijo
Abogada Contratista
Dirección de Energía Eléctrica

placosta@minenergía.gov.co
Calle 43 No 57 -31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minergía.gov.co

De: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Enviado: jueves, 18 de junio de 2026 13:05
Para: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Cc: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Cordial Saludo

Se remite acta ajustada a las observaciones y se anexan alcance de la solicitud presentada por el OR y aval de la interventoría ajustado.

Atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Martha Rincon

De: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Enviado: jueves, 18 de junio de 2026 9:02
Para: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Cc: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Buenos dias,

Se valida nuevamente el acta y se indica que:

1. Se ajusto la fecha de acuerdo a la información del radicado que tiene la solicitud aportada:




No. 1-2026-027846

Remitente:	HOLLMANN DAVID SCHMALBACH MOLINARES, HOLLMANN.SCHMALBACH@afinia.com.co
Destinatarios:	Minas Energia,Minas Energia;
Fecha:	Thu Jun 11 2026 18:52:45 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)
Asunto:	2026040000138651 - Solicitud Cambio Cronograma - PRONE GGC-1208-2023

2. Frente al ajuste de las fechas, es la misma situación que ya se presentó en las actas anteriores, y se reitera que jurídicamente se debe contabilizar los plazos del cronograma los días calendario, por lo tanto se hacen dos ajustes, el primero para dejar las fechas tal como están en el acta firmada:

PLAZO DEL CONTRATO	**20 AÑOS**
FECHA ACTA DE INICIO (Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio)	**4/03/2024**
ASE DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN	**37 MESES**

Ítem	Actividad	Duración (días)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIO N	DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra PLAZO ETAPA 1: 8.36 MESES					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	21	04/03/2024	24/03/2024	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	N/A	N/A	N/A	Certificación
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	46	25/03/2024	09/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	61	10/05/2024	09/07/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	91	10/07/2024	08/10/2024	Comunicación del
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	31	09/10/2024	08/11/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	61	09/11/2024	08/01/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	61	09/11/2024	08/01/2025	Actas
9	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	61	09/11/2024	08/01/2025	Planos / Actas

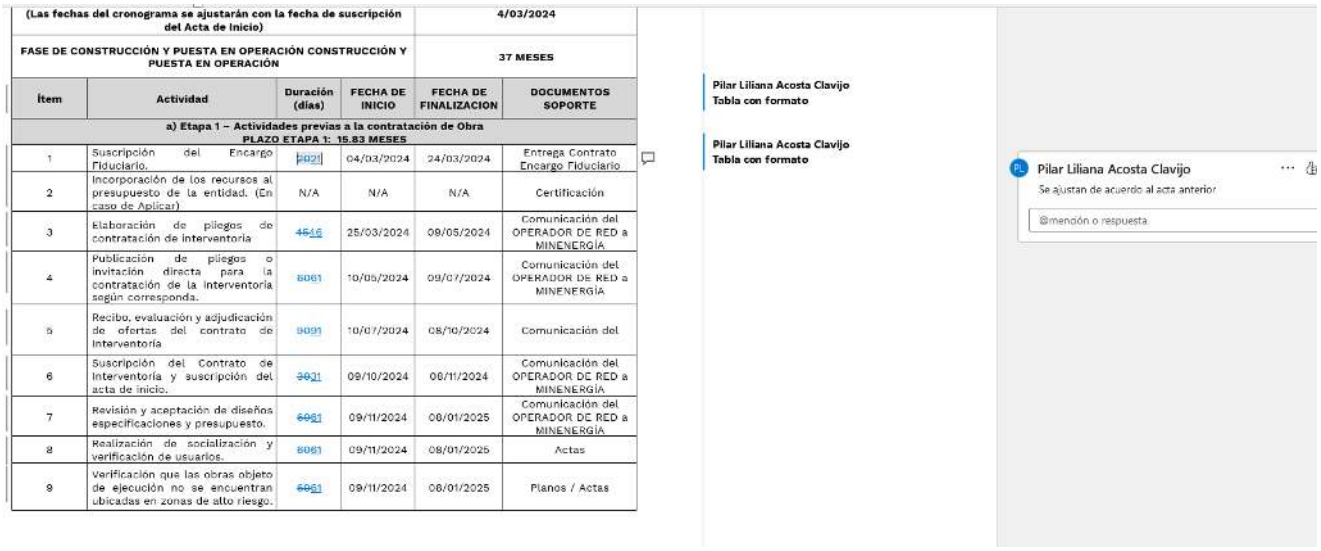

(Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio) 4/03/2024

FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN 37 MESES


Ítem	Actividad	Duración (días)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra PLAZO ETAPA 1: 15.83 MESES					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	~~21~~ 3021	04/03/2024	24/03/2024	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	N/A	N/A	N/A	Certificación
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	~~46~~ 46	25/03/2024	09/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	6061	10/05/2024	09/07/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	9091	10/07/2024	08/10/2024	Comunicación del
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	~~31~~ 3031	09/10/2024	08/11/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	~~61~~ 6061	09/11/2024	08/01/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	6061	09/11/2024	08/01/2025	Actas
9	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	~~61~~ 6061	09/11/2024	08/01/2025	Planos / Actas

Pilar Liliana Acosta Clavijo
Tabla con formato

Pilar Liliana Acosta Clavijo
Tabla con formato

Pilar Liliana Acosta Clavijo
Se ajustan de acuerdo al acta anterior
@mención o respuesta

Y el segundo contabilizando en días calendario el ajuste de las fechas en las actividades que se modifica con esta acta

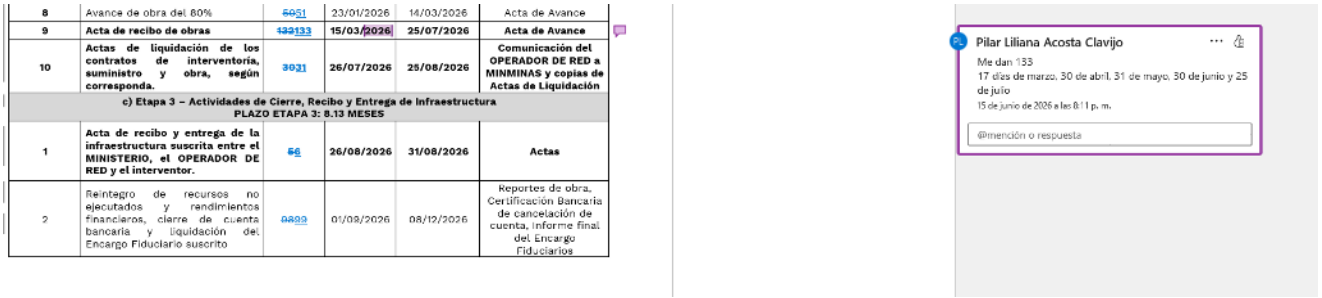

8	Avance de obra del 80%	~~5051~~	23/01/2026	14/03/2026	Acta de Avance
9	**Acta de recibo de obras**	~~133~~133	15/03/2026	25/07/2026	**Acta de Avance**
10	**Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.**	3031	26/07/2026	25/08/2026	**Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación**
c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3: 8.13 MESES					
1	**Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.**	~~56~~	26/08/2026	31/08/2026	**Actas**
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	0899	01/09/2026	08/12/2026	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios

Pilar Liliana Acosta Clavijo
Me dan 133
17 días de marzo, 30 de abril, 31 de mayo, 30 de junio y 25 de julio
15 de junio de 2026 a las 8:11 p. m.
@mención o respuesta

Cordialmente,

Pilar Liliana Acosta Clavijo
Abogada Contratista
Dirección de Energía Eléctrica

placosta@minenergía.gov.co
Calle 43 No 57 -31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minergía.gov.co

De: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Enviado: jueves, 18 de junio de 2026 8:43
Para: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Cc: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Cordial Saludo

Una vez revisados el control de cambios realizados por el apoyo juridico al acta, respetuosamente me permito indicar que no se aceptan en su totalidad, toda vez que la fecha de radicacion de la solicitud del operador de red esta correcta, (11 de junio), y los tiempos ajustados de las actividades tambien los cuales se modifican en el control de cambios, de manera cordial se solicita validar el acta nuevamente.

Cordialmente,

Martha Rincon

De: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Enviado: jueves, 18 de junio de 2026 7:24
Para: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Cc: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Martha buenos días,

Se remite el acta con la revisión de la Dra Neila para que se trasmita al operador de red.

Cordialmente,

Pilar Liliana Acosta Clavijo
Abogada Contratista
Dirección de Energía Eléctrica

placosta@minenergía.gov.co
Calle 43 No 57 -31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minergía.gov.co

De: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Enviado: jueves, 18 de junio de 2026 6:51
Para: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Cc: CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ <cmcholes@minenergia.gov.co>; MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>
Asunto: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Cordial saludo.

Remito con control de cambio y comentario acta de cronograma y seguimiento del contrato PRONE GGC 1208-2023.

Cordialmente,

Neila Baleta

De: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>
Enviado: martes, 16 de junio de 2026 12:18
Para: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
Cc: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS MARIO CHOLES BENITEZ <cmcholes@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Dra Neila buenos días,

Remito el modelo de acta de cronograma para los PRONE 2023 con Caribemar para su revisión y poder replicar en los demás contratos.

Se adjunta solicitud del operador, aval de la interventoría y la última acta vigente.

Quedo atenta.

Pilar Liliana Acosta Clavijo
Abogada Contratista
Dirección de Energía Eléctrica

placosta@minenergía.gov.co
Calle 43 No 57 -31 CAN, Bogotá, Colombia

www.minergía.gov.co

De: MARTHA GUADALUPE RINCON PEDREROS <mgrincon@minenergia.gov.co>
Enviado: Viernes, 12 de Junio de 2026 20:50
Para: PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>

CC: CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>
Asunto: Acta Cronograma y Seguimiento contrato PRONE 1208 2023

Cordial Saludo Dra. Pilar

Para su revisión adjunto proyecto de modificación del acta de cronograma y seguimiento del contrato PRONE 1208 de 2023 de acuerdo a la solicitud del operador de red.

En el siguiente enlace se encuentran los respectivos soportes.

Atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Martha Rincon
