





CONSORCIO INTER GIRÓN

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

GRUPO 4: INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIOÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

INFORME TÉCNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

DEL 15 OCTUBRE 2025 A 14 ABRIL 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.16228.4 DEL 08 SEPTIEMBRE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
3. FICHA TÉCNICA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 10
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 10
3.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 11
3.1.2. ESTADO INICIAL Y FINAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 14
3.2. RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 18
3.3. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 18
3.3.1. PÓLIZAS SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA 18
3.3.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA 19
3.3.3. PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA 19
3.4. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 19
3.4.1. BALANCE FINANCIERO 20
3.4.2. VALOR DE EJECUCIÓN POR AVANCE DE OBRA 21
3.5. PROGRAMA DE INVERSIONES 21
3.6. ANÁLISIS DEL PLAZO CONTRACTUAL 22
3.7. RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA 23
3.7.1. PERSONAL CONTRACTUAL 23
3.7.2. PERSONAL OPERATIVO 23
3.8. RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 24
4. PRESUPUESTRO CONTRACTUAL – CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN 28
5. AVANCE FINANCIERO MENSUAL 29
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 33
6.1. SECCIÓN PRIMERA 35
6.1.1. Ítem 1.01 - Replanteo, control y medición de obra 35
6.1.2. Ítem 1.03 - Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m) 36

6.1.3. Ítem 1.04 - Desmonte y limpieza 37
6.1.4. Ítem 1.05 - Retiro de basuras y escombros 38
6.1.5. Ítem 1.07 - Perfilado a mano descolgado de talud (en roca) 39
6.2. SECCIÓN SEGUNDA 40
6.2.1. Ítem 2.01.A.02 - Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad 40
6.2.2. Ítem 2.01.A.03 - Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad 41
6.2.3. Ítem 2.01.A.04 - Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata 42
6.2.4. Ítem 2.03 - Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m 43
6.3. SECCIÓN TERCERA 44
6.3.1. Ítem 3.01 – Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas 44
6.3.2. Ítem 3.03 – Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm 45
6.3.3. Ítem 3.08 – Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes 47
6.4. SECCIÓN CUARTA 47
6.4.1. Ítem 4.01 – Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2 48
6.4.2. Ítem 4.02.03 – Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m 49
6.4.3. Ítem 4,03 – Tensionamiento de anclajes 50
6.4.4. Ítem 4.04.01 – Malla electrosoldada 4mm y abertura 0,15 x 0,15 m 52
6.4.5. Ítem 4,05 – Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros 53
6.4.6. Ítem 4,06 – Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2" 53
6.4.7. Ítem 4,07 – Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje 54
6.5. SECCIÓN QUINTA 56
6.5.1. Ítem 5.04 – Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m 56
6.5.2. Ítem 5.05 - Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m. 57
6.6. SECCIÓN SEXTA 58
6.6.1. Ítem 6,02 – Canaleta (ancho=1m; e=10cm). 58
6.6.2. Ítem 6,04 – Estructura de disipación de energía. 59

6.6.3. Ítem 6,06 – Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora..... 61
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CIERRE DE OBRAS..... 62
8. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS..... 63
9. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA..... 65
10. SEGUIMIENTO AL CONTROL FINANCIERO DE OBRA (CURVA S)..... 67
11. FICHA TÉCNICA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025..... 68
11.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025..... 68
11.2. RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025..... 69
11.3. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025..... 69
11.3.1. PÓLIZAS SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 70
11.3.2. PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 70
11.3.3. PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 71
11.4. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.16228.4 del 08 SEPTIEMBRE 2025..... 71
11.4.1. BALANCE FINANCIERO..... 71
11.5. RELACION DE PERSONAL INTERVENTORÍA..... 72
12. PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE INTERVENTORIA..... 73
13. AVANCE FINANCIERON MENSUAL..... 74
14. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA..... 78
14.1. ACTIVIDADES TECNICAS:..... 79
14.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:..... 80
14.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS..... 81
14.4. COMPONENTE SOCIAL..... 82
1.1. COMPONENTE AMBIENTAL Y SST..... 84
15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 86
16. ANEXOS..... 88

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe final de interventoría se elabora con el propósito de consolidar y documentar el seguimiento técnico, administrativo, ambiental y social realizado durante la ejecución total del Contrato N. 210.16225.6 del 05 de septiembre de 2025, correspondiente al proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER". La interventoría mediante el Consorcio Inter Girón ejerció funciones permanentes de supervisión, control y verificación sobre cada una de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los diseños geotécnicos aprobados, las normas aplicables y las obligaciones contractuales establecidas para el proyecto.

La necesidad de intervención del talud se originó a partir de las condiciones de inestabilidad evidenciadas en el sector, asociadas principalmente a procesos de erosión superficial, infiltración de aguas, pérdida de cobertura vegetal, pendientes pronunciadas y presencia de materiales meteorizados con susceptibilidad a movimientos en masa. Estas condiciones generaban riesgo para las viviendas, infraestructura y comunidad localizada en el área de influencia, haciendo necesaria la implementación de una solución de ingeniería orientada al mejoramiento de las condiciones de estabilidad global del macizo y a la reducción de la amenaza geotécnica existente.

Con base en los estudios geológicos, geotécnicos, geomorfológicos e hidrológicos desarrollados para el proyecto, se definió como solución principal la construcción de una pantalla anclada, diseñada para proporcionar estabilidad al talud mediante un sistema estructural capaz de contener los empujes del terreno y controlar los desplazamientos asociados a las condiciones naturales y antrópicas presentes en el área intervenida. En este sentido, la obra contempló la ejecución de a 840 m³ de pantalla anclada, conformada por un total de 144 anclajes activos de tres cables de diámetro 1/2", distribuidos conforme a los parámetros establecidos en el diseño estructural y geotécnico del proyecto. Como manera preliminar, se ejecutaron actividades de perfilado y conformación de la superficie intervenida, retiro de material inestable, excavaciones controladas y manejo de material producto de corte, permitiendo garantizar condiciones adecuadas para la instalación progresiva del sistema de estabilización.

Cada anclaje fue ejecutado mediante procesos controlados de perforación, instalación de anclajes, inyección y llenado con lechada cementicia, garantizando la adecuada adherencia entre el sistema de anclaje y el macizo. Posterior al suministro y colocación de concreto de 3000 PSI en zapatas y talud, los anclajes fueron sometidos a procesos de tensionamiento a una carga de trabajo de 30 toneladas,

permitiendo generar las fuerzas de confinamiento requeridas para estabilizar el talud y mejorar los factores de seguridad de la ladera. Como parte integral de la estructura estabilizadora, la pantalla contó con parrillas de acero de refuerzo con resistencia fy de 4.200 kg/cm², las cuales fueron instaladas de acuerdo con las especificaciones estructurales y posteriormente recubiertas mediante la aplicación de concreto, conformando el sistema de contención superficial del talud. La interventoría realizó acompañamiento permanente durante estas actividades, verificando procedimientos constructivos, profundidades de perforación, dosificaciones de lechada, presiones de inyección, tiempos de fraguado y registros de tensionamiento, asegurando la trazabilidad y calidad técnica de cada elemento instalado.

Considerando que uno de los principales factores asociados a la inestabilidad del talud correspondía a la presencia de agua superficial e infiltraciones internas, el proyecto incluyó la implementación de obras hidráulicas orientadas al manejo y control eficiente de escorrentías y presiones hidrostáticas. En este contexto, se construyeron canaletas de corona y pie de talud, diseñadas para captar y conducir las aguas superficiales de manera controlada, evitando procesos erosivos adicionales y reduciendo la infiltración hacia el interior del macizo. Estas estructuras hidráulicas fueron interconectadas mediante cajas de inspección y disipador de energía, permitiendo direccionar los caudales recolectados hacia entregas seguras hacia pozos de inspección y canaletas preexistentes del sector.

Adicionalmente, la solución implementada contempló un sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora, con el propósito de disminuir la acumulación de agua dentro del terreno y reducir la presión hidrostática generada detrás de la pantalla anclada. La ejecución de este sistema permitió mejorar las condiciones de drenaje del macizo y contribuir significativamente al comportamiento estable de la estructura en el tiempo. La interventoría verificó permanentemente la correcta instalación y funcionamiento de estos elementos hidráulicos, dada su importancia dentro del desempeño general de la obra de estabilización.

De manera complementaria a las actividades técnicas y constructivas, durante el desarrollo del proyecto se ejecutaron las obligaciones ambientales derivadas de los permisos y compromisos adquiridos para la intervención del sector. Dentro de estas actividades se realizó la compensación ambiental correspondiente en la parte baja del talud, incluyendo labores orientadas a la recuperación y mejoramiento de las condiciones ambientales del área intervenida. Igualmente, se efectuó seguimiento al manejo adecuado de residuos de construcción, control de material particulado, manejo de aguas y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental definidas para el proyecto.

En el componente social, la interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a las actividades de relacionamiento comunitario adelantadas por el contratista, verificando la atención oportuna de

peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), así como el desarrollo de procesos de socialización con la comunidad del sector. Como parte del cierre del proyecto, se llevaron a cabo actas de vecindad de cierre, permitiendo registrar el estado final de las viviendas y áreas aledañas a la intervención, además de la aplicación de encuestas de satisfacción dirigidas a la comunidad y a la Junta de Acción Comunal, con el fin de evaluar la percepción ciudadana frente al desarrollo y resultados de la obra ejecutada.

La interventoría, en cumplimiento de sus funciones contractuales, realizó un seguimiento integral a los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales y sociales del proyecto, verificando que las actividades fueran ejecutadas conforme a los diseños aprobados, las especificaciones técnicas y la normatividad vigente aplicable. Asimismo, efectuó control permanente sobre la calidad de los materiales, procedimientos constructivos, cumplimiento de programación, implementación de medidas de seguridad industrial y manejo ambiental, dejando evidencia documental y fotográfica del desarrollo de cada una de las etapas de ejecución.

Finalmente, el presente informe consolida el recuento general de las actividades ejecutadas durante el desarrollo del proyecto, incorporando el análisis técnico de las obras realizadas, los controles efectuados por la interventoría, el seguimiento administrativo y contractual, así como el registro fotográfico y documental correspondiente al proceso constructivo y cierre definitivo de la obra de estabilización. Todo ello con el propósito de dejar constancia del cumplimiento de los objetivos planteados para el proyecto y de la implementación satisfactoria de las medidas orientadas a la mitigación del riesgo y protección de la comunidad ubicada en el área de influencia del talud intervenido.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Girón se localiza en el departamento de Santander, en la región nororiental de la República de Colombia, y hace parte integral del Área Metropolitana de Bucaramanga, junto con los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta. Su cabecera municipal, San Juan de Girón, se sitúa a aproximadamente 7 kilómetros al suroccidente de Bucaramanga, la capital departamental.

Girón se encuentra geográficamente ubicado entre las coordenadas 7°04’ de latitud norte y 73°10’ de longitud oeste, a una altitud promedio de 689 metros sobre el nivel del mar. El municipio limita al norte con Bucaramanga, al sur con Piedecuesta y Lebrija, al oriente con Floridablanca y al occidente con el municipio de Lebrija.


El territorio de Girón se caracteriza por una topografía variada, que combina zonas planas en el valle del río de Oro con sectores de ladera y relieve ondulado hacia las zonas rurales y de piedemonte andino. Esta diversidad geomorfológica influye directamente en sus condiciones climáticas, presentando un clima cálido y húmedo, con temperaturas medias anuales entre 24 °C y 28 °C.

Hidrológicamente, el municipio es atravesado por el río de Oro, principal afluente que recorre el casco urbano y desemboca en el río Lebrija, además de varias quebradas secundarias que drenan las microcuencas de las zonas rurales.

El barrio Villas de los Caballeros se localiza en el municipio de Girón, departamento de Santander, dentro del perímetro urbano y área de influencia del proyecto. Este sector se encuentra situado en la zona nororiental del municipio, con conexión directa a las principales vías de acceso que comunican con Bucaramanga y el resto del Área Metropolitana.

En este punto se desarrolla el frente de obra correspondiente a la construcción de la pantalla anclada, estructura destinada a la estabilización del talud contiguo a las viviendas existentes y a la protección de la infraestructura vial y peatonal adyacente.

Ubicación del frente de obra:
Latitud 7.051821, Longitud -73.163652
Calle 2ª con Carrera 15B
Barrio Villas de Los Caballeros
Girón, Santander

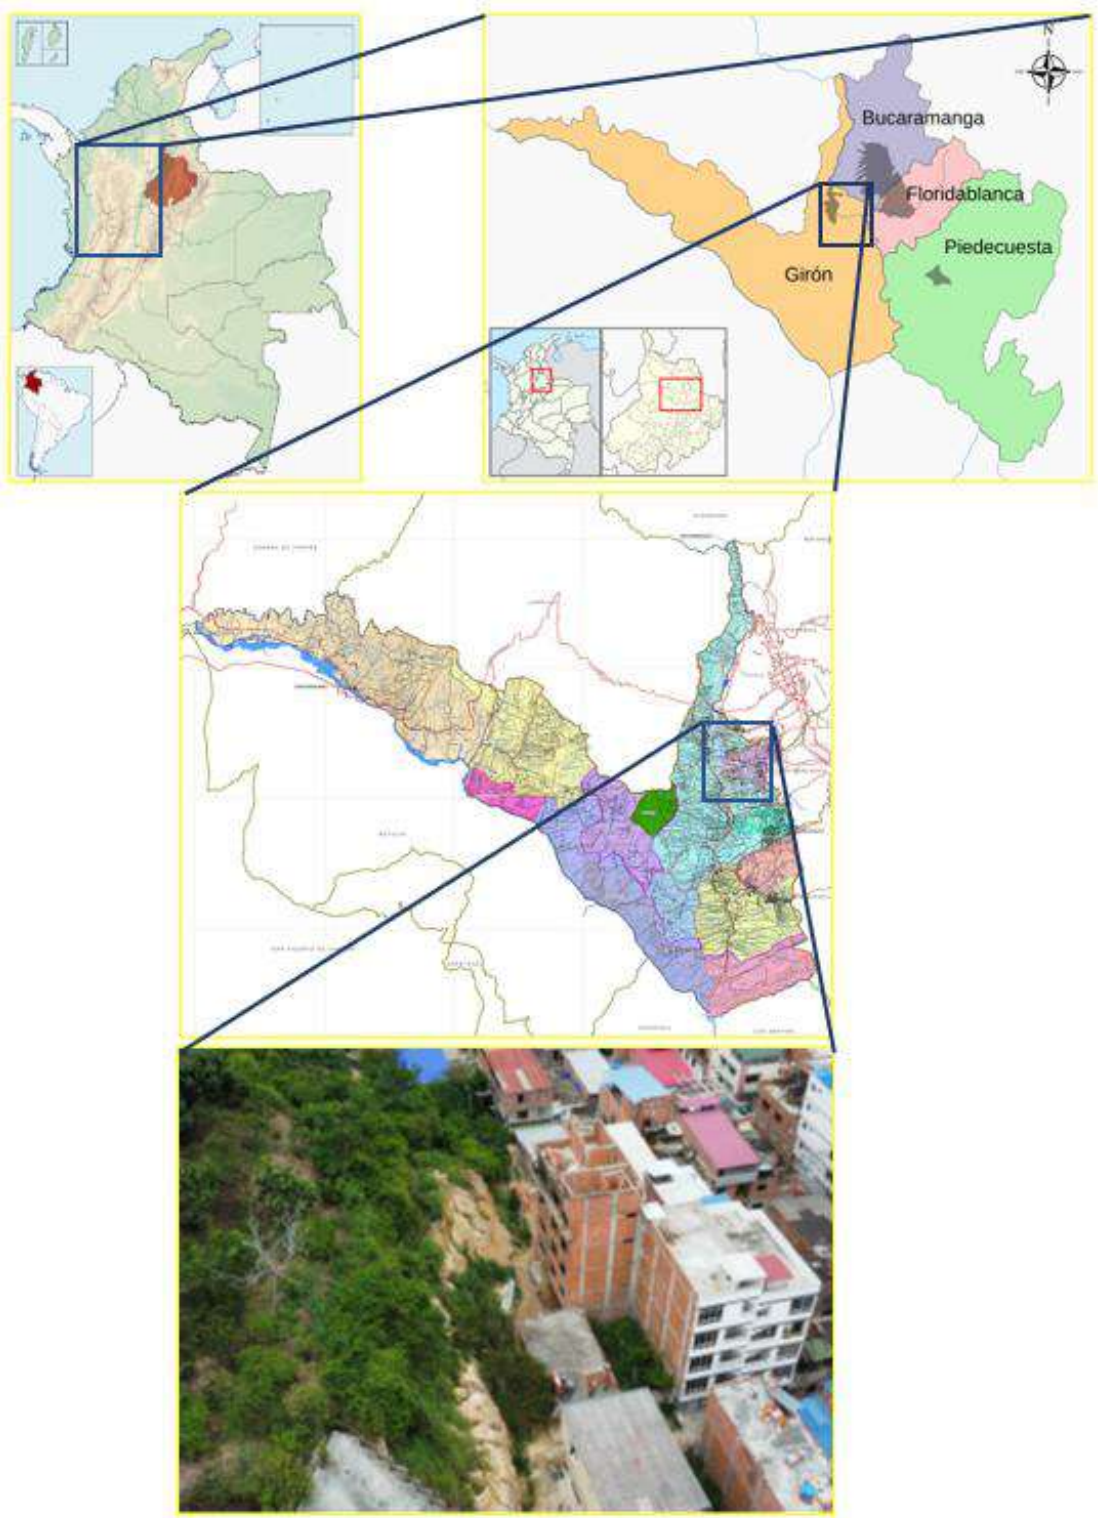

Santander, San Juan de Girón, Barrio Villa de Los Caballeros
Localización del proyecto

3. FICHA TÉCNICA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Contrato No:	210.16225.6 del 05 de septiembre 2025
Tipo de contrato:	Obra pública
Objeto:	"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
Contratante:	Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB Director General CDMB: Juan Carlos Reyes Nova 91.493.482 de Bucaramanga
Supervisor	Carlos Alberto Díaz Barrera CC. 91.496.579 Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT
Contratista:	**CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN** Integrantes: INFRACORP S.A.S. – 90% CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S. – 10%
Nit.:	901.982.571-5
Representante legal:	Johanna Marcela Padierna Castiblanco 1.098.682.052 de Bucaramanga
Valor del contrato:	Cuatro mil ciento cincuenta y nueve millones trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos diez con sesenta y cinco centavos. ($4.159.344.710,65)
Forma de pago:	*"La CDMB reconocerá y pagará el valor de los contratos de obra derivados de cada uno de los grupos o lotes, mediante actas parciales de acuerdo a la ejecución de la obra previa suscripción de actas de pago debidamente revisadas y aprobadas por la interventoría y la supervisión e igualmente de conformidad con la apropiación presupuestal respectiva para la vigencia 2025 y 2026."* CLAUSULA SÉPTIMA
Anticipo o Pago anticipado:	No aplica anticipo y/o pago anticipado
Plazo inicial:	Seis (06) meses a partir de la suscripción del acta de inicio (182 días)
Fecha de inicio:	15 Octubre de 2025
Fecha de terminación inicial:	14 Abril de 2026

Lugar de ejecución:	Barrio Villas de Los Caballeros Girón, Santander
% Ejecución	99,91%
Total ejecutado	Cuatro mil ciento cincuenta y cinco millones seiscientos sesenta y seis mil ciento noventa y nueve pesos con cincuenta centavos moneda corriente ($ 4.155.666.199,50).
Saldo a favor de la entidad	Tres millones seiscientos setenta y ocho mil quinientos once pesos con quince centavos moneda corriente ($ 3.678.511,15).

3.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La alternativa seleccionada para la estabilización del talud permitió mejorar significativamente sus condiciones de estabilidad, pasando de una condición de amenaza alta a una amenaza baja frente a fenómenos de remoción en masa, tanto en condiciones estáticas como dinámicas.

La solución planteada para el talud ubicado en el barrio Villa de los Caballeros, Girón, consistió en la construcción de una pantalla de concreto reforzado con anclajes activos, estructura que permitió mitigar la amenaza por movimientos en masa al transmitir de manera segura las cargas ejercidas por el talud hacia un punto ubicado por fuera de la dovela de falla.




Área de intervención: 840 m^2


Este tipo de obra se convirtió en un elemento fundamental para asegurar la estabilidad en áreas críticas con inclinaciones pronunciadas. Esto se logró mediante la utilización de anclajes que introducen tensiones, esfuerzos y deformaciones adicionales en el suelo, mejorando la estabilidad en general. Una vez instalados, estos anclajes se ajustaron previamente hasta alcanzar una carga segura. En este proceso, el suelo se comprime entre el lugar donde se encuentra el anclaje y la superficie de apoyo de la estructura.

A continuación, se mostrarán detalles esquemáticos de cada uno de los componentes principales de una pantalla de concreto anclada:


El sistema de anclaje activo propuesto para esta obra de estabilización estará conformado por tres torones de Ø=1/2", compuestos cada uno por ocho (8) hilos de acero trenzados radialmente. Una vez instalado el sistema, llenado e inyectado con lechada cementicia, y alcanzada la resistencia a compresión requerida de dicha lechada, cada torón será tensionado hasta una carga de 10 toneladas. En consecuencia, el sistema completo de anclaje activo quedará tensionado a una carga total de 30 toneladas, garantizando así el adecuado confinamiento y estabilización del talud.

La configuración geométrica del anclaje de este proyecto, se conforma por una longitud libre de 15,00m (distancia entre la cara del talud y el punto de inicio del bulbo) y por una longitud del bulbo de 10,00m.

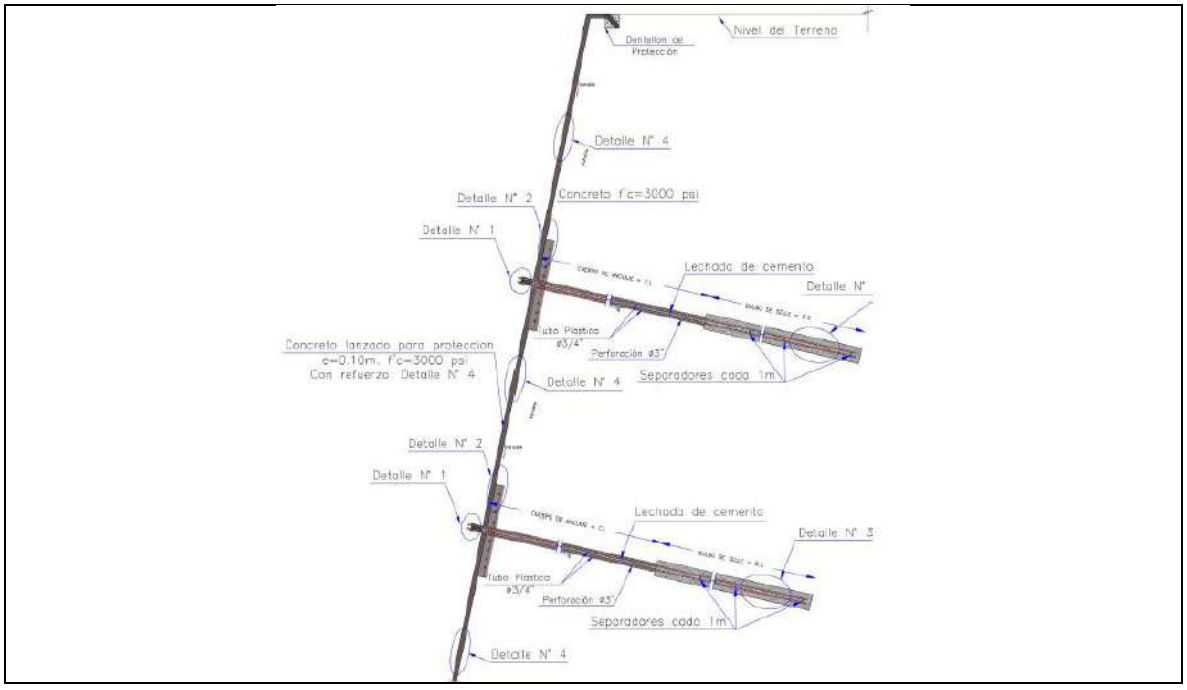



Total de anclajes activos: 144 und de 25 m de longitud

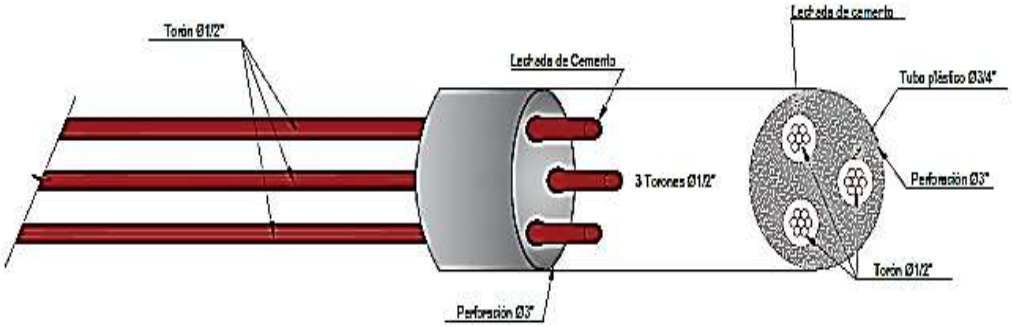


Cable de anclaje activo

El sistema de inyección del anclaje se ejecuta mediante lechada cementicia, con el propósito de mejorar la capacidad portante y el desempeño estructural del sistema de anclaje, garantizando una adecuada transferencia de cargas entre los torones y el suelo o roca. La inyección permite incrementar la adherencia y fricción entre el anclaje y el terreno circundante, generando un bulbo resistente que contribuye a la estabilidad global del talud y al correcto funcionamiento del sistema de contención.

La lechada cementicia, además de cumplir una función estructural, actúa como elemento de protección de los torones frente a agentes externos y procesos de corrosión, especialmente en presencia de humedad o infiltraciones de agua dentro del terreno. En la zona libre del anclaje, la lechada embebe completamente los torones, evitando el contacto directo del acero con el terreno natural y reduciendo la posibilidad de deterioro prematuro del sistema.


De igual manera, el proceso de inyección contribuye al sellado de vacíos y discontinuidades presentes en el terreno, disminuyendo la permeabilidad local y mejorando las condiciones geotécnicas del entorno inmediato del anclaje. La correcta ejecución de esta actividad resulta fundamental para garantizar la capacidad de carga proyectada, la durabilidad del sistema y el adecuado comportamiento de la estructura de estabilización a largo plazo.

El bulbo es la parte del anclaje que se adhiere al terreno natural y le transmite su carga mediante la lechada.

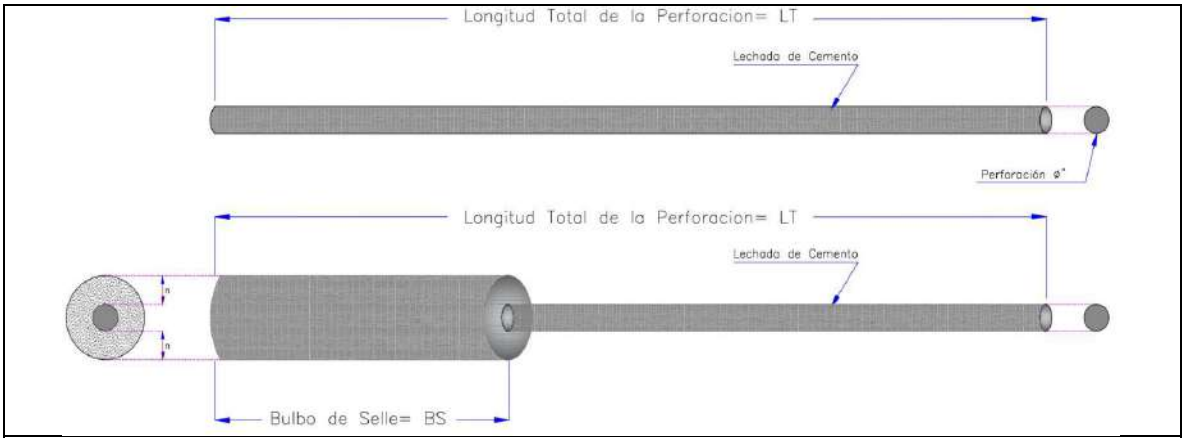

Detalle del sistema de inyección de anclaje activo

La zapata cumple la función de servir como elemento de apoyo y transferencia de las cargas generadas por el sistema de anclajes y la pantalla de concreto hacia el terreno de fundación. Debido a su configuración estructural, generalmente ensanchada, permite distribuir de manera uniforme los esfuerzos transmitidos al suelo, evitando concentraciones excesivas de carga en puntos específicos que puedan generar asentamientos diferenciales o fallas locales en el terreno. Adicionalmente, la zapata contribuye al incremento de la estabilidad global de la estructura de contención, al proporcionar una base rígida y estable que favorece el adecuado comportamiento del sistema frente a las solicitaciones estáticas y dinámicas actuantes. Su diseño geométrico y estructural se desarrolla considerando las características geotécnicas del terreno, las cargas transmitidas por los anclajes y las condiciones de estabilidad requeridas para garantizar el correcto desempeño de la obra a largo plazo.

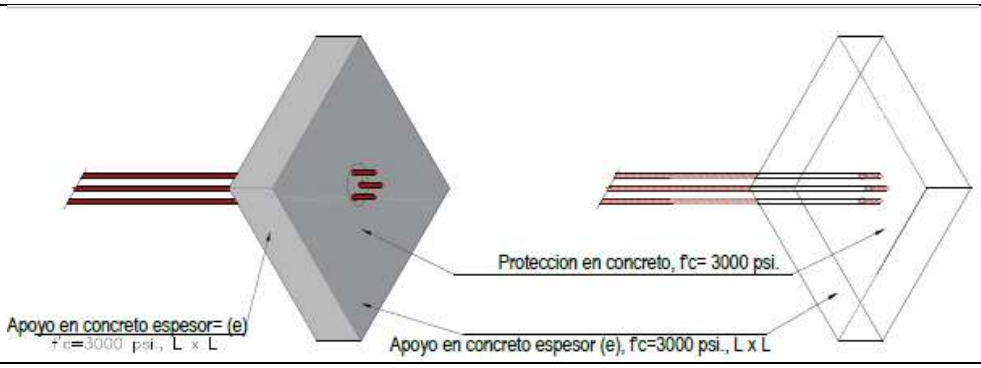


Detalle de la zapata del anclaje e=0,20 m; f'c=3.000psi

3.1.2. ESTADO INICIAL Y FINAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Se evidencia la presencia aparente de procesos de erosión superficial asociados a escorrentía, manifestados mediante la formación de surcos y cárcavas incipientes en sectores de la corona y

superficie del talud, acompañados de pérdida de cobertura vegetal y arrastre de material fino. Estas condiciones favorecen la desagregación progresiva del material y pueden incrementar la susceptibilidad a desprendimientos y procesos de inestabilidad local, por lo que se recomienda implementar medidas de manejo de aguas superficiales y control de erosión.

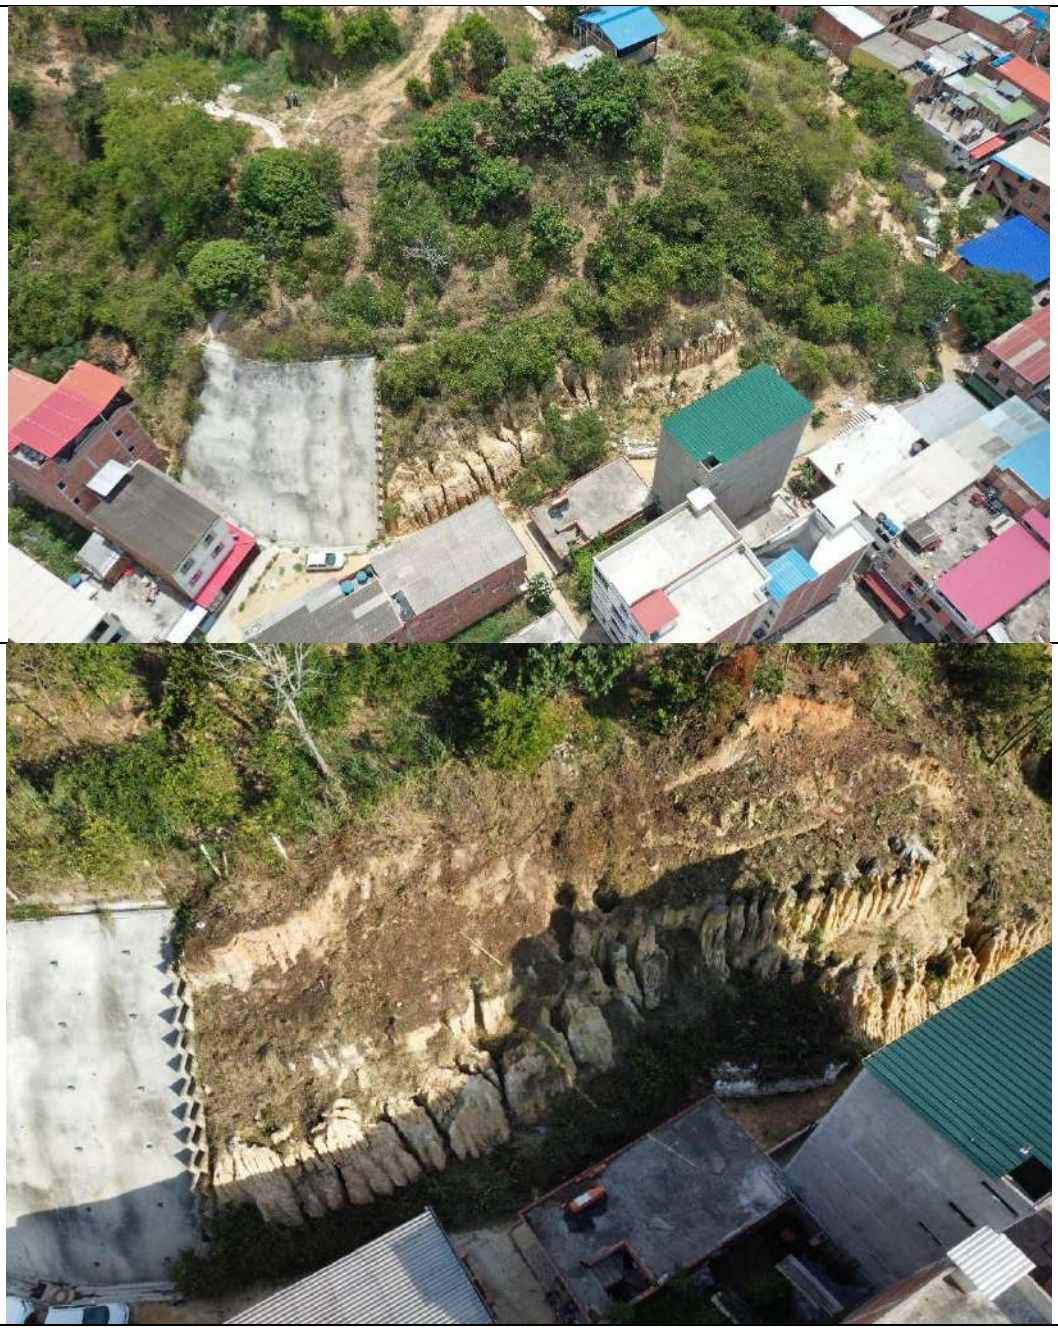

Estado inicial del área de intervención

Posterior a la intervención, el talud fue estabilizado mediante una pantalla anclada de 840 m² con 144 anclajes de tres cables, complementada con 121,60 m de canaletas en corona y pie de talud y 14 m de disipador, permitiendo mejorar la estabilidad del sector, controlar las aguas de escorrentía y reducir el riesgo de erosión y desprendimientos.



Control de erosión mediante construcción de pantalla en concreto con anclajes activos



Control de erosión mediante construcción de pantalla en concreto con anclajes activos

3.2. RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTOS ADMINISTRATIVOS			
ACTA	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
CONTRATO OBRA PÚBLICA	05/09/2025	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	$4.159.344.710,65
ACTA No. 1 -	15/10/2025	ACTA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NA
ACTA N. 02 - RECIBO Y PAGO PARCIAL No. 1	15/12/2025	15 OCTUBRE 2025 HASTA EL 30 NOVIEMBRE 2025.	$ 966.804.519,53 23,24 %
ACTA No. 3 - RECIBO Y PAGO PARCIAL No. 2	16/02/2026	01 DICIEMBRE 2025 HASTA EL 31 ENERO 2026.	$ 2.035.943.731,91 48,95 %
ACTA No. 4 - RECIBO Y PAGO PARCIAL No. 3	18/03/2026	01 FEBRERO 2026 HASTA EL 28 FEBRERO 2026.	$ 590.328.414,08 14,19 %
ACTA N. 5 – RECIBO Y PAGO PARCIAL N. 4	14/04/2026	DESDE EL 01 DE MARZO 2026 HASTA EL 14 DE ABRIL 2026.	$ 562.589.533,98 13,53%
ACTA N. 6 – RECIBO DEFINITIVO	14/04/2026	DESDE EL 15 DE OCTUBRE 2025 HASTA EL 14 DE ABRIL 2026.	$ 4.155.666.199,50 - 99,91% Valor ejecutado $ 3.678.511,15 – 0.09% Saldo a favor de la entidad

3.3. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

3.3.1. PÓLIZAS SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA

La CDMB, por intermedio de la Oficina de Contratación, expidió el Acta de Aprobación de Garantías el día 29 de septiembre de 2025, mediante la cual se verificó y avaló el cumplimiento de los requisitos de amparo exigidos para la formalización del contrato, quedando dichas garantías en calidad de APROBADAS para proceder a su suscripción.

ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE 2025				
PÓLIZA No.	**AMPAROS**	**VALOR**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
AB002685	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 831.868.942,60	05/09/2025	05/07/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 207.967.235,65	05/09/2025	15/03/2029
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 831.868.942,60	05/03/2026	15/03/2031

3.3.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA

ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 23 DE OCTUBRE 2025				
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALOR	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
AB002685	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 831.868.942,60	15/10/2025	15/08/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 207.967.235,65	15/10/2025	15/04/2029
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 831.868.942,60	15/04/2026	15/04/2031
AB002686	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 569.400.000,00	15/10/2025	15/04/2025

3.3.3. PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA

ASEGURADORA: EQUIDAD SEGUROS				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 06 DE MAYO 2026				
PÓLIZA No.	AMPAROS	VALOR	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
AB002685	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 831.868.942,60	15/10/2025	15/08/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 207.967.235,65	15/10/2025	15/04/2029
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 831.868.942,60	15/04/2026	15/04/2031
AB002686	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 569.400.000,00	15/10/2025	15/04/2025

3.4. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

El Contrato de Obra No. 210.16225.6, suscrito el 05 de septiembre de 2025, se celebró por un valor inicial de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.159.344.710,65), sin presentar modificaciones presupuestales.

Durante le ejecución del contrato se registraron siete (07) avances mensuales de obra, los cuales reflejan el comportamiento físico y financiero del proyecto durante el periodo de ejecución. Como resultado de estos avances, el contratista presentó cuatro (4) actas parciales de cobro, debidamente soportadas conforme a las cantidades ejecutadas y verificadas en campo por la interventoría.

Con corte al cierre de ejecución del proyecto, se evidencia un avance financiero equivalente al 99,91 % del valor contractual, reflejando un nivel de cumplimiento prácticamente total respecto a las actividades programadas y ejecutadas en el marco del contrato. En términos económicos, se registra un valor total ejecutado correspondiente a la suma de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 4.155.666.199,50), valor que corresponde a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, verificadas y avaladas por la interventoría conforme a los soportes técnicos, administrativos y financieros del proyecto.

Como resultado del balance final de ejecución contractual, se determinó un saldo a favor de la entidad por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON QUINCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.678.511,15), evidenciando un cierre financiero ajustado y acorde con las cantidades efectivamente desarrolladas durante la ejecución de la obra.

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**OBSERVACIÓN**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.159.344.710,65	Sin adiciones financieras

3.4.1. BALANCE FINANCIERO

El balance financiero del contrato de obra evidencia la correspondencia entre el valor contractual inicial y los valores registrados en las actas de recibo y pago parcial.

Durante la ejecución del contrato, el contratista de obra ha presentado a la entidad contratante cuatro (04) actas de recibo y pago parcial correspondientes al avance físico y financiero de la obra.

A la fecha de corte, se evidencia una ejecución financiera acumulada por valor de cuatro mil ciento cincuenta y cinco millones seiscientos sesenta y seis mil ciento noventa y nueve pesos con cincuenta centavos moneda corriente ($ 4.155.666.199,50), equivalente al 99,91 % del valor total contractual. En consecuencia, se establece un saldo a favor de la entidad por valor de tres millones seiscientos setenta y ocho mil quinientos once pesos con quince centavos moneda corriente ($ 3.678.511,15).

A continuación, se relacionan las actas parciales cobradas por parte del contratista de obra, correspondientes a los pagos tramitados ante la entidad contratante:

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
DETALLE	N. DE ACTA	VALOR PARCIAL SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN
RECIBO Y PAGO PARCIAL No. 1	2	$ 959.790.664,67	$ 7.013.854,86	$ 966.804.519,53	23,24 %
RECIBO Y PAGO PARCIAL No. 2	3	$ 2.021.173.617,02	$ 14.770.114,89	$ 2.035.943.731,91	72,19 %
RECIBO Y PAGO PARCIAL No. 3	4	$ 586.045.771,90	$ 4.282.642,18	$ 590.328.414,08	86,39 %
RECIBO Y PAGO PARCIAL No. 4	5	$ 558.508.128,42	$ 4.081.405,56	$ 562.589.533,98	99,91 %
TOTAL COBRADO	**NA**	**$ 4.125.518.182,01**	**$ 30.148.017,49**	**$ 4.155.666.199,50**	99,91 %
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD				$ 3.678.511,15	0,09%
SUMAS IGUALES				**$ 4.159.344.710 ,65**	**100%**

3.4.2. VALOR DE EJECUCIÓN POR AVANCE DE OBRA

Este apartado presenta el seguimiento mensual del avance físico y financiero del contrato, detallando para cada periodo las fechas de corte, el porcentaje de ejecución alcanzado y el valor ejecutado correspondiente. Esta información permite visualizar de manera clara la evolución del proyecto y verificar la coherencia entre el progreso reportado y los recursos aplicados mes a mes:

EJECUCIÓN POR AVANCE DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	PERIODO	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
AVANCE No. 1	15/10/2025 al 31/10/2025	0,56%	$ 23.193.255,29
AVANCE No. 2	01/11/2025 al 30/11/2025	22,69%	$ 943.611.264,24
AVANCE No. 3	01/12/2025 al 31/12/2025	22,62%	$ 940.804.159,48
AVANCE No. 4	01/01/2026 al 31/01/2026	26,33%	$ 1.095.139.572,43
AVANCE No. 5	01/02/2026 al 28/02/2026	14,19%	$ 590.328.414,08
AVANCE No. 6	01/03/2026 al 31/03/2026	11,70%	$ 486.814.393,38
AVANCE No. 7	14/04/2026 al 14/04/2026	1,82%	$ 75.775.140,60
ACUMULADO EJECUTADO		**99,91%**	**$ 4.155.666.199,50**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		**0.09%**	**$ 3.678.511,15**
VALOR DEL CONTRATO		**100%**	**$ 4.159.344.710,65**

3.5. PROGRAMA DE INVERSIONES

Durante la ejecución del contrato, comprendida entre el 15 de octubre de 2025 y el 14 de abril de 2026, el proyecto presentó un avance físico programado del cien por ciento (100 %), mientras que el avance

físico ejecutado alcanzó el 99,91 %, evidenciándose una diferencia equivalente al cero coma cero nueve por ciento (0,09 %) respecto de la meta establecida. No obstante, el comportamiento general de la ejecución refleja un nivel de cumplimiento altamente satisfactorio frente a las actividades previstas contractualmente.

La variación identificada corresponde a un saldo a favor de la entidad por valor de tres millones seiscientos setenta y ocho mil quinientos once pesos con quince centavos moneda corriente ($ 3.678.511,15), asociado a actividades cuya ejecución no se materializó en su totalidad dentro del periodo evaluado, razón por la cual dicho valor permanece pendiente dentro del balance final del contrato.

3.6. ANÁLISIS DEL PLAZO CONTRACTUAL

La ejecución formal del contrato de obra inició el 15 de octubre de 2025, conforme al Acta No. 1 de inicio, estableciéndose un plazo contractual de seis (6) meses calendario, sin prórrogas aprobadas. En consecuencia, la fecha de terminación se fijó para el 14 de abril de 2026, equivalente a 182 días calendario, sobre cuya base se realizó el análisis del avance físico, financiero y cronológico del proyecto para verificar el cumplimiento de las actividades y metas contractuales.

ANÁLISIS DE TIEMPO CONTRACTUAL			
DESCRIPCIÓN	**UND**	**CANTIDAD**	**PORCENTAJE**
PLAZO ACTUALIZADO	DIAS	182	100%
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIAS	182	100,00%
TIEMPO POR EJECUTAR	DIAS	0	0,00%

- **El plazo actualizado del contrato de obra*:*** corresponde al periodo contractual tiempo que, al contabilizarse día a día, incluyendo la fecha de inicio, equivale a un total de **182 días calendario**, lo que representa el **100%** del tiempo contractual vigente.
- **El tiempo de ejecución acumulado:** corresponde al periodo comprendido entre el 15 de octubre 2025 al 14 abril 2026, se registra un total de **182 días calendario**, equivalente al **100%** del plazo total actualizado. Este valor refleja el tiempo transcurrido desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte, dentro del cual se han desarrollado las actividades de obra.
- **El tiempo por ejecución:** El contrato cuenta con **0 días por ejecutar**, que representan el **0.00%** del plazo contractual llegando hasta la fecha límite de terminación establecida para el 14 de abril de 2026, culminando de manera satisfactoria el contrato, en cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y contractuales previstas.

3.7. RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

A continuación, se presenta la relación del personal que ha sido vinculado para la ejecución del contrato en mención, el cual permanece activo hasta la fecha de corte del presente informe. La vinculación de este recurso humano responde a las necesidades operativas, técnicas y administrativas requeridas para el cumplimiento del objeto contractual, garantizando así la adecuada ejecución de las actividades programadas.

Con el propósito de facilitar una mejor comprensión de la estructura de personal asignada, se ha dispuesto la información en dos cuadros diferenciados, los cuales discriminan entre:

3.7.1. PERSONAL CONTRACTUAL

Es el **personal calificado** que corresponde al recurso humano con formación profesional, cuya función está directamente relacionada con labores de coordinación, supervisión, control, ejecución especializada y demás actividades que requieren conocimientos específicos y experiencia comprobada en el área correspondiente:

PERSONAL CONTRACTUAL				
N.	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**EMPRESA**
1	EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO	72.254.372	DIRECTOR DE OBRA	CONAINCO S.A.S.
2	OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	1.098.756.647	RESIDENTE DE OBRA	INFRACORP S.A.
3	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	1.095.700.657	GEOTECNISTA	INDEPENDIENTE
4	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	1.098.618.429	ASESOR AMBIENTAL	INDEPENDIENTE
5	CLARA MELISSA DONADO ARIAS	1.098.704.436	PROFESIONAL SISO	INFRACORP S.A. CONAINCO S.A.S.
6	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	80.089.079	PMP	INDEPENDIENTE

3.7.2. PERSONAL OPERATIVO

Se trata del **personal de apoyo operativo** en campo, comúnmente clasificado como mano de obra no calificada; este equipo se encarga de ejecutar labores prácticas y operativas fundamentales para el avance del proyecto, sin que necesariamente se requiera una formación académica formal para la mayoría de sus integrantes.

El personal ha sido seleccionado atendiendo a criterios de experiencia práctica, disponibilidad y a las necesidades específicas del proyecto, garantizando así su aporte efectivo en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

PERSONAL VINCULADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN			
N.	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**
1	SERGIO RANGEL JIMÉNEZ	**1.095.786.737**	ALMACENISTA
2	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	1.098.605.491	ALMACENISTA
3	ISAÍ BAUTISTA PINZÓN	1.096.193.312	OPERADOR DE PERFORACIÓN I
4	ISAÍAS GARCÍA JAIMES	1.101.596.200	OPERADOR DE PERFORACIÓN I
5	JARRINSON STEVEN CAMARÓN CAICEDO	1.232.891.906	AYUDANTE DE PERFORACIÓN II
6	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIÁN	1.124.048.478	AYUDANTE DE PERFORACIÓN II
7	JESÚS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	1.101.520.618	AYUDANTE DE OBRA
8	ELISEO SÁNCHEZ CARVAJAL	91.343.755	AYUDANTE DE OBRA
9	WILLINGTON ALARCON ASCANIO	91.479.571	AYUDANTE DE PERFORACIÓN II
10	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	1.082.871.247	AYUDANTE DE OBRA
11	GIOVANY SEBASTIÁN PARRA FERRER	1.005.157.855	AYUDANTE DE OBRA
12	YOHAN ALEXANDER CACERES PABÓN	1.102.383.713	AYUDANTE DE OBRA
INFRACORP S.A.			
N.	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**
13	ALEX PRADA LÓPEZ	13.537.319	OFICIAL
14	FABIAN ZAMBRANO LESMES	1.098.673.915	TOPOGRAFO
15	SANDRA YOLIMA BERMUDEZ CALA	63.553.613	PROFESIONAL AMBIENTAL
DESARROLLO DE INGENIERÍA Y CONSULTORIA			
N.	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**
16	WILSON MANTILLA	13.544.381	OPERADOR MINICARGADOR
17	RUBEN DARIO DELGADO PALACIO	1.098.703.436	CONDUCTOR
18	DUCAN BUITRAGO RAMIREZ	9.357.094	OPERADOR DE MAQUINARIA

3.8. RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La maquinaria y equipos empleados en el desarrollo de las actividades correspondientes al contrato en referencia ha sido seleccionada de acuerdo con los requerimientos técnicos y operativos establecidos en el cronograma de ejecución. Dicha maquinaria ha permitido garantizar la eficiencia, continuidad y calidad en la ejecución de las diferentes fases del proyecto.

A continuación, se discrimina en el siguiente cuadro la relación de los equipos y maquinaria utilizada en el desarrollo del presente contrato, indicando la cantidad asignada durante la ejecución del mismo:

MAQUINARIA/ EQUIPO
ESTACIÓN TOPOGRÁFICA

RETROEXCAVADORA
VOLQUETAS
COMPRESOR DE AIRE
EQUIPO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL
MINICARGADOR
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO
UNIDAD DE INYECCIÓN
MIXER
MOTOBOMBA
BOMBA PERISTÁLTICA
EQUIPO DE TENSIONAMIENTO INCLUYE GATO HIDRAULICO

MAQUINARIA Y EQUIPO	
	
Equipos topográficos	
	
Retroexcavadora	Volquetas & Minicargador

	
Unidades de perforación horizontal	
	
Compresores de aire	
	
Mezcladora de concreto	Unidad de inyección

	
Mixer	Bomba peristáltica
	
Unidad de inyección	Bomba peristáltica
	
Gato de tensionamiento	Equipo hidráulico de tensionamiento

4. PRESUPUESTRO CONTRACTUAL – CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER

ITEM	CONCEPTO	CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA					
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$ 11.584.277,00	$ 11.584.277,00
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$ 2.664.417,00	$ 2.664.417,00
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	840,00	$ 5.453,00	$ 4.580.520,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	168,00	$ 86.609,00	$ 14.550.312,00
1.07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m^3	539,21	$ 257.918,00	$ 139.071.964,78
				SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:	**$ 172.451.490,78**
SECCIÓN SEGUNDA					
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	1.078,41	$ 49.921,00	$ 53.835.305,61
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	718,94	$ 91.187,00	$ 65.557.981,78
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3	29,00	$ 253.569,00	$ 7.353.501,00
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	26.614,8	$ 3.988,00	$ 106.139.822,40
				SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:	**$ 232.886.610,79**
SECCIÓN TERCERA					
3,00	Concretos				
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3	29,00	$ 1.089.450,00	$ 31.594.050,00
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2	840,00	$ 380.247,00	$ 319.407.480,00
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	87,00	$ 1.156.977,00	$ 100.656.999,00
				SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:	**$ 451.658.529,00**
SECCIÓN CUARTA					
4,00	Aceros				
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	5.807,00	$ 12.098,00	$ 70.253.086,00
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	144,00	$ 1.085.176,00	$ 156.265.344,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	144,00	$ 57.240,00	$ 8.242.560,00
4.04	Suministro y colocación				
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2	840,00	$ 37.001,00	$ 31.080.840,00
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	144,00	$ 82.440,00	$ 11.871.360,00
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	144,00	$ 158.039,00	$ 22.757.616,00
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	144,00	$ 96.886,00	$ 13.951.584,00
				SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:	**$ 314.422.390,00**
SECCIÓN QUINTA					
5,00	Perforaciones horizontales				
5.04	Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con	m	2.160,00	$ 510.989,00	$ 1.103.736.240,00
5.05	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.440,00	$ 585.973,00	$ 843.801.120,00
				SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:	**$ 1.947.537.360,00**
SECCIÓN SEXTA					
6,00	Varios				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	132,00	$ 134.615,00	$ 17.769.180,00
6.04	Estructura de disipación de energía	m	14,00	$ 634.862,00	$ 8.888.068,00
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	408,00	$ 75.174,00	$ 30.670.992,00
				SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:	**$ 57.328.240,00**
	Presupuesto Costos directos				**$ 3.176.284.620,57**
	Administración:			$ 0,24	$ 762.308.308,94
	Imprevistos			$ 0,01	$ 31.762.846,21
	Utilidades:			$ 0,05	$ 158.814.231,03
	A.I.U.:			$ 0,30	$ 952.885.386,18
	I.V.A.			$ 0,19	$ 30.174.703,90
	Presupuesto total de obra				**$ 4.159.344.710,65**

5. AVANCE FINANCIERO MENSUAL

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER

ITEM	CONCEPTO	CONDICIONES CONTRACTUALES				AVANCE No. 1 15/10/25 AL 31/10/25		AVANCE No. 2 01/11/25 AL 30/11/25	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA									
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$ 11.584.277,00	$ 11.584.277,00	0,08	$ 926.742,16	0,17	$ 1.969.327,09
1.03	Vallas y señales especiales								
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$ 2.664.417,00	$ 2.664.417,00	1,00	$ 2.664.417,00		$ -
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	840,00	$ 5.453,00	$ 4.580.520,00	620,00	$ 3.380.860,00	220,00	$ 1.199.660,00
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	168,00	$ 86.609,00	$ 14.550.312,00	124,00	$ 10.739.516,00	44,00	$ 3.810.796,00
1.07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m^3	539,21	$ 257.918,00	$ 139.071.964,78			539,20	$ 139.069.385,60
				SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:	**$ 172.451.490,78**		**$ 17.711.535,16**		**$ 146.049.168,69**
SECCIÓN SEGUNDA									
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes								
2.01.A	Excavación con acarreo libre								
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	1.078,41	$ 49.921,00	$ 53.835.305,61		$ -	1075,20	$ 53.675.059,20
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	718,94	$ 91.187,00	$ 65.557.981,78		$ -	718,00	$ 65.472.266,00
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3	29,00	$ 253.569,00	$ 7.353.501,00		$ -		$ -
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	26.614,8	$ 3.988,00	$ 106.139.822,40		$ -	26268,48	$ 104.758.698,24
				SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:	**$ 232.886.610,79**		**$ -**		**$ 223.906.023,44**
SECCIÓN TERCERA									
3,00	Concretos								
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3	29,00	$ 1.089.450,00	$ 31.594.050,00		$ -		$ -
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2	840,00	$ 380.247,00	$ 319.407.480,00		$ -		$ -
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	87,00	$ 1.156.977,00	$ 100.656.999,00		$ -		$ -
				SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:	**$ 451.658.529,00**		**$ -**		**$ -**
SECCIÓN CUARTA									
4,00	Aceros								
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	5.807,00	$ 12.098,00	$ 70.253.086,00		$ -		$ -
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	144,00	$ 1.085.176,00	$ 156.265.344,00		$ -	24,00	$ 26.044.224,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	144,00	$ 57.240,00	$ 8.242.560,00		$ -		$ -
4.04	Suministro y colocación								
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2	840,00	$ 37.001,00	$ 31.080.840,00		$ -		$ -
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	144,00	$ 82.440,00	$ 11.871.360,00		$ -		$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	144,00	$ 158.039,00	$ 22.757.616,00		$ -		$ -
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	144,00	$ 96.886,00	$ 13.951.584,00		$ -		$ -
				SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:	**$ 314.422.390,00**		**$ -**		**$ 26.044.224,00**
SECCIÓN QUINTA									
5,00	Perforaciones horizontales								
5.04	Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	2.160,00	$ 510.989,00	$ 1.103.736.240,00		$ -	360,00	$ 183.956.040,00
5.05	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.440,00	$ 585.973,00	$ 843.801.120,00		$ -	240,00	$ 140.633.520,00
				SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:	**$ 1.947.537.360,00**		**$ -**		**$ 324.589.560,00**
SECCIÓN SEXTA									
6,00	Varios								
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	132,00	$ 134.615,00	$ 17.769.180,00		$ -		$ -
6.04	Estructura de disipación de energía	m	14,00	$ 634.862,00	$ 8.888.068,00		$ -		$ -
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	408,00	$ 75.174,00	$ 30.670.992,00		$ -		$ -
				SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:	**$ 57.328.240,00**		**$ -**		**$ -**
	Presupuesto Costos directos				**$ 3.176.284.620,57**		**$ 17.711.535,16**		**$ 720.588.976,13**
	Administración:			$ 0,24	$ 762.308.308,94		$ 4.250.768,44		$ 172.941.354,27
	Imprevistos			$ 0,01	$ 31.762.846,21		$ 177.115,35		$ 7.205.889,76
	Utilidades:			$ 0,05	$ 158.814.231,03		$ 885.576,76		$ 36.029.448,81
	A.I.U.:			$ 0,30	$ 952.885.386,18		$ 5.313.460,55		$ 216.176.692,84
	I.V.A.			$ 0,19	$ 30.174.703,90		$ 168.259,58		$ 6.845.595,27
	Presupuesto total de obra				**$ 4.159.344.710,65**		**$ 23.193.255,29**		**$ 943.611.264,24**
							0,56%		**22,69%**

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER

ITEM	CONCEPTO	CONDICIONES CONTRACTUALES				AVANCE No. 3 01/12/25 AL 31/12/25		AVANCE No. 4 01/01/26 AL 31/01/26	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA									
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$ 11.584.277,00	$ 11.584.277,00	0,17	$ 1.969.327,09	0,17	$ 1.969.327,09
1.03	Vallas y señales especiales								
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$ 2.664.417,00	$ 2.664.417,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	840,00	$ 5.453,00	$ 4.580.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	168,00	$ 86.609,00	$ 14.550.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m^3	539,21	$ 257.918,00	$ 139.071.964,78	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:	**$ 172.451.490,78**		**$ 1.969.327,09**		**$ 1.969.327,09**
SECCIÓN SEGUNDA									
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes								
2.01.A	Excavación con acarreo libre								
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	1.078,41	$ 49.921,00	$ 53.835.305,61	0,00	$ -	0,00	$ -
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	718,94	$ 91.187,00	$ 65.557.981,78	0,00	$ -	0,00	$ -
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3	29,00	$ 253.569,00	$ 7.353.501,00	0,00	$ -	20,00	$ 5.071.380,00
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	26.614,8	$ 3.988,00	$ 106.139.822,40	0,00	$ -	208,00	$ 829.504,00
				SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:	**$ 232.886.610,79**		**$ -**		**$ 5.900.884,00**
SECCIÓN TERCERA									
3,00	Concretos								
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3	29,00	$ 1.089.450,00	$ 31.594.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2	840,00	$ 380.247,00	$ 319.407.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	87,00	$ 1.156.977,00	$ 100.656.999,00	38,40	$ 44.427.916,80	28,80	$ 33.320.937,60
				SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:	**$ 451.658.529,00**		**$ 44.427.916,80**		**$ 33.320.937,60**
SECCIÓN CUARTA									
4,00	Aceros								
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	5.807,00	$ 12.098,00	$ 70.253.086,00		$ -	2419,20	$ 29.267.481,60
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	144,00	$ 1.085.176,00	$ 156.265.344,00	46,00	$ 49.918.096,00	52,00	$ 56.429.152,00
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	144,00	$ 57.240,00	$ 8.242.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.04	Suministro y colocación								
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2	840,00	$ 37.001,00	$ 31.080.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	144,00	$ 82.440,00	$ 11.871.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	144,00	$ 158.039,00	$ 22.757.616,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	144,00	$ 96.886,00	$ 13.951.584,00		$ -		$ -
				SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:	**$ 314.422.390,00**		**$ 49.918.096,00**		**$ 85.696.633,60**
SECCIÓN QUINTA									
5,00	Perforaciones horizontales								
5.04	Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	2.160,00	$ 510.989,00	$ 1.103.736.240,00	690,00	$ 352.582.410,00	780,00	$ 398.571.420,00
5.05	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.440,00	$ 585.973,00	$ 843.801.120,00	460,00	$ 269.547.580,00	520,00	$ 304.705.960,00
				SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:	**$ 1.947.537.360,00**		**$ 622.129.990,00**		**$ 703.277.380,00**
SECCIÓN SEXTA									
6,00	Varios								
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	132,00	$ 134.615,00	$ 17.769.180,00	0,00	$ -	45,60	$ 6.138.444,00
6.04	Estructura de disipación de energía	m	14,00	$ 634.862,00	$ 8.888.068,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	408,00	$ 75.174,00	$ 30.670.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:	**$ 57.328.240,00**		**$ -**		**$ 6.138.444,00**
	Presupuesto Costos directos				**$ 3.176.284.620,57**		**$ 718.445.329,89**		**$ 836.303.606,29**
	Administración:			$ 0,24	$ 762.308.308,94		$ 172.426.879,17		$ 200.712.865,51
	Imprevistos			$ 0,01	$ 31.762.846,21		$ 7.184.453,30		$ 8.363.036,06
	Utilidades:			$ 0,05	$ 158.814.231,03		$ 35.922.266,49		$ 41.815.180,31
	A.I.U.:			$ 0,30	$ 952.885.386,18		$ 215.533.598,96		$ 250.891.081,88
	I.V.A.			$ 0,19	$ 30.174.703,90		$ 6.825.230,63		$ 7.944.884,26
	Presupuesto total de obra				**$ 4.159.344.710,65**		**$ 940.804.159,48**		**$ 1.095.139.572,43**
							22,62%		**26,33%**

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER

ITEM	CONCEPTO	CONDICIONES CONTRACTUALES				AVANCE No. 5 01/02/26 AL 28/02/26		AVANCE No. 6 01/02/26 AL 31/03/26	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
SECCIÓN PRIMERA									
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$ 11.584.277,00	$ 11.584.277,00	0,16	$ 1.853.484,32	0,16	$ 1.853.484,32
1.03	Vallas y señales especiales								
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$ 2.664.417,00	$ 2.664.417,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	840,00	$ 5.453,00	$ 4.580.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	168,00	$ 86.609,00	$ 14.550.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m^3	539,21	$ 257.918,00	$ 139.071.964,78	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:	**$ 172.451.490,78**		**$ 1.853.484,32**		**$ 1.853.484,32**
SECCIÓN SEGUNDA									
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes								
2.01.A	Excavación con acarreo libre								
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	1.078,41	$ 49.921,00	$ 53.835.305,61	0,00	$ -	0,00	$ -
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	718,94	$ 91.187,00	$ 65.557.981,78	0,00	$ -	0,00	$ -
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3	29,00	$ 253.569,00	$ 7.353.501,00	8,80	$ 2.231.407,20	0,00	$ -
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	26.614,8	$ 3.988,00	$ 106.139.822,40	91,52	$ 364.981,76	0,00	$ -
				SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:	**$ 232.886.610,79**		**$ 2.596.388,96**		**$ -**
SECCIÓN TERCERA									
3,00	Concretos								
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3	29,00	$ 1.089.450,00	$ 31.594.050,00	0,00	$ -	28,80	$ 31.376.160,00
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2	840,00	$ 380.247,00	$ 319.407.480,00	0,00	$ -	840,00	$ 319.407.480,00
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	87,00	$ 1.156.977,00	$ 100.656.999,00	19,20	$ 22.213.958,40	0,00	$ -
				SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:	**$ 451.658.529,00**		**$ 22.213.958,40**		**$ 350.783.640,00**
SECCIÓN CUARTA									
4,00	Aceros								
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	5.807,00	$ 12.098,00	$ 70.253.086,00	3386,88	$ 40.974.474,24	0,00	$ -
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	144,00	$ 1.085.176,00	$ 156.265.344,00	22,00	$ 23.873.872,00	0,00	$ -
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	144,00	$ 57.240,00	$ 8.242.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.04	Suministro y colocación								
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2	840,00	$ 37.001,00	$ 31.080.840,00	840,00	$ 31.080.840,00	0,00	$ -
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	144,00	$ 82.440,00	$ 11.871.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	144,00	$ 158.039,00	$ 22.757.616,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	144,00	$ 96.886,00	$ 13.951.584,00		$ -		$ -
				SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:	**$ 314.422.390,00**		**$ 95.929.186,24**		**$ -**
SECCIÓN QUINTA									
5,00	Perforaciones horizontales								
5.04	Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	2.160,00	$ 510.989,00	$ 1.103.736.240,00	330,00	$ 168.626.370,00	0,00	$ -
5.05	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.440,00	$ 585.973,00	$ 843.801.120,00	220,00	$ 128.914.060,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:	**$ 1.947.537.360,00**		**$ 297.540.430,00**		**$ -**
SECCIÓN SEXTA									
6,00	Varios								
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	132,00	$ 134.615,00	$ 17.769.180,00	0,00	$ -	76,00	$ 10.230.740,00
6.04	Estructura de disipación de energía	m	14,00	$ 634.862,00	$ 8.888.068,00	0,00	$ -	14,00	$ 8.888.068,00
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	408,00	$ 75.174,00	$ 30.670.992,00	408,00	$ 30.670.992,00	0,00	$ -
				SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:	**$ 57.328.240,00**		**$ 30.670.992,00**		**$ 19.118.808,00**
	Presupuesto Costos directos				**$ 3.176.284.620,57**		**$ 450.804.439,92**		**$ 371.755.932,32**
	Administración:			$ 0,24	$ 762.308.308,94		$ 108.193.065,58		$ 89.221.423,76
	Imprevistos			$ 0,01	$ 31.762.846,21		$ 4.508.044,40		$ 3.717.559,32
	Utilidades:			$ 0,05	$ 158.814.231,03		$ 22.540.222,00		$ 18.587.796,62
	A.I.U.:			$ 0,30	$ 952.885.386,18		$ 135.241.331,98		$ 111.526.779,70
	I.V.A.			$ 0,19	$ 30.174.703,90		$ 4.282.642,18		$ 3.531.681,36
	Presupuesto total de obra				**$ 4.159.344.710,65**		**$ 590.328.414,08**		**$ 486.814.393,38**
							14,19%		**11,70%**

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER

ITEM	CONCEPTO	CONDICIONES CONTRACTUALES				AVANCE No. 7 01/04/26 AL 14/04/26		ACUMULADO		%
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	
SECCIÓN PRIMERA										
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$ 11.584.277,00	$ 11.584.277,00	0,09	$ 1.042.584,93	1,00	$ 11.584.277,00	100,00%
1.03	Vallas y señales especiales									
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$ 2.664.417,00	$ 2.664.417,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.664.417,00	100,00%
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	840,00	$ 5.453,00	$ 4.580.520,00	0,00	$ -	840,00	$ 4.580.520,00	100,00%
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	168,00	$ 86.609,00	$ 14.550.312,00	0,00	$ -	168,00	$ 14.550.312,00	100,00%
1.07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m^3	539,21	$ 257.918,00	$ 139.071.964,78	0,00	$ -	539,20	$ 139.069.385,60	99,998%
	SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:				**$ 172.451.490,78**		**$ 1.042.584,93**		**$ 172.448.911,60**	**100,00%**
SECCIÓN SEGUNDA										
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes									
2.01.A	Excavación con acarreo libre									
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	1.078,41	$ 49.921,00	$ 53.835.305,61	0,00	$ -	1075,20	$ 53.675.059,20	99,70%
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	718,94	$ 91.187,00	$ 65.557.981,78	0,00	$ -	718,00	$ 65.472.266,00	99,87%
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3	29,00	$ 253.569,00	$ 7.353.501,00	0,00	$ -	28,80	$ 7.302.787,20	99,31%
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	26.614,8	$ 3.988,00	$ 106.139.822,40	0,00	$ -	26568,00	$ 105.953.184,00	99,82%
	SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:				**$ 232.886.610,79**		**$ -**		**$ 232.403.296,40**	**99,79%**
SECCIÓN TERCERA										
3,00	Concretos									
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3	29,00	$ 1.089.450,00	$ 31.594.050,00	0,00	$ -	28,80	$ 31.376.160,00	99,31%
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2	840,00	$ 380.247,00	$ 319.407.480,00	0,00	$ -	840,00	$ 319.407.480,00	100,00%
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	87,00	$ 1.156.977,00	$ 100.656.999,00	0,00	$ -	86,40	$ 99.962.812,80	99,31%
	SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:				**$ 451.658.529,00**		**$ -**		**$ 450.746.452,80**	**99,80%**
SECCIÓN CUARTA										
4,00	Aceros									
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	5.807,00	$ 12.098,00	$ 70.253.086,00	0,00	$ -	5806,08	$ 70.241.955,84	99,98%
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	144,00	$ 1.085.176,00	$ 156.265.344,00	0,00	$ -	144,00	$ 156.265.344,00	100,00%
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	144,00	$ 57.240,00	$ 8.242.560,00	144,00	$ 8.242.560,00	144,00	$ 8.242.560,00	100,00%
4.04	Suministro y colocación								$ -	
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2	840,00	$ 37.001,00	$ 31.080.840,00		$ -	840,00	$ 31.080.840,00	100,00%
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	144,00	$ 82.440,00	$ 11.871.360,00	144,00	$ 11.871.360,00	144,00	$ 11.871.360,00	100,00%
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	144,00	$ 158.039,00	$ 22.757.616,00	144,00	$ 22.757.616,00	144,00	$ 22.757.616,00	100,00%
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	144,00	$ 96.886,00	$ 13.951.584,00	144,00	$ 13.951.584,00	144,00	$ 13.951.584,00	100,00%
	SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:				**$ 314.422.390,00**		**$ 56.823.120,00**		**$ 314.411.259,84**	**100,00%**
SECCIÓN QUINTA										
5,00	Perforaciones horizontales									
5.04	Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	2.160,00	$ 510.989,00	$ 1.103.736.240,00	0,00	$ -	2160,00	$ 1.103.736.240,00	100,00%
5.05	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.440,00	$ 585.973,00	$ 843.801.120,00	0,00	$ -	1440,00	$ 843.801.120,00	100,00%
	SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:				**$ 1.947.537.360,00**		**$ -**		**$ 1.947.537.360,00**	**100,00%**
SECCIÓN SEXTA										
6,00	Varios									
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	132,00	$ 134.615,00	$ 17.769.180,00	0,00	$ -	121,60	$ 16.369.184,00	92,12%
6.04	Estructura de disipación de energía	m	14,00	$ 634.862,00	$ 8.888.068,00	0,00	$ -	14,00	$ 8.888.068,00	100,00%
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	408,00	$ 75.174,00	$ 30.670.992,00	0,00	$ -	408,00	$ 30.670.992,00	100,00%
	SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:				**$ 57.328.240,00**		**$ -**		**$ 55.928.244,00**	
	Presupuesto Costos directos				**$ 3.176.284.620,57**		**$ 57.865.704,93**		**$ 3.173.475.524,64**	**99,91%**
	Administración:			$ 0,24	$ 762.308.308,94		$ 13.887.769,18		$ 761.634.125,90	
	Imprevistos			$ 0,01	$ 31.762.846,21		$ 578.657,05		$ 31.734.755,25	
	Utilidades:			$ 0,05	$ 158.814.231,03		$ 2.893.285,24		$ 158.673.776,23	
	A.I.U.:			$ 0,30	$ 952.885.386,18		$ 17.359.711,47		$ 952.042.657,38	
	I.V.A.			$ 0,19	$ 30.174.703,90		$ 549.724,20		$ 30.148.017,48	
	Presupuesto total de obra				**$ 4.159.344.710,65**		**$ 75.775.140,60**		**$ 4.155.666.199,50**	**99,91%**
							1,82%		99,91%	

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA PÚBLICA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Durante el periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2025 y el 14 de abril de 2026, el contratista ejecutó de manera continua y progresiva las actividades correspondientes al objeto contractual, orientadas a la estabilización del talud y al control de los procesos de erosión presentes en el área intervenida. En primera instancia, se desarrollaron actividades permanentes de topografía, destinadas al control, localización, replanteo y verificación de las diferentes actividades de obra, el seguimiento técnico de cotas, alineamientos, pendientes y niveles, así como el control de cantidades ejecutadas en campo.

De igual manera, se llevaron a cabo actividades de excavación en material granular y roca, necesarias para la conformación de la geometría requerida del talud. Los materiales resultantes de excavación fueron objeto de cargue, retiro, transporte y disposición final en sitios autorizados, en cumplimiento de las disposiciones técnicas y ambientales aplicables.

Como parte fundamental de las obras de estabilización, se ejecutaron actividades de perfilado y conformación del talud, con el propósito de otorgar la geomorfología requerida a la pantalla de estabilización, logrando intervenir un volumen total aproximado de ochocientos cuarenta metros cúbicos (840 m³). Estas labores permitieron mejorar las condiciones de estabilidad superficial del terreno, adecuando el área para la instalación de los elementos estructurales proyectados.

Posteriormente, se realizaron perforaciones horizontales para el suministro e instalación de anclajes activos de veinticinco metros (25 m) de longitud, elementos diseñados para transferir esfuerzos y proporcionar estabilidad al macizo rocoso. Complementariamente, se ejecutaron excavaciones de cajas para zapatas, junto con el armado e instalación de parrillas de acero de refuerzo, así como la instalación de malla electrosoldada en la superficie del talud a estabilizar; elementos necesarios para el fortalecimiento estructural de las obras de soporte.

Asimismo, se implementó el sistema de abatimiento y conducción hidráulica para el manejo de infiltración interna, buscando reducir la presión hidrostática sobre el talud y minimizar factores de inestabilidad asociados a la saturación del terreno. Estas actividades se complementaron con la construcción de obras destinadas al control y manejo del sistema hidráulico superficial, incluyendo la ejecución de tramos de canaleta de corona y pie de talud, cajas de recolección y distribución de aguas, así como la construcción de un disipador de energía, orientadas a garantizar el adecuado manejo de escorrentías, reducir procesos erosivos y contribuir a la estabilidad del área intervenida.

Finalmente, se ejecutó el suministro y aplicación de concreto lanzado sobre el área intervenida del talud y las zapatas, consolidando la protección superficial de la pantalla de estabilización y aportando rigidez al sistema estructural. De igual forma, se efectuaron labores de tensionamiento de anclajes,

verificando el adecuado comportamiento mecánico del sistema instalado y asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas para la estabilidad integral de la intervención.

En términos generales, las actividades desarrolladas permitieron la materialización de las obras proyectadas, cumpliendo con las condiciones técnicas, funcionales y de seguridad requeridas para la estabilización del área intervenida.

El contratista de obra adelantó actividades de cierre y terminación en la zona intervenida, incluyendo adecuaciones en las áreas perimetrales como acciones complementarias orientadas al mejoramiento paisajístico y al confinamiento de terrenos en la base del talud, con el propósito de prevenir el arrastre de material y favorecer la estabilidad del área. Asimismo, se realizó el desmonte de la valla informativa, el retiro de insumos y elementos asociados al campamento, así como jornadas de orden, aseo y limpieza general del frente de obra, contribuyendo a la organización, recuperación y entrega del área intervenida en óptimas condiciones de funcionamiento y presentación.

Las actividades contractuales fueron ejecutadas en conformidad con lo establecido en el contrato de obra, siguiendo los lineamientos técnicos, administrativos y ambientales definidos en el mismo. Dichas labores se desarrollaron bajo la permanente supervisión, seguimiento y control técnico de los profesionales asignados por la interventoría, quienes verificaron el cumplimiento de las exigencias técnicas, el uso adecuado de materiales, el avance físico programado y el cumplimiento de las medidas de seguridad y normativas ambientales vigentes.

El presupuesto de obra se encuentra estructurado en seis secciones o capítulos, en los cuales se agrupan los ítems contractuales conforme a su naturaleza técnica y funcional. A continuación, se presenta la descripción de las actividades ejecutadas en cada uno de estos capítulos, correspondientes al periodo comprendido entre el 15 octubre 2025 al 14 abril 2026, de acuerdo con el avance físico reportado durante dicho intervalo:

6.1. SECCIÓN PRIMERA

En el período comprendido entre el 15 octubre 2025 al 14 abril 2026, el CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN ejecutó actividades correspondientes a la SECCIÓN PRIMERA.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN
SECCIÓN PRIMERA					
1.01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	1,00	100,00%
1.03	Vallas y señales especiales				
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	1,00	100,00%
1.04	Desmonte y limpieza	m^2	840,00	840,00	100,00%
1.05	Retiro de basuras y escombros	m^3	168,00	168,00	100,00%
1.07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m^3	539,21	539,20	99,998%

6.1.1. Ítem 1.01 - Replanteo, control y medición de obra

Durante la ejecución contractual se desarrollaron de manera permanente actividades topográficas de replanteo, control, seguimiento y medición de obra, iniciando con los levantamientos planimétricos y altimétricos de la zona de intervención, orientados a caracterizar la geomorfología del talud, determinar cotas, verificar pendientes y niveles hidráulicos, así como identificar las condiciones de estabilidad requeridas para la implantación y construcción de la pantalla anclada. Como parte de las actividades preliminares, se efectuó la georreferenciación de árboles y elementos ambientales preexistentes, la localización de la pantalla contigua existente y el reconocimiento de elementos de urbanismo e infraestructura cercanos, permitiendo evaluar interferencias, accesos, restricciones operativas y posibles afectaciones asociadas a la ejecución del proyecto.

De igual manera, durante el desarrollo de las actividades constructivas se realizó el replanteo topográfico permanente y el control geométrico de la obra, verificando alineamientos, niveles, pendientes, localización de perforaciones, conformación del talud, implantación de estructuras, sistema hidráulico y demás elementos ejecutados, garantizando la correcta correspondencia entre lo construido y lo establecido en los diseños y especificaciones técnicas del contrato. Asimismo, mediante el seguimiento técnico y las mediciones efectuadas en sitio, se verificó el avance físico del proyecto y se realizó la cuantificación de cantidades de obra ejecutadas, sirviendo de soporte técnico para la validación de los cortes de obra y los respectivos periodos de cobro parcial y final.

Finalmente, como parte del proceso de cierre y liquidación contractual, se adelantó el levantamiento y consolidación de la información técnica necesaria para la elaboración de los planos as built, verificando la correspondencia entre las condiciones finales ejecutadas y la documentación del proyecto, con el propósito de dejar registro de las obras efectivamente construidas. Todas estas actividades fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas, bajo seguimiento y revisión de la interventoría,

garantizando trazabilidad, control técnico y confiabilidad de la información generada durante la ejecución y terminación del contrato.

ITEM	1.01	DESCRIPCIÓN	REPLANTEO, CONTROL Y MEDICIÓN DE LA OBRA	UND: MES
				
				
				

6.1.2. <u>Ítem 1.03 - Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)</u>

Se instaló la valla informativa con las especificaciones principales del contrato, la cual fue ubicada estratégicamente cerca a la vía aledaña al frente de obra con el fin de asegurar su adecuada visibilidad

para la comunidad y los actores involucrados. La valla incluye información sobre la entidad contratante, el contratista de obra y la interventoría, además del objeto del contrato, plazos de ejecución y otros datos relevantes que permiten brindar transparencia sobre el desarrollo del proyecto.

Una vez finalizadas las actividades constructivas, se constató el desmantelamiento y entrega de la valla informativa a la entidad contratante, como parte de las actividades de cierre de la obra física.

ITEM	1.03.01.A	DESCRIPCIÓN	VALLA TIPO 1A (5,00M X 2,80 M)	UND: UND
			

6.1.3. *Ítem 1.04 - Desmonte y limpieza*

Se llevó a cabo el desmonte y la limpieza de un área total de 840 m² de área contractual a estabilizar. Estas actividades preliminares fueron ejecutadas con el fin de garantizar una adecuada visualización, diagnóstico y evaluación geotécnica del estado inicial del terreno, permitiendo identificar zonas de inestabilidad, material suelto, acumulaciones de residuos y elementos que pudieran interferir con los procesos de perfilamiento y adecuación del talud.

ITEM	1.04	DESCRIPCIÓN	DESMONTE Y LIMPIEZA	UND: M²
				




6.1.4. *Ítem 1.05 - Retiro de basuras y escombros*

Se ejecutaron actividades de retiro y limpieza de basuras, escombros y residuos preexistentes en el frente de obra, cubriendo la totalidad del área destinada a la construcción. Estas labores se efectuaron de manera previa al inicio de las actividades principales, con el propósito de eliminar cualquier elemento que pudiera interferir con el desarrollo adecuado y seguro de las obras.

La remoción de materiales se realizó mediante procedimientos combinados, empleando tanto medios mecánicos como labores manuales para zonas de difícil acceso. Para garantizar una correcta gestión ambiental, fue necesaria la implementación de una logística de clasificación de residuos, separación en sitio, cargue, transporte y disposición final en un lugar autorizado. Como soporte de estas acciones, se cuenta con los certificados de disposición final correspondiente al retiro de basuras y escombros.

ITEM	1.05	DESCRIPCIÓN	RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS	UND: M³
				

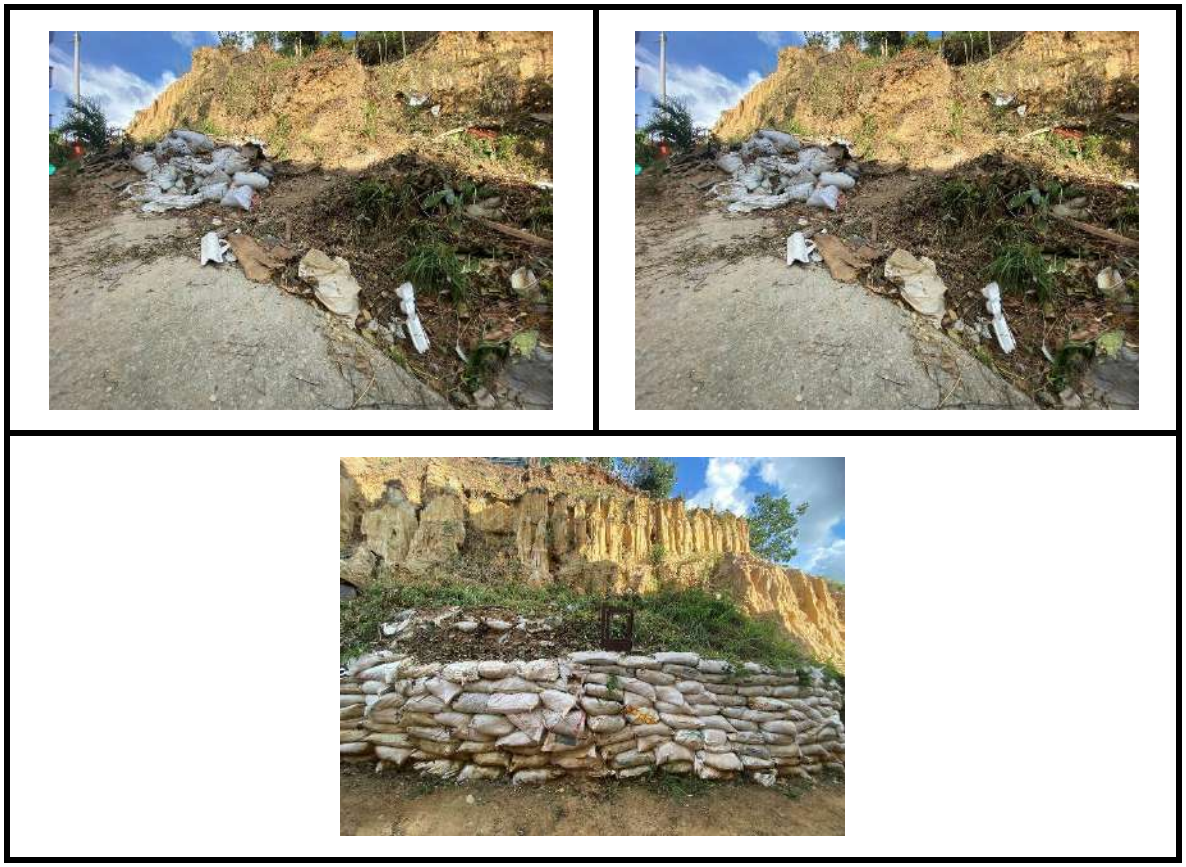

6.1.5. Ítem 1.07 - Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)

Durante la ejecución del contrato se realizaron actividades de remoción y perfilado del talud, orientadas a la adecuación geométrica y estabilización del área intervenida. Estas labores incluyeron la remoción de material superficial y material rocoso de mayor dureza, ejecutadas de manera controlada y bajo supervisión técnica, garantizando condiciones seguras para el desarrollo de las actividades y la estabilidad del área de trabajo.

Como resultado de estas intervenciones, se ejecutó el perfilado y conformación geomorfológica del talud, alcanzando un volumen total intervenido de 539,20 m³, permitiendo obtener una superficie uniforme y estable para la instalación de la pantalla anclada y la ejecución de las obras proyectadas conforme a los diseños y especificaciones técnicas.

El material producto de la remoción y excavación fue retirado, cargado, transportado y dispuesto en sitios autorizados, de acuerdo con los lineamientos técnicos y ambientales aplicables, contando con los soportes de disposición final correspondientes y garantizando el adecuado manejo de residuos generados durante la ejecución de la obra.

ITEM	1.07	DESCRIPCIÓN	PERFILADO A MANO DESCOLGADO DE TALUD (EN ROCA)	UND: M³





6.2. SECCIÓN SEGUNDA

En el período comprendido entre el 15 de octubre de 2025 y el 14 de abril de 2026, el CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN ejecutó actividades correspondientes a la SECCIÓN SEGUNDA.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN
SECCIÓN SEGUNDA					
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes				
2.01.A	Excavación con acarreo libre				
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m^3	1.078,41	1.075,20	99,70%
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m^3	718,94	718,00	99,87%
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m^3	29,00	28,80	99,31%
2.03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m^3-km	26.614,8	26.568,00	99,82%

6.2.1. Ítem 2.01.A.02 - Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad

Durante la ejecución del contrato, y una vez culminadas las actividades preliminares en el área de intervención, se adelantaron labores de excavación y remoción de material granular presente en el talud, utilizando maquinaria y equipos adecuados para este tipo de intervención, entre ellos retroexcavadora y volquetas, permitiendo la conformación y adecuación geométrica del área conforme a los requerimientos del proyecto. Estas actividades se desarrollaron bajo seguimiento técnico y cumpliendo las condiciones de seguridad requeridas para la operación en zonas de pendiente.

El material granular producto de la excavación fue cargado, retirado y transportado al sitio de disposición final autorizado El Carrasco, ubicado en la Bucaramanga, garantizando su manejo y disposición conforme a los lineamientos técnicos y ambientales aplicables. Este sitio opera bajo

tecnología de relleno sanitario y el material granular fue aprovechado en actividades operativas propias del relleno, entre ellas la cobertura diaria de celda.

Como soporte del proceso, se cuenta con los certificados de disposición final correspondientes al retiro de material, los cuales respaldan el cumplimiento de las obligaciones asociadas al manejo de residuos generados durante la ejecución de las actividades constructivas..

ITEM	2.01.A.02	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN CON ACARREO LIBRE EN MATERIAL GRANULAR A CUALQUIER PROFUNDIDAD	UND: M³
				

6.2.2. Ítem 2.01.A.03 - Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad

Durante la ejecución del contrato, y una vez desarrolladas las actividades preliminares en la zona de intervención, se realizaron labores de excavación controlada en material rocoso, con el propósito de adecuar geométricamente el talud y conformar una superficie estable y técnicamente apta para la ejecución de las obras de estabilización proyectadas. Debido a las condiciones geológicas del terreno, estas actividades requirieron el empleo de maquinaria y procedimientos específicos de excavación, garantizando el control del frente de trabajo, la estabilidad del talud y el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas para el proyecto.

A diferencia de las excavaciones realizadas en material granular, la intervención en roca demandó mayores controles operativos y técnicos, dada la dureza y compacidad del material, condiciones que incidieron en el rendimiento de las actividades y en la complejidad del proceso constructivo, siendo necesarias para lograr la conformación final requerida del talud.

El material resultante de excavación, correspondiente a roca fracturada y residuos asociados a la actividad, fue cargado, transportado y dispuesto en la escombrera El Cairo, sitio habilitado para la recepción y aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), contando con los respectivos soportes de disposición final como evidencia del adecuado manejo de materiales generados durante la ejecución de la obra.

ITEM	2.01.A.03	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN CON ACARREO LIBRE EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	UND: M³



6.2.3. Ítem 2.01.A.04 - Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata

El contratista realizó la excavación manual de zapatas de 1,00 m × 1,00 m × 0,20 m, correspondientes a 144 anclajes, utilizando herramientas manuales y equipos adecuados para trabajo en altura, garantizando la estabilidad del frente y la seguridad del personal. Esta actividad tuvo como finalidad permitir la instalación del acero de refuerzo y el posterior suministro de concreto para la conformación de zapatas de tensionamiento conforme a los diseños aprobados.

ITEM	2.01. A.04	DESCRIPCIÓN	EXCAVACIÓN A MANO CON ACARREO LIBRE DESCOLGADO PARA ZAPATA	UND: M³










6.2.4. *Ítem 2.03 - Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m*

La gestión del material generado ha sido realizada mediante su disposición final en dos lugares específicos: el material sobrante fue dispuesto en el relleno sanitario El Carrasco, este material es compuesto principalmente por residuos inertes no contaminados el cual fue aprovechado funcionalmente por el operador del relleno sanitario para la cobertura diaria de celdas de disposición de residuos sólidos; y los escombros fueron dispuesto en la escombrera “El Cairo”, infraestructura habilitada para la recepción y aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), en el marco de lo establecido por la Resolución 472 de 2017, que regula la gestión integral de este tipo de residuos.

ITEM	2.03	DESCRIPCIÓN	SOBREACARREOS PARA ACARREOS TOTALES MAYORES DE 1.000,00 M	UND: M^3-KM





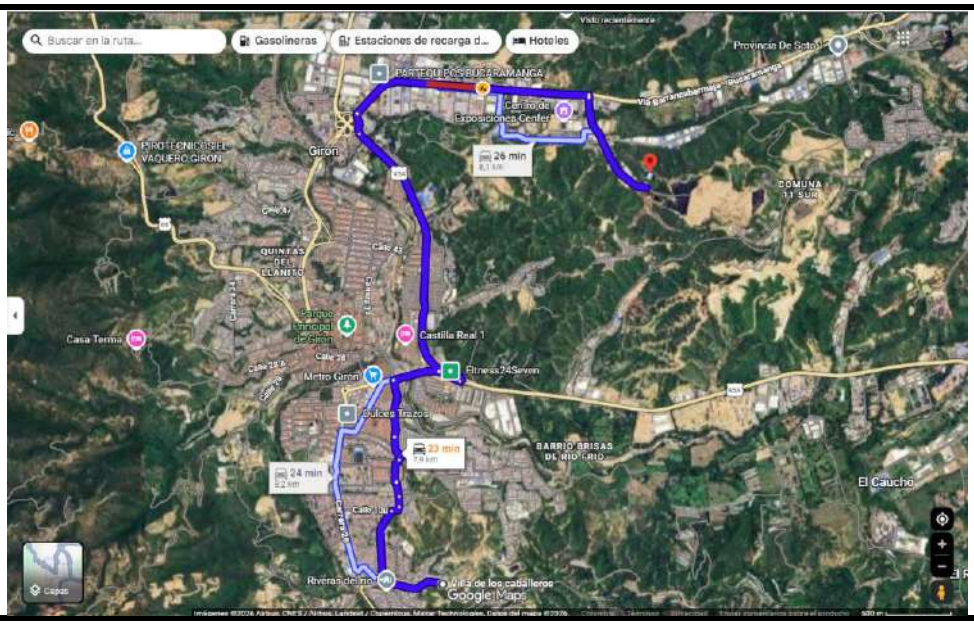

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL "EL CARRASCO" Y "EL CAIRO" – DISTANCIA 8 KM

6.3. SECCIÓN TERCERA

En el período comprendido entre el 15 octubre 2025 al 14 abril 2026, el CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN ejecutó actividades correspondientes a la SECCIÓN TERCERA.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN
SECCIÓN TERCERA					
3,00	Concretos				
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m^3	29,00	28,80	99,31%
3.03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm	m^2	840,00	840,00	100,00%
3.08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	m^3	87,00	86,40	99,31%

6.3.1. Ítem 3.01 – Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas

El contratista ejecutó el suministro y colocación de concreto con resistencia especificada de 3000 psi, tamaño máximo de agregado de 3/8" y asentamiento de 7", destinado a la construcción de zapatas internas de dimensiones 1,00 m x 1,00 m x 0,20 m, como parte de la obra de estabilización del talud.

Estas zapatas fueron concebidas como elementos de cimentación para los 144 anclajes activos proyectados, cumpliendo la función de distribuir adecuadamente las cargas hacia el terreno, incrementando el área de apoyo y contribuyendo a la estabilidad global del sistema.

Durante la ejecución, la interventoría verificó que las parrillas de acero de refuerzo se dispusieran en cada zapata de anclaje, garantizando su adecuado recubrimiento mediante el uso de distanciadores de concreto de 5 cm, evitando el contacto directo con el terreno y asegurando las condiciones de durabilidad y desempeño estructural requeridas.

De esta manera, se evita la concentración de esfuerzos puntuales en el terreno, lo que contribuye a mejorar el comportamiento estructural del sistema de estabilización y a garantizar la estabilidad del talud.

ITEM	3.01	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI CON MEZCLA HÚMEDA PARA ZAPATAS	UND: M^3
				
				

6.3.2. Ítem 3.03 – Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm

El contratistad e obra realizó el suministro y aplicación de concreto lanzado mediante mezcla húmeda, con un espesor minimo de diseño de 10 cm, sobre la superficie del talud, cubriendo un área de 840 m², como parte de las actividades de estabilización. La aplicación del concreto lanzado se realizó de manera uniforme, garantizando el espesor mínimo requerido y la adecuada adherencia al terreno, mediante el uso de aditivo reductor de agua tipo eucoshot af 600.

Así mismo, se efectuó el control de calidad del material aplicado mediante la toma de muestras para ensayos de resistencia a la compresión, con el propósito de verificar el cumplimiento de la resistencia especificada de 3000 psi. Estos ensayos permiten garantizar que el concreto cumple con los parámetros de diseño establecidos y asegurar el adecuado desempeño del sistema de estabilización del talud.

ITEM	3.03	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO LANZADO CON MEZCLA HÚMEDA DE ESPESOR 10 CM	UND: M²













6.3.3. Ítem 3.08 – Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes

Una vez ejecutada la perforación, suministro e instalación del anclaje, se procedió al llenado e inyección con lechada cementicia, con el fin de garantizar la correcta adherencia entre el anclaje, el terreno y la pantalla estructural. La lechada se prepara con cemento y agua en proporciones controladas, obteniendo una mezcla homogénea y libre de grumos.

El llenado e inyección se realizó utilizando equipo a presión y tubería de inyección, asegurando el llenado continuo y uniforme del bulbo del anclaje. Durante el proceso de inyección se controló la presión de inyección para garantizar una adecuada penetración de la lechada en el macizo del talud, sin generar sobrepresiones que puedan afectar la estabilidad del terreno o la integridad de la perforación.

Finalizado el llenado de la perforación y la inyección del anclaje, se verifica el afloramiento de la lechada en la superficie confirmando así el llenado y para la inyección se verifica la presión del fluido en el equipo asignado para esta actividad.

ITEM	3.08	DESCRIPCIÓN	LLENADO DE INYECCIÓN CON LECHADA CEMENTICIA PARA ANCLAJES	UND: MES
				

6.4. SECCIÓN CUARTA

En el período comprendido entre el 15 octubre 2025 al 14 abril 2026, el CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN ejecutó actividades correspondientes a la SECCIÓN CUARTA.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN
SECCIÓN CUARTA					
4,00	Aceros				
4.01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	5.807,00	5806,08	99,98%
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	144,00	144,00	100,00%
4.03	Tensionamiento de anclajes	und	144,00	144,00	100,00%
4.04	Suministro y colocación				
4.04.01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m^2	840,00	840,00	100,00%
4.05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	144,00	144,00	100,00%
4.06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros conicos para cuña de Ø=1/2"	und	144,00	144,00	100,00%
4.07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	144,00	144,00	100,00%

6.4.1. Ítem 4.01 – Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2

El contratista de obra realizó al armado e instalación de parrillas de acero corrugado de ¾ de pulgada (No. 6; estas tienen un peso aproximado de 2,24 kg por metro lineal) conformadas conforme a la separación y geometría definidas en los diseños aprobados. Cada parrilla está compuesta por 20 varillas de 0,90 m de longitud, dispuestas en una configuración de diez (10) horizontales y diez (10) verticales, con el fin de permitir el adecuado paso del anclaje y garantizar la correcta distribución de las cargas generadas durante el proceso de tensionamiento.

Las parrillas fueron instaladas en 144 anclaje una vez finalizada la excavación correspondiente. Para asegurar el recubrimiento adecuado y evitar el contacto directo del acero con el suelo natural, se emplearon distanciadores de concreto, garantizando la correcta ubicación del refuerzo dentro de la zapata.

ITEM	4.01	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2	UND: KG
				







6.4.2. Ítem 4.02.03 – Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m

El contratista de obra realizó las actividades correspondientes al suministro e instalación de 144 anclajes activos de tres (3) cables de diámetro 1/2". Estos anclajes están conformados por tres torones de acero, cada uno compuesto por siete (7) alambres, los cuales se ubican en la parte externa y paralela a un tubo de presión en PVC de 1", elemento que actúa como conducto para la inyección de la lechada cementicia durante la fase de anclaje e impregnación.

Cada torón se encuentra protegido en su longitud libre mediante manguera, evitando su adherencia no deseada al terreno natural; adicionalmente, se incorporan distanciadores–centradores, cuyo propósito es mantener la alineación del conjunto, garantizar el flujo homogéneo de la lechada y evitar el contacto directo de los elementos de acero con el suelo circundante.

Una vez ejecutada la perforación y verificadas las condiciones geométricas del martillo perforador y tubería, se procedió a la instalación del anclaje activo, diseñado con una longitud total de 25 metros, cumpliendo las especificaciones técnicas y los parámetros del sistema de estabilización.

La verificación de la ubicación, orientación e inclinación de cada punto de anclaje establecida de 15°, condición indispensable para garantizar la funcionalidad, continuidad y desempeño estructural del conjunto estabilizador del talud.

ITEM	4.02.03	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CABLES Ø=1/2" DE L=25M	UND: UND








6.4.3. Ítem 4,03 – Tensionamiento de anclajes

Se llevó a cabo la actividad de tensionamiento de anclajes activos mediante el uso de equipo hidráulico y gato de tensionamiento, aplicando una carga de 10 toneladas en cada torón de 1/2". Durante el proceso, se realizó el control de la elongación de los torones, registrando el alargamiento experimentado por cada torón posterior a la aplicación de la carga mediante el gato hidráulico.

Adicionalmente, se efectuó la verificación ocular de la carga aplicada, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema de anclaje y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, contribuyendo así a la estabilidad y desempeño estructural del talud.

ITEM	4.03	DESCRIPCIÓN	TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES	UND: UND











6.4.4. *Ítem 4.04.01 – Malla electrosoldada 4mm y abertura 0,15 x 0,15 m*

Se realizó la instalación de malla electrosoldada de 4 mm de diámetro con abertura de 0,15 x 0,15 m sobre la superficie del talud cuya área es de 840 m^2. La malla fue colocada siguiendo la geometría del talud y fijada mediante amarres y puntos de sujeción (pines) para garantizar su correcta estabilidad durante las etapas posteriores del proceso constructivo.

Para asegurar el recubrimiento de concreto de 10 cm, se instalaron distanciadores en concreto entre la superficie del talud y la malla electrosoldada, permitiendo mantener la separación requerida y garantizar que la malla quede embebida adecuadamente dentro del actividad de concreto lanzado, planificada para el siguiente mes.

Las secciones de malla se colocaron con los traslapos entre paños, asegurando la continuidad del refuerzo a lo largo del área intervenida. Finalmente, se verificó la correcta alineación y fijación de la malla, dejando la superficie preparada para la posterior aplicación del recubrimiento de concreto.

ITEM	4.01.01	DESCRIPCIÓN	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM Y ABERTURA 0,15 X 0,15 M	UND: m^2







6.4.5. *Ítem 4,05 – Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros*

Se realizó el suministro e instalación de platinas metálicas de 200 mm x 200 mm x 12 mm, provistas de tres perforaciones para cada torón, las cuales fueron empleadas como elementos de distribución de carga durante la aplicación de esfuerzos en el sistema de anclajes.

La instalación se efectuó asegurando su correcta alineación y apoyo sobre la superficie del talud, permitiendo una adecuada transmisión de los esfuerzos generados durante el tensionamiento de los torones hacia la estructura de contención. Asimismo, se verificó que las perforaciones coincidieran con la disposición de los elementos de anclaje, garantizando un montaje adecuado y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

ITEM	4.05	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 200MM X 200MM X 12MM CON TRES AGUJEROS	UND: UND







6.4.6. *Ítem 4,06 – Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"*

Se realizó el suministro e instalación de poporas con tres agujeros cónicos, diseñados para la colocación de cuñas en torones de Ø = 1/2", las cuales hacen parte del sistema de tensionamiento de los anclajes activos.

Estas piezas fueron instaladas sobre las platinas, asegurando la correcta inserción y ajuste de las cuñas, lo que permite el anclaje efectivo de los torones una vez aplicada la carga de tensionamiento. De esta forma, se garantiza la transferencia y retención de los esfuerzos en el sistema, cumpliendo con las especificaciones técnicas y asegurando el adecuado desempeño estructural del conjunto.

ITEM	4.06	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POPORA DE 3 AGUJEROS CÓNICOS PARA CUÑA DE Ø=1/2"	UND: UND
				
				


6.4.7. Ítem 4,07 – Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje

Se realizó el suministro e instalación de kits de cuñas para torones de Ø = 1/2", elementos fundamentales dentro del sistema de anclajes activos, cuya función principal es garantizar la adecuada sujeción y transferencia de cargas desde los torones hacia los dispositivos de anclaje. Previo a su instalación, se verificó el estado físico de cada componente del kit, asegurando la ausencia de defectos, deformaciones o presencia de agentes contaminantes que pudieran afectar su desempeño. Posteriormente, las cuñas fueron colocadas en las poporas, asegurando su correcta orientación y

ajuste con respecto a los torones. Durante el proceso de tensionamiento, las cuñas actuaron como elementos de fijación, generando un mecanismo de agarre progresivo sobre el torón a medida que se incrementa la carga aplicada mediante el gato hidráulico. Este sistema permite bloquear el retroceso del torón una vez alcanzada la carga de tensionamiento, garantizando la permanencia de los esfuerzos.

Finalmente, se verificó que las cuñas quedaran correctamente fijadas y sin evidencia de deslizamientos, asegurando así la eficiencia del sistema de anclaje.

ITEM	4.07	DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE CUÑAS DE Ø=1/2" PARA ANCLAJE	UND: UND

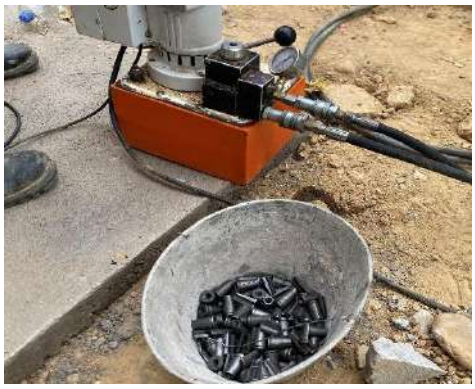











6.5. SECCIÓN QUINTA

En el período comprendido entre el 15 octubre 2025 al 14 abril 2026, el CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN ejecutó actividades correspondientes a la SECCIÓN QUINTA.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN
SECCIÓN QUINTA					
5,00	Perforaciones horizontales				
5.04	Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	2.160,00	2160,00	100,00%
5.05	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1.440,00	1440,00	100,00%

6.5.1. *Ítem 5.04 – Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m*

Una vez corroborada la ubicación y alineación de cada punto de anclaje se procedió a la ejecución de las perforaciones horizontales inclinadas a 15°, necesarias para la instalación del sistema de anclajes activos. La disposición espacial de los puntos fue confirmada previamente mediante control topográfico, garantizando la correcta distribución acorde al área del talud. Las perforaciones se realizaron empleando equipo de perforación rotativa, incorporando tubería de revestimiento para mantener la estabilidad de las paredes durante el proceso y asegurar una trayectoria uniforme. Conforme al alcance del presente ítem, cada perforación se ejecutó hasta una profundidad comprendida entre 0 y 15 metros, dependiendo de la ubicación y del diseño particular del anclaje.

ITEM	5.04	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN PERFORACIONES HORIZONTALES EN TALUDES CON PENDIENTES MAYORES A 1:1 (EN ROCA) CON EQUIPO DE PERFORACIÓN DESCOLGADO PARA ANCLAJES DE 0,00M A 15,00M	UND: M
				

6.5.2. *Ítem 5.05 - Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m.*

Una vez alcanzada la profundidad inicial establecida entre 0 y 15 metros, se continúa con el proceso de perforación hasta completar la longitud total requerida de 25 metros, garantizando que el martillo perforador mantenga en todo momento la dirección, pendiente y alineación definidas. Para esta fase, el equipo rotativo continúa avanzando mediante la instalación progresiva de tubería de revestimiento, asegurando la estabilidad del barreno y evitando el colapso del terreno durante la excavación.

De manera simultánea, se implementó un control técnico detallado por cada punto perforado, en el cual se registró información esencial para la trazabilidad y la calidad del proceso, incluyendo número identificador del anclaje, fecha de ejecución de la perforación, tipo de anclaje, fecha de instalación del anclaje, longitud, entre otras.

Al concluir la perforación a 25 metros, se proceder con la inserción del anclaje, garantizando la continuidad del proceso constructivo de estabilización del talud.

ITEM	**5.05**	**DESCRIPCIÓN**	**EJECUCIÓN PERFORACIONES HORIZONTALES EN TALUDES CON PENDIENTES MAYORES A 1:1 (EN ROCA) CON EQUIPO DE PERFORACIÓN DESCOLGADO PARA ANCLAJES MAYORES A 15,00M.**	**UND: M**
				





6.6. SECCIÓN SEXTA

En el período comprendido entre el 15 octubre 2025 al 14 abril 2026, el CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN ejecutó actividades correspondientes a la SECCIÓN SEXTA.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN
SECCIÓN SEXTA					
6,00	Varios				
6.02	Canaleta (ancho = 1m; e =10cm)	m	132,00	121,60	92,12%
6.04	Estructura de disipación de energía	m	14,00	14,00	100,00%
6.06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora	m	408,00	408,00	100,00%

6.6.1. Ítem 6,02 – Canaleta (ancho=1m; e=10cm).

Para la ejecución de esta actividad se llevó a cabo el control topográfico, la verificación de pendientes y el replanteo correspondiente, junto con excavaciones manuales en la corona del talud, garantizando el correcto alineamiento y trazado de la canaleta conforme a los diseños establecidos. Posteriormente, se realizó el suministro, vaciado y conformación de concreto con resistencia de 3.000 psi, empleando guías metálicas que aseguraron la alineación y geometría de la estructura, así como el acabado y pulido superficial hasta alcanzar la terminación deseada.

La ejecución de este ítem tiene como propósito controlar y conducir las aguas superficiales generadas por las precipitaciones, para ser canalizándolas de manera segura hacia los sistemas de drenaje existentes del municipio.

ITEM	6.02	DESCRIPCIÓN	CANALETA (ANCHO=1M; E=10CM).	UND: M








6.6.2. Ítem 6,04 – Estructura de disipación de energía.

Durante el periodo evaluado, se ejecutó la construcción de la estructura de disipación de energía, localizada en la zona final de la pantalla anclada para la conducción y descarga del sistema de drenaje superficial, con el fin de reducir la velocidad del flujo de agua y mitigar procesos erosivos en el área de entrega.

La estructura está conformada por una superficie en concreto, complementada con elementos transversales tipo escalonados, los cuales permiten disminuir la energía cinética del flujo mediante cambios de dirección y pérdida de velocidad.

La obra fue construida mediante el uso de concreto con resistencia de 3000 psi, garantizando la uniformidad y calidad del material. Previo al vaciado, se realizaron actividades de conformación, nivelación y adecuación de la superficie de apoyo, así como la instalación de formaletas, con el fin de asegurar la correcta definición geométrica de la estructura..

Posteriormente, se efectuaron labores de acabado y curado del concreto, con el fin de asegurar la durabilidad del elemento y su adecuado desempeño hidráulico. La estructura se integra funcionalmente con las canaletas (corona y pie de talud) y cajas de inspección (corona y pie de talud), permitiendo una descarga controlada del agua y contribuyendo a la estabilidad del talud intervenido.

ITEM	6.04	DESCRIPCIÓN	ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA	UND: M









6.6.3. *Ítem 6,06 – Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora.*

El contratista de obra realizó la instalación de un sistema de abatimiento para el control de líneas hidráulicas de infiltración interna, mediante la colocación de geodren, compuesto por una geored de polietileno de alta densidad (PEAD) que permite el transporte del agua captada y un geotextil no tejido, el cual favorece el proceso de filtración al retener las partículas finas del suelo.

Las franjas de geodren geodren permadrain se instalaron desde la corona hasta el pie del talud, ubicándose sobre la superficie del terreno y entre las líneas de anclajes, garantizando la adecuada captación y conducción de los flujos de agua infiltrada.

Esta intervención se ejecuta con el propósito de reducir las presiones hidrostáticas generadas en el trasdós de la estructura estabilizadora y en el talud intervenido, contribuyendo al adecuado funcionamiento del sistema de drenaje y a la estabilidad de la obra geotécnica.

ITEM	6.06	DESCRIPCIÓN	SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA LÍNEAS HIDRÁULICAS DE INFILTRACIÓN INTERNA Y PROTECCIÓN DEL TRASDÓS DE LA ESTRUCTURA ESTABILIZADORA	UND: M







7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CIERRE DE OBRAS

El contratista de obra ejecutó actividades complementarias no incluidas dentro del alcance contractual, orientadas al componente social y al adecuado manejo urbanístico, con el fin de optimizar las condiciones de la zona perimetral del frente de obra. Estas intervenciones se desarrollaron buscando garantizar la correcta integración del proyecto con su entorno inmediato, así como asegurar su adecuada operatividad y uso por parte de la comunidad beneficiaria.

En relación con la conformación geométrica de la terraza, se estableció que los niveles presentan pendientes dirigidas hacia la canaleta ubicada en el pie del talud, permitiendo un manejo de las aguas superficiales. Asimismo, con el propósito de controlar el material particulado y evitar el arrastre de sedimentos hacia las zonas peatonales, se ejecutó la construcción de un bordillo perimetral de 30 cm de altura. Adicionalmente, y en atención a las solicitudes de la comunidad, se realizó la adecuación de rampas que permiten el acceso de vehículos livianos, particularmente motocicletas, mejorando así la accesibilidad y funcionalidad del área intervenida. El contratista de obra realizó limpieza del frente de obra, desmonte de valla informativa, traslado de materiales, equipos y herramientas, y jornadas de lavado de fachadas de las casas aledañas.











Adecuaciones locativas en la zona contigua a la pantalla anclada

8. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la ejecución y hasta la culminación del contrato, el contratista de obra desarrolló las actividades administrativas, operativas y documentales necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, incluyendo la elaboración y radicación de informes, programación y seguimiento de cronogramas, control de personal, coordinación logística y de suministros, gestión documental, actualización de matrices de riesgos y cumplimiento de los requerimientos normativos, contractuales y técnicos aplicables. Estas actividades permitieron asegurar la adecuada planeación, organización y trazabilidad del proyecto, facilitando el desarrollo de las labores ejecutadas en campo y la consolidación del proceso de cierre contractual.

En el marco del seguimiento contractual, el contratista mantuvo comunicación permanente con la interventoría CONSORCIO INTER GIRÓN y con la entidad contratante Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, atendiendo oportunamente requerimientos técnicos, administrativos, sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, socializando información relevante del proyecto y suministrando los soportes requeridos para la verificación del avance contractual. De igual forma, se realizaron reuniones de seguimiento, comités técnicos y administrativos, así como la atención a visitas de control y seguimiento efectuadas por la CDMB, espacios en los cuales se verificó el estado de ejecución del contrato, el cumplimiento de obligaciones y el cierre de actividades pendientes.

COMITÉS TÉCNICOS	
CONSECUTIVO	**FECHA**
Acta de reunión n. 01	05 noviembre 2025
Acta de reunión n. 02	14 noviembre 2025
Acta de reunión n. 03	28 noviembre 2025
Acta de reunión n. 04	10 diciembre 2025
Acta de reunión n. 05	24 diciembre 2025
Acta de reunión n. 07	27 enero 2026
Acta de reunión n. 08	16 febrero 2026
Acta de reunión n. 09	27 febrero 2026
Acta de reunión n. 10	18 marzo 2026
Acta de reunión n. 11	27 marzo 2026
Acta de reunión n. 12	10 abril 2026
Acta de reunión n. 13	14 abril 2026

VISITAS DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
MES	**FECHA**
Hoja de visita mes de octubre 2025	14 octubre 2025
Hoja de visita mes de diciembre 2025	10 diciembre 2025
Hoja de visita mes de enero 2026	09 enero 2026
	27 enero 2026
Hoja de visita mes de enero 2026	11 febrero 2026
	16 febrero 2026
	27 febrero 2026
Hoja de visita mes de marzo 2026	13 marzo 2026
	18 marzo 2026
	27 marzo 2026
Hoja de visita mes de abril 2026	08 abril 2026
	14 abril 2026

Como parte de las actividades de cierre, el contratista adelantó la gestión y consolidación de compromisos socioambientales derivados de la ejecución del proyecto, incluyendo el cierre de medidas de compensación ambiental, la atención y respuesta a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), el cierre de compromisos adquiridos con la comunidad mediante actas suscritas, la formalización y cierre de actas de vecindad, así como el suministro de soportes documentales asociados al relacionamiento comunitario y manejo social del proyecto.

De igual manera, el contratista presentó y entregó los informes de seguimiento socioambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST), consolidando las actividades desarrolladas, el cumplimiento de medidas de manejo, las acciones de prevención y control implementadas, así como los soportes requeridos para evidenciar el cumplimiento de obligaciones contractuales, normativas y de gestión integral durante la ejecución del proyecto.

Asimismo, el contratista efectuó los aportes correspondientes al sistema de seguridad social del personal operativo y administrativo con incidencia directa en el proyecto durante el periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2025 y el 14 de abril de 2026, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones laborales asociadas a la ejecución contractual.

Como soporte del desarrollo de las actividades ejecutadas, se diligenció y mantuvo actualizada la bitácora de obra, en la cual se registraron de manera sistemática las actividades desarrolladas, el personal presente, recursos empleados, novedades técnicas y administrativas, así como situaciones relevantes ocurridas durante la ejecución del proyecto, constituyéndose en un instrumento de trazabilidad y seguimiento técnico.

Igualmente, el contratista consolidó el registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo contractual, permitiendo evidenciar el avance progresivo de las labores, respaldar técnicamente la ejecución de obra y complementar la información reportada en los diferentes informes de seguimiento.

Finalmente, el contratista hizo entrega a la interventoría de la documentación y soportes requeridos para sustentar los diferentes actos administrativos asociados al contrato, así como de la información necesaria para la elaboración de los informes de interventoría mediante los cuales se reportó a la entidad contratante el estado de ejecución y cierre contractual, permitiendo consolidar el proceso de seguimiento, verificación y liquidación del proyecto.

9. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el periodo contractual y hasta la culminación del proyecto, el contratista de obra realizó de manera cumplida los pagos correspondientes al sistema de seguridad social, parafiscales y riesgos laborales del personal operativo y administrativo vinculado a la ejecución del contrato, efectuando la entrega oportuna de los soportes respectivos a la interventoría para su verificación. En cumplimiento de sus funciones de seguimiento y control, la interventoría revisó y validó la información suministrada, evidenciando la actualización de afiliaciones, la cobertura del personal vinculado y el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social exigibles durante el periodo de ejecución.

En el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el contratista adelantó el seguimiento a la entrega, reposición y uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), garantizando su disponibilidad conforme a las actividades desarrolladas en obra. Asimismo, se realizaron jornadas de inducción, capacitaciones, charlas de seguridad y actividades de sensibilización orientadas a reforzar la obligatoriedad del uso de los EPP, la identificación de riesgos asociados a las labores ejecutadas y la implementación de medidas preventivas para minimizar la ocurrencia de incidentes o accidentes de trabajo, promoviendo condiciones seguras para el personal técnico y operativo.

De igual forma, durante la ejecución contractual se mantuvo la adecuada ubicación, señalización, disponibilidad e identificación de los elementos destinados a la atención de emergencias y primeros auxilios, garantizando su accesibilidad en los frentes de trabajo y permitiendo una capacidad de respuesta oportuna ante cualquier eventualidad presentada en obra.

Como parte del proceso de seguimiento y cierre del componente SST, el contratista elaboró y entregó a la interventoría el respectivo informe final de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo soportes de capacitaciones, inspecciones, registros de entrega de EPP, seguimiento a condiciones de seguridad, evidencias documentales y demás actividades implementadas para el cumplimiento de los lineamientos normativos y contractuales aplicables al proyecto.


La interventoría realizó el respectivo seguimiento, revisión y validación de la documentación aportada, verificando el cumplimiento de las obligaciones asociadas al componente SST y dejando trazabilidad de las acciones implementadas durante la ejecución y cierre del contrato.

10. SEGUIMIENTO AL CONTROL FINANCIERO DE OBRA (CURVA S)

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

GRUPO 4. INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONSORCIO INTER GIRÓN

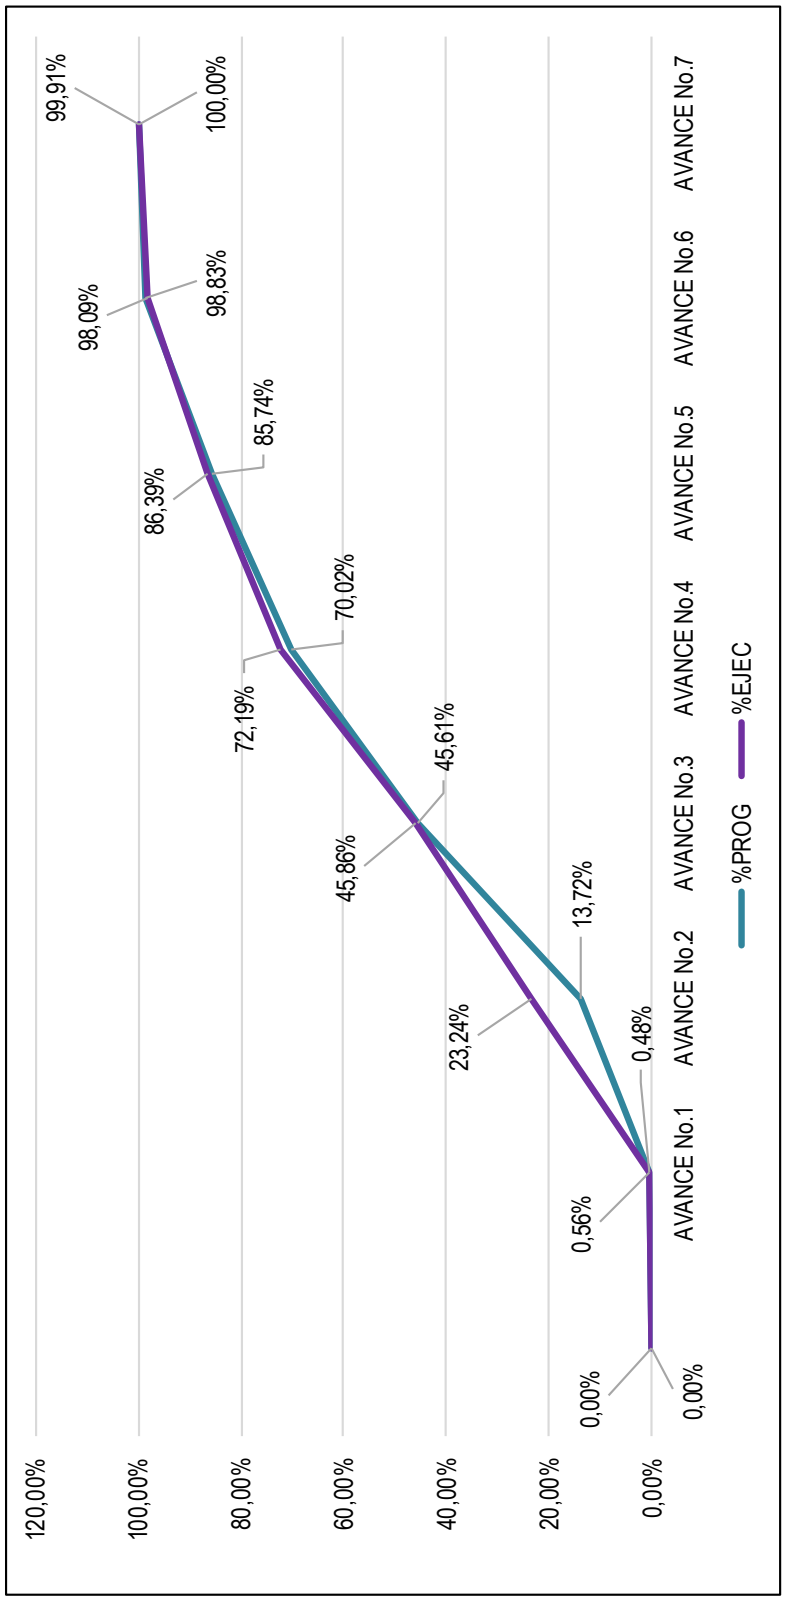

	AVANCE No.1	AVANCE No.2	AVANCE No.3	AVANCE No.4	AVANCE No.5	AVANCE No.6	AVANCE No.7
% PROG	0,48%	13,72%	45,61%	70,02%	85,74%	98,83%	100,00%
% EJECU	0,56%	23,24%	45,86%	72,19%	86,39%	98,09%	99,91%

11. FICHA TÉCNICA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

11.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Contrato No.:	210.16228.4 del 08 septiembre 2025
Tipo de contrato:	Consultoría
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 4: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER".
Contratante:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB DIRECTOR GENERAL CDMB JUAN CARLOS REYES NOVA 91.493.482 de Bucaramanga
Supervisor	Carlos Alberto Díaz Barrera CC 91496579 Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT
Contratista:	**CONSORCIO INTER GIRÓN** Participantes: IBG INGENIERÍA Empresa Unipersonal.- 20 % CONSTRUANLE S.A.S. – 80%
Nit.:	901985184-1
Representante legal:	Iban Gustavo Blanco González 79.431.435 de Bogotá
Valor del contrato:	Doscientos noventa y cuatro millones trescientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta pesos. ($294.388.150)
Forma de pago:	*"Según el Requerimiento No. 666 "Pagos parciales de acuerdo al avance y ejecución del contrato vigilado, mediante la suscrición de actas de pago debidamente revisadas y aprobadas por la Supervisión del contrato por parte de la CDMB""* CLAUSULA SÉPTIMA
Anticipo:	No aplica anticipo y/o pago anticipado
Plazo inicial:	Seis (06) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio (182 días)
Fecha de inicio:	15 Octubre de 2025

Fecha de terminación inicial:	14 Abril de 2026
Lugar de ejecución:	Barrio Villas de Los Caballeros Girón, Santander
% Ejecución	100 %
Total ejecutado	Doscientos noventa y cuatro millones trescientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta pesos. ($294.388.150)

11.2. RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTOS ADMINISTRATIVOS			
ACTA	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
TIPO CONTRATO: CONSULTORÍA	08/09/2025	CONSORCIO INTER GIRÓN	$ 294.388.150,00
ACTA No. 1 -	15/10/2025	ACTA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NA
ACTA N. 02 - RECIBO Y PAGO PARCIAL No. 1	15/12/2025	DESDE EL 15 DE OCTUBRE 2025 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.	$ 67.935.062,93 23,08 %
		Se deja constancia que el porcentaje de cobro correspondiente a la interventoría (23,08% ejecutada interventoría) difiere del porcentaje ejecutado de la obra (23,24% ejecutada obra), en razón a que el valor facturable de la interventoría se encuentra limitado por el monto del registro presupuestal vigente 2025 ($ 67.935.062,94) y no debe ser superado en el cobro. En consecuencia, el porcentaje ejecutado de la interventoría se ajusta al valor máximo permitido por dicho registro presupuestal, motivo por el cual no alcanza el 23,24 % ejecutado de la obra en este periodo. El saldo faltante para completar el porcentaje equivalente al 23,24 % será incluido y cobrado en el próximo periodo de cobro, una vez se cuente con la disponibilidad presupuestal correspondiente.	
ACTA No. 3 - RECIBO Y PAGO PARCIAL No. 2	17/02/2026	DESDE 01 DE DICIEMBRE 2025 HASTA EL 31 ENERO DE 2026.	$ 144.583.742,56 72,19 %
ACTA No. 4 - RECIBO Y PAGO PARCIAL No. 3	24/03/2026	DESDE 01 DE FEBRERO 2026 HASTA EL 28 FEBRERO DE 2026.	$ 41.803.117,30 86,39 %
ACTA No. 5 – RECIBO DEFINITIVO Y ÚLTIMO PAGO	14/04/2026	DESDE 01 DE FEBRERO 2026 HASTA EL 28 FEBRERO DE 2026.	$ 40.066.277,21 100,00 %

11.3. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NOMBRE DE LA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

11.3.1. PÓLIZAS SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La CDMB, por intermedio de la Oficina de Contratación, expidió el Acta de Aprobación de Garantías, mediante la cual se verificó y avaló el cumplimiento de los requisitos de amparo exigidos para la formalización del contrato, quedando dichas garantías en calidad de APROBADAS para proceder a su suscripción.

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 DE SEPTIEMBRE 2025				
ANEXO 0				
POLIZA No.	**AMPAROS**	**VALOR**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
96-44-101199756	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 58.877.630,00	08/09/2025	08/09/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 88.316.445,00	08/09/2025	08/03/2029
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 58.877.630,00	08/03/2026	08/03/2031

11.3.2. PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 DE OCTUBRE 2025				
ANEXO 1 Y 2				
POLIZA No.	**AMPAROS**	**VALOR**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
96-44-101199756	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 58.877.630,00	15/10/2025	15/10/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 88.316.445,00	15/10/2025	14/04/2029
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 58.877.630,00	14/04/2026	14/04/2031

11.3.3. PÓLIZAS ACTUALIZADAS AL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 ABRIL 2026				
ANEXO 3				
POLIZA No.	AMPAROS	VALOR	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
96-44-101199756	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 58.877.630,00	15/10/2025	15/10/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 88.316.445,00	15/10/2025	14/04/2029
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 58.877.630,00	14/04/2026	14/04/2031

11.4. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.16228.4 del 08 SEPTIEMBRE 2025

El contrato de interventoría No. 210.16228.4 suscrito el 08 septiembre 2025, se celebró por un valor inicial de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($294.388.150,00), sin presentar modificaciones presupuestales.

Durante la ejecución del contrato se registraron siete (07) avances mensuales de obra, los cuales reflejan el comportamiento físico y financiero del proyecto durante el periodo de ejecución. Como resultado de estos avances, el contratista presentó cuatro (4) actas parciales de cobro, debidamente verificadas por la supervisión del contrato de obra.

Con corte al cierre de ejecución del proyecto, se evidencia un avance financiero equivalente al 100 % del valor contractual, reflejando un nivel de cumplimiento total.

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	VALOR	OBSERVACIÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 294.388.150,00	No ha requerido adiciones financieras

11.4.1. BALANCE FINANCIERO

El balance financiero del contrato de interventoría evidencia la correspondencia entre el valor contractual inicial y los valores registrados en las actas parciales de cobro. Esta conciliación permite verificar que las sumas reportadas mantienen coherencia y trazabilidad, garantizando la adecuada

aplicación de los recursos y el reconocimiento proporcional de los avances ejecutados y asegurando el cumplimiento de los lineamientos financieros y administrativos del proyecto.

	ACTAS DE RECIBO Y PAGO PARCIAL				
	VALOR ACTA	**%**	**VALOR ACUMULADO**	**% ACUMULADO**	**AVANCES POR ACTA**
ACTA PARCIAL No. 1	$ 67.935.062,93	23.08%	$ 67.935.062,93	23,08 %	AVANCE 1 Y 2
ACTA PARCIAL No. 2	$ 144.583.742,56	49,11%	$ 212.518.805,49	72,19 %	AVANCE 3 Y 4
ACTA PARCIAL No. 3	$ 41.803.117,30	14,20%	$ 254.321.922,79	86,39 %	AVANCE 5
ACTA PARCIAL No. 4	$ 40.066.227,21	13,61%	$ 294.388.150,00	100,00 %	AVANCE 6 Y 7
ACUMULADO EJECUTADO			**$ 294.388.150,00**	**100%**	-
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD			**$0,00**	**0,0%**	

11.5. RELACION DE PERSONAL INTERVENTORÍA

Durante el periodo de ejecución y hasta la culminación del contrato, la interventoría contó con el personal profesional requerido para garantizar el adecuado seguimiento, supervisión, verificación y control integral de las actividades desarrolladas en el marco del contrato de obra, conforme a los perfiles exigidos contractualmente y a las necesidades técnicas del proyecto.

A continuación, se presenta la relación del personal vinculado a la interventoría durante la ejecución contractual:

PERSONAL CONTRACTUAL			
N.	**NOMBRE**	**CARGO**	**CÉDULA**
1	JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	91.275.391
2	JULIÁN FERNANDO VILLAMIZAR DURÁN	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	91.518.201
3	TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO	ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA	63.398.589
4	FREDY SEBASTIÁN TOLOZA PIMIENTO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1.098.739.051
5	IBAN GUSTAVO BLANCO	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	79.431.435
6	EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS	ESPECIALISTA AMBIENTAL	63.555.895
7	PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO	PROFESIONAL SISO	1.102.804.163

12. PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTER GIRÓN	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB)				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**ALCANCE**	**VALOR**
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	GLOBAL	1,00	100%	$ 247.385.000,00
VALOR COSTO BÁSICO					**$ 247.385.000,00**
IVA (19%)					$ 47.003.150,00
VALOR COSTO TOTAL					**$ 294.388.150,00**

13. AVANCE FINANCIERON MENSUAL

CONSORCIO INTER GIRÓN	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	CDMB 60 Años

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						AVANCE No. 1				AVANCE No. 2			
						PERIODO: 15 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2025				PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025			CONTRATO DE OBRA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025			EJECUTADO OBRA		EJECUTADO INTERVENTORIA		EJECUTADO OBRA		EJECUTADO INTERVENTORIA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER GIRÓN			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN										
OBJETO	VR INICIAL	VR FINAL	OBJETO	VR INICIAL	VR FINAL	VR EJECUTADO	% PONDERADO	VR COSTO	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	% PONDERADO	VR COSTO	% EJECUTADO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	$ 294.388.150,00	$ 294.388.150,00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	$ 4.159.344.710,65	$ 4.159.344.710,65	$ 23.193.255,29	0,56%	$ 1.648.573,64	0,56%	$ 943.611.264,24	22,69%	$ 66.767.232,42	22,68%
TOTAL	$ 294.388.150,00	$ 294.388.150,00	TOTAL	$ 4.159.344.710,65	$ 4.159.344.710,65	$ 23.193.255,29		$ 1.648.573,64		$ 943.611.264,24		$ 66.767.232,42	

CONSORCIO INTER GIRÓN	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	CDMB Años

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						AVANCE No. 3 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025				AVANCE No. 4 PERIODO: 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2026			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025			CONTRATO DE OBRA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025			EJECUTADO OBRA		EJECUTADO INTERVENTORIA		EJECUTADO OBRA		EJECUTADO INTERVENTORIA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER GIRÓN			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN										
OBJETO	VR INICIAL	VR FINAL	OBJETO	VR INICIAL	VR FINAL	VR EJECUTADO	% PONDERADO	VR COSTO	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	% PONDERADO	VR COSTO	% EJECUTADO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	$ 294.388.150,00	$ 294.388.150,00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	$ 4.159.344.710,65	$ 4.159.344.710,65	$ 940.804.159,48	22,6190%	$ 66.590.599,53	22,62%	$ 1.095.139.572,43	26,33%	$ 77.512.399,90	26,33%
TOTAL	$ 294.388.150,00	$ 294.388.150,00	TOTAL	$ 4.159.344.710,65	$ 4.159.344.710,65	$ 940.804.159,48		$ 66.590.599,53		$ 1.095.139.572,43		$ 77.512.399,90	

CONSORCIO INTER GIRÓN	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	CDMB Años

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						AVANCE No. 5				AVANCE No. 6			
						PERIODO: 01 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2026				PERIODO: 01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2026			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE			CONTRATO DE OBRA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025			EJECUTADO OBRA		EJECUTADO INTERVENTORIA		EJECUTADO OBRA		EJECUTADO INTERVENTORIA	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER GIRÓN			CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN										
OBJETO	VR INICIAL	VR FINAL	OBJETO	VR INICIAL	VR FINAL	VR EJECUTADO	% PONDERADO	VR COSTO	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	% PONDERADO	VR COSTO	% EJECUTADO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	$ 294.388.150,00	$ 294.388.150,00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	$ 4.159.344.710,65	$ 4.159.344.710,65	$ 590.328.414,08	14,19%	$ 41.803.117,30	14,20%	$ 486.814.393,38	11,70%	$ 34.443.413,55	11,70%
TOTAL	$ 294.388.150,00	$ 294.388.150,00	TOTAL	$ 4.159.344.710,65	$ 4.159.344.710,65	$ 590.328.414,08		$ 41.803.117,30		$ 486.814.393,38		$ 34.443.413,55	

CONSORCIO INTER GIRÓN	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**	CDMB Años

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						**AVANCE No. 7** PERIODO: 01 DE ABRIL A 14 DE ABRIL DE 2026				**ACUMULADOS**			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.16228.4 DEL 08 DE			**CONTRATO DE OBRA No. 210.16225.6 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025**			**EJECUTADO OBRA**		**EJECUTADO INTERVENTORIA**		**EJECUTADO OBRA**		**EJECUTADO INTERVENTORIA**	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER GIRÓN			**CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN**										
OBJETO	**VR INICIAL**	**VR FINAL**	**OBJETO**	**VR INICIAL**	**VR FINAL**	**VR EJECUTADO**	**% PONDERADO**	**VR COSTO**	**% EJECUTADO**	**VR EJECUTADO**	**% PONDERADO**	**VR COSTO**	**% EJECUTADO**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	$ 294.388.150,00	$ 294.388.150,00	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	$ 4.159.344.710,65	$ 4.159.344.710,65	$ 75.775.140,60	1,82%	$ 5.622.813,66	1,91%	$ 4.155.666.199,50	99,91%	$ 294.388.150,00	100,00%
TOTAL	$ 294.388.150,00	$ 294.388.150,00	**TOTAL**	$ 4.159.344.710,65	$ 4.159.344.710,65	**$ 75.775.140,60**		**$ 5.622.813,66**		**$ 4.155.666.199,50**		**$ 294.388.150,00**	

14. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la ejecución y hasta la culminación del contrato, la Interventoría desarrolló las actividades de seguimiento, control, supervisión y verificación integral de las obras ejecutadas en el marco del contrato de obra pública No. 210.16225.6 del 05 de septiembre de 2025, suscrito entre la entidad contratante Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, ambientales, sociales y de seguridad exigidas contractualmente.

En desarrollo de sus funciones, la interventoría efectuó el seguimiento permanente a las actividades constructivas ejecutadas por el contratista, mediante la revisión y verificación de diseños aprobados, especificaciones técnicas, planos constructivos, cantidades de obra ejecutadas, procedimientos constructivos y calidad de los materiales empleados, validando su conformidad con los lineamientos establecidos en los documentos contractuales y las condiciones técnicas del proyecto.

Asimismo, la interventoría realizó el control y seguimiento a la programación de obra, el avance físico y financiero del contrato, la revisión de informes técnicos y administrativos, el acompañamiento a comités y reuniones de seguimiento, la atención a visitas de control efectuadas por la entidad contratante, así como la emisión de observaciones, recomendaciones y conceptos técnicos orientados al adecuado desarrollo de las actividades y a la toma oportuna de decisiones durante la ejecución contractual.

De igual manera, se efectuó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), gestión ambiental y componente social, verificando el cumplimiento de medidas de manejo, el uso adecuado de elementos de protección personal, la implementación de acciones preventivas, el cumplimiento de compromisos socioambientales, la atención de PQRS, el cierre de actas de compromiso y vecindad, así como la entrega y validación de los informes socioambientales y SST presentados por el contratista de obra.

La interventoría verificó igualmente la aplicación de ensayos, pruebas y controles de calidad requeridos para la validación técnica de las actividades ejecutadas, asegurando la conformidad de los procesos constructivos y el cumplimiento de las especificaciones del proyecto.

Como resultado del proceso de seguimiento, control y verificación desarrollado durante el periodo contractual, la interventoría consolidó los soportes técnicos, administrativos y documentales requeridos para evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, contribuir al adecuado cierre del contrato y sustentar el proceso de liquidación del proyecto.

14.1. ACTIVIDADES TECNICAS:

Durante la ejecución contractual y hasta la culminación del proyecto, la interventoría desarrolló las siguientes actividades técnicas, orientadas al seguimiento, control, verificación y validación integral de las actividades ejecutadas por el contratista de obra:

- La interventoría adelantó actividades de control administrativo y técnico dirigidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del contratista, efectuando la revisión, análisis y cotejo de la documentación soporte correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo salud, pensión y riesgos laborales, así como las contribuciones parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, conforme a la normatividad vigente y a las obligaciones contractuales establecidas.

- La interventoría realizó acompañamiento permanente a la ejecución de las actividades constructivas mediante visitas, seguimiento en campo y supervisión continua de los procedimientos ejecutados por el contratista, verificando la correcta aplicación de los diseños aprobados, las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales utilizados, el cumplimiento de la secuencia constructiva, la ejecución conforme a cronogramas y la implementación de medidas de seguridad industrial, salud en el trabajo y gestión ambiental. De igual forma, se emitieron observaciones, recomendaciones y conceptos técnicos oportunos con el propósito de garantizar la conformidad de las actividades ejecutadas con lo establecido en el contrato, la normativa vigente y las buenas prácticas de la ingeniería.

- La interventoría verificó la permanencia y participación del personal profesional adscrito por el contratista de obra, constatando el cumplimiento de los perfiles, dedicaciones y obligaciones establecidas en la oferta contractual y en el plan de personal aprobado para el desarrollo del proyecto.

- La interventoría efectuó el seguimiento y verificación del diligenciamiento de la bitácora de obra como instrumento oficial de control, constatando el registro sistemático, cronológico y detallado de las actividades ejecutadas, novedades técnicas y administrativas, personal vinculado, recursos empleados y demás aspectos relevantes para la trazabilidad del proyecto.

- La interventoría realizó seguimiento permanente al suministro, almacenamiento, manejo y utilización de materiales, equipos e insumos requeridos para la ejecución de las actividades constructivas, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, estándares de calidad y condiciones de seguridad exigidas en los documentos contractuales y en la normatividad aplicable.

- La interventoría revisó, analizó y atendió oportunamente los requerimientos de carácter técnico presentados durante la ejecución contractual, emitiendo observaciones, recomendaciones y respuestas técnicas necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades, siempre dentro del alcance contractual establecido y sin generar modificaciones no autorizadas ni sobrecostos adicionales al proyecto.

- Adicionalmente, la interventoría participó en reuniones de seguimiento, comités técnicos y administrativos, así como en la atención y acompañamiento de visitas de control efectuadas por la entidad contratante Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, espacios en los cuales se verificó el avance físico del proyecto, el cumplimiento de obligaciones contractuales y la consolidación de acciones requeridas para el adecuado cierre técnico y administrativo del contrato.

14.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

Durante el periodo que comprende este informe de interventoría, se han realizado las siguientes actividades de carácter administrativo:

- La interventoría realizó la revisión, análisis y validación de las actas de obra presentadas por el contratista, verificando la correspondencia entre las actividades ejecutadas, las cantidades de obra reportadas, los soportes técnicos, registros de campo y demás documentos requeridos para sustentar el avance contractual, garantizando la trazabilidad y consistencia de la información reportada.

- La interventoría elaboró y presentó los informes técnicos, administrativos, ambientales, sociales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), mediante los cuales se efectuó el seguimiento integral al desarrollo del contrato, documentando el avance físico de las actividades, el cumplimiento de especificaciones técnicas, el control de obligaciones ambientales, sociales y de seguridad laboral, así como las novedades, observaciones, recomendaciones y acciones implementadas durante la ejecución contractual.

- La interventoría realizó el seguimiento y control permanente de la documentación asociada al contrato de obra y al contrato de interventoría, verificando la entrega oportuna de soportes, el cumplimiento de requerimientos formulados por la entidad contratante y la consolidación documental necesaria para el seguimiento, control y liquidación del proyecto.

- La interventoría efectuó la revisión y verificación del cumplimiento de obligaciones laborales, de seguridad social, riesgos laborales y demás requisitos administrativos asociados al

personal vinculado al proyecto, tanto del contratista de obra como del equipo de interventoría, validando la documentación soporte correspondiente.

- La interventoría realizó el trámite, revisión y radicación de las cuentas de cobro parcial del contrato de interventoría, verificando los soportes administrativos, técnicos y financieros requeridos para sustentar cada pago, conforme al avance contractual y a las condiciones establecidas en el contrato.

- La interventoría participó en reuniones de seguimiento, comités técnicos y administrativos y atención de visitas efectuadas por la entidad contratante Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, efectuando seguimiento a compromisos, revisión de observaciones y consolidación de acciones necesarias para el adecuado cierre técnico, administrativo, ambiental, social y de SST del proyecto.

- Finalmente, la interventoría consolidó y presentó la documentación soporte requerida para el cierre contractual, incluyendo informes finales, seguimiento a compromisos, soportes técnicos y administrativos, actas y demás documentos necesarios para sustentar el proceso de liquidación del contrato.

14.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante la ejecución contractual y hasta la culminación del proyecto, la interventoría desarrolló actividades de seguimiento, control y verificación financiera orientadas a validar la correcta ejecución presupuestal del contrato, el avance económico de las actividades y la consistencia entre el progreso físico y financiero del proyecto, entre las cuales se destacan las siguientes:

- La interventoría realizó el seguimiento y verificación del avance físico-financiero del contrato, mediante la revisión y validación de cantidades de obra ejecutadas, su correspondencia con las actividades efectivamente desarrolladas en campo y la consistencia de los valores económicos reportados por el contratista, garantizando la adecuada relación entre el avance físico y la inversión ejecutada.

- La interventoría efectuó el control y seguimiento al flujo de caja del proyecto, verificando la coherencia entre la programación financiera, los desembolsos proyectados y la ejecución presupuestal alcanzada, permitiendo identificar el comportamiento de la inversión durante el periodo contractual y efectuar el respectivo control del desempeño financiero del contrato.

- La interventoría realizó el seguimiento y análisis de la curva “S” del proyecto, verificando el comportamiento del avance ejecutado frente al programado, tanto en términos físicos como financieros, con el propósito de evaluar el cumplimiento de la programación establecida, identificar desviaciones y efectuar recomendaciones orientadas al cumplimiento de metas contractuales.

- La interventoría verificó el cumplimiento y seguimiento del programa de inversiones del contrato, constatando la adecuada destinación de recursos conforme a las actividades programadas, los cronogramas establecidos y las metas previstas dentro del desarrollo contractual.

- La interventoría efectuó seguimiento al cumplimiento del plan de gerencia del proyecto, verificando la implementación de las estrategias de control, seguimiento, organización y administración establecidas para el adecuado desarrollo técnico, administrativo y financiero del contrato.

- La interventoría realizó la revisión, validación y trámite de las cuentas de cobro parcial presentadas por el contratista de obra, verificando la consistencia de las cantidades ejecutadas, soportes técnicos, actas de obra, avances físicos, disponibilidad documental y demás requisitos contractuales exigidos para sustentar el reconocimiento económico correspondiente.

- La interventoría adelantó la elaboración, verificación y radicación de las cuentas de cobro parcial correspondientes al contrato de interventoría, validando el cumplimiento de obligaciones contractuales, soportes administrativos, informes de seguimiento y demás documentos requeridos para el trámite de pago ante la entidad contratante Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.

- La interventoría consolidó la información financiera del proyecto como soporte del proceso de seguimiento y liquidación contractual, permitiendo evidenciar la trazabilidad de la inversión ejecutada, la correspondencia entre avances físicos y financieros y el cumplimiento de las condiciones económicas pactadas contractualmente.

14.4. COMPONENTE SOCIAL

Durante la ejecución contractual y hasta la culminación del proyecto, la interventoría desarrolló actividades de seguimiento, control y verificación del componente social, orientadas a garantizar el adecuado relacionamiento comunitario, la atención de compromisos sociales y el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el manejo social del proyecto, entre las cuales se destacan las siguientes:

- La interventoría realizó seguimiento y verificación a la elaboración, socialización y suscripción de las actas de vecindad de inicio y cierre de actividades asociadas al proyecto, constatando el cumplimiento de los procesos de información y relacionamiento con la comunidad del área de influencia, así como la formalización de los respectivos soportes documentales requeridos durante la ejecución y cierre contractual.

- La interventoría efectuó seguimiento permanente a la atención, gestión y cierre de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) presentadas por la comunidad, verificando la oportuna recepción, trámite, respuesta y trazabilidad documental de las solicitudes formuladas en el marco de la ejecución del proyecto.

- La interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a las reuniones de socialización, concertación y participación comunitaria desarrolladas durante el proyecto, verificando el adecuado desarrollo de espacios de diálogo con la comunidad, la socialización de avances, programación de actividades, manejo de impactos temporales y atención de observaciones relacionadas con la ejecución contractual.

- La interventoría verificó el cumplimiento y cierre de compromisos sociales adquiridos con la comunidad mediante actas suscritas durante la ejecución del proyecto, realizando seguimiento a las acciones implementadas por el contratista y validando los soportes correspondientes para la formalización de su cierre.

- La interventoría efectuó seguimiento a la aplicación y consolidación de encuestas de satisfacción dirigidas a la comunidad del área de influencia, verificando la percepción ciudadana respecto al desarrollo del proyecto, la atención brindada, los mecanismos de comunicación implementados y el cumplimiento de compromisos sociales establecidos.

- La interventoría realizó seguimiento a la atención de inquietudes, observaciones y requerimientos manifestados por la comunidad directamente en el frente de obra, verificando que estas fueran atendidas oportunamente por el contratista y que se implementaran mecanismos de respuesta y comunicación adecuados para minimizar afectaciones y fortalecer el relacionamiento comunitario.

- La interventoría verificó la implementación, funcionamiento y disponibilidad del punto de atención a la comunidad dispuesto durante la ejecución del proyecto, constatando su adecuada operación como mecanismo de información, recepción de inquietudes, atención de PQRS y acompañamiento a los habitantes del área de influencia.

- La interventoría revisó, validó y consolidó los informes del componente social presentados por el contratista adjunto al informe de cumplimiento del plan de acción socio ambienta, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los soportes documentales, el cierre de compromisos comunitarios y las acciones implementadas para el adecuado cierre social del proyecto.

1.1. COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Durante la ejecución contractual y hasta la culminación del proyecto, la interventoría realizó seguimiento, control y verificación al cumplimiento de las obligaciones ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte del contratista de obra, constatando la implementación de medidas de manejo, prevención, mitigación y control requeridas para el adecuado desarrollo del proyecto, entre las cuales se destacan las siguientes:

- La interventoría efectuó seguimiento a la implementación de las medidas de manejo establecidas en el Plan de Acción Socioambiental, verificando su aplicación en los diferentes frentes de obra, el cumplimiento de programas de manejo ambiental y la ejecución de acciones orientadas a la prevención, mitigación, corrección y control de impactos derivados de las actividades constructivas.

- La interventoría supervisó la adecuada gestión integral de residuos sólidos, material sobrante de excavación, residuos líquidos y el control de emisiones atmosféricas, verificando su clasificación, manejo, almacenamiento temporal, transporte y disposición final en sitios autorizados, conforme a la normatividad ambiental vigente y a los lineamientos establecidos para el proyecto.

- Durante la ejecución contractual, la interventoría verificó el cumplimiento de los permisos ambientales requeridos para el desarrollo de las actividades de obra, incluyendo la validación de los permisos de intervención forestal emitidos por la autoridad ambiental competente. Asimismo, efectuó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de dichos permisos, incluyendo la ejecución y cierre de la compensación forestal establecida por la autoridad ambiental.

- La interventoría realizó seguimiento permanente a la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), verificando la ejecución de actividades preventivas, inspecciones, controles operacionales, capacitaciones, charlas de seguridad y demás acciones orientadas a la prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de las actividades constructivas.

- La interventoría verificó la disponibilidad, entrega, reposición y uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) por parte del personal vinculado al proyecto, constatando su utilización conforme a los riesgos asociados a las labores ejecutadas, incluyendo actividades de trabajo en alturas, operación de equipos y demás actividades que demandaban controles específicos de seguridad.

- La interventoría supervisó las medidas de señalización, demarcación, control de accesos, operación segura de maquinaria, condiciones locativas y demás controles implementados en los

frentes de trabajo, verificando el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad requeridas para el adecuado desarrollo de las actividades técnicas ejecutadas en obra.

- La interventoría verificó el registro, reporte, seguimiento y atención de incidentes, accidentes y condiciones inseguras presentadas durante la ejecución contractual, constatando la implementación de medidas correctivas, preventivas y de mejora orientadas a evitar su recurrencia y fortalecer las condiciones de seguridad del proyecto.

- De igual manera, la interventoría verificó la elaboración, entrega y validación de los informes ambientales y de SST presentados por el contratista, incluyendo soportes documentales, registros de seguimiento, cumplimiento de compromisos, evidencias de capacitaciones, controles implementados y demás actividades requeridas para sustentar el cierre ambiental y de seguridad y salud en el trabajo del proyecto.

- Finalmente, la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de compromisos ambientales asociados al cierre contractual, incluyendo la verificación de medidas de compensación, disposición final de residuos, cierre de frentes de obra y demás obligaciones derivadas del manejo ambiental implementado durante la ejecución del proyecto.

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-
- Valor contractual y adiciones del contrato de obra:

El contrato de obra contó con un valor inicial de $ 4.159.344.710,65 M/CTE, siendo este su valor actualizado a la fecha de finalización del contrato el 14 de abril 2026.

- Ejecución física y financiera del contrato de obra:

La ejecución del contrato presentó un avance acumulado final del 99,91 %, correspondiente a un valor ejecutado de $ 4.155.666.199,50 M/CTE.

El saldo a favor de la entidad es de $ 3.678.511,15 M/CTE, que representa el 0,09% del presupuesto vigente.

- Análisis del tiempo:

El plazo total actualizado del contrato es de 182 días calendario, de los cuales se han ejecutado en su totalidad (100 %), con fecha de culminación del 14 de abril de 2026, dando cumplimiento al tiempo contractual establecido.

- Avance físico y financiero del contrato de interventoría:

A la fecha de corte 14 de abril de 2026, el contrato de interventoría registra un avance financiero acumulado del 100% equivalente a $ 294.388.150,00, correspondiente al seguimiento y control ejercido sobre la ejecución del contrato de obra No. 210.16225.6.

- Pagos parciales de pago:

El contratista de obra e interventoría tramitó cuatro (4) actas de recibo y pago parcial frente a la entidad contratante:

	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN ACTAS DE RECIBO Y PAGO PARCIAL			
	VALOR ACTA	% EQUIVALENTE	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
ACTA PARCIAL No. 1	$ 966.804.519,53	23,24%	$ 966.804.519,53	23,24%
ACTA PARCIAL No. 2	$ 2.035.943.731,91	48,95%	$ 3.002.748.251,44	49,11%
ACTA PARCIAL No. 3	$ 590.328.414,08	14,19%	$ 3.593.076.665,52	86,39%
ACTA PARCIAL No. 4	$ 562.589.533,98	13,57%	$ 4.155.666.199,50	99,91%

	CONSORCIO INTER GIRÓN ACTAS DE RECIBO Y PAGO PARCIAL			
	VALOR ACTA	**%**	**VALOR ACUMULADO**	**% ACUMULADO**
ACTA PARCIAL No. 1	$ 67.935.062,93	23,08%	$ 67.935.062,93	23.08%
ACTA PARCIAL No. 2	$ 144.583.742,56	49,11%	$ 212.518.805,49	72,19%
ACTA PARCIAL No. 3	$ 41.803.117,30	14,20%	$ 254.321.922,79	86,39%
ACTA PARCIAL No. 4	$ 40.066.227,21	13,61%	$ 294.388.150,00	100%

El CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN cerró el contrato el 14 de abril de 2026, por un valor de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($4.155.666.199,50 M/CTE), acumulando un 99,91 % del valor total del Contrato de Obra Pública No. 210.16225.6 del 05 de septiembre de 2025. En consecuencia, se registra un saldo a favor de la entidad del 0,09 %, correspondiente a TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE CON QUINCE CENTAVOS ($ 3.678.511,15 M/CTE).

El CONSORCIO INTER GIRÓN cerró el contrato el 14 de abril 2026, por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($294.388.150,00 M/CTE) acumulando un 100% del valor total del Contrato de interventoría N. 210.16228.4 del 08 septiembre 2025.

Presentado por:

IBAN GUSTAVO BLANCO GONZÁLEZ
Representante legal
CONSORCIO INTER GIRÓN

16. ANEXOS

1. Seguridad social del personal del contratista de obra
2. Seguridad social del personal del contratista de interventoría
3. Soportes de nómina del personal de interventoría
4. Soportes de paz y salvos del personal de interventoría
5. Bitácora de obra
6. Actas de comités técnicos y hojas de visita formato CDMB
7. Control de perforación de anclajes
8. Control de llenado e inyección de anclajes
9. Control de tensionamiento
10. Resultados de ensayos de laboratorio
11. Manual de mantenimiento de obra
12. Memorias de cantidades finales y Planos As-Built
13. Informe final de seguimiento al plan de calidad
14. Informe final de seguimiento al plan de gerencia
15. Informes semanales de seguimiento de obra
16. Informe final del área ambiental de interventoría
17. Informe final del área de seguridad y salud en el trabajo de interventoría

ANEXO N. 01

SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-05, 09:25:30 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076752217

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 31/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	6	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095786737	SERGIO RANGEL JIMENEZ	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.396.575	$ 223.500	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 1.396.575	$ 55.900	6,960	$ 1.396.575	$ 97.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.396.575	$ 55.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.600
CC 1096193312	ISAI BAUTISTA PINZON	01	00	X																0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.191.463	$ 190.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.191.463	$ 47.700	6,960	$ 1.191.463	$ 83.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.191.463	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.100
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.099.438	$ 176.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.099.438	$ 44.000	6,960	$ 1.099.438	$ 76.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.099.438	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.600
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00	X																0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.315.651	$ 210.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.315.651	$ 52.700	6,960	$ 1.315.651	$ 91.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.315.651	$ 52.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.600
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.143.922	$ 183.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.143.922	$ 45.800	6,960	$ 1.143.922	$ 79.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.143.922	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.400
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 949.000	$ 151.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 949.000	$ 38.000	6,960	$ 949.000	$ 66.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00																	3	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 142.350	$ 22.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 142.350	$ 5.700	0,000	$ 142.350	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 142.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.238.399	$ 7.238.399	$ 7.238.399	$ 7.238.399	$ 1.158.600	$ 289.800	$ 494.300	$ 284.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.226.800	$ 0	$ 2.226.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-05, 09:24:56 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1076752501

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 31/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00	R																0	0	0	16	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 759.200	$ 52.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.900
CC 1098618429	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	59	00	R																0	0	0	16	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 759.200	$ 52.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.900
CC 80089079	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	59	00	R																0	0	0	16	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 759.200	$ 52.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 2.277.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.700	$ 0	$ 158.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-04, 11:43:57 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076746778

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 04/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA LUCIA HIGUERA PINO		
Documento	CC1095700657	**Dirección**	CRA 36 # 38 28 APTO 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212192048
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	03	00																0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 0	$ 405.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1892200033	9494159942	I	2025/11/11	2025/10/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098618429	OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	X																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

2025/11/04 11:50 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1892200033	9494159942	I	2025/11/11	2025/10/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7987473181**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1881897824

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7987473181**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1881897824

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 405.800

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-04, 03:35:55 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076197127

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 04/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS	**Nombre Sucursal**	SUCURSAL 1	**Código Sucursal**	002
Documento	NI901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		
Total Afiliados	4	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098682052	JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1098704436	CLARA MELISSA DONADO ARIAS	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 142.350	$ 22.800	(EPS010) EPS SURA	$ 142.350	$ 5.700	0,000	$ 142.350	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 142.350	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.200
CC 1098704436	CLARA MELISSA DONADO ARIAS	01	00																	0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.281.150	$ 205.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.281.150	$ 51.300	6,960	$ 1.281.150	$ 89.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.800
CC 1098781831	DENNIS MELISSA TARAZONA MANTILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.484.000	$ 397.500	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 2.484.000	$ 99.400	6,960	$ 2.484.000	$ 172.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.484.000	$ 99.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 769.200
CC 72254372	EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 6.552.000	$ 1.114.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.552.000	$ 262.100	6,960	$ 6.552.000	$ 456.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 6.552.000	$ 262.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.094.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.883.000	$ 11.883.000	$ 11.883.000	$ 11.883.000	$ 1.967.100	$ 475.500	$ 817.300	$ 475.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.735.400	$ 0	$ 3.735.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1902171283	9494353359	E	2025/11/12	2025/11/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$16,201,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (29 Afiliados)																						$53,916,771	$8,708,100			$55,340,271	$2,215,100			$57,458,443	$2,252,100			$55,340,271		$3,026,600		$0	$0		$16,201,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)																						$6,300,001	$1,008,100			$7,723,501	$309,100			$7,011,751	$280,600			$7,723,501		$39,800		$0	$0		$1,637,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						$6,300,001	$1,008,100			$7,723,501	$309,100			$7,011,751	$280,600			$7,723,501		$39,800		$0	$0		$1,637,600
1	CC	91071916	ACERO ROJAS JULIO CESAR																		0	$0	$0	MIN001	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$93,000
2	CC	1100893515	IBAÑEZ LOZADA DIANA MILENA																	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF40	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$564,100
3	CC	1098645233	REYES AVELLANEDA LUDDY KARINA																	230201	29	$3,866,667	$618,700	EPS002	29	$3,866,667	$154,700	CCF40	29	$3,866,667	$154,700	14-4	29	$3,866,667	0.522%	$20,200	29	$0	$0	Si	$948,300
4	CC	1098645233	REYES AVELLANEDA LUDDY KARINA												X					230201	1	$133,334	$21,400	EPS002	1	$133,334	$5,400	CCF40	1	$133,334	$5,400	14-4	1	$133,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$32,200

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (26 Afiliados)																							$47,616,770	$7,700,000			$47,616,770	$1,906,000			$50,446,692	$1,971,500			$47,616,770		$2,986,800		$0	$0		$14,564,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (26 Afiliados)																							$47,616,770	$7,700,000			$47,616,770	$1,906,000			$50,446,692	$1,971,500			$47,616,770		$2,986,800		$0	$0		$14,564,300
5	CC	91505735	ARAMBULA CALDERON GUSTAVO																		230201	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF40	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	Si	$235,200
6	CC	91505735	ARAMBULA CALDERON GUSTAVO													X					230201	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF40	14	$664,300	$26,600	14-4	14	$664,300	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$159,500
7	CC	1046427115	ARDILA NARVAEZ YOEL		X						X										231001	5	$315,262	$50,500	EPS002	5	$315,262	$12,700	CCF40	5	$990,658	$39,700	14-4	5	$315,262	6.960%	$22,000	5	$0	$0	Si	$124,900
8	CC	91464253	BAUTISTA ACOSTA WILLINTON								X										25-14	30	$2,341,332	$374,700	EPS037	30	$2,341,332	$93,700	CCF40	30	$2,341,332	$93,700	14-4	30	$2,341,332	6.960%	$163,000	30	$0	$0	Si	$725,100
9	CC	88203988	BERMUDEZ PEREIRA LUIS ERNESTO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	63553613	BERMUDEZ CALA SANDRA YOLIMA																		230301	30	$2,342,600	$374,900	MIN001	30	$2,342,600	$93,800	CCF40	30	$2,342,600	$93,800	14-4	30	$2,342,600	6.960%	$163,100	30	$0	$0	Si	$725,600
11	CC	91458433	CABALLERO JAIMES HELMER								X										230301	30	$1,431,588	$229,100	EPS017	30	$1,431,588	$57,300	CCF40	30	$1,431,588	$57,300	14-4	30	$1,431,588	6.960%	$99,700	30	$0	$0	Si	$443,400
12	CC	1232891906	CAMARON CAICEDO JARRINSON STEVEN		X						X										230301	7	$380,678	$61,000	EPS041	7	$380,678	$15,300	CCF40	7	$801,850	$32,100	14-4	7	$380,678	6.960%	$26,500	7	$0	$0	Si	$134,900
13	CC	1099371577	DIAZ ORTEGA HUGO ALFREDO								X										230201	30	$1,745,680	$279,400	EPS005	30	$1,745,680	$69,900	CCF40	30	$1,745,680	$69,900	14-4	30	$1,745,680	6.960%	$121,500	30	$0	$0	Si	$540,700
14	CC	1098704436	DONADO ARIAS CLARA MELISSA																		230201	27	$1,281,150	$205,000	EPS010	27	$1,281,150	$51,300	CCF40	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	Si	$396,800
15	CC	1098704436	DONADO ARIAS CLARA MELISSA										X								230201	3	$142,351	$22,800	EPS010	3	$142,351	$5,700	CCF40	3	$142,351	$0	14-4	3	$142,351	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,500
16	CC	1101596200	GARCIA JAIMES ISAIAS		X																230301	7	$400,416	$64,100	EPS037	7	$400,416	$16,100	CCF40	7	$1,056,242	$42,300	14-4	7	$400,416	6.960%	$27,900	7	$0	$0	Si	$150,400
17	CC	1101019874	GARCIA VARGAS JOLMAN JERONIMO								X										230201	15	$752,190	$120,400	EPS002	15	$752,190	$30,100	CCF40	15	$752,190	$30,100	14-4	15	$752,190	6.960%	$52,400	15	$0	$0	Si	$233,000
18	CC	1101019874	GARCIA VARGAS JOLMAN JERONIMO													X					230201	15	$738,036	$118,100	EPS002	15	$738,036	$29,600	CCF40	15	$711,750	$28,500	14-4	15	$738,036	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$176,200
19	PT	5338041	HERNANDEZ ESCOBAR ANNEL EDGARDO								X										230201	30	$1,589,305	$254,300	EPS037	30	$1,589,305	$63,600	CCF40	30	$1,589,305	$63,600	14-4	30	$1,589,305	6.960%	$110,700	30	$0	$0	Si	$492,200
20	CC	13516255	MANRIQUE ESTUPIÑAN FREDY LEONARDO								X										230301	30	$1,431,588	$229,100	EPS002	30	$1,431,588	$57,300	CCF40	30	$1,431,588	$57,300	14-4	30	$1,431,588	6.960%	$99,700	30	$0	$0	Si	$443,400
21	CC	1095831892	MEDINA FLOREZ JHONATAN								X										25-14	30	$1,431,588	$229,100	EPS002	30	$1,431,588	$57,300	CCF40	30	$1,431,588	$57,300	14-4	30	$1,431,588	6.960%	$99,700	30	$0	$0	Si	$443,400
22	CC	13542493	MONARES CUADROS EMIRO																		25-14	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF40	19	$901,550	$36,100	14-4	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	Si	$279,300
23	CC	13542493	MONARES CUADROS EMIRO													X					25-14	11	$524,916	$84,000	EPS037	11	$524,916	$21,000	CCF40	11	$521,950	$20,900	14-4	11	$524,916	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$125,900
24	CC	1007731661	NAVARRO FLOREZ EDINSON DAVID																		230301	16	$759,200	$121,500	EPS002	16	$759,200	$30,400	CCF40	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	Si	$235,200
25	CC	1007731661	NAVARRO FLOREZ EDINSON DAVID													X					230301	14	$703,932	$112,700	EPS002	14	$703,932	$28,200	CCF40	14	$664,300	$26,600	14-4	14	$703,932	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$167,500
26	CC	1098682052	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA																		25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF40	30	$8,000,000	$320,000	14-4	30	$8,000,000	6.960%	$556,800	30	$0	$0	Si	$2,556,800
27	CC	13537319	PRADA JEREZ ALEXANDER																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
28	CC	1124048478	RANGEL FLORIAN MIGUEL ANTONIO		X						X										230301	7	$376,634	$60,300	EPS037	7	$376,634	$15,100	CCF40	7	$910,125	$36,500	14-4	7	$376,634	6.960%	$26,300	7	$0	$0	Si	$138,200
29	CC	91459307	REATIGA RIATIGA SAMUEL								X										230201	30	$3,996,419	$639,500	EPS010	30	$3,996,419	$159,900	CCF40	30	$3,996,419	$159,900	14-4	30	$3,996,419	6.960%	$278,200	30	$0	$0	Si	$1,237,500
30	CC	1098701278	RESTREPO GARCIA MICHAEL GIUSEPPE																		230201	30	$1,550,000	$248,000	EPS002	30	$1,550,000	$62,000	CCF40	30	$1,550,000	$62,000	14-4	30	$1,550,000	6.960%	$107,900	30	$0	$0	Si	$479,900
31	CC	1098756647	SANCHEZ JEREZ OSCAR ANDRES																		230201	21	$2,450,000	$392,000	EPS010	21	$2,450,000	$98,000	CCF40	21	$2,450,000	$98,000	14-4	21	$2,450,000	6.960%	$170,600	21	$0	$0	Si	$758,600
32	CC	1098756647	SANCHEZ JEREZ OSCAR ANDRES												X						230201	9	$1,050,000	$168,000	EPS010	9	$1,050,000	$42,000	CCF40	9	$1,050,000	$0	14-4	9	$1,050,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$210,000
33	CC	1098640002	SEPULVEDA PARRA OLGER								X										230301	16	$993,238	$159,000	EPS002	16	$993,238	$39,800	CCF40	16	$993,238	$39,800	14-4	16	$993,238	6.960%	$69,200	16	$0	$0	Si	$307,800
34	CC	1098640002	SEPULVEDA PARRA OLGER													X					230301	14	$896,082	$143,400	EPS002	14	$896,082	$35,900	CCF40	14	$800,831	$32,100	14-4	14	$896,082	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$211,400
35	CC	1095919121	SIERRA JOHN JULIAN		X						X										230301	15	$897,035	$143,600	EPS037	15	$897,035	$35,900	CCF40	15	$1,605,207	$64,300	14-4	15	$897,035	6.960%	$62,500	15	$0	$0	Si	$306,300
36	CC	1234339663	VILLAMIZAR URBINA JONATHAN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
37	CC	1098673915	ZAMBRANO LESMES FABIAN LEONARDO																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS042	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Total	**Afiliados(29)**																						$53,916,771	$8,708,100			$55,340,271	$2,215,100			$57,458,443	$2,252,100			$55,340,271		$3,026,600		$0	$0		$16,201,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1902171283	9494353359	E	2025/11/12	2025/11/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$16,201,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$8,708,100	$0	$0	$8,708,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$278,300	$0	$0	$278,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,592,100	$0	$0	$2,592,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,294,500	$0	$0	$2,294,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,543,200	$0	$0	$3,543,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$3,026,600	$0	$0	$3,026,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	29	$3,026,600	$0	$0	$3,026,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,252,100	$0	$0	$2,252,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	29	$2,252,100	$0	$0	$2,252,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	$2,215,100	$0	$0	$2,215,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$100,000	$0	$0	$100,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$356,900	$0	$0	$356,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,300	$0	$0	$57,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$150,800	$0	$0	$150,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$452,500	$0	$0	$452,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$72,300	$0	$0	$72,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$635,400	$0	$0	$635,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$389,900	$0	$0	$389,900
TOTAL				**29**	**$16,201,900**	**$0**	**$0**	**$16,201,900**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-04, 10:52:42 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077660466

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 03/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA LUCIA HIGUERA PINO		
Documento	CC1095700657	**Dirección**	CRA 36 # 38 28 APTO 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212192048
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	03	00																0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 0	$ 405.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1979635359	9495111964	I	2025/12/09	2025/12/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098618429	OSPINO RODELO JOHANA PAOLA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1979635359	9495111964	I	2025/12/09	2025/12/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992524523**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1951812297

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992524523**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1951812297

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 405.800

Planilla Pagada
achSOI
Pagos de Seguridad Social
Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-04, 03:22:38 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1077637328

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 04/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 1098618429	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 80089079	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 4.270.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 0	$ 297.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-04, 03:20:24 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1077637575

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 04/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	10	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.186.250	$ 189.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.186.250	$ 47.500	6,960	$ 1.186.250	$ 82.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400
CC 1095786737	SERGIO RANGEL JIMENEZ	01	00		X								X							0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 335.138	$ 53.700	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 335.138	$ 13.500	6,960	$ 335.138	$ 23.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 406.033	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.900
CC 1095786737	SERGIO RANGEL JIMENEZ	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 60.721	$ 7.300	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 60.721	$ 0	0,000	$ 60.721	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.300
CC 1096193312	ISAI BAUTISTA PINZON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.562.912	$ 250.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.562.912	$ 62.600	6,960	$ 1.562.912	$ 108.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.562.912	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.100
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 332.150	$ 13.300	6,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.757.798	$ 281.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.757.798	$ 70.400	6,960	$ 1.757.798	$ 122.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.757.798	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.500
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.431.588	$ 229.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.431.588	$ 57.300	6,960	$ 1.431.588	$ 99.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.431.588	$ 57.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.400
CC 91343755	ELISEO SANCHEZ CARVAJAL	01	00	X	X								X							0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 569.400	$ 91.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 569.400	$ 22.800	6,960	$ 569.400	$ 39.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 590.753	$ 23.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.400
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.233.700	$ 197.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.233.700	$ 49.400	6,960	$ 1.233.700	$ 85.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.316.657	$ 11.316.657	$ 11.316.657	$ 11.348.184	$ 1.808.700	$ 450.800	$ 783.900	$ 454.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.497.900	$ 0	$ 3.497.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-04, 02:10:10 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1077580787

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202512

PAGADA 2025-12-04 09:28:07.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	4
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 72254372		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												X			0	20	20	20	20			F	$ 6.552.000	231001		16 %	$ 4.368.000	$ 698.900	$ 21.900	$ 21.900	EPS010		4 %	$ 4.368.000	$ 174.800	$ 0	14-4		0,000 %	$ 4.368.000	$ 0	CCF40	4 %	$ 4.368.000	$ 174.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0
															0	10	10	10	10			F	$ 6.552.000	231001		16 %	$ 2.184.000	$ 349.500	$ 11.000	$ 11.000	EPS010		4 %	$ 2.184.000	$ 87.400	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.184.000	$ 152.100	CCF40	4 %	$ 2.184.000	$ 87.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.048.400	$ 32.900	$ 32.900	$ 262.200	$ 152.100	$ 262.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.790.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1981374446	9496011303	E	2025/12/10	2025/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$15,207,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (24 Afiliados)																						$50,049,649	$8,089,000			$51,473,149	$2,060,100			$51,194,731	$2,030,200			$51,473,149		$3,028,100		$0	$0		$15,207,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)																						$6,300,000	$1,008,000			$7,723,500	$309,000			$7,011,750	$280,500			$7,723,500		$40,500		$0	$0		$1,638,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						$6,300,000	$1,008,000			$7,723,500	$309,000			$7,011,750	$280,500			$7,723,500		$40,500		$0	$0		$1,638,000
1	CC	91071916	ACERO ROJAS JULIO CESAR																		0	$0	$0	MIN001	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$711,750	$28,500	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$93,000
2	CC	1100893515	IBAÑEZ LOZADA DIANA MILENA																	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF40	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$564,100
3	CC	1098645233	REYES AVELLANEDA LUDDY KARINA																	230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (21 Afiliados)																							$43,749,649	$7,081,000			$43,749,649	$1,751,100			$44,182,981	$1,749,700			$43,749,649		$2,987,600		$0	$0		$13,569,400
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (21 Afiliados)																							$43,749,649	$7,081,000			$43,749,649	$1,751,100			$44,182,981	$1,749,700			$43,749,649		$2,987,600		$0	$0		$13,569,400
4	CC	91505735	ARAMBULA CALDERON GUSTAVO		X																23020 1	4	$189,800	$30,400	EPS037	4	$189,800	$7,600	CCF40	4	$288,643	$11,600	14-4	4	$189,800	6.960%	$13,300	4	$0	$0	Si	$62,900
5	CC	91464253	BAUTISTA ACOSTA WILLINTON									X									25-14	30	$2,359,287	$377,500	EPS037	30	$2,359,287	$94,400	CCF40	30	$2,359,287	$94,400	14-4	30	$2,359,287	6.960%	$164,300	30	$0	$0	Si	$730,600
6	CC	88203988	BERMUDEZ PEREIRA LUIS ERNESTO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	63553613	BERMUDEZ CALA SANDRA YOLIMA																		23030 1	30	$2,342,600	$374,900	MIN001	30	$2,342,600	$93,800	CCF40	30	$2,342,600	$93,800	14-4	30	$2,342,600	6.960%	$163,100	30	$0	$0	Si	$725,600
8	CC	91458433	CABALLERO JAIMES HELMER									X									23030 1	30	$1,463,940	$234,300	EPS017	30	$1,463,940	$58,600	CCF40	30	$1,463,940	$58,600	14-4	30	$1,463,940	6.960%	$101,900	30	$0	$0	Si	$453,400
9	CC	1099371577	DIAZ ORTEGA HUGO ALFREDO									X									23020 1	30	$1,789,081	$286,300	EPS005	30	$1,789,081	$71,600	CCF40	30	$1,789,081	$71,600	14-4	30	$1,789,081	6.960%	$124,600	30	$0	$0	Si	$554,100
10	CC	1098704436	DONADO ARIAS CLARA MELISSA																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	1101019874	GARCIA VARGAS JOLMAN JERONIMO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	PT	5338041	HERNANDEZ ESCOBAR ANNEL EDGARDO		X							X									23020 1	11	$543,788	$87,100	EPS037	11	$543,788	$21,800	CCF40	11	$916,965	$36,700	14-4	11	$543,788	6.960%	$37,900	11	$0	$0	Si	$183,500
13	PT	5338041	HERNANDEZ ESCOBAR ANNEL EDGARDO													X					23020 1	7	$370,838	$59,400	EPS037	7	$370,838	$14,900	CCF40	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$370,838	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$87,600
14	CC	13516255	MANRIQUE ESTUPIÑAN FREDY LEONARDO									X									23030 1	30	$1,439,676	$230,400	EPS002	30	$1,439,676	$57,600	CCF40	30	$1,439,676	$57,600	14-4	30	$1,439,676	6.960%	$100,300	30	$0	$0	Si	$445,900
15	CC	1095831892	MEDINA FLOREZ JHONATAN									X									25-14	30	$1,447,764	$231,700	EPS002	30	$1,447,764	$58,000	CCF40	30	$1,447,764	$58,000	14-4	30	$1,447,764	6.960%	$100,800	30	$0	$0	Si	$448,500
16	CC	13542493	MONARES CUADROS EMIRO									X									25-14	30	$1,447,764	$231,700	EPS037	30	$1,447,764	$58,000	CCF40	30	$1,447,764	$58,000	14-4	30	$1,447,764	6.960%	$100,800	30	$0	$0	Si	$448,500
17	CC	1007731661	NAVARRO FLOREZ EDINSON DAVID									X									23030 1	30	$1,426,412	$228,300	EPS002	30	$1,426,412	$57,100	CCF40	30	$1,426,412	$57,100	14-4	30	$1,426,412	6.960%	$99,300	30	$0	$0	Si	$441,800
18	CC	1098682052	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA																		25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF40	30	$8,000,000	$320,000	14-4	30	$8,000,000	6.960%	$556,800	30	$0	$0	Si	$2,556,800
19	CC	13537319	PRADA JEREZ ALEXANDER																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
20	CC	91459307	REATIGA RIATIGA SAMUEL									X									23020 1	30	$4,447,628	$711,700	EPS010	30	$4,447,628	$178,000	CCF40	30	$4,447,628	$178,000	14-4	30	$4,447,628	6.960%	$309,600	30	$0	$0	Si	$1,377,300
21	CC	1098701278	RESTREPO GARCIA MICHAEL GIUSEPPE																		23020 1	30	$1,550,000	$248,000	EPS002	30	$1,550,000	$62,000	CCF40	30	$1,550,000	$62,000	14-4	30	$1,550,000	6.960%	$107,900	30	$0	$0	Si	$479,900
22	CC	1098756647	SANCHEZ JEREZ OSCAR ANDRES																		23020 1	26	$3,033,334	$485,400	EPS010	26	$3,033,334	$121,400	CCF40	26	$3,033,334	$121,400	14-4	26	$3,033,334	6.960%	$211,200	26	$0	$0	Si	$939,400
23	CC	1098756647	SANCHEZ JEREZ OSCAR ANDRES												X						23020 1	4	$466,667	$74,700	EPS010	4	$466,667	$18,700	CCF40	4	$466,667	$0	14-4	4	$466,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$93,400
24	CC	1098640002	SEPULVEDA PARRA OLGER									X									23030 1	30	$1,813,570	$290,200	EPS002	30	$1,813,570	$72,600	CCF40	30	$1,813,570	$72,600	14-4	30	$1,813,570	6.960%	$126,300	30	$0	$0	Si	$561,700
25	CC	1234339663	VILLAMIZAR URBINA JONATHAN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
26	CC	1098673915	ZAMBRANO LESMES FABIAN LEONARDO																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS042	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Total		**Afiliados(24)**																					$50,049,649	$8,089,000			$51,473,149	$2,060,100			$51,194,731	$2,030,200			$51,473,149		$3,028,100		$0	$0		$15,207,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1981374446	9496011303	E	2025/12/10	2025/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$15,207,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$8,089,000	$0	$0	$8,089,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,600,900	$0	$0	$2,600,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,953,900	$0	$0	$1,953,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,306,400	$0	$0	$3,306,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$3,028,100	$0	$0	$3,028,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	$3,028,100	$0	$0	$3,028,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,030,200	$0	$0	$2,030,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	24	$2,030,200	$0	$0	$2,030,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				24	$2,060,100	$0	$0	$2,060,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$100,000	$0	$0	$100,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$375,100	$0	$0	$375,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$58,600	$0	$0	$58,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$150,800	$0	$0	$150,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$310,700	$0	$0	$310,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$616,300	$0	$0	$616,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$391,600	$0	$0	$391,600
TOTAL				**24**	**$15,207,400**	**$0**	**$0**	**$15,207,400**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-16, 08:57:23 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1078610284

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 09/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	10	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00	X																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.328.600	$ 212.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.328.600	$ 53.200	6,960	$ 1.328.600	$ 92.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.500
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 94.901	$ 15.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 94.901	$ 3.800	0,000	$ 94.901	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 94.901	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.427.544	$ 228.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.427.544	$ 57.200	6,960	$ 1.427.544	$ 99.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.427.544	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.300
CC 1096193312	ISAI BAUTISTA PINZON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.580.572	$ 252.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.580.572	$ 63.300	6,960	$ 1.580.572	$ 110.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.580.572	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489.600
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.427.544	$ 228.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.427.544	$ 57.200	6,960	$ 1.427.544	$ 99.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.427.544	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.300
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.332.644	$ 213.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.332.644	$ 53.400	6,960	$ 1.332.644	$ 92.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.332.644	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.900
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00														X			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 94.900	$ 15.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 94.900	$ 3.800	0,000	$ 94.900	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.745.317	$ 279.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.745.317	$ 69.900	6,960	$ 1.745.317	$ 121.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.745.317	$ 69.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.600
CC 1102383713	YOHAN ALEXANDER CACERES PABON	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.463.940	$ 234.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.463.940	$ 58.600	6,960	$ 1.463.940	$ 101.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.463.940	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.400
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.412.446	$ 226.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.412.446	$ 56.500	6,960	$ 1.412.446	$ 98.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.412.446	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.400
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.451	$ 7.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 47.451	$ 1.900	0,000	$ 47.451	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 47.451	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.500
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.435.632	$ 229.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.435.632	$ 57.500	6,960	$ 1.435.632	$ 100.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.435.632	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.814.991	$ 14.814.991	$ 14.814.991	$ 14.814.991	$ 2.371.000	$ 593.300	$ 1.015.100	$ 587.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.567.000	$ 0	$ 4.567.000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2047221215	9497187706	E	2026/01/13	2025/12/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$16.051.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL																								**$51.993.593**	**$8.400.000**			**$53.417.093**	**$2.137.600**			**$59.669.797**	**$2.376.000**			**$53.417.093**		**$3.137.800**		**$0**	**$0**		**$16.051.400**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5																								**$45.693.592**	**$7.391.900**			**$45.693.592**	**$1.828.500**			**$52.658.046**	**$2.095.400**			**$45.693.592**		**$3.102.100**		**$0**	**$0**		**$14.417.900**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER																								**$45.693.592**	**$7.391.900**			**$45.693.592**	**$1.828.500**			**$52.658.046**	**$2.095.400**			**$45.693.592**		**$3.102.100**		**$0**	**$0**		**$14.417.900**
1	CC	63553613	BERMUDEZ CALA SANDRA YOLIMA		X																	230301	21	$1.639.820	$262.400	MIN001	21	$1.639.820	$65.600	CCF40	21	$1.639.820	$65.600	14-4	21	$1.639.820	6,960%	$114.200	21	$0	$0	Si	$507.800
2	CC	63553613	BERMUDEZ CALA SANDRA YOLIMA													X						230301	9	$702.780	$112.500	MIN001	9	$702.780	$28.200	CCF40	9	$702.780	$28.200	14-4	9	$702.780	0,000%	$0	9	$0	$0	Si	$168.900
3	CC	1098704436	DONADO ARIAS CLARA MELISSA																			230201	30	$1.423.500	$227.800	EPS010	30	$1.423.500	$57.000	CCF40	30	$1.423.500	$57.000	14-4	30	$1.423.500	6,960%	$99.100	30	$0	$0	Si	$440.900
4	CC	13537319	PRADA JEREZ ALEXANDER																			231001	30	$1.423.500	$227.800	EPS037	30	$1.423.500	$57.000	CCF40	30	$1.423.500	$57.000	14-4	30	$1.423.500	6,960%	$99.100	30	$0	$0	Si	$440.900
5	CC	1098756647	SANCHEZ JEREZ OSCAR ANDRES																			230201	30	$3.500.000	$560.000	EPS010	30	$3.500.000	$140.000	CCF40	30	$3.500.000	$140.000	14-4	30	$3.500.000	6,960%	$243.600	30	$0	$0	Si	$1.083.600
6	CC	1098673915	ZAMBRANO LESMES FABIAN LEONARDO																			25-14	30	$2.500.000	$400.000	EPS042	30	$2.500.000	$100.000	CCF40	30	$2.500.000	$100.000	14-4	30	$2.500.000	6,960%	$174.000	30	$0	$0	Si	$774.000

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-01-16, 09:05:03 a. m. **Tipo Planilla** N **Número Planilla** 1078601085

Planilla Corregida Nro 1077748997 **Periodo Cotización** 202512 **Periodo Servicio** 202601

PAGADA 2026-01-07 14:59:20.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	2
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 72254372		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
	X						C								0	30	30	30	30			F	$ 6.552.000	231001		16 %	$ 6.552.000	$ 1.048.400	$ 32.800	$ 32.800	EPS010		4 %	$ 6.552.000	$ 262.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 6.552.000	$ 456.100	CCF40	4 %	$ 6.552.000	$ 262.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-16, 11:26:04 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1078610331

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 13/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 1098618429	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 80089079	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 4.270.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 0	$ 297.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-08, 04:38:22 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078090811

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 19/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA LUCIA HIGUERA PINO		
Documento	CC1095700657	**Dirección**	CRA 36 # 38 28 APTO 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212192048
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00										X							0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.720.000	$ 435.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.720.000	$ 340.000	0,522	$ 2.720.000	$ 14.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 789.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.720.000	$ 2.720.000	$ 2.720.000	$ 0	$ 435.200	$ 340.000	$ 14.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 789.400	$ 0	$ 789.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2077622043	9496957548	I	2026/01/09	2026/01/13	BANCO DE OCCIDENTE	4	$406,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098618429	OSPINO RODELO JOHANA PAOLA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2077622043	9496957548	I	2026/01/09	2026/01/13	BANCO DE OCCIDENTE	4	$406,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$600	$0	$228,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$600	$0	$228,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$500	$0	$178,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$500	$0	$178,500
TOTAL				1	$405,800	$1,100	$0	$406,900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7996245149**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2019927608

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7996245149**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/18			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2019927608

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 405.800

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-10, 04:34:08 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079201455

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 10/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA LUCIA HIGUERA PINO		
Documento	CC1095700657	**Dirección**	CRA 36 # 38 28 APTO 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212192048
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	52741573	9498404975	I	2026/02/09	2026/02/10	BANCO DE OCCIDENTE	1	$499,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098618429	OSPINO RODELO JOHANA PAOLA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	52741573	9498404975	I	2026/02/09	2026/02/10	BANCO DE OCCIDENTE	1	$499,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$200	$0	$280,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$200	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200	$0	$219,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$200	$0	$219,100
TOTAL				1	$499,100	$400	$0	$499,500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6001460250**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9179050

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
SUBTOTAL:			1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 218.900
SUBTOTAL:			1	**$ 218.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 499.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 499.100**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6001460250	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9179050

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280,200	$ 0	$ 280,200
SUBTOTALES:										**$ 280,200**	**$ 0**	**$ 280,200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218,900	$ 0	$ 0	$ 218,900
SUBTOTALES:													**$ 218,900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218,900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTA TRIBUTARIA	INGR	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD					ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	INDEPEND		$ 1,750,905				NO																	231001 - COLFONDOS	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,750,905	$ 218,900	$ 0	$ 218,900			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-10, 03:55:19 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1079201365

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 10/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PIÑO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 1098618429	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 80089079	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 5.252.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 0	$ 365.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-10, 03:45:49 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079201262

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 10/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	10	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.609.241	$ 257.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.609.241	$ 64.400	6,960	$ 1.609.241	$ 112.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.609.241	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498.400
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.728	$ 18.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 116.728	$ 4.700	0,000	$ 116.728	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 116.728	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00								X									0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.517.451	$ 242.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1096193312	ISAI BAUTISTA PINZON	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.522.425	$ 243.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.522.425	$ 60.900	6,960	$ 1.522.425	$ 106.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.522.425	$ 60.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.400
CC 1096193312	ISAI BAUTISTA PINZON	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.532.373	$ 245.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.532.373	$ 61.300	6,960	$ 1.532.373	$ 106.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.532.373	$ 61.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 474.500
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.527.399	$ 244.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.527.399	$ 61.100	6,960	$ 1.527.399	$ 106.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.527.399	$ 61.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.000
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 233.454	$ 37.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.547.296	$ 247.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.547.296	$ 61.900	6,960	$ 1.547.296	$ 107.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.547.296	$ 61.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.100
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 234.374	$ 37.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 234.374	$ 9.400	0,000	$ 234.374	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.300
CC 1102383713	YOHAN ALEXANDER CACERES PABON	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.691.945	$ 270.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.691.945	$ 67.700	6,960	$ 1.691.945	$ 117.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.691.945	$ 67.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.000
CC 1102383713	YOHAN ALEXANDER CACERES PABON	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00								X									0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00								X									0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 10/02/2026 | **Empresa NI901982571 CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON** | **Planilla Nro: 1079201262** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00								X									0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.952.671	$ 17.952.671	$ 17.952.671	$ 17.951.751	$ 2.873.100	$ 718.800	$ 1.079.500	$ 714.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.385.500	$ 0	$ 5.385.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-11, 08:20:08 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079180644

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 06/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		
Total Afiliados	23	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002237235	KILIAN ENRIQUE PERTUZ JIMENEZ	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.616.934	$ 258.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.616.934	$ 64.700	6,960	$ 1.616.934	$ 112.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.616.934	$ 64.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.800
CC 1002237235	KILIAN ENRIQUE PERTUZ JIMENEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 233.454	$ 37.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1005337243	MARIA DANIELA JEREZ RANGEL	01	00	X																0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.166.667	$ 346.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.166.667	$ 86.700	6,960	$ 2.166.667	$ 150.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.166.667	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.000
CC 1005452013	HELI ALBERTO MARIN PUENTES	01	00												X					0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.517.452	$ 242.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.517.452	$ 60.700	0,000	$ 1.517.452	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.517.452	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.500
CC 1005452013	HELI ALBERTO MARIN PUENTES	01	00												X					0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.455	$ 37.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 233.455	$ 9.400	0,000	$ 233.455	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.455	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800
CC 1094282401	WILLIAN ORLANDO ROJAS ALVAREZ	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 1095810739	DIANA PAOLA VANEGAS PORRAS	01	00																	0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.880.000	$ 460.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.880.000	$ 115.200	0,522	$ 2.880.000	$ 15.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.880.000	$ 115.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.300
CC 1095810739	DIANA PAOLA VANEGAS PORRAS	01	00														X			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 320.000	$ 51.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 320.000	$ 12.800	0,000	$ 320.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 320.000	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.800
CC 1095831315	MAYRA ALEJANDRA QUINTERO DELGADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.808.000	$ 449.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.808.000	$ 112.400	6,960	$ 2.808.000	$ 195.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.808.000	$ 112.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 869.600
CC 1095839242	MICHELLE MARIA TORRES PINZON	01	00		X						X									0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 291.818	$ 46.700	(EPS010) EPS SURA	$ 291.818	$ 11.700	0,522	$ 291.818	$ 1.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 994.515	$ 39.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.800
CC 1095839883	LEONARDO ANDRES DUARTE ROJAS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.820.543	$ 291.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.820.543	$ 72.900	6,960	$ 1.820.543	$ 126.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.820.543	$ 72.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.900
CC 1098690238	OSCAR YESID BLANCO ESTUPIÑAN	01	00	X																0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.508.533	$ 721.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.508.533	$ 180.400	6,960	$ 4.508.533	$ 313.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.508.533	$ 180.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.396.000
CC 1098704436	CLARA MELISSA DONADO ARIAS	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1098750530	JHON FREDDY BURGOS INFANTE	01	00	X																0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 2.024.100	$ 323.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.024.100	$ 81.000	6,960	$ 2.024.100	$ 140.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.024.100	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.800
CC 1098757546	LUIS ALFONSO SUAREZ ZARATE	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.636.831	$ 261.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.636.831	$ 65.500	6,960	$ 1.636.831	$ 114.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.636.831	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.900
CC 1098767789	ARNOLD GIOVANNY BURGOS INFANTE	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.517.451	$ 242.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 1099940291	JIREH LIZARAZO NAVAS	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.557.244	$ 249.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.557.244	$ 62.300	6,960	$ 1.557.244	$ 108.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.557.244	$ 62.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.200
CC 1099940291	JIREH LIZARAZO NAVAS	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 243.110	$ 38.900	(EPS010) EPS SURA	$ 243.110	$ 9.800	0,000	$ 243.110	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.100
CC 1127667629	EDUARDO JOSE BUTRON VARGAS	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/02/2026 | **Empresa NI901173035 CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS** | **Planilla Nro: 1079180644** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 72254372	EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO	01	00	X																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 6.552.000	$ 1.048.400	(EPS010) EPS SURA	$ 6.552.000	$ 262.100	6,960	$ 6.552.000	$ 456.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 6.552.000	$ 262.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.028.700
CC 91102897	MARCO TULIO GARNICA CORDERO	01	05	X																0	0	26	26	26	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.100
CC 91155195	HERMES HERNANDEZ AGUILAR	01	00	X																0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 91257569	JAVIER PICO NIÑO	01	00		X						X									0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 729.544	$ 29.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.100
CC 91264962	ALONSO CARRILLO LIZARAZO	01	00	X																0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 933.816	$ 149.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 933.816	$ 37.400	6,960	$ 933.816	$ 65.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.300
CC 91459128	ELIAS REATIGA RIATIGA	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.557.244	$ 249.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.557.244	$ 62.300	6,960	$ 1.557.244	$ 108.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.557.244	$ 62.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.200
CC 91459128	ELIAS REATIGA RIATIGA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 91480355	JORGE RAMIRO JOYA RODRIGUEZ	01	00	X																0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 2.024.100	$ 323.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.024.100	$ 81.000	6,960	$ 2.024.100	$ 140.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.024.100	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.800
CC 91530925	CARLOS ARTURO MOLINER JIMENEZ	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.616.934	$ 258.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.616.934	$ 64.700	6,960	$ 1.616.934	$ 112.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.616.934	$ 64.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.800
CC 91530925	CARLOS ARTURO MOLINER JIMENEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS010) EPS SURA	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 44.888.216	$ 46.405.667	$ 46.405.667	$ 47.769.888	$ 7.183.100	$ 1.857.200	$ 2.817.100	$ 1.841.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.699.000	$ 0	$ 13.699.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	43121774	9499365282	E	2026/02/10	2026/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$15.888.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL																						**$52.992.946**	**$8.557.900**			**$54.743.851**	**$2.191.600**			**$54.094.741**	**$2.137.500**			**$54.743.851**		**$3.001.500**		**$0**	**$0**		**$15.888.500**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5																						**$46.552.946**	**$7.527.500**			**$46.552.946**	**$1.863.900**			**$46.679.288**	**$1.840.800**			**$46.552.946**		**$2.959.700**		**$0**	**$0**		**$14.191.900**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER																						**$46.552.946**	**$7.527.500**			**$46.552.946**	**$1.863.900**			**$46.679.288**	**$1.840.800**			**$46.552.946**		**$2.959.700**		**$0**	**$0**		**$14.191.900**
1	CC	63553613	BERMUDEZ CALA SANDRA YOLIMA	X																230301	30	$2.342.600	$374.900	MIN001	30	$2.342.600	$93.800	CCF40	30	$2.342.600	$93.800	14-4	30	$2.342.600	6,960%	$163.100	30	$0	$0	Si	$725.600
2	CC	1098704436	DONADO ARIAS CLARA MELISSA							X										230201	30	$1.750.905	$280.200	EPS010	30	$1.750.905	$70.100	CCF40	30	$1.750.905	$70.100	14-4	30	$1.750.905	6,960%	$121.900	30	$0	$0	Si	$542.300
3	CC	13537319	PRADA JEREZ ALEXANDER							X										231001	26	$1.517.451	$242.800	EPS037	26	$1.517.451	$60.700	CCF40	26	$1.517.451	$60.700	14-4	26	$1.517.451	6,960%	$105.700	26	$0	$0	Si	$469.900
4	CC	13537319	PRADA JEREZ ALEXANDER													X				231001	4	$233.454	$37.400	EPS037	4	$233.454	$9.400	CCF40	4	$233.454	$9.400	14-4	4	$233.454	0,000%	$0	4	$0	$0	Si	$56.200
5	CC	1098756647	SANCHEZ JEREZ OSCAR ANDRES																	230201	30	$3.500.000	$560.000	EPS010	30	$3.500.000	$140.000	CCF40	30	$3.500.000	$140.000	14-4	30	$3.500.000	6,960%	$243.600	30	$0	$0	Si	$1.083.600
6	CC	1098673915	ZAMBRANO LESMES FABIAN LEONARDO																	25-14	30	$2.500.000	$400.000	EPS042	30	$2.500.000	$100.000	CCF40	30	$2.500.000	$100.000	14-4	30	$2.500.000	6,960%	$174.000	30	$0	$0	Si	$774.000

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-11, 08:22:03 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079239184

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 06/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS		
Documento	NI900688241	**Dirección**	CL 74A #22 - 31 OF 101 ED SAN FELIPE
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3045466736
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	HIGUERA PINO MARIA LUCIA	**Identificación**	CC 1095700657
Total Afiliados	26	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005327109	DARLIN MARTIN ORDUZ REY	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 700.362	$ 112.100	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 700.362	$ 28.100	6,960	$ 700.362	$ 48.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.100
CC 1007539883	KAROL YULIANA CELIS CUEVAS	01	00								X									0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.906.667	$ 305.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.906.667	$ 76.300	6,960	$ 1.906.667	$ 132.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.906.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.500
CC 1007539883	KAROL YULIANA CELIS CUEVAS	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 336.000	$ 53.800	(EPS010) EPS SURA	$ 336.000	$ 13.500	0,000	$ 336.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 293.334	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.100
CC 1007643671	ALEXANDER CAÑIZARES MANTILLA	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.996.839	$ 319.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.996.839	$ 79.900	6,960	$ 1.996.839	$ 139.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.996.839	$ 79.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.300
CC 1007784708	JULIAN ANDRES PALACIO CAPACHO	01	00	X									X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 2.204.083	$ 352.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.204.083	$ 88.200	6,960	$ 2.204.083	$ 153.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.204.083	$ 88.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 682.600
CC 1075256800	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ MURCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.700.000	$ 108.000	6,960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000
CC 1093738325	BAUDILLO RIVERA GOMEZ	01	00	X																0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 700.362	$ 112.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 700.362	$ 28.100	6,960	$ 700.362	$ 48.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.100
CC 1098661087	CATERINE MILENA RODRIGUEZ PEÑA	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.223.333	$ 355.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.223.333	$ 89.000	0,522	$ 2.223.333	$ 11.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.223.333	$ 89.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.500
CC 1098661087	CATERINE MILENA RODRIGUEZ PEÑA	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 76.667	$ 12.300	(EPS010) EPS SURA	$ 76.667	$ 3.100	0,000	$ 76.667	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 76.667	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.500
CC 1098691518	CAMILO ANDRES RUEDA CADENA	01	00	X																0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 1.120.000	$ 179.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.120.000	$ 44.800	0,522	$ 1.120.000	$ 5.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274.700
CC 1098701278	MICHAEL GIUSEPPE RESTREPO GARCIA	01	00								X									0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION	$ 992.180	$ 158.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 992.180	$ 39.700	6,960	$ 992.180	$ 69.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.300
CC 1098701278	MICHAEL GIUSEPPE RESTREPO GARCIA	01	00														X			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 1098701278	MICHAEL GIUSEPPE RESTREPO GARCIA	01	00														X			0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 700.362	$ 112.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 700.362	$ 28.100	0,000	$ 700.362	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.300
CC 1098701790	CARMEN JUDITH ALVARINO POLO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1098703436	RUBEN DARIO DELGADO PALACIO	01	00	X																0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.575.957	$ 252.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.575.957	$ 63.100	6,960	$ 1.575.957	$ 109.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.575.957	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 1098781831	DENNIS MELISSA TARAZONA MANTILLA	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 2.152.800	$ 344.500	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 2.152.800	$ 86.200	6,960	$ 2.152.800	$ 149.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.152.800	$ 86.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 666.800
CC 1098796268	ANGIE DANIELA SANTOS NIEVES	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.200.000	$ 128.000	6,960	$ 3.200.000	$ 222.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.800
CC 1098802898	JORGE BRITO MENDEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.290.105	$ 366.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.290.105	$ 91.700	6,960	$ 2.290.105	$ 159.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.290.105	$ 91.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.300
CC 1118566828	KAROL MELISSA TARAZONA ORTIZ	01	00																	0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 2.250.000	$ 360.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.250.000	$ 90.000	0,522	$ 2.250.000	$ 11.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-11, 09:45:25 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080206254

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA LUCIA HIGUERA PINO		
Documento	CC1095700657	**Dirección**	CRA 36 # 38 28 APTO 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212192048
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	129289795	9500149908	I	2026/03/09	2026/03/10	BANCO DE OCCIDENTE	1	$499,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098618429	OSPINO RODELO JOHANA PAOLA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	129289795	9500149908	I	2026/03/09	2026/03/10	BANCO DE OCCIDENTE	1	$499,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$200	$0	$280,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$200	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200	$0	$219,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$200	$0	$219,100
TOTAL				1	$499,100	$400	$0	$499,500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6004470877	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		93694499

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
SUBTOTAL:			1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
SUBTOTAL:			1	**$ 218.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 499.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 499.100**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6004470877**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			93694499

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-09, 10:38:32 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1080204876

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 06/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 1098618429	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 80089079	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 5.252.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 0	$ 365.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-09, 10:38:00 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080202190

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 06/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	10	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.595.712	$ 255.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.595.712	$ 63.900	6,960	$ 1.595.712	$ 111.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.595.712	$ 63.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.300
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 65.314	$ 7.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 65.314	$ 0	0,000	$ 65.314	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.900
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.728	$ 18.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 116.728	$ 4.700	0,000	$ 116.728	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 116.728	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.810.595	$ 289.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.810.595	$ 72.500	6,960	$ 1.810.595	$ 126.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.810.595	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.800
CC 1096193312	ISAI BAUTISTA PINZON	01	00		X								X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.461.741	$ 233.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.461.741	$ 58.500	6,960	$ 1.461.741	$ 101.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.620.706	$ 64.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.100
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.926.989	$ 308.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.926.989	$ 77.100	6,960	$ 1.926.989	$ 134.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.926.989	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.800
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.860.337	$ 297.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.860.337	$ 74.500	6,960	$ 1.860.337	$ 129.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.860.337	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.200
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.911.570	$ 305.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.911.570	$ 76.500	6,960	$ 1.911.570	$ 133.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.911.570	$ 76.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.000
CC 1102383713	YOHAN ALEXANDER CACERES PABON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.770.802	$ 283.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.770.802	$ 70.900	6,960	$ 1.770.802	$ 123.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.770.802	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.500
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.664.023	$ 266.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.664.023	$ 66.600	6,960	$ 1.664.023	$ 115.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.664.023	$ 66.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515.400
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.728	$ 18.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 116.728	$ 4.700	0,000	$ 116.728	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 116.728	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.770.802	$ 283.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.770.802	$ 70.900	6,960	$ 1.770.802	$ 123.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.770.802	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.822.246	$ 17.822.246	$ 17.822.246	$ 17.915.897	$ 2.849.600	$ 710.900	$ 1.220.200	$ 707.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.488.600	$ 0	$ 5.488.600

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-09, 10:23:16 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080165343

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 06/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		
Total Afiliados	21	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002237235	KILIAN ENRIQUE PERTUZ JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.055.722	$ 329.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.055.722	$ 82.300	6,960	$ 2.055.722	$ 143.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.055.722	$ 82.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636.700
CC 1005337243	MARIA DANIELA JEREZ RANGEL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1005452013	HELI ALBERTO MARIN PUENTES	01	00												X					0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.459.089	$ 233.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.459.089	$ 58.400	0,000	$ 1.459.089	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.459.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.900
CC 1005452013	HELI ALBERTO MARIN PUENTES	01	00												X					0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.819	$ 46.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 291.819	$ 11.700	0,000	$ 291.819	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.819	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.400
CC 1094282401	WILLIAN ORLANDO ROJAS ALVAREZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.886.892	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.700
CC 1095810739	DIANA PAOLA VANEGAS PORRAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.200.000	$ 128.000	0,522	$ 3.200.000	$ 16.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 784.800
CC 1095831315	MAYRA ALEJANDRA QUINTERO DELGADO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.685.655	$ 589.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.685.655	$ 147.500	6,960	$ 3.685.655	$ 256.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.685.655	$ 147.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.141.400
CC 1095839883	LEONARDO ANDRES DUARTE ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.890.182	$ 302.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.890.182	$ 75.700	6,960	$ 1.890.182	$ 131.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.890.182	$ 75.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.500
CC 1098690238	OSCAR YESID BLANCO ESTUPIÑAN	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.897.200	$ 783.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 4.897.200	$ 195.900	6,960	$ 4.897.200	$ 340.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.897.200	$ 195.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.516.300
CC 1098704436	CLARA MELISSA DONADO ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1098750530	JHON FREDDY BURGOS INFANTE	01	00	X																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.335.500	$ 373.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.335.500	$ 93.500	6,960	$ 2.335.500	$ 162.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.516.891	$ 100.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 730.500
CC 1098757546	LUIS ALFONSO SUAREZ ZARATE	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.943.182	$ 311.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.943.182	$ 77.800	6,960	$ 1.943.182	$ 135.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.943.182	$ 77.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 601.900
CC 1098767789	ARNOLD GIOVANNY BURGOS INFANTE	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.886.892	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.700
CC 1099940291	JIREH LIZARAZO NAVAS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.880.233	$ 300.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.880.233	$ 75.300	6,960	$ 1.880.233	$ 130.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.880.233	$ 75.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 582.400
CC 1127667629	EDUARDO JOSE BUTRON VARGAS	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.886.892	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.700
CC 72254372	EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO	01	00								X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 6.879.600	$ 1.100.800	(EPS010) EPS SURA	$ 6.879.600	$ 275.200	6,960	$ 6.879.600	$ 478.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 6.879.600	$ 275.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.130.100
CC 91102897	MARCO TULIO GARNICA CORDERO	01	05	X																0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.886.892	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267.500
CC 91155195	HERMES HERNANDEZ AGUILAR	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.886.892	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.700
CC 91264962	ALONSO CARRILLO LIZARAZO	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.862.963	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/03/2026 | **Empresa NI901173035 CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS** | **Planilla Nro: 1080165343** | **Periodo Cotización: febrero de 2026** | **Periodo Servicio: marzo de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91459128	ELIAS REATIGA RIATIGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.949.871	$ 312.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.949.871	$ 78.000	6,960	$ 1.949.871	$ 135.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.949.871	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.800
CC 91480355	JORGE RAMIRO JOYA RODRIGUEZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.335.500	$ 373.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.335.500	$ 93.500	6,960	$ 2.335.500	$ 162.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.516.891	$ 100.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 730.500
CC 91530925	CARLOS ARTURO MOLINER JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.019.510	$ 323.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.019.510	$ 80.800	6,960	$ 2.019.510	$ 140.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.019.510	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 49.828.493	$ 51.579.398	$ 51.579.398	$ 52.734.173	$ 7.973.600	$ 2.064.300	$ 3.263.000	$ 2.040.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.341.000	$ 0	$ 15.341.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	119456138	9501161061	E	2026/03/10	2026/03/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$18,363,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (26 Afiliados)																								$60,560,232	$9,771,600			$62,311,137	$2,488,700			$60,653,031	$2,427,000			$62,311,137		$3,676,000		$0	$0		$18,363,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)																								$8,409,209	$1,345,600			$10,160,114	$406,600			$8,438,392	$337,700			$10,160,114		$53,300		$0	$0		$2,143,200
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																								$8,409,209	$1,345,600			$10,160,114	$406,600			$8,438,392	$337,700			$10,160,114		$53,300		$0	$0		$2,143,200
1	CC	91071916	ACERO ROJAS JULIO CESAR																				0	$0	$0	MIN001	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$875,453	$35,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$114,400
2	CC	1098762015	DIAZ ARIZA KAREN DAYANNA	X																		230301	19	$2,216,667	$354,700	EPS005	19	$2,216,667	$88,700	CCF40	19	$2,216,667	$88,700	14-4	19	$2,216,667	0.522%	$11,600	19	$0	$0	Si	$543,700
3	CC	1100893515	IBAÑEZ LOZADA DIANA MILENA							X												230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
4	CC	1098725994	PARADA HERNANDEZ YADDY VANESSA							X												25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
5	CC	1095839242	TORRES PINZON MICHELLE MARIA	X																		230201	29	$1,692,542	$270,900	EPS010	29	$1,692,542	$67,800	CCF40	29	$846,272	$33,900	14-4	29	$1,692,542	0.522%	$8,900	29	$0	$0	Si	$381,500

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (21 Afiliados)																							**$52,151,023**	**$8,426,000**			**$52,151,023**	**$2,082,100**			**$52,214,639**	**$2,089,300**			**$52,151,023**		**$3,622,700**		**$0**	**$0**		**$16,220,100**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (21 Afiliados)																							**$52,151,023**	**$8,426,000**			**$52,151,023**	**$2,082,100**			**$52,214,639**	**$2,089,300**			**$52,151,023**		**$3,622,700**		**$0**	**$0**		**$16,220,100**
6	CC	18971400	ARGUELLES MARTINEZ JIMMY																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	91464253	BAUTISTA ACOSTA WILLINTON							X		X									25-14	30	$2,370,682	$379,400	EPS037	30	$2,370,682	$94,900	CCF40	30	$2,370,682	$94,900	14-4	30	$2,370,682	6.960%	$165,000	30	$0	$0	Si	$734,200
8	CC	88203988	BERMUDEZ PEREIRA LUIS ERNESTO									X									230201	30	$1,914,058	$306,300	EPS041	30	$1,914,058	$76,600	CCF40	30	$1,914,058	$76,600	14-4	30	$1,914,058	6.960%	$133,300	30	$0	$0	Si	$592,800
9	CC	63553613	BERMUDEZ CALA SANDRA YOLIMA																		230301	30	$2,506,582	$401,100	MIN001	30	$2,506,582	$100,300	CCF40	30	$2,506,582	$100,300	14-4	30	$2,506,582	6.960%	$174,500	30	$0	$0	Si	$776,200
10	CC	1096063092	BUSTOS PARADA HECTOR DANILO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
11	CC	91458433	CABALLERO JAIMES HELMER									X									230301	30	$1,979,716	$316,800	EPS017	30	$1,979,716	$79,200	CCF40	30	$1,979,716	$79,200	14-4	30	$1,979,716	6.960%	$137,800	30	$0	$0	Si	$613,000
12	CC	1065890228	CAÑIZARES CORDERO MARIA ANGELICA	X																	231001	29	$2,900,000	$464,000	EPS005	29	$2,900,000	$116,000	CCF40	29	$2,900,000	$116,000	14-4	29	$2,900,000	6.960%	$201,900	29	$0	$0	Si	$897,900
13	CC	1099371577	DIAZ ORTEGA HUGO ALFREDO							X		X									230201	30	$2,256,250	$361,000	EPS005	30	$2,256,250	$90,300	CCF40	30	$2,256,250	$90,300	14-4	30	$2,256,250	6.960%	$157,100	30	$0	$0	Si	$698,700
14	CC	1098704436	DONADO ARIAS CLARA MELISSA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
15	CC	1101019874	GARCIA VARGAS JOLMAN JERONIMO									X									230201	30	$2,025,877	$324,200	EPS002	30	$2,025,877	$81,100	CCF40	30	$2,025,877	$81,100	14-4	30	$2,025,877	6.960%	$141,100	30	$0	$0	Si	$627,500
16	CC	13516255	MANRIQUE ESTUPIÑAN FREDY LEONARDO									X									230301	30	$1,949,871	$312,000	EPS002	30	$1,949,871	$78,000	CCF40	30	$1,949,871	$78,000	14-4	30	$1,949,871	6.960%	$135,800	30	$0	$0	Si	$603,800
17	CC	1095831892	MEDINA FLOREZ JHONATAN									X									25-14	30	$1,949,871	$312,000	EPS002	30	$1,949,871	$78,000	CCF40	30	$1,949,871	$78,000	14-4	30	$1,949,871	6.960%	$135,800	30	$0	$0	Si	$603,800
18	CC	13542493	MONARES CUADROS EMIRO									X									25-14	30	$1,999,613	$320,000	EPS037	30	$1,999,613	$80,000	CCF40	30	$1,999,613	$80,000	14-4	30	$1,999,613	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
19	CC	1098805393	PABON MARTINEZ CAMILO ANDREY		X																230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF40	28	$1,814,521	$72,600	14-4	28	$1,634,178	6.960%	$113,800	28	$0	$0	Si	$513,300
20	CC	1098805393	PABON MARTINEZ CAMILO ANDREY										X								230301	2	$116,727	$14,100	EPS002	2	$116,727	$0	CCF40	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$14,100
21	CC	1098682052	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA							X											25-14	30	$8,560,000	$1,455,200	EPS005	30	$8,560,000	$342,400	CCF40	30	$8,560,000	$342,400	14-4	30	$8,560,000	6.960%	$595,800	30	$0	$0	Si	$2,735,800
22	CC	13537319	PRADA JEREZ ALEXANDER									X									231001	30	$1,984,691	$317,600	EPS037	30	$1,984,691	$79,400	CCF40	30	$1,984,691	$79,400	14-4	30	$1,984,691	6.960%	$138,200	30	$0	$0	Si	$614,600
23	CC	1098701278	RESTREPO GARCIA MICHAEL GIUSEPPE																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
24	CC	1098756647	SANCHEZ JEREZ OSCAR ANDRES							X											230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
25	CC	1098640002	SEPULVEDA PARRA OLGER							X		X									230301	30	$2,273,410	$363,800	EPS002	30	$2,273,410	$91,000	CCF40	30	$2,273,410	$91,000	14-4	30	$2,273,410	6.960%	$158,300	30	$0	$0	Si	$704,100
26	CC	1234339663	VILLAMIZAR URBINA JONATHAN									X									230301	30	$2,025,877	$324,200	EPS037	30	$2,025,877	$81,100	CCF40	30	$2,025,877	$81,100	14-4	30	$2,025,877	6.960%	$141,100	30	$0	$0	Si	$627,500
27	CC	1098673915	ZAMBRANO LESMES FABIAN LEONARDO							X											25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS042	30	$2,700,000	$108,000	CCF40	30	$2,700,000	$108,000	14-4	30	$2,700,000	6.960%	$188,000	30	$0	$0	Si	$836,000
Total			**Afiliados(26)**																				$60,560,232	$9,771,600			$62,311,137	$2,488,700			$60,653,031	$2,427,000			$62,311,137		$3,676,000		$0	$0		$18,363,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$9,771,600	$0	$0	$9,771,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$781,600	$0	$0	$781,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$3,498,800	$0	$0	$3,498,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,748,200	$0	$0	$2,748,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,743,000	$0	$0	$2,743,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$3,676,000	$0	$0	$3,676,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	26	$3,676,000	$0	$0	$3,676,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,427,000	$0	$0	$2,427,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	26	$2,427,000	$0	$0	$2,427,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				26	$2,488,700	$0	$0	$2,488,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$108,000	$0	$0	$108,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$377,900	$0	$0	$377,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$79,200	$0	$0	$79,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$170,400	$0	$0	$170,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$405,500	$0	$0	$405,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$76,600	$0	$0	$76,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$563,600	$0	$0	$563,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$637,400	$0	$0	$637,400
TOTAL				26	$18,363,300	$0	$0	$18,363,300

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-09, 10:20:49 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080186341

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 06/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS		
Documento	NI900688241	**Dirección**	CL 74A #22 - 31 OF 101 ED SAN FELIPE
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3045466736
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	HIGUERA PINO MARIA LUCIA	**Identificación**	CC 1095700657
Total Afiliados	29	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005327109	DARLIN MARTIN ORDUZ REY	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1007434553	ARLEY JESUS GALVIS MENDOZA	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(CCFC50) EPS-S COMFAORIENTE	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 1007539883	KAROL YULIANA CELIS CUEVAS	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.945.495	$ 471.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.945.495	$ 117.900	6,960	$ 2.945.495	$ 205.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.945.495	$ 117.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912.200
CC 1007643671	ALEXANDER CAÑIZARES MANTILLA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.175.000	$ 348.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 2.175.000	$ 87.000	6,960	$ 2.175.000	$ 151.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.175.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.400
CC 1007784708	JULIAN ANDRES PALACIO CAPACHO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.243.830	$ 359.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.243.830	$ 89.800	6,960	$ 2.243.830	$ 156.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.243.830	$ 89.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 694.900
CC 1075256800	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ MURCIA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.050.905	$ 488.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.050.905	$ 122.100	6,960	$ 3.050.905	$ 212.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.050.905	$ 122.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 944.800
CC 1093738325	BAUDILLO RIVERA GOMEZ	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.459.088	$ 58.400	6,960	$ 1.459.088	$ 101.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.459.088	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.900
CC 1093738325	BAUDILLO RIVERA GOMEZ	01	00														L			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 291.818	$ 46.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 1098661087	CATERINE MILENA RODRIGUEZ PEÑA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100
CC 1098690238	OSCAR YESID BLANCO ESTUPIÑAN	01	00	X																0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.692.542	$ 270.900	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.692.542	$ 67.800	6,960	$ 1.692.542	$ 117.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400
CC 1098691518	CAMILO ANDRES RUEDA CADENA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.200.000	$ 672.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.200.000	$ 168.000	0,522	$ 4.200.000	$ 22.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.200.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.030.000
CC 1098701278	MICHAEL GIUSEPPE RESTREPO GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1098701790	CARMEN JUDITH ALVARINO POLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1098703436	RUBEN DARIO DELGADO PALACIO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.520.201	$ 403.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.520.201	$ 100.900	6,960	$ 2.520.201	$ 175.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.520.201	$ 100.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 780.600
CC 1098781831	DENNIS MELISSA TARAZONA MANTILLA	01	00								X									0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 2.250.000	$ 360.000	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 2.250.000	$ 90.000	6,960	$ 2.250.000	$ 156.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.600
CC 1098781831	DENNIS MELISSA TARAZONA MANTILLA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 166.668	$ 26.700	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 166.668	$ 6.700	0,000	$ 166.668	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 166.668	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.400
CC 1098781831	DENNIS MELISSA TARAZONA MANTILLA	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 83.334	$ 13.400	(EPS046) SALUD MIA EPS046	$ 83.334	$ 3.400	0,000	$ 83.334	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 83.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800
CC 1098796268	ANGIE DANIELA SANTOS NIEVES	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.600.000	$ 576.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.600.000	$ 144.000	6,960	$ 3.600.000	$ 250.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.114.600
CC 1098802898	JORGE BRITO MENDEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.366.522	$ 378.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.366.522	$ 94.700	6,960	$ 2.366.522	$ 164.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.366.522	$ 94.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 732.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-10, 09:13:02 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080790202

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 09/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	9	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TAP	VSP	VSP	SUS	LMA	IGE	LMA	VAC	VAC	VST	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.796.999	$ 287.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.796.999	$ 71.900	6,960	$ 1.796.999	$ 125.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.796.999	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.500
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00													X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 59.259	$ 9.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 59.259	$ 2.400	0,000	$ 59.259	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.300
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.772.129	$ 283.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.772.129	$ 70.900	6,960	$ 1.772.129	$ 123.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.772.129	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.800
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00													X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 60.354	$ 9.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 60.354	$ 2.500	0,000	$ 60.354	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.987.803	$ 318.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.987.803	$ 79.600	6,960	$ 1.987.803	$ 138.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.987.803	$ 79.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.700
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00													X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 64.233	$ 10.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 64.233	$ 2.600	0,000	$ 64.233	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 63.334	$ 2.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.500
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00									X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.723.713	$ 275.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.723.713	$ 69.000	6,960	$ 1.723.713	$ 120.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.723.713	$ 69.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.800
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00											X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 62.011	$ 7.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 62.011	$ 0	0,000	$ 62.011	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00													X			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 62.012	$ 10.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 62.012	$ 2.500	0,000	$ 62.012	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.932.462	$ 309.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.932.462	$ 77.300	6,960	$ 1.932.462	$ 134.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.932.462	$ 77.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.300
CC 1102383713	YOHAN ALEXANDER CACERES PABON	01	00	X								X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 789.897	$ 126.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 789.897	$ 31.600	6,960	$ 789.897	$ 55.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 866.331	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.700
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.782.077	$ 285.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.782.077	$ 71.300	6,960	$ 1.782.077	$ 124.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.782.077	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.900
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00													X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 59.359	$ 9.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 59.359	$ 2.400	0,000	$ 59.359	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.300
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00									X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.715.092	$ 274.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.715.092	$ 68.700	6,960	$ 1.715.092	$ 119.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.715.092	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.300
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00											X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.728	$ 18.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 116.728	$ 4.700	0,000	$ 116.728	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 116.728	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00													X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.811.922	$ 290.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.811.922	$ 72.500	6,960	$ 1.811.922	$ 126.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.811.922	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.200
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00													X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 59.027	$ 9.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 59.027	$ 2.400	0,000	$ 59.027	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.913.441	$ 15.913.441	$ 15.913.441	$ 15.918.774	$ 2.544.500	$ 634.700	$ 1.066.100	$ 632.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.878.200	$ 0	$ 4.878.200

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-10, 09:12:37 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1080790284

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 09/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 1098618429	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 80089079	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 5.252.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700	$ 0	$ 365.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-13, 08:23:26 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080958708

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 10/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA LUCIA HIGUERA PINO		
Documento	CC1095700657	**Dirección**	CRA 36 # 38 28 APTO 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212192048
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	212339961	9501877860	I	2026/04/10	2026/04/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098618429	OSPINO RODELO JOHANA PAOLA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098618429		OSPINO RODELO JOHANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 197 15 185 CONJ VSER 2 CS 55	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6898027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	212339961	9501877860	I	2026/04/10	2026/04/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-10, 09:55:29 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080788421

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

PAGADA 2026-04-08 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	17
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 72254372		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			
															0	27	27	27	27		F	$ 6.879.600
												X			0	3	3	3	3		F	$ 6.879.600

Pensión							Salud					
Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC
231001		16 %	$ 6.191.640	$ 990.700	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 6.191.640	$ 247.700	$ 0
231001		16 %	$ 687.960	$ 110.100	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 687.960	$ 27.600	$ 0

Riesgos					Caja				Parafiscales			
Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
14-4	5	6,960 %	$ 6.191.640	$ 431.000	CCF40	4 %	$ 6.191.640	$ 247.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0
14-4		0,000 %	$ 687.960	$ 0	CCF40	4 %	$ 687.960	$ 27.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.100.800	$ 0	$ 0	$ 275.300	$ 431.000	$ 275.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.082.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	210164771	9502917642	E	2026/04/13	2026/04/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$17,429,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (25 Afiliados)																					$58,219,145	$9,402,500			$59,970,050	$2,400,900			$58,104,376	$2,326,200			$59,970,050		$3,300,200			$0	$0		$17,429,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)																					$9,750,909	$1,560,600			$11,501,814	$460,600			$9,750,909	$390,500			$11,501,814		$57,100			$0	$0		$2,468,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																					$4,500,002	$720,200			$4,500,002	$180,200			$4,500,002	$180,200			$4,500,002		$22,800			$0	$0		$1,103,400
1	CC	1100893515	BAÑEZ LOZADA DIANA MILENA																	23030 1	29	$2,416,667	$386,700	EPS002	29	$2,416,667	$96,700	CCF40	29	$2,416,667	$96,700	14-4	29	$2,416,667	0.522%	$12,700	29	$0	$0	Si	$592,800
2	CC	1100893515	BAÑEZ LOZADA DIANA MILENA												X					23030 1	1	$83,334	$13,400	EPS002	1	$83,334	$3,400	CCF40	1	$83,334	$3,400	14-4	1	$83,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,200
3	CC	1098725994	PARADA HERNANDEZ YADDY VANESSA																	25-14	29	$1,933,334	$309,400	EPS010	29	$1,933,334	$77,400	CCF40	29	$1,933,334	$77,400	14-4	29	$1,933,334	0.522%	$10,100	29	$0	$0	Si	$474,300
4	CC	1098725994	PARADA HERNANDEZ YADDY VANESSA												X					25-14	1	$66,667	$10,700	EPS010	1	$66,667	$2,700	CCF40	1	$66,667	$2,700	14-4	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																					$3,500,002	$560,200			$3,500,002	$140,200			$3,500,001	$140,100			$3,500,002		$15,900			$0	$0		$856,400
5	CC	1098762015	DIAZ ARIZA KAREN DAYANNA																	23030 1	26	$3,033,334	$485,400	EPS005	26	$3,033,334	$121,400	CCF40	26	$3,033,334	$121,400	14-4	26	$3,033,334	0.522%	$15,900	26	$0	$0	Si	$744,100
6	CC	1098762015	DIAZ ARIZA KAREN DAYANNA												X					23030 1	1	$116,667	$18,700	EPS005	1	$116,667	$4,700	CCF40	1	$116,667	$4,700	14-4	1	$116,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$28,100
7	CC	1098762015	DIAZ ARIZA KAREN DAYANNA												X					23030 1	3	$350,001	$56,100	EPS005	3	$350,001	$14,100	CCF40	3	$350,000	$14,000	14-4	3	$350,001	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$84,200
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$875,453	$35,100			$1,750,905		$9,200			$0	$0		$394,600
8	CC	1095839242	TORRES PINZON MICHELLE MARIA																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$875,453	$35,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$394,600
Ciudad: SAN GIL Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,750,905	$70,100			$875,453	$35,100			$1,750,905		$9,200			$0	$0		$114,400
9	CC	91071916	ACERO ROJAS JULIO CESAR																		0	$0	$0	MIN001	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$875,453	$35,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$114,400

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (20 Afiliados)								$48,468,236	$7,841,900			$48,468,236	$1,940,300			$48,353,467	$1,935,700			$48,468,236		$3,243,100		$0	$0		$14,961,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (11 Afiliados)								$23,311,997	$3,730,700			$23,311,997	$933,400			$23,203,860	$929,000			$23,311,997		$1,520,800		$0	$0		$7,113,900
10	CC	91464253	BAUTISTA ACOSTA WILLINTON	X		25-14	24	$1,907,982	$305,300	EPS037	24	$1,907,982	$76,400	CCF40	24	$1,907,982	$76,400	14-4	24	$1,907,982	6.960%	$132,800	24	$0	$0	Si	$590,900
11	CC	91464253	BAUTISTA ACOSTA WILLINTON		L	25-14	5	$395,114	$63,300	EPS037	5	$395,114	$15,900	CCF40	5	$305,000	$12,200	14-4	5	$395,114	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$91,400
12	CC	91464253	BAUTISTA ACOSTA WILLINTON		X	25-14	1	$79,023	$12,700	EPS037	1	$79,023	$3,200	CCF40	1	$61,000	$2,500	14-4	1	$79,023	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,400
13	CC	63553613	BERMUDEZ CALA SANDRA YOLIMA			230301	27	$2,255,924	$361,000	MIN001	27	$2,255,924	$90,300	CCF40	27	$2,255,924	$90,300	14-4	27	$2,255,924	6.960%	$157,100	27	$0	$0	Si	$698,700
14	CC	63553613	BERMUDEZ CALA SANDRA YOLIMA		X	230301	3	$250,659	$40,200	MIN001	3	$250,659	$10,100	CCF40	3	$250,659	$10,100	14-4	3	$250,659	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$60,400
15	CC	91458433	CABALLERO JAIMES HELMER	X		230301	30	$1,770,802	$283,400	EPS017	30	$1,770,802	$70,900	CCF40	30	$1,770,802	$70,900	14-4	30	$1,770,802	6.960%	$123,300	30	$0	$0	Si	$548,500
16	CC	1065890228	CAÑIZARES CORDERO MARIA ANGELICA			231001	27	$2,700,000	$432,000	EPS005	27	$2,700,000	$108,000	CCF40	27	$2,700,000	$108,000	14-4	27	$2,700,000	6.960%	$188,000	27	$0	$0	Si	$836,000
17	CC	1065890228	CAÑIZARES CORDERO MARIA ANGELICA		X	231001	3	$300,000	$48,000	EPS005	3	$300,000	$12,000	CCF40	3	$300,000	$12,000	14-4	3	$300,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$72,000
18	CC	1099371577	DIAZ ORTEGA HUGO ALFREDO	X		230201	30	$2,007,955	$321,300	EPS005	30	$2,007,955	$80,400	CCF40	30	$2,007,955	$80,400	14-4	30	$2,007,955	6.960%	$139,800	30	$0	$0	Si	$621,900
19	CC	1098704436	DONADO ARIAS CLARA MELISSA			230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS010	27	$1,575,815	$63,100	CCF40	27	$1,575,815	$63,100	14-4	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	Si	$488,100
20	CC	1098704436	DONADO ARIAS CLARA MELISSA		X	230201	3	$175,091	$28,100	EPS010	3	$175,091	$7,100	CCF40	3	$175,091	$7,100	14-4	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$42,300
21	CC	1101019874	GARCIA VARGAS JOLMAN JERONIMO	X		230201	30	$1,790,698	$286,600	EPS002	30	$1,790,698	$71,700	CCF40	30	$1,790,698	$71,700	14-4	30	$1,790,698	6.960%	$124,700	30	$0	$0	Si	$554,700
22	CC	13542493	MONARES CUADROS EMIRO			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
23	CC	1098701278	RESTREPO GARCIA MICHAEL GIUSEPPE			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
24	CC	1098640002	SEPULVEDA PARRA OLGER	X		230301	30	$1,901,124	$304,200	EPS002	30	$1,901,124	$76,100	CCF40	30	$1,901,124	$76,100	14-4	30	$1,901,124	6.960%	$132,400	30	$0	$0	Si	$588,800
25	CC	1098673915	ZAMBRANO LESMES FABIAN LEONARDO			25-14	27	$2,430,000	$388,800	EPS042	27	$2,430,000	$97,200	CCF40	27	$2,430,000	$97,200	14-4	27	$2,430,000	6.960%	$169,200	27	$0	$0	Si	$752,400
26	CC	1098673915	ZAMBRANO LESMES FABIAN LEONARDO		X	25-14	3	$270,000	$43,200	EPS042	3	$270,000	$10,800	CCF40	3	$270,000	$10,800	14-4	3	$270,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$64,800
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)								$21,510,177	$3,527,600			$21,510,177	$860,800			$21,503,545	$860,600			$21,510,177		$1,480,600		$0	$0		$6,729,600
27	CC	88203988	BERMUDEZ PEREIRA LUIS ERNESTO	X		230201	30	$1,760,853	$281,800	EPS041	30	$1,760,853	$70,500	CCF40	30	$1,760,853	$70,500	14-4	30	$1,760,853	6.960%	$122,600	30	$0	$0	Si	$545,400
28	CC	1096063092	BUSTOS PARADA HECTOR DANILO			25-14	27	$1,575,815	$252,200	ESSC24	27	$1,575,815	$63,100	CCF40	27	$1,575,815	$63,100	14-4	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	Si	$488,100
29	CC	1096063092	BUSTOS PARADA HECTOR DANILO		X	25-14	3	$175,091	$28,100	ESSC24	3	$175,091	$7,100	CCF40	3	$175,091	$7,100	14-4	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$42,300
30	CC	13516255	MANRIQUE ESTUPIÑAN FREDY LEONARDO	X		230301	29	$1,831,819	$293,100	EPS002	29	$1,831,819	$73,300	CCF40	29	$1,831,819	$73,300	14-4	29	$1,831,819	6.960%	$127,500	29	$0	$0	Si	$567,200
31	CC	13516255	MANRIQUE ESTUPIÑAN FREDY LEONARDO		X	230301	1	$64,996	$10,400	EPS002	1	$64,996	$2,600	CCF40	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$64,996	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$15,400
32	CC	1095831892	MEDINA FLOREZ JHONATAN			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
33	CC	1098682052	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA			25-14	30	$8,560,000	$1,455,200	EPS005	30	$8,560,000	$342,400	CCF40	30	$8,560,000	$342,400	14-4	30	$8,560,000	6.960%	$595,800	30	$0	$0	Si	$2,735,800
34	CC	1098756647	SANCHEZ JEREZ OSCAR ANDRES			230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
35	CC	1234339663	VILLAMIZAR URBINA JONATHAN	X		230301	30	$1,790,698	$286,600	EPS037	30	$1,790,698	$71,700	CCF40	30	$1,790,698	$71,700	14-4	30	$1,790,698	6.960%	$124,700	30	$0	$0	Si	$554,700
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)								$1,750,906	$280,300			$1,750,906	$70,200			$1,750,906	$70,200			$1,750,906		$109,700		$0	$0		$530,400
36	CC	18971400	ARGUELLES MARTINEZ JIMMY			230201	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF40	27	$1,575,815	$63,100	14-4	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	Si	$488,100
37	CC	18971400	ARGUELLES MARTINEZ JIMMY		X	230201	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF40	3	$175,091	$7,100	14-4	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$42,300
Ciudad: LEBRIJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)								$1,895,156	$303,300			$1,895,156	$75,900			$1,895,156	$75,900			$1,895,156		$132,000		$0	$0		$587,100
38	CC	13537319	PRADA JEREZ ALEXANDER	X		231001	30	$1,895,156	$303,300	EPS037	30	$1,895,156	$75,900	CCF40	30	$1,895,156	$75,900	14-4	30	$1,895,156	6.960%	$132,000	30	$0	$0	Si	$587,100
Total		**Afiliados(25)**						$58,219,145	$9,402,500			$59,970,050	$2,400,900			$58,104,376	$2,326,200			$59,970,050		$3,300,200		$0	$0		$17,429,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$9,402,500	$0	$0	$9,402,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$783,300	$0	$0	$783,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$3,429,300	$0	$0	$3,429,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,539,200	$0	$0	$2,539,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,650,700	$0	$0	$2,650,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$3,300,200	$0	$0	$3,300,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	25	$3,300,200	$0	$0	$3,300,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$2,326,200	$0	$0	$2,326,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	25	$2,326,200	$0	$0	$2,326,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				25	$2,400,900	$0	$0	$2,400,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$108,000	$0	$0	$108,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,200	$0	$0	$70,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$380,400	$0	$0	$380,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,900	$0	$0	$70,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$170,500	$0	$0	$170,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$383,400	$0	$0	$383,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,500	$0	$0	$70,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$464,000	$0	$0	$464,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$683,000	$0	$0	$683,000
TOTAL				**25**	**$17,429,800**	**$0**	**$0**	**$17,429,800**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 05:00:37 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1081282725

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 14/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1095700657	MARIA LUCIA HIGUERA PINO	59	00		T															0	0	0	15	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.000
CC 1098618429	JOHANA PAOLA OSPINO RODELO	59	00		T															0	0	0	15	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.000
CC 80089079	JUAN CARLOS RINCON LOZANO	59	00		T															0	0	0	15	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 2.626.359	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.000	$ 0	$ 183.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-14, 05:01:12 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081281840

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 14/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSOLIDACION GIRON		
Documento	NI901982571	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 AP 2405
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3012765665
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA	**Identificación**	CC 1098682052
Total Afiliados	8	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00	X									X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 663.222	$ 106.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 663.222	$ 26.600	6,960	$ 663.222	$ 46.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 576.622	$ 23.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.100
CC 1005157855	GIOVANY SEBASTIAN PARRA FERRER	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 296.293	$ 47.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 296.293	$ 11.900	0,000	$ 296.293	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.100
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00	X									X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 749.176	$ 119.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 749.176	$ 30.000	6,960	$ 749.176	$ 52.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 729.279	$ 29.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.300
CC 1082871247	MANUEL ENRIQUE CASTILLO FLOREZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 301.766	$ 48.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 301.766	$ 12.100	0,000	$ 301.766	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.100
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00	X									X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 719.697	$ 115.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 719.697	$ 28.800	6,960	$ 719.697	$ 50.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 649.141	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.100
CC 1098605491	EDSON ALEXANDER PORTILLA ARDILA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 321.165	$ 51.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 321.165	$ 12.900	0,000	$ 321.165	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 316.667	$ 12.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.000
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.669.396	$ 267.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.669.396	$ 66.800	6,960	$ 1.669.396	$ 116.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.669.396	$ 66.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.000
CC 1101520618	JESUS ALBERTO MAYORGA MAYORGA	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 310.057	$ 49.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 310.057	$ 12.500	0,000	$ 310.057	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.900
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 796.662	$ 127.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 796.662	$ 31.900	6,960	$ 796.662	$ 55.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.036.830	$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.400
CC 1101596200	ISAIAS GARCIA JAIMES	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 128.831	$ 20.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 128.831	$ 5.200	0,000	$ 128.831	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 122.564	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.900
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00	X									X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 663.222	$ 106.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 663.222	$ 26.600	6,960	$ 663.222	$ 46.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 712.953	$ 28.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.600
CC 1124048478	MIGUEL ANTONIO RANGEL FLORIAN	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 296.792	$ 47.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 296.792	$ 11.900	0,000	$ 296.792	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.100
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00	X									X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 769.072	$ 123.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 769.072	$ 30.800	6,960	$ 769.072	$ 53.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 819.144	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.300
CC 1232891906	JARRINSON STEVEN CAMARON CAICEDO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00	X									X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 673.170	$ 107.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 673.170	$ 27.000	6,960	$ 673.170	$ 46.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 655.811	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000
CC 91479571	WILLINGTONG ALARCON ASCANIO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 295.134	$ 47.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 295.134	$ 11.900	0,000	$ 295.134	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.945.473	$ 8.945.473	$ 8.945.473	$ 9.039.315	$ 1.432.200	$ 358.600	$ 466.900	$ 362.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.619.900	$ 0	$ 2.619.900

ANEXO N. 02

SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-06, 03:40:28 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1076964976

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 06/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER GIRON		
Documento	NI901985184	**Dirección**	CR 27 #37 - 33
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	**Identificación**	CC 79431435
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91518201	JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR DURAN	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1.866.667	$ 298.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.866.667	$ 74.700	6,960	$ 1.866.667	$ 130.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.866.667	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.866.667	$ 1.866.667	$ 1.866.667	$ 1.866.667	$ 298.700	$ 74.700	$ 130.000	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.100	$ 0	$ 578.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 10 de noviembre de 2025 09:57:37 AM

Período del informe: 202510

Pagada 10/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER GIRON		
Documento	NI901985184	**Dirección**	CR 27 #37 - 33
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	**Identificación**	CC79431435

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	1077041111	10/11/2025	202510	202510	R																	0	0	16	0	NIN-AF	NIN-EP	14-4	NIN-CC	$0	$0	$759.200	$0	$0	$0	$52.900	$0	$0	$0	$0	$0	$52.900
CC 1098739051	TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN	1076965158	06/11/2025	202510	202510	R																	0	0	16	0	NIN-AF	NIN-EP	14-4	NIN-CC	$0	$0	$759.200	$0	$0	$0	$52.900	$0	$0	$0	$0	$0	$52.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 07 de noviembre de 2025 09:27:49 AM

Período del informe: 202510

Pagada 06/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUANLE SAS	**Sucursal**	002 GENERAL
Documento	NI900714233	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 EDF SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 91275391	ALVAREZ CARREÑO JORGE ELIECER	1076979106	06/11/2025	202510	202511	X																	16	16	16	16	25-14	EPS010	14-4	CCF40	$1.920.000	$1.920.000	$1.920.000	$1.920.000	$307.200	$76.800	$133.700	$76.800	$0	$0	$0	$0	$594.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 07 de noviembre de 2025 09:30:08 AM

Período del informe: 202510

Pagada 06/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUANLE SAS	**Sucursal**	002 GENERAL
Documento	NI900714233	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 EDF SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 63555895	TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA	1076979106	06/11/2025	202510	202511										X								30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$432.000	$108.000	$188.000	$108.000	$0	$0	$0	$0	$836.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 07 de noviembre de 2025 02:33:23 PM

Período del informe: 202510

Pagada 06/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUANLE SAS	**Sucursal**	005 P
Documento	NI900714233	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 EDF SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1102804163	FAJARDO SILGADO PAULA EMILIA	1076979097	06/11/2025	202510	202511																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$288.000	$72.000	$125.300	$72.000	$0	$0	$0	$0	$557.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098739051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103 NO. 14-14	TELÉFONO:	6881856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992674223**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1920883631

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES										
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1098739051	TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	109873905	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.500

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1917949049	9494561830	I	2025/11/25	2025/11/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$263,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	X																	230301	16	$906,667	$145,100	EPS002	16	$906,667	$113,400		0	$0	$0	14-23	16	$906,667	$4,800	0	$0	$0	No	$263,300
Total	**Afiliados(1)**																						$906,667	$145,100			$906,667	$113,400			$0	$0			$906,667	$4,800		$0	$0		$263,300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900202701	7	I B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 N 37 33 OFICINA 804		6804843			ADMINISTRACION@IBGINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35193902	E	2025-11-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.170.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	35193902	2025-11-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1007669531	BLANCO BARRAGAN ANDRES FELIPE	3.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.000.000	480.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.000.000	120.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S	1711001
2	CC 79431435	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001
3	CC 1098802210	MARTINEZ BLANCO JUAN JOSE	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	3.000.000	480.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.000.000	120.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S	1711001
4	CC 1095940816	SAENZ AVILA LAURA JULIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001

PAGADO

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 11:14:16 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1077648416

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER GIRON		
Documento	NI901985184	**Dirección**	CR 27 #37 - 33
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	**Identificación**	CC 79431435
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91518201	JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR DURAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600	$ 0	$ 1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-02, 11:14:13 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1077108040

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 02/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER GIRON		
Documento	NI901985184	**Dirección**	CR 27 #37 - 33
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	**Identificación**	CC 79431435
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098739051	FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 63398589	TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 2.847.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.200	$ 0	$ 198.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 03 de diciembre de 2025 03:22:44 PM

Período del informe: 202511

Pagada 02/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUANLE SAS	**Sucursal**	005 P
Documento	NI900714233	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 EDF SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA EDITH COSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1102804163	FAJARDO SILGADO PAULA EMILIA	1077647236	02/12/2025	202511	202512																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$1.800.000	$288.000	$72.000	$125.300	$72.000	$0	$0	$0	$0	$557.300
CC 91275391	ALVAREZ CARREÑO JORGE ELIECER	1077647233	02/12/2025	202511	202512																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-4	CCF40	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$576.000	$144.000	$250.600	$144.000	$0	$0	$0	$0	$1.114.600
CC 63555895	TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA	1077647233	02/12/2025	202511	202512										X								30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$432.000	$108.000	$188.000	$108.000	$0	$0	$0	$0	$836.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098739051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103 NO. 14-14	TELÉFONO:	6881856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7994864356**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1997116735

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 34.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 34.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 440.500**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1984039745	9495790660	I	2025/12/22	2025/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$493,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS002	30	$1,700,000	$212,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,700,000	$8,900	0	$0	$0	No	$493,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$0	$0			$1,700,000	$8,900		$0	$0		$493,400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900202701	7	I B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 N 37 33 OFICINA 804		6804843			ADMINISTRACION@IBGINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35548512	E	2025-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.071.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	35548512	2025-12-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1007669531	BLANCO BARRAGAN ANDRES FELIPE	3.000.000	F		X														0			26	26	26	26	COLPENSION ES-25-14	2.600.000	416.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.600.000	104.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.600.000	104.000	2.600.000	13.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	637.600	S	1711001
2	CC 79431435	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001
3	CC 1098802210	MARTINEZ BLANCO JUAN JOSE	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	3.000.000	480.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.000.000	120.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S	1711001
4	CC 1095940816	SAENZ AVILA LAURA JULIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001

PAGADO

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-20, 09:41:57 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1078653212

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 19/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER GIRON		
Documento	NI901985184	**Dirección**	CR 27 #37 - 33
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GONZALES BLANCO IBAN	**Identificación**	CC 79431435
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91518201	JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR DURAN	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.869.444	$ 154.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.098.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.869.444	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 154.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.098.400	$ 0	$ 1.098.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-20, 09:41:59 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1078653235

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 19/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER GIRON		
Documento	NI901985184	**Dirección**	CR 27 #37 - 33
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GONZALES BLANCO IBAN	**Identificación**	CC 79431435
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098739051	FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 63398589	TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 2.847.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.200	$ 0	$ 198.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098739051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103 NO. 14-14	TELÉFONO:	6881856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7998726071	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		19			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		32422720

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 230.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 230.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 180.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 180.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 35.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 35.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.500**
VALOR MORA:	**$ 5.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 445.800**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2097537580	9497461045	I	2026/01/23	2026/01/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$493,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS002	30	$1,700,000	$212,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,700,000	$8,900	0	$0	$0	No	$493,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$0	$0			$1,700,000	$8,900		$0	$0		$493,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2097537580	9497461045	I	2026/01/23	2026/01/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$493,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,000	$0	$0	$272,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$272,000	$0	$0	$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,900	$0	$0	$8,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,500	$0	$0	$212,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$212,500	$0	$0	$212,500
TOTAL				**1**	**$493,400**	**$0**	**$0**	**$493,400**

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 20 de enero de 2026 09:44:19 AM

Período del informe: 202512

Pagada 16/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUANLE SAS	**Sucursal**	005 P
Documento	NI900714233	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 EDF SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1102804163	FAJARDO SILGADO PAULA EMILIA	1078687726	16/01/2026	202512	202601		X																17	17	17	17	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$1.020.000	$1.020.000	$1.020.000	$1.287.500	$163.200	$40.800	$71.000	$51.500	$0	$0	$0	$0	$326.500
CC 91275391	ALVAREZ CARREÑO JORGE ELIECER	1078687636	15/01/2026	202512	202601		X																30	30	30	30	25-14	EPS010	14-4	CCF40	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$4.030.000	$576.000	$144.000	$250.600	$161.200	$0	$0	$0	$0	$1.131.800
CC 63555895	TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA	1078687636	15/01/2026	202512	202601														X				15	15	15	15	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$1.027.818	$1.027.818	$1.027.818	$1.027.818	$164.500	$41.200	$0	$41.200	$0	$0	$0	$0	$246.900
CC 63555895	TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA	1078687636	15/01/2026	202512	202601																		15	15	15	15	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$1.027.818	$1.027.818	$1.027.818	$1.027.818	$164.500	$41.200	$71.600	$41.200	$0	$0	$0	$0	$318.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900202701	7	I B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 N 37 33 OFICINA 804		6804843			ADMINISTRACION@IBGINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35921749	E	2026-01-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.713.700	3.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	35921749	2026-01-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79431435	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	1.423.500	F																0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	521.950	83.600	0	0	SANITAS-EPS005	521.950	20.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	521.950	20.900	521.950	2.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	128.200	S	1711001
2	CC 79431435	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	5.217.190	F							X									0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	3.304.221	528.700	0	0	SANITAS-EPS005	3.304.221	132.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.304.221	132.200	3.304.221	17.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	810.400	S	1711001
3	CC 1067939423	DURANGO GRISALES JUAN FRANCISCO	2.112.000	F	X															0			24	24	24	24	COLPENSION ES-25-14	1.689.600	270.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.689.600	67.600	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.689.600	67.600	1.689.600	8.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	414.500	S	1711001
4	CC 5793778	GOMEZ RODRIGUEZ JUAN GABRIEL	1.769.600	F	X															0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	1.120.747	179.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.120.747	44.900	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.120.747	44.900	1.120.747	5.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	275.100	S	1711001
5	CC 1098802210	MARTINEZ BLANCO JUAN JOSE	3.000.000	F																0			24	24	24	24	PROTECCION -230201	2.400.000	384.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.400.000	96.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.400.000	96.000	2.400.000	12.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	588.600	S	1711001
6	CC 1098802210	MARTINEZ BLANCO JUAN JOSE	3.000.000	F													X			0			6	6	6	6	PROTECCION -230201	600.000	96.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	600.000	24.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	600.000	24.000	600.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	144.000	S	1711001
7	CC 1095940816	SAENZ AVILA LAURA JULIANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900202701	7	I B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 N 37 33 OFICINA 804		6804843			ADMINISTRACION@IBGINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35921749	E	2026-01-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.713.700	3.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	35921749	2026-01-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.060.018	11.060.018	11.060.018	11.060.018	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.769.900	0	2.200	0	1.772.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	480.000	0	600	0	480.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	300	0	228.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.062.100	0	1.300	0	1.063.400
EPS(Administradoras: 2)				5	442.600	0	700	0	443.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	265.600	0	400	0	266.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	177.000	0	300	0	177.300
ARP(Administradoras: 1)				5	55.000	0	100	0	55.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	55.000	0	100	0	55.100
CCF(Administradoras: 1)				5	442.600	0	600	0	443.200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	5	442.600	0	600	0	443.200
Gran Total					2.710.100	0	3.600	0	2.713.700

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-09, 12:15:31 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1079090498

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 05/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER GIRON		
Documento	NI901985184	**Dirección**	CR 27 #37 - 33
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GONZALES BLANCO IBAN	**Identificación**	CC 79431435
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91518201	JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR DURAN	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600	$ 0	$ 1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-09, 12:15:26 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1079090481

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 05/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER GIRON		
Documento	NI901985184	**Dirección**	CR 27 #37 - 33
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GONZALES BLANCO IBAN	**Identificación**	CC 79431435
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098739051	FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 63398589	TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 3.501.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 243.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098739051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103 NO. 14-14	TELÉFONO:	6881856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6005531934**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		6			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		72080556

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 281.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 281.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 219.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 219.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 42.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 2.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 544.000**

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	39704846	9498704893	I	2026/02/20	2026/02/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA							X											230301	30	EPS002	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	39704846	9498704893	I	2026/02/20	2026/02/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 09 de febrero de 2026 10:04:39 AM

Período del informe: 202601

Pagada 05/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUANLE SAS	**Sucursal**	005 P
Documento	NI900714233	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 EDF SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 37746431	OLARTE PRADA LILIANA	1079117617	05/02/2026	202601	202602	X																15	15	15	15	230201	EPS046	14-4	CCF40	$875.453	$875.453	$875.453	$875.453	$140.100	$35.100	$61.000	$35.100	$0	$0	$0	$0	$271.300
CC 33702314	HERNANDEZ ORTIZ FLOR EMILCE	1079117617	05/02/2026	202601	202602	X																15	15	15	15	25-14	EPS041	14-4	CCF40	$1.150.000	$1.150.000	$1.150.000	$1.150.000	$184.000	$46.000	$80.100	$46.000	$0	$0	$0	$0	$356.100
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1079117617	05/02/2026	202601	202602	X																15	15	15	15	230301	EPS002	14-4	CCF40	$900.000	$900.000	$900.000	$900.000	$144.000	$36.000	$62.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$278.700
CC 1096949307	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	1079117617	05/02/2026	202601	202602	X																15	15	15	15	25-14	EPS002	14-4	CCF40	$900.000	$900.000	$900.000	$900.000	$144.000	$36.000	$62.700	$36.000	$0	$0	$0	$0	$278.700
CC 91216863	LEON AMAYA LUIS EDUARDO	1079117617	05/02/2026	202601	202602	X																0	15	15	15	NIN-AF	EPS010	14-4	CCF40	$0	$875.453	$875.453	$875.453	$0	$35.100	$61.000	$35.100	$0	$0	$0	$0	$131.200
CC 1095839188	FARFAN MANTILLA PAULA JULIANA	1079117617	05/02/2026	202601	202602	X																30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$3.000.000	$480.000	$120.000	$208.800	$120.000	$0	$0	$0	$0	$928.800
CC 1098741585	MUÑOZ CESPEDES NATHALIA ALEJANDRA	1079103832	05/02/2026	202601	202602																	30	30	30	30	231001	EPS002	14-4	CCF40	$1.750.905	$1.750.905	$1.750.905	$1.750.905	$280.200	$70.100	$9.200	$70.100	$0	$0	$0	$0	$429.600
CC 13723217	TOLOZA MORA MILLER ALONSO	1079103832	05/02/2026	202601	202602																	30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$1.750.905	$1.750.905	$1.750.905	$1.750.905	$280.200	$70.100	$9.200	$70.100	$0	$0	$0	$0	$429.600
CC 1095944479	ANAYA RODRIGUEZ YEIMY PAOLA	1079103832	05/02/2026	202601	202602																	30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF40	$2.205.000	$2.205.000	$2.205.000	$2.205.000	$352.800	$88.200	$11.600	$88.200	$0	$0	$0	$0	$540.800
CC 37619739	CARVAJAL JAIMES ELSA VICTORIA	1079103832	05/02/2026	202601	202602																	30	30	30	30	25-14	EPS046	14-4	CCF40	$5.241.600	$5.241.600	$5.241.600	$5.241.600	$838.700	$209.700	$364.900	$209.700	$0	$0	$0	$0	$1.623.000
CC 91275391	ALVAREZ CARREÑO JORGE ELIECER	1079103832	05/02/2026	202601	202602	X																30	30	30	30	25-14	EPS010	14-4	CCF40	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$576.000	$144.000	$250.600	$144.000	$0	$0	$0	$0	$1.114.600
CC 63555895	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	1079103832	05/02/2026	202601	202602										X							30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$432.000	$108.000	$188.000	$108.000	$0	$0	$0	$0	$836.000
CC 1098762015	DIAZ ARIZA KAREN DAYANNA	1079103832	05/02/2026	202601	202602	X									X							30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF40	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$400.000	$100.000	$174.000	$100.000	$0	$0	$0	$0	$774.000
CC 1102804163	FAJARDO SILGADO PAULA EMILIA	1079103832	05/02/2026	202601	202602	X									X							30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900202701	7	I B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 N 37 33 OFICINA 804		6804843		ADMINISTRACION@IBGINGENIERIA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36284146	E	2026-02-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.775.900	14.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36284146	2026-02-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79431435	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	5.217.190	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.217.190	834.800	0	0	SANITAS-EPS005	5.217.190	208.700	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	5.217.190	208.700	5.217.190	363.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.615.400	S	1711001
2	CC 1067939423	DURANGO GRISALES JUAN FRANCISCO	2.112.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.112.000	338.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.112.000	84.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.112.000	84.500	2.112.000	11.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	518.100	S	1711001
3	CC 5793778	GOMEZ RODRIGUEZ JUAN GABRIEL	1.769.600	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.769.600	283.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.769.600	70.800	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.769.600	70.800	1.769.600	9.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	434.100	S	1711001
4	CC 1098802210	MARTINEZ BLANCO JUAN JOSE	3.180.000	F																0			22	22	22	22	PROTECCION -230201	2.332.000	373.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.332.000	93.300	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.332.000	93.300	2.332.000	12.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	572.000	S	1711001
5	CC 1098802210	MARTINEZ BLANCO JUAN JOSE	3.000.000	F													X			0			8	8	8	8	PROTECCION -230201	800.000	128.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	800.000	32.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	800.000	32.000	800.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	192.000	S	1711001
6	CC 1095940816	SAENZ AVILA LAURA JULIANA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900202701	7	I B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 N 37 33 OFICINA 804		6804843			ADMINISTRACION@IBGINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36284146	E	2026-02-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.775.900	14.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36284146	2026-02-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.981.695	13.981.695	13.981.695	13.981.695	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	2.237.400	0	8.700	0	2.246.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	1.100	0	281.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.456.000	0	5.600	0	1.461.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	501.200	0	2.000	0	503.200
EPS(Administradoras: 2)				5	559.400	0	2.200	0	561.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	364.000	0	1.400	0	365.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	195.400	0	800	0	196.200
ARP(Administradoras: 1)				5	405.000	0	1.600	0	406.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	405.000	0	1.600	0	406.600
CCF(Administradoras: 1)				5	559.400	0	2.200	0	561.600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	5	559.400	0	2.200	0	561.600
Gran Total					3.761.200	0	14.700	0	3.775.900

PLANILLA NRO. 36096612 Tipo I 2026 01

ASOPAGOS

DATOS GENERALES														
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	79431435	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ			ÚNICO	0	0	2026-01	2026-01	36096612		PRIVADA	I	14-23	86
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CRA 27 37 33 OFIC 804		BUCARAMANGA	1	SANTANDER	68	6804843	0	IBG.INGENIERIA@HOTMAIL.COM		7112		0	1	2026-02-18	2026-02-09

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	218900	0	0	0	0	0	218900	9	1300	0	220200	0	0	0	0	220200	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	280200	0	0	0	9	1600	0	281800	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	9200	0	0	0	9200	9	100	9300	0	0	93	9300

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	9	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	9	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	9	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	9	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	9	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	281800
SALUD	220200
RIESGOS LABORALES	9300
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	511300

PAGADO

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-12, 10:15:35 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1080043279

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER GIRON		
Documento	NI901985184	**Dirección**	CR 27 #37 - 33
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GONZALES BLANCO IBAN	**Identificación**	CC 79431435
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91518201	JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR DURAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600	$ 0	$ 1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098739051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103 NO. 14-14	TELÉFONO:	6881856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			6007870469	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			12				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			163817824

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 280.200	$ 2.200	$ 282.400
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 2.200**	**$ 282.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 218.900	$ 1.700	$ 0	$ 220.600
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 1.700**	**$ 0**	**$ 220.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 400	$ 0	$ 43.100
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 43.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1098739051	TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	109873905	$ 42.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 546.100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	132452681	9500883182	I	2026/03/20	2026/03/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

2026/03/12 02:51 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	132452681	9500883182	I	2026/03/20	2026/03/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-24, 08:43:21 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1080043285

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 20/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER GIRON		
Documento	NI901985184	**Dirección**	CR 27 #37 - 33
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GONZALES BLANCO IBAN	**Identificación**	CC 79431435
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098739051	FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 63398589	TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 3.501.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 200	$ 244.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 12 de marzo de 2026 10:17:51 AM

Período del informe: 202602

Pagada 10/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUANLE SAS	**Sucursal**	002 GENERAL
Documento	NI900714233	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 EDF SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 91275391	ALVAREZ CARREÑO JORGE ELIECER	1080112534	10/03/2026	202602	202603																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-4	CCF40	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$576.000	$144.000	$250.600	$144.000	$0	$0	$0	$0	$1.114.600
CC 63555895	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	1080112534	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$432.000	$108.000	$188.000	$108.000	$0	$0	$0	$0	$836.000
CC 1102804163	FAJARDO SILGADO PAULA EMILIA	1080112534	10/03/2026	202602	202603								X										30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900202701	7	I B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 N 37 33 OFICINA 804	6804843	ADMINISTRACION@IBGINGENIERIA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36566670	E	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.782.200	5.200	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5	36566670	2026-03-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 79431435	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	5.217.190	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.217.190	834.800	0	0	SANITAS-EPS005	5.217.190	208.700	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	5.217.190	208.700	5.217.190	363.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.615.400	S	1711001
2	CC 1067939423	DURANGO GRISALES JUAN FRANCISCO	2.112.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.112.000	338.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.112.000	84.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.112.000	84.500	2.112.000	11.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	518.100	S	1711001
3	CC 5793778	GOMEZ RODRIGUEZ JUAN GABRIEL	1.769.600	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.769.600	283.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.769.600	70.800	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.769.600	70.800	1.769.600	9.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	434.100	S	1711001
4	CC 1098802210	MARTINEZ BLANCO JUAN JOSE	3.180.000	F		X														0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	3.180.000	508.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.180.000	127.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.180.000	127.200	3.180.000	16.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	779.800	S	1711001
5	CC 1095940816	SAENZ AVILA LAURA JULIANA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1711001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900202701	7	I B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 N 37 33 OFICINA 804		6804843			ADMINISTRACION@IBGINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36566670	E	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.782.200	5.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36566670	2026-03-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
14.029.695	14.029.695	14.029.695	14.029.695	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	2.245.000	0	3.000	0	2.248.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	508.800	0	700	0	509.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	400	0	280.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.456.000	0	1.900	0	1.457.900
EPS(Administradoras: 2)				5	561.300	0	800	0	562.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	364.000	0	500	0	364.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	197.300	0	300	0	197.600
ARP(Administradoras: 1)				5	409.400	0	600	0	410.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	409.400	0	600	0	410.000
CCF(Administradoras: 1)				5	561.300	0	800	0	562.100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	5	561.300	0	800	0	562.100
Gran Total					3.777.000	0	5.200	0	3.782.200

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-10, 04:34:47 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081026291

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 10/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER GIRON		
Documento	NI901985184	**Dirección**	CR 27 #37 - 33
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GONZALES BLANCO IBAN	**Identificación**	CC 79431435
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91518201	JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR DURAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600	$ 0	$ 1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-13, 03:10:10 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1081026298

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 10/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER GIRON		
Documento	NI901985184	**Dirección**	CR 27 #37 - 33
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GONZALES BLANCO IBAN	**Identificación**	CC 79431435
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098739051	FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900
CC 63398589	TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 3.501.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.800	$ 0	$ 243.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 13 de abril de 2026 03:08:07 PM

Período del informe: 202603

Pagada 10/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUANLE SAS	**Sucursal**	002 GENERAL
Documento	NI900714233	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 EDF SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 91275391	ALVAREZ CARREÑO JORGE ELIECER	1081059755	10/04/2026	202603	202604																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-4	CCF40	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$576.000	$144.000	$250.600	$144.000	$0	$0	$0	$0	$1.114.600
CC 63555895	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	1081059755	10/04/2026	202603	202604								X										30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$432.000	$108.000	$188.000	$108.000	$0	$0	$0	$0	$836.000
CC 1102804163	FAJARDO SILGADO PAULA EMILIA	1081059755	10/04/2026	202603	202604								X										30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098739051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103 NO. 14-14	TELÉFONO:	6881856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6012782039	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		219829874

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 42.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 541.800**

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	219778585	9502505265	I	2026/04/23	2026/04/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900202701	7	I B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 N 37 33 OFICINA 804		6804843			ADMINISTRACION@IBGINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36894592	E	2026-04-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.782.300	5.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36894592	2026-04-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1007669531	BLANCO BARRAGAN ANDRES FELIPE	3.180.000	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.180.000	508.800	0	0	SANITAS-EPS005	3.180.000	127.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.180.000	127.200	3.180.000	16.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	779.800	S	1711001
2	CC 79431435	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	5.217.190	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.217.190	834.800	0	0	SANITAS-EPS005	5.217.190	208.700	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	5.217.190	208.700	5.217.190	363.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.615.400	S	1711001
3	CC 1067939423	DURANGO GRISALES JUAN FRANCISCO	2.112.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.112.000	338.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.112.000	84.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	2.112.000	84.500	2.112.000	11.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	518.100	S	1711001
4	CC 5793778	GOMEZ RODRIGUEZ JUAN GABRIEL	1.769.600	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.769.600	283.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.769.600	70.800	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.769.600	70.800	1.769.600	9.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	434.100	S	1711001
5	CC 1095940816	SAENZ AVILA LAURA JULIANA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1711001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900202701	7	I B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 N 37 33 OFICINA 804		6804843			ADMINISTRACION@IBGINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36894592	E	2026-04-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.782.300	5.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36894592	2026-04-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
14.029.695	14.029.695	14.029.695	14.029.695	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	2.245.000	0	3.100	0	2.248.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.964.800	0	2.700	0	1.967.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	400	0	280.600
EPS(Administradoras: 2)				5	561.300	0	800	0	562.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	70.100	0	100	0	70.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	491.200	0	700	0	491.900
ARP(Administradoras: 1)				5	409.400	0	600	0	410.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	409.400	0	600	0	410.000
CCF(Administradoras: 1)				5	561.300	0	800	0	562.100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	5	561.300	0	800	0	562.100
Gran Total					3.777.000	0	5.300	0	3.782.300

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-13, 09:24:18 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081649485

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 11/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER GIRON		
Documento	NI901985184	**Dirección**	CR 27 #37 - 33
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GONZALES BLANCO IBAN	**Identificación**	CC 79431435
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91518201	JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR DURAN	01	00		X															0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 1.633.334	$ 261.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.633.334	$ 65.400	6,960	$ 1.633.334	$ 113.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.806.251	$ 152.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.633.334	$ 1.633.334	$ 1.633.334	$ 3.806.251	$ 261.400	$ 65.400	$ 113.700	$ 152.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.800	$ 0	$ 592.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-13, 09:24:25 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1081649487

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 11/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INTER GIRON		
Documento	NI901985184	**Dirección**	CR 27 #37 - 33
Tipo de Empresa	CONTRATANTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GONZALES BLANCO IBAN	**Identificación**	CC 79431435
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098739051	FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO	59	00		T															0	0	0	14	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 817.089	$ 56.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.900
CC 63398589	TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO	59	00		T															0	0	0	14	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 817.089	$ 56.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.634.178	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.800	$ 0	$ 113.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 13 de mayo de 2026 09:26:51 AM

Período del informe: 202604

Pagada 11/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUANLE SAS	**Sucursal**	002 GENERAL
Documento	NI900714233	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 EDF SURA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA	**Identificación**	CC63555895

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 91275391	ALVAREZ CARREÑO JORGE ELIECER	1081704519	11/05/2026	202604	202605																		30	30	30	30	25-14	EPS010	14-4	CCF40	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$3.600.000	$576.000	$144.000	$250.600	$144.000	$0	$0	$0	$0	$1.114.600
CC 63555895	TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA	1081704519	11/05/2026	202604	202605																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000	$432.000	$108.000	$188.000	$108.000	$0	$0	$0	$0	$836.000
CC 1102804163	FAJARDO SILGADO PAULA EMILIA	1081704519	11/05/2026	202604	202605																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF40	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$3.500.000	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$0	$0	$0	$0	$1.083.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	300989206	9504178404	I	2026/05/25	2026/05/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	63398589	QUINTERO TULIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900202701	7	I B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 N 37 33 OFICINA 804	6804843	ADMINISTRACION@IBGINGENIERIA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37306985	E	2026-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.816.900	8.500	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5	37306985	2026-05-05	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1007669531	BLANCO BARRAGAN ANDRES FELIPE	3.180.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.180.000	508.800	0	0	SANITAS-EPS005	3.180.000	127.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	3.180.000	127.200	3.180.000	16.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	779.800	S	1711001
2	CC 79431435	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	5.217.190	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.217.190	834.800	0	0	SANITAS-EPS005	5.217.190	208.700	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	5.217.190	208.700	5.217.190	363.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.615.400	S	1711001
3	CC 1067939423	DURANGO GRISALES JUAN FRANCISCO	2.112.000	F																0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	774.400	124.000	0	0	SANITAS-EPS005	774.400	31.000	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	774.400	31.000	774.400	4.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	190.100	S	1711001
4	CC 1067939423	DURANGO GRISALES JUAN FRANCISCO	2.334.982	F							X									0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	1.478.822	236.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.478.822	59.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.478.822	59.200	1.478.822	7.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	362.900	S	1711001
5	CC 5793778	GOMEZ RODRIGUEZ JUAN GABRIEL	1.769.600	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.769.600	283.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.769.600	70.800	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.769.600	70.800	1.769.600	9.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	434.100	S	1711001
6	CC 1095940816	SAENZ AVILA LAURA JULIANA	1.750.905	F																0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.050.543	168.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.050.543	42.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	1.050.543	42.100	1.050.543	5.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	257.800	S	1711001
7	CC 1095940816	SAENZ AVILA LAURA JULIANA	1.750.905	F													X			0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	700.362	112.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	700.362	28.100	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	700.362	28.100	700.362	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	168.300	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900202701	7	I B G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 N 37 33 OFICINA 804		6804843			ADMINISTRACION@IBGINGENIERIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37306985	E	2026-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.816.900	8.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	37306985	2026-05-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
14.170.917	14.170.917	14.170.917	14.170.917	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	2.267.700	0	5.000	0	2.272.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	700	0	280.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.987.500	0	4.300	0	1.991.800
EPS(Administradoras: 2)				5	567.100	0	1.300	0	568.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	496.900	0	1.100	0	498.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	70.200	0	200	0	70.400
ARP(Administradoras: 1)				5	406.500	0	900	0	407.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	406.500	0	900	0	407.400
CCF(Administradoras: 1)				5	567.100	0	1.300	0	568.400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	5	567.100	0	1.300	0	568.400
Gran Total					3.808.400	0	8.500	0	3.816.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79431435	0	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 37 33 OFIC 804		6804843			IBG.INGENIERIA@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37065795	I	2026-05-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37065795	2026-05-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79431435	BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	508.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79431435	0	IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 27 37 33 OFIC 804		6804843			IBG.INGENIERIA@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37065795	I	2026-05-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37065795	2026-05-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098739051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103 NO. 14-14	TELÉFONO:	6881856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6015793686**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		19			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		358840960

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 0	$ 280.200	$ 3.900	$ 284.100
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 3.900**	**$ 284.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 218.900	$ 3.000	$ 0	$ 221.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 3.000**	**$ 0**	**$ 221.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 600	$ 0	$ 43.300
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 43.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1098739051	TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	109873905	$ 42.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 549.300

ANEXO N. 03

SOPORTES DE NÓMINA DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184

Comprobante de pago de nómina

No. **NPG1**

NOMBRE:	**JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR DUR**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	91518201-1	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00001
DIRECCION:	Cra 56 casa 35 corpovisur 2	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	FLORIDABLANCA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
31/10/2025	**DESDE:** 15/10/2025	**HASTA:** 31/10/2025	**$ 1.717.333.33**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	16	Días				$ 1.866.666,67

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	16	Días	4%			$ 74.666,67
Aporte pensión empleado	16	Días	4%			$ 74.666,67

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.866.666,67
DEDUCCIONES:	$ 149.333,34
TOTAL A PAGAR:	$ 1.717.333,33

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/11/2025	$ 1.717.333,33

CONSORCIO INTER GIRON

CRA 27 N° 36-14 OF 309 Tel:6844527
NIT: 901.985.184

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE01

INFORMACION DEL PROVEEDOR	FECHA
TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO **NIT No.:** 63.398.589 **DIRECCION:** BUCARICA 4 ETAPA, BLOQUE 15-9B APTO 347 **TELEFONO:** **CIUDAD:** FLORIDABLANCA **PAIS:** COLOMBIA	**06/11/2025** **TOTAL** **$ 933.333,00**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
733555	CUENTA DE COBRO N° CIG 01 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERA GEOTECNISTA.	1	$ 933.333,00	$ 933.333,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 06/12/2025	$ 933.333,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT

FRM-018V Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Sello de firma:

RDfKQHbtZqpRjyHULWUBq4Kefys/3bSkTaf3sBhuvfaaCnoa41zUhpT7RJSoN05uYEnX7CUc9MOpj9OxlkaqHuvaxRc9VpCsebVKldzUlF7vw/SjKSv4Cv8
FB54JHY+lE+d68fE2pAwSFE0aWp+GQugeSJuk1ucngHQwxJyhRj+U23W/GjhH4EI4ACcirdhpARI98GI81ZkxlO/0R5R31PQ0fEEW8xfMCOwsGMcboPbr
EPwVzMt//9nO9On36q+9LAVfYMgIbRspk/xhI74GUqNq0QPgJvUm31cp6Ym94Ctl8WDGeiPU3SO1p57jJs0IYExUMcW3IEXuFw==

CUDS: 98d679efd00095b1ec6b9e9394b887db456e129a99d487d3382d62b378b9dda05a86888e8b1f3e04cbb16b4f791a

Fecha emisión: 2025-11-06 10:05:45 **Fecha validación DIAN:** 2025-11-06 10:05:45

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,06 de noviembre de 2025 N° CIG01

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON

NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C. 63.398.589


LA SUMA DE: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($933.333 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniera especialista geotecnista cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 15 de octubre al 31 de octubre 2025

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,



TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C. 63.398.589

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14813062283

(415)7707212489984(8020) 000001481306228 3

3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 3 9 8 5 8 9	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 3 9 8 5 8 9	2 0 0 3 0 9 1 8

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Málaga 4 3 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUINTERO	GUERRERO	TULIA	ELENA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CON BUCARICA IV ETAPA BL 15 9 B AP 347

42. Correo electrónico: elena08245@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 8 1 0 0 3	6 0 1 6 4 9 7 2 4 7	3 1 6 8 3 2 0 5 2 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 1 0 1 0 1	7 4 9 0	2 0 2 0 0 6 0 8		7 1 1 1		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos	SI	NO X	60. No. de Folios: 0	61. Fecha: 2022 - 05 - 16 / 18 : 22: 17

La información suministrada a través de: formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-05-2022 05:33:29PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1917949049	9494561830	I	2025/11/25	2025/11/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$263,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	X																	230301	16	$906,667	$145,100	EPS002	16	$906,667	$113,400		0	$0	$0	14-23	16	$906,667	$4,800	0	$0	$0	No	$263,300
Total	**Afiliados(1)**																						$906,667	$145,100			$906,667	$113,400			$0	$0			$906,667	$4,800		$0	$0		$263,300

CONSORCIO INTER GIRON

CRA 27 N° 36-14 OF 309 Tel:6844527
NIT: 901.985.184

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE02

INFORMACION DEL PROVEEDOR	FECHA
FREDY SEBATIAN TOLOZA PIMIENTO **NIT No.:** 1.098.739.051 **DIRECCION:** CRA 15 A 104 A LC 12 TO VERONA **TELEFONO:** 3012872558 **CIUDAD:** FLORIDABLANCA **PAIS:** COLOMBIA	**06/11/2025** TOTAL **$ 800.000,00**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
733555	CUENTA DE COBRO N° CIG 01 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERO ESTRUCTURAL.	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 06/12/2025	$800.000,00

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-018V Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Sello de firma:

RDfKQHbtZqpRjyHULWUBq4Kefys/3bSkTaf3sBhuvfaaCnoa41zUhpT7RJSoN05uYEnX7CUc9MOpj9OxIkaqHuvaxRc9VpCsebVKldzUIF7vw/SjKSv4Cv8
FB54JHY+IE+d68fE2pAwSFE0aWp+GQugeSJuk1ucngHQwxJyhRj+U23W/GjhH4EI4ACcirdhpARI98GI81ZkxlO/0R5R31PQ0fEEW8xfMCOwsGMcboPbr
EPwVzMt//9nO9On36q+9LAVfYMgIbRspk/xhI74GUqNq0QPgJvUm31cp6Ym94CtI8WDGeiPU3SO1p57jJs0IYExUMcW3IEXuFw==

CUDS: 98d679efd00095b1ec6b9e9394b887db456e127451ds87d3382d62b378b9dda05a86888e8b1f3e04cbb16b4f785b

Fecha emisión: 2025-11-06 10:10:35 **Fecha validación DIAN:** 2025-11-06 10:10:35

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,06 de noviembre de 2025 N° CIG01

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON
NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

LA SUMA DE: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($800.000 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniero estructural cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 15 de octubre al 31 de octubre 2025

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905555819

(415)7707212489984(8020) 000001490555581 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 3 9 0 5 1	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 3 9 0 5 1	2 0 1 1 0 6 1 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TOLOZA	PIMIENTO	FREDY	SEBASTIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CR 15 A 104 A 11 LC 12 TO VERONA

42. Correo electrónico: fredytoloza16@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 2 8 7 2 5 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 2	2 0 1 6 0 9 1 4							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 28 / 17 : 24: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098739051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103 NO. 14-14	TELÉFONO:	6881856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992674223**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1920883631

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES										
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1098739051	TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	109873905	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.500

Planilla Pagada

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG238

NOMBRE:	**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	63555895-6	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00006
DIRECCION:	TORRES DE ARAGON	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	FLORIDABLANCA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
31/10/2025	**DESDE:** 01/10/2025	**HASTA:** 31/10/2025	**$ 2.684.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.700.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 200.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 108.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 108.000,00

TOTALES	
DEVENGADOS:	$ 2.900.000,00
DEDUCCIONES:	$ 216.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 2.684.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/11/2025	$ 2.684.000,00

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG239

NOMBRE:	**PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1102804163-4	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00015
DIRECCION:	CRA 27 36 14	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
31/10/2025	**DESDE:** 01/10/2025	**HASTA:** 31/10/2025	**$ 1.856.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.800.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 200.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 72.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 72.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.000.000,00
DEDUCCIONES:	$ 144.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 1.856.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/11/2025	$ 1.856.000,00

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG237

NOMBRE: **JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO**
NI: 91275391-6
DIRECCION: CRA 27 36 14 OF 309
CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00016
TIPO TRABAJADOR: Dependiente

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
31/10/2025	**DESDE:** 15/10/2025	**HASTA:** 31/10/2025	**$ 1.766.400.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	16	Días				$ 1.920.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	16	Días	4%			$ 76.800,00
Aporte pensión empleado	16	Días	4%			$ 76.800,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.920.000,00
DEDUCCIONES:	$ 153.600,00
TOTAL A PAGAR:	$ 1.766.400,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/11/2025	$ 1.766.400,00

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG252

NOMBRE: **JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO**
NI: 91275391-6
DIRECCION: CRA 27 36 14 OF 309
CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00016
TIPO TRABAJADOR: Dependiente

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
30/11/2025	**DESDE:** 01/11/2025	**HASTA:** 30/11/2025	**$ 3.312.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.600.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 144.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 144.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.600.000,00
DEDUCCIONES:	$ 288.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.312.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/12/2025	$ 3.312.000,00

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184

Comprobante de pago de nómina

No. **NPG2**

NOMBRE:	**JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR DUR**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	91518201-1	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00001
DIRECCION:	Cra 56 casa 35 corpovisur 2	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	FLORIDABLANCA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
30/11/2025	**DESDE:** 01/11/2025	**HASTA:** 30/11/2025	**$ 3.220.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES	
DEVENGADOS:	$ 3.500.000,00
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.220.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/12/2025	$ 3.220.000,00

I.B.G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL
NIT: 900202701-7

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO
DE NÓMINA ELECTRÓNICA

NE247

COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, CARRERA 27 # 37 - 33
OFICINA 804 EDIFICIO GREEN GOLD
administracion@ibgingenieria.com

EMPLEADO: IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79431435 DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, FLORIDABLANCA, EL OLYMPO CONDOMINIO & RESORT, CL. 200, 12-528 CORREO ELECTRÓNICO: ibg.ingenieria@hotmail.com SUELDO: 1,423,500	FECHA DE EMISIÓN 2025-11-29 10:15:20	PERIODO LIQUIDACIÓN 2025-11-01 2025-11-30
	CUNE 12d6da765b8e820faae872ef21a4ca3822c96fb011b39184e3ba7d77661be05536886a86565b8057957eae1b7e415d2c	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	DEVENGADO	DEDUCCION	DETALLE
1	Sueldo	30	1,423,500	0	
2	Auxilio de Transporte	30	200,000	0	
3	Salud	1	0	57,000	
4	Pension	1	0	57,000	

Observaciones: ---	**Total Devengados (+)**	1,623,500
	Total Deducciones (-)	114,000
	Valor Total	**1,509,500**

UN MILLÓN QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático eNomina.
Fecha y hora de expedición 2025-11-29 10:15:23.

CONSORCIO INTER GIRON
Nit 901985184

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE5

INFORMACION DEL PROVEEDOR	FECHA
TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO NIT No. : 63398589-3 DIRECCION : BUCARICA 4 ETAPA, BLOQUE 15-9B APTO 347 TELEFONO : CIUDAD : FLORIDABLANCA PAIS : Colombia	03/12/2025
	TOTAL
	$ 1.750.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103502	CUENTA DE COBRO N° CIG N° 02 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERIA GEOTECNISTA DEL 01 AL 30 DE NOV	1	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 02/01/2026	$ 1.750.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Resolución DIAN: 18764101109216 Prefijo: DSE Rango: 1 al 100 Vigencia: 6/11/2025 hasta 6/11/2027

CUDS: e06c22f4b0712da7a2fc375063b325f67bf2cb3121844e0b4b75d8894ffbd476933abd54fda1ea225606efe3c65fbd34

Fecha emisión: 2025-12-03 13:56:00

Fecha validación DIAN: 2025-12-03 13:56:07-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,03 diciembre de 2025 N° CIG02

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON
NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C. 63.398.589

LA SUMA DE: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($1.750.000 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniera especialista geotecnista cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 01 de nov al 30 de nov 2025

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C. 63.398.589

DIAN
POR UN COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0 2] Actualización

4. Número de formulario: 14813062283

(415)7707212489984(8020) 000001481306228 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6 3 3 9 8 5 8 9 | 6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 3 9 8 5 8 9	2 0 0 3 0 9 1 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Málaga 4 3 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUINTERO	GUERRERO	TULIA	ELENA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CON BUCARICA IV ETAPA BL 15 9 B AP 347

42. Correo electrónico: elena08245@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 8 1 0 0 3	6 0 1 6 4 9 7 2 4 7	3 1 6 8 3 2 0 5 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividac	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 1 0 1 0 1	7 4 9 0	2 0 2 0 0 6 0 8	7 1 1 1		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 05 - 18 / 18 : 22: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-05-2022 05:33:29PM

DOCUMENTO GENERADO EN LA PÁGINA WEB DE LA DIAN SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1984039745	9495790660	I	2025/12/22	2025/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$493,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS002	30	$1,700,000	$212,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,700,000	$8,900	0	$0	$0	No	$493,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$0	$0			$1,700,000	$8,900		$0	$0		$493,400

CONSORCIO INTER GIRON
Nit 901985184

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE4

INFORMACION DEL PROVEEDOR	FECHA
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO **NIT No. :** 1098739051-6 **DIRECCION :** CR 15 A 104 A 11 LC 12 TO VERONA **TELEFONO :** **CIUDAD :** FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia	**03/12/2025** **TOTAL** **$ 1.500.000,00**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103502	CUENTA DE COBRO N° CIG 02 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERO ESTRUCTURAL01 AL 30 DE NOV 2025	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 02/01/2026	$ 1.500.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Resolución DIAN: 18764101100018 Prefijo: DSE Rango: 1 al 100 Vigencia: 6/11/2025 hasta 6/11/2027

CUDS: 9e6475a05792493563d61706033f77f3d8b5e6601a00f9c6b34796b55a1594b17978925f936b72b5a0ce80e8c1a0e0eb
Fecha emisión: 2025-12-03 13:56:26
Fecha validación DIAN: 2025-12-03 13:56:33-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,03 de dic de 2025 N° CIG02

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON
NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
($1.500.000 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniero estructural cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 01 de nov al 30 de noviembre 2025

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905555819

(415)7707212489984(8020) 000001490555581 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 3 9 0 5 1	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 3 9 0 5 1	2 0 1 1 0 6 1 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TOLOZA	PIMIENTO	FREDY	SEBASTIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CR 15 A 104 A 11 LC 12 TO VERONA

42. Correo electrónico fredytoloza16@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 2 8 7 2 5 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 6 0 9 1 4							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 28 / 17 : 24: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098739051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103 NO. 14-14	TELÉFONO:	6881856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7994864356**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1997116735

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 34.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 34.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 440.500**

Planilla Pagada

COEDCO SAS / REP. LEGAL EDITH TOLOZA

Cra 27 N° 41-14 To 8 Apto 101 Tel:64899412

NIT: 901.109.221-1

Comprobante de pago de nómina

No. NPG504

NOMBRE:	**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	63555895-6	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00001
DIRECCION:	TORRES DE ARAGON	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	FLORIDABLANCA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
30/11/2025	**DESDE:** 01/11/2025	**HASTA:** 30/11/2025	**$ 5.278.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 5.800.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 232.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 232.000,00
Aporte fondo solidaridad pensional empleado			1%			$ 58.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 5.800.000,00
DEDUCCIONES:	$ 522.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 5.278.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/12/2025	$ 5.278.000,00

COEDCO SAS / REP. LEGAL EDITH TOLOZA

Cra 27 N° 41-14 To 8 Apto 101 Tel:64899412

NIT: 901.109.221-1

Comprobante de pago de nómina

No. NPG506

NOMBRE:	**PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	1102804163-4	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00046
DIRECCION:	CRA#6 85 -03	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
30/11/2025	**DESDE:** 04/11/2025	**HASTA:** 30/11/2025	**$ 2.898.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	27	Días				$ 3.150.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	27	Días	4%			$ 126.000,00
Aporte pensión empleado	27	Días	4%			$ 126.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.150.000,00
DEDUCCIONES:	$ 252.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 2.898.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/12/2025	$ 2.898.000,00

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de liquidación por terminación de contrato

No. CTRL-2512007

NOMBRE: **JORGE ELIECER ALVAREZ CARRE**
NI: 91275391-6
DIRECCION: CRA 27 36 14 OF 309
CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00016
TIPO TRABAJADOR: Dependiente
TIPO DE TERMINACIÓN: Mutuo acuerdo

FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
15/10/2025	31/12/2025	**DESDE:** 01/12/2025 **HASTA:** 31/12/2025	**$ 5.231.253.33**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.600.000,00
Vacaciones liquidadas	3,17	Días				$ 380.000,00
Prima legal	76	Días				$ 760.000,00
Cesantías pagadas al trabajador	76	Días				$ 760.000,00
Intereses cesantías anticipadas	76	Días				$ 19.253,33

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 144.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 144.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 5.519.253,33
DEDUCCIONES:	$ 288.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 5.231.253,33

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/01/2026	$ 5.231.253,33

FRM-760V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184

Tel.: 6076844527

Comprobante de liquidación por terminación de contrato

No. CTRL-2512001

NOMBRE: **JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR D**
NIT: 91518201-1
DIRECCION: Cra 56 casa 35 corpovisur 2
CIUDAD: FLORIDABLANCA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00001
TIPO TRABAJADOR: Dependiente
TIPO DE TERMINACIÓN: Mutuo acuerdo

FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
15/10/2025	31/12/2025	**DESDE:** 01/12/2025	**HASTA:** 31/12/2025	**$ 5.085.940.74**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00
Vacaciones liquidadas	3,17	Días				$ 369.444,44
Prima legal	76	Días				$ 738.888,89
Cesantías pagadas al trabajador	76	Días				$ 738.888,89
Intereses cesantías anticipadas	76	Días				$ 18.718,52

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 5.365.940,74
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 5.085.940,74

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/01/2026	$ 5.085.940,74

I.B.G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL
NIT: 900202701-7

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO
DE NÓMINA ELECTRÓNICA

NE252

COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, CARRERA 27 # 37 - 33
OFICINA 804 EDIFICIO GREEN GOLD
administracion@ibgingenieria.com

EMPLEADO: IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79431435 DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, FLORIDABLANCA, EL OLYMPO CONDOMINIO & RESORT, CL. 200, 12-528 CORREO ELECTRÓNICO: ibg.ingenieria@hotmail.com SUELDO: 5,217,190	FECHA DE EMISIÓN 2026-01-16 15:02:37	PERIODO LIQUIDACIÓN 2025-12-01 2025-12-31
	CUNE 11eef50ca06841d4543d732931315f1c94aa93afe642a0d85d6c116025c727d94c26aaa3ea53e6e2db128d908cebd06e	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	DEVENGADO	DEDUCCION	DETALLE
1	Sueldo	30	3,826,170.27	0	
2	Auxilio de Transporte	30	73,333.33	0	
3	Vacaciones Comunes	1	813,000	0	01/01/0001 - 01/01/0001
4	Prima Legal	1	1,001,016.4	0	
5	Salud	1	0	153,100	
6	Pension	1	0	153,100	

Observaciones: ---	**Total Devengados (+)**	5,713,520
	Total Deducciones (-)	306,200
	Valor Total	**5,407,320**

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático eNomina.
Fecha y hora de expedición 2026-01-16 15:02:39.

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG268

NOMBRE:	**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	63555895-6	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00006
DIRECCION:	TORRES DE ARAGON	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	FLORIDABLANCA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
31/12/2025	**DESDE:** 01/12/2025	**HASTA:** 31/12/2025	**$ 3.872.908.75**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	15	Días				$ 1.350.000,00
Auxilio legal de transporte	15	Días				$ 100.000,00
Vacaciones disfrutadas	15 (12 hábiles)	Días		01/12/2025	15/12/2025	$ 1.350.000,00
Prima legal	180	Días				$ 1.288.908,75

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 108.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 108.000,00

TOTALES	
DEVENGADOS:	$ 4.088.908,75
DEDUCCIONES:	$ 216.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.872.908,75

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/01/2026	$ 3.872.908,75

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de liquidación por terminación de contrato

No. CTRL-2512012

NOMBRE: **PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**
CC: 1102804163-4
DIRECCION: CRA 27 36 14
CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00015
TIPO TRABAJADOR: Dependiente
TIPO DE TERMINACIÓN: Mutuo acuerdo

FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
1/09/2025	17/12/2025	**DESDE:** 01/12/2025 **HASTA:** 17/12/2025	**$ 2.529.324.06**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	17	Días				$ 1.020.000,00
Auxilio legal de transporte	17	Días				$ 113.333,33
Vacaciones liquidadas	4,46	Días				$ 267.500,00
Prima legal	107	Días				$ 594.444,44
Cesantías pagadas al trabajador	107	Días				$ 594.444,44
Intereses cesantías anticipadas	107	Días				$ 21.201,85

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	17	Días	4%			$ 40.800,00
Aporte pensión empleado	17	Días	4%			$ 40.800,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.610.924,06
DEDUCCIONES:	$ 81.600,00
TOTAL A PAGAR:	$ 2.529.324,06

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/01/2026	$ 2.529.324,06

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184

Tel : 6076844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

No. DSE8

INFORMACION DEL PROVEEDOR

FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO

NIT No. : 1098739051-6

DIRECCION : CR 15 A 104 A 11 LC 12 TO VERONA

TELEFONO :

CIUDAD : FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia

FECHA

20/01/2026

TOTAL

$ 1.500.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103502	CUENTA DE COBRO N° CIG 03 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERO ESTRUCTURAL 01 AL 30 DE DIC 2025	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 19/02/2026	$ 1.500.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

RM 116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS Nit 816.006.637-9

CUDS: e084cc470f6f2c8cbeef3d2c5dc32e8c30b89b2334f6db8057d6e885fc147d6783f34d71fe342556b15162c0946c70a3

Fecha emisión: 2026-01-20 11:49:48

Fecha validación DIAN: 2026-01-20 11:49:53-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,20 enero de 2025 N° CIG03

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON
NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
($1.500.000 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniero estructural cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 01 de dic al 30 de dic 2025

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14905555819

(415)7707212489984(8020) 000001490555581 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1098739051	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1098739051	20110614

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Santander 68	Bucaramanga 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TOLOZA	PIMIENTO	FREDY	SEBASTIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Santander 68	Floridablanca 276

41. Dirección principal: CR 15 A 104 A 11 LC 12 TO VERONA

42. Correo electrónico: fredytoloza16@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3012872558	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7112	20160914						1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 52249

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 03 - 28 / 17 : 24: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-03-2024 01:23:14PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098739051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103 NO. 14-14	TELÉFONO:	6881856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7998726071	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		19			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		32422720

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 230.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 230.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 180.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 180.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 35.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 35.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.500**
VALOR MORA:	**$ 5.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 445.800**

Planilla Pagada

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184

Tel.. 6076844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE9

INFORMACION DEL PROVEEDOR

TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO

NIT No. : 63398589-3

DIRECCION : BUCARICA 4 ETAPA, BLOQUE 15-9B APTO 347

TELEFONO :

CIUDAD : FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia

FECHA

20/01/2026

TOTAL

$ 1.750.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103502	CUENTA DE COBRO N° CIG N° 03 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERIA GEOTECNISTA DEL 01 AL 30 DE DIC	1	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 19/02/2026	$ 1.750.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIB

C.C. O NIT:

FRM - IGV - (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS, NIT 811.[illegible]

CUDS: 0ac9c1121132a599bab19eda7b07d61744f41477c34c617b9f254815853e6ea12a48ecec30c1ae503632622a7aa8cea2

Fecha emisión: 2026-01-20 13:59:41

Fecha validación DIAN: 2026-01-20 13:59:46-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,20 de enero de 2026 N° CIG03

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON
NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C. 63.398.589

LA SUMA DE: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($1.750.000 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniera especialista geotecnista cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 01 de dic al 30 de dic 2025

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C. 63.398.589

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14813062283

(415)7707212489984(8020) 000001481306228 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 3 9 8 5 8 9	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 3 9 8 5 8 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Málaga 4 3 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUINTERO	GUERRERO	TULIA	ELENA

35. Razon social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CON BUCARICA IV ETAPA BL 15 9 B AP 347

42. Correo electrónico: elena08245@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 8 1 0 0 3	6 0 1 6 4 9 7 2 4 7	3 1 6 8 3 2 0 5 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 1 0 1 0 1	7 4 9 0	2 0 2 0 0 6 0 8		7 1 1 1		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 5	4	9																							

05 - Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-01-2026 10:38:50AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-98 apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2097537580	9497461045	I	2026/01/23	2026/01/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$493,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	63398589	QUINTERO TULIA	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS002	30	$1,700,000	$212,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,700,000	$8,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$0	$0			$1,700,000	$8,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272.000	$0	$0	$272,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$272,000	$0	$0	$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,900	$0	$0	$8,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,500	$0	$0	$212,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$212,500	$0	$0	$212,500
TOTAL				**1**	**$493,400**	**$0**	**$0**	**$493,400**

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG279

NOMBRE: **JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO**
NI: 91275391-6
DIRECCION: CRA 27 36 14 OF 309
CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00025
TIPO TRABAJADOR: Dependiente

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
31/01/2026	**DESDE:** 01/01/2026	**HASTA:** 31/01/2026	**$ 3.312.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.600.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 144.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 144.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.600.000,00
DEDUCCIONES:	$ 288.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.312.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 02/03/2026	$ 3.312.000,00

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184
Tel.: 6076844527

Comprobante de pago de nómina

No. NPG3

NOMBRE:	**JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR DUR**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	91518201-1	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00002
DIRECCION:	Cra 56 casa 35 corpovisur 2	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	FLORIDABLANCA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
31/01/2026	**DESDE:** 01/01/2026	**HASTA:** 31/01/2026	**$ 3.469.095.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 249.095,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.749.095,00
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.469.095,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 02/03/2026	$ 3.469.095,00

I.B.G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL
NIT: 900202701-7

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO
DE NÓMINA ELECTRÓNICA

NE262

COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, CARRERA 27 # 37 - 33
OFICINA 804 EDIFICIO GREEN GOLD
administracion@ibgingenieria.com

EMPLEADO: IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79431435
DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, FLORIDABLANCA, EL OLYMPO CONDOMINIO & RESORT, CL. 200, 12-528
CORREO ELECTRÓNICO: ibg.ingenieria@hotmail.com
SUELDO: 5,217,190

FECHA DE EMISIÓN
2026-02-23
10:51:24

PERIODO LIQUIDACIÓN
2026-01-01
2026-01-31

CUNE
045a402dfe71bd328bb6154c94c682673a22cfa87a4981
2349bc685162de645208dede98ee501dac78b5aea162b
c71bc

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	DEVENGADO	DEDUCCION	DETALLE
1	Sueldo	30	5,217,190	0	
2	Vacaciones Comunes	1	217,556.82	0	01/01/0001 - 01/01/0001
3	Vacaciones Compensadas	1	0	0	
4	Prima Legal	1	434,591.93	0	
5	Cesantias	1	434,591.93	0	
6	Intereses de Cesantias	1	52,171.9	0	
7	Salud	1	0	208,700	
8	Pension	1	0	208,700	

Observaciones:

Total Devengados (+)	6,356,102.58
Total Deducciones (-)	417,400
Valor Total	**5,938,702.58**

CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático eNomina.
Fecha y hora de expedición 2026-02-23 10:51:25.

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG280

NOMBRE:	**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	63555895-6	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00006
DIRECCION:	TORRES DE ARAGON	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	FLORIDABLANCA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
31/01/2026	**DESDE:** 01/01/2026	**HASTA:** 31/01/2026	**$ 3.081.095.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.700.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 249.095,00
Intereses cesantías	360	Días				$ 348.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 108.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 108.000,00

TOTALES	
DEVENGADOS:	$ 3.297.095,00
DEDUCCIONES:	$ 216.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.081.095,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 02/03/2026	$ 3.081.095,00

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184
Tel.: 6076844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE13

INFORMACION DEL PROVEEDOR

FECHA

FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO

12/02/2026

NIT No. : 1098739051-6
DIRECCION : CR 15 A 104 A 11 LC 12 TO VERONA
TELEFONO :
CIUDAD : FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia

TOTAL

$ 1.500.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103502	CUENTA DE COBRO N° CIG 04 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERO ESTRUCTURAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 14/03/2026	$ 1.500.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Resolución DIAN: 18764011199216 Prefijo DSE Rango 1 al 100 Vigencia 6/11/2025 hasta 6/11/2027

CUDS: bc07cbc28da9155c775fe5cb03d825b299f3ee7c78d2ee685d4cb851103c64c16f53c686d215bd6bf6baec866cdf50b6
Fecha emisión: 2026-02-12 14:49:15
Fecha validación DIAN: 2026-02-12 14:49:17-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga 12 febrero de 2026 N° CIG04

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON
NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
($1.500.000 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniero estructural cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de enero 2026

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905555819

(415)7707212489984(8020) 000001490555581 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 3 9 0 5 1	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 3 9 0 5 1	2 0 1 1 0 6 1 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TOLOZA	PIMIENTO	FREDY	SEBASTIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CR 15 A 104 A 11 LC 12 TO VERONA

42. Correo electrónico: fredytoloza16@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 2 8 7 2 5 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 6 0 9 1 4						1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 28 / 17 : 24: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098739051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103 NO. 14-14	TELÉFONO:	6881856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6005531934**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		6			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		72080556

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 281.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 281.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 219.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 219.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 42.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 2.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 544.000**

Planilla Pagada

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184
Tel.: 6076844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE12

INFORMACION DEL PROVEEDOR

TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO

NIT No. : 63398589-3
DIRECCION : BUCARICA 4 ETAPA, BLOQUE 15-9B APTO 347
TELEFONO :
CIUDAD : FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia

FECHA

12/02/2026

TOTAL

$ 1.750.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103502	CUENTA DE COBRO N° CIG N° 04 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERIA GEOTECNISTA DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO 2026	1	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 14/03/2026	$ 1.750.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. o NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Resolución DIAN: 18764101190916 Prefijo: DSE Rango: 1 al 100 Vigencia: 6/11/2025 hasta 6/11/2027

CUDS: a12b066f6229c0762bfe3d2ae8c2aa47012513ec00c361e7e8daf3f2ca1ecd0f1a1c809a03426539b4a6e8949bb424be
Fecha emisión: 2026-02-12 14:48:04
Fecha validación DIAN: 2026-02-12 14:48:11-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,12 de febrero de 2026 Nº CIG04

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON
NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C. 63.398.589

LA SUMA DE: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($1.750.000 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniera especialista geotecnista cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 enero 2026

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C. 63.398.589

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Clase: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14813062283

(415)7707212489984(8020) 000001481306228 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 3 9 8 5 8 9	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 3 9 8 5 8 9	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Málaga 4 3 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUINTERO	GUERRERO	TULIA	ELENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CON BUCARICA IV ETAPA BL 15 9 B AP 347

42. Correo electrónico: elena08245@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 8 1 0 0 3	6 0 1 6 4 9 7 2 4 7	3 1 6 8 3 2 0 5 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 1 0 1 0 1	7 4 9 0	2 0 2 0 0 6 0 8		7 1 1 1		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-98 apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	39704846	9498704893	I	2026/02/20	2026/02/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

2026/02/09 01:07 PM

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG281

NOMBRE:	**PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1102804163-4	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00026
DIRECCION:	CRA 27 36 14	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
31/01/2026	**DESDE:** 01/01/2026	**HASTA:** 31/01/2026	**$ 3.469.095.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 249.095,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.749.095,00
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.469.095,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 02/03/2026	$ 3.469.095,00

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG290

NOMBRE: **JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO**
NI: 91275391-6
DIRECCION: CRA 27 36 14 OF 309
CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00025
TIPO TRABAJADOR: Dependiente

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
28/02/2026	**DESDE:** 01/02/2026	**HASTA:** 28/02/2026	**$ 3.312.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.600.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 144.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 144.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.600.000,00
DEDUCCIONES:	$ 288.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.312.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/03/2026	$ 3.312.000,00

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184
Tel.: 6076844527

Comprobante de pago de nómina

No. NPG4

NOMBRE:	**JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR DUR**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	91518201-1	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00002
DIRECCION:	Cra 56 casa 35 corpovisur 2	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	FLORIDABLANCA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
28/02/2026	**DESDE:** 01/02/2026	**HASTA:** 28/02/2026	**$ 3.469.095.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 249.095,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.749.095,00
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.469.095,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/03/2026	$ 3.469.095,00

I.B.G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL
NIT: 900202701-7

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO
DE NÓMINA ELECTRÓNICA

NE268

COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, CARRERA 27 # 37 - 33
OFICINA 804 EDIFICIO GREEN GOLD
administracion@ibgingenieria.com

EMPLEADO: IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79431435 DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, FLORIDABLANCA, EL OLYMPO CONDOMINIO & RESORT, CL. 200, 12-528 CORREO ELECTRÓNICO: ibg.ingenieria@hotmail.com SUELDO: 5,217,190	FECHA DE EMISIÓN 2026-03-25 10:58:58	PERIODO LIQUIDACIÓN 2026-02-01 2026-02-28
	CUNE 6282d18acc9c572727ee9425c0fd8333512a50e271ce4d2b3c91252dc2a89f567de6cb773efa0f0af77a01ea46282d0f	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	DEVENGADO	DEDUCCION	DETALLE
1	Sueldo	30	5,217,190	0	
2	Vacaciones Comunes	1	217,556.82	0	01/01/0001 - 01/01/0001
3	Vacaciones Compensadas	1	0	0	
4	Prima Legal	1	434,591.93	0	
5	Cesantias	1	434,591.93	0	
6	Intereses de Cesantias	1	52,171.9	0	
7	Salud	1	0	208,700	
8	Pension	1	0	208,700	

Observaciones: ---	**Total Devengados (+)**	6,356,102.58
	Total Deducciones (-)	417,400
	Valor Total	**5,938,702.58**

CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático eNomina.
Fecha y hora de expedición 2026-03-25 10:59:01.

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG289

NOMBRE:	**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	63555895-6	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00006
DIRECCION:	TORRES DE ARAGON	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	FLORIDABLANCA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
28/02/2026	**DESDE:** 01/02/2026	**HASTA:** 28/02/2026	**$ 2.733.095.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.700.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 249.095,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 108.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 108.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.949.095,00
DEDUCCIONES:	$ 216.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 2.733.095,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/03/2026	$ 2.733.095,00

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184

Tel.: 6076844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE16

INFORMACION DEL PROVEEDOR

FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO

NIT No. : 1098739051-6

DIRECCION : CR 15 A 104 A 11 LC 12 TO VERONA

TELEFONO :

CIUDAD : FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia

FECHA

24/03/2026

TOTAL

$ 1.500.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103502	CUENTA DE COBRO N° CIG 05 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERO ESTRUCTURAL DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 23/04/2026	$ 1.500.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - inSoft SAS Nit 810.000.030-9

CUDS: f9a102457aba7d90e4ae1c743e02f04b0aeae6fa090b93309e2bde6ded6441f241728f78bb7f2d80005e37814b12fb66

Fecha emisión: 2026-03-24 08:31:15

Fecha validación DIAN: 2026-03-24 08:31:22-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga 20 marzo de 2026 N° CIG05

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON
NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
($1.500.000 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniero estructural cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 de febrero 2026

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14905555819

(415)7707212489984(8020) 000001490555581 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 3 9 0 5 1	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadania 1 3	1 0 9 8 7 3 9 0 5 1	2 0 1 1 0 6 1 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TOLOZA	PIMIENTO	FREDY	SEBASTIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CR 15 A 104 A 11 LC 12 TO VERONA

42. Correo electrónico: fredytoloza16@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 2 8 7 2 5 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 6 0 9 1 4							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 03 - 28 / 17 : 24: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO EN EL PORTAL WEB

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098739051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103 NO. 14-14	TELÉFONO:	6881856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6007870469**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		12					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		163817824	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 280.200	$ 2.200	$ 282.400
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 2.200**	**$ 282.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 218.900	$ 1.700	$ 0	$ 220.600
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 1.700**	**$ 0**	**$ 220.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 400	$ 0	$ 43.100
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 43.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1098739051	TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	109873905	$ 42.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 546.100

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184
Tel : 6076844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE17

INFORMACION DEL PROVEEDOR

TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO

NIT No. : 63398589-3
DIRECCION : BUCARICA 4 ETAPA, BLOQUE 15-9B APTO 347
TELEFONO :
CIUDAD : FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia

FECHA

24/03/2026

TOTAL

$ 1.750.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103502	CUENTA DE COBRO N° CIG N° 05 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERIA GEOTECNISTA DEL 01 FEBREROO AL 28 DE FEBRERO 2026	1	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 23/04/2026	$ 1.750.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT

CUDS: c4c6fa3e1d20f8d688513017bc93f06e8bdf5a9167cd4115fb88b5addf1cb9f514c6b9fc82f7128b68c3ea45a8222f2c
Fecha emisión: 2026-03-24 08:31:48
Fecha validación DIAN: 2026-03-24 08:31:51-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,20 marzo de 2026 N° CIG05

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON
NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C. 63.398.589

LA SUMA DE: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($1.750.000 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniera especialista geotecnista cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 01 de enero al 28 febrero 2026

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C. 63.398.589

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14813062283

(415)7707212489984(8020) 000001481306228 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 3 9 8 5 8 9	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	63398589

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Málaga 4 3 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUINTERO	GUERRERO	TULIA	ELENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CON BUCARICA IV ETAPA BL 15 9 B AP 347

42. Correo electrónico: elena08245@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 8 1 0 0 3	6 0 1 6 4 9 7 2 4 7	3 1 6 8 3 2 0 5 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 1 0 1 0 1	7 4 9 0	2 0 2 0 0 6 0 8	7 1 1 1		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Si [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 19-01-2026 10:38:50AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-98 apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	132452681	95008831182	1	2026/03/20	2026/03/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

2026/03/20 10:52 AM

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG294

NOMBRE:	**PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
CC:	1102804163-4	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00026
DIRECCION:	CRA 27 36 14	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
28/02/2026	**DESDE:** 01/02/2026	**HASTA:** 28/02/2026	**$ 3.469.095.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 249.095,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.749.095,00
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.469.095,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/03/2026	$ 3.469.095,00

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG303

NOMBRE: **JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO**
NI: 91275391-6
DIRECCION: CRA 27 36 14 OF 309
CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00025
TIPO TRABAJADOR: Dependiente

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
31/03/2026	**DESDE:** 01/03/2026	**HASTA:** 31/03/2026	**$ 3.312.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.600.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 144.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 144.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.600.000,00
DEDUCCIONES:	$ 288.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.312.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/04/2026	$ 3.312.000,00

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184

Tel.: 6076844527

Comprobante de pago de nómina

No. NPG5

NOMBRE:	**JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR DUR**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	91518201-1	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00002
DIRECCION:	Cra 56 casa 35 corpovisur 2	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	FLORIDABLANCA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
31/03/2026	**DESDE:** 01/03/2026	**HASTA:** 31/03/2026	**$ 3.469.095.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 249.095,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.749.095,00
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.469.095,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/04/2026	$ 3.469.095,00

I.B.G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL
NIT: 900202701-7

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO
DE NÓMINA ELECTRÓNICA

NE277

COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, CARRERA 27 # 37 - 33
OFICINA 804 EDIFICIO GREEN GOLD
administracion@ibgingenieria.com

EMPLEADO: IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79431435 DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, FLORIDABLANCA, EL OLYMPO CONDOMINIO & RESORT, CL. 200, 12-528 CORREO ELECTRÓNICO: ibg.ingenieria@hotmail.com SUELDO: 5,217,190	FECHA DE EMISIÓN 2026-04-15 10:04:37	PERIODO LIQUIDACIÓN 2026-03-01 2026-03-31
	CUNE b7822d05bea2bd16871bf2c2fcd989a6c0bf690111f8a0bd84cdada8513f1e040a6e52e6907ecfc1f3fbc7bef6fd5f71	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	DEVENGADO	DEDUCCION	DETALLE
1	Sueldo	30	5,217,190	0	
2	Vacaciones Comunes	1	217,556.82	0	01/01/0001 - 01/01/0001
3	Vacaciones Compensadas	1	0	0	
4	Prima Legal	1	434,591.93	0	
5	Cesantias	1	434,591.93	0	
6	Intereses de Cesantias	1	52,171.9	0	
7	Salud	1	0	208,700	
8	Pension	1	0	208,700	

Observaciones: ---	**Total Devengados (+)**	6,356,102.58
	Total Deducciones (-)	417,400
	Valor Total	**5,938,702.58**

CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático eNomina.
Fecha y hora de expedición 2026-04-15 10:04:39.

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG305

NOMBRE:	**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	63555895-6	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00006
DIRECCION:	TORRES DE ARAGON	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	FLORIDABLANCA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
31/03/2026	**DESDE:** 01/03/2026	**HASTA:** 31/03/2026	**$ 2.733.095.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.700.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 249.095,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 108.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 108.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.949.095,00
DEDUCCIONES:	$ 216.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 2.733.095,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/04/2026	$ 2.733.095,00

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG304

NOMBRE:	**PAULA JULIANA FARFAN MANTILLA**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	1095839188-4	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00019
DIRECCION:	Calle 30 N #22 -173 Campestre rea	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
31/03/2026	**DESDE:** 01/03/2026	**HASTA:** 31/03/2026	**$ 3.009.095.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.000.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 249.095,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 120.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 120.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.249.095,00
DEDUCCIONES:	$ 240.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.009.095,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/04/2026	$ 3.009.095,00

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184
Tel.: 6076844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE19

INFORMACION DEL PROVEEDOR

TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO

NIT No. : 63398589-3
DIRECCION : BUCARICA 4 ETAPA, BLOQUE 15-9B APTO 347
TELEFONO :
CIUDAD : FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia

FECHA
09/04/2026

TOTAL
$ 1.750.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103502	CUENTA DE COBRO N° CIG 06 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERO ESTRUCTURAL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2026	1	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 09/05/2026	$ 1.750.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

CUDS: 19e07096498b4aed15e46172d3824a2b317e1e94cd7acfb974c001ba50314f70f042564b8f51714b31eab69fef1b4be8
Fecha emisión: 2026-04-09 16:15:00
Fecha validación DIAN: 2026-04-09 16:15:03-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,09 abril de 2026 N° CIG06

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON
NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C. 63.398.589


LA SUMA DE: UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
($1.750.000 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniera especialista geotecnista cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 marzo 2026

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,



TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C. 63.398.589

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14905555819

(415)7707212489984(8020) 000001490555581 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 3 9 0 5 1	6	mpuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 9 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 9 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 5 6 8 7 3	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	2 7 6	

Vigencia:

80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63398589		QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347	BUCARAMANGA-SANTANDER	3168320523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	219778585	9502505265	I	2026/04/23	2026/04/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	63398589	QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184

Tel.: 6076844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE18

INFORMACION DEL PROVEEDOR

FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO

NIT No. : 1098739051-6

DIRECCION : CR 15 A 104 A 11 LC 12 TO VERONA

TELEFONO :

CIUDAD : FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia

FECHA

09/04/2026

TOTAL

$ 1.500.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103502	CUENTA DE COBRO N° CIG 06 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERO ESTRUCTURAL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2026	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 09/05/2026	$ 1.500.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - inSoft SAS. Nit 810.000.630-9

CUDS: 3e845273737ef15d07f7bbb1b9e0ce0e7f8ccdb4639f6dd13d75db4e41de7e89c844b4f9333182f51c9bcd6c217774f4

Fecha emisión: 2026-04-09 16:13:37

Fecha validación DIAN: 2026-04-09 16:13:42-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga, 09 de abril 2026 N° CIG06

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON
NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
($1.500.000 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniero estructural cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo 2026

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

Bucaramanga, 09 de abril 2026 N° CIG06

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON
NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
($1.500.000 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniero estructural cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo 2026

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905555819

(415)7707212489984(8020) 000001490555581 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 3 9 0 5 1	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedicion
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 3 9 0 5 1	2 0 1 1 0 6 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TOLOZA	PIMIENTO	FREDY	SEBASTIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CR 15 A 104 A 11 LC 12 TO VERONA

42. Correo electronico: fredytoloza16@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 2 8 7 2 5 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 6 0 9 1 4							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 03 - 28 / 17 : 24: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz: en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepte la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN VALIDEZ COMERCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098739051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 103 NO. 14-14	TELÉFONO:	6881856
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6012782039	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		219829874

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 42.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 541.800**

Planilla Pagada

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG308

NOMBRE: **JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO**
NI: 91275391-6
DIRECCION: CRA 27 36 14 OF 309
CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00025
TIPO TRABAJADOR: Dependiente

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
30/04/2026	**DESDE:** 01/04/2026	**HASTA:** 30/04/2026	**$ 3.312.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.600.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 144.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 144.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.600.000,00
DEDUCCIONES:	$ 288.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.312.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/05/2026	$ 3.312.000,00

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184

Tel.: 6076844527

Comprobante de liquidación por terminación de contrato

No. CTRL-2604002

NOMBRE: **JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR D**
NIT: 91518201-1
DIRECCION: Cra 56 casa 35 corpovisur 2
CIUDAD: FLORIDABLANCA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00002
TIPO TRABAJADOR: Dependiente
TIPO DE TERMINACIÓN: Mutuo acuerdo

FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN	PERIODO LIQUIDADO			TOTAL A PAGAR
1/01/2026	14/04/2026	**DESDE:** 01/04/2026	**HASTA:**	14/04/2026	**$ 4.328.156.83**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	14	Días				$ 1.633.333,33
Auxilio legal de transporte	14	Días				$ 116.244,33
Vacaciones liquidadas	4,33	Días				$ 505.555,56
Prima legal	104	Días				$ 1.083.071,89
Cesantías pagadas al trabajador	104	Días				$ 1.083.071,89
Intereses cesantías anticipadas	104	Días				$ 37.546,49

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	14	Días	4%			$ 65.333,33
Aporte pensión empleado	14	Días	4%			$ 65.333,33

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 4.458.823,49
DEDUCCIONES:	$ 130.666,66
TOTAL A PAGAR:	$ 4.328.156,83

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/05/2026	$ 4.328.156,83

I.B.G INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL
NIT: 900202701-7

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO
DE NÓMINA ELECTRÓNICA

NE279

COLOMBIA, SANTANDER, BUCARAMANGA, CARRERA 27 # 37 - 33
OFICINA 804 EDIFICIO GREEN GOLD
administracion@ibgingenieria.com

EMPLEADO: IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79431435 DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTANDER, FLORIDABLANCA, EL OLYMPO CONDOMINIO & RESORT, CL. 200, 12-528 CORREO ELECTRÓNICO: ibg.ingenieria@hotmail.com SUELDO: 5,217,190	FECHA DE EMISIÓN 2026-05-19 16:46:26	PERIODO LIQUIDACIÓN 2026-04-01 2026-04-30
	CUNE 3cc7fa4a914d7db46d1bd301728d6f1cf79d5274be9e9c07386f58a0a7ead018dc5d7a27113114674487ad591e1a3c49	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	DEVENGADO	DEDUCCION	DETALLE
1	Sueldo	30	5,217,190	0	
2	Vacaciones Comunes	1	217,556.82	0	01/01/0001 - 01/01/0001
3	Vacaciones Compensadas	1	0	0	
4	Prima Legal	1	434,591.93	0	
5	Cesantias	1	434,591.93	0	
6	Intereses de Cesantias	1	52,171.9	0	
7	Salud	1	0	208,700	
8	Pension	1	0	208,700	

Observaciones: ---	**Total Devengados (+)**	6,356,102.58
	Total Deducciones (-)	417,400
	Valor Total	**5,938,702.58**

CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático eNomina.
Fecha y hora de expedición 2026-05-19 16:46:28.

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG306

NOMBRE:	**EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	63555895-6	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00006
DIRECCION:	TORRES DE ARAGON	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	FLORIDABLANCA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
30/04/2026	**DESDE:** 01/04/2026	**HASTA:** 30/04/2026	**$ 2.733.095.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 2.700.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 249.095,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 108.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 108.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.949.095,00
DEDUCCIONES:	$ 216.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 2.733.095,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/05/2026	$ 2.733.095,00

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH

NIT 900.714.233-9

CONSTRUANLE S.A.S / REP LEGAL. EDITH TOLOZA

Comprobante de pago de nómina

No. NPG307

NOMBRE:	**PAULA JULIANA FARFAN MANTILLA**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	1095839188-4	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00019
DIRECCION:	Calle 30 N #22 -173 Campestre rea	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO		TOTAL A PAGAR
30/04/2026	**DESDE:** 01/04/2026	**HASTA:** 30/04/2026	**$ 3.009.095.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.000.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 249.095,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 120.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 120.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.249.095,00
DEDUCCIONES:	$ 240.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.009.095,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/05/2026	$ 3.009.095,00

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184
Tel.: 6076844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE23

INFORMACION DEL PROVEEDOR

TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO

NIT No. : 63398589-3
DIRECCION : BUCARICA 4 ETAPA, BLOQUE 15-9B APTO 347
TELEFONO :
CIUDAD : FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia

FECHA
14/04/2026

TOTAL
$ 817.100,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103502	CUENTA DE COBRO N° CIG 07 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERO ESTRUCTURAL DEL 01 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL 2026	1	$ 817.100,00	$ 817.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 14/05/2026	$ 817.100,00

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIEN PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

CUDS: d04c9d8f18ca774206930e15130719f9999e6ead1c1cca24d18bc90def351be16ccad9e0b1cc72a9be848f7ad0629cca
Fecha emisión: 2026-04-14 09:14:39
Fecha validación DIAN: 2026-04-14 09:14:42-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,14 de abril de 2026 N° CIG07

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON
NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C. 63.398.589


LA SUMA DE: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIEN PESOS M/CTE
($817.100 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniera especialista geotecnista cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 01 de abril al 14 abril 2026

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,



TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C. 63.398.589

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14813062283

(415)7707212489984(8020) 000001481306228 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 3 9 8 5 8 9	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 3 9 8 5 8 9	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Málaga 4 3 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
QUINTERO	GUERRERO	TULIA	ELENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CON BUCARICA IV ETAPA BL 15 9 B AP 347

42. Correo electrónico: elena08245@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 8 1 0 0 3	6 0 1 6 4 9 7 2 4 7	3 1 6 8 3 2 0 5 2 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 1 0 1 0 1	7 4 9 0	2 0 2 0 0 6 0 8	7 1 1 1			2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI: ☐ NO: X 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CONSORCIO INTER GIRON

Nit 901985184
Tel.: 6076844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE22

INFORMACION DEL PROVEEDOR

FECHA

FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO

NIT No. : 1098739051-6
DIRECCION : CR 15 A 104 A 11 LC 12 TO VERONA
TELEFONO :
CIUDAD : FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia

14/04/2026

TOTAL

$ 700.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103502	CUENTA DE COBRO N° CIG 07 POR CONCEPTO DE HONORARIOS INGENIERO ESTRUCTURAL DEL 01 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL 2026	1	$ 700.000,00	$ 700.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 14/05/2026	$ 700.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

CUDS: 89f1368338bf9b681048ef83348bd4137320ad22e0363ab538650beb2826e223db55f519ef30815c26d334ebca9492a6
Fecha emisión: 2026-04-14 09:13:45
Fecha validación DIAN: 2026-04-14 09:13:49-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,14 abril de 2026 N° CIG07

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO INTER GIRON
NIT N° 901.985.184-1

DEBE A
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051


LA SUMA DE: SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE
($700.000 =)

POR CONCEPTO DE: Honorarios como ingeniero estructural cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Correspondiente al periodo del 01 de abril al 14 de abril 2026

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,



FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO
C.C. 1.098.739.051

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905555819

(415)7707212489984(8020) 000001490555581 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 3 9 0 5 1	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 3 9 0 5 1	2 0 1 1 0 6 1 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TOLOZA	PIMIENTO	FREDY	SEBASTIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CR 15 A 104 A 11 LC 12 TO VERONA

42. Correo electrónico: fredytoloza16@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 2 8 7 2 5 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 6 0 9 1 4					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 03 - 28 / 17 : 24: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 2 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14905555819

(415)7707212489984(8020) 000001490555581 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 3 9 0 5 1	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 9 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 9 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 5 6 8 7 3	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	2 7 6	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ANEXO N. 04
PAZ Y SALVO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, **JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO** identificado con cedula de ciudadanía N 91.275.391 de Bucaramanga, declaro que la empresa **CONSTRUANLE SAS**, Nit 900.714.233-9, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el cargo de **DIRECTOR** la cual se encuentra aportada al CONSORCIO INTERGION Nit 901.985.184-1 al **Contrato No. 210.16228-4** cuyo objeto es, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
GRUPO 4: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Bucaramanga, el día 14 de abril del 2026.

Sin otro particular.

Atentamente



JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO
C.C 91.275.391 de Bucaramanga.


CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, **JULIAN VILLAMIZAR** identificada con cedula de ciudadanía N 9.158.201 de Bucaramanga, declaro que el **CONSORCIO INTERGIRON**, Nit 901.985.184-1, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el cargo de **RESIDENTE** para el **Contrato No. 210.16228-4** cuyo objeto es, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
GRUPO 4: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Bucaramanga, el día 14 de abril del 2026.

Sin otro particular.

Atentamente



JULIAN VILLAMIZAR
C.C 9.158.201 de Bucaramanga.

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, **IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía N 79.431.435 de Bucaramanga, declaro que la empresa I.B.G.INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL, Nit 900.202.701-1, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el cargo de **HIDRAULICO** la cual se encuentra aportada al CONSORCIO INTERGION Nit 901.985.184-1 al **Contrato No. 210.16228-4** cuyo objeto es, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
GRUPO 4: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Bucaramanga, el día 14 de abril del 2026.

Sin otro particular.

Atentamente

IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ
C.C 79.431.435 de Bucaramanga.


CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, **TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO** identificada con cedula de ciudadanía N 63.398.589 de Malaga, declaro que el **CONSORCIO INTERGIRON**, Nit 901.985.184-1, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el cargo de **GEOTECNISTA** para el **Contrato No. 210.16228-4** cuyo objeto es, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
GRUPO 4: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Bucaramanga, el día 14 de abril del 2026.

Sin otro particular.

Atentamente



TULIA ELENA QUINTERO GUERRERO
C.C 63.398.589 de Malaga.

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, **FREDY SEBASTIAN TOLOZA** identificada con cedula de ciudadanía N 1.098.739.051 de Bucaramanga, declaro que el **CONSORCIO INTERGIRON**, Nit 901.985.184-1, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el cargo de **ESTRUCTURAL** para el **Contrato No. 210.16228-4** cuyo objeto es, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
GRUPO 4: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Bucaramanga, el día 14 de abril del 2026.

Sin otro particular.

Atentamente



FREDY SEBASTIAN TOLOZA
C.C 1.098.739.051 de Bucaramanga.

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, **EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS** identificado con cedula de ciudadanía N 63.555.895 de Bucaramanga, declaro que la empresa **CONSTRUANLE SAS**, Nit 900.714.233-9, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el cargo de **AMBIENTAL** la cual se encuentra aportada al CONSORCIO INTERGION Nit 901.985.184-1 al **Contrato No. 210.16228-4** cuyo objeto es, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
GRUPO 4: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Bucaramanga, el día 14 de abril del 2026.

Sin otro particular.

Atentamente

EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
C.C 63.555.895 de Bucaramanga.

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Yo, **PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO** identificado con cedula de ciudadanía N 1.102.804.163 de Bucaramanga, declaro que la empresa **CONSTRUANLE SAS**, Nit 900.714.233-9, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el cargo de **SISO** la cual se encuentra aportada al CONSORCIO INTERGION Nit 901.985.184-1 al **Contrato No. 210.16228-4** cuyo objeto es, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
GRUPO 4: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Bucaramanga, el día 14 de abril del 2026.

Sin otro particular.

Atentamente

PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO
C.C 1.102.804.163 de Bucaramanga.

ANEXO N. 05

BITÁCORA DE OBRA

15 de Octubre del 2025

Estado del tiempo: Soleado

- Descripción: Una vez realizado el acta de inicio en las instalaciones de la entidad, se procede con actividades administrativas como lo son actualización de polizas, requerimientos de personal, materiales y busqueda de almacén de obra, lo anterior para dar inicio a las actividades contractuales del proyecto.
- Personal: (1) Director de obra; (1) Residente de obra; (1) Geotecnista (1) Asesor Ambiental; (1) SST; (1) Director de obra interventoria; (1) Residente de obra interventoria

Melissa Donado

16 de octubre del 2025

- Estado del tiempo: Lluvioso
- Descripción Se continuan actividades de administrativas correspondiente a contratación de personal, visita de obra en el frente villa de los caballeros, elección de campamento de obra y todas las actividades administrativas contractuales
- Personal: (1) Director de obra contratista; interventoria; Residente de obra contratista; interventoria; (2) SST contratista; interventoria

Melissa Donado.

17 de octubre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuan con actividades de conformación de campamento de obra, adecuación de luz, agua, almacen y oficina, Se contactara con la comunidad aferente al proyecto, el presidente de la junta de acción comunal para programar la respectiva socialización con la comunidad, cuyas comunidades expresan la vulnerabilidad que se tiene en el talud a intervenir.
- Personal: (2) Directores de obra; (2) Residentes de obra; (2) SST; (1) Trabajadora social; (1) Almacenista; (1) Oficial; (3) Ayudantes

Melissa Donado

18 de octubre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado.

002

-Descripción: Se inician con actividades relacionadas a levantamientos topográficos, en el talud a intervenir para obtener el area que será intervenida. Se inicia recibiendo material de obra para la adecuación de campamento de obra, el cual esta compuesto de un placa con su respectivo cimentación y levantado en muros en mampostería

- Personal: (2) Directores de obra; (2) Residentes de obra; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial; (5) Ayudantes de obra; (1) Topografo

- Equipo: Estación topografica

Melissa Donado

20 de octubre del 2025

- Estado del tiempo: lluvioso-nublado

- Descripción: Se realiza el inventario forestal con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad ambiental, se levanta los individuos arbóreos que se encuentran localizados en el área de influencia directa del proyecto. Se adecua el campamento con el fin de realizar la respectiva socialización con la comunidad.

- Personal: (2) Residente de obra; (2) SST; (1) trabajadora Social (1) Ingeniero Ambiental; (1) Forestal; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) Operadores de perforación; (3) Ayudantes de perforación

- Equipo: Estación Topografica

Melisso Donado

21 de octubre del 2025

- Estado del tiempo: Nublado

- Descripción: Se realizan desmonte y limpieza del area a intervenir, ejercicio necesario para la visualización y evaluación del estado inicial del terreno, se realiza acopio de los materiales producto del desmonte que impida el normal desarrollo de actividades. Se ejecuta actividades de cerramientos perimetriales tipo bailicada, delimitación y señalización de obra.

-Personal: (1) Director de obra; (2) Residentes de obra; (2) SST; (1) Topografo; (1) Almacenista; (2) Operadores de perforación; (2) Ayudantes

- Equipo: (1) Estación topografica; (1) Volqueta

Melissa Donado

22 de octubre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuan actividades de desmonte y limpieza del area a intervenir y se acopia el material vegetal, con el proposito de reutilizarlo posteriormente en las actividades de recuperacion, Se continua con la delimitación y cerramientos perimetrales, con el fin de garantizar las condiciones necesarios de seguridad para el desarrollo de actividades tecnicas
- Personal: (2) Directores de obra; (2) Residente de obra; (2) SST (2) Ing. Ambiental; (1) Topografo; (3) Ayudantes de perforación (1) Topografo; (7) Oficial; (2) operadores de perforación
- Equipo: (1) Estación topografica

Melissa Donado

23 de octubre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Una vez despejado el area de intervención, se continua nuevamente con replanteo, control y medición de obra con el fin de conocer el estado actual de la geomorfologia del terreno, calculo de pendientes para verificacion de niveles hidraulicos. y se continuan con actividades de acondicionamiento de campamento
- Personal: (2) Residentes de obra; (3) Ayudandes de perforación (2) operadores de perforación; (1) topografo; (1) Almacenista
- Equipo: (1) Estación topografica

Melissa Donado

24 de octubre del 2025

- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: Se ejecutaron actividades de instalación de linea de vida, se realiza la excavación para poder enterrar los pabs rollizos y se tiempla la guaya y se asegura con perros en toda la corona del talud, con el fin de poder realizar actividades descolgados en el talud. Se continuan actividades

de desmonte y limpieza y medicion de obra

- Peisonal: (2) Residentes de obra; (2) Directores de obra; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (2) Operadores de perforacion; (3) Ayudante (1) Almacenista; (1) Oficial;
- Equipo: Estacion topografica; (1) Volqueta

Melissa
Donado
25 de Octubre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se realizan actividades de retiro de basuras y escombros existentes en el frente de obra, antes de iniciar con los trabajos tecnicos, Se realiza por medios mecanicos y manuales, en busca de despejar el sitio en obra. Se continua con el desmonte y limpieza y acondicionamiento de campamento
- Peisonal: (2) Ingenieios Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (2) Operadores de perforacion; (3) Ayudantes de perforacion
- Equipo: (1) Volqueta; (1) Estacion topografica

Melissa
Donado
27 de octubre del 2025

- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción. Se realizan actividades de instalacion de valla informativa con las especificaciones principales del contrato y se localizo estrategicamente para garantizar la visibilidad y aislamiento de la misma. Se continuan con actividades de desmonte y limpieza.
- Peisonal: (2) Ingenieios Residentes; (1) Topografo; (2) operadores de perforacion (1) Almacenista; (1) oficial; (3) Ayudantes
- Equipo: Herramienta menor; (1) Volqueta; (1) Estacion topografica

Melissa
Donado
28 de octubre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuan con actividades de desmonte y limpieza adecuación de campamento, Cerramiento perimetral, instalacion de linea de vida, Señalizacion de obras, se realizo recorrido por las vias

para determinar el ingreso de la maquinaria pesada retroexcavadora que sera ingresada por medio de una camabaja

- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista (1) Oficial; (2) Operadores de perforación; (2) Ayudantes
- Equipo: (1) Estación Topografica; (1) Volqueta

Melissa Donado

29 de octubre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de control y medición de obra para realizar la delimitación del area a intervenir por medio de instalación de estacas de madera en toda la corona y pie de talud. Se reabe la retroexcavadora en el frente de obra villa de los caballeros para iniciar con actividades de movimiento de tierras
- Personal: (2) Residentes de obra; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) Operadores de perforación; (1) Oficial; (1) Operador de maquinaria; (3) Ayudantes de perforación

Melissa Donado

30 de octubre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de desmonte y limpieza y retiro de basuras y escombros y se acopia para poder retirarlo y disponerlo en el sitio adecuado de disposición final. Se deja listo el campamento de obra, señalizado y dispocisión de el punto ecologico
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) Oficial; (1) Ingeniera Ambiental; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (2) Ayudantes de perforación; (1) Conductor; (1) Operador de maquinaria
- Equipo: (1) Volqueta; (1) Retro excavadora

Melissa Donado

31 de octubre del 205

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de retiro de basuras y escombros

de unos sacos que se encontraban en el talud con un estado posible de demolición y tierra, todo lo anterior se dispone en el sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.
Se inician actividades de barricada perimetral de todo el pie del talud, de tal forma que sirva como contención ante el movimiento de tierras.
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (2) Ingenieros Ambientales (1) Topografo; (1) Oficial; (1) Almacenista; (1) Conductor; (3) Ayudantes
• Equipo: (1) Volquera; (1) Retro excavadora.

Melissa Donado

Noviembre 01, 02 y 03: Se Descansa debido a que es fin de semana con puente festivo

Melissa Donado

04 de noviembre del 2025
• Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de perfilamiento en el talud, se descuelgan por medio del arnes y con todos los cuidados respectivos, el terreno que se esta perfilando es rocoso y dificultoso bastante en poder extraerlo. Se inician actividades de excavación de maquinaria por medio de la retroexcavadora. Se realiza replanteo en la corona del talud.
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (3) Operadores de maquinaria; (4) Ayudantes de obra;
• Equipo: (1) Retroexcavadora

Paula Delgado

Melissa Donado.

05 de Noviembre del 2025
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: Se continuan con actividades de desmonte y limpieza, perfilado a mano descolgado en el talud, y excavación en material granular por medios mecanicos y manuales. Lo anterior se realiza contando con el equipo de izaje y el arnes de seguridad
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial;

(2) Operadores de perforación; (2) Ayudantes de obra; (3) Ayudantes de perforación

• Equipo: (3) Volquetas; (1) Retroexcavadora

Melissa Donado

06 de Noviembre del 2025

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se inician actividades de excavación de material granular por medios mecanicos, se continua con el perfilado a mano descolgado en el talud, Se realiza visita del alumbrado público debido a la existencia de un poste que nos interrumpio con la excavación con el objetivo de poderlo desplazar.

• Personal: (3) Volqueras; (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Director de obra; (1) Almacenista; (1) Oficial; (2) operadores; (2) Ayudantes

• Equipo: (3) Volquetas; (1) Retroexcavadora; (1) Estación topografica

Melissa Donado

07 de Noviembre del 2025

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se realizan actividades de excavación granular por medios mecanicos, y se retiro el material sobrante por medio de volquetes al sitio destinado de disposición final. El alumbrado público hace presencia para poder retirar el poste y instalarlo cuando ya quede la obra lista

• Personal (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (2) Directores de obra (1) Almacenista; (1) Oficial; (3) operadores; (2) Ayudantes (1) Oficial

• Equipo: (3) Volquetes; (1) Retroexcavadora

08 de Noviembre del 2025

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se realizan actividades de cerramiento de barricada en todo el pie del talud, se cierra con polisombra negra apartamento que esta cerca a la zona de intervención con el objetivo de no causar ningún daño. Se continuan con actividades de excavación de material granular y rocoso y se

dispone al sitio autorizado de disposición final.
• Peiscal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (3) Operadores; (2) Ayudantes
• Equipo: (3) Volqueras; (1) Retroexcavadora

16 de Noviembre del 2025
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: Se inician actividades de peinado a mano descolgada del talud, se continua con excavación de material granular y roca por medios mecanicos y se acopia en el sitio autorizado de disposición final. Se continua con un replanteo en la corona del talud para poder delimitar lo que va a hacer la canaleta.
• Peiscal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (2) Directores de obra; (1) Oficial; (3) Operadores; (2) Ayudantes
• Equipo: (3) Volqueras; (1) Retroexcavadora
Malisso
Donado

11 de Noviembre del 2025.
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: Se inician actividades de levantamientos y control, medición de obra por medio de la estación topografica por motivo de ir tomando niveles en el movimiento de tierras e ir demarcando con estacas el area a intervenir. Se continua con la excavación de material granular y roca.
• Equipo: (1) Estación Topografica; (3) Volqueras; (1) Retroexcavadora
• Peiscal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial; (3) Operadores; (2) Ayudantes

12 de Noviembre del 2025
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: Se continuan actividades de peinalamiento del talud descolgado, Se realiza actividades de conformación de cerramiento perimetral por medio de malla eslabonada y tela verde. Se continua con la excavación de material granular y roca por

medios mecanicos y manuales y se va retirando y se dispone en el sitio de disposición final

- Peisonal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (1) Almacenista; (3) Operadores (2) Ayudantes
- Equipo: (3) Volquetas; (1) Retro excavadora

Paula Delgado. Melissa Donado.

13 de Noviembre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de perfilamiento del talud, excavación de material granular, y retiro de basuras y escombros, lo anterior se almacena en el sitio autorizado de disposición final.
- Peisonal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (3) Operadores; (3) Ayudantes de perforación (3) Ayudantes de obra.
- Equipo: (1) Retro excavadora; (3) Volquetas; (1) Estación Topografica

Paula Delgado Melissa Donado

14 de Noviembre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de excavación de material granular y roceso en el area a intervenir; se continuan con el perfilamiento a mano descalzada en material granular y roceso. Se realizan actividades de cortar pines en varilla de 3/8" con el objetivo de demarcar cada anclaje. Se realizan actividades de retiro de material. Se recibe visita por parte de la entidad; la COMB para realizar una inspección ocular tecnica sobre el avance de la obra, las actividades contractuales realizadas y el avocence programado vs. el ejecutado realizado. Se toma registro de la asistencia y se Programa la proxima reunión el día 28 de noviembre.
- Peisonal: (2) Ingenieros Residentes; (2) Directores de obra; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial; (2) operadores; (3) Ayudantes de perforación
- Equipo: (1) Retroexcavadora; (3) Volquetas; (1) Estación Topografica

Ing. Hector Amado Profesional Esp. COMB — Contratista Profesional COMB — Paula Delgado. Melissa D

15, 16 y 17 de Noviembre del 2025 Días Festivos no laborales

18 de Noviembre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuan con actividades de desmonte y limpieza, excavación de material granular y rocoso, se acopia y se va retirando al sitio destinado a disposición final por medio de volqueras. Se continua con el perfilamiento de talud en roca y se replantea en la corona para realizar el paso y saber lo que va a ser la corona.
- Peirsonal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Ingeniera Ambiental; (1) Topografo; (3) operadores de maquinaria; (4) Ayudantes
- Equipo: (3) Volqueros; (1) Retroexcavadora

Melissa Donado

19 de Noviembre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuan con actividades de perfilado a mano descolgado del talud en terreno rocoso, Se continua con la barricada en el pie del talud a medida que vamos avanzando con la excavación de material granular y rocoso. Con ayuda de la topografia se marca niveles para cancer hasta donde va a llegar el area.
- Peirsonal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (2) Ingenieros Ambientales; (1) Almacenista; (1) Topografo; (3) Operadores de maquinaria; (3) Ayudantes de perforación
- Equipo: (1) Retroexcavadora; (1) Volquera; (1) Estación topografica

para Salgados

20 de Noviembre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de perfilamiento de talud a mano descolgada, se continua con la excavación de material granular y rocoso por medios mecanicos y se retira al sitio de disposición final. Se recibe materiales para las anclajes correspondiente a guaya, tubería, se dispone en obra acopiandolo en un lugar seguro que no impida el desarrollo de la obra.

Scanned with CamScanner

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (3) Ayudantes de Perforación, (3) Operadores
• Equipo: (1) Retro excavadora; (3) Volquetas; (1) Estación topografica

21 de Noviembre del 2025
• Estado del tiempo: Nublado
• Descripción: Se inician actividades de movimiento de tierras y se dispone al sitio de disposición final, se continua con el replanteo a mano descolgado del talud. Se realizan actividades de corte de guaya toron para los anclajes a una longitud de 25,5m y se comienza a armar el acopio para poder realizar los anclajes
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (3) Operadores; (4) Ayudantes
• Equipo: Herramienta menor; (3) Volquetos; (1) Retroexcavadora

Paula Melissa Dorado

22 de Noviembre del 2025
• Estado del tiempo: Se inician actividades de replanteo control y medición de obra, por medio de la estación topografica. Se inician actividades de perforación de tuberia pvc, corte de toron y demas actividades necesarios para los anclajes. Se continua con la excavación mecanico de material granular y el retiro del mismo al sitio autorizado de disposición final.
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (2) Ingenieros Ambientales; (1) Topografo; (3) operadores; (6) Ayudantes
• Equipo: (1) Retro excavadora; (3) Volquetes; (1) Estación

24 de Noviembre del 2025
• Estado del tiempo: Nublado
• Descripción: Se inician actividades de retiro de material producto de la excavación y se lleva al sitio autoriza

Scanned with CamScanner

do de disposición final. Se continua recibiendo material para los anclajes y se realizan actividades manuales de perforación de tubería, corte de toron, corte de neumáticos. Se realizan actividades de replanteo de anclajes en la zona de intervención

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (3) operadores; (6) Ayudantes; (1) Ing. Ambiental

•Equipo: Estación total; (3) Volqueteas; (1) Retroexcavadora

25 de Noviembre del 2025

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se inician actividades de tala de los arboles existentes en el frente de obra, previo al permiso solicitado a la entidad contratante y al inventario forestal anexado en el informe de obra No 1. Las anteriores actividades se realizan con el debido equipo de alturas. Se continuan con las excavaciones y el armado de anclajes

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial (3) Ayudantes de obra; (3) Operadores

•Equipo: (1) Retroexcavadora; (3) Volqueteas; (1) Estación topografica. Herramienta menor

Melissy Bonilla

26 de Noviembre del 2025

•Estado del tiempo: Soleado.

•Descripción: Se inician actividades de tala de los arboles ubicados en el area de influencia, se toma toda precaución con los equipos de alturas, se desmonta todas las ramas y cobertura vegetal previo al inventario forestal presentado anteriormente ante la entidad y la interventoria. Se realiza acta de aprobación de tala junto con interventoria y la entidad contratante. Se continuan con actividades de conformación de anclajes a una longitud de 25m de profundidad, se perfora tubería pvc para la longitud del bulbo del anclaje, se realiza excavación de cunetero en la corona del talud.

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista

(1) Oficial; (3) Operadores; (4) Ayudantes; (1) Ingeniera Ambiental
• Equipo: (1) Retroexcavadora; (1) Estación total; (3) Volquetas
Herramienta menor.

Melissa Donado

x27 de Noviembre del 2025
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: Se continuan actividades de tala de arboles existentes se retira el material sobrante producto de las excavaciones y se inicia con actividades de perforaciones horizontales a 25m de profundidad por medio de una unidad de perforación, a rotación, se instalan 13 tubos de 2m de longitud, Se continua con la distribución de anclajes en todo el area a intervenir y se instala el anclaje a 25m de profundidad. Se continuan con actividades de retiro de material sobrante y se destina al sitio autorizado de disposición final.
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) Ingenieros Ambientales; (2) SST (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Cadenero; (1) oficial, (1) Maestro; (3) Operadores; (4) Ayudantes; (2) Conductores;
• Equipo: (1) Estación total; Herramienta menor; (3) Volqueros; (1) Retroexcavadora; (1) Compresor; (1) Unidad de Perforación
Herramienta menor.

Melissa Donado

28 de Noviembre del 2025
• Estado del tiempo: Nublado
• Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales por medio de la unidad de perforación. Se continuan con el armado de anclajes y el retiro de material sobrante y se

dispone al sitio autorizado de disposición final. A las 9:00am se recibe visita de la entidad la CDMB por parte del Ing. Hector y el Arquitecto Hilberto, se realiza recorrido de obra en toda la pantalla a intervenir y se toma registro fotografico y se levanta acta de reunión para su evidencia

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Ing. Ambiental; (1) Almacenista; (2) Peirsonales profesionales por parte de la CDMB (3) Operadores; (3) Ayudantes

• Equipo: (1) Compresor; (1) Unidad de perforación; (2) Volquetas (1) Retroexcavadora.

Ing Hector Amado H
Profes. Especializado CDMB.

Gilberto Gomez C
Constratista Profesional CDMB

Paula Salgado

Melissa Donado

29 de Noviembre del 2025

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales por medio de la unidad de perforación neumatica, se perfora el terreno a una longitud de 25m de profundidad. Se realizan en piso los anclajes constituidos por tubería PVC, manguera polietileno, separadores, grapas y demas componentes según pliego de condiciones. Se instala los anclajes en cada uno de las perforaciones hechas.

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial; (3) Operadores; (5) Ayudantes; (1) Topografo; (1) Maestro

• Equipo: (1) Unidad de perforación; (1) Compresor; (1) Retroexcavadora

Melissa Donado

01 de Diciembre del 2025

• Estado del tiempo: Lluvioso.

• Descripción: Se continuan trabajos de perforaciones horizontales, e instalacion de anclajes 3 calles todo en la pantalla previamente delimitada y perfilada. Se continua en piso con el armado de anclajes y se instala en el terreno previo a la perforación. Se realizan actividades de replanteo de la terraza en la base del talud, se va rellenando la bancada a medida que vamos avanzando en ela perforación

• Peiscnal: (2) Ingenieios Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topogiafo; (1) Oficial; (1) Ingeniero Ambiental; (1) Trabajadoia Social
• Equipo: (1) Unidad de peifoiación; (1) Compiesoi;

paula Delgado.
Melissa Donado

02 de Diciembre del 2025 Melissa Donado

• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: Se inician actividades de peifoiaciones hoiizontales con la unidad de peifoiación No. 11, se peifoia el talud previamente demaicado en cada uno de los anclajes suministiados según topogiafía, se continua con la instalación de anclaje a 25m de piofundidad.
• Peiscnal: (2) Ingenieios Residentes; (2) SST; (1) Ingeniero Ambiental; (1) Diiectoi de obia; (1) Almacenista; (1) Topogiafo; (2) Opeiadoies (2) Ayudantes de obia
• Equipo: (2) Unidades de peifoiación; (2) Compiesoies;

03 de Diciembie del 2025 Melissa Donado

• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: Se continuan con actividades de suministio e instalación de anclajes 3 cables a una longitud de 25m de piofundidad, se iealiza pieviamente la peifoiación con la unidad neumática y se tiene al peiscnal detado con equipo de altuias, se continua con el aima-do de anclajes en el pie del talud. Se iealizan actividades de adecuación de campamento de cuaito acpm para delimita eia zona.
• Peiscnal: (2) Ingenieios Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topogiafo; (1) Almacenista; (1) Opeiadoies; (1) Ayudantes de obia
• Equipo: (2) Unidades de peifoiación; (2) Compiesoies

04 de Diciembie del 2025
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: Se continua con el aimado de anclajes en sitio veiificando sus accesoiios segun los pliegos de condiciones

Se continua con la perforación horizontal garantizando una inclinación de 15° respecto a la horizontal, Se continuan con actividades de perforaciones horizontales y suministro de anclajes, se continua con la adecuación de cuarto de ACPM

- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) Operadores de perforación; (7) Ayudantes de obra.
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

Melissa Donado

05 de Diciembre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales en los anclajes previamente marcados, se realizan actividades de armado de anclajes a 25m de profundidad. Se realiza cuarto de acopio de cemento para iños preparando para actividades de llenado e inyección de lechada cementicia
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (3) Operadores; (7) Ayudantes; (1) Director de obra
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

06 de Diciembre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales en el talud a intervenir, se suministra el anclaje respectivo. Se continuan con actividades de armado de campamento de cemento delimitado con tablas y cubierto con teja de zinc, con el objetivo de guardar un acopio maximo de 200 bultos.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Director de obra; (2) Operadores de perforación; (7) Ayudantes
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

Melissa Donado

07 y 08 de Diciembre: Días festivos no laborados

09 de Diciembre del 2025

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se continuan con actividades de perforaciones horizontales y suministro de anclajes a una profundidad de 25m, garantizando cada elemento construido. Se realizan actividades de armado de anclajes en piso. Se continuo con actividades de llenado de lechada cementicia en cada anclaje previamente instalado.

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (2) Operadores de perforación; (7) Ayudantes de obra (1) Operador de inyección

• Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores; (1) Unidad de Inyección

Melissa Dorado

10 de Diciembre del 2025

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales con la unidad de perforación neumatica perforando a 25m de profundidad, una vez perforado el terreno en cada punto del anclaje se instalo el anclaje. Las anteriores actividades se realizan con el personal dotado de curso de alturas y aines certificado. Se recibe visita por parte de la COMB en compañia de los profesionales especializados con el fin de realizar un recorrido de obra para inspeccionar las actividades realizadas y verificando el avance que ha tenido la obra, se realizo acto de visita como evidencia y se toma registro fotografico

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (2) operadores de perforación; (1) operador de inyección; (1) Director de obra; (1) Almacenista (1) Ingeniero Ambiental; (1) Topografo; (7) Ayudantes de obra; (2) Pascual profesional COMB

• Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

Melissa Dorado.

11 de Diciembre del 2025

·Estado del tiempo: Soleado

· Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales a una profundidad de 25m con equipo de perforación neumatica, cada personal cuenta con equipo de alturas y capacitado. Se continuan con el armado de anclajes 3 cables 7/2" según las especificaciones tecnicas de diseño

· Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Ingeniera Ambiental; (1) Director de obra; (1) Almacenista; (1) Topografo; (2) Operadores; (4) Ayudantes;

· Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

12 de Diciembre del 2025

·Estado del tiempo: Soleado

· Descripción: Se continuan con actividades de perforaciones horizontales en el talud oriental del barrio villa de los caballeros, se realizan actividades de armado de anclajes en piso. Se verifica en conjunto con topografia los puntos de anclajes, los niveles para las agujas Ilurias y el area a intervenir. Se continua con el armado en piso de los anclajes para completar la cantidad exacta

· Personal: (2) Ingenieros Residentes, (2) SST; (1) Ingeniera Ambiental (2) SST; (1) Almacenista; (1) topografo; (1) maestro; (2) operadores de perforación; (4) Ayudantes de obra

· Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

Melissa Donado

13 de Diciembre del 2025

·Estado del tiempo: Soleado

· Descripción: Se inician actividades de limpieza del todo el frente de obra, con el objetivo de tener un area de trabajo ordenada, se continuo con las perforaciones horizontales, con su respectiva instalación del anclaje 3 cables a 25m de profundidad

Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) operadores de perforación; (6) Ayudantes

·Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

15 de Diciembre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuan con actividades de llenado de anclajes por medio del equipo de inyección, se llena el anclaje en toda su profundidad con el objetivo de llenar cualquier porosidad dentro de la perforación. Se toma briquetas como ensayo de laboratorio con el objetivo de comprobar la resistencia
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Director de obra; (2) Operadores; (6) Ayudantes
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores; (1) Unidad de inyección

Melissa Bonilla

16 de Diciembre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuan con actividades de perforaciones horizontales, a una profundidad de 25m por medio de dos unidades de perforación neumaticas, se realiza la inyección en cada punto de anclaje en la zona de bulbo, con la lechada cementicia previamente preparada con su aditivo, cumpliendo la presión en la inyección respectiva según diseño.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) Topografo; (2) SST; (1) Almacenista; (3) Operadores; (6) Ayudantes; (1) Ingeniero Ambiental
- Equipo: (2) unidades de perforación; (2) Compresores; (1) Unidad de inyección

Melissa Bonilla

17 de Diciembre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de llenado e inyección de anclajes en el talud oriental del barrio villa de los caballeros, se realizan anclajes en piso, y se continua con actividades de perforaciones horizontales.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (3) Operadores, (6) Ayudantes
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (1) unidad de inyección; (2) Compresores

18 de Diciembre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se realizan actividades de perforaciones horizontales a una profundidad de 25m en el talud oriental del barrio villa de los caballeros, se realizan armado de anclajes, en piso y se instalan una vez el terreno se encuentre previamente perforado
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) Operadores; (6) Ayudantes
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

Melissa Donado

19 de Diciembre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuan con actividades de llenado de anclajes para cerrar los poros que pueden aparecer dentro de las perforaciones, luego realizado el llenado se continua con la inyección a la presión establecida en los estudios y diseños y rellenando toda la longitud del bulbo.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Ingeniera Ambiental (2) Operadores; (6) Ayudantes;
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (1) Unidad de inyección; (2) Compresores

Melissa Donado

20 de Diciembre del 2025

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuan con actividades de perforaciones horizontales en el talud oriental del barrio villa de los caballeros, garantizando una inclinación de 15° respecto a la horizontal, se continua con el armado en piso de los anclajes con sus respectivos elementos.
- Personal (2) Ingenieros Residentes, (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) operadores de perforación; (3) Ayudantes de perforación (3) Ayudantes de obra
- Equipo: (2) Vandados de perforación; (2) Compresores

22 de Diciembre del 2015

- Estado del tiempo. Soleado
- Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales con ayuda de dos unidades de perforación neumaticas. Se continua con la inyección de anclajes en la zona del bulbo con ayuda de la unidad de inyección a la presión establecida en los estudios y diseños, y se realiza previamente la preparación de lechada cementica
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) Oficial; (1) Almacenista; (3) operadores; (6) Ayudantes; (1) Director de Obra; (1) Ingeniera Ambiental; (1) Topografo;
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (1) Unidad de inyección; (2) Compresores

Melissa Dorado

23 de Diciembre del 2015

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se da inicio a actividades de perforaciones horizontales con dos unidades de perforación neumaticas, se continua con el armado en piso de los anclajes. Se realizan actividades de inyección de lechada cementicia en cada anclaje en la zona de bulbo. Se continua con la dimensión de anclajes en piso a una longitud de 25m de profundidad.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Ingeniero Ambiental; (2) Operadores de perforación; 6) Ayudantes
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores; (1) Unidad de inyección;

Melissa Dorado

24 de Diciembre del 2015

- Estado del tiempo.
- Descripción: Se inician actividades de perforación de anclajes a una profundidad de 25m con equipo de rotación, se realiza con dos unidades de perforación en los puntos de anclaje previamente impuestos según la topografia del terreno. Se realiza de manera simultanea el armado de anclajes con todos sus componentes según estudios y diseños.

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) Operadores de perforación; (4) Ayudantes de Perforación; (1) Director de obra; (1) Ingeniera Ambiental; (1) Oficial.

26 de Diciembre del 2025

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales a una profundidad de 25m, se cuenta con equipos de perforación neumaticos. Una vez perforado el anclaje se instala inmediatamente el anclaje compuesto por 3 cables guaya torón. Se continuan actividades de armado de anclajes en piso

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Ingeniero Ambiental; (1) Topografo; (2) operadores de perforación; (4) Ayudantes de perforación; (1) Almacenista; (2) Ayudantes de obra

• Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

Melissa Dorado

27 de Diciembre del 2025

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se continuan actividades de suministro e instalación de anclajes a una profundidad de 25m, se realizan anclajes en piso para completar la cantidad exacta a ejecutar, se replantea los puntos de anclaje con ayuda de la topografia, se marca niveles y al final se realiza limpieza del frente de obra

• Personal: (2) Ingenieros Residentes, (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) Operadores de Perforación; (2) Ayudantes de perforación; (1) Oficial

• Equipo: (2) Operadores de perforación; (2) Ayudantes de perforación

Melissa Dorado

29 de Diciembre del 2025

• Estado del tiempo Soleado

• Descripción: Se da inicio a las actividades de perforaciones horizontales alcanzando profundidades de 25m, se cuenta con dos unidades de perforación neumaticas. Se continua realizando el armado de anclajes en piso y armado de torsones.

Scanned with CamScanner

·Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo
(2) Operadores de perforación; (6) Ayudantes de obra
·Equipo: (2) unidades de perforación; (2) Ayudantes de perforación

30 de Diciembre del 2025
·Estado del tiempo: Soleado
·Descripción. Se continuan con actividades de perforaciones horizontales, armado y concreteado y instalación de anclajes en cada punto de anclaje previamente perforado. Se inicia actividades de llenado e inyección de lechada cementicia en cada punto de anclaje y se lleva un control tecnico
·Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Unidad de inyección
(2) Compresores
·Personal: (2) Ingenieros Residentes, (2) SST; (1) Almacenista; (1) topografo
(2) operadores de perforación; (2) Ayudantes de perforación.

Melissa Dorado

31 de Diciembre del 2025
·Estado del tiempo: Soleado
·Descripción: Se da inicio a actividades de perforaciones horizontales por medio de la unidad de perforación neumatico. Se continua con el armado en piso de anclajes y se realiza una jornada de orden y aseo
·Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (2) Operadores de perforación; (1) Almacenista
·Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

Melissa Dorado

02 de enero del 2026
·Estado del tiempo: Soleado
·Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales a una profundidad de 25m de longitud, se continuan con el armado en piso de los anclaje a una longitud de 25.60m según especificaciones tecnicas. Se realiza inventario de material existente en obra, y material pendiente por llegar.

Scanned with CamScanner

- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) Operadores de perforación; (6) Ayudantes de obra
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

3 de enero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales a una profundidad de 25m, con equipo de perforación neumatica. Se continua con el armado en piso de los anclajes según estudios y diseños respetando cada elemento compuesto. Se realiza aseo general de la obra y se recibe 200 bultos de cemento para actividades de llenado e inyección de anclajes.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Ingeniera Ambiental; (1) Topografo; (1) Director de obra; (1) Almacenista; (2) Operadores de Maquinaria; (6) Ayudantes de obra
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

Melissa Donado

05 de enero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician con actividades de perforaciones horizontales a una profundidad de 25m, se perfora en cada punto de anclaje previamente marcado por medio de la topografia respetando el alineamiento. Se continua con el armado en piso de anclajes 3 cables y se acopia la unidad de inyección y el cemento para nuevamente realizar actividades de llenado e inyección de anclajes
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (3) Operadores; (8) Ayudantes
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (1) Unidad de inyección; (2) Compresores
- Personal:

Melissa Donado

06 de enero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se da inicio nuevamente a actividades de llenado

e inyección de anclajes con lechada cementicia en cada anclaje previamente perforado, actividad destinada a garantiza. la adecuada adherencia del anclaje al terreno. De manera paralela se continua con la perforación de los anclajes

- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (3) Operadores; (6) Ayudantes; (1) Topografo
- Equipo: (1) Unidad de Inyección; (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

Melissa Dorado

07 de enero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continua con actividades de perforaciones horizontales a una profundidad de 25 metros lineales y el suministro instalación de anclajes 3 cables. De manera paralela se continua con el levantamientos topograficos de medición y control de obra. y se continua con el llenado de lechada en cada punto de anclaje
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (3) Operadores; (6) Ayudantes; (1) Ingeniera Ambiental; (1) Topografo
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (1) Unidad de Inyección (2) Compresores

08 de enero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se da inicio a actividades de perforaciones horizontales a una inclinación respectiva de 15° respecto a la horizontal, las cuales se posicionaron según la distribución de anclajes establecida previamente por comisión topografica. Las perforaciones se realizan con equipo rotativo cobrando su tubería de revestimiento Cabe mencionar que se lleva un control técnico de cada perforación de anclaje.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista (1) Topografo; (2) Operadores de perforación; (4) Ayudantes de perforación; (2) Ayudantes de obra; (1) Oficial

• Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

Melissa Dorado

09 de enero del 2026

• Estado del tiempo: Soleado.

• Descripción: Se realiza actividades de suministro e instalación de anclajes activos 3 cables D: 1/2". Así mismos, estos cuentan con toreres (3) de acero, ubicados perimetrialmente en un tubo de presión PVC de 4" por donde se realiza el proceso de llenado e inyección, cada toron esta protegido en su longitud libre por manguera. Una vez la perforación es terminada se procede a la instalación del anclaje activo con una longitud de 25m. Se recibe visita por parte de la COMB

• Personal: (2) Ingenieros Residente; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) Operadores de perforación; (6) Ayudante

• Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

• Hector Amado H. Profesional Especializado COMB

• David F. Mendoza B. Practicante Ing. Civil

10, 11 y 12: Dias festivos No laborales

13 de enero del 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se inician actividades de llenado de lechada cementicio en cada anclaje previamente perforado e instalado, sellando completamente el hueco que esta a 25m de profundidad. Se continua con las perforaciones horizontales en cada anclaje marcado.

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (3) Operadores; (6) Ayudantes

• Equipo: (1) Unidad de inyección; (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

Melissa Dorado

14 de enero del 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se continuan con actividades de llenado de anclajes en el terreno previamente perforado e instalado. Se llena el anclaje a una profundidad de 25m, con lechada cementicia con la dosificación y el diseño de mezcla establecido en la

estudios y diseños, se continuo con la perforación de anclajes a 25m de profundidad y se deja todo limpio y acoplado

- Personal: (2) Ingenieros Residentes, (1) Almacenista; (3) Operadores; (6) Ayudantes
- Equipo: (1) Unidad de inyección; (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

15 de enero del 2026

- Estado del tiempo: Lluvioso
- Descripción: Se inician actividades de llenado de lechada cementicia en cada punto de anclaje perforado e instalado, Simultanea mente se realiza la perforación de anclajes con dos unidades de perforación. Se paro un momento las actividades de obra por motivos de lluvia.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Director de obra (1) Ingeniero Ambiental; (1) Topografo; (6) Ayudantes de obra (3) Operadores
- Equipo: (1) Unidad de inyección; (2) Unidades de perforación (2) Compresores

Melissa Donado

16 de enero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales a una profundidad de 25m de longitud, una vez terminada la perforación se instala el anclaje respectivo. Se continua con el llenado de lechada cementicia en cada anclaje perforado. Se realiza muestreo de la lechada para enviar al laboratorio.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (3) Operadores; (6) Ayudantes; (1) Ingeniero Ambiental
- Equipo: (1) Unidad de inyección; (2) Unidades de perforación (2) Compresores

Melissa Donado

17 de enero del 2026

· Estado del tiempo: Soleado

· Descripción: Se da inicio a actividades a las perforaciones horizontales para la instalación de anclajes con una longitud de 25m Posteriormente una vez realizada la perforación e instalación del anclaje, se procede al llenado e inyección de lechada cementica a lo bigo de toda la perforación, garantizando la correcta adherencia y transmisión de refuerzos.

· Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Ingeniero Ambiental; (1) Topografo; (3) Operadores (6) Ayudantes

· Equipo: (1) Unidad de inyección; (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

19 de enero del 2026

· Estado del tiempo: Soleado

· Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales en cada punto de anclaje demarcado en la zona de ejecución del proyecto, se realiza la presente actividad a una profundidad de 25m; Se continuan con las excavaciones de zapatas en cada punto de anclaje, dicha actividad se realizo a mano descalgada y manual. Se recibe material correspondiente a las varillas de refuerzo de 3/4". Se acopio en el campamento y se dispone a realizar burro de base para realizar las pasillos para las zapatas

· Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Directo. de obra; (1) Ingeniero Ambiental; (1) Oficial; (2) Operadores de perforación; (6) Ayudantes de obra;

· Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

20 de enero del 2026

· Estado del tiempo: Soleado

· Descripción: Se continuan con actividades de perforaciones horizontales con equipo de perforación neumatica, se obtiene buen rendimiento en las perforaciones y se lleva un control tecnico de cada perforación registrando su fecha de perforación, la ubicación y su composición

en cada punto de anclaje.
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista
• Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

21 de enero del 2026
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: Finalizado las actividades de llenado e inyección de lechada cementicia en cada punto de anclaje se procede a realizar la excavación manual descolgada de las zapatas, con dimensiones de (1×1×0,20) m con el fin de poder permitir la instalación de la parilla de refuerzo, conformado por varillas de acero de 3/4"
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Ingeniero Ambiental (1) Topografo; (1) Almacenista; (2) operadores de perforación (6) Ayudantes de obra
• Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores; (1) mini bobcat

Melissa Donado

21 de enero del 2026
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: Se continuan con actividades de perforaciones horizontales en cada punto de anclaje respectiva, con ayuda de dos unidades de perforación neumaticos, se obtiene un buen rendimiento en las perforaciones ya que estan operativos dos unidades de perforación, se inician actividades de armado de parillas
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Ingeniero Ambiental; (1) Topografo; (2) Operadores de perforación; (6) Ayudantes de obra
• Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores; (1) mini bobcat;

Melissa Donado

22 de enero del 2026
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales a una longitud de 25m de profundidad, de manera continua se realizan excavaciones de zapatas de forma manual, Todo el acopio de material se

dispone en el sitio de disposición final

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (2) Operadores de perforación; (6) Ayudantes; (1) Oficial

• Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores; (1) Volqueta; (1) Mini Cargador

Melissa Donado

23 de enero del 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se ejecuto de manera continua la actividad de excavación manual de zapatas con dimensiones de (1x1x0,20) m, utilizando herramientas manuales y equipo especializado para trabajos en altura. El material sobrante producto de las excavaciones se acopia en un lugar especifico en obra y se dispone al sitio autorizado de disposición

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) Operadores de perforación; (6) Ayudantes

• Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores; (1) Herramienta menor

26 de enero del 2026

• Estado del tiempo: Nublado

• Descripción: Se inician actividades de replanteo de canaleta en la zona superior del talud denominado corona, se marca niveles necesarios para la caida del agua, se verifica con hilo y pines anclados en el terreno y se instalan guias para poder posteriormente fundir en concreto de 3000psi. Se continuan con las perforaciones horizontales a una profundidad de 25m para posteriormente instalar su anclaje.

• Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores; (1) mini cargador (1) Volqueta; Herramienta menor.

• Personal: (1) Director de obra; (2) Ingenieros Residentes; (1) Topografo; (1) Ingeniero Ambiental; (2) SST; (1) Almacenista; (2) Operadores de perforación (4) Ayudantes de perforación; (2) Ayudantes de obra

Melissa Donado

27 de enero del 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales a una profundidad de 25m y se instala inmediatamente el anclaje. Se continuo con actividades de fundida de canaleta en la parte superior del talud, actividad realizado en sitio de obra preparando el concreto con trompo y con una especificación de 3000 psi de su resistencia. Se continua con excavación de cajas en cada punto de anclaje, se realiza el retiro de material sobrante. Se recibe visita por parte de la superición, subdirección de gestión del riesgo y seguridad territorial SUYT y se realiza inspección ocular de las actividades mencionados anteriormente y se deja como evidencia la asistencia y registro fotografico

• Personal: (2) Ingenieros Residentes: (2) SST; (1) Oficial; (1) Almacenista; (1) Topografo; (3) Operadores; (7) Ayudantes; (1) Personal profesional COMB

• Equipo: (1) Trompo; (1) mini cargador; (2) Unidades de perforación (2) Compresores

Melisso Donado

28 de enero del 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se inician actividades de fundida de canaleta en la parte superior de la pantalla con el fin de manejar el sistema de aguas lluvias, se realiza la colocación de concreto y se le realiza un excelente acabado. Se continuar con actividades de perforaciones horizontales en cada punto de anclaje. Se realizan pruebas de ensayo

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) Operadores de perforación; (6) Ayudantes de obra

• Equipo: (2) Unidades de perforación; (1) Trompo; (1) Mini cargador; (2) Compresores

Melisso Donado

29 de enero del 2026

• Estado del tiempo: Soleado

- Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales en cada

punto de anclaje, se continua con el armado e instalación de parillas para los zapatas con el fin de realizar zapatas de tensionamiento. Se continua con la fundida de cabaleta

- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenistas; (2) Topografo (1) Oficial; (2) Operadores de perforación; (6) Ayudantes
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores; (1) Tiempo

30 de enero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de armado e instalación de acero de refuerzo de 3/4" en los puntos de anclaje respectivos. La estructura contempla una parilla de refuerzo, dispuesto a una separación y geometria definidas en los diseños, con el fin de permitir el adecuado acceso del anclaje y a su vez garantizar la correcta distribución de las cargas puntuales generados durante el proceso de tensionamiento
- Personal: (2) Ingeniero Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) Operadores; (6) Ayudantes
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores; (1) mini cargador

Melissa Donado

31 de enero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales en cada punto de anclaje, se continua con la fundida de cabaleta en la parte superior de la pantalla, se realiza armado e instalación de parillas para las zapatas De manera simultanea se realiza excavación de zapatas y se retira el material sobrante
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) Operadores de perforación;
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores; (1) Tiempo; (1) mini cargador

Melissa Donado. Pavimento Soleado

02 de febrero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de excavación de zapatas en cada punto de anclaje, de manera paralela se instalan las parillas para las zapatas asegurandolas con pines y dejando panelas para respetar su recubrimiento. Se continua con las perforaciones horizontales e instalación de los anclajes.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Director de obra; (1) Oficial; (1) Topografo; (2) Operadores (6) Ayudantes
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

03 de febrero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de llenado e inyección de anclajes con lechada cementicia, asegurandose bien la dosificación de la mezcla, se realizo muestras de laboratorio para comprobar su resistencia. Se continua con las perforaciones horizontales e instalación del anclaje.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) Oficial; (1) Almacenista; (1) Topografo; (2) Operadores; (9) Ayudantes
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (1) Unidad de inyección (2) Compresores

04 de febrero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales y suministro e instalación de anclajes, se continua con el armado e instalación de parillas para las zapatas, Se continua con el llenado de anclajes asegurandose que se llenen todas las oquedades del terreno
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (3) Operadores de perforación; (6) Ayudantes de obra

•Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores; (1) Unidad de Inyección

Melissa Donado

05 de Febrero del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales y se instala inmediatamente el anclaje, se realizan actividades de excavaciones de zapatas, asegurando sus dimensiones, se acopia el material excavado para disponerlo en el sitio de disposición final

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenistas; (1) Oficial (5) Ingenieros Auxiliares; (1) Topografo

•Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

06 de Febrero del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se continuan actividades de perforaciones horizontales en cada punto de anclaje, se realiza excavación de zapatas y se retira el material sobrante producto de la excavación, se realiza excavación del disipador de energía previo a demarcar y tomar niveles. Se instalan parillas de las zapatas

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) Director de obra; (1) Topografo (3) Operadores de perforación; (6) Ayudantes de obra; (1) Almacenista

•Equipo: (1) Volqueta; (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

Melissa Donado

7 de febrero del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se inician actividades de perforaciones horizontales e instalación de anclajes, se continua con las excavaciones de zapatas e instalación de acero para parillas. Se continua con el retiro de material sobrante al sitio de disposición final.

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) topografo; (1) Almacenista (2) Operadores de perforación; (6) Ayudantes de obra; (1) Almacenista

•Equipo: (1) Volqueta; (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

Scanned with CamScanner

Melissa Dorado

09 de Febrero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continua con el control y medición topografico de las actividades realizadas sobre el talud, se continua con actividades de perforaciones de anclajes e instalación de anclajes, mes raciones de longitud de 25m, se garantiza las condiciones operativas y de seguridad necesarias para el desarrollo del procedimiento
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) Topografo; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial; (6) Ayudantes de obra;
- Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

10 de Febrero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continua con actividades de excavación manual descolgado de talud para la ejecución de zapatas inferior en cada anclaje, con dimensiones de (1,0 x 1,0 x 0,20) m. El material sobrante producto de la excavación de las zapatas fue acopiado y posteriormente trasladado al relleno sanitario El carrasco, Para su aprovechamiento en actividades operativas del mismo.
- Equipo: (1) Volqueta; (1) mini cargador; (2) Unidades de perfora-ción; (2) Compresores
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) operadores de perforación; (6) Ayudantes de obra

Melissa Dorado

11 de Febrero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continua con el proceso de armado, suministro e instalación de las parillas de acero de refuerzo correspondiente a las zapatas de cada anclaje, Se realiza la topografia y cambio de niveles en lo que corresponde a la estructura de disipación de

energía. Se realiza el corte y figurado de acero según especificaciones técnicas del proyecto. Se recibe visita de la entidad COMB con el objetivo de realizar una visita de seguimiento ante la programación de obra. Se inspeccionó cada actividad y se deja como evidencia el registro fotográfico, hoja de visita y bitácora

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (2) SST; (2) oficiales; (1) Personal COMB;

•Equipo: (1) Mini cargador; (2) Unidades de perforación; (2) Compresores

12 de Febrero del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se inicia actividades de excavación de disipador de energía tipo escalera con las dimensiones especificadas en los diseños. Se continúa con la instalación de paillas para los zapatas se aseguran con pines. Se continua con la perforación del último anclaje finalizando la actividad de manera exitosa.

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (2) Operadores; (6) Ayudantes de obra

•Equipo: (2) Unidades de perforación; (2) Compresores; (1) mini cargador

Melissa Gaviria Salgado
Donado

13 de Febrero del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se continua con actividades de llenado de lechada cementicia en los últimos anclajes previamente perforados, se realiza ensayos de briquetas para comprobar su resistencia a morteros. Se realizan actividades de fundida de la placa del disipador a un espesor de 10cm. Se instala el acero figurado en las paredes del disipador.

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial (2) Operadores; (6) Ayudantes; (1) Ingeniero Ambiental

•Equipo: (1) Unidad de inyección; (1) mini cargador; (1) Trompo

14 de febrero del 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se inician actividades de fundida de canaleta huella y contrahuella en todo el disipador previamente acerado y formaleteado, se continua con la instalación de pailas para las zapatas en cada punto de anclaje

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (6) Ayudantes de obra

• Equipo: (1) Trompo; (1) Estación Topográfica; (1) mini cargador

Melissa Bonado

16 de febrero del 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se continuan actividades de excavación de las últimas cajas de zapatas en cada punto de anclaje, se acopio el terreno sobrante y se continua con la instalación de parilla de refuerzo con acero de 3/4". Se continuo con la fundida de disipador de energia realizando un buen terminado. Se recibe visita CDMB

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (1) Director de obra; (2) operadores (6) Ayudantes; (1) Ingeniero Ambiental; (Personal) profesional CDMB

• Equipo: (1) Trompo; (1) Volqueta; (1) mini cargador;

17 de Febrero del 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se inician actividades de instalación de geodren permeable con el objetivo de reducir cualquier infiltración interno que tenga el talud una vez recubierto el concreto. Se instala este material de corona a pie del talud. Se continua con la fundida de disipador de energia

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) Profesional SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (2) Operadores; (6) Ayudantes

• Equipo: (1) Trompo; (1) mini cargador

Melissa Bonado

18 de Febrero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuan con actividades de instalación de geodren perforacion desde la corona hasta el pie del talud y se asegura con pines. Paralelamente se instalan la malla electrosoldada en todo el area del talud, asegurandose con pines y parches para asegurar su recubrimiento
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (2) Operadores; (6) Ayudantes de obra; (
- Equipo: Trompo, mini cargador

Melissa Donado

19 de Febrero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de instalación de geodren desde la corona hasta el pie del talud en todas las filas de los anclajes Se instalan la malla electrosoldada en todo el talud asegurandolo con pines y dejando el debido traslapo.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial (1) Director de obra; (1) Topografo; (1) Ingeniero Ambiental; (2) Operadores; (6) Ayudantes
- Equipo: Herramienta menor

20 de Febrero del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de instalación de malla elec trosoldada en todo el area de la pantalla desde la corona hasta su pie de talud, asegurandolo con pines y dejando un traslapo de 0,20m. Se continua con la fundida de disipador de energia, su armado e instalación de acero siguiendo su especificación en el plano.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Ingeniero Ambiental. (1) Topografo; (1) Director de obra; (2) Operadores; (6) Ayudantes.
- Equipo: (1) mini cargador; (1) Trompo

21 de Febrero del 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se inician actividades de encofrado y vaciado de concreto de 3000 psi en el disipador de energía ubicado al costado de la pantalla, se realiza un buen terminado y se instala piedra bola en la huella con el objetivo de reducir la velocidad del agua. Se continua con actividades de instalación de malla electrosoldada

Melissa
Donado

23 de Febrero del 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se inician actividades de instalación de malla electrosoldada desde la corona hasta su pie del talud. De manera paralela se da inicio a la instalación de geodren permadrain, y se realizan actividades de localización, replanteo y niveles en la base del talud con el objetivo de marcar la canaleta y que tenga un desnivel a favor para el desagüe del agua de escorrentía

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) Director de obra; (1) Oficial (6) Ayudantes; (1) Topografo; (1) Oficial; (2) Operadores; (6) Ayudantes

• Equipo: (1) Estación total; (1) Tiempo; (1) mini cargador

Melissa
Donado

24 de Febrero del 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se continuan actividades de excavaciones de canaleta en la parte baja del talud teniendo en cuenta los niveles marcados. Se continua con instalación de tubería sanitaria de 2" para los lloraderos con el objetivo de instalarlos en el talud y así poder desaguar cualquier infiltración interna que se presente. Se continua con el vaciado de concreto en el disipador

• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Topografo; (1) Oficial (1) Operador; (7) Ayudantes de obra; (1) Almacenista

• Equipo: (1) Tompo; (1) Estación total.

25 de Febrero del 2026.

•Estado del tiempo: Soleado

• Descripción Se inician actividades de instalación de malla electrosoldada en todo el area de la pantalla, se asegura con pines y se deja un Traslapo de 10cm. Se continua con el figurado y armado de disipador de energia. Se realizan actividades de instalación de geodren en todo el largo de la pantalla

•Personal: (2) Ingenieros Residente; (1) SST; (1) Almacenista; (1) topografo (1) operador; (7) Ayudantes; (1) Oficial

•Equipo: (1) Trompo.

Melissa Dorado

26 de Febrero del 2026

• Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se inician actividades de instalación de malla electrosoldada en todo el area de la pantalla asegurandola con pines y realizando un traslapo de 10cm. Se continua con la fundida de las Paredes del disipador y se deja un buen terminado. Se acabe material previo al lanzado

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) Almacenista; (1) Ingeniero Ambiental (2) SST; (1) Oficial; (2) Operadores; (6) Ayudantes; (1) Director de obra.

•Equipo: (1) Trompo

27 de Febrero del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se da inicio a actividades de instalación de malla electrosoldada, se fija con pines para asegurar su posicionamiento en el talud. Se continua con el armado y encofrado del disipador de energia asegurado el nivel

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Ingeniero Ambiental; (1) Oficial; (1) Operador; (6) Ayudantes de obra.

•Equipo. (1) Trompo

Melissa Dorado

28 de Febrero del 2026.

· Estado del tiempo: Soleado

· Descripción: Se inician actividades previas al lanzado, se realiza una jornada de orden y aseo en todo el area del frente de trabajo. Se acopio el material sobrante y se retira. Se realiza excavación de canaleta, pasando niveles y conformando lo que es la guia. Se chuzo el taladro para poder excavar debido a que se encuentra muy rocoso el terreno.

· Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Operador; (6) Ayudantes de obra.

· Equipo: Taladro, (1) Trompo

Melissa Donado

02 de Marzo de 2026

· Estado del tiempo: Soleado

· Descripción: Se inician actividades de instalación de pines y (pareles) de recubrimiento con el fin de preparar la pantalla para el lanzado y asegurar su recubrimiento de 10 cm. Se continua con el armado y fundida del disipador de energia en la finalización del talud. Se realiza excavación de canaleta en la parte baja del talud para proceder a su recubrimiento

· Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Ingeniero Ambiental; (1) Director de obra; (1) Oficial; (1) Operador; (6) Ayudantes

· Equipo: (1) Trompo

03 de Marzo del 2026

· Estado del tiempo: Soleado

· Descripción: Se inician actividades de lanzado de concreto de 3000psi en toda el area de la pantalla, se ejecutan de manera paralela el suministro e instalación en-concreto de las zapatas asegurando su recubrimiento. Se le deja una terminación adecuada asegurando su recubrimiento y se le instala aditivo acelerante liquido para asegurar su adherencia. Se realiza de igual manera la fundida de canaleta en la

parte baja del talud, de igual manera se funde los paredes del disipador.

- Personal: (1) Almacenista; (1) Director de obra; (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Ingeniero Ambiental; (1) Conductor Mixer (3) Operadores; (1) Oficial; (10) Ayudantes; (1) Maestro;
- Equipo: (1) Carro tipo mixer; (1) Bomba de concreto; (1) Perisfaltica (1) Trompo; (1) Compresor

paula salgado

04 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de suministro e instalación de concreto lanzado en la pantalla a intervenir junto con sus zapatas recubiertos, se lleva un control riguroso sobre el espesor, tanto de las zapatas como de la pantalla. Se realiza fundida de canaleta en la parte baja del talud y se realiza fundida de disipador de energia. Las anteriores actividades se ejecutaron segun los estudios y diseños
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Ingeniero Ambiental; (1) Oficial; (12) Ayudantes
- Equipo: (1) Carro tipo mixer; (1) Bomba de concreto; (1) Perisfaltica (1) Trompo; (1) Compresor

Melissa Donado

paula salgado

05 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inicia actividades de suministro e instalación de concreto lanzado en las zapatas, se continua con la fundida de canaleta en la parte baja del talud, se realiza toma de muestras para compresión la resistencia a la compresión. A cada carro se le toma el asentamiento.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (1) Oficial; (2) Operadores; (1) Maestro; (4) Ayudantes de obra
- Equipo: (1) Carro tipo mixer; (1) Bomba de concreto; (1) Trompo; (1) Compresor

Melissa Donado

06 de Marzo del 2026

•Estado del tiempo: Soleado - lluvioso

•Descripción: Se inician actividades de concreto lanzado en el area intervenida y en las zapatas realizadas, asegurando su rebestimiento. Se continua con la fundida tanto del disipador como de la canaleta inferior. Se verifican niveles y recubrimientos

.Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (2) Operadores; (14) Ayudantes

•Equipo: (1) Carro tipo mixer; (1) Bomba de concreto; (1) Pertegatica; (1) trompo; (1) Compresor.

Paula Salgado

7 de Marzo del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se inicia con actividades de orden y aseo. Limpieza de desperdicio del concreto previamente lanzado. Se retira y se dispone al sitio de disposición final el material sobrante. Se retira de igual manera herramiento y equipo que ya no será utilizado en obra.

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Maestro; (6) Ayudantes de obra

•Equipo: (1) Estación Topografica

Paula Salgado

09 de Marzo del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se inician actividades de corte de manguera en los anclajes con el fin de adelantar trabajo correspondiente a tensionamiento. Se continuan actividades de conformación de terraza garantizando los niveles respectivos. En el area adicional despues del disipador se conforma con el fin de replantearlo e instalarle geotextil

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Maestro; (8) Ayudantes

•Equipo: N/A.

Paula Salgado

10 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Nublado
- Descripción: Se inician actividades de replanteo del area adicional, previo a esto, se instala el geotextil de cerca a pie del talud, y se asegura con pines. Se realiza una especie de bordillo en toda la delimitación de la presente area con el fin de asegurarla en el talud.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (8) Ayudantes de obra
- Equipo: N/A.

paula Salgado
Melissa Donado

11 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Lluvioso
- Descripción: Se presentan lluvias desde las 5 de la mañana hasta las 9 am. Se observa el comportamiento de las aguas lluvias en las estructuras realizadas, y no se presenta ningún problema. Una vez escampa se inspecciona los pozos que se encuentran cerca a la obra y se realiza jornada de limpieza dentro de ellos, retirando cualquier sedimento que tenga que obstruya el paso del agua
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (8) Ayudantes
- Equipo: N/A

MELISSA D
paula salgado

12 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inicia actividades de replanteo de la terraza B. verificando los niveles existentes. Se inicia con la excavación y alado de la caja de inspección ubicada al finalizar el disipador y canaleta inferior. Se verifican los niveles y se instala formaleta para sus paredes
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial, (8) Ayudantes
- Equipo: Estación topografica

Scanned with CamScanner

13 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de fundido de caja en la parte bajo del disipador, se realizan con dos salidas con el objetivo de generar rebose del agua. De igual manera se hacen las tapas dejando los respectivos ganchos
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista (1) Topografo; (1) Maestro, (8) Ayudantes de obra
- Equipo: (1) Trompo

14 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de resane de las estructuras realizadas como lo son estructura de disipación de energía, caja de inspección y canaleta en todos los filos que se encuentran gretreados. Se realiza limpieza general en obra por fin de semana
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Almacenista (1) Oficial; (8) Ayudantes
- Equipo: (1) Trompo

16 de marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inicia actividades de excavación de canaleta perimetral del area adicional con el objetivo de poder canalizar el agua en esa zona. Se verifica niveles y se realiza fundida de ese tramo. Se realizan actividades complementarias al contrato como es la realización de saidinel o bordillo en todas las pocetales con el fin de que sirva de barrera para no conducir el agua a las pocetales
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (2) SST; (1) Ingeniera Ambiental (1) Topografo; (1) Oficial; (8) Ayudantes

•Equipo: (1) Retro.

17 de Marzo del 2016

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se continuan con actividades de rondola de arrepeche en la pearenal con el objetivo de restringir el paso de cualquier sedimento. Se realiza la rampa para poder permitir el acceso de las motoconcleteros, según requerimiento de la comunidad

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Trabajadora Social; (1) Ingeniero Ambiental; (1) Topografo; (1) Oficial; (8) Ayudantes

•Equipo: (1) Mezcladora

18 de Marzo del 2016

•Estado del tiempo: Lluvioso

•Descripción: Se presenta lluvias intensas desde las 5am, lluvias que se presentan en todo el Area Metropolitana. Se detiene las actividades de obra debido a las fuertes lluvias. Se aprovecha condición climatica para observar las estructuras realizadas para conducir el agua de escorrentía, y se observa que estas actividades contractuales realizadas presentan un comportamiento hidraulico adecuado, sin fallas u observaciones técnicas. Finalizando el día se recibe visita de la COMB para observar si hubieron daños por las lluvias presentadas, se toma registro fotografico y hoja de visita de las actividades vistas. Se deja la observación de reunirse con el presidente de la acción comunal para definir la compensación forestal

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (2) Ingenieros Ambientales (1) Director de obra; (1) Almacenista; (1) Oficial; (8) Ayudantes

•Equipo: N/A

19 de Marzo del 2016

•Estado del tiempo: Nublado

•Descripción: Se inician actividades de obra con limpieza del

frente de trabajo debido a las fuertes lluvias ocasionadas el día anterior. Se continua con actividades de fundida de canaleta en la zona inferior de la pantalla anclada. Se continua con actividades urbanisticas en la terraza del talud

- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial; (1) Ingeniero Ambiental; (6) Ayudantes de obra
- Equipo: Mezcladora

20 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continua con la conformación geometrica de la terraza, y se verifica niveles mediante pendientes dirigidas hacia la canaleta ubicada en el pie del talud. Se continua la construcción de bordillo perimetral para el control de material particulado y evitar el arrastre de sedimentos
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) Oficial; (8) Ayudantes de Obra; (1) Almacenista; (1) Ingeniera Ambiental
- Equipo: Mezcladora

21, 22 y 23 Dias festivos (No laboral)

24 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se continuan con actividades de conformación de terraza, se verifica niveles y se perfila la tierra existente. Se instala abono para conformar una terraza ambientalista, y se riega semilla bracharia para que crezca el pasto
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) Ingeniera Ambiental; (1) SST; (1) Oficial; (6) Ayudantes; (1) topografo; (1) Almacenista
- Equipo: Estación Topografica; Mezcladora

25 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Lluvioso
- Descripción: Se presenta en horas de la mañana lluvia

leves que no impiden el desarrollo de la obra, Se realiza las lampas peatonales en los bordillos previamente realizados. Se destapa los lloraderos realizados sobre dicho bordillo. Se continua con la adecuación de la terraza.

- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Ingeniera Ambiental (1) topografo; (1) Oficial; (6) Ayudantes;
- Equipo: (1) Trompo

Melissa D.

26 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción Se realizan actividades de conformación de terraza verificando los niveles y se dejan pasantes en tubería de 2" para el desagüe, Se continua con la excavación de canaleta en la zona posterior a la pantalla con el objetivo de canalizar la zona donde no se realizo estabilización
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (6) Ayudantes; (1) topografo
- Equipo: (1) Mezcladora

27 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción. Se continuan con actividades de conformación de la terraza en el frente de obra. Se realiza fundida de canaleta en la zona posterior a la pantalla con el objetivo de canalizar la zona donde no se realizo estabilización. Se recibe visita COMB
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial; (6) Ayudantes; (Personal Contractual COMB
- Equipo (1) mezcladora

Melissa D

28 de Marzo del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción. Se continua con actividades de fundida de canaleta en la zona posterior a la pantalla Estabilizada, Se continua

conformado la terraza con instalación de abono y semilla.
Se realiza actividades menores de obra para dejar organizado para antes de semana santa
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista (1) Topografo; (1) Oficial; 6) Ayudantes
• Equipo: Mezcladora

30 de marzo del 2026
Estado del tiempo: Soleado
• Descripción: Se inician actividades de conformación de terraza generada por medio de las obras intervenidas. Se realiza bordillo en las peatonales con el fin de restringir cualquier sedimento. Se continua con el riego de abono en la zona de la terraza
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial (6) Ayudantes; (1) Director de obra, (1) Ingeniera Ambiental
• Equipo: (1) Trompo; (1) Estación total

31 de Marzo del 2026
• Estado del tiempo: Soleado
• Descripción Se inician actividades de construcción de bordillo perimetral en cada peatonal, dejando un terminado liso e instalando lloraderos para el desague del agua, y por solicitud de la comunidad se dejan rampas para el ingreso de motocicletas
• Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (6) Ayudantes
• Equipo: Estación Topografica; (1) mezcladora

01 de Abril del 2026
• Estado del tiempo Soleado
• Descripción Se inician actividades de conformación de terraza en la parte baja del talud, Se replantea, se nivela y se compacta el terreno suelto presente, Se realizan actividades de inventario, orden y aseo para poder salir a receso de semana

Santa. Se retira maquinaria y materiales para dejar despejado el frente de obra, limpio, guardado y organizado
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (1) Oficial; (6) Ayudantes
- Equipo: N/A

02, 03, 04 y 05 de Abril (Semana Santa)
Observaciones: Se descansa estos días

06 de Abril del 2026
- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de conformación de terraza, se perfila el talud existente, se retira el material sobrante. Se instala y se riega abono con semilla para dejar un ambiente armonioso y ambientalista. Se retira el cerramiento perimetral que se había realizado previamente.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes, (1) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial; (6) Ayudantes de obra; (1) Director de obra
- Equipo: N/A

paola delgado
Melissa D

07 de Abril del 2026
- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de fundida de cuneta en la zona posterior al lavado con el objetivo de canalizar el agua. Se deja un buen terminado y se inicia con actividades de excavación y formaleta de caja de inspección. Actividades sociales que se le realizan a la comunidad y que no son contractuales.
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Oficial; (6) Ayudantes
- Equipo (1) Mezcladora

paola delgado

08 de Abril del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

• Descripción: Se inician actividades de fundida de caja de inspección el cual va a recolectar las aguas lluvias que se presentan en la zona donde no hubo estabilización, con el objetivo de ayudar a la comunidad en las filtraciones y empozamientos que se presentaban. Se continua con la fundida de canaleta

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) topografo; (1) Oficial; (6) Ayudantes

•Equipo: (1) Mezcladora

09 de Abril del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Se inician actividades de tensionamiento de anclajes con ayuda del gato de tensionamiento, instalando previamente la platina, la papera y la cuña de tres agujeros. Se le aplica la presión respectiva en los estudios y diseños, dejando un terminado correcto. Se realiza un control técnico registrando su elongación física como resultado del tensionamiento en cada anclaje.

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) topografo; (1) Oficial; (1) Operador; (6) Ayudantes

•Equipo: Unidad de tensionamiento

10 de Abril del 2026

•Estado del tiempo: Soleado

•Descripción: Durante la última etapa del proceso de estabilización y después de haber obtenido los resultados de las resistencias del concreto, se procede a realizar la instalación de la platina, papera y cuña correspondiente en cada punto de anclaje, y realizar así el tensionamiento. Se utiliza un gato tensor Monotaon, el cual cuenta con un amanómetro para controlar la tensión

•Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Oficial (6) Ayudantes; (1) Operador.

Equipo: Unidad de tensionamiento

11 de Abril del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de instalación de platina, paporia y cuña en cada punto de anclaje, asegurandola y nivelandola en su sitio. Se procede al proceso de tensionamiento controlando por medio de manometro la tensión aplicado y se registra la elongación presentada. Se realizo la actividad extendiendo el horario laboral junto con el Personal de obra para poder cumplir con los tiempos
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST, (1) Almacenista; (1) Oficial (1) Maestro; (1) Operador; (6) Ayudantes
- Equipo: Unidad de tensionamiento

paula Salgado

13 de Abril del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se inician actividades de tensionamiento en los ultimos anclajes de la pantalla, instalando previamente la platina, paporia y cuñas. Se aplica la carga respectiva en cada anclaje. y se lleva un control técnico para registrar la elongación respectiva. Se termina los terminados de las canaletas y disipador de energia realizando sus respectivas tapas. Se inicia proceso de limpieza y conformación de la terraza con el objetivo de realizar su debido entrega. Se comienza a lavar las casas aledañas a la obra para realizarles su limpieza y resane
- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (1) Almacenista; (1) Topografo (1) maestro; (6) Ayudantes; (1) Oficial; (1) Director de obra; (1) Trabajadora Social; (1) Ingeniera Ambiental
- Equipo: (1) hidrolavadora; (1) Estación Total; (1) unidad de tensionamiento; (1) mezcladora;

paula salgado
Melissa Dorado

14 de Abril del 2026

- Estado del tiempo: Soleado
- Descripción: Se dio inicio a actividades de tensionamiento en los anclajes faltantes, se instala la platina, paporia y cuña y se le aplica la

caiga correspondiente, se registra un control técnico y se lleva el resultado de su elongación. Se realizan actividades de siembra en el frente de obra en la terraza detenida, se realiza el ahoyado con previa marcación de los huecos, se aplica hidroretenedor y abono para la para del arbol, seguido de la siembra del arbol se le instala nuevamente abono y sustrato. Se realiza el mismo procedimiento en cada arbol sembrado. Se continua con la fundida de protección de los cilindros con tubería de 3" para dejar un terminado armonioso. Se instalar las tapas de los cajas y se comienza a hacer aseo. Se revisa las cunetas del area número 4, se observa las obras locativas de la zona aledaña. Se verifica la entrega del acueducto construida por medio de captación de agua superficial. Se verifica el estado de los arboles. Se registra visita de la COMB para realizar la entrega respectiva

- Personal: (2) Ingenieros Residentes; (1) SST; (2) Ingenieras Ambientales (1) Director de obra; (1) Almacenista; (1) Topografo; (1) Maestro; (6) Ayudante; (1) Contratista de la COMB
- Equipo: (1) Unidad de herramientas para soldado.

Melissa Donado

ANEXO 06.

ACTAS DE COMITÉS TÉCNICOS Y HOJAS DE VISITA FORMATO CDMB

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	


TEMA:	VISITA ACTIVIDADES PRELIMINARES DE INICIO DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**		**ACTA No.**	**FECHA**	
				DD	**MM**	**AA**
			01	05	11	2025
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		**Hora Inicio**	1:00 pm	
			Hora final	3:00 pm	

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Recorrido de obra para revisión del alcance en área del objeto contractual y del avance de las actividades preliminares.	Contratista – Interventoría
2	Entrega de informe de avance de Obra.	Contratista – Interventoría

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Siendo la 1:00 p.m. del día 04 de noviembre de 2025, se dio inicio al comité de obra con la participación del equipo técnico de la Interventoría y del personal profesional del Contratista Consorcio Consolidación Girón, con el propósito de realizar un recorrido de obra, verificar el alcance en el área objeto del contrato y revisar el avance de las actividades preliminares ejecutadas a la fecha. Durante el recorrido se evidenció el desarrollo de las actividades preliminares, tales como: levantamientos topográficos, instalación de la valla informativa en un punto de alta visibilidad, delimitación del área a intervenir y adecuación del campamento de obra. Asimismo, se observaron las labores asociadas a la instalación de la línea de vida, cerramientos perimetrales tipo barricada, demarcaciones y señalización general de obra, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad industrial, control de accesos y organización del frente de trabajo. Lo anterior se encuentra soportado en las imágenes anexas al presente documento. El contratista informó a la Interventoría que se adelantó las actas de vecindad correspondientes a las viviendas colindantes al proyecto. En relación con el inventario forestal, y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, el contratista indicó que el profesional forestal del proyecto llevó a cabo el registro detallado de los individuos arbóreos localizados en el área de influencia directa. Dicho inventario constituye insumo técnico para la radicación del trámite de Aprovechamiento Forestal ante la CDMB, en su calidad de autoridad ambiental competente.

	Posteriormente, debido al avance de las actividades de desmonte y limpieza, fue posible identificar con mayor precisión el área definitiva de intervención, así como la distribución de las actividades contractuales a ejecutar. De manera conjunta, la Interventoría y el Contratista acordaron establecer reuniones semanales de seguimiento, con el fin de verificar y soportar técnicamente el avance de las actividades programadas.   		
2	En cumplimiento de las obligaciones establecidas para el contratista en el Contrato de Obra Pública No. 210.16225.6 y conforme a lo dispuesto en las cláusulas que exigen la elaboración y presentación de informes parciales de avance dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes, se realiza la entrega del Informe de Avance de Obra No. 01, correspondiente al periodo comprendido entre el 15 y el 31 de octubre de 2025, donde contiene el detalle del avance físico de cada una de las actividades programadas, acompañadas de su respectivo registro fotográfico, cantidades de obra ejecutadas, así como la relación del personal técnico y operativo, y el equipo empleado durante el periodo reportado. Se comenta de igual manera que el informe se encuentra soportado con los respectivos anexos.		
No.	**TAREAS**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	La Interventoría y el Contratista acuerdan realizar reuniones de seguimiento con una periodicidad semanal, con el fin de monitorear el desarrollo de las actividades iniciales y asegurar que el avance físico de la obra se mantenga por encima de lo programado.	Contratista- Interventoría	14/11/2025

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	14/11/2025	**HORA:**	2:00 pm	**LUGAR:**	Frente de Obra: Villa de los Caballeros

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA ACTIVIDADES PRELIMINARES DE INICIO DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros

ACTA No.	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AA**
01	05	11	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	Melissa Donado Arias
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6"**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"		**ACTA No.**	**FECHA**	
				DD	**MM**	**AA**
			02	14	11	2025
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		**Hora Inicio**	3:00 pm		
			Hora final	4:00 pm		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Recorrido de obra para revisión del avance de las actividades contractuales y toma de registros	Contratista – Interventoría - CDMB
2	Proyección de las actividades de obra para el mes de noviembre.	Contratista – Interventoría - CDMB

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Siendo las 3:00 p.m. del día 14 de noviembre de 2025, se dio inicio a la presente Acta de Reunión, con la participación del equipo técnico de la Interventoría, representantes profesionales de la CDMB y personal contractual del contratista. El propósito de la reunión fue evaluar técnicamente el avance de las actividades ejecutadas de lo que va del mes de noviembre. Durante el recorrido inicial se verificó la ejecución de actividades preliminares, entre las cuales se destacan: • Instalación de la valla informativa en un punto estratégico para su adecuada visualización. • Continuación de labores de desmonte y limpieza, retiro de basuras y escombros. • Perfilado manual descolgado del talud, con el objetivo de garantizar la correcta delimitación y preparación del área a intervenir. Asimismo, se constataron las actividades de movimiento de tierras en materiales granulares y rocosos, ejecutadas mediante equipo mecánico tipo retroexcavadora y para el material rocoso se utiliza martillo demoledor. El material excedente generado está siendo transportado al sitio autorizado de disposición final, verificándose que todas las volquetas cuenten con la documentación vigente y en regla. En relación con el inventario forestal de los individuos arbóreos ubicados en el área de influencia directa que se encuentra incluido en el informe de obra del mes de octubre, y con el fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente, el contratista informó que fue radicado ante la CDMB el trámite de Aprovechamiento Forestal, como autoridad ambiental competente. Dicho soporte será anexado en el Informe de Avance de Obra correspondiente al mes de noviembre.

En el recorrido de obra se realiza registro fotográfico como evidencia. Como compromiso, se acuerda programar la próxima visita para el día 28 de noviembre de 2025. Adicionalmente, se recomienda a la Interventoría la entrega de informes semanales de seguimiento, con el fin de realizar un control más preciso del avance constructivo.













2	Se informa sobre las actividades programadas para ejecución durante el mes de noviembre, específicamente en las perforaciones horizontales requeridas para la instalación de anclajes activos de 25 metros de longitud. El contratista indica que los materiales asociados a los anclajes, incluyendo sus accesorios y elementos, se encuentran próximos a llegar al frente de obra, lo cual permitirá iniciar oportunamente esta fase constructiva. Asimismo, se adelanta la preparación del área de acopio para el almacenamiento organizado de los materiales, así como la adecuación del espacio destinado para la instalación de los anclajes, los cuales tendrán una profundidad de 25 metros. De igual manera, se delimita y acondiciona la zona donde se ubicarán las máquinas de perforación y sus respectivos compresores, garantizando las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para el desarrollo de la actividad.

No.	**TAREAS**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	El contratista y la Interventoría se comprometen a programar y realizar reuniones periódicas de seguimiento, con el fin de evaluar el avance de obra, revisar las actividades ejecutadas y definir los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento del cronograma establecido.	Interventoría	21/11/2025

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	28/11/2025	**HORA:**	8:00 am	**LUGAR:**	Frente de Obra: Villa de los Caballeros

Elaboró Acta	**Cargo**	**Firma**
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A.PI-F085 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
02	14	11	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO M	GÉNERO F	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	Melissa Donado Arias
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		X	Profesional Ambiental	Contratista	
6	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	
7	Héctor Amado H.	x		Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	
8	Gilberto Gómez O.	x		Contratista Profesional CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	

Powered by CamScanner

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**	**ACTA No.**	**FECHA**		
			DD	**MM**	**AA**
		03	28	11	2025
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros	**Hora Inicio**	9:00 am		
		Hora final	10:00 am		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Recorrido de obra para revisión del avance de las actividades contractuales	Contratista – Interventoría - CDMB
2	Evidencias del acta de reunión.	Contratista – Interventoría - CDMB

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Siendo las 3:00 p.m. del día 28 de noviembre de 2025, se dio inicio a la presente Acta de Reunión, con la participación del equipo técnico de la Interventoría, representantes profesionales de la CDMB y personal contractual del Contratista. Durante la inspección ocular en el frente de obra "Villa de los Caballeros", se verificó el avance correspondiente al mes de noviembre, evidenciando el desarrollo de las actividades preliminares de desmonte y limpieza, perfilado manual y excavación de material granular y rocoso. Se constató que dichas actividades presentan un avance cercano al 100% de ejecución, lo cual resulta favorable para el cumplimiento contractual, dado que, conforme a la programación vigente, el proyecto se encuentra por encima de la curva de avance programado. Asimismo, se observó que la pantalla proyectada se encuentra conformada en su totalidad y que se realizó la distribución de los anclajes en toda el área objeto de intervención, registrándose una separación aproximada de 2 metros entre anclajes. Durante el recorrido técnico se verificó la instalación de la unidad de perforación neumática, incluyendo sus componentes operativos tales como la tubería de perforación y el compresor de aire. Se identificó la presencia del operador de perforación y su equipo de apoyo, quienes se encontraban debidamente posicionados en el talud y equipados con los elementos de seguridad para trabajo en alturas. Al momento de la visita se ejecutaban las perforaciones horizontales para la instalación de anclajes activos, con una longitud proyectada de 25 metros, constituidos por un cuerpo de tres (3) cables de ½" de diámetro cada uno. Para esta actividad se implementó el uso del inclinómetro, garantizando una inclinación de 15° respecto a la horizontal, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

2

Se registró evidencia fotográfica de la visita y de las actividades ejecutadas en el frente de obra. Asimismo, se procedió a la firma de la bitácora de obra, en la cual se consignó la descripción detallada de las actividades realizadas durante la jornada y los aspectos verificados en campo. De igual manera, se anexa la hoja de visita, documento que complementa y respalda la información anteriormente mencionada.















	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	El Contratista deberá elaborar y radicar la primera acta de cobro correspondiente a los periodos de octubre y noviembre, incluyendo el respaldo técnico y documental de las actividades ejecutadas durante dicho intervalo y sus anexos correspondientes a informes sst, ambiental y calidad.	Interventoría-Contratista	10/12/2025

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	11/12/2025	**HORA:**	8:00 am	**LUGAR:**	Frente de Obra: Villa de los Caballeros

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
03	28	11	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		X	Profesional Ambiental	Contratista	
6	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	
7	Héctor Amado H.	x		Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	
8	Gilberto Gómez O.	x		Contratista Profesional CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	

Powered by CamScanner

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**		**ACTA No.**	**FECHA**	
				DD	**MM**	**AA**
			04	10	12	2025
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		**Hora Inicio**	9:00 am		
			Hora final	10:00 am		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Visita de inspección ocular para revisión del avance de las actividades contractuales	Contratista – Interventoría - CDMB
2	Entrega de Acta parcial de cobro No.1	Contratista – Interventoría - CDMB



No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Siendo las 09:00 a.m. del día 10 de diciembre de 2025, se dio inicio a la presente reunión de comité, con la participación del equipo técnico de la Interventoría, representantes profesionales de la CDMB y personal contractual del Contratista. Posteriormente, se realizó un recorrido de verificación en campo en el frente de obra denominado "Villa de los Caballeros", donde se constató que las actividades correspondientes al perfilado de talud y las actividades preliminares se encuentran ejecutadas en un 100%. Durante el recorrido se evidenció y supervisó la ejecución de perforaciones horizontales para anclajes, realizadas mediante dos (2) unidades de perforación neumáticas, evaluando las condiciones de seguridad, operatividad e inclinación de las máquinas. Tanto el contratista de obra como la interventoría validaron rendimientos favorables, al encontrarse las unidades de perforación ubicadas en zonas de trabajo independientes, lo cual permite mantener un avance acorde con la programación establecida. Durante la visita se verificaron la longitud libre y la longitud del bulbo de los anclajes, validando una longitud total de 25 m por anclaje. Asimismo, se verificó el suministro e instalación de un anclaje en sitio, validando las condiciones de seguridad operativa y del personal que ejecuta actividades de alto riesgo (trabajo en alturas), en cumplimiento de los requerimientos establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo. De igual forma, se evidenció la ejecución de las actividades de llenado e inyección de lechada cementicia en los anclajes previamente perforados e instalados. El contratista de obra explicó la importancia de este proceso para garantizar la adecuada adherencia del sistema de anclaje al terreno, optimizando su comportamiento estructural y capacidad de carga. Para esta actividad se empleó una unidad de inyección especializada, que

	permitió la aplicación de presión controlada, favoreciendo la correcta penetración de la lechada en las oquedades del terreno. Se verificó una presión de inyección de 20 toneladas, constatándose el llenado completo del interior del anclaje, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Adicionalmente, el contratista de obra resaltó que las condiciones climáticas secas presentadas durante el mes de diciembre han contribuido a un rendimiento favorable, permitiendo el desarrollo continuo de las actividades programadas en obra. En conclusión, durante el recorrido se evidenció un avance satisfactorio en las actividades ejecutadas. Como evidencias de la visita se anexan registro fotográfico, firmas en la bitácora de obra y hoja de visita correspondiente al formato institucional de la CDMB.   
2	Se informa que el paquete documental correspondiente al Acta Parcial de Cobro se encuentra completo y listo para radicación ante la CDMB, correspondiente al período comprendido entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, dicho paquete incluye el Acta Parcial de Cobro, junto con las memorias de cantidades de obra y el soporte de las actividades ejecutadas, así como los respectivos anexos: informes de avance de obra, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), informe ambiental e informe de calidad, conforme a los requisitos contractuales. El paquete será entregado para su radicación el 15 de diciembre del 2025.

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA

1	Se acuerda programar una próxima reunión de comité con el fin de definir y coordinar la programación de actividades de obra, así como revisar y ajustar el cronograma de ejecución conforme al avance del proyecto.	Interventoría-Contratista	24/12/2025







PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	24/12/2025	**HORA:**	8:00 am	**LUGAR:**	Frente de Obra: Villa de los Caballeros

Elaboró Acta	**Cargo**	**Firma**
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**	**ACTA No.**	**FECHA**		
		04	**DD**	**MM**	**AA**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		10	12	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		X	Profesional Ambiental	Contratista	
6	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	
7	Héctor Amado H.	x		Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**	**ACTA No.**	**FECHA**		
			DD	**MM**	**AA**
		05	24	12	2025
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros	**Hora Inicio**	8:00 am		
		Hora final	9:00 am		


AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Visita de inspección ocular para revisión del avance de las actividades contractuales	Contratista – Interventoría
2	Programación de actividades de Obra para el año 2026	Contratista – Interventoría

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Siendo las 08:00 a.m. del día 24 de diciembre de 2025, se dio inicio a la presente reunión de Comité, con la participación del equipo profesional de la Interventoría y el personal contractual del Contratista, con el objetivo de realizar una visita de inspección en obra para la verificación del avance y la ejecución de las actividades contractuales. Durante el recorrido de obra se inspeccionaron las actividades ejecutadas en el mes de diciembre, realizando la revisión del avance físico ejecutado frente al programado, con el fin de recopilar información para la elaboración de los informes semanales de seguimiento. Como resultado de la inspección, se evidenció un avance superior al programado, lo cual refleja un comportamiento favorable del proyecto, el cumplimiento del cronograma establecido y una adecuada ejecución de las actividades. Adicionalmente, se realizó seguimiento a los informes mensuales, reiterando el compromiso de consolidar y entregar dicha información dentro de los primeros días de cada mes. Así mismo, se constató la continuidad de las actividades de perforaciones horizontales, para las cuales se mantiene un control técnico detallado por punto de anclaje, registrando fechas de perforación, instalación y características constructivas de cada elemento. Se indicó que, de mantenerse el ritmo de ejecución actual, se tiene proyectada la finalización de las perforaciones para el mes de febrero. De manera paralela, se continúan las actividades de llenado e inyección de lechada cementicia, para lo cual se dispone de una unidad de inyección que permite la aplicación de presión controlada, garantizando la adecuada penetración de la lechada en las oquedades del terreno. Durante la inspección se verificó una presión de inyección de 20 toneladas, constatándose el llenado completo del interior de los anclajes, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

	En cuanto a las condiciones climáticas del mes de diciembre, se informó que estas han sido favorables para el desarrollo del proyecto, permitiendo la continuidad de las actividades sin presentarse interrupciones ni afectaciones por eventos de precipitación.
2	En conjunto con la Interventoría, se realizó la revisión y socialización de la programación de actividades de obra para el año 2026, estableciendo que se proyecta la continuidad de las actividades de perforación hasta el mes de febrero, de acuerdo con el avance actual y el cronograma aprobado. Posteriormente, se tiene previsto el inicio de las actividades correspondientes al sistema de manejo de aguas, las cuales comprenden la construcción de canaletas perimetrales tanto en la corona como en el pie del talud, así como la construcción de un disipador de energía, diseñado para captar las aguas de escorrentía superficial y conducirlas de manera controlada hacia las cajas de inspección, permitiendo su descarga final a la red de alcantarillado del municipio. Adicionalmente, se programó el inicio de las excavaciones manuales de zapatas en cada punto de anclaje, seguido del armado e instalación de las parrillas de refuerzo, dispuestas con la separación, geometría y recubrimientos definidos en los diseños estructurales. Estas actividades tienen como finalidad garantizar el adecuado acceso a los anclajes, así como la correcta distribución de las cargas puntuales generadas durante el proceso de tensionamiento. Finalmente, se dejó constancia de que el cronograma del proyecto se mantiene conforme a la programación inicial, y que, de continuar el comportamiento actual de ejecución, se espera la finalización del proyecto dentro de la fecha establecida contractualmente.

No.	**TAREAS**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	Se acuerda programar una próxima reunión de Comité, con el propósito de llevar a cabo una inspección técnica de obra, orientada a la verificación del avance físico y de la ejecución de las actividades, de conformidad con la programación inicialmente presentada y aprobada.	Interventoría-Contratista	22/01/2026

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	22/01/2026	**HORA:**	2:00 pm	**LUGAR:**	Frente de Obra: Villa de los Caballeros




Elaboró Acta	**Cargo**	**Firma**
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros

ACTA No.	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AA**
05	24	12	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	**NOMBRE**	**GÉNERO**		**CARGO**	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
		M	**F**			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		X	Profesional Ambiental	Contratista	
6	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**		**ACTA No.**	**FECHA**	
				DD	**MM**	**AA**
			07	27	01	2026
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		**Hora Inicio**	2:00 pm		
			Hora final	3:00 pm		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Visita de inspección ocular para revisión del avance de las actividades contractuales según programación de Obra.	Contratista – Interventoría - CDMB
2	Entrega de obligaciones contractuales y acta parcial de cobro	Contratista – Interventoría

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Siendo las 2:00 p.m. del día 22 de enero de 2026, se dio inicio a la reunión de Comité con la participación del equipo profesional de la Interventoría, el personal contractual del Contratista y el profesional delegado de la CDMB, con el propósito de realizar visita de inspección ocular para la verificación del avance físico y la correcta ejecución de las actividades contractuales conforme a la programación vigente de obra. Durante el recorrido técnico se efectuó la revisión de las actividades ejecutadas en el transcurso del mes de enero. Se constató la continuidad en la ejecución de perforaciones horizontales para la instalación de anclajes activos de tres (3) torones con longitud de 25 m. Se evidenció que las labores se desarrollan bajo condiciones operativas y de seguridad adecuadas, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de procedimiento constructivo. De igual manera, se verificó el avance en las actividades de llenado e inyección de lechada cementicia en cada punto de anclaje, asegurando la correcta preparación de la mezcla y el cumplimiento de la dosificación definida en los estudios y diseños del proyecto. Lo anterior con el fin de garantizar las condiciones óptimas de resistencia mecánica y adecuada adherencia del sistema de anclaje, conforme a las especificaciones técnicas contractuales. De manera paralela, una cuadrilla ejecuta labores de excavación manual mediante descolgado de talud para la conformación de zapatas internas en cada anclaje, con dimensiones de 1.00 m x 1.00 m x 0.20 m. El material producto de excavación es acopiado temporalmente en obra y posteriormente transportado al sitio autorizado de disposición final "El Carrasco", en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Posteriormente a la actividades de zapatas se realiza el armado e instalación de parillas de refuerzo de ¾", asegurándolas con pines de seguridad.

	En el marco de la reunión, se informó el inicio de las actividades correspondientes al control y manejo de aguas lluvias, mediante la construcción de canaleta en la parte superior del talud. Para tal efecto, se realizó el replanteo topográfico, excavación, verificación de niveles y pendientes, y vaciado de concreto de 3.000 psi garantizando el adecuado direccionamiento y conducción de las aguas superficiales, con el fin de mitigar procesos de infiltración y erosión. Con base en el seguimiento realizado durante el recorrido, se proyecta que para el mes de febrero las actividades de perforaciones horizontales alcancen el 100% de ejecución. En consecuencia, se programan actividades complementarias tales como colocación de geodren para el manejo de aguas internas y suministro e instalación de malla electrosoldada, trabajos previos indispensables para la posterior ejecución del lanzado en concreto. Finalmente, se informa que a la semana número quince (15) el proyecto presenta un avance programado del 64,03% y un avance ejecutado del 64,37%, lo que representa un adelanto del 0,34% respecto a lo previsto en el cronograma contractual.   
2	En el marco del seguimiento contractual y considerando el avance favorable evidenciado en la ejecución física de las actividades en obra, se informa la proyección de elaboración y radicación del Acta Parcial de Cobro No. 02, correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Dicha acta incluirá las actividades ejecutadas y verificadas en campo durante el período mencionado, conforme a las cantidades de obra realmente ejecutadas y debidamente soportadas mediante los respectivos registros técnicos, actas de comité, reportes diarios e informes de avance. Se recuerda que, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Obra Pública y conforme a las cláusulas que exigen la elaboración y presentación de informes parciales de avance, el Contratista deberá presentar los informes mensuales correspondientes a diciembre de 2025 y enero de 2026, los cuales deberán contener el detalle técnico, financiero y fotográfico del progreso del proyecto, así como el análisis comparativo entre el avance programado y el ejecutado.

	Adicionalmente, se deja constancia de que los informes semanales de avance han sido entregados de manera progresiva a la Interventoría, mediante remisión oficial a través de correo electrónico, como parte del proceso formal de comunicación y seguimiento contractual.

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Se acuerda programar una próxima reunión de Comité, con el fin de realizar una inspección ocular e las actividades ejecutadas para poder establecer la fecha de finalización	Interventoría-Contratista	11/02/2026

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	22/01/2026	**HORA:**	2:00 pm	**LUGAR:**	Frente de Obra: Villa de los Caballeros

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
07	27	01	26

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	Melissa Donado Arias
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		X	Profesional Ambiental	Contratista	
6	Gilberto Gómez O.	x		Contratista Profesional CDMB-Apoyo supervisión	CDMB	
7	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**		**ACTA No.**	**FECHA**	
				DD	**MM**	**AA**
			08	16	02	2026
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		**Hora Inicio**	2:30 pm		
			Hora final	4:10 pm		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Visita de inspección técnica para revisión del avance de las actividades contractuales según programación de Obra.	Contratista – Interventoría-CDMB
2	Entrega de obligaciones contractuales y acta parcial de cobro	Contratista – Interventoría

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Siendo las 02:30 p.m. del día lunes 16 de febrero de 2026, se dio inicio al comité de obra con la participación del equipo profesional de la Interventoría y del personal contractual del Contratista. Así mismo, hizo presencia el profesional de apoyo a SURYT, con el propósito de realizar una visita de inspección ocular para verificar el avance físico del proyecto conforme a la programación de obra, así como el estado de ejecución de las actividades contractuales previas al proceso de lanzado de concreto. Durante el recorrido técnico, el profesional residente de obra realizó una explicación detallada de las actividades que se encuentran en ejecución dentro del frente de trabajo. En este sentido, informó que durante que durante el día el transcurso de la jornada de la mañana se dió finalización a las actividades de perforación, dando cumplimiento a la meta establecida de ciento cuarenta y cuatro (144) anclajes activos L=25m contemplados contractualmente. De forma paralela a las actividades de perforación horizontal para la instalación de anclajes activos, se evidenció la ejecución de labores de excavación manual de zapatas. Así mismo, se verificó el suministro, armado e instalación de las parrillas de acero de refuerzo en cada una de las zapatas previamente excavadas, así como la actividad de preparación de la lechada cementicia y su respectivo proceso de inyección en los anclajes. Se revisó en campo la actividad correspondiente al disipador de energía, evaluando sus niveles, ubicación y condiciones de diseño, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento en el control y manejo de las aguas lluvias presentes en la zona de ejecución del proyecto.

El profesional residente de obra informó que se tiene planificado finalizar las actividades de inyección de lechada el día 17 de febrero de 2026, conforme a la programación establecida para el desarrollo del proyecto. Así mismo, se indicó que se prevé finalizar la semana con la instalación total de las parrillas de acero de refuerzo correspondientes a las zapatas proyectadas.

Durante la reunión se efectuó la revisión de la programación de recursos, así como de la disponibilidad de personal, equipos y materiales requeridos en obra para el desarrollo de las actividades correspondientes a la instalación del geodren, compuesto por una geored de polietileno de alta densidad (PEAD) cubierta con un geotextil no tejido, el cual favorece el proceso de filtración del agua al retener las partículas finas del suelo. De igual manera, se verificó la disponibilidad en obra de la malla electrosoldada de 4 mm de diámetro con abertura de 0,15 x 0,15 m, constatando sus condiciones de almacenamiento y las medidas de protección implementadas para garantizar la conservación adecuada del material previo a su instalación.

Con base en el seguimiento efectuado durante el recorrido técnico, se proyecta que para el mes de marzo se dé inicio satisfactorio a las actividades contractuales correspondientes al suministro y colocación de mezcla húmeda de concreto sobre el talud y zapatas internas, como parte del sistema de estabilización y protección del talud, una vez culminen las actividades preparatorias y se verifique el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para su ejecución.

Finalmente, se informa que, a la semana número dieciocho (18) del proyecto, se registra un avance acumulado del proyecto de 83,15%, superando el avance programado del 82,21%, lo cual refleja un comportamiento favorable con un adelanto del 0,94% frente a la programación contractual








2	En el marco del seguimiento financiero, el residente de obra informa que la Interventoría y la Supervisión aprobaron y suscribieron el acta de recibo y pago parcial, correspondiente al período comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, por un valor de $2.035.943.731,91. Se indica que los trámites administrativos correspondientes se adelantarán en la mayor brevedad posible, con el fin de garantizar el equilibrio financiero del proyecto y el adecuado flujo de caja, necesarios para la continuidad y culminación de las actividades contractuales. Adicionalmente, se deja constancia de que los informes semanales de avance del proyecto han sido remitidos de manera progresiva a la supervisión del contrato por parte de la Interventoría, mediante comunicación formal a través de correo electrónico institucional, en el marco del proceso de seguimiento, control y trazabilidad de la información contractual.

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Se acuerda programar una próxima reunión de Comité, con el fin de realizar una inspección técnica de las actividades ejecutadas para poder establecer la fecha de finalización	Interventoría-Contratista	27/02/2026

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	27/02/2026	**HORA:**	3:00 pm	**LUGAR:**	Frente de Obra: Villa de los Caballeros

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**	**ACTA No.**	**FECHA**		
		08	**DD**	**MM**	**AA**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		16	02	26

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	Melissa Donado Arias
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		X	Profesional Ambiental	Contratista	
7	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	
8	Héctor Amado H.	x		Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**	**ACTA No.**	**FECHA**		
			DD	**MM**	**AA**
		09	27	02	2026
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros	**Hora Inicio**	3:00 pm		
		Hora final	4:00 pm		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Visita técnica para revisión de avance de actividades contractuales según programación de obra.	Contratista – Interventoría - CDMB
2	Estado del tiempo mes de febrero del 2026	Contratista – Interventoría

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	En el marco del comité, se dio inicio al acta de reunión con la participación del equipo profesional del contratista de obra, Interventoría y del equipo técnico de la CDMB, con el propósito de realizar un recorrido por el frente de trabajo y verificar en campo el estado de avance de las actividades contractuales conforme a la programación de obra vigente. Durante el recorrido se evidenció un avance significativo en las actividades previas al proceso de lanzado. Se finalizaron las actividades preliminares, entre las cuales se destacan las excavaciones de zapatas, el retiro y disposición de material sobrante, el llenado e inyección de anclajes con lechada cementicia, el suministro e instalación de acero de refuerzo para las zapatas, la instalación del sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna mediante geodren tipo Permadrain, y la instalación de malla electrosoldada en la totalidad del área de la pantalla, como preparación para la actividad de lanzado de concreto. Estas actividades fueron verificadas en campo, evidenciándose su ejecución conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. Así mismo, la Interventoría verificó la instalación de distanciadores (cubos de concreto) dispuestos sobre la superficie del talud, los cuales permiten garantizar el correcto embebido de la malla electrosoldada, manteniendo la separación requerida entre la malla y la superficie del talud, con el fin de asegurar el espesor de recubrimiento de concreto proyectado establecido en el diseño. Con el fin de evaluar y controlar el espesor contractual del concreto a suministrar, la Interventoría procedió a verificar la instalación de pines de control distribuidos sobre la superficie de la pantalla, los cuales funcionan como referencia para garantizar la uniformidad del espesor del concreto

proyectado durante la actividad de lanzado. Estos elementos permiten realizar el seguimiento y control en campo, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

El contratista de Interventoría realizó la verificación técnica de los componentes constructivos, así como de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y revisó la planificación y programación de las actividades correspondientes al suministro y colocación de concreto de 3.000 PSI para zapatas y talud, construcción de canaleta de pie de talud y fundida de disipador de energía. En virtud de lo anterior, avala la continuidad de la programación establecida, proyectando el inicio de esta actividad durante la primera semana del mes de marzo, conforme al cronograma de obra vigente.

Adicionalmente, se informa a la entidad contratante que, con fecha de corte al 22 de febrero de 2026, el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 84,43%, frente a un avance programado del 84,02%, evidenciando un adelanto del 0,40% respecto a la programación establecida.


Finalmente, la Interventoría y la Supervisión resaltan la importancia de realizar los ensayos de laboratorio correspondientes, con el fin de verificar la resistencia del concreto suministrado y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo, se indica que los resultados de dichos ensayos deberán ser anexados a los informes técnicos del proyecto, como soporte del control de calidad y seguimiento de la obra.





Como soporte de la visita, se deja registro fotográfico aéreo de las actividades ejecutadas, así como la correspondiente hoja de visita con las coordenadas del frente de obra y las firmas del personal que atendió el recorrido:




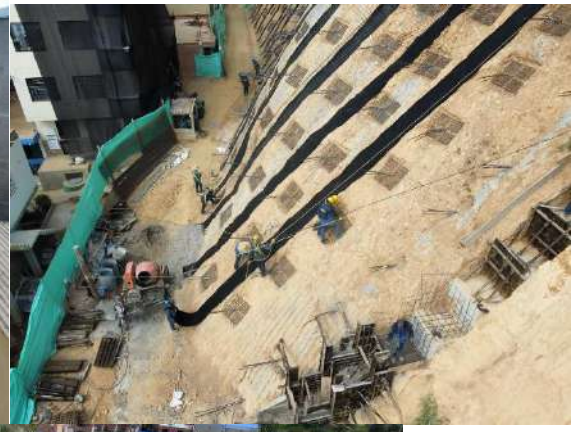




2	Se socializó sobre el estado del tiempo durante el periodo evaluado en el mes de febrero del 2026, en la zona de ejecución del proyecto se registraron algunos eventos de precipitación que representaron una afectación equivalente al 1,82 % del tiempo a corte del 27 de febrero de 2026, generando la suspensión temporal de actividades por un total de cuatro (04) horas. No obstante, dicha condición no ocasionó impactos ni retrasos en el cronograma general de ejecución de la obra. De igual manera, se comunica que, durante el período analizado se presentaron jornadas con alta radiación solar, condiciones climáticas propias de la zona de intervención. En atención a ello, se reforzaron las medidas de prevención y autocuidado del personal en obra, promoviendo pausas activas, periodos de descanso y una adecuada hidratación durante los recesos establecidos dentro de la jornada laboral. En términos generales, las condiciones climáticas registradas durante el mes permitieron el desarrollo continuo y normal de las actividades programadas, sin generar afectaciones significativas en la programación ni en el avance del proyecto.

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Se acuerda programar una próxima reunión de Comité, con el fin de controlar e inspeccionar las actividades de concreto lanzado	Interventoría-Contratista	06/03/2026

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	06/03/2026	**HORA:**	8:00 am	**LUGAR:**	Frente de Obra: Villa de los Caballeros

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

		ACTA No.	FECHA		
TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**	09	**DD**	**MM**	**AA**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		27	02	26

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	Melissa Donado Arias
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		X	Profesional Ambiental	Contratista	
7	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	
8	Héctor Amado H.		X	Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	
9	Gilberto Gómez O.		X	Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA Y DAÑOS OCACIONADOS POR LLUVIAS DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**		**ACTA No.**	**FECHA**	
				DD	**MM**	**AA**
			10	18	03	2026
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		**Hora Inicio**	3:00 pm		
			Hora final	4:00 pm		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Visita técnica para revisión de avance de actividades contractuales según programación de obra.	Contratista – Interventoría - CDMB
2	Revisión daños ocasionados por fuerte lluvia	Contratista – Interventoría -CDMB

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	En el marco del comité de obra, se dio apertura a la reunión con la participación del equipo profesional del contratista, la Interventoría y el equipo técnico de la CDMB, con el propósito de efectuar un recorrido por el frente de trabajo y verificar en campo el estado de avance de las actividades contractuales, en concordancia con la programación de obra vigente. Durante el recorrido, se evidenció la ejecución total de la pantalla de concreto lanzado, con un área aproximada de 840 m². Asimismo, se constató la culminación de las estructuras de canalización de aguas, tanto en la corona como en el pie del talud, así como la finalización de las obras correspondientes al disipador de energía. Estas actividades fueron socializadas por el contratista, indicando que su ejecución se desarrolló conforme a lo previsto, sin presentarse contratiempos ni inconsistencias técnicas. En relación con el concreto suministrado, se abordó la verificación del cumplimiento de la edad mínima requerida para la evaluación de la resistencia a la compresión, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Lo anterior, como condición previa para el inicio de las actividades de tensionamiento, las cuales se encuentran programadas para la primera semana de abril. De manera paralela, se informó sobre la ejecución de actividades preliminares, tales como el corte de mangueras y tuberías sobresalientes en los puntos de anclajes.

Durante la visita, se identificó un área denominada “terraza”, ubicada en el pie del talud, la cual ha presentado una ampliación respecto a sus condiciones iniciales como resultado de la ejecución de las actividades contractuales. En este sentido, se expuso su posible uso y tratamiento, contemplando la siembra de treinta y cinco (35) individuos arbóreos de especies con sistema radicular profundo, incluyendo especies frutales como pomarrosa, mango y limón. No obstante, considerando las dimensiones actuales del área, se precisó que no será posible la disposición total de los individuos en este sector, por lo cual se deberán definir áreas adicionales para completar la siembra. Como compromiso, se establece la realización de una reunión con el presidente de la Junta de Acción Comunal para concertar la localización definitiva.

Adicionalmente, en lo referente a la conformación geométrica de la terraza, se definió que los niveles se establecerán mediante pendientes controladas dirigidas hacia la canaleta ubicada en el pie del talud. Con el fin de controlar el material particulado y evitar el arrastre de sedimentos hacia las zonas peatonales, se contempla la construcción de bordillos perimetrales con una altura de 0,30 m.

En cuanto al manejo de las aguas de escorrentía superficial en la base del talud, se indicó que la canaleta construida contará con entregas a través de cajas de inspección profundas, que permitirán la conducción del flujo por rebose controlado. Posteriormente, el agua será transportada mediante tubería sanitaria de 8 pulgadas hacia dos puntos de descarga ubicados en zonas peatonales. Finalmente, se precisó que la canaleta proyectada en la base del talud tendrá continuidad hasta la peatonal 2B, permitiendo encauzar las aguas provenientes de la zona no estabilizada.

Adicionalmente, se informa a la entidad contratante que, con fecha de corte al 18 de marzo de 2026, el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 98,10%, frente a un avance programado del 98,06%, evidenciando un adelanto del 0,40% respecto a la programación establecida.








2	En atención al evento de precipitación de alta intensidad registrado el día de hoy 18 de marzo de 2026, y conforme al material audiovisual suministrado por la comunidad, se evidenció la condición de desbordamiento de un disipador de energía preexistente. Al respecto, es preciso aclarar que dicha estructura hidráulica no forma parte del alcance del contrato ejecutado por el Consorcio, dado que corresponde a una obra construida con anterioridad a la intervención actual. Cabe mencionar que el presente evento hidrometeorológico extremo presenta una situación atípica en relación con los eventos registrados en los últimos meses, caracterizándose por la ocurrencia de precipitaciones de alta intensidad. Una vez ocurrido el evento, se realizó un recorrido técnico de verificación en campo, abarcando tanto la terraza intervenida como la zona superior del talud. Como resultado de esta inspección, se constató que las obras ejecutadas en el marco del contrato conducen adecuadamente los flujos de escorrentía superficial hacia un disipador realizado, sin generar afectaciones adicionales, es decir la canaleta construida en la parte superior de la pantalla no aporta agua al disipador preexistente y no presenta conexión con las obras ejecutadas, cabe aclarar que como medida de mitigación se construirá un antepecho que impida cualquier arrastre o conducción o aporte de agua al disipador. En este sentido, se deja constancia de que las obras desarrolladas no alteran negativamente el funcionamiento de las estructuras hidráulicas preexistentes, toda vez que no se emplean como elementos de direccionamiento directo de los flujos hacia dichas estructuras, lo cual se soporta en la evidencia gráfica correspondiente. 

	Cabe resaltar que el sistema de manejo de aguas implementado en el área intervenida fue diseñado y construido para garantizar la adecuada captación, conducción y descarga de las aguas de escorrentía superficial generadas dentro del alcance del proyecto. Este sistema está conformado por canaletas superior e inferior, integradas a una caja de inspección y vinculadas a la pantalla de estabilización ejecutada, permitiendo interceptar y conducir los flujos hídricos de manera controlada. Las estructuras hidráulicas proyectadas direccionan el caudal en sentido Este, conforme a la configuración y localización de la obra construida. Adicionalmente, se identificó que una fracción del caudal observado durante el evento de lluvia proviene de áreas ubicadas en la parte alta del talud, correspondientes a predios privados externos al área de intervención. Estos aportes hídricos no se encuentran bajo el alcance de responsabilidad del Consorcio, en tanto no es viable intervenir ni regular las condiciones de drenaje de dichos predios sin la debida autorización de sus propietarios. Finalmente, en lo que respecta al sistema de manejo de aguas contemplado dentro del alcance contractual, se verificó su desempeño bajo condiciones reales de operación asociadas a un evento de precipitación de alta intensidad, sin que se presentaran fallas funcionales ni observaciones técnicas. Lo anterior evidencia un comportamiento hidráulico adecuado, garantizando la captación, conducción y descarga controlada de los caudales hacia el disipador de energía contemplado dentro del objeto contractual.

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Se acuerda programar una próxima reunión de Comité, con el fin de determinar el lugar de siembra de los árboles de compensación y definir la entrega contractual de la obra	Interventoría-Contratista-CDMB	27/03/2026







PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	27/03/2026	**HORA:**	8:00 am	**LUGAR:**	Frente de Obra: Villa de los Caballeros

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA Y DAÑOS OCACIONADOS POR LLUVIAS DEL CONTRATO 210.16225.6" **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**	**ACTA No.**	**FECHA**		
			DD	**MM**	**AA**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros	10	18	03	26

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS						
No.	**NOMBRE**	**GÉNERO**		**CARGO**	**DEPENDENCIA**	**FIRMA**
		M	**F**			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		X	Profesional Ambiental	Contratista	
7	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	
8	Héctor Amado H.		X	Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	
9	Gilberto Gómez O.		X	Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA PARA DEFINIR FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"		**ACTA No.**	**FECHA**	
				DD	**MM**	**AA**
			11	27	03	2026
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		**Hora Inicio**	3:00 pm		
			Hora final	4:00 pm		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Visita técnica para revisión de avance de actividades contractuales según programación de obra para definir fecha de terminación de la obra	Contratista – Interventoría - CDMB
2	Entrega de Acta parcial No.04 y Acta de recibo definitivo	Contratista – Interventoría


No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	En el marco del comité de obra, se dio apertura a la reunión con la participación del equipo profesional del contratista, la Interventoría y el equipo técnico de la CDMB, con el propósito de realizar una visita técnica al frente de trabajo, orientada a verificar en campo el estado de avance de las actividades contractuales, en concordancia con la proximidad de la fecha de terminación del contrato de obra pública. Durante el recorrido, se evidenció un avance físico y administrativo aproximado del noventa y ocho por ciento (98 %) del total contractual. Se informó que, previo a la culminación de las actividades, se encuentra en proceso el cumplimiento de la edad mínima requerida del concreto para la evaluación de su resistencia a la compresión, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Una vez validado este requisito, se procederá con la ejecución de las actividades finales correspondientes al sistema de tensionamiento. Así mismo, se constató la ejecución de obras complementarias, tales como la construcción de bordillos perimetrales en las zonas peatonales adyacentes al área intervenida, así como la implementación de rampas de acceso vehicular, las cuales, según lo manifestado por el contratista, obedecen a requerimientos de la comunidad para garantizar el acceso a las viviendas aledañas. En cuanto a la programación, se proyecta terminar las actividades de obra en la fecha establecida contractualmente, contemplando dentro de las semanas restante la ejecución del sistema de tensionamiento. Previo a esta actividad, se realizará la instalación de los elementos requeridos en cada punto de anclaje, incluyendo platinas, polainas (o poporas) y cuñas, conforme a las especificaciones de diseño.

	Para la ejecución del tensionamiento, se dispondrá de una unidad hidráulica acoplada a un gato tensor tipo monotorónn, equipada con manómetro calibrado que permita el control preciso de la carga aplicada. El procedimiento se desarrollará bajo estricto control técnico, conforme a los parámetros de diseño, aplicando una carga total de treinta (30) toneladas por anclaje, equivalente a diez (10) toneladas por cada torón, hasta alcanzar el cien por ciento (100 %) de la carga de tensión establecida. Estas actividades permitirán garantizar la adecuada transferencia de esfuerzos al sistema de contención, contribuyendo a la estabilidad global del talud conforme a los criterios geotécnicos definidos en el diseño. Finalmente, se realizará el correspondiente control técnico del proceso de tensionamiento, incluyendo la verificación y registro de las elongaciones físicas obtenidas, como mecanismo de validación del comportamiento del sistema instalado. En atención a los compromisos establecidos en el comité anterior, se definió la ejecución de una adecuación consistente en la construcción de un tapón o antepecho en el punto inicial de la canaleta ubicada en la corona del talud. Esta medida fue adoptada como acción preventiva y de mitigación, con el propósito de impedir el arrastre y/o la conducción no controlada de aguas de escorrentía superficial hacia el disipador de energía preexistente, evitando así posibles afectaciones a su funcionamiento hidráulico. A continuación, se presenta la descripción de la obra ejecutada, en la cual se detallan las características técnicas, localización y función hidráulica de la estructura construida: 
2	En el marco de las actividades administrativas asociadas al cierre del contrato, se llevó a cabo la recopilación y consolidación de la información correspondiente a los informes semanales revisados con la Interventoría, así como del informe mensual del mes de marzo de 2026, incluyendo sus respectivos anexos: actas de comité, informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), informe de calidad e informe ambiental.

	Lo anterior, con el propósito de garantizar la trazabilidad, integridad y actualización de la información administrativa relacionada con las actividades ejecutadas en obra, permitiendo contar con los soportes requeridos para la radicación del Acta Parcial de Pago No. 04. Una vez consolidada la información correspondiente al mes de marzo, se proyecta de manera paralela la estructuración de la documentación administrativa del mes de abril de 2026, con el fin de gestionar oportunamente la radicación del Acta de Recibo Definitivo. Este proceso se desarrolla en cumplimiento de los lineamientos contractuales y administrativos establecidos, asegurando el cierre adecuado del contrato, tanto en términos técnicos como documentales, dentro de los plazos estipulados.

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Se acuerda programar una próxima reunión de Comité, con el fin de observar inspeccionar las actividades finales de obra.	Interventoría-Contratista	10/04/2026






PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	10/04/2026	**HORA:**	8:00 am	**LUGAR:**	Frente de Obra: Villa de los Caballeros

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA PARA DEFINIR FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 210.16225.6" **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**	**ACTA No.**	**FECHA**		
			DD	**MM**	**AA**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros	11	27	03	26

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		X	Profesional Ambiental	Contratista	
7	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	
8	Gilberto Gómez O.		X	Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA DEL CONTRATO 210.16225.6" GRUPO 4: **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros

ACTA No.	**FECHA**		
	DD	**MM**	**AA**
12	10	04	2026
Hora Inicio	8:00 am		
Hora final	9:00 am		



AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Visita técnica para revisión de avance de actividades contractuales y revisión de terraza formada en la base del talud	Contratista – Interventoría
2	Visita para el recibo definitivo de obra	Contratista – Interventoría -CDMB

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	En el marco del comité de obra, se dio apertura a la reunión con la participación del equipo profesional del contratista y la Interventoría, con el propósito de definir técnicamente la solución para la terminación de la canaleta en la base del talud. Esta actividad se desarrolló mediante verificación en campo, considerando la proximidad de la fecha de terminación del contrato de obra pública. Durante el recorrido, se evidenció un avance físico satisfactorio, encontrándose las actividades contractuales ejecutadas próxima a su totalidad. Posteriormente, se realizó la inspección en el punto de terminación de la canaleta, localizado al final de la pantalla de estabilización, donde se presenta la integración hidráulica entre la canaleta superior, la canaleta inferior, un disipador de energía y una caja de inspección. Aguas abajo de estas estructuras, se identificó un área con presencia de procesos iniciales de erosión, la cual no cuenta con un sistema integral de estabilización, salvo una intervención puntual ejecutada por el Consorcio como apoyo a la comunidad, consistente en la instalación de geomanto para la protección superficial del terreno. Esta actividad fue socializada y contó con la aprobación de la comunidad y del presidente de la Junta de Acción Comunal. En función de las condiciones observadas en la zona no intervenida y con el fin de garantizar la continuidad hidráulica del sistema de drenaje, se determinó, de manera conjunta con la Interventoría, la necesidad de extender la canaleta contemplada contractualmente, con el objeto de captar las aguas de escorrentía superficial y conducirlas de forma controlada.

	En consecuencia, se definió la continuación de la construcción de veinticuatro (24) metros lineales de canaleta incluidos dentro de las cantidades contractuales, desde el punto de terminación de la pantalla de estabilización hasta la conexión con la red de drenaje ubicada en la calle 2C No. 16F-02. Dado que el terreno presenta una pendiente descendente, condiciones de socavación y la presencia de terrazas conformadas por estoraques, se estableció como solución técnica la conducción de las aguas por medio de una canaleta perimetral hasta una caja existente en la zona, la cual había sido construida de manera provisional por la comunidad. Dicha estructura será objeto de adecuación mediante la conformación en concreto con resistencia de 3000 psi, con el fin de garantizar su funcionalidad hidráulica y durabilidad. A partir de esta caja, se proyecta la descarga de las aguas mediante la instalación de tubería tipo Novafort de 8 pulgadas de diámetro, la cual permitirá redirigir el flujo hacia la zona peatonal de la calle 2C. Finalmente, la descarga se realizará con un ángulo aproximado de 45°, conectando con una canaleta existente de mayor capacidad hidráulica, la cual presenta condiciones adecuadas para el manejo de caudales, incluso bajo eventos de precipitación de alta intensidad, garantizando así una evacuación segura y controlada de las aguas.
2	En el marco del comité, el Contratista y la Interventoría adquieren el compromiso de culminar la totalidad de las actividades contractuales, tanto en su componente físico como administrativo, dentro del plazo establecido en el contrato de obra. En este sentido, se establece como prioridad la finalización de las actividades pendientes, correspondientes al sistema de tensionamiento, la ejecución de la canaleta y la siembra de especies arbóreas asociadas a las medidas de compensación ambiental. Se deja constancia de que la ejecución de las actividades contractuales será debidamente soportada mediante informes técnicos y sus respectivos anexos de calidad, garantizando que estas se desarrollen en conformidad con lo establecido en el contrato, bajo el cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y ambientales definidos. Así mismo, se precisa que las actividades han sido ejecutadas bajo la supervisión, seguimiento y control permanente por parte de la Interventoría, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el adecuado uso de materiales, el avance físico conforme a la programación y la implementación de las medidas de seguridad y normatividad ambiental vigente. Finalmente, se establece como compromiso la realización de la entrega formal de la obra y la suscripción del Acta de Recibo Definitivo para el día martes 14 de abril de 2026, sujeto a la verificación final del cumplimiento integral de las obligaciones contractuales

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Recorrido de obras y entrega física del contrato de obra pública.	Interventoría-Contratista-CDMB	14/04/2026






PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	14/04/2026	**HORA:**	1:00 pm	**LUGAR:**	Frente de Obra: Villa de los Caballeros

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

TEMA:	VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA PARA DEFINIR FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 210.16225.6" **CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**	**ACTA No.**	**FECHA**		
		12	**DD**	**MM**	**AA**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		10	04	26

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		X	Profesional Ambiental	Contratista	
7	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	
8	Gilberto Gómez O.		X	Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	RECORRIDO DE OBRA PARA REVISIÓN ENTREGA DEL CONTRATO 210.16225.6" **GRUPO 4: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**"		**ACTA No.**	**FECHA**	
				DD	**MM**	**AA**
			13	14	04	2026
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros		**Hora Inicio**	1:00 pm		
			Hora final	2:00 pm		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DÍA**	**RESPONSABLE**
1	Recorrido de obra para revisión de la entrega del proyecto	Contratista – Interventoría - CDMB

No.	**DESARROLLO ORDEN DEL DÍA**
1	Siendo la 1:00 p. m. del día 14 de abril de 2025, se dio inicio al comité de obra con la participación del equipo técnico de la interventoría, el personal profesional del contratista Consorcio Consolidación Girón y los representantes de la entidad contratante, CDMB, cuyo objeto fue llevar a cabo la inspección y verificación visual del estado final de las obras en el frente de trabajo villa de los caballeros. Durante la jornada se realizó un recorrido técnico detallado, evaluando las condiciones constructivas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los acabados, la correcta ejecución de las actividades programadas y la funcionalidad de las obras ejecutadas. Asimismo, se verificó la concordancia entre lo ejecutado en campo y lo establecido en los diseños, planos aprobados y documentos contractuales, identificando observaciones puntuales y definiendo las acciones requeridas para su respectivo mantenimiento. Lo anterior, con el fin de constatar la terminación integral del proyecto, garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual y validar la conformidad frente a la programación establecida para la entrega final del proyecto. La presente acta hace parte del registro técnico y contractual del proyecto, y la información consignada servirá como soporte para las evaluaciones y decisiones administrativas que correspondan en el marco del contrato de obra pública No. 210-16225-6. Como constancia de la visita, se anexa el registro fotográfico correspondiente.












No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	El contratista y la interventoría se comprometen a gestionar, consolidar y presentar la totalidad de la documentación requerida para la liquidación del contrato dentro de un plazo no mayor a dos meses (02) meses contados a partir de la fecha del presente comité, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y legales establecidos para tal fin.	Contratista- Interventoría	14/04/2026

Elaboró Acta	Cargo	Firma
Oscar Andrés Sánchez Jerez	Residente de Obra	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Julián Fernando Villamizar Durán	Residente de Interventoría	

1

TEMA:	RECORRIDO DE OBRA PARA REVISÓN ENTREGA DEL CONTRATO 210.16225.6" **GRUPO 4: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**", MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER (RA-OBRA-02)''.	**ACTA No.**	**FECHA**		
			DD	**MM**	**AA**
LUGAR:	Frente de Obra – Villa de los Caballeros	13	14	04	26

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO		CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
		M	F			
1	Oscar Andrés Sánchez Jerez	x		Residente de Contratista	Contratista	
2	Julián Fernando Villamizar Durán	x		Residente de Interventoría	Interventoría	
3	Clara Melissa Donado Arias		x	Profesional Siso	Contratista	
4	Edith Costanza Toloza Rojas		x	Especialista Ambiental	Interventoría	
5	Sandra Yolima Bermúdez Cala		x	Profesional Ambiental	Contratista	
7	Paula Emilia Fajardo Silgado		x	Profesional Siso	Interventoría	
8	Gilberto Gómez O.		x	Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	
9	Hector Amado H		X	Profesional Especializado CDMB- Apoyo supervisión	CDMB	

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: Atencion a la visita tecnica, obra ejecucion Concesion consolidacion" frente de obra villa de los caballeros

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
14	10	2025

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO | MICROCUENCA

COTA | E

PROPIETARIO: | C.C / NIT. 1095892521

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: consolidacion.giron@gmail.com | TELÉFONO FIJO | CELULAR 3022932492

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Interventoria | CELULAR

SITUACIÓN ENCONTRADA: Se evidencia avance del frente de obra, de la capa pelimcar correspondiente a retiro de basuras y escombros, desmonte y limpieza y perfilado mecanico y manual, se evidencia la instalación de valla informativa de la obra y cerramiento de la obra, se evidencia para el momento.

EVIDENCIAS: Registro fotografico, coordenadas, hoja de ruta

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: Se recomienda informes previos de acuerdo al cronograma establecida

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita tecnica de seguimiento OBRA e interventoria - obra PANTALLA ANCLADA GRUPO 4 sector barrio villa de los caballeros - MUNIC. GIRON

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
10	12	2025

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: GIRON | MICROCUENCA

COTA | 7°3'54914 | E: 73°9'49748N

PROPIETARIO: | C.C / NIT.

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: consolidacion.giron@gmail.com | TELÉFONO FIJO: 3012765665 | CELULAR

QUIEN ATIENDE LA VISITA: | CELULAR

SITUACIÓN ENCONTRADA: La obra esta Avanzando en lo siguiente: El Perfilado del talud esta Practicamente finalizado del area total a Intervenir, el material de Perfilado se retira de la obra, los labores de PERFORACIÓN para ANCLAJES ESTA AVANZANDO - se adelanta trazado y conformación de canaleta de coronación y su construcción

EVIDENCIAS: Anotación de Bitacora de obra, registro fotografico y hoja de visita.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

OSCAR SANCHEZ
QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

GOMEZ D.
GILBERTO GOMEZ O.
NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: VISITA TECNICA de SEGUIMIENTO OBRA e interventoria de obra Pantalla Anclada Grupo4 sector Barrio villa de los caballeros - MUNICIPIO GIRON

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
10	12	2025

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: GIRON | MICROCUENCA

COTA | 7°3'54.91"N | E: 73°9'49,748"W

PROPIETARIO: | C.C / NIT.: 90198 2571

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: consolidacion.giron@gmail.com | TELÉFONO FIJO: 3922765665 | CELULAR: 3022932492

QUIEN ATIENDE LA VISITA: interventoria | CELULAR

SITUACIÓN ENCONTRADA: La obra AVANZA en lo SIGUIENTE: El PERFILADO del TALUD Esta practicamente FINALIZADO del Area total a intervenir, el MATERIAL de PERFILADO se retira de la obra, LAS LABORES de Perforación PARA ANCLAJES ESTA AVANZANDO SE ADELANTA TRAZADO Y CONFORMACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN de CANALETA de CORONACIÓN

EVIDENCIAS: Anotacion Bitacora de OBRA - Registro fotografico y hoja de VISITA.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

OSCAR SANCHEZ
QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

GOMEZ G.
GILBERTO GOMEZ.
NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita tecnica de seguimiento Intervento Pantallo Anclado Grupo 4 Barrio Villa de los Caballeros, Municipio Giron

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
09	01	2026

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: Giron | MICROCUENCA

COTA | E

PROPIETARIO: | C.C / NIT.

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | TELÉFONO FIJO | CELULAR

QUIEN ATIENDE LA VISITA: | CELULAR

SITUACIÓN ENCONTRADA: Se observo avance en los actividades de Perforaciones horizontales para anclajes y el rendimiento Van en la mitad del total de instalación de anclajes (72) y procedan a la inyección, Una vez perforado se llena con lechada cementicea Se continua con perforación de faltante de anclajes y llenado de las instalados.

EVIDENCIAS:

Registro Fotografico

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se CDMB procede hacer Informe Tecnico

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

Hector Amado H. - David F. Mendoza B.

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: SE OBSERVA DETALLAMENTE LOS AVANCES DE OBRA. DEL CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON – FRENTE DE OBRA: VILLA DE LOS CABALLEROS

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
27	01	26

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO | MICROCUENCA

COTA 3,79 m | 7°3'6.070"N | E 73°9'49.32839

PROPIETARIO: Consorcio Consolidación Girón | C.C / NIT. 901982571-5

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Villa de los Caballeros | TELÉFONO FIJO | CELULAR

QUIEN ATIENDE LA VISITA: | CELULAR 3017932492

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se inicia la inspección con recorrido de obra en el frente Villa de los Caballeros se observa actividades de perforaciones horizontales e instalación de anclajes, Se visualiza las actividades de fundida de canaleta en concreto prefabricado en sitio. Se observa un excelente avance de obra de acuerdo a la programación de obra

EVIDENCIAS:

Registro Fotográfico, Hoja de visita y bitacora de obra

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

La obra de acuerdo a la programación va cumpliendo con su cronograma

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB
GILBERTO GOMEZ O.

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de inspección para las actividades ejecutadas correspondientes al avance de obra según programación.

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
11	02	26

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: Girón | MICROCUENCA

COTA | 7°3'5.491 N | E: 73°9' 49,748 W

PROPIETARIO: | C.C / NIT.: 901982571-5

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Villa de los Caballeros | TELÉFONO FIJO

CELULAR: 3012765665

QUIEN ATIENDE LA VISITA: | CELULAR: 3022932492

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se inicia la visita realizando un recorrido de obra en el frente Villa de los Caballeros donde se observa un avance favorable observando la ejecución de las actividades de perforaciones horizontales instalación de anclajes, excavación de zapatas a mano descalzada y paralelamente se realiza el suministro y colocación de varillas para zapatas instalando la parilla en cada punto de anclaje. Se observa la excavación de disipador de energía ubicada al final de la pantalla.

EVIDENCIAS:

Hoja de visita, registro fotográfico

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se observa un avance favorable en terminos de actividades técnicas y reforzamiento en el frente de obra en el cumplimiento de la programación

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

GILBERTO GOMEZ OLIVEROS
NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de inspección ocular para las actividades de obra ejecutadas correspondientes al avance de obra según programación

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
16	02	26

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: Guión | MICROCUENCA

COTA | 7°31'5.491 N | E: 73°9'49.748 W

PROPIETARIO: | C.C / NIT.: 901982571-5

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Villa de los Caballeros | TELÉFONO FIJO

CELULAR: 3012765665

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Contratista - Interventoria | CELULAR: 3027932492

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se evidencia la ejecución de actividades en obra correspondientes a las últimas perforaciones horizontales, con su respectivo anclaje, se continua con el llenado e inyección de lechada cementicia, se evidencia excavación de los cajos para las zapatas, e instalación de parillas. Se esta excavando el area correspondiente al disipador de energia para luego proceder con el armado de acero y fundido de concreto.

EVIDENCIAS:

Hoja de visita, Registro Fotografico

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se observa avance a acorde a la programación

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

Hector Amado H.

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de Obra: Consorcio Inter Giron
Frente: Villa de los Roballeros

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
27	02	26

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: Giron | MICROCUENCA

COTA | E

PROPIETARIO: | C.C / NIT.

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: | TELÉFONO FIJO | CELULAR

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Ing Daniela Herchan | CELULAR: 3165953410

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se esta finalizando (instalando) instalacion de la malla electrosoldada para luego continuar con el lanzado del concreto y de la pantalla, se continua con la construccion del disipador de energia, se continua con la excavacion de la corona del pie del talud, con un avance aproximado del 89%.

EVIDENCIAS:

Registro Fotografico - Hoja de Visita

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se observa buen avance segun cronograma.

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

Hector Amado H.

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

David T. Tinjaca

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

GILBERTO GOMEZ O. 1005-28-

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de inspección para observar el avance que ha tenido la obra en el frente villa de los caballeros

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
13	03	26

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: Girón Santander | MICROCUENCA

COTA: - | 7°3'4.92559 | E: 73°9'49.49608

PROPIETARIO: | C.C / NIT.

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Villa de los Caballeros, Girón Santander | TELÉFONO FIJO | CELULAR

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Contratista | CELULAR

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se evidencia un avance positivo en las actividades de obra. Se observa la culminación de actividades de concreto lanzado y estructura de disipación de energía. Se observa culminación de canaleta superior e inferior para el manejo de aguas lluvias. A fecha se registra un avance 83%. Se observa cajas de inspección para verter el agua. Como parte adicional se instala geomanta en una zona del talud descubierta, actividad adicional para poder mitigar la erosión del talud.

EVIDENCIAS:

Registro Fotográfico, hoja de visita

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

El avance se encuentra en un 83% por encima del avance programado

GILBERTO GOMEZ

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: VISITA DE INSPECCION PARA OBSERVAR EL AVANCE QUE HA TENIDO LA OBRA EN EL FRENTE VILLA DE LOS CABALLEROS

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
18	03	2026

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: GIRON - STDER | MICROCUENCA

COTA | 7°3'4.92559 | E: 73°9'49.49608

PROPIETARIO: | C.C / NIT.

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: VILLA DE LOS CABALLEROS- GIRON STDER. | TELÉFONO FIJO | CELULAR

QUIEN ATIENDE LA VISITA: CONTRATISTA | CELULAR

SITUACIÓN ENCONTRADA: Se inicia recorrido de obra para observar las actividades contractuales, se observa finalización en las actividades de concreto lanzado, se espera el riegvack de concreto para las actividades de tratamiento. Se continua actividades de construcción de cuneta para el control de aguas superficiales.

EVIDENCIAS:

Registro fotografico y hoja de visita.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se tiene previsto reunión para el día 19 de marzo con el presidente de la acción comunal para definir dias complementarios para la reconformación de area intervenida del pie del talud. con el fin de definir de igual manera la compensación ambiental

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

Hector Amado H.

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA Pos. Interv. Interventoría

GILBERTO GOMEZ O.

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de Inspección para observar el avance de las actividades en obra ejecutadas.

FECHA DE VISITA

DÍA	MES	AÑO
27	03	26

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: Girón | MICROCUENCA

COTA | 7°3'5.491 N | E: 73°9'49.748 W

PROPIETARIO: | C.C / NIT.: 901982571-5

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Villa de los Caballeros - Girón | TELÉFONO FIJO | CELULAR: 3012765665

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Contratista | CELULAR: 3027937492

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se evidencia la ejecución de las actividades correspondiente a canalización de las aguas lluvias como lo son construcción de canaleta. Se inicia actividades de confinamiento de ~~barrera~~ tetrato para la confinación de zona verde. Se observo la construcción de bordillo en los peatonales con el fin de contener cualquier tipo de material a los peatonales. Se comenta que se esta esperando los edades minimas para completar la resistencia y poder realizar actividades de tensionamiento.

EVIDENCIAS:

Registro Fotografico - Hoja de Visita

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se registra un avance ejecutado del 98,12%.
Las actividades realizadas no son contractuales ni estan dentro del contrato. El contratista las ejecuta como beneficio y donación para dejar un buen terminado

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

Melissa Rondon Arias

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de Inspección para observar el avance de las actividades en obra ejecutados.

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
08	04	26

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: GIRON | MICROCUENCA

COTA | 7°3'5.491"N | E: 73°9'19.748"W

PROPIETARIO: | C.C / NIT.: 901982571-5

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: VILLA DE LOS CABALLEROS - GIRON | TELÉFONO FIJO | CELULAR: 3012765665

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Contratista | CELULAR: 3022932492

SITUACIÓN ENCONTRADA: Se evidencia la ejecución de las actividades correspondientes a la CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS como lo son Construcción de CANALETAS. se CONTINUA ACTIVIDADES DE CONFORMACION DEL TERRENO PARA LA COMPOSICIÓN DE LA ZONA VERDE. Construcción de BORDILLOS para evitar cualquier tipo de material a las peatonales - Construcción de CAJA DE INSPECCION - RECOLECTOR AGUAS LLUVIAS - PARA EL TENSIONAMIENTO SE ESTA ESPERANDO SE CUMPLA LOS TIEMPOS REQUERIDOS Y PODER LLEVAR A CABO ESTE TENSIONAMIENTO.

EVIDENCIAS: HOJA DE VISITA - REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: SE REGISTRA UN BUEN AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 99%
las actividades en Realización no son contractuales ni estan dentro del contrato. Se ejecutan como donación y BENEFICIO de la COMUNIDAD Y DEJAR TODO TERMINADO POR PARTE DEL CONTRATISTA

GILBERTO GOMEZ O.

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA | NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA | OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO M-OA-F002 / VERSIÓN 03	**HOJA DE VISITA**		

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de finalización de obra según radia 210.16225.6 para el recibo definitivo de obra.

FECHA DE VISITA		
DÍA	MES	AÑO
14	04	26

FINCA | VEREDA | MUNICIPIO: Girón | MICROCUENCA

COTA | 7°3'5.491"N | E: 73°9'49.74"W

PROPIETARIO: | C.C / NIT.: 901982571-5

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: Villa de los Caballeros - Girón Santander | TELÉFONO FIJO | CELULAR: 3012765665

QUIEN ATIENDE LA VISITA: Contratista - Interventoria | CELULAR: 3022932492

SITUACIÓN ENCONTRADA:

Se dio inicio a recibido de obra en el frente Villa de los caballeros donde se evidencia la culminación de las actividades contractuales correspondiente a Tensionamiento de los anclajes. Se evidencia culminadas las actividades de anclajes, estructura de disipación de energía y canaleta realizada en la corona y el pie del talud. Las actividades contractuales se ejecutaron en el tiempo establecido y según las especificaciones tecnicas, El contrato se ejecuto en el tiempo establecido. Se observa la siembra de los arboles para su respectiva compensación

EVIDENCIAS:

Registro Fotografico, hoja de visita y Bitacora

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

La obra se encuentra teminada en su 100% en el tiempo establecido contractualmente

QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA

NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB

OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA


OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA


ANEXO N. 07


CONTROL DE PERFORACIÓN DE ANCLAJES

CONTROL DE PERFORACION EN CAMPO

CONTRATO	210.16225.6	**PERFORADOR**	ISAIAS GARCIA JAIMES
LOCALIZACION OBRA	**VILLA DE LOS CABALLEROS**		








ITEM	FECHA PERFORACION	ANCLAJE N°	EQUIPO #	ELEMENTO	PERFORACION Ø	TIPO DE PERFORACION				FECHA INSTALACION ANCLAJE	Ø TORON	CANTIDAD TORONES	LONGITUD BULBO (ML)	LONGITUD LIBRE (ML)	LONGITUD ANCLAJE (ML)
						PASIVO	ACTIVO	MIXTO	DREN						
1	26/11/2025	47	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			26/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
2	26/11/2025	46	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			26/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
3	26/11/2025	45	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			26/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
4	26/11/2025	44	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			26/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
5	26/11/2025	43	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			26/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
6	26/11/2025	42	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			26/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
7	27/11/2025	41	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			27/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
8	27/11/2025	40	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			27/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
9	27/11/2025	39	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			27/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
10	27/11/2025	38	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			27/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
11	27/11/2025	37	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			27/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
12	27/11/2025	36	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			27/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
13	28/11/2025	35	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			28/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
14	28/11/2025	34	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			28/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
15	28/11/2025	33	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			28/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
16	28/11/2025	32	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			28/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
17	28/11/2025	31	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			28/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
18	28/11/2025	30	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			28/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
19	29/11/2025	29	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			29/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
20	29/11/2025	28	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			29/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
21	29/11/2025	27	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			29/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
22	29/11/2025	26	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			29/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
23	29/11/2025	25	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			29/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
24	29/11/2025	24	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			29/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00


OBSERVACIONES GENERALES :


	INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**ING. OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**ING. JULIÁN FERNANDO VILLAMIZAR DURÁN**
FECHA	**30/11/2025**	**30/11/2025**

CONTROL DE PERFORACION EN CAMPO

CONTRATO	210.16225.6	PERFORADOR	ISAIAS GARCIA JAIMES
LOCALIZACION OBRA	VILLA DE LOS CABALLEROS		








ITEM	FECHA PERFORACION	ANCLAJE N°	EQUIPO #	ELEMENTO	PERFORACION Ø	TIPO DE PERFORACION				FECHA INSTALACION ANCLAJE	Ø TORON	CANTIDAD TORONES	LONGITUD BULBO (ML)	LONGITUD LIBRE (ML)	LONGITUD ANCLAJE (ML)
						PASIVO	ACTIVO	MIXTO	DREN						
25	1/12/2025	23	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			1/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
26	1/12/2025	22	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			1/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
27	2/11/2025	21	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			2/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
28	2/11/2025	20	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			2/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
29	3/11/2025	19	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			3/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
30	3/11/2025	18	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			3/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
31	4/11/2025	17	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			4/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
32	4/11/2025	16	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			4/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
33	5/11/2025	15	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			5/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
34	5/11/2025	14	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			5/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
35	6/11/2025	13	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			6/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
36	9/11/2025	12	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			9/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
37	9/11/2025	11	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			9/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
38	9/11/2025	10	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			9/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
39	10/11/2025	9	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			10/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
40	10/11/2025	144	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			10/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
41	11/11/2025	8	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			11/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
42	11/11/2025	7	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			11/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
43	12/11/2025	6	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			12/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
44	12/11/2025	5	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			12/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
45	13/11/2025	4	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			13/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
46	13/11/2025	3	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			13/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
47	15/11/2025	2	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			15/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
48	15/11/2025	1	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			15/11/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00


OBSERVACIONES GENERALES : Debido a las condiciones encontradas en el terreno durante la implantación de los anclajes en campo, se observó la necesidad de modificar la ubicación del anclaje N.° 144, Esta decisión fue evaluada y aprobada por la Interventoría y la Residencia de Obra, en beneficio de la correcta ejecución del proyecto


	INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	ING. OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	ING. JULIAN FERNANDO VILLAMIZAR DURAN
FECHA	31/12/2025	31/12/2025

CONTROL DE PERFORACION EN CAMPO

CONTRATO	210.16225.6	**PERFORADOR**	ISAÍ BAUTISTA PINZÓN
LOCALIZACION OBRA	**VILLA DE LOS CABALLEROS**		








ITEM	FECHA PERFORACION	ANCLAJE N°	EQUIPO #	ELEMENTO	PERFORACION Ø	TIPO DE PERFORACION				FECHA INSTALACION ANCLAJE	Ø TORON	CANTIDAD TORONES	LONGITUD BULBO (ML)	LONGITUD LIBRE (ML)	LONGITUD ANCLAJE (ML)
						PASIVO	ACTIVO	MIXTO	DREN						
1	9/12/2025	143	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			9/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
2	10/12/2025	48	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			10/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
3	11/12/2025	49	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			11/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
4	12/12/2025	50	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			12/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
5	13/12/2025	51	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			13/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
6	15/12/2025	52	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			15/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
7	15/12/2025	53	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			15/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
8	16/12/2025	54	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			16/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
9	17/12/2025	55	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			17/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
10	18/12/2025	56	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			18/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
11	19/12/2025	57	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			19/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
12	20/12/2025	58	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			20/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
13	22/12/2025	59	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			22/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
14	22/12/2025	60	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			22/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
15	23/12/2025	61	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			23/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
16	24/12/2025	62	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			24/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
17	26/12/2025	63	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			26/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
18	26/12/2025	64	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			26/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
19	27/12/2025	65	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			27/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
20	29/12/2025	66	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			29/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
21	30/12/2025	67	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			30/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
22	31/12/2025	68	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			31/12/2025	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00


OBSERVACIONES GENERALES : Debido a las condiciones encontradas en el terreno durante la implantación de los anclajes en campo, se observó la necesidad de modificar la ubicación del anclaje N.° 143, Esta decisión fue evaluada y aprobada por la Interventoría y la Residencia de Obra, en beneficio de la correcta ejecución del proyecto


	INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**ING. OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**ING. JULIÁN FERNANDO VILLAMIZAR DURÁN**
FECHA	**31/12/2025**	**31/12/2025**

CONTROL DE PERFORACION EN CAMPO

CONTRATO	210.16225.6	PERFORADOR	ISAIAS GARCIA JAIMES
LOCALIZACION OBRA	VILLA DE LOS CABALLEROS		








ITEM	FECHA PERFORACION	ANCLAJE N°	EQUIPO #	ELEMENTO	PERFORACION Ø	TIPO DE PERFORACION				FECHA INSTALACION ANCLAJE	Ø TORON	CANTIDAD TORONES	LONGITUD BULBO (ML)	LONGITUD LIBRE (ML)	LONGITUD ANCLAJE (ML)
						PASIVO	ACTIVO	MIXTO	DREN						
49	2/01/2026	69	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			2/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
50	2/01/2026	70	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			2/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
51	3/01/2026	71	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			3/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
52	5/01/2026	72	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			5/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
53	5/01/2026	73	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			5/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
54	6/01/2026	74	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			6/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
55	6/01/2026	75	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			6/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
56	7/01/2026	76	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			7/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
57	7/01/2026	77	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			7/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
58	8/01/2026	78	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			8/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
59	8/01/2026	79	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			8/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
60	9/01/2026	80	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			9/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
61	9/01/2026	81	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			9/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
62	10/01/2026	82	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			10/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
63	13/01/2026	83	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			13/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
64	13/01/2026	84	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			13/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
65	13/01/2026	85	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			13/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
66	14/01/2026	86	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			14/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
67	14/01/2026	87	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			14/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
68	15/01/2026	88	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			15/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
69	15/01/2026	89	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			15/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
70	16/01/2026	90	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			16/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
71	16/01/2026	91	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			16/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
72	17/01/2026	92	Und #7,	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			17/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00


OBSERVACIONES GENERALES :


	INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
SERVACIONES GENERALE		
NOMBRE	ING. OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	ING. JULIÁN FERNANDO VILLAMIZAR DURÁN
FECHA	31/01/2026	31/01/2026

CONTROL DE PERFORACION EN CAMPO

CONTRATO	210.16225.6	PERFORADOR	ISAÍ BAUTISTA PINZÓN
LOCALIZACION OBRA	VILLA DE LOS CABALLEROS		







ITEM	FECHA PERFORACION	ANCLAJE N°	EQUIPO #	ELEMENTO	PERFORACION Ø	TIPO DE PERFORACION				FECHA INSTALACION ANCLAJE	Ø TORON	CANTIDAD TORONES	LONGITUD BULBO (ML)	LONGITUD LIBRE (ML)	LONGITUD ANCLAJE (ML)
						PASIVO	ACTIVO	MIXTO	DREN						
23	2/01/2026	93	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			2/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
24	2/01/2026	94	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			2/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
25	3/01/2026	95	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			3/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
26	5/01/2026	96	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			5/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
27	5/01/2026	97	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			5/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
28	6/01/2026	98	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			6/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
29	6/01/2026	99	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			6/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
30	7/01/2026	100	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			7/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
31	7/01/2026	101	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			7/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
32	8/01/2026	102	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			8/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
33	8/01/2026	103	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			8/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
34	9/01/2026	104	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			9/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
35	9/01/2026	105	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			9/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
36	10/01/2026	106	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			10/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
37	13/01/2026	107	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			13/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
38	13/01/2026	108	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			13/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
39	13/01/2026	109	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			13/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
40	14/01/2026	110	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			14/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
41	14/01/2026	111	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			14/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
42	15/01/2026	112	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			15/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
43	15/01/2026	113	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			15/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
44	16/01/2026	114	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			16/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
45	16/01/2026	115	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			16/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
46	17/01/2026	116	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			17/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
47	19/01/2026	117	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			19/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
48	19/01/2026	118	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			19/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
49	20/01/2026	119	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			20/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
50	21/01/2026	120	Und #11	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			21/01/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00


OBSERVACIONES GENERALES :


	INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	ING. OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	ING. JULIÁN FERNANDO VILLAMIZAR DURÁN
FECHA	31/01/2026	31/01/2026


CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRON

CONTROL DE PERFORACION EN CAMPO

CONTRATO	210.16225.6	PERFORADOR	ISAIAS GARCIA JAIMES
LOCALIZACION OBRA	VILLA DE LOS CABALLEROS		







ITEM	FECHA PERFORACION	ANCLAJE N°	EQUIPO #	ELEMENTO	PERFORACION Ø	TIPO DE PERFORACION				FECHA INSTALACION ANCLAJE	Ø TORON	CANTIDAD TORONES	LONGITUD BULBO (ML)	LONGITUD LIBRE (ML)	LONGITUD ANCLAJE (ML)
						PASIVO	ACTIVO	MIXTO	DREN						
73	2/02/2026	121	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			2/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
74	2/02/2026	122	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			2/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
75	3/02/2026	123	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			3/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
76	3/02/2026	124	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			3/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
77	4/02/2026	125	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			4/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
78	4/02/2026	126	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			4/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
79	5/02/2026	127	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			5/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
80	5/02/2026	128	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			5/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
81	6/02/2026	129	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			6/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
82	6/02/2026	130	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			6/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
83	9/02/2026	131	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			9/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
84	9/02/2026	132	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			9/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
85	9/02/2026	133	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			9/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
86	10/02/2026	134	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			10/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
87	11/02/2026	135	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			11/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
88	11/02/2026	136	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			11/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
89	12/02/2026	137	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			12/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
90	13/02/2026	138	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			13/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
91	13/02/2026	139	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			13/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
92	14/02/2026	140	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			14/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
93	16/02/2026	141	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			16/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00
94	16/02/2026	142	Und #7	PANTALLA TERRAZA 1	3 1/2"		ACTIVO			16/02/2026	1/2"	3,00	10,00	15,00	25,00

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORÍA
		
NOMBRE	ING. OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	ING. JULIÁN FERNANDO VILLAMIZAR DURÁN
FECHA	28/02/2026	28/02/2026

ANEXO 08

CONTROL DE LLENADO E INYECCIÓN DE ANCLAJES

CONTROL INYECCION DE ANCLAJES

CONTRATO:	210-16225-06	**DIAMETRO PERFORACION**	3 1/2"
LOCALIZACION OBRA:	VILLA DE LOS CABALLEROS	**MANOMETRO:**	DE GLICERINA DE O-1000

ELEMENTO	ANCLAJE N°	LLENADO			Ø REFUERZO	LONGITUD (MTS)	INYECCION				OBSERVACIONES
		CEMENTO MARCA	RELACION A/C	FECHA			SI	NO	FECHA	PRESIÓN (PSI)	
PANTALLA TERRAZA 1	47	CEMEX	0,45	9/12/2025	1/2"	25	X		12/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	46	CEMEX	0,45	9/12/2025	1/2"	25	X		12/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	45	CEMEX	0,45	9/12/2025	1/2"	25	X		12/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	44	CEMEX	0,45	9/12/2025	1/2"	25	X		12/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	43	CEMEX	0,45	9/12/2025	1/2"	25	X		12/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	42	CEMEX	0,45	10/12/2025	1/2"	25	X		13/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	41	CEMEX	0,45	10/12/2025	1/2"	25	X		13/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	40	CEMEX	0,45	10/12/2025	1/2"	25	X		13/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	39	CEMEX	0,45	10/12/2025	1/2"	25	X		13/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	38	CEMEX	0,45	10/12/2025	1/2"	25	X		13/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	37	CEMEX	0,45	11/12/2025	1/2"	25	X		15/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	36	CEMEX	0,45	11/12/2025	1/2"	25	X		15/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	35	CEMEX	0,45	11/12/2025	1/2"	25	X		15/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	34	CEMEX	0,45	11/12/2025	1/2"	25	X		15/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	33	CEMEX	0,45	11/12/2025	1/2"	25	X		15/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	32	CEMEX	0,45	12/12/2025	1/2"	25	X		16/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	31	CEMEX	0,45	12/12/2025	1/2"	25	X		16/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	30	CEMEX	0,45	12/12/2025	1/2"	25	X		16/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	29	CEMEX	0,45	12/12/2025	1/2"	25	X		16/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	28	CEMEX	0,45	12/12/2025	1/2"	25	X		16/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	27	CEMEX	0,45	15/12/2025	1/2"	25	X		18/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	26	CEMEX	0,45	15/12/2025	1/2"	25	X		18/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	25	CEMEX	0,45	15/12/2025	1/2"	25	X		18/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	24	CEMEX	0,45	15/12/2025	1/2"	25	X		18/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	23	CEMEX	0,45	15/12/2025	1/2"	25	X		18/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	22	CEMEX	0,45	16/12/2025	1/2"	25	X		19/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	21	CEMEX	0,45	16/12/2025	1/2"	25	X		19/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	20	CEMEX	0,45	16/12/2025	1/2"	25	X		19/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	19	CEMEX	0,45	16/12/2025	1/2"	25	X		19/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	18	CEMEX	0,45	16/12/2025	1/2"	25	X		19/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	17	CEMEX	0,45	17/12/2025	1/2"	25	X		20/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	16	CEMEX	0,45	17/12/2025	1/2"	25	X		20/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	15	CEMEX	0,45	17/12/2025	1/2"	25	X		20/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	14	CEMEX	0,45	17/12/2025	1/2"	25	X		20/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	13	CEMEX	0,45	17/12/2025	1/2"	25	X		20/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	12	CEMEX	0,45	18/12/2025	1/2"	25	X		22/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	11	CEMEX	0,45	18/12/2025	1/2"	25	X		22/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	10	CEMEX	0,45	18/12/2025	1/2"	25	X		22/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	9	CEMEX	0,45	18/12/2025	1/2"	25	X		22/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	144	CEMEX	0,45	18/12/2025	1/2"	25	X		22/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	8	CEMEX	0,45	19/12/2025	1/2"	25	X		22/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	7	CEMEX	0,45	19/12/2025	1/2"	25	X		22/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	6	CEMEX	0,45	19/12/2025	1/2"	25	X		22/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	5	CEMEX	0,45	19/12/2025	1/2"	25	X		22/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	4	CEMEX	0,45	19/12/2025	1/2"	25	X		22/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	3	CEMEX	0,45	22/12/2025	1/2"	25	X		26/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	2	CEMEX	0,45	22/12/2025	1/2"	25	X		26/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	1	CEMEX	0,45	22/12/2025	1/2"	25	X		26/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	143	CEMEX	0,45	22/12/2025	1/2"	25	X		26/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	48	CEMEX	0,45	22/12/2025	1/2"	25	X		26/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	49	CEMEX	0,45	23/12/2025	1/2"	25	X		26/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	50	CEMEX	0,45	23/12/2025	1/2"	25	X		26/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	51	CEMEX	0,45	23/12/2025	1/2"	25	X		26/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	52	CEMEX	0,45	23/12/2025	1/2"	25	X		26/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	53	CEMEX	0,45	23/12/2025	1/2"	25	X		26/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	54	CEMEX	0,45	26/12/2025	1/2"	25	X		29/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	55	CEMEX	0,45	26/12/2025	1/2"	25	X		29/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	56	CEMEX	0,45	26/12/2025	1/2"	25	X		29/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	57	CEMEX	0,45	26/12/2025	1/2"	25	X		29/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	58	CEMEX	0,45	26/12/2025	1/2"	25	X		29/12/2025	200	
PANTALLA TERRAZA 1	59	CEMEX	0,45	29/12/2025	1/2"	25	X		2/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	60	CEMEX	0,45	29/12/2025	1/2"	25	X		2/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	61	CEMEX	0,45	29/12/2025	1/2"	25	X		2/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	62	CEMEX	0,45	29/12/2025	1/2"	25	X		2/01/2026	200	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	ING. OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	ING. JULIÁN FERNANDO VILLAMIZAR DURÁN
FECHA	31/12/2025	31/12/2025

CONTROL INYECCION DE ANCLAJES

CONTRATO:	210-16225-06	**DIAMETRO PERFORACION**	3 1/2"
LOCALIZACION OBRA:	VILLA DE LOS CABALLEROS	**MANOMETRO:**	DE GLICERINA DE O-1000

ELEMENTO	ANCLAJE N°	LLENADO			Ø REFUERZO	LONGITUD (MTS)	INYECCION				OBSERVACIONES
		CEMENTO MARCA	RELACIÓN A/C	FECHA			SI	NO	FECHA	PRESIÓN (PSI)	
PANTALLA TERRAZA 1	63	CEMEX	0,45	2/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	64	CEMEX	0,45	2/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	65	CEMEX	0,45	2/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	66	CEMEX	0,45	2/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	67	CEMEX	0,45	2/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	68	CEMEX	0,45	2/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	69	CEMEX	0,45	2/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	70	CEMEX	0,45	2/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	71	CEMEX	0,45	3/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	72	CEMEX	0,45	5/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	73	CEMEX	0,45	5/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	74	CEMEX	0,45	6/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	75	CEMEX	0,45	6/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	76	CEMEX	0,45	7/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	77	CEMEX	0,45	7/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	78	CEMEX	0,45	8/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	79	CEMEX	0,45	8/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	80	CEMEX	0,45	9/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	81	CEMEX	0,45	9/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	82	CEMEX	0,45	10/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	83	CEMEX	0,45	13/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	84	CEMEX	0,45	13/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	85	CEMEX	0,45	13/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	86	CEMEX	0,45	14/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	87	CEMEX	0,45	14/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	88	CEMEX	0,45	15/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	89	CEMEX	0,45	15/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	90	CEMEX	0,45	16/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	91	CEMEX	0,45	16/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	92	CEMEX	0,45	17/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	93	CEMEX	0,45	2/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	94	CEMEX	0,45	2/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	95	CEMEX	0,45	3/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	96	CEMEX	0,45	5/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	97	CEMEX	0,45	5/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	98	CEMEX	0,45	6/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	99	CEMEX	0,45	6/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	100	CEMEX	0,45	7/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	101	CEMEX	0,45	7/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	102	CEMEX	0,45	8/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	103	CEMEX	0,45	8/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	104	CEMEX	0,45	9/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	105	CEMEX	0,45	9/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	106	CEMEX	0,45	10/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	107	CEMEX	0,45	13/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	108	CEMEX	0,45	13/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	109	CEMEX	0,45	13/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	110	CEMEX	0,45	14/01/2026	1/2"	25	X		16/01/2026	200	

OBSERVACIONES GENERALES :


	INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	ING. OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	ING. JULIÁN FERNANDO VILLAMIZAR DURÁN
FECHA	31/01/2026	31/01/2026

CONTROL INYECCION DE ANCLAJES

CONTRATO:	210-16225-06	**DIAMETRO PERFORACION**	3 1/2"
LOCALIZACION OBRA:	VILLA DE LOS CABALLEROS	**MANOMETRO:**	DE GLICERINA DE O-1000

ELEMENTO	ANCLAJE N°	LLENADO			Ø REFUERZO	LONGITUD (MTS)	INYECCION				OBSERVACIONES
		CEMENTO MARCA	RELACION A/C	FECHA			SI	NO	FECHA	PRESIÓN (PSI)	
PANTALLA TERRAZA 1	111	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		16/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	112	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		16/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	113	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		16/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	114	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		16/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	115	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		16/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	116	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		16/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	117	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		16/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	118	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		16/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	119	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		16/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	120	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		16/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	121	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		16/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	122	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		16/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	123	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		16/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	124	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		16/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	125	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	126	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	127	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	128	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	129	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	130	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	131	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	132	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	133	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	134	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	135	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	136	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	137	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	138	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	139	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	140	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	141	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	
PANTALLA TERRAZA 1	142	CEMEX	0,45	13/02/2026	1/2"	25	X		17/02/2026	200	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	ING. OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	ING. JULIÁN FERNANDO VILLAMIZAR DURÁN
FECHA	28/02/2026	28/02/2026

ANEXO 09

CONTROL DE TENSIONAMIENTO


CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONTROL TENSIONAMIENTO ANCLAJES

FECHA:	14/04/2026	**EQUIPO:**	REV DRILL	**CALIBRE TORON:**	1/2"
OBRA:	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON	**MANOMETRO:**	MICRO PRE TEMP-MEC 164129J	**CARGA TENSION (Ton)**	10 TON
LOCALIZACION OBRA:	VILLA DE LOS CABALLEROS	**CERTIFICADO CALIBRACION:**	372A	**CARGA TENSION (PSI)**	3547,80

ESQUEMA ANCLAJE

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"

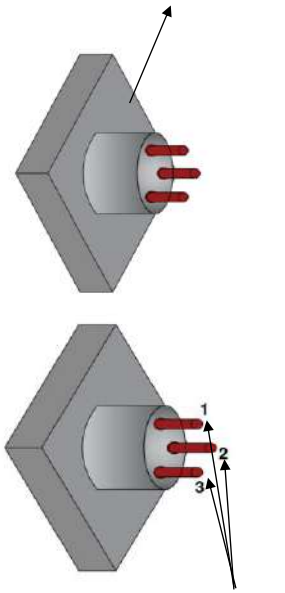


GUAYA TORON 1/2"


FECHA	ELEMENTO	N° ANCLAJE	CARGA DE TENSION %	N° CABLE	LONGITUD LIBRE (mts)	LONGITUD BULBO (mts)	LONGITUD TOTAL (mts)	ELONGACION TEORICA (cm)	ELONGACION FISICA (cm)	OBSERVACIONES
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	1	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,2	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	2	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	3	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	4	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	5	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	6	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	7	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	8	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	144	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	9	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	JULIÁN VILLAMIZAR

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"



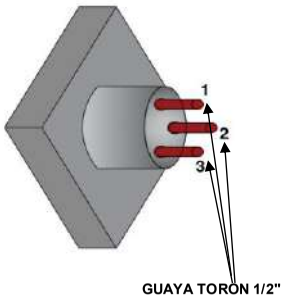


GUAYA TORON 1/2"


9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	10	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	11	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	12	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	13	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	14	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	15	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	16	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	17	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	18	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	19	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	1,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	20	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	21	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	9,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	22	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	JULIÁN VILLAMIZAR
FECHA	10/04/2026	10/04/2026

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"





GUAYA TORON


9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	23	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	24	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	25	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	26	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	27	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	1,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	28	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	29	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	30	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	31	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	32	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	33	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	34	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	35	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	1,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	


OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	JULIÁN VILLAMIZAR
FECHA	10/04/2026	10/04/2026

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUATA TORON 1/2"


9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	36	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	37	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	38	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	39	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	40	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	41	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	42	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	43	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	44	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	45	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	46	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	144	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,8	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,7	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,4	
9/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	48	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	JULIÁN VILLAMIZAR
FECHA	10/04/2026	10/04/2026

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	49	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	50	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	52	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	53	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	54	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	55	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	1,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	56	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	57	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	58	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	59	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	60	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	61	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	62	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**JULIÁN VILLAMIZAR**
FECHA	**11/04/2026**	**11/04/2026**

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	63	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	64	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	65	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	66	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,2	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	67	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	68	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	69	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	70	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	71	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	72	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	73	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
10/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	74	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**JULIÁN VILLAMIZAR**
FECHA	**11/04/2026**	**11/04/2026**

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	75	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	76	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	1,5	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	77	100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	78	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	79	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	80	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	81	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	82	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	83	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	84	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	85	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	86	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	10,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
11/04/2026	VILLA DE LOS CABALLEROS	87	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	JULIÁN VILLAMIZAR
FECHA	13/04/2026	13/04/2026

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	88	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	89	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	90	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	91	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	92	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	93	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	94	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	95	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	96	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	97	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	98	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	99	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	100	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	2,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**JULIÁN VILLAMIZAR**
FECHA	**13/04/2026**	**13/04/2026**

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	101	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	102	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	103	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	104	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	105	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	106	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,3	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	107	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	108	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	109	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	110	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	111	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	112	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	113	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	**OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ**	**JULIÁN VILLAMIZAR**
FECHA	**13/04/2026**	**13/04/2026**

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"






GUAYA TORON 1/2"


13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	114	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	115	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	116	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	117	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,3	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	118	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	119	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	120	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	121	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	122	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	123	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	124	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	9,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	125	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	126	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	2,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	JULIÁN VILLAMIZAR
FECHA	14/04/2026	14/04/2026

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"





GUAYA TORON 1/2"


14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	127	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	8,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	128	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	129	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	3,5	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	130	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	131	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	132	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	133	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	134	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,5	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	135	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	3,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	136	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	137	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	4,5	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	4,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	138	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	139	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	6,5	


OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	JULIÁN VILLAMIZAR
FECHA	14/04/2026	14/04/2026

14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	140	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
14/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	141	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	8,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	7,5	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	7,0	
13/04/2025	VILLA DE LOS CABALLEROS	142	100%	1	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	2	15,0	10,0	25,0	5,80	6,0	
			100%	3	15,0	10,0	25,0	5,80	5,0	

PLATINA 20 cms x 20 cm ESPESOR 5/8"

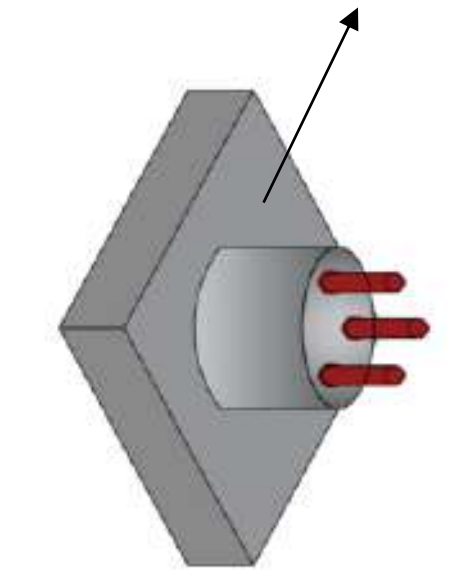

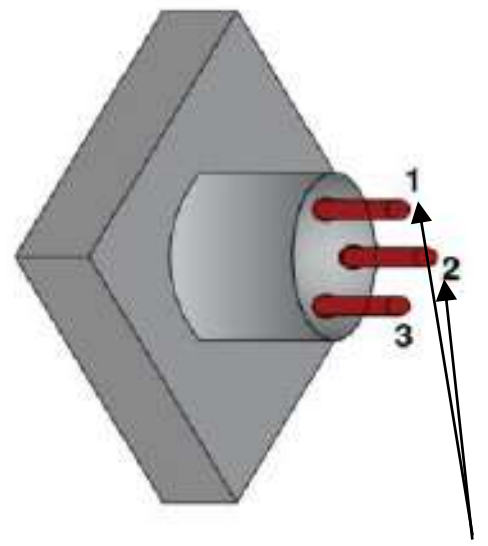

GUAYA TORON 1/2"

OBSERVACIONES GENERALES :

	INGENIERO RESIDENTE CONSTRATISTA	INGENIERA RESIDENTE INTERVENTORIA
FIRMA		
NOMBRE	OSCAR ANDRES SANCHEZ JEREZ	JULIÁN VILLAMIZAR
FECHA	14/04/2026	14/04/2026

ANEXO 10


RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

FECHA	**10/07/2024**	**ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRAULICO NTC 220-2022**		**N° DE ORDEN**	4-1
CODIGO	**CCU-1**			**FECHA DE INGRESO**	20/01/2026
VERSION	**3**			**CODIGO CLIENTE**	INTERGIRÓN

CLIENTE	**CONSORCIO INTER GIRÓN**	**NIT CLIENTE**	**901985184-1**	**RESISTENCIA ESPERADA (PSI)**	3000	**FRENTE DE OBRA**	VILLA DE LOS CABALLEROS
PROYECTO	CONTRATO N. 210.16228.4 DEL 08 SEPTIEMBRE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 4: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER".			**DIAMETRO (")**	4		

# DE CILINDRO		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
FECHA DE FUNDIDA		15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026		
FECHA DE ENSAYO		22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	22/01/2026	29/01/2026	12/02/2026	23/01/2026	30/01/2026	13/02/2026		
IDENTIFICACION		LLENADO DE LECHADA CEMENTICIA			LLENADO DE LECHADA CEMENTICIA			INYECCION DE LECHADA CEMENTICIA				
EDAD (DIAS)		7	14	28	7	14	28	7	14	28		
AREA (mm^2)		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500		
CARGA MAXIMA (N)		41290	48681	55005	37924	46968	54444	39815	49697	53547		
RESISTENCIA ESPECIFICADA (MPa)		20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70		
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	**(MPa)**	16.52	19.47	22.00	15.17	18.79	21.78	15.93	19.88	21.42		
	(PSI)	2395.45	2824.24	3191.13	2200.17	2724.86	3158.58	2309.88	2883.18	3106.54		
	(kg/cm2)	168.42	198.56	224.36	154.69	191.58	222.07	162.40	202.71	218.41		
RESISTENCIA %		79.79	94.07	106.29	73.28	90.76	105.21	76.94	96.03	103.47		

OBSERVACIONES	LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
	LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, FECHA DE ENSAYO, RESISTENCIA ESPERADA, ES INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE.


REVISÓ	RICARDO ANDRES QUIROS	**FIRMA**	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO		
APROBÓ	ANDRES LEONARDO BONILLA GOMEZ	**FIRMA**	
CARGO	GEOTECNISTA - DIRECTOR DE LABORATORIO		

FECHA	10/07/2024	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRAULICO NTC 220-2022		N° DE ORDEN	4-2
CODIGO	CCU-1			FECHA DE INGRESO	25/01/2026
VERSION	3			CODIGO CLIENTE	INTERGIRÓN

CLIENTE	CONSORCIO INTER GIRÓN	NIT CLIENTE	901985184-1	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	3000	FRENTE DE OBRA: VILLA DE LOS CABALLEROS
PROYECTO	CONTRATO N. 210.16228.4 DEL 08 SEPTIEMBRE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 4: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER".			DIAMETRO (")	4	

# DE CILINDRO		1	2	3	4	5	6					
FECHA DE FUNDIDA		20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026					
FECHA DE ENSAYO		27/01/2026	3/02/2026	17/02/2026	28/01/2026	4/02/2026	18/02/2026					
IDENTIFICACION		LLENADO DE LECHADA CEMENTICIA			INYECCION DE LECHADA CEMENTICIA							
EDAD (DIAS)		7	14	28	7	14	28					
AREA (mm^2)		2500	2500	2500	2500	2500	2500					
CARGA MAXIMA (N)		36057	47754	52319	37433	47282	53119					
RESISTENCIA ESPECIFICADA (MPa)		20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	(MPa)	14.42	19.10	20.93	14.97	18.91	21.25					
	(PSI)	2091.85	2770.46	3035.30	2171.68	2743.07	3081.71					
	(kg/cm2)	147.07	194.78	213.40	152.68	192.86	216.67					
RESISTENCIA %		69.68	92.28	101.10	72.33	91.37	102.65					

OBSERVACIONES	LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
	LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, FECHA DE ENSAYO, RESISTENCIA ESPERADA, ES INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE.


REVISÓ	RICARDO ANDRES QUIROS	FIRMA	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO		
APROBÓ	ANDRES LEONARDO BONILLA GOMEZ	FIRMA	
CARGO	GEOTECNISTA - DIRECTOR DE LABORATORIO		

FECHA	10/07/2024	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRAULICO NTC 220-2022		N° DE ORDEN	4-3
CODIGO	CCU-1			FECHA DE INGRESO	18/02/2026
VERSION	3			CODIGO CLIENTE	INTERGIRÓN

CLIENTE	CONSORCIO INTER GIRÓN	NIT CLIENTE	901985184-1	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	3000	FRENTE DE OBRA	VILLA DE LOS CABALLEROS
PROYECTO	CONTRATO N. 210.16228.4 DEL 08 SEPTIEMBRE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 4: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER".			DIAMETRO (")	4		

# DE CILINDRO		1	2	3								
FECHA DE FUNDIDA		13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026								
FECHA DE ENSAYO		20/02/2026	27/02/2026	13/03/2026								
IDENTIFICACION		LLENADO DE LECHADA CEMENTICIA										
EDAD (DIAS)		7	14	28								
AREA (mm^2)		2500	2500	2500								
CARGA MAXIMA (N)		45805	53146	57655								
RESISTENCIA ESPECIFICADA (MPa)		20.70	20.70	20.70								
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	(MPa)	18.32	21.26	23.06								
	(PSI)	2657.39	3083.28	3344.87								
	(kg/cm2)	186.83	216.78	235.17								
RESISTENCIA %		88.51	102.70	111.41								

OBSERVACIONES	LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
	LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, FECHA DE ENSAYO, RESISTENCIA ESPERADA, ES INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE.


REVISÓ	RICARDO ANDRES QUIROS	FIRMA	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO		
APROBÓ	ANDRES LEONARDO BONILLA GOMEZ	FIRMA	
CARGO	GEOTECNISTA - DIRECTOR DE LABORATORIO		

FECHA	10/07/2024	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRAULICO NTC 220-2022		N° DE ORDEN	4-4
CODIGO	CCU-1			FECHA DE INGRESO	21/02/2026
VERSION	3			CODIGO CLIENTE	INTERGIRÓN

CLIENTE	CONSORCIO INTER GIRÓN	NIT CLIENTE	901985184-1	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	3000	FRENTE DE OBRA: VILLA DE LOS CABALLEROS
PROYECTO	CONTRATO N. 210.16228.4 DEL 08 SEPTIEMBRE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 4: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER".			DIAMETRO (")	4	

# DE CILINDRO		1	2	3	4	5	6					
FECHA DE FUNDIDA		16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026					
FECHA DE ENSAYO		23/02/2026	2/03/2026	16/03/2026	24/02/2026	3/03/2026	17/03/2026					
IDENTIFICACION		INYECCION DE LECHADA CEMENTICIA			INYECCION DE LECHADA CEMENTICIA							
EDAD (DIAS)		7	14	28	7	14	28					
AREA (mm^2)		2500	2500	2500	2500	2500	2500					
CARGA MAXIMA (N)		42819	54697	60009	43920	49219	57672					
RESISTENCIA ESPECIFICADA (MPa)		20.70	20.70	20.70	20.70	20.70	20.70					
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	(MPa)	17.13	21.88	24.00	17.57	19.69	23.07					
	(PSI)	2484.15	3173.26	3481.43	2548.03	2855.45	3345.85					
	(kg/cm2)	174.65	223.10	244.77	179.14	200.76	235.24					
RESISTENCIA %		82.74	105.69	115.96	84.87	95.11	111.44					

OBSERVACIONES	LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
	LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, FECHA DE ENSAYO, RESISTENCIA ESPERADA, ES INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE.


REVISÓ	RICARDO ANDRES QUIROS	FIRMA	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO		
APROBÓ	ANDRES LEONARDO BONILLA GOMEZ	FIRMA	
CARGO	GEOTECNISTA - DIRECTOR DE LABORATORIO		

FECHA	10/07/2024	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E-410-13		N° DE ORDEN	5-1
CODIGO	CCil-1			FECHA DE INGRESO	9/03/2026
VERSION	3			CODIGO CLIENTE	INTERGIRÓN

CLIENTE	CONSORCIO INTER GIRÓN	NIT CLIENTE	901985184-1	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	3000	FRENTE DE OBRA	VILLA DE LOS CABALLEROS
PROYECTO	CONTRATO N. 210.16228.4 DEL 08 SEPTIEMBRE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 4: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER".			DIAMETRO (")	4		

# DE CILINDRO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ORIGEN DE MUESTRA		CONCRETO LANZADO	CONCRETO LANZADO	CONCRETO LANZADO								
FECHA DE FUNDIDA		3/03/2026	3/03/2026	3/03/2026								
FECHA DE ENSAYO		10/03/2026	17/03/2026	31/03/2026								
EDAD (DIAS)		7	14	28								
CARGA ESPERADA (kg/cm2)		210.921	210.921	210.921								
AREA TOTAL (cm^2)		81.07	81.07	81.07								
RESULTADOS	CARGA APLICADA (KN)	127	157	173								
	CARGA APLICADA (kgf)	12950.44	16009.60	17641.16								
	CARGA APLICADA (kgf/cm^2)	159.74	197.47	217.60								
	CARGA APLICADA (PSI)	2272.00	2808.69	3094.92								
	CARGA APLICADA (Mpa)	15.66	19.37	21.34								
	RESISTENCIA %	75.7%	93.6%	103.2%								
TIPO DE FRACTURA		3	4	4								
		Fisuras verticales encolumnadas a través de ambos extremos, conos mal formados	Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos, se debe golpear con martillo para distinguir del tipo 1	Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos, se debe golpear con martillo para distinguir del tipo 1								

OBSERVACIONES	LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
	LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, FECHA DE ENSAYO, RESISTENCIA ESPERADA, ES INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE.


REVISÓ	RICARDO ANDRES QUIROS	FIRMA	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO		
APROBÓ	ANDRES LEONARDO BONILLA GOMEZ	FIRMA	
CARGO	GEOTECNISTA - DIRECTOR DE LABORATORIO		

FECHA	**10/07/2024**	**ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E-410-13**		**N° DE ORDEN**	5-2
CODIGO	**CCil-1**			**FECHA DE INGRESO**	9/03/2026
VERSION	**3**			**CODIGO CLIENTE**	INTERGIRÓN

CLIENTE	**CONSORCIO INTER GIRÓN**	**NIT CLIENTE**	**901985184-1**	**RESISTENCIA ESPERADA (PSI)**	3000	**FRENTE DE OBRA**	VILLA DE LOS CABALLEROS
PROYECTO	CONTRATO N. 210.16228.4 DEL 08 SEPTIEMBRE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 4: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER".			**DIAMETRO (")**	4		

# DE CILINDRO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ORIGEN DE MUESTRA		CONCRETO LANZADO Y CANALETA	CONCRETO LANZADO Y CANALETA	CONCRETO LANZADO Y CANALETA								
FECHA DE FUNDIDA		4/03/2026	4/03/2026	4/03/2026								
FECHA DE ENSAYO		11/03/2026	18/03/2026	1/04/2026								
EDAD (DIAS)		7	14	28								
CARGA ESPERADA (kg/cm2)		210.921	210.921	210.921								
AREA TOTAL (cm^2)		81.07	81.07	81.07								
RESULTADOS	**CARGA APLICADA (KN)**	143	162	174								
	CARGA APLICADA (kgf)	14582.00	16519.46	17743.13								
	CARGA APLICADA (kgf/cm^2)	179.86	203.76	218.85								
	CARGA APLICADA (PSI)	2558.23	2898.14	3112.81								
	CARGA APLICADA (Mpa)	17.64	19.98	21.46								
	RESISTENCIA %	85.3%	96.6%	103.8%								
TIPO DE FRACTURA		4	4	3								
		Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos, se debe golpear con martillo para distinguir del tipo 1	Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos, se debe golpear con martillo para distinguir del tipo 1	Fisuras verticales encolumnadas a través de ambos extremos, conos mal formados								

OBSERVACIONES	LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
	LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, FECHA DE ENSAYO, RESISTENCIA ESPERADA, ES INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE.


REVISÓ	RICARDO ANDRES QUIROS	**FIRMA**	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO		
APROBÓ	ANDRES LEONARDO BONILLA GOMEZ	**FIRMA**	
CARGO	GEOTECNISTA - DIRECTOR DE LABORATORIO		

FECHA	10/07/2024	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E-410-13		N° DE ORDEN	5-3
CODIGO	CCil-1			FECHA DE INGRESO	10/03/2026
VERSION	3			CODIGO CLIENTE	INTERGIRÓN

CLIENTE	CONSORCIO INTER GIRÓN	NIT CLIENTE	901985184-1	RESISTENCIA ESPERADA (PSI)	3000	FRENTE DE OBRA	VILLA DE LOS CABALLEROS
PROYECTO	CONTRATO N. 210.16228.4 DEL 08 SEPTIEMBRE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 4: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER".			DIAMETRO (")	4		

# DE CILINDRO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ORIGEN DE MUESTRA		CONCRETO LANZADO	CONCRETO LANZADO	CONCRETO LANZADO								
FECHA DE FUNDIDA		5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026								
FECHA DE ENSAYO		12/03/2026	19/03/2026	2/04/2026								
EDAD (DIAS)		7	14	28								
CARGA ESPERADA (kg/cm2)		210.921	210.921	210.921								
AREA TOTAL (cm^2)		81.07	81.07	81.07								
RESULTADOS	CARGA APLICADA (KN)	152	163	180								
	CARGA APLICADA (kgf)	15499.74	16621.44	18354.96								
	CARGA APLICADA (kgf/cm^2)	191.18	205.02	226.40								
	CARGA APLICADA (PSI)	2719.24	2916.03	3220.15								
	CARGA APLICADA (Mpa)	18.75	20.11	22.2								
	RESISTENCIA %	90.6%	97.2%	107.3%								
TIPO DE FRACTURA		4	4	4								
		Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos, se debe golpear con martillo para distinguir del tipo 1	Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos, se debe golpear con martillo para distinguir del tipo 1	Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos, se debe golpear con martillo para distinguir del tipo 1								

OBSERVACIONES	LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
	LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, FECHA DE ENSAYO, RESISTENCIA ESPERADA, ES INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE.


REVISÓ	RICARDO ANDRES QUIROS	FIRMA	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO		
APROBÓ	ANDRES LEONARDO BONILLA GOMEZ	FIRMA	
CARGO	GEOTECNISTA - DIRECTOR DE LABORATORIO		

FECHA	**10/07/2024**	**ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E-410-13**		**N° DE ORDEN**	5-4
CODIGO	**CCil-1**			**FECHA DE INGRESO**	11/03/2026
VERSION	**3**			**CODIGO CLIENTE**	INTERGIRÓN

CLIENTE	**CONSORCIO INTER GIRÓN**	**NIT CLIENTE**	**901985184-1**	**RESISTENCIA ESPERADA (PSI)**	3000	**FRENTE DE OBRA**	VILLA DE LOS CABALLEROS
PROYECTO	CONTRATO N. 210.16228.4 DEL 08 SEPTIEMBRE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 4: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER".			**DIAMETRO (")**	4		

# DE CILINDRO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ORIGEN DE MUESTRA		CONCRETO LANZADO	CONCRETO LANZADO	CONCRETO LANZADO								
FECHA DE FUNDIDA		6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026								
FECHA DE ENSAYO		13/03/2026	20/03/2026	3/04/2026								
EDAD (DIAS)		7	14	28								
CARGA ESPERADA (kg/cm2)		210.921	210.921	210.921								
AREA TOTAL (cm^2)		81.07	81.07	81.07								
RESULTADOS	**CARGA APLICADA (KN)**	158	163	172								
	CARGA APLICADA (kgf)	16111.58	16621.44	17539.18								
	CARGA APLICADA (kgf/cm^2)	198.73	205.02	216.34								
	CARGA APLICADA (PSI)	2826.58	2916.03	3077.04								
	CARGA APLICADA (Mpa)	19.49	20.11	21.22								
	RESISTENCIA %	94.2%	97.2%	102.6%								
TIPO DE FRACTURA		3	3	4								
		Fisuras verticales encolumnadas a través de ambos extremos, conos mal formados	Fisuras verticales encolumnadas a través de ambos extremos, conos mal formados	Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos, se debe golpear con martillo para distinguir del tipo 1								

OBSERVACIONES	LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
	LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, FECHA DE ENSAYO, RESISTENCIA ESPERADA, ES INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE.

REVISÓ	RICARDO ANDRES QUIROS	**FIRMA**	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO		
APROBÓ	ANDRES LEONARDO BONILLA GOMEZ	**FIRMA**	
CARGO	GEOTECNISTA - DIRECTOR DE LABORATORIO		

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-043
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO A LA COMPRESIÓN, USANDO CUBOS DE 50 MM O 2 PULGADAS DE LADO. NTC 220-2022	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	5
		Página 2 de 2	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE - FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACION DEL CLIENTE
18/02/2026	2	22/01/2026	011-26	VILLA DE LOS CABALLEROS	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON consolidacion.giron@gmail.com

N° ID DEL CUBO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	IDENTIFICACIÓN DEL CUBO	LARGO	ANCHO	ÁREA	ALTURA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% RESISTENCIA
					(mm)	(mm)	(mm^2)	(mm)	(g)	(g/mm^3)	(N)	(Mpa)	(MPa)	(PSI)	(kg/cm^2)	ESPECIFICADA
3	20/01/2026	27/01/2026	7	LLENADO DE LECHADA CEMENTICIA	52,33	50,01	2617	50,81	261,6	1,967	38130	20,7	14,6	2113	148,6	70%
3,1	20/01/2026	3/02/2026	14		51,98	50,80	2641	50,41	256,4	1,926	50270	20,7	19,0	2761	194,1	92%
3,2	20/01/2026	17/02/2026	28		52,1	52,44	2730	53,45	253,0	1,734	56630	20,7	20,7	3009	211,5	100%
4	21/01/2026	28/01/2026	7	INYECCIÓN DE LECHADA CEMENTICIA	52,43	52,27	2741	52,10	272,8	1,911	40060	20,7	14,6	2120	149,1	71%
4,1	21/01/2026	4/02/2026	14		51,99	52,57	2733	51,41	266,0	1,893	51260	20,7	18,8	2720	191,3	91%
4,2	21/01/2026	18/02/2026	28		52,0	52,14	2710	52,27	276,6	1,953	57280	20,7	21,1	3066	215,6	102%

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INTALACIONES DEL LABORATORIO.

- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

-LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
			
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE:	MARTHA LILIANA BAYONA
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO:	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.

FIN DEL INFORME

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-043
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO A LA COMPRESIÓN, USANDO CUBOS DE 50 MM O 2 PULGADAS DE LADO. NTC 220-2022	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	5
		Página 1 de 1	

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE - FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACION DEL CLIENTE
17/03/2026	1	19/02/2026	035-26	VILLA DE LOS CABALLEROS	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON consolidacion.giron@gmail.com


N° ID DEL CUBO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	IDENTIFICACIÓN DEL CUBO	LARGO	ANCHO	ÁREA	ALTURA	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			% RESISTENCIA
					(mm)	(mm)	(mm^2)	(mm)	(g)	(g/mm^3)	(N)	(Mpa)	(MPa)	(PSI)	(kg/cm^2)	ESPECIFICADA
1	13/02/2026	20/02/2026	7	LLENADO DE LECHADA CEMENTICIA	52,05	52,54	2735	52,63	280,6	1,950	42510	20,7	15,5	2255	158,5	75%
1,1	13/02/2026	27/02/2026	14		50,59	52,25	2643	52,28	296,0	2,142	55090	20,7	20,8	3023	212,5	101%
1,2	13/02/2026	13/03/2026	28		52,1	52,62	2743	52,12	292,0	2,043	61640	20,7	22,5	3260	229,2	109%
2	16/02/2026	23/02/2026	7	INYECCIÓN DE LECHADA CEMENTICIA	52,26	52,17	2726	52,27	274,6	1,927	43950	20,7	16,1	2338	164,4	78%
2,1	16/02/2026	2/03/2026	14		52,28	52,26	2732	52,28	293,0	2,051	60400	20,7	22,1	3206	225,4	107%
2,2	16/02/2026	16/03/2026	28		52,08	52,43	2731	52,18	278,0	1,951	87280	20,7	32,0	4636	325,9	154%
3	17/02/2026	24/02/2026	7	INYECCIÓN DE LECHADA CEMENTICIA	52,39	52,41	2746	52,47	295,6	2,052	42520	20,7	15,5	2246	157,9	75%
3,1	17/02/2026	3/03/2026	14		52,30	52,04	2722	52,38	277,0	1,943	53190	20,7	19,5	2834	199,3	94%
3,2	17/02/2026	17/03/2026	28		52,3	52,09	2725	52,03	299,0	2,109	61190	20,7	22,5	3256	228,9	108%

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INTALACIONES DEL LABORATORIO.

- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.

-LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
			
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE:	MARTHA LILIANA BAYONA
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO:	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.

Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.


FIN DEL INFORME

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	6
		Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
31/03/2026	1	4/03/2026	052-26	VILLA DE LOS CABALLEROS	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON consolidacion.giron@gmail.com

# ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONDITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(mm^2)				(g)	(kg/m^3)		(MPa)	(MPa)	(kg/cm^2)	(PSI)	
1	3/03/2026	10/03/2026	7	LANZADO	149,44	151,64	150,54	300	299	299	300	17799	2,0	1,00	NO PRESENTA	12186	2290	253,11	20,7	14,2	144	2054	3
1,1	3/03/2026	17/03/2026	14		150,20	151,66	150,93	298	297	297	297	17891	2,0	1,00	NO PRESENTA	12137	2280	349,59	20,7	19,5	198	2823	3
1,2	3/03/2026	31/03/2026	28		149,64	151,47	150,56	299	299	298	299	17802	2,0	1,00	NO PRESENTA	12294	2310	386,78	20,7	21,6	221	3139	4



Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos



Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.




Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a traves de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrendar).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
			
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	MARTHA LILIANA BAYONA ORTIZ
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.
Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.


FIN DEL INFORME

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	6
		Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
4/04/2026	1	5/03/2026	053-26	VILLA DE LOS CABALLEROS	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON consolidacion.giron@gmail.com

# ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONDITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(mm^2)				(g)	(kg/m^3)		(MPa)	(MPa)	(kg/cm^2)	(PSI)	
1	4/03/2026	11/03/2026	7	LANZADO CANALETA	150,17	150,78	150,48	301	301	302	301	17784	2,0	1,00	NO PRESENTA	12204	2280	250,07	20,7	14,1	143	2040	4
1,1	4/03/2026	18/03/2026	14		149,46	151,76	150,61	300	299	300	300	17815	2,0	1,00	NO PRESENTA	12153	2280	328,02	20,7	18,3	187	2660	4
1,2	4/03/2026	1/04/2026	28		151,65	151,84	151,75	300	299	299	299	18085	2,0	1,00	NO PRESENTA	12183	2250	394,11	20,7	21,7	221	3148	4



Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos



Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.




Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a traves de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrendar).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	MARTHA LILIANA BAYONA ORTIZ
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.
Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.


FIN DEL INFORME

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	6
		Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
4/04/2026	1	6/03/2026	057-26	VILLA DE LOS CABALLEROS	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON consolidacion.giron@gmail.com

# ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONDITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(mm^2)				(g)	(kg/m^3)		(MPa)	(MPa)	(kg/cm^2)	(PSI)	
1	5/03/2026	12/03/2026	7	LANZADO	150,40	151,00	150,70	301	302	302	302	17837	2,0	1,00	NO PRESENTA	12228	2270	279,36	20,7	15,7	160	2272	4
1,1	5/03/2026	19/03/2026	14		150,69	150,86	150,78	303	302	302	302	17855	2,0	1,00	NO PRESENTA	12290	2280	342,21	20,7	19,2	195	2780	4
1,2	5/03/2026	2/04/2026	28		149,95	150,69	150,32	301	302	301	302	17747	2,0	1,00	NO PRESENTA	12297	2300	434,00	99,0	24,5	249	3547	4



Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos



Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.




Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a traves de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrendar).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	MARTHA LILIANA BAYONA ORTIZ
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.
Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.


FIN DEL INFORME

	FORMATO DE GESTIÓN DE LABORATORIO	CÓDIGO	FT-GL-044
HSC HIDROSUELOS DE COLOMBIA	INFORME DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410 - 13	FECHA	9/06/2025
		VERSIÓN	6
		Página 1 de 1	


LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE KM 7 + 400 M ANILLO VIAL PALENQUE, DIAGONAL FLORIDABLANCA N° 22-31. BODEGA 16 - PISO 1, GIRON, SANTANDER, COLOMBIA.

FECHA DE INFORME	N° DE INFORME	FECHA DE INGRESO DE LA MUESTRA	N° DE ORDEN DE SERVICIO	FRENTE DE OBRA	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
4/04/2026	1	9/03/2026	058-26	VILLA DE LOS CABALLEROS	CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRON consolidacion.giron@gmail.com

# ID DEL CILINDRO	FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	ELEMENTO	DIÁMETRO (mm)			LONGITUD (mm)				ÁREA	RELACIÓN LONDITUD / DIÁMETRO	FACTOR DE CORRECCIÓN	DEFECTOS EN EL ESPÉCIMEN	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁXIMA	RESISTENCIA ESPERADA POR EL CLIENTE	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			PATRÓN DE FRACTURA
			(DÍAS)		Diámetro 1	Diámetro 2	Promedio	longitud 1	longitud 2	longitud 3	Promedio	(mm^2)				(g)	(kg/m^3)		(MPa)	(MPa)	(kg/cm^2)	(PSI)	
1	6/03/2026	13/03/2026	7	LANZADO	151,84	151,96	151,90	299	298	298	298	18122	2,0	1,00	NO PRESENTA	121253	22420	245,35	20,7	13,5	138	1956	4
1,1	6/03/2026	20/03/2026	14		150,58	150,60	150,59	298	297	297	297	17811	2,0	1,00	NO PRESENTA	11899	2250	321,35	20,7	18,0	183	2606	4
1,2	6/03/2026	3/04/2026	28		150,72	150,88	150,80	301	301	301	301	17860	2,0	1,00	NO PRESENTA	12130	2250	374,84	20,7	20,9	213	3032	4



Tipo 1
Conos razonablemente bien formados en ambos extremos



Tipo 2
Conos bien formados en un extremo pero no en el otro. Grietas verticales que llegan a los extremos.




Tipo 3
Agrietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos. No hay conos bien formados.



Tipo 4
Fractura diagonal sin grietas a traves de los extremos. Se debe golpear con martillo para distinguirlo del tipo 1.



Tipo 5
Fracturas en las esquinas (usuales en cilindros sin refrendar).



Tipo 6
Similar al tipo 5, pero las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro.

OBSERVACIONES

- ESTE ENSAYO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO.
- INFORMACIÓN DEL CONCRETO: EL CLIENTE NO SUMINISTRÓ ESTA INFORMACIÓN.
- LOS RESULTADOS DE ESTE INFORME CORRESPONDEN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS.
- LOS DATOS DE FECHA DE TOMA, INFORMACIÓN DEL CONCRETO, ELEMENTO Y RESISTENCIA ESPERADA CORRESPONDEN A INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. CUALQUIER OTRO DATO SUMINISTRADO POR ESTE SE INCLUIRÁ Y SE IDENTIFICARÁ EN EL INFORME CON EL CARÁCTER (*). HIDROSUELOS DE COLOMBIA S.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE INCLUIDA EN ESTE INFORME Y QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE	WILLIAM EDUARDO CORTES	NOMBRE	MARTHA LILIANA BAYONA ORTIZ
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIO	CARGO	GERENTE

Queda totalmente prohibida la reproducción parcial de este informe sin la previa autorización de HIDROSUELOS DE COLOMBIA SAS.
Este documento es valido cuando lleve la firma de quien lo revisó y lo aprobó.

FIN DEL INFORME

ANEXO 11

MANUAL DE MANTENIMIENTO DE OBRA

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

MANUAL DE MANTENIMIENTO



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.210-16225-6

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN		
ELABORADO POR: CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN	REVISADO POR: ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO RL CONTRATISTA	APROBADO POR: ING.: IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ RL INTERVENTORÍA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 5
3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 6
3.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4. GLOSARIO DE TERMINOS 7
5. FICHA DE MANTENIMIENTO 9
6. CONCLUSIONES 16


1. INTRODUCCIÓN

En el presente manual se describen las actividades a realizar para facilitar la conservación y mantenimiento de las obras de intervención correctivas requeridas para mitigar el riesgo por movimiento en masa que harán parte integral de la construcción de pantallas ancladas en el barrio villa de los caballeros. Se busca informar el cuidado adecuado de las obras de infraestructura para el control de erosión, con el fin de mantener y/o prolongar su vida útil, manejando conceptos tales como uso, deterioro, conservación y mantenimiento, así como las acciones necesarias para su adecuada ejecución en sus tiempos idóneos, identificando a su vez a los responsables implicados de su mantenimiento. Lo anterior se realiza con el fin de generar un desarrollo integral, un impacto benéfico para la infraestructura de los espacios intervenidos y que a su vez genera un gran apoyo a la comunidad aledaña.

El municipio de Girón se encuentra altamente poblado por lo cual ha obligado a la población a migrar y construir en las zonas que presentan amenazas por movimientos en masa, erosión e inundación; por tal motivo y en miras de proteger a la comunidad presente en dichos sectores se realizó la evaluación de los factores de amenaza con el fin de controlar los problemas que se puedan presentar, de acuerdo a lo anterior se adelantó un sistema de estabilización tipo pantalla anclada, mediante la instalación de anclajes activos de 25m de longitud que introducen estados de tensiones, esfuerzos y deformaciones, mejorando la estabilidad general del terreno, adicionalmente se realizan actividades de suministro e instalación de concreto lanzado de 10cm de espesor que protege contra los efectos erosivos. Una vez realizada la actividad se espera 30 días para el debido curado del concreto y así poder finalizar con el tensionamiento en los anclajes previamente instalados, aplicando una carga admisible de 30 Ton, garantizando así su debido confinamiento.

Para ejecutar lo descrito anteriormente, la administración municipal proyecto los trabajos y gestiono los recursos ante la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA CDMB, quien a su vez suscribió el Contrato de Obra No 210.16225.6 cuyo objeto es "**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

Se muestra a continuación el esquema de distribución de cada uno de los anclajes y componentes que hacen parte del frente de obra **VILLA DE LOS CABALERROS**, con el objetivo de cumplir cabalmente el objeto de este contrato y cuya ejecución lidero el **CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN.**

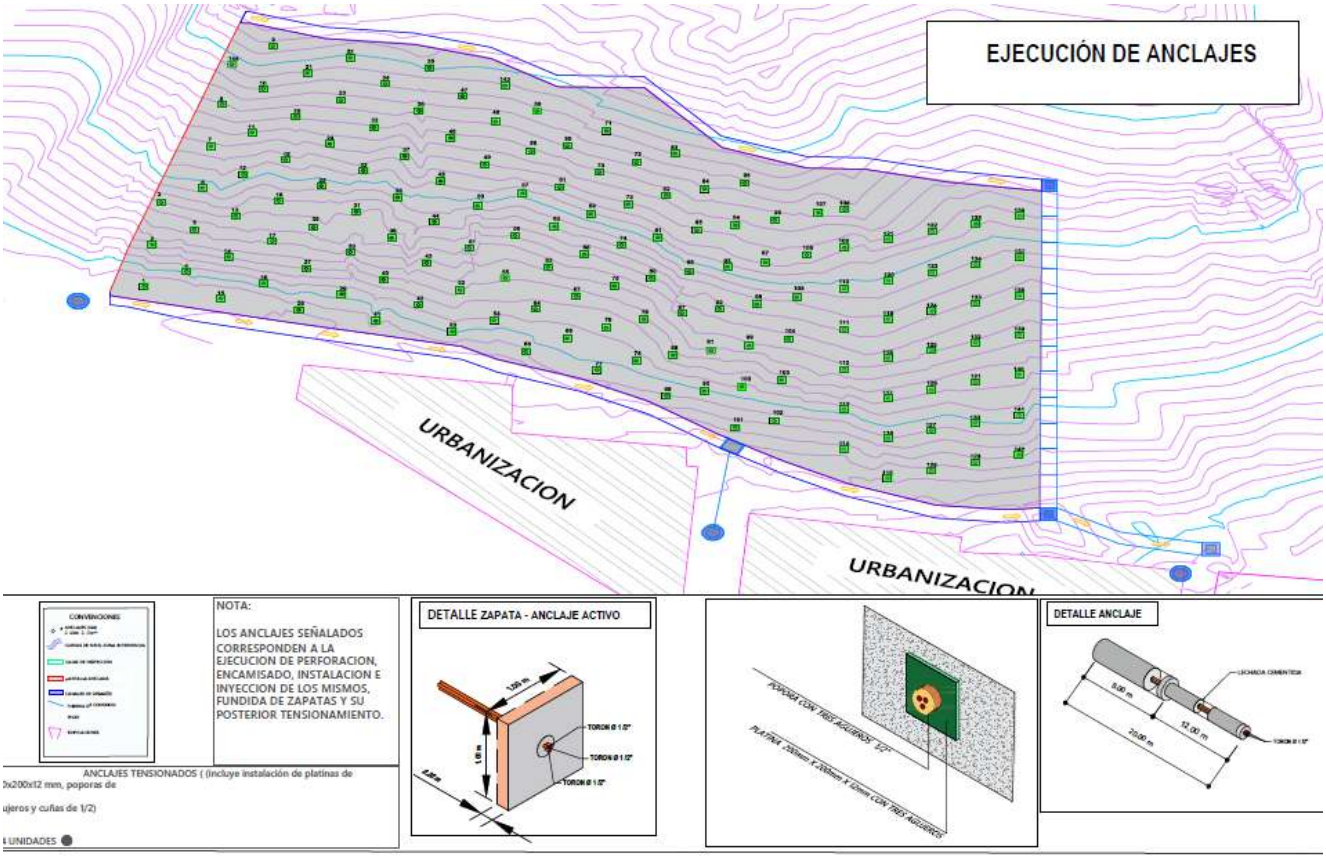
EJECUCIÓN DE ANCLAJES
URBANIZACION
URBANIZACION
CONVENCIONES
NOTA:
LOS ANCLAJES SEÑALADOS CORRESPONDEN A LA EJECUCION DE PERFORACION, ENCAMISADO, INSTALACION E INYECCION DE LOS MISMOS, FUNDIDA DE ZAPATAS Y SU POSTERIOR TENSIONAMIENTO.
ANCLAJES TENSIONADOS ((incluye instalación de platinas de
?x200x12 mm, poporas de
ujeros y cuñas de 1/2)
UNIDADES
DETALLE ZAPATA - ANCLAJE ACTIVO
TORON Ø 1.0"
TORON Ø 1.0"
TORON Ø 1.0"
DETALLE ANCLAJE

2. OBJETIVOS

- Lograr el adecuado estado de conservación de la infraestructura para garantizar condiciones de seguridad y el buen funcionamiento.
- Fijar lineamientos, responsables y directrices generales que permitan orientar y supervisar la metodología y estrategias por implementar para garantizar una mayor vida útil, y adecuada gestión de la infraestructura entregada.
- Que los responsables de la gestión de mantenimiento conozcan sus funciones y alcances e identifiquen adecuadamente los orígenes sobre los que se hace necesaria su intervención, así como sus posibles daños, causas y efectos.
- Obtener una mayor y eficiente conservación y buen manejo de la infraestructura, estimulando a la comunidad para que de alguna manera intervenga en el espacio de la forma correcta, fortaleciendo la inclusión social y ambiental con el medio ambiente, el sentido de pertenencia y la cultura ciudadana.

3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

3.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El sector denominado Villa de los Caballeros se encuentra adscrito al municipio de Girón, que pertenece al Área Metropolitana de Bucaramanga. Específicamente se encuentra ubicado en el costado Sur del municipio, al Sur-Este del Barrio Mirador de Arenales (Figura 1. Ubicación general del área de estudio.)

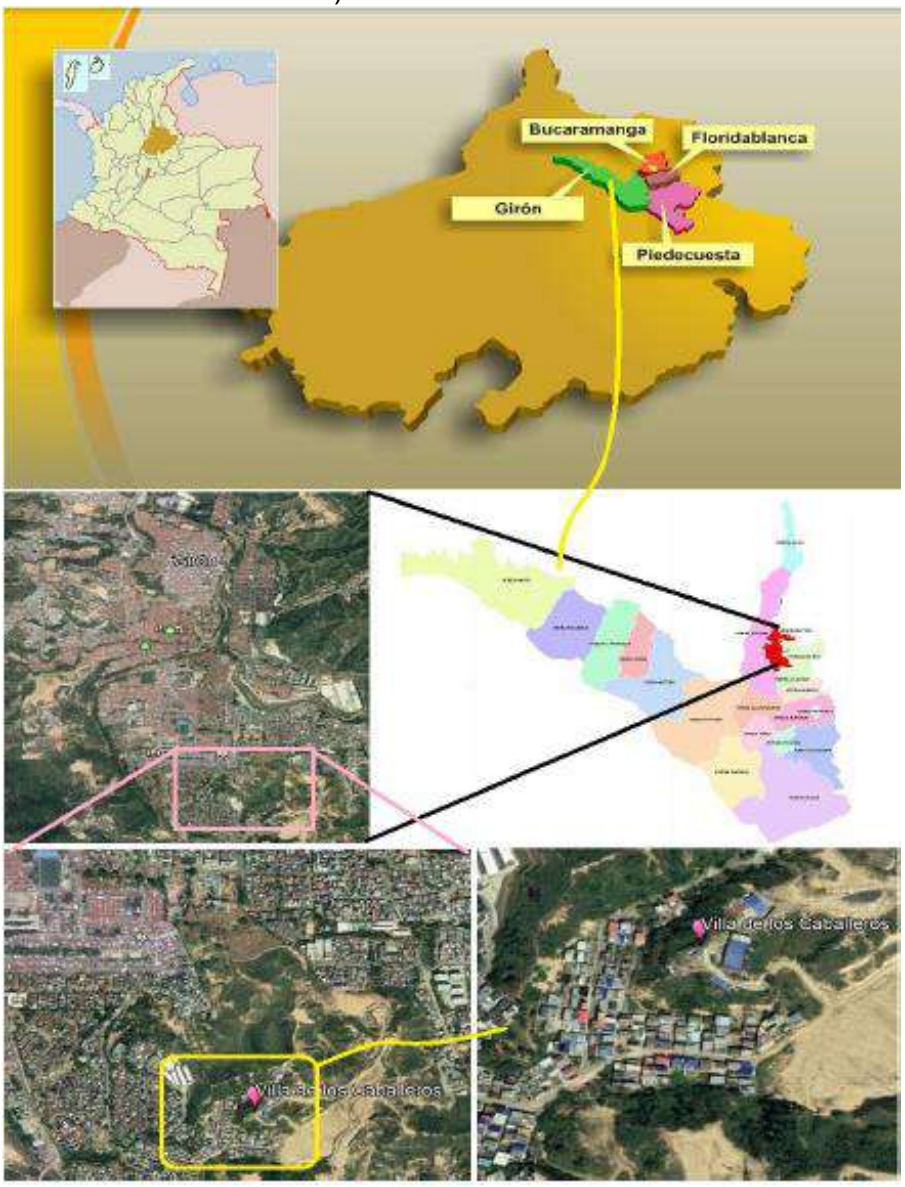


Figura 1. *Ubicación general del área de estudio*

4. GLOSARIO DE TERMINOS

4.1 DETERIORO: Entendido como el desgaste en la calidad o estado en los componentes de la infraestructura, producido por factores internos como falta de mantenimiento, desgaste natural e intervenciones inadecuadas y factores externos como factores ambientales; exposición a la humedad y cambios extremos de la temperatura.

4.2 MANTENIMIENTO: Es el conjunto de acciones y tareas realizadas para conservar, reparar y mejorar el estado y funcionamiento de la infraestructura, necesarias para prolongar la vida útil, garantizar la seguridad y funcionalidad, mejorar la eficiencia y productividad y conservar la calidad.

- El MANTENIMIENTO se puede clasificar según su frecuencia, así:



4.2.1 MANTENIMEITNO RUTINARIO: Conjunto de actividades que se ejecutan regularmente, diario, semanal, mensual, etc. a lo largo de la estructura y que se realiza directamente en cada tramo de la misma. Tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la estructura con la mínima cantidad de alteraciones o daños y en lo posible conservando las condiciones que tenía después de la construcción.

4.2.2 MANTENIMIENTO PERIODICO: Es un tipo de mantenimiento que se realiza en intervalos específicos de tiempo, como semestral, anual, bianual, etc. y que tienen el propósito de evitar la aparición o el agravamiento de defectos mayores.

- El MANTENIMIENTO se puede clasificar según su objetivo, así:



4.2.3 MANTENIMIENTO RECURRENTE: Son todos los procesos o trabajos rutinarios de limpieza que deben ser ejecutados periódicamente y a intervalos de tiempo regulares, con el propósito de que las obras se encuentren continuamente operativas o cumpliendo su función.

4.2.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Son los procesos de conservación de las condiciones físicas de la infraestructura; comprenden aquellas acciones que se deben realizar en forma planificada, periódica, permanente y programada, para prevenir, retrasar o evitar su deterioro, producto del uso normal, para alargar así su vida útil.

4.2.5 MANTENIMIENTO PREDICTIVO: Son las acciones de medición periódica y seguimiento constante que buscan prevenir la interrupción de servicios; se aplican con el propósito de detectar fallas o defectos.

4.2.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Corresponde a las acciones y labores que se deben realizar con el objeto de renovar, recuperar, reparar o restaurar daños o deterioros ocasionados por el uso normal, por falta de mantenimiento predictivo, recurrente y preventivo, por el desgaste natural, por accidentes, por usos inadecuados de la infraestructura u otros factores externos. Requiere inversiones cuantiosas y de mano de obra especializada.

5. FICHA DE MANTENIMIENTO

FICHA DE MANTENIMIENTO	
NOMBRE DEL ELEMENTO	
Anclajes activos	
DESCRIPCIÓN	
Elemento principal del sistema de estabilización que tiene por objetivo la compresión de la masa del suelo dado que introducen estados de tensiones, esfuerzos y deformaciones, mejorando la estabilidad de la masa del suelo. Una vez instalados se tensionan hasta alcanzar una carga admisible, con lo cual se comprime el terreno entre la zona del anclaje y el apoyo superficial de la pantalla	
MANTENIMIENTO	**FRECUENCIA**
Conservación de la estructura física exterior de protección de los torones que constituye el anclaje, conformada por un cilindro de concreto de 3” por 15 cms de longitud.	-Inspección Visual Anual -Si se presenta afectación programar reparación inmediata.
Los anclajes activos deberán someterse a inspecciones periódicas con el propósito de verificar la condición y funcionalidad de sus componentes, incluyendo cuñas, portacuñas (popora), platina de apoyo y dado de anclaje, garantizando así su correcto desempeño estructural y condiciones adecuadas de operación. Retoque o pintura total en esmalte para exteriores es esencial para proteger y conservar la apariencia de las superficies pintadas al aire libre. El procedimiento será inicialmente lijar la superficie del portacuñas -platina para eliminar los excesos de agentes corrosivos que se pudieran haber presentado por el retiro de la pintura, al igual retirar los residuos de pintura suelta o en mal estado de todo el cuerpo de la protección del anclaje. Posteriormente aplicar anticorrosivo solamente en la parte inferior del elemento zona donde se encuentra el portacuñas- platina y por último aplicar 2 capas de pintura esmalte para exteriores con el color de acabado. Estas actividades deberán realizarse con el respectivo equipo para trabajos en altura en descolado de talud.	-Inspección Visual Anual -Si se presenta afectación programar reparación inmediata -Si se mantiene en buen estado, realizar un mantenimiento cada 5 años renovando solamente la pintura de protección.





RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	• Cuadrilla de Mantenimiento • Ingenieros Civiles
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	Informe Interno Entidad

FICHA DE MANTENIMIENTO	
NOMBRE DEL ELEMENTO	
Pantalla de Concreto	
DESCRIPCIÓN	
Elemento principal del sistema de estabilización que tiene por objetivo la protección del área para evitar nuevos focos erosivos por agentes tales como lluvias o vientos sobre el suelo. También funciona como soporte o apoyo superficial al tensionamiento para generar la compresión de la masa	
MANTENIMIENTO	**FRECUENCIA**
Realizar Inspección visual a toda el área de protección para detectar posibles daños, grietas o desprendimiento de pequeñas porciones por efectos de asentamientos del terreno, factores antrópicos o la presencia de agua producto de infiltraciones provocadas por el rompimiento de líneas de acueducto o alcantarillado.	-Inspección Anual. -Si se presenta afectación programar reparación inmediata.
TRABAJO EN CAMPO	-Recorrido en campo -Recolección de información del estado de la obra -Programación de cuadrilla de limpieza, poda y rocería con priorización de las actividades. -Registros detallados de todas las inspecciones, reparaciones y trabajos de mantenimiento realizados en el sistema de control de erosión.



RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	• Cuadrilla de Mantenimiento • Ingenieros Civiles
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	Informe Interno Entidad

FICHA DE MANTENIMIENTO	
NOMBRE DEL ELEMENTO	
Canaletas en concreto	
DESCRIPCIÓN	
Estructura hidráulica que tiene como función el transporte del caudal generado por el endurecimiento de las áreas a entregas controladas con el fin de no generar fenómenos erosivos adicionales por efectos de escurrimiento en el terreno. Un drenaje en buen estado ayudara a prevenir la erosión y la saturación del talud y con ellos aumentar el factor de seguridad.	
MANTENIMIENTO	**FRECUENCIA**
Limpieza perimetral del canal y las cajas de entrega que se encuentren con basuras o sedimentos que colmatan la estructura y no permiten el adecuado transporte del agua o por taponamiento se rebosan y generan puntos de carcavamiento.	-Inspección visual semanal -Limpieza de sedimentos mensual -Época de Invierno limpieza de sedimentos semanal o de acuerdo a la intensidad
TRABAJO EN CAMPO	- Recorrido en campo - Recolección de información del estado de la obra - Programación de cuadrilla de limpieza, poda y rocería con priorización de las actividades. - Retiro de basuras y desechos





RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	• Cuadrilla de Mantenimiento • Ingenieros civiles
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	Informe Interno Entidad

FICHA DE MANTENIMIENTO	
NOMBRE DEL ELEMENTO	
Revegetalización correspondiente a la compensación ambiental	
DESCRIPCIÓN	
Las actividades de revegetalización corresponden al restablecimiento de la cobertura vegetal en las áreas intervenidas y a la reforestación de las zonas afectadas, en cumplimiento de las medidas de compensación ambiental derivadas de la intervención realizada. Estas labores contemplan la siembra de especies nativas, garantizando la recuperación paisajística y ecológica del área, así como el desarrollo de acciones orientadas al manejo responsable y sostenible de los recursos ambientales.	
MANTENIMIENTO	**FRECUENCIA**

Se debe regar con agua los árboles en lo posible en las horas de la mañana en las épocas de verano. En épocas de lluvia retirar la maleza dado que afecta el crecimiento de las especies. Así mismo, estar pendiente de que no existan plagas que puedan afectar a las especies sembradas.	-Inspección Visual Mensual -Riego constante solo en época de veranos intensos.





RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	• Cuadrilla de Mantenimiento • Comunidad (socialización de la necesidad)
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	Informe Interno Entidad

FICHA DE MANTENIMIENTO	
NOMBRE DEL ELEMENTO	
Disipador de energía	
DESCRIPCIÓN	
Estructura hidráulica que tiene como función el transporte del caudal procedente de aguas lluvias, generado por el endurecimiento de las áreas, a zonas de topografía suave o entregas controladas con el fin de no generar fenómenos erosivos adicionales por efectos de escurrimiento en el terreno. Un drenaje en buen estado ayudara a prevenir la erosión y la saturación del talud y con ellos aumentar el factor de seguridad.	
MANTENIMIENTO	**FRECUENCIA**
Limpieza de toda la zona construida del disipador, junto con el canal perimetral y las cajas de entrega de basuras o sedimentos que colmatan la estructura y no permiten el adecuado transporte del agua o por taponamiento se rebosan y generan puntos de carcavamiento. Programa de sello de grietas y fisuras generadas por posibles asentamientos diferenciales.	-Inspección visual semanal -Limpieza de sedimentos mensual -Época de Invierno limpieza de sedimentos semanal o de acuerdo a la intensidad -Si se presenta afectación programar reparación inmediata.





RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	• Cuadrilla de Mantenimiento • Ingenieros civiles
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	Informe Interno Entidad

6. CONCLUSIONES

- Es de gran importancia dar cumplimiento lo estipulado en este “MANUAL DE MANTENIMIENTO” y realizar los mencionados mantenimientos de acuerdo a la frecuencia establecida en la ficha para cada uno de los elementos que hacen parte del sistema.

- Llegado el caso de no seguir las indicaciones de mantenimiento indicado en el presente manual para cada elemento, o no contar con los soportes del cumplimiento, el contratista no se hace responsable por las afectaciones o daños causados por falta de mantenimiento que se puedan presentar en la infraestructura,

- Dadas las condiciones sociales del sector, se recomienda la visita periódica a las obras para verificar el estado, las mismas son susceptibles de daños o afectaciones por actos vandálicos propios de la problemática de la zona.

- La atención de cada una de las recomendaciones acá dadas está encaminada a alargar la vida útil de los elementos y prevenir o disminuir la ocurrencia de eventos sobre los mismos antes de lo previsto.

- Recordar que el mantenimiento puede variar dependiendo de las condiciones climáticas y el uso de cada elemento, es importante realizar un mantenimiento regular para garantizar la seguridad y durabilidad de cada infraestructura realizada, si se detectan daños o problemas, es importante abordarlos de inmediato para evitar que se puedan agravar.

CDMB

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.210-16225-6

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA No. 01		ACTA No. 02		ACTA No. 03		ACTA No. 04		CANTIDADES ACUMULADAS	
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SECCION PRIMERA															
1,01	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$ 11.584.277,00	$ 11.584.277,00	0,25	$ 2.896.069,25	0,34	$ 3.938.654,18	0,16	$ 1.853.484,32	0,25	$ 2.896.069,25	1,00	$ 11.584.277,00
1,03	Vallas y señales especiales													0,00	$ -
1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	und	1,00	$ 2.664.417,00	$ 2.664.417,00	1,00	$ 2.664.417,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 2.664.417,00
1,04	Desmonte y limpieza	m2	840,00	$ 5.453,00	$ 4.580.520,00	840,00	$ 4.580.520,00		$ -		$ -		$ -	840,00	$ 4.580.520,00
1,05	Retiro de basuras y escombros	m3	168,00	$ 86.609,00	$ 14.550.312,00	168,00	$ 14.550.312,00		$ -		$ -		$ -	168,00	$ 14.550.312,00
1,07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	m3	539,21	$ 257.918,00	$ 139.071.964,78	539,20	$ 139.069.385,60		$ -		$ -		$ -	539,20	$ 139.069.385,60
				SUBTOTAL SECCION PRIMERA:	$ 172.451.490,78		$ 163.760.703,85		$ 3.938.654,18		$ 1.853.484,32		$ 2.896.069,25		$ 172.448.911,60
SECCION SEGUNDA															
2.01	Excavación a tajo abierto en taludes														
2.01.A	Excavacion con acarreo libre														
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	1078,41	$ 49.921,00	$ 53.835.305,61	1075,20	$ 53.675.059,20		$ -		$ -		$ -	1075,20	$ 53.675.059,20
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	718,94	$ 91.187,00	$ 65.557.981,78	718,00	$ 65.472.266,00		$ -		$ -		$ -	718,00	$ 65.472.266,00
2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	m3	29,00	$ 253.569,00	$ 7.353.501,00		$ -	20,00	$ 5.071.380,00	8,80	$ 2.231.407,20		$ -	28,80	$ 7.302.787,20
2,03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	m3-km	26614,80	$ 3.988,00	$ 106.139.822,40	26268,48	$ 104.758.698,24	208,00	$ 829.504,00	91,52	$ 364.981,76		$ -	26568,00	$ 105.953.184,00
				SUBTOTAL SECCION SEGUNDA:	$ 232.886.610,79		$ 223.906.023,44		$ 5.900.884,00		$ 2.596.388,96		$ -		$ 232.403.296,40
SECCION TERCERA															
3,00	Concretos														
3.01	Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	29,00	$ 1.089.450,00	$ 31.594.050,00		$ -		$ -		$ -	28,80	$ 31.376.160,00	28,80	$ 31.376.160,00
3,03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla humeda de espesor de 10cm	m2	840,00	$ 380.247,00	$ 319.407.480,00		$ -		$ -		$ -	840,00	$ 319.407.480,00	840,00	$ 319.407.480,00
3,08	Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes	m3	87,00	$ 1.156.977,00	$ 100.656.999,00		$ -	67,20	$ 77.748.854,40	19,20	$ 22.213.958,40		$ -	86,40	$ 99.962.812,80
				SUBTOTAL SECCION TERCERA:	$ 451.658.529,00		$ -		$ 77.748.854,40		$ 22.213.958,40		$ 350.783.640,00		$ 450.746.452,80
SECCION CUARTA															
4,00	Aceros														
4,01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	kg	5807,00	$ 12.098,00	$ 70.253.086,00		$ -	2419,20	$ 29.267.481,60	3386,88	$ 40.974.474,24		$ -	5806,08	$ 70.241.955,84
4,02	Suministro y colocación de anclajes						$ -							0,00	$ -
4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	und	144,00	$ 1.085.176,00	$ 156.265.344,00	24,00	$ 26.044.224,00	98,00	$ 106.347.248,00	22,00	$ 23.873.872,00		$ -	144,00	$ 156.265.344,00
4,03	Tensionamiento de anclajes	und	144,00	$ 57.240,00	$ 8.242.560,00		$ -		$ -			144,00	$ 8.242.560,00	144,00	$ 8.242.560,00
4,04	Suministro y colocación													0,00	
4,04,01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m2	840,00	$ 37.001,00	$ 31.080.840,00					840,00	$ 31.080.840,00			840,00	$ 31.080.840,00
4,05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	und	144,00	$ 82.440,00	$ 11.871.360,00		$ -		$ -			144,00	$ 11.871.360,00	144,00	$ 11.871.360,00
4,06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	und	144,00	$ 158.039,00	$ 22.757.616,00		$ -		$ -		$ -	144,00	$ 22.757.616,00	144,00	$ 22.757.616,00
4,07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	und	144,00	$ 96.886,00	$ 13.951.584,00		$ -		$ -		$ -	144,00	$ 13.951.584,00	144,00	$ 13.951.584,00
				SUBTOTAL SECCION CUARTA:	$ 314.422.390,00		$ 26.044.224,00		$ 135.614.729,60		$ 95.929.186,24		$ 56.823.120,00		$ 314.411.259,84
SECCION QUINTA															
5,00	Perforaciones horizontales														
5,04	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	m	2160,00	$ 510.989,00	$ 1.103.736.240,00	360,00	$ 183.956.040,00	1470,00	$ 751.153.830,00	330,00	$ 168.626.370,00		$ -	2160,00	$ 1.103.736.240,00
5,05	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	m	1440,00	$ 585.973,00	$ 843.801.120,00	240,00	$ 140.633.520,00	980,00	$ 574.253.540,00	220,00	$ 128.914.060,00		$ -	1440,00	$ 843.801.120,00
				SUBTOTAL SECCION QUINTA:	$ 1.947.537.360,00		$ 324.589.560,00		$ 1.325.407.370,00		$ 297.540.430,00		$ -		$ 1.947.537.360,00
SECCION SEXTA															
6,00	Varios														
6,02	Canaleta (ancho = 1m; e=10cm)	m	132,00	$ 134.615,00	$ 17.769.180,00		$ -	45,60	$ 6.138.444,00		$ -	76,00	$ 10.230.740,00	121,60	$ 16.369.184,00
6,04	Estructura de disipación de energía	m	14,00	$ 634.862,00	$ 8.888.068,00		$ -		$ -		$ -	14,00	$ 8.888.068,00	14,00	$ 8.888.068,00

6,06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdos de la estructura estabilizadora	m	408,00	$ 75.174,00	$ 30.670.992,00		$ -		$ -	408,00	$ 30.670.992,00		$ -	408,00	$ 30.670.992,00
				SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:	$ 57.328.240,00		$ -		$ 6.138.444,00		$ 30.670.992,00		$ 19.118.808,00		$ 55.928.244,00
				VALOR COSTOS DIRECTOS:	$ 3.176.284.620,57		$ 738.300.511,29		$ 1.554.748.936,18		$ 450.804.439,92		$ 429.621.637,25		$ 3.173.475.524,6400
	ADMINISTRACION	STRACION:	24%		$ 762.308.308,94		$ 177.192.122,71		$ 373.139.744,67		$ 108.193.065,58		$ 103.109.192,94		$ 761.634.125,90
	IMPREVISTOS	REVISTOS:	1%		$ 31.762.846,21		$ 7.383.005,11		$ 15.547.489,36		$ 4.508.044,40		$ 4.296.216,37		$ 31.734.755,25
	UTILIDAD	UTILIDAD:	5%		$ 158.814.231,03		$ 36.915.025,56		$ 77.737.446,81		$ 22.540.222,00		$ 21.481.081,86		$ 158.673.776,23
	A.I.U.	A.I.U:	30%		$ 952.885.386,18		$ 221.490.153,38		$ 466.424.680,84		$ 135.241.331,98		$ 128.886.491,17		$ 952.042.657,38
	VALOR TOTAL SIN IVA				$ 4.129.170.006,75		$ 959.790.664,67		$ 2.021.173.617,02		$ 586.045.771,90		$ 558.508.128,42		$ 4.125.518.182,02
	IVA de U.	IVA de U:	19%		$ 30.174.703,90		$ 7.013.854,86		$ 14.770.114,89		$ 4.282.642,18		$ 4.081.405,56		$ 30.148.017,48
				VALOR TOTAL:	$ 4.159.344.710,65		$ 966.804.519,53		$ 2.035.943.731,91		$ 590.328.414,08		$ 562.589.533,98		$ 4.155.666.199,50
				SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD											$ 3.678.511,15
				SUMAS IGUALES											$ 4.159.344.710,65

Firma
Nombre: JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO
Identificación: 1.098.682.052
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista de Obra

Firma
Nombre: IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ
Identificación: 79.431.435
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoría

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA
Identificación: 91.496.575
Subdirector SUMYT- Supervisión
Entidad Contratante

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

MEMORIA DE CALCULO No.	1

SECCION	PRIMERA	ITEM	1,01	Replanteo, control y medición de la obra	UND: mes

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	1,00	mes	1,00

CANTIDADES ACUMULADAS				
ACTA N°1	ACTA N°2	ACTA N°3	ACTA N°4	TOTAL ACUMULADO(mes)
0,25	0,34	0,16	0,25	1,00

Descripcion	No. Acta	Fecha inicio	Fecha Final	Meses
Periodos ejecutados	ACTA N°1	15/10/2025	AL 31/10/2025	0,08
		01/11/2025	30/11/2025	0,17
	ACTA N°2	01/12/2025	31/12/2025	0,17
		01/01/2026	31/01/2026	0,17
	ACTA N°3	01/02/2026	28/02/2026	0,16
	ACTA N°4	1/03/2026	31/03/2026	0,16
		01/04/2026	14/04/2026	0,09
TOTAL ACUMULADO				1,00







ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. JHÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

					MEMORIA DE CALCULO No.	2
SECCION	PRIMERA	ITEM	1.03.01.A	Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	UND	und

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	1,00	UND	1,00

TIPO	CANT ACTA 1 (Und)
Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)	1
TOTAL (UND)	1









ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

					MEMORIA DE CALCULO No.	3
SECCION	PRIMERA	ITEM	1,04	Desmonte y limpieza	UND	m2

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	840,00	M2	840,00

DESMONTE Y LIMPIEZA		
Frente de Obra	Und	Cantidades Totales (m2)
Villa de los Caballeros	m2	840
CANTIDAD TOTAL M2		840









ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

MEMORIA DE CALCULO No.	4

SECCION	PRIMERA	ITEM	1,05	Retiro de basuras y escombros	UND	m3

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	168,00	m3	168,00

Retiro de basuras y escombros		
Frente de Obra	Area a intervenir (m2)	Volumen ejecutado (m3)
Villa de los Caballeros	840,00	168,00
CANTIDAD TOTAL M3		168,00

ABSCISA	AREA (A)	DISTANCIA (D)	VOLUMEN (A*D)
k0+000	3,42		
		10	34,50
k0+010	3,48		
		10	34,40
k0+020	3,40		
		10	33,95
k0+030	3,39		
		10	34,25
k0+040	3,46		
		8,92	30,90
k0+048,92	3,469		
			0,00
	SUB TOTAL		168,00







ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

					MEMORIA DE CALCULO No.	5
SECCION	PRIMERA		ITEM	1,07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	UND	m3

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	539,21	M3	539,20

Perfilado a mano descolgado de talud		
Frente de Obra	Area a intervenir (m2)	Volumen ejecutado (m3)
Villa de los Caballeros	840,00	539,20
CANTIDAD TOTAL M3		539,20

ABSCISA	AREA (A)	DISTANCIA (D)	VOLUMEN (A*D)
k0+000	11,02		
		10	110,85
k0+010	11,15		
		10	110,70
k0+020	10,99		
		10	110,20
k0+030	11,05		
		10	110,75
k0+040	11,1		
		8,92	96,70
k0+048,92	10,582		
	SUB TOTAL		539,20







ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

				MEMORIA DE CALCULO No.	6
SECCION	SEGUNDA	ITEM	2.01.A.02	Excavacion con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	UND	m3

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	1078,41	m3	1075,20

Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad		
Frente de Obra	Area a intervenir (m2)	Volumen ejecutado (m3)
Villa de los Caballeros	840,00	1075,20
CANTIDAD TOTAL M3		1075,20

ABSCISA	AREA PROM (A)	DISTANCIA (D)	VOLUMEN (A*D)
k0+000	22,05		
		10	220,70
k0+010	22,09		
		10	221,20
k0+020	22,15		
		10	220,80
k0+030	22,01		
		10	219,95
k0+040	21,98		
		8,92	192,55
k0+048,92	21,193		
	SUB TOTAL		1.075,20







ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

						MEMORIA DE CALCULO No.	7
SECCION	SEGUNDA		ITEM	2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	UND	m3

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	718,94	m3	718,00

Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad		
Frente de Obra	Area a intervenir (m2)	Volumen ejecutado (m3)
Villa de los Caballeros	840,00	718,00
CANTIDAD TOTAL M3		718,00

ABSCISA	AREA PROM (A)	DISTANCIA (D)	VOLUMEN (A*D)
k0+000	14,7		
		10	147,20
k0+010	14,74		
		10	146,45
k0+020	14,55		
		10	146,00
k0+030	14,65		
		10	147,50
k0+040	14,85		
		8,92	130,85
k0+048,92	14,489		
	SUB TOTAL		718,00







ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

MEMORIA DE CALCULO No.	8

SECCION	SEGUNDA	ITEM	2.01.A.04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	UND	m3


PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	29,00	m3	28,80

CANTIDADES ACUMULADAS		
ACTA N°2	ACTA N°3	TOTAL ACUMULADO(m3)
20,00	8,80	28,80

CANTIDAD ZAPATAS UND	LADO A (m)	LADO B (m)	ESPESOR (m)	TOTAL (m3)
144,00	1,00	1,00	0,20	28,80
		TOTAL		28,80

AREA
LADO A LA
LADO B LB


ESPESOR (M) 0.20



LA = LB





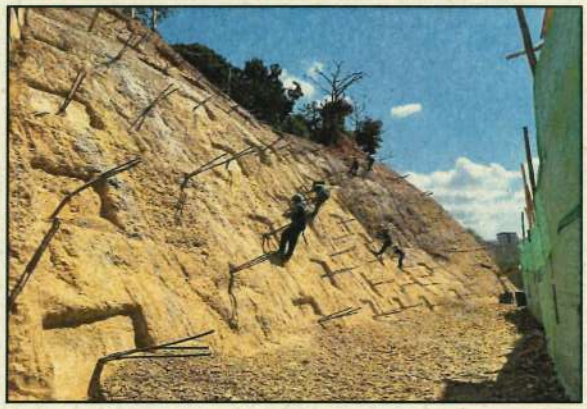

ELABORADO POR:

ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

APROBADO POR:

ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN


CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

					MEMORIA DE CALCULO No.	9
SECCION	SEGUNDA	ITEM	2,03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	UND	m3-km

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	26614,80	m3-km	26568,00

CANTIDADES ACUMULADAS			
ACTA N°1	ACTA N°2	ACTA N°3	TOTAL ACUMULADO(m3-km)
26268,48	208,00	91,52	26568,00

Ítem	Actividad	Volumen (m3)	Distancia (km)	% Expansión	Total
1.07	Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)	539,20	8	1,5	6470,40
2.01.A.03	Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	718,00	8	1,5	8616,00
CANTIDAD TOTAL MATERIAL ROCOSO					15086,40
2.01.A.02	Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	1075,20	8	1,3	11182,08
2,01,A,04	Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata	28,8	8	1,3	299,52
CANTIDAD TOTAL MATERIAL GRANULAR					11481,60
CANTIDAD TOTAL SOBREACARREOS					26568,00

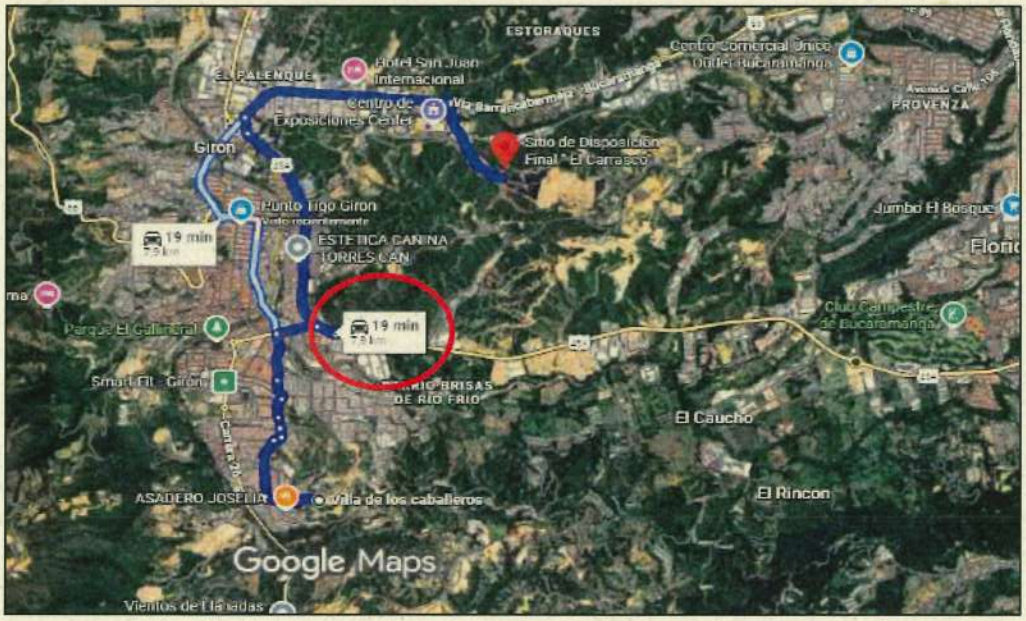

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

					MEMORIA DE CALCULO No.	9
SECCION	SEGUNDA	ITEM	2,03	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m	UND	m3-km

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	26614,80	m3-km	26568,00









ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

MEMORIA DE CALCULO No.	10

SECCION	TERCERA	ITEM	3.01	Suministro y colocacion de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	UND	m3

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	29,00	m3	28,80

CANTIDAD ZAPATAS (und)	AREA LA*LB (m2)	ESPESOR (m)	TOTAL (m3)
144,00	1,00	0,20	28,80
		TOTAL	28,80

AREA
LADO A LA
LADO B LB


LA = LB

ESPESOR (M) 0.20









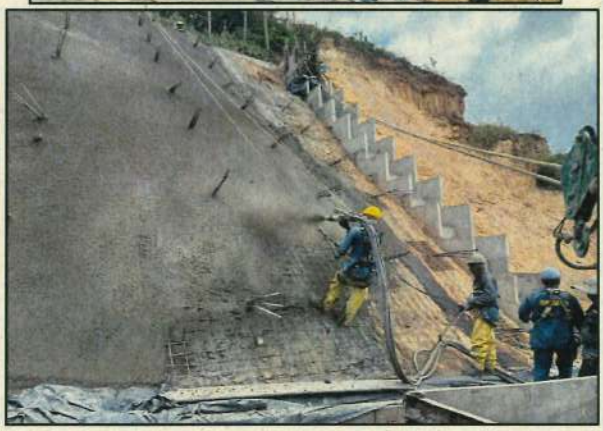

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

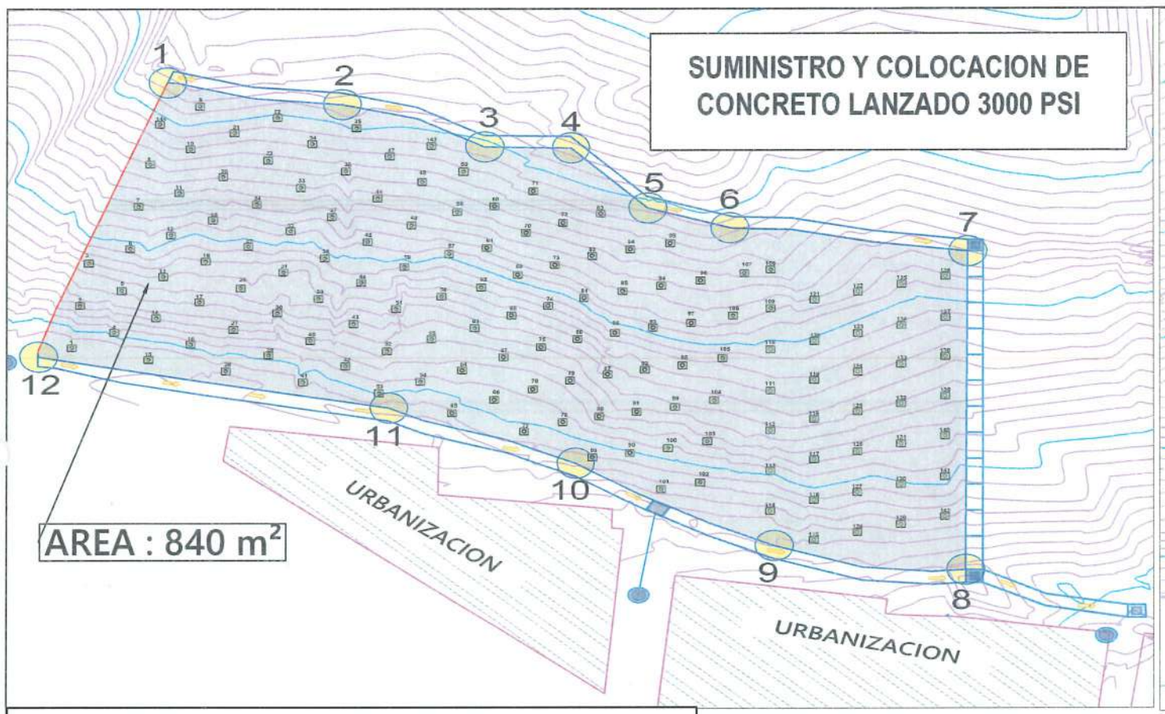

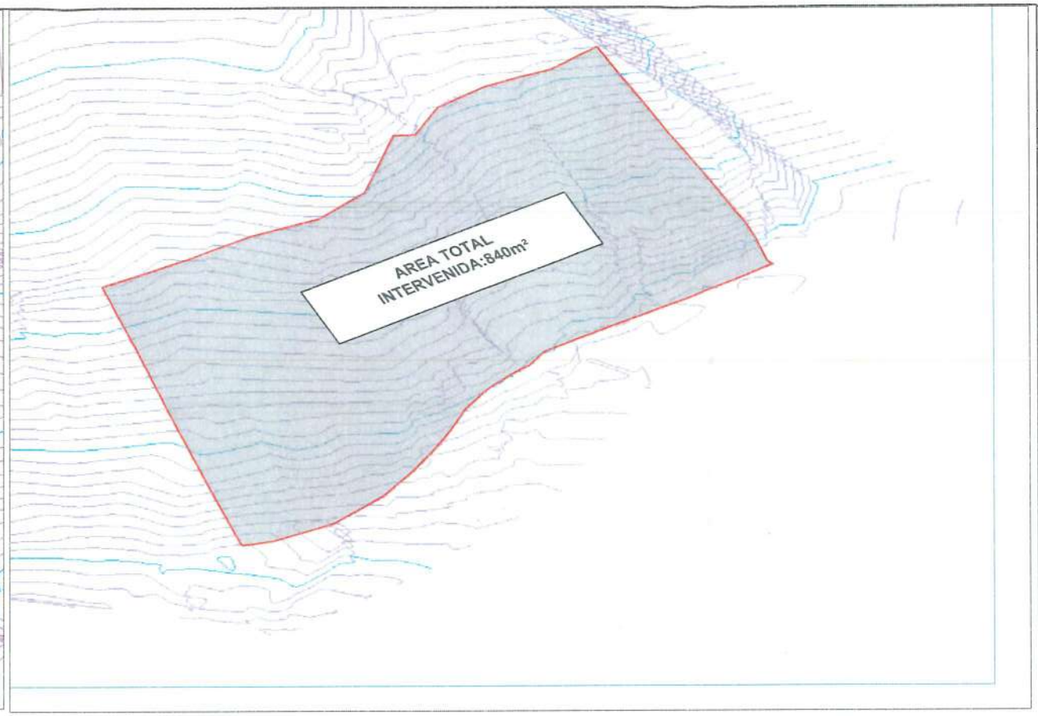

Fecha: MAYO 2026

Archivo Dwg: VILLAS DE LOS CABALLEROS.dwg

Plano No. 02

ENTIDAD CONTRATANTE:

CDMB

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATISTA:

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS
EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Contiene: CONCRETO LANZADO Y MALLA VILLAS DE LOS CABALLEROS

ELABORO: Top. FABIAN LEONARDO ZAMBRANO LESMES

REVISO: Ing. IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALES

APROBO: Ing. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Escala: INDICADAS

Localizacion Grafica:



Modificaciones:

Fecha	Observaciones	Revisó

Fecha: ABRIL 2026

Archivo Dwg: VILLAS DE LOS CABALLEROS.dwg

Plano No: 02

CUADRO DE COORDENADAS

ITEM	NORTE	ESTE	ELEVACION
1	2337223,332	4981945,803	784,84
2	2337213,709	4981944,374	784,58
3	2337205,888	4981941,773	783,896
4	2337201,124	4981939,728	785,85
5	2337196,87	4981937,238	783,71
6	2337192,386	4981936,145	783,239
7	2337179,315	4981937,157	780,4099
8	2337179,447	4981924,654	768,3217
9	2337189,967	4981925,296	769,556
10	2337200,874	4981930,179	771,051
11	2337211,144	4981934,119	771,387
12	2337230,432	4981936,884	772,576

CONVENCIONES

- # ANCLAJES (144) 2.40m↕ 2.10m↔
- CURVAS DE NIVEL ZONA INTERVENIDA
- CAJAS DE INSPECCION
- PANTALLA ANCLADA
- CANALES DE DESAGÜE
- TUBERIA DE CONEXION
- POZO
- EDIFICACIONES

ANTES



ACTUAL



SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO LANZADO 3000 PSI

840 m²

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

				MEMORIA DE CALCULO No.	11
SECCION	TERCERA	ITEM	3,03	Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla humeda de espesor de 10cm	UND	m2

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	840,00	m2	840,00

DESCRIPCIÓN	UND	AREA	TOTAL (m2)
Concreto lanzado con mezcla humeda de espesor de 10cm	m2	840,00	840,00
	TOTAL		840,00











ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

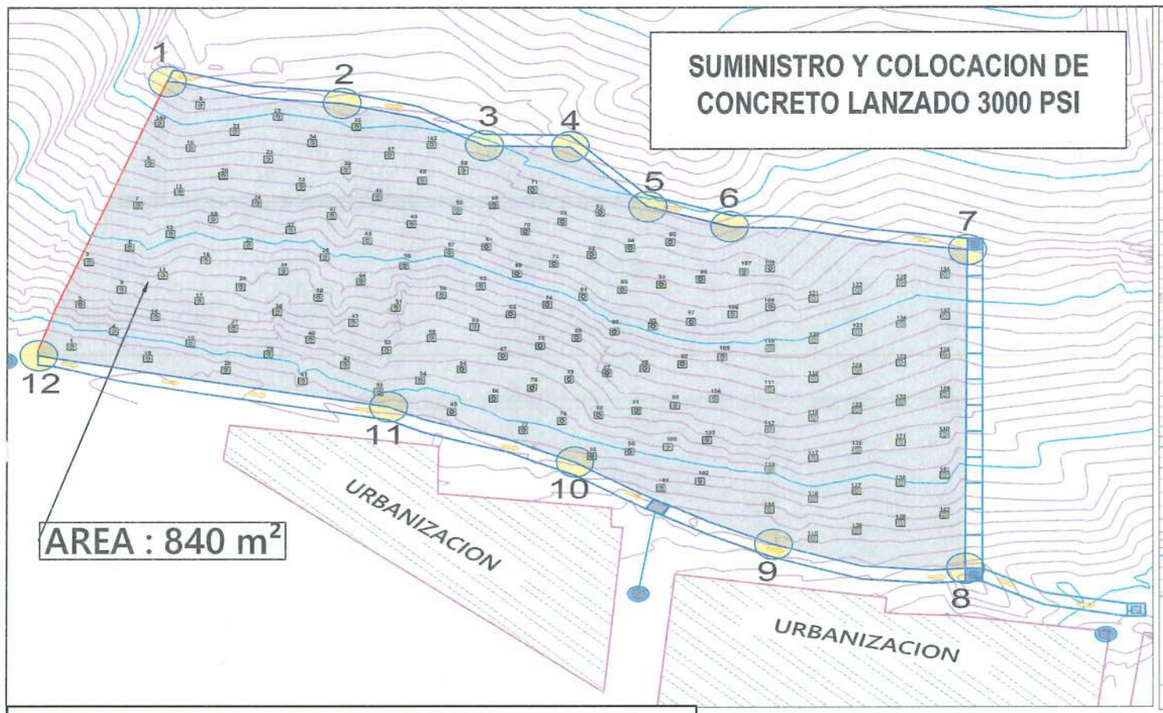

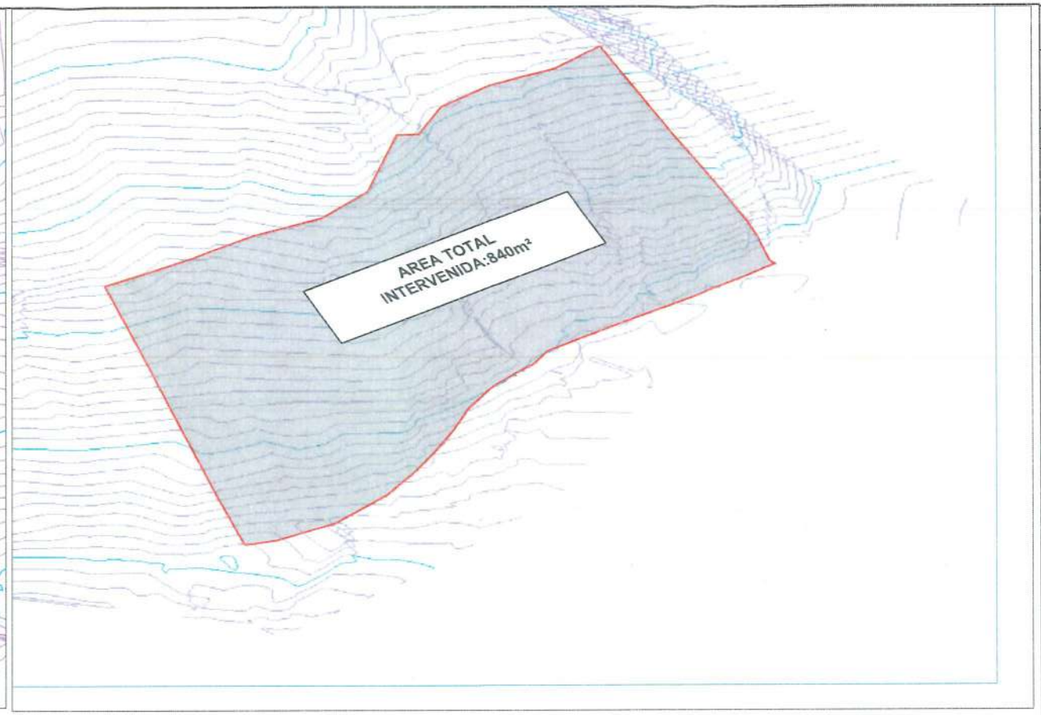

CUADRO DE COORDENADAS			
ITEM	NORTE	ESTE	ELEVACION
1	2337223,332	4981945,803	784,84
2	2337213,709	4981944,374	784,58
3	2337205,888	4981941,773	783,896
4	2337201,124	4981939,728	785,85
5	2337196,87	4981937,238	783,71
6	2337192,386	4981936,145	783,239
7	2337179,315	4981937,157	780,4099
8	2337179,447	4981924,654	768,3217
9	2337189,967	4981925,296	769,556
10	2337200,874	4981930,179	771,051
11	2337211,144	4981934,119	771,387
12	2337230,432	4981936,884	772,576

CONVENCIONES

- # ANCLAJES (144) 2.40m↕ 2.10m↔
- CURVAS DE NIVEL ZONA INTERVENIDA
- CAJAS DE INSPECCION
- PANTALLA ANCLADA
- CANALES DE DESAGÜE
- TUBERIA DE CONEXION
- POZO
- EDIFICACIONES

ANTES



ACTUAL



SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO LANZADO 3000 PSI

840 m²

Fecha: MAYO 2026

Archivo Dwg: VILLAS DE LOS CABALLEROS.dwg

Plano No. 02

ENTIDAD CONTRATANTE:

CDMB

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS
EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Contiene: CONCRETO LANZADO Y MALLA VILLAS DE LOS CABALLEROS

ELABORO: Top. FABIAN LEONARDO ZAMBRANO LESMES

REVISO: Ing. IVAN GUSTAVO BLANCO GONZALES

APROBO: Ing. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Escala: INDICADAS

Localizacion Grafica:



Modificaciones:

Fecha	Observaciones	Revisó

Fecha: ABRIL 2026

Archivo Dwg: VILLAS DE LOS CABALLEROS.dwg

Plano No: 02

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.


				MEMORIA DE CALCULO No.	12
SECCION	TERCERA	ITEM	3,08	Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes	UND	m3

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	87,00	m3	86,40

CANTIDADES ACUMULADAS		
ACTA N°2	ACTA N°3	TOTAL ACUMULADO(m3)
67,20	19,20	86,40

CANTIDAD ANCLAJES (und)	VOL X ANCLAJE (BULBO)	TOTAL (m3)
144,00	0,60	86,40
	TOTAL	86,40

CALCULO DE VOLUMEN LECHADA DE INYECCION			
Descripción	Long (m)	Radio (m)	Vol cilindro
Llenado (4")	15	0,05	0,12
Bulbo (9")	10	0,1143	0,41
SUBTOTAL			0,53
Desperdicio por infiltracion en grietas del talud (14%)			0,07
TOTAL			0,60







ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.


MEMORIA DE CALCULO No.	13

SECCION	CUARTA	ITEM	4,01	Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	UND	kg


PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	5807,00	kg	5806,08

CANTIDADES ACUMULADAS		
ACTA N°2	ACTA N°3	TOTAL ACUMULADO(kg)
2419,20	3386,88	5806,08

Ø ACERO (pulgadas)	Peso x Zapata (Kg/ml)	LONGITUD ACERO (m)	# Varillas en ambas direcciones X Parrilla	Peso x Zapata (Kg)	CANTIDAD DE ANCLAJES	TOTAL
3/4"	2,24	0,9	20,00	40,32	144	5806,08
				CANTIDAD TOTAL		5806,08

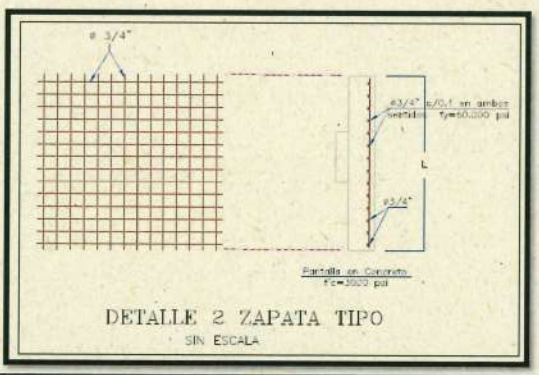




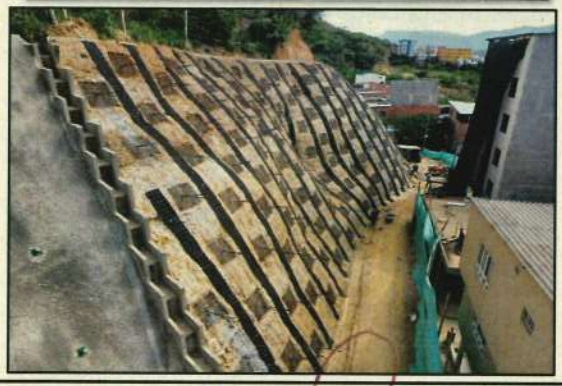



ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

EJECUCIÓN DE ANCLAJES

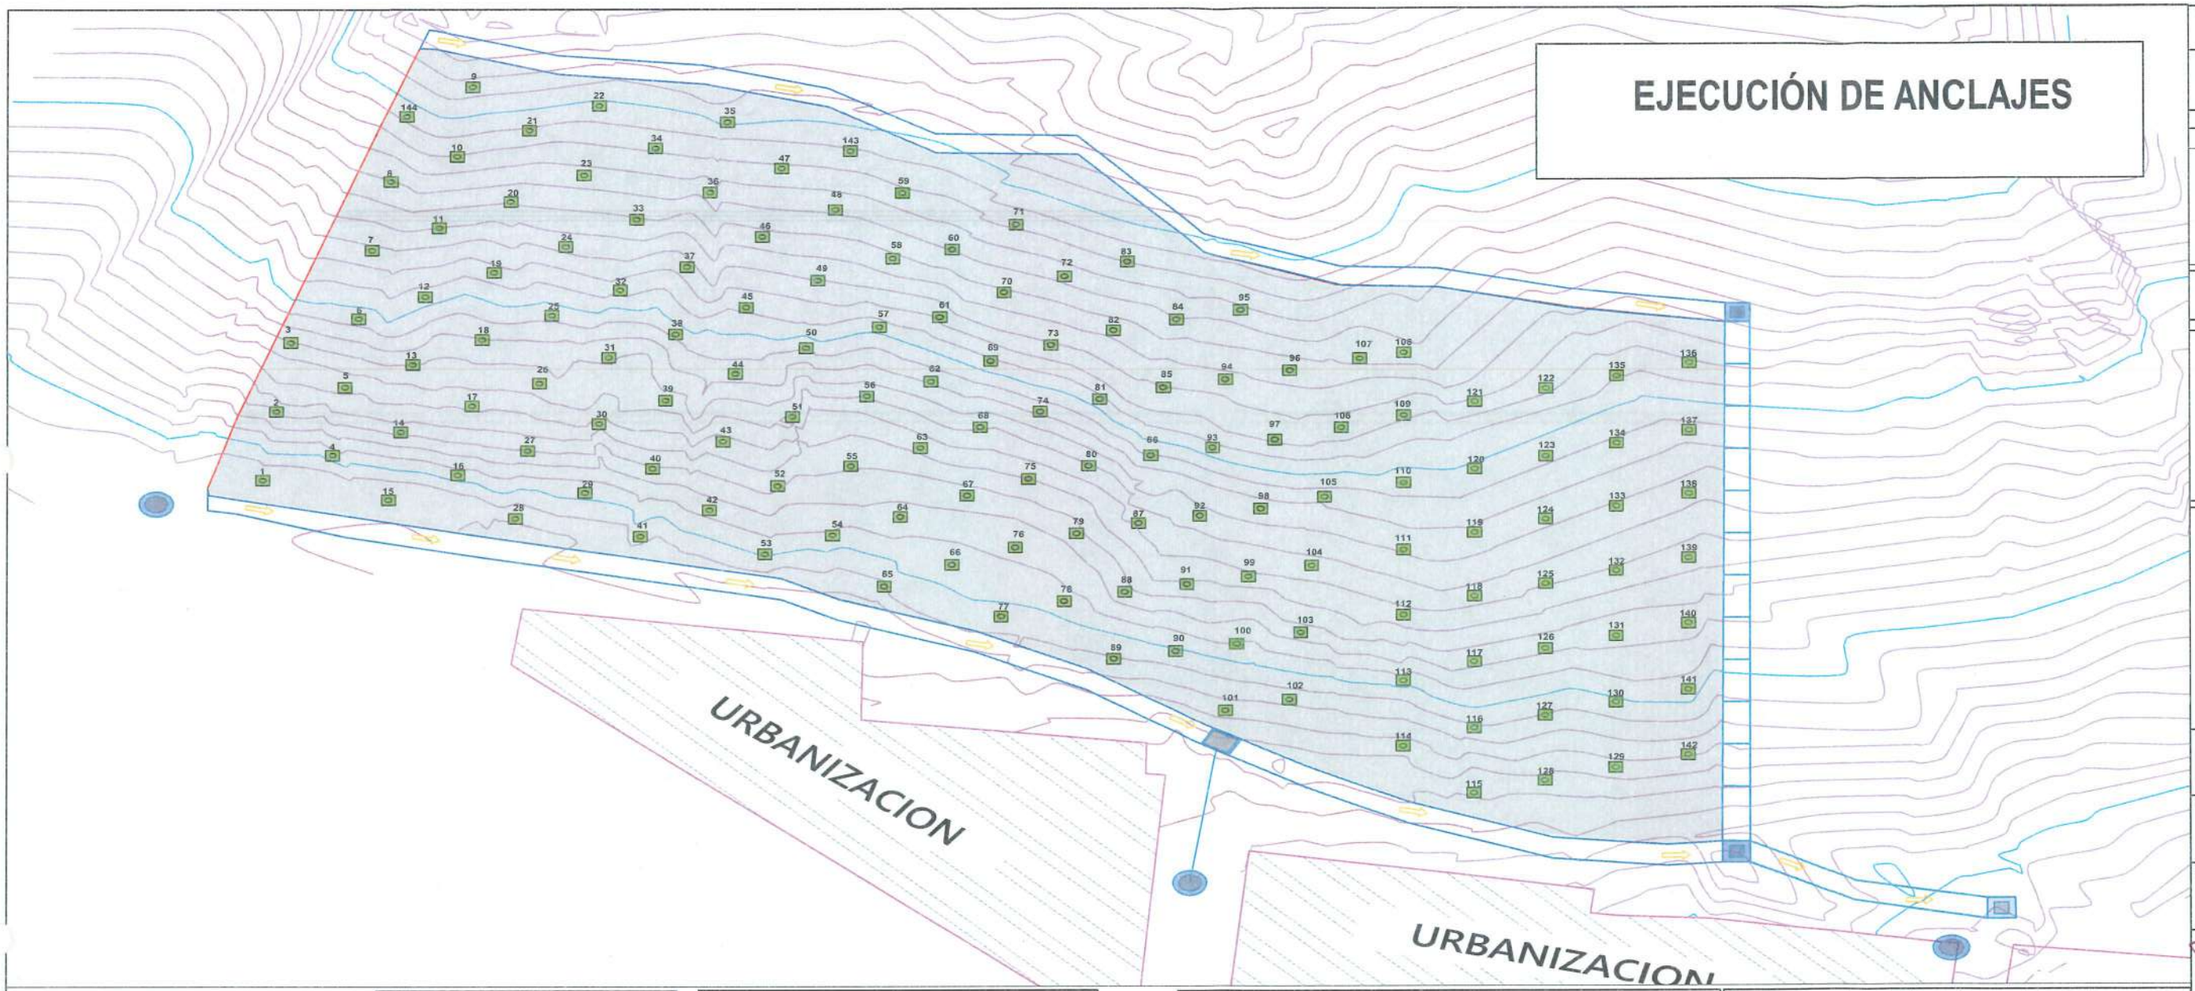

CONVENCIONES

- # ANCLAJES (144)
- CURVAS DE NIVEL ZONA INTERVENIDA
- CAJAS DE INSPECCION
- PANTALLA ANCLADA
- CANALES DE DESAGÜE
- TUBERIA DE CONEXION
- POZO
- EDIFICACIONES

NOTA:


LOS ANCLAJES SEÑALADOS CORRESPONDEN A LA EJECUCION DE PERFORACION, ENCAMISADO, INSTALACION E INYECCION DE LOS MISMOS, FUNDIDA DE ZAPATAS Y SU POSTERIOR TENSIONAMIENTO.


ANCLAJES TENSIONADOS ((incluye instalación de platinas de 200x200x12 mm, poporas de

agujeros y cuñas de 1/2)


144 UNIDADES

DETALLE ZAPATA - ANCLAJE ACTIVO

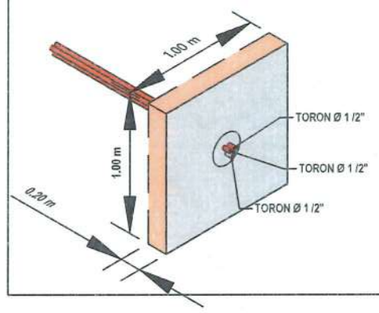

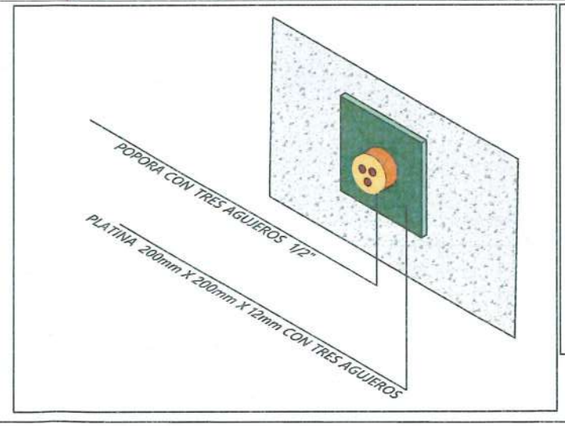

DETALLE ANCLAJE

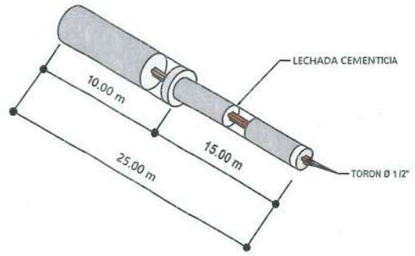

Fecha: MAYO 2026

Archivo Dwg: VILLAS DE LOS CABALLEROS.dwg

Plano No: 01

ENTIDAD CONTRATANTE:

CDMB

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS
EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Contiene:

EJECUCION DE ANCLAJES VILLAS DE LOS CABALLEROS

ELABORÓ:

Top. FABIAN LEONARDO ZAMBRANO LESMES

REVISÓ:

Ing. IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALES

APROBÓ:

Ing. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Escala: INDICADAS

Localizacion Grafica:



Modificaciones:

Fecha	Observaciones	Reviso

Fecha: MAYO 2026

Archivo Dwg: VILLAS DE LOS CABALLEROS.dwg

Plano No: 01

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.


MEMORIA DE CALCULO No.	14


SECCION	CUARTA	ITEM	4.02.03	Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=25m	UND	und

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	144,00	und	144,00

CANTIDADES ACUMULADAS			
ACTA N°1	ACTA N°2	ACTA N°3	TOTAL ACUMULADO(und)
24,00	98,00	22,00	144,00

Descripcion	Longitud (m)	Cantidad anclajes (und)	Total (und)
Suministro e instalación de anclajes	25,00	144,00	144,00
CANTIDADES TOTALES			144,00










ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

EJECUCIÓN DE ANCLAJES

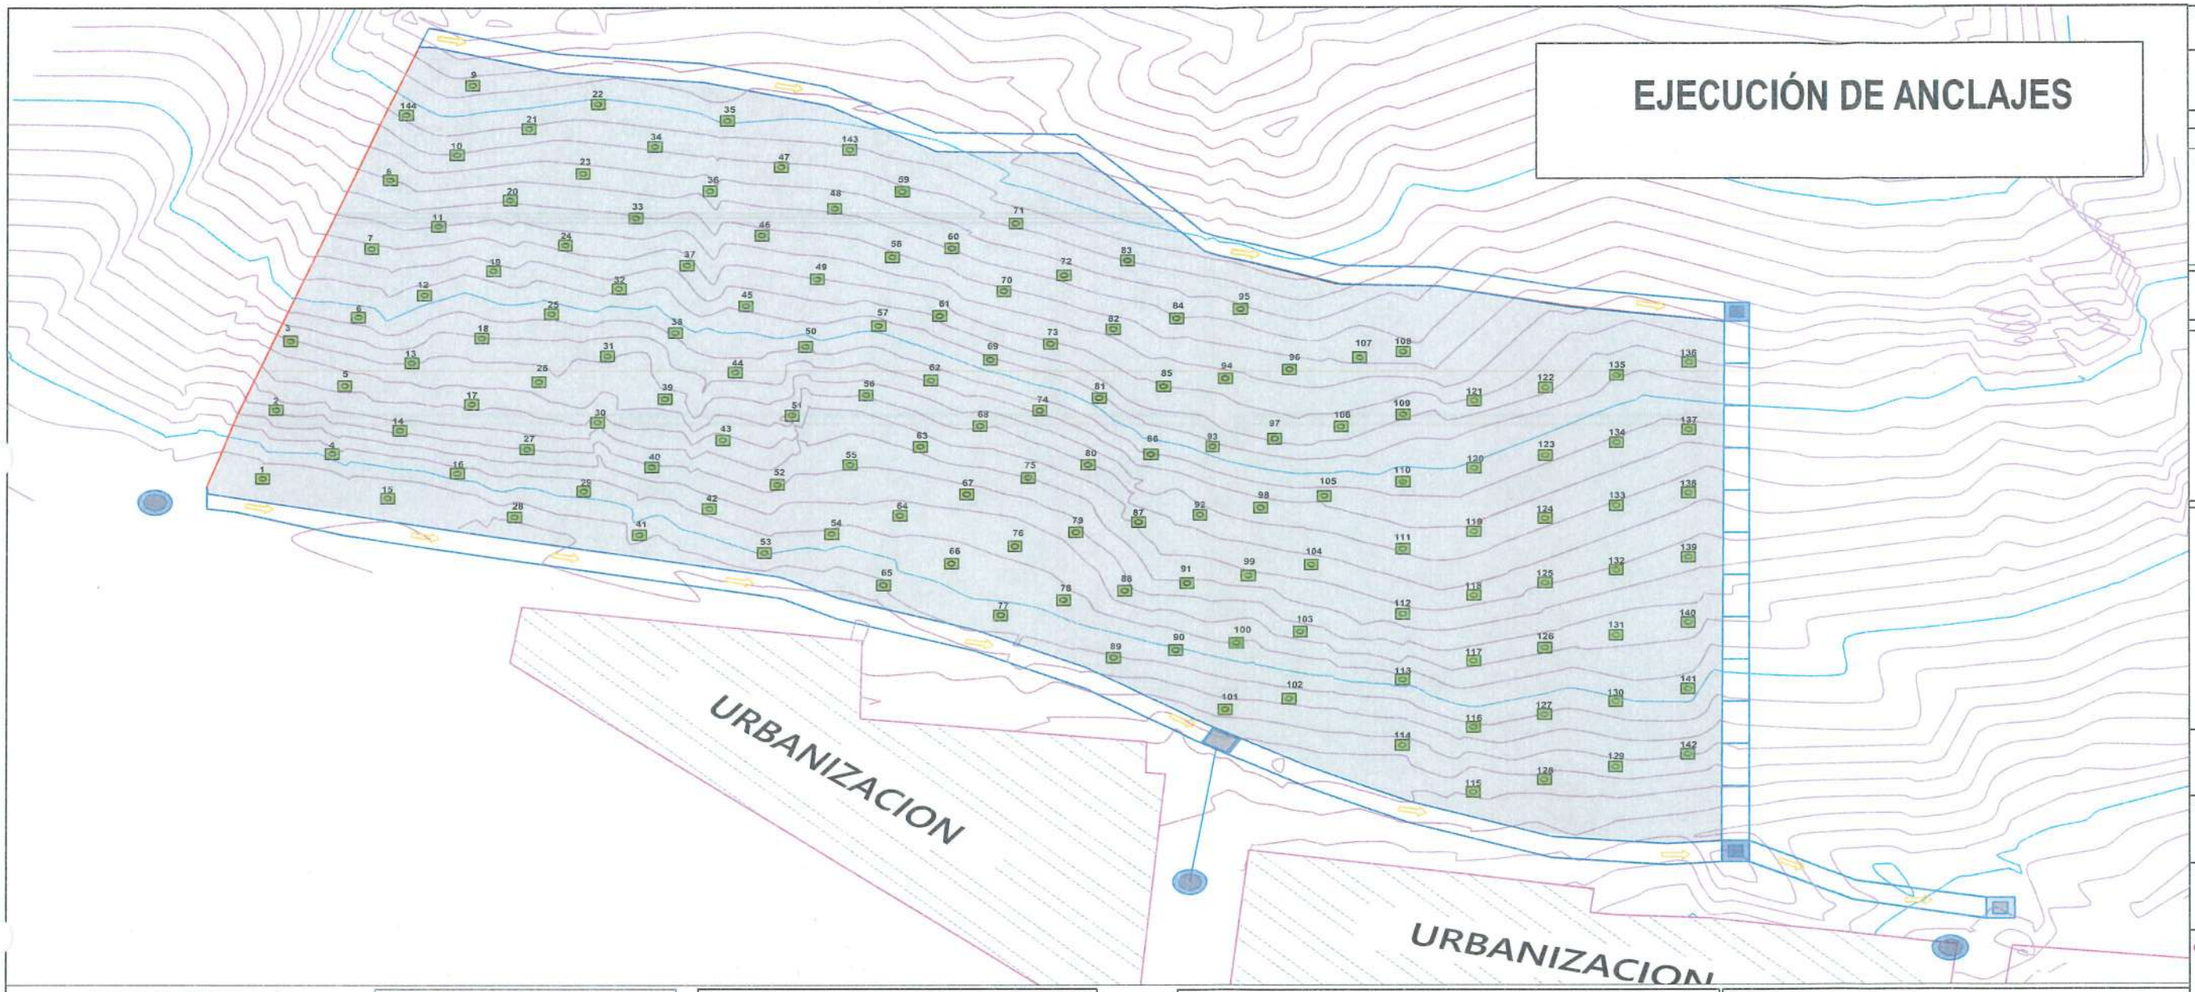

CONVENCIONES

- ANCLAJES (144)
- CURVAS DE NIVEL ZONA INTERVENIDA
- CAJAS DE INSPECCION
- PANTALLA ANCLADA
- CANALES DE DESAGÜE
- TUBERIA DE CONEXION
- POZO
- EDIFICACIONES

NOTA:


LOS ANCLAJES SEÑALADOS CORRESPONDEN A LA EJECUCION DE PERFORACION, ENCAMISADO, INSTALACION E INYECCION DE LOS MISMOS, FUNDIDA DE ZAPATAS Y SU POSTERIOR TENSIONAMIENTO.


ANCLAJES TENSIONADOS ((incluye instalación de platinas de 200x200x12 mm, poporas de

agujeros y cuñas de 1/2)


144 UNIDADES

DETALLE ZAPATA - ANCLAJE ACTIVO

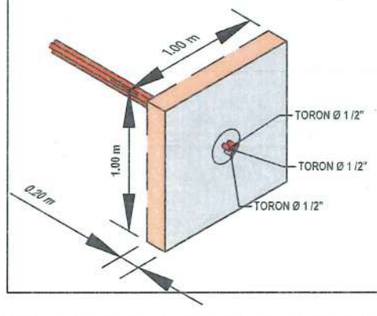

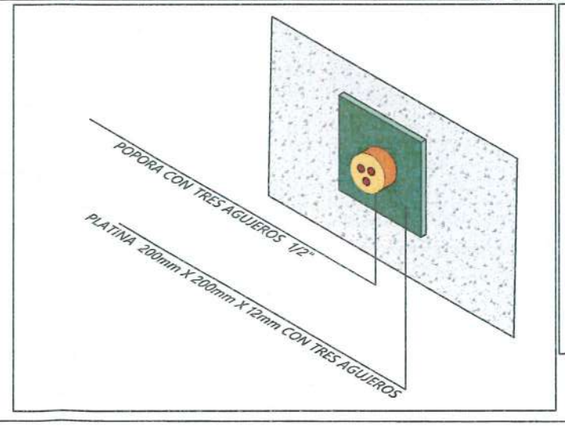

DETALLE ANCLAJE

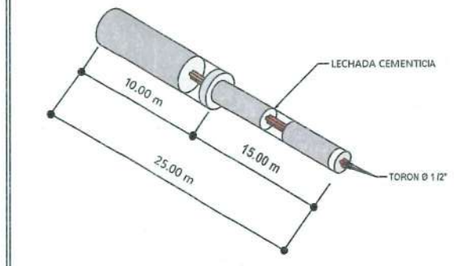

Fecha: MAYO 2026

Archivo Dwg: VILLAS DE LOS CABALLEROS.dwg

Plano No: 01

ENTIDAD CONTRATANTE:

CDMB

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS
EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Contiene: EJECUCION DE ANCLAJES VILLAS DE LOS CABALLEROS

ELABORÓ: Top. FABIAN LEONARDO ZAMBRANO LESMES

REVISÓ: Ing. IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALES

APROBÓ: Ing., JOHANNA MARICELA PADIERNA CASTIBLANCO

Escala: INDICADAS

Localizacion Grafica:



Modificaciones:

Fecha	Observaciones	Revisó

Fecha: MAYO 2026

Archivo Dwg: VILLAS DE LOS CABALLEROS.dwg

Plano No: 01

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

MEMORIA DE CALCULO No.	15

SECCION	CUARTA	ITEM	4,03	Tensionamiento de anclajes	UND	und

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	144,00	und	144,00

Descripción	Cantidad de anclajes	Total (und)
Tensionamiento de anclajes	144,00	144,00
CANTIDADES TOTALES		**144,00**










ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

EJECUCIÓN DE ANCLAJES

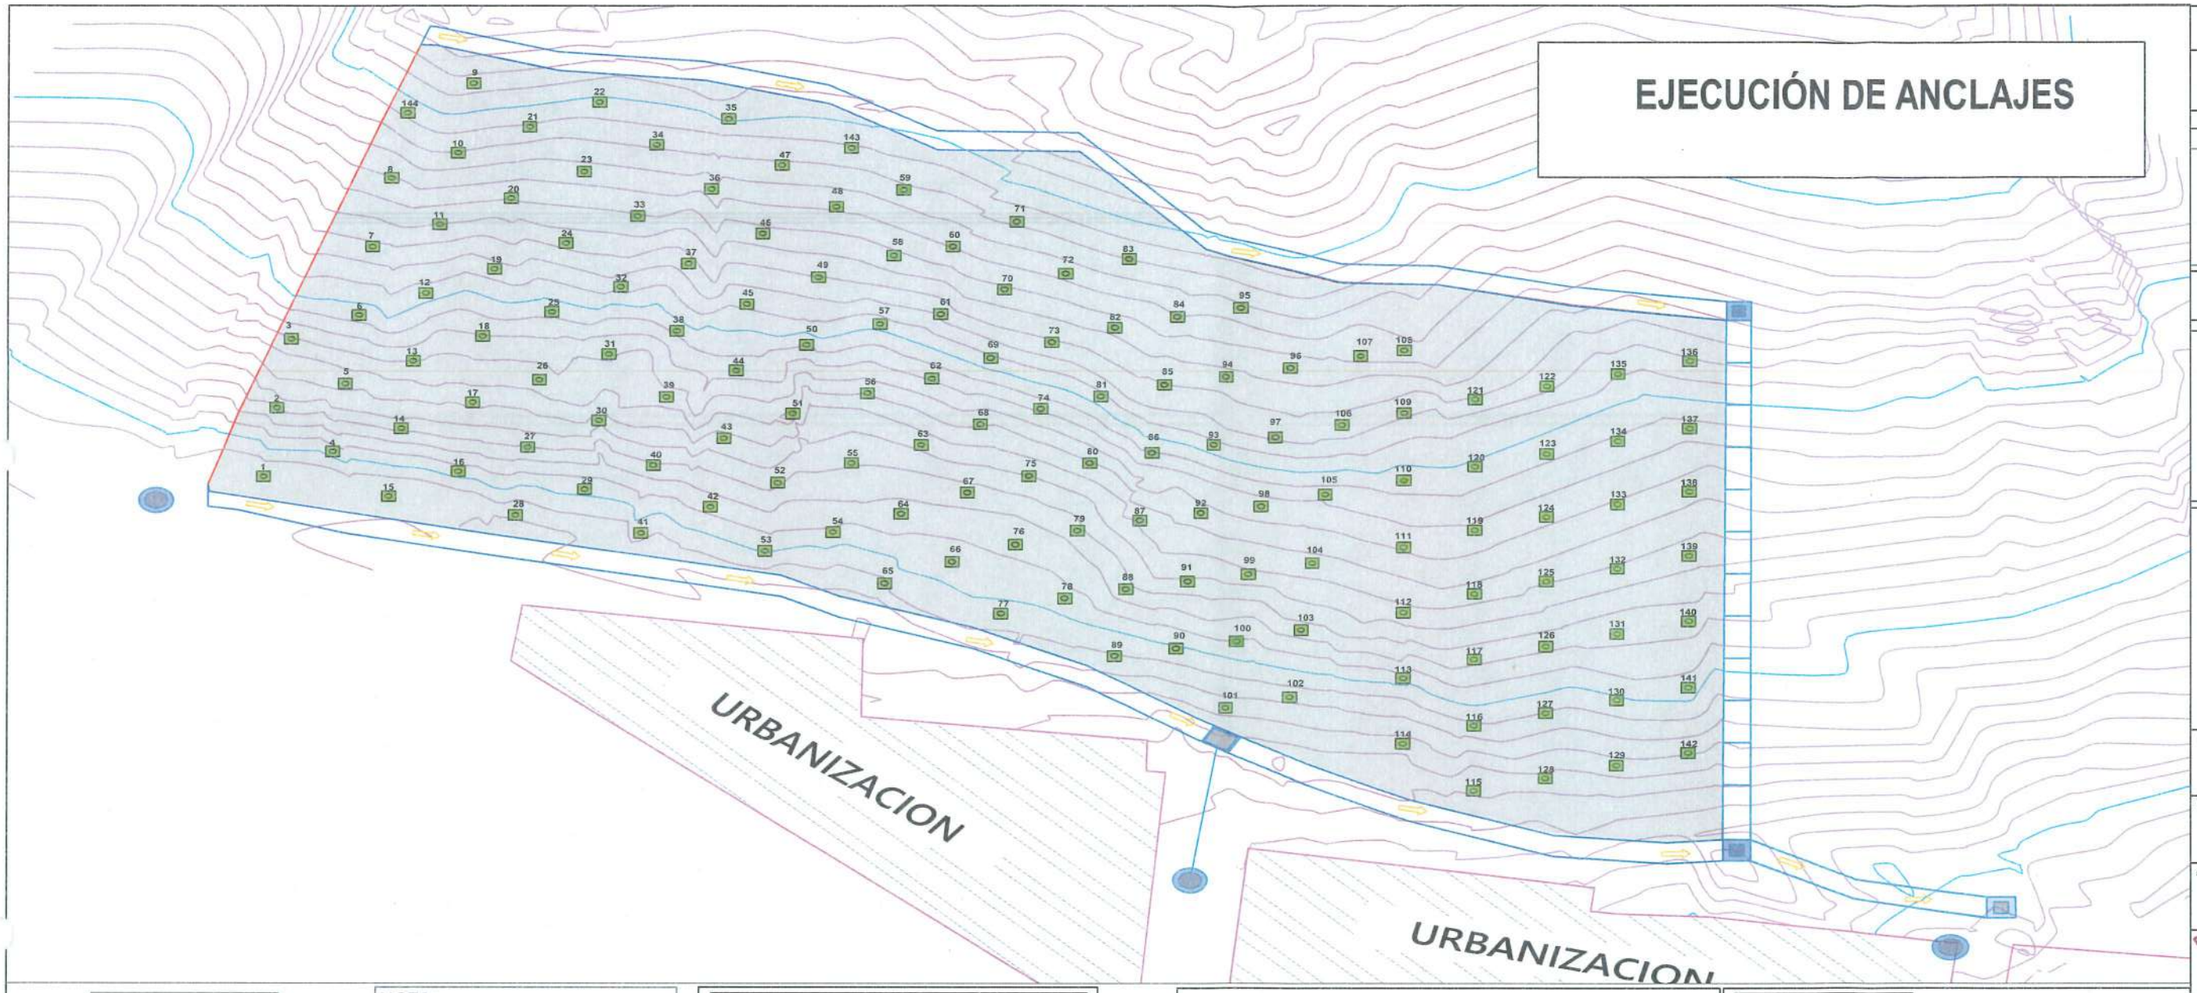

CONVENCIONES

- # ANCLAJES (144)
- CURVAS DE NIVEL ZONA INTERVENIDA
- CAJAS DE INSPECCION
- PANTALLA ANCLADA
- CANALES DE DESAGÜE
- TUBERIA DE CONEXION
- POZO
- EDIFICACIONES

NOTA:


LOS ANCLAJES SEÑALADOS CORRESPONDEN A LA EJECUCION DE PERFORACION, ENCAMISADO, INSTALACION E INYECCION DE LOS MISMOS, FUNDIDA DE ZAPATAS Y SU POSTERIOR TENSIONAMIENTO.


ANCLAJES TENSIONADOS ((incluye instalación de platinas de 200x200x12 mm, poporas de

agujeros y cuñas de 1/2)


144 UNIDADES

DETALLE ZAPATA - ANCLAJE ACTIVO

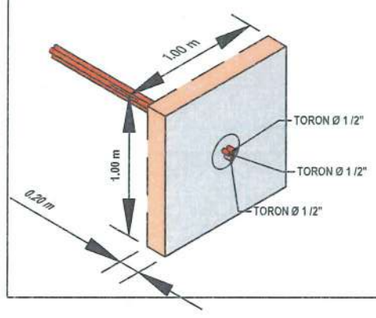

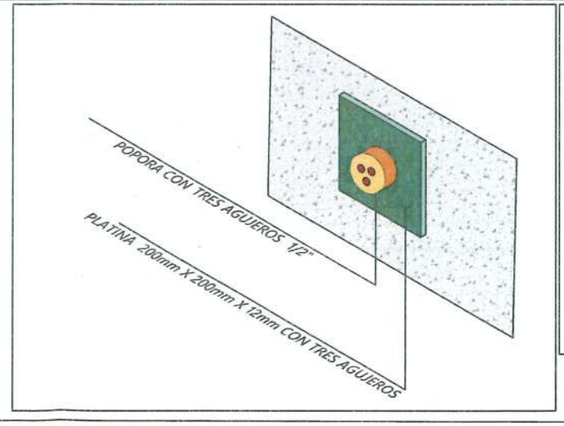

DETALLE ANCLAJE

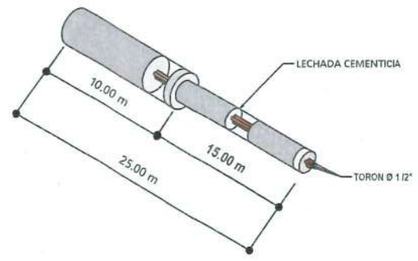

Fecha: MAYO 2026

Archivo Dwg: VILLAS DE LOS CABALLEROS.dwg

Plano No: 01

ENTIDAD CONTRATANTE:

CDMB

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATISTA

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS
EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Contiene: EJECUCION DE ANCLAJES VILLAS DE LOS CABALLEROS

ELABORÓ: Top. FABIAN LEONARDO ZAMBRANO LESMES

REVISÓ: Ing. IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALES

APROBÓ: Ing. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Escala: INDICADAS

Localizacion Grafica:



Modificaciones:

Fecha	Observaciones	Revisó

Fecha: MAYO 2026

Archivo Dwg: VILLAS DE LOS CABALLEROS.dwg

Plano No: 01

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN


CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

				MEMORIA DE CALCULO No.	16
SECCION	CUARTA	ITEM	4,04,01	Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	UND	m2

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	840,00	m2	840,00	**840,00**

DESCRIPCIÓN	UND	AREA	TOTAL (m2)
Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m	m2	840,00	840,00
	TOTAL		**840,00**



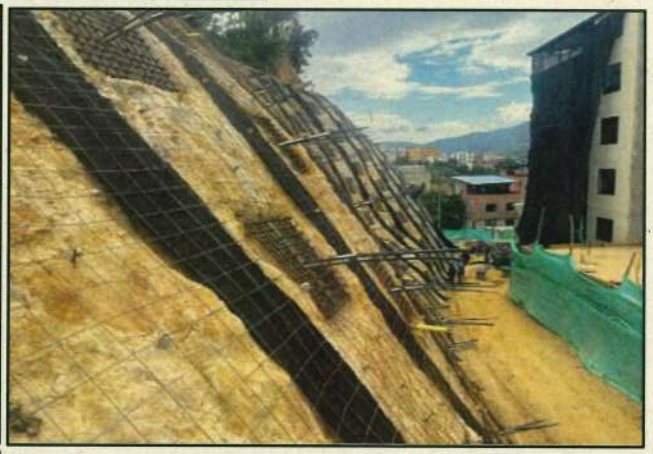





ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN


CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

				MEMORIA DE CALCULO No.	17
SECCION	CUARTA	ITEM	4,05	Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	UND	und

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA	
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	144,00	und	144,00	**144,00**

Descripción	Cantidad de anclajes (und)	Total (und)
Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros	144,00	144,00
CANTIDADES TOTALES		**144,00**



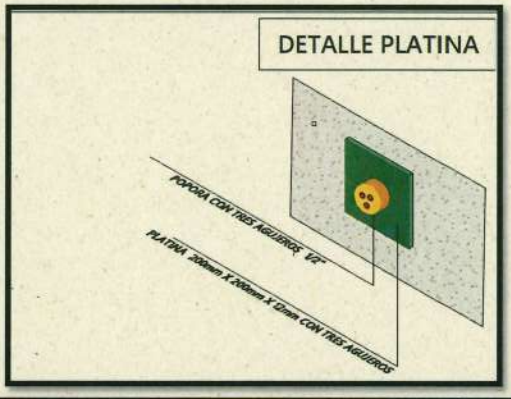





ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN


CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

						MEMORIA DE CALCULO No.	18
SECCION	CUARTA		ITEM	4,06	Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	UND	und

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	144,00	und	144,00

Descripción	Cantidad de anclajes (und)	Total (und)
Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"	144,00	144,00
CANTIDADES TOTALES		**144,00**



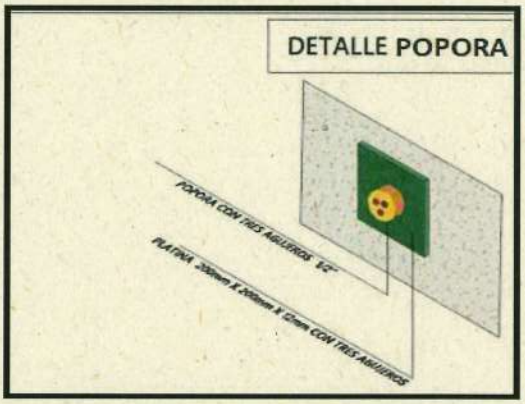





ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN


CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

					MEMORIA DE CALCULO No.		19
SECCION	CUARTA		ITEM	4,07	Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	UND	und

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	144,00	und	144,00

Descripción	Cantidad de anclajes (und)	Total (und)
Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje	144,00	144,00
CANTIDADES TOTALES		144,00



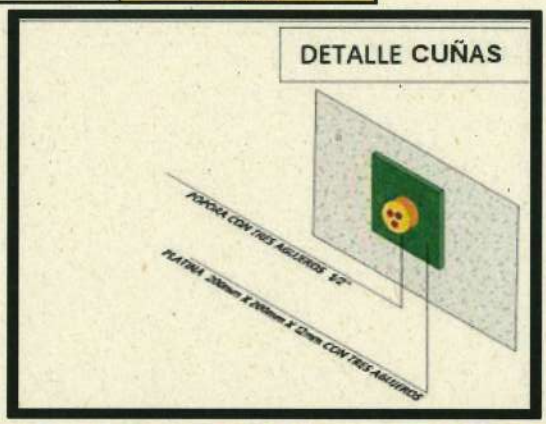





ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.


MEMORIA DE CALCULO No.	20

SECCION	QUINTA	ITEM	5,04	Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m	UND	m

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	2160,00	m	2160,00

CANTIDADES ACUMULADAS			
ACTA N°1	ACTA N°2	ACTA N°3	TOTAL ACUMULADO(m)
360,00	1470,00	330,00	2160,00

Descripcion	CANT	Longitud	ML
Perforaciones horizontales villa de los caballeros	144,00	15,00	2160,00
		CANTIDADES TOTALES	2160,00







ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN


CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

						MEMORIA DE CALCULO No.	21
SECCION	QUINTA	ITEM	5,05	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m	UND	m	

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	1440,00	m	1440,00

CANTIDADES ACUMULADAS			
ACTA N°1	ACTA N°2	ACTA N°3	TOTAL ACUMULADO(mes)
240,00	980,00	220,00	1440,00

Descripcion	CANT	Longitud	ML
Perforaciones horizontales villa de los caballeros	144,00	10,00	1440,00
		CANTIDADES TOTALES	1440,00







ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

				MEMORIA DE CALCULO No.	22
SECCION	SEXTA	ITEM	6,02	Canaleta (ancho = 1m; e=10cm)	UND	m

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	132,00	m	121,60

CANTIDADES ACUMULADAS		
ACTA N°2	ACTA N°4	TOTAL ACUMULADO(m)
45,60	76,00	121,60

UBICACIÓN	ABS INI	ABS FIN	LONG. (ml)	TOTAL (ml)
Corona del talud	0+0,00	0+45,60	45,60	45,60
Base del talud	0+0,00	0+76,00	76,00	76,00
		TOTAL		121,60







ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ


LONGITUD : 45.6 m

CANALETA SUPERIOR

SISTEMAS DE MANEJO AGUAS LLUVIAS-CANAL+DISIPADOR

CONVENCIONES

- # ANCLAJES (144) 2.40m↕ 2.10m↔
- CURVAS DE NIVEL ZONA INTERVENIDA
- CAJAS DE INSPECCION
- PANTALLA ANCLADA
- CANALES DE DESAGÜE
- TUBERIA DE CONEXION
- POZO
- EDIFICACIONES

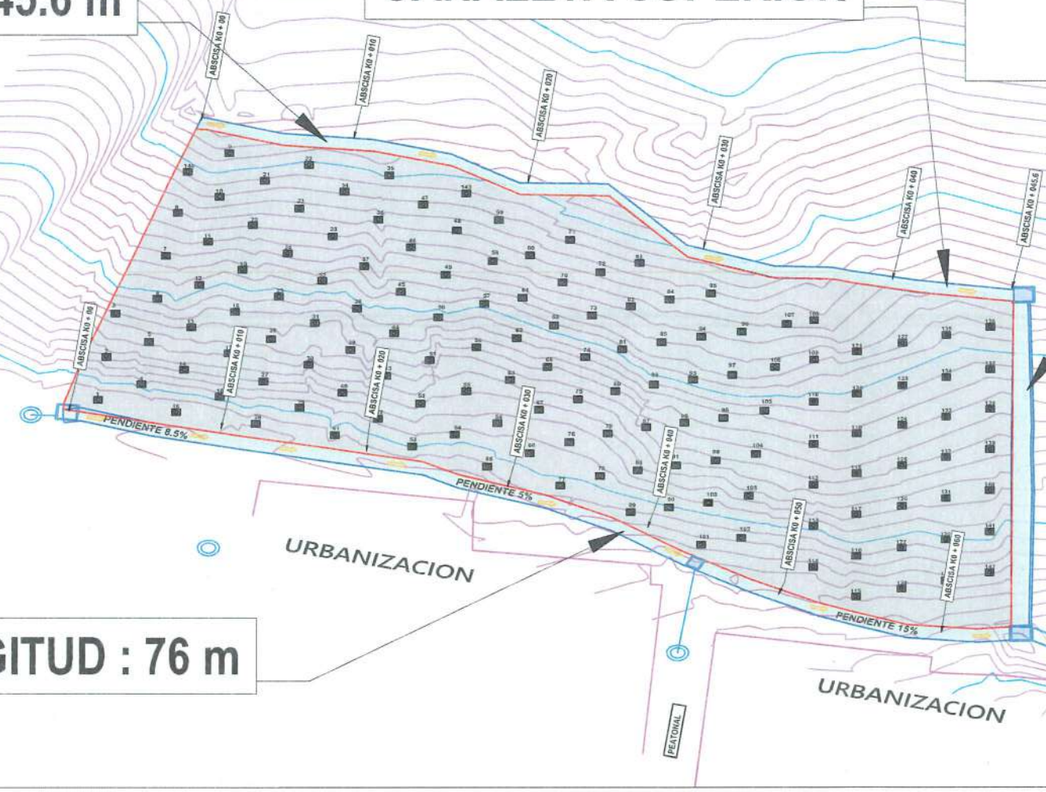


DISIPADOR


CANALETA INFERIOR

LONGITUD : 76 m


- CANALETA SUPERIOR 45.6 m
- CANALETA INFERIOR 76 m

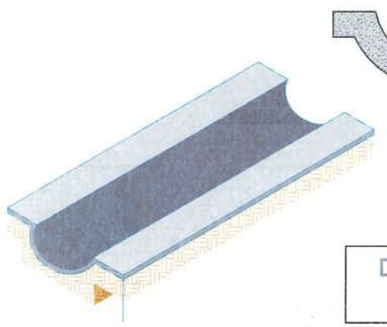

DETALLE CUNETA DE 1.00 m
ESPESOR 0.10 m

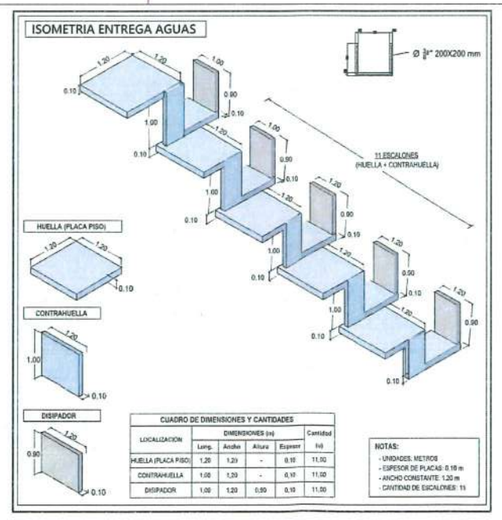

DETALLE DISIPADOR

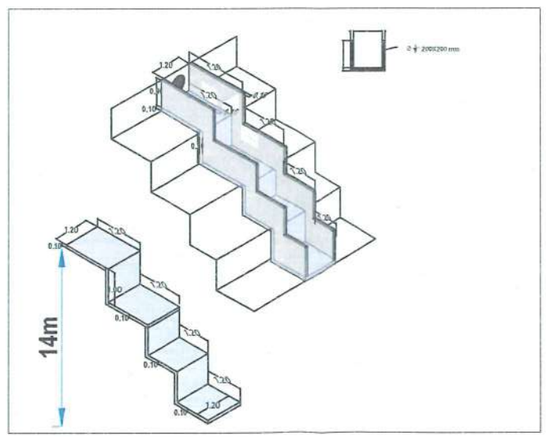

Fecha: MAYO 2026

Archivo Dwg: VILLAS DE LOS CABALLEROS.dwg

Plano No: 03

ENTIDAD CONTRATANTE:

CDMB

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Contiene: SISTEMA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS VILLAS DE LOS CABALLEROS

ELABORO: Top. FABIAN LEONARDO ZAMBRANO LESMES

REVISO: Ing. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALES

APROBO: Ing. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTILBLANCO

Escala: INDICADAS

Localizacion Grafica:



Modificaciones:

Fecha	Observaciones	Revision

Fecha: MAYO 2026

Archivo Dwg: VILLAS DE LOS CABALLEROS.dwg

Plano No: 03

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN


CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

MEMORIA DE CALCULO No.	23

SECCION	SEXTA	ITEM	6.03	Estructura de disipación de energia	UND	m

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	14,00	m	14,00

Descripción	Cantidad (ml)	Total (ml)
Estructura de disipación de energía	14,00	14,00
CANTIDADES TOTALES		**14,00**

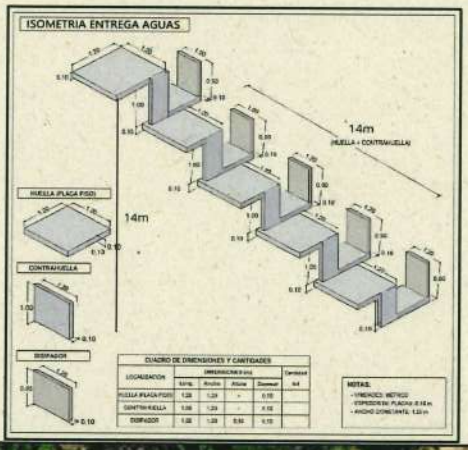









ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ

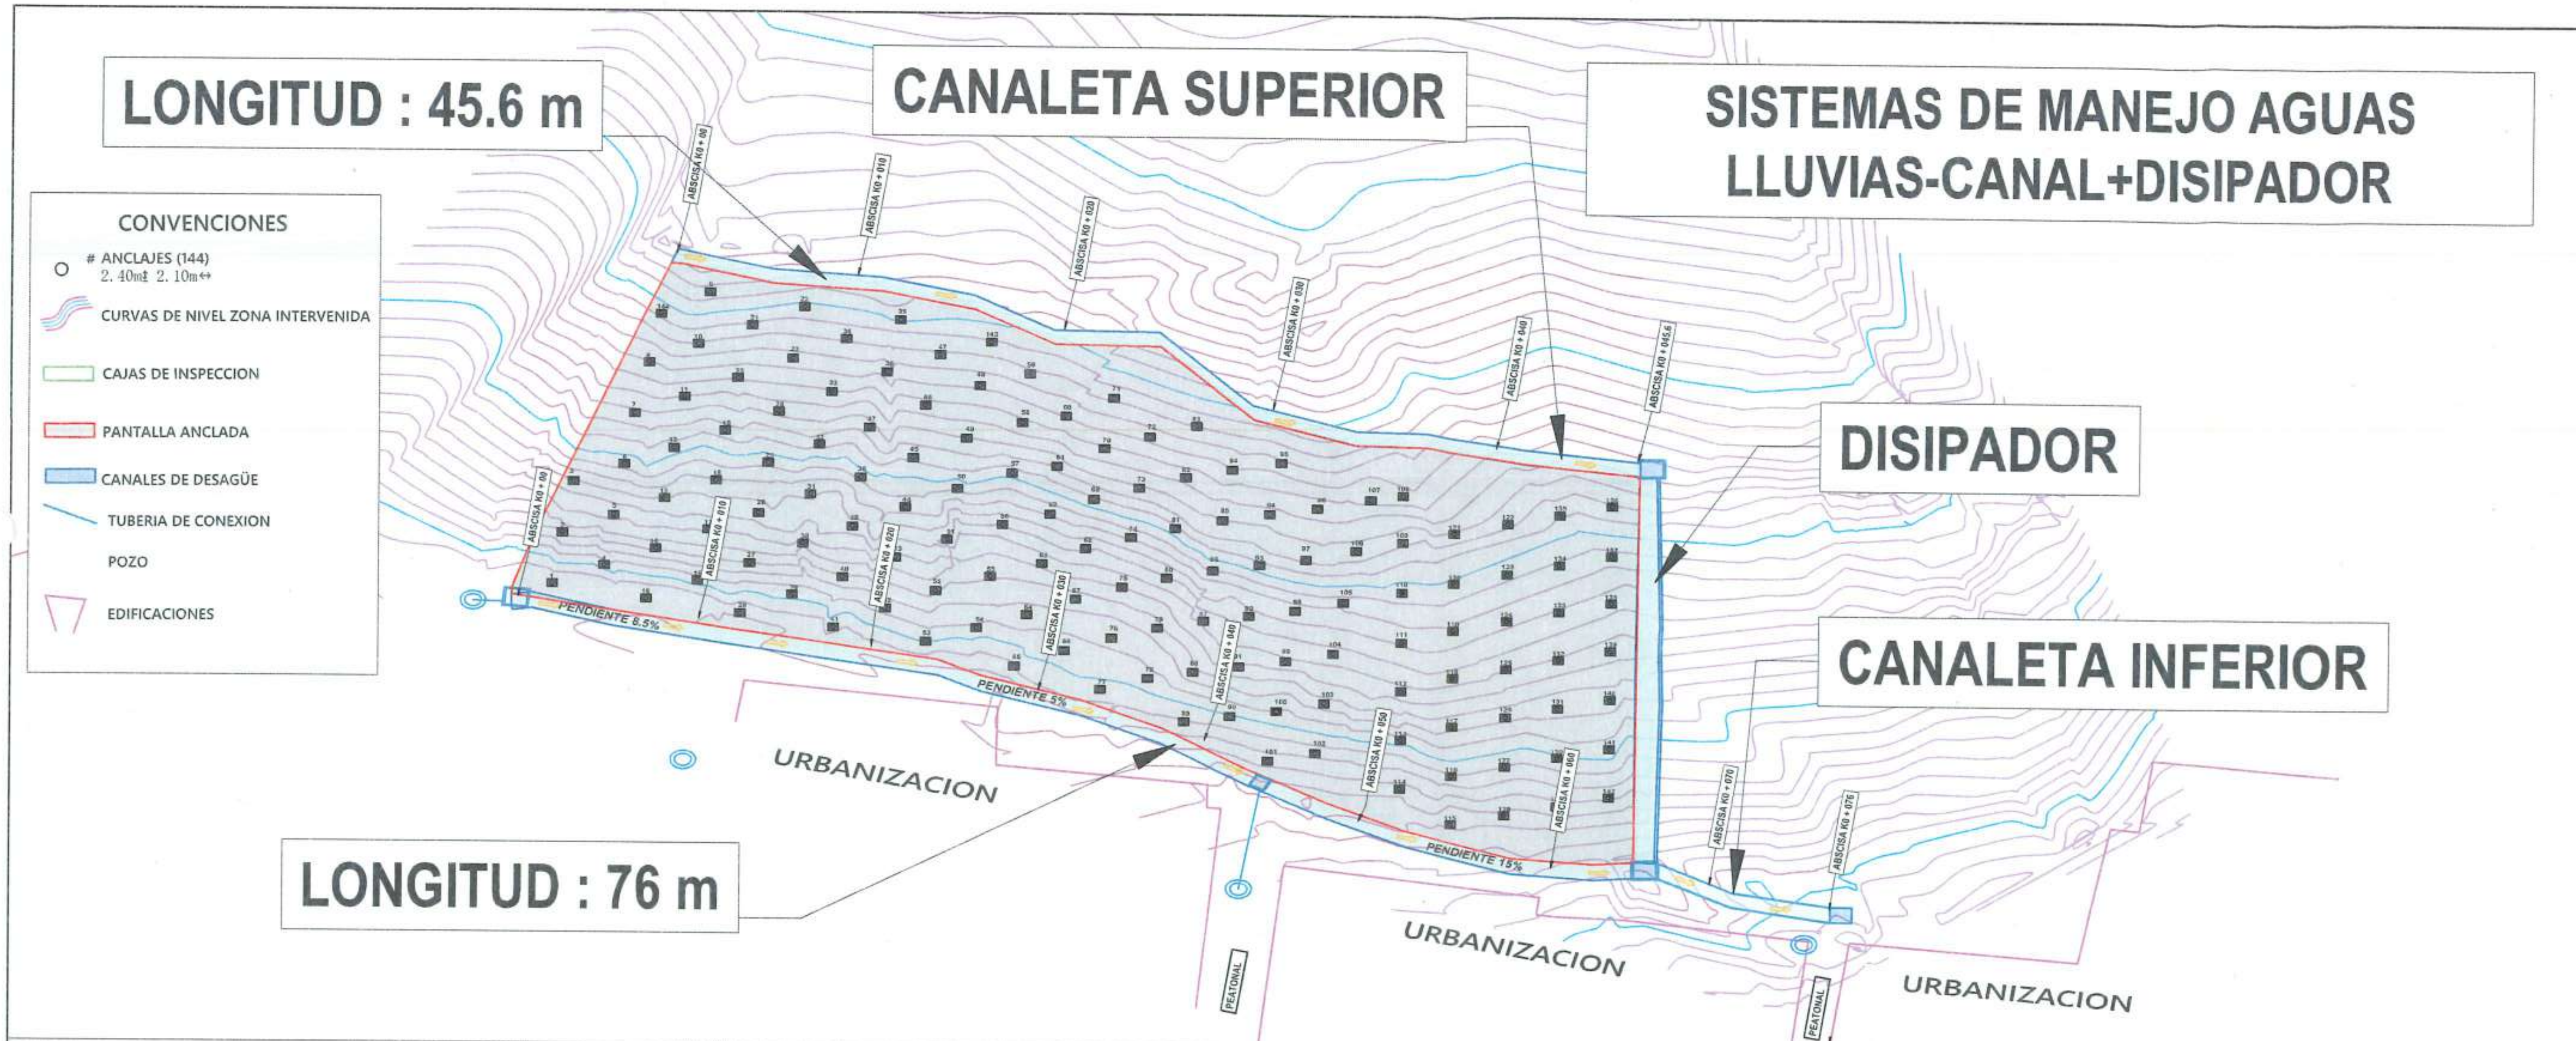


CANALETA SUPERIOR 45.6 m

CANALETA INFERIOR 76 m

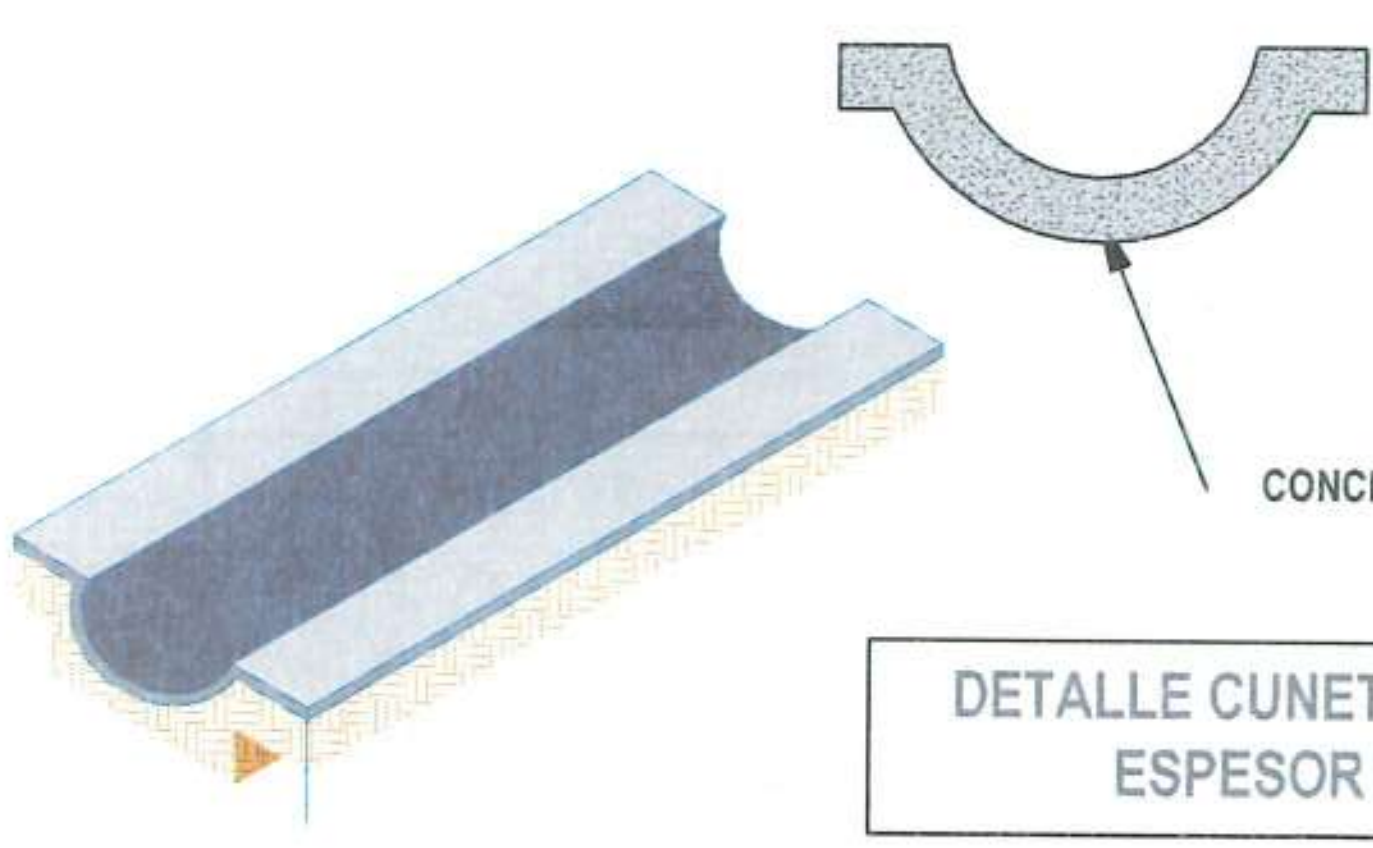

DETALLE CUNETA DE 1.00 m
ESPESOR 0.10 m

ISOMETRIA ENTREGA AGUAS

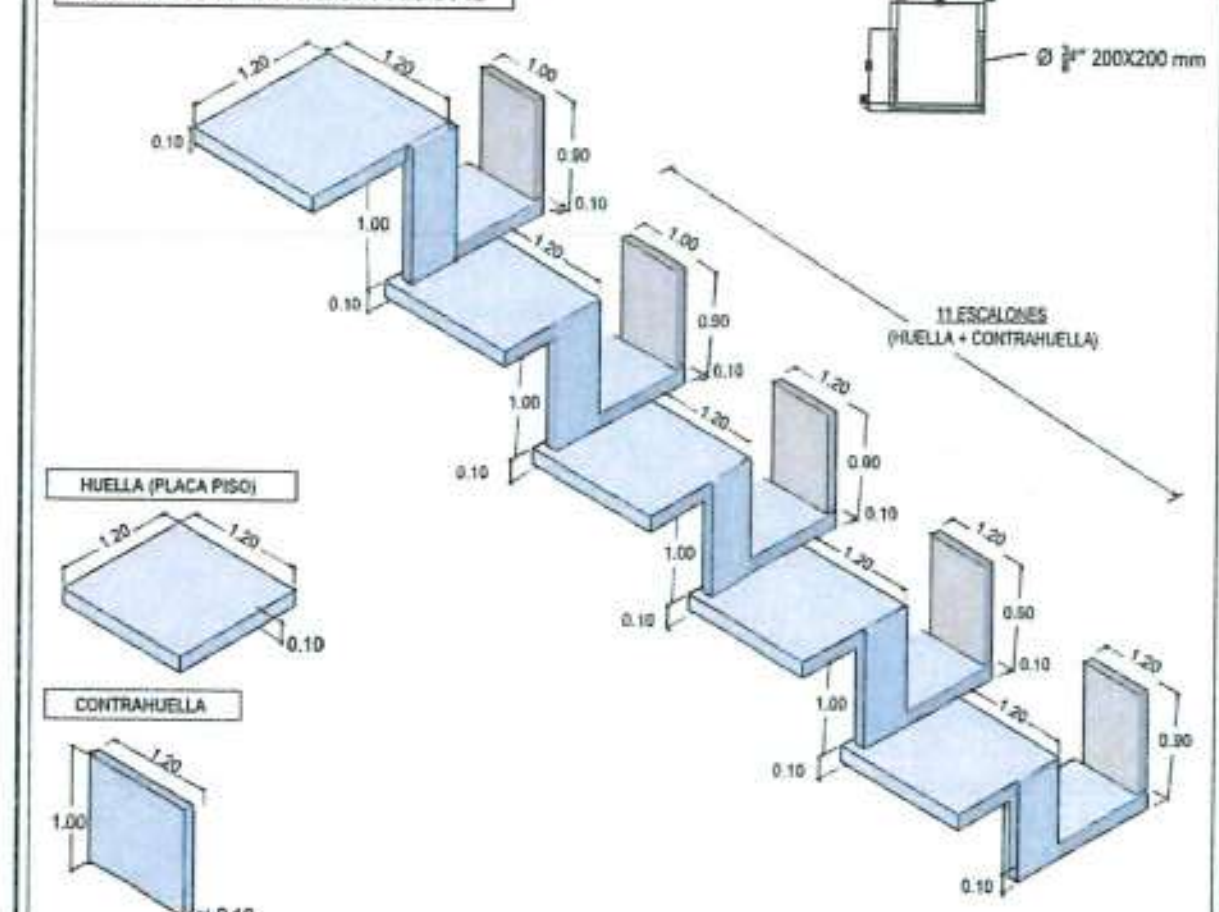


CUADRO DE DIMENSIONES Y CANTIDADES

LOCALIZACION	DIMENSIONES (m)				Cantidad
	Long.	Ancho	Altura	Espesor	(u)
HUELLA (PLACA PISO)	1,20	1,20	-	0,10	11,00
CONTRAHUELLA	1,00	1,20	-	0,10	11,00
DISIPADOR	1,00	1,20	0,90	0,10	11,00

NOTAS:
- UNIDADES: METROS
- ESPESOR DE PLACAS: 0.10 m
- ANCHO CONSTANTE: 1,20 m
- CANTIDAD DE ESCALONES: 11

DETALLE DISIPADOR

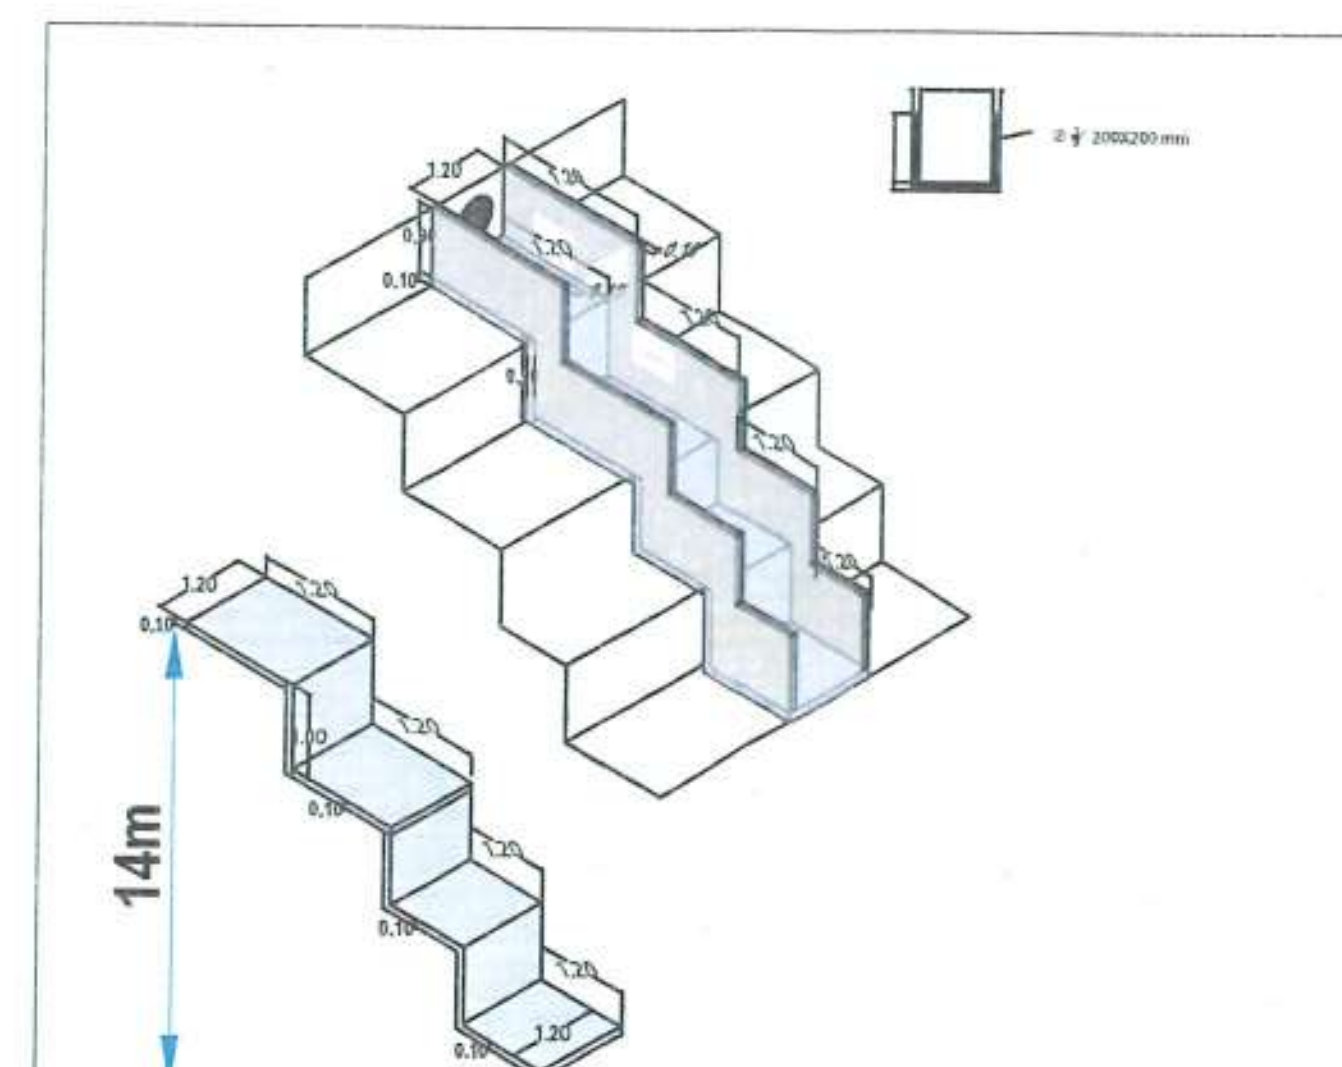

Fecha: MAYO 2026

Archivo Dwg: VILLAS DE LOS CABALLEROS.dwg

Plano No: 03

ENTIDAD CONTRATANTE:

CDMB

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATISTA:

CONSORCIO CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Contiene: SISTEMA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS VILLAS DE LOS CABALLEROS

ELABORO: Top. FABIAN LEONARDO ZAMBRANO LESMES

REVISO: Ing. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALES

APROBO: Ing. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO

Escala: INDICADAS

Localizacion Grafica:



Modificaciones:

Fecha	Observaciones	Reviso

Fecha: MAYO 2026

Archivo Dwg: VILLAS DE LOS CABALLEROS.dwg

Plano No: 03

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO
CONSOLIDACIÓN GIRÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

				MEMORIA DE CALCULO No.	24
SECCION	SEXTA	ITEM	6,06	Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdos de la estructura estabilizadora	UND	m

PERIODO	CANTIDAD CONTRACTUAL	UND	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
15 de octubre del 2025 al 14 de abril de 2026	408,00	m	408,00	

DESCRIPCIÓN	UND	Longitud	TOTAL (m)
Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdos de la estructura	ML	408,00	408,00
	TOTAL		408,00

Geodren permadrain	
Linea	Longitud
1	18,42
2	18,19
3	18,19
4	18,31
5	18,64
6	18,64
7	18,64
8	18,53
9	18,31
10	17,97
11	17,29
12	17,29
13	17,18
14	17,41
15	17,74
16	18,19
17	19,09
18	19,65
19	19,65
20	20,21
21	20,21
22	20,25
Total	408,00





ELABORADO POR:	APROBADO POR:
ING. JOHANNA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO	ING. IBÁN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ
