

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CRTR	CPTR	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	%AVANCE	% EJECUTADO	Tarea - % Completado	Tarea - % Planeado Duración	Tarea - % Completado Valor Ganado	Tarea - % Planeado Valor Ganado	Costo	Predecesoras	Sucesoras
0	**ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 2**	162,73 días	11/11/25	10/07/26	$ 4.619.275.308,90	$ 1.358.037.883,89	$ 1.286.707.373,12	29,4	27,82	-1,58	28%	46,09	28,19	29,4	29,53	$ 4.619.275.308,90		
1	ACTA DE INICIO	0 días	11/11/25	11/11/25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	100	100	100	100	$ 0,00		2
2	PLANEACION PROYECTO Y PLAN DE CAMPO	10 días	11/11/25	25/11/25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	100	100	100	100	$ 0,00	1	15;6;143;20
3	**VÍA DESDE EL CASCO URBANO DE GUATAVITA A LA VEREDA CARBONERA**	115 días	9/12/25	27/05/26	$ 659.896.472,70	$ 359.899.155,17	$ 314.753.622,44	54,54	47,7	-6,84	48%	64,77	28,14	54,54	55,2	$ 659.896.472,70		
4	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	67 días	9/12/25	17/03/26	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0	100%	100	100	100	100	$ 39.238.478,10		
13	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	85 días	15/01/26	19/05/26	$ 135.622.344,80	$ 66.772.399,16	$ 49.075.485,00	49,23	36,19	-13,04	36%	76,6	60,17	49,23	49,84	$ 135.622.344,80		
74	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	54 días	16/02/26	6/05/26	$ 18.871.444,80	$ 16.846.921,99	$ 16.821.615,45	89,27	89,14	-0,13	89%	89,23	57,89	89,27	89,27	$ 18.871.444,80		
84	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	48 días	2/03/26	12/05/26	$ 215.710.179,00	$ 103.294.359,99	$ 98.260.300,73	47,89	45,55	-2,34	46%	51,06	54,61	47,89	48,8	$ 215.710.179,00		
106	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	46 días	2/03/26	8/05/26	$ 18.871.444,80	$ 10.524.459,60	$ 9.726.052,32	55,77	51,54	-4,23	52%	59,37	25	55,77	57,03	$ 18.871.444,80		
120	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	49 días	2/03/26	13/05/26	$ 29.897.644,50	$ 26.516.363,27	$ 26.338.401,10	88,69	88,1	-0,59	88%	75,58	0	88,69	88,69	$ 29.897.644,50		
133	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	30 días	20/03/26	6/05/26	$ 30.831.284,00	$ 14.980.485,74	$ 7.916.140,49	48,59	25,68	-22,91	26%	71,43	0	48,59	52,74	$ 30.831.284,00		
141	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	75 días	20/01/26	8/05/26	$ 29.897.644,50	$ 15.322.434,50	$ 10.552.109,81	51,25	35,29	-15,96	35%	86,51	0	51,25	51,41	$ 29.897.644,50		
170	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	35 días	18/03/26	11/05/26	$ 32.710.125,00	$ 16.501.089,85	$ 15.210.208,14	50,45	46,5	-3,95	47%	71,07	0	50,45	50,45	$ 32.710.125,00		
194	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	40 días	13/03/26	13/05/26	$ 65.932.204,70	$ 41.483.129,60	$ 35.394.799,20	62,92	53,68	-9,24	54%	77,2	0	62,92	62,92	$ 65.932.204,70		
218	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	63 días	10/02/26	13/05/26	$ 22.366.984,20	$ 8.419.033,36	$ 6.220.032,10	37,64	27,81	-9,83	28%	73,53	26,47	37,64	37,64	$ 22.366.984,20		
231	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	22 días	20/04/26	20/05/26	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	5,56	0	0	0	$ 19.946.694,30		
245	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	27 días	20/04/26	27/05/26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 0,00		
253	**VÍA DESDE EL SECTOR LA PLAYA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN**	125 días	9/12/25	11/06/26	$ 659.896.472,70	$ 274.864.230,28	$ 255.573.781,34	41,65	38,73	-2,92	39%	45,85	28,14	41,65	41,69	$ 659.896.472,70		
254	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	67 días	9/12/25	17/03/26	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0	100%	100	100	100	100	$ 39.238.478,10		
263	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	70 días	20/02/26	3/06/26	$ 135.622.344,80	$ 49.596.252,80	$ 44.046.223,89	36,57	32,48	-4,09	32%	49,58	60,17	36,57	36,79	$ 135.622.344,80		
324	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	69 días	20/02/26	2/06/26	$ 18.871.444,80	$ 15.638.083,03	$ 16.593.856,64	82,87	87,93	5,06	88%	81,82	57,89	82,87	82,87	$ 18.871.444,80		
334	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	62 días	3/03/26	2/06/26	$ 215.710.179,00	$ 95.679.448,28	$ 89.528.352,68	44,36	41,5	-2,86	42%	56,74	54,61	44,36	44,36	$ 215.710.179,00		
356	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	58 días	3/03/26	27/05/26	$ 18.871.444,80	$ 7.875.199,08	$ 7.258.248,00	41,73	38,46	-3,27	38%	29,69	25	41,73	41,73	$ 18.871.444,80		
370	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	62 días	3/03/26	2/06/26	$ 29.897.644,50	$ 21.113.431,80	$ 21.042.246,93	70,62	70,38	-0,24	70%	48,42	0	70,62	70,57	$ 29.897.644,50		
383	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	50 días	6/03/26	20/05/26	$ 30.831.284,00	$ 10.888.165,16	$ 7.916.140,49	35,32	25,68	-9,64	26%	81,54	0	35,32	35,32	$ 30.831.284,00		
391	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	85 días	20/01/26	22/05/26	$ 29.897.644,50	$ 12.495.557,78	$ 10.552.109,81	41,79	35,29	-6,5	35%	75,49	0	41,79	41,83	$ 29.897.644,50		
420	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	30 días	13/04/26	25/05/26	$ 32.710.125,00	$ 1.771.798,44	$ 0,00	5,42	0	-5,42	0%	44,65	0	5,42	5,42	$ 32.710.125,00		
444	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	40 días	25/03/26	22/05/26	$ 65.932.204,70	$ 17.426.385,45	$ 16.256.694,43	26,43	24,66	-1,77	25%	59,55	0	26,43	26,41	$ 65.932.204,70		
468	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	41 días	27/03/26	27/05/26	$ 22.366.984,20	$ 3.141.430,37	$ 3.141.430,37	14,04	14,04	0	14%	14,71	26,47	14,04	14,04	$ 22.366.984,20		
481	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	29 días	23/04/26	3/06/26	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	1,23	0	0	0	$ 19.946.694,30		
495	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	27 días	5/05/26	11/06/26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 0,00		
503	**VÍA DESDE EL SECTOR ALTO DE MINAS AL CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO**	126 días	9/12/25	12/06/26	$ 659.896.472,70	$ 140.166.346,37	$ 166.734.462,40	21,24	25,27	4,03	25%	27,34	28,14	21,24	21,24	$ 659.896.472,70		
504	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	70 días	9/12/25	19/03/26	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0	100%	100	100	100	100	$ 39.238.478,10		
513	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	55 días	18/03/26	9/06/26	$ 135.622.344,80	$ 7.152.779,27	$ 19.796.150,62	5,27	14,6	9,33	15%	22,56	60,17	5,27	5,29	$ 135.622.344,80		
574	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	63 días	24/02/26	27/05/26	$ 18.871.444,80	$ 11.242.380,68	$ 9.370.648,46	59,57	49,66	-9,91	50%	69	57,89	59,57	59,62	$ 18.871.444,80		
584	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	63 días	3/03/26	3/06/26	$ 215.710.179,00	$ 35.280.598,16	$ 50.044.761,52	16,36	23,2	6,84	23%	35,46	54,61	16,36	16,36	$ 215.710.179,00		
606	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	60 días	3/03/26	29/05/26	$ 18.871.444,80	$ 7.875.199,08	$ 7.258.248,00	41,73	38,46	-3,27	38%	64,06	25	41,73	41,73	$ 18.871.444,80		
620	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	64 días	3/03/26	4/06/26	$ 29.897.644,50	$ 12.931.917,66	$ 20.643.611,67	43,25	69,05	25,8	69%	48,6	0	43,25	43,25	$ 29.897.644,50		
633	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	37 días	13/04/26	3/06/26	$ 30.831.284,00	$ 933.271,30	$ 0,00	3,03	0	-3,03	0%	2,38	0	3,03	2,88	$ 30.831.284,00		
641	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	91 días	20/01/26	1/06/26	$ 29.897.644,50	$ 11.522.418,76	$ 10.552.109,81	38,54	35,29	-3,25	35%	72,09	0	38,54	38,63	$ 29.897.644,50		
670	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	30 días	22/04/26	3/06/26	$ 32.710.125,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 32.710.125,00		
694	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	49 días	20/03/26	2/06/26	$ 65.932.204,70	$ 13.989.303,35	$ 9.830.454,22	21,22	14,91	-6,31	15%	44,85	0	21,22	21,15	$ 65.932.204,70		
718	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	24 días	30/04/26	3/06/26	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	26,47	0	0	$ 22.366.984,20		
731	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	27 días	30/04/26	9/06/26	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 19.946.694,30		



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CRTR	CPTR	%PROGRA	%EJECU	%AVANC	% EJECUTADO	Tarea - % Completado	Tarea - % Planeado (Duración)	Tarea - % Completado (Valor Ganado)	Tarea - % Planeado (Valor Ganado)	Costo	Predecesoras	Sucesoras
745	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	25 días	8/05/26	12/06/26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 0,00		
753	VÍA CORRALEJA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA	129 días	9/12/25	18/06/26	$ 659.896.472,70	$ 142.324.700,46	$ 116.404.877,71	21,57	17,64	-3,93	18%	24,2	28,14	21,57	21,68	$ 659.896.472,70		
754	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	70 días	9/12/25	19/03/26	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0	100%	100	100	100	100	$ 39.238.478,10		
763	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	63 días	16/03/26	18/06/26	$ 135.622.344,80	$ 9.109.081,34	$ 4.852.369,90	6,72	3,58	-3,14	4%	11,98	60,17	6,72	6,72	$ 135.622.344,80		
824	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	69 días	20/02/26	2/06/26	$ 18.871.444,80	$ 16.233.625,85	$ 15.943.117,16	86,02	84,48	-1,54	84%	88,89	57,89	86,02	86,02	$ 18.871.444,80		
834	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	62 días	3/03/26	2/06/26	$ 215.710.179,00	$ 28.642.928,08	$ 14.357.669,51	13,28	6,66	-6,62	7%	35,46	54,61	13,28	13,28	$ 215.710.179,00		
856	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	66 días	3/03/26	9/06/26	$ 18.871.444,80	$ 3.970.688,61	$ 2.482.320,82	21,04	13,15	-7,89	13%	23,44	25	21,04	21,04	$ 18.871.444,80		
870	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	65 días	3/03/26	5/06/26	$ 29.897.644,50	$ 20.643.611,67	$ 20.643.611,67	69,05	69,05	0	69%	53,19	0	69,05	69,05	$ 29.897.644,50		
883	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	37 días	17/04/26	10/06/26	$ 30.831.284,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 30.831.284,00		
891	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	95 días	20/01/26	5/06/26	$ 29.897.644,50	$ 11.522.418,76	$ 10.552.109,81	38,54	35,29	-3,25	35%	70,3	0	38,54	38,63	$ 29.897.644,50		
920	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	33 días	23/04/26	10/06/26	$ 32.710.125,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 32.710.125,00		
944	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	56 días	18/03/26	10/06/26	$ 65.932.204,70	$ 12.963.868,04	$ 8.335.200,74	19,66	12,64	-7,02	13%	51,92	0	19,66	20,77	$ 65.932.204,70		
968	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	22 días	12/05/26	11/06/26	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	26,47	0	0	$ 22.366.984,20		
981	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	27 días	11/05/26	18/06/26	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 19.946.694,30		
995	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	22 días	18/05/26	18/06/26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 0,00		
1003	VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE	143 días	9/12/25	9/07/26	$ 659.896.472,70	$ 140.144.718,37	$ 129.650.098,07	21,24	19,65	-1,59	20%	25,53	28,14	21,24	21,23	$ 659.896.472,70		
1004	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	70 días	9/12/25	19/03/26	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0	100%	100	100	100	100	$ 39.238.478,10		
1013	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	106 días	2/02/26	8/07/26	$ 135.622.344,80	$ 23.468.326,17	$ 26.178.378,61	17,3	19,3	2	19%	26,46	60,17	17,3	17,3	$ 135.622.344,80		
1074	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	94 días	16/01/26	2/06/26	$ 18.871.444,80	$ 14.224.080,38	$ 13.763.139,92	75,37	72,93	-2,44	73%	71,17	57,89	75,37	75,13	$ 18.871.444,80		
1084	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	86 días	24/02/26	2/07/26	$ 215.710.179,00	$ 21.283.404,32	$ 15.496.619,26	9,87	7,18	-2,69	7%	36,67	54,61	9,87	9,87	$ 215.710.179,00		
1106	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	85 días	24/02/26	1/07/26	$ 18.871.444,80	$ 3.409.177,09	$ 2.634.744,02	18,07	13,96	-4,11	14%	51,76	25	18,07	18,07	$ 18.871.444,80		
1120	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	89 días	24/02/26	7/07/26	$ 29.897.644,50	$ 17.152.148,65	$ 16.030.832,23	57,37	53,62	-3,75	54%	52	0	57,37	57,63	$ 29.897.644,50		
1133	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	41 días	30/04/26	1/07/26	$ 30.831.284,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 30.831.284,00		
1141	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	96 días	5/02/26	26/06/26	$ 29.897.644,50	$ 9.848.635,83	$ 7.972.705,19	32,94	26,67	-6,27	27%	54,98	0	32,94	32,94	$ 29.897.644,50		
1170	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	43 días	28/04/26	1/07/26	$ 32.710.125,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 32.710.125,00		
1194	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	76 días	11/03/26	3/07/26	$ 65.932.204,70	$ 11.520.467,83	$ 8.335.200,74	17,47	12,64	-4,83	13%	39,25	0	17,47	17,39	$ 65.932.204,70		
1218	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	30 días	15/05/26	30/06/26	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	26,47	0	0	$ 22.366.984,20		
1231	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	29 días	26/05/26	8/07/26	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 19.946.694,30		
1245	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	23 días	4/06/26	9/07/26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 0,00		
1253	VÍA DESDE EL SECTOR EL ENCUENTRO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	143,73 días	9/12/25	9/07/26	$ 659.896.472,70	$ 126.088.133,07	$ 139.411.749,86	19,11	20,88	1,77	21%	21,92	28,14	19,11	19,11	$ 659.896.472,70		
1254	VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE	67 días	9/12/25	17/03/26	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	$ 39.238.478,10	100	100	0	100%	100	100	100	100	$ 39.238.478,10		
1263	VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	86,73 días	3/03/26	9/07/26	$ 135.622.344,80	$ 9.902.632,71	$ 19.796.150,62	7,3	14,6	7,3	15%	11,14	60,17	7,3	7,3	$ 135.622.344,80		
1324	VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	87 días	29/01/26	4/06/26	$ 18.871.444,80	$ 10.708.150,49	$ 9.370.648,46	56,74	49,66	-7,08	50%	81,54	57,89	56,74	56,74	$ 18.871.444,80		
1334	VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	89 días	24/02/26	7/07/26	$ 215.710.179,00	$ 22.709.967,64	$ 27.265.766,62	10,53	12,64	2,11	13%	31,04	54,61	10,53	10,53	$ 215.710.179,00		
1356	VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	85 días	24/02/26	1/07/26	$ 18.871.444,80	$ 3.600.091,01	$ 4.209.783,84	19,08	13,69	-5,39	22%	21,43	25	19,08	19,08	$ 18.871.444,80		
1370	VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	89 días	24/02/26	7/07/26	$ 29.897.644,50	$ 16.941.998,54	$ 20.643.611,67	56,67	69,05	12,38	69%	44,88	0	56,67	56,75	$ 29.897.644,50		
1383	VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	45 días	4/05/26	8/07/26	$ 30.831.284,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 30.831.284,00		
1391	VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION	112 días	20/01/26	3/07/26	$ 29.897.644,50	$ 11.522.418,76	$ 10.552.109,81	38,54	35,29	-3,25	35%	57,59	0	38,54	38,63	$ 29.897.644,50		
1420	VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	36 días	13/05/26	6/07/26	$ 32.710.125,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 32.710.125,00		
1444	VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO	76 días	11/03/26	3/07/26	$ 65.932.204,70	$ 11.464.395,82	$ 8.335.200,74	17,39	12,64	-4,75	13%	62,03	0	17,39	17,39	$ 65.932.204,70		
1468	VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL	24 días	29/05/26	6/07/26	$ 22.366.984,20	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	26,47	0	0	$ 22.366.984,20		
1481	VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES	35 días	19/05/26	9/07/26	$ 19.946.694,30	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 19.946.694,30		
1495	VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO	24 días	3/06/26	9/07/26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 0,00		

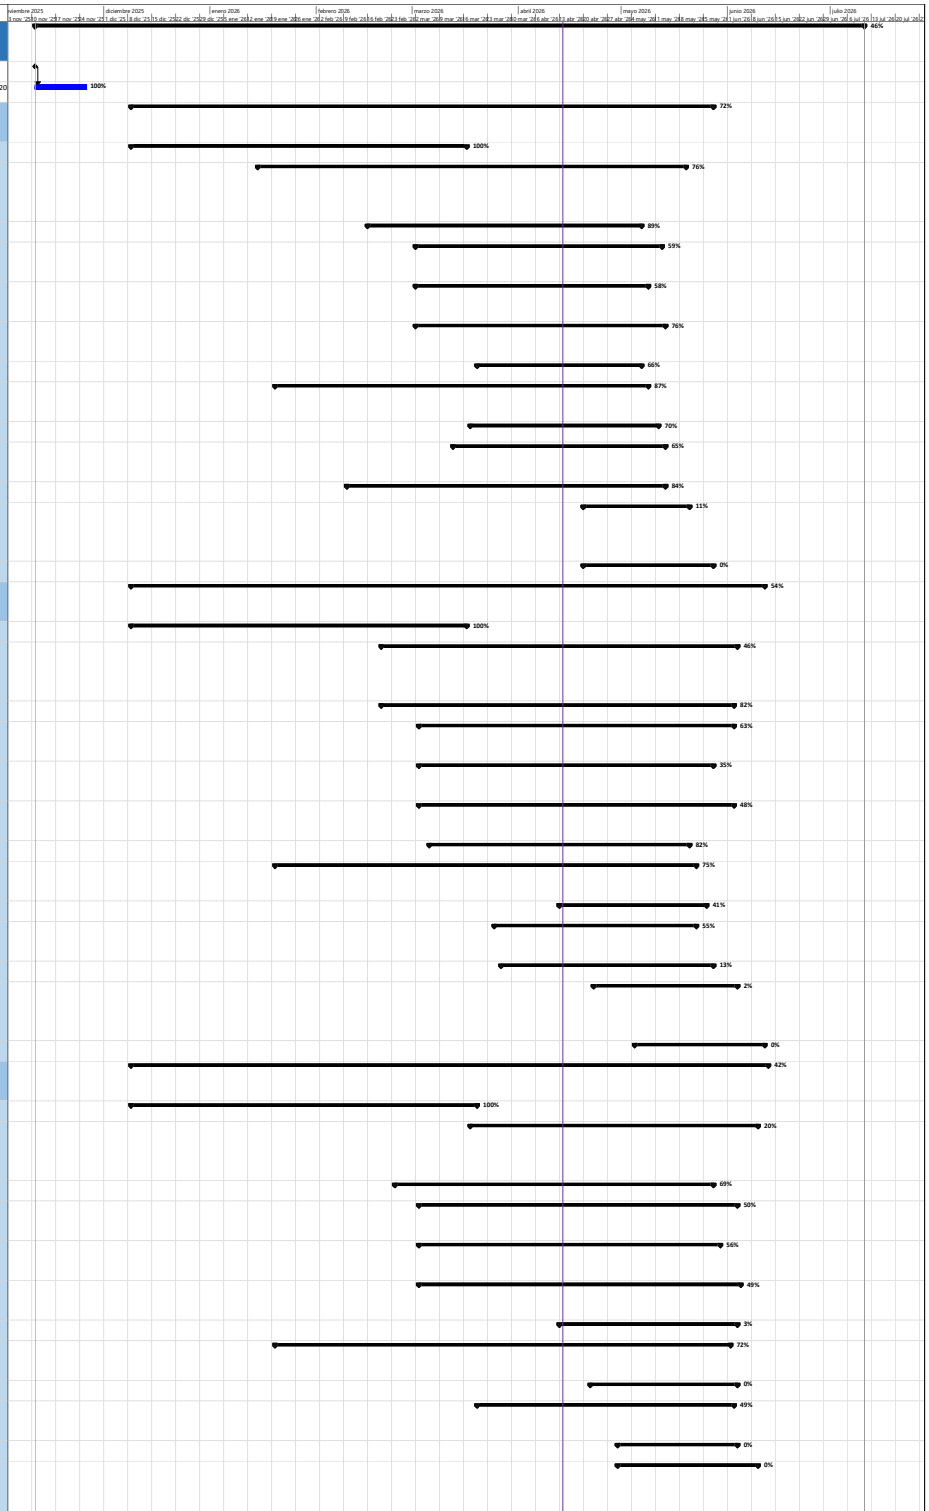

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CRTR	CPTR	%PROGRA	%EJECU	%VAN	% EJECUTADO	Tarea - % Completado	Tarea - % Planeado (Duracion)	Tarea - % Completado (Valor Ganado)	Tarea - % Planeado (Valor Ganado)	Costo	Predecesoras	Sucesoras
1503	**VÍA DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN HASTA EL LÍMITE DEPARTAMENTAL (SENTIDO HACIA EL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ)**	**143,73 días**	**9/12/25**	**9/07/26**	**$ 659.896.472,70**	**$ 174.550.600,17**	**$ 164.178.781,32**	**26,45**	**24,88**	**-1,57**	**25%**	**24,4**	**28,14**	**26,45**	**26,54**	**$ 659.896.472,70**		
1504	**VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE**	**70 días**	**9/12/25**	**19/03/26**	**$ 39.238.478,10**	**$ 39.238.478,10**	**$ 39.238.478,10**	**100**	**100**	**0**	**100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**$ 39.238.478,10**		
1513	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	**121,73 días**	**13/01/26**	**9/07/26**	**$ 135.622.344,80**	**$ 19.698.386,58**	**$ 19.033.058,14**	**14,52**	**14,03**	**-0,49**	**14%**	**39,91**	**60,17**	**14,52**	**14,57**	**$ 135.622.344,80**		
1574	**VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA**	**91 días**	**29/01/26**	**11/06/26**	**$ 18.871.444,80**	**$ 14.316.268,47**	**$ 13.763.139,92**	**75,86**	**72,93**	**-2,93**	**73%**	**68,22**	**57,89**	**75,86**	**75,86**	**$ 18.871.444,80**		
1584	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION**	**90 días**	**24/02/26**	**8/07/26**	**$ 215.710.179,00**	**$ 53.841.260,67**	**$ 50.044.761,52**	**24,96**	**23,2**	**-1,76**	**23%**	**27,27**	**54,61**	**24,96**	**24,96**	**$ 215.710.179,00**		
1606	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES**	**87 días**	**24/02/26**	**3/07/26**	**$ 18.871.444,80**	**$ 7.258.248,00**	**$ 7.258.248,00**	**38,46**	**38,46**	**0**	**38%**	**32,32**	**25**	**38,46**	**38,46**	**$ 18.871.444,80**		
1620	**VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO**	**90 días**	**24/02/26**	**8/07/26**	**$ 29.897.644,50**	**$ 20.643.611,67**	**$ 20.643.611,67**	**69,05**	**69,05**	**0**	**69%**	**45,58**	**0**	**69,05**	**67,78**	**$ 29.897.644,50**		
1633	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES**	**45 días**	**4/05/26**	**8/07/26**	**$ 30.831.284,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$ 30.831.284,00**		
1641	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION**	**70 días**	**19/03/26**	**3/07/26**	**$ 29.897.644,50**	**$ 8.089.950,86**	**$ 5.862.283,23**	**27,06**	**19,61**	**-7,45**	**20%**	**26,09**	**0**	**27,06**	**29,41**	**$ 29.897.644,50**		
1670	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS**	**36 días**	**13/05/26**	**6/07/26**	**$ 32.710.125,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$ 32.710.125,00**		
1694	**VOLUMEN X. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO**	**76 días**	**11/03/26**	**3/07/26**	**$ 65.932.204,70**	**$ 11.464.395,82**	**$ 8.335.200,74**	**17,39**	**12,64**	**-4,75**	**13%**	**63,74**	**0**	**17,39**	**17,65**	**$ 65.932.204,70**		
1718	**VOLUMEN XI. GESTIÓN PREDIAL**	**24 días**	**29/05/26**	**6/07/26**	**$ 22.366.984,20**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**26,47**	**0**	**0**	**$ 22.366.984,20**		
1731	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**34 días**	**20/05/26**	**9/07/26**	**$ 19.946.694,30**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$ 19.946.694,30**		
1745	**VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO**	**23 días**	**4/06/26**	**9/07/26**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$ 0,00**		
1753	ENTREGA PRODUCTOS CONSULTORÍA	7 días	2/07/26	10/07/26	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	0	0	0%	0	0	0	0	$ 0,00	1748;1498;124	

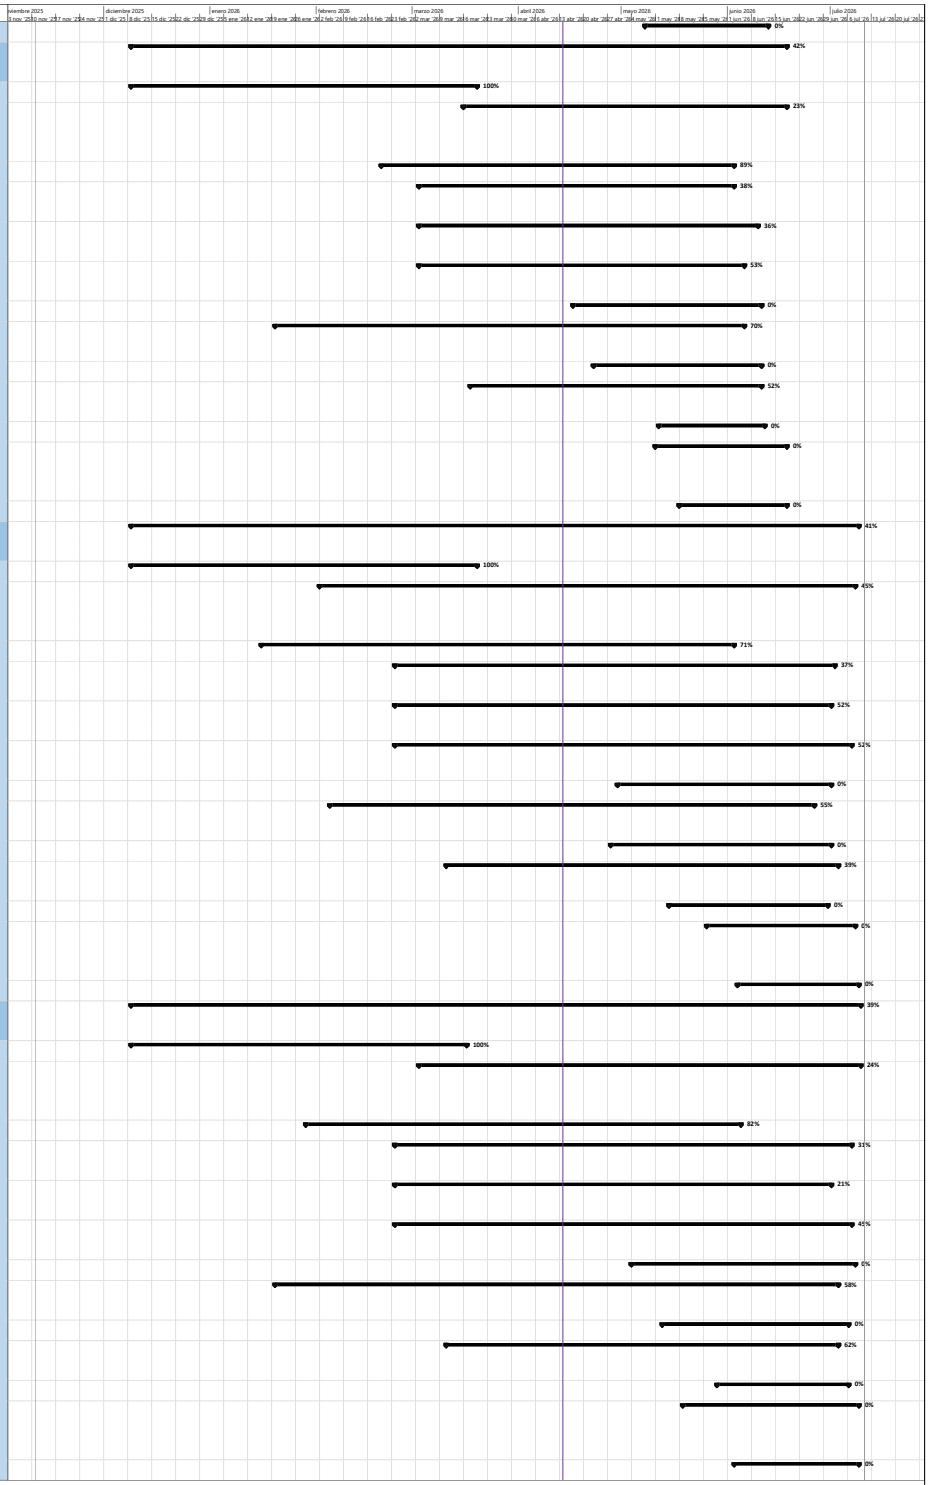
