INFORME N° : 23	**PERÍODO DEL INFORME**
FECHA: Noviembre 2025	**DESDE: 01 / 10 / 2025 HASTA: 31 / 10 / 2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se describe a continuación la información básica general del proyecto del que se derivan los contratos de obra e interventoría abajo relacionados:

BPIN del proyecto	**2023002200078**
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA
Valor total del proyecto	33.136.085.744,00
Valor del proyecto antes de Interventoría	31.303.723.744,00
Valor de la Interventoría	1.832.362.000,00
Fuente de financiación	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
Objetivo general del proyecto	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR
Producto (s) por entregar con el proyecto	ACUEDUCTOS AMPLIADOS

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratación	LICITACIÓN PÚBLICA
No. de proceso de selección	LOP SIN 00122023
No. de contrato	2023040018
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA
Contratante	GOBERNACIÓN DEL CESAR
Contratista	CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA
NIT	91324384
Representante legal	CESAR AUGUSTO CAMARGO GONZALEZ
Valor inicial del contrato	31.303.723.744
Valor anticipo del contrato	N/A
Valor adicional 01 del contrato	$ 11.638.137.345
Valor actualizado del contrato	$ 42.941.861.089,00
Fecha de inicio	04 DICIEMBRE 2023
Fecha de suspensión No. 001	
Fecha de terminación inicial	04 AGOSTO 2025
Fecha de terminación actualizada	03 DICIEMBRE 2025
Plazo inicial del contrato	20 MESES
Prorroga 1	4 MESES
Plazo del actualizado del contrato	24 MESES
Secretario de infraestructura	JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Supervisor técnico	GERMAN TAPIAS MONTAÑO

Supervisor ambiental	MARIA JOSE RAMOS NAVARRO
Supervisor social	SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista interventor	CONSORCIO INTERVENTORIA HIDROMECANICA
NIT	1123409946
Representante legal	MARIA DE JESUS CASTAÑEDA DEL PRADO
Cedula representante legal	1123409946
Supervisor técnico	GERMAN TAPIAS MONTAÑO
Supervisor ambiental	MARIA JOSE RAMOS
Supervisor social	SADINA SOTO

4. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTÍAS

(se relacionan los datos de las pólizas actualizadas del contrato).

Casa aseguradora			SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**%**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
CG - 1048792	CUMPLIMIENTO		$ 12.882.558.326,70	17/12/2024	04/04/2026
CG - 1048792	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES		$ 2.147.093.054,45	17/12/2024	04/12/2028
CG - 1048792	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$ 12.882.558.326,70	04/12/2025	04/12/2030
CG - 1011135	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$ 2.147.093.054,45	04/12/2023	04/12/2025

5. CONTROL FISICO Y FINANCIERO

OBRA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
# CDP	**16425**	**VALOR**	**$ 27.308.781.791**	**FECHA**	**6/02/2025**

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	**1024**	**VALOR**	**$ 27.308.781.791**	**FECHA**	**04/02/2025**

INTERVENTORIA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
# CDP	**34223**	**VALOR**	**$ 1.832.362.249**	**FECHA**	**24/08/2023**

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	**10193**	**VALOR**	**$ 1.832.362.000**	**FECHA**	**29/11/2023**

6. CONTROL DE AVANCE FISICO, FINANCIERO Y PAGOS REALIZADOS


OBRA


Descripción	Valor
Valor del contrato:	$42.941.861.089
Valor pagado acta parcial 01:	$ 4.279.817.063,00
Valor pagado acta parcial 02:	$ 5.286.448.644,00
Valor pagado acta parcial 03:	$ 1.863.035.140,00
Valor pagado acta parcial 04:	$ 4.203.778.451,00
Valor pagado acta parcial 05:	$ 5.954.272.952,00
Valor pagado acta parcial 06:	$ 3.949.394.000,00
Valor pagado acta parcial 07:	$ 2.116.914.888,00
Valor pagado acta parcial 08	$ 4.167.665.354.00
Valor por pagar:	$ 11.120.534.597

INTERVENTORIA

Porcentajes facturados		Valores facturados	
Acta parcial 01:	10.58%	**Presente acta:**	$ 250.518.890,89
Acta parcial 02:	13.07%	**Presente acta:**	$ 309.442.023,24
Acta parcial 03:	4.61%	**Presente acta:**	$ 109.052.674,47
Acta parcial 04:	10.39%	**Presente acta:**	$ 246.067.974,30
Acta parcial 05:	13.87%	**Presente acta:**	$ 275.022.482,33
Acta parcial 06:	6.95%	**Presente acta:**	$ 217.728.878,41
Total, % Facturado:	59.47%	**Total, facturado (acumulado):**	$ 1.407.832.923,64
Por facturar:	40.53%	**Saldos por facturar:**	$ 959.538.691,36

7. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRÁFICAS

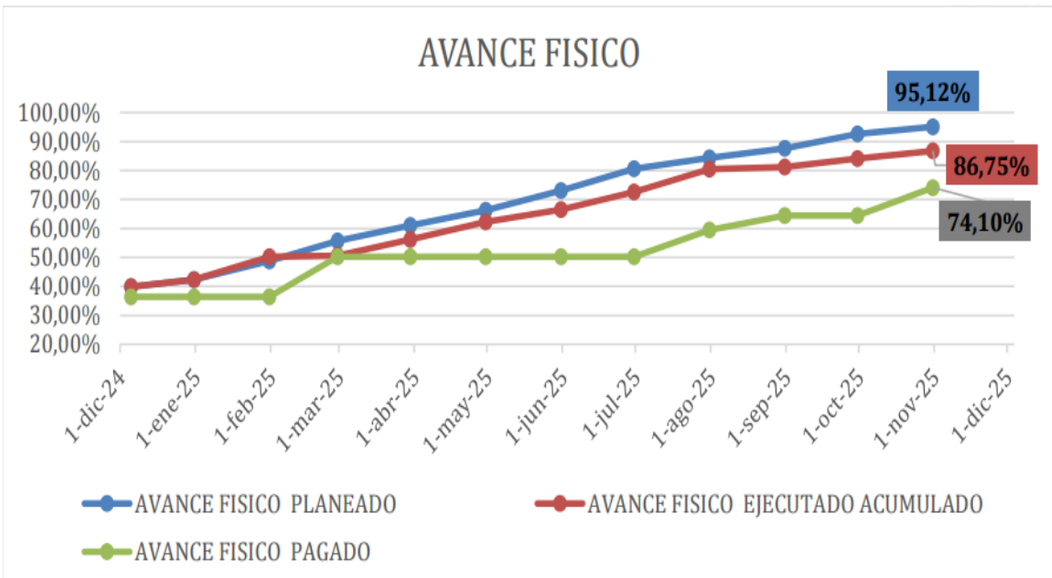

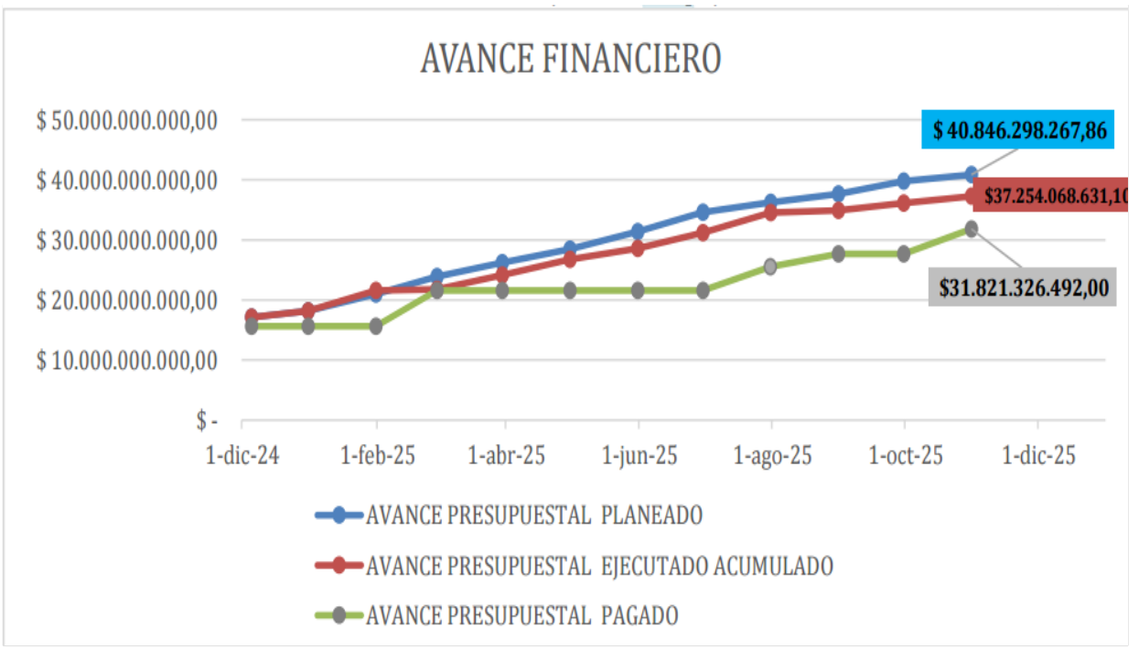
AVANCE FINANCIERO
$ 50.000.000.000,00
$ 40.000.000.000,00
$ 30.000.000.000,00
$ 20.000.000.000,00
$ 10.000.000.000,00
$ -
1-dic-24
1-feb-25
1-abr-25
1-jun-25
1-ago-25
1-oct-25
1-dic-25
$ 40.846.298.267,86
$37.254.068.631,1
$31.821.326.492,00
AVANCE PRESUPUESTAL PLANEADO
AVANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO
AVANCE PRESUPUESTAL PAGADO

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES



9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Con fundamento en el seguimiento realizado durante el periodo objeto del presente informe y en las conclusiones presentadas por la interventoría, la supervisión evidencia que, si bien durante el periodo evaluado se registró un avance físico del 2,64%, superior en un 0,10% al avance programado para el mismo periodo, el proyecto mantiene un retraso acumulado del 8,37% frente a la programación contractual.

El avance físico acumulado ejecutado corresponde al 86,75% del contrato, porcentaje inferior al 95,12% previsto en la programación de obra, situación que evidencia un rezago significativo que compromete el cumplimiento de las metas establecidas y el plazo contractual vigente.

Asimismo, se observa que persiste la disminución del personal dispuesto por el contratista para la ejecución de las actividades, situación advertida reiteradamente por la interventoría sin que, a la fecha del presente informe, se evidencie respuesta o justificación formal por parte del contratista, ni la adopción de medidas efectivas para revertir esta condición.

En consideración al estado actual del proyecto y al tiempo restante para la terminación del contrato, la supervisión concluye que existe un riesgo alto de incumplimiento de las obligaciones contractuales, de mantenerse el ritmo actual de ejecución, por lo que resulta indispensable la adopción inmediata de acciones correctivas que permitan recuperar el cronograma o, en su defecto, gestionar oportunamente los mecanismos contractuales que correspondan.

Revisó: German Tapias Montaño	Firma.
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.	
