INFORME N° : 25	**PERÍODO DEL INFORME**
FECHA: Enero 2026	**DESDE: 01 / 12 / 2025 HASTA: 31 / 12 / 2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se describe a continuación la información básica general del proyecto del que se derivan los contratos de obra e interventoría abajo relacionados:

BPIN del proyecto	**2023002200078**
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA
Valor total del proyecto	33.136.085.744,00
Valor del proyecto antes de Interventoría	31.303.723.744,00
Valor de la Interventoría	1.832.362.000,00
Fuente de financiación	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR
Objetivo general del proyecto	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR
Producto (s) por entregar con el proyecto	ACUEDUCTOS AMPLIADOS

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratación	LICITACIÓN PÚBLICA
No. de proceso de selección	LOP SIN 00122023
No. de contrato	2023040018
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA
Contratante	GOBERNACIÓN DEL CESAR
Contratista	CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA
NIT	91324384
Representante legal	CESAR AUGUSTO CAMARGO GONZALEZ
Valor inicial del contrato	31.303.723.744
Valor anticipo del contrato	N/A
Valor adicional 01 del contrato	$ 11.638.137.345
Valor actualizado del contrato	$ 42.941.861.089,00
Fecha de inicio	04 DICIEMBRE 2023
Fecha de suspensión No. 001	
Fecha de terminación inicial	04 AGOSTO 2025
Fecha de terminación actualizada	03 JUNIO 2026
Plazo inicial del contrato	20 MESES
Prorroga 1	4 MESES
Prorroga 2	2 MESES
Plazo del actualizado del contrato	26 MESES
Secretario de infraestructura	JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA

Supervisor técnico	
Supervisor ambiental	
Supervisor social	

3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista interventor	CONSORCIO INTERVENTORIA HIDROMECANICA
NIT	1123409946
Representante legal	MARIA DE JESUS CASTAÑEDA DEL PRADO
Cedula representante legal	1123409946
Supervisor técnico	MILLER ASDRUBAL GONZALEZ ZULETA
Supervisor ambiental	MARIA JOSE RAMOS
Supervisor social	SADINA SOTO

4. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTÍAS

(se relacionan los datos de las pólizas actualizadas del contrato).

ACTUALIZACIÓN GARANTIAS – PRORROGA No. 02 OBRA

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO		**VIGENCIAS GARANTIAS**		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
CG - 1048792	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 12.882.558.326,70	04/02/2026	04/07/2026
	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 2.147.093.054,45	04/02/2026	04/06/2029
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 12.882.558.326,70	04/06/2026	04/06/2031
CG- 1011135	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	$ 2.147.093.054,45	04/12/2023	04/06/2026

ACTUALIZACIÓN GARANTIAS - PRORROGA No. 03 - INTERVENTORIA

Casa aseguradora		**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
75-44-101133566	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$236.737.161.50	04/12/2023	03/10/2026
	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$236.737.161.50	04/12/2023	03/06/2029
	CALIDAD DE SERVICIO	$710.211.484.50	04/12/2023	04/12/2028

5. CONTROL FISICO Y FINANCIERO

OBRA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
# CDP	**16425**	**VALOR**	**$ 27.308.781.791**	**FECHA**	**6/02/2025**

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	**1024**	**VALOR**	**$ 27.308.781.791**	**FECHA**	**04/02/2025**

INTERVENTORIA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
# CDP	**34223**	**VALOR**	**$ 1.832.362.249**	**FECHA**	**24/08/2023**

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	**10193**	**VALOR**	**$ 1.832.362.000**	**FECHA**	**29/11/2023**

6. CONTROL DE AVANCE FISICO, FINANCIERO Y PAGOS REALIZADOS


Obra


Descripción	Valor
Valor del contrato:	$42.941.861.089
Valor pagado acta parcial 01:	$ 4.279.817.063,00
Valor pagado acta parcial 02:	$ 5.286.448.644,00
Valor pagado acta parcial 03:	$ 1.863.035.140,00
Valor pagado acta parcial 04:	$ 4.203.778.451,00
Valor pagado acta parcial 05:	$ 5.954.272.952,00
Valor pagado acta parcial 06:	$ 3.949.394.000,00
Valor pagado acta parcial 07:	$ 2.116.914.888,00
Valor pagado acta parcial 08:	$ 4.167.665.354.00
Valor pagado acta parcial 09:	$ 2.724.391.402,97
Valor por pagar:	$ 8.396.143.194,02

Interventoría

Porcentajes facturados		**Valores facturados**	
Acta parcial 01:	10.58%	**Presente acta:**	$ 250.518.890,89
Acta parcial 02:	13.07%	**Presente acta:**	$ 309.442.023,24
Acta parcial 03:	4.61%	**Presente acta:**	$ 109.052.674,47
Acta parcial 04:	10.39%	**Presente acta:**	$ 246.067.974,30
Acta parcial 05:	13.87%	**Presente acta:**	$ 275.022.482,33
Acta parcial 06:	6.95%	**Presente acta:**	$ 217.728.878,41
Acta parcial 07:	4.69%	**Presente acta:**	$ 110.996.897,90
Acta parcial 08	4.71%	**Presente Acta:**	$ 111.613.982,30
Total, % Facturado:	64.16%	**Total, facturado (acumulado):**	$ 1.630.443.803,87
Por facturar:	31.13%	**Saldos por facturar:**	$ 736.927.811,13

7. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRÁFICAS

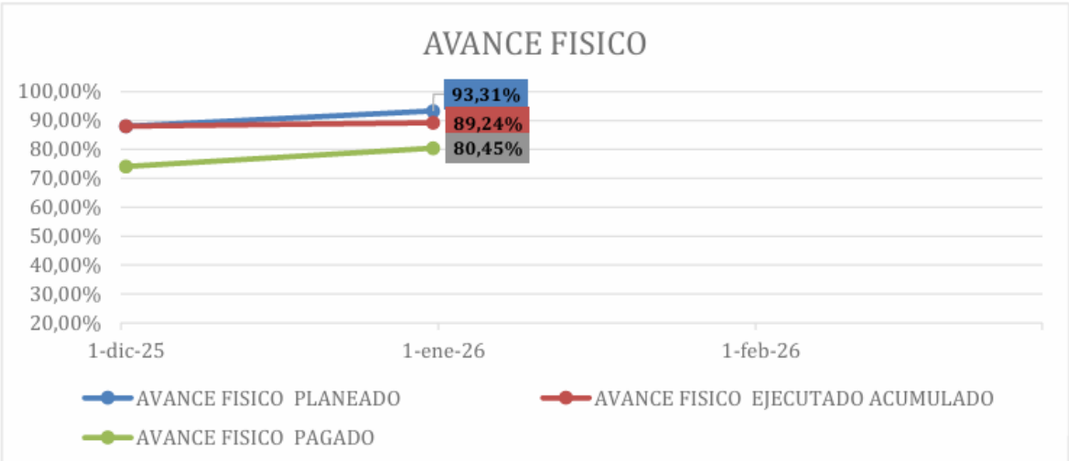

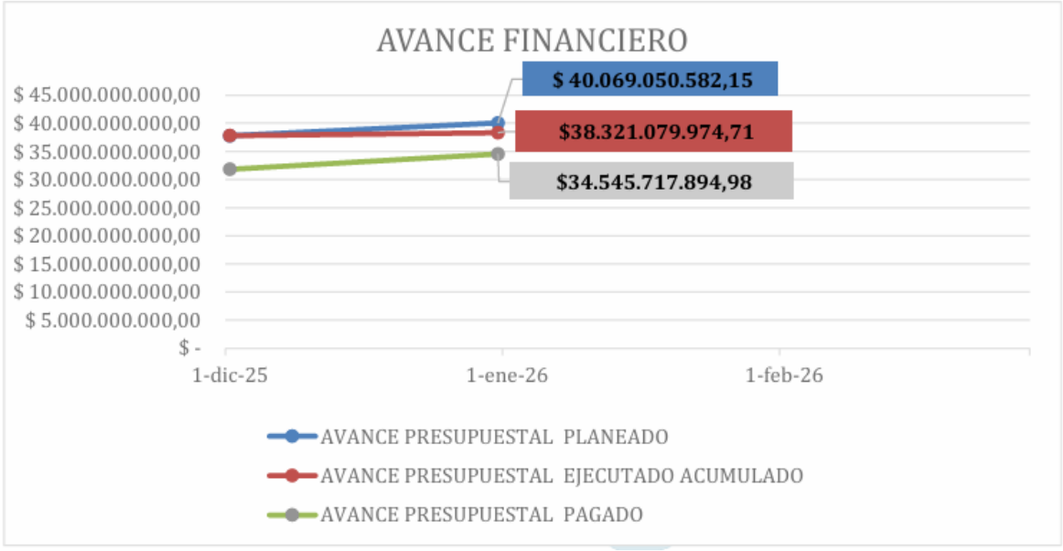
AVANCE FINANCIERO
$ 40.069.050.582,15
$38.321.079.974,71
$34.545.717.894,98
$ 45.000.000.000,00
$ 40.000.000.000,00
$ 35.000.000.000,00
$ 30.000.000.000,00
$ 25.000.000.000,00
$ 20.000.000.000,00
$ 15.000.000.000,00
$ 10.000.000.000,00
$ 5.000.000.000,00
$ -
1-dic-25
1-ene-26
1-feb-26
AVANCE PRESUPUESTAL PLANEADO
AVANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO
AVANCE PRESUPUESTAL PAGADO

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En desarrollo de las actividades de supervisión, se realizó el seguimiento al avance físico del contrato, así como la verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas y financieras por parte del contratista CONSORCIO SISTEMA HIDRÁULICO DE BOSCONIA. Para el presente período se verificó un avance físico ejecutado del 1,31 %, equivalente a $63.231.176,44, frente a un avance programado del 5,29 %, equivalente a $2.271.624.451,60, evidenciándose un atraso del 3,98 % respecto de la programación establecida.

En cuanto al avance acumulado del proyecto, se constató que, de acuerdo con la programación vigente, a la fecha de corte del presente informe se debía alcanzar un avance del 93,31 %, equivalente a $40.069.050.582,15 del valor del contrato. No obstante, el avance acumulado ejecutado corresponde al 89,20 %, equivalente a $38.321.079.974,71, lo que representa un atraso acumulado del 4,11 %.

Durante el período evaluado se evidenció que, pese a la aprobación de la Prórroga No. 2 y a los compromisos adquiridos por el contratista relacionados con el incremento del personal en obra y la garantía de un suministro continuo de materiales para mejorar el rendimiento de las actividades, dichas medidas no se reflejaron de manera efectiva en la ejecución del proyecto, manteniéndose el atraso frente a la programación reprogramada.

Recomendaciones

- Requerir al contratista para que implemente de manera inmediata las acciones necesarias que permitan recuperar el atraso presentado en la ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de la programación vigente.
- Exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos con ocasión de la Prórroga No. 2, especialmente en lo relacionado con el incremento del personal de obra, la disponibilidad de equipos y el suministro oportuno y permanente de materiales.
- Solicitar al contratista la presentación y ejecución de un plan de recuperación que incluya actividades, recursos, responsables y cronograma, orientado a disminuir el atraso acumulado y asegurar el cumplimiento del plazo contractual.
- Mantener un seguimiento permanente al avance físico y al cumplimiento de las obligaciones contractuales, verificando la efectividad de las medidas implementadas por el contratista y dejando constancia de los resultados en los informes de supervisión correspondientes.
- En caso de persistir los incumplimientos o no evidenciarse acciones efectivas para la recuperación del cronograma, poner en conocimiento de la entidad contratante la situación, con el fin de que se evalúe la adopción de las medidas contractuales a que haya lugar.

Revisó: Jorge Maestre Jaraba	Firma. 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.	
