PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES
PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
INFRAESTRUCTURA

3. Apoyar la revisión periódica de las instalaciones para identificar posibles fallas que provoquen daños a la infraestructura del Área Protegida y apoyar actividades de adecuación de infraestructura liviana de ecoturismo.

Se realizó diferentes reparaciones y mantenimiento en la oficina administrativa del Municipio de El Cocuy

Fecha: 11 de junio 2026.

1. **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:**

Se realizó cambio de llave de agua potable del Tanque o Alberca del manobi de la Oficina Administrativa de El Cocuy.




Fecha: 24 de junio

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD:

Se realizó mantenimiento de las bisagras de las puertas de vidrio de la oficina, ya que estaban en mal estado (Caídas) y presentaban problemas de funcionamiento de cierre y apertura.

Por lo que fue necesario desarmarlas, colocar arandelas en la parte inferior para poderlas subir un poquito. Y se volvieron a instalar nuevamente, de tal manera que ya quedaron en perfecto funcionamiento.



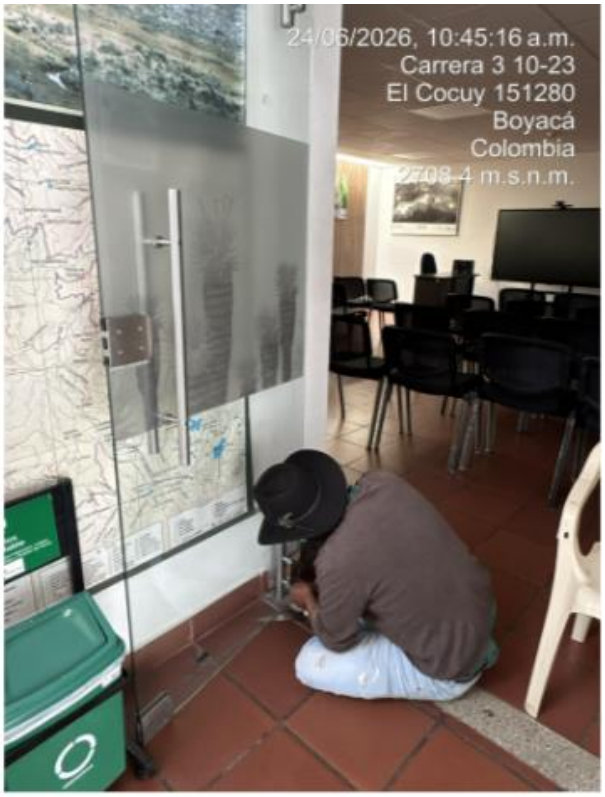

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD:

Se desarmó la parte inferior del sifón del lavamanos, debido a que estaba presentando una fuerte humedad, ya que el tubo estaba en desnivel, lo que provocaba gotera y el baño presentaba fuga de agua y estaba ocasionando un daño. Por ende, se cortó una parte al sifón y subir el tubo, se volvió a armar y se aplicó sicaflex para evitar la humedad.





Elaborado por: Isidro Flórez
Operario de Infraestructura
