ALCALDÍA DE RAMIRIQUI	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI NIT: 891.801.280-6	MACROPROCESO	APOYO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso	Gestión Documental
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Formato	
	ACTA	Cód.-TRD:	Versión: 01
		Página 1 de 2	Fecha:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN

1. INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO

CONTRATO N°	MRAM-MC-014-2025
FECHA DEL CONTRATO	VEINTIUNO (21) DE MARZO DE 2025
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	374 DEL VEINTICINCO (25) DE MARZO DEL AÑO 2025
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT:891.801.280-6 R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ CC. 72.326.507 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI
CONTRATISTA	CONTRATISTA: INCONS S.A.S NIT 901.062.819-9 R/L JORGE MANUEL CASTRO LEÓN CC N° 1.004.472 expedida en Bogotá
OBJETO	REPOSICIÓN DE UN TRAMO DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ.
VALOR	TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL ($ 36.840.225) M/CTE
PLAZO	QUINCE (15) DIAS
FECHA PRORROGA No. 001	NUEVE (09) DE ABRIL DE 2025
TIEMPO PRORROGA	CINCO (05) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTE (20) DIAS
PÓLIZA No.	39-44-101171025 DE CUMPLIMIENTO Y 39-40-101044710 RCE
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	RESOLUCIÓN No. 129 DEL VEINTICINCO (25) DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR	CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
FECHA DE INICIO	VEINTICINCO (25) DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	NUEVE (09) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION SG PRORROGA 001	CATORCE (14) DE ABRIL DE 2025.
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	TRECE (13) DE ABRIL DE 2025
FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO	SIETE (07) DE MAYO 2025.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

De acuerdo al contrato MRAM-MC-014-2025, los ítems contratados a entregar son las siguientes:

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + FACTOR DE INCREMENTO POR DISTANCIA (4%)	VALOR TOTAL
1		EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS					$ 4.467.489,61
1,1	3,13,14	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	60	$ 5.638,74	$ 5.638,74	$ 338.324,40
1,2	3,13,17	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	M2	30,00	$ 23.093,12	$ 23.093,12	$ 692.793,60
1,30	1,02,17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	6,00	$ 51.943,58	$ 51.943,58	$ 311.661,47
1,40	3,02,07	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	M3	42,00	$ 16.429,53	$ 16.429,53	$ 690.040,37
1,50	2,06,18	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO	ML	30,00	$ 24.992,32	$ 24.992,32	$ 749.769,60
1,60	3,12,01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	21,00	$ 5.013,50	$ 5.013,50	$ 105.283,50
1,70	3,13,36	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	6,00	$ 115.320,06	$ 4.612,80	$ 27.676,81
1,80	2,01,09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	27,00	$ 26.055,23	$ 26.055,23	$ 703.491,08

1,90	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3	9,00	$ 90.646,13	$ 94.271,98	$	848.447,78
2,0	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**						**$**	**17.981.239,33**
2.1	2,05,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 24"	ML	30,00	$ 527.993,04	$ 549.112,76	$	16.473.382,85
2,2	COT	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PLASTICA PARA POZO DE INSPECCION	UND	2,00	$ 724.931,00	$ 753.928,24	$	1.507.856,48
3,0	**PAVIMENTO**						**$**	**5.649.406,81**
3,1	3.06.11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	M2	45	$ 4.258,64	$ 4.428,99	$	199.304,35
3,2	3,06,17	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	M3	5,4	$ 970.459,840	$ 1.009.278,23	$	5.450.102,46
4,0	**TRANSPORTE**						**$**	**240.500**
4,1	1.01.02	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3/km	100	$ 2.405,00	$ 2.405,00	$	240.500
						TOTAL, COSTO DIRECTO DEL PROYECTO	**$**	**28.338.635**
ADMINISTRACIÓN						**23%**	**$**	**6.517.886**
						IMPREVISTOS 4%	**$**	**1.133.545**
						UTILIDAD 3%	**$**	**850.159**
						COSTO TOTAL OBRA	**$**	**36.840.225**

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realiza las actividades según las especificaciones solicitadas en el proceso de contratación número MRAM-MC-014-2025, cantidades estipuladas en la sabana de liquidación y detalladas en las memorias de cantidades y relacionadas a continuación:

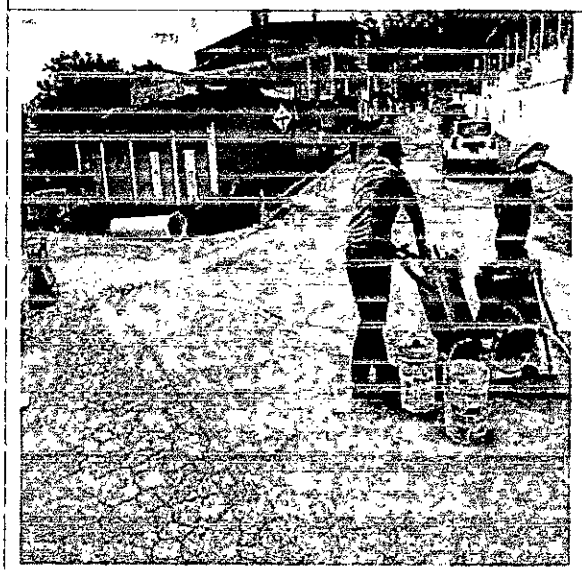
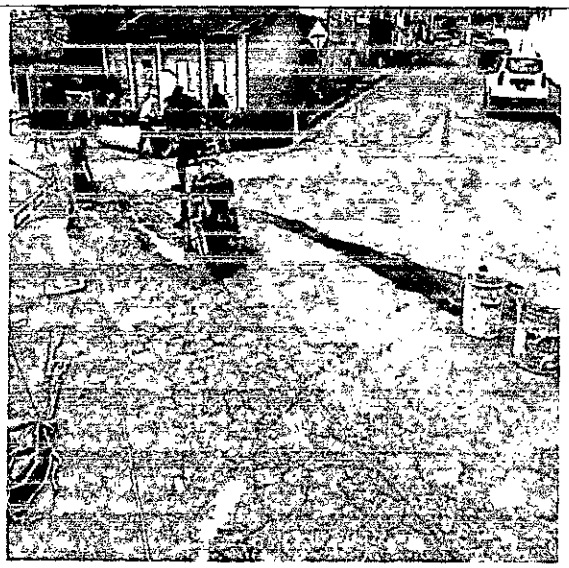
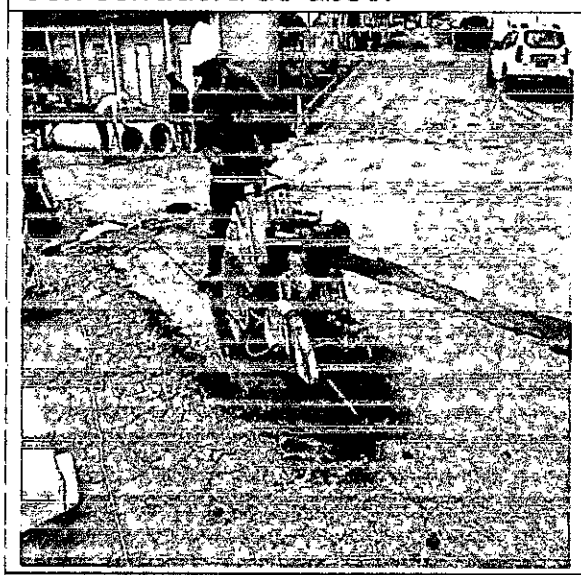
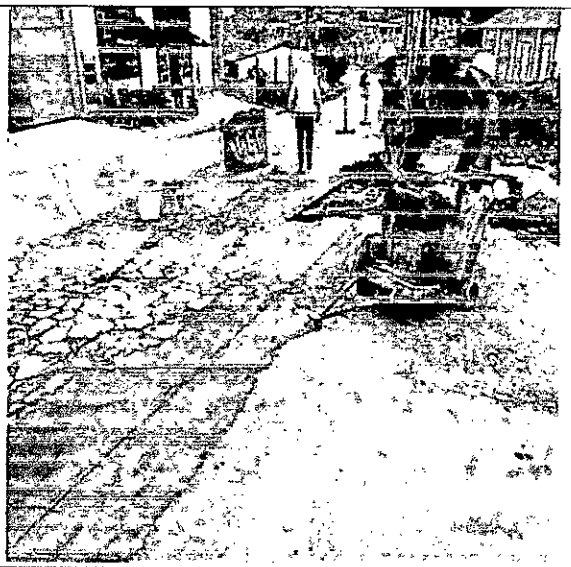
Nº	DESCRIPCION	UND			CANTIDAD	VALOR

			VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + FACTOR DE INCREMENTO POR DISTANCIA (4%)		
1	EXCAVACIONES,RETIROS Y RELLENOS					$ 5.428.016
1,1	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	$ 5.638,74	$ 5.638,74	83,90	$ 473.090
1,2	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	M2	$ 23.093,12	$ 23.093,12	44,31	$ 1.023.256
1,3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	$ 51.943,58	$ 51.943,58	3,19	$ 165.700
1,4	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO	M3	$ 16.429,53	$ 16.429,53	31,89	$ 523.938
1,5	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO	ML	$ 24.992,32	$ 24.992,32	25,30	$ 632.306
1,6	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	$ 5.013,50	$ 5.013,50	34,40	$ 172.464
1,7	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M3	$ 115.320,06	$ 4.612,80	12,05	$ 55.584
1,8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 26.055,23	$ 26.055,23	14,74	$ 384.054
1,9	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 90.646,13	$ 94.271,98	21,19	$ 1.997.623

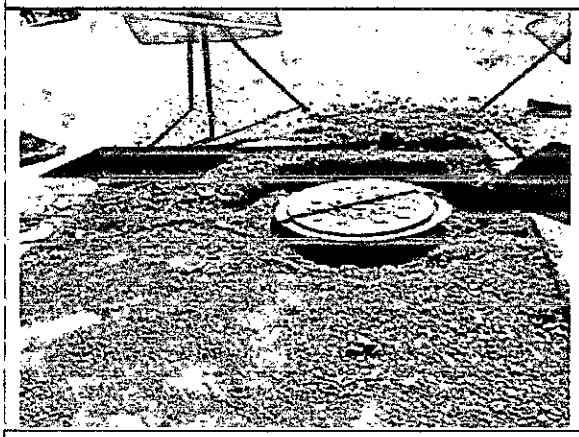
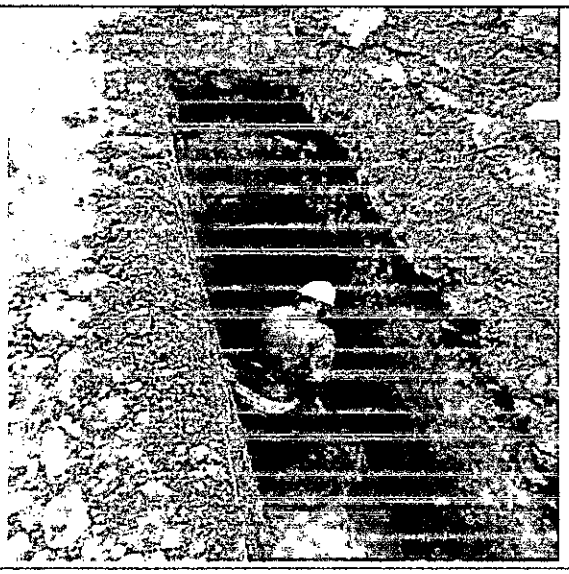
2	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**					**$ 16.498.635**
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 24"	ML	$ 527.993,04	$ 549.112,76	27,30	$ 14.990.778
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PLASTICA PARA POZO DE INSPECCION	UND	$ 724.931,00	$ 753.928,24	2,00	$ 1.507.856
3	**PAVIMENTO**					**$ 3.326.527**
3,10	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	M2	$ 4.258,64	$ 4.428,99	49,21	$ 217.950
3,2	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	M3	$ 970.459,84	$ 1.009.278,23	3,08	$ 3.108.577
4	**TRANSPORTE**					**$ 1.838.863**
4,1	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3/km	$ 2.405,00	$ 2.405,00	764,60	$ 1.838.863
5	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**					**$ 504.815**
NP 1	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).	M3	$ 97.274,42	$ 101.165,40	4,99	$ 504.815
TOTAL COSTO DIRECTO ,SIN AIU						**$ 27.576.856**
ADMINISTRACION (23%)						**$ 6.347.277**
IMPREVISTOS (4%)						**$ 1.103.874**
UTILIDAD (3%)						**$ 827.906**
VALOR TOTAL						**$ 35.875.913**

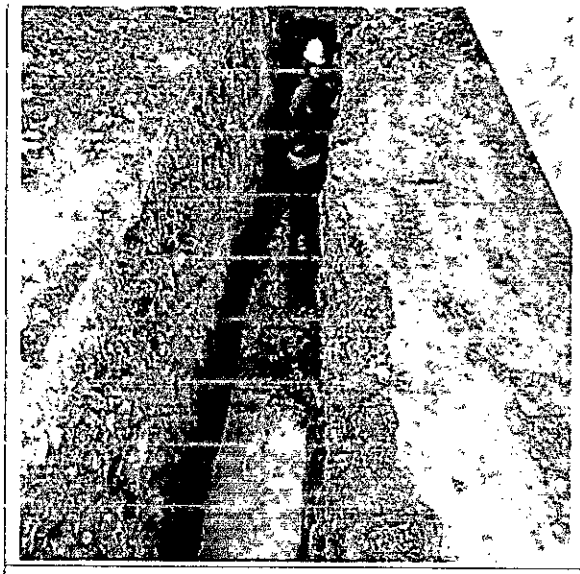
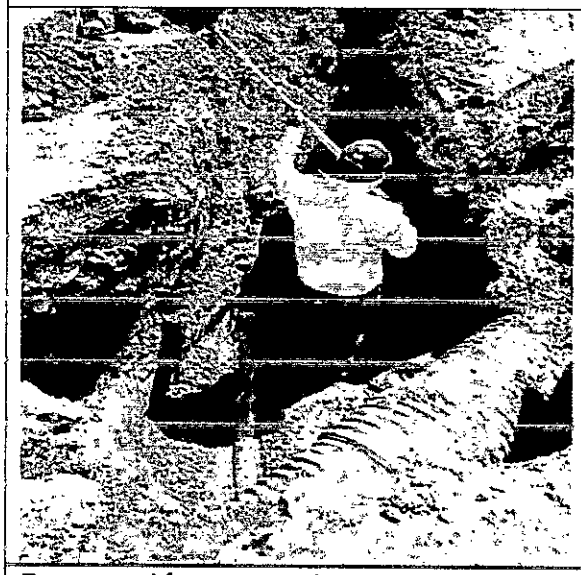
4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

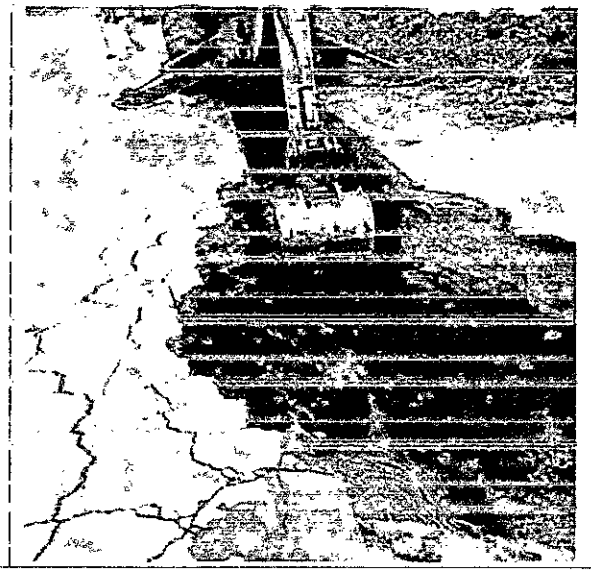
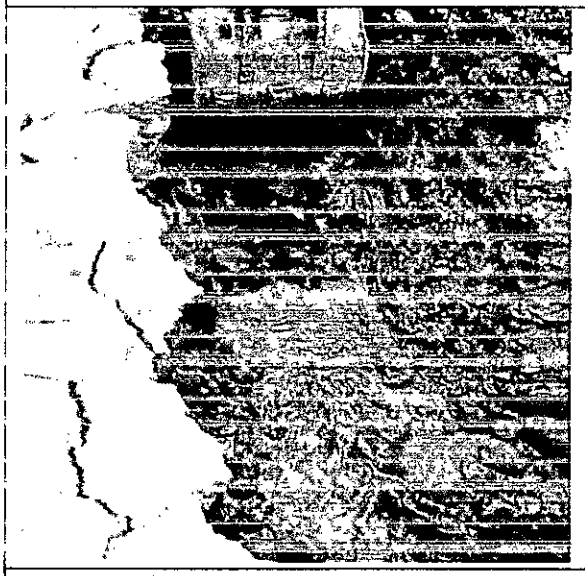
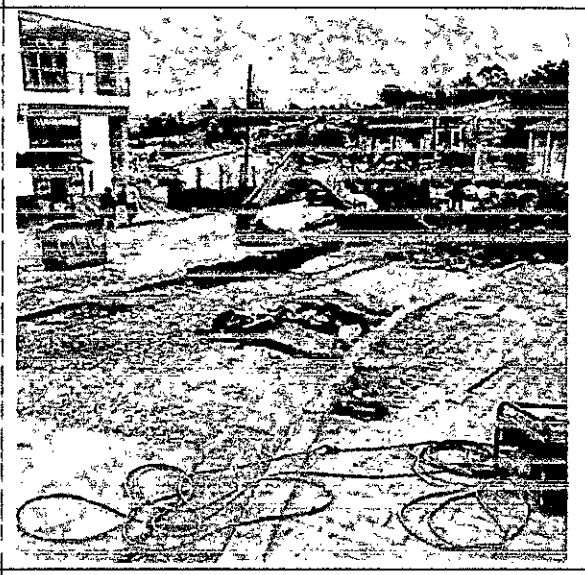
A continuación, se muestra el registro fotográfico que demuestra lo realizado por el contratista.

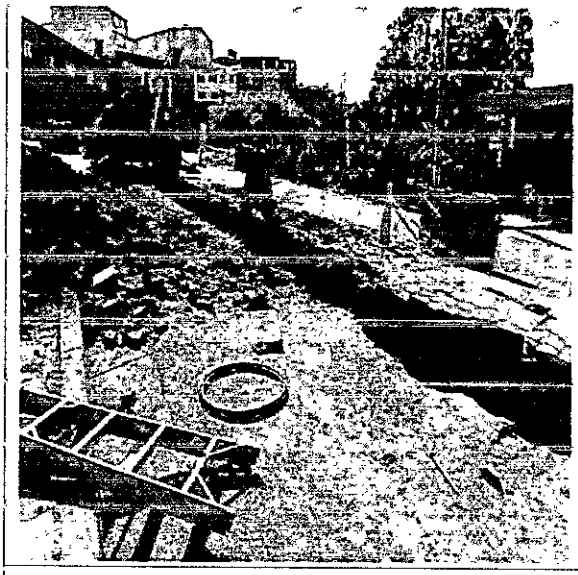
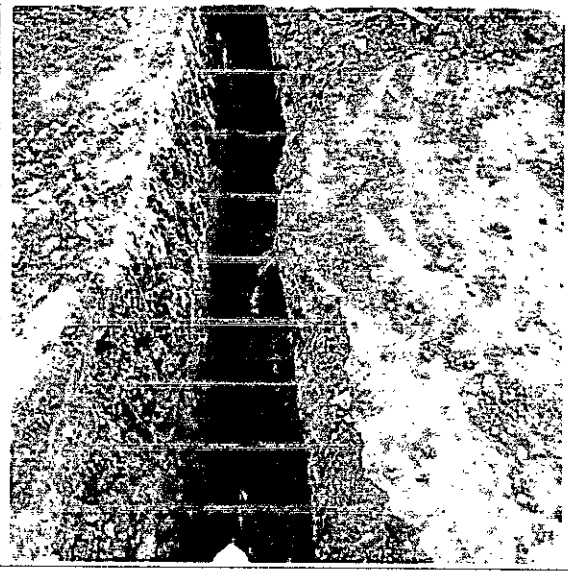
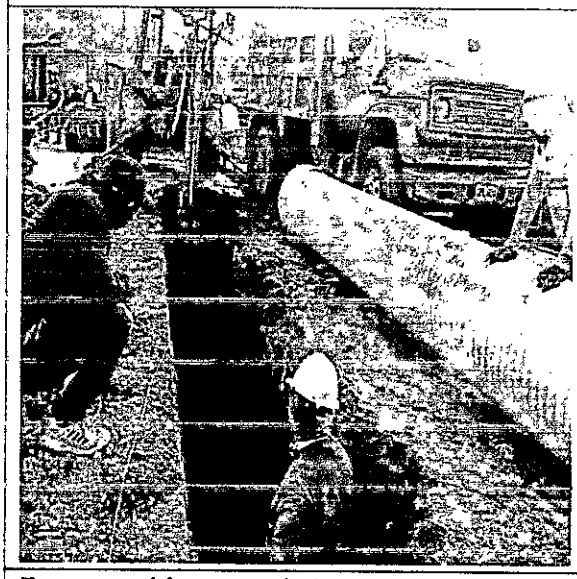
1 1.1	**EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS** CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
	
Trazado y corte de pavimento asfáltio con cortadora de disco.	Trazado y corte de pavimento asfáltio con cortadora de disco.
	
Trazado y corte de pavimento asfáltio con cortadora de disco.	Trazado y corte de pavimento asfáltio con cortadora de disco.

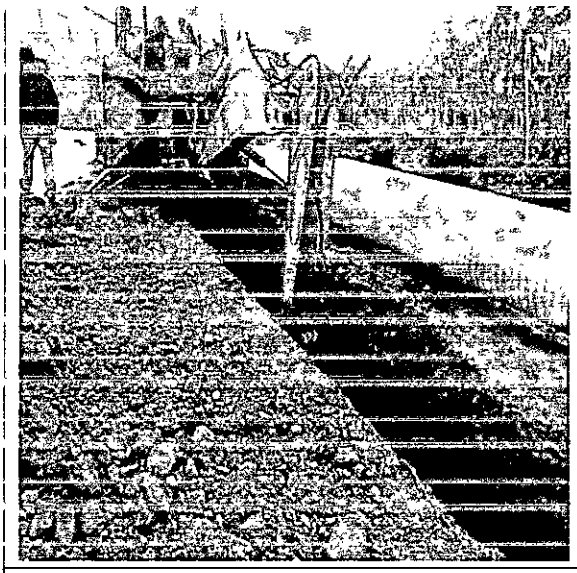
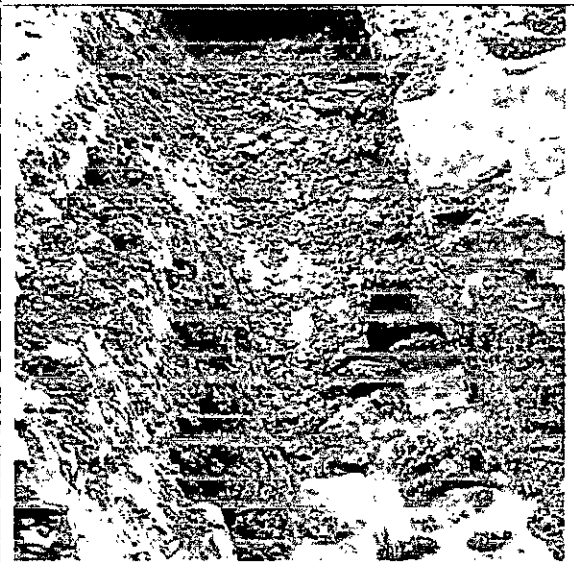
1,2	**DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)**
	
Demolición manual de pavimento asfáltico, tras corte con disco.	Demolición manual de pavimento asfáltico, tras corte con disco.
	

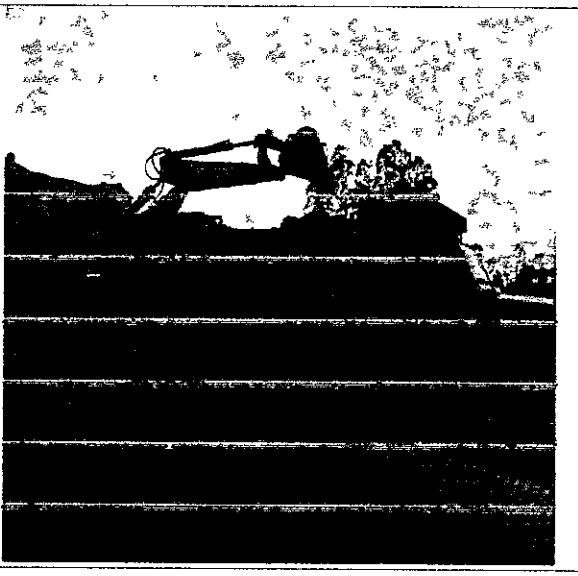
Demolición manual de pavimento asfáltico, tras corte con disco.	Demolición manual de pavimento asfáltico, tras corte con disco.
	
Demolición manual de pavimento asfáltico, tras corte con disco.	
1,3	**EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)**
	
Excavación manual y retiro de material residual.	Excavación manual y retiro de material residual.

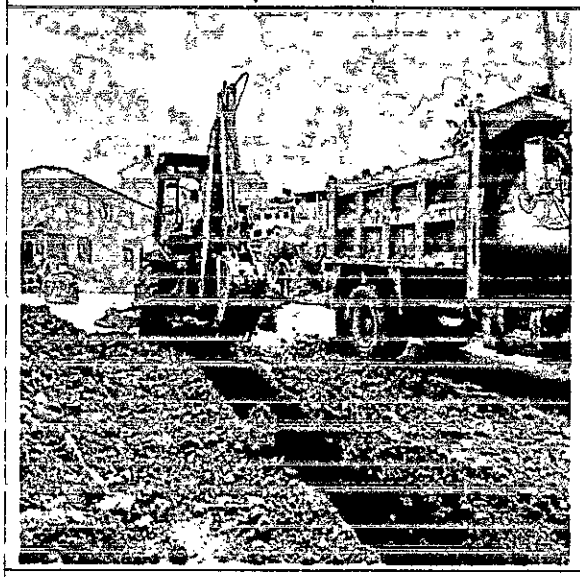
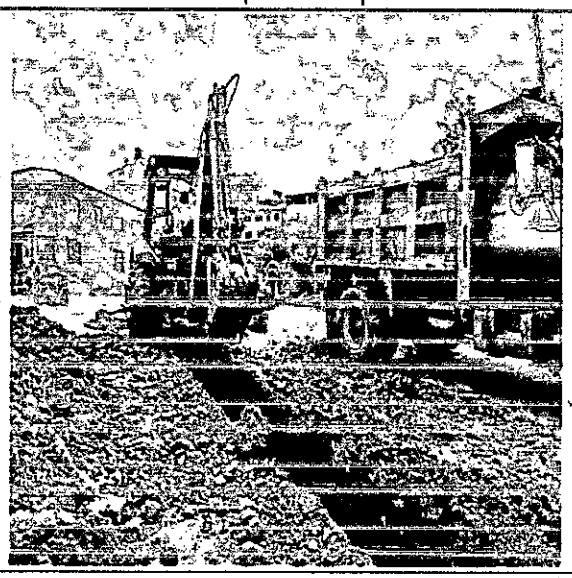
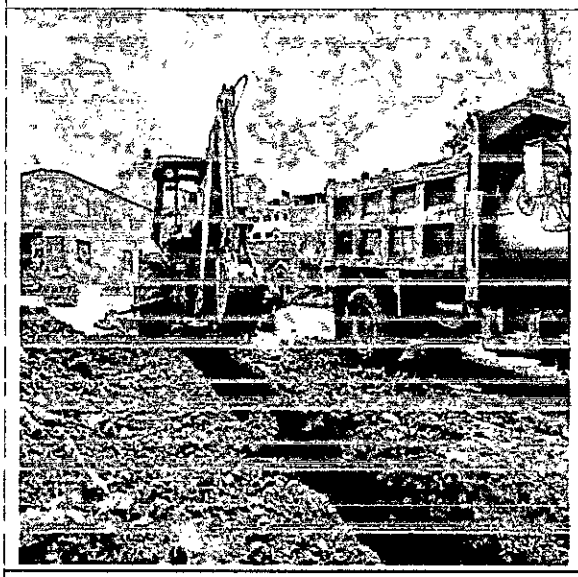
	
Excavación manual y retiro de material residual.	Excavación manual y retiro de material residual.
	
Excavación manual y retiro de material residual.	
1,4	**EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO**

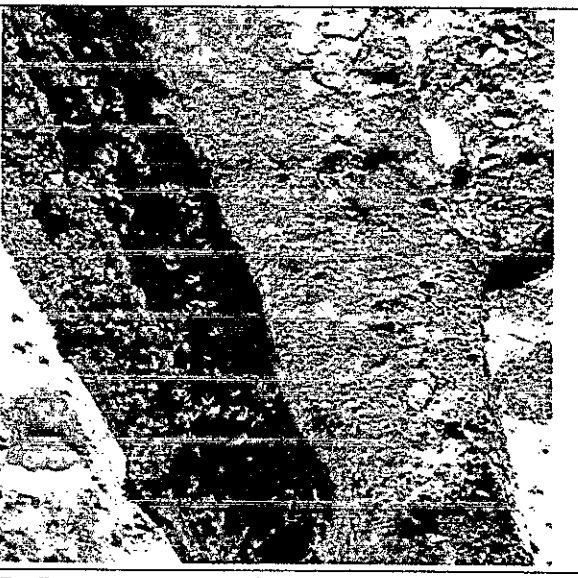
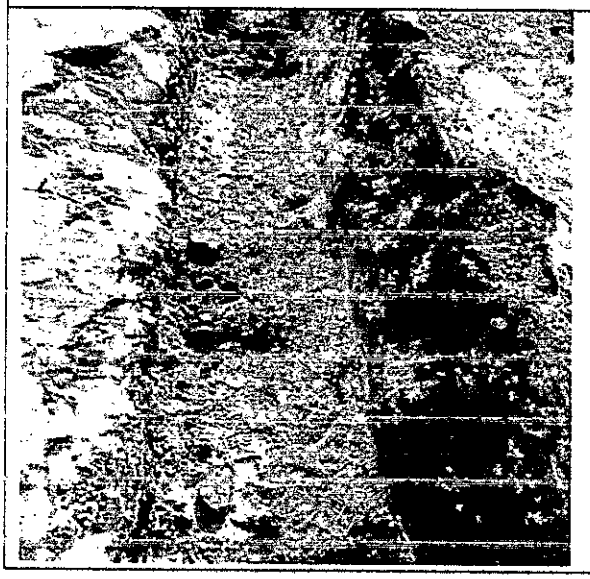
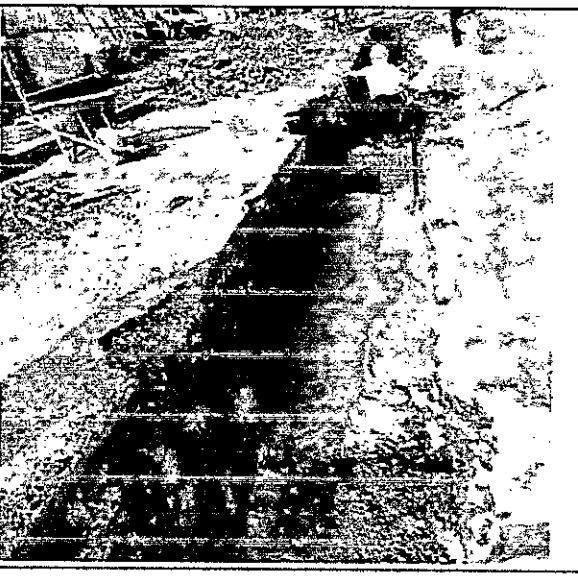
	
Excavación mecánica con maquinaria amarilla.	Excavación mecánica con maquinaria amarilla.
	
Excavación mecánica con maquinaria amarilla.	Excavación mecánica con maquinaria amarilla.

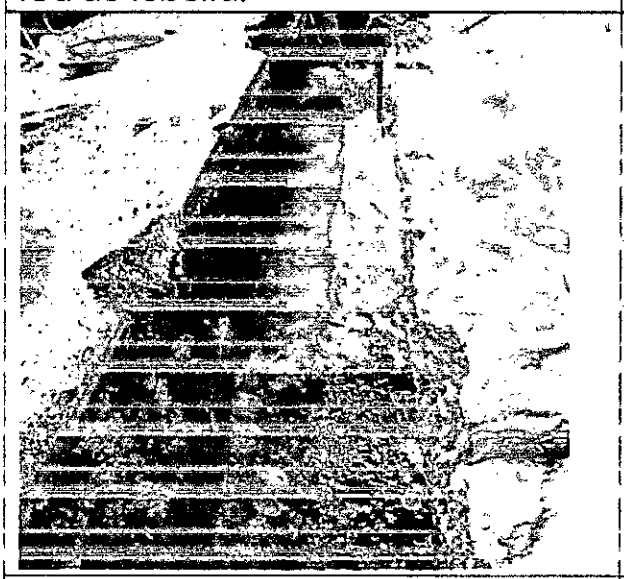
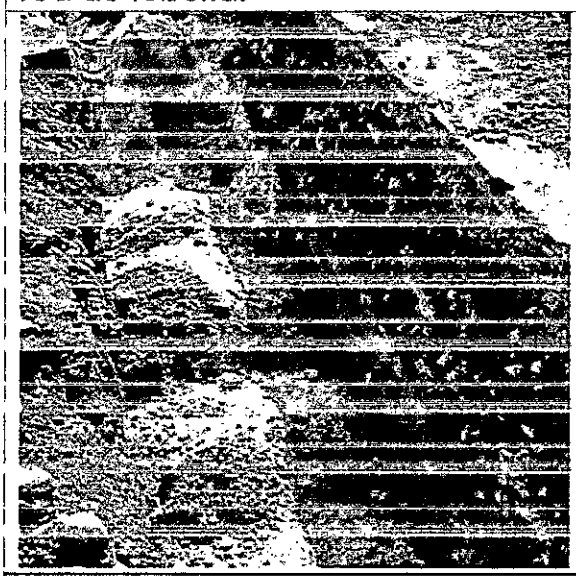
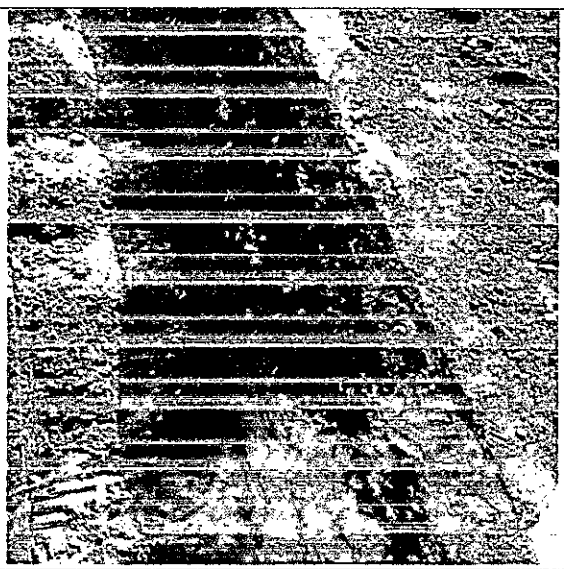
	
Excavación mecánica con maquinaria amarilla.	Excavación mecánica con maquinaria amarilla.
	
Excavación mecánica con maquinaria amarilla.	Excavación mecánica con maquinaria amarilla.

	
Excavación mecánica con maquinaria amarilla.	Excavación mecánica con maquinaria amarilla.
1,5	**RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO**
	

Retiro tubería en concreto existente, para reposición.	Retiro tubería en concreto existente, para reposición.
	
Retiro tubería en concreto existente, para reposición.	Retiro tubería en concreto existente, para reposición.
1,6	**CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)**
	

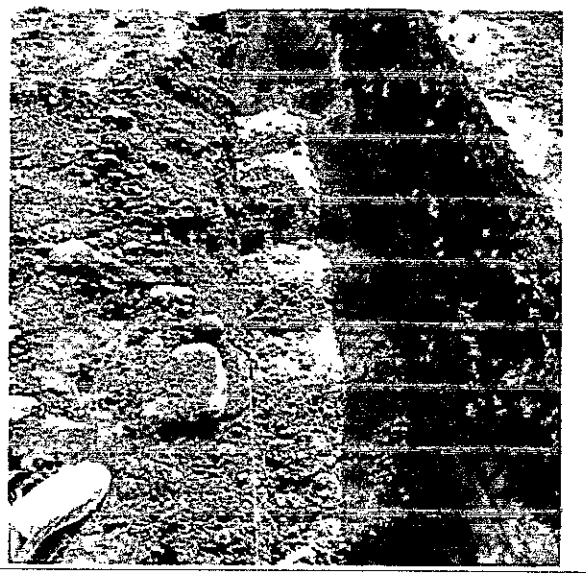
Cargue y acarreo de material residual suelto con maquinaria pesada	Cargue y acarreo de material residual suelto con maquinaria pesada
	
Cargue y acarreo de material residual suelto	Cargue y acarreo de material residual suelto
	
Cargue y acarreo de material residual suelto	Cargue y acarreo de material residual suelto con maquinaria pesada

1,7	**RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)**
Relleno y extendido de arena de peña en red de tuberia.	Relleno y extendido de arena de peña en red de tuberia.
	
Relleno y extendido de arena de peña en red de tuberia.	Relleno y extendido de arena de peña en red de tuberia.
	

Compactado de arena de peña en red de tuberia.	Compactado de arena de peña en red de tuberia.
	
Compactado de arena de peña en red de tuberia.	Extendido de arena de peña en red de tuberia.
	
Extendido de arena de peña en red de tuberia.	Extendido de arena de peña en red de tuberia.



Extendido de arena de peña en red de tuberia.



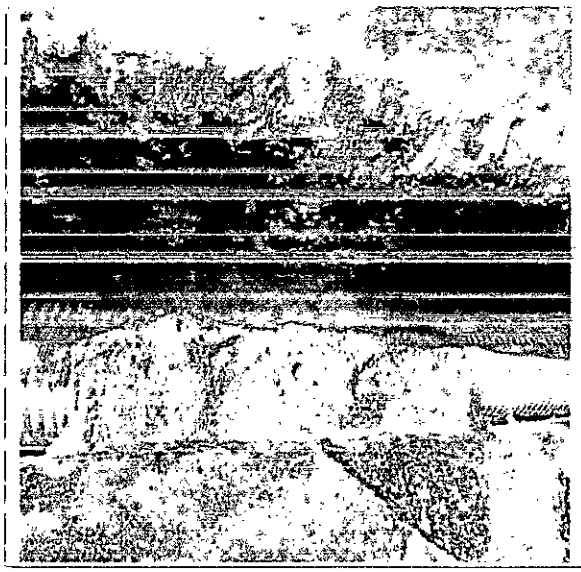
Extendido de arena de peña en red de tuberia.



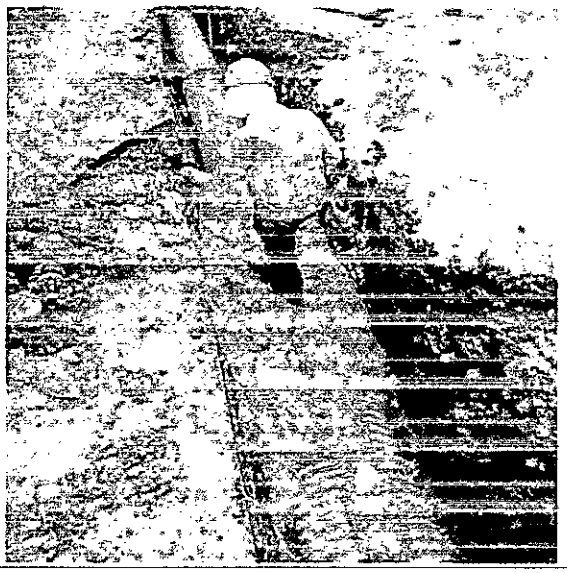
Extendido y compactado de arena de peña en red de tuberia.



Suministro y extendido de arena de peña en res de tubería.



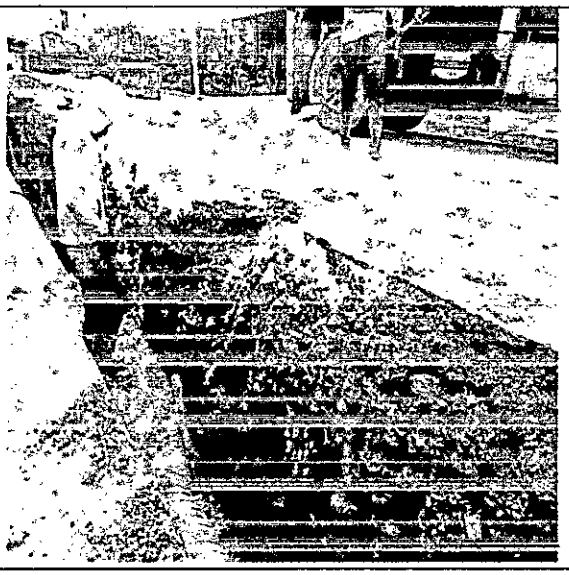
Extendido de arena de peña en red de tubería.



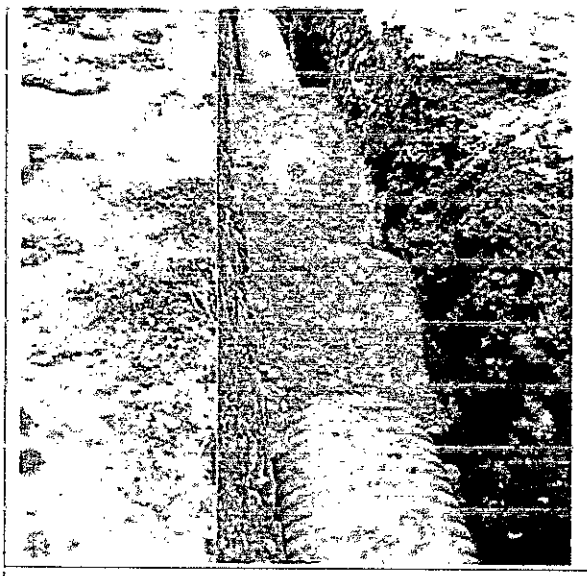
Extendido de arena de peña en red de tubería.



Extendido y compactado de arena de peña en red de tubería.



Extendido de arena de peña en red de tubería.



Extendido de arena de peña en red de tuberia.



Extendido de arena de peña en red de tuberia.



Extendido de arena de peña en red de tuberia.



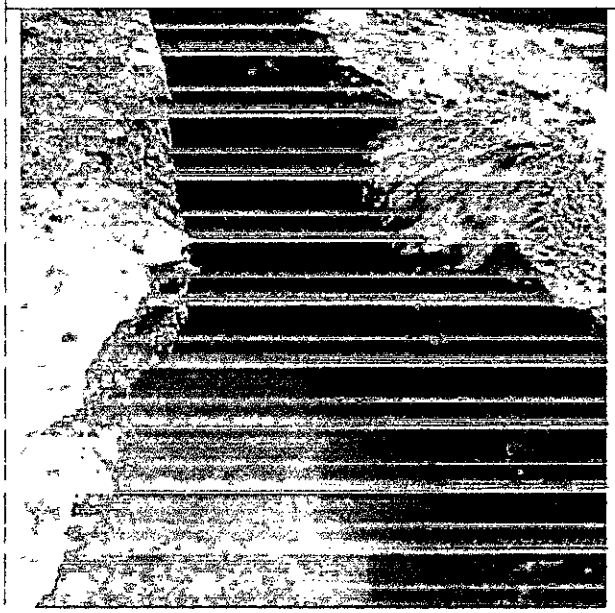
Extendido de arena de peña en red de tuberia.



Extendido de arena de peña en red de tubería.

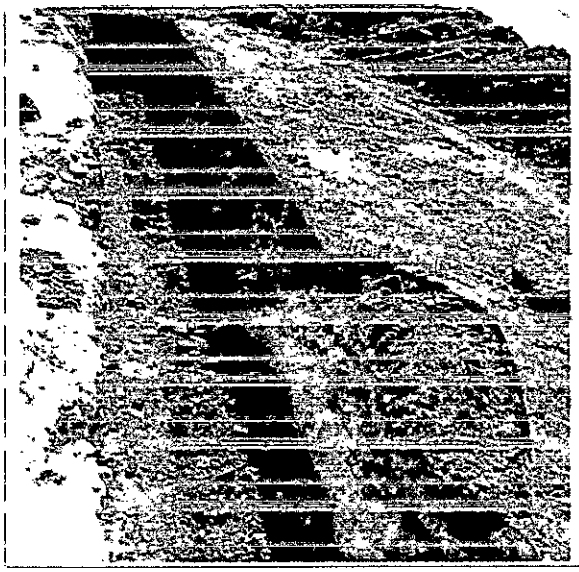


Extendido de arena de peña en red de tubería.



Extendido de arena de peña en red de tubería.

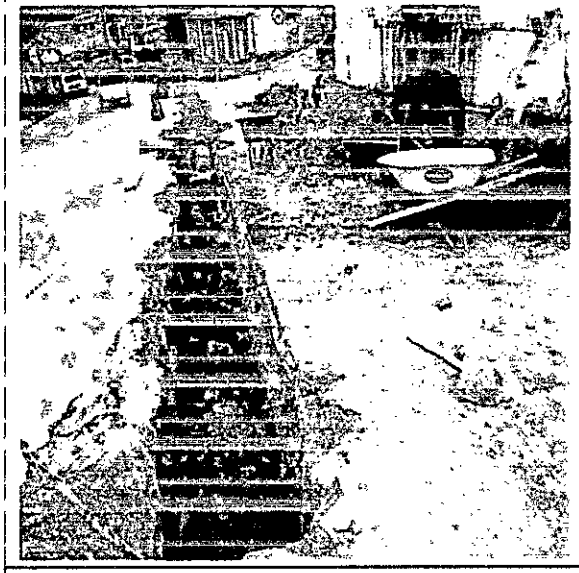
1,8	**RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA**
	
Relleno con material seleccionado, extendido manualmente.	Relleno con material seleccionado, extendido manualmente.
	
Compactado de material seleccionado de la excavación, extendido manualmente.	Compactado de material seleccionado de la excavación, extendido manualmente.



Compactado de material seleccionado de la excavación, extendido manualmente.



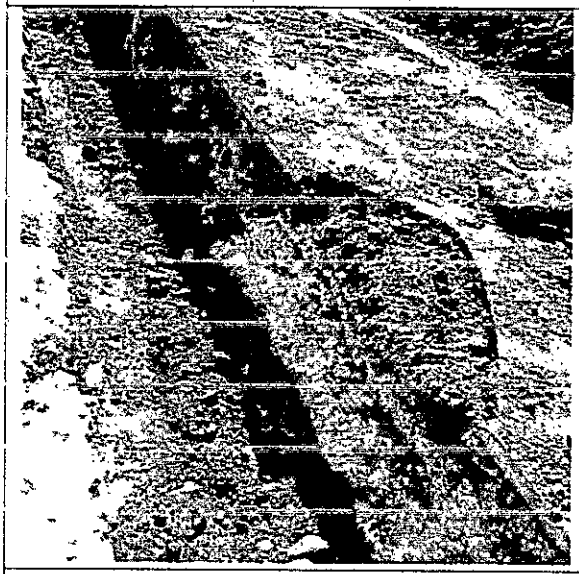
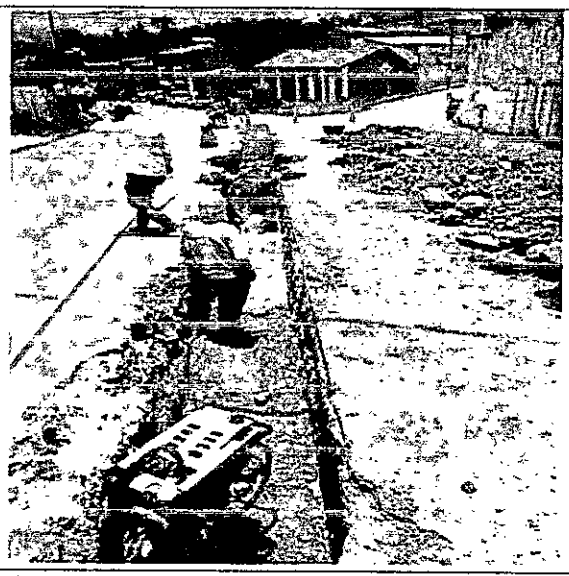
Compactado de material seleccionado de la excavación, extendido manualmente.

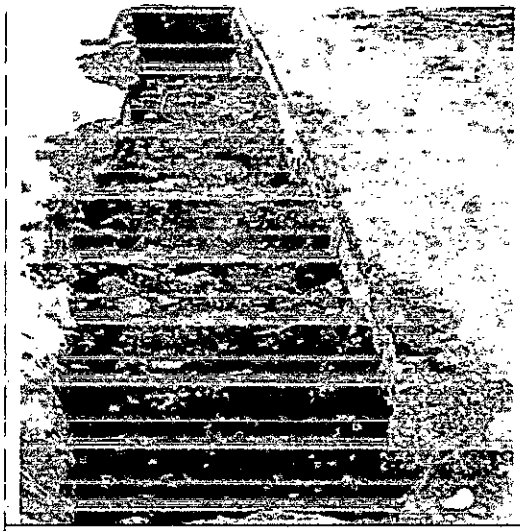
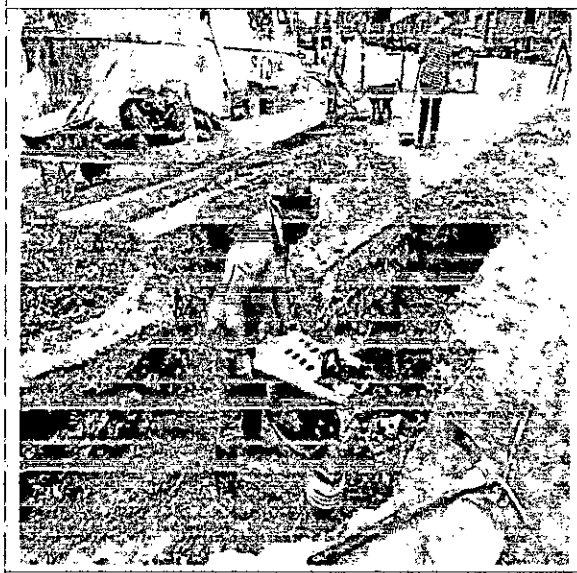
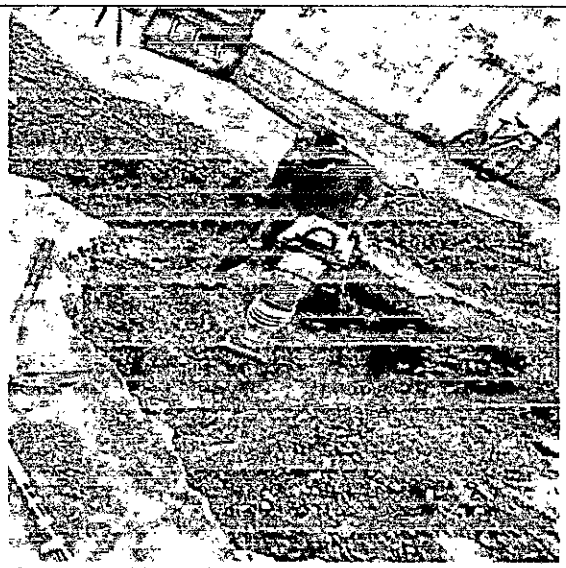


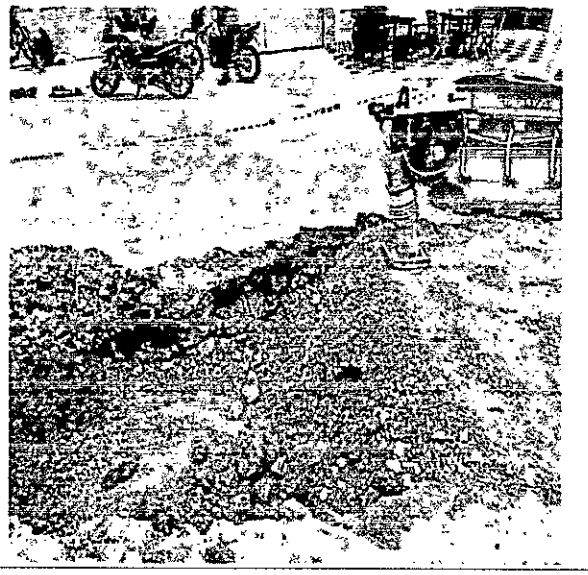
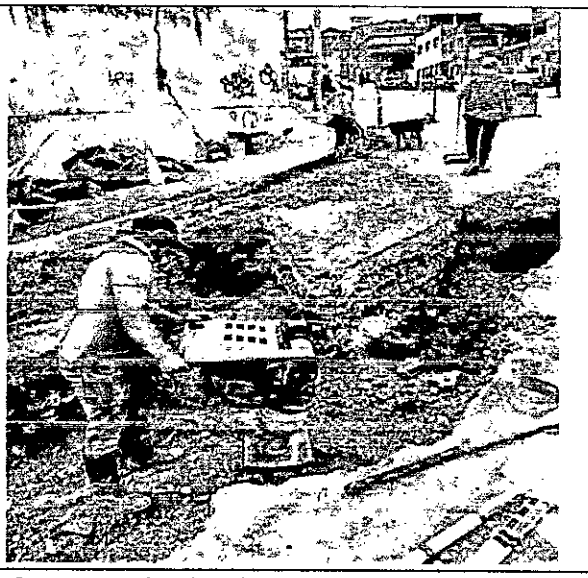
Compactado de material seleccionado de la excavación, extendido manualmente.

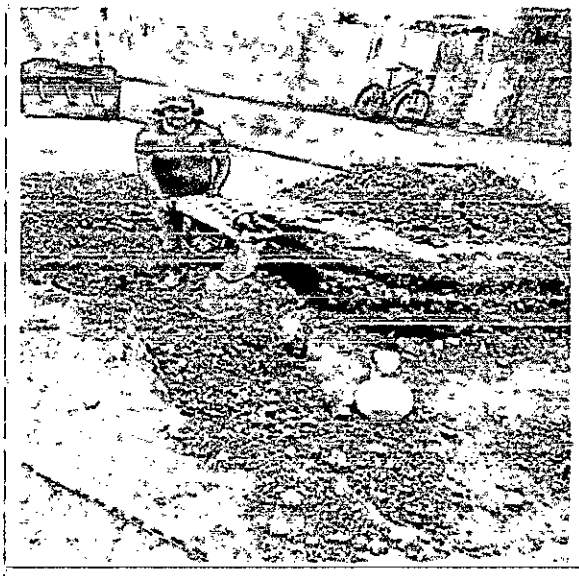
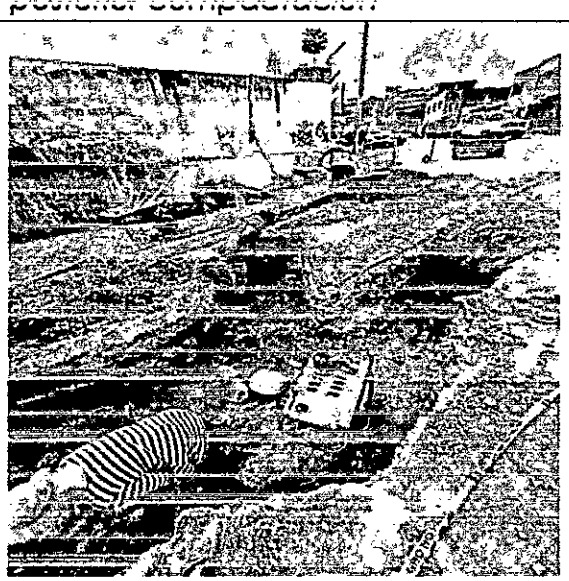


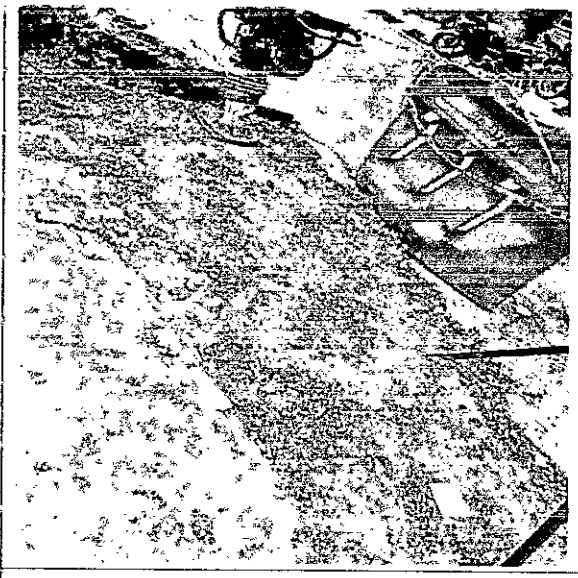
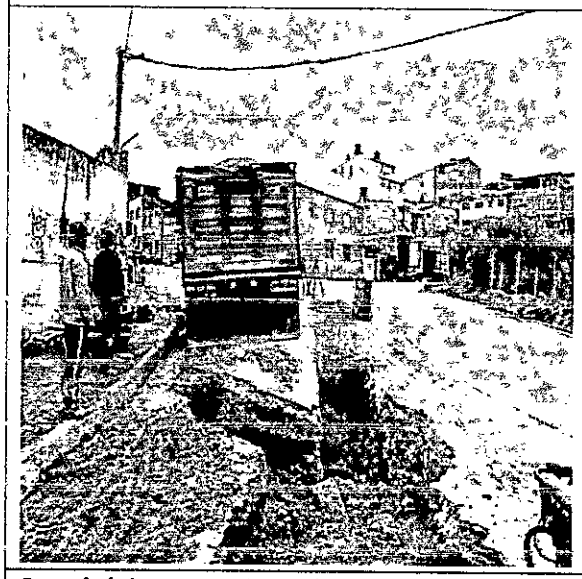
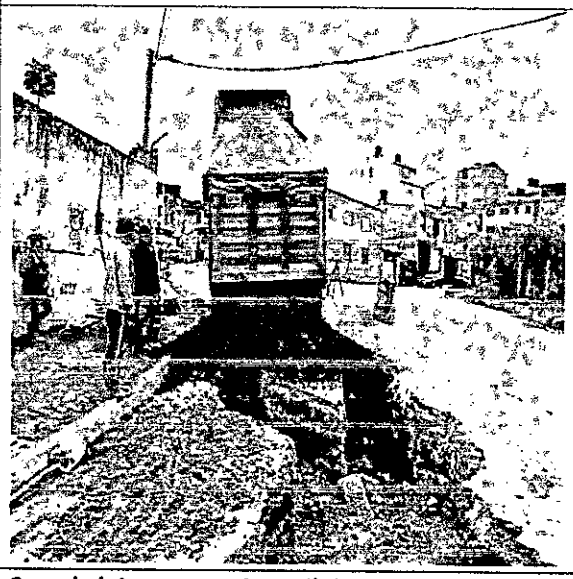
Compactado de material seleccionado de la excavación, extendido manualmente.

	
Compactado de material seleccionado de la excavación, extendido manualmente.	Compactado de material seleccionado de la excavación, extendido manualmente.
	
Compactado de material seleccionado de la excavación, extendido manualmente.	Compactado de material seleccionado de la excavación, extendido manualmente.

	
Compactado de material seleccionado de la excavación, extendido manualmente.	Compactado de material seleccionado de la excavación, extendido manualmente.
1,9	**RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA**
	
Compactado de material de afirmado.	Compactado de material de afirmado.

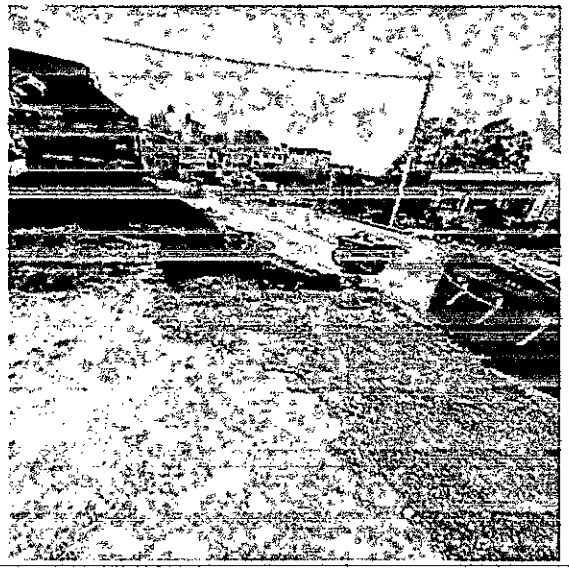
	
Compactado de material de afirmado.	Compactado de material de afirmado.
	
Compactado de material de afirmado.	Compactado de material de afirmado.

	
Compactado de material de afirmado.	Extendido de material afirmado, para posterior compactación.
	
Compactado de material de afirmado.	Extendido de material afirmado, para posterior compactación

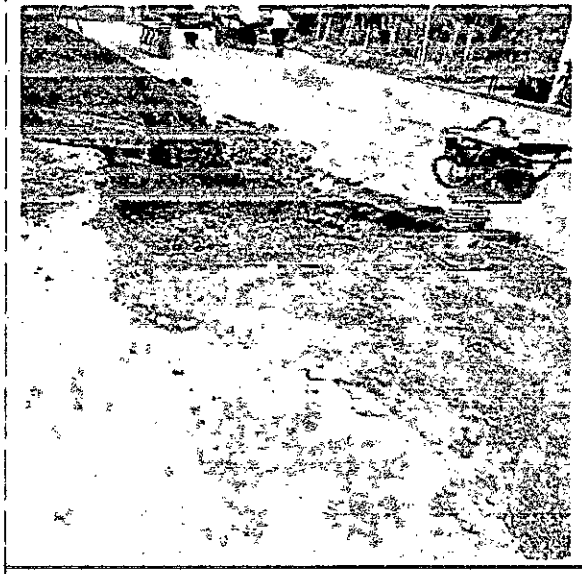
	
Compactado de material de afirmado.	Compactado de material de afirmado.
	
Suministro y extendido de material de afirmado, para posterior compactación.	Suministro y extendido de material de afirmado, para posterior compactación.



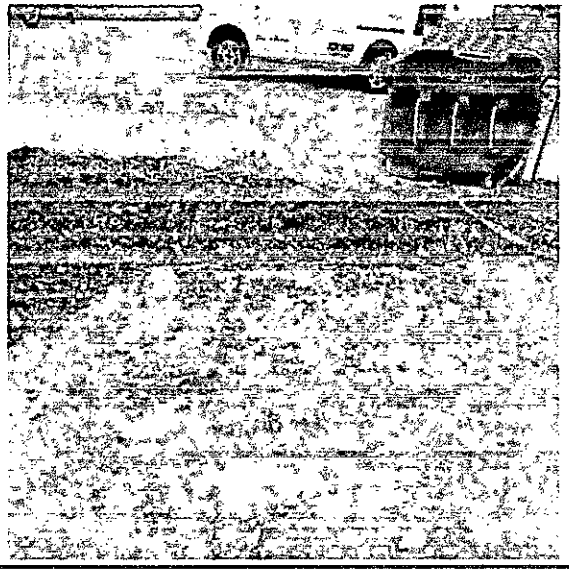
Suministro y extendido de material de afirmado, para posterior compactación.



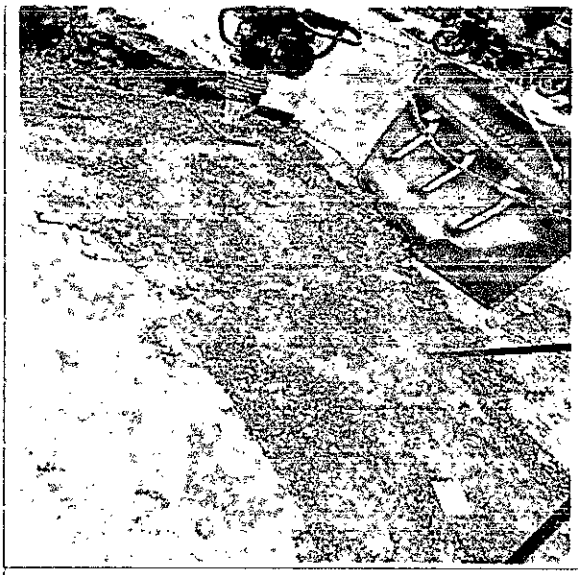
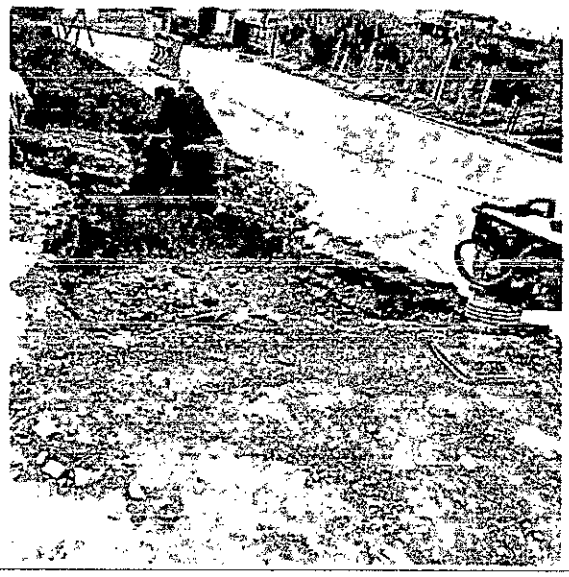
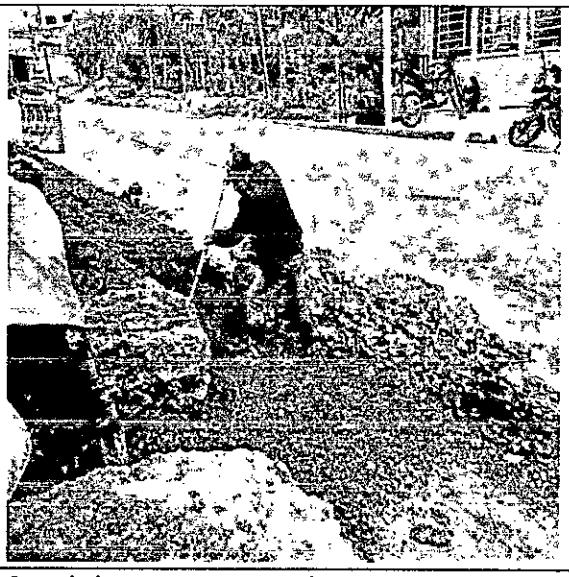
Suministro y extendido de material de afirmado, para posterior compactación.

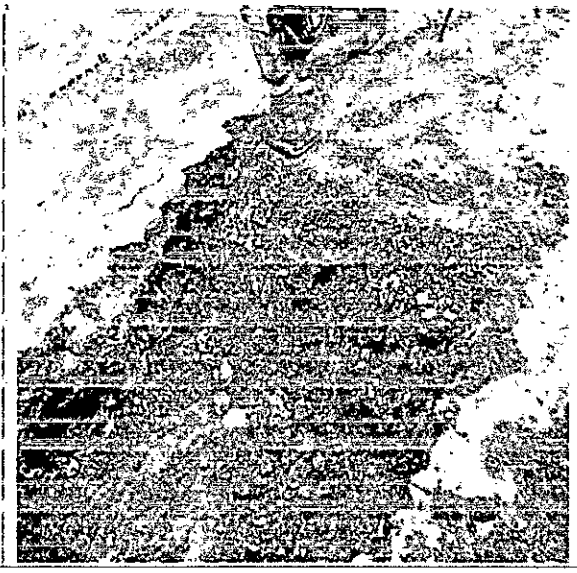
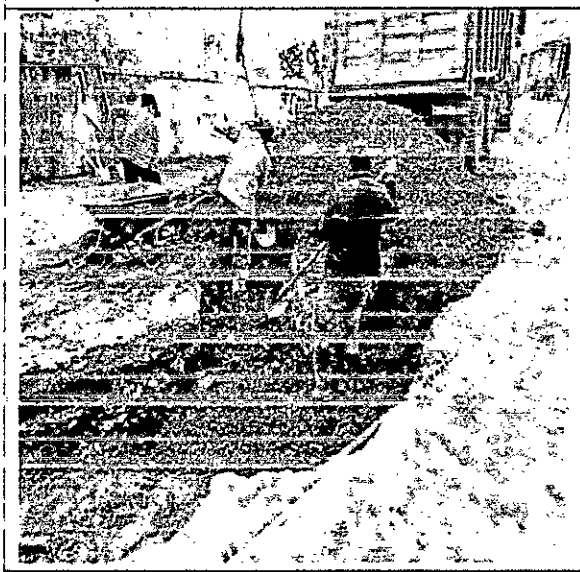


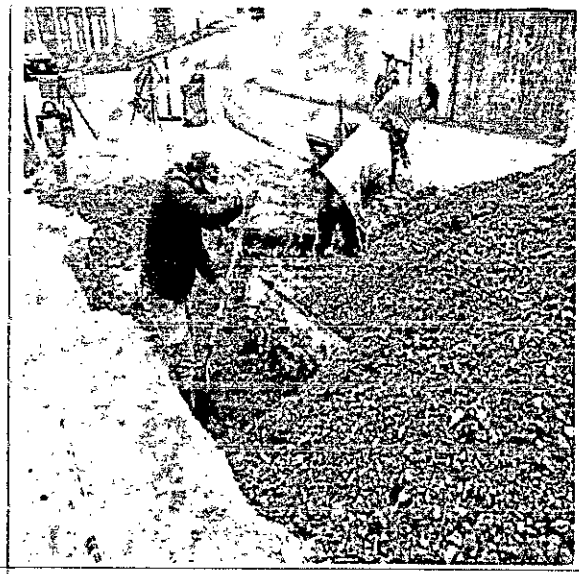
Suministro y extendido de material de afirmado, para posterior compactación.

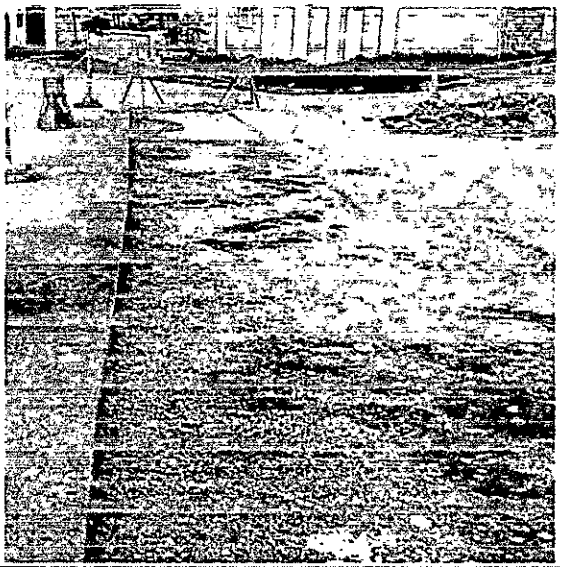
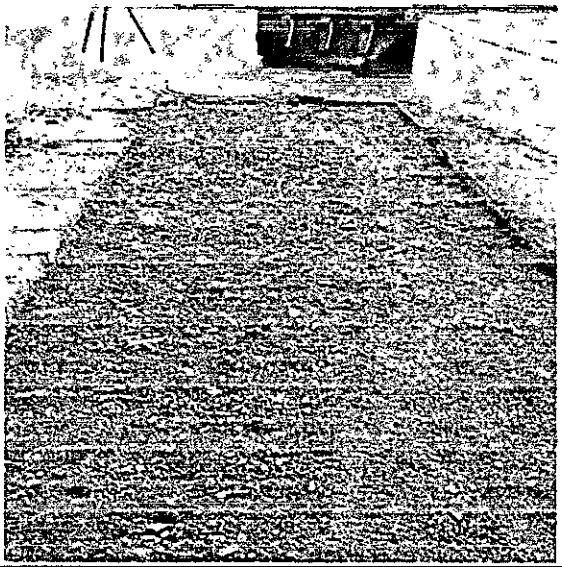
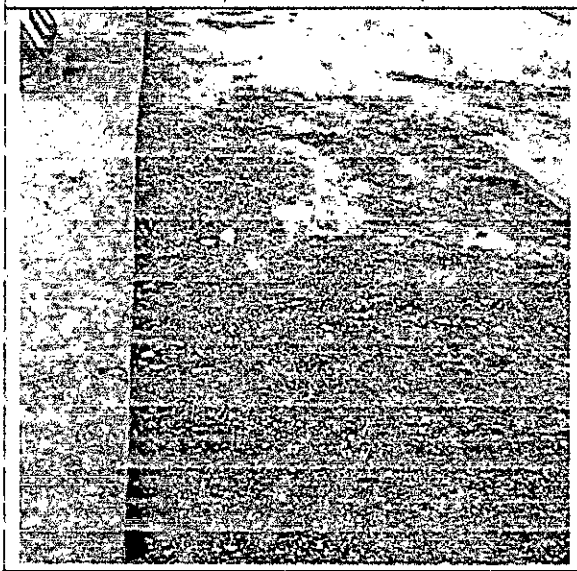


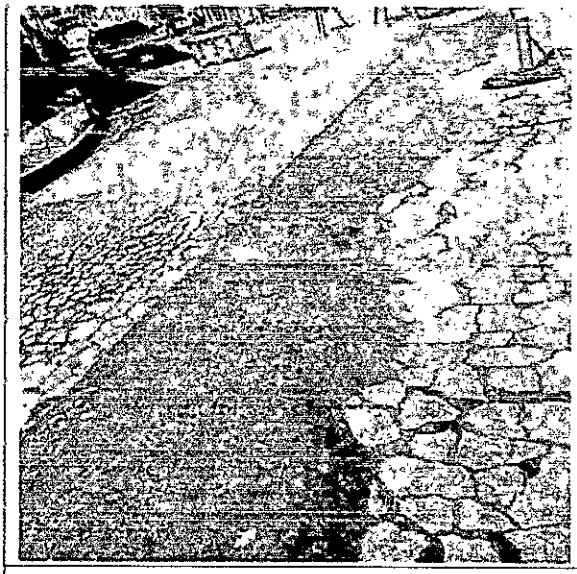
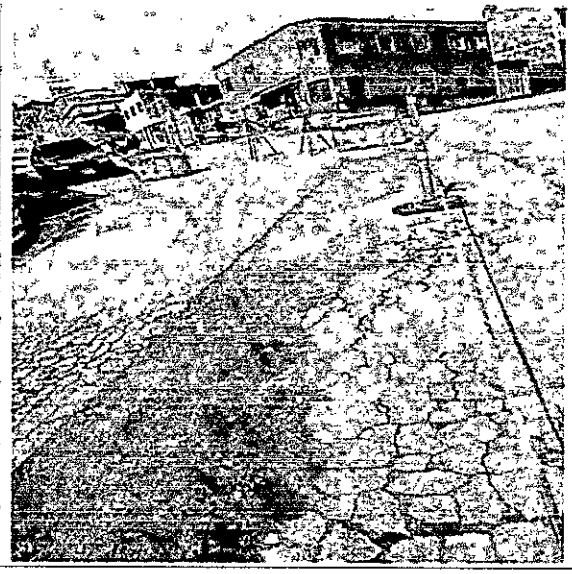
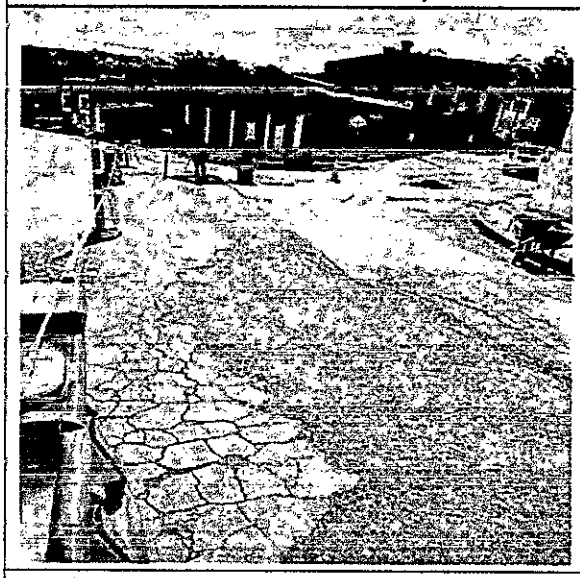
Extendido de material de afirmado, para posterior compactación.

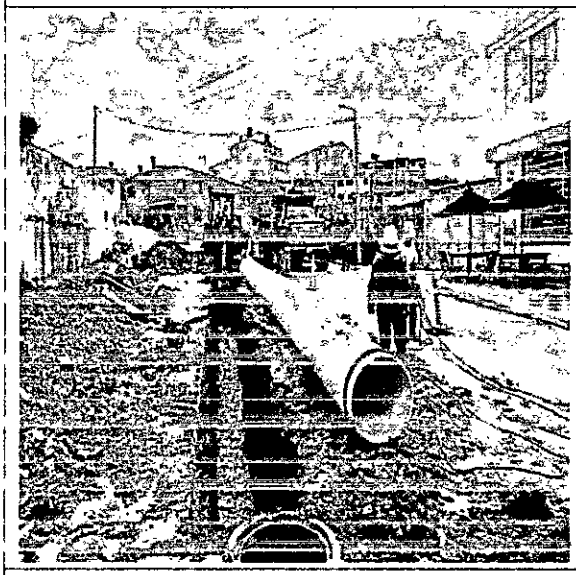
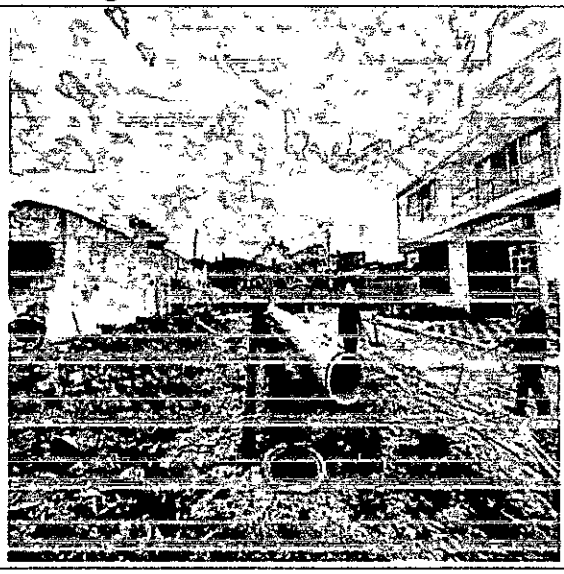
	
Compactado de material de afirmado.	Extendido de material de afirmado, para posterior compactación.
	
Suministro y extendido de material de afirmado, para posterior compactación.	Suministro y extendido de material de afirmado, para posterior compactación.

	
Compactado de material de afirmado	Compactado de material de afirmado
	
Suministro y extendido de material de afirmado, para posterior compactación.	Suministro y extendido de material de afirmado, para posterior compactación.

	
Suministro y extendido de material de afirmado, para posterior compactación.	Suministro y extendido de material de afirmado, para posterior compactación.
	
Suministro y extendido de material de afirmado, para posterior compactación.	Suministro y extendido de material de afirmado, para posterior compactación.

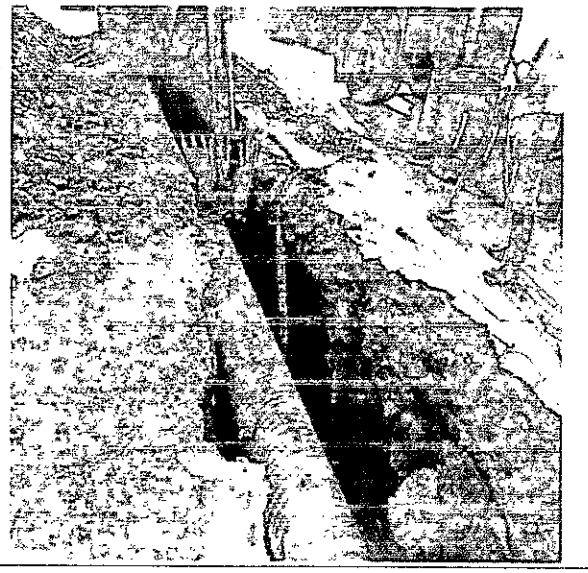
	
Material de afirmado compactado.	Material de afirmado compactado.
	
Material de afirmado compactado.	Material de afirmado compactado.

	
Material de afirmado compactado.	Material de afirmado compactado.
	
Material de afirmado compactado.	Material de afirmado compactado.
2,0	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**
2,1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 24"**

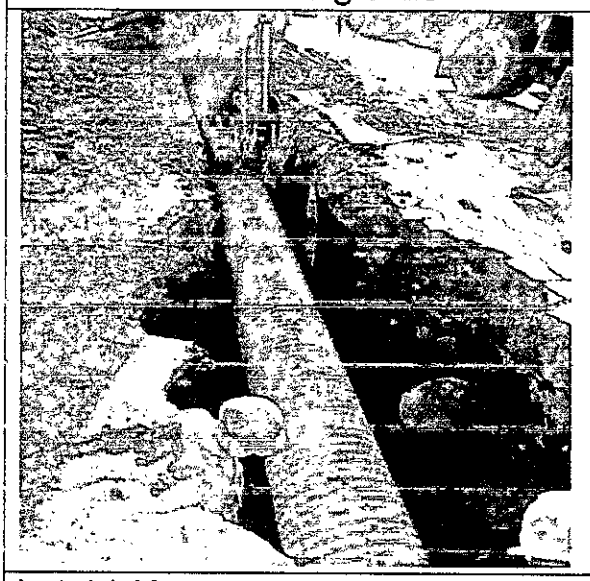
	
Extendido de gravilla, para posterior instalación de tubería.	instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla
	
instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla	instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla



instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla



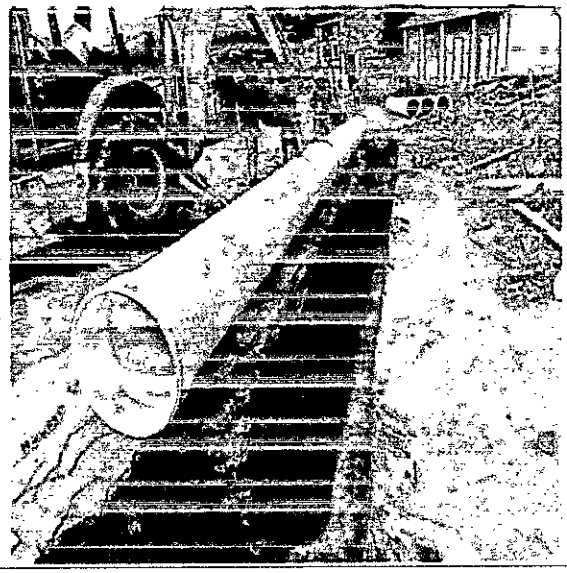
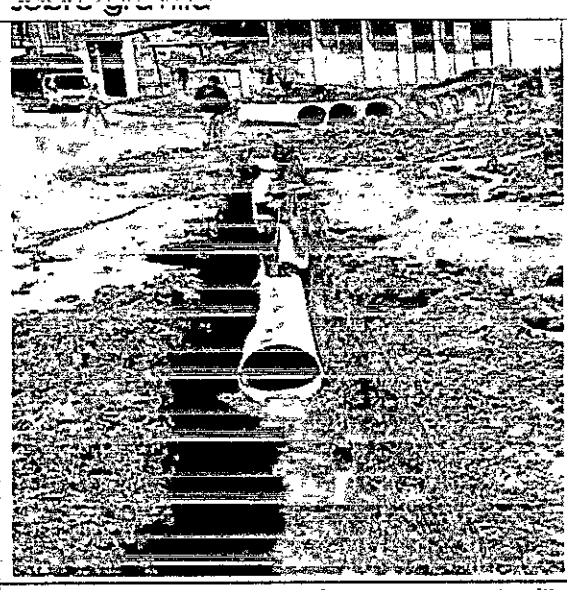
instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla

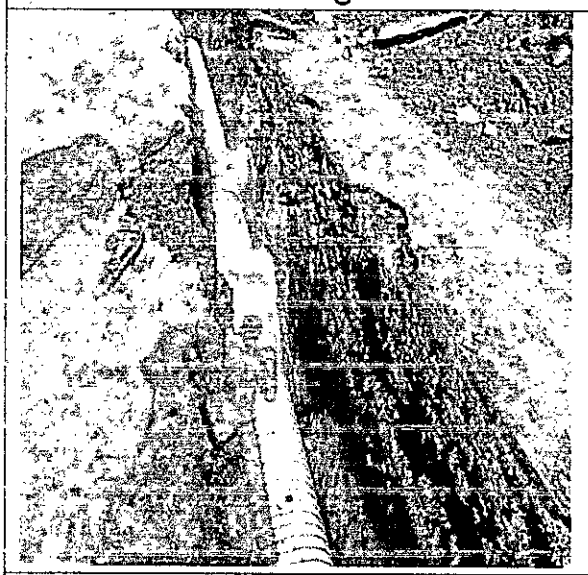
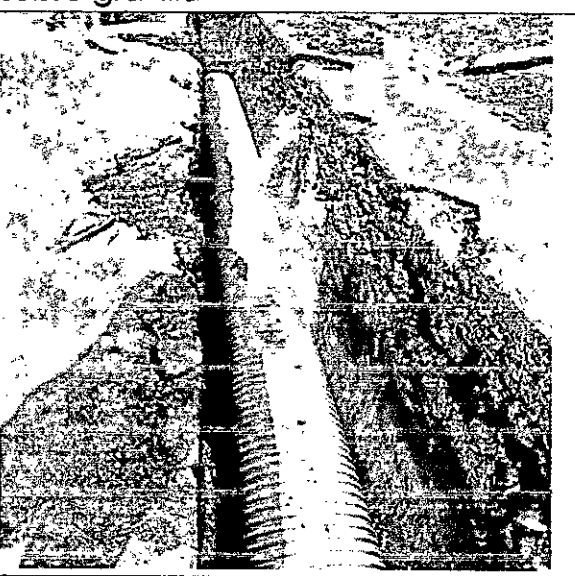


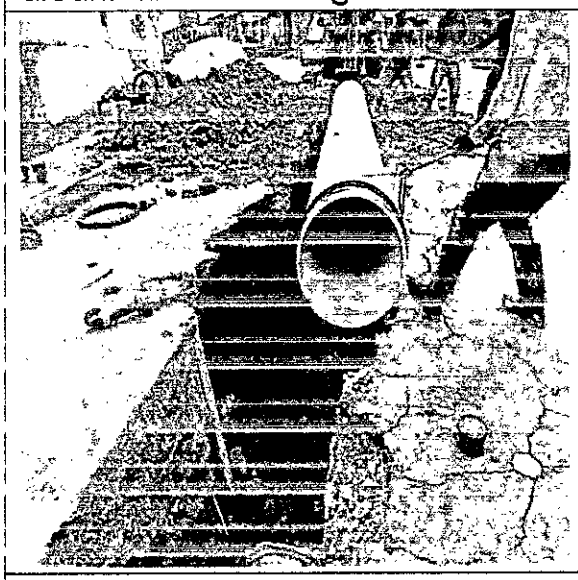
instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla

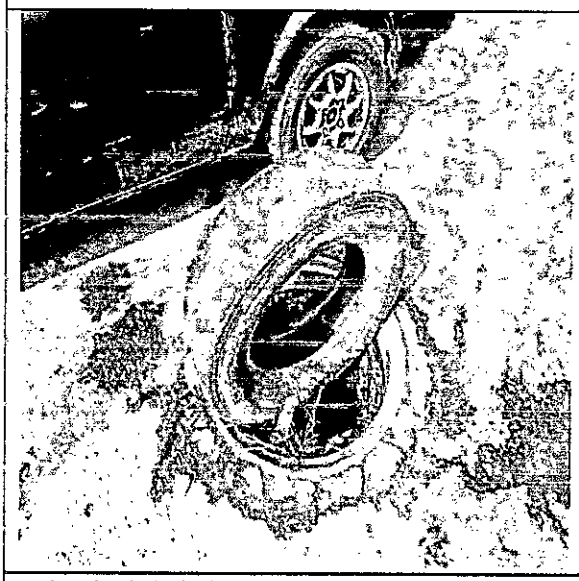


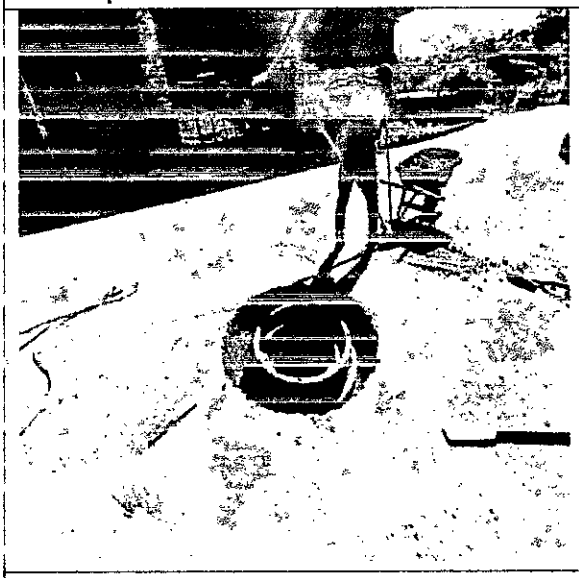
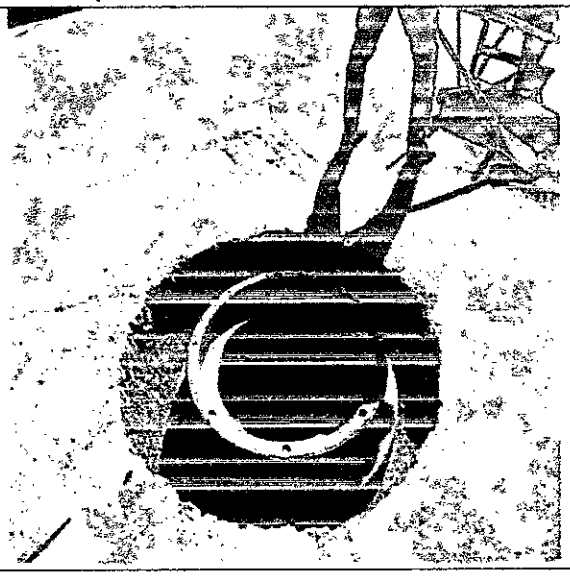
instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla

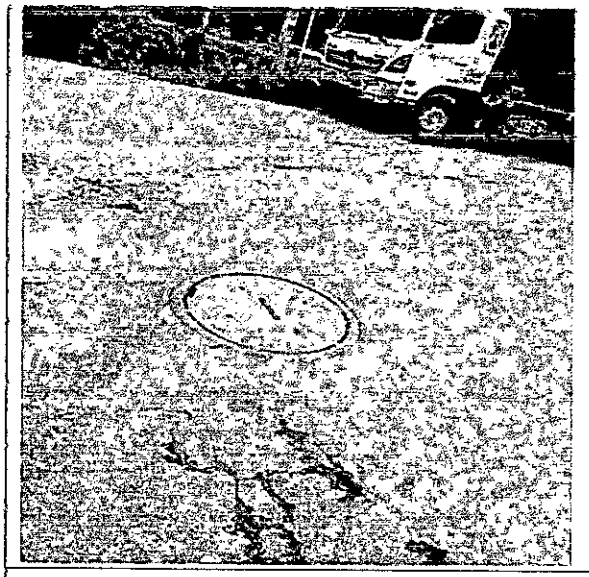
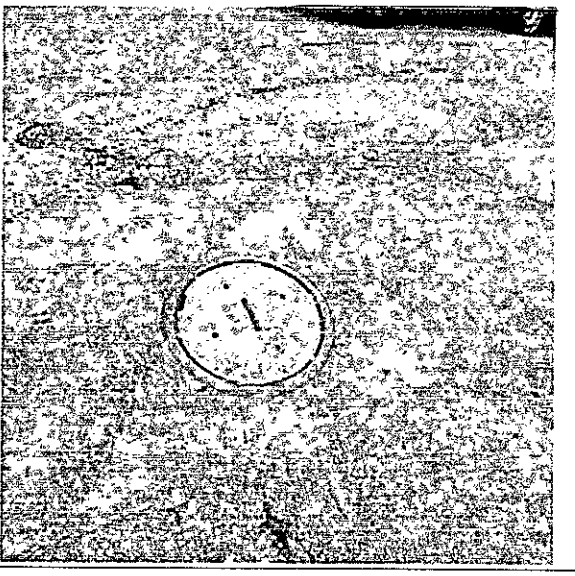
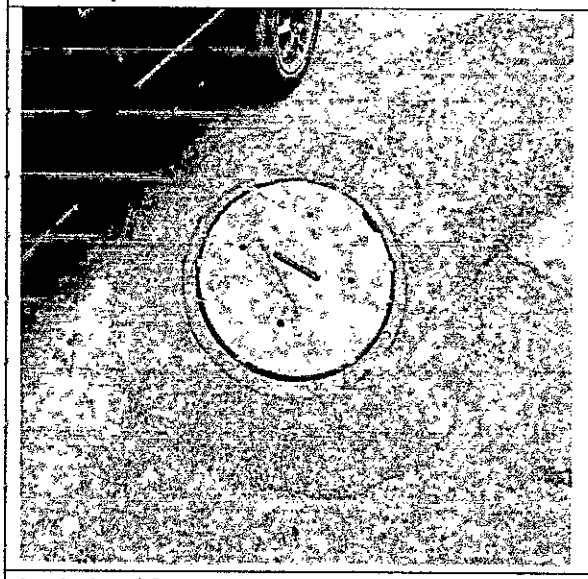
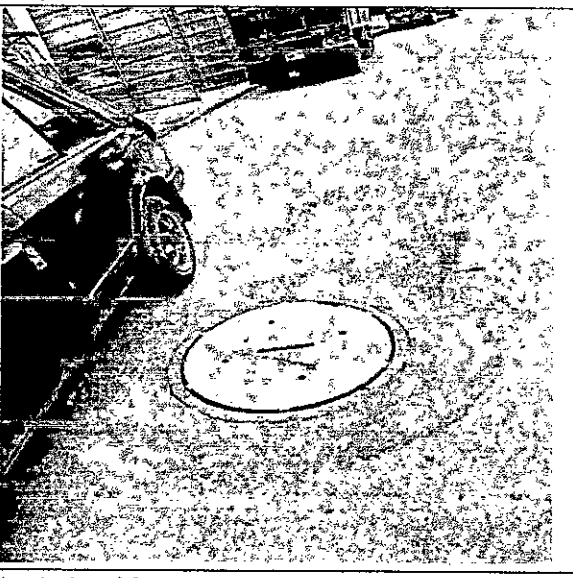
	
instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla	instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla
	
instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla	instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla

	
instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla	instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla
	
instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla	instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla

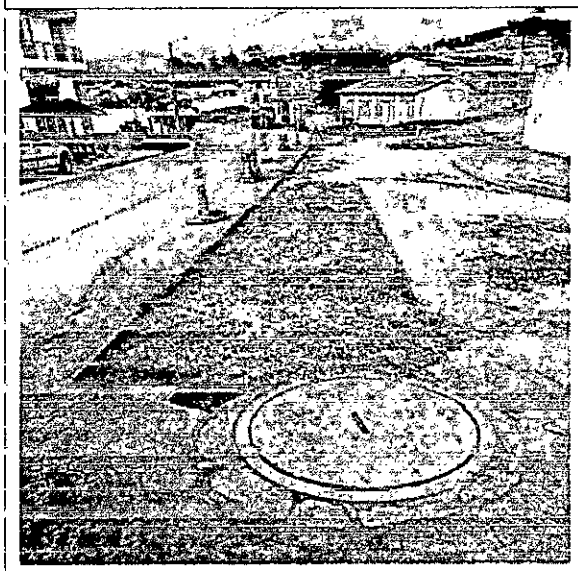
	
instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla	instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla
	
instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla	instalación de tubería de alcantarillado sobre gravilla
2,2	**SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PLASTICA PARA POZO DE INSPECCION**

	
Estado inicial de pozo de inspección.	Estado inicial de pozo de inspección
	
Corte y excavación de boca de pozo de inspección	Corte y excavación de boca de pozo de inspección

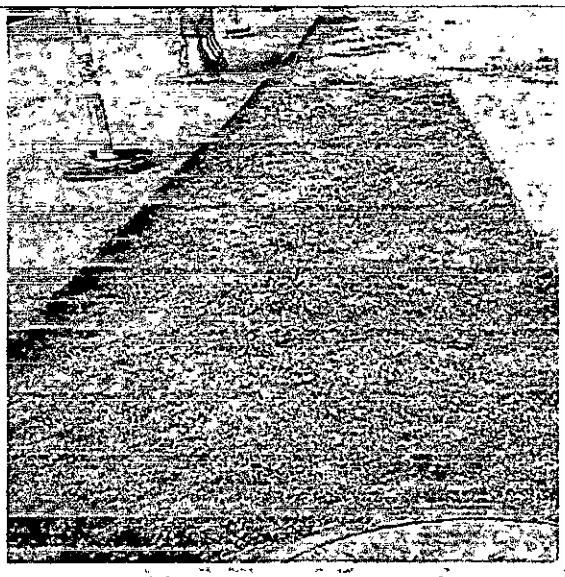
	
Corte y excavación de boca de pozo de inspección	Corte y excavación de boca de pozo de inspección
	
Suministro e instalación de aro plastico de pozo de inspección.	Suministro e instalación de aro plastico de pozo de inspección.

	
Instalación de tapa plástica de pozo de inspección.	Instalación de tapa plástica de pozo de inspección.
	
Instalación de tapa plástica de pozo de inspección.	Instalación de tapa plástica de pozo de inspección.
3,0	**PAVIMENTO**
3,1	

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H



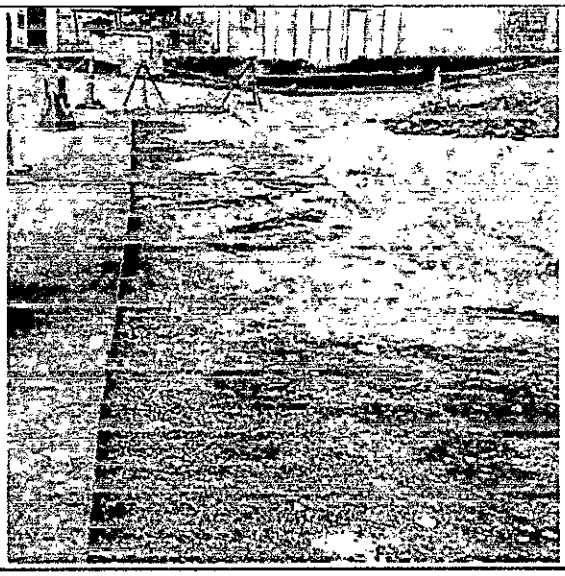
Preparación de corte para riego deliga con emulsión asfáltica



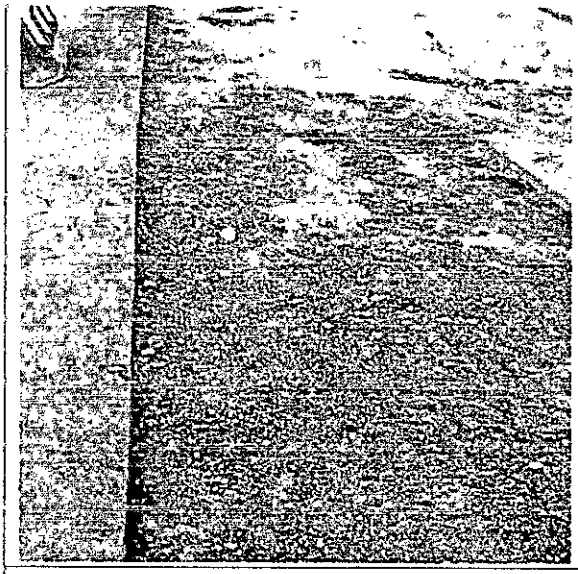
Preparación de corte para riego deliga con emulsión asfáltica



Preparación de corte para riego de liga con emulsión asfáltica.



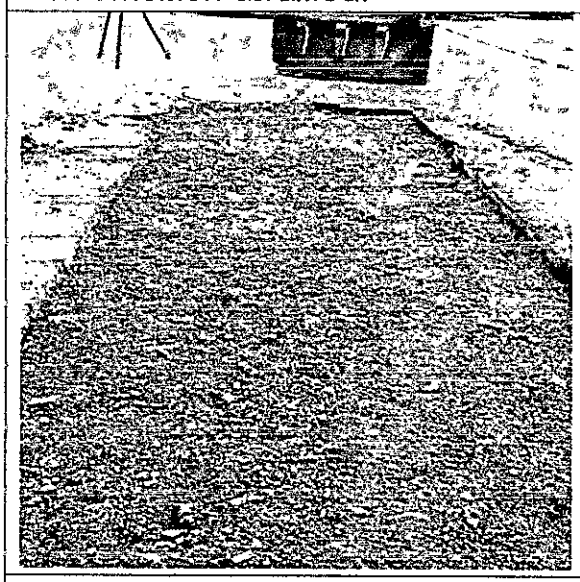
Preparación de corte para riego deliga con emulsión asfáltica.



Preparación de corte para riego deliga con emulsión asfáltica.



Preparación de corte para riego deliga con emulsión asfáltica.



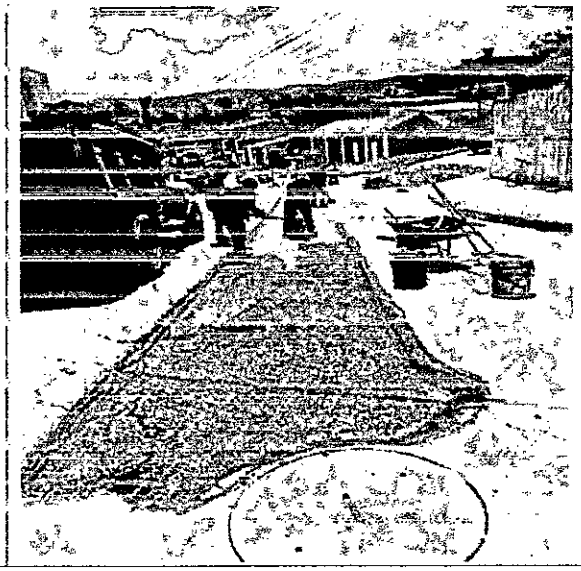
Preparación de corte para riego deliga con emulsión asfáltica.



Preparación de corte para riego deliga con emulsión asfáltica.



Preparación de corte para riego de liga con emulsión asfáltica.



Riego de liga con emulsión asfáltica.



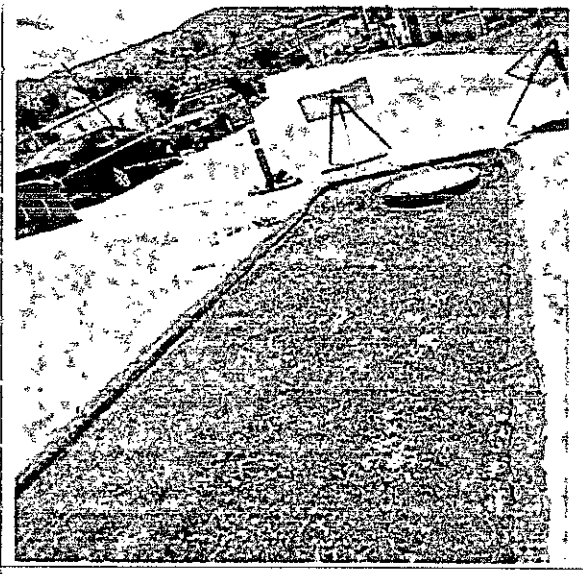
Riego de liga con emulsión asfáltica.



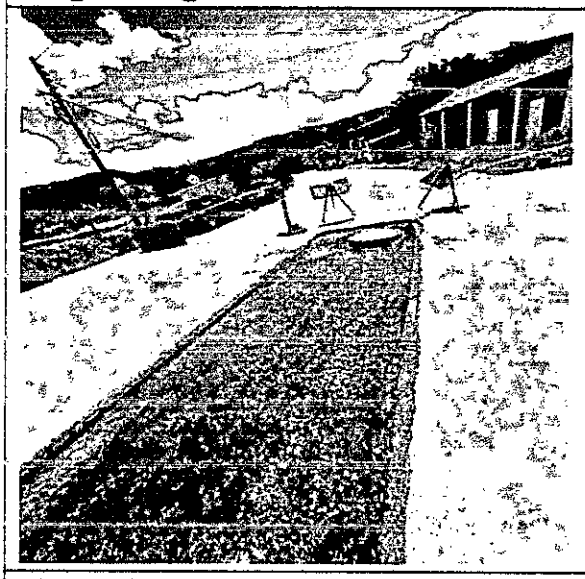
Riego de liga con emulsión asfáltica.



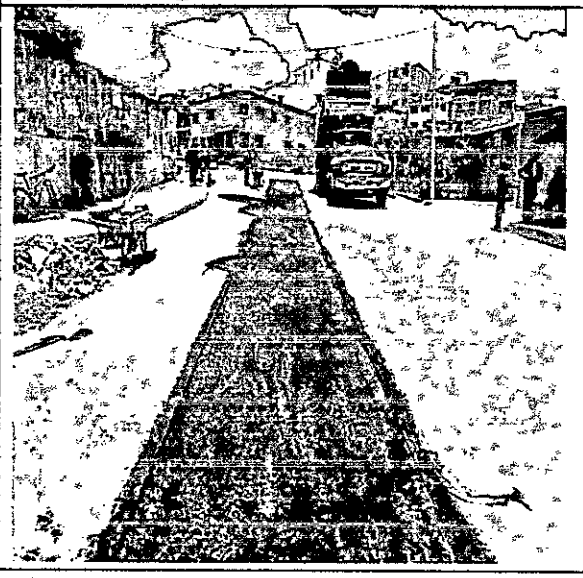
Riego de liga con emulsión asfáltica.



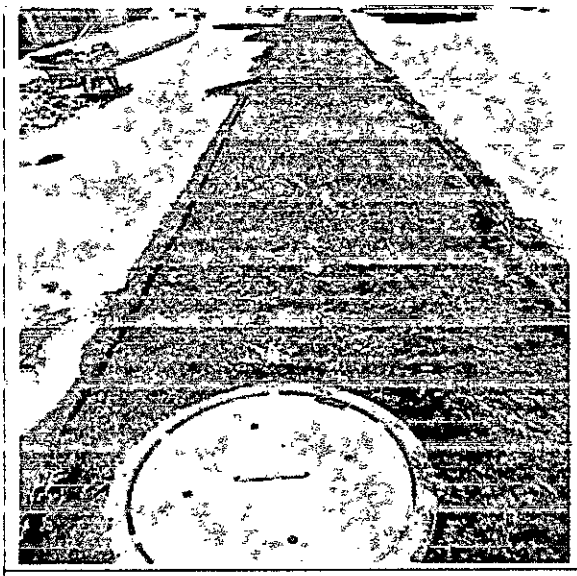
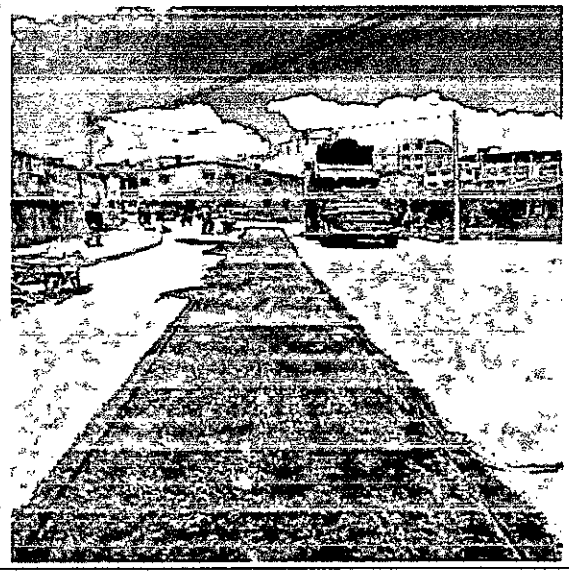
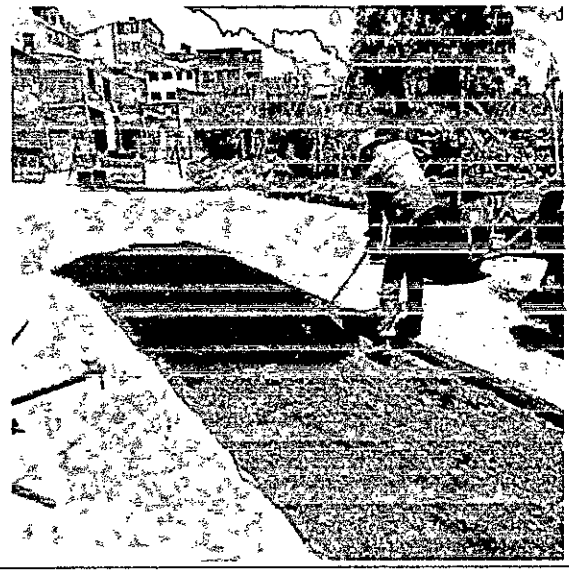
Riego de liga con emulsión asfáltica.

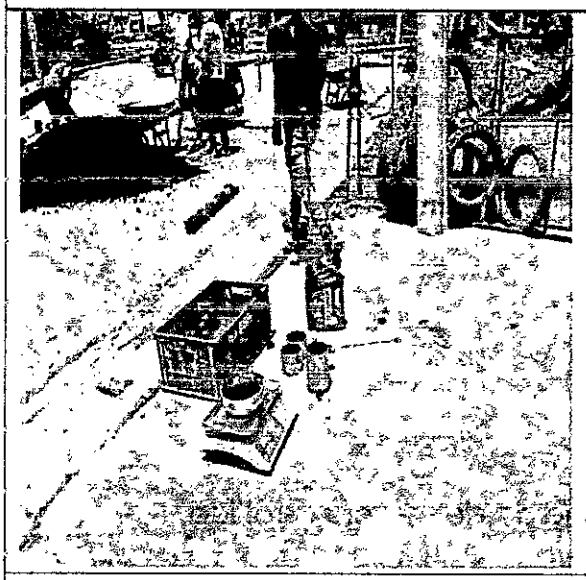
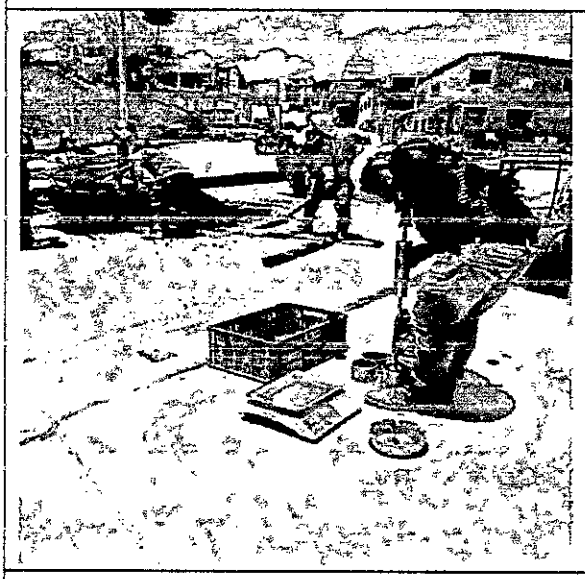
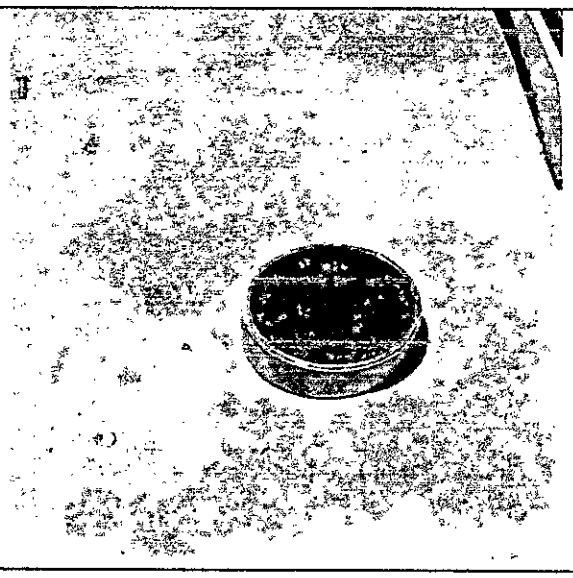


Riego de liga con emulsión asfáltica.



Riego de liga con emulsión asfáltica.

	
Riego de liga con emulsión asfáltica.	Riego de liga con emulsión asfáltica.
3,2	**SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)**
	

Suministro y extendido de mezcla asfáltica.	Suministro y extendido de mezcla asfáltica.
	
Toma de muestras para estudio de laboratorio.	Toma de muestras para estudio de laboratorio.
	
Toma de muestras para estudio de laboratorio.	Toma de muestras para estudio de laboratorio.



Extendido de mezcla asfáltica.



Extendido de mezcla asfáltica.



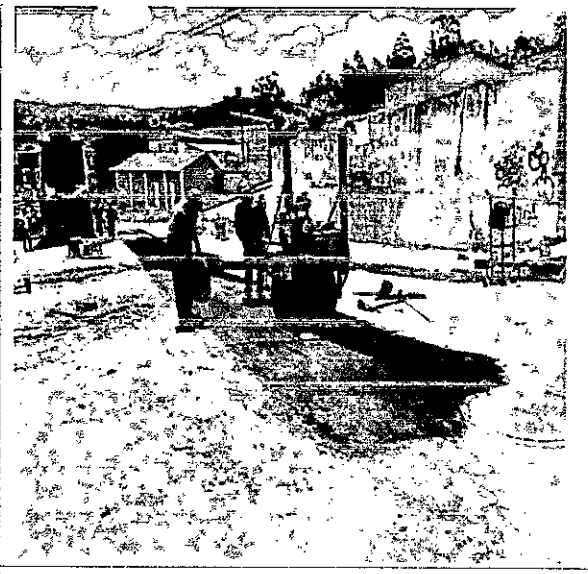
Extendido y compactación de mezcla asfáltica.



Extendido y compactación de mezcla asfáltica.



Extendido y compactación de mezcla asfáltica.



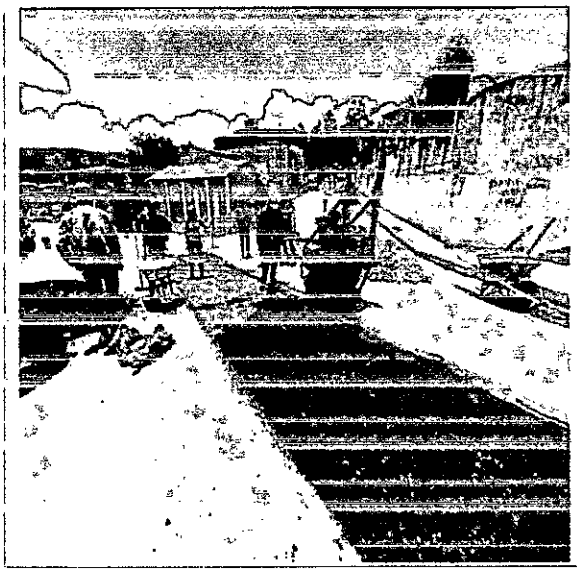
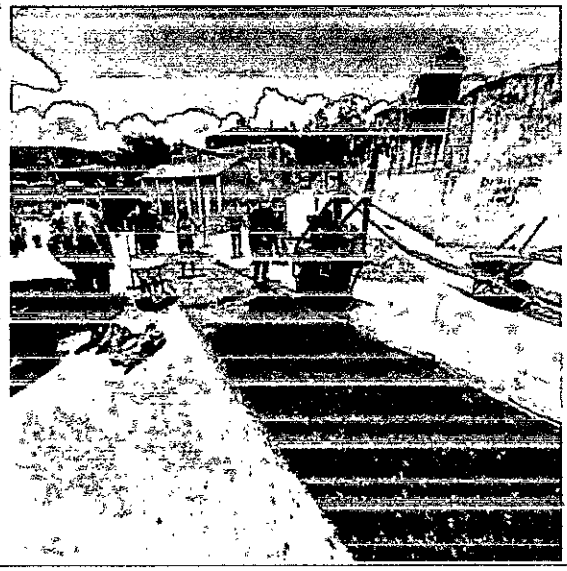
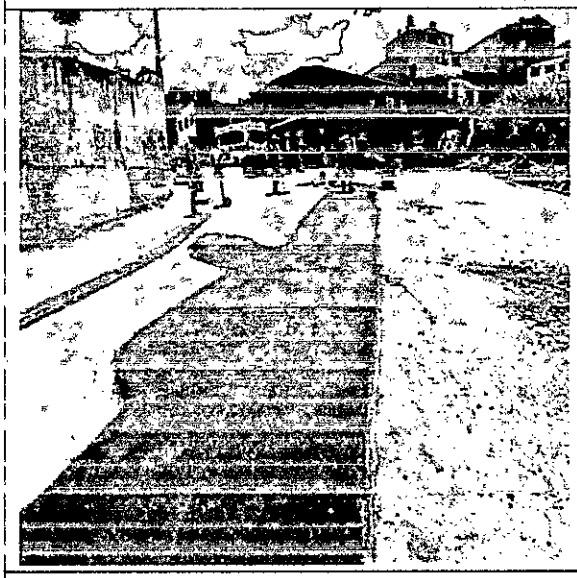
Extendido y compactación de mezcla asfáltica.

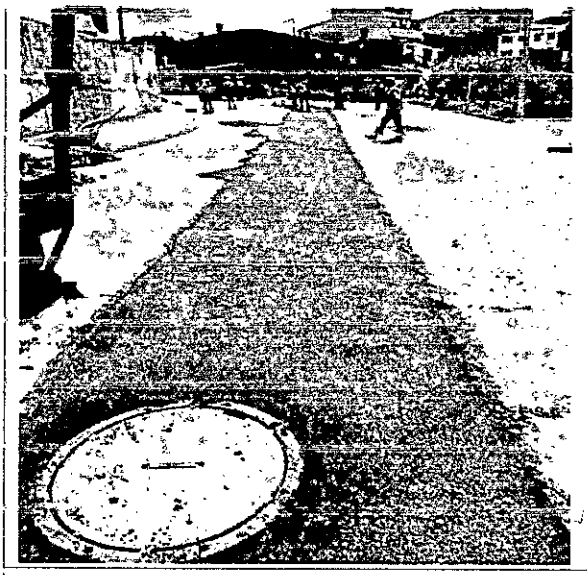
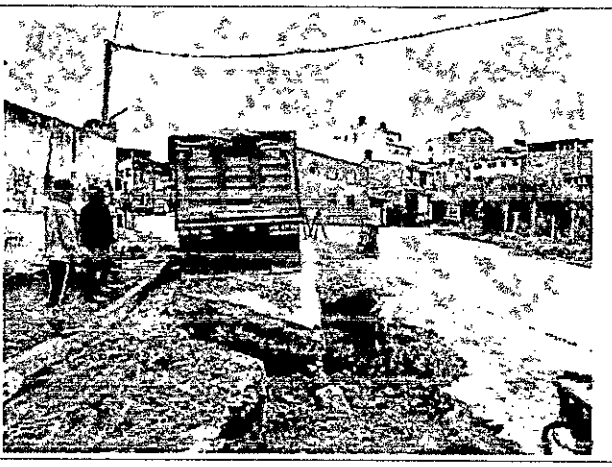
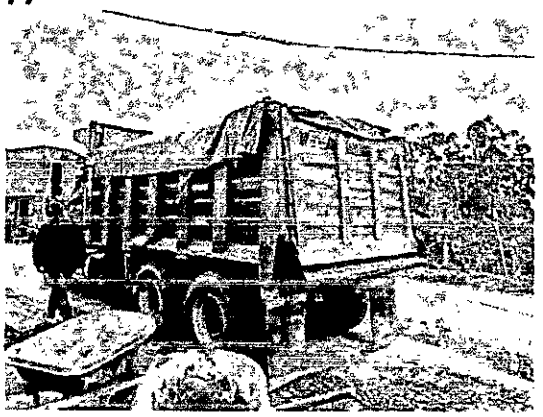


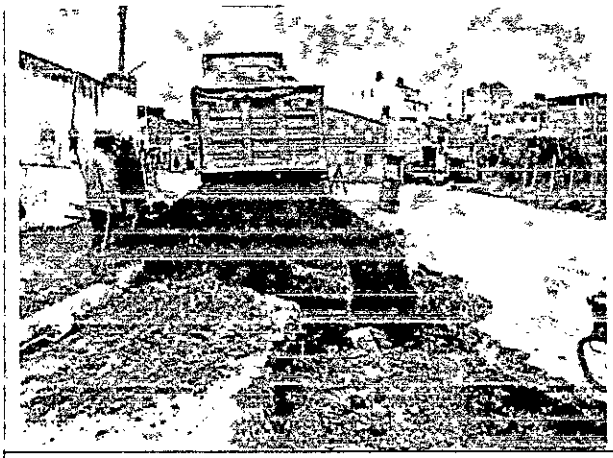
Extendido y compactación de mezcla asfáltica.

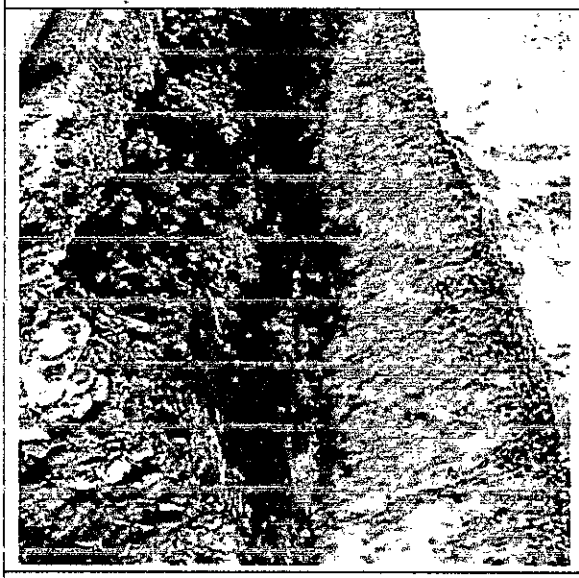
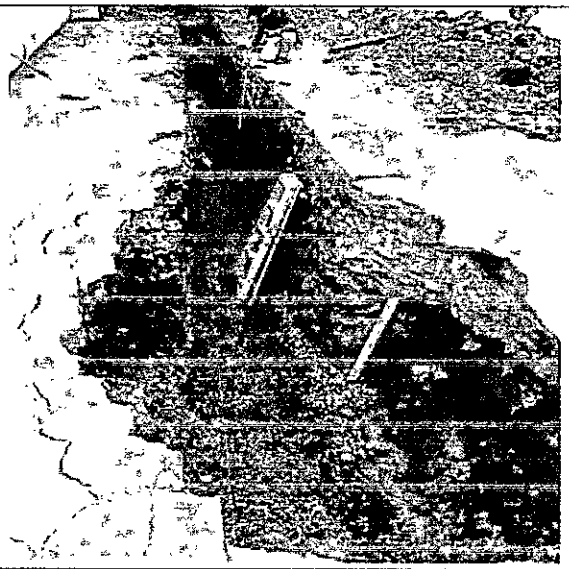


Extendido de mezcla asfáltica.

	
Extendido y compactación de mezcla asfáltica.	Extendido y compactación de mezcla asfáltica.
	
Limpieza de parcheo para retirar sobrantes.	Limpieza de parcheo para retirar sobrantes.

	
Limpieza de parcheo para retirar sobrantes.	Limpieza de parcheo para retirar sobrantes.
4,0	**TRANSPORTE**
77	
	

	
5.1	**RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).**
	
Relleno y extendido de gravilla en red de tubería.	Relleno y extendido de gravilla en red de tubería.

	
Relleno y extendido de gravilla en red de tuberia.	Relleno y extendido de gravilla en red de tuberia.
	
Relleno y extendido de gravilla en red de tuberia.	Relleno y extendido de gravilla en red de tuberia.

5. MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Para el contrato MRAM-MC-014-2025 no se realizó ninguna suspensión.

6. MOTIVO DE LA PRORROGA

Para el contrato MRAM-MC-014-2025 se realizó documento de prórroga, de acuerdo al siguiente detalle: Que el contratista presento oficio el día ocho (08) de abril de 2025 solicitando prorroga numero 1 al contrato MRAM-MC-014-2025, por un tiempo de cinco (05) días, indicando que teniendo en cuenta que el día cuatro (04) de abril de 2025, se culminó la ejecución de la actividad de relleno a la cota rasante de la calle sexta, donde se realizó la excavación para realizar la reposición y mantenimiento del sistema de alcantarillado combinado, recomiendo con el fin de garantizar la estabilidad de la mezcla asfáltica del parcheo a aplicar sobre el área intervenida, dejar el material afirmado expuesto al tráfico de vehículos para garantizar una mayor compactación producto del tránsito que circula sobre el área intervenida, Que también es importante el factor estado del clima ya que se han presentado precipitaciones en los últimos tres (3) días ocasionando el aplazamiento de la toma de densidades y además para instalar la mezcla asfáltica del parcheo debe estar seco y un clima idóneo para evitar en la mayor brevedad el choque térmico entre el material de asfalto y el piso donde se va aplicar.

7. MOTIVO DE LA ADICIÓN EN VALOR

Para el contrato MRAM-MC-014-2025 no se realizó ningún tipo de adición.

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN

Para el contrato N° MRAM-MC-014-2025 no se realizó documentos de adición, por lo tanto, no se cuenta con certificado de registro presupuestal para adición.

9. FECHA DEL OTRO SÍ (DOCUMENTO MODIFICATORIO AL CONTRATO)

Para el contrato N° MRAM-MC-014-2025 no se realizó ningún documento modificatorio al contrato.

10. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS

Para el contrato MRAM-MC-014-2025 se tiene información de garantías según lo establecido en el contrato.

Característica	Condición
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato

Característica	Condición
	de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.
Asegurado/ beneficiario	MUNICIPIO DE RAMIRIQUI identificada con NIT 891.801.280-6
Amparos, vigencia y valores asegurados	

Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Cinco por ciento (05%) del valor del contrato
Calidad de la obra	Igual al plazo de ejecución del Contrato y tres (3) años más.	Diez por ciento (10%) del valor del contrato

Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o

Característica	Condición
	consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Garantías de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ identificado con NIT 891.801.280-6 y el contratista
Característica	**Condición**
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

Valor	Doscientos (200) SMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y MUNICIPIO DE RAMIRIQUI identificada con NIT 891.801.280-6
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la Póliza	* Número y año del contrato * Objeto del contrato * Firma del representante legal del contratista * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

11. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Para el contrato N° MRAM-MC-014-2025 se tiene la siguiente información de aprobación de garantías.

N° 39-44-101171025 ANEXO 0 DE CUMPLIMIENTO N° 39-40-1010447 10 ANEXO 0 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL APROBADAS BAJO RESOLUCIÓN N° 129 CONTRATO DE FECHA VEINTICINCO (25) DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGÚN CONTRATO
N° 39-44-101171025 ANEXO 3 DE CUMPLIMIENTO N° 39-40-1010447 10 ANEXO 3 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL APROBADAS BAJO RESOLUCIÓN N°174 DEL ONCE (11) DE ABRIL DE 2025, SEGÚN PRORROGA N°1
N° 39-44-101171025 ANEXO 4 DE CUMPLIMIENTO APROBADAS BAJO RESOLUCIÓN N°192 DEL VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE 2025, SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

12. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el contrato MRAM-MC-014-2025 no se ha realizado ningún pago, según acta sabana y memorias de cantidades de liquidación, se tiene pendiente por cancelar la suma de de TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS ($35.875.913) M/CTE, de acuerdo al siguiente balance

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	$ 36.840.225	
VALOR DEL ADICIONAL	$0	
VALOR CANCELADO ANTICIPO		$ 0
VALOR POR CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 35.875.913
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 964.312
SUMAS IGUALES	**$ 36.840.225**	**$ 36.840.225**

13. PROCESOS SANCIONATORIOS

Como supervisora del contrato, me permito dejar constancia que en desarrollo de la etapa contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no ha tenido que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista.

ING. CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO
Secretaria de infraestructura y Movilidad
Municipio de Ramiriquí

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: secretaria de infraestructura y movilidad
Copia: Unidad Ejecutora Contratación
Elaboró: Yonatan Pulido – apoyo secretaria de infraestructura y movilidad urbana
Revisó: Carmen Elvira Páez – secretaria de infraestructura y movilidad urbana
Aprobó: Camilo Andrés Ávila Márquez – alcalde municipal
