GOBERNACION DEL PUTUMAYO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1071-2025

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

INFORME 1 DE INTERVENTORIA

Periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre de 2025.



Ing. DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Interventor

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA
Contratista de Obra

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCION 2
2. INFORMACION BASICA 3
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
4. LOCALIZACION 4
Ubicación en el territorio nacional y departamental 4
5. Características iniciales del proyecto 5
6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA 6
1. INFORMACIÓN CONTRATISTA E INTERVENTOR 7
7.1. Información Contratista 7
2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA OBRA 7
7. RESUMEN DE OBRA 9
8. INFORME CONTRATO DE OBRA 10
10.7.1. Avance Financiero y Control Presupuestal 15
11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 15
12. CONCLUSIONES 20

1. INTRODUCION

En concordancia con los planes de desarrollo departamental se subcribio el contrato N° 1943-2024 del 11 de octubre de 2025, a cargo del contratista CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA cuyo objeto es "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Los recursos de inversión en el marco del contrato mencionado para la realización del proyecto inicialmente, ascienden a la suma DE TRECIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEICIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($ 311.762.642,00).

El inicio del proyecto se suscribió el dia 27 de octubre de 2025, fecha en la cual ya se contaba con la adjudicación y selección de la firma de interventoría, la cual se formalizó el día 18 de septiembre de 2025 con el contrato de interventoría No. 1071 del 18/07/2025 a cargo del ingeniero DAVID ANDRES ENCISO ARANGO que tiene como "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".por un valor de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($25.222.194,00) con duración de (03) dos meses, de cuyo contrato se derivó el acta de inicio de interventoría suscrita el día 27 de octubre de 2025.

2. INFORMACION BASICA

2.1 Fecha de elaboración del informe de interventoria

Fecha de Elaboración del informe	**03 de diciembre del 2025**
Periodo de avance	27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025

a. Nombre del proyecto

Contrato de Obra No. 1943-2024 del 11 de octubre de 2025

Objeto: la "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Localización del proyecto

El proyecto denominado la "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". se realiza en la Inspección de Puerto Limón, del municipio de Mocoa – Putumayo, la Inspección de Puerto Limón está ubicado en el departamento del Putumayo. El municipio de Mocoa, está ubicado geográficamente en una Longitud 76° 38'47`` Oeste y en una Latitud 1°08'57`` Norte. Este municipio se localiza en el Departamento de Putumayo, siendo la capital, y a una distancia de Bogotá D.C., Capital de la República de Colombia de 633 Km. La cabecera municipal está sobre de 604 m.s.n.m y posee una extensión de 1263 Km² una densidad poblacional de 57.22 Ha/km2, en promedio tiene una temperatura de 22.9ºC. La totalidad de sus territorios son planos o ligeramente ondulados, pertenecientes a la Amazonia, y por la conformación de su relieve, únicamente ofrecen el piso térmico cálido.


Sin embargo, Puerto Limón fue fundado en 1922. Algunas versiones dicen que su fundación fue impulsada por Fray Anselmo de Olott (Gómez, A. 2005. Kuan, B 2013); otras, consultadas en fuentes audiovisuales y asociaciones espacio temporales de los hechos, mencionan que fue el primer pueblo fundado en el Putumayo por padres capuchinos venidos desde el municipio que hoy se conoce como Santa Rosa, Cauca, lugar donde se reunía la comisión y órdenes religiosas con Sebastián de Belalcázar en las Misiones de la Selva (FEDECAP, 2015, 0m51s). También es destacable que desde

1632, él realizaba misiones provenientes de Quito para la región de Putumayo, Caquetá y Sucumbíos, Ecuador (Cabrera, F. 2019). Quien sea su fundador, arribó a Puerto Limón transitando los caminos de indígenas.

El proyecto se localiza específicamente desde el parque principal al embarcadero de la inspección de puerto, tal como se muestra en las siguientes imágenes.

4. LOCALIZACION

Ubicación en el territorio nacional y departamental

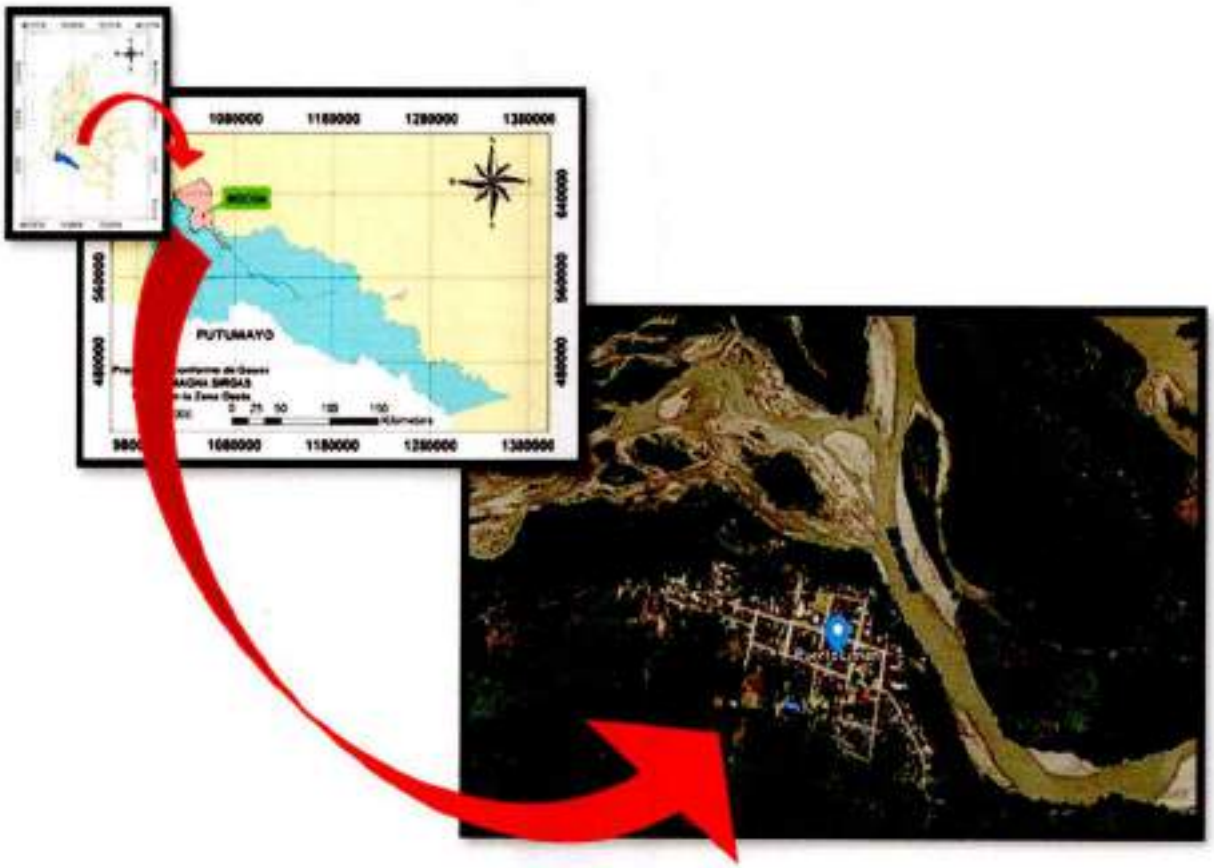



5. Características iniciales del proyecto

5.1 Características iniciales del proyecto

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN ITEMS	VALOR TOTAL
1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	$154.842.801,00
2	ANDENES	$27.712.934,00
3	SEÑALIZACION	$22.980.768,00
TOTAL COSTO DIRECTO		**$205.536.503,00**
ADMINISTRACION (31.32%)		$64.374.033,00
IMPREVISTOS (3%)		$6.166.095,00
UTILIDAD (0%)		$ 00.00
COSTOS INDIRECTOS		**$ 70.540.128,00**
SUBTOTAL OBRA CIVIL		$276.076.632,00
COSTOS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		$35.686.010,00
COSTO TOTAL OBRA		**$241.329.387,00**
INTERVENTORIA		**$ 25,222,194.00**
VALOR APORTADO POR LA GOBERNACION		$ 311.762.642,00
VALOR APORTADO POR CONCEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		-$ 70.433.255,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**$ 241.329.387,00**

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA

6.1. Información de contrato de obra inicial

Entidad contratante	**GOBERNACION DEL PUTUMAYO**
Contrato de obra	No. 1943-2024 del 10 de octubre del 2024
Contratista	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA
Valor inicial	CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 241.329.387,00).
Valor total	CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 241.329.387,00).
Objeto: " MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".	
Plazo total:	TRES (03) meses a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha de inicio	27 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de terminación	26 DE ENERO DE 2026
Datos de contacto:	VDA La Acacias, Puerto Guzmán, Tel: 3213959011

6.3. Información de contrato de interventoría

Entidad contratante	**GOBERNACION DEL PUTUMAYO**
Aceptación de oferta No.	1071-2025
Contratista	ING DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Valor inicial	$ 25,222,194,00
Valor total	$ 25,222,194,00
Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	
Plazo total:	TRES (03) meses a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha de inicio	27 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de terminación	26 de enero de 2026
Datos de contacto:	ING DAVID ANDRES ENCISO ARANGO Email: davidencisoa@gmail.com

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA E INTERVENTOR

7.1. Información Contratista

CONTRATISTA	**CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**
NIT	901.042.420-9
REPRESENTANTE LEGAL	NILSON MOYA MENA

7.2. Información Interventor

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**
IDENTIFICACION CONTRATISTA	CC. 1.113.304.913 Sevilla Valle
MATRICULA PROFESIONAL	N°.63202-220004QND
TIPO DE CONTRATISTA	Persona natural

7.3. Información Personal de Interventoria

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CARGO
DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO	100%	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA OBRA

2.1 Generalidades

CONTRATISTA	VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA	PLAZO INICIAL	F. INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN NO. 1
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA	$ 241.329.387,00	TRES (03) MESES	27 DE OCTUBRE DE 2025	26 DE ENERO DE 2026

8.2 Avance de obra condiciones iniciales

Avance Físico 1	**68,92%**
Avance Acumulado	68,92%

Tiempo total transcurrido	**UN (01) Mes**
Plazo de Ejecución inicial	TRES (03) Meses

Inversión ejecutada en el periodo 1 + AIU	**$ 166.334.844,21**
Inversión ejecutada acumulada + AIU	$ 166.334.844,21
Saldo por ejecutar + AIU	$ 74.994.542,79
Valor total del contrato	$ 241.329.387,00



Para el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre del 2025, la obra logro alcanzar un porcentaje de avance físico acumulado del 68,92% equivalente a $ 166.334.844,21 restando por ejecutar el 31,08% representado en la inversión de $ 74.994.542,79.

8.3. Resumen contractual inicial – Contrato de obra N° 1943-2024 del 11 de octubre de 2024

RESUMEN CONTRACTUAL	
Contrato de obra:	No. 1943-2024 11/10/2024
Contratista:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA
Plazo inicial:	Tres (03) meses
Plazo total:	Tres (03) meses
Fecha de iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de terminación:	26 de enero de 2026
Costo Directo inicial:	$205.536.503,50
Valor AIU 34.32% inicial:	$ 70.540.128,00
Costo total inicial:	$276.076.632,00

7. RESUMEN DE OBRA

9.1 Inventario y Estado inicial del Proyecto

El contrato N° 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuenta con un tiempo de ejecución correspondiente a tres (3) meses, proyecto inicial contratado por parte de la secretaria de Infraestructura departamental de la Gobernación del Putumayo, como parte de las obras proyectadas en el plan de desarrollo departamental. A continuación, se presenta el presupuesto oficial y el valor de contrato.

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO DE OBRA — 100.00 — ML

ESPECIFICACION INVIAS	ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	Valor total
	1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**					$ 154,642,851.00
10	1.1	Localización y replanteo, incluye andenes	m²	848.00	$ 2,500.00	$ 2,120,000.00	$ 2,120,000.00
210.2.2	1.2	Excavación en material común a mano/en la explanación (incluye descarga)	m³	268.65	$ 50,621.00	$ 13,601,579.00	$ 13,601,579.00
630	1.3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)	m²	1124.0	$ 880,562.00	$ 99,855,731.00	$ 99,855,731.00
221.3	1.4	Suministro e instalación de material seleccionado	m³	3831	$ 84,375.00	$ 3,233,720.00	$ 3,233,720.00
320.1	1.5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	m³	9450	$ 108,549.00	$ 14,226,784.00	$ 14,226,784.00
202.2	1.6	Suministro e instalacion de geotext para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	4500.00	$ 12,699.00	$ 8,254,350.00	$ 8,254,350.00
572.1	1.7	Bordillos de concreto 600DF3	m3	4.00	$ 675,499.00	$ 2,809,996.00	$ 2,699,996.00
	1.8	Acero de refuerzo 3/8" (sardinel)	Kg	1271.0	$ 8,132.00	$ 770,377.00	$ 770,377.00
640	1.9	Cunetillas en acero de refuerzo de 14000 PSI, 3 1/4", Pasajuelas	ml	170.00	$ 21,826.00	$ 4,710,426.00	$ 3,710,426.00
640	1.10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	694.48	$ 9,390.00	$ 5,747,288.00	$ 5,747,288.00
640	1.11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	7010	$ 11,209.00	$ 702,057.80	$ 782,057.00
630P	1.12	Corte juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	67.67	$ 17,826.00	$ 1,215,560.00	$ 1,215,560.00
	2	**ANDENES**					$ 37,713,834.00
10	2.1	Excavacion en material comun en seco a mano (incluye retiro)	m³	38.00	$ 41,648.00	$ 1,492,056.00	1,492,056.00
610P	2.2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	m³	42.00	$ 150,548.00	$ 6,323,016.00	6,323,016.00
	2.3	Anden en concreto clase D (3500 PSI) en 0.10 m	m²	21.00	$ 677,898.00	$ 14,235,696.00	14,235,696.00
640	2.4	Malla Electrosoldada Gi 2.15m 15 X 15 4x4 mm	kg	428.50	$ 19,814.00	$ 5,663,172.00	5,663,172.00
	3	**SEÑALIZACION**					$ 22,980,768.00
710	3.1	señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3.00	$ 502,604.00	$ 1,507,812.00	1,507,812.00
	3.2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarilla para canalizacion vial (ancho)	ml	1846.0	$ 15,480.00	$ 2,413,473.00	2,320,656.00
	3.3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delineacion para pasarela y cruce de paso (incluye microesferas)	m	12.00	$ 28,539.00	$ 356,475.00	356,475.00
	3.4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para Reductores (incluye microesferas)	m	280.00	$ 90,364.00	$ 18,130,800.00	18,130,800.00
	3.5	Suministro e instalacion de tachas	un	32.00	$ 38,819.00	$ 402,208.00	402,208.00
		Total costos directos					$ 203,598,603.00

Administración	31.32%
Imprevistos	5.00%
Utilidad	0.00%
SUBTOTAL AIU	36.32%

$ 84,674,810.00
$ 56,180,895.00
$ 0.00
$ 70,140,126.00

		Subtotal obra civil					$ 278,079,831.00
		COSTOS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO					$ 65,000,000.00
		PROVISION PARA EL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	UND	1.00	$ 10,840,000.00	$ 10,840,000.00	
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1.00	$ 54,160,000.00	$ 54,160,000.00	
		Costo total obra					$ 343,079,831.00

8. INFORME CONTRATO DE OBRA

10.1 Descripción del proyecto.

El presente contrato de obra comprende la realización de actividades de:

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO

- Localización y replanteo, incluye andenes
- Excavación en material común a máquina de la explanación (incluye desalojo)
- Pavimento de concreto hidráulico (MR 3.8)
- Suministro e instalación de material seleccionado
- Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
- Suministro e instalación de geotextil para estabilización de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)
- Bordillos de concreto 3000PSI
- Acero de refuerzo 3/8" bordillo
- Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasa juntas
- Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal
- Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal
- Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado

ANDENES

- Excavación en material común en seco a mano (Incluye retiro)
- Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
- Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m
- Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm

SEÑALIZACION

- Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)
- Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central
- Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación paso peatonal y línea de pare (incluye microesferas)
- Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)
- Suministro e instalación de tachas

10.2. Inventario y descripción de actividades ejecutadas en el periodo

En este numeral se presenta las cantidades de obra ejecutados durante el periodo en consideración, resumida mediante el siguiente cuadro:

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

ACTA DE AVANCE N° 1

Objeto Contratista:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		FECHA ACTA	25/11/2025	
Objeto Interventoría:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	PLAZO:	TRES (03) MESES		
CONTRATISTA:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	FECHA INICIO:	21/10/2025	FECHA FIN:	21/01/2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	LUGAR INTERVENTOR:	Inspección de Puerto Limon	VALOR INICIAL:	$ 241.329.357,00
		INTERVENTOR:	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO	VALOR ACUMULADO:	$ 166.334.844,21
				% AVANCE:	68,92%

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VR TOTAL	ACUMULADO TOTAL CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL VR TOTAL
1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO								
1,1	Localizacion y replanteo. incluye andenes	m²	840,00	$ 2.500,00	$ 2.100.000,00	840,00	$ 2.100.000,00	840	$ 2.100.000,00
1,2	Excavación en material comun a maquina de la explanación (incluye desalojo)	m³	264,66	$ 50.621,00	$ 13.693.969,86	263,66	$ 13.665.315,76	268,656	$ 13.693.315,76
1,3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3,8)	m³	113,40	$ 880.562,00	$ 99.855.730,80	107,06	$ 89.870.157,72	107,06	$ 89.870.157,72
1,4	Suministro e instalación de material seleccionado	m³	38,11	$ 94.275,00	$ 3.211.728,25	38,11	$ 3.211.728,25	38,11	$ 3.211.728,25
1,5	subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelacion, humedecido y compactacion)	m³	94,50	$ 150.548,00	$ 14.226.786,00	94,50	$ 14.226.786,00	94,5	$ 14.226.786,00
1,6	Suministro e instalación de geotextil para estabilización de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	660,00	$ 12.690,00	$ 8.254.350,00	658,56	$ 8.254.350,00	658	$ 8.254.350,00
1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4,90	$ 675.484,00	$ 3.309.645,10	4,44	$ 2.995.838,07	4,439	$ 2.995.838,07
1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	121,10	$ 6.132,00	$ 779.177,20	115,92	$ 710.821,44	115,92	$ 710.821,44
1,90	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4". Pasa pantes	un	176,00	$ 21.826,00	$ 3.710.420,69	153,06	$ 3.339.378,00	153	$ 3.339.378,00
1,10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	604,40	$ 6.200,00	$ 3.747.280,00	543,96	$ 3.372.552,00	543,96	$ 3.372.552,00
1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	75,50	$ 11.000,00	$ 782.050,50	63,45	$ 703.850,86	63,4500001	$ 703.850,86
1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	67,97	$ 17.825,00	$ 1.211.565,25		$ -	0	$ -
2	ANDENES								
2,1	Excavación en material comun en seco a mano (incluye retiro)	m³	34,80	$ 41.445,00	$ 1.442.056,80		$ -	0	$ -
2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelacion, humedecido y compactacion)	m³	42,00	$ 160.648,00	$ 6.323.016,00		$ -	0	$ -
2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m²	21,00	$ 677.896,00	$ 14.235.816,00		$ -	0	$ -
2,4	Malla Electrosoldada 6 x 2,35 m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409,59	$ 13.824,00	$ 5.662.172,16		$ -	0	$ -
3	SEÑALIZACION								
3,1	Señal vertical con lamina retro reflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3,00	$ 502.604,00	$ 1.507.812,00		$ -	0	$ -
3,2	Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central	ml	156,02	$ 15.463,00	$ 2.413.473,26	3	$ -	0	$ -
3,3	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación paso peatonal y línea de pare (incluye marcaderas)	ml	12,50	$ 28.518,00	$ 356.475,00	3	$ -	0	$ -
3,4	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	200,00	$ 90.604,00	$ 18.100.800,00	3	$ -	0	$ -
3,5	Suministro e instalación de tachas	un	32,00	$ 18.819,00	$ 602.208,00		$ -	0	$ -
				COSTO DIRECTO DE OBRA	$ 205.536.503,56		$ 142.438.770,06		$ 142.438.770,06
ADMINISTRACION		21,32%			$ 64.374.003,00		$ 44.611.823,00		$ 44.611.823,00
IMPREVISTOS		3,00%			$ 6.166.315,00		$ 4.273.163,00		$ 4.273.163,00
UTILIDAD		0,00%			$ -		$ -		$ -
		24,32%			$ 70.540.138,00		$ 48.884.986,00		$ 48.884.986,00
	COSTOS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 276.076.632,00		$ 191.323.756,00		$ 191.323.756,00
	PREVISION PARA EL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	UND	1,00		$ 35.686.010,00		$ 23.822.010,00		$ 23.822.010,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00		$ 10.843.580,00		$ 8.309.580,00		$ 8.309.580,00
					$ 24.742.510,00		$ 15.512.510,00		$ 15.512.510,00
				Valor aportado por la gobernacion	$ 311.762.642,00		$ 215.145.766,00		$ 215.145.766,00
				Valor aportado por Consejo Comunitario Las Acacias	-$ 70.433.215,00		-$ 48.810.921,79		-$ 48.810.921,79
				Valor total del proyecto	$ 241.329.357,00		$ 166.334.844,21		$ 166.334.844,21

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo Ptyo.
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

De acuerdo a las cantidades de obra consignadas en la tabla anterior, se puede determinar que el porcentaje de avance físico corresponde al 68,92% equivalente a una inversión de $ 166.334.844,21. Cuyo avance se encuentra representado principalmente en las actividades de los capítulos **PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.**

En el Anexo 2, se presenta las obras ejecutadas en el periodo 1, así mismo se presenta el registro fotográfico que da veracidad de las actividades realizadas en campo.

Finalmente se expone que el contratista ha cumplido con todas las recomendaciones que han propuesto la interventoría con base a los requerimientos y lo establecido en las normativas vigentes, planos, diseños y especificaciones del proyecto con el fin de que la obra tenga los más altos índices de calidad y funcionalidad.

10.3. Aspectos técnicos

La interventoria en cumplimiento con su objeto contractual realiza un control minucioso de la ejecución del proyecto por parte del contratista, para velar por la correcta ejecución de los items proyectados de manera segura, eficiente y acorde a la reglamentación que rige cada una de las actividades a realizarse, como también vigilar la calidad de los materiales, equipos y productos a usarse, de manera que se ocupe el menor tiempo posible y con los costos contratados, así pues el resultado sea un producto que cumpla con estándares requeridos que brinden a la comunidad el bienestar deseado.

En la ejecución comprendida en este periodo se exigió por parte de la interventoría el cumplimiento de los planos y las especificaciones de diseño, materiales de construcción, concepto de especialistas etc.

La interventoría comprometida con la responsabilidad civil y contractual realizo una vigilancia de todos los procesos llevados a cabo en obra.

10.4. Aspectos de diseño

El contratista ha cumplido hasta el momento con lo trazado en planos y la entrega de los mismos para revisión y aprobación por parte de interventoría.

Los diseños que rigen el proyecto corresponden principalmente a:

- Subbase granular
- Pavimento de concreto hidráulico
- señalización

10.5. Aspectos ambientales, impacto urbano y seguridad industrial

Para la ejecución de este trabajo el contratista cuenta con un profesional de salud ocupacional que es el encargado de ejecutar actividades de HSEQ como:

- Inducción para el ingreso de trabajo.
- Afiliaciones a seguridad social.
- Entrega de dotación y EPIS.
- Inspecciones de obra.
- Acciones correctivas en hallazgos encontrados.

10.6. Seguimiento de seguridad social y parafiscal

Cumpliendo con los requerimientos dados por la Interventoria y la secretaria de infraestructura departamental, el personal empleado por el contratista debe cumplir con los requisitos de la ley 100, código sustantivo del trabajo Decreto 1072 del 2015, (Afiliación a ARP, EPS, Pensión, Caja de compensación, Sena e ICBF).

Por parte de la interventoria se ha manifestado al contratista hacer entrega de los documentos en lo referente a las Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social EPS, ARL y AFL del personal de la obra y del personal administrativo. Ver Anexo N°10.

Así mismo, el personal ha contado con la dotación y los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de este tipo de trabajos.

10.7. Aspectos administrativos y legales

CLÁUSULA OCTAVA - FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES:

El aporte que realizará el **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($241.329.386,00),** de los cuales será destinado a la obra, el cual será transferido por el Departamento del Putumayo, de la siguiente manera:

ANTICIPO: La Entidad entregará en calidad de anticipo, un 50% del valor total del aporte del Departamento en el contrato, previo perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de legalización y de ejecución del contrato, así como firma del acta de inicio por parte del Representante del Consejo Comunitario, el supervisor designado y el interventor contratado. Para lo anterior se deberá anexar copia del contrato, documentos soporte legalización, fotocopia del RUT, documento de identificación del Representante legal del consejo comunitario plan de inversión del anticipo aprobado por la supervisión e interventoría y certificación bancaria de cuenta de ahorros conjunta que se apertura a nombre de contrato para el manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo, recursos que únicamente podrán ser retirados por autorización del supervisor e interventor designados. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados pertenecerán al tesoro departamental-siendo, por ello consignados a favor del Departamento y de tal evento se deberá dejar constancia en el acta de liquidación. El valor del anticipo, será amortizado de acuerdo con lo establecido para el manejo de estos recursos

y según las cantidades de obra ejecutadas, amortizándose de manera gradual en las actas parciales de ejecución por el 50% del valor que se pretende cobrar en cada acta hasta cubrir el monto total desembolsado a título de anticipo.

Hasta el 90% del valor total del contrato en actas parciales de obra, siempre y cuando el porcentaje de ejecución física sea igual al 90% del valor aportado por el Departamento.

10.7.1. Avance Financiero y Control Presupuestal

A continuación, se presenta un resumen de los aspectos financieros del proyecto hasta la fecha:

Periodo 1: Comprendido del 27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre del 2025: Las actividades ejecutadas por el contratista durante este periodo están relacionadas en el Acta de Avance Parcial de Obra N° 01 en el que se presenta un avance en inversión en este periodo de aproximadamente $ 166.334.844,21 con un avance porcentual de 68,92% del valor contratado.

11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

11.1. información de garantías y presupuestales del contrato de obra N° 1943-2024 del 11 de octubre de 2024

ANEXO 0: Póliza de cumplimiento **41-44-101287134**, el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	11/10/2024	31/07/2025	31.176.264,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E IND.	11/10/2024	11/01/2028	15.588.132.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.		
RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	26/12/2023	29/02/2024	$ 31.176.264,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/10/2024	31/07/2025	$ 31.176.264,00

ANEXO 0: Póliza de Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento 41-40-101053868, garantiza la responsabilidad civil extracontractual del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	11/10/2024	11/01/2025	$ 260.000.000,00

ANEXO 1: El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas de contrato no. 1943-2024 celebrado entre las partes, relacionado con MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Mediante el presente anexo se aclara.

- Beneficiarios. Departamento del putumayo y terceros afectados.
- Los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	11/10/2024	11/01/2025	$ 260.000.000,00

11.3. Información de garantías y presupuestales del contrato de interventoría No 1071 - 2025 de 18 de septiembre de 2025:

ANEXO 1: póliza de cumplimiento 41-44-101295598, con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan ECU010B, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido y hasta el límite del valor asegurado señalado en cada amparo, SEGUROS DEL ESTADO S.A., garantiza:

El pago de los perjuicios causados con ocasión del incumplimiento de las obligaciones contractuales, en desarrollo del contrato de interventoría No. 1071-2025 cuyo objeto es MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO

DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	18/07/2025	31/10/2030	$ 6.305.548,50

ANEXO 2: por medio del presente anexo el cual forma parte integral de la póliza, se ajusta vigencia de las garantías según acta de inicio firmada por las partes el 27/10/2025. Los demás términos y condiciones no modificados continúan vigentes.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	27/10/2025	09/08/2026	$ 2.522.219,40
CALIDAD DEL SERVICIO	09/02/2026	09/02/2031	$ 2.522.219,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E IND.	27/10/2025	09/02/2029	$ 1.261.109,70

Anexo 12. Pólizas de interventoria.

11.4. Actas de inicio y socialización

- ACTA DE SOCIALIZACIÓN: Se suscribió el dia 12 de septiembre de 2025 con presencia de la comunidad, contratistas de interventoría y obra y secretaria de infraestructura departamental.
- ACTA DE INICIO DE OBRA: Se suscribió el día 27 de octubre de 2025, con visto bueno por parte de la secretaria de Educación departamental y Contratista.
- ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA: Se suscribió el día 27 de octubre de 2025, con aprobación de la secretaria de Educación departamental y Contratista Interventor.

11.5. Equipo del contratista

En el Anexo N°5 se muestra el equipo utilizado por el Contratista para el desarrollo del Contrato en periodo comprendido desde el 27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre del 2025. Todo el equipo, maquinaria y procesos fueron controlados de manera precisa por la interventoria para verificar su

correcta utilización, adicionalmente que este cuente con especificaciones técnicas y la operación se haga de manera segura tanto para los operarios como la comunidad del sector.

11.6. Personal del contratista de obra

El contratista presenta documentación referente al personal que se encontrará en el desarrollo del proyecto. A continuación, se describe el Organigrama del contratista.



11.7. Estado del tiempo

El registro del estado del tiempo para el periodo comprendido desde el 27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre del 2025 se encuentra en el Anexo N°8.

11.8. Control de calidad

El contrato de interventoría como responsable del control de calidad, evalúa en conjunto los siguientes aspectos:

- Control de calidad del proyecto: Planteamiento, planos, cálculos etc.
- Control de calidad de material.
- Control de calidad de ejecución.

Hasta el momento el contratista ha cumplido con la normativa y procesos contratados y ha atendido las recomendaciones dadas por el personal de interventoría.

11.9. Relación de actas contractuales

Las actas que se han firmado en el presente contrato están resumidas en la siguiente tabla:

ACTAS	FECHA
Acta de Inicio de interventoría 1071-2025	27/10/2025
Acta de Inicio de obra 1943-2024 del 11 de octubre de 2024	27/10/2025
Acta de Socialización	12/09/2025

11.10. Registro fotográfico

Se presenta el registro fotográfico del periodo N° 2 en el cual se registran las actividades que se realizaron en obra por parte del contratista y vigiladas por interventoria para el cumplimiento a cabalidad de los procesos y normativas exigidas.

11.11. Relación financiera del contrato de obra

En el cuadro N° 7, presente en los anexos se hace un resumen financiero del contrato 1943-2025.

11.12. Actividades básicas de interventoría

En el desarrollo de este Contrato la Interventoría adelantó durante el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre del 2025, entre otras, las siguientes actividades:

- ✓ Control técnico a las actividades ejecutadas de acuerdo a las especificaciones y normas técnicas.
- ✓ Control administrativo, realizando las actas, oficios y documentación pertinente a la ejecución del contrato para su buen desarrollo
- ✓ Ejecución del informe mensual.
- ✓ Diligenciamiento de los formatos de control.
- ✓ Verificación de las normas de seguridad industrial de los trabajadores

11.13. Control técnico de la obra

La Interventoría realizó las funciones de seguimiento y en cumplimiento de sus funciones técnicas constató la ejecución de las obras, además en labor conjunta con el contratista se resolvieron dudas presentadas en el desarrollo del contrato de obra. La supervisión y control de las actividades de obra comprende la evaluación y seguimiento de todos los recursos de personal, maquinaria y equipos que provee el Contratista para el cumplimiento de las metas físicas y de inversión contractual.

12. CONCLUSIONES

- ✓ Durante el periodo número 1, comprendido del 27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre de 2025, el avance físico de la obra ha sido del **68,92%** correspondiente a una inversión de $ 166.334.844,21, frente a un avance programado de 7.71%

- ✓ Representados en actividades,

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO

- ✓ A la fecha no se han presentado hechos relevantes en la obra. La obra ha acontecido en normalidad, el personal de obra se encuentra debidamente afiliado al sistema de seguridad social, cuentan con los elementos de protección personal acorde a la actividad a realizar.

- ✓ Las obras realizadas, se han ejecutado de acuerdo a los diseños y planos del proyecto, con el fin de garantizar la buena calidad y funcionamiento de la misma.

- ✓ Los materiales empleados hasta el momento como el acero de refuerzo, material de cantera tipo grava, cemento para la elaboración del concreto según los diseños de mezclas, cumplen con las especificaciones de calidad para ser empleados en obra.

DAVID ANDRES ENCISO ARANGO

INTERVENTOR

MP N°.63202220004QND

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

TOMO No 1

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.1 INFORMACION GENERAL (INCLUYE SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES).

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101287134	0

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	10	2024	11	10	2024	00:00	11	01	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.042.420-9

DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS — CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO — TELÉFONO: 3213859011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO — IDENTIFICACIÓN NIT: 860.094.154-6

DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40 — CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO — TELÉFONO 4360573

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN GOMOSOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 1343-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO SOBRE EL MARGEN MUNICIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2024	11/07/2025	$31,176,264.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/10/2024	11/07/2025	$135,981,321.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/10/2024	11/01/2029	$13,348,132.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			
CALIDAD DEL SERVICIO			
	11/10/2024	11/07/2025	$31,176,264.20

EL AMPARO 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS = $31,176,264.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****570,481.00	$ *****30,000.00	$ *****113,527.00	$ **********713,789.00	$ *******264,096,245.70	CONTADO

INTERMEDIARIO	CLAVE	% DE PART.
CNS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 53 - TELEFONO: 7336622 - PASTO

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Representante de Firmas

Nixon moya

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA En WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 34, PBX & TELEFONO: 601-3138777, 601-6516500 — NUP1103864 — 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101287134, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 15 días del mes de OCTUBRE de 2024

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101287134	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	09	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELÉFONO: 3213959015

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO 4260573
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSOLOR, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 1943-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2024	31/07/2025	$31,176,264.20	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/10/2024	31/07/2025	$155,881,321.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/10/2024	11/01/2028	$15,588,132.10	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS *		$31,176,264.20	$31,176,264.20
CALIDAD DEL SERVICIO	11/10/2024	31/07/2025	$31,176,264.20	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO. MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LAS VIGENCIA DEL AMPARO ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA POR EL TERMINO DE CINCO (5) AÑOS, CONFORME MODIFICATORIO 1 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL CONTRATO No 1943-2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****187,229.00	$ *******0,000.00	$ ******37,093.00	$ **********232,321.00	$ ******264,996,245.70	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Nilson moza

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101287134	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	09	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9	
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	**CIUDAD:** PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	4250573

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7228833 - PASTO

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Nilson mora

FIRMA TOMADOR

DUF142PHA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101287134, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 20 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101287134	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	09	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.042.420-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
VDA LAS ACACIAS	PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	3213059011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4260573

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECXIICOB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No. 1049-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2024	31/07/2025	$31,176,264.20	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/10/2024	31/07/2025	$155,881,321.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/10/2024	11/01/2028	$15,588,132.10	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS +		$31,176,264.20	$31,176,264.20

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE SUPRIME EL AMPARO DE CALIDAD DE SERVICIO, CONFORME AL MODIFICATORIO No. 1 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******(170.00)	$ **********0.00	$ *******(32.00)	$ **********(203.00)	$ ******233,821,981.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CDG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	141664	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7326622 - PASTO

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

Nilxon Mora

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101287134	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	09	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	**CIUDAD:** PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3213859011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	4260573

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 34 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Nixon moza

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101287134, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 22 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101287134	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	10	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELÉFONO: 3213999011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 890.094.164-6
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO 4260573
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSIDO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No. 1049-2024 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2024	31/12/2025	$31,176,264.20	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/10/2024	31/12/2025	$155,881,321.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/10/2024	11/01/2028	$15,588,132.10	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$31,176,264.20	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA COMPRENDIENDO No. SID-2025-2453 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2025, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****156,820.00	$ *******8,000.00	$ ******31,315.00	$ **********196,136.00	$ ******233,821,981.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG NOENCIA DE SEGUROS LTDA	140964	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101287134	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	10	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.042.420-9

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	VDA LAS ACACIAS		PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	3213668011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CL 5 NRO. 7 - 40		MOCOA, PUTUMAYO	4260573

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7329921 - PASTO

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101287134, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 04 días del mes de OCTUBRE de 2025

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101287134	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	11	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELÉFONO: 3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO 4260573
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUOLOB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 1947-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 2º DE OCTUBRE DEL 2025, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SI SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(870.458.00)	$ ****(36.000.00)	$ ***(172.227.00)	$ *******(1.078.685.00)	$ ****(233.821.981.50)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143644	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

Nilxon mora

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101287134	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	11	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9	
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	**CIUDAD:** PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	**TELEFONO:** 3213569011	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:** 4260573	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226522 - PASTO

41-44-101287134

Nixon mora

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101287134, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 04 días del mes de NOVIEMBRE de 2025

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101287134	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	11	2025	27	10	2025	00:00	27	01	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9	
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELÉFONO:	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO	4260573
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECO0100, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 1343-2025 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2025, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2025	16/01/2027	$31,176,264.20	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/10/2025	16/01/2027	$155,881,321.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/10/2025	26/01/2029	$15,588,132.10	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$31,176,264.20	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****870,458.00	$ ******36,000.00	$ *****172,227.00	$ *********1,078,685.00	$ ******233,821,981.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRV AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143604	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cleda - Vicepresidente de Ramos

Nixon moxa

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101287134	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	11	2025	27	10	2025	00:00	27	01	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9
DIRECCIÓN: VIDA LAS ACACIAS	**CIUDAD:** PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	**TELEFONO:** 3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:** 4260673

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226522 - PASTO

41-44-101287134

Nilson Mora

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101287134, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 04 días del mes de NOVIEMBRE de 2025

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053668	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	10	2024	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.429-8	
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELÉFONO:	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-6	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO	4200573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 19-03-2020 - 1320-0-06-00000-0-RCE-002A-0002 / 21-03-22 -1320-0-06-00000-0-RCE-0012-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y LEIDO EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO ESTIPULADO EN CADA AMPARO, EXISTOS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 1543-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024.CUYO OBJETIVO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	11/01/2025	$200,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	11/01/2025	$200,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	11/01/2025	$200,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****163,835.00	$ *******3,000.00	$ *****31,896.00	$ **********198,534.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CNG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143644	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7229822 - PASTO

41-40-101053668

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Davila - Representante de Firmas

Nixon moya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	10	2024	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.042.420-9
DIRECCION: VIA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELEFONO: 3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4
DIRECCION: CLL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELEFONO: 4260573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	11/01/2025	$250,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	11/01/2025	$250,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	11/01/2025	$250,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 12 - TELEFONO: 7326622 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Nilxon moya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	10	2024	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.043.439-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
VDA LAS ACACIAS	PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	321395801

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4260573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 13-05-3320 - 1320-2-04-00000-S-RCE-0034-0001 / 31-03-32-1320-2-04-00000-S-RCE-0019-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 1963-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, CUYO OBJETIVO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL BARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LYNCH DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$240,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$60,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$240,000,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA:

BENEFICIARIOS: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y TERCEROS AFECTADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ********0.00	$ ********0.00	$ ********0.00	$ **********0.00	$ ****240,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CNO AGENCIA DE SEGUROS LTDA	141664	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Vasconcelos de Flores

Nilxon Moya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	1

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	10	2024	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.042.429-9

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
VDA LAS ACACIAS	PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4

DIRECCION:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4200372

BENEFICIARIO: 900094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 42 - TELEFONO: 7220823 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Vicepresidente de Pymes

Nixon moyca.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053858	1

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	10	2024	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS — IDENTIFICACION: NIT 901.642.439-8

DIRECCION: VDA LAS ACACIAS — CIUDAD: PUERTO [illegible] PUTUMAYO — TELEFONO: [illegible]

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO — IDENTIFICACION: NIT 891.094.144-4

DIRECCION: CL 8 NRO 7 - 40 — CIUDAD: MOCOA PUTUMAYO — TELEFONO: [illegible]

BENEFICIARIO: 891094144 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

[illegible]

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 18 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7310431 - PASTO

41-40-101053858

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ibarra - Representante de Firmas

Nixon Moya.

FIRMA TOMADOR

PLATINUM

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	09	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.642.420-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
VDA LAS ACACIAS	PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACION
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4260673

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1319-0-06-00000-E-RCE-002A-0001 / 31-03-22 -1319-0-06-05000-E-RCE-0019-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO DE 1943-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, CUYO OBJETIVO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE INFORMA QUE EN LA POLIZA ARRIBA CITADA SE HAN TENIDOS EN CUENTA LA MODIFICACION NO. 01 DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL CONTRATO No 1943-2024,SUS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y TERCEROS AFECTADOS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143464	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226822 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cleves - Vicepresidente de Finanzas

Nilxon moya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	09	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9	
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELEFONO:	3213556011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	4200573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

AMPARO	DEDUCTIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 34 - 52 - TELEFONO: 7336832 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Nilxon moya.

FIRMA TOMADOR

C.C. 1124...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	2

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	09	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9
DIRECCION: VDA LAS ACACIAS	**CIUDAD:** PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	**TELEFONO:** 3213559011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACION
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.154-4
DIRECCION: CL 8 NRO. 7 - 40	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	TELEFONO: 4200800

BENEFICIARIO: 800094154 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

TEXTO ADICIONAL

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 53 - TELEFONO: 7229522 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

Nilxon Moya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF1107004A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	09	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.042.420-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
VDA LAS ACACIAS	PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4350573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-3020 - 1329-P-06-30000-E-RCE-002A-0001 / 31-03-22 -1329-P-06-30000-E-RCE-001P-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 1543-2024 EL 11 DE OCTUBRE DEL 2024,CUYO OBJETIVO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL CEMENTERIO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE INFORMA QUE NO LA POLIZA ARRIBA CITADA SE HACE CONSTAR LA MODIFICACION No. 01 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL CONTRATO No 1543-2024,LAS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y TERCEROS AFECTADOS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******260.000.000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143494	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226822 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Vicepresidente de Ramos

Nixon Muñoz

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	2

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	09	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9	
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELEFONO:	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 900.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	4200573

BENEFICIARIO: 900094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 34 - 52 - TELEFONO: 7226522 - PASTO

41-40-101053868

Firma AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Wilxon Moya

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	1

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	09	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9
DIRECCION: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELEFONO:	3213999011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4
DIRECCION: CL 8 NRO 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	4200672

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PRIMA ANUAL/CORTO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226672 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Representante de Ventas

Nilxon moyu.

FIRMA TOMADOR

FIRMA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	09	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.042.420-9

DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS — CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO — TELÉFONO: 3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.094.164-4

DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 -40 — CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO — TELÉFONO: 4250573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-0012-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 1563-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, PARA CONTRATAR POR MINIMA CUANTIA EL MANTENIMIENTO MECANICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES INCLUIDOS DESDE EL TANQUE PRINCIPAL AL CUBRIMIENTO DE LA INSTALACION DE PUENTE LINEA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PERDIDA LUCROS Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	

ACLARACIONES

APLICANTE EL PRESENTE ANEXO SE INFORMA QUE EN LA POLIZA ARRIBA CITADA SE HACE CONSTAR LA MODIFICACION NO. 01 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL CONTRATO No 1563-2024-SUMINISTRO Y CORRECTIVO NO DE MOCOPICAL.

BENEFICIARIOS: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y TERCEROS AFECTADOS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	243464	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA. POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 02 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Nilxon moyce.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	09	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.042.420-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
VDA LAS ACACIAS	PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 8 NRO 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4200573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planeas

Nilxon Moya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	41	41-40-101053868	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	09	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS — IDENTIFICACION: NIT: 901.042.429-7

DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS — CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO — TELÉFONO: 321385903

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO — IDENTIFICACIÓN: NIT: 800.094.164-1

DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40 — CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO — TELÉFONO: 4260570

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

TEXTO ADICIONAL PARTE

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7270627 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planeas

Milxon moya - CC1143884

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	10	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-1	
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELÉFONO:	3213058011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO	4280573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-8-06-00000-E-RCE-0028-0001 / 31-03-22 -1329-8-06-00000-E-RCE-0019-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA 2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, CUYO OBJETIVO ES: MEJORAMIENTO ESTUFAS FAVORECIDOS RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL SEMICAMPO DE LA VEREDA DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VIGENCIA AÑO ACTUAL	VIGENCIA AÑO ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$284,700,000.00	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$284,700,000.00	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$284,700,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO A 284 SMMLV VIGENCIA DEL 2025 Y SE MODIFICA LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA ADICIONAL NO. 3 No. 2310-2024-2153 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2024, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******5,000.00	$ **********0.00	$ ********950.00	$ **********5,950.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CISG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	140664	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Nilxon Mora.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

CIU... SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PAS...

SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	41	41-40-101053868	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	10	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.042.429-9

DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS — CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO — TELÉFONO: 3213959011

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO — IDENTIFICACIÓN: NIT. 800.094.164-4

DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40 — CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO — TELÉFONO: 4260573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

AMPARO	DEDUCTIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$284,700,000.00	$280,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$284,700,000.00	$280,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$284,700,000.00	$280,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226632 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Ramos

Nilxon moya.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	10	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-0
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELÉFONO:	3213958011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN NIT:	
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		800.994.164-4
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	4260573

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | PSE | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO - NO APLICA PARA TRANSFERENCIAS

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 00646544-6

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******5.000,00	$ **********0,00	$ ********950,00	$ **********5.950,00	$ ******284.700.000,00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CIA ASESORA DE SEGUROS LTDA	140044	100,00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO CUANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 34 - 52 - TELEFONO: 7228822 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1100061946799-0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Milxon moyca.

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	10	2025	11	10	2024	00:00	11	01	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.429-8	
DIRECCIÓN: VÍA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELEFONO:	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	4260573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7236632 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidencia de Planeas

IVilsonmoya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	10	2025	11	10	2024	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.042.420-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
VDA LAS ACACIAS	PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4250573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 11-05-2020 - 1320-P-06-00000-8-RCE-002A-0001 / 11-05-20 -1320-P-06-00000-8-RCE-0012-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 1943-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024,CUYO OBJETIVO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

REQUIERE SU PRORROGA SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO A 200 SMMLV VIGENCIA DEL 2025 Y SE RENUEVA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ANEXA CONDOMINIO ,POLIZA No. RCE-2023-2419 DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****690,299.00	$ ******3,000.00	$ *****131,727.00	$ **********825,026.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
1000 AGENCIA DE ASEGUROS LIDA	14366a	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ossa - Vicepresidencia de Finanzas

Nixon Moya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	10	2025	11	10	2024	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT. 901.042.420-9	
DIRECCIÓN: VIA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELÉFONO:	3213659011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT. 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	4260573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	11/10/2024	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	11/10/2024	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	11/10/2024	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 34 - 53 - TELEFONO: 7228822 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Nilxon moya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	10	2025	11	10	2024	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT:	901.042.421-9
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELEFONO:	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	4200573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7336632 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planeas

Wilxon moya

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DILIGENCIAR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	10	2025	11	10	2024	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELÉFONO: 3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO 4280573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-9-06-00000-R-RCE-002A-0001 / 31-03-20 -1329-9-06-00000-R-RCE-001P-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO DE 1343-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, CUYO OBJETIVO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO VARIOS DEL BARRIO TRIENTINA EL EMBARCADERO DE LA INTERSECCIÓN DE PUERTO LEMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA:

MODIFICANDO EL VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO Y CONTRATO ADICIONAL.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *********0.00	$ *********0.00	$ *********0.00	$ **********0.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	14300x	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 32 - TELEFONO: 7225622 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

wilson moya

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	10	2025	11	10	2024	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.042.420-9	
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	**CIUDAD:** PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	**TELEFONO:** 3213958011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELEFONO:** 4260573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

AMPARO	DEDUCTIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	11/10/2024	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 34 - 82 - TELEFONO: 7228822 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Nilson moya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	10	2025	11	10	2024	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9	
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELEFONO:	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	4260573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7228622 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Nilxon Anaya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	11	2025	11	10	2024	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.042.420-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
VDA LAS ACACIAS	PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	3213059011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4260573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1320-P-06-00000-8-RCE-002A-0001 / 31-03-22-1320-P-06-00000-8-RCE-0012-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No. 1943-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIBRE DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

1183001 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 2° DE OCTUBRE DEL 2025, QUE SIGUE TENIENDO LA CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(859,135.00)	$ *****(6,000.00)	$ ***(164,375.00)	$ *******(1,029,511.00)	$ ****(284,700,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRC AGENCIA DE SEGUROS LTDA	14344	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

Nilxon moyu.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	11	2025	11	10	2024	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.042.420-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
VDA LAS ACACIAS	PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4260573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

TEXTO ADICIONAL

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 34 - 53 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Nilxon moya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	11	2025	27	10	2025	00:00	16	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.042.420-8
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO		TELÉFONO: 3213059011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO		TELÉFONO 4280573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-20200-E-RCE-002A-000I / 31-03-21-1329-P-06-20000-E-RCE-0019-000I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 1943-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024,2020 OBJETO: [illegible] VALORIZADO BIENES DESDE SU PUNTO PRINCIPAL AL ORNAMENTO DE LA INTERSECCION DE PUENTO LINDA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUBL. ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	27/10/2025	16/01/2027	$284,700,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	27/10/2025	16/01/2027	$284,700,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	27/10/2025	16/01/2027	$284,700,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AFECTA EL ACTA DE INICIO A PARTIR DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2025, SIN OTRAS TENENCIAS Y CONDICIONES DE LA MODIFICADA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****856,135.00	$ *******0,000.00	$ *****164,375.00	$ *********1,029,511.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRC AGENCIA DE SEGUROS LTDA	142464	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidencia de Finanzas

Nixon Moya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053668	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	11	2025	27	10	2025	00:00	16	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	IDENTIFICACION	NIT: 901.042.420-9
DIRECCION: VDA LAS ACACIAS	CIUDAD: PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	TELEFONO:	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.094.164-4
DIRECCION: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELEFONO:	4200573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/10/2025	16/01/2027	$284,700,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/10/2025	16/01/2027	$284,700,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/10/2025	16/01/2027	$284,700,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 62 - TELEFONO: 7220822 - PASTO

41-40-101053668

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidencia de Ramos

Nilxon moya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	11	2025	27	10	2025	00:00	16	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT. 901.042.420-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
VDA LAS ACACIAS	PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT. 800.094.164-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4260573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226822 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planes

Nilxon moya.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.2 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO – PROGRAMA DE OBRA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

NIT. 800.094.164-4

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

ANEXO AVANCE FÍSICO

CIUDAD			
PAGINA	1	DE	1
FECHA	4	MAYO	2021

AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS DEL CONTRATO

Mes: 1 CONTRATO No. [illegible] SECTOR: MOJUDA, INSPECCION DE PUERTO LIMON

CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA

DESCRIPCIÓN GRANDES PARTIDAS DE PAGO O ITEMS	PROGRAMADAS (1)				EJECUTADAS MES (1)		EJECUTADAS MES (2)	
	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADAS	VALOR TOTAL	EJECUTADAS	VALOR
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO								
Localizacion y replanteo, incluye andenes	m²	340.00	$ 3,080.00	$ 2,100,000.00	846.00	$ 2,106,080.00		
Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	260.96	$ 50,821.00	$ 13,551,569.66	268.96	$ 13,662,316.76		
[illegible]	m³	112.40	$ 860,502.00	$ 96,720,725.00	102.90	$ 88,571,157.72		
Suministro e instalacion de material seleccionado	m³	38.11	$ 84,276.00	$ 3,211,720.25	38.11	$ 3,211,720.25		
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	m³	94.50	$ 150,548.00	$ 14,226,786.00	94.50	$ 14,226,786.00		
Suministro e instalacion de geotecil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas [illegible]	m²	650.00	$ 12,696.00	$ 8,284,350.00	[illegible]	[illegible]		
Bombillos de concreto 3000PSI	Und	4.00	$ 671,409.00	$ 3,385,545.10	4.04	$ 2,695,636.07		
Acero de refuerzo 3/8" incluido	Kg	127.10	$ 6,132.00	$ 779,377.20	115.62	$ 710,021.44		
Canastillas en acero de refuerzo de 3400f PSI, 3 1/4", Pasajuntas	ml	170.00	$ 21,026.00	$ 3,714,420.00	152.00	$ 3,339,376.00		
[illegible]	ml	604.40	$ 5,200.00	$ 3,147,288.00	141.00	$ 733,200.00		
[illegible]	Kg	70.60	$ 11,068.00	$ 781,664.80	63.40	$ 702,550.89		
Corte Juntas de Dilatación y su respectivo sellado	ml	67.67	$ 17,525.00	$ 1,211,565.25		$ -		
ANDENES						$ -		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ -		
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	m³	42.00	$ 156,548.00	$ 6,573,816.00		$ -		
Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m²	21.00	$ 671,580.00	$ 14,230,980.00		$ -		
Malla Electrosoldada 6x2,33m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409.59	$ 13,824.00	$ 5,662,172.16		$ -		
SEÑALIZACION						$ -		
Señal vertical con aleros retroreflectivo (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3.00	$ 502,604.00	$ 1,507,812.00		$ -		
Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	m2	100.02	$ 15,405.00	$ 2,411,473.10		$ -		
Reflectantes con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion vial (bidireccional)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ -		
Reductores de velocidad tipo resalto en concreto	m	14.00	$ 400,000.00	$ 5,600,000.00		$ -		
Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	m	280.00	$ 57,504.00	$ 16,100,880.00		$ -		
Suministro e instalacion de tachas	un	32.00	$ 18,519.00	$ 592,608.00		$ -		
				$ 600,536,360.56		$ 142,408,772.00		

ADMINISTRACION	31.32%	$ 94,314,032.00	$ 46,911,621.00
IMPREVISTOS	3.28%	$ 9,186,095.00	$ 4,273,183.00
UTILIDAD	0.00%	$ -	$ -
	34.32%	$ 103,540,128.00	$ 48,884,686.00

COSTOS AMBIENTALES Y PLAN DE				$ 276,276,632.00	$ 131,323,756.00
PREVISION PARA EL PLAN DE	UNE	1.00		$ 35,685,010.00	$ 23,822,010.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UNE	1.00		$ 10,843,680.00	$ 8,309,536.00
				$ 34,742,510.00	$ 15,512,510.00
			Valor aportado por la gobernacion	$ 511,782,641.00	$ 228,148,788.00
			Valor aportado por Consejo Comunitario Las Acacias	$ 16,443,245.00	$ 40,870,821.71
			Valor total del proyecto	$ 941,329,387.00	$ 188,334,644.71

(1) Se debe actualizar con las reprogramaciones que se realicen durante la ejecucion del contrato.
(2) Se debe totalizar la cantidad META programada durante el mes.
(3) Se debe totalizar la cantidad META ejecutada durante el mes.
(4) Corresponden a los acumulados a partir de la iniciacion del contrato.

Firma:
Nombre: RL. NILSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

Firma:
Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Contratista de Interventoria
Matricula No: [illegible]

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUESTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM:	1.1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	UNIDAD:	m²



Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)		Longitud (m)
Localizacion y replanteo, incluye andenes	5.40	100.00			840.00
					840,00

ITEM:	1.2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	UNIDAD:	m³




Descripción	Factor expansion	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)					268,68
					268,68

ITEM:	1.3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)	UNIDAD:	m³



Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Un	Volumen (m3)
Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)					102,08
					102,08

ITEM:	3.4	Suministro e instalacion de material seleccionado	UNIDAD:	m³

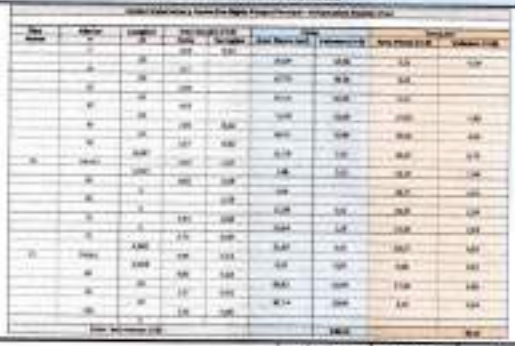


Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Suministro e instalacion de material seleccionado					38.11
					38.11

ITEM:	5.1	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	UNIDAD:	m³




Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).					94.51
					94.00

ITEM:	3.4	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	UNIDAD:	m²

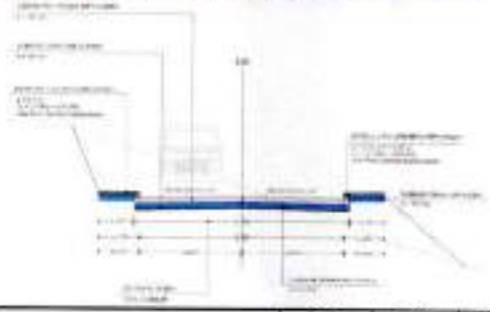


Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Area m2
Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	6.50	100.00			650.00
					650.00

ITEM:	3.7	Bordillos de concreto 3000PSI	UNIDAD:	m3

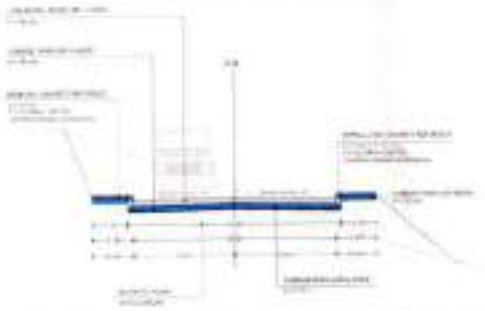


Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	Longitud (m)
Bordillos de concreto 3000PSI					4,44
					4,44

ITEM:	3.8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	UNIDAD:	Kg




Descripción	Long bordillo	# empalmes	Ld (m)	Cant varillas	Varilla diametro	Peso por ml (kg)	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 3/8" bordillo	50	25	0,54	2	3/8"	0,56	119,82
							119,82

ITEM:	3.9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	UNIDAD:	ml

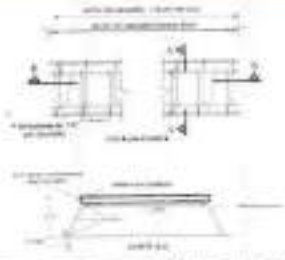

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Kg/ml	Nos.	Peso (Kg)
Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	6,30			24,32	153,00
					153,00

ITEM:	1.10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	UNIDAD:	Kg

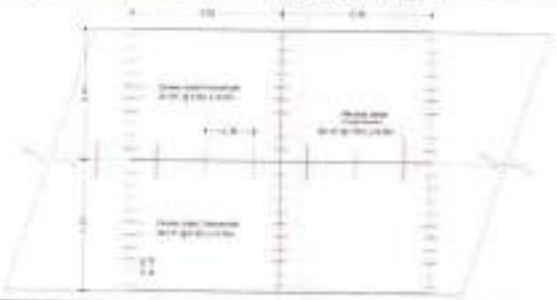

Descripción	Ancho (m)	Numero (un)	Largo (m)	Kg/ml	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 1/8" Transversal	21,00	24,32	0,35	3,542	543,96
0					
					543,9630

ITEM:	1.11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	UNIDAD:	Kg



Descripción	Elementos	Cantidad	Largo (m)	Kg/ml	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 1/2" Longitudinal	2,08	24,32	0,95	0,998	63,45
					63,45

Nilson moya

R.L. NILSON MOYA MESA
CONSEJO COMUNITARIO LAS AGUAS

R.L. DAVID ANDRES CHICO ARANGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Car tera Materiales PARQUE PRINCIPAL - EMCARCADERO, PUERTO LIMON

Tipo	Abscisa	Longitud	Materiales Estructura (m3)				
Punto	m	m	[4] Subbase Via	[5] Concreto Via	[18] Concreto Bordillo_Via	[21] Concreto Anden	[23] Subbase_ Anden
	0						
		10	9,45	11,34	0,493	2,1	3,15
	10						
		10	9,45	11,34	0,493	2,1	3,15
	20						
		10	9,45	11,34	0,493	2,1	3,15
	30						
		10	9,45	11,34	0,493	2,1	3,15
	40						
		10	9,45	11,34	0,493	2,1	3,15
	50						
		8,347	7,89	9,47	0,411	1,753	2,63
PC	58,347						
		1,653	1,56	1,87	0,081	0,347	0,52
	60						
		5	4,73	5,67	0,246	1,05	1,58
	65						
		5	4,73	5,67	0,246	1,05	1,58
	70						
		5	4,73	5,67	0,246	1,05	1,58
	75						
		4,961	4,69	5,63	0,244	1,042	1,56
PT	79,961						
		0,039	0,04	0,04	0,002	0,008	0,01
	80						
		10	9,45	11,34	0,493	2,1	3,15
	90						
		10	9,45	11,34	0,493	2,1	3,15
	100						
		80,00					
Totales Volúmenes (m3) :			94,53	102,06	4,44	0,00	0,00

Nilson Moya

RL. NILSON MOYA MENA

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

R.L. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

CONTRATISTA INTERVENTOR

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Cartera Volumenes y Cortes Pav Rigido Parque Principal - Embarcadero Puerto Limon

Tipo	Abscisa	Longitud	Area Seccion (m2)		Corte		Terraplen	
Punto	m	m	Corte	Terraplen	Area Planta (m2)	Volumen (m3)	Area Planta (m2)	Volumen (m3)
	0		2,54	0,31				
		10			85,69	34,26	3,51	0,59
	10		4,57					
		10			87,79	48,36	0,03	
	20		5,39					
		10			91,53	56,83	0,00	
	30		4,48					
		10			75,69	25,69	17,02	3,80
	40		2,35	0,54				
		10			68,97	20,90	23,46	4,04
	50		1,37	0,32				
		8,347			31,29	7,54	45,37	8,75
PC	58,347		0,30	1,35				
		1,653			4,38	0,20	11,52	2,13
	60		0,00	1,59				
		5			0,06		48,17	9,65
	65			1,53				
		5			11,09	0,41	35,91	5,24
	70		0,24	0,63				
		5			29,64	2,38	15,60	1,93
	75		0,71	0,10				
		4,961			32,80	3,91	10,47	0,83
PT	79,961		0,85	0,18				
		0,039			0,25	0,03	0,08	0,01
	80		0,85	0,18				
		10			69,81	10,99	17,34	0,80
	90		1,37	0,01				
		10			84,74	19,06	1,16	0,04
	100		2,35	0,80				
		0						
Total Volumenes (m3) :						**230,55**		**38,11**

Nilson Moya

RL. NILSON MOYA MERA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

R.L. DAVID ANDRÉS CHICO ARANGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.3 COPIA DE LAS ACTAS DE COMITÉ TECNICO SEMANAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Período comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

PROYECTO: " **MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** ".

En la Inspección de Puerto Limón, Municipio de Mocoa, Putumayo, se reunieron los abajo firmantes con la finalidad de socializar con la comunidad y beneficiaros, la el contrato de obra denominado MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" el cual surge las solicitudes de la Comunidad ante la gobernación del Putumayo con base a necesidad requerida, por lo anterior el presente proyecto fue priorizado en el Plan de Desarrollo departamental "Seguimos Avanzando de la Mano con las Comunidades 2024-2027".

Se deja constancia por parte de la comunidad asistente de que la formulación del proyecto expuesto cubrirá la necesidad planteada.

Dado en la En la inspección de Puerto Limón del municipio de Mocoa a los 12 días del mes de septiembre de 2025.

Nombre y Apellido	Número cédula	Cargo	Firma
Alvaro Enrique P	18103528	Ing de obra	
Diana Marcela L.	1'124.856.659	Beneficiario	
David Andrés Cacua A.	1.113.304.993	Interventor	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6

PUTUMAYO GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

Nombre y Apellido	Numero cédula	Cargo	Firma
Judy Pinchao	69 008 057	AAHLK	Judy P.
Maria Fanando	69.009.914	CCAHLK	Maria Fanando
Ayde Meza	1124853997	CCHLK	Ayde M
Araely Cabrera	69009380	Jun Rec.	Araely C.
Beto Enriquez	12'987.88	Rector	Beto
Fanor Ovidio Cortes	5.299.435	AAHLK	Fanor C.
Wilson Mezu Ve	4 5.0 8 17 7	Docente	
Isabel Cortes	27127084	JACPL	Isabel Cortes
Marinela Meza	69007712	Pto. L	Marinela M S
Rosa Zambrano	- -	Ptal.	R. Z.
Josefa Juajibioy	- -	- -	No firma.
Jaime Enriquez	12'987.88	Rector	Jaime
Wilson Mezu Sevilla	5'299'435	Concejal	
Carlos Tenorio	5203395	Ptal.	Carlos Tenorio

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6

PUTUMAYO
CONSERVACIÓN
NIT. 800.094.164-4

Jose Libardo Mesa C	17122395	Presidente Concejo	Presidente Concejo
Libardo Mesa C	18.124.405		
Nombre y Apellido	Numero cédula	Cargo	Firma

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-129
	DOCUMENTO ADICIONAL	VERSION: 01
		FECHA: 20/11/2015

CLASE	**CONTRATACIÓN DIRECTA-CONTRATO DE OBRA**		
PARTES	**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO NIT 800094164-4**		
	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS NIT: 901042420-9 R/L NILSON MOYA MENA C. C. 4.800.171 de Bojaya (B)		
OBJETO	**"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIP AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO D MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($311.762.642,00).**		
	APORTE GOBERNACION	**($241.329.386,00) M/CTE**	**CDP:** 4671 de 23/09/2024
	APORTE CONSEJO COMUNITARIO	**($70.433.255,00) M/CTE**	Recursos propios.
PLAZO DEL CONTRATO	**TRES (03) MESES**		

Entre los suscritos a saber: **EDGAR ORLANDO GONZÁLEZ ORTEGA**, obrando en su calidad Secretario de Servicios Administrativos Departamental con Funciones de ordenación del gasto según Decreto Departamental N° 075 del 28/02/2023 y actuando como Representante Legal de esta Entidad de derecho público, y por ende la faculta para contratar por la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, Artículo 11, Numeral 3, Literal b) y quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte y por la otra **EL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS** con NIT N° **901042420-9**, Representado Legalmente por el señor **NILSON MOYA MENA**, identificado con C.C. 4.800.171 de Bojaya (B), obrando en su calidad de Representante Legal, hemos acordado celebrar el siguiente contrato previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Nuestra Carta Política establece en el inciso 1º del Artículo 209 que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 7 prevé que *"El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana"* y en este sentido, en el artículo transitorio 55 dispuso *"Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley.*

En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale

la ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.

PARAGRAFO 1°. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista.

PARAGRAFO 2°. Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no hubiere expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley."

En el mismo texto constitucional se contempla en el artículo 298 que "...Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. (..) Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes...".

Conforme a ello, la Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de la atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", regula en su artículo 6º el Principio de coordinación y colaboración en virtud del cual "...las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. (...) En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares...".

Mediante la Ley 70 de 1993 además de reconocer el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras, se establecieron "*mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana*".

Los artículos 1º y 3º de la Ley 2160 de 2021 modificaron los artículos 6º y 7º de la Ley 80 de 1993, respectivamente, dando capacidad jurídica y definiendo cada una de las organizaciones y comunidades que tiene capacidad jurídica para celebrar contratos con el Estado, entre ellas, los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras, las formas o expresiones organizativas de la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera, las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las organizaciones de segundo nivel, de la siguiente manera:

> *ARTÍCULO 7°. ENTIDADES A CONTRATAR. Para los efectos de esta ley se entiende por:*
> *1. (...)*
> *2. Consejo comunitario de las comunidades negras: Es la persona jurídica que ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad".*
> *3. Formas o expresiones organizativas. Son manifestaciones que, en ejercicio del derecho constitucional de participación, asociación y de la autonomía de conjuntos de familias de ascendencia negra,*

afrocolombiana, raizal o palenquera que reivindican y promueven su cultura propia, su historia, sus prácticas tradicionales y costumbres, para preservar y proteger la identidad cultural y que estén asentados en un territorio que por su naturaleza no es susceptible de ser titulada de manera colectiva.
4. Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Son asociaciones comunitarias integradas por personas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, que reivindican y promueven los derechos étnicos y humanos de estas comunidades.
5. Organizaciones de Segundo Nivel. Son asociaciones de Consejos Comunitarios, formas y expresiones organizativas y/u organizaciones de base que agrupan a más de dos (2), inscritas en el Registro Único de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, siempre y cuando el área de influencia de la organización de segundo nivel corresponda a más de la tercera parte de los departamentos donde existan comisiones consultivas (...)"
Para las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las demás formas y expresiones organizativas, deberán contar con diez (10) años o más de haber sido incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro; y los consorcios y uniones temporales".

El artículo 2° de Ley 2160 de 2021 incluyó los literales M) y N) al numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionando como causales de contratación directa la que se realice con consejos comunitarios de las comunidades negras y organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras o con las demás formas y expresiones organizativas, así:

"M). Los contratos que las entidades estatales suscriban con los consejos comunitarios de las comunidades negras, regulados por la Ley 70 de 1993, que se encuentren incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro, cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad étnica y cultural, el ejercicio de la autonomía, y/o la garantía de los derechos de los pueblos de las mismas comunidades.

N). Los contratos que las entidades estatales suscriban con las organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras o con las demás formas y expresiones organizativas, que cuenten con diez (10) años o más de haber sido incorporados, por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro, cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento de sus organizaciones, la identidad étnica y cultural, y/o la garantía de los derechos de las poblaciones de las mismas organizaciones".

Las precitadas causales autorizan a las entidades estatales para contratar de manera directa con consejos comunitarios de comunidades negras reguladas por la Ley 70 de 1993, así como con organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras o con las demás formas y expresiones organizativas, que cuenten con diez (10) años o más de haber sido incorporados, por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización, cuando el objeto del contrato se encuentre relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio o de sus organizaciones, la identidad étnica y cultural, el ejercicio de la autonomía, y la garantía de los derechos de los pueblos de las mismas comunidades.

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-129
	DOCUMENTO ADICIONAL	VERSION: 01
		FECHA: 20/11/2015

La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente en la CARTILLA PARA INCENTIVAR Y FORTALECER EL ACCESO AL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS EN COLOMBIA, hace referencia a la capacidad para contratar, conferida en especifico a Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, así: *"la Ley 2160 del 2021 establece de manera clara y precisa, que se podrán celebran contratos con: i) consejos comunitarios de las comunidades negras; ii) Formas o expresiones organizativas; iii Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; y iv) Organizaciones de Segundo Nivel."*

Con el Propósito de mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, el Instituto Nacional de Vias, estructuró y se encuentra ejecutando el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual nace como una iniciativa del Gobierno Nacional con el propósito de convertirse en un programa de inversión de alta prioridad dentro de la agenda de desarrollo

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y **EL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS"** del municipio de Mocoa, Putumayo (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el CONTRATO por celebrarse se regirá por las Leyes 70 de 1993, 21 de 1991 y 2294 de 2023; y, por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 2160 de 2021, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.

La Gobernación del Putumayo en cumplimiento de las acciones determinadas en el Plan de Desarrollo Departamental "Somos el gobierno de la gente" 2024-2027 y desde la Secretaría de Infraestructura Departamental, requiere ejecutar los proyectos de inversión encaminados garantizar el mejoramiento y mantenimiento de las vias, buscando con ello mejorar los estándares de calidad, razón por la cual se formuló el **" MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO",** con Registro BPIN No. 2024006860112.

Que, para garantizar el cumplimiento de sus funciones y según estudio previo presentado por la Secretaría de Infraestructura Departamental, se requiere celebrar un contrato con el objeto de **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".**

Que, el contrato contempla una inversión de recursos por la suma de **TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($311.762.642,00)**, los cuales se encuentran amparados bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal anexo y discriminados de la siguiente manera:

OBJETO: " MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMEN DEL PUTUMAYO (OBRA)"
FUENTE: ICLD
REGISTRO BPIN: N° 2024006860112

Identificación Presupuestal	CONCEPTO	VALOR
0301-0.2.3.04.24.02.041.9.2.	Autopista, carreteras, calles	**$241.329.386,00**

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-129
	DOCUMENTO ADICIONAL	VERSION: 01
		FECHA: 20/11/2015

3.2.01.01.001.03.02-1002					
No. de CDP	4671	**F/Expedición**	23/09/2024	**Vigencia**	22/12/2024

Que el contratista, realiza una contribución al presente contrato por un valor de **SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($70.433.255)** equivalente a mano de obra no calificada

DESGLOSE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA			
ESPECIFICACIÓN INVIAS	**ITEM**	**Descripción**	**MONC**
	1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO**	
1P	1,1	Localización y replanteo, incluye andenes	423.108,00
210,2,2	1,2	Excavación en material común a máquina de la explanación (incluye desalojo)	183.236,00
630	1,3	Pavimento de concreto hidráulico (MR 3.8)	16.573.513,00
221,1	1,4	Suministro e instalación de material seleccionado	30.327,00
320,1	1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	94.012,00
232,1	1,6	Suministro e instalación de geotextil para estabilización de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	969.636,00
672,1	1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	417.749,00
	1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	148.991,00
640	1,90	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	882.192,00
640	1,10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	360.645,00
640	1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	42.067,00
433P	1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	303.828,00
	2	**ANDENES**	
2P	2,1	Excavación en material común en seco a mano (Incluye retiro)	716.135,00

610P	2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	41.783,00
	2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	1.790.352,00
640	2,4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	36.577.715,00
	3	**SEÑALIZACIÓN**	
710	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	56.269,00
	3,2	Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central	1.216.315,00
	3,3	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación paso peatonal y línea de pare (incluye microesferas)	179.652,00
	3,4	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	9.122.236,00
	3,5	Suministro e instalación de tachas	303.494,00
SUBTOTAL			**70.433.255,00**

Para un valor total del aporte por parte de la Gobernación del Putumayo de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($241.329.386,00) M/CTE.**

No obstante, lo anterior, el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expedido por el Profesional especializado de la Oficina de Presupuesto Departamental.

Que, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el Departamento del Putumayo emitió el acto administrativo que justifica la modalidad de Contratación directa, previo viabilidad y certificado de idoneidad realizado por la el Secretario de Infraestructura Departamental.

Que, el contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. En las materias no reguladas por las citadas leyes se aplicará la legislación comercial cuando el contrato tenga el carácter de mercantil de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 del Código de Comercio. En caso contrario se aplicará la legislación civil.

Que, el Representante Legal del **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**, manifiesta bajo la gravedad del juramento surtido mediante la suscripción de este documento, que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones vigentes sobre la materia y que, si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993.

Que, este contrato también se regirá además de sus estipulaciones y normas relacionadas, a los mandatos de los principios de la buena fe y la equidad, de manera tal que las partes eviten incurrir en conflictos de intereses o conductas desleales o ilícitas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - El objeto del presente contrato **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".** por lo anterior, el Departamento del Putumayo y el **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**, se comprometen a aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para ejecutar el objeto del contrato de conformidad al artículo 2, numeral 4, literal M) de la ley 1150 de 2007 adicionada por la ley 2160 de 2021 y conforme al estudio previo presentado por la Secretaría de Infraestructura Departamental y al subproyecto registrado en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación Departamental del Putumayo con Registro BPIN No. 2024006860112.

PARÁGRAFO: Las especificaciones técnicas son las que se describen a continuación:

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-129
	DOCUMENTO ADICIONAL	VERSION: 01
		FECHA: 20/11/2015

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800.103.081-6

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO DE OBRA

100,00 ML

ESPECIFICACION INVIAS	ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	Valor total
	1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO					$ 154.822.800,00
107	1,1	Junta fija en y materiales...incluye pintura	m²	840,00	$ 2.680,00	$ 2.251.200,00	
110,2,2	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explotacion (incluye desalojo)	m³	788,66	$ 10.831,00	$ 13.613.570,00	
330	2,2	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3,8)	m³	131,40	$ 882.565,00	$ 99.853.731,00	
211,1	3,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	m³	84,44	$ 94.275,00	$ 8.013.700,00	
300,1	3,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humectación y compactación)	m³	84,44	$ 260.340,00	$ 24.224.760,00	
212,1	3,6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	676,00	$ 12.695,00	$ 8.254.200,00	
412,1	3,7	Bordillos de concreto 3000PSI	ml	4,50	$ 675.400,00	$ 3.039.300,00	
	3,8	Acero de refuerzo 60F fy=420Mpa	Kg	1.211,10	$ 9.130,00	$ 778.473,00	
540	3,90	Juntas de dilatacion de asfalto de refuerzo de 3/4"DE PVC, D 1/2", Para juntas	ml	140,00	$ 21.816,00	$ 3.710.720,00	
540	3,10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) Transversal	Kg	884,40	$ 9.200,00	$ 8.747.280,00	
540	3,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) Longitudinal	Kg	76,56	$ 13.091,00	$ 752.067,00	
420P	3,12	Corte juntas de Expansion y su respectivo sellado	ml	87,97	$ 17.825,00	$ 1.211.565,00	
	4	ANDENES					$ 27.712.934,00
2P	2,1	Excavacion en material comun en seco a mano (incluye retiro)	m³	36,00	$ 41.446,00	$ 1.492.056,00	
420P	2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humectación y compactación)	m³	41,00	$ 260.418,00	$ 8.313.024,00	
	2,3	Andenes en concreto clase D (4000PSI) e=0,10 m	m²	21,00	$ 677.898,00	$ 14.235.600,00	
540	2,4	Malla Electrosoldada ver/horiz D 11 @ 15 de 6 mm	Kg	885,19	$ 13.831,00	$ 3.662.172,00	
	5	SEÑALIZACION					$ 22.860.768,00
710	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3,00	$ 502.936,00	$ 1.507.811,00	
	3,2	Demarcacion con pintura trafico de frio color amarilla para delineacion central	ml	156,00	$ 10.465,00	$ 1.632.540,00	
	3,3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanca para delineacion en caso peatonal y cruce de para brillo/reflectivo	ml	11,65	$ 18.018,00	$ 209.975,00	
	3,4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanca para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	108,00	$ 80.591,00	$ 8.703.800,00	
	3,5	Suministro e instalacion de tachas	un	31,00	$ 18.813,00	$ 602.208,00	
		Total costos directos					$ 305.836.569,00

Administración	17,17%
Imprevistos	3,00%
Utilidad	3,00%
SUBTOTAL AIU	24,17%

$ 66.319.231,00
$ 9.166.095,00
$ 0,00
$ 75.040.326,00

		Subtotal obra civil					$ 380.876.895,00
		COSTOS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO					$ 25.484.614,00
		PROVISION PARA EL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	UND	1,00	$ 10.843.006,00	$ 10.843.006,00	
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00	$ 14.641.608,00	$ 14.641.608,00	
		Costo total obra					$ 406.361.509,00
		Interventoria					$ 28.870.674,00
		Valor aportado por la gobernacion					$ 170.000.000,00
		Valor aportado por Consejo Comunitario Las Aguas					$ 79.491.252,00
		Valor total del proyecto					$ 340.491.252,00

CLÁUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO: Son obligaciones del Departamento, sin perjuicio de las demás que las disposiciones legales vigentes le imponen en desarrollo de este contrato, las siguientes:

1.- Transferir al contratista, los recursos con destinación especifica de que trata el contrato, previo cumplimiento de los requisitos que la transferencia amerite con el fin adelantar la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".** En cuantía de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($241.329.386,00).

2.- Ejercer la supervisión general del presente contrato a través del Secretario de Infraestructura Departamental, o del funcionario que se designe, en miras de verificar el cumplimiento del mismo y que la inversión se realice a fin de dar cumplimiento a la ejecución del proyecto radicado y viabilizado en el Banco de Proyectos Departamental.

3.- Velar porque el contratista cumpla y desarrolle el proyecto tal y como fue aprobado por el Departamento.

4.- Realizar la supervisión técnica y financiera a las actividades que se ejecutan en desarrollo del contrato, por medio de la Secretaría de Infraestructura Departamental del Putumayo, del funcionario que se delegue para tal fin, y realizar visita de seguimiento para la verificación de cumplimiento de las actividades estipuladas en el Plan Operativo y objeto del contrato.

5.- Brindar el apoyo técnico necesario al ejecutor del proyecto para el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato.

6.- Coordinar las actividades administrativas y logísticas para el desarrollo del objeto del contrato.

7.- Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

OTRAS OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

En virtud del contrato, la Entidad se obliga a:

1) Pagar en la forma establecida en la Cláusula forma de pago.
2) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista.
3) Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley.
4) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS U OBLIGACIONES DEL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS DEL MUNICIPIO DE MOCOA:

El Municipio, deberá cumplir las siguientes obligaciones frente al contrato:

1.- Mantener los requisitos de idoneidad, existencia y personería jurídica durante el plazo de duración del contrato, por lo que, el Contratista no podrá disolverse, cancelarse o liquidarse en este periodo.

2.- Mantener al día la información financiera de la ejecución de actividades del proyecto.

2.- Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y Estudios previos y demás anexos que hacen parte integral del presente Contrato.

3.- Velar por el cumplimiento de las leyes y normas pertinentes a la ejecución de la actividad del proyecto y los criterios adecuados de contratación y optimización de recursos.

4.- Realizar la respectiva contratación para la ejecución del proyecto de conformidad con lo reglamentado en las leyes 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus Decretos reglamentarios, No se autoriza aplicar otro régimen diferente.

5.- Tener a disposición de la Secretaria de Infraestructura Departamental, la información de la ejecución técnica, administrativa, operativa y financiera del contrato que se suscriba posterior a la firma del presente contrato.

7.- Elevar a consulta de la Secretaría de Infraestructura Departamental cualquier modificación al contrato que considere pertinente dentro de la vigencia del mismo con los respectivos soportes técnicos y administrativos con quince (15) días de anterioridad como mínimo.

8.- Presentación del informe de ejecución completo en original o copia e impreso, aprobado por el supervisor del contrato.

9.- Realizar el aporte al proyecto **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por un valor de SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($70.433.255) con el fin de llevar a cabo la ejecución del presente.

10. Aperturar una cuenta conjunta en un banco o corporación con el nombre del objeto del contrato para consignar ahí los aportes de la Gobernación del Putumayo. Dichos recursos únicamente podrán ser retirados por autorización del supervisor designado y el interventor. La original de la certificación donde conste la apertura de la cuenta deberá ser enviada al Departamento. Los aportes que reciba de la Gobernación se ejecutarán bajo la responsabilidad del Consejo Comunitario, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 4°, artículo 6° de la ley 1551 de 2012 y estarán destinados única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del presente contrato.

INFORMES DE SEGUIMIENTO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Los informes del contratista respecto del contrato celebrado entre el Departamento del Putumayo, en cumplimiento del mismo deberán contener como mínimo los aspectos mencionados a continuación:

INFORME EJECUTIVO: Relacionar las acciones adelantadas para el desarrollo de la actividad del proyecto, cuya actividad es el **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL**

EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

- Dar crédito correspondiente a la Gobernación del Putumayo, como entidad participe en el desarrollo del objeto del contrato, y divulgar, a través de medios idóneos del área de influencia del proyecto, el interés de esta entidad en el desarrollo de la región y especialmente en el bienestar de la comunidad.
- Presentar el informe final de actividades dando cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en cumplimiento del objeto del presente contrato, remitiendo junto con el informe final, fotocopia de los documentos de índole legal y técnico que justifiquen la inversión a la Secretaría de Infraestructura Departamental para proyectar el Acta de recibo final de liquidación del Contrato en conjunto. Así mismo deberá allegar Fotocopia del Extracto bancario del movimiento de la cuenta corriente o de ahorro bancaria donde se efectúa el desembolso formarán parte integral del informe que se obliga a presentar a la Secretaría de Infraestructura Departamental y dichos movimientos deberán estar legalmente soportados.
- Efectuar el objetivo descrito del contrato conforme las consideraciones establecidas en los estudios de conveniencia y oportunidad.
- En el caso de no ejecutarse el proyecto, el contratista deberá restituir de forma inmediata en su integridad a la Gobernación del Putumayo, las sumas aportadas por esta última como contrapartida contemplada en el proyecto, más los intereses generados, de ser el caso.

11.- Las transferencias que el contratista reciba del Departamento del Putumayo se ejecutarán bajo su responsabilidad y estarán destinados única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del presente contrato.
12.- Las demás que se concreten por mutuo acuerdo entre las partes durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA CUARTA. - COMPROMISOS CONJUNTOS DE LAS PARTES:

- Responder por las actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo
- Colaborar recíprocamente para el normal desarrollo del contrato y del proyecto que constituye su objeto.
- Realizar su aporte en la forma y oportunidad convenidas en el contrato, siempre que se hubieren satisfecho los requisitos previstos en él para ello.
- Coordinar la elaboración conjunta de un Plan Operativo y de Inversión para la ejecución de las actividades del contrato.
- Supervisar y controlar periódicamente la ejecución del contrato.
- Concurrir a la liquidación final del Contrato, una vez cumplido el objeto del mismo.
- Aportar la información técnica disponible y la experiencia institucional requeridas para el desarrollo del objeto del contrato.
- Las demás acordadas expresamente por las partes.

CLÁUSULA QUINTA: ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO: EL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS DEL MUNICIPIO DE MOCOA, será el ejecutor del proyecto y de los recursos aportados por el Departamento del Putumayo en cumplimiento del proyecto que constituye el objeto del contrato. De la misma forma se obliga a cumplir las actividades de acuerdo al plan de inversión:

Los demás detalles del presente proceso de contratación se encuentran incluidos en el banco de proyectos bajo el número BPIN 2024006860112 y los demás documentos del proceso.

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-129
	DOCUMENTO ADICIONAL	VERSION: 01
		FECHA: 20/11/2015

CLÁUSULA SEXTA: VALOR Y CLASE DE APORTES. - El valor del presente Contrato para todos los efectos legales y fiscales, se fija así: **TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($311.762.642,00)**, de los cuales la Gobernación del Putumayo aportará al proyecto **" "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($241.329.386,00)**, los cuales serán destinados a la obra.

OBJETO: " MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMEN DEL PUTUMAYO (OBRA)"
FUENTE: ICLD
REGISTRO BPIN: N° 2024006860112

Identificación Presupuestal	CONCEPTO	VALOR
0301-0.2.3.04.24.02.041.9.2.3.2.01.01.001.03.02-1002	Autopista, carreteras, calles	**$241.329.386,00**

No. de CDP	4671	F/Expedición	23/09/2024	Vigencia	22/12/2024

Que el contratista, realiza una contribución al presente contrato por un valor de **SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($70.433.255)** equivalente a mano de obra no calificada

CLAUSULA SÉPTIMA: RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO. - La Gobernación del Putumayo cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar, de conformidad con lo siguiente:

OBJETO: " MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMEN DEL PUTUMAYO (OBRA)"
FUENTE: ICLD
REGISTRO BPIN: N° 2024006860112

Identificación Presupuestal	CONCEPTO	VALOR
0301-0.2.3.04.24.02.041.9.2.3.2.01.01.001.03.02-1002	Autopista, carreteras, calles	**$241.329.386,00**

No. de CDP	4671	F/Expedición	23/09/2024	Vigencia	22/12/2024

No obstante, lo anterior, el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expedido por el Profesional especializado de la Oficina de Presupuesto Departamental.

CLÁUSULA OCTAVA - FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES:

El aporte que realizará el **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($241.329.386,00),** de los cuales será destinado a la obra, el cual será transferido por el Departamento del Putumayo, de la siguiente manera:

ANTICIPO: La Entidad entregará en calidad de anticipo, un 50% del valor total del aporte del Departamento en el contrato, previo perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de legalización y de ejecución del contrato, así como firma del acta de inicio por parte del Representante del Consejo Comunitario, el supervisor designado y el interventor contratado. Para lo anterior se deberá anexar copia del contrato, documentos soporte legalización, fotocopia del RUT, documento de identificación del Representante legal del consejo comunitario plan de inversión del anticipo aprobado por la supervisión e interventoría y certificación bancaria de cuenta de ahorros conjunta que se apertura a nombre de contrato para el manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo, recursos que únicamente podrán ser retirados por autorización del supervisor e interventor designados. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados pertenecerán al tesoro departamental-siendo, por ello consignados a favor del Departamento y de tal evento se deberá dejar constancia en el acta de liquidación. El valor del anticipo, será amortizado de acuerdo con lo establecido para el manejo de estos recursos y según las cantidades de obra ejecutadas, amortizándose de manera gradual en las actas parciales de ejecución por el 50% del valor que se pretende cobrar en cada acta hasta cubrir el monto total desembolsado a título de anticipo.

Hasta el 90% del valor total del contrato en actas parciales de obra, siempre y cuando el porcentaje de ejecución física sea igual al 90% del valor aportado por el Departamento.

PAGO FINAL: El 10% del valor total del aporte del Departamento en el contrato a título de pago final, el cual se realizará la terminación del plazo de ejecución previa amortización del 100% del anticipo desembolsado, así como aprobación y recibo final de la Obra, realizado por el interventor y el supervisor del contrato y presentación de soportes pertinentes para la liquidación (Anexando todos los soportes que demuestren la inversión), todo ello previo a la suscripción del acta de liquidación. Este pago se hará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que el consejo comunitario haya presentado y radicado el informe final de ejecución total de la obra por parte de la interventoría y certificación del cumplimiento del 100% del objeto del contrato expedida por el supervisor del mismo. El acta de liquidación será suscrita por el Representante Legal del Consejo comunitario, la supervisión del contrato, el interventor y el ordenador del gasto del Departamento del Putumayo.

DEL DERECHO DE TURNO. Según lo señalado en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007, la Entidad respetara el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la Entidad.

PARÁGRAFO 2: INFORMES FINAL CONTENIDO: El informe final de ejecución que se obliga a presentar el Consejo Comunitario la Acacias al Departamento al finalizar el plazo del contrato o sus actividades, deberá

contener la relación de contratos que requiera suscribir el Consejo comunitario o para la ejecución del contrato que soporta la inversión de los recursos aportados y del valor total del contrato, con los debidos soportes, facturas y demás.

El informe contendrá un balance de inversión de los recursos en los que se aprecie los gastos efectuados en la ejecución del proyecto que constituye el objeto del contrato con los respectivos recibos y/o notas debito que recaen sobre la cuenta de ahorros que apertura el Consejo comunitario para el manejo de recursos.

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DEL CONTRATO: Se estima que la actividad objeto de la necesidad del contrato se desarrollará en un plazo de **TRES (03) MESES** que se contará a partir de que perfeccione y se suscriba el acta de inicio por las partes y el supervisor del contrato.

CLÁUSULA DECIMA. – GARANTÍAS: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo del Decreto 1088 de 1993, adicionado por el artículo 1, Decreto No. 252 del 21 de febrero de 2020, el cual señala lo siguiente:

"Para la ejecución contractual, la entidad estatal deberá exigir la constitución de una garantía única que consistirá en una póliza de seguros que cubrirá suficientemente los riesgos del contrato o contrato"

Dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato, el contratista presentara a la entidad una póliza de garantía única, la cual debe ser suficiente de acuerdo a las distintas clases de obligaciones amparadas. Los riesgos que deben cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar así:

Clase de amparo	Valor asegurado	Vigencia del amparo
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, o el pago de multas y demás sanciones que se deriven de su incumplimiento	10% del valor del contrato	Plazo del contrato hasta la liquidación del contrato.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100% del valor entregado como anticipo	Hasta la liquidación del contrato
Responsabilidad extracontractual	200 SMLMV para manera general, pero debe tener en cuenta la tabla del decreto No. 1510 del 2013, según la cuantía del contrato.	Plazo del contrato
Garantía de salarios prestaciones sociales	5% del valor del contrato Si para la ejecución del contrato requiere personal	Plazo del contrato Tres años más
Estabilidad y calidad de la obra	10% del valor del contrato	Equivalente al 10% del valor del contrato, estará vigente a partir del momento del recibo de la obra a satisfacción por parte del Departamento del Putumayo por el término de dos años.
Calidad del servicio	10% del valor del contrato	Plazo del contrato hasta la liquidación del contrato.

Los porcentajes y vigencias de los anteriores amparos están encaminados a garantizar los siguientes riesgos:

- Que la persona jurídica responsable de la ejecución del contrato no pueda dar cumplimiento total o parcial a sus compromisos pactados en el contrato o que no cumpla dentro del plazo de ejecución pactado.

- Que la persona jurídica no invierta ni ejecute correctamente la suma de dinero entregada por las demás partes en calidad de anticipo.

- La persona jurídica responsable de la ejecución del contrato deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros.

- De igual manera en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía.

Se recomienda a la entidad ejecutora al momento de invertir y ejecutar los aportes del Departamento, exigir al contratista que le suministren bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del proyecto, la constitución de las garantías necesarias que amparen los riesgos en las contrataciones y así garantizar el cumplimiento del contrato y proteger los recursos aportados al contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO. - Cualquier prórroga, adición o modificación al presente contrato deberá hacerse por escrito ante la Secretaria de Infraestructura Departamental para su estudio y aprobación; Si se trata de prórroga o incremento en su valor se hará mediante contrato adicional.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN: El contrato podrá terminarse por vencimiento del plazo; por incumplimiento de las actividades a cargo de alguna de las partes; por mutuo acuerdo de las partes.

De acuerdo a la normatividad vigente, Articulo 11 Ley 1150 de 2007, se realizará la liquidación del contrato de común acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo fijado para su ejecución. En aquellos casos en que el beneficiario no se presente a la liquidación previa, notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el C.C.A o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: COMPROMISORIA: Las partes acuerdan que en la eventualidad del surgimiento de discrepancias o diferencias por razón o con ocasión del desarrollo del presente contrato, buscarán la solución en forma directa mediante Conciliación o Transacción, para lo cual se conceden mutuamente un plazo de diez (10) días a partir de la notificación que una de las partes le haga a la otra. Si en dicho término no fuere posible acordar fórmulas de arreglo en forma total o parcial, someterán sus diferencias a la amigable composición ante autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente sobre la materia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RÉGIMEN APLICABLE: El régimen aplicable a los actos o contratos que realice el Municipio, en desarrollo de este contrato se sujetará a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios y demás normas que regulan la materia por tratarse de entidades públicas del orden territorial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN: EL CONSEJO COMUNITARIO, no podrá ceder parcial ni totalmente el presente contrato sin previa autorización por escrito del Departamento del Putumayo.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEMNIDAD: **EL CONSEJO COMUNITARIO**, en virtud de la autonomía que le asiste para la ejecución de las actividades pactadas, asume de forma total y exclusiva la responsabilidad que se derive por la calidad e idoneidad de los servicios prestados al Departamento del Putumayo- Secretaría de Infraestructura Departamental, así como la responsabilidad por los perjuicios que puedan derivarse de sus acciones u omisiones.

El **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS,** se obliga a mantener indemne al Departamento del Putumayo contra todo reclamo, requerimiento, demanda, acción legal, que pueda causarse o surgir por daños y lesiones a personas o propiedades o terceros, ocasionados por el **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**, durante la ejecución de las actividades del objeto del contrato y hasta la liquidación definitiva del mismo. **EL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**, será responsable ante la entidad por todos los daños causados a las propiedades e instalaciones de la entidad ya sea por su culpa, por el personal a sus servicios, de sus subcontratistas o de sus proveedores y reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos a satisfacción del Departamento del Putumayo.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Toda vez que **EL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS,** ejecutará el objeto del presente contrato con autonomía técnica y sin subordinación con respecto al Departamento del Putumayo, queda entendido que no habrá lugar a vínculo laboral alguno entre el Departamento del Putumayo y **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS.**

CLÁUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA: RÉGIMEN LEGAL: El presente contrato estará sometido en todo a la Ley Colombiana, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y se rige por las disposiciones civiles o comerciales pertinentes, salvo las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen, reglamenten o adicionen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO: Conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, este contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y para su ejecución requiere la expedición del correspondiente registro presupuestal de compromiso. Los gastos que se generen como consecuencia de la legalización de este contrato no son imputables al mismo y corren por cuenta de la **EL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS.**

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los fines contractuales se establece como domicilio el Municipio de San Miguel Agreda de Mocoa – Departamento del Putumayo.

CLÁUSULA VIGÉSIMATERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Harán parte integral del contrato los siguientes documentos: Estudio previo, sub-proyecto registrado en Banco de Proyectos, CDP, invitación a presentar propuesta, propuesta presentada con sus anexos, acta de verificación, registro presupuestal y todo documento que se genere con la ejecución del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia

de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado la siguiente opción: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría General de la Nación, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría General de la Nación, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, se podrá acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS EFECTOS: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por la Gobernación del Putumayo cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente contrato, conforme a la normatividad vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, El Departamento del Putumayo puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: Multas diarias y sucesivas a razón del uno por ciento (1x100) del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra entre el incumplimiento de la obligación y hasta cuando esta efectivamente se cumpla, y sin que el valor total de las multas pueda sobrepasar el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-020
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/07/2015

CONTRATO No. 1071 DEL 18/07/2025

Clase de contrato	INTERVENTORÍA
Contratista	DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
Objeto	"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)".
F/suscripción	18/07/2025
Fecha de R.P.	18/07/2025
Fecha de aprobación de póliza	24/07/2025
Plazo inicial	Tres (03) meses
Fecha de inicio	27/10/2025
F/terminación plazo del convenio	26/01/2026

En las instalaciones de la Secretaría de infraestructura Departamental del Putumayo se reunieron: VIRGILIO BRAVO SOSA, en su calidad de Secretario de infraestructura Departamental y el señor NILSON MOYA MENA, identificado con C.C No. 4.800.171 de Bojayá (B) en calidad de Representante legal del Consejo Comunitario las Acacias con NIT 800.094.164-4, y el señor DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO identificado con C.C. No. 1.113.304.913 de Sevilla (V) en calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato en mención, previo las siguientes consideraciones.

1. Que, según el contrato de obra de la referencia, su plazo se pactó por el término de tres (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2. Que a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de interventoría No. 1071 del 18/07/2025, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:

1. Dar inicio a la ejecución del contrato de interventoría No. 1071 del 18 de julio de 2025, a partir del día veinte siete (27) días de octubre de 2025.
2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el veinte seis (26) días de enero (01) de 2026.
3. El interventor se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio.

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-020
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/07/2015

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los 27 días del mes de octubre de 2025.

Por la Gobernación del Putumayo	Por la Interventoría
VIRGILIO BRAVO SOSA	**DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO**
Secretario de Infraestructura Departamental Gobernación del Putumayo	Contratista de Interventoría C.C. No. 1.113.304.913 de Sevilla (V)

Elaboró	Karoll Daniela Lasso	Secretaria de infraestructura Departamental	Profesional de apoyo

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.4 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

NIT. 800.094.164-4	GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL ANEXO EQUIPO DE OBRA	CÓDIGO	FT-SID-007		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 26 nov 2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

INTERVENTOR: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES 1 **CONTRATO No.** 1943-2024 DEL 11 de OCTUBRE DE 2024 **MUNICIPIO** CORREGIMIENTO DE PUERTO LIMO, MUNICIPIO DE MOCOA

CONTRATISTA CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA

DIA / MAQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Herramienta menor	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
pulidora		A	A					A	A				A	A				A			A	A				A	A	A			
concretadora tipo trompo																						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
vibrador de concreto																						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bomba de fumigar																						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES
ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I

Firma
Nombre: NILSON MOYA MENA
REPRESENTANTE LEGAL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

Firma
Nombre: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
Director de Interventoría
Matrícula No. 63202-220004 QND

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.5 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

NIT. 800.094.164-4	GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	CÓDIGO	FT-SID-007		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1
		FECHA	26	NOV	2025

OBJETO "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

INTERVENTOR: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES 1 **CONTRATO No.** 1943-2024 DEL 11 de OCTUBRE DE 2024 **MUNICIPIO** MOCOA, INSPECCION DE PUERTO LIMON **PERIODO:** 27/OCTUBRE/2025 AL 26/NOVIEMBRE/2025

CONTRATISTA CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CORTEZ CABEZAS JOSE JUANITO	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RODRIGUE NARVAEZ ERIRA YANIRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ALVARO MILTON MONTENEGRO MATINEZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CORTEZ CABEZAS JOSE JUANITO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ENRIQUEZ PANTOJA LUIS ALVARO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VALENCIA MEZA SANDRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ENRIQUE PANTOJA VICTOR HUGO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
ORTEGA LOPEZ MARCO ANTONIO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
RIVERA QUISTIAL HOVER DANIEL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
VALENCIA MEZA SANDRO JULIO																														

Firma: Nilson Moya
Nombre: NILSON MOYA MENA
REPRESENTANTE LEGAL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

Firma:
Nombre: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
Director de interventoría
Matricula No.: 63202-220004 CND

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.6 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

NIT. 800.094.109-4	GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL INFORME FINANCIERO DE LA OBRA	CODIGO			
		VERSIÓN			
		PAGINA	1	DE	1
		FECHA			

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL — GOBERNACIÓN: PUTUMAYO

CONTRATO No: 1943-2024 DEL 11 de OCTUBRE DE 2024 — CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS — MES: 1

SECTOR: MOCOA, INSPECCION DE PUERTO LIMON

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Acta No	Mes/ Año	Valor Directo	Valor Indirecto	Valor Total	Amortización Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	Observaciones
CONTRATO INICIAL		$ 205,536,503.50	$ 35,792,883.50	$ 241,329,387.00	$ -	$ -	$ 241,329,387.00	$0	$ 241,329,387.00	
TOTALES		$0.0	$0	$0.00						

Nota: Los valores se deben expresar en millones de pesos

Firma: Nilson Moya

NOMBRE: NILSON MOYA MEÑA

REPRESENTANTE LEGAL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

Firma

NOMBRE: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

Contratista de Interventoría

Matrícula No.: 63202-220004 QND

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

NIT. 800.094.164-4	GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL ANEXO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CODIGO	T-SID-C07		
		VERSIÓN	1		
		FECHA	1	DE	1

FECHA 26 NOV 2025

OBJETO "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL A EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"

INTERVENTOR DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO MES 1

CONTRATO No: 1943-2024 DEL 11 de OCTUBRE DE 2024 CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS MUNICIPIO: MOCOA, INSPECCION DE PUERTO LIMON

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Clase de tiempo																											X			X	
Seco	X		X	X		X			X			X				X															
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas					X					X			X				X	X	X	X			X		X	X			X		X

Firma: NILSON MOYA MINA
Nombre: NILSON MOYA MINA
REPRESENTANTE LEGAL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

Firma:
Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 63202-220004 CND

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.8 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATISTA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

PUTUMAYO
GOBERNACIÓN

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO



1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 10 | 2025

A. DATOS GENERALES

2. Contrato No:	1043	**3. FECHA CONTRATO:**	11	Octubre	2024	**4. VALOR CONTRATO:**	$	241.329.386,00

5. FECHA ACTA INICIO:	27 | 10 | 2025	**6. FECHA DE TERMINACIÓN:**	26 | 1 | 2026	**7. PLAZO EJEC. (MESES):**	3

8. CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
9. CONTRATISTA:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS NIT: 900.094.164-4 R/L NILSON MOYA MENA

10. CTO INTERVENTORIA No:	1071	**11. DEL AÑO:**	2025	**12. PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES):**	3	**13. VALOR CONTRATO:**	$ 25.222.194,00

14. OBJETO DEL CONVENIO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

15. VALOR ANTICIPO:	$ 120.664.693,00	**16. PORCENTAJE ANTICIPO:**	50%

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

17. ITEM	18. DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
1	COSTOS DE PERSONAL (NOMINA)	$ 0,0	0%
2	MATERIALES E INSUMOS	$ 60.332.346,5	50%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 48.265.877,2	40%
4	EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ 12.066.469,3	10%
5	ADMINISTRACIÓN	$ 0,0	0%
TOTAL		$ 120.664.693,00	100,00%

NOTA: *Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo.*

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Mocoa (Putumayo), a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025.

ELABORADO POR:

Nilson moya

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 900.094.164-4
NILSON MOYA MENA
C.C. No. 4.800.171 de Bojayá (B)

APROBADO POR:

DAVID ANDRES ERCISO PARANGO
C.C No.1.113.304.213 de Sevilla (V)
Contrato de Interventoría. 1071-2025

APROBADO POR:

ING. VIRGILIO BRAVO SOSA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

NIT: 9010424220-9

RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

DOCUMENTO EJECUTIVO DE ENTREGA DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

1. RESUMEN FINANCIERO DEL ANTICIPO

El Plan de Inversión del Anticipo está diseñado para garantizar la liquidez necesaria para la adquisición de materiales base y la movilización de equipos y personal, que son críticos para la fase inicial del proyecto.

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO	**$ 241.329.386,00**	100%
VALOR DEL ANTICIPO	**$ 120.664.693,00**	**50%**

2. DESGLOSE DEL PLAN DE INVERSIÓN

El 50% del anticipo se distribuirá en las siguientes categorías, priorizando la ejecución efectiva de las actividades del primer mes de acuerdo con el cronograma de ejecución (Desglose de Anticipo):

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A INVERTIR	PORCENTAJE DEL ANTICIPO
1	**MATERIALES E INSUMOS**	$ 60.332.346,5	50%
2	**TRANSPORTE DE MATERIALES**	$ 48.265.877,2	40%
3	**EQUIPOS Y MAQUINARIA**	$ 12.066.469,3	10%
TOTAL, INVERSIÓN		**$ 120.664.693,00**	**100%**

Nota: El rubro de Costos de Personal (Nómina) no tiene asignación directa del anticipo, asumiéndose que se pagará con la ejecución de las actas de obra.

3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (Detalle Semanal)

El Desglose de Anticipo detalla la ejecución de obra por valor acumulado, evidenciando una rápida inversión de los recursos en las primeras semanas para adquirir materiales y asegurar la estructura del pavimento rígido.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

NIT: 9010424220-9

RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

MES	SEMANA	VALOR ACUMULADO DE OBRA	PRINCIPALES ACTIVIDADES CUBIERTAS
MES 1	Semanas 1 y 2	$ 8.926.786,00	Localización y Replanteo, Excavación, Adquisición de Subbase y Geotextil.
	Semana 3	$ 15.579.711,00	Continuación de Subbase, Instalación de Geotextil, Bordillos.
	Semana 4	$ 28.785.630,00	Pavimento en Concreto Hidráulico (Inicio de vaciado).
MES 2	Semana 7	$ 84.202.331,00	Mayor ejecución de Concreto Hidráulico y Andenes.
MES 3	Semana 9	**$ 120.664.693,00**	Finalización y Sellado de Juntas, Señalización,

4. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

La ejecución del presente PIA estará sujeta a las siguientes medidas:

- **Cuenta Única:** Los recursos serán manejados en una cuenta bancaria exclusiva para el proyecto.
- **Amortización:** La amortización del anticipo se realizará de forma lineal y proporcional en cada acta de recibo parcial de obra, hasta su total cubrimiento.
- **Soporte Documental:** Todos los egresos serán respaldados por facturas, órdenes de compra y recibos de pago con el visto bueno de la Interventoría, garantizando la trazabilidad de cada peso invertido.

PARA CONSTANCIA Y ENTREGA FORMAL

El presente documento ejecutivo se presenta para la aprobación y conocimiento de las partes.

Nilson moya

NILSON MOYA MENA
Representante Legal
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO



No	DESCRIPCION		MES PROCESO CONTRACTUAL	MES 1				MES 2				MES 3
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO											
1,1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	$ 3.100.000,00		X $ 1.860.000,00	X $ 1.860.000,00							
1,2	Excavación en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	$ 13.853.570,00			X $ 3.413.393,00	X $ 3.413.393,00	X $ 3.413.393,00	X $ 3.413.393,00			X $ 24.963.933,00	X $ 28.030.209,00
1,3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3,8)	$ 99.855.731,00					X $ 802.930,00	X $ 802.930,00	X $ 802.930,00	X $ 802.930,00		
1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	$ 1.211.720,00						X $ 3.556.897,00	X $ 3.556.897,00	X $ 3.556.897,00	X $ 3.556.897,00	
1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	$ 14.226.786,30						X $ 2.063.588,00	X $ 2.063.588,00	X $ 2.063.588,00		X $ 1.183.315,00
1,6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 u	$ 9.254.360,00					X $ 2.961.568,00				X $ 194.844,00	X $ 269.792,00
1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	$ 1.369.945,00								X $ 927.605,00	X $ 927.605,00	X $ 1.256.887,99
1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	$ 779.377,00								X $ 936.820,00	X $ 936.820,00	X $ 1.249.093,33
1,9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	$ 3.710.420,00								X $ 195.514,00	X $ 195.514,00	X $ 260.686,00
1,10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi), Transversal	$ 3.747.260,00										X $ 263.036,67
1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi), Longitudinal	$ 782.057,00										
1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	$ 1.211.585,00										
2	ANDENES						X $ 373.014,00	X $ 373.014,00	X $ 373.014,00	X $ 373.014,00		
2,1	Excavacion en material comun en seco a mano (incluye retiro)	$ 1.492.056,00						X $ 1.566.754,00	X $ 1.566.754,00	X $ 1.566.754,00	X $ 1.566.754,00	X $ 3.556.123,89
2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	$ 8.323.016,00										
2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	$ 14.226.880,00						X $ 1.413.343,00	X $ 1.413.343,00	X $ 1.413.343,00	X $ 1.413.343,00	
2,4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	$ 5.892.170,00										
3	SEÑALIZACION											
3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y	$ 1.507.812,00										
3,2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	$ 2.413.471,00										
3,3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye	$ 356.476,00										
3,4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	$ 18.100.800,00										
3,5	Suministro e instalacion de tachas	$ 602.356,00										
	COSTO DIRECTO OBRA	$ 205.576.583,00	Total acumulado	1.860.000,00	6.983.393,00	3.413.393,00	6.662.925,00	13.205.915,00	9.792.520,00	11.063.4[illegible],00	30.371.741,00	36.462.352,00
	COSTOS INDIRECTOS OBRA	$ 70.546.128,00	Valor acumulado obra	1.860.000,00	8.843.393,00	12.256.786,00	18.919.711,00	32.125.626,00	41.918.146,00	[illegible]	84.262.331,00	120.084.683,00

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 900.094.164-4
NILSON MOYA MERA
C.C. No. 4.900.171 de Sibundoy (P)

DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
C.C No 1.113.304.[illegible] de Sevilla (V)
Contrato de Interventoria 1371-2025

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.9 INFORMACION RELACIONADA CON EL RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

ANEXO:
LABORATORIOS

	METODO DE ENSAYO ESTANDAR PARA DETERMINAR LA RELACIÓN HUMEDAD-DENSIDAD DE SUELOS Y ME2CLAS DE SUELO-AGREGADO	PROCESO	GESTIÓN DE LABORATORIO
		FECHA VERSIÓN	01/02/2022
		VERSIÓN	02
		PAGINA	1 DE 1

OBRA / PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

SOLICITANTE:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT:	901.042.420
REFERENCIA:	COP-1943-2024	LABORATORISTA:	Ing. Carlos Sanchez
MATERIAL:	Subbase granular	FECHA DE ENSAYO:	20/11/2025
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E 142-13	METODO:	C - Humedo

Molde No.	2.00	2.00	2.00	2.00
Diametro del molde (cm)	15.24	15.24	15.24	15.24
Altura del molde (cm)	11.65	11.65	11.65	11.65
Volumen del molde (cm)	2125.14	2125.14	2125.14	2125.14
Peso suelo humedo + molde (gr)	10085.00	10302.00	10392.00	10332.00
Peso molde (gr)	5730.0	5730.0	5730.0	5730.0
Peso suelo humedo (gr)	4355.00	4572.00	4662.00	4602.00
Densidad humeda (gr/cm3)	2.05	2.15	2.19	2.17
Recipiente No.	G1	G2	G3	G4
Peso S. Huedo + Recipiente (gr)	300.20	311.40	309.9	324.5
Peso S. Seco + Recipiente (gr)	291.01	296.75	290.68	298.31
Peso recipiente (gr)	4.00	4.00	4.00	4.00
Peso del agua (gr)	9.19	14.65	19.22	26.19
Peso S. Seco (gr)	287.01	292.75	286.68	294.31
Humedad (%)	3.20	5.00	6.70	8.90
Densidad humedad (gr/cm3)	2.05	2.15	2.19	2.17
Densidad seca (gr/cm3)	1.99	2.05	2.06	1.99



DATOS DEL ENSAYO	
Volumen del molde (gr/cm3):	2125.14
Tipo de martillo:	Manual
Número de capas:	5
# de golpes por capa:	56
Metodo de compactación:	C
Metodo de preparación:	Humedo

RESULTADOS	
RESULTADO DE COMPACTACION	
Densidad seca max. (gr/cm3)	2.06
Humedad óptima (%)	6.1
Humedad óptima corregida(%)	5.8

OBSERVACIONES:

GEOTEK SAS.
Laboratorio de Suelos
TOPOGRAFÍA
Nit. 900940486 - 3

Laboratorista
Ing. Carlos Sanchez
MP. 091037-0678463 CNDB

	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	PROCESO	GESTIÓN DE LABORATORIO
		FECHA VERSIÓN	01/02/2022
		VERSIÓN	02
		PAGINA	1 DE 1

CLIENTE:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	CONTRATO No.	COP-1943-2024
OBRA / PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.		
IDENTIFICACION/MUESTRA:	Subbase Granular	FECHA DE TOMA	22/11/2025
METODO:	Cono y Arena	FECHA DE INFORME	22/11/2025
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E-161-13		

I.- UBICACIÓN y/o PRUEBA	
Ubicación de la muestra	Abscisa K0+007
Fecha de compactación	21-11-25
Capa	1
Margen	Izquierdo
Número de Prueba	01





II.- DATOS DE CAMPO		
P. INICIAL ARENA + FRASCO (Wo)	5900.5	gr.
P. FINAL ARENA + FRASCO (Wf)	2873.2	gr.
P. ARENA TOTAL UTILIZADA	3027.3	gr
CONSTANTE DEL CONO	1429.6	gr
P. ARENA EN EL HOYO	1597.7	gr
DENSIDAD DE LA ARENA	1.416	gr/cm3
VOLUMEN HUECO (V)	1128.32	cm3
P. TOTAL HUMEDO(Wm)	2668.4	gr.
P. RECIPIENTE (t)	5	gr.
P. SUELO HUMEDO (Wh)	2663.4	gr.
DENS. SUELO HUMEDO (γh)	2.361	gr/cm3

III.- DATOS DE LABORATORIO		
P. TOTAL HÚMEDO (Wh)	296.5	gr.
P. TOTAL SECO (Ws)	277.6	gr.
P. RECIPIENTE (t) (Capsula)	0.00	gr.
P. AGUA (Ww)	18.9	gr.
P. SUELO SECO (Ws)	277.6	gr.
% HUMEDAD SUELO (%w)	6.81	%
% HUMEDAD SUELO CORREGIDO (%cw)	11.50	%

DENS. SUELO SECO (γd)	2.210	gr/cm3
DENS. SUELO SECO (γd) Corregido	1.983	gr/cm3
DENS. MAX. PROCTOR (γdmax)	2.060	gr/cm3
% HUMEDAD SUELO - LABORATORIO (%	5.80	%
PORCENTAJE EXIGIDO	95	%
PORCENTAJE ALCANZADO	96.26	%
CUMPLE	SI	

OBSERVACIONES:

1.- Pruebas de identificación realizado por el personal de laboratorio.

2.- Se realizo correccion por sobretamaño.

GEOTEK SAS
Laboratorio de Suelos
TOPOGRAFÍA
Nit 900943486-1

Laboratorista
Carlos Sanchez
Ing. Civil. MP. 091037-0678463 CNDB

	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	PROCESO	GESTIÓN DE LABORATORIO
		FECHA VERSIÓN	01/02/2022
		VERSIÓN	02
		PAGINA	1 DE 1

CLIENTE:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	**CONTRATO No.**	COP-1943-2024
OBRA / PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.		
IDENTIFICACION/MUESTRA:	Subbase Granular	**FECHA DE TOMA**	22/11/2025
METODO:	Cono y Arena	**FECHA DE INFORME**	22/11/2025
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E-161-13		

I.- UBICACIÓN y/o PRUEBA	
Ubicación de la muestra	Abscisa K0+030
Fecha de compactación	21-11-25
Capa	1
Margen	Derecho
Numero de Prueba	02





II.- DATOS DE CAMPO		
P. INICIAL ARENA + FRASCO (Wo)	5762.1	gr.
P. FINAL ARENA + FRASCO (Wf)	2831.8	gr.
P. ARENA TOTAL UTILIZADA	2930.3	gr
CONSTANTE DEL CONO	1429.6	gr
P. ARENA EN EL HOYO	1500.7	gr
DENSIDAD DE LA ARENA	1.416	gr/cm3
VOLUMEN HUECO (v)	1059.82	cm3
P. TOTAL HUMEDO(Wth)	2300.5	gr.
P. RECIPIENTE (t)	5	gr.
P. SUELO HUMEDO (Wt)	2295.5	gr.
DENS. SUELO HUMEDO (yh)	2.166	gr/cm3

III.- DATOS DE LABORATORIO		
P. TOTAL HUMEDO (Wth)	297.7	gr.
P. TOTAL SECO (Wts)	284.1	gr.
P. RECIPIENTE (t) (Capsula)	0.00	gr.
P. AGUA (Ww)	13.6	gr.
P. SUELO SECO (Ws)	284.1	gr.
% HUMEDAD SUELO (%w)	4.79	%
% HUMEDAD SUELO CORREGIDO (%cw)	8.70	%

DENS. SUELO SECO (yd)	2.067	gr/cm3
DENS. SUELO SECO (yd) Corregido	1.993	gr/cm3
DENS. MAX. PROCTOR (ydmax)	2.060	gr/cm3
% HUMEDAD SUELO - LABORATORIO (%	5.80	%
PORCENTAJE EXIGIDO	95	%
PORCENTAJE ALCANZADO	96.75	%
CUMPLE	SI	

OBSERVACIONES:

1.- Pruebas de identificación realizado por el personal de laboratorio.

2.- Se realizo correccion por sobretamaño.

GEOTEK-SAS
Laboratorio de Suelos
TOPOGRAFÍA
Nit. 900940486 - 3

Laboratorista
Carlos Sanchez
Ing. Civil. MP. 091037-0678463 CND6

Geotek	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	PROCESO	GESTIÓN DE LABORATORIO
		FECHA VERSIÓN	01/02/2022
		VERSIÓN	02
		PAGINA	1 DE 1

CLIENTE:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	CONTRATO No.	COP-1943-2024
OBRA / PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.		
IDENTIFICACION/MUESTRA:	Subbase Granular	FECHA DE TOMA	22/11/2025
METODO:	Cono y Arena	FECHA DE INFORME	22/11/2025
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E-161-13		

I.- UBICACIÓN y/o PRUEBA	
Ubicación de la muestra	Abscisa K0+073
Fecha de compactación	21-11-25
Capa	1
Margen	Izquierdo
Número de Prueba	03





II.- DATOS DE CAMPO		
P. INICIAL ARENA + FRASCO (Wo)	5656.7	gr.
P. FINAL ARENA + FRASCO (Wf)	2528.6	gr.
P. ARENA TOTAL UTILIZADA	3128.1	gr
CONSTANTE DEL CONO	1429.6	gr
P. ARENA EN EL HOYO	1698.5	gr
DENSIDAD DE LA ARENA	1.416	gr/cm3
VOLUMEN HUECO (V)	1199.51	cm3
P. TOTAL HUMEDO(Wth)	2753.6	gr.
P. RECIPIENTE (t)	5	gr.
P. SUELO HÚMEDO (Wh)	2748.6	gr.
DENS. SUELO HUMEDO (yt)	2.291	gr/cm3

III.- DATOS DE LABORATORIO		
P. TOTAL HÚMEDO (Wth)	403.2	gr.
P. TOTAL SECO (Wts)	380.5	gr.
P. RECIPIENTE (t) (Capsula)	0.00	gr.
P. AGUA (Ww)	22.7	gr.
P. SUELO SECO (Ws)	380.5	gr.
% HUMEDAD SUELO (%w)	5.97	%
% HUMEDAD SUELO CORREGIDO (%cw)	7.40	%

DENS. SUELO SECO (yd)	2.162	gr/cm3
DENS. SUELO SECO (yd) Corregido	2.071	gr/cm3
DENS. MAX. PROCTOR (ydmax)	2.060	gr/cm3
% HUMEDAD SUELO - LABORATORIO (%w	5.80	%
PORCENTAJE EXIGIDO	95	%
PORCENTAJE ALCANZADO	100.53	%
CUMPLE	SI	

OBSERVACIONES:

1.- Pruebas de identificación realizado por el personal de laboratorio.

2.- Se realizo correccion por sobretamaño.

GEOIEK SAS
Laboratorio de Suelos
TOPOGRAFÍA
Nit. 900940486 - 3

Laboratorista
Carlos Sanchez
Ing. Civil. MP. 091037-067846 3 CND

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO
F'C 175 y 210 kg/cm²

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.



PRENSA HIDRÁULICA DE 80 TON

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
CONTRATANTE

WALTER H CORTES O
ELABORO DISEÑO

MOCOA NOVIEMBRE DE 2025

DISEÑO DE CONCRETO HIDRÁULICO

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

GENERALIDADES

En la mezcla de concreto que a continuación se va a diseñar, se utilizará la combinación más apropiada entre los agregados disponibles, agua y cemento, utilizando la mínima cantidad de pasta por unidad de volumen de concreto y que dé por resultado una mezcla que cumpla con los requisitos de manejabilidad, resistencia y durabilidad necesarias para la pavimentación.

Aunque el concreto es un material esencialmente heterogéneo, porque sus componentes tienen características que no son constantes. No son solos los materiales los causantes de las variaciones en la calidad del hormigón; también influye la forma de mezclarlo, su transporte y colocación en formaletas, la compactación a que se someta y el curado que se le proporcione.

Por las razones anteriores, es necesario tomar las precauciones adecuadas para que la calidad del material producido, sea aceptable. La medida final que informa sobre la calidad obtenida, es la que resulta de los ensayos de resistencia.

MATERIALES UTILIZADOS

CEMENTO PORTLAND TIPO I

Es de tipo portland estructural, el cual es destinado a obras de hormigón en general, al que se le exige propiedades especiales.

Para el presente diseño utilizaremos las siguientes propiedades físicas del cemento portland, como son la de peso específico y masa unitaria suelta.

AGREGADOS

Agregado grueso:
Proviene de la fuente del rio Caquetá, este material triturado, el cual se procesa en la inspección el tigre - municipio de Villagarzón. Su tamaño máximo es 1-1/2", el cual tiene las siguientes características físicas, tienen forma angular y de textura áspera.

Agregado Fino-mixto: Proviene de la misma fuente, su obtención se realiza de forma manual en la fuente su tamaño máximo de 3/4". Sus características físicas son: forma subangular y redondeada y de textura lisa.

Para el diseño de mezclas, se requieren las siguientes propiedades físicas del material como son: Granulometría, peso específico, tamaño máximo, tamaño máximo nominal, porcentaje de absorción, masa unitaria suelta, módulo de finura.

AGUA

El agua de mezcla cumple dos funciones muy importantes permitir la hidratación del cemento y hacer la mezcla manejable. De toda el agua que se emplea en la preparación del concreto, parte hidrata el cemento, el resto no presenta ninguna alteración y con el tiempo se evapora. De acuerdo con lo anterior como una regla práctica, se debe colocar la menor cantidad de agua en la mezcla, pero teniendo en cuenta que el hormigón quede trabajable.

Se considera que el agua es adecuada para producir hormigón si su composición química indica que es apta para el consumo humano, sin importar si ha tenido un tratamiento preliminar o no; es decir, casi cualquier agua natural que pueda beberse y que no tenga sabor u olor notable sirve para mezclar el concreto. Sin embargo, el agua que sirva para preparar estas mezclas, puede no servir para beberla.

DESARROLLO DISEÑO DE MEZCLA

DATOS DE LOS MATERIALES

AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (Rio Caquetá)

DENSIDAD APARENTE SECA	2.690 kg/dm³
TAMAÑO MÁXIMO	1-1/2" - pulgada
TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL	1" - pulgada
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN	1.04 %
MASA UNITARIA SUELTA	1.42 kg/dm³

AGREGADO FINO (Rio Caquetá)

DENSIDAD APARENTE SECA	2.554 kg/dm³
TAMAÑO MÁXIMO	1-1/2" - pulgada
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN	3.01 %
MASA UNITARIA SUELTA	1.50 kg/dm³

CEMENTO (USO GENERAL)

PESO ESPECÍFICO	3.03 kg/dm³
MASA UNITARIA SUELTA	1.21 kg/dm³

AGUA

PESO ESPECÍFICO	1.0 kg/dm³
MASA UNITARIA SUELTA	1.0 kg/dm³

DESARROLLO DISEÑO FC 210 Kg/cm²

Se realizó ajuste granulométrico con los siguientes resultados: Agregado grueso =40% y agregado fino- mixto = 60%. Se comparó con la curva ideal fuller.

- ASENTAMIENTO: se escogió una mezcla de consistencia semiseca, entre 5.0 y 10.0 centímetros.
- ESTIMACIÓN DEL AGUA DE LA MEZCLA: Se escogió 164 Kg. de agua por m^3 de concreto, con esta cantidad de agua se obtiene un asentamiento inferior a 10 centímetros, sin utilizar aditivos.
- COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL 5%, Porque ya se ha producido concreto en condiciones similares.
- RESISTENCIA DE DOSIFICACIÓN: Para el anterior coeficiente de variancia tenemos un F`cr = 260 kg/cm^2.
- SELECCIÓN AGUA CEMENTO: Por resistencia y durabilidad, según la recomendación de la norma NSR-10; para un valor de resistencia a la compresión de 260 kg/cm^2, se obtiene un valor de relación A/C = 0.50.

- CALCULO DEL CONTENIDO DE CEMENTO GENERAL:
  C = A/(A/C) = 185/0.50 = 370 Kg/m^3 de concreto.

- DATOS AGREGADOS:
  Volumen Absoluto Agregados = 1000- 185/1- 370.0/3.03= 737.1 dm^3.

  PESO ESPECIFICO PROMEDIO: 2.607 kg/dm^3.
  - Peso del agregado = 694.5 * 2.607= 1810.2 kg/de concreto
  - Peso del agregado fino =1810.2 * 0.60 =1086.1 kg
  - Peso del agregado grueso =1810.2 * 0.40 =724.1 kg

DESARROLLO DISEÑO FC 175 Kg/cm²

Se realizó ajuste granulométrico con los siguientes resultados: Agregado grueso =40% y agregado fino- mixto =60%. Se comparó con la curva ideal fuller.

- ASENTAMIENTO: se escogió una mezcla de consistencia semiseca, entre 5.0 y 10.0 centímetros.
- ESTIMACIÓN DEL AGUA DE LA MEZCLA: Se escogió 185 Kg. de agua por m³ de concreto, con esta cantidad de agua se obtiene un asentamiento inferior a 10 centímetros, sin utilizar aditivos.
- COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL 5%, Porque ya se ha producido concreto en condiciones similares.
- RESISTENCIA DE DOSIFICACIÓN: Para el anterior coeficiente de variancia tenemos un F`cr = 210 kg/cm².
- SELECCIÓN AGUA CEMENTO: Por resistencia y durabilidad, según la recomendación de la norma NSR-10; para un valor de resistencia a la compresión de 210 kg/cm², se obtiene un valor de relación A/C = 0.55.

- CALCULO DEL CONTENIDO DE CEMENTO GENERAL:
  C = A/(A/C) = 185/0.55 = 336.4 Kg/m³ de concreto.

- DATOS AGREGADOS:
  Volumen Absoluto Agregados = 1000- 185/1- 336.4/3.03= 705.4 dm³.

  PESO ESPECIFICO PROMEDIO: 2.607 kg/dm³.
  - Peso del agregado = 705.4 * 2.607= 1838.8 kg/de concreto
  - Peso del agregado fino =1838.8 * 0.60 =1103.3 kg
  - Peso del agregado grueso =1838.8 * 0.40 =735.5 kg

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO
F'C 280 kg/cm²

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPALAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO



CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
CONTRATANTE

WALTER H CORTES O
ELABORO DISEÑO

MOCOA NOVIEMBRE DE 2025

DISEÑO DE CONCRETO HIDRÁULICO

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPALAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

GENERALIDADES

En la mezcla de concreto que a continuación se va a diseñar, se utilizará la combinación más apropiada entre los agregados disponibles, agua y cemento, utilizando la mínima cantidad de pasta por unidad de volumen de concreto y que dé por resultado una mezcla que cumpla con los requisitos de manejabilidad, resistencia y durabilidad necesarias para el pavimento hidráulico.

Aunque el concreto es un material esencialmente heterogéneo, porque sus componentes tienen características que no son constantes. No son solos los materiales los causantes de las variaciones en la calidad del hormigón; también influye la forma de mezclarlo, su transporte y colocación en formaletas, la compactación a que se someta y el curado que se le proporcione.

Por las razones anteriores, es necesario tomar las precauciones adecuadas para que la calidad del material producido, sea aceptable. La medida final que informa sobre la calidad obtenida, es la que resulta de los ensayos de resistencia.

MATERIALES UTILIZADOS

CEMENTO PORTLAND ESTRUCTURAL

Por sus características es un cemento especial para concretos estructurales. Su tiempo de fraguado incrementa el rendimiento de la obra, pues permite desencofrar en menor tiempo, siendo esto un comportamiento ideal para la elaboración de elementos prefabricados, el cual es destinado a obras de hormigón en general, al que se le exige propiedades especiales.

AGREGADOS

Agregado grueso:
Proviene de la fuente del rio Caquetá, este material triturado, el cual se procesa en la inspección el tigre - municipio de Villagarzón. Su tamaño máximo es 1-1/2", el cual tiene las siguientes características físicas, tienen forma angular y de textura áspera.

Agregado Fino-mixto: Proviene de la misma fuente, su obtención se realiza de forma manual en la fuente su tamaño máximo de 3/4". Sus características físicas son: forma subangular y redondeada y de textura lisa.

Para el diseño de mezclas, se requieren las siguientes propiedades físicas del material como son: Granulometría, peso específico, tamaño máximo, tamaño máximo nominal, porcentaje de absorción, masa unitaria suelta, módulo de finura.

AGUA

El agua de mezcla cumple dos funciones muy importantes permitir la hidratación del cemento y hacer la mezcla manejable. De toda el agua que se emplea en la preparación del concreto, parte hidrata el cemento, el resto no presenta ninguna alteración y con el tiempo se evapora. De acuerdo con lo anterior como una regla práctica, se debe colocar la menor cantidad de agua en la mezcla, pero teniendo en cuenta que el hormigón quede trabajable.

Se considera que el agua es adecuada para producir hormigón si su composición química indica que es apta para el consumo humano, sin importar si ha tenido un tratamiento preliminar o no; es decir, casi cualquier agua natural que pueda beberse y que no tenga sabor u olor notable sirve para mezclar el concreto. Sin embargo, el agua que sirva para preparar estas mezclas, puede no servir para beberla.

DESARROLLO DISEÑO DE MEZCLA

DATOS DE LOS MATERIALES

AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (Rio Caquetá)

DENSIDAD APARENTE SECA	2.690 kg/dm³
TAMAÑO MÁXIMO	1-1/2" - pulgada
TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL	1" - pulgada
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN	1.04 %
MASA UNITARIA SUELTA	1.42 kg/dm³

AGREGADO FINO (Rio Caquetá)

DENSIDAD APARENTE SECA	2.554 kg/dm³
TAMAÑO MÁXIMO	1-1/2" - pulgada
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN	3.01 %
MASA UNITARIA SUELTA	1.50 kg/dm³

CEMENTO (USO GENERAL)

PESO ESPECÍFICO	3.03 kg/dm³
MASA UNITARIA SUELTA	1.21 kg/dm³

AGUA

PESO ESPECÍFICO	1.0 kg/dm³
MASA UNITARIA SUELTA	1.0 kg/dm³

DESARROLLO DISEÑO F'C 280 Kg/cm²

Se realizó ajuste granulométrico con los siguientes resultados: Agregado grueso =40% y agregado fino- mixto = 60%. Se comparó con la curva ideal fuller.

- ASENTAMIENTO: se escogió una mezcla de consistencia semiseca, entre 5.0 y 10.0 centímetros.
- ESTIMACIÓN DEL AGUA DE LA MEZCLA: Se escogió 165 Kg. de agua por m³ de concreto, con esta cantidad de agua se obtiene un asentamiento inferior a 10 centímetros, sin utilizar aditivos.
- COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL 5%, Porque ya se ha producido concreto en condiciones similares.
- RESISTENCIA DE DOSIFICACIÓN: Para el anterior coeficiente de variancia tenemos un F`cr = 350 kg/cm².
- SELECCIÓN AGUA CEMENTO: Por resistencia y durabilidad, según la recomendación de la norma NSR-10; para un valor de resistencia a la compresión de 350 kg/cm², se obtiene un valor de relación A/C = 0.47.

- CALCULO DEL CONTENIDO DE CEMENTO ESTRUCTURAL:
  C = A/(A/C) = 165/0.50 = 351.1 Kg/m³ de concreto.

- DATOS AGREGADOS:
  Volumen Absoluto Agregados = 1000- 165/1- 351.1/3.03= 720.6 dm³.

  PESO ESPECIFICO PROMEDIO: 2.607 kg/dm³.
  - Peso del agregado = 720.6 * 2.607= 1878.5 kg/de concreto
  - Peso del agregado fino =1878.5 * 0.60 =1127.1 kg
  - Peso del agregado grueso =1878.5 * 0.40 =751.4 kg

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTES
TEL3118060140
wacort@gmail.com

DISEÑO DE MEZCLAS
CONCRETO HIDRÁULICO

RESISTENCIA :	280 Kg/cm²	FECHA:	noviembre 25, 2025
RESISTENCIA FCr:	350 Kg/cm²	MÉTODO	EN PESO
CLIENTE:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	FUENTE	RIO CAGUETA/ RIO CAGUETA
PROYECTO:	MEJORAMIENTO VEREDAL PAVIMENTO RIGIDO EJE DE LA PARTE PRINCIPAL DE EMBARCADERO DE LA	CEMENTO	CEMEX ESTRUCTURAL
	INSPECCION DE POLICIA (PARTE DEL) MUNICIPIO DE MILICIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	MATERIAL	ARENA MIXTA y TRITURADO.

DESCRIPCIÓN	AGUA	CEMENTO	AGREGADOS		SUMATORIA
			MIXTO	TRITURADO	
PESO DEL MATERIAL (kg/m3ccto)	165	351,1	1127,1	751,4	2394,5
VOLUMEN ABSOLUTO(dm3/m3 ccto)	165	114,35	441,36	279,28	1000,0
PROPORCIÓN EN PESO SECO	*0,47*	*1*	*3,21*	*2,14*	
VOLUMEN SUELTO(dm3/m3 ccto)	165	290,14	761,54	529,14	
PROPORCIÓN EN VOLUMEN SUELTO	*0,57*	*1*	*2,62*	*1,82*	

CANTIDAD DE MATERIAL A UTILIZAR POR CADA 42,5 Kg DE CEMENTO

DESCRIPCIÓN	PROPORCIÓN EN PESO	BULTO CEMENTO	PARA UN BULTO	MASA UNITARIA SUELTA	VOLUMEN SUELTO
AGUA	0,47	42,5	20,0	Kg/dm3	dm3
CEMENTO ESTRUCTURAL	1	42,5	42,5		
AGREGADO FINO MIXTO	3,21	42,5	136,4	1,48	92,2
AGREGADO GRUESO	2,14	42,5	91,0	1,42	64,1

POR LO TANTO

AGUA= QUE PRODUZCA UN ASENTAMIENTO MÁXIMO DE 10 CM

CEMENTO	=42,5 Kg	
AG FINO	=0.0922m³	(VOLUMEN SUELTO)
AG GRUESO	=0.0641m³	(VOLUMEN SUELTO)

DOSIFICACION EN VOLUMEN

1 CEMENTO
2,5 ARENA MIXTA
1,75 TRITURADO

VOLUMEN DEL CAJÓN

AG FINO-	0,0307 m³
AG GRUESO	0,0320 m³

DIMENSIÓN DEL CAJÓN

DESCRIPCIÓN	MIXTO	TRITURADO
LARGO	0,33	0,33
ANCHO	0,33	0,33
ALTURA	0,28	0,29

EN RESUMEN (1 BULTO DE CEMENTO)

AGUA	ASENTAMIENTO DE MÁXIMO DE 10cm CON ENSAYO SLUMP	
CEMENTO ESTRUCTURAL	42,5 Kg	valdes de construccion
AGREGADO FINO (mixto arena)	3 CAJONES (0.33X0.33X0.24)	10
AGREGADO TRITURADO SIN A DITIVO	2 CAJONES (0.33X0.33X0.25)	7

ATENTAMENTE

WALTER HERNANDO CORTES ORTIZ
19516015864CAU - GEOTECNÓLOGO

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTES
TEL: 4296887 311-8060140

ANALISIS GRANULOMÉTRICO
CURVAS IDEALES
NORMA INV-13

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPALAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL NUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUNAYO

CLIENTE: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

DESCRIPCIÓN MUESTRA: **TRITURADO 1"** FECHA: **25 de noviembre de 2025**

CANTERA: **PLANTA VILLA- CAQUETA**

MUESTRA: **A**

GRADACIÓN: **CONCRETOS**

PESO TOTAL MUESTRA: **2567,7**


EJECUTADO POR: **WALTER H CORTÈS**

CALCULADO POR: **WALTER H CORTÈS**

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RET TOTAL	% PASA
1-1/2'	0	0,0	0,0	100,0
1'	0,0	0	0	100,0
3/4'	1480,0	58	58	42,4
3/8'	1041,0	41	98	1,8
No 4	2,0	0	98	1,7
No 8	0,0	0	98	1,7
No 16	0,0	0	98	1,7
No 30	2,0	0	98	1,7
No 50	3,0	0	98	1,5
No 100	4,0	0,2	99	1,4
FONDO	35,7	1,4		

Límite Líquido	NL
Límite plástico	NP
Indice de plasticidad	
Clasificación AASHTO	
Clasificación U.S.C.	GP

OBSERVACIONES

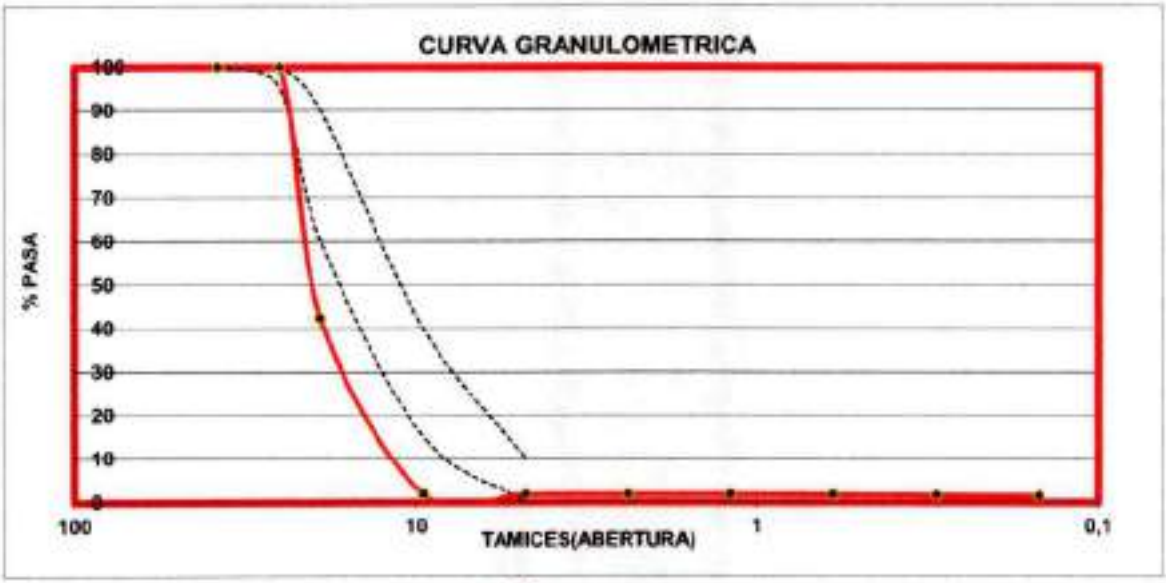

GEOTEC. **WALTER H CORTÉS O**

ING. **REVISO**

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTES
TEL: 4296887 311-8060140

ANALISIS GRANULOMÉTRICO
CURVAS IDEALES
NTC 174

PROYECTO	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPALAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÒN DE PUERTO LIMÒN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
CLIENTE	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	MIXTO ARENOSO	FECHA	25 de noviembre de 2025
CANTERA	RIO CAQUETA JAUNO	PESO TOTAL MUESTRA	2086,5
MUESTRA	B	EJECUTADO POR	WALTER H CORTÈS
GRADACIÓN	CONCRETOS	CALCULADO POR	WALTER H CORTÈS


TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RET TOTAL	% PASA
1-1/2'	0	0	0	100
1'	262,0	13	13	87
3/4'	84,0	4	17	83
3/8'	313,0	15	32	68
No 4	151,0	7	39	61
No 8	153,5	7,4	46,2	53,8
No 16	234,5	11,2	57,4	42,6
No 30	294,5	14,1	71,5	28,5
No 50	264,7	12,7	84,2	15,8
No 100	197,3	9,5	93,7	6,3
FONDO	132	6,3		

Límite Líquido	NL
Límite plástico	NP
Índice de plasticidad	
Clasificación AASHTO	
Clasificación U.S.C.	SW-SM

OBSERVACIONES

especificaión

NTC 174

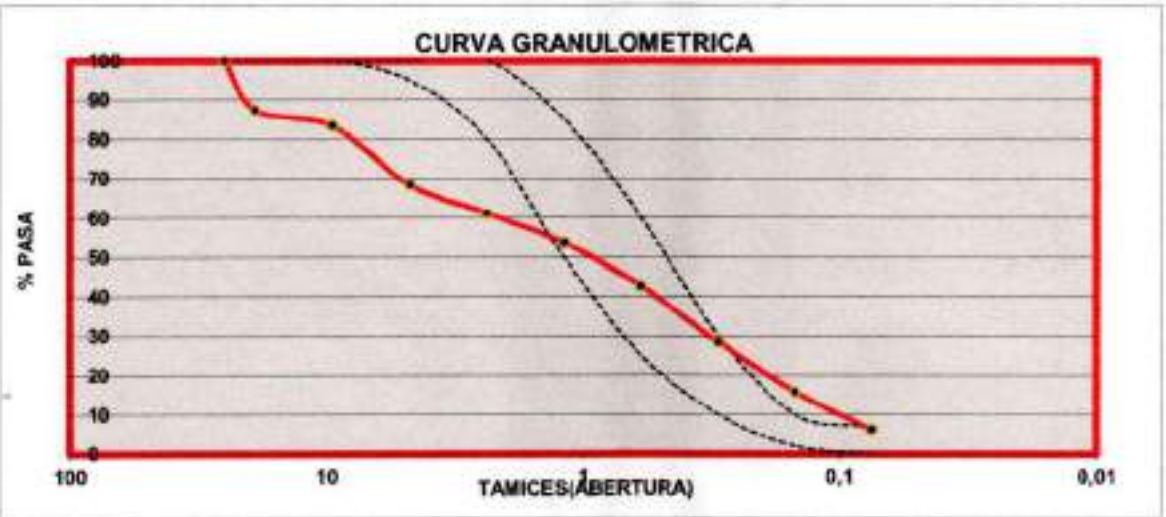

GEOTEC. _____

WALTER H CORTÉS O

ING. _____

REVISO

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTES
TEL: 4296887 311-8060140

AJUSTE GRANULOMÉTRICO
CURVA IDEAL FULLER

PROYECTO MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPALAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CLIENTE **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**

DESCRIPCIÓN MUESTRA _____ FECHA **25 de noviembre de 2025**

PESO TOTAL MUESTRA _____

CANTERA **RIO CAQUETA** EJECUTADO POR **WALTER H CORTÈS**

MUESTRA **TRITURADO-MIXTO ARENOSO** CALCULADO POR **WALTER H CORTÈS**

GRADACION **A+B**


PORCENTAJE DE A **40** PORCENTAJE DE B **60**

TAMIZ	ESPECIFICACIÓN	GRADACIÓN A	GRADACIÓ	COMBINACIÓN A+B
1"	100	100,0	100	100,0
3/4"	69,6/80	100,0	87	92,5
3/8"	59,7/70,9	42,4	83	67,0
No 4	41,1/53,2	1,8	68	41,8
No 8	27/39,5	1,7	61	37,4
No 16	18,6/28,9	1,7	54	33,0
No 30	12-/20	1,7	43	26,2
No 50	7,3/12,9	1,7	28	17,7
No 100	4,1/7,0	1,5	16	10,1
No 200	1,7/2,4	1,4	6	4,4
FONDO				

Límite Líquido _____
Límite plástico _____
Indice de plasticidad _____
Clasificación AASHTO _____
Clasificación U.S.C. _____

OBSERVACIONES

AJUSTE
curva ideal de linea negra

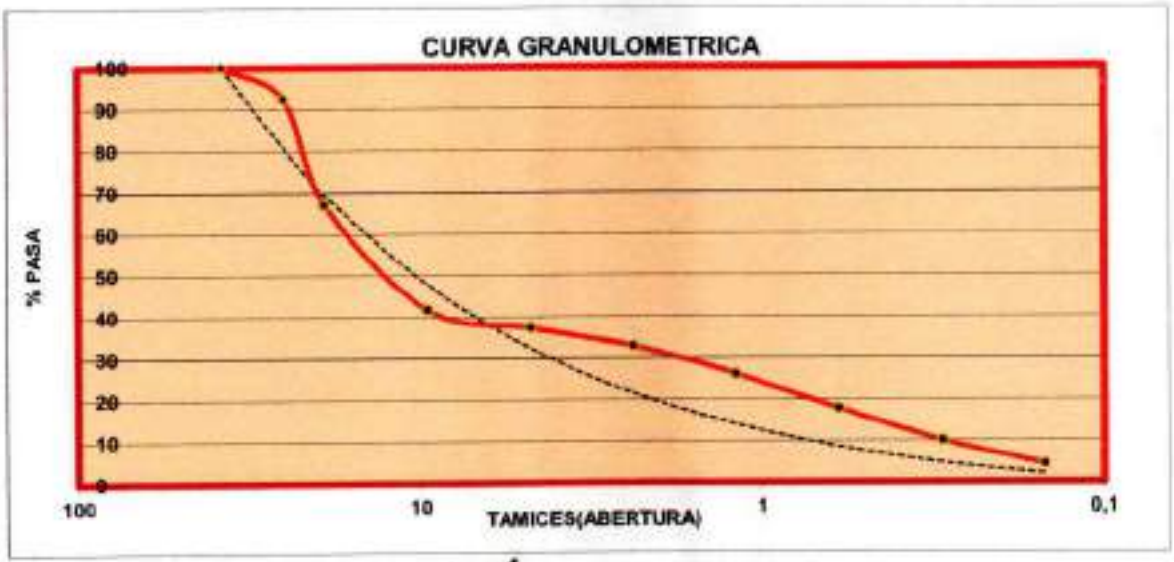

GEOTEC. _____
WALTER H CORTÉS O

ING. _____
REVISO

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTES
TEL: 4296587 - 311.8060140

DENSIDAD Y ABSORCIÓN DE AGRAGADOS GRUESOS

CLIENTE: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPALAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA :25-NOVIEMBRE--25 FUENTE : RIO CAQUETA

EJECUTADO POR: WALTER CORTÉS MUESTRA : TRITURADO DE 1"

PRUEBAS	1	2	3	PROMEDIO
PESO DEL MATERIAL EN EL AIRE EN ESTADO SSS + RECIPIENTE	1235,4	1164,8	989,5	
PESO DEL RECIPIENTE EN EL AIREA	200,8	142,9	196,3	
PESO DEL MATERIAL EN EL AIRE EN ESTADO SSS	**1034,6**	**1021,9**	**793,2**	
PESO DEL MATERIAL SATURADO EN EL AGUA +RECIPIENTE	718,6	712,0	569,2	
PESO DEL RECIPIENTE EN EL AGUA	76,0	76,0	76,0	
PESO DEL MATERIAL SATURADO EN EL AGUA	**642,8**	**636**	**493,2**	
PESO DEL MATERIAL SECO EN EL AIRE + RECIPIENTE	1224,9	1153.7	981,6	
PESO DEL RECIPIENTE EN EL AIREA	200,8	142,9	196,3	
PESO DEL MATERIAL SECO EN EL AIRE	**1024,1**	**1010,8**	**785,3**	
GS, BULK	2,614	2,619	2,618	2,617
GS,BULK SSS	2,641	2,648	2,644	2,644
GS,APARENTE	2,686	2,697	2,688	2,690
% DE ABSORCIÓN	1,03	1,10	1,01	1,04

OBSERVACIÓN

Waller Hernando Cortés Ortiz
Geotecnólogo

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTÉS
TEL: 4296887 (MOCOA)

DENSIDAD Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINO

CLIENTE: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPALAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA :25-NOVIEMBRE--25 | FUENTE : RIO CAQUETA

EJECUTADO POR: WALTER CORTÉS | MUESTRA : ARENA DE RIO PASA No 4

PRUEBAS	1	2	3	PROMEDIO
MATRAZ No	1			
TEMPERATURA °C	30			
PESO DEL AGUA Y PICNÓMETRO (Wpa)	**625**			
PESO DEL PICNÓMETRO,SUELO Y AGUA (Wpas)	777,1			
PESO SECO DEL SUELO (Ws)	242,7			
VOLUMEN DE SÓLIDOS (Vs=Wpa-(Wpas-Ws)) cc	**90,6**			
AGUA EN LOS POROS DE LAS PARTICULAS (Ww=250-Ws) grms.	7,3			
VOLUMEN DE SÓLIDOS SATURADOS (Vss=Vs+Ww) cc	97,9			
PESO BULK O DENSIDAD SECA GS=Ws/Vss	2,479			2,479
DENSIDAD APARENTE GS=250/Vss	2,554			2,554
GRAVEDAD ESPECÍFICA O RELATIVA G=Ws/VSS-Ww	2,679			2,679
ABSORCIÓN Aos%=(Ww/Ws*100)	3,01			3,01

OBSERVACIÓN

Walter Hernando Cortés Ortiz
Geotecnólogo

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.10 REVISION Y VERIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1113526460	ERIKA YANIRA RODRIGUEZ NARVAEZ	BRR CENTRO	4545444	hugoandersson2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	11/12/2025	92302454	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	1113526460	ERIKA YANIRA RODRIGUEZ NARVAEZ		BRR CENTRO	4545444	hugoandersson2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-11	2025-11	I	11/12/2025	92302454	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1113526460	RODRIGUEZ NARVAEZ ERIKA YANIRA	59	0			N																			25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS018	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16628656	ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ	BRR DORADO	4545444	hugoandersson2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	11/12/2025	92302463	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	16628656	ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ		BRR DORADO	4545444	hugoandersson2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-11	2025-11	I	11/12/2025	92302463	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	16628656	ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ	59	0			N																			25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS018	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901042420	9	CONCEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-1	BARRIO PROGRESO		3213959011			LAEP15@HOTMAIL.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35574455	E	2025-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.322.700	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35574455	2025-12-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 58299356	CORTEZ CABEZAS JOSE JUANITO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439001
2	CC 18103528	ENRIQUEZ PANTOJA LUIS ALVARO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS-SEMSSANAR-ESSC18	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439001
3	CC 18129153	VALENCIA MEZA SANDRO JULIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5439001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901042420	9	CONCEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-1	BARRIO PROGRESO		3213959011			LAEP15@HOTMAIL.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35574455	E	2025-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.322.700	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35574455	2025-12-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.270.500	4.270.500	4.270.500	4.270.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	683.400	0	0	0	683.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 2)				3	171.000	0	0	0	171.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	0	0	114.000
ARP(Administradoras: 1)				3	297.300	0	0	0	297.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	297.300	0	0	0	297.300
CCF(Administradoras: 1)				3	171.000	0	0	0	171.000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891200337	8	3	171.000	0	0	0	171.000
Gran Total					1.322.700	0	0	0	1.322.700

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901042420	9	CONCEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-1	BARRIO PROGRESO		3213959011			LAEP15@HOTMAIL.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35574446	E	2025-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	359.000	5.900	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35574446	2025-11-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 58299356	CORTEZ CABEZAS JOSE JUANITO	1.423.500	F	X															0			8	8	8	8	PROTECCION-230201	379.600	60.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	379.600	15.200	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	379.600	15.200	379.600	26.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	117.700	S	5439001
2	CC 18103528	ENRIQUEZ PANTOJA LUIS ALVARO	1.423.500	F	X															0			8	8	8	8	COLPENSIONES-25-14	379.600	60.800	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	379.600	15.200	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	379.600	15.200	379.600	26.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	117.700	S	5439001
3	CC 18129153	VALENCIA MEZA SANDRO JULIO	1.423.500	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	379.600	60.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	379.600	15.200	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	379.600	15.200	379.600	26.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	117.700	S	5439001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901042420	9	CONCEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-1	BARRIO PROGRESO		3213959011			LAEP15@HOTMAIL.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35574446	E	2025-12-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	359.000	5.900	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	35574446	2025-11-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.138.800	1.138.800	1.138.800	1.138.800	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				3	182.400	0	3.000	0	185.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	60.800	0	1.000	0	61.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	60.800	0	1.000	0	61.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	60.800	0	1.000	0	61.800
EPS(Administradoras: 2)				3	45.600	0	800	0	46.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	1	15.200	0	300	0	15.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	30.400	0	500	0	30.900
ARP(Administradoras: 1)				3	79.500	0	1.300	0	80.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	79.500	0	1.300	0	80.800
CCF(Administradoras: 1)				3	45.600	0	800	0	46.400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891200337	8	3	45.600	0	800	0	46.400
Gran Total					353.100	0	5.900	0	359.000

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.11 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO (INCLUYE SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES).

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

NIT. 800.094.164-4	GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL ANEXO SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES OBRA INTERVENTORIA	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA			

SECRETARIA EJECUTORA: **SECRETARIA DE DE INFRAESTRUCTURA**

GOBERNACIÓN: **PUTUMAYO**

CONTRATO No. **1071-2025**

CONTRATISTA **DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO**

OBJETO DEL CONTRATO: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

ORDEN DE INICIO 27/10/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ACTUALIZADO TRES (03) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO DEL 26/01/2026

		VIGENCIA								
1. Garantía única de cumplimiento:	**41-44-101295698**	DESDE:	27	10	2025	HASTA:	9	8	2026
1.2. Pago de salarios, prestaciones	**41-44-101295698**	DESDE:	27	10	2025	HASTA:	9	2	2029
1.4. Calidad del servicio:	**41-44-101295698**	DESDE:	9	2	2026	HASTA:	9	2	2031

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: Pólizas expedidas por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO. Las pólizas tienen textos y aclaraciones anexas por parte de la aseguradora en las cuales indica que todas las pólizas serán ajustadas de acuerdo con la fecha en la cual se firma el acta con el contrato de obra y fecha de inicio.

Contratos adicionales: **Modificación No.** N.A. **Póliza No.** N.A.

Firma

Nombre: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
Contratista de Interventoria
Matricula No.: 63202-220004 QND

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2025	18	07	2025	00:00	31	10	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES	CC: 1113.304.913	3105526416

DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE GALAN — CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4	4260573

DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40 — CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.1671-2025, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORIA).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AJUSTA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS SEGUN ACTA DE INICIO FIRMADA POR LAS PARTES EL 17/10/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****(80,472.00)	$ ****(8,000.00)	$ ****(16,809.00)	$ *********(105,281.00)	$ ******(6,305,548.50)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA NORA QUINTAS JURADO	240850	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Olaya - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2025	18	07	2025	00:00	31	10	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES	CC: 1113.304.913

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE GALAN	PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	3105526416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4260573

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · exito · MOVIRED · GanaGana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****(80,472.00)	$ ****(8,000.00)	$ ****(16,809.00)	$ *********(105,281.00)	$ *******(6,305,548.50)	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CLAUDIA MORA QUINTAS JURADO	240650	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO CUANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2025	18	07	2025	00:00	31	10	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES		CC: 1113.304.913	
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE CALAN	**CIUDAD:** PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	**TELEFONO:** 3105526416	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELEFONO:** 4260573	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 34 - 52 - TELEFONO: 7226522 - PASTO

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

PLARGONZALEZ

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101295598, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 30 días del mes de OCTUBRE de 2025

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2025	27	10	2025	00:00	09	02	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES		CC: 1113.304.913	
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE GALAN	CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	TELÉFONO: 3105526416	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO	4260573

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ROTULIS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.1ETI-2025, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORIA).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2025	09/08/2026	$2,522,219.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/10/2025	09/02/2029	$1,261,109.70	
CALIDAD DEL SERVICIO	09/02/2026	09/02/2031	$2,522,219.40	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AJUSTA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS SEGUN ACTA DE INICIO FIRMADA POR LAS PARTES EL 27/10/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******80,472.00	$ *******8,000.00	$ ******16,809.00	$ **********105,281.00	$ ********6,305,548.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA NORA QUINTAS JURADO	240850	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Dieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2025	27	10	2025	00:00	09	02	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES	CC: 1113.304.913

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE GALAN	PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	3105526416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.994.164-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4260573

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******80,472.00	$ *******8,000.00	$ ******16,809.00	$ **********105,281.00	$ ********6,305,546.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA NORA QUINTAS JURADO	240850	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709994021167(8020)110061051520(3900)0000010526(96)20161027

REFERENCIA PAGO: 1100061051520-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2025	27	10	2025	00:00	09	02	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES		CC: 1113.304.913
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE GALAN	**CIUDAD:** PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3105526416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	4200573

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

RLARDONZALEZ 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101295598, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 30 días del mes de OCTUBRE de 2025

41-44-101295598
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.12 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025

TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

NIT. 800.094.164-4	GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL ANEXO EQUIPO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	FT-SID-007		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 26 NOV 2025

OBJETO: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

INTERVENTOR: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MES: 7 **CONTRATO No.:** 1071-2025 **MUNICIPIO:** MOCOA, INSPECCION DE PUERTO LIMON

CONTRATISTA DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

DIA / MAQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Camara fotografica	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Computador/elementos de oficina	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Transporte(camioneta)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES
ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I

Firma
Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Contratista de Interventoría
Matricula No.: 63202-220004 QND

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.13 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

NIT. 800.094.164-4	GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	FT-SIG-007		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	INTERVENTOR:	DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO	FECHA	26	NOV	2026

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MES 2 CONTRATO No. 1071-2025 MUNICIPIO MOCOA, INSPECCION DE PUERTO LIMON

CONTRATISTA DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
Residente de Interventoría	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

Firma

Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Contratista de Interventoría
Matrícula No.: 63202-220004 QNO

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.14 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME FINANCIERO DE INTERVENTORIA

CODIGO			
VERSIÓN			
PAGINA	1	DE	1
FECHA			

NIT. 800.0 4.954-4

SECRETARIA EJECUTORA: EDUCACION

GOBERNACIÓN: PUTUMAYO

CONTRATO No: 1171 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONTRATISTA: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

NIT: 5

OBJETO: VIA SILVANIA, ORITO - PUTUMAYO

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Acta No	Mes/Año	Valor Directo	Valor IVA	Valor Total	Amortización Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	Observaciones
CONTRATO INICIAL				$ 25.222.194,00	$ -	$ -	$ 25.222.194,00	$ -	$ 25.222.194,00	
TOTAL: $		$0	$0	$0	$0	$0	$ 25.222.194,00	$0,00	$ -	

Nota: Los registros se deben explicar en el formato de anexo

F: ESP

D: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

O: Interventoría e Interventoría

1139

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.15 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR .

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025

TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1112568913
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JAVIER MORSE ENCISO ARANGO
DIGITO VERIFICACIÓN:			PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	VILLAMAYEN	DEPARTAMENTO:	111111
TIPO APORTANTE:	BARRIO FATIMA CALLE 7 N/O. 2 1/2	TELÉFONO:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	0	CLASE APORTANTE:	ACTIVIDAD ECONÓMICA
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA		Construcción de otras obras de ingeniería civil
APORTANTE:	UNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		70012472291	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN (TROS	MES	noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES noviembre AÑO	2025
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025/11/18	NUMERO AUTORIZACION		1140360441

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
25301	[illegible] FONDO MIN	1	$ 883.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 883.300	$ 0	$ 0	$ 883.300
SUBTOTALES										$ 883.300	$ 0	$ 0	$ 883.300

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AJUSTE	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AJUSTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible] APS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 321.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.000	$ 0	$ 0	$ 321.000
SUBTOTALES													$ 321.000	$ 0	$ 0	$ 321.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD EP VALOR	PAGO A STROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-01	14-01-PUESTOS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 44.500	$ 44.500	$ 0	$ 0	$ 44.500
SUBTOTALES									$ 44.500	$ 0	$ 0	$ 44.500

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: ID	TIPO ID COTIZANTE	NUMERO ID COTIZANTE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	VALOR SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	ACTIVIDAD ECONÓMICA TARIFA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 1.179.500				1															

PENSIÓN: ADMIN	PENSIÓN: IBC	PENSIÓN: COTIZACIÓN	FSP: SUBSIST. EMPLEADOR	FSP: SOLIDARIDAD EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS: COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	SALUD: IBC	SALUD: COTIZACION	SALUD: VALOR AJUSTE	SALUD: TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	ARP: IBC	ARP: CENTRO DE TRABAJO	ARP: TOTAL APORTE	PARAFISCALES: IBC	PARAFISCALES: CCF ADMIN	PARAFISCALES: CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES: SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES: ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES: ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES: MEN TOTAL APORTE
25301 - FONDO MIN	$ 1.179.500	$ 883.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 883.300	PIJAO - PUNTUAL FPS	$ 1.179.500	$ 321.000	$ 0	$ 321.000	14-01 - PUESTOS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.179.500	[illegible]	$ 44.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.261.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1113304913
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	BARRIO FATIMA CALLE 7 NO. 2	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7991247291**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1940952681	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 683.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 683.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 533.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 533.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 44.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 44.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.261.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.261.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA — NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: — TELEFONO:
CÓDIGO MUNICIPIO: — CLASE APORTANTE:
DIRECCIÓN: — ACTIVIDAD ECONÓMICA:
TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:
APORTANTE SOMBREADO PAGO APORTES SALUD, ARL/A E ICBF (PERFORMA TRIBUTARIA)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: **116529943** — TIPO DE PLANILLA:
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: MES — AÑO — DÍAS — PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: MES — AÑO — DÍAS
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): — NÚMERO AUTORIZACIÓN:

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	SOLIDARIDAD		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23301	23301 PORVENIR	1	$ 661.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 661.000	$ 0	$ 661.000
SUBTOTALES										**$ 661.000**	**$ 0**	**$ 661.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	PAGO ANTICIPADO POR INCAPACIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LICENCIAS		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AFIRES	COTIZACIÓN	VALOR AFIRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	SPECIAL ASSIST SAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 133.000
SUBTOTALES													**$ 133.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 133.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	PRIMA MES AP			SALDO A FAVOR		NOVEDADES		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-02	LA EQUIDAD SEG COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 44.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000
SUBTOTALES										**$ 44.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 44.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | ADICIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1113304913
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZON	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	BARRIO FATIMA CALLE 7 NO. 2	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7988229940**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1850818600	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 683.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 683.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 533.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 533.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 44.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 44.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.261.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.261.800**

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.16 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Período comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Puerto Caicedo, 30 de julio del 2025

OFI-001

Ingeniero:

VIRGILIO BRAVO SOSA
Secretario de Infraestructura Departamental
Mocoa, Putumayo.

Ref: Solicitud de documentación referente al contrato de obra según proceso de contratación SID-CD-1943-2024 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Cordial saludo;

Con base al asunto de la referencia y en calidad de interventor mediante contrato de interventoría N° 1071-2025 suscrito con la Gobernación del Putumayo y cuyo objeto es "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)"; me permito solicitar formalmente a la entidad brindarme la documentación descrita en la presente, la cual corresponde al contrato de obra llevado a cabo mediante proceso de contratación SID-CD-1943-2024, con el fin de obtener la información necesaria para realizar la respectiva revisión y aprobación acorde con la normatividad, especificaciones técnicas y requisitos estipulados en los estudios previos y pliegos definitivos del proceso de contratación; todo esto es necesario previamente a la suscripción del acta de inicio de los contratos de obra e interventoría.

Por lo anterior la interventoría solicita a la supervisión (secretaría de infraestructura departamental) la siguiente información:

- Minuta del contrato de obra.

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

- Planos de diseños y programación de obra. (editables)
- Acompañamiento y disponibilidad de fecha para realizar la respectiva socialización con la comunidad.
- Propuesta económica con Unitarios (presupuesto oficial) y Memoria de cantidades. (editables)
- Pólizas expedidas con el contrato de obra.

De ante mano agradezco su atención y colaboración a la presente

Atentamente;



ING. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matricula No.: 63202-220004 QND

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Puerto Caicedo, 30 de octubre del 2025

OFI-002

Señores:

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
Contratista de obra
Mocoa, Putumayo.

Ref: Solicitud de documentación y recomendaciones referente al contrato de obra No. 1943-2024 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Cordial saludo;

Con base al asunto de la referencia y en calidad de interventor mediante contrato de interventoría N° 1071-2025 suscrito con la Gobernación del Putumayo y cuyo objeto es "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)"; me permito solicitar formalmente sea remitida la documentación descrita en la presente.

Por lo anterior la interventoría solicita a CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS la siguiente información:

1. **Entrega del programa de Manejo de tránsito:**
   Para la implementación de este documento y seguimiento se debe realizar seguimiento e inversión al presupuesto establecido en el proyecto:

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

PMT			
MANO DE OBRA			
DESCRIPCIÓN		**CANTIDAD**	**TIEMPO MESES**
AUXILIAR DE TRANSITO		2.00	3.00
Factor multiplicador			
TOTAL MANO DE OBRA			

GASTOS OPERACIONALES			
DESCRIPCIÓN		**UNIDAD**	**CANTIDAD**
MANEJO DE TRANSITO			
SRO-4 PARE / SIGA		UND	2.00
SEÑALES INFORMATIVAS			
SEÑAL SIO-02 INICIO DE OBRA		UND	2.00
SEÑAL SIO-03 FIN DE OBRA		UND	2.00
SEÑALES PREVENTIVAS			
SEÑAL SPO-01 TRABAJOS EN LA VIA		UND	2.00
SEÑAL SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA		UND	2.00
SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRANSITO		UND	2.00

SEÑALES REGLAMENTARIAS		
SEÑAL SRO-02 PROHIBIDO PARQUEAR O DETENERSE	UND	2.00

SEÑALES CANALIZACION		
CINTA PELIGRO	ROLLO/100M	10.00
DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UND	40.00
BARRICADAS DE LISTONES (FIG 4-15 MANUAL DE SEÑALIZACION MINTRANSPORTE)	UND	2.00

2. **Previsión Para El Plan De Adaptación A La Guía Ambiental (PAGA):**
   Para la implementación de este documento y seguimiento se debe realizar seguimiento e inversión al presupuesto establecido en el proyecto:

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Programa 1: Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental		
De gestión integral de residuos sólidos (ordinarios, orgánicos, reciclables, escombros y peligrosos)		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**
Punto Ecológico Bolsa De 65 X 80 Paquete X 100 Unidades	Unidad	1
Convenios: reciclaje, aceites usados y residuos - peligrosos	Mes	2
Subtotal		
Programa 2: Manejo de Instalaciones temporales, de maquinaria y equipo		
Uso y almacenamiento adecuado de materiales y elementos de construcción		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**
Cinta delimitadora de peligro para demarcación de zonas de almacenamiento	Rollo	1
Fichas de seguridad almacenamiento	Unidad	3
Señalización	Global	3
Valla informativa	Global	2
Extintor multipropósito	Unidad	1
Subtotal		
Programa 3: Actividades Constructivas		
Residuos solidos		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**
Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.	Global	2
Subtotal		
Programa 4: Conservación y protección de la fauna y flora		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**
Manejo de descapote y cobertura vegetal.	Global	1
Recuperación de áreas afectadas	Global	2
Protección de fauna.	Global	2
Subtotal		
Programa 5: Manejo de aguas superficiales		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

Proyecto de manejo de aguas superficiales. Permisos		0
Subtotal		
Programa 6: Manejo de campamentos e instalaciones temporales		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**
Botiquín	Unidad	1
Camilla	Unidad	1
4	Bidon	4
Subtotal		
Programa 7: Gestión Social		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**
Material informativo	Unidad	50
Mesa	Unidad	1
Silla	Unidad	1
Lapiceros	Unidad	3
Subtotal		
Programa 8: Educación ambiental y capacitación a trabajadores		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**
Capacitación y Educación Ambiental	Global	1
Subtotal		
IMPEMENTACION DEL PMA		
Descripción	**Sueldo mes básico**	**% dedicación**
Tecnólogo Ambiental	$ 1,950.00	165

3. Informe de Sistema de Gestión de Calidad.
4. Entregar hojas de vida de acuerdo al desglose del AIU (ingeniero civil y/o ingeniero de vías y transportes - residente de obra, hoja de vida del maestro de obra)
5. Hoja de vida de ingeniero ambiental o tecnólogo ambiental
6. Hoja de vida de dos auxiliares de tránsito
7. Entregar presupuesto con sus componentes (Desglose del AIU, APUs, memoria de cantidades, análisis de cuadrillas,
8. Actas (Actas de Vecindad, Conformaciones de Veedurías).

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

9. Formatos de Control (Control de Seguimiento a las Garantías Contractuales Obra, Control del Estado del tiempo, Control Diario del Personal de Obra, Control del Equipo y Herramientas).
10. Llevar diariamente la bitácora de obra
11. Cerramiento provisional y señalización de obra
12. Instalación de valla informativa de acuerdo a circular de Gobernación de Putumayo
13. Entregar afiliaciones de personal mano de obra calificada y no calificada, de acuerdo a salarios del desglose del AIU, como lo establece la Ley (Certificación por parte del Contador o Revisor Fiscal con sus respectivos documentos).

1	**Personal de obra**		**TIEMPO/MES**			
1.1	Residente de obra con prestaciones sociales	Mes	3	100%	$ 3,500,000.00	$ 10,500,000.00
1.2	Maestro de obra	Mes	3	100%	$ 3,800,000.00	$ 11,400,000.00
1.3	Comisión topográfica	Mes	3	100%	$ 4,100,000.00	$ 12,300,000.00

14. Permisos Ambientales y Fuentes de abastecimiento de materiales Pétreos y demás permisos o licencias para correcta ejecución del mismo.
15. Correspondencia (enviada y recibida en el mes).
16. Diseño de mezclas para los concretos establecidos en el contrato MR 3,8 para el pavimento hidráulico y 3000 PSI para andenes y bordillos.

De ante mano agradezco su atención y colaboración a la presente

Atentamente;

ING. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matricula No.: 63202-220004 QND

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Puerto Caicedo, 10 de noviembre del 2025

OFI-003

Ingeniero:

VIRGILIO BRAVO SOSA
Secretario de Infraestructura Departamental
Mocoa, Putumayo.

Ref: Entrega de pólizas actualizadas con acta de inicio de los contratos de obra (1943-2024) e interventoría (1071-2025) correspondientes al proceso cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Cordial saludo;

Con base al asunto de la referencia y en calidad de interventor, por medio de la presente dando cumplimiento a lo establecido en los contratos de obra e interventoria, hago entrega en físico de las pólizas actualizadas con acta de inicio para su revisión y aprobación por parte de la supervisión.

- Pólizas de Interventoria: Publicadas en Secop 2 el 30/10/2025

ANEXO 1 y 2: póliza de cumplimiento entidad estatal No: 41-44-101295598 expedida por COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2025	09/08/2026	$ 2.522.219,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27/10/2025	09/02/2029	$ 1.261.1099,07
CALIDAD DEL SERVICIO	09/02/2026	09/02/2031	$ 2.522.219,40

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo Ptyo.
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

- Pólizas de obra: Publicadas en Secop 2 el 05/11/2025

ANEXO 4,5,6 y 7: póliza de cumplimiento entidad estatal No: 41-44-101287134 y responsabilidad civil extracontractual No: 41-40-101053868 expedida por COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2025	16/01/2027	$ 31.176.264,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27/10/2025	16/01/2027	$ 155.881.321,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/10/2025	26/01/2029	$ 15.588.132,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		$ 31.176.264,20

DESCRIPCIÓN AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/10/2025	16/01/2027	$ 284.700.000,00
CONSTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/10/2025	16/01/2027	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/10/2025	16/01/2027	$ 284.700.000,00

De ante mano agradezco su atención y colaboración a la presente

Atentamente;

ING. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matricula No.: 63202-220004 QND

Anexo: Pólizas de interventoría anexo 1 y 2
Pólizas de obra anexos 4,5,6 y 7

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo Ptyo.
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Puerto Caicedo, 27 de noviembre del 2025

OFI-004

Señores:

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
Contratista de obra
Mocoa, Putumayo.

Ref: Solicitud de documentación correspondiente al informe de obra No. 1 referente al contrato de obra No. 1943-2024 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Cordial saludo;

Con base al asunto, me permito solicitarle al contratista de obra hacer la entrega de la documentación correspondiente al informe de avance No. 1, que corresponde al primer mes de ejecución de la obra en mención y el cual tiene un corte de avance del día 26 de noviembre del presente año.

La interventoría por medio del presente oficio se permite comunicar al contratista de obra CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS que dentro de sus obligaciones establecidas en el contrato se encuentran los informes de obra; por lo anterior en necesario recordarles que deben basarse en los modelos de informes mensuales de la gobernación, teniendo en cuenta que dentro del informe de obra que presenta el contratista, debe estar incluida la documentación e informes de avance técnico, PMT, PAGA, así como la bitácora de obra según los requerimientos incluidos en el contrato.

Cabe resaltar que en oficio anterior (OFI-002 30/10/2025), se le solicitó documentación necesaria la cual debe ir adjunta y soportada junto al informe de obra y se comunicó al contratista de la entrega puntual de este informe de acuerdo a los compromisos adquiridos en reunión de la firma del acta de inicio realizada en la Secretaría de Infraestructura Departamental (SID) donde se estableció la entrega de éste a más tardar el día 27 de cada mes para su revisión por parte de la interventoría, esto teniendo en cuenta el plazo de 9 días para la entrega de los informes de obra e

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

interventoría a partir del corte de avance del mes, según lo comunicado por la supervisión a cargo de la Secretaría de Infraestructura Departamental (SID).

Por lo anterior se le solicita al contratista de obra CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS que de manera urgente haga entrega de la documentación del informe mensual No. 1 conforme a los requisitos establecidos y teniendo en cuenta sus obligaciones como contratista según la cláusula tercera del contrato de obra.

De ante mano agradezco su atención y colaboración a la presente

Atentamente;

ING. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matricula No.: 63202-220004 QND

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Calcedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Puerto Caicedo, 9 de diciembre del 2025

OFI-005

Señores:

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
Contratista de obra
Mocoa, Putumayo.

Ref: Solicitud No. 2 de documentación correspondiente al informe de obra No. 1 referente al contrato de obra No. 1943-2024 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Cordial saludo;

En base al asunto de referencia y en calidad interventor, me permito solicitarle nuevamente al contratista de obra hacer la entrega de la documentación correspondiente al informe de avance No. 1, que corresponde al primer mes de ejecución de la obra en mención y el cual tiene un corte de avance del día 26 de noviembre del presente año y a fecha 05 de diciembre de 2025 se cumplió el plazo para la entrega de los informes respectivos a la entidad contratante.

Se reitera que mediante oficio emitido el dia 27 de noviembre de 2025 con consecutivo OFI-004, se realizo la solicitud de la documentación correspondiente al informe de obra No. 1, y se le recuerda al contratista de obra CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS sus obligaciones, una de la cuales es la entrega de informes de obras de forma periódica, teniendo en cuenta que dentro del informe de obra que presenta el contratista, debe estar incluida la documentación e informes de avance técnico, PMT, PAGA, así como la bitácora de obra según los requerimientos incluidos en el contrato.

La presentación de los informes de obra se debe realizar a más tardar el día 27 de cada mes para su revisión por parte de la interventoria, esto teniendo en cuenta el plazo de 9 días para la entrega de los informes de obra e interventoria a partir del corte de avance del mes, según lo comunicado por la supervisión a cargo de la Secretaría de Infraestructura Departamental (SID).

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo Ptyo.
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Por lo anterior se le solicita al contratista de obra CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS que de manera urgente y reiterada haga entrega de la documentación del informe mensual No. 1 conforme a los requisitos establecidos y teniendo en cuenta sus obligaciones como contratista según la cláusula tercera del contrato de obra.

De ante mano agradezco su atención y colaboración a la presente

Atentamente;



ING. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matricula No.: 63202-220004 QND

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo Ptyo.
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.17 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N°1

PÁGINA	1	DE	1
FECHA	23	10	2025

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CONTRATO No: 1071-2025

Semana Número: 1 Del 27 de octubre de 2025 Al: 2 de noviembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 Dias Corresponde al: 7.14% del Plazo total del Contrato

Supervisor Tecnico de Contrato: VIRGILIO BRAVO SOSA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.44%	0.44%
Valor Basico de la Obra programada:	$ 1,050,000.00	$ 1,050,000.00

	SEMANAL	ACUMULAD
Obra Fisica Ejecutada (%)	5.90%	5.90%
Valor Basico de Obra Ejecutada:	$ 14,228,685.76	$ 14,228,685.76

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
RL. NILSON NOYA MENA

Contrato No: 1943-2025 DEL 11/10/2025
Valor Inicial: $ 241,329,387.00
Valor Actualizado: $ 241,329,387.00
Plazo Inicial: Tres (03) Meses
Plazo Actualizado: Tres (03) Meses
Fecha de Iniciación: 27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento: 26 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO

Contrato No: 1071-2025 DEL 18/07/2025
Valor Inicial: $ 25,222,194.00
Valor Actualizado: $ 25,222,194.00
Plazo Inicial: 3 MESES
Plazo Actualizado: 3 MESES
Fecha de Iniciación: 27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento: 26 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTYIVIDADES EJECUTADAS

Localizacion y replanteo, incluye andenes
Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la siguiente semana se tiene previsto realizar las siguientes actividades en base al cronograma de programación de obra:

Localizacion y replanteo, incluye andenes
Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

S e inicia y se culmina la ejecucion de las actividades programdas si observaciones que afecten el desarrollo de las mismas

OBSERVACIONES

se realizo la localizacion y replanteo del proyecto con ayuda del topografo para el inicio de las actividades de excavacion.

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FRS. Y FECHA DE VISITA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Matricula No.: 63202-220004 QND

CONDICIONES ORIGINALES										
ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR PARCIAL	Semana 1	VALOR PRESENTE SEMANA	VALOR ACUMULADO
	1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**							
1P	1,1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	m²	840	$ 2.500,00	$ 2.100.000,00	840,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
210,2,2	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	268,66	$ 50.821,00	$ 13.653.570,00	238,66	$ 12.128.685,76	$ 12.128.685,76
630	1,3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3,8)	m³	113,4	$ 880.562,00	$ 99.856.731,00		$ -	$ -
221,1	1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	m³	38,11	$ 84.275,00	$ 3.211.720,00		$ -	$ -
320,1	1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	94,5	$ 150.548,00	$ 14.226.786,00		$ -	$ -
232,1	1,6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650	$ 12.699,00	$ 8.254.350,00		$ -	$ -
672,1	1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4,9	$ 675.499,00	$ 3.309.945,00		$ -	$ -
	1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127,1	$ 6.132,00	$ 779.377,00		$ -	$ -
640	1,9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	ml	170	$ 21.826,00	$ 3.710.420,00		$ -	$ -
640	1,1	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	604,4	$ 6.200,00	$ 3.747.280,00		$ -	$ -
640	1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	70,5	$ 11.093,00	$ 782.057,00		$ -	$ -
433P	1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	67,97	$ 17.825,00	$ 1.211.565,00		$ -	$ -
	2	**ANDENES**							
2P	2,1	Excavacion en material comun en seco a mano (Incluye retiro)	m³	36	$ 41.446,00	$ 1.492.056,00		$ -	
610P	2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	42	$ 150.548,00	$ 6.323.016,00		$ -	
0	2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m³	21	$ 677.890,00	$ 14.235.690,00		$ -	
640	2,4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409,59	$ 13.824,00	$ 5.662.172,00		$ -	
	3	**SEÑALIZACION**							
710	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3	$ 502.604,00	$ 1.507.812,00		$ -	
0	3,2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	ml	156,02	$ 15.469,00	$ 2.413.473,00		$ -	
0	3,3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	ml	12,5	$ 28.518,00	$ 356.475,00		$ -	
0	3,4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	200	$ 90.504,00	$ 18.100.800,00		$ -	
0	3,5	Suministro e instalacion de tachas	un	32	$ 18.819,00	$ 602.208,00		$ -	

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 14.228.685,76	$ 14.228.685,76
VALOR EJECUTADO		14.228.685,76500
ACUMULADO ANTERIOR OBRA	0,00	0,00
NUEVO ACUMULADO OBRA	0,00	14.228.685,76
VALOR EJECUTADO EN EL MES	0,00	14.228.685,76
VALOR TOTAL ACUMULADO	0,00	14.228.685,76

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM:	1,1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	UNIDAD:	m²



Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alta (m)		Longitud (m)
Localizacion y replanteo, incluye andenes	8,40	100,00			840,00
					840,00

ITEM:	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desali	UNIDAD:	m³

Descripción	Factor expansion	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo) corte					238,66
					238,66

RL. NELSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

RL. ANTO ANDRES PACHO MUNGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PÁGINA	1	DE	1

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº2

SECRETARIA EJECUTORA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	FECHA	23	10	2025
	CONTRATO No:	1071-2025		

Semana Número: 2 Del 3 de noviembre de 2025 Al 9 de noviembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 14 Dias Corresponde al 14.29% del Plazo total del Contrato

Supervisor Tecnico de Contrato VIRGILIO BRAVO SOSA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUNULADO
Obra programada (%)	1.85%	2.28%
Valor basico de la Obra programada:	$ 4,483,393.00	$ 5,513,393.00

	SEMANAL	ACUMULAD
Obra Fisica Ejecutada (%)	8.43%	14.33%
Valor basico de Obra Ejecutada:	$ 20,345,824.40	$ 34,574,510.16

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	**CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA**
Contrato No.	1943-2025 DEL 11/10/2025
Valor Inicial:	$ 241,329,387.00
Valor Actualizado:	$ 241,329,387.00
Plazo Inicial:	Tres (03) Meses
Plazo Actualizado:	Tres (03) Meses
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**
Contrato No.	1071-2025 DEL 18/07/2025
Valor Inicial:	$ 25,222,194.00
Valor Actualizado:	$ 25,222,194.00
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	3 MESES
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTYIVIDADES EJECUTADAS

Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)
Suministro e instalacion de material seleccionado
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subresente y capas granulares (NT 2400 o similar)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la siguiente semana se tiene previsto realizar las siguientes actividades en base al cronograma de programación de obra:

Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)

REQUERIMIENTO GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Según los resultados de los informes semanales y una revisión visual de la obra, se deduce un avance significativo de la obra pudiéndose decir que en la siguiente semana de da por terminado la ejecución de las actividades contratadas y modificadas.

OBSERVACIONES

Durante el periodo de la presente semana se realizaron actividades de excavacion, realizando el retiro de material del sitio de obra por los ejes ya establecidos con ayuda del teodolito

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FIRMA Y FECHA DE VISITA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Matricula No.: 63202-[illegible]4 QND

CONDICIONES ORIGINALES											
ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR PARCIAL	Semana 1	Semana 2	VALOR PRESENTE SEMANA	VALOR ACUMULADO
	1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**								
1P	1,1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	m²	840	$ 2.500,00	$ 2.100.000,00	840,00		$ -	$ 2.100.000,00
210,2,2	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	268,66	$ 50.821,00	$ 13.653.570,00	238,66	30,00	$ 1.524.630,00	$ 13.653.315,76
630	1,3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)	m³	113,4	$ 880.562,00	$ 99.855.731,00			$ -	$ -
221,1	1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	m³	38,11	$ 84.275,00	$ 3.211.720,00		13,20	$ 1.112.430,00	$ 1.112.430,00
320,1	1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	94,5	$ 150.548,00	$ 14.226.786,00		62,80	$ 9.454.414,40	$ 9.454.414,40
232,1	1,6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650	$ 12.699,00	$ 8.254.350,00		650,00	$ 8.254.350,00	$ 8.254.350,00
672,1	1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4,9	$ 675.499,00	$ 3.309.945,00			$ -	$ -
	1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127,1	$ 6.132,00	$ 779.377,00			$ -	$ -
640	1,9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	ml	170	$ 21.826,00	$ 3.710.420,00			$ -	$ -
640	1,1	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	604,4	$ 6.200,00	$ 3.747.280,00			$ -	$ -
640	1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	70,5	$ 11.093,00	$ 782.057,00			$ -	$ -
433P	1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	67,97	$ 17.825,00	$ 1.211.565,00			$ -	$ -
	2	**ANDENES**								
2P	2,1	Excavacion en material comun en seco a mano (Incluye retiro)	m³	36	$ 41.446,00	$ 1.492.056,00			$ -	
610P	2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	42	$ 150.548,00	$ 6.323.016,00			$ -	
0	2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m³	21	$ 677.890,00	$ 14.235.690,00			$ -	
640	2,4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409,59	$ 13.824,00	$ 5.662.172,00			$ -	
	3	**SEÑALIZACION**								
710	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3	$ 502.604,00	$ 1.507.812,00			$ -	
0	3,2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	ml	156,02	$ 15.469,00	$ 2.413.473,00			$ -	
0	3,3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	ml	12,5	$ 28.518,00	$ 356.475,00			$ -	
0	3,4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	200	$ 90.504,00	$ 18.100.800,00			$ -	
0	3,5	Suministro e instalacion de tachas	un	32	$ 18.819,00	$ 602.208,00			$ -	
		TOTAL COSTO DIRECTO							$ 20.345.824,40	$ 34.574.510,16
		VALOR EJECUTADO								20.345.824,40000
		ACUMULADO ANTERIOR OBRA							0,00	0,00
		NUEVO ACUMULADO OBRA							0,00	20.345.824,40
		VALOR EJEJCUTADO EN EL MES							0,00	34.574.510,16
		VALOR TOTAL ACUMULADO							0,00	34.574.510,16

ITEM:	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desal	UNIDAD:	m³



Descripción	Factor expansion	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo) Terraplen					30,00
					30,00

ITEM:	1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	UNIDAD:	m³

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Suministro e instalacion de material seleccionado					
corte	6	90	0,2	66	13,20
					13,20

ITEM:	1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	UNIDAD:	m³

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).					
via, bordillo, anden					52,80
					52,80

ITEM:	1,6	*Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)*	UNIDAD:	m^2

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Area m2
Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	6,50	100,00			650,00
					650,00

Nilson Moyo

R.L. NILSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

R.L. DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N°3

PÁGINA	1	DE	1
FECHA	23	10	2025

SECRETARIA EJECUTORA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CONTRATO No: 1071-2025

Semana Número: 3 Del 10 de noviembre de 2025 Al: 17 de noviembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 22 Días Corresponde al: 22.45% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato: VIRGILIO BRAVO SOSA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1.41%	3.70%
Valor basico de la Obra programada:	$ 3,413,393.00	$ 8,926,786.00

	SEMANAL	ACUMULAD
Obra Física Ejecutada (%)	2.85%	17.17%
Valor basico de Obra Ejecutada:	$ 6,871,861.85	$ 41,446,172.01

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	**CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA**
Contrato No.	1943-2025 DEL 11/10/2025
Valor Inicial:	$ 241,329,387.00
Valor Actualizado:	$ 241,329,387.00
Plazo Inicial:	Tres (03) Meses
Plazo Actualizado:	Tres (03) Meses
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**
Contrato No.	1071-2025 DEL 18/07/2025
Valor Inicial:	$ 25,222,194.00
Valor Actualizado:	$ 25,222,194.00
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	3 MESES
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTYIVIDADES EJECUTADAS

Suministro e instalacion de material seleccionado

Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la siguiente semana se tiene previsto realizar las siguientes actividades en base al cronograma de programación de obra:

Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)

Suministro e instalacion de material seleccionado

Suministro e instalacion de pavimento para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (MT 240) o similar)

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Según los resultados de los informes semanales y una revisión visual de la obra, se deduce un avance significativo de la obra pudiéndose decir que en la siguiente semana se da por terminado la ejecución de las actividades contratadas y modificadas.

OBSERVACIONES

se realizaron actividades de intalacion de material seleccionado, de igual forma se realizo la compactacion del mismo

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FIRMA Y FECHA DE VISITA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Matricula No. : 63202-220624 CND

CONDICIONES ORIGINALES											
ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR PARCIAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	VALOR PRESENTE SEMANA	VALOR ACUMULADO
	1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**									
1P	1,1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	m²	840	$ 2.500,00	$ 2.100.000,00	840,00			$ -	$ 2.100.000,00
210,2,2	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	268,66	$ 50.821,00	$ 13.653.570,00	238,66	30,00		$ -	$ 13.653.315,76
630	1,3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3,8)	m³	113,4	$ 880.562,00	$ 99.855.731,00				$ -	$ -
221,1	1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	m³	38,11	$ 84.275,00	$ 3.211.720,00		13,20	24,91	$ 2.099.290,25	$ 3.211.720,25
320,1	1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	94,5	$ 150.548,00	$ 14.226.786,00		62,80	31,70	$ 4.772.371,60	$ 14.226.786,00
232,1	1,6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650	$ 12.699,00	$ 8.254.350,00		650,00		$ -	$ 8.254.350,00
672,1	1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4,9	$ 675.499,00	$ 3.309.945,00				$ -	$ -
	1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127,1	$ 6.132,00	$ 779.377,00				$ -	$ -
640	1,9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	ml	170	$ 21.826,00	$ 3.710.420,00				$ -	$ -
640	1,1	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	604,4	$ 6.200,00	$ 3.747.280,00				$ -	$ -
640	1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	70,5	$ 11.093,00	$ 782.057,00				$ -	$ -
433P	1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	67,97	$ 17.825,00	$ 1.211.565,00				$ -	$ -
	2	**ANDENES**									
2P	2,1	Excavacion en material comun en seco a mano (incluye retiro)	m³	36	$ 41.446,00	$ 1.492.056,00				$ -	
610P	2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	42	$ 150.548,00	$ 6.323.016,00				$ -	
0	2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m²	21	$ 677.890,00	$ 14.235.690,00				$ -	
640	2,4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409,59	$ 13.824,00	$ 5.662.172,00				$ -	
	3	**SEÑALIZACION**									
710	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3	$ 502.604,00	$ 1.507.812,00				$ -	
0	3,2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	ml	156,02	$ 15.469,00	$ 2.413.473,00				$ -	
0	3,3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	ml	12,5	$ 28.518,00	$ 356.475,00				$ -	
0	3,4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	200	$ 90.504,00	$ 18.100.800,00				$ -	
0	3,5	Suministro e instalacion de tachas	un	32	$ 18.819,00	$ 602.208,00				$ -	
		TOTAL COSTO DIRECTO								$ 6.871.661,85	$ 41.446.172,01
		VALOR EJECUTADO									**6.871.661,85000**
		ACUMULADO ANTERIOR OBRA								**0,00**	**0,00**
		NUEVO ACUMULADO OBRA								**0,00**	**6.871.661,85**
		VALOR EJEJCUTADO EN EL MES								**0,00**	**41.446.172,01**
		VALOR TOTAL ACUMULADO								**0,00**	**41.446.172,01**

ITEM:	1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	UNIDAD:	m³

Descripcion	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Suministro e instalacion de material seleccionado					24,91
					24,91

ITEM:	2,3	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	UNIDAD:	m³

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)					31,71
					31,70

Nilson Moya

R.L. NELSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

R.L. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N°4

PÁGINA	1	DE	1	
FECHA	23	10	2020	

SECRETARIA EJECUTORA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CONTRATO No: 1071-2025

Semana Número: 4 Del 18 de noviembre de 2025 Al 25 de noviembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 31 Días Corresponde al: 31.83% del Plazo total del Contrato

Supervisor Tecnico de Contrato: VIRGILIO BRAVO SUSA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2.76%	6.46%
Valor basico de la Obra programada:	$ 8,652,925.00	$ 15,579,711.00

	SEMANAL	ACUMULAD
Obra Fisica Ejecutada (%)	41.85%	58.02%
Valor basico de Obra Ejecutada:	$ 100,902,506.08	$ 142,438,770.09

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	**CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA**
Contrato No.	1943-2025 DEL 11/10/2025
Valor Inicial:	$ 241,329,387.00
Valor Actualizado:	$ 241,329,387.00
Plazo Inicial:	Tres (03) Meses
Plazo Actualizado:	Tres (03) Meses
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**
Contrato No.	1071-2025 DEL 18/07/2025
Valor Inicial:	$ 25,222,194.00
Valor Actualizado:	$ 25,222,194.00
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	3 MESES
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTYMIDADES EJECUTADAS

Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)
Bordillos de concreto 3000PSI
Acero de refuerzo 3/8" bordillo
Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la siguiente semana se tiene previsto realizar las siguientes actividades en base al cronograma de programación de obra:

Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)
Suministro e instalacion de material seleccionado
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)

REQUERIMIENTO GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Según los resultados de los informes semanales y una revisión visual de la obra, se deduce un avance significativo de la obra pudiéndose decir que en la siguiente semana de ha por terminado la ejecución de las actividades contratadas y modificadas.

OBSERVACIONES

se realizo la preparacion del equipo y materiales necesarios para la realizacion del concreto según el diseño de mezcla, a medida que avazaba el vaciado de concreto este se vibraba, se realizo toma de ensayos de concreto por parte de interventoria y el contratista de obra, se realizo prueba de acentamineto antes del vaciado de concreto.

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Matricula No.: 63202-220804 QND

CONDICIONES ORIGINALES													
ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR PARCIAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	semana 4	VALOR PRESENTE SEMANA	VALOR ACUMULADO
	1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**										
1P	1,1	Localizacion y replanteo, incluye anderes	m²	840	$ 2.500,00	$ 2.100.000,00	840,00				$ -	$ 2.100.000,00
210,2,2	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	268,66	$ 50.821,00	$ 13.653.570,00	238,66	30,00			$ -	$ 13.653.315,76
630	1,3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3,8)	m³	113,4	$ 880.562,00	$ 99.855.731,00				102,06	$ 89.870.157,72	$ 89.870.157,72
221,1	1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	m³	38,11	$ 84.275,00	$ 3.211.720,00		13,20	24,91		$ -	$ 3.211.720,25
320,1	1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	m³	94,5	$ 150.548,00	$ 14.226.786,00		62,80	31,70		$ -	$ 14.226.786,00
232,1	1,6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650	$ 12.699,00	$ 8.254.350,00		650,00			$ -	$ 8.254.350,00
672,1	1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4,9	$ 675.499,00	$ 3.309.945,00				4,44	$ 2.995.838,07	$ 2.995.838,07
	1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127,1	$ 6.132,00	$ 779.377,00				115,92	$ 710.821,44	$ 710.821,44
640	1,9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI. D 1/4", Pasajuntas	ml	170	$ 21.826,00	$ 3.710.420,00				153,00	$ 3.339.378,00	$ 3.339.378,00
640	1,1	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	604,4	$ 6.200,00	$ 3.747.280,00				543,96	$ 3.372.552,00	$ 3.372.552,00
640	1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	70,5	$ 11.093,00	$ 782.057,00				63,45	$ 703.850,86	$ 703.850,86
433P	1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	67,97	$ 17.825,00	$ 1.211.565,00					$ -	$ -
	2	**ANDENES**										
2P	2,1	Excavacion en material comun en seco a mano (Incluye retiro)	m³	36	$ 41.446,00	$ 1.492.056,00					$ -	
610P	2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	42	$ 150.548,00	$ 6.323.016,00					$ -	
0	2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m²	21	$ 677.890,00	$ 14.235.690,00					$ -	
640	2,4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409,59	$ 13.824,00	$ 5.662.172,00					$ -	
	3	**SEÑALIZACION**										
710	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3	$ 502.604,00	$ 1.507.812,00					$ -	
0	3,2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	ml	156,02	$ 15.469,00	$ 2.413.473,00					$ -	
0	3,3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	ml	12,5	$ 28.518,00	$ 356.475,00					$ -	
0	3,4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	200	$ 90.504,00	$ 18.100.800,00					$ -	
0	3,5	Suministro e instalacion de tachas	un	32	$ 18.819,00	$ 602.208,00					$ -	
		TOTAL COSTO DIRECTO									$ 100.992.598,08	$ 142.438.770,09
		VALOR EJECUTADO										100.992.598,08299
		ACUMULADO ANTERIOR OBRA									0,00	0,00
		NUEVO ACUMULADO OBRA									0,00	100.992.598,08
		VALOR EJEJCUTADO EN EL MES									0,00	142.438.770,09
		VALOR TOTAL ACUMULADO									0,00	142.438.770,09

ITEM:	1.3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)	UNIDAD:	m²

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Un	Volumen (m3)
Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)					102.96
					102,96

ITEM:	1.7	Bordillos de concreto 3000PSI	UNIDAD:	m3

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	Longitud (mt)
Bordillos de concreto 3000PSI					4.44
					4,44

ITEM:	1.8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	UNIDAD:	Kg

Descripción	Long bordillo	# empalmes	Ld (m)	Cant varillas	Varilla diametro	Peso por ml (kg)	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 3/8" bordillo	90	25	0.54	2	3/8"	0,56	115,92
							115,92

ITEM:	1.9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	UNIDAD:	ml

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Kg/ml	Nos.	Peso (Kg)
Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI. D 1/4". Pasajuntas	6,30			24,32	153,00
					153,00

ITEM:	3.10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	UNIDAD:	Kg

Descripción	Ancho (m)	Numero (un)	Largo (m)	Kg/ml	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 7/8" Transversal	21,90	24,32	0,35	3,042	543,96
0					
					543,9600

ITEM:	3.11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	UNIDAD:	Kg

Descripción	Elementos	Cantidad	Largo (m)	Kg/ml	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 1/2" Longitudinal	3,08	24,32	0,85	0,998	63,45
					63,45

Nilson moya

RL. NILSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

R.L. DARIO ANDRES ENCISO ARANGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.18 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1



Fotografia: 1

Localización y replanteo, incluye andenes



Fotografía: 2

Localización y replanteo, incluye andenes

	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	FOTOGRAFÍAS 1 y 2
DAVID ANDRÉS BACIGO ARANGO	INFORME MENSUAL No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 1943-2025 DEL 11 de OCTUBRE DE 2025 GOBERNACION DE PUTUMAYO	26-nov-2025



Fotografía: 3

Localizacion y replanteo, incluye andenes



Fotografía: 4

Instalacion de formaleta

	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	FOTOGRAFÍAS 3 y 4
DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO	INFORME MENSUAL No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 1943-2025 DEL 11 de OCTUBRE DE 2025 GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO	26-nov-2025



Fotografia: 5

Vaciado de concreto



Fotografia: 6

Verificacion de niveles de formaleta y concreto



Fotografía: 7

Instalacion de refuerzo



Fotografía. 8

vibrado de concreto y alisado



Fotografia: 9

Verificacion de espesor de placa



Fotografía: 10

Corte de placa



Fotografía: 11

Acabado de pavimento



Fotografía: 12

Acabado de pavimento

	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	FOTOGRAFÍAS 11 y 12
DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO	INFORME MENSUAL No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 1943-2025 DEL 11 de OCTUBRE DE 2025 GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO	26-nov-2025

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO N o.19 BITACORA DE OBRA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Período comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

1

27 de Octubre 2025

Clima: Mañana Seco - Tarde Seco

Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial.

Actividad: Replanteo y georeferenciación de ejes y bordes de calzada. Coordenadas, hitos o mojones instalados. Verificación con planos. Retiro de capa vegetal, basura y escombros. Áreas despejadas (m^2). Disposición final del material. Corte o terraplén para alcanzar la Cota de Subrasante.

maquinaria: No hay maquinaria

Residente Obra

Residente Interventoría

28 de octubre 2025

Clima: mañana Seco - Tarde Seco

Personal: 1 residente de obra - 2 obreros - 1 almacenista, 1 oficial

Actividad: Replanteo y georeferencia de ejes y bordes de calzada. Coordenadas, hitos o mojones instalados. Verificación con planos. Retiro de capa vegetal, basuras y escombros. Áreas despejadas (m^2). Disposición final del material. Corte o terraplén para alcanzar la cota de Subrasante.

Maquinaria: no hay maquinaria

Residente Obra

Residente Interventoría

2

29 de octubre 2025

maquinaria:

personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 Oficial.

Clima: mañana Seco - Tarde Seco

Actividad: Replanteo y georreferenciación de ejes y borde de calzada. coordenadas, hitos o mojones instalados. Verificación con planos. Retiro de capa Vegetal, basuras y escombros. Area despejada (m²). Disposición final del material. Corte o terraplén para alcanzar la cota de subrasante.

maquinaria: no hay maquinaria

Residente Obra

Residente Interventoria.

30 de octubre 2025

Clima: mañana Seco - Tarde Seco.

Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial

Actividad: Replanteo y georeferenciación de ejes y bordes de calzada. Coordenadas, hitos y mojones instalados. Verificación con planos. Retiro de capa Vegetal, basuras y escombros. Area despejada (m²). Disposición final del material. Corte o terraplén para alcanzar la cota de Subrasante.

maquinaria: no hay maquinaria

Residente Obra

Residente Interventoria.

3

31 de Octubre 2025
Clima: mañana Sdes. Tarde Seco
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 Oficial
Actividad: Replanteo y georreferenciación de ejes y bordes de calzada. Coordenadas, hitos o mojones instalados. Verificación con planos Retiro con de capa Vegetal, basura y escombros. Área despejada (m²). Disposición final del material. Corte o terraplén para alcanzar la cota de Subrasante.
maquinaria: No hay maquinaria

Residente obra

Residente Interventoria

01 de noviembre 2025.
Clima: mañana seco - Tarde lluviosa
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 Oficial.
Actividad: Replanteo y georreferenciación de ejes y bordes de calzada. Coordenadas, hitos o mojones instalados Verificación con planos. Retiro de capa Vegetal, basura y escombros - Area despejada (m²). Disposición final de material. Corte o terraplén para alcanzar la cota del Subrasante.
maquinaria: No hay maquinaria

Residente obra

Residente Interventoria

02 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco - Tarde Seco
No se laboro por ser dia festivo

Residente obra

Residente Interventoria

03 de noviembre 2025.
Clima: mañana seco - Tarde seco.
No se laboro por ser dia festivo

Residente Obra

Residente Interventoria

04 de noviembre 2025.
Clima: mañana Seco - Tarde Seco.
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Replanteo y georeferenciación de ejes y bordes de calzada. Coordenadas, hitos o mojones instalados. Verificaciones con planos. Retiro de capa vegetal, basura y escombros. Area despejada (m²). Disposición final del material. Corte y Traplén para alcanzar la cota de subrasante.
maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibro compactador 9 TON

Residente Obra

Residente Interventoria

05 de noviembre 2025.
Clima: mañana Seco - tarde lluvia leve
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial.
Actividad: Transporte y colocación de material de Subbase (granular o Suelo - cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la Subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la Subbase antes de la siguiente capa.
maquina: Retro Cargador CAT. - Vibro compactador 9 TON

Residente obra

Residente Interventoria.

06 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco - Tarde Seco.
personal: 1 residente de obra, 2 obreros. 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y colocación del material de Subbase (granular o suelo cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm) Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la Subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la Subbase antes de la siguiente capa.
maquinaria: Retro cargador CAT - vibro compactador 9 Ton

G

07 de noviembre 2025.
Clima: mañana Seco - Tarde Seco.
Personal: 1 residente obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial.
Actividad: Transporte y colocación del material de subbase (granular o suelo-cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de medición de espesor de la subbase antes de la siguiente capa.
Maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibro compactador 9TON

Residente obra

Residente Interventoria

08 de noviembre 2025.
Clima: mañana Seco - Tarde lluvia leve.
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y colocación del material de subbase (granular o suelo-cemento) Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladoras. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la siguiente etapa/capa.
Maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibro compactador 9TON

Residente obra

Residente Interventoria

7

09 de noviembre 2025.
Clima: mañana Nublado - Tarde Lluvia
No se labora por ser día festivo

Residente obra

Residente Interventoría

10 de noviembre
Clima: mañana Seco - Tarde Seco.
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y Colocación del material de subbase (granular o suelo-cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la subbase. Tipo de equipo y vibrador. Número de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la siguiente capa.
Maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibro compactador 9 Ton

Residente obra

Residente Interventoría

11 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco - Tarde Seco
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y colocación de material de subbase Granular o Suelo-cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la subbase. Tipo de equipo y vibrador. Número de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la siguiente capa.

8

maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibro compactador 9ton

Residente obra

Residente Interventoria

12 de noviembre 2025
Clima: mañana lluvia - tarde Seco.
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y colocación del material de Subbase Granular suelo - cemento. Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la Superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes - Compactación de la Subbase, Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la Siguiente Capa.
maquinaria : Retro Cargador CAT - Vibrocompactador 9Ton

Residente obra

Residente Interventoria

13 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco - Tarde lluvia.
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y colocación del material de Subbase Granular suelo cemento). Origen y tipo de material Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y Pendientes. Compactación de la Subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la Siguiente Capa.
maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibro compactador 9Ton

Residente obra

Residente Interventoria

9

14 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco - Tarde lluvia
Personal: 1 residente obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y colocación del material de Subbase (granular o suelo cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la Superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la Subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la Siguiente capa.
Maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibrocompactador 9 ton

Residente Obra

Residente Interventoria

15 de noviembre 2025
Clima = mañana lluvia. Tarde Seco
Personal = 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: transporte y colocación del material de Subbase (granular o suelo-cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Origen y tipo de material. Espesor. Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la Subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de medición de espesor de la subbase antes de la Siguiente capa.
Maquinaria: Retro Cargador CAT. Vibrocompactador 9 ton

Residente obra

Residente Interventoria

10

16 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco - Tarde lluvia leve.
No se labora por ser dia Festivo.

Residente obra

Residente Interventoria

17 de noviembre 2025.
Clima: mañana Seco - Tarde Seco.
No se labora por ser dia Festivo.

Residente Obra

Residente Interventoria

18 de noviembre 2025
Clima: mañana lluvia - Tarde Seco.
personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial.
Actividad: transporte y colocación del material de Subbase (granular o Suelo-cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la Superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la subbase. Tipo de equipo y vibrador. Número de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la siguiente capa.
maquinaria: Retro cargador CAT. Vibrocompactador, grar

Residente obra

Residente Interventoria,

19 de noviembre 2025.
Clima: mañana lluvia - Tarde Seco
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros 1 almacenista, 1 Oficial
Actividad: Transporte y colocación del material de subbase (granular o suelo-cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la Subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la siguiente capa.
maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibrocompactador 9Ton

Residente obra

Residente Interventoria

20 de noviembre 2025.
Clima: mañana Seco - Tarde lluvia leve.
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 10 fiscal
Actividad: Transporte y colocación del material de subbase (granular o suelo-cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la siguiente capa
maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibro compactador 9Ton

Residente obra

Residente Interventoria.

12

21 de noviembre 2025
Clima: mañana lluvia - tarde Seco
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial.
Actividad: Transporte y colocación del material de Subbase Cgranular o Suelo Cemento) Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendiente. compactación de la Subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de medciones de espesor de la subbase antes de la siguiente capa.
maquinaria: Retro Cargador CAT Vibro compactador 9 ton

Residente obra

Residente interventoria.

22 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco - tarde Seco.
Personal: 1 residente obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y colocación del material de Subbase Cgranular o Suelo cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm) conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendiente Compactación de Subbase. Tipo de equipo y Vibrador. Numero de pasadas. Resultados de medición de espesor de la subbase antes de la siguiente capa.
maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibrocompactador 9TON

Residente obra

Residente interventoria.

23 de noviembre 2025
Clima: Mañana lluvia leve - Tarde Seco
No se labora por ser dia festivo.

Residente obra

Residente Interventoria

24 de noviembre 2025
Clima: mañana seco - tarde lluvia leves
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Instalación, alineación y aseguramiento de formaletas (metalicas o de madera. Longitud formaleteada (m). Verificación de altura y plomada. colocación de barras pasajuntas (dowel bars) con canastillas. Diámetro, longitud y espaciamiento (cm). Recubrimiento de las barras. Instalación de barras de amarre (tie bars) en juntas longitudinales.
maquinaria: Retro cargador CAT, vibro compactador STON

Residente obra

Residente Interventoria

25 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco tarde Seco
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Instalación, alineación y aseguramiento de formaletas (metalicas o de madera). Longitud formaleteada (m). Verificación de altura y plomada. Colocación de barras pasajuntas (dowel bars) con canastillas. Diámetro, longitud y espaciamiento (cm). Recubrimiento de las barras. Instalación de barras de amarre (tie bars) en juntas longitudes.

14

maquinaria: Retro cargador CAT, Vibro Compactador 5 ton.

26 de noviembre 2025
Clima: mañana lluvia - Tarde Seco.
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: instalación, alineación y aseguramiento de formaletas (metalicas o de madera). Longitud formaleteada (m). Verificación de altura y plomada. colocación de barras pasajuntas (dowel bars) con canastillas. Diámetro, longitud y espaciamiento (cm). Recubrimiento de las barras, instalación de barras de amarre (tie bars) en juntas (longitudes) longitudinales.
maquinaria: Retro cargador CAT. Vibro compactador 5 ton

Residente Obra

Residente Interventoria

27 de noviembre 2025.
Clima: mañana Seco - Tarde Seco.
personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: colocación y distribución del concreto. Area o carril fundido (m²). Temperatura ambiente. Ubicación y hora de colocación. uso de vibradores internos para la consolidación del concreto. Profundidad de penetración y tiempo de vibrado. Uso de reglas vibratorias o manuales y acabados superficiales (float, texturización, banda)
maquinaria: Retro cargador CAT, Vibro compactador 5 ton

Residente obra

Residente Interventoria

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GCO-147
PUTUMAYO GOBERNACIÓN	PROCESO	Gestión de Contratación	VERSIÓN	02
	FORMATO	Lista de Control de Documentos Para Liquidación	FECHA	09/08/2023

1. DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	Tipo de Contrato	Nombre del Contratista y/o razón social	NIT y/o Identificación
1071-2025	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO	1.113.304.913 DE SEVILLA (V)

2. ETAPA POSCONTRACTUAL

Lista de control de documentos para liquidación (marque con una X)						
	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	FOLIOS DE-HASTA	OBSERVACIONES
1	Informe presentado por el contratista (presentar anexos de soporte)			X		
2	Informe final presentado por el interventor, si aplica	X			1-20	Original
3	Bitácora en caso de contratos de obra y/o interventoria (original).	X			21-51	Original
4	Planos récord de final de obra (solo contratos de obra)			X		
5	Registro Fotográfico, de la obra ejecutada, antes de iniciar trabajos, durante la ejecución y ejecutada. Se debe incluir fotografía de le valla.	X			52-57	Original
6	Acta de recibo de la comunidad o entidad a cargo de prestar el servicios, bienes u obras construidas o adecuadas			X		
7	En los casos donde hay equipo de trabajo, se debe aportar los contratos de vinculación junto con las planillas de seguridad social y parafiscales, esto conforme a la vinculación y a los honorarios pactados. (según el caso que corresponda al contrato y propuesta aprobada por el departamento)	X			58-60	Copia

DOCUMENTO CONTROLADO

Lista de control de documentos para liquidación (marque con una X)						
REQUISITOS		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	FOLIOS DE-HASTA	OBSERVACIONES
8	Certificación expedida por el supervisor e interventor (si aplica) y certificación del contador y/o revisor fiscal, donde declare haber verificado las planillas y/o certificaciones del pago de seguridad social del contratista y su equipo mínimo, durante el periodo de ejecución del contrato, base de liquidación que corresponda según el tipo o clase de contrato y propuesta aprobada.	X			61-66	Copia
9	Nota de ingreso y de salida de Almacén Departamental (Cuando se trata de adquisición de bienes)			X		
10	Factura electrónica y/o cuenta de cobro según aplique	X			67	Copia
11	Certificado de distribución de recursos por municipios.			X		
12	Resolución de aprobación de Numeración de Facturación DIAN	X			68-69	Copia
13	Garantías actualizadas conforme a la norma vigente (Pólizas Actualizadas)	X			70-75	Copia
14	Recibo original de Pago del FIC,			X		
15	Certificado SENA de pago del FIC			X		
16	Copia orden de pago y comprobantes de egreso efectuados durante la ejecución del contrato, expedidos por el área de Tesorería de la Gobernación del			X		

DOCUMENTO CONTROLADO

Lista de control de documentos para liquidación (marque con una X)

	REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	FOLIOS DE-HASTA	OBSERVACIONES
	Putumayo, de los valores realmente cancelados.					
17	Liquidación de rendimientos financieros (expedido por la Oficina de Contabilidad del Departamento del Putumayo).			X		
18	Recibo Original de reintegro de rendimientos financieros, anexar certificado de cancelación de la cuenta de manejo del anticipo, emitida por la entidad financiera			X		
19	Soportes financieros de amortización del anticipo, anexar: Documentos del revisor fiscal (contador: Certificado actualizado de la Junta Central de Contadores; Copia de tarjeta profesional de contador y Copia de cedula de ciudadanía)			X		
20	Extracto bancario de cuenta bancaria para manejo del anticipo, conforme al contrato.			X		
21	Copia de la liquidación del pago de estampillas y el recibo de pago.	X			76-77	Copia
22	Certificación del supervisor de la publicación de los documentos como minutas, acta de inicio, Adiciones, Prorrogas, Suspensiones, Reinicio e informes de supervisión y cumplimiento, en la plataforma dispuesta para ello.			X		
23	Oficio de publicación sin fecha (Secop I)			X		

DOCUMENTO CONTROLADO

Lista de control de documentos para liquidación (marque con una X)						
REQUISITOS		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	FOLIOS DE-HASTA	OBSERVACIONES
24	Informe de calidad de la obra y anexos de calidad de materiales.	X			78-124	Original
25	Certificación Bancaria para pago parcial o final (si el pago es a Consorcio o U.T. El pago se realizará a la cuenta aperturada por estas)	X			125	Copia
26	Si el contrato es de Regalías, debe aportar la Certificación expedida por la plataforma GESPROY, que dé cuenta del porcentaje de ejecución conforme al acta de liquidación.			X		
27	Acta de recibo final del contrato	X			126-128	Original
28	Acta de imprevistos cuando aplique	X			129-131	Original
29	ACTA DE ENTREGA DE OBRAS FT-GCO-146			X		
30	Certificación de cumplimiento a satisfacción firmado por el supervisor y el interventor del contrato (cuando aplique)	X			132-133	Original
31	Informe de supervisión y cumplimiento de contrato: formato FT-OC-121.	X			134-137	Original
32	Otros	X			138-473	Original- Copia
33	Formato Acta De Liquidación Bilateral De Contratos o Convenios, Código: FT-OC-023 Versión: 02, y/o resolución de liquidación unilateral.	X			474-479	Original

DOCUMENTO CONTROLADO

	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		CÓDIGO	FT-GCO-147
PUTUMAYO GOBERNACIÓN	PROCESO	Gestión de Contratación	VERSIÓN	02
	FORMATO	Lista de Control de Documentos Para Liquidación	FECHA	09/08/2023

Lista de control de documentos para liquidación (marque con una X)					
REQUISITOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	FOLIOS DE- HASTA	OBSERVACIONES

NOTA:

ADICIONAL A LO ANTERIOR, DEBERÁ VERIFICARSE DE MANERA PARTICULAR, LOS REQUERIMIENTOS, CONDICIONES O DOCUMENTOS REQUERIDOS EN CADA MINUTA CONTRACTUAL Y LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO CONTRACTUAL.

LOS FOLIOS DEBERÁN SEGUIR LA SECUENCIA DEL ÚLTIMO FOLIO QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, Y DE MANERA CONSECUTIVA REALIZAR LA DEBIDA FOLIACIÓN CONFORME AL FORMATO.

LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE HACEN PARTE DEL PROCESO CONTRACTUAL DEBEN REPOSAR EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN.

QUIEN VERIFICA:

KAROLL DANIELA LASSO FERNÁNDEZ

Nombre: VIRGILIO BRAVO SOSA

Cargo: Secretario de Infraestructura Departamental

Firma:



Fecha: 19 de mayo de 2026

Etapa Verificada: POSCONTRACTUAL

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Etapa verificada por la oficina de contracción:

_____

DOCUMENTO CONTROLADO

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1071-2025

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

INFORME 2 Y FINAL DE INTERVENTORIA

Periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025.



Ing. DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Interventor

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA
Contratista de Obra

TOMO No 1

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCION 4

2. INFORMACION BASICA 5

2.1 Fecha de elaboración del informe de interventoría 5

2.2 Nombre del proyecto 5

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

3.1 Localización del proyecto 5

4. LOCALIZACION 6

Ubicación en el territorio nacional y departamental 6

5. Características iniciales del proyecto 7

5.1 Características iniciales del proyecto 7

5.2 Características iniciales del contrato de interventoría 8

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA 9

6.1. Información de contrato de obra inicial 9

6.2. Información de contrato de interventoría 9

7. INFORMACIÓN CONTRATISTA E INTERVENTOR 10

7.1. Información Contratista 10

7.2. Información Personal Contratista 10

7.3. Información Interventor 10

7.4. Información Personal de Interventoría 10

8. RESUMEN EJECUTIVO DE LA OBRA 11

8.1 Generalidades 11

8.2 Avance de obra condiciones iniciales 11

8.3. Resumen contractual inicial – Contrato de obra N° 1943-2024 del 11 de octubre de 202412

9. RESUMEN DE OBRA 12

9.1 Inventario y Estado inicial del Proyecto 12

10. INFORME CONTRATO DE OBRA 13

10.1 Descripción del proyecto. 13
10.2. Inventario y descripción de actividades ejecutadas en el periodo 14
10.3. Inventario y descripción de actividades ejecutadas finales 16
10.4. Aspectos técnicos 19
10.5. Aspectos de diseño 19
10.6. Aspectos ambientales, impacto urbano y seguridad industrial 19
10.7. Seguimiento de seguridad social y parafiscal 22
10.8. Aspectos administrativos y legales 23
10.8.1. Avance Financiero y Control Presupuestal 24
11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 24
11.1. información de garantías y presupuestales del contrato de obra N° 1943-2024 del 11 de octubre de 2024 24
11.2. Información de garantías y presupuestales del contrato de interventoría No 1071 - 2025 de 18 de septiembre de 2025: 32
11.3. Actas de inicio y socialización 34
11.4. Equipo del contratista 34
11.5. Personal del contratista de obra 34
11.6. Estado del tiempo 35
11.7. Control de calidad 35
11.8. Relación de actas contractuales 35
11.9. Registro fotográfico 36
11.10. Relación financiera del contrato de obra 36
11.11. Actividades básicas de interventoría 36
11.12. Control técnico de la obra 36
12. CONCLUSIONES 37
13. ANEXOS 39

TABLA DE CONTENIDO ANEXOS

ANEXO No.1 INFORMACION GENERAL (INCLUYE SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES).

ANEXO No.2 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO – PROGRAMA DE OBRA.

ANEXO No.3 COPIA DE LAS ACTAS DE COMITÉ TECNICO SEMANAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA.

ANEXO No.4 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA.

ANEXO No.5 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.

ANEXO No.6 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.

ANEXO No.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

ANEXO No.8 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATISTA.

ANEXO No.9 INFORMACION RELACIONADA CON EL RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

ANEXO No.10 REVISION Y VERIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR.

ANEXO No.11 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO (INCLUYE SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES).

ANEXO No.12 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA.

ANEXO No.13 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

ANEXO No.14 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

ANEXO No.15 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR.

ANEXO No.16 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

ANEXO No.17 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA.

ANEXO No.18 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

ANEXO No.19 BITACORA DE OBRA.

ANEXO N o.20 PLANOS RECORD.

1. INTRODUCION

En concordancia con los planes de desarrollo departamental se subcribio el contrato N° 1943-2024 del 11 de octubre de 2024, a cargo del contratista CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA cuyo objeto es "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Los recursos de inversión en el marco del contrato mencionado para la realización del proyecto inicialmente, ascienden a la suma DE TRECIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEICIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE. ($ 311.762.641,00).

El inicio del proyecto se suscribió el día 27 de octubre de 2025, fecha en la cual ya se contaba con la adjudicación y selección de la firma de interventoria, la cual se formalizó el día 18 de septiembre de 2025 con el contrato de interventoría No. 1071 del 18/07/2025 a cargo del ingeniero DAVID ANDRES ENCISO ARANGO que tiene como "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO",por un valor de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($25.222.194,00) con duración de (03) dos meses, de cuyo contrato se derivó el acta de inicio de interventoría suscrita el día 27 de octubre de 2025.

2. INFORMACION BASICA

2.1 Fecha de elaboración del informe de interventoria

Fecha de Elaboración del informe	**26 de diciembre del 2025**
Periodo de avance	27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025

2.2 Nombre del proyecto

Contrato de Obra No. 1943-2024 del 11 de octubre de 2024

Objeto: la "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Localización del proyecto

El proyecto denominado la "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". se realiza en la Inspección de Puerto Limón, del municipio de Mocoa – Putumayo, la Inspección de Puerto Limón está ubicado en el departamento del Putumayo. El municipio de Mocoa, está ubicado geográficamente en una Longitud 76° 38'47`` Oeste y en una Latitud 1°08'57`` Norte. Este municipio se localiza en el Departamento de Putumayo, siendo la capital, y a una distancia de Bogotá D.C., Capital de la República de Colombia de 633 Km. La cabecera municipal está sobre de 604 m.s.n.m y posee una extensión de 1263 Km^2 una densidad poblacional de 57.22 Ha/km2, en promedio tiene una temperatura de 22.9ºC. La totalidad de sus territorios son


planos o ligeramente ondulados, pertenecientes a la Amazonia, y por la conformación de su relieve, únicamente ofrecen el piso térmico cálido.

Sin embargo, Puerto Limón fue fundado en 1922. Algunas versiones dicen que su fundación fue impulsada por Fray Anselmo de Olott (Gómez, A. 2005. Kuan, & 2013); otras, consultadas en fuentes audiovisuales y asociaciones espacio temporales de los hechos, mencionan que fue el primer pueblo fundado en el Putumayo por padres capuchinos venidos desde el municipio que hoy se conoce como Santa Rosa, Cauca, lugar donde se reunía la comisión y órdenes religiosas con Sebastián de Belalcázar en las Misiones de la Selva (FEDECAP, 2015, 0m51s). También es destacable que desde 1632, él realizaba misiones provenientes de Quito para la región de Putumayo, Caquetá y Sucumbios, Ecuador (Cabrera, F. 2019). Quien sea su fundador, arribó a Puerto Limón transitando los caminos de indígenas.

El proyecto se localiza específicamente desde el parque principal al embarcadero de la inspección de puerto, tal como se muestra en las siguientes imágenes.

4. LOCALIZACION

Ubicación en el territorio nacional y departamental

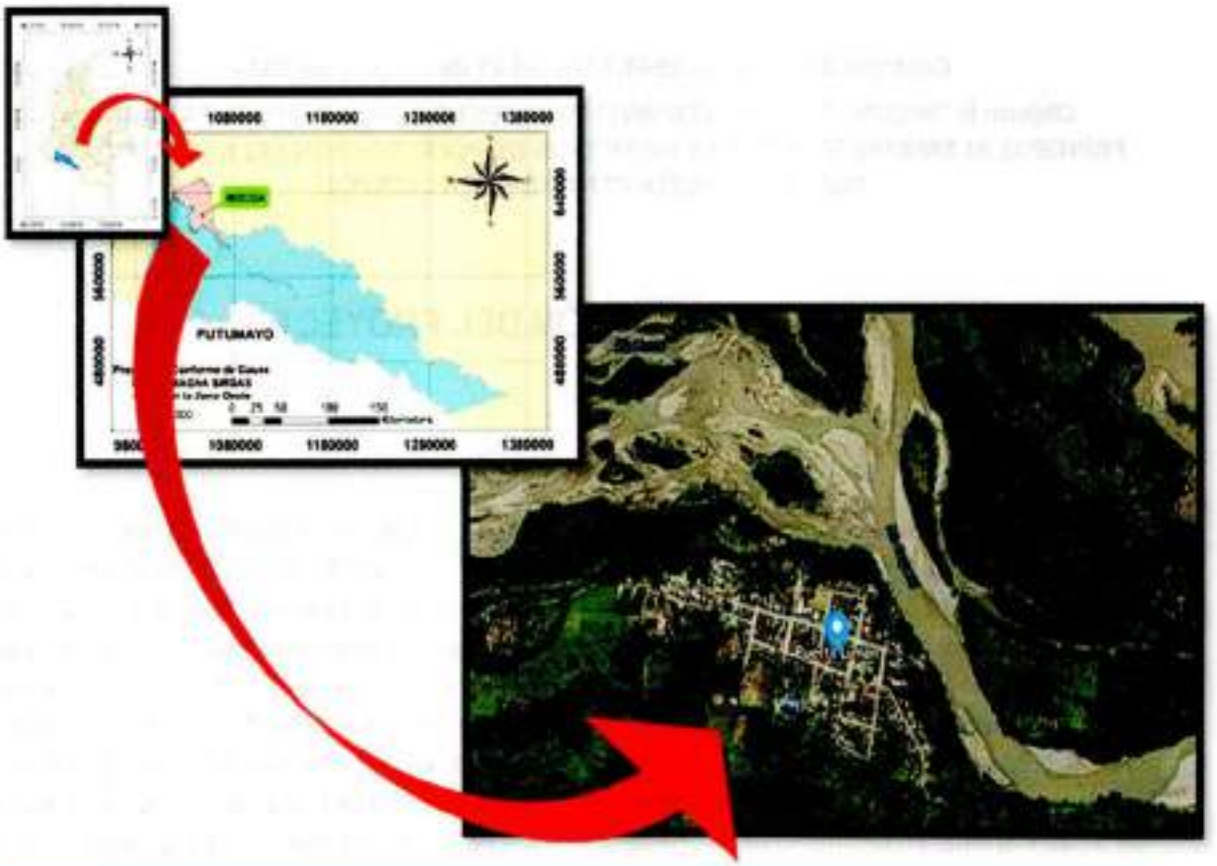



5. Características iniciales del proyecto

5.1 Características iniciales del proyecto

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN ITEMS	VALOR TOTAL
1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	$154.842.801,00
2	ANDENES	$27.712.934,00
3	SEÑALIZACION	$22.980.768,00
TOTAL COSTO DIRECTO		**$205.536.503,00**
ADMINISTRACION (31.32%)		$64.374.033,00
IMPREVISTOS (3%)		$6.166.095,00
UTILIDAD (0%)		$ 00.00
COSTOS INDIRECTOS		**$ 70.540.128,00**
SUBTOTAL OBRA CIVIL		$276.076.631,00
COSTOS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		$35.686.010,00
COSTO TOTAL OBRA		**$ 311.762.641,00**
VALOR APORTADO POR LA GOBERNACION		**$ 241.329.386,00**
VALOR APORTADO POR CONCEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		$ 70.433.255,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**$ 311.762.641,00**
INTERVENTORIA		**$ 25,222,194.00**

5.2 Características iniciales del contrato de interventoría

PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA							
PERSONAL PROFESIONAL							
Concepto	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	
	CANT.	**Sueldo Mensual Básico**	**% de Dedicación**	**Factor Multiplicador**	**Valor Mes (AxBxCxD)**	**Cantidad de Meses**	**Subtotal (ExF)**
Residente de interventoria	1	$ 2.200.000,00	100%	2,10	$ 4.620.000,00	3	$ 13.860.000,00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL (1)							**$ 13.860.000,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS							
Otros Costos Directos			**UNIDAD**		**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
Papeleria			Mes		3	$ 316.023,00	$ 948.069,00
Arriendo Oficina			Mes		3	$ 696.958,00	$ 2.090.874,00
Servicios (energia, agua ecinternet)			Mes		3	$ 150.000,00	$ 450.000,00
Transporte			Dias		3	$ 150.000,00	$ 450.000,00
Ensayos (Cilindros)			Unidad		16	$ 30.000,00	$ 480.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)							**$ 4.418.943,00**
IMPUESTOS							
IMPUESTOS			**PORCENTAJES**			**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Tasa pro deporte			2,5%			$ 528.293,00	$ 528.293,00
Estampilla pro bienestar de adulto mayor			5,0%			$ 1.056.586,00	$ 1.056.586,00
Estampillas ITP			3,0%			$ 633.952,00	$ 633.952,00
Retención en la fuente			2,0%			$ 422.635,00	$ 422.635,00
Reteica			1,0%			$ 211.317,00	$ 211.317,00
SUBTOTAL IMPUESTOS (3)							**$ 2.852.783,00**
						COSTO TOTAL (1+2+3)	**$ 21.131.726,00**
						IVA (19%)	$ 4.015.028,00
						COSTO TOTAL (1+2+3) + IVA (19%)	**$ 25.146.754,00**
POLIZAS							
POLIZAS			**PORCENTAJES**			**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Póliza de calidad			0,3%			$ 75.440,00	$ 75.440,00
Póliza de cumplimiento							
Póliza salarios y prestaciones sociales							
SUBTOTAL POLIZAS (4)							**$ 75.440,00**
VALOR TOTAL DE LA OFERTA							**$ 25.222.194,00**

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA

6.1. Información de contrato de obra inicial

Entidad contratante	**GOBERNACION DEL PUTUMAYO**
Contrato de obra	No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024
Contratista	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA
Valor inicial	TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($311.762.641,00) M/CTE. **APORTE GOBERNACION** ($241.329.386,00) M/CTE. **APORTE CONSEJO COMUNITARIO** ($70.433.255,00) M/CTE.
Valor total	TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($311.762.641,00) M/CTE.
Objeto: " MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".	
Plazo total:	TRES (03) meses a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha de inicio	27 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de terminación	26 DE ENERO DE 2026
Datos de contacto:	VDA La Acacias, Puerto Guzmán, Tel: 3213959011

6.2. Información de contrato de interventoría

Entidad contratante	**GOBERNACION DEL PUTUMAYO**
Aceptación de oferta No.	1071-2025 del 18 de julio 2025
Contratista	ING DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Valor inicial	$ 25,222,194,00
Valor total	$ 25,222,194,00
Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	
Plazo total:	TRES (03) meses a partir de la suscripción del acta de inicio
Fecha de inicio	27 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de terminación	26 DE ENERO DE 2026
Datos de contacto:	ING DAVID ANDRES ENCISO ARANGO

Email: davidencisoa@gmail.com

7. INFORMACIÓN CONTRATISTA E INTERVENTOR

7.1. Información Contratista

CONTRATISTA	**CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**
NIT	901.042.420-9
REPRESENTANTE LEGAL	NILSON MOYA MENA

7.2. Información Personal Contratista

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CARGO
ALVARO MILTON MONTENGRO MARTINEZ	100%	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
LUIS ALVARO ENRIQUEZ PANTOJA	100%	MAESTRO DE OBRA
ERIKA YANIRA RODRIGUEZ NARVAEZ	100%	INGENIERA AMBIENTAL
SANDRO JULIO VALENCIA MEZA	100%	AUXILIAR DE TRANSITO
CORTEZ CABEZAS JOSE JUANITO	100%	AUXILIAR DE TRANSITO

7.3. Información Interventor

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**
IDENTIFICACION CONTRATISTA	CC. 1.113.304.913 Sevilla Valle
MATRICULA PROFESIONAL	N° 63202-220004QND
TIPO DE CONTRATISTA	Persona natural

7.4. Información Personal de Interventoría

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CARGO
DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO	100%	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

8. RESUMEN EJECUTIVO DE LA OBRA

8.1 Generalidades

CONTRATISTA	VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA	APORTE GOBERNACION	APORTE CONSEJO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	F. INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN NO. 1
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA	$311.762.641,00	$ 241.329.386,00	$70.433.255,00	TRES (03) MESES	27 DE OCTUBRE DE 2025	26 DE ENERO DE 2026

8.2 Avance de obra condiciones iniciales

Avance Físico 1	**68,92%**
Avance Físico 2 y final	31,08%
Avance Acumulado	100,00%
Tiempo total transcurrido	**DOS (02) Meses**
Plazo de Ejecución inicial	TRES (03) Meses
Inversión ejecutada en el periodo 1 + AIU	$ 166.335.098,21
Inversión ejecutada en el periodo 2 y final + AIU	$ 74.994.287,79
Inversión ejecutada acumulada + AIU	$ 241.329.386,00
Saldo por ejecutar + AIU	$ 000,00
Valor total del contrato	$ 241.329.386,00

Para el periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2025 al 26 de diciembre del 2025, la obra logro alcanzar un porcentaje de avance físico acumulado del 100,00% equivalente a $ 311.762.641,00, incluyendo el aporte del consejo comunitario ($70.433.255,00) con lo cual se da por terminado la ejecución de las actividades contratadas.

8.3. Resumen contractual inicial – Contrato de obra N° 1943-2024 del 11 de octubre de 2024

RESUMEN CONTRACTUAL	
Contrato de obra:	No. 1943-2024 11/10/2024
Contratista:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA
Plazo inicial:	Tres (03) meses
Plazo total:	Tres (03) meses
Fecha de iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de terminación:	26 de enero de 2026
Costo Directo inicial:	$205.536.503,00
Valor AIU 34.32% inicial:	$ 70.540.128,00
Costo total inicial:	$276.076.631,00
Costos Ambientales y Plan de Manejo de Transito	$35.686.010,00
COSTO TOTAL OBRA	**$ 311.762.641,00**

9. RESUMEN DE OBRA

9.1 Inventario y Estado inicial del Proyecto

El contrato N° 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuenta con un tiempo de ejecución correspondiente a tres (3) meses, proyecto inicial contratado por parte de la secretaria de Infraestructura departamental de la Gobernación del Putumayo, como parte de las obras proyectadas en el plan de desarrollo departamental. A continuación, se presenta el presupuesto oficial y el valor de contrato. Los recursos de inversión en el marco del contrato mencionado para la realización del proyecto inicialmente, ascienden a la suma de **TRECIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEICIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 311.762.641,00)**, cabe resaltar que el contratista ejecutor CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS, aporta al presente contrato un valor de **SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($70.433.255)** equivalente a mano de obra no calificada.

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO DE OBRA						100,00	ML
ESPECIFICACIÓN INVIAS	ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	Valor total
	1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO					$ 154.842.801,00
3P	1,1	Localización y replanteo, (Incluye andenes)	m²	840,00	$ 2.500,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
330,22	1,2	Excavación en material común y mecánica de la explanación (Incluye desalojo)	m³	308,04	$ 50.000,00	$ 15.402.000,00	$ 15.402.000,00
450	1,3	Mejoramiento con concreto hidraulico (MR 5 M)	m³	333,40	$ 480.000,00	$ 160.032.000,00	$ 160.032.000,00
331,2	1,4	Suministro e instalación de material seleccionado	m³	98,11	$ 60.000,00	$ 5.886.600,00	$ 5.886.600,00
320,1	1,5	Subbase granular (Incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	m³	46,50	$ 350.000,00	$ 16.275.000,00	$ 16.275.000,00
210,1	1,6	Suministro e instalación de geotextil para estabilización de suelos de subrasante y capa granular (NT 1800 o similar)	m²	840,00	$ 12.000,00	$ 10.080.000,00	$ 10.080.000,00
410,1	1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	ml	6,00	$ 120.000,00	$ 720.000,00	$ 720.000,00
	1,8	Acero de refuerzo 60P (Incl Dll)	kg	127,10	$ 6.000,00	$ 762.600,00	$ 762.600,00
640	1,10	Construcción acero de refuerzo de 3400 PSI, D 60P, Resistente	m	130,00	$ 45.000,00	$ 5.850.000,00	$ 5.850.000,00
640	1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	kg	900,00	$ 6.200,00	$ 5.580.000,00	$ 5.580.000,00
640	1,12	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	kg	70,50	$ 11.700,00	$ 824.850,00	$ 824.850,00
450,1	1,13	Corte y sellado de losa en fresa y sumidero de lateral	m	97,67	$ 11.400,00	$ 1.113.438,00	$ 1.113.438,00
	2	ANDENES					$ 27.312.834,00
3P	2,1	Excavación en material común en seco a mano (Incluye retiro)	m³	36,00	$ 41.440,00	$ 1.492.054,39	$ 1.492.054,39
610,9	2,2	Subbase granular (Incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	m³	42,00	$ 150.000,00	$ 6.225.000,00	$ 6.225.000,00
	2,3	Andén en concreto clase 2 (3000 PSI) e=0,10 m	m²	25,00	$ 57.000,00	$ 14.235.000,00	$ 14.235.000,00
640	2,4	Malla Electrosoldada No.2 (5 m X 2.15 de 4 mm	kg	409,50	$ 13.800,00	$ 5.652.375,00	$ 5.652.375,00
	3	SEÑALIZACION					$ 22.980.768,00
700	3,2	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, Incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3,00	$ 322.894,00	$ 1.107.861,00	$ 1.107.861,00
	3,3	Demarcación con pintura trafico en frio color amarillo para delimitación vial central	m	196,00	$ 15.400,00	$ 2.402.647,00	$ 2.720.646,00
	3,7	Demarcación con cinta reflectiva en frio color blanco para delimitación vial peatonal y lineas de pare (Incluye microesferas)	m	12,50	$ 28.928,00	$ 184.831,00	$ 184.831,00
	3,8	Demarcación con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (Incluye microesferas)	m	200,00	$ 40.500,00	$ 16.100.800,00	$ 18.100.800,00
	3,9	Suministro e instalación de tachas	un	32,00	$ 28.813,00	$ 922.208,00	$ 922.208,00
Total costos directos							$ 205.336.303,00

Administración	11,12%
Imprevistos	5,00%
Utilidad	0,00%
SUBTOTAL AIU	16,12%

$ 64.326.051,00
$ 10.166.099,00
$ 0,00
$ 79.949.226,00

Subtotal obra civil						$ 276.286.051,00
		COSTOS AMBIENTALES: PTLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 35.486.000,00
		PREVENCION PARA EL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (UNICA)	UND	1,00	$ 10.943.500,00	$ 10.943.500,00
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00	$ 24.742.510,00	$ 24.742.510,00
Costo total obra						$ 311.772.051,00
Valor aportado por la gobernación						$ 241.220.386,00
Valor aportado por Consejo Comunitario Los Alpes						$ 70.551.291,00

10. INFORME CONTRATO DE OBRA

10.1 Descripción del proyecto.

El presente contrato de obra comprende la realización de actividades de:

De acuerdo a las cantidades de obra consignadas en la tabla anterior, se puede determinar que el *porcentaje de avance fisico para el periodo del mes 2 corresponde al 31,08% equivalente a una* inversión de $ 74.994.287,79.

Cuyo avance se encuentra representado principalmente en las actividades de los capítulos :

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.

- Pavimento de concreto hidráulico (MR 3.8)
- Bordillos de concreto 3000PSI
- Acero de refuerzo 3/8" bordillo
- Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasa juntas
- Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal
- Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal
- Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado

ANDENES

- Excavación en material común en seco a mano (Incluye retiro)
- Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
- Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m
- Malla Electrosoldada 6 x 2,35 m 15 X 15 de 4 mm

SEÑALIZACION

- Señal vertical con lamina retro reflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)
- Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central
- Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación paso peatonal y línea de pare (incluye microesferas)
- Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)
- Suministro e instalación de tachas

PAGA Y PMT

- previsión para el plan de adaptación a la guía ambiental
- plan de manejo de transito

En el Anexo 2, se presenta las obras ejecutadas en el periodo 2 y final, así mismo se presenta el registro fotográfico que da veracidad de las actividades realizadas en campo.

Finalmente se expone que el contratista ha cumplido con todas las recomendaciones que han propuesto la interventoría con base a los requerimientos y lo establecido en las normativas vigentes, planos, diseños y especificaciones del proyecto con el fin de que la obra tenga los más altos índices de calidad y funcionalidad.

10.3. Inventario y descripción de actividades ejecutadas finales

De igual manera como se detalla en la tabla anterior, se evidencia que el porcentaje de avance físico acumulado de los periodos 1 y 2 corresponde al 100,00% equivalente al valor total del contrato con una inversión de $ 311.762.641,00 de la cual la gobernación como entidad contratante aporta el valor

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO

- Localización y replanteo, incluye andenes
- Excavación en material común a máquina de la explanación (incluye desalojo)
- Pavimento de concreto hidráulico (MR 3.8)
- Suministro e instalación de material seleccionado
- Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
- Suministro e instalación de geotextil para estabilización de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)
- Bordillos de concreto 3000PSI
- Acero de refuerzo 3/8" bordillo
- Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasa juntas
- Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal
- Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal
- Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado

ANDENES

- Excavación en material común en seco a mano (Incluye retiro)
- Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
- Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m
- Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm

SEÑALIZACION

- Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)
- Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central
- Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación paso peatonal y línea de pare (incluye microesferas)
- Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)
- Suministro e instalación de tachas

10.2. Inventario y descripción de actividades ejecutadas en el periodo

En este numeral se presenta las cantidades de obra ejecutados durante el periodo en consideración, resumida mediante el siguiente cuadro:

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Objeto Contratado:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			**PLAZO:**	TRES (03) MESES		
Objeto Interventoría:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			**FECHA INICIO:**	27/10/2025	**FECHA FIN**	26/01/2026
CONTRATISTA:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	**LUGAR INTERVENTOR:**	Inspeccion de Puerto Limon	**VALOR INICIAL:**	$ 241.329.386,00	**% AVANCE**	100,00%
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	**INTERVENTOR:**	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO	**VALOR ACUMULADO:**	$ 241.329.386,00		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACTA MES 1 CANT.	ACTA MES 1 VR. TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VR TOTAL	ACUMULADO TOTAL CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL VR TOTAL
1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**										
1.1	Localización y replanteo, incluye andenes	m²	840,00	$ 7.500,00	$ 2.100.000,00	840,00	$ 2.100.000,00		$ -	840,00	$ 2.100.000,00
1.2	Excavación en material común a máquina de la explanación (incluye desalojo)	m³	268,66	$ 50.821,00	$ 13.653.570,00	268,660	$ 13.653.569,86		$ -	268,66	$ 13.653.570,00
1.3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3,8)	m³	113,40	$ 869.982,00	$ 98.655.731,00	102,06	$ 88.870.157,72	11,34	$ 9.985.573,28	113,40	$ 98.855.731,00
1.4	Suministro e instalación de material seleccionado	m³	38,11	$ 84.273,00	$ 3.211.720,00	38,11	$ 3.211.720,25	-	$ -	38,11	$ 3.211.720,00
1.5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	94,50	$ 158.548,00	$ 14.226.786,00	94,58	$ 14.226.786,00	-	$ -	94,50	$ 14.226.786,00
1.6	Suministro e instalación de geotextil para estabilización de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650,00	$ 12.699,00	$ 8.254.350,00	650,00	$ 8.254.350,00	-	$ -	650,00	$ 8.254.350,00
1.7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4,90	$ 675.499,00	$ 3.309.945,00	4,44	$ 2.995.838,07	0,46	$ 314.107,04	4,90	$ 3.309.945,00
1.8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127,10	$ 6.132,00	$ 779.377,00	115,92	$ 710.821,44	11,18	$ 68.555,76	127,10	$ 779.377,00
1.90	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasa juntas	ml	170,00	$ 21.624,00	$ 3.716.420,00	153,00	$ 3.339.378,00	17,00	$ 371.042,00	170,00	$ 3.710.420,00
1.10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	654,40	$ 4.590,00	$ 3.747.388,00	543,96	$ 3.372.555,00	60,44	$ 374.738,00	654,40	$ 3.747.380,00
1.11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	70,50	$ 11.094,00	$ 781.857,00	63,45	$ 703.850,66	7,0500	$ 78.206,65	70,50	$ 781.057,00
1.12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	67,97	$ 17.823,00	$ 1.211.560,00		$ -	67,97	$ 1.211.560,23	67,97	$ 1.211.560,00
2	**ANDENES**							-	$ -	0,00	$ -
2.1	Excavación en material común en seco a mano (incluye retiro)	m³	36,00	$ 41.448,00	$ 1.492.056,00		$ -	36,00	$ 1.492.056,00	36,00	$ 1.492.056,00
2.2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	42,00	$ 158.548,00	$ 6.323.016,00		$ -	42,00	$ 6.323.016,00	42,00	$ 6.323.016,00
2.3	Andén en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m²	21,00	$ 677.990,00	$ 14.237.790,00		$ -	21,00	$ 14.237.790,00	21,00	$ 14.237.790,00
2.4	Malla Electrosoldada 6 x 2,35 m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409,59	$ 13.824,00	$ 5.662.172,00		$ -	409,59	$ 5.662.172,16	409,59	$ 5.662.172,00
3	**SEÑALIZACION**							-	$ -	0,00	$ -
3.1	Señal vertical con lamina retro reflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3,00	$ 662.604,00	$ 1.987.812,00		$ -	3,00	$ 1.987.812,00	3,00	$ 1.987.812,00
3.2	Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central	ml	156,02	$ 15.469,00	$ 2.413.473,00		$ -	156,02	$ 2.413.473,38	156,02	$ 2.413.473,00
3.3	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación paso peatonal y línea de pare (incluye microesferas)	ml	12,90	$ 26.518,00	$ 356.476,00		$ -	12,90	$ 356.475,00	12,90	$ 356.475,00
3.4	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	290,00	$ 90.564,00	$ 18.100.800,00		$ -	306,00	$ 18.100.800,00	290,00	$ 18.100.800,00
3.5	Suministro e instalación de tachas	un	32,00	$ 19.819,00	$ 602.208,00		$ -	32,00	$ 602.208,00	32,00	$ 602.208,00
				COSTO DIRECTO DE OBRA	$ 280.530.503,00		$ 142.439.824,19		$ 62.997.479,32		$ 280.530.503,00
ADMINISTRACION		31,32%			$ 84.374.033,00		$ 46.611.902,00		$ 19.762.131,00		$ 84.374.033,00
IMPREVISTOS		3,00%			$ 8.166.095,00		$ 4.371.171,00		$ 1.892.924,00		$ 8.166.095,00
UTILIDAD		0,00%			$ -		$ -		$ -		$ -
		34,32%			$ 76.540.128,00		$ 40.691.073,00		$ 21.655.055,00		$ 76.540.128,00
					$ 276.076.631,00		$ 191.236.897,00		$ 84.752.534,00		$ 276.076.631,00
	COSTOS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 35.666.910,00		$ 23.821.910,00		$ 11.844.000,00		$ 35.666.910,00
	PREVISION PARA EL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	UND	1,00		$ 10.940.500,00		$ 8.306.500,00		$ 2.634.000,00		$ 10.940.500,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00		$ 24.742.510,00		$ 15.515.410,00		$ 9.230.000,00		$ 24.742.510,00
				Valor total del proyecto	$ 311.702.641,00		$ 215.146.107,00		$ 96.616.534,00		$ 311.702.641,00
				Valor aportado por Consejo Comunitario Las Acacias	-$ 70.433.255,00		-$ 48.911.069,79		-$ 21.522.265,21		-$ 70.433.255,00
				Valor aportado por la gobernacion	$ 241.329.386,00		$ 166.234.695,21		$ 74.994.317,79		$ 241.329.386,00

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo Ptyo.
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

de $ 241.329.386,00 y el contratista ejecutor CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS aporta el valor *de $70.433.255 que corresponde a la mano de obra no calificada como se describe a continuación:*

Actividades finales ejecutadas:

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.

- Localización y replanteo, incluye andenes
- Excavación en material común a máquina de la explanación (incluye desalojo)
- Pavimento de concreto hidráulico (MR 3.8)
- Suministro e instalación de material seleccionado
- Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)
- Suministro e instalación de geotextil para estabilización de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)
- Bordillos de concreto 3000PSI
- Acero de refuerzo 3/8" bordillo
- Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasa juntas
- Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal
- Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal
- Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado

ANDENES

- Excavación en material común en seco a mano (Incluye retiro)
- Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
- Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m
- Malla Electrosoldada 6 x 2,35 m 15 X 15 de 4 mm

SEÑALIZACION

- Señal vertical con lamina retro reflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)
- Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central
- Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)
- Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)
- Suministro e instalación de tachas

PAGA Y PMT

- previsión para el plan de adaptación a la guía ambiental
- plan de manejo de transito

Mano de obra no calificada aportada por el contratista:

ESPECIFICACION INVIAS	ITEM	Descripción	MONC
	1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	
1P	1,1	Localización y replanteo, incluye andenes	423.108,00

210,2,2	1,2	Excavación en material común a máquina de la explanación (incluye *desalojo*)	183.236,00
630	1,3	Pavimento de concreto hidráulico (MR 3.8)	16.573.513,00
221,1	1,4	Suministro e instalación de material seleccionado	30.327,00
320.1	1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	94.012,00
232,1	1,6	Suministro e instalación de geotextil para estabilización de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	969.636,00
672,1	1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	417.749,00
	1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	148.991,00
640	1,90	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	882.192,00
640	1,10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	360.645,00
640	1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	42.067,00
433P	1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	303.828,00
	2	**ANDENES**	
2P	2,1	Excavación en material común en seco a mano (Incluye retiro)	716.135,00
610P	2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	41.783,00
	2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	1.790.352,00
640	2,4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	36.577.715,00
	3	**SEÑALIZACION**	
710	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y andaje)	56.269,00
	3,2	Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central	1.216.315,00
	3,3	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación paso peatonal y línea de pare (incluye microesferas)	179.652,00
	3,4	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	9.122.236,00
	3,5	Suministro e instalación de tachas	303.494,00
SUBTOTAL			**70.433.255,00**

10.4. Aspectos técnicos

La interventoría en cumplimiento con su objeto contractual realiza un control minucioso de la ejecución del proyecto por parte del contratista, para velar por la correcta ejecución de los ítems proyectados de manera segura, eficiente y acorde a la reglamentación que rige cada una de las actividades a realizarse, como también vigilar la calidad de los materiales, equipos y productos a usarse, de manera que se ocupe el menor tiempo posible y con los costos contratados, así pues el resultado sea un producto que cumpla con estándares requeridos que brinden a la comunidad el bienestar deseado.

En la ejecución comprendida en este periodo se exigió por parte de la interventoría el cumplimiento de los planos y las especificaciones de diseño, materiales de construcción, concepto de especialistas etc.

La interventoría comprometida con la responsabilidad civil y contractual realizo una vigilancia de todos los procesos llevados a cabo en obra.

10.5. Aspectos de diseño

El contratista ha cumplido hasta el momento con lo trazado en planos y la entrega de los mismos para revisión y aprobación por parte de interventoría.

Los diseños que rigen el proyecto corresponden principalmente a:

- Subbase granular
- Pavimento de concreto hidráulico
- señalización

10.6. Aspectos ambientales, impacto urbano y seguridad industrial

Para la ejecución de este trabajo el contratista cuenta con un profesional de salud ocupacional que es el encargado de ejecutar actividades de HSEQ como:

- Inducción para el ingreso de trabajo.
- Afiliaciones a seguridad social.
- Entrega de dotación y EPIS.
- Inspecciones de obra.
- Acciones correctivas en hallazgos encontrados.

Por parte del contratista se presenta la Previsión Para El Plan De Adaptación A La Guía Ambiental *(PAGA) y se realizó la implementación de este documento y seguimiento por parte de la interventoría* de la inversión de acuerdo al presupuesto establecido en el proyecto.

Informe de gestión ambiental, se presenta el desglose presupuesto contratado y la ejecución de las actividades contratadas se evidencia en el informe correspondiente incluido en el anexo de informe de obra.

PRESUPUESTO PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL				
Programa 1: Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental				
De gestión integral de residuos sólidos (ordinarios, orgánicos, reciclables, escombros y peligrosos)				
Descripción	**Unidad**	**Cant.**	**Valor unitario**	**Valor total**
Punto Ecológico Bolsa De 65 X 80 Paquete X 100 Unidades	Unidad	1	$ 69.800,00	$ 69.800,00
	Mes	2		
			Subtotal	$ 69.800,00
Programa 2: Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipo				
Uso y almacenamiento adecuado de materiales y elementos de construcción				
Descripción	**Unidad**	**Cant.**	**Valor unitario**	**Valor total**
Cinta delimitadora de peligro para demarcación de zonas de almacenamiento	Rollo	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00
Fichas de seguridad almacenamiento	Unidad	3	$ 10.000,00	$ 30.000,00
Señalización	Global	3	$ 300.000,00	$ 900.000,00
Valla informativa	Global	2	$ 550.000,00	$ 1.100.000,00
Extintor multipropósito	Unidad	1	$ 120.000,00	$ 120.000,00
			Subtotal	$ 2.170.000,00
Programa 3: Actividades Constructivas				
Residuos solidos				
Descripción	**Unidad**	**Cant.**	**Valor unitario**	**Valor total**
Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.	Global	2	$ -	$ -
			Subtotal	$ -
Programa 4: Conservación y protección de la fauna y flora				
Descripción	**Unidad**	**Cant.**	**Valor unitario**	**Valor total**
Manejo de descapote y cobertura vegetal.	Global	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
Recuperación de áreas afectadas	Global	2	$ -	$ -
Protección de fauna.	Global	2	$ 100.000,00	$ 200.000,00
			Subtotal	$ 300.000,00
Programa 5: Manejo de aguas superficiales				
Descripción	**Unidad**	**Cant.**	**Valor unitario**	**Valor total**

Proyecto de manejo de aguas superficiales. Permisos		0	$ -	$ -
			Subtotal	$ -
Programa 6: Manejo de campamentos e instalaciones temporales				
Descripción	**Unidad**	**Cant.**	**Valor unitario**	**Valor total**
Botiquín	Unidad	1	$ 187.700,00	$ 187.700,00
Camilla	Unidad	1	$ 135.000,00	$ 135.000,00
4	Bidón	4	$ 9.000,00	$ 36.000,00
			Subtotal	$ 358.700,00
Programa 7: Gestión Social				
Descripción	**Unidad**	**Cant.**	**Valor unitario**	**Valor total**
Material informativo	Unidad	50	$ 1.000,00	$ 50.000,00
Mesa	Unidad	1	$ 75.000,00	$ 75.000,00
Silla	Unidad	1	$ 45.000,00	$ 45.000,00
Lapiceros	Unidad	3	$ 1.000,00	$ 3.000,00
			Subtotal	$ 173.000,00
Programa 8: Educación ambiental y capacitación a trabajadores				
Descripción	**Unidad**	**Cant.**	**Valor unitario**	**Valor total**
Capacitación y Educación Ambiental	Global	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00
			Subtotal	$ 150.000,00
IMPEMENTACION DEL PMA				
Descripción	**Sueldo mes básico**	**% dedicación**	**No. Mes**	**Valor total**
Tecnólogo Ambiental	$ 1.950,00	165	$ 3,00	$ 7.722.000,00
			Subtotal	$ 7.722.000,00
			Total	$ 10.943.500,00

Por parte del contratista se presenta el programa de Manejo de tránsito y se realizó la implementación de este documento y seguimiento por parte de la interventoría de la inversión de acuerdo al presupuesto establecido en el proyecto.

Se presenta el desglose del presupuesto PMT, y sus evidencias de ejecución se encuentra en el informe presentado por parte del contratista de obra, incluido en el anexo de informe de obra.

PMT				
MANO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**TIEMPO MESES**	**VALOR MES**	**VALOR SOBRE COSTO TOTAL**
AUXILIAR DE TRANSITO	2,00	3,00	$ 1.300.000,00	$ 14.430.000,00

Factor multiplicador				$	1,85
TOTAL MANO DE OBRA				**$**	**14.430.000,00**

GASTOS OPERACIONALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
		MANEJO DE TRANSITO		
SRO-4 PARE / SIGA	UND	2,00	$ 68.885,00	$ 137.770,00
		SEÑALES INFORMATIVAS		
SEÑAL SIO-02 INICIO DE OBRA	UND	2,00	$ 551.885,00	$ 1.103.770,00
SEÑAL SIO-03 FIN DE OBRA	UND	2,00	$ 551.885,00	$ 1.103.770,00
		SEÑALES PREVENTIVAS		
SEÑAL SPO-01 TRABAJOS EN LA VIA	UND	2,00	$ 551.885,00	$ 1.103.770,00
SEÑAL SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	UND	2,00	$ 551.885,00	$ 1.103.770,00
SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRANSITO	UND	2,00	$ 551.885,00	$ 1.103.770,00
		SEÑALES REGLAMENTARIAS		
SEÑAL SRO-02 PROHIBIDO PARQUEAR O DETENERSE	UND	2,00	$ 551.885,00	$ 1.103.770,00
		SEÑALES CANALIZACION		
CINTA PELIGRO	ROLLO/100M	10,00	$ 28.635,00	$ 286.350,00
DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UND	40,00	$ 54.050,00	$ 2.162.000,00
BARRICADAS DE LISTONES (FIG 4-15 MANUAL DE SEÑALIZACION MINTRANSPORTE)	UND	2,00	$ 551.885,00	$ 1.103.770,00

COSTO TOTAL EQUIPO	**$**	**10.312.510,00**
COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA	$	14.430.000,00
COSTO TOTAL EQUIPO	$	10.312.510,00
COSTO TOTAL	**$**	**24.742.510,00**

10.7. Seguimiento de seguridad social y parafiscal

Cumpliendo con los requerimientos dados por la Interventoría y la secretaria de infraestructura departamental, el personal empleado por el contratista debe cumplir con los requisitos de la ley 100, código sustantivo del trabajo Decreto 1072 del 2015, (Afiliación a ARP, EPS, Pensión, Caja de compensación, Sena e ICBF).

Por parte de la interventoría se ha manifestado al contratista hacer entrega de los documentos en lo *referente a las Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social EPS, ARL y AFL del personal de la obra y del* personal administrativo. Ver Anexo N°10.

Así mismo, el personal ha contado con la dotación y los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de este tipo de trabajos.

10.8. Aspectos administrativos y legales

CLÁUSULA OCTAVA - FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES:

El aporte que realizará el **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($241.329.386,00),** de los cuales será destinado a la obra, el cual será transferido por el Departamento del Putumayo, de la siguiente manera:

ANTICIPO: La Entidad entregará en calidad de anticipo, un 50% del valor total del aporte del Departamento en el contrato, previo perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de legalización y de ejecución del contrato, así como firma del acta de inicio por parte del Representante del Consejo Comunitario, el supervisor designado y el interventor contratado.

Para lo anterior se deberá anexar copia del contrato, documentos soporte legalización, fotocopia del RUT, documento de identificación del Representante legal del consejo comunitario plan de inversión del anticipo aprobado por la supervisión e interventoría y certificación bancaria de cuenta de ahorros conjunta que se apertura a nombre de contrato para el manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo, recursos que únicamente podrán ser retirados por autorización del supervisor e interventor designados. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados pertenecerán al tesoro departamental-siendo, por ello consignados a favor del Departamento y de tal evento se deberá dejar constancia en el acta de liquidación. El valor del anticipo, será amortizado de acuerdo con lo establecido para el manejo de estos recursos y según las cantidades -de obra ejecutadas, amortizándose de manera gradual en las actas parciales de ejecución por el 50% del valor que se pretende cobrar en cada acta hasta cubrir el monto total desembolsado a título de anticipo.

Hasta el 90% del valor total del contrato en actas parciales de obra, siempre y cuando el porcentaje de ejecución física sea igual al 90% del valor aportado por el Departamento.

10.8.1. Avance Financiero y Control Presupuestal

A continuación, se presenta un resumen de los aspectos financieros del proyecto hasta la fecha:

Periodo 1: Comprendido del 27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre del 2025: Las actividades ejecutadas por el contratista durante este periodo están relacionadas en el Acta de Avance Parcial de Obra N° 01 en el que se presenta un avance en Inversión en este periodo de aproximadamente $ 166.335.098,21 con un avance porcentual de 68,92% del valor contratado.

Periodo 2 y final: Comprendido del 27 de noviembre de 2025 al 26 de diciembre del 2025: Las actividades ejecutadas por el contratista durante este periodo están relacionadas en el Acta de Avance Parcial de Obra N° 02 y final en el que se presenta un avance en Inversión en este periodo de aproximadamente $ 74.994.287,79, con un avance porcentual de 100,00% del valor contratado, con lo cual se da por terminadas la ejecución de las actividades de obra contratadas.

11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

11.1. información de garantías y presupuestales del contrato de obra N° 1943-2024 del 11 de octubre de 2024

ANEXO 0: Póliza de cumplimiento 41-44-101287134, el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	11/10/2024	31/07/2025	$ 31.176.264,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/10/2024	31/07/2025	$ 155.881.321,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E IND.	11/10/2024	11/01/2028	$ 15.588.132.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 31.176.264,20
CALIDAD DEL SERVICIO	11/10/2024	31/07/2025	$ 31.176.264,20

ANEXO 0: Póliza de Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento RCE 41-40-*101053868, garantiza la responsabilidad civil extracontractual del contrato No. 1943-2024 del 11 de* octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	11/10/2024	11/01/2025	$ 260.000.000,00

ANEXO 1: Póliza de Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento RCE 41-40-101053868, El objeto de la presente póliza es garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas de contrato no. 1943-2024 celebrado entre las partes, relacionado con MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Mediante el presente anexo se aclara.

- Beneficiarios. Departamento del putumayo y terceros afectados.
- *Los demás términos y condiciones no se modifican.*

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	11/10/2024	11/01/2025	$ 260.000.000,00

ANEXO 1: Póliza de cumplimiento 41-44-101287134, el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ACLARACIONES:

Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo mediante el presente anexo se actualiza las vigencias del amparo estabilidad y calidad de la obra por el termino de cinco (5) años, conforme modificatorio 1 del 16 de septiembre del 2025 al contrato no 1943-2024, los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	11/10/2024	31/07/2025	$ 31.176.264,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/10/2024	31/07/2025	$ 155.881.321,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E IND.	11/10/2024	11/01/2028	$ 15.588.132.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 31.176.264,20
CALIDAD DEL SERVICIO	11/10/2024	31/07/2025	$ 31.176.264,20

ANEXO 2: Póliza de Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento 41-40-101053868, garantiza la responsabilidad civil extracontractual del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Mediante el presente anexo se informa que la póliza arriba citada se esta teniendo en cuenta la modificación No. 01 del 16 de septiembre del 2025 al contrato No. 1943-2024, los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	11/10/2024	11/01/2025	$ 260.000.000,00

ANEXO 2: Póliza de cumplimiento 41-44-101287134, el pago de los perjuicios derivados del *incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas del contrato No. 1943-2024 del 11 de* octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ACLARACIONES:

Mediante el presente anexo se suprime el amparo de calidad de servicio, conforme al modificatorio No. 1 del 16 de septiembre de 2025. Los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO

CUMPLIMIENTO	11/10/2024	31/07/2025	$ 31.176.264,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/10/2024	31/07/2025	$ 155.881.321,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E IND.	11/10/2024	11/01/2028	$ 15.588.132.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 31.176.264,20

ANEXO 3: Póliza de Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento 41-40-101053868, garantiza la responsabilidad civil extracontractual del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Mediante el presente anexo se aumenta el valor asegurado a 200 SMMLV vigencia del 2025 y se prorroga las vigencias de la póliza arriba conforme oficio No. SID-2025-2453 del 02 de octubre del 2025, los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	11/10/2024	11/01/2025	$ 284.700.000,00

ANEXO 3: Póliza de cumplimiento 41-44-101287134, el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ACLARACIONES:

Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta a satisfacción del mismo mediante el presente anexo se prorroga las vigencias de la póliza arriba citada conforme. Oficio No. SID-2025-2453 del 02 de octubre del 2025, los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	11/10/2024	31/12/2025	$ 31.176.264,20

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**11/10/2024**	**31/12/2025**	**$ 155.881.321,00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E IND.	**11/10/2024**	**11/01/2028**	**$ 15.588.132.10**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS**		**$ 31.176.264,20**

ANEXO 4: Póliza de Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento 41-40-101053868, garantiza la responsabilidad civil extracontractual del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Mediante el presente se aumenta el valor asegurado a 200 SMMLV vigencia del 2025 y se prorroga las vigencias de la póliza arriba conforme oficio No. SID-2025-2453 del 02 de octubre del 2025, los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	11/10/2024	31/12/2025	$ 284.700.000,00

ANEXO 4: Póliza de cumplimiento 41-44-101287134, el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ACLARACIONES:

Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta a satisfacción del mismo mediante el presente anexo se aplica el acta de inicio a partir del 27 de octubre de 2025, los demás términos y condiciones no se modifican.

ANEXO 5: Póliza de Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento 41-40-101053868, garantiza la responsabilidad civil extracontractual del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Mediante el presente anexo se aclara:

Beneficiarios: departamento del putumayo y terceros afectados

Los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	11/10/2024	31/12/2025	$ 284.700.000,00

ANEXO 5: Póliza de cumplimiento 41-44-101287134, el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ACLARACIONES:

Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo mediante el presente anexo se aplica el acta de inicio a partir del 27 de octubre del 2025, los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	27/10/2025	16/01/2027	$ 31.176.264,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/10/2025	16/01/2027	$ 155.881.321,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E IND.	27/10/2025	26/01/2029	$ 15.588.132.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 31.176.264,20

ANEXO 6: Póliza de Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento 41-40-101053868, garantiza la responsabilidad civil extracontractual del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Mediante el presente anexo se aplica el acta de inicio a partir del 27 de octubre del 2025, los demás términos y condiciones no se modifican

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	11/10/2024	31/12/2025	$ 284.700.000,00

ANEXO 6: Póliza de cumplimiento 41-44-101287134, el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ACLARACIONES:

- Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo mediante el presente anexo se aclara que la póliza arriba citada tiene en cuenta que el anexo 4 y 5:

Asegurados: contratista y entidad contratante (departamento del putumayo)

Beneficiarios: terceros afectados y entidad contratante (departamento del putumayo)

Los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	27/10/2025	16/01/2027	$ 31.176.264,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/10/2025	16/01/2027	$ 155.881.321,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E IND.	27/10/2025	26/01/2029	$ 15.588.132.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 31.176.264,20

ANEXO 7: Póliza de Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento 41-40-101053868, garantiza la responsabilidad civil extracontractual del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Mediante el presente anexo se aplica el acta de inicio a partir el 27 de octubre del 2025, los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	27/10/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00

ANEXO 8: Póliza de Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento 41-40-101053868, garantiza la responsabilidad civil extracontractual del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Mediante el presente anexo se aclara que la póliza arriba citada tiene en cuenta que el anexo 6 y 7: asegurados: contratista y entidad contratante (departamento del putumayo)

Beneficiarios: terceros afectados y entidad contratante (departamento del putumayo)

Los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	27/10/2025	16/01/2027	$ 284.700.000,00

ANEXO 7: Póliza de cumplimiento 41-44-101287134, el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ACLARACIONES:

- Mediante el presente anexo se aplica el acta de recibo final de obra a partir del 4 de marzo del 2026.
- Los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	27/10/2025	16/01/2027	$ 31.176.264,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/10/2025	16/01/2027	$ 155.881.321,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E IND.	**27/10/2025**	**26/01/2029**	**$ 15.588.132.10**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS**		**$ 31.176.264,20**

ANEXO 8: Póliza de cumplimiento 41-44-101287134, el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas del contrato No. 1943-2024 del 11 de octubre del 2024 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

ACLARACIONES:

- Mediante el presente anexo se actualiza la vigencia del amparo de estabilidad y calidad de la obra a partir del 04 de marzo del 2026hasta el 04 de marzo de 2031, conforme al acta de recibo final de obra.
- Los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	27/10/2025	16/01/2027	$ 31.176.264,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/10/2025	16/01/2027	$ 155.881.321,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E IND.	27/10/2025	26/01/2029	$ 15.588.132.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	04/03/2026	04/03/2031	$ 31.176.264,20

11.2. Información de garantías y presupuestales del contrato de interventoría No 1071 - 2025 de 18 de septiembre de 2025:

ANEXO 0: el pago de los perjuicios causados con ocasión del incumplimiento de las obligaciones contractuales, en desarrollo del contrato de interventoría no. 1071-2025 cuyo objeto es "mejoramiento mediante pavimento rigido desde el parque principal al embarcadero de la inspección de puerto limón, del municipio de Mocoa, departamento del putumayo (interventoría)

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	18/07/2025	30/04/2026	$ 2.522.219,40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/10/2025	31/10/2030	$ 2.522.219,40

PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E IND.	18/07/2025	31/10/2028	$ 1.261.109,70

ANEXO 1: póliza de cumplimiento 41-44-101295598, con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan ECU010B, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido y hasta el límite del valor asegurado señalado en cada amparo, SEGUROS DEL ESTADO S.A., garantiza:

El pago de los perjuicios causados con ocasión del incumplimiento de las obligaciones contractuales, en desarrollo del contrato de interventoría No. 1071-2025 cuyo objeto es MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONZABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL	18/07/2025	31/10/2030	$ 6.305.548,50

ANEXO 2: por medio del presente anexo el cual forma parte integral de la póliza, se ajusta vigencia de las garantías según acta de inicio firmada por las partes el 27/10/2025. Los demás términos y condiciones no modificados continúan vigentes.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	27/10/2025	09/08/2026	$ 2.522.219,40
CALIDAD DEL SERVICIO	09/02/2026	09/02/2031	$ 2.522.219,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E IND.	27/10/2025	09/02/2029	$ 1.261.109,70

ANEXO 3: mediante el presente anexo se aplica el acta final del de interventoría no 01 del 04 de marzo del 2026.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	27/10/2025	09/08/2026	$ 2.522.219,40
CALIDAD DEL SERVICIO	04/03/2026	09/02/2031	$ 2.522.219,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E IND.	27/10/2025	09/02/2029	$ 1.261.109,70

ANEXO 4: se actualiza la vigencia del amparo calidad del servicio conforme acta de recibo final de interventoria del 04 mar 2026.los demás términos y condiciones no se modifican.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	27/10/2025	09/08/2026	$ 2.522.219,40
CALIDAD DEL SERVICIO	04/03/2026	04/03/2031	$ 2.522.219,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E IND.	27/10/2025	09/02/2029	$ 1.261.109,70

Anexo 12. Pólizas de interventoría.

11.3. Actas de inicio y socialización

- ACTA DE SOCIALIZACIÓN: Se suscribió el día 12 de septiembre de 2025 con presencia de la comunidad, contratistas de interventoria y obra y secretaria de infraestructura departamental.
- ACTA DE INICIO DE OBRA: Se suscribió el día 27 de octubre de 2025, con visto bueno por parte de la secretaria de Educación departamental y Contratista.
- ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA: Se suscribió el día 27 de octubre de 2025, con aprobación de la secretaria de Educación departamental y Contratista Interventor.

11.4. Equipo del contratista

En el Anexo N°4 se muestra el equipo utilizado por el Contratista para el desarrollo del Contrato en periodo comprendido desde el 27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre del 2025. Todo el equipo, maquinaria y procesos fueron controlados de manera precisa por la interventoría para verificar su correcta utilización, adicionalmente que este cuente con especificaciones técnicas y la operación se haga de manera segura tanto para los operarios como la comunidad del sector.

11.5. Personal del contratista de obra

El contratista presenta documentación referente al personal que se encontrará en el desarrollo del proyecto. A continuación, se describe el Organigrama del contratista, en el anexo 5 se presenta de manera diaria el personal de obra relacionado.



11.6. Estado del tiempo

El registro del estado del tiempo para el periodo comprendido desde el 27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre del 2025 se encuentra en el Anexo N°7.

11.7. Control de calidad

El contrato de interventoría como responsable del control de calidad, evalúa en conjunto los siguientes aspectos:

- Control de calidad del proyecto: Planteamiento, planos, cálculos etc.
- Control de calidad de material.
- Control de calidad de ejecución.

Hasta el momento el contratista ha cumplido con la normativa y procesos contratados y ha atendido las recomendaciones dadas por el personal de interventoría.

11.8. Relación de actas contractuales

Las actas que se han firmado en el presente contrato están resumidas en la siguiente tabla:

ACTAS	FECHA
Acta de Inicio de interventoría 1071-2025	27/10/2025
Acta de Inicio de obra 1943-2024 del 11 de octubre de 2024	27/10/2025
Acta de Socialización	12/09/2025

11.9. Registro fotográfico

Se presenta el registro fotográfico del periodo N° 2 en el cual se registran las actividades que se realizaron en obra por parte del contratista y vigiladas por interventoria para el cumplimiento a cabalidad de los procesos y normativas exigidas.

11.10. Relación financiera del contrato de obra

En el cuadro N° 6, presente en los anexos se hace un resumen financiero del contrato 1943-2024.

11.11. Actividades básicas de interventoría

En el desarrollo de este Contrato la Interventoría adelantó durante el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre del 2025, entre otras, las siguientes actividades:

- ✓ Control técnico a las actividades ejecutadas de acuerdo a las especificaciones y normas técnicas.
- ✓ Control administrativo, realizando las actas, oficios y documentación pertinente a la ejecución del contrato para su buen desarrollo
- ✓ Ejecución del informe mensual.
- ✓ Diligenciamiento de los formatos de control.
- ✓ Verificación de las normas de seguridad industrial de los trabajadores

11.12. Control técnico de la obra

La Interventoría realizó las funciones de seguimiento y en cumplimiento de sus funciones técnicas constató la ejecución de las obras, además en labor conjunta con el contratista se resolvieron dudas presentadas en el desarrollo del contrato de obra. La supervisión y control de las actividades de obra comprende la evaluación y seguimiento de todos los recursos de personal, maquinaria y equipos que provee el Contratista para el cumplimiento de las metas físicas y de inversión contractual.

12. CONCLUSIONES

- ✓ Durante el periodo número 2 y final, Comprendido del 27 de noviembre de 2025 al 26 de diciembre del 2025, Las actividades ejecutadas por el contratista durante este periodo están relacionadas en el Acta de Avance Parcial de Obra N° 02 y final en el que se presenta un avance en Inversión en este periodo de aproximadamente $ 74.994.287,79, con un avance porcentual de 31,08% del valor contratado y que sumado con el avance del periodo 1 de valor ejecutado $ 166.335.098,21 y avance porcentual de 68,92% del valor contratado; el avance físico acumulado de la obra llega al **100,00%** correspondiente a una inversión de $ 241,329,386.00.

- ✓ Representados en actividades:

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.

- Localización y replanteo, incluye andenes
- Excavación en material común a máquina de la explanación (incluye desalojo)
- Pavimento de concreto hidráulico (MR 3.8)
- Suministro e instalación de material seleccionado
- Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)
- Suministro e instalación de geotextil para estabilización de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)
- Bordillos de concreto 3000PSI
- Acero de refuerzo 3/8" bordillo
- Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasa juntas
- Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal
- Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal
- Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado

ANDENES

- Excavación en material común en seco a mano (Incluye retiro)
- Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
- Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m
- Malla Electrosoldada 6 x 2,35 m 15 X 15 de 4 mm

SEÑALIZACION

- Señal vertical con lamina retro reflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)
- Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central

- Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación paso peatonal y línea de pare (incluye microesferas)
- Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye *microesferas)*
- Suministro e instalación de tachas

PAGA Y PMT

- previsión para el plan de adaptación a la guía ambiental
- plan de manejo de transito

✓ A la fecha no se presentaron hechos relevantes en la obra. La obra tuvo un desarrollo en normalidad, el personal de obra se encontró debidamente afiliado al sistema de seguridad social, cuentan con los elementos de protección personal acorde a la actividad a realizar.

✓ Las obras realizadas, se ejecutaron de acuerdo a los diseños y planos del proyecto, con el fin de garantizar la buena calidad y funcionamiento de la misma.

✓ Los materiales empleados como el acero de refuerzo, material de cantera tipo grava, cemento para la elaboración del concreto según los diseños de mezclas, cumplen con las especificaciones de calidad para ser empleados en obra.

✓ Por parte del contratista se presentó la Previsión Para El Plan De Adaptación A La Guía Ambiental (PAGA) y se realizó la implementación de este documento y seguimiento por parte de la interventoría de la inversión de acuerdo al presupuesto establecido en el proyecto.

✓ Por parte del contratista se presentó el programa de Manejo de tránsito y se realizó la implementación de este documento y seguimiento por parte de la interventoría de la inversión de acuerdo al presupuesto establecido en el proyecto.

✓ Se realizó el diligenciamiento de la bitácora en conjunto con el contratista.

✓ Se llevo a cabo un registro fotográfico con el fin de evidenciar visualmente la evolución del proyecto.

DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
INTERVENTOR
MP N°.63202220004QND

13. ANEXOS

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.1 INFORMACION GENERAL (INCLUYE SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES).

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025

TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101287134	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	01	2026	27	10	2025	00:00	27	01	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.042.420-9	PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	3213859011

DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-6	MOCOA, PUTUMAYO	4260573

DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUDIS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTENIDAS DEL CONTRATO No 1943-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024, CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2025	16/01/2027	$31,176,264.20	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/10/2025	16/01/2027	$155,881,321.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/10/2025	26/01/2029	$15,588,132.10	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$31,176,264.20	$31,176,264.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO VIG CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA POLIZA ARRIBA CITA TIENE EN CUENTA QUE EL ANEXO 4 Y 5:

ASEGURADOS: CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE (DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO)
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y ENTIDAD CONTRATANTE (DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO).

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ********233,821,981.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	143684	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7126622 - PASTO

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101287134	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	01	2026	27	10	2025	00:00	27	01	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.420-9	
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	**CIUDAD:** PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	4260573

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

Nilson Moyo

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101287134, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 14 días del mes de ENERO de 2026

41-44-101287134

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	01	2026	27	10	2025	00:00	16	01	2027	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.042.420-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
VDA LAS ACACIAS	PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4260573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y SABIA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 1543-2024 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2024,CUYO OBJETIVO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/10/2025	16/01/2027	$284,700,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/10/2025	16/01/2027	$284,700,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/10/2025	16/01/2027	$284,700,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA POLIZA ARRIBA CITA TIENE EN CUENTA QUE EL ANEXO 6 Y 7:

ASEGURADOS: CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATANTE (DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO)
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y ENTIDAD CONTRATANTE (DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO).

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CRG AGENCIA DE SEGUROS LTDA	142964	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Olaya - Vicepresidente de Fianzas

Nilson Mayo

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	01	2026	27	10	2025	00:00	16	01	2027	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT: 901.042.420-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
VDA LAS ACACIAS	PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	3213959011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4260573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	27/10/2025	16/01/2027	$284,700,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	27/10/2025	16/01/2027	$284,700,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	27/10/2025	16/01/2027	$284,700,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 34 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101053868

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Nilson Mora

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101053868	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	01	2026	27	10	2025	00:00	16	01	2027	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		NIT: 901.042.429-9	
DIRECCIÓN: VDA LAS ACACIAS	**CIUDAD:** PUERTO GUZMAN, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3213859011

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	**CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	4260573

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101053869

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

NILSON MOYO

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF143864A 3

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.2 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO – PROGRAMA DE OBRA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Período comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

PUTUMAYO	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	ACTA DE AVANCE N° 2 Y FINAL

				FECHA ACTA	26/12/2025	26/12/2025	
Objeto Contractual:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			PLAZO:	TRES (03) MESES		
Objeto Interventoría:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			FECHA INICIO:	27/10/2025	FECHA FIN	26/12/2025
CONTRATISTA:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	LUGAR INTERVENTOR:	Inspeccion de Puerto Limon	VALOR INICIAL	$ 241,329,387.00	% AVANCE	100.00%
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	INTERVENTOR:	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO	VALOR ACUMULADO	$ 241,329,387.00		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACTA MES 1 CANT.	ACTA MES 1 VR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VR TOTAL	ACUMULADO TOTAL CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL VR TOTAL
1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO										
1.1	Localización y replanteo, incluye anderes	m²	840.00	$ 2,500.00	$ 2,100,000.00	840.00	$ 2,100,000.00		$ -	840.00	$ 2,100,000.00
1.2	Excavación en material comun a máquina de la explanación (incluye desalojo)	m³	268.66	$ 50,821.00	$ 13,651,569.86	268.660	$ 13,653,569.86		$ -	268.66	$ 13,653,569.86
1.3	Pavimento de concreto hidráulico (MR 3.8)	m³	113.40	$ 880,562.00	$ 99,855,730.80	102.06	$ 89,870,157.72	11.34	$ 9,985,573.08	113.40	$ 99,855,730.80
1.4	Suministro e instalación de material seleccionado	m³	38.11	$ 84,275.00	$ 3,211,720.25	38.11	$ 3,211,720.25	-	$ -	38.11	$ 3,211,720.25
1.5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	94.50	$ 150,548.00	$ 14,226,786.00	94.50	$ 14,226,786.00	-	$ -	94.50	$ 14,226,786.00
1.6	Suministro e instalación de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650.00	$ 12,699.00	$ 8,254,350.00	650.00	$ 8,254,350.00	-	$ -	650.00	$ 8,254,350.00
1.7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4.90	$ 675,498.00	$ 3,309,845.10	4.44	$ 2,995,538.37	0.47	$ 314,107.34	4.90	$ 3,309,845.10
1.8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127.70	$ 6,132.00	$ 779,377.20	115.52	$ 710,821.44	11.18	$ 68,555.76	127.70	$ 779,377.20
1.90	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasa juntas	ml	170.00	$ 21,826.00	$ 3,710,420.00	153.00	$ 3,338,378.00	17.00	$ 371,042.00	170.00	$ 3,710,420.00
1.10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	604.40	$ 6,200.00	$ 3,747,280.00	543.96	$ 3,373,552.00	60.44	$ 374,728.00	604.40	$ 3,747,280.00
1.11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	70.50	$ 11,093.00	$ 782,056.50	63.45	$ 703,850.69	7.05	$ 78,205.64	70.50	$ 782,056.50
1.12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	67.97	$ 17,825.00	$ 1,211,565.25		$ -	67.97	$ 1,211,565.25	67.97	$ 1,211,565.25
2	ANDENES							-	$ -	0.00	$ -
2.1	Excavación en material común en seco a mano (Incluye retiro)	m³	36.00	$ 41,446.00	$ 1,492,056.00		$ -	36.00	$ 1,492,056.00	36.00	$ 1,492,056.00
2.2	Subbase granular (Incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	42.00	$ 150,548.00	$ 6,323,016.00		$ -	42.00	$ 6,323,016.00	42.00	$ 6,323,016.00
2.3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) en0,10 m	m²	21.00	$ 677,690.00	$ 14,235,090.00		$ -	21.00	$ 14,235,090.00	21.00	$ 14,235,090.00
2.4	Malla Electrosoldada 6 x 2,35 m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409.59	$ 13,824.00	$ 5,662,172.16		$ -	409.59	$ 5,662,172.16	409.59	$ 5,662,172.16
3	SEÑALIZACION							-	$ -	0.00	$ -
3.1	Señal vertical con lamina retro reflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3.00	$ 502,604.00	$ 1,507,812.00		$ -	3.00	$ 1,507,812.00	3.00	$ 1,507,812.00
3.2	Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central	ml	156.02	$ 15,469.00	$ 2,413,473.38		$ -	156.02	$ 2,413,473.38	156.02	$ 2,413,473.38
3.3	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación peso postional y linea de pare (incluye microesferas)	ml	12.50	$ 28,518.00	$ 356,475.00		$ -	12.50	$ 356,475.00	12.50	$ 356,475.00
3.4	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	200.00	$ 90,504.00	$ 18,100,800.00		$ -	200.00	$ 18,100,800.00	200.00	$ 18,100,800.00
3.5	Suministro e instalación de tachas	un	32.00	$ 18,819.00	$ 602,208.00		$ -	32.00	$ 602,208.00	32.00	$ 602,208.00
				COSTO DIRECTO DE OBRA	$ 205,536,583.50		$ 142,438,824.19		$ 63,097,479.31		$ 205,536,583.50

ADMINISTRACION	31.32%				$ 64,374,033.00	$ 44,611,902.00	$ 19,762,131.00	$ 64,374,033.00
IMPREVISTOS	3.00%				$ 6,166,095.00	$ 4,273,171.00	$ 1,892,924.00	$ 6,166,095.00
UTILIDAD	0.00%				$ -	$ -	$ -	$ -
	34.32%				$ 70,540,128.00	$ 48,885,073.00	$ 21,655,055.00	$ 70,540,128.00
					$ 276,078,632.00	$ 191,324,097.00	$ 84,752,534.00	$ 276,078,632.00
	COSTOS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 35,666,010.00	$ 23,832,310.00	$ 11,864,000.00	$ 35,666,010.00
	PREVISION PARA EL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	UND	1.00		$ 10,943,500.00	$ 8,309,500.00	$ 2,634,000.00	$ 10,943,500.00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1.00		$ 24,742,510.00	$ 15,512,510.00	$ 9,230,000.00	$ 24,742,510.00
				Valor aportado por la gobernacion	$ 311,762,642.00	$ 215,148,197.00	$ 96,616,534.00	$ 311,762,642.00
				Valor aportado por Consejo Comunitario Las Acacias	-$ 70,433,255.00	-$ 48,811,098.79	-$ 21,622,246.21	-$ 70,433,255.00
				Valor total del proyecto	$ 241,329,387.00	$ 166,335,098.21	$ 74,994,287.79	$ 241,329,387.00

RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA		
VALOR APORTE GOBERNACION	$	311,762,642.00
VALOR APORTE CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	-$	70,433,255.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	241,329,387.00
VALOR ANTICIPO CONTRATO ORIGINAL	$	120,611,296.79
VALOR ACTA PARCIAL 01	$	166,335,098.21
PORCENTAJE DE EJECUCION		68.92%
VALOR ACTA PARCIAL 02		$ 74,994,287.79
PORCENTAJE ACTA PARCIAL 02		31.08%
VALOR ACTA PARCIAL 03		
PORCENTAJE ACTA PARCIAL 03		
VALOR TOTAL ACTAS	$	241,329,387.00
PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO		100.00%

SALDO POR EJECUTAR	$ -
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	0.00%

Nilson moya

R.L. NILSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

R.L. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

MEMORIAS DE CALCULO

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Descripción	Fator expansion	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)					268.66
					268.66

ITEM:	1.3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)	UNIDAD:	m²



Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Un	Volumen (m3)
Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)					11.34
					11.34

ITEM:	1.7	Bordillos de concreto 3000PSI	UNIDAD:	m3




Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	Longitud (ml)
Bordillos de concreto 3000PSI					0.49
Ajuste por redondeo					-0.03
					0.47

ITEM:	1.8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	UNIDAD:	Kg




Descripción	Long bordillo	# empalmes	Ld (m)	Cant varillas	Varilla diametro	Peso por ml (kg)	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 3/8" bordillo	10	0	0.54	2	3/8"	0.56	11.20
Ajuste por redondeo							-0.02
							11.18

ITEM:	1.9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	UNIDAD:	ml

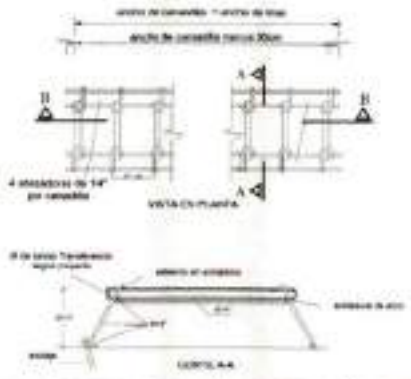


Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Kg/ml	Nos.	Peso (Kg)
Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	6.30			2.70	17.00
					17.00

ITEM:	1.10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	UNIDAD:	Kg

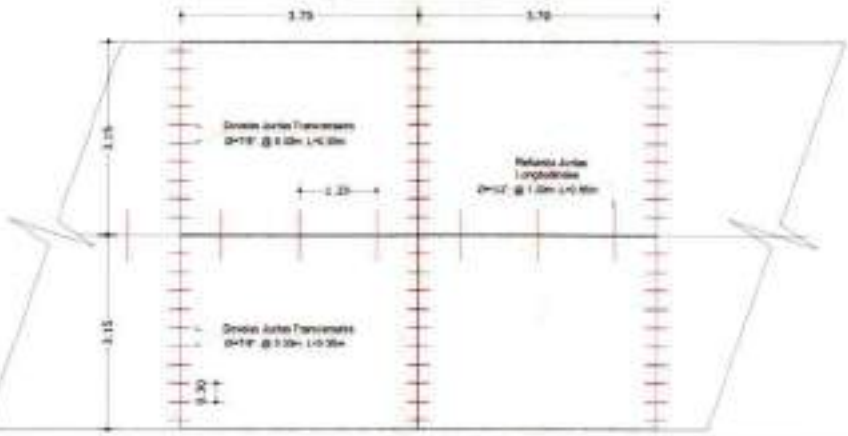


Descripción	Ancho (m)	Numero (un)	Largo (m)	Kg/ml	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 7/8" Transversal	21.00	2.70	0.35	3.042	60.43
					60.40

ITEM:	1.11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	UNIDAD:	Kg

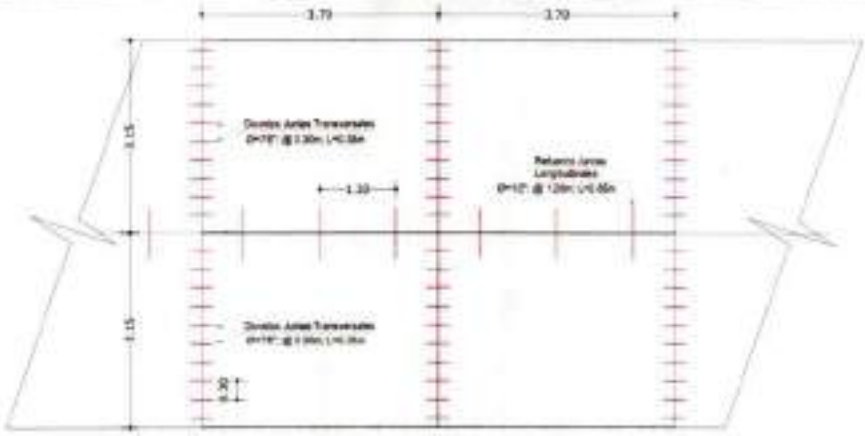

Descripción	Elementos	Cantidad	Largo (m)	Kg/ml	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 1/2" Longitudinal	3.08	27.03	0.85	0.996	70.55
					70.60

ITEM	1.12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	UNIDAD:	ml

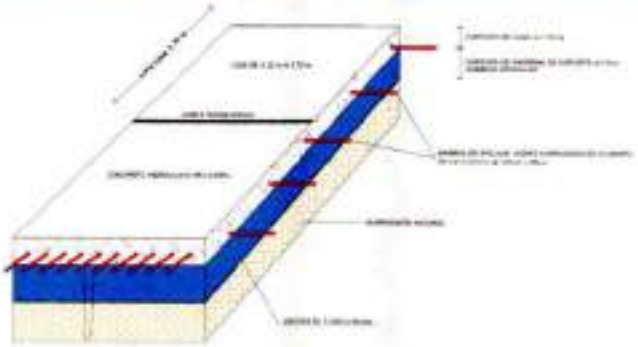

Descripción	Cant	Numero (un)	Largo (m)	Kg/ml	Peso (Kg)
Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	66.67		1.30		67.97
					67.97

ITEM:	2.1	Excavacion en material comun en seco a mano (Incluye retiro)	UNIDAD:	m^3




Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	Volumen (m3)
Excavacion en material comun en seco a mano (Incluye retiro)	0.6	100.00	0.3	2	36.00
					36.00

ITEM:	2.2	Subbase granular (Incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y	UNIDAD:	m^3




Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	Volumen (m3)
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	1.05	100.00	0.2	2	42.00
					42.00

ITEM:	2.3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	UNIDAD:	m²

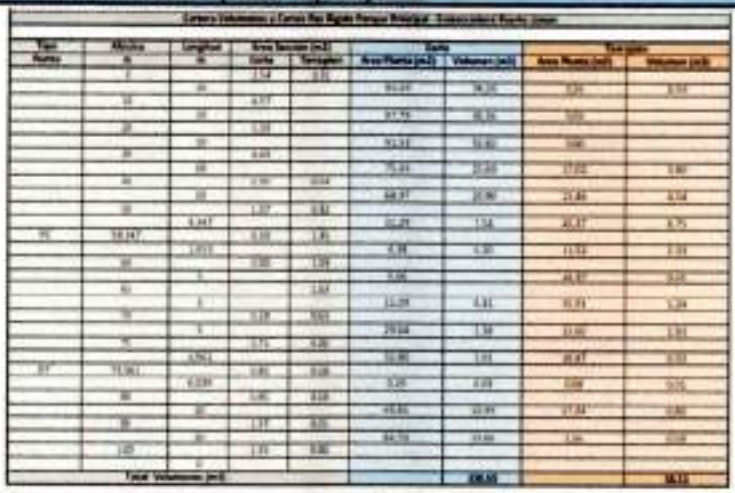

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	Volumen (m2)
Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m					21.00
					21.00

ITEM:	2.4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	UNIDAD:	Kg

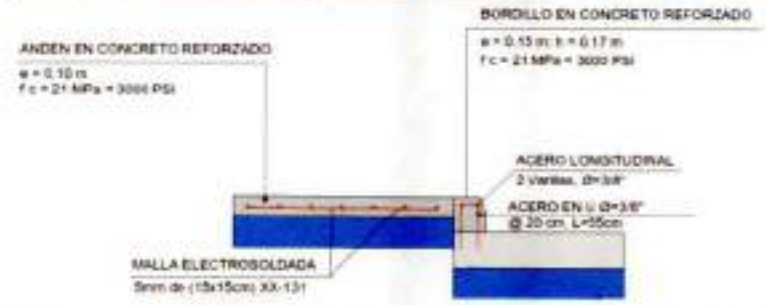

Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Volumen (m3)
Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	1.05	213.33	224.00	1.92	409.59
					409.59

ITEM:	3.1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	UNIDAD:	un



Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)					3.00
					3.00

ITEM:	3.2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	UNIDAD:	ml





Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central					156.02
					156.02

ITEM:	3.3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	UNIDAD:	ml



Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)					12.50
					12.50

ITEM:	3.4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	UNIDAD:	ml



Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)					200.00
					200.00

ITEM:	3.5	Suministro e instalacion de tachas	UNIDAD:	un



Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Suministro e instalacion de taches					32.00
					32.00

Nilson moya

RL. NILSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

R.L. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Car tera Materiales PARQUE PRINCIPAL - EMCARCADERO, PUERTO LIMON

Tipo	Abscisa	Longitud	Materiales Estructura (m3)				
Punto	m	m	[4] Subbase Via	[5] Concreto Via	[18] Concreto Bordillo_Via	[21] Concreto Anden	[23] Subbase_ Anden
		8.347		9.47	0.411		
PC		1.653		1.87	0.081		
PT							
		10.00					
Totales Volúmenes (m3) :			0.00	11.34	0.49	0.00	0.00

RL. NILSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

R.L. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.3 COPIA DE LAS ACTAS DE COMITÉ TECNICO SEMANAL DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

PUTUMAYO
GOBERNACIÓN
NIT. 800.094.164-4

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6

ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

PROYECTO: "**MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** ".

En la inspección de Puerto Limón, Municipio de Mocoa, Putumayo, se reunieron los abajo firmantes con la finalidad de socializar con la comunidad y beneficiaros, la el contrato de obra denominado MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" el cual surge las solicitudes de la Comunidad ante la gobernación del Putumayo con base a necesidad requerida, por lo anterior el presente proyecto fue priorizado en el Plan de Desarrollo departamental "Seguimos Avanzando de la Mano con las Comunidades 2024-2027".

Se deja constancia por parte de la comunidad asistente de que la formulación del proyecto expuesto cubrirá la necesidad planteada.

Dado en la En la inspección de Puerto Limón del municipio de Mocoa a los 12 días del mes de septiembre de 2025.

Nombre y Apellido	Número cédula	Cargo	Firma
Alvaro Enrique P	18103528	Ver de obra	
Diana Marcela L.	1'124.856.659	Beneficiario	Diana L
David Andrés Enciso A.	1.113.304.913	Interventor	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102691-6

PUTUMAYO
CONSTRUYE CON TODOS
NIT. 800.094.164-4

Nombre y Apellido	Número cédula	Cargo	Firma
Judy Pinchao	69 008 057	ACHLK	Judy P.
Maria Fernanda	69.009 914	CCHLK	Maria fernanda
Ayde [illegible]	1124853969	CCHLK	Ayde
Arely Cabrera	69009380	Sub Rep.	Arely C.
Beto Enrique P2	12'487 88	Rep Lv	Beto
Faiver David Cortes	5.299.435	ACHLK	Faiver C.
Wilson [illegible]	4500127	[illegible]	[illegible]
Isabel Cortes	27127084	JACPL	Isabel Cortes
Marinela Meza	69007712	Pto. L	Marinela M S
Rosa Zambrano	- -	PIOL	R. Z.
Josefa Jaguibay	- -	- -	No firma.
Jaime Enriquez	17987382	Rep Lv	[illegible]
Wilson Meza Sevilla	5'299'435	Cuerpo	[illegible]
Carlos Perez	5203395	PIOL	Carlos Perez

NIT. 800.094.164-4

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891-6

José Libardo Mora C	18122595	Presidente Concejo	
Edwin Mora D	18.124.405		
Nombre y Apellido	Número cédula	Cargo	Firma

GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO

RESOLUCIÓN No. 438 DEL 10 OCT 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL EMBARCADERO EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"

El Secretario de Servicios Administrativos delegatario con Funciones de Ordenación del Gasto del Departamento del Putumayo, Según Decreto Departamental No. 075 del 28/02/2023, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

CONSIDERANDO

Que, la Gobernación del Putumayo, como Entidad regida por las normas de derecho público, tiene el deber legal y constitucional de asumir las responsabilidades que le atañen en su campo específico de acción, según lo previsto en la Constitución, las leyes, Ordenanzas y demás normas que la regulan a las cuales esta sujeto el accionar del servidor público, con el fin de que ello redunde en el beneficio de los administrados y refleje a la vez la buena marcha de la administración.

Que, el artículo 2° de la Constitución Política señala, entre otros, como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que, los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines, de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 de la Constitución Política.

Que, la Constitución Política en el Artículo 209, consagra que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, estableciendo adicionalmente, que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que, el Artículo 3° de la Ley 489 de 1998 señala que la función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Que, el Artículo 5° de la Ley 489 de 1998 establece que la finalidad de la función administrativa es buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política, por lo cual los organismos, entidades y personas encargadas, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general.

GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO

RESOLUCIÓN No. 438 DEL 10 DE 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL EMBARCADERO EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"

Que, el Artículo 6° de la Ley 489 de 1998 consagra el principio de coordinación al establecer que, en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales prestando colaboración para facilitar el ejercicio de sus funciones.

Mediante la Ley 70 de 1993 además de reconocer el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras, se establecieron "*mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana*".

Los artículos 1° y 3° de la Ley 2160 de 2021 modificaron los artículos 6° y 7° de la Ley 80 de 1993, respectivamente, dando capacidad jurídica y definiendo cada una de las organizaciones y comunidades que tiene capacidad jurídica para celebrar contratos con el Estado, entre ellas, los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras, las formas o expresiones organizativas de la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera, las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las organizaciones de segundo nivel, de la siguiente manera:

> *ARTÍCULO 7°. ENTIDADES A CONTRATAR. Para los efectos de esta ley se entiende por:*
>
> *1. (...)*
>
> *2. Consejo comunitario de las comunidades negras. Es la persona jurídica que ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad".*
>
> *3. Formas o expresiones organizativas. Son manifestaciones que, en ejercicio del derecho constitucional de participación, asociación y de la autonomía de conjuntos de familias de ascendencia negra, afrocolombiana, raizal o palenquera que reivindican y promueven su cultura propia, su historia, sus prácticas tradicionales y costumbres, para preservar y proteger la identidad cultural y que estén asentados en un territorio que por su naturaleza no es susceptible de ser titulada de manera colectiva.*
>
> *4. Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Son asociaciones comunitarias integradas por personas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, que reivindican y promueven los derechos étnicos y humanos de estas comunidades.*

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

RESOLUCIÓN No. 438 DEL 10 OCT 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL EMBARCADERO EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"

5. Organizaciones de Segundo Nivel. Son asociaciones de Consejos Comunitarios, formas y expresiones organizativas y/u organizaciones de base que agrupan a más de dos (2), inscritas en el Registro Único de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, siempre y cuando el área de influencia de la organización de segundo nivel corresponda a más de la tercera parte de los departamentos donde existan comisiones consultivas (...)"

Para las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las demás formas y expresiones organizativas, deberán contar con diez (10) años o más de haber sido incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro; y los consorcios y uniones temporales".

El artículo 2° de Ley 2160 de 2021 incluyó los literales M) y N) al numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionando como causales de contratación directa la que se realice con consejos comunitarios de las comunidades negras y organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras o con las demás formas y expresiones organizativas, así:

"M). Los contratos que las entidades estatales suscriban con los consejos comunitarios de las comunidades negras, regulados por la Ley 70 de 1993, que se encuentren incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro, cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad étnica y cultural, el ejercicio de la autonomía, y/o la garantía de los derechos de los pueblos de las mismas comunidades.

N). Los contratos que las entidades estatales suscriban con las organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras o con las demás formas y expresiones organizativas, que cuenten con diez (10) años o más de haber sido incorporados, por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro, cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento de sus organizaciones, la identidad étnica y cultural, y/o la garantía de los derechos de las poblaciones de las mismas organizaciones".

Las precitadas causales autorizan a las entidades estatales para contratar de manera directa con consejos comunitarios de comunidades negras reguladas por la Ley 70 de 1993, así como con organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras o con las demás formas y expresiones organizativas, que cuenten con diez (10) años o más de haber sido incorporados, por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización, cuando el objeto del contrato se

RESOLUCIÓN No. 438 DEL 10 OCT 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL EMBARCADERO EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"

encuentre relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio o de sus organizaciones, la identidad étnica y cultural, el ejercicio de la autonomía, y la garantía de los derechos de los pueblos de las mismas comunidades.

Que, en los últimos años se han llevado a cabo esfuerzos para promover el desarrollo sostenible y la participación de las comunidades afrodescendientes en la toma de decisiones en el Putumayo, a través de la construcción de planes de etnodesarrollo y la promoción de proyectos que aborden sus necesidades específicas. La historia y la cultura afrodescendiente siguen siendo una parte importante de la identidad y la diversidad cultural en el Putumayo y en Colombia en general.
Que con la ejecución del proyecto se verán beneficiadas 2.300 personas pertenecientes las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras del departamento del Putumayo, quienes se organizaron mediante el Consejo Comunitario las Acacias, los cuales se consolidan como organización reconocida a nivel local y departamental, y busca este reconocimiento a nacional e internacional como grupo étnico.

La Gobernación del Putumayo, en cumplimiento de las Acciones determinadas en el Plan de Desarrollo Departamental, requiere adelantar el proyecto **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

La Secretaría de infraestructura, presentó a la Oficina del Banco de Proyectos de la secretaria de Planeación del Departamento del Putumayo el subproyecto denominado **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**, el cual fue aprobado por el secretario de Planeación Departamental (Oficina de Banco de Proyectos) según certificación No. BPIN No. 2024006860112 del 20 de septiembre de 2024.

PROBLEMA CENTRAL: Dificultad en el transporte y la Intercomunicación Multimodal de la población rural en la Inspección de Puerto Limón del Municipio de Mocoa.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE: La comunidad de la inspección de Puerto Limón del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, enfrenta problemas de acceso y movilidad debido a la falta de una vía adecuada que conecte la zona con el centro urbano. La vía actual, que es utilizado por vehículos y peatones, presenta dificultades para su uso debido a la presencia de baches y la falta de una superficie adecuada.

GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO

RESOLUCIÓN No. 138 DEL 10 OCT 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL EMBARCADERO EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"

Además, la comunidad enfrenta los efectos del cambio climático en la zona, que se traducen en lluvias intensas y frecuentes, lo que agrava las condiciones de la vía y dificulta aún más el acceso y la movilidad en la zona.

Dadas estas condiciones, se plantea la necesidad de construir una placa de concreto hidráulico como alternativa de solución para mejorar el acceso y la movilidad de la comunidad de la inspección de Puerto Limón del municipio de Mocoa departamento del Putumayo. La construcción de una placa de concreto hidráulico permitiría mejorar las condiciones de transitabilidad, reducir los tiempos de viaje y mejorar la seguridad en la vía.

Sin embargo, la construcción de una placa de concreto hidráulico debe ser planificada y ejecutada de manera adecuada para asegurar su durabilidad y seguridad en el tiempo. Es importante tener en cuenta que la zona se encuentra afectada por el cambio climático, lo que implica lluvias intensas y frecuentes que pueden afectar la estabilidad de la vía.

Por lo tanto, el enfoque en la necesidad de construir una placa de concreto hidráulico como alternativa de solución para mejorar el acceso y la movilidad de las comunidades de la inspección de Puerto Limón del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, tomando en cuenta la presencia de baches en la vía actual y la necesidad de planificar adecuadamente la construcción de la placa de concreto hidráulico para asegurar su durabilidad y seguridad en el tiempo.

El objetivo principal del proyecto es: el **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

Mejorar el acceso y la movilidad de las comunidades que tienen asiento y residencia en la inspección de Puerto Limón del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. Se busca reducir el tiempo de viaje, aumentar la seguridad y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona.

EL OBJETIVOS ESPECÍFICOS SON:

- Diseñar e implementar un plan de construcción de pavimento rígido que contemple las condiciones climáticas de la zona, la topografía del terreno y la calidad de los materiales disponibles, con el objetivo de asegurar la durabilidad y la seguridad de la vía en el tiempo
- Construir el pavimento rígido en la inspección de Puerto Limón, realizando trabajos de nivelación y compactación de la superficie, y la eliminación de baches, con el fin de garantizar el acceso y la movilidad de la comunidad.

RESOLUCIÓN No. 438 DEL 10 [illegible] 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL EMBARCADERO EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"

- Fomentar la participación activa de la comunidad la inspección de Puerto Limón en la construcción del pavimento rígido, a través de la organización de jornadas de trabajo comunitario en las que se involucre a los habitantes en actividades como la limpieza del terreno, el transporte de materiales y la supervisión de los trabajos. De esta manera, se busca no solo fomentar el sentido de pertenencia de la comunidad hacia la vía, sino también reducir los costos del proyecto y generar un ambiente de colaboración y cooperación entre los habitantes de la vereda.

Que, para garantizar el cumplimiento de sus funciones y según estudio previo presentado por la Secretaria de Infraestructura Departamental, se requiere celebrar un contrato mediante la modalidad de contratación directa con el objeto de celebrar la obra del proyecto: **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**., con el fin de fortalecer el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial, lo que contribuye a la generación de un impacto económico positivo para la comunidad al tener mayor facilidad para transitar y comercializar sus productos, además de la posibilidad de acceder de manera oportuna a los servicios de salud, buscando con ello mejorar los estándares de calidad de vida.

Que, la secretaria de infraestructura, con la presentación del estudio previo, da viabilidad técnica, administrativa financiera y contable del proyecto, como secretaria encargada de la estructuración y revisión del mismo.

Que, la Ley 1150 de 2007 introdujo medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y además dictó otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.

Que, en la Subsección IV del Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional", establece en su artículo 2.2.1.2.1.4.1 que cuando proceda la modalidad de selección de contratación directa la entidad así lo señalará en acto administrativo de justificación de la contratación directa.

Que, el futuro contrato mediante contratación directa contempla una inversión de recursos por parte del Departamento, para lo cual cuenta con el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la profesional especializada de la oficina de presupuesto que se relaciona así:

GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO

RESOLUCIÓN No. 139 **DEL** 10 OCT 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL EMBARCADERO EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"

OBJETO "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO D PUTUMAYO". **FUENTE**: RECURSOS PROPIOS **REGISTRO BPIN** No. 2023006860127		
Identificación Presupuestal	**CONCEPTO**	**VALOR**
0301-0.2.3.04.24.02.041.9.2.3.2.01.01.001.03.02-1002	Autopistas, carreteras, calles	**$241.329.386,00**
	TOTAL, CERTIFICADO	**$241.329.386,00**

No. de CDP	4671	**F/Expedición**	23/09/2024	**Vigencia**	22/12/2024

No obstante, lo anterior el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expedido por el Profesional especializado de la oficina de Presupuesto Departamental.

Que, el futuro contrato contempla una inversión de recursos por parte de la Gobernación del Departamento del Putumayo de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($241.329.386,00) M/CTE.**

Que, el referido contrato contempla, además, una inversión de recursos por parte del Consejo Comunitario las Acacias del municipio de Mocoa de **SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($70.443.250,00) M/CTE**, representados en especie, aportando la mano de obra no calificada.

Que el Departamento del Putumayo mediante la celebración del contrato busca el **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**. de este modo dar cumplimiento a los postulados Constitucionales, y Legales.

Que, el presente acto administrativo, de acuerdo con lo reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015, invoca la causal de Contratación Directa establecida en el literal M y N del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 (Literal ADICIONADO por el artículo 01 de la ley 2160 de 2021).

RESOLUCIÓN No. 438 DEL 10 OCT 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL EMBARCADERO EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"

> ***"ARTÍCULO 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN.*** *La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:*
> *(...)*
>
> *4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos:*
>
> *(...)*
>
> *m) Los contratos que las entidades estatales suscriban con los consejos comunitarios de las comunidades negras, regulados por la Ley 70 de 1993, que se encuentren incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro, cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad étnica y cultural, el ejercicio de la autonomía, y/o la garantía de los derechos de los pueblos de las mismas comunidades.*
>
> *n) Los contratos que las entidades estatales suscriban con las organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras o con las demás formas y expresiones organizativas, que cuenten con diez (10) años o más de haber sido incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro, cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento de sus organizaciones, la identidad étnica y cultural, y/o la garantía de los derechos de las poblaciones de las mismas organizaciones."*

Que las precitadas causales autorizan a las entidades estatales para contratar de manera directa con consejos comunitarios de comunidades negras reguladas por la Ley 70 de 1993, así como con organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras o con las demás formas y expresiones organizativas, que cuenten con diez (10) años o más de haber sido incorporados, por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización, cuando el objeto del contrato se encuentre relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio o de sus organizaciones, la identidad étnica y cultural, el ejercicio de la autonomía, y la garantía de los derechos de los pueblos de las mismas comunidades.

Que, así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 'Colombia Potencia Mundial de la Vida', tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo convenio social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

RESOLUCIÓN No. 438 DEL 10 OCT 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL EMBARCADERO EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"

naturaleza. Este proceso debe desembocar en la paz total, entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común.

Que, en este sentido, el Ministerio de Transporte como cabeza del sector transporte e infraestructura, lideró la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 Colombia, «Potencia Mundial de la Vida», la cual se llevó a cabo entre el 10 de enero y el 6 de febrero de 2023, como resultado de esta se protocolizaron acuerdos con las comunidades étnicas dentro de los cuales se tienen los siguientes a cargo del INVIAS:

> *"(...) a. Construir, mejorar, mantener y adecuar la infraestructura vial (vías terciarias, caminos ancestrales y puentes) de interés de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de acuerdo a las necesidades definidas y priorizadas por las comunidades en el marco de las asignaciones presupuestales del Sector.*

Que, la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior emitió el concepto identificado con el Radicado No. 2024-2-002200-002517 de 29 de enero de 2024, sobre las definiciones de que tratan los literales m) y n) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el que expuso que de conformidad con el criterio jurisprudencial constitucional, los siguientes corresponden a conceptos jurídicos indeterminados que no presentan una definición acabada:

> *"(...)*
>
> *(i) **Gobierno propio y autonomía:** Son garantías derivadas de los derechos de subsistencia e integridad de las comunidades étnicas, que permiten para aquellas la posibilidad de que configurar, mantener o modificar sus instituciones gobierno, con la finalidad de autodeterminar y autogestionar lo relativo al orden social.*
>
> *(ii) **Identidad étnica y cultural:** Es una garantía para sujetos con una cosmovisión diferente a la de la sociedad mayoritaria de poder ejercer sus derechos fundamentales de conformidad con su visión particular del mundo.*
>
> *(iii) **Garantía de derechos:** La ejecución de acciones tendientes asegurar que los administrados puedan ejercer los derechos constitucional y convencionalmente consagrados. (...)"*

Así mismo al respecto de la garantía de los derechos indica lo siguiente:

RESOLUCIÓN No. 438 DEL 10 OCT 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL EMBARCADERO EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"

"(...) a juicio del suscrito, debe entenderse en el marco de la Cláusula de Estado Social de Derecho, pues, según lo esbozado por la jurisprudencia constitucional el goce efectivo de los derechos es un aspecto del núcleo esencial de la Cláusula, al decir:

"El aseguramiento del goce efectivo de los derechos es uno de los compromisos principales del Estado Social y Democrático de Derecho. Tanto la jurisprudencia internacional, como las decisiones de esta Corporación y la doctrina, han establecido que los derechos humanos se realizan plenamente, es decir, se asegura su goce efectivo, cuando los Estados cumplen con tres tipos de obligaciones:

(i) La obligación de respeto de los derechos humanos implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar su goce efectivo. Esta obligación tiene por tanto un carácter en principio negativo, por cuanto involucra, fundamentalmente, el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio de tales derechos(...) Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, que condicionen el acceso o el ejercicio de los derechos, basadas en criterios tales como el género, la nacionalidad y la casta.
(ii) La obligación de protección requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el ejercicio de un derecho por parte de su titular.
(iii) La obligación de garantía implica el deber del Estado de organizar todo el aparato gubernamental y las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos. La obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos es el resultado, entre otros, de su 'efecto horizontal' y tiene, a la inversa de lo que sucede con la obligación de respeto, un carácter positivo. Efectivamente, ella implica el deber del Estado de adoptar todas las medidas que sean necesarias y que, de acuerdo a las circunstancias, resulten razonables para asegurar el ejercicio de esos derechos".

De ahí, que se entienda por garantía de derechos, la ejecución de acciones tendientes asegurar que los administrados puedan ejercer los derechos constitucional y convencionalmente consagrados. (...)"

Adicionalmente en el referido concepto, la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, expuso, luego de una revisión de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la infraestructura de transporte y su relación con la garantía de derechos constitucionales, lo siguiente:

"Los ejemplos de decisiones judiciales aquí expuestos son ilustrativos de la importancia de la infraestructura de transporte como medio para garantizar intereses y derechos colectivos o fundamentales. No pretende ser una exposición acabada de decisiones que pudieran usar las autoridades en el marco de sus competencias, mejoramiento, rehabilitación y construcción de obra pública con comunidades negras en cumplimiento de la Ley 2160 de 2021, pues como se ve, este tipo de procesos contractuales encuadran dentro de los objetos enunciados en la Ley 2160 de 2021".

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

RESOLUCIÓN No. 438 DEL 10 OCT 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL EMBARCADERO EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"

Que en el marco de sus funciones la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente creada a través de Decreto 4170 de 2011, como ente regente de la contratación estatal en nuestro país, emitió concepto C-025 de 2024 del 21 de febrero de 2024, sobre el entendimiento que debe tener la entidades del sector público, de los conceptos jurídicos indeterminados fortalecimiento del gobierno propio o de sus organizaciones, la identidad étnica y cultural, el ejercicio de la autonomía, y/o la garantía de los derechos de los pueblos de las mismas comunidades y si dentro de estos puede entenderse la realización de obras de infraestructura.

Que por su relevancia y a manera de ilustración es preciso citar algunos apartes del referido concepto de Colombia Compra eficiente:

> *"En consonancia con lo explicado en el numeral 2.2 del presente concepto, es importante precisar que tales causales no restringen su aplicación a unas tipologías contractuales en concreto, ni tampoco a negocios jurídicos con una cuantía determinada, sino que, únicamente exigen el cumplimiento de los requisitos antes estudiados. En ese sentido, la posibilidad de celebrar un contrato de obra en aplicación de los dispositivos normativos aquí explicados depende de su relación con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad cultural, el ejercicio de la autonomía y/o la garantía de los derechos de las comunidades.*
>
> *(...)*
>
> *Ahora bien, la infraestructura de transporte es definida por el artículo 2 de la Ley 1682 de 2013 como un '[...] un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos'. En concordancia con dicha definición el artículo 4 de la citada ley establece la forma como está conformada la infraestructura de transporte indicando lo siguiente:*
>
> ***Artículo 4°.** Integración de la infraestructura de transporte. La infraestructura de transporte está integrada, entre otros por:*
>
> *1. La red vial de transporte terrestre automotor con sus zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio, instalaciones operativas como estaciones de pesaje, centros de control de operaciones, estaciones de peaje, áreas de servicio y atención, facilidades y su señalización, entre otras.*
>
> *(...)*
>
> *Según estas disposiciones traídas de la Ley 1682 de 2013, es claro que la infraestructura de transporte está integrada por distintos de bienes inmuebles susceptibles de ser intervenidos con trabajos*

RESOLUCIÓN No. 488 DEL 10 OCT 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL EMBARCADERO EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"

materiales contratados en el marco de relaciones contractuales estructuradas bajo la tipología de obra pública. Es por esto por lo que, en aplicación de este tipo contractual y de distintas modalidades de selección, las Entidades Estatales suelen contratar objetos tendientes a la construcción, mantenimiento, rehabilitación y/o mejoramiento de carreteras, puertos, vías férreas, puentes, viaductos y otras actividades sobre los bienes inmuebles que integran la infraestructura de transporte, con el propósito de garantizar la prestación efectiva del servicio público de transporte y mejorar la calidad de vida de las personas.

De hecho, conforme evidencian distintos precedentes jurisprudenciales, existen situaciones en la que infraestructura de transporte por su relevancia para la prestación del servicio de transporte se erige en un presupuesto para acceder a otros derechos como la educación y libertad de locomoción.

*En ese sentido, teniendo en cuenta que los literales M) y N) del artículo 2, numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, **no involucran ninguna restricción sobre la tipología contractual a la que resultan aplicables,** y considerando que la **realización de obras para intervenir la infraestructura de transporte puede tornarse relevante para garantizar de derechos de las personas y comunidades,** se estima que es válido aplicar **tales causales para celebrar de manera directa contratos de obra con Consejos Comunitarios,** Organizaciones de Base y demás formas o expresiones organizativas a las que se refiere la Ley 2160 de 2021. Sin embargo, para que tales negocios jurídicos se ajusten al marco jurídico que habilita su contratación directa es necesario que cumplan los requisitos objetivos explicados en el numeral 2.2 del presente concepto".*

Que, de igual forma, la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente en la CARTILLA PARA INCENTIVAR Y FORTALECER EL ACCESO AL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS EN COLOMBIA, hace referencia a la capacidad para contratar, conferida en específico a Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, así: *"la Ley 2160 del 2021 establece de manera clara y precisa, que se podrán celebran contratos con: i) consejos comunitarios de las comunidades negras; ii) Formas o expresiones organizativas; iii Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; y iv) Organizaciones de Segundo Nivel."*

Que, con base en todos los argumentos esbozados, a través del presente acto administrativo se encuentra justificado con la viabilidad y certificado de idoneidad presentada por la secretaria de Infraestructura Departamental

Que, de conformidad con lo anterior, la secretaria de Servicios Administrativos Departamental Delegataria con funciones de ordenador del gasto del departamento del Putumayo,

171

GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO

RESOLUCIÓN No. 438 DEL 10 OCT 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL EMBARCADERO EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"

RESUELVE:

PRIMERO. - Justificar la modalidad de selección por contratación directa, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con el artículo 2 numeral 4, literal M) y N) de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 2 de la ley 2160 de 2021, con el fin de ejecutar el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

SEGUNDO.- Celébrese el contrato de obra con el **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS DEL MUNICIPIO DE MOCOA** identificada con NIT No.901042420-9, Representado Legalmente por el señor **NILSON MOYA MENA**, identificado con C.C. No. 4.800.171 de Bojaya (B) para la ejecución del objeto del convenio y del sub-proyecto registrado y viabilizado en Banco de Proyectos Departamental con Registro No. 2023006860127 **"MEJORAMIENTO DE CAMINO VEREDAL EN LA VEREDA AMARON BAJO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, y por la suma de **TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 311.762.641,00) M/CTE. (valor total de la obra),** los cuales se encuentran discriminados de la siguiente manera:

APORTANTES	VIGENCIA	VALOR	FUENTE
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	2024	$241.329.386,00	RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DEL COOPERANTE / EL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	2024	$ 70.433.255,00	RECURSOS PROPIOS
RECURSOS OTRAS ENTIDADES		$00	
COSTO TOTAL DE LA OBRA		$ 311.762.641,00	

TERCERO. - El estudio previo y los documentos que justifican la celebración del contrato, se encuentran y se podrán consultar en la oficina de Contratación Departamental o en la plataforma electrónica SECOP II.

GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO

RESOLUCIÓN No 438 DEL 10 OCT 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL EMBARCADERO EN LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA"

CUARTO. - Ordenase la publicación en el portal único de contratación SECOP II del presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

QUINTO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Mocoa, Putumayo 10 OCT 2024

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

EDGAR ORLANDO GONZÁLEZ ORTEGA
Secretario Delegatario con Funciones de Ordenador del Gasto del Departamento del Putumayo, Según Decreto Departamental No. 075 del 28/02/2023

PROYECTO: ANDREA ESTHER QUEMAG ARTEAGA -PROFESIONAL DE APOYO SDI
REVISO: JORGE ANDRÉS CORTEZ VERA-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
REVISÓ: WILLIAM ARMANDO DIAZ CHAMORRO – JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN
REVISÓ: DANIELA RODRÍGUEZ – PROFESIONAL DE APOYO OCD
REVISÓ: YOAN DANIEL ORDÓÑEZ VÉLEZ – PROFESIONAL ESP. DE APOYO SSAD

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-129
	DOCUMENTO ADICIONAL	VERSION: 01
		FECHA: 20/11/2015

CLASE	**CONTRATACIÓN DIRECTA-CONTRATO DE OBRA**		
PARTES	**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO NIT 800094164-4**		
	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS NIT: 901042420-9 R/L NILSON MOYA MENA C. C. 4.800.171 de Bojaya (B)		
OBJETO	**"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIP AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO D MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($311.762.642,00).**		
	APORTE GOBERNACION	**($241.329.386,00) M/CTE**	**CDP:** 4671 de 23/09/2024
	APORTE CONSEJO COMUNITARIO	**($70.433.255,00) M/CTE**	Recursos propios.
PLAZO DEL CONTRATO	**TRES (03) MESES**		

Entre los suscritos a saber: **EDGAR ORLANDO GONZÁLEZ ORTEGA**, obrando en su calidad Secretario de Servicios Administrativos Departamental con Funciones de ordenación del gasto según Decreto Departamental N° 075 del 28/02/2023 y actuando como Representante Legal de esta Entidad de derecho público, y por ende la faculta para contratar por la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, Artículo 11, Numeral 3, Literal b) y quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte y por la otra **EL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS** con NIT N° **901042420-9**, Representado Legalmente por el señor **NILSON MOYA MENA**, identificado con C.C. 4.800.171 de Bojaya (B), obrando en su calidad de Representante Legal, hemos acordado celebrar el siguiente contrato previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

Nuestra Carta Política establece en el inciso 1º del Artículo 209 que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 7 prevé que *"El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana"* y en este sentido, en el artículo transitorio 55 dispuso *"Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley.*

En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale

la ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.

PARAGRAFO 1°. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista.

PARAGRAFO 2°. Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no hubiere expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley."

En el mismo texto constitucional se contempla en el artículo 298 que "...Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. (..) Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes...".

Conforme a ello, la Ley 489 de 1998, "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de la atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", regula en su artículo 6° el Principio de coordinación y colaboración en virtud del cual "...las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. (...) En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares...".

Mediante la Ley 70 de 1993 además de reconocer el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras, se establecieron "*mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana*".

Los artículos 1° y 3° de la Ley 2160 de 2021 modificaron los artículos 6° y 7° de la Ley 80 de 1993, respectivamente, dando capacidad jurídica y definiendo cada una de las organizaciones y comunidades que tiene capacidad jurídica para celebrar contratos con el Estado, entre ellas, los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras, las formas o expresiones organizativas de la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera, las orgarizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las organizaciones de segundo nivel, de la siguiente manera:

> *ARTÍCULO 7°. ENTIDADES A CONTRATAR. Para los efectos de esta ley se entiende por:*
> *1. (...)*
> *2. Consejo comunitario de las comunidades negras: Es la persona jurídica que ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad".*
> *3. Formas o expresiones organizativas. Son manifestaciones que, en ejercicio del derecho constitucional de participación, asociación y de la autonomía de conjuntos de familias de ascendencia negra,*

afrocolombiana, raizal o palenquera que reivindican y promueven su cultura propia, su historia, sus prácticas tradicionales y costumbres, para preservar y proteger la identidad cultural y que estén asentados en un territorio que por su naturaleza no es susceptible de ser titulada de manera colectiva.
4. Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Son asociaciones comunitarias integradas por personas de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, que reivindican y promueven los derechos étnicos y humanos de estas comunidades.
5. Organizaciones de Segundo Nivel. Son asociaciones de Consejos Comunitarios, formas y expresiones organizativas y/u organizaciones de base que agrupan a más de dos (2), inscritas en el Registro Único de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, siempre y cuando el área de influencia de la organización de segundo nivel corresponda a más de la tercera parte de los departamentos donde existan comisiones consultivas (...)"
Para las organizaciones de base de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las demás formas y expresiones organizativas, deberán contar con diez (10) años o más de haber sido incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro; y los consorcios y uniones temporales".

El artículo 2° de Ley 2160 de 2021 incluyó los literales M) y N) al numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionando como causales de contratación directa la que se realice con consejos comunitarios de las comunidades negras y organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras o con las demás formas y expresiones organizativas, así:

"M). Los contratos que las entidades estatales suscriban con los consejos comunitarios de las comunidades negras, regulados por la Ley 70 de 1993, que se encuentren incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro, cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad étnica y cultural, el ejercicio de la autonomía, y/o la garantía de los derechos de los pueblos de las mismas comunidades.

N). Los contratos que las entidades estatales suscriban con las organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras o con las demás formas y expresiones organizativas, que cuenten con diez (10) años o más de haber sido incorporados, por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro, cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento de sus organizaciones, la identidad étnica y cultural, y/o la garantía de los derechos de las poblaciones de las mismas organizaciones".

Las precitadas causales autorizan a las entidades estatales para contratar de manera directa con consejos comunitarios de comunidades negras reguladas por la Ley 70 de 1993, así como con organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras o con las demás formas y expresiones organizativas, que cuenten con diez (10) años o más de haber sido incorporados, por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización, cuando el objeto del contrato se encuentre relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio o de sus organizaciones, la identidad étnica y cultural, el ejercicio de la autonomía, y la garantía de los derechos de los pueblos de las mismas comunidades.

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-129
	DOCUMENTO ADICIONAL	VERSION: 01
		FECHA: 20/11/2015

La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente en la CARTILLA PARA INCENTIVAR Y FORTALECER EL ACCESO AL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS EN COLOMBIA, hace referencia a la capacidad para contratar, conferida en específico a Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, así: *"la Ley 2160 del 2021 establece de manera clara y precisa, que se podrán celebran contratos con: i) consejos comunitarios de las comunidades negras; ii) Formas o expresiones organizativas; iii Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; y iv) Organizaciones de Segundo Nivel."*

Con el Propósito de mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, el Instituto Nacional de Vías, estructuró y se encuentra ejecutando el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual nace como una iniciativa del Gobierno Nacional con el propósito de convertirse en un programa de inversión de alta prioridad dentro de la agenda de desarrollo

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y **EL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS"** del municipio de Mocoa, Putumayo (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el CONTRATO por celebrarse se regirá por las Leyes 70 de 1993, 21 de 1991 y 2294 de 2023; y, por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 2160 de 2021, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia.

La Gobernación del Putumayo en cumplimiento de las acciones determinadas en el Plan de Desarrollo Departamental "Somos el gobierno de la gente" 2024-2027 y desde la Secretaria de Infraestructura Departamental, requiere ejecutar los proyectos de inversión encaminados garantizar el mejoramiento y mantenimiento de las vías, buscando con ello mejorar los estándares de calidad, razón por la cual se formuló el **" MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO",** con Registro BPIN No. 2024006860112.

Que, para garantizar el cumplimiento de sus funciones y según estudio previo presentado por la Secretaría de Infraestructura Departamental, se requiere celebrar un contrato con el objeto de **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".**

Que, el contrato contempla una inversión de recursos por la suma de **TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($311.762.642,00),** los cuales se encuentran amparados bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal anexo y discriminados de la siguiente manera:

OBJETO: " MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMEN DEL PUTUMAYO (OBRA)"
FUENTE: ICLD
REGISTRO BPIN: N° 2024006860112

Identificación Presupuestal	CONCEPTO	VALOR
0301-0.2.3.04.24.02.041.9.2.	Autopista, carreteras, calles	**$241.329.386,00**

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-129
	DOCUMENTO ADICIONAL	VERSION: 01
		FECHA: 20/11/2015

3.2.01.01.001.03.02-1002					
No. de CDP	4671	**F/Expedición**	23/09/2024	**Vigencia**	22/12/2024

Que el contratista, realiza una contribución al presente contrato por un valor de **SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($70.433.255)** equivalente a mano de obra no calificada

DESGLOSE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA			
ESPECIFICACIÓN INVIAS	**ITEM**	**Descripción**	**MONC**
	1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO**	
1P	1,1	Localización y replanteo, incluye andenes	423.108,00
210,2,2	1,2	Excavación en material común a máquina de la explanación (incluye desalojo)	183.236,00
630	1,3	Pavimento de concreto hidráulico (MR 3.8)	16.573.513,00
221,1	1,4	Suministro e instalación de material seleccionado	30.327,00
320,1	1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	94.012,00
232,1	1,6	Suministro e instalación de geotextil para estabilización de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	969.636,00
672,1	1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	417.749,00
	1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	148.991,00
640	1,90	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	882.192,00
640	1,10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	360.645,00
640	1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	42.067,00
433P	1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	303.828,00
	2	**ANDENES**	
2P	2,1	Excavación en material común en seco a mano (Incluye retiro)	716.135,00

610P	2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	41.783,00
	2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	1.790.352,00
640	2,4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	36.577.715,00
	3	**SEÑALIZACIÓN**	
710	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	56.269,00
	3,2	Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central	1.216.315,00
	3,3	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación paso peatonal y línea de pare (incluye microesferas)	179.652,00
	3,4	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	9.122.236,00
	3,5	Suministro e instalación de tachas	303.494,00
SUBTOTAL			**70.433.255,00**

Para un valor total del aporte por parte de la Gobernación del Putumayo de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($241.329.386,00) M/CTE.**

No obstante, lo anterior, el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expedido por el Profesional especializado de la Oficina de Presupuesto Departamental.

Que, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el Departamento del Putumayo emitió el acto administrativo que justifica la modalidad de Contratación directa, previo viabilidad y certificado de idoneidad realizado por la el Secretario de Infraestructura Departamental.

Que, el contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios. En las materias no reguladas por las citadas leyes se aplicará la legislación comercial cuando el contrato tenga el carácter de mercantil de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 del Código de Comercio. En caso contrario se aplicará la legislación civil.

Que, el Representante Legal del **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**, manifiesta bajo la gravedad del juramento surtido mediante la suscripción de este documento, que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones vigentes sobre la materia y que, si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993.

Que, este contrato también se regirá además de sus estipulaciones y normas relacionadas, a los mandatos de los principios de la buena fe y la equidad, de manera tal que las partes eviten incurrir en conflictos de intereses o conductas desleales o ilícitas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - El objeto del presente contrato **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**. por lo anterior, el Departamento del Putumayo y el **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**, se comprometen a aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para ejecutar el objeto del contrato de conformidad al artículo 2, numeral 4, literal M) de la ley 1150 de 2007 adicionada por la ley 2160 de 2021 y conforme al estudio previo presentado por la Secretaría de Infraestructura Departamental y al subproyecto registrado en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeación Departamental del Putumayo con Registro BPIN No. 2024006860112.

PARÁGRAFO: Las especificaciones técnicas son las que se describen a continuación:

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-129
	DOCUMENTO ADICIONAL	VERSION: 01
		FECHA: 20/11/2015

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102691-6

ALCALDÍA DE MOCOA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL

SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO DE OBRA

100,00 ML

ESPECIFICACION INVIAS	ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	Valor total
	1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO					$ 154.802.881,00
3P	1,1	Localizacion y replanteo, incluye ordenes	m²	840,00	$ 2.500,00	$ 2.100.000,00	
210,2,2	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	358,04	$ 50.611,00	$ 18.123.270,44	
630	1,3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 38)	m³	113,40	$ 880.562,00	$ 99.855.731,00	
224,1	1,4	Suministro e instalacion de material sellico poxido	m³	38,11	$ 84.275,00	$ 3.211.720,00	
500,1	1,5	Soldura granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactacion)	m³	94,50	$ 150.348,00	$ 14.204.796,00	
684,1	1,6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasantes y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	490,00	$ 12.000,00	$ 5.880.000,00	
672,1	1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	ml	4,00	$ 675.499,00	$ 2.699.996,00	
	1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127,20	$ 6.152,00	$ 778.977,00	
640	1,10	Canastillas en acero de refuerzo de 34500 PSI, D 1/8" Pasajuntas	ml	170,00	$ 31.826,00	$ 5.710.420,00	
640	1,10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi), Transversal	Kg	604,40	$ 6.202,00	$ 3.747.288,00	
640	1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi), Longitudinal	Kg	70,00	$ 11.833,00	$ 782.857,00	
410P	1,12	Sorte Juntas de Expansión con respectivo sellado	ml	97,87	$ 27.825,00	$ 2.211.545,00	
	2	CUNETAS					$ 27.712.934,00
3P	2,1	Excavacion en material comun en seco a mano (incluye retiro)	m³	30,00	$ 41.496,00	$ 2.492.056,80	
410P	2,2	Soldura granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactacion)	m³	42,00	$ 150.348,00	$ 6.313.656,00	
	2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m²	21,00	$ 677.860,00	$ 14.235.660,00	
665	2,4	Malla Electrosoldada 6x6 Tipo 154 (0,9 x 6 mm	Kg	600,59	$ 13.474,00	$ 5.662.172,00	
	3	SEÑALIZACION					$ 22.868.769,00
710	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva o reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3,00	$ 502.604,00	$ 1.507.812,00	
	3,2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delineacion (por carril)	m	156,22	$ 15.468,00	$ 2.415.473,96	
	3,3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delineacion (eje central y lineas de pare (incluye resaltos))	m	12,00	$ 29.918,00	$ 358.473,00	
	3,4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye resaltos)	m	100,00	$ 90.599,00	$ 18.200.800,00	
	3,5	Suministro e instalacion de tachas	un	51,00	$ 10.813,00	$ 551.704,00	
		Total costos directos					$ 199.316.569,00

Administración	31,12%	$ 61.274.283,00
Imprevistos	5,00%	$ 9.165.997,00
Utilidad	5,00%	$ 0,00
SUBTOTAL ADU	36,12%	$ 70.540.120,00

		Subtotal obra civil				$ 270.019.651,00
		COSTOS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 11.466.910,00
		PROVISION PARA EL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (1%GA)	UNO	1,00	$ 10.943.000,00	$ 10.943.000,00
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UNO	1,00	$ 24.762.910,00	$ 24.762.910,00
		Costo total obra				$ 281.486.561,00
		Interventoria				$ 28.148.656,00
		Valor aportado por la gobernación				$ 170.000.000,00
		Valor aportado por Consejo Comunitario Los Bosques				$ 79.485.905,00
		Valor total del proyecto				$ 309.635.217,00

CLÁUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO: Son obligaciones del Departamento, sin perjuicio de las demás que las disposiciones legales vigentes le imponen en desarrollo de este contrato, las siguientes:

1.- Transferir al contratista, los recursos con destinación especifica de que trata el contrato, previo cumplimiento de los requisitos que la transferencia amerite con el fin adelantar la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".** En cuantía de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($241.329.386,00).

2.- Ejercer la supervisión general del presente contrato a través del Secretario de Infraestructura Departamental, o del funcionario que se designe, en miras de verificar el cumplimiento del mismo y que la inversión se realice a fin de dar cumplimiento a la ejecución del proyecto radicado y viabilizado en el Banco de Proyectos Departamental.

3.- Velar porque el contratista cumpla y desarrolle el proyecto tal y como fue aprobado por el Departamento.

4.- Realizar la supervisión técnica y financiera a las actividades que se ejecutan en desarrollo del contrato, por medio de la Secretaría de Infraestructura Departamental del Putumayo, del funcionario que se delegue para tal fin, y realizar visita de seguimiento para la verificación de cumplimiento de las actividades estipuladas en el Plan Operativo y objeto del contrato.

5.- Brindar el apoyo técnico necesario al ejecutor del proyecto para el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato.

6.- Coordinar las actividades administrativas y logísticas para el desarrollo del objeto del contrato.

7.- Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato.

OTRAS OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

En virtud del contrato, la Entidad se obliga a:

1) Pagar en la forma establecida en la Cláusula forma de pago.
2) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista.
3) Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley.
4) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS U OBLIGACIONES DEL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS DEL MUNICIPIO DE MOCOA:

El Municipio, deberá cumplir las siguientes obligaciones frente al contrato:

1.- Mantener los requisitos de idoneidad, existencia y personería jurídica durante el plazo de duración del contrato, por lo que, el Contratista no podrá disolverse, cancelarse o liquidarse en este periodo.

2.- Mantener al día la información financiera de la ejecución de actividades del proyecto.

2.- Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y Estudios previos y demás anexos que hacen parte integral del presente Contrato.

3.- Velar por el cumplimiento de las leyes y normas pertinentes a la ejecución de la actividad del proyecto y los criterios adecuados de contratación y optimización de recursos.

4.- Realizar la respectiva contratación para la ejecución del proyecto de conformidad con lo reglamentado en las leyes 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus Decretos reglamentarios, No se autoriza aplicar otro régimen diferente.

5.- Tener a disposición de la Secretaría de Infraestructura Departamental, la información de la ejecución técnica, administrativa, operativa y financiera del contrato que se suscriba posterior a la firma del presente contrato.

7.- Elevar a consulta de la Secretaría de Infraestructura Departamental cualquier modificación al contrato que considere pertinente dentro de la vigencia del mismo con los respectivos soportes técnicos y administrativos con quince (15) días de anterioridad como mínimo.

8.- Presentación del informe de ejecución completo en original o copia e impreso, aprobado por el supervisor del contrato.

9.- Realizar el aporte al proyecto **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**. por un valor de SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($70.433.255) con el fin de llevar a cabo la ejecución del presente.

10. Aperturar una cuenta conjunta en un banco o corporación con el nombre del objeto del contrato para consignar ahí los aportes de la Gobernación del Putumayo. Dichos recursos únicamente podrán ser retirados por autorización del supervisor designado y el interventor. La original de la certificación donde conste la apertura de la cuenta deberá ser enviada al Departamento. Los aportes que reciba de la Gobernación se ejecutarán bajo la responsabilidad del Consejo Comunitario, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 4°, artículo 6° de la ley 1551 de 2012 y estarán destinados única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del presente contrato.

INFORMES DE SEGUIMIENTO A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Los informes del contratista respecto del contrato celebrado entre el Departamento del Putumayo, en cumplimiento del mismo deberán contener como mínimo los aspectos mencionados a continuación:

INFORME EJECUTIVO: Relacionar las acciones adelantadas para el desarrollo de la actividad del proyecto, cuya actividad es el **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL**

EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

- Dar crédito correspondiente a la Gobernación del Putumayo, como entidad participe en el desarrollo del objeto del contrato, y divulgar, a través de medios idóneos del área de influencia del proyecto, el interés de esta entidad en el desarrollo de la región y especialmente en el bienestar de la comunidad.
- Presentar el informe final de actividades dando cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en cumplimiento del objeto del presente contrato, remitiendo junto con el informe final, fotocopia de los documentos de índole legal y técnico que justifiquen la inversión a la Secretaría de Infraestructura Departamental para proyectar el Acta de recibo final de liquidación del Contrato en conjunto. Así mismo deberá allegar Fotocopia del Extracto bancario del movimiento de la cuenta corriente o de ahorro bancaria donde se efectúa el desembolso formarán parte integral del informe que se obliga a presentar a la Secretaría de Infraestructura Departamental y dichos movimientos deberán estar legalmente soportados.
- Efectuar el objetivo descrito del contrato conforme las consideraciones establecidas en los estudios de conveniencia y oportunidad.
- En el caso de no ejecutarse el proyecto, el contratista deberá restituir de forma inmediata en su integridad a la Gobernación del Putumayo, las sumas aportadas por esta última como contrapartida contemplada en el proyecto, más los intereses generados, de ser el caso.

11.- Las transferencias que el contratista reciba del Departamento del Putumayo se ejecutarán bajo su responsabilidad y estarán destinados única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del presente contrato.
12.- Las demás que se concreten por mutuo acuerdo entre las partes durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA CUARTA. - COMPROMISOS CONJUNTOS DE LAS PARTES:

- Responder por las actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo
- Colaborar recíprocamente para el normal desarrollo del contrato y del proyecto que constituye su objeto.
- Realizar su aporte en la forma y oportunidad convenidas en el contrato, siempre que se hubieren satisfecho los requisitos previstos en él para ello.
- Coordinar la elaboración conjunta de un Plan Operativo y de Inversión para la ejecución de las actividades del contrato.
- Supervisar y controlar periódicamente la ejecución del contrato.
- Concurrir a la liquidación final del Contrato, una vez cumplido el objeto del mismo.
- Aportar la información técnica disponible y la experiencia institucional requeridas para el desarrollo del objeto del contrato.
- Las demás acordadas expresamente por las partes.

CLÁUSULA QUINTA: ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO: EL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS DEL MUNICIPIO DE MOCOA, será el ejecutor del proyecto y de los recursos aportados por el Departamento del Putumayo en cumplimiento del proyecto que constituye el objeto del contrato. De la misma forma se obliga a cumplir las actividades de acuerdo al plan de inversión:

Los demás detalles del presente proceso de contratación se encuentran incluidos en el banco de proyectos bajo el número BPIN 2024006860112 y los demás documentos del proceso.

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-129
	DOCUMENTO ADICIONAL	VERSION: 01
		FECHA: 20/11/2015

CLÁUSULA SEXTA; VALOR Y CLASE DE APORTES. - El valor del presente Contrato para todos los efectos legales y fiscales, se fija así: **TRESCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($311.762.642,00)**, de los cuales la Gobernación del Putumayo aportará al proyecto **" "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($241.329.386,00)**, los cuales serán destinados a la obra.

OBJETO: " MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMEN DEL PUTUMAYO (OBRA)"
FUENTE: ICLD
REGISTRO BPIN: N° 2024006860112

Identificación Presupuestal	CONCEPTO	VALOR
0301-0.2.3.04.24.02.041.9.2.3.2.01.01.001.03.02-1002	Autopista, carreteras, calles	**$241.329.386,00**

No. de CDP	4671	F/Expedición	23/09/2024	Vigencia	22/12/2024

Que el contratista, realiza una contribución al presente contrato por un valor de **SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($70.433.255)** equivalente a mano de obra no calificada

CLAUSULA SÉPTIMA: RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO. - La Gobernación del Putumayo cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar, de conformidad con lo siguiente:

OBJETO: " MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMEN DEL PUTUMAYO (OBRA)"
FUENTE: ICLD
REGISTRO BPIN: N° 2024006860112

Identificación Presupuestal	CONCEPTO	VALOR
0301-0.2.3.04.24.02.041.9.2.3.2.01.01.001.03.02-1002	Autopista, carreteras, calles	**$241.329.386,00**

No. de CDP	4671	F/Expedición	23/09/2024	Vigencia	22/12/2024

No obstante, lo anterior, el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expedido por el Profesional especializado de la Oficina de Presupuesto Departamental.

CLÁUSULA OCTAVA - FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES:

El aporte que realizará el **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($241.329.386,00),** de los cuales será destinado a la obra, el cual será transferido por el Departamento del Putumayo, de la siguiente manera:

ANTICIPO: La Entidad entregará en calidad de anticipo, un 50% del valor total del aporte del Departamento en el contrato, previo perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de legalización y de ejecución del contrato, así como firma del acta de inicio por parte del Representante del Consejo Comunitario, el supervisor designado y el interventor contratado. Para lo anterior se deberá anexar copia del contrato, documentos soporte legalización, fotocopia del RUT, documento de identificación del Representante legal del consejo comunitario plan de inversión del anticipo aprobado por la supervisión e interventoría y certificación bancaria de cuenta de ahorros conjunta que se apertura a nombre de contrato para el manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo, recursos que únicamente podrán ser retirados por autorización del supervisor e interventor designados. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados pertenecerán al tesoro departamental-siendo, por ello consignados a favor del Departamento y de tal evento se deberá dejar constancia en el acta de liquidación. El valor del anticipo, será amortizado de acuerdo con lo establecido para el manejo de estos recursos y según las cantidades de obra ejecutadas, amortizándose de manera gradual en las actas parciales de ejecución por el 50% del valor que se pretende cobrar en cada acta hasta cubrir el monto total desembolsado a título de anticipo.

Hasta el 90% del valor total del contrato en actas parciales de obra, siempre y cuando el porcentaje de ejecución física sea igual al 90% del valor aportado por el Departamento.

PAGO FINAL: El 10% del valor total del aporte del Departamento en el contrato a título de pago final, el cual se realizará la terminación del plazo de ejecución previa amortización del 100% del anticipo desembolsado, así como aprobación y recibo final de la Obra, realizado por el interventor y el supervisor del contrato y presentación de soportes pertinentes para la liquidación (Anexando todos los soportes que demuestren la inversión), todo ello previo a la suscripción del acta de liquidación. Este pago se hará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que el consejo comunitario haya presentado y radicado el informe final de ejecución total de la obra por parte de la interventoría y certificación del cumplimiento del 100% del objeto del contrato expedida por el supervisor del mismo. El acta de liquidación será suscrita por el Representante Legal del Consejo comunitario, la supervisión del contrato, el interventor y el ordenador del gasto del Departamento del Putumayo.

DEL DERECHO DE TURNO. Según lo señalado en el artículo 19 de la ley 1150 de 2007, la Entidad respetara el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la Entidad.

PARÁGRAFO 2: INFORMES FINAL CONTENIDO: El informe final de ejecución que se obliga a presentar el Consejo Comunitario la Acacias al Departamento al finalizar el plazo del contrato o sus actividades, deberá

contener la relación de contratos que requiera suscribir el Consejo comunitario o para la ejecución del contrato que soporta la inversión de los recursos aportados y del valor total del contrato, con los debidos soportes, facturas y demás.

El informe contendrá un balance de inversión de los recursos en los que se aprecie los gastos efectuados en la ejecución del proyecto que constituye el objeto del contrato con los respectivos recibos y/o notas debito que recaen sobre la cuenta de ahorros que apertura el Consejo comunitario para el manejo de recursos.

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DEL CONTRATO: Se estima que la actividad objeto de la necesidad del contrato se desarrollará en un plazo de **TRES (03) MESES** que se contará a partir de que perfeccione y se suscriba el acta de inicio por las partes y el supervisor del contrato.

CLÁUSULA DECIMA. – GARANTÍAS: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo del Decreto 1088 de 1993, adicionado por el artículo 1, Decreto No. 252 del 21 de febrero de 2020, el cual señala lo siguiente:

"Para la ejecución contractual, la entidad estatal deberá exigir la constitución de una garantía única que consistirá en una póliza de seguros que cubrirá suficientemente los riesgos del contrato o contrato"

Dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato, el contratista presentara a la entidad una póliza de garantía única, la cual debe ser suficiente de acuerdo a las distintas clases de obligaciones amparadas. Los riesgos que deben cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar así:

Clase de amparo	Valor asegurado	Vigencia del amparo
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, o el pago de multas y demás sanciones que se deriven de su incumplimiento	10% del valor del contrato	Plazo del contrato hasta la liquidación del contrato.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100% del valor entregado como anticipo	Hasta la liquidación del contrato
Responsabilidad extracontractual	200 SMLMV para manera general, pero debe tener en cuenta la tabla del decreto No. 1510 del 2013, según la cuantía del contrato.	Plazo del contrato
Garantía de salarios prestaciones sociales	5% del valor del contrato Si para la ejecución del contrato requiere personal	Plazo del contrato Tres años más
Estabilidad y calidad de la obra	10% del valor del contrato	Equivalente al 10% del valor del contrato, estará vigente a partir del momento del recibo de la obra a satisfacción por parte del Departamento del Putumayo por el término de dos años.
Calidad del servicio	10% del valor del contrato	Plazo del contrato hasta la liquidación del contrato.

Los porcentajes y vigencias de los anteriores amparos están encaminados a garantizar los siguientes riesgos:

- Que la persona jurídica responsable de la ejecución del contrato no pueda dar cumplimiento total o parcial a sus compromisos pactados en el contrato o que no cumpla dentro del plazo de ejecución pactado.

- Que la persona jurídica no invierta ni ejecute correctamente la suma de dinero entregada por las demás partes en calidad de anticipo.

- La persona jurídica responsable de la ejecución del contrato deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros.

- De igual manera en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía.

Se recomienda a la entidad ejecutora al momento de invertir y ejecutar los aportes del Departamento, exigir al contratista que le suministren bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del proyecto, la constitución de las garantías necesarias que amparen los riesgos en las contrataciones y así garantizar el cumplimiento del contrato y proteger los recursos aportados al contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO. - Cualquier prórroga, adición o modificación al presente contrato deberá hacerse por escrito ante la Secretaria de Infraestructura Departamental para su estudio y aprobación; Si se trata de prórroga o incremento en su valor se hará mediante contrato adicional.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN: El contrato podrá terminarse por vencimiento del plazo; por incumplimiento de las actividades a cargo de alguna de las partes; por mutuo acuerdo de las partes.

De acuerdo a la normatividad vigente, Articulo 11 Ley 1150 de 2007, se realizará la liquidación del contrato de común acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo fijado para su ejecución. En aquellos casos en que el beneficiario no se presente a la liquidación previa, notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el C.C.A o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: COMPROMISORIA: Las partes acuerdan que en la eventualidad del surgimiento de discrepancias o diferencias por razón o con ocasión del desarrollo del presente contrato, buscarán la solución en forma directa mediante Conciliación o Transacción, para lo cual se conceden mutuamente un plazo de diez (10) días a partir de la notificación que una de las partes le haga a la otra. Si en dicho término no fuere posible acordar fórmulas de arreglo en forma total o parcial, someterán sus diferencias a la amigable composición ante autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente sobre la materia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RÉGIMEN APLICABLE: El régimen aplicable a los actos o contratos que realice el Municipio, en desarrollo de este contrato se sujetará a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios y demás normas que regulan la materia por tratarse de entidades públicas del orden territorial.

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-129
	DOCUMENTO ADICIONAL	VERSION: 01
		FECHA: 20/11/2015

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN: EL CONSEJO COMUNITARIO, no podrá ceder parcial ni totalmente el presente contrato sin previa autorización por escrito del Departamento del Putumayo.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEMNIDAD: **EL CONSEJO COMUNITARIO**, en virtud de la autonomía que le asiste para la ejecución de las actividades pactadas, asume de forma total y exclusiva la responsabilidad que se derive por la calidad e idoneidad de los servicios prestados al Departamento del Putumayo- Secretaría de Infraestructura Departamental, así como la responsabilidad por los perjuicios que puedan derivarse de sus acciones u omisiones.

El **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS,** se obliga a mantener indemne al Departamento del Putumayo contra todo reclamo, requerimiento, demanda, acción legal, que pueda causarse o surgir por daños y lesiones a personas o propiedades o terceros, ocasionados por el **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**, durante la ejecución de las actividades del objeto del contrato y hasta la liquidación definitiva del mismo. **EL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**, será responsable ante la entidad por todos los daños causados a las propiedades e instalaciones de la entidad ya sea por su culpa, por el personal a sus servicios, de sus subcontratistas o de sus proveedores y reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos a satisfacción del Departamento del Putumayo.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Toda vez que **EL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS,** ejecutará el objeto del presente contrato con autonomía técnica y sin subordinación con respecto al Departamento del Putumayo, queda entendido que no habrá lugar a vínculo laboral alguno entre el Departamento del Putumayo y **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS.**

CLÁUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA: RÉGIMEN LEGAL: El presente contrato estará sometido en todo a la Ley Colombiana, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y se rige por las disposiciones civiles o comerciales pertinentes, salvo las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen, reglamenten o adicionen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO: Conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, este contrato se perfecciona con la suscripción por las partes y para su ejecución requiere la expedición del correspondiente registro presupuestal de compromiso. Los gastos que se generen como consecuencia de la legalización de este contrato no son imputables al mismo y corren por cuenta de la **EL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS.**

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los fines contractuales se establece como domicilio el Municipio de San Miguel Agreda de Mocoa – Departamento del Putumayo.

CLÁUSULA VIGÉSIMATERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Harán parte integral del contrato los siguientes documentos: Estudio previo, sub-proyecto registrado en Banco de Proyectos, CDP, invitación a presentar propuesta, propuesta presentada con sus anexos, acta de verificación, registro presupuestal y todo documento que se genere con la ejecución del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia

de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado la siguiente opción: Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría General de la Nación, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría General de la Nación, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, se podrá acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS EFECTOS: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por la Gobernación del Putumayo cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente contrato, conforme a la normatividad vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, El Departamento del Putumayo puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: Multas diarias y sucesivas a razón del uno por ciento (1x100) del valor total del contrato, por cada día calendario que transcurra entre el incumplimiento de la obligación y hasta cuando esta efectivamente se cumpla, y sin que el valor total de las multas pueda sobrepasar el diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-020
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/07/2015

CONTRATO No. 1071 DEL 18/07/2025

Clase de contrato	INTERVENTORÍA
Contratista	DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
Objeto	"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)".
F/suscripción	18/07/2025
Fecha de R.P.	18/07/2025
Fecha de aprobación de póliza	24/07/2025
Plazo inicial	Tres (03) meses
Fecha de inicio	27/10/2025
F/terminación plazo del convenio	26/01/2026

En las instalaciones de la Secretaría de infraestructura Departamental del Putumayo se reunieron: VIRGILIO BRAVO SOSA, en su calidad de Secretario de infraestructura Departamental y el señor NILSON MOYA MENA, identificado con C.C No. 4.800.171 de Bojayá (B) en calidad de Representante legal del Consejo Comunitario las Acacias con NIT 800.094.164-4, y el señor DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO identificado con C.C. No. 1.113.304.913 de Sevilla (V) en calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato en mención, previo las siguientes consideraciones.

1. Que, según el contrato de obra de la referencia, su plazo se pactó por el término de tres (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2. Que a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de interventoria No. 1071 del 18/07/2025, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:

1. Dar inicio a la ejecución del contrato de interventoría No. 1071 del 18 de julio de 2025, a partir del día veinte siete (27) días de octubre de 2025.
2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el veinte seis (26) días de enero (01) de 2026.
3. El interventor se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio.

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-020
	ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/07/2015

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los 27 días del mes de octubre de 2025.

Por la Gobernación del Putumayo	Por la Interventoría
VIRGILIO BRAVO SOSA	**DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO**
Secretario de Infraestructura Departamental Gobernación del Putumayo	Contratista de Interventoría C.C. No. 1.113.304.913 de Sevilla (V)

Elaboró	Karol Daniela Lasso	Secretaria de infraestructura Departamental	Profesional de apoyo	

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.4 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

NIT. 800.094.164-4	GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL **ANEXO EQUIPO DE OBRA**	CÓDIGO	FT-SID-007		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 26 dic 2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

INTERVENTOR: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES: 2 CONTRATO No. 1943-2024 DEL 11 de OCTUBRE DE 2024 MUNICIPIO: CORREGIMIENTO DE PUERTO LIMO, MUNICIPIO DE MOCOA

CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA

DIA / MAQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Herramienta menor	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A														
pulidora		A	A	A	A	A	A	A	A																						
concretadora tipo trompo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																					
vibrador de concreto	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																					

CONVENCIONES
ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I

Firma: Nilson moya
Nombre: NILSON MOYA MENA
REPRESENTANTE LEGAL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

Firma:
Nombre: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
Director de Interventoria
Matricula No : 63202-220004 QND

193

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.5 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

NIT. 800.094.164-4	GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	CÓDIGO	FT-SID-007		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1
		FECHA	26	DIC	2025

OBJETO "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

INTERVENTOR: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES 2 **CONTRATO No.** 1943-2024 DEL 11 de OCTUBRE DE 2024 **MUNICIPIO:** MOCOA, INSPECCION DE PUERTO LIMON **PERIODO:** 27/NOVIEMBRE/2025 AL 26/DICIEMBRE/2025

CONTRATISTA CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA

PROFESIONAL \ DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CORTEZ CABEZAS JOSE JUANITO	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X														
RODRIGUE NARVAEZ ERIKA YANIRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
ALVARO MILTON MONTENEGRO MATINEZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
ENRIQUEZ PANTOJA LUIS ALVARO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
ENRIQUE PANTOJA VICTOR HUGO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
ORTEGA LOPEZ MARCO ANTONIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
RIVERA QUISTIAL HOVER DANIEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
VALENCIA MEZA SANDRO JULIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														

Firma: Nilson Moya
Nombre: NILSON MOYA MENA
REPRESENTANTE LEGAL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

Firma:
Nombre: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 63202-220004 QNO

196

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.6 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

NIT. 800.094.164-4	GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL INFORME FINANCIERO DE LA OBRA	CODIGO			
		VERSIÓN			
		PAGINA	1	DE	1
		FECHA			

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL — GOBERNACIÓN: PUTUMAYO

CONTRATO No: 1943-2024 DEL 11 de OCTUBRE DE 2024 — CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS — MES: 2

SECTOR: MOCOA. INSPECCION DE PUERTO LIMON

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Acta No	Mes/ Año	Valor Directo	Valor Indirecto	Valor Total	Amortización Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	Observaciones
CONTRATO INICIAL		$ 205,536,503.50	$ 35,792,883.50	$ 241,329,387.00	$ -	$ -	$ 241,329,387.00	$0	$ 241,329,387.00	
TOTALES		$0.0	$0	$0.00						

Nota: Los valores se deben expresar en millones de pesos

Firma: Nilson moya

NOMBRE: NILSON MOYA MENA

REPRESENTANTE LEGAL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

Firma:

NOMBRE: DAVID RAMÓN ENCISO ARANGO

Contratista de Interventoría

Matrícula No.: 63202-220004 QND

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

NIT. 100.094 164-4	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL ANEXO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	FT-SID-307
		VERSIÓN	1
		FECHA	1 DE 1

FECHA 26 DIC 2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

INTERVENTOR: DAVID ANDRÉS ENCISO / RANGO: _____ MES: 2

CONTRATO No: 1943-2024 DEL 11 de OCTUBRE DE 2024 CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS MUNICIPIO: MOCOA, INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Clase de tiempo																															
Seco	X	X		X		X			X	X	X																				
Lluvias moderadas					X			X				X	X		X	X	X	X	X	X											
Lluvias intensas			X																												

Firma: Nilson Moya
Nombre: NILSON MOSQUERA MENA
REPRESENTANTE LEGAL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

Firma: _____
Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Director de Interventoría
Matrícula No.: 6321-2[illegible]

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.8 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATISTA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO



1. FECHA ELABORACIÓN: 30 | 10 | 2025

A. DATOS GENERALES

2. Contrato No:	1943	**3. FECHA CONTRATO:**	11	Octubre	2024	**4. VALOR CONTRATO:**	$	241.329.386,00

5. FECHA ACTA INICIO:	27 | 10 | 2025	**6. FECHA DE TERMINACIÓN:**	26 | 1 | 2026	**7. PLAZO EJEC. (MESES):**	3

8. CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
9. CONTRATISTA :	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS NIT: 800.094.164-4 R/L NILSON MOYA MENA

10. CTO INTERVENTORIA No:	1071	**11. DEL AÑO:**	2025	**12. PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES):**	3	**13. VALOR CONTRATO:**	$ 25.222.184,00

14. OBJETO DEL CONVENIO :	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

15. VALOR ANTICIPO:	$ 120.664.693,00	**16. PORCENTAJE ANTICIPO:**	50%

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

17. ITEM	18. DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
1	COSTOS DE PERSONAL (NOMINA)	$ 0,0	0%
2	MATERIALES E INSUMOS	$ 60.332.346,5	50%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 48.265.877,2	40%
4	EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ 12.066.469,3	10%
5	ADMINISTRACIÓN	$ 0,0	0%
TOTAL		$ 120.664.693,00	100,00%

NOTA: *Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo .*

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Mocoa (Putumayo), a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025.

ELABORADO POR:

Nilson Moya

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 800.094.164-4
NILSON MOYA MENA
C.C. No. 4.800.171 de Bojayá (B)

APROBADO POR:

DAVID ANDRES ERCISO ARANGO
C.C No.1.113.304.913 de Sevilla (V)
Contrato de interventoria: 1071-2025

APROBADO POR:

ING. VIRGILIO BRAVO SOSA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

NIT: 9010424220-9

RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

DOCUMENTO EJECUTIVO DE ENTREGA DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

1. RESUMEN FINANCIERO DEL ANTICIPO

El Plan de Inversión del Anticipo está diseñado para garantizar la liquidez necesaria para la adquisición de materiales base y la movilización de equipos y personal, que son críticos para la fase inicial del proyecto.

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO	**$ 241.329.386,00**	100%
VALOR DEL ANTICIPO	**$ 120.664.693,00**	**50%**

2. DESGLOSE DEL PLAN DE INVERSIÓN

El 50% del anticipo se distribuirá en las siguientes categorías, priorizando la ejecución efectiva de las actividades del primer mes de acuerdo con el cronograma de ejecución (Desglose de Anticipo):

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A INVERTIR	PORCENTAJE DEL ANTICIPO
1	**MATERIALES E INSUMOS**	$ 60.332.346,5	50%
2	**TRANSPORTE DE MATERIALES**	$ 48.265.877,2	40%
3	**EQUIPOS Y MAQUINARIA**	$ 12.066.469,3	10%
TOTAL, INVERSIÓN		**$ 120.664.693,00**	**100%**

Nota: El rubro de Costos de Personal (Nómina) no tiene asignación directa del anticipo, asumiéndose que se pagará con la ejecución de las actas de obra.

3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (Detalle Semanal)

El Desglose de Anticipo detalla la ejecución de obra por valor acumulado, evidenciando una rápida inversión de los recursos en las primeras semanas para adquirir materiales y asegurar la estructura del pavimento rígido.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

NIT: 9010424220-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

MES	SEMANA	VALOR ACUMULADO DE OBRA	PRINCIPALES ACTIVIDADES CUBIERTAS
MES 1	Semanas 1 y 2	$ 8.926.786,00	Localización y Replanteo, Excavación, Adquisición de Subbase y Geotextil.
	Semana 3	$ 15.579.711,00	Continuación de Subbase, Instalación de Geotextil, Bordillos.
	Semana 4	$ 28.785.630,00	Pavimento en Concreto Hidráulico (Inicio de vaciado).
MES 2	Semana 7	$ 84.202.331,00	Mayor ejecución de Concreto Hidráulico y Andenes.
MES 3	Semana 9	**$ 120.664.693,00**	Finalización y Sellado de Juntas, Señalización.

4. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

La ejecución del presente PIA estará sujeta a las siguientes medidas:

- **Cuenta Única:** Los recursos serán manejados en una cuenta bancaria exclusiva para el proyecto.
- **Amortización:** La amortización del anticipo se realizará de forma lineal y proporcional en cada acta de recibo parcial de obra, hasta su total cubrimiento.
- **Soporte Documental:** Todos los egresos serán respaldados por facturas, órdenes de compra y recibos de pago con el visto bueno de la Interventoría, garantizando la trazabilidad de cada peso invertido.

PARA CONSTANCIA Y ENTREGA FORMAL

El presente documento ejecutivo se presenta para la aprobación y conocimiento de las partes.

Nilson moya

NILSON MOYA MENA
Representante Legal
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO



No	DESCRIPCION		MES PROCESO CONTRACTUAL	MES 1				MES 2				MES 3
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO											
1,1	Localizacion y replanteo, incluye sinderes	$ 2.100.000,00		X $ 1.050.000,00	X $ 1.050.000,00							
1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	$ 13.653.570,00			X $ 3.413.393,00	X $ 3.413.393,00	X $ 3.413.393,00	X $ 3.413.393,00				
1,3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)	$ 99.855.731,00									X $ 24.963.933,00	X $ 28.532.209,00
1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	$ 3.211.728,00					X $ 802.930,00	X $ 802.930,00	X $ 802.930,00	X $ 802.930,00		
1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	$ 14.226.786,00						X $ 3.556.697,00	X $ 3.556.697,00	X $ 3.556.697,00	X $ 3.556.697,00	
1,6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o	$ 8.254.356,00					X $ 2.063.589,00	X $ 2.063.589,00	X $ 2.063.589,00	X $ 2.063.589,00		
1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	$ 3.309.945,00										X $ 1.103.315,00
1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordito	$ 779.377,00									X $ 194.844,00	X $ 258.792,00
1,9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	$ 3.710.426,00								X $ 927.605,00	X $ 927.605,00	X $ 1.236.807,00
1,10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi), Transversal	$ 3.747.299,00								X $ 936.825,00	X $ 936.825,00	X $ 1.249.083,33
1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi), Longitudinal	$ 782.051,00								X $ 195.514,00	X $ 195.514,00	X $ 260.686,00
1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	$ 1.211.560,00										X $ 363.538,67
2	ANDENES											
2,1	Excavacion en material comun en seco a mano (incluye retiro)	$ 1.492.056,00					X $ 373.014,00	X $ 373.014,00	X $ 373.014,00	X $ 373.014,00		
2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	$ 6.323.016,00						X $ 1.580.754,00	X $ 1.580.754,00	X $ 1.580.754,00	X $ 1.580.754,00	
2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	$ 14.235.690,00										X $ 3.558.923,00
2,4	Malla Electrosoldada 6x2.35m 15 X 15 de 4 mm	$ 5.662.172,00						X $ 1.415.543,00	X $ 1.415.543,00	X $ 1.415.543,00	X $ 1.415.543,00	
3	SEÑALIZACION											
3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y	$ 1.507.812,00										
3,2	Demarcación con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	$ 2.413.473,00										
3,3	Demarcación con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y lineas de pare (incluye	$ 356.475,00										
3,4	Demarcación con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	$ 18.108.808,00										
3,5	Suministro e instalacion de tachas	$ 602.206,00										
	COSTO DIRECTO OBRA	$ 205.536.563,00	Total acumulado	1.050.000,00	4.463.393,00	3.413.393,00	6.882.025,00	13.295.910,00	9.700.526,00	11.882.405,00	31.771.710,00	39.462.362,00
	COSTOS INDIRECTOS OBRA	$ 70.540.126,00	Valor acumulado obra	1.050.000,00	5.513.393,00	8.926.786,00	15.579.711,00	28.765.634,00	38.579.156,00	50.461.561,00	82.233.271,00	121.695.633,00

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT. 900.094.164-4
NILSON MOYA MENA
C.C. No. 4.900.171 de Bajoyá (S)

DAVID ANDRES INCISO ARANGO
C.C No.1.113.304.913 de Sevilla (V)
Contrato de Interventoría. 1071-2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.9 INFORMACION RELACIONADA CON EL RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	CÓDIGO			
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	VERSIÓN			
NIT. 800.094.164-4	ANEXO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA	PAGINA	1	DE	1
		FECHA	7	1	2026

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL — GOBERNACIÓN: PUTUMAYO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. ORDEN	ESPECIFICACIÓN						
	DESCRIPCION/ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA	No. MUESTRAS	RANGO CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE OBTENIDO%	OBSERVACIÓN /ACCIONES
1	PLACA DE COCNCRETO		3/12/2025	7 DIAS	3146.5	79.00%	28/11/2025
2			10/12/2025	14 DIAS	3796	95.00%	
3			24/12/2025	28 DIAS	4320.4	106.00%	
4	PLACA DE COCNCRETO		[illegible]	7 DIAS	3084.6	77.00%	[illegible]
5			11/12/2025	14 DIAS	3678.1	97.00%	
6			25/12/2025	28 DIAS	4225.3	106.00%	
7	PLACA DE COCNCRETO		6/12/2025	7 DIAS	3074.7	77.00%	29/11/2025
8			13/12/2025	14 DIAS	3778.9	94.00%	
9			27/12/2025	28 DIAS	4627.7	116.00%	
10	PLACA DE COCNCRETO		8/12/2025	7 DIAS	3115	78.00%	1/12/2025
11			15/12/2025	14 DIAS	3804.6	95.00%	
12			29/12/2025	28 DIAS	4152.1	104.00%	
13	BORDILLOS		15/12/2025	7 DIAS	1966.3	66.00%	4/12/2025
14			18/12/2025	14 DIAS	2679	90.00%	
15			1/1/2026	28 DIAS	3808.2	127.00%	
16	ANDEN		17/12/2025	7 DIAS	2015.7	67.00%	10/12/2025
17			24/12/2025	14 DIAS	2827.8	94.00%	
18			7/1/2026	28 DIAS	3936.3	131.00%	

Firma: NILSON MOYA

Nombre: NILSON MOYA MENA

REPRESENTANTE LEGAL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

Firma

Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO

Director de interventoria

Matricula No.: 63202-220004 QND

CONTROL DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRAULICO

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NORMA INV E-410

CLIENTE:	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO	FECHA:	07/01/2026
CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071 - 2025	NIT:	87219077 - 5
PROYECTO	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)		

Fecha de Fundición (dd/mm/aa)	Cilindro No.	Días de Curado	Fecha de rotura (dd/mm/aa)	Carga Aplicada (KN)	Resistencia alcanzada (PSI)	Obra / estructura	Resistencia de Diseño (PSI)	% alcanzado	Cumple
28-nov-25	1	7	03-dic-25	168.6	3546.5	Placa de Concreto	4000	70%	SI
	2	14	10-dic-25	203.4	3795.0	Placa de Concreto	4000	95%	SI
	3	28	24-dic-25	236.2	4320.4	Placa de Concreto	4000	108%	SI
27-nov-25	4	7	04-dic-25	169.4	3086.5	Placa de Concreto	4000	77%	SI
	5	14	11-dic-25	207.8	3878.1	Placa de Concreto	4000	97%	SI
	6	28	25-dic-25	231.0	4336.4	Placa de Concreto	4000	108%	SI
29-nov-25	7	7	06-dic-25	168.1	3076.7	Placa de Concreto	4000	77%	SI
	8	14	13-dic-25	206.5	3778.9	Placa de Concreto	4000	94%	SI
	9	28	27-dic-25	253.0	4627.7	Placa de Concreto	4000	116%	SI
01-dic-25	10	7	08-dic-25	170.5	3115.0	Placa de Concreto	4000	78%	SI
	11	14	15-dic-25	208.0	3804.6	Placa de Concreto	4000	95%	SI
	12	28	29-dic-25	227.0	4152.1	Placa de Concreto	4000	104%	SI
04-dic-25	13	7	11-dic-25	107.9	1969.3	Bordillos	3000	66%	SI
	14	14	18-dic-25	157.4	2873.0	Bordillos	3000	96%	SI
	15	28	01-ene-26	208.2	3808.2	Bordillos	3000	127%	SI
10-dic-25	16	7	17-dic-25	110.2	2015.7	Anden	3000	67%	SI
	17	14	24-dic-25	154.6	2827.8	Anden	3000	94%	SI
	18	28	07-ene-26	215.3	3936.3	Anden	3000	131%	SI

Observaciones:

Profesional responsable

Carlos Humberto Sanchez Morales
Ingeniero Civil
M. P. No. 050267 0678463 CND

Registro Fotográfico




1703
2080
1574
1102
1546

	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE NORMA INV E-414-13	PROCESO	GESTIÓN DE LABORATORIO
		FECHA VERSIÓN	13/12/2024
		VERSIÓN	02
		PAGINA	1 DE 1

REFERENCIA N°	COP-1943-2024	**F. DE INFORME**	30/12/2025
CLIENTE	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	**NIT:**	901.042.420
OBRA/PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.		

Obra / estructura	Muestra	Viga No.	Fecha de Fundición (dd/mm/aa)	Fecha de rotura (dd/mm/aa)	Edad de la muestra (dias)	Carga Aplicada (KN)	Resistencia Conseguida (MPA)	Resistencia de Diseño (MPA)	%	Cumple
Placa de concreto 3.8 MPa	1	A	26-nov-25	03-dic-25	7	21.4	2.82	3.8	74%	SI
		B		10-dic-25	14	26	3.43	3.8	90%	SI
		C		24-dic-25	28	30.2	3.98	3.8	105%	SI
	2	A	27-nov-25	04-dic-25	7	21.2	2.80	3.8	74%	SI
		B		11-dic-25	14	28.6	3.77	3.8	99%	SI
		C		25-dic-25	28	29.2	3.85	3.8	101%	SI
	3	A	29-nov-25	06-dic-25	7	25	3.30	3.8	87%	SI
		B		13-dic-25	14	29	3.82	3.8	101%	SI
		C		27-dic-25	28	33.4	4.40	3.8	116%	SI
	4	A	01-dic-25	08-dic-25	7	23.8	3.14	3.8	83%	SI
		B		15-dic-25	14	27.8	3.67	3.8	96%	SI
		C		29-dic-25	28	33.6	4.43	3.8	117%	SI

Observaciones:

Jefe de Laboratorio

Luis Fernando Rúales
Ingeniero Civil.
M. P. No. 52202 – 306984 NRÑ

Registro Fotografico



Imagen 1, y 2: Muestra 1 - Viga A





Imagen 3, y 4: Muestra 1 - Viga B





Imagen 5, y 6: Muestra 1 - Viga C





Imagen 7, y 8: Muestra 2 - Viga A





Imagen 9, y 10: Muestra 2 - Viga B





Imagen 11, y 12: Muestra 2 - Viga C





Imagen 13, y 14: Muestra 3 - Viga A





Imagen 15, y 16: Muestra 3 - Viga B





Imagen 17, y 18: Muestra 3 - Viga C





Imagen 19, y 20: Muestra 4 - Viga A





Imagen 21 y 22: Muestra 4 - Viga B





Imagen 23, y 24: Muestra 4 - Viga C



RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA INV-E-410-13

REFERENCIA N°	COP-1943-2024	**FECHA DE INFORME**	20/12/2025
CLIENTE:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	**NIT:**	901.042.420
PROYECTO	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.		

Obra / estructura	Muestra	Cilindro No.	Fecha de Fundición (dd/mm/aa)	Fecha de rotura (dd/mm/aa)	Edad de la muestra (Días)	Diámetro del cilindro (cm)	Carga Aplicada (KN)	Área de cilindro (cm2)	Resistencia Conseguida (kg/cm2)	Resistencia Conseguida (PSI)	Resistencia de Diseño (PSI)	%	Cumple
Bordillos	1	A	08-dic-25	15-dic-25	7	10	133	78.5	173	2456.0	3000	82%	SI
Bordillos	2	A	09-dic-25	16-dic-25	7	10	154.4	78.5	174	3481.9	3000	83%	SI
Andenes	3	A	10-dic-25	17-dic-25	7	10	153.6	78.5	199	2836.4	3000	95%	SI
Andenes	4	A	11-dic-25	18-dic-25	7	10	197.6	78.5	257	3649.0	3000	122%	SI
Andenes	5	A	12-dic-25	19-dic-25	7	10	189.8	78.5	246	3504.9	3000	117%	SI
Andenes	6	A	13-dic-25	20-dic-25	7	10	168.8	78.5	219	3117.1	3000	104%	SI

Observaciones:

Profesional responsable:

Carlos Humberto Sanchez Morales
Ingeniero Civil
M. P. No. 091037-0678463 CNDB

Registro Fotografico





Imagen 1, 2. (Muestra 1)





Imagen 3, 4. (Muestra 2)





Imagen 5, 6. (Muestra 3)





Imagen 7, 8. (Muestra 4)





Imagen 9, 10. (Muestra 5)





Imagen 11, 12. (Muestra 6)

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA INV-E-410-13

REFERENCIA N°	COP-1943-2024	**FECHA DE INFORME**	07/01/2026
CLIENTE:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	**NIT:**	901.042.420
PROYECTO	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.		

Obra / estructura	Muestra	Cilindro No.	Fecha de Fundición (dd/mm/aa)	Fecha de rotura (dd/mm/aa)	Edad de la muestra (Días)	Diámetro del cilindro (cm)	Carga Aplicada (KN)	Área de cilindro (cm2)	Resistencia Conseguida		Resistencia de Diseño (PSI)	%	Cumple
									(kg/cm2)	(PSI)			
Placa de concreto 3.8 Mpa	1	A	26-nov-25	03-dic-25	7	10	153.6	78.5	199	2836.4	4000	71%	SI
		B		10-dic-25	14	10	189.8	75.4	257	3649.4	4000	91%	SI
		C		24-dic-25	28	10	233.6	77.0	309	4401.3	4000	110%	SI
Placa de concreto 3.8 Mpa	2	A	27-nov-25	04-dic-25	7	10	168.8	77.0	224	3180.4	4000	80%	SI
		B		11-dic-25	14	10	197.6	78.5	257	3649.0	4000	91%	SI
		C		25-dic-25	28	10	231.8	78.5	301	4280.5	4000	107%	SI
Placa de concreto 3.8 Mpa	3	A	29-nov-25	06-dic-25	7	10	145.2	78.5	189	2681.3	4000	67%	SI
		B		13-dic-25	14	10	191.4	75.4	259	3680.2	4000	92%	SI
		C		27-dic-25	28	10	228.8	78.5	297	4225.1	4000	106%	SI
Placa de concreto 3.8 Mpa	4	A	01-dic-25	08-dic-25	7	10	150.4	78.5	195	2777.3	4000	69%	SI
		B		15-dic-25	14	10	195.8	78.5	254	3615.7	4000	90%	SI
		C		29-dic-25	28	10	223.8	78.5	291	4132.8	4000	103%	SI
Bordillos	5	A	04-dic-25	11-dic-25	7	10	139.8	78.5	182	2581.6	3000	86%	SI
		B		18-dic-25	14	10	170.4	78.5	221	3146.7	3000	105%	SI
		C		01-ene-26	28	10	205.2	78.5	264	3752.4	3000	125%	SI
Andén	6	A	10-dic-25	17-dic-25	7	10	113.8	78.5	174	2470.8	3000	82%	SI
		B		24-dic-25	14	10	160.6	78.5	209	2965.7	3000	99%	SI
		C		07-ene-26	28	10	206.6	78.5	268	3815.2	3000	127%	SI

Observaciones:

Jefe de Laboratorio

Luis Fernando Rúales
Ingeniero Civil.
M. P. No. 52202 – 306984 NRÑ

Registro Fotografico




Imagen 1, 2. (Muestra 1 - Cilindro A)




Imagen 3, 4. (Muestra 1 - Cilindro B)




Imagen 5, 6. (Muestra 1 - Cilindro C)




Imagen 7, 8. (Muestra 2 - Cilindro A)




Imagen 9, 10. (Muestra 2 - Cilindro B)




Imagen 11, 12. (Muestra 2 - Cilindro C)



Imagen 13, 14. (Muestra 3 - Cilindro A)



Imagen 15, 16. (Muestra 5 - Cilindro B)



Imagen 17, 18. (Muestra 3 - Cilindro C)



Imagen 19, 20. (Muestra 4 - Cilindro A)



Imagen 21, 22. (Muestra 4 - Cilindro B)



Imagen 23, 24. (Muestra 4 - Cilindro C)





Imagen 25, 26. (Muestra 5 - Cilindro A)





Imagen 27, 28. (Muestra 5 - Cilindro B)





Imagen 29, 30. (Muestra 5 - Cilindro C)





Imagen 31, 32. (Muestra 6 - Cilindro A)





Imagen 33, 34. (Muestra 6 - Cilindro B)





Imagen 35, 36. (Muestra 6 - Cilindro C)



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 9010424220-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

ANEXO:

LABORATORIOS

	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE NORMA INV E-414-13	PROCESO	GESTIÓN DE LABORATORIO
Geotek		FECHA VERSIÓN	13/12/2024
		VERSIÓN	02
		PAGINA	1 OF 1

REFERENCIA N°	COP-1943-2024	F. DE INFORME	20/12/2025
CLIENTE	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT:	901.042.420
OBRA/PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.		

Obra / estructura	Viga No.	Fecha de Fundición (dd/mm/aa)	Fecha de rotura (dd/mm/aa)	Edad de la muestra (Horas)	Carga Aplicada (KN)	Resistencia Conseguida (MPA)	Resistencia de Diseño (MPA)	%	Cumple
Losa de concreto 3.8 MPa	1	28-nov-25	12-dic-25	14	26	3.43	3.8	90%	
	2	01-dic-25	15-dic-25	14	30.2	3.61	3.8	95%	
	3	03-dic-25	17-dic-25	14	21.4	2.82	3.8	74%	
	4	05-dic-25	19-dic-25	14	29.2	3.49	3.8	92%	

Observaciones:

Profesional responsable

Carlos Humberto Sanchez Morales
Ingeniero Civil
M. P. No. 091037-057IM63 CNDB

Registro Fotografico




Imagen 1, y 2: Viga 1.




Imagen 3 y 4: Viga 2.




Imagen 5 y 6: Viga 3.




Imagen 5 y 6: Viga 4.

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA INV-E-410-13

REFERENCIA N°	COP-1943-2024	**FECHA DE INFORME**	20/12/2025
CLIENTE:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	**NIT:**	901.042.420
PROYECTO	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.		

Obra / estructura	Muestra	Cilindro No.	Fecha de Fundición (dd/mm/aa)	Fecha de rotura (dd/mm/aa)	Edad de la muestra (Días)	Diámetro del cilindro (cm)	Carga Aplicada (KN)	Área de cilindro (cm2)	Resistencia Conseguida		Resistencia de Diseño (PSI)	%	Cumple
									(kg/cm2)	(PSI)			
Bordillos	1	A	08-dic-25	15-dic-25	7	10	133	78.5	173	2456.0	3000	82%	Si
Bordillos	2	A	09-dic-25	16-dic-25	7	10	134.4	78.5	174	2481.9	3000	83%	Si
Andenes	3	A	10-dic-25	17-dic-25	7	10	153.6	78.5	199	2836.4	3000	95%	Si
Andenes	4	A	11-dic-25	18-dic-25	7	10	197.6	78.5	257	3649.0	3000	122%	Si
Andenes	5	A	12-dic-25	19-dic-25	7	10	189.8	78.5	246	3504.9	3000	117%	Si
Andenes	6	A	13-dic-25	20-dic-25	7	10	168.8	78.5	219	3117.1	3000	104%	Si

Observaciones:

Profesional responsable

Carlos Humberto Sanchez Morales
Ingeniero Civil
M. P. No. 091037-0678463 CNDB

Registro Fotográfico





Imagen 1, 2. (Muestra 1)





Imagen 3, 4. (Muestra 2)



Imagen 5, 6. (Muestra 3)

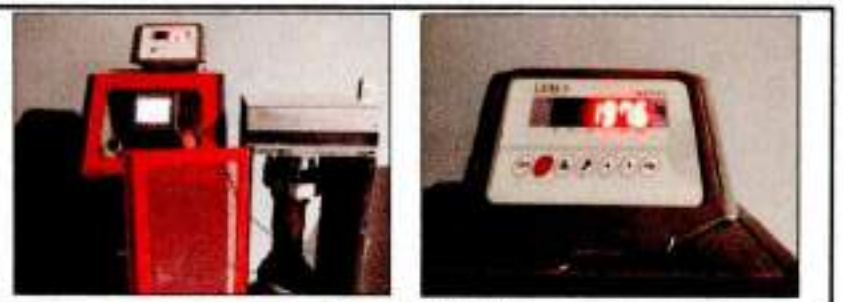


Imagen 7, 8. (Muestra 4)

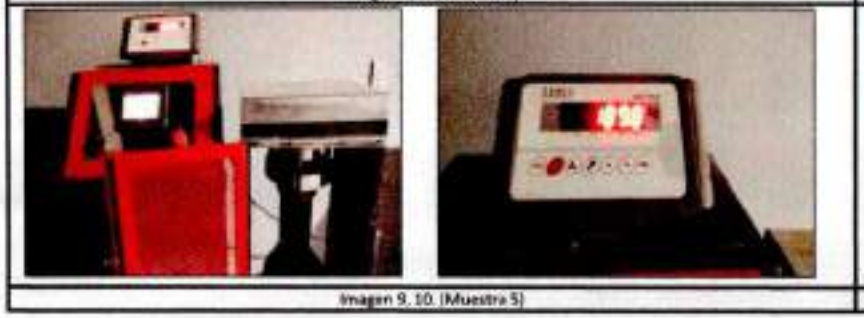


Imagen 9, 10. (Muestra 5)

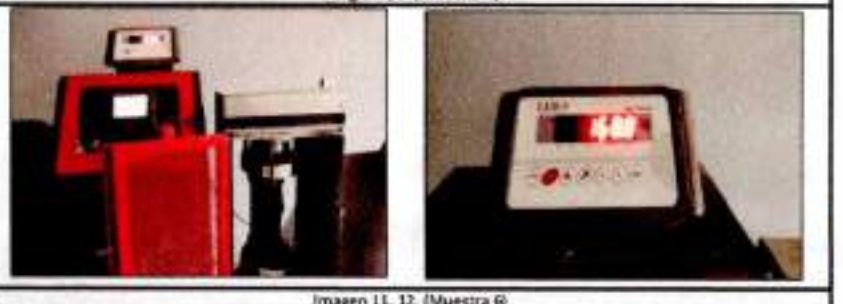



Imagen 11, 12. (Muestra 6)

	METODO DE ENSAYO ESTANDAR PARA DETERMINAR LA RELACIÓN HUMEDAD-DENSIDAD DE SUELOS Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO	PROCESO	GESTIÓN DE LABORATORIO
		FECHA VERSIÓN	01/02/2022
		VERSIÓN	02
		PAGINA	1 DE 1

OBRA / PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

SOLICITANTE:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	NIT:	901.042.420
REFERENCIA:	COP-1943-2024	LABORATORISTA:	Ing. Carlos Sanchez
MATERIAL:	Subbase granular	FECHA DE ENSAYO:	20/11/2025
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E 142-13	METODO:	C - Humedo

Molde No.	2.00	2.00	2.00	2.00
Diametro del molde (cm)	15.24	15.24	15.24	15.24
Altura del molde (cm)	11.65	11.65	11.65	11.65
Volumen del molde (cm)	2125.14	2125.14	2125.14	2125.14
Peso suelo humedo + molde (gr)	10085.00	10302.00	10392.00	10332.00
Pesd molde (gr)	5730.0	5730.0	5730.0	5730.0
Peso suelo humedo (gr)	4355.00	4572.00	4662.00	4602.00
Densidad humeda (gr/cm3)	2.05	2.15	2.19	2.17
Recipiente No.	G1	G2	G3	G4
Peso S. Huedo + Recipiente (gr)	300.20	311.40	309.9	324.5
Peso S. Seco + Recipiente (gr)	291.01	296.75	290.68	298.31
Peso recipiente (gr)	4.00	4.00	4.00	4.00
Peso del agua (gr)	9.19	14.65	19.22	26.19
Peso S. Seco (gr)	287.01	292.75	286.68	294.31
Humedad (%)	3.20	5.00	6.70	8.90
Densidad humedad (gr/cm3)	2.05	2.15	2.19	2.17
Densidad seca (gr/cm3)	1.99	2.05	2.06	1.99

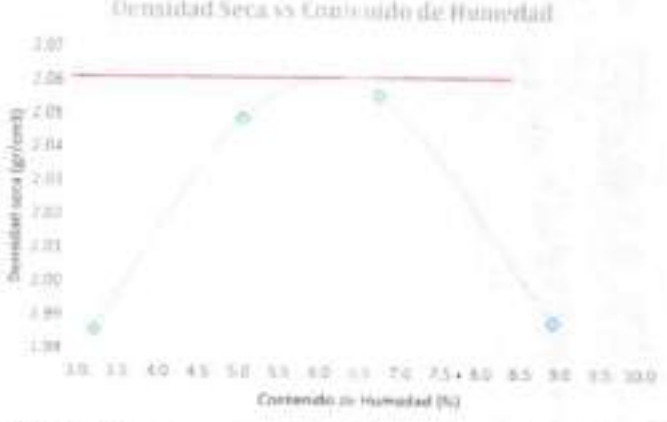

DATOS DEL ENSAYO	
Volumen del molde (gr/cm3):	2125.14
Tipo de martillo:	Manual
Número de capas:	5
# de golpes por capa:	56
Metodo de compactación:	C
Metodo de preparación:	Humedo

RESULTADOS	
RESULTADO DE COMPACTACION	
Densidad seca max. (gr/cm3)	2.06
Humedad óptima (%)	6.1
Humedad óptima corregida(%)	5.8

OBSERVACIONES:

GEOTEK SAS.
Laboratorio de Suelos
TOPOGRAFÍA
Nit. 900940486 - 3

Laboratorista
Ing. Carlos Sanchez
MP. 091037-0678463 CNDB

	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	PROCESO	GESTIÓN DE LABORATORIO
		FECHA VERSIÓN	01/02/2022
		VERSIÓN	02
		PAGINA	1 DE 1

CLIENTE:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	CONTRATO No.	COP-1943-2024
OBRA / PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.		

IDENTIFICACION/MUESTRA:	Subbase Granular	FECHA DE TOMA	22/11/2025
METODO:	Cono y Arena	FECHA DE INFORME	22/11/2025
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E-161-13		

I.- UBICACIÓN y/o PRUEBA	
Ubicación de la muestra	Abscisa K0+007
Fecha de compactación	21-11-25
Capa	1
Margen	Izquierdo
Número de Prueba	01





II.- DATOS DE CAMPO		
P. INICIAL ARENA + FRASCO (Wo)	5900.5	gr.
P. FINAL ARENA + FRASCO (Wf)	2873.2	gr.
P. ARENA TOTAL UTILIZADA	3027.3	gr
CONSTANTE DEL CONO	1429.6	gr
P. ARENA EN EL HOYO	1597.7	gr
DENSIDAD DE LA ARENA	1.416	gr/cm3
VOLUMEN HUECO (V)	1128.32	cm3
P. TOTAL HUMEDO(Wth)	3568.4	gr.
P. RECIPIENTE (t)	5	gr.
P. SUELO HÚMEDO (Wh)	3663.4	gr.
DENS. SUELO HUMEDO (γh)	2.361	gr/cm3

III.- DATOS DE LABORATORIO		
P. TOTAL HÚMEDO (Wth)	296.5	gr.
P. TOTAL SECO (Wts)	277.6	gr.
P. RECIPIENTE (t) (Capsula)	0.00	gr.
P. AGUA (Ww)	18.9	gr.
P. SUELO SECO (Ws)	277.6	gr.
% HUMEDAD SUELO (%w)	6.81	%
% HUMEDAD SUELO CORREGIDO (%ow)	11.50	%

DENS. SUELO SECO (γd)	2.210	gr/cm3
DENS. SUELO SECO (γd) Corregido	1.983	gr/cm3
DENS. MAX. PROCTOR (γdmax)	2.060	gr/cm3
% HUMEDAD SUELO - LABORATORIO (%	5.80	%
PORCENTAJE EXIGIDO	95	%
PORCENTAJE ALCANZADO	96.26	%
CUMPLE	SI	

OBSERVACIONES:

1.- Pruebas de identificación realizado por el personal de laboratorio.

2.- Se realizo correccion por sobretamaño.

GEOTEK SAS
Laboratorio de Suelos
TOPOGRAFÍA
Nit 9[illegible]

Laboratorista
Carlos Sanchez
Ing. Civil. MP. 091037-0678463 CND6

Geotek	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	PROCESO	GESTIÓN DE LABORATORIO
		FECHA VERSIÓN	01/02/2022
		VERSIÓN	02
		PAGINA	1 DE 1

CLIENTE:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	CONTRATO No.	COP-1543-2024
OBRA / PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.		
IDENTIFICACION/MUESTRA:	Subbase Granular	FECHA DE TOMA	22/11/2025
METODO:	Cono y Arena	FECHA DE INFORME	22/11/2025
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E-161-13		

I.- UBICACIÓN y/o PRUEBA	
Ubicación de la muestra	Abscisa K0+030
Fecha de compactación	21-11-25
Capa	1
Margen	Derecho
Número de Prueba	02





II.- DATOS DE CAMPO		
P. INICIAL ARENA + FRASCO (Wo)	5762.1	gr.
P. FINAL ARENA + FRASCO (Wf)	2831.8	gr.
P. ARENA TOTAL UTILIZADA	2930.3	gr
CONSTANTE DEL CONO	1429.6	gr
P. ARENA EN EL HOYO	1500.7	gr
DENSIDAD DE LA ARENA	1.416	gr/cm3
VOLUMEN HUECO (V)	1059.82	cm3
P. TOTAL HUMEDO(Wh)	2300.5	gr.
P. RECIPIENTE (t)	5	gr
P. SUELO HUMEDO (Wh)	2295.5	gr.
DENS. SUELO HUMEDO (yh)	2.166	gr/cm3

III.- DATOS DE LABORATORIO		
P. TOTAL HÚMEDO (Wh)	297.7	gr.
P. TOTAL SECO (Ws)	284.1	gr.
P. RECIPIENTE (t) (Capsula)	0.00	gr.
P. AGUA (Ww)	13.6	gr.
P. SUELO SECO (Ws)	284.1	gr.
% HUMEDAD SUELO (%w)	4.79	%
% HUMEDAD SUELO CORREGIDO (%cw)	8.70	%

DENS. SUELO SECO (yd)	2.067	gr/cm3
DENS. SUELO SECO (yd) Corregido	1.993	gr/cm3
DENS. MAX. PROCTOR (ydmax)	2.060	gr/cm3
% HUMEDAD SUELO - LABORATORIO (%	5.80	%
PORCENTAJE EXIGIDO	95	%
PORCENTAJE ALCANZADO	96.75	%
CUMPLE	SI	

OBSERVACIONES:

1.- Pruebas de identificación realizada por el personal de laboratorio.

2.- Se realizo correccion por sobretamaño.

GEOTEK-SAS
Laboratorio de Suelos
TOPOGRAFÍA
Nit. 900940486 - 3

Laboratorista
Carlos Sanchez
Ing. Civil. MP. 091037-0678463 CNDB

	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA	PROCESO	GESTIÓN DE LABORATORIO
		FECHA VERSIÓN	01/02/2022
		VERSIÓN	02
		PAGINA	1 DE 1

CUENTE:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	CONTRATO No.	COP-1943-2024
OBRA / PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.		
IDENTIFICACION/MUESTRA:	Subbase Granular	FECHA DE TOMA	22/11/2025
METODO:	Cono y Arena	FECHA DE INFORME	22/11/2025
NORMA REFERENCIA DE ENSAYO:	INV E-161-13		

I.- UBICACIÓN y/o PRUEBA	
Ubicación de la muestra	Abscisa K0+073
Fecha de compactación	21-11-25
Capa	1
Margen	Izquierdo
Número de Prueba	03





II.- DATOS DE CAMPO		
P. INICIAL ARENA + FRASCO (Wa)	5656.7	gr.
P. FINAL ARENA + FRASCO (Wf)	2528.6	gr.
P. ARENA TOTAL UTILIZADA	3128.1	gr
CONSTANTE DEL CONO	1429.6	gr
P. ARENA EN EL HOYO	1698.5	gr
DENSIDAD DE LA ARENA	1.416	gr/cm3
VOLUMEN HUECO (V)	1199.51	cm3
P. TOTAL HUMEDO(Wh)	2753.6	gr.
P. RECIPIENTE (t)	5	gr.
P. SUELO HUMEDO (Wh)	2748.6	gr.
DENS. SUELO HUMEDO (γh)	2.291	gr/cm3

III.- DATOS DE LABORATORIO		
P. TOTAL HÚMEDO (Wh)	403.2	gr.
P. TOTAL SECO (Ws)	380.5	gr.
P. RECIPIENTE (t) (Capsula)	0.00	gr.
P. AGUA (Ww)	22.7	gr.
P. SUELO SECO (Ws)	380.5	gr.
% HUMEDAD SUELO (%w)	5.97	%
% HUMEDAD SUELO CORREGIDO (%ow)	7.40	%

DENS. SUELO SECO (γd)	2.162	gr/cm3
DENS. SUELO SECO (γd) Corregido	2.071	gr/cm3
DENS. MAX. PROCTOR (γdmax)	2.060	gr/cm3
% HUMEDAD SUELO - LABORATORIO (%	5.80	%
PORCENTAJE EXIGIDO	95	%
PORCENTAJE ALCANZADO	100.53	%
CUMPLE	SI	

OBSERVACIONES:

1.- Pruebas de identificación realizada por el personal de laboratorio.

2.- Se realizo correccion por sobretamaño.

GEOIEK SAS
Laboratorio de Suelos
TOPOGRAFÍA
Nit. 900940486 - 3

Laboratorista
Carlos Sanchez
Ing. Civil. MP. 091037-0678463 CNDI

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO
F'C 175 y 210 kg/cm²

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.



PRENSA HIDRÁULICA DE 80 TON

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
CONTRATANTE

WALTER H CORTES O
ELABORO DISEÑO

MOCOA NOVIEMBRE DE 2025

DISEÑO DE CONCRETO HIDRÁULICO

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

GENERALIDADES

En la mezcla de concreto que a continuación se va a diseñar, se utilizará la combinación más apropiada entre los agregados disponibles, agua y cemento, utilizando la mínima cantidad de pasta por unidad de volumen de concreto y que dé por resultado una mezcla que cumpla con los requisitos de manejabilidad, resistencia y durabilidad necesarias para la pavimentación.

Aunque el concreto es un material esencialmente heterogéneo, porque sus componentes tienen características que no son constantes. No son solos los materiales los causantes de las variaciones en la calidad del hormigón; también influye la forma de mezclarlo, su transporte y colocación en formaletas, la compactación a que se someta y el curado que se le proporcione.

Por las razones anteriores, es necesario tomar las precauciones adecuadas para que la calidad del material producido, sea aceptable. La medida final que informa sobre la calidad obtenida, es la que resulta de los ensayos de resistencia.

MATERIALES UTILIZADOS

CEMENTO PORTLAND TIPO I

Es de tipo portland estructural, el cual es destinado a obras de hormigón en general, al que se le exige propiedades especiales.

Para el presente diseño utilizaremos las siguientes propiedades físicas del cemento portland, como son la de peso específico y masa unitaria suelta.

AGREGADOS

Agregado grueso:
Proviene de la fuente del rio Caquetá, este material triturado, el cual se procesa en la inspección el tigre - municipio de Villagarzón. Su tamaño máximo es 1-1/2", el cual tiene las siguientes características físicas, tienen forma angular y de textura áspera.

Agregado Fino-mixto: Proviene de la misma fuente, su obtención se realiza de forma manual en la fuente su tamaño máximo de 3/4". Sus características físicas son: forma subangular y redondeada y de textura lisa.

Para el diseño de mezclas, se requieren las siguientes propiedades físicas del material como son: Granulometría, peso específico, tamaño máximo, tamaño máximo nominal, porcentaje de absorción, masa unitaria suelta, módulo de finura.

AGUA

El agua de mezcla cumple dos funciones muy importantes permitir la hidratación del cemento y hacer la mezcla manejable. De toda el agua que se emplea en la preparación del concreto, parte hidrata el cemento, el resto no presenta ninguna alteración y con el tiempo se evapora. De acuerdo con lo anterior como una regla práctica, se debe colocar la menor cantidad de agua en la mezcla, pero teniendo en cuenta que el hormigón quede trabajable.

Se considera que el agua es adecuada para producir hormigón si su composición química indica que es apta para el consumo humano, sin importar si ha tenido un tratamiento preliminar o no; es decir, casi cualquier agua natural que pueda beberse y que no tenga sabor u olor notable sirve para mezclar el concreto. Sin embargo, el agua que sirva para preparar estas mezclas, puede no servir para beberla.

DESARROLLO DISEÑO DE MEZCLA

DATOS DE LOS MATERIALES

AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (Rio Caquetá)

DENSIDAD APARENTE SECA	2.690 kg/dm³
TAMAÑO MÁXIMO	1-1/2" - pulgada
TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL	1" - pulgada
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN	1.04 %
MASA UNITARIA SUELTA	1.42 kg/dm³

AGREGADO FINO (Rio Caquetá)

DENSIDAD APARENTE SECA	2.554 kg/dm³
TAMAÑO MÁXIMO	1-1/2" - pulgada
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN	3.01 %
MASA UNITARIA SUELTA	1.50 kg/dm³

CEMENTO (USO GENERAL)

PESO ESPECÍFICO	3.03 kg/dm³
MASA UNITARIA SUELTA	1.21 kg/dm³

AGUA

PESO ESPECÍFICO	1.0 kg/dm³
MASA UNITARIA SUELTA	1.0 kg/dm³

DESARROLLO DISEÑO FC 210 Kg/cm²

Se realizó ajuste granulométrico con los siguientes resultados: Agregado grueso =40% y agregado fino- mixto = 60%. Se comparó con la curva ideal fuller.

- ASENTAMIENTO: se escogió una mezcla de consistencia semiseca, entre 5.0 y 10.0 centímetros.
- ESTIMACIÓN DEL AGUA DE LA MEZCLA: Se escogió 164 Kg. de agua por m³ de concreto, con esta cantidad de agua se obtiene un asentamiento inferior a 10 centímetros, sin utilizar aditivos.
- COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL 5%, Porque ya se ha producido concreto en condiciones similares.
- RESISTENCIA DE DOSIFICACIÓN: Para el anterior coeficiente de variancia tenemos un F`cr = 260 kg/cm².
- SELECCIÓN AGUA CEMENTO: Por resistencia y durabilidad, según la recomendación de la norma NSR-10; para un valor de resistencia a la compresión de 260 kg/cm², se obtiene un valor de relación A/C = 0.50.

- CALCULO DEL CONTENIDO DE CEMENTO GENERAL:
  C = A/(A/C) = 185/0.50 = 370 Kg/m³ de concreto.

- DATOS AGREGADOS:
  Volumen Absoluto Agregados = 1000- 185/1- 370.0/3.03= 737.1 dm³.

  PESO ESPECIFICO PROMEDIO: 2.607 kg/dm³.
  - Peso del agregado = 694.5 * 2.607= 1810.2 kg/de concreto
  - Peso del agregado fino =1810.2 * 0.60 =1086.1 kg
  - Peso del agregado grueso =1810.2 * 0.40 =724.1 kg

DESARROLLO DISEÑO FC 175 Kg/cm²

Se realizó ajuste granulométrico con los siguientes resultados: Agregado grueso =40% y agregado fino- mixto =60%. Se comparó con la curva ideal fuller.

- ASENTAMIENTO: se escogió una mezcla de consistencia semiseca, entre 5.0 y 10.0 centímetros.
- ESTIMACIÓN DEL AGUA DE LA MEZCLA: Se escogió 185 Kg. de agua por m³ de concreto, con esta cantidad de agua se obtiene un asentamiento inferior a 10 centímetros, sin utilizar aditivos.
- COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL 5%, Porque ya se ha producido concreto en condiciones similares.
- RESISTENCIA DE DOSIFICACIÓN: Para el anterior coeficiente de variancia tenemos un F`cr = 210 kg/cm².
- SELECCIÓN AGUA CEMENTO: Por resistencia y durabilidad, según la recomendación de la norma NSR-10; para un valor de resistencia a la compresión de 210 kg/cm², se obtiene un valor de relación A/C = 0.55.

- CALCULO DEL CONTENIDO DE CEMENTO GENERAL:
  C = A/(A/C) = 185/0.55 = 336.4 Kg/m³ de concreto.

- DATOS AGREGADOS:
  Volumen Absoluto Agregados = 1000- 185/1- 336.4/3.03= 705.4 dm³.

  PESO ESPECIFICO PROMEDIO: 2.607 kg/dm³.
  - Peso del agregado = 705.4 * 2.607= 1838.8 kg/de concreto
  - Peso del agregado fino =1838.8 * 0.60 =1103.3 kg
  - Peso del agregado grueso =1838.8 * 0.40 =735.5 kg

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO
F'C 280 kg/cm²

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPALAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO



CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
CONTRATANTE

WALTER H CORTES O
ELABORO DISEÑO

MOCOA NOVIEMBRE DE 2025

DISEÑO DE CONCRETO HIDRÁULICO

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPALAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

GENERALIDADES

En la mezcla de concreto que a continuación se va a diseñar, se utilizará la combinación más apropiada entre los agregados disponibles, agua y cemento, utilizando la mínima cantidad de pasta por unidad de volumen de concreto y que dé por resultado una mezcla que cumpla con los requisitos de manejabilidad, resistencia y durabilidad necesarias para el pavimento hidráulico.

Aunque el concreto es un material esencialmente heterogéneo, porque sus componentes tienen características que no son constantes. No son solos los materiales los causantes de las variaciones en la calidad del hormigón; también influye la forma de mezclarlo, su transporte y colocación en formaletas, la compactación a que se someta y el curado que se le proporcione.

Por las razones anteriores, es necesario tomar las precauciones adecuadas para que la calidad del material producido, sea aceptable. La medida final que informa sobre la calidad obtenida, es la que resulta de los ensayos de resistencia.

MATERIALES UTILIZADOS

CEMENTO PORTLAND ESTRUCTURAL

Por sus características es un cemento especial para concretos estructurales. Su tiempo de fraguado incrementa el rendimiento de la obra, pues permite desencofrar en menor tiempo, siendo esto un comportamiento ideal para la elaboración de elementos prefabricados, el cual es destinado a obras de hormigón en general, al que se le exige propiedades especiales.

AGREGADOS

Agregado grueso:
Proviene de la fuente del rio Caquetá, este material triturado, el cual se procesa en la inspección el tigre - municipio de Villagarzón. Su tamaño máximo es 1-1/2", el cual tiene las siguientes características físicas, tienen forma angular y de textura áspera.

Agregado Fino-mixto: Proviene de la misma fuente, su obtención se realiza de forma manual en la fuente su tamaño máximo de 3/4". Sus características físicas son: forma subangular y redondeada y de textura lisa.

Para el diseño de mezclas, se requieren las siguientes propiedades físicas del material como son: Granulometría, peso específico, tamaño máximo, tamaño máximo nominal, porcentaje de absorción, masa unitaria suelta, módulo de finura.

AGUA

El agua de mezcla cumple dos funciones muy importantes permitir la hidratación del cemento y hacer la mezcla manejable. De toda el agua que se emplea en la preparación del concreto, parte hidrata el cemento, el resto no presenta ninguna alteración y con el tiempo se evapora. De acuerdo con lo anterior como una regla práctica, se debe colocar la menor cantidad de agua en la mezcla, pero teniendo en cuenta que el hormigón quede trabajable.

Se considera que el agua es adecuada para producir hormigón si su composición química indica que es apta para el consumo humano, sin importar si ha tenido un tratamiento preliminar o no; es decir, casi cualquier agua natural que pueda beberse y que no tenga sabor u olor notable sirve para mezclar el concreto. Sin embargo, el agua que sirva para preparar estas mezclas, puede no servir para beberla.

DESARROLLO DISEÑO DE MEZCLA

DATOS DE LOS MATERIALES

AGREGADOS

AGREGADO GRUESO (Rio Caquetá)

DENSIDAD APARENTE SECA	2.690 kg/dm³
TAMAÑO MÁXIMO	1-1/2" - pulgada
TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL	1" - pulgada
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN	1.04 %
MASA UNITARIA SUELTA	1.42 kg/dm³

AGREGADO FINO (Rio Caquetá)

DENSIDAD APARENTE SECA	2.554 kg/dm³
TAMAÑO MÁXIMO	1-1/2" - pulgada
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN	3.01 %
MASA UNITARIA SUELTA	1.50 kg/dm³

CEMENTO (USO GENERAL)

PESO ESPECÍFICO	3.03 kg/dm³
MASA UNITARIA SUELTA	1.21 kg/dm³

AGUA

PESO ESPECÍFICO	1.0 kg/dm³
MASA UNITARIA SUELTA	1.0 kg/dm³

DESARROLLO DISEÑO F'C 280 Kg/cm²

Se realizó ajuste granulométrico con los siguientes resultados: Agregado grueso =40% y agregado fino- mixto = 60%. Se comparó con la curva ideal fuller.

- ASENTAMIENTO: se escogió una mezcla de consistencia semiseca, entre 5.0 y 10.0 centímetros.
- ESTIMACIÓN DEL AGUA DE LA MEZCLA: Se escogió 165 Kg. de agua por m³ de concreto, con esta cantidad de agua se obtiene un asentamiento inferior a 10 centímetros, sin utilizar aditivos.
- COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL 5%, Porque ya se ha producido concreto en condiciones similares.
- RESISTENCIA DE DOSIFICACIÓN: Para el anterior coeficiente de variancia tenemos un F'cr = 350 kg/cm².
- SELECCIÓN AGUA CEMENTO: Por resistencia y durabilidad, según la recomendación de la norma NSR-10; para un valor de resistencia a la compresión de 350 kg/cm², se obtiene un valor de relación A/C = 0.47.

- CALCULO DEL CONTENIDO DE CEMENTO ESTRUCTURAL:
  C = A/(A/C) = 165/0.50 = 351.1 Kg/m³ de concreto.

- DATOS AGREGADOS:
  Volumen Absoluto Agregados = 1000- 165/1- 351.1/3.03= 720.6 dm³.

  PESO ESPECIFICO PROMEDIO: 2.607 kg/dm³.
  - Peso del agregado = 720.6 * 2.607= 1878.5 kg/de concreto
  - Peso del agregado fino =1878.5 * 0.60 =1127.1 kg
  - Peso del agregado grueso =1878.5 * 0.40 =751.4 kg

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTES
TEL3115060140
wscor1@gmail.com

DISEÑO DE MEZCLAS
CONCRETO HIDRÁULICO

RESISTENCIA :	280 Kg/cm²	FECHA:	noviembre 25, 2025
RESISTENCIA F'Cr:	350 Kg/cm²	MÉTODO	EN PESO
CLIENTE:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	FUENTE	RIO CAQUETA/ RIO CAQUETA
PROYECTO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE LA PARTE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA	CEMENTO	CEMEX ESTRUCTURAL
	INSPECCIÓN DE PUERTO UNIÓN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	MATERIAL	ARENA MIXTA y TRITURADO.

DESCRIPCIÓN	AGUA	CEMENTO	AGREGADOS		SUMATORIA
			MIXTO	TRITURADO	
PESO DEL MATERIAL (kg/m3ccto)	165	351,1	1127,1	751,4	2394,5
VOLUMEN ABSOLUTO(dm3/m3 ccto)	165	114,35	441,36	279,28	1000,0
PROPORCIÓN EN PESO SECO	*0,47*	*1*	*3,21*	*2,14*	
VOLUMEN SUELTO(dm3/m3 ccto)	165	290,14	761,54	529,14	
PROPORCIÓN EN VOLUMEN SUELTO	*0,57*	*1*	*2,62*	*1,82*	

CANTIDAD DE MATERIAL A UTILIZAR POR CADA 42,5 Kg DE CEMENTO

DESCRIPCIÓN	PROPORCIÓN EN PESO	BULTO CEMENTO	PARA UN BULTO	MASA UNITARIA SUELTA	VOLUMEN SUELTO
AGUA	0,47	42,5	20,0	Kg/dm3	dm3
CEMENTO ESTRUCTURAL	1	42,5	42,5		
AGREGADO FINO MIXTO	3,21	42,5	136,4	1,48	92,2
AGREGADO GRUESO	2,14	42,5	91,0	1,42	64,1

POR LO TANTO

AGUA= QUE PRODUZCA UN ASENTAMIENTO MÁXIMO DE 10 CM

CEMENTO	=42,5 Kg	
AG FINO	=0.0922m³	(VOLUMEN SUELTO)
AG GRUESO	=0.0641m³	(VOLUMEN SUELTO)

DOSIFICACION EN VOLUMEN

1 CEMENTO
2,5 ARENA MIXTA
1,75 TRITURADO

VOLUMEN DEL CAJÓN

AG FINO-	0,0307 m³
AG GRUESO	0,0320 m³

DIMENSIÓN DEL CAJÓN

DESCRIPCIÓN	MIXTO	TRITURADO
LARGO	0,33	0,33
ANCHO	0,33	0,33
ALTURA	0,28	0,29

EN RESUMEN (1 BULTO DE CEMENTO)

		valdes de construccion
AGUA	ASENTAMIENTO DE MÁXIMO DE 10cm CON ENSAYO SLUMP	
CEMENTO ESTRUCTURAL	42,5 Kg	
AGREGADO FINO (mixto arena)	3 CAJONES (0.33X0.33X0.24)	10
AGREGADO TRITURADO	2 CAJONES (0.33X0.33X0.25)	7
SIN A DITIVO		

ATENTAMENTE

WALTER HERNANDO CORTÉS ORTIZ
19516015864CAU - GEOTECNÓLOGO

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTES
TEL: 4296887 311-8060149

ANALISIS GRANULOMÉTRICO
CURVAS IDEALES
NORMA INV-13

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPALAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CLIENTE: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

DESCRIPCIÓN MUESTRA: **TRITURADO 1"** FECHA: **25 de noviembre de 2025**

CANTERA: **PLANTA VILLA- CAQUETA**

MUESTRA: **A**

GRADACIÓN: **CONCRETOS**

PESO TOTAL MUESTRA: **2567,7**


EJECUTADO POR: **WALTER H CORTÉS**

CALCULADO POR: **WALTER H CORTÉS**

TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RET TOTAL	% PASA
1-1/2'	0	0,0	0,0	100,0
1'	0,0	0	0	100,0
3/4'	1480,0	58	58	42,4
3/8'	1041,0	41	98	1,8
No 4	2,0	0	98	1,7
No 8	0,0	0	98	1,7
No 16	0,0	0	98	1,7
No 30	2,0	0	98	1,7
No 50	3,0	0	98	1,5
No 100	4,0	0,2	99	1,4
FONDO	35,7	1,4		

Límite Líquido: **NL**
Límite plástico: **NP**
Índice de plasticidad:
Clasificación AASHTO:
Clasificación U.S.C.: **GP**

OBSERVACIONES

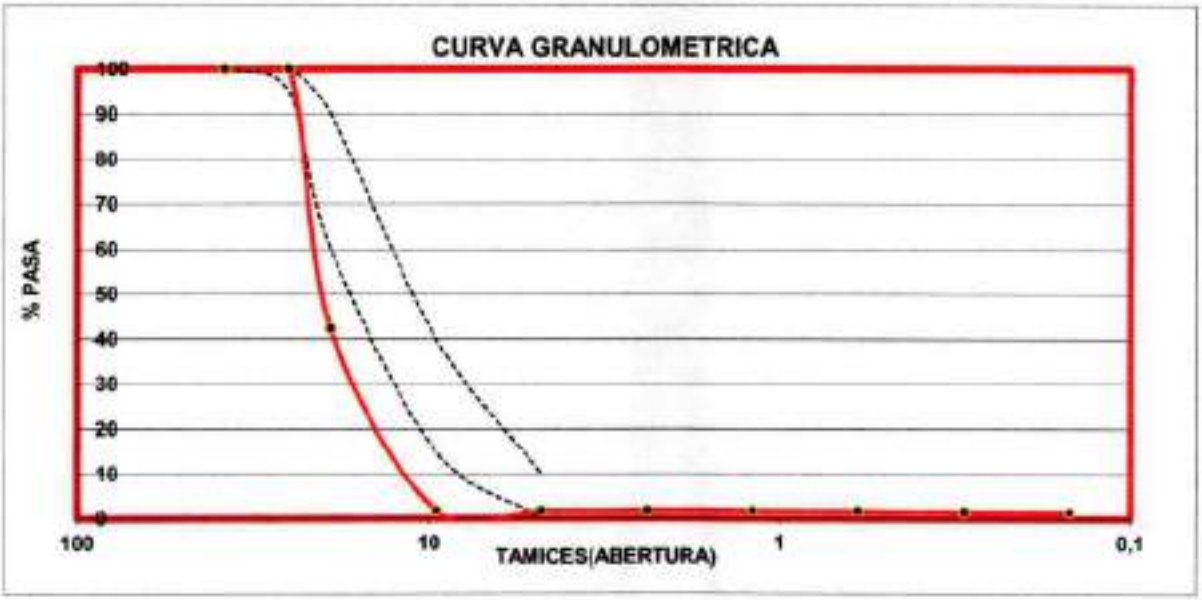

GEOTEC. **WALTER H CORTÉS O**

ING. **REVISO**

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTES
TEL: 4296887 311-8060140

ANALISIS GRANULOMÉTRICO
CURVAS IDEALES
NTC 174

PROYECTO	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPALAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUNAYO		
CLIENTE	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	MIXTO ARENOSO	FECHA	25 de noviembre de 2025
CANTERA	RIO CAQUETA JAUNO	PESO TOTAL MUESTRA	2086,5
MUESTRA	B	EJECUTADO POR	WALTER H CORTÈS
GRADACIÓN	CONCRETOS	CALCULADO POR	WALTER H CORTÈS


TAMIZ	PESO RETENIDO	% RETENIDO	% RET TOTAL	% PASA
1-1/2'	0	0	0	100
1'	262,0	13	13	87
3/4'	84,0	4	17	83
3/8'	313,0	15	32	68
No 4	151,0	7	39	61
No 8	153,5	7,4	46,2	53,8
No 16	234,5	11,2	57,4	42,6
No 30	294,5	14,1	71,5	28,5
No 50	264,7	12,7	84,2	15,8
No 100	197,3	9,5	93,7	6,3
FONDO	132	6,3		

Límite Líquido	NL
Límite plástico	NP
Indice de plasticidad	
Clasificación AASHTO	
Clasificación U.S.C.	SW-SM

OBSERVACIONES

especificaión

NTC 174

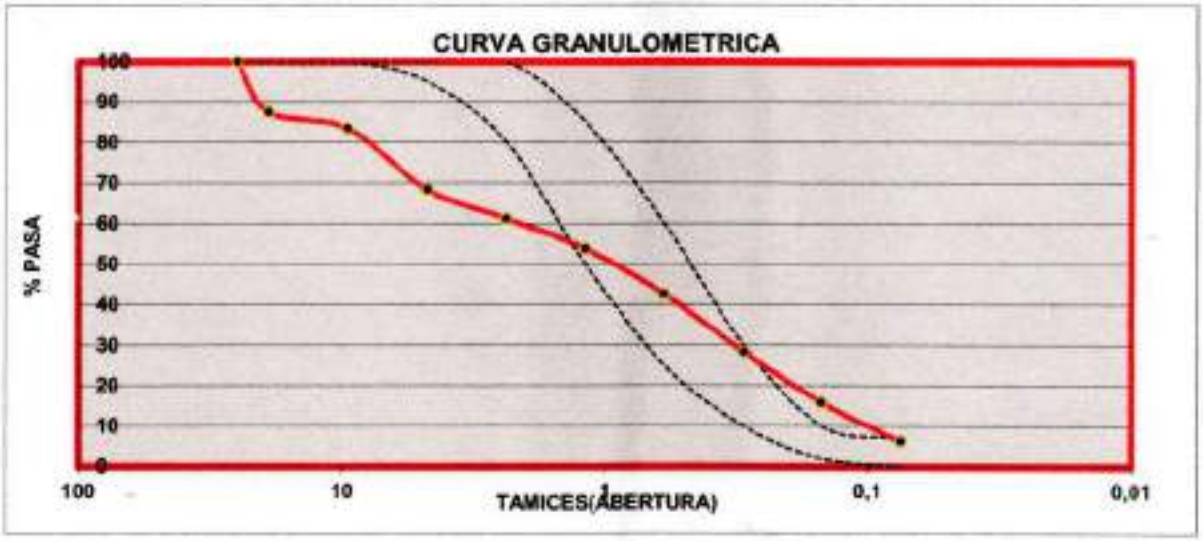

GEOTEC. WALTER H CORTÉS O

ING. REVISO

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTES
TEL: 4296887 311-3060140

AJUSTE GRANULOMÉTRICO
CURVA IDEAL FULLER

PROYECTO MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPALAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CLIENTE **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**

DESCRIPCIÓN MUESTRA _____ FECHA **25 de noviembre de 2025**

PESO TOTAL MUESTRA _____

CANTERA **RIO CAQUETA** EJECUTADO POR **WALTER H CORTÉS**

MUESTRA **TRITURADO-MIXTO ARENOSO** CALCULADO POR **WALTER H CORTÉS**

GRADACION **A+B**


PORCENTAJE DE A **40** PORCENTAJE DE B **60**

TAMIZ	ESPECIFICACIÓN	GRADACIÓN A	GRADACIÓ	COMBINACIÓN A+B
1'	100	100,0	100	100,0
3/4'	69,6/80	100,0	87	92,5
3/8'	59,7/70,9	42,4	83	67,0
No 4	41,1/53,2	1,8	68	41,8
No 8	27/39,5	1,7	61	37,4
No 16	18,6/28,9	1,7	54	33,0
No 30	12-/20	1,7	43	26,2
No 50	7,3/12,9	1,7	28	17,7
No 100	4,1/7,0	1,5	16	10,1
No 200	1,7/2,4	1,4	6	4,4
FONDO				

Límite Líquido _____
Límite plástico _____
Indice de plasticidad _____
Clasificación AASHTO _____
Clasificación U.S.C. _____

OBSERVACIONES

AJUSTE
curva ideal de linea negra

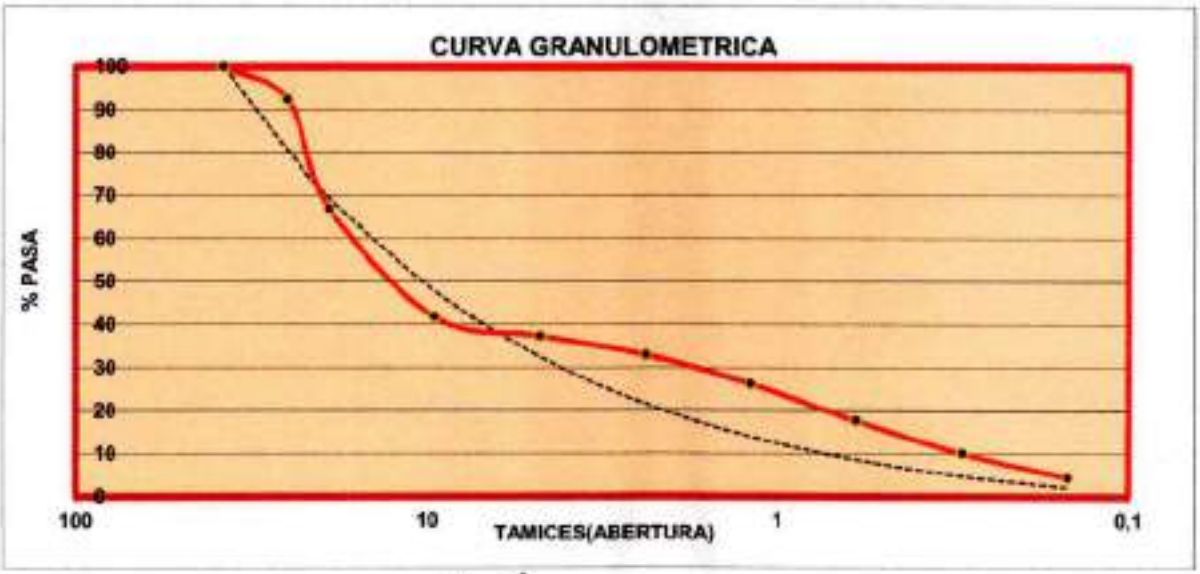

GEOTEC. _____
WALTER H CORTÉS O

ING. _____
REVISO

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTES
TEL: 4296887 - 311.8060140

DENSIDAD Y ABSORCIÓN DE AGRAGADOS GRUESOS

CLIENTE: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPALAL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LINÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA :25-NOVIEMBRE--25 FUENTE : RIO CAQUETA

EJECUTADO POR: WALTER CORTÉS MUESTRA : TRITURADO DE 1"

PRUEBAS	1	2	3	PROMEDIO
PESO DEL MATERIAL EN EL AIRE EN ESTADO SSS + RECIPIENTE	1235,4	1164,8	989,5	
PESO DEL RECIPIENTE EN EL AIREA	200,8	142,9	196,3	
PESO DEL MATERIAL EN EL AIRE EN ESTADO SSS	**1034,6**	**1021,9**	**793,2**	
PESO DEL MATERIAL SATURADO EN EL AGUA +RECIPIENTE	718,8	712,0	569,2	
PESO DEL RECIPIENTE EN EL AGUA	76,0	76,0	76,0	
PESO DEL MATERIAL SATURADO EN EL AGUA	**642,8**	**636**	**493,2**	
PESO DEL MATERIAL SECO EN EL AIRE + RECIPIENTE	1224,9	1153,7	981,6	
PESO DEL RECIPIENTE EN EL AIREA	200,8	142,9	196,3	
PESO DEL MATERIAL SECO EN EL AIRE	**1024,1**	**1010,8**	**785,3**	
GS, BULK	2,614	2,619	2,618	2,617
GS,BULK SSS	2,641	2,648	2,644	2,644
GS,APARENTE	2,686	2,697	2,688	2,690
% DE ABSORCIÓN	1,03	1,10	1,01	1,04

OBSERVACIÓN

Walter Hernando Cortés Ortiz
Geotecnólogo

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTÉS
TEL: 4236887 (MOCOA)

DENSIDAD Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINO

CLIENTE: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPALAL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA :25-NOVIEMBRE--25 | FUENTE : RIO CAQUETA

EJECUTADO POR: WALTER CORTÉS | MUESTRA : ARENA DE RIO PASA No 4

PRUEBAS	1	2	3	PROMEDIO
MATRAZ No	1			
TEMPERATURA °C	30			
PESO DEL AGUA Y PICNÓMETRO (Wpa)	**625**			
PESO DEL PICNÓMETRO,SUELO Y AGUA (Wpas)	777,1			
PESO SECO DEL SUELO (Ws)	242,7			
VOLUMEN DE SÓLIDOS (Vs=Wpa-(Wpas-Ws)) cc	**90,6**			
AGUA EN LOS POROS DE LAS PARTICULAS (Ww=250-Ws) grms.	7,3			
VOLUMEN DE SÓLIDOS SATURADOS (Vss=Vs+Ww) cc	97,9			
PESO BULK O DENSIDAD SECA GS=Ws/Vss	2,479			2,479
DENSIDAD APARENTE GS=250/Vss	2,554			2,554
GRAVEDAD ESPECÍFICA O RELATIVA G=Ws/VSS-Ww	2,679			2,679
ABSORCIÓN Aos%=(Ww/Ws*100)	3,01			3,01

OBSERVACIÓN

Walter Hernando Cortés Ortiz
Geotecnólogo

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERREMONO SAS ZOMAC**	Fecha Impresión	**25/08/24**	Informe N°:	**114764**
Dirección:	**BRR PROGRESO CL 4 N 71 VILLAGARZON**	No. Remisión:	**187222611**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**3162327090**	Página:	**1 de 10**	Centro:	**Centro Manizales**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA,PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu	% V
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022308	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.86	0.15	0.022	0.018	0.45	0.224	0.069	0.209	0.003
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022517	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.91	0.15	0.023	0.019	0.45	0.222	0.069	0.182	0.004
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022307	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.86	0.15	0.022	0.018	0.45	0.224	0.069	0.209	0.003
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022303	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.86	0.15	0.022	0.018	0.45	0.224	0.069	0.209	0.003
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022518	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.91	0.15	0.023	0.019	0.45	0.222	0.069	0.182	0.004
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022506	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.91	0.15	0.023	0.019	0.45	0.222	0.069	0.182	0.004
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022507	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.91	0.15	0.023	0.019	0.45	0.222	0.069	0.182	0.004
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022503	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.91	0.15	0.023	0.019	0.45	0.222	0.069	0.182	0.004
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BNSH02683F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	0.95	0.24	0.022	0.028	0.47	0.220	0.070	0.25	0.003
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BFOU06042B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.28	1.19	0.22	0.007	0.018	0.48	0.01	0.01	0.01	0.060
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BNSP030855	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.26	0.93	0.23	0.024	0.026	0.44	0.210	0.073	0.23	0.003
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO4602918	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.29	1.20	0.21	0.009	0.017	0.49	0.01	0.01	0.02	0.002
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO4602917	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.29	1.20	0.21	0.009	0.017	0.49	0.01	0.01	0.02	0.002
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO5000318	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.29	1.21	0.20	0.005	0.019	0.49	0.01	0.01	0.02	0.002
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO5000318R	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.29	1.21	0.20	0.005	0.019	0.49	0.01	0.01	0.02	0.002
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO5040316	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.29	1.20	0.19	0.006	0.015	0.49	0.01	0.01	0.01	0.002
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289 G60	A012024415	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.86	0.15	0.024	0.018	0.46	0.281	0.068	0.174	0.003

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERREMONO SAS ZOMAC**	Fecha Impresión	**25/08/24**	Informe N°:	**114764**
Dirección:	**BRR PROGRESO CL 4 N 71 VILLAGARZON**	No. Remisión:	**187222611**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**3162327090**	Página:	**2 de 10**	Centro:	**Centro Manizales**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA_PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu	% V
C8001349	BARRA COR 5.8"(No.5) 6m NTC2289 G60	A012004605	NTC 2289 GR60	Ternium	0.27	0.88	0.16	0.018	0.018	0.45	0.225	0.056	0.145	0.004
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289 G60	BNSE037609	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.26	0.022	0.025	0.46	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289 G60	BNSE037617	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.26	0.022	0.025	0.46	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289 G60	BNSE037615	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.26	0.022	0.025	0.46	0.220	0.060	0.20	0.003
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289 G60	BNSE037612	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.27	0.93	0.26	0.022	0.025	0.46	0.220	0.060	0.20	0.003

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA_PROD	FABRICANTE	% Mo
C8001348	BARRA COR 1.2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012002308	NTC 2289 GR60	Ternium	0.035
C8001348	BARRA COR 1.2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012002517	NTC 2289 GR60	Ternium	0.021
C8001348	BARRA COR 1.2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012002307	NTC 2289 GR60	Ternium	0.035
C8001348	BARRA COR 1.2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012002303	NTC 2289 GR60	Ternium	0.035
C8001348	BARRA COR 1.2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012002515	NTC 2289 GR60	Ternium	0.021
C8001348	BARRA COR 1.2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012002506	NTC 2289 GR60	Ternium	0.021
C8001348	BARRA COR 1.2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012002507	NTC 2289 GR60	Ternium	0.021
C8001348	BARRA COR 1.2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012002503	NTC 2289 GR60	Ternium	0.021
C8007443	BARRA COR 3.8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BNSH026603F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.014

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan unicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERREMONO SAS ZOMAC**	Fecha Impresión	**25/08/24**	Informe N°:	**114764**
Dirección:	**BRR PROGRESO CL 4 N 71 VILLAGARZON**	No. Remisión:	**187222611**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**3162327090**	Página:	**3 de 10**	Centro:	**Centro Manizales**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**COLADA/LOTE**	**NORMA PROD**	**FABRICANTE**	**% Mo**
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BFOLI06042B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.000
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BNSR030805	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.020
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289 G60	BFO4602918	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.000
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289 G60	BFO4602917	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.000
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289 G60	BFO5000031A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.000
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289 G60	BFO5000031B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.000
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289 G60	BFO5040316	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.000
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289 G60	A012004415	NTC 2289 GR60	Ternium	0.053
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289 G60	A012004605	NTC 2289 GR60	Ternium	0.033
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289 G60	BNSE037609	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.014
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289 G60	BNSE037617	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.014
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289 G60	BNSE037615	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.014
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289 G60	BNSE037612	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.014

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERREMONO SAS ZOMAC**	Fecha Impresión	**25/08/24**	Informe N°:	**114764**
Dirección:	**BRR PROGRESO CL 4 N 71 VILLAGARZON**	No. Remisión:	**187222611**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**3162327090**	Página:	**4 de 10**	Centro:	**Centro Manizales**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS					
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	CORTANTE SOLDADURA N	Doblado	Relación RT/RF
C8012376	MALLA ELEC XX-131 NTC5806	2AB1988220	NTC 5806	Ternium		650		8876	SinGrieta	
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022308	NTC 2289 GR60	Ternium	493	647	15		SinGrieta	1.31
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022517	NTC 2289 GR60	Ternium	488	642	16		SinGrieta	1.32
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022307	NTC 2289 GR60	Ternium	493	647	15		SinGrieta	1.31
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022303	NTC 2289 GR60	Ternium	493	647	15		SinGrieta	1.31
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022516	NTC 2289 GR60	Ternium	488	642	16		SinGrieta	1.32
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022506	NTC 2289 GR60	Ternium	488	642	16		SinGrieta	1.32
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022507	NTC 2289 GR60	Ternium	488	642	16		SinGrieta	1.32
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022503	NTC 2289 GR60	Ternium	488	642	16		SinGrieta	1.32
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BNSH02663F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	491	645	15.88		SinGrieta	1.31
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BFOU060428	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	453	595	17.76		SinGrieta	1.31
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BNSR030855	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	522	659	14.85		SinGrieta	1.25
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO4602918	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	466	617	17.8		SinGrieta	1.32
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO4602917	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	466	617	17.8		SinGrieta	1.32
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO5000031A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	477	633	16.6		SinGrieta	1.31

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERREMONO SAS ZOMAC**	Fecha Impresión	**25/08/24**	Informe N°:	**114764**
Dirección:	**BRR PROGRESO CL 4 N 71 VILLAGARZON**	No. Remisión:	**187222611**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**3162327090**	Página:	**5 de 10**	Centro:	**Centro Manizales**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS					
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	CORTANTE SOLDADURA N	Doblado	Relación RT/RF
C8001462	BARRA CORR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO5000318	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	477	623	16.8		SinGrieta	1.31
C8001462	BARRA CORR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO5040316	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	484	628	17.1		SinGrieta	1.30
C8001349	BARRA CORR 5.8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012024415	NTC 2289 GR60	Ternium	484	628	16		SinGrieta	1.30
C8001349	BARRA CORR 5.8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012024605	NTC 2289 GR60	Ternium	472	629	15		SinGrieta	1.33
C8005643	ROLLO COMPACTO CORR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037609	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00		SinGrieta	1.45
C8005643	ROLLO COMPACTO CORR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037617	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00		SinGrieta	1.45
C8005643	ROLLO COMPACTO CORR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037615	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00		SinGrieta	1.45
C8005643	ROLLO COMPACTO CORR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037612	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	481	695	15.00		SinGrieta	1.45

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERREMONO SAS ZOMAC**	Fecha Impresión	**25/08/24**	Informe N°:	**114764**
Dirección:	**BRR PROGRESO CL 4 N 71 VILLAGARZON**	No. Remisión:	**187222611**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**3162327090**	Página:	**6 de 10**	Centro:	**Centro Manizales**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA/PROD	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Especlamiento
					Kg/m	mm	mm	mm
C8012376	MALLA ELEC XX-131 NTC5806	2AB1988220	NTC 5806	Ternium				
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022508	NTC 2289 GR60	Ternium	1.003	1.08	2.6	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022517	NTC 2289 GR60	Ternium	0.995	0.82	2.7	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022507	NTC 2289 GR60	Ternium	1.003	1.08	2.6	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022503	NTC 2289 GR60	Ternium	1.003	1.08	2.6	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022516	NTC 2289 GR60	Ternium	0.995	0.82	2.7	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022506	NTC 2289 GR60	Ternium	0.995	0.82	2.7	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022507	NTC 2289 GR60	Ternium	0.995	0.82	2.7	8.1
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022503	NTC 2289 GR60	Ternium	0.995	0.82	2.7	8.1
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BNSH02683F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.551	0.53	2.2	5.8
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BFDU06042B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.546	0.59	2.2	5.9
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BNSR030855	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.559	0.55	2.5	6.2
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO4602918	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.493	0.47	1.8	5.5
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO4602917	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.493	0.47	1.8	5.5
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO5000031A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.499	0.47	2.0	5.5
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO5000031B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.499	0.47	2.0	5.5

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERREMONO SAS ZOMAC**	Fecha Impresión	**25/08/24**	Informe N°:	**114764**
Dirección:	**BRR PROGRESO CL 4 N 71 VILLAGARZON**	No. Remisión:	**187222611**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**3162327090**	Página:	**7 de 10**	Centro:	**Centro Manizales**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PROD	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
					Kg/m	mm	mm	mm
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO5040316	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.496	0.43	1.9	5.6
C8001349	BARRA COR 5.8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012024415	NTC 2289 GR60	Ternium	1.509	1.12	3.4	10.5
C8001349	BARRA COR 5.8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012024605	NTC 2289 GR60	Ternium	1.521	1.09	3.4	10.5
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037609	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.562	0.44	2.3	6.0
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037617	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.562	0.44	2.3	6.0
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037615	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.562	0.44	2.3	6.0
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037612	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.562	0.44	2.3	6.0

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

120

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERREMONO SAS ZOMAC**	Fecha Impresión	**25/08/24**	Informe N°:	**114764**
Dirección:	**BRR PROGRESO CL 4 N 71 VILLAGARZON**	No. Remisión:	**187222611**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**3162327090**	Página:	**8 de 10**	Centro:	**Centro Manizales**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA,PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte
C8012376	MALLA ELEC XX 131 NTC5806	2AB1868220	NTC 5806	Ternium	
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022308	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022517	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022307	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022303	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022515	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022506	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022507	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289 G60	A012022503	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BNSH62683F	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BFOU06042B	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289 G60	BNSR030855	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	53
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO4602918	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	57
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO4602917	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	57
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO5000031A	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO5000318	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERREMONO SAS ZOMAC**	Fecha Impresión	**25/08/24**	Informe N°:	**114764**
Dirección:	**BRR PROGRESO CL 4 N 71 VILLAGARZON**	No. Remisión:	**187222611**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**3162327090**	Página:	**9 de 10**	Centro:	**Centro Manizales**

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte
					°
C8001442	BARRA COR 9mm 6m NTC2289/G60	BFO5040316	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	AE12024415	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	AE12024605	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037659	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037617	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037615	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C9005643	ROLLO COMPACTO COR 3/8" NTC2289/G60	BNSE037612	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

122

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Carrera 42 # 26 - 18. Itagüi**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**FERREMONO SAS ZOMAC**	Fecha Impresión	**25/08/24**	Informe N°:	**114764**
Dirección:	**BRR PROGRESO CL 4 N 71 VILLAGARZON**	No. Remisión:	**187222611**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**3162327090**	Página:	**10 de 10**	Centro:	**Centro Manizales**

Material	Ensayo	Método	Fecha Ensayo
C8012376			22.05.2025
C8012376			22.05.2025

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

123



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Estructural

Fecha de Emisión: 23-oct-25
Número de Reporte: IBG-ART-41-2025

Km 5 Vía Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia
Planta Caracolito

Cemento Hidráulico Tipo ART

Fecha inicial* 5-oct-25 — Fecha final* 11-oct-25

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	19.1 MPa	Mínimo 11.0
3 días	NTC 220	32.8 MPa	Mínimo 22.0
7 días	NTC 220	38.0 MPa	No especificado
28 días **	NTC 220	44.0 MPa	No especificado

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	3.55 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	385 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	239 min

Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)



Resultado: 148 min
Método de ensayo: NTC 118

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 6.8%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%)



Resultado: 0.001%
Método de ensayo: NTC 4927

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121:2023 "ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO"**. Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC**, el cual ejecuta auditorías periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de un análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido en parcial o totalmente sin la autorización por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior.

Carlos Andrés Parra Bermúdez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6030606 | (571) 5469000 | Bogotá, D.C. Colombia

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.10 REVISION Y VERIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1662958	ALVARO HILTON MONTENEGRO MARTINEZ	BRR CENTRO	4545444	hiquandonson2015@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	NUMERO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	0525112	1	22/12/2025	82000189	$ 270.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	NUEVA EPS	900156264	118.700	0		0		0	0	0	0	118.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	151.900	0	0	0	0	0	0		151.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	800011539	5.000				5.000	0	0	5.000			50	5.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	118.700	118.700
Pensión	1	151.900	151.900
Riesgos Laborales	1	5.000	5.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	275.600	275.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16628688	ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ		ERR CENTRO	4545444	fvgcandelario@2013@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			PUTUMAYO	VILLAGARZON		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA MES AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	1	22/12/2025	82930189	$275.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE									INFORMACION NOVEDADES																PENSION							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP		Cód. AFP	SBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	SBC EPS	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	SBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	SBC CCF	Aporte CCF	SBC cómp. parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16628688	ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ	SI	X			NO	X																23-11	$48.000	12.000	0	0	0	0	EPS010	$48.000	108.780	14-20	$48.000	1	0,348		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1135526460	ERIKA YANIRA RODRIGUEZ NARVAEZ		ERR CENTRO	4545444	fegjandersson2510@hotmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	VILLAGARZON		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2026-12	I	22/12/2025	92950177	$275.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
EPS018	Serv. Oc. Salud - EPS	805001157-2	116.700	0		0		0	0	0	0	116.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	151.900	0	0	0	0	0	0		151.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.000				5.000	0	0	5.000			53	5.000	1

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGS, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	116.700	116.700
Pensión	1	151.900	151.900
Riesgos Laborales	1	5.000	5.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	273.600	273.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1113526460	ERIKA YANIRA RODRIGUEZ NARVAEZ		BRR CENTRO	4545446	hupsandersson2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I - Independiente			PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA-MES-AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	1	22-12-2025	92550177	$275.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																	PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Diferido	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1116326460	ROMPACUET NARVAEZ Erika yanira	01	0			N	X																15-14	946.000	01.260	0	0	0	0	EPS018	946.000	115.700	14-20	946.000	1	5.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901042429	8	CONCILIO COMUNITARIO LAS ADICIAS	S	S	POSITIVA - 14-23	SNCA	4299	APORTA
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
86-1	BARRIO PROGRESO		3213008811		LAEPISBH@HOTMAIL.ES			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	36357097	E	2026-01-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	$88.800	14.800	MIXTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36357097	2026-01-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD				OCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INCAP	AUSE	LICR	AFP	EPS	ARL	CCF	NOMBRE	IBC	DÍAS	COT	TIPO	FSOLID	NOMBRE	IBC	DÍAS	COT	NOMBRE	IBC	DÍAS	COT	IBC	DÍAS	ARL	IBC	COT	COT	COT	COT	COT	TRI	RET TRI	TOTAL	SUMAS NO PRESTACIONALES	AUXILIOS ECONÓMICOS
1	CC 1824441731	CORTEZ CARREÑAS JOSE JUANITO	1.423.500	F	X																17	17	17	17	PROTECCION 23-23-10	906.500	129.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	906.500	32.300		COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCFC	906.500	32.300		906.500	56.300	0,00%									349.500	0	349.500
2	CC 1824441731	CORTEZ CARREÑAS JOSE JUANITO	1.423.500	F	X				C												17	17	17	17	PROTECCION 23-23-10	906.500	129.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	906.500	32.300		COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCFC	906.500	32.300		906.500	56.300	0,00%	906.500	10.200	34.300	0	0	0	1	0	333.300	0	349.500
3	CC 1801571129	RODRIGUEZ PANTOJA LUIS ALVARO	1.423.500	F	X				C												17	17	17	17	COLPENSION 23-23-10	906.500	129.000	0		EPS S.A.S. SANITASUNE-EPS018	906.500	32.300		COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCFC	906.500	32.300		906.500	56.300	0,00%	906.500	10.200	34.300	0	0	0	1	0	333.300	0	349.500
4	CC 1832519128	ENRIQUEZ PANTOJA LUIS ALVARO	1.423.500	F	X				C												17	17	17	17	COLPENSION 23-23-10	906.500	129.000	0		EPS S.A.S. SANITASUNE-EPS018	906.500	32.300		COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCFC	906.500	32.300		906.500	56.300	0,00%	906.500	10.200	34.300	0	0	0	1	0	333.300	0	349.500
5	CC 1810519464	ENRIQUEZ PANTOJA VICTOR HUGO	1.423.500	F	X				A												17	17	17	17	POSITIVA 23-23-10	906.500	129.000	0		EPS S.A.S. SANITASUNE-EPS018	906.500	32.300		COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCFC	906.500	32.300		906.500	56.300	0,00%	906.500	10.200	34.300	0	0	0	1	0	333.300	0	349.500
6	CC 1810519464	ENRIQUEZ PANTOJA VICTOR HUGO	1.423.500	F	X				C												17	17	17	17	POSITIVA 23-23-10	906.500	129.000	0		EPS S.A.S. SANITASUNE-EPS018	906.500	32.300		COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCFC	906.500	32.300		906.500	56.300	0,00%	906.500	10.200	34.300	0	0	0	1	0	333.300	0	349.500
7	CC 1810519464	ORTEGA LOPEZ MARCO ANTONIO	1.423.500	F	X				A												8	17	17	17	EMAPI 23-23-10	0	0	0		EPS S.A.S. SANITASUNE-EPS018	906.500	32.300		COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCFC	906.500	32.300		906.500	56.300	0,00%	906.500	10.200	34.300	0	0	0	1	0	333.300	0	349.500
8	CC 1810519464	ORTEGA LOPEZ MARCO ANTONIO	1.423.500	F	X				C												9	17	17	17	EMAPI 23-23-10	0	0	0		EPS S.A.S. SANITASUNE-EPS018	906.500	32.300		COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCFC	906.500	32.300		906.500	56.300	0,00%	906.500	10.200	34.300	0	0	0	1	0	333.300	0	349.500
9	CC 1124867567	RIVERA QUINTAL BONITA DANIEL	1.423.500	F	X				A												17	17	17	17	POSITIVA 23-23-10	906.500	129.000	0		EPS S.A.S. SANITASUNE-EPS018	906.500	32.300		COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCFC	906.500	32.300		906.500	56.300	0,00%	906.500	10.200	34.300	0	0	0	1	0	333.300	0	349.500
10	CC 1124867567	RIVERA QUINTAL BONITA DANIEL	1.423.500	F	X				C												17	17	17	17	POSITIVA 23-23-10	906.500	129.000	0		EPS S.A.S. SANITASUNE-EPS018	906.500	32.300		COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCFC	906.500	32.300		906.500	56.300	0,00%	906.500	10.200	34.300	0	0	0	1	0	333.300	0	349.500
11	CC 1812519712	VALENCIA MESA SANDRO JULIO	1.423.500	F	X				A												17	17	17	17	POSITIVA 23-23-10	906.500	129.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	906.500	32.300		COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCFC	906.500	32.300		906.500	56.300	0,00%	906.500	10.200	34.300	0	0	0	1	0	333.300	0	349.500
12	CC 1812519712	VALENCIA MESA SANDRO JULIO	1.423.500	F	X				C												17	17	17	17	POSITIVA 23-23-10	906.500	129.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	906.500	32.300		COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCFC	906.500	32.300		906.500	56.300	0,00%	906.500	10.200	34.300	0	0	0	1	0	333.300	0	349.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	CONJUNTO COMUNITARIO LAS ACACIAS	E	[illegible]	POSITIVA - 14-03	ÚNICA	4290	Jurídica
NUM DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-1	BARRIO PROGRESO		[illegible]		LALF15@HOTMAIL.ES		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-12	2020-01	36357287	H	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	888.800	14.900	MIDAS
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	36357287	2020-01-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC INEXACTO	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	0	0	4.539.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 2)				6	411.600	0	9.300	0	420.900
EPS-S EMSSANAR	ESSC16	901021565	6	4	274.400	0	6.200	0	280.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	137.200	0	3.100	0	140.300
SENA(Administradoras: 1)				6	97.200	0	2.200	0	99.400
SENA	PASENA	899999034	1	6	97.200	0	2.200	0	99.400
ICBF(Administradoras: 1)				6	145.200	0	3.300	0	148.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	6	145.200	0	3.300	0	148.500
Gran Total					654.000	0	14.800	0	668.800

PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	16628650	ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ		BRR CENTRO	4545444	hugoendersaor2016@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	22/12/2025	92550189	$275.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	NUEVA EPS	800130264	118.700	0		0		0	0	0	0	118.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	151.900	0	0	0	0	0	0		151.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.000				5.000	0	0	5.000			92	5.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	118.700	118.700
Pensión	1	151.900	151.900
Riesgos Laborales	1	5.000	5.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	275.600	275.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19029935	ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ		BRR CENTRO	4540444	hugoandersson2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	1	22/12/2025	92550189	$275.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				COT			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ingreso	Retiro	T. Prestación	Cotiza Pensión	Novedad	ING	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19029935	ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ	59	30			N	X														25-14	540.000	151.800	0	0	0	0	EPS018	648.000	148.720	14-04	648.000	1	5.880		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			[illegible]
CIUDAD/MUNICIPIO		DEPARTAMENTO	PUTUMAYO
DIRECCIÓN	[illegible]	TELÉFONO	[illegible]
TIPO APORTANTE	DEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	[illegible]
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	600835448331	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTE
FORMATO	[illegible]	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	[illegible]	PER.	[illegible]
CÓDIGO ARL	[illegible]				
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)	[illegible]	NÚMERO AUTORIZACIÓN	[illegible]		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	IBC FACTURACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	AFILIADO	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	INT	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTALES										[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	ACEPTACIÓN POR EMPRENDIMIENTO		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		INCAPACIDAD		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	DIAS/CUOTA	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTALES													[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	ACEPTACIÓN ARP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ARP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTALES									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.11 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO (INCLUYE SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES).

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025

TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

NIT. 800.094.164-4	GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL ANEXO SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES OBRA INTERVENTORIA	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA			

SECRETARIA EJECUTORA: **SECRETARIA DE DE INFRAESTRUCTURA**

GOBERNACIÓN: **PUTUMAYO**

CONTRATO No. **1071-2025 DEL 18 DE JULIO DE 2025** CONTRATISTA **DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO**

OBJETO DEL CONTRATO: **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

ORDEN DE INICIO 27/10/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ACTUALIZADO TRES (03) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO DEL 26/1/2026

		VIGENCIA								
1. Garantía única de cumplimiento:	**41-44-101295598**	DESDE:	27	10	2025	HASTA:	9	8	2026
1.2. Pago de salarios, prestaciones	**41-44-101295598**	DESDE:	27	10	2025	HASTA:	9	2	2029
1.4. Calidad del servicio	**41-44-101295598**	DESDE:	9	2	2028	HASTA:	9	2	2031

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: Pólizas expedidas por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO. Las pólizas tienen textos y aclaraciones anexas por parte de la aseguradora en las cuales indica que todas las pólizas serán ajustadas de acuerdo con la fecha en la cual se firma el acta con el contrato de obra y fecha de inicio.

Contratos adicionales: **Modificación No.** N.A. **Póliza No.** N.A.

Firma

Nombre: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
Contratista de Interventoría
Matrícula No.: 63202-220004 QND

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2025	18	07	2025	00:00	31	10	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES	CC: 1113.304.913

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE GALAN	PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	3105526416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4260573

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSOIOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.1811-2025, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORIA).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AJUSTA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS SEGUN ACTA DE INICIO FIRMADA POR LAS PARTES EL 27/10/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****(80,472.00)	$ *****(8,000.00)	$ ****(16,809.00)	$ *********(105,281.00)	$ ******(6,305,548.50)	CONTADO

INTERMEDIARIO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CLAUDIA NORA QUINTERO JURADO	260850	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2025	18	07	2025	00:00	31	10	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES		CC: 1113.304.913	
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE GALAN	CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	TELÉFONO: 3105526416	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.094.164-4	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO 4260573	

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | Efecty | PSE | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | SuperINTER | exito | MOVIIRED

Gana Gana | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****(80,472.00)	$ *****(8,000.00)	$ ****(16,609.00)	$ *********(106,281.00)	$ ******(6,305,548.50)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA NORA QUINTERO JURADO	240950	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

71

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2025	18	07	2025	00:00	31	10	2030	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES		CC: 1113.304.913	
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE GALAN	CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	TELEFONO:	3105526416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELEFONO:	4200873

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLAGONZALEZ 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101295598, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 30 días del mes de OCTUBRE de 2025

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

72

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2025	27	10	2025	00:00	09	02	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES		CC: 1113.304.913	
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE GALAN	CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	TELÉFONO:	3105526410

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT. 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO	4260573
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECONOCE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.1071-2025, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL BARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORIA).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2025	09/08/2026	$2,522,219.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/10/2025	09/02/2029	$5,261,109.70	
CALIDAD DEL SERVICIO	09/02/2026	09/02/2031	$2,522,219.40	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AJUSTA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS SEGUN ACTA DE INICIO FIRMADA POR LAS PARTES EL 27/10/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******80,472.00	$ *******8,000.00	$ *****16,809.00	$ **********105,281.00	$ ********8,306,548.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA NORA QUINTAS JURADO	240850	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 -TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidencia de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2025	27	10	2025	00:00	09	02	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	CC: 1113.304.913
ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES			
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 2 -4 BARRIO JOSE GALAN	CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	TELÉFONO	3106526416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.094.164-4	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO	4260573

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opcion PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁCINA WEB | PSE | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******80,472.00	$ ******8,000.00	$ ******16,809.00	$ **********105,281.00	$ ********6,305,548.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA NORA QUINTAR JURADO	240650	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7326622 - PASTO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO:
1100961051520-1

(415) 7709998021167(8020) 110961051520 1 (3900) 0000001051 81 (96) 20261027

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2025	27	10	2025	00:00	09	02	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES	IDENTIFICACIÓN	CC: 1113.304.913
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE GALAN	CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	TELEFONO:	3105525418

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELEFONO:	4200573

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLARGONCAL02 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101295598, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 30 días del mes de OCTUBRE de 2025

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

74/4

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	03	2026	27	10	2025	00:00	09	02	2031	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES		CC: 1113.304.913	
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE GALAN	CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	TELÉFONO:	3105526416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		NIT: 800.094.164-4	
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO	4260573
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSIDB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.1371-2025, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO CALLE 8A DEL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORIA).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2025	09/08/2026	$2,522,219.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/10/2025	09/02/2029	$1,261,109.70	
CALIDAD DEL SERVICIO	04/03/2026	09/02/2031	$2,522,219.40	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL ACTA FINAL DEL DE INTERVENTORIA No 01 DEL 04 DE MARZO DEL 2026

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********3.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******8,305,548.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA MORA QUINTAS JURADO	240855	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ossio - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	3

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	03	2026	27	10	2025	00:00	09	02	2031	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	CC: 1113.304.913
ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES			
DIRECCION: CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE GALAN	CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	TELEFONO:	3105526416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	NIT: 860.094.164-4
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			
DIRECCION: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELÉFONO:	4260573

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7326622 - PASTO

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF3468504

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

75/V

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	03	2026	27	10	2025	00:00	04	03	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES	CC: 1113.304.913

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE GALAN	PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	3105525416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	NIT: 800.094.164-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 8 NRO. 7 - 40	MOCOA, PUTUMAYO	4260573

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECO0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.1071-2025, CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORIA).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2025	09/08/2026	$2,522,219.43	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/10/2025	09/02/2029	$1,261,109.72	
CALIDAD DEL SERVICIO	04/03/2026	04/03/2031	$2,522,219.43	$2,522,219.40

ACLARACIONES

SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DEL AMPARO CALIDAD DEL SERVICIO CONFORME ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA DEL 04 MAR 2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ********6,305,548.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA NORA QUINTAS JURADO	240830	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO. POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295598	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	03	2026	27	10	2025	00:00	04	03	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ENCISO ARANGO, DAVID ANDRES			CC: 1113.304.913
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 2 - 4 BARRIO JOSE GALAN	CIUDAD: PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO	TELEFONO:	3105526416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			NIT: 800.094.164-4
DIRECCIÓN: CL 8 NRO. 7 - 40	CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO	TELEFONO:	4260573

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226522 - PASTO

41-44-101295598

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

SLF240808

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.13 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

NIT. 800.094.164-4	GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	FT-SID-007		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

		FECHA	26	DIC	2026
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	INTERVENTOR:	DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO		

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

MES 2 CONTRATO No. 1071-2025 DEL 18 DE JULIO DE 2025 MUNICIPIO MOCOA, INSPECCION DE PUERTO LIMON

CONTRATISTA DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Residente de Interventoria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Firma

Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Contratista de Interventoria
Matricula No.: 63202-220004 QND

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.14 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

NIT. 800.094.154-4	GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL INFORME FINANCIERO DE INTERVENTORIA	CODIGO			
		VERSIÓN			
		PAGINA	1	DE	1
		FECHA			

SECRETARIA EJECUTORA: EDUCACION — GOBERNACIÓN: PUTUMAYO

CONTRATO No: 1071 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 — CONTRATISTA: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO — MES: 2

SECTOR: VDA SILVANIA, ORITO - PUTUMAYO

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Acta No	Mes/ Año	Valor Directo	Valor IVA	Valor Total	Amortización Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	Observaciones
CONTRATO INICIAL				$ 25,222,194.00	$ -	$ -	$ 25,222,194.00	$ -	$ 25,222,194.00	
TOTALES		$0	$0	$0	$0	$0	$ 25,222,194.00	$0.00	$ -	

Nota: Los valores se deben expresar en millones de pesos

Firma
DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Contratista de Interventoria

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.15 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL INTERVENTOR .

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

PAOLA YULIET MENESES POTOSI
CONTADOR PUBLICO T.P:290326-T

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA

Certifica

Que verificados los soportes presentados por: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.113.304.913 de Sevilla - Valle, en calidad de interventor mediante el de contrato de interventoría N° 1071-2025, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)";** se verificó su cumplimiento y se acreditó con los comprobantes de pago los aportes al sistema de seguridad en salud, riesgos laborales y pensiones, de conformidad a lo previsto por el art. 50 de la Ley 789 de 2002.

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CARGO	Mes Cancelado SGSSS	No. Planilla	CONCEPTO	VALOR APORTADO	EMPRESA	Fecha de pago (aaa/mm/dd):
DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO CC: 1.113.304.913 RESIDENTE DE INTERVENTORIA	OCTUBRE 2025	7988229940	SALUD	$ 533.900,00	NUEVA EPS	14/10/2025
			PENSIÓN	$ 683.300,00	PORVENIR	14/10/2025
			RIESGOS	$ 44.600,00	POSITIVA	14/10/2025
DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO CC: 1.113.304.913 RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NOVIEMBRE 2025	7991247291	SALUD	$ 533.900,00	NUEVA EPS	19/11/2025
			PENSIÓN	$ 683.300,00	PORVENIR	19/11/2025
			RIESGOS	$ 44.600,00	POSITIVA	19/11/2025
DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO CC: 1.113.304.913 RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DICIEMBRE 2025	7996813781	SALUD	$ 533.900,00	NUEVA EPS	04/12/2025
			PENSIÓN	$ 683.300,00	PORVENIR	04/12/2025
			RIESGOS	$ 44.600,00	POSITIVA	04/12/2025

El supervisor del contrato emite la presente supervisión en cumplimiento del parágrafo primero del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los seis (06) días del mes de marzo de 2026.

PAOLA YULIET MENESES POTOSI
Contadora Pública Titulada
T.P 290326-T

CORREO ELECTRONICO: paolam1285@gmail.com
CEL: 3135440582
Barrio San Luis – Villagarzon Putumayo



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

290326-T

PAOLA YULIET
MENESES POTOSI
C.C. 41171336
RES. INSCRIPCION 2974 DEL 23/11/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
Asesor Grado 6 Código 1020

313261 330361



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 41.171.336
MENESES POTOSI
APELLIDOS
PAOLA YULIET
NOMBRES

FIRMA



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 15 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-NOV-1985
ORITO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.45 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
27-NOV-2003 VILLAGARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-6403000-01001049-F-0041171336-20190427 0060967311A 1 48239214

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AF5140566393F4B78

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAOLA YULIET MENESES POTOSI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41171336 de VILLAGARZON (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 290326-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 06 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO APORTANTE:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		DAVID ANDRES ENCISO ARANGO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	BARRIO PONTEVEDRA CALLE 7 NO. 2 170	TELÉFONO	[illegible]
TIPO APORTANTE:	ID-PENSIONADOS	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79082229546	TIPO DE PLANILLA:			I INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN (OTROS):	MES	mubre AÑO	0001	PERIODO COTIZACIÓN (SALUD):	MES	mubre AÑO	0001
DIAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (AAAA/MM/DD):			2025/10/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			19000 19000

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23401	[illegible]	1	$ 440.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.300	$ 0	$ 440.300
SUBTOTALES										$ 440.300	$ 0	$ 440.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APRES	COTIZACIÓN	VALOR APRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	[illegible]	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 322.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.900	$ 0	$ 0	$ 322.900
SUBTOTALES													$ 322.900	$ 0	$ 0	$ 322.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	[illegible]	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 14.400	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 14.400
SUBTOTALES									$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 14.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO APORTANTE:		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1113004972
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DAVID ANDRES ERAZO ARANGO
CIUDAD/MUNICIPIO:			PUTUMAYO
DIRECCIÓN:		VILLAMARTIN	DEPARTAMENTO: 111111
TIPO APORTANTE:		BARRIO FATIMA CALLE 7 NO. 2 176	TELÉFONO:
TIPO EMPRESA:		02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE
FORMA DE PRESENTACIÓN:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: 0
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		UNICO	Continuidad de esta línea de siguiente una:
			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79512472	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN (PAGO):	MES	noviembre AÑO	2020	PERIODO COTIZACIÓN (SALUD):	MES noviembre AÑO 2020
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			20201119	NÚMERO AUTOPAGACIÓN:	79512472

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	Entidad: POR ELEGIR	1	$ 1.100.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100.300	$ 0	$ 1.100.300
SUBTOTALES:										$ 1.100.300	$ 0	$ 1.100.300

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS			$ 0		$ 0		$ 0	$ 333.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.900	$ 0	$ 0	$ 333.900
SUBTOTALES:													$ 333.900	$ 0	$ 0	$ 333.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD INT.		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 44.900	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 44.900
SUBTOTALES:								$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 44.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	[illegible] 3
NOMBRE 1 RAZÓN SOCIAL:			DAVID ANDRES SIICSO ARMADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	BARRIO FATIMA CALLE 7 NO. 2 170	TELÉFONO:	[illegible]
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (PERSONAS TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7995913781	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES: diciembre AÑO: 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: diciembre AÑO:	mora
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa)		20/01/2026	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS AMPLIACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	SAlUD POMVENIR	1	$ 663.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 663.300	$ 0	$ 663.300
SUBTOTAL($):										$ 663.300	$ 0	$ 663.300

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTE	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 122.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.000	$ 0	$ 0	$ 122.000
SUBTOTAL($):													$ 122.000	$ 0	$ 0	$ 122.000

TOTAL APORTES A ORGANISMOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A CENTRO RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTOS	TOTALES VALOR PAGADO
14-03	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 44.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000
SUBTOTAL($):									$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / SEGURIDAD SOCIAL / PARAFISCALES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BRUTO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RESIDENTE TRIBUTARIA	IGE	LMA	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS	INDEMNIZACIÓN TARDÍA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR APORTE	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	CCF	CCF IBC	CAJA	CAJA TOTAL APORTE	ICBF	ICBF TOTAL APORTE	SENA	SENA TOTAL APORTE	ESAP	ESAP TOTAL APORTE	MINCIEN	MINCIEN TOTAL APORTE
1	CC [illegible]	[illegible]	01-DEPENDIENTE		$ 4.270.000				01												230301 POMVENIR	30	4.270.000	$ 663.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 663.300	46 SALUD TOTAL EPS	30	4.270.000	$ 633.900	$ 0	$ 633.900	14-03 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	4.270.000	[illegible]	$ 44.000																			

TOTAL PAGADO: $ 1.261.800

Planilla Pagada

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110384511
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		DIVIDENDOS: EMISIÓN APARICIO	PUTUMAYO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAGARZÓN	DEPARTAMENTO:	1710111
DIRECCIÓN:	BARRIO PATRIA CALLE 7 NO. 2 1-76	TELÉFONO:	CLASE APORTANTE:
TIPO APORTANTE:	52-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	Combinación de letras antes de registrarlo (Ind.	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (ESTATUTARIO TRIBUTARIO):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7966229540	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN (TRIM):	MES	octubre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (dd/mm/aaaa):			2025/10/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			

TOTAL APORTES A PENSIONES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD	FSP	MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE		SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25253	[illegible]	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 663.300	$ 0	$ 663.300
SUBTOTALES										$ 663.300	$ 0	$ 663.300

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 533.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.900	$ 0	$ 0	$ 533.900
SUBTOTALES													$ 533.900	$ 0	$ 0	$ 533.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD PP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES	
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN			DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-ARGOS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0			$ 0	$ 44.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000
SUBTOTALES									$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000

No.	SECUENCIA	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	VALOR SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO RESIDENTE	RET. PENS. TRASL. RÉGIMEN	PEN	INDT	SUE	ERP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	10	[illegible]	1-DEPENDIENTE 3-TRABAJADOR DE SERVICIO DOMESTICO		$ 1.261.800				NO														

No.	SECUENCIA	ADMINISTRADORA	SALARIO BÁSICO	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APLICA EL VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMINISTRADORA	SALARIO BÁSICO	IBC	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	TOTAL APORTES	ADMINISTRADORA	SALARIO BÁSICO	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	PAGO SUE	IBC	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
		PENSIONES		$ 663.300	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 663.300	EPS037 NUEVA EPS	$ 1.261.800	$ 1.261.800	$ 533.900	$ 533.900	$ 533.900	ARGOS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 1.261.800	$ 1.261.800	1 $ 44.000	$ 44.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.261.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	1112204812
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			DAVID ANDRES ENCISO AYANDO
DATOS MUNICIPIO:			PUTUMAYO
DIRECCION:	VILLAGRUZON	DEPARTAMENTO:	1111111
TIPO APORTANTE:	BARRIO TATIANI CALLE 7 NO 2 -70	TELEFONO:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	(I)-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	Consolidación de otras cierta de ingresarlo ent.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	(MICI)		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7091247291	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES noviembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:				0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/11/19	NUMERO AUTORIZACION:		1160953997

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES SOLUNARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	[illegible] PORVENIR	1	$ 840.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.000	$ 0	$ 0	$ 840.000
SUBTOTALES										$ 840.000	$ 0	$ 0	$ 840.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APRES	COTIZACIÓN	VALOR APRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	[illegible]	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 322.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.500	$ 0	$ 0	$ 322.500
SUBTOTALES													$ 322.500	$ 0	$ 0	$ 322.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS PERIODOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-01	14-[illegible] COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			$ 0	$ 0			$ 44.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000	
SUBTOTALES									$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000	

COTIZACIONES DE ESTE APORTE

DATOS DEL COTIZANTE								MOVIMIENTOS																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD							ARP												
																									ADMIN			FSP					ADMIN							ADMIN												

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	[illegible]
NOMBRE O RAZON SOCIAL			DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
CIUDAD(MUNICIPIO)	TELURIDRZON	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO
DIRECCION	BARRIO PATIA CALLE 7 NO 2 175	TELEFONO	3171311
TIPO APORTANTE	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	-INDEPENDIENTE
TIPO Empresa	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Contratación de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE ESCOGIENDO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7995813781	TIPO DE PLANILLA			-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN (TRIM)	MES	diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	diciembre AÑO	2025
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/12/04	NUMERO AUTORIZACION			1961141570

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]	$ 0	[illegible]
SUBTOTALES										[illegible]	$ 0	[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	EPS041 NUEVA EPS	1	$ 0		$ 0			$ 0	$ 533.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.900	$ 0	$ 0	$ 533.900
SUBTOTALES													$ 533.900	$ 0	$ 0	$ 533.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-03	14-03 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 44.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000
SUBTOTALES									$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000

DATOS DEL COTIZANTE

TIPO	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	DIAS COTIZADOS EN EL MES	ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL
1	CC 1112394612	DAVID ANDRES	03-INDEPENDIENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		$ 4.270.000		30	NO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACION DE LA AUTOLIQUIDACION

TOTALES SGSSI

PENSION										SALUD				APP					PARAFISCALES					
ADMIN	IBC	APORTACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDEMNIZACION SUSTITUTIVA	TOTAL APORTES	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	CCF	TOTAL APORTES	SENA	TOTAL APORTES	ICBF	TOTAL APORTES	MINEDU
250301 POSITIVA	$ 4.270.000	$ 960.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 960.900	EPS041 NUEVA EPS	$ 4.270.000	$ 533.900	$ 0	$ 533.900	14-03 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	$ 4.270.000	2111109	$ 44.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.261.800

Planilla Pagada

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.16 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Período comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Puerto Caicedo, 30 de julio del 2025

OFI-001

Ingeniero:

VIRGILIO BRAVO SOSA
Secretario de Infraestructura Departamental
Mocoa, Putumayo.

Ref: Solicitud de documentación referente al contrato de obra según proceso de contratación SID-CD-1943-2024 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Cordial saludo;

Con base al asunto de la referencia y en calidad de interventor mediante contrato de interventoría N° 1071-2025 suscrito con la Gobernación del Putumayo y cuyo objeto es "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)"; me permito solicitar formalmente a la entidad brindarme la documentación descrita en la presente, la cual corresponde al contrato de obra llevado a cabo mediante proceso de contratación SID-CD-1943-2024, con el fin de obtener la información necesaria para realizar la respectiva revisión y aprobación acorde con la normatividad, especificaciones técnicas y requisitos estipulados en los estudios previos y pliegos definitivos del proceso de contratación; todo esto es necesario previamente a la suscripción del acta de inicio de los contratos de obra e interventoría.

Por lo anterior la interventoría solicita a la supervisión (secretaría de infraestructura departamental) la siguiente información:

- Minuta del contrato de obra.

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

- Planos de diseños y programación de obra. (editables)
- Acompañamiento y disponibilidad de fecha para realizar la respectiva socialización con la comunidad.
- Propuesta económica con Unitarios (presupuesto oficial) y Memoria de cantidades. (editables)
- Pólizas expedidas con el contrato de obra.

De ante mano agradezco su atención y colaboración a la presente

Atentamente:



ING. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matricula No.: 63202-220004 QND

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Puerto Caicedo, 30 de octubre del 2025

OFI-002

Señores:

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
Contratista de obra
Mocoa, Putumayo.

Ref: Solicitud de documentación y recomendaciones referente al contrato de obra No. 1943-2024 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Cordial saludo;

Con base al asunto de la referencia y en calidad de interventor mediante contrato de interventoría N° 1071-2025 suscrito con la Gobernación del Putumayo y cuyo objeto es "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)"; me permito solicitar formalmente sea remitida la documentación descrita en la presente.

Por lo anterior la interventoria solicita a CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS la siguiente información:

1. **Entrega del programa de Manejo de tránsito:**
   Para la implementación de este documento y seguimiento se debe realizar seguimiento e inversión al presupuesto establecido en el proyecto:

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

PMT		
MANO DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO MESES
AUXILIAR DE TRANSITO	2.00	3.00
Factor multiplicador		
TOTAL MANO DE OBRA		

GASTOS OPERACIONALES		
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
MANEJO DE TRANSITO		
SRO-4 PARE / SIGA	UND	2.00
SEÑALES INFORMATIVAS		
SEÑAL SIO-02 INICIO DE OBRA	UND	2.00
SEÑAL SIO-03 FIN DE OBRA	UND	2.00
SEÑALES PREVENTIVAS		
SEÑAL SPO-01 TRABAJOS EN LA VIA	UND	2.00
SEÑAL SPO-02 MAQUINARIA EN LA VIA	UND	2.00
SEÑAL SPO-03 AUXILIAR DE TRANSITO	UND	2.00

SEÑALES REGLAMENTARIAS		
SEÑAL SRO-02 PROHIBIDO PARQUEAR O DETENERSE	UND	2.00

SEÑALES CANALIZACION		
CINTA PELIGRO	ROLLO/100M	10.00
DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UND	40.00
BARRICADAS DE LISTONES (FIG 4-15 MANUAL DE SEÑALIZACION MINTRANSPORTE)	UND	2.00

2. **Previsión Para El Plan De Adaptación A La Guia Ambiental (PAGA):**
   Para la implementación de este documento y seguimiento se debe realizar seguimiento e inversión al presupuesto establecido en el proyecto:

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Programa 1: Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental		
De gestión integral de residuos sólidos (ordinarios, orgánicos, reciclables, escombros y peligrosos)		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**
Punto Ecológico Bolsa De 65 X 80 Paquete X 100 Unidades	Unidad	1
Convenios: reciclaje, aceites usados y residuos - peligrosos	Mes	2
Subtotal		
Programa 2: Manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipo		
Uso y almacenamiento adecuado de materiales y elementos de construcción		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**
Cinta delimitadora de peligro para demarcación de zonas de almacenamiento	Rollo	1
Fichas de seguridad almacenamiento	Unidad	3
Señalización	Global	3
Valla informativa	Global	2
Extintor multipropósito	Unidad	1
Subtotal		
Programa 3: Actividades Constructivas		
Residuos solidos		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**
Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y especiales.	Global	2
Subtotal		
Programa 4: Conservación y protección de la fauna y flora		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**
Manejo de descapote y cobertura vegetal.	Global	1
Recuperación de áreas afectadas	Global	2
Protección de fauna.	Global	2
Subtotal		
Programa 5: Manejo de aguas superficiales		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105235415
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Proyecto de manejo de aguas superficiales. Permisos		0
Subtotal		
Programa 6: Manejo de campamentos e instalaciones temporales		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**
Botiquín	Unidad	1
Camilla	Unidad	1
4	Bidon	4
Subtotal		
Programa 7: Gestión Social		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**
Material informativo	Unidad	50
Mesa	Unidad	1
Silla	Unidad	1
Lapiceros	Unidad	3
Subtotal		
Programa 8: Educación ambiental y capacitación a trabajadores		
Descripción	**Unidad**	**Cant.**
Capacitación y Educación Ambiental	Global	1
Subtotal		
IMPEMENTACION DEL PMA		
Descripción	**Sueldo mes básico**	**% dedicación**
Tecnólogo Ambiental	$ 1,950.00	165

3. Informe de Sistema de Gestión de Calidad.
4. Entregar hojas de vida de acuerdo al desglose del AIU (ingeniero civil y/o ingeniero de vias y transportes - residente de obra, hoja de vida del maestro de obra)
5. Hoja de vida de ingeniero ambiental o tecnólogo ambiental
6. Hoja de vida de dos auxiliares de tránsito
7. Entregar presupuesto con sus componentes (Desglose del AIU, APUs, memoria de cantidades, análisis de cuadrillas,
8. Actas (Actas de Vecindad, Conformaciones de Veedurías).

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

9. Formatos de Control (Control de Seguimiento a las Garantías Contractuales Obra, Control del Estado del tiempo, Control Diario del Personal de Obra, Control del Equipo y Herramientas).
10. Llevar diariamente la bitácora de obra
11. Cerramiento provisional y señalización de obra
12. Instalación de valla informativa de acuerdo a circular de Gobernación de Putumayo
13. Entregar afiliaciones de personal mano de obra calificada y no calificada, de acuerdo a salarios del desglose del AIU, como lo establece la Ley (Certificación por parte del Contador o Revisor Fiscal con sus respectivos documentos).

1	Personal de obra		TIEMPO/MES			
1.1	Residente de obra con prestaciones sociales	Mes	3	100%	$ 3,500,000.00	$ 10,500,000.00
1.2	Maestro de obra	Mes	3	100%	$ 3,800,000.00	$ 11,400,000.00
1.3	Comisión topográfica	Mes	3	100%	$ 4,100,000.00	$ 12,300,000.00

14. Permisos Ambientales y Fuentes de abastecimiento de materiales Pétreos y demás permisos o licencias para correcta ejecución del mismo.
15. Correspondencia (enviada y recibida en el mes).
16. Diseño de mezclas para los concretos establecidos en el contrato MR 3,8 para el pavimento hidráulico y 3000 PSI para andenes y bordillos.

De ante mano agradezco su atención y colaboración a la presente

Atentamente;

ING. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matrícula No.: 63202-220004 QND

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Puerto Caicedo, 10 de noviembre del 2025

OFI-003

Ingeniero:

VIRGILIO BRAVO SOSA
Secretario de Infraestructura Departamental
Mocoa, Putumayo.

Ref: Entrega de pólizas actualizadas con acta de inicio de los contratos de obra (1943-2024) e interventoría (1071-2025) correspondientes al proceso cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Cordial saludo;

Con base al asunto de la referencia y en calidad de interventor, por medio de la presente dando cumplimiento a lo establecido en los contratos de obra e interventoria, hago entrega en físico de las polizas actualizadas con acta de inicio para su revisión y aprobación por parte de la supervisión.

- Pólizas de Interventoría: Publicadas en Secop 2 el 30/10/2025

ANEXO 1 y 2: póliza de cumplimiento entidad estatal No: 41-44-101285590 expedida por COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2025	09/08/2026	$ 2.522.219,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27/10/2025	09/02/2029	$ 1.261.1099,07
CALIDAD DEL SERVICIO	09/02/2026	09/02/2031	$ 2.522.219,40

Direccion: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo Ptyo.
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

- Pólizas de obra: Publicadas en Secop 2 el 05/11/2025

ANEXO 4,5,6 y 7: póliza de cumplimiento entidad estatal No: 41-44-101287134 y responsabilidad civil extracontractual No: 41-40-101053869 expedida por COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2025	16/01/2027	$ 31.176.264,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	27/10/2025	16/01/2027	$ 155.881.321,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/10/2025	26/01/2029	$ 15.588.132,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		$ 31.176.264,20

DESCRIPCIÓN AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	27/10/2025	16/01/2027	$ 284.700.000,00
CONSTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/10/2025	16/01/2027	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/10/2025	16/01/2027	$ 284.700.000,00

De ante mano agradezco su atención y colaboración a la presente

Atentamente;

ING. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matricula No.: 63202-220004 QND

Anexo: Pólizas de interventoria anexo 1 y 2
Pólizas de obra anexos 4,5,6 y 7

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo Ptyo.
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Puerto Caicedo, 27 de noviembre del 2025

OFI-004

Señores:

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
Contratista de obra
Mocoa, Putumayo.

Ref: Solicitud de documentación correspondiente al informe de obra No. 1 referente al contrato de obra No. 1943-2024 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Cordial saludo;

Con base al asunto, me permito solicitarle al contratista de obra hacer la entrega de la documentación correspondiente al informe de avance No. 1, que corresponde al primer mes de ejecución de la obra en mención y el cual tiene un corte de avance del día 26 de noviembre del presente año.

La interventoría por medio del presente oficio se permite comunicar al contratista de obra CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS que dentro de sus obligaciones establecidas en el contrato se encuentran los informes de obra; por lo anterior es necesario recordarles que deben basarse en los modelos de informes mensuales de la gobernación, teniendo en cuenta que dentro del informe de obra que presenta el contratista, debe estar incluida la documentación e informes de avance técnico. PMT, PAGA, así como la bitácora de obra según los requerimientos incluidos en el contrato.

Cabe resaltar que en oficio anterior (OFI-002 30/10/2025), se le solicitó documentación necesaria la cual debe ir adjunta y soportada junto al informe de obra y se comunicó al contratista de la entrega puntual de este informe de acuerdo a los compromisos adquiridos en reunión de la firma del acta de inicio realizada en la Secretaría de Infraestructura Departamental (SID) donde se estableció la entrega de este a mas tardar el día 27 de cada mes para su revisión por parte de la interventoría, esto teniendo en cuenta el plazo de 9 días para la entrega de los informes de obra e

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

interventoría a partir del corte de avance del mes, según lo comunicado por la supervisión a cargo de la Secretaría de Infraestructura Departamental (SID).

Por lo anterior se le solicita al contratista de obra CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS que de manera urgente haga entrega de la documentación del informe mensual No. 1 conforme a los requisitos establecidos y teniendo en cuenta sus obligaciones como contratista según la cláusula tercera del contrato de obra.

De ante mano agradezco su atención y colaboración a la presente

Atentamente;

ING. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matricula No.: 63202-220004 QND

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Puerto Caicedo, 9 de diciembre del 2025

OFI-005

Señores:

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
Contratista de obra
Mocoa, Putumayo.

Ref: Solicitud No. 2 de documentación correspondiente al informe de obra No. 1 referente al contrato de obra No. 1943-2024 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Cordial saludo;

En base al asunto de referencia y en calidad interventor, me permito solicitarle nuevamente al contratista de obra hacer la entrega de la documentación correspondiente al informe de avance No. 1, que corresponde al primer mes de ejecucion de la obra en mencion y el cual tiene un corte de avance del dia 26 de noviembre del presente año y a fecha 05 de diciembre de 2025 se cumplió el plazo para la entrega de los informes respectivos a la entidad contratante.

Se reitera que mediante oficio emitido el dia 27 de noviembre de 2025 con consecutivo OFI-004, se realizo la solicitud de la documentación correspondiente al informe de obra No. 1, y se le recuerda al contratista de obra CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS sus obligaciones, una de la cuales es la entrega de informes de obras de forma periódica, teniendo en cuenta que dentro del informe de obra que presenta el contratista, debe estar incluida la documentación e informes de avance técnico, PMT, PAGA, así como la bitácora de obra según los requerimientos incluidos en el contrato.

La presentación de los informes de obra se debe realizar a más tardar el día 27 de cada mes para su revisión por parte de la interventoria, esto teniendo en cuenta el plazo de 3 días para la entrega de los informes de obra o interventoría a partir del corte de avance del mes, según lo comunicado por la supervisión a cargo de la Secretaría de Infraestructura Departamental (SID).

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo Ptyo.
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Por lo anterior se le solicita al contratista de obra CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS que de manera urgente y reiterada haga entrega de la documentación del informe mensual No. 1 conforme a los requisitos establecidos y teniendo en cuenta sus obligaciones como contratista según la cláusula tercera del contrato de obra.

De ante mano agradezco su atención y colaboración a la presente

Atentamente;



ING. DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matricula No.: 63202 220001 QND

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo Ptyo.
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CORRESPONDENCIA
19 DIC 2025
Hora 3:50pm Recibido por Jhean
Registro No 1445

DAVID ENCISO

Puerto Caicedo. 19 de diciembre del 2025

OFI 006

Ingeniero
VIRGILIO BRAVO SOSA
Secretario de Infraestructura Departamental
Gobernación del Putumayo
Mocoa, putumayo

Referencia: contrato de interventoría No. 1071-2025.

Asunto: Entrega de informe de interventoría número 01 correspondiente al Contrato de obra No. 1943-2024 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Cordial saludo.

Por medio del presente y en cumplimiento de mis obligaciones como interventor con contrato No 1071-2025 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". hago entrega del informe de interventoría No. 01 correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre del 2025.

Atentamente;

ING. DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matricula No.: 63202-220004 QND

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

Puerto Caicedo, 30 de diciembre del 2025

OFI-007

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CORRESPONDENCIA
30 DIC 2025
Hora 15:47
Radicado No. 1970

Ingeniero
VIRGILIO BRAVO SOSA
Secretario de Infraestructura Departamental
Gobernación del Putumayo
Mocoa, putumayo

Referencia: contrato de interventoria No. 1071-2025.

Asunto: Entrega de informe de interventoría número 02 y final correspondiente al Contrato de obra No. 1943-2025 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Cordial saludo.

Por medio del presente y en cumplimiento de mis obligaciones como interventor con contralo No 1071-2025 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" hago entrega del informe de interventoría No. 02 y final correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2025 al 26 de diciembre del 2025.

Atentamente:

ING. DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matricula No.: 63202-220004 QND

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoe@gmail.com

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CORRESPONDENCIA
19 DIC 2025
Hora: 3:50pm Recibido por: Jhean
Registro No. 1943

DAVID ENCISO

Puerto Caicedo, 19 de diciembre del 2025

OFI-006

Ingeniero
VIRGILIO BRAVO SOSA
Secretario de Infraestructura Departamental
Gobernación del Putumayo
Mocoa, putumayo

Referencia: contrato de interventoría No. 1071-2025.

Asunto: Entrega de informe de interventoría número 01 correspondiente al Contrato de obra No. 1943-2024 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Cordial saludo.

Por medio del presente y en cumplimiento de mis obligaciones como interventor con contrato No 1071-2025 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". hago entrega del informe de interventoría No. 01 correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2025 al 26 de noviembre del 2025.

Atentamente;

ING. DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matricula No.: 63202-220004 QND

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.17 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N°1

PÁGINA	1	DE	1
FECHA	23	10	2025

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CONTRATO No: 1071-2025

Semana Número: 1 Del 27 de octubre de 2025 Al: 2 de noviembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 Dias Corresponde al: 7.14% del Plazo total del Contrato

Supervisor Tecnico de Contrato: VIRGILIO BRAVO SOSA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.44%	0.44%
Valor Basico de la Obra programada:	$ 1,050,000.00	$ 1,050,000.00

	SEMANAL	ACUMULAD
Obra Fisica Ejecutada (%)	5.90%	5.90%
Valor Basico de Obra Ejecutada:	$ 14,228,685.76	$ 14,228,685.76

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
RL. NILSON NOYA MENA

Contrato No: 1943-2025 DEL 11/10/2025
Valor Inicial: $ 241,329,387.00
Valor Actualizado: $ 241,329,387.00
Plazo Inicial: Tres (03) Meses
Plazo Actualizado: Tres (03) Meses
Fecha de Iniciación: 27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento: 26 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO

Contrato No: 1071-2025 DEL 18/07/2025
Valor Inicial: $ 25,222,194.00
Valor Actualizado: $ 25,222,194.00
Plazo Inicial: 3 MESES
Plazo Actualizado: 3 MESES
Fecha de Iniciación: 27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento: 26 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTYIVIDADES EJECUTADAS

Localizacion y replanteo, incluye andenes
Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la siguiente semana se tiene previsto realizar las siguientes actividades en base al cronograma de programación de obra:

Localizacion y replanteo, incluye andenes
Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

S e inicia y se culmina la ejecucion de las actividades programdas si observaciones que afecten el desarrollo de las mismas

OBSERVACIONES

se realizo la localizacion y replanteo del proyecto con ayuda del topografo para el inicio de las actividades de excavacion.

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FRS. Y FECHA DE VISITA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Matricula No.: 63202-220004 QND

CONDICIONES ORIGINALES										
ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR PARCIAL	Semana 1	VALOR PRESENTE SEMANA	VALOR ACUMULADO
	1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**							
1P	1,1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	m²	840	$ 2.500,00	$ 2.100.000,00	840,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
210,2,2	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	268,66	$ 50.821,00	$ 13.653.570,00	238,66	$ 12.128.685,76	$ 12.128.685,76
630	1,3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3,8)	m³	113,4	$ 880.562,00	$ 99.856.731,00		$ -	$ -
221,1	1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	m³	38,11	$ 84.275,00	$ 3.211.720,00		$ -	$ -
320,1	1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	94,5	$ 150.548,00	$ 14.226.786,00		$ -	$ -
232,1	1,6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650	$ 12.699,00	$ 8.254.350,00		$ -	$ -
672,1	1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4,9	$ 675.499,00	$ 3.309.945,00		$ -	$ -
	1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127,1	$ 6.132,00	$ 779.377,00		$ -	$ -
640	1,9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	ml	170	$ 21.826,00	$ 3.710.420,00		$ -	$ -
640	1,1	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	604,4	$ 6.200,00	$ 3.747.280,00		$ -	$ -
640	1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	70,5	$ 11.093,00	$ 782.057,00		$ -	$ -
433P	1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	67,97	$ 17.825,00	$ 1.211.565,00		$ -	$ -
	2	**ANDENES**							
2P	2,1	Excavacion en material comun en seco a mano (Incluye retiro)	m³	36	$ 41.446,00	$ 1.492.056,00		$ -	
610P	2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	42	$ 150.548,00	$ 6.323.016,00		$ -	
0	2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m³	21	$ 677.890,00	$ 14.235.690,00		$ -	
640	2,4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409,59	$ 13.824,00	$ 5.662.172,00		$ -	
	3	**SEÑALIZACION**							
710	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3	$ 502.604,00	$ 1.507.812,00		$ -	
0	3,2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	ml	156,02	$ 15.469,00	$ 2.413.473,00		$ -	
0	3,3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	ml	12,5	$ 28.518,00	$ 356.475,00		$ -	
0	3,4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	200	$ 90.504,00	$ 18.100.800,00		$ -	
0	3,5	Suministro e instalacion de tachas	un	32	$ 18.819,00	$ 602.208,00		$ -	

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 14.228.685,76	$ 14.228.685,76
VALOR EJECUTADO		14.228.685,76500
ACUMULADO ANTERIOR OBRA	0,00	0,00
NUEVO ACUMULADO OBRA	0,00	14.228.685,76
VALOR EJECUTADO EN EL MES	0,00	14.228.685,76
VALOR TOTAL ACUMULADO	0,00	14.228.685,76

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM:	1,1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	UNIDAD:	m²



Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alta (m)		Longitud (m)
Localizacion y replanteo, incluye andenes	8,40	100,00			840,00
					840,00

ITEM:	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desali	UNIDAD:	m³

Descripción	Factor expansion	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo) corte					238,66
					238,66

RL. NELSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

RL. ANTO ANDRES PACHO MUNGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PÁGINA	1	DE	1

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA Nº2

SECRETARIA EJECUTORA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	FECHA	23	10	2025
	CONTRATO No:	1071-2025		

Semana Número: 2 Del 3 de noviembre de 2025 Al 9 de noviembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 14 Dias Corresponde al 14.29% del Plazo total del Contrato

Supervisor Tecnico de Contrato VIRGILIO BRAVO SOSA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUNULADO
Obra programada (%)	1.85%	2.28%
Valor basico de la Obra programada:	$ 4,483,393.00	$ 5,513,393.00

	SEMANAL	ACUMULAD
Obra Fisica Ejecutada (%)	8.43%	14.33%
Valor basico de Obra Ejecutada:	$ 20,345,824.40	$ 34,574,510.16

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	**CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA**
Contrato No.	1943-2025 DEL 11/10/2025
Valor Inicial:	$ 241,329,387.00
Valor Actualizado:	$ 241,329,387.00
Plazo Inicial:	Tres (03) Meses
Plazo Actualizado:	Tres (03) Meses
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**
Contrato No.	1071-2025 DEL 18/07/2025
Valor Inicial:	$ 25,222,194.00
Valor Actualizado:	$ 25,222,194.00
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	3 MESES
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTYIVIDADES EJECUTADAS

Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)
Suministro e instalacion de material seleccionado
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subresente y capas granulares (NT 2400 o similar)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la siguiente semana se tiene previsto realizar las siguientes actividades en base al cronograma de programación de obra:

Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)

REQUERIMIENTO GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Según los resultados de los informes semanales y una revisión visual de la obra, se deduce un avance significativo de la obra pudiéndose decir que en la siguiente semana de da por terminado la ejecución de las actividades contratadas y modificadas.

OBSERVACIONES

Durante el periodo de la presente semana se realizaron actividades de excavacion, realizando el retiro de material del sitio de obra por los ejes ya establecidos con ayuda del teodolito

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FIRMA Y FECHA DE VISITA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Matricula No.: 63202-[illegible]4 QND

CONDICIONES ORIGINALES											
ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR PARCIAL	Semana 1	Semana 2	VALOR PRESENTE SEMANA	VALOR ACUMULADO
	1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**								
1P	1,1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	m²	840	$ 2.500,00	$ 2.100.000,00	840,00		$ -	$ 2.100.000,00
210,2,2	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	268,66	$ 50.821,00	$ 13.653.570,00	238,66	30,00	$ 1.524.630,00	$ 13.653.315,76
630	1,3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)	m³	113,4	$ 880.562,00	$ 99.855.731,00			$ -	$ -
221,1	1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	m³	38,11	$ 84.275,00	$ 3.211.720,00		13,20	$ 1.112.430,00	$ 1.112.430,00
320,1	1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	94,5	$ 150.548,00	$ 14.226.786,00		62,80	$ 9.454.414,40	$ 9.454.414,40
232,1	1,6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650	$ 12.699,00	$ 8.254.350,00		650,00	$ 8.254.350,00	$ 8.254.350,00
672,1	1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4,9	$ 675.499,00	$ 3.309.945,00			$ -	$ -
	1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127,1	$ 6.132,00	$ 779.377,00			$ -	$ -
640	1,9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	ml	170	$ 21.826,00	$ 3.710.420,00			$ -	$ -
640	1,1	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	604,4	$ 6.200,00	$ 3.747.280,00			$ -	$ -
640	1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	70,5	$ 11.093,00	$ 782.057,00			$ -	$ -
433P	1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	67,97	$ 17.825,00	$ 1.211.565,00			$ -	$ -
	2	**ANDENES**								
2P	2,1	Excavacion en material comun en seco a mano (Incluye retiro)	m³	36	$ 41.446,00	$ 1.492.056,00			$ -	
610P	2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	42	$ 150.548,00	$ 6.323.016,00			$ -	
0	2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m³	21	$ 677.890,00	$ 14.235.690,00			$ -	
640	2,4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409,59	$ 13.824,00	$ 5.662.172,00			$ -	
	3	**SEÑALIZACION**								
710	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3	$ 502.604,00	$ 1.507.812,00			$ -	
0	3,2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	ml	156,02	$ 15.469,00	$ 2.413.473,00			$ -	
0	3,3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	ml	12,5	$ 28.518,00	$ 356.475,00			$ -	
0	3,4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	200	$ 90.504,00	$ 18.100.800,00			$ -	
0	3,5	Suministro e instalacion de tachas	un	32	$ 18.819,00	$ 602.208,00			$ -	
		TOTAL COSTO DIRECTO							$ 20.345.824,40	$ 34.574.510,16
		VALOR EJECUTADO								20.345.824,40000
		ACUMULADO ANTERIOR OBRA							0,00	0,00
		NUEVO ACUMULADO OBRA							0,00	20.345.824,40
		VALOR EJEJCUTADO EN EL MES							0,00	34.574.510,16
		VALOR TOTAL ACUMULADO							0,00	34.574.510,16

ITEM:	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desal	UNIDAD:	m³



Descripción	Factor expansion	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo) Terraplen					30,00
					30,00

ITEM:	1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	UNIDAD:	m³

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Suministro e instalacion de material seleccionado					
corte	6	90	0,2	66	13,20
					13,20

ITEM:	1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	UNIDAD:	m³

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).					
via, bordillo, anden					52,80
					52,80

ITEM:	1,6	*Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)*	UNIDAD:	m^2

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Area m2
Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	6,50	100,00			650,00
					650,00

Nilson Moyo

R.L. NILSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

R.L. DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N°3

PÁGINA	1	DE	1
FECHA	23	10	2025

SECRETARIA EJECUTORA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CONTRATO No: 1071-2025

Semana Número: 3 Del 10 de noviembre de 2025 Al: 17 de noviembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 22 Días Corresponde al: 22.45% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato: VIRGILIO BRAVO SOSA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1.41%	3.70%
Valor basico de la Obra programada:	$ 3,413,393.00	$ 8,926,786.00

	SEMANAL	ACUMULAD
Obra Física Ejecutada (%)	2.85%	17.17%
Valor basico de Obra Ejecutada:	$ 6,871,861.85	$ 41,446,172.01

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	**CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL NILSON MOYA MENA**
Contrato No:	1943-2025 DEL 11/10/2025
Valor Inicial:	$ 241,329,387.00
Valor Actualizado:	$ 241,329,387.00
Plazo Inicial:	Tres (03) Meses
Plazo Actualizado:	Tres (03) Meses
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**
Contrato No:	1071-2025 DEL 18/07/2025
Valor Inicial:	$ 25,222,194.00
Valor Actualizado:	$ 25,222,194.00
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	3 MESES
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTYIVIDADES EJECUTADAS

Suministro e instalacion de material seleccionado
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la siguiente semana se tiene previsto realizar las siguientes actividades en base al cronograma de programación de obra:

Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)
Suministro e instalacion de material seleccionado
Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Según los resultados de los informes semanales y una revisión visual de la obra, se deduce un avance significativo de la obra pudiéndose decir que en la siguiente semana se da por terminado la ejecución de las actividades contratadas y modificadas.

OBSERVACIONES

se realizaron actividades de instalacion de material seleccionado, de igual forma se realizo la compactacion del mismo

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON PRS Y FECHA DE VISITA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Matricula No.: 63202-220624 CND

CONDICIONES ORIGINALES											
ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR PARCIAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	VALOR PRESENTE SEMANA	VALOR ACUMULADO
	1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**									
1P	1,1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	m²	840	$ 2.500,00	$ 2.100.000,00	840,00			$ -	$ 2.100.000,00
210,2,2	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	268,66	$ 50.821,00	$ 13.653.570,00	238,66	30,00		$ -	$ 13.653.315,76
630	1,3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3,8)	m³	113,4	$ 880.562,00	$ 99.855.731,00				$ -	$ -
221,1	1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	m³	38,11	$ 84.275,00	$ 3.211.720,00		13,20	24,91	$ 2.099.290,25	$ 3.211.720,25
320,1	1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	94,5	$ 150.548,00	$ 14.226.786,00		62,80	31,70	$ 4.772.371,60	$ 14.226.786,00
232,1	1,6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650	$ 12.699,00	$ 8.254.350,00		650,00		$ -	$ 8.254.350,00
672,1	1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4,9	$ 675.499,00	$ 3.309.945,00				$ -	$ -
	1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127,1	$ 6.132,00	$ 779.377,00				$ -	$ -
640	1,9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	ml	170	$ 21.826,00	$ 3.710.420,00				$ -	$ -
640	1,1	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	604,4	$ 6.200,00	$ 3.747.280,00				$ -	$ -
640	1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	70,5	$ 11.093,00	$ 782.057,00				$ -	$ -
433P	1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	67,97	$ 17.825,00	$ 1.211.565,00				$ -	$ -
	2	**ANDENES**									
2P	2,1	Excavacion en material comun en seco a mano (incluye retiro)	m³	36	$ 41.446,00	$ 1.492.056,00				$ -	
610P	2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	42	$ 150.548,00	$ 6.323.016,00				$ -	
0	2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m²	21	$ 677.890,00	$ 14.235.690,00				$ -	
640	2,4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409,59	$ 13.824,00	$ 5.662.172,00				$ -	
	3	**SEÑALIZACION**									
710	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3	$ 502.604,00	$ 1.507.812,00				$ -	
0	3,2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	ml	156,02	$ 15.469,00	$ 2.413.473,00				$ -	
0	3,3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	ml	12,5	$ 28.518,00	$ 356.475,00				$ -	
0	3,4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	200	$ 90.504,00	$ 18.100.800,00				$ -	
0	3,5	Suministro e instalacion de tachas	un	32	$ 18.819,00	$ 602.208,00				$ -	
		TOTAL COSTO DIRECTO								$ 6.871.661,85	$ 41.446.172,01
		VALOR EJECUTADO									**6.871.661,85000**
		ACUMULADO ANTERIOR OBRA								**0,00**	**0,00**
		NUEVO ACUMULADO OBRA								**0,00**	**6.871.661,85**
		VALOR EJEJCUTADO EN EL MES								**0,00**	**41.446.172,01**
		VALOR TOTAL ACUMULADO								**0,00**	**41.446.172,01**

ITEM:	1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	UNIDAD:	m³

Descripcion	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Suministro e instalacion de material seleccionado					24,91
					24,91

ITEM:	2,3	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	UNIDAD:	m³

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Area m2	Volumen (m3)
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)					31,71
					31,70

Nilson Moya

R.L. NELSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

R.L. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA N°4

PÁGINA	1	DE	1	
FECHA	23	10	2020	

SECRETARIA EJECUTORA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CONTRATO No: 1071-2025

Semana Número: 4 Del 18 de noviembre de 2025 Al 25 de noviembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 31 Días Corresponde al: 31.83% del Plazo total del Contrato

Supervisor Tecnico de Contrato: VIRGILIO BRAVO SUSA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2.76%	6.46%
Valor basico de la Obra programada:	$ 8,652,925.00	$ 15,579,711.00

	SEMANAL	ACUMULAD
Obra Fisica Ejecutada (%)	41.85%	58.02%
Valor basico de Obra Ejecutada:	$ 100,902,506.08	$ 142,438,770.09

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	**CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA**
Contrato No.	1943-2025 DEL 11/10/2025
Valor Inicial:	$ 241,329,387.00
Valor Actualizado:	$ 241,329,387.00
Plazo Inicial:	Tres (03) Meses
Plazo Actualizado:	Tres (03) Meses
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**
Contrato No.	1071-2025 DEL 18/07/2025
Valor Inicial:	$ 25,222,194.00
Valor Actualizado:	$ 25,222,194.00
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	3 MESES
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTYMIDADES EJECUTADAS

Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)
Bordillos de concreto 3000PSI
Acero de refuerzo 3/8" bordillo
Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la siguiente semana se tiene previsto realizar las siguientes actividades en base al cronograma de programación de obra:

Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)
Suministro e instalacion de material seleccionado
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)

REQUERIMIENTO GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Según los resultados de los informes semanales y una revisión visual de la obra, se deduce un avance significativo de la obra pudiéndose decir que en la siguiente semana de ha por terminado la ejecución de las actividades contratadas y modificadas.

OBSERVACIONES

se realizo la preparacion del equipo y materiales necesarios para la realizacion del concreto según el diseño de mezcla, a medida que avazaba el vaciado de concreto este se vibraba, se realizo toma de ensayos de concreto por parte de interventoria y el contratista de obra, se realizo prueba de acentamineto antes del vaciado de concreto.

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Matricula No.: 63202-220804 QND

CONDICIONES ORIGINALES													
ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR PARCIAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	semana 4	VALOR PRESENTE SEMANA	VALOR ACUMULADO
	1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**										
1P	1,1	Localizacion y replanteo, incluye anderes	m²	840	$ 2.500,00	$ 2.100.000,00	840,00				$ -	$ 2.100.000,00
210,2,2	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	268,66	$ 50.821,00	$ 13.653.570,00	238,66	30,00			$ -	$ 13.653.315,76
630	1,3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3,8)	m³	113,4	$ 880.562,00	$ 99.855.731,00				102,06	$ 89.870.157,72	$ 89.870.157,72
221,1	1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	m³	38,11	$ 84.275,00	$ 3.211.720,00		13,20	24,91		$ -	$ 3.211.720,25
320,1	1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	m³	94,5	$ 150.548,00	$ 14.226.786,00		62,80	31,70		$ -	$ 14.226.786,00
232,1	1,6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650	$ 12.699,00	$ 8.254.350,00		650,00			$ -	$ 8.254.350,00
672,1	1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4,9	$ 675.499,00	$ 3.309.945,00				4,44	$ 2.995.838,07	$ 2.995.838,07
	1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127,1	$ 6.132,00	$ 779.377,00				115,92	$ 710.821,44	$ 710.821,44
640	1,9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI. D 1/4", Pasajuntas	ml	170	$ 21.826,00	$ 3.710.420,00				153,00	$ 3.339.378,00	$ 3.339.378,00
640	1,1	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	604,4	$ 6.200,00	$ 3.747.280,00				543,96	$ 3.372.552,00	$ 3.372.552,00
640	1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	70,5	$ 11.093,00	$ 782.057,00				63,45	$ 703.850,86	$ 703.850,86
433P	1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	67,97	$ 17.825,00	$ 1.211.565,00					$ -	$ -
	2	**ANDENES**										
2P	2,1	Excavacion en material comun en seco a mano (Incluye retiro)	m³	36	$ 41.446,00	$ 1.492.056,00					$ -	
610P	2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	42	$ 150.548,00	$ 6.323.016,00					$ -	
0	2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m²	21	$ 677.890,00	$ 14.235.690,00					$ -	
640	2,4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409,59	$ 13.824,00	$ 5.662.172,00					$ -	
	3	**SEÑALIZACION**										
710	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3	$ 502.604,00	$ 1.507.812,00					$ -	
0	3,2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	ml	156,02	$ 15.469,00	$ 2.413.473,00					$ -	
0	3,3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	ml	12,5	$ 28.518,00	$ 356.475,00					$ -	
0	3,4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	200	$ 90.504,00	$ 18.100.800,00					$ -	
0	3,5	Suministro e instalacion de tachas	un	32	$ 18.819,00	$ 602.208,00					$ -	
		TOTAL COSTO DIRECTO									$ 100.992.598,08	$ 142.438.770,09
		VALOR EJECUTADO										100.992.598,08299
		ACUMULADO ANTERIOR OBRA									0,00	0,00
		NUEVO ACUMULADO OBRA									0,00	100.992.598,08
		VALOR EJEJCUTADO EN EL MES									0,00	142.438.770,09
		VALOR TOTAL ACUMULADO									0,00	142.438.770,09

ITEM:	1.3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)	UNIDAD:	m²

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Un	Volumen (m3)
Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)					102.96
					102,96

ITEM:	1.7	Bordillos de concreto 3000PSI	UNIDAD:	m3

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	Longitud (mt)
Bordillos de concreto 3000PSI					4.44
					4,44

ITEM:	1.8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	UNIDAD:	Kg

Descripción	Long bordillo	# empalmes	Ld (m)	Cant varillas	Varilla diametro	Peso por ml (kg)	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 3/8" bordillo	90	25	0.54	2	3/8"	0,56	115,92
							115,92

ITEM:	1.9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	UNIDAD:	ml

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Kg/ml	Nos.	Peso (Kg)
Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI. D 1/4". Pasajuntas	6,30			24,32	153,00
					153,00

ITEM:	3.10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	UNIDAD:	Kg

Descripción	Ancho (m)	Numero (un)	Largo (m)	Kg/ml	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 7/8" Transversal	21,90	24,32	0,35	3,042	543,96
0					
					543,9600

ITEM:	3.11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	UNIDAD:	Kg

Descripción	Elementos	Cantidad	Largo (m)	Kg/ml	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 1/2" Longitudinal	3,08	24,32	0,85	0,998	63,45
					63,45

Nilson moya

RL. NILSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

R.L. DARIO ANDRES ENCISO ARANGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gestión Pública para Todas las Regiones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°5

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA	3	12	2025

CONTRATO No: 1071-2025

Semana Número: 5 Del 27 de noviembre de 2025 Al: 3 de diciembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 39 Días Correspondiente al: 27.83% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato: VIRGILIO BRAVO SOSA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6.43%	14.01%
Valor básico de la Obra programada:	$ 13,205,919.00	$ 28,785,630.00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5.25%	74.56%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 10,799,898.64	$ 153,238,923.03

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	**CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA**
Contrato No.	1943-2024 DEL 11/10/2024
Valor Inicial:	$ 241,329,387.00
Valor Actualizado:	$ 241,329,387.00
Plazo Inicial:	Tres (03) Meses
Plazo Actualizado:	Tres (03) Meses
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**
Contrato No.	1071-2025 DEL 18/07/2025
Valor Inicial:	$ 25,222,194.00
Valor Actualizado:	$ 25,222,194.00
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	3 MESES
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTYIVIDADES EJECUTADAS

Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)
Acero de refuerzo 3/8" bordillo
Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI D 1/4". Pasajuntas
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la siguiente semana se tiene previsto realizar las siguentes actividades en base al cronograma de programación de obra:

Suministro e instalacion de material seleccionado
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)
Excavacion en material comun en seco a mano (Incluye retiro)
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se inicia y se culmina la ejecucion de las actividades programadas si observaciones que afecten el desarrollo de las mismas

CONTRATISTA

se da por terinada la ejecucion de las actividades de pavimento de concreto hidraulico durante esta semana

ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA

INTERVENTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO

CONDICIONES ORIGINALES

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR PARCIAL	Semana 5	Semana 6	Semana 7	VALOR PRESENTE SEMANA	VALOR ACUMULADO
	1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**									
1P	1.1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	m²	840	$ 2,500.00	$ 2,100,000.00				$ -	$ -
210,2 2	1.2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	268.66	$ 50,821.00	$ 13,653,570.00				$ -	$ -
630	1.3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)	m³	112.4	$ 888,562.00	$ 99,855,731.00	11.34			$ 9,9 5,573.08	$ 9,985,573.08
221 1	1.4	Suministro e instalacion de material seleccionado	m³	38.11	$ 84,275.00	$ 3,211,720.00				$ -	$ -
320 1	1.5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	94.5	$ 150,548.00	$ 14,228,786.00				$ -	$ -
232 1	1.6	Suministro e instalacion de geo extil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650	$ 12,699.00	$ 8,254,350.00				$ -	$ -
672 1	1.7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4.9	$ 675,499.00	$ 3,309,945.00				$ -	$ -
	1.8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127.1	$ 6,132.00	$ 779,377.00	11.18			$ 68,555.76	$ 68,555.76
640	1.9	Canastillas en acero de refuerzo de 3 000 PSI, D 1/4", Pasa juntas	ml	170	$ 21,826.00	$ 3,710,420.00	17.00			$ 371,042.00	$ 371,042.00
640	1.1	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) Transversal	Kg	604.4	$ 6,200.00	$ 3,747,280.00	60.44			$ 374,728.00	$ 374,728.00
640	1.11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) Longitudinal	Kg	70.5	$ 11,093.00	$ 782,057.00				$ -	$ -
433?	1.12	Corte Juntas de Expansion y su respectivo sellado	ml	67.97	$ 17,825.00	$ 1,211,565.00				$ -	$ -
	2	**ANDENES**									
2P	2.1	Excavacion en material comun en seco a mano (Incluye retiro)	m³	36	$ 41,446.00	$ 1,492,056.00				$ -	
610?	2.2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	m³	42	$ 150,548.00	$ 6,323,016.00				$ -	
0	2.3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m²	21	$ 677,890.00	$ 14,235,690.00				$ -	
640	2.4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409.59	$ 13,824.00	$ 5,662,172.00				$ -	
	3	**SEÑALIZACION**									
710	3.1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3	$ 502,604.00	$ 1,507,812.00				$ -	
0	3.2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	ml	156.02	$ 15,469.00	$ 2,413,473.00				$ -	
0	3.3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	ml	12.5	$ 28,518.00	$ 353,475.00				$ -	
0	3.4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	200	$ 90,504.00	$ 18,100,800.00				$ -	
0	3.5	Suministro e instalacion de tachas	un	32	$ 18,819.00	$ 602,208.00				$ -	
		TOTAL COSTO DIRECTO								$ 10,79 9,898.84	$ 10,799,898.84
		VALOR EJECUTADO									10,799,898.84
		ACUMULADO ANTERIOR OBRA								0.00	142,439,024.10
		NUEVO ACUMULADO OBRA								0.00	153,238,923.01
		VALOR EJECUTADO EN EL MES								0.00	10,799,898.84
		VALOR TOTAL ACUMULADO								0.00	153,238,923.01

MEMORIAS DE CALCULO

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	1.3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)	UNIDAD:	m²




Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Un	Volumen (m3)
Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)					11.34
					11.34

ITEM:	1.8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	UNIDAD:	Kg




Descripción	Long bordillo	# empalmes	Ld (m)	Cant varillas	Varilla diametro	Peso por ml (kg)	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 3/8" bordillo	10	0	0.54	2	3/8"	0.56	11.20
ajuste por redondeo							-0.02
							11.18

ITEM:	1.9	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	UNIDAD:	ml

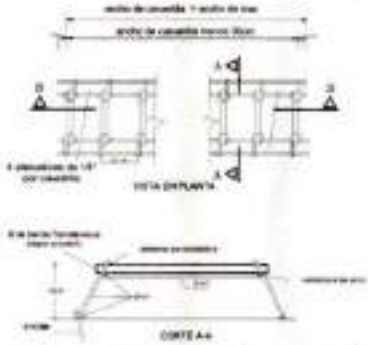

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Kg/ml	Nos.	Peso (Kg)
Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	6.30			2.70	17.00
					17.00

ITEM:	1.10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	UNIDAD:	Kg

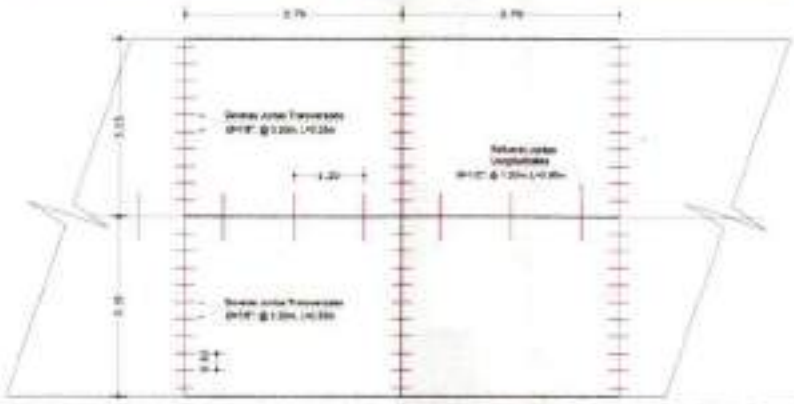

Descripción	Ancho (m)	Numero (un)	Largo (m)	Kg/ml	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 7/8" Transversal	21.00	2.70	0.35	3.042	60.43
ajuste por redondeo					0.01
					60.44

Nilson Moya

RL. NILSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

R.L. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
Gracias Dios solo por tantas bendiciones

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°8

PÁGINA	1	DE	1
FECHA	10	12	2025

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CONTRATO No: 1071-2025

Semana Número: 6 Del 4 de diciembre de 2025 Al: 10 de diciembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 48 Días Correspondiente al: 44.83% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato: VIRGILIO BRAVO SOSA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4.70%	16.77%	Obra Física Ejecutada (%)	10.44%	84.93%
Valor básico de la Obra programada:	$ 9,792,526.00	$ 38,578,156.00	Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 21,453,181.78	$ 174,692,104.81

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	**CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA**
Contrato No.	1943-2024 DEL 11/10/2024
Valor Inicial:	$ 241,329,387.00
Valor Actualizado:	$ 241,329,387.00
Plazo Inicial:	Tres (03) Meses
Plazo Actualizado:	Tres (03) Meses
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**
Contrato No.	1071-2025 DEL 18/07/2025
Valor Inicial:	$ 25,222,194.00
Valor Actualizado:	$ 25,222,194.00
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	3 MESES
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTYMIDADES EJECUTADAS

Bordillos de concreto 3000PSI
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal
Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado
Excavacion en material comun en seco a mano (Incluye retiro)
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)
...den en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m
Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la siguiente semana se tiene previsto realizar las siguientes actividades en base al cronograma de programación de obra:

Suministro e instalacion de material seleccionado
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)
Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)
Excavacion en material comun en seco a mano (Incluye retiro)
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)
Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Según los resultados de los informes semanales y una revisión visual de la obra, se deduce un avance significativo de la obra pudiéndose decir que en la siguiente semana de da por terminado la ejecución de las actividades contratadas y modificadas.

OBSERVACIONES

se avanza en la ejecucion de las actividades sin contratimpos

ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA

FIRMA INTERVENTOR

Firma:
Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO

CONDICIONES ORIGINALES												
ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR PARCIAL	Semana 5	Semana 6	Semana 7	VALOR PRESENTE SEMANA	VALOR ACUMULADO
	1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**									
1F	1.1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	m²	840	$ 2,500.00	$ 2,100,000.00				$ -	$ -
210,2,2	1.2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	2681.66	$ 50,821.00	$ 13,653,573.00				$ -	$ -
630	1.3	Pavimento de concreto hidraulico (MF 3.8)	m³	110.4	$ 880,562.00	$ 99,855,731.00				$ -	$ -
221 1	1.4	Suministro e instalacion de material seleccionado	m³	38.11	$ 84,275.00	$ 3,211,720.00				$ -	$ -
320 1	1.5	Subbase granular (incluye suministro, extencido, nivelación, humedecido y compactación)	m³	94.5	$ 150,548.00	$ 14,226,786.00				$ -	$ -
232 1	1.6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650	$ 12,699.00	$ 8,254,350.00				$ -	$ -
672 1	1.7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4.9	$ 675,499.00	$ 3,309,945.00		0.47		$ 314,107.04	$ 314,107.04
	1.8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127.1	$ 6,132.00	$ 779,377.00				$ -	$ -
640	1.9	Canastillas en acero de refuerzo de 3-1000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	ml	170	$ 21,826.00	$ 3,710,420.00				$ -	$ -
640	1.1	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) Transversal	Kg	604.4	$ 6,200.00	$ 3,747,280.00				$ -	$ -
640	1.11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) Longitudinal	Kg	70.5	$ 11,093.00	$ 782,057.00		7.05		$ 78,205.65	$ 78,205.65
433P	1.12	Corte Juntas de Expansion y su respectivo sellado	ml	67.97	$ 17,825.00	$ 1,211,565.25		67.97		$ 1,211,565.25	$ 1,211,565.25
	2	**ANDENES**									
2F	2.1	Excavacion en material comun en seco a mano (Incluye retiro)	m³	36	$ 41,446.00	$ 1,492,056.00		36.00		$ 1,492,056.00	$ 1,492,056.00
610P	2.2	Subbase granular (incluye suministro, extencido, nivelación, humedecido y compactación)	m³	42	$ 150,548.00	$ 6,323,016.00		42.00		$ 6,323,016.00	$ 6,323,016.00
0	2.3	Anden en concreto clase D (3000 PSI e=0,10 m	m³	21	$ 677,890.00	$ 14,235,690.00		10.00		$ 6,778,900.00	$ 6,778,900.00
640	2.4	Malla Electrosoldada 6x6 .35m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409.59	$ 13,824.00	$ 5,662,172.00		380.16		$ 5,255,331.84	$ 5,255,331.84
	3	**SEÑALIZACION**									
710	3.1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3	$ 502,604.00	$ 1,507,812.00				$ -	
0	3.2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	ml	156.02	$ 15,469.00	$ 2,413,473.00				$ -	
0	3.3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatoral y linea de pare (incluye microesferas)	ml	12.5	$ 28,518.00	$ 356,475.00				$ -	
0	3.4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	200	$ 90,504.00	$ 18,100,800.00				$ -	
0	3.5	Suministro e instalacion de tachas	un	32	$ 18,819.00	$ 602,208.00				$ -	
					TOTAL COSTO DIRECTO					$ 21,453,181.78	$ 21,453,181.78
					VALOR EJECUTADO						21,453,181.7780
					ACUMULADO ANTERIOR OBRA					0.00	153,238,923.03
					NUEVO ACUMULADO OBRA					0.00	174,692,104.81
					VALOR EJECUTADO EN EL MES					0.00	32,253,080.63
					VALOR TOTAL ACUMULADO					0.00	174,692,104.81

MEMORIAS DE CALCULO


CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	1.7	Bordillos de concreto 3000PSI	UNIDAD:	m3




Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	Longitud (ml)
Bordillos de concreto 3000PSI					0.49
ajuste por redondeo					-0.03
					0.47

ITEM:	1.11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	UNIDAD:	Kg

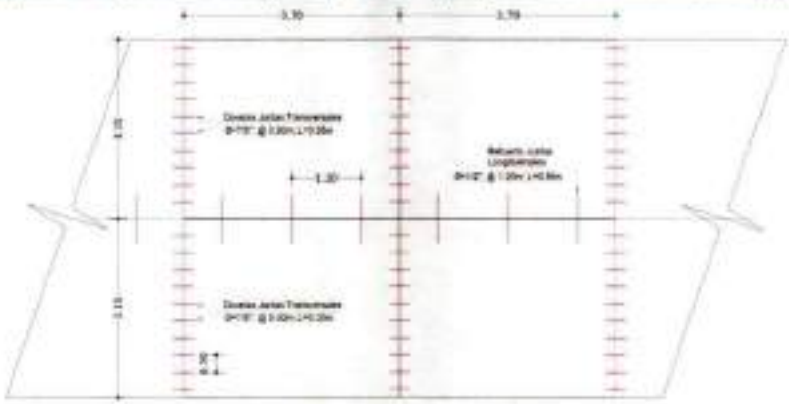


Descripción	Elementos	Cantidad	Largo (m)	Kg/ml	Peso (Kg)
Acero de refuerzo 1/2" Longitudinal	3.08	2.70	0.85	0.996	7.06
					7.06

ITEM	1.12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	UNIDAD:	ml

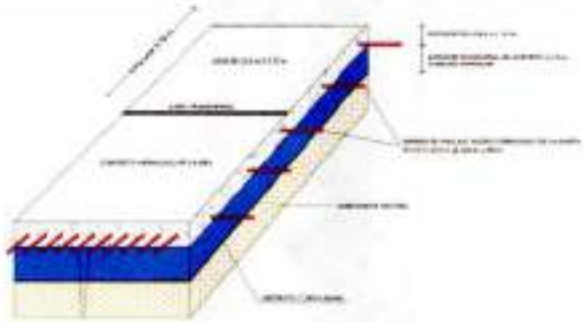

Descripción	Cant	Numero (un)	Largo (m)	Kg/ml	Peso (Kg)
Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	66.67		1.30		67.97
					67.97

ITEM:	2.1	Excavacion en material comun en seco a mano (incluye retiro)	UNIDAD:	m³

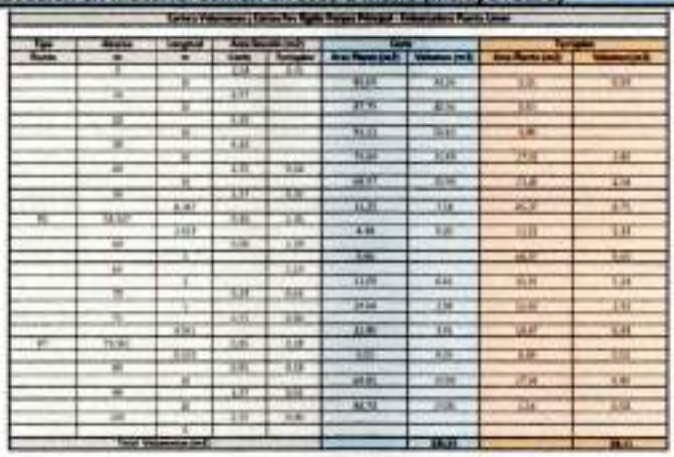

Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	Volumen (m3)
Excavacion en material comun en seco a mano (incluye retiro)	0.6	100.00	0.3	2	36.00
					36.00

ITEM:	2.2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y	UNIDAD:	m³




Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	Volumen (m3)
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	1.05	100.00	0.2	2	42.00
					42.00

ITEM:	2.3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	UNIDAD:	m²



Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	Volumen (m2)
Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0.10 m					10.00
					10.00

ITEM:	2.4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	UNIDAD:	Kg

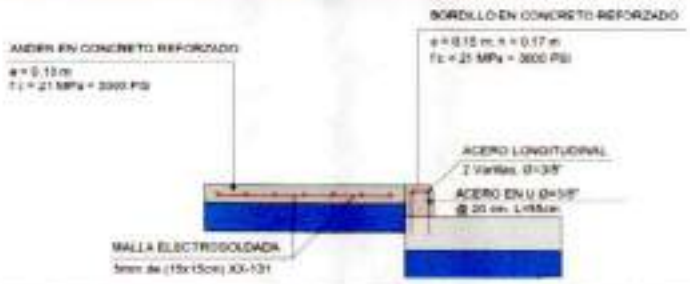

Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Volumen (m3)
Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	1.05	198.00	224.00	1.92	380.16
					380.16

Nilson Moya

RL. NILSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

R.L. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
Gobierno Para Ver por Otras Soluciones

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N°7

	PÁGINA	1	DE	1
SECRETARIA EJECUTORA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	FECHA	20	12	2025

CONTRATO No: 1071-2025

Semana Número: 7 Del 11 de diciembre de 2025 Al 20 de diciembre de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 55 Días Corresponde al: 54.48% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato: VIRGILIO BRAVO SOSA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5.77%	24.54%
Valor básico de la Obra programada:	$ 11,852,465.00	$ 50,430,621.00

	SEMANAL	ACUMULAD
Obra Física Ejecutada (%)	15.01%	100.00%
Valor básico de Obra Ejecutada:	$ 30,844,398.70	$ 205,536,503.51

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	**CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA**
Contrato No.	1943-2024 DEL 11/10/2024
Valor Inicial:	$ 241,329,387.00
Valor Actualizado:	$ 241,329,387.00
Plazo Inicial:	Tres (03) Meses
Plazo Actualizado:	Tres (03) Meses
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**
Contrato No.	1071-2025 DEL 18/07/2025
Valor Inicial:	$ 25,222,194.00
Valor Actualizado:	$ 25,222,194.00
Plazo Inicial:	3 MESES
Plazo Actualizado:	3 MESES
Fecha de Iniciación:	27 de octubre de 2025
Fecha de Vencimiento:	26 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTYIVIDADES EJECUTADAS

Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0.10 m
Malla Electrosoldada 6x2.35m 15 X 15 de 4 mm
Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)
Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central
Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)
Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)
Suministro e instalacion de tachas

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la siguiente semana se tiene previsto realizar las siguientes actividades en base al cronograma de programación de obra:
Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
Acero de refuerzo 3/8" Sardilla
Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasajuntas
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal
Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal
Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

con la ejecucion y el avance obtenido durante la semana se da por terminado la ejecucion al 100% de las actividades contratadas

OBSERVACIONES

se realizaron activiades finales relacionadas con el capitulo de señalizacion

FIRMA DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Matricula No.: 63202-220904 QND

CONDICIONES ORIGINALES												
ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR PARCIAL	Semana 5	Semana 6	Semana 7	VALOR PRESENTE SEMANA	VALOR ACUMULADO
	1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**									
1P	1.1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	m²	840	$ 2,500.00	$ 2,100,000.00					$ -
210.2.2	1.2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	268.66	$ 50,821.00	$ 13,653,570.00					$ -
530	1.3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3.8)	m³	113.4	$ 880,562.00	$ 99,855,731.00					$ -
221.1	1.4	Suministro e instalacion de material seleccionado	m³	38.11	$ 84,275.00	$ 3,211,720.00					$ -
320.1	1.5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación)	m³	94.5	$ 150,548.00	$ 14,225,766.00					$ -
232.1	1.6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650	$ 12,698.00	$ 8,254,350.00					$ -
672.1	1.7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4.9	$ 675,499.00	$ 3,309,945.00				$ -	$ -
	1.8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127.1	$ 6,132.00	$ 779,377.00				$ -	$ -
640	1.9	Canastillas en acero de refuerzo de 3.000 PSI, D 1/4", Pasajuntas	ml	170	$ 21,826.00	$ 3,710,420.00				$ -	$ -
640	1.1	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) Transversal	Kg	604.4	$ 6,200.00	$ 3,747,280.00				$ -	$ -
640	1.11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) Longitudinal	Kg	70.5	$ 11,093.00	$ 782,057.00				$ -	$ -
4333	1.12	Corte Juntas de Expansion y su respectivo sellado	ml	67.07	$ 17,825.00	$ 1,211,565.00				$ -	$ -
	2	**ANDENES**									$ -
2P	2.1	Excavacion en material comun en seco a mano (incluye retiro)	m³	36	$ 41,446.00	$ 1,492,056.00				$ -	$ -
6103	2.2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	42	$ 150,548.00	$ 6,323,016.00				$ -	$ -
0	2.3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m²	21	$ 671,890.00	$ 14,235,690.00			11.00	$ 7,456,790.00	$ 7,456,790.00
640	2.4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409.59	$ 13,824.00	$ 5,662,172.00			29.43	$ 406,840.32	$ 406,840.32
	3	**SEÑALIZACION**									$ -
710	3.1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3	$ 502,604.00	$ 1,507,812.00			3.00	$ 1,507,812.00	$ 1,507,812.00
0	3.2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	ml	156.02	$ 15,469.00	$ 2,413,473.00			156.02	$ 2,413,473.38	$ 2,413,473.38
0	3.3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	ml	12.5	$ 28,518.00	$ 356,475.00			12.50	$ 356,475.00	$ 356,475.00
0	3.4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluya microesferas)	ml	200	$ 90,504.00	$ 18,100,800.00			200.00	$ 18,100,800.00	$ 18,100,800.00
0	3.5	Suministro e instalacion de tachas	un	32	$ 18,819.00	$ 602,208.00			32.00	$ 602,208.00	$ 602,208.00
		TOTAL COSTO DIRECTO									$ 30,844,398.70
		VALOR EJECUTADO									30,844,398.70000
		ACUMULADO ANTERIOR OBRA								0.00	174,692,104.81
		NUEVO ACUMULADO OBRA								0.00	205,536,503.51
		VALOR EJECUTADO EN EL MES								0.00	61,097,479.32
		VALOR TOTAL ACUMULADO								0.00	205,536,503.51

MEMORIAS DE CALCULO


CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM:	2.3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	UNIDAD:	m²



Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Nos.	Volumen (m2)
Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m					11.00
					11.00

ITEM:	2.4	Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	UNIDAD:	Kg

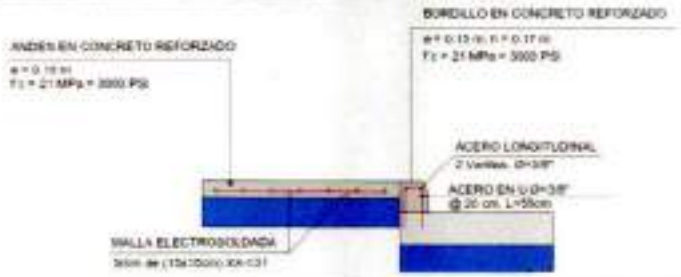

Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Volumen (m3)
Malla Electrosoldada 6x2,35m 15 X 15 de 4 mm	1.05	15.33	224.00	1.92	29.43
					29.43

ITEM:	8.1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	UNIDAD:	un



Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)					3.00
					3.00

ITEM:	3.2	Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central	UNIDAD:	ml





Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Demarcacion con pintura trafico en frio color amarillo para delimitacion vial central					156.02
					156.02

ITEM:	3.3	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	UNIDAD:	ml



Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para delimitacion paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)					12.50
					12.50

ITEM:	3.4	Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	UNIDAD:	ml



Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Demarcacion con pintura trafico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)					200.00
					200.00

ITEM:	3.5	Suministro e instalacion de tachas	UNIDAD:	un



Descripción	Ancho	Largo (m)	Area	Peso	Cant
Suministro e instalacion de tachas					32.00
					32.00

Nilson moya

RL. NILSON MOYA MENA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

R.L. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
CONTRATISTA INTERVENTOR

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO No.18 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1



Fotografia: 1

Localización y replanteo, incluye andenes



Fotografía: 2

Localización y replanteo, incluye andenes

	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	FOTOGRAFÍAS 1 y 2
DAVID ANDRÉS BACIGO ARANGO	INFORME MENSUAL No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 1943-2025 DEL 11 de OCTUBRE DE 2025 GOBERNACION DE PUTUMAYO	26-nov-2025



Fotografía: 3

Localizacion y replanteo, incluye andenes



Fotografía: 4

Instalacion de formaleta

	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	FOTOGRAFÍAS 3 y 4
DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO	INFORME MENSUAL No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 1943-2025 DEL 11 de OCTUBRE DE 2025 GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO	26-nov-2025



Fotografia: 5

Vaciado de concreto



Fotografia: 6

Verificacion de niveles de formaleta y concreto



Fotografía: 7

Instalacion de refuerzo



Fotografía. 8

vibrado de concreto y alisado



Fotografia: 9

Verificacion de espesor de placa



Fotografía: 10

Corte de placa



Fotografía: 11

Acabado de pavimento



Fotografía: 12

Acabado de pavimento

	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	FOTOGRAFÍAS 11 y 12
DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO	INFORME MENSUAL No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 1943-2025 DEL 11 de OCTUBRE DE 2025 GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO	26-nov-2025

INFORME N° 2 Y FINAL DE INTERVENTORÍA

"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Período: 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

ANEXO FOTOGRÁFICO



Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación paso peatonal y línea de pare (incluye microesferas)



Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central



Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m



Señal vertical con lamina retro reflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)



Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)



Señal vertical con lamina retro reflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)

ANEXO FOTOGRÁFICO



Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación paso peatonal y línea de pare (incluye microesferas)



Bordillos de concreto 3000PSI



Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal



Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal



Bordillos de concreto 3000PSI



Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado

INFORME N° 2 Y FINAL DE INTERVENTORÍA

"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Período: 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

ANEXO FOTOGRÁFICO



Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central



Señal vertical con lamina retro reflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)



Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m



Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m



Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m



Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)

INFORME N° 2 Y FINAL DE INTERVENTORÍA

"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Período: 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

ANEXO FOTOGRÁFICO



Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m



Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m




Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m



Suministro e instalación de tachas



Señal vertical con lamina retro reflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)

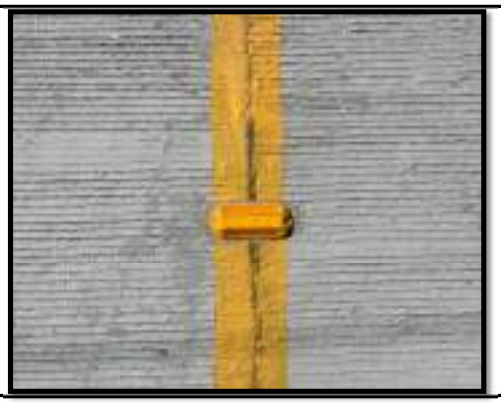

Suministro e instalación de tachas

INFORME N° 2 Y FINAL DE INTERVENTORÍA

"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Período: 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

ANEXO FOTOGRÁFICO



Recorrido verificacion activiades terminadas



Suministro e instalación de tachas



recorrido actividades terminadas



recorrido actividades terminadas



verificacion de andenes



recorrido actividades terminadas

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO N o.19 BITACORA DE OBRA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

ANEXO N o.19 BITACORA DE OBRA.

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Período comprendido entre el 27 de octubre del 2025 al 26 de noviembre del 2025
TOMO No 1

1

27 de Octubre 2025

Clima: Mañana Seco - Tarde Seco

Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial.

Actividad: Replanteo y georeferenciación de ejes y bordes de calzada. Coordenadas, hitos o mojones instalados. Verificación con planos. Retiro de capa vegetal, basura y escombros. Áreas despejadas (m^2). Disposición final del material. Corte o terraplén para alcanzar la Cota de Subrasante.

maquinaria: No hay maquinaria

Residente Obra

Residente Interventoría

28 de octubre 2025

Clima: mañana Seco - Tarde Seco

Personal: 1 residente de obra - 2 obreros - 1 almacenista, 1 oficial

Actividad: Replanteo y georeferencia de ejes y bordes de calzada. Coordenadas, hitos o mojones instalados. Verificación con planos. Retiro de capa vegetal, basuras y escombros. Áreas despejadas (m^2). Disposición final del material. Corte o terraplén para alcanzar la cota de Subrasante.

Maquinaria: no hay maquinaria

Residente Obra

Residente Interventoría

2

29 de octubre 2025

maquinaria:

personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 Oficial.

Clima: mañana Seco - Tarde Seco

Actividad: Replanteo y georreferenciación de ejes y borde de calzada. coordenadas, hitos o mojones instalados. Verificación con planos. Retiro de capa Vegetal, basuras y escombros. Area despejada (m²). Disposición final del material. Corte o terraplén para alcanzar la cota de subrasante.

maquinaria: no hay maquinaria

Residente Obra

Residente Interventoria.

30 de octubre 2025

Clima: mañana Seco - Tarde Seco.

Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial

Actividad: Replanteo y georeferenciación de ejes y bordes de calzada. Coordenadas, hitos y mojones instalados. Verificación con planos. Retiro de capa Vegetal, basuras y escombros. Area despejada (m²). Disposición final del material. Corte o terraplén para alcanzar la cota de Subrasante.

maquinaria: no hay maquinaria

Residente Obra

Residente Interventoria.

3

31 de Octubre 2025
Clima: mañana Sdes. Tarde Seco
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 Oficial
Actividad: Replanteo y georreferenciación de ejes y bordes de calzada. Coordenadas, hitos o mojones instalados. Verificación con planos Retiro con de capa Vegetal, basura y escombros. Área despejada (m²). Disposición final del material. Corte o terraplén para alcanzar la cota de Subrasante.
maquinaria: No hay maquinaria

Residente obra

Residente Interventoria

01 de noviembre 2025.
Clima: mañana seco - Tarde lluviosa
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 Oficial.
Actividad: Replanteo y georreferenciación de ejes y bordes de calzada. Coordenadas, hitos o mojones instalados Verificación con planos. Retiro de capa Vegetal, basura y escombros - Area despejada (m²). Disposición final de material. Corte o terraplén para alcanzar la cota del Subrasante.
maquinaria: No hay maquinaria

Residente obra

Residente Interventoria

02 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco - Tarde Seco
No se laboro por ser dia festivo

Residente obra

Residente Interventoria

03 de noviembre 2025.
Clima: mañana seco - Tarde seco.
No se laboro por ser dia festivo

Residente Obra

Residente Interventoria

04 de noviembre 2025.
Clima: mañana Seco - Tarde Seco.
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Replanteo y georeferenciación de ejes y bordes de calzada. Coordenadas, hitos o mojones instalados. Verificaciones con planos. Retiro de capa vegetal, basura y escombros. Area despejada (m²). Disposición final del material. Corte y Traplén para alcanzar la cota de subrasante.
maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibro compactador 9 TON

Residente Obra

Residente Interventoria

05 de noviembre 2025.
Clima: mañana Seco - tarde lluvia leve
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial.
Actividad: Transporte y colocación de material de Subbase (granular o Suelo - cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la Subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la Subbase antes de la siguiente capa.
maquina: Retro Cargador CAT. - Vibro compactador 9 TON

Residente obra

Residente Interventoria.

06 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco - Tarde Seco.
personal: 1 residente de obra, 2 obreros. 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y colocación del material de Subbase (granular o suelo cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm) Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la Subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la Subbase antes de la siguiente capa.
maquinaria: Retro cargador CAT - vibro compactador 9 Ton

G

07 de noviembre 2025.
Clima: mañana Seco - Tarde Seco.
Personal: 1 residente obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial.
Actividad: Transporte y colocación del material de subbase (granular o suelo-cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de medición de espesor de la subbase antes de la siguiente capa.
Maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibro compactador 9TON

Residente obra

Residente Interventoria

08 de noviembre 2025.
Clima: mañana Seco - Tarde lluvia leve.
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y colocación del material de subbase (granular o suelo-cemento) Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladoras. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la siguiente etapa/capa.
Maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibro compactador 9TON

Residente obra

Residente Interventoria

7

09 de noviembre 2025.
Clima: mañana Nublado - Tarde Lluvia
No se labora por ser día festivo

Residente obra

Residente Interventoría

10 de noviembre
Clima: mañana Seco - Tarde Seco.
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y Colocación del material de subbase (granular o suelo-cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la subbase. Tipo de equipo y vibrador. Número de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la siguiente capa.
Maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibro compactador 9 Ton

Residente obra

Residente Interventoría

11 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco - Tarde Seco
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y colocación de material de subbase Granular o Suelo-cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la subbase. Tipo de equipo y vibrador. Número de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la siguiente capa.

8

maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibro compactador 9ton

Residente obra

Residente Interventoria

12 de noviembre 2025
Clima: mañana lluvia - tarde Seco.
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y colocación del material de Subbase Granular suelo - cemento. Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la Superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes - Compactación de la Subbase, Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la Siguiente Capa.
maquinaria : Retro Cargador CAT - Vibrocompactador 9Ton

Residente obra

Residente Interventoria

13 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco - Tarde lluvia.
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y colocación del material de Subbase Granular suelo cemento). Origen y tipo de material Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y Pendientes. Compactación de la Subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la Siguiente Capa.
maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibro compactador 9Ton

Residente obra

Residente Interventoria

9

14 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco - Tarde lluvia
Personal: 1 residente obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y colocación del material de Subbase (granular o suelo cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la Superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la Subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la Siguiente capa.
Maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibrocompactador 9 ton

Residente Obra

Residente Interventoria

15 de noviembre 2025
Clima = mañana lluvia. Tarde Seco
Personal = 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: transporte y colocación del material de Subbase (granular o suelo-cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Origen y tipo de material. Espesor. Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la Subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de medición de espesor de la subbase antes de la Siguiente capa.
Maquinaria: Retro Cargador CAT. Vibrocompactador 9 ton

Residente obra

Residente Interventoria

10

16 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco - Tarde lluvia leve.
No se labora por ser dia Festivo.

Residente obra

Residente Interventoria

17 de noviembre 2025.
Clima: mañana Seco - Tarde Seco.
No se labora por ser dia Festivo.

Residente Obra

Residente Interventoria

18 de noviembre 2025
Clima: mañana lluvia - Tarde Seco.
personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial.
Actividad: transporte y colocación del material de Subbase (granular o Suelo-cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la Superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la subbase. Tipo de equipo y vibrador. Número de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la siguiente capa.
maquinaria: Retro cargador CAT. Vibrocompactador, grar

Residente obra

Residente Interventoria,

19 de noviembre 2025.
Clima: mañana lluvia - Tarde Seco
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros 1 almacenista, 1 Oficial
Actividad: Transporte y colocación del material de subbase (granular o suelo-cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la Subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la siguiente capa.
maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibrocompactador 9Ton

Residente obra

Residente Interventoria

20 de noviembre 2025.
Clima: mañana Seco - Tarde lluvia leve.
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 10 fiscal
Actividad: Transporte y colocación del material de subbase (granular o suelo-cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendientes. Compactación de la subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de mediciones de espesor de la subbase antes de la siguiente capa
maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibro compactador 9Ton

Residente obra

Residente Interventoria.

12

21 de noviembre 2025
Clima: mañana lluvia - tarde Seco
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial.
Actividad: Transporte y colocación del material de Subbase Cgranular o Suelo Cemento) Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm). Conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendiente. compactación de la Subbase. Tipo de equipo y vibrador. Numero de pasadas. Resultados de medciones de espesor de la subbase antes de la siguiente capa.
maquinaria: Retro Cargador CAT Vibro compactador 9 ton

Residente obra

Residente interventoria.

22 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco - tarde Seco.
Personal: 1 residente obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Transporte y colocación del material de Subbase Cgranular o Suelo cemento). Origen y tipo de material. Espesor nominal extendido (cm) conformación de la superficie con motoniveladora. Verificación de cotas y pendiente Compactación de Subbase. Tipo de equipo y Vibrador. Numero de pasadas. Resultados de medición de espesor de la subbase antes de la siguiente capa.
maquinaria: Retro Cargador CAT - Vibrocompactador 9TON

Residente obra

Residente interventoria.

23 de noviembre 2025
Clima: Mañana lluvia leve - Tarde Seco
No se labora por ser dia festivo.

Residente obra

Residente Interventoria

24 de noviembre 2025
Clima: mañana seco - tarde lluvia leves
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Instalación, alineación y aseguramiento de formaletas (metalicas o de madera. Longitud formaleteada (m). Verificación de altura y plomada. colocación de barras pasajuntas (dowel bars) con canastillas. Diámetro, longitud y espaciamiento (cm). Recubrimiento de las barras. Instalación de barras de amarre (tie bars) en juntas longitudinales.
maquinaria: Retro cargador CAT, vibro compactador STON

Residente obra

Residente Interventoria

25 de noviembre 2025
Clima: mañana Seco tarde Seco
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: Instalación, alineación y aseguramiento de formaletas (metalicas o de madera). Longitud formaleteada (m). Verificación de altura y plomada. Colocación de barras pasajuntas (dowel bars) con canastillas. Diámetro, longitud y espaciamiento (cm). Recubrimiento de las barras. Instalación de barras de amarre (tie bars) en juntas longitudes.

14

maquinaria: Retro cargador CAT, Vibro Compactador 5 ton.

26 de noviembre 2025
Clima: mañana lluvia - Tarde Seco.
Personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: instalación, alineación y aseguramiento de formaletas (metalicas o de madera). Longitud formaleteada (m). Verificación de altura y plomada. colocación de barras pasajuntas (dowel bars) con canastillas. Diámetro, longitud y espaciamiento (cm). Recubrimiento de las barras, instalación de barras de amarre (tie bars) en juntas (longitudes) longitudinales.
maquinaria: Retro cargador CAT. Vibro compactador 5 ton

Residente Obra

Residente Interventoria

27 de noviembre 2025.
Clima: mañana Seco - Tarde Seco.
personal: 1 residente de obra, 2 obreros, 1 almacenista, 1 oficial
Actividad: colocación y distribución del concreto. Area o carril fundido (m²). Temperatura ambiente. Ubicación y hora de colocación. uso de vibradores internos para la consolidación del concreto. Profundidad de penetración y tiempo de vibrado. Uso de reglas vibratorias o manuales y acabados superficiales (float, texturización, banda)
maquinaria: Retro cargador CAT, Vibro compactador 5 ton

Residente obra

Residente Interventoria

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

INFORME DE OBRA

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL N° 2

PERIODO DEL 27 NOVIEMBRE DEL 2025 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025

DAVID ANDRES ENCISO ARANGO

C.C No. 1.113.304.913 de Sevilla (V)

Contratista interventor

CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

NIT: 901042420-9

Contratista obra

DICIEMBRE 2025



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

1. Datos completos del contrato

1.1. Información general

Concepto	Detalle
Clase de Contratación	Contratación Directa - Contrato de Obra
Objeto del Contrato	"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
Contratante (El Departamento)	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, NIT 800.094.164-4
Contratista	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS, NIT: 901042420-9
Representante Legal Contratista	NILSON MOYA MENA, C. C. 4.800.171 de Bojayá (B)
Valor Total del Contrato	$311.762.642,00 (Trescientos once millones setecientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y dos pesos)
Aporte Gobernación	$241.329.386,00 M/CTE
Aporte Contratista	$70.433.255,00 M/CTE (Mano de obra no calificada - MONC)
Plazo del Contrato	TRES (03) MESES
CDP	4671 de 23/09/2024
Registro BPIN	No. 2024006860112

1.2. Pólizas del contrato

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	41-44-101287134	ANEXO DE PRORROGA	1
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2024	31/07/2025	$31,176,264.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/10/2024	31/07/2025	$155,881,321.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/10/2024	31/07/2025	$15,588,132.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$31,176,264.20
CALIDAD DEL SERVICIO	11/10/2024	31/07/2025	$31,176,264.20



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	41-44-101287134	ANEXO CAUSA PRIMA	2
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2024	31/07/2025	$31,176,264.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/10/2024	31/07/2025	$155,881,321.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/10/2024	31/07/2025	$15,588,132.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$31,176,264.20

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO	41-40-101053868	ANEXO CAUSA PRIMA	2	
AMPAROS	**DEDUCIBLE**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/10/2024	11/01/2025	$260,000,000.00

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	41-44-101287134	ANEXO DE PRORROGA	3
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2024	31/12/2025	$31,176,264.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/10/2024	31/12/2025	$155,881,321.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/10/2024	31/12/2025	$15,588,132.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$31,176,264.20

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	**41-44-101287134**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**	**5**
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2024	16/01/2025	$31,176,264.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/10/2024	16/01/2025	$155,881,321.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/10/2024	16/01/2025	$15,588,132.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$31,176,264.20

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO	**41-40-101053868**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**	**7**	
AMPAROS	**DEDUCIBLE**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/10/2024	16/01/2027	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/10/2024	16/01/2027	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/10/2024	16/01/2027	$284,700,000.00



2. Descripción general de la obra: condiciones iniciales, ajustes, acuerdos y condiciones finales de ejecución

2.1. Caracteristicas técnicas iniciales del proyecto

El proyecto consiste en el mejoramiento vial mediante pavimento rigido en Puerto Limón, Mocoa. La longitud de la obra se estima en **100.00 Metros Lineales (ML)**.

Las principales actividades y componentes técnicos iniciales, según el Presupuesto de Obra, son:

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO: Incluye localización y replanteo, excavación, pavimento de concreto hidráulico (MR 3.8), suministro e instalación de material seleccionado, subbase granular, geotextil para estabilización de suelos, bordillos de concreto 3000PSI, acero de refuerzo, canastillas, y corte y sellado de juntas de expansión.

ANDENES (Aceras): Incluye excavación manual, subbase granular, andén en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m y malla electrosoldada.

SEÑALIZACIÓN: Incluye señalización vertical, demarcación con pintura tráfico en frio (amarillo y blanco para lineas centrales, pasos peatonales y flechas) y suministro e instalación de tachas.

Costos Adicionales: Se incluyen costos para la previsión para el Plan de Adaptación a la Guia Ambiental (PAGA) y Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

3. Antecedentes y descripción del proceso de ejecución

La Ley 2160 de 2021 adicionó la causal de contratación directa para Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, como es el caso del Contratista, autorizando aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para la ejecución del objeto.

Metas ejecutadas y no ejecutadas, tiempos e indicadores:

La información sobre metas, tiempos e indicadores de ejecución (avance fisico) no está disponible en el documento contractual.

3.1. Actividades ejecutadas en el mes.



Basado en los Informes Semanales de Avance de Obra (INF-N° 6 al INF-N° 8) que cubren el periodo **del 27 de noviembre - 20 de diciembre de 2025**, las actividades ejecutadas se resumen por fase de la siguiente manera:

El proyecto de "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN" avanzó significativamente, completando las fases de preparación, movimiento de tierras, conformación de subbase e iniciando la fundición del pavimento rígido.

Resumen de Actividades Ejecutadas (27 de noviembre - 20 de diciembre de 2025)

Informe N° 6 (01 al 07 de diciembre de 2025)

Este periodo se centró en la **Fase V: Continuidad de Pavimentación y Gestión Ambiental**:

- **Obra Civil:** Se realizó la preparación de la subbase mediante compactación e instalación de pasadores (barras de transferencia de carga). Se continuó con el vaciado de concreto y el texturizado final para garantizar la seguridad vial.
- **Gestión Ambiental:** Se implementaron medidas para recolectar el lodo generado por el corte de pavimento, riegos controlados para mitigar el polvo y la clasificación de residuos sólidos.
- **Convivencia:** Las actividades de alto impacto auditivo se limitaron a horarios diurnos autorizados.

Informe N° 7 (08 al 14 de diciembre de 2025)

Corresponde a la **Fase VI: Verificación de Resistencia y Adecuación**:

- **Validación Técnica:** Se realizaron pruebas de rotura de cilindros a los 28 días, confirmando que el concreto alcanzó o superó los 4.000 psi (28 MPa). Se verificó la ausencia de grietas aleatorias en las secciones fundidas.
- **Terminaciones:** Se retiraron las formaletas metálicas del segundo tramo y se procedió al relleno y compactación de bermas laterales para nivelar el terreno.
- **Cierre Ambiental:** Se realizó la limpieza final de la obra, incluyendo la recolección de escombros y la limpieza de sumideros para asegurar el flujo de aguas lluvias.

Informe N° 8 - Final (15 al 20 de diciembre de 2025)



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Documenta la **Fase VII: Aceptación Técnica y Entrega Oficial**:

- **Certificación Final:** Se validaron los reportes de laboratorio para cilindros y vigas (flexo tracción), confirmando la aptitud estructural para el tránsito vehicular.
- **Entrega:** Se retiraron todos los elementos de control (cintas y vallas) y se realizó la señalización final. La obra se declaró técnicamente finalizada y aprobada.
- **Mantenimiento:** Se incluyó una guía de mantenimiento preventivo que recomienda la inspección semestral de juntas y el control de tránsito pesado para preservar la vida útil de la estructura, proyectada a 20 años.

El proyecto se declara técnicamente finalizado y aprobado, cumpliendo con los estándares de resistencia estructural y las normativas de manejo ambiental establecidas.


Tabla de Relación Climática para noviembre.

Horas Totales Controladas: Se registraron un total de **280 horas** durante este periodo.

Condición Predominante (Seco): El clima seco fue la condición mayoritaria, cubriendo **222 horas**, lo que representa el **79.29%** del tiempo registrado.

Precipitaciones:

- **Lluvia Intensa:** Se reportaron **54 horas**, equivalentes al **19.29%** del periodo.
- **Lluvia Moderada:** Se registraron únicamente **4 horas**, representando el **1.43%**.

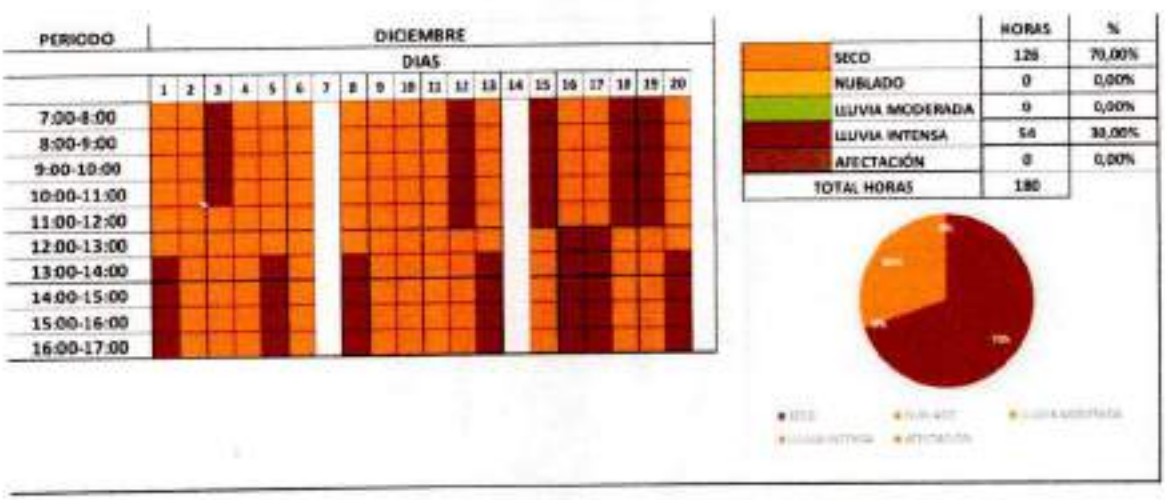



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**				
1,1	Localización y replanteo, incluye andenes	m²	640,00	$ 2.500,00	**$ 2.100.000,00**
1,2	Excavación en material común a máquina de la explanación (incluye desalojo)	m³	268,66	$ 50.821,00	**$ 13.653.569,86**
1,3	Pavimento de concreto hidráulico (MR 3.8)	m³	113,40	$ 880.562,00	**$ 99.855.730,80**
1,4	Suministro e instalación de material seleccionado	m³	38,11	$ 84.275,00	**$ 3.211.720,25**
1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	94,50	$ 150.548,00	**$ 14.226.786,00**
1,6	Suministro e instalación de geotextil para estabilización de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650,00	$ 12.699,00	**$ 8.254.350,00**
1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4,90	$ 675.499,00	**$ 3.309.945,10**
1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127,10	$ 6.132,00	**$ 779.377,20**
1,90	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasa juntas	ml	170,00	$ 21.826,00	**$ 3.710.420,00**
1,10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	604,40	$ 6.200,00	**$ 3.747.280,00**
1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	70,50	$ 11.093,00	**$ 782.056,50**
1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	67,97	$ 17.825,00	**$ 1.211.565,25**
2	**ANDENES**				
2,1	Excavación en material común en seco a mano (Incluye retiro)	m³	36,00	$ 41.446,00	**$ 1.492.056,00**



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	42,00	$ 150.548,00	**$ 6.323.016,00**
2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m³	21,00	$ 677.890,00	**$ 14.235.690,00**
2,4	Malla Electrosoldada 6 x 2,35 m 15 X 15 de 4 mm	Kg	409,59	$ 13.824,00	**$ 5.662.172,16**
3	**SEÑALIZACION**				
3,1	Señal vertical con lamina retro reflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	3,00	$ 502.604,00	**$ 1.507.812,00**
3,2	Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central	ml	156,02	$ 15.469,00	**$ 2.413.473,38**
3,3	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación paso peatonal y línea de pare (incluye microesferas)	ml	12,50	$ 28.518,00	**$ 356.475,00**
3,4	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml	200,00	$ 90.504,00	**$ 18.100.800,00**
3,5	Suministro e instalación de tachas	un	32,00	$ 18.819,00	**$ 602.208,00**
COSTO DIRECTO DE OBRA					**$ 205.536.503,50**
ADMINISTRACION	31,32%				**$ 64.374.033,00**
IMPREVISTOS	3,00%				**$6.166.095,00**
UTILIDAD	0,00%				**$ -**
	34,32%				**$ 70.540.128,00**
					$ 276.076.632,00
	COSTOS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				**$ 35.686.010,00**



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

	PREVISION PARA EL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	UND	1,00	**$ 10.943.500,00**
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00	**$ 24.742.510,00**
Valor aportado por la gobernación				**$ 311.762.642,00**
Valor aportado por Concejo Comunitario Las Acacias				**-$ 70.433.255,00**
Valor total del proyecto				**$ 241.329.387,00**

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO**				
1,1	Localización y replanteo, incluye andenes	m²	840,00	$ 2.500,00	$ 2.100.000,00
1,2	Excavación en material común a máquina de la explanación (incluye desalojo)	m³	268,66	$ 50.821,00	$ 13.653.569,86
1,3	Pavimento de concreto hidráulico (MR 3.8)	m³	113,40	$ 880.562,00	$ 99.855.730,80
1,4	Suministro e instalación de material seleccionado	m³	38,11	$ 84.275,00	$ 3.211.720,25
1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	94,50	$ 150.548,00	$ 14.226.786,00
1,6	Suministro e instalación de geotextil para estabilización de suelos de subrasante y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	650,00	$ 12.699,00	$ 8.254.350,00
1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4,90	$ 675.499,00	$ 3.309.945,10
1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127,10	$ 6.132,00	$ 779.377,20
1,90	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, D 1/4", Pasa juntas	ml	170,00	$ 21.826,00	$ 3.710.420,00
1,10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	604,40	$ 6.200,00	$ 3.747.280,00
1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	70,50	$ 11.093,00	$ 782.056,50
1,12	Corte Juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	67,97	$ 17.825,00	$ 1.211.565,25



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

2	**ANDENES**				
2,1	Excavación en material común en seco a mano (Incluye retiro)	m³	36,00	$ 41.446,00	$ 1.492.056,00
2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).	m³	42,00	$ 150.548,00	$ 6.323.016,00
2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m³	24,60	$ 677.890,00	$ 16.676.094,00
2,4	Malla Electrosoldada 6 x 2,35 m 15 X 15 de 4 mm	Kg	408,63	$ 13.824,00	$ 5.648.887,30
3	**SEÑALIZACION**				
3,1	Señal vertical con lamina retro reflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un		$ 502.604,00	$ -
3,2	Demarcación con pintura tráfico en frio color amarillo para delimitación vial central	ml		$ 15.469,00	$ -
3,3	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para delimitación paso peatonal y linea de pare (incluye microesferas)	ml		$ 28.518,00	$ -
3,4	Demarcación con pintura tráfico en frio color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	ml		$ 90.504,00	$ -
3,5	Suministro e instalación de tachas	un		$ 18.819,00	$ -
				COSTO DIRECTO DE OBRA	**$ 184.982.854,26**

ADMINISTRACION	31,32%	**$ 57.936.630,00**
IMPREVISTOS	3,00%	**$ 5.549.486,00**
UTILIDAD	0,00%	**$ -**
	34,32%	**$ 63.486.116,00**

					$ 248.468.970,00
	COSTOS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				**$ 32.117.409,16**



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

	PREVISION PARA EL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	UND	1,00		**$ 9.849.150,05**
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00		**$ 22.268.259,11**
				Valor aportado por la gobernación	**$ 280.586.379,16**
				Valor aportado por Concejo Comunitario Las Acacias	**-$ 63.389.929,81**
				Valor total del proyecto	**$ 217.196.448,00**

3.1.1. Actividades administrativas.

Las actividades administrativas ejecutadas durante el periodo **del 27 de noviembre al 20 de diciembre de 2025** se enfocaron principalmente en la puesta en marcha, la gestión de personal, la logística y el control de calidad documental del proyecto:

Resumen de Actividades Administrativas Ejecutadas

Categoria	Actividades Detalladas	Periodo Clave
1. Gestión de Contratación y Personal	**Contratación y Vinculación:** Se ejecutó la contratación y vinculación formal del equipo humano requerido para la obra, incluyendo operadores de maquinaria, auxiliares de obra y personal de seguridad.	27 Nov - 20 Dic
2. Logística y Suministros Iniciales	**Movilización de Equipos:** Se gestionó y ejecutó la movilización de la maquinaria pesada esencial (retroexcavadora, vibrocompactador) y de los equipos de apoyo (volquetas) al sitio del proyecto.	27 Nov - 20 Dic
3. Seguridad y Plan de Manejo de Tráfico (PMT)	**Implementación del PMT:** Se gestionó el suministro e instalación de los elementos de señalización provisional (delineadores, señales de VÍA CERRADA) para la implementación efectiva del Plan de Manejo de Tránsito.	27 Nov - 20 Dic
4. Control de Calidad y Documentación	**Gestión de Ensayos:** Se coordinó la toma de muestras y la ejecución de pruebas de control de calidad, incluyendo: Pruebas de Densidad de Campo (DMT o DHC) en subrasante y subbase. Pruebas de *Slump* y	27 Nov - 20 Dic



	toma de cilindros de concreto (para ensayos de resistencia a los 7, 14 y 28 días).	
5. Reporte y Seguimiento	**Emisión de Informes y Actas:** Se elaboraron y presentaron los Informes Semanales de Avance de Obra (INF-N° 1 al INF-N° 5) ante la Interventoría.	27 Nov - 20 Dic

3.1.2. Actividades de obra. (BITÁCORA) (Anexo 01)

La información detallada de actividades de obra (bitácora) ejecutadas en el mes.

3.1.3. Actividades ejecutadas de Seguridad y Salud en el trabajo (Anexo 02).

Las actividades de **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)** ejecutadas durante el periodo del **27 de noviembre al 20 de diciembre de 2025** se enfocaron en la prevención de riesgos inherentes a las fases de movilización, movimiento de tierras y fundición del pavimento rígido.

A continuación, se presenta un resumen de las acciones de SST documentadas durante este tiempo:

Resumen de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)


Categoría	Actividades Detalladas	Periodo Clave
1. Gestión del Riesgo Público y Vial (PMT)	**Implementación y Mantenimiento del PMT:** Se gestionó y mantuvo la señalización provisional requerida por el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) para delimitar la zona de obra, advertir a peatones y conductores, y prevenir accidentes viales durante la excavación y el tránsito de maquinaria pesada.	27 Nov - 20 Dic
2. Entrega y Uso de Elementos de Protección Personal (EPP)	**Dotación y Supervisión:** Se dotó al personal con los EPP adecuados para las tareas específicas (cascos, guantes, gafas de seguridad, botas de seguridad, chalecos reflectivos) y se supervisó su uso obligatorio durante las actividades de movimiento de tierras, compactación y fundición de concreto.	27 Nov - 20 Dic
3. Capacitación y Divulgación	**Inducción Inicial (27 Oct - 02 Nov):** Se realizó la inducción al personal recién contratado sobre los riesgos específicos de la obra, los procedimientos de trabajo seguro y el uso correcto de la maquinaria.	27 Nov - 20 Dic



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

	Charlas de Seguridad: Se ejecutaron charlas de cinco minutos al inicio de cada jornada, enfocadas en los riesgos del día, tales como: Riesgos por movimiento de tierras y taludes (durante excavación). Riesgos por manejo de maquinaria pesada (retroexcavadora y vibrocompactador). Riesgos ergonómicos y de exposición a químicos (durante el vaciado y curado del concreto).	27 Nov - 20 Dic
4. Control Operacional	**Seguridad en Compactación y Rellenos:** Se verificó que la actividad de compactación (con vibrocompactador) se realizara en áreas despejadas y que el personal mantuviera una distancia segura de la maquinaria en movimiento.	27 Nov - 20 Dic
	Seguridad en Fundición de Concreto: Se supervisó el uso de guantes y protección ocular adecuada por parte del personal que manipuló directamente el concreto y los aditivos de curado (membrana), minimizando el riesgo de quemaduras químicas o irritaciones.	27 Nov - 20 Dic

3.2. Programación y avance de obra.

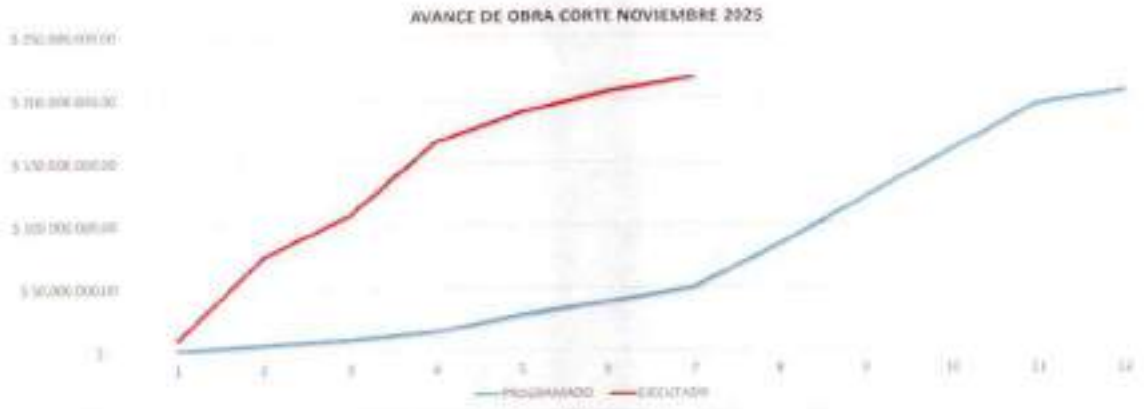

PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO:	90.00 %
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 217.196.448,00
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO:	24.54 %
VALOR TOTAL PROGRAMADO:	$ 50.430.621,00

El plazo de ejecución es de TRES (03) MESES.



Retroexcavadora	Ejecución de la excavación mecánica, movimiento de tierras y cargue de material sobrante para desalojo.	Movimiento de Tierras (Fase I)
Vibrocompactador	Compactación de la subrasante (rellenos con material seleccionado) y compactación de la subbase granular.	Movimiento de Tierras (Fase I) y Conformación de Subbase (Fase II)
Volquetas	Transporte y desalojo del material sobrante de la excavación. Transporte de material seleccionado y subbase granular al sitio de obra.	Movimiento de Tierras (Fase I) y Conformación de Subbase (Fase II)
Formaletas	Elementos metálicos o de madera utilizados para contener el concreto fresco y darle la forma geométrica requerida a la losa del pavimento.	Fundición de Pavimento
Vibrador de Concreto	Equipo esencial para consolidar el concreto durante el vaciado, eliminando bolsas de aire y asegurando un producto denso y homogéneo.	Fundición de Pavimento
Máquina de Corte de Juntas	Equipo especializado utilizado para realizar los cortes transversales y longitudinales de control de contracción en el pavimento rígido ya fraguado.	Curado y Acabado

4. Descripción de los espacios participativos desarrollados en el marco del componente de acompañamiento comunitario.

El contrato se enmarca en la Ley 70 de 1993 y sus modificaciones, que promueven la contratación con Consejos Comunitarios. El objetivo del proyecto contribuye al "Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total".

El documento establece la obligación de dar crédito a la Gobernación del Putumayo y divulgar, a través de medios idóneos en el área de influencia del proyecto, el interés de la entidad en el desarrollo de la región y el bienestar de la comunidad.

El contrato fue celebrado con el **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**, en virtud de la Ley 2160 de 2021 (que promueve la contratación directa con Consejos Comunitarios de Comunidades Negras), el proyecto tiene un **componente de participación comunitaria inherente** a su naturaleza.



3.3. Personal de obra.

En las actividades de obra realizadas (excavación, rellenos, compactación, fundición de concreto) y en el tipo de maquinaria utilizada, se puede inferir el siguiente personal clave que participó en la ejecución:

Personal Clave Involucrado en la Obra

Rol (Inferido por Tareas Ejecutadas)	Función Principal en el Período	Observaciones
Director de Obra	Liderazgo general, gestión de recursos y cumplimiento contractual.	Responsable de la coordinación administrativa y técnica.
Ingeniero Residente	Supervisión técnica directa de las fases de movimiento de tierras, subbase y fundición de concreto.	Responsable del control de calidad (niveles, compactación, *slump*).
Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Ejecución de charlas de seguridad, inspección de EPP y vigilancia del Plan de Manejo de Tráfico (PMT).	Responsable de la prevención de riesgos laborales.
Topógrafo	Localización y replanteo, control de niveles de subrasante y subbase, y verificación de cotas para el vaciado de concreto.	Su labor es clave para la calidad dimensional de la obra.
Personal de Obra / Ayudantes / Mano de Obra No Calificada (MONC)	Apoyo en la extensión manual de rellenos y subbase, instalación de formaletas, armado de acero de refuerzo, vibrado y acabado del concreto.	Este grupo incluye la **Mano de Obra No Calificada (MONC)** aportada por el contratista (Consejo Comunitario Las Acacias).

3.4.1. Planillas de seguridad social personal de obra. (Anexo 03).

3.7. Equipos de obra.

Equipos de Obra Utilizados

Los equipos se clasifican según la fase de construcción en la que fueron requeridos:

Tipo de Equipo	Función Específica en la Obra	Fase de Ejecución



A continuación, se indican los espacios participativos desarrollados, basándose en la normativa de este tipo de contratos:

Espacios Participativos

Tipo de Espacio	Propósito y Marco Conceptual	Inferencia Basada en el Contrato
Participación Interna del Consejo Comunitario	**Movilización de Mano de Obra No Calificada (MONC):** La ejecución del contrato obliga al Consejo Comunitario a aportar $70.433.255,00 en Mano de Obra No Calificada. Esto implica espacios internos de convocatoria, selección, socialización de condiciones laborales y gestión de planillas de seguridad social con los miembros de la comunidad que participan directamente en la obra.	Se ejecutó la contratación y vinculación de personal, lo que sugiere una **convocatoria interna** del Consejo Comunitario.
Socialización del Alcance y PMT	**Reuniones de Información Pública:** Espacios para informar a la comunidad aledaña al proyecto (Puerto Limón) sobre el alcance técnico, el plazo de ejecución y, fundamentalmente, las afectaciones temporales generadas por el **Plan de Manejo de Tráfico (PMT)**, especialmente durante las fases de excavación y fundición.	La implementación de la señalización de **VÍA CERRADA** y el PMT requieren necesariamente de una socialización previa o acompañamiento en el sitio.
Audiencias o Mesas de Trabajo con Beneficiarios	**Seguimiento Comunitario:** Reuniones periódicas con lideres comunitarios y beneficiarios directos para recoger inquietudes, coordinar acciones de apoyo logístico (ej. paso peatonal) y validar la calidad de la ejecución de la obra.	Son esenciales para garantizar la transparencia y el éxito de la obra, pero **no se confirman** en los informes de avance.
Divulgación de la Gestión (Obligación Contractual)	**Visibilidad Institucional:** El Contratista tiene la obligación de divulgar, a través de medios idóneos en el área de influencia, el interés de la Gobernación del Putumayo en el desarrollo de la región.	Esto implica la **instalación de vallas informativas** o la realización de **eventos de divulgación** para garantizar la transparencia del uso de recursos públicos.



5. Ejecución administrativa de acuerdo con las obligaciones contractuales.

obligaciones de las partes:

Obligaciones del Departamento del Putumayo: Transferir los recursos, resolver peticiones, cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas, supervisar y controlar periódicamente la ejecución del contrato, y concurrir a la liquidación final.

Obligaciones del Consejo Comunitario Las Acacias: Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, mantener los requisitos de idoneidad y personería jurídica, mantener al día la información financiera, velar por el cumplimiento de las leyes y normas, realizar la respectiva contratación conforme a la Ley 1150 de 2007, y coordinar la elaboración conjunta de un Plan Operativo y de Inversión.

6. Información financiera.

El valor total del contrato es de $311.762.642,00.

Concepto	**Valor (COP)**
Aporte Gobernación del Putumayo	$241.329.386,00
Aporte Contratista (M.O.N.C)	$70.433.255,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$311.762.642,00**

Desglose Presupuestal (Costos financiados por la Gobernación, excluyendo M.O.N.C.):

Concepto	**Valor (COP)**
Total, Costos Directos	$205.536.503,00
Administración (31.32%)	$64.374.033,00
Imprevistos (3.00%)	$6.166.095,00
Utilidad (0.00%)	$0,00
Subtotal AIU	$70.540.128,00
Subtotal Obra Civil	$276.076.631,00
Costos Ambientales y PMT	$35.686.010,00
Costo Total Obra	**$241.329.386,00**



7. Conclusiones y recomendaciones.

CONCLUSIONES

1. **Finalización Técnica Exitosa:** El proyecto alcanzó el **100% de la ejecución técnica** en sus fases criticas (preparación, subbase y pavimento rigido), logrando un avance fisico real del **90% del valor total contractual** (según el corte al 20 de diciembre). El porcentaje ejecutado ($217.196.448) supera ampliamente al programado ($50.430.621), demostrando una eficiencia operativa alta por parte del Consejo Comunitario Las Acacias.
2. **Calidad Estructural Garantizada:** Las pruebas de laboratorio confirmaron que el concreto hidráulico alcanzó resistencias superiores a los **4.000 psi (28 MPa)**, superando el requerimiento contractual de **MR 3.8**. La ausencia de grietas aleatorias y el cumplimiento de los protocolos de densidad en la subbase aseguran la estabilidad de la estructura.
3. **Gestión Ambiental y Social Efectiva:** Se cumplió satisfactoriamente con el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), destacando el manejo de lodos de corte y la mitigación de polvo. Asimismo, la concertación del cambio de eje con la comunidad evitó conflictos sociales y demoliciones innecesarias, cumpliendo el objetivo de conectar el parque con el embarcadero.
4. **Climatología a Favor:** El factor climático fue determinante para el éxito del vaciado de concreto, ya que el **79.29% del tiempo predominó el clima seco**, permitiendo jornadas de trabajo continuas y un fraguado óptimo de las losas.
5. **Seguridad y Salud en el Trabajo:** No se reportaron accidentes laborales. La implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y el uso estricto de EPP durante la manipulación de concreto y maquinaria pesada mitigaron los riesgos críticos identificados en la inducción.

RECOMENDACIONES

1. **Periodo de Curado y Apertura:** Se recomienda restringir el tránsito vehicular pesado por un periodo mínimo de **28 días** tras la última fundición, asegurando que todas las losas alcancen su máxima capacidad de soporte antes de ser sometidas a cargas de diseño.
2. **Mantenimiento Preventivo de Juntas:** De acuerdo con la guía de mantenimiento entregada, se debe realizar una **inspección semestral del sello de las juntas** de dilatación. El desprendimiento o deterioro del sello puede permitir la entrada de agua a la subbase, comprometiendo la vida útil de 20 años proyectada.



3. **Control de Cargas en el Embarcadero:** Dado que la vía conduce a un punto de carga y descarga (embarcadero), es vital que la autoridad local controle que no se excedan las cargas por eje para las cuales fue diseñado el pavimento MR 3.8, evitando fallas por fatiga prematura.
4. **Monitoreo Ambiental Post-Obra:** Realizar una última inspección a los sumideros de aguas lluvias un mes después de la entrega, para asegurar que no existan sedimentos residuales del proceso de construcción que puedan causar obstrucciones durante la próxima temporada de lluvias intensas.
5. **Liquidación Administrativa:** Proceder con la consolidación de los ítems de señalización (3.1 a 3.5) que, según la tabla de actividades ejecutadas, muestran un saldo pendiente por ejecutar/legalizar para alcanzar el 100% del valor administrativo del proyecto.

8. Detalle de actividades.

FASE PRELIMINAR Y ADMINISTRATIVA

- **Gestión de Talento Humano:** Vinculación formal de la cuadrilla de obra (maestros, oficiales y ayudantes) y operadores de maquinaria pesada.
- **Logística de Maquinaria:** Movilización al sitio de retroexcavadora, vibrocompactador y volquetas para el transporte de materiales y desalojo.
- **Localización y Replanteo (Ajustado):** Ejecución de la topografía inicial sobre un área de **840,00 m²**, realizando el ajuste del eje de diseño para evitar la afectación de viviendas existentes, con aprobación de interventoría.

FASE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SUBESTRUCTURA

- **Excavación Mecánica:** Retiro de **268,66 m³** de material común para la explanación de la vía, incluyendo el desalojo de sobrantes a botaderos autorizados.
- **Estabilización de Suelos:** Suministro e instalación de **650,00 m² de geotextil** (NT 2400) para mejorar la capacidad portante de la subrasante.
- **Conformación de Subbase**: Extendido y compactación de **94,50 m³** de material de subbase granular, verificando densidades de campo al 100%.

FASE DE PAVIMENTACIÓN (CONCRETO HIDRÁULICO)



- **Instalación de Aceros:** Colocación de **170,00 ml** de canastillas con barras de transferencia (pasa juntas) y acero de refuerzo longitudinal/transversal (674,90 kg en total).
- **Fundición de Losas:** Vaciado de **113,40 m³** de concreto rigido con resistencia **MR 3.8 (4.000 PSI)**.
- **Acabado y Texturizado:** Aplicación de estriado transversal para garantizar la adherencia y seguridad vial (fricción).
- **Tratamiento de Juntas:** Corte de juntas de expansión (**67,97 ml**) y sellado técnico para evitar la infiltración de agua a las capas inferiores.

FASE DE URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

- **Bordillos:** Construcción de **4,90 m³** de bordillos en concreto de 3.000 PSI con su respectivo acero de refuerzo.
- **Andenes Peatonales:** Fundición de **24,60 m³** de andenes en concreto clase D (3.000 PSI) con refuerzo de malla electrosoldada para mejorar la movilidad de la comunidad.

FASE DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

- **Señalización Vertical:** Instalación de 3 señales (informativas/preventivas) con lámina retrorreflectiva.
- **Demarcación Horizontal:** Aplicación de pintura de tráfico en frio (amarillo y blanco) para la línea central, pasos peatonales, líneas de pare y flechas direccionales.
- **Elementos de Control:** Instalación de **32 tachas** reflectivas para mejorar la visibilidad nocturna.

GESTIÓN AMBIENTAL Y SST (Seguridad y Salud en el Trabajo)

- **Manejo Ambiental:** Recolección de lodos producidos por el corte de juntas, riego de agua para control de material particulado (polvo) y limpieza de sumideros.
- **Seguridad Industrial:** Ejecución de charlas diarias de 5 minutos, entrega de EPP (cascos, botas, protección visual) y señalización del área de trabajo mediante el Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

RESUMEN DE AVANCE:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

- **Estado:** Técnicamente finalizado.
- **Avance Físico Ejecutado:** 90.00%
- **Inversión Ejecutada:** $217.196.448,00
- **Condición Climática:** 79.29% tiempo seco (favorable para la fundición).

9. Registro fotográfico

	
INSTALACION DE FORMALETA	INSTALACION DE FORMALETA
	
INSTALACION DE ACERO PARA TRANFERENCIA DE CARGAS	NIVELACION DE CONCRETO

	
TEXTURIZADO DE CONCRETO	TEXTURIZADO DE CONCRETO
	
TEXTURIZADO DE CONCRETO	TEXTURIZADO DE CONCRETO
	
TEXTURIZADO DE CONCRETO	TEXTURIZADO DE CONCRETO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

	
TEXTURIZADO DE CONCRETO	TEXTURIZADO DE CONCRETO
	
TEXTURIZADO DE CONCRETO	TEXTURIZADO DE CONCRETO
	
TEXTURIZADO DE CONCRETO	TEXTURIZADO DE CONCRETO

	
UBICACIÓN DE CAMILLA, BOTIQUIN, EXTINTOR Y PUNTO ECOLOGICO	UBICACIÓN DE ACCESO A BAÑOS
	
CONTROL VIAL	CONTROL VIAL
	
SEÑALIZACION CON CINTA PELIGRO	SEÑALIZACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 901042420-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

	
SEÑALIZACION	SEÑALIZACION
	
SEÑALIZACION	SEÑALIZACION
	
SEÑALIZACION	SEÑALIZACION

ING. ALVARO MILTON MONTENEGRO MARTINEZ
CC. 16628656
MP. 19202-14988 CND



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS
NIT: 9010424220-9
RESOLUCION 172 DEL 23 DE JUNIO DEL 2022 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

ANEXO:

INFORMES SEMANALES

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN: 01
	GESTION DE CONTRATACION	

CONTRATISTA DE OBRA: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS — CONTRATO No: 1363 DEL 11 OCTUBRE DEL 2025

INTERVENTOR: DAVID ANDRES ERAZO ARANGO — CONTRATO No: 1371 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2025

Fecha: Del: lunes, 1 de diciembre de 2025 Al domingo, 7 de diciembre de 2025

Supervisor Contrato de Interventoría:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO, CALLES EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INMACULADA DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO EL MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	Interventor:	DAVID ANDRES ERAZO ARANGO
Contrato No:	1363 DEL 11 OCTUBRE DEL 2025	Contrato No:	1371 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2025
Valor total:	$ 3.241.229.386,00 INCTE	Valor Inicial:	$ 93.222.184,00 M/CTE
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES	Plazo Inicial:	TRES (03) MESES
Fecha de Iniciación:	lunes, 27 de octubre de 2025	Fecha de Iniciación:	lunes, 27 de octubre de 2025
Fecha de Terminación 1:	domingo, 25 de enero de 2026	Fecha de Terminación 1:	domingo, 25 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME Nº 6

1. Objeto del Informe

Documentar la Fase II: Continuidad de Pavimentación, Apertura Controlada y Gestión Ambiental, ejecutada por el Consejo Comunitario Las Acacias entre el 01 y el 07 de diciembre de 2025. El informe detalla la progresión de la obra física y las medidas de mitigación para reducir el impacto ambiental derivado de la construcción.

2. Desarrollo Técnico de Actividades Proyectadas

2.1. Preparación de la Subbase y Progresión de Obra

•Compactación y Fundación: Se preparó el siguiente tramo mediante los cortes de nivelación de carga (procedentes). Se verificó que el terreno esté humedecido previo al vaciado para evitar que la subbase absorba el agua del concreto.

•Vaciado y Tratamiento: Continuación del bombeo de concreto, manteniendo la homogeneidad de la mezcla y aplicando el acabado final (rayado/texturizado) para seguridad vial.

2.2. Plan de Manejo Ambiental (PMA)

Se implementaron las siguientes acciones para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente:

•Gestión del Lodo de Corte: El residuo líquido generado por la sierra de diamante durante la Fase IV se recolectó y se infiltró en relleno directo a depresiones o fuentes de agua cercanas. Se dispondrá en una zona de sedimentación controlada.

•Control de Polvo y Emisiones: Dado que el tramo es marginario y el viento puede levantar partículas, se programaron riegos de agua controlados sobre la subbase descubierta para minimizar la afectación a las viviendas de Las Acacias.

•Manejo de Residuos Sólidos: Los restos de formaleta, plásticos de embalaje de los cafeteros y residuos de madera serán clasificados y retirados del sitio de obra para su disposición final en un centro autorizado.

2.3. Cierre de Radio y Horarios

•Para garantizar la convivencia con el Consejo Comunitario, las actividades de mayor impacto auditivo (maquinaria y vibrado) se realizarán estrictamente en horarios diurnos acordados.

3. Conclusión

La Fase V asegura no solo el buen frente del pavimento, sino también un compromiso con el entorno. La correcta gestión de los lodos de corte y el control de partículas en suspensión protegen la salud de la comunidad y cumplen con los estándares de sostenibilidad del proyecto. La secuencia anterior contempla el proceso de galletería, el mantenimiento ambiental constante

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:

SE EJECUTA LA ACTIVIDAD DE CORTE DE PAVIMENTO



Descripción:

SE EJECUTA LA ACTIVIDAD DE CORTE DE PAVIMENTO

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN: 01
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	

CONTRATISTA DE OBRA: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS — CONTRATO No: 1943 DEL 11 OCTUBRE DEL 2025

INTERVENTORIA: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO — CONTRATO No: 1071 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2025

Fecha: Supervisor Contrato de Interventoria — Del: lunes, 8 de diciembre de 2025 — A: domingo, 14 de diciembre de 2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCION DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	Interventor:	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Contrato No:	1943 DEL 11 OCTUBRE DEL 2025	Contrato No:	1071 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2025
Valor total:	$ 241.329.396,03 M/CTE	Valor Inicial:	$ 25.222.194,00 M/CTE
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES	Plazo Inicial:	TRES (03) MESES
Fecha de Iniciación:	lunes, 27 de octubre de 2025	Fecha de Iniciación:	lunes, 27 de octubre de 2025
Fecha de terminación 1:	domingo, 25 de enero de 2026	Fecha de Terminacion 1:	domingo, 25 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME N° 7

1. Objeto del Informe

Documentar la Fase VI: Verificación de Resistencia Final, Desmovilizacion y Entrega de Sectores, ejecutada por el Consejo Comunitario Las Acacias entre el 08 y el 14 de diciembre de 2025. Este informe se centra en la validación técnica del concreto a los 28 días y la adecuación de las bermas o zonas laterales para garantizar la seguridad del tránsito.

2. Desarrollo Técnico de Actividades Ejecutadas

2.1. Validación de Resistencia de Diseño (f'c)

•Rotura de Cilindros (28 días): Se presentan los resultados de laboratorio de los cilindros tomados en las primeras fases. Se confirma que el concreto alcanzó o superó la resistencia de diseño especificada (ej. 4.000 psi o 28 MPa), lo que garantiza que la losa puede soportar las cargas de diseño sin fallas estructurales.

•Inspección de Fisuras: Se realizó un recorrido detallado por la sección fundida para verificar la ausencia de grietas anormales, confirmando que el sellado de juntas realizado en la Fase IV está funcionando correctamente.

2.2. Remoción de Formaletas y Adecuación de Bordes

•Desencofrado Final: Retiro total de las formaletas metálicas del segundo tramo. Se verificó la verticalidad de las caras laterales y la ausencia de hormigueros (vacíos) en los bordes.

•Relleno de Bermas: Para evitar el "escalonamiento" y proteger el borde de la losa, se procedió al relleno y compactación de los laterales con material de sitio o subbase, nivelando el terreno con la superficie del nuevo pavimento.

2.3. Cierre del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

•Limpieza Final de Obra: Recolección total de escombros, restos de concreto seco y señalización temporal de las áreas ya finalizadas.

•Restauración de Áreas Intervenidas: Limpieza de cunetes y sumideros que pudieran recibir sedimentos durante la etapa de construcción, asegurando el correcto flujo de aguas lluvias.

3. Conclusión

Con la finalización de la Fase VI, el Consejo Comunitario Las Acacias entrega una sección de pavimento rígido que cumple con los estándares técnicos de resistencia y sostenibilidad ambiental. Los resultados de laboratorio respaldan la calidad del material utilizado, y la adecuación de los bordes asegura una transición suave para el tránsito. El proyecto está en su etapa de monitoreo post - construcción y mantenimiento preventivo inicial.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:

SE EJECUTA LA ACTIVIDAD DE CORTE DE PAVIMENTO



Descripción:

SE EJECUTA LA ACTIVIDAD DE CORTE DE PAVIMENTO

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 01

CONTRATISTA DE OBRA: CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS — CONTRATO No: 1843 DEL 11 OCTUBRE DEL 2025

INTERVENTORIA: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO — CONTRATO No: 1071 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2025

Fecha: Del: lunes, 15 de diciembre de 2025 Al: sábado, 20 de diciembre de 2025

Supervisor Contrato de Interventoría:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMON DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	Interventor:	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Contrato No:	1843 DEL 11 OCTUBRE DEL 2025	Contrato No:	1071 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2025
Valor Inicial:	$ 241.029.366,00 M/CTE	Valor Inicial:	$ 25.273.184,00 M/CTE
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES	Plazo Inicial:	TRES (03) MESES
Fecha de Iniciación:	lunes, 27 de octubre de 2025	Fecha de Iniciación:	lunes, 27 de octubre de 2025
Fecha de terminación 1:	domingo, 25 de enero de 2026	Fecha de Terminación 1:	domingo, 25 de enero de 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME N° 5 (FINAL)

1. Objeto del Informe

Documentar la Fase VII: Ampliación Técnica, Apertura Vial y Cierre de Proyecto, ejecutada por el Consejo Comunitario Las Acacias entre el 15 y el 20 de diciembre de 2025. Este informe certifica que el pavimento rígido ha cumplido con los ciclos de curado y resistencia de diseño (3Fc8) y Módulo de Rotura), permitiendo la entrega de la vía para su uso público.

2. Desarrollo Técnico y Resultados Finales

2.1. Certificación de Resistencia a los 28 Días

•Resultados de Cilindros (Compresión): Se recibieron los reportes finales de laboratorio. El concreto alcanzó el 108% de la resistencia de diseño (ej. 4.500 psi / 28 MPa), validando la calidad de la mezcla y el proceso de fundición.

•Resultados de Vigas (Flexo tracción): Las pruebas de rotura de vigas confirmaron que la losa posee la capacidad necesaria para soportar las cargas de flexión generadas por el tránsito vehicular, cumpliendo con los requerimientos para pavimentos rígidos.

•Verificación de Juntas: Se validó la inspección final del sellado, confirmando la adherencia total del material y la integridad de las juntas de dilatación y contracción.

2.2. Adecuación Final y Señalización

•Retirada de Elementos de Control: Se procedió al retiro de las cintas de peligro, formaletas remanentes y barreras de protección una vez confirmada la rigidez estructural del pavimento.

•Limpieza y Cierre: Se realizó una jornada de limpieza general para eliminar cualquier residuo de construcción, todo de cara a material pétreo sobrante, dejando el área en condiciones óptimas para la comunidad.

2.3. Cierre del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

•Disposición Final: Se certificó que el 100% de los residuos sólidos y líquidos (restos de curlex fueron manejados y dispuestos de acuerdo con los protocolos ambientales establecidos en el informe N° 4.

•Recuperación del Entorno: Las áreas de acopio de materiales fueron niveladas y restauradas, minimizando cualquier huella de impacto ambiental en el sector de Las Acacias.

3. Conclusión y Entrega

El proyecto de pavimentación ejecutado por el Consejo Comunitario Las Acacias se declara TECNICAMENTE FINALIZADO Y APROBADO. La vía cumple con las especificaciones de diseño, los protocolos de curado y los estándares de sostenibilidad ambiental. Se hace entrega oficial de la obra a la comunidad, recomendando el cumplimiento de las normas de tránsito y el mantenimiento preventivo de las juntas cada 2 años para prolongar la vida útil de la estructura (proyectada a 20 años).

Documentación Adjunta sugerida para este informe:

•Planilla de resultados de laboratorio (Cilindros y Vigas a 28 días).

•Registro fotográfico de antes y después.

•Acta de recibido y visto ambiental.

GUIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: PAVIMENTO RIGIDO

Proyecto: Pavimentación Sector Las Acacias

Responsable: Comité de Infraestructura del Consejo Comunitario

1. Inspección y Cuidado de las Juntas (El punto más crítico)

Las juntas son el "talón de" del pavimento. Su función es permitir que las losas se expandan y contraigan.

•Inspección Semestral: Revisar que el material de sello (asfáltico o poliuretano) no se haya desprendido o endurecido.

•Limpieza de Sedimentos: Si existen acumulación de tierra o piedras pequeñas en las juntas, retirarlas. En caso pierna duro (sello arrancado), al reponerlos la losa por el valor, el borde del concreto se puede "desgastar" (descortinamiento).

•Resellado: Si el sello se daña o se sale, debe reemplazarse de inmediato para evitar que el agua se filtre a la subbase y debilite el suelo.

2. Control de Drenaje y Limpieza Superficial

El peor enemigo de un pavimento es el agua estancada en sus bordes.

•Limpieza de Cunetas: Asegurar que las cunetas laterales estén siempre libres de basura, malezas o escombros.

•Evitar Acumulación de Tierra: El lodo acumulado sobre la losa retiene humedad y puede generar crecimiento de vegetación en las juntas, cuyas raíces rompen el concreto.

•Lavado: No es necesario lavar el pavimento, pero si hay derrames de aceites o combustibles, se recomienda limpiar con arena o desengrasantes suaves para evitar manchas permanentes.

3. Control de Cargas y Uso de la Vía

•Tránsito Pesado: Evitar que camiones de carga salga - pesada (más de lo diseñado) se estacionen por tiempos prolongados en los bordes de la losa, ya que es el punto más vulnerable a flexar.

•No a las Excavaciones sin Permiso: Prohibir que terceros rompan el pavimento para instalaciones de tuberías sin la supervisión técnica adecuada y un plan de reposición con pasadores de acero.

•Protección contra Impactos: Evitar el uso de herramientas de impacto (picas o barras) directamente sobre la superficie del concreto.

4. Calendario de Actividades

Frecuencia/Actividad/Objetivo

Mensual: Limpieza de cunetas y todo en Gestión. Evitar obstrucción de drenajes.

Cada 6 meses/Inspección visual de grietas y sellos. Detectar fallas tempranas.

Cada 2-3 años/Mantenimiento/Reposición de sellos en juntas. Evitar filtraciones de agua a la base.

Permanente/Control de paso de vehículos pesados. Preservar la integridad estructural.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción:

INSTALACION DE SEÑALIZACION



Descripción:

INSTALACION DE SEÑALIZACION

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ".

DOCUMENTOS PARA RECIBO FINAL

INFORME 1 DE INTERVENTORÍA
Periodo comprendido entre el 27 de noviembre del 2025 al 26 de diciembre del 2025
TOMO No 1

CONTRATO DE OBRA No 1943-2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2025

CONTRATO: [X] CONVENIO: [ ]

CONTRATO O CONVENIO No:	1071 DEL 18/07/2025
CLASE DE CONTRATO	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	

OBJETO DEL CONTRATO
"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)".

DATOS DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social:	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Identificación:	C.C 1.113.304.913 DE SEVILLA (V)
Si hubo cesión del contrato, indique los datos del cesionario:	N/A
Nombre o Razón Social:	N/A
Identificación:	N/A

VIGENCIA DEL CONTRATO			
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES	**VALOR INICIAL**	$ 25.222.194 M/CTE
FECHA DE INICIO	27/10/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	26/01/2026

GARANTIAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA					
	AMPARO	**POLIZA No.**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			DESDE	**HASTA**	
SEGUROS DEL ESTADO S. A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101295598 Anexo 0 Fecha Expedición: 22/07/2025	18/07/2025	30/04/2026	$ 2.522.219,40
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		18/07/2025	31/10/2028	$ 1.261.109,70
	CALIDAD DE SERVICIO		31/10/2025	31/10/2030	$ 2.522.219,40

Póliza aprobada por medio de la Plataforma Transaccional Secop II por Jensy Natalia López Oliveros en calidad de Jefe Oficina de Contratación Departamental el día 24/07/2025.

GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN ACTA DE INICIO				
SEGUROS DEL	**AMPARO**	**PÓLIZA No.**	**VIGENCIA**	**VALOR**

			DESDE	HASTA	ASEGURADO
ESTADO S. A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101295598 Anexo 2 Fecha Expedición: 30/10/2025	27/10/2025	09/08/2026	$ 2.522.219,40
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		27/10/2025	09/02/2029	$ 1.261.109,70
	CALIDAD DE SERVICIO		09/02/2026	09/02/2031	$ 2.522.219,40

Póliza aprobada por medio de la Plataforma Transaccional Secop II por Jensy Natalia López Oliveros en calidad de Jefe Oficina de Contratación Departamental el día 20/11/2025.

GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN ACTA DE RECIBO FINAL					
	AMPARO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S. A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101295598 Anexo 3 Fecha Expedición: 05/03/2026	27/10/2025	09/08/2026	$ 2.522.219,40
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		27/10/2025	09/02/2029	$ 1.261.109,70
	CALIDAD DE SERVICIO		04/03/2026	09/02/2031	$ 2.522.219,40

Póliza aprobada por medio de la Plataforma Transaccional Secop II por Jensy Natalia López Oliveros en calidad de Jefe Oficina de Contratación Departamental el día 09/03/2026.

GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN ACTA DE RECIBO FINAL					
	AMPARO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S. A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101295598 Anexo 4 Fecha Expedición: 05/03/2026	27/10/2025	09/08/2026	$ 2.522.219,40
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		27/10/2025	09/02/2029	$ 1.261.109,70
	CALIDAD DE SERVICIO		04/03/2026	04/03/2031	$ 2.522.219,40

Póliza aprobada por medio de la Plataforma Transaccional Secop II por Jensy Natalia López Oliveros en calidad de Jefe Oficina de Contratación Departamental el día 09/03/2026.

PAGOS EFECTUADOS

Concepto	Valor pagado	No. Orden de Pago y año	Amortización del Anticipo
Pagos	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$25.222.194,00
Valor Adicionado	$ 0,00
Valor disminuido del contrato	$ 0,00
Valor Total del Contrato	$25.222.194,00
Valor Contrato Ejecutado	$25.222.194,00
Valor Recibido por el Contratista	$ 0,00
Valor No Ejecutado a Favor del Departamento	$ 0,00
Saldo a Favor del Contratista	$25.222.194,00

La siguiente casilla aplica solo para convenios.	
Valor Aportado por la Gobernación	$ 0,00
Valor Aportado por el Contratista	$ 0,00
Saldo a Favor del Contratista Previo Descuentos	$ 0,00
Valor No Ejecutado a Favor del Departamento	$ 0,00
Valor Rendimientos Financieros	$ 0,00
Valor Total Girado Reintegrado al Departamento a dd/mm/aaaa a la cuenta departamental 598 02001000162	$ 0,00
Saldo FINAL a Favor del Contratista:	$ 0,00

Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro:

ANTICIPO	
Valor del Anticipo:	$ 0,00
Valor Amortizado:	$ 0,00
Saldo por amortizar:	$ 0,00

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O CONVENIO

Descripción	Marque con una X
Se efectuó a entera satisfacción de la Secretaría de Infraestructura Departamental:	X
No se efectuó a entera satisfacción de la Secretaría Infraestructura Departamental, por los siguientes motivos:	-
El contratista de interventoría cumplió durante la ejecución del mismo, con anexar los	X

soportes de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, en los términos y cuantías establecidos por la Ley.	

DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre: VIRGILIO BRAVO SOSA

Cargo: Secretario de Infraestructura Departamental

Dependencia: Secretaría de Infraestructura Departamental

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO

Cargo: Contratista

Dependencia: N/A

OBSERVACIONES DE LAS PARTES

1. Que el 18 de julio de 2025 la **Gobernación del Departamento de Putumayo** y el señor **DAVID ANDRES ENCISO ARANGO,** identificado con C.C. No. 1.113.304.913 de Sevilla (V), suscribieron el Contrato de interventoría No. 1071-2025 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)", con un plazo inicial de Tres (03) meses.

2. Que, el valor del contrato No. 1071 de 2025 es por VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($25.222.194,00), amparado bajo las Disponibilidad Presupuestal **No. 4676** del 22/12/2024 y Registro Presupuestal **No. 2025005052** del 18/07/2025, emitido por el profesional especializado del área.

3. Que, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, la Oficina de Rentas procedió a la liquidación de las estampillas el día veintitrés (23) de julio de 2025, conforme a las facturas Nos. 267391, 267392 y 267393, las cuales fueron canceladas por el contratista en la misma fecha, es decir, el 23 de julio de 2025, y se relacionan a continuación:

Estampilla	Valor	Factura
Pro Bienestar del adulto mayor	$ 1.261.000,00	267391
Instituto tecnológico del Putumayo	$ 757.000,00	267392
TASA PRO-DEPORTE	$ 631.000,00	267393
TOTAL	$ 2.649.000,00	

4. Que, el día 27 de octubre de 2025, entre el señor **VIRGILIO BRAVO SOSA,** en calidad de Secretario de Infraestructura Departamental, como **SUPERVISOR DEL CONTRATO,** y el señor **DAVID ANDRES ENCISO ARANGO,** identificado con C.C. No. 1.113.304.913 de Sevilla (S), en calidad de **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**, se suscribe el acta de inicio del contrato de interventoría No 1071 del 18 de julio de 2025, estableciendo en ella como fecha de inicio el 27/10/2025 y fecha de finalización el 26/01/2026.

5. Que, de acuerdo a la Plataforma Transaccional Secop II, el contrato de Interventoría No. 1071 de 2025, inició su ejecución el día 27 de octubre de 2025 y su finalización el día 26 de enero de 2026

conforme lo establecido en ACTA DE INICIO.

6. Que, el día 19 de diciembre de 2025, mediante radicado No.1943 se radico en la secretaria de infraestructura el informe No.1 de Interventoría del periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2025 hasta el 26 de noviembre de 2025, evidenciando una ejecución del 68.92% de las actividades contratadas.

7. Que, el día 30 de diciembre de 2025, mediante radicado No. 1973 se radico en la secretaria de infraestructura el informe No. 2 y Final de Interventoría del periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2025 hasta el 26 de diciembre de 2025, evidenciando una ejecución del 100% de las actividades contratadas.

8. Que, el día 04 de marzo de 2026, entre el Ing. **VIRGILIO BRAVO SOSA,** en calidad de Secretario de Infraestructura Departamental, como **SUPERVISOR DEL CONTRATO,** y el señor **DAVID ANDRES ENCISO ARANGO,** identificado con 1.113.304.913 de Sevilla (S), en calidad de **CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA**, se suscribe el **ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA** del contrato No. 1071 del 18/07/2025.

9. Se evidencia una incongruencia en el numeral 1 del Acta de Terminación del Contrato de Interventoría No. 1071-2025, toda vez que allí se consigna de manera incorrecta la fecha de terminación del proyecto. En efecto, conforme al Acta de Inicio suscrita el 27 de octubre de 2025, el contrato fue pactado con un plazo de ejecución de tres (3) meses, estableciendo como fecha de terminación inicial el 26 de enero de 2026. No obstante, en la ejecución real del contrato se verificó que el proyecto finalizó de manera anticipada el día 26 de diciembre de 2025, circunstancia que no fue correctamente reflejada en el acta de terminación. En consecuencia, se precisa que la fecha de terminación correcta del proyecto corresponde al 26 de diciembre de 2025, aclaración que se realiza con el fin de evitar interpretaciones erróneas y garantizar la coherencia entre los documentos contractuales y la realidad fáctica de la ejecución.

10. Que el día seis (06) de marzo de 2026, la contadora pública PAOLA YULIETH MENESES POTOSÍ, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.171.336 y tarjeta profesional No. 290326-T, certificó la verificación de los soportes presentados por el señor DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.113.304.913, expedida en Sevilla – Valle del Cauca, quien actúa en calidad de interventor del contrato de interventoría No. 1071-2025. En dicha certificación se deja constancia de que los comprobantes de pago y soportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, incluyendo salud, riesgos laborales y pensiones, se encuentran debidamente acreditados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, así:

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CARGO	MES CANCELADO SGSSS	NO. PLANILLA	CONCEPTO	VALOR APORTADO	EMPRESA	FECHA DE PAGO
DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO CC. 1.113.304.913 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	oct-25	7988229940	SALUD	$ 533.900,00	NUEVA EPS	14/10/2025
			PENSIÓN	$ 683.300,00	PORVENIR	14/10/2025
			RIESGOS	$ 44.600,00	POSITIVA	14/10/2025
DAVID ANDRÉS	nov-25	7991247291	SALUD	$ 533.900,00	NUEVA EPS	19/11/2025

ENCISO ARANGO CC. 1.113.304.913 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA			PENSIÓN	$	683.300,00	PORVENIR	19/11/2025
			RIESGOS	$	44.600,00	POSITIVA	19/11/2025
DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO CC. 1.113.304.913 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	dic-25	7995613781	SALUD	$	533.900,00	NUEVA EPS	4/12/2025
			PENSIÓN	$	683.300,00	PORVENIR	4/12/2025
			RIESGOS	$	44.600,00	POSITIVA	4/12/2025

11. Por lo anterior, se procede a liquidar el Contrato de interventoría No. 1071 del 18/07/2025, teniendo en cuenta lo señalado en la presente Acta y el informe de supervisión y cumplimiento del 03/03/2026, y los demás documentos que obran dentro del expediente contractual, que sirve de base para la liquidación del presente contrato.

12. Que, el día 03/03/2026, el Ing. **VIRGILIO BRAVO SOSA,** en calidad de Secretario de Infraestructura Departamental, como **SUPERVISOR DEL CONTRATO,** mediante el Informe de Supervisión y Cumplimiento de Contrato, hace constatar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.

13. Que el día diez (10) de marzo de 2026, el suscrito Secretario de Infraestructura Departamental del Putumayo, señor VIRGILIO BRAVO SOSA, certifica que el señor DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.113.304.913, expedida en Sevilla (Valle del Cauca), en calidad de contratista de interventoría, ha dado cumplimiento oportuno y adecuado a los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden frente al Sistema de Seguridad Social Integral y, cuando ha habido lugar, a los aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondientes al equipo mínimo de personal de interventoría vinculado para la ejecución del Contrato de Interventoría No. 1071-2025.

14. Que el día diez (10) de marzo de 2026, el suscrito Secretario de Infraestructura Departamental del Putumayo, señor VIRGILIO BRAVO SOSA, certifica que el señor DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.113.304.913, expedida en Sevilla (Valle del Cauca), en calidad de contratista de interventoría, cumplió a cabalidad con los ítems descritos en el Acta de Recibo Final, correspondientes a la ejecución de la interventoría, alcanzando el cien por ciento (100 %) del valor del Contrato de Interventoría No. 1071-2025.

15. Que cumplido el objeto del contrato se procede a efectuar la presente liquidación de conformidad con el Acta de Recibo Final del Contrato de Interventoría No. 1071 del 18/07/2025 suscrita el 04 de marzo de 2026 para lo cual, se procederá a pagar al Contratista de Interventoría el valor de **VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($25.222.194,00 M/CTE)**

16. Que las actividades derivadas del contrato No. 1071 del 18/07/2025, se han cumplido a cabalidad, por lo tanto, las partes quedan a paz y salvo por todo concepto relacionado con el referido contrato, una vez se cancelen los valores por pagar al contratista.

17. Que, cumplido el objeto del Contrato No. 1071 del 18/07/2025, se procede a efectuar la presente liquidación de conformidad con el Acta de Recibo Final de Interventoría.

18. Se deja constancia de que el DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO no es responsable de los

acuerdos y negocios pactados entre miembros de la comunidad y la firma Contratista por voluntad propia y de común acuerdo, como obras adicionales ajenas al objeto del presente contrato.

19. De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el supervisor designado por la entidad para el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de las prestaciones debidas por el contratista, certifica para efectos de la presente liquidación, hablar verificado el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista.

20. Que, cumplido el objeto del contrato, se procede a efectuar la presente liquidación y terminación

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

El artículo 11 de la ley 1150 de 2007 proscribe:

«La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

Establece el artículo 60 de la ley 80 de 1993, lo siguiente con respecto a la liquidación de los contratos estatales, el cual fue derogado en su inciso primero por el artículo 32 de la ley 1150 de 2007, salvo en la parte inicial: Artículo 60 De su Ocurrencia y Contenido Modificado por el art, 217, Decreto – ley 019 de 2012. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes , procedimiento que se efectuara dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

Ahora bien, si el termino de los cuatro meses a que se refiere el artículo 60 de la ley 80 de 1993 vencía sin que las partes hubieren podido llegar a un acuerdo sobre la liquidación bilateral o sin que el contratista siquiera concurriera a su práctica, de conformidad con lo dispuesto por el literal d) del artículo 44 (inc., 10. °) de la ley 446 de 1998, la administración contaba con un término de dos meses para liquidar de manera unilateral el contrato.

Por lo anterior, aplicando las citas normativas y jurisprudenciales, las partes se encuentran dentro del lapso legal para suscribir la liquidación.

SALVEDADES DE LAS PARTES

"Que, para efectos de la presente liquidación, la Oficina de Contratación solo funge como apoyo en la revisión de la competencia para liquidar y revisión del texto jurídico del acta de liquidación, conforme a que es el interventor y/o supervisor el encargado de certificar el cumplimiento del contrato y garantizar el seguimiento jurídico, técnico y financiero de la ejecución del mismo, teniendo en cuenta los deberes establecidos en el artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 así como las responsabilidades contempladas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido en el artículo 33 y siguientes del

Manual de Contratación del Departamento".

Las partes acuerdan que, con la firma de la presente acta de liquidación bilateral, dejan constancia que no existen salvedades para alguna reclamación futura sobre la ejecución del presente contrato.

FIRMAS DEL ACTA

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. Una vez la Gobernación del Departamental del Putumayo consigne a favor del contratista el valor de **VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($25.222.194,00).** Una vez se efectué la radicación de la cuenta correspondiente.

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y de la Ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.

Dada en Mocoa a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2026.

El Contratista de Interventoria:	El Supervisor:
DAVID ANDRES ENCISO ARANGO C.C No. 1.113.304.913 Contrato de Interventoría No. 1071 del 18/07/2025	**VIRGILIO BRAVO SOSA** Secretario de Infraestructura Departamental Supervisor del Contrato

V.B. Ordenador del Gasto o su delegado:

JAIRO FAVIAN ROSERO VALLEJO
Secretario de Servicios Administrativos Departamental con funciones de ordenación del gasto, según Decreto No. 004 del 03/01/2025

Elaboró	Karoll Lasso Fernández	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional Especializado SID
Revisó	Dario Guerrero Palacios	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional Jurídico SID
Revisó	Maritza Yaneth Osorio	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional Financiero SID
Revisó	Mabel Xiomara Figueroa Fajardo	Oficina de Contratación Departamental	Profesional de apoyo Jurídico OCD
Revisó	Mauricio Jiménez Dueñas	Oficina de Contratación Departamental	Profesional apoyo Técnico OCD
Revisó	Jensy Natalia López Oliveros	Oficina de Contratación Departamental	Jefe de Oficina de Contratación
Revisó	Laura Christina Benavides	Secretaria de Servicios Administrativos Departamental	Profesional Jurídico

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

CONCEPTO Y APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA
INFORME DE RELACIÓN Y MANEJO DEL ANTICIPO

Proyecto: **MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Contrato de Obra No.: **1943-2024**
Entidad Contratante: **GOBERNACION DEL PUTUMAYO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
Contratista: **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**
Contrato de Interventoría No.: **1071-2025**
Interventoría: **ING. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO**
Fecha: **31 DE OCTUBRE DE 2025 – MOCOA PUTUMAYO**

ASUNTO: Concepto de interventoría sobre relación del anticipo presentado por el contratista.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de interventoría, y de conformidad con lo establecido en la normativa vigente aplicable a la contratación estatal, la interventoría realizó la revisión de la documentación de Relación y Manejo del Anticipo presentado por el contratista CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA.

1. REVISIÓN DEL INFORME

El contratista reporta los siguientes eventos:

El contratista presenta la relación detallada del uso del anticipo, incluyendo:

- formato plan de inversión del anticipo
- desglose del plan de inversión del anticipo
- documento ejecutivo de entrega del plan de inversión del anticipo
- resumen financiero del anticipo
- cronograma de ejecución financiera (detalle semanal)
- mecanismos de control y seguimiento

2. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

Una vez evaluada la información aportada por el contratista de obra, De la verificación realizada, la interventoría concluye:

2.1 Destinación de los recursos:
Se evidencia que los recursos del anticipo han sido destinados a actividades propias del contrato.

2.2 Manejo financiero:
Existe cuenta bancaria exclusiva para el manejo del anticipo.

2.3 Soporte documental:
Los gastos están debidamente soportados.

2.4 Amortización del anticipo:

Porcentaje amortizado: 0 %
Saldo por amortizar: $ 120.664.693,00

3. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA
Con base en la revisión técnica, financiera y documental, la interventoría emite concepto:

- **FAVORABLE** sobre a la relación y manejo del anticipo presentado.

5. DECISIÓN DE LA INTERVENTORÍA
Con base en lo expuesto, la interventoría:

- **APRUEBA** el informe de relación del anticipo.

Se deja constancia de lo anterior para efectos contractuales y de control fiscal.

Atentamente;

ING. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matricula No.: 63202-220004 QND

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoe@gmail.com

GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA No.	01	DEL	4/03/2026	Contrato No.	1071	DE	18/07/2025
CONTRATISTA				DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO			

NUMERO DE CONTRATO	1071 DEL 18 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA	DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
IDENTIFICACIÓN	C.C 1.113.304.913 DE SEVILLA VALLE
OBJETO	"MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)".
LUGAR DE EJECUCIÓN	INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN – MUNICIPIO DE MOCOA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 25.222.194,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 25.222.194,00
FORMA DE PAGO	**PAGOS POR ACTAS PARCIALES** Hasta el 90% del valor del contrato, se cancelará mediante la presentación de actas de recibo parciales de avance obra, debiendo acreditar un avance en la ejecución efectiva de la obra de mínimo el cincuenta por ciento (50%) para el pago del primer Acta parcial. Para el pago de las Actas se reunirán el Contratista y el Interventor, efectuarán las mediciones a que haya lugar y, prepararán el acta correspondiente la cual, para su trámite, requerirá el Visto Bueno del Supervisor designado de la entidad, además de los informes de interventoría respectivos y de la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión si se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista. **PAGO FINAL** El 10% restante del valor total del aporte del Departamento en el contrato a título de pago final, el cual se realizará la terminación del plazo de ejecución previa amortización del 100% del anticipo desembolsado, así como la aprobación y recibo final de la obra, realizado por el supervisor del contrato y presentación de soportes de liquidación. Se pagará al finalizar la obra en las condiciones requeridas y de la presentación de informes con registros fotográfico y demás anexos propios de la ejecución y del recibo final de obra, previa certificación de cumplimiento, sus informes de interventoría respectivos y de la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar y firma del acta de liquidación. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión si se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista.

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA No.	01	DEL	4/03/2026	Contrato No.	1071	DE	18/07/2025
CONTRATISTA				DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO			

PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE ENERO DE 2026 26-ENERO-2026
PERÍODO DE RECIBO	**Del:** 27 DE OCTUBRE DE 2025 **Al:** 26 DE ENERO DE 2026
VALOR PRESENTE ACTA	$ 25.222.194,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00
TOTAL, A PAGAR	$ 25.222.194,00

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Putumayo, a los cuatro (04) días, del mes de marzo de 2026, se reunieron: el señor **VIRGILIO BRAVO SOSA**, Secretario de Infraestructura Departamental, en calidad de SUPERVISOR; el señor **NILSON MOYA MENA**, representante legal del CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS y en calidad de Interventor, el ingeniero **DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**, con el fin de celebrar la presente Acta de Recibo Final del contrato de Interventoría No. 1071-2025, previstas las siguientes consideraciones:

1. Que, el dia 27/10/2025 las partes suscribieron el ACTA DE INICIO del contrato de interventoría No.1071 del 18/07/2025, con un plazo de ejecución de tres (03) meses, con fecha de terminación No. 01 el 26/01/2026.

2. Que, el dia 04/03/2026 se suscribe el Acta De Recibo Final de contrato de obra No. 1943-2024 entre la secretaria de Infraestructura Departamental, Interventoría y Contratista de Obra.

3. Que la presente Acta de Recibo Final se suscribe en cumplimiento de las subsanaciones y ajustes realizados por el contratista, en atención a las observaciones, requerimientos técnicos y administrativos consignados en los informes de seguimiento emitidos los días 16 y 30 de diciembre de 2025, los cuales fueron debidamente notificados y atendidos dentro de los plazos establecidos.

4. Que, en los informes de interventoría, se presentan las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido desde el **Del:** 27 DE OCTUBRE DE 2025 **Al:** 26 DE ENERO DE 2026, registradas en el Acta Final de obra que fueron presentadas por el contratista de obra y aprobadas por la interventoría, siendo estos, documentos complementarios de la presente acta.

5. Que el interventor, en acompañamiento de la Gobernación de Putumayo y previa verificación física en sitio, se evaluó el cumplimiento de terminación de la obra del Contrato No. 1943-2024, constatando que las cantidades de obra ejecutadas corresponden a las efectivamente medidas, verificadas y aceptadas, conforme a las actas de obra, cortes y balances finales, las cuales se detallan a continuación y constituyen el soporte técnico del cierre contractual:

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA No.	01	DEL	4/03/2026	Contrato No.	1071	DE	18/07/2025
CONTRATISTA				DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO			

OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO DE OBRA — 100,00 ML

ESPECIFICACIÓN INVIAS	ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor parcial	Valor total
	1	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO					$ 334.842.831,00
3P	1,1	Localizacion y replanteo, incluye andenes	m²	840,00	$ 2.500,00	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
210,12	1,2	Excavacion en material comun a maquina de la explanacion (incluye desalojo)	m³	268,66	$ 50.631,00	$ 13.603.570,00	$ 13.603.570,00
630	1,3	Pavimento de concreto hidraulico (MR 3,8)	m³	113,40	$ 880.552,00	$ 99.855.701,00	$ 99.855.701,00
221,1	1,4	Suministro e instalacion de material seleccionado	m³	38,13	$ 84.375,00	$ 3.211.729,00	$ 3.211.729,00
320,1	1,5	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelado, humedecido y compactado).	m³	94,50	$ 150.548,00	$ 14.226.786,00	$ 14.226.786,00
232,1	1,6	Suministro e instalacion de geotextil para estabilizacion de suelos de sobrecanto y capas granulares (NT 2400 o similar)	m²	660,00	$ 12.899,00	$ 8.254.350,00	$ 8.254.350,00
672,1	1,7	Bordillos de concreto 3000PSI	m3	4,90	$ 675.499,00	$ 3.309.945,00	$ 3.309.945,00
	1,8	Acero de refuerzo 3/8" bordillo	Kg	127,10	$ 6.132,00	$ 779.377,00	$ 779.377,00
640	1,09	Canastillas en acero de refuerzo de 34000 PSI, Ø 1/4", Pasajuntas	Un	370,00	$ 21.636,00	$ 3.710.420,00	$ 3.710.420,00
640	1,10	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Transversal	Kg	604,40	$ 6.180,00	$ 3.747.280,00	$ 3.747.280,00
640	1,11	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi). Longitudinal	Kg	70,50	$ 11.093,00	$ 782.057,00	$ 782.057,00
410P	1,12	Corte juntas de Expansión y su respectivo sellado	ml	97,97	$ 17.825,00	$ 1.721.565,00	$ 1.721.565,00
	2	ANDENES					$ 21.712.864,00
3P	2,1	Excavacion en material comun en zona a mano (incluye retiro)	m³	36,00	$ 41.446,00	$ 1.492.056,00	1.492.056,00
630P	2,2	Subbase granular (incluye suministro, extendido, nivelado, humedecido y compactado)	m³	43,00	$ 150.168,00	$ 6.457.224,00	6.457.224,00
	2,3	Anden en concreto clase D (3000 PSI) e=0,10 m	m²	21,00	$ 677.390,00	$ 14.225.190,00	14.225.190,00
640	2,4	Malla Electrosoldada M-272 (5,0 x 15,6 mm) 4 mm	kg	469,56	$ 12.324,00	$ 5.786.372,00	5.786.372,00
	3	SEÑALIZACION					$ 23.080.768,00
710	3,1	Señal vertical con lamina retroreflectiva (informativa, preventiva y reglamentaria, incluye estructura de soporte y anclaje)	un	4,00	$ 392.204,00	$ 1.567.812,00	1.567.812,00
	3,2	Demarcacion con pintura vinilo de tipo color amarillo para delineacion tipo central	ml	196,00	$ 15.488,00	$ 2.433.472,00	2.920.166,40
	3,3	Demarcacion con pintura vinilo de tipo color blanco para delineacion para canales y zona de cebras (incluye microesferas)	m2	12,50	$ 28.118,00	$ 356.475,00	356.475,00
	3,4	Demarcacion con pintura vinilo de tipo color blanco para flechas sobre pavimento (incluye microesferas)	m2	180,00	$ 90.904,00	$ 18.109.880,00	18.109.880,00
	3,5	Suministro e instalacion de tachas	un	40,00	$ 16.419,00	$ 602.208,00	602.208,00
		Valor parcial directo					$ 308.616.378,00

Administración	11,00%
Imprevistos	1,00%
Utilidad	5,00%
SUBTOTAL (A)	17,00%

$ 364.374.051,00
$ 34.161.891,00
$0,00
$ 70.445.126,00

		Subtotal obra (A)					$ 777.175.421,00
		COSTOS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO					$ 35.686.068,00
		REVISION PARA EL PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	UND	1,00	$ 10.943.590,00	$ 10.943.590,00	
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1,00	$ 24.742.510,00	$ 24.742.510,00	
		Costo total obra					$ 812.861.489,00
		Valor aportado por la gobernacion					$ 741.329.396,00
		Valor aportado por Consejo Gobernacion Los Acacios					$ 70.621.213,00
		Valor total del proyecto					$ 811.950.609,00

6. Que, Interventoría certifica que las actividades ejecutadas en la presente acta se realizaron siguiendo las Normas Técnicas Colombianas aplicables y bajo las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA No.	01	DEL	4/03/2026	Contrato No.	1071	DE	18/07/2025
CONTRATISTA				DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO			

7. Las partes acuerdan, que durante la ejecución del contrato no surgieron otras situaciones que crearan a su favor haberes económicos adicionales al contratista, relacionada a actividades adicionales o diferentes a los técnicos establecidos en la presente acta de recibo final.

8. Que, Interventoría Certifica que el Contratista de obra cumplió con los aportes de seguridad social y parafiscales de los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato de Obra No. 1943 del 11 de octubre de 2024 para el periodo recibido y serán allegados a la supervisión para su posterior revisión.

CONCLUSIONES:

a. La INTERVENTORÍA certifica que la obra contratada se encuentra ejecutada y se recibe a entera satisfacción, el Departamento y la Interventoría hacen una verificación de las cantidades de obra contratadas vs las ejecutadas, dejando constancia, mediante la firma de esta acta, que las cantidades ejecutadas se reciben al 100%.

b. Se deja constancia de que el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA cumplió con el objeto contratado en un 100% dentro del plazo establecido.

c. Se deja constancia de que el DEPARTAMENTO no es responsable de los acuerdos y negocios pactados entre miembros de la comunidad y la firma Contratista por voluntad propia y de común acuerdo, como obras adicionales ajenas al objeto del presente contrato.

d. Por lo anterior, el Contratista y la Interventoría hacen entrega oficial de la obra ejecutada al Departamento, la cual fue constatada y recibida a entera satisfacción de las partes considerando que se entregan soportes que evidencian el cumplimiento del objeto contratado.

e. El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA certifica que el CONSEJO COMUNITARIOS LAS ACACIAS, cumplió con el pago de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones y ARL y se encuentra a Paz y Salvo durante el tiempo de ejecución de la obra, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002, Artículo 50 y Ley 1150 de 2007.

f. El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se compromete a poner en conocimiento de la correspondiente aseguradora, el presente evento y a actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite para la aprobación del certificado de modificación de las Garantías a que haya lugar ante la Gobernación de Putumayo.

Para que esta Acta produzca efectos vinculantes, debe ser suscrita por el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y el SUPERVISOR DEL CONTRATO. Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de recibo final de mutuo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 con los soportes de información del beneficiario.

Por lo anterior, el contratista y la interventoría hacen entrega oficial de la obra ejecutada al Departamento, la cual fue constatada y con el aval de la interventoría, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción de las partes considerando que se entregan soportes que evidencian el cumplimiento de las actividades para la entrega de la obra física funcional.

GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA No.	01	DEL	4/03/2026	Contrato No.	1071	DE	18/07/2025
CONTRATISTA				DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO			

La Secretaria de Infraestructura de Departamental como supervisión del contrato, procede en virtud de la buena fe de presunción de legalidad de la información presentada y avalada por interventoría en el marco de sus competencias legales, además, de las descritas en la minuta contractual. Se presenta el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 25.222.194,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 25.222.194,00
PRESENTE ACTA	
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 25.222.194,00
VALOR AMORTIZADO	$ 0,00
TOTAL, NETO A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL	**$ 25.222.194,00**
ACUMULADO DE PAGOS NETOS	
ANTICIPO	$ 0,00
ACTA PARCIAL 01	$ 25.222.194,00
TOTAL, PAGOS ACUMULADOS	**$ 25.222.194,00**
SALDOS	
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ 0,00

En constancia, se firma en Mocoa (Putumayo) a los cuatro (04) días del mes de Marzo de 2026.

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
NILSON MOYA MENA R.L. CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	**DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO** CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
SUPERVISIÓN	
VIRGILIO BRAVO SOSA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	

Elaboró	Karoll Daniela Lasso	Secretaría de Infraestructura Departamental	Profesional apoyo Técnico SID
Revisó	Ximena Cerón	Secretaría de Infraestructura Departamental	Profesional apoyo Jurídico SID
Revisó	Maritza Yaneth Osorio	Secretaría de Infraestructura Departamental	Profesional apoyo Financiero SID

APROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM: IMPREVISTOS – ACTIVIDADES EJECUTADAS

PROYECTO:
Mejoramiento mediante pavimento rígido desde el parque principal al embarcadero de la inspección de Puerto Limón, municipio de Mocoa, departamento del Putumayo.

1. OBJETO DE LA APROBACIÓN

La presente tiene por objeto **aprobar técnicamente las especificaciones de las actividades ejecutadas bajo el ítem de IMPREVISTOS (3%)**, las cuales no se encontraban contempladas en los diseños iniciales, pero fueron necesarias para garantizar la funcionalidad, estabilidad y continuidad del proyecto.

2. ACTIVIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS

✔ 2.1 Canalización de aguas superficiales en andenes

Unidad: Metro lineal (ml)
Cantidad ejecutada: 50 ml

Especificaciones técnicas:

- Excavación manual en material común
- Conformación de sección hidráulica
- Pendiente mínima garantizada para escorrentía
- Concreto simple (f'c ≈ 2.500 psi o equivalente)
- Acabado liso y alineado
- Disposición de material sobrante

☑ Cumplimiento:

Se verificó que la actividad cumple con criterios de:

- Drenaje superficial
- Protección de estructura vial
- Buenas prácticas constructivas

Estado: APROBADO

✔ 2.2 Concreto ciclópeo para contención de andenes

Unidad: Metro lineal (ml)
Cantidad ejecutada: 20 ml
Ubicación: K0+55 a K0+75

Especificaciones técnicas:

- Excavación para cimentación
- Base compactada
- Concreto ciclópeo (mezcla de concreto + piedra de gran tamaño)
- Correcta trabazón del material pétreo
- Geometría adecuada para contención
- Control de verticalidad y alineamiento

☑ **Cumplimiento:**

Se verificó que la estructura:

- Cumple función de contención lateral
- Garantiza estabilidad del andén
- Responde a condiciones geotécnicas del sitio

- **Estado:** APROBADO

✔ **2.3 Demolición de estructuras de concreto existentes**

Unidad: Metro cúbico (m³)

✦ **Elementos intervenidos:**

- Andenes deteriorados
- Columnas
- Zapata de portón

✦ **Especificaciones técnicas:**

- Demolición manual y/o mecánica controlada
- Corte de elementos estructurales
- Retiro y cargue de escombros
- Transporte y disposición final autorizada

☑ **Cumplimiento:**

- Eliminación total de interferencias
- Área liberada para ejecución de obra
- Cumplimiento ambiental básico

- **Estado:** APROBADO

✔ **2.4 Ajustes finales de obra**

Unidad: Global

✦ **Actividades incluidas:**

- Empalmes entre estructuras

- Ajustes de nivelación
- Corrección de pendientes
- Adecuaciones menores

Especificaciones técnicas:

- Cumplimiento de cotas de diseño
- Continuidad geométrica
- Transición adecuada entre elementos
- Acabados finales uniformes

Cumplimiento:

- Integración adecuada de las estructuras
- Mejora funcional del proyecto
- Cumplimiento técnico en obra

- **Estado:** APROBADO

3. CONCEPTO DE INTERVENTORÍA

Una vez revisadas las condiciones de ejecución en campo, los procedimientos constructivos y los resultados obtenidos, la interventoría **emite concepto técnico favorable**, determinando que:

- Las actividades ejecutadas son **técnicamente procedentes**
- Se ajustan a las **condiciones reales del terreno**
- Cumplen con criterios de **ingeniería y funcionalidad vial**
- Se encuentran dentro del alcance del **ítem de imprevistos (3%)**

4. CONCLUSIÓN

En virtud de lo anterior, se **APRUEBAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES**, autorizando su inclusión dentro del avance de obra y su respectivo reconocimiento [illegible]

FIRMAS

INTERVENTOR
DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

Nilson Moya.
CONTRATISTA
CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

GOBERNACIÓN DEL
PUTUMAYO
NIT. 800.094.184-1

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que, el señor **DAVID ANDRES ENCISO ARANGO** con C.C No. 1.113.304.913 de Sevilla (V), en calidad de contratista de Interventoría, ha dado cumplimiento con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social y cuando ha habido lugar con los aportes a Caja de Compensación Familiar, del equipo mínimo y personal de Interventoría en la ejecución del contrato No. 1071 del 18/07/2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

La presente certificación se expide, teniendo en cuenta la certificación presentada por la contadora **PAOLA YULIET MENESES POTOSI** TP 290326 de fecha de 06 de marzo de 2026 mediante la cual certifica que el señor DAVID ANDRES ENCISO ARANGO, identificado con C.C No. 1.113.304.913 de Sevilla (V) ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales corresponde al tiempo de ejecución del contrato de Interventoría de conformidad a lo previsto por el (Artículo 50 Ley 789 de 2002).

Para constancia se firma en Mocoa Putumayo a los diez (10) días del mes de marzo de 2026.

VIRGILIO BRAVO SOSA
Secretario de Infraestructura Departamental del Putumayo

Elaboró:	Karoll Daniela Lasso	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de apoyo Técnico - SID
Revisó:	Ximena Cerón	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de apoyo Jurídico - SID
Revisó:	Dario Guerrero Palacios	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de apoyo Jurídico - SID

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
NIT. 800.094.164-4

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que, el señor **DAVID ANDRES ENCISO ARANGO** con C.C No. 1.113.304.913 de Sevilla (V), en calidad de contratista de Interventoría, cumplió a cabalidad el con los ítems descritos en el acta de recibo final correspondientes a ejecución de Interventoria de un 100%, el valor acumulado de ejecución es de 100% del valor del contrato de Interventoria No. 1071-2025 del 18/07/2025 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

La presente certificación se expide teniendo en cuenta la aprobación por parte del contratista de Interventoría, como se evidencia en los entregables de manera física y magnética, presentados a la entidad contratante.

Para constancia se firma en Mocoa Putumayo a los diez (10) días del mes de marzo de 2026.

VIRGILIO BRAVO SOSA
Secretario de Infraestructura Departamental del Putumayo

Elaboró:	Karoll Daniela Lasso	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de apoyo Técnico - SID	
Revisó:	Ximena Cerón	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de apoyo Jurídico - SID	
Revisó:	Dorio Guerrero Palacios	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de apoyo Jurídico - SID	

CONCEPTO Y APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA
INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS

Proyecto: **MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
Contrato de Obra No.: **1943-2024**
Entidad Contratante: **GOBERNACION DEL PUTUMAYO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
Contratista: **CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS**
Contrato de Interventoría No.: **1071-2025**
Interventoría: **ING. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO**
Fecha: **16 DE ABRIL DE 2026 – MOCOA PUTUMAYO**

ASUNTO: Concepto de interventoría sobre el informe de justificación de imprevistos presentado por el contratista

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, la interventoría realizó la revisión integral técnica, administrativa, financiera y jurídica del Informe de Justificación de Imprevistos presentado por el contratista CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS RL. NILSON MOYA MENA.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPREVISTOS

El contratista reporta los siguientes eventos:

- Canal en concreto simple para manejo de escorrentía (incluye excavación conformación y vaciado): $ 2.000.000
- Muro en concreto ciclópeo para contención (incluye excavación, piedra y concreto): $ 2.400.000
- Demolición de concreto (andenes, columnas y zapata de portón) incluye retiro y disposición: $ 900.000
- Ajustes constructivos, perfilado, empalmes y adecuación final: $ 866.095

Valor Total: $ 6.166.095 mcte.

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

DAVID ENCISO
INGENIERO CIVIL

2. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA
Una vez evaluada la información aportada por el contratista de obra informes técnicos, registros fotográficos, bitácora de obra, y demás soportes, la interventoría concluye:

2.1 Naturaleza del imprevisto:
Se verifica que los hechos corresponden a situaciones no previsibles al momento de estructuración del contrato y sobrevinientes durante la ejecución

2.2 Soporte técnico:
Los eventos se encuentran debidamente soportados.

2.3 Responsabilidad:
La interventoría establece que la ocurrencia de los hechos es no imputable al contratista

3. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA
Con fundamento en el análisis realizado, la interventoria emite concepto:

- **FAVORABLE** frente a la justificación de los imprevistos.

5. DECISIÓN DE LA INTERVENTORÍA
Con base en lo expuesto, la interventoría:

- **APRUEBA** el informe de justificación de imprevistos.

De ante mano agradezco su atención y colaboración a la presente

Atentamente,

ING. DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
INGENIERO CIVIL - INTERVENTOR
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla Valle
Matricula No. 63202-220004 QND

Dirección: Cra 2 Cl 2 Casa # 4 – Puerto Caicedo
Celular: 3105526416
Correo: davidencisoa@gmail.com

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-GCO-121
	INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSION: 02
		FECHA: 10/10/2025

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 03/03/2026	Nombre del Contratista: **DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**		No. Contrato: **1071 DEL 18/07/2025**
Periodo del informe:	Desde el 27/11/2025 hasta el 26/12/2025		
Objeto del contrato: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	C.C 1.113.304.913 DE SEVILLA (V)		
Dirección	CL 5 CR 9 ESQ BRR EL RECREO		
Teléfono	3105526416		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros No. 00130882000200017387		Banco: BBVA
Fecha de suscripción	18/07/2025		
Fecha de Iniciación	27/10/2025		
Fecha de Terminación	26/01/2026		
Plazo Inicial	03 MESES		
Prorrogas (Tiempo)	Prorroga N.1	N/A	N/A
	Prorroga N.2	N/A	N/A
Plazo Total	03 MESES		
Valor Inicial	$ 25.222.194,00		
Adiciones (Valor)	Adición N.1	N/A	N/A
	Adición N.2	N/A	N/A
Valor Total	$ 25.222.194,00		
Suspensiones: (fecha)	N/A	En días y/o Meses:	N/A
Reanudaciones: (fecha)	N/A		
Terminación Anticipada:	N/A		
PAGO ANTICIPADO	Fecha del pago anticipado:		N/A
	Valor del pago anticipado		$ 0,00
ANTICIPO	Desembolso del anticipo:		$ 0,00
	Valor del anticipo:		$ 0,00
	Amortización del anticipo		
	Valor anticipo amortizado		$ 0,00
	Saldo anticipo por amortizar		$ 0,00
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:		$0,00
	Tiempo de Ejecución:		3 MESES
	Porcentaje de Ejecución:		100%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:		$ 25.222.194,00
	(+) Adiciones:		$ 0,00

	(-) Reducciones:	$ 0,00
	(=) Valor Total del contrato:	$ 25.222.194,00
	Valor a pagar con la presente Acta	**$ 25.222.194,00**
	Saldo del contrato	$ 0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No	DAE6097
	Fecha de la factura	13/03/2026
	Valor antes de IVA	$ 25.222.194,00
	IVA	$ 0,00
	Impo-Consumo	$ 0,00
	(-) Notas Crédito	$ 0,00
	(+) Notas Debito	$ 0,00
	(-) Descuentos o Glosas	$ 0,00
	(-) Amortización de Anticipo	$ 0,00
	Neto a Pagar	**$ 25.222.194,00**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Póliza C.E No: 41-44-101295598 expedida el 22/07/2025 ANEXO 0	Aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO S.A) Fecha de aprobación: 24/07/2025	
	Póliza C.E No: 41-44-101295598 expedida el 30/10/2025 ANEXO 1	Aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO S.A) Fecha de aprobación: 20/11/2025	
	Póliza C.E No: 41-44-101295598 expedida el 30/10/2025 ANEXO 2	Aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO S.A) Fecha de aprobación: 20/11/2025	
	Póliza C.E No: 41-44-101295598 expedida el 05/03/2026 ANEXO 3	Aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO S.A) Fecha de aprobación: 09/03/2026	
	Póliza C.E No: 41-44-101295598 expedida el 05/03/2026 ANEXO 4	Aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO S.A) Fecha de aprobación: 09/03/2026	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
	No. C.D.P Inicial:	4676	23/09/2024
	Registro Presupuestal		
	No. R.P Inicial:	2025005052	18/07/2025
	Estampillas Departamentales		
	Pro Bienestar del Adulto Mayor	267391	23/07/2025

	Instituto tecnológico del putumayo		267392	23/07/2025
	TASA PRO-DEPORTE		267393	23/07/2025
	Aportes de Seguridad Social			
	No de Planilla 7995813781 DIC/2025	SALUD	Entidad: NUEVA EPS Fecha: 2025/12/04 Valor: $553.900	
		PENSIÓN	Entidad: PORVENIR Fecha: 2025/12/04 Valor: $683.300	
		RIESGOS LABORALES	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A Fecha: 2025/12/04 Valor: $44.600	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor deja constancia que, en el marco del Contrato de Interventoria No. 1071-2025, suscrito el 18 de julio de 2025 entre el Departamento del Putumayo y el señor DAVID ANDRES ENCISO ARANGO, identificado con C.C 1.113.304.913 de Sevilla (V), y conforme a la revisión de la documentación que reposa en el expediente contractual, las actividades ejecutadas por el contratista de interventoría se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones pactadas. Se deja constancia que, a la fecha de presentación del presente informe, las pólizas contractuales se encuentran vigentes y debidamente actualizadas, de acuerdo con los requisitos establecidos en el contrato. Así mismo, se certifica que el contratista dio cumplimiento a sus obligaciones en materia de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás contribuciones a que está legalmente obligado. Para tal efecto, se anexa: Certificación expedida por el contador público PAOLA YULIET MENESES POTOSI, TP 290326-T, con fecha de certificación del 06 de marzo de 2026. De igual manera, la Gobernación del Putumayo designó al señor David Andrés Enciso Arango, identificado con C.C. No. 1.113.304.913, como Interventor del contrato, asignándole funciones de vigilancia, control y seguimiento durante la ejecución contractual. Dichas funciones estuvieron orientadas a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, actividades administrativas, requerimientos socioambientales, legales y presupuestales, así como las demás obligaciones y responsabilidades contractuales.			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-GCO-121
	INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSION: 02
		FECHA: 10/10/2025

	El presente Informe de Supervisión se suscribe en observancia del principio de buena fe y bajo la presunción de legalidad de la documentación presentada ante la Secretaría de Infraestructura Departamental por el respectivo interventor.	
	Valor a pagar:	**Veinticinco millones doscientos veintidós mil ciento noventa y cuatro pesos M/CTE**
		$ 25.222.194,00
DOCUMENTO SOPORTES	• Informe mensual de ejecución en medio físico • Factura Original. • Copia de Rut. • Copia de Liquidación de Estampillas. • Recibo de pago de Estampillas. • Certificación de pago de seguridad social • Certificación Parafiscales • Certificación bancaria vigente	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME		
Supervisor: **VIRGILIO BRAVO SOSA** Secretario de Infraestructura Departamental Secretaria de infraestructura departamental		Firma

Elaboró	Ing. Karoll Daniela Lasso	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de apoyo Técnico - SID	
Revisó:	Maritza Yaneth Osorio	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de apoyo Financiero - SID	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-GCO-121
	INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSION: 02
		FECHA: 10/10/2025

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 16/02/2026	Nombre del Contratista: **DAVID ANDRES ENCISO ARANGO**		No. Contrato: **1071 DEL 18/07/2025**
Periodo del informe:	Desde el 27/10/2025 hasta el 26/11/2025		
Objeto del contrato: "MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".			
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	C.C 1.113.304.913 DE SEVILLA (V)		
Dirección	CL 5 CR 9 ESQ BRR EL RECREO		
Teléfono	3105526416		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros No. 00130882000200017387		Banco: BBVA
Fecha de suscripción	18/07/2025		
Fecha de Iniciación	27/10/2025		
Fecha de Terminación	26/01/2026		
Plazo Inicial	03 MESES		
Prorrogas (Tiempo)	Prorroga N.1	N/A	N/A
	Prorroga N.2	N/A	N/A
Plazo Total	03 MESES		
Valor Inicial	$ 25.222.194,00		
Adiciones (Valor)	Adición N.1	N/A	N/A
	Adición N.2	N/A	N/A
Valor Total	$ 25.222.194,00		
Suspensiones: (fecha)	N/A	En días y/o Meses:	N/A
Reanudaciones: (fecha)	N/A		
Terminación Anticipada:	N/A		
PAGO ANTICIPADO	Fecha del pago anticipado:		N/A
	Valor del pago anticipado		$ 0,00
ANTICIPO	Desembolso del anticipo:		$ 0,00
	Valor del anticipo:		$ 0,00
	Amortización del anticipo		
	Valor anticipo amortizado		$ 0,00
	Saldo anticipo por amortizar		$ 0,00
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:		$ 0,00
	Tiempo de Ejecución:		3 MESES
	Porcentaje de Ejecución:		50%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:		$ 25.222.194,00
	(+) Adiciones:		$ 0,00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-GCO-121
	INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSION: 02
		FECHA: 10/10/2025

	(-) Reducciones:		$ 0,00
	(=) Valor Total del contrato:		$ 25.222.194,00
	Valor a pagar con la presente Acta		$ 0,00
	Saldo del contrato		$ 25.222.194,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No		N/A
	Fecha de la factura		N/A
	Valor antes de IVA		$ 0,00
	IVA		$ 0,00
	Impo-Consumo		$ 0,00
	(-) Notas Crédito		$ 0,00
	(+) Notas Debito		$ 0,00
	(-) Descuentos o Glosas		$ 0,00
	(-) Amortización de Anticipo		$ 0,00
	Neto a Pagar		$ 0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Póliza C.E No: 41-44-101295598 expedida el 22/07/2025 ANEXO 0		Aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO S.A) Fecha de aprobación: 24/07/2025
	Póliza C.E No: 41-44-101295598 expedida el 30/10/2025 ANEXO 1		Aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO S.A) Fecha de aprobación: 20/11/2025
	Póliza C.E No: 41-44-101295598 expedida el 30/10/2025 ANEXO 2		Aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO S.A) Fecha de aprobación: 20/11/2025
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
	No. C.D.P Inicial:	4676	23/09/2024
	Registro Presupuestal		
	No. R.P Inicial:	2025005052	18/07/2025
	Estampillas Departamentales		
	Pro Bienestar del Adulto Mayor	267391	23/07/2025
	Instituto tecnológico del putumayo	267392	23/07/2025
	TASA PRO-DEPORTE	267393	23/07/2025
	Aportes de Seguridad Social		
	No de Planilla 7988229940 MES OCT/2025	SALUD	Entidad: NUEVA EPS Fecha: 2025/10/14 Valor: $553.900
		PENSIÓN	Entidad: PORVENIR Fecha: 2025/10/14

			Valor: $683.300
		RIESGOS LABORALES	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A Fecha: 2025/10/14 Valor: $44.600
	No de Planilla 7991247291 MES NOV/2025	SALUD	Entidad: NUEVA EPS Fecha: 2025/11/19 Valor: $553.900
		PENSIÓN	Entidad: PORVENIR Fecha: 2025/11/19 Valor: $683.300
		RIESGOS LABORALES	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A Fecha: 2025/11/19 Valor: $44.600
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor deja constancia que, en el marco del Contrato de Interventoria No. 1071-2025, suscrito el 18 de julio de 2025 entre el Departamento del Putumayo y el señor DAVID ANDRES ENCISO ARANGO, identificado con C.C 1.113.304.913 de Sevilla (V), y conforme a la revisión de la documentación que reposa en el expediente contractual, las actividades ejecutadas por el contratista de interventoria se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones pactadas. Se deja constancia que, a la fecha de presentación del presente informe, las pólizas contractuales se encuentran vigentes y debidamente actualizadas, de acuerdo con los requisitos establecidos en el contrato. De igual manera, la Gobernación del Putumayo designó al señor David Andrés Enciso Arango, identificado con C.C. No. 1.113.304.913, como Interventor del contrato, asignándole funciones de vigilancia, control y seguimiento durante la ejecución contractual. Dichas funciones estuvieron orientadas a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, actividades administrativas, requerimientos socioambientales, legales y presupuestales, así como las demás obligaciones y responsabilidades contractuales. El presente Informe de Supervisión se suscribe en observancia del principio de buena fe y bajo la presunción de legalidad de la documentación presentada ante la Secretaría de Infraestructura Departamental por el respectivo interventor.		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-GCO-121
	INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSION: 02
		FECHA: 10/10/2025

	Valor a pagar:	N/A
		$ 0,00
DOCUMENTO SOPORTES	• Informe mensual de ejecución en medio físico • Copia de Rut. • Copia de Liquidación de Estampillas. • Recibo de pago de Estampillas. • Certificación de pago de seguridad social	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME		
Supervisor: **VIRGILIO BRAVO SOSA** Secretario de Infraestructura Departamental Secretaria de infraestructura departamental		Firma

Elaboró	Ing. Karoll Daniela Lasso	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de apoyo Técnico - SID	
Revisó:	Maritza Yaneth Osorio	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional de apoyo Financiero - SID	

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT: 800094164-4

MOVIMIENTO - **REGISTRO PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2025005052**

FECHA: 18/jul/2025

EL JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE REALIZA EL REGISTRO PRESUPUESTAL A NOMBRE DE:

ENCISO ARANGO DAVID ANDRES C.C. - NIT: **1113304913-6** CODIGO **09425**

CONCEPTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL PARQUE PRINCIPAL AL EMBARCADERO DE LA INSPECCIÓN DE PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO BPIN 2024006860112

Nº disponibilidad afecta: **2025001414** Nº documento: CONTRATO 1071-2025 Nº SECOP: SID-MC-032-2025

OBSERVACIÓN:

UNIDAD FUNCIONAL: Secretaria de Infraestructura -

VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACION DE FONDOS: Con Situación de Fondos

CODIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	SC	PRG	PROD	CPC	VALOR
2	GASTOS						
2.3	INVERSIÓN						
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERDS						
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS						
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS						
2.3.2.01.01.001.03	OTRAS ESTRUCTURAS						
2.3.2.01.01.001.03.19	Otras obras de ingeniería civil	1000	24	2402	2402041		25,222,194.00
					TOTAL $:		25,222,194.00

OBJETO DE GASTO	FUENTE DE RECURSOS	SCTRIAL	BPIN	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.19	Icld	0	2024006860112	25,222,194.00

CLAUDIA CARMENZA GARCIA LUCERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO
