ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN

1. INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO

CONTRATO N°	MRAM-MC-038-2025
FECHA DEL CONTRATO	VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	889 DEL VEINTE (20) DE JUNIO DEL AÑO 2025
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT:891.801.280-6 R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ CC. 72.326.507 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI
CONTRATISTA	CONTRATISTA: INCONS S.A.S NIT 901.062.819-9 R/L JORGE MANUEL CASTRO LEÓN CC N° 1.004.472 expedida en Bogotá
OBJETO	MANTENIMIENTO MEDIANTE EL REPARCHEO DE BACHES EN PAVIMENTO PARA LOS SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ
VALOR	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($ 24.460.920) M/CTE
PLAZO	QUINCE (15) DIAS
FECHA PRORROGA No. 001	CUATRO (04) DE JULIO DE 2025
FECHA DE ADICIÓN	CUATRO (04) DE JULIO DE 2025
VALOR DE ADICIÓN	ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($11.610.518) M/CTE
TIEMPO PRORROGA	SEIS (06) DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTIÚN (21) DÍAS
PÓLIZA No.	39-44-101173399 DE CUMPLIMIENTO Y 39-40-101045347 DE RCE
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	RESOLUCIÓN No. 303 DEL VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025
SUPERVISORA	CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
FECHA DE INICIO	VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	CINCO (05) DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SG PRORROGA 001	ONCE (11) DE JULIO DE 2025.
FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO	QUINCE (15) DE AGOSTO 2025.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

De acuerdo a la carta de aceptación del proceso No. MRAM-MC-038-2025, los ítems contratados a entregar fueron los siguientes:

CONDICIONES ORIGINALES							
ITEM	ITEM GOBERNACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + FACTOR DE INCREMENTO POR DISTANCIA (4%)	VALOR TOTAL
1	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS						$ 6.255.529
1.1	3,13,14	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	195,40	$ 9.018,51	$ 9.018,51	$ 1.762.217,00
1.2	3,13,16	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	M2	135,73	$ 22.575,46	$ 22.575,46	$ 3.064.167,00
1.3	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	6,79	$ 70.577,63	$ 70.577,63	$ 479.222,00
1.4	3,12,01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	6,79	$ 15.102,75	$ 15.102,75	$ 102.548,00

1.5	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3	6,79	$ 119.997,54	$ 124.797,44	$ 847.375,00
2,0	**PAVIMENTO**						**$ 12.347.864**
2.1	3.06.11	RIEGO DE LÍGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	M2	135,73	$ 5.759	$ 5.989,17	$ 812.910,00
2.2	3.06.17	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	M3	9,50	$ 1.167.505	$ 1.214.205,64	$ 11.534.954,00
3.0	**TRANSPORTE**						**$ 212.699**
3.1	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3/km	100	$ 2.127	$ 2.126,99	$ 212.699,00
4,0	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**						
NP-1	1.01.05	CONCRETO SIMPLE DE 24.5 Mpa: (3500 PSI)	m3		$ 611.396,72	$ 635.852,59	$ -
					SUBTOTAL		**$ 18.816.092**

		ADMINISTRACIÓN	23%			$ 4.327.701
		IMPREVISTOS	4%			$ 752.644
		UTILIDAD	3%			$ 564.483
		VALOR TOTAL				$ 24.460.920

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Para el proceso de contratación número MRAM-MC-038-2025, se realizo acta de mayores y menores cantidades, acta de ítem no previstos y documento de prorroga y adición No. 001, por lo que se presentaron cambios en las cantidades e ítems contratados inicialmente, por lo cual se relaciona a continuación, los ítems y cantidades ejecutados por parte del contratista al igual que se encuentran especificados en la sabana y memorias de cantidades adjuntas al presente proceso.

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA	
ITEM	ITEM GOBERNACION	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + FACTOR DE INCREMENTO POR DISTANCIA (4%)	CANTIDAD	VALOR
1	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS						$7.896.540
1.1	3,13,14	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	$9.018,51	$9.018,51	320,55	$2.890.883,00
1.2	3,13,16	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	M2	$22.575,46	$22.575,46	221,73	$5.005.657,00

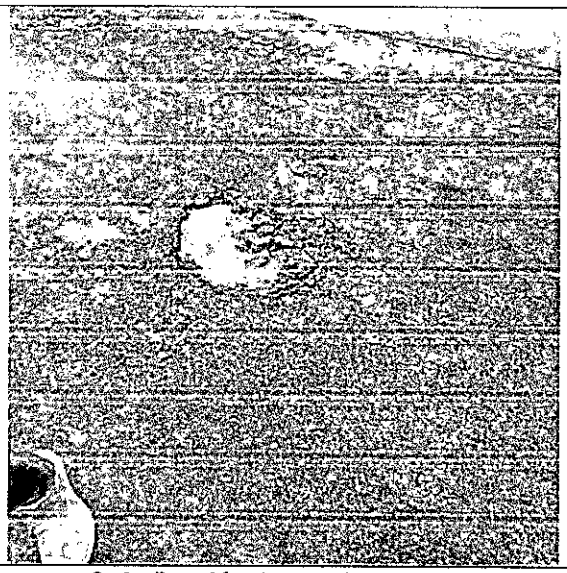
1.3	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	$70.577,63	$70.577,63		$ -
1.4	3,12,01	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBRANTES Y/O DERRUMBES (INCLUYE ACARREO LIBRE)	M3	$15.102,75	$15.102,75		$ -
1.5	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3	$119.997,54	$124.797,44		$ -
2,0		**PAVIMENTO**					**$ 18.893.067**
2.1	3.06.11	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	M2	$ 5.759	$ 5.989,17	239,23	$ 1.432.790,00
2.2	3.06.17	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	M3	$ 1.167.505	$1.214.205,64	14,38	$17.460.277,00
3.0		**TRANSPORTE**					**$ 366.310**

3.1	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3/km	$ 2.127	$ 2.126,99	172,22	$ 366.310,00
4,0	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**						**$ 591.343**
NP-1	1.01.05	CONCRETO SIMPLE DE 24.5 Mpa. (3500 PSI)	m3	$ 611.396,72	$635.852,59	0,93	$ 591.343,00
	SUBTOTAL						**$27.747.260,00**
	ADMINISTRACIÓN		**23%**				**$6.381.870,00**
	IMPREVISTOS		**4%**				**$1.109.890,00**
	UTILIDAD		**3%**				**$832.418,00**
	VALOR TOTAL						**$36.071.438,00**

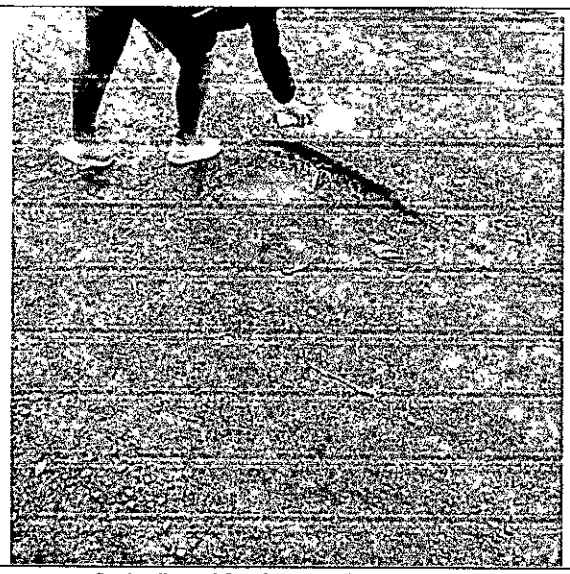
4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

A continuación, se muestra el registro fotográfico que demuestra lo realizado por el contratista.

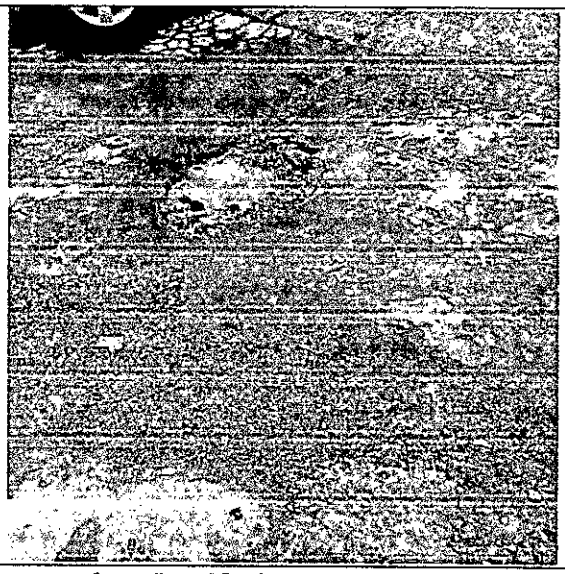
ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
SEÑALIZACIÓN PUNTOS A INTERVENIR				



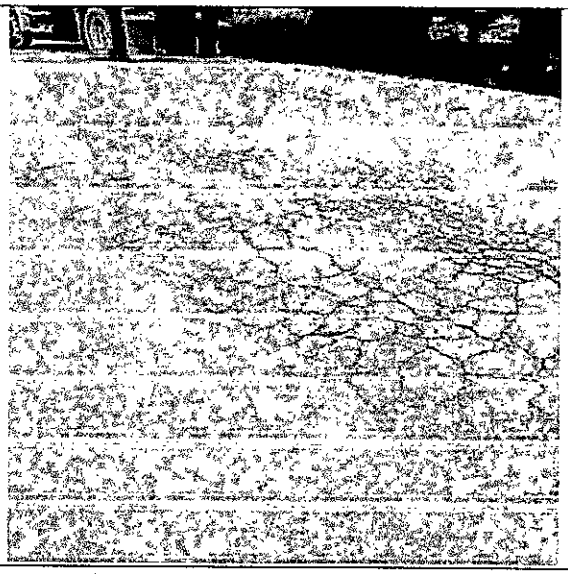
Señalización 1, mantenimiento



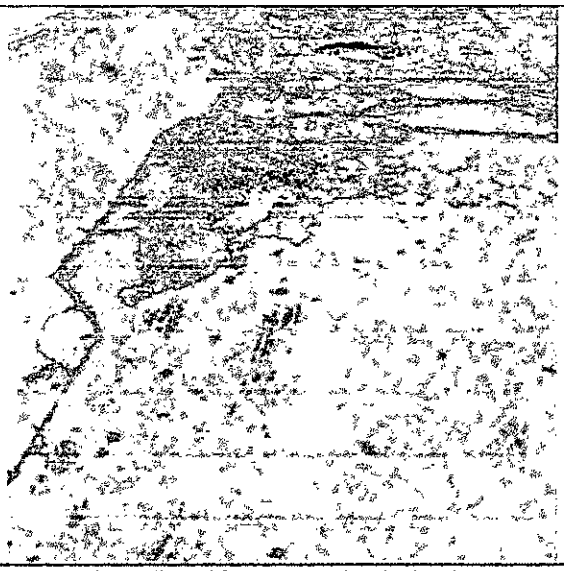
Señalización 2, mantenimiento



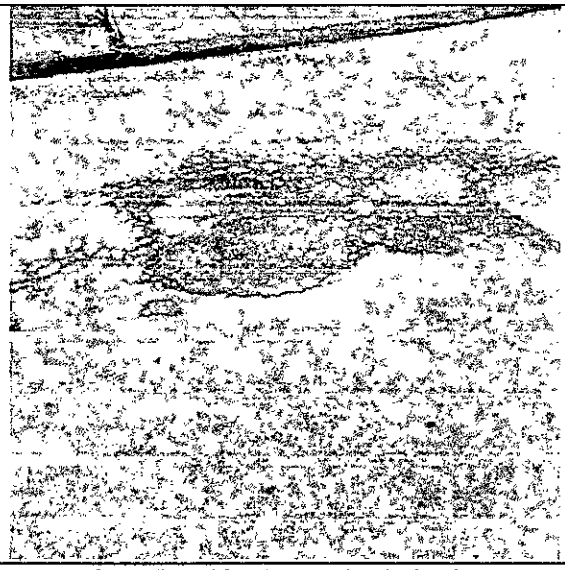
Señalización 3, mantenimiento



Señalización 4, mantenimiento



Señalización 5, mantenimiento



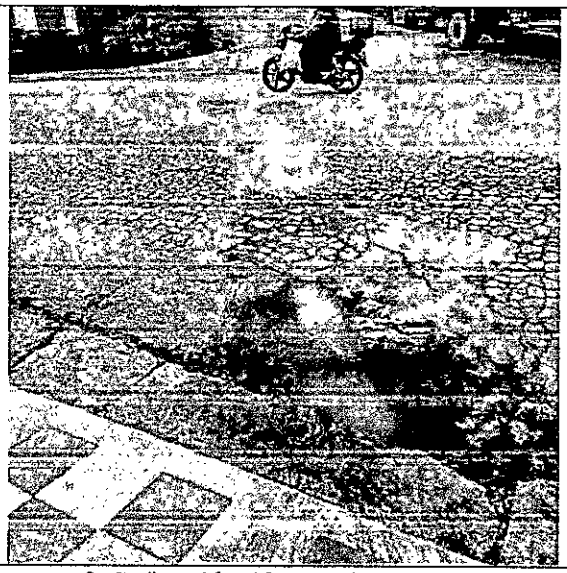
Señalización 6, mantenimiento



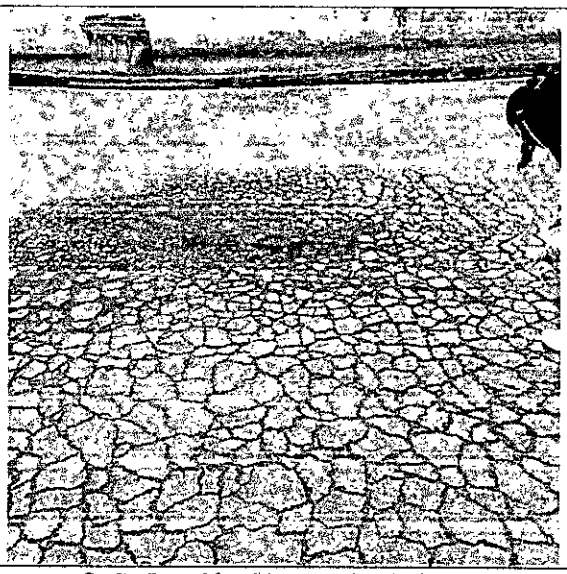
Señalización 7, mantenimiento



Señalización 8 y 9, mantenimiento



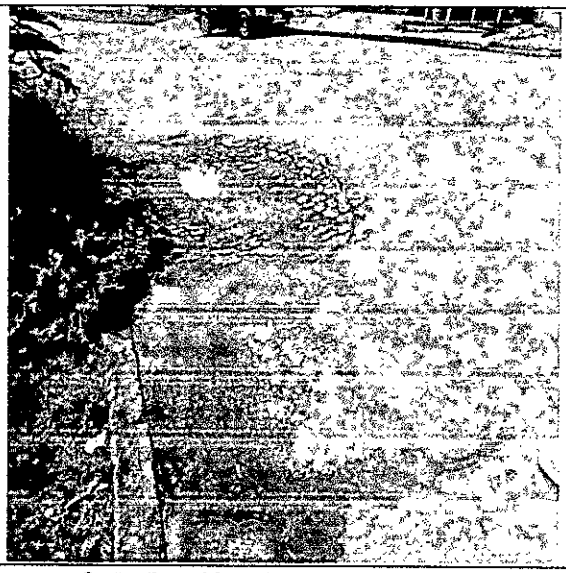
Señalización 10, mantenimiento



Señalización 11, mantenimiento

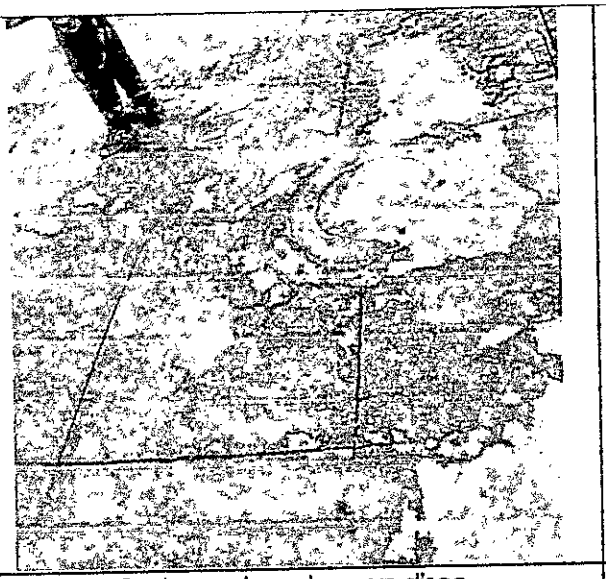


Señalización 12, mantenimiento



Señalización 13, mantenimiento

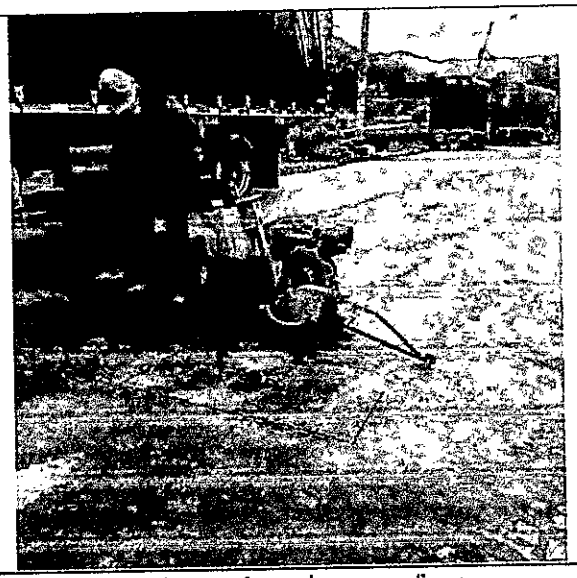
1	**EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS**			
1.1	3.13.13	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	320,55



Corte pavimento, con disco



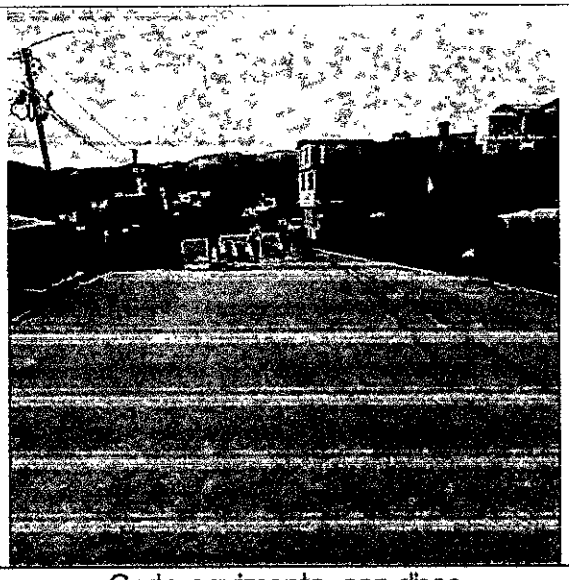
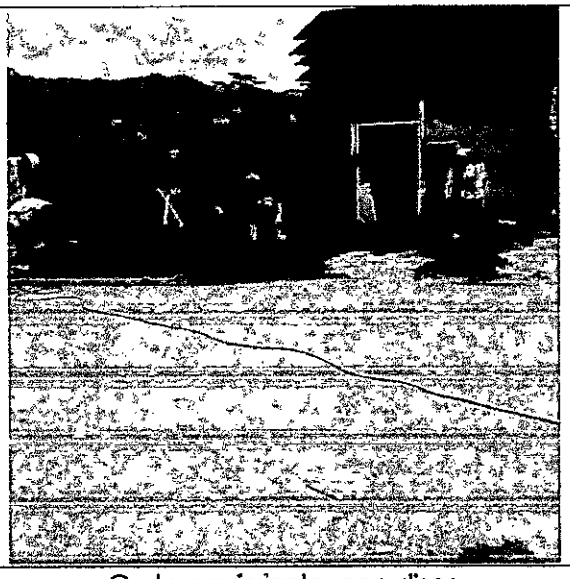
Corte pavimento, con disco



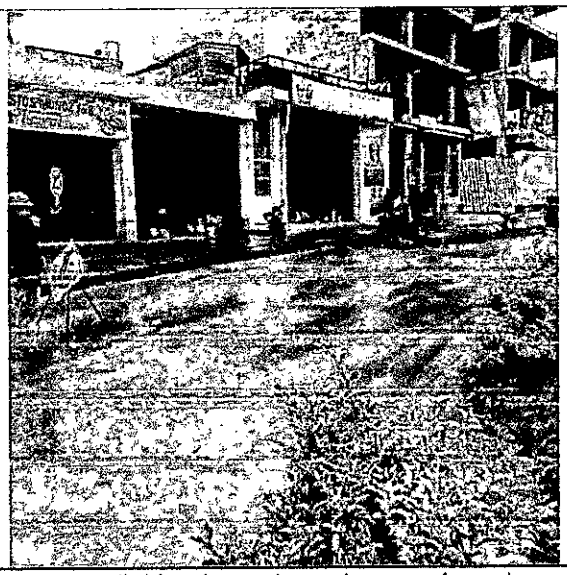
Corte pavimento, con disco



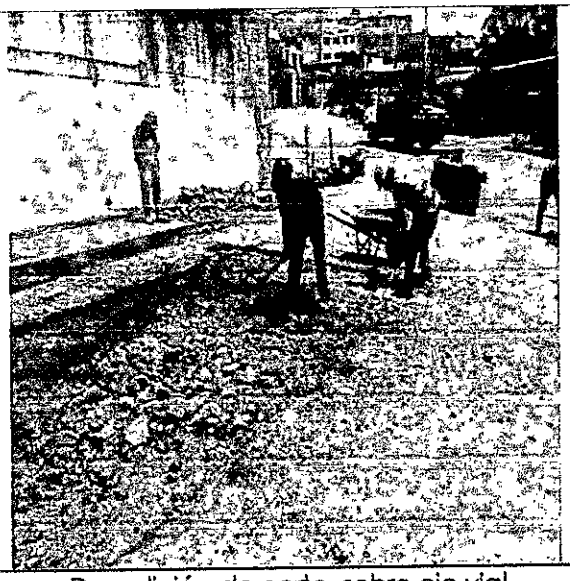
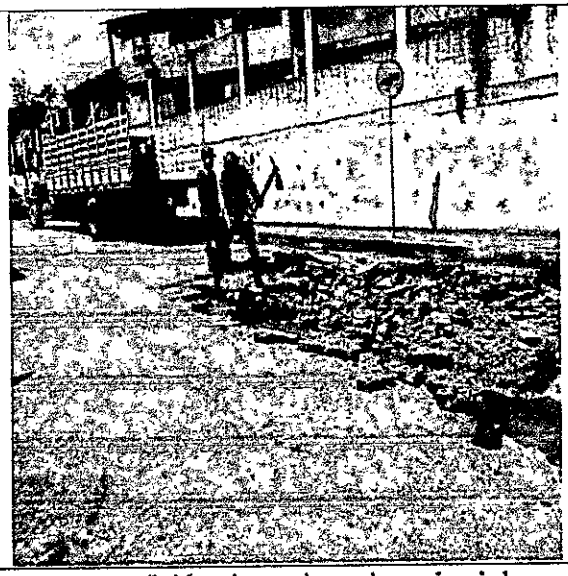
Corte pavimento, con disco

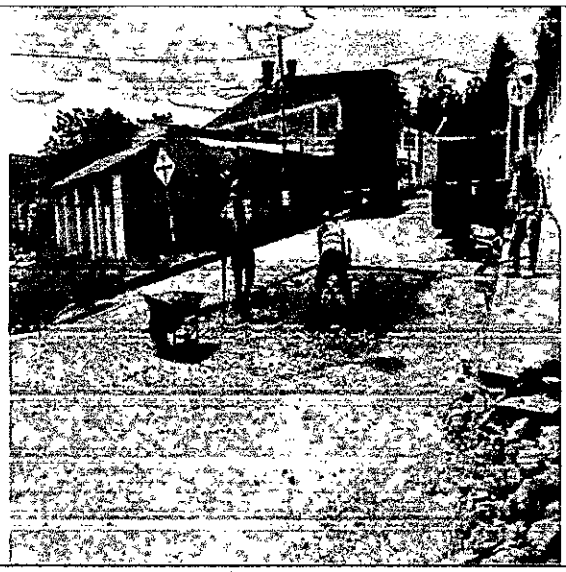
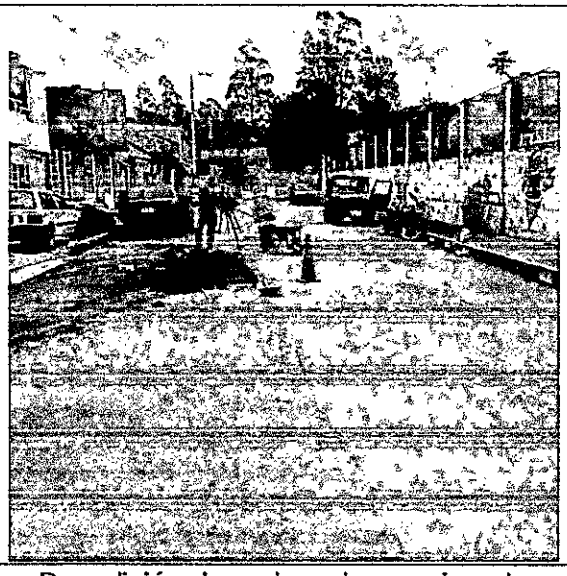
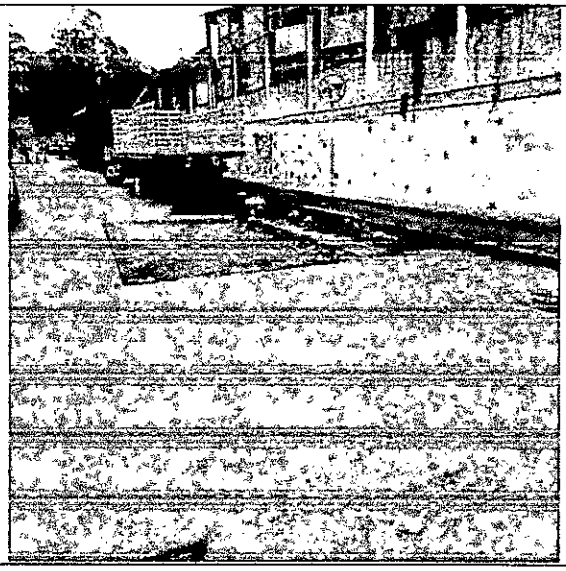
	
Corte pavimento, con disco	Corte pavimento, con disco
	
Corte pavimento, con disco	Corte pavimento, con disco

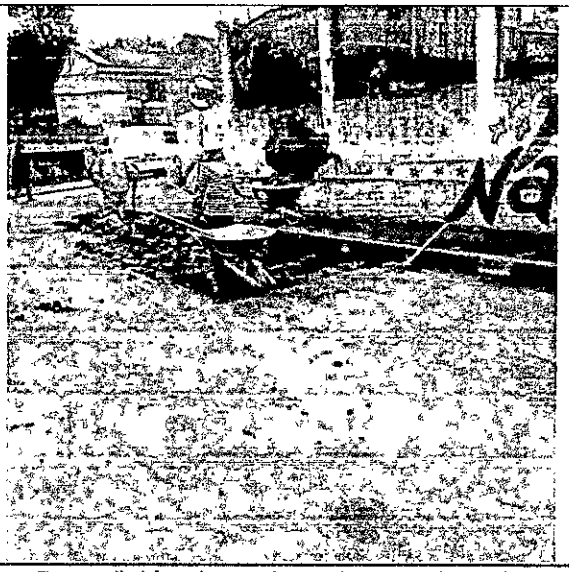
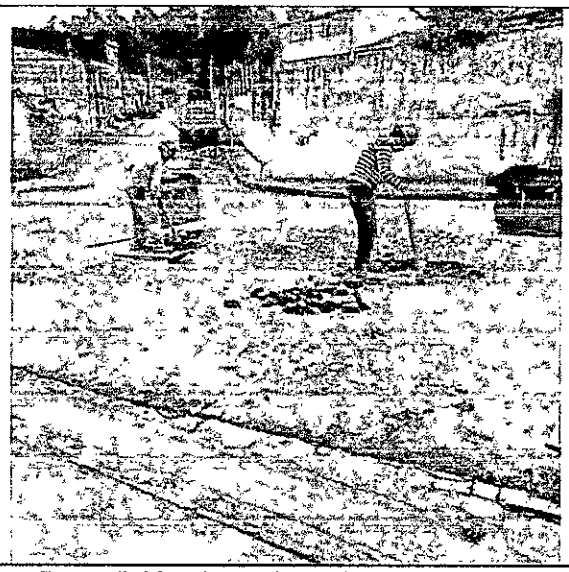
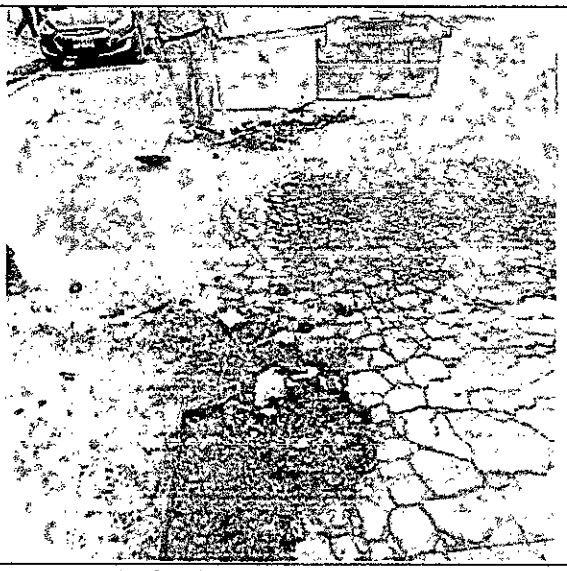
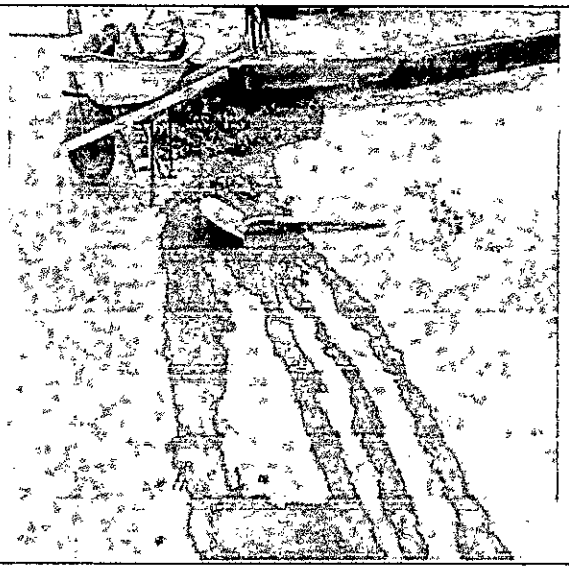
1.2	3.13. 16	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS (INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	M2	221,73

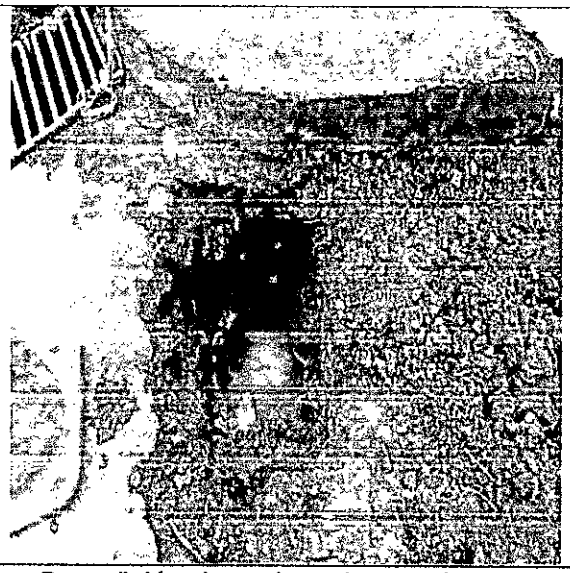
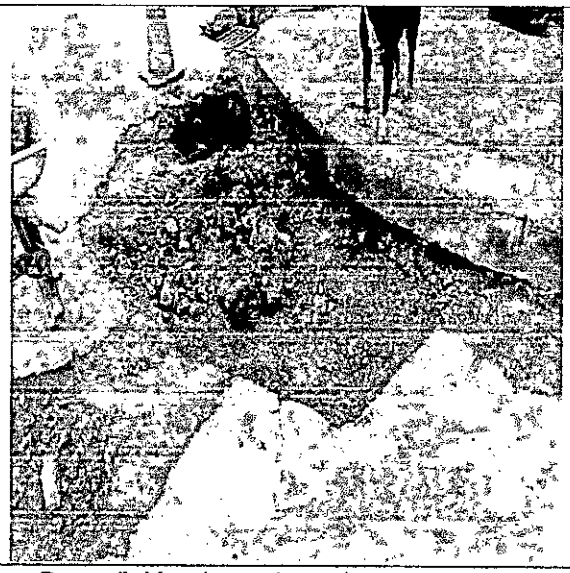
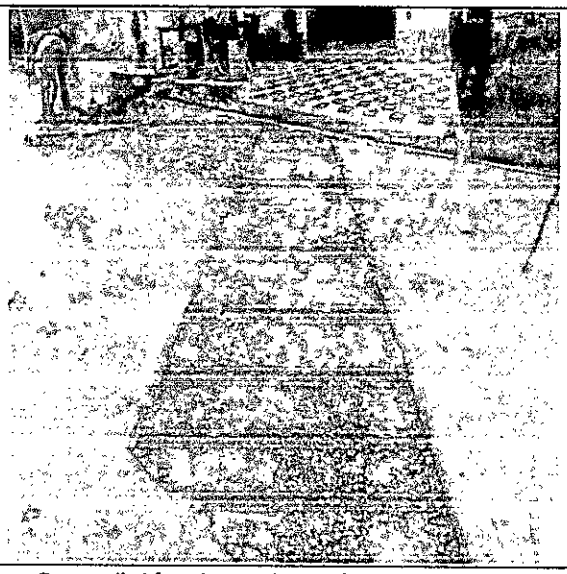
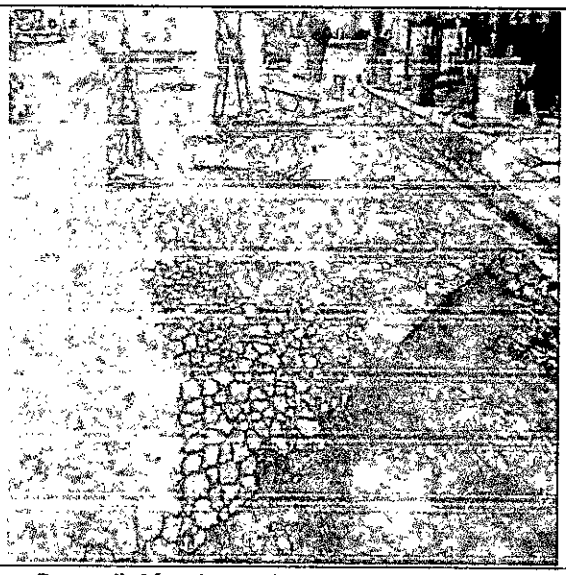
	
Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico	Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico
	
Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico	Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico

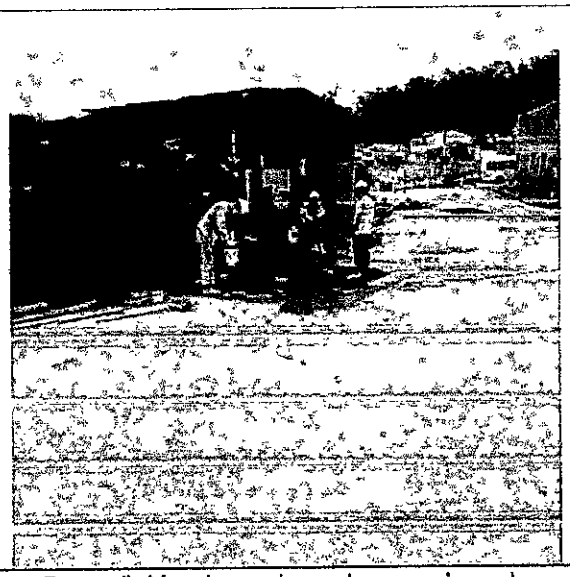
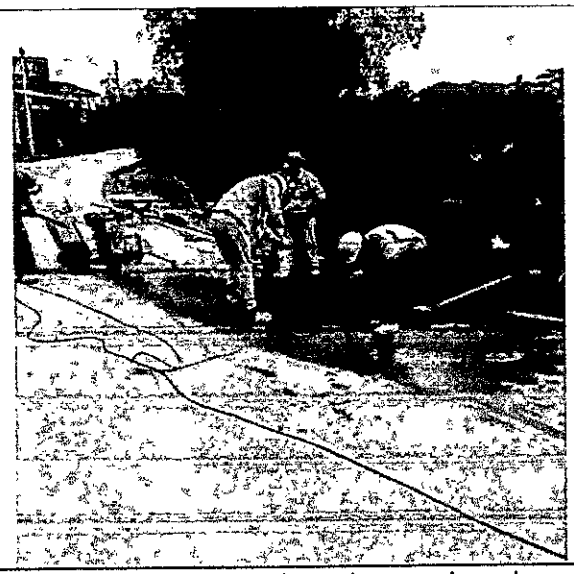
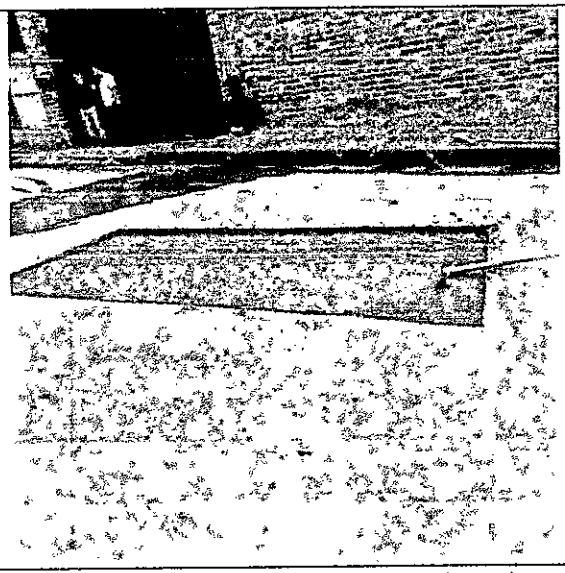
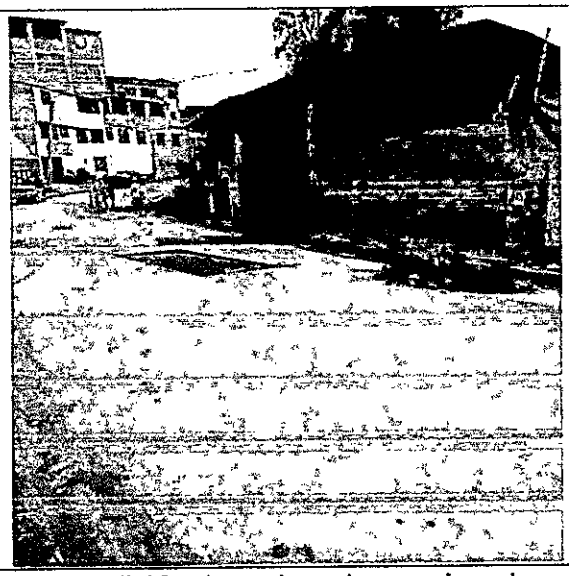
	
Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico	Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico
	
Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico	Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico

	
Demolición de corte, sobre eje vial	Demolición de corte, sobre eje vial
	
Demolición de corte, sobre eje vial	Demolición de corte, sobre eje vial

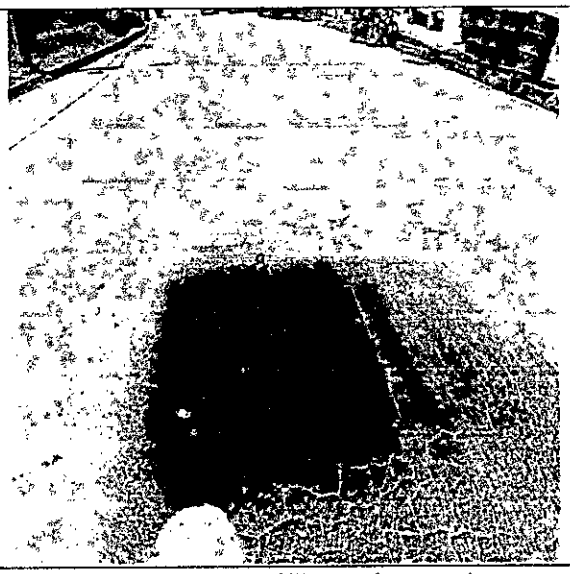
	
Demolición de corte, sobre eje vial	Demolición de corte, sobre eje vial
	
Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico	Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico

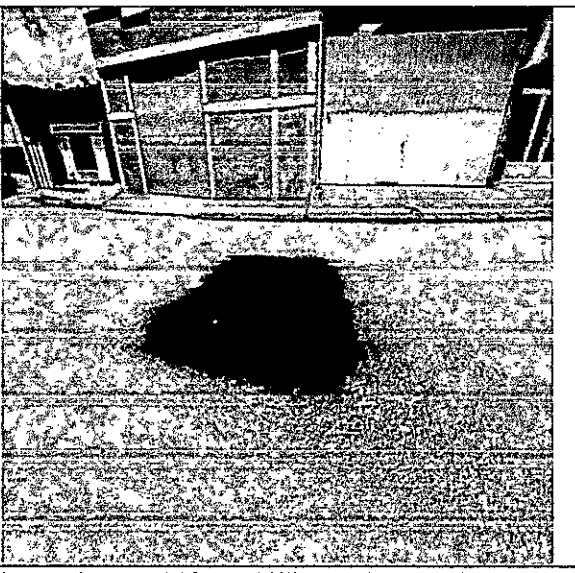
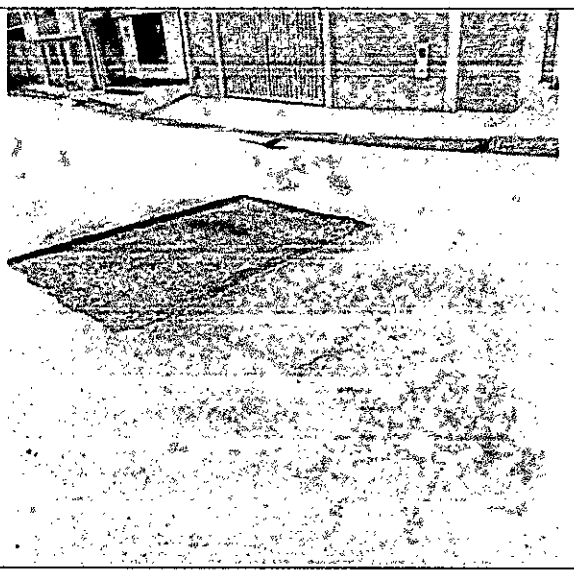
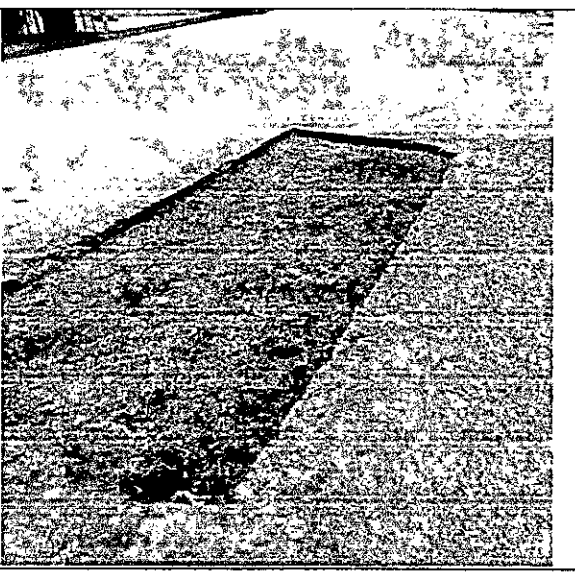
	
Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico	Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico
	
Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico	Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico

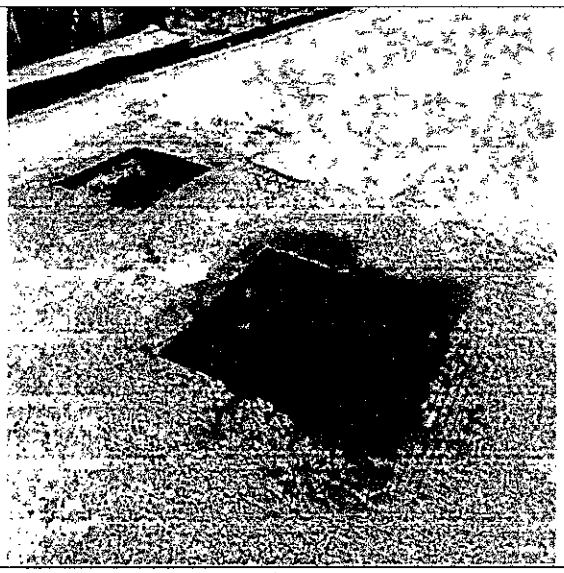
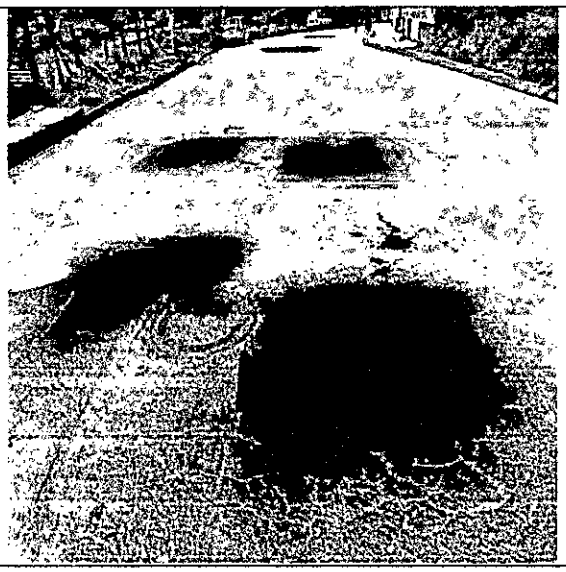
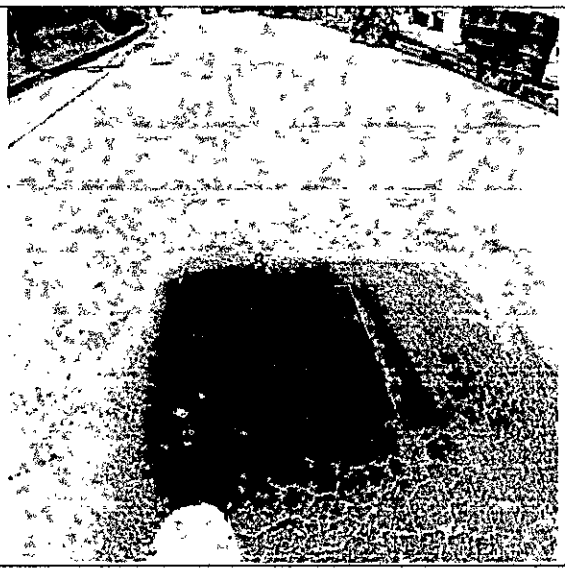
	
Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico	Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico
	
Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico	Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico

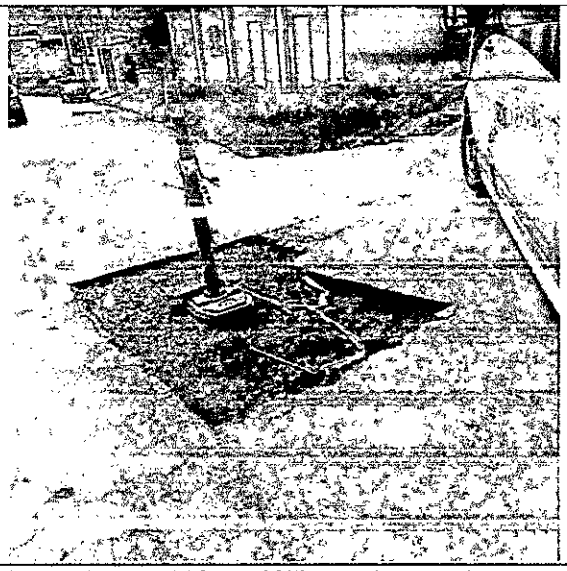
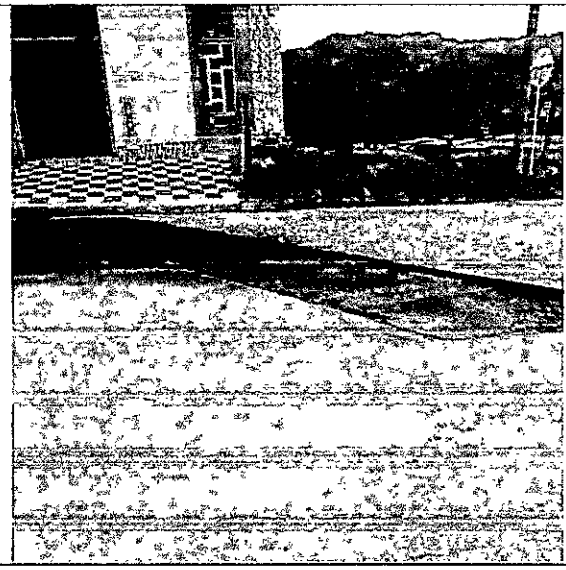
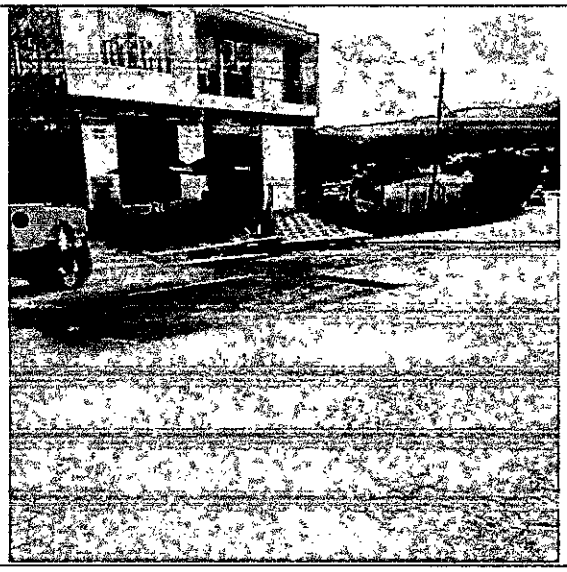
	
Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico	Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico
	
Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico	Demolición de cortes sobre pavimento asfaltico

 Demolición de corte, sobre eje vial				 Demolición de corte, sobre eje vial
2	**PAVIMENTO**			
2.1	3.06.11	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	239,23
 Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.				 Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.

	
Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.	Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.
	
Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.	Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.

	
Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.	Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.
	
Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.	Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.

	
Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.	Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.
	
Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.	Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.

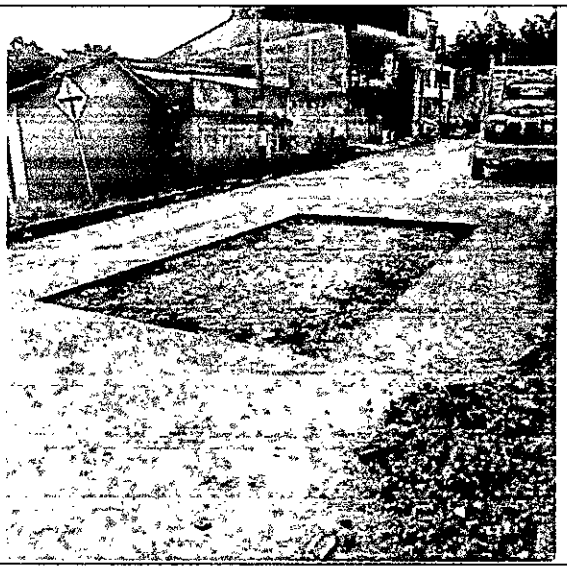
	
Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.	Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.
	
Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.	Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.



Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.



Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.

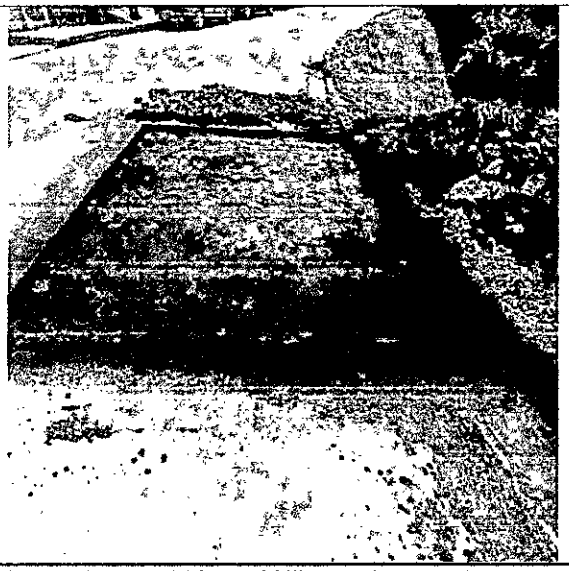


Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.



Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.

	
Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.	Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.
	
Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.	Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.



Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.



Riego de emulsión asfáltica sobre cortes, para aplicación de asfalto.

2.2	3.06.17	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	M3	14,38

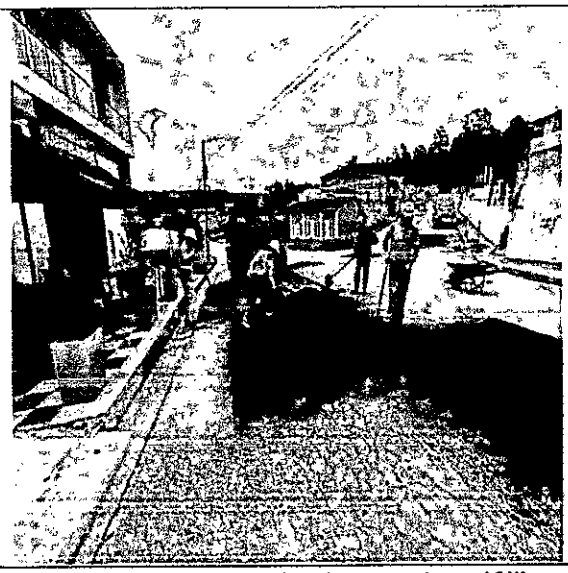


Suministro e instalación de mezcla asfáltica

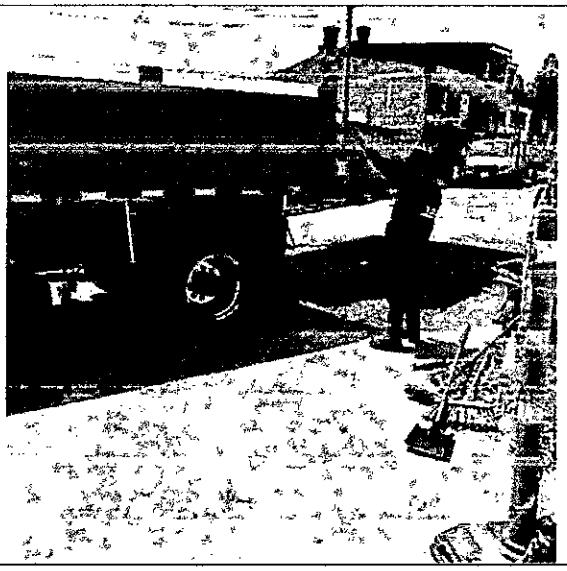


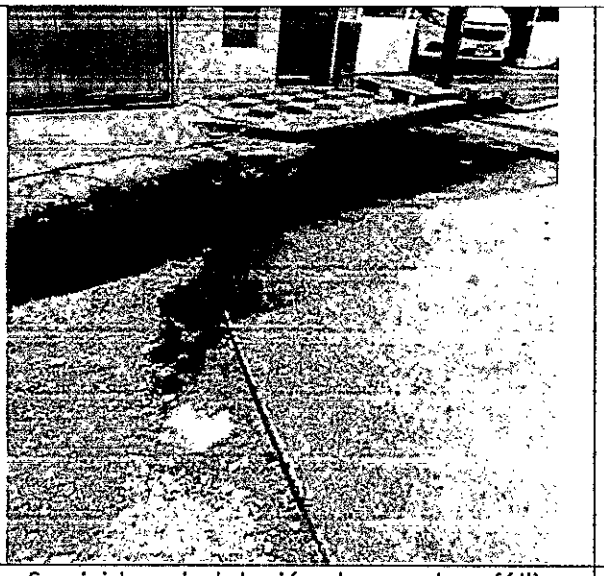
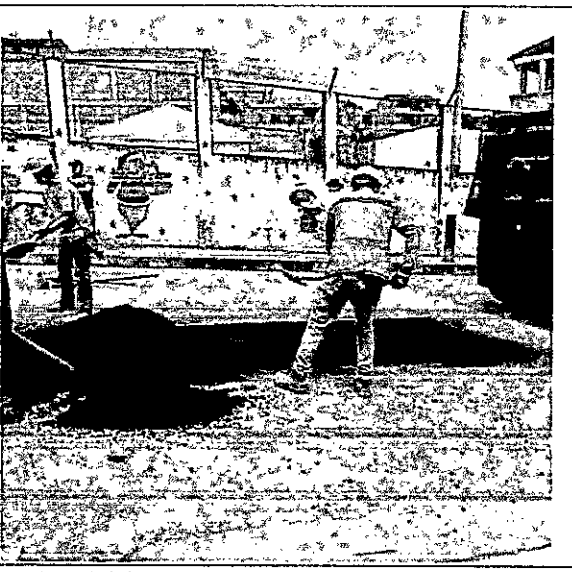
Suministro e instalación de mezcla asfáltica

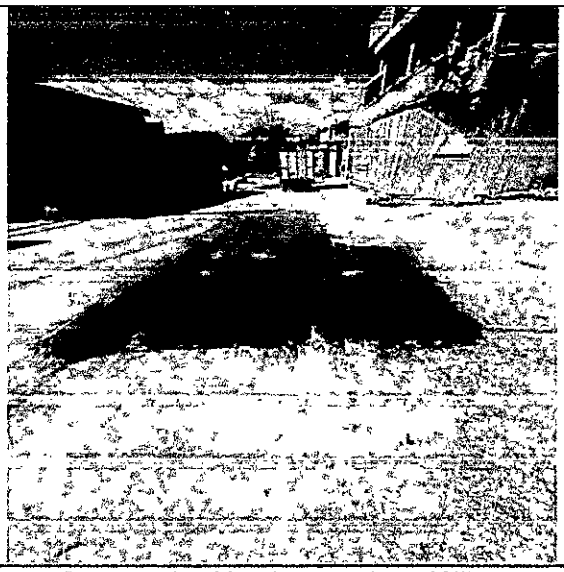
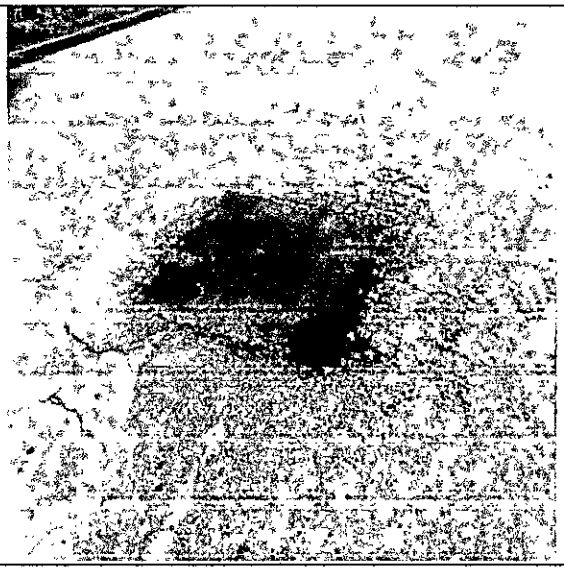
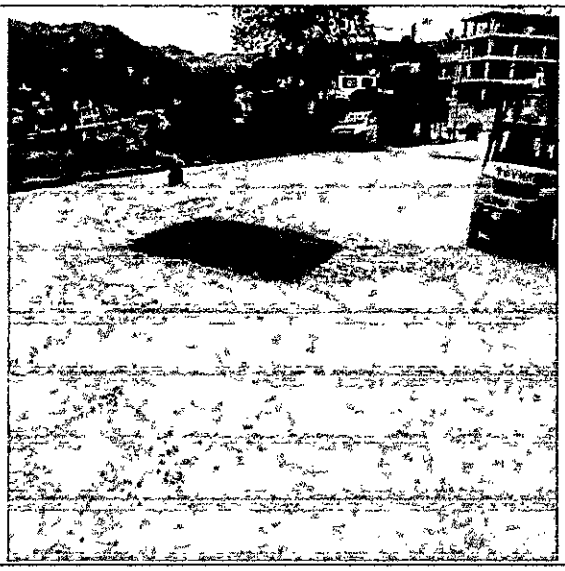
	
Suministro e instalación de mezcla asfáltica	Suministro e instalación de mezcla asfáltica
	
Suministro e instalación de mezcla asfáltica	Suministro e instalación de mezcla asfáltica

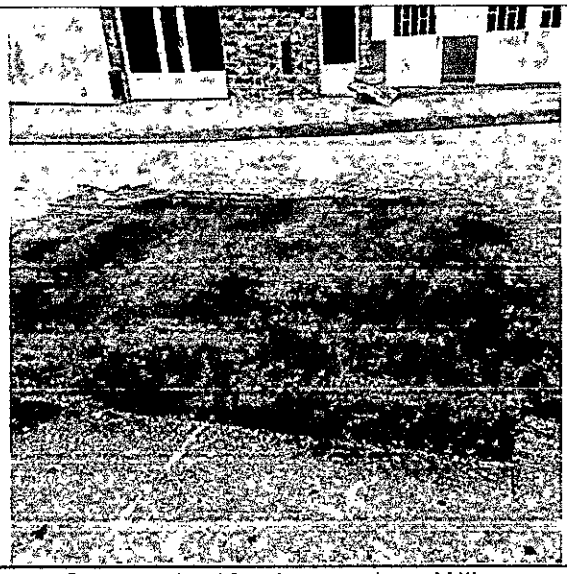
	
Extendido de mezcla asfaltica para reparcheo	Suministro e instalación de mezcla asfáltica
	
Suministro e instalación de mezcla asfáltica	Suministro e instalación de mezcla asfáltica

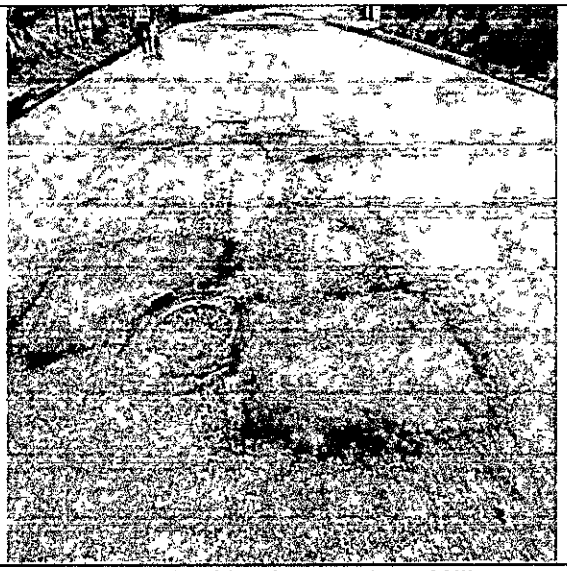
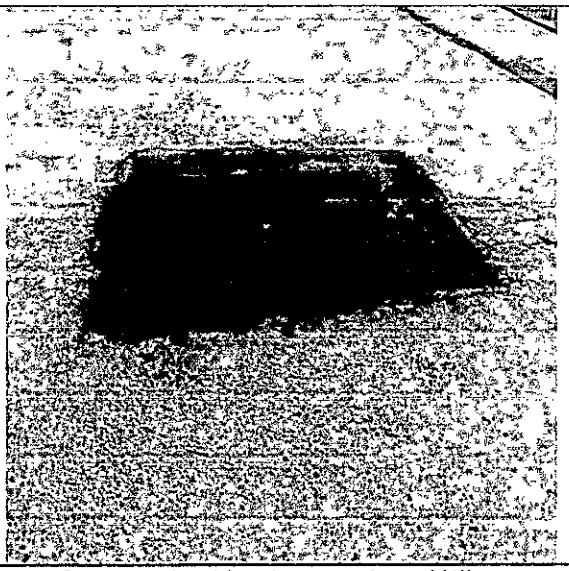
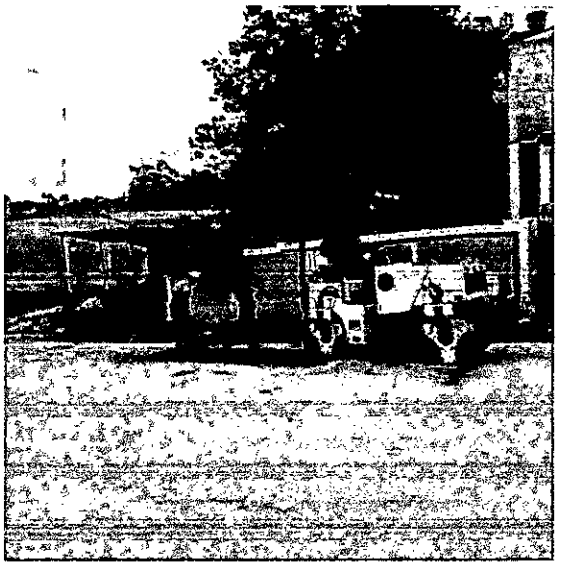
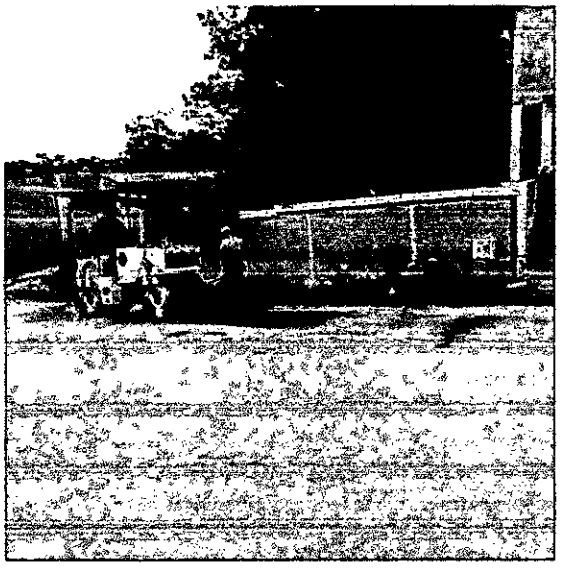
	
Suministro e instalación de mezcla asfáltica	Suministro e instalación de mezcla asfáltica
	
Suministro e instalación de mezcla asfáltica	Suministro e instalación de mezcla asfáltica

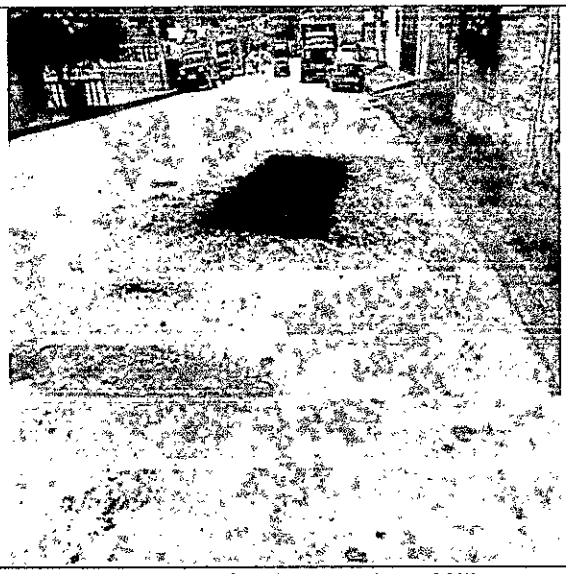
	
Suministro e instalación de mezcla asfáltica	Suministro e instalación de mezcla asfáltica
	
Suministro e instalación de mezcla asfáltica	Suministro e instalación de mezcla asfáltica

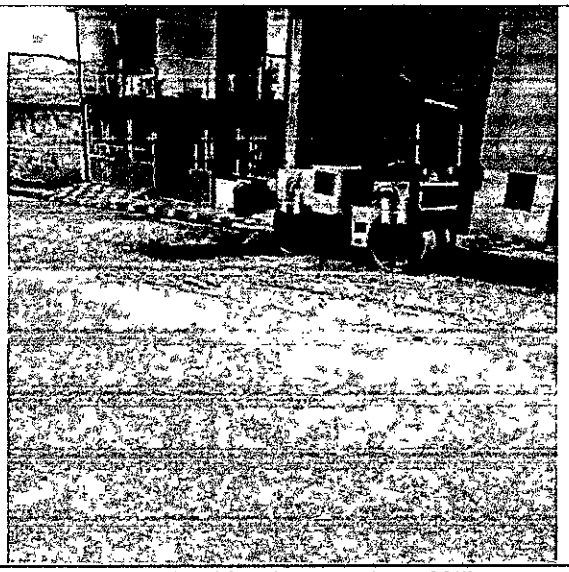
	
Suministro e instalación de mezcla asfáltica	Suministro e instalación de mezcla asfáltica
	
Suministro e instalación de mezcla asfáltica	Suministro e instalación de mezcla asfáltica

	
Compactación de mezcla asfáltica	Compactación de mezcla asfáltica
	
Compactación de mezcla asfáltica	Compactación de mezcla asfáltica

	
Compactación de mezcla asfáltica	Compactación de mezcla asfáltica
	
Compactación de mezcla asfáltica	Compactación de mezcla asfáltica

	
Compactación de mezcla asfáltica	Compactación de mezcla asfáltica
	
Compactación de cortes sobre vía	Compactación de cortes sobre vía

	
Compactación de mezcla asfáltica	Compactación de mezcla asfáltica
	
Compactación de mezcla asfáltica	Compactación de mezcla asfáltica



Compactación de mezcla asfáltica



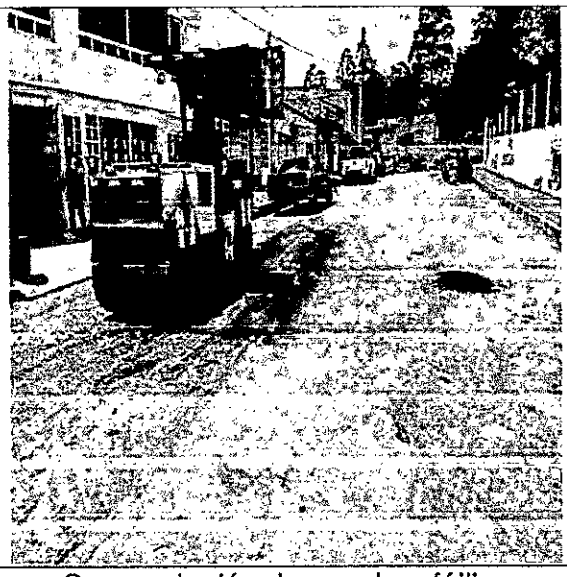
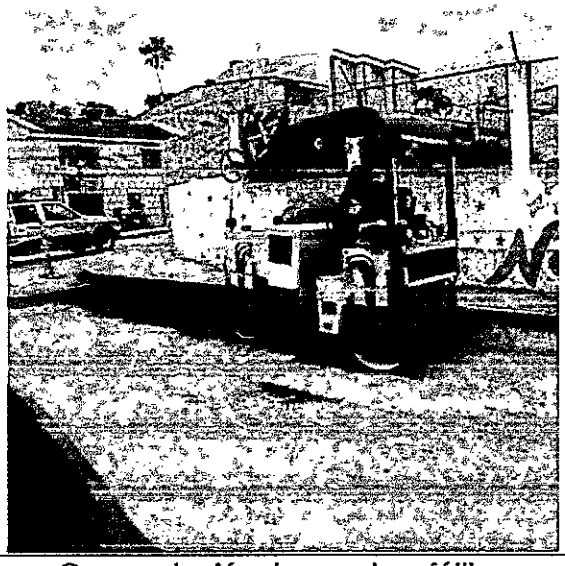
Compactación de mezcla asfáltica

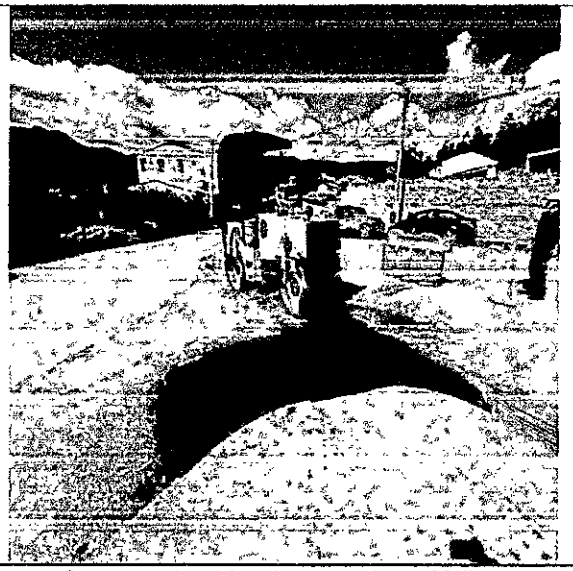
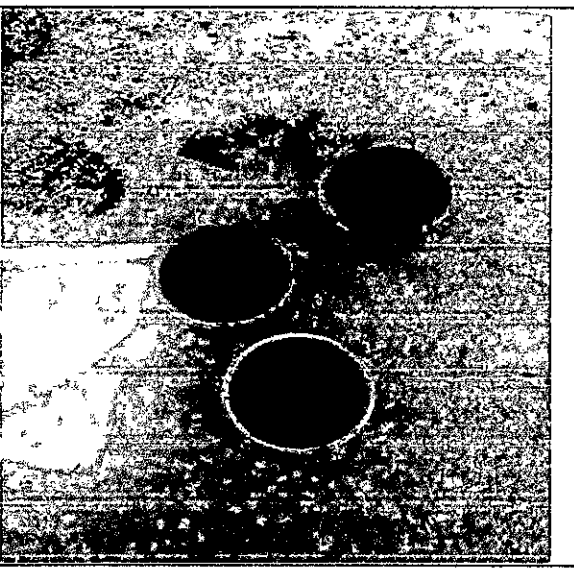


Compactación de mezcla asfáltica

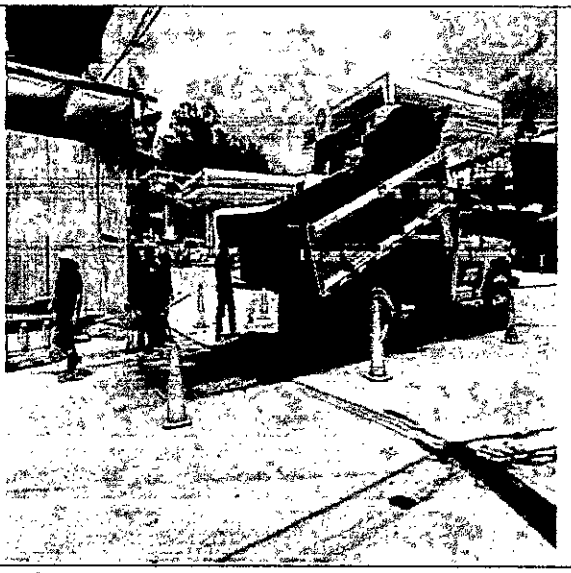


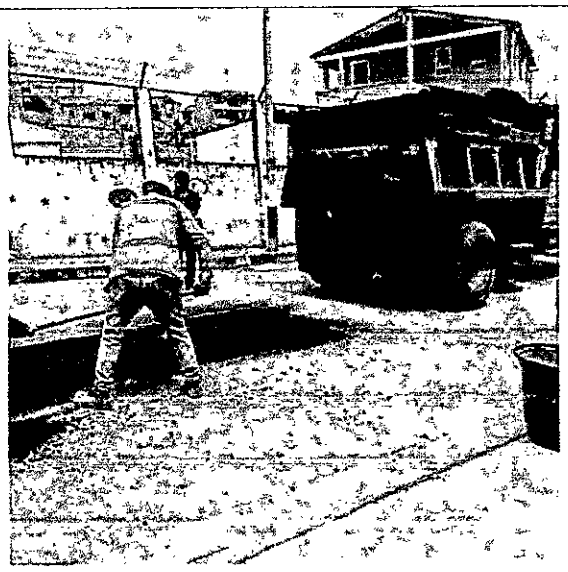
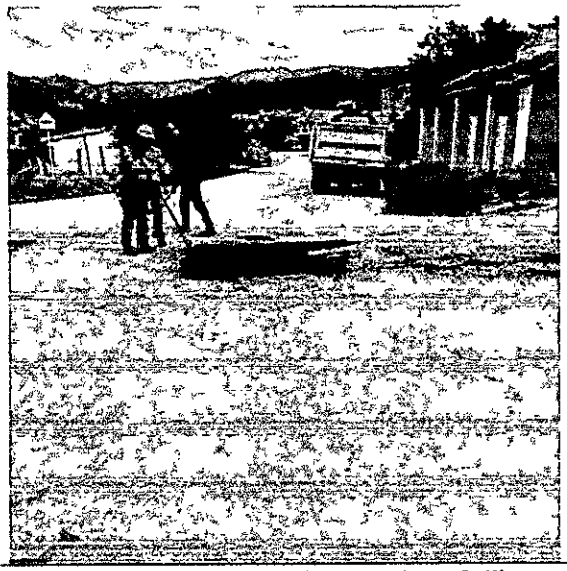
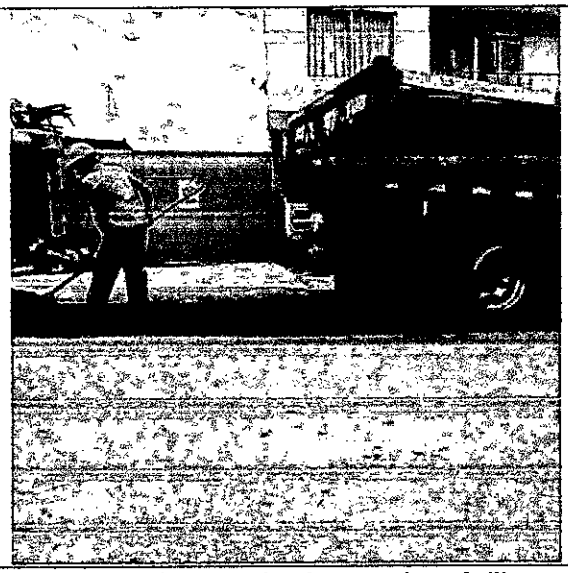
Compactación de mezcla asfáltica

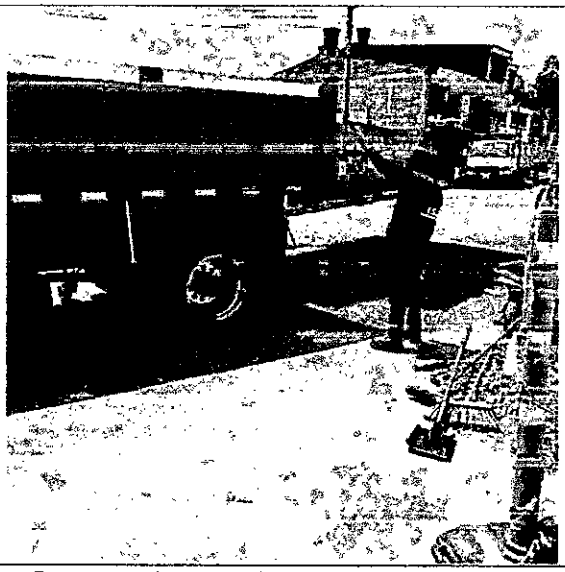
	
Compactación de mezcla asfáltica	Compactación de mezcla asfáltica
	
Compactación de mezcla asfáltica	Compactación de mezcla asfáltica

	
Compactación de mezcla asfáltica	Compactación de mezcla asfáltica
	
Toma de muestras de laboratorio	Toma de muestras de laboratorio

3	**TRANSPORTE**			
3.1	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUES DE 5 KM).	M3/km	172,22

	
Cargue y transporte de mezcla asfaltica	Cargue y transporte de mezcla asfaltica
	
Cargue y transporte de mezcla asfaltica	Cargue y transporte de mezcla asfaltica

	
Cargue y transporte de mezcla asfaltica	Cargue y transporte de mezcla asfaltica
	
Cargue y transporte de mezcla asfaltica	Cargue y transporte de mezcla asfaltica



Cargue y transporte de mezcla asfaltica

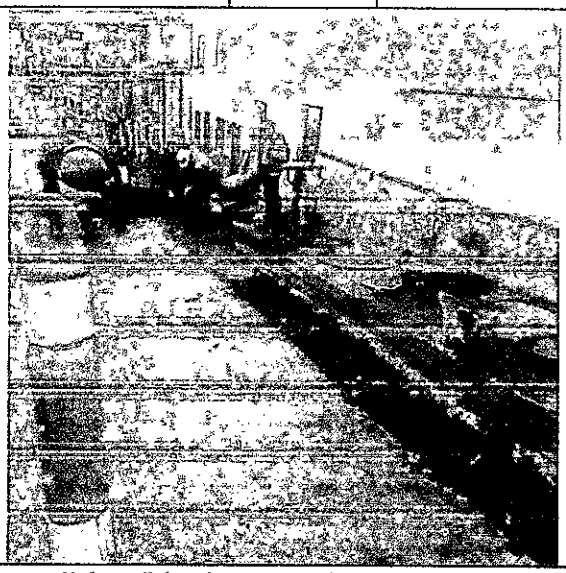


Cargue y transporte de mezcla asfaltica

4	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			
NP-1	1.01.05	CONCRETO SIMPLE DE 24,5 Mpa. (3500 PSI)	M3	0.93



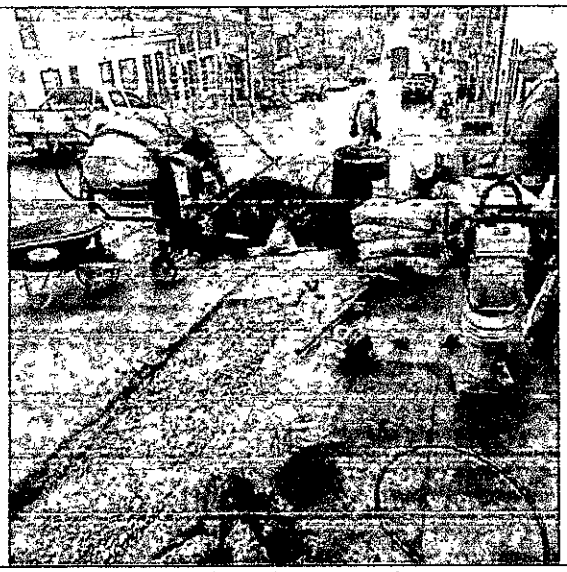
Materiales para mezcla de concreto.



Extendido de concreto sobre corte



Fundida de concreto



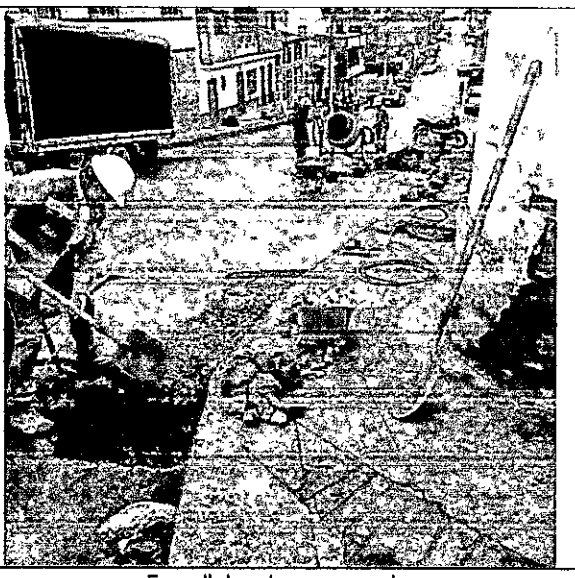
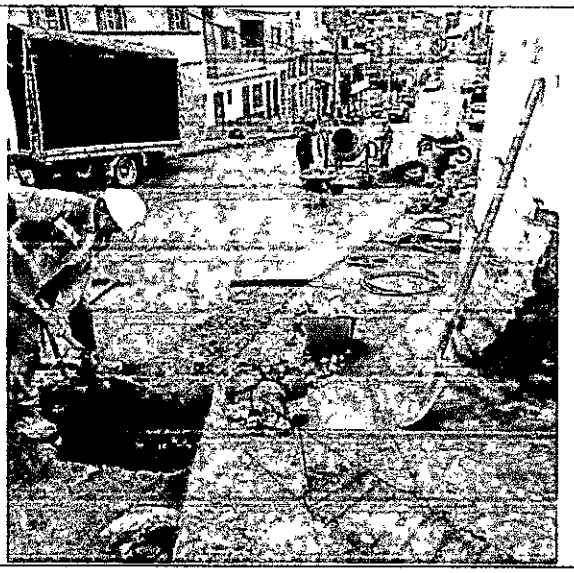
Fundida de concreto

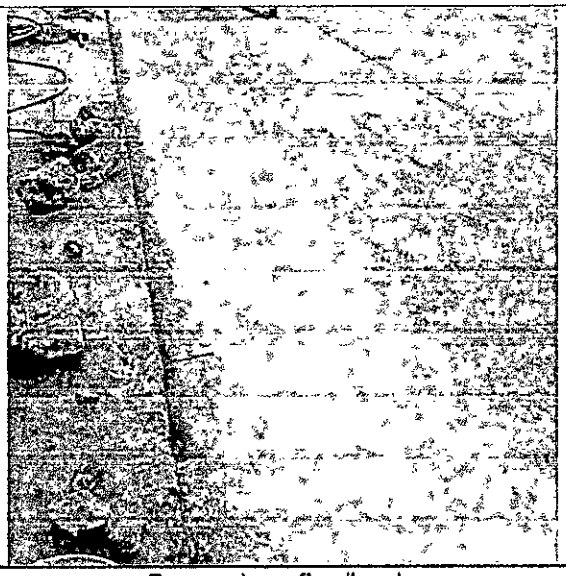
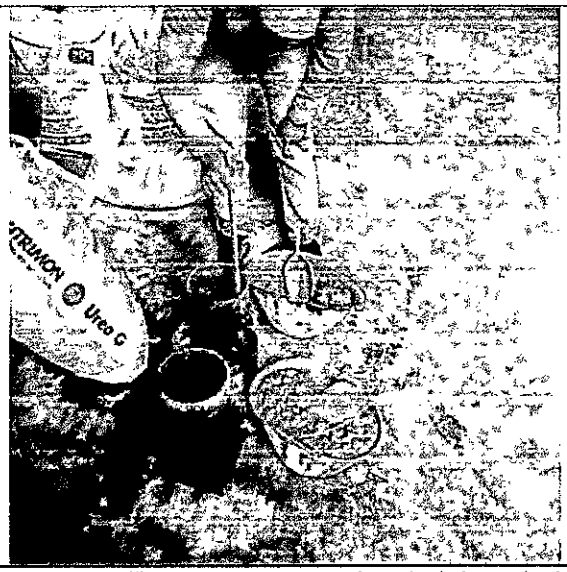
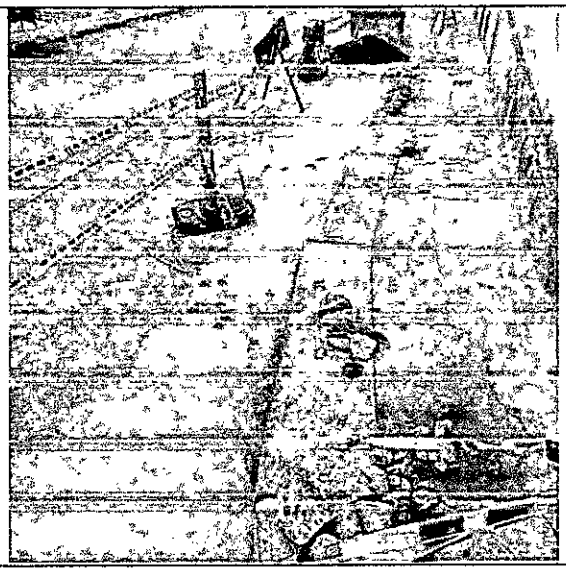


Fundida de concreto



Fundida de concreto

	
Fundida de concreto	Fundida de concreto
	
Fundida de concreto	Fundida de concreto

	
Reparcheo finalizado	Toma de cilindros para muestra de laboratorio
	
Reparcheo finalizado	Reparcheo finalizado

5. MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Para el contrato MRAM-MC-038-2025 no se realizó ningún tipo de suspensión.

6. MOTIVO DE LA PRORROGA

Para el contrato MRAM-MC-038-2025 se realizó prorroga, debido a que el contratista presento oficio solicitando adicional y prorroga número 1 al contrato MRAM-MC-038-2025, por un tiempo de seis (06)

días, indicando que teniendo en cuenta las áreas de los baches del pavimento flexible a intervenir en el Re parcheo se evidencio en las actividades de corte pavimento y demolición de la carpeta flexible existente que el área afectada por deterioro tales como hundimiento, piel de cocodrilo y ojo de pescado de acuerdo al anexo b del invias presentan un área mayor a la contemplada generando mayores cantidades de obra. De igual manera se evidenciaron áreas aledañas afectadas a las contempladas inicialmente que pueden generar daños y perdida de estabilidad a la estructura del pavimento flexible nuevo. Y finalmente que por condiciones climáticas no ha sido posible avanzar al rendimiento establecido y por lo tanto ejecutar la totalidad de las actividades contempladas.

7. MOTIVO DE LA ADICIÓN EN VALOR

Para el contrato MRAM-MC-038-2025 se realizó adición debido a que el contratista presento oficio el día dos (02) de julio de 2025 solicitando adicional y prorroga número 1 al contrato MRAM-MC-038-2025, por un tiempo de seis (06) días, indicando que teniendo en cuenta las áreas de los baches del pavimento flexible a intervenir en el Re parcheo se evidencio en las actividades de corte pavimento y demolición de la carpeta flexible existente que el área afectada por deterioro tales como hundimiento, piel de cocodrilo y ojo de pescado de acuerdo al anexo b del invias presentan un área mayor a la contemplada generando mayores cantidades de obra. De igual manera se evidenciaron áreas aledañas afectadas a las contempladas inicialmente que pueden generar daños y perdida de estabilidad a la estructura del pavimento flexible nuevo.

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN

Para el contrato MRAM-MC-038-2025 se realizó documento de adición, con registro presupuestal 1011 del cuatro (04) de julio de 2025.

9. FECHA DEL OTRO SÍ (DOCUMENTO MODIFICATORIO AL CONTRATO)

Para el contrato MRAM-MC-038-2025 se ha realizado documento de adición y prorroga No. 001.

10. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS

Para el contrato MRAM-MC-038-2025 se tiene información de garantías según lo establecido en el contrato

CLASE DE AMPARO	DESCRIPCIÓN	RIESGOS ASEGURADOS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Equivalente al 10% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) el pago del valor de las multas

		y de la cláusula penal pecuniaria.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL QUE SE EMPLEE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Por una suma equivalente al 5% del valor total del mismo, vigente por el término de ejecución del contrato y tres (3) años más.	Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Equivalente al 10% del valor total del Contrato, vigente por un término no inferior a dos (2) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra.	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Equivalente a 200 SMMLV y su vigencia es por el término de duración del contrato	La póliza de responsabilidad civil extracontractual la protege de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.

11. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Para el contrato MRAM-MC-038-2025 se tiene la siguiente información de aprobación de garantías.

N° 39-44-101173399 anexo 0 de cumplimiento y la póliza N° 39-44-101173399 anexo 0 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL APROBADAS BAJO RESOLUCIÓN N° 303 DEL VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025
N° 39-44-101173399 anexo 2 de cumplimiento y la póliza N° 39-44-101173399 anexo 1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL APROBADAS BAJO RESOLUCIÓN N° 345 DEL ocho (08) DE JULIO DE 2025 según documento de adición y prorroga No. 001
N° 39-44-101173399 ANEXO 3 DE CUMPLIMIENTO APROBADAS BAJO RESOLUCIÓN N° 387 DEL VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE 2025 SEGÚN ACTA TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

12. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el contrato MRAM-MC-038-2025 no se ha realizado ningún pago, según las actividades ejecutadas por el contratista y el documento de adición celebrado, a la fecha se tiene pendiente por cancelar la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($36.071.438) M/CTE, según el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	$ 24.460.920	
VALOR DEL ADICIONAL	$11.610.518	
VALOR CANCELADO ANTICIPO		$ 0
VALOR CANCELADO EN ACTAS PARCIALES		$ 0
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 36.071.438
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 36.071.438**	**$ 36.071.438**

13. PROCESOS SANCIONATORIOS

Como supervisora del contrato, me permito dejar constancia que en desarrollo de la etapa contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no ha tenido que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista.

CARMEN ELVIRA PAEZ CARO
Secretaria de infraestructura pública y Movilidad
Municipio de Ramiriquí, Boyacá

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: secretaria de infraestructura pública y movilidad
Ubicación: Carpeta Proceso Contratación
Elaboro: Yonatan Felipe Pulido -Apoyo secretaria de infraestructura
Revisó: Carmen Elvira Páez Caro - secretaria de infraestructura
Aprobó: Carmen Elvira Páez Caro - secretaria de infraestructura
