
CONTRATO No.	CONV SOL-467-2025	**FECHA:**	30 de diciembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCAN MUNICIPIO LA CALERA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA REFERIDA VEREDA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 1		

ITEM:	1.0	**ACTIVIDAD:**	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	**UND:**	M3

DESCRIPCION	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	N° DE ELEMENTOS	TOTAL
RELLENO TRITURADO PARA CAMA DE TUBERIA DE 24" PARA ALCANTARILLA	7.00	1.00	0.20	1.00	1.40
RELLENO TRITURADO PARA ATRAQUE DE TUBERIA DE 24" PARA ALCANTARILLA	6.00	0.40	0.30	2.00	1.44
TOTAL ITEM:	**RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"**			**M3**	**2.84**





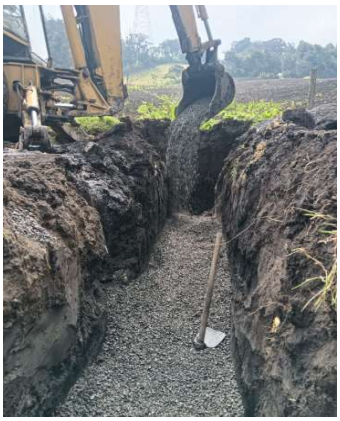



OBSERVACIONES:

Debido a la escases de material en el municipio referente a agregado grueso tipo 5 se realizó la aplicación de grava, con un valor similar al requerido. Técnicamente el uso de grava favorece el atraque del tubo de alcantarillado de 24"

Mario Alix Barrera de Sánchez

CONTRATISTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL VOLCAN

R.L. MARIA ALIX BARRERA SANCHEZ

SUPERVISIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MILLER RODRIGO AVELLANEDA

CONTRATO No.	CONV SOL-467-2025	**FECHA:**	30 de diciembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCAN MUNICIPIO LA CALERA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA REFERIDA VEREDA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 1		

ITEM:	**2.0**	**ACTIVIDAD:**	**AFIRMADO**	**UND:**	**M3**

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	VOL (m3)	N° DE ELEMENTOS	TOTAL
AFIRMADO			6.00	6.00	36.00
TOTAL ITEM: **AFIRMADO**				**M3**	**36.00**


















OBSERVACIONES:

Esta actividad se ejecutó en puntos críticos especialmente los ubicados en altas pendientes

La JAC compro 6 viajes de material de afirmado, adicionalmente la alcaldía apoyo el convenio con 6 viajes adicionales

Mario Alix Barrero de Sánchez

CONTRATISTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL VOLCAN

R.L. MARIA ALIX BARRERA SANCHEZ


SUPERVISIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MILLER RODRIGO AVELLANEDA

CONTRATO No.	CONV SOL-467-2025	**FECHA:**	30 de diciembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCAN MUNICIPIO LA CALERA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA REFERIDA VEREDA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 1		
ITEM:	3.0	**ACTIVIDAD:**	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"
UND:	ML		

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	N° DE ELEMENTOS	TOTAL
TUBERÍA DE 24" PR 0+717	6.00			1.00	6.00
TOTAL ITEM: TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 24"				**ML**	**6.00**

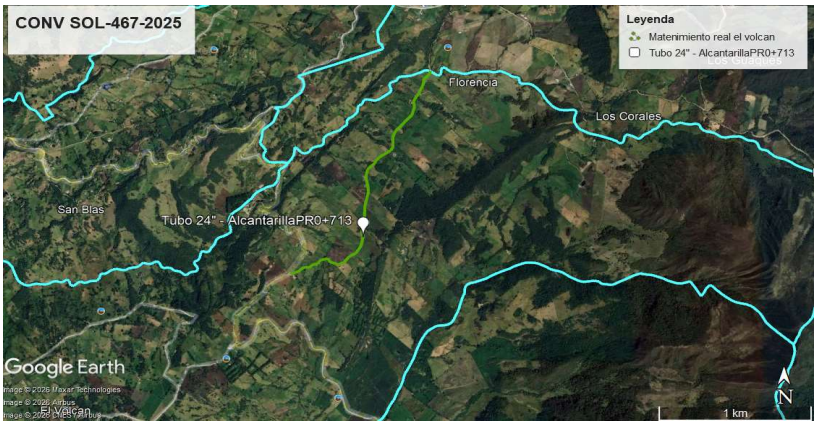





OBSERVACIONES:

Mario Alix Barrera de Sánchez

CONTRATISTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL VOLCAN

R.L. MARIA ALIX BARRERA SANCHEZ

SUPERVISIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MILLER RODRIGO AVELLANEDA

CONTRATO No.	CONV SOL-467-2025	**FECHA:**	30 de diciembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCAN MUNICIPIO LA CALERA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA REFERIDA VEREDA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 1		

ITEM:	4.0	**ACTIVIDAD:**	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	**UND:**	M2

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ESPESOR	N° DE ELEMENTOS	TOTAL
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE PR0+000 A PR2+239	2,239.00	5.00		1.00	11,195.00
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE EN PUNTOS DAÑADOS POR EL CLIMA Y DE ACUERDO AL MATERIAL PROPORCIONADO	650.00	5.00		1.00	3,250.00
TOTAL ITEM:	**CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE**			**M2**	**14445.00**





















OBSERVACIONES:

Mario Alix Barrero de Sánchez

CONTRATISTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL VOLCAN

R.L. MARIA ALIX BARRERA SANCHEZ

SUPERVISIÓN


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MILLER RODRIGO AVELLANEDA

CONTRATO No.	CONV SOL-467-2025	**FECHA:**	30 de diciembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCAN MUNICIPIO LA CALERA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA REFERIDA VEREDA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 1		

ITEM:	**5.0**	**ACTIVIDAD:**	**EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)**	**UND:**	**M3**

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	N° DE ELEMENTOS	TOTAL
EXCAVACIÓN PARA CAPTURA AGUAS ALCANTARIILA 24"	1.20	1.20	1.60	1.00	2.30
EXCAVACIÓN DESCOLE PR 0+157	16.00	0.40	0.45	2.00	5.76
EXCAVACIÓN DESCOLE PR 0+412	3.00	0.60	0.60	2.00	2.16
EXCAVACIÓN DESCOLE PR 0+622	25.00	0.40	0.50	1.00	5.00
EXCAVACIÓN DESCOLE PR 1+670	5.00	0.60	0.40	2.00	2.40
EXCAVACIÓN DESCOLE PR 1+960	8.00	1.20	0.50	2.00	9.60
EXCAVACIÓN APOYO CONFORMACIÓN	372.41	0.35	0.35	2.00	91.24
TOTAL ITEM:	**EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)**			**M3**	**118.46**

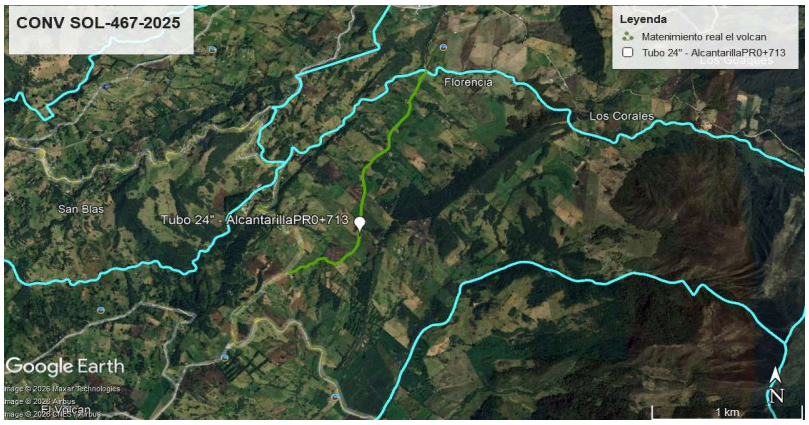













OBSERVACIONES:

Mario Alix Barrera de Sánchez

CONTRATISTA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA EL VOLCAN

R.L. MARIA ALIX BARRERA SANCHEZ

SUPERVISIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MILLER RODRIGO AVELLANEDA
