

Id	Modo de tarea	Ítem	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1			**CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.**	**139 días**	**lun 2/03/26**	**dom 9/08/26**		
2			**Parque 06-030**	**77 días**	**lun 2/03/26**	**vie 29/05/26**		
3			**PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 2/03/26**	**lun 2/03/26**		
4		1,03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26		36
5			**DEMOLICIONES**	**2 días**	**vie 3/04/26**	**sáb 4/04/26**		
6		2,01	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	2 días	vie 3/04/26	sáb 4/04/26	25	8
7			**DESMONTES Y RETIROS**	**1 día**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**		
8		3,03	Desmonte y retiro canecas	1 día	lun 6/04/26	lun 6/04/26	6	
9			**EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO**	**18 días**	**mié 11/03/26**	**mar 31/03/26**		
10		4,01	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC	4 días	mié 11/03/26	sáb 14/03/26	27	11
11		4,04	Compactación fondo de excavación con equipos livia	1 día	lun 16/03/26	lun 16/03/26	10	24
12		4,05	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	6 días	mié 25/03/26	mar 31/03/26	13	26
13		4,08	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	6 días	mié 18/03/26	mar 24/03/26	24	12
14			**JUNTAS**	**1 día**	**lun 2/03/26**	**lun 2/03/26**		
15		6,01	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26		
16			**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**65 días**	**mié 4/03/26**	**lun 18/05/26**		
17		8,13	Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol**	1 día	mié 4/03/26	mié 4/03/26	36	27;38
18		8,18	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	4 días	mié 13/05/26	sáb 16/05/26	20	21
19		8,21	Pintura estructura baloncesto	2 días	vie 8/05/26	sáb 9/05/26	25FC+30 días	20
20		8,23	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	19	18
21		8,28	Pintura y demarcación tablero baloncesto	1 día	lun 18/05/26	lun 18/05/26	18	29
22			**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**28 días**	**lun 2/03/26**	**jue 2/04/26**		
23		9,02	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26		
24		9,05	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	1 día	mar 17/03/26	mar 17/03/26	11	13
25		9,06	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26	26	6;19FC+30 días
26		9,07	Riego de liga (CRR-1)inc. Sum+inst+transp	1 día	mié 1/04/26	mié 1/04/26	12	25
27		9,08	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	5 días	jue 5/03/26	mar 10/03/26	17	10
28			**MOBILIARIO URBANO**	**7 días**	**mar 19/05/26**	**mar 26/05/26**		
29		10,01	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	2 días	mar 19/05/26	mié 20/05/26	21	30
30		10,14	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosiv	2 días	jue 21/05/26	vie 22/05/26	29	31
31		10,29	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	1 día	sáb 23/05/26	sáb 23/05/26	30	32
32		10,41	Señal SC-120 2 caras (Sum + Inst)	1 día	lun 25/05/26	lun 25/05/26	31	33
33		10,43	Señal IDG-S-2 caras (Sum + Inst)	1 día	mar 26/05/26	mar 26/05/26	32	35
34			**NO PREVISTOS**	**76 días**	**mar 3/03/26**	**vie 29/05/26**		
35		NP-02	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierr	3 días	mié 27/05/26	vie 29/05/26	33	
36		NP-05	Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+ret	1 día	mar 3/03/26	mar 3/03/26	4	17
37		NP-09	Tuberia PVC.S d=4" **	2 días	mié 11/03/26	jue 12/03/26	38	
38		NP-10	CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL.	5 días	jue 5/03/26	mar 10/03/26	17	37
39			**COMPONENTES**	**77 días**	**lun 2/03/26**	**vie 29/05/26**		
40			COMPONENTE AMBIENTAL	77 días	lun 2/03/26	vie 29/05/26		
41			COMPONENTE SOCIAL	77 días	lun 2/03/26	vie 29/05/26		
42			COMPONENTE PMT	77 días	lun 2/03/26	vie 29/05/26		
43			**Parque 06-002**	**44 días**	**lun 9/03/26**	**mar 28/04/26**		
44			**PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 9/03/26**	**lun 9/03/26**		
45		1,03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	lun 9/03/26	lun 9/03/26		55
46			**DEMOLICIONES**	**5 días**	**vie 27/03/26**	**mié 1/04/26**		
47		2,04	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	3 días	vie 27/03/26	lun 30/03/26	77	48
48		2,07	Demolicion Manual Gradas en Concreto +cargue y ret	2 días	mar 31/03/26	mié 1/04/26	47	50
49			**DESMONTES Y RETIROS**	**4 días**	**jue 2/04/26**	**lun 6/04/26**		
50		3,01	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	2 días	jue 2/04/26	vie 3/04/26	48	51CC;89
51		3,05	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	2 días	jue 2/04/26	vie 3/04/26	50CC	52
52		3,07	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	2 días	sáb 4/04/26	lun 6/04/26	51	53CC
53		3,10	Desmonte y reinst.Adoquín Arcilla p<5% suelo Med	2 días	sáb 4/04/26	lun 6/04/26	52CC	58
54			**EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO**	**26 días**	**mar 10/03/26**	**mié 8/04/26**		
55		4,01	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	45	56
56		4,02	Excavacion manual con retiro en recebo	3 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26	55	57
57		4,05	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	3 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26	56	62
58		4,10	SLURING EMULSION CRL-1,CRL-0 Y ARENA DE PEÑA (Sum+	2 días	mar 7/04/26	mié 8/04/26	53	86;87
59			**JUNTAS**	**1 día**	**lun 27/04/26**	**lun 27/04/26**		
60		6,01	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	1 día	lun 27/04/26	lun 27/04/26	75FC-2 días	
61			**ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**2 días**	**vie 20/03/26**	**sáb 21/03/26**		
62		7,02	Malla Eslabonada Cal.10 Hueco de 11/2X11/2"	2 días	vie 20/03/26	sáb 21/03/26	57	77
63			**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**10 días**	**vie 17/04/26**	**mar 28/04/26**		
64		8,01	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	5 días	vie 17/04/26	mié 22/04/26	86	65CC;67CC
65		8,02	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	4 días	vie 17/04/26	mar 21/04/26	64CC	66CC
66		8,06	Arreglo de Graderias para Parque***	4 días	vie 17/04/26	mar 21/04/26	65CC	
67		8,15	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	1 día	vie 17/04/26	vie 17/04/26	64CC	68CC
68		8,16	Pintura cerramiento malla eslabonada	2 días	vie 17/04/26	sáb 18/04/26	67CC	70CC
69		8,18	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	72CC	73CC
70		8,21	Pintura estructura baloncesto	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	68CC	71CC
71		8,22	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	70CC	72CC;74CC
72		8,23	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	71CC	69CC
73		8,25	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	69CC	75CC
74		8,28	Pintura y demarcación tablero baloncesto	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	71CC	80CC
75		8,31	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	73CC	60FC-2 días
76			**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**4 días**	**lun 23/03/26**	**jue 26/03/26**		
77		9,02	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	4 días	lun 23/03/26	jue 26/03/26	62	47
78			**MOBILIARIO URBANO**	**1 día**	**mar 28/04/26**	**mar 28/04/26**		
79		10,01	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	75CC	81CC
80		10,14	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosiv	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	74CC	
81		10,29	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	79CC	82CC
82		10,42	Señal SC-80 2 caras (Sum + Inst)	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	81CC	83CC
83		10,43	Señal IDG-S-2 caras (Sum + Inst)	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	82CC	84CC
84		10,45	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	83CC	
85			**NO PREVISTOS**	**13 días**	**sáb 4/04/26**	**sáb 18/04/26**		
86		NP-01	Modulo Complemento para Baranda M-80(0.80x0.85m	7 días	jue 9/04/26	jue 16/04/26	58	64;88
87		NP-04	RecubrimientoSintetico Canch+Demarc Asfalt(Sum+In	7 días	jue 9/04/26	jue 16/04/26	58	
88		NP-06	Pintura baranda cerramientos M83 (Sum+Inst)	2 días	vie 17/04/26	sáb 18/04/26	86	
89		NP-07	DESMONTE LOSETA IDU	1 día	sáb 4/04/26	sáb 4/04/26	50	
90			**COMPONENTES**	**44 días**	**lun 9/03/26**	**mar 28/04/26**		
91			COMPONENTE AMBIENTAL	44 días	lun 9/03/26	mar 28/04/26		
92			COMPONENTE SOCIAL	44 días	lun 9/03/26	mar 28/04/26		
93			COMPONENTE PMT	44 días	lun 9/03/26	mar 28/04/26		
94			**Parque 06-001**	**104 días**	**lun 2/03/26**	**mar 30/06/26**		
95			**PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 6/04/26**	**lun 6/04/26**		
96		1,03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	lun 6/04/26	lun 6/04/26		143;145;1
97			**DEMOLICIONES**	**3 días**	**jue 2/04/26**	**sáb 4/04/26**		
98		2,01	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	1 día	jue 2/04/26	jue 2/04/26	130	100;99
99		2,03	Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+ret	1 día	vie 3/04/26	vie 3/04/26	98	
100		2,04	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	2 días	vie 3/04/26	sáb 4/04/26	98	102;103;1
101			**DESMONTES Y RETIROS**	**13 días**	**lun 6/04/26**	**mié 13/05/26**		
102		3,01	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	1 día	lun 6/04/26	lun 6/04/26	100	121
103		3,07	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	1 día	mié 13/05/26	mié 13/05/26	100	
104		3,08	Desmonte Señal (IDG-S)	1 día	mié 13/05/26	mié 13/05/26	100	
105		3,10	Desmonte y reinst.Adoquín Arcilla p<5% suelo Med	1 día	mié 13/05/26	mié 13/05/26	100	116
106			**EXCAVAVION NIVELACION Y RELLENO**	**25 días**	**lun 2/03/26**	**lun 30/03/26**		
107		4,01	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC	4 días	lun 2/03/26	jue 5/03/26		109;108CC
108		4,03	Excavacion manual con retiro suelo blando	1 día	lun 2/03/26	lun 2/03/26	107CC	
109		4,04	Compactación fondo de excavación con equipos livia	1 día	vie 6/03/26	vie 6/03/26	107	129
110		4,05	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	4 días	jue 26/03/26	lun 30/03/26	112	131
111		4,07	Relleno rajon (mecanico) **	4 días	mar 17/03/26	vie 20/03/26	133	112
112		4,08	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	4 días	sáb 21/03/26	mié 25/03/26	111	110
113			**JUNTAS**	**1 día**	**jue 21/05/26**	**jue 21/05/26**		
114		6,01	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	1 día	jue 21/05/26	jue 21/05/26	128	119
115			**ESTRUCTURAS METÁLICAS**	**3 días**	**jue 14/05/26**	**sáb 16/05/26**		
116		7,02	Malla Eslabonada Cal.10 Hueco de 11/2X11/2"	3 días	jue 14/05/26	sáb 16/05/26	105	128
117			**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**69 días**	**mar 7/04/26**	**jue 25/06/26**		
118		8,01	Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+i	1 día	jue 25/06/26	jue 25/06/26	128FC+30 días	134
119		8,02	Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena CDRC	4 días	vie 22/05/26	mar 26/05/26	114	
120		8,13	Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol**	1 día	jue 7/05/26	jue 7/05/26	130FC+30 días	122
121		8,14	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolor+	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26	102	
122		8,18	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	3 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26	120	123
123		8,21	Pintura estructura baloncesto	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	122	125
124		8,22	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	1 día	vie 5/06/26	vie 5/06/26	142	
125		8,23	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	2 días	jue 14/05/26	vie 15/05/26	123	126
126		8,28	Pintura y demarcación tablero baloncesto	1 día	sáb 16/05/26	sáb 16/05/26	125	136
127			**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**97 días**	**sáb 7/03/26**	**sáb 27/06/26**		
128		9,02	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	3 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	116	114;142FC
129		9,05	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	1 día	sáb 7/03/26	sáb 7/03/26	109	132
130		9,06	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	1 día	mié 1/04/26	mié 1/04/26	131	120FC+30 días
131		9,07	Riego de liga (CRR-1)inc. Sum+inst+transp	1 día	mar 31/03/26	mar 31/03/26	110	130
132		9,08	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	4 días	lun 9/03/26	jue 12/03/26	129	133
133		9,10	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	3 días	vie 13/03/26	lun 16/03/26	132	111
134		9,17	Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 *	2 días	vie 26/06/26	sáb 27/06/26	118	
135			**MOBILIARIO URBANO**	**5 días**	**lun 18/05/26**	**vie 22/05/26**		
136		10,01	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	1 día	lun 18/05/26	lun 18/05/26	126	137
137		10,14	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosiv	1 día	mar 19/05/26	mar 19/05/26	136	138
138		10,29	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	1 día	mié 20/05/26	mié 20/05/26	137	139
139		10,41	Señal SC-120 2 caras (Sum + Inst)	1 día	jue 21/05/26	jue 21/05/26	138	140
140		10,42	Señal SC-80 2 caras (Sum + Inst)	1 día	vie 22/05/26	vie 22/05/26	139	148
141			**NO PREVISTOS**	**53 días**	**mar 7/04/26**	**sáb 6/06/26**		
142		NP-01	Modulo Complemento para Baranda M-80(0.80x0.85m	6 días	vie 29/05/26	jue 4/06/26	128FC+7 días	144;124
143		NP-05	Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+ret	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26	96	
144		NP-06	Pintura baranda cerramientos M83 (Sum+Inst)	2 días	vie 5/06/26	sáb 6/06/26	142	

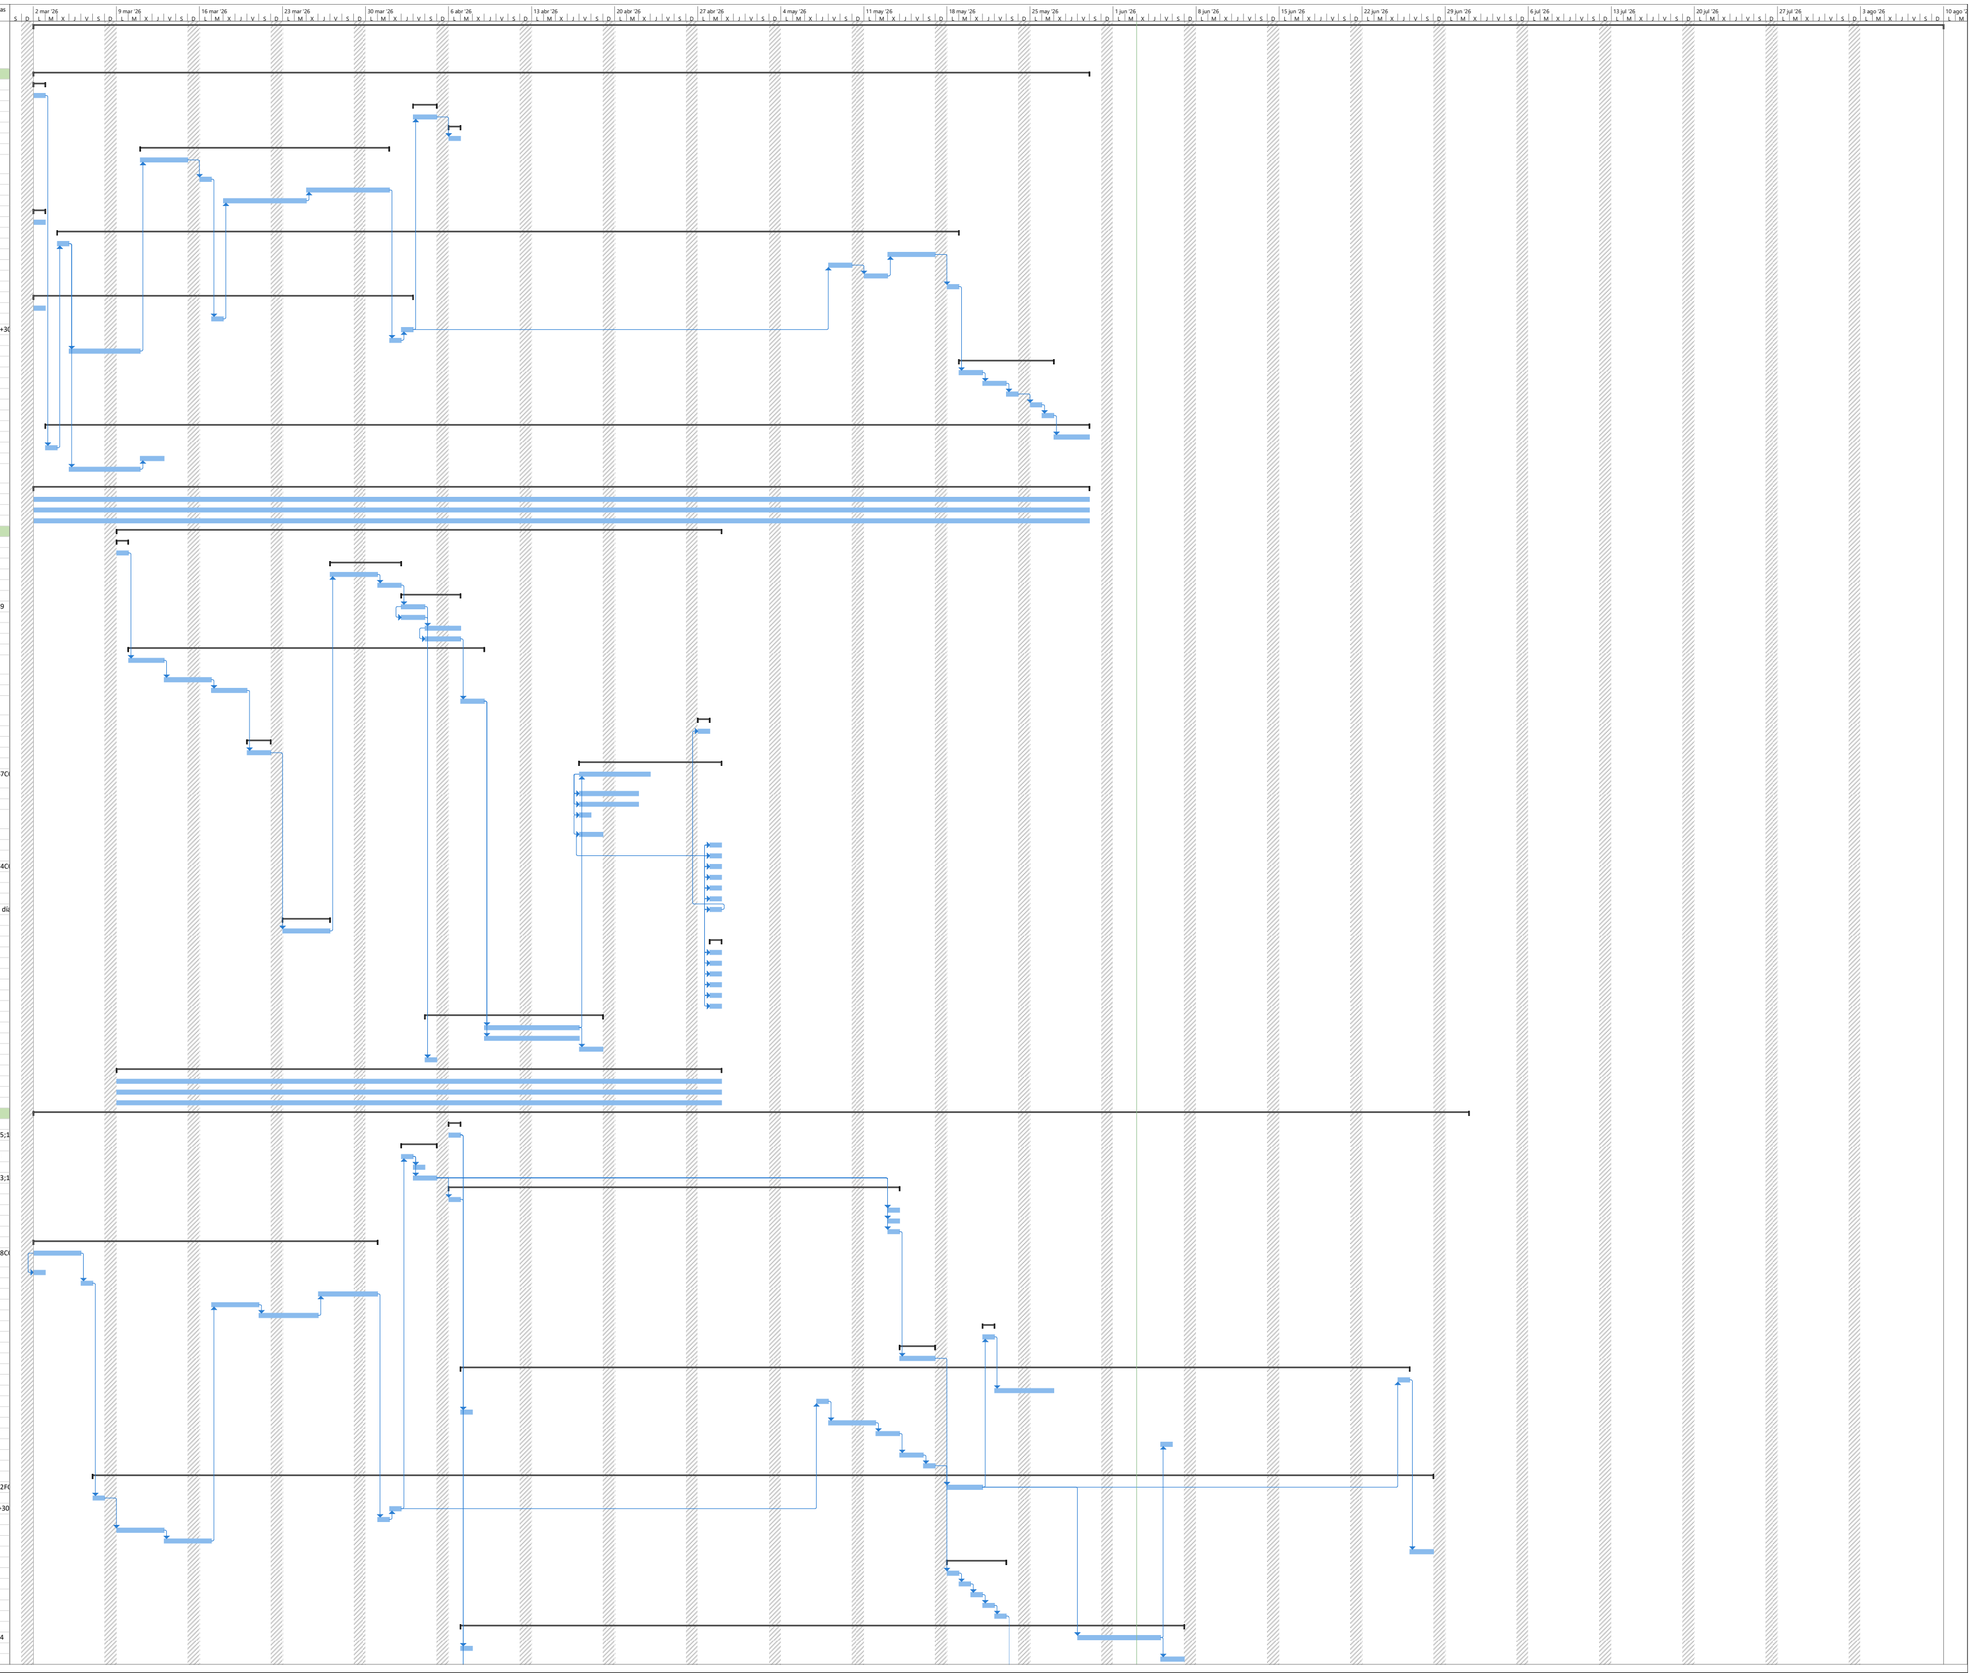

Proyecto: Proyecto parques Tun
Fecha: mié 3/06/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · sólo el comienzo · sólo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Sucesoras
145		NP-07	DESMONTE LOSETA IDU	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26	96	
146		NP-08	Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26	96	147CC
147			Tuberia PVC.S d=4" **	1 día	mar 7/04/26	mar 7/04/26	146CC	
148		NP-11	ALUMBRADO PUBLICO SOLAR	1 día	sáb 23/05/26	sáb 23/05/26	140	
149			**COMPONENTES**	**74 días**	**lun 6/04/26**	**mar 30/06/26**		
150			COMPONENTE AMBIENTAL	74 días	lun 6/04/26	mar 30/06/26		
151			COMPONENTE SOCIAL	74 días	lun 6/04/26	mar 30/06/26		
152			COMPONENTE PMT	74 días	lun 6/04/26	mar 30/06/26		
153			**Parque 06-024**	**51 días**	**mié 15/04/26**	**vie 12/06/26**		
154			**PRELIMINARES**	**1 día**	**mié 15/04/26**	**mié 15/04/26**		
155		1,03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	mié 15/04/26	mié 15/04/26		192
156			**DEMOLICIONES**	**1 día**	**mar 9/06/26**	**mar 9/06/26**		
157		2,01	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	1 día	mar 9/06/26	mar 9/06/26	176	
158			**DESMONTES Y RETIROS**	**1 día**	**mar 9/06/26**	**mar 9/06/26**		
159		3,05	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	1 día	mar 9/06/26	mar 9/06/26	176	
160			**EXCAVACION NIVELACION Y RELLENO**	**21 días**	**vie 17/04/26**	**lun 11/05/26**		
161		4,01	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC	14 días	vie 17/04/26	mar 21/04/26	192	162
162		4,04	Compactación fondo de excavación con equipos livia	1 día	mié 22/04/26	mié 22/04/26	161	179
163		4,05	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	5 días	mié 6/05/26	lun 11/05/26	164	181
164		4,08	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	6 días	mié 29/04/26	mar 5/05/26	182	163
165			**JUNTAS**	**1 día**	**jue 11/06/26**	**jue 11/06/26**		
166		6,01	Junta de Dilatación sikarod 16mm + sikaflex	1 día	jue 11/06/26	jue 11/06/26	178	184;186;1
167			**ESTRUCTURAS METALICAS**	**1 día**	**mar 9/06/26**	**mar 9/06/26**		
168		7,02	Malla Eslabonada Cal.10 Hueco de 11/2X11/2"	1 día	mar 9/06/26	mar 9/06/26	176	178
169			**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**6 días**	**mar 2/06/26**	**mié 10/06/26**		
170		8,13	Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol**	1 día	mié 3/06/26	mié 3/06/26	180FC+15	171
171		8,15	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	6 días	jue 4/06/26	mié 10/06/26	170	
172		8,16	Pintura cerramiento malla eslabonada	2 días	jue 4/06/26	vie 5/06/26	173	
173		8,18	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	2 días	mar 2/06/26	mié 3/06/26	180FC+15	174;172
174		8,21	Pintura estructura baloncesto	2 días	jue 4/06/26	vie 5/06/26	173	175;176;1
175		8,28	Pintura y demarcación tablero baloncesto	2 días	sáb 6/06/26	lun 8/06/26	174	
176		8,31	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	2 días	sáb 6/06/26	lun 8/06/26	174	168;157;1
177			**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**42 días**	**jue 23/04/26**	**mié 10/06/26**		
178		9,02	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	1 día	mié 10/06/26	mié 10/06/26	168	166
179		9,05	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	1 día	jue 23/04/26	jue 23/04/26	162	182
180		9,06	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado	1 día	mié 13/05/26	mié 13/05/26	181	173FC+15
181		9,07	Riego de liga (CRR-1)inc. Sum+inst+transp	1 día	mar 12/05/26	mar 12/05/26	163	180
182		9,08	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	4 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26	179	164
183			**MOBILIARIO URBANO**	**6 días**	**sáb 6/06/26**	**vie 12/06/26**		
184		10,01	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	1 día	vie 12/06/26	vie 12/06/26	166	
185		10,16	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	6 días	sáb 6/06/26	vie 12/06/26	174	
186		10,29	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	1 día	vie 12/06/26	vie 12/06/26	166	
187		10,41	Señal SC-120 2 caras (Sum + Inst)	1 día	vie 12/06/26	vie 12/06/26	166	
188		10,43	Señal IDG-S-2 caras (Sum + Inst)	1 día	vie 12/06/26	vie 12/06/26	166	
189		10,45	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	1 día	vie 12/06/26	vie 12/06/26	166	
190			**NO PREVISTOS**	**45 días**	**jue 16/04/26**	**sáb 6/06/26**		
191		NP-02	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierr	1 día	sáb 6/06/26	sáb 6/06/26	174	
192		NP-05	Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+ret	1 día	jue 16/04/26	jue 16/04/26	155	161
193			**COMPONENTES**	**51 días**	**mié 15/04/26**	**vie 12/06/26**		
194			COMPONENTE AMBIENTAL	51 días	mié 15/04/26	vie 12/06/26		
195			COMPONENTE SOCIAL	51 días	mié 15/04/26	vie 12/06/26		
196			COMPONENTE PMT	51 días	mié 15/04/26	vie 12/06/26		199FC+1 d
197			**Parque 06-032**	**49 días**	**lun 15/06/26**	**dom 9/08/26**		
198			**PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 15/06/26**	**lun 15/06/26**		
199		1.03	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	1 día	lun 15/06/26	lun 15/06/26	196FC+1 d	201;228;2
200			**DEMOLICIONES**	**1 día**	**mar 16/06/2**	**mar 16/06/26**		
201		2.01	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	1 día	mar 16/06/2	mar 16/06/26	199	203;206
202			**DESMONTES Y RETIROS**	**2 días**	**mié 17/06/2**	**jue 18/06/26**		
203		3.01	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	1 día	mié 17/06/2	mié 17/06/26	201	204;212
204		3.08	Desmonte Señal (IDG-S)	1 día	jue 18/06/26	jue 18/06/26	203	
205			**EXCAVACION NIVELACION Y RELLENO**	**9 días**	**mié 17/06/2**	**vie 26/06/26**		
206		4.01	Excavac Mecanic+retiro(250m3/dia)V-15m3-BlandoCDRC	4 días	mié 17/06/26	sáb 20/06/26	201	207CC
207		4.04	Compactación fondo de excavación con equipos livia	4 días	mié 17/06/2	sáb 20/06/26	206CC	208CC+3 d
208		4.05	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	5 días	sáb 20/06/2	jue 25/06/26	207CC+3 d	209CC
209		4.08	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	6 días	sáb 20/06/2	vie 26/06/26	208CC	211;215
210			**PISO EMPRADIZACION Y PINTURA**	**11 días**	**jue 18/06/2**	**mar 30/06/26**		
211		8.07	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	3 días	sáb 27/06/2	mar 30/06/26	209	
212		8.14	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolic+retiro)	6 días	jue 18/06/2	mié 24/06/26	203	
213			**SENDEROS Y CONFINAMIENTOS**	**17 días**	**sáb 27/06/2**	**jue 16/07/26**		
214		9.02	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	10 días	lun 6/07/26	jue 16/07/26	215CC+7 d	217
215		9.08	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	sáb 27/06/2	mié 8/07/26	209	214CC+7 d
216			**MOBILIARIO URBANO**	**7 días**	**vie 17/07/26**	**vie 24/07/26**		
217		10.01	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	1 día	vie 17/07/26	vie 17/07/26	214	218;219
218		10.13	Modulo m - 5 columpio (sum + inst)	6 días	sáb 18/07/2	vie 24/07/26	217	
219		10.29	Banca prefab M-31 sinEspald sumin+instala Z.dura	2 días	sáb 18/07/2	lun 20/07/26	217	220
220		10.38	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	1 día	mar 21/07/2	mar 21/07/26	219	221
221		10.42	Señal SC-80 2 caras (Sum + Inst)	1 día	mié 22/07/2	mié 22/07/26	220	222
222		10.43	Señal IDG-S-2 caras (Sum + Inst)	1 día	jue 23/07/26	jue 23/07/26	221	223
223		10.45	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	1 día	vie 24/07/26	vie 24/07/26	222	225
224			**NO PREVISTOS**	**2 días**	**sáb 25/07/2**	**lun 27/07/26**		
225		NP-02	Empradizacion sencilla cespedon pasto kikuyo + Tierr	2 días	sáb 25/07/26	lun 27/07/26	223	226CC
226		NP-03	Juego muro incluyente	2 días	sáb 25/07/26	lun 27/07/26	225CC	
227			**COMPONENTES**	**48 días**	**mar 16/06/2**	**dom 9/08/26**		
228			COMPONENTE AMBIENTAL	48 días	mar 16/06/26	dom 9/08/26	199	
229			COMPONENTE SOCIAL	48 días	mar 16/06/26	dom 9/08/26	199	
230			COMPONENTE PMT	48 días	mar 16/06/26	dom 9/08/26	199	
231								
232								
233								
234								
235								
236								
237								
238								
239								
240								
241								
242								
243								
244								
245								
246								
247				7 días	lun 15/06/26	dom 21/06/26		

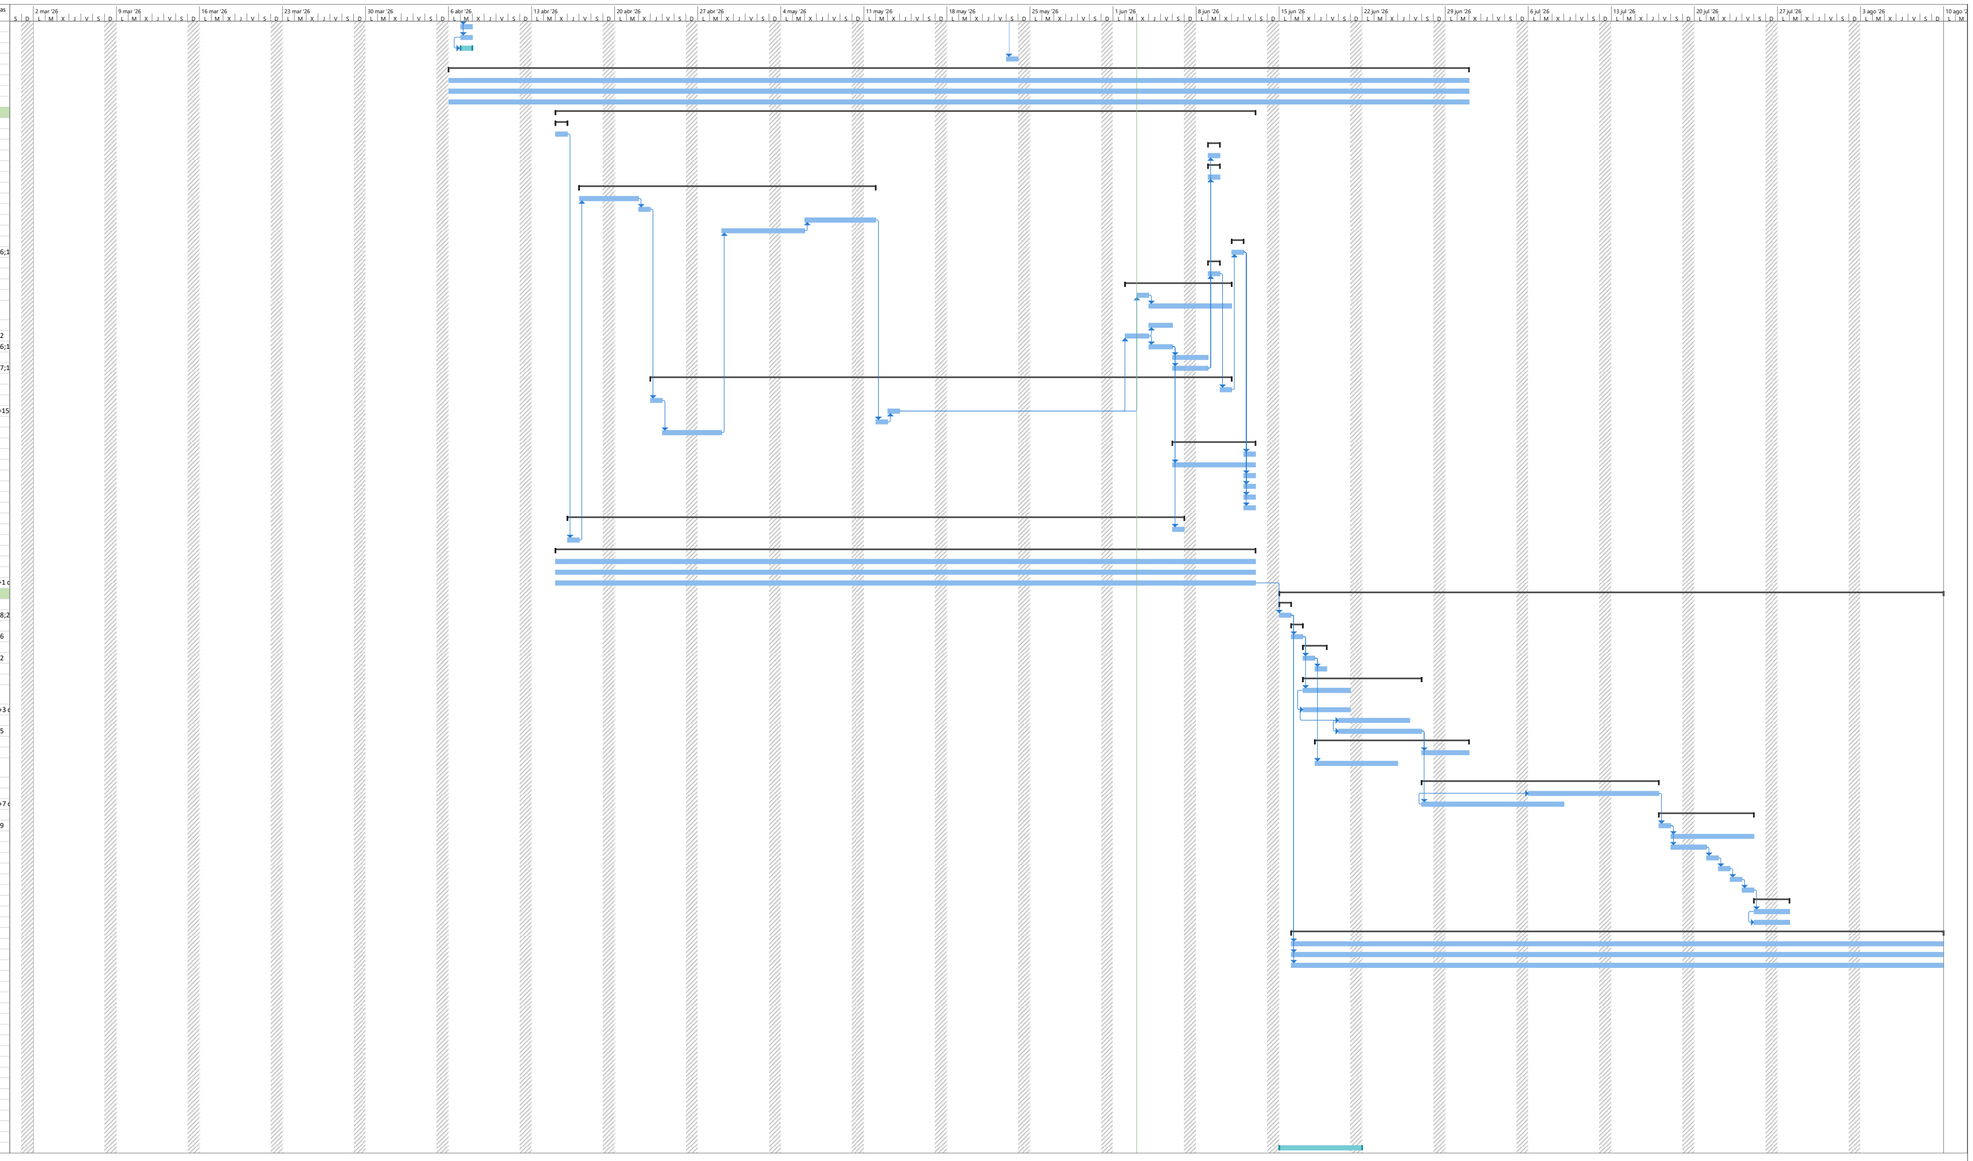

CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025.
Nombre del representante legal VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ
C. C. No. 1.110.521.236

ING. MARGARITA GOMEZ GOMEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
APROBO

Proyecto: Proyecto parques Tun
Fecha: mié 3/06/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso
