

Id	Modo de tarea	Item	Item Contractual	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo
1				**PROYECTO ED. SALUD MENTAL**	**478 días**	**$ 20,559,033,660.00**	**lun 10/02/25**
2				**INICIO**	**0 días**	**$ 0.00**	**lun 10/02/25**
3		**COMPONENTE 1**		**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**	**159 días**	**$ 1,070,953,946.00**	**lun 10/02/25**
4		1.01	01.01.01	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	71 días	$ 230,114,504.00	lun 10/02/25
5		1.02	01.01.02	ESTUDIOS DE DETALLE DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL	71 días	$ 59,927,327.00	lun 10/02/25
6		1.03	01.01.03	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	71 días	$ 13,895,000.00	lun 10/02/25
7		1.04	02.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, CO	20 días	$ 40,464,473.00	sáb 10/05/25
8		1.05	02.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA (21	días	$ 41,991,742.00	sáb 10/05/25
9		1.06	02.01.03	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA, INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE (20	días	$ 120,754,768.00	vie 16/05/25
10		1.07	02.01.04	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA E	5 días	$ 818,122.00	vie 6/06/25
11		1.08	02.01.06	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,60X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MAD	1 día	$ 883,320.00	vie 16/05/25
12		1.09	02.01.07	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC	1 día	$ 226,991.00	vie 16/05/25
13		1.10'	02.01.09	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA	1 día	$ 4,712,927.00	vie 16/05/25
14		1.11	02.01.10	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	7 días	$ 26,712,332.00	jue 5/06/25
15		1.12	02.01.11	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MAL	2 días	$ 9,975,408.00	jue 5/06/25
16		1.13	02.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	7 días	$ 41,070,282.00	mié 11/06/25
17		1.14	02.01.16	TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	20 días	$ 7,779,153.00	vie 16/05/25
18		1.15	02.01.22	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO,	7 días	$ 15,087,230.00	jue 5/06/25
19		1.16	02.01.23	LIMPIEZA Y DESENMALEZAMIENTO DE TERRENO CON MALEZA ADYACENTE A LA OBRA DE TIM	7 días	$ 72,100,485.00	jue 5/06/25
20		1.17	02.02.03	PROTECCIÓN CON CARTÓN, POLIETILENO Y CINTA DE ENMASCARAR	7 días	$ 6,922,200.00	sáb 7/06/25
21		1.18	02.02.04	PROTECCION ESCALERA AUXILIAR EN GRANITO, BARANDAS Y PASAMANOS	7 días	$ 2,242,691.00	sáb 7/06/25
22		1.19	03.01.01	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS AUXILI	10 días	$ 1,552,508.00	sáb 7/06/25
23		1.20'	03.01.02	DESMONTAJE DE CIELO RASO DE ARENA CEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA, INCLU	30 días	$ 134,046,259.00	sáb 7/06/25
24		1.21	03.01.04	DESMONTAJE DE MARQUESINA EN VIDRIO	15 días	$ 5,283,542.00	vie 13/06/25
25		1.22	03.01.06	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	20 días	$ 3,469,215.00	sáb 7/06/25
26		1.23	03.01.07	DESMONTAJE DE PUERTAS Y MARCOS NO PATRIMONIALES O NO PRIORIZADOS (INC	25 días	$ 4,052,327.00	sáb 7/06/25
27		1.24	03.01.08	DESMONTAJE DE REJAS METÁLICAS	7 días	$ 9,584,821.00	vie 13/06/25
28		1.25	03.01.09	DESMONTAJE DE VENTANERÍA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCO	15 días	$ 29,608,869.00	vie 13/06/25
29		1.26	03.01.10	DESMONTE CONTROLADO DE CAPAS PREVIAS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIER	20 días	$ 46,537,280.00	mar 24/06/25
30		1.27	03.01.12	RETIRO CONTROLADO DE PISO EN ALFOMBRA,CAUCHO Y VINILO	7 días	$ 49,024,952.00	vie 13/06/25
31		1.28	03.01.13	RETIRO DE MALLA SOBRE VENTANA	7 días	$ 263,455.00	vie 13/06/25
32		1.29	03.01.16	DESMONTE DE MUEBLE EN MADERA	15 días	$ 3,163,892.00	vie 13/06/25
33		1.30'	03.02.03	DEMOLICIÓN DE ESCALERA O RAMPA FUNDIDA EN SITIO	5 días	$ 15,168,092.00	vie 13/06/25
34		1.31	03.02.05	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO	5 días	$ 766,109.00	vie 13/06/25
35		1.32	03.02.11	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO CON GRANITO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSI	7 días	$ 517,765.00	vie 13/06/25
36		1.33	03.02.14	DEMOLICIÓN Y RETIRO ENCHAPES CERÁMICOS SOBRE MURO CUIDANDO LA NO DEF	15 días	$ 9,806,243.00	jue 26/06/25
37		1.34	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE	159 días	$ 70,439,612.00	lun 10/02/25
38		**COMPONENTE 2**		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**183 días**	**$ 364,738,195.00**	**lun 10/02/25**
39		2.01	02.01.12	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	2 días	$ 2,327,026.00	jue 5/06/25
40		2.02	02.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	30 días	$ 6,730,596.00	mié 20/08/25
41		2.03	02.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	30 días	$ 9,246,247.00	mié 20/08/25
42		2.04	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE	24 días	$ 70,439,612.00	sáb 30/08/25
43		2.05	INP-001	Desmonte De Casetones De Guadua De Losas Existentes	45 días	$ 186,714,264.00	vie 20/06/25
44		2.06	INP-020	Desmonte De Tuberia Existente (Hidraulica Y Sanitaria En Pvc, De Varios Tamaños) Incluye	20 días	$ 9,352,744.00	vie 20/06/25
45		2.07	INP-021	Demolición De Media Caña En Granito	15 días	$ 43,526,144.00	lun 23/06/25
46		2.08	INP-028	Desmonte De Puertas Doble, Incluye Disposición Final.	5 días	$ 154,653.00	sáb 7/06/25
47		2.09	INP-029	Desmonte De Marcos (Sin Puertas), Incluye Disposición Final.	5 días	$ 148,400.00	sáb 7/06/25
48		2.1	INP-031	Demolición De Muro En Mamposteria No Estructural En Metro Lineal	20 días	$ 19,540,558.00	vie 20/06/25
49		2.11	INP-032	Desmonte Retiro Y Puesta A Disposición De Tubería En Hierro Colado De Varios Tamaños	15 días	$ 8,953,367.00	vie 20/06/25
50		2.12	INP-035	Desmonte De Pasamanos En Madera, Incluye Disposición Final	5 días	$ 768,103.00	vie 20/06/25
51		2.13	INP-048	Desmonte De Divisiones en madera Con Vidrios, Incluye Retiro Y Disposición Final En Sitio	5 días	$ 3,212,927.00	sáb 7/06/25
52		2.14	INP-005	Tala de Arbol >15m incluye desenraice, retiro, disposicion final y tramites ante la secretaria d	5 días	$ 3,623,584.00	lun 10/02/25
53		**COMPONENTE 3**		**DESMONTES Y RETIROS**	**41 días**	**$ 169,729,277.00**	**vie 23/06/25**
54		3.01	03.01.03	DESMONTAJE DE GUARDAESCOBA	0 días	$ 0.00	mar 15/07/25
55		3.02	03.01.05	DESMONTAJE DE MEDIA CAÑA EN GRANITO	0 días	$ 0.00	mar 15/07/25
56		3.03	03.01.11	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO	20 días	$ 100,131,187.00	jue 3/07/25
57		3.04	03.01.14	RETIRO DE REJILLA DE VENTILACIÓN	2 días	$ 2,011.00	jue 3/07/25
58		3.05	03.01.15	RETIRO PROTECCIÓN Y TRASLADO A TALLER PARA RESTAURACION PUERTAS CAR	0 días	$ 0.00	mar 15/07/25
59		3.06	03.01.17	DESMONTE MUEBLE EN MADERA PARA MANTENIMIENTO	0 días	$ 0.00	mar 15/07/25
60		3.07	03.02.02	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS. INCLUYE RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, CARGUE,	5 días	$ 620,798.00	mié 16/07/25
61		3.08	03.02.12	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL	20 días	$ 40,398,751.00	vie 20/06/25
62		3.09	INP-059	Retiro Controlado De Pañete En Arena Cemento M	20 días	$ 15,622,057.00	jue 3/07/25
63		3.10'	INP-205	DESMONTE DE BARANDA METALICA PARA PROTECCION, INCLUYE ENVOLTURA EN F	1 día	$ 1,170,688.00	lun 11/08/25
64		3.11	INP-206	DESMONTE DE PLACAS PATRIMONIALES PARA PROTECCION, INCLUYE GUACAL EN	1 día	$ 932,014.00	lun 11/08/25
65		3.12	INP-014	Demolición De Tanques De Almacenamiento De Agua En La Cubierta, Incluye Trasiego Verti	1 día	$ 10,845,771.00	mié 16/07/25
66		**COMPONENTE 4**		**DEMOLICIONES**	**55 días**	**$ 150,844,945.00**	**mar 22/07/25**
67		4.01	03.02.01	ESCARIFICACION DE COLUMNAS Y MUROS. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE O ACABAD	30 días	$ 20,885,719.00	mar 29/07/25
68		4.02	03.02.04	DEMOLICION DE MURO EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE RETIRO DEL ACERO C	15 días	$ 951,478.00	mar 29/07/25
69		4.05	03.02.08	DEMOLICIÓN DE VIGAS AEREAS Y PLACA AÉREA MACIZA REFORZADA, (INCLUYE ALI	40 días	$ 14,856,156.00	mar 29/07/25
70		4.06	03.02.09	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO (INCLU	15 días	$ 2,585,793.00	mar 29/07/25
71		4.07	03.02.10	DEMOLICION DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y	15 días	$ 10,840,443.00	mar 29/07/25
72		4.08	03.02.13	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 20 A 40CM. INCLUYE EL ELEMENT	0 días	$ 0.00	mar 29/07/25
73		4.09	INP-027	Demolición, Limpieza Y Reposición De Mortero O Alfinado De Piso (Rodros De Muros Demol	30 días	$ 23,030,219.00	lun 11/08/25
74		4.10'	INP-053	Raspado De Muros Con Humedad Interior (Retiro De Pintura Y Estuco Húmedo donde aplic	20 días	$ 4,395,059.00	lun 11/08/25
75		4.12	INP-058	Demolición De Mortero De Nivelación, Incluye disposicion final	30 días	$ 49,956,632.00	vie 22/08/25
76		4.13	INP-200	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO EN FACHADA CON ALTURA	20 días	$ 23,343,446.00	mar 22/07/25
77		**COMPONENTE 5**		**EXCAVACIONES Y RETIROS**	**183 días**	**$ 181,402,654.00**	**lun 10/02/25**
78		5.02	04.01.02	EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALT	50 días	$ 19,738,635.00	mié 16/07/25
79		5.03	04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO I	45 días	$ 28,262,484.00	lun 4/08/25
80		5.04	04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	50 días	$ 59,605,161.00	mar 22/07/25
81		5.05	INP-187	Motobomba Eyectoras Para Manejo De Agua En Excavaciones (8 Horas)	0 días	$ 0.00	mar 22/07/25
82		5.06	INP-201	Excavación manual en recebo compactado. De 2 A 4 M De Altura. No Incluye, Entibado, Can	30 días	$ 3,556,762.00	vie 22/08/25
83		1.34	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE	159 días	$ 70,439,612.00	lun 10/02/25
84		**COMPONENTE 6**		**LLENOS**	**45 días**	**$ 332,088,430.00**	**mar 30/09/25**
85		6.01	04.02.01	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	25 días	$ 261,648,818.00	mié 1/10/25
86		6.02	04.02.02	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA ME	0 días	$ 0.00	mar 30/09/25
87		6.03	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE	45 días	$ 70,439,612.00	mar 30/09/25
88		**COMPONENTE 7**		**CIMENTACION**	**213 días**	**$ 323,819,433.00**	**lun 10/02/25**
89		7.01	05.01.01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	30 días	$ 21,841,788.00	lun 11/08/25
90		7.02	05.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE FC=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE F	30 días	$ 29,788,341.00	sáb 16/08/25
91		7.03	05.01.04	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMI	0 días	$ 0.00	lun 13/10/25
92		7.04	05.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSORES	30 días	$ 22,589,817.00	vie 22/08/25
93		7.05	05.01.06	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZ	30 días	$ 4,965,786.00	mié 13/08/25
94		7.06	05.01.07	PLACA DE CONTRAPSO DE E=0.12 EN CONCRETO DE FC=21MPA. INCLUYE ELEMEN	10 días	$ 60,555,533.00	mar 30/09/25
95		7.07	05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGUI	30 días	$ 59,858,509.00	mié 13/08/25
96		7.08	INP-003	Concreto De 4000 Psi Para Vigas De amarre en Cimentación (45x35cm). Incluye Formaleton	30 días	$ 32,787,212.00	mar 30/09/25
97		7.09	INP-004	Concreto De 2500 Psi Para Contrapiso De Campamento, E=0.10m. Incluye Formaleteria Lab	10 días	$ 10,981,765.00	mié 16/07/25
98		7.10'	INP-192	Reforzamiento de columnas , seccion 45cmx35cm, en semisotano para subsanar efecto dc	25 días	$ 9,992,570.00	mar 30/09/25
99		1.34	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE	159 días	$ 70,439,612.00	lun 10/02/25
100		**COMPONENTE 8**		**COLUMNAS**	**80 días**	**$ 718,196,992.00**	**lun 11/08/25**
101		8.01	05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTALES (INCLUYE	7 días	$ 10,243,972.00	jue 4/09/25
102		8.02	05.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE FC=3.000 PSI PARA MUROS. (INCLU	60 días	$ 167,015,842.00	jue 4/09/25
103		8.03	05.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE FC=3.000 PSI PARA RECALCE DE CC	40 días	$ 35,490,353.00	jue 4/09/25
104		8.04	05.02.04	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	60 días	$ 197,110,963.00	lun 1/09/25
105		8.05	05.02.05	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZ	60 días	$ 24,853,597.00	lun 1/09/25
106		8.06	05.02.06	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,15 M - D =5/8").INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	60 días	$ 29,020,194.00	lun 1/09/25
107		8.07	05.02.07	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L = 0,20 M - D =3/4"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	60 días	$ 7,819,717.00	lun 1/09/25
108		8.08	05.02.08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,22 M - D =7/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZ	60 días	$ 22,291,915.00	lun 1/09/25
109		8.09	05.02.09	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,25 M - D =1"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	60 días	$ 6,084,898.00	lun 1/09/25
110		8.10'	05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGUI	60 días	$ 180,448,724.00	lun 1/09/25
111		8.11	INP-069	Grouting Para Remate De Reforzamiento De Columna Y Vigas	40 días	$ 30,892,195.00	jue 4/09/25
112		4.11	INP-054	Raspado De Muros Con Humedad De Fachada (Retiro De Pintura Y Estuco Húmedo donde	20 días	$ 6,924,622.00	lun 11/08/25
113		4.13	INP-200	RETIRO CONTROLADO DE PAÑETE EN ARENA CEMENTO EN FACHADA CON ALTURA	0 días	$ 0.00	vie 15/08/25
114		**COMPONENTE 9**		**VIGAS Y PLACAS**	**106 días**	**$ 410,491,499.00**	**mié 16/07/25**
115		9.01	05.01.03	PLACA MACIZA AÉREA E.MAX=0,10 M EN CONCRETO FC=3.000 PSI. INCLUYE SUMINI	40 días	$ 2,448,289.00	vie 12/09/25
116		9.02	05.03.01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIC	20 días	$ 40,121,403.00	vie 19/09/25
117		9.03	05.03.02	PLACA MACIZA AÉREA E.MAX=0,20 M EN CONCRETO FC=3.000 PSI. INCLUYE SUMINI	40 días	$ 28,880,871.00	vie 12/09/25
118		9.04	05.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE FC=3.000 PSI PARA RECALCE DE VI	60 días	$ 28,330,529.00	vie 12/09/25
119		9.05	05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGUI	60 días	$ 80,458,663.00	lun 1/09/25

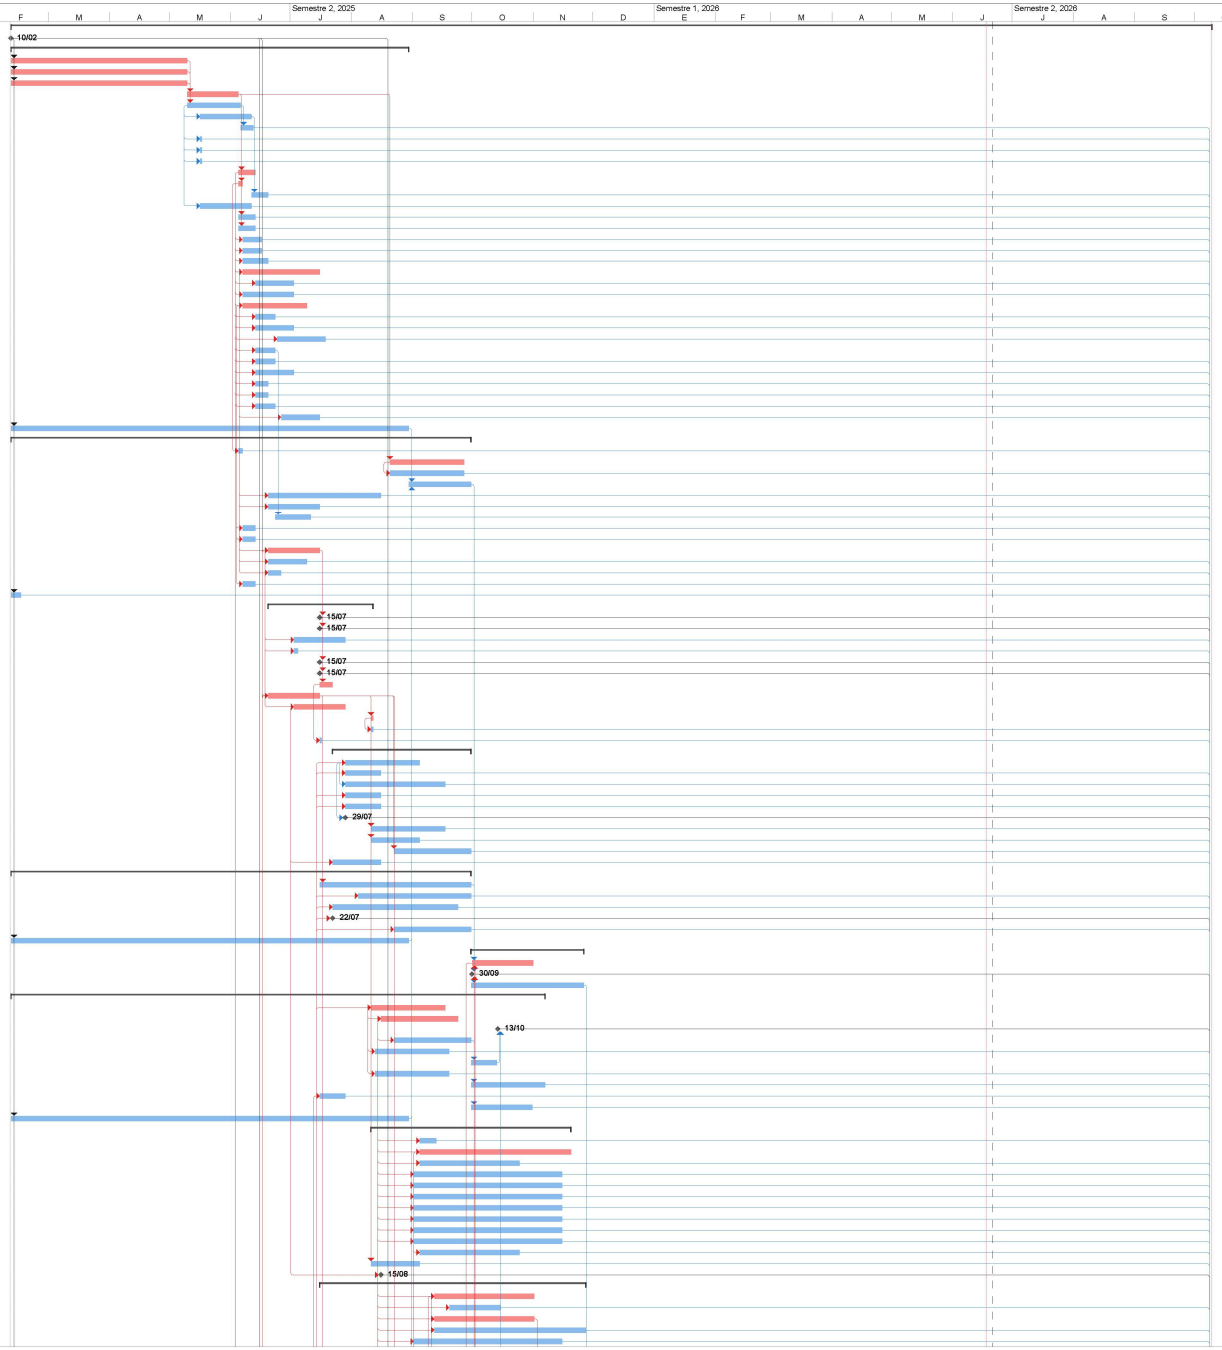

Proyecto: msproj11
Fecha: jue 18/06/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Ítem Contractual	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo
120		9.06	05.05.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FLIA	40 días	$ 34.026.707.00	jue 4/09/25
121		9.07	INP-087	Perforaciones de 1/2" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamie	60 días	$ 63.919.252.00	jue 4/09/25
122		9.08	INP-088	Perforaciones de 5/8" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamie	60 días	$ 3.190.018.00	jue 4/09/25
123		9.09	INP-089	Perforaciones de 3/4" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamie	60 días	$ 35.901.675.00	jue 4/09/25
124		9.10	INP-090	Perforaciones de 7/8" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamie	60 días	$ 6.844.610.00	jue 4/09/25
125		9.11	INP-091	Perforaciones de 1" de 30 a 40 cm en vigas para pase de varillas de aceros del reforzamient	60 días	$ 25.030.670.00	jue 4/09/25
126		9.12	03.02.06	DEMOLICIÓN DE PLACA REFORZADA, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, (	40 días	$ 47.825.403.00	mié 16/07/25
127		9.13	03.02.07	ESCARIFICACIÓN MANUAL DE VIGAS AÉREAS EN CONCRETO HASTA EL REFUERZO	30 días	$ 15.513.409.00	mar 29/07/25
128		**COMPONENTE 10**		**TANQUE**	**138 días**	**$ 967.365.367,00**	**lun 18/08/25**
129		10.01	05.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=1	15 días	$ 235.549.021.00	mar 7/11/25
130		10.02	05.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=1	15 días	$ 202.819.378.00	jue 20/11/25
131		10.03	05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGU	20 días	$ 264.502.920.00	sáb 25/10/25
132		5.01	04.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLU	60 días	$ 3.279.084.00	mié 16/07/25
133		10.04	INP-006	Excavación Mecánica En Material Común. De 2 A 4 M De Altura. No Incluye. Entibado, Carg	20 días	$ 30.729.104.00	mar 30/09/25
134		10.05	02.01.27	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	0 días	$ 0.00	lun 6/10/25
135			INP-026	Chequeo de niveles para control de asentamiento, incluye nivel automatico de precision, topc	100 días	$ 4.299.113.00	mar 17/06/25
136		5.02	04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALT	60 días	$ 49.588.347.00	mié 16/07/25
137		5.03	04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO	145 días	$ 106.158.788.00	mar 5/08/25
138		1.34	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE	159 días	$ 70.439.612.00	lun 10/02/25
139		**COMPONENTE 11**		**CARCAMOS, RAMPA Y ESCALERAS**	**262 días**	**$ 361.641.255,00**	**lun 1/09/25**
140		11.01	02.01.08	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CO	30 días	$ 72.078.867.00	sáb 23/05/26
141		11.02	INP-034	Cárcamo Estructura En Concreto De 4000 Psi Reforzado Con Sección Externa De 50x55cm	0 días	$ 63.004.881.00	mié 28/01/26
142		11.03	05.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE F'C=3.500 PSI (F'C=24.5 MPA) PARA E	148 días	$ 13.933.213.00	lun 1/06/26
143		11.04	05.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	30 días	$ 80.359.958.00	mar 9/12/25
144		11.05	INP-041	Suministro E Instalación De Concreto De F'c=3.500 Psi (F'c=24.5 Mpa) Para Rampa. E = 10	15 días	$ 42.547.923.00	lun 1/06/26
145		11.06	05.02.04	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0.10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	60 días	$ 9.162.141.00	lun 1/09/25
146		11.07	05.02.05	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L MAX = 0,15 M - D =1/2"). INCLUYE ACERO DE REFUERZ	60 días	$ 6.731.183.00	lun 1/09/25
147		11.08	INP-207	Fundición Con Grouting. para pases de tuberias existentes D <= 2, Incluye Retiro De Tuberia	30 días	$ 3.383.477.00	jue 4/09/25
148		11.09	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE	15 días	$ 70.439.612.00	lun 25/05/26
149		**COMPONENTE 12**		**ESTRUCTURA METÁLICA**	**319 días**	**$ 586.897.227.00**	**mar 19/08/25**
150		12.01	06.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A572 GR 50, INCLUY	200 días	$ 480.603.190.00	jue 20/11/25
151		12.02	06.01.02	ESCALERA METÁLICA EXTERIOR PARA ACCESO A LA CUBIERTA	7 días	$ 972.458.00	lun 21/09/26
152		12.03	INP-039	Escalera Removible Acero Inoxidable Para Ingreso A Tanque	7 días	$ 1.992.280.00	lun 21/09/26
153		12.04	INP-030	Reparacion de via de acceso mejorada con cemento al 5%, Cra 10 - Salud Mental	5 días	$ 103.329.299.00	mar 19/08/25
154		**COMPONENTE 13**		**OBRAS EN CUBIERTA**	**95 días**	**$ 61.130.831.00**	**jue 4/06/26**
155		13.01	07.01.01	SUPERFICIE ACRÍLICA TRANSPARENTE PARA CIELO FALSO DE AUDITORIO	15 días	$ 2.059.711.00	lun 14/09/26
156		13.02	07.01.02	CLARABOYA CON MARCO Y VIDRIO	10 días	$ 25.983.461.00	lun 14/09/26
157		13.03	07.01.05	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA MARQUESINA	0 días	$ 0.00	lun 21/09/26
158		13.04	08.03.01	LIMPIEZA DE ALFAJIAS Y CORNISAS EN CONCRETO	5 días	$ 1.621.155.00	mié 10/06/26
159		13.05	INP-086	Alfajia En Concreto Prefabricadas Para Bordes De Muros En Cubierta	30 días	$ 31.466.504.00	jue 4/06/26
160		13.06	02.01.12	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	0 días	$ 0.00	mar 29/09/26
161		**COMPONENTE 14**		**MUROS EN MAMPOSTERIA Y FIBROCEMENTO**	**195 días**	**$ 478.763.423,00**	**lun 3/11/25**
162		14.01	08.01.01	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA ESTRADO N°4 (9X23X33CM) CON PEGA DE 1.0 CM EN	20 días	$ 10.741.280.00	lun 3/11/25
163		14.02	08.02.01	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10MM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO	180 días	$ 181.048.788.00	vie 21/11/25
164		14.03	INP-008	Columnetas Y Dinteles Para Confinamiento De Muros En Mamposteria, Incluye Acero De Re	160 días	$ 142.290.872.00	vie 14/11/25
165		14.04	INP-055	Muros En Placa De Fibrocemento De 10mm Una Cara, Incluye Estucado Y 3mano De Pintur	180 días	$ 40.501.210.00	vie 21/11/25
166		14.05	INP-056	Muros En Placa De Fibrocemento De 10mm Una Cara, Incluye Estucado Y 3mano De Pintur	180 días	$ 33.741.661.00	vie 21/11/25
167		14.06	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE	50 días	$ 70.439.612.00	mié 26/11/25
168		**COMPONENTE 15**		**PUERTAS Y VENTANAS**	**110 días**	**$ 1.564.868.025.00**	**jue 23/04/26**
169		15.01	09.01.01	DIVISIÓN INTERNA EN PANELES DE VIDRIO TEMPLADO BISELADO E=15MM. ANCLAJE	30 días	$ 50.251.231.00	lun 3/08/26
170		15.02	09.01.02	DIVISIÓN CORTAFUEGOS EN VIDRIO CORTAFUEGO MULTILAMINADO CON MARCO DI	30 días	$ 28.261.574.00	lun 3/08/26
171		15.03	09.01.03	PUERTA PLEGABLE PERSIANA PLANTA ELÉCTRICA. PUERTA CON REJILLA METALICA	30 días	$ 14.072.764.00	lun 3/08/26
172		15.04	09.01.04	PUERTA BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS. PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO METÁL	30 días	$ 64.715.887.00	lun 3/08/26
173		15.05	09.01.05	CERRAMIENTO VERDE EN ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA CIRCULAR 2" Y MALL	30 días	$ 4.615.488.00	lun 3/08/26
174		15.06	09.01.06	CORREDIZA BAÑOS PMR. P9. PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO METALIZADO.	30 días	$ 63.817.977.00	lun 3/08/26
175		15.07	09.01.07	PUERTA CUARTO TECNICO RESIDUOS ROPA SUCIA. PUERTA BATIENTE SENCILLA EN	30 días	$ 19.405.228.00	lun 3/08/26
176		15.08	09.01.08	DIVISIÓN CAFETERIA. VIDRIO TEMPLADO 10MM CON PELÍCULA VINIL OPALIZADA, ZÓ	30 días	$ 3.263.131.00	lun 3/08/26
177		15.09	09.01.09	PUERTA DOBLE PARA ACCESO DESDE CONSULTA EXTERNA. P-50. PUERTA DOBLE H	30 días	$ 14.396.958.00	lun 3/08/26
178		15.10'	09.01.10	PUERTA DOBLE PARA CIRCULACIONES. PUERTA DOBLE HOJA EN FORMICA ACABAD	30 días	$ 49.401.313.00	lun 3/08/26
179		15.11	09.01.11	PUERTA DOBLE PARA SALAS DE PROCEDIMIENTOS. P-23. PUERTA DOBLE HOJA CON	30 días	$ 14.114.660.00	lun 3/08/26
180		15.12	09.01.12	PUERTAS CORTAFUEGO EN VIDRIO MULTILAMINADO P-31 CON PERFIL DE ACERO LÁ	30 días	$ 30.651.267.00	lun 3/08/26
181		15.13	09.01.13	PUERTA DE HABITACION AISLADO. P18. PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO MET	30 días	$ 32.875.927.00	lun 3/08/26
182		15.14	09.01.14	PUERTA DE INTRAHOSPITALARIA. P25. PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO METÁ	30 días	$ 26.590.824.00	lun 3/08/26
183		15.15	09.01.15	PUERTA DE LABORTERAPIA. P24. PUERTA CON HOJA FORMICA ACABADO METALIZA	30 días	$ 37.227.153.00	lun 3/08/26
184		15.16	09.01.16	PUERTA CORREDIZA 4 HOJAS, VIDRIO TEMPLADO 10MM (2)PV 93; PS3 Y PS4	30 días	$ 7.967.736.00	lun 3/08/26
185		15.17	09.01.17	PUERTA PARA OFICINAS SALA DE VISITAS TERRAZAS PISO 2. PUERTA DE UNA HOJA	30 días	$ 43.822.551.00	lun 3/08/26
186		15.18	09.01.18	PUERTA POCETAS DE ASEO. P7. PUERTA DOBLE HOJA CON HOJA Y REJILLA EN ALU	30 días	$ 14.884.031.00	lun 3/08/26
187		15.19	09.01.19	PUERTA TRABAJO SUCIO LIMPIO MEDICAMENTOS. PUERTA DE UNA HOJA CON TABL	30 días	$ 43.264.307.00	lun 3/08/26
188		15.2	09.01.20	PUERTA SENCILLA PARA CIRCULACIÓN . P-51 Y P-52. PUERTA DOBLE HOJA CON TAE	30 días	$ 32.057.874.00	lun 3/08/26
189		15.21	09.01.21	PUERTAS CORTAFUEGO SENCILLA CORTAFUEGO P-19, PROTECCION EI-90, CON PEI	30 días	$ 16.091.894.00	lun 3/08/26
190		15.22	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE	30 días	$ 70.439.612.00	jue 23/04/26
191		15.23	09.02.01	REJILLA DE VENTILACIÓN EN LÁMINA MICROPERFORADA	30 días	$ 22.648.026.00	lun 3/08/26
192		15.24	09.04.01	VENTANERÍA EN PVC COLOR CON ALMA METÁLICA. DOBLE VIDRIO LAMINADO	40 días	$ 860.030.612.00	lun 1/06/26
193		**COMPONENTE 16**		**BARANDAS Y OTROS**	**65 días**	**$ 199.664.565.00**	**vie 19/06/26**
194		16.01	09.03.01	BARANDA METÁLICA EXTERIOR, 83CM. EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATI	16 días	$ 50.743.712.00	mar 15/07/26
195		16.02	09.03.02	BARANDA METÁLICA EXTERIOR 65 CM. EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATI	16 días	$ 2.537.098.00	mar 15/07/26
196		16.03	09.03.03	ESCOTILLA METÁLICA EN CUBIERTA Y CUARTOS TECNICOS. CUBIERTA Y ARMAZÓN	15 días	$ 4.741.835.00	mié 15/07/26
197		16.04	INP-043	Baranda En Acero Inoxidable Con Vidrio Templado De 8 Mm	15 días	$ 57.724.347.00	mié 15/07/26
198		16.05	INP-061	Marquesina en Estructura Metálica, Incluye Vidrio 3+3.	20 días	$ 36.591.164.00	mié 15/07/26
199		16.06	INP-016	Restauración De Pasamanos En Madera	0 días	$ 0.00	mié 15/07/26
200		16.07	INP-017	Suministro E Instalación De Pasamano Doble En Madera	20 días	$ 20.853.199.00	mié 15/07/26
201		16.08	09.06.01	MANTENIMIENTO BARANDAS METÁLICAS	15 días	$ 5.203.757.00	vie 19/06/26
202		16.09	20.04.01	PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES METRO	5 días	$ 4.004.707.00	mié 8/07/26
203		16.10'	20.04.02	SOLDADURA DE PIEZAS	10 días	$ 6.013.017.00	mié 15/07/26
204		16.11	20.04.03	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE MORTERO	10 días	$ 1.888.675.00	mar 28/07/26
205		16.12	20.04.04	ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS DE CORROSIÓN	10 días	$ 1.542.107.00	lun 10/08/26
206		16.13	20.04.05	APLICACIÓN PINTURA ALQUÍLICA	15 días	$ 2.110.492.00	vie 21/08/26
207		16.14	20.04.06	APLICACIÓN PINTURA EN POLIURETANO	15 días	$ 5.710.395.00	vie 21/08/26
208		**COMPONENTE 17**		**MUEBLES EN MADERA**	**0 días**	**$ 0.00**	**lun 27/07/26**
209		17.01	07.02.01	MANTENIMIENTO MUEBLES FIJOS EN MADERA	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
210		17.02	09.05.01	MUEBLE BAJO EN MADERA	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
211		17.03	09.05.02	CLOSET EN MADERA	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
212		17.04	09.05.03	MUEBLE CONTROL CONSULTA EXTERNA MESON EN MARMOL GEIGE, MUEBLE INFER	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
213		17.05	09.05.04	MUEBLE ESTACIÓN DE ENFERMERÍA. SECCIÓN A EN MESON DE MARMOL BLANCO,	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
214		17.06	09.05.05	MUEBLE ESTACIÓN DE ENFERMERÍA. SECCIÓN B DIVISIONES Y ENTREPAÑOS EN ME	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
215		17.07	09.05.06	MUEBLE SALA DE PROCEDIMIENTOS. MESON EN ACERO INOXIDABLE, MUEBLE BAJO	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
216		17.08	09.05.07	MUEBLE TRABAJO SUCIO A. ACERO INOXIDABLE. MUEBLE INFERIOR MELAMINICO	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
217		17.09	09.05.08	MUEBLE TRABAJO SUCIO B. MUEBLE INFERIOR MELAMINICO Y MESON EN ACERO IN	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
218		17.10'	09.05.09	MUEBLE TRABAJO SUCIO C. PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
219		17.11	09.05.10	MUEBLE LAVADO DE RECIPIENTES. PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA. MESÓN	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
220		17.12	09.05.11	DISPENSADOR DE ALIMENTOS A. PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA. MESÓN E	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
221		17.13	09.05.12	DISPENSADOR DE ALIMENTOS B EN ELE (L). PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMIN	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
222		17.14	09.05.13	DISPENSADOR DE ALIMENTOS C. PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN MELAMINA. MESÓN E	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
223		17.15	09.05.14	MUEBLE CAFETÍN PERSONAL. MESON EN CORAL GRANITO O SIMILAR, CON SALPICA	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
224		17.16	09.05.15	MUEBLE PARA TERAPEUTAS SEMISTANO CON DIVISIONES Y ENTREPAÑOS EN MEL	0 días	$ 0.00	lun 27/07/26
225		**COMPONENTE 18**		**PISOS Y ENCHAPES**	**358 días**	**$ 1.669.439.412,00**	**sáb 7/06/25**
226		18.01	10.01.01	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 60X30CM, INSTALADA H	45 días	$ 128.811.201.00	lun 1/06/26
227		18.02	10.01.02	PISO DECK EN PVC	0 días	$ 0.00	lun 1/06/26
228		18.03	10.01.03	PISO EN CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE 3000 PSI H=7.0CM, ENDURECE	10 días	$ 4.736.603.00	jue 2/07/26
229		18.04	10.01.04	BORDILLO IN SITU (EXTERIORES)	45 días	$ 1.240.133.00	jue 2/07/26
230		18.05	10.01.05	CERÁMICA PASTA BLANCA CON BORDES RECTIFICADOS DE 20.5X20X5CM, ALTURA	0 días	$ 0.00	mar 5/05/26
231		18.06	10.01.06	CONCRETO PERMEABLE 0.08 (ANDENES EXTERIORES)	45 días	$ 12.858.655.00	vie 10/07/26
232		18.07	10.01.07	ENCHAPE DE PISO EN ARCILLA EXTRUIDA Y COCIDA DE 26X8CM TIPO 1/4 X 26, COLC	45 días	$ 14.444.385.00	lun 1/06/26
233		18.08	10.01.08	ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 20X20	30 días	$ 24.764.553.00	jue 2/07/26
234		18.09	10.01.09	JUNTA DE PVC PARA DILATACIONES EN EL ACABADO DE PISO	5 días	$ 4.274.359.00	vie 12/06/26
235		18.10'	10.01.10	LÁMINA DE SUPERBOARD 9MM PARA TAPA DE INSPECCIÓN	10 días	$ 2.552.930.00	vie 21/08/26
236		18.11	10.01.11	PISO EN BALDOSA AGLOMERADA VIBROPRENSADA DE GRANO DE MÁRMOL FORMA	150 días	$ 119.761.297.00	jue 2/07/26
237		18.12	10.01.12	PISO VINÍLICO O CAUCHO 3MM IMITACIÓN MADERA	40 días	$ 628.953.478.00	mié 15/07/26

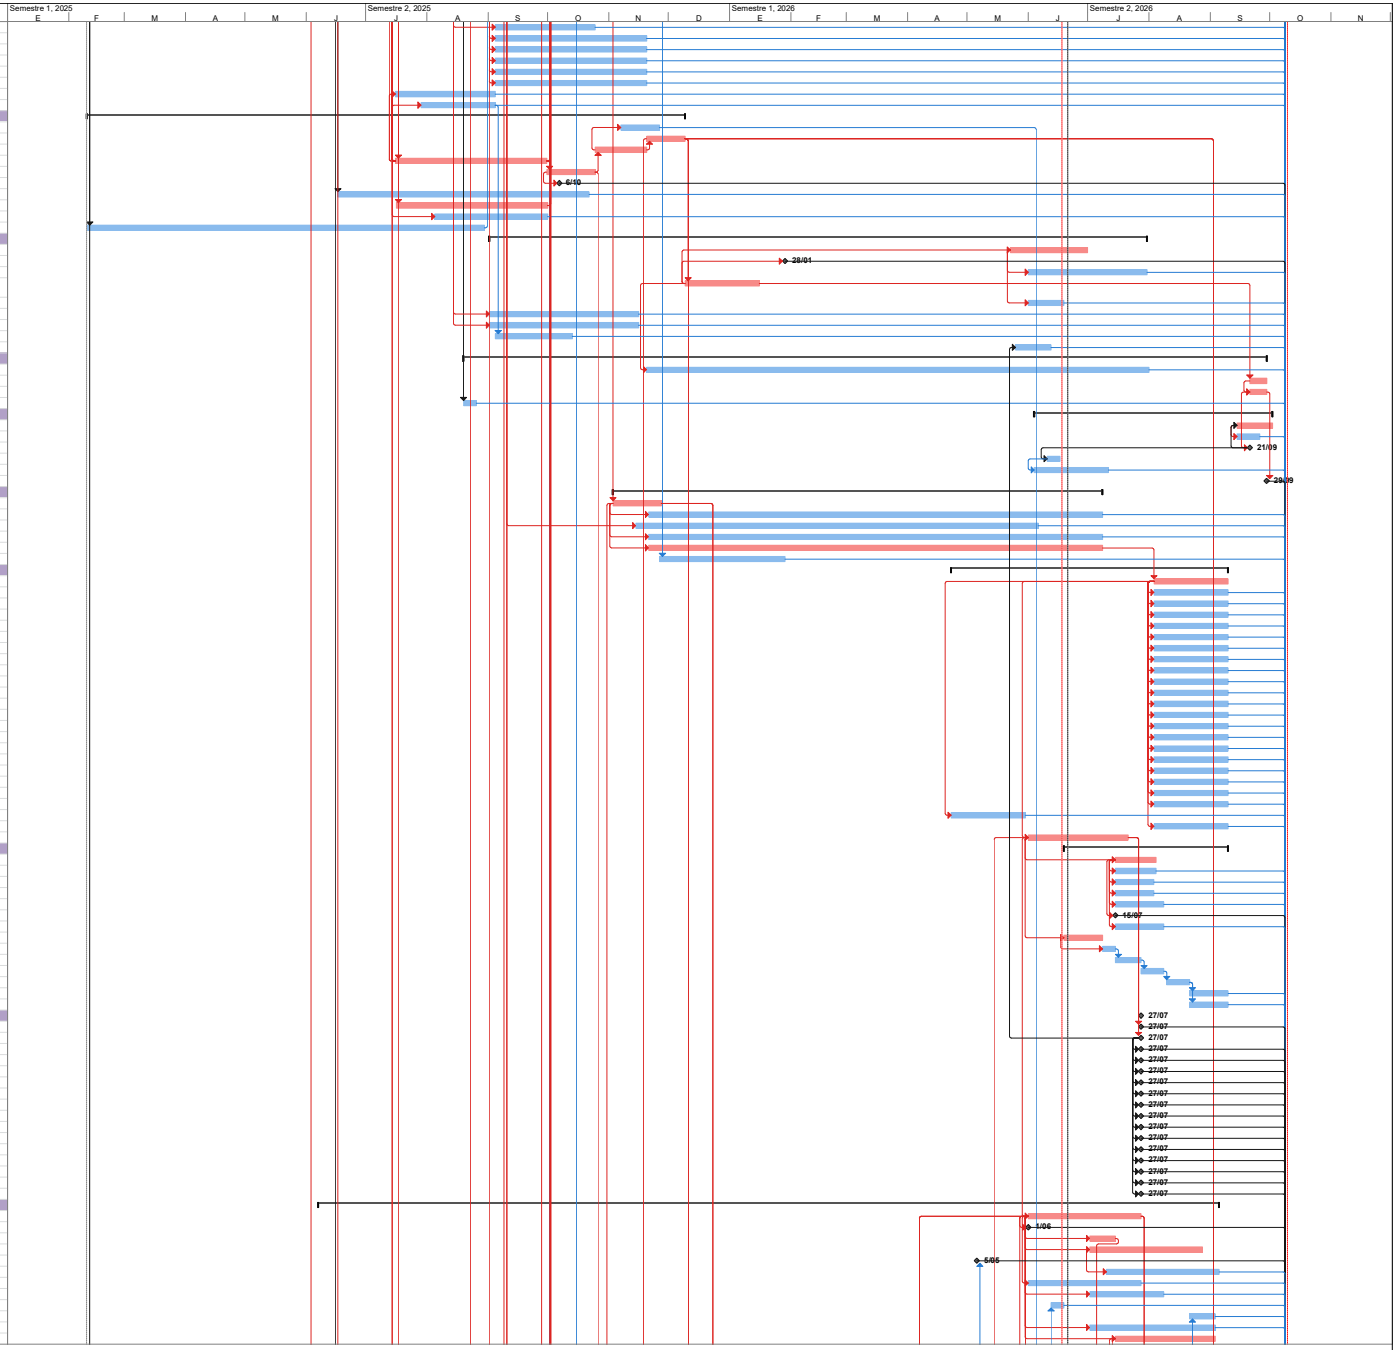

Proyecto: msproj11
Fecha: jue 18/06/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Item	Item Contractus	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo
238		18.13	10.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES ACÚSTICOS	15 días	$ 40,063,552.00	mar 28/07/26
239		18.14	10.01.14	PERFIL DE TRANSICIÓN CERÁMICA A VINILOS	5 días	$ 7,279,181.00	mié 15/07/26
240		18.15	10.01.15	ENCHAPE CON LISTONES DE MADERA PARA PISO TARIMA AUDITORIO	20 días	$ 4,373,404.00	mar 28/07/26
241		18.16	10.01.16	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO 10X10CM.	20 días	$ 9,499,970.00	jue 2/07/26
242		18.17	10.01.17	PISO GRANITO	20 días	$ 4,075,306.00	vie 12/06/26
243		18.18	10.01.18	GRADAS ESCALERA EN GRANITO PULIDO	5 días	$ 8,480,007.00	jue 2/07/26
244		18.19	INP-047	Piso Dieléctrico - Sala De Procedimientos	5 días	$ 29,135,910.00	mié 8/07/26
245		18.20	INP-051	Mortero De Nivelación Impermeabilizado Para Baños	20 días	$ 27,068,103.00	vie 10/04/26
246		18.21	INP-015	Pintares En Blanco Para Reposición En Escaleras.	5 días	$ 5,944,348.00	mié 8/07/26
247		18.22	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE	0 días	$ 0.00	mar 1/06/26
248		18.23	10.02.01	MANTENIMIENTO PISO EN RETAL DE MARMOL O GRANITO	0 días	$ 0.00	mar 19/05/26
249		18.24	10.02.02	MANTENIMIENTO PISO EN GRES	0 días	$ 0.00	mar 19/05/26
250		18.25	INP-018	Reacondicionamiento Y Restauración Total Del Piso De Retal De Mármol Pulido, Incluye Rec	10 días	$ 0.00	mié 20/05/26
251		18.26	INP-202	Mortero De Nivelación 1:3	15 días	$ 70,439,612.00	vie 10/04/26
252		1.22	03.01.06	DESMONTAJE DE PISO EN TERRAZO/BALDOSAS CERÁMICA O DE CONCRETO	20 días	$ 3,322,836.00	sáb 7/06/25
253		5.02	04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALT	60 días	$ 7,951,112.00	mié 16/07/25
254		5.03	04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO I	45 días	$ 10,201,584.00	mar 5/08/25
255			04.03.02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	60 días	$ 21,514,990.00	mar 30/09/25
256		7.06	05.01.07	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE FC=21MPA. INCLUYE ELEMEN	10 días	$ 477,691,903.00	mié 1/10/25
257		**COMPONENTE 19**		**CIELO RASO**	**85 días**	**$ 18,691,057.00**	**mar 19/05/26**
258		19.01	11.01.01	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 12 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEC	0 días	$ 0.00	mar 19/05/26
259		19.02	11.01.02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS	0 días	$ 0.00	mar 19/05/26
260		19.03	11.01.03	MEDIA CAÑA EN PVC	30 días	$ 18,691,057.00	mar 28/07/26
261		19.04	INP-203	Cielo raso en placa de fibrocemento 12mm, estructura en vigueta y omegas, incluye masilla y d	0 días	$ 0.00	mar 19/05/26
262		19.05	INP-204	Cielorraso en Superboard RH de 8mm, estructura en viguetas y omegas g60 cal 24, omegas 0	0 días	$ 0.00	mar 19/05/26
263		**COMPONENTE 20**		**PAÑETES**	**45 días**	**$ 436,317,677.00**	**mar 23/12/25**
264		20.01	12.01.01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATA	45 días	$ 114,342,015.00	mar 23/12/25
265		20.02	12.01.02	RESTITUCIÓN DE ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR CON PAÑETE TRANSPIRABLE DE	45 días	$ 103,684,351.00	mar 23/12/25
266		20.03	12.01.03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.	0 días	$ 0.00	mié 31/12/25
267		20.04	INP-025	Pañete Liso En Mortero 1:4 Para Muros Interiores (Incluye Filos Y Dilataciones) Por Metro Lin	5 días	$ 51,091,038.00	jue 1/01/26
268		20.05	INP-049	Pañete Liso En Mortero 1:4 Impermeabilizado Para Muros Interiores	10 días	$ 19,164,762.00	mié 7/01/26
269		20.06	INP-046	Regata En Muro De Mampostería Para Redes, Incluye Su Reparación Con Mortero Y Refuerz	15 días	$ 25,631,317.00	mié 7/01/26
270		20.07	INP-099	Restitución De Acabado Interior Y Exterior Con Pañete Transpirable De Mortero Cal Y Puzzo	15 días	$ 51,964,582.00	mié 7/01/26
271		20.08	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE	41 días	$ 70,439,612.00	mar 23/12/25
272		**COMPONENTE 21**		**ESTUCO Y PINTURA**	**181 días**	**$ 352,241,440.00**	**mié 18/02/26**
273		21.01	12.02.01	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	100 días	$ 72,694,754.00	lun 1/06/26
274		21.02	12.02.02	PINTURA EPÓXICA BLANCA	20 días	$ 37,513,149.00	jue 10/09/26
275		21.03	12.02.03	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE	20 días	$ 14,254,653.00	jue 10/09/26
276		21.04	12.02.04	PINTURA A BASE DE SILOXANOS	31 días	$ 23,013,166.00	vie 28/08/26
277		21.05	12.02.05	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	45 días	$ 56,257,555.00	lun 10/08/26
278		21.06	12.02.06	PINTURA EPÓXICA SEMIMATE CIELO RASOS	20 días	$ 2,843,772.00	jue 10/09/26
279		21.07	INP-022	Estuco Plastico Incluye Detallada Y Filos Por Metro Linea Hasta 50cm	80 días	$ 48,032,927.00	mié 6/05/26
280		21.08	INP-023	Estuco Plastico Incluye Detallada Y Filos	80 días	$ 82,741,221.00	mié 6/05/26
281		21.09	INP-024	Pintura Vinilica Tipo 1, 3 Manos Por Metro Linea Hasta 50 Cm	45 días	$ 42,782,291.00	lun 1/06/26
282		21.10	INP-050	Filos Y Dilataciones Plastico	5 días	$ 31,590,806.00	mié 23/09/26
283		21.11	INP-052	Pintura Epoxica Blanca En Metro Lineal > A 50 Cm	20 días	$ 2,438,850.00	jue 10/09/26
284		21.12	INP-070	Estuco Acrilico Para Exteriores	80 días	$ 52,119,891.00	mié 6/05/26
285		21.13	INP-071	Pintura A Base De Siloxanos Para Muros Exteriores	30 días	$ 15,518,793.00	vie 28/08/26
286		21.14	INP-085	Acabado Con Pañete Liso Impermeabilizado Integralmente 1:3, Espesor 1.5cm. Incluye Esta	0 días	$ 0.00	mié 18/02/26
287		21.15	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE	45 días	$ 70,439,612.00	mié 18/02/26
288		**COMPONENTE 22**		**ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS ELCTRICAS**	**40 días**	**$ 1,149,141,917.00**	**lun 18/05/26**
289		22.01	13.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X12 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3/4"	30 días	$ 133,146,354.00	lun 18/05/26
290		22.02	13.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10 AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1"	30 días	$ 12,731,308.00	lun 18/05/26
291		22.03	13.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X8+1X8 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/4"	30 días	$ 13,311,738.00	lun 18/05/26
292		22.04	13.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X6+1X6 +10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	30 días	$ 4,709,809.00	lun 18/05/26
293		22.05	13.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4+1X4 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	30 días	$ 31,585,107.00	lun 18/05/26
294		22.06	13.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X4/0+1X4/0 +4T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	30 días	$ 44,605,612.00	lun 18/05/26
295		22.07	13.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X1/0+1X1/0 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	30 días	$ 23,605,632.00	lun 18/05/26
296		22.08	13.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X350+1X350 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	30 días	$ 144,607,399.00	lun 18/05/26
297		22.09	13.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X250+1X250 +2T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 3"	30 días	$ 70,875,060.00	lun 18/05/26
298		22.10	13.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X2+1X2 +8T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 2"	30 días	$ 11,529,700.00	lun 18/05/26
299		22.11	13.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 2(3X500+1X500 +1/0T AWG LSHF)ALOJADO EN TUBERÍA PVC DE 4"	30 días	$ 161,243,898.00	lun 18/05/26
300		22.12	INP-112	Suministro E Instalación De Alimentador En Cable Cu 2 (3x350+1x350 +1/0t Awg Lshf) Alojado En Tubería Pvc 2 Ø De 4" Según Diagrama Unifilar Rediseño (No Incluye Tubería)	0 días	$ 176,512,472.00	lun 18/05/26
301		22.13	INP-113	Suministro E Instalación De Alimentador En Cable Cu 2 (3x4/0+4/0+2t) En Tubería Pvc 2ø De 4" Según Diagrama Unifilar Rediseño (No Incluye Tubería)	30 días	$ 147,509,018.00	lun 18/05/26
302		22.14	INP-114	Suministro E Instalación De Alimentador En Cable Cu 3x2/0+2+2t En Tubería Pvc 1ø2" Embebida En Concreto (No Incluye Tubería Ni Concreto)	30 días	$ 55,184,978.00	sáb 23/05/26
303		22.15	INP-115	Suministro E Instalación De Parcial En Cable Cu De 3x4/0+1x4/0 +6t Awg Lshf Alojado En Tubería Pvc De 3" (No Incluye Tubería)	30 días	$ 5,225,998.00	sáb 23/05/26
304		22.16	INP-116	Suministro E Instalación De Parcial En Cable Cu De 3x8+1x8 +8t Awg Lshf Alojado En Tubería Pvc De 1-1/4" (No Incluye Tubería)	30 días	$ 84,817,053.00	sáb 23/05/26
305		22.17	INP-117	Suministro E Instalación De Parcial En Cable Cu De 3x6+1x6 +8t Awg Lshf Alojado En Tubería Pvc De 1-1/2" (No Incluye Tubería)	30 días	$ 24,189,066.00	vie 29/05/26
306		22.18	INP-118	Suministro E Instalación De Parcial En Cable Cu De 2x8+1x8 +8t Awg Lshf Alojado En Tubería Emt De 1" (No Incluye Tubería)	30 días	$ 3,751,715.00	sáb 23/05/26
307		**COMPONENTE 23**		**SALIDAS**	**105 días**	**$ 528,853,389.00**	**mar 5/05/26**
308		23.01	13.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE EN TUBERIA 1/2" EMT A LA VISTA CABLE 12 AWG LHSF. INCLUYE TOMA	40 días	$ 7,675,570.00	mar 5/05/26
309		23.02	13.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE EN TUBERIA 1/2" PVC INCRUSTADA CABLE 12 AWG LHSF. INCLUYE TOMA	40 días	$ 17,631,504.00	mar 5/05/26
310		23.03	13.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA EMT 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	40 días	$ 5,152,222.00	mar 5/05/26
311		23.04	13.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF. INCLUE TOMA Y CABLE	40 días	$ 5,508,589.00	mar 5/05/26
312		23.05	13.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO REGULADA EN TUBERIA PVC 1/2" CABLE 12 AWG LHSF (INCLUYE APARATO)	40 días	$ 8,285,519.00	mar 5/05/26
313		23.06	13.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIPO NORMAL PARA INSTALAR EN CANALETA. SOLO TOMA	40 días	$ 338,574.00	mar 5/05/26
314		23.07	13.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X 12 AWG LHSF PARA CANALETA	15 días	$ 1,444,177.00	jue 27/08/26
315		23.08	13.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	43 días	$ 148,399.00	mar 5/05/26
316		23.09	13.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	40 días	$ 853,042.00	mar 5/05/26
317		23.10	13.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA 360 TIPO ULTRASÓNICO	20 días	$ 1,363,950.00	jue 11/06/26
318		23.11	13.03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	40 días	$ 3,728,087.00	mar 5/05/26
319		23.12	13.03.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	40 días	$ 13,077,593.00	mar 5/05/26
320		23.13	13.03.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-274	40 días	$ 7,653,316.00	mar 5/05/26
321		23.14	13.03.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN 4"PVC	30 días	$ 25,843,815.00	mar 5/05/26
322		23.15	13.03.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERIA 3"PVC	30 días	$ 2,388,898.00	mar 5/05/26
323		23.16	13.03.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA BAJA TENSIÓN EN TUBERRIA 2"PVC	30 días	$ 1,269,431.00	mar 5/05/26
324		23.17	INP-123	Suministro E Instalacion De Canalizacion Para Baja Tension En Tuberia Emt 1ø4"	30 días	$ 8,057,224.00	mar 5/05/26
325		23.18	INP-124	Suministro E Instalación De Canalización Para Baja Tensión En Tubería Imc 1ø3"	30 días	$ 4,635,958.00	mar 5/05/26
326		23.19	INP-125	Suministro E Instalación De Salida Para Iluminación En Tubería 3/4" Pvc Incrustada Cable 12 Awg Lhsf.	40 días	$ 23,418,918.00	mar 5/05/26

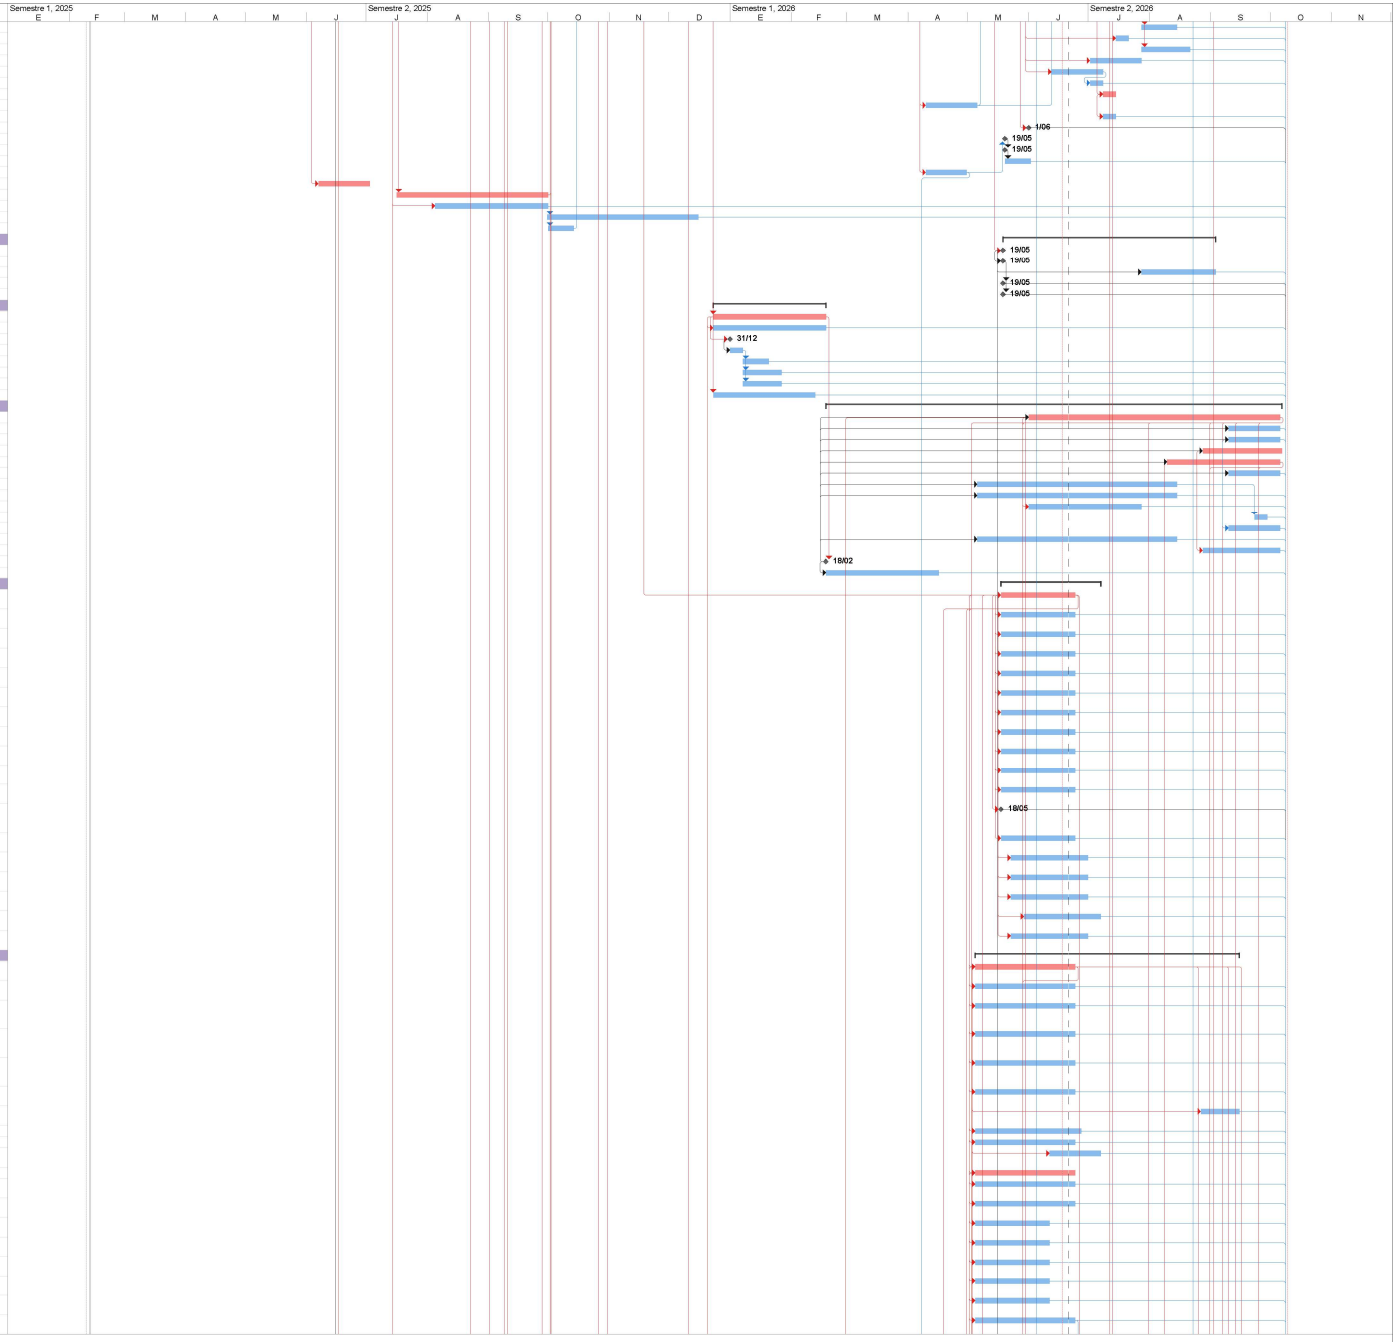

Proyecto: msproj11
Fecha: jue 18/06/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Ítem Contractual	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo
327		23.20'	INP-126	Suministro E Instalación De Salida Para Iluminación En Tubería 3/4" Emt A La Vista Cable 12 Awg Lhsf.	70 días	$ 182.979.872,00	mar 5/05/26
328		23.21	INP-127	Suministro E Instalación De Tomacorriente Tipo Regulada Para Instalar En Canaleta. Solo Toma	10 días	$ 860.221,00	jue 11/06/26
329		23.22	INP-128	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Regulada En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	35 días	$ 7.809.768,00	vie 12/06/26
330		23.23	INP-129	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Grado Hospitalario Blanco En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	35 días	$ 5.320.207,00	vie 12/06/26
331		23.24	INP-130	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Grado Hospitalario Blanco En Tubería Pvc 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	35 días	$ 7.967.549,00	vie 12/06/26
332		23.25	INP-131	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Grado Hospitalario Rojo Ramal Crítico En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	35 días	$ 9.748.237,00	vie 12/06/26
333		23.26	INP-132	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Normal De Piso En Tubería Pvc 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	35 días	$ 69.056.605,00	vie 12/06/26
334		23.27	INP-133	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Bifásica De 30a En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	35 días	$ 1.708.936,00	vie 12/06/26
335		23.28	INP-134	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Trifásica De 30a En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	35 días	$ 601.603,00	vie 12/06/26
336		23.29	INP-135	Suministro E Instalación De Interruptor Conmutable	35 días	$ 776.680,00	vie 12/06/26
337		23.30'	INP-136	Suministro E Instalación De Sensor De Presencia 180 Tipo Infrarrojo	35 días	$ 5.184.930,00	vie 12/06/26
338		23.31	INP-137	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente En Tubería 3/4" Emt A La Vista Cable 12 Awg Lhsf. Incluye Toma	35 días	$ 6.666.132,00	vie 12/06/26
339		23.32	INP-138	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente En Tubería 3/4" Pvc Incrustada Cable 12 Awg Lhsf. Incluye Toma	35 días	$ 23.347.870,00	vie 12/06/26
340		23.33	INP-139	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Gfci En Tubería Emt 3/4" Cable 12 Awg Lhsf. Incluye Toma Y Cable	35 días	$ 8.179.297,00	vie 12/06/26
341		23.34	INP-140	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Gfci En Tubería Pvc 3/4" Cable 12 Awg Lhsf. Incluye Toma Y Cable	35 días	$ 3.838.822,00	vie 12/06/26
342		23.35	INP-141	Suministro E Instalación De Salida Para Tomacorriente Tipo Regulada En Tubería Pvc 3/4" Cable 12 Awg Lhsf (Incluye Aparato)	35 días	$ 10.239.394,00	vie 12/06/26
343		23.36	INP-193	Suministro e instalacion canalizacion en baja tension un tuberia PVC 1 1/4"	35 días	$ 19.582.515,00	vie 12/06/26
344		23.37	INP-194	Suministro e instalacion canalizacion en baja tension un tuberia EMT 1 1/4"	35 días	$ 26.509.965,00	vie 12/06/26
345		**COMPONENTE 24**		**TABLEROS**	**110 días**	**$ 247.093.877,00**	**mié 6/05/26**
346		24.01	13.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC. 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	30 días	$ 2.859.328,00	mié 6/05/26
347		24.02	13.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS, 208V, ICC. 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	30 días	$ 1.085.561,00	mié 6/05/26
348		24.03	13.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC. 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	30 días	$ 7.035.261,00	mié 6/05/26
349		24.04	13.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKER INDUSTRIAL	10 días	$ 4.186.704,00	lun 21/09/26
350		24.05	13.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X20 A, 3X30 A, 3X40 A AJUSTABLE (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	10 días	$ 5.277.646,00	lun 1/06/26
351		24.06	13.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X60 A, 3X80 A, 3X100 A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	10 días	$ 3.512.764,00	jue 10/09/26
352		24.07	13.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TOTALIZADOR TRIPOLAR DE LOS SIGUIENTES RANGOS 3X125 A, 3X160 A, AJUSTABLE HASTA 200A (SEGÚN CORRESPONDA EN DIAGRAMA UNIFILAR)	10 días	$ 719.394,00	jue 10/09/26
353		24.08	13.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR DE 1X20 A HASTA 1 X40A	10 días	$ 3.480.139,00	lun 1/06/26
354		24.09	13.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE BIPOLAR DE 2X20 A HASTA 2 X40A	10 días	$ 2.349.483,00	lun 1/06/26
355		24.10'	13.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 3X20 A HASTA 3X50A	10 días	$ 5.083.583,00	lun 1/06/26
356		24.11	INP-119	Suministro E Instalación De Tablero Enchufable, Trifásico De 6 Circuitos, 208v, Icc: 10ka Con Barras De Neutro Y Tierra Independientes, Puerta, Chapa, Certificado De Producto Retie	10 días	$ 2.241.710,00	lun 1/06/26
357		24.12	INP-120	Suministro E Instalación De Tablero Enchufable, Bifásico De 12 Circuitos, 208v, Icc: 10ka Con Barras De Neutro Y Tierra Independientes, Con Espacio Para Totalizador, Puerta, Chapa, Certificado De Producto Retie	10 días	$ 1.813.983,00	lun 1/06/26
358		24.13	INP-121	Suministro E Instalación De Breaker Enchufable Tripolar De 3x80	10 días	$ 929.917,00	lun 1/06/26
359		24.14	INP-122	Suministro E Instalación De Tablero Enchufable, Trifásico De 6 Circuitos, Fabricación Especial 208v, Icc: 10ka Con Barras De Neutro Y Tierra Independientes, Con Espacio Para Totalizador, Con Conexiones Para Cables Superiores A 1/0, Puerta, Chapa, Certific	10 días	$ 1.969.834,00	lun 1/06/26
360		24.15	INP-151	Suministro E Instalación De Tablero General De Distribución En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Analizador De Redes, Dps, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño,	10 días	$ 34.697.641,00	jue 10/09/26
361		24.16	INP-152	Suministro E Instalación De Tablero General Normal Tgn En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Dps, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño,	10 días	$ 20.524.741,00	jue 10/09/26
362		24.17	INP-153	Suministro E Instalación De Tablero General Crítico Tgc En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Dps, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño,	10 días	$ 38.939.784,00	jue 10/09/26
363		24.18	INP-154	Suministro E Instalación De Tablero Transferencia Crítico Ttc En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño,	10 días	$ 47.251.773,00	jue 10/09/26
364		24.19	INP-155	Suministro E Instalación De Transferencia Automática Para Bomba Contraincendios Bci En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño, No Certificada Para Rci, Solo Retie	10 días	$ 47.899.280,00	jue 10/09/26
365		24.20'	INP-156	Suministro E Instalación De Tablero By-Pass En Lámina Galvanizada Incluye Breakers, Barrajes De Cobre Según Diagrama Unifilar Del Rediseño	10 días	$ 15.235.351,00	jue 10/09/26
366		**COMPONENTE 25**		**CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**	**60 días**	**$ 69.862.433,00**	**jue 7/05/26**
367		25.01	13.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA 12X5 CON 2 DIVISIONES Y TAPA INCLUYE CURVAS, UNIONES Y LÍNEA CABLE 12 AWG DESNUDA DE PUESTA A TIERRA	20 días	$ 6.637.687,00	vie 26/06/26
368		25.02	13.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TROQUEL UNIVERSAL PARA CANALETA 12X5 PARA ALOJAR TOMAS NORMAL-REGULADA -VOZ DATOS	20 días	$ 923.123,00	vie 26/06/26
369		25.03	13.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 50X8 CM	0 días	$ 0,00	vie 26/06/26
370		25.04	INP-195	Suministro e instalacion de ducto cerrado 40x20 cm incluye elementos de soporte	0 días	$ 0,00	vie 26/06/26
371		25.05	INP-196	Suministro e instalacion de ducto cerrado 30x5 cm incluye elementos de soporte	20 días	$ 61.120.420,00	lun 8/06/26
372		25.06	INP-197	Suministro e instalacion de caja metalica de paso 50x50x20cm	0 días	$ 0,00	lun 8/06/26
373		25.07	INP-198	Suministro e instalacion de caja metalica de paso 80x80x20cm	10 días	$ 1.181.203,00	vie 3/07/26
374		25.08	INP-199	Suministro e instalacion de caja metalica de paso 20x20x10cm	0 días	$ 0,00	jue 7/05/26
375		**COMPONENTE 26**		**ILUMINACIÓN**	**15 días**	**$ 256.851.342,00**	**jue 3/09/26**
376		26.01	13.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 12W	15 días	$ 8.276.740,00	jue 3/09/26
377		26.02	13.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED CIRCULAR 18W	15 días	$ 5.176.710,00	jue 3/09/26
378		26.03	13.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 24W	15 días	$ 1.436.176,00	jue 3/09/26
379		26.04	13.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL CUADRADO 60X60 CMS 40W, 12	15 días	$ 9.441.086,00	jue 3/09/26
380		26.05	13.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA "SALIDA" 2.1W, 120V	15 días	$ 13.506.301,00	jue 3/09/26
381		26.06	13.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA DOS LAMPARAS 3,2W, 12	15 días	$ 29.062.261,00	jue 3/09/26
382		26.07	13.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50W, 120V CON PANEL SOLAR Y SENSOR	15 días	$ 11.349.389,00	jue 3/09/26
383		26.08	INP-142	Suministro E Instalación De Luminaria Grado Hospitalario De 30x30cm De 19w	15 días	$ 59.838.445,00	jue 3/09/26
384		26.09	INP-143	Suministro E Instalación De Luminaria Panel Rectangular De 40w 120x30cm	15 días	$ 8.183.770,00	jue 3/09/26
385		26.10'	INP-144	Suministro E Instalación De Luminaria Hermética De 50w	15 días	$ 1.945.212,00	jue 3/09/26
386		26.11	INP-145	Suministro E Instalación De Luminaria Hermética De 18w	15 días	$ 4.697.638,00	jue 3/09/26
387		26.12	INP-146	Suministro E Instalación Reflector 20w, 120v Con Panel Solar Y Sensor De Presencia	15 días	$ 5.094.442,00	jue 3/09/26
388		26.13	INP-147	Suministro E Instalación De Luminaria Para Escaleras De 19w	15 días	$ 6.342.931,00	jue 3/09/26
389		26.14	INP-148	Suministro E Instalación De Sistema De Control De Iluminación Integrado Por Panel, Sensor	15 días	$ 92.500.841,00	jue 3/09/26
390		**COMPONENTE 27**		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO**	**106 días**	**$ 35.778.222,00**	**mar 3/03/26**
391		27.01	13.06.01	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA	28 días	$ 1.707.801,00	mar 3/03/26
392		27.02	13.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	28 días	$ 3.198.157,00	mar 3/03/26
393		27.03	13.06.03	SOLDADURA EXOTERMICA	28 días	$ 776.041,00	mar 3/03/26
394		27.04	13.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA	28 días	$ 540.510,00	mar 3/03/26
395		27.05	13.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PRINCIPAL DE INTERCONEXIÓN DE TIERR	28 días	$ 6.050.706,00	mié 10/06/26
396		27.06	13.06.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 6 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTI	28 días	$ 3.486.111,00	mié 10/06/26
397		27.07	13.06.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CU # 2 VERDE PARA INTERCONEXION DE ELEMENTI	28 días	$ 12.879.637,00	mié 10/06/26
398		27.08	INP-149	Suministro E Instalación De Cable Desnudo 1/0 En Cu	28 días	$ 7.139.259,00	vie 13/03/26
399		**COMPONENTE 28**		**EQUIPOS ELECTRICOS**	**100 días**	**$ 375.339.145,00**	**lun 25/05/26**

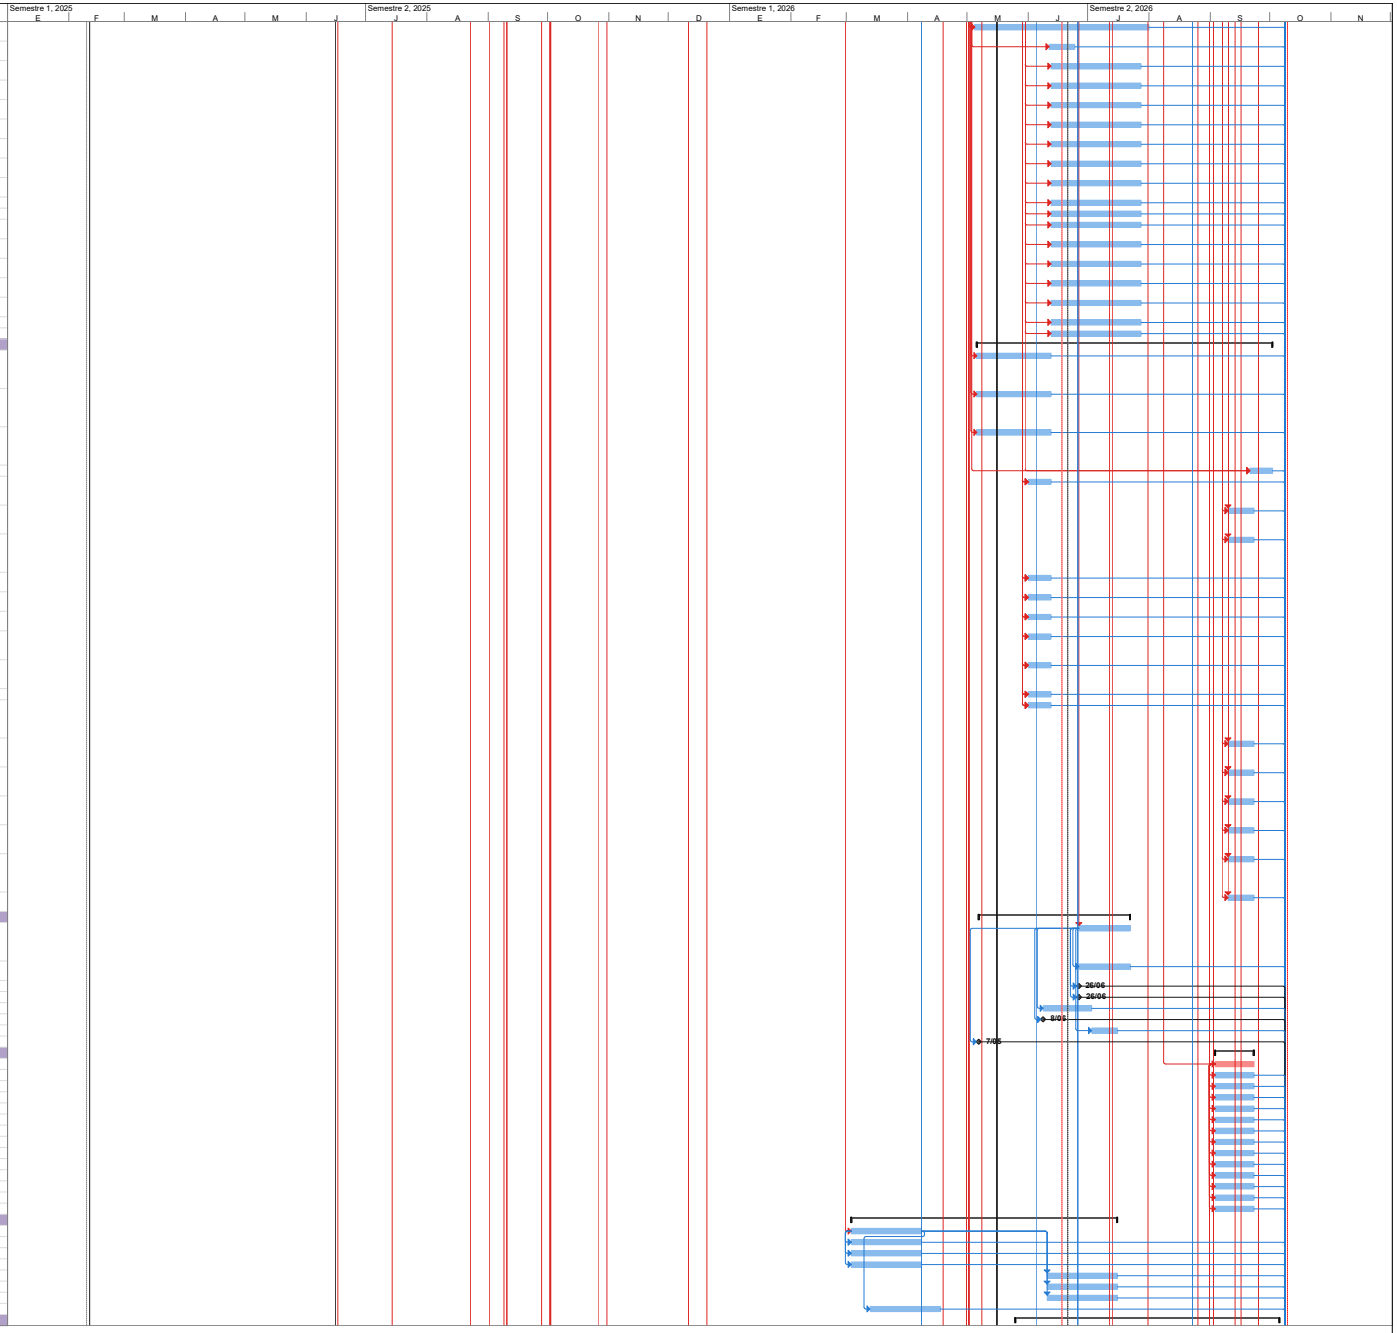

Proyecto: msproj11
Fecha: jue 18/06/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · Sólo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual


Id	Modo de tarea	Ítem	Ítem Contractual	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo
400		28.01	13.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT -TGD AUTO SOPORTADO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BARRAJES COBRE DE 1000A, 208V, 25KA (3F+N+T), DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR- INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	7 días	$ 28,772,236.00	mié 16/09/26
401		28.02	13.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN BT REGULADO AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES	7 días	$ 13,838,646.00	mié 16/09/26
402		28.03	13.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA MEDIDA AE 319	15 días	$ 14,222,891.00	mié 16/09/26
403		28.04	13.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA TOTAL - 125KVA - 208/120V EFECTIVOS BOGOTA CUNDINAMARCA CON CABINA INSONORA INCLUYE TUBERIA DE ESCAPE Y SUCCION HASTA CUBIERTA	20 días	$ 215,423,874.00	jue 3/09/26
404		28.05	13.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA Y TABLERO GENERAL AUTO SOPORTADO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 600A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE ANALIZADOR DE REDES.	7 días	$ 20,802,691.00	mié 16/09/26
405		28.06	13.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRASNFERENCIA AUTO SOPORTADO, PARA BOMBA CONTRA INCENDIO Y BOMBA JOCKEY CERTIFICADA FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 14, PINTURA ELECTROSTÁTICA CON BARRAS DE COBRE DE 300A, 208V, 25KA (3F+N+T). DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR. INCL	20 días	$ 25,977,361.00	jue 3/09/26
406		28.07	13.07.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS BIFÁSICA 6 KVA	5 días	$ 34,436,821.00	lun 25/05/26
407		28.08	13.07.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 10 KVA	0 días	$ 0.00	mié 16/09/26
408		28.09	13.07.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA 20 KVA	0 días	$ 0.00	mié 16/09/26
409		28.10'	INP-188	Desarme De Planta Eléctrica En Sitio Transporte Y Armado En Cuarto Eléctrico	15 días	$ 21,884,625.00	mié 16/09/26
410		**COMPONENTE 29**		**INSTALACIONES DE LA RED DE DATOS**	**145 días**	**$ 463,918,112.00**	**mié 18/03/26**
411		29.01	14.01.01	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	15 días	$ 1,815,379.00	lun 31/08/26
412		29.02	14.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1(1" EMT PARA INTERCONEXIÓN DE SALIDAS DE COMUNICACIONES	15 días	$ 3,843,715.00	mié 18/03/26
413		29.03	14.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 10X10 PARA CONEXIÓN DE TUBERIA A BANDEJA PORTACABLES (INCLUYE ELEMENTO DE SUJECCIÓN A	15 días	$ 8,891,369.00	mié 18/03/26
414		29.04	14.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA VOZ-DATOS RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION,	15 días	$ 672,879.00	mié 18/03/26
415		29.05	14.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA DATOS (WIFI) RJ-45 CAT6A AMP INCLUYE HERRAJES RJ-45, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO, MARCACION,	15 días	$ 37,503,586.00	mié 20/05/26
416		29.06	14.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ-45 CAT6A AMP PARA INSTALACION EN HERRAJE RACK, ELEMENTOS DE CONEXIÓN,PONCHADO,MARCACION,	15 días	$ 2,298,710.00	lun 31/08/26
417		29.07	14.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICA (1,50 METROS), ROJO. PARA RACK	15 días	$ 2,377,514.00	lun 31/08/26
418		29.08	14.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CAT 6A DE FABRICADO (1,50 METROS), AZUL.	15 días	$ 2,458,134.00	lun 31/08/26
419		29.09	14.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A, F/UTP LSZH, AMP O SIMILAR	15 días	$ 82,223,979.00	lun 31/08/26
420		29.10'	14.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM2, AMP O SIMILAR	15 días	$ 32,245,414.00	lun 31/08/26
421		29.11	14.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE 24 PUERTOS, ANGULADO. 1 UNIDAD DE RACK AMP, INCLUYE ORGANIZADOR	15 días	$ 769,055.00	lun 31/08/26
422		29.12	14.01.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK CERRADO DE 19 RU, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD-ROLLED CALIBRE 16 PERFORADA, CON ACABADO EN PINTURA	15 días	$ 290,831.00	lun 31/08/26
423		29.13	14.01.13	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE CASSETTE -12 A 6X LC DÚPLEX, OM4 MULTIMODO 12 FIBRAS, TIPO AF EN BANDEJA DE CUATRO CASETES.	15 días	$ 99,435.00	lun 31/08/26
424		29.14	14.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DISTRIBUIDOR DE FIBRA FHD DE FIBRA ÓPTICA PARA RACK DE 19", INCLUR TAPA EN ACRILICO, ORGANIZADOR FRONTAL.	15 días	$ 48,367.00	lun 31/08/26
425		29.15	14.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DÚPLEX DE F.O. CON CONECTORES LC-LC, FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, DE 10 FT (SOPORTE PARA	15 días	$ 109,629.00	lun 31/08/26
426		29.16	14.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES LC (SOPORTE PARA APLICACIONES DE 10 GBPS), PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 UM, OM4 DE INTERIOR.	15 días	$ 40,243.00	lun 31/08/26
427		29.17	14.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS	15 días	$ 13,575,676.00	lun 31/08/26
428		29.18	14.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE FIBRA MULTIMODO 10 GBPS SFP+	15 días	$ 2,519,339.00	lun 31/08/26
429		29.19	INP-157	Suministro E Instalación De Access Point Largo Alcance Wifi6	15 días	$ 84,118,674.00	lun 31/08/26
430		29.20'	INP-158	Suministro E Instalación De Switch Y Controlador Para Access Points, Incluye Incluye Switch 24 Ptos Poe, Controlador En Nube Y Switch Controlador Central	15 días	$ 25,488,332.00	lun 31/08/26
431		29.21	INP-159	Suministro E Instalación De Rack Abierto De Piso 42u, Tipo Bastidor, Incluye Organizadores Verticales Frontal-Trasero, Multitoma Horizontal 6 Servicios, Tira De Tierra Vertical Y Barra	15 días	$ 16,122,357.00	lun 31/08/26
432		29.22	INP-160	Módulo De Conexión Para 12 Hilos De Fibra Con Conexión Por Fusión	15 días	$ 16,367,321.00	lun 31/08/26
433		29.23	INP-161	Suministro E Instalación De Bandeja De Fibra Óptica Deslizable 4 Slot 1u	15 días	$ 2,461,724.00	lun 31/08/26
434		29.24	INP-162	Suministro E Instalación De Patch Cord De Fibra Óptica Para Interconexión De Switches	15 días	$ 4,461,244.00	lun 31/08/26
435		29.25	INP-163	Enlace Con Hospital Existente Y Empalme Tecnológico	15 días	$ 8,714,516.00	lun 31/08/26
436		29.26	INP-164	Configuración Start Up Para El Sistema De La Red Wifi	15 días	$ 13,612,504.00	lun 31/08/26
437		29.27	INP-178	Suministro E Instalación De Central Y Consola Llamado De Enfermería	15 días	$ 39,505,828.00	lun 31/08/26
438		29.28	INP-179	Suministro E Instalación De Luz Dintel	15 días	$ 7,641,958.00	lun 31/08/26
439		29.29	INP-180	Suministro E Instalación De Cordón De Baño	15 días	$ 15,564,994.00	lun 31/08/26
440		29.30'	INP-181	Suministro E Instalación De Placa De Cama	15 días	$ 3,184,551.00	lun 31/08/26
441		29.31	INP-182	Suministro E Instalación De Cableados Sistema Llamado Enfermera	15 días	$ 23,752,196.00	lun 31/08/26
442		29.32	INP-183	Configuraciones Start Up Del Sistema Llamado Enfermera	15 días	$ 5,133,936.00	lun 31/08/26
443		29.33	INP-167	Herraje Plano 24 Ptos Modular Para Patch Panel F/Utp	15 días	$ 5,181,414.00	lun 31/08/26
444		29.34	INP-168	Cable Hdmi (20 Mts)	15 días	$ 823,309.00	lun 31/08/26
445		**COMPONENTE 30**		**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS**	**15 días**	**$ 258,356,231.00**	**jue 3/09/26**
446		30.01	14.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO	15 días	$ 68,097,982.00	jue 3/09/26
447		30.02	14.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO DE ALARMA	15 días	$ 3,226,086.00	jue 3/09/26
448		30.03	14.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR 2-D (OPTICO-TERMICO)	15 días	$ 54,341,539.00	jue 3/09/26
449		30.04	14.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	15 días	$ 1,398,653.00	jue 3/09/26
450		30.05	14.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACION MANUAL DE ALARMA	15 días	$ 3,001,376.00	jue 3/09/26
451		30.06	14.02.06	INSTALACIÓN PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL	15 días	$ 4,619,844.00	jue 3/09/26
452		30.07	14.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN PARED	15 días	$ 8,847,113.00	jue 3/09/26
453		30.08	14.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	15 días	$ 2,923,736.00	jue 3/09/26
454		30.09	14.02.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE CONTROL	15 días	$ 3,732,029.00	jue 3/09/26
455		30.10'	14.02.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO MONITOREO (PREVISTOS)	15 días	$ 2,589,517.00	jue 3/09/26
456		30.11	INP-165	Suministro E Instalación Cable Incendio 2x16 Fplr Sin Blindaje	15 días	$ 67,532,276.00	jue 3/09/26
457		30.12	INP-166	Suministro E Instalación Parlante Con Luz Estroboscopica En Techo	15 días	$ 38,046,080.00	jue 3/09/26
458		**COMPONENTE 31**		**SISTEMA CCTV**	**0 días**	**$ 0.00**	**mar 29/09/26**
459		31.01	14.03.01	NVR 64 CANALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCION	0 días	$ 0.00	mar 29/09/26
460		31.02	14.03.02	SWITCH POE 24 PUERTOS	0 días	$ 0.00	mar 29/09/26
461		31.03	14.03.03	PATCH PANEL 24 PUERTOS	0 días	$ 0.00	mar 29/09/26
462		31.04	14.03.04	MOBILIARIO PARA CUARTO DE CONTROL	0 días	$ 0.00	mar 29/09/26
463		31.05	14.03.05	MONITORES LCD DE 42"	0 días	$ 0.00	mar 29/09/26
464		31.06	14.03.06	GABINETE DE PISO	0 días	$ 0.00	mar 29/09/26
465		31.07	14.03.07	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO IP	0 días	$ 0.00	mar 29/09/26
466		31.08	14.03.08	CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO WDR IP	0 días	$ 0.00	mar 29/09/26
467		31.09	14.03.09	CAMARA FIJA TIPO BULLET IP	0 días	$ 0.00	mar 29/09/26
468		31.10'	14.03.10	CAMARA FIJA TIPO BULLET CON HOUSING IP	0 días	$ 0.00	mar 29/09/26
469		31.13	INP-171	Suministro Tarjetas De Proximidad Para Usuarios	0 días	$ 0.00	mar 29/09/26
470		**COMPONENTE 32**		**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**	**25 días**	**$ 153,818,580.00**	**lun 25/05/26**
471		32.01	14.04.01	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1 1/2" VERTICAL DETECCION	25 días	$ 1,393,546.00	lun 25/05/26
472		32.02	14.04.02	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1/2"	25 días	$ 8,239,934.00	lun 25/05/26
473		32.03	14.04.03	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 3/4"	25 días	$ 106,460,398.00	lun 25/05/26
474		32.04	14.04.04	TUBERIA EMT SOBREPUESTA 1"	25 días	$ 1,703,185.00	lun 25/05/26
475		32.05	14.04.05	BANDEJA PORTACABLE 30X10	25 días	$ 36,021,517.00	lun 25/05/26
476		32.06	14.04.06	CABLEADO GL	0 días	$ 0.00	lun 25/05/26
477		**COMPONENTE 33**		**PVC PRESIÓN**	**55 días**	**$ 245,381,911.00**	**mar 5/05/26**
478		33.01	15.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" PVC RDE 13,5	55 días	$ 5,616,124.00	mar 5/05/26
479		33.02	15.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" PVC RDE 21	55 días	$ 6,128,559.00	mar 5/05/26
480		33.03	15.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" PVC RDE 21	55 días	$ 1,168,350.00	mar 5/05/26
481		33.04	15.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" PVC RDE 21	55 días	$ 11,127,288.00	mar 5/05/26
482		33.05	15.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" PVC RDE21	55 días	$ 6,793,709.00	mar 5/05/26
483		33.06	15.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" PVC RDE 21	55 días	$ 5,147,324.00	mar 5/05/26
484		33.07	15.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2-1/2" PVC RDE 21	55 días	$ 22,045,433.00	mar 5/05/26
485		33.08	15.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1/2" CPVC	55 días	$ 10,662,098.00	mar 5/05/26

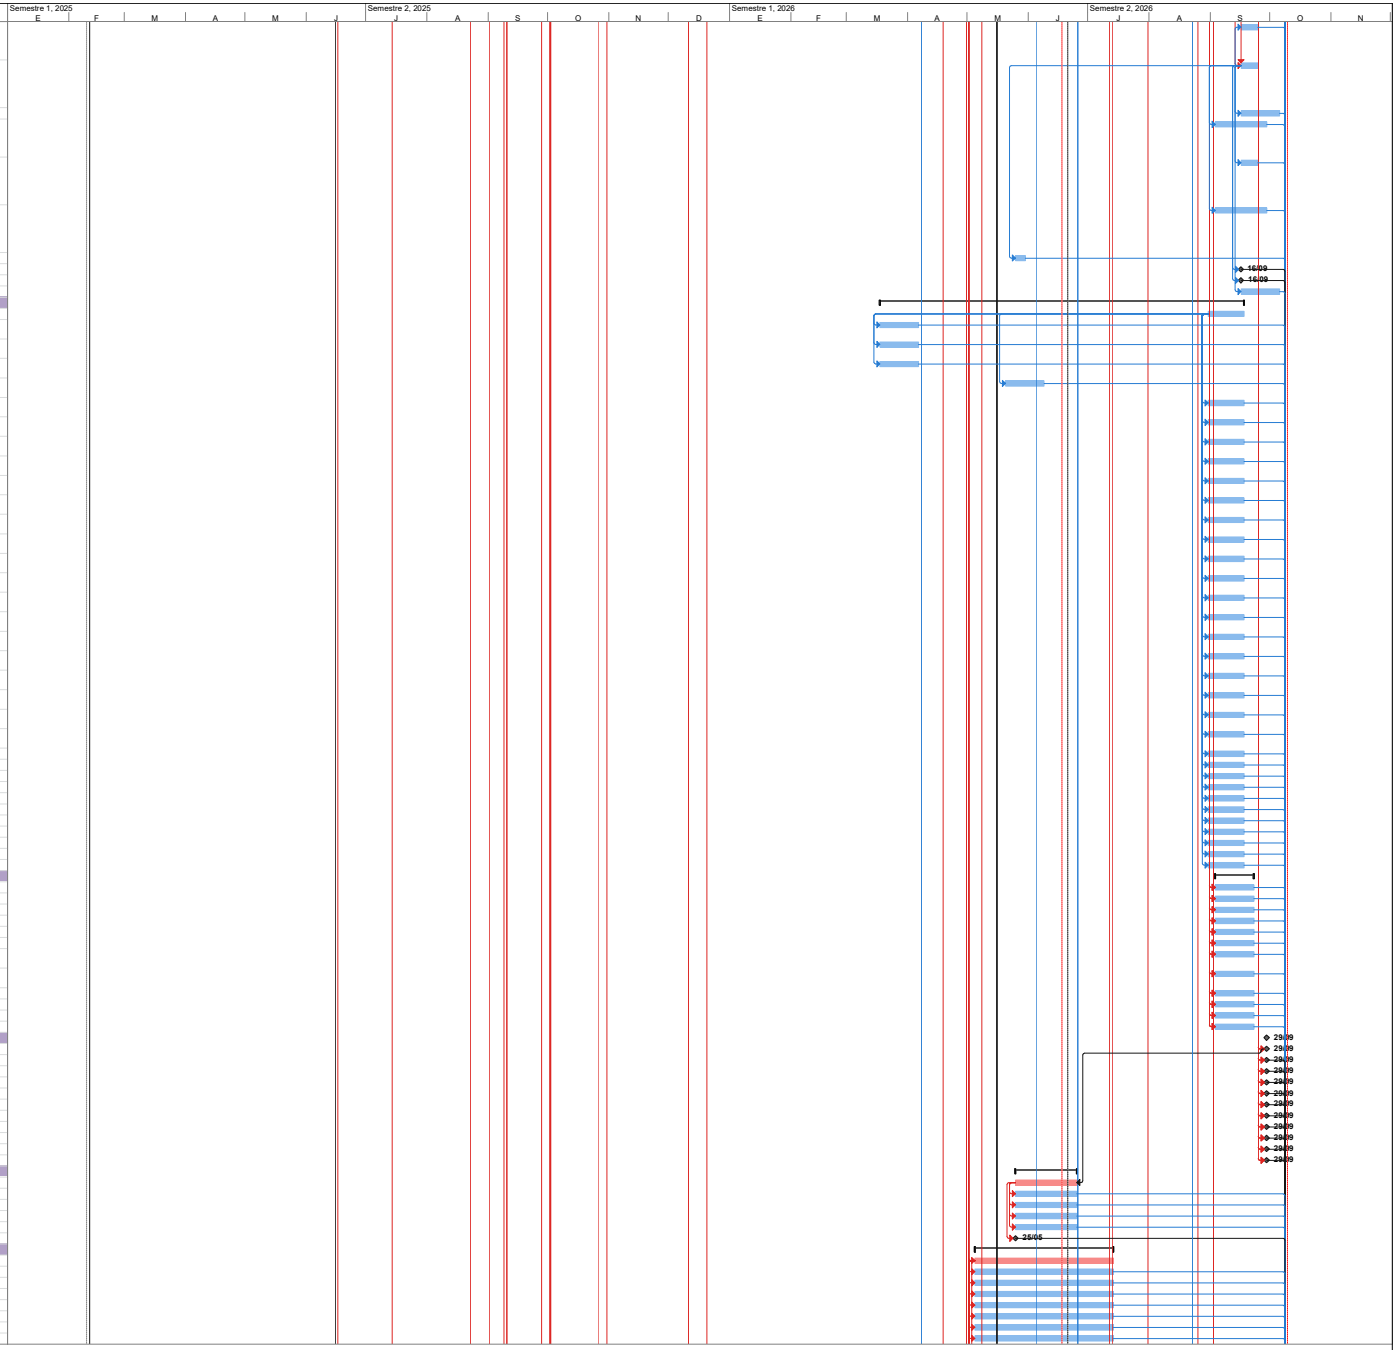

Proyecto: msproj11
Fecha: jue 18/06/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	Ítem	Ítem Contractual	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo
486		33.09	15.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4" CPVC	55 días	$ 11,377,914.00	mar 5/05/26
487		33.10'	15.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1" CPVC	55 días	$ 4,451,301.00	mar 5/05/26
488		33.11	15.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4" CPVC	55 días	$ 15,806,719.00	mar 5/05/26
489		33.12	15.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/2" CPVC	55 días	$ 3,177,876.00	mar 5/05/26
490		33.13	15.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 2" CPVC	55 días	$ 1,623,047.00	mar 5/05/26
491		33.14	15.01.14	ANCLAJE PARA TUBERÍA COLGANTE AL TECHO DE 3/8"	55 días	$ 13,439,661.00	mar 5/05/26
492		33.15	15.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1/2"	55 días	$ 2,792,728.00	mar 5/05/26
493		33.16	15.01.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4"	55 días	$ 4,397,189.00	mar 5/05/26
494		33.17	15.01.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/4"	55 días	$ 12,078,557.00	mar 5/05/26
495		33.18	15.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1-1/2"	55 días	$ 434,434.00	mar 5/05/26
496		33.19	15.01.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2"	55 días	$ 1,313,211.00	mar 5/05/26
497		33.20'	15.01.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE COMPUERTA DE 2-1/2"	55 días	$ 3,720,693.00	mar 5/05/26
498		33.21	15.01.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 2-1/2"	55 días	$ 1,559,565.00	mar 5/05/26
499		33.22	15.01.22	SUMINISTRO DE NIPLE DE VENTILACIÓN CON CODOS PARA TANQUE	55 días	$ 809,273.00	mar 5/05/26
500		33.23	15.01.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTROS DE ARENA Y CARBON CON ACCESORIOS	55 días	$ 79,547,178.00	mar 5/05/26
501		33.24	15.01.24	PASAMURO PARA TUBERIA SUCCIÓN DE BOMBAS	55 días	$ 2,806,693.00	mar 5/05/26
502		33.25	15.03.01	PUNTO HIDRÁULICO 1" - TUBERÍA 3 METROS	55 días	$ 5,781,639.00	mar 5/05/26
503		33.26	15.03.02	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" - TUBERÍA 3 METROS	55 días	$ 7,724,205.00	mar 5/05/26
504		33.27	15.03.03	PUNTO HIDRÁULICO 3/4" - TUBERÍA 3 METROS	55 días	$ 3,851,144.00	mar 5/05/26
505		**COMPONENTE 34**		**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**	**298.5 días**	**$ 266,673,671.00**	**mar 5/08/25**
506		34.01	15.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 2"	40 días	$ 9,264,108.00	lun 11/05/26
507		34.02	15.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 3"	40 días	$ 3,364,494.00	lun 11/05/26
508		34.03	15.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4"	40 días	$ 27,365,786.00	lun 11/05/26
509		34.04	15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 6"	40 días	$ 22,626,203.00	lun 11/05/26
510		34.05	15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2"	40 días	$ 5,221,088.00	lun 11/05/26
511		34.06	15.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUB	40 días	$ 7,451,993.00	lun 11/05/26
512		34.07	15.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO 8"	40 días	$ 17,819,739.00	lun 11/05/26
513		34.08	15.02.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS 3"	40 días	$ 2,467,146.00	lun 11/05/26
514		34.09	15.02.09	ANCLAJE PARA TUBERÍAS	40 días	$ 16,265,140.00	lun 11/05/26
515	HW	34.10'	15.02.10	SIFÓN TIPO PIÑA	40 días	$ 1,727,060.00	lun 22/06/26
516		34.11	15.02.11	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN	30 días	$ 4,326,486.00	lun 11/05/26
517		34.12	15.02.12	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACIÓN	30 días	$ 176,328.00	lun 11/05/26
518		34.13	15.02.13	RELLENO EN TRITURADO	30 días	$ 11,531,038.00	lun 11/05/26
519		34.14	15.02.14	RELLENO EN ARENA	30 días	$ 8,358,926.00	lun 11/05/26
520		34.15	15.02.15	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	30 días	$ 18,064,153.00	lun 11/05/26
521		34.16	15.04.01	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 2"	35 días	$ 16,536,380.00	lun 11/05/26
522		34.17	15.04.02	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 3"	35 días	$ 2,974,914.00	lun 11/05/26
523		34.18	15.04.03	PUNTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE 4"	35 días	$ 12,507,015.00	lun 11/05/26
524		34.19	15.05.01	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60 INCLUYE TAPA CON MARCO	35 días	$ 34,916,026.00	lun 11/05/26
525		34.20'	15.05.02	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 80X80 INCLUYE TAPA CON MARCO	35 días	$ 9,581,916.00	lun 11/05/26
526	HW	34.21	15.05.03	TRAMPA DE ARENAS	30 días	$ 7,271,128.00	lun 13/07/26
527	HW	5.02	04.01.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALT	30 días	$ 8,638,383.00	sáb 23/08/25
528	HW	5.03	04.03.01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO	145 días	$ 18,218,221.00	mar 5/08/25
529		**COMPONENTE 35**		**APARATOS SANITARIOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS.**	**154 días**	**$ 482,788,863.00**	**lun 16/06/25**
530		35.01	16.01.01	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PRM REF. FREE 003891001, COLOR BLANCO 100 DE	130 días	$ 27,932,353.00	lun 3/08/26
531		35.02	16.01.02	TAZA EN PORCELANA VITRIFICADA ALONGADA INSTITUCIONAL CON FLUXÓMETRO T	30 días	$ 30,745,972.00	sáb 6/06/26
532		35.03	16.01.03	ORINAL EN PORCELANA VITRIFICADA DE ENTRADA SUPERIOR, GEOMETRÍA DEL PO	230 días	$ 931,297.00	sáb 6/06/26
533		35.04	16.01.04	MESON CONTINUO CON PENDIENTE EN QUARTZTONE ESPESOR 20MM, COLOR BLANC	30 días	$ 115,586,835.00	lun 3/08/26
534		35.05	16.01.05	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA BAÑOS, EN LÁMINA DE	30 días	$ 174,314,533.00	lun 3/08/26
535		35.06	16.01.06	DIVISIONES SANITARIAS TIPO SOCODA A PISO CLÁSICA PARA ORINALES, EN LÁMINA	0 días	$ 0.00	lun 3/08/26
536		35.07	16.01.07	ESPEJO DE CRISTAL E=4MM, SIN BISELAR, CON BORDE PULIDO, INSTALADO FLOTAC	0 días	$ 0.00	lun 3/08/26
537		35.08	16.01.08	ESPEJO EN CRISTAL FLOTADO CON INCLINACIÓN DEL 15%, E=4MM, SIN MARCO, CO	10 días	$ 0.00	lun 3/08/26
538		35.09	16.01.09	ACCESORIO DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PARA BAÑO INSTITUCIONAL EN ACO	0 días	$ 0.00	lun 3/08/26
539		35.10'	16.01.10	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EMPOTRADO EN MURO, VÁLVULA ANTICORROSIVO	0 días	$ 0.00	lun 3/08/26
540		35.11	16.01.11	ASIDERO PARA BAÑO PLEGABLE HACIA ARRIBA. LONGITUD=0.75M, ANCLADO A MUR	0 días	$ 0.00	lun 3/08/26
541		35.12	16.01.12	ASIDERO DE BAÑO HORIZONTAL PARA SANITARIO. LONGITUD=0.75M, ANCLADO AL M	0 días	$ 0.00	lun 3/08/26
542		35.13	16.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DUCHA	30 días	$ 2,227,924.00	lun 3/08/26
543		35.14	16.01.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA	30 días	$ 15,094,255.00	sáb 6/06/26
544		35.15	16.01.16	LLAVE DE SERVICIO TIPO JARDÍN EXTENSIÓN CROMADA, REF 977900001, TIPO COR	30 días	$ 1,000,929.00	lun 3/08/26
545		35.16	INP-065	Suministro E Instalación De Lavamanos Con Pedestal, Incluye Grifería	30 días	$ 33,924,009.00	vie 12/06/26
546		35.17	INP-066	Suministro E Instalación De Rejilla Granada Metálica 4x3"	30 días	$ 1,163,363.00	vie 12/06/26
547		35.18	INP-067	Tapa Registro Plástica 15 X15 Cm (Válvula De Paso)	30 días	$ 6,442,697.00	lun 3/08/26
548		35.19	INP-068	Poceta De Aseo Medidas 60x45x40 Cm (A X L X H)	30 días	$ 2,886,084.00	lun 3/08/26
549		35.20'	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE	30 días	$ 70,439,612.00	jue 23/04/26
550		35.21	INP-026	Chequeo de niveles para control de asentamiento, incluye nivel automatico de precision, topc	0 días	$ 0.00	lun 16/06/25
551		**COMPONENTE 36**		**RED GENERAL AGUA INCENDIO**	**117 días**	**$ 399,100,731.00**	**mié 22/04/26**
552		36.01	16.02.01	TUBERIA AC DE 1" CON ACCESORIOS SCH40	60 días	$ 15,258,541.00	mié 22/04/26
553		36.02	16.02.02	TUBERÍA AC 1-1/4" CON ACCESORIOS SCH40	60 días	$ 6,075,293.00	mié 22/04/26
554		36.03	16.02.03	TUBERÍA AC 1-1/2" CON ACCESORIOS SCH40	60 días	$ 3,106,325.00	mié 22/04/26
555		36.04	16.02.04	TUBERÍA AC 2" CON ACCESORIOS SCH10	60 días	$ 3,757,112.00	mié 22/04/26
556		36.05	16.02.05	TUBERÍA AC 2-1/2" CON ACCESORIOS SCH10	40 días	$ 1,591,265.00	mié 22/04/26
557		36.06	16.02.06	TUBERÍA AC 3" CON ACCESORIOS SCH10	40 días	$ 6,007,391.00	mié 22/04/26
558		36.07	16.02.07	TUBERÍA AC 4" CON ACCESORIOS SCH10	40 días	$ 18,895,263.00	mié 22/04/26
559		36.08	16.02.08	TUBERÍA AC 5" CON ACCESORIOS SCH10	0 días	$ 0.00	mié 22/04/26
560		36.09	16.02.09	TOMA FIJA PARA ESCALERAS DE 2-1/2"	30 días	$ 1,854,040.00	mar 7/07/26
561		36.10'	16.02.10	ROCIADORES DE 1/2" ANTIVANDÁLICO PEND RESPUESTA RÁPIDA K=5,6	30 días	$ 11,905,792.00	mar 7/07/26
562		36.11	16.02.11	SOPORTERIA ANTISISMICA TRANSVERSAL	50 días	$ 8,703,068.00	mar 28/04/26
563		36.12	16.02.12	SOPORTERIA ANTISISMICA LONGITUDINAL	50 días	$ 5,192,327.00	mar 28/04/26
564		36.13	16.02.13	SOPORTERIA ANTISISMICA DOBLE VIA	50 días	$ 14,005,382.00	mar 28/04/26
565		36.14	16.02.14	ANCLAJE PARA TUBERÍAS EN 3/8"	50 días	$ 35,591,912.00	mar 28/04/26
566		36.15	16.02.15	TUBERÍA CPVC C 900 O SIMILAR DE 5" CON ACCESORIOS	0 días	$ 0.00	lun 4/05/26
567		36.16	16.02.16	CABEZAL DE PRUEBA	7 días	$ 5,849,010.00	jue 27/08/26
568		36.17	16.02.18	SIAMESA 4"X2"1/2"X2"1/2"	7 días	$ 946,266.00	jue 27/08/26
569		36.18	16.02.19	PASAMURO SUCCIÓN DE BOMBAS MURO DE CONCRETO L=1 M.	50 días	$ 1,871,128.00	mié 22/04/26
570		36.19	16.02.20	PLACA ANTIVORTICE 50X50	7 días	$ 265,264.00	mié 9/09/26
571		36.20'	16.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA EXPULSORA / ADMISORA DE AIRE PARA TUB	15 días	$ 596,159.00	lun 27/07/26
572		36.28	INP-094	Suministro E Instalación De Tubería Pvc Awwa C 900 De 4"	50 días	$ 52,255,245.00	mar 5/05/26
573		36.29	INP-095	Suministro E Instalación De Kit Adaptador Brida Serie 4200 De 4" Incluye Brida Copa Ranura	50 días	$ 21,513,640.00	mar 5/05/26
574		36.30'	INP-096	Válvula Compuerta 4" Ranurada Ul/Fm	15 días	$ 3,673,877.00	jue 11/06/26
575		36.31	INP-097	Válvula Cheque 4" Ranurada Ul/Fm	15 días	$ 4,467,412.00	jue 11/06/26
576		36.32	INP-098	Sensor De Flujo De 4" Tipo Paleta	15 días	$ 3,124,566.00	jue 11/06/26
577		36.33	INP-100	Válvula De Prueba Y Drenaje 1"	15 días	$ 1,876,461.00	jue 11/06/26
578		36.34	INP-101	Manómetro En Glicerina 0-300 Lbs Psi Incluye Válvula Tipo Cortina De 3 Vías De 1/4, Codo	15 días	$ 6,373,866.00	jue 11/06/26
579		36.35	INP-102	Válvula Mariposa Ranurada De 4"	15 días	$ 3,922,624.00	jue 11/06/26
580		36.36	INP-189	Suministro E Instalación De Restricto Hd Serie 1200 Tubo A Acc De 4"	15 días	$ 60,209,250.00	jue 11/06/26
581		36.37	INP-190	Suministro E Instalación De Codo Campana X Campana Pvc Awwa C 900 De 4" X 90°.	50 días	$ 18,775,478.00	mar 5/05/26
582		36.38	INP-191	Suministro E Instalación De Tee Campana X Campana PVC Awwa C 900 De 4"	50 días	$ 10,997,162.00	mar 5/05/26
583		36.39	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE	30 días	$ 70,439,612.00	mié 22/04/26
584		**COMPONENTE 37**		**RED DE GAS**	**80 días**	**$ 65,290,491.00**	**vie 22/05/26**
585		37.01	16.03.01	TUBERIA EN COBRE TIPO L DE 1/2" PARA GAS	1 día	$ 59,616.00	vie 22/05/26
586		37.02	16.03.02	TUBERIA EN COBRE TIPO L DE 3/4" PARA GAS	17 días	$ 163,644.00	vie 22/05/26
587		37.03	16.03.03	VÁLVULA DE 1/2" PARA TUBERIA DE GAS	17 días	$ 53,883.00	vie 24/07/26
588		37.04	16.03.04	VÁLVULA DE 3/4" PARA TUBERIA DE GAS	17 días	$ 89,974.00	vie 24/07/26
589		37.05	16.03.06	REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA	17 días	$ 1,209,560.00	vie 24/07/26
590		37.06	16.03.07	CAJA MEDIDOR DE GAS CON MEDIDOR Y REGULADOR PRIMERA ETAPA	17 días	$ 1,121,406.00	vie 24/07/26
591		37.07	16.03.08	CALDERIN DE 300 L	0 días	$ 0.00	vie 22/05/26
592		37.08	INP-092	Suministro E Instalación De Sistema De Agua Caliente Cascada Inteligente	30 días	$ 54,914,791.00	vie 24/07/26
593		37.09	INP-093	Tubería En Cobre Tipo L De 1" Para Gas	17 días	$ 7,677,617.00	vie 22/05/26
594		**COMPONENTE 38**		**EQUIPOS DE LA RED HIDRÁULICA Y CONTRAINCENDIOS**	**20 días**	**$ 99,811,156.00**	**jue 10/09/26**
595		38.01	17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA AGUA POTABLE H=29,2 MCA -;	20 días	$ 23,868,802.00	jue 10/09/26
596		38.02	17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PARA AGUA RECIRCULADA H=35 MCA ; Q =	20 días	$ 31,825,069.00	jue 10/09/26
597		38.03	17.01.03	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 200 LITROS	20 días	$ 7,195,906.00	jue 10/09/26
598		38.04	17.01.04	SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 300 LITROS	20 días	$ 8,777,110.00	jue 10/09/26
599		38.05	17.01.05	SUMINSITRO E INSTALACIÓN BOMBA EYECTORA PARA AGUAS RESIDUALES H= 5 M.	20 días	$ 16,036,478.00	jue 10/09/26
600		38.06	17.01.06	SUMINSITRO E INSTALACION DE DOSIFICACIÓN DE CLORO EN LINEA DE 1,5 MGIL PA	20 días	$ 2,794,057.00	jue 10/09/26
601		38.07	17.01.07	CAUDALIMETRO PARA INSTALAR EN RED DE 6" INCLUYE ACCESORIOS	20 días	$ 9,313,734.00	jue 10/09/26
602		**COMPONENTE 39**		**EQUIPOS RED AGUA INCENDIO**	**10 días**	**$ 379,603,102.00**	**jue 27/08/26**
603		39.01	17.02.01	ESTANTE CON MATERIAL DE SOPORTE O MANTENIMIENTO	10 días	$ 2,909,038.00	jue 27/08/26
604	HW	39.02	17.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE PARA DERRAMES CON ACCESOR	10 días	$ 8,563,744.00	jue 27/08/26

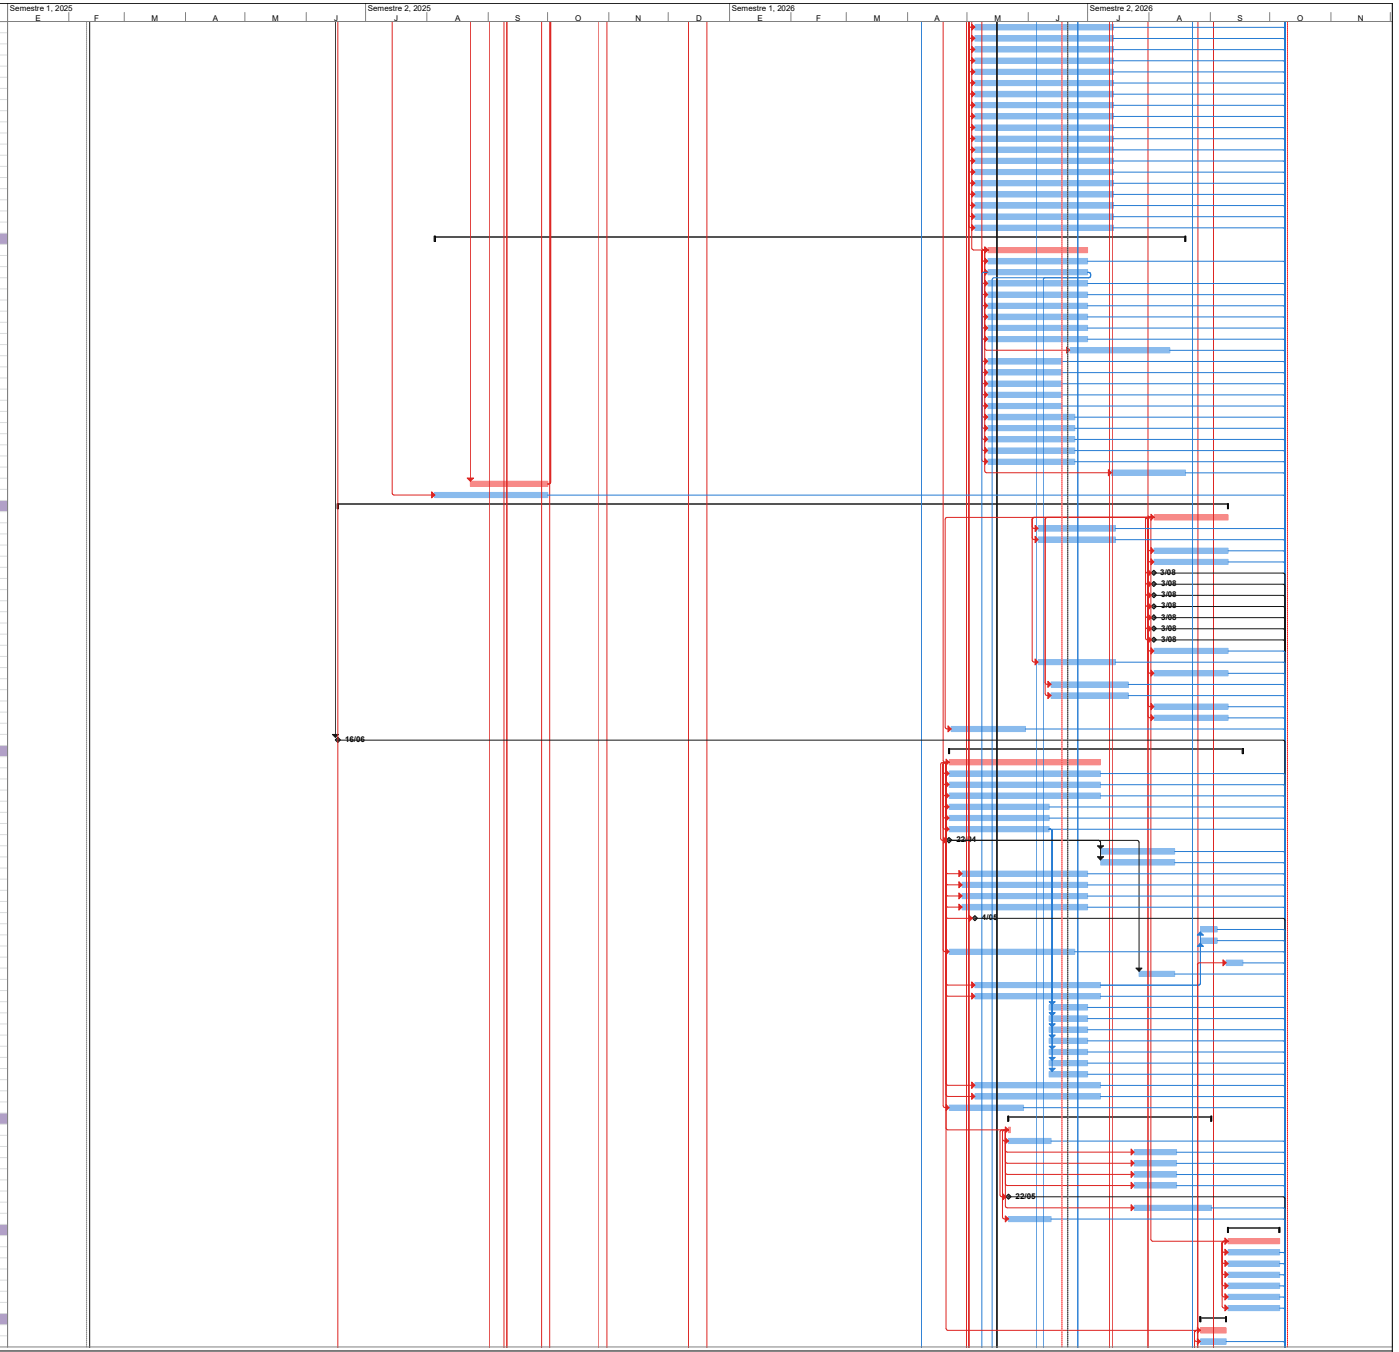


Proyecto: msproj11
Fecha: jue 18/06/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	Ítem	Ítem Contractual	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo
605		39.03	17.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRINCIPAL CONTRAINCENDIOS PARA FUNC	10 días	$ 342.434.730,00	jue 27/08/26
606		39.04	17.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAJOCKEY CONTRAINCENDIOS PARA FUNCION	10 días	$ 20.688.553,00	jue 27/08/26
607		39.05	17.02.05	ESTACIÓN DE CONTROL INCLUYE VRP, DRENAJE, VÁLVULA DE CIERRE CONTROLAD	10 días	$ 5.007.037,00	jue 27/08/26
608		**COMPONENTE 40**		**ELECTROMECÁNICA HVAC**	**75 días**	**$ 453.498.384,00**	**mar 19/05/26**
609		40.01	18.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE TIRO HORIZONTAL, UC-RV-02, 48.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 4.0 KW, 208/1/60. (INCLUYE PAD ANTIVIBRATORIO, SOPORTES, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTAL	15 días	$ 34.306.397,00	lun 3/08/26
610		40.02	18.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL CASSETTE UNA VIA, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 50 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, PANEL, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	15 días	$ 6.454.421,00	lun 3/08/26
611		40.03	18.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 7.500 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 30 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERAC	15 días	$ 4.956.276,00	lun 3/08/26
612		40.04	18.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD EVAPORADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FANCOIL PARED, 12.000 BTU/H (CAPACIDAD NOMINAL), 42 W, 208/1/60. (INCLUYE SOPORTE, BOMBA DE CONDENSADOS, CONTROL REMOTO, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERA	15 días	$ 31.006.520,00	lun 3/08/26
613		40.05	18.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO BAJO NIVEL DE RUIDO, UVS-01, 210 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y F	15 días	$ 9.973.417,00	lun 3/08/26
614		40.06	18.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE SUMINISTRO BAJO NIVEL DE RUIDO, UVS-02, 250 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, FILTROS MERV 8, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y F	15 días	$ 9.973.417,00	lun 3/08/26
615		40.07	18.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO, VEC-TH-01, 600 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	15 días	$ 12.880.154,00	lun 3/08/26
616		40.08	18.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO, VEC-TH-02, 500 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	15 días	$ 12.902.704,00	lun 3/08/26
617		40.09	18.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO HONGO, VEC-TH-03, 350 CFM A 0.2 IN WC, 1/4 HP, 115/1/60. (INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES FLEXIBLES A CONDUCTOS, ARRANQUE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	15 días	$ 12.826.487,00	lun 3/08/26
618		40.10'	INP-104	Suministro E Instalación Rejilla De Extracción Tipo Aleta Fija 152 X 152 (6"X6")	15 días	$ 404.313,00	lun 3/08/26
619		40.11	INP-105	Acometida Eléctrica 2 X 12 Awg Mas Tierra 12 Awg, Incluye Accesorios Y Elementos Para Instalación.	30 días	$ 89.501.975,00	mar 19/05/26
620		40.12	INP-106	Suministro E Instalación De Unidad Condensadora De Refrigerante Variable De Tiro Horizontal, Uc-Rv-01, 15,5 Kw (52.900 Btu/H) (Capacidad Nominal), 4,21 Kw, 208/1/60. (Incluye Pad Antivibratorio, Soportes, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Corr	15 días	$ 44.324.837,00	lun 3/08/26
621		40.13	INP-107	Suministro E Instalación Unidad Evaporadora De Refrigerante Variable Tipo Fancoil Cassette Una Via, 5,6 Kw (19.100 Btu/H) (Capacidad Nominal), 60 W, 208/1/60. (Incluye Soporte, Panel, Control Remoto, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta	15 días	$ 13.300.379,00	lun 3/08/26
622		40.14	INP-108	Suministro E Instalación Ventilador De Extracción Tipo Hongo, Vec-Th-01, 306,8 L/S A 74,7 Pa (650 Clm A 0.3 In Wc), 186,4 W (1/4 Hp), 115/1/60. (Incluye Soportes, Conexiones Flexibles A Conductos, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ope	15 días	$ 25.603.608,00	lun 3/08/26
623		40.15	INP-109	Suministro E Instalación Ventilador De Extracción Tipo Hongo, Vec-Th-02, 306,8 L/S A 74,7 Pa (650 Clm A 0.3 In Wc), 186,4 W (1/4 Hp), 115/1/60. (Incluye Soportes, Conexiones Flexibles A Conductos, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ope	15 días	$ 25.603.392,00	lun 3/08/26
624		40.16	INP-110	Suministro E Instalación Ventilador De Extracción Tipo Hongo, Vec-Th-04, 283,2 L/S A 74,7 Pa (600 Clm A 0.3 In Wc), 186,4 W (1/4 Hp), 115/1/60. (Incluye Soportes, Conexiones Flexibles A Conductos, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ope	15 días	$ 26.004.644,00	lun 3/08/26
625		40.17	INP-111	Suministro E Instalación Ventilador De Extracción Tipo Hongo, Vec-Th-05, 141,6 L/S A 49,8 Pa (350 Clm A 0.25 In Wc), 186,4 W (1/4 Hp), 115/1/60. (Incluye Soportes, Conexiones Flexibles A Conductos, Arranque, Pruebas Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Op	15 días	$ 23.035.831,00	lun 3/08/26
626		40.18	24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES	7 días	$ 70.439.612,00	mar 19/05/26
627		**COMPONENTE 41**		**RED DE TUBERIA DE COBRE**	**65 días**	**$ 146.251.695,00**	**mar 5/05/26**
628		41.01	18.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	15 días	$ 74.885.560,00	mar 5/05/26
629		41.02	18.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/2"	1 día	$ 3.083.523,00	mar 5/05/26
630		41.03	18.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 1/4"	15 días	$ 2.166.053,00	mar 5/05/26
631		41.04	18.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/4"	1 día	$ 266.082,00	mar 5/05/26
632		41.05	18.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 3/8"	15 días	$ 2.308.265,00	mar 5/05/26
633		41.06	18.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE COBRE TIPO K PARA TUBERÍA OD Ø 5/8"	15 días	$ 839.792,00	mar 5/05/26
634		41.07	18.03.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/2" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	1 día	$ 22.432.013,00	mar 5/05/26
635		41.08	18.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 1/4" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	15 días	$ 11.853.630,00	mar 5/05/26
636		41.09	18.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 3/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	15 días	$ 14.684.021,00	mar 5/05/26
637		41.10'	18.03.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K PREAISLADA OD Ø 5/8" (INCLUYE SOPORTE, ASILAMIENTO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN).	15 días	$ 11.020.647,00	mar 5/05/26
638		41.11	18.03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y-BRACH REFERENCIA MXJ-YA1509M (O SEGÚN MARCA DE LOS EQUIPOS VRF OFERTADOS).	15 días	$ 2.712.109,00	mar 7/07/26
639		**COMPONENTE 42**		**TERMINAL DE AIRE, ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**	**15 días**	**$ 52.694.797,00**	**lun 3/08/26**
640		42.01	18.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA 8"X4"	15 días	$ 687.448,00	lun 3/08/26
641		42.02	18.04.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA 20"X4"	15 días	$ 297.871,00	lun 3/08/26
642		42.03	18.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA 8"X4"	15 días	$ 6.620.378,00	lun 3/08/26
643		42.04	18.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE EXTRACCIÓN TIPO ALETA FIJA 8"X4"	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
644		42.05	18.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE-AA-03	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
645		42.06	18.05.02	TUBERÍA Y CABLEADO DE CONTROL	10 días	$ 45.089.100,00	lun 3/08/26
646		**COMPONENTE 43**		**SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**	**0 días**	**$ 0,00**	**lun 3/08/26**
647		43.01	19.01.01	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
648		43.02	19.01.02	SEÑALES DE EVACUACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 TIPO BANDERA HORIZON	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
649		43.03	19.01.03	SEÑALES DE EVACUACION PUNTO DE ENCUENTRO EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 IN	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
650		43.04	19.01.04	SEÑALES DE EVACUACION PLANO DE INFORMACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
651		43.05	19.01.05	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO INDICADOR DE SENTIDO DE RUTA EN MATERIAL	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
652		43.06	19.01.06	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN GIROS O CRUCES EN MATERIAL ALUMINIO	0, 0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
653		43.07	19.01.07	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO CON SIMBOLO DE SILLA DE RUEDAS EN MATERIA	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
654		43.08	19.01.08	SEÑALES DE EVACUACION DE PISO EN CINTA ANTIDESLIZANTE DE ALUMINIO GRAD	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
655		43.09	19.01.09	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
656		43.10'	19.01.10	SEÑALES DE PREVENCION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
657		43.11	19.01.11	SEÑALES DE ADVERTENCIA EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
658		43.12	19.01.12	SEÑALES DE OBLIGACION EN POLIESTIRENO CALIBRE 40 INSTALADO SOBRE PARED	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
659		43.13	19.01.13	SEÑALES INFORMATIVAS EN VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO INSTALADO SOBRE	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
660		43.14	19.01.14	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN DOMOS TRUNCADOS DE POLICARBONATO	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
661		43.15	19.01.15	SEÑALES PODOTACTILES DE ALERTA EN REGLETAS DE POLICARBONATO HIPS (POL	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
662		**COMPONENTE 44**		**DOTACIÓN**	**0 días**	**$ 0,00**	**lun 3/08/26**
663		44.01	19.02.01	SILLAS INTERLOCUTORAS	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
664		44.02	19.02.02	SILLA EJECUTIVA	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
665		44.03	19.02.03	ESCRITORIO	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
666		44.04	19.02.04	ARCHIVO RODANTE EN LÁMINA C.R. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CINC	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
667		44.05	19.02.05	CASILLERO METÁLICO EN LÁMINA C.R. CALIBRE 22 CON PINTURA PARA POLVO HOR	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
668		44.06	19.02.06	SOFA DE TERRAZA	0 días	$ 0,00	lun 3/08/26
669		**COMPONENTE 45**		**ASEO**	**69 días**	**$ 62.990.208,00**	**mié 15/07/26**
670		45.01	19.03.01	ASEO FINAL GENERAL	14 días	$ 20.833.333,00	mié 23/09/26
671		45.02	19.03.02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO: INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZ	14 días	$ 4.714.911,00	mié 23/09/26
672		45.03	19.03.03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZ	15 días	$ 36.447.380,00	mié 15/07/26
673		45.04	19.03.04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLU	0 días	$ 0,00	sáb 15/08/26

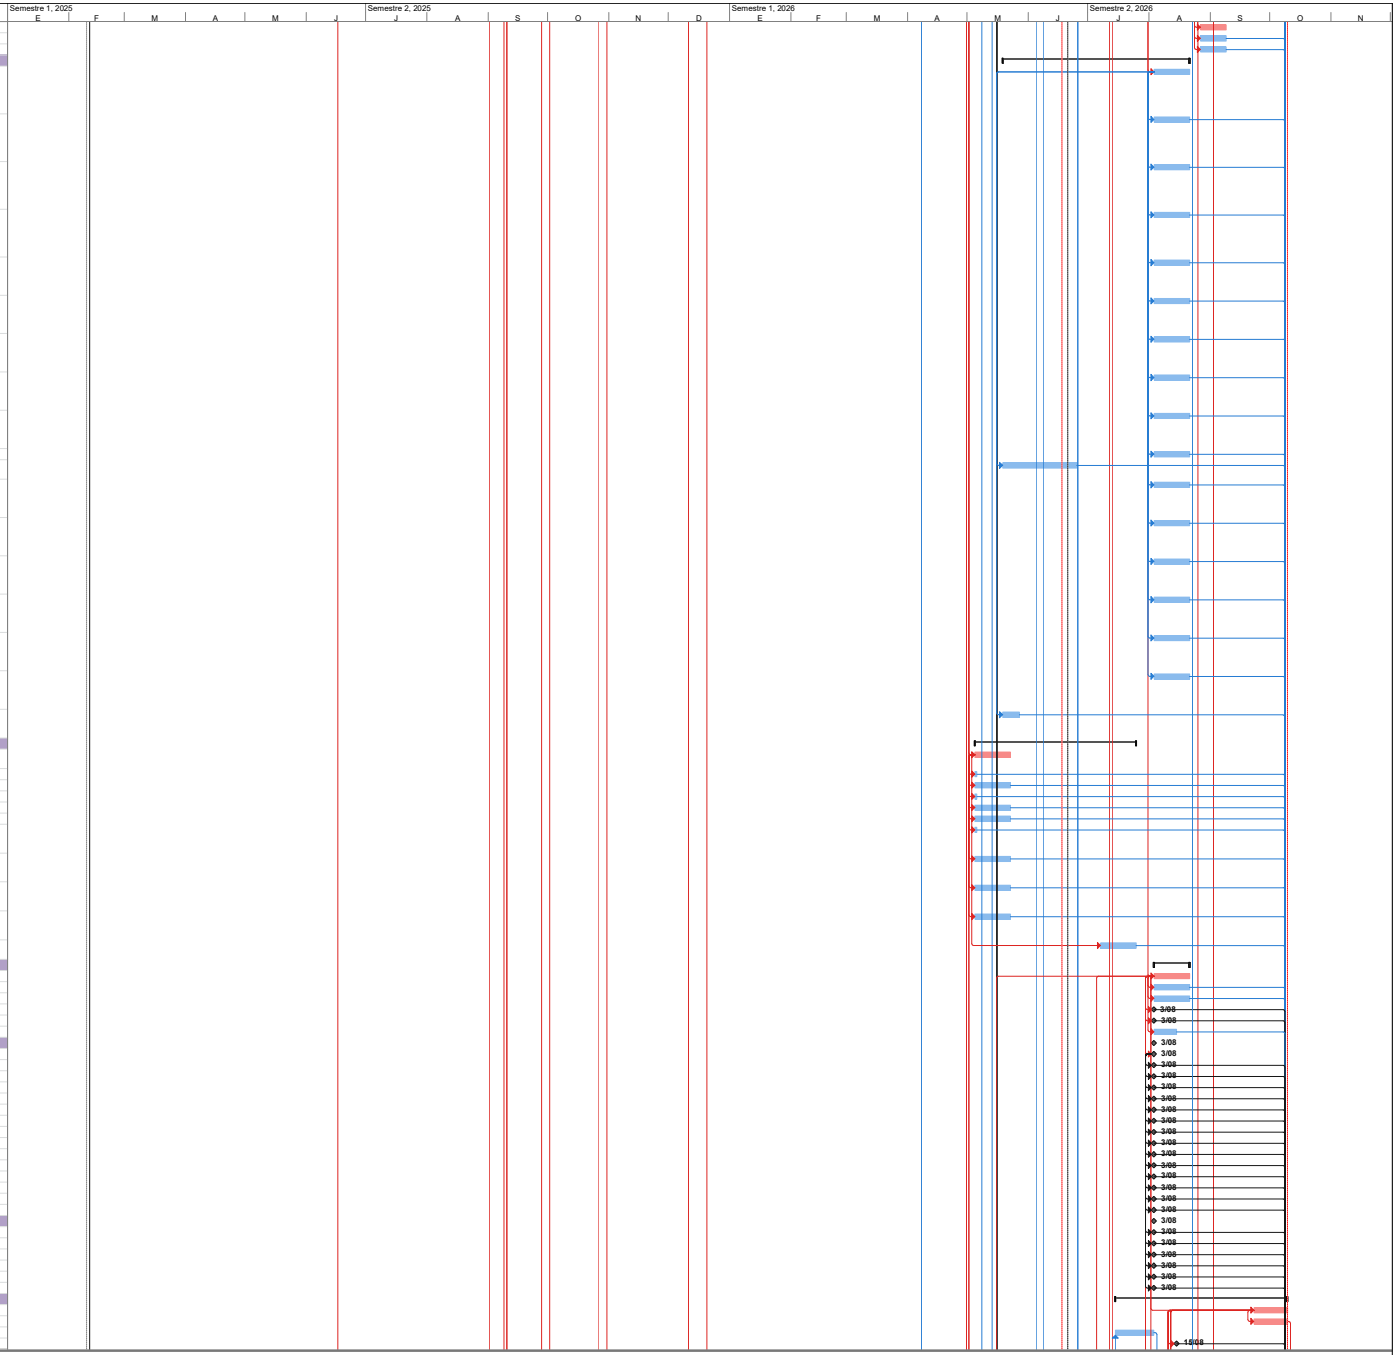


Id	Modo de tarea	Ítem Contractua	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo
674		45.05	02.01.12 CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA	0 días	$ 0.00	sáb 15/08/26
675		45.06	20.01.01 PROTECCIÓN TEMPORAL	9 días	$ 356,357.00	sáb 15/08/26
676		45.07	20.01.02 LIMPIEZA DE SUCIEDAD EN MATERIAL PÉTREO LISO	9 días	$ 163,084.00	sáb 15/08/26
677		45.08	20.02.01 PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES UNIDAD	9 días	$ 356,357.00	sáb 15/08/26
678		45.09	20.02.02 LIMPIEZA DE SUCIEDAD EN MATERIAL PÉTREO LISO	0 días	$ 0.00	sáb 15/08/26
679		45.10'	20.02.03 REINTERGRACION CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS	0 días	$ 0.00	sáb 15/08/26
680		45.11	20.03.01 PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES UNIDAD	9 días	$ 118,786.00	sáb 15/08/26
681		45.12	20.03.02 LIMPIEZA DE SUCIEDAD EN MATERIAL PÉTREO LISO	0 días	$ 0.00	sáb 15/08/26
682		45.13	20.03.03 REINTERGRACION CROMÁTICA PINTURA DE LETRAS	0 días	$ 0.00	sáb 15/08/26
683			**COMPONENTE 46 ASCENSORES**	**90 días**	**$ 594,890,670.00**	**mar 5/05/26**
684		46.01	21.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 900 KG 3 PAR	90 días	$ 250,055,193.00	mar 5/05/26
685		46.02	21.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR (SIN CUARTO DE MAQUINAS, 1600 KG 3 PAS	90 días	$ 334,835,477.00	mar 5/05/26
686			**COMPONENTE 47 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS**	**20 días**	**$ 495,475,239.00**	**jue 10/09/26**
687		47.01	21.02.01 UNIDAD CONTROLADORA CENTRAL	20 días	$ 35,938,389.00	jue 10/09/26
688		47.02	21.02.02 UNIDAD CONTROLADORA REMOTA	20 días	$ 65,473,136.00	jue 10/09/26
689		47.03	21.02.03 TECLADO DE ALARMAS	20 días	$ 3,382,225.00	jue 10/09/26
690		47.04	21.02.04 BOTON DE PANICO	20 días	$ 979,185.00	jue 10/09/26
691		47.05	21.02.05 BOTON DE APERTURA MONTAJE SOBREPUESTO	20 días	$ 1,913,125.00	jue 10/09/26
692		47.06	21.02.06 DETECTOR DE APERTURA	20 días	$ 9,151,250.00	jue 10/09/26
693		47.07	21.02.07 LECTORA DE TARJETAS	20 días	$ 87,336,733.00	jue 10/09/26
694		47.08	21.02.08 RETENEDOR MAGNETICO	20 días	$ 24,453,811.00	jue 10/09/26
695		47.09	21.02.09 BOTON DE APERTURA TIPO TOUCHLESS	20 días	$ 956,125.00	jue 10/09/26
696		47.10'	INP-172 Suministro E Instalación Fuente De Poder Para Puertas	20 días	$ 32,581,528.00	jue 10/09/26
697		47.11	INP-173 Suministro E Instalación De Cableados Para Control De Accesos	20 días	$ 46,617,187.00	jue 10/09/26
698		47.12	INP-174 Configuración Start Up Para El Control De Acceso	20 días	$ 14,993,489.00	jue 10/09/26
699		47.13	INP-175 Suministro E Instalación Panel De Alarma Intrusión Incluye Gabinete, Batería, Transformador	20 días	$ 3,091,178.00	jue 10/09/26
700		47.14	INP-176 Suministro E Instalación Cableados Para Sistema Intrusión	20 días	$ 8,753,176.00	jue 10/09/26
701		47.15	INP-177 Suministro E Instalación Servidor Y Software Control De Acceso	20 días	$ 160,242,692.00	jue 10/09/26
702			**COMPONENTE 48 OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES, PROTECCION Y APUNTALAMIENTO**	**90 días**	**$ 97,365,269.00**	**mar 5/05/26**
703		48.01	22.01.01 OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑ	0 días	$ 0.00	mié 26/08/26
704		48.02	02.02.01 INSTALACIÓN DE SOBREPISO CON ESTIBAS DE MADERA, CAPA DE CARTÓN CORRU	30 días	$ 9,451,854.00	mar 5/05/26
705		48.03	02.02.02 INSTALACIÓN DE SOBREPISO CON ESTIBAS DE MADERA Y CAPA DE POLIETILENO	0 días	$ 0.00	mié 26/08/26
706		48.04	02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMIENTO TEMPORAL CON PARAL METÁLI	30 días	$ 42,996,953.00	mar 5/05/26
707		48.05	02.03.02 ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROVAMIDAMIENTE 10 METROS DE LARGO	30 días	$ 45,136,462.00	mar 5/05/26
708			**COMPONENTE 49 OBRAS REDES ESPECIALES (RED DE GASES MEDICINALES) E ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PMA**	**20 días**	**$ 240,482,200.00**	**mar 5/05/26**
709		49.01	23.01.01 OBRAS RED DE GASES MEDICINALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑ	0 días	$ 0.00	mar 5/05/26
710		49.02	23.01.02 OBRAS TELEMEDICINA (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	0 días	$ 0.00	mar 5/05/26
711		49.03	23.01.03 ITEMS DE OBRA RESULTANTES DE LOS AJUSTES DERIVADOS DEL PROGRAMA MÉDI	0 días	$ 0.00	mar 5/05/26
712		49.04	INP-072 Tubería Cobre Tipo L 1/2" Para Red De Oxigeno	20 días	$ 57,550,668.00	mar 5/05/26
713		49.05	INP-073 Tubería Cobre Tipo L 3/4" Para Red De Oxigeno	20 días	$ 4,031,330.00	mar 5/05/26
714		49.06	INP-074 Tubería Cobre Tipo L 1" Para Red De Oxigeno	20 días	$ 58,314,632.00	mar 5/05/26
715		49.07	INP-075 Válvula De Bola Inox De 1/2 Tipo 4 Tornillos	20 días	$ 2,058,942.00	mar 5/05/26
716		49.08	INP-076 Válvula De Bola Inox De 3/4 Tipo 4 Tornillos	20 días	$ 585,050.00	mar 5/05/26
717		49.09	INP-077 Válvula De Bola Inox De 1" Tipo 4 Tornillos	20 días	$ 3,196,837.00	mar 5/05/26
718		49.10	INP-078 Caja De Corte 1 Vía	20 días	$ 4,342,941.00	mar 5/05/26
719		49.11	INP-079 Alarma Touchscreen 7" 1 Vía	20 días	$ 21,282,632.00	mar 5/05/26
720		49.12	INP-080 Alarma Maestra 7" Touch10 Señales	0 días	$ 0.00	mar 5/05/26
721		49.13	INP-081 Presoswitch 100 A 1.500 Psi	20 días	$ 2,677,057.00	mar 5/05/26
722		49.14	INP-082 Toma De Pared Oxigeno Gentec Ref. 3823u-O	20 días	$ 19,925,652.00	mar 5/05/26
723		49.15	INP-083 Manifold 2 X 5 Para Oxigeno -Regulación Manual	20 días	$ 34,100,159.00	mar 5/05/26
724		49.16	INP-084 Suministro Manifold 2x1 Para Termos De Oxigeno Medicinal	20 días	$ 32,416,300.00	mar 5/05/26
725			**COMPONENTE 50 PATOLOGIAS EN CONCRETOS**	**30 días**	**$ 124,406,760.00**	**vie 12/09/25**
726		50.01	INP-002 Resane Con Mortero Estructural De Losa Y Viguetas	30 días	$ 756,561.00	vie 12/09/25
727		50.02	INP-040 Escarificación, Limpieza Y Aplicación De Inhibidor De Corrosión A Aceros De Viguetas (Hasta	30 días	$ 100,317,477.00	vie 12/09/25
728		50.03	INP-044 Restitución De Viguetas, Incluye Demolición, Reposición De Acero, Anclajes Y Fundición Con	30 días	$ 13,562,847.00	vie 12/09/25
729		50.04	INP-045 Fundición Con Grouting para pases de tuberias existentes D <= 4", Incluye Retiro De Tuberí	30 días	$ 9,769,875.00	vie 12/09/25
730			**COMPONENTE 51 SOBRECUBIERTA**	**30 días**	**$ 930,924,924.00**	**jue 25/09/25**
731		51.01	02.01.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INC	30 días	$ 523,604,175.00	jue 25/09/25
732		51.02	02.01.25 DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	5 días	$ 6,420,746.00	mié 8/10/25
733			**COMPONENTE 52 DISEÑO, PRUEBAS Y CERTIFICACIONES**	**50 días**	**$ 55,701,248.00**	**lun 20/07/26**
734		52.02	INP-009 Extracción Y Realización De Ensayo De Resistencia A Cilindros De 2" De Concretos	0 días	$ 0.00	lun 20/07/26
735		52.03	INP-010 Ensayo De Profundidad De Carbonatación (Ph) Sobre Núcleo De Concreto	0 días	$ 0.00	mié 26/08/26
736		52.04	INP-011 Prueba Estándar Para Potencial De Corrosión De Acero Sin Recubrimiento En Concreto	0 días	$ 0.00	mié 26/08/26
737		52.05	INP-012 Ensayo De Velocidad De Pulso Ultrasónico A Través Del Concreto Directo	0 días	$ 0.00	mié 26/08/26
738		52.06	INP-013 Punto De Detección De Armadura De Refuerzo, Posición Relativa Y Recubrimiento - Detecci	0 días	$ 0.00	mié 26/08/26
739		52.07	INP-104 Diseño, Ingeniería De Detalle, Pruebas Y Puesta En Funcionamiento del sistema de gases m	15 días	$ 12,459,508.00	jue 27/08/26
740		52.09	16.03.04 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS	15 días	$ 435,380.00	jue 27/08/26
741		52.10'	16.02.17 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A RED DE INCENDIOS	15 días	$ 1,306,137.00	jue 27/08/26
742		52.11	16.03.05 PRUEBA DE PRESIÓN DE HERMETICIDAD	15 días	$ 435,380.00	jue 27/08/26
743		52.12	13.08.01 CERTIFICACIONES RETE	20 días	$ 20,532,422.00	jue 27/08/26
744		52.13	13.08.02 CERTIFICACIÓN RETILAP	20 días	$ 20,532,422.00	jue 27/08/26
745			**COMPONENTE 53 IMPERMEABILIZACION**	**245 días**	**$ 319,199,712.00**	**lun 3/11/25**
746		53.01	07.01.03 PENDIENTADO DE CUBIERTA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO	30 días	$ 85,808,450.00	lun 3/11/25
747		53.02	07.01.04 INSTALACIÓN DE MANTO IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO, POLIUREA O SIM	30 días	$ 130,352,388.00	lun 3/08/26
748		53.03	INP-037 Suministro E Instalación Impermeabilización En Poliuria 2 Mm Para Muros De Tanque En Co	20 días	$ 103,038,874.00	vie 5/06/26
749			**COMPONENTE 54 SERVICIOS, ACOMPAÑAMIENTO, OTROS**	**60 días**	**$ 145,324,454.00**	**mar 19/05/26**
750		54.01	02.01.05 SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES	10 días	$ 33,178,405.00	mar 19/05/26
751		54.02	02.01.26 ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA.	0 días	$ 0.00	lun 3/08/26
752		54.03	16.01.15 GUARDACAMILLAS EN PVC VIRGEN DE 2500X100X24MM, INCLUYE BASE RIEL DE ALU	20 días	$ 112,346,249.00	mié 8/07/26
753			**COMPONENTE 55 AMBIENTAL**	**5 días**	**$ 5,467,735.00**	**lun 10/02/25**
754		55.01	02.01.17 INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE ELABORACIÓN DE	5 días	$ 4,961,140.00	lun 10/02/25
755		55.02	02.01.18 TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAICE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	0 días	$ 0.00	lun 10/02/25
756		55.03	02.01.19 TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	0 días	$ 0.00	lun 10/02/25
757		55.04	02.01.20 SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, A	0 días	$ 0.00	lun 10/02/25
758		55.05	02.01.21 PROTECCION DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	5 días	$ 506,595.00	lun 10/02/25
759			**COMPONENTE 56 ITEM NO PREVISTO**	**478 días**	**$ 1,139,985,491.00**	**lun 19/01/25**
760		56.01	INP-007 Corte con pulidora sobre muro en mampostería	30 días	$ 39,419,442.00	vie 20/06/25
761		56.02	INP-019 Suministro e instalacion de filtro frances para manejo de aguas. (No incluye excavación)	15 días	$ 693,574.00	mar 30/09/25
762		56.03	INP-036 Acarreo horizontal y vertical para rellenos y demoliciones	35 días	$ 110,523,267.00	mié 1/10/25
763		56.04	INP-038 Grouting Para Remate De Reforzamiento De muros pantallas	30 días	$ 32,835,408.00	jue 4/09/25
764		56.05	INP-042 Pases sobre losa de 2" a 4" para tubería sanitarias y aguas lluvias	25 días	$ 14,496,187.00	lun 1/09/26
765		56.06	INP-057 Muro En Bloque De Arcilla Estriado N°4 (10x20x30cm) Con Pega De 1.0 Cm En Mortero. Refuerzo Y Elementos De Confinamiento Según Diseño Estructural. Metro Lineal	30 días	$ 2,242,546.00	lun 3/11/25
766		56.07	INP-060 Cargue con mortero pobre (1:5) sobre muros de excavacion para mitigar efecto de erosion por lluvias.	15 días	$ 6,611,766.00	sáb 25/10/25
767		56.08	INP-062 Pañete Liso En Mortero 1:4 Para Muros Interiores (Incluye Filos Y Dilataciones) con espesores superiores a 1.5 cm y no mayor a 5 cm	45 días	$ 16,950,045.00	mar 23/12/25
768		56.09	INP-208 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PANEL FIBROCEMENTO 6MM PARA CIELO RASO DE ESPACIOS GENERALES. INCLUYE ESTRUCTURA	70 días	$ 297,813,079.00	lun 25/05/26
769		56.10	INP-209 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO EN PANEL YESO RH PARA CIELO RASO DE ZONAS HUMEDAS. INCLUYE ESTRUCTURA	45 días	$ 45,033,546.00	vie 19/06/26
770		56.11	INP-210 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO EN PANEL YESO ACUSTICO (EXSOUND O SIMILAR) PARA CIELO RASO DE AUDITORIO. INCLUYE ESTRUCTURA	20 días	$ 22,584,508.00	vie 19/06/26
771		56.12	INP-211 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLON DE GRESS 30*30 O SIMILAR COLOR ROJO O ARENA	70 días	$ 28,046,649.00	sáb 11/04/26
772		56.13	INP-212 SUMINISTRO DE INSTALACION DE MEDIACAÑA EN VINILO DE 2MM	35 días	$ 96,145,587.00	lun 3/08/26
773		56.14	INP-213 SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTONIVELANTE PARA PISO EN VINILO	50 días	$ 93,803,218.00	mié 15/07/26
774		56.15	INP-214 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA PARA PISO DE AUDITORIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	15 días	$ 37,002,272.00	mié 15/07/26
775		56.16	INP-215 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO INOX. DE 2 1/2" RANURADO EN EXTREMOS	15 días	$ 4,151,256.00	mar 9/12/25
776		56.17	INP-216 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA TRATADAS CON VARIADOR DE VELOCIDAD	30 días	$ 56,714,174.00	mié 2/09/26
777		56.18	INP-217 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA POTABLE CON VARIADOR DE VELOCIDAD	30 días	$ 55,984,978.00	mié 2/09/26
778		56.19	INP-218 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO EYECTOR DUPLEX PARA AGUAS RESIDUALES	30 días	$ 21,333,984.00	mié 2/09/26
779		56.20	INP-220 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ADRIATICO CON FLUXOMETRO SUPERIOR TIPO PLUSH	50 días	$ 73,820,495.00	jue 11/06/26

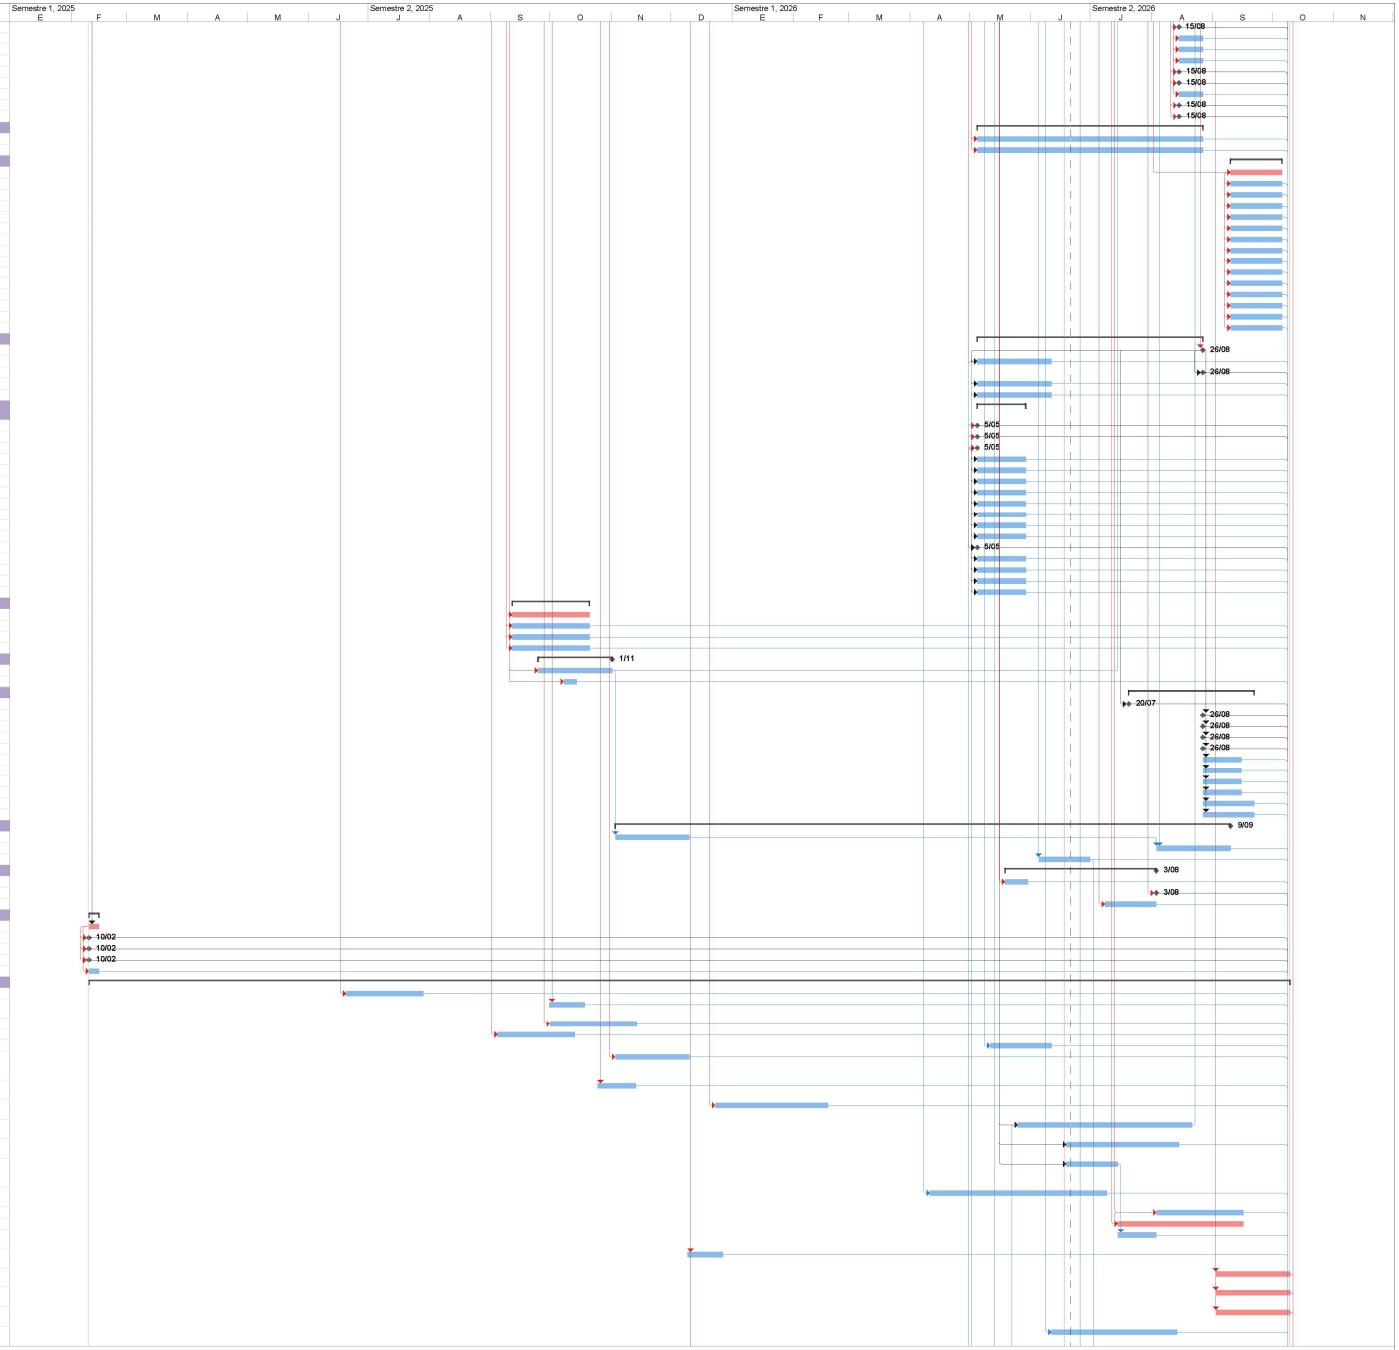

Proyecto: msproj11
Fecha: jue 18/06/26

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso

Id	Modo de tarea	Ítem	Ítem Contractual	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo
780		56.21	INP-221	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA FLUXOMETRO SUPERIOR TIPO PLUSH PARA SANITARIO BALTICO	0 días	$ 0.00	lun 18/05/26
781		56.22	INP-222	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO INOX. DE 1" a 1 1/2" RANURADO EN EXTREMOS	15 días	$ 1,291,236.00	mar 9/12/25
782		56.23	INP-223	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBON DE 1 1/2" a 2 1/2" RANURADO Y/O ROSCADO EN EXTREMOS HASTA 1,0 MT.	15 días	$ 2,506,115.00	mar 9/12/25
783		56.24	INP-224	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBON DE 4" RANURADO Y/O ROSCADO EN EXTREMOS HASTA 1,0 MT	15 días	$ 1,025,730.00	mar 9/12/25
784		56.25	INP-225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA DE SEGURIDAD EN POLIPROPILENO CON MARCO, PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 80 × 80 CM.	0 días	$ 0.00	lun 10/02/25
785		56.26	INP-226	IMPREMEABILIZACION CARA EXTERNA MUROS TANQUE . MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE	1 día	$ 237,914.00	lun 29/12/25
786		56.27	INP-227	FLOTADOR EN BRONCE DE 1-1/2"	5 días	$ 2,113,555.00	mié 1/07/26
787		56.28	INP-228	PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-41	1 día	$ 634,867.00	mar 5/05/26
788		56.29	INP-229	SELLADO DE JUNTAS CON COLA DE RATÓN (INCLUYE CORTE CON PULIDORA)	0 días	$ 0.00	mar 5/05/26
789		56.30	INP-230	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA DE 30 cm X 30 cm	40 días	$ 3,082,661.00	mié 24/06/26
790		56.31	INP-231	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10F+1X10N+10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA EMT DE 3/4" DESDE DE TABLERO GENERAL CRITICO (TGC) - TABLERO AIRE A UNIDAD INTERIORES (TAAU)) (NO INCLUYE TUBERIA)	40 días	$ 2,686,523.00	mié 24/06/26
791		56.32	INP-232	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO EN PANEL FIBROCEMENTO 6MM PARA CIELORRASO DE ESPACIOS GENERALES MENORES A 50CM. INCLUYE ESTRUCTURA	60 días	$ 69,900,719.00	lun 25/05/26
792				**FIN**	**0 días**	**$ 0.00**	**vie 9/10/26**

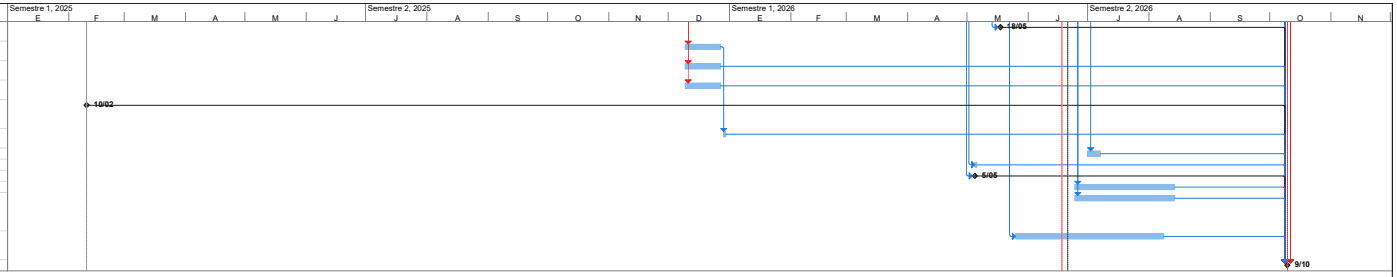

Proyecto: msproj11
Fecha: jue 18/06/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso
