CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 1787-2025

OBJETO:

OBJETO: *"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO".*

CONTRATO DE CONSULTORIA: No. 1995-2024

OBJETO: *"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO".*

INTERVENTOR: *CONSORCIO INGEVIAM*

EJECUTOR: *CARLOS DEL RIO DIAZ*

MARZO DE 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN ***3***
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ***3***
2.1 Localización 3
2.2 Inventario y estado inicial de la vía. 4
2.3 Características técnicas del proyecto. 4
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SEÑALIZACIÓN No. 1787-2025 ..... ***5***
3.1 Información general (Incluye seguimiento a las garantías contractuales). 5
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 6
3.3 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría. 6
3.4 Maquinaria y equipo contrato de suministro: 7
3.5 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de suministro: 7
3.6 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 7
3.7 Estado General del Tiempo. 7
3.8 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de suministro. 7
3.9 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 7
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ***8***
5. OTROS ANEXOS ***8***

1. INTRODUCCIÓN

INVIAS suscribió el contrato No.1787-2025 con *CARLOS DEL RIO DIAZ*, quien se encargará de habilitar y/o brindar transitabilidad en la red vial a cargo de INVIAS a través del sistema de monto agotable, en las vías a cargo de la dirección territorial Quindío, bajo la supervisión de la Administración de Mantenimiento Vial, CONSORCIO INGEVIAM, a través del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1995-2024, con el fin de brindar al usuario de la vía transitabilidad segura.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

Contrato No. 1787-2025

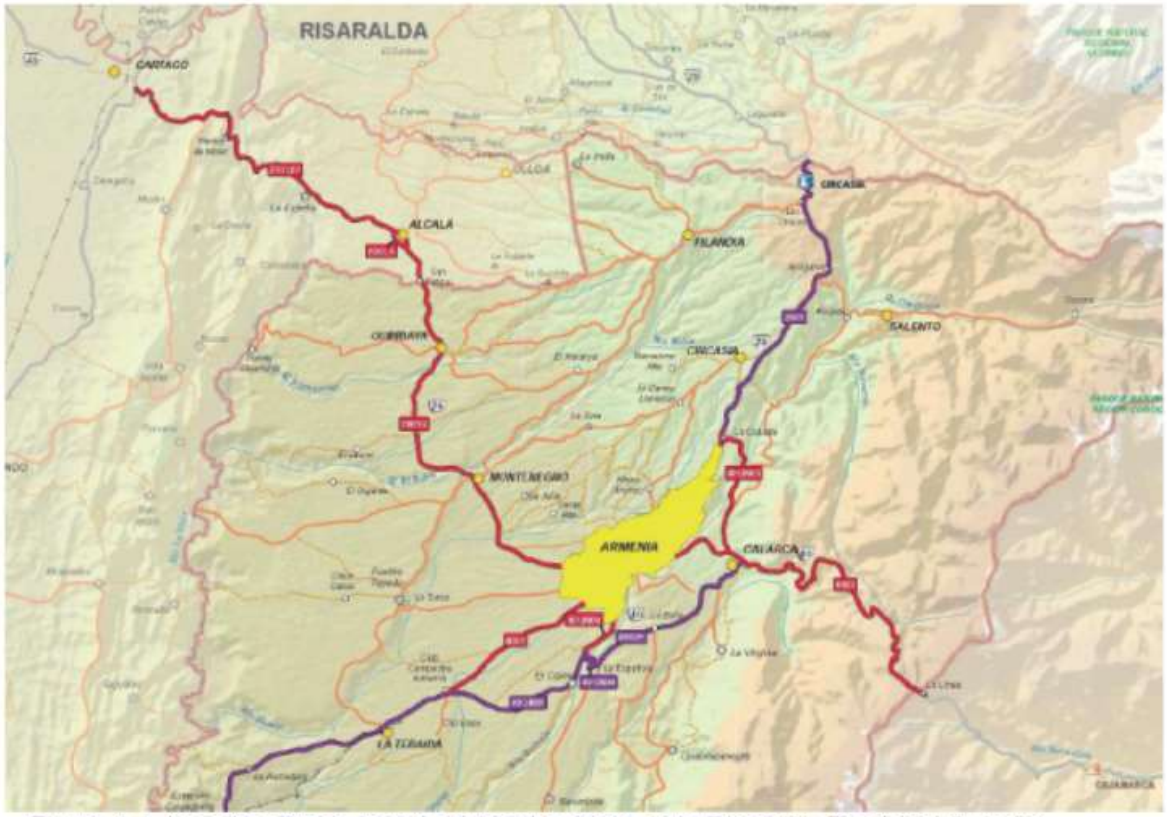


Figura 1.1. Localización de la red nacional a cargo de la Dirección Territorial Quindío

2.2 Inventario y estado inicial de la vía.

La red vial para intervenir, identificada con el contrato No. 1787-2025, tiene una longitud total de 67 km e incluye las siguientes rutas y tramos:

- Cartago – Alcalá, ruta 25VL07
- Armenia – Alcalá, ruta 2901B
- Variante Alcalá y accesos, ruta 29VLA
- Variante Calarcá – La Cabaña, ruta 40QN05
- Sector Club campestre – Armenia, ruta 4002
- La española – Armenia, ruta 40QN04
- Sector Armenia – Calarcá, ruta 4003

La superficie de rodadura de las rutas mencionadas presenta un notable deterioro, excepto el sector denominado Club campestre – Armenia, ruta 4002, con los siguientes daños identificados: Fisuras tipo "piel de cocodrilo", baches y hundimientos, y mal estado de las líneas de eje y de borde.

Además de los daños previamente descritos (fisuras tipo "piel de cocodrilo", baches, hundimientos, y mal estado de las líneas de señalización), se han identificado sitios críticos que requieren atención prioritaria debido a la presencia de fenómenos geotécnicos que afectan la estabilidad de la vía. Entre estos se encuentran: Deslizamientos de tierra y hundimiento de la superficie, especialmente en las rutas de montaña, se han registrado hundimientos adicionales, que no solo afectan la calidad de la capa de rodadura, sino que también podrían estar relacionados con problemas de drenaje. Estos hundimientos presentan un riesgo para los vehículos y requieren una evaluación detallada para determinar su causa y la mejor solución técnica.

2.3 Características técnicas del proyecto.

Las actividades objeto de la presente contratación deberán ejecutarse de conformidad con lo dispuesto en las Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Invias, adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante resolución No. 0001376 del 26 de mayo de 2014, incluyendo la totalidad de las normas y especificaciones en ellas contenidas y/o referidas y en el Manual de Señalización Vial de Colombia - Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial 2024, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante resolución No. 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE MONTO AGOTABLE No. 1787-2025

3.1 Información general (Incluye seguimiento a las garantías contractuales).

CONTRATO DE SUMINTRO No.	***1787-2025***
CONTRATISTA:	*CARLOS DEL RIO DIAZ*
NIT:	*19.341.681*
REPRESENTANTE LEGAL	*CARLOS DEL RIO DIAZ*
IDENTIFICACIÓN	*19.341.681*
TELÉFONO	*3203063995*
OBJETO:	*HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.*
LOCALIZACIÓN:	*Zona de influencia municipio de Cartago y Alcalá Departamento Valle del Cauca, Montenegro, Quimbaya, Calarcá, Armenia y Salento del Departamento del Quindío.*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRON MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE($138.984.345)*
FECHA DE INICIACIÓN:	*14-11-2025*
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	*HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*HASTA EL 31-12-2025*
PRORROGA NO. 1	*HASTA EL 15-02-2026*
PRORROGA NO. 2	*HASTA EL 17-03-2026*
PRORROGA NO. 3	*HASTA EL 16/04/2026*

FECHA DE TERMINACION ACTUAL	*HASTA EL 16-04-2025.*
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, (anexo 6)	*B-100070163 SEGUROS MUNDIAL*
VIGENCIA	*14/11/2025 HASTA17--04-2031*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL(ANEXO 5):	*B-100019341*
VIGENCIA	*14/11/2025 HASTA 17-04-2026*
ASEGURADORA	*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.*
NÚMERO PROCESO SECOP II	*IP-DT-QUI-003-2025*

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el presente periodo se continuaron las actividades de atención del sitio crítico por perdida de banca en el PR 7 +0280 de la ruta 25VL07 con actividades de elaboración de muro en gaviones y la construcción de disipador en concreto reforzado con una ejecución acumulada del contrato del 77.97%

3.3 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría.

- *La administración vial realiza seguimiento a los corredores y de manera inmediata las emergencias que requieran atención del contratista en el marco del contrato*
- *La interventoría ha realizado seguimiento y control del proyecto. Supervisa las actividades que adelanta el contratista, la calidad de los materiales, señalización y seguimiento al componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.*
- *Durante el presente periodo el contratista presento el acta parcial no. 5 por valor de cero (0) pesos la cual fue aprobada por la administración vial, par aun ejecución acumulada de $104.498.309.*
- *Debido a las intensas lluvias presentadas en la región, atípicas para la temporada de inicio de año, se presentó una socavación en la alcantarilla en concreto y su aleta izquierda, que genero un volcamiento de la estructura por lo que se requirió de una intervención diferente a la proyectada con mayores cantidades de obra a ejecutar para cumplir el objetivo de la intervención, la cual fue aprobada por la supervisión del contrato e inicio su ejecución durante el presente periodo.*

3.4 Maquinaria y equipo contrato de suministro:

Ver anexo No. 2.

3.5 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de suministro:

Se entrega anexo No. 3 - Correspondiente al contrato 1787-2025

3.6 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

Ver anexo No. 4

3.7 Estado General del Tiempo.

Ver anexo No. 5

3.8 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de suministro.

Ver anexo No.6

3.9 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Se realiza seguimiento y control del proyecto. Supervisa las actividades que adelante el contratista.
- Se mantuvo comunicación permanente con el supervisor del contrato y el contratista de obra Las inquietudes presentadas por el contratista se han resueltas en el menor tiempo posible, con el fin de no generar atrasos en la ejecución del contrato.
- Se lleven registros de todas las actividades y/o actuaciones realizadas en la ejecución del contrato.
- Las actividades realizadas se han efectuadas de la manera adecuada y garantizando la calidad del proyecto.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el presente periodo se culminaron las actividades de atención del sitio critico por perdida de banca en el PR 7+0280 de la ruta 25VL07, Cartago-Alcalá con excavaciones y elaboración de gaviones.

En atención a la situación actual donde se tiene condiciones climáticas con lluvias constantes en la región y sitios con inestabilidad que generan derrumbes y caída de material sobre las calzadas, se requiere garantizar una respuesta eficiente y oportuna ante situaciones imprevistas, actualmente el contrato 1787-2025 cuenta con recursos y plazo para cumplir con ese objetivo.

Se recomienda continuar con la gestión de contratos de este tipo, para la atención de emergencias y sitios críticos de las vías a cargo de la Dirección territorial Quindío.

5. OTROS ANEXOS

- Ver anexo No. 6 - Relación de la correspondencia generada entre contratista y administración vial incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente de la Administración Vial
CONSORCIO INGEVIAM

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO



ANEXO 2

Maquinaria y equipo contrato de suministro

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO 2026

PROYECTO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.

CONTRATO No. 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DEL RIO DIAZ

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1995 - 2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INGEVIAM

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: DURANTE EL PRESENTE PERIODO NO SE PRESENTARON EMERGENCIAS EN LAS VIAS A CARGO ,NI SE REALIZARON ACTIVIDADES CON MAQUINARIA O EQUIPOS

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CARLOS DEL RIO DIAZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 15850-014502BYC

Firma
Nombre: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
Residente de Interventoría - AMV QUINDIO
Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 3

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de suministro

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	1/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DEL RIO DIAZ

PROYECTO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAR-2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGEVIAM

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
6																																										
7																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

DURANTE EL PRESENTE PERIODO NO SE PRESENTARON EMERGENCIAS EN LAS VIAS A CARGO Y NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE OBRA

El contratista adjunta la certificación de fecha 2/03/2026 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CARLOS DEL RIO DIAZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 15850-014502BYC

Firma
Nombre: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
Director de Interventoría - Residente AMV QUINDIO
Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 4

Informe financiero y presupuestal contrato de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PÁGINA 1 de 1.

FECHA **17/04/2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 1787 DE 2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DEL RIO DIAZ

MES INFORME MENSUAL: 1-31 de marzo del 2026 **PROYECTO:** HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CONSULTORIA-ADMINISTRACION VIAL-1995-2025 **INTERVENTOR:** CONSULTOR-ADMINISTRACION VIAL CONSORCIO INGEVIAM

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	784625	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	10	Nacion	PRINCIPAL	$ 138.984.345,00	$ 138.984.345,00
					TOTAL	$ 138.984.345,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 138.984.345,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha.	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	14 al 30 de Noviembre de 2025		$ -	$ -				**784625 de 11/05/2025**	$ 138.984.345,00	$ 138.984.345,00				
2	PARCIAL	1 al 31 de Diciembre de 2025							**784625 de 11/05/2025**	$ 138.984.345,00	$ 138.984.345,00				
3	PARCIAL	1 al 31 de enero del 2026	$ 67.027.745,00		$ 67.027.745,00				**784625 de 11/05/2025**	$ 71.956.600,00	$ 71.956.600,00				
4	PARCIAL	1 al 28 de febrero del 2026	$ 37.470.564,00		$ 37.470.564,00				**784625 de 11/05/2025**	$ 34.486.036,00	$ 34.486.036,00			|	
5	PARCIAL	1 31 de marzo del 2(	$ -		$ -				**784625 de 11/05/2025**	$ 34.486.036,00	$ 34.486.036,00				
TOTALES			**$ 104.498.309,00**	**$ -**	**$ 104.498.309,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 34.486.036,00**	**$ 34.486.036,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 104.498.309,00	$ -	**$ 104.498.309,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
AJUSTES	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
*			
VALOR TOTAL	$ 104.498.309,00	$ -	**$ 104.498.309,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
CARLOS DEL RIO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula No. 15850-014502 BYC

Firma
ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO
SUPERVISOR
Matrícula No. MAT. No. 5220208-3952 CPN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5

Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DEL RIO DIAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-26 **PROYECTO:** HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: CONSULTORIA 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA - ADMINISTRACIÓN VIAL - CONSORCIO INGEVIAM

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																																
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	20	18	17	22	18	17	18	24	24	24	24	20	18	17	23	24	14	24	24	22	18	17	24	22	20	24	24	16	24	24		625
Lluvias moderadas	4	4	4	2	2	3	5					4	4	4	1		4			2	2	3		2	3			4				57
Lluvias intensas		2	3		4	4	1						2	3			6				4	4			1			4				38
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				672

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: **Ing. CARLOS DE RIO DIAZ**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 15850-014502BYC

Firma
Nombre: **MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES**
Residente de la Administración Vial
Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 6

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de suministro.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) / 4 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DE RIO DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

FECHA DE INICIO: 14/11/2025

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 138.984.345,00

VALOR ACUMULADO: (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CONSULTORIA No. 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA ADMINSITRACIÓN VIAL CONSORCIO INGEVIAM

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 13.898.435,50	31	10	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 27.796.869,00	31	10	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 41.695.303,50	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100070163

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 7/11/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 284.700.000,00	31	10	2025	31	12	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100019341 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 7/11/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2 (Día)	4 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DE RIO DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

FECHA DE INICIO: 14/11/2025

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 138.984.345,00

VALOR ACUMULADO: (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CONSULTORIA No. 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA ADMINSITRACIÓN VIAL CONSORCIO INGEVIAM

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 13.898.435,50	14	11	2025	14	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 27.796.869,00	14	11	2025	14	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 41.695.303,50	14	1	2026	14	1	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100070163

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/12/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 284.700.000,00	14	11	2025	14	1	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100019341 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. Anexo 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/12/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2 (Día)	4 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DE RIO DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

FECHA DE INICIO: 14/11/2025

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 138.984.345,00

VALOR ACUMULADO: (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CONSULTORIA No. 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA ADMINSITRACIÓN VIAL CONSORCIO INGEVIAM

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 13.898.435,50	22	12	2025	15	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 27.796.869,00	22	12	2025	15	2	2029
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 41.695.303,50	15	2	2026	15	3	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100070163

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/01/2026

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 350.181.000,00	14	11	2026	15	2	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100019341 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/01/2026

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2 (Día)	4 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DE RIO DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

FECHA DE INICIO: 14/11/2025

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 138.984.345,00

VALOR ACUMULADO: (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CONSULTORIA No. 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA ADMINSITRACIÓN VIAL CONSORCIO INGEVIAM

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 13.898.435,00	9	2	2026	17	9	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 27.796.869,00	9	2	2026	17	3	2029
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 41.695.304,00	17	3	2026	17	3	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100070163

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/02/2026

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV	$ 350.181.000,00	14	11	2025	17	3	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100019341 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/02/2026

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 4 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DE RIO DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

FECHA DE INICIO: 14/11/2025

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/04/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 138.984.345,00

VALOR ACUMULADO: (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CONSULTORIA No. 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA ADMINSITRACIÓN VIAL CONSORCIO INGEVIAM

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 13.898.435,00	16	3	2026	16	10	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 27.796.869,00	16	3	2026	16	4	2029
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 41.695.304,00	16	4	2026	16	4	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100070163

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 7/04/2026

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 smlmv	$ 350.181.000,00	14	11	2025	16	4	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100019341 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 7/04/2026

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el

Firma

Nombre: MARTHA LUCIAV EGA BENAVIDES
Director de Interventoría - Ingenira residente adminsitración vial CONSORCIO INGEVIAM
Matrícula Profesional No.:19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 7

Relación de correspondencia

MARZO 2026				
FECHA	**REFERENCIA / RADICADO**	**ASUNTO**	**ENVÍA**	**RECIBE**
5/03/2026	CQUI-1329/ 2026E-VUVRAZ-020657	Concepto de Viabilidad de Prorroga No. 3 al contrato No. 1787-2025.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
17/03/2026	CQUI-1347/2026E-VUVRAZ-025457	Entrega Acta de Obra N° 4 del mes de febrero 2026 del Contrato NO. 1787 de 2025 Monto Agotable.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS

CQUI-1329

Calarcá, marzo 5 de 2026

Ingeniero:
LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Director Territorial Quindío, (E).
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Armenia

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1995-2024, QUE TIENE COMO OBJETO: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO".**

Asunto: Concepto de Viabilidad de Prorroga No. 3 al contrato No. 1787-2025.

Cordial Saludo,

Atendiendo el documento presentado por el contratista CARLOS DEL RIO DIAZ el día 2 de marzo del 2026, donde solicita la prórroga del contrato y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que en el boletín No. 060 de CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES publicado el 1 de marzo del 2026 por Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se informa a las entidades en la Zona del Departamento del Quindío, que este se encuentra catalogado en Alerta alta (roja) con probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios del departamento, lo que puede generar distintas emergencias en el corredor vial a cargo.

2. Que el propósito principal del contrato es atender y prevenir las emergencias como derrumbes que se puedan presentar en las vías a cargo de la Dirección Territorial Quindío del Instituto Nacional de Vías.

3. Que las rutas 2901B Armenia - Alcalá, 25VL07 Cartago - Alcalá y 40QN05 Variante Calarcá – La cabaña, tiene amplios sectores con riesgo de inminentes deslizamientos debido a las características geológicas y topográficas de la región, lo que afectarían la transitabilidad de los corredores.

4. Que, debido al riesgo de una inminente pérdida de banca en el sitio crítico ubicado en el PR 7+0280 de la ruta 25VL07, el cual presentaba socavación en su talud inferior, la Dirección Territorial solicitó la intervención de dicho punto mediante la construcción de muros en gaviones y la ejecución de obras menores de drenaje, con el fin de garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios de la vía.

   Que, una vez ejecutadas las actividades requeridas para la estabilización del sitio crítico, se determinó la existencia de recursos remanentes dentro del contrato, así como la necesidad de mantener la disponibilidad operativa, técnica y financiera del contratista.

Que, en consideración a las condiciones climáticas variables que inciden en el corredor vial y al carácter preventivo que debe orientar la gestión del riesgo en infraestructura de transporte, se hace necesario prorrogar el plazo contractual, con el fin de asegurar la atención oportuna de posibles emergencias o eventos sobrevinientes que puedan afectar la estabilidad y transitabilidad de la vía.

En consecuencia, y en aplicación de los principios de planeación y continuidad del servicio, la Administración Vial considera procedente: Otorgar prórroga al contrato por el término de treinta (30) días calendario, hasta el dieciséis (16) de abril de 2026, con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada gestión del corredor vial.

Anexos:

- Oficio emitido por el contratista – Solicitud prórroga No. 2 al contrato 1787-2025.
- MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud Adición, Modificación Y Prorroga Obra
- Estado general del tiempo
- Seguimiento a las garantías.

Sin otro particular, agradeciendo la atención prestada y quedando atentos a la respuesta de la entidad.

Atentamente,

MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
INGENIERA RESIDENTE AMV-QUINDIO
CONSORCIO INGEVIAM

C.C. Archivo

Marzo 2 de 2026

SEÑORES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Territorial Quindío
Ciudad.

Ref. CONTRATO No. 1787 -2025
Asunto: Solicitud Prorroga No. 3

Respetados señores

En mi calidad de contratista y en desarrollo del Contrato de Monto Agotable No. 1787 de 2025, me permito solicitar respetuosamente la prórroga del plazo contractual por el término de treinta (30) días calendario, esto es, hasta el dieciséis (16) de abril de 2026.

La presente solicitud se sustenta en la proyección de recursos remanentes una vez finalizada la intervención del sitio crítico PR 7+0280 de la Ruta 25VL07. En tal escenario, resulta necesario mantener la vigencia contractual a efectos de disponer de la capacidad operativa y financiera requerida para atender eventuales afectaciones que puedan presentarse en el corredor vial, particularmente en el marco de la actual temporada de lluvias.

En consecuencia, la ampliación del plazo permitirá optimizar la ejecución de los recursos disponibles y asegurar la continuidad de las actividades de mantenimiento y prevención asociadas al objeto contractual.

Cordialmente,



CARLOS DEL RIO DIAZ
C.C. 19.341.681 DE BOGOTA

Anexo: Boletín 060 IDEAM

INFORME TÉCNICO DIARIO

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C. 1 de marzo de 2026
Hora de actualización 12:30 HLC

Boletín No.
060

IDEAM

CONTENIDO

Lo más destacado
Precipitación
Temperaturas
Alerta por descensos significativos de las temperaturas mínimas del aire
Condiciones Hidrometeorológicas actuales
Pronóstico de precipitación de las próximas 24 horas
Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales
Alertas Hidrológicas
Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por deslizamientos
Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios
Alertas Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano
Alertas Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional
Alertas Meteomarinas por Ciclón Tropical Mar Caribe Colombiano

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA


PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.


Alertas vigentes hasta 1 de marzo de 2026 - 18:00 HLC.

Lo más destacado

Mapas de precipitación

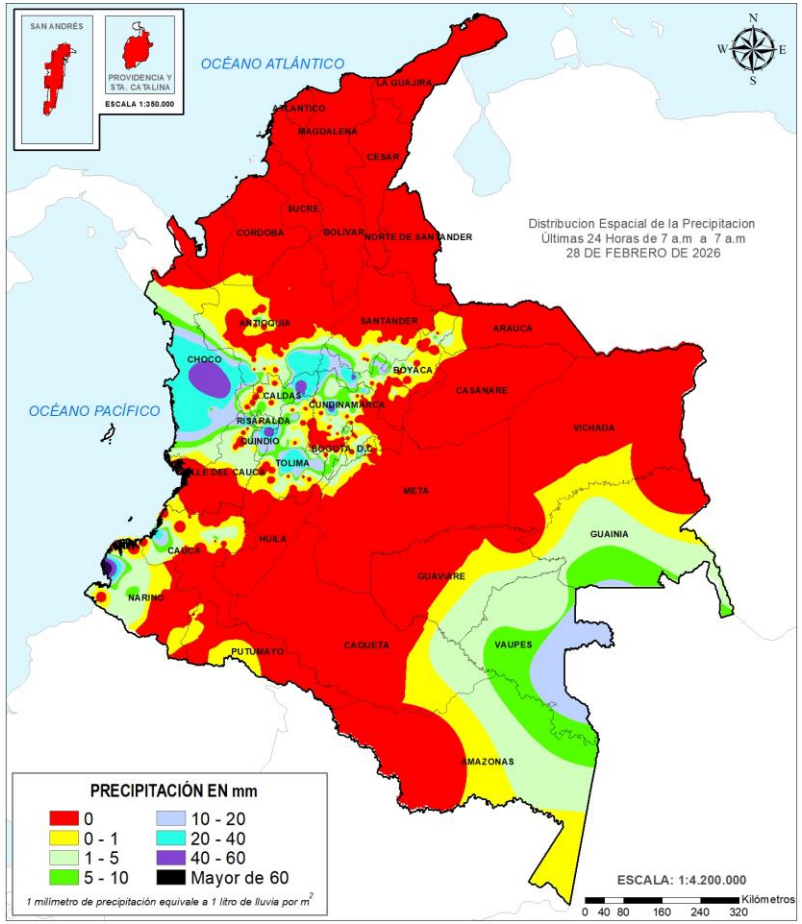

Precipitación diaria desde las 07:00 HLC del sábado 28 hasta las 07:00 HLC del domingo, 1 de marzo de 2026.
Fuente: IDEAM

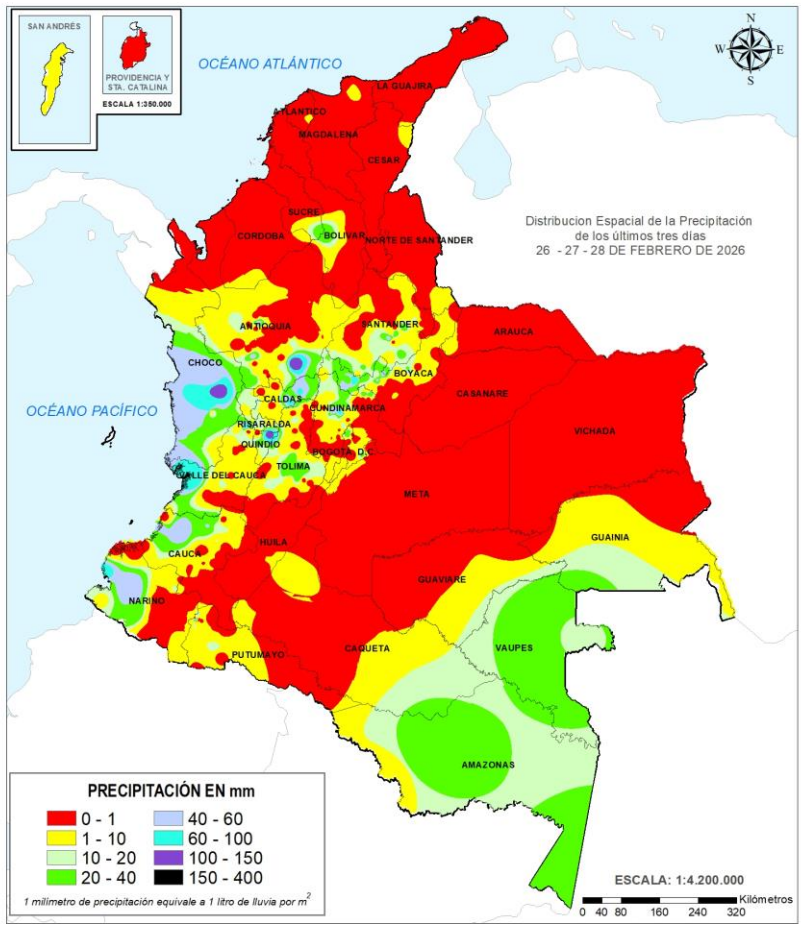

Precipitación últimas 72 horas desde las 07:00 HLC jueves 26 hasta las 07:00 HLC del domingo, 1 de marzo de 2026.
Fuente: IDEAM

- Un milímetro de lluvia (1 mm) equivale a un litro (1 L) de lluvia que ha caído en un metro cuadrado (1 m²).
  La lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua lluvia que se han registrado en un lapso de tiempo.

Lluvias registradas en las últimas 24 horas

Se registró un aumento aproximado del **36,9 %** % en los volúmenes de precipitación con respecto al día anterior. Las lluvias más intensas se han concentrado en varios municipios de los departamentos de Boyacá, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Quindío. El valor más alto de precipitación acumulada en un periodo de 24 horas se reportó en el municipio de **Francisco Pizarro**, en el departamento de **Nariño**, con **67,0** milímetros de precipitación.

Alerta ROJA

- Por alta probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en las cuencas de los ríos que comprenden las zonas de Atrato - Darién, Caribe - Litoral, Sinú, Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge, Cauca, Tapaje - Dagua – Directos
- Por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Nariño, Quindío, Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima y Huila.
- Por alta probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en algunos municipios de los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Meta y Vichada.

Alerta NARANJA


- Por moderada probabilidad de crecientes súbitas o niveles altos en las cuencas de los ríos que comprenden las zonas de Atrato - Darién, Caribe - Litoral, Alto Magdalena, Saldaña, Medio Magdalena, Sogamoso, Cauca, Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge, Nechí, Napo, Mira, Patía, Tapaje - Dagua - Directos, San Juan, Baudó - Directos Pacifico, Pacífico – Directos.
- Por moderada probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
- Por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en algunos municipios de los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Tolima y Vichada.
- Por viento y oleaje en el litoral central y oriental del mar caribe.

Alertas amarillas e información más detallada para cada una de las categorías de alerta, remítase a la temática particular del informe.

Precipitacion
Información Adicional

IDEAM

Estimación Satelital (24 Horas)

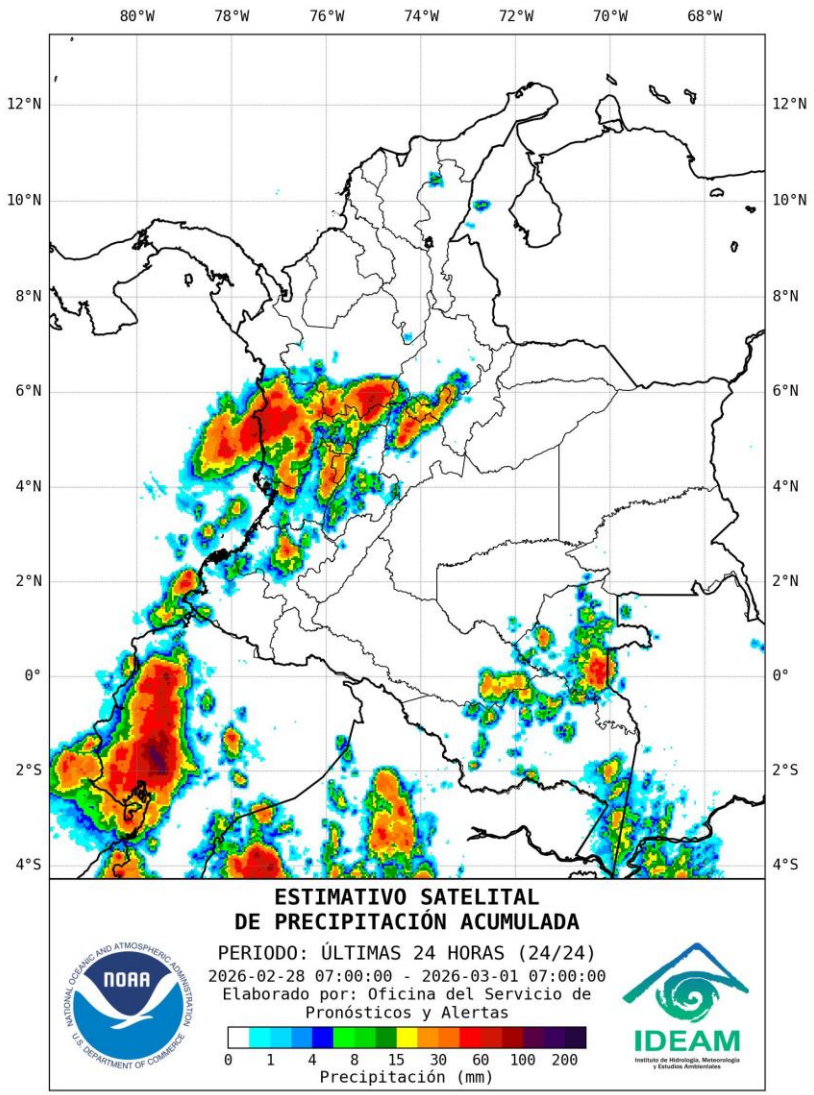

Precipitaciones

A continuación, los municipios donde se registraron precipitaciones iguales o superiores a 40,0 mm en las últimas 24 horas.

Aclaración: aunque los volúmenes de lluvia registrados en un municipio se relacionan con la ubicación de las estaciones de monitoreo del IDEAM, en ocasiones, dichas estaciones pueden estar distantes de los lugares en donde se concentra la mayor población o alejados de los centros municipales.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
BOYACÁ	Pauna (44.6)
CALDAS	Samana (56.0), Victoria (42.8)
CHOCÓ	Apto, Quibdó (41.9), Lloró (56.3)
CUNDINAMARCA	Nocaima (45.7)
NARIÑO	**Francisco Pizarro (67.0)**
QUINDÍO	Salento (45.0)


NO SE REGISTRARON VALORES DE PRECIPITACIONES POR ENCIMA DE LOS MÁXIMOS HISTÓRICOS

El hidroestimador utiliza datos de los satélites ambientales geoestacionarios operacionales (GOES) de NOAA para estimar las tasas de lluvia. Las estimaciones de las precipitaciones de los satélites pueden proporcionar información crítica sobre las precipitaciones en regiones donde los datos de los medidores o radares no están disponibles o no son confiables.

Temperaturas
Información Adicional

IDEAM

Estimativo satelital de la temperatura superficial

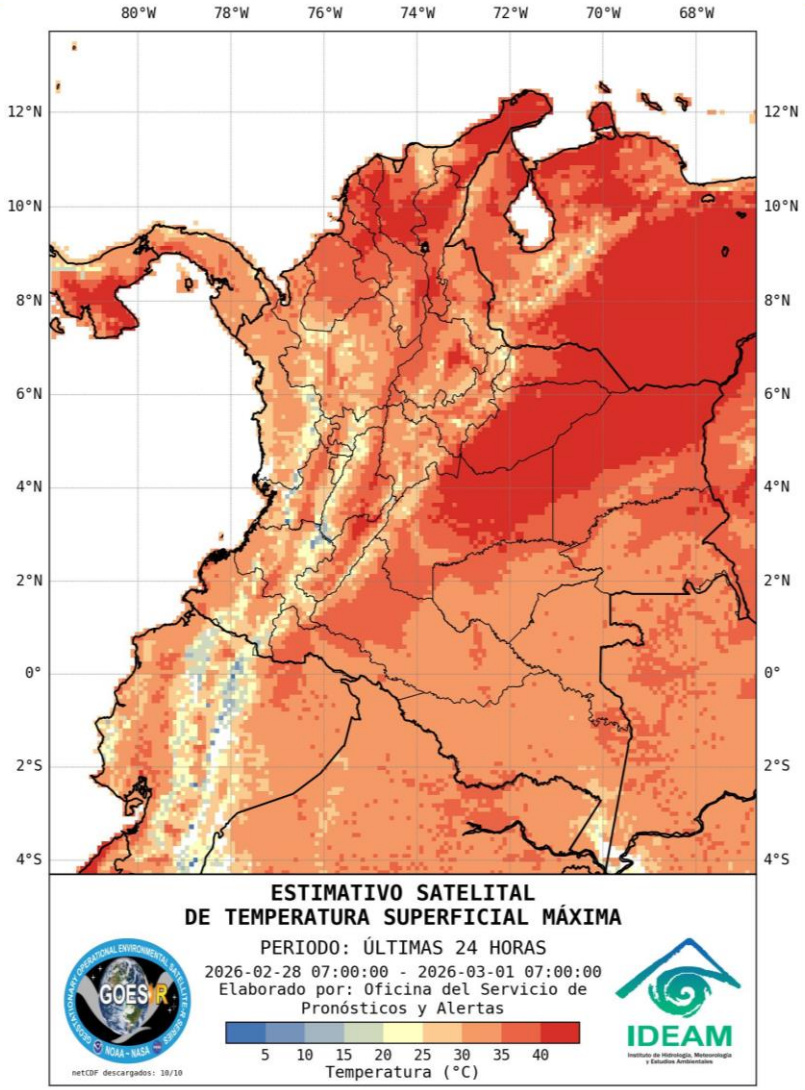

Temperaturas Máximas

A continuación, los municipios donde se registraron temperaturas iguales o superiores a 37,0 ºC en las últimas 24 horas.

Aclaración: aunque los valores registrados en un municipio se relacionan con la ubicación de las estaciones de monitoreo del IDEAM, en ocasiones, dichas estaciones pueden estar distantes de los lugares en donde se concentra la mayor población o alejados de los centros municipales.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
CASANARE	Trinidad (37.2)
CESAR	Valledupar (37.6)
CUNDINAMARCA	Jerusalen (37.6)
HUILA	**Villavieja (37.8)**

NO SE REGISTRARON TEMPERATURAS DEL AIRE POR ENCIMA DE LOS MÁXIMOS HISTÓRICOS.

Temperaturas Mínimas

A continuación se relacionan los municipios donde en las últimas 24 horas se registraron temperaturas menores o iguales a 5.0°C.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
BOYACÁ	Chita (4.8)
CAUCA	**San Sebastián (1.6)**
CUNDINAMARCA	Choachi (3.0)
NARIÑO	Ipiales (Aldana) (4.6), Pasto (4.8)

NO SE REGISTRARON VALORES DE TEMPERATURAS DEL AIRE POR DEBAJO DE LOS MINIMOS HISTÓRICOS

La estimación satelital de la temperatura superficial máxima en 24 horas utiliza datos de los satélites ambientales geoestacionarios operacionales (GOES) de NOAA para estimar al temperatura de la superficie del país, en donde los datos de los medidores o radares no están disponibles o no son confiables.

Condiciones Hidrometeorológicas Actuales


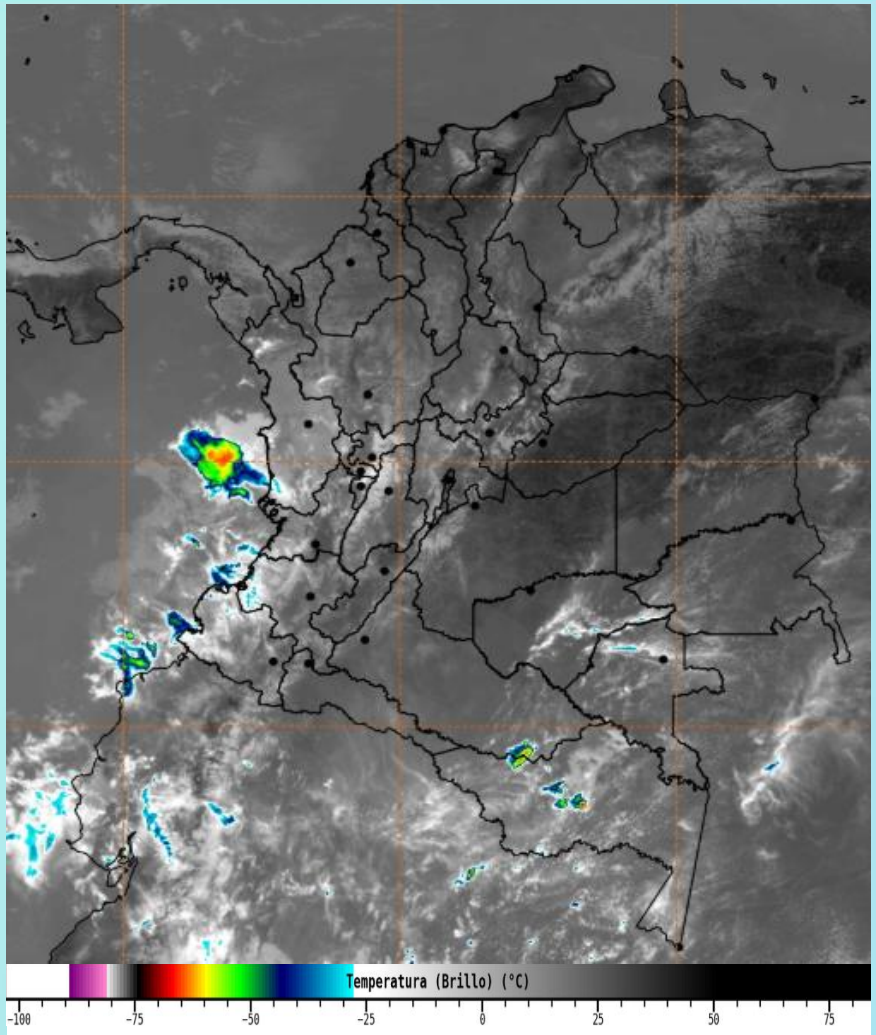


Imagen GOES 19 East Canal Infrarrojo, 1 de marzo de 2026 - Hora 12:00 HLC.
Fuente: https:bart.ideam.gov.co GOES 19

En la mañana dominical ha prevalecido el tiempo seco en la mayor parte del país con cielo entre despejado y parcialmente nublado. Abundante nubosidad con precipitaciones con acumulados bajos en el centro y sur del océano Pacífico colombiano y sectores de Chocó y litoral de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, Vaupés y suroccidente de Amazonas.


En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha observado tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado.

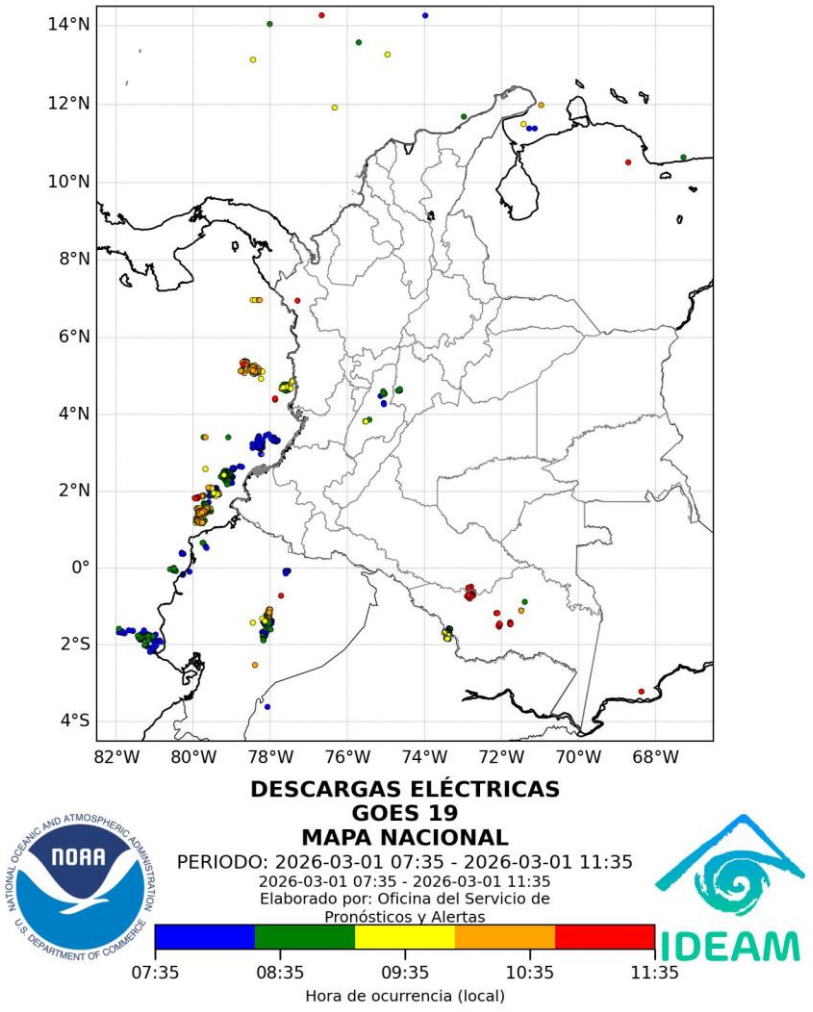

Descargas eléctricas en las últimas 4 horas. Hora 11:35 HLC
Fuente: IDEAM - GOES

- La imagen del canal infrarrojo (10.3 µm) permite identificar nubes en cualquier período temporal a partir de la temperatura de brillo de la nube (ver escala de colores). De esta forma, se puede identificar, clasificar y caracterizar la nubosidad en una zona determinada.
- La imagen de las descargas eléctricas muestra los rayos nube-tierra que se han descargado en una zona en las últimas 4 horas (ver escala de colores)

Pronóstico de precipitación para las próximas veinticuatro (24) horas

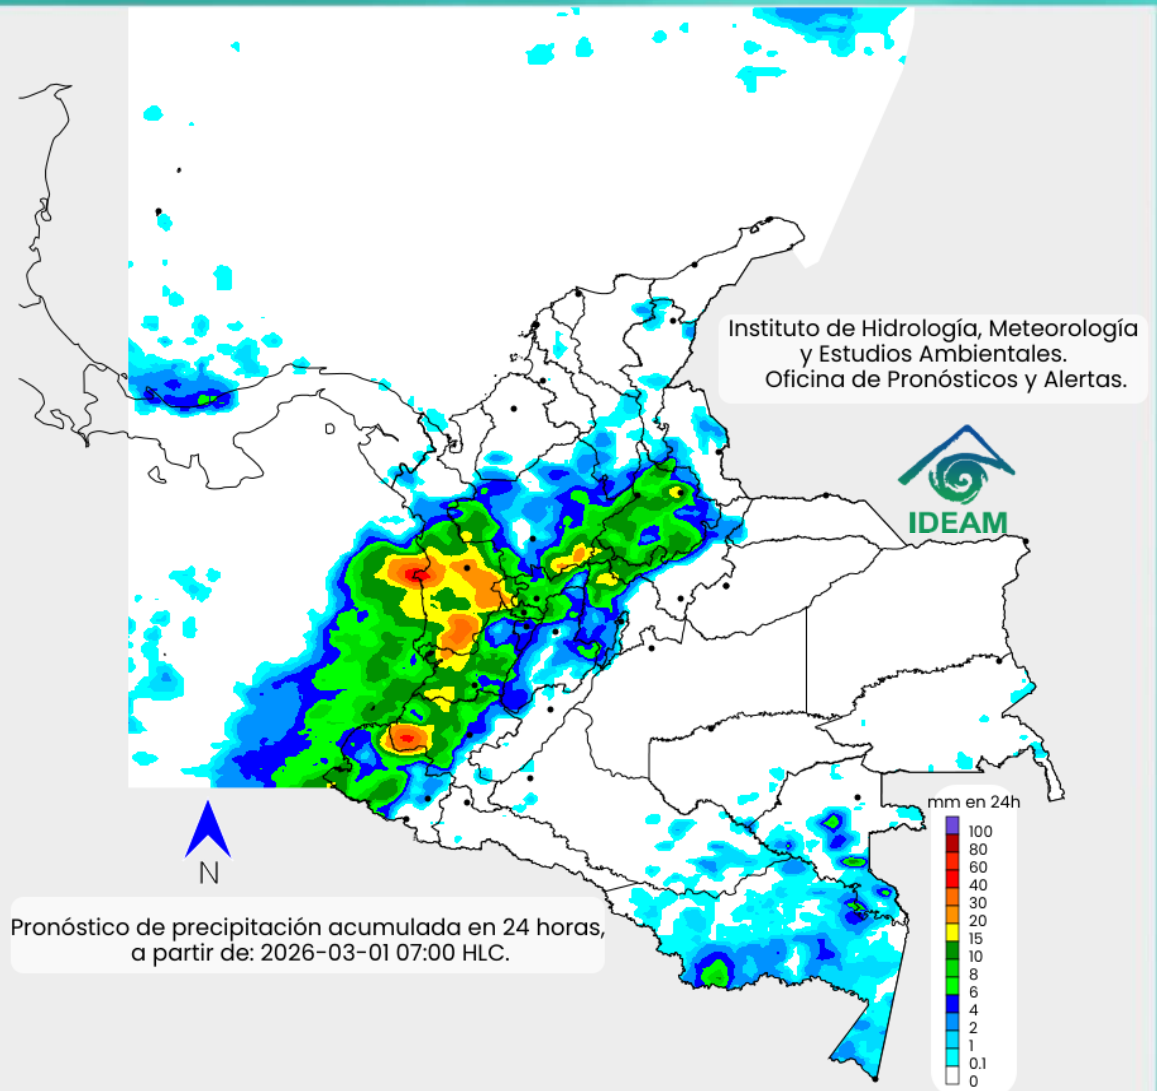

Para la tarde y noche de hoy domingo son previstas condiciones secas en gran parte del territorio nacional con cielo entre despejado y parcialmente nublado, probabilidad de elevadas temperaturas del aire en las regiones Caribe y Orinoquia y a lo largo de los valles interandinos. Posibles lluvias con altos acumulados en áreas del oriente y sur de Santander, norte de Boyacá, centro-noroccidente de Cundinamarca, noroccidente de Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, norte de Cauca, sur de Nariño y suroccidente de Amazonas.

En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica una tarde y noche secas con cielo entre ligera y parcialmente nublado.

- La resolución espacial del mapa de pronóstico es de 6.5 km aproximadamente. Por lo tanto, fenómenos meteorológicos inferiores a esta escala no están considerados en esta predicción.
- La escala de colores está asociada a un rango de precipitación en el intervalo de tiempo indicado, lo que implica que el pronóstico no es determinista (un valor exacto en una zona) sino corresponde a un pronóstico cuantitativo (un rango de valores en una zona).


Estado de los Embalses




ID_Embalse	Nombre
0	Represa Alto Anchicaya
1	Represa de Betania
2	Embalse La Salvajina
3	Embalse de Calima (Lago Calima)
4	Embalse del Río Prado
5	Embalse Chisacá
6	Reoresa de La Regadera
7	Represa del Muña
8	Embalse de Chuza
9	Embalse San Rafael
10	Embalse Del Guavio
11	Embalse La Esmeralda (Chivor)
12	Embalse de Tomine
13	Represa de Tibito
14	Embalse Pantano de Arce
15	Emblase del Sisga
16	EMBALSE DEL NEUSA
17	Embalse el Hato
18	Embalse El Peñol (Guatape)
19	Embalse Punchina
20	Embalse Las Playas
21	Embalse San Lorenzo
22	Embalse Río Grande
23	Embalse de Miraflores
24	Embalse Troneras
25	Embalse Juan Guillermo Penagos - Porce II
26	Embalse Urra

A continuación, se relaciona el volumen útil diario de los principales embalses del país (expresado en porcentaje), de acuerdo con la información reportada por **XM S.A. E.S.P** en la siguiente dirección electrónica: https://www.xm.com.co/soluciones/informe-diario-de-operacion

VOLÚMEN ÚTIL DIARIO EN LOS PRINCIPALES EMBALSES DEL PAÍS

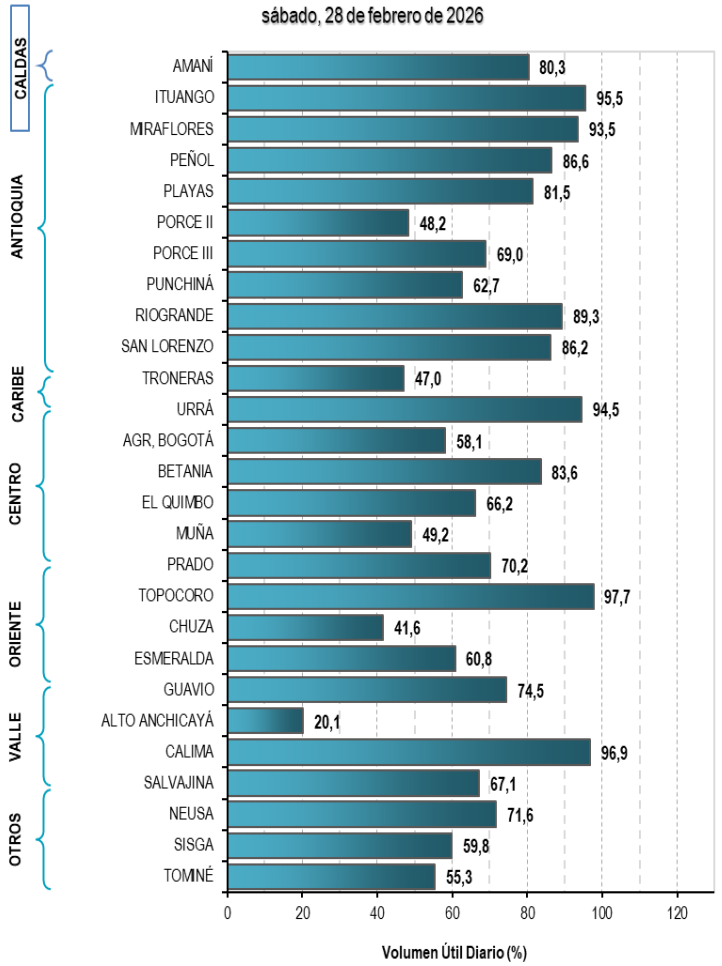

VOLÚMEN ÚTIL DIARIO DE EMBALSES POR REGIONES (%)

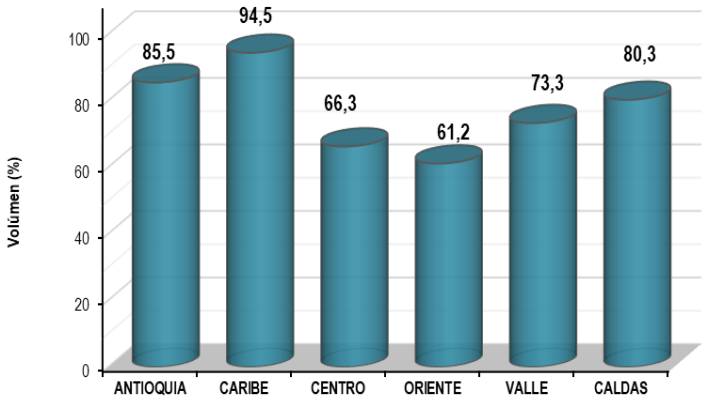

Infografía: IDEAM

Fuente: xm

Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales

IDEAM


Pronóstico zonas volcánicas

ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ			
Mañana: Cielo parcialmente nublado - Lloviznas			
Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
Noche: Cielo nublado - Lloviznas			
Madrugada: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
El SERVICIO GEÓLOGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat: 4.89 Lon: -75.32			
ELEVACIÓN (pies)	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	
		VELOCIDAD (Nudos)	VELOCIDAD (Km/h)
10.000	ESTE	0 - 5	0 - 9
18.000	ESTE-NORESTE	0 - 5	0 - 9
24.000	SURESTE	5 - 10	9 - 18
30.000	OESTE	0 - 5	0 - 9

ÁREA DEL VOLCÁN NEVADO DEL HUILA			
Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
Noche: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Madrugada: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat:2.92 Lon:-76.05			
ELEVACIÓN (pies)	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	
		VELOCIDAD (Nudos)	VELOCIDAD (Km/h)
10.000	SURESTE	0 - 5	0 - 9
18.000	ESTE-SURESTE	5 - 10	9 - 18
24.000	SURESTE	10 - 15	18 - 27
30.000	OESTE	5 - 10	9 - 18

ÁREA DEL VOLCÁN CERRO MACHÍN			
Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
Noche: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Madrugada: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat:4.80 Lon:-75.62			
ELEVACIÓN (pies)	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	
		VELOCIDAD (Nudos)	VELOCIDAD (Km/h)
10.000	SUR-SURESTE	0 - 5	0 - 9
18.000	ESTE-NORESTE	0 - 5	0 - 9
24.000	SURESTE	5 - 10	9 - 18
30.000	OESTE	5 - 10	9 - 18

Mapa de zonas volcánicas

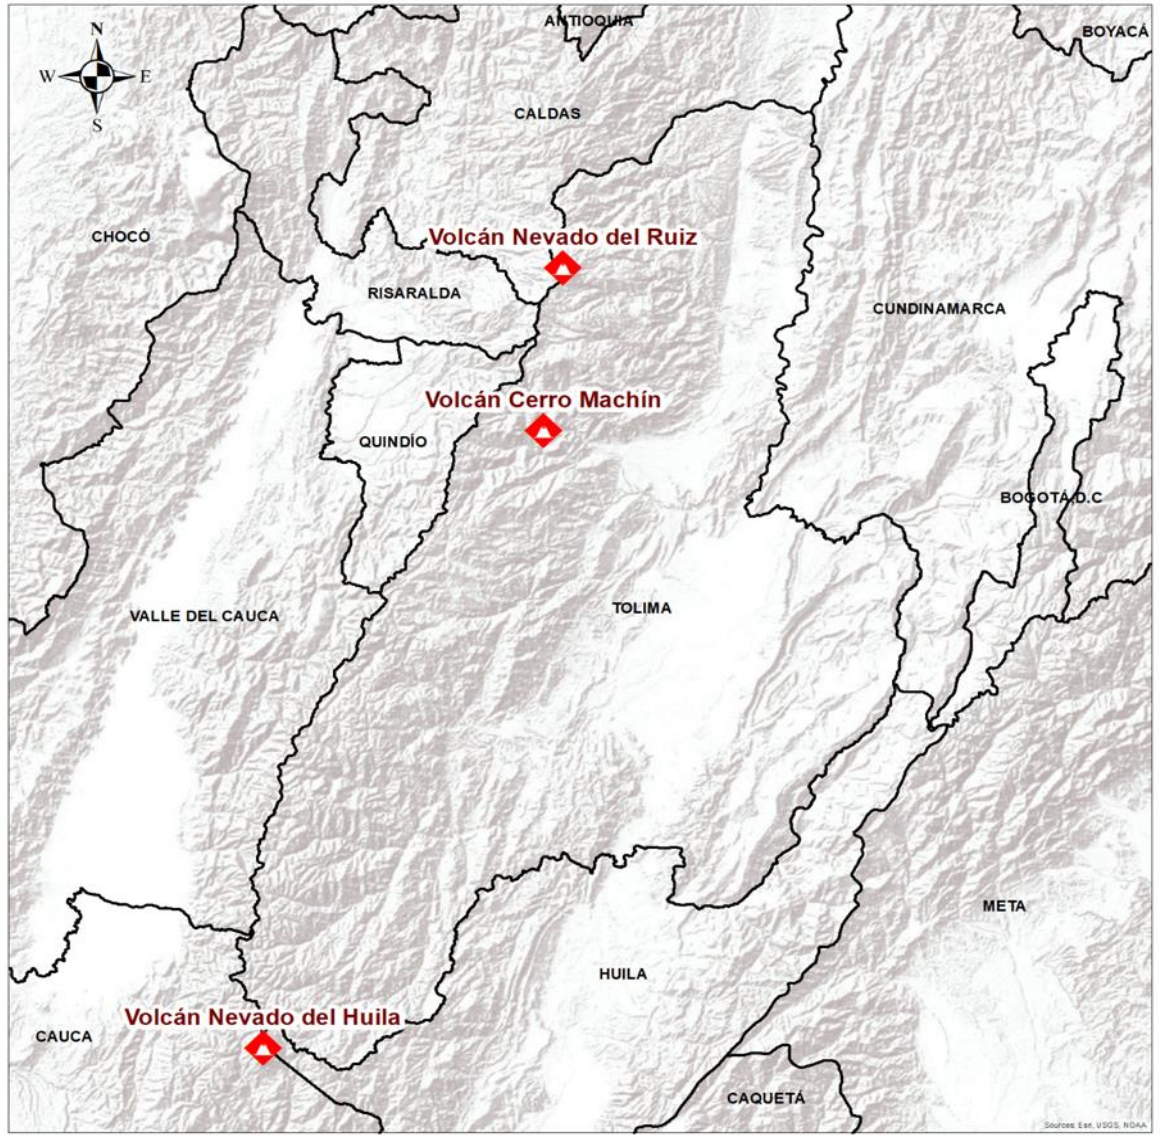

Pronóstico condiciones meteorológicas adicionales

Pronóstico zonas volcánicas

ÁREA DEL VOLCÁN GALERAS			
Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Tarde: Cielo mayormente nublado - Lluvias			
Noche: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Madrugada: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat: 1.55 Lon: -77.37			
ELEVACIÓN (pies)	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	
		VELOCIDAD (Nudos)	VELOCIDAD (Km/h)
10.000	SURESTE	0 - 5	0 - 9
18.000	ESTE-SURESTE	5 - 10	9 - 18
24.000	SURESTE	5 - 10	9 - 18
30.000	OESTE-NOROESTE	5 - 10	9 - 18


ÁREA DEL COMPLEJO VOLCÁNICO CHILES-CERRO NEGRO DE MAYASQUER			
Mañana: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Tarde: Cielo mayormente nublado - Lloviznas			
Noche: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
Madrugada: Cielo parcialmente nublado - Tiempo seco			
El SERVICIO GEÓLOGICO COLOMBIANO reporta en nivel AMARILLO (III): CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA. Lat: 0.81 -Lon:77.93 Lat: 0.76 Lon:-77.95			
ELEVACIÓN (pies)	DIRECCIÓN	VELOCIDAD	
		VELOCIDAD (Nudos)	VELOCIDAD (Km/h)
10.000	ESTE-SURESTE	0 - 5	0 - 9
18.000	ESTE-SURESTE	5 - 10	9 - 18
24.000	SURESTE	10 - 15	18 - 27
30.000	OESTE-NOROESTE	5 - 10	9 - 18

Mapa de zonas volcánicas



Alertas Hidrológicas

Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

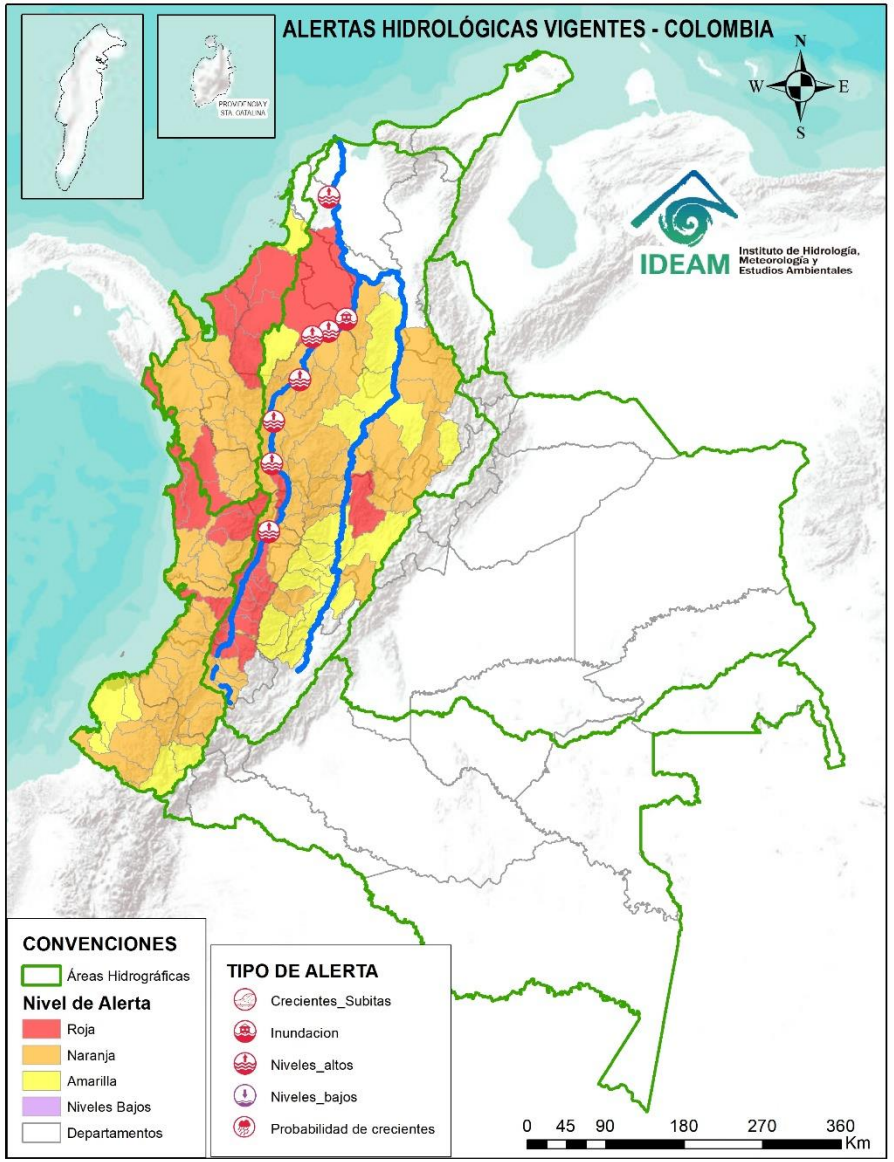



Caño Cristales el río de los cinco colores, paraíso tropical! (Sierra de La Macarena – Meta, Colombia). – Autor: Mcleods, 19 de Febrero de 1918
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Flashpacker_Connect_-_Cano_Cristales_.webp

FEWS COLOMBIA
Sistema de Pronósticos Hidrológicos y Alertas Tempranas

Consulte aquí el estado de los niveles en los ríos del país:


http://fews.ideam.gov.co/

Nota 1: Las alertas hidrológicas pueden ser corregidas y/o actualizadas en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
Nota 2: Es probable que los eventos hidrológicos reportados en las alertas emitidas no se estén presentando sobre los ríos principales sino sobre sus afluentes.
Nota 3: El IDEAM le sugiere a la población ribereña estar muy atentos al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita para la implementación de medidas de contingencia ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
Nota 4: Dentro de las alertas emitidas no se contemplan aquellas asociadas a desabastecimientos. En caso de requerir información asociada a estos reportes consultar en contactenos@gestiondelriesgo.gov.co

LLUVIAS
NIVELES BAJOS
NIVELES ALTOS
CRECIENTE SÚBITA
TRANSITO DE CRECIENTES
CRECIENTE POR DESEMBALSE
INUNDACIONES

Alertas Hidrológicas


IDEAM

CONVENCIONES		
	Lluvias	Lluvias antecedentes intensas o continuas y/o pronóstico de las mismas, las cuales pueden generar crecientes súbitas en los ríos principales y sus afluentes.
	Niveles bajos	Nivel de referencia del río cuyos valores iguales o inferiores pueden generar restricciones para navegabilidad, captación de agua para acueductos, actividades de pesca entre otros sectores que pudieran verse afectados por la disminución de los caudales.
	Niveles altos	Nivel de referencia del río cuyos valores iguales o superiores pueden generar afectaciones en las zonas ribereñas.
	Creciente súbita	Fenómeno natural que se presenta en los ríos de montaña como consecuencia de la ocurrencia de lluvias intensas o torrenciales en zonas de alta pendiente del cauce principal y sus afluentes.
	Tránsito de crecientes	Es el desplazamiento de una onda de creciente de aguas arriba hacia aguas abajo de la corriente.
	Creciente por desembalse	Proceso de tránsito del flujo de agua por descarga controlada desde un embalse.
	Inundación	Aumento en los niveles y/o caudales de los ríos que superan la capacidad máxima de transporte o modificación de la sección transversal que la reduce, ocasionando el desbordamiento e inundación en zonas aledañas al cauce principal.



Resumen de Alertas Hidrológicas

Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

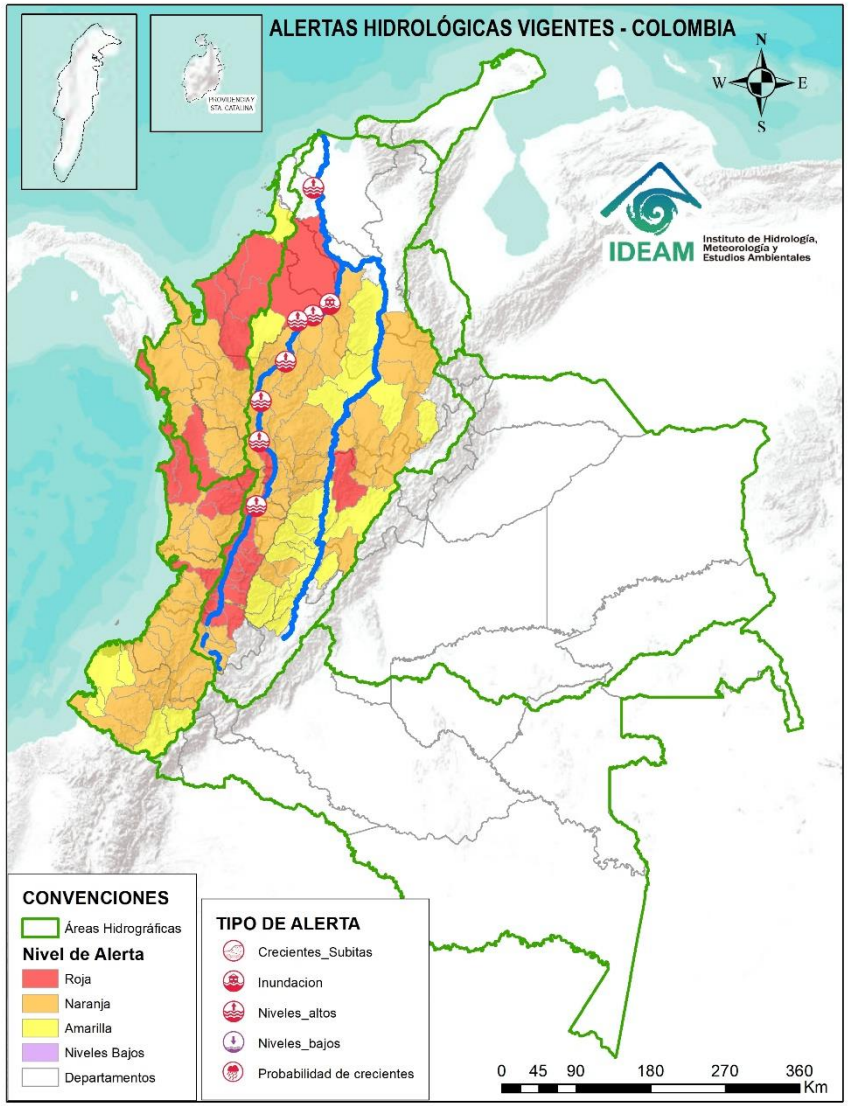

ALERTAS POR PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS Y/O INUNDACIONES

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Magdalena Cauca	20
Caribe	8
Pacífico	6
TOTAL	34

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Magdalena Cauca	36
Pacífico	21
Caribe	16
TOTAL	73

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Magdalena Cauca	22
Pacífico	6
Caribe	1
TOTAL	29

TOTAL ALERTAS HIDROLÓGICAS	136

ALERTAS PUNTUALES POR INUNDACIONES Y/O CRECIENTE SÚBITAS

Área Hidrográfica	# de Subzonas
Magdalena Cauca	8
TOTAL	8

ALERTAS PUNTUALES POR NIVELES BAJOS

Área Hidrográfica	# de Subzonas
TOTAL	0


Nota 1: Las alertas hidrológicas pueden ser corregidas y/o actualizadas en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM.
Nota 2: Es probable que los eventos hidrológicos reportados en las alertas emitidas no se estén presentando sobre los ríos principales sino sobre sus afluentes.
Nota 3: El IDEAM le sugiere a la población ribereña estar muy atentos al comportamiento de los niveles de los ríos y atender las recomendaciones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emita para la implementación de medidas de contingencia ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
Nota 4: Dentro de las alertas emitidas no se contemplan aquellas asociadas a desabastecimientos. En caso de requerir información asociada a estos reportes consultar en contactenos@gestiondelriesgo.gov.co

FEWS COLOMBIA
Sistema de Pronósticos Hidrológicos y Alertas Tempranas

Consulte aquí el estado de los niveles en los ríos del país:
https://fews.ideam.gov.co/visorfews/nacional/estacion

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

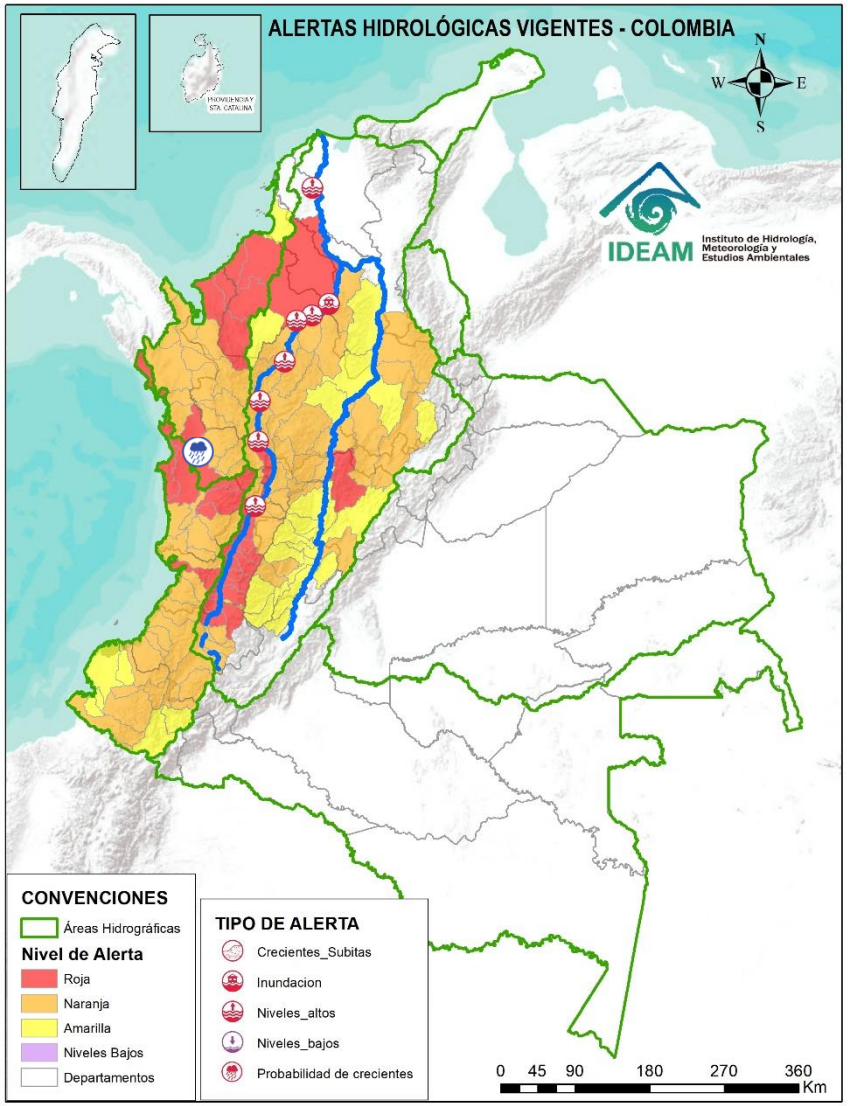

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:
Caribe	• Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Quito. Especial atención en los municipios de Cantón de San Pablo, Unión Panamericana, Cértegui, Río Quito y Atrato (Chocó). • Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH Directos al Atrato entre los ríos Quito y Bojayá (mi), espacialmente los ríos Beté y Tanguí, en la zona rural del municipio Medio Atrato. Se recomienda especial atención en el río Atrato a la altura de Vigía de Fuerte (Antioquia).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

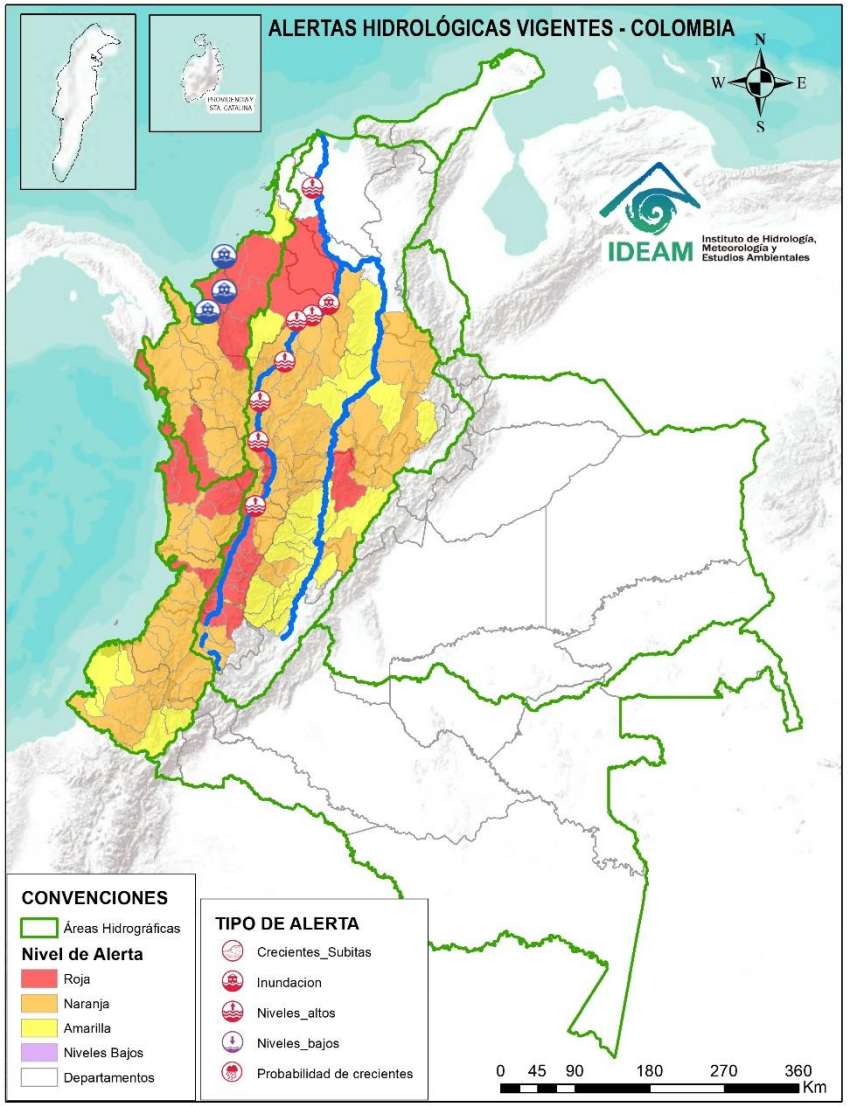

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:
Caribe	• Crecientes súbitas en el río Mulatos y sus afluentes, como los ríos Currulao, Guadalito y Turbo, así como en otros ríos que desembocan directamente en el Caribe. Se recomienda especial atención en los municipios Necoclí y Turbo, así como sus centros poblados (Antioquia). **Notas**: **1)** Se reportan desbordamientos de ríos y quebradas, los cuales han generado inundaciones en diversas veredas, entre ellas Palestina, Villanueva, Bocas de Iguana, Sucio Laureles, La Unión, La Salada y La Pampa del municipio de Necoclí, Antioquia (31/01/2026). **2)** Se reportaron inundaciones por creciente súbita del río Damaquiel en el corregimiento de Damaquiel del municipio de San Juan de Urabá, Antioquia (01/02/2026). • Crecientes súbitas en el río San Juan y sus afluentes, especialmente el río Damaquiel y las quebradas El Guadal y el Paso. Especial atención en los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y San Juan de Urabá (Antioquia). **Notas**: **1)** Se reporta afectaciones por inundaciones en el Corregimiento de Guadual del municipio de Arboletes, Antioquia (31/01/2026). **2)** Se reporta inundaciones por lluvias y desbordamiento de la quebrada Naranjita, en el corregimiento Naranjita del municipio de Arboletes, Antioquia. (31/01/2026). **3)** Se reportan inundaciones en algunas veredas del municipios de San Juan de Urabá (31/01/2026). **4)** Se reporta inundaciones en algunas verdeas del municipio de San Pedro de Urabá (31/01/2026). **5)** Se reportó inundaciones por desbordamiento de la quebrada El Caimán en las veredas Nuevo Horizonte y Florida en el corregimiento El Tomate en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia (31/01/2026). **6)** Se reportó desbordamiento de los ríos San Juan y Damaquiel en el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia (30/01/2026). • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Canalete y sus afluentes, entre otros arroyos directos al Caribe. Especial atención en el municipio de Arboletes (Antioquia) y Canalete (Córdoba). **Notas**: **1)** Se presentaron inundaciones en zona urbana y rural del municipio de Canalete, Córdoba (01/02/2026). **2)** Se presentaron inundaciones en zona rural del municipio de Puerto Escondido, Córdoba (01/02/2026). **3)** Se reporta creciente súbita del rio Canalete a la altura del corregimiento de la Caña de Canalete, en puerto Escondido, Córdoba (18/02/2026).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

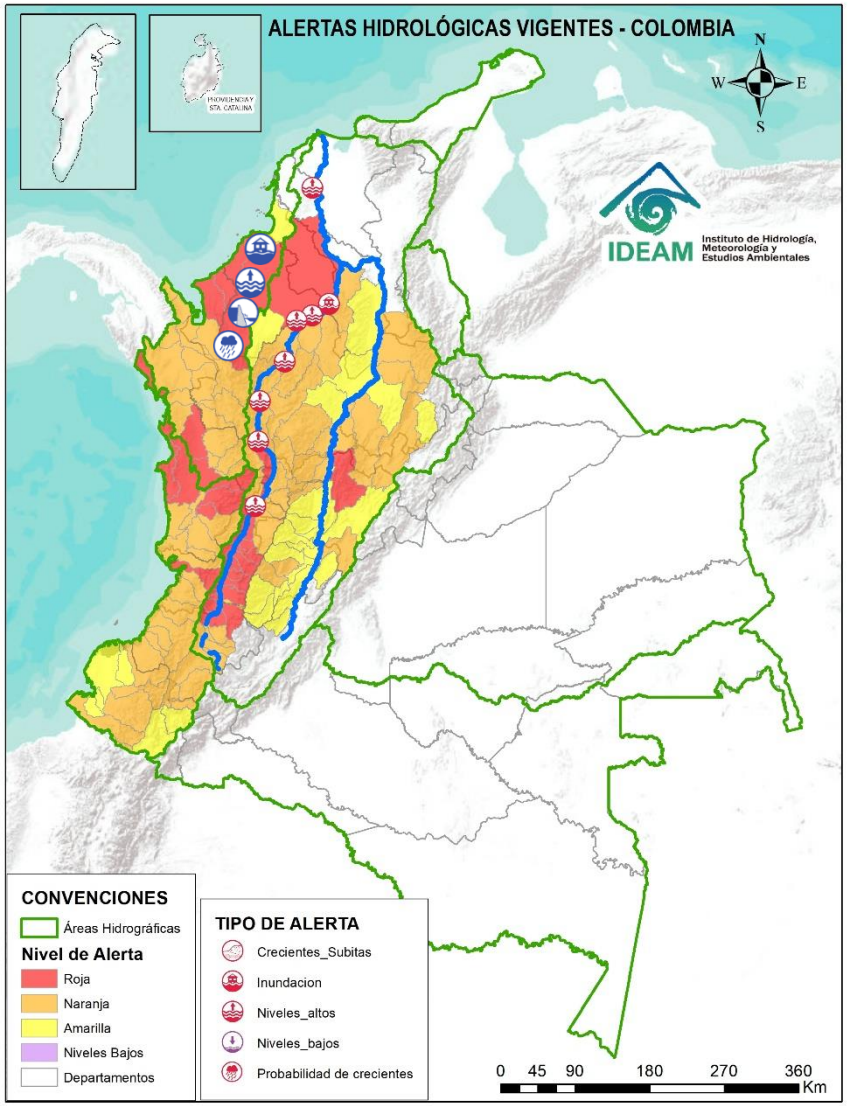

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:
Caribe	• Probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Sinú y sus afluentes en la parte alta. **Nota:** se reportó inundación en los corregimientos de Batata, Callejas, Villa Providencia y Volador, Puerto Rico, Ceibal, Desafío, Ley, Lagos Nueva Platanera en el municipio de Tierralta, Córdoba (02/02/2026). • Niveles altos en la parte media del río Sinú y probabilidad de crecientes súbitas en sus afluentes, en este sector (aguas abajo del Embalse de Urrá I). Se recomienda especial atención en los centros poblados de Tierralta y Valencia (Córdoba). **Notas**: **1)** Desbordamiento de los ríos Nuevo y Manzanares, generando afectaciones en el casco urbano y zona rural del municipio de Valencia y zona rural del municipio de Montería, Córdoba (01/02/2026). **2)** Comunidades aguas abajo del embalse Urra, deben estar atentos a incrementos súbitos por reboses que se están realizando en el embalse de Urra debido a que esta alcanzando su capacidad máxima (01/02/2026). **3)** Inundación en Tierralta por desbordamiento de los ríos Tay,Tuis Tius entre otros con afectaciones a viviendas, muebles y enseres. (02/02/2026). • Niveles altos en la parte baja del río Sinú y probabilidad de crecientes súbitas en sus afluentes en la cuenca baja. Se recomienda especial atención en los municipios de Cereté, Lorica, Montería, San Anteno, San Bernardo del Viento y San Pelayo (Córdoba). **Notas 1)**: Inundaciones en las vereda (01/02/2026). **2)** Inundaciones por lluvias en la zona rural y urbana en el corregimiento de Tinajones, Castillo, Sicaria Limón, Jose Manuel de Altamira, Trementino, Caño Grande Junin, Paso Nuevo, Playas del Viento, Camino Real con sus respectivas veredas del municipio de San Bernardo del Viendo, Córdoba (01/02/2026). **3)** Inundaciones por lluvias en zona urbana y rural en los municipios de Cereté, Córdoba. **4)** Inundaciones por fuertes lluvias que desbordan quebradas en zona rural y sectores de La Dorada y Pueblo Flecha del municipio de San José de Ure, Córdoba. (01/02/2026). **5)** Inundaciones por lluvias en zona rural y urbana del municipio de Los Córdobas, Córdoba (31/01/2026). **6)** Inundaciones por lluvias en la zona rural de San Antero, Córdoba (01/02/2026). **7)** Inundaciones por la creciente del río Sinú en Montería, Córdoba (02/02/2026). **8)** Inundaciones en la cabecera municipal y área rural del municipio de San Carlos (04/02/2026). **9)** desbordamiento del río Sinú con inundaciones en el Sector de El Tigre de la ciudad de Montería (19/02/2026).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

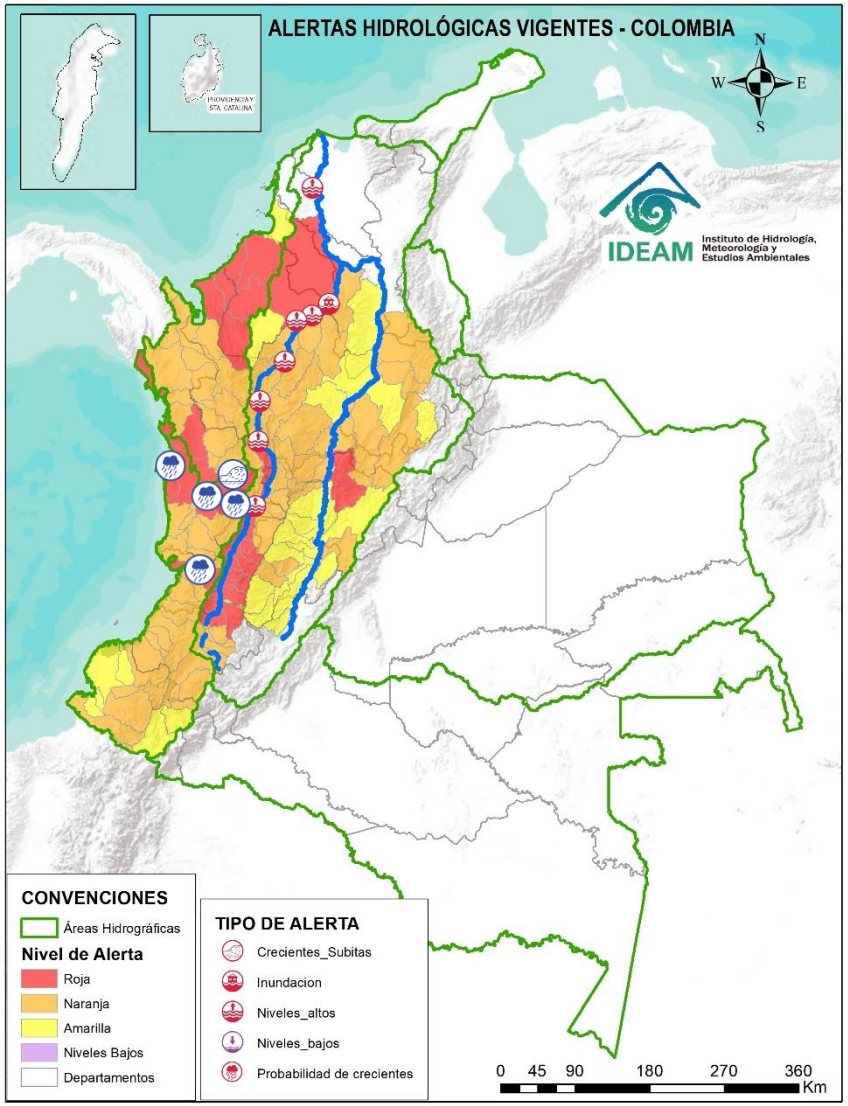

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:
Pacífico	• Probabilidad de incrementos súbitos en el nivel de los ríos Valle, Jella, Chocolatal, Jurado, Piliza, Pavasa, Purricha, Catripe, Abaquia, y sus afluentes, entre otros directos al Océano Pacífico en el departamento de Chocó, se recomienda especial atención en los municipios de Bahía Solano y Juradó. • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Baudó y sus afluentes, especialmente los ríos Ancosó, Berreberre, Catrú, Cedro, Cuguchó, Dubaza, Misará, Pavasa, Pepé, Purricha, Siguirisua y Torreidó. Se recomienda especial atención en los corregimientos de Almendro, Bellavista, Chachajo, Cohecho, Divisa, La Pureza, Miacorá, Nauca, Puerto Elacio, Santa María y Santa Rita, en los municipios de Alto Baudó, Bajo Baudó y Medio Baudó. • Crecientes súbitas en el río San Juan Alto y sus afluentes, especialmente en los ríos Pureto y Muerto. Se recomienda especial atención en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico (Risaralda), y Tadó y Istmina (Chocó). • Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Iró, Tamaná, Condoto, entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios San José del Palmar, Rio Iró, Condoto, Novita y Medio San Juan (Chocó). • Probabilidad de incrementos en los niveles de las cuencas del río Cajón entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios Nóvita y Medio San Juan. • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Dagua y sus afluentes, especialmente en el río Bitaco a la altura del municipio de La Cumbre (Valle del Cauca). Se recomienda especial atención en los municipios de Dagua, La Cumbre y Buenaventura (Valle del Cauca). Nota: Se reportaron inundaciones en la vereda Los Hispanos, del municipio de Vijes, Valle del Cauca (16/02/2026).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

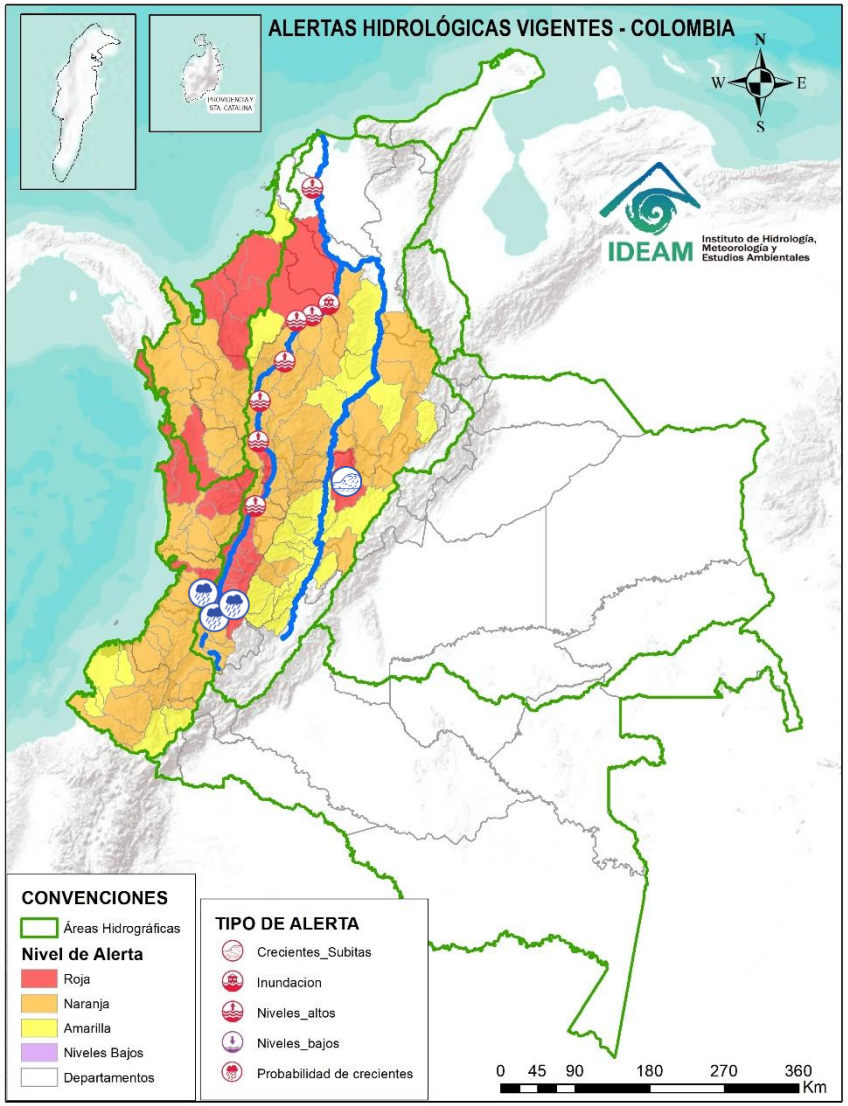

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:
Magdalena – Cauca	• Crecientes súbitas del río Negro y sus aportantes, se recomienda especial atención en los ríos Bunque, Contador, Guaguaqui, Las Cañas, Moras, Negro, Sasaima, Tobia, Villeta, y las quebradas Agua Clara, Amarilla, Furatena, Honduras, La Chorrera, La Negra, La Papaya, Las Margaritas, Reyes y Retama. Especial atención en los municipios de Caparrapí, Guaduas, La Peña, La Vega, Nimaima, Pacho, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Tobia, Útica, Villeta, Villagómez y Yacopí (Cundinamarca). • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Quinamayó, Quilichao y sus aportantes, la quebrada La Antonia y el río Chiquito. Especial atención en los municipios de Caloto y Santander de Quilichao (Cauca). **Nota:** Se reportan inundaciones en el casco urbano del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), por desbordamientos de quebradas. (16/02/2026) • Probabilidad de creciente súbita en el río Timba y sus afluentes, especial atención entre los municipios de El Cedral y Buenos Aires (Cauca). • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Palo y sus aportantes especialmente las quebradas Caparroza y Gargantilla, y los ríos Paila, Guengüe, Jagual y Negro. Especial atención en los municipios de Silvia, Padilla, Miranda, Toribio, Caloto, Padilla, Puerto Tejada y Corinto (Cauca). • Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Lilí, Meléndez y Canaveralejo, afluentes al Alto Cauca en el departamento de Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en la ciudad de Cali. • Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Claro, Jamundí, Pance y sus afluentes. Se recomienda especial atención al municipio de Jamundí, Valle del Cauca. **Notas: 1)** Se reportó desbordamiento del río Jamundí a la altura del sector Puente de Las Brujas del municipio de Jamundí, Valle del Cauca (02/02/2026). **2)** Se reporta desbordamiento del Río Cauca, en la zona agrícola del corregimiento de Villa Paz, Jamundí (24/02/2026). • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cali y sus afluentes. Se recomienda especial atención en la ciudad de Cali. • Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Bolo, Fraile, Guachal y Párraga y sus afluentes, aportantes al río Cauca en el departamento del Valle del Cauca. Especial atención en los municipios de Candelaria, Florida, Palmira y Pradera. **Nota:** Inundación por lluvias en el municipio de Florida, Valle del Cauca (23/02/2026).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

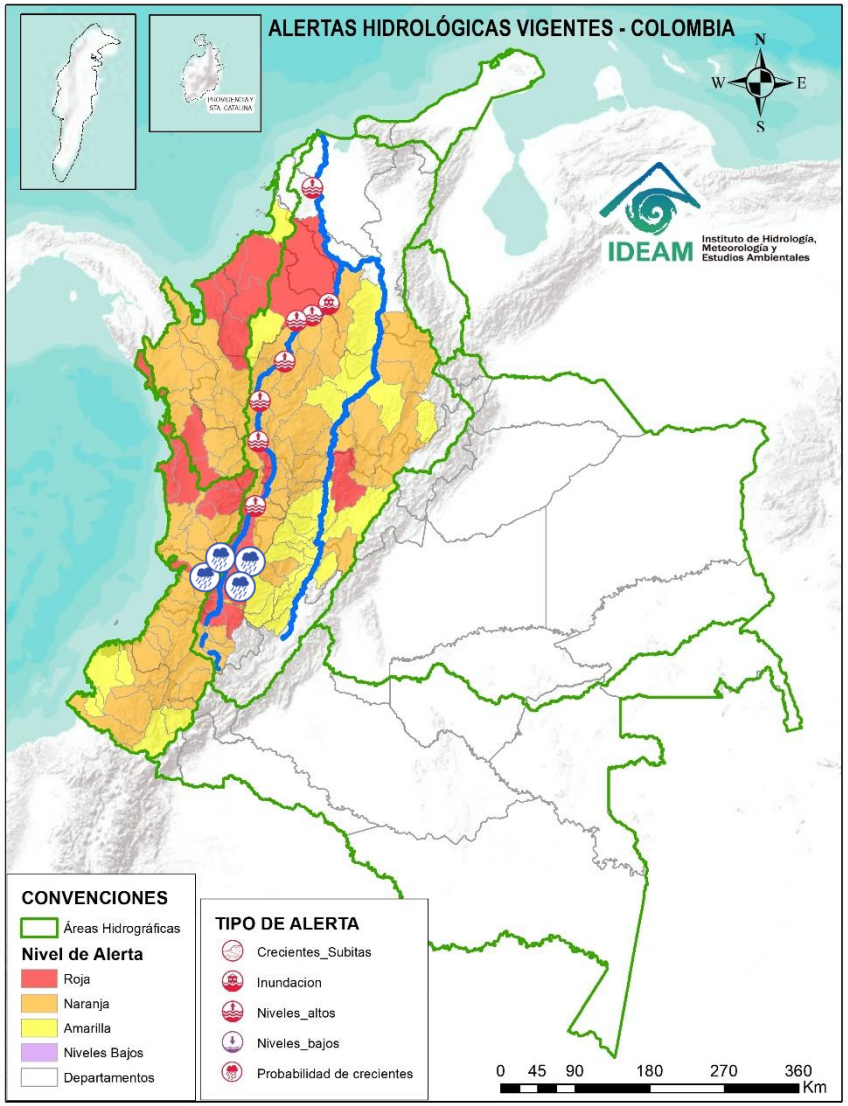

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:
Magdalena – Cauca	• Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Amaime, Cerrito y sus afluentes como el río Nima (departamento de Valle del Cauca). Especial atención en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. • Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Guabas, Sabaletas, Sonso y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Ginebra y Guacarí (departamento de Valle del Cauca). **Nota:** Se reportó desbordamiento del río Terciario en el sector Sonso del municipio de Guacarí, Valle del Cauca (05/02/2026). • Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH de los ríos Arroyohondo, Dapa, Mediacanoa, Mulalo, Piedras, Vijes y Yotoco y sus afluentes (departamento de Valle del Cauca). • Probabilidad de crecientes en las cuencas de los ríos Guadalajara, San Pedro y sus afluentes, especialmente la quebrada La Pachita. Especial atención en los municipios de Guadalajara de Buga y San Pedro (departamento de Valle del Cauca). **Notas: 1).** Se presenta inundaciones en la vereda La Puente del Municipio de San Pedro, Valle del Cauca. (12/02/2026). **2**.) Se reporta creciente súbita del rio Guadalajara a la altura de la vereda La María, del municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca (12/02/2026). • Crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Tuluá y Morales, entre otros aportantes al río Cauca en el departamento del Valle del Cauca, especialmente el río San Pedro. Especialmente atención al municipio de Tuluá, Valle del Cauca. **Notas: 1).** Desbordamiento del río Tuluá, generando afectaciones en el casco urbano del municipio de Tuluá (01/02/2026). **2).** Se reporta desbordamiento del río Tuluá a la altura de la carrera 28, en el barrio Tomás Uribe del municipio de Tuluá, Valle del Cauca (13/02/2026). **3).** Se reportan crecientes súbitas del rio Barragán, a la altura del municipio de Caicedonia (15/02/2025). • Probabilidad de crecientes súbitas en el río Frío y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Riofrío y Trujillo. **Nota:** inundaciones en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca (21/02/2025).

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

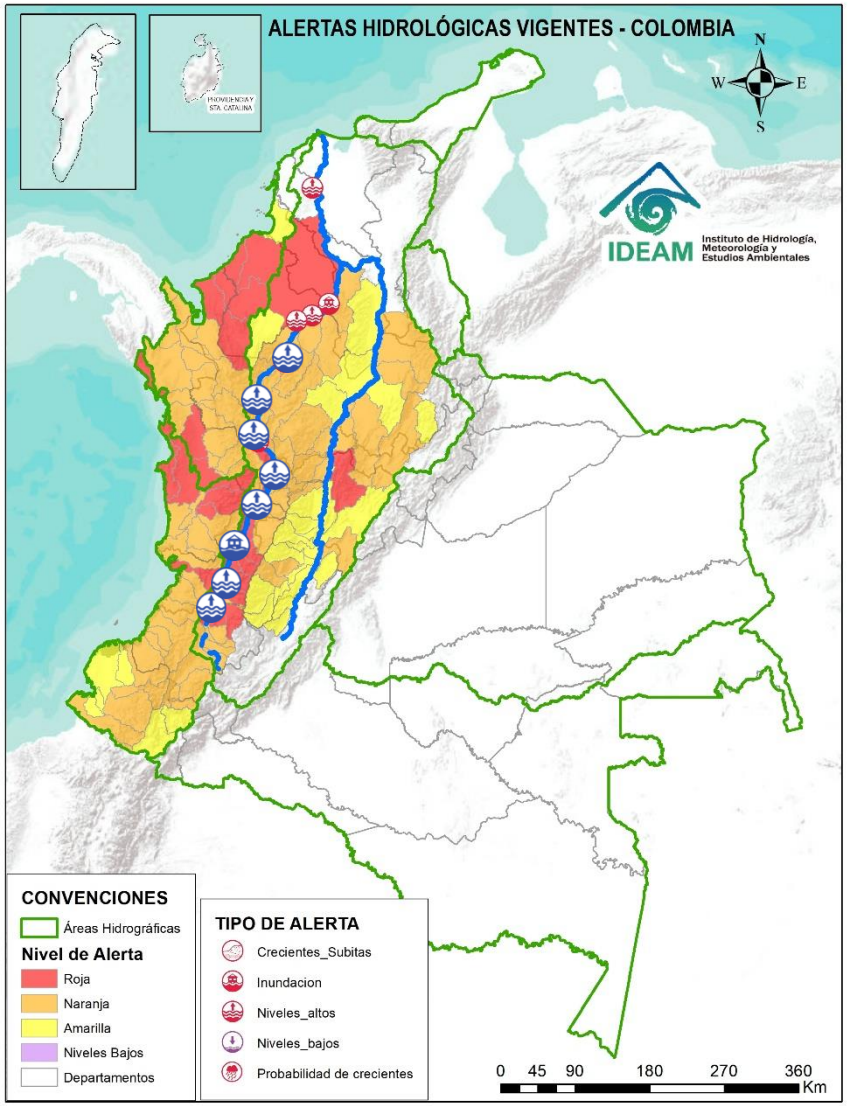

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:
Magdalena – Cauca	• Niveles altos del río Cauca en su recorrido por los municipios de Jamundí, Cali, Candelaria, Yumbo, Palmira, Vijes, El Cerrito, Yotoco, Guacarí, Buga, San Pedro y Tuluá (Valle del Cauca). Se recomienda estar atentos en las comunidades aledañas a la ribera del río ante posibles desbordamientos e inundaciones. **Nota**: **1)** inundaciones por desbordamiento del rio Cauca, en el corregimiento de Villapaz del municipio de Jamundí (24/02/2026). **2)** Se reporta el desbordamiento del río Cauca, a la altura de los municipios de Jamundí, Cali, Candelaria y Vijes en el Valle del Cauca (25/02/2026). **3)** Se reportó rompimiento de Jarillón y desbordamiento del río Cauca a la altura de la hacienda El Canelo, entre los municipios de Rozo y Cerrito, Valle del Cauca (27/02/2026). • Niveles altos del río Cauca en el tramo comprendido entre los municipios de Tuluá, Zarzal, La Victoria, Cartago (Valle del Cauca)) y La Virginia (Risaralda). Se recomienda estar atentos en las comunidades aledañas a la ribera del río. • Niveles altos del río Cauca en el tramo comprendido entre los municipios de La Virginia, Pereira (Risaralda) y La Pintada, en el departamento de Antioquia. Se recomienda estar atentos en las comunidades aledañas a la ribera del río ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones. • Niveles altos del río Cauca en el tramo comprendido desde la estación La Pintada (a la altura del municipio La Pintada), pasando por los municipios de Fredonia y Venecia, hasta la estación Olaya (a la altura del municipio de Olaya). Se recomienda estar atentos en las comunidades aledañas a la ribera del río Cauca.

Resumen de Alertas Hidrológicas


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

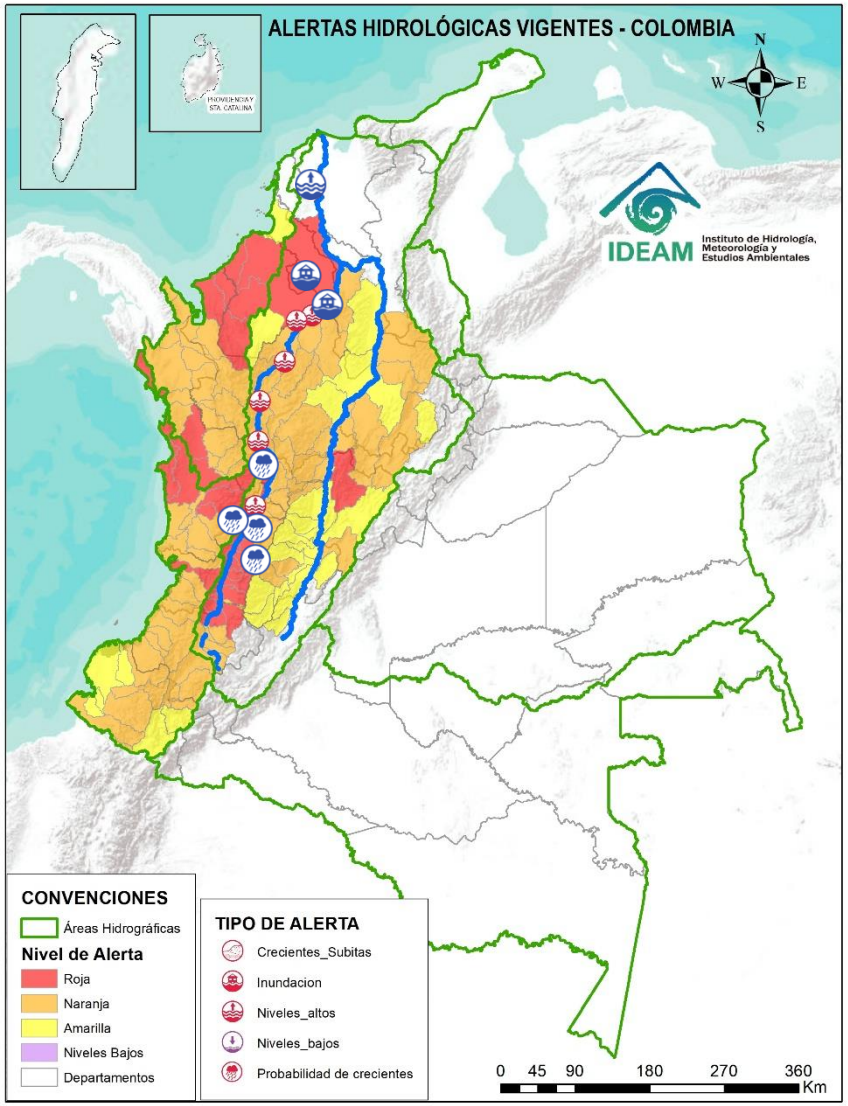

ÁREA HIDROGRÁFICA	SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ALERTAS ROJAS POR NIVELES ALTOS, CRECIENTES SÚBITAS, DESBORDAMIENTOS Y/O INUNDACIONES:
Magdalena – Cauca	• Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bugalagrande y sus afluentes (departamento de Valle del Cauca). Especial atención a la altura del municipio de Andalucía y Bugalagrande. • Probabilidad de creciente súbita en el río La Paila y sus afluentes (quebradas San José, Brasil, La Esperanza, Sanabria y San Marcos). Especial atención a la altura de los municipios de Zarzal y Sevilla (Valle del Cauca). • Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca de las quebradas Las Cañas - Los Micos y Obando, aportantes al Cauca en el departamento Valle del Cauca. Especial atención en los municipios de Zarzal, la Victoria, Obando y Cartago. **Nota:** Se reportaron inundaciones por fuertes lluvias en la zona urbana del municipio de Zarzal, Valle del Cauca (18/02/2026). • Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Roldanillo, Cáceres, Quebrada El Rey, Zanjón Los Mudos y Quebrada La Unión asociados con el distrito de riego del RUT (ríos Roldanillo - La Unión - Toro) y pertenecientes a la subzona hidrográfica de los ríos Pescador, Chanco, Catarina, Cañaveral (departamento de Valle del Cauca), se recomienda especial atención en los municipios de El Águila, Roldanillo y La Unión (Valle del Cauca). **Nota**: Inundaciones en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca (21/02/2025). • Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cartama (Antioquia) y sus aportantes como el río Supía (Caldas) y las quebradas Cascabel, La Leona, La Vega y Pantanos. Especial atención en los municipios de La Pintada, Pueblorrico, Támesis y Valparaíso (Antioquia), Marmato y Supía (Caldas) y Quinchía (Risaralda). **Nota:** Se reportó avenida torrencial en los sectores Cascabel, Chaburquia y San Pedro, municipio de Marmato, Caldas (12/02/2026). • **Alerta puntual:** Afectaciones por rompimiento del dique marginal del río Cauca en el sector Caregato a la altura de San Jacinto del Cauca (Bolívar). Se recomienda especial atención en La Región de La Mojana por t0ransvase del caudal del río Cauca (06/05/2024). • Persisten las áreas inundadas en los municipios de San Jacinto del Cauca, Caimito, San Benito Abad, Ayapel, Guaranda, San Marcos y Sucre, asociadas al ingreso de agua del río Cauca a través de los boquetes en Caregato y Los Arrastres. **Notas: 1)** Activación del rompimiento en el sector de la Hacienda la Palmira (4/02/2026). **2)** reporte de Rompimientos en la margen izquierda del rio San Jorge en los sectores del Totumo, Cantaleta y Voragine, afectando las comunidades de Nueva Esperanza, Puerto Leticia, Puerto Santo y Cintura – Pueblo Nuevo. (08/02/2026). • **Alerta Puntual**: Se reportó falla en la estructura de contención del río Magdalena en el sector de Canta Rana en el municipio de Calamar, Bolívar (10/02/2026).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

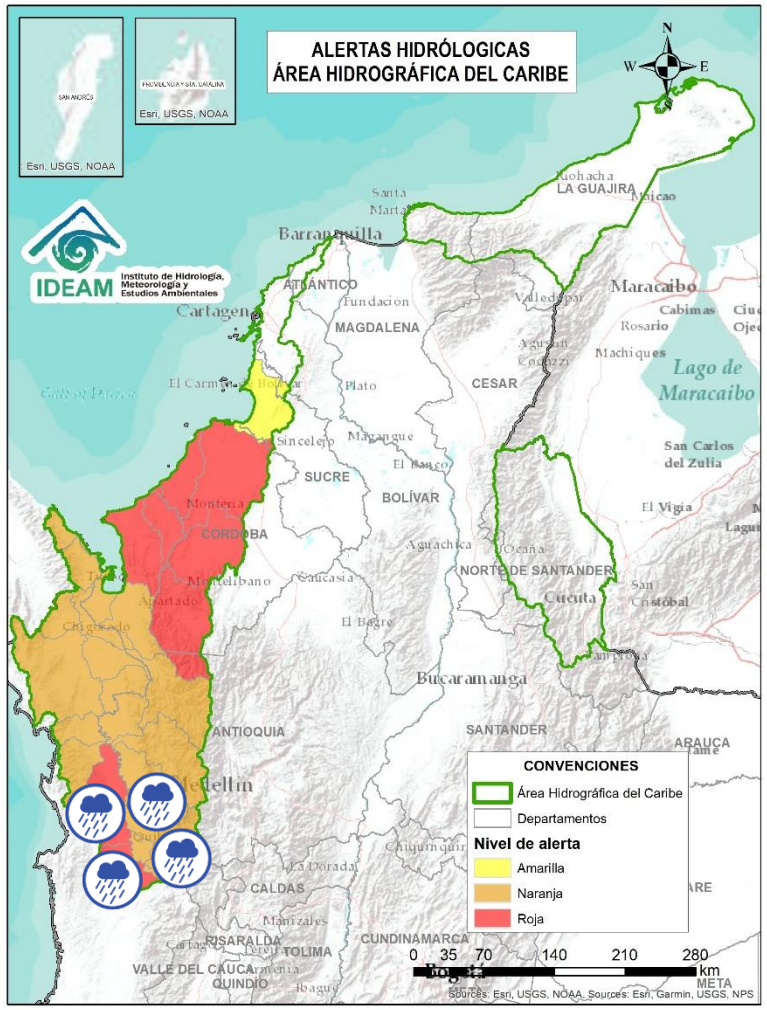

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Atrato – Darién	Cuenca alta del río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río Atrato y sus afluentes, se recomienda especial atención en los municipios de El Carmen de Atrato, Lloró, Bagadó, Cértegui, Quibdó y Unión Panamericana (Animas).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Andágueda	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Andágueda y sus aportantes. Se recomienda especial atención en los municipios de Bagadó y Cértegui (Chocó).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Quito	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Quito. Especial atención en los municipios de Cantón de San Pablo, Unión Panamericana, Cértegui, Río Quito y Atrato (Chocó).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Cabí	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cabí entre otros directos al río Atrato, así como en el río Atrato en su recorrido por el municipio de Quibdó. Especial atención en los municipios de Atrato y Quibdó (Chocó).
	Atrato - Darién	Cuenca del río Bebaramá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Bebaramá y otros Directos Atrato (md). Se recomienda especial atención al municipio de Medio Atrato y su cabecera municipal Beté (Chocó).
	Atrato - Darién	Cuenca media río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH Directos al Atrato entre los ríos Quito y Bojayá (mi), espacialmente los ríos Beté y Tanguí, en la zona rural del municipio Medio Atrato. Se recomienda especial atención en el río Atrato a la altura de Vigía de Fuerte (Antioquia).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

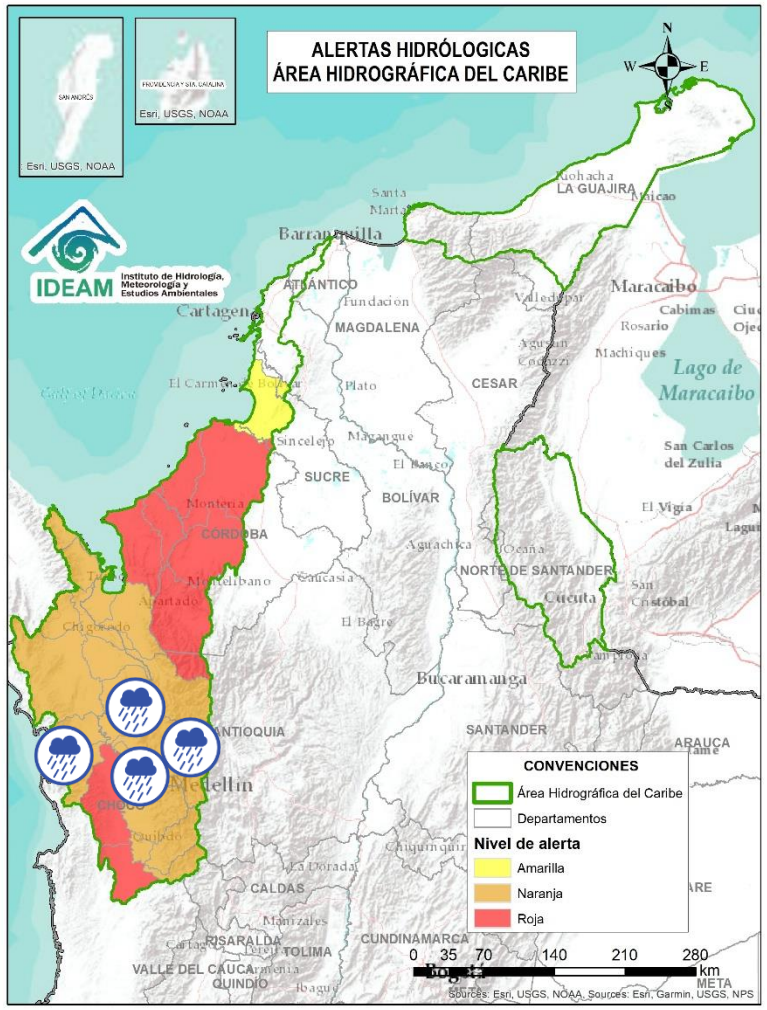

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Atrato - Darién	Cuenca Media del río Atrato	Probabilidad de crecientes súbitas de los afluentes directos al Atrato, entre Bebaramá y Murrí (md). Se recomienda especial atención en el municipio de Vigía del Fuerte y sus centros poblados (Antioquia).
⚠	Atrato – Darién	Cuenca del río Murrí	Probabilidad de crecientes súbitas del río Murrí y sus afluentes, especialmente el río Ocaidó entre otros directos a la parte media del río Atrato. Se recomienda especial atención en los municipios de Urrao y Vigía del Fuerte (Antioquia).
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Bojayá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bojayá y sus afluentes. Especial atención en el municipio de Bojayá (Chocó).
⚠	Atrato – Darién	Cuenca del río Napipí – río Opogadó	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Napipí – río Opogadó y sus aportantes.
⚠	Atrato - Darién	Cuenca del río Murindó	Probabilidad de crecientes súbitas del río Murindó y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

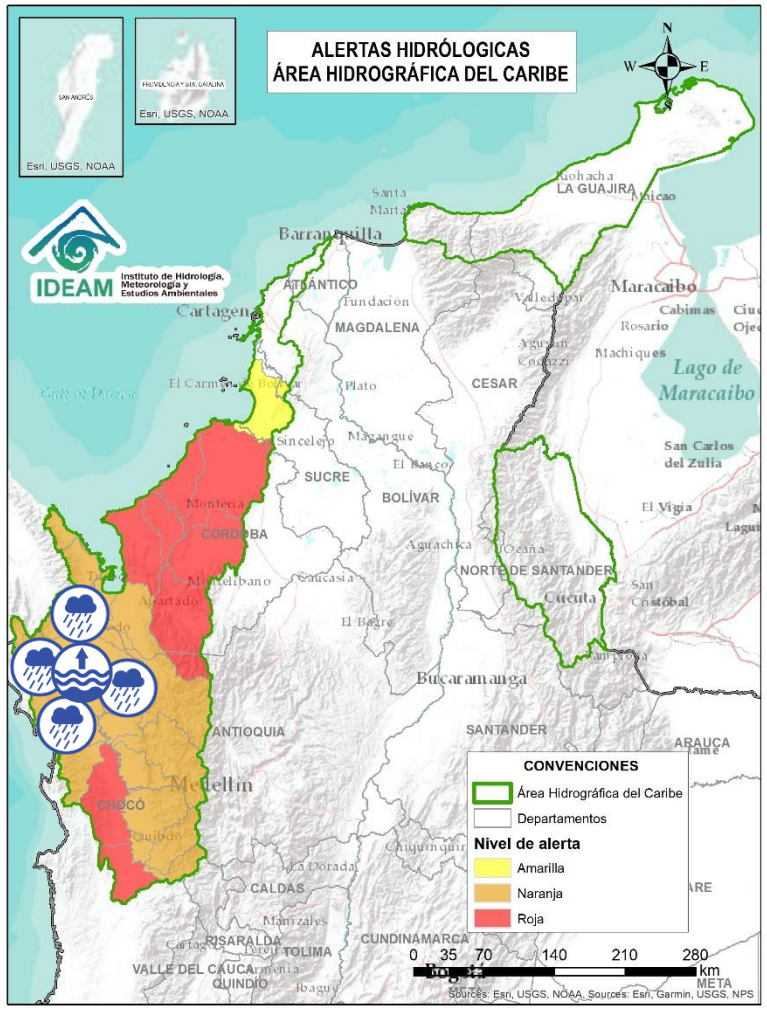

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Atrato – Darién	Cuenca del río Sucio	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Sucio y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los ríos Herradura, Mutatá y Urumita, así como en las quebradas Agualinda, Cañada Seca, Desmotadora, El Tigre, La Antigua, La Caracol, La Encalichada, Potreros y San José de Urama. Se sugiere especial atención en los municipios de Abriaquí, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Mutatá, Nuevo Belén de Bajirá y Uramita (Antioquia).
	Atrato - Darién	Cuenca Baja del río Atrato	Niveles altos del río Atrato entre el municipio de Carmen del Darién y el municipio de Riosucio (Chocó).
	Atrato – Darién	Cuenca del río Salaquí	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Salaquí y Truandó, y sus aportantes a la cuenca baja del río Atrato, espacialmente el río Truandó en el municipio de Riosucio (Chocó). **Nota:** se reportó inundación por desbordamiento del río Atrato afectando a las comunidades Indígenas de Bocas de Taparal, Dos Bocas, La Nueva, Clavellino, Truandó Medio, Villa Hermosa y Río Sigo, en el municipio de Riosucio, Chocó (21/02/2026).
	Atrato – Darién	Cuenca del río Perancho	Probabilidad de incrementos súbitos en el nivel del río Perancho y sus afluentes, especialmente en el río Domingodó, aportante a la cuenca baja del río Atrato. Especial atención en los municipios Carmen de Darién y Riosucio (Chocó).
	Atrato – Darién	Cuenca baja del río Atrato	Probabilidad de incrementos súbitos en la SZH Directos al Bajo Atrato entre río Sucio y Desembocadura al Mar Caribe. Especial atención en los municipios de Riosucio, Unguía (Chocó) y Turbo (Antioquia).
	Atrato – Darién	Cuenca baja del río Atrato	Niveles altos del río Atrato entre el municipio de río Sucio y la Desembocadura al Mar Caribe. Especial atención en los municipios de Riosucio, Unguía (Chocó) y Turbo (Antioquia).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

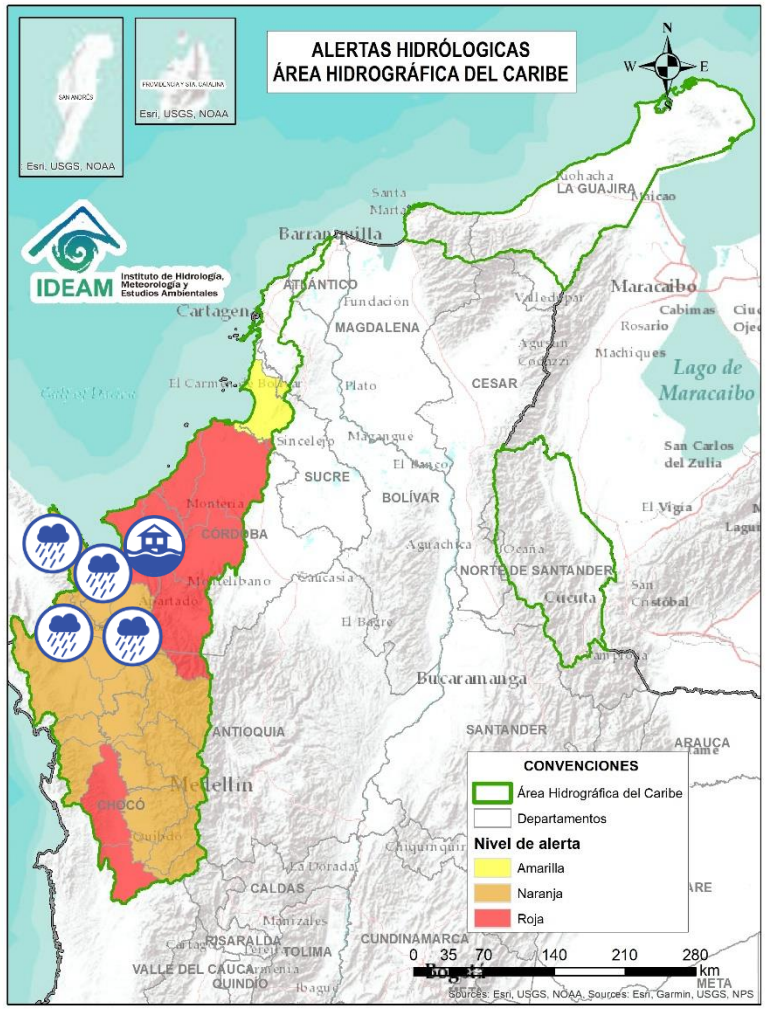

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Atrato – Darién	Cuenca del río Tanela	Probabilidad de crecientes súbitas del río Tanela y sus aportantes, tales como, los ríos Nati y Cuti, en la cuenca baja del río Atrato. Se recomienda especial atención en el municipio de Unguía (Chocó). **Nota:** Se registró desbordamiento de los ríos Cuti y Tanela, en la vía que comunica los municipios de Santa María y Tanela, municipio de Unguía (16/02/2026).
	Atrato – Darién	Cuenca del río Tolo	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tolo y sus afluentes, especialmente la quebrada La Carolina entre otros directos al Caribe. Especial atención a la altura de los municipios de Acandí y Capurgana (Chocó).
	Caribe - Litoral	Cuenca del río León	Probabilidad de crecientes súbitas de los ríos Apartadó, Carepa, Chigorodó, Grande, León y Vijagual, los cuales desembocan al Golfo de Urabá. Especial atención en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo (Antioquia). **Notas: 1)** Inundaciones por rompimiento de jarillón en el río Carepa afectando los sectores de La Primavera, La Esmeralda, Casa Verde, Bosque los Almendros, Mi Lucha, Nueva Esperanza, Bocas de Chigorodó del municipio de Carepa, Antioquia. (01/02/2026). **2)** se reportan inundaciones en el corregimiento de El Silencio, municipio de Carepa (Antioquia), por desbordamiento de los caños San Miguel, San Germán y 9 de enero (14/02/2026). **3)** Se reportaron inundaciones por crecientes súbitas del río Apartadó en el municipio de San José de Apartadó, Antioquia (17/02/2026).
	Caribe - Litoral	Cuenca del río Mulatos	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Mulatos y sus afluentes, como los ríos Currulao, Guadalito y Turbo, así como en otros ríos que desembocan directamente en el Caribe. Se recomienda especial atención en los municipios Necoclí y Turbo, así como sus centros poblados (Antioquia). **Notas**: **1)** Se reportan desbordamientos de ríos y quebradas, los cuales han generado inundaciones en diversas veredas, entre ellas Palestina, Villanueva, Bocas de Iguana, Sucio Laureles, La Unión, La Salada y La Pampa del municipio de Necoclí, Antioquia (31/01/2026). **2)** Se reportaron inundaciones por creciente súbita del río Damaquiel en el corregimiento de Damaquiel del municipio de San Juan de Urabá, Antioquia (01/02/2026).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

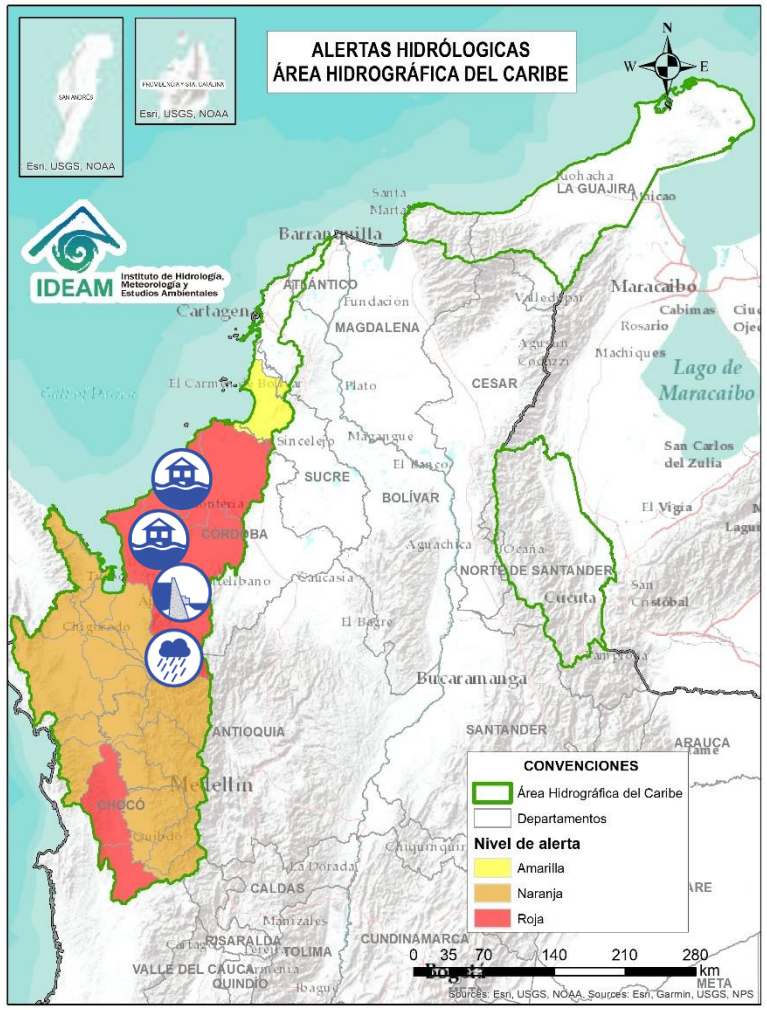

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Caribe - Litoral	Cuenca del río San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan y sus afluentes, especialmente el río Damaquiel y las quebradas El Guadal y el Paso. Especial atención en los municipios de San Pedro de Urabá, Arboletes y San Juan de Urabá (Antioquia). **Notas**: **1)** Se reporta afectaciones por inundaciones en el Corregimiento de Guadual del municipio de Arboletes, Antioquia (31/01/2026). **2)** Se reporta inundaciones por lluvias y desbordamiento de la quebrada Naranjita, en el corregimiento Naranjita del municipio de Arboletes, Antioquia. (31/01/2026). **3)** Se reportan inundaciones en algunas veredas del municipios de San Juan de Urabá (31/01/2026). **4)** Se reporta inundaciones en algunas verdeas del municipio de San Pedro de Urabá (31/01/2026). **5)** Se reportó inundaciones por desbordamiento de la quebrada El Caimán en las veredas Nuevo Horizonte y Florida en el corregimiento El Tomate en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia (31/01/2026). **6)** Se reportó desbordamiento de los ríos San Juan y Damaquiel en el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia (30/01/2026).
	Caribe - Litoral	Cuenca del río Canalete	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Canalete y sus afluentes, entre otros arroyos directos al Caribe. Especial atención en el municipio de Arboletes (Antioquia) y Canalete (Córdoba). **Notas**: **1)** Se presentaron inundaciones en zona urbana y rural del municipio de Canalete, Córdoba (01/02/2026). **2)** Se presentaron inundaciones en zona rural del municipio de Puerto Escondido, Córdoba (01/02/2026). **3)** Se reporta creciente súbita del rio Canalete a la altura del corregimiento de la Caña de Canalete, en puerto Escondido, Córdoba (18/02/2026).
	Sinú	Cuenca alta del río Sinú	Probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Sinú y sus afluentes en la parte alta. **Nota:** se reportó inundación en los corregimientos de Batata, Callejas, Villa Providencia y Volador, Puerto Rico, Ceibal, Desafío, Ley, Lagos Nueva Platanera en el municipio de Tierralta, Córdoba (02/02/2026).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

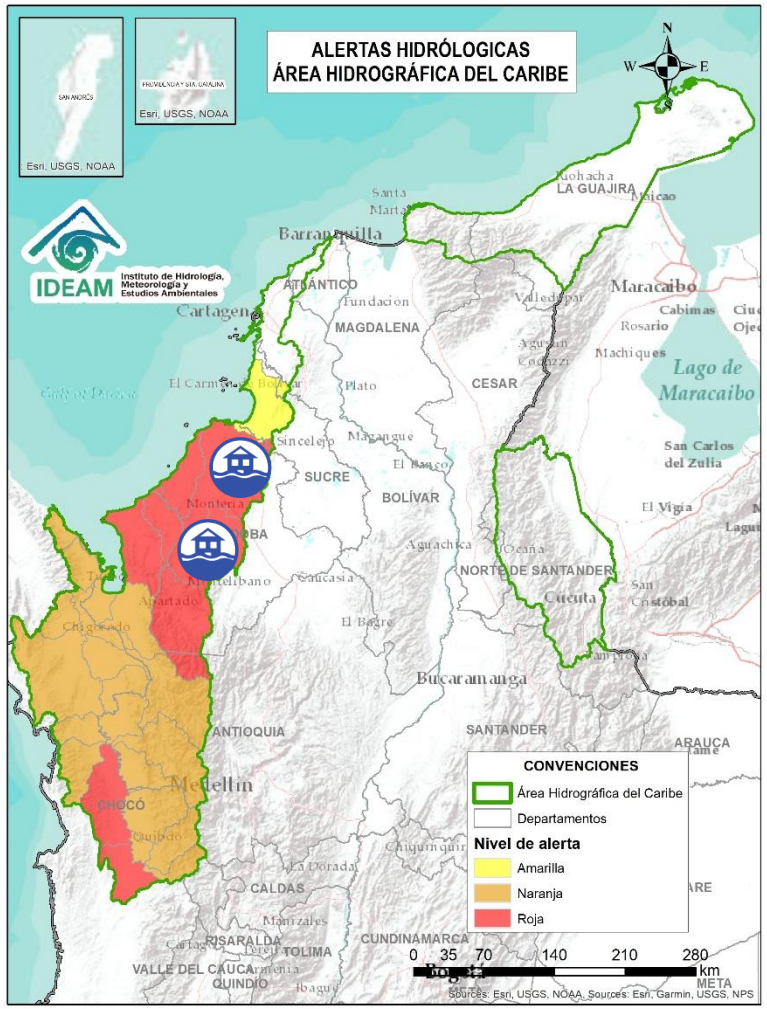

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Sinú	Cuenca media del río Sinú	Niveles altos en la parte media del río Sinú y probabilidad de crecientes súbitas en sus afluentes, en este sector (aguas abajo del Embalse de Urrá I). Se recomienda especial atención en los centros poblados de Tierralta y Valencia (Córdoba). **Notas**: **1)** Desbordamiento de los ríos Nuevo y Manzanares, generando afectaciones en el casco urbano y zona rural del municipio de Valencia y zona rural del municipio de Montería, Córdoba (01/02/2026). **2)** Comunidades aguas abajo del embalse Urra, deben estar atentos a incrementos súbitos por reboses que se están realizando en el embalse de Urra debido a que esta alcanzando su capacidad máxima (01/02/2026). **3)** Inundación en Tierralta por desbordamiento de los ríos Tay, Tuis Tuis, entre otros con afectaciones a viviendas, muebles y enseres. (02/02/2026).
	Sinú	Cuenca baja del río Sinú	Niveles altos en la parte baja del río Sinú y probabilidad de crecientes súbitas en sus afluentes en la cuenca baja. Se recomienda especial atención en los municipios de Cereté, Lorica, Montería, San Anteno, San Bernardo del Viento y San Pelayo (Córdoba). **Notas 1)**: Inundaciones en las vereda (01/02/2026). **2)** Inundaciones por lluvias en la zona rural y urbana en el corregimiento de Tinajones, Castillo, Sicaria Limón, Jose Manuel de Altamira, Trementino, Caño Grande Junin, Paso Nuevo, Playas del Viento, Camino Real con sus respectivas veredas del municipio de San Bernardo del Viendo, Córdoba (01/02/2026). **3)** Inundaciones por lluvias en zona urbana y rural en los municipios de Cereté, Córdoba. **4)** Inundaciones por fuertes lluvias que desbordan quebradas en zona rural y sectores de La Dorada y Pueblo Flecha del municipio de San José de Ure, Córdoba. (01/02/2026). **5)** Inundaciones por lluvias en zona rural y urbana del municipio de Los Córdobas, Córdoba (31/01/2026). **6)** Inundaciones por lluvias en la zona rural de San Antero, Córdoba (01/02/2026). **7)** Inundaciones por la creciente del río Sinú en Montería, Córdoba (02/02/2026). **8)** Inundaciones en la cabecera municipal y área rural del municipio de San Carlos (04/02/2026). **9)** desbordamiento del río Sinú con inundaciones en el Sector de El Tigre de la ciudad de Montería (19/02/2026).

Área Hidrográfica del Caribe


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

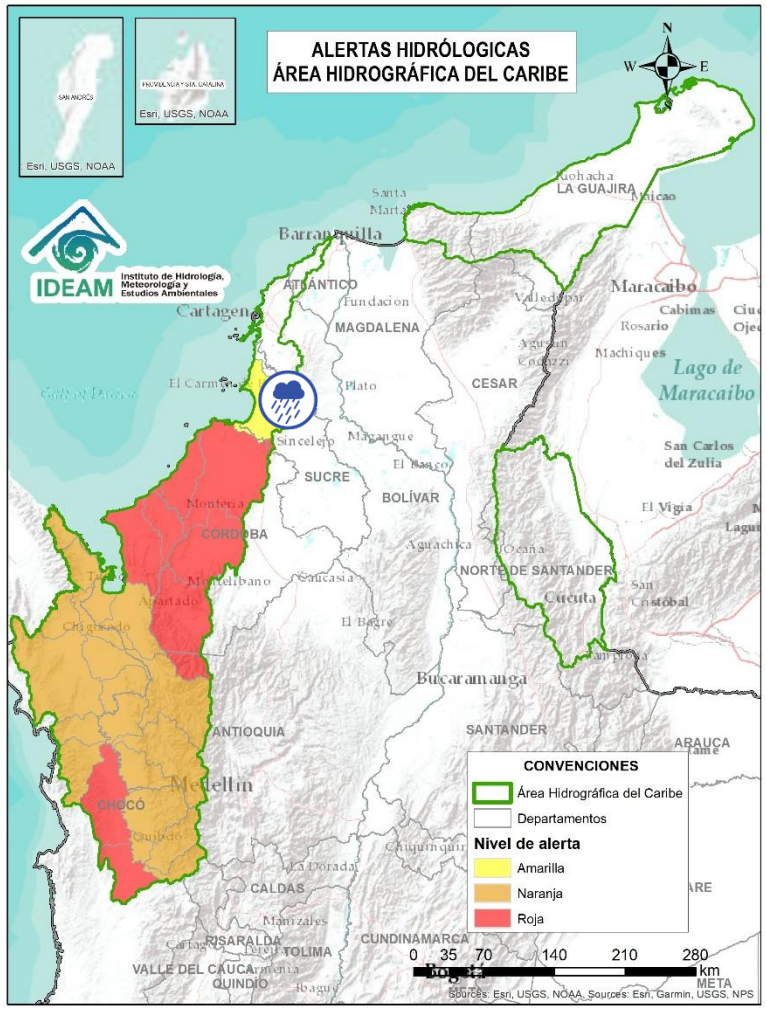

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Caribe - Litoral	Directos al Caribe Golfo de Morrosquillo	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Mar Caribe en el Golfo de Morrosquillo, especialmente en los arroyos Amansa, Guapos, El Piru y Petrona. Especial atención en los municipios de San Onofre, Tolú, Coveñas, Palmito, Toluviejo, Chalán, Colosó, Morroa y Sincelejo.

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

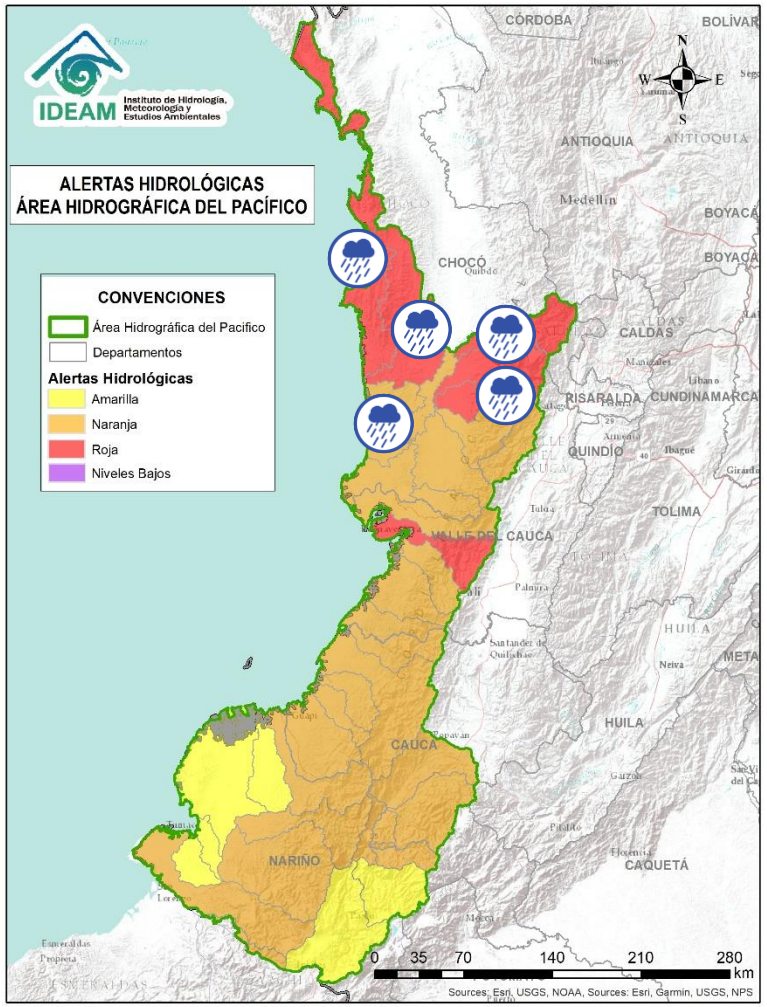

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Directos al Pacífico	Cuencas directas al Pacífico (Chocó)	Probabilidad de incrementos súbitos en el nivel de los ríos Valle, Jella, Chocolatal, Jurado, Piliza, Pavasa, Purricha, Catripe, Abaquia, y sus afluentes, entre otros directos al Océano Pacífico en el departamento de Chocó, se recomienda especial atención en los municipios de Bahía Solano y Juradó.
	Baudó - Directos al Pacífico	Cuenca del río Baudó	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Baudó y sus afluentes, especialmente los ríos Ancosó, Berreberre, Catrú, Cedro, Cuguchó, Dubaza, Misará, Pavasa, Pepé, Purricha, Siguirisua y Torreidó. Se recomienda especial atención en los corregimientos de Almendro, Bellavista, Chachajo, Cohecho, Divisa, La Pureza, Miacorá, Nauca, Puerto Elacio, Santa María y Santa Rita, en los municipios de Alto Baudó, Bajo Baudó y Medio Baudó.
	Baudó - Directos al Pacífico	Cuenca del río Docampadó	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Docampadó, Orpúa, Ijuá, Capiro, Ordó, Sivirú y sus afluentes, entre otros directos al Océano Pacífico en el departamento de Chocó. Se recomienda especial atención en los municipios de Bajo Baudó y Litoral de San Juan (Chocó).
	San Juan	Cuenca alta del río San Juan	Crecientes súbitas en el río San Juan Alto y sus afluentes, especialmente en los ríos Pureto y Muerto. Se recomienda especial atención en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico (Risaralda), y Tadó y Istmina (Chocó).
	San Juan	Cuenca del río Tamaná	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Iró, Tamaná, Condoto, entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios San José del Palmar, Rio Iró, Condoto, Novita y Medio San Juan (Chocó).
	San Juan	Cuenca del río Cajón	Probabilidad de incrementos en los niveles de las cuencas del río Cajón entre otros aportantes a la cuenca media del río San Juan. Especial atención a la altura de los municipios Nóvita y Medio San Juan.

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

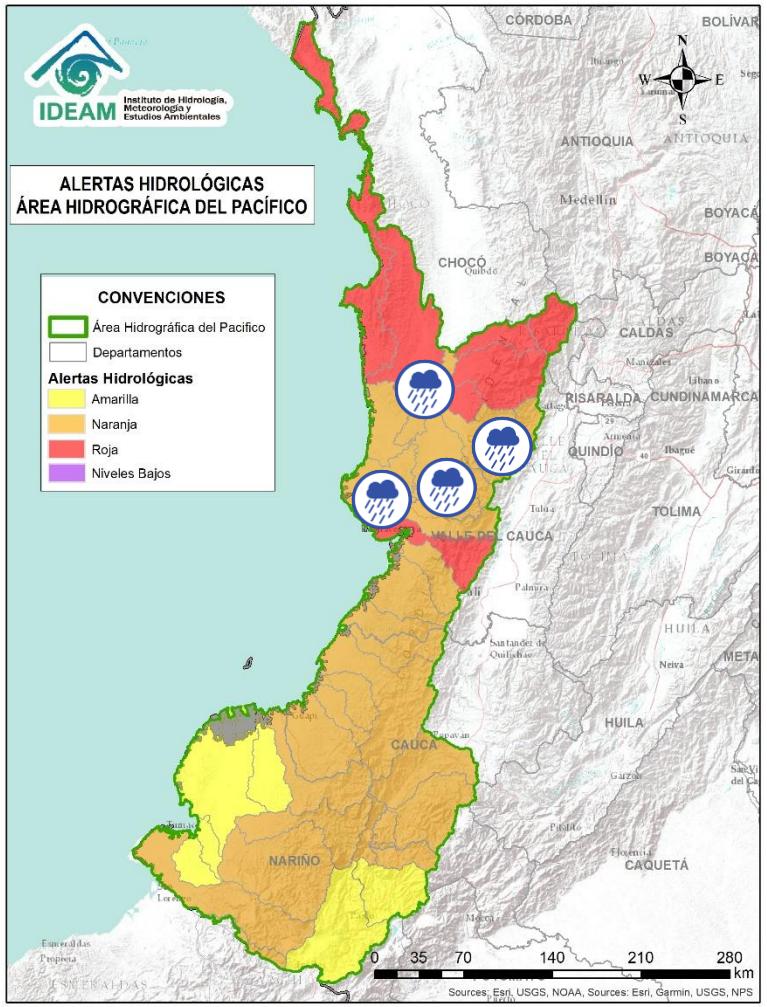

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	San Juan	Cuenca del río Sipí	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Sipí, especialmente en los ríos Taparal, San Agustín y Garrapatas, a la altura del municipio de Sipí (Chocó) y río Sanquinini, a la altura del municipio de Bolívar (Valle del Cauca).
	San Juan	Cuenca media del río San Juan	Probabilidad de incrementos en los niveles en la parte media del río San Juan. Especial atención a la altura del municipio Medio San Juan e Istmina (Chocó).
	San Juan	Cuenca del río Capoma	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Capoma y otros directos al San Juan, tales como, el río Cucurrupí y la quebrada Fujadó al igual que sus aportantes.
	San Juan	Cuenca del río Munguidó	Probabilidad de incrementos en los niveles de la cuenca del río Munguidó. Se recomienda especial atención en la vereda Las Delicias.
	San Juan	Ríos Calima y Bajo San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Calima. Se recomienda especial atención a el municipio de Litoral de San Juan (Chocó) y los municipios Calima, Darién, Buenaventura y Bahía Málaga (Valle del Cauca). **Notas: 1)** Se reportó inundación en el área urbana del municipio de Calima, Valle del Cauca (18/02/2026). **2)** Se reportó inundación a la altura de la vereda El Diamante, en el municipio de Calima, Valle del Cauca (24/02/2026).

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

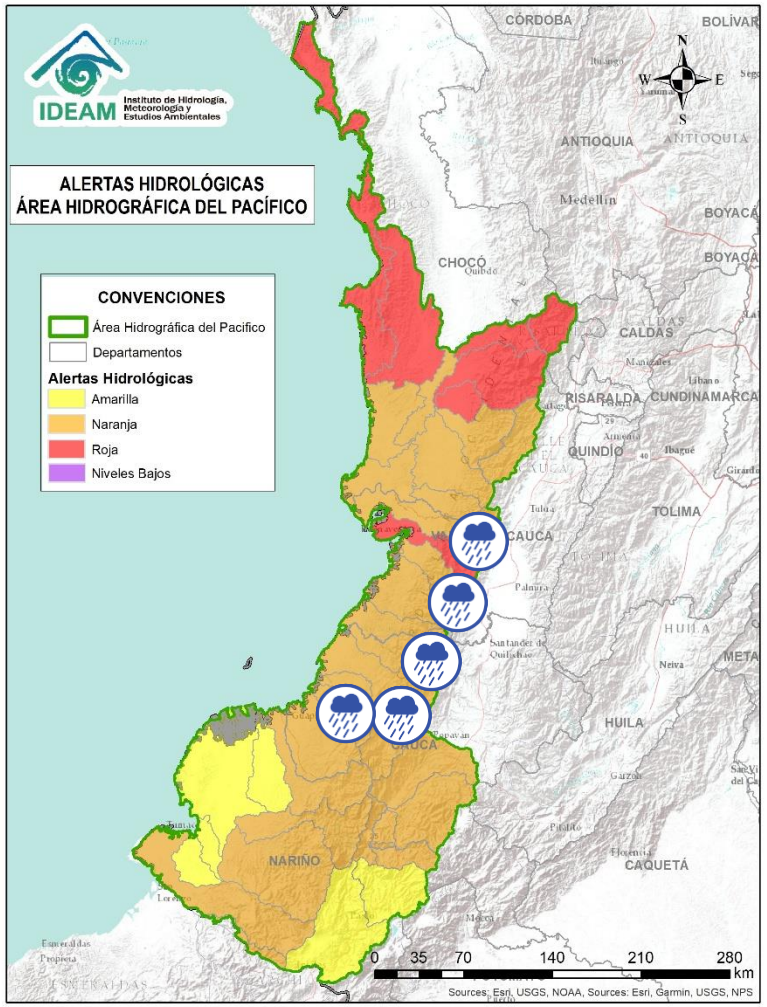

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Dagua	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Dagua y sus afluentes, especialmente en el río Bitaco a la altura del municipio de La Cumbre (Valle del Cauca). Se recomienda especial atención en los municipios de Dagua, La Cumbre y Buenaventura (Valle del Cauca). **Nota:** Se reportaron inundaciones en la vereda Los Hispanos, del municipio de Vijes, Valle del Cauca (16/02/2026).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Anchicayá	Probabilidad de creciente súbita en el río Anchicayá y sus afluentes, que drena sus aguas hacia el Océano Pacífico en el departamento del Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en el municipio de Dagua y Buenaventura (Valle del Cauca).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuencas de los ríos Cajambre, Mayorquín y Raposo	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Cajambre, Mayorquín, Raposo y sus afluentes, directos al Océano Pacífico en el departamento del Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Naya – Yurumanguí	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Naya – Yurumanguí y sus afluentes, especialmente el río San Francisco, a la altura del municipio de López de Micay – Cauca y Buenaventura – Valle del Cauca.
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río San Juan de Micay	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan de Micay y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Se recomienda especial atención en los municipios de Argelia, San Miguel y López de Micay (Cauca).
	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Saija	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Saija y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico.

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

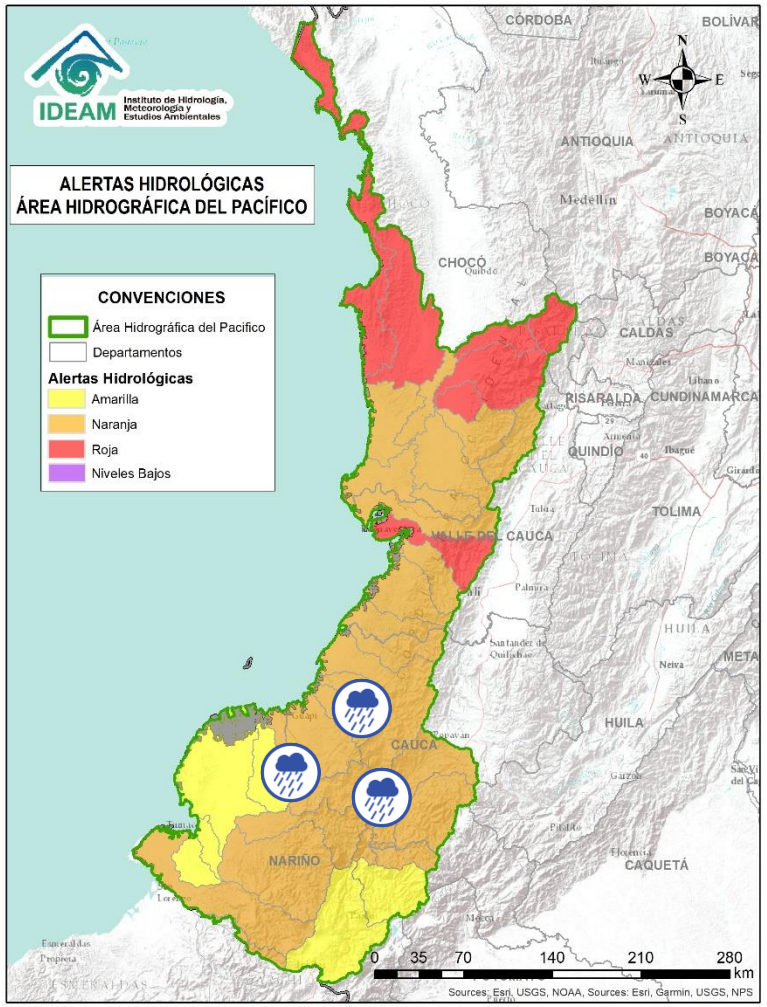

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Timbiquí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Timbiquí y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Especial atención en el municipio de Timbiquí (Cauca).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Guapi	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guapi y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Especial atención en el municipio de Guapi (Cauca).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Iscuandé	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Iscuandé y sus afluentes, aportante directo al Océano Pacífico. Especial atención en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño).
⚠	Tapaje – Dagua – Directos	Cuenca del río Tapaje	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Tapaje y sus afluentes, el cual drena sus aguas al Océano Pacífico en el departamento de Nariño.
⚠	Patía	Cuenca alta del río Patía	Probabilidad de crecientes súbitas en el Alto Patía y sus afluentes, particularmente en los ríos Timbío, Quilcacé y Guabas, y las quebradas Sachamates, San Gandinga, Las Tallas y El Águila. Se recomienda especial atención en los municipios de El Tambo, Patía, Mercaderes y Balboa (Cauca), y Leiva (Nariño).

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

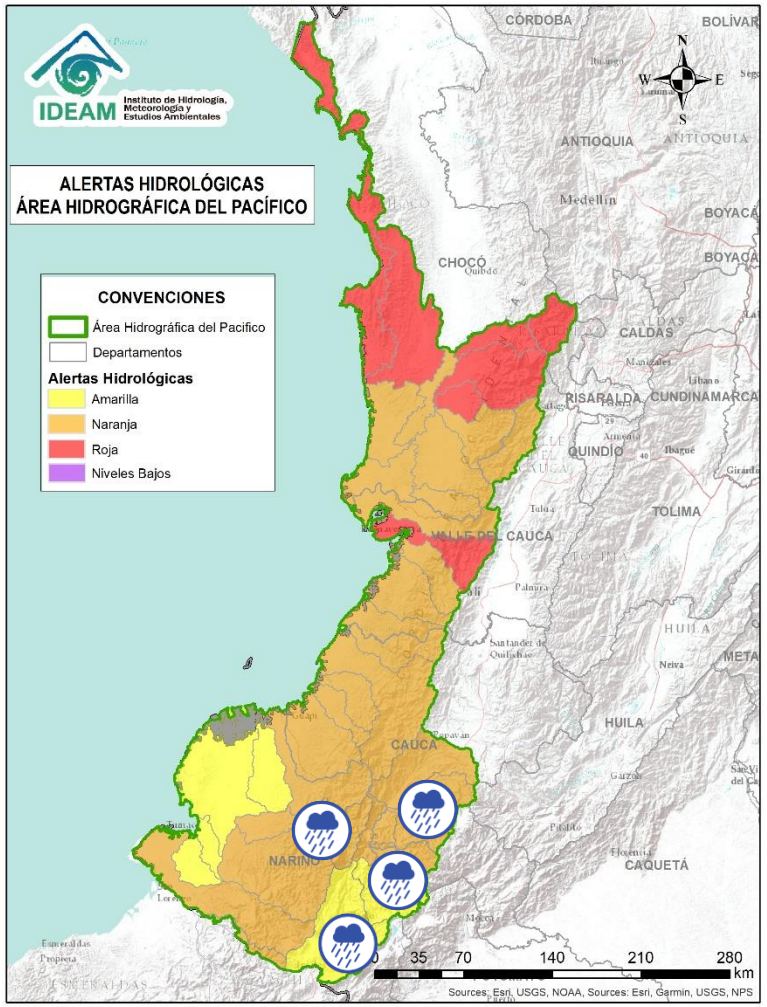

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Patía	Cuenca del río San Jorge	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Jorge y sus afluentes, especialmente en los ríos San Pedro, Mazamorras y Pancitará, y las quebradas San Gandinga, Salinas, Cascadas y Buenavista. Especial atención en los municipios de Almaguer, Sucre, Mercaderes y Bolívar, La Sierra, San Sebastián y La Vega (Cauca).
	Patía	Cuenca del río Mayo	Probabilidad de incremento en los niveles del río Mayo, aportante al alto Patía al nororiente del departamento de Nariño. Especial atención en el municipio de San Pablo (Nariño).
	Patía	Cuenca río Juanambú	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Juanambú y sus afluentes (aportantes al Alto Patía - Nariño), especialmente el río Pasto y la quebrada El Royo. Se recomienda especial atención en los municipios de Pasto, San Bernardo y Chachagüi (Nariño).
	Patía	Cuenca del río Guáitara	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guáitara y sus aportantes, especialmente la quebrada Molinocayo. Especial atención en los municipios de Santacruz, Yacuanquer y El Tambo (Nariño).
	Patía	Cuenca media del río Patía	Probabilidad de crecientes en los niveles en la cuenca media del río Patía y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Cumbitara, El Charco, El Rosario, Leiva, Los Andes (Sotomayor), Magüí (Payán), Policarpa (Nariño).

Área Hidrográfica del Pacífico


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

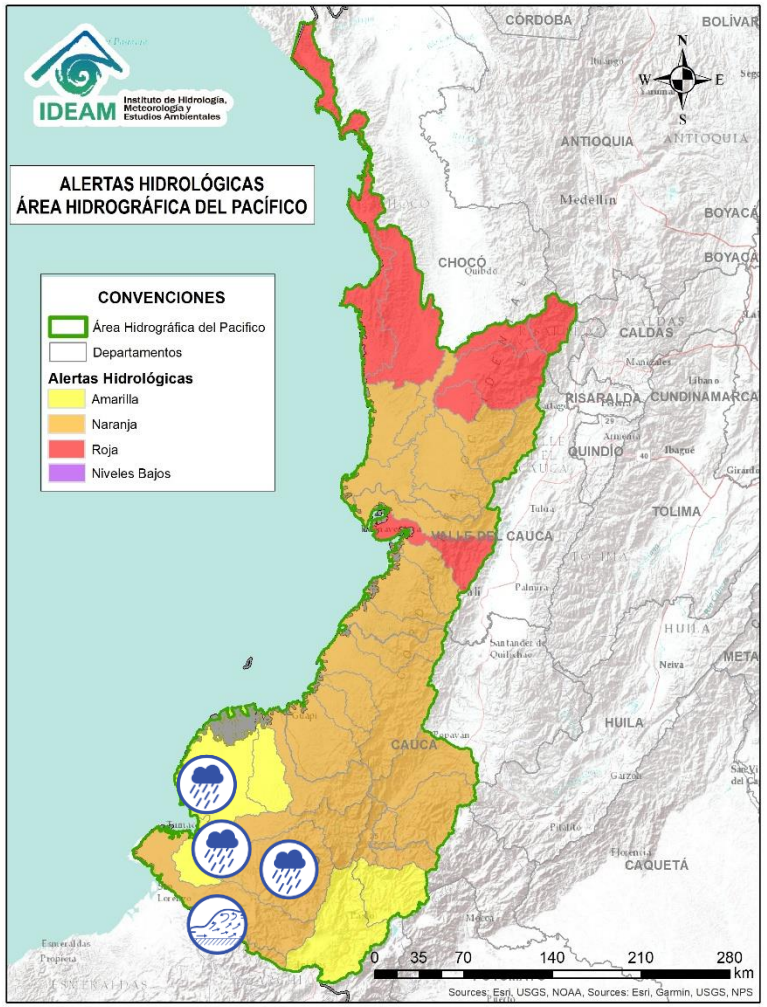

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Patía	Cuenca del río Telembí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Telembí y sus afluentes, especialmente el río Ispi. Se recomienda especial atención en los municipios de Roberto Payan, Barbacoas, Mallama y Tumaco (Nariño).
	Patía	Cuenca baja del río Patía	Probabilidad de crecientes súbitas en el nivel de la parte baja del río Patía y sus afluentes, el cual descarga sus aguas al océano Pacífico en el departamento de Nariño. Se recomienda especial atención en los municipios de Magüí (Payán), Roberto Payán, Francisco Pizarro, La Tola, Olaya Herrera y Mosquera (Nariño).
	Mira	Cuenca del río Chagüi	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Chagüi y sus afluentes. Se recomienda especial atención en el municipio de Tumaco (Nariño).
	Mira	Cuenca del río Rosario	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Rosario y sus afluentes. Se recomienda especial atención en el municipio de Tumaco (Nariño).
	Mira	Cuenca del río Mira	Crecientes súbitas en el río Mira y sus afluentes, tales como, los ríos Guiza, San Juan y Chagüi. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco (Nariño).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

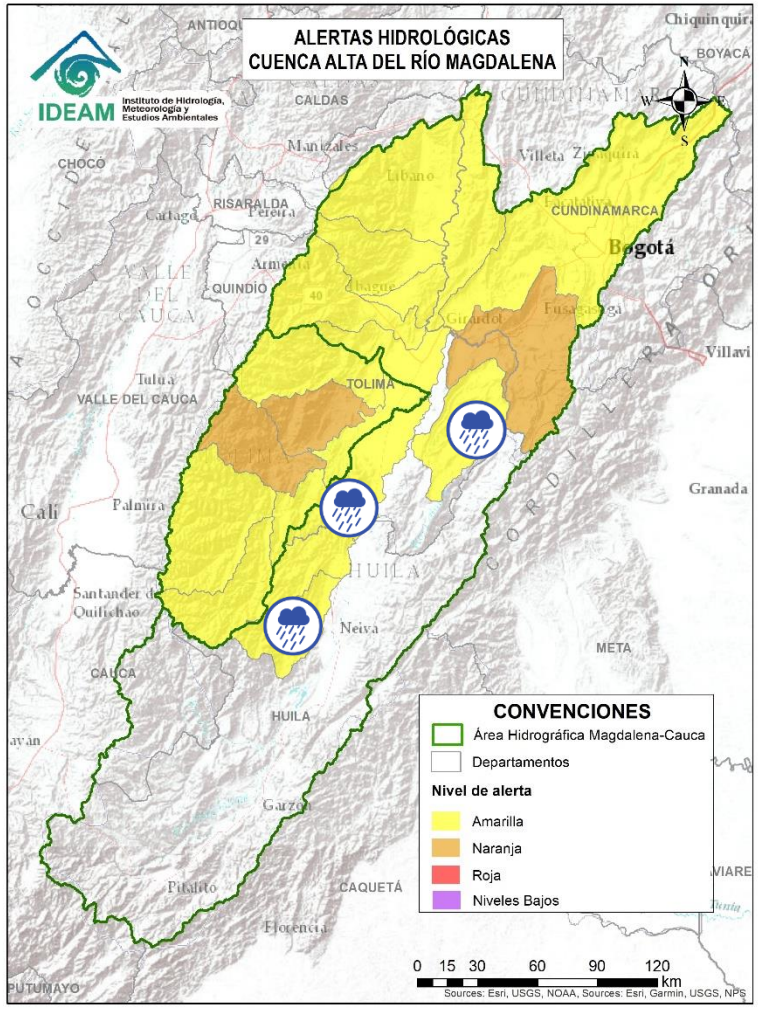

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Baché	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Baché y sus afluentes. Especial atención las quebradas San Miguel, El Oso, El Carmen y El Chuco en el municipio de Santa Maria (Huila). **Nota**: Se reportó creciente súbita en la quebrada El Oso, a la altura de las veredas Buenos Aires del Carmen y Mirador, del municipio de Palermo, Huila (27/02/2026).
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Aipe - Chenche	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Aipe, Chenche y sus afluentes. Especial atención en los municipios Aipe (Huila) y Natagaima (Tolima).
⚠	Alto Magdalena	Cuenca del río Prado	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Prado, Cuinde y Negro, afluentes al embalse de Prado, especial atención en los municipios de Cunday, Villarrica y Prado (Tolima). **Nota:** Desbordamiento de la quebrada Caliche a la altura de la vereda Aco del municipio de Prado, Tolima (23/02/2026).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

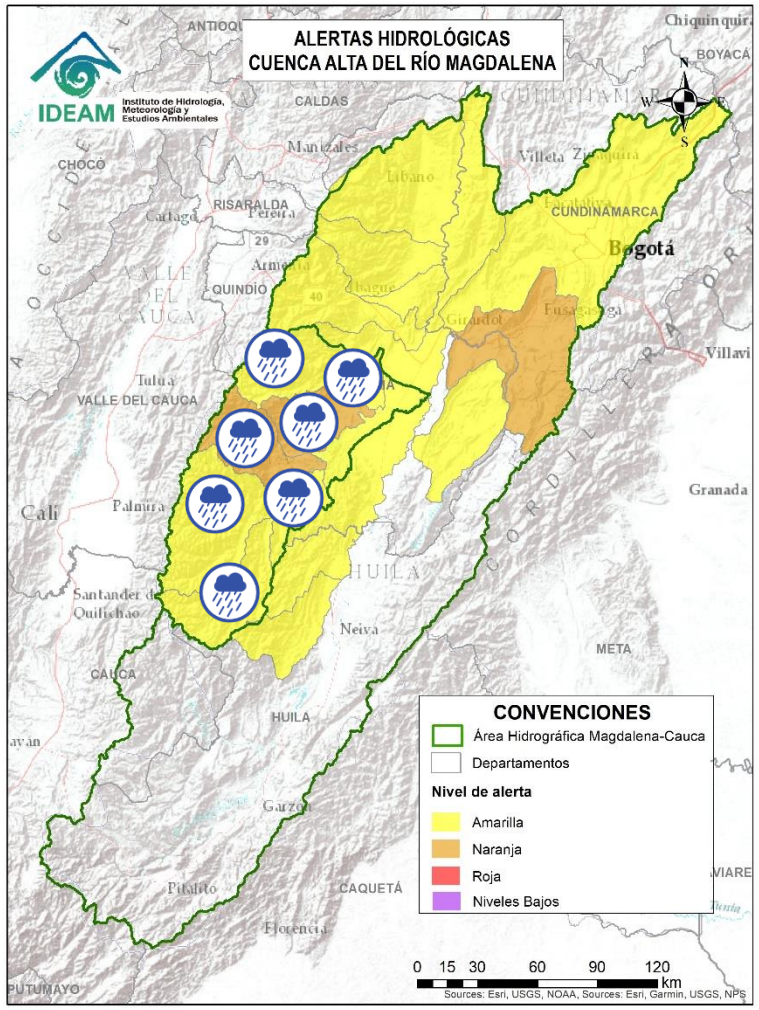

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Saldaña	Cuenca del río Atá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Atá, aportante al Alto Saldaña en el departamento del Tolima.
	Saldaña	Cuenca Alta del río Saldaña	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca Alta del río Saldaña y sus afluentes como son los ríos Hereje, Anamichú y Cambrín, especial atención en los municipios Herrera y Rioblanco, en el departamento del Tolima.
	Saldaña	Cuenca media del río Saldaña	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca media del río Saldaña. Especial atención en el municipio de Ataco, en el departamento del Tolima.
	Saldaña	Cuenca baja del río Saldaña	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca baja del río Saldaña. Especial atención en el municipio de Saldaña en el departamento del Tolima.
	Saldaña	Cuenca del río Amoyá	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Amoyá y sus aportantes en el departamento del Tolima. Especial atención al municipio de Chaparral.
	Saldaña	Cuencas de los ríos Tetuán y Ortega	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Tetuán y Ortega en el departamento del Tolima. Se recomienda especial atención en la zona urbana del dicho municipio de Ortega y Chaparral.
	Saldaña	Cuenca del río Cucuana	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cucuana y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Roncesvalles, Rovira y San Luis, en el departamento del Tolima.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

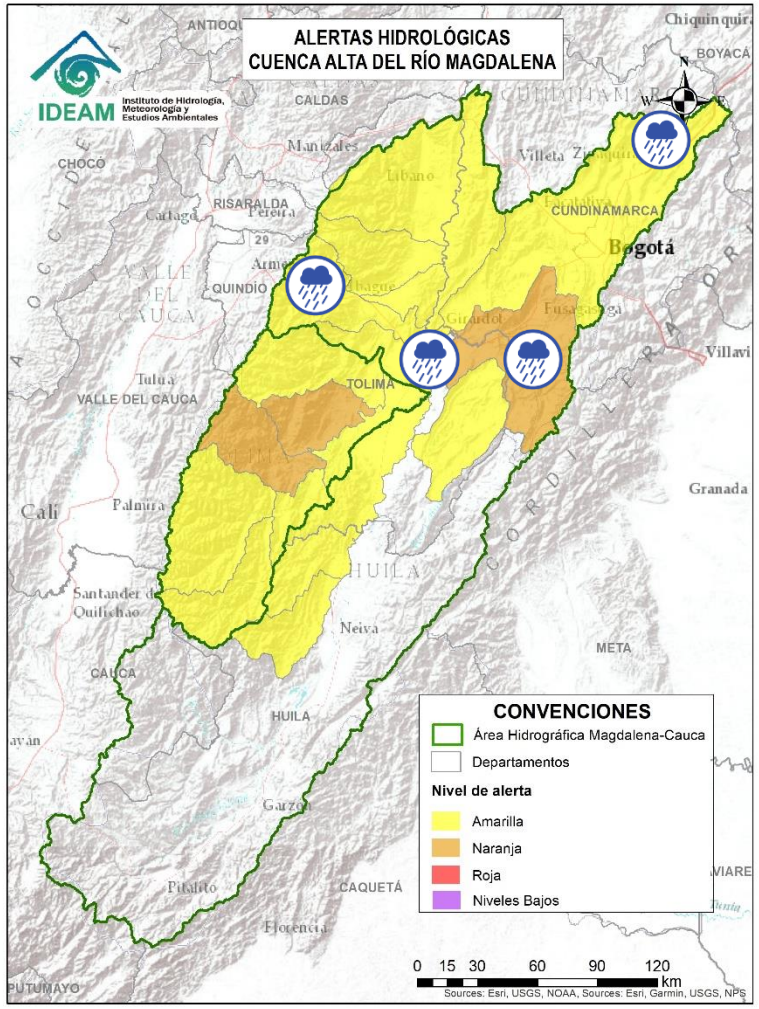

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Alto Magdalena	Cuenca del río Luisa	Probabilidad de incrementos moderados en los niveles del río Luisa y sus afluentes, directos al Alto Magdalena. Especial atención a la altura de los municipios de Valle de San Juan y Róvira (Tolima).
	Alto Magdalena	Cuenca del río Coello	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Coello y sus tributarios, especialmente el río Combeima y la quebrada Bellavista en centro poblado de Villa Restrepo. Se recomienda especial atención en la ciudad de Ibagué.
	Alto Magdalena	Cuenca del río Sumapaz	Crecientes súbitas en el río Sumapaz, se prevé igual condición en sus afluentes tales como los ríos Cuja, Subía, Pague y las quebradas Yayatá, La Arenosa, La Lejía y Sabaneta. Se recomienda especial atención en los municipios de Ricaurte, Cabrera, Pandi, Melgar, Arbeláez, Silvania y Nilo (Cundinamarca) y Carmen de Apicalá (Tolima).
	Alto Magdalena	Cuenca del río Opía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Opía y sus afluentes, especial atención en los municipios de Piedras (Tolima) y Nariño (Cundinamarca).
	Alto Magdalena	Cuenca Alta del río Bogotá	Probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta del río Bogotá y sus afluentes, especialmente en la quebrada Surará. Especial atención en los municipios de La Calera, Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Zipaquirá, Tocancipá, Chía (Cundinamarca) y Bogotá D.C. **Nota**: Inundaciones en la parte baja del Barrio Lucero –Bogotá (24/02/2026)

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Magdalena)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

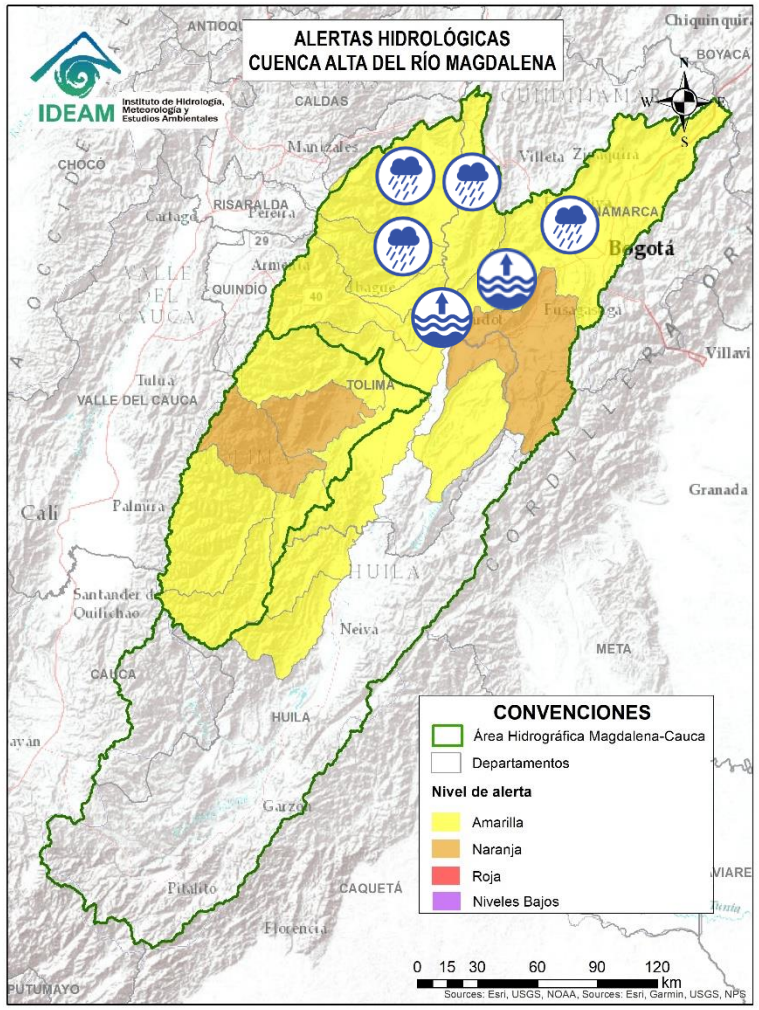

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Alto Magdalena	Cuenca media del río Bogotá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bogotá y sus afluentes, especialmente los ríos Subachoque, Torca, Córdoba, Salitre, Fucha, Tunjuelo, Apulo y Lindo, y las quebradas Yomasa, La Pilama y Cachimbula. Se recomienda especial atención en los municipios de Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Zipaquirá, Tocancipá, Chía, Madrid, Funza, Mosquera, Bogotá, Soacha, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios y Girardot (Cundinamarca).
	Alto Magdalena	Cuenca Baja del río Bogotá	Niveles altos en la cuenca baja del río Bogotá y probabilidad de crecientes súbitas en sus aportantes, tales como los ríos Apulo y Lindo, y las quebradas La Pilama y Cachimbula. Especial atención en municipios de San Antonio del Tequendama, El Colegio, Tena, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios y Girardot (Cundinamarca).
	Alto Magdalena	Cuenca del río Totare	Probabilidad de creciente súbita en el río Totare y probabilidad de incrementos moderados en los niveles sus afluentes, especial atención en los municipios de Anzoátegui, Alvarado y la ciudad de Ibagué.
	Alto Magdalena	Cuenca del río Lagunilla	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Azufrado, Lagunilla, Recio, Sabandija y Venadillo, afluentes del alto Magdalena, así como en las quebradas Chocarí y Galapos. Se recomienda especial atención en los municipios de Ambalema, Armero, Lérida, Líbano, Murillo, Santa Isabel, Venadillo y Villahermosa (Tolima).
	Alto Magdalena	Cuenca del río Seco y otros directos al Magdalena	Probabilidad de incrementos moderados en el nivel del río Seco entre otros directos al Magdalena en este sector. Se recomienda especial atención en los municipios de Jerusalén y San Juan de Rioseco (Cundinamarca).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

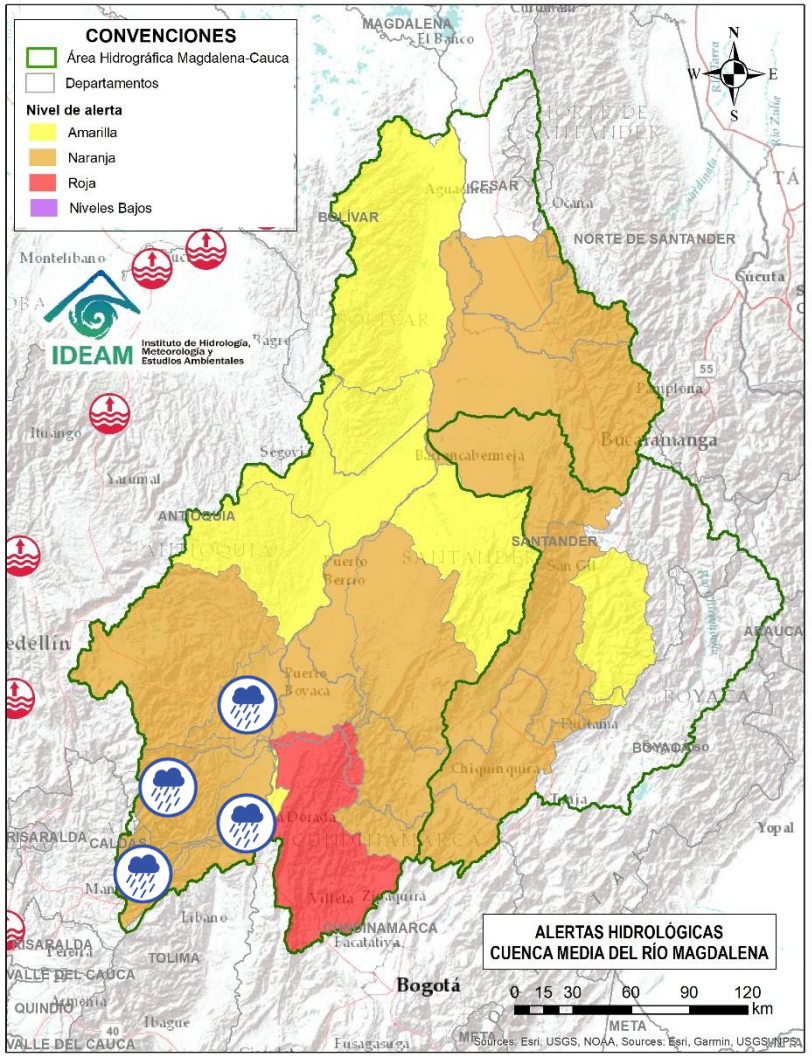

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Medio Magdalena	Cuenca del río Gualí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río y sus afluentes, especialmente en el río San Juan. Especial atención en los municipios de Fresno (Tolima), Mariquita (Tolima), Pensilvania (Caldas), Casablanca (Tolima) y Samaná (Caldas).
	Medio Magdalena	Cuenca del río Guarinó	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guarinó, especialmente en la quebrada San Antonio y el río Perrillo. Especial atención en el municipio de Manzanares (Caldas).
	Medio Magdalena	Directos al Medio Magdalena entre los ríos Guarinó y La Miel	Probabilidad de crecientes súbitas en los directos al Medio Magdalena entre los ríos Guarinó y La Miel, se recomienda especial atención en el municipio de La Dorada (Caldas).
	Medio Magdalena	Cuenca del río La Miel (Samaná)	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río La Miel, especialmente en sus aportantes entre ellos el río Venus en el municipio de Nariño (Antioquia). Especial atención en los municipios de Argelia, Marquetalia, Nariño, Norcasia, Pensilvania, Samaná y Sonsón (Antioquia).
	Medio Magdalena	Cuenca de los directos al Magdalena entre La Miel y Nare	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Medio Magdalena entre los ríos La Miel y Nare, especialmente en el río Claro (Cocorná Sur) y sus aportantes como la quebrada Las Mercedes. Especial atención a la altura de los municipios de Sonsón, Puerto Triunfo, Puerto Nare y San Francisco (Antioquia).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

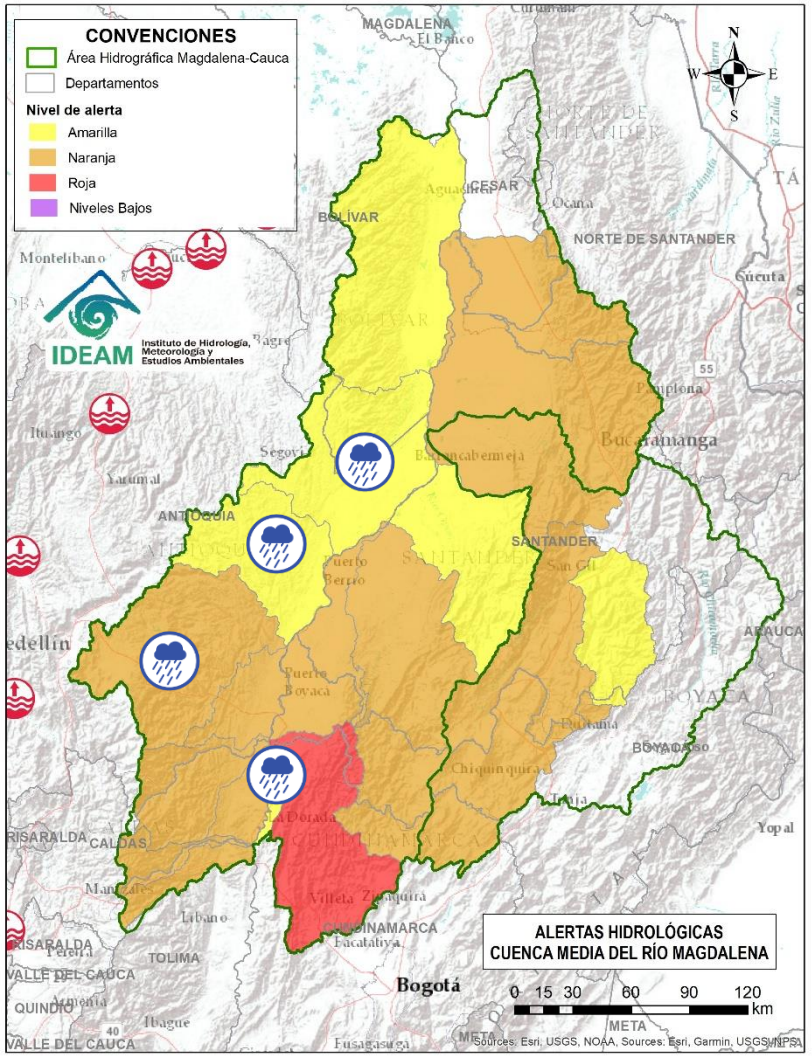

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Medio Magdalena	Cuenca del río Nare	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nare y sus afluentes, especialmente en los ríos Samaná, Guatapé, Nus, Negro, Pantanillo y las quebradas Iraka (Natalia), San Roque, La Pereira, La Grande, Marinilla, El Arenal, La Mosca, Santa Gertrudis, Guayabal, La Villa, La Chorrera, La Paisanita, La Aguada, La Cristalina, Bodegas, Tenería y La Reina. Se recomienda estar atentos en los municipios de Guarne, El Retiro, La Ceja, Cisneros, San German, San Roque, Caracolí, Santo Domingo, Concepción, Rionegro, Santuario, Marinilla, Cocorná, Granada, San Luis, Yolombó, Puerto Nare, San Francisco, San Carlos y San Rafael (Antioquia). Granada, San Luis, Yolombó, Puerto Nare, San Francisco, San Carlos y San Rafael (Antioquia).
	Medio Magdalena	Cuenca del río San Bartolo	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río San Bartolo, especialmente en sus aportantes de la cuenca Media-Baja, estar atentos en los ríos Vegachi, Regla, La Cruz y El Volcán, las quebradas La Gallinera y La Malena, entre otros. Especial atención en los municipios de Yolombó, Vegachi, Maceo y Puerto Berrio (Antioquia).
	Medio Magdalena	Cuenca del río Cimitarra	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cimitarra y sus afluentes, especial atención en los municipios de Cantagallo (Bolívar), Yondó y Remedios (Antioquia).
	Medio Magdalena	Directos al medio Magdalena entre los ríos Seco y Negro (md)	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Medio Magdalena entre los ríos Seco y Negro. Especial atención en el municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

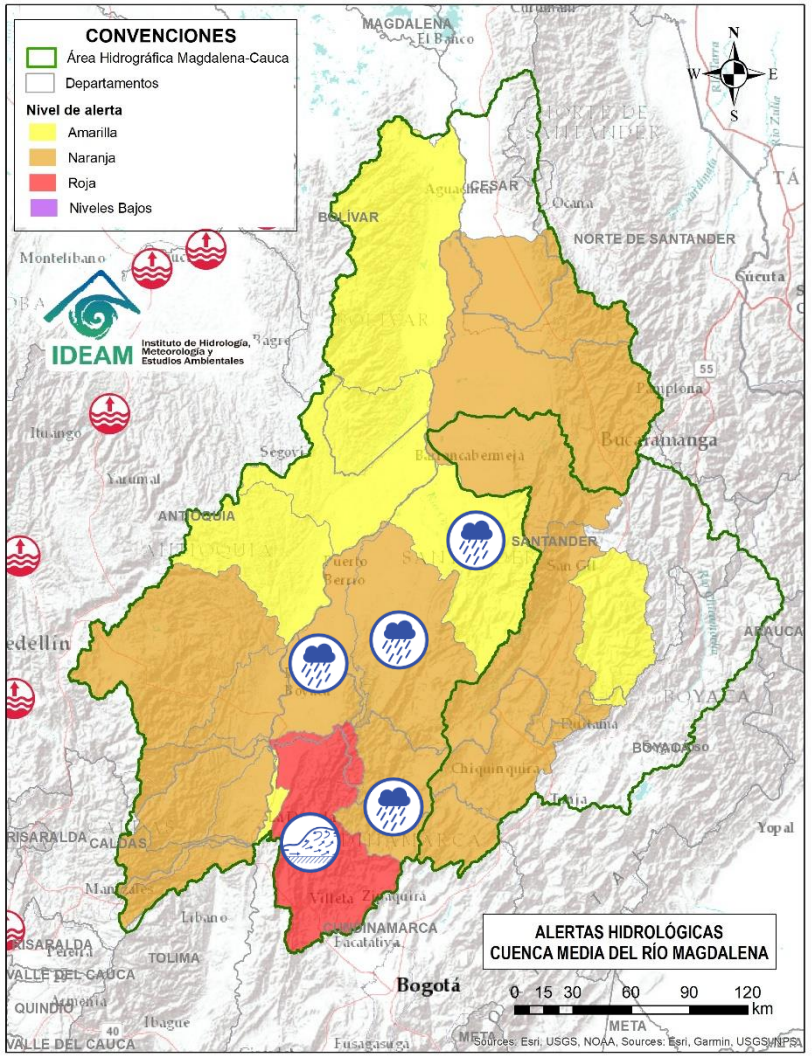

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Medio Magdalena	Cuenca del río Negro	Crecientes súbitas del río Negro y sus aportantes, se recomienda especial atención en los ríos Bunque, Contador, Guaguaqui, Las Cañas, Moras, Negro, Sasaima, Tobia, Villeta, y las quebradas Agua Clara, Amarilla, Furatena, Honduras, La Chorrera, La Negra, La Papaya, Las Margaritas, Reyes y Retama. Especial atención en los municipios de Caparrapí, Guaduas, La Peña, La Vega, Nimaima, Pacho, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Tobia, Útica, Villeta, Villagómez y Yacopí (Cundinamarca).
	Medio Magdalena	Directos al Magdalena Medio entre ríos Negro y Carare	Probabilidad de crecientes súbitas en los directos al Medio Magdalena entre los ríos Negro y Carare, especialmente en los ríos Guaguaqui y Ermitaño, y el caño Loco. Se recomienda especial atención en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).
	Medio Magdalena	Cuenca Alta y Media del río Carare	Probabilidad de crecientes súbitas en los niveles de los ríos Minero y sus afluentes (Cuenca alta y media del Carare) como quebrada La Locha. Se recomienda especial atención en los municipios de San Cayetano (Cundinamarca), Pauna, Muzo, Otanche, Buenavista, San Pablo de Borbur, Quípama y Maripí (Boyacá).
	Medio Magdalena	Cuenca baja del río Carare	Probabilidad de crecientes súbitas en el nivel del río Carare en su parte baja y en sus aportantes, a la altura de los municipios de Cimitarra y Puerto Parra (Santander).
	Medio Magdalena	Cuenca del río Opón	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Opón y sus tributarios, especialmente en la quebrada Capote y en los ríos Cascajales, Honduras, Bermelanola y La Colorada. Especial atención a la altura de los municipios Simacota, Santa Helena, Puerto Parra y El Carmen del Chucuri (Santander).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

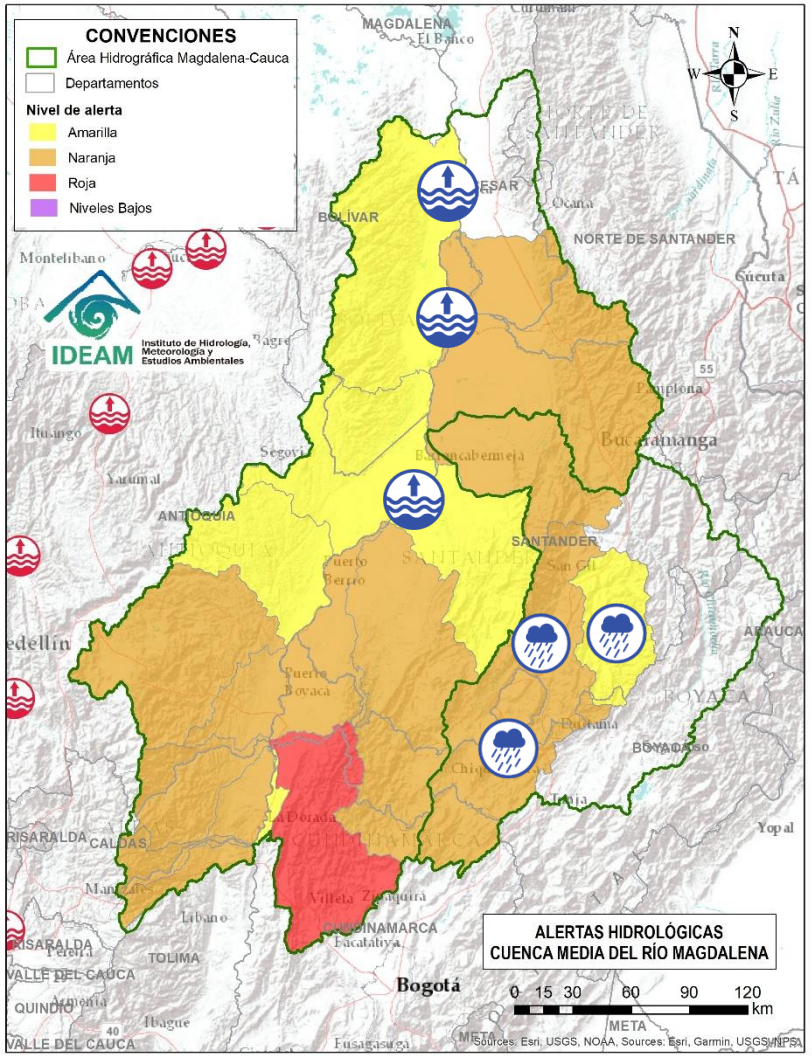

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Medio Magdalena	Medio Magdalena	Niveles altos en el río Magdalena entre los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches (Santander), San Pablo (Bolívar) y Gamarra (Cesar). Se recomienda estar atentos en los centros poblados ribereños de dichos municipios, ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
	Sogamoso	Cuenca del río Suárez	Probabilidad de recientes súbitas en el río Suárez y sus afluentes, como son los ríos Cane, Moniquirá, Jupal, Ubaza, Fativa, Chuquque, Cedaba y las quebradas La Honda, Favitera, La Vitoca, La Guayacana, El Aserradero, La Negra y La Paramera. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Ubaté, Fúquene (Cundinamarca), Arcabuco, Chichinquirá, Chitaraque, Gámbita, Guachantivá, Moniquirá, Saboya, Saboyá, Santa Sofía y Villa de Leyva (Boyacá), Barbosa, Cabrera, Chipatá, Confines, Galán, Gámbita, Guadalupe, Güepsa, Oiba, Palmar, Puente Nacional, San Benito, Simacota, Socorro, Suata y Villanueva (Santander).
	Sogamoso	Cuenca del río Fonce	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Fonce y sus afluentes, especialmente las quebradas Curití, Pozo Azul, Las Américas y río Mogoticos. Se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Mogotes, Charalá, San Gil, Curití y Páramo (Santander).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca media del Río Magdalena)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

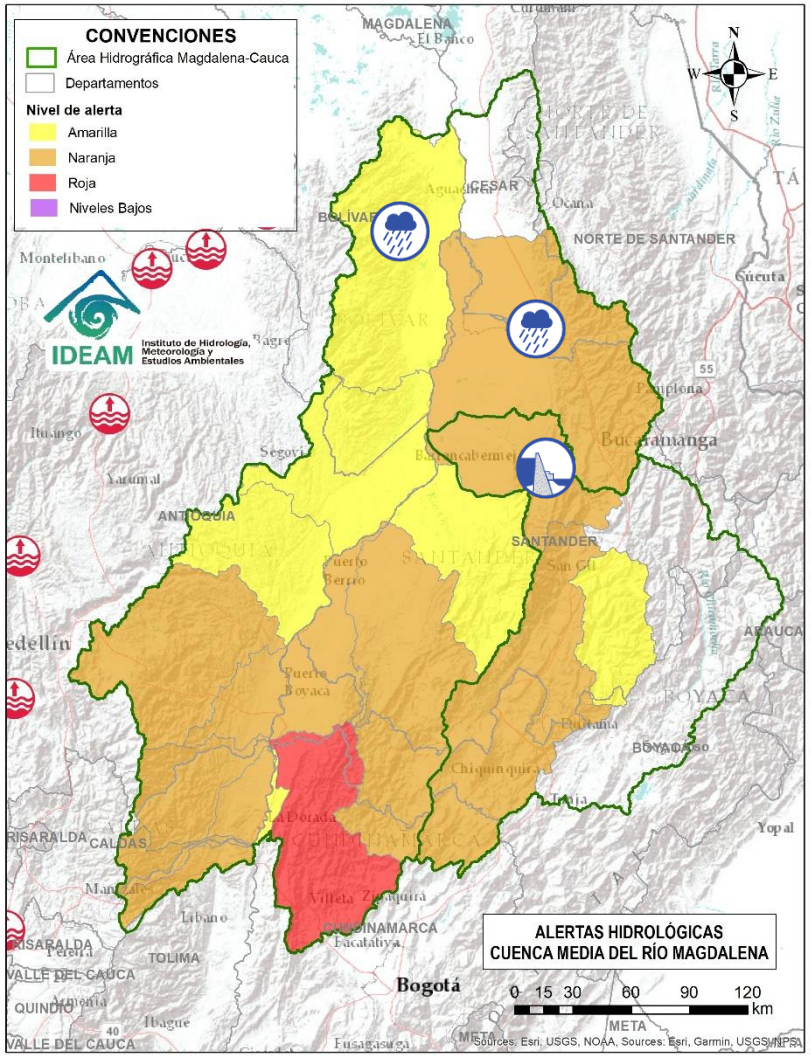

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Sogamoso	Cuenca del río Sogamoso	Probabilidad de crecientes súbita en el río Sogamoso y sus afluentes. Estar atentos a la altura de los municipios Piedecuesta, Los Santos, Girón y Zapatoca. **Nota:** Se recomienda especial atención en el corredor ribereño entre Puente La Paz a Bocas del Sogamoso (desembocadura al río Magdalena), por posibles incrementos en el nivel del río Sogamoso como consecuencia del tránsito de onda por descarga controlada del embalse de Topocoro. Se recomienda especial atención a las poblaciones ribereñas de los sectores Marta (Girón), El Puente, La Playa, Casa de Barro, Tienda Nueva, El Peaje (Betulia), San Luis de Río Sucio (Sabana de Torres), La Cascajera (Barrancabermeja), Puerto Cayumba, El Pedral, La Lucha, Puente Sogamoso y Bocas de Sogamoso (Puerto Wilches).
⚠	Medio Magdalena	Cuenca del río Lebrija	Probabilidad de crecientes en el río Lebrija y sus aportantes, especialmente en las quebradas La Ruitoca, Zapamanga, Agua Blanca, Española, La Iglesia, Vega de Oro, Chirrerón, El Caraño, La Raya, La Lejía, San Alberto, El Palo y La Cascajera, y los ríos Frío, Hato, Cáchira, Río de Oro, Charta, Florida Blanca, San Pablo y El Playón. Especial atención en los municipios de Cáchira, La Esperanza (Norte de Santander), Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Rionegro, Bucaramanga, Sabana de Torres y Puerto Wilches (Santander).
⚠	Medio Magdalena	Directos al Magdalena (Brazo Morales)	Probabilidad de incremento en los niveles de los ríos directos al Magdalena en el Brazo Morales y sus aportantes, especialmente la quebrada Norosí en el municipio de Norosí (Bolívar).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

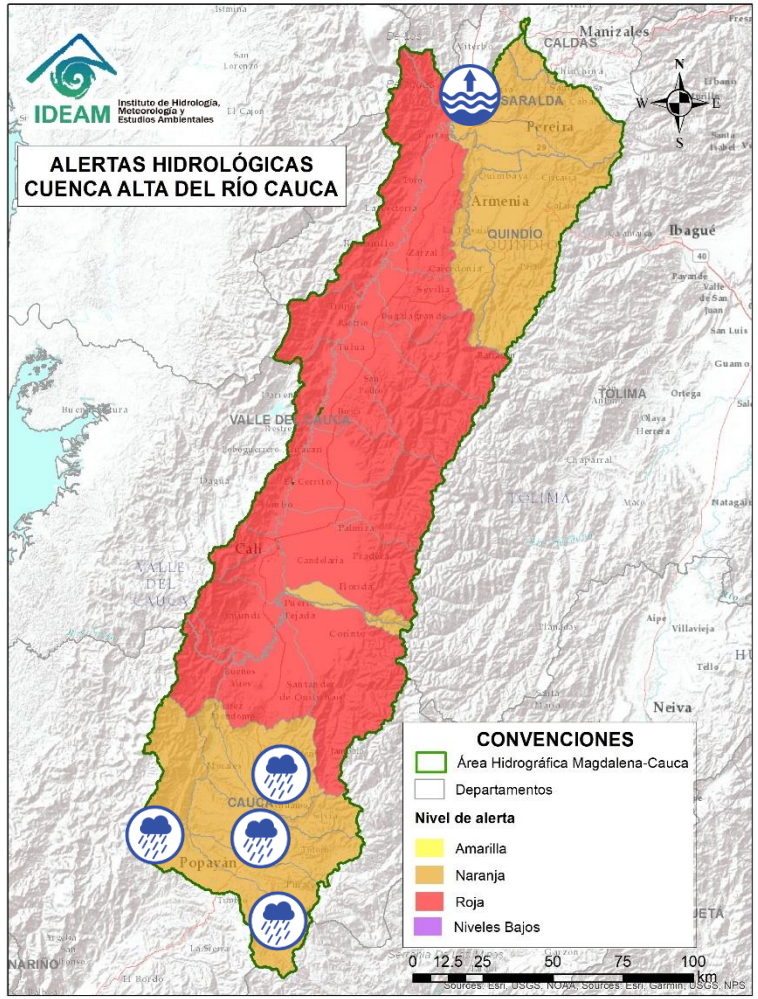

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Alto Río Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH del Alto Cauca, especialmente en el río San Francisco y río Blanco en el municipio de Puracé (Cauca), también en el río Piedras y la quebrada Pubus en el municipio de Popayán (Cauca). **Nota:** A la fecha, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reporta de acuerdo con la actividad del volcán Puracé, éste se encuentra en alerta amarilla. La cuenca alta del río Cauca, en los municipios de Puracé y Popayán, presenta **amenaza alta por lahares** provenientes del volcán Puracé. En el contexto de posible erupción, un flujo de lodo de origen volcánico podría encauzarse por los valles y quebradas que descienden del volcán, alcanzando sectores como Puracé (valle del río Vinagre), la población de Paletará (que se encuentra en la desembocadura de la quebrada Río Blanco en el río Cauca), el complejo minero de Azufre EMICAUCA y la represa Florida II. Estos lahares, con potencial de recorrer más de 50 km, podrían incorporarse al cauce del río Cauca y afectar áreas urbanas y rurales de Popayán localizadas cerca del río (Servicio Geológico Colombiano, 2014).
⚠	Cauca	Cuenca del río Salado	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Salado y sus afluentes como el río Negro (Cauca). Especial atención entre los municipios de El Tambo, Sotará y Puracé (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Palacé	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Palace y sus afluentes (aportante al Alto Cauca). Especial atención en los municipios de Totoró, Popayán y Cajibío (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Piendamó	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Piendamó, especialmente en la quebrada Manchay. Se recomienda especial atención en los municipios de Silvia, Piendamo, Morales y Suárez (Cauca).
⚠	Cauca	Cuenca del río Ovejas	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Ovejas y en el río Colcha, especialmente en los municipios de Caldono y Piendamó (Cauca).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

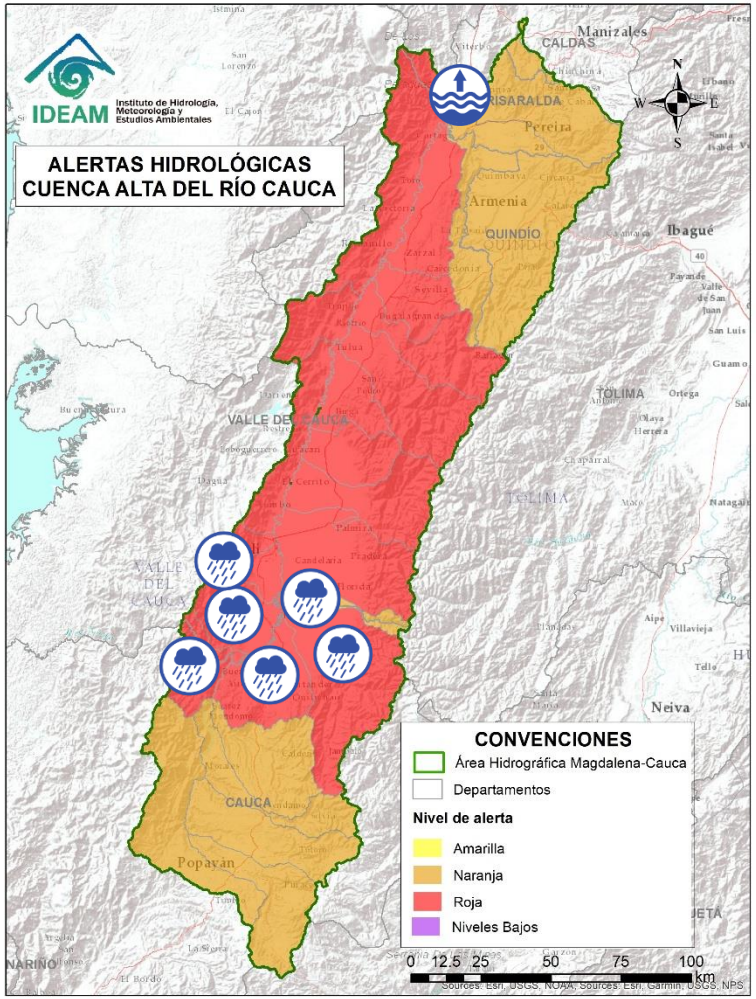

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Cauca	Cuenca del río Quinamayó	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Quinamayó, Quilichao y sus aportantes, la quebrada La Antonia y el río Chiquito. Especial atención en los municipios de Caloto y Santander de Quilichao (Cauca). **Nota:** Se reportan inundaciones en el casco urbano del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), por desbordamientos de quebradas. (16/02/2026)
	Cauca	Cuenca del río Timba	Probabilidad de creciente súbita en el río Timba y sus afluentes, especial atención entre los municipios de El Cedral y Buenos Aires (Cauca).
	Cauca	Cuenca del río Palo	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Palo y sus aportantes especialmente las quebradas Caparroza y Gargantilla, y los ríos Paila, Guengüe, Jagual y Negro. Especial atención en los municipios de Silvia, Padilla, Miranda, Toribio, Caloto, Padilla, Puerto Tejada y Corinto (Cauca).
	Cauca	Cuenca de los ríos Claro y Jamundí	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Claro, Jamundí, Pance y sus afluentes. Se recomienda especial atención al municipio de Jamundí, Valle del Cauca. **Notas: 1)** Se reportó desbordamiento del río Jamundí a la altura del sector Puente de Las Brujas del municipio de Jamundí, Valle del Cauca (02/02/2026). **2)** Se reporta desbordamiento del Río Cauca, en la zona agrícola del corregimiento de Villa Paz, Jamundí (24/02/2026)
	Cauca	Cuencas de los ríos Lilí, Meléndez y Cañaveralejo	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Lilí, Meléndez y Canaveralejo, afluentes al Alto Cauca en el departamento de Valle del Cauca. Se recomienda especial atención en la ciudad de Cali.
	Cauca	Cuenca del río Cali	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cali y sus afluentes. Se recomienda especial atención en la ciudad de Cali.
	Cauca	Cuenca del río Desbaratado	Probabilidad de crecientes súbitas del río Desbaratado y sus afluentes, aportantes al río Cauca en el departamento Valle del Cauca.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

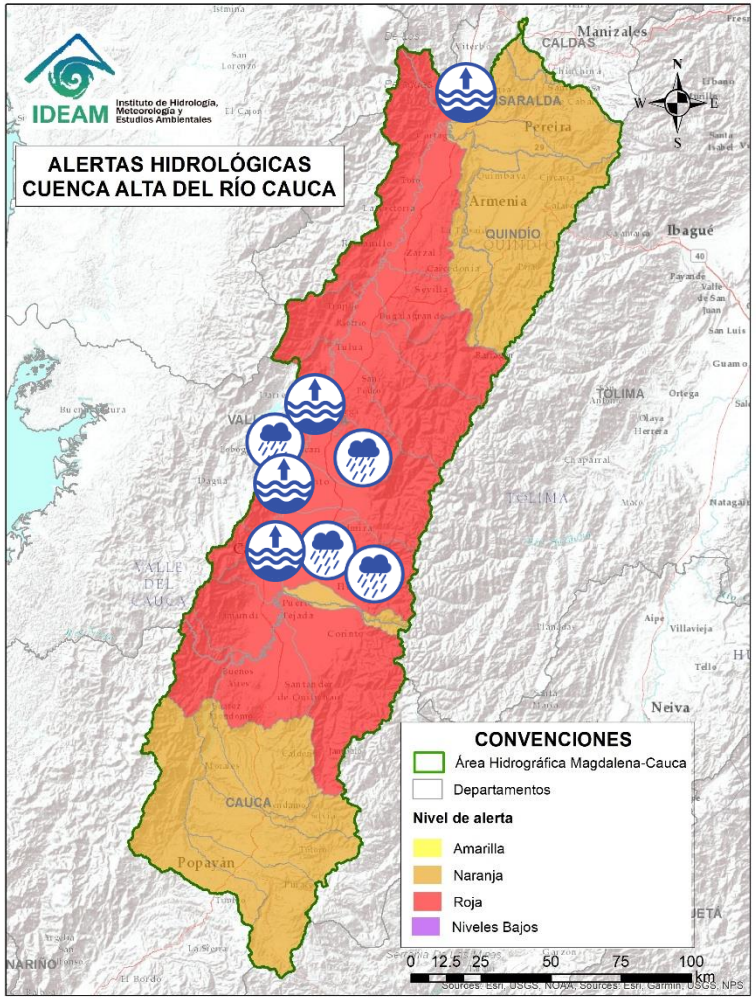

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuencas de los ríos Guachal, Bolo, Fraile y Párraga	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Bolo, Fraile, Guachal y Párraga y sus afluentes, aportantes al río Cauca en el departamento del Valle del Cauca. Especial atención en los municipios de Candelaria, Florida, Palmira y Pradera. **Nota:** Inundación por lluvias en el municipio de Florida, Valle del Cauca (23/02/2026).
⚠	Cauca	Alto río Cauca	Niveles altos del río Cauca en su recorrido por los municipios de Jamundí, Cali, Candelaria, Yumbo, Palmira, Vijes, El Cerrito, Yotoco, Guacarí, Buga, San Pedro y Tuluá (Valle del Cauca). Se recomienda estar atentos en las comunidades aledañas a la ribera del río ante posibles desbordamientos e inundaciones. **Nota**: **1)** inundaciones por desbordamiento del rio Cauca, en el corregimiento de Villapaz del municipio de Jamundí (24/02/2026). **2)** Se reporta el desbordamiento del río Cauca, a la altura de los municipios de Jamundí, Cali, Candelaria y Vijes en el Valle del Cauca (25/02/2026). **3)** Se reportó rompimiento de Jarillón y desbordamiento del río Cauca a la altura de la hacienda El Canelo, entre los municipios de Rozo y Cerrito, Valle del Cauca (27/02/2026).
⚠	Cauca	Cuencas de los ríos Amaime y Cerrito	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Amaime, Cerrito y sus afluentes como el río Nima (departamento de Valle del Cauca). Especial atención en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. **Nota:** Se reporta creciente súbita del rio Cerrito a la altura del corregimiento de San Antonio, municipio de El cerrito, Valle del Cauca (13/02/2026).
⚠	Cauca	Cuencas de los ríos Guabas, Sabaletas y Sonso	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Guabas, Sabaletas, Sonso y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Ginebra y Guacarí (departamento de Valle del Cauca). **Nota: 1)** Se reportó desbordamiento del río Terciario en el sector Sonso del municipio de Guacarí, Valle del Cauca (05/02/2026). **2)** Creciente súbita en el nivel del rio Sonso a la altura de Guacarí, Valle del Cauca (24/02/2026).
⚠	Cauca	Cuencas directas al río Cauca en el departamento del Valle del Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la SZH de los ríos Arroyohondo, Dapa, Mediacanoa, Mulalo, Piedras, Vijes y Yotoco y sus afluentes (departamento de Valle del Cauca).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

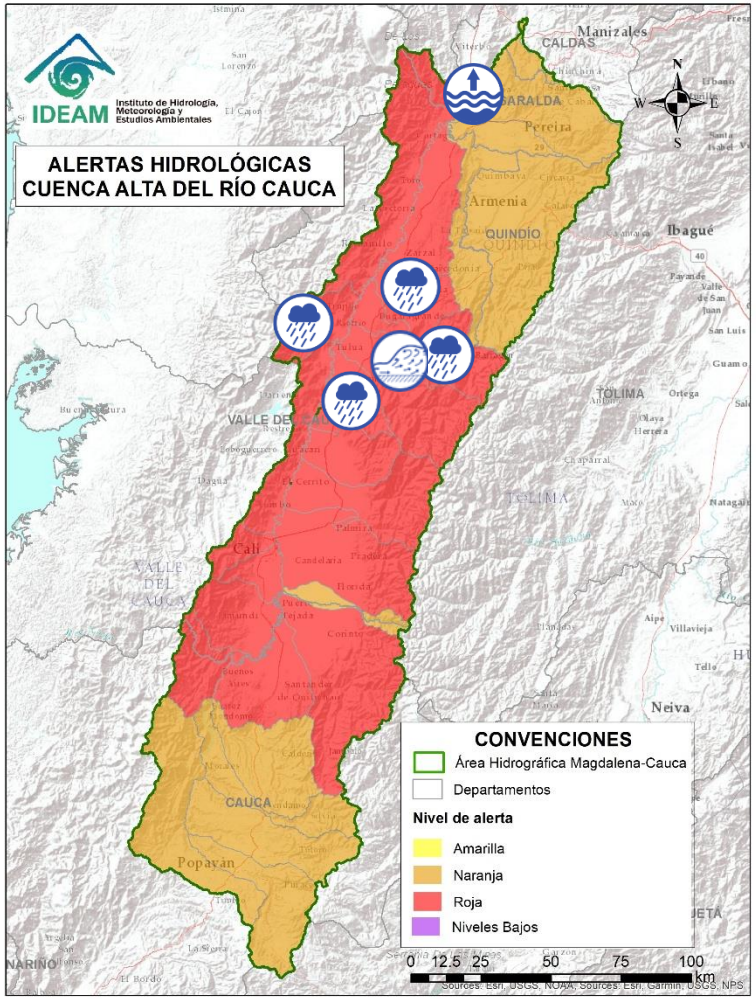

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Cauca	Cuenca de los ríos Guadalajara y San Pedro	Probabilidad de crecientes en las cuencas de los ríos Guadalajara, San Pedro y sus afluentes, especialmente la quebrada La Pachita. Especial atención en los municipios de Guadalajara de Buga y San Pedro (departamento de Valle del Cauca). **Nota: 1).** Se presenta inundaciones en la vereda La Puente del Municipio de San Pedro, Valle del Cauca. (12/02/2026). **2**.) Se reporta creciente súbita del rio Guadalajara a la altura de la vereda La María, del municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca (12/02/2026).
⚠	Cauca	Cuencas de los ríos Tuluá y Morales	Crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Tuluá y Morales, entre otros aportantes al río Cauca en el departamento del Valle del Cauca, especialmente el río San Pedro. Especialmente atención al municipio de Tuluá, Valle del Cauca. **Notas: 1).** Desbordamiento del río Tuluá, generando afectaciones en el casco urbano del municipio de Tuluá (01/02/2026). **2).** Se reporta desbordamiento del río Tuluá a la altura de la carrera 28, en el barrio Tomás Uribe del municipio de Tuluá, Valle del Cauca (13/02/2026). **3).** Se reportan crecientes súbitas del rio Barragán, a la altura del municipio de Caicedonia (15/02/2025).
⚠	Cauca	Cuenca río Frío	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Frío y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Riofrío y Trujillo. **Nota:** inundaciones en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca (21/02/2025).
⚠	Cauca	Cuencas del río Bugalagrande	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Bugalagrande y sus afluentes (departamento de Valle del Cauca). Especial atención a la altura del municipio de Andalucía y Bugalagrande.
⚠	Cauca	Cuenca del río La Paila	Probabilidad de creciente súbita en el río La Paila y sus afluentes (quebradas San José, Brasil, La Esperanza, Sanabria y San Marcos). Especial atención a la altura de los municipios de Zarzal y Sevilla (Valle del Cauca).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca alta del Río Cauca)

Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

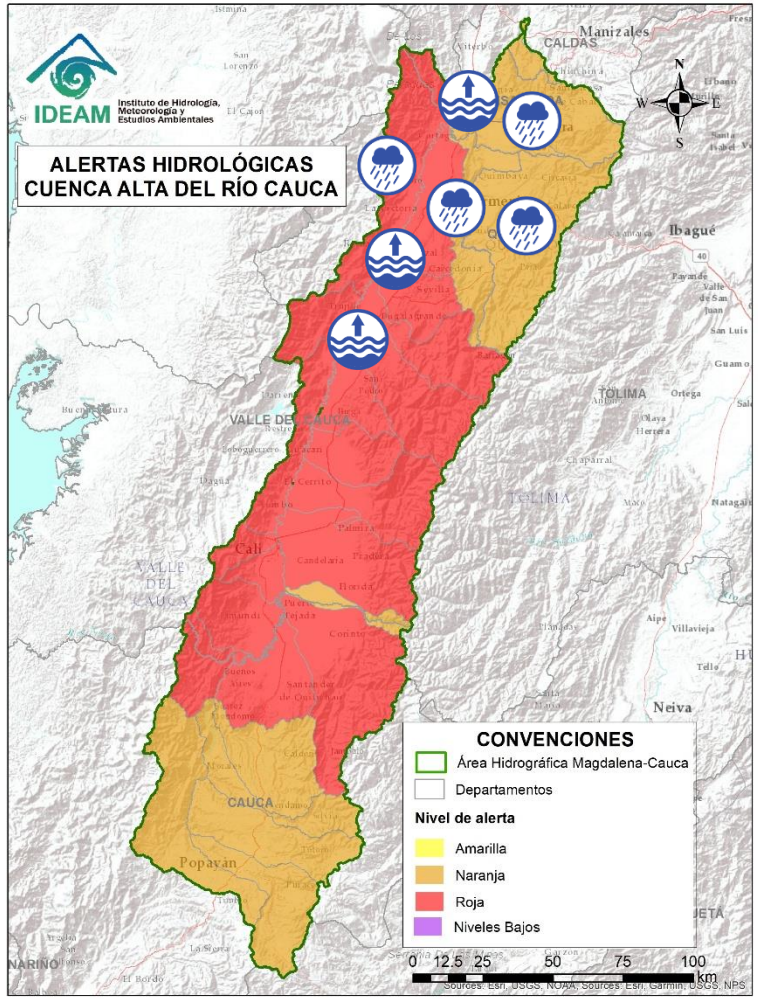


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Cauca	Cuencas aportantes al río Cauca en el norte departamento del Valle del Cauca (md)	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca de las quebradas Las Cañas - Los Micos y Obando, aportantes al Cauca en el departamento Valle del Cauca. Especial atención en los municipios de Zarzal, la Victoria, Obando y Cartago. **Nota:** Se reportaron inundaciones por fuertes lluvias en la zona urbana del municipio de Zarzal, Valle del Cauca (18/02/2026).
	Cauca	Ríos Pescador – RUT – Chanco – Catarina – Cañaveral	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Roldanillo, Cáceres, Quebrada El Rey, Zanjón Los Mudos y Quebrada La Unión asociados con el distrito de riego del RUT (ríos Roldanillo - La Unión - Toro) y pertenecientes a la subzona hidrográfica de los ríos Pescador, Chanco, Catarina, Cañaveral (departamento de Valle del Cauca), se recomienda especial atención en los municipios de El Águila, Roldanillo y La Unión (Valle del Cauca). **Nota**: Inundaciones en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca (21/02/2025).
	Cauca	Cuenca del río La Vieja	Probabilidad de crecientes súbitas en el río La Vieja y sus afluentes, especialmente en los ríos Verde (municipios de Córdoba y Buenavista) y Quindío (municipios de Calarcá y Salento), río Lejos y la quebrada La Iglesia (municipio de Pijao), rio Barragán. Se recomienda especial atención en los municipios de Tebaida, Pijao, Génova, Armenia, Calarcá y Salento (Quindío), Caicedonia y Cartago (Valle del Cauca). **Nota**: Creciente súbita del río La Vieja a la altura de Cartago, Valle del Cauca. (24/02/2026)
	Cauca	Río Cauca	Niveles altos del río Cauca en el tramo comprendido entre los municipios de Tuluá, Zarzal, La Victoria, Cartago (Valle del Cauca)) y La Virginia (Risaralda). Se recomienda estar atentos en las comunidades aledañas a la ribera del río.
	Cauca	Cuenca del río Otún y otros directos al río Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Otún y sus afluentes, especial atención al río San Eugenio. Se recomienda especial atención en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Marsella y Pereira (Risaralda).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca Media del Río Cauca)


IDEAM

Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

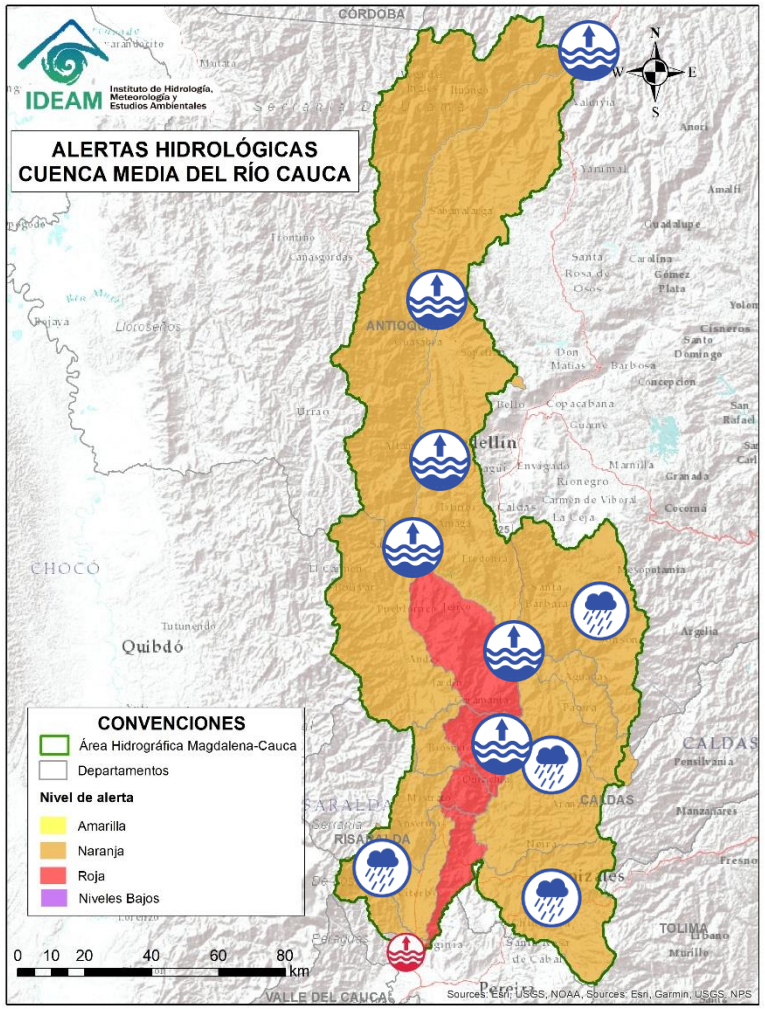


Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Cauca	Cuenca del río Chinchiná	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Chinchiná y sus afluentes en el Eje Cafetero. Especial atención en los municipios de Villamaría y Manizales (Caldas).
	Cauca	Cuenca del río Risaralda	Probabilidad Crecientes súbitas en el río Risaralda y sus afluentes, especialmente las quebradas Aguas Claras y Pidria, y los ríos Guática y Mapa. Especial atención a la altura del municipio de Anserma, Belalcázar, Riosucio y Viterbo (Caldas), Apía, Balboa, Belén de Umbría, La Virginia y Mistrató (Risaralda).
	Cauca	Cuenca media del río Cauca	Niveles altos del río Cauca en el tramo comprendido entre los municipios de La Virginia, Pereira (Risaralda) y La Pintada, en el departamento de Antioquia. Se recomienda estar atentos en las comunidades aledañas a la ribera del río ante posibles afectaciones por desbordamientos e inundaciones.
	Cauca	Cuenca media del río Cauca	Niveles altos del río Cauca en el tramo comprendido desde la estación La Pintada (a la altura del municipio La Pintada), pasando por los municipios de Fredonia y Venecia, hasta la estación Olaya (a la altura del municipio de Olaya). Se recomienda estar atentos en las comunidades aledañas a la ribera del río Cauca.
	Cauca	Cuenca del río Tapias	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tapias y sus afluentes en el Eje Cafetero. Especial atención en el municipio de La Merced, Filadelfia, Aranzázu, Neira, Pácora y Salamina (Caldas).
	Cauca	Cuenca del río Arma	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Arma y sus afluentes, especialmente las quebradas Guz y Gue, en el municipio de Abejorral y el río Piedras a la altura del municipio de La Unión (Antioquia).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca Media del Río Cauca)

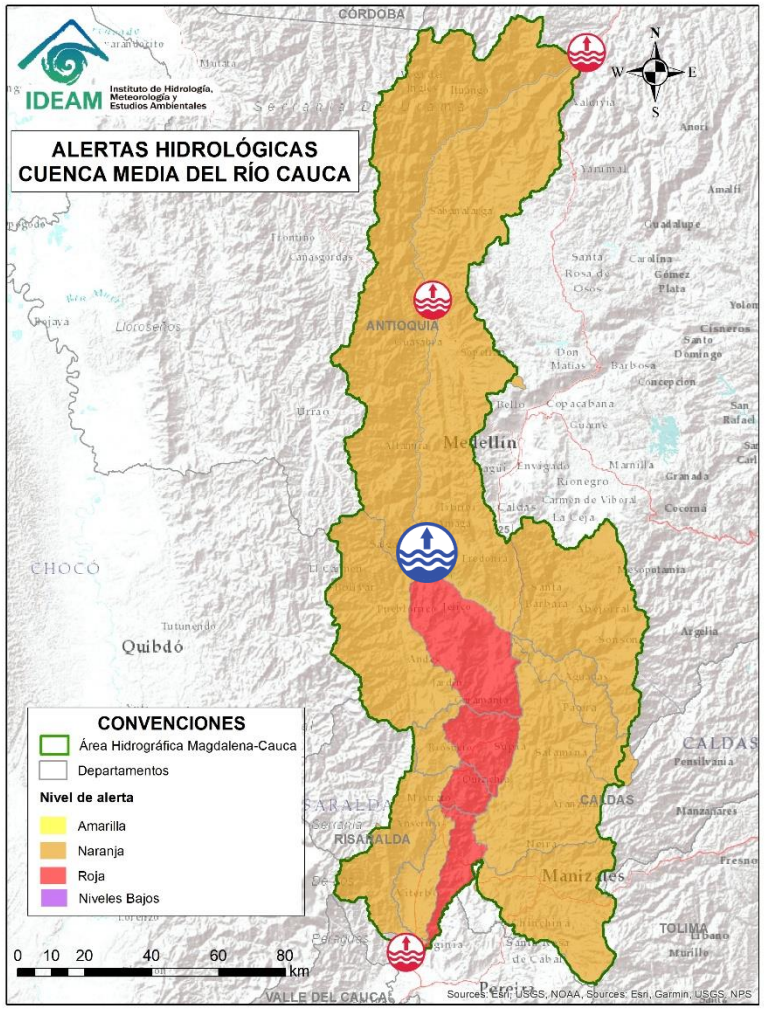

Condiciones proyectadas estación Bolombolo Rio Cauca

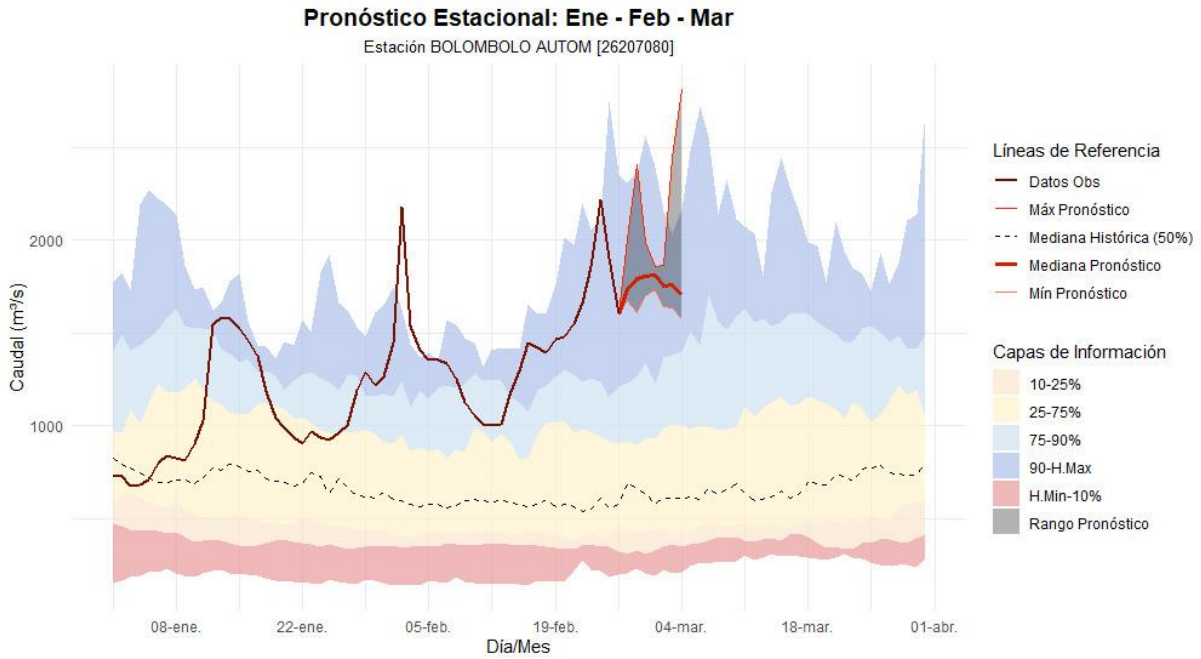


Condiciones Cauca Hidroituango: Acorde con las lluvias ocurridas y el pronóstico para los próximos días - El caudal se mantendrá en valores altos a la altura de Bolombolo. Actualmente, el río Cauca lleva cerca de 1.660 m^3/s, con posibilidad de aumento hasta 2.400 m^3/s para el 28 de febrero y 2.000 m^3/s para el 1 de marzo, en el rango de altos, antes de su paso por el embalse de Hidroituango.

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca Media del Río Cauca)

IDEAM


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

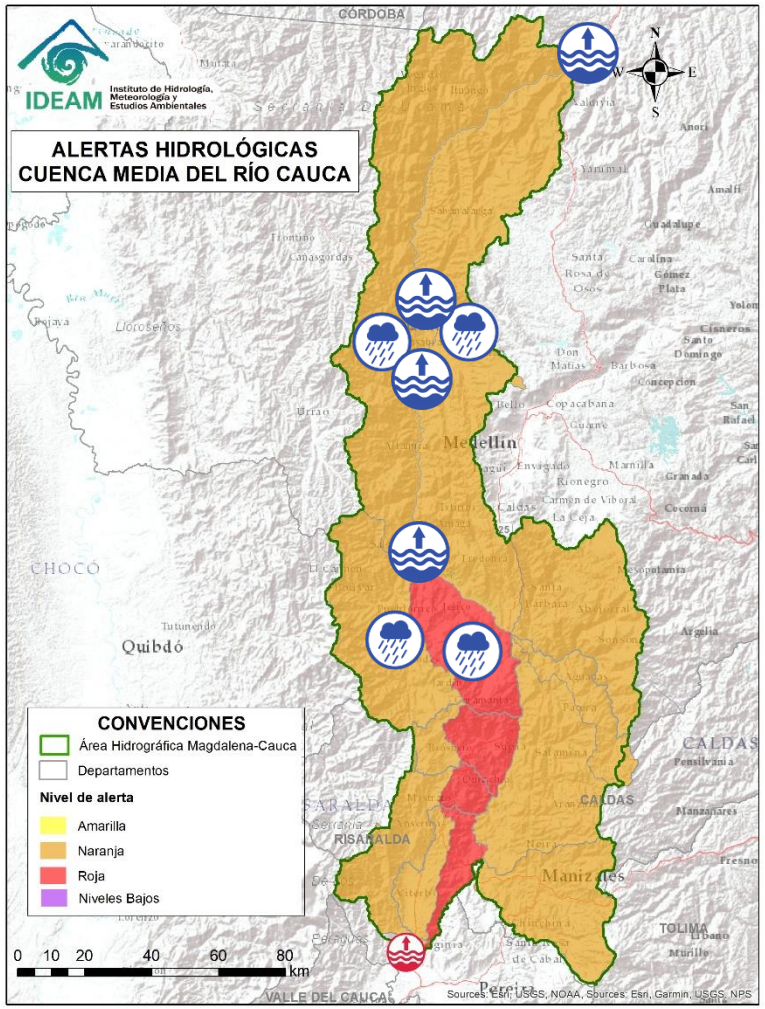

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Cauca	Cuenca del río Cartama y Otros Directos al Cauca	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Cartama (Antioquia) y sus aportantes como el río Supía (Caldas) y las quebradas Cascabel, La Leona, La Vega y Pantanos. Especial atención en los municipios de La Pintada, Pueblorrico, Támesis y Valparaíso (Antioquia), Marmato y Supía (Caldas) y Quinchína (Risaralda). **Nota:** Se reportó avenida torrencial en los sectores Cascabel, Chaburquia y San Pedro, municipio de Marmato, Caldas (12/02/2026).
	Cauca	Cuenca del río San Juan	Probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan y sus afluentes, especialmente en los ríos Taparto y Bolívar, y las quebradas La Liboriana, Los Monos y La Linda, a la altura de los municipios de Andes, Betania, Salgar, Ciudad Bolívar y Pueblorrico (Antioquia).
	Cauca	Cuenca media del río Cauca	Niveles altos del río Cauca en el tramo comprendido entre los municipios de Venecia, Tarso, Concordia y Olaya (Antioquia).
	Cauca	Directos al río Cauca entre San Juan - Pto Valdivia	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes a la SZH directos al río Cauca entre el río San Juan y Pto Valdivia, como el río Tonusco en el municipio de Santa Fe de Antioquia; la quebrada La Tigra en el municipio de Venecia; las quebradas Chachafrutal, La Frisola, Murrapal y Sopetrán a la altura del municipio de Buriticá; la quebrada La Guaduala a la altura de la cabecera municipal de Ebéjico; quebrada Selvana Sector El Refresco en el municipio Amagá; y el caño de La Carolina (Quebrada Piedra Verde) a la altura de la Vereda Jonás en el municipio de Fredonia. Especial atención en los municipios de Amagá, Armenia, Briceño, Buriticá, Concordia, Ebéjico, Fredonia, Heliconia, Ituango, Olaya, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Venecia (Antioquia). **Notas**: **1)** Se reportó avenida torrencial en la quebrada la Sucia, a la altura del municipio de Heliconia, Antioquía (06/02/2026). **2)** Se presentaron inundaciones en la urbanización la Guaca municipio de Heliconia, Antioquía (06/02/2026).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Cauca)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

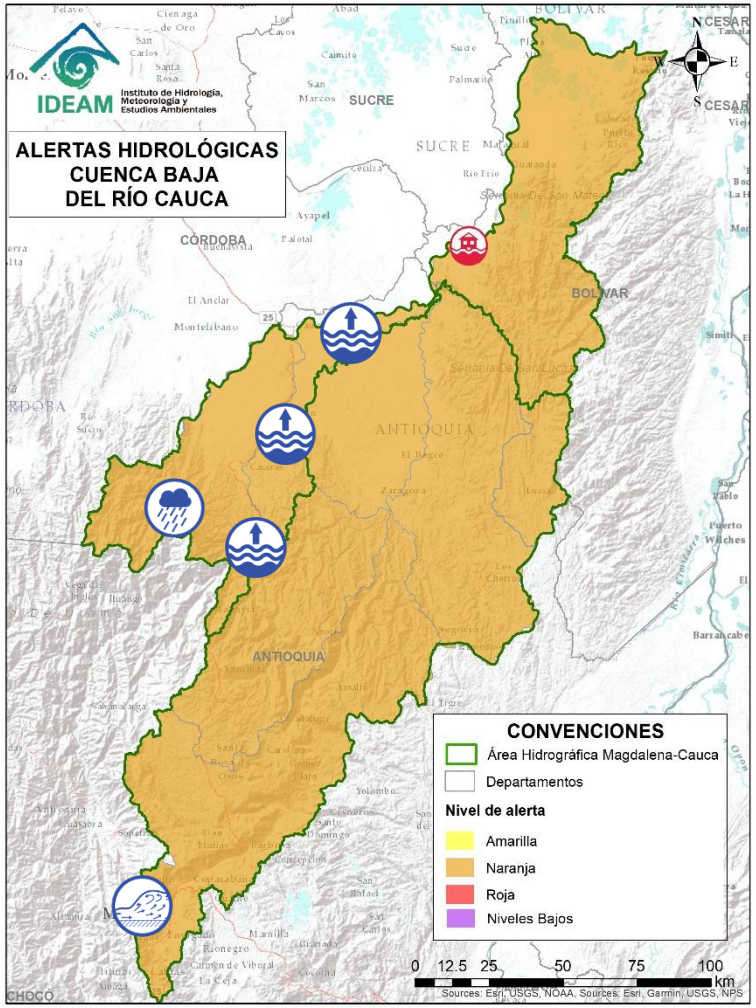

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Cauca	Cuenca del río Tarazá-Man	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Tarazá, Man y sus afluentes, especialmente la quebrada La Pinta y el caño Silencio. Especial atención a la altura de los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia (Antioquia).
	Cauca	Directos al Cauca entre Pto. Valdivia y Nechí	Niveles altos en el rio Cauca entre los municipios de Puerto Valdivia, Caucasia y Nechí (Antioquia). Especial atención a las comunidades ribereñas asentadas en la zona y a puntos de rompimiento histórico como Nuevo Mundo y Santillana.
	Cauca	Directos al Cauca entre Pto. Valdivia y Nechí	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al río Cauca entre los municipios de Puerto Valdivia y Nechí. Especial atención a las comunidades ribereñas asentadas en la zona como Nuevo Mundo y Santillana.
	Nechí	Cuenca Alta del río Porce (río Medellín)	Crecientes súbitas en el río Medellín y sus aportantes en el Valle de Aburra. Se recomienda mantener especial atención sobre el río Medellín y sus principales afluentes, entre ellos las quebradas Alta Vista, La Bermejala, Cafetal, Chuscala, Doña María, El Sesteadero, El indio, Jabalona–Aguacatala, La Honda, La Iguaná, La Loca, La Madera, La Magdalena, La Muñoz, La Picacha, La Presidenta, La Santa Elena, Olivares, Sabanetica y La Toscana–Zenú. Especial atención a los municipios de Bello, Caldas, Copacabana, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín, Sabaneta y Barbosa (Antioquia). **Nota**: Se reportaron inundaciones en Medellín, Antioquia (17/02/2026).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Cauca)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

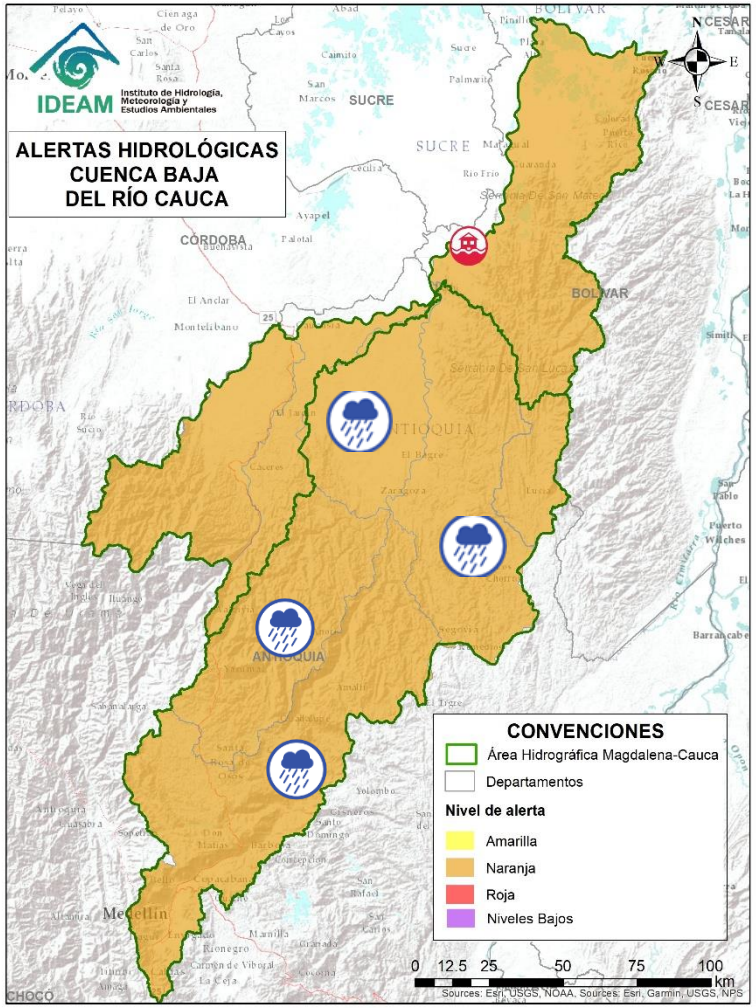

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Nechí	Cuenca del río Porce	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Porce y sus afluentes. Especial atención a los municipios de Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Donmatías y Amalfi (Antioquia).
⚠	Nechí	Cuenca alta del río Nechí	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Nechí y sus aportantes en la cuenca alta, especialmente en los ríos Tenche, Dolores, Anorí y la quebrada Caño Seco. Especial atención a los municipios de Angostura, Anorí, Campamento y Yarumal (Antioquia). **Nota**: inundaciones en la vereda San Pablo en el municipio de Campamento, Antioquia (16/02/2026).
⚠	Nechí	Cuenca baja del río Nechí (md) y sus aportantes	Crecientes súbitas en el río Nechí y sus aportantes en la cuenca baja, especialmente las quebradas La Oca – Villa Mena, Villa - Puente Villa, y los ríos Tiguí y El Bagre. Se recomienda especial atención en los municipios de Zaragoza, El Bagre y Nechí (Antioquia). **Notas: 1)** Se reportó inundación por desbordamiento de los ríos Nechí y Tigui, a la altura de los corregimientos: Carmelo, Naranjitas, El Guadual, Candelaria, Santafé de la Platas, Buenos Aires, Trinidad. -veredas: San Juancito del Vijao, Cuchillo, La Arenosa del Carmelo, La Corona y en los barrios Jerusalén y Río Bobo del municipio de El Bagre, Antioquia (01/02/2026). **2)** Se reportó inundación por desbordamiento de la quebrada Santa Isabel a la altura de la vereda La Corona del municipio de El Bagre, Antioquia (01/02/2026). **3)** Se reportaron inundaciones por desbordamiento del río Nechí y Tigui a la altura de la vereda Tosnoban Uno en el municipio de Zaragoza, Antioquia (02/02/2026). **4)** Se reportaron inundaciones en el corregimiento de La Concha en el municipio de Nechí, Antioquia (06/02/2026).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Cauca)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

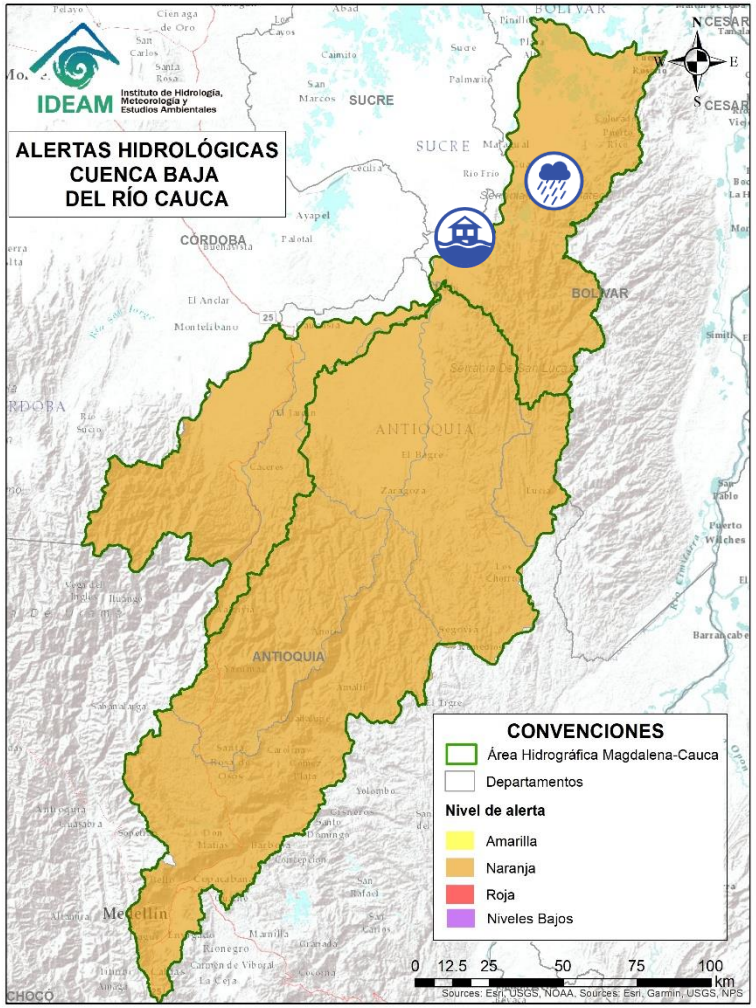

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Cauca	Directos Bajo Cauca – Magdalena. Ciénaga La Raya entre Río Nechí y Brazo de Loba	Probabilidad de crecientes súbitas en los aportantes directos al Bajo Cauca – Ciénaga La Raya entre río Nechí y Brazo de Loba, con especial atención en las quebradas San Mateo, Claras, Montecristo, Bocachica y Manzanares; y los ríos Ariza y Caribona en el municipio de Montecristo (Bolívar). **Nota: 1)** Se reportó inundaciones por desbordamiento de una quebrada, en el casco urbano del municipio de Montecristo, Bolivar (06/02/2026). **2)** Se reportó creciente súbita y desbordamiento del río Caribona a la altura del corregimiento de Regencia del municipio Montecristo, Bolívar (01/02/2026). **3)** Se reporta aumento del caudal del río Caribona en zona de influencia del municipio de Montecristo (14/02/2026)
	Cauca	Bajo río Cauca	**Alerta puntual:** Afectaciones por rompimiento del dique marginal del río Cauca en el sector Caregato a la altura de San Jacinto del Cauca (Bolívar). Se recomienda especial atención en La Región de La Mojana por transvase del caudal del río Cauca (06/05/2024).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Magdalena)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

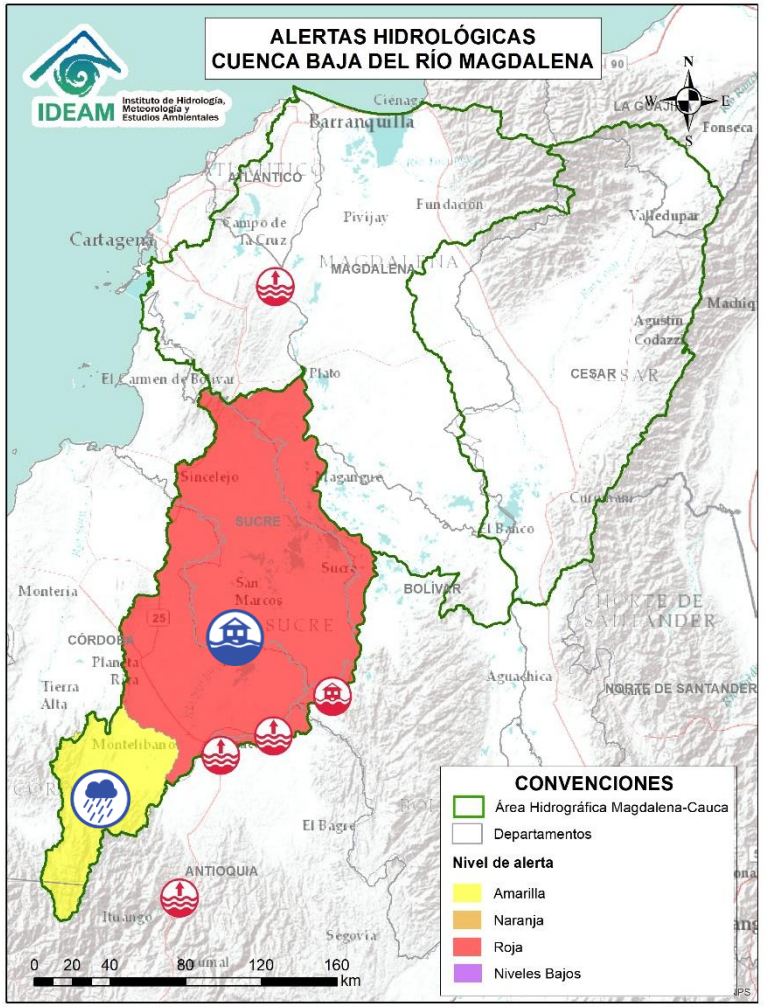

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Bajo Magdalena – Cauca – San Jorge	Cuenca alta del río San Jorge	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca alta del río San Jorge, se recomienda especial atención en sus afluentes como las quebradas La Manuela y Morrojo, y los ríos San Pedro y Uré, así como en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano (Córdoba). **Notas: 1)** Se reportó desbordamiento del río San Jorge en zonas ribereñas de los municipios de Puerto Libertador y Montelibano, Córdoba (01/02/2026). **2)** Desbordamiento del río San Jorge en la zona urbana y rural del municipio La Apartada, Córdoba (01/02/2026).
	Bajo Magdalena – Cauca – San Jorge	Bajo San Jorge – La Mojana	Persisten las áreas inundadas en los municipios de San Jacinto del Cauca, Caimito, San Benito Abad, Ayapel, Guaranda, San Marcos y Sucre, asociadas al ingreso de agua del río Cauca a través de los boquetes en Caregato y Los Arrastres. **Notas: 1)** Activación del rompimiento en el sector de la Hacienda la Palmira (4/02/2026). **2)** reporte de Rompimientos en la margen izquierda del rio San Jorge en los sectores del Totumo, Cantaleta y Voragine, afectando las comunidades de Nueva Esperanza, Puerto Leticia, Puerto Santo y Cintura – Pueblo Nuevo. (08/02/2026).

Área Hidrográfica del Magdalena – Cauca (Cuenca baja del Río Magdalena)


Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

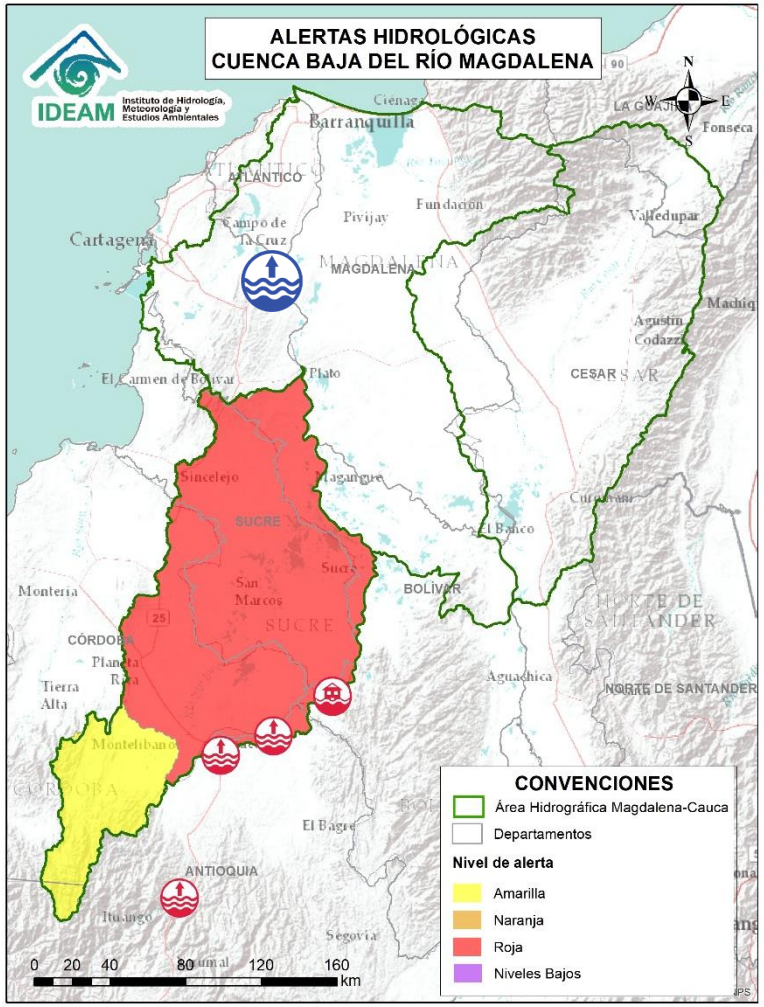

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Bajo Magdalena	Directos al bajo Magdalena entre el Plato y Calamar	**Alerta Puntual**: Se reportó falla en la estructura de contención del río Magdalena en el sector de Canta Rana en el municipio de Calamar, Bolívar (10/02/2026).

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

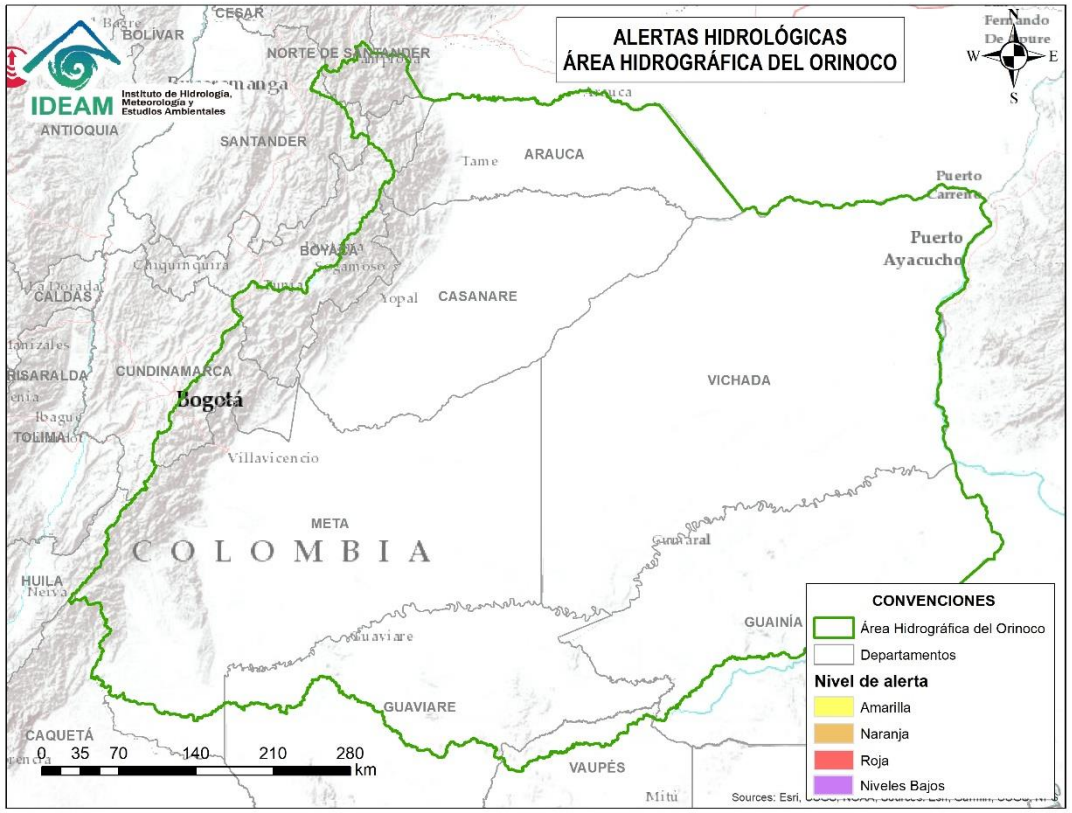


CONDICIONES NORMALES

Por favor, pique aquí para volver al mapa principal de Áreas Hidrográficas de Colombia.

Área Hidrográfica del Amazonas

Actualización: 01 de marzo de 2026 12:00 HLC

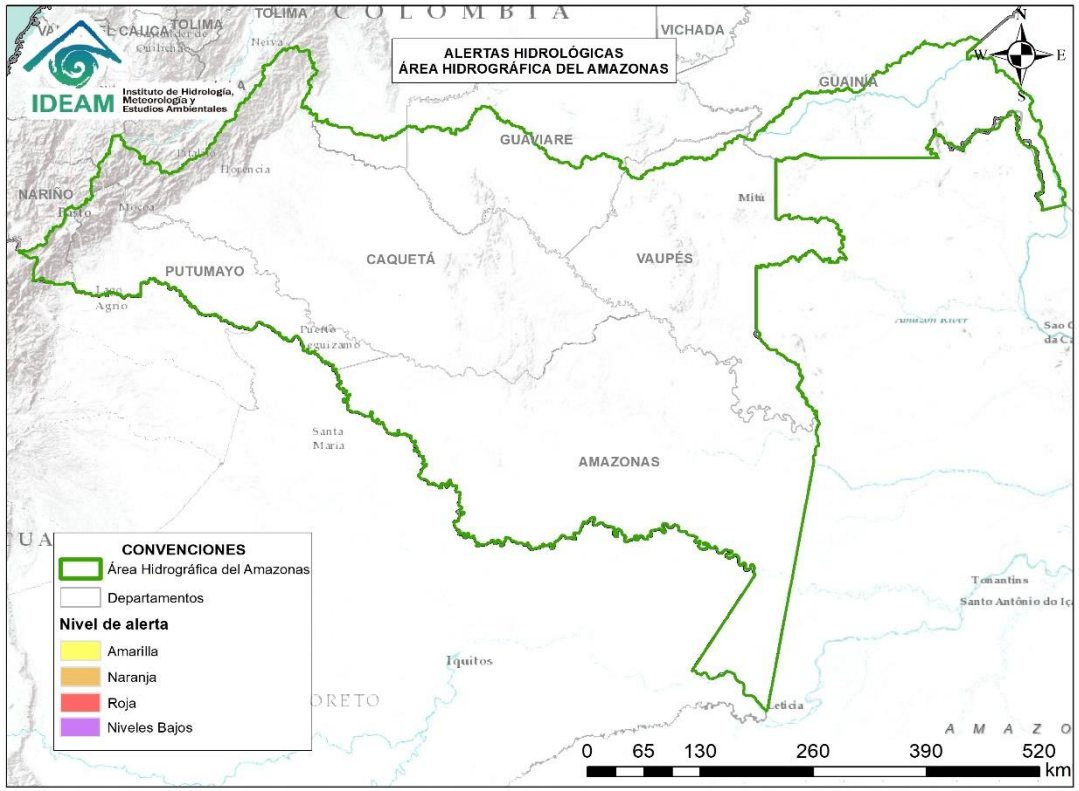

CONDICIONES NORMALES

RESUMEN

Debido a las precipitaciones de los últimos días, se presenta saturación de humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta pendiente:


Alerta Alta: Para algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Nariño, Quindío, Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima y Huila.

Alerta Moderada: Para algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.


Alerta Baja: Para algunos municipios de las regiones Andina, Pacífico, Caribe y Amazonía.

En el apartado específico de este informe para cada región, se encuentra información detallada de los niveles de alerta en cada municipio.

Mapa de Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

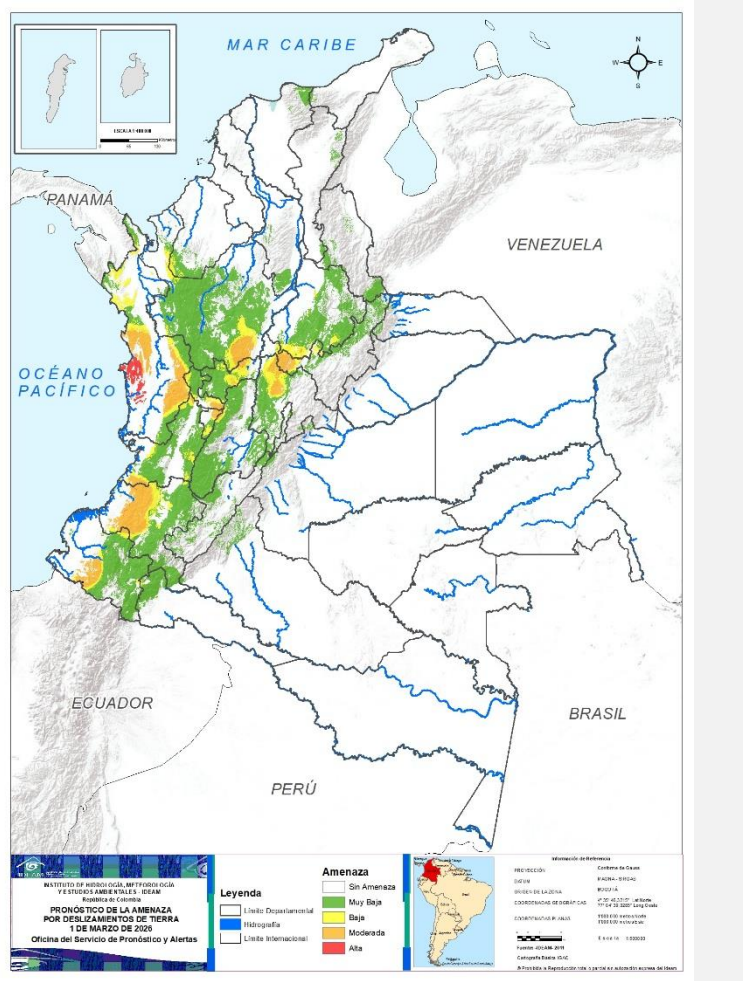

Gráfica de seguimiento de alertas por pronóstico de la amenaza de deslizamientos de tierra para Colombia durante los últimos 30 días

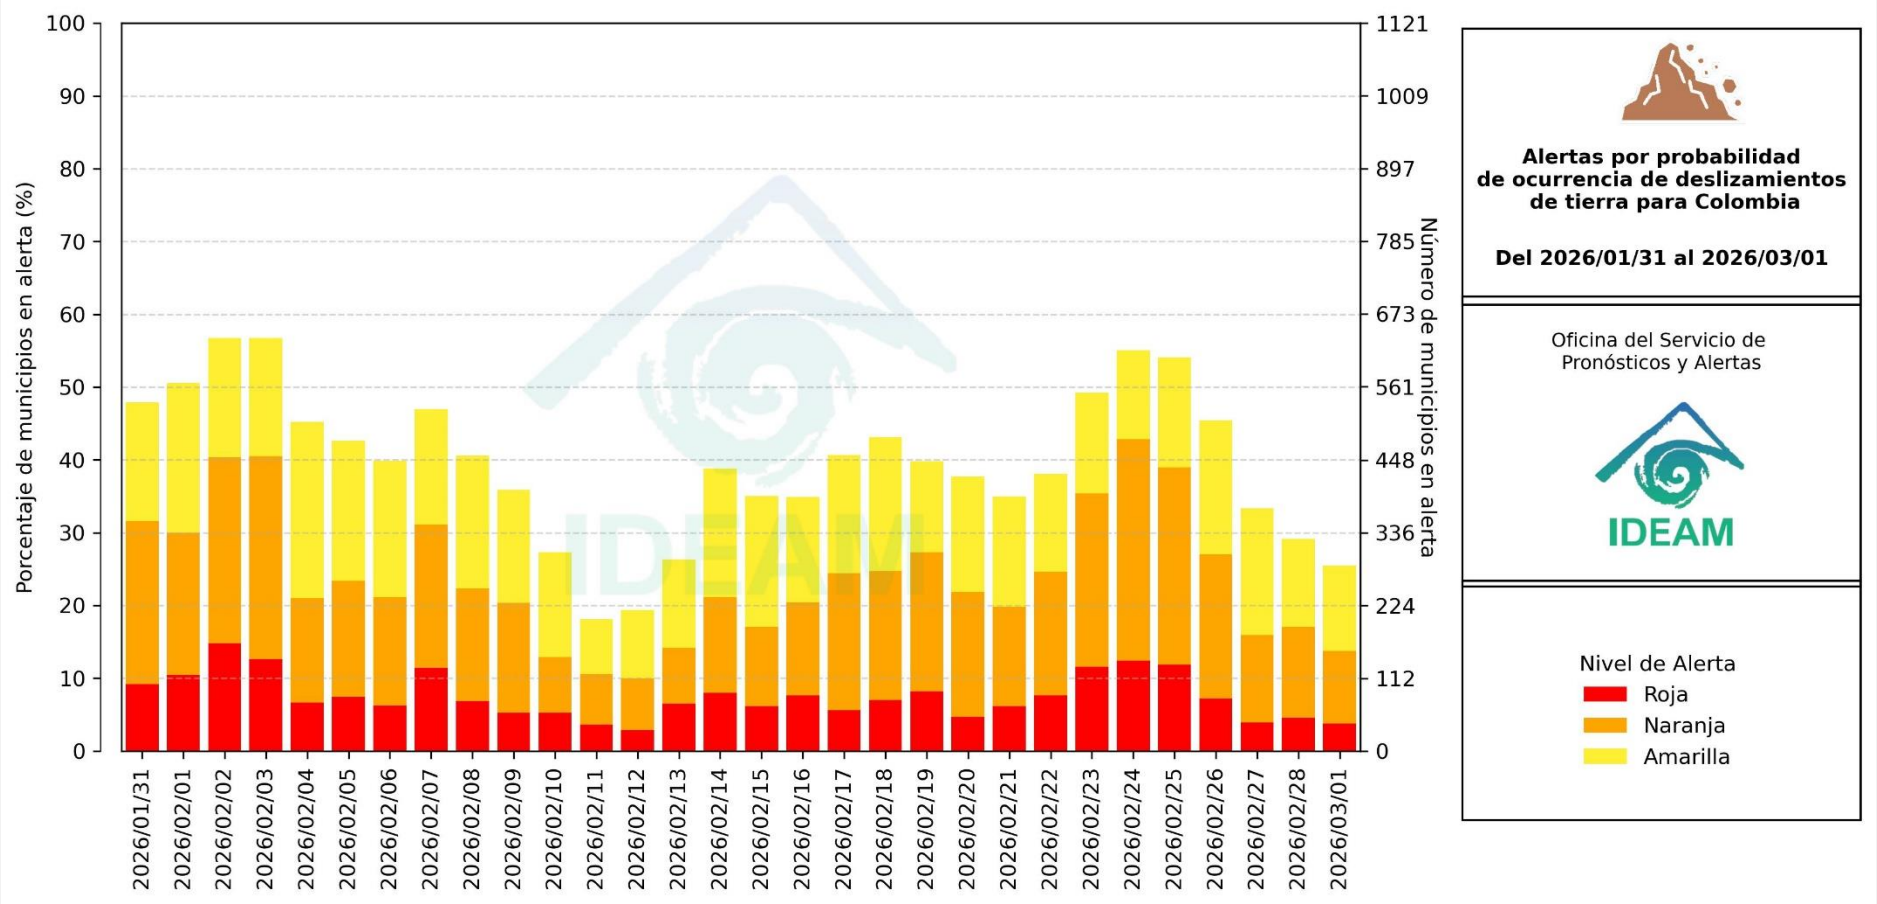


El eje horizontal presenta la fecha de evaluación de las alertas, el eje vertical izquierdo el porcentaje de municipios* en alerta y el eje vertical derecho el número total de éstos; categorizando las alertas en una barra apilada según su nivel de amenaza: alta (rojo), moderada (naranja) y baja (amarillo).


** Municipios oficiales registrados por el DANE representado el 100% (1121 municipios) a la fecha.*

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

Actualización: 1 de marzo de 2026 | 12:00 HLC

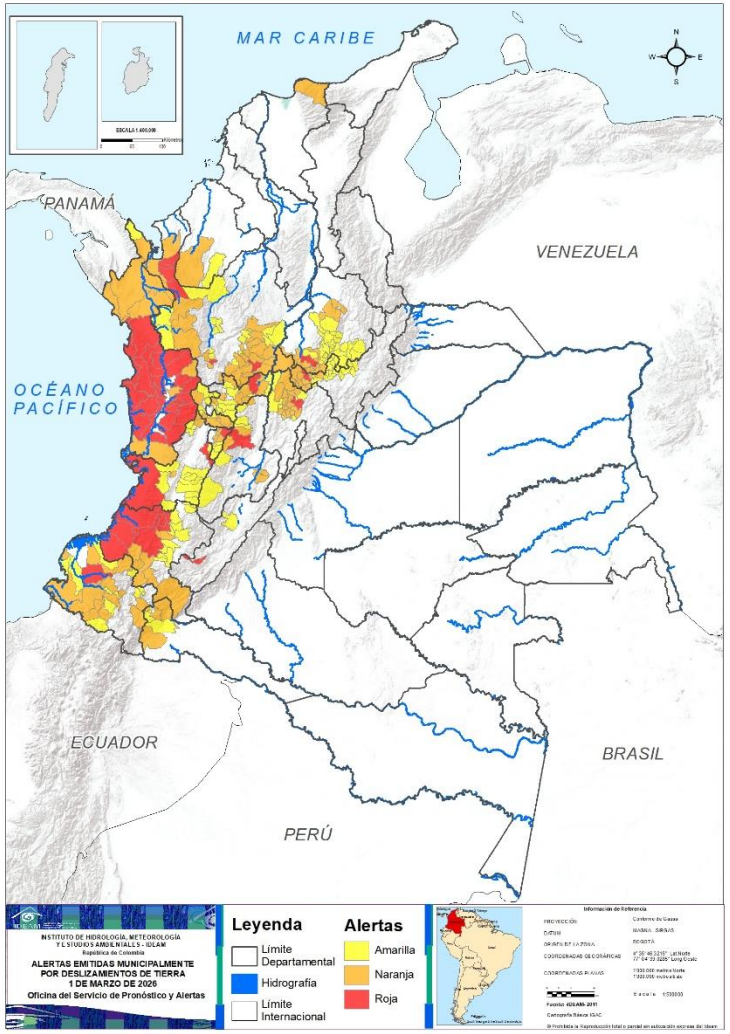

Municipios por regiones:

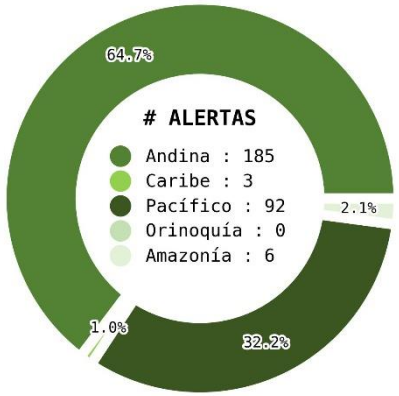


TOTAL MUNICIPIOS : 286
FECHA : 2026-03-01

DEPARTAMENTO	#
CHOCÓ	19
CAUCA	7
ANTIOQUIA	6
VALLE DEL CAUCA	2
BOYACÁ	1
CALDAS	1
NARIÑO	1
QUINDÍO	1
SANTANDER	1
CUNDINAMARCA	1
HUILA	1
TOLIMA	1
TOTAL	**42**

DEPARTAMENTO	#
ANTIOQUIA	23
CUNDINAMARCA	16
BOYACÁ	12
NARIÑO	9
CALDAS	8
SANTANDER	8
CAUCA	7
CHOCÓ	7
RISARALDA	5
TOLIMA	5
QUINDÍO	4
VALLE DEL CAUCA	3
PUTUMAYO	3
CÓRDOBA	1
MAGDALENA	1
TOTAL	**112**

DEPARTAMENTO	#
SANTANDER	22
ANTIOQUIA	16
BOYACÁ	16
VALLE DEL CAUCA	15
CAUCA	11
CALDAS	10
NARIÑO	10
CUNDINAMARCA	9
RISARALDA	8
TOLIMA	5
QUINDÍO	4
PUTUMAYO	3
CHOCÓ	1
CÓRDOBA	1
HUILA	1
TOTAL	**132**


REGIÓN CARIBE

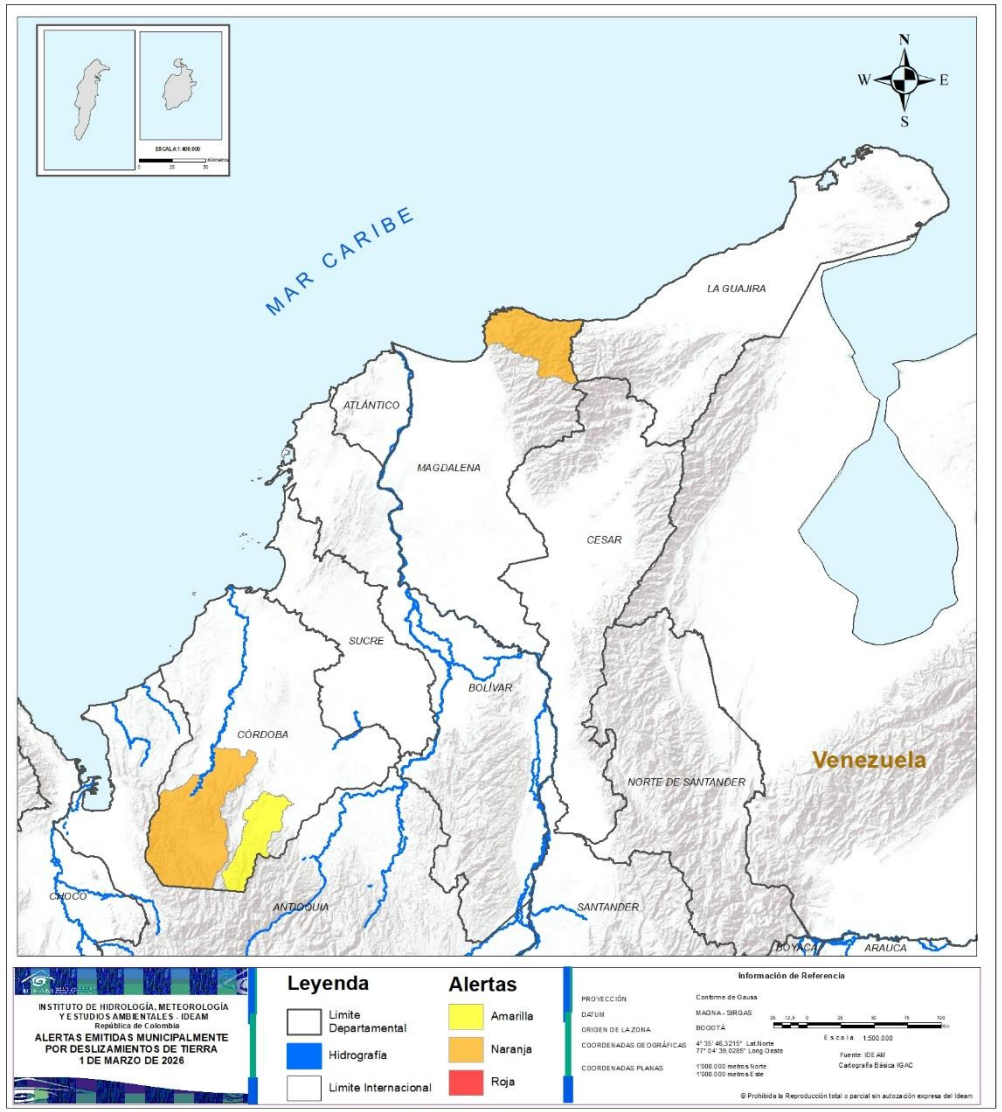

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CÓRDOBA : Tierralta. MAGDALENA : Santa Marta.
	CÓRDOBA : Puerto Libertador.

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra


REGIÓN ANDINA

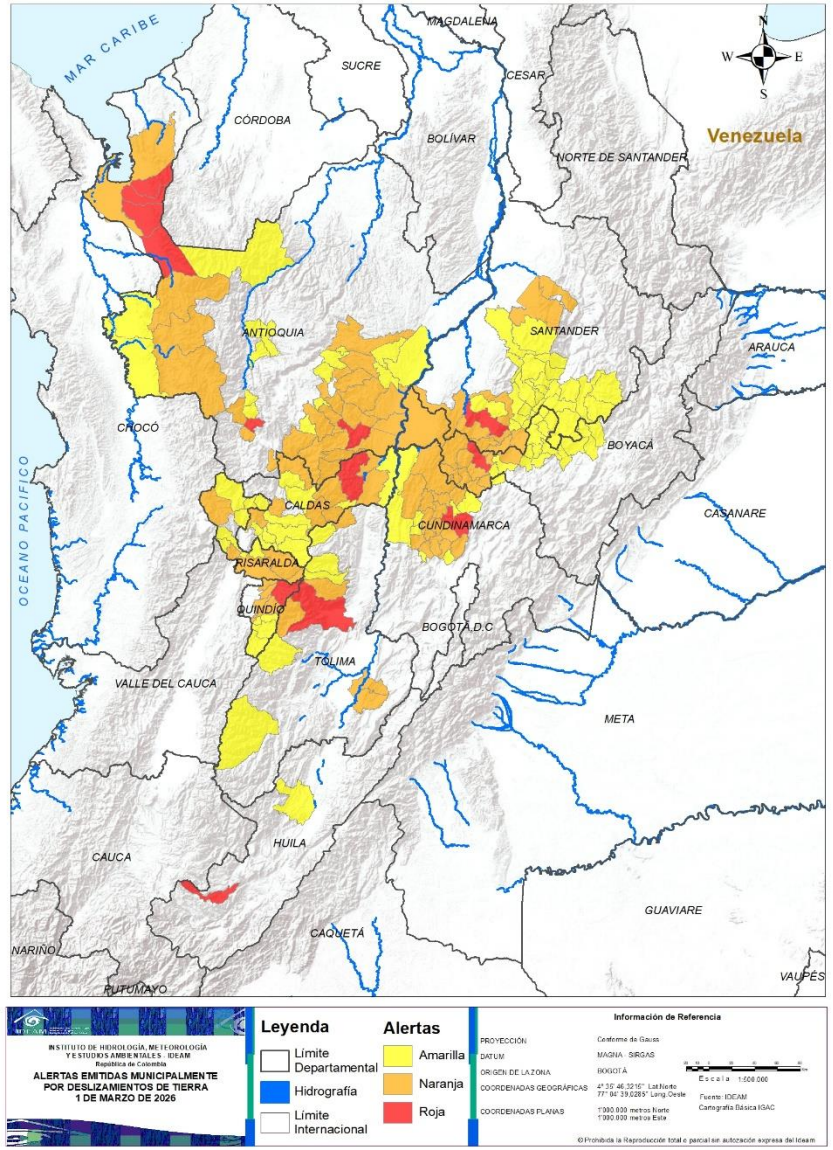

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ANTIOQUIA : Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, San Francisco, Venecia. BOYACÁ : Pauna. CALDAS : Samaná. CUNDINAMARCA : Pacho. HUILA : La Argentina. QUINDÍO : Salento. SANTANDER : Sucre. TOLIMA : Ibagué.
	ANTIOQUIA : Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concordia, Dabeiba, El Carmen De Viboral, Frontino, Granada, Nariño, Peñol, Puerto Nare, Puerto Triunfo, San Carlos, San Luis, San Rafael, San Roque, Sonsón, Tarso, Turbo, Urrao, Valparaíso, Yolombó. BOYACÁ : Briceño, Buenavista, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, Puerto Boyacá, Quípama, Saboyá, San Pablo De Borbur, Tununguá. CALDAS : Aguadas, Anserma, Filadelfia, Manzanares, Marulanda, Norcasia, Pensilvania, Victoria. CUNDINAMARCA : Caparrapí, El Peñón, La Palma, La Peña, La Vega, Nimaima, Nocaima, Paime, San Francisco, Sasaima, Subachoque, Supatá, Topaipí, Vergara, Villeta, Yacopí. QUINDÍO : Armenia, Calarcá, Circasia, Filandia. RISARALDA : Balboa, Dosquebradas, Pereira, Pueblo Rico, Santa Rosa De Cabal. SANTANDER : Albania, Betulia, Bolívar, Florián, Jesús María, La Belleza, Puente Nacional, San Vicente De Chucurí. TOLIMA : Anzoátegui, Cajamarca, Fresno, Prado, Purificación.

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra


REGIÓN ANDINA

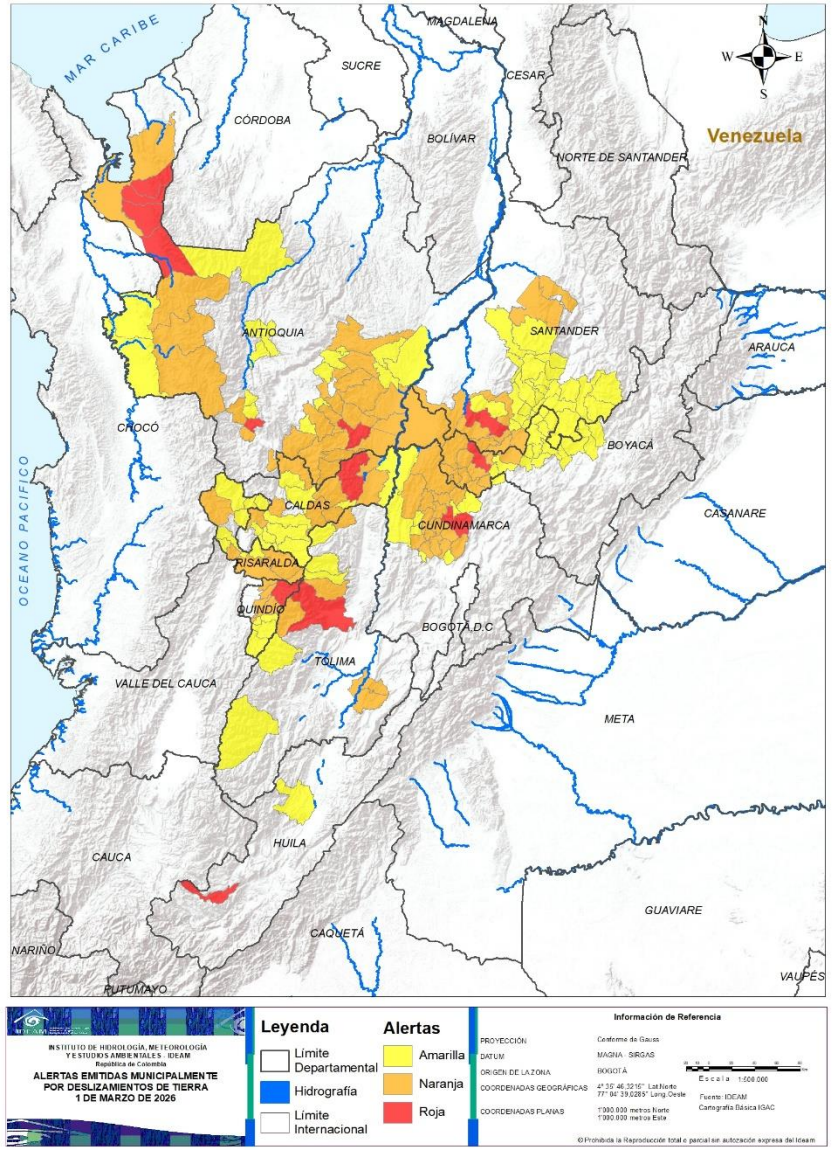

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ANTIOQUIA : Armenia, Belmira, Caracolí, Cisneros, Concepción, El Santuario, Ituango, La Unión, Liborina, Maceo, Murindó, Puerto Berrío, Santo Domingo, Sopetrán, Titiribí, Vigía Del Fuerte. BOYACÁ : Arcabuco, Caldas, Chiquinquirá, Chitaraque, Cómbita, Duitama, Gachantivá, Moniquirá, Paipa, San José De Pare, Santa Sofía, Santana, Sotaquirá, Sutamarchán, Togüí, Villa De Leyva. CALDAS : Chinchiná, La Dorada, Manizales, Marquetalia, Neira, Palestina, Pácora, Risaralda, Salamina, Villamaría. CUNDINAMARCA : Albán, El Rosal, Guaduas, Puerto Salgar, Quebradanegra, San Cayetano, Simijaca, Villagómez, Útica. HUILA : Palermo. QUINDÍO : Buenavista, Córdoba, Génova, Pijao. RISARALDA : Belén De Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Quinchía, Santuario. SANTANDER : Aguada, Barbosa, Charalá, Chima, Chipatá, Contratación, Coromoro, El Carmen De Chucurí, El Guacamayo, El Peñón, Encino, Guadalupe, Guavatá, Gámbita, Güepsa, La Paz, Oiba, San Benito, Santa Helena Del Opón, Simacota, Suaita, Vélez. TOLIMA : Herveo, Murillo, Rioblanco, Roncesvalles, Santa Isabel.

Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

REGIÓN PACÍFICO

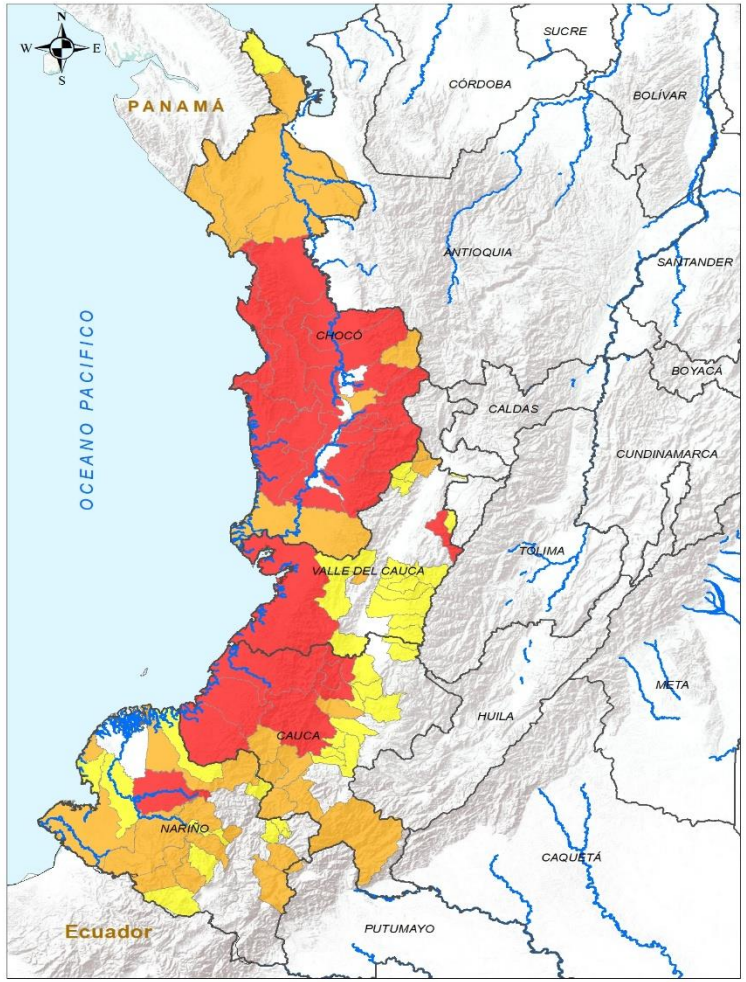




ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	CAUCA : Buenos Aires, El Tambo, Guapi, López De Micay, Morales, Suárez, Timbiquí. CHOCÓ : Alto Baudó, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Condoto, El Cantón Del San Pablo, Istmina, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Nuquí, Nóvita, Quibdó, Río Iró, Río Quito, San José Del Palmar, Sipí, Tadó. NARIÑO : Magüí. VALLE DEL CAUCA : Buenaventura, Sevilla.
	CAUCA : Argelia, Balboa, Bolívar, Cajibío, Mercaderes, Patía, Santa Rosa. CHOCÓ : Carmen Del Darién, Cértegui, El Carmen De Atrato, El Litoral Del San Juan, Juradó, Riosucio, Unguía. NARIÑO : Barbacoas, Buesaco, El Charco, Los Andes, Mallama, Pasto, Ricaurte, Samaniego, San Andrés De Tumaco. VALLE DEL CAUCA : Ansermanuevo, El Águila, Restrepo.
	CAUCA : Caldono, Corinto, La Sierra, Miranda, Piendamó - Tunía, Popayán, Rosas, Santander De Quilichao, Silvia, Sotará Paispamba, Timbío. CHOCÓ : Acandí. NARIÑO : Cumbal, Francisco Pizarro, La Llanada, La Unión, Leiva, Roberto Payán, San Lorenzo, San Pedro De Cartago, Santa Bárbara, Santacruz. VALLE DEL CAUCA : Argelia, Caicedonia, Calima, Dagua, El Cairo, El Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, Guadalajara De Buga, Jamundí, Palmira, Pradera, Ulloa, Versalles.


Pronóstico de la Amenaza por Deslizamientos de Tierra

REGIÓN ORINOQUÍA

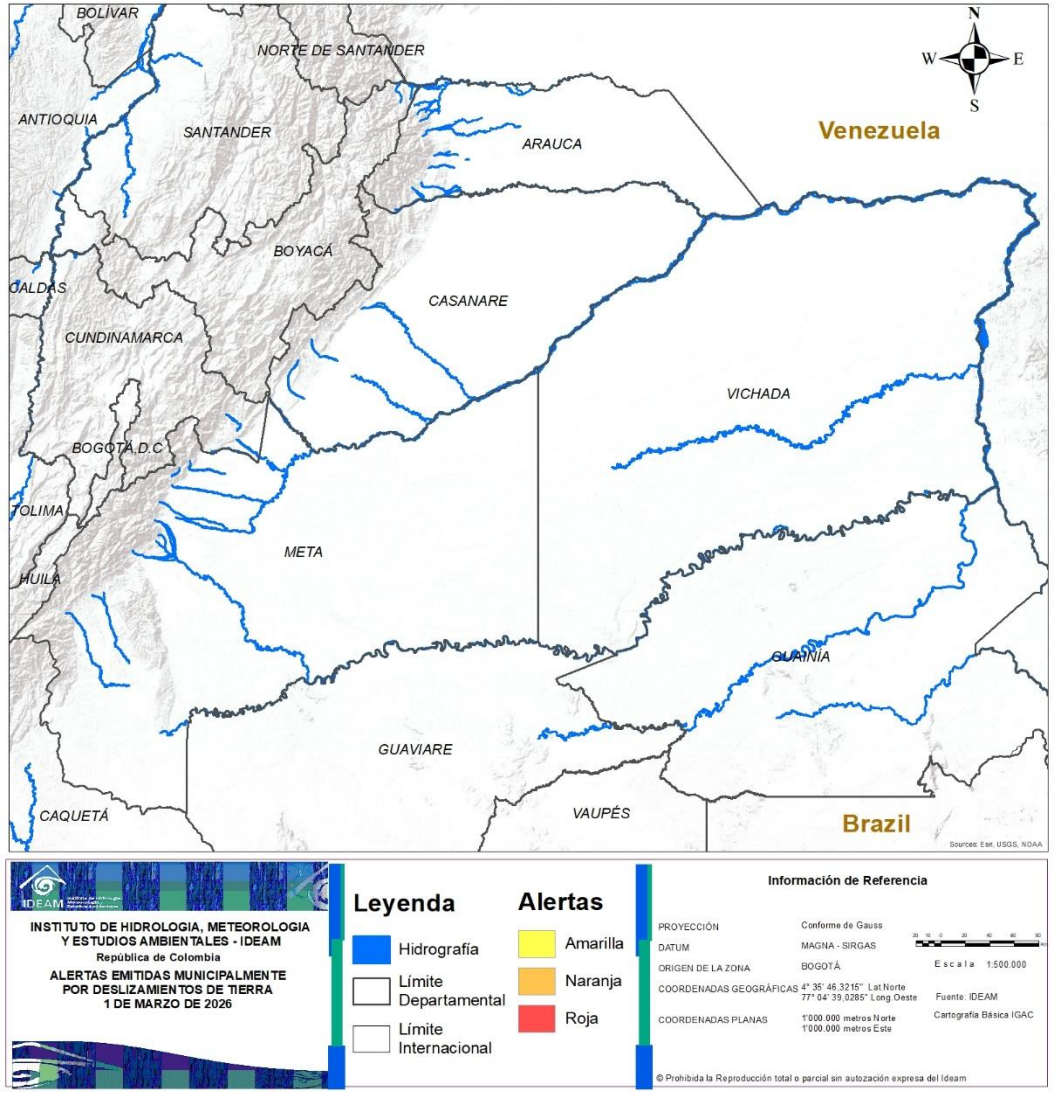


CONDICIONES NORMALES

REGIÓN AMAZONÍA

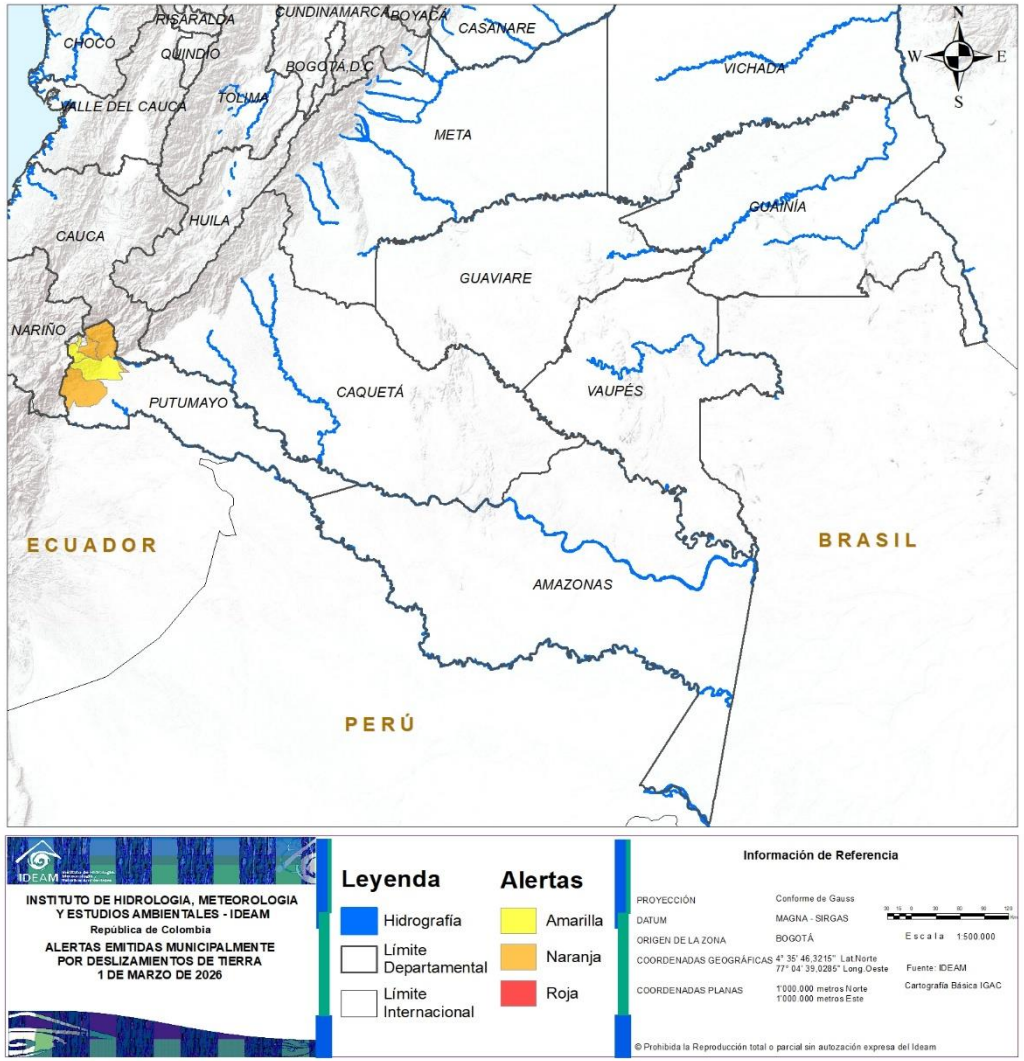

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
⚠	PUTUMAYO : Mocoa, Orito, San Francisco.
⚠	PUTUMAYO : Colón, Santiago, Villagarzón.

DEFINICIONES Y RECOMENDACIONES

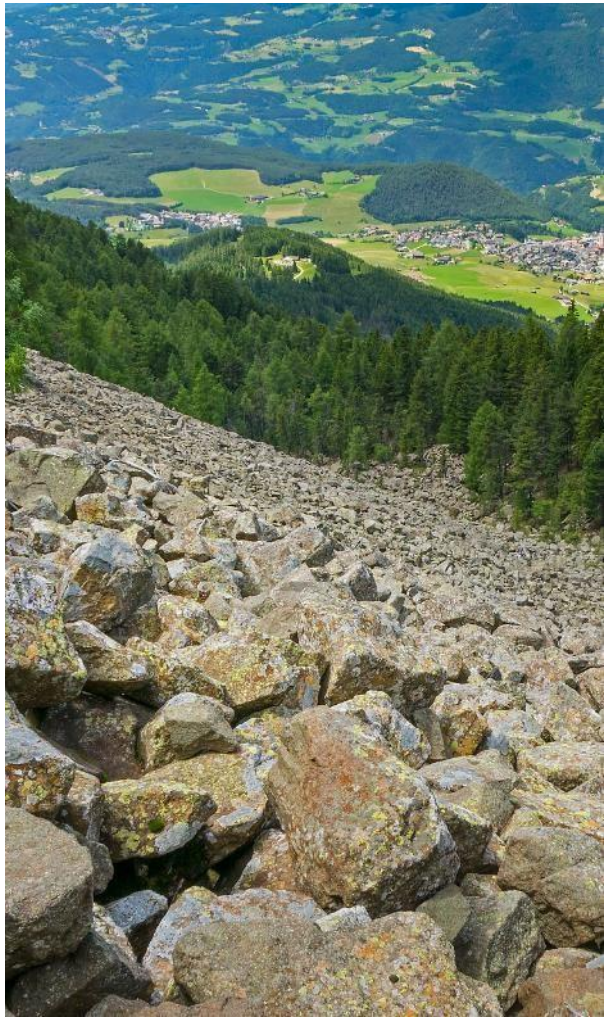

DEFINICIONES	RECOMENDACIONES
DERRUMBE: Término común para referirse a diversos tipos de movimientos en masa, particularmente caídas y deslizamientos. **DESLIZAMIENTO:** Movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de zonas relativamente delgadas con gran deformación cortante. **TIPOS DE DESLIZAMIENTOS:** Deslizamientos: Incluye movimientos tipo deslizamiento rotacional o deslizamiento traslacional en suelo o roca. En este grupo se pueden incluir los procesos en laderas tipo flujo que hacen parte de la zona de alimentación de flujos de detritos o flujos de lodo. **Caídas:** Incluye movimientos tipo caída en suelos o rocas. Se pueden incluir también en este tipo los movimientos tipo volcamiento. **Flujos:** En este tipo se incluyen los procesos tipo flujo de detritos, flujo de lodos o avenida torrencial (Ver numeral 1.2). **Reptación:** Término utilizado para describir movimientos lentos Y extremadamente lentos (Hungr et al., 2014).	• Construya o habite en zonas seguras. • Proteja los bosques. • Evite la tala de árboles y la quema de estos. • Identifique las áreas con amenazas de deslizamientos o derrumbes. • Realice un plan de emergencia familiar. • Estudie rutas alternativas para su evacuación. • No permita que el agua se filtre en el interior de las montañas: abra zanjas, alcantarillas y cuencas firmes que permita el desagüe de agua adecuado. • Evite la acumulación de basura o desechos en suelos ya que esta no permite que el agua filtre por donde debe hacerlo, lo que hace que el terreno se desestabilice.

RESUMEN


Debido a la precipitación y temperatura máxima que se han dado en los últimos días, se presentan condiciones de :

Alerta Alta: En algunos municipios de los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Meta y Vichada.

Alerta Moderada: En algunos municipios de los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Tolima y Vichada.


Alerta Baja: En algunos municipios de las regiones Orinoquía, Caribe, Andina y Amazonía.

Mapa de Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

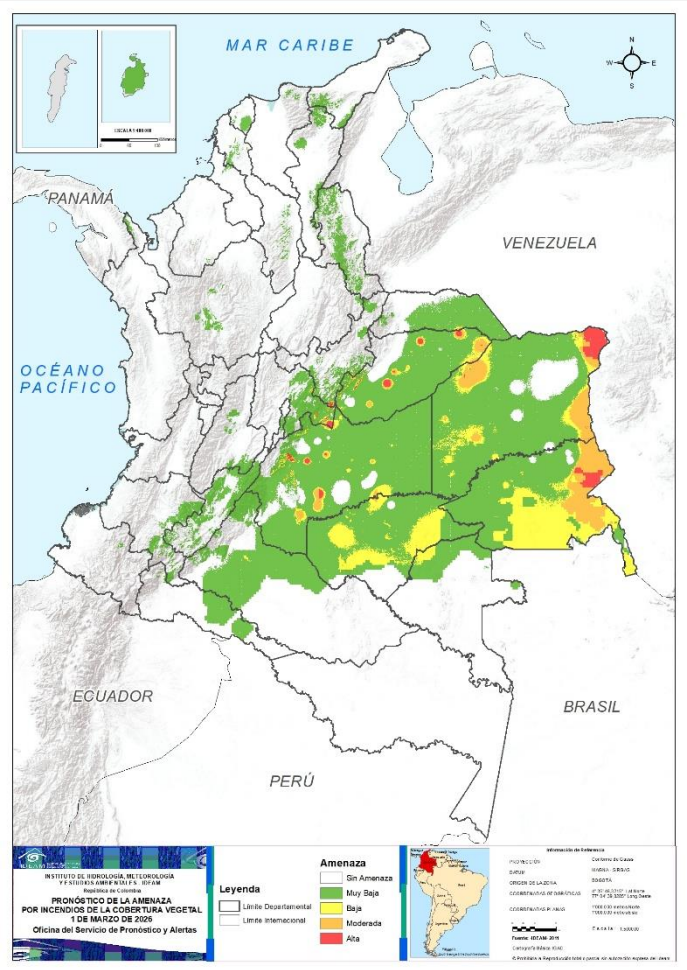

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

Gráfica de seguimiento de alertas por pronóstico de la amenaza de incendios de la cobertura vegetal para Colombia durante los últimos 30 días

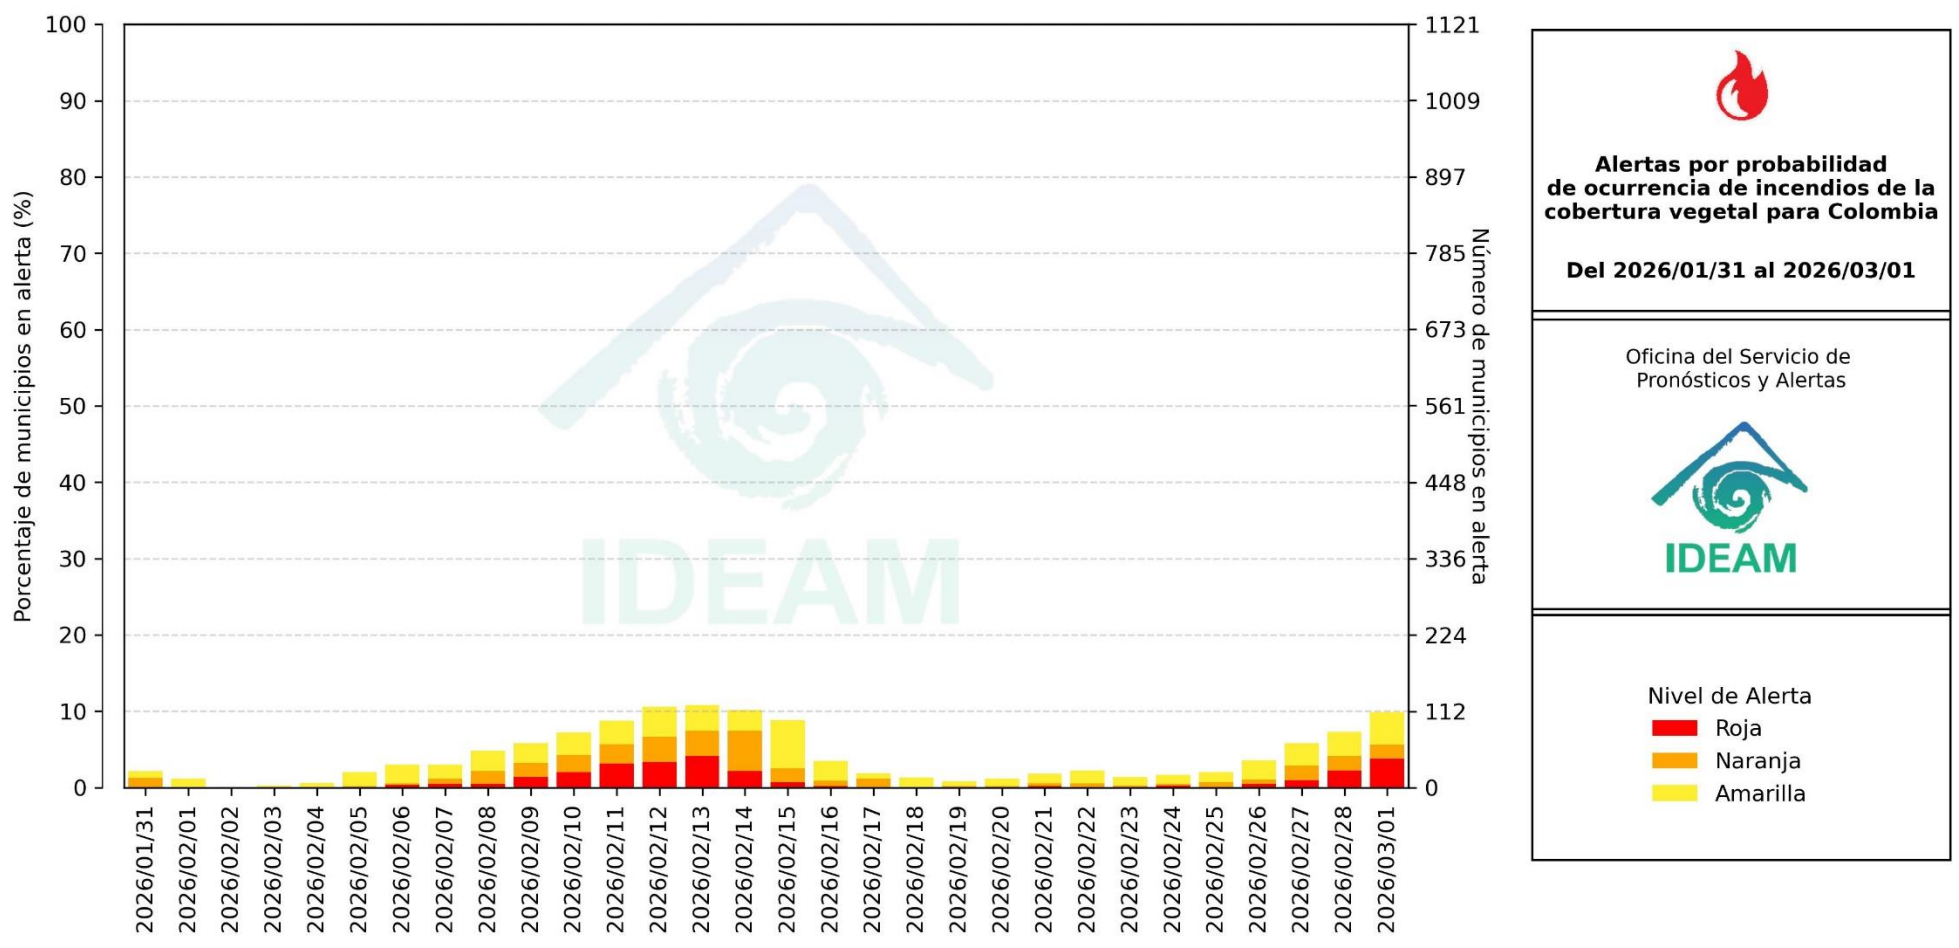


El eje horizontal presenta la fecha de evaluación de las alertas, el eje vertical izquierdo el porcentaje de municipios* en alerta y el eje vertical derecho el número total de éstos; categorizando las alertas en una barra apilada según su nivel de amenaza: alta (rojo), moderada (naranja) y baja (amarillo).


** Municipios oficiales registrados por el DANE representado el 100% (1121 municipios) a la fecha.*

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

Actualización: 01 de marzo de 2026 | 12:00 HLC

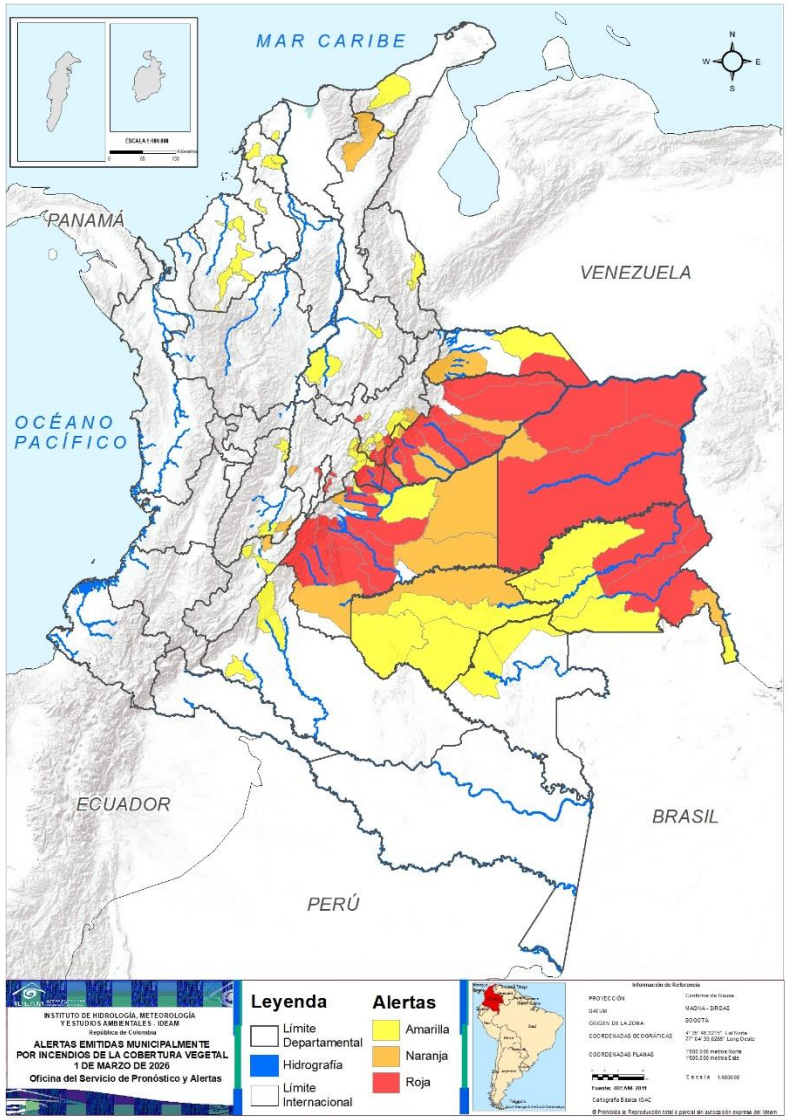

Municipios por regiones:

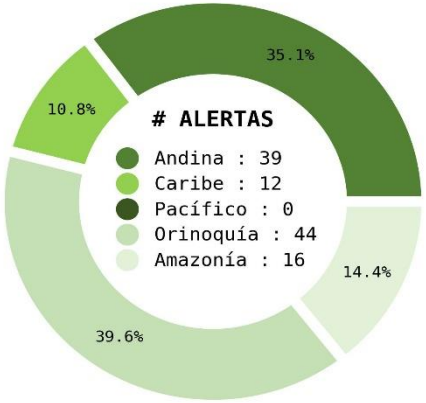

TOTAL MUNICIPIOS : 111
FECHA : 2026-03-01


DEPARTAMENTO	#
META	16
CASANARE	10
CUNDINAMARCA	5
BOYACÁ	4
GUAINÍA	3
VICHADA	3
ARAUCA	1
TOTAL	**42**

DEPARTAMENTO	#
BOYACÁ	4
CASANARE	4
META	4
CUNDINAMARCA	2
ARAUCA	1
GUAINÍA	1
VICHADA	1
GUAVIARE	1
HUILA	1
TOLIMA	1
CESAR	1
TOTAL	**21**

DEPARTAMENTO	#
BOYACÁ	9
CUNDINAMARCA	5
GUAINÍA	4
CÓRDOBA	4
BOLÍVAR	3
GUAVIARE	3
TOLIMA	3
META	2
CAQUETÁ	2
LA GUAJIRA	2
NORTE DE SANTANDER	2
SANTANDER	2
VAUPÉS	2
ARAUCA	1
CASANARE	1
ATLÁNTICO	1
HUILA	1
SUCRE	1
TOTAL	**48**

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal


REGIÓN CARIBE

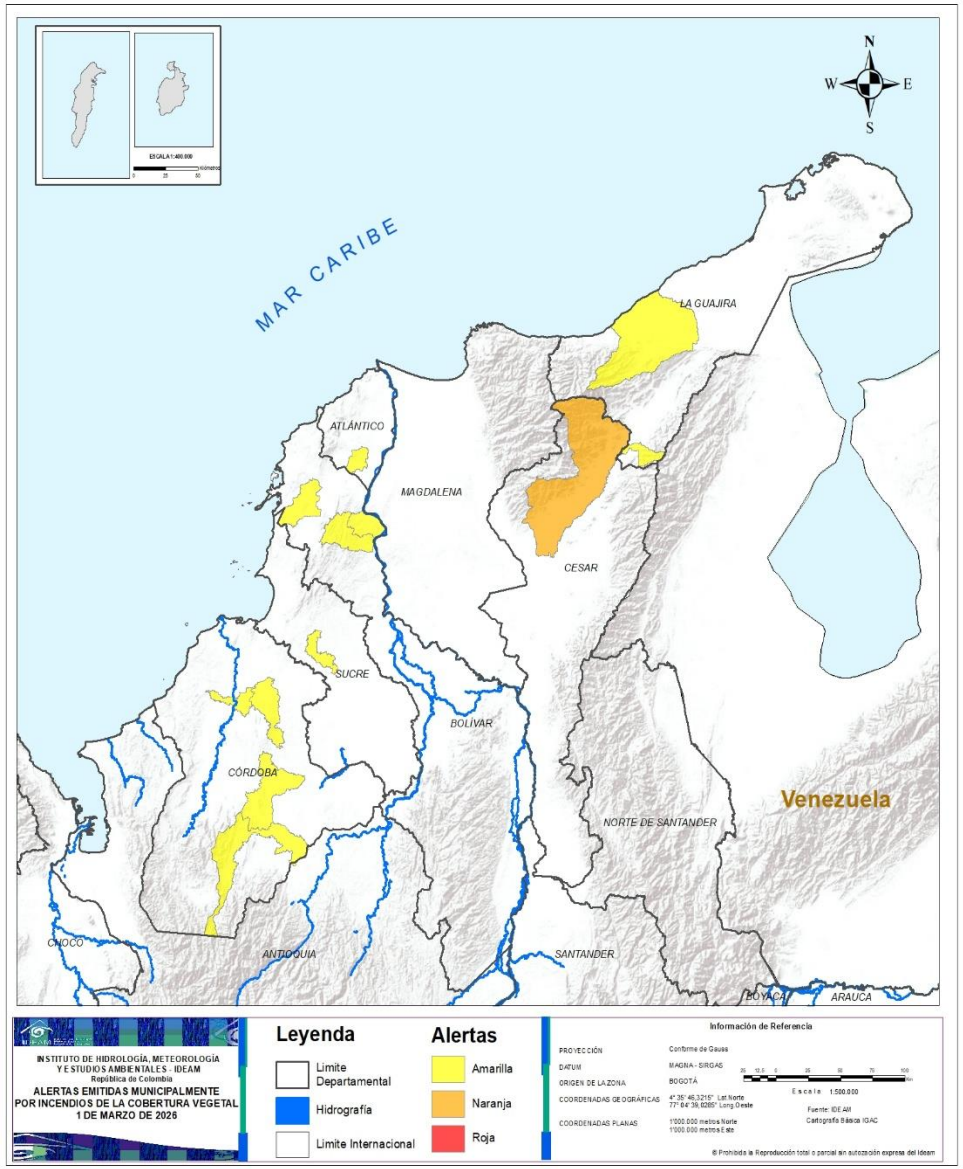

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
⚠	CESAR : Valledupar.
⚠	ATLÁNTICO : Manatí. BOLÍVAR : Arjona, El Guamo, San Juan Nepomuceno. CÓRDOBA : Cereté, Ciénaga de Oro, Montelíbano, Planeta Rica. LA GUAJIRA : Riohacha, Urumita. SUCRE : Corozal.

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

REGIÓN ANDINA

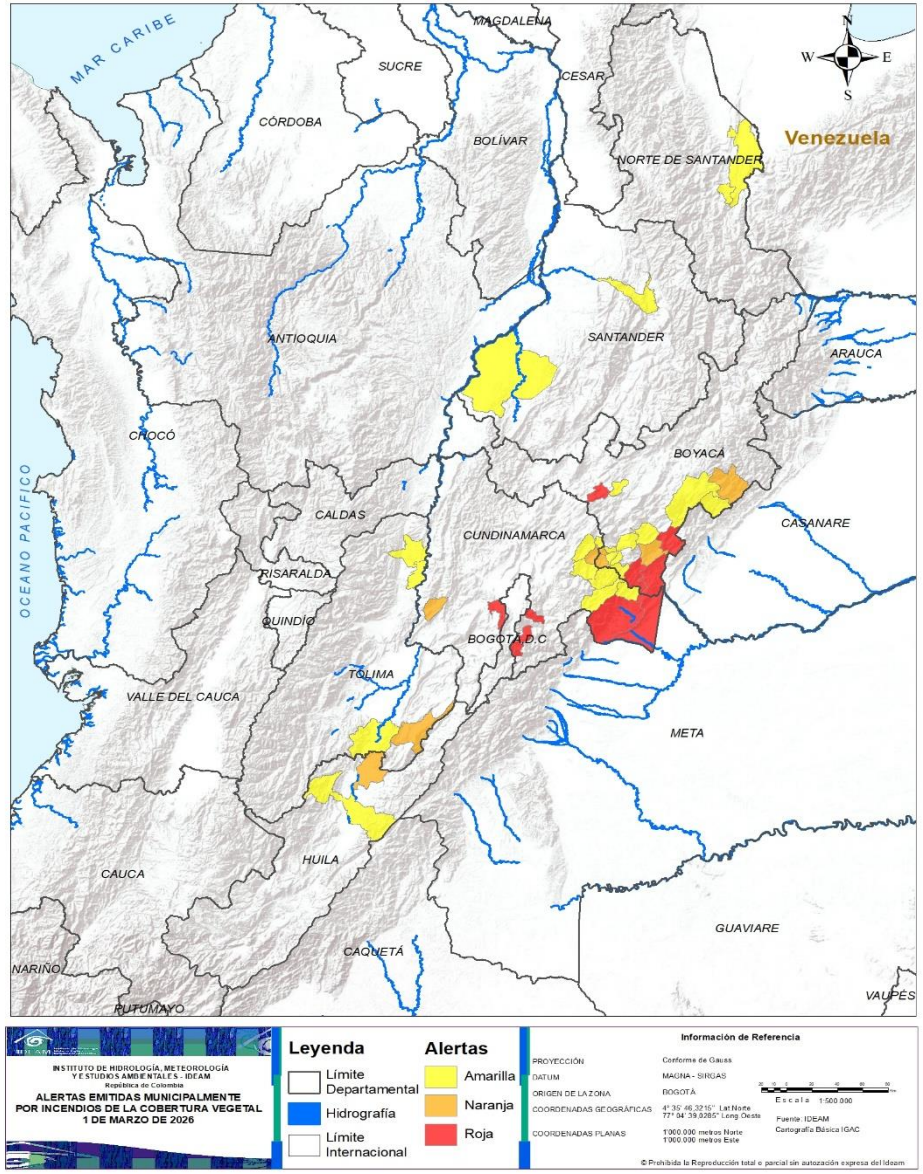

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	BOYACÁ : Páez, San Luis de Gaceno, Santa María, Samacá. CUNDINAMARCA : Medina, Paratebueno, Une, Soacha, Ubaque.
	BOYACÁ : Campohermoso, Guateque, Guayatá, Labranzagrande. CUNDINAMARCA : Jerusalén, Manta. HUILA : Villavieja. TOLIMA : Dolores.
	BOYACÁ : Almeida, Aquitania, Chivor, Garagoa, Miraflores, Pajarito, Somondoco, Sutatenza, Tunja. CUNDINAMARCA : Gachalá, Gachetá, Machetá, Tibirita, Ubalá. HUILA : Neiva. NORTE DE SANTANDER : San Cayetano, San José de Cúcuta. SANTANDER : Cimitarra, Girón. TOLIMA : Ambalema, Armero, Natagaima.

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal


REGIÓN PACÍFICO



CONDICIONES NORMALES

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal


REGIÓN ORINOQUÍA

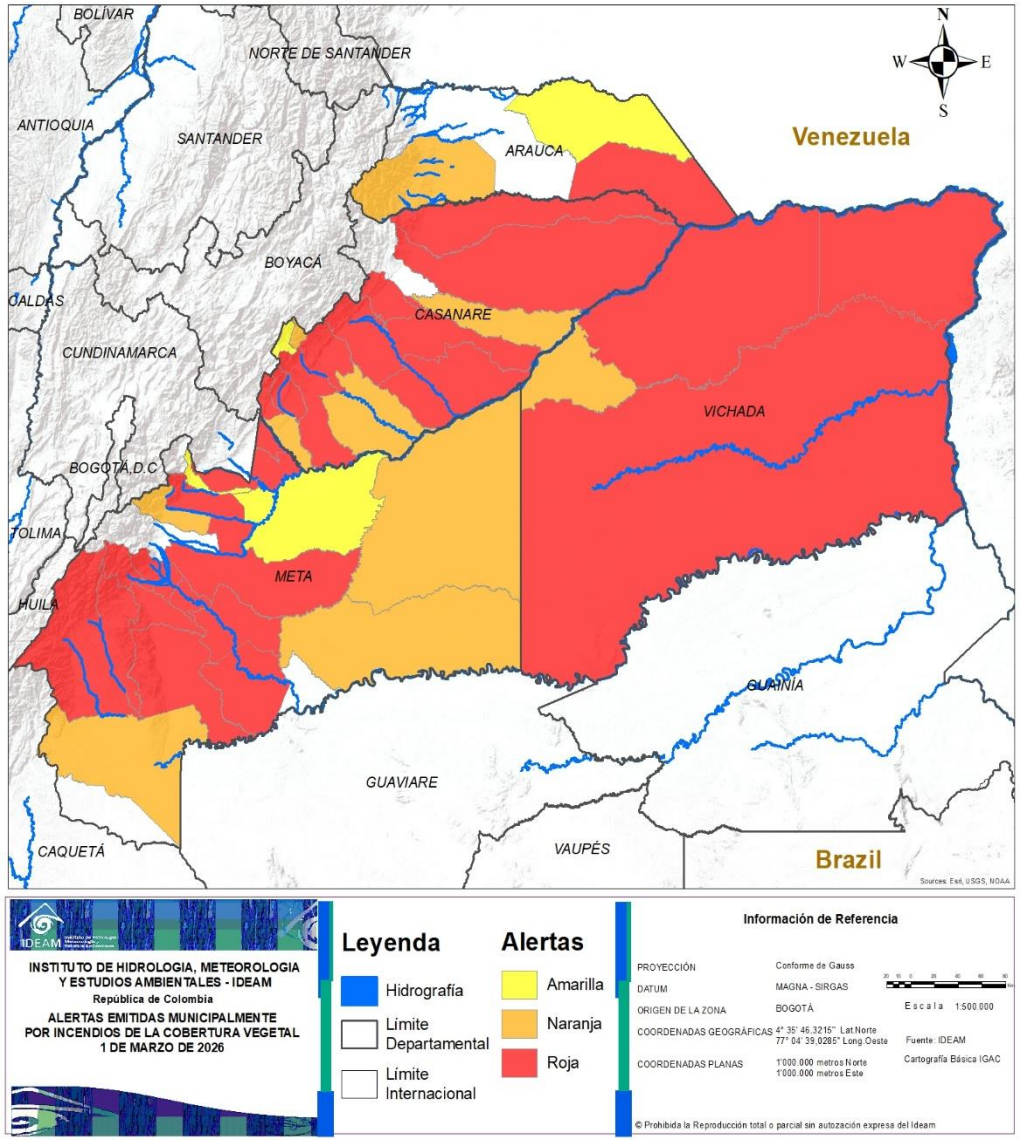

ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	ARAUCA : Cravo Norte. CASANARE : Aguazul, Hato Corozal, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Sabanalarga, San Luis de Palenque, Tauramena, Yopal. META : Barranca de Upía, Cabuyaro, Cumaral, El Castillo, Fuente de Oro, Granada, Lejanías, Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Martín, Uribe, Villavicencio, Vistahermosa. VICHADA : Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño.
	ARAUCA : Tame. CASANARE : Maní, Recetor, Trinidad, Villanueva. META : Acacías, La Macarena, Mapiripán, Puerto Gaitán. VICHADA : Santa Rosalía.
	ARAUCA : Arauca. CASANARE : Chámeza. META : Puerto López, Restrepo.

Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal

REGIÓN AMAZONIA

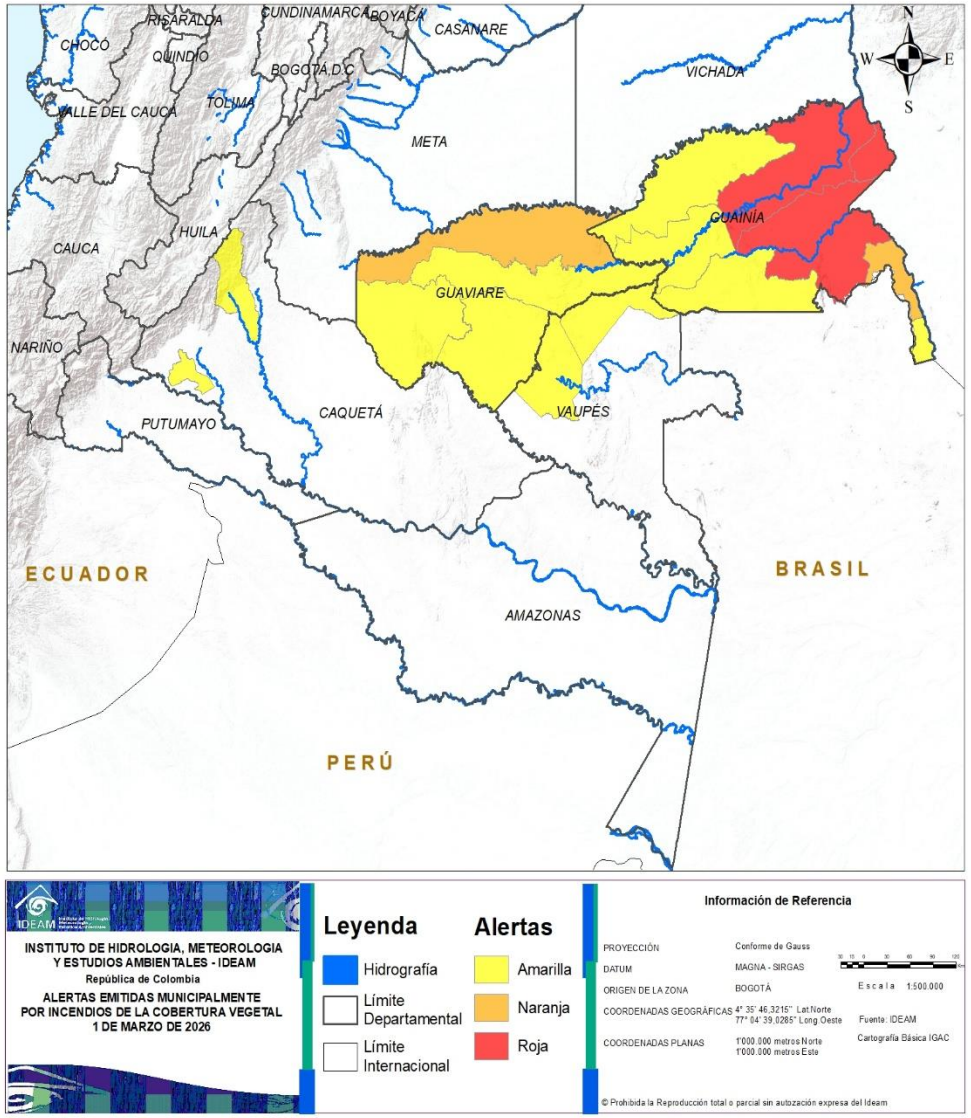


ALERTA	SITIOS PARA LOS CUALES SE GENERA LA ALERTA
	GUAINÍA : Cacahual, Inírida, Puerto Colombia.
	GUAINÍA : San Felipe. GUAVIARE : San José del Guaviare.
	CAQUETÁ : Puerto Rico, Valparaíso. GUAINÍA : Barrancominas, La Guadalupe, Morichal, Pana Pana. GUAVIARE : Calamar, El Retorno, Miraflores. VAUPÉS : Carurú, Papunahua.

DEFINICIONES Y RECOMENDACIONES



DEFINICIONES	RECOMENDACIONES
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Ley 1523 de 2012). Conato (Incendio): Fuego de origen natural o antrópico que afecta o destruye una extensión inferior a 5.000 m2, de cualquier tipo de cobertura vegetal, ya sea en zona urbana o rural. Incendio de la cobertura vegetal: Fuego sobre la cobertura vegetal de origen natural o antrópico que se propaga sin control, que causa perturbaciones ecológicas afectando o destruyendo una extensión superior a 5.000 m2, ya sea en zona urbana o rural, que responde al tipo de vegetación, cantidad de combustible, oxígeno, condiciones meteorológicas, topografía, actividades humanas, entre otras. Incendio forestal: Un incendio forestal es un "fuego que, cualquiera sea su origen, se propaga sin control en terrenos rurales a través de vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, ya sea viva o muerta". Es decir, no solo se queman los árboles, sino que se destruye todo un ecosistema de especies vegetales silvestres y también animales que habitan en estos terrenos. (Conaf, 2019)	A la comunidad en general, a los turistas y caminantes apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos tipo vidrio que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios. A los consejos departamentales y municipales, las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención de incendios con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de los mismos especialmente en áreas de reserva forestal y del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales. A los sistemas regionales y locales de bomberos disponer de los elementos necesarios para la atención oportuna de eventos de incendio de la cobertura vegetal

Alertas Meteomarinas Vigentes
Mar Caribe Colombiano

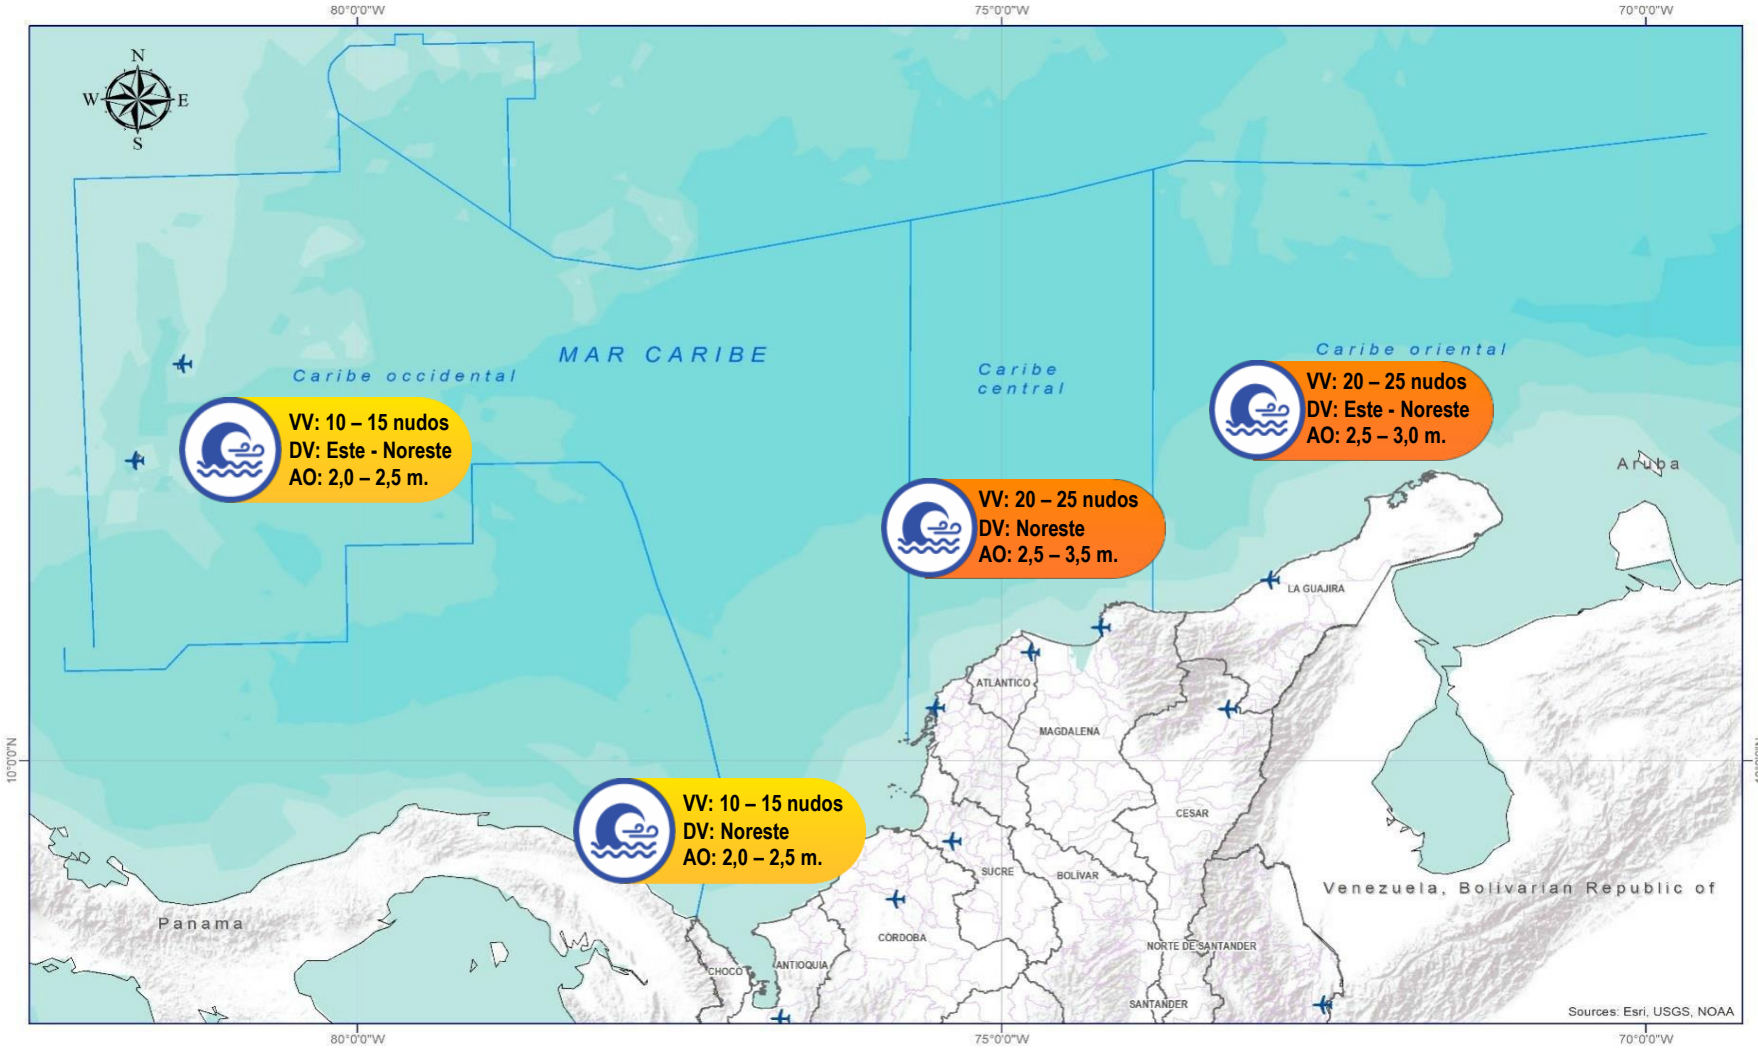

Abreviaturas

VV – Velocidad del viento máxima probable.
DV – Dirección predominante del viento.
AO – Altura significativa de la ola.

Convenciones

Tiempo Lluvioso
Probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Sugerencia o recomendación
A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar en zonas de inminente tempestad.

A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los avisos de las autoridades locales.

Pleamar
La marea alcanzará su máximo nivel en el intervalo de tiempo establecido.

Sugerencia o recomendación
Se sugiere a los habitantes costeros estar atentos a la evolución del fenómeno.


Viento y oleaje
Velocidad del viento y altura del oleaje con valores por encima de lo normal para la época.

Sugerencia o recomendación
A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución del fenómeno y a las indicaciones de las autoridades locales.

A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar.

* La altura significativa de la ola, representa la media del tercio más alto de las olas, por lo cual la altura máxima posible puede ser incluso superior al doble de este valor.

Alertas Meteomarinas Vigentes
Océano Pacifico Nacional

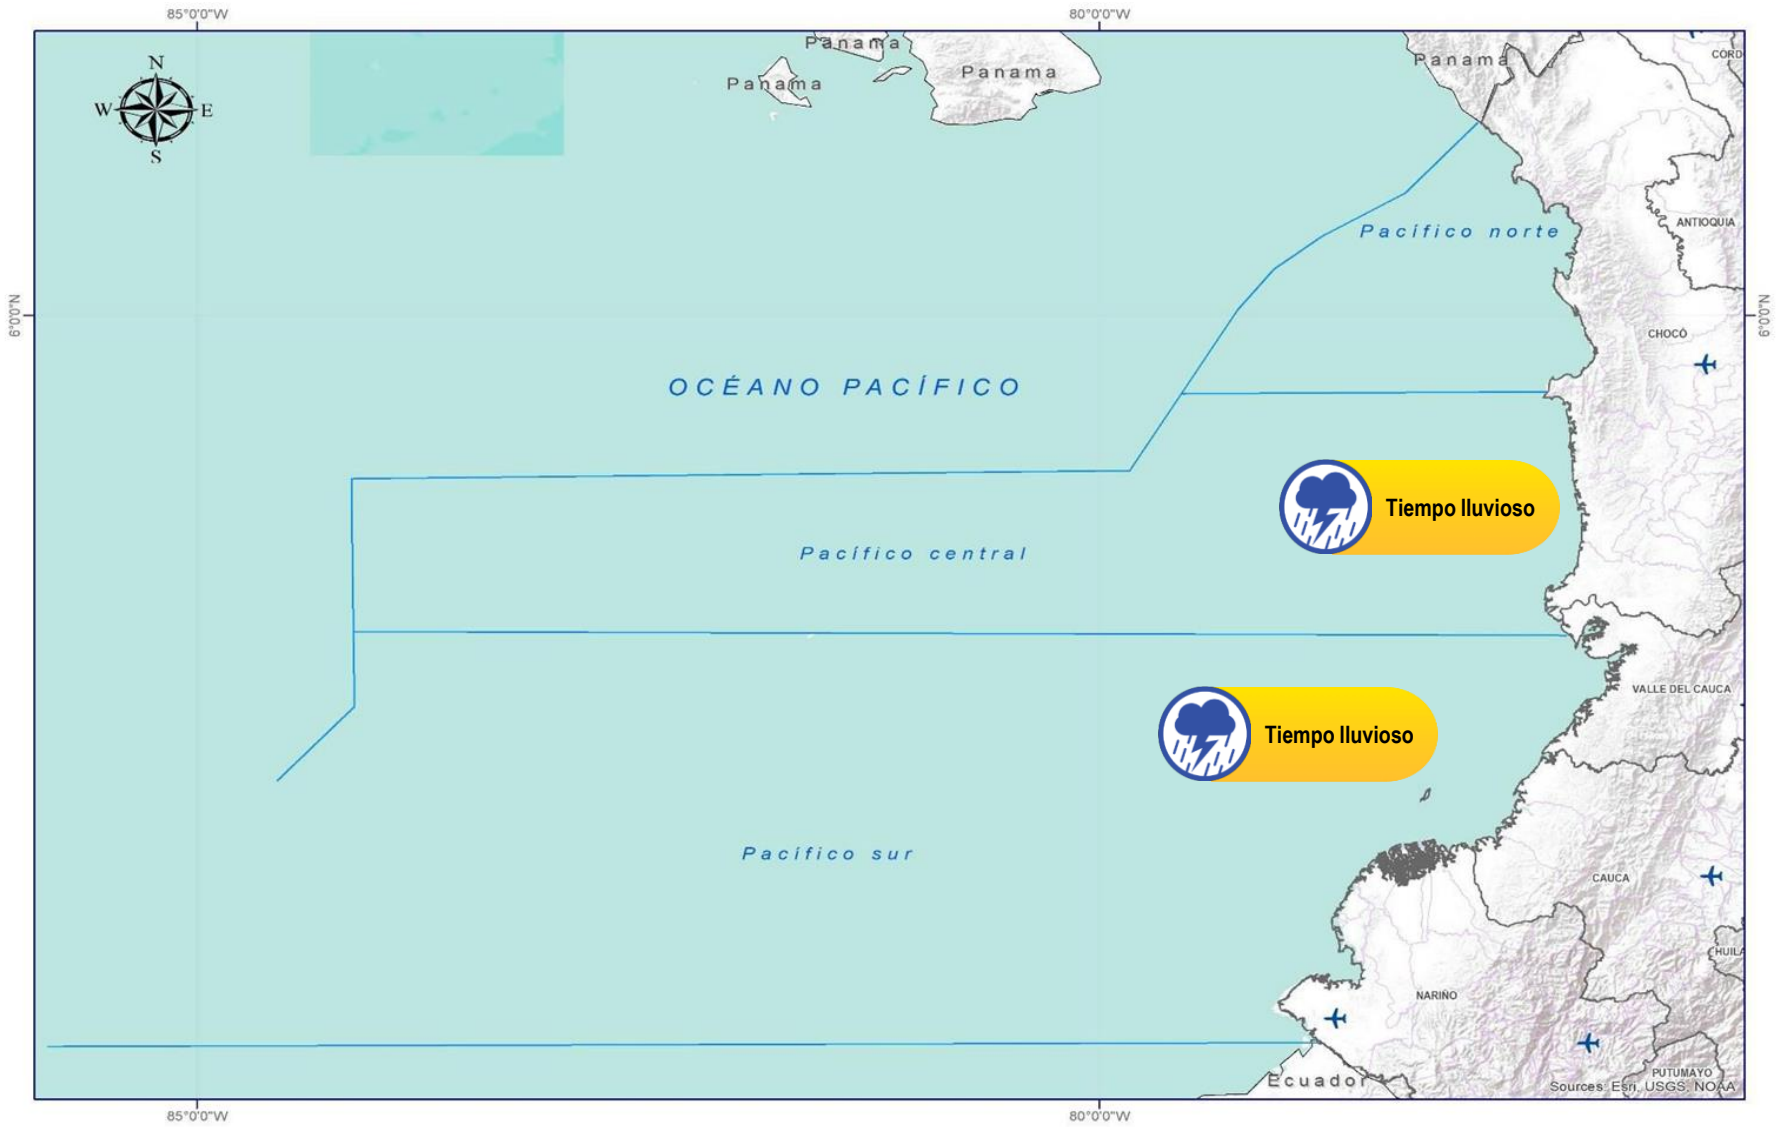

Abreviaturas

VV – Velocidad del viento máxima probable.
DV – Dirección predominante del viento.
AO – Altura significativa de la ola.

Convenciones

Tiempo Lluvioso
Probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, en algunos casos con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Sugerencia o recomendación
A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar en zonas de inminente tempestad.

A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los avisos de las autoridades locales.

Pleamar
La marea alcanzará su máximo nivel en el intervalo de tiempo establecido.

Sugerencia o recomendación
Se sugiere a los habitantes costeros estar atentos a la evolución del fenómeno.

Viento y oleaje
Velocidad del viento y altura del oleaje con valores por encima de lo normal para la época.

Sugerencia o recomendación
A los bañistas y habitantes costeros, estar atentos a la evolución del fenómeno y a las indicaciones de las autoridades locales.

A las embarcaciones de poco calado, consultar con las Capitanías de puerto antes de zarpar.

* La altura significativa de la ola, representa la media del tercio más alto de las olas, por lo cual la altura máxima posible puede ser incluso superior al doble de este valor.

INFORME TÉCNICO DIARIO

Ghisliane Echeverry Prieto | Directora General
Jennifer Dorado Delgado | Jefe Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas

Elaboró:

Daniel Useche Samudio (Meteorología).
Josue David Daza Rojas (Hidrología).
Carolina Valencia Monroy (Deslizamientos de tierra).
Mayra Alexandra Soto Perdomo (Incendios de la cobertura vegetal).
Angela Jurany Amaya González (Datos hidrometeorológicos).
Hernando Villamizar Orozco (Informe Técnico Diario).

OFICINA DEL SERVICIO DE PRONÓSTICO Y ALERTAS
https://www.ideam.gov.co
Correos electrónicos: servicio@ideam.gov.co
Calle 25D N° 96B - 70, piso 3. Bogotá, D.C.
Teléfono: 601-3527160 ext. 1334 -1336.

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES


InstitutoIDEAM


@IDEAMColombia


IdeamColombia


Ideam.Instituto

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) | 3 (Mes) | 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DE RIO DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

FECHA DE INICIO: 14/11/2025

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/03/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 138,984,345.00

VALOR ACUMULADO:
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CONSULTORIA No. 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA ADMINSITRACIÓN VIAL CONSORCIO INGEVIAM

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 13,898,435.50	31/10/2025	30/6/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 27,796,869.00	31/10/2025	31/12/2028
Calidad de Estudios y Diseños			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 41,695,303.50	31/12/2025	31/12/2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100070163

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 7/11/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 284,700,000.00	31/10/2025	31/12/2025
Otros			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100019341 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 7/11/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)
Cumplimiento	10%	$ 13,898,435.50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 27,796,869.00
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 41,695,303.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
14	11	2025	14	7	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
14	11	2025	14	1	2029
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
14	1	2026	14	1	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100070163

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/12/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
14	11	2025	14	1	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100019341 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. Anexo 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/12/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)
Cumplimiento	10%	$ 13,898,435.50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 27,796,869.00
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 41,695,303.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
22	12	2025	15	8	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
22	12	2025	15	2	2029
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
15	2	2026	15	2	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100070163

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/01/2026

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 350,181,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
14	11	2026	15	2	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100019341 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/01/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)
Cumplimiento	10%	$ 13,898,435.50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 27,796,869.00
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 41,695,303.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	2	2026	17	9	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
9	2	2026	17	3	2029
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
17	3	2026	17	3	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100070163

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/02/2026

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 350,181,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
14	11	2025	17	3	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100019341 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/06/2026

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el

Firma

Nombre: MARTHA LUCIAV EGA BENAVIDES
Director de Interventoría - Ingeniera residente administración vial CONSORCIO INGEVIAM
Matrícula Profesional No.:19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DEL RIO DIAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-26 **PROYECTO:** HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: CONSULTORIA 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA - ADMINISTRACIÓN VIAL - CONSORCIO INGEVIAM

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	20	18	24	24	22	24	24	24	24	24	24	17	22	18	17	18	18	24	24	23	24	14	24	22	20	24	24	24				609
Lluvias moderadas	4	4			2							4	2	2	3	5	4			1		4		2	3							40
Lluvias intensas		2										3		4	4	1	2					6			1							23
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				672

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: **Ing. CARLOS DE RIO DIAZ**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 15850-014502BYC

Firma
Nombre: **MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES**
Residente de la Administración Vial
Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (02/03/2026 16:29)

Nombre estacion:	ALCALA [26120150]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	4.6764722220	**Longitud:**	-75.78630556	**Elevación:**	1261
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	**Area Operativa:**	Area Operativa 09 - Cauca-Valle-Caldas	**Departamento:**	Valle Del Cauca
Municipio:	Alcalá	**Fecha instalacíon:**	15/03/1972 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	01/02/2026 00:00-28/02/2026 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencional)	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2026-02-01 00:00	8	Preliminar
2026-02-02 00:00	22	Preliminar
2026-02-03 00:00	0	Preliminar
2026-02-04 00:00	0	Preliminar
2026-02-05 00:00	5	Preliminar
2026-02-06 00:00	0	Preliminar
2026-02-07 00:00	0	Preliminar
2026-02-08 00:00	0	Preliminar
2026-02-09 00:00	0	Preliminar
2026-02-10 00:00	0	Preliminar
2026-02-11 00:00	0	Preliminar
2026-02-12 00:00	19	Preliminar
2026-02-13 00:00	8	Preliminar
2026-02-14 00:00	21	Preliminar
2026-02-15 00:00	31	Preliminar
2026-02-16 00:00	21	Preliminar
2026-02-17 00:00	52	Preliminar
2026-02-18 00:00	0	Preliminar
2026-02-19 00:00	0	Preliminar
2026-02-20 00:00	5	Preliminar
2026-02-21 00:00	0	Preliminar
2026-02-22 00:00	26	Preliminar
2026-02-23 00:00	0	Preliminar
2026-02-24 00:00	10	Preliminar
2026-02-25 00:00	21	Preliminar
2026-02-26 00:00	0	Preliminar
2026-02-27 00:00	0	Preliminar
2026-02-28 00:00	0	Preliminar

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA **5/03/2026**
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 1787 de 2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CARLOS DEL RIO DIAZ
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CONSULTORIA 1995-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ADMINISTRACIÓN VIAL- CONSORCIO INGEVIAM

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/11/2025
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	29/12/2025	1/01/2026	15/02/2026
2	13/02/2026	15/02/2026	17/03/2026

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/03/2026
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 138,984,345.00 **50% EN SMMLV:** $ 48.82
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
			$ -
			$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 138,984,345.00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita de fecha 2 de marzo de 2026 el Contratista de Obra solicita prorrogar el plazo del contrato No 1787-2025 hasta el 16 de abril de 2026, es decir, treinta (30) días.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Atención de emergencias en las vías nacionales a cargo de la Territorial Quindío, mediante la intervención de afectaciones que incidan en la transitabilidad y seguridad vial.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

FECHA: **5/03/2026** (Día / Mes / Año)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: __	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.	$ 138,984,345.00			$ 138,984,345.00
			$ -	
Valor Total	**$ 138,984,345.00**		**$ -**	**$ 138,984,345.00**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de FEBRERO (mes anterior a la presente solicitud) 2026 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 71.42% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 60%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ - (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ - (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ -
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: FEBRERO (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) $ 99,256,124.00

Último mes facturado: FEBRERO (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 39,728,221.00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO SE HA INICIADO PROCESO DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

la adminsitración vial estimaa precedente prorrogar el contrato de Monto Agotable No. 1787-2025 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que en el boletín No. 060 de CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES publicado el 1 de marzo del 2026 por Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se informa a las entidades en Zona del Departamento del Quindío, que este se encuentra catalogado en Alerta alta (roja) con probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios del departamento, lo que puede generar distintas emergencias en el corredor vial a cargo.

2.Que el propósito principal del contrato es atender y prevenir las emergencias como derrumbes que se puedan presentar en las vías a cargo de la Dirección Territorial Quindío del Instituto Nacional de Vías.

3. Que las rutas 2901B Armenia - Alcalá, 25VL07 Cartago - Alcalá y 40QN05 Variante Calarcá – La cabaña, tiene amplios sectores con riesgo de inminentes deslizamientos debido a las características geológicas y topográficas de región, lo que afectarían la transitabilidad de los corredores.

4. Que, debido al riesgo de una inminente pérdida de banca en el sitio crítico ubicado en el PR 7+0280 de la ruta 25VL07, el cual presentaba socavación en su talud inferior, la Dirección Territorial solicitó la intervención de dicho punto mediante la construcción de muros en gaviones y la ejecución de obras menores de drenaje, con el fin de garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios de la vía.

Que, una vez ejecutadas las actividades requeridas para la estabilización del sitio crítico, se determinó la existencia de recursos remanentes dentro del contrato, así como la necesidad de mantener la disponibilidad operativa, técnica y financiera del contratista.

5, Que, en consideración a las condiciones climáticas variables que inciden en el corredor vial y al carácter preventivo que debe orientar la gestión del riesgo en infraestructura de transporte, se hace necesario prorrogar el plazo contractual, con el fin de asegurar la atención oportuna de posibles emergencias o eventos sobrevinientes que puedan afectar la estabilidad y transitabilidad de la vía.

JURÍDICA:

De conformidad con los artículos 2 de la Constitución Política y 3, 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, la Entidad se encuentra legalmente facultada para modificar los contratos estatales cuando ello resulte indispensable para garantizar la continuidad del servicio público y el cumplimiento de los fines del Estado.

Del estudio jurídico y técnico efectuado se establece que la modificación contractual propuesta es estrictamente necesaria, objetiva y proporcional, en tanto evita la suspensión del servicio, asegura la ejecución ininterrumpida del objeto contractual y garantiza condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad vial en la infraestructura a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

La prórroga propuestas no constituyen reconocimiento de desequilibrio económico ni generan derechos a reclamaciones, compensaciones o ajustes de ninguna naturaleza, permaneciendo incólumes las demás estipulaciones contractuales.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

	FECHA	**5/03/2026** (Día / Mes / Año)

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

el contrato cuenta con recursos para la continuidad de ejecucion del contrato de monto agotable No. 1787-2025

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

El contrato cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 66525 del 02 de abril de 2025, lo cual garantiza la disponibilidad de los recursos

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

El presente proceso no requiere modificaciones o variaciones en aspectos ambientales, sociales y/o de sostenibilidad.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

N/A

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

1.Oficio emitido por el contratista, en el que solicita la prorroga No. 3 al contrato No. 1787 de 2025.
2. Oficio de la Administración Vial, en la que expresa la viabilidad de la solicitud de prorroga
3. Formato seguimiento a garantias.
4. Formato Estado del tiempo

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: CARLOS DEL RIO DIAZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 15850-014502BYC

Firma

Nombre: **MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría consultoria -Administracion vial -Consorcio INGEVIAM
Matrícula Profesional No.: 19202- 50471CAU

Vo.Bo.Firma
Nombre: **ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO**
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

CQUI-1347

Calarcá, marzo 17 de 2025

Ingeniero:
LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Director Territorial Quindío (E).
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1995-2024, QUE TIENE COMO OBJETO: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO".**

ASUNTO: Entrega Acta de Obra N° 4 del mes de febrero 2026 del Contrato NO. 1787 de 2025 Monto Agotable.

Cordial Saludo,

Por medio del presente hacemos entrega del Acta parcial de Obra N° 4 con sus documentos soporte, del contrato N° 1787-2025, para su revisión y aprobación, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos como apoyo a interventoría de dicho contrato.

Quedamos atentos a cualquier observación o sugerencia.

Anexos: Acta Parcial de Obra N°4 cto 1787-2025 (incluidos soportes)

Atentamente,

MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
INGENIERA RESIDENTE AMV-QUINDIO
CONSORCIO INGEVIAM

C.C. Archivo
C.C Ing. Erwin Federman Rosero bravo- Supervisor cto 1787-2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PAGINA 1 DE 1

FECHA: **17/03/2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 37.470.564,00 **MES** 1 al 28 de Febrero de 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **1787 DE 2025** (Indique número y año)

OBJETO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATISTA: **CARLOS DEL RIO DIAZ** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **CTO CONSULTORIA 1995-2024** INTERVENTOR: **CONSULTOR -ADMINISTRACION VIAL-CONSORCIO INGEVIAM**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31/12/2025** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **4,03** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **14/11/2025** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **15/03/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **NA** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: **NA** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(** $ **138.984.345,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 138.984.345,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha:		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201.7	201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	1,00	$ 218.350,00	$ 218.350,00			9,84	$ 2.148.564,00	10,34	$ 2.257.739,00
2	211.1	211-22		REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	1,00	$ 19.500,00	$ 19.500,00				$ -		$ -
3	211.2P	211-22	211.2P	REMOCIÓN DE DERRUMBES-Con Retrocargador (Pajarita)	M3	1,00	$ 19.000,00	$ 19.000,00						
4	600.1.1	600-22		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1,00	$ 65.400,00	$ 65.400,00			12,10	$ 791.340,00	186,90	$ 12.223.260,00
5	610.1	610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	1,00	$ 220.000,00	$ 220.000,00			84,21	$ 18.526.200,00	158,01	$ 34.762.200,00
6	610.8	610-22		RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	M3	1,00	$ 262.500,00	$ 262.500,00						$ -
7	630.1.4.1	630-22		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPA	M3	1,00	$ 920.000,00	$ 920.000,00						$ -
8	630.1.6	630-22		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA	M3	1,00	$ 669.500,00	$ 669.500,00			7,83	$ 5.242.185,00	7,83	$ 5.242.185,00
9	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa	KG	1,00	$ 7.400,00	$ 7.400,00						$ -
10	671.3	671-22		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1,00	$ 770.000,00	$ 770.000,00						$ -
11	673.1.1	673-22		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700N	M2	1,00	$ 23.200,00	$ 23.200,00						$ -
12	681.1	681-22		GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	1,00	$ 422.050,00	$ 422.050,00			25,50	$ 10.762.275,00	118,50	$ 50.012.925,00
13	900.3	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m).	M3-KM	1,00	$ 1.600,00	$ 1.600,00						$ -
14	P			MEZCLA ASFALTICA FABRICADA EN CALIENTE Y APLICADA EN FRIO PARA BACHEO	KG	1,00	$ 7.500,00	$ 7.500,00						$ -
														$ -
														$ -
														$ -
				ÍTEM NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL OBRAS								$ 37.470.564,00		$ 104.498.309,00
*				**OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)**				$ -				$ -		$ -
*				**VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)**				$ 138.984.345,00				$ 37.470.564,00		$ 104.498.309,00
*				**VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (D)**										
*				**VALOR TOTAL DEL CONTRATO (A+B)**				$ 138.984.345,00				$ 37.470.564,00		$ 104.498.309,00
*														
*														
*				**VALOR TOTAL**				**$ 138.984.345,00**				**$ 37.470.564,00**		**$ 104.498.309,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU ..... %
Utilidad ..... %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PAGINA 1 DE 1

FECHA **17/03/2026**
(Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	**IVA**	**TOTAL PRESENTE MES**
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)	$ 37.470.564,00	$ -	$ 37.470.564,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 37.470.564,00	$ -	$ 37.470.564,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ -**
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 37.470.564,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
CARLOS DEL RIO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CARLOS DEL RIO DIAZ
Matricula No. 15850-014502 BYC

Firma:
ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO
SUPERVISOR
Matricula No. MAT. No. 5220208-3952 CPN

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	PAGINA 1 DE 1

FECHA: 17/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **QUINDIO** PERIODO MES: **1 al 28 de Febrero de 2026**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **4** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: **$ 37.470.564,00**

	Día/Mes/Año					FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9	3	2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	17	3	2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: **1787** DE **2025**

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATISTA: **CARLOS DEL RIO DIAZ** **NIT.** 19341681-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL ING., **LENIN TITO MENDOZA PEÑA** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CARLOS DEL RIO DIAZ**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 37.470.564,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **4** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** **1 al 28 de Febrero de 2026** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	NA	Firma
NA	**LENIN TITO MENDOZA PEÑA**	Nombre:	**LENIN TITO MENDOZA PEÑA**
Matricula No.	**Matricula No. 19202-59285**	Matricula profesional No.:	**Matricula No. 19202-59285**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL (E) QUINDIO	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **1787 DE 2025**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	4	**1 al 28 de Febrero de 2026**
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____				
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? ACTA DE RECIBO DE OBRA		4	**1 al 28 de Febrero de 2026**

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 784625	RUBRO No. C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	**$ 37.470.564,00**
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$
			TOTAL ACTA	**$ 37.470.564,00**

ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No. MAT. No. 5220208-3952 CPN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PÁGINA 1 de 1.

FECHA **17/03/2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 1787 DE 2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DEL RIO DIAZ

MES INFORME MENSUAL: 1 al 28 de Febrero de 2026 **PROYECTO:** HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CONSULTORIA-ADMINISTRACION VIAL-1995-2025 **INTERVENTOR:** CONSULTOR-ADMINISTRACION VIAL CONSORCIO INGEVIAM

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	784625	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	10	Nacion	PRINCIPAL	$ 138.984.345,00	$ 138.984.345,00
					TOTAL	$ 138.984.345,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 138.984.345,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha.	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	14 al 30 de Noviembre de 2025		$ -	$ -				**784625 de 11/05/2025**	$ 138.984.345,00	$ 138.984.345,00				
2	PARCIAL	1 al 31 de Diciembre de 2025							**784625 de 11/05/2025**	$ 138.984.345,00	$ 138.984.345,00				
3	PARCIAL	1 al 31 de enero del 2026	$ 67.027.745,00		$ 67.027.745,00				**784625 de 11/05/2025**	$ 71.956.600,00	$ 71.956.600,00				
4	PARCIAL	1 al 28 de febrero del 2026	$ 37.470.564,00		$ 37.470.564,00				**784625 de 11/05/2025**	$ 34.486.036,00	$ 34.486.036,00			|	
TOTALES			**$ 104.498.309,00**	**$ -**	**$ 104.498.309,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 34.486.036,00**	**$ 34.486.036,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 104.498.309,00	$ -	**$ 104.498.309,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
AJUSTES	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
*			
VALOR TOTAL	$ 104.498.309,00	$ -	**$ 104.498.309,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
CARLOS DEL RIO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No. 15850-014502 BYC

Firma
ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO
SUPERVISOR
Matricula No. MAT. No. 5220208-3952 CPN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1787 DE 2025** Contratista **CARLOS DEL RIO DIAZ**

Objeto del Contrato **HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO**

CONTROL FINANCIERO Y

Acta N° **4** Valor basico $ **$ 138.984.345** Período **1 al 28 de Febrero de 2026**

Valor Incluido Iva $ **$ 138.984.345**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	25VL07	CARTAGO-ALCALA	$ 37.470.564			**$ 37.470.564**
2	29VLA	VARIANTE ALCALA Y ACCESOS				
3	2901B	ARMENIA -ALCALA				
4	4003	ARMENIA-IBAGUE				
5	4002	LA PAILA -ARMENIA				
6	40QN05	VARIANTE CALARCA -LA CABAÑA				
7	40QN04	LA ESPAÑOLA- ARMENIA				
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 37.470.564**	**$**		**$ 37.470.564**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	VALLE DEL CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.900.493-2.	CARTAGO			$ 37.470.564
	TOTAL VALLE DEL CAUCA			$ 37.470.564

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
CARLOS DEL RIO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No. 15850-014502 BYC

INTERVENTOR- CONSULTOR
MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDEZ
RESIDENTE ADMINISTRACION VIAL
Matrícula Profesional No.:19202-50471 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL QUINDÍO

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución No. 0241 del 04 de febrero de 2026

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: ***CARLOS DEL RIO DIAZ***

NIT. ***19341681-8***

Valor facturado: **$ 37.470.564,00**

Letras: **TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Correspondiente al acta parcial de obra No. 4, del contrato No. 1787-2025, cuyo objeto es HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO, del periodo comprendido entre el 1 Al 28 DE FEBRERO DE 2026.

Con cargo al registro presupuestal número **784625** de Fecha: **11/05/2025**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato, (registro presupuestal y aprobación de pólizas)

FIRMA:

Nombre: ING. LENIN TITO MENDOZA PEÑA
DIRECTOR TERRITORIAL (E) QUINDÍO - INVIAS
Fecha: 8/01/2026

Proyectó:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL QUINDIO

PREACTA PERIODO 4 DE 1 AL 28 FEBRERO DE 2026

CONTRATO: 1787 DE 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATISTA: **CARLOS DE RIO DÍAZ**

REP. LEGAL : CARLOS DE RIO DIAZ

C. C. #: 19.341.681 de Bogotá

INTERVENTOR: CONSULTOR -ADMINISTRACION VIAL-CONSORCIO INGEVIAM

ING, RESIDENTE MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES

SUPEVISOR ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO

TRAMOS: VIA CARTAGO - ALCALA 25VL07

SECTOR: VIA CARTAGO - ALCALA; VIA VARIANTE DE ALCALA Y ACCESOS; VIA VARIANTE CALARCA -LA CABAÑA; VIA LA ESPAÑOLA - ARMENIA; VIA CLUB CAMPESTRE - ARMENIA; VIA ARMENIA - CALARCA; VIA ARMENIA -MONTENEGRO

PLAZO: HASTA EL 15 DE MARZO DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

FECHA INICIO: 14/11/2025

FECHA FINALIZACION: 14/03/2026

FECHA SUSPENSIÓN: N. A.

FECHA DE CORTE 28/02/2026

201.7	DEMOLICION ESTRUCTURA					Subtotal		9,84
			UBICACIÓN	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**VOLUMEN**
			ALETA IZQUIERDA (A)	1,80	0,30	1,50		0,81
			VIGA CIMENTACION ALETA	1,80	0,90	0,50		0,81
			PANTALLA (B1)	3,60	0,30	1,60		1,73
			PANTALLA (B2)	3,60	0,80	1,00		2,88
			DESCUENTO TUBERIA					-0,76
			LOSA (C)	3,80	1,20	0,50		2,28
			DISIPADOR					
			PANTALLA POSTERIOR (D)	2,00	0,30	1,60		0,96
			PANTALLA FRONTAL (F1)	2,80	0,30	0,60		0,50
			PANTALLA FRONTAL (F2)	1,60	0,15	1,40		0,17
			ESCALONES DISIPADOR (E)	3,80	1,20	0,20		0,46
211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES		**Localización**	**CANTIDAD**	**PR BOTADERO**	**DISTANCIA**		**M3-Km**
211.2P	REMOCIÓN DE DERRUMBES-Con Retrocargador (Pajarita)					Subtotal		0,00
			Localización	**CANTIDAD**	**PR BOTADERO**	**DISTANCIA**		**M3-Km**
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR					Subtotal		12,10
			UBICACIÓN	**LONGITUD PROMEDIO**	**ANCHO PROMEDIO**	**ALTO PROMEDIO**		**VOLUMEN**
			MURO ALCANTARILLA	5,7	2,5	0,8		11,4
			SEPARACION GAVIONES	0,7	1	1		0,7












INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL QUINDIO

PREACTA PERIODO 4 DE 1 AL 28 FEBRERO DE 2026

CONTRATO: 1787 DE 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATISTA: **CARLOS DE RIO DÍAZ**

REP. LEGAL : CARLOS DE RIO DIAZ
C. C. #: 19.341.681 de Bogotá

INTERVENTOR: CONSULTOR -ADMINISTRACION VIAL-CONSORCIO INGEVIAM
ING, RESIDENTE MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
SUPEVISOR ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO

TRAMOS: VIA CARTAGO - ALCALA 25VL07 **SECTOR:** VIA CARTAGO - ALCALA; VIA VARIANTE DE ALCALA Y ACCESOS; VIA VARIANTE CALARCA -LA CABAÑA; VIA LA ESPAÑOLA - ARMENIA; VIA CLUB CAMPESTRE - ARMENIA; VIA ARMENIA - CALARCA; VIA ARMENIA -MONTENEGRO **PLAZO**: HASTA EL 15 DE MARZO DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

FECHA INICIO: 14/11/2025 FECHA FINALIZACION: 14/03/2026 FECHA SUSPENSIÓN: N. A. **FECHA DE CORTE** 28/02/2026

610.1 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO — **Subtotal** 84,21






	UBICACIÓN	LONGITUD PROMEDIO	ANCHO PROMEDIO	ALTO PROMEDIO		VOLUMEN
	MURO PRINCIPAL LADO IZQUIERDO (R1)	4	4,8	3,5		43,68
	MURO GAVIONES ALCANTARILLA (R2)	5,7	1	3,4		25,22
	DERECHO MURO ALCANTARILLA (R3)	1	3	3		5,85
	POCETA ENTRADA ALCANTARILLA (RA1)	1,75	1	2		4,55
	POCETA ENTRADA ALCANTARILLA (RA2)	1,80	1,05	2,00		4,914

610.8 RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE — **Subtotal** 0,00

	UBICACIÓN	LONGITUD PROMEDIO	ANCHO PROMEDIO	ALTO PROMEDIO		VOLUMEN

630.1.4.1 CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPA — **Subtotal** 0,00

	UBICACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO		VOLUMEN
	DISIPADOR					

630.1.6 CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA — **Subtotal** 7,83




	UBICACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO		VOLUMEN
	PISO GAVION					
	GAVION	5,7	2,5	0,5		7,125
	SEPARACION GAVIONES	0,70	1,00	1,00		0,7

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL QUINDIO

PREACTA PERIODO 4 DE 1 AL 28 FEBRERO DE 2026

CONTRATO: 1787 DE 2025 OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATISTA: **CARLOS DE RIO DÍAZ**

INTERVENTOR: CONSULTOR -ADMINISTRACION VIAL-CONSORCIO INGEVIAM
ING, RESIDENTE MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES

REP. LEGAL : CARLOS DE RIO DIAZ
C. C. #: 19.341.681 de Bogotá

SUPEVISOR ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO

TRAMOS: VIA CARTAGO - ALCALA 25VL07 **SECTOR:** VIA CARTAGO - ALCALA; VIA VARIANTE DE ALCALA Y ACCESOS; VIA VARIANTE CALARCA -LA CABAÑA; VIA LA ESPAÑOLA - ARMENIA; VIA CLUB CAMPESTRE - ARMENIA; VIA ARMENIA - CALARCA; VIA ARMENIA -MONTENEGRO **PLAZO**: HASTA EL 15 DE MARZO DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

FECHA INICIO: 14/11/2025 FECHA FINALIZACION: 14/03/2026 FECHA SUSPENSIÓN: N. A. **FECHA DE CORTE** 28/02/2026

640-22 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa — **Subtotal** 0,00

UBICACIÓN	DIAMETRO	KG/ML	LONGITUD	CANTIDAD		PESO TOTAL
DISIPADOR ALCANTARILLA						

671-22 CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO — **Subtotal** 0,00

	UBICACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO		VOLUMEN
						0

673-22 GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700N — **Subtotal**

	UBICACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO		VOLUMEN

681.1 GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) — **Subtotal** 25,50






	UBICACIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO		VOLUMEN
	ALCANTARILLA					
	FILA 1	5	2	1		10
	FILA 2	5	2	1		10
	FILA 3	5,5	1	1		5,5

900-22 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m). — **Subtotal** 0,00

FECHA	Localización	CANTIDAD	PR BOTADERO	DISTANCIA		M3-Km

P MEZCLA ASFALTICA FABRICADA EN CALIENTE Y APLICADA EN FRIO PARA BACHEO — **Subtotal** 0,00

UBICACIÓN	KG/M3	LONGITUD	ANCHO	ALTO		VOLUMEN
CALZADA						

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL QUINDIO

PREACTA PERIODO 4 DE 1 AL 28 FEBRERO DE 2026

CONTRATO: 1787 DE 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATISTA: **CARLOS DE RIO DÍAZ**

REP. LEGAL : CARLOS DE RIO DIAZ

C. C. #: 19.341.681 de Bogotá

INTERVENTOR: CONSULTOR -ADMINISTRACION VIAL-CONSORCIO INGEVIAM

ING, RESIDENTE MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES

SUPEVISOR ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO

TRAMOS: VIA CARTAGO - ALCALA 25VL07

SECTOR: VIA CARTAGO - ALCALA; VIA VARIANTE DE ALCALA Y ACCESOS; VIA VARIANTE CALARCA -LA CABAÑA; VIA LA ESPAÑOLA - ARMENIA; VIA CLUB CAMPESTRE - ARMENIA; VIA ARMENIA - CALARCA; VIA ARMENIA -MONTENEGRO

PLAZO: HASTA EL 15 DE MARZO DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS

FECHA INICIO: 14/11/2025

FECHA FINALIZACION: 14/03/2026

FECHA SUSPENSIÓN: N. A.

FECHA DE CORTE 28/02/2026

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GRAL	ESPECIFICACIONES PART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO		VALOR TOTAL
								$ 37.470.564,00
201.7	201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	9,84	$ 218.350,00		$ 2.148.564,00
211.1	211-22		REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3		$ 19.500,00		$ -
211.2P	211-22	211.2P	REMOCIÓN DE DERRUMBES-Con Retrocargador (Pajarita)	M3		$ 19.000,00		$ -
600.1.1	600-22		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	12,10	$ 65.400,00		$ 791.340,00
610.1	610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	84,21	$ 220.000,00		$ 18.526.200,00
610.8	610-22		RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	M3		$ 262.500,00		$ -
630.1.4.1	630-22		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPA	M3	0,00	$ 920.000,00		$ -
630.1.6	630-22		CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA	M3	7,83	$ 669.500,00		$ 5.242.185,00
640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa	KG	0,00	$ 7.400,00		$ -
671.3	671-22		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	0,00	$ 770.000,00		$ -
673.1.1	673-22		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700N	M2		$ 23.200,00		$ -
681.1	681-22		GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	25,50	$ 422.050,00		$ 10.762.275,00
900.3	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m).	M3-KM		$ 1.600,00		$ -
P			MEZCLA ASFALTICA FABRICADA EN CALIENTE Y APLICADA EN FRIO PARA BACHEO	KG		$ 7.500,00		$ -

VALOR TOTAL BÁSICO "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO" (CON AIU Y SIN IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS)		$ 37.470.564,00
VALOR IVA ("HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO") (19% SOBRE UTILIDAD)		$ 37.470.564,00
VALOR TOTAL "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO" (CON AIU E INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS)		$ 37.470.564,00

Reviso: **MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES**
Ingeniera Residente -Administracion Vial
Consorcio Ingeviam

Contratista.
R. L.: CARLOS DE RIO DÍAZ
C. C. #: 19.341.681 de Bogotá
Contratista.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CONTRATO 1787 DE 2025

ING. CARLOS DEL RIO DIAZ

El suscrito Carlos del Rio Díaz, identificado con cedula de ciudadanía no. 19.641.681, CERTIFICA que en la ejecución del contrato 1787-2025 cuyo objeto es" HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO , me encuentro a paz y salvo con el pago de salarios y aportes de todos mis empleados al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, hasta el periodo comprendido para el mes de 01 al 28 de febrero del 2026.

En constancia se firma la presente en Armenia, el día cinco (05) de marzo del 2026



CARLOS DEL RIO DIAZ
CC. 19.641.681
CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19341681	0	DEL RIO DIAZ CARLOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARLOS	CRA 5 16 52	VILLAVICENCIO-META	7484153	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	125924741	9501137234	E	2026/03/18	2026/03/09	NEQUI	0	$2,335,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CARLOS (8 Afiliados)						$6,711,805	$1,074,400			$6,711,805	$269,000			$6,711,805	$269,000			$6,711,805	$164,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CARLOS (8 Afiliados)						$6,711,805	$1,074,400			$6,711,805	$269,000			$6,711,805	$269,000			$6,711,805	$164,000		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (8 Afiliados)						$6,711,805	$1,074,400			$6,711,805	$269,000			$6,711,805	$269,000			$6,711,805	$164,000		$0	$0
1	CC	1110454576	GUTIERREZ YOJAN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF34	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$1,500	1	$0	$0
2	CC	93449093	LOAIZA JAIR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
3	CC	1088904006	LOPEZ DANIEL	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC62	1	$58,364	$2,400	CCF34	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$1,500	1	$0	$0
4	CC	1112782336	MEJIA JULIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
5	CC	71366293	MOSQUERA JOSE	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF34	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$1,500	1	$0	$0
6	CC	16222521	RIVAS ILSSON	231001	21	$1,225,634	$196,200	EPS037	21	$1,225,634	$49,100	CCF34	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$29,900	21	$0	$0
7	CC	1112792290	RUIZ CRISTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
8	CC	1114153108	SERNA MAURO	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF34	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$1,500	1	$0	$0
EMPLEADO					**PENSION**		**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: IBAGUE (2 Afiliados)						$875,453	$140,100			$1,750,905	$70,100			$2,626,358	$105,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0
Centro de Trabajo: IBAGUE (2 Afiliados)						$875,453	$140,100			$1,750,905	$70,100			$2,626,358	$105,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$875,453	$140,100			$1,750,905	$70,100			$2,626,358	$105,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0
9	CC	19241285	DEL RIO ORLANDO		0	$0	$0	EPS001	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	1018441579	DEL RIO SERGIO	25-14	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF50	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	14	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					$7,587,258	$1,214,500			$8,462,710	$339,100			$9,338,163	$374,200			$10,213,615	$407,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,214,500	$0	$0	$1,214,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$196,200	$0	$0	$196,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$149,500	$0	$0	$149,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$868,800	$0	$0	$868,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$407,800	$0	$0	$407,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$407,800	$0	$0	$407,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$374,200	$0	$0	$374,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	8	$269,000	$0	$0	$269,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	$105,200	$0	$0	$105,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$339,100	$0	$0	$339,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$70,100	$0	$0	$70,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$2,400	$0	$0	$2,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$119,200	$0	$0	$119,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$74,900	$0	$0	$74,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,400	$0	$0	$2,400
TOTAL				**10**	**$2,335,600**	**$0**	**$0**	**$2,335,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19341681		DELRIO DIAZ CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 1 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7484153	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	59721017	9500703736	I	2026/03/18	2026/03/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	19341681	DEL RIO CARLOS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14931638424

(415)7707212489984(8020) 000001493163842 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 4 1 6 8 1	8	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 3 4 1 6 8 1	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DEL RIO	DIAZ	CARLOS	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Moniquirá 4 6 9

41. Dirección principal
CR 5 16 52

42. Correo electrónico cahudigomc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 2 8 2 7 4 8	3 2 0 3 0 6 3 9 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 7 0 9 0 1	4 3 3 0	2 0 0 7 0 9 0 1	4 2 1 0			2 1 4 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1	6	2	2	4	9	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
16- Obligación facturar por ingresos bienes
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DEL RIO DIAZ CARLOS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	Mhjaolayac	JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	5/11/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 66525 de fecha 2025-04-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	784625	**Fecha Registro:**	2025-11-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	138.984.345,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	138.984.345,00	**Saldo x Obligar:**	138.984.345,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	19341681	**Razón Social:**	CARLOS DEL RIO DIAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550176700057001	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	76312085	**Nombre:**	LENIN TITO MENDOZA PEÑA	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1787/2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-11-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
8-21 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA ATENDIDA POR EMERGENCIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	10	CSF		138.984.345,00	0,00		
					Total:	138.984.345,00	0,00	138.984.345,00	138.984.345,00

Objeto:	DTQUI ADO 1787/2025 P:31/12/2025 R:2025I-VBOG-087631 HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGODE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	69.492.172,50	69.492.172,50	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	69.492.172,50	69.492.172,50	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 1787-2025

OBJETO:

OBJETO: *"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO".*

CONTRATO DE CONSULTORIA: No. 1995-2024

OBJETO: *"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO".*

INTERVENTOR: *CONSORCIO INGEVIAM*

EJECUTOR: *CARLOS DEL RIO DIAZ*

FEBRERO DE 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN ***3***
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ***3***
2.1 Localización 3
2.2 Inventario y estado inicial de la vía. 4
2.3 Características técnicas del proyecto. 4
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SEÑALIZACIÓN No. 1787-2025 ***5***
3.1 Información general (Incluye seguimiento a las garantías contractuales). 5
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 6
3.3 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría. 6
3.4 Maquinaria y equipo contrato de suministro: 6
3.5 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de suministro: 7
3.6 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 7
3.7 Estado General del Tiempo. 7
3.8 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de suministro. 7
3.9 Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 7
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ***7***
5. OTROS ANEXOS ***8***

1. INTRODUCCIÓN

INVIAS suscribió el contrato No.1787-2025 con *CARLOS DEL RIO DIAZ*, quien se encargará de habilitar y/o brindar transitabilidad en la red vial a cargo de INVIAS a través del sistema de monto agotable, en las vías a cargo de la dirección territorial Quindío, bajo la supervisión de la Administración de Mantenimiento Vial, CONSORCIO INGEVIAM, a través del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1995-2024, con el fin de brindar al usuario de la vía transitabilidad segura.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

Contrato No. 1787-2025

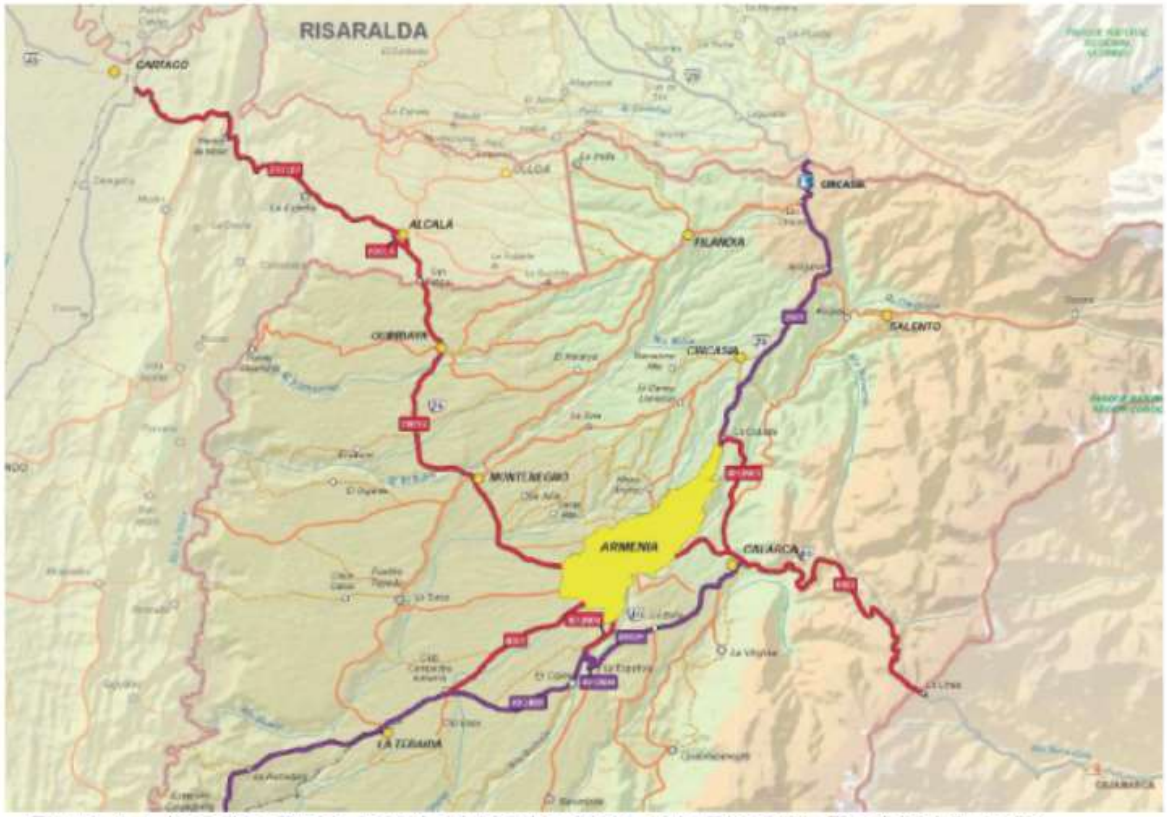


Figura 1.1. Localización de la red nacional a cargo de la Dirección Territorial Quindío

2.2 Inventario y estado inicial de la vía.

La red vial para intervenir, identificada con el contrato No. 1787-2025, tiene una longitud total de 67 km e incluye las siguientes rutas y tramos:

- Cartago – Alcalá, ruta 25VL07
- Armenia – Alcalá, ruta 2901B
- Variante Alcalá y accesos, ruta 29VLA
- Variante Calarcá – La Cabaña, ruta 40QN05
- Sector Club campestre – Armenia, ruta 4002
- La española – Armenia, ruta 40QN04
- Sector Armenia – Calarcá, ruta 4003

La superficie de rodadura de las rutas mencionadas presenta un notable deterioro, excepto el sector denominado Club campestre – Armenia, ruta 4002, con los siguientes daños identificados: Fisuras tipo "piel de cocodrilo", baches y hundimientos, y mal estado de las líneas de eje y de borde.

Además de los daños previamente descritos (fisuras tipo "piel de cocodrilo", baches, hundimientos, y mal estado de las líneas de señalización), se han identificado sitios críticos que requieren atención prioritaria debido a la presencia de fenómenos geotécnicos que afectan la estabilidad de la vía. Entre estos se encuentran: Deslizamientos de tierra y hundimiento de la superficie, especialmente en las rutas de montaña, se han registrado hundimientos adicionales, que no solo afectan la calidad de la capa de rodadura, sino que también podrían estar relacionados con problemas de drenaje. Estos hundimientos presentan un riesgo para los vehículos y requieren una evaluación detallada para determinar su causa y la mejor solución técnica.

2.3 Características técnicas del proyecto.

Las actividades objeto de la presente contratación deberán ejecutarse de conformidad con lo dispuesto en las Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Invias, adoptadas por el Ministerio de Transporte mediante resolución No. 0001376 del 26 de mayo de 2014, incluyendo la totalidad de las normas y especificaciones en ellas contenidas y/o referidas y en el Manual de Señalización Vial de Colombia - Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial 2024, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante resolución No. 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE MONTO AGOTABLE No. 1787-2025

3.1 Información general (Incluye seguimiento a las garantías contractuales).

CONTRATO DE SUMINTRO No.	***1787-2025***
CONTRATISTA:	*CARLOS DEL RIO DIAZ*
NIT:	*19.341.681*
REPRESENTANTE LEGAL	*CARLOS DEL RIO DIAZ*
IDENTIFICACIÓN	*19.341.681*
TELÉFONO	*3203063995*
OBJETO:	*HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.*
LOCALIZACIÓN:	*Zona de influencia municipio de Cartago y Alcalá Departamento Valle del Cauca, Montenegro, Quimbaya, Calarcá, Armenia y Salento del Departamento del Quindío.*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRON MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE($138.984.345)*
FECHA DE INICIACIÓN:	*14-11-2025*
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	*HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*HASTA EL 31-12-2025*
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	*HASTA EL 31-12-2025.*
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, (anexo 5)	*B-100070163 SEGUROS MUNDIAL*

VIGENCIA	*14/11/2025 HASTA17--03-2031*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL(ANEXO 4):	*B-100019341*
VIGENCIA	*14/11/2025 HASTA 17-03-2026*
ASEGURADORA	*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.*
NÚMERO PROCESO SECOP II	*IP-DT-QUI-003-2025*

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el presente periodo se continuaron las actividades de atención del sitio crítico por perdida de banca en el PR 7 +0280 de la ruta 25VL07 con actividades de elaboración de muro en gaviones con una ejecución acumulada del contrato del 75.18%

3.3 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría.

- *La administración vial realiza seguimiento a los corredores y de manera inmediata las emergencias que requieran atención del contratista en el marco del contrato*
- *La interventoría ha realizado seguimiento y control del proyecto. Supervisa las actividades que adelanta el contratista, la calidad de los materiales, señalización y seguimiento al componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.*
- *Durante el presente periodo el contratista presento el acta parcial no. 4 por valor de 37.470.564,00 la cual fue aprobada por la administración vial, par aun ejecución acumulada de $104.498.309.*
- *Debido a las intensas lluvias presentadas en la región, atípicas para la temporada de inicio de año, se presentó una socavación en la alcantarilla en concreto y su aleta izquierda, que genero un volcamiento de la estructura por lo que se requirió de una intervención diferente a la proyectada con mayores cantidades de obra a ejecutar para cumplir el objetivo de la intervención, la cual fue aprobada por la supervisión del contrato e inicio su ejecución durante el presente periodo.*

3.4 Maquinaria y equipo contrato de suministro:

Ver anexo No. 2.

3.5 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de suministro:

Se entrega anexo No. 3 - Correspondiente al contrato 1787-2025

3.6 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

Ver anexo No. 4

3.7 Estado General del Tiempo.

Ver anexo No. 5

3.8 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de suministro.

Ver anexo No.6

3.9 Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

- Se realiza seguimiento y control del proyecto. Supervisa las actividades que adelante el contratista.
- Se mantuvo comunicación permanente con el supervisor del contrato y el contratista de obra Las inquietudes presentadas por el contratista se han resueltas en el menor tiempo posible, con el fin de no generar atrasos en la ejecución del contrato.
- Se lleven registros de todas las actividades y/o actuaciones realizadas en la ejecución del contrato.
- Las actividades realizadas se han efectuadas de la manera adecuada y garantizando la calidad del proyecto.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el presente periodo se iniciaron las actividades de atención del sitio critico por perdida de banca en el PR 7+0280 de la ruta 25VL07, Cartago-Alcalá con excavaciones y elaboración de gaviones.

En atención a la situación actual donde se tiene condiciones climáticas con lluvias constantes en la región y sitios con inestabilidad que generan derrumbes y caída de

material sobre las calzadas, se requiere garantizar una respuesta eficiente y oportuna ante situaciones imprevistas, actualmente el contrato 1787-2025 cuenta con recursos y plazo para cumplir con ese objetivo.

Se recomienda continuar con la gestión de contratos de este tipo, para la atención de emergencias y sitios críticos de las vías a cargo de la Dirección territorial Quindío.

5. OTROS ANEXOS

- Ver anexo No. 6 - Relación de la correspondencia generada entre contratista y administración vial incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.



ING. MARTHA LUCIA VEGA B.
Residente de la Administración Vial
CONSORCIO INGEVIAM

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO




















ANEXO 2

Maquinaria y equipo contrato de suministro

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2026

PROYECTO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.

CONTRATO No. 1787-2025

CONTRATISTA: CARLOS DEL RIO DIAZ

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1995 - 2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INGEVIAM

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: DURANTE EL PRESENTE PERIODO NO SE PRESENTARON EMERGENCIAS EN LAS VIAS A CARGO ,NI SE REALIZARON ACTIVIDADES CON MAQUINARIA O EQUIPOS

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: CARLOS DEL RIO DIAZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 15850-014502BYC

Firma

Nombre: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
Residente de Interventoría - AMV QUINDIO
Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 3

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de suministro

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DEL RIO DIAZ

PROYECTO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO, 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGEVIAM

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COFREM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ILSSON RIVAS	16.222.521	AYUDANTE	$ 1.225.634								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CARLOS DEL RIO DIAZ	$ 1.225.634	$ 29.900	V	SALUD TOTAL	9501137234	$ 49.100	PORVENIR	9501137234	$ 196.200	$ 49.100			
2	JAIR LOAIZA	93.449.093	MAESTRO DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CARLOS DEL RIO DIAZ	$ 1.750.905	$ 42.700	V	SALUD TOTAL	9501137234	$ 70.100	PORVENIR	9501137234	$ 280.200	$ 70.100			
	JULIAN MEJIA	1112782336	AYUDANTE	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CARLOS DEL RIO DIAZ	$ 1.750.905	$ 42.700	V	NUEVA EPS	9501137234	$ 70.100	PORVENIR	9501137234	$ 280.200	$ 70.100			
	CRISTIAN RUIZ	1112792290	AYUDANTE	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CARLOS DEL RIO DIAZ	$ 1.750.905	$ 42.700	V	SOS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	9501137234	$ 70.100	PORVENIR	9501137234	$ 280.200	$ 70.100			
6																																																	
7																																																	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 2/03/2026 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CARLOS DEL RIO DIAZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 15850-014502BYC

Firma
Nombre: MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
Director de Interventoría - Residente AMV QUINDIO
Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 4

Informe financiero y presupuestal contrato de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	PÁGINA 1 de 1.

FECHA: **17/03/2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 1787 DE 2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DEL RIO DIAZ

MES INFORME MENSUAL: 1 al 28 de Febrero de 2026 **PROYECTO:** HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CONSULTORIA-ADMINISTRACION VIAL-1995-2025 **INTERVENTOR:** CONSULTOR-ADMINISTRACION VIAL CONSORCIO INGEVIAM

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	784625	5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	10	Nacion	PRINCIPAL	$ 138.984.345,00	$ 138.984.345,00
					TOTAL	$ 138.984.345,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 138.984.345,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha.	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	14 al 30 de Noviembre de 2025		$ -	$ -				**784625 de 11/05/2025**	$ 138.984.345,00	$ 138.984.345,00				
2	PARCIAL	1 al 31 de Diciembre de 2025							**784625 de 11/05/2025**	$ 138.984.345,00	$ 138.984.345,00				
3	PARCIAL	1 al 31 de enero del 2026	$ 67.027.745,00		$ 67.027.745,00				**784625 de 11/05/2025**	$ 71.956.600,00	$ 71.956.600,00				
4	PARCIAL	1 al 28 de febrero del 2026	$ 37.470.564,00		$ 37.470.564,00				**784625 de 11/05/2025**	$ 34.486.036,00	$ 34.486.036,00			|	
TOTALES			**$ 104.498.309,00**	**$ -**	**$ 104.498.309,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 34.486.036,00**	**$ 34.486.036,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 104.498.309,00	$ -	**$ 104.498.309,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
AJUSTES	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
*			
VALOR TOTAL	$ 104.498.309,00	$ -	**$ 104.498.309,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
CARLOS DEL RIO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
Matricula No. 15850-014502 BYC

Firma
ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO
SUPERVISOR
Matricula No. MAT. No. 5220208-3952 CPN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5

Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DEL RIO DIAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-26 **PROYECTO:** HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: CONSULTORIA 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA - ADMINISTRACIÓN VIAL - CONSORCIO INGEVIAM

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														**Total**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**				
Seco	12	8	12	12	12	16	20	18	14	24	24	12	12	8	20	24	16	20	18	14	24	24	12	12	8	12	12	12				432
Lluvias moderadas	6	8	6	6	6	4	2	4	6			6	6	8	2		4	2	4	6			6	6	8	6	6	6				124
Lluvias intensas	6	8	6	6	6	4	2	2	4			6	6	8	2		4	2	2	4			6	6	8	6	6	6				116
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				672

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: **Ing. CARLOS DE RIO DIAZ**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No. 15850-014502BYC

Firma
Nombre: **MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES**
Residente de la Administración Vial
Matrícula Profesional No.: 19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 6

Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de suministro.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2 (Día)	3 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DE RIO DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

FECHA DE INICIO: 14/11/2025

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/03/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 138.984.345,00

VALOR ACUMULADO:
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CONSULTORIA No. 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA ADMINSITRACIÓN VIAL CONSORCIO INGEVIAM

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 13.898.435,50	31	10	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 27.796.869,00	31	10	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 41.695.303,50	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100070163

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 7/11/2025

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 284.700.000,00	31	10	2025	31	12	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100019341 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 7/11/2025

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2 (Día)	3 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DE RIO DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

FECHA DE INICIO: 14/11/2025

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/03/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 138.984.345,00

VALOR ACUMULADO:
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CONSULTORIA No. 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA ADMINSITRACIÓN VIAL CONSORCIO INGEVIAM

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 13.898.435,50	14	11	2025	14	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 27.796.869,00	14	11	2025	14	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 41.695.303,50	14	1	2026	14	1	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100070163

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 26/12/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 284.700.000,00	14	11	2025	14	1	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100019341 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. Anexo 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 26/12/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	2 (Día)	3 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DE RIO DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

FECHA DE INICIO: 14/11/2025

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/03/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 138.984.345,00

VALOR ACUMULADO:
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CONSULTORIA No. 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA ADMINSITRACIÓN VIAL CONSORCIO INGEVIAM

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 13.898.435,50	22	12	2025	15	8	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 27.796.869,00	22	12	2025	15	2	2029
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 41.695.303,50	15	2	2026	15	3	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100070163

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/01/2026

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 350.181.000,00	14	11	2026	15	2	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100019341 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/01/2026

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) | 3 (Mes) | 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1787-2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DE RIO DIAZ

OBJETO DEL CONTRATO:

HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO

FECHA DE INICIO: 14/11/2025

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 138.984.345,00

VALOR ACUMULADO: (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CONSULTORIA No. 1995-2024 **INTERVENTOR:** CONSULTORIA ADMINSITRACIÓN VIAL CONSORCIO INGEVIAM

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 13.898.435,00	9	2	2026	17	9	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 27.796.869,00	9	2	2026	17	3	2029
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 41.695.304,00	17	3	2026	17	3	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100070163

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/02/2026

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV		14	11	2025	17	3	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100019341 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía de seguros mundial s.a.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 23/02/2026

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el

Firma

Nombre: MARTHA LUCIAV EGA BENAVIDES
Director de Interventoría - Ingenira residente adminsitración vial CONSORCIO INGEVIAM
Matrícula Profesional No.:19202-50471 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 7

Relación de correspondencia

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA CONTRATO DE CONSULTORÍA No. **1995-2024**	**CODIGO:**	**OFP-FR-001**	
		VERSIÓN:	**3**	
		PAGINA:		**DE**

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	1995-2024
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAM
SUPERVISOR:	ING. DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES

FEBRERO 2026

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
3/02/2025	CQUI-1238/ 2026E-VUVRAZ-007838	Concepto de Viabilidad de Prorroga No. 2 al contrato No. 1787-2025.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
9/02/2026	CQUI-1276/2026E-VUVRAZ-010268	Concepto de Viabilidad de Prorroga No. 2 al contrato No. 1787-2025.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
12/02/2026	CQUI-1283/ 2026E-VUVRAZ-011966	Entrega Actas de Obra N° 1 y 2 de los meses de noviembre y diciembre del Contrato NO. 1787 DE 2025.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
12/02/2026	CQUI-1284/2026E-VUVRAZ-011977	Entrega Acta de Obra N° 3 del mes de enero 2026 del Contrato NO. 1787 DE 2025.	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS
20/02/2026	CQUI-1303/2026E-VUVRAZ-015299	Remisión de informes semanales contrato 1787-2025 monto agotable	CONSORCIO INGEVIAM	INVIAS

Firma:

Nombre:

INGENIERO RESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN VIAL

CQUI-1238

Calarcá, febrero 3 de 2026

Ingeniero:
LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Director Territorial Quindío, (E).
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Armenia

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1995-2024, QUE TIENE COMO OBJETO: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO".**

Asunto: Concepto de Viabilidad de Prorroga No. 2 al contrato No. 1787-2025.

Cordial Saludo,

Atendiendo el documento presentado por el contratista CARLOS DEL RIO DIAZ el día 2 de febrero del 2026, donde solicita la prórroga del contrato y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que en el boletín No. 033 de CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES publicado el 2 de febrero del 2026 por Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se informa a las entidades en la Zona del Departamento del Quindío, que este se encuentra catalogado en Alerta alta (roja) con probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios del departamento, lo que puede generar distintas emergencias en el corredor vial a cargo.

2. Que el propósito principal del contrato es atender y prevenir las emergencias como derrumbes que se puedan presentar en las vías a cargo de la Dirección Territorial Quindío del Instituto Nacional de Vías.

3. Que las rutas 2901B Armenia - Alcalá, 25VL07 Cartago - Alcalá y 40QN05 Variante Calarcá – La cabaña, tiene amplios sectores con riesgo de inminentes deslizamientos debido a las características geológicas y topográficas de la región, lo que afectarían la transitabilidad de los corredores.

4. Que debido al riesgo de una inminente perdida de banca en los sitios críticos de los PR 7+0280 Y PR 16+0200 de la ruta 25VL07, que presentaban socavación en sus taludes inferiores, la dirección territorial solicito la intervención de dichos sitios con la construcción de muros en gaviones y obras menores de drenaje, para garantizar la transitabilidad en la vía, lo que requiere de la inversión de los recursos del contrato en estos sitios. No obstante, las condiciones climáticas adversas asociadas a las lluvias persistentes han afectado el desarrollo normal de las actividades, razón por la cual no se ha alcanzado el rendimiento inicialmente previsto para la ejecución de dichas obras.

La Administración Vial considera procedente:

Se otorgue la prórroga del contrato por 30 días, hasta el 17 de marzo de 2026, con el fin de cumplir con el objetivo planteado en el contrato.

Anexos:

- Oficio contratista Solicitud de prórroga No. 2 al contrato 1787-2025.
- MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud Adición, Modificación Y Prorroga Obra

Sin otro particular, agradeciendo la atención prestada y quedando atentos a la respuesta de la entidad.

Atentamente,

MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
INGENIERA RESIDENTE AMV-QUINDIO
CONSORCIO INGEVIAM

C.C. Archivo

CQUI-1276

Calarcá, febrero 9 de 2026

Ingeniero:
LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Director Territorial Quindío, (E).
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Armenia

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1995-2024, QUE TIENE COMO OBJETO: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO".**

Asunto: Concepto de Viabilidad de Prorroga No. 2 al contrato No. 1787-2025.

Cordial Saludo,

Atendiendo el documento presentado por el contratista CARLOS DEL RIO DIAZ el día 9 de febrero del 2026, donde solicita la prórroga del contrato y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que en el boletín No. 033 de CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES publicado el 2 de febrero del 2026 por Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se informa a las entidades en la Zona del Departamento del Quindío, que este se encuentra catalogado en Alerta alta (roja) con probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunos municipios del departamento, lo que puede generar distintas emergencias en el corredor vial a cargo.

2. Que el propósito principal del contrato es atender y prevenir las emergencias como derrumbes que se puedan presentar en las vías a cargo de la Dirección Territorial Quindío del Instituto Nacional de Vías.

3. Que las rutas 2901B Armenia - Alcalá, 25VL07 Cartago - Alcalá y 40QN05 Variante Calarcá – La cabaña, tiene amplios sectores con riesgo de inminentes deslizamientos debido a las características geológicas y topográficas de la región, lo que afectarían la transitabilidad de los corredores.

4. Que, debido al riesgo de una inminente pérdida de banca en el sitio crítico ubicado en el PR 7+0280 de la ruta 25VL07, el cual presentaba socavación en su talud inferior, la Dirección Territorial solicitó la intervención de dicho punto mediante la construcción de muros en gaviones y la ejecución de obras menores de drenaje, con el fin de garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios de la vía.

   No obstante, las lluvias persistentes que se vienen presentando en la región han generado la ampliación de la afectación en la banca, incrementando el nivel de riesgo, razón por la cual ha sido necesario destinar y priorizar los recursos del contrato para la atención integral de este sitio crítico; así mismo, estas condiciones climáticas adversas han incidido en el desarrollo normal de las actividades y en el rendimiento inicialmente previsto para la ejecución de las obras.

La Administración Vial considera procedente:

Se otorgue la prórroga del contrato por 30 días, hasta el 17 de marzo de 2026, con el fin de cumplir con el objetivo planteado en el contrato.

Anexos:

- Oficio emitido por el contratista – Solicitud prórroga No. 2 al contrato 1787-2025.

- MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud Adición, Modificación Y Prorroga Obra
- Estado general del tiempo
- Seguimiento a las garantías.

Sin otro particular, agradeciendo la atención prestada y quedando atentos a la respuesta de la entidad.

Atentamente,

MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
INGENIERA RESIDENTE AMV-QUINDIO
CONSORCIO INGEVIAM

C.C. Archivo

CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

CQUI-1283

Calarcá, Febrero 12 de 2026

Ingeniero:
LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Director Territorial Quindío (E).
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1995-2024, QUE TIENE COMO OBJETO: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO".**

ASUNTO: Entrega Actas de Obra N° 1 y 2 de los meses de noviembre y diciembre del Contrato NO. 1787 DE 2025.

Cordial Saludo,

Por medio del presente hacemos entrega de las Actas parciales de Obra N° 1 y 2, como del contrato N° 1787-2025, para su revisión y aprobación, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos como apoyo a interventoría de dicho contrato.

Quedamos atentos a cualquier observación o sugerencia.

Anexos: Acta Parcial de Obra N°1 y 2 cto 1787- 2025

Atentamente,

MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
INGENIERA RESIDENTE AMV-QUINDIO
CONSORCIO INGEVIAM

C.C. Archivo

.

CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

CQUI-1284

Calarcá, Febrero 12 de 2025

Ingeniero:
LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Director Territorial Quindío (E).
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1995-2024, QUE TIENE COMO OBJETO: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO".**

ASUNTO: Entrega Acta de Obra N° 3 del mes de enero 2026 del Contrato NO. 1787 DE 2025.

Cordial Saludo,

Por medio del presente hacemos entrega del Acta parcial de Obra N° 3 con sus documentos soporte, del contrato N° 1787-2025, para su revisión y aprobación, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos como apoyo a interventoría de dicho contrato.

Quedamos atentos a cualquier observación o sugerencia.

Anexos: Acta Parcial de Obra N°3 cto 1787-2025
Soportes Acta Acta Parcial de Obra N°3 cto 1787-2025

Atentamente,

MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
INGENIERA RESIDENTE AMV-QUINDIO
CONSORCIO INGEVIAM

C.C. Archivo
Ing. Diana Carolina Gálvez Cifuentes – Supervisora contrato consultoría No. 1995-2024.
Ing. Daniel Isaías Velásquez – Apoyo Técnico.

CONSORCIO INGEVIAM

NIT: 901.838.771-6

CQUI-1303

Calarcá, febrero 20 de 2026

Ingeniero:
LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Director Territorial Quindío (E).
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1995-2024, QUE TIENE COMO OBJETO: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO".**

Asunto: Remisión de informes semanales contrato 1787-2025 monto agotable

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir los informes semanales de la ejecución del contrato 1787-2025 desde la fecha de inicio del 14 de noviembre del 2025 hasta el 14 de febrero del 2026

- Anexo: Informes formato PDF

Atentamente,

MARTHA LUCIA VEGA BENAVIDES
INGENIERA RESIDENTE AMV-QUINDIO
CONSORCIO INGEVIAM
C.C. Archivo

BITACORA DE OBRA

31/01/26 Personal.
4 Ayudantes
Equipo
Cobertor Menor
Concreto (Solicitud)
Se continua con la excavación y Compactación de Pedraplen.

Ing. Aux.
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindío
Consorcio INGEVIAM

02/02/26 Personal
1 Maestro
4 Ayudantes
Equipo
Cobertor Menor
Se despacha Volqueta de 8R C6 + 200 para continuar con la excavación.

Ing. Aux.
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindío
Consorcio INGEVIAM

Powered by CamScanner

08/02/21 Personal
Maestro
3 Ayudantes
Equipo
Ult Never
Se Suspende provisionalmente la actividad anterior
Se determina q' se deben hacer en el PR 7+280.

Ing. Residente
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGEVIAM

10/02/21 Se reinicia actividad PR 7+0280
Personal
1 Maestro
3 Ayudantes
Equipo
Ult Mower
Taladro Compresor
Planta Eléctrica.

Se reinicia con la demolición de la estructura (Cabezote y aleta, Disipadres) Alcantarilla.
Visita del Supervisor Ing. Erwin Rosero, Co Marden

administración vial Ing. Martha Lucía Vega

Ing. Auxiliar
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindío
Consorcio INGEVIAM

11/02/26 Personal
1 Maestro
3 ayudantes
Equipo
Kit de mano
Compresor de frisilo
Planta Electrica

Se continua con la demolición de la estructura

Ing. Aux
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindío
Consorcio INGEVIAM

12/02/26 Personal
1 Maestro
3 ayudantes
Equipo

Powered by CamScanner

1/4 Ayudante
1 compresor Martillo
1 planta Electrica

Se Continua con la demolicion de la estructura encontrada esposa hasta de 90 cm. y el dia se termina la demolicion.

Atte.
Ing. Residente
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGEVIAM

13/02/24 Personal
1 Maestro
3 ayudantes
Equipo
1 compresor Martillo
1 Planta Electrica
1/4 Menor.
0 Canguro (Suspendido).
Se procede con la Construccion de Gaviones en la parte de la demolicion de la estructura demolida. Como el Solado Pega el Montaje de los Gaviones. Primero hasta la Excavacion

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGEVIAM

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGEVIAM

Libro MoMo Oficio 80 11

Powered by CamScanner

Ing. Auxiliar
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindío
Consorcio INGEVIAM

Mano de personal
1 almacenista
2 ayudantes
Equipo
1 Cargador (Bateria) - Motosierra
1/4 Mixer
Se contrata con la construcción de las
casetas con su respectivo Salario.

Ing Auxiliar
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindío
Consorcio INGEVIAM

Mano de personal
1 Maestro
3 ayudantes
Equipo
1 Cargador (Bateria)

Libro Multiple Oficio 80 H.

Powered by CamScanner

Hora Menor.
Se continua con la construccion de cunetas

Ing. Auxiliar
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGENIAM

17/06/22 personal
1 Maestro
3 ayudantes
Equipo
1 Compac (Saltarin)
Hora Menor
Se continua con la construccion de las cunetas
dando por terminado la primera fila

Ing. Auxiliar
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGENIAM

16/06/22 personal
1 Maestro
3 ayudantes

Powered by CamScanner

20/02/26 Personal
1 Maestro
3 ayudantes
Equipo
1 Compac (Saltarin)
Htta Menor

Se Continua con la Construccion de Gaviones de la 2 fila y se procede a realizar rellenos con su respectiva compactacion.

Ing. Residente
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGEVIAM

21/02/26 Personal
1 Maestro
3 ayudantes
Equipo
1 Compac. (Saltarin)
Htta Menor

Se Continua con la construccion de Gaviones 2

fila y Rellenos con ur compactado

Ing. Auxiliar
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGENIAM

23/02/24 Personal
1 Maestro
3 ayudantes
Equipo
1 Compac (Saltarin)
Herramienta menor

Se termina la Construcción de gaviones fila 2 y se continua con la Construcción de gaviones ultima fila (3)

Ing. Auxiliar
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGENIAM

24/02/24 Personal
1 Maestro

Powered by CamScanner

3 ayudantes
Equipo
1 Cargador (Bulldozer)
Hoja Menor

Se continua con la Construccion de gaviones fila 2

Ing. Auxiliar
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGEVIAM

24/02/20 Personal
1 Maestro
3 ayudantes
Equipo
1 Cargador (Bulldozer)
Hoja Menor

Se Continua con la Construccion de la ultima fila de Gaviones y sus respectivos rellenos compactados

Ing. Auxiliar. Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGEVIAM

Powered by CamScanner

25/02/26 Personal
1 Maestro
3 ayudantes
Equipo
1 Compac (Saltarin)
Htas Menor

7:

Se Continua con la Construccion de 6 Casas ultima fila y relleno Compactado alcantarilla (Sellado)

Ing. Residente
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGEVIAM

26/02/26 Personal
1 Maestro
3 ayudantes
Equipo
1 Compac (Saltarin)
Htas Menor

Se Continua con la Construccion de la ultima fila de Casas

Ing. Residente
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGEVIAM

23/02/26 Personal
Material
Herramientas
Equipos
Maquinaria (Subbase)
Mat. Mejor

Se termina la construcción de la obra falta de
Obras y se procede a Retirar los mismos
Con la Compactación.

Ing. Residente
Contratista

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGEVIAM

28/02/26 Personal
Material
Herramientas
Equipos

Marden

Powered by CamScanner

Ing Aux Admon Vial Quindio
Consorcio INGEVIAM

Powered by CamScanner
