CONSORCIO MOC

TIPO DE INFORME

INFORME MENSUAL No 2

Grupo 3.

INFORME PRESENTADO POR

CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-335-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO MOC

INFORME AVALADO POR:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. USPEC-CTO-336-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO 3802 INTERUSPEC

PERIODO DE EJECUCIÓN

1 MARZO DE 2026 – 31 DE MARZO DE 2026

VERSIÓN	CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA	
	ELABORÓ	REVISÓ	REVISÓ	APROBÓ
01				
	Ing. Cristian David Nieto Puerta Ing. Residente de obra	Ing. Luis Felipe Salguero Director de Obra	Ing. Erick Rodríguez Ing. Residente de interventoría	Ing. Cesar Camargo Representante Legal

Tabla de contenido

INTRODUCCION 3
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
GARANTIAS POLIZAS INICIALES CONTRACTUALES 5
POLIZAS DE GARANTIA SEGÚN ACTA DE INICIO 6
POLIZAS DE GARANTIA DE OTROSÍ No 1 DE PRORROGA AL CONTRATO 7
DETALLE DE ALCANCE PROYECTADO EN CADA FRENTE/ERON. 8
RESUMEN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRENTES. 8
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 11
REGISTRO FOTOGRAFICO 12
RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO 22
CONCLUSIONES 23
ANEXOS 24

INTRODUCCION

En el marco del Contrato de Obra No. USPEC-CTO-335-2025, el presente informe mensual tiene como propósito describir de manera general las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el primero (1) de marzo del año hasta el treinta y uno (31) de marzo del año 2026, relacionadas con la fase inicial de diagnóstico técnico de la infraestructura eléctrica en los establecimientos incluidos dentro del alcance del contrato.

Durante este lapso, el equipo de trabajo dispuso de una logística operativa necesaria para adelantar las visitas técnicas en un total de 8 frentes de trabajo, con el objetivo de realizar levantamientos de información y verificar el estado real de las subestaciones eléctricas y sus equipos asociados. Las actividades de diagnóstico incluyeron la inspección de plantas eléctricas de emergencia, sistemas de transferencia automática, tableros generales de distribución y transformadores, permitiendo identificar las condiciones actuales de operación y las posibles necesidades de intervención.

La información recopilada en estas visitas constituye la base técnica para la identificación de actividades de mantenimiento preventivo, pruebas especializadas —como análisis de aceite en transformadores—, limpieza dieléctrica y demás acciones necesarias, orientadas a mejorar la confiabilidad y condiciones de operación de los sistemas eléctricos en los establecimientos evaluados.

CONSORCIO MOC

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORME MENSUAL UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC"	
Informe No:	**002**
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO:	CONTRATO No. USPEC-CTO-335-2025.
OBJETO:	**MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA TALES COMO SUBESTACIONES, GENERADORES, ACOMETIDAS Y REDES ELÉCTRICAS E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC.” GRUPO 3”.**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR:	$ 1.377.325.397,00
PLAZO:	28 DE JUNIO DEL 2026

CONSORCIO MOC

GARANTIAS POLIZAS INICIALES CONTRACTUALES

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	580-47-994000095771		
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RC)	580-74-994000029136		
EXPEDIDA POR:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	26/12/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**	
CUMPLIMIENTO	17/12/2025	30/06/2026	$ 413.197.619,10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17/12/2025	30/04/2026	$ 413.197.619,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/12/2025	31/12/2028	$ 137.732.539,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	17/12/2025	31/12/2028	$ 275.465.079,40
CALIDAD DEL BIEN	17/12/2025	31/12/2027	$ 275.465.079,40
AMPAROS POLIZAS DE RC	17/12/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00

CONSORCIO MOC

POLIZAS DE GARANTIA SEGÚN ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	580-47-994000095771			
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RC)	580-74-994000029136			
EXPEDIDA POR:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
FECHA DE EXPEDICIÓN	28/01/2026			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	
	FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**		
CUMPLIMIENTO	29/12/2025	30/06/2026	$	413.197.619,10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	29/12/2025	30/04/2026	$	413.197.619,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/12/2025	31/12/2028	$	137.732.539,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29/12/2025	31/12/2028	$	275.465.079,40
CALIDAD DEL BIEN	29/12/2025	31/12/2027	$	275.465.079,40
AMPAROS POLIZA DE RC	29/12/2025	31/12/2025	$	284.700.000,00

CONSORCIO MOC

POLIZAS DE GARANTIA DE OTROSÍ No 1 DE PRORROGA AL CONTRATO

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	580-47-994000095771		
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RC)	580-74-994000029136		
EXPEDIDA POR:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	26/02/2026		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**	
CUMPLIMIENTO	29/12/2025	28/12/2026	$ 413.197.619,10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	29/12/2025	28/10/2026	$ 413.197.619,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/12/2025	28/06/2029	$ 137.732.539,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/06/2026	28/06/2031	$ 275.465.079,40
CALIDAD DEL BIEN	29/12/2025	28/06/2028	$ 275.465.079,40
AMPAROS POLIZAS DE RC	31/12/2025	28/06/2026	$ 350.181.000,00

CONSORCIO MOC

DETALLE DE ALCANCE PROYECTADO EN CADA FRENTE/ERON.

A la fecha de corte, el contrato se encuentra en la **Fase 1 – Etapa de Diagnóstico**, en la cual se adelantan las actividades orientadas a la identificación, evaluación y caracterización del estado actual de la infraestructura eléctrica en cada uno de los ERON intervenidos. En este sentido, el alcance proyectado para cada establecimiento se define con base en los resultados consignados en los informes técnicos de diagnóstico, los cuales establecen las necesidades de intervención, priorización de actividades y lineamientos técnicos que servirán como insumo para las fases posteriores del proyecto.

RESUMEN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRENTES.

Para la fecha de este informe, el porcentaje de avance se determina con base en la cantidad de frentes visitados, la entrega de los informes de diagnóstico y su respectiva aprobación, en relación con la cantidad total ponderada de los ítems ejecutados. En este sentido, a continuación, se presenta la siguiente tabla.

ERON	VISITA REALIZADA	ENTREGA DE INFORME DIAGNOSTICO	APROBACIÓN DE INFORME DIAGNOSTICO (INTERVENTORIA)	APROBACIÓN DE INFORME DIAGNOSTICO (USPEC)	PORCENTAJE
EC JP BARRANQUILLA (MODELO)	100%	0%	0%	0%	25,00%
EPMSC CARTAGENA	100%	100%	100%	100%	100,00%
EPMSC ERE VALLEDUPAR	100%	100%	100%	0%	75,00%
EPMSC JP MONTERÍA	100%	100%	100%	100%	100,00%
EPMSC SANTA MARTA	100%	100%	100%	100%	100,00%
EPMSC EL BANCO	100%	100%	100%	0%	75,00%
EPMSC SAN ANDRÉS	100%	100%	100%	0%	75,00%
EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)	100%	100%	100%	100%	100,00%

CONSORCIO MOC

EPAMS CAS VALLEDUPAR	100%	100%	100%	0%	75,00%
EPC TIERRALTA	100%	100%	100%	0%	75,00%
EPMSC ARAUCA	100%	100%	100%	100%	100,00%
EPMSC PAMPLONA	100%	100%	100%	100%	100,00%
EPMSC OCAÑA	100%	100%	100%	100%	100,00%
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA (LA MODELO)	100%	100%	100%	100%	100,00%
EPMSC SAN GIL	100%	100%	100%	0%	75,00%
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	100%	100%	100%	100%	100,00%
RM BUCARAMANGA	100%	100%	100%	100%	100,00%
EPAMS CAS GIRON	100%	100%	100%	0%	75,00%
COCUC CÚCUTA	100%	100%	100%	0%	75,00%
EPAMS CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)	100%	100%	100%	100%	100,00%
EPMSC MEDELLÍN (BELLAVISTA)	100%	100%	100%	0%	75,00%
EPMSC CAUCASIA	100%	100%	100%	100%	100,00%
EPMSC QUIBDÓ	100%	100%	100%	100%	100,00%
EPMSC ITSMINA	100%	100%	100%	100%	100,00%
EP PUERTO TRIUNFO - EL PESEBRE	100%	100%	100%	0%	75,00%
COPED PEDREGAL	100%	100%	100%	0%	75,00%
PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL					86,54%

PORCENTAJE DE AVANCE DEL TIEMPO CONTRACTUAL

El porcentaje de tiempo contractual se calcula considerando exclusivamente los periodos activos del contrato, excluyendo los tiempos de suspensión, conforme a las buenas prácticas de control de ejecución contractual. De acuerdo a lo anterior se presenta que:

TIEMPOS DEL CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS CALENDARIO
PERIODO 1:	29/12/2025	30/12/2025	1
SUSPENSIÓN:	31/12/2025	12/02/2026	44
PERIODO 2:	13/02/2026	28/06/2026	136
PERIODO DE CORTE DE INFORME 1:	29/12/2025	28/02/2026	17
PERIODO DE CORTE DE INFORME 2:	1/03/2026	31/03/2026	31
PORCENTAJE DE TIEMPO CONTRACTUAL MENSUAL			22,79%
PORCENTAJE DE TIEMPO CONTRACTUAL ACUMULADO			35,29%

CONSORCIO MOC

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de marzo de 2026 se realizaron visitas de diagnóstico técnico en los diferentes frentes relacionados, con el objetivo de verificar el estado real de las subestaciones eléctricas y de los principales equipos asociados a la infraestructura eléctrica de cada establecimiento.

Para el desarrollo de estas actividades, el equipo de trabajo dispuso una logística operativa y de desplazamiento que permitió atender un total de 8 frentes de trabajo en un periodo aproximado de 10 días hábiles, optimizando los tiempos de visita, recolección de información y verificación técnica en cada establecimiento.

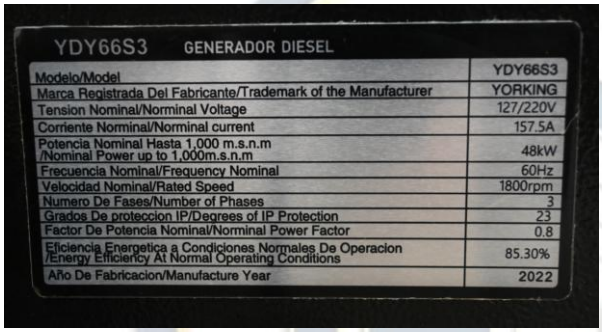
Durante las visitas se efectuó el levantamiento detallado de información técnica, el cual incluyó la inspección del estado operativo y físico de plantas eléctricas de emergencia, sistemas de transferencia automática, tableros generales de distribución y transformadores de potencia. Asimismo, se revisaron las condiciones de instalación, funcionamiento, evidencias de mantenimiento previo y posibles señales de deterioro o riesgo operativo en los equipos evaluados.

El proceso de diagnóstico permitió identificar el estado actual de los sistemas eléctricos, documentar los principales hallazgos y determinar las necesidades de intervención, tales como mantenimientos preventivos, pruebas de aceite dieléctrico en transformadores, limpieza dieléctrica de tableros y equipos, verificación de sistemas de control y protección, así como otras actividades orientadas a garantizar la confiabilidad, seguridad y continuidad del servicio eléctrico.

La información recopilada constituye la base técnica para la planeación de las actividades de mantenimiento y mejora de las subestaciones, permitiendo priorizar las intervenciones de acuerdo con las condiciones encontradas y el nivel de criticidad de los equipos evaluados.

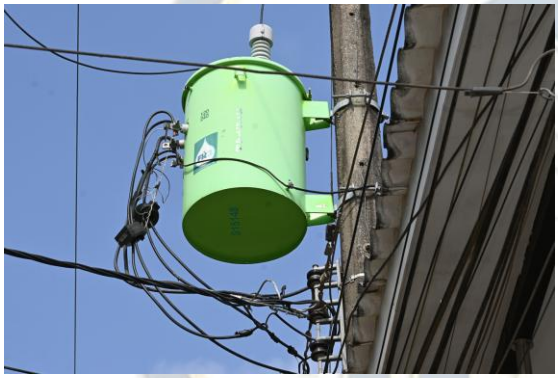
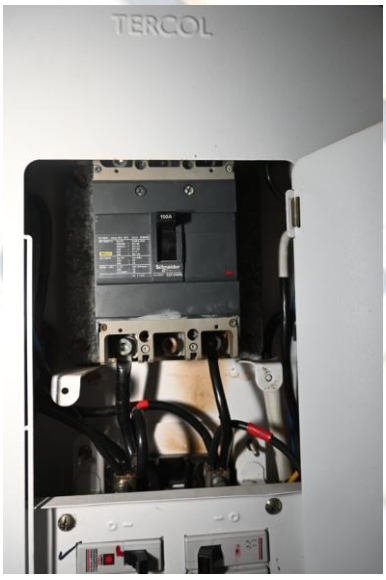
CONSORCIO MOC

REGISTRO FOTOGRAFICO

EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ	
	
EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ	
	

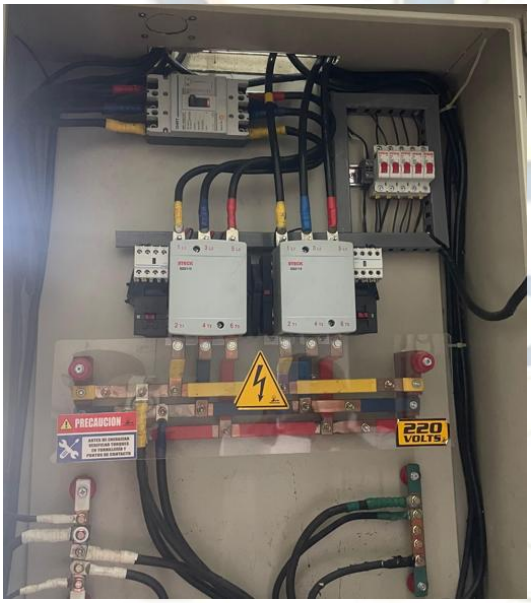
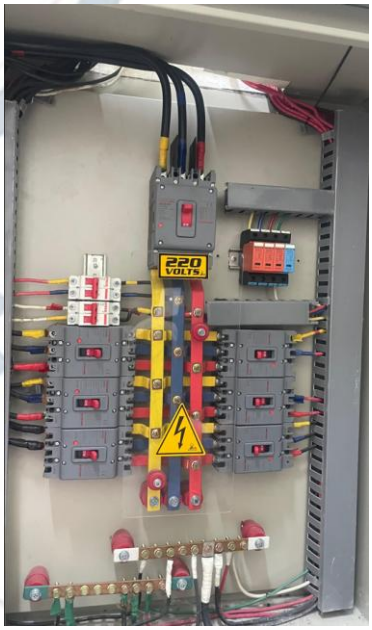
Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

EPMSC CAUCASIA	
	
EPMSC CAUCASIA	
	

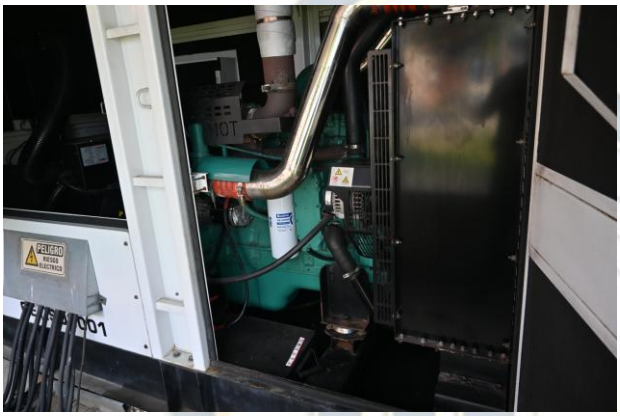
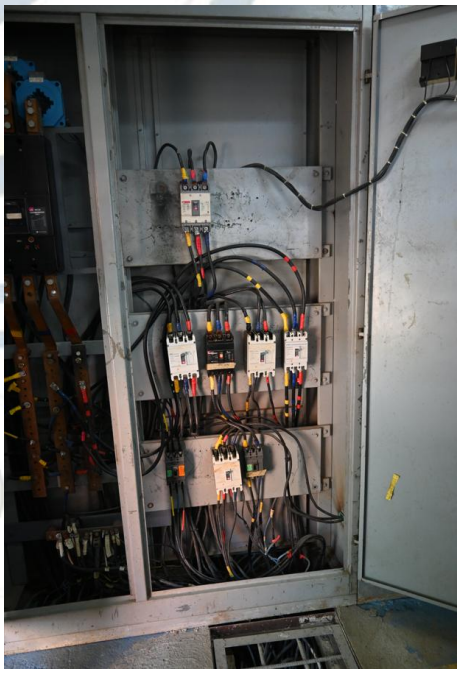
Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

EPMSC ITSMINA	
	
EPMSC ITSMINA	
	

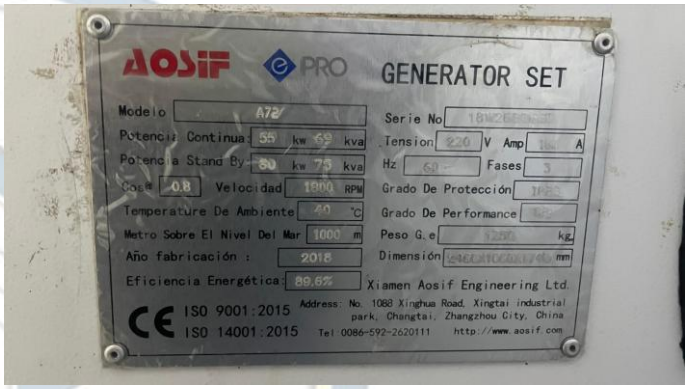
Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

EPMSC JP MONTERIA	
	
EPMSC JP MONTERIA	
	

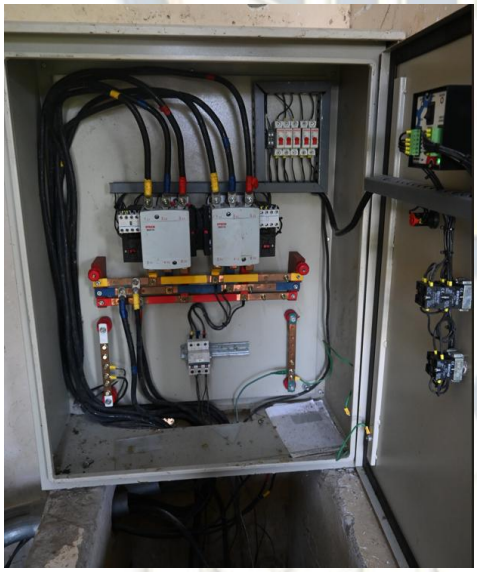
Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

EPMSC QUIBDO	
	
EPMSC QUIBDO	
	

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

EPMSC TIERRALTA	
	
EPMSC TIERRALTA	
	

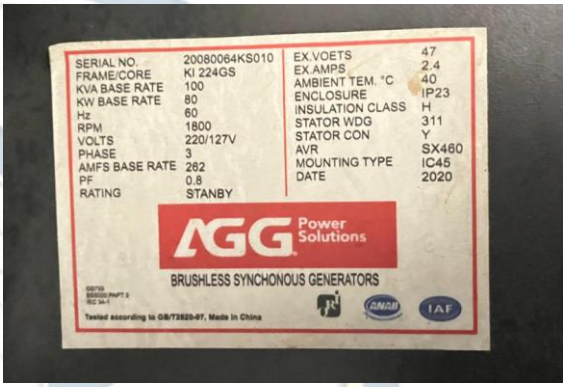
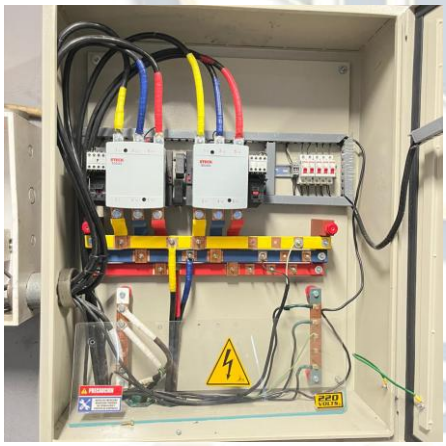
Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

EPMSC SAN ANDRÉS	
	
EPMSC SAN ANDRES	
	

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

EPMSC ARAUCA	
	
EPMSC ARAUCA	
	

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

Adicionalmente, el día 29 de marzo del presente año se recibió, vía correo electrónico, la notificación de una interrupción del servicio de energía eléctrica en el ERON EPMSC JP Puerto Triunfo. En dicha comunicación se informó una emergencia asociada a la falla de una celda de seccionamiento, originada por el cortocircuito de uno de los fusibles que la componen, específicamente un fusible tipo HH de 30 A. Este evento fue causado por la intrusión de un roedor (zarigüeya) al interior de la celda, lo que generó el daño del elemento.

En atención a esta situación, el equipo de trabajo dispuso de manera inmediata la logística necesaria para atender la contingencia en el menor tiempo posible. Como resultado, el día 30 de marzo en horas de la tarde se logró subsanar la falla mediante el envío del fusible de reemplazo y la movilización del personal encargado de ejecutar la intervención.

En consecuencia, se evidencia la atención oportuna de la emergencia, logrando restablecer el servicio de energía eléctrica interrumpido por la falla en la celda de seccionamiento ubicada en la subestación del bloque mínimo.

A continuación, se presenta el registro fotográfico correspondiente a la atención de la emergencia.

EPMSC JP PUERTO TRIUNFO	
	

CONSORCIO MOC

EPMSC JP PUERTO TRIUNFO	
	

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO

RELACION DE PERSONAL		
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**
1	LUIS FELIPE MARTINEZ ARENAS	1.093.214.733
2	JULIAN ALBERTO ARANZAZU B.	1.088.263.499
3	CRISTIAN DAVID NIETO PUERTA	1.010.126.904
4	JUAN CAMILO SALCEDO SEPULVEDA	1.089.379.567
5	LUIS FELIPE SALCEDO SEPULVEDA	1.088.028.910
6	JOSE ISRAEL SALCEDO SOSA	18.512.335
7	CRISTHIAN DAVID LONDOÑO SALCEDO	1.088.279.699
8	KEVIN VILLADA MARIN	1.088.029.419
9	SERGIO ANDRES SANCHEZ GUAPACHA	1.088.251.363
10	JHON JARVIS OROZCO OROZCO	83.219.516
11	LUIS FELIPE SALGUERO	10.883.112.547
12	BAYRON ESTEBAN LOPEZ BOLIVAR	1.088.327.879
13	JHON EDWIN GONZALEZ LOPEZ	1.088.301.554
14	MARTHA LUCIA PINZON MORA	52.222.607
15	JUAN MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	1.088.306.816
16	VIANIS MARIA BALDOVINO ARRIETA	1.103.094.218

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONCLUSIONES

Las visitas de diagnóstico permitieron determinar con precisión la condición actual de los sistemas eléctricos y de las subestaciones en los ocho frentes de trabajo inspeccionados, generando información técnica actualizada para cada instalación.

Con base en las inspecciones y levantamientos realizados, se identificó la necesidad de desarrollar actividades de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, tales como limpieza dieléctrica, verificación de sistemas de transferencia automática, mantenimiento de plantas eléctricas y análisis de aceite en transformadores.

La información obtenida durante las visitas se convierte en un insumo clave para la planeación de las intervenciones técnicas, ya que facilita la priorización de acciones orientadas a asegurar la confiabilidad, la seguridad y la continuidad del servicio eléctrico en los establecimientos evaluados.

De manera complementaria, se llevó a cabo un trabajo administrativo integral que permitió consolidar un total de 25 informes diagnósticos, incluyendo la elaboración de balances, estructuración de programaciones en Microsoft Project, definición de flujos de inversión y la identificación de requerimientos técnicos y operativos conforme a lo establecido en el anexo técnico del contrato.

Finalmente, la logística adoptada por el equipo de trabajo permitió optimizar el uso de tiempos y recursos, logrando abarcar 8 frentes de trabajo en un lapso aproximado de 10 días hábiles y consolidar tanto los diagnósticos como sus respectivos soportes técnicos y administrativos dentro del plazo previsto.

De acuerdo con la visita realizada por el personal al ERON EPMSC Barranquilla (Modelo), se deja constancia de que no fue posible obtener un diagnóstico adecuado, debido a la oposición del director del centro penitenciario ante la ausencia de personal de la USPEC durante la inspección. En consecuencia, se propone efectuar el diagnóstico de este frente en el momento en que se lleve a cabo la ejecución del otro centro penitenciario ubicado en la misma ciudad.

CONSORCIO MOC

ANEXOS
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900907274	1	MARVALL COMERCIALIZADORA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MARVALL COMERCIALIZADORA	CARRERA 11 48 126	PEREIRA-RISARALDA	3207083	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	48633010	9499413945	E	2026/02/17	2026/02/09	BANCO DE BOGOTA	0	$13,561,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	in g	re ti	ta e	ta p	ta d	vs p	co r	vs t	si n	ige	im a	va c	av p	vc t	in t	vt p	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MARVALL COMERCIALIZADORA (15 Afiliados)																					$47,786,274	$7,772,300			$47,786,274	$1,912,300			$47,458,868	$1,811,100			$47,786,274		$2,066,100		$0	$0		$13,561,800
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)																					$14,177,307	$2,268,700			$14,177,307	$567,400			$14,177,307	$567,400			$14,177,307		$66,800		$0	$0		$3,470,300
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (5 Afiliados)																					$14,177,307	$2,268,700			$14,177,307	$567,400			$14,177,307	$567,400			$14,177,307		$66,800		$0	$0		$3,470,300
1	CC	1088324951	GARCIA GERALDINE											X					25-14	3	$462,441	$74,000	EPS01	3	$462,441	$18,500	CCF44	3	$462,441	$18,500	14-7	3	$462,441	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$111,000
2	CC	1088324951	GARCIA GERALDINE																25-14	27	$4,161,960	$666,000	EPS01	27	$4,161,960	$166,500	CCF44	27	$4,161,960	$166,500	14-7	27	$4,161,960	0.522%	$21,800	27	$0	$0	SI	$1,020,800
3	CC	42151762	MAZO MARIA											X					23020 1	3	$185,091	$29,700	EPS01 0	3	$185,091	$7,500	CCF44	3	$185,091	$7,500	14-7	3	$185,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$44,700
4	CC	42151762	MAZO MARIA																23020 1	27	$1,665,815	$266,600	EPS01 0	27	$1,665,815	$66,700	CCF44	27	$1,665,815	$66,700	14-7	27	$1,665,815	0.522%	$8,700	27	$0	$0	SI	$408,700
5	CC	1061373044	MUÑOZ LAURA											X					25-14	3	$350,200	$56,100	EPS01 0	3	$350,200	$14,100	CCF44	3	$350,200	$14,100	14-7	3	$350,200	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$84,300
6	CC	1061373044	MUÑOZ LAURA																25-14	27	$3,151,800	$504,300	EPS01 0	27	$3,151,800	$126,100	CCF44	27	$3,151,800	$126,100	14-7	27	$3,151,800	0.522%	$16,500	27	$0	$0	SI	$773,000
7	CC	1088270988	MURILLO DIANA											X					23020 1	3	$200,000	$32,000	EPS00 5	3	$200,000	$8,000	CCF44	3	$200,000	$8,000	14-7	3	$200,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$48,000
8	CC	1088270988	MURILLO DIANA																23020 1	27	$1,800,000	$288,000	EPS00 5	27	$1,800,000	$72,000	CCF44	27	$1,800,000	$72,000	14-7	27	$1,800,000	0.522%	$9,400	27	$0	$0	SI	$441,400
9	CC	1088326821	URREA SEBASTIAN											X					23030 1	3	$220,000	$35,200	EPS01 0	3	$220,000	$8,800	CCF44	3	$220,000	$8,800	14-7	3	$220,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$52,800
10	CC	1088326821	URREA SEBASTIAN																23030 1	27	$1,980,000	$316,800	EPS01 0	27	$1,980,000	$79,200	CCF44	27	$1,980,000	$79,200	14-7	27	$1,980,000	0.522%	$10,400	27	$0	$0	SI	$485,600

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: OBRA (10 Afiliados)																					$33,608,967	$5,503,600			$33,608,967	$1,344,900			$33,281,561	$1,243,700			$33,608,967		$1,999,300		$0	$0		$10,091,500
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (10 Afiliados)																					$33,608,967	$5,503,600			$33,608,967	$1,344,900			$33,281,561	$1,243,700			$33,608,967		$1,999,300		$0	$0		$10,091,500
11	CC	1088263499	ARANZAZU JULIAN														X		23030 1	3	$330,000	$52,800	EPS01 0	3	$330,000	$13,200	CCF44	3	$330,000	$13,200	14-7	3	$330,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$79,200
12	CC	1088263499	ARANZAZU JULIAN																23030 1	27	$3,151,800	$504,300	EPS01 0	27	$3,151,800	$126,100	CCF44	27	$3,151,800	$126,100	14-7	27	$3,151,800	6.960%	$219,400	27	$0	$0	SI	$975,900
13	CC	8512301	BRAVO WILTON														X		25-14	3	$560,001	$89,700	EPS03 7	3	$560,001	$22,500	CCF44	3	$560,001	$22,500	14-7	3	$560,001	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$134,700
14	CC	8512301	BRAVO WILTON																25-14	27	$5,040,000	$806,400	EPS03 7	27	$5,040,000	$201,600	CCF44	27	$5,040,000	$201,600	14-7	27	$5,040,000	6.960%	$350,800	27	$0	$0	SI	$1,560,400
15	CC	1024530165	CASTAÑEDA JESSICA															X	23030 1	3	$300,000	$48,000	EPS00 2	3	$300,000	$12,000	CCF44	3	$300,000	$12,000	14-7	3	$300,000	6.960%	$20,900	3	$0	$0	SI	$92,900
16	CC	1061368883	GIRALDO CLAUDIA														X		23020 1	3	$175,091	$28,100	EPS03 7	3	$175,091	$7,100	CCF44	3	$142,350	$5,700	14-7	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$40,900
17	CC	1061368883	GIRALDO CLAUDIA																23020 1	27	$1,575,815	$252,200	EPS03 7	27	$1,575,815	$63,100	CCF44	27	$1,281,150	$51,300	14-7	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	SI	$476,300
18	CC	1093214733	MARTINEZ LUIS														X		23020 1	3	$1,200,000	$204,000	EPS01 0	3	$1,200,000	$48,000	CCF44	3	$1,200,000	$48,000	14-7	3	$1,200,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$300,000
19	CC	1093214733	MARTINEZ LUIS																23020 1	27	$11,350,800	$1,929,800	EPS01 0	27	$11,350,800	$454,100	CCF44	27	$11,350,800	$454,100	14-7	27	$11,350,800	6.960%	$790,100	27	$0	$0	SI	$3,628,100
20	CC	1010126904	NIETO CRISTIAN														X		25-14	3	$200,000	$32,000	EPS03 7	3	$200,000	$8,000	CCF44	3	$200,000	$8,000	14-7	3	$200,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$48,000
21	CC	1010126904	NIETO CRISTIAN																25-14	27	$1,800,000	$288,000	EPS03 7	27	$1,800,000	$72,000	CCF44	27	$1,800,000	$72,000	14-7	27	$1,800,000	6.960%	$125,300	27	$0	$0	SI	$557,300
22	CC	83219516	OROZCO JHON														X		23030 1	3	$222,365	$35,600	EPS00 2	3	$222,365	$8,900	CCF44	3	$222,365	$8,900	14-7	3	$222,365	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$53,400
23	CC	83219516	OROZCO JHON																23030 1	27	$2,001,285	$320,300	EPS00 2	27	$2,001,285	$80,100	CCF44	27	$2,001,285	$80,100	14-7	27	$2,001,285	6.960%	$139,300	27	$0	$0	SI	$619,800
24	CC	52222607	PINZON MARTHA											X					23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS01 8	30	$2,200,000	$88,000	CCF44	30	$2,200,000	$0	14-7	30	$2,200,000	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$440,000
25	CC	94192581	QUINTERO DARIO															X	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS04 1	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
26	CC	1110291058	SOLARTE JORNAN																25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS04 1	30	$1,750,905	$70,100	CCF44	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total	**Afiliados(15)**																				$47,786,274	$7,772,300			$47,786,274	$1,912,300			$47,458,868	$1,811,100			$47,786,274		$2,066,100		$0	$0		$13,561,800

CONSORCIO MOC

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$7,772,300	$0	$0	$7,772,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,796,700	$0	$0	$2,796,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,665,000	$0	$0	$1,665,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$3,310,600	$0	$0	$3,310,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$2,066,100	$0	$0	$2,066,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	15	$2,066,100	$0	$0	$2,066,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,811,100	$0	$0	$1,811,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	15	$1,811,100	$0	$0	$1,811,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$1,912,300	$0	$0	$1,912,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$1,128,800	$0	$0	$1,128,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$374,300	$0	$0	$374,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$88,000	$0	$0	$88,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$101,000	$0	$0	$101,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				15	$13,561,800	$0	$0	$13,561,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088327879		LOPEZ BOLIVAR BAYRON ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 11 # 48 - 128 PISO 2	PEREIRA-RISARALDA	3007879993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-02	2026-02	151930388	9501534593	I	2026/03/18	2026/03/18	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1088327879	LOPEZ BAYRON	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-7	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0		$541,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088327879		LOPEZ BOLIVAR BAYRON ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 11 # 48 - 128 PISO 2	PEREIRA-RISARALDA	3007879993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	151930388	9501534593	I	2026/03/18	2026/03/18	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088301554		GONZALEZ LOPEZ JOHN EDWIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 11 48 126 PISO 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3007879993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	151937805	9501535485	I	2026/03/12	2026/03/18	BANCO DE BOGOTA	6	$544,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1088301554	GONZALEZ JOHN	X																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-7	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0		$541,800

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

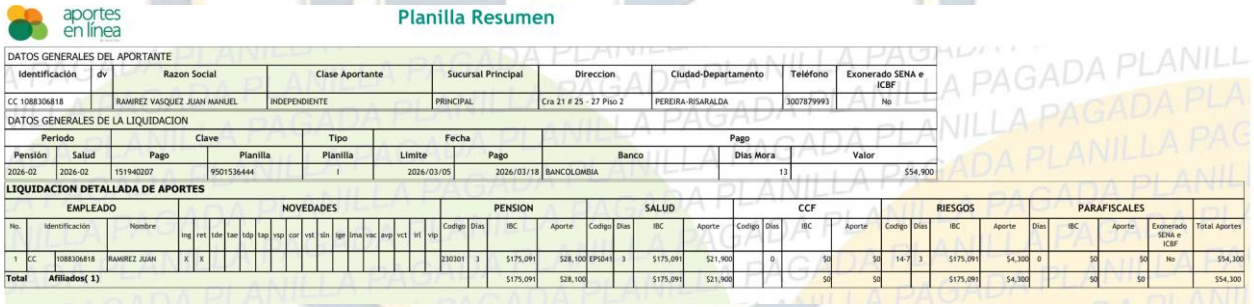
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088301554		GONZALEZ LOPEZ JOHN EDWIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 11 48 126 PISO 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3007879993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	151937805	9501535485	I	2026/03/12	2026/03/18	BANCO DE BOGOTA	6	$544,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,100	$0	$281,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$1,100	$0	$281,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$200	$0	$42,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$42,700	$200	$0	$42,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$900	$0	$219,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$900	$0	$219,800
TOTAL				1	$541,800	$2,200	$0	$544,000



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

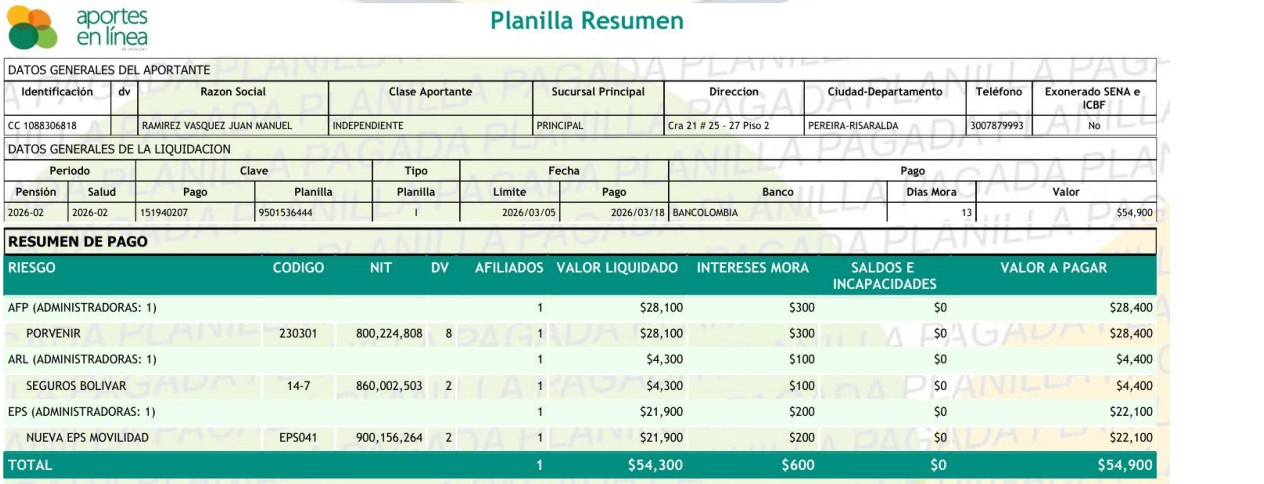
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088306818		RAMIREZ VASQUEZ JUAN MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 21 # 25 - 27 Piso 2	PEREIRA-RISARALDA	3007879993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	151940207	9501536444	I	2026/03/05	2026/03/18	BANCOLOMBIA	13	$54,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1088306818	RAMIREZ JUAN	X	X																230301	3	$175,091	$28,100	EPS041	3	$175,091	$21,900		0	$0	$0	14-7	3	$175,091	$4,300	0	$0	$0	No	$54,300
Total	**Afiliados(1)**																					$175,091	$28,100			$175,091	$21,900			$0	$0			$175,091	$4,300		$0	$0		$54,300



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088306818		RAMIREZ VASQUEZ JUAN MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 21 # 25 - 27 Piso 2	PEREIRA-RISARALDA	3007879993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	151940207	9501536444	I	2026/03/05	2026/03/18	BANCOLOMBIA	13	$54,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,100	$300	$0	$28,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$28,100	$300	$0	$28,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,300	$100	$0	$4,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$4,300	$100	$0	$4,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,900	$200	$0	$22,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$21,900	$200	$0	$22,100
TOTAL				1	$54,300	$600	$0	$54,900

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088311254		SALGUERO ISAZA LUIS FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 17 a 83 34 la villa	PEREIRA-RISARALDA	3007879993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	151922375	9501533932	I	2026/03/12	2026/03/18	BANCO DE BOGOTA	6	$544,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC 1088311254	SALGUERO LUIS	X	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	0		$0	$0	14-7 30	$1,750,905	2.436%	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,100	$0	$281,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,100	$0	$281,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$200	$0	$42,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$42,700	$200	$0	$42,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$900	$0	$219,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$900	$0	$219,800
TOTAL				1	$541,800	$2,200	$0	$544,000

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1103094218		BALDOVINO ARRIETA VIANIS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 N° 26-31	COROZAL-SUCRE	2841995	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	42207275	9498247192	I	2026/02/05	2026/02/06	BANCOLOMBIA	1	$1,547,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000	$600	$0	$800,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$800,000	$600	$0	$800,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,800	$100	$0	$121,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,800	$100	$0	$121,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$400	$0	$625,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$625,000	$400	$0	$625,400
TOTAL				1	$1,546,800	$1,100	$0	$1,547,900

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

CONTROL DE COMUNICACIONES

CONTROL DE COMUNICACIONES CONSORCIO MOC MES DE MARZO			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DIRIGIDO A**	**ASUNTO**
CTO-335-2025-OFI-025	2/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORME TECNICO DE EMERGENCIA
CTO-335-2025-OFI-026	2/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE DIAGNOSTICOS SEMANA No 1
CTO-335-2025-OFI-027	4/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CTO-335-2025-OFI-028	5/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	RESPUESTA SOLICITUD INFORME SEMANAL Y MENSUAL
CTO-335-2025-OFI-029	6/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO
CTO-335-2025-OFI-030	6/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORME MENUAL No 1
CTO-335-2025-OFI-031	10/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	PERSONAL COMITÉ DE OBRA PRESENCIAL
CTO-335-2025-OFI-032	12/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE DIAGNOSTICOS SUBSANADOS
CTO-335-2025-OFI-033	12/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CTO-335-2025-OFI-034	13/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE DIAGNOSTICOS SUBSANADOS
CTO-335-2025-OFI-035	16/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE PLAN DE SST
CTO-335-2025-OFI-036	16/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES
CTO-335-2025-OFI-037	17/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORMES DIAGNOSTICO
CTO-335-2025-OFI-038	18/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORME MENSUAL No 1 SUBSANADO
CTO-335-2025-OFI-039	18/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SUBSANADO
CTO-335-2025-OFI-040	24/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN FINAL DE INFORMES DIAGNOSTICOS
CTO-335-2025-OFI-041	25/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL No 5

CONSORCIO MOC

CTO-335-2025-OFI-042	30/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO
CTO-335-2025-OFI-043	30/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL No 6
CTO-335-2025-OFI-044	30/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN SST PERSONAL OPERATIVO
CTO-335-2025-OFI-045	30/03/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORME TÉCNICO DE EMERGENCIA EPMSC JP PUERTO TRIUNFO
