CONSORCIO MOC

TIPO DE INFORME

INFORME MENSUAL No 3

Grupo 3.

INFORME PRESENTADO POR

CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-335-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO MOC

INFORME AVALADO POR:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. USPEC-CTO-336-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO 3802 INTERUSPEC

PERIODO DE EJECUCIÓN

1 ABRIL DE 2026 – 30 DE ABRIL DE 2026

VERSIÓN	CONTRATISTA DE OBRA		INTERVENTORIA	
	ELABORÓ	REVISÓ	REVISÓ	APROBÓ
01				
	Ing. Cristian David Nieto Puerta Ing. Residente de obra	Ing. Luis Felipe Salguero Director de Obra	Ing. Erick Rodríguez Ing. Residente de interventoría	Ing. Cesar Camargo Representante Legal

CONSORCIO MOC

Tabla de contenido

INTRODUCCION 3
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
GARANTIAS POLIZAS INICIALES CONTRACTUALES 5
POLIZAS DE GARANTIA SEGÚN ACTA DE INICIO 6
POLIZAS DE GARANTIA DE OTROSÍ No 1 DE PRORROGA AL CONTRATO 7
DETALLE DE ALCANCE PROYECTADO EN CADA FRENTE/ERON. 8
RESUMEN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRENTES. 10
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 11
REGISTRO FOTOGRAFICO 14
RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO 22
CONCLUSIONES 23
ANEXOS 24

INTRODUCCION

En el marco del Contrato de Obra No. USPEC-CTO-335-2025, el presente informe mensual tiene como propósito describir de manera general las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el primero (1) de abril y el treinta (30) de abril del año 2026, relacionadas con la fase final de los diagnósticos y el inicio de la fase de ejecución de la infraestructura eléctrica en los establecimientos incluidos dentro del alcance contractual.

Durante este periodo, el equipo de trabajo dispuso la logística operativa necesaria para la intervención en dos (2) frentes de trabajo, con el objetivo de dar inicio a la ejecución de las actividades definidas en la fase de diagnóstico. Estas intervenciones contemplaron la implementación de un programa integral de mantenimiento para los componentes de las subestaciones eléctricas en los centros penitenciarios.

Cabe resaltar que el inicio efectivo de las actividades en campo se dio a partir del día veintisiete (27) de abril de 2026, una vez se contó con el aval correspondiente por parte de la entidad. En este contexto, se estableció un total de catorce (14) frentes de intervención; no obstante, para la fecha de corte del presente informe, se logró la ejecución de actividades en dos (2) de dichos frentes.

Las actividades desarrolladas constituyen la base técnica para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica de los centros de reclusión, incluyendo la realización de pruebas y mantenimientos especializados tales como: análisis fisicoquímico de aceite en transformadores, limpieza dieléctrica de equipos, inspección y mantenimiento de plantas eléctricas, pruebas en vacío y bajo carga, simulación de estados operativos en tableros de transferencia automática (ATS), verificación de conexiones en tableros generales de distribución, entre otras acciones orientadas a mejorar la confiabilidad, seguridad y condiciones de operación de los sistemas eléctricos intervenidos.

CONSORCIO MOC

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORME MENSUAL UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC"	
Informe No:	**003**
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO:	CONTRATO No. USPEC-CTO-335-2025.
OBJETO:	**MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA TALES COMO SUBESTACIONES, GENERADORES, ACOMETIDAS Y REDES ELÉCTRICAS E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y CIVIL, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC." GRUPO 3".**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR:	$ 1.377.325.397,00
PLAZO:	28 DE JUNIO DEL 2026

CONSORCIO MOC

GARANTIAS POLIZAS INICIALES CONTRACTUALES

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	580-47-994000095771		
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RC)	580-74-994000029136		
EXPEDIDA POR:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	26/12/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**	
CUMPLIMIENTO	17/12/2025	30/06/2026	$ 413.197.619,10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	17/12/2025	30/04/2026	$ 413.197.619,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/12/2025	31/12/2028	$ 137.732.539,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	17/12/2025	31/12/2028	$ 275.465.079,40
CALIDAD DEL BIEN	17/12/2025	31/12/2027	$ 275.465.079,40
AMPAROS POLIZAS DE RC	17/12/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00

CONSORCIO MOC

POLIZAS DE GARANTIA SEGÚN ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	580-47-994000095771			
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RC)	580-74-994000029136			
EXPEDIDA POR:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
FECHA DE EXPEDICIÓN	28/01/2026			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	
	FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**		
CUMPLIMIENTO	29/12/2025	30/06/2026	$	413.197.619,10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	29/12/2025	30/04/2026	$	413.197.619,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/12/2025	31/12/2028	$	137.732.539,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29/12/2025	31/12/2028	$	275.465.079,40
CALIDAD DEL BIEN	29/12/2025	31/12/2027	$	275.465.079,40
AMPAROS POLIZA DE RC	29/12/2025	31/12/2025	$	284.700.000,00

CONSORCIO MOC

POLIZAS DE GARANTIA DE OTROSÍ No 1 DE PRORROGA AL CONTRATO

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	580-47-994000095771		
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RC)	580-74-994000029136		
EXPEDIDA POR:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	26/02/2026		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**	
CUMPLIMIENTO	29/12/2025	28/12/2026	$ 413.197.619,10
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	29/12/2025	28/10/2026	$ 413.197.619,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/12/2025	28/06/2029	$ 137.732.539,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28/06/2026	28/06/2031	$ 275.465.079,40
CALIDAD DEL BIEN	29/12/2025	28/06/2028	$ 275.465.079,40
AMPAROS POLIZAS DE RC	31/12/2025	28/06/2026	$ 350.181.000,00

DETALLE DE ALCANCE PROYECTADO EN CADA FRENTE/ERON.

A la fecha de corte, el contrato se encuentra en la **Fase 2 – Etapa de Ejecución**, en la cual se desarrollan las actividades previamente aprobadas durante la Fase 1 de diagnóstico. Para el presente informe, se proyecta el alcance correspondiente a dos (2) frentes de intervención, cuyos detalles se presentan a continuación.

- **EPAMS CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)**

El alcance proyectado para este ERÓN se detalla en la siguiente tabla:

ALCANCE PROYECTADO EPAMS CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)			
PLANTAS	**TRASNFERENCIAS**	**TRANSFORMADORES**	**OBRAS CIVILES**
Programas de mantenimiento preventivo para las plantas eléctricas de las subestaciones, en un total de cinco plantas correspondientes a las tres subestaciones principales del complejo. Incluye limpieza general, suministro de ACPM, cambio de filtros, aceite y refrigerantes.	Programa de mantenimiento preventivo para las transferencias eléctricas asociadas a cada una de las plantas presentes en el complejo, incluye limpieza, retorqueo, verificación de funcionamiento y demás pruebas para asegurar su correcto funcionamiento.	Programa de mantenimiento preventivo para los tres transformadores que conforman las subestaciones, incluye limpieza, pruebas de resistencia a tierra, inspección con cámara termográfica y demás pruebas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento.	Actividad y pegado mediante imprimante asfalticos relacionadas a la realización de un sistema de impermeabilización causado por problema de filtraciones en la cubierta de una de las subestaciones lo cual pone en riesgo la integridad de los generadores ahí presentes, incluye impermeabilización con manto asfaltico, preparación de la superficie.

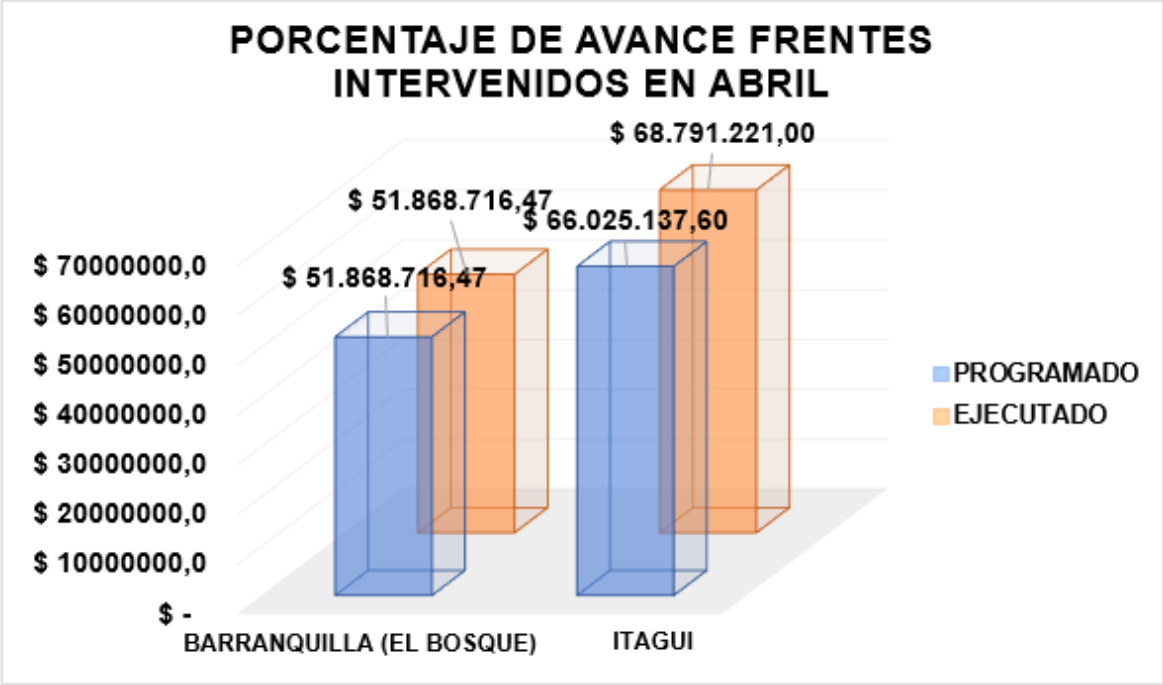
- **EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)**

ALCANCE PROYECTADO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)			
PLANTAS	**TRASNFERENCIAS**	**TRANSFORMADORES**	**TABLEROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN**
Programa de mantenimiento preventivo integral para las plantas ubicadas en la subestación del bloque nuevo y del bloque viejo, consiste en cambio de filtros, suministro de ACPM, pruebas funcionales, limpieza con dieléctrico y demás elementos y pruebas para asegurar su funcionamiento.	Programa de mantenimiento preventivo para las transferencias automáticas asociadas a cada una de las plantas, incluye verificación de contactos, retorqueo, limpieza, pruebas de funcionamiento en vació y bajo carga y demás elementos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento.	Programa de mantenimiento preventivo para el transformador principal sumergido en aceite y para los transformadores tipo seco de baja tensión presentes en las subestaciones, incluye limpieza, pruebas de resistencia a tierra, inspección con cámara termográfica y demás pruebas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento	Programa de mantenimiento preventivo para los tableros principales de distribución del centro penitenciario, incluye verificación de circuitos, contactos, retorqueo, limpieza de las acometidas y demás pruebas funcionales para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos asociados

RESUMEN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA UNO DE LOS FRENTES.

Para la fecha de corte del presente informe, el porcentaje de avance se determina con base en las cantidades efectivamente ejecutadas, expresadas en términos porcentuales y calculadas a partir de los flujos de inversión, tal como se presenta en la siguiente tabla:

ERÓN	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
EPAMS CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)	$ 66.025.138	$ 68.791.221	83,35%
EPMSC BARRANQUILLA (EL BOSQUE)	$ 51.868.716	$ 51.868.716	100%



PORCENTAJE DE AVANCE DEL TIEMPO CONTRACTUAL

El porcentaje de tiempo contractual se calcula considerando exclusivamente los periodos activos del contrato, excluyendo los tiempos de suspensión, conforme a las buenas prácticas de control de ejecución contractual. De acuerdo a lo anterior se presenta que:

TIEMPOS DEL CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIAS CALENDARIO
PERIODO 1:	29/12/2025	30/12/2025	1
SUSPENSIÓN:	31/12/2025	12/02/2026	44
PERIODO 2:	13/02/2026	28/06/2026	136
PERIODO DE CORTE DE INFORME 1:	29/12/2025	28/02/2026	17
PERIODO DE CORTE DE INFORME 2:	1/03/2026	31/03/2026	31
PERIODO DE CORTE DE INFORME 3:	1/04/2026	30/04/2026	30
PORCENTAJE DE TIEMPO CONTRACTUAL MENSUAL			22,06%
PORCENTAJE DE TIEMPO CONTRACTUAL ACUMULADO			57,35%

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

EPAMS CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)

Durante el periodo ejecutado en el establecimiento penitenciario de Itagüí, se desarrollaron actividades orientadas al mantenimiento preventivo y mejoramiento de la infraestructura eléctrica asociada a las subestaciones y sistemas de respaldo energético del complejo.

En el componente de plantas eléctricas, se llevaron a cabo programas de mantenimiento preventivo sobre cinco (5) plantas eléctricas correspondientes a las tres subestaciones principales del establecimiento, incluyendo labores de limpieza general de los equipos, suministro de ACPM, cambio de filtros, revisión y reposición

de aceite y refrigerantes, así como verificaciones operativas para garantizar su adecuado funcionamiento y confiabilidad ante eventuales contingencias eléctricas.

Respecto a las transferencias eléctricas, se efectuaron actividades de mantenimiento preventivo a las transferencias asociadas a cada una de las plantas eléctricas instaladas en el complejo, contemplando procesos de limpieza interna, ajuste y retoque de conexiones, inspección de componentes, pruebas de funcionamiento y demás verificaciones técnicas necesarias para asegurar la correcta operación y respuesta automática de los sistemas de transferencia.

En relación con los transformadores, se ejecutó mantenimiento preventivo a los tres (3) transformadores que conforman las subestaciones eléctricas del establecimiento, incluyendo limpieza técnica de los equipos, mediciones y pruebas de resistencia de puesta a tierra, inspecciones mediante cámara termográfica y pruebas complementarias orientadas a validar las condiciones operativas y de seguridad de los activos eléctricos.

Adicionalmente, en el componente de obras civiles, se adelantaron actividades de impermeabilización en la cubierta de una de las subestaciones, debido a problemas de filtraciones que representaban riesgo para la integridad y operación de los generadores instalados. Las labores ejecutadas incluyeron preparación de superficie, aplicación de imprimante asfáltico y suministro e instalación de manto asfáltico, con el propósito de mitigar el ingreso de humedad y garantizar condiciones adecuadas para la infraestructura eléctrica.

EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

Durante el periodo ejecutado en el establecimiento penitenciario EPMSC Barranquilla (El Bosque), se desarrollaron actividades de mantenimiento preventivo orientadas a garantizar la continuidad, confiabilidad y seguridad de la infraestructura eléctrica asociada a los sistemas de respaldo y distribución de energía del complejo penitenciario.

En el componente de plantas eléctricas, se ejecutó el programa de mantenimiento preventivo integral para las plantas eléctricas ubicadas en las subestaciones correspondientes al bloque nuevo y bloque viejo del establecimiento. Las actividades desarrolladas incluyeron cambio de filtros, suministro de ACPM, limpieza técnica con dieléctrico, inspecciones generales, pruebas funcionales y demás verificaciones necesarias para asegurar el correcto desempeño y operatividad de los equipos de generación.

Respecto a las transferencias automáticas, se realizaron actividades de mantenimiento preventivo a los sistemas asociados a cada una de las plantas eléctricas, contemplando verificación y ajuste de contactos, retoque de conexiones,

limpieza interna, pruebas de funcionamiento tanto en vacío como bajo carga y demás ensayos operativos requeridos para garantizar la correcta transferencia y continuidad del suministro eléctrico ante fallas de la red principal.

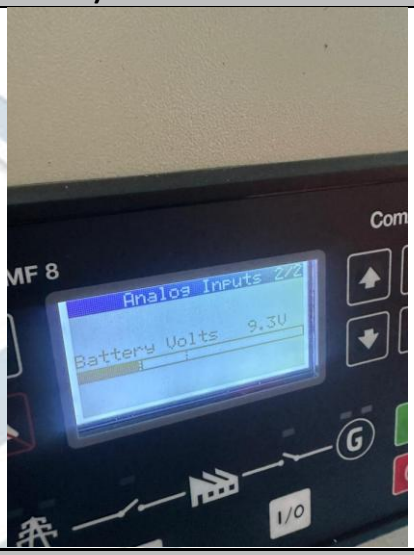
En relación con los transformadores, se adelantó el mantenimiento preventivo del transformador principal sumergido en aceite y de los transformadores secos de baja tensión instalados en las subestaciones del establecimiento. Las labores ejecutadas incluyeron limpieza técnica, pruebas de resistencia de puesta a tierra, inspección mediante cámara termográfica y demás pruebas eléctricas necesarias para validar las condiciones de operación y confiabilidad de los equipos.

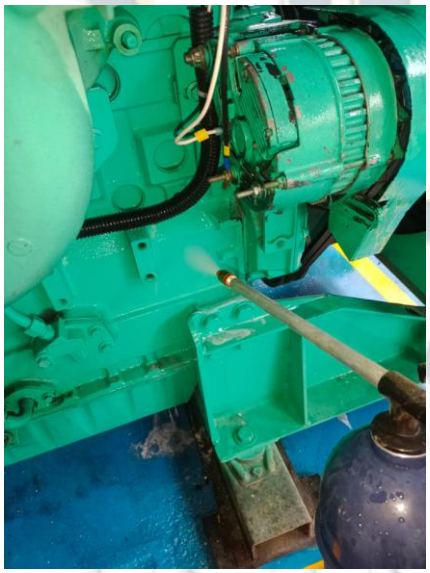
Durante la inspección termográfica realizada al transformador principal sumergido en aceite, se identificó una novedad asociada a un incremento anormal de temperatura, evidenciándose un recalentamiento interno del equipo. Esta condición fue detectada mediante el análisis térmico efectuado con cámara termográfica, permitiendo identificar puntos con comportamiento térmico fuera de los parámetros normales de operación, situación que podría comprometer la confiabilidad y vida útil del transformador si no se implementan las acciones correctivas correspondientes.

Adicionalmente, se efectuó mantenimiento preventivo a los tableros generales de distribución del centro penitenciario, realizando verificación de circuitos y contactos, ajuste y retoque de conexiones, limpieza de acometidas y pruebas funcionales sobre los equipos asociados, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de distribución eléctrica interno del establecimiento.

CONSORCIO MOC

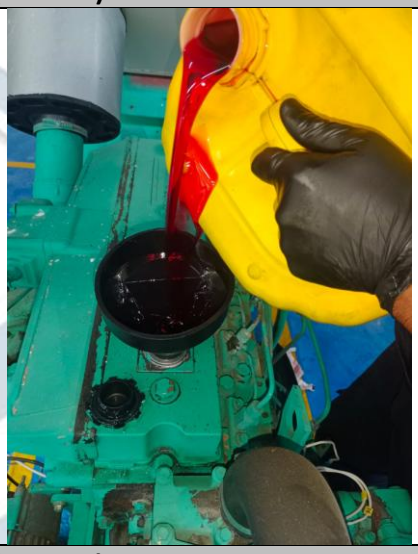
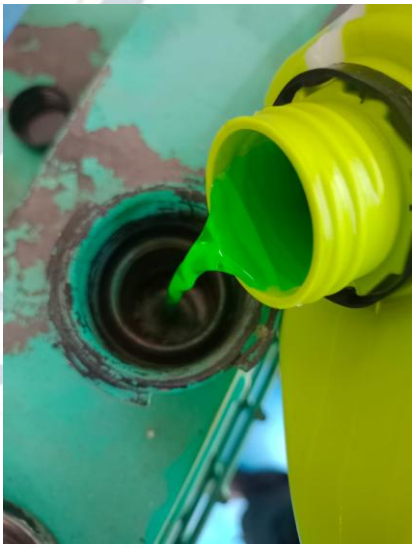
REGISTRO FOTOGRAFICO

EPMSC CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)	
	

EPMSC CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)	
	

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

EPMSC CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)	
	
EPMSC CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)	
	

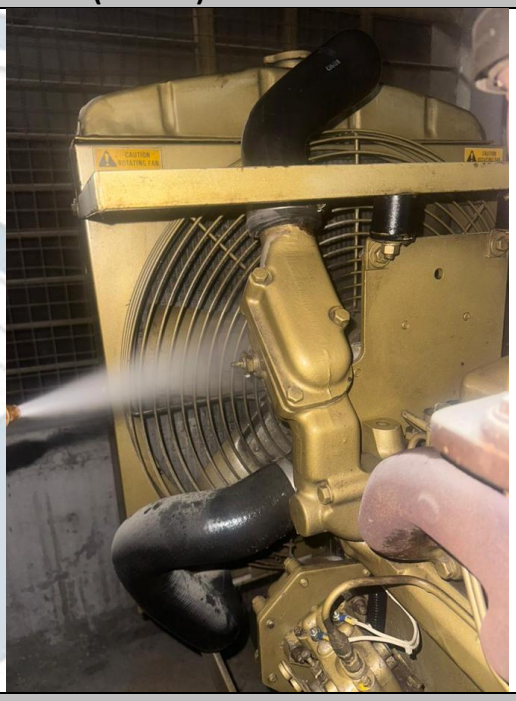
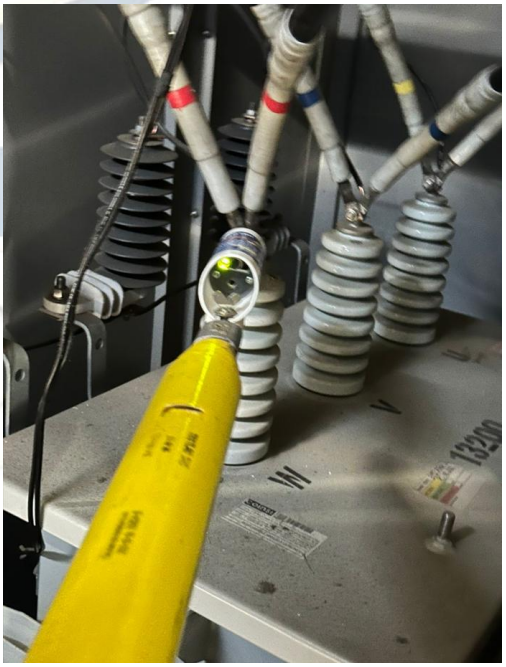
Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

EPMSC CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)	
	
EPMSC CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)	
	

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

EPMSC CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)	
	
EPMSC CAS ERE JP LA PAZ (ITAGUI)	
	

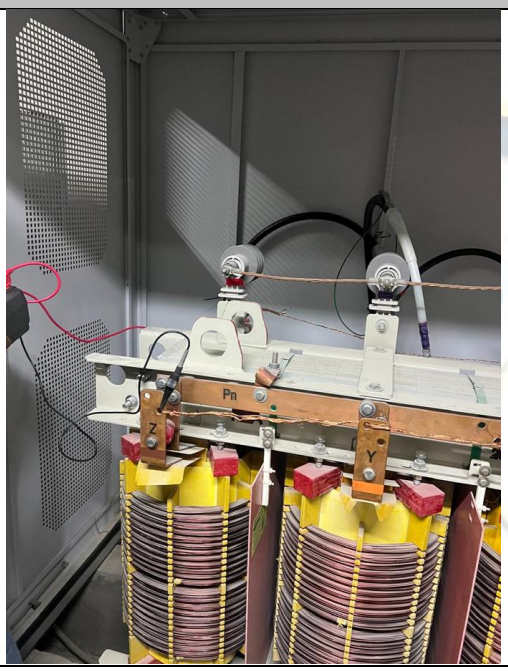
Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)	
	
EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)	
	

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)	
	
EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)	
	

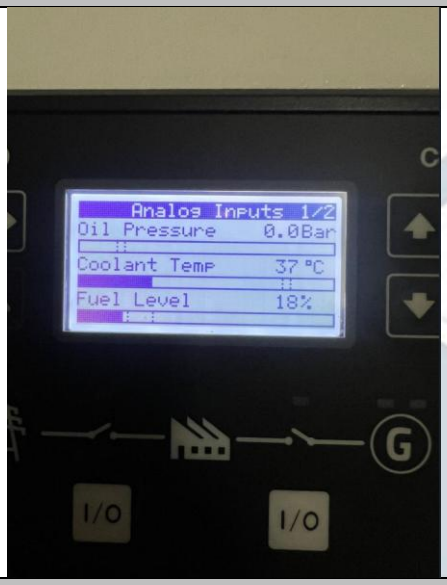
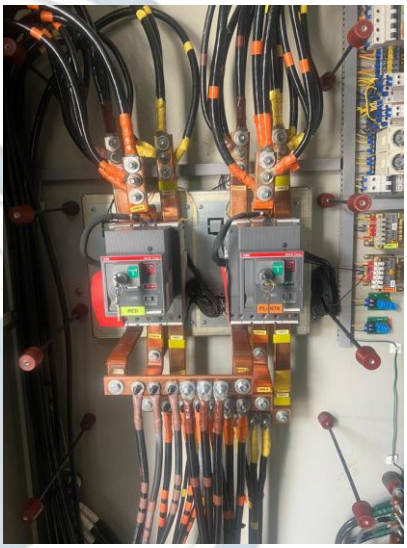
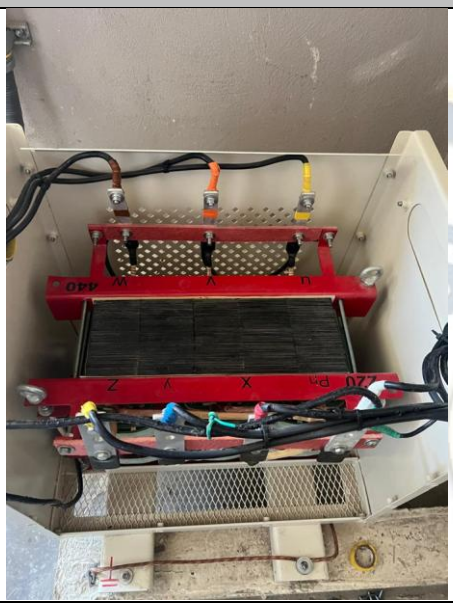
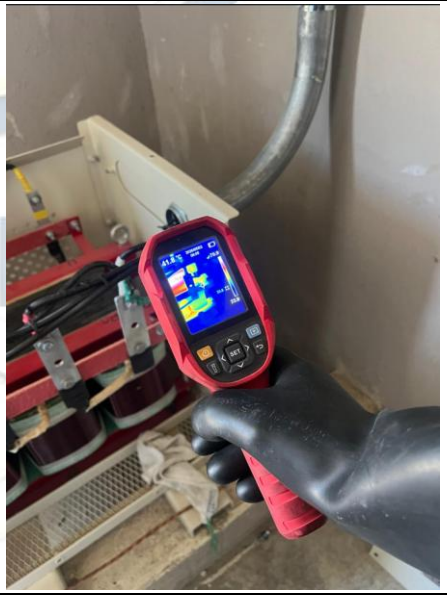
Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)	
	
EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)	
	

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)	
	
EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)	
	

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO

RELACION DE PERSONAL		
ITEM	**NOMBRE**	**CEDULA**
1	LUIS FELIPE MARTINEZ ARENAS	1.093.214.733
2	JULIAN ALBERTO ARANZAZU B.	1.088.263.499
3	CRISTIAN DAVID NIETO PUERTA	1.010.126.904
4	JUAN CAMILO SALCEDO SEPULVEDA	1.089.379.567
5	LUIS FELIPE SALCEDO SEPULVEDA	1.088.028.910
6	JOSE ISRAEL SALCEDO SOSA	18.512.335
7	CRISTHIAN DAVID LONDOÑO SALCEDO	1.088.279.699
8	KEVIN VILLADA MARIN	1.088.029.419
9	SERGIO ANDRES SANCHEZ GUAPACHA	1.088.251.363
10	JHON JARVIS OROZCO OROZCO	83.219.516
11	LUIS FELIPE SALGUERO	10.883.112.547
12	BAYRON ESTEBAN LOPEZ BOLIVAR	1.088.327.879
13	JHON EDWIN GONZALEZ LOPEZ	1.088.301.554
14	MARTHA LUCIA PINZON MORA	52.222.607
15	JUAN MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	1.088.306.816
16	VIANIS MARIA BALDOVINO ARRIETA	1.103.094.218

CONCLUSIONES

Las actividades de mantenimiento preventivo ejecutadas en el EPMSC Barranquilla (El Bosque) permitieron fortalecer las condiciones de operación, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico asociado a las plantas de emergencia, transferencias automáticas, transformadores y tableros generales de distribución del establecimiento penitenciario.

La ejecución de pruebas funcionales, inspecciones técnicas y labores de limpieza y ajuste contribuyó a minimizar riesgos de fallas eléctricas y a garantizar una adecuada respuesta de los sistemas de respaldo energético ante eventuales interrupciones del suministro principal.

Las inspecciones realizadas mediante cámara termográfica evidenciaron la importancia del mantenimiento predictivo dentro de las subestaciones eléctricas, permitiendo identificar de manera oportuna anomalías térmicas que no son perceptibles mediante inspecciones convencionales.

Durante el mantenimiento del transformador principal sumergido en aceite se detectó un recalentamiento interno del equipo, condición que representa un riesgo potencial para la estabilidad operativa y vida útil del transformador, por lo que se hace necesario adelantar una revisión técnica especializada y la implementación de acciones correctivas que permitan mitigar posibles fallas futuras.

El mantenimiento preventivo efectuado a los tableros generales de distribución y sistemas de transferencia automática permitió verificar el correcto estado de conexiones, contactos y circuitos eléctricos, mejorando las condiciones de seguridad y confiabilidad de la infraestructura eléctrica del centro penitenciario.

CONSORCIO MOC

ANEXOS
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088301554		GONZALEZ LOPEZ JOHN EDWIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 11 48 126 PISO 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3007879993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	211797712	9502110240	I	2026/04/15	2026/04/10	BANCOLOMBIA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1088301554 GONZALEZ JOHN																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-7	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total	Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088327879		LOPEZ BOLIVAR BAYRON ESTEBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 11 # 48 - 128 PISO 2	PEREIRA-RISARALDA	3007879993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	211767549	9502367335	I	2026/04/21	2026/04/10	BANCOLOMBIA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1088327879 LOPEZ BAYRON																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-7	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total	Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088306818		RAMIREZ VASQUEZ JUAN MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 21 # 25 - 27 Piso 2	PEREIRA-RISARALDA	3007879993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	211810995	9502904189	I	2026/04/08	2026/04/10	BANCOLOMBIA	2	$54,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1088306818 RAMIREZ JUAN	X	X																230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$21,900		0	$0	$0	14-7	3	$175,091	$4,300	0	$0	$0	No	$54,300
Total	Afiliados(1)																					$175,091	$28,100			$175,091	$21,900			$0	$0			$175,091	$4,300		$0	$0		$54,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1088311254		SALGUERO ISAZA LUIS FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 17 a 83 34 la villa	PEREIRA-RISARALDA	3007879993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	211788775	9502096368	I	2026/04/15	2026/04/10	BANCOLOMBIA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700			$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700			$0	$0		$541,800
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700			$0	$0		$541,800
1	CC	1088311254 SALGUERO LUIS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-7	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total	Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda – Colombia.

CONSORCIO MOC

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1103094218		BALDOVINO ARRIETA VIANIS MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 13 N° 26-31	COROZAL-SUCRE	2841995	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	209561312	9501760163	I	2026/04/08	2026/04/09	BANCOLOMBIA	1	$1,548,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000	$600	$0	$800,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$800,000	$600	$0	$800,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,800	$100	$0	$121,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,800	$100	$0	$121,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$500	$0	$625,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$625,000	$500	$0	$625,500
TOTAL				1	$1,546,800	$1,200	$0	$1,548,000

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | | |

CONSORCIO MOC

CONTROL DE COMUNICACIONES

CONTROL DE COMUNICACIONES CONSORCIO MOC MES DE MARZO			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DIRIGIDO A**	**ASUNTO**
CTO-335-2025-OFI-046	1/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE PAGO DE IMPUESTO TIMBRE
CTO-335-2025-OFI-047	1/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CTO-335-2025-OFI-048	6/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL No 7
CTO-335-2025-OFI-049	6/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORME MENSUAL No 2
CTO-335-2025-OFI-050	6/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	DOCUMENTACIÓN SST SUBSANADA PERSONAL OPERATIVO
CTO-335-2025-OFI-051	8/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE DESEMBOLSO DE ANTICIPO
CTO-335-2025-OFI-052	10/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE PAQUETE DE INCLUSIÓN DE NPs
CTO-335-2025-OFI-053	10/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE DIAGNOSTICOS SUBSANADOS
CTO-335-2025-OFI-054	10/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
CTO-335-2025-OFI-055	10/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	SOLICITUD DE MEMORANDO DE ACEPTACIÓN Y REITERACIÓN DE INFORMACIÓN DE ANTICIPO
CTO-335-2025-OFI-056	13/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL No 8
CTO-335-2025-OFI-057	15/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORME SST MARZO

CTO-335-2025-OFI-058	16/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORME DE EMERGENCIA SUBSANADO
CTO-335-2025-OFI-059	21/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL No 9
CTO-335-2025-OFI-060	23/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FASE 1
CTO-335-2025-OFI-061	27/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL No 10
CTO-335-2025-OFI-062	27/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REMISIÓN DE PAQUETE DE NPs SUBSANADOS
CTO-335-2025-OFI-063	28/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO
CTO-335-2025-OFI-064	29/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO BARRANQUILLA(MODELO)
CTO-335-2025-OFI-065	29/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO SUBSANADOS
CTO-335-2025-OFI-066	30/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE ESTADO DE DESEMBOLSO DE ANTICIPO
CTO-335-2025-OFI-066	30/04/2026	CONSORCIO 3802 INTERUSPEC	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE ESTADO DE DESEMBOLSO DE ANTICIPO
