1. FECHA ELABORACIÓN:	30	5	2026	TIPO DE CONTRATO	OBRA		
2. ACTA No.	PARCIAL 5			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:	X	RECIBO PARCIAL DE OBRA	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA, UNIDAD OPERATIVA SAN JERONIMO DEL YUSTE, UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL NUEVOS PASOS, UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN, UNIDAD OPERATIVA CDC BELLO HORIZONTE, UNIDAD OPERATIVA CDC LA VICTORIA, UNIDAD OPERATIVA SLIS SAN CRISTOBAL, UNIDAD OPERATIVA CENTRO DIA TIERRA DE SABERES, UNIDAD OPERTAVIDA HOGAR DE PASO BAKATA					DEL 01 DE ABRIL 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026	

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10674			7. FECHA CONTRATO:	18	11	2.025,00	8. VALOR CONTRATO:	$ 11.516.637.448,00
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11,00	2.027	11. PLAZO:	24,2 Meses/días
12. PRORROGAS:				13. SUSPENSIONES:				14. ADICIONES:	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11834			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2.025,00	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12 2027	22. PLAZO:	25 Meses/días
23. PRORROGAS:				24. SUSPENSIONES:				25. ADICIONES:	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25								
27. SUPERVISOR SDIS:	ARQ. JOHNNY EDWAR PADILLA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 30 días del mes de MAYO del año 2026 se reunieron CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON representante legal del contratista y NESTOR CAMILO ARTUNDUANGA ÁVILA representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de ABRIL según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA**												
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**												
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN	M	1,00	$ 95.307,00	$ 95.307,00	30,33	$ 2.890.661,31		$ -	30,33	$ 2.890.661,31	30,33	$ 2.890.661,31
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1,00	$ 17.945,00	$ 17.945,00	2,00	$ 35.890,00	1,20	$ 21.534,00	0,00	$ -	1,20	$ 21.534,00
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.1	PROTECCIÓN DEL CIELO RASO EXISTENTE DEJADO EXPUESTO POSTERIOR AL DESMONTE DE LA	M2	1,00	$ 6.219,00	$ 6.219,00	158,40	$ 985.089,60		$ -	0	$ -	0	$ -
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE	M	1,00	$ 12.378,00	$ 12.378,00	85,25	$ 1.055.224,50		$ -	85,25	$ 1.055.224,50	85,25	$ 1.055.224,50
1.4.3	DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE	M	1,00	$ 12.378,00	$ 12.378,00	14,00	$ 173.292,00	4,30	$ 53.225,40	14	$ 173.292,00	18,3	$ 226.517,40
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE	M2	1,00	$ 69.229,00	$ 69.229,00	360,94	$ 24.987.515,26		$ -	360,94	$ 24.987.515,26	360,94	$ 24.987.515,26
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 10.468,00	$ 10.468,00	32,00	$ 334.976,00	31,82	$ 333.091,76	0,00	$ -	31,82	$ 333.091,76
1.5.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.	M2	1,00	$ 26.723,00	$ 26.723,00	9,00	$ 240.507,00	8,08	$ 215.921,84	0,00	$ -	8,08	$ 215.921,84

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 26.723,00	$ 26.723,00	31,00	$ 828.413,00	30,42	$ 812.913,66	0,00	$ -	30,42	$ 812.913,66
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.3	SELLADO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES DE 1/2" A 1,1/2" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN EN EL ÁREA AFERENTE A LA SALIDA DEL PUNTO, EL CORTE DE LA TUBERÍA PARA GARANTIZAR QUE NO SOBRESALGA POSTERIOR AL SELLADO, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'C=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	U	1,00	$ 18.852,00	$ 18.852,00	2,00	$ 37.704,00	2,00	$ 37.704,00	0,00	$ -	2,00	$ 37.704,00
1.6.7	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES DE 2" A 4" EN PARED O PISO,	U	1,00	$ 61.177,00	$ 61.177,00	2,00	$ 122.354,00		$ -	2	$ 122.354,00	2,00	$ 122.354,00
1.6.21	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.	UN	1,00	$ 26.894,00	$ 26.894,00	2,00	$ 53.788,00	2,00	$ 53.788,00	0,00	$ -	2,00	$ 53.788,00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS	UN	1,00	$ 13.606,00	$ 13.606,00	35,00	$ 476.210,00		$ -	35	$ 476.210,00	35,00	$ 476.210,00
1.6.27	DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELÉCTRICAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O	UN	1,00	$ 20.397,00	$ 20.397,00	35,00	$ 713.895,00		$ -	35	$ 713.895,00	35,00	$ 713.895,00
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 19.787,00	$ 19.787,00	236,17	$ 4.673.095,79		$ -	236,17	$ 4.673.095,79	236,17	$ 4.673.095,79
1.7.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN ESTERILLA MALLA Y PAÑETE / ACABADO TEXTURIZADO.	M2	1,00	$ 21.489,00	$ 21.489,00	27,01	$ 580.417,89		$ -	27,01	$ 580.417,89	27,01	$ 580.417,89
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO	M	1,00	$ 6.577,00	$ 6.577,00	18,12	$ 119.175,24		$ -	18,12	$ 119.175,24	18,12	$ 119.175,24
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 6.783,00	$ 6.783,00	235,49	$ 1.597.328,67		$ -	235,49	$ 1.597.328,67	235,49	$ 1.597.328,67
1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA	M2	1,00	$ 8.648,00	$ 8.648,00	11,16	$ 96.511,68		$ -	11,16	$ 96.511,68	11,16	$ 96.511,68
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O	M2	1,00	$ 10.251,00	$ 10.251,00	2,40	$ 24.602,40		$ -	137,82	$ 1.412.792,82	137,82	$ 1.412.792,82
1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1,00	$ 10.520,00	$ 10.520,00	137,82	$ 1.449.866,40	7,71	$ 81.109,20	137,82	$ 1.449.866,40	145,53	$ 1.530.975,60
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN	M2	1,00	$ 23.840,00	$ 23.840,00	31,71	$ 755.966,40		$ -	82,56	$ 1.968.182,72	82,56	$ 1.968.182,72
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.9.1	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA	M2	1,00	$ 20.735,00	$ 20.735,00	325,83	$ 6.756.085,05		$ -	325,83	$ 6.756.085,05	325,83	$ 6.756.085,05

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.9.2	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES	M	1,00	$ 22.273,00	$ 22.273,00	33,29	$ 741.468,17		$ -	33,29	$ 741.468,17	33,29	$ 741.468,17
1.9.8	DEMOLICION DE CONCRETOS ENTERRADOS (PROVISION). INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE,	M3	1,00	$ 201.852,00	$ 201.852,00	2,25	$ 454.167,00		$ -	2,25	$ 454.167,00	2,25	$ 454.167,00
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO	M2	1,00	$ 51.410,00	$ 51.410,00	7,81	$ 401.512,10		$ -	7,81	$ 401.512,10	7,81	$ 401.512,10
1.9.16	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A	M3	1,00	$ 284.727,00	$ 284.727,00	4,77	$ 1.358.147,79		$ -	8,61	$ 2.451.499,47	8,61	$ 2.451.499,47
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO												
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS,	M3	1,00	$ 61.622,00	$ 61.622,00	4,93	$ 303.796,46		$ -	3,04	$ 187.330,88	3,04	$ 187.330,88
2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO,	M3	1,00	$ 34.587,00	$ 34.587,00	3,05	$ 105.490,35		$ -	3,04	$ 105.144,48	3,04	$ 105.144,48
2.2	CONCRETOS												
2.2.1	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2000 PSI.	M2	1,00	$ 22.398,00	$ 22.398,00	4,61	$ 103.254,78		$ -	4,61	$ 103.254,78	4,61	$ 103.254,78
2.2.4	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	1,00	$ 425.220,00	$ 425.220,00	0,40	$ 170.088,00		$ -	0,40	$ 170.088,00	0,40	$ 170.088,00
2.2.9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>12,1<=15,0 CM F'C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4	M2	1,00	$ 274.145,00	$ 274.145,00	7,81	$ 2.141.072,45		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.2.17	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	1,00	$ 292.683,00	$ 292.683,00	139,16	$ 40.729.766,28		$ -	139,16	$ 40.729.766,28	139,16	$ 40.729.766,28
2.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000	M	1,00	$ 112.069,00	$ 112.069,00	9,06	$ 1.015.345,14		$ -	9,06	$ 1.015.345,14	9,06	$ 1.015.345,14
2.2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO	M	1,00	$ 110.344,00	$ 110.344,00	10,46	$ 1.154.198,24		$ -	10,46	$ 1.154.198,24	10,46	$ 1.154.198,24
2.3	VARIOS - CIMENTACIONES												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	1,00	$ 28.429,00	$ 28.429,00	293,00	$ 8.329.697,00		$ -	293,00	$ 8.329.697,00	293,00	$ 8.329.697,00
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO												
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON	M	1,00	$ 329.641,00	$ 329.641,00	8,50	$ 2.801.948,50		$ -	8,50	$ 2.801.948,50	8,50	$ 2.801.948,50
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1,00	$ 5.081,00	$ 5.081,00	3.380,89	$ 17.178.302,09		$ -	2442,62	$ 12.410.952,22	2442,62	$ 12.410.952,22
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 17.409,00	$ 17.409,00	8.146,00	$ 141.813.714,00	258,98	$ 4.508.582,82	8624,98	$ 150.152.276,82	8883,96	$ 154.660.859,64
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.												
3.1.3	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL.	M2	1,00	$ 185.848,00	$ 185.848,00	11,46	$ 2.129.818,08		$ -	15,78	$ 2.932.681,44	15,78	$ 2.932.681,44
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.15	TUBERÍA PVCP 3" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M.	M	1,00	$ 92.540,00	$ 92.540,00	3,86	$ 357.204,40		$ -	3,86	$ 357.204,40	3,86	$ 357.204,40
4.1.16	TUBERÍA PVCP 4" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M.	M	1,00	$ 178.983,00	$ 178.983,00	28,04	$ 5.018.683,32		$ -	28,04	$ 5.018.683,32	28,04	$ 5.018.683,32
4.1.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"	UN	1,00	$ 54.691,00	$ 54.691,00	5,00	$ 273.455,00		$ -	5,00	$ 273.455,00	5,00	$ 273.455,00
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	UN	1,00	$ 37.284,00	$ 37.284,00	1,00	$ 37.284,00	1,00	$ 37.284,00	0,00	$ -	1,00	$ 37.284,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL												
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 138.554,00	$ 138.554,00	9,00	$ 1.246.986,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 191.194,00	$ 191.194,00	9,00	$ 1.720.746,00	9,00	$ 1.720.746,00	0,00	$ -	9,00	$ 1.720.746,00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 (FASE+ RETORNO+RETO0RNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 209.489,00	$ 209.489,00	8,00	$ 1.675.912,00	8,00	$ 1.675.912,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.675.912,00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 207.806,00	$ 207.806,00	1,00	$ 207.806,00	1,00	$ 207.806,00	0,00	$ -	1,00	$ 207.806,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	1,00	$ 194.855,00	$ 194.855,00	4,00	$ 779.420,00	4,00	$ 779.420,00	0,00	$ -	4,00	$ 779.420,00
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X50A 50 KA	UN	1,00	$ 385.871,00	$ 385.871,00	1,00	$ 385.871,00	1,00	$ 385.871,00	0,00	$ -	1,00	$ 385.871,00
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1,00	$ 34.559,00	$ 34.559,00	10,00	$ 345.590,00	10,00	$ 345.590,00	0,00	$ -	10,00	$ 345.590,00
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Ó SENCILLO CONMUTABLE INLCUYE	UN	1,00	$ 19.387,00	$ 19.387,00	7,00	$ 135.709,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2	SALIDAS												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 223.874,00	$ 223.874,00	24,00	$ 5.372.976,00	30,00	$ 6.716.220,00	9,00	$ 2.014.866,00	39,00	$ 8.731.086,00
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 220.149,00	$ 220.149,00	9,00	$ 1.981.341,00	8,00	$ 1.761.192,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.761.192,00
5.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 215.196,00	$ 215.196,00	2,00	$ 430.392,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 224.570,00	$ 224.570,00	72,00	$ 16.169.040,00	56,00	$ 12.575.920,00	20,00	$ 4.491.400,00	76,00	$ 17.067.320,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 302.732,00	$ 302.732,00	13,00	$ 3.935.516,00	13,00	$ 3.935.516,00	0,00	$ -	13,00	$ 3.935.516,00
5.3	TABLEROS Y OTROS												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 688.634,00	$ 688.634,00	1,00	$ 688.634,00	1,00	$ 688.634,00	0,00	$ -	1,00	$ 688.634,00
5.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$ 55.506,00	$ 55.506,00	10,00	$ 555.060,00	7,00	$ 388.542,00	0,00	$ -	7,00	$ 388.542,00
5.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA TERMINAL DE COMPRESIÓN BIMETÁLICA PARA CABLE CALIBRE Nº 2/0 AWG.	UN	1,00	$ 10.272,00	$ 10.272,00	1,00	$ 10.272,00	1,00	$ 10.272,00	0,00	$ -	1,00	$ 10.272,00
5.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 0,3X0,3 M, INCLUYE MARCO Y TAPA	UN	1,00	$ 340.984,00	$ 340.984,00	1,00	$ 340.984,00	1,00	$ 340.984,00	0,00	$ -	1,00	$ 340.984,00
5.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.44 M	UN	1,00	$ 496.298,00	$ 496.298,00	1,00	$ 496.298,00	1,00	$ 496.298,00	0,00	$ -	1,00	$ 496.298,00
5.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G	UN	1,00	$ 224.679,00	$ 224.679,00	1,00	$ 224.679,00	1,00	$ 224.679,00	0,00	$ -	1,00	$ 224.679,00
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T)	M	1,00	$ 15.400,00	$ 15.400,00	348,00	$ 5.359.200,00	271,98	$ 4.188.492,00	0,00	$ -	271,98	$ 4.188.492,00
5.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE Nº 2/0 AWG	M	1,00	$ 60.741,00	$ 60.741,00	4,00	$ 242.964,00	4,00	$ 242.964,00	0,00	$ -	4,00	$ 242.964,00
5.4.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/2" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	M	1,00	$ 32.729,00	$ 32.729,00	10,00	$ 327.290,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 53.935,00	$ 53.935,00	236,60	$ 12.761.021,00	126,66	$ 6.831.407,10	0,00	$ -	126,66	$ 6.831.407,10
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 66.771,00	$ 66.771,00	24,00	$ 1.602.504,00	13,00	$ 868.023,00	0,00	$ -	13,00	$ 868.023,00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	1,00	$ 184.243,00	$ 184.243,00	41,00	$ 7.553.963,00	41,00	$ 7.553.963,00	0,00	$ -	41,00	$ 7.553.963,00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 39.856,00	$ 39.856,00	3,00	$ 119.568,00	3,00	$ 119.568,00	0,00	$ -	3,00	$ 119.568,00
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1,00	$ 67.279,00	$ 67.279,00	8,00	$ 538.232,00	8,00	$ 538.232,00	0,00	$ -	8,00	$ 538.232,00
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 38.834,00	$ 38.834,00	22,00	$ 854.348,00	22,00	$ 854.348,00	0,00	$ -	22,00	$ 854.348,00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 50.609,00	$ 50.609,00	21,00	$ 1.062.789,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 121.127,00	$ 121.127,00	2,00	$ 242.254,00	2,00	$ 242.254,00	0,00	$ -	2,00	$ 242.254,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.				0								
7.1.2	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1,00	$ 24.980,00	$ 24.980,00	31,00	$ 774.380,00	30,42	$ 759.891,60	0,00	$ -	30,42	$ 759.891,60
7.1.3	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	$ 27.230,00	$ 27.230,00	8,08	$ 220.018,40	8,08	$ 220.018,40	0,00	$ -	8,08	$ 220.018,40
7.1.8	CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO	M	1,00	$ 11.584,00	$ 11.584,00	41,08	$ 475.870,72		$ -	13,20	$ 152.908,80	13,20	$ 152.908,80
7.2					0								

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.2.3	ACABADO DE PISO CON TABLÓN DE GRES GRAFILADO ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM E.=12 MM TRÁFICO 5 COLOR, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3.	M2	1,00	$ 57.425,00	$ 57.425,00	31,00	$ 1.780.175,00	30,42	$ 1.746.868,50	0,00	$ -	30,42	$ 1.746.868,50
7.2.12	ACABADO DE PISO CON BALDOSAS DE CERÁMICA DE 20,5X20,5 CM, TIPO EGEO DE CORONA O	M2	1,00	$ 44.792,00	$ 44.792,00	1,69	$ 75.698,48		$ -	1,69	$ 75.680,56	1,69	$ 75.680,56
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	1,00	$ 20.153,00	$ 20.153,00	37,00	$ 745.661,00	36,15	$ 728.530,95	0,00	$ -	36,15	$ 728.530,95
7.3.11	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1,00	$ 17.874,00	$ 17.874,00	32,00	$ 571.968,00	31,82	$ 568.750,68	0,00	$ -	31,82	$ 568.750,68
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN	M2	1,00	$ 108.572,00	$ 108.572,00	1,20	$ 130.286,40		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1,00	$ 121.561,00	$ 121.561,00	104,27	$ 12.675.165,47	52,14	$ 6.338.190,54	104,27	$ 12.675.165,47	156,41	$ 19.013.356,01
9.3.3	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	1,00	$ 42.696,00	$ 42.696,00	2,00	$ 85.392,00	1,20	$ 51.235,20	0,00	$ -	1,20	$ 51.235,20
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
11.1	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1,00	$ 96.213,00	$ 96.213,00	2,00	$ 192.426,00	1,54	$ 148.168,02	0,00	$ -	1,54	$ 148.168,02
11.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA CON MANGUERA (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 114.406,00	$ 114.406,00	2,00	$ 228.812,00	2,00	$ 228.812,00	0,00	$ -	2,00	$ 228.812,00
11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	1,00	$ 23.550,00	$ 23.550,00	2,00	$ 47.100,00	2,00	$ 47.100,00	0,00	$ -	2,00	$ 47.100,00
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.1	CIELOS RASOS.												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1,00	$ 102.778,00	$ 102.778,00	27,01	$ 2.776.033,78		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.1.2	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	1,00	$ 192.360,00	$ 192.360,00	57,01	$ 10.965.731,87	48,67	$ 9.362.161,20	0,00	$ -	48,67	$ 9.362.161,20
14.1.4	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO	M2	1,00	$ 90.661,00	$ 90.661,00	268,20	$ 24.315.126,08	256,26	$ 23.232.787,86	0,00	$ -	256,26	$ 23.232.787,86
14.1.6	TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M	1,00	$ 58.882,00	$ 58.882,00	56,00	$ 3.297.392,00	55,15	$ 3.247.342,30	0,00	$ -	55,15	$ 3.247.342,30
14.2	DIVISIONES.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
14.2.1	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DIVISIONES EN PANELERÍA LIVIANA ACABADO DOS (2) CARAS FABRICADAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO E.=6 MM, SIN FRESCASA, PERFILERÍA GALVANIZADA CR. BASE 9 CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE TAPAS LATERALES DE TERMINACIÓN CUANDO SE REQUIERA, PERFILERÍA, LÁMINAS, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	1,00	$ 174.019,00	$ 174.019,00	14,04	$ 2.443.226,76		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.2.6	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1,00	$ 144.951,00	$ 144.951,00	22,00	$ 3.188.922,00	21,05	$ 3.051.218,55	0,00	$ -	21,05	$ 3.051.218,55
14.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M	1,00	$ 81.644,00	$ 81.644,00	8,00	$ 653.152,00	7,49	$ 611.513,56	0,00	$ -	7,49	$ 611.513,56
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.361,00	$ 4.361,00	234,29	$ 1.021.728,66		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.5	PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 29.519,00	$ 29.519,00	48,05	$ 1.418.387,95		$ -	48,05	$ 1.418.387,95	48,05	$ 1.418.387,95
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1,00	$ 24.900,00	$ 24.900,00	226,81	$ 5.647.569,00		$ -	226,81	$ 5.647.569,00	226,81	$ 5.647.569,00
21.1.7	PAÑETE LISO COMÚN 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 26.898,00	$ 26.898,00	144,63	$ 3.890.257,74		$ -	18,79	$ 505.305,83	18,79	$ 505.305,83
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	$ 68.604,00	$ 68.604,00	48,05	$ 3.296.422,20		$ -	48,05	$ 3.296.422,20	48,05	$ 3.296.422,20
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE	M2	1,00	$ 13.131,00	$ 13.131,00	73,77	$ 968.673,87		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.1.9	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 23.318,00	$ 23.318,00	474,73	$ 11.069.754,14		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	1,00	$ 35.715,00	$ 35.715,00	865,61	$ 30.915.261,15	180,52	$ 6.447.271,80	775,22	$ 27.686.982,30	955,74	$ 34.134.254,10
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1,00	$ 27.338,00	$ 27.338,00	29,91	$ 817.679,58	49,69	$ 1.358.425,22	29,91	$ 817.679,58	79,60	$ 2.176.104,80
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	1,00	$ 242.793,00	$ 242.793,00	357,86	$ 86.885.902,98		$ -	385,53	$ 93.602.771,33	385,53	$ 93.602.771,33
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y	M2	1,00	$ 95.665,00	$ 95.665,00	53,70	$ 5.137.210,50		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26	M	1,00	$ 51.597,00	$ 51.597,00	23,30	$ 1.202.210,10		$ -	11,75	$ 606.264,75	11,75	$ 606.264,75
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 78.835,00	$ 78.835,00	6,00	$ 473.010,00	6,00	$ 473.010,00	0,00	$ -	6,00	$ 473.010,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1,00	$ 43.271,00	$ 43.271,00	13,00	$ 562.523,00	12,14	$ 525.309,94	0,00	$ -	12,14	$ 525.309,94
1	SUBTOTAL SAMPER MENDOZA				$ 10.808.571,00		$ 561.923.476,16		$ 118.994.614,10		$ 431.854.685,34		$ 550.849.299,44
1	UNIDAD OPERATIVA SAN JERONIMO DEL YUSTE												
1.3													
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1,00	$ 26.894,00	$ 26.894,00	2,00	$ 53.788,00	2,00	$ 53.788,00	0,00	$ -	2,00	$ 53.788,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE,	M2	1,00	$ 19.206,00	$ 19.206,00	110,00	$ 2.112.660,00	34,51	$ 662.799,06	163,29	$ 3.136.147,74	197,80	$ 3.798.946,80
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO,	M2	1,00	$ 26.723,00	$ 26.723,00	81,13	$ 2.168.036,99		$ -	75,38	$ 2.014.379,74	75,38	$ 2.014.379,74
1.8.17	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1,00	$ 23.670,00	$ 23.670,00	39,00	$ 923.130,00	0,20	$ 4.734,00	0,00	$ -	0,20	$ 4.734,00
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.4	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3	ML	1,00	$ 26.494,00	$ 26.494,00	200,00	$ 5.298.800,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.16	TUBERÍA PVCP 4" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M.	M	1,00	$ 178.983,00	$ 178.983,00	4,00	$ 715.932,00		$ -	2,00	$ 357.966,00	2,00	$ 357.966,00
4.1.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"	UN	1,00	$ 54.691,00	$ 54.691,00	1,00	$ 54.691,00	1,00	$ 54.691,00	0,00	$ -	1,00	$ 54.691,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.4	OTROS												
7.4.6	ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E=6CM 26X6X6, INSTALADO Y PEGADO CON MORTERO 1:3, SEGÚN	M2	1,00	$ 233.176,00	$ 233.176,00	81,13	$ 18.917.568,88		$ -	75,12	$ 17.516.181,12	75,12	$ 17.516.181,12
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18	M2	1,00	$ 522.589,00	$ 522.589,00	2,00	$ 1.045.178,00	1,80	$ 940.660,20	0,72	$ 376.264,08	2,52	$ 1.316.924,28
18.1	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN	1,00	$ 465.544,00	$ 465.544,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.361,00	$ 4.361,00	400,00	$ 1.744.400,00	160,91	$ 701.728,51	0,00	$ -	160,91	$ 701.728,51
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21,1	BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.												
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1,00	$ 30.158,00	$ 30.158,00	3,00	$ 90.474,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 46.483,00	$ 46.483,00	100,00	$ 4.648.300,00		$ -	19,23	$ 893.868,09	19,23	$ 893.868,09
22.6	OTROS EN OBRAS INTERIORES.												
22.6.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	1,00	$ 51.428,00	$ 51.428,00	2,33	$ 119.827,24		$ -	2,33	$ 119.827,24	2,33	$ 119.827,24
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E					E							
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												
23.3.2	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y	M2	1,00	$ 29.733,00	$ 29.733,00	81,13	$ 2.412.238,29	2,00	$ 59.466,00	73,12	$ 2.174.076,96	75,12	$ 2.233.542,96
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	$ 120.445,00	$ 120.445,00	162,26	$ 19.543.405,70	124,68	$ 15.017.082,60	73,12	$ 8.806.938,40	197,80	$ 23.824.021,00
1	SUBTOTAL SAN JERONIMO DEL YUSTE				$ 1.833.684,00		$ 59.848.430,10		17494949,37		35395649,37		52890599 0
1	UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL NUEVOS PASOS												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN	M	1,00	$ 37.022,00	$ 37.022,00	10,00	$ 370.220,00		$ -	10,00	$ 370.220,00	10,00	$ 370.220,00
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 17.945,00	$ 17.945,00	37,26	$ 668.630,70		$ -	37,26	$ 668.630,70	37,26	$ 668.630,70
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE	M	1,00	$ 12.378,00	$ 12.378,00	61,90	$ 766.198,20		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4.3	DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE	M	1,00	$ 12.378,00	$ 12.378,00	37,60	$ 465.412,80		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE,	M2	1,00	$ 19.206,00	$ 19.206,00	120,00	$ 2.304.720,00		$ -	117,00	$ 2.247.102,00	117,00	$ 2.247.102,00
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE	M3	1,00	$ 69.229,00	$ 69.229,00	30,50	$ 2.111.484,50		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE	M2	1,00	$ 34.461,00	$ 34.461,00	436,05	$ 15.026.719,05		$ -	111,12	$ 3.829.306,32	111,12	$ 3.829.306,32

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.29	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES,	UN	1,00	$ 11.213,00	$ 11.213,00	42,00	$ 470.946,00		$ -	42,00	$ 470.946,00	42,00	$ 470.946,00
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 19.787,00	$ 19.787,00	30,00	$ 593.610,00		$ -	7,64	$ 151.172,68	7,64	$ 151.172,68
1.9.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 15.005,00	$ 15.005,00	12,00	$ 180.060,00		$ -	12,00	$ 180.060,00	12,00	$ 180.060,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO												
2.2.4	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	1,00	$ 425.220,00	$ 425.220,00	0,90	$ 382.698,00		$ -	0,36	$ 153.079,20	0,36	$ 153.079,20
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 17.409,00	$ 17.409,00	1.180,13	$ 20.544.883,17		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.												
3.5.2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1,00	$ 19.849,00	$ 19.849,00	200,00	$ 3.969.800,00		$ -	194,59	$ 3.862.416,91	194,59	$ 3.862.416,91
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL												
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE	UN	1,00	$ 120.937,00	$ 120.937,00	20,00	$ 2.418.740,00		$ -	23,00	$ 2.781.551,00	23,00	$ 2.781.551,00
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON	UN	1,00	$ 138.554,00	$ 138.554,00	12,00	$ 1.662.648,00		$ -	6,00	$ 831.324,00	6,00	$ 831.324,00
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 135.360,00	$ 135.360,00	1,00	$ 135.360,00		$ -	1,00	$ 135.360,00	1,00	$ 135.360,00
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE	UN	1,00	$ 191.194,00	$ 191.194,00	29,00	$ 5.544.626,00		$ -	5,00	$ 955.970,00	5,00	$ 955.970,00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON	UN	1,00	$ 209.489,00	$ 209.489,00	8,00	$ 1.675.912,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO	UN	1,00	$ 194.855,00	$ 194.855,00	12,00	$ 2.338.260,00		$ -	13,00	$ 2.533.115,00	13,00	$ 2.533.115,00
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE	UN	1,00	$ 385.871,00	$ 385.871,00	2,00	$ 771.742,00	1,00	$ 385.871,00	0,00	$ -	1,00	$ 385.871,00
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1,00	$ 34.559,00	$ 34.559,00	20,00	$ 691.180,00	1,00	$ 34.559,00	18,00	$ 622.062,00	19,00	$ 656.621,00
5.2	SALIDAS												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE	UN	1,00	$ 223.874,00	$ 223.874,00	53,00	$ 11.865.322,00	4,00	$ 895.496,00	62,00	$ 13.880.188,00	66,00	$ 14.775.684,00
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE	UN	1,00	$ 220.149,00	$ 220.149,00	6,00	$ 1.320.894,00	3,00	$ 660.447,00	6,00	$ 1.320.894,00	9,00	$ 1.981.341,00
5.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR	UN	1,00	$ 215.196,00	$ 215.196,00	2,00	$ 430.392,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE	UN	1,00	$ 224.570,00	$ 224.570,00	147,00	$ 33.011.790,00		$ -	137,00	$ 30.766.090,00	137,00	$ 30.766.090,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE	UN	1,00	$ 302.732,00	$ 302.732,00	25,00	$ 7.568.300,00		$ -	25,00	$ 7.568.300,00	25,00	$ 7.568.300,00
5.2	SALIDAS												
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 437.642,00	$ 437.642,00	1,00	$ 437.642,00		$ -	1,00	$ 437.642,00	1,00	$ 437.642,00
5.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$ 55.506,00	$ 55.506,00	20,00	$ 1.110.120,00		$ -	20,00	$ 1.110.120,00	20,00	$ 1.110.120,00
5.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$ 88.900,00	$ 88.900,00	2,00	$ 177.800,00		$ -	2,00	$ 177.800,00	2,00	$ 177.800,00
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 57.590,00	$ 57.590,00	49,00	$ 2.821.910,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA TERMINAL DE COMPRESIÓN BIMETÁLICA PARA CABLE CALIBRE	UN	1,00	$ 10.272,00	$ 10.272,00	1,00	$ 10.272,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 0,3X0,3 M, INCLUYE MARCO	UN	1,00	$ 340.984,00	$ 340.984,00	1,00	$ 340.984,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.44 M	UN	1,00	$ 496.298,00	$ 496.298,00	1,00	$ 496.298,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G	UN	1,00	$ 224.679,00	$ 224.679,00	1,00	$ 224.679,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 8 -T-REG INCLUYE PEINADO Y ORGANIZACIÓN DE	UN	1,00	$ 305.202,00	$ 305.202,00	1,00	$ 305.202,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	1,00	$ 15.400,00	$ 15.400,00	506,50	$ 7.800.100,00	14,67	$ 225.918,00	654,59	$ 10.080.686,00	669,26	$ 10.306.604,00
5.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE N° 2/0 AWG	M	1,00	$ 60.741,00	$ 60.741,00	6,00	$ 364.446,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE	M	1,00	$ 58.119,00	$ 58.119,00	278,03	$ 16.158.825,57		$ -	266,60	$ 15.494.525,40	266,60	$ 15.494.525,40
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE	M	1,00	$ 53.935,00	$ 53.935,00	531,30	$ 28.655.665,50	7,80	$ 420.693,00	344,62	$ 18.587.079,70	352,42	$ 19.007.772,70
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V	UN	1,00	$ 66.771,00	$ 66.771,00	25,00	$ 1.669.275,00		$ -	25,00	$ 1.669.275,00	25,00	$ 1.669.275,00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	1,00	$ 184.243,00	$ 184.243,00	62,00	$ 11.423.066,00		$ -	64,00	$ 11.791.552,00	64,00	$ 11.791.552,00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	1,00	$ 184.796,00	$ 184.796,00	25,00	$ 4.619.900,00		$ -	26,00	$ 4.804.696,00	26,00	$ 4.804.696,00
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE	UN	1,00	$ 67.279,00	$ 67.279,00	18,00	$ 1.211.022,00		$ -	9,00	$ 605.511,00	9,00	$ 605.511,00
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	1,00	$ 38.834,00	$ 38.834,00	9,00	$ 349.506,00		$ -	9,00	$ 349.506,00	9,00	$ 349.506,00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS	UN	1,00	$ 50.609,00	$ 50.609,00	42,00	$ 2.125.578,00		$ -	29,00	$ 1.467.661,00	29,00	$ 1.467.661,00
5.6	INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
5.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ 45 CAT 6A INCLUYE ORGANIZADOR	UN	1,00	$ 403.969,00	$ 403.969,00	1,00	$ 403.969,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP	M	1,00	$ 7.107,00	$ 7.107,00	202,00	$ 1.435.614,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A INCLUYE PONCHADO EN PUESTO DE	UN	1,00	$ 183.102,00	$ 183.102,00	10,00	$ 1.831.020,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN	1,00	$ 1.009.240,00	$ 1.009.240,00	1,00	$ 1.009.240,00	1,00	$ 1.009.240,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.009.240,00
5.6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARED 12 O 13 Ur X 50 Cm NEGRO FM	UN	1,00	$ 595.282,00	$ 595.282,00	1,00	$ 595.282,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARED 9 Ur X 50 Cm NEGRO FM	UN	1,00	$ 425.164,00	$ 425.164,00	1,00	$ 425.164,00	1,00	$ 425.164,00	0,00	$ -	1,00	$ 425.164,00
5.6.11	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS CAT. 6A	UN	1,00	$ 47.622,00	$ 47.622,00	10,00	$ 476.220,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN												
6.1	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1,00	$ 211.634,00	$ 211.634,00	33,00	$ 6.983.922,00		$ -	34,00	$ 7.195.556,00	34,00	$ 7.195.556,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 252.495,00	$ 252.495,00	1,00	$ 252.495,00		$ -	1,00	$ 252.495,00	1,00	$ 252.495,00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1,00	$ 166.567,00	$ 166.567,00	5,00	$ 832.835,00		$ -	4,00	$ 666.268,00	4,00	$ 666.268,00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1,00	$ 261.058,00	$ 261.058,00	5,00	$ 1.305.290,00		$ -	4,00	$ 1.044.232,00	4,00	$ 1.044.232,00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1,00	$ 440.476,00	$ 440.476,00	5,00	$ 2.202.380,00		$ -	4,00	$ 1.761.904,00	4,00	$ 1.761.904,00
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125	UN	1,00	$ 7.168.604,00	$ 7.168.604,00	1,00	$ 7.168.604,00		$ -	1,00	$ 7.168.604,00	1,00	$ 7.168.604,00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1,00	$ 8.254,00	$ 8.254,00	426,00	$ 3.516.204,00		$ -	457,45	$ 3.775.792,30	457,45	$ 3.775.792,30
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE	M2	1,00	$ 361.126,00	$ 361.126,00	37,26	$ 13.455.554,76		$ -	37,26	$ 13.455.554,76	37,26	$ 13.455.554,76
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM	M2	1,00	$ 198.385,00	$ 198.385,00	37,26	$ 7.391.825,10		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.2	DIVISIONES.												
14.2.6	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E	M2	1,00	$ 144.951,00	$ 144.951,00	5,00	$ 724.755,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.361,00	$ 4.361,00	872,10	$ 3.803.228,10		$ -	872,10	$ 3.803.228,10	872,10	$ 3.803.228,10
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE	M2	1,00	$ 13.131,00	$ 13.131,00	715,10	$ 9.389.978,10		$ -	577,50	$ 7.583.152,50	577,50	$ 7.583.152,50
22.1.9	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE	M2	1,00	$ 23.318,00	$ 23.318,00	634,63	$ 14.798.302,34		$ -	721,50	$ 16.823.937,00	721,50	$ 16.823.937,00
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE	M	1,00	$ 12.354,00	$ 12.354,00	25,00	$ 308.850,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 28.716,00	$ 28.716,00	16,00	$ 459.456,00		$ -	14,83	$ 425.858,28	14,83	$ 425.858,28
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR,	M2	1,00	$ 15.996,00	$ 15.996,00	697,68	$ 11.160.089,28		$ -	131,97	$ 2.110.992,12	131,97	$ 2.110.992,12
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	1,00	$ 35.715,00	$ 35.715,00	156,44	$ 5.587.254,60		$ -	156,44	$ 5.587.254,60	156,44	$ 5.587.254,60
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	$ 120.445,00	$ 120.445,00	79,40	$ 9.563.333,00		$ -	55,29	$ 6.659.404,05	55,29	$ 6.659.404,05
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	1,00	$ 242.793,00	$ 242.793,00	436,05	$ 105.869.887,65		$ -	375,35	$ 91.132.352,55	375,35	$ 91.132.352,55
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y	M2	1,00	$ 95.665,00	$ 95.665,00	30,00	$ 2.869.950,00		$ -	32,50	$ 3.109.112,50	32,50	$ 3.109.112,50
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26	M	1,00	$ 51.597,00	$ 51.597,00	80,00	$ 4.127.760,00		$ -	87,05	$ 4.491.518,85	87,05	$ 4.491.518,85
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 78.835,00	$ 78.835,00	5,00	$ 394.175,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M.	M	1,00	$ 43.271,00	$ 43.271,00	25,00	$ 1.081.775,00		$ -	12,00	$ 519.252,00	12,00	$ 519.252,00
1	SUBTOTAL JARDIN INFANTIL NUEVOS PASOS				$ 18.757.475,00		$ 417.017.252,42		$ 4.057.388,00		$ 317.470.310,52		$ 321.527.698,52
1	UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN	M	1,00	$ 37.022,00	$ 37.022,00	83,10	$ 3.076.528,20		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 17.945,00	$ 17.945,00	144,43	$ 2.591.844,80	2,64	$ 47.374,80	83,70	$ 1.501.996,50	86,34	$ 1.549.371,30
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL	U	1,00	$ 23.633,00	$ 23.633,00	18,00	$ 425.394,00		$ -	17,00	$ 401.761,00	17,00	$ 401.761,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.1	PROTECCIÓN DEL CIELO RASO EXISTENTE DEJADO EXPUESTO POSTERIOR AL DESMONTE DE LA	M2	1,00	$ 6.219,00	$ 6.219,00	266,14	$ 1.655.094,19		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE	M	1,00	$ 12.378,00	$ 12.378,00	101,40	$ 1.255.129,20		$ -	101,40	$ 1.255.129,20	101,40	$ 1.255.129,20
1.4.3	DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE	M	1,00	$ 12.378,00	$ 12.378,00	36,00	$ 445.608,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE	M2	1,00	$ 69.229,00	$ 69.229,00	488,68	$ 33.830.827,72		$ -	488,68	$ 33.830.827,72	488,68	$ 33.830.827,72
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE	M	1,00	$ 10.468,00	$ 10.468,00	173,46	$ 1.815.779,28	198,41	$ 2.076.955,88	96,53	$ 1.010.476,04	294,94	$ 3.087.431,92
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO,	M2	1,00	$ 26.723,00	$ 26.723,00	234,08	$ 6.255.271,74		$ -	408,43	$ 10.914.474,89	408,43	$ 10.914.474,89
1.5.8	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 17.684,00	$ 17.684,00	29,00	$ 512.836,00	28,20	$ 498.688,80	0,00	$ -	28,20	$ 498.688,80
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.20	DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLÁSTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, U OTROS RELACIONADOS.	UN	1,00	$ 116.725,00	$ 116.725,00	1,00	$ 116.725,00	1,00	$ 116.725,00	0,00	$ -	1,00	$ 116.725,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.6.21	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.	UN	1,00	$ 26.894,00	$ 26.894,00	10,00	$ 268.940,00	3,00	$ 80.682,00	10,00	$ 268.940,00	13,00	$ 349.622,00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS	UN	1,00	$ 13.606,00	$ 13.606,00	29,00	$ 394.574,00		$ -	23,00	$ 312.938,00	23,00	$ 312.938,00
1.6.27	DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELÉCTRICAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O	UN	1,00	$ 20.397,00	$ 20.397,00	29,00	$ 591.513,00		$ -	23,00	$ 469.131,00	23,00	$ 469.131,00
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 19.787,00	$ 19.787,00	302,82	$ 5.991.899,34		$ -	302,82	$ 5.991.899,34	302,82	$ 5.991.899,34
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 6.783,00	$ 6.783,00	86,00	$ 583.338,00		$ -	85,97	$ 583.134,51	85,97	$ 583.134,51
1,9	DEMOLICIONEDEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.S Y/O DESMONTES DE CIELO												
1.9.9	DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE BORDILLOS), CONCRETO ASFÁLTICO, ESCALAS SOBRE TERRENO Y PISOS DE EDIFICACIONES (INCLUYE ACABADO) EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M2	1,00	$ 19.115,00	$ 19.115,00	80,45	$ 1.537.801,75		$ -	80,45	$ 1.537.801,75	80,45	$ 1.537.801,75
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	$ 51.410,00	$ 51.410,00	85,95	$ 4.418.895,14		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,1	DEMOLICIONEDEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS												
1.10.2	DEMOLICIÓN MANUAL DE BORDILLOS EN CONCRETO INCLUYENDO SU ACABADO (INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO), CON MEDIDAS H.<=20 A.<=15. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 22.273,00	$ 22.273,00	41,36	$ 921.211,28		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO												
2,5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1,00	$ 315.198,00	$ 315.198,00	80,45	$ 25.357.679,10	80,45	$ 25.357.679,10	0,00	$ -	80,45	$ 25.357.679,10
2,5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	M	1,00	$ 4.708,00	$ 4.708,00	114,61	$ 539.561,91		$ -	107,27	$ 505.027,16	107,27	$ 505.027,16
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 17.409,00	$ 17.409,00	700,00	$ 12.186.300,00		$ -	602,22	$ 10.484.047,98	602,22	$ 10.484.047,98
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL												
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 191.194,00	$ 191.194,00	12,00	$ 2.294.328,00		$ -	15,00	$ 2.867.910,00	15,00	$ 2.867.910,00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETO0RNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 209.489,00	$ 209.489,00	6,00	$ 1.256.934,00		$ -	6,00	$ 1.256.934,00	6,00	$ 1.256.934,00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 207.806,00	$ 207.806,00	6,00	$ 1.246.836,00		$ -	1,00	$ 207.806,00	1,00	$ 207.806,00
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	1,00	$ 194.855,00	$ 194.855,00	5,00	$ 974.275,00		$ -	5,00	$ 974.275,00	5,00	$ 974.275,00
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X50A 50 KA	UN	1,00	$ 385.871,00	$ 385.871,00	1,00	$ 385.871,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1,00	$ 34.559,00	$ 34.559,00	4,00	$ 138.236,00		$ -	12,00	$ 414.708,00	12,00	$ 414.708,00
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Ó SENCILLO CONMUTABLE INLCUYE	UN	1,00	$ 19.387,00	$ 19.387,00	15,00	$ 290.805,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2	SALIDAS												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 223.874,00	$ 223.874,00	36,00	$ 8.059.464,00		$ -	41,00	$ 9.178.834,00	41,00	$ 9.178.834,00
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 220.149,00	$ 220.149,00	2,00	$ 440.298,00		$ -	2,00	$ 440.298,00	2,00	$ 440.298,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 215.196,00	$ 215.196,00	2,00	$ 430.392,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 224.570,00	$ 224.570,00	63,00	$ 14.147.910,00		$ -	66,00	$ 14.821.620,00	66,00	$ 14.821.620,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 302.732,00	$ 302.732,00	7,00	$ 2.119.124,00		$ -	7,00	$ 2.119.124,00	7,00	$ 2.119.124,00
5.3	TABLEROS Y OTROS												
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 688.634,00	$ 688.634,00	1,00	$ 688.634,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 437.642,00	$ 437.642,00	2,00	$ 875.284,00		$ -	2,00	$ 875.284,00	2,00	$ 875.284,00
5.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$ 55.506,00	$ 55.506,00	5,00	$ 277.530,00		$ -	3,00	$ 166.518,00	3,00	$ 166.518,00
5.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$ 88.900,00	$ 88.900,00	1,00	$ 88.900,00		$ -	2,00	$ 177.800,00	2,00	$ 177.800,00
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 57.590,00	$ 57.590,00	31,00	$ 1.785.290,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA TERMINAL DE COMPRESIÓN BIMETÁLICA PARA CABLE CALIBRE Nº 2/0 AWG.	UN	1,00	$ 10.272,00	$ 10.272,00	1,00	$ 10.272,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 0,3X0,3 M, INCLUYE MARCO Y TAPA	UN	1,00	$ 340.984,00	$ 340.984,00	1,00	$ 340.984,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.44 M	UN	1,00	$ 496.298,00	$ 496.298,00	1,00	$ 496.298,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G	UN	1,00	$ 224.679,00	$ 224.679,00	1,00	$ 224.679,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	1,00	$ 15.400,00	$ 15.400,00	428,20	$ 6.594.280,00		$ -	401,79	$ 6.187.566,00	401,79	$ 6.187.566,00
5,4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE Nº 2/0 AWG	M	1,00	$ 60.741,00	$ 60.741,00	6,00	$ 364.446,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 53.935,00	$ 53.935,00	283,40	$ 15.285.179,00		$ -	255,09	$ 13.758.279,15	255,09	$ 13.758.279,15
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 66.771,00	$ 66.771,00	7,00	$ 467.397,00		$ -	7,00	$ 467.397,00	7,00	$ 467.397,00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	1,00	$ 184.243,00	$ 184.243,00	41,00	$ 7.553.963,00		$ -	41,00	$ 7.553.963,00	41,00	$ 7.553.963,00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 184.796,00	$ 184.796,00	5,00	$ 923.980,00		$ -	16,00	$ 2.956.736,00	16,00	$ 2.956.736,00
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	1,00	$ 38.834,00	$ 38.834,00	17,00	$ 660.178,00		$ -	9,00	$ 349.506,00	9,00	$ 349.506,00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 50.609,00	$ 50.609,00	17,00	$ 860.353,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.				0								
7.1.1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 H.= 2 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1,00	$ 23.642,00	$ 23.642,00	299,11	$ 7.071.558,62	16,71	$ 395.057,82	299,11	$ 7.071.558,62	315,82	$ 7.466.616,44
7.1.2	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1,00	$ 24.980,00	$ 24.980,00	234,08	$ 5.847.273,44		$ -	219,70	$ 5.488.106,00	219,70	$ 5.488.106,00
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1,00	$ 122.171,00	$ 122.171,00	122,30	$ 14.941.330,04		$ -	109,33	$ 13.356.955,43	109,33	$ 13.356.955,43
7.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EROSSION 50 X 50 6MM COLORES	M2	1,00	$ 146.521,00	$ 146.521,00	300,91	$ 44.088.974,77	28,20	$ 4.131.892,20	299,11	$ 43.825.896,31	327,31	$ 47.957.788,51
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.												
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	1,00	$ 20.153,00	$ 20.153,00	24,00	$ 483.672,00	23,13	$ 466.138,89	0,00	$ -	23,13	$ 466.138,89
7.3.9	GUARDA ESCOBA EN PVC	M	1,00	$ 46.808,00	$ 46.808,00	202,20	$ 9.464.577,60	28,20	$ 1.319.985,60	198,70	$ 9.300.749,60	226,90	$ 10.620.735,20
7.3.11	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1,00	$ 17.874,00	$ 17.874,00	71,79	$ 1.283.174,46		$ -	69,12	$ 1.235.450,88	69,12	$ 1.235.450,88
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1,00	$ 62.039,00	$ 62.039,00	9,62	$ 596.815,18	1,51	$ 93.678,89	9,62	$ 596.815,18	11,13	$ 690.494,07
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE	M2	1,00	$ 508.215,00	$ 508.215,00	2,20	$ 1.118.073,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SIN	M2	1,00	$ 361.126,00	$ 361.126,00	66,29	$ 23.939.042,54		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,00	$ 361.126,00	$ 361.126,00	144,43	$ 52.158.403,22	2,64	$ 953.372,64	79,50	$ 28.709.517,00	82,14	$ 29.662.889,64
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1,00	$ 143.936,00	$ 143.936,00	3,00	$ 431.808,00	2,64	$ 379.991,04	0,00	$ -	2,64	$ 379.991,04
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1,00	$ 830.695,00	$ 830.695,00	4,00	$ 3.322.780,00		$ -	4,00	$ 3.322.780,00	4,00	$ 3.322.780,00
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1,00	$ 326.091,00	$ 326.091,00	2,00	$ 652.182,00	2,00	$ 652.182,00	0,00	$ -	2,00	$ 652.182,00
11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	1,00	$ 569.011,00	$ 569.011,00	3,00	$ 1.707.033,00		$ -	3,00	$ 1.707.033,00	3,00	$ 1.707.033,00
11.10	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1,00	$ 40.554,00	$ 40.554,00	2,00	$ 81.108,00		$ -	2,00	$ 81.108,00	2,00	$ 81.108,00
11.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE SEGURIDAD 0.34 X 2 X 0,65	UN	1,00	$ 486.800,00	$ 486.800,00	2,00	$ 973.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	1,00	$ 622.035,00	$ 622.035,00	2,00	$ 1.244.070,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN	1,00	$ 621.668,00	$ 621.668,00	2,00	$ 1.243.336,00		$ -	2,00	$ 1.243.336,00	2,00	$ 1.243.336,00
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1,00	$ 388.883,00	$ 388.883,00	2,00	$ 777.766,00	2,00	$ 777.766,00	0,00	$ -	2,00	$ 777.766,00
11.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN	1,00	$ 540.604,00	$ 540.604,00	1,00	$ 540.604,00	1,00	$ 540.604,00	0,00	$ -	1,00	$ 540.604,00
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.1	CIELOS RASOS.												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS,	M2	1,00	$ 102.778,00	$ 102.778,00	277,77	$ 28.548.305,89		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.1.2	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	1,00	$ 192.360,00	$ 192.360,00	100,24	$ 19.282.166,40	3,96	$ 761.745,60	100,24	$ 19.282.166,40	104,20	$ 20.043.912,00
14.1.6	TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M	1,00	$ 58.882,00	$ 58.882,00	82,04	$ 4.830.679,28		$ -	82,04	$ 4.830.679,28	82,04	$ 4.830.679,28
14.2,6	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1,00	$ 144.951,00	$ 144.951,00	2,00	$ 289.902,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	ML	1,00	$ 81.644,00	$ 81.644,00	37,00	$ 3.020.828,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADOS 1.5 DE E=4MM. INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	1,00	$ 55.964,00	$ 55.964,00	4,50	$ 251.838,00	1,20	$ 67.156,80	2,99	$ 167.332,36	4,19	$ 234.489,16
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI, H=0,10 M, FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO.	M2	1,00	$ 50.829,00	$ 50.829,00	93,94	$ 4.774.876,26		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.361,00	$ 4.361,00	454,33	$ 1.981.343,60	436,63	$ 1.904.143,43	0,00	$ -	436,63	$ 1.904.143,43
21,1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1,00	$ 24.900,00	$ 24.900,00	340,83	$ 8.486.763,12		$ -	217,99	$ 5.427.951,00	217,99	$ 5.427.951,00
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE	M2	1,00	$ 13.131,00	$ 13.131,00	659,24	$ 8.656.428,59		$ -	554,53	$ 7.281.533,43	554,53	$ 7.281.533,43
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 46.483,00	$ 46.483,00	592,17	$ 27.525.838,11	14,51	$ 674.468,33	592,17	$ 27.525.838,11	606,68	$ 28.200.306,44
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	$ 12.354,00	$ 12.354,00	194,00	$ 2.396.676,00	193,95	$ 2.396.058,30	0,00	$ -	193,95	$ 2.396.058,30
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 28.716,00	$ 28.716,00	281,16	$ 8.073.727,38		$ -	194,69	$ 5.590.718,04	194,69	$ 5.590.718,04
22.1.13	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, LINEAL A.<=50 CM, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	$ 10.691,00	$ 10.691,00	236,94	$ 2.533.125,54		$ -	334,34	$ 3.574.428,94	334,34	$ 3.574.428,94
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	1,00	$ 35.715,00	$ 35.715,00	800,81	$ 28.600.929,15		$ -	735,24	$ 26.259.096,60	735,24	$ 26.259.096,60
22.4	SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA.												
22.4.1	PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE	M2	1,00	$ 17.846,00	$ 17.846,00	45,81	$ 817.525,26	63,92	$ 1.140.716,32	0,00	$ -	63,92	$ 1.140.716,32
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	1,00	$ 242.793,00	$ 242.793,00	494,12	$ 119.968.877,16		$ -	443,45	$ 107.666.555,85	443,45	$ 107.666.555,85
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y	M2	1,00	$ 95.665,00	$ 95.665,00	44,46	$ 4.253.265,90		$ -	43,46	$ 4.157.600,90	43,46	$ 4.157.600,90
1	SUBTOTAL JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN				$ 13.838.495,00		$ 620.315.149,15		$ 44.833.063,44		$ 461.545.350,17		$ 506.378.413,61
1	UNIDAD OPERATIVA CDC BELLO HORIZONTE												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN	M	1,00	$ 37.022,00	$ 37.022,00	60,00	$ 2.221.320,00		$ -	28,00	$ 1.036.616,00	28,00	$ 1.036.616,00
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1,00	$ 17.945,00	$ 17.945,00	44,00	$ 789.580,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3.7	DESMONTE MANUAL DE REJAS METÁLICAS Y/O VARILLAS DE ACERO EN VANOS DE VENTANAS. INCLUYE	M2	1,00	$ 16.823,00	$ 16.823,00	44,00	$ 740.212,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3.8	DESMONTE MANUAL DE BARANDAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO), CONTEMPLANDO SUS PASAMANOS, APOYOS VERTICALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN PLANTA. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M	1,00	$ 11.267,00	$ 11.267,00	28,00	$ 315.476,00		$ -	28,00	$ 315.476,00	28,00	$ 315.476,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.1	PROTECCIÓN DEL CIELO RASO EXISTENTE DEJADO EXPUESTO POSTERIOR AL DESMONTE DE LA	M2	1,00	$ 6.219,00	$ 6.219,00	360,00	$ 2.238.840,00		$ -	345,44	$ 2.148.291,36	345,44	$ 2.148.291,36
1.4.3	DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE	M	1,00	$ 12.378,00	$ 12.378,00	50,00	$ 618.900,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE,	M2	1,00	$ 19.206,00	$ 19.206,00	30,00	$ 576.180,00		$ -	92,45	$ 1.775.594,70	92,45	$ 1.775.594,70
1.4.6	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE BARRO DE CUBIERTA, SUS CUMBRERAS, LIMAHOYAS Y LIMATEZAS	M2	1,00	$ 18.598,00	$ 18.598,00	360,00	$ 6.695.280,00		$ -	345,50	$ 6.425.609,00	345,50	$ 6.425.609,00
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC	M2	1,00	$ 18.598,00	$ 18.598,00	256,67	$ 4.773.548,66		$ -	281,17	$ 5.229.199,66	281,17	$ 5.229.199,66
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 13.606,00	$ 13.606,00	20,00	$ 272.120,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.6.29	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES,	M2	1,00	$ 11.213,00	$ 11.213,00	8,00	$ 89.704,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7,5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 19.787,00	$ 19.787,00	100,00	$ 1.978.700,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA	M2	1,00	$ 8.648,00	$ 8.648,00	28,00	$ 242.144,00		$ -	28,00	$ 242.144,00	28,00	$ 242.144,00
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O	M2	1,00	$ 10.251,00	$ 10.251,00	28,00	$ 287.028,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	$ 51.410,00	$ 51.410,00	182,00	$ 9.356.620,00		$ -	181,80	$ 9.346.338,00	181,80	$ 9.346.338,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO												
2.1.3	EXCAVACION MECANICA. DESCAPOTE Y MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M3	1,00	$ 61.681,00	$ 61.681,00	81,90	$ 5.051.673,90		$ -	72,72	$ 4.485.442,32	72,72	$ 4.485.442,32
2.2	CONCRETOS												
2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	M2	1,00	$ 25.325,00	$ 25.325,00	182,00	$ 4.609.150,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE	M2	1,00	$ 315.198,00	$ 315.198,00	182,00	$ 57.366.036,00		$ -	181,80	$ 57.302.996,40	181,80	$ 57.302.996,40
2.3.1	IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE CONTENCION CON PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABLE + UNA	M2	1,00	$ 51.069,00	$ 51.069,00	34,40	$ 1.756.773,60		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO												
2.4.8	SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO, TIPO TITAN O SIMILAR, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RECEBO (A-	M	1,00	$ 48.930,00	$ 48.930,00	2,00	$ 97.860,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	1,00	$ 4.708,00	$ 4.708,00	250,00	$ 1.177.000,00		$ -	244,40	$ 1.150.635,20	244,40	$ 1.150.635,20
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1,00	$ 5.081,00	$ 5.081,00	20,00	$ 101.620,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 17.409,00	$ 17.409,00	4.500,00	$ 78.340.500,00		$ -	4480,72	$ 78.004.798,77	4480,72	$ 78.004.798,77
3.4.1	PROCESO DE ANCLAJE PARA VARILLA 1/4" PERFORANDO UNA PROFUNDIDAD DE 15,00 CM (INDIFERENTE DE LA LONGITUD DE LA VARILLA A INCRUSTAR POSTERIORMENTE). INCLUYE PERFORACIÓN CON BROCA DE DIÁMETRO SUPERIOR, LIMPIEZA, INYECCIÓN DEL EPÓXICO E INCRUSTACIÓN DE LA VARILLA. NO INCLUYE LA VARILLA DE ACERO.	UN	1,00	$ 15.221,00	$ 15.221,00	168,00	$ 2.557.128,00		$ -	132,00	$ 2.009.172,00	132,00	$ 2.009.172,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.1.13	TUBERÍA PVCP 2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1,00	$ 64.247,00	$ 64.247,00	2,20	$ 141.343,40		$ -	2,20	$ 141.343,40	2,20	$ 141.343,40
4.1.15	TUBERÍA PVCP 3" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1,00	$ 92.540,00	$ 92.540,00	24,00	$ 2.220.960,00		$ -	7,00	$ 647.780,00	7,00	$ 647.780,00
4.1.16	TUBERÍA PVCP 4" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1,00	$ 178.983,00	$ 178.983,00	15,00	$ 2.684.745,00		$ -	14,20	$ 2.541.558,60	14,20	$ 2.541.558,60
4.1.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1,00	$ 82.190,00	$ 82.190,00	5,00	$ 410.950,00		$ -	5,00	$ 410.950,00	5,00	$ 410.950,00
4.1.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 6"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1,00	$ 201.264,00	$ 201.264,00	3,50	$ 704.424,00		$ -	3,50	$ 704.424,00	3,50	$ 704.424,00
4.6.1	TUBERIA DE COBRE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y CORAZA CAMBIO DE DIRECCION, UNION, BIFURCACION Y REDUCCION	M	1,00	$ 53.243,00	$ 53.243,00	10,00	$ 532.430,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.6.3	VÁLVULA DE BOLA PARA GAS 3/4"	UN	1,00	$ 60.605,00	$ 60.605,00	3,00	$ 181.815,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO GAS COBRE DE 3/4"	UN	1,00	$ 84.938,00	$ 84.938,00	3,00	$ 254.814,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.16	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	1,00	$ 19.634,00	$ 19.634,00	8,00	$ 157.072,00		$ -	8,00	$ 157.072,00	8,00	$ 157.072,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1.7	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESCOBIADO INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO CON CERÁMICA COLOR	M2	1,00	$ 101.404,00	$ 101.404,00	182,00	$ 18.455.528,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.1.8	CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO H.=1/3 ESPESOR DE LA PLACA DE CONTRAPISO / ENTREPISO PF.>4,1<=7,0 CM (VER ADICIONAL EL ÍTEM DE SELLANTE).	M	1,00	$ 11.247,00	$ 11.247,00	30,00	$ 337.410,00		$ -	62,00	$ 697.314,00	62,00	$ 697.314,00
7.2.7	ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM COLOR BLANCO PARA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y RETICULADO, IMPERMEABLE, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, TRÁFICO COMERCIAL MODERADO, TIPO BALDOSA ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS Y PISCINA REF. 135026583 DE ALFA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.	M2	1,00	$ 80.847,00	$ 80.847,00	100,20	$ 8.100.869,40		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.4.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	1,00	$ 25.881,00	$ 25.881,00	100,00	$ 2.588.100,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE	M2	1,00	$ 121.561,00	$ 121.561,00	28,00	$ 3.403.708,00		$ -	28,00	$ 3.403.708,00	28,00	$ 3.403.708,00
9.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,00	$ 684.039,00	$ 684.039,00	12,00	$ 8.208.468,00		$ -	11,50	$ 7.866.448,50	11,50	$ 7.866.448,50
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE	M2	1,00	$ 361.126,00	$ 361.126,00	34,59	$ 12.491.348,34		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18	UN	1,00	$ 162.905,00	$ 162.905,00	1,00	$ 162.905,00		$ -	1,00	$ 162.905,00	1,00	$ 162.905,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
11.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS TIPO QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20	UN	1,00	$ 1.553.817,00	$ 1.553.817,00	1,00	$ 1.553.817,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS,	M2	1,00	$ 102.778,00	$ 102.778,00	133,91	$ 13.762.796,42		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
16.12	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO B600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,00	$ 87.785,00	$ 87.785,00	27,30	$ 2.396.530,50		$ -	63,63	$ 5.585.759,55	63,63	$ 5.585.759,55
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.361,00	$ 4.361,00	486,54	$ 2.121.800,94		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA	M2	1,00	$ 28.716,00	$ 28.716,00	48,00	$ 1.378.368,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS	M2	1,00	$ 40.779,00	$ 40.779,00	1.174,92	$ 47.912.062,68		$ -	1166,59	$ 47.572.373,61	1166,59	$ 47.572.373,61
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,00	$ 120.445,00	$ 120.445,00	80,00	$ 9.635.600,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	1,00	$ 35.715,00	$ 35.715,00	1.079,14	$ 38.541.485,10		$ -	967,89	$ 34.568.191,35	967,89	$ 34.568.191,35
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	1,00	$ 242.793,00	$ 242.793,00	360,00	$ 87.405.480,00		$ -	345,50	$ 83.884.981,50	345,50	$ 83.884.981,50
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1,00	$ 95.665,00	$ 95.665,00	41,02	$ 3.924.178,30		$ -	60,00	$ 5.739.900,00	60,00	$ 5.739.900,00
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	1,00	$ 206.181,00	$ 206.181,00	256,67	$ 52.920.477,27		$ -	256,67	$ 52.920.477,27	256,67	$ 52.920.477,27
1	SUBTOTAL CDC BELLO HORIZONTE				$ 5.421.436,00		$ 504.842.880,51		$ 0,00		$ 416.477.500,19		$ 416.477.500,19
1	UNIDAD OPERATIVA CDC LA VICTORIA												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN	M	1,00	$ 37.022,00	$ 37.022,00	120,00	$ 4.442.640,00		$ -	75,50	$ 2.795.161,00	75,50	$ 2.795.161,00
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.1	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE	M2	1,00	$ 18.598,00	$ 18.598,00	140,00	$ 2.603.720,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 17.945,00	$ 17.945,00	41,96	$ 752.972,20	94,00	$ 1.686.830,00	11,40	$ 204.573,00	105,40	$ 1.891.403,00
1.3.6	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES Y PUERTAS METÁLICAS DE CABINAS DE BAÑO (INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 23.633,00	$ 23.633,00	20,00	$ 472.660,00	6,37	$ 150.542,21	11,20	$ 264.689,60	17,57	$ 415.231,81

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.3.7	DESMONTE MANUAL DE REJAS METÁLICAS Y/O VARILLAS DE ACERO EN VANOS DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1,00	$ 16.823,00	$ 16.823,00	94,00	$ 1.581.362,00	94,00	$ 1.581.362,00	0,00	$ -	94,00	$ 1.581.362,00
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE	M2	1,00	$ 69.229,00	$ 69.229,00	910,00	$ 62.998.390,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.2	PICADA DE PISO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA	M2	1,00	$ 6.158,00	$ 6.158,00	99,00	$ 609.642,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.5.8	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO,	M2	1,00	$ 17.684,00	$ 17.684,00	55,00	$ 972.620,00		$ -	44,16	$ 780.925,44	44,16	$ 780.925,44
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.1	SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA HIDRÁULICA AL INGRESO DEL EDIFICIO Y POSTERIOR AL	U	1,00	$ 118.766,00	$ 118.766,00	2,00	$ 237.532,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.6.2	SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL INGRESO DEL EDIFICIO Y POSTERIOR AL	U	1,00	$ 28.732,00	$ 28.732,00	2,00	$ 57.464,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.6.3	SELLADO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES DE 1/2" A 1,1/2" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA	U	1,00	$ 18.852,00	$ 18.852,00	14,00	$ 263.928,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.6.6	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES DE 1/2" A 1,1/2" EN PARED O	U	1,00	$ 30.104,00	$ 30.104,00	20,00	$ 602.080,00		$ -	10,00	$ 301.040,00	10,00	$ 301.040,00
1.6.21	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO	UN	1,00	$ 26.894,00	$ 26.894,00	14,00	$ 376.516,00	5,00	$ 134.470,00	7,00	$ 188.258,00	12,00	$ 322.728,00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS	UN	1,00	$ 13.606,00	$ 13.606,00	10,00	$ 136.060,00		$ -	3,00	$ 40.818,00	3,00	$ 40.818,00
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 6.577,00	$ 6.577,00	50,00	$ 328.850,00		$ -	45,12	$ 296.754,24	45,12	$ 296.754,24
1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 8.648,00	$ 8.648,00	100,00	$ 864.800,00		$ -	177,97	$ 1.539.084,56	177,97	$ 1.539.084,56
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O	M2	1,00	$ 10.251,00	$ 10.251,00	333,00	$ 3.413.583,00	84,12	$ 862.314,12	198,92	$ 2.039.128,92	283,04	$ 2.901.443,04
1.8.11	DESMONTE / DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON	M2	1,00	$ 22.273,00	$ 22.273,00	20,00	$ 445.460,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 23.840,00	$ 23.840,00	5,00	$ 119.200,00	7,38	$ 175.939,20	3,22	$ 76.764,80	10,60	$ 252.704,00
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	$ 51.410,00	$ 51.410,00	54,00	$ 2.776.140,00	1,68	$ 86.368,80	41,58	$ 2.137.627,80	43,26	$ 2.223.996,60
1.10	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.												
1.10.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALFAÍJÍA EN CONCRETO INCLUYENDO SU ACABADO (INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO), CON MEDIDAS E = 15 CM, H = 15 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 20.800,00	$ 20.800,00	3,00	$ 62.400,00		$ -	1,82	$ 37.856,00	1,82	$ 37.856,00
1.10.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE LAVAMANOS, LAVADERO Y ORINALES CORRIDOS (INDIFERENTE DEL	M	1,00	$ 36.491,00	$ 36.491,00	12,00	$ 437.892,00	1,91	$ 69.697,81	5,80	$ 211.647,80	7,71	$ 281.345,61
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO												
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1,00	$ 61.622,00	$ 61.622,00	3,00	$ 184.866,00	2,86	$ 176.238,92	0,00	$ -	2,86	$ 176.238,92
2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1,00	$ 34.587,00	$ 34.587,00	5,00	$ 172.935,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1,00	$ 93.589,00	$ 93.589,00	3,00	$ 280.767,00	5,13	$ 480.111,57	0,00	$ -	5,13	$ 480.111,57
2,2	CONCRETOS												
2.2.9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>12,1<=15,0 CM F'C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1,00	$ 274.145,00	$ 274.145,00	55,00	$ 15.077.975,00	54,83	$ 15.031.370,35	0,00	$ -	54,83	$ 15.031.370,35
2.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	1,00	$ 112.069,00	$ 112.069,00	7,00	$ 784.483,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO												
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	1,00	$ 329.641,00	$ 329.641,00	3,00	$ 988.923,00	2,40	$ 791.138,40	0,00	$ -	2,40	$ 791.138,40
2.4.10	ESCALERAS SOBRE TERRENO EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA. RAMPA, DESCANSOS, PELDAÑOS Y	M3	1,00	$ 631.039,00	$ 631.039,00	18,00	$ 11.358.702,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.4.14	RAMPA EN CONCRETO E = 0.12 M 3000 PSI	M2	1,00	$ 111.256,00	$ 111.256,00	27,00	$ 3.003.912,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	1,00	$ 4.708,00	$ 4.708,00	100,00	$ 470.800,00	174,90	$ 823.429,20	0,00	$ -	174,90	$ 823.429,20
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1,00	$ 5.081,00	$ 5.081,00	396,00	$ 2.012.076,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNETAS METÁLICAS DE 100 X 100 X 4 MM. ALTURA 2.50 M	UN	1,00	$ 475.278,00	$ 475.278,00	9,00	$ 4.277.502,00	2,00	$ 950.556,00	0,00	$ -	2,00	$ 950.556,00
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 17.409,00	$ 17.409,00	10,00	$ 174.090,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4,1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.11	TUBERÍA PVCP 1,1/2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1,00	$ 29.889,00	$ 29.889,00	18,00	$ 538.002,00	3,50	$ 104.611,50	18,00	$ 538.002,00	21,50	$ 642.613,50
4.1.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1,00	$ 82.190,00	$ 82.190,00	12,00	$ 986.280,00		$ -	9,20	$ 756.148,00	9,20	$ 756.148,00
4.1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1,00	$ 11.729,00	$ 11.729,00	18,00	$ 211.122,00		$ -	13,30	$ 155.995,70	13,30	$ 155.995,70
4.1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	1,00	$ 40.437,00	$ 40.437,00	4,00	$ 161.748,00		$ -	4,00	$ 161.748,00	4,00	$ 161.748,00
4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2".	UN	1,00	$ 42.822,00	$ 42.822,00	6,00	$ 256.932,00		$ -	6,00	$ 256.932,00	6,00	$ 256.932,00
4.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA DUCHA	UN	1,00	$ 72.265,00	$ 72.265,00	3,00	$ 216.795,00		$ -	3,00	$ 216.795,00	3,00	$ 216.795,00
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1,00	$ 67.670,00	$ 67.670,00	10,00	$ 676.700,00		$ -	7,42	$ 502.111,40	7,42	$ 502.111,40

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.1.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1,00	$ 57.402,00	$ 57.402,00	17,00	$ 975.834,00		$ -	7,42	$ 425.922,84	7,42	$ 425.922,84
4.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	1,00	$ 91.582,00	$ 91.582,00	1,00	$ 91.582,00		$ -	1,00	$ 91.582,00	1,00	$ 91.582,00
4.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UN	1,00	$ 32.246,00	$ 32.246,00	4,00	$ 128.984,00		$ -	2,00	$ 64.492,00	2,00	$ 64.492,00
4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN	1,00	$ 39.009,00	$ 39.009,00	1,00	$ 39.009,00		$ -	1,00	$ 39.009,00	1,00	$ 39.009,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL												
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE	UN	1,00	$ 135.360,00	$ 135.360,00	2,00	$ 270.720,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 191.194,00	$ 191.194,00	11,00	$ 2.103.134,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 207.806,00	$ 207.806,00	1,00	$ 207.806,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	1,00	$ 194.855,00	$ 194.855,00	3,00	$ 584.565,00		$ -	8,00	$ 1.558.840,00	8,00	$ 1.558.840,00
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	1,00	$ 47.618,00	$ 47.618,00	2,00	$ 95.236,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1,00	$ 34.559,00	$ 34.559,00	3,00	$ 103.677,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2	SALIDAS												
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 220.149,00	$ 220.149,00	2,00	$ 440.298,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE	UN	1,00	$ 224.570,00	$ 224.570,00	4,00	$ 898.280,00		$ -	33,00	$ 7.410.810,00	33,00	$ 7.410.810,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 302.732,00	$ 302.732,00	6,00	$ 1.816.392,00		$ -	5,00	$ 1.513.660,00	5,00	$ 1.513.660,00
5.3	TABLEROS Y OTROS												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 688.634,00	$ 688.634,00	1,00	$ 688.634,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$ 55.506,00	$ 55.506,00	4,00	$ 222.024,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$ 88.900,00	$ 88.900,00	1,00	$ 88.900,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 8 -T-REG INCLUYE PEINADO Y ORGANIZACIÓN DE	UN	1,00	$ 305.202,00	$ 305.202,00	1,00	$ 305.202,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	1,00	$ 15.400,00	$ 15.400,00	60,00	$ 924.000,00		$ -	54,76	$ 843.304,00	54,76	$ 843.304,00
5.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG	M	1,00	$ 62.971,00	$ 62.971,00	20,00	$ 1.259.420,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 53.935,00	$ 53.935,00	47,06	$ 2.538.181,10		$ -	44,26	$ 2.387.163,10	44,26	$ 2.387.163,10
5.4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE	M	1,00	$ 53.566,00	$ 53.566,00	20,00	$ 1.071.320,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT CONDUIT 2" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	1,00	$ 92.586,00	$ 92.586,00	18,10	$ 1.675.806,60		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 66.771,00	$ 66.771,00	6,00	$ 400.626,00		$ -	5,00	$ 333.855,00	5,00	$ 333.855,00
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	1,00	$ 28.806,00	$ 28.806,00	1,00	$ 28.806,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	1,00	$ 184.243,00	$ 184.243,00	4,00	$ 736.972,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	1,00	$ 38.834,00	$ 38.834,00	15,00	$ 582.510,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 50.609,00	$ 50.609,00	33,00	$ 1.670.097,00		$ -	33,00	$ 1.670.097,00	33,00	$ 1.670.097,00
5.6	INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
5.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP	M	1,00	$ 7.107,00	$ 7.107,00	106,40	$ 756.184,80		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A INCLUYE PONCHADO EN PUESTO DE TRABAJO Y PATCH PANEL INCULYE PATCH CORD DE RACK Y PUESTO DE TRABAJO E INSTALACION DE LOS MISMOS	UN	1,00	$ 183.102,00	$ 183.102,00	4,00	$ 732.408,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.				0								
7.1.1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 H.= 2 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1,00	$ 23.642,00	$ 23.642,00	239,00	$ 5.650.438,00		$ -	56,00	$ 1.323.952,00	56,00	$ 1.323.952,00
7.1.7	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESCOBIADO INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO CON CERÁMICA	M2	1,00	$ 101.404,00	$ 101.404,00	38,00	$ 3.853.352,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.8	CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO	M	1,00	$ 11.584,00	$ 11.584,00	38,00	$ 440.192,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.6	ACABADO DE PISO CON BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL VIBROPRENSADO 33X33 CM, BLANCO HUILA GRANO #5. INCLUYE MORTERO 1:3, BOQUILLA BLANCA, DESTRONQUE (#36), 3 PULIDAS (#60,120,220) Y BRILLO AL PLOMO.	M2	1,00	$ 149.143,00	$ 149.143,00	42,00	$ 6.264.006,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2.7	ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM	M2	1,00	$ 80.847,00	$ 80.847,00	42,00	$ 3.395.574,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1,00	$ 122.171,00	$ 122.171,00	239,00	$ 29.198.869,00		$ -	20,93	$ 2.557.039,03	20,93	$ 2.557.039,03
7.3.6	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	1,00	$ 47.986,00	$ 47.986,00	40,00	$ 1.919.440,00	19,23	$ 922.770,78	20,00	$ 959.720,00	39,23	$ 1.882.490,78
7.3.7	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1,00	$ 33.484,00	$ 33.484,00	30,00	$ 1.004.520,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.4	OTROS												
7.4.10	BORDILLO PREFABRICADO A80	M	1,00	$ 72.272,00	$ 72.272,00	15,00	$ 1.084.080,00	34,16	$ 2.468.811,52	0,00	$ -	34,16	$ 2.468.811,52
7.4.16	WIN DE ALUMINIO	M	1,00	$ 22.953,00	$ 22.953,00	12,00	$ 275.436,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN	M2	1,00	$ 108.572,00	$ 108.572,00	6,00	$ 651.432,00		$ -	20,94	$ 2.273.497,68	20,94	$ 2.273.497,68

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1,00	$ 121.561,00	$ 121.561,00	206,00	$ 25.041.566,00	6,22	$ 756.109,42	66,32	$ 8.061.925,52	72,54	$ 8.818.034,94
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3	M2	1,00	$ 195.824,00	$ 195.824,00	42,00	$ 8.224.608,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE	M2	1,00	$ 508.215,00	$ 508.215,00	2,20	$ 1.118.073,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,00	$ 465.595,00	$ 465.595,00	5,00	$ 2.327.975,00	4,58	$ 2.132.425,10	0,00	$ -	4,58	$ 2.132.425,10
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE	M2	1,00	$ 522.589,00	$ 522.589,00	10,00	$ 5.225.890,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDIZA EN ALUMINIO Y ACRÍLICO (INCLUYE MARCO,	M2	1,00	$ 410.061,00	$ 410.061,00	45,00	$ 18.452.745,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE	M2	1,00	$ 361.126,00	$ 361.126,00	85,00	$ 30.695.710,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18	UN	1,00	$ 162.905,00	$ 162.905,00	1,00	$ 162.905,00	1,00	$ 162.905,00	0,00	$ -	1,00	$ 162.905,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DESCARGA A PISO GRIFERÍA PARA SANITARIOS	UN	1,00	$ 723.530,00	$ 723.530,00	10,00	$ 7.235.300,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	1,00	$ 326.091,00	$ 326.091,00	4,00	$ 1.304.364,00	4,00	$ 1.304.364,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.304.364,00
11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE	UN	1,00	$ 622.035,00	$ 622.035,00	10,00	$ 6.220.350,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE ACOPLE, GRIFERÍA	UN	1,00	$ 789.345,00	$ 789.345,00	2,00	$ 1.578.690,00	1,00	$ 789.345,00	0,00	$ -	1,00	$ 789.345,00
11.19	LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM	M	1,00	$ 255.044,00	$ 255.044,00	8,00	$ 2.040.352,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHAS 8" COMPLETA CON GRIFERÍA	UN	1,00	$ 228.621,00	$ 228.621,00	4,00	$ 914.484,00	3,00	$ 685.863,00	0,00	$ -	3,00	$ 685.863,00
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1,00	$ 388.883,00	$ 388.883,00	10,00	$ 3.888.830,00	5,00	$ 1.944.415,00	0,00	$ -	5,00	$ 1.944.415,00
11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	1,00	$ 28.530,00	$ 28.530,00	6,00	$ 171.180,00	3,00	$ 85.590,00	0,00	$ -	3,00	$ 85.590,00
11.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADOR PARA DUCHAS (INCLUYE PERILLAS)	UN	1,00	$ 109.107,00	$ 109.107,00	2,00	$ 218.214,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 190.558,00	$ 190.558,00	2,00	$ 381.116,00	1,00	$ 190.558,00	0,00	$ -	1,00	$ 190.558,00
11.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA 18"	UN	1,00	$ 190.558,00	$ 190.558,00	2,00	$ 381.116,00	1,00	$ 190.558,00	0,00	$ -	1,00	$ 190.558,00
11.47	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1,00	$ 171.008,00	$ 171.008,00	10,00	$ 1.710.080,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	1,00	$ 724.121,00	$ 724.121,00	4,00	$ 2.896.484,00	7,34	$ 5.315.048,14	0,00	$ -	7,34	$ 5.315.048,14
12.13	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE	M	1,00	$ 358.585,00	$ 358.585,00	40,00	$ 14.343.400,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PLEGABLE PARA DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 1.416.968,00	$ 1.416.968,00	2,00	$ 2.833.936,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.1	CIELOS RASOS.												
14.1.2	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO,	M2	1,00	$ 192.360,00	$ 192.360,00	36,00	$ 6.924.960,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADOS 1.5 DE E=4MM. INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	M2	1,00	$ 55.964,00	$ 55.964,00	6,00	$ 335.784,00	7,34	$ 410.775,76	0,00	$ -	7,34	$ 410.775,76
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.361,00	$ 4.361,00	910,00	$ 3.968.510,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.5	PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 29.519,00	$ 29.519,00	206,00	$ 6.080.914,00		$ -	72,54	$ 2.141.308,26	72,54	$ 2.141.308,26
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1,00	$ 24.900,00	$ 24.900,00	8,00	$ 199.200,00		$ -	7,00	$ 174.300,00	7,00	$ 174.300,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	$ 68.604,00	$ 68.604,00	60,00	$ 4.116.240,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE	M2	1,00	$ 13.131,00	$ 13.131,00	36,00	$ 472.716,00		$ -	70,00	$ 919.170,00	70,00	$ 919.170,00
22.1.9	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 23.318,00	$ 23.318,00	90,00	$ 2.098.620,00	28,23	$ 658.267,14	0,00	$ -	28,23	$ 658.267,14
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA	M2	1,00	$ 28.716,00	$ 28.716,00	30,00	$ 861.480,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	1,00	$ 35.715,00	$ 35.715,00	10,00	$ 357.150,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
23.1	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.												
23.1.4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO	M	1,00	$ 251.022,00	$ 251.022,00	10,00	$ 2.510.220,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	1,00	$ 242.793,00	$ 242.793,00	10,00	$ 2.427.930,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y	M2	1,00	$ 95.665,00	$ 95.665,00	10,00	$ 956.650,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	1,00	$ 24.374,00	$ 24.374,00	85,00	$ 2.071.790,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
25	OTRAS ACTIVIDADES												
25.2	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	1,00	$ 730.514,00	$ 730.514,00	4,00	$ 2.922.056,00	3,80	$ 2.775.953,20	0,00	$ -	3,80	$ 2.775.953,20
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	1,00	$ 397.867,00	$ 397.867,00	10,00	$ 3.978.670,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1	SUBTOTAL CDC LA VICTORIA				$ 19.140.757,00		$ 379.214.726,70		$ 43.898.739,14		$ 48.251.708,69		$ 92.150.447,83
1	UNIDAD OPERATIVA SLIS SAN CRISTOBAL												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN	M	1,00	$ 37.022,00	$ 37.022,00	55,00	$ 2.036.210,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.1	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERFILERÍA METÁLICA Y TABLEROS DE	M2	1,00	$ 18.598,00	$ 18.598,00	10,00	$ 185.980,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1,00	$ 17.945,00	$ 17.945,00	170,52	$ 3.059.981,40	121,00	$ 2.171.345,00	44,23	$ 793.707,35	165,23	$ 2.965.052,35
1.3.7	DESMONTE MANUAL DE REJAS METÁLICAS Y/O VARILLAS DE ACERO EN VANOS DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1,00	$ 16.823,00	$ 16.823,00	17,00	$ 285.991,00	16,66	$ 280.271,18	0,00	$ -	16,66	$ 280.271,18
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	1,00	$ 19.206,00	$ 19.206,00	64,81	$ 1.244.740,86		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE	M2	1,00	$ 69.229,00	$ 69.229,00	545,00	$ 37.729.805,00	316,35	$ 21.900.594,15	195,00	$ 13.499.655,00	511,35	$ 35.400.249,15
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 18.598,00	$ 18.598,00	2,00	$ 37.196,00	1,90	$ 35.336,20	0,00	$ -	1,90	$ 35.336,20
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 13.606,00	$ 13.606,00	60,00	$ 816.360,00	44,00	$ 598.664,00	0,00	$ -	44,00	$ 598.664,00
1.6.27	DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELÉCTRICAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA, CABELADO Y APARATOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 20.397,00	$ 20.397,00	50,00	$ 1.019.850,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 18.395,00	$ 18.395,00	55,00	$ 1.011.725,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 19.787,00	$ 19.787,00	545,00	$ 10.783.915,00	289,50	$ 5.728.336,50	195,00	$ 3.858.465,00	484,50	$ 9.586.801,50
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 6.783,00	$ 6.783,00	39,89	$ 270.573,87		$ -	39,89	$ 270.573,87	39,89	$ 270.573,87
1.9.2	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.). INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD / ALTURA DE LA PIEZA.	M	1,00	$ 22.273,00	$ 22.273,00	169,92	$ 3.784.628,16	289,50	$ 6.448.033,50	169,92	$ 3.784.628,16	459,42	$ 10.232.661,66
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	1,00	$ 28.429,00	$ 28.429,00	160,00	$ 4.548.640,00	160,00	$ 4.548.640,00	0,00	$ -	160,00	$ 4.548.640,00
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 17.409,00	$ 17.409,00	3.350,18	$ 58.323.283,62	3701,17	$ 64.433.668,53	1048,46	$ 18.252.640,14	4749,63	$ 82.686.308,67

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.												
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.												
3.1.3	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL.	M2	1,00	$ 185.848,00	$ 185.848,00	198,83	$ 36.952.157,84		$ -	23,49	$ 4.365.569,52	23,49	$ 4.365.569,52
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.												
3.3.2	VIGA CINTA DE REMATE / CONFINAMIENTO PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL H.>10,0<=12,5 CM	M	1,00	$ 134.596,00	$ 134.596,00	290,06	$ 39.040.656,26		$ -	51,12	$ 6.880.547,52	51,12	$ 6.880.547,52
3.4	ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.												
3.4.1	PROCESO DE ANCLAJE PARA VARILLA 1/4" PERFORANDO UNA PROFUNDIDAD DE 15,00 CM	UN	1,00	$ 15.221,00	$ 15.221,00	180,00	$ 2.739.780,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 191.194,00	$ 191.194,00	23,00	$ 4.397.462,00	2,00	$ 382.388,00	11,00	$ 2.103.134,00	13,00	$ 2.485.522,00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETO0RNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 209.489,00	$ 209.489,00	4,00	$ 837.956,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 207.806,00	$ 207.806,00	1,00	$ 207.806,00	1,00	$ 207.806,00	1,00	$ 207.806,00	2,00	$ 415.612,00
5.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12(FASE+ RETORNO+RETORNO +RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 221.722,00	$ 221.722,00	3,00	$ 665.166,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	1,00	$ 194.855,00	$ 194.855,00	5,00	$ 974.275,00		$ -	3,00	$ 584.565,00	3,00	$ 584.565,00
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X50A 50 KA	UN	1,00	$ 385.871,00	$ 385.871,00	2,00	$ 771.742,00	1,00	$ 385.871,00	0,00	$ -	1,00	$ 385.871,00
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1,00	$ 34.559,00	$ 34.559,00	4,00	$ 138.236,00	3,00	$ 103.677,00	3,00	$ 103.677,00	6,00	$ 207.354,00
5.2	SALIDAS												
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 220.149,00	$ 220.149,00	2,00	$ 440.298,00		$ -	2,00	$ 440.298,00	2,00	$ 440.298,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 224.570,00	$ 224.570,00	105,00	$ 23.579.850,00	59,00	$ 13.249.630,00	51,00	$ 11.453.070,00	110,00	$ 24.702.700,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 302.732,00	$ 302.732,00	16,00	$ 4.843.712,00	10,00	$ 3.027.320,00	6,00	$ 1.816.392,00	16,00	$ 4.843.712,00
5.3	TABLEROS Y OTROS												
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 688.634,00	$ 688.634,00	2,00	$ 1.377.268,00	1,00	$ 688.634,00	1,00	$ 688.634,00	2,00	$ 1.377.268,00
5.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$ 55.506,00	$ 55.506,00	2,00	$ 111.012,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$ 88.900,00	$ 88.900,00	1,00	$ 88.900,00		$ -	1,00	$ 88.900,00	1,00	$ 88.900,00
5.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA TERMINAL DE COMPRESIÓN BIMETÁLICA PARA CABLE CALIBRE Nº 2/0 AWG.	UN	1,00	$ 10.272,00	$ 10.272,00	12,00	$ 123.264,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 0,3X0,3 M, INCLUYE MARCO Y TAPA	UN	1,00	$ 340.984,00	$ 340.984,00	2,00	$ 681.968,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.44 M	UN	1,00	$ 496.298,00	$ 496.298,00	2,00	$ 992.596,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G	UN	1,00	$ 224.679,00	$ 224.679,00	6,00	$ 1.348.074,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	1,00	$ 15.400,00	$ 15.400,00	470,40	$ 7.244.160,00	78,55	$ 1.209.670,00	147,01	$ 2.263.954,00	225,56	$ 3.473.624,00
5.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE Nº 2/0 AWG	M	1,00	$ 60.741,00	$ 60.741,00	210,00	$ 12.755.610,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 53.935,00	$ 53.935,00	400,00	$ 21.574.000,00	34,26	$ 1.847.813,10	47,06	$ 2.538.181,10	81,32	$ 4.385.994,20
5.4.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT CONDUIT 2" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	1,00	$ 92.586,00	$ 92.586,00	18,10	$ 1.675.806,60		$ -	18,10	$ 1.675.806,60	18,10	$ 1.675.806,60
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 66.771,00	$ 66.771,00	6,00	$ 400.626,00		$ -	6,00	$ 400.626,00	6,00	$ 400.626,00
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	1,00	$ 28.806,00	$ 28.806,00	6,00	$ 172.836,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	1,00	$ 184.243,00	$ 184.243,00	98,00	$ 18.055.814,00		$ -	36,00	$ 6.632.748,00	36,00	$ 6.632.748,00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	1,00	$ 184.796,00	$ 184.796,00	10,00	$ 1.847.960,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	1,00	$ 38.834,00	$ 38.834,00	15,00	$ 582.510,00		$ -	15,00	$ 582.510,00	15,00	$ 582.510,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 50.609,00	$ 50.609,00	6,00	$ 303.654,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 121.127,00	$ 121.127,00	57,00	$ 6.904.239,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.6	INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
5.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP	M	1,00	$ 7.107,00	$ 7.107,00	106,40	$ 756.184,80		$ -	131,40	$ 933.859,80	131,40	$ 933.859,80
5.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A INCLUYE PONCHADO EN PUESTO DE TRABAJO Y PATCH PANEL INCULYE PATCH CORD DE RACK Y PUESTO DE TRABAJO E INSTALACION DE LOS MISMOS	UN	1,00	$ 183.102,00	$ 183.102,00	4,00	$ 732.408,00		$ -	4,00	$ 732.408,00	4,00	$ 732.408,00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE	M2	1,00	$ 361.126,00	$ 361.126,00	170,53	$ 61.582.816,78		$ -	43,29	$ 15.633.144,54	43,29	$ 15.633.144,54
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.1	CIELOS RASOS.												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS,	M2	1,00	$ 102.778,00	$ 102.778,00	545,00	$ 56.014.010,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.1.4	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	1,00	$ 90.661,00	$ 90.661,00	27,00	$ 2.447.847,00		$ -	9,60	$ 870.345,60	9,60	$ 870.345,60
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.361,00	$ 4.361,00	464,95	$ 2.027.660,91		$ -	195,00	$ 850.395,00	195,00	$ 850.395,00
21	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
21.1.7	PAÑETE LISO COMÚN 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 26.898,00	$ 26.898,00	3,26	$ 87.687,48		$ -	3,26	$ 87.687,48	3,26	$ 87.687,48
21.1.8	PAÑETE LISO COMÚN 1:4, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1,00	$ 13.840,00	$ 13.840,00	40,97	$ 567.024,80		$ -	40,97	$ 567.024,80	40,97	$ 567.024,80
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 13.131,00	$ 13.131,00	351,05	$ 4.609.637,55		$ -	351,05	$ 4.609.637,55	351,05	$ 4.609.637,55
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA	M2	1,00	$ 28.716,00	$ 28.716,00	198,00	$ 5.685.768,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	1,00	$ 35.715,00	$ 35.715,00	658,28	$ 23.510.470,20	417,83	$ 14.922.798,45	373,36	$ 13.334.552,40	791,19	$ 28.257.350,85
22.6.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	1,00	$ 3.431,00	$ 3.431,00	130,02	$ 446.098,62		$ -	130,02	$ 446.098,62	130,02	$ 446.098,62
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
23.1	ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.												
23.1.4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO	M	1,00	$ 251.022,00	$ 251.022,00	10,00	$ 2.510.220,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M	1,00	$ 120.445,00	$ 120.445,00	64,81	$ 7.806.088,63		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	1,00	$ 242.793,00	$ 242.793,00	545,00	$ 132.322.185,00	329,37	$ 79.968.730,41	195,86	$ 47.553.436,98	525,23	$ 127.522.167,39
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y	M2	1,00	$ 95.665,00	$ 95.665,00	5,00	$ 478.325,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26	M	1,00	$ 51.597,00	$ 51.597,00	409,36	$ 21.121.747,92	136,46	$ 7.040.926,62	52,00	$ 2.683.044,00	188,46	$ 9.723.970,62
1	SUBTOTAL SLIS SAN CRISTOBAL				$ 7.308.621,00		$ 639.674.455,30		$ 229.180.153,64		$ 171.587.723,03		$ 400.767.876,67
1	UNIDAD OPERATIVA CENTRO DIA TIERRA DE SABERES												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN	M	1,00	$ 37.022,00	$ 37.022,00	26,94	$ 997.372,68		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE	M	1,00	$ 12.378,00	$ 12.378,00	40,23	$ 497.966,94		$ -	21,20	$ 262.413,60	21,20	$ 262.413,60
1.4.3	DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE	M	1,00	$ 12.378,00	$ 12.378,00	27,50	$ 340.395,00		$ -	12,00	$ 148.536,00	12,00	$ 148.536,00
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE	M2	1,00	$ 69.229,00	$ 69.229,00	175,60	$ 12.156.702,40		$ -	166,91	$ 11.555.012,39	166,91	$ 11.555.012,39
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS	UN	1,00	$ 13.606,00	$ 13.606,00	38,00	$ 517.028,00		$ -	34,00	$ 462.604,00	34,00	$ 462.604,00
1.6.27	DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELÉCTRICAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O	UN	1,00	$ 20.397,00	$ 20.397,00	38,00	$ 775.086,00		$ -	34,00	$ 693.498,00	34,00	$ 693.498,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 9.344,00	$ 9.344,00	124,66	$ 1.164.823,04		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 19.787,00	$ 19.787,00	129,59	$ 2.564.114,22		$ -	82,38	$ 1.630.148,04	82,38	$ 1.630.148,04
1.7.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN ESTERILLA MALLA Y PAÑETE / ACABADO TEXTURIZADO.	M2	1,00	$ 21.489,00	$ 21.489,00	173,15	$ 3.720.730,10		$ -	125,94	$ 2.706.427,81	125,94	$ 2.706.427,81
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1,00	$ 10.520,00	$ 10.520,00	7,62	$ 80.162,40		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.9.1	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA	M2	1,00	$ 20.735,00	$ 20.735,00	114,24	$ 2.368.766,40		$ -	114,24	$ 2.368.766,40	114,24	$ 2.368.766,40
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO												
2.2	CONCRETOS												
2.2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO	M	1,00	$ 110.344,00	$ 110.344,00	21,40	$ 2.361.361,60		$ -	21,40	$ 2.361.361,60	21,40	$ 2.361.361,60
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1,00	$ 5.081,00	$ 5.081,00	110,29	$ 560.393,65		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 17.409,00	$ 17.409,00	1.259,70	$ 21.930.117,30		$ -	1154,47	$ 20.098.168,23	1154,47	$ 20.098.168,23
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL												
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 191.194,00	$ 191.194,00	12,00	$ 2.294.328,00		$ -	8,00	$ 1.529.552,00	8,00	$ 1.529.552,00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 207.806,00	$ 207.806,00	2,00	$ 415.612,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN	1,00	$ 194.855,00	$ 194.855,00	2,00	$ 389.710,00		$ -	2,00	$ 389.710,00	2,00	$ 389.710,00
5.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X40A 50 KA	UN	1,00	$ 336.501,00	$ 336.501,00	1,00	$ 336.501,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1,00	$ 34.559,00	$ 34.559,00	9,00	$ 311.031,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Ó SENCILLO CONMUTABLE INLCUYE	UN	1,00	$ 19.387,00	$ 19.387,00	2,00	$ 38.774,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2	SALIDAS												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 223.874,00	$ 223.874,00	22,00	$ 4.925.228,00		$ -	21,00	$ 4.701.354,00	21,00	$ 4.701.354,00
5.2.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 148.979,00	$ 148.979,00	2,00	$ 297.958,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 220.149,00	$ 220.149,00	2,00	$ 440.298,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 215.196,00	$ 215.196,00	2,00	$ 430.392,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 224.570,00	$ 224.570,00	43,00	$ 9.656.510,00		$ -	36,00	$ 8.084.520,00	36,00	$ 8.084.520,00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 302.732,00	$ 302.732,00	8,00	$ 2.421.856,00		$ -	8,00	$ 2.421.856,00	8,00	$ 2.421.856,00
5.3	TABLEROS Y OTROS												
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 688.634,00	$ 688.634,00	1,00	$ 688.634,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$ 55.506,00	$ 55.506,00	3,00	$ 166.518,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1,00	$ 57.590,00	$ 57.590,00	23,00	$ 1.324.570,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA TERMINAL DE COMPRESIÓN BIMETÁLICA PARA CABLE CALIBRE Nº 2/0 AWG.	UN	1,00	$ 10.272,00	$ 10.272,00	6,00	$ 61.632,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 0,3X0,3 M, INCLUYE MARCO Y TAPA	UN	1,00	$ 340.984,00	$ 340.984,00	1,00	$ 340.984,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.44 M	UN	1,00	$ 496.298,00	$ 496.298,00	1,00	$ 496.298,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G	UN	1,00	$ 224.679,00	$ 224.679,00	1,00	$ 224.679,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	1,00	$ 15.400,00	$ 15.400,00	210,30	$ 3.238.620,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE Nº 2/0 AWG	M	1,00	$ 60.741,00	$ 60.741,00	6,00	$ 364.446,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/2" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	M	1,00	$ 32.729,00	$ 32.729,00	10,00	$ 327.290,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 53.935,00	$ 53.935,00	183,40	$ 9.891.679,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 66.771,00	$ 66.771,00	8,00	$ 534.168,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	1,00	$ 184.243,00	$ 184.243,00	20,00	$ 3.684.860,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	1,00	$ 38.834,00	$ 38.834,00	8,00	$ 310.672,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 50.609,00	$ 50.609,00	23,00	$ 1.164.007,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 121.127,00	$ 121.127,00	6,00	$ 726.762,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN												
6,1	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1,00	$ 252.495,00	$ 252.495,00	4,00	$ 1.009.980,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1,00	$ 8.254,00	$ 8.254,00	130,50	$ 1.077.147,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1,00	$ 121.561,00	$ 121.561,00	4,28	$ 520.281,08		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
11.47	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1,00	$ 171.008,00	$ 171.008,00	5,00	$ 855.040,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.1	CIELOS RASOS.												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS,	M2	1,00	$ 102.778,00	$ 102.778,00	9,77	$ 1.004.141,06		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.1.4	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	1,00	$ 90.661,00	$ 90.661,00	173,15	$ 15.697.571,37		$ -	107,70	$ 9.764.189,70	107,70	$ 9.764.189,70
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
15.1	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
15.1.1	CERROJO DE SEGURIDAD, DOBLE CILINDRO DE LLAVE MULTIPUNTO, PESTILLO FIJO, RESISTENTE A VANDALISMO Y GOLPES. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	1,00	$ 44.145,00	$ 44.145,00	1,00	$ 44.145,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.361,00	$ 4.361,00	173,15	$ 755.088,83		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.												
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.												
21.1.5	PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 29.519,00	$ 29.519,00	7,62	$ 224.934,78		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.1.9	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN	M2	1,00	$ 73.684,00	$ 73.684,00	52,95	$ 3.901.567,80		$ -	52,95	$ 3.901.567,80	52,95	$ 3.901.567,80
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	$ 68.604,00	$ 68.604,00	124,66	$ 8.552.174,64		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE	M2	1,00	$ 13.131,00	$ 13.131,00	443,88	$ 5.828.588,28		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 46.483,00	$ 46.483,00	69,37	$ 3.224.525,71		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	$ 12.354,00	$ 12.354,00	91,78	$ 1.133.850,12		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA	M2	1,00	$ 28.716,00	$ 28.716,00	52,95	$ 1.520.512,20		$ -	52,95	$ 1.520.512,20	52,95	$ 1.520.512,20
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	1,00	$ 35.715,00	$ 35.715,00	166,20	$ 5.935.833,00		$ -	166,20	$ 5.935.833,00	166,20	$ 5.935.833,00
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50	M	1,00	$ 27.338,00	$ 27.338,00	20,43	$ 558.515,34		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.4.1	PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.	M2	1,00	$ 17.846,00	$ 17.846,00	0,49	$ 8.744,54		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.6.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	1,00	$ 3.431,00	$ 3.431,00	25,37	$ 87.044,47		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	1,00	$ 242.793,00	$ 242.793,00	114,24	$ 27.736.672,32		$ -	114,24	$ 27.736.672,32	114,24	$ 27.736.672,32
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y	M2	1,00	$ 95.665,00	$ 95.665,00	10,59	$ 1.013.379,35		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.5	CUBIERTAS FIBROCEMENTO												
23.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 6, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	$ 31.800,00	$ 31.800,00	61,36	$ 1.951.289,34		$ -	52,67	$ 1.674.906,00	52,67	$ 1.674.906,00
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26	M	1,00	$ 51.597,00	$ 51.597,00	38,40	$ 1.981.324,80		$ -	33,10	$ 1.707.860,70	33,10	$ 1.707.860,70
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 78.835,00	$ 78.835,00	11,70	$ 922.369,50		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1	SUBTOTAL CENTRO DIA TIERRA DE SABERES UNIDAD OPERATIVA AMAR MARTIRES 2				$ 6.771.812,00		$ 181.083.757,26		$ 0,00		$ 111.655.469,79		$ 111.655.469,79
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN	M	1,00	$ 37.022,00	$ 37.022,00	42,50	$ 1.573.435,00		$ -	2,50	$ 92.555,00	2,50	$ 92.555,00
1.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 17.945,00	$ 17.945,00	6,30	$ 113.053,50		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL	U	1,00	$ 23.633,00	$ 23.633,00	4,00	$ 94.532,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.1	PROTECCIÓN DEL CIELO RASO EXISTENTE DEJADO EXPUESTO POSTERIOR AL DESMONTE DE LA	M2	1,00	$ 6.219,00	$ 6.219,00	206,90	$ 1.286.737,22		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE	M	1,00	$ 12.378,00	$ 12.378,00	52,53	$ 650.216,34		$ -	38,40	$ 475.315,20	38,40	$ 475.315,20
1.4.3	DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE	M	1,00	$ 12.378,00	$ 12.378,00	45,00	$ 557.010,00		$ -	6,40	$ 79.219,20	6,40	$ 79.219,20
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE	M2	1,00	$ 34.461,00	$ 34.461,00	123,90	$ 4.269.717,90		$ -	143,31	$ 4.938.605,91	143,31	$ 4.938.605,91
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC	M2	1,00	$ 18.598,00	$ 18.598,00	79,60	$ 1.480.387,78	11,94	$ 222.060,12	61,47	$ 1.143.219,06	73,41	$ 1.365.279,18
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 10.468,00	$ 10.468,00	8,27	$ 86.570,36		$ -	8,27	$ 86.570,36	8,27	$ 86.570,36
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO,	M2	1,00	$ 26.723,00	$ 26.723,00	61,15	$ 1.634.191,62	2,00	$ 53.446,00	40,47	$ 1.081.479,81	42,47	$ 1.134.925,81
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS	UN	1,00	$ 13.606,00	$ 13.606,00	43,00	$ 585.058,00	3,00	$ 40.818,00	36,00	$ 489.816,00	39,00	$ 530.634,00
1.7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 19.787,00	$ 19.787,00	118,73	$ 2.349.395,59		$ -	111,99	$ 2.215.946,13	111,99	$ 2.215.946,13
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN,	M2	1,00	$ 6.783,00	$ 6.783,00	677,03	$ 4.592.310,09		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O	M2	1,00	$ 10.251,00	$ 10.251,00	48,70	$ 499.203,20		$ -	72,80	$ 746.221,55	72,80	$ 746.221,55
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.9.1	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA	M2	1,00	$ 20.735,00	$ 20.735,00	203,50	$ 4.219.557,99		$ -	61,47	$ 1.274.580,45	61,47	$ 1.274.580,45
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO	M2	1,00	$ 51.410,00	$ 51.410,00	149,80	$ 7.701.218,00		$ -	21,00	$ 1.079.610,00	21,00	$ 1.079.610,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO												
2,1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y	M3	1,00	$ 93.589,00	$ 93.589,00	6,52	$ 610.050,54		$ -	3,15	$ 294.805,35	3,15	$ 294.805,35
2.2	CONCRETOS												
2.2.1	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2000 PSI.	M2	1,00	$ 22.398,00	$ 22.398,00	21,73	$ 486.663,74		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE	M2	1,00	$ 315.198,00	$ 315.198,00	21,73	$ 6.848.622,14		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.2.9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>12,1<=15,0 CM F'C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4	M2	1,00	$ 274.145,00	$ 274.145,00	21,00	$ 5.757.045,00		$ -	21,00	$ 5.757.045,00	21,00	$ 5.757.045,00
2,5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	1,00	$ 4.708,00	$ 4.708,00	108,49	$ 510.753,97		$ -	56,00	$ 263.648,00	56,00	$ 263.648,00
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 17.409,00	$ 17.409,00	1.357,50	$ 23.632.759,28		$ -	289,44	$ 5.038.860,96	289,44	$ 5.038.860,96
3,2	OTROS MAMPUESTOS												
3.2.5	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	1,00	$ 24.695,00	$ 24.695,00	9,80	$ 242.011,00		$ -	9,80	$ 242.011,00	9,80	$ 242.011,00
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4,1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION,	M	1,00	$ 57.402,00	$ 57.402,00	13,60	$ 780.667,20		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.1.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCL 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION,	M	1,00	$ 45.647,00	$ 45.647,00	14,50	$ 661.881,50		$ -	14,53	$ 663.250,91	14,53	$ 663.250,91
4.1.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 3"	UN	1,00	$ 50.967,00	$ 50.967,00	3,00	$ 152.901,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES												
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Ó SENCILLO CONMUTABLE INLCUYE	UN	1,00	$ 19.387,00	$ 19.387,00	27,00	$ 523.449,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	1,00	$ 15.400,00	$ 15.400,00	247,77	$ 3.815.658,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE	M	1,00	$ 58.119,00	$ 58.119,00	82,59	$ 4.800.048,21		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5	ILUMINACIÓN.												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V	UN	1,00	$ 66.771,00	$ 66.771,00	19,00	$ 1.268.649,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	1,00	$ 184.243,00	$ 184.243,00	33,00	$ 6.080.019,00	3,00	$ 552.729,00	19,00	$ 3.500.617,00	22,00	$ 4.053.346,00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS	UN	1,00	$ 50.609,00	$ 50.609,00	7,00	$ 354.263,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.												
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1,00	$ 24.980,00	$ 24.980,00	61,15	$ 1.527.601,94		$ -	61,47	$ 1.535.520,60	61,47	$ 1.535.520,60
7.2	ACABADO DE PISOS.												
7.2.3	ACABADO DE PISO CON TABLÓN DE GRES GRAFILADO ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM E.=12 MM TRÁFICO 5 COLOR, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3.	M2	1,00	$ 57.425,00	$ 57.425,00	2,00	$ 114.850,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1,00	$ 122.171,00	$ 122.171,00	113,09	$ 13.816.379,48		$ -	59,67	$ 7.289.943,57	59,67	$ 7.289.943,57
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.												
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	1,00	$ 25.563,00	$ 25.563,00	25,00	$ 639.075,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.11	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1,00	$ 17.874,00	$ 17.874,00	32,00	$ 571.968,00		$ -	31,92	$ 570.538,08	31,92	$ 570.538,08
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1,00	$ 62.039,00	$ 62.039,00	2,54	$ 157.579,06		$ -	2,54	$ 157.579,06	2,54	$ 157.579,06
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN	M2	1,00	$ 108.572,00	$ 108.572,00	51,09	$ 5.546.943,48		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1,00	$ 121.561,00	$ 121.561,00	101,00	$ 12.277.661,00		$ -	109,22	$ 13.276.539,89	109,22	$ 13.276.539,89
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18	M2	1,00	$ 522.589,00	$ 522.589,00	4,62	$ 2.414.361,18		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SIN	M2	1,00	$ 361.126,00	$ 361.126,00	6,30	$ 2.275.093,80		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE	M2	1,00	$ 208.233,00	$ 208.233,00	6,30	$ 1.311.867,90		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18	M2	1,00	$ 257.601,00	$ 257.601,00	1,68	$ 432.769,68		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA LAVAPLATOS EN ACERO CAL. 18 R304 60 X 40 X 30 CM CON	UN	1,00	$ 144.559,00	$ 144.559,00	1,00	$ 144.559,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).												
14.1	CIELOS RASOS.												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1,00	$ 102.778,00	$ 102.778,00	122,09	$ 12.548.166,02		$ -	111,99	$ 11.510.108,22	111,99	$ 11.510.108,22
14.1.4	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO	M2	1,00	$ 90.661,00	$ 90.661,00	118,73	$ 10.764.570,37		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M	1,00	$ 81.644,00	$ 81.644,00	19,17	$ 1.565.115,48		$ -	19,17	$ 1.565.115,48	19,17	$ 1.565.115,48
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.361,00	$ 4.361,00	225,16	$ 981.937,15	282,40	$ 1.231.546,40	0,00	$ -	282,40	$ 1.231.546,40
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.												
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.												
22.1.9	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 23.318,00	$ 23.318,00	235,00	$ 5.479.730,00		$ -	234,74	$ 5.473.727,95	234,74	$ 5.473.727,95
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 46.483,00	$ 46.483,00	677,03	$ 31.470.492,40	309,95	$ 14.407.405,85	0,00	$ -	309,95	$ 14.407.405,85
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	$ 12.354,00	$ 12.354,00	82,00	$ 1.013.028,00	79,75	$ 985.231,50	0,00	$ -	79,75	$ 985.231,50

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 28.716,00	$ 28.716,00	38,34	$ 1.100.971,44		$ -	38,34	$ 1.100.971,44	38,34	$ 1.100.971,44
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	1,00	$ 35.715,00	$ 35.715,00	463,56	$ 16.556.045,40	31,90	$ 1.139.308,50	189,55	$ 6.769.778,25	221,45	$ 7.909.086,75
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1,00	$ 27.338,00	$ 27.338,00	39,00	$ 1.066.182,00	7,96	$ 217.610,48	54,60	$ 1.492.654,80	62,56	$ 1.710.265,28
22.6	OTROS EN OBRAS INTERIORES.												
22.6.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	1,00	$ 51.428,00	$ 51.428,00	7,57	$ 389.207,10	20,38	$ 1.048.102,64	0,00	$ -	20,38	$ 1.048.102,64
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E												
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.4.1	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE	M2	1,00	$ 208.964,00	$ 208.964,00	79,60	$ 16.633.388,13	11,94	$ 2.495.030,16	64,55	$ 13.488.626,20	76,49	$ 15.983.656,36
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	1,00	$ 242.793,00	$ 242.793,00	123,90	$ 30.082.052,70		$ -	143,88	$ 34.933.056,84	143,88	$ 34.933.056,84
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y	M2	1,00	$ 95.665,00	$ 95.665,00	40,17	$ 3.843.006,55		$ -	15,33	$ 1.466.544,45	15,33	$ 1.466.544,45
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26	M	1,00	$ 51.597,00	$ 51.597,00	54,10	$ 2.791.397,70		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 78.835,00	$ 78.835,00	52,53	$ 4.141.202,55		$ -	38,40	$ 3.027.264,00	38,40	$ 3.027.264,00
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M.	M	1,00	$ 43.271,00	$ 43.271,00	45,00	$ 1.947.195,00		$ -	12,80	$ 553.868,80	12,80	$ 553.868,80
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1,00	$ 40.246,00	$ 40.246,00	10,00	$ 402.460,00		$ -	10,00	$ 402.460,00	10,00	$ 402.460,00
1	SUBTOTAL AMAR MARTIRES 2				$ 4.923.544,00		$ 272.224.893,68		$ 22.393.288,65		$ 134.077.674,52		$ 156.470.963,17
1	UNIDAD OPERATIVA HOGAR DE PASO BAKATÁ - BASURAS (EMERGENCIA)												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1,1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN	M	1,00	$ 37.022,00	$ 37.022,00	10,50	$ 388.731,00		$ -	7,26	$ 268.779,72	7,26	$ 268.779,72
1,3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1,00	$ 26.894,00	$ 26.894,00	1,00	$ 26.894,00		$ -	1,00	$ 26.894,00	1,00	$ 26.894,00
1.3.8	DESMONTE MANUAL DE BARANDAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO),	M	1,00	$ 11.267,00	$ 11.267,00	14,04	$ 158.188,68		$ -	14,04	$ 158.188,68	14,04	$ 158.188,68
1.3.16	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PORTÓN (DOS HOJAS SENCILLA) (INDIFERENTE DEL	U	1,00	$ 23.633,00	$ 23.633,00	2,00	$ 47.266,00	2,00	$ 47.266,00	0,00	$ -	2,00	$ 47.266,00
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE	M	1,00	$ 10.468,00	$ 10.468,00	22,19	$ 232.284,92		$ -	48,43	$ 506.965,24	48,43	$ 506.965,24
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO,	M2	1,00	$ 26.723,00	$ 26.723,00	36,44	$ 973.786,12		$ -	36,44	$ 973.786,12	36,44	$ 973.786,12
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.7	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES DE 2" A 4" EN PARED O PISO,	U	1,00	$ 61.177,00	$ 61.177,00	1,00	$ 61.177,00		$ -	1,00	$ 61.177,00	1,00	$ 61.177,00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS	UN	1,00	$ 13.606,00	$ 13.606,00	3,00	$ 40.818,00		$ -	4,00	$ 54.424,00	4,00	$ 54.424,00
1.6.27	DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELÉCTRICAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA, CABELADO Y APARATOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 20.397,00	$ 20.397,00	4,00	$ 81.588,00		$ -	4,00	$ 81.588,00	4,00	$ 81.588,00
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O	M2	1,00	$ 10.251,00	$ 10.251,00	47,93	$ 491.330,43		$ -	47,93	$ 491.330,43	47,93	$ 491.330,43

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1,00	$ 10.520,00	$ 10.520,00	44,43	$ 467.450,94		$ -	44,43	$ 467.450,94	44,43	$ 467.450,94
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 23.840,00	$ 23.840,00	1,82	$ 43.388,80		$ -	1,82	$ 43.388,80	1,82	$ 43.388,80
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO	M2	1,00	$ 51.410,00	$ 51.410,00	30,36	$ 1.560.807,60		$ -	35,50	$ 1.825.055,00	35,50	$ 1.825.055,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO	0											
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	0											
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1,00	$ 61.622,00	$ 61.622,00	1,97	$ 121.395,34		$ -	2,53	$ 155.903,66	2,53	$ 155.903,66
2.1.6	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M3	1	$ 72.846,00	$ 72.846,00	0,73	$ 53.177,58		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO,	M3	1	$ 34.587,00	$ 34.587,00	0,73	$ 25.248,51		$ -	1,57	$ 54.301,59	1,57	$ 54.301,59
2.2	CONCRETOS	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1,00	$ 315.198,00	$ 315.198,00	25,94	$ 8.176.236,12	8,78	$ 2.767.438,44	25,94	$ 8.176.236,12	34,72	$ 10.943.674,56
2.2.9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>12,1<=15,0 CM F'C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4	M2	1	$ 274.145,00	$ 274.145,00	30,36	$ 8.323.042,20		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1,00	$ 5.081,00	$ 5.081,00	82,21	$ 417.709,01		$ -	82,21	$ 417.709,01	82,21	$ 417.709,01
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.1	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.1.1	MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1,00	$ 45.696,00	$ 45.696,00	2,00	$ 91.392,00	1,09	$ 49.808,64	0,00	$ -	1,09	$ 49.808,64
3.1.3	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL.	M2	1	$ 185.848,00	$ 185.848,00	19,62	$ 3.646.337,76		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.3.1	VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO (VIGA CANCHADA) PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MUROS BAJOS H.>6<=8 CM A.>10<=13 CM EN CONCRETO F'C=3000 PSI, REALIZADA ENTRE LAS CARAS VISTAS DE LA ÚLTIMA HILADA DE LA MAMPOSTERÍA (DENTRO DE LA PIEZA DEL MAMPUESTO CORTADA EN "U"), SEGÚN DISEÑO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M	1,00	$ 92.074,00	$ 92.074,00	9,60	$ 883.910,40		$ -	9,60	$ 883.910,40	9,60	$ 883.910,40

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.3.3	COLUMNETAS Y/O VIGUETAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI, PARA REFORZAMIENTO Y/O CONFINAMIENTO DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, FORMALETA CORRIENTE CON ACABADO NO VISTO. INCLUYE DESMOLDANTE, CURADOR DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	1,00	$ 476.381,00	$ 476.381,00	0,34	$ 161.969,54		$ -	0,34	$ 161.969,54	0,34	$ 161.969,54
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.1.11	TUBERÍA PVCP 1,1/2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÈS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1,00	$ 29.889,00	$ 29.889,00	16,00	$ 478.224,00		$ -	16,00	$ 478.224,00	16,00	$ 478.224,00
4.1.16	TUBERÍA PVCP 4" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M.	M	1	$ 178.983,00	$ 178.983,00	6,10	$ 1.091.796,30		$ -	16,26	$ 2.910.263,58	16,26	$ 2.910.263,58
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1,00	$ 67.670,00	$ 67.670,00	2,00	$ 135.340,00	1,46	$ 98.798,20	0,00	$ -	1,46	$ 98.798,20
4.1.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"	UN	1	$ 54.691,00	$ 54.691,00	3,00	$ 164.073,00	5,00	$ 273.455,00	0,00	$ -	5,00	$ 273.455,00
4.1.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 3"	UN	1,00	$ 50.967,00	$ 50.967,00	1,00	$ 50.967,00	1,00	$ 50.967,00	0,00	$ -	1,00	$ 50.967,00
4.1.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	1,00	$ 99.719,00	$ 99.719,00	4,00	$ 398.876,00	4,00	$ 398.876,00	0,00	$ -	4,00	$ 398.876,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 120.937,00	$ 120.937,00	3,00	$ 362.811,00	3,00	$ 362.811,00	0,00	$ -	3,00	$ 362.811,00
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 135.360,00	$ 135.360,00	1,00	$ 135.360,00	1,00	$ 135.360,00	0,00	$ -	1,00	$ 135.360,00
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1,00	$ 34.559,00	$ 34.559,00	2,00	$ 69.118,00	2,00	$ 69.118,00	0,00	$ -	2,00	$ 69.118,00
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Ó SENCILLO CONMUTABLE INLCUYE	UN	1	$ 19.387,00	$ 19.387,00	2,00	$ 38.774,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 224.570,00	$ 224.570,00	7,00	$ 1.571.990,00	7,00	$ 1.571.990,00	0,00	$ -	7,00	$ 1.571.990,00
5.5	ILUMINACIÓN.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	1	$ 184.243,00	$ 184.243,00	3,00	$ 552.729,00	7,00	$ 1.289.701,00	0,00	$ -	7,00	$ 1.289.701,00
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.2	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1	$ 24.980,00	$ 24.980,00	36,44	$ 910.271,20	35,27	$ 881.044,60	0,00	$ -	35,27	$ 881.044,60

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.2	ACABADO DE PISOS.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2.6	ACABADO DE PISO CON BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL VIBROPRENSADO 33X33 CM, BLANCO HUILA	M2	1	$ 149.143,00	$ 149.143,00	36,44	$ 5.434.770,92		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	1	$ 25.563,00	$ 25.563,00	47,93	$ 1.225.234,59		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.6	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	1	$ 47.986,00	$ 47.986,00	64,21	$ 3.081.181,06	46,83	$ 2.247.184,38	0,00	$ -	46,83	$ 2.247.184,38
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1,00	$ 62.039,00	$ 62.039,00	2,00	$ 124.078,00	1,10	$ 68.242,90	0,00	$ -	1,10	$ 68.242,90
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1,00	$ 108.572,00	$ 108.572,00	117,94	$ 12.804.981,68	104,94	$ 11.393.545,68	117,94	$ 12.804.981,68	222,88	$ 24.198.527,36
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE	M2	1	$ 121.561,00	$ 121.561,00	80,72	$ 9.812.403,92		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,00	$ 215.827,00	$ 215.827,00	4,00	$ 863.308,00	3,16	$ 682.013,32	0,00	$ -	3,16	$ 682.013,32
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE	M2	1	$ 438.512,00	$ 438.512,00	2,64	$ 1.157.671,68		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE	M2	1	$ 522.589,00	$ 522.589,00	2,82	$ 1.473.700,98	5,81	$ 3.036.242,09	0,00	$ -	5,81	$ 3.036.242,09
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1	$ 143.936,00	$ 143.936,00	2,64	$ 379.991,04		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	1,00	$ 23.550,00	$ 23.550,00	1,00	$ 23.550,00	1,00	$ 23.550,00	0,00	$ -	1,00	$ 23.550,00
11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	1,00	$ 28.530,00	$ 28.530,00	6,00	$ 171.180,00	6,00	$ 171.180,00	0,00	$ -	6,00	$ 171.180,00
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.1	CIELOS RASOS.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS,	M2	1	$ 102.778,00	$ 102.778,00	44,51	$ 4.574.648,78		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.1.4	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	1,00	$ 90.661,00	$ 90.661,00	43,00	$ 3.898.423,00	42,23	$ 3.828.614,03	0,00	$ -	42,23	$ 3.828.614,03
15		0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.1.2	CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO SENCILLA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	1,00	$ 256.502,00	$ 256.502,00	1,00	$ 256.502,00	1,00	$ 256.502,00	0,00	$ -	1,00	$ 256.502,00
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	$ 4.361,00	$ 4.361,00	44,51	$ 194.108,11	34,72	$ 151.413,92	0,00	$ -	34,72	$ 151.413,92
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.1	SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
21.1.5	PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1	$ 29.519,00	$ 29.519,00	19,62	$ 579.162,78	104,94	$ 3.097.723,86	117,94	$ 3.481.470,86	222,88	$ 6.579.194,72
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1,00	$ 24.900,00	$ 24.900,00	3,00	$ 74.700,00	2,36	$ 58.764,00	0,00	$ -	2,36	$ 58.764,00
21.1.10	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1,00	$ 35.956,00	$ 35.956,00	5,00	$ 179.780,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE	M2	1	$ 13.131,00	$ 13.131,00	34,22	$ 449.342,82		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 46.483,00	$ 46.483,00	5,00	$ 232.415,00	4,61	$ 214.286,63	0,00	$ -	4,61	$ 214.286,63
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 28.716,00	$ 28.716,00	15,00	$ 430.740,00	14,09	$ 404.608,44	0,00	$ -	14,09	$ 404.608,44
22.1.15	PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA PARA ACABADO APLICADO SOBRE PAÑETE TOTALMENTE SECO Y/O SUPERFICIES SECAS (POR EJEMPLO SISTEMA DRYWALL DE YESO Y/O FIBROCEMENTO), VERSIÓN BRILLANTE, FORMULADA EN DOS COMPONENTES, IMPERMEABLE AL PASO DE AGUA Y VAPORES, TIPO SIKAGUARD-68 O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICADA EN TRES (3) CAPAS GARANTIZANDO UN ESPESOR FINAL DE 12 MILS (305 MICRONES). INCLUYE DILUCIÓN CON PRODUCTO TIPO COLMASOLVENTE EPÓXICO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES.	M2	1,00	$ 17.239,00	$ 17.239,00	43,00	$ 741.277,00	42,23	$ 728.002,97	0,00	$ -	42,23	$ 728.002,97
22.3.4	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	1,00	$ 38.619,00	$ 38.619,00	5,00	$ 193.095,00	4,66	$ 179.964,54	0,00	$ -	4,66	$ 179.964,54
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1,00	$ 27.338,00	$ 27.338,00	16,00	$ 437.408,00	15,06	$ 411.710,28	0,00	$ -	15,06	$ 411.710,28
1	SUBTOTAL HOGAR DE PASO BAKATÁ - BASURAS (EMERGENCIA)				$ 5.720.652,00		$ 81.228.113,81		$ 34.950.182,92		$ 34.483.998,37		$ 69.434.181,29
1	UNIDAD OPERATIVA SUB DIRECCION SLIS TEUSAQUILLO												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1,3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 17.945,00	$ 17.945,00	16,74	$ 300.463,90		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE	M	1,00	$ 12.378,00	$ 12.378,00	3,50	$ 43.323,00	9,00	$ 111.402,00	0,00	$ -	9,00	$ 111.402,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.4.3	DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1,00	$ 12.378,00	$ 12.378,00	4,00	$ 49.512,00	3,10	$ 38.371,80	0,00	$ -	3,10	$ 38.371,80
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE	M2	1,00	$ 69.229,00	$ 69.229,00	40,70	$ 2.817.481,84		$ -	49,80	$ 3.447.604,20	49,80	$ 3.447.604,20
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 18.598,00	$ 18.598,00	22,00	$ 409.156,00	21,78	$ 405.064,44	0,00	$ -	21,78	$ 405.064,44
1,6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS	UN	1,00	$ 13.606,00	$ 13.606,00	8,00	$ 108.848,00		$ -	8,00	$ 108.848,00	8,00	$ 108.848,00
1.6.27	DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELÉCTRICAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O	UN	1,00	$ 20.397,00	$ 20.397,00	8,00	$ 163.176,00		$ -	8,00	$ 163.176,00	8,00	$ 163.176,00
1,7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 19.787,00	$ 19.787,00	13,80	$ 273.060,60		$ -	13,80	$ 273.060,60	13,80	$ 273.060,60
1.7.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN ESTERILLA MALLA Y PAÑETE / ACABADO TEXTURIZADO.	M2	1,00	$ 21.489,00	$ 21.489,00	29,95	$ 643.509,59		$ -	29,95	$ 643.595,55	29,95	$ 643.595,55
2,6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 17.409,00	$ 17.409,00	50,70	$ 882.636,30		$ -	50,70	$ 882.636,30	50,70	$ 882.636,30
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1	INTERRUPTORES Y SENSORES	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 191.194,00	$ 191.194,00	3,00	$ 573.582,00		$ -	3,00	$ 573.582,00	3,00	$ 573.582,00
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1,00	$ 34.559,00	$ 34.559,00	3,00	$ 103.677,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Ó SENCILLO CONMUTABLE INLCUYE	UN	1,00	$ 19.387,00	$ 19.387,00	2,00	$ 38.774,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2	SALIDAS	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 223.874,00	$ 223.874,00	1,00	$ 223.874,00		$ -	1,00	$ 223.874,00	1,00	$ 223.874,00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 224.570,00	$ 224.570,00	13,00	$ 2.919.410,00		$ -	13,00	$ 2.919.410,00	13,00	$ 2.919.410,00
5.4	CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	1,00	$ 15.400,00	$ 15.400,00	78,70	$ 1.211.980,00		$ -	78,70	$ 1.211.980,00	78,70	$ 1.211.980,00
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1,00	$ 53.935,00	$ 53.935,00	78,70	$ 4.244.684,50		$ -	78,70	$ 4.244.684,50	78,70	$ 4.244.684,50
5.5	ILUMINACIÓN.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	1,00	$ 184.243,00	$ 184.243,00	8,00	$ 1.473.944,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	1,00	$ 38.834,00	$ 38.834,00	13,00	$ 504.842,00		$ -	13,00	$ 504.842,00	13,00	$ 504.842,00
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE	M2	1,00	$ 361.126,00	$ 361.126,00	16,74	$ 6.045.249,24		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.47	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1,00	$ 171.008,00	$ 171.008,00	5,00	$ 855.040,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.1	CIELOS RASOS.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.1.4	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO	M2	1,00	$ 90.661,00	$ 90.661,00	29,95	$ 2.714.934,31		$ -	29,11	$ 2.639.141,71	29,11	$ 2.639.141,71
15.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING CORTADO EN PLOTTER INSTALADO	M2	1,00	$ 21.558,00	$ 21.558,00	16,74	$ 360.958,53		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,00	$ 4.361,00	$ 4.361,00	29,95	$ 130.594,51	31,55	$ 137.589,55	31,16	$ 135.888,76	62,71	$ 273.478,31
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	$ 68.604,00	$ 68.604,00	5,00	$ 343.020,00	4,23	$ 290.194,92	0,00	$ -	4,23	$ 290.194,92
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE	M2	1,00	$ 13.131,00	$ 13.131,00	143,55	$ 1.884.955,05	43,86	$ 575.925,66	12,77	$ 167.682,87	56,63	$ 743.608,53
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 46.483,00	$ 46.483,00	11,18	$ 519.679,94		$ -	11,18	$ 519.679,94	11,18	$ 519.679,94
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1,00	$ 12.354,00	$ 12.354,00	15,43	$ 190.622,22	17,00	$ 210.018,00	15,43	$ 190.622,22	32,43	$ 400.640,22
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	1,00	$ 35.715,00	$ 35.715,00	27,60	$ 985.734,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50	M	1,00	$ 27.338,00	$ 27.338,00	3,50	$ 95.683,00	15,20	$ 415.537,60	0,00	$ -	15,20	$ 415.537,60
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E					-							
23.5	CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 6, (INCLUIDO ACCESORIOS DE	M2	1,00	$ 31.800,00	$ 31.800,00	40,70	$ 1.294.196,40		$ -	49,80	$ 1.583.640,00	49,80	$ 1.583.640,00
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26	M	1,00	$ 51.597,00	$ 51.597,00	26,60	$ 1.372.480,20		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 78.835,00	$ 78.835,00	3,50	$ 275.922,50	9,00	$ 709.515,00	0,00	$ -	9,00	$ 709.515,00
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1,00	$ 43.271,00	$ 43.271,00	7,00	$ 302.897,00	6,20	$ 268.280,20	0,00	$ -	6,20	$ 268.280,20
1	SUBTOTAL SUB DIRECCION SLIS TEUSAQUILLO				$ 2.267.054,00		$ 34.357.901,63		$ 3.161.899,17		$ 20.433.948,65		$ 23.595.847,82
1	UNIDAD OPERATIVA HOGAR DE PASO BAKATA - REGISTROS(EMERGENCIA)												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1,00	$ 23.633,00	$ 23.633,00	1,00	$ 23.633,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3.16	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PORTÓN (DOS HOJAS SENCILLA) (INDIFERENTE DEL	U	1,00	$ 23.633,00	$ 23.633,00	1,00	$ 23.633,00		$ -	1,00	$ 23.633,00	1,00	$ 23.633,00
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.6.16	DESMONTE MANUAL DE TUBERÍA POTABLE, SANITARIA, Y/O DE VENTILACIÓN DE DIÁMETROS DESDE 1/2" HASTA 2" Y QUE SE ENCUENTRE EMBEBIDA EN MURO O PLACA Y/O DENTRO DE ALGÚN ELEMENTO PARA DEMOLICIÓN. INCLUYE REGATA PARA EL DESMONTE Y POSTERIOR RESANE, CORTES Y TAPONES DE SUSPENSIÓN TERMINALES EN CASO DE REQUERIRSE, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 188.418,00	$ 188.418,00	26,00	$ 4.898.868,00		$ -	26,00	$ 4.898.868,00	26,00	$ 4.898.868,00
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 6.577,00	$ 6.577,00	87,65	$ 576.474,05		$ -	87,65	$ 576.474,05	87,65	$ 576.474,05
1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 8.648,00	$ 8.648,00	13,91	$ 120.315,30		$ -	13,91	$ 120.293,68	13,91	$ 120.293,68
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O	M2	1,00	$ 10.251,00	$ 10.251,00	13,91	$ 142.617,04		$ -	13,91	$ 142.591,41	13,91	$ 142.591,41
3	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.5	RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1,00	$ 22.081,00	$ 22.081,00	2,13	$ 46.922,13		$ -	2,13	$ 47.032,53	2,13	$ 47.032,53
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.1	TUBERIAS Y ACCESORIOS	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1,00	$ 11.729,00	$ 11.729,00	60,00	$ 703.740,00		$ -	60,00	$ 703.740,00	60,00	$ 703.740,00
4.2	VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	UN	1,00	$ 37.284,00	$ 37.284,00	1,00	$ 37.284,00		$ -	1,00	$ 37.284,00	1,00	$ 37.284,00
4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN	1,00	$ 39.009,00	$ 39.009,00	51,00	$ 1.989.459,00		$ -	51,00	$ 1.989.459,00	51,00	$ 1.989.459,00
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE	M2	1	$ 121.561,00	$ 121.561,00	13,91	$ 1.691.217,41		$ -	13,91	$ 1.690.913,51	13,91	$ 1.690.913,51
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,00	$ 465.595,00	$ 465.595,00	14,87	$ 6.924.328,84		$ -	14,87	$ 6.923.397,65	14,87	$ 6.923.397,65
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1,00	$ 388.883,00	$ 388.883,00	1,00	$ 388.883,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.47	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1,00	$ 171.008,00	$ 171.008,00	60,00	$ 10.260.480,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

	28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	16.10	CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 Ø=2,5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L=60MM A =25,4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24, CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GUÍA CON GUAYA DE ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA.	M	1,00	$ 57.756,00	$ 57.756,00	4,40	$ 254.126,40		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	18	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	18.1	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN	1,00	$ 465.544,00	$ 465.544,00	2,00	$ 931.088,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	$ 4.361,00	$ 4.361,00	112,01	$ 488.466,89		$ -	112,01	$ 488.475,61	112,01	$ 488.475,61
1		SUBTOTAL HOGAR DE PASO BAKATA - REGISTROS(EMERGENCIA)				$ 237.527,00		$ 29.501.536,05		$ 0,00		$ 17.642.162,44		$ 17.642.162,44
1		UNIDAD OPERATIVA HOGAR DE PASO BAKATA - SEDE GRANDE												
	1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1,00	$ 37.022,00	$ 37.022,00	10,00	$ 370.220,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	1,3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.												
	1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1,00	$ 17.945,00	$ 17.945,00	77,86	$ 1.397.156,43		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1,00	$ 26.894,00	$ 26.894,00	48,00	$ 1.290.912,00	5,00	$ 134.470,00	0,00	$ -	5,00	$ 134.470,00
	1.3.6	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES Y PUERTAS METÁLICAS DE CABINAS DE BAÑO (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1,00	$ 23.633,00	$ 23.633,00	97,20	$ 2.297.009,44		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	1.3.7	DESMONTE MANUAL DE REJAS METÁLICAS Y/O VARILLAS DE ACERO EN VANOS DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1,00	$ 16.823,00	$ 16.823,00	1,17	$ 19.649,26		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.3.10	DESMONTE MANUAL DE ESCALERA METÁLICA CON ESTRUCTURA CENTRAL Y GUALDERAS EN PERFILERÍA PESADA A.>75<=1,00 M, INCLUYENDO SUS HUELLAS, CONTRAHUELLAS, DESCANSO, GUALDERAS, BARANDAS Y PASAMANOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN PLANTA. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DE LA ESCALERA MEDIDA EN PLANTA.	M	1,00	$ 23.633,00	$ 23.633,00	2,00	$ 47.266,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3.14	DESMONTE MANUAL DE COMPUERTA / TAPA DE ACCESO A CUBIERTA Y/O TANQUE (INDIFERENTE DEL MATERIAL), CON MEDIDAS DESDE 60X60 CM HASTA 1,20X1,20 CM. INCLUYE LA HOJA Y SU MARCO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1,00	$ 23.633,00	$ 23.633,00	1,00	$ 23.633,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.3.16	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PORTÓN (DOS HOJAS SENCILLA) (INDIFERENTE DEL	U	1,00	$ 23.633,00	$ 23.633,00	11,00	$ 259.963,00		$ -		$ -	0,00	$ -
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 10.468,00	$ 10.468,00	492,21	$ 5.152.454,28		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 26.723,00	$ 26.723,00	583,74	$ 15.599.409,62		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.5.8	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 17.684,00	$ 17.684,00	7,73	$ 136.730,92	7,73	$ 136.730,92	0,00	$ -	7,73	$ 136.730,92
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 13.606,00	$ 13.606,00	59,00	$ 802.754,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.6.29	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1,00	$ 11.213,00	$ 11.213,00	25,00	$ 280.325,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,7	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL	M2	1,00	$ 19.787,00	$ 19.787,00	125,85	$ 2.490.198,70		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 6.577,00	$ 6.577,00	600,00	$ 3.946.200,00		$ -		$ -	0,00	$ -
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1,00	$ 6.783,00	$ 6.783,00	118,80	$ 805.820,40		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 8.648,00	$ 8.648,00	118,80	$ 1.027.382,40		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O	M2	1,00	$ 10.251,00	$ 10.251,00	175,00	$ 1.793.925,00	16,28	$ 166.860,65		$ -	16,28	$ 166.860,65
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5	ILUMINACIÓN.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 39.856,00	$ 39.856,00	26,00	$ 1.036.256,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5.16	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	1,00	$ 19.634,00	$ 19.634,00	33,00	$ 647.922,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.2	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1,00	$ 24.980,00	$ 24.980,00	583,74	$ 14.581.942,61		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.4	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1,00	$ 39.486,00	$ 39.486,00	10,00	$ 394.860,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,2	ACABADO DE PISOS.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2.11	ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 33,8X33,8 CM, TIPO DUROPISO DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.	M2	1,00	$ 61.756,00	$ 61.756,00	583,74	$ 36.049.737,69	2,50	$ 154.680,25	0,00	$ -	2,50	$ 154.680,25
7,3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.	0			0	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.4	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	1,00	$ 26.816,00	$ 26.816,00	98,00	$ 2.627.968,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.6	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	1,00	$ 47.986,00	$ 47.986,00	383,80	$ 18.417.026,80		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.11	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1,00	$ 17.874,00	$ 17.874,00	108,41	$ 1.937.720,34		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE	M2	1	$ 121.561,00	$ 121.561,00	175,00	$ 21.273.175,00	4,38	$ 532.133,28		$ -	4,38	$ 532.133,28
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,00	$ 465.595,00	$ 465.595,00	183,93	$ 85.636.329,64		$ -		$ -	0,00	$ -
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,00	$ 198.385,00	$ 198.385,00	77,86	$ 15.445.799,81		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,00	$ 597.182,00	$ 597.182,00	3,28	$ 1.957.920,91		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM	UN	1,00	$ 39.434,00	$ 39.434,00	77,00	$ 3.036.418,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1,00	$ 143.936,00	$ 143.936,00	29,63	$ 4.265.471,39		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 80 X 80 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN	1,00	$ 219.229,00	$ 219.229,00	1,00	$ 219.229,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 80 X 80 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN	1,00	$ 219.229,00	$ 219.229,00	1,00	$ 219.229,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	1,00	$ 23.550,00	$ 23.550,00	2,00	$ 47.100,00	2,00	$ 47.100,00	0,00	$ -	2,00	$ 47.100,00
11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	1,00	$ 28.530,00	$ 28.530,00	6,00	$ 171.180,00	6,00	$ 171.180,00	0,00	$ -	6,00	$ 171.180,00
11.47	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	1,00	$ 171.008,00	$ 171.008,00	39,00	$ 6.669.312,00	39,00	$ 6.669.312,00	0,00	$ -	39,00	$ 6.669.312,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2	1,00	$ 724.121,00	$ 724.121,00	97,20	$ 70.380.940,60		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14,1	CIELOS RASOS.	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
14.1.2	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	1,00	$ 192.360,00	$ 192.360,00	125,85	$ 24.208.552,14		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.2	DIVISIONES,	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
14.2.1	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE DIVISIONES EN PANELERÍA LIVIANA ACABADO DOS (2) CARAS FABRICADAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO E.=6 MM, SIN FRESCASA, PERFILERÍA GALVANIZADA CR. BASE 9 CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE TAPAS LATERALES DE TERMINACIÓN CUANDO SE REQUIERA, PERFILERÍA, LÁMINAS, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	1,00	$ 174.019,00	$ 174.019,00	276,10	$ 48.046.645,90		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
15.1	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	1,00	$ 72.440,00	$ 72.440,00	7,00	$ 507.080,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN),	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1,00	$ 146.760,00	$ 146.760,00	20,10	$ 2.949.876,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	$ 4.361,00	$ 4.361,00	3.394,37	$ 14.802.844,47		$ -		$ -	0,00	$ -
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
21,1	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
21.1.5	PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 29.519,00	$ 29.519,00	118,80	$ 3.506.857,20		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.1.9	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 73.684,00	$ 73.684,00	28,00	$ 2.063.152,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN),	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
21.2.3	PAÑETE LISO COMÚN BAJO PLACA 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 33.600,00	$ 33.600,00	9,64	$ 323.904,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
22,1	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	$ 68.604,00	$ 68.604,00	118,80	$ 8.150.155,20		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 13.131,00	$ 13.131,00	4.640,36	$ 60.932.597,36	104,58	$ 1.373.289,88	0,00	$ -	104,58	$ 1.373.289,88
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 28.716,00	$ 28.716,00	1.379,32	$ 39.608.583,57		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.1.15	PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA PARA ACABADO APLICADO SOBRE PAÑETE TOTALMENTE SECO Y/O SUPERFICIES SECAS (POR EJEMPLO SISTEMA DRYWALL DE YESO Y/O FIBROCEMENTO), VERSIÓN BRILLANTE, FORMULADA EN DOS COMPONENTES, IMPERMEABLE AL PASO DE AGUA Y VAPORES, TIPO SIKAGUARD-68 O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICADA EN TRES (3) CAPAS GARANTIZANDO UN ESPESOR FINAL DE 12 MILS (305 MICRONES). INCLUYE DILUCIÓN CON PRODUCTO TIPO COLMASOLVENTE EPÓXICO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES.	M2	1,00	$ 17.239,00	$ 17.239,00	125,85	$ 2.169.532,29		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 15.996,00	$ 15.996,00	37,64	$ 602.089,44		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
23,8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
23.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 PELDAÑOS, 2M A 4M	UN	1,00	$ 77.946,00	$ 77.946,00	1,00	$ 77.946,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1	SUBTOTAL HOGAR DE PASO BAKATA - SEDE GRANDE				$ 4.333.896,00		$ 530.706.363,79		9385756,98		0		9385757 0
1	UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL RIO NEGRO												
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1,00	$ 37.022,00	$ 37.022,00	14,30	$ 529.414,60		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE	M2	1,00	$ 34.461,00	$ 34.461,00	10,00	$ 344.610,00	8,34	$ 287.525,35		$ -	8,34	$ 287.525,35
1.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.												
1.5.2	PICADA DE PISO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.	M2	1,00	$ 6.158,00	$ 6.158,00	3,15	$ 19.397,70		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 10.468,00	$ 10.468,00	6,88	$ 72.019,84		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1,00	$ 26.723,00	$ 26.723,00	3,15	$ 84.177,45		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.												
1.6.7	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES DE 2" A 4" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'C=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	U	1,00	$ 61.177,00	$ 61.177,00	1,00	$ 61.177,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.8	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.												
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O	M2	1,00	$ 10.251,00	$ 10.251,00	1,62	$ 16.606,62	1,09	$ 11.163,34		$ -	1,09	$ 11.163,34
1.9	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.												
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,00	$ 51.410,00	$ 51.410,00	4,00	$ 205.640,00	1,09	$ 55.985,49	0,00	$ -	1,09	$ 55.985,49
1.9.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1,00	$ 15.005,00	$ 15.005,00	4,00	$ 60.020,00	6,60	$ 99.033,00	0,00	$ -	6,60	$ 99.033,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO	0											
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS	0											
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1,00	$ 40.746,00	$ 40.746,00	1,00	$ 40.746,00	24,35	$ 992.165,10	0,00	$ -	24,35	$ 992.165,10
2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO,	M3	1	$ 34.587,00	$ 34.587,00	1,00	$ 34.587,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	1,00	$ 116.287,00	$ 116.287,00	28,60	$ 3.325.808,20	24,35	$ 2.831.588,45	0,00	$ -	24,35	$ 2.831.588,45
2.2	CONCRETOS	0											
2.2.9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>12,1<=15,0 CM F'C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4	M2	1,00	$ 274.145,00	$ 274.145,00	1,00	$ 274.145,00	1,83	$ 501.598,99	0,00	$ -	1,83	$ 501.598,99
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1,00	$ 17.409,00	$ 17.409,00	5,00	$ 87.045,00	42,48	$ 739.607,44	0,00	$ -	42,48	$ 739.607,44
4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).												
4,1	TUBERIAS Y ACCESORIOS												
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1,00	$ 67.670,00	$ 67.670,00	3,00	$ 203.010,00	25,00	$ 1.691.750,00	0,00	$ -	25,00	$ 1.691.750,00
4.1.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"	UN	1,00	$ 54.691,00	$ 54.691,00	1,00	$ 54.691,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3	TABLEROS Y OTROS	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.3.13	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA (NO INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL)	UN	1,00	$ 799.284,00	$ 799.284,00	1,00	$ 799.284,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,1	BASES DE PISOS Y AFINADOS.	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.2	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1,00	$ 24.980,00	$ 24.980,00	3,15	$ 78.687,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.1.3	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1,00	$ 27.230,00	$ 27.230,00	3,15	$ 85.774,50	1,83	$ 49.822,32	0,00	$ -	1,83	$ 49.822,32
7,2	ACABADO DE PISOS.	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2.3	ACABADO DE PISO CON TABLÓN DE GRES GRAFILADO ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM E.=12 MM TRÁFICO 5 COLOR, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3.	M2	1,00	$ 57.425,00	$ 57.425,00	1,00	$ 57.425,00	1,83	$ 105.069,66	0,00	$ -	1,83	$ 105.069,66

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.2.11	ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 33,8X33,8 CM, TIPO DUROPISO DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.	M2	1,00	$ 61.756,00	$ 61.756,00	2,95	$ 182.180,20		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.	0			0		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.6	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	1,00	$ 47.986,00	$ 47.986,00	11,88	$ 570.073,68		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3.11	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1,00	$ 17.874,00	$ 17.874,00	1,00	$ 17.874,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1,00	$ 108.572,00	$ 108.572,00	1,62	$ 175.886,64		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	1,00	$ 23.550,00	$ 23.550,00	6,00	$ 141.300,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1	$ 4.361,00	$ 4.361,00	100,00	$ 436.100,00		$ -		$ -	0,00	$ -
21	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
21,1	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1,00	$ 19.358,00	$ 19.358,00	6,00	$ 116.148,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.1.5	PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1,00	$ 29.519,00	$ 29.519,00	6,00	$ 177.114,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
22,1	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,00	$ 68.604,00	$ 68.604,00	1,00	$ 68.604,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1,00	$ 13.131,00	$ 13.131,00	1,00	$ 13.131,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22,3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 35.715,00	$ 35.715,00	51,00	$ 1.821.465,00	4,51	$ 161.074,65	0,00	$ -	4,51	$ 161.074,65
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1,00	$ 27.338,00	$ 27.338,00	26,60	$ 727.190,80	17,81	$ 486.889,78	0,00	$ -	17,81	$ 486.889,78
23	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
23.3	TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
23.3.5	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM.	M	1,00	$ 13.014,00	$ 13.014,00	9,00	$ 117.126,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.4	CUBIERTAS TRASLÚCIDAS	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1,00	$ 242.793,00	$ 242.793,00	10,00	$ 2.427.930,00	8,34	$ 2.025.743,40	0,00	$ -	8,34	$ 2.025.743,40
23.8	OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.	0			0		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS según Formato FOR-GIF-027 (Balance Mayores y Menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1,00	$ 51.597,00	$ 51.597,00	10,00	$ 515.970,00	8,21	$ 423.611,37	0,00	$ -	8,21	$ 423.611,37
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1,00	$ 78.835,00	$ 78.835,00	23,60	$ 1.860.506,00	13,87	$ 1.093.441,45	0,00	$ -	13,87	$ 1.093.441,45
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1,00	$ 43.271,00	$ 43.271,00	3,00	$ 129.813,00	3,94	$ 170.487,74	0,00	$ -	3,94	$ 170.487,74
1	**SUBTOTAL UNIDAD OPERATIVA JARDIN INFANTIL RIO NEGRO**				**$ 2.617.381,00**		**$ 15.932.678,23**		**$ 11.726.557,53**		**$ 0,00**		**$ 11.726.557,53**

34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**$ 8.724.725.339,39**	**$ 4.327.871.614,81**	**$ 540.076.592,94**	**$ 2.200.876.181,08**	**$ 2.740.952.774,02**
35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**					
ADMINISTRACIÓN	26,00%	$ 2.268.428.588,25	$ 1.125.246.619,85	$ 140.419.914,16	$ 572.227.807,08	$ 712.647.721,24
IMPREVISTO	1,00%	$ 87.247.253,39	$ 43.278.716,15	$ 5.400.765,93	$ 20.711.457,49	$ 26.112.223,42
UTILIDAD	5,00%	$ 436.236.266,97	$ 216.393.580,74	$ 27.003.829,65	$ 110.043.809,05	$ 137.047.638,70
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		**$ 2.791.912.108,61**	**$ 1.384.918.916,74**	**$ 172.824.509,74**	**$ 702.983.073,62**	**$ 875.807.583,36**
TOTAL COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO		**$ 11.516.637.448,00**	$ 5.712.790.531,55	**$ 712.901.102,68**	$ 2.903.859.254,70	**$ 3.616.760.357,38**
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ 0,00				
AJUSTE AL PESO		$ 0,00	$ 0,45	$ 0,32	-$ 0,70	-$ 0,38
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		**$ 11.516.637.448,00**	**$ 5.712.790.532,00**	**$ 712.901.103,00**	**$ 2.903.859.254,00**	**$ 3.616.760.357,00**

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025 literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) el contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago" **La interventoría anexa documento donde certifica el uso del 1% de imprevistos para el corte el cual corresponde a $ 5.400.765,93**

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	No.5	1 may a 30 may	202604_Pago 4_Informe tecnico No 5	
INFORME SOCIAL	No.5	1 may a 30 may	202604_Pago 4_Informe Gestion Social No 5	
INFORME AMBIENTAL	No.5	1 may a 30 may	202604_Pago 4_ Informe Ambiental No 5	
INFORME SST	No.5	1 may a 30 may	202604_Pago 4_ Informe SST No 5	
INFORME DE SUPERVISION	No.5	1 may a 30 may	202604_Pago 4_ Informe Supervision Interventoria No 5	
ACTA PARCIAL	No.5	1 may a 30 may	202604_Pago 4_Acta 4 y memorias	
SOPORTE PAGO SDH	No.5	1 may a 30 may	202604_Certificado Hacienda	
FACTURA	No.5	1 may a 30 may	202604_FAC 09_Distrito_VIGENCIA /202604_FAC 08_Distrito_RESERVAS	
FORMATO MC 14	No.5	1 may a 30 may	MC 14-CTO 10674-2025-Reservas-Distrito / MC 14-CTO 10674-2025-Vigencia-Distrito	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los _30_ días del mes de _MAYO_del año _2026_

Nombre: CONSORCIO OBRAS DE INTEGRACION DT
Rep Legal. CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON
Nit. 902,001,890,5

Nombre: CONSORCIO INTERSOCIAL 25
Rep legal NESTOR CAMILO ARTUNDUANGA AVILA
Nit. 902.008.268-5

Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**		
ITEM: 1,3,2	**DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	ENFERMERIA	1,2		0,5	2,00	1,2

TOTAL EJECUTADO	1,20
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,20**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,20	0,00	**1,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		
ITEM: 1.4.3	**DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	FACHADA ACCESO		4,3		1,00	4,3

TOTAL EJECUTADO	4,30
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**4,30**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
4,30	0,00	**4,30**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**		
ITEM: 1,5,3	**DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
	PATIO		3,86		1,00	3,86
			5,8		1,00	5,8
			8,19		1,00	8,19
			6,1		1,00	6,1
			0,8		1,00	0,8
			0,21		2,00	0,42
			0,1		1,00	0,1
			1,8		1,00	1,8
			0,25		1,00	0,25
 	DESCUENTO PUERTA		0,9		1,00	-0,9
			0,89		1,00	-0,89
	FACHADA PRINCIPAL		3,15		1,00	3,15
			0,72		1,00	0,72
			0,2		1,00	0,2
			0,1		1,00	0,1
			2,12		1,00	2,12
					TOTAL EJECUTADO	31,82
					MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
					MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
					PRESENTE ACTA	**31,82**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
31,82	0,00	**31,82**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**		
ITEM: 1,5,4	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	PATIO	1,9	4,25		1,00	8,08

TOTAL EJECUTADO	8,08
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**8,08**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
8,08	0,00	**8,08**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**		
ITEM: 1,5,5	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	PATIO	3,86	1,27		1,00	4,90
		5,8	1,27		1,00	7,37
		8,19	1,27		1,00	10,40
		6,1	1,27		1,00	7,75

TOTAL EJECUTADO	30,42
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**30,42**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
30,42	0,00	**30,42**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**		
ITEM: 1,6,3	**SELLADO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES DE 1/2" A 1,1/2" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN EN EL ÁREA AFERENTE A LA SALIDA DEL PUNTO, EL CORTE DE LA TUBERÍA PARA GARANTIZAR QUE NO SOBRESALGA POSTERIOR AL SELLADO, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'C=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	COCINA				2,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**		
ITEM: 1,6,21	**DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	BAÑOS PATIO				2,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**		
ITEM: 1,8,6	**DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**largo**	**Alto**		
 	SALON BLOQUE 2	2,9		1,29	1,00	3,7
		3,08		1,29	1,00	4,0

TOTAL EJECUTADO	7,71
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**7,71**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
7,71	0,00	**7,71**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ESTRUCTURAS METALICAS**		
ITEM: 2.6.2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)**	**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**largo**	**peso(kg/1m)**	**alto**		
ESTRUCTURA CUBIERTA					
TEMPLETES 1/2	1,10	0,99		134,00	145,93
PORTA CORREAS (PLATINAS 1/4"X 2")	0,14	2,53		138,00	48,88
PERFIL RECTANGULAR 100*50*2MM (cocina para capampana)	4,60	4,65		3,00	64,17

TOTAL EJECUTADO	258,98
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**258,98**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
258,98	0,00	**258,98**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.**		
ITEM: 4,2,12	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**PESO**	**Alto**		
	COCINA				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 5.5.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
BAÑOS MUJERES				2,00	2,00
BAÑOS HOMBRES				1,00	1,00
DEPOSITO				1,00	1,00
ENFERMERIA				1,00	1,00
COORDINACIÓN				1,00	1,00
DEPOSITO EN COCINA				1,00	1,00
OFICINA				1,00	1,00
BAÑO CERCA COMEDOR				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	9,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**9,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
9,00	0,00	**9,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 5.1.6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETOORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



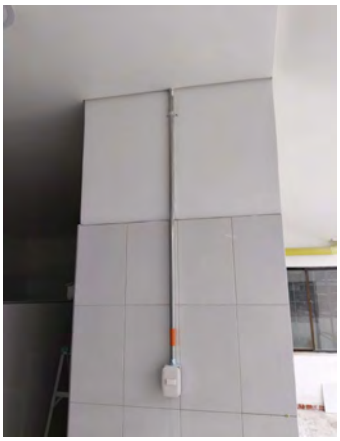

LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
RECEPCIÓN				2,00	2,00
COORDINACIÓN				2,00	2,00
COCINA				2,00	2,00
COMEDOR				2,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	8,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**8,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
8,00	0,00	**8,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 5.1.7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
COMEDOR				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 5.1.19	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X50A 50 KA**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
TABLERO				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 5.1.10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



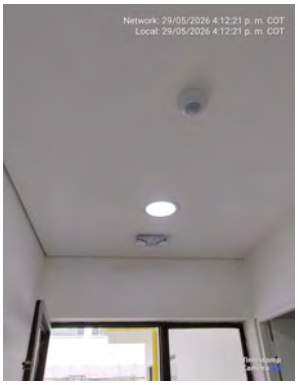



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
PASILLOS				4,00	4,00

TOTAL EJECUTADO	4,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**4,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
4,00	0,00	**4,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 5.1.24	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



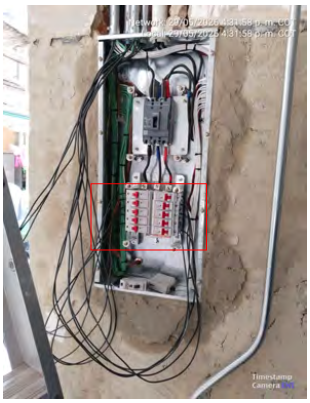

LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
ILUMINACIÓN					
TN-C1				1,00	1,00
TN-C2				1,00	1,00
TN-C3				1,00	1,00
TN-C4				1,00	1,00
TOMACORRIENTE					
TN-C5				1,00	1,00
TN-C6				1,00	1,00
TN-C7				1,00	1,00
TN-C8				1,00	1,00
TN-C9				1,00	1,00
TN-C10				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	10,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**10,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
10,00	0,00	**10,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SALIDAS**		
ITEM: 5.2.2	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
RECEPCIÓN				8,00	8,00
DEPOSITO				2,00	2,00
ENFERMERIA				2,00	2,00
OFICINA				1,00	1,00
DEPOSITO				1,00	1,00
COORDINACIÓN				4,00	4,00
COMEDOR INGRESO				6,00	6,00
COMEDOR 2				5,00	5,00
COCINA				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	30,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**30,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
30,00	0,00	**30,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SALIDAS**		
ITEM: 5.2.4	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
BAÑOS NIÑOS				2,00	2,00
COCINA				3,00	3,00
BAÑO 1				1,00	1,00
BAÑO 2				1,00	1,00
BAÑO 3				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	8,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**8,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
8,00	0,00	**8,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SALIDAS**		
ITEM: 5.2.14	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN.**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



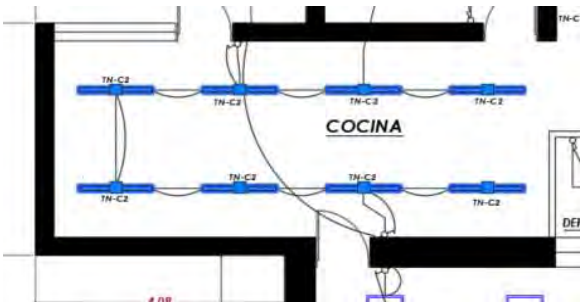

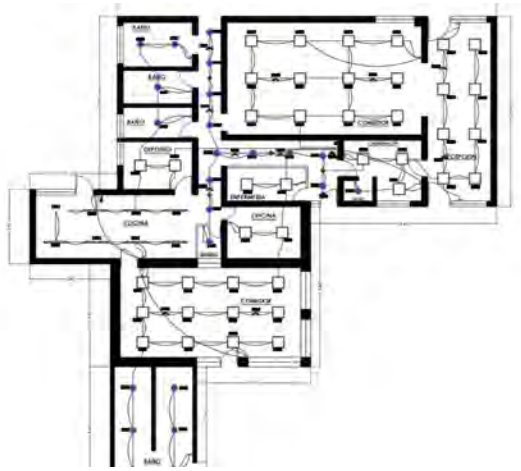

LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
SALIDA PARA ILUMINACIÓN 60X60					
DEPOSITO				2,00	2,00
ENFERMERIA				2,00	2,00
COORDINACIÓN				3,00	3,00
OFICINA				2,00	2,00
COMEDOR				12,00	12,00
SALIDA PARA ILUMINACIÓN HERMETICA					
COCINA				8,00	8,00
SALIDA DE ILUMINACIÓN PANEL REDONDO					
BAÑOS				5,00	5,00
PASILLOS				11,00	11,00
BAÑO COEMEDOR				6,00	6,00
DEPOSITO				1,00	1,00
BAÑO DE COORDINACIÓN				1,00	1,00
REFLECTORES					
RECEPCIÓN				1,00	1,00
COMEDOR				2,00	2,00





TOTAL EJECUTADO	56,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**56,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
56,00	0,00	**56,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SALIDAS**		
ITEM: 5.2.16	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
PASILLO				7,00	7,00
COMEDORES				4,00	4,00
RECEPCIÓN				2,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	13,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**13,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
13,00	0,00	**13,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**TABLEROS Y OTROS**		
ITEM: 5.3.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

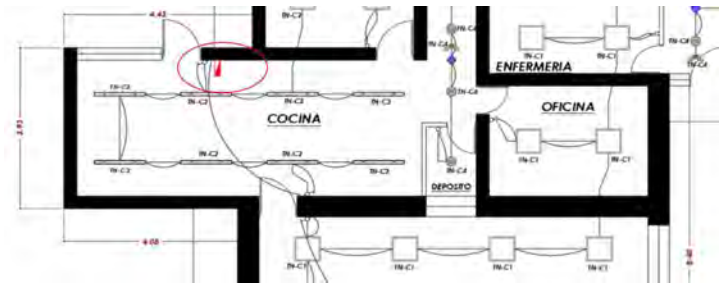



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
COCINA				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**TABLEROS Y OTROS**		
ITEM: 5.3.8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	TECHO PARA CIRCUITO DE ILUMINACIÓN				7,00	7,00

TOTAL EJECUTADO	7,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**7,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
7,00	0,00	**7,00**

OBSERVACIONES:

El presente item s epaga al 50% debido a que no cumple con la especificacion contractual el APU.

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**TABLEROS Y OTROS**		
ITEM: 5.3.14	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA TERMINAL DE COMPRESIÓN BIMETÁLICA PARA CABLE CALIBRE Nª 2/0 AWG.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

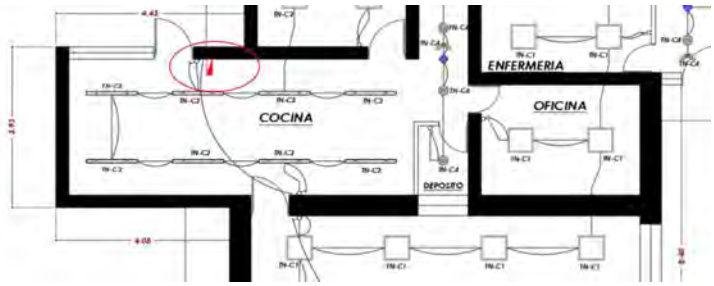





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
TABLERO				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**TABLEROS Y OTROS**		
ITEM: 5.3.15	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 0,3X0,3 M, INCLUYE MARCO Y TAPA**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

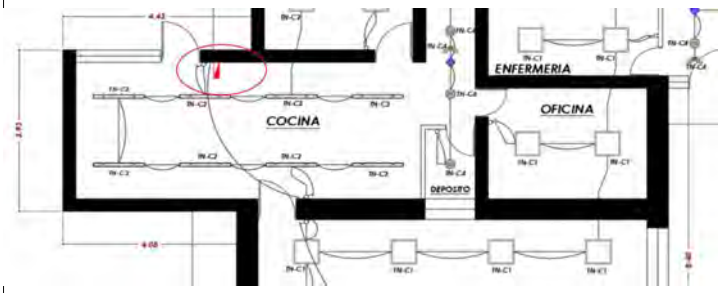



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
EMPALME DE ACOMETIDA				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**TABLEROS Y OTROS**		
ITEM: 5.3.16	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.44 M**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

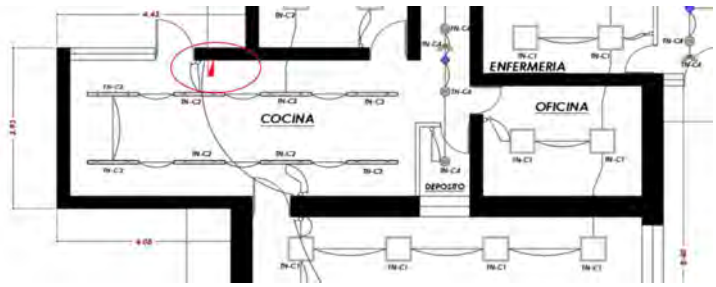



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
CAJA DE INSPECCIÓN				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO: No. 10674-2025**

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**TABLEROS Y OTROS**		
ITEM: 5.3.17	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G**	**UNIDAD**	**UN.**

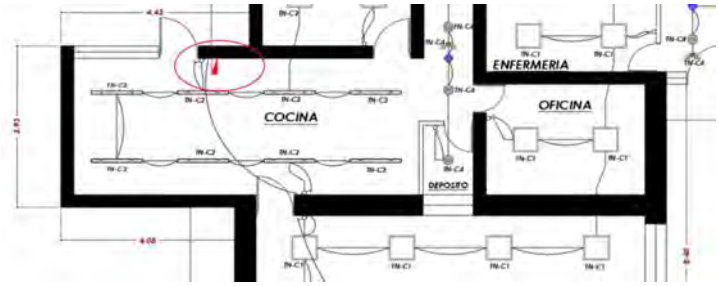ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	TABLERO				1,00	1,00
						

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CANALIZACIONES Y CALEADO ELECTRICO**		
ITEM: 5.4.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

ILUMINACIÓN

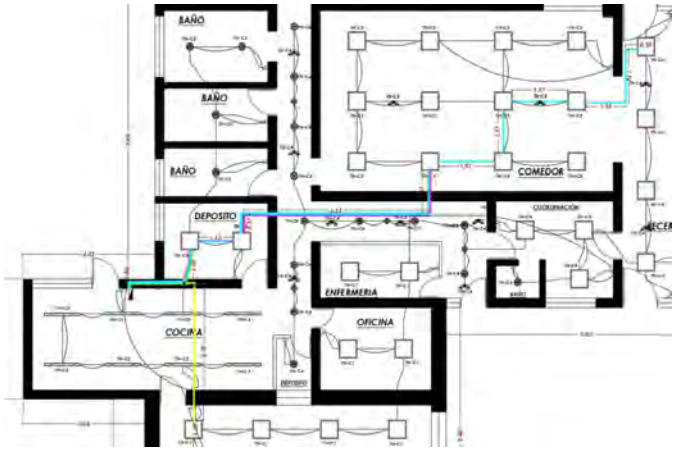

TOMACORRINETE

LOCALIZACIÓN / LUGAR	Ancho	Largo	Alto	CANTIDAD	TOTAL
CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN					
TN-C1					
TABLERO		2,70			
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,40			
		4,60		11,50	11,50
TN-C2					
TABLERO		2,70			
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17			
		2,17		8,84	8,84
TN-C3					
TABLERO		2,70			
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17			
		2,17			
		1,15			
		0,57			
		6,27			
		1,37		18,20	18,20
TN-C4					
TABLERO		2,70			
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17			
		2,00			
		1,15			
		0,57			
		6,27			
		1,37			
		1,87			
		1,37			
		1,87			
		1,34			
		1,74			
		0,39		26,61	26,61

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CANALIZACIONES Y CALEADO ELECTRICO**		
ITEM: 5.4.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

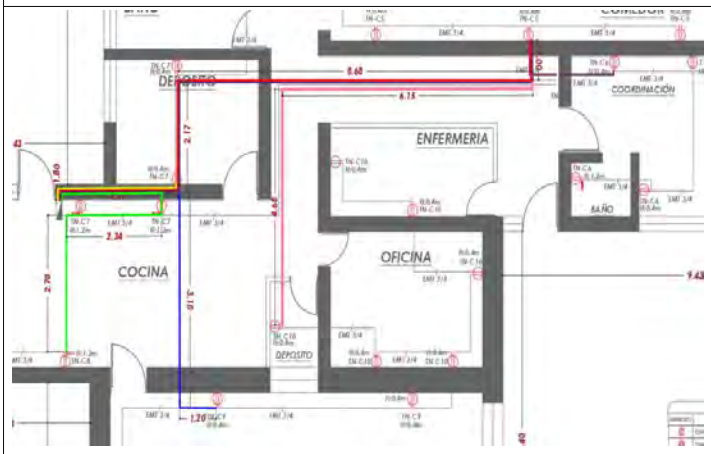

INTERRUPTORES RETORNOS



LOCALIZACIÓN / LUGAR	Ancho	Largo	Alto	CANTIDAD	TOTAL
CIRCUITOS TOMACORRIENTE					
TN-C5					
TABLERO		2,70			
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17			
		2,17			
		8,68			
		1,00			
DISTANCIA ENTRE SALIDAS		5,30			
		5,00			
		8,00			
		3,49			
DESCUENTO ENTRE SALIDAS		-12,00		28,31	28,31
TN-C6					
TABLERO		2,70			
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17			
		2,17			
		8,68			
		1,00			
		1,00		19,52	19,52
TN-C7					
TABLERO		2,70			
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17		6,67	6,67
TN-C8					
TABLERO		2,70			
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17			
		2,34			
		2,70		11,71	11,71
TN-C9					
TABLERO		2,70			
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17			
		3,10			
		1,20		10,97	10,97
TN-C10					
TABLERO		2,70			
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17			
		2,17			
		8,68			
		1,00			
		6,15			
		4,68		29,35	29,35
TN-C11					
TABLERO		2,70			
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		4,70		9,20	9,20
INTERRUPTORES RETORNOS					
RECEPCIÓN					
SUBIDA INTERRUPTOR		3,40			
VIAJERO CONMUTABLE		21,60			
RECORRIDO ENTRE LUMINARIAS		2,50			
		2,50			
		2,50			
		2,50			
		2,50			
		2,50			
		2,50			
		2,50		15,00	15,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CANALIZACIONES Y CALEADO ELECTRICO**		
ITEM: 5.4.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
	COMEDOR 1					
	SUBIDA INTERRUPTOR DOBLE		3,40			
			8,40			
	RECORRIDO ENTRE LUMINARIAS		2,60			
			2,60			
			2,60			
			2,60			
			2,60			
			2,60			
			2,60			
			2,60			
			2,60			
			2,60			
			2,60			
			2,60		14,33	14,33
	PASILLO					
	RECORRIDO ENTRE LUMINARIAS		1,70			
			1,70			
			1,70			
			1,70			
			1,70			
			1,70			
			1,70			
			1,70			
			1,70			
			1,70			
			1,70		6,23	6,23
	COORDINACIÓN 2 INTERRUPTORES					
	SUBIDA INTERRUPTOR		3,40			
	VIAJERO CONMUTABLE		11,80			
	RECORRIDO ENTRE LUMINARIAS		2,20			
			2,20			
			2,20		7,27	7,27
	BAÑO COORDINACIÓN					
	SUBIDA INTERRUPTOR		3,40			
	RECORRIDO ENTRE LUMINARIAS		0,80		1,40	1,40
	ENFERMERIA					
	SUBIDA INTERRUPTOR		3,40			
	RECORRIDO ENTRE LUMINARIAS		2,20		1,87	1,87
	COMEDOR 2					
	SUBIDA INTERRUPTOR		3,40			
	VIAJERO CONMUTABLE		20,80			
	RECORRIDO ENTRE LUMINARIAS		2,50			
			2,50			
			2,50			
			2,50			
			2,50			
			2,50			
			2,50			
			2,50			
			2,50			
			2,50			
			2,50		18,07	18,07
	BAÑO NIÑOS					
	SUBIDA INTERRUPTOR		3,40			
	RECORRIDO ENTRE LUMINARIAS		2,40			
			2,40			
			2,40			
			2,40			
			2,40			
			2,40		5,93	5,93
	COCINA 2 INTERRUPTORES					
	SUBIDA INTERRUPTOR		3,40			
	VIAJEROS CONMUTABLE		19,60			
	RECORRIDO ENTRE LUMINARIAS		2,20			
			2,20			
			2,20			
			2,20			
			2,20			
			2,20			
			2,20		13,53	13,53
	DEPOSITO					
	SUBIDA INTERRUPTOR		1,70			
	RECORRIDO ENTRE LUMINARIAS		1,90		1,20	1,20

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CANALIZACIONES Y CALEADO ELECTRICO**		
ITEM: 5.4.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN LUGAR	Ancho	Largo	Alto	CANTIDAD	TOTAL
	DEPOSITO 2					
	SUBIDA INTERRUPTOR		1,70			
	RECORRIDO ENTRE LUMINARIAS		1,30		1,00	1,00
	OFICINA					
	SUBIDA INTERRUPTOR		1,70			
	RECORRIDO ENTRE LUMINARIAS		2,00		1,23	1,23
	BAÑO					
	SUBIDA INTERRUPTOR		3,40		1,13	1,13
	BAÑO					
	SUBIDA INTERRUPTOR		3,40		1,13	1,13
	BAÑO					
	SUBIDA INTERRUPTOR		3,40			
	RECORRIDO ENTRE LUMINARIAS		1,90		1,77	1,77

TOTAL EJECUTADO	271,98
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**271,98**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
271,98	0,00	**271,98**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CANALIZACIONES Y CALEADO ELECTRICO**		
ITEM: 5.4.12	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE Nº 2/0 AWG**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

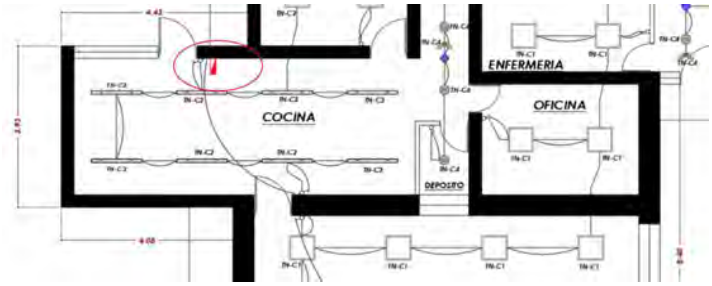

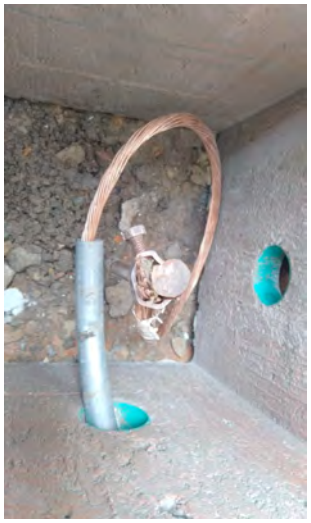



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
CAJA DE INSPECIÓN		4,00		1,00	4,00

TOTAL EJECUTADO	4,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**4,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
4,00	0,00	**4,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		


CAPITULO	**CANALIZACIONES Y CALEADO ELECTRICO**		
ITEM: 5.4.19	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

ILUMINACIÓN

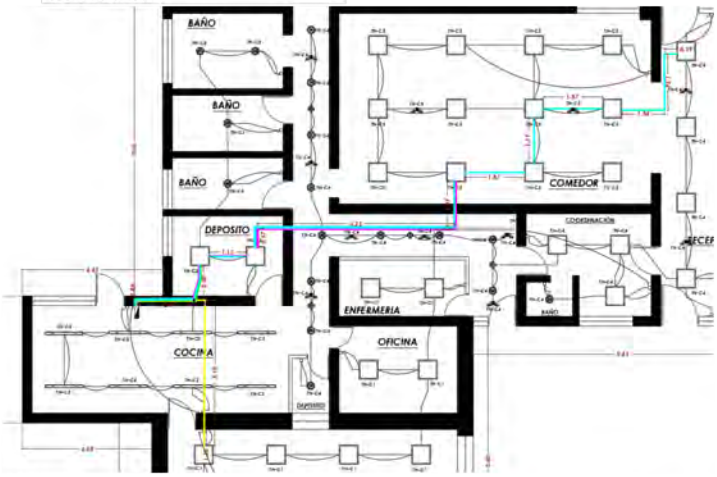

TOMACORRINETE

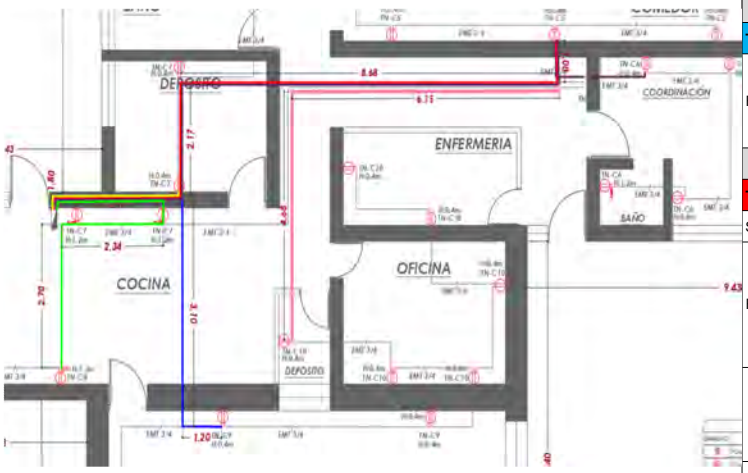





LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN					
TN-C1					
SUBIDA AL TECHO		2,70			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17			
		3,20			
		8,00		16,07	16,07
TN-C2					
SUBIDA A TECHO		2,60			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN CON ALTURA DE TECHO		4,34		6,94	6,94
TN-C3					
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17			
		6,27			
		1,80		12,04	12,04
TN-C4					
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		3,60			
		2,74			
		6,27		12,61	12,61
CIRCUITOS TOMACORRIENTE					
TN-C5					
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17			
		2,17		25,61	25,61
		8,68			
		1,00			
DISTANCIA ENTRE SALIDAS		5,30			
		5,00			
		8,00			
		3,49			
DESCUENTO		-12,00			
TN-C6					
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		1,00			
		1,70		2,70	2,70
TN-C7					
SUBIDA AL TECHO		3,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17			
				5,97	5,97

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CANALIZACIONES Y CALEADO ELECTRICO**		
ITEM: 5.4.19	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
TN-C8					
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		3,60		6,30	6,30
		2,70			
TN-C9					
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17			
		5,60		11,77	11,77
		2,20			
TN-C10					
SUBIDA AL TECHO		1,80			
RECORRIDO DE ALIMENTACIÓN		2,17			
		2,17		26,65	26,65
		8,68			
		1,00			
		6,15			
		4,68			

TOTAL EJECUTADO	126,66
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**126,66**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
126,66	0,00	**126,66**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ILUMINACIÓN**		
ITEM: 5.5.2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





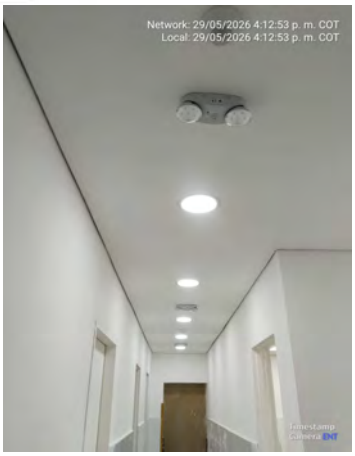

LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
PASILLO				7,00	7,00
COMEDORES				4,00	4,00
RECEPCIÓN				2,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	13,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**13,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
13,00	0,00	**13,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ILUMINACIÓN**		
ITEM: 5.5.4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
DEPOSITO				2,00	2,00
ENFERMERIA				2,00	2,00
COORDINACIÓN				3,00	3,00
OFICINA				2,00	2,00
COMEDOR				12,00	12,00
RECEPCIÓN				8,00	8,00
COMEDOR				12,00	12,00

TOTAL EJECUTADO	41,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**41,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
41,00	0,00	**41,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ILUMINACIÓN**		
ITEM: 5.5.9	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
RECEPCIÓN				1,00	1,00
COMEDOR				2,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	3,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**3,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
3,00	0,00	**3,00**



OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **CONTRATO: No. 10674-2025**

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ILUMINACIÓN**		
ITEM: 5.5.10	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER**	**UNIDAD**	**UN**

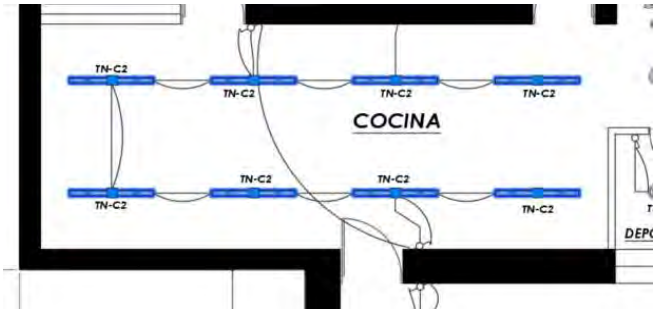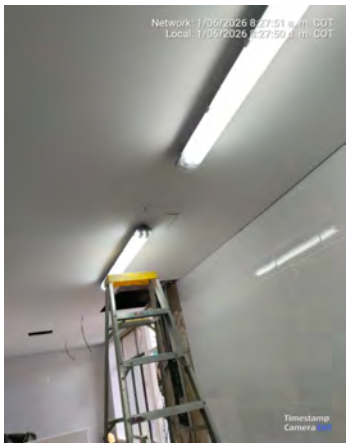ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	COCINA				8,00	8,00
						

TOTAL EJECUTADO	8,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**8,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
8,00	0,00	**8,00**



OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**
	CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ILUMINACIÓN**		
ITEM: 5.5.11	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR**	**UNIDAD**	**UN**

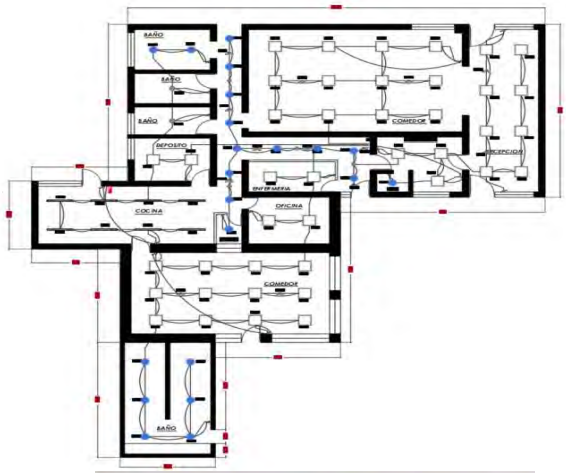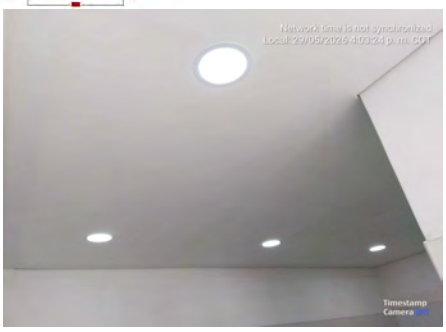ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	BAÑO 1				2,00	2,00
	PASILLOS				10,00	10,00
	BAÑO NIÑOS				6,00	6,00
	DEPOSITO				1,00	1,00
	BAÑO DE COORDINACIÓN				1,00	1,00
	BAÑO 2				2,00	2,00
						

TOTAL EJECUTADO	22,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**22,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
22,00	0,00	**22,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ILUMINACIÓN**		
ITEM: 5.5.14	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

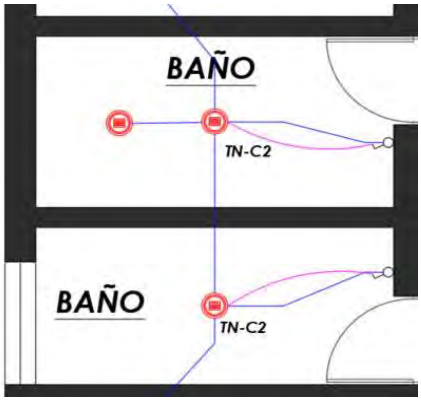



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
BAÑO 3				1,00	1,00
PASILLO				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		



CAPITULO	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**		
ITEM: 7,1,2	**ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	PATIO	3,86	1,27		1,00	4,90
		5,8	1,27		1,00	7,37
		8,19	1,27		1,00	10,40
		6,1	1,27		1,00	7,75

TOTAL EJECUTADO	30,42
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**30,42**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
30,42	0,00	**30,42**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**		
ITEM: 7,1,3	**ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	PATIO	1,9	4,25		1,00	8,08

TOTAL EJECUTADO	8,08
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**8,08**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
8,08	0,00	**8,08**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ACABADO DE PISOS.**		
ITEM: 7,2,3	**ACABADO DE PISO CON TABLÓN DE GRES GRAFILADO ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM E.=12 MM TRÁFICO 5 COLOR, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**PESO**	**Alto**		
 	PATIO	3,86	1,27		1,00	4,90
		5,8	1,27		1,00	7,37
		8,19	1,27		1,00	10,40
		6,1	1,27		1,00	7,75

TOTAL EJECUTADO	30,42
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**30,42**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
30,42	0,00	**30,42**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**		
ITEM: 7,3,2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
COCINA		3,31		2,00	6,6
		8,09		2,00	16,2
		2,29		1,00	2,3
		1,3		1,00	1,3
		2,44		4,00	9,8

TOTAL EJECUTADO	36,15
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**36,15**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
36,15	0,00	**36,15**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**		
ITEM: 7,3,11	**GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**PESO**	**Alto**		
  	PATIO		3,86		1,00	3,86
			5,8		1,00	5,8
			8,19		1,00	8,19
			6,1		1,00	6,1
			0,8		1,00	0,8
			0,21		2,00	0,42
			0,1		1,00	0,1
			1,8		1,00	1,8
			0,25		1,00	0,25
	DESCUENTO PUERTA		0,9		1,00	-0,9
			0,89		1,00	-0,89
	FACHADA PRINCIPAL		3,15		1,00	3,15
			0,72		1,00	0,72
			0,2		1,00	0,2
			0,1		1,00	0,1
			2,12		1,00	2,12
					TOTAL EJECUTADO	31,82
					MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
					MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
					PRESENTE ACTA	**31,82**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
31,82	0,00	**31,82**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025



CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 8,2	**ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.**	**UNIDAD**	**M2**

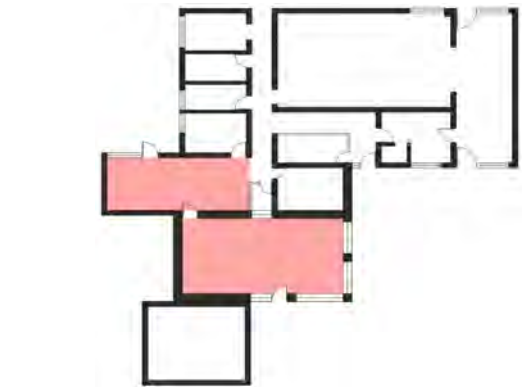ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
  	COCINA	1,03		1,98	1,00	2,0
		0,77		0,63	1,00	0,5
		1,24		1,17	2,00	2,9
		3,58		0,2	1,00	0,7
		4,23		2,0	1,00	8,46
	COMEDOR 2	3,65		1,26	1,00	4,60
		1,14		0,9	1,00	1,03
		4,37		1,26	1,00	5,51
		1,98		0,86	1,00	1,70
		1,3		1,26	1,00	1,64
		1,98		0,86	1,00	1,70
		0,77		1,26	1,00	0,97
		2,63		0,84	1,00	2,21
		1,25		1,26	1,00	1,58
		1,16		0,9	1,00	1,04
		4,73		1,26	1,00	5,96
		0,47		1,26	1,00	0,59
		4,7		1,26	1,00	5,92
	BAÑOS PATIO	0,75		1,84	1,00	1,38
		0,5		1,84	1,00	0,92
		0,43		1,84	1,00	0,79
					TOTAL EJECUTADO	52,14
					MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
					MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
					PRESENTE ACTA	**52,14**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
52,14	0,00	**52,14**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		


CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 9,3,3	**REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES**	**UNIDAD**	**M2**

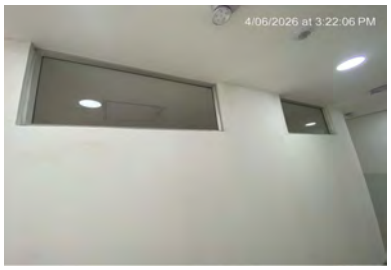ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**PESO**	**Alto**		
	ENFERMERIA	1,2		0,5	2,00	1,2

TOTAL EJECUTADO	1,20
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,20**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,20	0,00	**1,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 11,1	**INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**PESO**	**Alto**		
BAÑOS PATIO				2,00	2,00
DESCUENTO PROPORCION POR BRIDA				-0,46	-0,46

TOTAL EJECUTADO	1,54
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,54**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,54	0,00	**1,54**

OBSERVACIONES:DESCUENTO DE BRIDA SANITARIA DE 4" $:21,500, el cual es equivalente al 0,46 unidades de instalación.

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 11,24	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA CON MANGUERA (INCLUYE GRIFERÍA)**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**PESO**	**Alto**		
 	BAÑOS PATIO				2,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 11,28	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**PESO**	**Alto**		
 	BAÑOS PATIO				2,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CIELOS RASOS.**		
ITEM: 14,1,2	**CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	ALEROS PATIO	1,1	6,16		1,00	6,8
		1,24	7		1,00	8,7
		1,24	1,24		1,00	1,5
		1,24	7		1,00	8,7
		1,24	6,11		1,00	7,6
		1,9	3,5		1,00	6,7
		1,82	3,51		1,00	6,4
		1,12	2,13		1,00	2,4

TOTAL EJECUTADO	48,67
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**48,67**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
48,67	0,00	**48,67**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CIELOS RASOS.**		
ITEM: 14,1,4	**CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
BAÑO PATIO	3,71	3,84		1,00	14,2
	2,51	3,98		1,00	10,0
COMEDOR 2	4,68	9,15		1,00	42,8
COCINA	3,3	8,1		1,00	26,7
MENAJE	1,17	1,71		1,00	2,0
BODEGA DE INSUMOS	2,71	3,75		1,00	10,2
PASILLO	1,15	1,8		1,00	2,1
	1,25	2,3		1,00	2,9
	1,16	6,07		1,00	7,0
	1,24	4,23		1,00	5,2
	1,6	3,07		1,00	4,9
ENFERMERIA	1,76	4,04		1,00	7,1
DESPENSA	2,25	3,38		1,00	7,6
BAÑO ADULTOS 1	1,66	3,52		1,00	5,8
BAÑO ADULTOS 2	0,68	1,75		1,00	1,2
	1,46	1,75		1,00	2,6
	1,2	1,75		1,00	2,1
BAÑO NIÑOS	2,33	3,64		1,00	8,5
COMEDOR 1	5,76	9,86		1,00	56,8
RECEPCION	3,23	7,81		1,00	25,2
COORDINACION	1,65	1,68		1,00	2,8
	2,3	3		1,00	6,9
BAÑO COORDINACION	1,08	1,47		1,00	1,6

TOTAL EJECUTADO	256,26
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**256,26**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
256,26	0,00	**256,26**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CIELOS RASOS.**		
ITEM: 14,1,6	**TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	ALEROS PATIO		6,16		1,00	6,2
			7		1,00	7,0
			1,24		1,00	1,2
			7		1,00	7,0
			6,11		1,00	6,1
			3,5		1,00	3,5
			5,64		1,00	5,6
			4,5		1,00	4,5
			6,8		1,00	6,8
			0,9		1,00	0,9
			6,3		1,00	6,3
 						

TOTAL EJECUTADO	55,15
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**55,15**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
55,15	0,00	**55,15**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DIVISIONES.**		
ITEM: 14,2,6	**MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA






LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
CULATA SUPEIROR RECEPCION	2,11	6,55		1,00	6,9
	2,11	5,5		1,00	5,8
BAÑO PATIO	3,1	1,1		1,00	3,4
	1,9	2,58		1,00	4,9
DESCUENTO PUERTA	0,81	2,1		1,00	-1,7
ENEFERMERIA	3,46	0,5		1,00	1,7

TOTAL EJECUTADO	21,05
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**21,05**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
21,05	0,00	**21,05**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DIVISIONES.**		
ITEM: 14,2,7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
RECEPCION		2,34		2,00	4,7
		2		1,00	2,0
COMEDOR 1		0,81		1,00	0,8

TOTAL EJECUTADO	7,49
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**7,49**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
7,49	0,00	**7,49**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**		
ITEM: 22.3.5	**ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	ESTRUCTURA CUBIERTA					
	TEMPLETES 1/2	1,10			134,00	147,40
	PORTA CORREAS (PLATINAS 1/4"X 2")	0,14			138,00	19,32
	PERFIL RECTANGULAR 100*50*2MM (cocina para capampana)	4,60			3,00	13,80

TOTAL EJECUTADO	180,52
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**180,52**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
180,52	0,00	**180,52**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**		
ITEM: 22.3.6	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA






LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
CANAL PATIO LAVANDERIA		6		1,00	6,00
		6,8		1,00	6,80
		4,5		1,00	4,50
BAJANTES PATIO		4,3		1,00	4,30
		3,5		1,00	3,50
		4,42		1,00	4,42
		4,44		1,00	4,44
		4,46		1,00	4,46
		3,43		1,00	3,43
		3,54		1,00	3,54
		4,3		1,00	4,30

TOTAL EJECUTADO	49,69
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**49,69**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
49,69	0,00	**49,69**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**		
ITEM: 23,8,5	**CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	CANAL PATIO LAVANDERIA		6		1,00	6,00

TOTAL EJECUTADO	6,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**6,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
6,00	0,00	**6,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN SAMPER MENDOZA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**		
ITEM: 23,8,10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	BAJANTES PATIO		4,3		1,00	4,30
			3,54		1,00	3,54
			4,3		1,00	4,30

TOTAL EJECUTADO	12,14
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**12,14**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
12,14	0,00	**12,14**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDÍN SOCIAL SAN JERONIMO DEL YUSTE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM: 1.3.3	**DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.8**	**UNIDAD**	**M2**

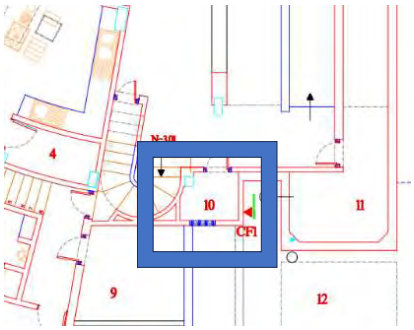ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Area		
	DESMONTE DE PUERTA METALICA	2	1	2,00	1	2,00
						

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES: Contractual, memorias que soportan el corte No. 1 fecha 31 de enero 2026


FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**
	CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDÍN SOCIAL SAN JERONIMO DEL YUSTE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM: 1.4.4	**DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

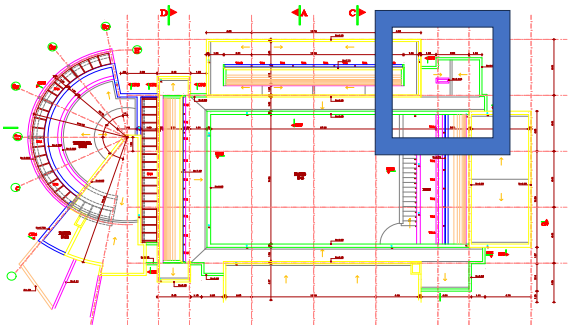



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
MURO CIRCULAR ALREDED	25,19	3,50	88,17	1,00	88,17
PLACA DE TERRAZA			75,12	1,00	75,12
TERRAZA NIVEL 3	1,80	4,91	8,84	1,00	8,84
	4,23	5,87	24,83	1,00	24,83
	0,52	1,62	0,84	1,00	0,84

TOTAL EJECUTADO	197,80
MENOS ACTAS ANTERIORES	-163,29
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**34,51**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
34,51	163,29	**197,80**


OBSERVACIONES: Contractual, memorias que soportan el corte No. 1 fecha 31 de enero 2026

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**
	CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDÍN SOCIAL SAN JERONIMO DEL YUSTE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM: 1.8.17	**PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)**	**UNIDAD**	**M2**

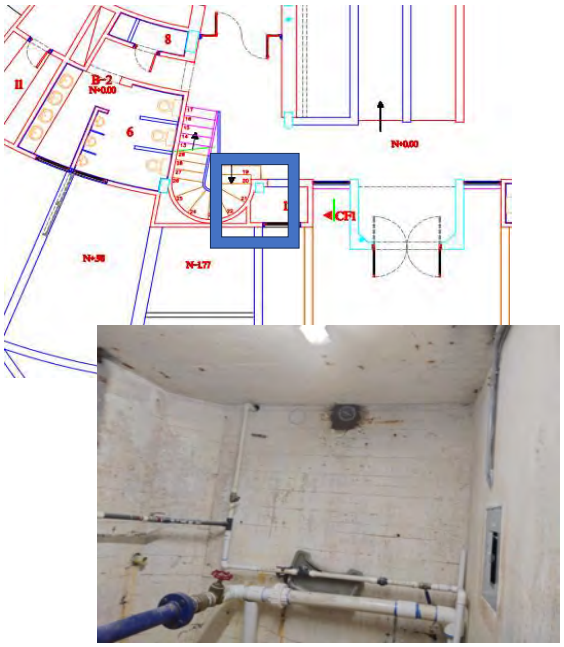ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
	PERFORACIN PARA TUBO DE 4"		0,20		1,00	0,20
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

TOTAL EJECUTADO	0,20
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**0,20**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
0,20		**0,20**


OBSERVACIONES: Contractual, memorias que soportan el corte No. 1 fecha 31 de enero 2026

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**
	CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDÍN SOCIAL SAN JERONIMO DEL YUSTE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**
ITEM: 4.1.47	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"**

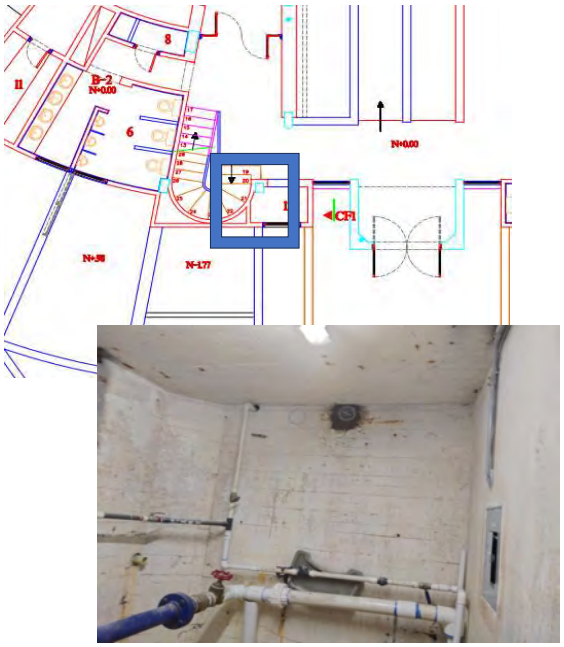ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"				1,00	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00		**1,00**


OBSERVACIONES: Contractual, memorias que soportan el corte No. 1 fecha 31 de enero 2026

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**
	CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDÍN SOCIAL SAN JERONIMO DEL YUSTE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**
ITEM: 9.1.8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Area		
	PUERTA CUARTO DE BOMA	2,00		0,90	1,80	1,80
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						

TOTAL EJECUTADO	1,80
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,80**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
1,80		**1,80**

OBSERVACIONES: Contractual, memorias que soportan el corte No. 1 fecha 31 de enero 2026

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDÍN SOCIAL SAN JERONIMO DEL YUSTE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		
ITEM: 19	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
PLACA DE TERRAZA		75,12	75,12	1,00	107,17
TERRAZA NIVEL 3	1,80	4,91	8,84	1,00	8,84
	4,23	5,87	24,83	1,00	24,83
	0,52	1,62	0,84	1,00	0,84
CUARTO DE BOMBAS			19,23	1,00	19,23

TOTAL EJECUTADO	160,91
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**160,91**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
160,91		**160,91**

OBSERVACIONES: Contractual, memorias que soportan el corte No. 1 fecha 31 de enero 2026

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDÍN SOCIAL SAN JERONIMO DEL YUSTE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**
ITEM: 23.3.2	**ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:3 H.=8 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Area		
	PLACA DE TERRAZA			75,12	1,00	75,12





TOTAL EJECUTADO	75,12
MENOS ACTAS ANTERIORES	-73,12
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
2,00	73,12	**75,12**

OBSERVACIONES: Contractual, memorias que soportan el corte No. 1 fecha 31 de enero 2026

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDÍN SOCIAL SAN JERONIMO DEL YUSTE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 23,3,4	**MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





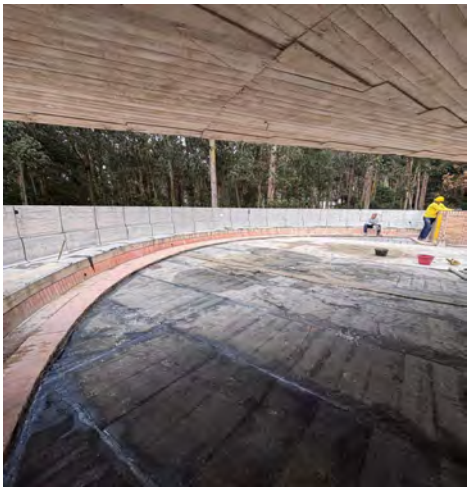

LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
MURO CIRCULAR ALREDEDOR DE LA TERRAZA	25,19	3,50	88,17	1,00	88,17
PLACA DE TERRAZA		75,12	75,12	1,00	75,12
TERRAZA NIVEL 3	1,80	4,91	8,84	1,00	8,84
	4,23	5,87	24,83	1,00	24,83
	0,52	1,62	0,84	1,00	0,84

TOTAL EJECUTADO	197,80
MENOS ACTAS ANTERIORES	-73,12
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**124,68**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
124,68	73,12	**197,80**

OBSERVACIONES: Contractual, memorias que soportan el corte No. 1 fecha 31 de enero 2026

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI NUEVOS PASOS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 5.1.19	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X50A 50 KA**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	TABLERO SEGUNDO PISO				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI NUEVOS PASOS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 5.1.24	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	UPS				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI NUEVOS PASOS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SALIDAS**		
ITEM: 5.2.2	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
RACK				1,00	1,00
TOMACORRIENTE COCINA				3,00	3,00

TOTAL EJECUTADO	4,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**4,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
4,00	0,00	**4,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI NUEVOS PASOS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SALIDAS**		
ITEM: 5.2.4	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
COCINA				3,00	3,00

TOTAL EJECUTADO	3,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**3,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI NUEVOS PASOS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CANALIZACIONES Y CALEADO ELECTRICO**		
ITEM: 5.4.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN					
RACK					
TABLERO		2,70			
CONEXIÓN RACK		9,20			
BAJADA PANEL DE INCENDIOS		2,77		14,67	14,67

TOTAL EJECUTADO	14,67
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**14,67**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
14,67	0,00	**14,67**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI NUEVOS PASOS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CANALIZACIONES Y CALEADO ELECTRICO**		
ITEM: 5.4.19	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
RACK					
BAJADA SEUNDO PISO A RACK		5,80			
BAJADA A PANEL		2,00		7,80	7,80

TOTAL EJECUTADO	7,80
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**7,80**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
7,80	0,00	**7,80**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI NUEVOS PASOS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 5.6.8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

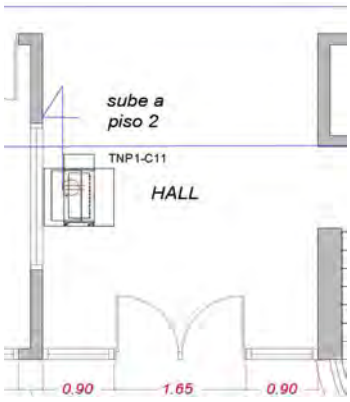





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
RACK				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JI NUEVOS PASOS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 5.6.10	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARED 9 Ur X 50 Cm NEGRO FM**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	RACK				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**		
ITEM: 1.3.2	**DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
PRIMER PISO					
COCINA	0,58		0,89	1,00	0,52
	0,58		0,79	1,00	0,46
	1,73		0,60	1,00	1,04
	0,98		0,64	1,00	0,63

TOTAL EJECUTADO	2,64
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,64**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,64	0,00	**2,64**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**		
ITEM: 1.5.3	**DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
PRIMER PISO					
AULA COORDINACION		12,68		1,00	12,68
AULA INTERDICIPLINARIOS		15,42		1,00	15,42
SEGUNDO PISO					
SALON 3		15,81		1,00	15,81
SALON 2		18,33		1,00	18,33
SALON 1		19,71		1,00	19,71
SALA MATERNA		20,35		1,00	20,35
SALA AMIGA		14,69		1,00	14,69
CAMINADORES		17,8		1,00	17,80
PREJARDIN 3		18,64		1,00	18,64
HALL		10,28		1,00	10,28
PASILLO		11,40		1,00	11,40
DEPOSITO		6,93		1,00	6,93
LAVANDERÍA		16,37		1,00	16,37

TOTAL EJECUTADO	198,41
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**198,41**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
198,41	0,00	**198,41**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**		
ITEM: 1,5,8	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

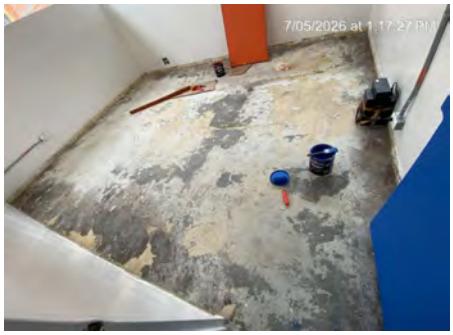

LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
PRIMER PISO					
AULA COORDINACION	3,13	3,67		1,00	11,49
AULA INTERDICIPLINARIOS	3,73	4,48		1,00	16,71

TOTAL EJECUTADO	28,20
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**28,20**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
28,20	0,00	**28,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**		
ITEM: 1,6,20	**DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLÁSTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, U OTROS RELACIONADOS.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	**SEGUNDO PISO**					
	LAVANDERIA				1	1

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**		
ITEM: 1,6,21	**DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	**SEGUNDO PISO**					
	BAÑO ADULTOS					
	LAVAMANOS				1,00	1,00
	SANITARIOS				2,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	3,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**3,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CONCRETOS**		
ITEM: 2,2,8	**PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

ANDÉN

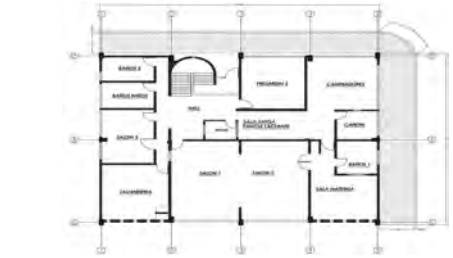





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**peso**		
FACHADA PRINCIPAL SUR-OCCIDENTAL EJE A ENTRE 1-5	1,92	20,33		1,00	39,03
FACHADA PRINCIPAL NOR-OCCIDENTAL EJE 5 ENTRE A-C	2,48	16,70		1,00	41,42

TOTAL EJECUTADO	80,45
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**80,45**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
80,45	0,00	**80,45**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ARQ. DAVID ISAZA / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**		
ITEM: 7,1,1	**ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 H.= 2 CM, SIN PENDIENTE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	PRIMER PISO					
	AULA INTERDICIPLINARIOS	3,73	4,48		1,00	16,71

TOTAL EJECUTADO	16,71
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**16,71**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
16,71	0,00	**16,71**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**		
ITEM: 7,2,17	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EROSSION 50 X 50 6MM COLORES**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
PRIMER PISO					
AULA COORDINACION	3,13	3,67		1,00	11,49
AULA INTERDICIPLINARIOS	3,73	4,48		1,00	16,71

TOTAL EJECUTADO	28,20
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**28,20**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
28,20	0,00	**28,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**		
ITEM: 7,3,2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
SEGUNDO PISO					
LAVACOLAS		11,16		1,00	11,16
CAFETIN		9,22		1,00	9,22
PRIMER PISO					
COCINA		2,75		1	2,75

TOTAL EJECUTADO	23,13
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**23,13**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
23,13	0,00	**23,13**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**		
ITEM: 7,3,9	**GUARDA ESCOBA EN PVC**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
PRIMER PISO					
AULA COORDINACION	3,13	3,67		1,00	11,49
AULA INTERDICIPLINARIOS	3,73	4,48		1,00	16,71

TOTAL EJECUTADO	28,20
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**28,20**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
28,20	0,00	**28,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**OTROS**		
ITEM: 7,4,1	**BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
PRIMER PISO					
AULA COORDINACION		0,75		1,00	0,75
AULA INTERDICIPLINARIOS		0,76		1,00	0,76

TOTAL EJECUTADO	1,51
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,51**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,51	0,00	**1,51**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 9.2,2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
PRIMER PISO					
COCINA	0,58		0,89	1,00	0,52
	0,58		0,79	1,00	0,46
	1,73		0,60	1,00	1,04
	0,98		0,64	1,00	0,63

TOTAL EJECUTADO	2,64
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,64**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
2,64	0,00	**2,64**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 9,3,1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	PRIMER PISO					
	COCINA	0,58		0,89	1,00	0,52
		0,58		0,79	1,00	0,46
		1,73		0,60	1,00	1,04
		0,98		0,64	1,00	0,63

TOTAL EJECUTADO	2,64
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,64**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,64	0,00	**2,64**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 11,5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	**BAÑO ADULTOS**					
	SANITARIOS				2,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 11,23	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	**BAÑOS**					
	LAVAMANOS				2,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 11,23	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	SEGUNDO PISO					
	LAVANDERIA				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CIELOS RASOS.**		
ITEM: 14,1,2	**CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	CIELO RASO ACCESO PEATONAL	1,8	2,2		1	3,96

TOTAL EJECUTADO	3,96
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**3,96**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
3,96	0,00	**3,96**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 15,2,1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADOS 1.5 DE E=4MM. INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	BAÑO 1 PISO NIÑAS	2		0,6	1	1,2

TOTAL EJECUTADO	1,20
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,20**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,20	0,00	**1,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		
ITEM: 19.1	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

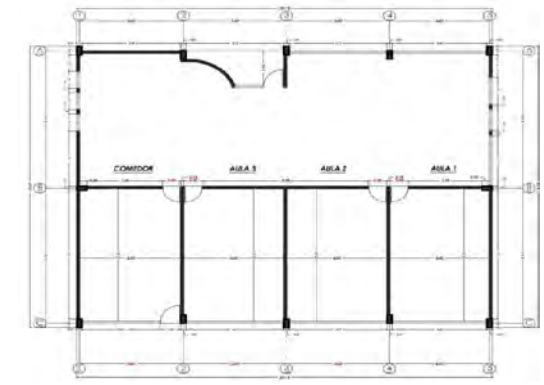

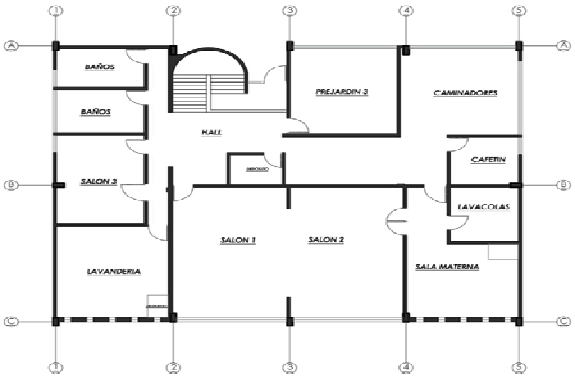

LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
PRIMER PISO					
COMEDOR	4,7	7,78		1,00	36,57
AULA 3	4,86	7,42		1,00	36,06
	0,88	0,4		1,00	0,35
AULA 1	4,8	7,8		1,00	37,44
AULA 2	4,87	7,41		1,00	36,09
	0,48	0,90		1,00	0,43
AULA COORDINACION	3,13	3,67		1,00	11,49
AULA INTERDICIPLINARIOS	3,73	4,48		1,00	16,71
SEGUNDO PISO					
BAÑOS NIÑOS	0,73	1,37		1,00	1,00
	0,70	1,37		1,00	0,96
	0,71	1,37		1,00	0,97
	0,80	1,53		1,00	1,22
	2,40	0,80		1,00	1,92
	1,30	1,50		1,00	1,95
HALL - PASILLO	0,89	8,93		1,00	7,95
HALL	2,34	4,91		1,00	11,49
	1,75	2,67		1,00	4,67
DEPOSITO	1,63	2,12		1,00	3,46
LAVANDERÍA	4,80	5,25		1,00	25,20
CAFETÍN	2,49	2,51		1,00	6,25
BAÑOS 2 - LAVA COLAS	1,80	1,14		1,00	2,05

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		
ITEM: 19.1	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
	[illegible]	2,62	1,4		1,00	3,67
	SALON 3	5,19	3,74		1,00	$ 19,41
	SALON 2	7,78	4,84		1,00	$ 37,66
	SALON 1	7,80	4,83		1,00	$ 37,67
		0,16	4,97		1,00	$ 0,80
	SALA MATERNA	4,21	4,70		1,00	$ 19,79
		2,00	2,65		1,00	$ 5,30
		0,97	1,00		1,00	$ 0,97
	SALA AMIGA	7,14	2,61		1,00	$ 18,64
	CAMINADORES	4,76	5,18		1,00	$ 24,66
	PREJARDIN 3	5	4,77		1,00	$ 23,85
					TOTAL EJECUTADO	436,63
					MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
					MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
					PRESENTE ACTA	**436,63**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
436,63	0,00	**436,63**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		
ITEM: 22.1.10	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
PRIMER PISO					
PUERTA COMEDOR	0,78		1,9	2,00	2,96
PUERTA HOJA COCINA	0,81		2,25	2,00	3,65
DESCUENTO	0,27		0,47	2,00	-0,25
PUERTA HOJA ACCESO	0,91		2,24	2,00	4,08
	0,91		2,24	2,00	4,08

TOTAL EJECUTADO	14,51
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**14,51**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
14,51	0,00	**14,51**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**		
ITEM: 22.1.11	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
PRIMER PISO					
COCINA VENTANA 1	0,88			2	1,76
	0,57			2	1,14
COCINA VENTANA 2	0,78			2	1,56
	0,57			2	1,14
COCINA VENTANA 3	1,74			2	3,48
	0,57			2	1,14
MUROS	0,9			2	1,8
MARCOS DE PUERTA 1 PISO					
PUERTA PRINCIPAL	18,70			1,00	18,7
BAÑO NIÑOS	6,12			1,00	6,12
BAÑO NIÑAS	6,10			1,00	6,1
CUARTO INTERDICIEPLINARIO	6,12			1,00	6,12
CUATO COORDINACION	6,10			1,00	6,1
AULA 1	6,04			1,00	6,04
AULA 2	6,12			1,00	6,12
AULA 3	6,12			1,00	6,12
COMEDOR INTERIOR	6,20			1,00	6,2
COMEDOR EXTERIOR	6,40			1,00	6,4
MARCOS DE PUERTA 2 PISO					
PREJARDIN 3	5,72			1,00	5,72
SALA AMIGA	5,08			1,00	5,08
CAFETIN	6,26			1,00	6,26
BAÑO LAVACOLAS	4,92			1,00	4,92
SALA MATERNA	5,77			1,00	5,77
SALON 1	6,28			1,00	6,28
LAVANDERIA	5,50			1,00	5,5
SALON 3 PUERTA 1	5,83			1,00	5,83
SALON 3 PUERTA 2	6,22			1,00	6,22
BAÑO NIÑOS	6,26			1,00	6,26
BAÑO ADULTOS	6,26			1,00	6,26
VENTANA 1 DEPOSITO	6,66			1,00	6,66
VENTANA SALON 1	12,32			1,00	12,32
VENTANA PUNTO FIJO	9,08			1,00	9,08
BARANDA PUNTO FIJO	15,75			1,00	15,75
				TOTAL EJECUTADO	193,95
				MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
				MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
				PRESENTE ACTA	**193,95**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
193,95	0,00	**193,95**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**JARDIN INFANTIL TRINIDAD GALAN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA.**		
ITEM: 22.4,1	**PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

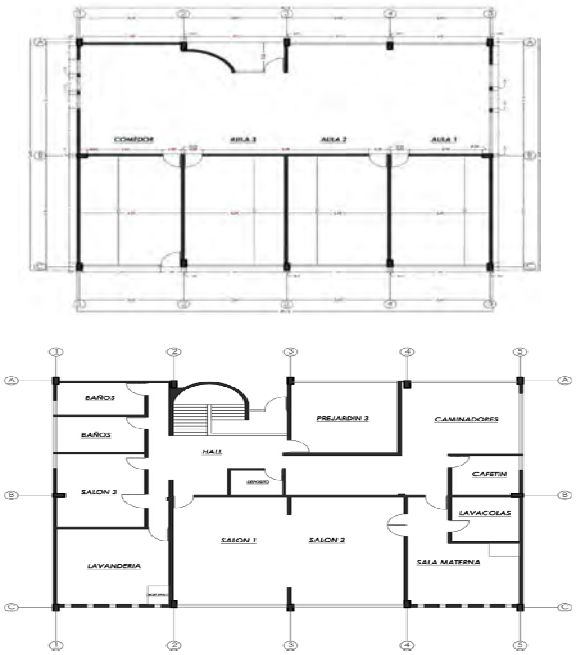

LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
PRIMER PISO					
BAÑOS NIÑOS	0,78		1,1	2,00	1,72
BAÑOS NIÑAS	0,78		1,1	2,00	1,72
COORDINACION	0,8		1,1	2,00	1,76
INTERDICIPLINARIO	0,78		1,90	2,00	2,96
AULA 3	0,77		1,10	2,00	1,69
ALA 2	0,73		1,10	2,00	1,61
AULA 1	0,77		1,10	2,00	1,69
COMEDOR	0,77		1,10	2,00	1,69
CUARTO BASURAS	0,58		1,92	2,00	2,23
SUBIDA PUNTO FIJO	1,43		1,18	2,00	3,37
SEGUNDO PISO					
ENTRADA HALL	1,38		1,16	2,00	3,20
BAÑO ADULTOS	0,80		1,98	2,00	3,17
BAÑO NIÑOS	0,79		1,10	2,00	1,74
SALON 3	0,79		1,10	2,00	1,74
	1,10		2,34	2,00	5,15
LAVANDERIA	0,79		1,95	2,00	3,08
LUDOTECA	0,80		1,95	2,00	3,12
	1,94		2,36	2,00	9,16
DESCUENTO	0,66		1,14	2,00	-1,50
LAVACOLAS	0,80		2,01	2,00	3,22
DESCUENTO	0,49		0,84	2,00	-0,82
SALA MATERNA	0,97		1,10	2,00	2,13
PREJARDIN 3	0,78		1,10	2,00	1,72
SALA AMIGA	0,79		1,10	2,00	1,74
	1,10		2,17	2,00	4,77
CAFETIN	0,85		1,10	2,00	1,87
				TOTAL EJECUTADO	63,92
				MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
				MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
				PRESENTE ACTA	**63,92**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
63,92	0,00	**63,92**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		


CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**		
ITEM: 1,3,2	**DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







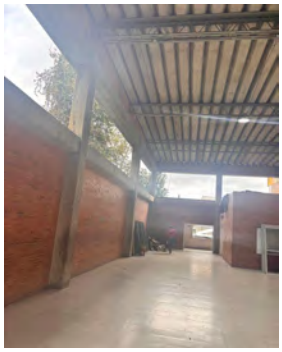

LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Alto**	**Area**		
DESMONTE VENTANAS COLISEO	2,78	1,08	3,00	2,00	6,00
	4,40	2,00	8,80	4,00	35,20
	6,60	2,00	13,20	4,00	52,80

TOTAL EJECUTADO	94,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**94,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
94,00		**94,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**		
ITEM: 1.3.6	**DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES Y PUERTAS METÁLICAS DE CABINAS DE BAÑO (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**M2**

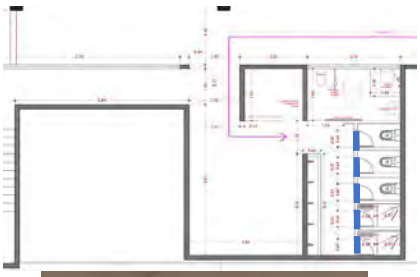ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Alto	Area		
 	DESMONTE PUERTAS CABINAS	0,52	1,75	0,91	7,00	6,37

TOTAL EJECUTADO	6,37
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**6,37**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
6,37		**6,37**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		


CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**		
ITEM: 1,3,7	**DESMONTE MANUAL DE REJAS METÁLICAS Y/O VARILLAS DE ACERO EN VANOS DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







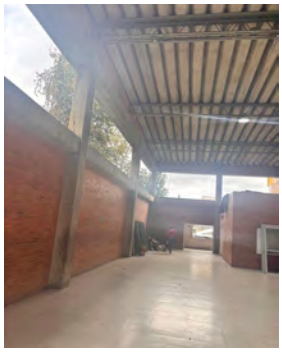

LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Alto**	**Area**		
DESMONTE REJAS COLISEO	2,78	1,08	3,00	2,00	6,00
	4,40	2,00	8,80	4,00	35,20
	6,60	2,00	13,20	4,00	52,80

TOTAL EJECUTADO	94,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**94,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
94,00		**94,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**		
ITEM: 1.6.21	**DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.**	**UNIDAD**	**UN**

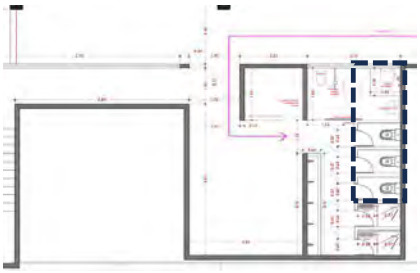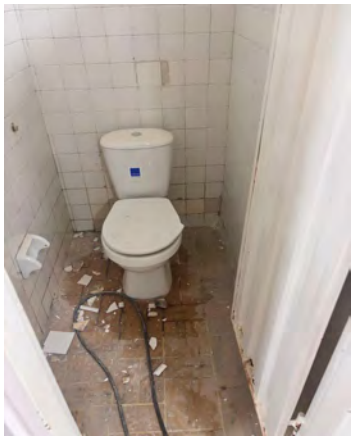ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Alto**	**Area**		
	SANITARIOS				5,00	5,00
						

TOTAL EJECUTADO	5,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**5,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
5,00		**5,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**		
ITEM: 1.8.5	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Alto**	**Area**		
DEMOLICION DE ENCHAPES MUROS CABINAS WC HOMBRES	0,95	2,09	1,99	7,00	13,90
	1,45	2,09	3,03	12,00	36,37
	0,42	2,09	0,88	10,00	8,78
MUROS BAÑOS	3,10	2,09	6,48	2,00	12,96
MUROS DE LAVAMANOS	3,89	2,09	8,13	1,00	8,13
	1,91	2,09	3,99	1,00	3,99

TOTAL EJECUTADO	84,12
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**84,12**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
84,12		**84,12**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**		
ITEM: 1.8.12	**MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Alto**	**Area**		
DEMOLICION DE MUROS CABINAS	1,45	2,09	3,03	1,00	3,03
MOCHETAS	0,42	2,09	0,88	2,00	1,76
MOCHETA DE DUCHAS	0,42	2,09	0,88	2,00	1,76
BANCAS DUCHAS	0,60	0,70	0,42	2,00	0,84

TOTAL EJECUTADO	7,38
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**7,38**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
7,38		**7,38**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**		
ITEM: 1.9.10	**DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

COLISEO -BAÑOS
ACTUAL

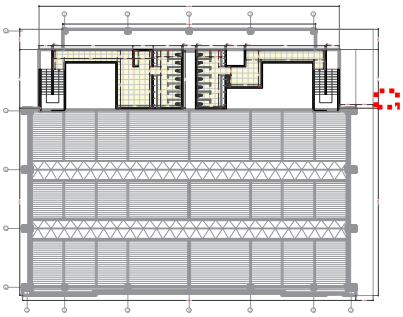



LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Alto	Area		
DEMOLICION DE RAMPA	1,46	1,15	1,68	1,00	1,68

TOTAL EJECUTADO	1,68
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,68**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
1,68		**1,68**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**		
ITEM: 110.5	**DEMOLICIÓN MANUAL DE LAVAMANOS, LAVADERO Y ORINALES CORRIDOS (INDIFERENTE DEL MATERIAL). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL ELEMENTO EN SU COSTADO CONTRA EL MURO.**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Alto	Area		
 	LAVAMANOS	1,91			1,00	1,91

TOTAL EJECUTADO	1,91
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,91**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
1,91		**1,91**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**		
ITEM:2.1.4	**EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M3**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

COLISEO -BAÑOS
ACTUAL

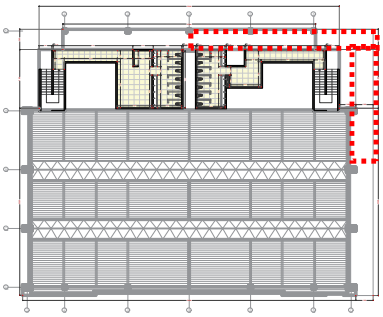





LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Area	Prof	Volumen		
ACCESO A BAÑOS	9,52	0,30	2,86	1,00	2,86

TOTAL EJECUTADO	2,86
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,86**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
2,86		**2,86**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**		
ITEM:2.1.9	**RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.**	**UNIDAD**	**M3**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

COLISEO -BAÑOS
ACTUAL

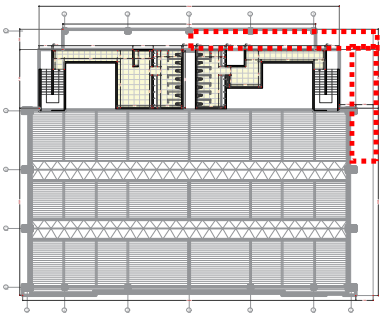



LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Area	Prof	Volumen		
placa en concreto hacia baños	9,52	0,10	0,95	1,00	0,95
	3,77	0,10	0,38	1,00	0,38
	2,26	0,10	0,23	1,00	0,23
	3,70	0,10	0,37	1,00	0,37
	10,13	0,10	1,01	1,00	1,01
	7,02	0,10	0,70	1,00	0,70
	14,95	0,10	1,50	1,00	1,50

TOTAL EJECUTADO	5,13
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**5,13**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
5,13		**5,13**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**		
ITEM:2.2.9	**PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>12,1<=15,0 CM F'C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

COLISEO -BAÑOS
ACTUAL

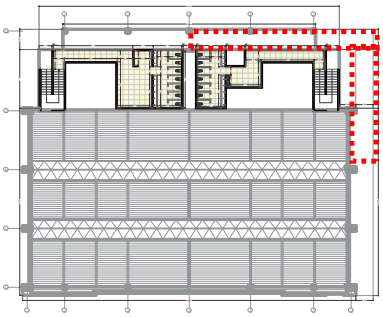





LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Area		
ACCESO A BAÑOS	5,00	2,28	11,40	1,00	11,40
	1,77	1,33	2,35	1,00	2,35
	5,28	1,33	7,02	1,00	7,02
	2,18	1,33	2,90	1,00	2,90
	2,18	3,71	8,09	1,00	8,09
	2,90	2,42	7,02	1,00	7,02
	6,50	2,30	14,95	1,00	14,95
	2,90	0,38	1,10	1,00	1,10

TOTAL EJECUTADO	54,83
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**54,83**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
54,83		**54,83**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**		
ITEM:2.4.2	**CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Area		
	ACCESO A BAÑOS		2,40		1,00	2,40

COLISEO -BAÑOS
ACTUAL

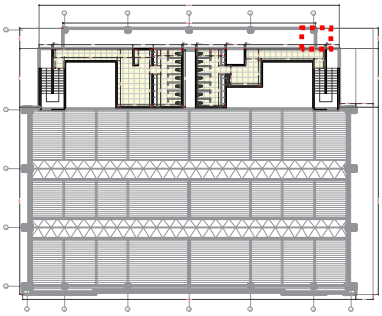



TOTAL EJECUTADO	2,40
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,40**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
2,40		**2,40**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**		
ITEM:2.5.1	**MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN. PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA**	**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

COLISEO -BAÑOS
ACTUAL

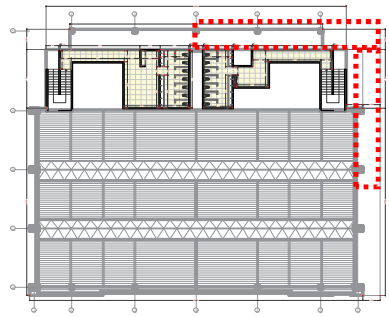





LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	PESO	Area		
PLACA ACCESO A BAÑOS		1,33	131,50	1,00	174,90

TOTAL EJECUTADO	174,90
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**174,90**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
174,90		**174,90**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**		
ITEM:2.5.1	**MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN. PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA**	**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	LONG	Area		
	COLUMAS DE CONFINAMIENTO ACCEO A BAÑOS				2,00	2,00

COLISEO -BAÑOS
ACTUAL

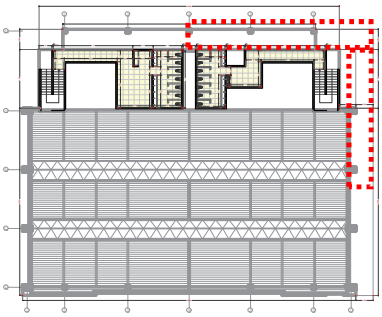

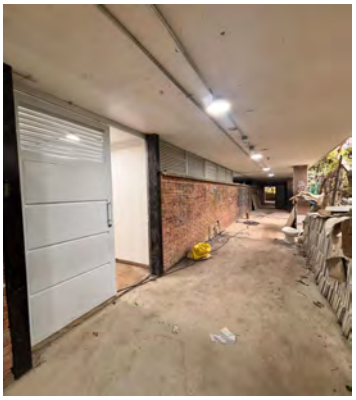

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
2,00		**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**		
ITEM: 4,1,11	**TUBERÍA PVCP 1,1/2" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.**	**UNIDAD**	**M**

1

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Long	Alto	Area		
 	TUBERIA 1 1/2	1,20			1,00	1,20
		2,70			1,00	2,70
		12,00			1,00	12,00
		1,80			1,00	1,80
		0,80			1,00	0,80
		1,40			1,00	1,40
		1,60			1,00	1,60

TOTAL EJECUTADO	21,50
MENOS ACTAS ANTERIORES	-18,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**3,50**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
3,50	18,00	**21,50**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**		
ITEM: 7,3,6	**GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE**	**UNIDAD**	**MI**

1

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Long**	**Alto**	**Area**		
baño mujeres	30,63			1	30,63
	8,60			1	8,60
					0,00
					0,00
					0,00


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**		
ITEM:7.4.10	**BORDILLO PREFABRICADO A80**	**UNIDAD**	**ml**

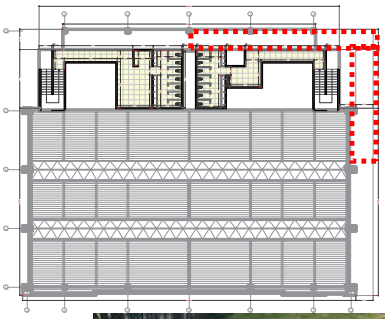ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Area		
COLISEO -BAÑOS *ACTUAL*  	ACCESO A BAÑOS		7,20		1,00	7,20
			7,65		1,00	7,65
			7,48		1,00	7,48
			1,37		1,00	1,37
			1,32		1,00	1,32
			1,32		1,00	1,32
			3,60		1,00	3,60
			2,22		1,00	2,22
			2,00		1,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	34,16
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**34,16**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
34,16		**34,16**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 8,2	**ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.**	**UNIDAD**	**M2**

1

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Long	Alto	Area		
1	1,36	1,93	2,62	1	2,62
	0,89	1,93	1,72	1	1,72
	1,50	1,93	2,90	1	2,90
	1,36	1,93	2,62	1	2,62
	0,93	1,93	1,79	1	1,79
	1,50	1,93	2,90	1	2,90
	1,37	1,93	2,64	1	2,64
	0,89	1,93	1,72	1	1,72
	1,51	1,93	2,91	1	2,91
	1,37	1,93	2,64	1	2,64
	0,90	1,93	1,74	1	1,74
	1,51	1,93	2,91	1	2,91
	1,39	1,93	2,68	1	2,68
	0,67	1,93	1,29	1	1,29
	2,96	1,93	5,71	1	5,71
	3,84	1,35	5,20	1	5,20
	0,84	0,60	0,50	1	0,50
	0,50	1,93	0,97	10	9,65
	0,12	1,93	0,23	5	1,16
	3,80	0,60	2,28	1	2,28
	1,90	1,93	3,67	2	7,33
	2,05	1,90	3,90	1	3,90
	1,50	1,93	2,90	1	2,90
	0,45	0,6	0,27	3	0,81

TOTAL EJECUTADO	72,54
MENOS ACTAS ANTERIORES	-66,32
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**6,22**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
6,22	66,32	**72,54**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM:9.1,5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.**	**UNIDAD**	**ml**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Area		
	ACCESO A BAÑOS	2,50	1,83	4,58	1,00	4,58

COLISEO -BAÑOS
ACTUAL

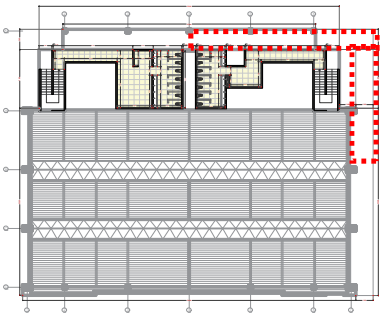



TOTAL EJECUTADO	4,58
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**4,58**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
4,58		**4,58**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM:9.3.6	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18**	**UNIDAD**	**ml**

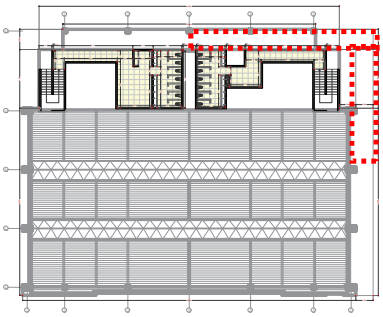ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Area		
COLISEO -BAÑOS *ACTUAL*  	ACCESO A BAÑOS				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
1,00		**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM11.5	**SSUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)**	**UNIDAD**	**ml**

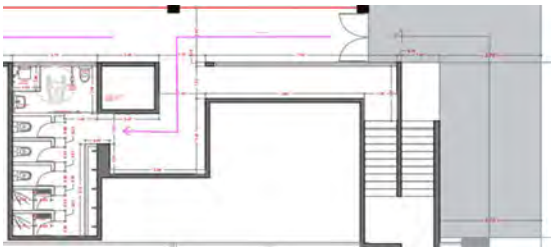ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Area		
	BAÑO MUJERES				4,00	4,00
						

TOTAL EJECUTADO	4,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**4,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
4,00		**4,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**
	CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM 11.18	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE ACOPLE, GRIFERÍA ELECTRÓNICA, SIFÓN EN P, DESAGÜE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)**	**UNIDAD**	**ml**

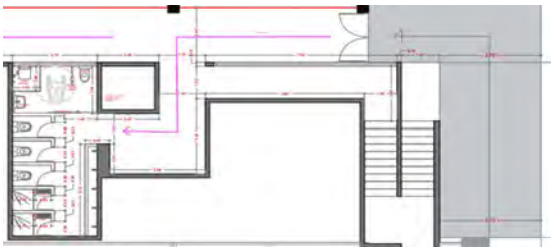ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
 	BAÑO MUJERES				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00		**1,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**
	CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM 11.22	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHAS 8" COMPLETA CON GRIFERÍA**	**UNIDAD**	**ml**

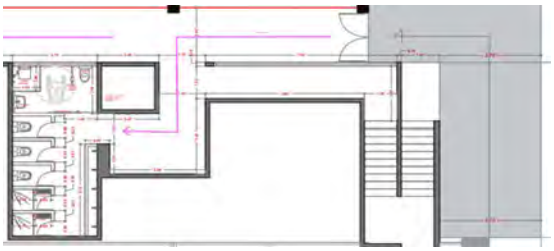ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
	BAÑO MUJERES				3,00	3,00


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM11.23	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS**	**UNIDAD**	**ml**

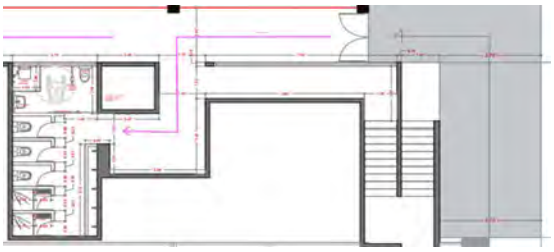ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
	BAÑO MUJERSES				5,00	5,00
						

TOTAL EJECUTADO	5,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**5,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
5,00		**5,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM11.30	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"**	**UNIDAD**	**ml**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

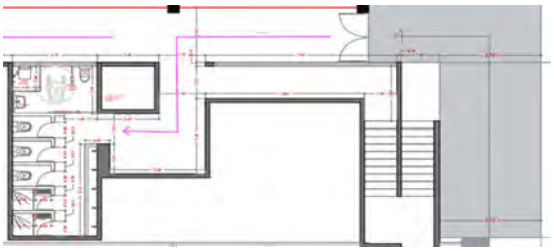



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
BAÑO MUJERSES				2,00	2,00
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	3,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**3,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
3,00		**3,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM11.41	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE**	**UNIDAD**	**ml**

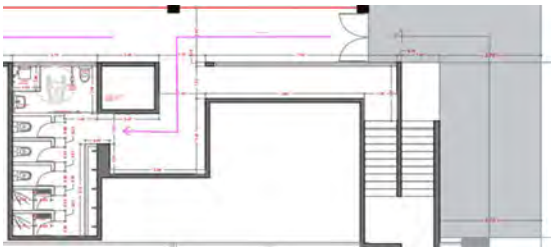ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
						
	BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA				1,00	1,00
						

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00		**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM11.42	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA 18"**	**UNIDAD**	**ml**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

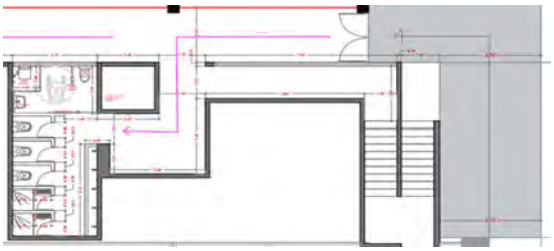



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00		**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM 12.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS**	**UNIDAD**	**ml**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
DIVISIONES DE BAÑOS	0,52	1,75	0,91	3,00	2,73
DIVISION WC DISCAPACITADOS	0,42	1,90	0,80	1,00	0,80
	1,10	1,81	1,99	1,00	1,99
DIVISIONES DE DUCHAS	0,52	1,75	0,91	2,00	1,82

TOTAL EJECUTADO	7,34
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**7,34**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
7,34		**7,34**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM 15.2.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADOS 1.5 DE E=4MM. INCLUYE INSUMOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**ml**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

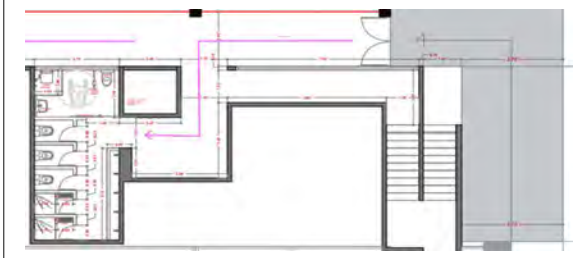

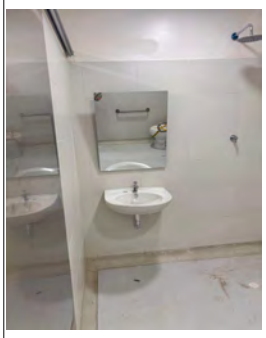



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
DIVISIONES DE BAÑOS	0,52	1,75	0,91	3,00	2,73
DIVISION WC DISCAPACITADOS	0,42	1,90	0,80	1,00	0,80
	1,10	1,81	1,99	1,00	1,99
DIVISIONES DE DUCHAS	0,52	1,75	0,91	2,00	1,82

TOTAL EJECUTADO	7,34
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**7,34**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
7,34		**7,34**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		
ITEM:22.1.9	**PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

COLISEO -BAÑOS
ACTUAL

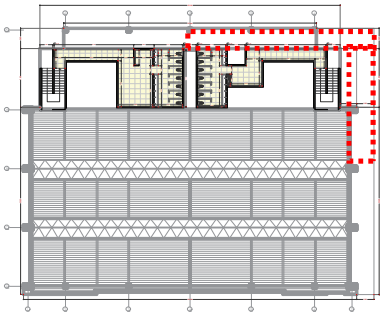





LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Area		
muros	2,50	0,55	1,38	1	1,38
	2,03	0,55	1,12	1	1,12
	7,15	0,55	3,93	1	3,93
cielo raso	3,05	7,15	21,81	1	21,81

TOTAL EJECUTADO	28,23
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**28,23**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
28,23		**28,23**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CDC LA VICTORIA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**OTRAS ACTIVIDADES**		
ITEM:25.2	**MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

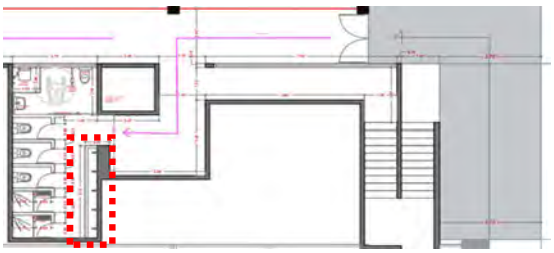

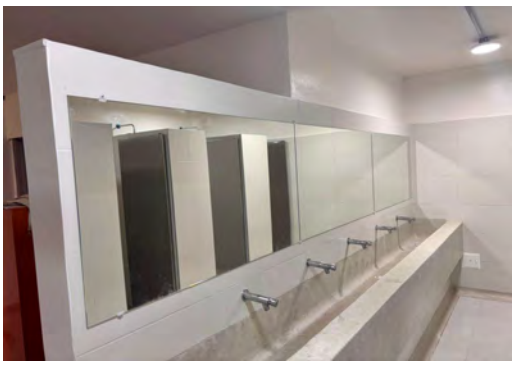

LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
LAVAMANOS		3,80		1	3,80

TOTAL EJECUTADO	3,80
MENOS ACTAS ANTERIORES	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**3,80**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
3,80		**3,80**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM:1.3.2	**DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







ACTUAL







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
SEDE INFANCIA	3,45	0,6	2,07	1	2,07
	1,66	0,6	1,00	1	1,00
	0,7	6	4,20	1	4,20
	5,05	1,86	9,39	1	9,39
					0,00
SUB DIRECCION	1,86	3,33	6,19	1	6,19
	0,58	3,55	2,06	1	2,06
	6,70	1,86	12,46	1	12,46
	9,86	1,86	18,34	1	18,34
	6,70	1,86	12,46	2	24,92
	1,86	1,86	3,46	1	3,46
	9,98	0,58	5,79	1	5,79
	1,86	3,33	6,19	1	6,19
	6,70	1,86	12,46	1	12,46
	6,70	1,86	12,46	1	12,46

TOTAL EJECUTADO	121,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**121,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
121,00	0,00	**121,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM:1.3.7	**DESMONTE MANUAL DE REJAS METÁLICAS Y/O VARILLAS DE ACERO EN VANOS DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

ACTUAL





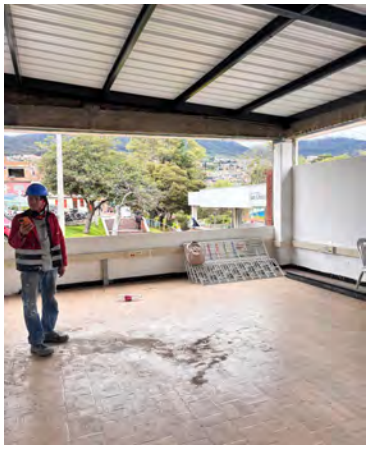

LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
SEDE INFANCIA	3,45	0,6	2,07	1	2,07
	1,66	0,6	1,00	1	1,00
	0,7	6	4,20	1	4,20
	5,05	1,86	9,39	1	9,39

TOTAL EJECUTADO	16,66
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**16,66**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
16,66	0,00	**16,66**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM:1.4.7	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



FACHADA LATERAL IZQUIERDA
ACTUAL









LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
INFANCIA	7,33	7,6	55,71	1	55,71
SUBDIRECCION	28,8	7,9	227,52	1	227,52
	14,4	2,3	33,12	1	33,12
				1	

TOTAL EJECUTADO	316,35
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**316,35**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
316,35	0,00	**316,35**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM:1.4.9	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
EDIFICIO INFANCIA	1,1	1,73	1,90	1	1,90
				1	

TOTAL EJECUTADO	1,90
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,90**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
1,90	0,00	**1,90**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM:1.6.26	**DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



FACHADA LATERAL IZQUIERDA
ACTUAL





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
EDIFICIO INFANCIA				8	0,00
SUBDIRECCION				41	41,00
ACCESO				3	3,00
				1	

TOTAL EJECUTADO	44,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**44,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
44,00	0,00	**44,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		


CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM:1.7.5	**DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

FACHADA POSTERIOR
ACTUAL



FACHADA LATERAL IZQUIERDA
ACTUAL





LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
EDIFICIO INFANCIA	6,93	7,2	49,90	1	49,90
SUBDIRECCION	28,4	7,5	213,00	1	213,00
	14	1,9	26,60	1	26,60
				1	

TOTAL EJECUTADO	289,50
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**289,50**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
289,50	0,00	**289,50**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM:1.9.2	**DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.). INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD / ALTURA DE LA PIEZA.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
EDIFICIO INFANCIA	6,93	7,2	49,90	1	49,90
SUBDIRECCION	28,4	7,5	213,00	1	213,00
	14	1,9	26,60	1	26,60
				1	

TOTAL EJECUTADO	289,50
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**289,50**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
289,50	0,00	**289,50**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		


CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM:2.3.5	**ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

FACHADA FRONTAL
ACTUAL



FACHADA LATERAL IZQUIERDA
ACTUAL







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**PERFORACIONES**	**Peso**	**pseoxperfil**		
EDIFICIO INFANCIA					
PLATINA 0,2x0,2x9,5mm	4			6	24,00
SUBDIRECCION					0,00
PLATINA 0,2x0,2x9,5mm	4			34	136,00

TOTAL EJECUTADO	160,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**160,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
160,00	0,00	**160,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM:2.6.2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)**	**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



FACHADA LATERAL IZQUIERDA
ACTUAL







LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	**Ancho**	**Peso**	**pseoxperfil**		
EDIFICIO INFANCIA					
PERFIL ,14*,10*3mm	7,2	7,33	52,80	3	158,40
	0,42	7,33	3,08	3	9,24
PERFIL ,15*,50*3mm	6,93	9,42	65,28	7	456,96
TENSOR					
PLATINA 0,2x0,2x9,5mm		0,19		6	1,14
SUBDIRECCION					
PERFIL ,14*,10*3mm	7,67	7,33	56,25	8	449,97
	2,36	7,33	17,31	5	86,53
	7,5	7,33	55,00	1	55,00
PERFIL ,15*,50*3mm	28	9,42	263,76	8	2110,08
	13	9,42	122,46	3	367,38
TENSOR					
PLATINA 0,2x0,2x9,5mm		0,19		34	6,46

TOTAL EJECUTADO	3.701,17
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**3701,17**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
3701,17	0,00	**3701,17**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 5.1.5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

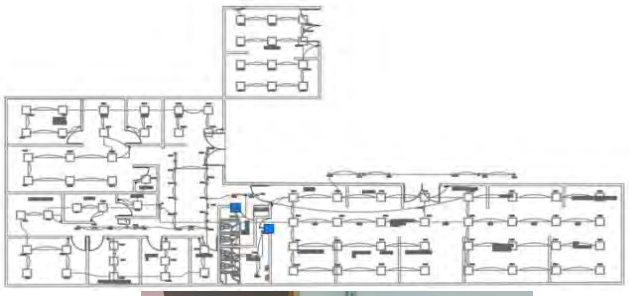



LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
BAÑO DE HOMBRES				1,00	1,00
BAÑO MUJERES				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 5.1.7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

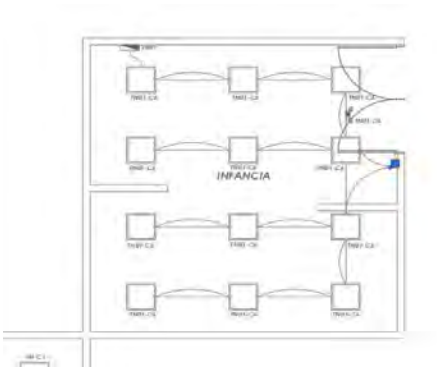



LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
INFANCIA				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 5.1.19	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X50A 50 KA**	**UNIDAD**	**UN.**

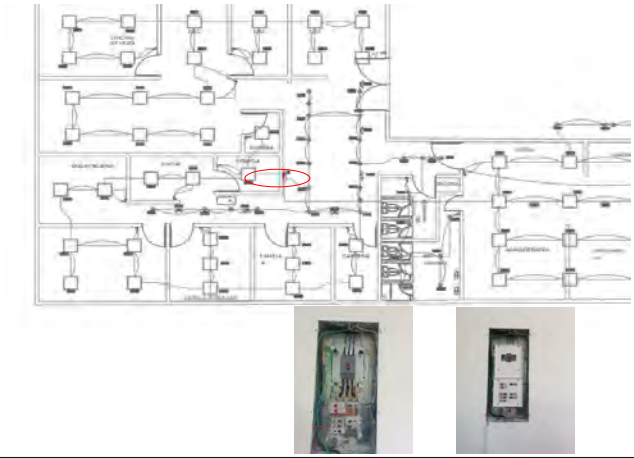ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
	TABLERO PASILLO				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 5.1.24	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

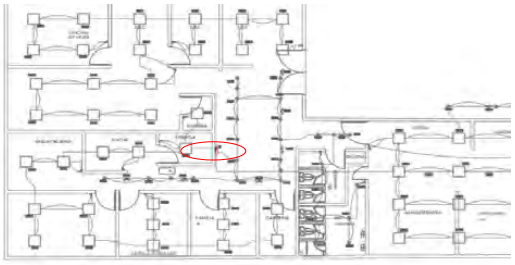



LOCALIZACIÓN LUGAR	Ancho	Largo	Alto	CANTIDAD	TOTAL
TN-C1				1,00	1,00
TN-C2				1,00	1,00
TN-C3				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	3,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**3,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SALIDAS**		
ITEM: 5.2.14	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
SALIDA LUMINARIAS 60X60					
INFANCIA				12,00	12,00
SOCIAL				4,00	4,00
ADMON				2,00	2,00
ADMINISTRATIVA				2,00	2,00
CRECIENDO EN FAMILIA				4,00	4,00
CONTRATACIÓN				2,00	2,00
ENTRADA				2,00	2,00
CONTRATACIÓN				2,00	2,00
ADMON				4,00	4,00
SECRETARIA SUBDIRECCIÓN				2,00	2,00
PLANEACIÓN TERRITORIAL				4,00	4,00
SUBDIRECCIÓN				4,00	4,00
SALIDA DE ILUMINACIÓN PANEL LED REDONDA					
PASILLO POR BAÑOS				2,00	2,00
BAÑOS HOMBRES				2,00	2,00
BAÑO MUJERES				5,00	5,00
PASILLO				6,00	6,00

TOTAL EJECUTADO	59,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**59,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
59,00	0,00	**59,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SALIDAS**		
ITEM: 5.2.16	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

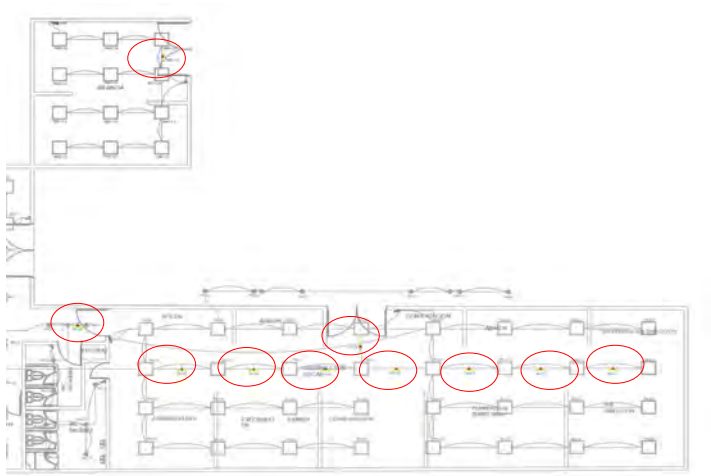



LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
INFANCIA				1,00	1,00
PASILLO POR BAÑOS				1,00	1,00
SUBDIRECCIÓN LOCAL				7,00	7,00
ENTRADA				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	10,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**10,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
10,00	0,00	**10,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SALIDAS**		
ITEM: 5.3.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA**	**UNIDAD**	**UN.**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	INFANCIA				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**		
ITEM: 5.4.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

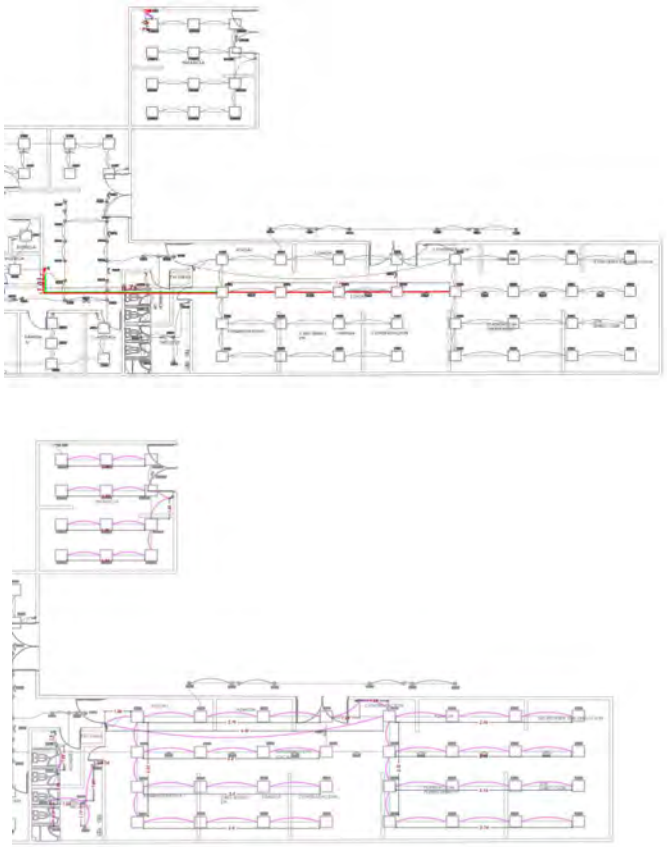

LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN					
TN-C4					
RESERVA TABLERO		2,70			
SALIDA DE TABLERO		1,01			
TRAYECTO ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO		8,75			12,46
TN-C5					
RESERVA TABLERO		2,70			
SALIDA DE TABLERO		1,01			
TRAYECTO ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO		8,75			
		11,24			23,70
TN-C6					
RESERVA TABLERO		2,70			
SUBIDA ATECHO		1,5			
TRAYECTO ALIMETACIÓN		2,00			6,20
INTERRUPTORES RETORNOS					
BAÑO DE HOMBRES					
RECORRIDO EN ILUMINACIÓN		1,22			
BAJA		1,50			2,72
BAÑO MUJERES					
RECORRIDO EN ILUMINACIÓN		1,69			DIS
		1,17			
		1,50			
BAJA		1,00			5,36
SUBDIRECCIÓN LOCAL					
RECORRIDO EN ILUMINACIÓN		2,75			
		4,33			
		2,32			28,11
		2,40			
		2,40			
		2,74			
		2,32			
		2,74			
		2,74			
		0,91			
BAA		1,22			
		1,24			

	78,55
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**78,55**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
78,55	0,00	**78,55**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**		
ITEM: 5,4,19	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

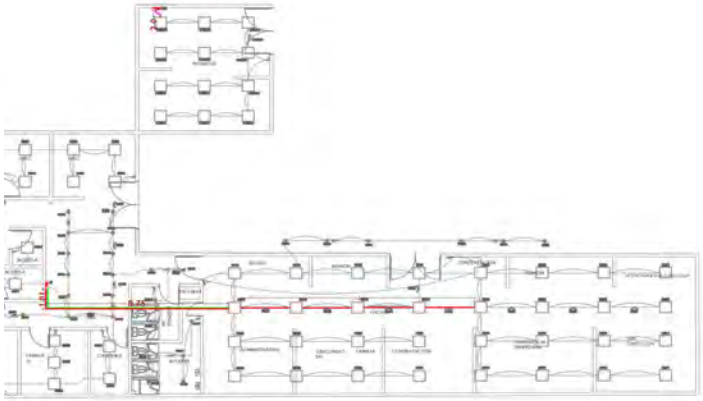





LOCALIZACIÓN LUGAR	Ancho	Largo	Alto	CANTIDAD	TOTAL
TN-C4					
SUBIDA DE TABLERO		1,01			
ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO		8,75			9,76
TN-C5					
SUBIDA DE TABLERO		1,01			
ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO		8,75			
		11,24			21,00
TN-C6					
SUBIDA DE TABLERO		1,50			
ALIMENTACIÓN DE CIRCUITO		2,00			3,50

TOTAL EJECUTADO	34,26
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**34,26**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
34,26	0,00	**34,26**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SLIS SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)**		
CAPITULO	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**		
ITEM 22.3.5	**ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Peso**		
EDIFICIO INFANCIA					
PERFIL ,14*,10*3mm	7,2			3	21,60
	0,42			3	1,26
PERFIL ,15*,50*3mm	6,93			7	48,51
					0,00
TENSOR					0,00
PLATINA 0,2x0,2x9,5mm	0,2			14	2,80
SUBDIRECCION					0,00
PERFIL ,14*,10*3mm	7,67			8	61,36
	2,36			5	11,80
	7,5			1	7,50
PERFIL ,15*,50*3mm	28			8	224,00
	13			3	39,00
					0,00
TENSOR					0,00
PLATINA 0,2x0,2x9,5mm	0,2			52	10,40
				TOTAL EJECUTADO	417,83
				MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
				MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
				PRESENTE ACTA	**417,83**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
417,83	0,00	**417,83**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		


CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM:23.4.5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

FACHADA POSTERIOR
ACTUAL



FACHADA LATERAL IZQUIERDA
ACTUAL







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
INFANCIA	7,33	7,6	55,71	1	55,71
SUBDIRECCION	28,8	7,9	227,52	1	227,52
	14,4	2,3	33,12	1	33,12
TEJA ACCESO A SUDIRECCION	6,2	2,1	13,02	1	13,02

TOTAL EJECUTADO	329,37
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**329,37**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
329,37	0,00	**329,37**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SAN CRISTOBAL**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM:23.8.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
INFANCIA		6,93		1	6,93
		7,2		1	7,20
		6,93		1	6,93
					0,00
SUBDIRECCION		56,8		1	56,80
		15		1	15,00
		28		1	28,00
		3,8		1	3,80
CUBIERTA ACCESO A SUB DIRECCION		11,8		1	11,80

TOTAL EJECUTADO	136,46
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**136,46**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
136,46	0,00	**136,46**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ SANDRA SIERRA/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CENTRO AMAR MARTIRES 2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		
ITEM: 1.4.9	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	PATIO - COCINA SEGUNDO PISO	3	3,98		1,00	11,94
						

TOTAL EJECUTADO	11,94
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**11,94**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
11,94	0,00	**11,94**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CENTRO AMAR MARTIRES 2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**		
ITEM: 1.5.5	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

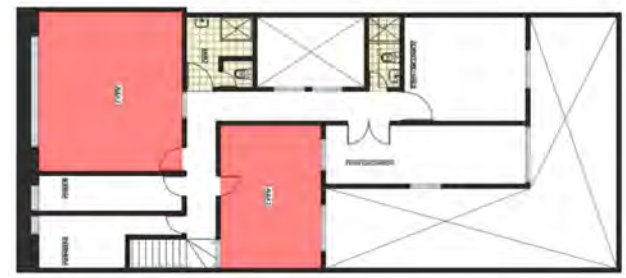





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
SEGUNDO PISO					
AULA 1	1	1		1	1
AULA 2	1	1		1	1

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CENTRO AMAR MARTIRES 2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**		
ITEM: 1.6.26	**DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**UN**

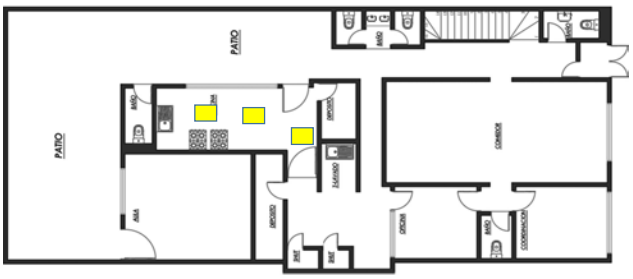ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	PRIMER PISO					
	COCINA				3,00	3,00
 						

TOTAL EJECUTADO	3,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**3,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CENTRO AMAR MARTIRES 2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ILUMINACIÓN.**		
ITEM: 5.5.4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

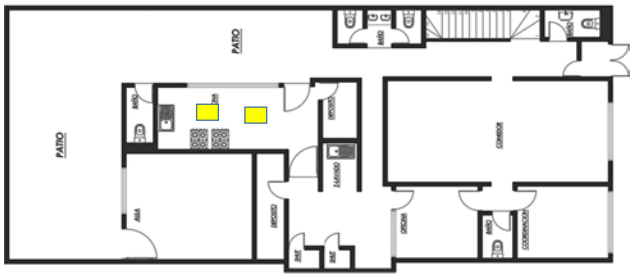
PATIO
PATIO
COCINA
COMEDOR
ASEO
ASEO
ASEO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CENTRO AMAR MARTIRES 2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		
ITEM: 19.1	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
PRIMER PISO					
COMEDOR	7,43	3,82		1,00	28,38
SALA SOCIAL	3,22	2,70		1,00	8,69
PASILLO INTERNO	4,38	1,20		1,00	5,26
PASILLO PRINCIPAL	5,45	1,34		1,00	7,30
	4,20	1,00		1,00	4,20
BAÑO	3,68	1,24		1,00	4,56
COORDINACIÓN	3,00	2,69		1,00	8,07
BAÑO MUJERES	1,14	0,88		1,00	1,00
SALON PATIO	4,60	4,00		1,00	18,40
	1,00	0,70		1,00	0,70
BAÑO PATIO	2,13	1,00		1,00	2,13
PATIO 1	4,17	9,66		1,00	40,28
PATIO 2	1,84	2,56		1,00	4,71
	2,78	5,28		1,00	14,68
PATIO - COCINA	3	3,98		1,00	11,94
SEGUNDO PISO					
ENFERMERIA	3,08	1,21		1,00	3,73
	1,97	0,83		1,00	1,64
BODEGA	5,15	1,32		1,00	6,80
AULA 1	6	4,95		1,00	29,70
AULA 2	5,2	3,74		1,00	19,45
PASILLO	4,38	1,08		1,00	4,73
	1,03	7,82		1,00	8,05
BAÑO 1	2,75	2,4		1,00	6,60
BAÑO 2	2,64	1,14		1,00	3,01
DORMITORIO NIÑAS	7,38	2,35		1,00	17,34
DORMITORIO NIÑOS	4,48	3,98		1,00	17,83
ESCALERAS	3	1,07		1,00	3,21
				TOTAL EJECUTADO	282,40
				MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
				MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
				PRESENTE ACTA	**282,40**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
282,40	0,00	**282,40**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CENTRO AMAR MARTIRES 2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		
ITEM: 22.1.10	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
SEGUNDO PISO					
DORMITORIO NIÑOS	4,00		2,52	2,00	20,16
	4,48		2,52	2,00	22,58
DESCUENTO VANOS	1,50		1,50	1,00	-2,25
	1,01		2,00	1,00	-2,02
DORMITORIO NIÑAS	7,38		2,55	2,00	37,64
	0,53		2,55	1,00	1,35
	0,37		2,55	1,00	0,94
	0,12		2,55	4,00	1,22
	2,20		2,55	2,00	11,22
	0,20		0,30	2,00	0,12
	1,20		0,30	2,00	0,72
DESCUENTO VANOS	1,41		1,50	2,00	-4,23
	2,10		1,82	1,00	-3,82
	1,55		2,10	1,00	-3,26
PASILLO	7,83		2,54	1,00	19,89
	6,76		2,54	1,00	17,17
	0,23		0,30	2,00	0,14
	1,20		0,30	2,00	0,72
	0,50		1,03	1,00	0,52
	5,48		2,53	1,00	13,86
	5,42		2,53	1,00	13,71
DESCUENTO VANOS	1,55		2,10	1,00	-3,26
	0,73		2,10	1,00	-1,53
	1,20		1,40	2,00	-3,36
	0,62		2,10	1,00	-1,30
	0,66		2,00	1,00	-1,32
	0,73		2,00	1,00	-1,46
	0,87		2,10	1,00	-1,83
	0,91		1,32	1,00	-1,20
	0,90		2,10	1,00	-1,89
	1,10		1,50	1,00	-1,65
SALON 2	5,18		2,49	2,00	25,80
	3,74		2,49	2,00	18,63
	1,41		0,22	2,00	0,62
	1,50		0,22	2,00	0,66
	1,81		0,22	2,00	0,80
	1,50		0,22	2,00	0,66
DESCUENTO VANOS	1,41		1,50	1,00	-2,12
	1,81		1,50	1,00	-2,72
	1,10		1,50	1,00	-1,65
	0,90		2,10	1,00	-1,89
ENFERMERIA	5,19		2,44	1,00	12,66
	2,00		2,44	1,00	4,88
	2,90		2,44	1,00	7,08
	2,00		2,44	1,00	4,88
	1,20		2,44	1,00	2,93
	0,50		0,82	1,00	0,41
DESCUENTO VANOS	1,42		0,92	1,00	-1,31
BODEGA	5,14		2,43	2,00	24,98
	1,32		2,43	2,00	6,42
DESCUENTO VANOS	1,41		0,34	1,00	-0,48
	0,80		2,03	1,00	-1,62
	6,00		2,52	2,00	30,24
	5,40		2,52	2,00	27,22

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025



CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CENTRO AMAR MARTIRES 2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		
ITEM: 22.1.10	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
	SALON 1	4,20		0,45	1,00	1,89
		0,91		0,25	2,00	0,46
		1,32		0,25	2,00	0,66
	DESCUENTO VANOS	0,49		1,67	2,00	-1,64
		2,27		1,67	1,00	-3,79
		0,91		2,38	1,00	-2,17
		0,91		1,32	1,00	-1,20
	ESCALERAS	3,00		3,83	1,00	11,49
		1,10		2,90	1,00	3,19
		1,95		2,91	1,00	5,67
		1,09		2,55	1,00	2,78
		1,23		2,20	1,00	2,71
	PLACA ESCALERRA	1,10		1,23	1,00	1,35
	PUERTA 1	0,97		2,10	2,00	4,07
	DESCUENTO VIDRIO	0,80		0,92	2,00	-1,47
	PUERTA 2	0,69		2,07	4,00	5,71
	DESCUENTO VIDRIO	0,67		0,93	4,00	-2,49
	DESCUENTO VIDRIO	0,84		0,58	2,00	-0,97
	DESCUENTO VIDRIO	0,84		0,57	2,00	-0,96
					TOTAL EJECUTADO	309,95
					MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
					MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
					PRESENTE ACTA	**309,95**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
309,95	0,00	**309,95**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CENTRO AMAR MARTIRES 2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**		
ITEM: 22.1.11	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
SENGUNDO PISO					
PUERTA 1		5,23		1,00	5,23
PUERTA 2		5,80		1,00	5,80
PUERTA 3		3,40		1,00	3,40
PUERTA 4		6,52		1,00	6,52
PUERTA 5		4,80		1,00	4,80
PUERTA 6		6,36		1,00	6,36
PUERTA 7		4,73		1,00	4,73
VENTANA 1		9,00		1,00	9,00
VENTANA 2		11,79		1,00	11,79
VENTANA 3		7,20		1,00	7,20
VENTANA 4		5,30		1,00	5,30
VENTANA 5		5,25		1,00	5,25
VENTANA 6		6,00		1,00	6,00
DESCUENTO POR PREPARACION DE SUPERFICIE			81,38	-0,02	-1,63

TOTAL EJECUTADO	79,75
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**79,75**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
79,75	0,00	**79,75**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CENTRO AMAR MARTIRES 2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**		
ITEM: 22.3.5	**ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
CUBIERTA ESTRUCTURA POLICARBONATO PATIO COCINA		3,98		5,00	19,90
		3		4	12,00

TOTAL EJECUTADO	31,90
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**31,90**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
31,90	0,00	**31,90**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CENTRO AMAR MARTIRES 2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**		
ITEM: 22,3,6	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

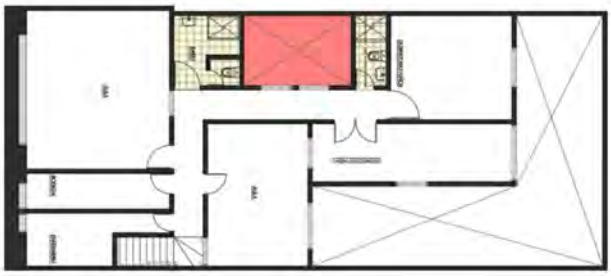



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**AREA**		
CANAL CUBIERTA POLICARBONATO PATIO COCINA		3,98		2,00	7,96

TOTAL EJECUTADO	7,96
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**7,96**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
7,96	0,00	**7,96**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL





MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CENTRO AMAR MARTIRES 2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**OTROS EN OBRAS INTERIORES.**		
ITEM: 22.6.1	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
ESCALERAS -HUELLAS	1,1	0,25		17,00	4,68
ESCALERAS-CONTRA HUELLA	1,1	0,18		17,00	3,37
ESCALERAS -HUELLAS RESPALDO	1,1	0,25		17,00	4,68
ESCALERAS-CONTRA HUELLA RESPALDO	1,1	0,18		17,00	3,37
PASAMANOS EN MALLA	2,15	1		2	4,3

TOTAL EJECUTADO	20,38
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**20,38**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
20,38	0,00	**20,38**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**CENTRO AMAR MARTIRES 2**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**		
ITEM: 23.4.1	**DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO**	**UNIDAD**	**M2**

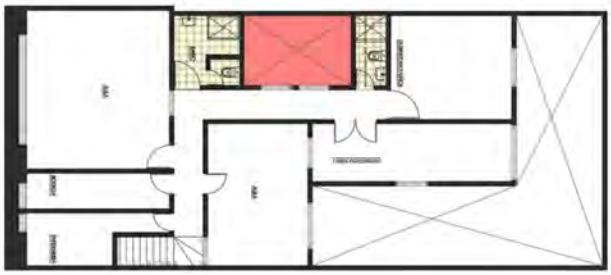ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**AREA**		
	PATIO - COCINA SEGUNDO PISO	3	3,98		1,00	11,94
						

TOTAL EJECUTADO	11,94
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**11,94**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
11,94	0,00	**11,94**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SLIS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		
ITEM: 1.4.2	**DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	PERIMETRO SUBDIRECCIÓN PATIO		9,00		1,00	9,00

TOTAL EJECUTADO	9,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**9,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
9,00	0,00	**9,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SLIS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		
ITEM: 1.4.3	**DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	PERIMETRO SUBDIRECCIÓN PATIO		3,10		1,00	3,10

TOTAL EJECUTADO	3,10
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**3,10**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
3,10	0,00	**3,10**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SLIS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		
ITEM: 1.4.9	**DESMONTE MANUAL DE BAJANTE Ø.<=4" CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA BAJANTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	PERIMETRO SUBDIRECCION PATIO	3,35	6,50		1,00	21,78

TOTAL EJECUTADO	21,78
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**21,78**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
21,78	0,00	**21,78**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SLIS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		
ITEM: 19.1	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	PERIMETRO SUBDIRECCIÓN PATIO	3,35	6,50		1,00	21,78
	PUNTO FIJO INTERNO	2,92	1,47		1,00	4,29
		1,41	3,89		1,00	5,48

TOTAL EJECUTADO	31,55
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**31,55**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
31,55	0,00	**31,55**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SLIS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		


CAPITULO	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**		
ITEM: 22,1,4	**ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	PUNTO FIJO INTERNO -TECHO	1,45	2,92		1,00	4,23

TOTAL EJECUTADO	4,23
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**4,23**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
4,23	0,00	**4,23**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SLIS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**		
ITEM: 22,1,7	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	PUNTO FIJO INTERNO -TECHO	1,45	2,92		1,00	4,23
	TECHO LATERAL	2,92	3,30		1,00	9,64
	PUNTO FIJO MUROS	2,92		5,02	1,00	14,66
		3,2	5,02	3,30	1,00	13,56
		1,45		3,92	1,00	5,68
		2,92		0,25	1,00	0,73
		1,12		0,54	1,00	0,60
	DESCUENTO VANOS	0,75		3,5	2	-5,25
					TOTAL EJECUTADO	43,86
					MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
					MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
					PRESENTE ACTA	**43,86**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
43,86	0,00	**43,86**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SLIS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**		
ITEM: 22,1,11	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	MARCOS DE VENTANAS PUNTO FIJO		3,50		4,00	14,00
			0,75		4,00	3,00

TOTAL EJECUTADO	17,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**17,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
17,00	0,00	**17,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SLIS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**		
ITEM: 22.3.6	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
PERIMETRO SUBDIRECCION PATIO - CANAL		9,00		1,00	9,00
BAJANTES		3,1		2	6,20

TOTAL EJECUTADO	15,20
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**15,20**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
15,20	0,00	**15,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SLIS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**		
ITEM: 23.8.5	**CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	PERIMETRO SUBDIRECCION PATIO		9,00		1,00	9,00

TOTAL EJECUTADO	9,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**9,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
9,00	0,00	**9,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**SUB DIRECCION SLIS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**		
ITEM: 23,8,10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	BAJANTES		3,1		2	6,20

TOTAL EJECUTADO	6,20
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**6,20**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
6,20	0,00	**6,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		
ITEM: 1,3,16	**DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PORTÓN (DOS HOJAS SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**U**

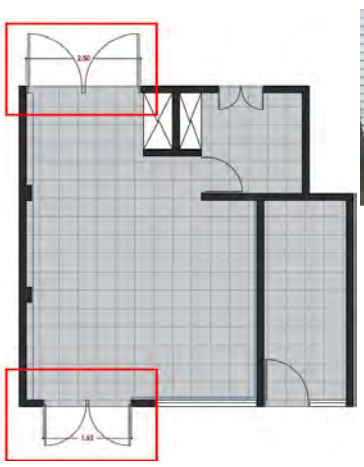ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	PUERTA 1				1,00	1,00
	PUERTA 2				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CONCRETOS**		
ITEM: 2,2,8	**PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

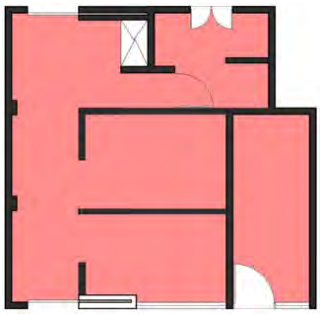





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
CUARTO GRANDE	1,05	2		1,00	2,10
CUARTO PEQUEÑO	2,97	2,25		1,00	6,68

TOTAL EJECUTADO	8,78
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**8,78**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
8,78	0,00	**8,78**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.**		
ITEM: 3,1,1	**MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
FACHADA	0,46		2,36	1,00	1,09

TOTAL EJECUTADO	1,09
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,09**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,09	0,00	**1,09**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**		
ITEM: 4,1,40	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

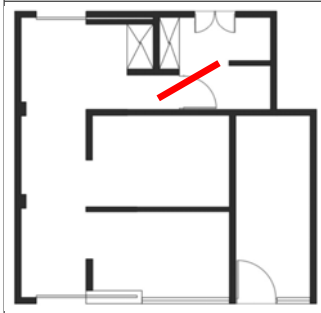



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
TUBERIA DE 4" CUARTO PEQUEÑO		1,46		1	1,46

TOTAL EJECUTADO	1,46
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,46**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,46	0,00	**1,46**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**		
ITEM: 4,1,47	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	SHUT DE BASURAS				5	5





TOTAL EJECUTADO	5,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**5,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
5,00	0,00	**5,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**		
ITEM: 4,1,48	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 3"**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	SHUT DE BASURAS- POCETA				1	1

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**		
ITEM: 4,1,58	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA LLAVE MANGUERA 1/2"**	**UNIDAD**	**UN**

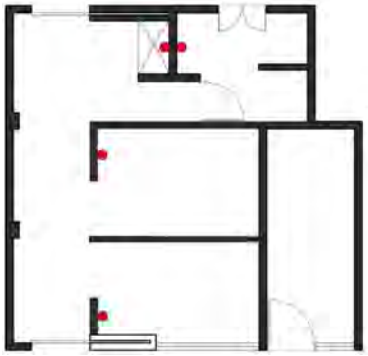ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	SHUT DE BASURAS				4	4
						
						

TOTAL EJECUTADO	4,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**4,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
4,00	0,00	**4,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INTERRUPTORES Y SENSORES**		
ITEM: 5,1,1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
SHUT DE BASURAS				2,00	2,00
CUARTO DE RECICLAJE				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	3,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**3,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INTERRUPTORES Y SENSORES**		
ITEM: 5,1,3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
 	SHUT DE BASURAS				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INTERRUPTORES Y SENSORES**		
ITEM: 5,1,24	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

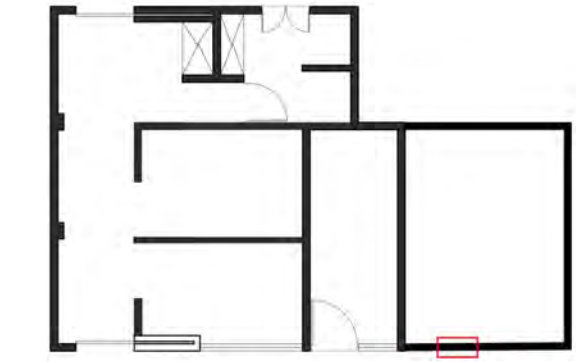





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
SHUT DE BASURAS				2,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ILUMINACIÓN.**		
ITEM: 5,2,14	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
SHUT DE BASURAS				6,00	6,00
CUARTO DE RECICLAJE				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	7,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**7,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
7,00	0,00	**7,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ILUMINACIÓN.**		
ITEM: 5,5,4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
SHUT DE BASURAS				6,00	6,00
CUARTO DE RECICLAJE				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	7,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**7,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
7,00	0,00	**7,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**		
ITEM: 7,1,2	**ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

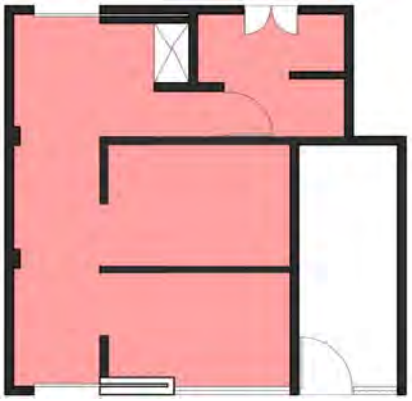





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
SHUT DE BASURAS	1,62	4,45		1,00	7,21
	2,28	3,85		1,00	8,78
	2,22	2,65		1,00	5,88
	2,13	3,04		1,00	6,48
	2,11	3,02		1,00	6,37
TAPA DE CAJA EXTERNA	0,74	0,74		1,00	0,55

TOTAL EJECUTADO	35,27
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**35,27**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
35,27	0,00	**35,27**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**		
ITEM: 7,3,6	**GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
    	SHUT DE BASURAS		2,6		1,00	2,60
			0,86		1,00	0,86
			0,66		1,00	0,66
			0,3		1,00	0,30
			0,66		1,00	0,66
			1,03		1,00	1,03
			2,86		1,00	2,86
			1,4		1,00	1,40
			0,78		1,00	0,78
			1,2		1,00	1,20
			0,45		1,00	0,45
			7		1,00	7,00
			1,2		1,00	1,20
			0,2		1,00	0,20
			1		1,00	1,00
			3		1,00	3,00
			2,1		1,00	2,10
			3,2		1,00	3,20
			0,26		1,00	0,26
			3,2		1,00	3,20
			2,13		1,00	2,13
			3		1,00	3,00
			1,26		1,00	1,26
			0,26		1,00	0,26
			1,12		1,00	1,12
			2,06		1,00	2,06
			2,44		1,00	2,44
			0,6		1,00	0,60
					TOTAL EJECUTADO	46,83
					MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
					MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
					PRESENTE ACTA	**46,83**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
46,83	0,00	**46,83**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**OTROS**		
ITEM: 7,4,1	**BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
SHUT DE BASURAS		1,1		1,00	1,10
		2,45		1,00	2,45
		1,5		1,00	1,50

TOTAL EJECUTADO	1,10
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,10**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,10	0,00	**1,10**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 8,1	**ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.**	**UNIDAD**	**M2**

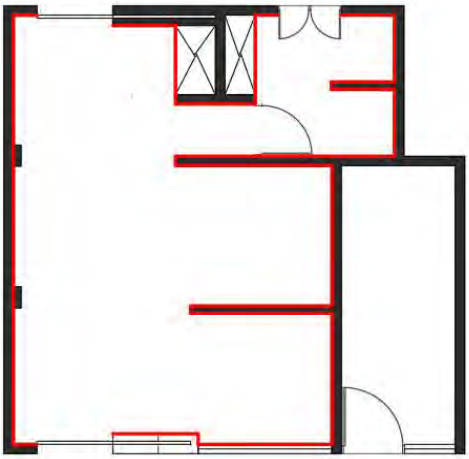ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
	SHUT BASURAS	0,15		2,54	1,00	0,38
		0,35		2,54	1,00	0,89
		2,02		2,54	1,00	5,13
		0,14		2,54	1,00	0,36
		0,35		2,54	1,00	0,89
		0,14		2,54	1,00	0,36
		1,91		2,54	1,00	4,85
		0,14		2,54	1,00	0,36
		0,35		2,54	1,00	0,89
		0,14		2,54	1,00	0,36
		2,18		2,54	1,00	5,54
		0,15		2,54	1,00	0,38
		0,3		0,63	1,00	0,19
		1,14		2,43	1,00	2,77
		0,13		2,43	1,00	0,32
		0,96		2,43	1,00	2,33
		3		2,43	1,00	7,29
		2,1		2,43	1,00	5,10
		3,19		2,43	1,00	7,75
		0,14		2,41	1,00	0,34
		3,19		2,41	1,00	7,69
		2,14		2,41	1,00	5,16
		3,06		2,41	1,00	7,37
		0,93		2,41	1,00	2,24
		0,14		2,41	1,00	0,34
		1,07		2,41	1,00	2,58
		2,07		2,41	1,00	4,99
		2,28		2,41	1,00	5,49
		0,47		2,41	1,00	1,13
		0,13		2,41	1,00	0,31
		0,53		2,41	1,00	1,28
		0,1		2,41	1,00	0,24
		0,15		2,41	1,00	0,36
		0,2		1,15	1,00	0,23
		0,37		1,1	2,00	0,81











		0,12		1,1	1,00	0,13
		1,3		0,9	1,00	1,17
		0,12		2,36	1,00	0,28
		1,36		2,36	1,00	3,21
		2,54		2,36	1,00	5,99
		0,22		2,36	1,00	0,52
		0,87		2,36	1,00	2,05
		0,66		2,36	1,00	1,56
		0,15		2,36	1,00	0,35
		0,66		2,36	1,00	1,56
		1,03		2,36	1,00	2,43
		2,86		2,36	1,00	6,75
	DESCUENTOS DE VANOS	0,6		2,17	1	-1,30
		0,83		2,2	2	-3,65
		1,19		2,36	1	-2,81
					TOTAL EJECUTADO	104,94
					MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
					MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
					PRESENTE ACTA	**104,94**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
104,94	0,00	**104,94**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 9,1,1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
	PUERTA 1	**1,47**		**2,15**		3,16

TOTAL EJECUTADO	3,16
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**3,16**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
3,16	0,00	**3,16**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 9,1,7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
  	PUERTA 2	**2,45**		**2,37**	**1,00**	5,81

TOTAL EJECUTADO	5,81
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**5,81**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
5,81	0,00	**5,81**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 11,28	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

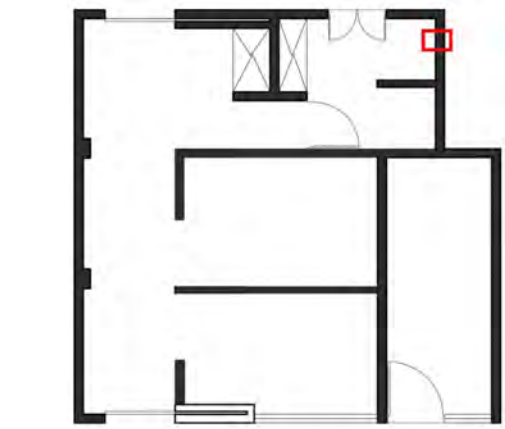





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
CUARTO PEQUEÑO				1	1

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 11,30	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
SHUT DE BASURAS				5	5
POCETA				1	1

TOTAL EJECUTADO	6,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**6,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
6,00	0,00	**6,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CIELOS RASOS.**		
ITEM: 14,1,4	**CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

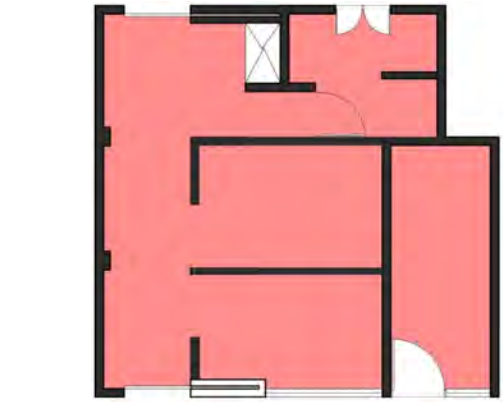





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
SHUT DE BASURAS Y CUARTO SIGUIENTE	1,62	4,45		1,00	7,21
	2,28	3,85		1,00	8,78
	2,22	2,65		1,00	5,88
	2,13	3,04		1,00	6,48
	2,11	3,02		1,00	6,37
	1,7	4,42		1,00	7,51

TOTAL EJECUTADO	42,23
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**42,23**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
42,23	0,00	**42,23**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 15,1,2	**CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO SENCILLA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
 	SHUT DE BASURAS PUERTA PRINCIPAL				1,00	1,00

TOTAL EJECUTADO	1,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		
ITEM: 19,1	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

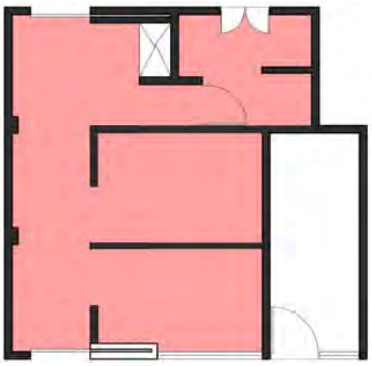ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
	SHUT DE BASURAS	1,62	4,45		1,00	7,21
		2,28	3,85		1,00	8,78
		2,22	2,65		1,00	5,88
		2,13	3,04		1,00	6,48
		2,11	3,02		1,00	6,37
						

TOTAL EJECUTADO	34,72
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**34,72**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
34,72	0,00	**34,72**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**		
ITEM: 21,1,5	**PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Area		
SHUT BASURAS	0,15		2,54	1,00	0,38
	0,35		2,54	1,00	0,89
	2,02		2,54	1,00	5,13
	0,14		2,54	1,00	0,36
	0,35		2,54	1,00	0,89
	0,14		2,54	1,00	0,36
	1,91		2,54	1,00	4,85
	0,14		2,54	1,00	0,36
	0,35		2,54	1,00	0,89
	0,14		2,54	1,00	0,36
	2,18		2,54	1,00	5,54
	0,15		2,54	1,00	0,38
	0,3		0,63	1,00	0,19
	1,14		2,43	1,00	2,77
	0,13		2,43	1,00	0,32
	0,96		2,43	1,00	2,33
	3		2,43	1,00	7,29
	2,1		2,43	1,00	5,10
	3,19		2,43	1,00	7,75
	0,14		2,41	1,00	0,34
	3,19		2,41	1,00	7,69
	2,14		2,41	1,00	5,16
	3,06		2,41	1,00	7,37
	0,93		2,41	1,00	2,24
	0,14		2,41	1,00	0,34
	1,07		2,41	1,00	2,58
	2,07		2,41	1,00	4,99
	2,28		2,41	1,00	5,49
	0,47		2,41	1,00	1,13
	0,13		2,41	1,00	0,31
	0,53		2,41	1,00	1,28
	0,1		2,41	1,00	0,24
	0,15		2,41	1,00	0,36
	0,2		1,15	1,00	0,23
	0,37		1,1	2,00	0,81
	0,12		1,1	1,00	0,13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**		
ITEM: 21,1,5	**PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Area		
		1,3		0,9	1,00	1,17
		0,12		2,36	1,00	0,28
		1,36		2,36	1,00	3,21
		2,54		2,36	1,00	5,99
		0,22		2,36	1,00	0,52
		0,87		2,36	1,00	2,05
		0,66		2,36	1,00	1,56
		0,15		2,36	1,00	0,35
		0,66		2,36	1,00	1,56
		1,03		2,36	1,00	2,43
		2,86		2,36	1,00	6,75
	DESCUENTOS DE VANOS	0,6		2,17	1	-1,30
		0,83		2,2	2	-3,65
		1,19		2,36	1	-2,81
					MENOS ACTAS ANTERIORES	104,94
					MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
					PRESENTE ACTA	**104,94**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
104,94	0,00	**104,94**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**		
ITEM: 21,1,6	**PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
FACHADA			2,36	1,00	2,36

TOTAL EJECUTADO	2,36
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,36**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,36	0,00	**2,36**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**		
ITEM: 22,1,10	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
REJAS VENTANA	1,18		0,63	1,00	0,74
	2,34		0,62	1,00	1,45
PUERTA REJA	1,03		2,35	1,00	2,42

TOTAL EJECUTADO	4,61
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**4,61**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
4,61	0,00	**4,61**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**		
ITEM: 22,1,12	**PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
  	FACHADA	4,87		2,75	1,00	13,39
		0,14		2,75	2,00	0,77
		2,48		2,75	1,00	6,82
		0,14		2,75	2,00	0,77
		0,19		2,75	1,00	0,52
	DESCUENTO VANOS	1,18		0,63	1	-0,74
		1,03		2,35	1	-2,42
		0,62		2,34	1	-1,45
		1,52		2,35	1	-3,57

TOTAL EJECUTADO	14,09
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**14,09**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
14,09	0,00	**14,09**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**		
ITEM: 22,1,15	**PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA PARA ACABADO APLICADO SOBRE PAÑETE TOTALMENTE SECO Y/O SUPERFICIES SECAS (POR EJEMPLO SISTEMA DRYWALL DE YESO Y/O FIBROCEMENTO), VERSIÓN BRILLANTE, FORMULADA EN DOS COMPONENTES, IMPERMEABLE AL PASO DE AGUA Y VAPORES, TIPO SIKAGUARD-68 O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICADA EN TRES (3) CAPAS GARANTIZANDO UN ESPESOR FINAL DE 12 MILS (305 MICRONES). INCLUYE DILUCIÓN CON PRODUCTO TIPO COLMASOLVENTE EPÓXICO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

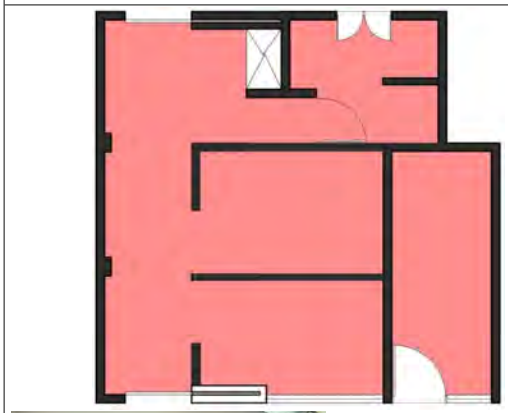





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
SHUT DE BASURAS Y CUARTO SIGUIENTE	1,62	4,45		1,00	7,21
	2,28	3,85		1,00	8,78
	2,22	2,65		1,00	5,88
	2,13	3,04		1,00	6,48
	2,11	3,02		1,00	6,37
	1,7	4,42		1,00	7,51

TOTAL EJECUTADO	42,23
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**42,23**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
42,23	0,00	**42,23**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**		
ITEM: 22,3,4	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

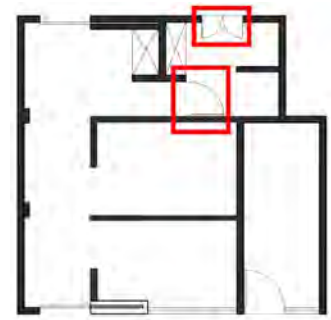





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**alto**		
SHUT DE BASURAS	1,2		2,36	1,00	2,83
	0,83		2,2	1,00	1,83

TOTAL EJECUTADO	4,66
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**4,66**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
4,66	0,00	**4,66**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**		
ITEM: 22,3,6	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**alto**		
SHUT DE BASURAS FACHADA CANAL		12,5		1,00	12,50
SHUT DE BASURAS FACHADA BAJANTE		2,56		1,00	2,56

TOTAL EJECUTADO	15,06
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**15,06**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
15,06	0,00	**15,06**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**		
ITEM: 1,3,3	**DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

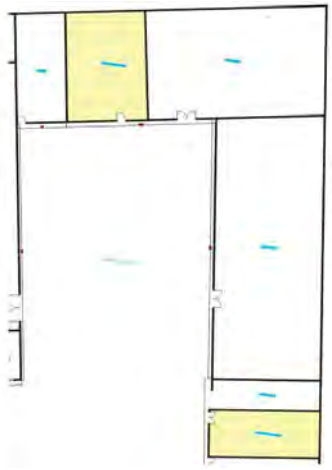





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
BAÑO USUARIOS 2				2,00	2,00
BAÑO USUARIOS 3				3,00	3,00

TOTAL EJECUTADO	5,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**5,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
5,00	0,00	**5,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**		
ITEM: 1,5,8	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

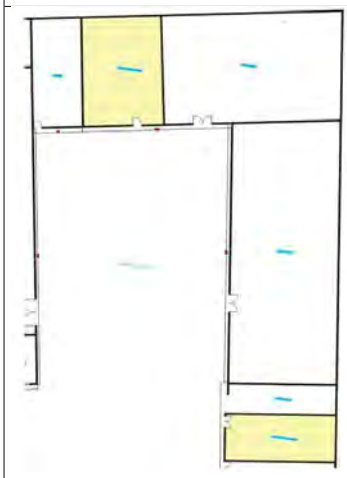





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
BAÑO USUARIOS 2	0,33	0,33		48,00	5,23
BAÑO USUARIOS 3	0,33	0,33		23,00	2,50

TOTAL EJECUTADO	7,73
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**7,73**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
7,73	0,00	**7,73**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**		
ITEM: 1,8,5	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

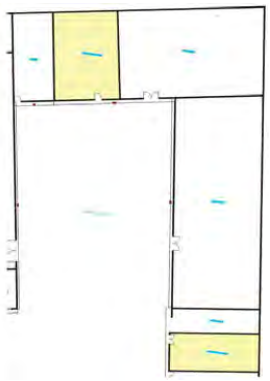





LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
BAÑO USUARIOS 2- MURO	0,25	0,35		136,00	11,90
BAÑO USUARIOS 3- MURO	0,25	0,35		209,00	18,29
DESCUENTO DE EMERGENCIA					-13,91

TOTAL EJECUTADO	16,28
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**16,28**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
16,28	0,00	**16,28**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ACABADO DE PISOS.**		
ITEM: 7,2,11	**ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 33,8X33,8 CM, TIPO DUROPISO DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.**	**UNIDAD**	**M2**

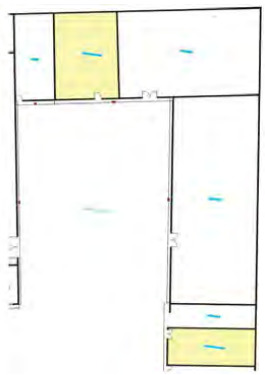ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
  	BAÑO USUARIOS 3- PISO	0,33	0,33		23,00	2,50

TOTAL EJECUTADO	2,50
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,50**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,50	0,00	**2,50**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 8,2	**ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

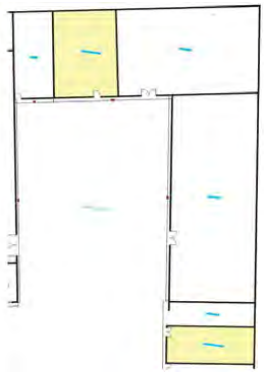





LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
BAÑO USUARIOS 3- MURO	0,25	0,35		209,00	18,29
DESCUENTO DE EMERGENCIA					-13,91

TOTAL EJECUTADO	4,38
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**4,38**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
4,38	0,00	**4,38**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 11,28	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

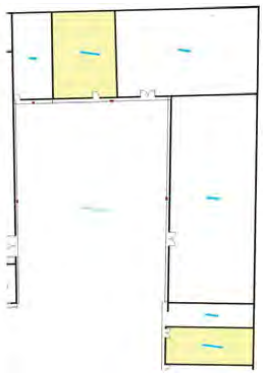



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
BAÑO USUARIOS 3- MURO				3,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 11,30	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"**	**UNIDAD**	**UN**

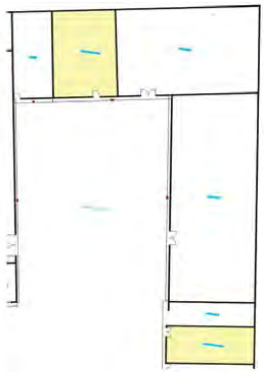ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
  	BAÑO USUARIOS 3- MURO				6,00	6,00

TOTAL EJECUTADO	6,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**6,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
6,00	0,00	**6,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA - BAÑOS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 11,47	**SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**		
BAÑO USUARIOS 2					
ORINALES				8,00	8,00
SANITARIOS				8,00	8,00
LAVAMANOS				2,00	2,00
BAÑO USUARIOS 3					
ORINALES				9,00	9,00
SANITARIOS				10,00	10,00
LAVAMANOS				2,00	2,00

TOTAL EJECUTADO	39,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**39,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
39,00	0,00	**39,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**HOGAR DE PASO BAKATA - BAÑOS**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**		
ITEM: 22,1,7	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

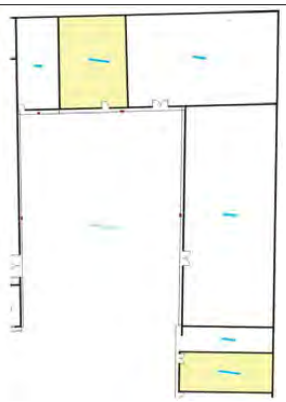





LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Alto		
BAÑO USUARIOS 3	2,62	4	5,86	4,00	77,59
	2,62	7		1	18,34
	2,62	7,17		1	18,79
DESCUENTO DE VANOS	0,73	2,1		1	-1,533
	0,73	4,3		1	-3,139
	0,84	2,4		1	-2,016
	0,8	4,3		1	-3,44

TOTAL EJECUTADO	104,58
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**104,58**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
104,58	0,00	**104,58**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ .JORGE NICOLAS REYES SANTACRUZ/ ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES**		
ITEM: 1.4.8	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Area		
CUBIERTA SHUT Y HALL	4,51	1,85	8,34	1	8,34
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

TOTAL EJECUTADO	8,34
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**8,34**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
8,34	0,00	**8,34**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**
	CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM: 1.4.8	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
shut	**0,33**	**0,33**	**0,11**	**5**	**0,54**
hall de chut	**0,33**	**0,33**	**0,11**	**5**	**0,54**

TOTAL EJECUTADO	1,09
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**1,09**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,09	0,00	**1,09**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM: 1.9.10	**DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
shut	**0,33**	**0,33**	**0,11**	**5**	**0,54**
hall de chut	**0,33**	**0,33**	**0,11**	**5**	**0,54**

TOTAL EJECUTADO	1,09
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**1,09**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,09	0,00	**1,09**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		
ITEM: 1.9.15	**CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
shut		**0,33**		**10**	**3,30**
hall de chut		**0,33**		**10**	**3,30**

TOTAL EJECUTADO	6,60
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**6,60**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
6,60	0,00	**6,60**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
	CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO			
ITEM: 2.1.15	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
 	**PATIO INTERIOR**	**4,4**			**1**	**4,40**
		16			**1**	**16,00**
		3,95			**1**	**3,95**
						0,00
						0,00

TOTAL EJECUTADO	24,35
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**24,35**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
24,35	0,00	**24,35**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**		
ITEM: 2,1,5	**EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
 	**PATIO INTERIOR**	**4,4**			**1**	**4,40**
		16			**1**	**16,00**
		3,95			**1**	**3,95**
						0,00
						0,00

TOTAL EJECUTADO	24,35
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**24,35**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
24,35	0,00	**24,35**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**
	CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ESTRUCTURAS METALICAS**		
ITEM: 2.2.9	**PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>12,1<=15,0 CM F'C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**area**		
	**shut**	**0,33**	**0,33**	**0,11**	**5**	**1,65**
	hall de chut	**0,33**	**0,33**	**0,11**	**5**	**0,18**
						0,00
						0,00
						0,00

TOTAL EJECUTADO	1,83
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**1,83**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,83	0,00	**1,83**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ESTRUCTURAS METALICAS**		
ITEM: 2.6.2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Peso**		
 	**cubierta shut**					**0,00**
	PERFIL ,15*,50*3mm		**4,51**	9,42	**1**	**42,48**
						0,00
						0,00
						0,00

TOTAL EJECUTADO	42,48
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**42,48**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
42,48	0,00	**42,48**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**		
ITEM: 4.1.40	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
PATIO INTERIOR	**4,4**			**1**	**4,40**
	16			**1**	**16,00**
	3,95			**1**	**3,95**
	0,65			**1**	**0,65**
					0,00
					0,00

TOTAL EJECUTADO	25,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**25,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
25,00	0,00	**25,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA
	CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**		
ITEM: 7.1.3	**ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Area		
	shut	0,33	0,33	0,11	5	1,65
	hall de chut	0,33	0,33	0,11	5	0,18
						0,00
						0,00
						0,00

TOTAL EJECUTADO	1,83
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**1,83**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
1,83	0,00	**1,83**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**		
ITEM: 7.2,3	**ACABADO DE PISO CON TABLÓN DE GRES GRAFILADO ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM E.=12 MM TRÁFICO 5 COLOR, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



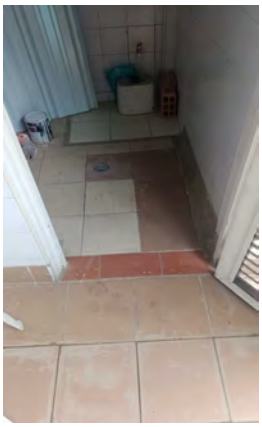

LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
shut	**0,33**	**0,33**	**0,11**	**5**	**1,65**
hall de chut	**0,33**	**0,33**	**0,11**	**5**	**0,18**
					0,00
					0,00
					0,00

TOTAL EJECUTADO	1,83
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**1,83**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,83	0,00	**1,83**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**
	CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA**		
ITEM: 22.3.5	**ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**				**CANTIDAD**	**TOTAL**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Peso**		
 	**cubierta shut**					**0,00**
	PERFIL ,15*,50*3mm		**4,51**		**1**	**4,51**
						0,00
						0,00
						0,00

TOTAL EJECUTADO	4,51
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**4,51**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
4,51	0,00	**4,51**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 22.8.5	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
canal cubierta shut	**9,27**			**1**	**9,27**
	4,6			**1**	**4,60**
cubierta corredor lateral	**1,97**			**2**	**3,94**

TOTAL EJECUTADO	17,81
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**17,81**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
17,81	0,00	**17,81**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 23.4.5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Area		
 	CUBIERTA SHUT Y HALL	4,51	1,85	8,34	1	8,34
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

TOTAL EJECUTADO	8,34
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**8,34**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
8,34	0,00	**8,34**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 23.8.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
	LUGAR	Ancho	Largo	Area		
 	cubierta shut	4,51			1	4,51
		1,85			1	1,85
		1,85			1	1,85
						0,00
						0,00
						0,00

TOTAL EJECUTADO	8,21
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**8,21**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
8,21	0,00	**8,21**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 23.8.5	**CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN				**CANTIDAD**	**TOTAL**
LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Area**		
cubierta shut	**9,27**			**1**	**9,27**
	4,6			**1**	**4,60**

TOTAL EJECUTADO	13,87
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**13,87**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
13,87	0,00	**13,87**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO: No. 10674-2025

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**FRENTE DE OBRA**	**RIO NEGRO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT	**CONTRATO No.**	10674-2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSOCIAL 25	**CONTRATO No.**	11834-2025
OBJETO:	**REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL -GRUPO No. 2-.**		

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		
ITEM: 23.8.10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN				CANTIDAD	TOTAL
LUGAR	Ancho	Largo	Area		
cubierta corredor lateral	1,97			2	3,94
					0,00

TOTAL EJECUTADO	3,94
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
.4.	0,00
PRESENTE ACTA	**3,94**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
3,94	0,00	**3,94**

OBSERVACIONES:

FIRMA		
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR DE OBRA**
NOMBRE	ING. CARLOS ANDRES PACHECHO / ING. CARLOS FELIPE CORREA	ARQ. SANDRA SIERRA / ARQ. CARLOS PINZÓN
FIRMA		
