RM CONCRETAR S.A.S

INFORME DE OBRA No.4

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

EL CHUSCAL

PÓLIZAS

RM CONCRETAR S.A.S

Seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.06.16 10:08:58 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

Código de Seguridad: 412Xbhk58wztbmgYAQXb5w==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA CVA-100005337	No. ANEXO 3		No. CERTIFICADO 360035497		No. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO			FECHA DE EXPEDICION 16/06/2026		SUC. EXPEDIDORA CEN VALLE DE ABURRA
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 03/07/2025	24:00 Horas Del 31/07/2026		N/A	N/A	N/A N/A

TOMADOR	RM CONCRETAR SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.871.788-6
DIRECCIÓN	CLL 51 NO. 48 74	TELÉFONO	3113601689
ASEGURADO	RM CONCRETAR SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.871.788-6
DIRECCIÓN	CLL 51 NO. 48 74	TELÉFONO	3113601689
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS Y SE HACE ADICION SEGUN OTRO SI 2 DE FECHA 27/05/2026
SE ACTUALIZA VALOR ASEGURADO A SALARIO MINIMO 2026
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.054-2025 , CUYO OBJETO ES

AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL
MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE
2025 DE ACUERDO CON LOS ÍTEMS Y LINEAMIENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA
ESTUDIOS PREVIOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y CUYOS DOCUMENTOS HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	350.181.000,00	350.181.000,00	350.181.000,00	150.052,50
PATRONAL	350.181.000,00	350.181.000,00	350.181.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	350.181.000,00	350.181.000,00	350.181.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	350.181.000,00	350.181.000,00	350.181.000,00	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 350.181.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SELECT SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	150.052,50
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	150.052,50
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	28.509,98
TOTAL A PAGAR	$	178.562,48

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/06/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.06.16 10:08:58 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 412XbhkS8wztbmgYAQXbSw==

No. PÓLIZA	CVA-100005337	**No. ANEXO**	3	**No. CERTIFICADO**	360035497	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	16/06/2026	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN VALLE DE ABURRA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/07/2025	24:00 Horas Del	31/07/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RM CONCRETAR SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.871.788-6
DIRECCIÓN	CLL 51 NO. 48 74	**TELÉFONO**	3113601689
ASEGURADO	RM CONCRETAR SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.871.788-6
DIRECCIÓN	CLL 51 NO. 48 74	**TELÉFONO**	3113601689
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	1

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS Y SE HACE ADICION SEGUN OTRO SI 2 DE FECHA 27/05/2026
SE ACTUALIZA VALOR ASEGURADO A SALARIO MINIMO 2026
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.054-2025 , CUYO OBJETO ES

AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL
MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE
2025 DE ACUERDO CON LOS ÍTEMS Y LINEAMIENTOS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA
ESTUDIOS PREVIOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y CUYOS DOCUMENTOS HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	350.181.000,00	350.181.000,00	350.181.000,00	150.052,50
PATRONAL	350.181.000,00	350.181.000,00	350.181.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	350.181.000,00	350.181.000,00	350.181.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	350.181.000,00	350.181.000,00	350.181.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 350.181.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SELECT SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	150.052,50
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	150.052,50
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	28.509,98
TOTAL A PAGAR	$	178.562,48

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/06/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADA A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA ART

RM CONCRETAR S.A.S

FACTURA

CONCRETAR S.A.S

CONCRETAR S.A.S

Factura Electrónica de Venta N° **CS153**
Fecha de expedición **2026-07-10 16:10:13-05:00**
Fecha de vencimiento **2026-08-10**
Forma de Pago: Credito **Plazo 31 días**
Medio de Pago: CREDITO

CUFE d88f52ea5ec746cf521994cf5399674aad605078e574e53d9fcb97589a5d5c5862a6ebedbb8d4bc964cf285e96725e6f

Razón social: **RM CONCRETAR S.A.S.**
NIT: **900871788-6**
Dirección: CR 29 11 SUR 110 A P 1206
Teléfono: 3147737106 - 2720852
Ciudad: MEDELLIN
email: facturacionelectronica@rmconcretar.com

Responsables del IVA
Numeración de facturación N° **18764099825789** del **2025-10-07** Autoriza rango desde el **CS 74** al **999** Vigencia **12** meses

Hora de generación 7/10/2026 4:15:37 PM

Cliente: **FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO**
NIT: **900198194-5**
Dirección: CR 21 21 37
Telefono: 5410934
Ciudad: RETIRO
Vendedor: GENERICO
Sucursal:
Email: fondeserelretiro@gmail.com
OC:
Pedido/Remision:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
0001	COSTO DIRECTO	1.000	204,695,562.00	0.00	0.0	204,695,562.00
0001	ADMINISTRACION (21.57%)	1.000	44,151,179.00	0.00	0.0	44,151,179.00
0001	UTILIDAD (5%)	1.000	10,234,778.00	0.00	0.0	10,234,778.00
		3.000				

Observaciones: ACTA N° 4 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, ANTIQOUIA.

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 259,081,519.00**
Descuento	**$ 0.00**
Subtotal	**$ 259,081,519.00**
IVA	**$ 0.00**
Rte Fte	**$ 0.00**
ReteIVA	**$ 0.00**
Imp. Consumo	**$ 0.00**
ICA	**$ 0.00**
IpoConsumo	**$ 0.00**
ICUI	**$ 0.00**
IBUA	**$ 0.00**
TOTAL	**$ 259,081,519.00**

Firma Digital:
YHeheRfCTEtGt1ec5pDZZifIQjrhFzID6efrSauCZMF0QJgIZPMjLCDI6gDMuDdAFPhKhuYZPVorG39cV/JU1/YxgHdQboKQodNsnpbTfK4RycvkrNgiy/Nht/amOwDoHAj3ocf4DWVjZN1MHIJCLFCZtHBsaEDqvgZk6cVYyhzjryywq3EzgMvXnWdFKlodhlFbejqzAM3cDhJlr1bYJ0b/5YYBv4k4LzRT0vHf9CRY0Jftuz3cP/cU7BiUblGJhEddqhrby/0W80dzifDyplNuepze1x+f1eKxkS08+teNmL69kjLq57m3N9/K/XtHF73XncLVZiyN36MdWHhMrA==

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fabricante del Software: 900.947.532-6 RIBISOFT SAS - www.ribisoft.com.co
Documento emitido por: Software propio

RM CONCRETAR S.A.S

INFORME DE OBRA
No.4

RM
CONCRETAR S.A.S

CONTRATO No. 054 DE 2025

OBJETO: "AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025"



INFORME DE OBRA
No.4

CONTRATO DE OBRA No. 054 DE 2025
RM CONCRETAR S.A.S.

18 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2026

VEREDA EL CHUSCAL
MUNICIPIO DE EL RETIRO - ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

LISTA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
2.1. Localización 3
1.1.1 Vereda El Chuscal. 4
2.2. Datos generales del municipio de El Retiro 5
2.3. Información del contrato 5
2.1. Avance de actividades 5
2.2. Obras extras 6
2.3. Programación de obra 6
2.4. Porcentaje de actividades ejecutadas a la fecha 6
2.5. Cronograma. 6
3. COMPONENTE TÉCNICO 6
3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EN EL PRESENTE PERIODO. 6
3.2. Avance físico 12
3.3. Maquinaria y equipos de obra 14
3.4. Colaboradores 14
1.2.1 Personal Administrativo 14
1.3.1 Personal Operativo 14
4. Conclusiones 14

1. INTRODUCCIÓN

El presente contrato de obra pública se ejecuta en el municipio de El Retiro, Antioquia, con el objetivo de ampliar la cobertura del sistema de acueducto en la vereda El Chuscal. Para ello, se contempla la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), la instalación de tubería de conducción y la implementación de una línea de impulsión hacia los tanques de almacenamiento.

Estas acciones tienen como propósito principal fortalecer la operación del acueducto de la vereda El Chuscal, garantizando una potabilización más eficiente y sostenible, así como la conexión de nuevos usuarios. Todo ello orientado a mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y contribuir a su bienestar social mediante la prestación de un servicio público digno, continuo y confiable.

El presente informe describe las actividades desarrolladas en el componente técnico, en el marco del contrato de obra suscrito entre el Fondo de Desarrollo Social del Municipio de El Retiro (FONDESER) y la empresa RM Concretar S.A.S.

Asimismo, se presenta el seguimiento realizado durante la ejecución del Contrato de Obra No. 054 de 2025, el cual recopila las acciones ejecutadas en relación con la implementación y control de las actividades orientadas al mejoramiento continuo. Dichas acciones incluyen la organización, planeación, aplicación y evaluación de procesos mediante la intervención de diversas disciplinas y la participación de todos los niveles de la organización, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y salud de los colaboradores.

Estas medidas se reflejan en la aplicación de los diferentes procedimientos constructivos del área técnica, con el apoyo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), buscando prevenir accidentes, enfermedades laborales y comunes, así como garantizar el cumplimiento de la normativa colombiana vigente. De esta manera, se promueven óptimas condiciones laborales durante el desarrollo de las actividades de obra.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

El proyecto se ejecuta en la vereda El Chuscal del municipio de El Retiro

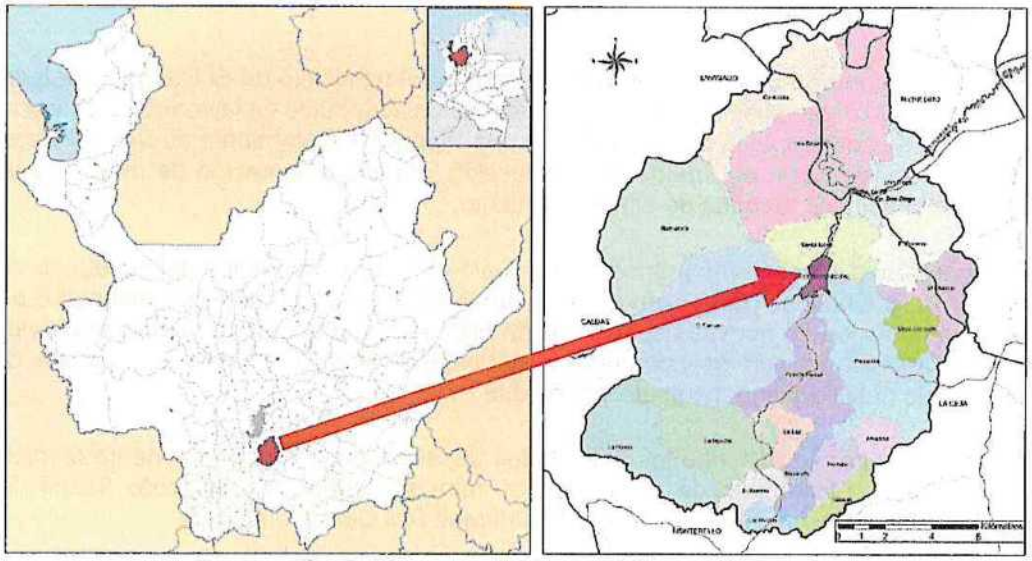


Ilustración 1. *Mapa municipio de El Retiro, Antioquia.*

1.1.1 Vereda El Chuscal.



Ilustración 2. *Ubicación Vereda El Chuscal*

2.2. Datos generales del municipio de El Retiro

Departamento: Antioquia
Fecha de Fundación: 1.790
Superficie: 244 Km2
Altitud promedio: 2.175 m.s.n.m.
Población promedio: 23.514 habitantes en total. En la zona rural se tiene un promedio de 11.038 habitantes.
Coordenadas de Ubicación: 6° 03' 23" N 75° 27' 28" O.

2.3. Información del contrato

INFORMACIÓN CONTRACTUAL – CONTRATISTA	
CONTRATO No:	054 de 2025
OBJETO:	"AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025"
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S.
NIT CONTRATISTA:	900 871 788-2
CONTRATANTE:	Fondo de Desarrollo Social del municipio de El Retiro - FONDESER
INTERVENTOR:	Ingeniería y Construcción El Diamante S.A.S.
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
VALOR INICIAL:	Mil treinta y nueve millones quinientos mil noventa y nueve pesos m.l. ($1.039.500.099)
ADICIÓN No.1	Quinientos diecinueve millones setecientos cuarenta nueve mil novecientos sesenta y tres pesos m.l. (519.749.963)
VALOR FINAL	Mil quinientos cincuenta y nueve millones doscientos cincuenta mil sesenta y dos pesos m.l. ($1.559.250.062)
FECHA DE INICIO:	Julio 09 de 2025
PRÓRROGA No.1	Cuatro meses
PRÓRROGA No.2	Dos meses
FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO:	31 de Julio de 2026

2.1. Avance de actividades

Las actividades realizadas hasta la fecha para la implementación de la planta de tratamiento en la vereda El Chuscal son las siguientes:

- Instalación de tubería de 4"
- Llenos de material de préstamo.
- Excavación de brechas para tubería

- Vaciado de losas.
- Transporte de materiales a la zona del tanque de almacenamiento
- Vaciado de concreto para losa.
- Instalación de cercha.
- Instalaciones eléctricas, tomas, suiches e iluminación.
- Instalación de cajas de registro en concreto.
- Instalación de red de desagüe
- Instalación de alambre de púas.

2.2. Obras extras

Durante el periodo evaluado se identificaron y ejecutaron varias obras extras necesarias para garantizar la continuidad y adecuada ejecución del proyecto. Dichas actividades fueron revisadas, verificadas y debidamente avaladas por la interventoría y por Fondeser, conforme a los procedimientos de control técnico, financiero y contractual establecidos (ver anexos).

Como soporte de estas actividades, en los anexos del presente informe se incluyen el Acta de Modificación No. 3 y el acta de aprobación de mayores y menores cantidades de obra.

2.3. Programación de obra

Se hace balance del cumplimiento de la programación de obra del proyecto.
Se presenta como anexo 1, la programación de obra.

2.4. Porcentaje de actividades ejecutadas a la fecha

Para el periodo en mención y según el avance de obra, las actividades realizadas mostraron un avance fisico 70,28% del así mismo y un el avance financiero es del 53,67%.

2.5. Cronograma.

En los anexos del presente informe se adjunta el cronograma actualizado, elaborado conforme a la adición de recursos y la ampliación del plazo aprobadas para la ejecución del contrato

3. COMPONENTE TÉCNICO

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EN EL PRESENTE PERIODO.

A continuación, se presentan las actividades realizadas con su registro foto gráfico.

- Excavaciones en cunetas, pilotes y zanjas para instalación de tubería



Ilustración 2. Excavaciones

- Vaciado de caja de registro



Ilustración 3. Instalación de caja de registro.

- Vaciado de pilotes y anclajes.



Ilustración 4. Vaciado de pilotes

- Instalación de PTAP



Ilustración 5. Planta de tratamiento de agua potable

- Red de desagüe



Ilustración 6. Red de desagüe a la quebrada

- Instalaciones eléctricas



Ilustración 7. Instalaciones eléctricas en la caseta.

- Localización y replanteo



Ilustración 8. Localización y replanteo.

- Instalación de tubería de presión de 4"





Ilustración 9. Instalación de tubería a presión de 4"

- Poda



Ilustración 10. Poda zona tanque de almacenamiento.

- Instalación de cinta de acueducto.



Ilustración 11. Cinta de acueducto.

- Instalación de cerco en alambre de púas.



Ilustración 12. Reposición de cerco en Alambre de púas.

3.2. Avance físico

En la Tabla 1 se presentan las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo evaluado, las cuales alcanzan un valor de $ 259.081.519 Este monto corresponde a un avance físico–financiero del 16,62%, para un avance acumulado total del 70,28% y una ejecución presupuestal de $ 1.095.943.365.

Para mayor detalle, ver archivo Anexo: "Acta de Obra No.4".

Tabla 1. Acta de obra No.4 de las cantidades ejecutadas en el periodo en mención.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S
NIT 901230154-9

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 026 - 2025

CONCRETAR S.A.S

Objeto:
"AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025"

Fondeser

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL No. 4		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1.1	**Localizacion y Replanteo**								
1.3	**Llenos y reemplazos**								
1.3.2	Excavación manual de material Rokalgerico de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad, incluye, roca descompuesta, bolos en roca de volumen inferior a 0.35m3	m3	41.0	$ 57,106.43	$ 2,343,636.91	11.94	$ 681,737.00	137.16	$ 7,832,833.00
1.3	**Concretos**								
1.3.3	Construcción de CAJA DE RECEPTIVO de 0.60x0.60 m y profundidad hasta 1.20 cm, incluye la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrada y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones. La excavacion, Relleno, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en item respectivo.	und	10.0	$ 784,115.99	$ 7,841,159.87	1.00	$ 784,116.00	1.00	$ 784,116.00
1.4	**Aceros**								
1.4.1	Suministro, transporte, figuración y colocacion de acero de refuerzo de 60.000 psi	kg	9342.0	$ 9,458.58	$ 88,333,857.41	23.81	$ 225,118.00	9584.94	$ 90,631,017.00
1.7	**Acometida y red eléctrica**								
1.8	**Caseta de bombeo y oficina**								
1.8.2	Suministro y colocacion de concreto F'c= 21 Mpa (210 Kg/cm2) para pilas circulares d=20cm, no incluye refuerzo	m3	1.8	$ 675,760.31	$ 1,273,783.84	0.45	$ 304,093.00	17.95	$ 12,129,951.00
1.8.5	Suministro e instalación Tuberías aguas servidas D4" incluye accesorios y toda la necesarios para su correcta instalación.	m	65.0	$ 53,917.01	$ 3,504,605.58	31.60	$ 1,703,777.00	31.60	$ 1,703,777.00
1.8.17	Suministro, transporte e instalacion de salidas para breaker 20 amperios monopolar para circuitos de iluminación incluye breaker y alambre	und	6.0	$ 110,032.12	$ 660,192.79	6.00	$ 660,193.00	6.00	$ 660,193.00
1.8.19	Suministro, transporte e instalación de salida de interruptor sencillo (1m), especial, en tubería EMT de 1/2", 15 A, TIPO Lóstrar, referencia 1451, 16A, 125 V, según certificación RETIE y prueba de conformidad UL. Incluye interruptor, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplementaria, ducto EMT de 1/2", conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, chazos y tornillos, CABLES SINTOX 12 AWG CU THFN-LS TC 750V/90°C , y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento	und	2.0	$ 191,278.22	$ 873,934.66	1.00	$ 191,278.00	1.00	$ 191,278.00
1.8.20	Suministro, transporte e instalación de salida de tomacorriente doble (4m) exposible, con polo a tierra,en EMT 1/2" 15A, 125V, ref Lev 5262-0IO naranja, certificación RETE y pruebas de conformidad U l 20V. Incluye marcación, cables 3Mm12 AWG THLS, cajas de paso o conexión 12X12 con tapa suplementaria, aparato certificado con general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento	und	5.0	$ 169,355.92	$ 846,779.59	7.00	$ 1,185,491.00	7.00	$ 1,185,491.00
1.8.22	Suministro, transporte e instalación de luminaria Ojo de Buey para el LED de 36W, INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm)libre de halógenos, clavija con polo a tierra, elementos de fijación según norma NRS-10, ANCLAMOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante.	und	6.0	$ 153,859.15	$ 923,154.89	2.00	$ 307,718.00	2.00	$ 307,718.00
1.8.23	Suministro, transporte e instalación de reflector led tipo exterior de 70W con fotocelda. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm) libre de halógenos, clavija con polo a tierra, elementos de fijación según norma NRS-10, ANCLAMOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante.	und	4.0	$ 400,092.02	$ 1,600,368.09	4.00	$ 1,600,368.00	4.00	$ 1,600,368.00
2	**REDES HIDRAULICAS**								
2.1	Localización y replanteo	día	5.0	$ 739,448.03	$ 3,697,240.15	5.00	$ 3,697,240.00	10.00	$ 7,394,480.00
2.3	Suministro, transporte e instalación de tubería de impulsión acampanada PVC Presión a 4" RDE 21 desde estación de bombeo hasta tanque de almacenamiento	m	1212.0	$ 87,852.78	$ 110,587,574.29	1367.20	$ 133,784,326.00	1367.20	$ 133,784,326.00
2.6	Anclajes para tubería pvc en concreto de 210 kg/cm2, incluye gancho de 1/4"	m3	2.3	$ 748,562.11	$ 1,571,980.43	0.60	$ 449,137.00	1.89	$ 1,413,787.00
2.7	Excavación manual o mecanica en material común seco de 0-2 m (incluye acarreo de material a pie)	m3	570.3	$ 87,106.43	$ 32,941,579.35	330.91	$ 18,897,090.00	952.87	$ 54,415,007.00
3	**OBRAS EXTRAS**								
OE1	Corte y limpieza de maleza y arbustos mediante machete, incluyendo el retiro y acondicionamiento de los residuos generados en limpieza o en bolsas. No contempla el acarreo hasta del predio del material sobrante.	m2		$ 2,714	$ -	307.00	$ 833,198.00	4627.00	$ 12,557,678.00
OE2	Suministro transporte e instalación de cinta de señalización para tubería de acueducto	m		$ 2,183	$ -	1351.20	$ 2,949,670.00	1920.20	$ 4,213,627.00
OE16	Retiro y reinstalación de cerramiento con alambre de puas, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m		$ 40,655	$ -	40.60	$ 1,650,593.00	65.50	$ 2,662,903.00
OE18	Acarreo interno de material sobrante de excavación por medios manuales o mecánicos. Su transporte hasta el sitio que la interventoría.	m3		$ 28,515	$ -	327.36	$ 8,679,950.00	327.36	$ 8,679,950.00
OE25	Suministro, transporte e instalación de cantina metálica para cruce de tubería sobre cuera, fabricada en ángulo de acero 2 1/2" x 1/4", incluye corte, armado y soldadura, aplicación de recubrimiento anticorrosivo y pintura esmalte, mano de obra, herramienta, equipos, anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, fijación y funcionamiento.	m		$ 256,894	$ -	5.40	$ 4,085,068.00	5.40	$ 4,085,068.00
OE27	Construcción de CUNETA PERIMETRAL en concreto de 21 Mpa , con un DESARROLLO mínimo de 60 cm y un ESPESOR DE 12 cm. Incluye entresuelo de 15 cm en piedra de 2" a 4" y 5 cm en arenillo y todos los demás elementos necesarios para su correcta funcionalidad.	m		$ 149,855	$ -	33.00	$ 4,948,515.00	33.00	$ 4,948,515.00
OE31	Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación con toma 15 A, NEMA5-15R, por tubo EMT 1/2", cables 2#12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable.	und		$ 182,166	$ -	6.00	$ 1,092,996.00	6.00	$ 1,092,996.00
OE32	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución de 12 circuitos 220 voltios monofásico 100 amperios con proyección de 2x30	und		$ 1,372,878.00	$ -	1.00	$ 1,372,878.00	1.00	$ 1,372,878.00
OE34	Transporte mular interno de materiales donde no es posible el acceso de vehículos de tracción mecánica, para distancias de 200m hasta 100m. Nota: En caso de generarse distancias superiores a 100m se pagará por este mismo ítem de manera proporcional a la distancia y al valor establecido. La anterior descripción aplica para el ingreso del vaciado de las losa del tanque de almacenamiento donde no hay ingreso vehicular, incluye empacada de materiales en costales.	carga		$ 38,917	$ -	396.00	$ 14,631,012.00	396.00	$ 14,631,012.00
					$ -		$ -		
					$ -		$ -		
					$ -		$ -		
					$ -		$ -		
					$ -		$ -		
					$ -		$ -		
	COSTO DIRECTO				$ 821,209,985.51		$ 204,695,562.00		$ 865,884,776.00
	ADMINISTRACIÓN (21.57%)				$ 177,145,614.00		$ 44,151,179.00		$ 186,764,350.00
	UTILIDAD (5%)				$ 41,064,499.70		$ 10,234,778.10		$ 43,294,237.00
	TOTAL COSTO DIRECTO + AU				$ 1,039,500,099.00		$ 259,081,519.00		$ 1,095,943,365.00
					AVANCE (%)				

FIRMA SUPERVISOR
Fondo Desarrollo Social Retiro
FONDESER

FIRMA INTERVENTORÍA
Representante legal

FIRMA CONTRATISTA
Representante Legal

3.3. Maquinaria y equipos de obra

Maquinaria y equipos disponibles en obra	Cantidad
Mini excavadora	1
Pulidora inalámbrica	1
Radial	1
Concretadora	1
Taladro inalámbrico	1
Vibrador de concreto	1
Herramienta menor	1

3.4. Colaboradores

1.2.1 Personal Administrativo

Personal Administrativo	Descripción
1	Director de Obra
1	Ingeniero residente
1	Gestor SST

1.3.1 Personal Operativo

Personal Operativo	Descripción
1	Oficiales
1	Operador de máquina
8	Ayudantes

4. Conclusiones

A la fecha, el proyecto presenta un avance físico acumulado del 70,28 %. Se encuentran pendientes por ejecutar algunos suministros y equipos principales, entre ellos la bomba del pozo de bombeo, el tanque de almacenamiento y el transformador.

Robinson Muñoz Sánchez
Representante legal

OBRAS EXTRAS Y APU´S

CONCRETAR S.A.S

CONTRACTO:	No. 054-2025
OBJETO:	"AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025"
CONTRATANTE:	FONDESER
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S., NIT: 900 871 788 R/L: Robinson Alberto Muñoz Sánchez C.C. 8.161.189
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 1.039.500.099
ADICIÓN No.1	$ 519.749.963
VALOR FINAL:	$ 1.559.250.062
PLAZO INICIAL:	6 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE
PRÓRROGA: 1	4 MESES
PRÓRROGA: 1	2 MESES
PLAZO FINAL:	31 DE JULIO DE 2026

Fecha de iniciación: 09/07/2025

Fecha de terminación: 31/07/2026

En el Municipio de El Retiro (Antioquia) a los 20 días del mes de mayo de 2026, se reunieron en las oficinas de FONDESER, el señor CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA, identificado con cédula de ciudadanía número 71.557.289, gerente de FONDESER, en calidad CONTRATANTE; el señor ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 8.161.189, representante legal de la firma RM CONCRETAR S.A.S., con NIT 900.871.788-1 en calidad CONTRATISTA y el señor JORGE DAVID CARO GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía número 71.626.439, Representante Legal de INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS., con Nit 900.902.315, en calidad de INTERVENTOR, con el fin de elaborar la presente acta de aprobación de precios de obra extra.

Se deja constancia de lo siguiente:

Con el fin de garantizar la correcta ejecución de las obras y el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos, es necesario realizar actividades adicionales que permitan satisfacer plenamente el objeto contractual.

Los siguientes APU para OE

- OE 31 Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación con toma 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT1/2", cables 3N°12 AWG, caja 12x5,

incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable.

- OE 32 Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución de 12 circuitos 220 voltios monofásico 100 amperios con protección de 2x30

- OE 33 Suministro transporte e instalacion de transformador trifasico de 30kva 13.2kv/440/220, vestida en poste RA2-026, acometida para en 3#4+2#4 Cu THWN AWG, bajante en TMG de 2", certificacion y pruebes de conformidad, (RA2-907), TC y TP para medida.

- OE 34Transporte mular interno de materiales donde no es posible el acceso de vehículos de tracción mecánica, para distancias de 200m hasta 100m. Nota: En caso de generarse distancias superiores a 100m se pagará por este mismo ítem de manera proporcional a la distancia y al valor establecido. La anterior descripción aplica para el ingreso del vaciado de las losas del tanque de almacenamiento donde no hay ingreso vehicular, incluye empacada de materiales en costales.

- OE 35 Capacitación teórico–práctica para la operación, control y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), incluyendo procesos de captación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Comprende además el manejo de sistemas eléctricos asociados, tableros de control, protecciones, instrumentación básica, operación de bombas (arranque, paro, mantenimiento preventivo y correctivo), protocolos de seguridad industrial, resolución de fallas operativas y cumplimiento de la normatividad vigente para la calidad del agua potable

- OE 36 Retiro y botada de material sobrante proveniente de la excavación, a botadero certificado

Los cuales la Alcaldía, mediante FONDESER realizan la verificación de las necesidades mediante registro fotográfico expuesto a los entes mencionados.

Se deja por escrito las justificaciones unitarias de las modificaciones realizadas y pactas en comités y de las obras extras requeridas para el desarrollo con éxito del presente proyecto.

Se anexa cuadro de cantidades actuales, modificación #2 y condición final actualizada para el balance de obra:

Nota: el documento se observa completo en el Balance de mayores y de menores.

Los ítems y precios de obra extra y contractual pactados son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO PACTADO	JUSTIFICACIÓN
OE31	Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación con toma 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT3/4", cables 3N°12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable.	und	$ 182,166	Se requiere para garantizar la alimentación eléctrica de las luminarias proyectadas en la caseta de operación, permitiendo el adecuado funcionamiento del sistema de iluminación y asegurando condiciones óptimas de visibilidad, seguridad y operación de la infraestructura.
OE32	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución de 12 circuitos 220 voltios monofásico 100 amperios con protección de 2x30	und	$ 1,372,878.00	Se requiere para la adecuada distribución y protección de los circuitos eléctricos de la caseta, permitiendo independizar los sistemas de iluminación, tomacorrientes, controles y equipos de bombeo, garantizando la seguridad eléctrica, facilidad de mantenimiento y cumplimiento de la normatividad vigente.
OE34	Transporte mular interno de materiales donde no es posible el acceso de vehículos de tracción mecánica, para distancias de 200m hasta 100m. Nota: En caso de generarse distancias superiores a 100m se pagará por este mismo ítem de manera proporcional a la distancia y al valor establecido. La anterior descripción aplica para el ingreso del vaciado de la losa del tanque de almacenamiento donde no hay ingreso vehicular, incluye empacada de materiales en costales.	carga	$ 36,947	Se requiere debido a que el área destinada para la construcción de la losa del tanque de almacenamiento no cuenta con acceso vehicular, siendo necesario realizar el transporte manual y mular de materiales para garantizar el suministro oportuno de insumos y la correcta ejecución de las actividades constructivas proyectadas.
OE35	Capacitación teórico–práctica para la operación, control y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), incluyendo procesos de captación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Comprende además el manejo de sistemas eléctricos asociados, tableros de control, protecciones, instrumentación básica, operación de bombas (arranque, paro, mantenimiento preventivo y correctivo), protocolos de seguridad industrial, resolución de fallas operativas y	und	$ 3,500,000	Se requiere para capacitar al personal encargado de la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua potable, garantizando el adecuado funcionamiento de la infraestructura, la correcta ejecución de los procedimientos operativos y el cumplimiento de los estándares de calidad del agua establecidos por la normatividad vigente.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO PACTADO	JUSTIFICACIÓN
	cumplimiento de la normatividad vigente para la calidad del agua potable			
OE36	Retiro y botada de material sobrante proveniente de la excavación, a botadero certificado	m3	$ 97,565	Se requiere para disponer adecuadamente el material sobrante producto de las excavaciones ejecutadas durante la construcción de las obras, garantizando condiciones seguras de trabajo, evitando afectaciones ambientales y cumpliendo con la normatividad aplicable para el manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición.

El contratista formulo y suministro los APU para Obra Extra, con los soportes de cotizaciones de actividades que aplican, el día 20 de mayo de 2026, se procede a realizar las respectivas revisiones y validaciones de los APU de OE suministrados por el CONTRATISTA, validados y aprobados previamente por el contratista INTERVENTOR, expuestos anteriormente, en la cual se validaron que los precios propuestos, no generen detrimento del patrimonio del CONTRATANTE.

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
Gerente
FONDESER

ROBINSON MUÑOZ SÁNCHEZ
Rpte legal, empresa RM Concretar S.A.S.
Contratista de obra

JORGE DAVID CARO GUZMAN
Rpte Legal, empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S.
Interventoría

2. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
OE31	Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación con toma 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT1/2", cables 3N°12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable.	und	1.00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/día	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas 5% M.O.					$ 2,767.36
taladro-brocas-discos			$ 41,890.00	0.05	$ 2,094.50
multidireccionales 1,50			$ 116,000.00	0.19	$ 21,886.79
de 1.4m			$ 9,200.00	0.19	$ 1,735.85
Juego de ruedas			$ 8,850.00	0.19	$ 1,669.81
				SUBTOTAL	$ 30,154.31

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tuberia EMT de 3/4	ml	3.15	$ 17,290.00	$ 54,463.50
Cable libre de halogeno N° 12 AGW blanco	ml	9.45	$ 2,850.90	$ 26,941.01
caja EMT 4x4 con tapa flush	und	1	$ 3,250.00	$ 3,250.00
terminal EMT de 3/4	und	2	$ 3,705.00	$ 7,410.00
Conectores y cintas	und	1	$ 2,600.00	$ 2,600.00
			SUBTOTAL	$ 94,664.51

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
acarreo del material	0.1			$ 20,000.00	$ 2,000.00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 2,000.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Oficial			$ 124,649.48	3.81	$ 32,726.38
Ayudante			$ 86,158.92	3.81	$ 22,620.79
				SUBTOTAL	$ 55,347.17
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 182,166.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en El Retiro, a los veinte(20) días, del mes febrero del año2026.

Firma:

Nomb ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ

DIRECTOR DE PROYECTO

Firma: Jorge Ortiz B.

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

2. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
OE32	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución de 12 circuitos 220 voltios monofásico 100 amperios con protección de 2x30	und	1.00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo		Tarifa/día	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas 5% M.O.						$ 10,540.42
					SUBTOTAL	$ 8,615.89

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tablero trifásico de distribución de 12 circuitos	un	1	$ 1,137,853.60	1137853.6
Chapa con llave para el tablero eléctrico	un	1	$ 11,700.00	11700
Empotrada del tablero en la pared o muro	gl	1	$ 3,900.00	3900
			SUBTOTAL	$ 1,153,453.60

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
1 Oficial de obra negra			$ 124,649.48	1.000	$ 124,649.48
1 ayudantes rasos			$ 86,158.92	1.000	$ 86,158.92
				SUBTOTAL	$ 210,808.40
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1,372,878.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en El Retiro, a los veinte(20) días, del mes febrero del año2026.

Firma: 

Nomb ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ

DIRECTOR DE PROYECTO

Firma: Jorge Cano G.

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

2. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
OE34	Transporte mular interno de materiales donde no es posible el acceso de vehículos de tracción mecánica, para distancias de 200m hasta 100m. Nota: En caso de generarse distancias superiores a 100m se pagará por este mismo ítem de manera proporcional a la distancia y al valor establecido. La anterior descripción aplica para el ingreso del vaciado de las losa del tanque de almacenamiento donde no hay ingreso vehicular, incluye empacada de materiales en costales.	Carga	1.00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/día	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas 5% M.O.					$ 430.79
				SUBTOTAL	$ 430.79

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Costales	und	1	$ 2,900.00	$ 2,900.00
			SUBTOTAL	$ 2,900.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte mular	1			$ 25,000.00	$ 25,000.00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 25,000.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante			$ 86,158.92	0.100	$ 8,615.89
				SUBTOTAL	$ 8,615.89
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 36,947.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en El Retiro, a los veinte(20) días, del mes febrero del año2026.

Firma:

Nomb ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ

DIRECTOR DE PROYECTO

Firma: Jorge Cano G.

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

2. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
OE35	Capacitación teórico–práctica para la operación, control y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), incluyendo procesos de captación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Comprende además el manejo de sistemas eléctricos asociados, tableros de control, protecciones, instrumentación básica, operación de bombas (arranque, paro, mantenimiento preventivo y correctivo), protocolos de seguridad industrial, resolución de fallas operativas y cumplimiento de la normatividad vigente para la calidad del agua potable	gl	1.00

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/día	Rendimiento	Vr. Unitario
teórico–práctica para					$ 3,500,000.00
Herramientas 5% M.O.					
				SUBTOTAL	$ 3,500,000.00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Costales				$ -
			SUBTOTAL	$ -

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte mular					$ -
				SUBTOTAL	$ -

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 3,500,000.00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en El Retiro, a los veinte(20) días, del mes febrero del año2026.

Firma:

Nomb ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ

DIRECTOR DE PROYECTO

Firma: Jorge Ortiz G.

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

2. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
OE36	Retiro y botada y cargue de material sobrante proveniente de la excavación, a botadero certificado	m3	1.00

1. Equipo

Descripción	Tarifa/día	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas 5% M.O.			$ 86.16
Retroexcavadora oruga	$ 112,669.20	0.125	$ 14,083.65
		SUBTOTAL	$ 14,169.81

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	$ -

3. Transportes

Material	unidad	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
Transporte de material al botadero oficial	Vlr/Km	13.51	1.3	$ 2,800	$ 49,172.00
Botada de material con derechos de botadero ofical	m3	1.3		$ 25,000	$ 32,500.00
				SUBTOTAL	$ 81,672.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Ayudante			$ 86,158.92	0.020	$ 1,723.18
				SUBTOTAL	$ 1,723.18
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 97,565.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en El Retiro, a los veinte(20) días, del mes febrero del año2026.

Firma:

Nomb ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ

DIRECTOR DE PROYECTO

Firma: Jorge Cano E.

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL INTERVENTORÍA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO PACTADO	JUSTIFICACIÓN
OE31	Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación con toma 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT3/4", cables 3N°12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable.	und	$ 182,166	Se requiere para garantizar la alimentación eléctrica de las luminarias proyectadas en la caseta de operación, permitiendo el adecuado funcionamiento del sistema de iluminación y asegurando condiciones óptimas de visibilidad, seguridad y operación de la infraestructura.
OE32	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución de 12 circuitos 220 voltios monofásico 100 amperios con protección de 2x30	und	$ 1,372,878.00	Se requiere para la adecuada distribución y protección de los circuitos eléctricos de la caseta, permitiendo independizar los sistemas de iluminación, tomacorrientes, controles y equipos de bombeo, garantizando la seguridad eléctrica, facilidad de mantenimiento y cumplimiento de la normatividad vigente.
OE34	Transporte mular interno de materiales donde no es posible el acceso de vehículos de tracción mecánica, para distancias de 200m hasta 100m. Nota: En caso de generarse distancias superiores a 100m se pagará por este mismo ítem de manera proporcional a la distancia y al valor establecido. La anterior descripción aplica para el ingreso del vaciado de las losa del tanque de almacenamiento donde no hay ingreso vehicular, incluye empacada de materiales en costales.	carga	$ 36,947	Se requiere debido a que el área destinada para la construcción de la losa del tanque de almacenamiento no cuenta con acceso vehicular, siendo necesario realizar el transporte manual y mular de materiales para garantizar el suministro oportuno de insumos y la correcta ejecución de las actividades constructivas proyectadas.
OE35	Capacitación teórico–práctica para la operación, control y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), incluyendo procesos de captación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Comprende además el manejo de sistemas eléctricos asociados, tableros de control, protecciones, instrumentación básica, operación de bombas (arranque, paro, mantenimiento preventivo y correctivo), protocolos de seguridad industrial, resolución de fallas operativas y cumplimiento de la normatividad vigente para la calidad del agua potable	und	$ 3,500,000	Se requiere para capacitar al personal encargado de la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua potable, garantizando el adecuado funcionamiento de la infraestructura, la correcta ejecución de los procedimientos operativos y el cumplimiento de los estándares de calidad del agua establecidos por la normatividad vigente.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO PACTADO	JUSTIFICACIÓN
OE36	Retiro y botada de material sobrante proveniente de la excavación, a botadero certificado	m3	$ 97,565	Se requiere para disponer adecuadamente el material sobrante producto de las excavaciones ejecutadas durante la construcción de las obras, garantizando condiciones seguras de trabajo, evitando afectaciones ambientales y cumpliendo con la normatividad aplicable para el manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en El Retiro, a los veinte(20) días, del mes mayo del año2026

ROBINSON MUÑOZ SÁNCHEZ
Rpte legal, empresa RM Concretar S.A.S.
Contratista de obra

JORGE DAVID CARO GUZMAN
Rpte Legal, empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE S.A.S.
Interventoría

RM CONCRETAR S.A.S

ACTA DE OBRA No.4 Y MEMORIAS DE CANTIDADES

RM CONCRETAR S.A.S

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EL DIAMANTE S.A.S.
900.922.315-0

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 026 - 2025

RM CONCRETAR S.A.S

Objeto:
"AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRAVIO 026 DE 2025"

Fondeser

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL No. 4		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1.1	**Localizacion y Replanteo**								
1.2	**Llenos y reemplazos**								
1.2.2	Excavación manual de material heterogeneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye, roca descompuesta, bolsa de roca de volúmen inferior a 0.35m3.	m3	41.0	$ 57,108.43	$ 2,343,618.91	11.94	$ 681,737.00	137.16	$ 7,832,833.00
1.3	**Concretos**								
1.3.3	Construcción de CAJA DE REGISTRO de 0,60x0,60 m x profundidad hasta 120 cm, incluye la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones. La excavacion, llenos, entresuelo y acero de refuerzono se pagarán en item respectivo.	und	10.0	$ 764,115.99	$ 7,641,159.87	1.00	$ 764,116.00	1.00	$ 764,116.00
1.4	**Aceros**								
1.4.1	Suministro, transporte, figuración y colocacion de acero de refuerzo de 60.000 psi.	kg	8342.0	$ 9,455.56	$ 88,333,857.41	23.81	$ 225,118.00	9584.94	$ 90,631,017.00
1.7	**Acometida y red eléctrica**								
1.8	**Caseta de bombeo y oficina**								
1.8.2	Suministro y colocacion de concreto f' c= 21 Mpa (210 Kg/cm2), para pilotes circulares d=20cm, no incluye refuerzo	m3	1.0	$ 675,763.31	$ 1,273,783.64	0.45	$ 304,093.00	17.95	$ 12,129,951.00
1.8.5	Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø4". Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	65.0	$ 63,917.01	$ 3,604,605.38	31.60	$ 1,703,777.00	31.60	$ 1,703,777.00
1.8.17	Suministro, transporte e instalacion de salidas para breaker 20 amperios monopolar para circuitos de iluminación incluye breaker y alambre	und	6.0	$ 110,032.13	$ 660,192.79	6.00	$ 660,193.00	6.00	$ 660,193.00
1.8.19	Suministro, transporte e instalación de salida de interruptor sencillo (3m), expuesta, en tubería EMT de 1/2", 15 A, TIPO Lévitan, referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye interruptor, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto EMT de 1/2", conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, chazos y tornillos, CABLES SINTOX 12 AWG CU HF FR LS TC 750V 80°C , y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	und	3.0	$ 191,276.22	$ 573,834.66	1.00	$ 191,278.00	1.00	$ 191,278.00
1.8.20	Suministro, transporte e instalación de salida de tomacorriente doble (4m) expuesto, con polo a tierra,en EMT 1/2" 15A, 125V, ref Lev 5262-0IG naranja, certificación RETIE y pruebas de conformidad U120V. Incluye medición, cables 3No12 AWG HFLS, cajas de paso o conexión 12X12 con tapa suplemento, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	5.0	$ 169,355.92	$ 846,779.59	7.00	$ 1,185,491.00	7.00	$ 1,185,491.00
1.8.22	Suministro, transporte e instalación de luminaria Ojo de Buey panel LED de 30W, INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm) libre de halógenos, clavija con polo a tierra, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante.	und	6.0	$ 153,859.15	$ 923,154.89	2.00	$ 307,718.00	2.00	$ 307,718.00
1.8.23	Suministro, transporte e instalación de reflector led tipo exterior de 75W con fotocelda, INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm) libre de halógenos, clavija con polo a tierra, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante.	und	4.0	$ 400,092.02	$ 1,600,368.08	4.00	$ 1,600,368.00	4.00	$ 1,600,368.00
2	**REDES HIDRAULICAS**								
2.1	Localización y replanteo	dia	5.0	$ 739,448.03	$ 3,697,240.15	5.00	$ 3,697,240.00	10.00	$ 7,394,480.00
2.3	Suministro, transporte e instalación de tubería de impulsión acampanada PVC Presión a 4" RDE 21 desde estación de bombeo hasta tanques de almacenamiento	m	1212.0	$ 97,852.76	$ 118,597,574.29	1367.20	$ 133,784,326.00	1367.20	$ 133,784,326.00
2.8	Anclajes para tubería pvc en concreto de 210 kg/cm2, incluye gancho de 1/4"	m3	2.1	$ 748,562.14	$ 1,571,980.49	0.60	$ 449,137.00	1.89	$ 1,413,787.00
2.7	Excavación manual o mecánica en material común seco de 0-2 m (incluye acarreo de material a pie)	m3	576.3	$ 57,106.43	$ 32,911,579.35	330.91	$ 18,897,090.00	952.87	$ 54,415,007.00
3	**OBRAS EXTRAS**								
OE1	Corte y limpieza de maleza y arbustos mediante machete, incluyendo el retiro y amontonamiento de los residuos generados en linea o en bolsas. No contempla el acarreo fuera del predio del material resultante.	m2		$ 2,714	$ -	307.00	$ 833,198.00	4627.00	$ 12,557,678.00
OE2	Suministro transporte e instalación de cinta de señalización para tubería de acueducto.	m		$ 2,183	$ -	1351.20	$ 2,949,670.00	1930.20	$ 4,213,627.00
OE18	Retiro y reinstalación de cerramiento con alambre de púas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m		$ 40,655	$ -	40.60	$ 1,650,593.00	65.50	$ 2,662,903.00
OE18	Acarreo interno de material sobrante de excavación por medios manuales ó mecánicos. Su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3		$ 26,515	$ -	327.36	$ 8,679,950.00	327.36	$ 8,679,950.00
OE25	Suministro, transporte e instalación de cercha metálica para cruce de tubería sobre cauce, fabricada en ángulo de acero 2 1/2" x 1/4". Incluye corte, armado y soldadura, aplicación de recubrimiento anticorrosivo y pintura esmalte, mano de obra, herramientas, equipos, anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, nivelación y funcionamiento.	m		$ 756,494	$ -	5.40	$ 4,085,068.00	5.40	$ 4,085,068.00
OE27	Construcción de CUNETA PERIMETRAL en concreto de 21 Mpa., con un DESARROLLO máximo de 60 cm y un ESPESOR DE 12 cm. Incluye entresuelo de 15 cm en piedra de 2" a 4" y 5 cm en arenilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m		$ 149,955	$ -	33.00	$ 4,948,515.00	33.00	$ 4,948,515.00
OE31	Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación con toma 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT1/2", cables 3N°12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable.	und		$ 182,166	$ -	6.00	$ 1,092,996.00	6.00	$ 1,092,996.00
OE32	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución de 12 circuitos 220 voltios monofásico 100 amperios con protección de 2x30	und		$ 1,372,878.00	$ -	1.00	$ 1,372,878.00	1.00	$ 1,372,878.00
OE34	Transporte mular interno de materiales donde no es posible el acceso de vehiculos de tracción mecánica, para distancias de 200m hasta 100m. Nota: En caso de generarse distancias superiores a 100m se pagará por este mismo item de manera proporcional a la distancia y el valor establecido. La anterior descripción aplica para el ingreso del vaciado de las losa del tanque de almacenamiento donde no hay ingreso vehicular, incluye empacada de materiales en costales.	carga		$ 38,947	$ -	396.00	$ 14,631,012.00	396.00	$ 14,631,012.00
					$ -		$ -		
					$ -		$ -		
					$ -		$ -		
					$ -		$ -		
					$ -		$ -		
					$ -		$ -		
	COSTO DIRECTO				$ 821,289,985.51		$ 204,695,562.00		$ 865,884,776.00
	ADMINISTRACIÓN (21.57%)				$ 177,145,614.00		$ 44,151,179.00		$ 186,764,350.00
	UTILIDAD (5%)				$ 41,064,499.28		$ 10,234,778.10		$ 43,294,239.00
	TOTAL COSTO DIRECTO + AU				$ 1,039,500,099.00		$ 259,081,519.00		$ 1,095,943,365.00
					AVANCE (%)				

FIRMA SUPERVISOR
Fondo Desarrollo Social Retiro
FONDESER

FIRMA INTERVENTORÍA
Representante Legal

FIRMA CONTRATISTA
Representante Legal

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026			ACTA N°	4		
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER						
ITEM	1.2.2	DESCRIPCION	Excavación manual de material heterogeneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye, roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0,35m3.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL			





LOCALIZACION	FECHA			VOLUMEN	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
Acta No.2						
Vigas Floculador	4.00	0.40	0.40	0.64	4.00	2.56
Vigas filtros	6.00	0.30	0.30	0.54	2.00	1.08
Vigas filtros	2.00	0.30	0.30	0.18	4.00	0.72
Losa floculador	4.00	4.00	0.25	4.00	1.00	4.00
Losa Filtros	2.00	6.00	0.25	3.00	1.00	3.00
Losa tanques	8.00	4.00	0.25	8.00	1.00	8.00
Viga pozo bombeo	5.60	0.30	0.30	0.50	4.00	2.02
Intersecciones floculador	0.40	0.40	0.40	0.06	(4.00)	(0.26)
Intersecciones filtros	0.30	0.30	0.30	0.03	(8.00)	(0.22)
Intersecciones tanque	0.40	0.40	0.40	0.06	(8.00)	(0.51)
Intersepción pozo de bombeo	0.30	0.30	0.30	0.027	(4.00)	(0.11)
Explanación losa tanques	1.2	10.00	6.00	72.00	1.00	72.00
Excavación pozo pared	7.6	1.50	2.10	23.94	1.00	23.94
Excavación fondo de pozo para nivelación	6.00	6.00	0.25	9.00	1.00	9.00

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026			ACTA N°	4		
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER						
ITEM	1.2.2	DESCRIPCION	Excavación manual de material heterogeneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye, roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0,35m3.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL			





Acta No.3						
Vigas Floculador	4.00	0.40	(0.15)	(0.24)	4.00	(0.96)
Vigas filtros	6.00	0.30	(0.12)	(0.22)	2.00	(0.43)
Vigas filtros	2.00	0.30	(0.12)	(0.07)	4.00	(0.29)
Losa floculador	4.00	4.00	(0.05)	(0.80)	1.00	(0.80)
Losa Filtros	2.00	6.00	(0.08)	(0.96)	1.00	(0.96)
Viga pozo bombeo	5.60	0.30	(0.30)	(0.50)	4.00	(2.02)
Brecha de drenaje cunetas	17.05	0.40	0.80	5.46	1.00	5.46
Acta No.4						
Brecha de drenaje cunetas	12.85	0.40	0.80	4.11	1.00	4.11
Excavación caja para reboce pozo de bombeo	0.80	0.80	1.40	0.90	1.00	0.90
Excavación cunetas losa filtros	20.00	0.60	0.30	3.60	1.00	3.60
Excavación cunetas losa Floculador	16.00	0.60	0.30	2.88	1.00	2.88
Excavación columnas cerchas para puente	2.50	0.30	0.30	0.23	2.00	0.45
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						137.16
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						11.94
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						125.22
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						149.10
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de Interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser · Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062

OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025					
FECHA DE ELABORACION (día/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026	ACTA N° 4

CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER

ITEM	1.3.3	DESCRIPCION	Construcción de CAJA DE REGISTRO de 0,60x0,60 m x profundidad hasta 120 cm, incluye la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones. La excavacion, llenos, entresuelo y acero de refuerzonn se pagarán en item respectivo.	FORMULA:	UNIDAD	und	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL





LOCALIZACION	FECHA			AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
	CANTIDAD	ANCHO	ALTO			
	Acta No.4					
PTAP	1.00			1.00		1.00
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						1.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						1.00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de Interventoria

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser · Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	2
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062

OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025						
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026	ACTA N°	4

CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER				
ITEM	1.4.1	DESCRIPCION	Suministro, transporte, figuración y colocacion de acero de refuerzo de 60.000 psi.	FORMULA:	UNIDAD	kg	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL	



LOCALIZACION	FECHA			kg	N° ELEM	km total
	LARGO	# varilla	Peso kg/m			
		Acta No.2				
Floculador				-		-
Pilotes	3.00	4	1.00	3.00	16	48.00
Estribos micropilotes	1.00	3	0.56	0.56	72	40.32
Vigas	4.40	4	1.00	4.40	16	70.40
Estribos vigas	1.50	3	0.56	0.84	100	84.00
Filtros						
Pilotes	3.00	4	1.00	3.00	32	96.00
Estribos micropilotes	1.00	3	0.56	0.56	144	80.64
Vigas Longitudinales	6.15	3	0.56	3.44	8	27.55
Vigas transversales	2.10	3	0.56	1.18	16	18.82
Estribos longitudinales	1.00	3	0.56	0.56	78	43.68
Estribos transversales	1.00	3	0.56	0.56	44	24.64
Pozo de bombas						
Refuerzo parrillas	10.91	6	2.25	24.55	14	343.70
	10.3	6	2.25	23.18	14	324.52
	8.95	6	2.25	20.14	74	1,490.36
	8.35	6	2.25	18.79	74	1,390.46
	7.3	6	2.25	16.43	14	230.02
	6.68	6	2.25	15.03	14	210.42
	6	6	2.25	13.50	102	1,377.00
Refuerzo vigas inf. Y sup.	5.85	6	2.25	13.16	44	579.04
Refuerzo parrillas	4.4	6	2.25	9.90	74	732.60
	3.27	6	2.25	7.36	74	544.64
	2.95	6	2.25	6.64	74	491.36
Estribos de vigas perimetrales	1	3	0.56	0.56	403	225.87
Caseta				-		-
Viga longitudinal	4.5	4	1.00	4.50	8.00	36.00
Losa	4.4	4	1.00	4.40	46.00	202.40
Viga transversal	3.5	4	1.00	3.50	8.00	28.00
Viga transversales	3.4	4	1.00	3.40	58.00	197.20



Estribos	0.8	3	0.56	0.45	106	47.49
Tanques				-		-
Vigas longitudinales	8.35	4	1.00	8.35	8.00	66.80
Vigas transversales	4.35	4	1.00	4.35	16.00	69.60
Pilotes	3	4	1.00	3.00	32.00	96.00
Etribos vigas	1.4	3	0.56	0.78	210.00	164.64
Estribos pilotes	1	3	0.56	0.56	136.00	76.16
		Acta No.3				
Pozo de bombas ganchos parrilla inferior y superior	0.45	3	0.56	0.25	16.00	4.03
Ganchos paredes	0.27	3	0.56	0.15	16.00	2.42
Refuerzo losa superior	3	6	2.25	6.75	74.00	499.50
Compuertas	1	6	2.25	2.25	(48.00)	(108.00)
Caseta				-		-
Viga longitudinal	4.5	4	1.00	4.50	(8.00)	(36.00)
Losa	4.4	4	1.00	4.40	(46.00)	(202.40)
Viga transversal	3.5	4	1.00	3.50	(8.00)	(28.00)
Viga transversales	3.4	4	1.00	3.40	(58.00)	(197.20)
Estribos	0.8	3	0.56	0.45	(106.00)	(47.49)
Estribos viga-caseta	0.36	3	0.56	0.20	68.00	13.71
Refuerzo longitudinal	13.6	4	1	13.60	4.00	54.40
Traslapo Refuerzo longitudinal	1.8	4	1	1.80	4.00	7.20
Dovelas Muro 2.90 bajo	2.7	4	1	2.70	3.00	8.10
Dovelas Muro 2.90 alto	3.1	4	1	3.10	1.00	3.10
Dovelas Muro 3.90	2.9	4	1	2.90	4.00	11.60
Dovelas Muro 3.90	2.9	4	1	2.90	4.00	11.60
Floculador						
Pilotes	0.74	4	1.00	0.74	16.00	11.84
Estribos micropilotes	1.00	3	0.56	0.56	21.00	
Filtros						
Pilotes	0.74	4	1.00	0.74	32.00	23.68
Estribos micropilotes	1.00	3	0.56	0.56	42.00	23.52
Tanques						
Pilotes	0.74	4	1.00	0.74	32.00	23.68
Estribos pilotes	1.00	3	0.56	0.56	42.00	23.52
		Acta No.4				
Columnas para la cercha	2.50	4	1.00	2.50	8.00	20.00
Estribos columna cercha	0.20	3	0.56	0.11	34.00	3.81
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						9584.94
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						23.81
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						9561.13
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						9584.94
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de Interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062

OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025						
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026	ACTA N°	4

CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANTE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER		
ITEM	1.8.2	DESCRIPCION	Suministro y colocacion de concreto f' c= 21 Mpa (210 Kg/cm2), para pilotes circulares d=20cm, no incluye refuerzo	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA: VEREDA EL CHUSCAL



LOCALIZACION	FECHA LARGO	FECHA ANCHO	FECHA ALTO	AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
Acta No.2						
Floculador	0.50	0.50	2.50	0.63	4.00	2.50
Filtros	0.50	0.50	2.50	0.63	8.00	5.00
Tanque	0.50	0.50	2.50	0.63	8.00	5.00
Acta No.3						
Floculador	0.50	0.50	1.00	0.25	4.00	1.00
Filtros	0.50	0.50	1.00	0.25	8.00	2.00
Tanque	0.50	0.50	1.00	0.25	8.00	2.00
Acta No.4						
Columnas para cercha	0.30	0.30	2.50	0.23	2.00	0.45
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						17.95
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						0.45
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						17.50
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						17.95
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de Interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026	ACTA N°	4				
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER						
ITEM	1.8.5	DESCRIPCION	Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø4". Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	FORMULA:		UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL		






LOCALIZACION	FECHA LARGO	FECHA ANCHO	FECHA ALTO	AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
Acta No.4						
Caja para reboce - quebrada	30.00			30.00	1.00	30.00
Cuneta	0.80			0.80		0.80
Entrada a caja	0.80			0.80		0.80
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						31.60
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						31.60
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de Interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		18/03/2026	HASTA	5/06/2026		ACTA N°	4		
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS		SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER					
ITEM	1.8.17	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalacion de salidas para breaker 20 amperios monopolar para circuitos de iluminación incluye breaker y alambre	FORMULA:		UNIDAD	und	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL		

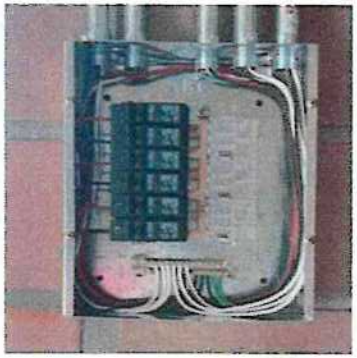



LOCALIZACION	FECHA			AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
Acta No.4						
caseta					6.00	6.00
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						6.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						6.00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de Interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser · Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062

OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025

FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026	ACTA N°	4

CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER

ITEM	1.8.19	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalación de salida de interruptor sencillo (3m), expuesta, en tubería EMT de 1/2", 15 A. TIPO Lévinton, referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye interruptor, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto EMT de 1/2", conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, chazos y tornillos, CABLES SINTOX 12 AWG CU HF FR LS TC 750V 80°C, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	FORMULA:	UNIDAD	und	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL



LOCALIZACION	FECHA LARGO	FECHA ANCHO	FECHA ALTO	AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
Acta No.4						
Caseta					1.00	1.00
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						1.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						1.00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ

Residente de obra

REVISÓ

Residente de interventoria

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser · Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026			ACTA N°	4		
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER						

ITEM	1.8.20	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalación de salida de tomacorriente doble (4m) expuesto, con polo a tierra,en EMT 1/2" 15A, 125V, ref Lev 5262-0IG naranja, certificación RETIE y pruebas de conformidad U120V. Incluye marcación, cables 3No12 AWG HFLS, cajas de paso o conexión 12X12 con tapa suplemento, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	FORMULA:	UNIDAD	und	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL





LOCALIZACION	FECHA			AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
Acta No.4						
Caseta					7.00	7.00
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						7.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						7.00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						-
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ

Residente de obra

REVISÓ

Residente de interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser · Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062

OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025					
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026	ACTA N° 4

CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S		INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS		SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER		
ITEM	18.22	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalación de luminaria Ojo de Buey panel LED de 30W, INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm) libre de halógenos, clavija con polo a tierra, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante.	FORMULA:	UNIDAD	und	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL	



LOCALIZACION	FECHA LARGO	FECHA ANCHO	FECHA ALTO	AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
		Acta No.4				
Caseta					2.00	2.00
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
-				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						2.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						2.00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026			ACTA N°	4		
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER						

ITEM	1.8.23	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalación de reflector led tipo exterior de 70W con fotocelda, INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm) libre de halógenos, clavija con polo a tierra, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante.	FORMULA:	UNIDAD	und	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL





LOCALIZACION	FECHA LARGO	FECHA ANCHO	FECHA ALTO	AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
Acta No.4						
caseta					4.00	4.00
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						4.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						4.00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de Interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062

OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025						
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026	ACTA N°	4

CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER		
ITEM	2.1	DESCRIPCION	Localización y replanteo	FORMULA:	UNIDAD	día	FRENTE DE OBRA: VEREDA EL CHUSCAL



LOCALIZACION	FECHA			AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
Acta No.2						
VEREDA EL CHUSCAL	21	Octubre	2025		1.00	1.00
	22	Octubre	2025		1.00	1.00
	23	Octubre	2025		1.00	1.00
PTAP	12	noviembre	2025		1.00	1.00
PTAP	13	noviembre	2025		1.00	1.00
Acta No.4						
Losa tanques	11	Mayo	2026		1.00	1.00
	13	Mayo	2026		1.00	1.00
	15	Mayo	2026		1.00	1.00
	21	Mayo	2026		1.00	1.00
	22	Mayo	2026		1.00	1.00
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						10.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						5.00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						0.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						5.00
TOTAL POR EJECUTAR						10.00

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de Interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser · Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062

OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025						
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026	ACTA N°	4

CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER		

ITEM	2.3	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalación de tubería de impulsión acampanada PVC Presión ø 4" RDE 21 desde estación de bombeo hasta tanques de almacenamiento	FORMULA:	UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL





LOCALIZACION	FECHA			AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
Acta No.4						
Llegada al tanque	2.40			2.40		2.40
Finca - Lindero superior	167.20			167.20		167.20
Finca - lindero hasta entrada principal	149.60			149.60		149.60
De entrada a la finca hasta los franciscanos	470.00			470.00		470.00
Hasta vía nacional	294.20			294.20		294.20
De la esquina a la obra transversal	66.20			66.20		66.20
Cruce obra transversal	10.00			10.00		10.00
Obra transversal a entrada vía hacia lejos del nido	39.50			39.50		39.50
Via en placa huella hasta pozo de bombeo	168.10			168.10		168.10
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						1367.20
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						1367.20
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ

Residente de obra

REVISÓ

Residente de Interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026			ACTA N°	4		
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER						
ITEM	2.6	DESCRIPCION	Anclajes para tubería pvc en concreto de 210 kg/cm2, incluye gancho de 1/4"	FORMULA:		UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL		





LOCALIZACION	FECHA			AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
Acta No.2						
Conducción Cruce de cauce k 0 + 201	1.20	0.50	0.50	0.30	1.00	0.30
Tubería	1.20	3.14	0.01	0.02	(1.00)	(0.02)
Acequia k 0+307	0.50	0.70	0.50	0.18	1.00	0.18
Tubería	1.20	3.14	0.01	0.02	(1.00)	(0.02)
Acequia k 0+357	0.50	0.70	0.50	0.18	1.00	0.18
Tubería	1.20	3.14	0.01	0.02	(1.00)	(0.02)
Cambio de dirección k 0+108	0.90	0.50	0.50	0.23	1.00	0.23
Tubería	0.90	3.14	0.01	0.02	(1.00)	(0.02)
Cambio de dirección k 0+082	1.00	0.80	0.50	0.40		0.40
Tubería	0.90	3.14	0.01	0.02	(1.00)	(0.02)
Cambio de dirección k 0+000	0.50	0.50	0.50	0.13		0.13
Tubería	0.90	3.14	0.01	0.02	(1.00)	(0.02)
Acta No.4						
Anclaje sector puente	1.20	0.50	0.50	0.30	2.00	0.60
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						1.89
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						0.60
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ

Residente de obra

REVISÓ

Residente de Interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser · El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		18/03/2026	HASTA	5/06/2026		ACTA N°	4		
CONTRATISTA:		INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANTE SAS		SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER					
ITEM	2.7	DESCRIPCION	Excavación manual o mecanica en material común seco de 0-2 m (incluye acarreo de material a pila)		FORMULA:		UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL	





LOCALIZACION	FECHA			AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
Acta No.1						
Predio del municipio PTAP						
Losas y cuarto de bombeo	19.98	8.60	0.52			89.35
Zanja 1	8.50	0.75	0.40			2.55
Zanja 2	6.90	0.75	0.40			2.07
Tubería 0+579-0+472.5	106.50	0.60	0.65			41.54
Perfilamiento talud llegando al floculador	24.00	3.28	2.10			165.31
Predio 00567						
Tubería 0+472.5 - 0+392.5	80.00	0.60	0.65			31.20
Tubería 0+392.5-0+308.5	84.00	0.60	0.45			22.68
Tubería 0+308.5 - 0+188.5	120.00	0.60	0.85			61.20
Perfilamiento talud llegando al floculador	12.40	2.00	1.21			30.01
Predio 00188						
Tubería 0+188.5 - 0+140	48.50	0.60	0.80			23.28
Tubería 0+140 - 0+080	60.00	0.60	0.65			23.40
Tubería 0+080 - 0+020	60.00	0.60	1.10			39.60
Tubería 0+020 - 0+000	20.00	0.60	0.55			6.60

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser · Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

										HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$				1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025												
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE				18/03/2026	HASTA	5/06/2026			ACTA N°	4	
CONTRATISTA:		INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS			SUPERVISOR:		GERENTE DE FONDESER					
ITEM	2.7	DESCRIPCION	Excavación manual o mecanica en material común seco de 0-2 m (incluye acarreo de material a pila)			FORMULA:		UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL		



Acta No.3						
Predio del municipio PTAP						
Tubería 0+579-0+472.5	106.50	0.20	0.65			13.85
Predio 00567						
Tubería 0+472.5 - 0+392.5	80.00	0.20	0.65			10.40
Tubería 0+392.5-0+308.5	84.00	0.20	0.45			7.56
Tubería 0+308.5 - 0+188.5	120.00	0.20	0.85			20.40
Predio 00188						
Tubería 0+188.5 - 0+140	48.50	0.20	0.80			7.76
Tubería 0+140 - 0+080	60.00	0.20	0.65			7.80
Tubería 0+080 - 0+020	60.00	0.20	1.10			13.20
Tubería 0+020 - 0+000	20.00	0.20	0.55			2.20
Acta No.4						
Finca - Lindero superior	167.20	0.40	0.60			40.13
Finca - lindero hasta	149.60	0.40	0.60			35.90
De entrada a la finca hasta	470.00	0.40	0.60			112.80
Hasta vía nacional	294.20	0.40	0.60			70.61
De la esquina a la obra	66.20	0.40	0.85			22.51
Obra transversal a entrada	39.50	0.40	0.60			9.48
Via en placa huella hasta	164.50	0.40	0.60			39.48
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						952.87
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						330.91
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						621.96
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						952.87
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser · Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE			18/03/2026	HASTA	5/06/2026		ACTA N°		4
CONTRATISTA:		INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS			SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER				
ITEM	2.7	DESCRIPCION	Excavación manual o mecanica en material común seco de 0-2 m (incluye acarreo de material a pila)			FORMULA:		UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL



Acta No.3						
Predio del municipio PTAP						
Tubería 0+579-0+472.5	106.50	0.20	0.65			13.85
Predio 00567						
Tubería 0+472.5 - 0+392.5	80.00	0.20	0.65			10.40
Tubería 0+392.5-0+308.5	84.00	0.20	0.45			7.56
Tubería 0+308.5 - 0+188.5	120.00	0.20	0.85			20.40
Predio 00188						
Tubería 0+188.5 - 0+140	48.50	0.20	0.80			7.76
Tubería 0+140 - 0+080	60.00	0.20	0.65			7.80
Tubería 0+080 - 0+020	60.00	0.20	1.10			13.20
Tubería 0+020 - 0+000	20.00	0.20	0.55			2.20
Acta No.4						
Finca - Lindero superior	167.20	0.40	0.60			40.13
Finca - lindero hasta	149.60	0.40	0.60			35.90
De entrada a la finca hasta	470.00	0.40	0.60			112.80
Hasta vía nacional	294.20	0.40	0.60			70.61
De la esquina a la obra	66.20	0.40	0.85			22.51
Obra transversal a entrada	39.50	0.40	0.60			9.48
Vía en placa huella hasta	164.50	0.40	0.60			39.48
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						952.87
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						330.91
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						621.96
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						952.87
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de Interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026			ACTA N°	4		
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S.	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE FONDESER						
ITEM	OE1	DESCRIPCION	Corte y limpieza de maleza y arbustos con machete, retiro y amontonamiento de residuos en líneas o bolsas (no incluye acarreo fuera del predio ni quema).	FORMULA:		UNIDAD	m2	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL		





LOCALIZACION	FECHA			AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
Acta No.2						
Tramo tubería lindereo del predio 00062	260.00	6.00				1,560.00
Predio PTAP	120.00	6.00				720.00
Tramo tubería lindereo del predio 00188	90.00	6.00				540.00
Predio Tanques - Tubería	120.00	2.00				240.00
Predio Tanques - Losa	10.00	6.00				60.00
Acta No.3						
Tramo tubería lindereo del predio 00062	260.00	2.00				520.00
Predio PTAP	120.00	2.00				240.00
Tramo tubería lindereo del predio 00188	90.00	2.00				180.00
Predio Tanques - Tubería	120.00	2.00				240.00
Predio Tanques - Losa	10.00	2.00				20.00
Acta No.4						
Finca - lindero hasta la vía en placa huella	153.50	2.00				307.00
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						4627.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						307.00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						4320.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						4627.00
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de Interventoria

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		18/03/2026	HASTA	5/06/2026		ACTA N°	4		
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANTE SAS		SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER					
ITEM	OE2	DESCRIPCION	Suministro transporte e instalación de cinta de señalización para tubería de acueducto.	FORMULA:		UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL		





LOCALIZACION	FECHA LARGO	FECHA ANCHO	FECHA ALTO	AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
Acta No.2						
Tubería de conducción	579.00			579.00		579.00
Acta No.4						
Finca - Lindero superior	167.20			167.20		167.20
Finca - lindero hasta entrada principal	149.60			149.60		149.60
De entrada a la finca hasta los franciscanos	470.00			470.00		470.00
Hasta via nacional	294.20			294.20		294.20
De la esquina a la obra transversal	66.20			66.20		66.20
Obra transversal a entrada vía hacia lejos del nido	39.50			39.50		39.50
Via en placa huella hasta pozo de bombeo	164.50			164.50		164.50
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						1930.20
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						1351.20
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ

Residente de obra

REVISÓ

Residente de Interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE		18/03/2026	HASTA	5/06/2026		ACTA N°	4		
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER						

ITEM	OE9	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalación de planta de tratamiento de agua potable en fibra de vidrio para 7.5 l/s. Incluye floculador-sedimentador de 3.20m de diámetro por 3.30m de altura; 4 filtros de 0.90m de diámetro por 3m de altura. Todas las válvulas y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	FORMULA:	UNIDAD	und	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL





LOCALIZACION	FECHA LARGO	FECHA ANCHO	FECHA ALTO	AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
Acta No.2						
Planta de tratamiento					0.25	0.25
Acta No.3						-
Planta de tratamiento					0.50	0.50
Acta No.4						-
Planta de tratamiento					0.15	0.15
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						0.90
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						0.15
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						0.75
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						0.90
TOTAL POR EJECUTAR						0.00

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de Interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser · Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026			ACTA N°	4		
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER						
ITEM	OE16	DESCRIPCION	Retiro y reinstalación de cerramiento con alambre de púas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	FORMULA:		UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL		



LOCALIZACION	FECHA LARGO	FECHA ANCHO	FECHA ALTO	AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
Acta No.2						
Entre lote 00188 y 00567. Abscisa tubería k0+188	8.10			8.10		8.10
Lote 00567 y vía veredal. Abscisa tubería k0+467	7.00			7.00		7.00
Lote 00566 y vía veredal. Abscisa tubería k0+474	9.80			9.80		9.80
Acta No.4						
Tramo Escula a vía principal	28.60			28.60		28.60
Lindero zona tanque	12.00			12.00		12.00
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						65.50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						40.60
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						24.90
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						65.50
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser · Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062

OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025					
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026	ACTA N° 4

CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER

ITEM	OE18	DESCRIPCION	Acarreo interno de material sobrante de excavación por medios manuales ó mecánicos. Su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	FORMULA:	UNIDAD	m3	FRENTE DE OBRA: VEREDA EL CHUSCAL





LOCALIZACION	FECHA LARGO	FECHA ANCHO	FECHA ALTO	AREAS	N° ELEM.	MEDIDA TOTAL
		Acta No.4				
PTAP - paralelo a la quebrada	32.00	6.20	1.65	327.36	1	327.36
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						327.36
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						327.36
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026					ACTA N°	4
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER						

ITEM	OE25	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalación de cercha metálica para cruce de tubería sobre cauce, fabricada en ángulo de acero 2 1/2" x 1/4". Incluye corte, armado y soldadura, aplicación de recubrimiento anticorrosivo y pintura esmalte, mano de obra, herramientas, equipos, anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, nivelación y funcionamiento.	FORMULA:	UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL



LOCALIZACION	FECHA			AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
Lote 00565 - cruce quebrada	5.40			5.40		5.40
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						5.40
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						5.40
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de interventoria

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062

OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025				
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026	ACTA N°	4

CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER

ITEM	OE27	DESCRIPCION	Construcción de CUNETA PERIMETRAL en concreto de 21 Mpa., con un DESARROLLO máximo de 60 cm y un ESPESOR DE 12 cm. Incluye entresuelo de 15 cm en piedra de 2" a 4" y 5 cm en arenilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción	FORMULA:	UNIDAD	m	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL







LOCALIZACION	FECHA			AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
losa Floculador	16.00			16.00		16.00
Losa Filtros	16.00			16.00		16.00
Losa 1 a Losa 2	1.00			1.00		1.00
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						33.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						33.00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de Interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / ALCALDÍA DE El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025										
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026			ACTA N°	4		
CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER						

ITEM	OE31	DESCRIPCION	Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación con toma 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT1/2", cables 3Nº12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable.	FORMULA:	UNIDAD	und	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL





LOCALIZACION	FECHA			AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
Acta No.4						
Caseta					6.00	6.00
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						6.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						6.00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de Interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		


								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062

OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025						
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026	ACTA N°	4

CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANATE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER

ITEM	OE32	DESCRIPCION	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución de 12 circuitos 220 voltios monofásico 100 amperios con protección de 2x30	FORMULA:	UNIDAD	und	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL



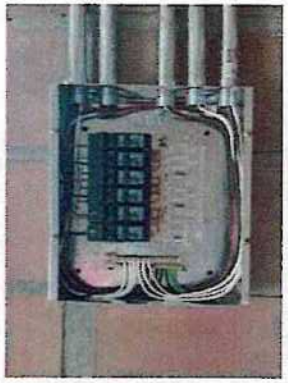

LOCALIZACION	FECHA			AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
Acta No.4						
Caseta					1.00	1.00
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						1.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						1.00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ

Residente de obra

REVISÓ

Residente de interventoría

COD.	Formato Memorias de Cálculo y Cantidades de Obra Pública	Fondeser / Alcaldía de El Retiro
Versión 1		

								HOJA N°	1	DE	1
CONTRATO No	054 de 2025	DEL AÑO	2025	FECHA DE INICIO	9/07/2025	FECHA DE TERMINACION	30/07/2026	VALOR	$		1,559,250,062

OBJETO	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025				
FECHA DE ELABORACION (dia/mes/año)	5/06/2026	CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE	18/03/2026	HASTA	5/06/2026	ACTA N°	4

CONTRATISTA:	RM CONCRETAR S.A.S	INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES EL DIAMANTE SAS	SUPERVISOR:	GERENTE DE FONDESER

ITEM	OE34	DESCRIPCION		FORMULA:	UNIDAD	carga	FRENTE DE OBRA	VEREDA EL CHUSCAL
			Transporte mular interno de materiales donde no es posible el acceso de vehículos de tracción mecánica, para distancias de 200m hasta 100m. Nota: En caso de generarse distancias superiores a 100m se pagará por este mismo ítem de manera proporcional a la distancia y al valor establecido. La anterior descripción aplica para el ingreso del vaciado de las losa del tanque de almacenamiento donde no hay ingreso vehicular, incluye empacada de materiales en costales.					







LOCALIZACION	FECHA			AREAS	N° ELEM	MEDIDA TOTAL
	Descripción	Viajes	ALTO			
Cemento		67.00		67.00		67.00
Arena		127.00		127.00		127.00
Triturado		195.00		195.00		195.00
Concretadora		1.00		1.00		1.00
Planta eléctrica		1.00		1.00		1.00
Acero		5.00		5.00		5.00
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
OBSERVACIONES:						
SUBTOTAL ESTA HOJA						396.00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						396.00
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
TOTAL POR EJECUTAR						

ELABORÓ	REVISÓ
Residente de obra	Residente de Interventoría

OTROSÍ

RM
CONCRETAR S.A.S

ACTA DE REINICIO DE CONTRATO DE OBRA

NÚMERO:	054 DE 2025
CONTRATISTA: REP.LEGAL	RM CONCRETAR S.A.S. NIT 900.871.788 ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ CC 8.161.189
OBJETO:	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025
VALOR:	MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($ 1.039.500.099)
PLAZO:	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍAS ÚNICAS DEL CONTRATO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
SUPERVISOR:	Gerente

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA mayor y vecino del municipio de el retiro Antioquia, identificado con cédula 71.557.289 de El Retiro, actuando como representante legal de **FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO (FONDESER),** en su calidad de gerente facultado para celebrar este tipo de contrato conforme al acuerdo no. 002 de 2018, de una parte, que se denominará FONDESER Y RM CONCRETAR S.A.S. identificada con NIT 900.871.788 representada legalmente por ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ identificado con CC 8.161.189 de la otra parte, que se denominará el contratista, se ha convenido suscribir la presente el acta de reinicio al contrato de obra, el cual se regirá por las siguientes

CONSIDERACIONES

Qué el FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO (FONDESER) Y RM CONCRETAR S.A.S. celebraron el contrato de obra N° 054 de 2025 cuyo objeto es AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025 con un plazo inicial de ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2026

Que el pasado 29 de diciembre de 2025 las partes celebraron un OTROSI # 1 donde se prorrogo el plazo contractual hasta el día 30 de abril de 2026

Que en el mes de febrero de 2026 el contratista solicito la suspensión temporal del contrato por un termino de 30 días calendario bajo los siguientes argumentos

"A través de solicitud por parte del contratista de obra RM CONCRETAR SAS, se indicó la necesidad de suspender el contrato, lo anterior, en razón a la necesidad de adelantar estudios complementarios y efectuar ajustes a los diseños hidráulicos y eléctricos, requeridos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de bombeo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).

La suspensión solicitada, por un término máximo de treinta (30) días calendario, permitirá adelantar los trámites correspondientes ante EPM para la definición del punto de conexión eléctrica y la obtención de la viabilidad técnica para la instalación del transformador trifásico requerido, con esto también se informa que dependemos de los tiempos que tome EPM para dar dicha viabilidad requerida."

Que, la Interventoría del contrato 054 de 2025 , a través de comunicación de fecha del 6 de febrero de 2026, manifiesta la viabilidad de la suspensión de obra solicitada por el contratista, en atención a las circunstancias presentadas durante la ejecución del contrato interadministrativo C.I 026-2025 las cuales afectan la normal ejecución del contrato debido al que se encuentran "adelantando trámites ante EPM para la definición del punto de conexión eléctrica y la obtención de viabilidad técnica para la instalación del transformador trifásico requerido".

Que el pasado 18 de febrero de 2026 las partes suscribieron el acta de suspensión de la obra hasta el día 19 de marzo de 2026

Que el día 19 de marzo de 2026 el municipio de El Retiro Antioquia y FONDESER suscribieron el acta de reinicio de ejecución del contrato interadministrativo 026-2025 celebrado entre las partes al considerar que los inconvenientes que dieron lugar a la suspensión fueron superados

Así mismo el día 19 de Marzo de 2026 las partes se reunieron y proceden igualmente a suscribir la presente acta de reinicio del contrato de obra derivado

de conformidad con lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: REINICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA C.O. 054 DE 2025 el cual tiene por objeto AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025 hasta el día 30 de mayo de 2026

SEGUNDO: el contratista se obliga al correspondiente ajuste de las pólizas conforme a

la suspensión que se suscribe.

TERCERO: publicar la presente acta en el SECOP II.

De conformidad con lo que antecede, en ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de los suscriben este documento, en el municipio de el Retiro a los 19 días del mes de marzo de 2026

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
C.C. 71.557.289
Gerente FONDESER.

ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ
RM CONCRETAR S.A.S.
Contratista

OTORSI AL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO:	059 DE 2025
CONTRATISTA: REP.LEGAL	RM CONCRETAR S.A.S. NIT 900.871.788 ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ CC 8.161.189
OBJETO:	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025
VALOR:	MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($ 1.039.500.099)
PLAZO:	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍAS ÚNICAS DEL CONTRATO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
OTROSÍ 1	SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO CUATRO (4) MESES MÁS SIN SUPERAR EL 30 DE ABRIL DE 2026
SUPERVISOR:	Gerente

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA mayor y vecino del municipio de El Retiro Antioquia, identificado con cédula 71.557.289 de El Retiro, actuando como representante legal de **FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO (FONDESER),** en su calidad de gerente facultado para celebrar este tipo de contrato conforme al acuerdo no. 002 de 2018, de una parte, que se denominará FONDESER Y RM CONCRETAR S.A.S. identificada con NIT 900.871.788 representada legalmente por ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ identificado con CC 8.161.189 de la otra parte, que se denominará el contratista, se ha convenido celebrar el presente otrosi al contrato de obra de la entidad, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y consideraciones

CONSIDERACIONES

Qué el FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO (FONDESER) y RM CONCRETAR S.A.S. parte celebraron el contrato 054 de 2025 cuyo objeto es AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025

Que el contratista durante la ejecución del contrato en el mes de abril efectuó la siguiente solicitud


"(...) me permito informar que, durante la ejecución de las actividades contractuales, se han identificado requerimientos técnicos y constructivos adicionales, indispensables para garantizar el cumplimiento integral del alcance contractual, las especificaciones técnicas, la funcionalidad del sistema y los estándares de calidad previstos. El proyecto contempla la ejecución de los siguientes componentes principales: tubería de conducción, Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), tanque de bombeo, tubería de impulsión y tanque de almacenamiento. No obstante, durante la ejecución se han presentado situaciones sobrevinientes que han generado impactos técnicos, hidráulicos y económicos, las cuales se detallan a continuación:

1. Modificación del punto de bocatoma y desarenador: El predio donde inicialmente se tenía proyectada la localización del punto de bocatoma y del desarenador, perteneciente a la empresa

Alimentos Cárnicos SA.S., presentó un cambio de propietario. El nuevo titular del predio no otorgó autorización para la ejecución de las obras en el punto inicialmente planteado, lo cual hizo necesaria la redefinición de la ubicación de dichas estructuras. En consecuencia, se modificó el inicio de la tubería de conducción y las coordenadas del sistema, generando variaciones en las condiciones hidráulicas, dimensiones, capacidad y caudal de diseño de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), lo que implicó la realización de ajustes técnicos y constructivos no contemplados en el presupuesto inicial.

Esta situación continúa vigente, toda vez que la modificación del punto de bocatoma y del desarenador generó afectaciones integrales al proyecto que aún no han sido superadas. El cambio de ubicación implicó la redefinición del trazado de la tubería de conducción, ajustes en las coordenadas del sistema y la necesidad de recalcular las condiciones hidráulicas, dimensiones, capacidad y caudal de diseño de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). En consecuencia, persisten impactos técnicos, constructivos, presupuestales y de programación de obra, los cuales siguen condicionando la ejecución normal del contrato hasta tanto no se adopten y aprueben de manera definitiva las soluciones requeridas.

Figura 1: Trazados durante la ejecución del proyecto con la alternativa autorizada por el propietario de la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S.

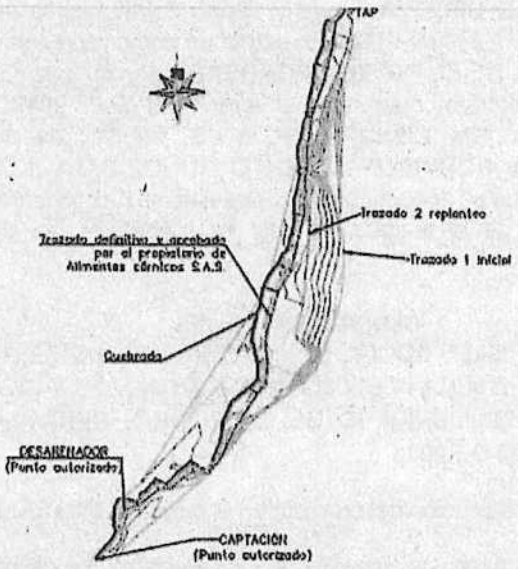

2. Cambio en la localización del tanque de almacenamiento: Durante el desarrollo y validación técnica del proyecto, se identificaron condiciones topográficas, hidráulicas y operativas que hacían necesario ajustar la localización inicialmente prevista para la construcción del tanque de almacenamiento, con el propósito de garantizar un funcionamiento más eficiente, seguro y técnicamente adecuado del sistema. En atención a dichas condiciones, y previo proceso de concertación con el propietario del predio, se definió la instalación del tanque en un nuevo punto ubicado aproximadamente 8 metros por encima de la cota inicialmente contemplada. Este ajuste

genera impactos directos sobre las condiciones de bombeo y operación del sistema, requiriendo la reevaluación y ajuste de componentes tales como la selección y potencia de la bomba, sistemas eléctricos, tableros de control, acometidas, accesorios hidráulicos y demás obras complementarias necesarias para asegurar la correcta prestación y funcionamiento del sistema, situación que conlleva un incremento en los costos inicialmente proyectados.

3. Ajustes técnicos complementarios: Se hace necesario implementar ajustes técnicos y constructivos durante la ejecución de la obra, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema, la estabilidad de las estructuras y el cumplimiento del objeto contractual conforme a la normatividad vigente y a las especificaciones técnicas del proyecto.

En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar la ejecución integral del proyecto conforme a su alcance contractual, se requiere una adición presupuestal por valor de QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($519.749.963), la cual se encuentra debidamente soportada y discriminada en el Anexo No. 1 Proyección Obra 06022026, donde se detallan las cantidades reales a ejecutar y las obras adicionales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual (...)".

Posteriormente la interventoría del proyecto avalo técnicamente la necesidad de realizar la redistribución de los recursos y de incorporar actividades adicionales, señalando que las condiciones derivadas de los nuevos trazados necesarios para la continuidad del proyecto, hacen necesario ajustar el valor del contrato, como el plazo establecido inicialmente, con el fin de garantizar la adecuada culminación de las obras y el cumplimiento integral del objeto contractual.

Que mediante oficio 116 del 14 de abril de 2026 FONDESER procedió a dar traslado de la solicitud al municipio de El Retiro.

Teniendo en cuenta el balance de la obra, se identificaron las actividades que, producto de las revisiones técnicas efectuadas durante la fase de ejecución y de la necesidad de ajustar las condiciones constructivas inicialmente contempladas, no serán ejecutadas dentro del proyecto. Lo anterior obedece principalmente a modificaciones en los diseños inicialmente previstos, tales como: cambio en la ubicación de la caseta, modificación del método constructivo del pozo de bombeo, variación en las especificaciones de la planta, reubicación de los tanques de almacenamiento y ajustes en las especificaciones eléctricas (...)

En consecuencia, dichas actividades fueron objeto de ajuste durante la ejecución del proyecto, corresponde a la redistribución de los recursos resultantes del balance financiero efectuado; no obstante, adicional a ello y teniendo en cuenta los imprevistos y ajustes técnicos surgidos durante la ejecución del proyecto, se hace necesario incorporar recursos adicionales:

Con base a lo anterior se presenta el siguiente modificación a las especificaciones técnicas, lo cual implica la adición solicitada por el contratista:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	TOTAL
1	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE				
1.1	Localizacion y Replanteo				

1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoria. Incluye demarcación con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas y plano	dia	$ 739.448,03	5,0	$ 3.697.240,00
1.1.3	Suministro e instalación de cerramiento provisional en tela verde con una altura de 2,1 m. Estructura en larguero común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m Incluye: suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	m	$ 36.409,22	120,0	$ 4.369.107,00
1.2	**Llenos y reemplazos**				
1.2.1	Excavación mecacnica de material heterogeneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye, roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0,35 m3, tuberia,	m3	$ 40.139,75	239,2	$ 9.600.465,00
1.2.2	Excavación manual de material heterogeneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye, roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0,35m3.	m3	$ 57.106,43	134,0	$ 7.654.515,00
1.2.3	Suministro, transporte e instalación de material de prestamo, tipo afirmado compactada, para mejoramiento de suelo para la construcción de losas.	m3	$ 133.376,06	18,9	$ 2.523.675,00
1.3	**Concretos**				
1.3.1	Construcción de LOSAS DE PISO para floculador, filtros,caseta de operacion y oficina en concreto de 21 MPa pulido, e=0.20m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto y juntas cada 2 metros en sello elastomérico, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y acabado final. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	$ 189.263,70	74,2	$ 14.041.474,00
1.3.2	Construcción de POZO DE BOMBAS en concreto de 21 MPa, e=0.20m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto y llave PVC para sello hidráulico, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y acabado final. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. Inicuye losas y muros	m3	$ 770.142,60	0,0	$ 0,00
1.3.3	Construcción de CAJA DE REGISTRO de 0,60x0,60 m x profundidad hasta 120 cm, incluye la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones. La excavacion, llenos, entresuelo y acero de refuerzonn se pagarán en item respectivo.	und	$ 764.115,99	0,0	$ 0,00

1.4	Aceros				
1.4.1	Suministro, transporte, figuración y colocacion de acero de refuerzo de 60.000 psi.	kg	$ 9.455,56	9883,3	$ 93.451.906,00
1.5	Tanques y filtros				
1.5.1	Suministro, transporte e instalación de tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 500 lit. para dosificación de quimicos	un	$ 439.431,10	3,0	$ 1.318.293,00
1.5.2	Suministro, transporte e instalación de planta de tratamiento de agua potable en fibra de vidrio para 6l/s. Incluye floculador-sedimentador de 2.5m de diámetro por 5.2m de altura; 4 filtros de 0.90m de diámetro por 3m de altura. Todas las válvulas y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	und	$ 154.200.000,00	0,0	$ 0,00
1.6	Equipos				
1.6.1	Suministro e instalación de sistema de bombeo H=132 m y Q=360 l/min, incluye dos bombas sumergibles, válvulas, tablero de control, válvula de cheque y todos los accesorios necesarios para un correcto funcionamiento	un	$ 18.283.580,00	0,0	$ 0,00
1.7	Acometida y red eléctrica				
1.7.1	Suministro transporte e instalacion de transformador trifasico de 15kva 13.2kv/440/220, vestida en poste RA2-026, acometida para en 3#4+2#4 Cu THWN AWG, bajante en TMG de 2", certificacion y pruebes de conformidad, (RA2-907), TC y TP para medida.	GL	$ 35.940.000,00	0,0	$ 0,00
1.7.2	Suministro transporte e instalacion Tablero ATX para Arranque Directo, bomba 6 Hp 440/220, incluye guarda motor contacores, protecciones, pilotos, botones, bornera potencia, DPS y demas elementos para su correcto funcionamiento. 5 metros de acometida para conexion de la bomba	GL	$ 3.713.000,00	0,0	$ 0,00
1.7.3	Suministro transporte e instalacion Medidor trifasico 480v 100A incluye caja para medidor intemperie con totalizador, totalizador 70A, puesta a tierra, acometida hasta el tablero de protecciones y demas accesorios para su correcta instalacion.	GL	$ 4.346.200,00	1,0	$ 4.346.200,00
1.7.4	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC diámetro 2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	GL	$ 535.500,00	1,0	$ 535.500,00
1.7.5	Suministro transporte e instalacion Transformador seco de voltaje para control 2000 V.A, Monofásica, Entrada 440-460 Vac, Salida 220-110 Vac, , incluile gabinete de proteccion y conexiones a tablero para tomas generales e iluminacion 3 breakers 20 A. Y demas elementos para su correcta instalacion	GL	$ 3.094.000,00	1,0	$ 3.094.000,00
1.7.6	Suministro, transporte e instalación de Gabinete ML incluye breaker industrial de 3x60A, 1 breaker industrial 3 X 40A , 2x30A, y demas accesorios para su correcta instalacion	GL	$ 5.084.000,00	1,0	$ 5.084.000,00
1.7.7	certificacion RETIE, legalizacion para puesta en marcha.	GL	$ 10.115.000,00	2,0	$ 20.230.000,00
1.7.8	Suministro, transporte y colocación de materiales para construccion de caja de piso de 40X40X40 cm medidas internas, según normas de EPM. Incluye excavación, botada de material sobrante, concreto 21 Mpa, mortero 1:5, cama de triturado en el fondo	GL	$ 1.666.000,00	2,0	$ 3.332.000,00

	de e=0.06m, bloques de concreto de 0.15x0.20x0.40 m, herraje tipo pesado y antifraude, tapa tipo pesado y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma RS3-016 de EPM.				
1.7.9	Iluminacion y tomas generales, incluye tablero 6 ctos, 2 luminarias hermeticas 2x80w,3 reflectores 50w iluminacion exterior, 3 salidas para toma doble, cableado, canalizaciones y demas elementos para su correcta instalacion	GL	$ 2.380.000,00	1,0	$ 2.380.000,00
1.8	**Caseta de bombeo y oficina**				
1.8.1	Suministro y colocación de Solado de limpieza E:0.05 R 1:5	m2	$ 31.517,79	128,6	$ 4.053.188,00
1.8.2	Suministro y colocacion de concreto f´c= 21 Mpa (210 Kg/cm2), para pilotes circulares d=20cm, no incluye refuerzo	m3	$ 675.763,31	13,2	$ 8.933.591,00
1.8.3	Suministro y colocacion de concreto f´c= 21 Mpa (210 Kg/cm2), para vigas decimentación de 0.40*0.40 m, según especificaciones, no incluye refuerzo, incluye formaleta	m3	$ 961.865,04	22,1	$ 21.261.507,00
1.8.4	Mortero 1:4 tipo Grout para mamposteria.	m3	$ 577.214,99	3,8	$ 2.200.055,00
1.8.5	Suministro e instalación Tuberías aguas servidas Ø4". Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 53.917,01	65,0	$ 3.504.605,00
1.8.6	Suministro e instalación de Tuberías aguas servidas Ø2". Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 27.479,93	10,0	$ 274.799,00
1.8.7	Punto de desagüe 4" (Sanitario). Suministro e instalación de salida sanitaria y todo lo requerido para su correcta instalación.	und	$ 81.570,32	3,0	$ 244.711,00
1.8.8	Punto de desagüe 2" (Sifón de piso, lavamanos, pozuelo). Suministro e instalación de salida sanitaria y todo lo requerido para su correcta instalación.	und	$ 41.539,91	3,0	$ 124.620,00
1.8.9	Punto de agua fría (Reg de corte) 1/2"	und	$ 16.168,81	20,0	$ 323.376,00
1.8.10	Suministro e instalación tuberías PVC Ø1/2" RDE 21 (incluye accesorios)	m	$ 12.875,20	40,0	$ 515.008,00
1.8.11	Suministro, transporte e instalación de lavamanos de sobreponer tipo marcella o similar. Incluye grifería metálica, abasto metálico, sifón y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	$ 389.994,17	0,0	$ 0,00
1.8.12	Suministro, transporte e instalación de sanitario integral línea económica color blanco tipo corona o similar, consumo de 6lt. Incluye el suministro y transporte del sanitario, abasto metálico, cemento blanco, silicona antihongos, tapón, brida de fijación, soldadura y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	$ 309.932,40	0,0	$ 0,00
1.8.13	Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica parasoporte de cubierta cubierta.	kg	$ 21.554,60	90,0	$ 1.939.914,00
1.8.14	Suministro, transporte e instalacion de teja termo acustica de 2mm blanca-blanca con todos sus accesorios para su correcta instalación.	m2	$ 345.924,96	21,3	$ 7.375.120,00

1.8.15	Suministro y colocación de canoa en lamina galvanizada calibre 20 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 60cm., incluye:embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva y de acabado color a definir por interventoria , y todos los elementos para su correcta fijación.	m	$ 159.425,16	12,0	$ 1.913.102,00
1.8.16	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución de 8 circuitos 220 voltios monofásico 100 amperios con protección de 2x30	und	$ 1.260.271,63	0,0	$ 0,00
1.8.17	Suministro, transporte e instalacion de salidas para breaker 20 amperios monopolar para circuitos de iluminación incluye breaker y alambre	und	$ 110.032,13	6,0	$ 660.193,00
1.8.18	Suministro, transporte e instalacion de acometida en calibre 10 para tablero de distribución incluye tubería pvc y emt de ¾ y cable # 10 awg	m	$ 146.689,96	20,0	$ 2.933.799,00
1.8.19	Suministro, transporte e instalación de salida de interruptor sencillo (3m), expuesta, en tubería EMT de 1/2", 15 A. TIPO Lévinton, referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye interruptor, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto EMT de 1/2", conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, chazos y tornillos, CABLES SINTOX 12 AWG CU HF FR LS TC 750V 80°C , y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	und	$ 191.278,22	3,0	$ 573.835,00
1.8.20	Suministro, transporte e instalación de salida de tomacorriente doble (4m) expuesto, con polo a tierra,en EMT 1/2" 15A, 125V, ref Lev 5262-0IG naranja, certificación RETIE y pruebas de conformidad U120V. Incluye marcación, cables 3No12 AWG HFLS, cajas de paso o conexión 12X12 con tapa suplemento, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	$ 169.355,92	5,0	$ 846.780,00
1.8.21	Suministro, transporte e instalación de salida de toma doble con polo a tierra GFCI (4m) empotrado -15 A - 125 V, norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE, reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 1493, por ducto pvc empotrado. Incluye el tomacorriente con tapa, ducto pvc 3/4", cajas 4"x4" con tapa suplemento, conectores de empalme y conexión, curvas, adaptadores terminales, pega pvc, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80°C, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	und	$ 141.856,96	0,0	$ 0,00
1.8.22	Suministro, transporte e instalación de luminaria Ojo de Buey panel LED de 30W, INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm) libre de halógenos, clavija con polo a tierra, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante.	und	$ 153.859,15	6,0	$ 923.155,00

1.8.23	Suministro, transporte e instalación de reflector led tipo exterior de 70W con fotocelda, INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm) libre de halógenos, clavija con polo a tierra, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante.	und	$ 400.092,02	4,0	$ 1.600.368,00
1.8.24	Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12x20x40 cm. ranurado común de perforaciones horizontales, instalado de 0-2m de altura. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	$ 64.050,88	0,0	$ 0,00
1.8.25	Construccion de mamapostería en bloque estructural 12-29 29 x 12 x 10 arcilla cara lisa, incluye el suministro y transporte del ladrillo, mortero de peda 1:4 espesor max =0.01 m y todos los demas elementos para su correcta construcciony funcionamiento.	m2	$ 79.372,11	20,0	$ 1.587.442,00
1.8.26	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS con altura de 0-2m. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	$ 42.696,80	37,2	$ 1.588.321,00
1.8.27	Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS INTERIORES REVOCADOS con altura de 0-2m, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	$ 14.460,46	0,0	$ 0,00
1.8.28	Aplicación de PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	$ 18.115,03	0,0	$ 0,00
1.8.29	Colocación de ENCHAPE CERÁMICO PARED, tipo Egeo DE 20.5 x 20.5 cm. o su equivalente, color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 92.981,73	0,0	$ 0,00
1.8.30	Piso en cerámica egeo blanco de 25x35 corona o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 92.144,53	0,0	$ 0,00

1.8.31	Construcción de dinteles y/o sillares de 0.15 m x 0.20 m., en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, curado, mortero 1:4. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. Según diseño.	ml	$ 57.657,86	8,0	$ 461.263,00
1.8.32	Puerta entamborada de un ala de 1,50m de ancho, de caras lisas, fabricada en lámina galvanizada calibre 18 con bastidores para el ala y el montante en tubería pts de 30x30x3mm + Persiana de ventilacion con empaque para aislamiento de par galvanico. Acabado en wash primer + pintura anticorrosiva + esmalte semibrillante color blanco. Manija autin de Yale o similar y tope de piso media luna. Incluye suministro y transporte de todos los materiales, transportes internos, acoples, empaques, chazos, tornillos, sellado (interior y exterior) con silicona transparente antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	und	$ 523.782,94	3,0	$ 1.571.349,00
1.8.33	Ventana de apertura tipo guillotina de sistema liviano en aluminio extruido con cristal templado 6mm + 6mm traslúcido. Acabado en pintura electrostática líquida de color negro ral 9005. Incluye suministro y transporte de todos los materiales, transportes internos, acoples, empaques, chazos, tornillos, sellado (interior y exterior) con silicona transparente antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento	m2	$ 281.865,96	4,8	$ 1.343.520,00
1.8.34	Lavaplatos de acero inoxidable para instalación en mesón, de 1 cubeta, de 700x490 mm, con válvula de desagüe, para mesón de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para lavaplatos, gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.	und	$ 1.755.369,58	0,0	$ 0,00
2	REDES HIDRAULICAS				
2,1	Localización y replanteo	dia	$ 739.448,03	10,0	$ 7.394.480,00
2,2	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Presión ø 6" RDE 21 desde bocatoma, desarenador hasta floculador	m	$ 109.746,23	579,0	$ 63.543.064,00
2,3	Suministro, transporte e instalación de tubería de impulsión acampanada PVC Presión ø 4" RDE 21 desde estación de bombeo hasta tanques de almacenamiento	m	$ 97.852,78	1365,0	$ 133.569.050,00
2,6	Anclajes para tubería pvc en concreto de 210 kg/cm2, incluye gancho de 1/4"	m3	$ 748.562,14	2,1	$ 1.571.980,00
2,7	Excavación manual o mecanica en material común seco de 0-2 m (incluye acarreo de material a pila)	m3	$ 57.106,43	1030,2	$ 58.830.476,00
2,9	Llenos con material clasificado de la excavación compactados mecanicamente al 80% del ensayo de proctor modificado	m3	$ 19.944,69	1030,2	$ 20.546.818,00
2,10	Lleno con material de préstamo compactados mecanicamente al 80% del ensayo de proctor modificado	m3	$ 134.444,18	132,7	$ 17.843.432,00

2,11	Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta elástica 6" con llave de triángulo. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento (caja y accesorios).	un	$ 2.230.043,39	1,0	$ 2.230.043,00
2,12	Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta elástica 4" con llave de triángulo. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento (caja y accesorios).	un	$ 1.003.411,39	10,0	$ 10.034.114,00
2,13	Suministro, transporte e instalación de tanque en fibra de vidrio con capacidad de 50 m3 (3.0m de diámetro y 7.2m de altura) según diseño. Incluye válvulas y accesorios para su correcta instalación	un	$ 53.460.994,70	1,0	$ 53.460.995,00
3	OBRAS EXTRAS				
OE1	Corte y limpieza de maleza y arbustos mediante machete, incluyendo el retiro y amontonamiento de los residuos generados en líneas o en bolsas. No contempla el acarreo fuera del predio del material resultante.	m2	$ 2.714,00	3604,00	$ 9.781.256,00
OE2	Suministro transporte e instalación de cinta de señalización para tubería de acueducto.	m	$ 2.183,00	1946,00	$ 4.248.118,00
OE3	Desvió temporal de la quebrada para garantizar la instalacion de la tubería en la abscisa 0+190 de la red conducción. Incluye las labores necesarias para restablecer el flujo natural del canal una vez finalizada la actividad, así como la reinstalación y adecuación de la capa vegetal afectada.	m	$ 109.261,00	30,80	$ 3.365.239,00
OE4	Excavación manual para pilotes Ø= 0.5m. En material heterogéneo (HASTA 2.5 m.). Incluye el cargue, transporte interno y regada del material proveniente de la excavacióndonde lo indique la interventoria Y SU MEDIDA SERA EN SITIO.	m	$ 67.190,00	50,00	$ 3.359.500,00
OE5	Colocación de material granular limpio de 1" a 1 1/2" para la construcción de filtros para el abatimiento de nivel freático. Incluye transporte interno y externo del material y todos los demás elementos para su correcta colocación, según diseño y su medida será en sitio.	m3	$ 289.381,00	11,4	$ 3.298.943,00
OE6	Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 para la construcción de filtros para el abatimiento de nivel freático, incluye transporte interno y externo del material y todos los demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 23.328,00	100,3	$ 2.340.266,00
OE7	Suministro, transporte e instalación de tubería perforada con un diámetro de 100mm, para la construcción de filtros para el abatimiento de nivel freático, incluye transporte interno y externo del material y todos los demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	m	$ 38.996,00	53,2	$ 2.074.587,00
OE8	Manejo de agua constante con motobomba para realizar trabajo por debajo del nivel freático como	día	$ 108.678,00	75,0	$ 8.150.850,00

	lo armado de acero, encofrado y vaciado. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
OE9	Suministro, transporte e instalación de planta de tratamiento de agua potable en fibra de vidrio para 7.5 l/s. Incluye floculador-sedimentador de 3.20m de diámetro por 3.30m de altura; 4 filtros de 0.90m de diámetro por 3m de altura. Todas las válvulas y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	und	$ 298.550.000,00	1,0	$ 298.550.000,00
OE10	Suministro, transporte e instalación de concreto Ciclópeo 60/40, 60% de concreto de 21 Mpa y 40% de Piedra. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, colocación de la piedra, formaleta en madera, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	$ 818.986,00	38,4	$ 31.481.822,00
OE11	Suministro transporte e instalación de codo PVC PRESION de 45° de 6 pulgadas. Incluye lubricante, limpiador, pega y todo lo necesario para su correcta instalación.	un	$ 336.719,00	3,0	$ 1.010.157,00
OE12	Excavación mecánica de material heterogéneo de 2-4m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye, roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m3	m3	$ 49.424,00	114,2	$ 5.645.605,00
OE13	Construcción de concreto de 21 Mpa losa de fondo, superior y paredes POZO DE BOMBAS en concreto de 21 MPa, e=0.30m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto obras falsa para losas o formaleta metalica para muros, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y acabado final. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. Incluye losas y muros	m3	$ 1.328.872,00	34,1	$ 45.357.059,00
OE14	Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el suministro y transporte de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor.	m	$ 189.601,00	22,4	$ 4.247.062,00
OE15	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 221. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	$ 32.607,00	92,0	$ 2.999.844,00
OE16	Retiro y reinstalación de cerramiento con alambre de púas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 40.655,00	60,0	$ 2.439.300,00
OE17	Inducción de Junta de dilatación en losas de concreto. Incluye sellador de juntas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	$ 29.252,00	36,0	$ 1.053.072,00
OE18	Acarreo interno de material sobrante de excavación por medios manuales ó mecánicos. Su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	$ 26.515,00	70,0	$ 1.856.050,00

OE19	Suministro e instalación de acometida eléctrica temporal desde domicilio vecino para funcionamiento de bombas (2) succión sumergible a 220v. Incluye suiche 2x40, extensión encauchetada 4x10 AWG hasta 60m, gabinete, toma y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	gl	$ 2.136.865,00	1,0	$ 2.136.865,00
OE20	Suministro, transporte e instalación de tapa de control e inspección para pozo de bombeo, dimensiones 1,00 m x 1,00 m, fabricada lámina de acero tipo alfajor 2 mm. Incluye marco perimetral metálico, bisagras reforzadas, sistema de cierre, acabado anticorrosivo, mano de obra, herramientas, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, alineación y funcionamiento.	und	$ 964.068,00	2,0	$ 1.928.136,00
OE21	Suministro e instalación de semilla de grama. Incluye fertilizante y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 5.745,00	500,0	$ 2.872.500,00
OE22	Acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo Incluye suministro y transporte de materiales, compactación mecanica, incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	m3	$ 295.079,00	47,5	$ 14.022.154,00
OE23	Suministro e instalación de sistema de bombeo pAra H=150 m y una distancia horirzontal de 1400m , incluye una bomba sumergibles tipo lapicero acoplada a motor de 25 HP y todos los accesorios necesarios para un correcto funcionamiento	un	$ 38.902.035,00	1,0	$ 38.902.035,00
OE24	Suministro transporte e instalacion Tablero ATX para Arranque Directo, bomba 25 Hp 440/220; incluye guarda motor contatores, protecciones, pilotos, botones, bornera potencia, DPS y demás elementos para su correcto funcionamiento.	GL	$ 9.981.349,00	1,0	$ 9.981.349,00
OE25	Suministro, transporte e instalación de cercha metálica para cruce de tubería sobre cauce, fabricada en ángulo de acero 2 1/2" x 1/4". Incluye corte, armado y soldadura, aplicación de recubrimiento anticorrosivo y pintura esmalte, mano de obra, herramientas, equipos, anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, nivelación y funcionamiento.	m	$ 756.494,00	8,0	$ 6.051.952,00
OE26	Demolición de estructuras de concreto de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo y en cualquier clase de estructura. Incluye el retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado o piso (huellas, cunetas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables, el transporte interno hasta el sitio de acopio que indique la interventoría y/o el cargue y botada de escombros en botaderos oficiales manual o mecánicamente, para volúmenes hasta 0.50 m3	m2	$ 301.614,00	30,60	$ 9.229.388,00
OE27	Construcción de CUNETA PERIMETRAL en concreto de 21 Mpa., con un DESARROLLO máximo de 60 cm y un ESPESOR DE 12 cm. Incluye entresuelo de 15 cm en piedra de 2" a 4" y 5 cm en arenilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	$ 149.955,00	52,4	$ 7.851.644,00

OE28	Suministro transporte e instalación de abrazadera para fijación de tubería sobre la obra transversal de la vía principal Don Diego - La Ceja k 28+900	und	$ 97.303,00	10,0	$ 973.030,00
OE29	Limpieza de obra transversal en la vía principal Don Diego - La Ceja Km 28+900	m	$ 57.931,00	16,0	$ 926.896,00
OE30	Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12x20x40 cm. liso común de perforaciones horizontales, instalado hasta 2.5m de altura. Incluye personal y andamios certificados para trabajos en alturas, el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	$ 124.823,00	38,0	$ 4.743.274,00
OE31	Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación con toma 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT1/2", cables 3N°12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable.	und	$ 182.166,00	10,0	$ 1.821.660,00
OE32	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución de 12 circuitos 220 voltios monofásico 100 amperios con protección de 2x30	und	$ 1.372.878,00	1,0	$ 1.372.878,00
OE33	Suministro transporte e instalacion de transformador trifasico de 50kva 13.2kv/440/220, vestida en poste RA2-026, acometida para en 3#4+2#4 Cu THWN AWG, bajante en TMG de 2", certificacion y pruebes de conformidad, (RA2-907), TC y TP para medida.	GL	$ 53.500.000,00	1,0	$ 53.500.000,00
OE34	Transporte mular interno de materiales donde no es posible el acceso de vehículos de tracción mecánica, para distancias de 200m hasta 100m. Nota: En caso de generarse distancias superiores a 100m se pagará por este mismo ítem de manera proporcional a la distancia y al valor establecido. La anterior descripción aplica para el ingreso del vaciado de las losa del tanque de almacenamiento donde no hay ingreso vehicular, incluye empacada de materiales en costales.	carga	$ 36.947,00	310,0	$ 11.453.570,00
OE35	Capacitación teórico–práctica para la operación, control y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), incluyendo procesos de captación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Comprende además el manejo de sistemas eléctricos asociados, tableros de control, protecciones, instrumentación básica, operación de bombas (arranque, paro, mantenimiento preventivo y correctivo), protocolos de seguridad industrial, resolución de fallas operativas y cumplimiento de la normatividad vigente para la calidad del agua potable	und	$ 3.500.000,00	2,0	$ 7.000.000,00
OE36	Retiro y botada de material sobrante proveniente de la excavación, a botadero certificado	m3	$ 97.565,00	148,3	$ 14.472.402,00

En este sentido, y en aras de dar cumplimiento al objeto y alcance contractual, una vez revisadas las condiciones técnicas, constructivas, operativas y financieras evidenciadas durante la ejecución del proyecto, se identificó la necesidad de realizar ajustes en las cantidades de obra, modificaciones a los diseños hidráulicos inicialmente contemplados e incorporación de actividades adicionales indispensables para garantizar la funcionalidad y puesta en marcha del

sistema de acueducto. Lo anterior obedece principalmente a las variaciones topográficas encontradas en campo, a los ajustes técnicos requeridos para la correcta ejecución del proyecto y a las necesidades constructivas derivadas de las actividades preliminares desarrolladas durante la ejecución contractual.

Mediante oficio 116 del 14 de abril de 2026 FONDESER brindó traslado al municipio de El Retiro Antioquia

El día 19 de mayo de 2026 el municipio de El Retiro y FONDESER celebraron un otrosí al contrato interadministrativo 026 de 2025 donde acordaron Adicionar el contrato en la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L. ($595.108.778), y prorrogar el pazo por el término de dos (2) meses más hasta el día 31 de julio de 2026

En consecuencia, es deber de la entidad adicionar el contrato de obra y prorrogar el plazo inicialmente pactado al contrato derivado el cual corresponde a dos (2) meses adicionales al plazo establecido

Que la entidad contratante cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal 222 del 25 de mayo de 2026 para respaldar la presente Adición

Que la adición a efectuar no supera el valor del 50% del valor inicialmente contratado

Por lo demás el resto del clausulado del presente contrato queda igual a lo acordado previamente.

De conformidad con lo anterior, las partes

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA DE ALCANCE DEL CONTRATO se modifica las especificaciones técnicas inicialmente contratadas así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	TOTAL
1	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE				
1.1	Localizacion y Replanteo				
1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoria. Incluye demarcación con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas y plano	dia	$ 739.448,03	5,0	$ 3.697.240,00
1.1.3	Suministro e instalación de cerramiento provisional en tela verde con una altura de 2,1 m. Estructura en larguero común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m Incluye: suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17,5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad	m	$ 36.409,22	120,0	$ 4.369.107,00

	aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.				
1.2	Llenos y reemplazos				
1.2.1	Excavación mecacnica de material heterogeneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye, roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0,35 m3, tuberia,	m3	$ 40.139,75	239,2	$ 9.600.465,00
1.2.2	Excavación manual de material heterogeneo de 0-2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye, roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0,35m3.	m3	$ 57.106,43	134,0	$ 7.654.515,00
1.2.3	Suministro, transporte e instalación de material de prestamo, tipo afirmado compactada, para mejoramiento de suelo para la construcción de losas.	m3	$ 133.376,06	18,9	$ 2.523.675,00
1.3	Concretos				
1.3.1	Construcción de LOSAS DE PISO para floculador, filtros,caseta de operacion y oficina en concreto de 21 MPa pulido, e=0.20m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto y juntas cada 2 metros en sello elastomérico, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y acabado final. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	$ 189.263,70	74,2	$ 14.041.474,00
1.3.2	Construcción de POZO DE BOMBAS en concreto de 21 MPa, e=0.20m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto y llave PVC para sello hidráulico, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y acabado final. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. Inlcuye losas y muros	m3	$ 770.142,60	0,0	$ 0,00
1.3.3	Construcción de CAJA DE REGISTRO de 0,60x0,60 m x profundidad hasta 120 cm, incluye la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, formaleta, vibrado y todos los elementos necesarios apara su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño y especificaciones. La excavacion, llenos, entresuelo y acero de refuerzonn se pagarán en ítem respectivo.	und	$ 764.115,99	0,0	$ 0,00
1.4	Aceros				
1.4.1	Suministro, transporte, figuración y colocacion de acero de refuerzo de 60.000 psi.	kg	$ 9.455,56	9883,3	$ 93.451.906,00
1.5	Tanques y filtros				
1.5.1	Suministro, transporte e instalación de tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 500 lit. para dosificación de químicos	un	$ 439.431,10	3,0	$ 1.318.293,00

1.5.2	Suministro, transporte e instalación de planta de tratamiento de agua potable en fibra de vidrio para 6l/s. Incluye floculador-sedimentador de 2.5m de diámetro por 5.2m de altura; 4 filtros de 0.90m de diámetro por 3m de altura. Todas las válvulas y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	und	$ 154.200.000,00	0,0	$ 0,00
1.6	Equipos				
1.6.1	Suministro e instalación de sistema de bombeo H=132 m y Q=360 l/min, incluye dos bombas sumergibles, válvulas, tablero de control, válvula de cheque y todos los accesorios necesarios para un correcto funcionamiento	un	$ 18.283.580,00	0,0	$ 0,00
1.7	Acometida y red eléctrica				
1.7.1	Suministro transporte e instalacion de transformador trifasico de 15kva 13.2kv/440/220, vestida en poste RA2-026, acometida para en 3#4+2#4 Cu THWN AWG, bajante en TMG de 2", certificacion y pruebes de conformidad, (RA2-907), TC y TP para medida.	GL	$ 35.940.000,00	0,0	$ 0,00
1.7.2	Suministro transporte e instalacion Tablero ATX para Arranque Directo, bomba 6 Hp 440/220, incluye guarda motor contacores, protecciones, pilotos, botones, bornera potencia, DPS y demas elementos para su correcto funcionamiento. 6 metros de acometida para conexion de la bomba	GL	$ 3.713.000,00	0,0	$ 0,00
1.7.3	Suministro transporte e instalacion Medidor trifasico 480v 100A incluye caja para medidor intemperie con totalizador, totalizador 70A, puesta a tierra, acometida hasta el tablero de protecciones y demas accesorios para su correcta instalacion.	GL	$ 4.346.200,00	1,0	$ 4.346.200,00
1.7.4	Suministro, transporte e instalación de tuberia PVC diámetro 2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	GL	$ 535.500,00	1,0	$ 535.500,00
1.7.5	Suministro transporte e instalacion Transformador seco de voltaje para control 2000 V.A, Monofásica, Entrada 440-460 Vac, Salida 220-110 Vac, , incluile gabinete de proteccion y conexiones a tablero para tomas generales e iluminacion 3 breakers 20 A. Y demas elementos para su correcta instalacion	GL	$ 3.094.000,00	1,0	$ 3.094.000,00
1.7.6	Suministro, transporte e instalación de Gabinete ML incluye breaker industrial de 3x60A, 1 breaker industrial 3 X 40A , 2x30A, y demas accesorios para su correcta instalacion	GL	$ 5.084.000,00	1,0	$ 5.084.000,00
1.7.7	certificacion RETIE, legalizacion para puesta en marcha.	GL	$ 10.115.000,00	2,0	$ 20.230.000,00
1.7.8	Suministro, transporte y colocación de materiales para construccion de caja de piso de 40X40X40 cm medidas internas, según normas de EPM. Incluye excavación, botada de material sobrante, concreto 21 Mpa, mortero 1:5, cama de triturado en el fondo de e=0.06m, bloques de concreto de 0.15x0.20x0.40 m, herraje tipo pesado y antifraude, tapa tipo pesado y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma RS3-016 de EPM.	GL	$ 1.666.000,00	2,0	$ 3.332.000,00
1.7.9	iluminacion y tomas generales, incluye tablero 6 ctos, 2 luminarias hermeticas 2x80w,3 reflectores 50w iluminacion exterior, 3 salidas para toma doble, cableado, canalizaciones y demas elementos para su correcta instalacion	GL	$ 2.380.000,00	1,0	$ 2.380.000,00
1.8	Caseta de bombeo y oficina				

1.8.1	Suministro y colocación de Solado de limpieza E:0.05 R 1:5	m2	$ 31.517,79	128,6	$ 4.053.188,00
1.8.2	Suministro y colocacion de concreto f' c= 21 Mpa (210 Kg/cm2), para pilotes circulares d=20cm, no incluye refuerzo	m3	$ 675.763,31	13,2	$ 8.933.591,00
1.8.3	Suministro y colocacion de concreto f' c= 21 Mpa (210 Kg/cm2), para vigas decimentación de 0.40*0.40 m, según especificaciones, no incluye refuerzo, incluye formaleta	m3	$ 961.885,04	22,1	$ 21.261.507,00
1.8.4	Mortero 1:4 tipo Grout para mamposteria.	m3	$ 577.214,99	3,8	$ 2.200.055,00
1.8.5	Suministro e instalación Tuberias aguas servidas Ø4". Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 53.917,01	65,0	$ 3.504.605,00
1.8.6	Suministro e instalación de Tuberias aguas servidas Ø2". Incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 27.479,93	10,0	$ 274.799,00
1.8.7	Punto de desagüe 4" (Sanitario). Suministro e instalación de salida sanitaria y todo lo requerido para su correcta instalación.	und	$ 81.570,32	3,0	$ 244.711,00
1.8.8	Punto de desagüe 2" (Sifón de piso, lavamanos, pozuelo). Suministro e instalación de salida sanitaria y todo lo requerido para su correcta instalación.	und	$ 41.539,91	3,0	$ 124.620,00
1.8.9	Punto de agua fría (Reg de corte) 1/2"	und	$ 16.168,81	20,0	$ 323.376,00
1.8.10	Suministro e instalación tuberias PVC Ø1/2" RDE 21 (incluye accesorios)	m	$ 12.875,20	40,0	$ 515.008,00
1.8.11	Suministro, transporte e instalación de lavamanos de sobreponer tipo marcella o similar. Incluye grifería metálica, abasto metálico, sifón y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	$ 389.994,17	0,0	$ 0,00
1.8.12	Suministro, transporte e instalación de sanitario integral línea económica color blanco tipo corona o similar, consumo de 6lt. Incluye el suministro y transporte del sanitario, abasto metálico, cemento blanco, silicona antihongos, tapón, brida de fijación, soldadura y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	$ 309.932,40	0,0	$ 0,00
1.8.13	Suministro, fabricación, transporte y montaje de estructura metálica parasoporte de cubierta cubierta.	kg	$ 21.554,60	90,0	$ 1.939.914,00
1.8.14	Suministro, transporte e instalacion de teja termo acustica de 2mm blanca-blanca con todos sus accesorios para su correcta instalación.	m2	$ 345.924,96	21,3	$ 7.375.120,00
1.8.15	Suministro y colocación de canoa en lamina galvanizada calibre 20 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 60cm., incluye:embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva y de acabado color a definir por interventoria , y todos los elementos para su correcta fijación.	m	$ 159.425,16	12,0	$ 1.913.102,00
1.8.16	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución de 8 circuitos 220 voltios monofásico 100 amperios con protección de 2x30	und	$ 1.260.271,63	0,0	$ 0,00
1.8.17	Suministro, transporte e instalacion de salidas para breaker 20 amperios monopolar para circuitos de iluminación incluye breaker y alambre	und	$ 110.032,13	6,0	$ 660.193,00

1.8.18	Suministro, transporte e instalacion de acometida en calibre 10 para tablero de distribución incluye tuberia pvc y emt de ¾ y cable # 10 awg	m	$ 146.689,96	20,0	$ 2.933.799,00
1.8.19	Suministro, transporte e instalación de salida de interruptor sencillo (3m), expuesta, en tuberia EMT de 1/2", 15 A. TIPO Lévinton, referencia 1451,.10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye interruptor, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto EMT de 1/2", conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, chazos y tornillos, CABLES SINTOX 12 AWG CU HF FR LS TC 750V 80°C , y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	und	$ 191.278,22	3,0	$ 573.835,00
1.8.20	Suministro, transporte e instalación de salida de tomacorriente doble (4m) expuesto, con polo a tierra,en EMT 1/2" 15A, 125V, ref Lev 5262-0IG naranja, certificación RETIE y pruebas de conformidad U120V. Incluye marcación, cables 3No12 AWG HFLS, cajas de paso o conexión 12X12 con tapa suplemento, aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	$ 169.355,92	5,0	$ 846.780,00
1.8.21	Suministro, transporte e instalación de salida de toma doble con polo a tierra GFCI (4m) empotrado -15 A - 125 V, norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE, reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 1493, por ducto pvc empotrado. Incluye el tomacorriente con tapa, ducto pvc 3/4", cajas 4"x4" con tapa suplemento, conectores de empalme y conexión, curvas, adaptadores terminales, pega pvc, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	und	$ 141.856,96	0,0	$ 0,00
1.8.22	Suministro, transporte e instalación de luminaria Ojo de Buey panel LED de 30W, INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm) libre de halógenos, clavija con polo a tierra, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante.	und	$ 153.859,15	6,0	$ 923.155,00
1.8.23	Suministro, transporte e instalación de reflector led tipo exterior de 70W con fotocelda, INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm) libre de halógenos, clavija con polo a tierra, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante.	und	$ 400.092,02	4,0	$ 1.600.368,00
1.8.24	Construcción de MAMPOSTERIA EN LADRILLO DE 12x20x40 cm. ranurado común de perforaciones horizontales, instalado de 0-2m de altura. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	$ 64.050,88	0,0	$ 0,00

1.8.25	Construccion de mamaposteria en bloque estructural 12-29 29 x 12 x 10 arcilla cara lisa, incluye el suministro y transporte del ladrillo, mortero de peda 1:4 espesor max =0.01 m y todos los demas elementos para su correcta construccion y funcionamiento.	m2	$ 79.372,11	20,0	$ 1.587.442,00
1.8.26	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS con altura de 0-2m. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	$ 42.696,80	37,2	$ 1.588.321,00
1.8.27	Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS INTERIORES REVOCADOS con altura de 0-2m, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	$ 14.460,46	0,0	$ 0,00
1.8.28	Aplicación de PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	$ 18.115,03	0,0	$ 0,00
1.8.29	Colocación de ENCHAPE CERÁMICO PARED, tipo Egeo DE 20.5 x 20.5 cm, o su equivalente, color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 92.981,73	0,0	$ 0,00
1.8.30	Piso en cerámica egeo blanco de 25x35 corona o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 92.144,53	0,0	$ 0,00
1.8.31	Construcción de dinteles y/o sillares de 0.15 m x 0.20 m., en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, curado, mortero 1:4. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. Según diseño.	ml	$ 57.657,86	8,0	$ 461.263,00
1.8.32	Puerta entamborada de un ala de 1,50m de ancho, de caras lisas, fabricada en lámina galvanizada calibre 18 con bastidores para el ala y el montante en tubería pts de 30x30x3mm + Persiana de ventilacion con empaque para aislamiento de par galvanico. Acabado en wash primer + pintura anticorrosiva + esmalte semibrillante color blanco. Manija autin de Yale o similar y tope de piso media luna. Incluye suministro y transporte de todos los materiales, transportes internos, acoples, empaques, chazos, tornillos, sellado (interior y exterior) con silicona transparente antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	und	$ 523.782,94	3,0	$ 1.571.349,00

1.8.33	Ventana de apertura tipo guillotina de sistema liviano en aluminio extruido con cristal templado 6mm + 6mm traslúcido. Acabado en pintura electrostática liquida de color negro ral 9005. Incluye suministro y transporte de todos los materiales, transportes internos, acopies, empaques, chazos, tornillos, sellado (interior y exterior) con silicona transparente antihongos y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento	m2	$ 281.865,96	4,8	$ 1.343.520,00
1.8.34	Lavaplatos de acero inoxidable para instalación en mesón, de 1 cubeta, de 700x490 mm, con válvula de desagüe, para mesón de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para lavaplatos, gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.	und	$ 1.755.369,58	0,0	$ 0,00
2	REDES HIDRAULICAS				
2,1	Localización y replanteo	dia	$ 739.448,03	10,0	$ 7.394.480,00
2,2	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC Presión ø 6" RDE 21 desde bocatoma, desarenador hasta floculador	m	$ 109.746,23	579,0	$ 63.543.064,00
2,3	Suministro, transporte e instalación de tubería de impulsión acampanada PVC Presión ø 4" RDE 21 desde estación de bombeo hasta tanques de almacenamiento	m	$ 97.852,78	1365,0	$ 133.569.050,00
2,6	Anclajes para tubería pvc en concreto de 210 kg/cm2, incluye gancho de 1/4"	m3	$ 748.562,14	2,1	$ 1.571.980,00
2,7	Excavación manual o mecanica en material común seco de 0-2 m (incluye acarreo de material a pila)	m3	$ 57.106,43	1030,2	$ 58.830.476,00
2,9	Llenos con material clasificado de la excavación compactados mecanicamente al 80% del ensayo de proctor modificado	m3	$ 19.944,69	1030,2	$ 20.546.818,00
2,10	Lleno con material de préstamo compactados mecanicamente al 80% del ensayo de proctor modificado	m3	$ 134.444,18	132,7	$ 17.843.432,00
2,11	Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta elástica 6" con llave de triángulo. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento (caja y accesorios).	un	$ 2.230.043,39	1,0	$ 2.230.043,00
2,12	Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta elástica 4" con llave de triángulo. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento (caja y accesorios).	un	$ 1.003.411,39	10,0	$ 10.034.114,00
2,13	Suministro, transporte e instalación de tanque en fibra de vidrio con capacidad de 50 m3 (3.0m de diámetro y 7.2m de altura) según diseño. Incluye válvulas y accesorios para su correcta instalación	un	$ 53.460.994,70	1,0	$ 53.460.995,00
3	OBRAS EXTRAS				

OE1	Corte y limpieza de maleza y arbustos mediante machete, incluyendo el retiro y amontonamiento de los residuos generados en líneas o en bolsas. No contempla el acarreo fuera del predio del material resultante.	m2	$ 2.714,00	3604,00	$ 9.781.256,00
OE2	Suministro transporte e instalación de cinta de señalización para tubería de acueducto.	m	$ 2.183,00	1946,00	$ 4.248.118,00
OE3	Desvió temporal de la quebrada para garantizar la instalacion de la tubería en la abscisa 0+190 de la red conducción. Incluye las labores necesarias para restablecer el flujo natural del canal una vez finalizada la actividad, así como la reinstalación y adecuación de la capa vegetal afectada.	m	$ 109.261,00	30,80	$ 3.365.239,00
OE4	Excavación manual para pilotes Ø= 0.5m. En material heterogéneo (HASTA 2.5 m.). Incluye el cargue, transporte interno y regada del material proveniente de la excavacióndonde lo indique la interventoria Y SU MEDIDA SERA EN SITIO.	m	$ 67.190,00	50,00	$ 3.359.500,00
OE5	Colocación de material granular limpio de 1" a 1 1/2" para la construcción de filtros para el abatimiento de nivel freático. Incluye transporte interno y externo del material y todos los demás elementos para su correcta colocación, según diseño y su medida será en sitio.	m3	$ 289.361,00	11,4	$ 3.298.943,00
OE6	Suministro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 para la construcción de filtros para el abatimiento de nivel freático, incluye transporte interno y externo del material y todos los demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	$ 23.328,00	100,3	$ 2.340.265,00
OE7	Suministro, transporte e instalación de tubería perforada con un diámetro de 100mm, para la construcción de filtros para el abatimiento de nivel freático, incluye transporte interno y externo del material y todos los demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	m	$ 38.996,00	53,2	$ 2.074.587,00
OE8	Manejo de agua constante con motobomba para realizar trabajo por debajo del nivel freático como lo armado de acero, encofrado y vaciado. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	día	$ 108.678,00	75,0	$ 8.150.850,00
OE9	Suministro, transporte e instalación de planta de tratamiento de agua potable en fibra de vidrio para 7.5 l/s. Incluye floculador-sedimentador de 3.20m de diámetro por 3.30m de altura; 4 filtros de 0.90m de diámetro por 3m de altura. Todas las válvulas y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento según diseño.	und	$ 298.550.000,00	1,0	$ 298.550.000,00
OE10	Suministro, transporte e instalación de concreto Ciclópeo 60/40, 60% de concreto de 21 Mpa y 40% de Piedra. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, colocación de la piedra, formaleta en madera, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta ejecución.	m3	$ 818.986,00	38,4	$ 31.481.822,00
OE11	Suministro transporte e instalación de codo PVC PRESION de 45° de 6 pulgadas. Incluye lubricante, limpiador, pega y todo lo necesario para su correcta instalación.	un	$ 336.719,00	3,0	$ 1.010.157,00
OE12	Excavación mecánica de material heterogéneo de 2-4m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye, roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,35 m3	m3	$ 49.424,00	114,2	$ 5.645.605,00

OE13	Construcción de concreto de 21 Mpa losa de fondo, superior y paredes POZO DE BOMBAS en concreto de 21 MPa, e=0.30m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto obras falsa para losas o formaleta metalica para muros, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y acabado final. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. Incluye losas y muros	m3	$ 1.328.872,00	34,1	$ 45.357.059,00
OE14	Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de construcción de tanques. Incluye el suministro y transporte de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según especificaciones del proveedor.	m	$ 189.601,00	22,4	$ 4.247.062,00
OE15	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 221. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	$ 32.607,00	92,0	$ 2.999.844,00
OE16	Retiro y reinstalación de cerramiento con alambre de púas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	m	$ 40.655,00	60,0	$ 2.439.300,00
OE17	Inducción de Junta de dilatación en losas de concreto. Incluye sellador de juntas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	$ 29.252,00	36,0	$ 1.053.072,00
OE18	Acarreo interno de material sobrante de excavación por medios manuales ó mecánicos. Su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	$ 26.515,00	70,0	$ 1.856.050,00
OE19	Suministro e instalación de acometida eléctrica temporal desde domicilio vecino para funcionamiento de bombas (2) succión sumergible a 220v. Incluye suiche 2x40, extensión encauchetada 4x10 AWG hasta 60m, gabinete, toma y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	gl	$ 2.136.865,00	1,0	$ 2.136.865,00
OE20	Suministro, transporte e instalación de tapa de control e inspección para pozo de bombeo, dimensiones 1,00 m x 1,00 m, fabricada lámina de acero tipo alfajor 2 mm. Incluye marco perimetral metálico, bisagras reforzadas, sistema de cierre, acabado anticorrosivo, mano de obra, herramientas, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, alineación y funcionamiento.	und	$ 964.068,00	2,0	$ 1.928.136,00
OE21	Suministro e instalación de semilla de grama. Incluye fertilizante y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	$ 5.745,00	500,0	$ 2.872.500,00
OE22	Acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo Incluye suministro y transporte de materiales, compactación mécanica, incluye todo lo necesario para su correcta colocación.	m3	$ 295.079,00	47,5	$ 14.022.154,00
OE23	Suministro e instalación de sistema de bombeo pAra H=150 m y una distancia horizontal de 1400m , incluye una bomba sumergibles tipo lapicero acoplada a motor de 25 HP y todos los accesorios necesarios para un correcto funcionamiento	un	$ 38.902.035,00	1,0	$ 38.902.035,00

OE24	Suministro transporte e instalacion Tablero ATX para Arranque Directo, bomba 25 Hp 440/220, incluye guarda motor contatores, protecciones, pilotos, botones, bornera potencia, DPS y demás elementos para su correcto funcionamiento.	GL	$ 9.981.349,00	1,0	$ 9.981.349,00
OE25	Suministro, transporte e instalación de cercha metálica para cruce de tubería sobre cauce, fabricada en ángulo de acero 2 1/2" x 1/4". Incluye corte, armado y soldadura, aplicación de recubrimiento anticorrosivo y pintura esmalte, mano de obra, herramientas, equipos, anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, nivelación y funcionamiento.	m	$ 756.494,00	8,0	$ 6.051.952,00
OE26	Demolición de estructuras de concreto de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo y en cualquier clase de estructura. Incluye el retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado o piso (huellas, cunetas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables, el transporte interno hasta el sitio de acopio que indique la interventoría y/o el cargue y botada de escombros en botaderos oficiales manual o mecánicamente, para volúmenes hasta 0.50 m3	m2	$ 301.614,00	30,60	$ 9.229.388,00
OE27	Construcción de CUNETA PERIMETRAL en concreto de 21 Mpa., con un DESARROLLO máximo de 60 cm y un ESPESOR DE 12 cm. Incluye entresuelo de 15 cm en piedra de 2" a 4" y 5 cm en arenilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	$ 149.955,00	52,4	$ 7.851.644,00
OE28	Suministro transporte e instalación de abrazadera para fijación de tubería sobre la obra transversal de la vía principal Don Diego - La Ceja k 28+900	und	$ 97.303,00	10,0	$ 973.030,00
OE29	Limpieza de obra transversal en la vía principal Don Diego - La Ceja Km 28+900	m	$ 57.931,00	16,0	$ 926.896,00
OE30	Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 12x20x40 cm. liso común de perforaciones horizontales, instalado hasta 2.5m de altura. Incluye personal y andamios certificados para trabajos en alturas, el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	$ 124.823,00	38,0	$ 4.743.274,00
OE31	Suministro transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación con toma 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT1/2", cables 3N°12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cable.	und	$ 182.166,00	10,0	$ 1.821.660,00
OE32	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución de 12 circuitos 220 voltios monofásico 100 amperios con protección de 2x30	und	$ 1.372.878,00	1,0	$ 1.372.878,00
OE33	Suministro transporte e instalacion de transfomador trifasico de 50kva 13.2kv/440/220, vestida en poste RA2-026, acometida para en 3#4+2#4 Cu THWN AWG, bajante en TMG de 2", certificacion y pruebes de conformidad, (RA2-907), TC y TP para medida.	GL	$ 53.500.000,00	1,0	$ 53.500.000,00

OE34	Transporte mular interno de materiales donde no es posible el acceso de vehículos de tracción mecánica, para distancias de 200m hasta 100m. Nota: En caso de generarse distancias superiores a 100m se pagará por este mismo ítem de manera proporcional a la distancia y al valor establecido. La anterior descripción aplica para el ingreso del vaciado de las losa del tanque de almacenamiento donde no hay ingreso vehicular, incluye empacada de materiales en costales.	carga	$ 36.947,00	310,0	$ 11.453.570,00
OE35	Capacitación teórico–práctica para la operación, control y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), incluyendo procesos de captación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Comprende además el manejo de sistemas eléctricos asociados, tableros de control, protecciones, instrumentación básica, operación de bombas (arranque, paro, mantenimiento preventivo y correctivo), protocolos de seguridad industrial, resolución de fallas operativas y cumplimiento de la normatividad vigente para la calidad del agua potable	und	$ 3.500.000,00	2,0	$ 7.000.000,00
OE36	Retiro y botada de material sobrante proveniente de la excavación, a botadero certificado	m3	$ 97.565,00	148,3	$ 14.472.402,00

CLAUSULA SEGUNDA MODIFICAR LA CLAUSULA DEL VALOR DEL CONTRATO: se adiciona al valor del contrato la suma de QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($519.749.963)

CLAUSULA TERCERA MODIFICAR LA CLAUSULA DEL PLAZO CONTRACTUAL: se PRORROGA el contrato inicial hasta el día 31 julio de 2026.

CLAUSULA CUARTA: ACTUALIZACION DE POLIZAS DE GARANTIA: el contratista asume la responsabilidad de actualizar las pólizas de garantía expedidas inicialmente en virtud del presente contrato de conformidad con los términos de la presente modificación

CLAUSULA QUINTA: PUBLICACIÒN: la presente modificación requiere de acuerdo al decreto 1082 de 2015 de su publicación en la página web secop II una vez legalizado

CLAUSULA SEXTA: en lo demás, que no contrarie lo aquí acordado, la presente modificación, queda sometida a las cláusulas establecidas en el contrato 054-2025

De conformidad con lo que antecede, en ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de los suscriben este otrosí al contrato, en el municipio de el Retiro a los 27 días del mes de mayo de 2026

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
C.C. 71.557.289
Gerente FONDESER.

ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ
RM CONCRETAR S.A.S.
Contratista

ADMINISTRACIÓN

RM
CONCRETAR S.A.S

RM CONCRETAR S.A.S.

NIT. 900871788

Comprobante de pago 364

EMPLEADO	RAUL ANTONIO LONDOÑO ALVAREZ	**CEDULA**	1035866882
NOMINA	Salario del 01/03/2026 al 15/03/2026	**FECHA**	12/03/2026
Salario	**5.798.200**		

DEVENGADOS (+).		
Salario básico		$ 2.899.100
Auxilio de transporte		$ 0
Horas extras y recargos		$ 0
Incapacidades		$ 0
Licencias		$ 0
Ingresos adicionales		$ 0
Vacaciones		**$ 0**
Dotación		$ 0
Recargo Habitual	0,00	
TOTAL DEVENGADO		**$ 2.899.100**

DEDUCCIONES (-)	
Salud	$ 115.964
Pensión	$ 115.964
Retefuente	$ 0
Fondo de solidaridad	$ 0
TOTAL DEDUCCIONES	**$ 231.928**

PRESTACIONES SOCIALES (-)		
Cesantias	0	$ 0
Intereses cesantias	0	$ 0
Prima de servicios	0	$ 0
TOTAL PRESTACIONES		$ 0

TOTAL NETO A PAGAR **$ 2.667.172**

FIRMA EMPLEADO

FIRMA EMPLEADOR

El suscrito trabajador hace constar que en esta fecha ha recibido de la empresa el valor correspondiente a la que se ha hecho acreedor. Igualmente acepta en todas sus partes esta liquidación y declara quedar a paz y salvo por estos conceptos.

Representación Gráfica **Desde el software RIBISOFT 900.947.532-6 - www.ribisoft.com.co**

CONCRETAR S.A.S

RM CONCRETAR S.A.S.

NIT. 900871788

Comprobante de pago 365

EMPLEADO	RAUL ANTONIO LONDOÑO ALVAREZ	**CEDULA**	1035866882
NOMINA	Salario del 16/03/2026 al 30/03/2026	**FECHA**	27/03/2026
Salario	**5.798.200**	**Cargo**	OPERARIO
Centro costos	ADMINISTRACIÓN		

DEVENGADOS (+).

Salario básico		$ 2.899.100
Auxilio de transporte		$ 0
Horas extras y recargos		$ 0
Incapacidades		$ 0
Licencias		$ 0
Ingresos adicionales		$ 50.000
Vacaciones		**$ 0**
Dotación		$ 0
Recargo Habitual	0,00	
TOTAL DEVENGADO		**$ 2.949.100**

DEDUCCIONES (-)

Salud - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS	$ 115.964
Pensión - Porvenir	$ 115.964
Retefuente	$ 0
Fondo de solidaridad	$ 0
TOTAL DEDUCCIONES	**$ 231.928**

PRESTACIONES SOCIALES (-)

Cesantías	0	$ 0
Intereses cesantías	0	$ 0
Prima de servicios	0	$ 0
TOTAL PRESTACIONES		**$ 0**

TOTAL NETO A PAGAR **$ 2.717.172**

FIRMA EMPLEADO

FIRMA EMPLEADOR

El suscrito trabajador hace constar que en esta fecha ha recibido de la empresa el valor correspondiente a la que se ha hecho acreedor. Igualmente acepta en todas sus partes esta liquidación y declara quedar a paz y salvo por estos conceptos.

Representación Gráfica **Desde el software RIBISOFT 900.947.532-6 - www.ribisoft.com.co**

RM CONCRETAR S.A.S.

NIT. 900871788

Comprobante de pago 378

EMPLEADO	RAUL ANTONIO LONDOÑO ALVAREZ	**CEDULA**	1035866882
NOMINA	Salario del 01/04/2026 al 15/04/2026	**FECHA**	14/04/2026
Salario	**5.798.200**	**Cargo**	OPERARIO
Centro costos	ADMINISTRACIÓN		

DEVENGADOS (+).		
Salario básico		$ 2.899.100
Auxilio de transporte		$ 0
Horas extras y recargos		$ 0
Incapacidades		$ 0
Licencias		$ 0
Ingresos adicionales		$ 0
Vacaciones		**$ 0**
Dotación		$ 0
Recargo Habitual	0,00	
TOTAL DEVENGADO		**$ 2.899.100**

DEDUCCIONES (-)	
Salud - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS	$ 115.964
Pensión - Porvenir	$ 115.964
Retefuente	$ 0
Fondo de solidaridad	$ 0
TOTAL DEDUCCIONES	**$ 231.928**

PRESTACIONES SOCIALES (-)		
Cesantias	0	$ 0
Intereses cesantias	0	$ 0
Prima de servicios	0	$ 0
TOTAL PRESTACIONES		$ 0

TOTAL NETO A PAGAR **$ 2.667.172**

FIRMA EMPLEADO

FIRMA EMPLEADOR

El suscrito trabajador hace constar que en esta fecha ha recibido de la empresa el valor correspondiente a la que se ha hecho acreedor. Igualmente acepta en todas sus partes esta liquidación y declara quedar a paz y salvo por estos conceptos.

Representación Gráfica **Desde el software RIBISOFT 900.947.532-6 - www.ribisoft.com.co**

CONCRETAR S.A.S

RM CONCRETAR S.A.S.

NIT. 900871788

Comprobante de pago 386

EMPLEADO	RAUL ANTONIO LONDOÑO ALVAREZ	**CEDULA**	1035866882
NOMINA	Salario del 16/04/2026 al 30/04/2026	**FECHA**	28/04/2026
Salario	**5.798.200**	**Cargo**	OPERARIO
Centro costos	ADMINISTRACIÓN		

DEVENGADOS (+).

Salario básico		$ 2.899.100
Auxilio de transporte		$ 0
Horas extras y recargos		$ 0
Incapacidades		$ 0
Licencias		$ 0
Ingresos adicionales		$ 0
Vacaciones		**$ 0**
Dotación		$ 0
Recargo Habitual	0,00	
TOTAL DEVENGADO		**$ 2.899.100**

DEDUCCIONES (-)

Salud - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS	$ 115.964
Pensión - Porvenir	$ 115.964
Retefuente	$ 0
Fondo de solidaridad	$ 0
TOTAL DEDUCCIONES	**$ 231.928**

PRESTACIONES SOCIALES (-)

Cesantias	0	$ 0
Intereses cesantias	0	$ 0
Prima de servicios	0	$ 0
TOTAL PRESTACIONES		**$ 0**

TOTAL NETO A PAGAR **$ 2.667.172**

FIRMA EMPLEADO

FIRMA EMPLEADOR

El suscrito trabajador hace constar que en esta fecha ha recibido de la empresa el valor correspondiente a la que se ha hecho acreedor. Igualmente acepta en todas sus partes esta liquidación y declara quedar a paz y salvo por estos conceptos.

Representación Gráfica **Desde el software RIBISOFT 900.947.532-6 - www.ribisoft.com.co**

RM CONCRETAR S.A.S.

NIT. 900871788

Comprobante de pago 400

EMPLEADO	RAUL ANTONIO LONDOÑO ALVAREZ	**CEDULA**	1035866882
NOMINA	Salario del 01/05/2026 al 15/05/2026	**FECHA**	12/05/2026
Salario	**5.798.200**	**Cargo**	OPERARIO
Centro costos	ADMINISTRACIÓN		

DEVENGADOS (+).		
Salario básico		$ 2.899.100
Auxilio de transporte		$ 0
Horas extras y recargos		$ 0
Incapacidades		$ 0
Licencias		$ 0
Ingresos adicionales		$ 0
Vacaciones		**$ 0**
Dotación		$ 0
Recargo Habitual	0,00	
TOTAL DEVENGADO		**$ 2.899.100**

DEDUCCIONES (-)	
Salud - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS	$ 115.964
Pensión - Porvenir	$ 115.964
Retefuente	$ 0
Fondo de solidaridad	$ 0
TOTAL DEDUCCIONES	**$ 231.928**

PRESTACIONES SOCIALES (-)		
Cesantias	0	$ 0
Intereses cesantias	0	$ 0
Prima de servicios	0	$ 0
TOTAL PRESTACIONES		$ 0

TOTAL NETO A PAGAR **$ 2.667.172**

FIRMA EMPLEADO

FIRMA EMPLEADOR

El suscrito trabajador hace constar que en esta fecha ha recibido de la empresa el valor correspondiente a la que se ha hecho acreedor. Igualmente acepta en todas sus partes esta liquidación y declara quedar a paz y salvo por estos conceptos.

Representación Gráfica **Desde el software RIBISOFT 900.947.532-6 - www.ribisoft.com.co**

CONCRETAR S.A.S

RM CONCRETAR S.A.S.

NIT. 900871788

Comprobante de pago 416

EMPLEADO	RAUL ANTONIO LONDOÑO ALVAREZ	**CEDULA**	1035866882
NOMINA	Salario del 16/05/2026 al 30/05/2026	**FECHA**	25/05/2026
Salario	**5.798.200**	**Cargo**	OPERARIO
Centro costos	ADMINISTRACIÓN		

DEVENGADOS (+).

Salario básico		$ 2.899.100
Auxilio de transporte		$ 0
Horas extras y recargos		$ 0
Incapacidades		$ 0
Licencias		$ 0
Ingresos adicionales		$ 0
Vacaciones		**$ 0**
Dotación		$ 0
Recargo Habitual	0,00	
TOTAL DEVENGADO		**$ 2.899.100**

DEDUCCIONES (-)

Salud - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS	$ 115.964
Pensión - Porvenir	$ 115.964
Retefuente	$ 0
Fondo de solidaridad	$ 0
TOTAL DEDUCCIONES	**$ 231.928**

PRESTACIONES SOCIALES (-)

Cesantias	0	$ 0
Intereses cesantias	0	$ 0
Prima de servicios	0	$ 0
TOTAL PRESTACIONES		**$ 0**

TOTAL NETO A PAGAR **$ 2.667.172**

FIRMA EMPLEADO

FIRMA EMPLEADOR

El suscrito trabajador hace constar que en esta fecha ha recibido de la empresa el valor correspondiente a la que se ha hecho acreedor. Igualmente acepta en todas sus partes esta liquidación y declara quedar a paz y salvo por estos conceptos.

Representación Gráfica **Desde el software RIBISOFT 900.947.532-6 - www.ribisoft.com.co**

RM CONCRETAR S.A.S

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

RM CONCRETAR S.A.S

CONCRETAR S.A.S

"AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DEL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 026 DE 2025"

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SG SSS
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ identificado con CC **7.161.189** en mi condición de representante legal y **RODRIGO SANCHEZ BETANCUR** identificado con CC **70.500.898.** y **TP 72387 – T** en mi condición de contador de **RM CONCRETAR S.A.S.** con **NIT 900.871.788** bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la empresa durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de emisión del presente certificado. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en medellín a los 10 días del mes de Junio de 2026.

Atentamente,

ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ
CC 8.161.189
Representante Legal
RM CONCRETAR SAS
NIT 900.871.788

RODRIGO SANCHEZ BETANCUR
CC 70.500.898
TP 72387 - T
Contador



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-1956
ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
17-ENE-1976 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0115100-00026344-M-0070500898-20080719 0001235920A 1 2230015445

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.500.898
SANCHEZ BETANCUR
APELLIDOS
RODRIGO
NOMBRES



FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



72387-T

RODRIGO
SANCHEZ BETANCUR
C.C. 70500898
RESOLUCION INSCRIPCION 55 FECHA 11/05/2000
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA
FEBRERO 24 DE 2025

Presidente

80597

CARVAJAL S.A.

01/2000-24236

FEBRERO 24/DE 205

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

070500898

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 1 9 0 4 7 F 2 0 0 4 2 4 A 4 D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RODRIGO SANCHEZ BETANCUR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70500898 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 72387-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CRONOGRAMA

RM
CONCRETAR S.A.S

PROPUESTA ECONÓMICA - RM CONCRETAR S.A.S.

AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRAVIO 026 DE 2025"

RM CONCRETAR S.A.S

PROGRAMACIÓN PARA FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ABRIL DE 2026				MAYO DE 2026						JUNIO DE 2026		
				SEM 41	SEM 42	SEM 43	SEM 44	SEM 45	SEM 46	SEM 47	SEM 48	SEM 49	SEM 50	SEM 51	SEM 52
				del 11	12 al 18	19a 25	27al 02	04al 9	10 al 16	18 al 23	25 al 30	24 al 29	31 al 06	4 al 7	25 al 28
1.6	Tanques y filtros														
1.6.1	Suministro, transporte e instalación de tanque de almacenamiento de agua con capacidad de 500 lt. para dosificación de químicos	un	3.0												
1.6	Equipos														
1.7	Acometida y red eléctrica														
1.7.3	Suministro transporte e instalacion tablero trifasico 480v 100A, incluye caja para medidor intemperie con totalizador, totalizador TDA, puesta a tierra, aterrizado hasta el tablero de protecciones y demas accesorios para su correcta instalacion.	GL	1.0												
1.7.5	Suministro transporte e instalacion Transformador seco de voltaje para control 3000 V.A, Monofasico, Entrada 440-480 Vac, Salida 220-110 Vac , incluye gabinete de proteccion y conexiones a tablero para tomas generales e iluminacion 3 breakers 20 A. Y demas elementos para su correcta instalacion	GL	1.0												
1.7.6	Suministro, transporte e instalación de Gabinete ML incluye breaker industrial de 3x63A, 1 breaker industrial 3 X 40A , 2x30A, y demas accesorios para su correcta instalacion	GL	1.0												
1.7.7	Certificacion RETIE, energizacion para puesta en marcha	GL	2.0												
1.7.8	Suministro, transporte y colocación de materiales para construccion de caja de piso de 40X40X40 cm medidas internas, segun normas de EPM, incluye excavación, batida de material solturado, concreto 21 Mpa, mortero 1:5, cama de triturado en el fondo de e=0,05m, bloques de concreto de 0.15x0.20x0.40 m, tornaje tipo pesado y antifraude, tapa tipo pesado y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento segun norma RSA-016 de EPM	GL	2.0												
2	REDES HIDRAULICAS														
2.1	Localización y replanteo	ha	10.0												
2.5	Suministro, transporte e instalación de tubería de impulsión acompañada PVC Presión e 4" RDE 21 desde estación de bombeo hasta tanques de almacenamiento	m	1369.0												
2.6	Anclaje seco, tubería pvc en concreto de 210 kg cm2, incluye atraque de 1/4"	m3	2.1												
2.7	Excavación manual o mecanica en material común seco de 0-2 m (incluye acarreo de material a pie)	m3	1030.2												
2.9	Lleno con material clasificado de la excavación, compactados mecanicamente al 90%, del articulo de precios modificado	m3	1030.2												
2.10	Lleno con material de prestamo compactados mecanicamente al 90% del ensayo de proctor modificado	m3	132.7												
2.12	Suministro, transporte e instalacion de válvula compuerta elastica 4" con llave de triangulo. Se entregara debidamente instalada sin presentar de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento (cinta y accesorios)	un	10.0												
2.13	Suministro, transporte e instalación de tanque en fibra de vidrio con capacidad de 50 m3 (3.0m de diámetro y 7.2m de altura) segun diseño incluye válvulas y accesorios hasta su correcta instalación	un	1.0												
OE1	Corte y limpieza de malezas y arbustos mediante machete, incluyendo el retiro y disposición de los residuos generados en bolsa o en bólsas. No contempla el cargue fuera del predio del material resultante.	m2	2604.00												
OE2	Suministro transporte e instalación de cinta de señalización para tubería de acueducto.	m	1946.00												
OE16	Retiro y reinstalación de cerramiento con alambre de puas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	m	60.0												
OE19	Suministro e instalación de acometida eléctrica temporal desde tomillo vecino para funcionamiento de bombeo (2) succion sumergible a 220v incluye suelta 2x40, extensión encauchetada 4x10 AWG hasta 60m, gabinete, toma y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	gl	1.0												
OE20	Suministro, transporte e instalacion de tapa de control e inspección para pozo de bombeo, dimensiones 1.00 m x 1.50 m, fabricada lámina de acero tipo alfajor 2 mm. Incluye marco perimetral metálico, bisagras reforzadas, sistema de cierre, anclados antivandalico, mano de obra, herramientas, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, alineación y funcionamiento.	und	2.0												
OE21	Suministro e instalacion de semilla de grama. Incluye fertilizante y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	520.6												
OE23	Suministro e instalacion de sistema de bombeo pluto H=150 m y una distancia horizontal de 1400m , incluye una bomba sumergibles tipo tanque/ acoplada a motor de 25 HP y todos los accesorios necesarios para un correcto funcionamiento.	un	1.0												
OE24	Suministro transporte e instalacion Tablero ATA para Arranque Directo, bomba 25 Hp 440/220, incluye guarda motor contactores, protecciones, pilotos, botones, borneria potencia. DPS y demas elementos para su correcto funcionamiento.	GL	1.0												
OE25	Suministro, transporte e instalación de cercha metálica para cruce de tubería sobre cauce, fabricada en angulo de acero 2 1/2" x 1/4", incluye corte, armado y soldadura, aplicación de recubrimiento anticorrosivo y pintura esmalte, mano de obra, herramientas, equipos, anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, nivelación y funcionamiento.	m	8.0												
OE26	Demolición de estructuras de concreto de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo y en cualquier clase de estructura. Incluye el retiro de refuerzo y cualquier tipo de pintura o p-40 (hierros, cuberias) e instalaciones embebidas, compresor neumatico con martillo, acumula recuperación de los materiales aprovechables, el transporte interno hasta el sitio de acopio que indique la interventoria y/o el cargue y botada en escombrera en botaderos oficiales manual o mecanicamente, para volumenes hasta 0.50 m3	m2	10.50												
OE27	Construcción de CUNETA PERIMETRAL en concreto de 21 Mpa., con un DESARROLLO mínimo de 50 cm y un ESPESOR DE 12 cm. Incluye enrocado de 15 cm en piedra de 2" a 4" y 5 cm en triturilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	32.4												
OE28	Suministro transporte e instalación de abrazaderas para fijacion de tubería sobre la obra transversal de la via principal Don Diego - La Ceja k 28+900	und	13.0												
OE29	Limpieza de obra transversal en la via principal Don Diego - La Ceja Km 28+900	m	19.0												
OE31	Suministro transporte e instalacion de salida electrica para iluminación con toma 15 A, NEMA 5-15R, por tubo EMT1/2", cables 3#12 AWG, caja 12x5, incluye todos los accesorios para su correcta instalación, NOTA: cada salida tendrá un desarrollo de 3 metros en tubería y cobre.	und	12.0												
OE32	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribución de 12 circuitos 220 voltios monofasico 100 amperios con protección de 2x30.	und	1.0												
OE33	Suministro, transporte e instalacion de transformador trifasico de 30kva 13.2kv/440/220, montado en poste RAZ-026, acometida para en 3#4+2#4 Cu THWN AWG, tubería en TPC de 3", certificación y pruebas de conformidad. (RAZ-007). TC + TP para medida	GL	1.0												
OE34	Transporte mular interno de materiales donde no es posible el acceso de vehículos de tracción mecánica, para distancias de 200m hasta 1000m. Nota: En caso de generarse distancias superiores a 1000m se pagará por esta misma ítem de manera proporcional a la distancia y al valor establecido. La anterior descripción aplica para el ingreso del material de las vías del tanque de almacenamiento donde no hay ingreso vehicular. Incluye embalajes de materiales en costales.	carga	310.0												
OE35	Capacitación teórico-práctica para la operación, control y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas potable (PTAP), incluyendo procesos de captación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Comprenda además el manejo de sistemas eléctricos asociados, tableros de control, protecciones, instrumentación básica, operación de bombas (arranque, paro, mantenimiento preventivo y correctivo), protocolos de seguridad industrial, resolución de fallas operativas y cumplimiento de la normatividad vigente para la calidad del agua potable	und	2.0												

ROBINSON ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ
Representante Legal
RM CONCRETAR S.A.S.
NIT 900.871.788-6

CONSOLIDADO PERSONAL

RM CONCRETAR S.A.S

Cédula	Nombre	Apellidos	RH	Municipio	EPS	Fecha ingreso	ARL	Pensiones	Empresa	Cargo	Fecha de salida y/o traslado
1040036167	Andrés Alberto	Villada Villada	A -	El Retiro	Nueva EPS	20/08/2025	Sura	Protección	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	25/10/2025
1037675196	Jhonder de Jesus	Prieto Arango	O +	La Unión	Salud total	20/08/2025	Sura	Porvenir	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	25/11/2026
15388559	Yamit de Jesus	Villada Villada	A +	El Retiro	Nueva EPS	20/08/2025	Sura	Porvenir	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	10/10/2025
1017201040	Alejandro	Ramirez Builes	O +	Medellín	Sura	28/10/2025	Sura	Colpensiones	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	9/01/2026
5704522	Moises	Rodriguez Marcano	A +	El Retiro	Coosalud	4/11/2025	Sura	Porvenir	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	15/12/2025
6778318	Wuilkerd Daniel	Huertado Martinez	A +	El Retiro	Nueva EPS	6/11/2025	Sura	Colpensiones	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	23/12/2025
						20/01/2026					3/02/2026
15387337	Omar de Jesus	Rios Aguirre	O +	La Ceja	Sura	13/11/2025	Sura	Protección	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	15/01/2026
1040049590	Diego Armando	Quintero Carmona	O +	El Retiro	Savia	18/11/2025	Sura	Porvenir	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	28/11/2025
1040180565	Jhon Alejandro	Quintero Carmona	O +	El Retiro	Savia	18/11/2025	Sura	Porvenir	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	27/11/2025
1007425344	Jose Jair	Narvaez Narvaez	O +	La Ceja	Savia	21/11/2025	Sura	Porvenir	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	15/01/2026
1151195421	Eldor Omar	Morales Ashana	O +	El Retiro	Salud total	1/12/2025	Sura	Porvenir	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	15/02/2026
1037368795	Andres Felipe	Cano Monsalve	O +	Itagüí	Salud total	28/10/2025	Sura	Porvenir	RM CONCRETAR S.A.S	Encargado	N/A
8463892	Juan Carlos	Gutierrez Blandon	O +	El Retiro	Sura	20/01/2026	Sura	Porvenir	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	N/A
15386825	Jhon Jairo	Morales Rios	A +	La Ceja	Nueva EPS	18/02/2026	Sura	Colpensiones	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	26/02/2026
1040033985	Tomas	Cardona Rios	O +	La Ceja	Sura	18/02/2026	Sura	Protección	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	13/04/2026
1040041860	Esneider	Giraldo Marin	A +	La Ceja	Sura	30/03/2026	Sura	Colfondos	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	N/A
1040041535	Richar	Castro Uribe	A +	La Ceja	Savia salud	23/04/2026	Sura	Porvenir	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	14/05/2026
1039096173	Brayan Sebastian	Correa Alzate	A +	La Ceja	Savia	24/04/2026	Sura	Colfondos	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	2/06/2026
61717166	Santiago Jose	Romero Roca	A +	El Retiro	Sura	28/04/2026	Sura	Protección	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	4/06/2026
1006917300	Alvaro Enrique	Uriana	O +	El Retiro	Salud total	30/04/2026	Sura	Porvenir	RM CONCRETAR S.A.S	Oficial	N/A
1006917302	Machao Alejandro	Uriana	O +	El Retiro	ASOCIACIàN DE CABILDOS INDÔGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA "DUSAKAWI A.R.S.I." -CM	8/05/2026	Sura	Colpensiones	RM CONCRETAR S.A.S	Oficial	22/05/2026
1040037282	Yessid Stiven	Villada Marulanda	O+	La Ceja	Sura	6/05/2026	Sura	Colpensiones	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	4/06/2026
1040182187	Juan Pablo	Garcia Castañeda	O+	El Retiro	Nueva EPS	7/05/2026	Sura	Protección	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	19/05/2026
1040744742	Diego Leon	Perez Cardona	O+	Medellín	Sura	8/05/2026	Sura	Protección	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	N/A
1040739104	Jhoan Alexis	Ramirez Tamayo	O+	Medellín	Sura	8/05/2026	Sura	Protección	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	N/A
1047405964	Camilo Andres	Zamora Martelo	O+	El Retiro	Mutualser	13/05/2026	Sura	Colpensiones	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	4/06/2026
1003459168	Rafael Antonio	Avila Viloria	O+	El Retiro	Proteger EPS	13/05/2026	Sura	Porvenir	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante de construcción	4/06/2026
1048044702	Edwin Alexis	Jaramillo Jaramillo	O +	Medellín	Sura	23/04/2026	Sura	Porvenir	RM CONCRETAR S.A.S	Ayudante electricista	N/A

RM CONCRETAR S.A.S

SEGURIDAD SOCIAL

RM
CONCRETAR S.A.S

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-04, 10:13:51 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85285570

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 04/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DENIS FERNANDO CASTANEDA ARANGO		
Documento	CC15448404	**Dirección**	CRR 54 46-78
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5630809
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020306913	ANDRES FELIPE GIRALDO MARIN	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1033541322	JUAN FELIPE BUITRAGO OSORIO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1035976295	SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 1036765378	JOSE ALEJANDRO SOTO CASTRO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1036765480	ESNEIDER SEBASTIAN RIOS MARTINEZ	01	00	X	X														0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 583.635	$ 93.400	(EPS010) EPS SURA	$ 583.635	$ 23.400	4,350	$ 583.635	$ 25.400	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.200
CC 1045026963	WILLIAM ALBERTO DUQUE LONDOÑO	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 1050594339	VICTOR AUGUSTO DIAZ GUERRERO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 15359188	JHON FREDY ROMAN CASTRO	01	00	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	4,350	$ 58.364	$ 2.600	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800
CC 15434597	ARNOLDO DE JESUS MEJIA GIRALDO	01	00													X			0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.283.997	$ 205.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.283.997	$ 51.400	0,000	$ 1.283.997	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.283.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.900
CC 15434597	ARNOLDO DE JESUS MEJIA GIRALDO	01	00																0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 466.908	$ 74.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 466.908	$ 18.700	4,350	$ 466.908	$ 20.400	(CCF04) COMFAMA	$ 466.908	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12.898.334	$ 12.898.334	$ 12.898.334	$ 12.898.334	$ 2.064.300	$ 516.500	$ 481.200	$ 465.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.527.100	$ 0	$ 3.527.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				151	$38,536,900	$0	$0	$38,536,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$5,398,800	$0	$0	$5,398,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	$6,319,900	$0	$0	$6,319,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	64	$17,651,000	$0	$0	$17,651,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	41	$9,167,200	$0	$0	$9,167,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$16,657,600	$0	$0	$16,657,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	152	$16,657,600	$0	$0	$16,657,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				152	$9,400,300	$0	$0	$9,400,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	152	$9,400,300	$0	$0	$9,400,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				152	$9,642,700	$0	$0	$9,642,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$228,000	$0	$0	$228,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$23,400	$0	$0	$23,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	55	$3,693,400	$0	$0	$3,693,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	37	$2,053,300	$0	$0	$2,053,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$72,500	$0	$0	$72,500
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$1,629,100	$0	$0	$1,629,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	29	$1,802,800	$0	$0	$1,802,800
TOTAL				**152**	**$74,237,500**	**$0**	**$0**	**$74,237,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900871788	6	RM CONCRETAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	avenida 40 N° 51-110	ITAGUI-ANTIOQUIA	3043360508	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	322833502	9504966169	E	2026/05/25	2026/05/20	BANCOLOMBIA	0	$74,237,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION Codigo	PENSION Días	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Días	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Días	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Días	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)						$5,225,634	$836,200			$5,225,634	$209,100			$5,225,634	$209,100			$5,225,634		$363,800		$0	$0		$1,618,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)						$5,225,634	$836,200			$5,225,634	$209,100			$5,225,634	$209,100			$5,225,634		$363,800		$0	$0		$1,618,200
Ciudad: ITAGUI Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)						$5,225,634	$836,200			$5,225,634	$209,100			$5,225,634	$209,100			$5,225,634		$363,800		$0	$0		$1,618,200
1	CC 1040741461	BARRADA SARA		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC 1152705408	QUINTERO CINDY		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
3	CC 71382852	SANTOS MANUEL	X X	231001	21	$1,225,634	$196,200	EPS010	21	$1,225,634	$49,100	CCF04	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	6.960%	$85,400	21	$0	$0	SI	$379,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION Codigo	PENSION Días	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Días	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Días	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Días	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ITAGUI (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$650,000	$26,000			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$385,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$650,000	$26,000			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$385,500
Ciudad: ITAGUI Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$650,000	$26,000			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$385,500
4	CC 43602391	OCAMPO NORA		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$650,000	$26,000	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$385,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION Codigo	PENSION Días	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Días	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Días	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Días	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Días	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BARBOSA (27 Afiliados)						$42,626,284	$6,821,400			$42,626,284	$1,706,600			$41,229,893	$1,650,700			$42,626,284		$2,968,000		$0	$0		$13,146,700

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	cde	cdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GIMNASIO (10 Afiliados)																					$10,412,528	$1,666,500			$10,412,528	$417,100			$10,412,528	$417,100			$10,412,528		$725,100		$0	$0		$3,225,800
Centro de Trabajo: GYM RETIRO (10 Afiliados)																					$10,412,528	$1,666,500			$10,412,528	$417,100			$10,412,528	$417,100			$10,412,528		$725,100		$0	$0		$3,225,800
Ciudad: RETIRO Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados)																					$10,412,528	$1,666,500			$10,412,528	$417,100			$10,412,528	$417,100			$10,412,528		$725,100		$0	$0		$3,225,800
115	CC	1039471411	AGUDELO CORREA JUAN DAVID	X															23020 1	6	$350,181	$56,100	EPS010	6	$350,181	$14,100	CCF04	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	6.960%	$24,400	6	$0	$0	SI	$108,700
116	CC	1038813624	BALLESTERO MENDOZA CRISTIAN ALIRIO																23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
117	CC	1037368795	CANO MONSALVE ANDRES FELIPE																23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF04	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	SI	$712,100
118	CC	1040033985	CARDONA RIOS TOMAS																23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
119	CC	1001477679	CASTRO VILLADA JONATHAN DAVID	X															23030 1	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF04	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	6.960%	$28,500	7	$0	$0	SI	$126,700
120	CC	84038922	FABRA MORA YEIS MADER																23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
121	CC	1040041860	GIRALDO MARIN ESNEIDER	X															23100 1	4	$233,454	$37,400	EPS010	4	$233,454	$9,400	CCF04	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	6.960%	$16,300	4	$0	$0	SI	$72,500
122	CC	1003192848	GONZALEZ GAVIRIA ALMAR ANTONIO	X															25-14	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF04	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
123	CC	8463892	GUTIERREZ BLANDON JUAN CARLOS																23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
124	CC	15438477	RAIGOSA JURADO SERGIO ANDRES	X	X														23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF04	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
Total	**Afiliados(124)**																				$206,914,009	$33,111,500			$208,664,914	$8,352,800			$203,948,990	$8,163,800			$208,664,914		$14,415,200		$0	$0		$64,043,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				123	$33,111,500	$0	$0	$33,111,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	$4,287,200	$0	$0	$4,287,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$5,563,300	$0	$0	$5,563,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	56	$15,470,100	$0	$0	$15,470,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	$7,790,900	$0	$0	$7,790,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				124	$14,415,200	$0	$0	$14,415,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	124	$14,415,200	$0	$0	$14,415,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				124	$8,163,800	$0	$0	$8,163,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	124	$8,163,800	$0	$0	$8,163,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				124	$8,352,800	$0	$0	$8,352,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$232,700	$0	$0	$232,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	41	$3,071,200	$0	$0	$3,071,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	31	$1,726,400	$0	$0	$1,726,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$63,100	$0	$0	$63,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$1,560,400	$0	$0	$1,560,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	21	$1,558,800	$0	$0	$1,558,800
TOTAL				124	$64,043,300	$0	$0	$64,043,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900871788	6	RM CONCRETAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	avenida 40 N° 51-110	ITAGUI-ANTIOQUIA	3043360508	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-04	223016726	9503076035	E	2026/04/23	2026/04/14	BANCOLOMBIA	0	$64,043,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$1,238,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$1,238,400
Ciudad: ITAGUI Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$1,238,400
1	CC 1040741461	BARRADA PEREA SARA ISABEL		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC 1152705408	QUINTERO MONTOYA CINDY VANESSA		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ITAGUI (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$650,000	$26,000			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$385,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$650,000	$26,000			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$385,500
Ciudad: ITAGUI Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$650,000	$26,000			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$385,500
3	CC 43602391	OCAMPO SOSSA NORA ELENA		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$650,000	$26,000	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$385,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BARBOSA (24 Afiliados)						$39,474,655	$6,317,100			$39,474,655	$1,580,300			$38,870,961	$1,554,100			$39,474,655		$2,748,400		$0	$0		$12,201,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

RM CONCRETAR S.A.S

DOCUMENTOS VEHICULOS

RM CONCRETAR S.A.S

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO MES DÍA)	VIGENCIA DESDE (AÑO MES DÍA)	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL (AÑO MES DÍA)
2025 11 18	2025 11 19	2026 11 18

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/KVA	MODELO
3471758800	TOP487	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	7636	2008

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	

LÍNEA VEHÍCULO	
4300	

No. MOTOR	No. CHASIS O No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
470HM2U1521718	3HAMMAAR68L658750	3HAMMAAR68L658750	8

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CASTA?EDA ARANGO, DENIS FERNANDO	3117523519	CC	15448404	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	57790351	3471758800	CARMEN DE VIBORAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
332	$839.200,00	$436.300,00	$2.400,00

TOTAL A PAGAR

$1.277.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Digitized with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024178070

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TOP487	INTERNATIONAL	4300	2008

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.636	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	8600 - 2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
470HM2U1521718	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	3HAMMAAR68L658750	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CASTAÑEDA ARANGO DENIS FERNANDO	C.C. 15448404

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
13423010805323

I/E
I

FECHA IMPORT.
31/10/2007

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
04/12/2007

FECHA EXP. LIC. TTO
07/10/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRANSITO

INSP TTO MCPAL LA CEJA



LT03004513262

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.000.306.915

GIRALDO MARIN

APELLIDOS

ANDRES FELIPE

NOMBRES



Andres Giraldo

FIRMA

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025855727

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
OWN115	FORD	F 800	1960

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
8.000	BLANCO Y AMARILLO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	4000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
FU131543CM	S	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
F80FU131543	S	F80FU131543	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CASTAÑEDA ARANGO DENIS FERNANDO	C.C. 15448404

Scanned with CamScanner

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E
I

FECHA IMPORT.

PUERTAS
2



LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
01/01/1960

FECHA EXP. LIC. TTO.
11/11/2022

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL LA ESTRELLA

LT03005636662

Scanned with CamScanner

CDA
LOS CRISTALES SAS
TEL: 4484783

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182850388

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LOS CRISTALES

NIT: 900338277

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-038-001

Fecha de expedición: 2025/07/29

Fecha de vencimiento: 2026/07/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA: OWN115

CLASE: VOLQUETA

MARCA: FORD

MODELO: 1960

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 8000

NRO. MOTOR: FU131543CM

NRO. CHASIS: F80FU131543

VIN:

LÍNEA: F 800

COLOR: BLANCO Y AMARILLO

NOMBRE PROPIETARIO: DENIS F. CASTAÑEDA A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL URREGO OQUENDO

Scanned with CamScanner

seguros mundial®
tu compañía siempre

SOLUCIONES DE MOVILIDAD



PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL AUTOMÓVILES SEGURO TER-CERO - ESENCIAL

Versión Clausulado Número
21-03-2025-1317-P-03-PPSUS10RT0000055-DRCI
Código Anexo de Asistencia

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N.6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono: (601) 285 56 00

No. Póliza	NB 2000489398	No. de Certificado	1805160017	No. Riesgo	1
Tipo de documento	RENOVACION	Fecha de expedición	2025-12-09	Suc. expedidora	BOGOTÁ
Vigencia desde	00:00 Horas del D 14 / M 12 / A 2025	Vigencia hasta	00:00 Horas del D 14 / M 12 / A 2026	Días	365
Vigencia del certificado desde	00:00 Horas del D 14 / M 12 / A 2025	Vigencia del certificado hasta	00:00 Horas del D 14 / M 12 / A 2026		

Tomador	DENIS FERNANDO CASTAÑEDA ARANGO			Nº. Doc. identidad	15448404
Dirección	VEREDA EL HIGUERON	Ciudad	RIONEGRO ANTIOQUIA	Teléfono	3117523519
Asegurado	DENIS FERNANDO CASTAÑEDA ARANGO			Nº. Doc. identidad	15448404
Dirección	VEREDA EL HIGUERON	Ciudad	RIONEGRO ANTIOQUIA	Teléfono	3117523519
Beneficiario	TERCEROS AFECTADOS			CC/NIT	
Beneficiario				CC/NIT	

RIESGO ASEGURADO

Cod. Fasecolda	99900000	Modelo	1960	Servicio	PARTICULAR
Placa	OWN115	Marca y clase	-	Color	BLANCO Y AMARILLO
Tonelaje/Cilindraje/Pasajeros	2	No. Motor	FU131543CM	Tipo de vehículo	VOLQUETA
Dpto/Municipio	RIONEGRO	Valor comercial		No. Chasis / Serie	F80FU131543
		Valor accesorios		Valor comercial total	

CONDICIONES DE COBERTURA

Cobertura	Límite asegurado (Pesos Colombianos)	%	Deducibles S.M.M.L.V / Pesos COP
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$50.000.000.00	10.0 %	0.5 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	10.0 %	0.5 SMMLV

Convenio de pago	Contado			Fecha límite de pago	2026-01-08		
PRIMA BRUTA	$ 266,555.00	DESCUENTOS	$		PRIMA NETA	$	266,555.00
GASTOS EXP.	$	IVA	$	50,645.00	TOTAL A PAGAR	$	317,200.00

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
NEGOCIOS DIRECTOS	100.0			

OBSERVACIONES

En caso de haber contratado servicio de asistencia puede solicitarlo comunicándose a Bogotá al (601)6580702 Opción 1 - Celular o Fijo de forma gratuita al 018000118820 Opción 1

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

En de obligatorio cumplimiento diligenciar el formulario de conocimiento del cliente, suministrar información veraz y verificable al igual que realizar actualización de datos por lo menos una vez al año (circular externa 026 de 2008 superfinanciera.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

Autorizo a **Seguros Mundial** para almacenar, recolectar y gestionar mis datos personales para el suministro de información y educación financiera, ofrecimiento comercial, así como los servicios inherentes a la actividad aseguradora, realización de encuestas de satisfacción de clientes y fines estadísticos. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como las derechos que me asisten como titular de los mismos.

Para mayor información sobre la política de tratamiento de datos ingrese a **https://www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/**. En caso que no desee otorgar esta autorización, favor comunicarse a las líneas de atención al cliente que aparecen en la póliza o ingrese a nuestra página web **https://www.segurosmundial.com.co/contacto/** y diligencie el formulario o envíe un correo electrónico a **consumidorfinanciero@segurosmundial.com.co.**

Conozca las **condiciones generales de la póliza** y el anexo de asistencia en **https://www.segurosmundial.com.co/personas/**

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.
Angela Munar
Vicepresidente de Producto
CC 52.646.070

Tomador

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No. 1805160017

Scanned with CamScanner

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		HASTA LAS 24:00 HORAS DEL
2026 1 20	DESDE LAS 00:01 HORAS DEL 2026 1 21		2027 1 20

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC/TON	MODELO
3505051800	OWN115	VEHICULOS DE CARGA	PARTICULAR	8000	1960

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	FORD	
	LINEA VEHICULO: F 800	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
FU131543CM	F80FU131543	F80FU131543000000	4

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CASTA?EDA ARANGO, DENIS FERNANDO	3117523519	CC	15448404	MEDELLIN

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
1306	26	57790351	3505051800	CARMEN DE VIBORAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FONYGA	TASA RUNT
331	$582.900,00	$303.100,00	$2.400,00

TOTAL A PAGAR
$888.400,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fonyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesaria, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.033.341.322



Apellidos
BUITRAGO OSORIO

Nombres
JUAN FELIPE

Nacionalidad
COL

Estatura
1.72

Sexo
M

Fecha de nacimiento
20 AGO 1995

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
LA UNION (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
12 SEPT 2013, AMAGA

Firma

Fecha de expiración
06 JUN 2035

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1033341322

NOMBRE

JUAN FELIPE BUITRAGO OSORIO



FECHA DE NACIMIENTO

20-08-1995

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

12-08-2019

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

SDT SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD RIONEGRO

Scanned with CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	31-08-2034	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	31-08-2027	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERPITORIO NACIONAL

LC06002985293

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 182258072

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LOS CRISTALES

NIT: 900338277

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-038-001

Fecha de expedición: 2025/07/04

Fecha de vencimiento: 2026/07/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TOP487	CLASE:	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	MODELO:	2008
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	7636	NRO. MOTOR:	470HM2U1521718
NRO. CHASIS:	3HAMMAAR68L658750	VIN:	
LÍNEA:	4300		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: DENIS F. CASTAÑEDA A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL URREGO OQUENDO

Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-2000**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA

O- G.S. RH

M SEXO

24-DIC-2018 SANTUARIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0125600-01054902-M-1000306915-20190111 0064114612A 1 2185281691

Scanned with CamScanner

2:38

POLIZA - 2000282709.pdf OK

1 de 29



DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - AUTOMOVILES

Versión Clausulado Número
21-03-2025-1317-P-03-PESU0101000000021063
Código Anexo de Asistencia
21-03-2025-1317-A-03-ASUS0101000000051063

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 13N 6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono: (601) 285 56 00

No. Póliza	M 2000282709	No. de Certificado	1805129730	No. Riesgo	1
Tipo de documento	RENOVACION	Fecha de expedición	2025-11-25	Suc. expedidora	MEDELLIN
Vigencia desde	00:00 horas del 025 / M 11 / A 2025	Vigencia hasta	00:00 horas del 025 / M 11 / A 2026	Días	365
Vigencia del certificado desde	00:00 horas del 025 / M 11 / A2025	Vigencia del certificado hasta	00:00 horas del 025 / M 11 / A2026		
Tomador	DENIS FERNANDO CASTAÑEDA ARANGO			Nº. Doc. Identidad	15448404
Dirección	VEREDA EL HIGUERON	Ciudad	RIONEGRO ANTIOQUIA	Teléfono	3117523519
Asegurado	DENIS FERNANDO CASTAÑEDA ARANGO			Nº. Doc. Identidad	15448404
Dirección	VEREDA EL HIGUERON	Ciudad	RIONEGRO ANTIOQUIA	Teléfono	3117523519
Beneficiario	TERCEROS AFECTADOS			CC/nit	
Beneficiario				CC/nit	

RIESGO ASEGURADO

Cod. Fasecolda	03626037	Modelo	2025	Servicio	PUBLICO	Color	BLANCO
Placa	TOP487	Marca y clase	INTERNATIONAL VOLQUETA - 4300 SBA MT 7600CC TD 4X2 [ATD]			Tipo de vehículo	VOLQUETA
Toneladas/Cilindraje/Pasajeros	0	No. Motor	4300M2U1521718			No. Chasis / Serie	3HAMMAAR691,656750
Ruta/Municipio	RIONEGRO	Valor comercial	$157,400,000.00	Valor accesorios	$0.00	Valor comercial total	$157,400,000.00

CONDICIONES DE COBERTURA

Cobertura	Límite asegurado (Pesos Colombianos)	%	Deducibles SMMLV / Pesos COP
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$500,000,000.00	20.0 %	4.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	$500,000,000.00	20.0 %	4.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS	$1,000,000,000.00	20.0 %	4.0 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS MEDICOS	$200,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	$10,348,632.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$10,348,632.00	Sin Deducible	Sin Deducible
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	$5,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA EN VIAJE	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible

Convenio de pago	Contado	Fecha límite de pago	2025-12-25		
PRIMA BRUTA	$ 1,867,213.00	DESCUENTOS	$	PRIMA NETA	$ 1,867,213.00
GASTOS EXP.	$ 5,000.00	IVA	$ 355,721.00	TOTAL A PAGAR	$ 2,227,936.00

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
MULTISEGUROS LATINOS LTDA	100.0			

OBSERVACIONES

En caso de haber contratado servicio de asistencia puede solicitarlo enviando el mensaje a Línea Nal. 018000118939 o Bta (601)3274712 ET Opc 3 Asistencias – 2 Auto, moto 4935

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

Es su obligación verificar y comprobar, diligenciar el formulario de conocimiento del cliente, suministrar información veraz y verificable y actualizarla de manera oportuna cuando se presente una variación de más del 10% superior/inferior.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

Autorizo a **Seguros Mundial** para almacenar, recolectar y gestionar mis datos personales para el suministro de información y educación financiera, ofrecimiento comercial, activación de servicios ofrecidos y la actividad aseguradora, respuestas de encuestas de satisfacción, fidelización y fines estadísticos. De acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y sus reglamentos, puedo ejercer mis derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo de mis datos personales a través de los canales habilitados para tal fin. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que realizan los datos personales suministrados en el presente formulario de enlace, así como sus derechos que se describen en mi Manual de Usuario.

Para mayor información sobre la política de tratamiento de datos ingrese a **https://www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/**. Así mismo puede ejercer sus derechos a través de los canales de atención al cliente que encuentra en la página web **https://www.segurosmundial.com.co/contacto/**, diligenciando el formulario o envíe un correo electrónico a **consumidorfinanciero@segurosmundial.com.co**.

Consulte las **condiciones generales de la póliza** y el resto de documentos en **https://www.segurosmundial.com.co/personas/**

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.
Angela Munar
Vicepresidencia de Producto
CC 52.646.078

Tomador

Hoja No. 1

---

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No. 1805129730

Fecha de Facturación	2025-12-25	Fecha Límite de Pago	2025-12-25
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - AUTOMOVILES		Prima (Incluye gastos de expedición)	1,867,213.00
Póliza No.	M 2000282709	IVA	355,721.00
Periodo Facturado	2025-11-25 / 2026-11-25	VALOR TOTAL A PAGAR $	2,227,936.00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	DENIS FERNANDO CASTAÑEDA ARANGO
VEREDA EL HIGUERON	15448404
Intermediario	MULTISEGUROS LATINOS LTDA 5126260

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018791805

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KEF563	CHEVROLET	C 70 149	1981

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.500	VERDE MENTA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	7000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
FE6002676C	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
CM002209	N	CM002209	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TABARES CASTRO SANDRA JANET	C.C. 1036925038

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
14957

I/E
I

FECHA IMPORT.
14/05/1981

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA
23/03/1982

FECHA EXP. LIC. TTO.
17/07/2019

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DE TTOYTTE DEL MCPIO DE MARINILLA

LT03003647044

Scanned with CamScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1000306915



NOMBRE

ANDRES FELIPE GIRALDO MARIN

FECHA DE NACIMIENTO

10-08-2000

SANGRE-RH

O-

FECHA DE EXPEDICIÓN

06-04-2026

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA DE TTOYTTE DEL MCPIO DE MARINILLA

Scanned with CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	06-04-2036	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	06-04-2029	PUBLICO



PB-0325

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC08000287806

Scanned with CamScanner

seguros mundial®
tu compañía siempre



DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

Versión Clausulado Número
21-03-2025-1317-P-03-PPSUS10[illegible]052-DRCT

Código Anexo de Asistencia
21-03-2025-1317-A-03-ASUS10[illegible]053-DRCT

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N.6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono: (601) 285 56 00

No. Póliza	NB 2000435411	No. de Certificado	1804739102	No. Riesgo	1
Tipo de documento	RENOVACION	Fecha de expedición	2025-08-14	Suc. expedidora	BOGOTÁ
Vigencia desde	00:00 Horas del 20 / 08 / A 2025	Vigencia hasta	00:00 Horas del 020 / M 08 / A 2026	Días	365
Vigencia del certificado desde	00:00 Horas del D 20 / M 08 / A2025	Vigencia del certificado hasta	00:00 Horas del 020 / M08 / A2026		

Tomador	SANDRA JANET TABARES CASTRO			Nº. Doc. Identidad	1036925038
Dirección	CRA 52 # 29 A 111 LOC. 411		Ciudad MEDELLIN ANTIOQUIA	Teléfono	6045743397
Asegurado	SANDRA JANET TABARES CASTRO			Nº. Doc. Identidad	1036925038
Dirección	CRA 52 # 29 A 111 LOC. 411		Ciudad MEDELLIN ANTIOQUIA	Teléfono	6045743397
Beneficiario	TERCEROS AFECTADOS			CC/NIT	
Beneficiario				CC/NIT	

RIESGO ASEGURADO

Cod. Fasecolda	01626002	Modelo	1981	Servicio	PARTICULAR	Color	VERDE MENTA
Placa	KEF563	Marca y clase	CHEVROLET VOLQUETA - C70 149 MT TD 4X2			Tipo de vehículo	VOLQUETA
Tonelaje/Cilindraje/Pasajeros	6500	No. Motor	FE6002676C			No. Chasis / Serie	CM002209
Dpto/Municipio	MEDELLIN	Valor comercial	$15,500,000.00	Valor accesorios	$0.00	Valor comercial total	$15,500,000.00

CONDICIONES DE COBERTURA

Cobertura	Límite asegurado (Pesos Colombianos)	Deducibles %	Deducibles S.M.M.L.V / Pesos COP
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$150,000,000.00	20.0 %	4.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	$150,000,000.00	20.0 %	4.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS	$300,000,000.00	20.0 %	4.0 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS MÉDICOS	$200,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	$10,348,632.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$5,338,580.00	Sin Deducible	Sin Deducible
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	$5,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible

Convenio de pago	Contado			Fecha límite de pago	2025-09-13		
PRIMA BRUTA	$ 832,128.00	DESCUENTOS	$	PRIMA NETA	$ 832,128.00		
GASTOS EXP.	$ 5,000.00	IVA	$ 159,054.00	TOTAL A PAGAR	$ 996,182.00		

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
NEGOCIOS DIRECTOS	100.0			

OBSERVACIONES

En caso de haber contratado servicio de asistencia puede solicitarlo comunicándose a Línea Nal. 018000111935 o Bta (601) 3274742-13 Opc 1 Asistencias – 2 Autos, salud 9935

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

Es de obligatoria cumplimentación diligenciar el formulario de conocimiento del cliente, suministrar información veraz y verificable, al igual que realizar actualización de datos por lo menos una vez al año (circular externa 026 de 2008 superintendencia)

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

Autorizo a **Seguros Mundial** para almacenar, recolectar y gestionar mis datos personales para el suministro de información y educación financiera, ofrecimiento comercial, así como los servicios inherentes a la actividad aseguradora, realización de encuestas de satisfacción de clientes y fines estadísticos. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como los derechos que se ejercen como titular de los mismos.

Para mayor información sobre la política de tratamiento de datos ingrese a **https://www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/**. En caso que no desee otorgar esta autorización, favor comunicarse a las líneas de atención al cliente que aparecen en la página inicial o a nuestra página web **https://www.segurosmundial.com.co/contacto/** y diligencie el formulario o envíe un correo electrónico a **consumidorfinanciero@segurosmundial.com.co**.

Consulte las **condiciones generales de la póliza** y el anexo de asistencia en **https://www.segurosmundial.com.co/personas/**

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.
Angela Munar
Vicepresidente de Producto
CC 52.646.070

Tomador

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	1804739102

Fecha de Facturación	2025-09-13
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES	
Póliza No.	NB 2000435411
Periodo Facturado	2025-08-20 2026-08-20

Fecha Límite de Pago	2025-09-13
Prima (incluye gastos de expedición)	832,128.00
IVA	159,054.00
VALOR TOTAL A PAGAR $	996,182.00

EFECTIVO $

Scanned with CamScanner

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		
AÑO MES DÍA	DESDE: AÑO MES DÍA	HASTA: LAS 24 HORAS DEL AÑO MES DÍA	
2025 11 19	2025 11 20	2026 11 19	

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3472319800	KEF563	VEHICULOS DE CARGA	PARTICULAR	6500	1981

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	CHEVROLET	
	LINEA VEHICULO: C 70 149	

No. MOTOR	No. CHASIS O No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
FE6002676C	CM002209	CM002209000000000	7

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TABARES CASTRO, SANDRA JANET		CC	1036925038	MEDELLIN

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	57790436	3472319800	CARMEN DE VIBORAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION POLITICA	TASA RUNT
332	$839.200,00	$436.300,00	$2.400,00

TOTAL A PAGAR
$1.277.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costes de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Scanned with CamScanner

CDA
LOS CRISTALES SAS
TEL: 4484733

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 188505837

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LOS CRISTALES

NIT: 900338277

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-038-001

Fecha de expedición: 2026/03/18

Fecha de vencimiento: 2027/03/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA: KEF563

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1981

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6500

NRO. MOTOR: FE6002676C

NRO. CHASIS: CM002209

VIN:

LÍNEA: C 70 149

COLOR: VERDE MENTA

NOMBRE PROPIETARIO: SANDRA J. TABARES C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

RAFAEL ARCANGEL URREGO OQUENDO

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1036962864

NOMBRE

ARLEX VERA ALZATE

FECHA DE NACIMIENTO

19-05-1998

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICIÓN

22-12-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SDT SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD RIONEGRO

Scanned with CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	22-12-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	22-12-2028	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06003122674

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.036.962.864

VERA ALZATE


APELLIDOS

ARLEX

NOMBRES

Arlex Vera Alzate

FIRMA

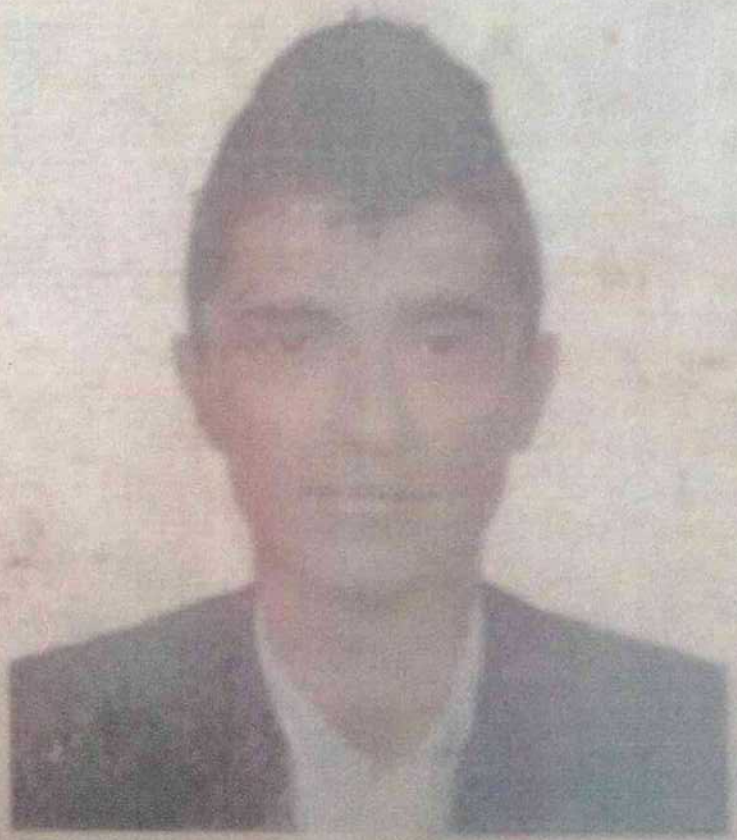

Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
19-MAY-1998

ABEJORRAL
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

01-JUN-2016 RIONEGRO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0121400-00845318-M-1036962864-20160630 0050761865A 1 45532218

Scanned with CamScanner

ARL | sura

Medellín, 19 de May de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CASTAÑEDA ARANGO DENIS FERNANDO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000002 CONDUCTOR		Clase: 4	Porcentaje Cotización:	4.35 %	
C1036962864	VERA ALZATE ARLEX	20/05/2026		19017720	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/05/2026 15:02:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.206.50.209, 192.230.104.15, 172.16.42.57

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS | sura

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud 6I_7897248

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	CC 15448404 DENIS FERNANDO CASTAÑEDA ARANGO
Afiliado	CC 1036962864 ARLEX VERA ALZATE
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 1,750,905
Cargo	OTRO
Sucursal	LA CEJA CL 18 20-12 INT 104
Fecha de ingreso	20/05/2026
Fecha de radicación	20/05/2026 02:45:53 p.m.
Código de Transacción	218031217
Resultado delReingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 06/2026

Fecha de generación 20/05/2026

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **ARLEX VERA ALZATE** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1036962864,** se encuentra afiliado/a desde **18/12/2018** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 19 de mayo de 2026.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

comfama

Radicado: 3980969

Certificado de afiliación

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama

hace constar que:

Arlex Vera Alzate con cédula de ciudadanía 1036962864, se encuentra afiliado(a) a esta Corporación, en calidad de trabajador(a) dependiente, con tarifa de afiliación A, por intermedio de:

Razón social	Tipo Documento	Fecha afiliación	Fecha ingreso empresa*
Denis Fernando Castañeda Arango	CC 15448404	2026-05-20	2026-05-20

*Fecha reportada por el empleador al momento de la afiliación a Comfama.

No tiene grupo familiar registrado.

Se expide esta constancia el dia 21 de mayo de 2026 a solicitud del empleador.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN BARRERA HINCAPIÉ
Responsable Afiliaciones

Product Perform **Standard**

Q/0211LWZ 601-2023

these goods are qualified to leave factory after inspection

LOVOL HEAVY INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
Inspection Seal of Product
Inspection Seal of Product

Model	FR60E2-H
Code	RFL1EHP1A3G3313J
Name	Hydraulic Excavator
PIN	*FTC003RFTSZ000101*
VIN	- - -
Engine Model	4TNV94L-BVFNC
No. of Engine	H9839A
Dimension	6090×1950×2660
Left/Right Tracke No.	- - - -
Inspector	GCJY(01)
Chief of Inspector Section	车孙印保
Date	2024-01-29
Certificate No.	304181

Powered by CamScanner

satrack

NIT: 830.059.669-3

31 de marzo de 2026

Certificado de monitoreo

Por medio del presente, certificamos que **MRM INGENIERÍA S.A.S.**, identificado con **RUC/NIT 900886407**, mantiene activo el servicio de plataforma Servisat Satrack. Dicho servicio proporciona, mediante nuestro software, la capacidad de localizar de forma georreferenciada los siguientes vehículos:

VEHÍCULOS 1

Placa	Tipo	Marca	Línea	Modelo	Serial Motor	Serial Chasis
TC003RFTSZ000'	MAQ. CONSTRUCCION O MINERA	FOTON LOVOL	FR60E2-H	2025	H9839A	FTC003RFTSZ000101

PLAN / UNIDAD

Placa	Fecha Activación	Plan	Tipo Unidad	Serial Unidad	IMEI
TC003RFTSZ00010	18/03/2024	Monitoreo Avanzado Pago Anticipado	QUECLINK-GV	GV861157042141693	861157042141693

Este certificado se expide el 31 de marzo de 2026.

Cualquier confirmación o ampliación del certificado emitido, puede validarse a través de nuestras líneas de atención.

Leyton Castro Posada
Director Atención Clientes

FOTON

Excavadora 5.7 Ton

FR60E



GARANTÍA EXCAVADORA
1 año
2.000 hrs
LO QUE OCURRA PRIMERO*

EXCAVADORA 5.7 TON FR60E
Motor Yanmar 4TNV94L-SFN 36/2000
Sistema hidráulico KYB

FOTON


Excavadora 5.7 Ton.

FR60E


Especificaciones Técnicas

Dimensiones generales (LxAxH)(mm)	6090 x 1880 x 2660
Marca del motor	YANMAR
Referencia de motor	4TNV94L - BVFN
Cilindraje de motor (cc)	3054
Potencia (HP/rpm)	49/2100
Sistema hidráulico KYB/JAPAN	
Bombas hidráulicas	3
Caudal	135 litros x minuto
Peso de operación (Kg)	5730
Presión de trabajo	24,5
Bloque valvular	Distribuidor de flujo y regulador de presión
Motores hidráulicos KSY	Reductor de giro y de translación
Joint center	Distribuidor de flujo de los motores de translación
Sistema eléctrico	12 V
Marca bomba translación	KYB Japan
Marca motor translación	KYB Japan
Banco de válvulas	KYB Japan
Bombas hidráulicas	KYB Japan
Fuerza excavación brazo KN	31
Fuerza excavación cucharon KN	44
Capacidad cucharón m3	0,2
Velocidad adelante alta (Km/h)	4,2

DIMENSIONES (mm)



RANGOS DE TRABAJO

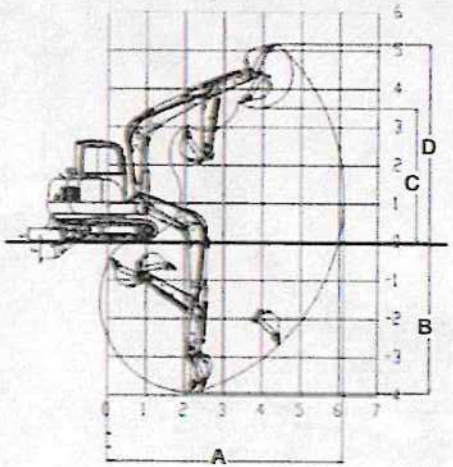

A	Máximo radio de excavación	6110
B	Máxima profundidad de excavación	3925
C	Altura máxima de descarga	3500
D	Máxima altura en excavación	5170
E	Máxima distancia al suelo de la cuchilla	400
F	Máxima profundidad de hundimiento de la cuchilla	560



PUNTOS DE VENTA: BOGOTÁ: Cra. 45 **(Autopista Norte)** # 242-10 Tel: (031) 6760282 – Cel: 318 4505104 / **Av. Boyacá** # 66A-06 Tel: (031) 2245204 – Cel 318 4152068 / **Fontibón** Calle Diagonal 16 # 98-17 (Variante Fontibón) Tel: (031) 7431917 – Cel: 317 4044272 / **MEDELLÍN:** Calle 2 # 50-21 Tel: (034) 3615828 – Cel: 317 4410432 / **CALI:** Calle 15 #32 A-285 Vía Yumbo Tel: (032) 4853790 – Cel: 317 4312744 / **BARRANQUILLA:** Vía 40 # 509-54 Tel: (035) 3851752 – Cel: 316 2477691 / **VILLAVICENCIO:** Calle 1 # 37-200 Bodega 2 Anillo Vial Villavicencio Tel: (038) 6848416 - Cel: 315 5143936 / **PASTO:** Calle 22 # 6-28 Av. Bolívar Tel: (032) 7306131 – Cel 316 2727913 / **NEIVA:** Casamotor Cra. 7 # 2-25 Sur Tel: (038) 8701653 / **PEREIRA:** Casautos S.A. Av. 30 de Agosto # 105-90 Tel: (036) 3205500 - Cel: 318 3121037 / **IBAGUÉ:** Casamotor SAS Cra. 48 Sur # 113-103 Sector Aparco Km 5 Vía Picaleña Tel: (038) 2655529 / **BUCARAMANGA:** Agrotrans Cra. 15 # 18-45 Sucursal Kilómetro 3 Vía Bucaramanga-Girón Tel: (037) 671 1111 - Cel: 320 349 3175 / **POPAYÁN:** Automotores El Ingenio Cra. 9 # 10 N-15 Tel: (032) 837 2929 – Cel: 315 3526550 / **MONTERÍA:** Doriautos Cra. 2 # 45-431 Tel: (034) 7911111- Cel: 315 7157920 / **CÚCUTA:** Av. Libertadores # 2-160 Zona F Tel: (057) 5876867 Cel: 315 7006633 / **TUNJA:** Cra. 6 # 73-37 Tel: (038) 7462106 - Cel: 313 2256299 / **Línea de atención Nacional:** 01 8000 518 822 // **(Las toneladas anunciadas no incluyen el peso de la carrocería. Las imágenes son ilustrativas y no corresponden necesariamente a la oferta comercial local. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.)**

ES MÁS QUE SÓLO ACEITE. ES INGENIERÍA LÍQUIDA™

Castrol

Lubricante recomendado por Foton.



MANTENIMIENTO MAQUINARIA AMARILLA	
EQUIPO	RETROEXCAVADORA
MARCA	LENOVO
MODELO	2025
LINEA	FR60E2-H

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HORAS			
ELEMENTO	ACCION		HOROMETRO
	CAMBIO	REVISION	
Filtro del A/C	⊗		253.4
Filtro Sep Combust	⊗		
Filtro Aire Int/Ext	⊗		
Filtro de Aceite	⊗		
Filtro Combustible	⊗		
Multi 15W-40 CK-4 3X4L Asp X3	⊗		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HORAS			
ELEMENTO	ACCION		HOROMETRO
	CAMBIO	REVISION	
ACEITE MOBIL 15W40 GL X3	⊗		509.7
ACEITE MAXTER 80W90 GL	⊗		
FILTRO ACEITE	⊗		
FILTRO COMBUSTIBLE	⊗		
KIT AIRE	⊗		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HORAS			
ELEMENTO	ACCION		HOROMETRO
	CAMBIO	REVISION	
ACEITE MOBIL 15W40 GL X3	⊗		753.4
ACEITE MAXTER 80W90 GL	⊗		

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HORAS			
ELEMENTO	ACCION		HOROMETRO
	CAMBIO	REVISION	
ACEITE MOBIL 15W40 GL X3	⊗		1024.4
ACEITE MAXTER 80W90 GL	⊗		
FILTRO ACEITE	⊗		
FILTRO COMBUSTIBLE	⊗		
KIT AIRE	⊗		

Nota: Rango Maquinaria y Herramienta realiza oportunamente sus mantenimientos con apoyo de nuestros tecnicos y operadores de la Retroexcavadora.

Diego Rtp

Tecnico encargado de mantenimientos
Diego Fernando Restrepo Giraldo
CC. 1.037.368.029



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 130561

No. DE REGISTRO MI708971	MARCA LOVOL	LINEA FR60E2-H	AÑO MODELO 2025
TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	CLASE EXCAVADORA		No. SERIE FTC003RFTS2000101
COLOR(ES) AMARILLO	No. MOTOR H9839A		RODAJE ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
5730 Kg	2660 mm	1950 mm	6090 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
MRM INGENIERIA SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 900.886.407



INFORMACIÓN GENERAL

Ciudad y fecha	Oficina radicación	Número de cotización	Número de póliza	Documento
MEDELLIN, 2025-05-30	4037 - SUCURSAL SAN FERNANDO 3	03047223250410368502	900001197497	EXPEDICIÓN RENOVACIÓN

Vigencia del seguro		Días de vigencia del seguro
Desde las 24:00 horas del 2025-06-02	Hasta las 24:00 horas del 2026-06-02	365

Moneda
COP

ASESOR

Nombre	Código
VALENCIA Y HOYOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	5121

TOMADOR

Nombre	Tipo de identificación	Número de identificación	Tomador principal	Calidad Tomador	Dirección de correspondencia
MRM INGENIERIA S.A.S.	NIT	9008864070	✓	En nombre propio	cra 56 # 9 70

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA

EXCAVADORA FR60E 6 TONELADAS

Dirección	Ciudad	Departamento	Tipo modalidad	Actividad de la máquina/Equipo	Indice variable	Valor total del riesgo
CR 56 # 9 - 70	Medellin	Antioquia	Reposición a Nuevo	Construcción de edificaciones		$205.990.000

ASEGURADO

Nombre	Tipo de identificación	Número de identificación
MRM INGENIERIA S.A.S.	NIT	9008864070

BENEFICIARIO

Nombre	Tipo de identificación	Número de identificación
GRUPO AGENCIAUTO S.A	NIT	8909290520

COBERTURAS

Cobertura	Valor asegurado	Sublímite evento	Deducible
Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga y actos mal intencionados y terrorismo	$205.990.000	100%	20% de la pérdida, mínimo 15 SMMLV
Cobertura básica (todo riesgo daño material)	$205.990.000		10% de la pérdida, mínimo 5 SMMLV
Sustracción con violencia	100%		15% de la pérdida, mínimo 5 SMMLV
Sustracción sin violencia	100%		20% de la pérdida, mínimo 6 SMMLV
Terremoto, temblor o erupción volcánica	$205.990.000		10% de la pérdida, mínimo 3 SMMLV

Accidentes al conductor

Muerte Accidental	Gastos de curación
$50.000.000	$5.000.000

Máquinas / Equipos

Tipo de Equipo	Marca	Modelo	Año de Fabricación	Serial o Número de Motor	Valor de la Máquina
Excavadoras o Retroexcavadoras	FOTON	2025	2024	FTC0033RFTSZ000101	$205.990.000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

VALOR A PAGAR EXCAVADORA FR60E 6 TONELADAS			
Valor a pagar	Valor IVA	VALOR TOTAL A PAGAR	Tasa
$2.168.629	$412.040	$2.580.669	10,5278%o

CONDICIONES PARTÍCULARES

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cláusulas

Cláusula de ubicación de los bienes asegurados

Queda convenido que para efectos del presente seguro, la cobertura para los bienes amparados en la póliza, opera en cualquier lugar donde estén ubicados dentro del Territorio Nacional. En este sentido, la dirección o ubicación descrita en el certificado de seguro, solo se especifica con la finalidad de propiciar controles de orden administrativo. Se acepta que los bienes se trasladen a los diferentes predios asegurados en la póliza, dentro del Territorio Colombiano, con ocasión del desarrollo de la actividad realizada por el asegurado.

Cláusula de limitación y exclusión de sanciones (ofac - lma3100)

No estará cubierta ninguna reclamación cuyo pago dé lugar a que la aseguradora o sus reaseguradores sean sancionados o incurran en cualquier tipo de responsabilidad, por ir en contravía de las sanciones, prohibiciones o restricciones impuestas por las resoluciones de las Naciones Unidas o en contravía de las sanciones comerciales o económicas, leyes o regulaciones de la Unión Europea, Reino Unido o Estados Unidos de América. Sin embargo, en caso de que cese la sanción, prohibición o restricción que impedía el pago, el reasegurador deberá proceder con el mismo, si está permitido legalmente hacerlo en virtud de la sanción correspondiente, ley o reglamento.

Cláusula protección al demerito

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones y cláusulas contenidos en la Póliza, la condición de demerito, calculado como la proporción entre el tiempo de uso y su vida útil, se modificará tomando en consideración las siguientes reglas: 1. Si el tiempo de uso es inferior a 2.000 horas o el cálculo del demerito es inferior al 15%, no se aplicará tal condición. 2. Si el demerito se encuentra entre el 15% y el 75%, el porcentaje calculado será reducido en un 15%. 3. Si el demerito es superior al 75%, el porcentaje calculado corresponderá a un 75%. Esta cobertura no aplicará para equipos que hayan sufrido repotenciaciones o bienes para los cuales no sea posible determinar su tiempo de uso.

Cláusula cobertura para asistencia de orientación jurídica telefónica

SURA por solicitud del Asegurado brindará, vía telefónica, los servicios de Consultoría Legal en cualquiera de las ramas del derecho relacionadas a continuación, quedando excluida de responsabilidad SURA de cualquier determinación que adopte el Asegurado por la consulta jurídica. DERECHO CIVIL: El Asegurado recibirá asesoría jurídica en adquisición de bienes muebles, inmuebles, y sujetos a registro, garantías hipotecarias y prendarias, contratos para remodelación de vivienda, régimen de propiedad horizontal (conjuntos/edificios), responsabilidad civil contractual y extracontractual en eventos de tránsito, celebración, ejecución y finalización de contratos, etc. DERECHO COMERCIAL: El Asegurado recibirá asesoría en actos de comercio, obligaciones y contratos mercantiles, venta y adquisición de establecimientos de comercio, títulos valores, entre otros. DERECHO CONSUMIDOR: El Asegurado recibirá orientación frente a la aplicación del estatuto de protección al consumidor, cumplimiento de garantías de bienes y servicios, publicidad engañosa, entre otros. DERECHO ADMINISTRATIVO: El Asegurado recibirá asesoría en derechos de petición, quejas y trámites ante entidades públicas, acción de tutela y derechos fundamentales, servicios públicos domiciliarios, entre otros. DERECHO POLICIVO: El Asegurado recibirá asesoría en reclamaciones ante autoridades de policía, impugnación de comparendos, obtención de permisos para funcionamiento de negocios entre otros. DERECHO NOTARIAL: El Asegurado recibirá orientación frente a trámites de documentos ante las notarías tales como sucesiones, matrimonio, registros del estado civil y su corrección, declaraciones extrajudiciales, cancelación de gravámenes a la propiedad, tradición de bienes sujetos a registro, entre otros. DERECHO FAMILIAR: El Asegurado recibirá orientación en régimen legal del matrimonio, régimen económico, afectaciones al patrimonio de familia, patria potestad, custodia, sucesiones con o sin testamento, entre otros. DERECHO LABORAL: El Asegurado podrá recibir orientación en la contratación de empleados domésticos, liquidaciones, modalidades de vinculación laboral, invalidez, incapacidades, pensiones. PROCESO DE PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO: SURA recibirá solicitudes directamente desde el #888, siendo éste el único autorizado para la activación de asistencias. La atención de los servicios estará condicionada a lo siguiente: 1. La cobertura está limitada a un total de 2 servicios o eventos durante la vigencia del seguro. 2. Los usuarios podrán acceder al servicio las 24 horas del día los 7 días de la semana, 365 días del año. 3. El tiempo máximo en línea será de 60 minutos por evento. 4. Se podrá brindar la asistencia en cualquier ciudad siempre y cuando se tenga recepción de las llamadas telefónicas. 2. La línea de Asistencia de SURA recibirá la llamada, solicitando los siguientes datos al usuario: Nombre y Apellidos. Ciudad. Identificar aseguradora, cliente y plan. (número de póliza). Teléfonos de contacto. Preferencia de horario de atención. RESPONSABILIDAD: SURA será responsable por la prestación de los servicios convenidos, pero deja expresa constancia que este amparo ES DE MEDIO Y NO DE RESULTADOS, por lo cual el Asegurado acepta que SURA no será responsable de los resultados de las acciones emprendidas por él o por las personas que él autorice, con ocasión de la asesoría recibida.

Exclusiones

Toda clase de equipos cuya actividad este directamente relacionada a la operación en gaseoductos, poliductos y oleoductos.

Toda clase de equipos cuya actividad este directamente relacionada a la operación en gaseoductos, poliductos y oleoductos.

Daños o pérdidas materiales ocurridos a todo tipo de vehículos

Daños o pérdidas materiales ocurridos a todo tipo de vehículos.

Daños o pérdidas materiales ocurridas a los equipos por no encontrarse a cargo de una persona o empresa responsable por su seguridad.

Daños o pérdidas materiales ocurridas a los equipos por no encontrarse a cargo de una persona o empresa responsable por su seguridad.

Maquinaria asegurada que no cuente con extintores manuales en sus ubicaciones y/o frentes de obra.

Maquinaria asegurada que no cuente con extintores manuales en sus ubicaciones y/o frentes de obra.

Cualquier reclamación relacionada directa o indirectamente con un sistema informático

Cualquier reclamación relacionada directa o indirectamente con un sistema informático, hardware, programa, software, datos, almacenamiento de información, microchip, circuito integrado o un dispositivo similar en equipos informáticos y no informáticos (ya sea o no propiedad del titular de la póliza asegurada), están excluidos excepto que se trate de daños materiales en los bienes asegurados que surjan a raíz de uno o varios de los siguientes riesgos: incendio, rayo, explosión, impacto de aeronave o vehículo, caída de objetos, tempestad, granizada, tornado, ciclón, huracán, terremoto, volcán, maremoto, inundación, helada o peso de la nieve, o eventos amparados en la póliza.

Equipos electrónicos fijos, móviles y portátiles

Equipos electrónicos fijos, móviles y portátiles, a menos que estos equipos electrónicos hagan parte del valor asegurado declarado para la maquinaria asegurada, e incorporados de fábrica.

Daños cuya causa u origen se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor de la póliza

Daños cuya causa u origen se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor de la póliza, aun cuando las consecuencias se manifiesten durante la vigencia de la misma.

Cualquier pérdida directa o indirectamente relacionada con levantamiento de cargas en equipos tales como

Cualquier pérdida directa o indirectamente relacionada con levantamiento de cargas en equipos tales como, pero no limitado a grúas, torre grúas, equipos de construcción de puentes, que excedan las capacidades nominales de los equipos establecidos o publicados en manuales, folletos y/o tablas del fabricante o que deben estar adecuadas de acuerdo con las especificaciones originales con alarmas operacionales de sobrecarga e indicadores de velocidad de vientos y dichas alarmas o indicadores no se encuentran en operación.

Todo tipo de responsabilidad civil

Todo tipo de responsabilidad civil

Responsabilidad civil cruzada

Responsabilidad civil cruzada

Daños generados a los bienes objeto de izaje o cargue u operaciones similares realizadas con la maquinaria o equipo

Daños generados a los bienes objeto de izaje o cargue u operaciones similares realizadas con la maquinaria o equipo

Se excluyen tuneladoras (tbm), jumbos, drilling rigs, rozadoras (roadheaders), equipos de transporte y carga de explosivos y similares.

Se excluyen tuneladoras (TBM), jumbos, drilling rigs, rozadoras (roadheaders), equipos de transporte y carga de explosivos y similares.

Daños o el hurto de vehículos automotores.

Daños o el hurto de vehículos automotores.

Transporte de maquinaria o equipo diferentes a los denominados como aplicativos como se describe en el numeral 6 de la presente póliza

Transporte de maquinaria o equipo diferentes a los denominados como aplicativos como se describe en el numeral 6 de la presente póliza

Responsabilidad civil generada por accidente de tránsito

Responsabilidad civil generada por accidente de tránsito

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Responsabilidad civil extracontractual del chasis o vehículo que transporta el aditamento

Responsabilidad civil extracontractual del chasis o vehículo que transporta el aditamento

Movilización por sus propios medios

Movilización por sus propios medios

Perdida de contenidos

Perdida de contenidos

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VALOR A PAGAR MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA	
VALOR A PAGAR GRUPO DE MÁQUINAS	$2.168.629
VALOR TOTAL A PAGAR	$2.168.629
VALOR TOTAL A PAGAR IVA	$412.040
VALOR TOTAL A PAGAR MAS IVA	$2.580.669

VALOR A PAGAR DEL SEGURO

Solución	Valor a pagar	Valor IVA	Valor total a pagar
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA	$2.168.629	$412.040	$2.580.669
VALOR TOTAL	**$2.168.629**	**$412.040**	**$2.580.669**



ASESORES

Código	Nombre del asesor principal	Lider
5121	VALENCIA Y HOYOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	✓

CONDICIONES GENERALES

DATOS DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Solución	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación de la proforma
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA	2020-01-30	13-18	P	012	F-13-18-0032-022

DEFINICIONES

SMMLV

Salario mínimo mensual legal vigente.

SMDLV

Salario mínimo diario legal vigente.


SUBLÍMITE

Todos los valores establecidos como sublimites en cualquiera de las coberturas de esta póliza se entienden incluidosdentro de la suma asegurada o límite máximo de responsabilidad asegurado, y por lo tanto no adicionan valor asegurado.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas deseguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009965 de 2010. "Responsabledo impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención"

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED

CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.



Firma autorizada


SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A



FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1986
MACEO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-ABR-2004 MACEO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
P-0117500-01048976-M-1037368029-20181207 0053502214A 1 9906324622

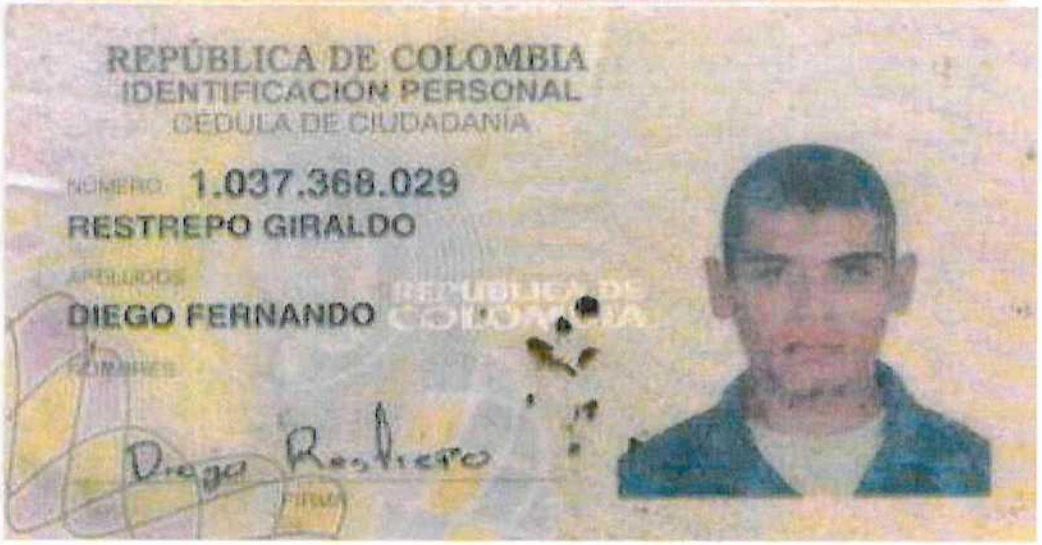

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.037.368.029
RESTREPO GIRALDO
APELLIDOS
DIEGO FERNANDO
NOMBRES
FIRMA

CERTIFICA

El(La) Señor(a) DIEGO FERNANDO RESTREPO GIRALDO identificado(a) con CC 1037368029 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	**01/09/2017**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**VIVA 1A IPS PRADO**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 22 días del mes de mayo del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

nueva eps

CERTIFICA

El(La) Señor(a) DIEGO ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ identificado(a) con TI 1020303703 se encuentra afiliado a la EPS en condición de BENEFICIARIO.

Fecha de Activación de	**01/09/2017**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**E.S.E. HOSPITAL MARCO A. CARDONA**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 22 días del mes de mayo del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

comfama

Radicado: 3986822

Certificado de afiliación

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama

hace constar que:

Diego Fernando Restrepo Giraldo con cédula de ciudadanía 1037368029, se encuentra afiliado(a) a esta Corporación, en calidad de trabajador(a) dependiente, con tarifa de afiliación A, por intermedio de:

Razón social	Tipo Documento	Fecha afiliación	Fecha Ingreso empresa*
Mrm Ingenieria S.A.S	NIT 900886407	2024-05-07	2024-05-07

*Fecha reportada por el empleador al momento de la afiliación a Comfama.

Tiene el siguiente grupo familiar registrado:

Nombre	Parentesco
Diego Alejandro Restrepo Gomez	Hijo

Se expide esta constancia el dia 22 de mayo de 2026 a solicitud del empleador.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN BARRERA HINCAPIÉ
Responsable Afiliaciones

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

DIEGO FERNANDO RESTREPO GIRALDO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.037.368.029**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 22 de Mayo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 - 9

CERTIFICA QUE

DIEGO FERNANDO RESTREPO GIRALDO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 1.037.368.029, ha estado vinculado con las siguientes empresas:

Numero Afiliacion	Empresa	Estado	Fecha de inicio de cobertura	Fecha de finalización
9047698	MRM INGENIERIA S A S	ACTIVO	01/03/2026	

Las fechas de ingreso y finalización reflejadas en este certificado corresponden a las últimas novedades registradas por el empleador.

Para el campo fecha de finalización tenga en cuenta que:

1. Si el estado del trabajador es "RETIRADO", la fecha de finalización corresponde a la fecha de retiro registrada en el sistema.

2. Si el estado del trabajador es "ACTIVO" y existe una fecha de finalización registrada, esta fecha corresponde a la fecha que finalización del contrato o práctica.

3. Si el estado del trabajador es "ACTIVO" y la fecha de finalización está en blanco, se entiende que el contrato es de naturaleza indefinida, por lo que no existe una fecha de finalización establecida.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el 22 dias del mes de mayo de 2026

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

AXA COLPATRIA

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el 22 dias del mes de mayo de 2026

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

DIEGO FERNANDO RESTREPO GIRALDO

Con Cedula de Ciudadania No. 1.037.368.029

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TÉCNICO EN
OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA EXCAVACIÓN

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Puerto Berrío, a los seis (6) días del mes de diciembre de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
FERNANDO CANO GOMEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia
FERNANDO CANO GOMEZ
Subdirector COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL
REGIONAL ANTIOQUIA

29168899 - 06/12/2016
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 950200956283CC1037368029C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

DIEGO FERNANDO RESTREPO GIRALDO

Con Cedula de Ciudadania No. 1.037.368.029

Cursó y aprobó la acción de Formación

OPERAR RETROEXCAVADORA ORUGADA

con una duración de 80 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Maceo, a los dos (2) dias del mes de octubre de dos mil quince (2015)

Firmado Digitalmente por
JUAN GUILLERMO CARVAJAL CORREA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

JUAN GUILLERMO CARVAJAL CORREA
SUBDIRECTOR
COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL
REGIONAL ANTIOQUIA

31083711 - 02/10/2015
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9502001049915CC1037368029C.

Mediclinico San Francisco S.A.S.

¡ Tu Bienestar es nuestro mayor compromiso !

Direccion: Calle 49 45 81 Piso 2 Edificio Cataluna Medellin, Antioquia

REPORTE DE PRUEBA DE LABORATORIO CLINICO

Fecha de Impresión : 20/06/2025 13:33:11

PACIENTE : DIEGO FERNANDO RESTREPO GIRALDO
DIRECCION : CAMPO VALDES

DOCUMENTO : CC - 1037368029 SEXO : MASCULINO

F.NACIMIENTO : 24/03/1996 EDAD : 29 Años - 2 Meses - 27 Dias
TELEFONO : 3192039068

Cod.	Nombre del Analito	Resultado 1	Resultado 2	Resultado 3	Unidades	Ref. Inf.	Ref. Sup.
PERFIL LIPÍDICO			**CONSEC. :**	**485**	**FECHA ADMISION :**	**20/06/2025 13:30**	
					FECHA VALIDACIÓN :	**20/06/2025 13:33**	
PERFIL LIPÍDICO							
P004	COLESTEROL TOTAL	174	Normal		mg/dl	50.00	200.00
P005	COLESTEROL HDL	40	Normal		mg/dl	36.00	70.00
P006	COLESTEROL LDL	134	Normal		mg/dl	0.00	140.00
P007	COLESTEROL VLDL	76	Normal		mg/dl	0.00	50.00
P008	TRIGLICERIDOS	380	Anormal		mg/dl	0.00	150.00

Adriana M/D.

ADRIANA MALDONADO ROZO

Registro Médico : 404-2002



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1037368029

NOMBRE

DIEGO FERNANDO RESTREPO GIRALDO

FECHA DE NACIMIENTO

24-03-1986

RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

29-03-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEyTTO MCPAL SANTA FE ANTIOQUIA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	10-01-2024	PARTICULAR
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	29-03-2032	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	29-03-2028	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07000754452

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-07, 07:36:07 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84801065

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 07/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MRM INGENIERIA SAS	**Nombre Sucursal**	MRM INGENIERIA	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900886407	**Dirección**	CR 56 #9 - 70 EDIFICIO 970 BODEGA 401		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5178297		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	ROJAS MESA DAVID MATEO	**Identificación**	CC 1152188551		
Total Afiliados	68	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000403084	JOHN ALEXIS CARO MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1030405691	ANDRES FELIPE MURILLO ANGULO	01	00		X															0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 758.726	$ 121.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 758.726	$ 30.400	6,960	$ 758.726	$ 52.800	(CCF04) COMFAMA	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100
CC 1030648595	MARIA CAMILA ZAPATA CHAVERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1031014706	MARIA ISABEL NARANJO CEBALLOS	01	00		X															0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 715.332	$ 114.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 715.332	$ 28.700	6,960	$ 715.332	$ 49.800	(CCF04) COMFAMA	$ 715.332	$ 28.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.700
CC 1031132863	BRAYAN GAMBOA PINO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1031504435	ERICA PATRICIA MARTINEZ MORALES	01	00		X															0	16	16	16	16	(231001) COLFONDOS	$ 1.040.483	$ 166.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.040.483	$ 41.700	6,960	$ 1.040.483	$ 72.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.040.483	$ 41.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.400
CC 1031531167	JHON ALEJANDRO GONZALEZ CLAVIJO	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.635	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 1031697830	JAINER JOSE OSPINO OJEDA	01	00	X																0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 933.816	$ 149.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 933.816	$ 37.400	6,960	$ 933.816	$ 65.000	(CCF04) COMFAMA	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.300
CC 1037695903	SHIRLEY ALEJANDRA LEON MONSALVE	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 390.181	$ 62.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 390.181	$ 15.700	6,960	$ 390.181	$ 27.200	(CCF04) COMFAMA	$ 390.181	$ 15.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.100
CC 1017349796	NICOLAS CARO MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1017355354	DAVID FERNANDO MACHADO SANDOVAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1020452536	YULIETH RINCON GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.332.900	$ 533.300	(EPS010) EPS SURA	$ 3.332.900	$ 133.400	6,960	$ 3.332.900	$ 232.000	(CCF04) COMFAMA	$ 3.332.900	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.032.100
CC 1020485521	MANUELA TOBON OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.950.905	$ 312.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.950.905	$ 78.100	6,960	$ 1.950.905	$ 135.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.950.905	$ 78.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 604.200
CC 1023003984	DIVIS JAZBLEIDY DEVIA FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.950.905	$ 312.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.950.905	$ 78.100	6,960	$ 1.950.905	$ 135.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.950.905	$ 78.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 604.200
CC 1025682196	JUAN DAVID LONDOÑO CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1028017435	HERIBERTO HERRERA CABRERA	01	00		X															0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 583.635	$ 93.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 583.635	$ 73.000	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 11.700	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 259.400
CC 1036619578	MARGARITA MARIA VELEZ ANGEL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.546.655	$ 407.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.546.655	$ 101.900	0,522	$ 2.546.655	$ 13.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.546.655	$ 101.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.600
CC 1036656107	DARIO ALEJANDRO POSADA URIBE	01	00	X	X															0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 175.091	$ 26.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	6,960	$ 175.091	$ 12.200	(CCF04) COMFAMA	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.500
CC 1036665380	JUAN PABLO BOLIVAR RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.212.000	$ 354.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.212.000	$ 88.500	6,960	$ 2.212.000	$ 154.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.212.000	$ 88.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 685.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 07/05/2026 | **Empresa NI900886407 MRM INGENIERIA SAS** | **Planilla Nro: 84801065** | **Periodo Cotización: abril de 2026** | **Periodo Servicio: mayo de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDS	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1037368029	DIEGO FERNANDO RESTREPO GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.102.700	$ 336.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.102.700	$ 84.200	6,960	$ 2.102.700	$ 146.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.102.700	$ 84.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 651.300
CC 1037585823	RICARDO ALBERTO MONCADA ROMAN	01	00		X															0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 583.635	$ 93.400	(EPS010) EPS SURA	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 1047372899	LUIS FERNANDO OLEA CAMAÑO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1047392004	CARLOS DAVID ARCINIEGAS SEVERICHE	01	00	X																0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1047489799	LUIS ALFONSO CANTILLO MERCADO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1048044608	JUAN DAVID AYALA HERRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.892.210	$ 462.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.892.210	$ 115.700	6,960	$ 2.892.210	$ 201.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.892.210	$ 115.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 895.500
CC 1066748212	JHON FERNANDO TOVIO CORDOBA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.332.900	$ 533.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.332.900	$ 133.400	6,960	$ 3.332.900	$ 232.000	(CCF04) COMFAMA	$ 3.332.900	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.032.100
CC 1077999963	JANIER ISAA DIAZ PEREA	01	00		X															0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 525.272	$ 84.100	(EPS010) EPS SURA	$ 525.272	$ 21.100	6,960	$ 525.272	$ 36.600	(CCF04) COMFAMA	$ 525.272	$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.900
CC 1086604244	JHON ANDERSON USUGA MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 11222885	EDWIN OSVALDO NUÑEZ GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1127596254	LUIS ANTONIO GOMEZ BERRIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.950.905	$ 312.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.950.905	$ 78.100	6,960	$ 1.950.905	$ 135.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.950.905	$ 78.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 604.200
CC 1128480663	EDDY SANTIAGO ORTIZ RIVERA	01	00		X															0	10	10	10	10	(231001) COLFONDOS	$ 737.334	$ 118.000	(EPS010) EPS SURA	$ 737.334	$ 29.500	6,960	$ 737.334	$ 51.400	(CCF04) COMFAMA	$ 737.334	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.400
CC 1128525459	CARLOS ARMANDO MURILLO CACERES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.403.300	$ 384.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.403.300	$ 96.200	6,960	$ 2.403.300	$ 167.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.403.300	$ 96.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 744.300
CC 1143344435	KUNDRI MONTERO ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.804.000	$ 608.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.804.000	$ 152.200	6,960	$ 3.804.000	$ 264.800	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 3.804.000	$ 152.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.177.900
CC 1152186531	DAVID MATEO ROJAS MESA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.479	$ 352.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.479	$ 88.100	6,960	$ 2.200.479	$ 153.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.479	$ 88.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.500
CC 1152207186	MELISSA ARANGO TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.200.479	$ 352.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.479	$ 88.100	6,960	$ 2.200.479	$ 153.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.479	$ 88.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.500
CC 1152483677	SIMON SANTIAGO ROJAS MESA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.950.905	$ 312.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.950.905	$ 78.100	1,044	$ 1.950.905	$ 20.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.950.905	$ 78.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.800
CC 1152692634	CRISTIAN ARLEY PALACIO PARRA	01	00	X	X															0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 758.726	$ 121.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 758.726	$ 30.400	6,960	$ 758.726	$ 52.900	(CCF04) COMFAMA	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100
CC 1192896403	OSNAIDER RUIZ GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1193092503	BRANDON RIOS QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.282.905	$ 365.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.282.905	$ 91.400	0,522	$ 2.282.905	$ 12.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.282.905	$ 91.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.100
CC 1193403710	FRANKLIN NEGRETE BOLAÑO	01	00		X															0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 525.272	$ 84.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 525.272	$ 21.100	6,960	$ 525.272	$ 36.600	(CCF04) COMFAMA	$ 525.272	$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.900
CC 1234888723	KELLY YOMARA BARROSO GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.950.905	$ 312.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.950.905	$ 78.100	6,960	$ 1.950.905	$ 135.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.950.905	$ 78.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 604.200
CC 1235249430	LEONARDO JOSE LUZARDO PINTO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 15335057	MARCO AURELIO ALVAREZ ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.212.000	$ 354.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.212.000	$ 88.500	6,960	$ 2.212.000	$ 154.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.212.000	$ 88.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 685.000
CC 15349453	LEON FREDY RODRIGUEZ VELEZ	01	00		X															0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 583.635	$ 93.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 15536784	JADER ALBERTO CADAVID SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 3400068	CARLOS ALBERTO LONDOÑO SALDARRIAGA	01	00		X															0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 583.635	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 3413634	ELKIN FERNANDO GALVIS GARCIA	01	00		X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS010) EPS SURA	$ 233.454	$ 9.400	6,960	$ 233.454	$ 16.300	(CCF04) COMFAMA	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 45492709	ANA TERESA PUERTA EDNA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.318.000	$ 370.900	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 2.318.000	$ 92.800	6,960	$ 2.318.000	$ 161.400	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.318.000	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 717.900
CC 70137051	JESUS FERNANDO FORONDA SOTO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 71229721	JUAN BERNARDO JIMENEZ PATIÑO	01	00		X															0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 875.453	$ 140.100	(EPS010) EPS SURA	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF04) COMFAMA	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300
CC 71332756	JORGE HUGO BUSTAMANTE GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.212.000	$ 354.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.212.000	$ 88.500	6,960	$ 2.212.000	$ 154.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.212.000	$ 88.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 685.000
CC 71337533	GUSTAVO ANDRES JIMENEZ PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 71381830	JULIO CESAR CORREA MUÑOZ	01	00		X															0	10	10	10	10	(231001) COLFONDOS	$ 583.635	$ 93.400	(EPS010) EPS SURA	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 71382876	WILMAR ALBERTO TEJADA	01	00		X															0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 583.635	$ 93.400	(EPS010) EPS SURA	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 71452316	JORGE ANTONIO OSPINA AGUDELO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 73561104	JOSE ALBERTO SANCHEZ JIRADO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 77157865	EDUAR SUAREZ RUIZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/05/2026 | Empresa NI900886407 MRM INGENIERIA SAS | Planilla Nro: 84801065 | Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: mayo de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 78714266	RICARDO DE JESUS GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 8870511	ARGEMIRO HERNANDEZ ARIAS	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.300
CC 92447623	FRANCISCO JULIO BERRIO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.300
CC 92671463	YERLIS MANUEL ZABALETA BELTRAN	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.300
CC 98546753	DIDIER LONDOÑO MORENO	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.635	$ 83.400	(EPS010) EPS SURA	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 98592533	JOSE ALEXANDER ZAPATA CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.892.210	$ 462.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.892.210	$ 115.700	6,960	$ 2.892.210	$ 201.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.892.210	$ 115.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 895.500
PT 2363680	LUIS RAMON MUÑOZ DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 4632244	CARLOS EDUARDO RONDON PERNIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.212.000	$ 354.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.212.000	$ 88.500	6,960	$ 2.212.000	$ 154.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.212.000	$ 88.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 685.000
PT 4861963	MARCOS LEON ZAMBRANO CHAVEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.403.300	$ 384.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.403.300	$ 96.200	6,960	$ 2.403.300	$ 167.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.403.300	$ 96.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 744.300
PT 5479607	LUIS EDUARDO GUEDEZ CASTELLANOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 6255325	FRANCISCO JOSE RIVAS PORRAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.212.000	$ 354.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.212.000	$ 88.500	6,960	$ 2.212.000	$ 154.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.212.000	$ 88.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 685.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 100.595.270	$ 100.595.270	$ 100.595.270	$ 100.595.270	$ 16.098.500	$ 4.077.400	$ 6.578.000	$ 4.027.800	$ 11.700	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.811.000	$ 45.000	$ 30.856.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-063
		Versión: 01
	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 2/01/2023

Nombre: YESSID STIVEN VILLADA MARULANDA

Cedula: 1040037282

Cargo: AYUDANTE

Fecha de entrega EPI	EPI Entregado	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? SI	NO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
06-05-26	Casco de seguridad		x	Nuevo	Yessid St. villada
06-05-26	Monogafas		x	Nuevo	Yessid St. villada
06-05-26	Tapa oídos de inserción		x	Nuevo	Yessid St. villada
06-05-26	Guantes de carnaza		x	Nuevo	Yessid St. villada

FIRMA DE QUIEN ENTREGA _____

Con mi firma dejo constancia que recibí capacitación y comprendí las instrucciones dadas sobre el uso, conservación y mantenimiento del elemento de protección personal y me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, de igual manera me comprometo a informar a mi jefe inmediato o al personal de seguridad y salud en el trabajo la requisición o cambio de ellos.

Autorizo que se me descuenten de la nómina el EPP que sea entregado en reposición por pérdida

Powered by CamScanner

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-063
		Versión: 01
	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 2/01/2023

Nombre: Rafael Antonio Avila Viloria

Cedula: 1.003.459.168

Cargo: Ayudante.

Fecha de entrega EPI	EPI Entregado	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? SI	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? NO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
12-05-26	Casco de seguridad		x	Nuevo	x ROCFOVE1
12-05-26	Monogafas		x	Nuevo	x ROCFOVE1
12-05-26	Tapa oídos de inserción		x	Nuevo	x ROCFOVE1
12-05-26	Guantes de carnaza		x	Nuevo	x ROCFOVE1

FIRMA DE QUIEN ENTREGA _____

Con mi firma dejo constancia que recibí capacitación y comprendí las instrucciones dadas sobre el uso, conservación y mantenimiento del elemento de protección personal y me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, de igual manera me comprometo a informar a mi jefe inmediato o al personal de seguridad y salud en el trabajo la requisición o cambio de ellos.

Autorizo que se me descuenten de la nómina el EPP que sea entregado en reposición por pérdida

CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-063
		Versión: 01
	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 2/01/2023

Nombre: MACHAO ALEJANDRO URIANA

Cedula: 1006917302

Cargo: OFICIAL

Fecha de entrega EPP	EPP Entregado	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? SI	NO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
08-05-26	Casco de seguridad		x	Nuevo	M Alejandro
08-05-26	Monogafas		x	Nuevo	M Alejandro
08-05-26	Tapa oídos de inserción		x	Nuevo	M Alejandro
08-05-26	Guantes de carnaza		x	Nuevo	M Alejandro

FIRMA DE QUIEN ENTREGA Danny Buitrago

Con mi firma dejo constancia que recibí capacitación y comprendí las instrucciones dadas sobre el uso, conservación y mantenimiento del elemento de protección personal y me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, de igual manera me comprometo a informar a mi jefe inmediato o al personal de seguridad y salud en el trabajo la requisición o cambio de ellos.

Autorizo que se me descuenten de la nómina el EPP que sea entregado en reposición por pérdida

Powered by CamScanner

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-063
		Versión: 01
	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 2/01/2023

Nombre: JUAN PABLO GARCIA CASTAÑEDA

Cedula: 1040182187

Cargo: AYUDANTE

Fecha de entrega EPI	EPI Entregado	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? SI	NO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
07-05-26	Casco de seguridad		x	Nuevo	Juan pablo GG
07-05-26	Monogafas		x	Nuevo	Juan pablo GG
07-05-26	Tapa oídos de inserción		x	Nuevo	Juan pablo GG
07-05-26	Guantes de carnaza		x	Nuevo	Juan pablo GG

FIRMA DE QUIEN ENTREGA Danny Bent

Con mi firma dejo constancia que recibí capacitación y comprendí las instrucciones dadas sobre el uso, conservación y mantenimiento del elemento de protección personal y me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, de igual manera me comprometo a informar a mi jefe inmediato o al personal de seguridad y salud en el trabajo la requisición o cambio de ellos.

Autorizo que se me descuenten de la nómina el EPP que sea entregado en reposición por pérdida

Powered by CamScanner

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-063
		Versión: 01
	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 2/01/2023

Nombre: JHOAN ALEXIS RAMIREZ TAMAYO

Cedula: 1040739104

Cargo: AYUDANTE

Fecha de entrega EPI	EPI Entregado	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? SI	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? NO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
07-05-26	Casco de seguridad		x	Nuevo	Jhoan Alexis Ramirez
07-05-26	Monogafas		x	Nuevo	Jhoan Ramirez
07-05-26	Tapa oídos de inserción		x	Nuevo	Jhoan Ramirez
07-05-26	Guantes de carnaza		x	Nuevo	Jhoan Ramirez

FIRMA DE QUIEN ENTREGA _____

Con mi firma dejo constancia que recibí capacitación y comprendí las instrucciones dadas sobre el uso, conservación y mantenimiento del elemento de protección personal y me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, de igual manera me comprometo a informar a mi jefe inmediato o al personal de seguridad y salud en el trabajo la requisición o cambio de ellos.

Autorizo que se me descuenten de la nómina el EPP que sea entregado en reposición por pérdida

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-063
		Versión: 01
	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 2/01/2023

Nombre: DIEGO LEON PEREZ CA RDONA

Cedula: 1.040.744.742

Cargo: AYUDANTE

Fecha de entrega EPI	EPI Entregado	¿REPOSICIÓN POR PERDIDA? SI	¿REPOSICIÓN POR PERDIDA? NO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
07-05-26	Casco de seguridad		x	Nuevo	DIEGO LEON PEREZ C..
07-05-26	Monogafas		x	Nuevo	DIEGO LEON PEREZ C..
07-05-26	Tapa oídos de inserción		x	Nuevo	DIEGO LEON PEREZ C..
07-05-26	Guantes de carnaza		x	Nuevo	DIEGO LEON PEREZ C.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA _____

Con mi firma dejo constancia que recibí capacitación y comprendí las instrucciones dadas sobre el uso, conservación y mantenimiento del elemento de protección personal y me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, de igual manera me comprometo a informar a mi jefe inmediato o al personal de seguridad y salud en el trabajo la requisición o cambio de ellos.

Autorizo que se me descuenten de la nómina el EPP que sea entregado en reposición por pérdida

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-063
		Versión: 01
	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 2/01/2023

Nombre: Camilo Andres Zamora M.

Cedula: 1.047.405.964

Cargo: Ayudante.

Fecha de entrega EPI	EPI Entregado	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? SI	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? NO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
12-05-26	Casco de seguridad		x	Nuevo	Camilo
12-05-26	Monogafas		x	Nuevo	Camilo
12-05-26	Tapa oídos de inserción		x	Nuevo	Camilo
12-05-26	Guantes de carnaza		x	Nuevo	Camilo

FIRMA DE QUIEN ENTREGA _____

Con mi firma dejo constancia que recibí capacitación y comprendí las instrucciones dadas sobre el uso, conservación y mantenimiento del elemento de protección personal y me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, de igual manera me comprometo a informar a mi jefe inmediato o al personal de seguridad y salud en el trabajo la requisición o cambio de ellos.

Autorizo que se me descuenten de la nómina el EPP que sea entregado en reposición por pérdida

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-063
		Versión: 01
	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 2/01/2023

Nombre: ALVARO ENRIQUE URIANA

Cedula: 1006917300

Cargo: OFICIAL

Fecha de entrega EPI	EPI Entregado	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? SI	NO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
30/04/26	Casco de seguridad		x	Nuevo	Casco Alvaro U.
30/04/26	Monogafas		x	Nuevo	Gafas Alvaro U.
30/04/26	Tapa oídos de inserción		x	Nuevo	Alvaro U.
30/04/26	Guantes de carnaza		x	Nuevo	Alvaro U.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA _____

Con mi firma dejo constancia que recibí capacitación y comprendí las instrucciones dadas sobre el uso, conservación y mantenimiento del elemento de protección personal y me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, de igual manera me comprometo a informar a mi jefe inmediato o al personal de seguridad y salud en el trabajo la requisición o cambio de ellos.

Autorizo que se me descuenten de la nómina el EPP que sea entregado en reposición por pérdida

Powered by CamScanner

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-063
		Versión: 01
	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 2/01/2023

Nombre: SANTIAGO JOSE ROMERO ROCA

Cedula: 61717166

Cargo: AYUDANTE

Fecha de entrega EPI	EPI Entregado	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? SI	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? NO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
28/04/26	Casco de seguridad		x	Nuevo	
28/04/26	Monogafas		x	Nuevo	
28/04/26	Tapa oídos de inserción		x	Nuevo	
28/04/26	Guantes de carnaza		x	Nuevo	

FIRMA DE QUIEN ENTREGA Deidy Bitar T

Con mi firma dejo constancia que recibí capacitación y comprendí las instrucciones dadas sobre el uso, conservación y mantenimiento del elemento de protección personal y me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, de igual manera me comprometo a informar a mi jefe inmediato o al personal de seguridad y salud en el trabajo la requisición o cambio de ellos.

Autorizo que se me descuenten de la nómina el EPP que sea entregado en reposición por pérdida

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-063 Versión: 01
	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 2/01/2023

Nombre: RICHAR CASTRO URIBE

Cedula: 1040041535

Cargo: AYUDANTE

Fecha de entrega EPI	EPI Entregado	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? SI	NO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
23/04/26	Casco de seguridad		x	Nuevo	
23/04/26	Monogafas		x	Nuevo	
23/04/26	Tapa oídos de inserción		x	Nuevo	
23/04/26	Guantes de carnaza		x	Nuevo	

FIRMA DE QUIEN ENTREGA Daisy Botero T

Con mi firma dejo constancia que recibí capacitación y comprendí las instrucciones dadas sobre el uso, conservación y mantenimiento del elemento de protección personal y me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, de igual manera me comprometo a informar a mi jefe inmediato o al personal de seguridad y salud en el trabajo la requisición o cambio de ellos.

Autorizo que se me descuenten de la nómina el EPP que sea entregado en reposición por pérdida

Powered by CamScanner

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-063 Versión: 01
	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 2/01/2023

Nombre: EDWIN JARAMILLO JARAMILLO

Cedula: 1048044702

Cargo: INSTALACION ELECTRICA

Fecha de entrega EPI	EPI Entregado	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? SI	NO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
22-04/26	Casco de seguridad		x	Nuevo	
22-04/26	Monogafas		x	Nuevo	
22-04/26	Tapa oídos de inserción		x	Nuevo	
22-04/26	Guantes de carnaza		x	Nuevo	

FIRMA DE QUIEN ENTREGA _____

Con mi firma dejo constancia que recibí capacitación y comprendí las instrucciones dadas sobre el uso, conservación y mantenimiento del elemento de protección personal y me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, de igual manera me comprometo a informar a mi jefe inmediato o al personal de seguridad y salud en el trabajo la requisición o cambio de ellos.

Autorizo que se me descuenten de la nómina el EPP que sea entregado en reposición por pérdida

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-063
		Versión: 01
	FORMATO ENTREGA Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	Fecha: 2/01/2023

Nombre: BRAYAN SEBASTIAN CORREA ALZATE

Cedula: 11039096173

Cargo: AYUDANTE

Fecha de entrega EPI	EPI Entregado	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? SI	¿REPOSICIÓN POR PÉRDIDA? NO	OBSERVACIONES	FIRMA DEL EMPLEADO
24/04/26	Casco de seguridad		x	Nuevo	Brayan
24/04/26	Monogafas		x	Nuevo	Brayan
24/04/26	Tapa oídos de inserción		x	Nuevo	Brayan
24/04/26	Guantes de carnaza		x	Nuevo	Brayan

FIRMA DE QUIEN ENTREGA _____

Con mi firma dejo constancia que recibí capacitación y comprendí las instrucciones dadas sobre el uso, conservación y mantenimiento del elemento de protección personal y me comprometo a utilizar durante mi labor los implementos de protección personal y seguridad industrial que me han sido asignados, de igual manera me comprometo a informar a mi jefe inmediato o al personal de seguridad y salud en el trabajo la requisición o cambio de ellos.

Autorizo que se me descuenten de la nómina el EPP que sea entregado en reposición por pérdida

Powered by CamScanner

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-078
		Versión: 001
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION PERSONAL	Fecha: 02/01/2023

Itagüí – Antioquia 06 de mayo de 2026

Asunto: Entrega de Dotación

Por medio del presente documento se dispone la entrega de dotación

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERSONAL		
NOMBRE DEL EMPLEADO: YESSID STIVEN VILLADA MARULANDA		
FECHA DE ENTREGA: 06 de mayo de 2026		
ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**TALLA**
BOTAS	1	41
PANTALON	1	32
CAMISA	1	L

EMPLEADO

Como constancia de lo anterior.

Conforme a lo indicado por el artículo 230 del código sustantivo del trabajo- CST, Recibo a la fecha, la dotación como (botas platineras, pantalón azul, camibuso y bota de caucho si lo requiere) que son de uso personal para cada empleado lo cual se le hace entrega por parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa

en caso de terminación del contrato el trabajador se compromete hacer entrega parcial de todos los elementos suministrados por el contratante según las políticas internas de RM CONCRETAR S.A.S.

ENTREGADO POR:

FIRMA DEL EMPLEADO:

C.C. 1040037232

Powered by CamScanner

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-078
		Versión: 001
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION PERSONAL	Fecha: 02/01/2023

Itagüí – Antioquia 12 de mayo de 2026

Asunto: Entrega de Dotación

Por medio del presente documento se dispone la entrega de dotación

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERSONAL		
NOMBRE DEL EMPLEADO: RAFAEL ANTONIO AVILA VILORIA		
FECHA DE ENTREGA: 12 de mayo de 2026		
ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**TALLA**
BOTAS	1	41
PANTALON	2	32
CAMISA	2	L

EMPLEADO

Como constancia de lo anterior.

Conforme a lo indicado por el artículo 230 del código sustantivo del trabajo- CST, Recibo a la fecha, la dotación como (botas platineras, pantalón azul, camibuso y bota de caucho si lo requiere) que son de uso personal para cada empleado lo cual se le hace entrega por parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa

en caso de terminación del contrato el trabajador se compromete hacer entrega parcial de todos los elementos suministrados por el contratante según las políticas internas de RM CONCRETAR S.A.S.

ENTREGADO POR:

FIRMA DEL EMPLEADO:

C.C.

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-078
		Versión: 001
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION PERSONAL	Fecha: 02/01/2023

Itagüi – Antioquia 08 de mayo de 2026

Asunto: Entrega de Dotación

Por medio del presente documento se dispone la entrega de dotación

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERSONAL		
NOMBRE DEL EMPLEADO: MACHAO ALEJANDRO URIANA		
FECHA DE ENTREGA: 08 de mayo de 2026		
ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**TALLA**
BOTAS	1	40
PANTALON	2	32
CAMISA	2	L

EMPLEADO

Como constancia de lo anterior.

Conforme a lo indicado por el artículo 230 del código sustantivo del trabajo- CST, Recibo a la fecha, la dotación como (botas platineras, pantalón azul, camibuso y bota de caucho si lo requiere) que son de uso personal para cada empleado lo cual se le hace entrega por parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa

en caso de terminación del contrato el trabajador se compromete hacer entrega parcial de todos los elementos suministrados por el contratante según las políticas internas de RM CONCRETAR S.A.S.

ENTREGADO POR:

Danny Bedoya

FIRMA DEL EMPLEADO:

K M. Machao M

C.C. 1006917302

Powered by CamScanner

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-078
		Versión: 001
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION PERSONAL	Fecha: 02/01/2023

Itagüí – Antioquia 07 de mayo de 2026

Asunto: Entrega de Dotación

Por medio del presente documento se dispone la entrega de dotación

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERSONAL		
NOMBRE DEL EMPLEADO: JUAN PABLO GARCIA CASTAÑEDA		
FECHA DE ENTREGA: 07 de mayo de 2026		
ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**TALLA**
BOTAS	1	40
PANTALON	2	38
CAMISA	2	XL

EMPLEADO

Como constancia de lo anterior.

Conforme a lo indicado por el artículo 230 del código sustantivo del trabajo- CST, Recibo a la fecha, la dotación como (botas platineras, pantalón azul, camibuso y bota de caucho si lo requiere) que son de uso personal para cada empleado lo cual se le hace entrega por parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa

en caso de terminación del contrato el trabajador se compromete hacer entrega parcial de todos los elementos suministrados por el contratante según las políticas internas de RM CONCRETAR S.A.S.

ENTREGADO POR:

FIRMA DEL EMPLEADO:

C.C.

Powered by CamScanner

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-078
		Versión: 001
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION PERSONAL	Fecha: 02/01/2023

Itagüí – Antioquia 07 de mayo de 2026

Asunto: Entrega de Dotación

Por medio del presente documento se dispone la entrega de dotación

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERSONAL		
NOMBRE DEL EMPLEADO: JHOAN ALEXIS RAMIREZ TAMAYO		
FECHA DE ENTREGA: 07 de mayo de 2026		
ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**TALLA**
BOTAS	1	40
PANTALON	2	32
CAMISA	2	XL

EMPLEADO

Como constancia de lo anterior.

Conforme a lo indicado por el artículo 230 del código sustantivo del trabajo- CST, Recibo a la fecha, la dotación como (botas platineras, pantalón azul, camibuso y bota de caucho si lo requiere) que son de uso personal para cada empleado lo cual se le hace entrega por parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa

en caso de terminación del contrato el trabajador se compromete hacer entrega parcial de todos los elementos suministrados por el contratante según las políticas internas de RM CONCRETAR S.A.S.

ENTREGADO POR:

FIRMA DEL EMPLEADO:

Jhoan Alexis Ramirez

C.C. 1040739104

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-078
		Versión: 001
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION PERSONAL	Fecha: 02/01/2023

Itagüí – Antioquia 07 de mayo de 2026

Asunto: Entrega de Dotación

Por medio del presente documento se dispone la entrega de dotación

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERSONAL		
NOMBRE DEL EMPLEADO: DIEGO LEON PEREZ CA RDONA		
FECHA DE ENTREGA: 07 de mayo de 2026		
ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**TALLA**
BOTAS	1	44
PANTALON	1	32
CAMISA	2	XL

EMPLEADO

Como constancia de lo anterior.

Conforme a lo indicado por el artículo 230 del código sustantivo del trabajo- CST, Recibo a la fecha, la dotación como (botas platineras, pantalón azul, camibuso y bota de caucho si lo requiere) que son de uso personal para cada empleado lo cual se le hace entrega por parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa

en caso de terminación del contrato el trabajador se compromete hacer entrega parcial de todos los elementos suministrados por el contratante según las políticas internas de RM CONCRETAR S.A.S.

ENTREGADO POR:

FIRMA DEL EMPLEADO:

DIEGO LEON PEREZ C...

C.C. 1040744747

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-078
		Versión: 001
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION PERSONAL	Fecha: 02/01/2023

Itagüí – Antioquia 12 de mayo de 2026

Asunto: Entrega de Dotación

Por medio del presente documento se dispone la entrega de dotación

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERSONAL		
NOMBRE DEL EMPLEADO: CAMILO ANDRES ZAMORA MORTEJO		
FECHA DE ENTREGA: 12 de mayo de 2026		
ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**TALLA**
BOTAS	1	41
PANTALON	2	32
CAMISA	2	L

EMPLEADO

Como constancia de lo anterior.

Conforme a lo indicado por el artículo 230 del código sustantivo del trabajo- CST, Recibo a la fecha, la dotación como (botas platineras, pantalón azul, camibuso y bota de caucho si lo requiere) que son de uso personal para cada empleado lo cual se le hace entrega por parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa

en caso de terminación del contrato el trabajador se compromete hacer entrega parcial de todos los elementos suministrados por el contratante según las políticas internas de RM CONCRETAR S.A.S.

ENTREGADO POR:

Daryl Botero

FIRMA DEL EMPLEADO:

Camilo Zamora

C.C. 1.047.405.964

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-078
		Versión: 001
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION PERSONAL	Fecha: 02/01/2023

Itagüí – Antioquia 30 de abril de 2026

Asunto: Entrega de Dotación

Por medio del presente documento se dispone la entrega de dotación

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERSONAL		
NOMBRE DEL EMPLEADO: ALVARO ENRIQUE URIANA		
FECHA DE ENTREGA: 30 de abril de 2026		
ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**TALLA**
BOTAS	1	42
PANTALON	2	30
CAMISA	2	X1

EMPLEADO

Como constancia de lo anterior.

Conforme a lo indicado por el artículo 230 del código sustantivo del trabajo- CST, Recibo a la fecha, la dotación como (botas platineras, pantalón azul, camibuso y bota de caucho si lo requiere) que son de uso personal para cada empleado lo cual se le hace entrega por parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa

en caso de terminación del contrato el trabajador se compromete hacer entrega parcial de todos los elementos suministrados por el contratante según las políticas internas de RM CONCRETAR S.A.S.

ENTREGADO POR:

FIRMA DEL EMPLEADO:

x Alvaro U.

C.C. x 1006917300

Powered by CamScanner

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-078
		Versión: 001
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION PERSONAL	Fecha: 02/01/2023

Itagüí – Antioquia 27 de abril de 2026

Asunto: Entrega de Dotación

Por medio del presente documento se dispone la entrega de dotación

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERSONAL		
NOMBRE DEL EMPLEADO: SANTIAGO JOSE ROMERO ROCA		
FECHA DE ENTREGA: 27 de abril de 2026		
ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**TALLA**
BOTAS	1	44
PANTALON	2	36
CAMISA	2	XL

EMPLEADO

Como constancia de lo anterior.

Conforme a lo indicado por el artículo 230 del código sustantivo del trabajo- CST, Recibo a la fecha, la dotación como (botas platineras, pantalón azul, camibuso y bota de caucho si lo requiere) que son de uso personal para cada empleado lo cual se le hace entrega por parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa

en caso de terminación del contrato el trabajador se compromete hacer entrega parcial de todos los elementos suministrados por el contratante según las políticas internas de RM CONCRETAR S.A.S.

ENTREGADO POR:

FIRMA DEL EMPLEADO:

C.C.K 617-17 16

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-078
		Versión: 001
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION PERSONAL	Fecha: 02/01/2023

Itagüí – Antioquia 23 de abril de 2026

Asunto: Entrega de Dotación

Por medio del presente documento se dispone la entrega de dotación

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERSONAL		
NOMBRE DEL EMPLEADO: RICHAR CASTRO URIBE		
FECHA DE ENTREGA: 23 de abril de 2026		
ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**TALLA**
BOTAS	1	41
PANTALON	2	32
CAMISA	2	L

EMPLEADO

Como constancia de lo anterior.

Conforme a lo indicado por el artículo 230 del código sustantivo del trabajo- CST, Recibo a la fecha, la dotación como (botas platineras, pantalón azul, camibuso y bota de caucho si lo requiere) que son de uso personal para cada empleado lo cual se le hace entrega por parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa

en caso de terminación del contrato el trabajador se compromete hacer entrega parcial de todos los elementos suministrados por el contratante según las políticas internas de RM CONCRETAR S.A.S.

ENTREGADO POR:

Daisy Bueno T

FIRMA DEL EMPLEADO:

C.C. 1040041535

Powered by CamScanner

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-078
		Versión: 001
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION PERSONAL	Fecha: 02/01/2023

Itagüí – Antioquia 22 de abril de 2026

Asunto: Entrega de Dotación

Por medio del presente documento se dispone la entrega de dotación

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERSONAL		
NOMBRE DEL EMPLEADO: EDWIN ALEXIS JARAMILLO JARAMILLO		
FECHA DE ENTREGA: 22 de abril de 2026		
ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**TALLA**
BOTAS	1	39
PANTALON	2	34
CAMISA	2	M.

EMPLEADO

Como constancia de lo anterior.

Conforme a lo indicado por el artículo 230 del código sustantivo del trabajo- CST, Recibo a la fecha, la dotación como (botas platineras, pantalón azul, camibuso y bota de caucho si lo requiere) que son de uso personal para cada empleado lo cual se le hace entrega por parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa

en caso de terminación del contrato el trabajador se compromete hacer entrega parcial de todos los elementos suministrados por el contratante según las políticas internas de RM CONCRETAR S.A.S.

ENTREGADO POR:

FIRMA DEL EMPLEADO:

C.C. 1.048.044.702.

RM CONCRETAR S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SST-FO-078
		Versión: 001
	FORMATO ENTREGA DE DOTACION PERSONAL	Fecha: 02/01/2023

Itagüí – Antioquia 24 de abril de 2026

Asunto: Entrega de Dotación

Por medio del presente documento se dispone la entrega de dotación

FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION PERSONAL		
NOMBRE DEL EMPLEADO: BRAYAN SEBASTIAN CORREA ALZATE		
FECHA DE ENTREGA: 24 de abril de 2026		
ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**TALLA**
BOTAS	1	39
PANTALON	2	32
CAMISA	2	L

EMPLEADO

Como constancia de lo anterior.

Conforme a lo indicado por el artículo 230 del código sustantivo del trabajo- CST, Recibo a la fecha, la dotación como (botas platineras, pantalón azul, camibuso y bota de caucho si lo requiere) que son de uso personal para cada empleado lo cual se le hace entrega por parte de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa

en caso de terminación del contrato el trabajador se compromete hacer entrega parcial de todos los elementos suministrados por el contratante según las políticas internas de RM CONCRETAR S.A.S.

ENTREGADO POR:

Deisy Botero T.

FIRMA DEL EMPLEADO:

Brayan

C.C. 1039096173

Powered by CamScanner

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

CEMENTO HIDRÁULICO GRIS, TIPO UG Y ART

Fabricado por **EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S.**, en la **Carrera 43A No. 14-57 Piso 6 Edificio San Francisco, Medellín, Autopista Medellin Bogota 600 m adelante del puente Rioclaro Sonson, Antioquia, Colombia**, identificada con **número de NIT 900907364.**

Manufactured by **EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S.**, in the **Carrera 43A No. 14-57 Piso 6 Edificio San Francisco, Medellin, Autopista Medellin Bogota 600 m adelante del puente Rioclaro Sonson, Antioquia, Colombia**, identified with **NIT number 900907364.**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 121 (2021)

Especificación de Desempeño para Cemento Hidráulico
Performance Specification for Hydraulic Cement.

SECTOR ICS 91.100.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER945380
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2022-08-05	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:		**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2028-08-04

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANSI ACCREDITED
ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

Fecha: 27-may-26
Norma: NTC-382/2295

Consecutivo 9.607
Referencia: TUBO PRESION ACAMP RDE 21 4"
Lote de Fabricación: 30000088447

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
DIAMETRO EXTERIOR	mm	NTC-3358	114,07 - 114,53	114,40
OVALAMIENTO	mm	NTC-3358	<= 2,54	0,38
ESPESOR DE PARED MINIMO	mm	NTC-3358	5,44 - 6,10	5,69
LONGITUD DEL TUBO	mm	NTC-3358	6000 - 6012	6009,58
ESPESOR DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	>= 5,44	6,22
ESPESOR DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	>= 5,99	6,27
DIAMETRO INT DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	115,00 - 117,00	116,58
DIAMETRO INT DEL ANILLO	mm	NTC-3358	133,80 - 135,30	135,17
DIAMETRO INT DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	115,00 - 117,00	115,53
LONGITUD DE LA CAMPANA	mm	NTC-3358	>= 130,00	156,50
LONGITUD DE LA PESTAÑA	mm	NTC-3358	>= 24,00	41,50
REGRESIÓN ACELERADA (1 h)	psi	NTC-5494	0 - 2000	616,33
PRESION DE ROTURA	psi	NTC-3579	>= 630	640,91

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas

CERTIFICADO DE CALIDAD

Laboratorio de Ensayos de PVC Gerfor S.A.S

Fecha: 27-may-26
Norma: NTC-382/2295

Consecutivo 9.607
Referencia: TUBO PRESION ACAMP RDE 21 4"
Lote de Fabricación: 30000088447

REQUISITO	UN. MEDIDA	METODO DE ENSAYO	ESPECIFICACION	RESULTADO
CALIDAD DE EXTRUSION	MINUTOS	NTC-2983	NO DEBE PRESENTAR DELAMINACION O DESMORONAMIENTO	CUMPLE
RESISTENCIA AL IMPACTO	JULIOS	NTC-1125	122	CUMPLE
APLASTAMIENTO TRANSVERSAL	%	NTC-3254	60% DEL DIAMETRO EXTERNO	CUMPLE
ATOXICIDAD	%	NTC-539	APTO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	Psi	NTC-2295	100 PSI X 1 HORA / 500 PSI X 1 HORA / 630 PSI X 1 MINUTO	CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA JUNTA	InHg	NTC-2295	22 InHg X 1 HORA	CUMPLE
ROTULADO	N/A	NTC-382	GERFOR IND. COL. PVC PRESION AGUA POTABLE 4" - 114mm RDE21 PT 1,38MPa - 200psi CALIDAD CERTIFICADA N ICONTEC NTC 382/2295 - REGLAMENTO TÉCNICO N Res. 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado corresponden únicamente a la muestra evaluada.
Este certificado no podrá ser reproducido ni de forma parcial ni total sin la autorización de PVC Gerfor S.A.S
Muestreo realizado según la NTC 2859-1. Vigente

Revisó:

Juan Ramos

Juan Manuel Ramos Morales
Coordinador De Laboratorio PVC Gerfor

Aprobó:

Jenny Rodriguez

Jenny Andrea Rodriguez Gutierrez
Jefe de Laboratorio PVC Gerfor

NIT. 8605025091
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
COTA - CUNDINAMARCA Colombia
PBX: 8776820 FAX: 8776849
www.gerfor.com

Colombia corre por nuestras venas
