INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.CAR-CM-1439-2025

OBJETO:
REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

CONTRATANTE
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025

INTERVENTOR
TECHNE S.A.S

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN					
VERSIÓN	**FECHA**	**OBJETO**	**ELABORADO**	**REVISADO**	**APROBADO**
01	01-02-2026 AL 28-02-2026	INFORME MENSUAL	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS 7
3.1 CONTRATO DE OBRA 7
3.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9
4. ASPECTOS TÉCNICOS 11
4.1 RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO 11
- Programación de obra 11
4.2 VISITAS REALIZADAS EN ENTORNOS 13
- Municipio de Apulo. 14
- Municipio de Ricaurte. 23
- Municipio de Zipaquirá. 43
- Municipio de Guaduas. 43
- Municipio de Útica. 45
- Municipio de La Mesa. 55
- Municipio de Bituima. 64
- Municipio de Quipile. 83
- Municipio de Caldas. 88
- Municipio de Fúquene. 92
- Municipio de Anolaima. 96
4.3 SEGUIMIENTO TÉCNICO INTERVENTORÍA 110
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 118
5.1 ACTAS DE COMITÉ 118
5.2 CONTROL DE CORRESPONDENCIA 122
5.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERVENTORÍA. 147
6. SEGUIMIENTO AL PLAN HSEQ DE OBRA E INTERVENTORÍA 152
6.1 SOCIALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PLAN HSEQ 152
6.2 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRA 152
6.3 GESTIÓN AMBIENTAL 152
6.4 ACCIDENTES E INCIDENTE 152
6.5 CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 152
6.6 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA 152
6.7 PERSONAL DE INTERVENTORÍA 152
7. ASPECTOS FINANCIEROS 154
7.1 CONTRATO DE OBRA 154
7.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 154
7.3 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 155
7.4 ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 155
7.5 SEGUIMIENTO FINANCIERO INTERVENTORÍA. 156
8. ASPECTOS JURÍDICOS 159
8.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 159

- Pólizas contrato de obra 159

8.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 160

- Pólizas contrato de interventoría 160

10. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA 162

10 CONCLUSIONES 171

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Datos del Contrato de Obra 7
Tabla 2 Profesionales contrato de obra 8
Tabla 3 Datos del contrato de interventoría 9
Tabla 4 Profesionales del contrato de interventoría 10
Tabla 5 Cuadro de Avance Ejecutado 11
Tabla 6 Programado vs Ejecutado 11
Tabla 7 Alcances Municipio de Apulo 14
Tabla 8 Municipio de Apulo – Alcaldía Municipal 15
Tabla 9 Municipio de Apulo – Polideportivo 16
Tabla 10 Municipio de Apulo – Salón Taekwondo 18
Tabla 11 Municipio de Apulo – Estación Bomberos 19
Tabla 12 Municipio de Apulo – Casa Adulto Mayor 20
Tabla 13 Municipio de Apulo – I.E.D Antonio Nariño Sede Chicago 22
Tabla 14 Municipio de Ricaurte – I.E.D Manuel Sur 24
Tabla 15 Municipio de Ricaurte – Alcaldía 27
Tabla 16 Municipio de Ricaurte – GOES 30
Tabla 17 Municipio de Ricaurte – Inspección de Policía 33
Tabla 18 Municipio de Ricaurte – Cundeportes 34
Tabla 19 Municipio de Ricaurte – Pacande 39
Tabla 20 Municipio de Zipaquirá – Reconocimiento de Entornos 43
Tabla 21 Municipio de Guaduas – Escuela Rural Ceniceros 44
Tabla 22. Municipio de Útica – I.E.D Manuel Murillo Toro 46
Tabla 23. Municipio de Útica – Jardín Infantil Los Bulliciosos 48
Tabla 24. Municipio de Útica – Alcaldía Municipal 50
Tabla 25. Municipio de Útica – Polideportivo 52
Tabla 26 Municipio de Nariño – Reconocimiento de Entornos 55
Tabla 27. Municipio de La Mesa – I.E.D San Javier 56
Tabla 28. Municipio de La Mesa – Centro de Vida San Javier 61
Tabla 29. Municipio de La Mesa – Jardín Grandes Sueños 62
Tabla 30. Municipio de Bituima– Adulto Mayor 65
Tabla 31. Municipio Bituima– C.D.I 65
Tabla 32. Municipio de Bituima – José María Vergara – Sede Principal 66
Tabla 33. Municipio de Bituima– Iglesia 70
Tabla 34. Municipio de Bituima– I.E.D José María Vergara – Sede Periquito 73
Tabla 35. Municipio de Bituima – I.E.D José María Vergara – Sede Volcan 76

Tabla 36. Municipio de Bituima – Salón Comunal Rincón Santo 79
Tabla 37. Municipio de Bituima– I.E.D José María Vergara – Sede Rincón Santo 80
Tabla 38. Municipio de Quipile– I.E.D La Sierra Simón Bolívar 84
Tabla 39. Municipio de Caldas– I.E.D Francisco José de Caldas – Sede Primaria 89
Tabla 40. Municipio de Fúquene – IED Técnico Comercial Capellanía 93
Tabla 41. Municipio de Fúquene – IED Nacionalizado Fúquene - Nuevo Fúquene 93
Tabla 42. Municipio de Fúquene – HCB Mis Pequeñas Personitas 94
Tabla 43. Municipio de Fúquene – IED Nacionalizado Fúquene - La Granja 94
Tabla 44. Municipio de Fúquene – Hogar Comunitario Los Ángeles Tarabita 95
Tabla 45. Municipio de Fúquene – IED Técnico Comercial Capellanía - Puente Plata 95
Tabla 46. Municipio de Fúquene – IED Nacionalizado Fúquene - Siberia 96
Tabla 47. Municipio de Anolaima – IED La Florida 97
Tabla 48. Municipio de Anolaima – Biblioteca La Florida 105
Tabla 49. Municipio de Anolaima – Parroquia La Florida 106
Tabla 50. Municipio de Anolaima – Centro de Vida La Florida 109
Tabla 51. Municipio de Anolaima – Cementerio 110
Tabla 52. Municipio de Anolaima – Ludoteca 110
Tabla 53 Actas de comité 118
Tabla 54 Correspondencia Enviada 122
Tabla 55 Correspondencia Recibida 137
Tabla 56 Personal Profesional de Obra 152
Tabla 57 Personal profesional de interventoría 153
Tabla 58 Forma de Pago Contrato de Obra 154
Tabla 59 Forma de Pago Contrato de Interventoría 154
Tabla 60 Estado Financiero del Contrato de Obra No. CAR-LP-1259-2025 155
Tabla 61 Estado Financiero del Contrato de Interventoría No. CAR-CM-1439-2025 155
Tabla 62 Estado Financiero del Contrato de Interventoría No. CAR-CM-1439-2025 155
Tabla 63 Estado legal del contrato de obra 159
Tabla 64 Pólizas iniciales contrato de obra 159
Tabla 65 Pólizas Acta de inicio 159
Tabla 66 Pólizas Prórroga 160
Tabla 67 Estado legal del contrato de interventoría 160
Tabla 68 Pólizas iniciales contrato de interventoría 160
Tabla 69 Pólizas acta de inicio 161

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en su calidad de entidad contratante y en cumplimiento de los principios de transparencia y eficiencia en la contratación pública, elaboró y publicó el pliego de condiciones para adelantar el proceso de selección del contratista encargado de ejecutar las obras previstas de adecuaciones menores, Como resultado de este proceso, se adjudicó al Consorcio Adecuaciones CAR 2025 el Contrato de Obra No. CAR-LP-1259-2025, cuyo objeto es: "Realizar las adecuaciones menores e instalación de alternativas ecoeficientes para la implementación de prácticas sostenibles en los entornos sostenibles, en el marco de los proyectos de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano."

Con el fin de garantizar el cumplimiento integral del contrato de obra, la CAR también llevó a cabo el proceso de selección para contratar la interventoría correspondiente, en el cual fue seleccionada la firma Techne S.A.S., mediante el Contrato No. CAR-CM-1439-2025. El objeto de este contrato es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable al contrato cuyo objeto corresponde a: realizar las adecuaciones menores e instalación de alternativas ecoeficientes para la implementación de prácticas sostenibles en los entornos sostenibles, en el marco de los proyectos de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano."

En cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en la cláusula novena del contrato de interventoría, específicamente el numeral 5, que establece la responsabilidad del interventor de presentar informes mensuales pormenorizados, se presenta a continuación el Informe Mensual No. 8, correspondiente al período comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2025.

Este informe incluye, las actividades de seguimiento y control realizadas por la interventoría al Contrato de Obra No. CAR-LP-1259-2025, en los componentes técnico, administrativo y financiero, conforme a lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.

El documento detalla las principales acciones ejecutadas por Techne S.A.S. durante el período de referencia, así como los procedimientos implementados y los avances más significativos en los aspectos técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable, dando cumplimiento a las responsabilidades contractuales asignadas en el marco de la interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Buscando desarrollar de manera articulada los proyectos 13 - Entornos sostenibles para la promoción de los negocios verdes y la Economía Circular y 17- Entornos sostenibles para la Cultura Ambiental, Educación, Participación y Servicio al Ciudadano, se determinó la necesidad de desarrollar distintas estrategias enfocadas en diversas temáticas y actividades que permitirán una participación, cultura y educación ambiental fortalecida con herramientas educativas que potencien su impacto y mejoren la calidad de vida y el ambiente de los beneficiarios.

El desarrollo de estas estrategias se realizará a través de la organización de componentes temáticos que contengan las herramientas pedagógicas, que permiten desagregar las categorías de los elementos a utilizar, así:

- Componente sistema de recolección de agua lluvia
- Componente uso eficiente y ahorro de agua
- Componente Residuos sólidos
- Componente Biodiversidad
- Componente uso eficiente y ahorro de la energía
- Componente Movilidad sostenible
- Componente Consumo responsable
- Componente planes comunitarios de gestión del riesgo
- Componente de horticultura
- Componente aulas ambientales.

Estos componentes comprenden las herramientas pedagógicas necesarias para la ejecución de proyectos, que incluyen: los insumos para la ejecución de actividades de educación ambiental, y las adecuaciones menores e instalaciones.

A través del presente proceso, se realizará la contratación de las adecuaciones menores e instalaciones a realizar en lo relacionado exclusivamente con la mano de obra requerida, toda vez que los insumos necesarios para cada adecuación menor e instalación, serán suministrados mediante un contrato de suministro separado. Las adecuaciones menores e instalaciones corresponden a las siguientes:

- ADECUACIONES HIDROSANITARIAS: GRIFERÍAS (Componente uso eficiente y ahorro de agua)
- ADECUACIONES HIDROSANITARIAS: SANITARIOS Y ORINALES (uso eficiente y ahorro de agua)
- INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS (Componente sistema de recolección de agua lluvia)
- ADECUACIÓN SISTEMA CAPTADOR DE AGUA DE NIEBLA (Componente uso eficiente y ahorro de agua)
- ADECUACIÓN INVERNADERO GERMINADERO (Componente de horticultura)
- ADECUACIÓN HUERTA (Componente de horticultura)
- ENCERRAMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO (Componente sistema de recolección de agua lluvia)
- ENCERRAMIENTO Y TECHADO COMPOSTERAS (Componente Residuos sólidos)
- ADECUACIÓN CENTROS DE ACOPIO (Componente Residuos sólidos)
- ADECUACIÓN AULAS AMBIENTALES (Componente aulas ambientales)

3. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

Se hace la presentación detallada de la parte contractual y administrativa del contrato de obra e interventoría del proyecto:

3.1 CONTRATO DE OBRA

Los datos del contrato de obra se describen a continuación, se menciona que se presentara actualización de información una vez se realice alguna modificación o acto legal jurídico por parte de la entidad contratante.

Tabla 1 Datos del Contrato de Obra

CTO DE OBRA - NO. CAR-LP-1259-2025	
Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR REP. LEG./Yulian Aldemar Beltrán Melo
No. Identificación	Nit. C.C. 79.691.092
Entidad Contratante	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano
Objeto	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	25601182
Valor del contrato	$ COP 3.059.701.535.00 Tres Mil Cincuenta y Nueve Millones Setecientos Un Mil Quinientos Treinta y Cinco pesos M/Cte.
Fecha suscripción contrato	29 de enero de 2025
Fecha de inicio	01 de abril de 2025
Fecha de terminación	30 de mayo de 2026
Plazo del contrato	Trece (13) meses y veintinueve (29) días
Forma de pago	Pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato, de acuerdo con las actividades desarrolladas, cantidades ejecutadas y plasmadas por el contratista en el informe de actividades, durante el periodo correspondiente, previa aprobación de la Interventoría, certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato. 10% restante, contra acta de terminación, acta de recibo y de liquidación.
Supervisor(es)	Nidia Clemencia Riaño Rincón Directora de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano

Fuente: Techne S.A.S.

El personal ofertado por el contratista de obra durante el para la correcta ejecución del contrato No. CAR-LP-1259-2025 es el siguiente:

Tabla 2 Profesionales contrato de obra

CARGO	DEDICACIÓN	NOMBRE DEL PROFESIONAL
Director de obra	30%	José Luis Lamus Rodríguez
Residente de obra	100%	Luis Alfonso Riveira Pinto
Profesional técnico 1	100%	Juan Manuel Franco Guzmán
Profesional técnico 2	100%	Kewin Manfred Castañeda
Profesional técnico 3	100%	Jonatan Alexander Feo González
Profesional técnico 4	100%	Yeison Alonso Cárdenas Acosta
Profesional técnico 5	100%	Dayana Robayo Lancheros

3.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presentan los datos generales del Contrato de Interventoría, los cuales recogen la información vigente al momento de elaboración del presente informe. Cabe señalar que esta información será actualizada oportunamente en caso de presentarse alguna modificación contractual o la expedición de actos jurídicos que afecten su contenido.

Para el período comprendido se realizó el cambio del representante legal de la interventoría tal como se menciona en la tabla No.3

Tabla 3 Datos del contrato de interventoría

INTERVENTORÍA CTO CAR-CM-1439-2025	
Contratista	Techne S.A.S. REP. LEG. /Laura Roció Galindo Castro
No. Identificación	Nit.900.282.761-0 C.C. 1.053.615.046
Entidad Contratante	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano
Objeto	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	25601201
Valor del contrato	$ COP 306.544.238.00
Valor del contrato	Trescientos Seis Millones Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Treinta Y Ocho pesos M/Cte.
Fecha suscripción contrato	24 de febrero de 2025
Fecha de inicio	01 de abril de 2025
Fecha de terminación	31 de mayo de 2026
Plazo del contrato	Catorce (14) meses
Forma de pago	Pagos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato, de acuerdo con las actividades desarrolladas, cantidades ejecutadas y plasmadas por el contratista en el informe de actividades, durante el periodo correspondiente, previa aprobación de la Interventoría, certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores y certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato.
Supervisor(es)	Nidia Clemencia Riaño Rincón Directora de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano

Fuente: Techne S.A.S.

A continuación, se presenta el listado del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de interventoría, en cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato suscrito. Este personal fue formalmente presentado ante la entidad contratante con el fin de dar inicio al proceso de revisión y aprobación por parte de la supervisión del contrato.

Esta relación incluye los perfiles profesionales comprometidos por el interventor, conforme a la propuesta técnica presentada y aprobada durante el proceso de selección, y constituye un componente esencial para el adecuado desarrollo de las actividades de seguimiento, control y verificación del contrato de obra.

Tabla 4 Profesionales del contrato de interventoría

CARGO	DEDICACIÓN	PROFESIONAL INTERVENTORÍA
Director de interventoría	30%	Juan Carlos Aragón Pinzón
Residente de interventoría	100%	Fredy Leonel Gómez Rincón
Inspector 1	50%	Erica Andrea Ramírez González
Inspector 2	50%	David Santiago Guamán Panche

Fuente: Techne S.A.S.

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 RESUMEN GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO

A continuación, se presenta un resumen detallado del avance de la obra en ejecución, correspondiente a las actividades desarrolladas hasta la fecha por parte del Consorcio Adecuaciones CAR 2025, El avance de ejecución de las actividades se ha medido conforme a los hitos establecidos en el contrato de obra, y en la programación general presentada y avalada por la interventoría.

Es fundamental señalar que, como parte del seguimiento a la ejecución de la obra, la interventoría ha solicitado al contratista la presentación de plan de contingencia y su implementación de acuerdo con el atraso que se lleva a la fecha, el cual es del **-75,67%** por tanto, se pone en conocimiento de la entidad el atraso que se lleva a la fecha del presente informe.

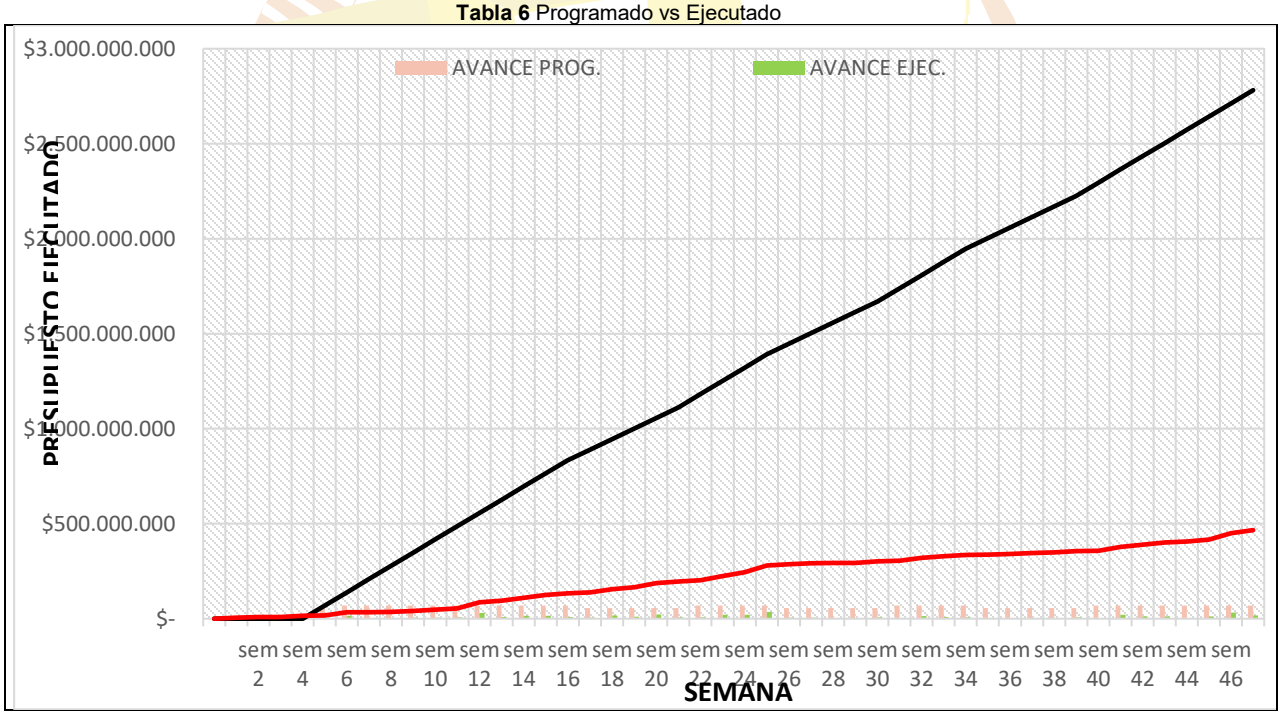
Tabla 5 Cuadro de Avance Ejecutado

MES	FECHA	PROGRAMADO	EJECUTADO
11	01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026	**90,91%**	**15,24%**

Fuente: Techne S.A.S

- **Programación de obra**

Tabla 6 Programado vs Ejecutado



Fuente: Techne S.A.S.

En el marco del presente contrato, la Corporación Autónoma Regional (CAR) a la fecha ha asignado los siguientes municipios:

GRUPO 1
COGUA
SUSA
CHOCONTÁ
SUPATÁ
BUENAVISTA
SAN MIGUEL DE SEMA
EL COLEGIO
NOCAIMA
NIMAIMA
CALDAS
NEMOCÓN

GRUPO 2
PASUNCHA
VERGARA
LA PEÑA
CAPARRAPÍ
PARQUE NEUSA
QUEBRADANEGRA
TAUSA
YACOPÍ

GRUPO 3
SABOYA
SOACHA
SIBATÉ
SAN BERNARDO
TIBACUY
TENA
TIBIRITA

GRUPO 4
SABOYA I.E CARRIZAL
CAJICA
MACHETA
AGUA DE DIOS
SUTATAUSA

GRUPO 4
UTICA
MANTA
PUERTO SALGAR
SESQUILÉ
ANOLAIMA

GRUPO 5
RICAURTE
LA VEGA
CUCUNUBA
CHAGUANÍ
GUAYABAL DE SIQUIMA
TOPAIPI
BELTRÁN

GRUPO 6
APULO
GUADUAS
GIRARDOT
LA MESA
SAN JUAN DE RIOSECO
SAN FRANCISCO
SUESCA
QUIPILE
LA PALMA
ARBELÁEZ
PUERTO SALGAR 2
CALDAS 2
BITUIMA

GRUPO 7
NARIÑO
ANOLAIMA – LA FLORIDA
ZIPAQUIRÁ
SOPÓ

4.2 VISITAS REALIZADAS EN ENTORNOS

- **Municipio de Apulo.**

El **05 de febrero de 2026** se llevó a cabo la visita de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Apulo** entre interventoría, contratista de obra y CAR. Durante la inspección, se verificaron todas las adecuaciones ejecutadas en cada uno de los entornos intervenidos, que corresponden a: **Alcaldía Municipal, Polideportivo, Salón Taekwondo, Bomberos, I.E.D Antonio Nariño Sede Chicago.** Con el objetivo de hacer entrega del entorno a la supervisión.

Las intervenciones ejecutadas en el municipio se relacionan a continuación.

Tabla 7 Alcances Municipio de Apulo

	ENTORNOS SOSTENIBLES MUNICIPIO DE APULO
ENTORNO	**ALCANCES**
I.E.D ANTONIO NARIÑO SEDE CHICAGO	• Cambio de cuatro (04) griferías llave para lavamanos de pared tipo push. • Cambio de cuatro (04) Sanitarios
CASA ADULTO MAYOR	• Cambio de tres (03) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de tres (03) Sanitarios.
ESTACION DE BOMBEROS	• Cambio de una (01) grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de dos (02) Sanitarios.
SALÓN TAEKWONDO	• Cambio de un sistema de recolección de agua potable (asbesto a plástico) de 1.000 lts. • Cambio de una (01) grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de tres (03) Sanitarios.
POLIDEPORTIVO	• Cambio de nueve (09) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de dos (02) Sanitarios.
ALCALDÍA MUNICIPAL	• Cambio de dos (02) Sanitarios. • Cambio de dos (02) lavamanos completos.

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

Tabla 8 Municipio de Apulo – Alcaldía Municipal

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	

Tabla 9 Municipio de Apulo – Polideportivo

Antes	Después
	
	

Antes	Después
	
	
	

Tabla 10 Municipio de Apulo – Salón Taekwondo

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	

Tabla 11 Municipio de Apulo – Estación Bomberos

Antes	Después
	

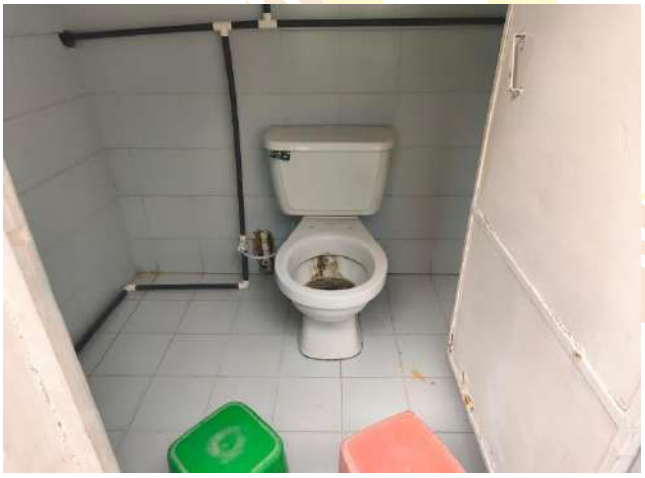
Antes	Después
	
	

Tabla 12 Municipio de Apulo – Casa Adulto Mayor

Antes	Después
	

Antes	Después
	
	
	

Tabla 13 Municipio de Apulo – I.E.D Antonio Nariño Sede Chicago

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	

- **Municipio de Ricaurte.**

El **05 de febrero de 2026** se llevó a cabo la visita de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Ricaurte** entre interventoría, contratista de obra y CAR. Durante la inspección, se verificaron todas las adecuaciones ejecutadas en cada uno de los entornos intervenidos, que corresponden a: **I.E.D Manuel Sur, Alcaldía Municipal, GOES, Inspección de Policía, Cundeportes y Pacandé.** Con el objetivo de hacer entrega del entorno a la supervisión luego de Contratista de obra atender las observaciones anteriormente formuladas por la interventoría el día 16 de enero de 2026.

Las intervenciones ejecutadas en el municipio se relacionan a continuación.

	ENTORNOS SOSTENIBLES MUNICIPIO DE RICAURTE
ENTORNO	**ALCANCES**

I.E.D MANUEL SUR	• Sistema de recolección de 1.000 lts • Huerta cerramiento. • Cerramiento Compostera de 280 lts • Cambio de once (11) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de un (01) Sanitario
PACANDE	• Cambio de diez (10) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de nueve (09) Sanitarios.
CUNDEPORTES	• Cambio de diez (10) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de doce (12) Sanitarios.
INSPECCIÓN DE POLICÍA	• Cambio de un (01) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de una (01) Sanitario.
GOES	• Cambio de tres (03) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de tres (03) Sanitarios.
ALCALDÍA MUNICIPAL	• Cambio de siete (07) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de tres (03) Sanitarios.

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

Tabla 14 Municipio de Ricaurte – I.E.D Manuel Sur

Antes	Después
	

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	
	

Tabla 15 Municipio de Ricaurte – Alcaldía

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	

Tabla 16 Municipio de Ricaurte – GOES

Antes	Después
	

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	

Tabla 17 Municipio de Ricaurte – Inspección de Policía

Antes	Después
	

Tabla 18 Municipio de Ricaurte – Cundeportes

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	

Tabla 19 Municipio de Ricaurte – Pacande

Antes	Después
	

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	
	
	

Antes	Después
	

- **Municipio de Zipaquirá.**

El **22 de enero de 2026** se llevó a cabo la visita de reconocimiento de entornos en el municipio de **Zipaquirá** entre CAR, interventoría y contratista de obra. Durante la inspección, se identificaron los entornos a intervenir y las herramientas a instalar en cada uno de ellos, que corresponden a: **Palacio Municipal, Casa de Gobierno e I.E.M Cundinamarca.**

Tabla 20 Municipio de Zipaquirá – Reconocimiento de Entornos



- **Municipio de Guaduas.**

El **09 de febrero de 2026** se llevó a cabo la visita de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Guaduas** entre interventoría, contratista de obra y CAR. Durante la inspección, se verificaron todas las adecuaciones ejecutadas en cada uno de los entornos intervenidos, que corresponden a: **Escuela Rural Ceniceros.**

Las intervenciones ejecutadas en el municipio se relacionan a continuación.

	ENTORNOS SOSTEBILBLES MUNICIPIO DE GUADUAS
ENTORNO	**ALCANCES**
IED SEDE CENICEROS	• Sistema de recolección de 2.000 lts • Sistema de recolección de 1.000 lts • Cerramiento Compostera de 280 lts

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

Tabla 21 Municipio de Guaduas – Escuela Rural Ceniceros

Antes	Después
	
	

Antes	Después
	

- **Municipio de Útica.**

El **11 de febrero de 2025** se llevó a cabo la visita de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Útica** entre interventoría, contratista de obra y Supervisión. Durante la inspección, se verificaron todas las adecuaciones ejecutadas en cada una de los entornos intervenidos, que corresponden a: **I.E.D Manuel Murillo Toro, Alcaldía Municipal, Jardín Infantil Los Bulliciosos** y el **Polideportivo.**

Las intervenciones ejecutadas en el municipio se relacionan a continuación

ENTORNOS SOSTENIBLES MUNICIPIO DE UTICA	
ENTORNO	**ALCANCES**
I.E.D MANUEL MURILLO TORO	• Cerramiento Compostera de 280 lts • Huerta con cerramiento • Adecuación aula ambiental 6m X 5m • Cambio de veinte (20) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push • Cambio de tres (03) Sanitarios
JARDIN LOS BULLICIOSOS	• Cambio de seis (06) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push • Cambio de dos (02) Sanitarios • Cambio de cinco (05) sanitarios infantiles
POLIDEPORTIVO	• Cambio de ocho (08) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push • Cambio de cuatro (04) Sanitarios
ALCALDÍA MUNICIPAL	• Cambio de cinco (05) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push • Cambio de dos (02) Sanitarios

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

Tabla 22. Municipio de Útica – I.E.D Manuel Murillo Toro

ANTES	DESPUÉS
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	

Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 23. Municipio de Útica – Jardín Infantil Los Bulliciosos

ANTES	DESPUÉS
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	

Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 24. Municipio de Útica – Alcaldía Municipal

ANTES	DESPUÉS
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	

Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 25. Municipio de Útica – Polideportivo

ANTES	DESPUÉS
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

Fuente: Techne S.A.S.

- **Municipio de Nariño**

El **12 de febrero de 2026** se llevó a cabo la visita de reconocimiento de entornos en el municipio de **Nariño** entre CAR, interventoría y contratista de obra. Durante la inspección, se identificaron los

entornos a intervenir y las herramientas a instalar en cada uno de ellos, que corresponden a: **Escuela La Reforma, Alcaldía Municipal, Centro Día** y **Parroquia.**

Tabla 26 Municipio de Nariño – Reconocimiento de Entornos



- **Municipio de La Mesa.**

El **13 de febrero de 2025** se llevó a cabo la visita de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **La Mesa** entre interventoría y contratista de obra. Durante la inspección, se verificaron todas las adecuaciones ejecutadas en cada una de los entornos intervenidos, que corresponden a: **I.E.D San Javier, Jardín Grandes Sueños y Centro de Vida San Javier.**

Las intervenciones ejecutadas en el municipio se relacionan a continuación

	ENTORNOS SOSTENIBLES MUNICIPIO DE LA MESA
ENTORNO	**ALCANCES**
I.E.D. SAN JAVIER	• Sistema de recolección de 2.000 lts • Huerta con cerramiento. • Cerramiento Compostera de 280 lts • Cambio de doce (12) griferías llave para lavamanos de pared tipo push. • Cambio de cuatro (04) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de ocho (08) Sanitarios. • Adecuación aula ambiental
CENTRO DE VIDA ABUELOS	• Sistema de recolección de 1.000 lts • Cambio de una (01) grifería llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de un (01) Sanitario.
JARDÍN GRANDES SUEÑOS	• Sistema de recolección de 1.000 lts • Cambio de un (01) Sanitario. • Cambio de un (01) Sanitario Infantil

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

Tabla 27. Municipio de La Mesa – I.E.D San Javier

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

Fuente: Techne S.A.S.

Durante la revisión, se generaron observaciones sobre la instalación de las mallas en las puertas de los cerramientos correspondientes a la huerta, la compostera y el sistema de recolección de aguas lluvias

de 2000 L, toda vez que estas fueron dispuestas en el costado externo, contrariando la directriz que establece su instalación en el costado interno.

De igual manera, se identificó una problemática en el área de instalación del aula ambiental. Según lo reportado por la institución educativa, tras la ejecución de las obras se presentaron precipitaciones de alta intensidad, lo que ocasionó el ingreso de un volumen considerable de agua proveniente de la vía colindante, generando la inundación del área y el desprendimiento de dos costados del cerramiento en mampostería de ladrillo como se ilustra en la *Imagen 1*. Ante este evento, la supervisión se encuentra en proceso de análisis para determinar las acciones correctivas a implementar.

Imagen 1. Aula Ambiental Afectada.



Tabla 28. Municipio de La Mesa – Centro de Vida San Javier

ANTES	DESPUÉS
	

ANTES	DESPUÉS
	
	

Tabla 29. Municipio de La Mesa – Jardín Grandes Sueños

ANTES	DESPUÉS
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

- **Municipio de Bituima.**

El **16 de febrero de 2025** se llevó a cabo la visita de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Bituima** entre interventoría y contratista de obra. Durante la inspección, se verificaron todas las adecuaciones ejecutadas en cada una de los entornos intervenidos, que corresponden a: **Adulto Mayor, C.D.I, I.E.D José María Vergara Sede Periquito, I.E.D José María Vergara Sede Volcán, , I.E.D José María Vergara Sede Principal, , I.E.D José María Vergara Sede Rincón Santo, Salón Comunal Rincón Santo** y la **Parroquia**

Las intervenciones ejecutadas en el municipio se relacionan a continuación

	ENTORNOS SOSTENIBLES MUNICIPIO DE BITUIMA
ENTORNO	**ALCANCES**
I.E.D JOSÉ MARÍA VERGARA SEDE PERIQUITO	• Sistema de recolección de 1.000 lts • Cerramiento Compostera de 280 lts • Huerta con cerramiento • Adecuación aula ambiental • Cambio de dos (02) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push • Cambio de tres (03) Sanitarios
C.D.I	• Cambio de siete (07) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push
SALÓN COMUNAL RINCÓN SANTO	• Cambio de dos (02) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push • Cambio de dos (02) Sanitarios
CASA ADULTO MAYOR	• Sistema de recolección de 500 lts
I.E.D. JOSÉ MARÍA VERGARA Y VERGARA SEDE RINCÓN SANTO	• Sistema de recolección de 2.000 lts • Recambio de un (01) tanques de recolección de agua potable de 1.000 lts • Huerta con cerramiento • Cerramiento Compostera de 280 lts • Cambio de una (01) grifería llave para lavamanos de mesa tipo push • Cambio de dos (02) Sanitarios
I.E.D. JOSÉ MARÍA VERGARA Y VERGARA SEDE VOLCÁN	• Sistema de recolección de 1.000 lts • Cambio de cuatro (04) Sanitarios • Cambio de dos (02) grifería llave para lavamanos de pared tipo push • Cambio de dos (02) grifería llave para lavamanos de mesa tipo push • Huerta con cerramiento • Cerramiento Compostera de 280 lts • Tanque de recolección agua potable de 5.000 lts con cerramiento 3x3
I.E.D. SEDE PRINCIPAL	• Cambio de nueve (09) Sanitarios • Cambio de una (01) grifería llave para lavamanos de mesa tipo push • Sistema de recolección de 1.000 lts • Adecuación aula ambiental
PARROQUIA	• Sistema de recolección de 1.000 lts • Cambio de cuatro (04) Sanitarios • Cambio de siete (07) grifería llave para lavamanos de mesa tipo push

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

Tabla 30. Municipio de Bituima– Adulto Mayor

ANTES	DESPUÉS
	

Tabla 31. Municipio Bituima– C.D.I

ANTES	DESPUÉS
	
	

ANTES	DESPUÉS
	

Tabla 32. Municipio de Bituima – José María Vergara – Sede Principal

ANTES	DESPUÉS
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	

Tabla 33. Municipio de Bituima– Iglesia

ANTES	DESPUÉS
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	

Tabla 34. Municipio de Bituima– I.E.D José María Vergara – Sede Periquito

ANTES	DESPUÉS
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	

Tabla 35. Municipio de Bituima – I.E.D José María Vergara – Sede Volcan

ANTES	DESPUÉS
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	

Tabla 36. Municipio de Bituima – Salón Comunal Rincón Santo

ANTES	DESPUÉS
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

Tabla 37. Municipio de Bituima– I.E.D José María Vergara – Sede Rincón Santo

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	

Fuente: Techne S.A.S.

- **Municipio de Quipile.**

El **16 de febrero de 2025** se llevó a cabo la visita de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Quipile – La Sierra** entre interventoría y contratista de obra. Durante la inspección, se verificaron todas las adecuaciones ejecutadas en cada una de los entornos intervenidos, que corresponden a: **I.E.D La Sierra – Simón Bolívar y Inspección de Policía La Sierra**

Las intervenciones ejecutadas en el municipio se relacionan a continuación

	ENTORNOS SOSTENIBLES MUNICIPIO DE QUIPILE
ENTORNO	**ALCANCES**
I.E.D LA SIERRA SIMÓN BOLÍVAR	• Sistema de recolección de 1.000 lts • Huerta con cerramiento. • Cerramiento Compostera de 280 lts • Cambio de diez (10) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de ocho (08) Sanitarios • Adecuación aula ambiental
SUB ESTACIÓN DE POLICÍA	• Cambio de ocho (08) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de un (01) Sanitarios.

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

Tabla 38. Municipio de Quipile– I.E.D La Sierra Simón Bolívar

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	

Durante la revisión se identificaron una (1) llave de mesa sin instalar y cuatro (4) llaves de mesa instaladas con fallas en su funcionamiento. Esto fue reportado a supervisión para iniciar el proceso de reposición por garantía.

- **Municipio de Caldas.**

El **18 de febrero de 2025** se llevó a cabo la visita de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Caldas** entre supervisión interventoría y contratista de obra. Durante la inspección, se verificaron todas las adecuaciones ejecutadas en cada una de los entornos intervenidos, que corresponden a: **I.E.D Francisco José de Caldas – Sede Primaria.**

Las intervenciones ejecutadas en el municipio se relacionan a continuación

	ENTORNOS SOSTENIBLES MUNICIPIO DE CALDAS V2
ENTORNO	**ALCANCES**
I.E.D. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS SEDE PRIMARIA	• Sistema de recolección de 500 lts • Huerta con cerramiento. • Cerramiento Compostera de 280 lts • Cambio de una (01) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de dos (02) griferías llave para lavamanos de pared tipo push. • Cambio de seis (06) Sanitarios

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

Tabla 39. Municipio de Caldas– I.E.D Francisco José de Caldas – Sede Primaria

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	

Durante la revisión, se identificó una (1) llave de mesa con fallas en su funcionamiento. Esto fue reportado a supervisión para iniciar el proceso de reposición por garantía.

- **Municipio de Fúquene.**

El **19 de febrero de 2025** se llevó a cabo la visita de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Fúquene** entre supervisión interventoría y contratista de obra. Durante la inspección, se verificaron todas las adecuaciones ejecutadas en cada una de los entornos intervenidos, que corresponden a: **I.E.D Técnico Comercial de Capellanía, I.E.D Nacionalizado de Fúquene – Sede Nuevo Fúquene, , I.E.D Nacionalizado de Fúquene – Sede La Granja, , I.E.D Técnico Comercial de Capellanía – Sede Puente Plata, , I.E.D Nacionalizado de Fúquene – Sede Siberia, H.C.B Mis Pequeñas Personitas** y el **Hogar Comunitario Los Ángeles Sede Tarabita.**

Las intervenciones ejecutadas en el municipio se relacionan a continuación

	ENTORNOS SOSTENIBLES MUNICIPIO DE FÚQUENE
ENTORNO	ALCANCES

I.E.D NACIONALIZADO DE FÚQUENE SEDE LA GRANJA	• Sistema de recolección de 1.000 lts (cerramiento).
I.E.D NACIONALIZADO DE FÚQUENE SEDE NUEVO FÚQUENE	• Sistema de recolección de 1.000 lts (cerramiento).
I.E.D TÉCNICO COMERCIAL CAPELLANÍA	• Sistema de recolección de 1.000 lts (cerramiento).
I.E.D NACIONALIZADO DE FÚQUENE SEDE SIBERIA	• Sistema de recolección de 1.000 lts
IED TÉCNICO COMERCIAL CAPELLANÍA SEDE PUENTE PLATA	• Sistema de recolección de 1.000 lts (cerramiento)
HOGAR COMUNITARIO LOS ÁNGELES SEDE TARABITA	• Sistema de recolección de 1.000 lts (cerramiento)
HOGAR COMUNITARIO MIS PEQUEÑAS PERSONITAS	• Sistema de recolección de 1.000 lts

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

Tabla 40. Municipio de Fúquene – IED Técnico Comercial Capellanía

ANTES	DESPUÉS
	

Tabla 41. Municipio de Fúquene – IED Nacionalizado Fúquene - Nuevo Fúquene

ANTES	DESPUÉS
	

Tabla 42. Municipio de Fúquene – HCB Mis Pequeñas Personitas

ANTES	DESPUÉS
	

Tabla 43. Municipio de Fúquene – IED Nacionalizado Fúquene - La Granja

ANTES	DESPUÉS
	

Tabla 44. Municipio de Fúquene – Hogar Comunitario Los Ángeles Tarabita

ANTES	DESPUÉS
	

Tabla 45. Municipio de Fúquene – IED Técnico Comercial Capellanía - Puente Plata

ANTES	DESPUÉS
	

Tabla 46. Municipio de Fúquene – IED Nacionalizado Fúquene - Siberia

ANTES	DESPUÉS
	

- **Municipio de Anolaima.**

El **27 de febrero de 2025** se llevó a cabo la visita de verificación de herramientas de los entornos en el municipio de **Anolaima** entre supervisión interventoría y contratista de obra. Durante la inspección, se verificaron todas las adecuaciones ejecutadas en cada una de los entornos intervenidos, que corresponden a: **I.E.D La Florida, Biblioteca La Florida, Parroquia La Florida, Centro de Vida y Ludoteca.**

Las intervenciones ejecutadas en el municipio se relacionan a continuación

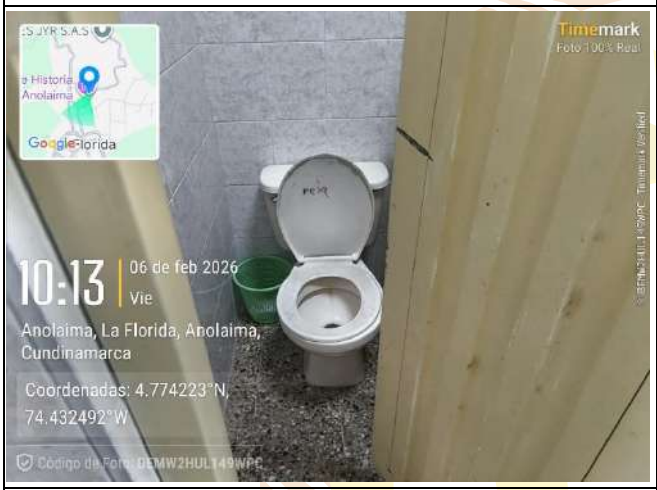
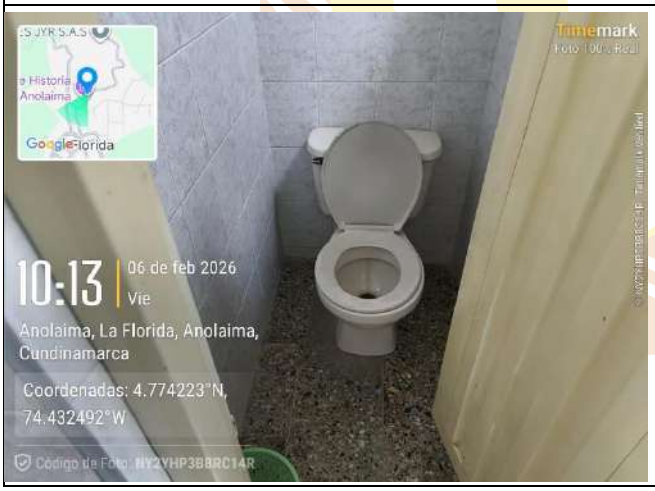
	ENTORNOS SOSTEBILBLES MUNICIPIO DE ANOLAIMA
ENTORNO	**ALCANCES**
I.E.D ANTONIO NARIUÑO LA FLORIDA	• Sistema de recolección de 1.000 lts • Huerta con cerramiento. • Cerramiento Compostera de 280 lts • Cambio de diez (10) griferías llave para lavamanos de pared tipo push. • Cambio de tres (03) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push • Cambio de quince (15) Sanitarios • Adecuación aula ambiental
BIBLIOTECA	• Cambio de una (01) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de un (01) Sanitario.

PARROQUIA	• Sistema de recolección de 1.000 lts . • Cambio de ocho (08) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de cuatro (04) Sanitarios.
CENTRO DE VIDA	• Cambio de tres (03) griferías llave para lavamanos de mesa tipo push. • Cambio de un (01) Sanitario.
LUDOTECA	• Cambio de dos (02) Sanitarios.

A continuación, se presentan algunas de las intervenciones realizadas en los entornos previamente mencionados, evidenciando las condiciones iniciales y el estado final posterior a la ejecución de las actividades.

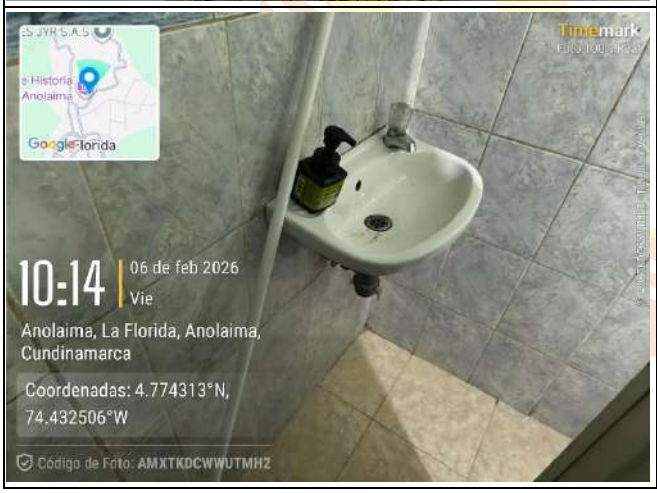
Tabla 47. Municipio de Anolaima – IED La Florida

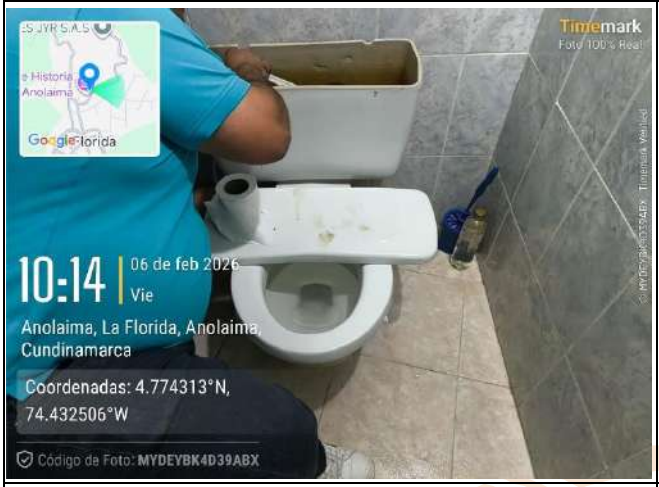
ANTES	DESPUÉS
	
	

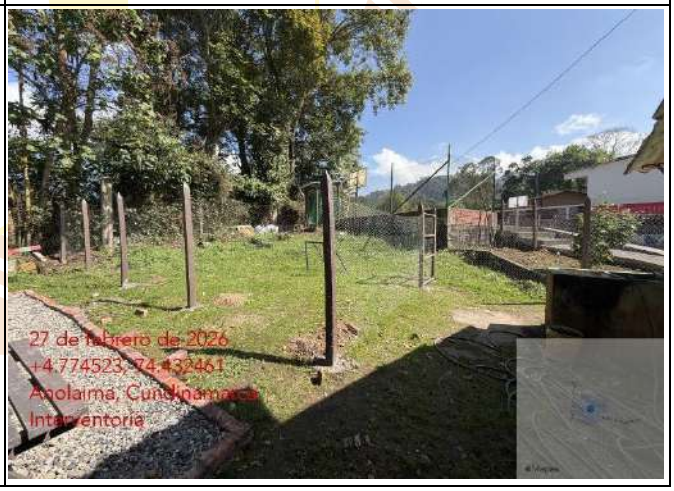
ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	

Tabla 48. Municipio de Anolaima – Biblioteca La Florida

ANTES	DESPUÉS
	
	

Tabla 49. Municipio de Anolaima – Parroquia La Florida

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

ANTES	DESPUÉS
	
	
	

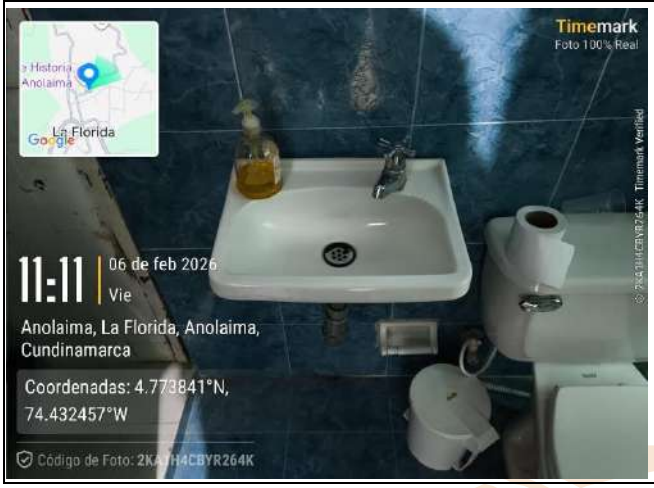
ANTES	DESPUÉS
	

Tabla 50. Municipio de Anolaima – Centro de Vida La Florida

ANTES	DESPUÉS
	
	

Tabla 51. Municipio de Anolaima – Cementerio

ANTES	DESPUÉS
	

Tabla 52. Municipio de Anolaima – Ludoteca

ANTES	DESPUÉS
	

4.3 SEGUIMIENTO TÉCNICO INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato de interventoría, se presenta a continuación el listado de actividades encomendadas por la entidad con las cuales debe cumplir la interventoría y que a fecha ha respondido diligentemente a sus funciones tal y como se presenta a continuación:

Actividad	Soporte / Justificación
1. Coordinar y realizar con el Supervisor designado por la Corporación y el contratista de obra las visitas preliminares a los predios proyectados para las	En conjunto con la supervisión, contratista e interventoría se realizaron las visitas preliminares a los entornos asignados por la Corporación CAR para las adecuaciones con objeto de identificar sus características, y actividades a ejecutar, como se puede evidenciar en las actas de seguimiento.

Actividad	Soporte / Justificación
adecuaciones e instalaciones de las diferentes herramientas con el fin de realizar el reconocimiento del terreno verificando el estado, posibles antecedentes, coordenadas, área de intervención y los demás necesarios para la correcta ejecución de las obras.	Anexo 2. Actas de comité
2. Revisar todos y cada uno de los documentos del proceso contractual de la obra, con el fin de tener el conocimiento completo y detallado de los aspectos técnicos del desarrollo del proyecto, alcance del objeto contractual, especificaciones técnicas, entre otros.	Durante el periodo reportado, la interventoría ha cumplido con las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables establecidas en el contrato, realizando seguimiento permanente a la ejecución de las obras. Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-370**, se enviaron al contratista de obra las observaciones correspondientes al informe mensual No. 9 V2 Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-380**, se enviaron al contratista de obra las observaciones correspondientes al informe mensual No. 10
3. Participar en los comités de obra y suscribir las correspondientes actas. Este comité se reunirá una vez al mes, cuantas veces se requiera fin de coordinar y controlar la ejecución y entrega de los productos y obras tendientes a cumplir con estándares de calidad, costos eficientes y tiempos de entrega de acuerdo con lo planeado y los diseños elaborados; así como de resolver situaciones que se tengan en el desarrollo del contrato, la función general de este comité será la de realizar seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato en cada uno de sus componentes.	Se ha participado activamente en cada uno de los comités de obra programados para llevar el seguimiento y control del proyecto, diligenciando sus actas correspondientes donde se especificaron los temas tratados respectivamente, como se puede evidenciar en los **17** comités realizados en el periodo y .**162** comités realizados a la fecha *Ver anexo 2. Actas de comité.*
4. Verificar el cumplimiento del objeto contratado, especificaciones técnicas, propuesta técnica y económica, cronograma propuesto por el contratista de obra y solicitar los ajustes a que haya lugar.	Durante el periodo evaluado, la interventoría ha efectuado el seguimiento técnico y administrativo al cumplimiento del objeto contractual, verificando que las actividades desarrolladas por el contratista se ajusten a las especificaciones técnicas, la propuesta aprobada y el cronograma de ejecución. Se han emitido observaciones y requerimientos formales al contratista de obra cuando se ha

Actividad	Soporte / Justificación
	evidenciado la necesidad de fortalecer la calidad en la ejecución de determinadas actividades y se han plasmado en las respectivas actas de comité remitidas oficialmente por correo electrónico. De igual manera, al finalizar cada visita se comparten las observaciones en el grupo de WhatsApp donde participan todas las partes. *Ver anexo 2. Actas de comité.*
5. Autorizar el inicio de los trabajos de obra exigiendo lo especificado en las obligaciones del contrato y verificar y exigir la disponibilidad del personal ofrecido en la propuesta técnica.	Durante el desarrollo del contrato, se ha hecho seguimiento a la disponibilidad y permanencia del equipo técnico ofrecido en la propuesta, requiriendo al contratista los ajustes pertinentes cuando se han evidenciado ausencias o variaciones en los perfiles comprometidos. Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión conforme a lo indicado en los comunicados. *Ver Anexo 9 Bitácora*
6. Verificar durante el desarrollo del proyecto la permanencia de los profesionales exigidos en el proceso contractual.	Durante el desarrollo del contrato, se ha hecho seguimiento a la disponibilidad y permanencia del equipo técnico ofrecido en la propuesta, requiriendo al contratista los ajustes pertinentes cuando se han evidenciado ausencias o variaciones en los perfiles comprometidos. Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista de obra mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión. *Ver Anexo 9 Bitácora*
7. Realizar seguimiento al programa de trabajo, frentes de trabajo y equipo propuesto para la ejecución de las obras, y en caso de establecer posibles incumplimientos tomar las medidas correctivas.	Mediante los informes semanales se efectuó el seguimiento al avance de las actividades desarrolladas por el contratista, registrando las recomendaciones y observaciones correspondientes, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los componentes contractuales establecidos. *Ver Anexo 5. Informes Semanales.*
8. Realizar seguimiento acucioso al cumplimiento de la ejecución del cronograma de obra y en caso de establecer posibles	La interventoría ha realizado un seguimiento constante al avance físico del proyecto, contrastando el desarrollo de las actividades con el cronograma avalado

Actividad	Soporte / Justificación
incumplimientos tomar las medidas correctivas.	En los comités realizados entre las partes se ha realizado el debido seguimiento a los entornos en ejecución y se ha realizado la solicitud de inicio de actividades en aquellos municipios que cuentan con las condiciones habilitantes para la ejecución de la obra. De igual manera, se mantiene un seguimiento semanal a los compromisos en el grupo de WhatsApp donde participan todas las partes, considerando las restricciones actuales de la supervisión para la gestión de comunicaciones vía correo electrónico. *Ver Anexo 2. Actas de Comité*
9. Rechazar los informes presentados por el contratista de obra que no cumplan con las especificaciones técnicas y cada uno de los componentes exigidos dentro de los productos del contrato.	La interventoría ha efectuado la revisión detallada de los informes mensuales y demás productos entregados por el contratista de obra, verificando su correspondencia con las especificaciones técnicas, los componentes contractuales y los requisitos formales establecidos. En los casos en que se han identificado inconsistencias o no conformidades frente a lo exigido, los informes han sido rechazados y devueltos para su respectiva corrección, notificando formalmente al contratista las observaciones pertinentes y los ajustes requeridos. Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-370**, se enviaron al contratista de obra las observaciones correspondientes al informe mensual No. 9 V2 Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-380**, se enviaron al contratista de obra las observaciones correspondientes al informe mensual No. 10
10. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y solicitudes técnicas del contratista de obra, informando de manera oportuna a la Corporación las determinaciones adoptadas que sean de su competencia.	La interventoría esta presta y con los canales de comunicación abiertos para atender cualquier tipo de sugerencias, reclamaciones y solicitudes que el contratista requiera. Las determinaciones adoptadas frente a dichas solicitudes han sido informadas oportunamente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, mediante comunicaciones oficiales, garantizando la trazabilidad y transparencia en las decisiones dentro del ámbito de competencia de la interventoría. Durante el periodo reportado no se presentaron sugerencias, reclamaciones o solicitudes por parte del contratista de obra que fueran de competencia de la Supervisión.
11. Verificar y aprobar al contratista de obra los análisis de precios unitarios de la propuesta	Se verificarán y aprobarán las actividades propuestas por el contratista con el propósito de garantizar la correcta ejecución del contrato.

Actividad	Soporte / Justificación
presentada y el Análisis de AIU, así como durante la ejecución de las obras los nuevos que se requieran, y las modificaciones de cantidades a que haya lugar.	Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-230**, la interventoría otorgó aval a los ítems no previstos presentados por el contratista de obra y solicitó a la supervisión su inclusión dentro del alcance contractual. Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-368**, se realiza el envío formal de los compromisos del acta de comité No. 151, correspondiente a la revisión del modificatorio e inclusión de NPs Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-377**, se realiza el envío formal de los compromisos del acta de comité No. 157, correspondiente a la revisión del modificatorio e inclusión de NPs
12. Realizar la aprobación de los procedimientos constructivos con base en las recomendaciones impartidas por los profesionales de su propuesta.	La interventoría ha revisado y evaluado los procedimientos constructivos presentados por el contratista de obra, verificando su conformidad con las especificaciones técnicas del contrato, las normas aplicables y las buenas prácticas de ingeniería.
13. Verificar la permanencia y funciones de los profesionales en obra para la cual dejará constancia diaria en la bitácora de obra.	La interventoría ha efectuado el seguimiento de los profesionales designados por el contratista en el frente de obra. Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión. *Ver Anexo 9 Bitácora*
14. Mantener en los sitios de trabajo los frentes de trabajo con los profesionales y personal de apoyo propuestos para las actividades de seguimiento de interventoría de acuerdo con la propuesta económica.	La interventoría ha dispuesto el personal técnico y de apoyo requerido para el seguimiento y control de las actividades de obra, garantizando su presencia y cumplimiento de funciones conforme a lo establecido en la propuesta económica y en las obligaciones contractuales. Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión. *Ver Anexo 9 Bitácora*
15. Exigir que la maquinaria, herramienta y equipo del contratista de obra se encuentren en condiciones de servicio y solicitar por escrito al contratista de obra el retiro y reemplazo de	Se realiza el seguimiento e inspección adecuado a las condiciones de servicio de maquinaria, herramienta y equipo del contratista, en caso de algún daño se solicitará inmediatamente su retiro y reemplazo.

Actividad	Soporte / Justificación
los equipos que estén dañados o subutilizados. Se dejará constancia diaria en la bitácora.	Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de las condiciones de la maquinaria, herramienta y equipo. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión. *Ver Anexo 9 Bitácora*
16. En forma oportuna rechazará las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con especificaciones inferiores a las contratadas.	Dentro de las funciones de seguimiento y control técnico, la interventoría ha realizado observaciones a las actividades ejecutadas por el contratista de obra, con el propósito de asegurar que se ajusten a las especificaciones y condiciones contractuales. Dichas observaciones permaneces plasmadas en las actas de comité levantadas en campo. *Ver Anexo 2 Actas de Comité*
17. Registrar en la bitácora en conjunto con el contratista de obra los aspectos más relevantes de las obras objeto de la presente interventoría.	La interventoría ha venido diligenciando la bitácora de obra en conjunto con el contratista, registrando de manera permanente los aspectos más relevantes del desarrollo de las actividades en campo, incluyendo avances, observaciones y condiciones de ejecución. *Ver Anexo 9 Bitácora*
18. Mensualmente presentar informe de interventoría con las especificaciones requeridas y ejecutadas.	Se presentarán los informes mensuales con las especificaciones requeridas y ejecutadas respectivamente. Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-357** se presenta el informe mensual de interventoría No. 10
19. En coordinación con el contratista de obra se adelantarán los planos récord a las obras y exigirá la presentación definitiva a la firma contratista de los mismos con el último corte de obra, los cuales deberá estar firmados por los profesionales competentes de acuerdo con la propuesta.	Durante el presente periodo, el contratista de obra no ha realizado la entrega de los planos récord correspondientes a los entornos finalizados.
20. Verificar y exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental, seguridad industrial establecidos por parte de la CORPORACIÓN durante la ejecución de los trabajos.	Durante las labores de seguimiento, se ha exigido al contratista la implementación de las medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental y del SG-SST. Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control del cumplimiento de la normatividad ambiental y seguridad industrial. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión. *Ver Anexo 9 Bitácora*

Actividad	Soporte / Justificación
21. Suspender los trabajos de obra en caso de presentarse afectación al medio ambiente y solicitar las acciones correctivas.	A la fecha, no se han presentado afectaciones al medio ambiente derivadas de la ejecución de las actividades de obra. La interventoría mantiene seguimiento permanente a las condiciones ambientales del proyecto y, en caso de identificarse alguna situación que pueda generar impacto, se procederá conforme a lo establecido en el contrato y en la normatividad ambiental vigente.
22. Aprobar el Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato de Obra.	Para el periodo de referencia no aplica.
23. Coordinar con el contratista de obra las reuniones de socialización y asesorías técnicas, así como suscribir las respectivas actas para cada beneficiario, así como suscribir conjuntamente las actas de vecindad y verificar en todo momento que no se presenten afectaciones a los predios donde se realizan los trabajos con la maquinaria y equipo.	En cada reunión realizada con el contratista y supervisión se ha suscrito la respectiva acta, donde se resaltan los aspectos más importantes y novedades en cuanto a las ejecuciones de obra. *Ver Anexo 2 Actas de Comité*
24. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y las normas Ambientales, de Gestión de Riesgo, y de todos los requisitos exigidos dentro del sistema HSEQ de la Corporación (Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad).	Se ha venido realizando un seguimiento riguroso al cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, las normativas ambientales, la gestión de riesgos y todos los requisitos establecidos en el sistema HSEQ Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-370,** en el marco de las observaciones formuladas al Informe Mensual de Obra No. 9V2, y mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-380**, en el marco de las observaciones formuladas al Informe Mensual de Obra No. 10, se incluyeron las observaciones correspondientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) presentado por el contratista de obra.
25. Aprobar y dar seguimiento de las medidas de control, dotación del personal y elaboración de los protocolos generales y específicos que deben ser implementados y adoptados por el contratista con el fin de garantizar	Se ha realizado seguimiento y garantizando que el contratista implementa de manera adecuada tanto los protocolos generales como los específicos establecidos, asegurando su cumplimiento en todas las fases del proyecto.

Actividad	Soporte / Justificación
la bioseguridad de los profesionales y el personal a su cargo, que labore dentro de la ejecución del contrato en campo y oficina, con el fin de evitar los contagios y la propagación de diferentes virus que se puedan presentar, así como demás normas y recomendaciones relacionadas con esta materia, que sean expedidas por el Gobierno Nacional o por los Gobiernos Departamentales y Locales donde se ejecute el objeto contractual.	

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El presente capitulo detalla las actividades de carácter administrativo que se han desarrollado durante el periodo del presente informe, con el ánimo de mantener a la Corporación informada sobre los pormenores del proyecto en el aspecto administrativo.

5.1 ACTAS DE COMITÉ

Las actas de comité que se relacionan a continuación han sido producto del seguimiento y control que la interventoría ha llevado a cabo con el contratista de obra y que, como parte de sus obligaciones contractuales, ha manifestado su interés y ha puesto en conocimiento a la entidad contratante las novedades surgidas durante el periodo contractual. Las actas de los comités llevados a cabo hasta la fecha entre las partes (Obra, Interventoría y Supervisión), se relacionan a continuación.

Tabla 53 Actas de comité

ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL NO. 01		
Nº	**FECHA**	**OBJETO**
1	28 – MAR - 2025	Acta de comité de seguimiento y control
2	16 – ABR – 2025	Acta de comité de seguimiento y control
3	24 – ABR – 2025	Acta de comité de seguimiento y control
4	28 – ABR – 2025	Acta de comité de seguimiento y control
5	29 – ABR – 2025	Visita puntos de intervencion municipio de Susa
6	30 – ABR – 2025	Acta de comité de seguimiento y control.No.6
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 02		
7	05- MAY -2025	Recorrido avance de obra-comité No.7
8	13- MAY -2025	Recorrido avance de obra- No.8
9	16- MAY -2025	Recorrido para reconocimiento de entornos municipio Buenavista - comité No.9
10	19- MAY -2025	Recorrido para reconocimiento de entornos municipio del Colegio- comité No.10
11	19- MAY -2025	Entrega Escuela la Glorieta Susa y Recorrido sa Miguel de Sema- comité No.11
12	19- MAY -2025	Recorrido para reconocimiento de entornos municipio Ninaima- comité No.12
13	20- MAY -2025	Recorrido para reconocimiento de entornos comité No.13
14	20- MAY -2025	Recorrido para reconocimiento de entornos municipio Supata- comité No.14
15	21- MAY -2025	Comité de segumiento y control No.15
16	26- MAY -2025	Comité de segumiento y control No.16
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 03		
17	03 – JUN – 2025	Seguimiento al contrato de Obra
18	04 – JUN – 2025	Revisión de APU de items no previstos – Lectura de oficio de observaciones de interventoría.
19	04 – JUN - 2025	Verificación de items no previstos.
20	05 – JUN - 2025	Recorrido de entrega y verificación de herramientas entornos sostenibles – Susa.
21	06 – JUN - 2025	Informe de avance grupo I y coordinación de visitas entornos Grupo II
22	09 – JUN - 2025	Recorrido puntos a intervenir Municipio de Caldas
23	09 – JUN - 2025	Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles Pasuncha y Yacopí
24	10 – JUN – 2025	Seguimiento y verificación adecuaciones herramientas ecosostenibles – Buenavista.
25	10 – JUN – 2025	Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles – Tausa

26	12 – JUN – 2025	Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles – Quebradanegra
27	12 – JUN - 2025	Verificación en la implementación de herramientas sostenibles – Nocaima
28	12 – JUN - 2025	Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles – La Peña y Vergara.
29	13 – JUN - 2025	Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles - Caparrapí
30	19 - JUN - 2025	Recorrido reconocimiento alcances entornos sostenibles – Nemocón.
31	19 - JUN - 2025	Avances municipio Mesitas del Colegio.
32	20 – JUN – 2025	Seguimiento y verificación adecuaciones herramientas ecosotenibles – Nimaima
33	20 – JUN - 2025	Seguimiento y verificación adecuaciones herramientas ecosotenibles – Nocaima
34	20 – JUN – 2025	Seguimiento y verificación adecuaciones herramientas ecosotenibles – Supatá
35	20 – JUN – 2025	Verificación observaciones dadad por inteventoria a informes mensuales de obra No. 1 y No. 2
36	24 – JUN – 2025	Verificación atención observaciones dadas por interventoría a informes mensuales de obra No.1 y No.2
37	27 – JUN – 2025	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Saboyá
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 04		
38	01 – JUL – 2025	Revisión Informe Mensual de Obra No. 1 y revisión plan de contingencia.
39	04 – JUL – 2025	Entrega de insumos entornos sostenibles – La Peña.
40	08 – JUL – 2025	Verificación de Alcances Entorno Parque Embalse de Neusa.
41	09 – JUL – 2025	Seguimiento y verificación Acta Parcial de Obra No. 1.
42	10 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Saboyá.
43	10 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Buenavista.
44	11 – JUL – 2025	Entrega de insumos y herramientas – Caparrapí.
45	12 – JUL – 2025	Verificación Memoria de Cantidades
46	14 – JUL – 2025	Avance entornos y dificultades presentadas.
47	14 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Supatá
48	14 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Pasuncha
49	15 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Nocaima
50	15 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Nimaima
51	22– JUL – 2025	Socialización de item no previstos.
52	22 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – El Colegio.
53	25 – JUL – 2025	Reconocimiento alcances entornos sostenibles – Parque Embalse de Neusa
54	29 – JUL – 2025	Verificación de herramientas entornos sostenibles – San Miguel de Sema – Buenavista.
55	31 – JUL – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles – Chocontá
56	31 – JUL – 2025	Revisión plan de contingencia.
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 05		
57	05 – AGO – 2025	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Tena
58	05 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles – Yacopí
59	06 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles – Caparrapí
60	12 – AGO – 2025	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Sibaté
61	13 – AGO – 2025	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Soacha
62	15 – AGO – 2025	Seguimiento y control
63	15 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles – Tibacuy
64	19 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles – Tena
65	20 – AGO – 2025	Seguimiento y control

66	20 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles – Tausa
67	20 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles – Parque Neusa, Sector Chapinero
68	20 – AGO – 2025	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – San Bernardo
69	21 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles – Vergara
70	22 – AGO – 2025	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Tibirita
71	25 – AGO – 2025	Verificación herramientas entornos sostenibles - Quebradanegra
72	27 – AGO – 2025	Reconocimiento municipio de la Mesa
73	28 – AGO - 2025	Reconocimiento Municipio Cajica
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 06		
74	01 – SEP – 2025	Socialización programa cosecha de Agua Comunitaria
75	02 – SEP – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Saboyá
76	02 – SEP – 2025	Revisión avance contrato – Cuenta parcial de cobro No. 1
77	03 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – San Miguel de Sema.
78	03 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles - Caldas
79	04 – SEP – 2025	Seguimiento y control
80	05 – SEP – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Agua de Dios
80.1	05 – SEP – 2025	Revisión Observaciones Ítems No Previstos
81	08 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – San Bernardo
82	09 – SEP – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Manta
83	10 – SEP – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Sutatausa
84	11 – SEP – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Útica
85	12 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Sibaté.
86	12 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Soacha.
87	12 – SEP – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Sesquilé
88	17 – SEP – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Puerto Salgar
89	18 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – La Peña.
90	19 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Tibirita.
91	22 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Sutatausa.
92	23 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Parque Neusa.
93	24 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Agua de Dios.
94	25 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Parque Neusa.
95	26 – SEP – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Saboyá
96	29 – SEP – 2025	Revisión informes de interventoría y obra.
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 07		
97	01 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Machetá.
98	01 – OCT – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles - Manta
99	03 – OCT – 2025	Revisión observaciones informes mensuales de obra e interventoría
100	07 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Anolaima.
101	08 – OCT – 2025	Verificación de instalación de sistemas de recolección de aguas lluvia – La Mesa
102	09 – OCT – 2025	Verificación de herramientas – La Peña.
103	10 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Cucunuba.
104	16 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Chaguani.

105	17 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Guayabal de Siquima.
106	22 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Manta
107	24 – OCT – 2025	Seguimiento y control al contrato de obra.
108	28 – OCT – 2025	Revisión Acta Parcial de Obra #1
109	29 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Ricaurte.
110	29 – OCT – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Beltrán.
111	31 – OCT – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Cogua.
112	31 – OCT – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Cajicá.
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 08		
113	07 –NOV – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Macheta (Contratista – Interventoría)
114	12 – NOV – 2025	Revisión de acta parcial No.1
115	12 – NOV – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Manta (Contratista – Interventoría – CAR)
116	14 – NOV – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Guayabal de Siquima (Contratista – Interventoría – CAR)
117	14 – NOV – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Beltrán (Contratista – Interventoría)
118	20 – NOV – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Chaguaní (Contratista – Interventoría)
119	21 – NOV – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Anolaima (Contratista – Interventoría – CAR)
120	24 – NOV – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Machetá (Contratista – Interventoría – CAR)
121	26 – NOV – 2025	Revisión Acta Parcial No. 2 de Obra.
122	27 – NOV – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – La Mesa.
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 09		
123	02 – DIC – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Guaduas.
124	04 – DIC – 2025	Verificación y seguimiento a instalación de herramientas – Parque Embalse de Neusa
125	04 – DIC – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Suesca.
126	09 – DIC – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Fúquene.
127	09 – DIC – 2025	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Útica
128	10 – DIC – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – La Palma.
129	11 – DIC – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Simijaca
130	15 – DIC – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Girardot.
131	16 – DIC – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Caldas.
132	17 – DIC – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Arbeláez.
133	18 – DIC – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – San Francisco
134	19 – DIC – 2025	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – San Juan de Rioseco.
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 10		
135	14 – ENE – 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – La Vega
136	15 – ENE – 2026	Seguimiento y control al contrato de obra.
137	16 – ENE – 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Apulo
138	16 – ENE – 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Ricaurte
139	19 – ENE – 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Cucunubá
140	22 – ENE – 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – San Juan de Rioseco
141	23 – ENE – 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Sesquilé

142	23 – ENE – 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Suesca
143	27 – ENE – 2026	Revisión Modificatorio Cto Obra 1259-2025
144	27 – ENE – 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Simijaca
145	30 – ENE – 2026	Reconocimiento de entornos – Sopó.
ACTAS DE COMITÉ INFORME MENSUAL No. 11		
146	02 – FEB - 2026	Seguimiento y control al contrato de obra
147	05 – FEB - 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Apulo
148	05 – FEB - 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Ricaurte
149	06 – FEB - 2026	Reconocimiento de entornos – Zipaquirá.
150	09 – FEB - 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Guaduas
151	09 – FEB - 2026	Revisión de Modificatorio
152	11 – FEB - 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Útica
153	13 – FEB - 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – La Mesa
154	12 – FEB - 2026	Reconocimiento de entornos – Nariño.
155	16 – FEB - 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Bituima
156	16 – FEB - 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Quipile (La Sierra)
157	17 – FEB - 2026	Revisión de Modificatorio
158	18 – FEB - 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Caldas
159	19 – FEB - 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Fúquene
160	24 – FEB – 2026	Revisión Modificatorio
161	26 – FEB – 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Puerto Salgar
162	27 – FEB – 2026	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Anolaima – La Florida

Fuente: Techne S.A.S.

Anexo 2 Actas de comité

5.2 CONTROL DE CORRESPONDENCIA

La correspondencia que a continuación se relaciona se ha generado en el transcurso de la ejecución del proyecto; se menciona la correspondencia enviada y recibida de la interventoría u otra entidad.

Tabla 54 Correspondencia Enviada

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
No.	**Fecha**	**Asunto**	**Destinatario**
1	19-FEB-2025	Solicitud información inicial para desarrollo de los contratos de obra e interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
2	19-FEB-2025	Solicitud información inicial para el desarrollo del proyecto	Consorcio Adecuaciones CAR
3	25-FEB-2025	Entrega de pólizas iniciales	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
4	13-MAR-2025	Solicitud información adicional por cambio de representante legal	Consorcio Adecuaciones CAR
5	13-MAR-2025	Presentación designación como interventor contrato de obra No. 1259-2025	Consorcio Adecuaciones CAR
6	17-MAR-2025	Alcance a presentación designación como interventor contrato de obra N0. 1259-2025	Consorcio Adecuaciones CAR
7	18-MAR-2025	Notificación cambio de representante legal contratista de obra	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
8	20-MAR-2025	Observaciones a entrega de documentación inicial	Consorcio Adecuaciones CAR
9	2-ABR-2025	Entrega listado de insumos priorizados por el ordenador del gasto para el desarrollo del contrato No. 1259-2025.	Consorcio Adecuaciones CAR

10	3-ABR-2025	Observaciones a entrega documentación inicial respuesta comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-003	Consorcio Adecuaciones CAR
11	4-ABR-2025	Solicitud entrega pólizas actualizadas de acuerdo al acta de inicio.	Consorcio Adecuaciones CAR
12	4-ABR-2025	Alcance a radicado No. 20252011808 designación de interventoría del contrato No. 1259-2025.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
13	7-ABR-2025	Entrega cronograma de trabajo y plan de trabajo de la interventoría.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
14	7-ABR-2025	Entrega informe semanal No. 1 de interventoría.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
15	8-ABR-2025	Aval y entrega parcial – documentación inicial contratista de obra.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
16	8-ABR-2025	Solicitud entrega de soporte de afiliaciones al sistema de salud, pensión, ARL, y aportes parafiscales del personal.	Consorcio Adecuaciones CAR
17	8-ABR-2025	Entrega de pólizas actualizadas al acta de inicio – interventoría.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
18	9-ABR-2025	Solicitud de entrega listado sitios priorizados por la entidad para ejecución del contrato de obra 1259-2025.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
19	10-ABR-2025	Aval parcial – documentación inicial contratista de obra.	Consorcio Adecuaciones CAR
20	12-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-007 información sobre seguridad social	Consorcio Adecuaciones CAR
21	12-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-005. Observaciones a entrega de documentación inicial	Consorcio Adecuaciones CAR
22	14-ABR-2025	Entrega informe semanal No. 2 de interventoría.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
23	21-ABR-2025	Entrega informe semanal No. 3 de interventoría.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
24	22-ABR-2025	Entrega hojas de vida personal profesional de interventora y solicitud de cambio de profesional residente de interventora.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
25	23-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-008 información sobre seguridad social – primer llamado de atención.	Consorcio Adecuaciones CAR
26	23-ABR-2025	Citación comité de seguimiento y control No. 3.	Consorcio Adecuaciones CAR
27	26-ABR-2025	Citación comité técnico.	Consorcio Adecuaciones CAR
28	28-ABR-2025	Solicitud entrega de listado de personal por frentes de obra.	Consorcio Adecuaciones CAR
29	29-ABR-2025	Entrega de acta y compromisos del comité de seguimiento y control del 28 de abril de 2025 y citación a próximo comité de seguimiento.	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
30	29-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-010 seguridad social.	Consorcio Adecuaciones CAR
31	30-ABR-2025	Entrega de acta y compromisos del comité de seguimiento y control del 30 de abril de 2025, y citación a próximo comité de seguimiento.	Consorcio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.2			
32	3-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-011 aclaración soportes de seguridad social.	Consorcio Adecuaciones CAR
33	3-MAY-2025	Solicitud de entrega de cronograma por entorno priorizado por la entidad contratante car	Consorcio Adecuaciones CAR
34	4-MAY-2025	Entrega informe mensual de interventoría no.1	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
35	5-MAY-2025	Solicitud cumplimiento compromisos adquiridos en comité de seguimiento y control de fecha 28 de abril de 2025	Consorcio Adecuaciones CAR
36	6-MAY-2025	Remisión de cronograma de entrega de insumos y listado de entornos priorizados – municipios asignados	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR

37	7-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-009 documentación inicial	Consorcio Adecuaciones CAR
38	7-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0013 informe mensual de obra no.1	Consorcio Adecuaciones CAR
39	9-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0017 aval programación detallada municipio de Susa	Consorcio Adecuaciones CAR
40	9-MAY-2025	Remisión programación de obra detallada municipio de Susa	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
41	9-MAY-2025	Remisión comunicada CAC-CAR-LP-1259-2025-0018 solicitud de certificados de calidad y caracterización de materiales	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
42	9-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0019 notificación sobre condicionantes del avance físico por dependencia de suministros.	Consorcio Adecuaciones CAR
43	10-MAY-2025	Remisión comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0019 condicionantes avances físico	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
44	10-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0015 solicitud de aprobación de cambio personal mínimo requerido – contrato de obra no. 1259 de2025	Consorcio Adecuaciones CAR
45	12-MAY-2025	Aval y solicitud de aprobación de cambio de personal profesional	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
46	14-MAY-2025	Aval y solicitud de aprobación cambio de personal profesional	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
47	14-MAY-2025	Solicitud de entrega de cronograma detallado de intervención en los entornos del municipio de Chocontá	Consorcio Adecuaciones CAR
48	15-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0014 entrega de ítem no previstos	Consorcio Adecuaciones CAR
49	16-MAY-2025	Solicitud de entrega informe mensual de obra no.1	Consorcio Adecuaciones CAR
50	17-MAY-2025	Observaciones apu contractuales contrato de obra 1259-2025	Consorcio Adecuaciones CAR
51	19-MAY-2025	Entrega informe quincenal no.1 de interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
52	20-MAY-2025	Citación mesa de trabajo	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
53	22-MAY-2025	Observaciones apu contractuales contrato de obra 1259-2025	Consorcio Adecuaciones CAR
54	22-MAY-2025	Respuesta a comunicado 0026 ítems no previstos	Consorcio Adecuaciones CAR
55	23-MAY-2025	respuesta a comunicado 0024 respuesta a observaciones informe mensual no.1	Consorcio Adecuaciones CAR
56	23-MAY-2025	constancia de inasistencia a mesa de trabajo	Consorcio Adecuaciones CAR
57	24-MAY-2025	Citación mesa de trabajo día lunes 26 de mayo de 2025	Consorcio Adecuaciones CAR
58	27-MAY-2025	Entrega de acta y compromisos de mesa de trabajo 21 de mayo,26 de mayo de 2025, y citación a próximo comité de seguimiento.	Consorcio Adecuaciones CAR
59	29-MAY-2025	Primer llamado de atención solicitud de inicio de actividades en entornos asignados por la entidad contratante car	Consorcio Adecuaciones CAR
60	29-MAY-2025	Respuesta a comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0030 cronograma de actividades y flujo de inversión	Consorcio Adecuaciones CAR
61	30-MAY-2025	Aval cambio de personal técnico – consorcio adecuaciones car 2025	Consorcio Adecuaciones CAR
62	30-MAY-2025	Alcance a comunicado no. CAR-CM-1439-2025-17 – entrega de pólizas actualizadas a acta de inicio	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
INFORME MENSUAL No.3			
63	4-JUN-2025	Entrega de acta, compromisos comité No.17 y citación comité	Consorcio Adecuaciones CAR
64	5-JUN-2025	Respuesta comunicado 034 actas de comité	Consorcio Adecuaciones CAR

65	6-JUN-2025	Respuesta comunicada 0036 modificación cronograma inicial	Consorcio Adecuaciones CAR
66	6-JUN-2025	Respuesta solicitud información frentes de ejecución	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
67	7-JUN-2025	Entrega de actas y compromisos comité de seguimiento No.18 y No.19	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
68	7-JUN-2025	Solicitud corrección y presentación ítems no previstos	Consorcio Adecuaciones CAR
69	9-JUN-2025	Entrega acta de comité No.20, compromisos y citación comité	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
70	10-JUN-2025	Respuesta comunicado 0040 relación personal por entorno	Consorcio Adecuaciones CAR
71	11-JUN-2025	Entrega informe mensual No.2 interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
72	11-JUN-2025	Respuesta comunicado 0051 Ajuste AIU	Consorcio Adecuaciones CAR
73	12-JUN-2025	Remisión competencia materiales faltantes	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
74	13-JUN-2025	Aval y solicitud inclusión ítems no previstos	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
75	13-JUN-2025	Traslado comunicado 0045 atraso cronograma	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
76	14-JUN-2025	Respuesta ofi 045 reprogramación	Consorcio Adecuaciones CAR
77	16-JUN-2025	Respuesta comunicado 003 informe mensual No.1 de obra	Consorcio Adecuaciones CAR
78	16-JUN-2025	Traslado OF 0055 cronograma insumos grupo II y visitas grupo III	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
79	16-JUN-2025	Traslado comunicado 0056 alcances entornos grupo II y III	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
80	17-JUN-2025	Traslado comunicado 0057 solicitud cambio accesorios hidráulico	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
81	19-JUN-2025	Citación comité de seguimiento – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
82	19-JUN-2025	Solicitud entrega balance de obra – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
83	19-JUN-2025	Entrega acta comité No 22 al No 30 – Contratista – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
84	20-JUN-2025	Citación verificación de observaciones inf obra – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
85	20-JUN-2025	Respuesta comunicado 042 Informe mensual No.22 de obra – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
86	21-JUN-2025	Aclaración y entrega de soportes planillas parafiscales abril y mayo – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
87	21-JUN-2025	Reiteración solicitud entrega plan de contingencia – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
88	21-JUN-2025	Solicitud presentación ensayos laboratorio concreto – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
89	21-JUN-2025	Entrega acta comité No 32-33-34 – Contratista – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
90	24-JUN-2025	Entrega de actas y compromisos comité de seguimiento No.21 y No.31 – Contratista	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
91	24-JUN-2025	Entrega de acta y compromiso comité de seguimiento No.35 – Contratista	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
92	24-JUN-2025	Observaciones a actividades Municipio de Caldas – Contratista	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
93	25-JUN-2025	Entrega acta comité No 36 24-06-25 - Contratista – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR

94	27-JUN-2025	Presunto incumplimiento obligaciones contractuales adquiridas en comité No.36 – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
95	27-JUN-2025	Citación comité No.37 – Contratista , Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
96	28-JUN-2025	Entrega Acta Comité No. 37 – Supervisión – Contratista.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
97	28-JUN-2025	Respuesta comunicado CAC-CAR-0064 y 0065 – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.4			
98	1-JUL-2025	Observaciones Informe Mensual 1 – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
99	2-JUL-2025	Respuesta OF 068 Firma apoyo SST – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
100	2-JUL-2025	Entrega informe mensual No. 3 interventoría – Supervisión.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
101	2-JUL-2025	Entrega Acta de Comité No. 38 del 01-07-25 – Supervisión – Contratista	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
102	3-JUL-2025	102. Citación comité No.39 – Contratista.	Consorcio Adecuaciones CAR
103	4-JUL-2025	103. Entrega actas comité originales – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
104	4-JUL-2025	Traslado 0F 074 cumplimiento entrega insumos – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
105	4-JUL-2025	Respuesta OF 060 Plan de contingencia – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
106	4-JUL-2025	Alcance OF 074 aval y solicitud inclusión NP – supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
107	5-JUL-2025	Reiteración Observaciones Informe Mensual 1 – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
108	5-JUL-2025	Observaciones informe No.2 obra – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
108.1	7-JUL-2025	108.1 Respuesta OF 0062 y 0073 APU contractuales – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
109	7-JUL-2025	Traslado OF 073 materiales faltantes Vergara, Peña – supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
110	7-JUL-2025	Respuesta OF 74 y 076 faltante insumos – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
111	7-JUL-2025	Solicitud citación contratista insumos comité – Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
112	8-JUL-2025	Solicitud entrega doc personal M.O -Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
113	8-JUL-2025	Entrega acta comité No 40 08-07-25 - Contratista – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
114	10-JUL-2025	Entrega acta comité No.41 y compromisos – Contratista	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
115	11-JUL-2025	Solicitud cambio inspector 2 intervenoria – Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
116	11-JUL-2025	Citación revisión Memorias – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
117	12-JUL-2025	Entrega acta comité y compromisos No 42 – 43 – 44 - Contratista – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
118	12-JUL-2025	Entrega Actas 7-14 – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
119	12-JUL-2025	Entrega informe Quincenal No.5 – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR

120	15-JUL-2025	Entrega de acta No.45 y compromisos - Contratista, supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
121	15-JUL-2025	Entrega acta No.46 y compromisos – Contratista, supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
122	15-JUL-2025	Respuesta OF 084 observaciones plan contingencia – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
123	16-JUL-2025	Observaciones informe mensual No.3 obra – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
124	16-JUL-2025	Respuesta comunicado CAC 0081 anexo ambiental – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
125	16-JUL-2025	Solicitud entrega de balance de obra -Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
126	16-JUL-2025	Aval y entrega plan SG-SST y Ambeintal obra – Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
127	18-JUL-2025	Entrega acta comité No 47-48-49-50 – Contratista – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
128	19-JUL-2025	Reiteración entrega actas de vecindad – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
129	19-JUL-2025	Solicitud asistencia profesional obra a comités de seguimiento – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
130	21-JUL-2025	Citación comité de seguimiento No.51 – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
131	21-JUL-2025	Entrega plan SG-SST interventoría – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
132	21-JUL-2025	Respuesta OF 94 informe mensual No.2 obra – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
133	22-JUL-2025	Solicitud entrega planos récord entornos finalizados – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
134	22-JUL-2025	Entrega acta comité No.51 – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
135	24-JUL-2025	Entrega acta comité No 52- Contratista – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
136	26-JUL-2025	Entrega informe Quincenal No.6 – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
137	30-JUL-2025	Respuesta OF 101 Plan contingencia – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
138	30-JUL-2025	Respuesta OF 104 personal Caparrapi – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
139	31-JUL-2025	Reiteración entrega planos record – contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
140	31-JUL-2025	Respuesta OF 096 publicación C. ambiental – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
141	31-JUL-2025	Respuesta OF 98 acta parcial No.1 – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
142	31-JUL-2025	Entrega acta comité y compromisos No 54-55 - Contratista – Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR
143	31-JUL-2025	Entrega acta y compromisos No.56 – Contratista, supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.5			
144	1-AGO-2025	Notificación cambio R.L inter – Supervisión.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
145	1-AGO-2025	Notificación cambio de R.L inter – Contratista.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
146	2-AGO-2025	Observaciones informe mensual No.3 V02 – Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
147	4-AGO-2025	Observaciones inf mensual No.2 V03 OF 105 – Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
148	8-AGO-2025	Entrega informe mensual No.4 interventoría – Supervisión.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR

149	8-AGO-2025	Entrega acta comité y compromisos No 53 y 57 – Contratista – Supervisión.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
150	8-AGO-2025	Solicitud entrega informe mensual No.4 obra – Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
151	8-AGO-2025	Respuesta OF 109 plan contingencia V04 – Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
152	11-AGO-2025	Entrega informe Quincenal No.7 – Supervisión.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
153	12-AGO-2025	Alcance OF 144 y respuesta rad 20252075228 – Supervisión.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
154	13-AGO-2025	Citación comité de seguimiento y control – Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
155	16-AGO-2025	Entrega acta y compromisos comité No.62 – Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
156	16-AGO-2025	Entrega acta comité y compromisos No 60-61 y 63 – Contratista – Supervisión.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
157	19-AGO-2025	Entrega actas comité No.58 y 59 – Contratista – Supervisión.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
158	19-AGO-2025	Respuesta OF 0112 y 0126 Informe mensual No.4 obra – Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
159	19-AGO-2025	Entrega acta comité No 64 – Contratista – Supervisión.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
160	20-AGO-2025	Entrega acta comité No 65 – Contratista – Comité.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
161	20-AGO-2025	Entrega acta comité No 66 – Contratista – Supervisión.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
162	20-AGO-2025	Entrega acta comité No 67 – Contratista – Supervisión.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
163	21-AGO-2025	Entrega acta comité No 68 – Contratista – Supervisión.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
164	22-AGO-2025	Respuesta OF 125 ensayos laboratorio – Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
165	22-AGO-2025	Respuesta OF 118 obs inf 3 V03 – Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
166	22-AGO-2025	Entrega acta comité No 69 – Contratista – Supervisión.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
167	22-AGO-2025	Entrega acta comité No 70 – Contratista – Supervisión.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
168	23-AGO-2025	Entrega informe Quincenal No.8 – Supervisión.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
169	25-AGO-2025	Entrega Acta 39 – Contratista – Supervisión.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
170	26-AGO-2025	Entrega de acta y compromisos comité No.71	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR

171	27-AGO-2025	Respuesta rad 20252054161 Atención a observaciones inf No.1 interventoría V02	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
172	28-AGO-2025	Observaciones documentación SST y Ambiental inicial	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
173	28-AGO-2025	Entrega acta comité No 72 y compromisos	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
174	28-AGO-2025	Entrega acta comité No 73	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
INFORME MENSUAL No.6			
175	4-SEP-2025	Entrega acta comité No 75	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
176	4-SEP-2025	Citación mesa de trabajo revisión cuenta e informes	Consorcio Adecuaciones CAR
177	5-SEP-2025	Entrega actas comité No.76 y 79	Consorcio Adecuaciones CAR
178	5-SEP-2025	Entrega informe mensual No.5 inter	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
179	6-SEP-2025	Entrega informe quincenal No.9	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
180	8-SEP-2025	No aval intercambio Resi – Tec	Consorcio Adecuaciones CAR
182	9-SEP-2025	Respuesta rad 20252055693 obs inf No.2 inter	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
183	9-SEP-2025	Entrega acta comité No 77	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
184	9-SEP-2025	Entrega acta comité No 78	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
185	9-SEP-2025	Entrega acta comité No 80	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
186	9-SEP-2025	Entrega acta comité No 81	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
187	9-SEP-2025	Entrega acta comité No 82	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
188	10-SEP-2025	Aval y entrega plan de contingencia	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
189	11-SEP-2025	Solicitud entrega NP	Consorcio Adecuaciones CAR
190	11-SEP-2025	Reiteración a observaciones doc SST	Consorcio Adecuaciones CAR
191	11-SEP-2025	Entrega acta comité 80.1 NP	Consorcio Adecuaciones CAR
192	12-SEP-2025	Observaciones NP	Consorcio Adecuaciones CAR
193	13-SEP-2025	Solicitud gestión entrega entornos	Consorcio Adecuaciones CAR
194	13-SEP-2025	Respuesta entrega Neusa	Consorcio Adecuaciones CAR
195	13-SEP-2025	Respuesta OF 195 Obser inf No.5	Consorcio Adecuaciones CAR
196	15-SEP-2025	Entrega acta comité No 83	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
197	15-SEP-2025	Entrega acta comité No 84	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
198	15-SEP-2025	Entrega acta comité No 85	Consorcio Adecuaciones CAR

			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
199	15-SEP-2025	Entrega acta comité No 86	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
200	15-SEP-2025	Entrega acta comité No 87	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
201	15-SEP-2025	Observaciones cuenta parcial No.1 obra	Consorcio Adecuaciones CAR
203	18-SEP-2025	Respuesta OF 150 doc inicial SST	Consorcio Adecuaciones CAR
204	18-SEP-2025	Observaciones actividades IED Korea Peña	Consorcio Adecuaciones CAR
205	20-SEP-2025	Entrega informe quincenal No.10	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
207	22-SEP-2025	Respuesta OF 151 Inf No.2 V06	Consorcio Adecuaciones CAR
208	22-SEP-2025	Entrega acta comité No 88	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
209	22-SEP-2025	Entrega acta comité No 89	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
210	22-SEP-2025	Entrega acta comité No 90	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
211	22-SEP-2025	Llamado de atención inicio Manta, Cajicá	Consorcio Adecuaciones CAR
212	22-SEP-2025	Entrega acta comité No 91 y solicitud entrega insumos pendientes	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
213	23-SEP-2025	Entrega acta comité No 92	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
214	25-SEP-2025	Observaciones act Agua de Dios	Consorcio Adecuaciones CAR
215	25-SEP-2025	No cumplimiento plan de contingencia	Consorcio Adecuaciones CAR
216	25-SEP-2025	Entrega acta comité No 93	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
217	25-SEP-2025	Entrega acta comité No 94	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
218	26-SEP-2025	Entrega acta comité No 95	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
219	30-SEP-2025	Reiteración inicio de actividades Cajicá	Consorcio Adecuaciones CAR
220	30-SEP-2025	Entrega acta comité No 96 y compromisos	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
221	30-SEP-2025	Reiteración atención OSB doc SST y Ambiental	Consorcio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No. 7			
222	1-OCT-2025	Respuesta OF 163 Alcance NP	Consorcio Adecuaciones CAR
223	1-OCT-2025	Solicitud entrega cantidad reservorios	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
224	1-OCT-2025	Observaciones actividades Manta	Consorcio Adecuaciones CAR
225	2-OCT-2025	Entrega acta comité No 97	Consorcio Adecuaciones CAR

			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
226	3-OCT-2025	Entrega acta comité No 99	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
227	4-OCT-2025	Entrega informe Quincenal No.11	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
228	6-OCT-2025	Observaciones Actividades Obra	Consorcio Adecuaciones CAR
229	6-OCT-2025	Reiteración observaciones La Peña	Consorcio Adecuaciones CAR
230	7-OCT-2025	Aval item no previstos	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
231	9-OCT-2025	Solicitud entrega apr 131odifi acta inicio	Consorcio Adecuaciones CAR
232	9-OCT-2025	Entrega informe mensual No.6 inter	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
233	10-OCT-2025	Traslado OF 171 definiciòn diseños nuevos compostera	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
234	10-OCT-2025	Traslado OF 169 Situaciòn 131odific Cajica	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
235	10-OCT-2025	Presunto incumplimiento atraso obra	Consorcio Adecuaciones CAR
236	10-OCT-2025	Solicitud entrega planilla salarios personal	Consorcio Adecuaciones CAR
237	10-OCT-2025	Solicitud entrega relacion personal obra	Consorcio Adecuaciones CAR
238	11-OCT-2025	Observaciones La Peña	Consorcio Adecuaciones CAR
239	11-OCT-2025	Entrega acta comité No 100	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
240	11-OCT-2025	Entrega acta comité No 101	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
241	11-OCT-2025	Entrega acta comité No 102	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
242	11-OCT-2025	Entrega acta comité No 103	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
243	11-OCT-2025	Entrega informe Semanal No.28	Corporación Autónoma Regional – CAR
244	15-OCT-2025	Entrega acta comité No 98	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
245	15-OCT-2025	Llamado de 131odifica obs doc incial SST	Consorcio Adecuaciones CAR
246	16-OCT-2025	Solicitud entrega actualizada bitacora	Consorcio Adecuaciones CAR
247	16-OCT-2025	Solicitud inicio actividades Sesquile	Consorcio Adecuaciones CAR
248	17-OCT-2025	Entrega acta comité No 104	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
249	17-OCT-2025	Entrega acta comité No 105	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
250	18-OCT-2025	Solicitud entrega informe No.4 y no.5 subsanados	Consorcio Adecuaciones CAR
251	18-OCT-2025	Entrega informe Semanal No.29	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR

252	20-OCT-2025	Citacion comité seguimiento	Consorcio Adecuaciones CAR
253	20-OCT-2025	Respuesta rad 20252098498 definicion entornos	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
254	22-OCT-2025	Solcitud soporte 132odificaci poliza	Consorcio Adecuaciones CAR
255	22-OCT-2025	Observaciones informe mensual No.6	Consorcio Adecuaciones CAR
256	22-OCT-2025	Respuesta remisòn acta No.1 comité	Consorcio Adecuaciones CAR
257	24-OCT-2025	Entrega acta comité No 106	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
258	24-OCT-2025	Entrega acta comité No. 107	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
259	24-OCT-2025	Respuesta OF 168 Y 172 obs inf 1 y 2	Consorcio Adecuaciones CAR
260	24-OCT-2025	Traslado OF 184 entrega insumos faltantes	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
261	25-OCT-2025	Llamado de 132odifica Inf 4 y 5	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR - Consorcio Adecuaciones CAR
262	25-OCT-2025	Solcitud entrega doc perosnla grupo VI	Consorcio Adecuaciones CAR
263	27-OCT-2025	Entrega informe semanal No.30	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
264	29-OCT-2025	Respuesta OF 192 bitacora	Consorcio Adecuaciones CAR
265	30-OCT-2025	Entrega acta comité No 108	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
266	30-OCT-2025	Entrega acta comité No 109	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
267	30-OCT-2025	Entrega acta comité No 110	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
268	30-OCT-2025	Solicitud 132odificación forma pago inter	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
INFORME MENSUAL No. 8			
269	01-NOV-2025	Entrega acta comité No 111 – Contratista – Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
270	01-NOV-2025	Entrega acta comité No 112 – Contratista – Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
272	01-NOV-2025	Entrega informe Semanal No.31 – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
274	05-NOV-2025	Entrega de informe mensual No.7 interventoria – Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
275	06-NOV-2025	Presunto incumplimiento no entrega inf 7 – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
276	06-NOV-2025	Reiteraciòn firma bitacora – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
277	06-NOV-2025	Presunto incumplimiento aten obs inf No.6 – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
278	06-NOV-2025	Observaciones Cuenta Parcial No.1 V02 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
279	07-NOV-2025	Solicitud inicio actividades saboya y Pto Salgar – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR

280	07-NOV-2025	Entrega acta comité No 113 – Contratista – Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
281	08-NOV-2025	Entrega informe Semanal No.32 – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
282	10-NOV-2025	Observaciones Planos Cogua – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
283	11-NOV-2025	Aval entornos intervenidos Cajicá – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
284	11-NOV-2025	Aval entornos intervenidos Machetá – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
285	12-NOV-2025	Citaciòn comité CAR – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
286	13-NOV-2025	Entrega acta comité No 114 – Contratista – Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR
288	13-NOV-2025	Entrega y aval acta parcial No.1 obra - Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
289	15-NOV-2025	Entrega acta comité No 115 – Contratista – Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
290	15-NOV-2025	Entrega acta comité No 116 – Contratista – Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
291	15-NOV-2025	Entrega acta comité No 117 – Contratista – Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
292	15-NOV-2025	Observaciones Municipio Beltran- Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
293	15-NOV-2025	Solicitud Inicio Actividades La Vega, Sesquile y Cucunuba – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
294	15-NOV-2025	Entrega informe Semanal No.33 – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
295	18-NOV-2025	Solicitud Actualización Bitacora – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
296	19-NOV-2025	Solicitud Prorroga y Modificación Forma Pago CTO Interventoría - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
297	22-NOV-2025	Traslado Respuesta Solicitud Insumos – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
298	22-NOV-2025	Entrega acta comité No 118 – Contratista – Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
299	22-NOV-2025	Entrega acta comité No 119 – Contratista – Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR
300	22-NOV-2025	Entrega informe Semanal No.34 – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
301	24-NOV-2025	Observaciones Informe Mensual 3 V4 – Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
302	24-NOV-2025	Aval entornos intervenidos Chaguani – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
303	24-NOV-2025	Aval entornos intervenidos Beltran – Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
304	28-NOV-2025	Respuesta Radicado 2025110508	Corporación Autónoma Regional – CAR
305	28-NOV-2025	Entrega acta comité No 120 – Contratista – Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
306	28-NOV-2025	Entrega acta comité No 121 – Contratista – Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
307	28-NOV-2025	Entrega acta comité No 122 – Contratista – Supervisión	Consorcio Adecuaciones CAR

			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
308	29-NOV-2025	Entrega informe Semanal No.35- Supervisión	Corporación Autónoma Regional – CAR
INFORME MENSUAL No. 9			
309	05 – DIC – 2025	Entrega Informe Mensual No. 8 Interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
310	06 – DIC – 2025	Entrega acta comité No. 123	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
311	06 – DIC – 2025	Entrega acta comité No. 124	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
312	06 – DIC – 2025	Entrega acta comité No. 125	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
313	06 – DIC – 2025	Entrega informe Semanal No. 36	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
314	13 – DIC – 2025	Entrega acta comité No. 126	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
315	13 – DIC – 2025	Entrega acta comité No. 127	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
316	13 – DIC – 2025	Entrega acta comité No. 128	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
317	13 – DIC – 2025	Entrega acta comité No. 129	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
318	13 – DIC – 2025	Entrega informe Semanal No. 37	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
319	16 – DIC – 2025	Entrega actas comité originales 1 jul a 31 oct	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
320	17 – DIC – 2025	Citación Comité CAR	Consorcio Adecuaciones CAR
321	17 – DIC – 2025	Alcance Citación Comité	Consorcio Adecuaciones CAR
322	20 – DIC – 2025	Entrega acta comité No. 130	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
323	20 – DIC – 2025	Entrega acta comité No. 131	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
324	20 – DIC – 2025	Entrega acta comité No. 132	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
325	20 – DIC – 2025	Entrega acta comité No. 133	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
326	20 – DIC – 2025	Entrega acta comité No. 134	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
327	20 – DIC – 2025	Entrega informe Semanal No. 38	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR

328	22 – DIC – 2025	Entrega y aval acta parcial No. 2 obra	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
329	23 – DIC – 2025	Entrega actas comité originales 1 nov a 19 dic	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
330	27 – DIC – 2025	Entrega informe Semanal No.39	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
331	31 – DIC – 2025	Entrega Informe Mensual No.9 Interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
333	31 – DIC – 2025	Solicitud Entrega Informe Mensual	Consorcio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No. 10			
332	05 – ENE – 2026	Entrega informe Semanal No.40	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
334	07 – ENE – 2026	Solicitud Actualización Pólizas	Consorcio Adecuaciones CAR
335	08 – ENE – 2026	Observaciones Informe Mensual 9	Consorcio Adecuaciones CAR
336	13 – ENE – 2026	Entrega informe Semanal No.41	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
337	14 – ENE – 2026	Citación Comité CAR	Consorcio Adecuaciones CAR – Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
338	14 – ENE – 2026	Entrega acta comité No 135	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
339	15 – ENE – 2026	Entrega acta comité No 136	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
340	17 – ENE – 2026	Entrega acta comité No 137	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
341	17 – ENE – 2026	Entrega acta comité No 138	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
342	19 – ENE – 2026	Entrega informe Semanal No.42	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
343	19 – ENE – 2026	Entrega acta comité No 139	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
344	19 – ENE – 2026	Respuesta DP Veeduría Contrato Obra	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
345	20 – ENE – 2026	Respuesta DP Veeduría Contrato Obra	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
346	21 – ENE – 2026	Reiteración Solicitud Actualización Pólizas y Cronograma	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
347	21 – ENE – 2026	Respuesta DP Veeduría Contrato Obra	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
348	24 – ENE – 2026	Observaciones Modificatorio y Reunión	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
349	24 – ENE – 2026	Entrega acta comité No 140	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
350	24 – ENE – 2026	Entrega acta comité No 141	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
351	24 – ENE – 2026	Entrega acta comité No 142	Consorcio Adecuaciones CAR

			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
352	26 – ENE – 2026	Entrega informe Semanal No.43	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
353	27 – ENE – 2026	Entrega acta comité No 144	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
354	28 – ENE – 2026	Entrega acta comité No 143 y Citación Comité	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
355	30 – ENE – 2026	Entrega acta comité No 145	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
356	31 – ENE – 2026	Entrega informe Semanal No.44	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
INFORME MENSUAL 11			
357	02 – FEB – 2026	Entrega Informe Mensual No. 10 Interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
358	03 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 146	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
359	02 – FEB – 2026	Entrega Actas de Comité Originales	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
360	04 – FEB – 2026	Respuesta DP Veeduría Contrato Interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
361	05 – FEB – 2026	Respuesta DP Veeduría Contrato Interventoría	VEEDURÍA
362	06 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 147	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
363	06 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 148	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
364	06 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 149	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
365	09 – FEB – 2026	Entrega Informe Semanal No. 45	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
366	09 – FEB – 2026	Traslado Entrega Circular Fechas Radicación Cuentas	Consorcio Adecuaciones CAR
367	10 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 150	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
368	10 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 151	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
369	10 – FEB – 2026	Respuesta Solicitud Reajuste Precios	Consorcio Adecuaciones CAR
370	10 – FEB – 2026	Observaciones Informe Mensual 9 V2	Consorcio Adecuaciones CAR
371	11 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 152	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
372	14 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 153	Consorcio Adecuaciones CAR

			Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
373	14 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 154	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
374	16 – FEB – 2026	Entrega Informe Semanal No. 46	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
375	17 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 155	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
376	17 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 156	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
377	18 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 157	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
378	18 – FEB – 2026	Solicitud Modificación Forma de Pago Prórroga Adición Interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
379	19 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 158	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
380	20 – FEB – 2026	Observaciones Informe Mensual 10	Consorcio Adecuaciones CAR
381	21 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 159	Consorcio Adecuaciones CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
382	23 – FEB – 2026	Entrega Informe Semanal No. 47	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
383	25 – FEB – 2026	Observaciones Modificatorio 2	Consorcio Adecuaciones CAR
384	26 – FEB – 2026	Entrega Acta Comité No. 160	Consorcio Adecuaciones CAR

Fuente: Techne S.A.S.

Anexo 3. Correspondencia enviada

Tabla 55 Correspondencia Recibida

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
No.	**Fecha**	**Asunto**	**Emisor**
1	8-MAR-2025	Respuesta al radicado 20251016023 CAR-CM-1439-2025-1. Solicitud Documentación Inicial – Supervisión.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
2	10-MAR-2025	Designación de interventoría del contrato No. 1259 de 2024 Consorcio Adecuaciones CAR	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
3	13-MAR-2025	Notificación cambio de representante legal y representante legal suplente del Consorcio Adecuaciones CAR 2025	Consorcio Adecuaciones CAR
4	17-MAR-2025	Alcance al radicado CAR No. 20252011808 del 10 de Marzo de 2025- Designación de Interventoría del Contrato No. 1259 de 2025 – CONSORCIO ADECUACIONES CAR.	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
5	18-MAR-2025	Respuesta al oficio CAR-CM-1439-2025-2 con asunto “SOLICITUD INFORMACIÓN INICIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO”.	Consorcio Adecuaciones CAR
6	31-MAR-2025	Respuesta al oficio CAR-CM-1439-2025-8 con asunto “OBSERVACIONES A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN INICIAL”.	Consorcio Adecuaciones CAR
7	4-ABR-2025	Respuesta al oficio AC-CAR-LP-1259-2025-011 con asunto "Solicitud de entrega de pólizas actualizadas"	Consorcio Adecuaciones CAR
8	4-ABR-2025	Respuesta parcial al oficio No. CAR-CM-1439-2025-10 "Observaciones a entrega de documentación inicial"	Consorcio Adecuaciones CAR
9	7-ABR-2025	Remisión de pólizas actualizadas	Consorcio Adecuaciones CAR

10	10-ABR-2025	Respuesta a solicitud de información sobre Seguridad Social	Consorcio Adecuaciones CAR
11	10-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAR-CM-1439-2025-20 información sobre seguridad social	Consorcio Adecuaciones CAR
12	23-ABR-2025	Respuesta al radicado 20251032512: SOLICITUD INFORMACION INICIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN INTERVENTORIA	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
13	23-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAR-CM-1439-2025-21 observaciones a entrega de documentación inicial	Consorcio Adecuaciones CAR
14	25-ABR-2025	Citación comité técnico	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
15	28-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAR-CM-1439-2025-25 información sobre seguridad social	Consorcio Adecuaciones CAR
16	28-ABR-2025	Respuesta a comunicado CAR-CM-1439-2025-28 información personal.	Consorcio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.2			
17	2-MAY-2025	Respuesta radicado 20251042710 Solicitud entrega de listado priorizados	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
18	5-MAY-2025	Respuesta a radicado 20251034752 Notificación cambio representante legal contrato de obra	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
19	7-MAY-2025	Entrega Informe mensual No.1	Consorcio Adecuaciones CAR
20	7-MAY-2025	Entrega ítems no previstos	Consorcio Adecuaciones CAR
21	7-MAY-2025	Solicitud cambio de personal Mínimo requerido CTO 1259-2025	Consorcio Adecuaciones CAR
22	8-MAY-2025	Remisión cronograma detallado intervención Susa	Consorcio Adecuaciones CAR
23	9-MAY-2025	Solicitud certificados de calidad y caracterización material	Consorcio Adecuaciones CAR
24	9-MAY-2025	Notificación sobre condiciones avance físico por dependencia de suministro de insumos	Consorcio Adecuaciones CAR
25	9-MAY-2025	Solicitud de aclaración sobre impuestos tasas y contribuciones aplicables CTO 1259-2025	Consorcio Adecuaciones CAR
26	12-MAY-2025	Remisión de información faltante del personal profesional	Consorcio Adecuaciones CAR
27	13-MAY-2025	Solicitud de aprobación de nuevo personal	Consorcio Adecuaciones CAR
28	19-MAY-2025	Respuesta a observaciones sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y gestión Ambiental	Consorcio Adecuaciones CAR
29	19-MAY-2025	Respuesta a observaciones informe mensual No.1	Consorcio Adecuaciones CAR
30	19-MAY-2025	Remisión Cronograma	Consorcio Adecuaciones CAR
31	21-MAY-2025	Respuesta entrega hojas de vida interventoría - Aprobación	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
32	21-MAY-2025	Complementación justificaciones	Consorcio Adecuaciones CAR
33	22-MAY-2025	Remisión física de precios unitarios - contractuales	Consorcio Adecuaciones CAR
34	22-MAY-2025	Respuesta radicado 20251041748 entrega informe semanal No.1 interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
35	24-MAY-2025	Respuesta radicado 20251041320 entrega plan de trabajo y cronograma interventoría	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
36	27-MAY-2025	Envió Cronograma de actividades de inversión actualizado del proyecto	Consorcio Adecuaciones CAR
37	27-MAY-2025	Envió actualización ítems no previstos	Consorcio Adecuaciones CAR
38	30-MAY-2025	Solicitud modificación y complementación actas de comité	Consorcio Adecuaciones CAR

39	30-MAY-2025	Informe frentes de ejecución	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
40	30-MAY-2025	Entrega de documentación subsanada AIU	Consorcio Adecuaciones CAR
41	30-MAY-2025	Respuesta a observaciones informe mensual No.1	Consorcio Adecuaciones CAR
42	30-MAY-2025	Envió de cronograma entornos asignados	Consorcio Adecuaciones CAR
43	30-MAY-2025	Respuesta a solicitud sobre modificación cronograma	Consorcio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.3			
44	5-JUN-2025	Solicitud de remisión alcances entornos grupo II	Consorcio Adecuaciones CAR
45	5-JUN-2025	Solicitud ítems no previstos 0039	Consorcio Adecuaciones CAR
46	5-JUN-2025	Remisión personal por entorno 0040	Consorcio Adecuaciones CAR
47	5-JUN-2025	Remisión informe No.2 0042	Consorcio Adecuaciones CAR
48	9-JUN-2025	Remisión ítems no previstos 0043	Consorcio Adecuaciones CAR
49	10-JUN-2025	Notificación personal técnico visita 0044	Consorcio Adecuaciones CAR
50	10-JUN-2025	Solicitud aval cronograma actualizado 0045	Consorcio Adecuaciones CAR
51	10-JUN-2025	Notificación material faltante 0049	Consorcio Adecuaciones CAR
52	11-JUN-2025	Desglose AIU 0051	Consorcio Adecuaciones CAR
53	12-JUN-2025	Acta parcial No.1 obra 0053	Consorcio Adecuaciones CAR
54	12-JUN-2025	Personal de obra Pacho 0054	Consorcio Adecuaciones CAR
55	16-JUN-2025	Solicitud cronograma materiales grupo II 0055	Consorcio Adecuaciones CAR
56	16-JUN-2025	Solicitud envío alcances grupo II y III 0056	Consorcio Adecuaciones CAR
57	16-JUN-2025	Solicitud cambio accesorios hidráulicos Chocontá 0057	Consorcio Adecuaciones CAR
58	18-JUN-2025	Respuesta observaciones mensual No.1 obra 0058 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
59	21-JUN-2025	Solicitud envió actas No. 21 y 31 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
60	24-JUN-2025	Remisión NPs - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
61	24-JUN-2025	Cronograma entrega de insumos y recorrido entornos - Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
62	24-JUN-2025	Remisiòn de items no previstos - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
63	24-JUN-2025	Remisòn correciòn APU contractuales - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
64	26-JUN-2025	Entrega Plan Contingencia - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
65	25-JUN-2025	Entrega Acta Mayores y Menores - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
66	25-JUN-2025	Alcance Entrega Balance - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
67	27-JUN-2025	Respuesta alcances OF 079 - Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
68	27-JUN-2025	Respuesta cambio tecnicos obra OF 045 - Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

69	27-JUN-2025	Respuesta materiales faltantes OF 73 - Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
70	27-JUN-2025	Respuesta certificados calidad insumos OF 41 - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
71	27-JUN-2025	Entrega informes mensuales No.1 y No.2 obra - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
72	27-JUN-2025	Respuesta Comunicado 094 - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
73	27-JUN-2025	Respuesta a requerimiento 094 parafiscales - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.4			
74	1-JUL-2025	Aclaración Ubicación Documentos Seguridad Social - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
75	1-JUL-2025	Solicitud Firma Apoyo SST - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
76	1-JUL-2025	Entrega NP 10 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
77	1-JUL-2025	Solicitud Inclusión NPs - Contratista	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Consorcio Adecuaciones CAR
78	2-JUL-2025	OF 071 Balance de obra - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
79	2-JUL-2025	Respuesta parafiscales - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
80	2-JUL-2025	Apu contractuales - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
81	3-JUL-2025	OF.74 Solicitud cumplimiento materiales - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
82	7-JUL-2025	Entrega informe mensual No.3 obra - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
83	7-JUL-2025	OF 76 Solicitud entrega de materiales peña - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
84	7-JUL-2025	Respuesta OF 111 inter - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
85	7-JUL-2025	Respuesta insumos - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
86	8-JUL-2025	OF 078 personal Saboya y la peña - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
87	8-JUL-2025	OF 077 Respuesta AIU - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
88	10-JUL-2025	Citación comité - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
89	10-JUL-2025	Respuesta 0057 Insumos Chocontá - Supervisión	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
90	9-JUL-2025	Citación entrega saboya -OF 79 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
91	9-JUL-2025	Citación entrega paso ancho Supatá OF 80 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
92	10-JUL-2025	Envío anexo ambiental informe No.3 OF 81- Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
93	11-JUL-2025	Alcance cronograma plan contingencia OF 84 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
94	10-JUL-2025	Balance de obra OF 083 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR

95	11-JUL-2025	Cierre pasuncha y Supatá OF 85 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
96	12-JUL-2025	Respuesta radicado 20251058402 mensual No.1 inter - Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
97	15-JUL-2025	0F 088 valor kit sistema recolecciòn - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
98	16-JUL-2025	OF.089 items no previstos - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
99	16-JUL-2025	OF 090 Balance de obra - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
100	17-JUL-2025	OF 091 Notificación física NP - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
101	17-JUL-2025	OF 092 Memorias ajustadas obra - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
102	17-JUL-2025	Observaciones inf No.2 interventoría - Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
103	18-JUL-2025	OF 93 Subsanación informe mensual No.1 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
104	18-JUL-2025	OF 94 Notificacion subsanaciòn informe mensual No.2 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
105	21-JUL-2025	OF 95 Entrega mesitas del colegio - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
106	21-JUL-2025	OF 96 Respuesta anexo ambiental - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
107	21-JUL-2025	OF 97 Solicitud de alcance entorno Neusa - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
108	21-JUL-2025	OF 98 Memorias acta parcial No.1 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
109	22-JUL-2025	OF 99 Atención observaciones inf mensual No.3 - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
110	22-JUL-2025	OF 100 Aclaracion actas vecindad - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
111	24-JUL-2025	OF 101 Plan contingencia ajustado - Contratista	Consorcio Adecuaciones CAR
112	28-JUL-2025	Respuesta OF 74 cumplimiento insumos - Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
113	28-JUL-2025	Respuesta OF 76 Cumplimiento insumos - Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
114	28-JUL-2025	Respuesta OF 74 item no previstos - Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
115	29-JUL-2025	Alcances grupo III - Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
116	31-JUL-2025	Respuesta OF 78 Cronograma insumos – Supervisiòn	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
INFORME MENSUAL No.5			
117	4-AGO-2025	Aprobación cambio inspector II inter - Supervisión.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
118	5-AGO-2025	OF 109 Entrega plan de contingencia V04 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
119	8-AGO-2025	OF 110 Respuesta entrega planos record - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
120	8-AGO-2025	OF 111 Solicitud provisión llave Vergara - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
121	8-AGO-2025	OF 112 Entrega inf mensual No.4 obra - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
122	11-AGO-2025	OF 113 Resp obs infor No.2 obra - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR

123	11-AGO-2025	Res obs inf No.3 obra OF 105 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
124	12-AGO-2025	Res obs inf No.3 obra OF 105 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
125	14-AGO-2025	OF 117 Alcance plan contingencia - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
126	15-AGO-2025	Rad 20252076746 pólizas acta inicio inter - Supervisión.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
127	15-AGO-2025	Rad 20252076747 obs inf No.3 inter - Supervisión.pdf	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
128	15-AGO-2025	OF 116 Remisión plan de contingencia - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
129	15-AGO-2025	OF 118 Alcance informe No.3 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
130	15-AGO-2025	OF 119 Ejecución Tibacuy - Contratista.pd	Consorcio Adecuaciones CAR
131	15-AGO-2025	OF 120 Cierre Tena - Contratista.pd	Consorcio Adecuaciones CAR
132	15-AGO-2025	OF 121 Cierre Tausa - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
133	15-AGO-2025	OF 122 Cierre Neusa Chapinerito - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
134	15-AGO-2025	OF 123 Cierre Vergara - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
135	15-AGO-2025	OF 124 Entrega DWG planos record - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
136	15-AGO-2025	OF 125 Ensayos laboratorio - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
137	15-AGO-2025	OF 126 Alcance informe No.4 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
138	19-AGO-2025	OF 127 Citación revisión informes - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
139	19-AGO-2025	OF 128 Remisión acta 58 y 59 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
140	20-AGO-2025	OF 129 Solicitud aval cambio residente - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
141	20-AGO-2025	OF 130 Remisión acta 39 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
142	21-AGO-2025	Remisión informe No.1 V04 - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
143	22-AGO-2025	OF 132 Cierre San Miguel Caldas - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
144	22-AGO-2025	OF 133 Respuesta OF 164 ensayos laboratorio - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
145	23-AGO-2025	OF 134 Cierre Quebrada Negra - Contratista.pdf	Consorcio Adecuaciones CAR
146	26-AGO-2025	OF 135- Cierre Nemocón	Consorcio Adecuaciones CAR
147	26-AGO-2025	OF-136 Remisiòn informe No.2 – Subsanaciòn observaciones	Consorcio Adecuaciones CAR
148	27-AGO-2025	OF-137 Remisiòn y respuesta plan de contingencia	Consorcio Adecuaciones CAR
149	27-AGO-2025	Observaciones SST y ambiental obra	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
150	28-AGO-2025	OF 139 Cierre San Miguel	Consorcio Adecuaciones CAR
151	28-AGO-2025	OF 138 Remisiòn informe No.3 – Subsanaciòn observaciones	Consorcio Adecuaciones CAR
152	29-AGO-2025	Remisiòn observaciones presentadas items no previstos	Consorcio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.6			
153	2-SEP-2025	Convocatoria mesa de trabajo	Consorcio Adecuaciones CAR

154	5-SEP-2025	OF 142. Cierre San Bernardo	Consorcio Adecuaciones CAR
155	8-SEP-2025	OF 143 Radicaciòn acta No.1 obra	Consorcio Adecuaciones CAR
156	8-SEP-2025	OF 144 Cierre Sibate y Soacha	Consorcio Adecuaciones CAR
157	12-SEP-2025	OF 145 Entrega inf mensual No.5	Consorcio Adecuaciones CAR
158	12-SEP-2025	OF 146 Subsanaciòn obs NP	Consorcio Adecuaciones CAR
159	12-SEP-2025	OF 147 Cierre Neusa	Consorcio Adecuaciones CAR
160	12-SEP-2025	OF 148 Cierre la peña	Consorcio Adecuaciones CAR
161	12-SEP-2025	OF 149 Cierre Tibirita	Consorcio Adecuaciones CAR
162	16-SEP-2025	OF 150 entrega atención obs SST	Consorcio Adecuaciones CAR
163	16-SEP-2025	OF 151 Remisiòn inf informe No.2	Consorcio Adecuaciones CAR
164	16-SEP-2025	OF 152 Remisiòn inf informe No.3	Consorcio Adecuaciones CAR
165	18-SEP-2025	OF 153 Cierre Sutatausa	Consorcio Adecuaciones CAR
166	18-SEP-2025	OF 154 Cierre Agua de Dios	Consorcio Adecuaciones CAR
167	20-SEP-2025	OF 155 Cierre Neusa	Consorcio Adecuaciones CAR
168	20-SEP-2025	OF 156 Remision NP	Consorcio Adecuaciones CAR
169	24-SEP-2025	OF 157 Cierre la Mesa	Consorcio Adecuaciones CAR
170	24-SEP-2025	OF 158 Cierre Pelusa	Consorcio Adecuaciones CAR
171	25-SEP-2025	OF 160 Entrega y Cierre Saboya	Consorcio Adecuaciones CAR
172	25-SEP-2025	Respuesta OF 211 llamado de atención	Consorcio Adecuaciones CAR
173	26-SEP-2025	Respuesta radicado153 y 144 cambio representante legal interventoría	Consorcio Adecuaciones CAR
174	26-SEP-2025	Respuesta radicado 153 y 144 cambio representante legal interventoría	Consorcio Adecuaciones CAR
175	28-SEP-2025	Respuesta radicado 148 informe mensual No.4 interventoría	Consorcio Adecuaciones CAR
176	28-SEP-2025	Observaciones agua de Dios	Consorcio Adecuaciones CAR
177	29-SEP-2025	Solicitud Inclusión Np ajustados	Consorcio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No.7			
178	1-OCT-2025	OF 163 inclusion NP	Consorcio Adecuaciones CAR
179	1-OCT-2025	OF 164 Solicitud remisión acta No.1	Consorcio Adecuaciones CAR
180	1-OCT-2025	OF 165 Inclusión NP	Consorcio Adecuaciones CAR
181	1-OCT-2025	OF 166 Inicio actividades Cajicá	Consorcio Adecuaciones CAR
182	2-OCT-2025	OF 167 Doc inicial SST	Consorcio Adecuaciones CAR
183	2-OCT-2025	OF 168 Solicitud aval NP	Consorcio Adecuaciones CAR
184	6-OCT-2025	OF 168 Ajuste informe SST No.1	Consorcio Adecuaciones CAR
185	2-OCT-2025	OF 169 Situación municipio Cajicá llaves	Consorcio Adecuaciones CAR

186	6-OCT-2025	OF 170 Solicitud inclusión de NP	Consorcio Adecuaciones CAR
187	8-OCT-2025	OF 171 Respuesta actividades Peña	Consorcio Adecuaciones CAR
188	8-OCT-2025	OF 172 Remisión informe 2	Consorcio Adecuaciones CAR
189	9-OCT-2025	OF 173 Observaciones Fátima	Consorcio Adecuaciones CAR
190	10-OCT-2025	OF 175 Respuesta póliza acta inicio	Consorcio Adecuaciones CAR
191	11-OCT-2025	OF 176 Entrega informe No.6	Consorcio Adecuaciones CAR
192	15-OCT-2025	Rad 8498 informe quincenal	Corporación Autónoma Regional - CAR
193	23-OCT-2025	OF 174 Respuesta llamado de atención doc SST	Consorcio Adecuaciones CAR
194	23-OCT-2025	OF 182 Respuesta aprobación pólizas obra	Consorcio Adecuaciones CAR
195	24-OCT-2025	OF 183 Entrega planillas de pago	Consorcio Adecuaciones CAR
196	24-OCT-2025	OF 184 Solicitud entrega doc faltantes	Corporación Autónoma Regional - CAR
197	25-OCT-2025	Rad 1607 ítem no previstos	Corporación Autónoma Regional - CAR
198	25-OCT-2025	OF 185 Citación cierre Cajicá	Consorcio Adecuaciones CAR
199	25-OCT-2025	OF 186 Citación cierre Machetá	Consorcio Adecuaciones CAR
200	27-OCT-2025	OF 131 Atención Obs inf 1 V07	Consorcio Adecuaciones CAR
201	27-OCT-2025	OF 187 Respuesta OF 261 Inf 4 y Inf 5	Consorcio Adecuaciones CAR
202	27-OCT-2025	OF 188 Reprogramación Cajicá	Consorcio Adecuaciones CAR
203	27-OCT-2025	OF 189 Respuesta ejecuciòn Sesquile	Consorcio Adecuaciones CAR
204	27-OCT-2025	OF 190 Respuesta inf 4 y 5	Consorcio Adecuaciones CAR
205	27-OCT-2025	OF 191. Respuesta a cordinaciòn entornos	Consorcio Adecuaciones CAR
206	27-OCT-2025	OF 192 Respuesta actualizacion Bitacora	Consorcio Adecuaciones CAR
207	28-OCT-2025	OF 194 Entrega municipio Macheta	Consorcio Adecuaciones CAR
208	29-OCT-2025	Respuesta rad 1114366 presunto incumplimiento	Corporación Autónoma Regional - CAR
INFORME MENSUAL No.8			
209	04-NOV-2025	OF 196 Alcance OF 195 Planos Cogua	Consorcio Adecuaciones CAR
210	05-NOV-2025	OF 197 Entrega informes No.1V07 y No.2 V06	Consorcio Adecuaciones CAR
211	07-NOV-2025	Respuesta OF 295 RAD 1530 compostera	Corporación Autónoma Regional - CAR
212	08-NOV-2025	Respuesta OF 53 Rad 5378 alcance entornos	Corporación Autónoma Regional - CAR
213	08-NOV-2025	OF 201. Entrega Informe Mensual 6 V02	Consorcio Adecuaciones CAR
214	08-NOV-2025	Entrega Informe Mensual 7	Consorcio Adecuaciones CAR

215	11-NOV-2025	Respuesta radicado 1108754 comité presunto incumplimiento	Corporación Autónoma Regional - CAR
216	11-NOV-2025	Respuesta radicado 1109890 inicio actividades Cajica	Corporación Autónoma Regional - CAR
217	11-NOV-2025	OF 202 Respuesta inicio actividades Pto Salgar y Saboya	Consorcio Adecuaciones CAR
218	11-NOV-2025	OF 193 Respuesta presunto incumplimiento	Consorcio Adecuaciones CAR
219	11-NOV-2025	OF 204 Entrega Anolaima	Consorcio Adecuaciones CAR
220	11-NOV-2025	OF 205 Entrega Guayabal y Beltrán	Consorcio Adecuaciones CAR
221	14-NOV-2025	Respuesta Aval Macheta	Corporación Autónoma Regional - CAR
222	14-NOV-2025	Solicitud Accesorios Faltantes Chaguani	Consorcio Adecuaciones CAR
223	18-NOV-2025	Citación Entrega Chaguani	Consorcio Adecuaciones CAR
224	18-NOV-2025	Citación Entrega Anolaima	Consorcio Adecuaciones CAR
225	18-NOV-2025	Respuesta Observaciones Beltrán	Consorcio Adecuaciones CAR
226	18-NOV-2025	Respuesta Actualización Bitácora	Consorcio Adecuaciones CAR
227	19-NOV-2025	Respuesta Observaciones Soacha	Consorcio Adecuaciones CAR
228	19-NOV-2025	Respuesta Traslado Entrega Insumos	Corporación Autónoma Regional - CAR
229	25-NOV-2025	Respuesta Radicado 1121610 Modificación Forma de Pago	Corporación Autónoma Regional - CAR
230	27-NOV-2025	Entrega Acta Parcial 2	Consorcio Adecuaciones CAR
231	28-NOV-2025	Respuesta Radicado 1122167 Entrega Informe Semanal 31	Corporación Autónoma Regional - CAR
INFORME MENSUAL No.9			
232	01-DIC-2025	OF 217 Respuesta Observaciones Inf Mensual 3 V03	Consorcio Adecuaciones CAR -
233	04-DIC-2025	OF 218 Citación cierre Útica	Consorcio Adecuaciones CAR -
234	05-DIC-2025	Entrega Informe Mensual 8	Consorcio Adecuaciones CAR -
235	10-DIC-2025	OF 220 Citación cierre Sesquilé	Consorcio Adecuaciones CAR -
236	15-DIC-2025	Respuesta Prórroga y Forma de Pago	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
INFORME MENSUAL No.10			
237	05 – ENE – 2026	Entrega Informe Diciembre	Consorcio Adecuaciones CAR -
238	13 – ENE – 2026	Entrega La Vega	Consorcio Adecuaciones CAR
239	13 – ENE – 2026	Entrega Cucunuba	Consorcio Adecuaciones CAR
240	13 – ENE – 2026	Entrega Ricaurte Apulo	Consorcio Adecuaciones CAR
241	16 – ENE – 2026	Entrega Cucunuba	Consorcio Adecuaciones CAR
242	16 – ENE – 2026	Entrega San Juan de Rio Seco	Consorcio Adecuaciones CAR

243	20 – ENE – 2026	Entrega Sesquilé y Suesca	Consorcio Adecuaciones CAR
244	23 – ENE – 2026	Observaciones y Reunión Modificatorio	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
245	21 – ENE – 2026	Subsanación Informe Mensual 9	Consorcio Adecuaciones CAR
246	26 – ENE – 2026	Entrega Pólizas y Cronograma Actualizado	Consorcio Adecuaciones CAR
247	21 – ENE – 2026	Entrega Informe No. 9 Corregido	Consorcio Adecuaciones CAR
248	26 – ENE – 2026	Citación Entrega Simijaca	Consorcio Adecuaciones CAR
249	30 – ENE – 2026	Citación Entrega Neusa	Consorcio Adecuaciones CAR
250	30 – ENE – 2026	Citación Entrega La Mesa	Consorcio Adecuaciones CAR
251	30 – ENE – 2026	Citación Entrega Utica	Consorcio Adecuaciones CAR
252	30 – ENE – 2026	Citación Entrega Ricaurte Apulo	Consorcio Adecuaciones CAR
INFORME MENSUAL No. 11			
253	03 – FEB – 2026	Entrega Modificatorio	Consorcio Adecuaciones CAR
254	03 – FEB – 2026	Solicitud Reajuste Precios	Consorcio Adecuaciones CAR
255	06 – FEB – 2026	Circular Fechas Radicación Cuentas	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
256	09 – FEB – 2026	Entrega Informe Mensual 10	Consorcio Adecuaciones CAR
257	09 – FEB – 2026	Entrega Bituima y Quipile	Consorcio Adecuaciones CAR
258	13– FEB – 2026	Entrega Caldas	Consorcio Adecuaciones CAR
259	13 – FEB – 2026	Entrega Girardot	Consorcio Adecuaciones CAR
260	13 – FEB – 2026	Entrega Puerto Salgar	Consorcio Adecuaciones CAR
261	13 – FEB – 2026	Entrega Fúquene	Consorcio Adecuaciones CAR
262	18 – FEB – 2026	Respuesta Observaciones Informe Mensual No. 9 V2	Consorcio Adecuaciones CAR
263	18 – FEB – 2026	Entrega Pólizas Modificatorio 1	Consorcio Adecuaciones CAR
264	23 – FEB – 2026	Entrega Anolaima	Consorcio Adecuaciones CAR
265	25 – FEB – 2026	Entrega Nariño	Consorcio Adecuaciones CAR
266	25 – FEB – 2026	Entrega La Palma y Topaipi	Consorcio Adecuaciones CAR
267	25 – FEB – 2026	Entrega Modificatorio V3	Consorcio Adecuaciones CAR
268	26 – FEB – 2026	Entrega San Francisco	Consorcio Adecuaciones CAR
269	26 – FEB – 2026	Entrega Girardot	Consorcio Adecuaciones CAR
270	26 – FEB – 2026	Citación Revisión Modificatorio Obra	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Fuente: Techne S.A.S.

Anexo 4. Correspondencia recibida

5.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERVENTORÍA.

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato de interventoría, se presenta a continuación el listado de actividades administrativas encomendadas por la entidad con las cuales debe cumplir la interventoría y que a fecha ha respondido diligentemente a sus funciones tal y como se presenta a continuación:

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
1. Verificar que el contratista de obra mantenga durante la ejecución del contrato el personal ofrecido en la propuesta para cada una de las Etapas del contrato.	S	La interventoría ha estado presta a revisar el personal profesional ofertado por el contratista de obra se ha observado cuando se considere necesario. Durante el desarrollo del contrato, se ha hecho seguimiento a la disponibilidad y permanencia del equipo técnico ofrecido en la propuesta, requiriendo al contratista los ajustes pertinentes cuando se han evidenciado ausencias o variaciones en los perfiles comprometidos. Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión. *Ver Anexo 9 Bitácora*
2. Exigir al contratista los informes, documentos y demás detalles para asegurar la correcta ejecución del contrato.	S	Durante el presente periodo, la interventoría ha solicitado al contratista de obra la entrega de los informes, documentos y soportes técnicos requeridos para garantizar el adecuado seguimiento y control de la ejecución contractual. Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-370**, se enviaron al contratista de obra las observaciones correspondientes al informe mensual No. 9 V2 Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-380**, se enviaron al contratista de obra las observaciones correspondientes al informe mensual No. 10
3. Realizar seguimiento al programa de trabajo y el	S	A través de los informes semanales, se ha realizado un seguimiento sistemático al progreso de las

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
cumplimiento de los plazos establecidos en el programa de trabajo del contratista, así como la ejecución de los frentes de trabajo necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual en el plazo establecido.		actividades ejecutadas por el contratista, formulando las recomendaciones y observaciones correspondientes para garantizar el cumplimiento de los componentes establecidos en el contrato. *Ver anexo 5. Informes Semanales.*
4. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral y de seguridad social vigente y verificar que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio.	S	La interventoría ha verificado el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y de seguridad industrial por parte del contratista de obra, conforme a la normatividad vigente.
5. Solicitar a la Corporación a través de la Dirección de Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano su intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud así lo ameriten.	S	Durante el periodo reportado no se presentaron sugerencias, reclamaciones o solicitudes que fueran competencia de la Supervisión.
6. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y solicitudes de tipo administrativo que realice el contratista de obra, informando de manera oportuna a la Corporación las determinaciones adoptadas que sean de su competencia.	S	La interventoría esta presta y con los canales de comunicación abiertos para atender cualquier tipo de sugerencias, reclamaciones y solicitudes que el contratista requiera. Las determinaciones adoptadas frente a dichas solicitudes han sido informadas oportunamente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, mediante comunicaciones oficiales, garantizando la trazabilidad y transparencia en las decisiones dentro del ámbito de competencia de la interventoría. Durante el periodo reportado no se presentaron sugerencias, reclamaciones o solicitudes por parte del contratista de obra que fueran de competencia de la Supervisión.
7. Verificar que el contratista cumpla con la constitución de garantías contractuales establecidas y exigir con la	S	El día 31 de diciembre de 2025 fue aprobada por la supervisión la prórroga No. 1 y modificatorio No. 1 al

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
debida anticipación su renovación o modificación. En el caso que la Corporación autorice prorrogas, la interventoría exigirá la ampliación de las garantías, y la responsabilidad de la interventoría en la ejecución del proyecto, continuará hasta que la obra haya sido liquidada y entregada sin que esto altere el valor del contrato de interventoría.		contrato No. CAR-LP-1259-2025 y el contrato No. CAR-CM-1439-2025. Teniendo en cuenta lo anterior, mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-334**, se solicitó al contratista de obra que, con ocasión del Modificatorio No. 1 al contrato de obra, proceda a actualizar las pólizas contractuales y cargarlas en la plataforma SECOP II. Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-346**, reitera al contratista de obra la solicitud de la actualización de pólizas y cronograma de obra. Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista de obra envió las pólizas actualizadas e informó que fueron cargadas en la plataforma SECOP II. Lo anterior mediante el comunicado CAR-CAR-LP-1259-2025-0244
8. Emitir concepto sobre las modificaciones que resulten durante la ejecución del contrato y someterlas a consideración de la Corporación con la respectiva justificación técnica y el análisis de beneficio en caso de requerirse cambios o modificaciones en las condiciones iniciales del proyecto, solicitudes de prórroga, reprogramaciones.	S	Mediante el comunicado **CAC-CAR-LP-1259-2025-230**, la interventoría da aval y traslada a la supervisión la solicitud de la inclusión de ítems no previstos, necesarios para la ejecución del contrato de obra. El día 31 de diciembre de 2025 fue aprobada por la supervisión la prórroga No. 1 y modificatorio No. 1 al contrato No. CAR-LP-1259-2025 y el contrato No. CAR-CM-1439-2025. Durante el periodo evaluado no se registraron actualizaciones, manteniéndose la información y condiciones previamente reportadas.
9. Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto por el contratista y solicitar los cambios a que haya lugar.	S	La interventoría ha realizado el seguimiento y control al personal técnico vinculado por el contratista de obra, verificando el cumplimiento de los perfiles, funciones y soportes exigidos conforme a la propuesta aprobada. Mediante el seguimiento a la bitácora de obra, la interventoría realiza el control de la disponibilidad del

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
		personal ofrecido por el contratista. En este sentido, se ha solicitado al contratista mantener la bitácora debidamente actualizada y disponible para su revisión. *Ver Anexo 9 Bitácora.*
10. Suscribir las actas de iniciación, suspensión, reinicio, recibo final, liquidación, actas de comité, actas con la comunidad y las demás que se requieran para el desarrollo del objeto contractual.	S	Al momento del presente informe no se han realizado modificaciones a los contratos.
11. Colaborar con la Corporación en la solución de las reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución del respectivo contrato.	S	En caso de que se presente algún tipo de perjuicio a terceros, se informara inmediatamente a la corporación con el fin de evaluar y ejecutar las soluciones pertinentes. Durante este periodo no se generaron reclamaciones de ningún tipo.
12. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista que puedan causar perjuicio a la Corporación en razón de la ejecución del contrato y colaborar en la solución de los mismos.	S	La interventoría ha informado de manera oportuna a la Entidad Contratante sobre los hechos imputables al contratista que pueden afectar el normal desarrollo del contrato. Durante el periodo evaluado no se presentaron hechos imputables al contratista que representaran riesgo o perjuicio para la Corporación; en consecuencia, no fue necesario adelantar gestiones de reporte o colaboración para su solución.
13. Presentar solicitud, debidamente motivada y sustentada técnica, económica y legal con recomendación a la Corporación de las adiciones, prorrogas, suspensiones y reiniciación.	S	El día 31 de diciembre de 2025 fue aprobada por la supervisión la prórroga No. 1 y modificatorio No. 1 al contrato No. CAR-LP-1259-2025 y el contrato No. CAR-CM-1439-2025.
14. Elaborar en conjunto con el Contratista de Obra las actas y listados de asistencia de todas las reuniones que se realicen para validación del proyecto con los actores locales y regionales involucrados en el tema.	S	En cada reunión realizada con el contratista y supervisión se ha suscrito la respectiva acta, donde se resaltan los aspectos más importantes y novedades en cuanto a las ejecuciones de obra. *Ver Anexo 2. Actas de Comité*

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
15. Elaborar y presentar a la supervisión un informe semanal, en el que se refleje para cada periodo de tiempo reportado, el avance del proyecto, información de los costos, registro fotográfico, descripción de las actividades realizadas y cumplimiento del componente HSEQ, de acuerdo al formato establecido en la Corporación para tal fin.	S	Se han elaborado y presentado los informes semanales correspondientes, en los cuales se detallan de manera específica todos los aspectos requeridos según lo establecido y solicitado por la entidad contratante *Ver Anexo 5. Informes Semanales.*
16. Solicitar copia de las planillas de pago de salarios con identificación y cargo de los trabajadores.	S	Se ha realizado la solicitud de planillas de pago de salarios cada vez que ha sido necesario. Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-370,** en el marco de las observaciones formuladas al Informe Mensual de Obra No. 9V2, y mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-380**, en el marco de las observaciones formuladas al Informe Mensual de Obra No. 10, se solicitó la remisión completa de las planillas de pago de salarios del periodo reportado.

6. SEGUIMIENTO AL PLAN HSEQ DE OBRA E INTERVENTORÍA

La interventoría Techne S.A.S. en el periodo de la referencia ha realizado seguimiento al área de HSQE, en el cual se permite informar las actividades realizadas por el contratista de obra Consorcio Adecuaciones CAR 2025.

6.1 SOCIALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PLAN HSEQ

Evidencia de la socialización del plan HSEQ al personal involucrado en obra e interventoría. Se socializan los, protocolos, procedimientos y formatos de reporte, al personal de obra.

6.2 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRA

Uso de elementos de protección personal (EPP).
Señalización de áreas de trabajo.
Reporte y seguimiento de condiciones subestándar o actos inseguros.

6.3 GESTIÓN AMBIENTAL

Control de emisiones, vertimientos y generación de ruido.
Protección de recursos naturales en el área de intervención.
Manejo adecuado de residuos

6.4 ACCIDENTES E INCIDENTE

A la fecha de corte del presente informe, no se han presentado accidentes ni incidentes laborales durante la ejecución de las actividades de obra, lo cual indica un cumplimiento adecuado de las medidas de seguridad establecidas en el Plan HSEQ.

6.5 CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Capacitaciones en seguridad laboral, uso de EPP, manejo ambiental, entre otros.
Número de personas capacitadas y temáticas abordadas.

6.6 PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA

A continuación, se presenta el personal del contratista de obra avalado a la fecha por la interventoría.

Tabla 56 Personal Profesional de Obra

CARGO	PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	José Luis Lamus Rodríguez
RESIDENTE DE OBRA	Luis Alfonso Riveira Pinto
PROFESIONAL TÉCNICO 1	Juan Manuel Franco Guzmán
PROFESIONAL TÉCNICO 2	Kewin Manfred Castañeda
PROFESIONAL TÉCNICO 3	Jonatan Alexander Feo González
PROFESIONAL TÉCNICO 4	Yeison Alonso Cárdenas Acosta
PROFESIONAL TÉCNICO 5	Dayana Robayo Lancheros

Fuente: Techne S.A.S.

6.7 PERSONAL DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con las condiciones contractuales y a la dedicación del personal profesional por parte de la interventoría, se relaciona el personal ofertado.

Tabla 57 Personal profesional de interventoría

CARGO	DEDICACIÓN	PROFESIONAL INTERVENTORÍA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	30%	Juan Carlos Aragón Pinzón
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	100%	Fredy Leonel Gómez Rincón
INSPECTOR 1	50%	Erica Andrea Ramírez González
INSPECTOR 2	50%	David Santiago Guamán Panche

Fuente: Techne S.A.S.

7. ASPECTOS FINANCIEROS

En este capítulo se realiza el seguimiento al ámbito financiero del contrato de obra, con el fin de velar por el bienestar económico del contrato y que no se presente un desequilibrio económico que ponga en riesgo el alcance contractual.

Adicionalmente, se presentan de manera detallada los aspectos financieros y contables referentes a las formas de pago, pagos de cuentas de cobro de los contratos de obra e interventoría, junto con el seguimiento al flujo de caja, cronograma y balance del contratista de obra.

7.1 CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato de obra No CAR-LP-1259 de 2025, en la cláusula decima se pacta la siguiente forma de pago:

Tabla 58 Forma de Pago Contrato de Obra

Pago	Porcentaje a Pagar	Requisitos
1	Hasta el 90%	Informe de actividades ejecutadas durante el periodo a cobrar Previa aprobación de la interventoría Certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores Certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato.
2	10%	Acta de terminación Acta de recibo a satisfacción Acta de liquidación del contrato Certificación de encontrarse a paz y salvo con los trabajadores Certificación de encontrarse al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social y ARL de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato.

Fuente: Techne S.A.S.

7.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Teniendo en cuenta lo establecido en el contrato de interventoría No. CAR-CM-1439 de 2025, la forma de pago establecida en la cláusula cuarta es la siguiente:

Tabla 59 Forma de Pago Contrato de Interventoría

Pago	Porcentaje a Pagar	Requisitos
1	Hasta el 90%	Informe pormenorizado de las actividades desarrolladas por la interventoría. Informe administrativo y financiero tanto de obra como de interventoría. Informe ejecutivo de interventoría avalando las actividades contractuales del contrato al cual le ejerce la interventoría. Memorias de cálculo de cantidades de obra, avance programado vs avance real de ejecución. Relación de personal tanto de obra como de interventoría que participa en la ejecución del proyecto, registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones.

		Certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal de interventoría y certificación de encontrarse al día en los aportes al sistema general de seguridad social y ARL. Factura Constancia del pago de los Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales o Aportes Parafiscales Certificación de encontrarse a paz y salvo con el personal según corresponda.
2	10%	Acta de terminación Acta de liquidación del contrato Recibo a satisfacción del informe final entregado donde se especifique el recibo a satisfacción de los productos finales del contrato de obra y la liquidación del mismo

Fuente: Contrato de obra CAR-LP-1259-2025

7.3 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presentan los datos relevantes sobre el estado financiero de los contratos de obra y de interventoría a la fecha:

Tabla 60 Estado Financiero del Contrato de Obra No. CAR-LP-1259-2025

Descripción	Valor	Porcentaje	Saldo por ejecutar
Valor Inicial del Contrato	$ 3.059.701.535.00	100%	-
Cuenta No 1	$145.986.376.00	4,77%	$2.913.715.159.00
Cuenta No 2	$59.169.514.00	1,93%	$2.854.545.645.00

Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 61 Estado Financiero del Contrato de Interventoría No. CAR-CM-1439-2025

Descripción	Valor	Porcentaje	Saldo por ejecutar
Valor Inicial del Contrato	$ 306.544.238.00	100%	-
Cuenta No 1	$14.622.782.00	4,77%	$291.921.456.00
Cuenta No 2	$5.946.336.00	1,93%	$285.975.120.00

Fuente: Techne S.A.S.

7.4 ANÁLISIS FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo reportado en el presente informe, no se presentaron solicitudes de pago a la interventoría.

A la fecha la interventoría ha generado el trámite respectivo de las cuentas de cobro de cada uno de los periodos, los cuales se presentan a continuación:

Tabla 62 Estado Financiero del Contrato de Interventoría No. CAR-CM-1439-2025

Cuenta	Periodo		Porcentaje	Valor	Observaciones
	Desde	Hasta			
1	1 de abril de 2025	30 de junio de 2025	4,77%	$14.622.782.00	Aprobada por la Corporación.
2	1 de julio de 2025	31 de octubre de 2025	1,93%	$5.946.336.00	Aprobada por la Corporación.
Total, acumulado			6,70%	$ $20.569.118.00	

Fuente: Techne S.A.S.

De acuerdo con lo expuesto en la solicitud radicada mediante el oficio **CAR-CM-1439-2025-268**, y radicado CAR No **20251121610** presentada por la interventoría, y tras el análisis técnico, jurídico y financiero del contenido del documento, se considera procedente la modificación de la Cláusula Cuarta "Forma de pago" del Contrato de Interventoría No. 1439-2025, con el fin de garantizar el equilibrio económico del contrato de interventoría.

Esta recomendación se sustenta en los siguientes aspectos:

- El contrato de interventoría constituye un contrato estatal de carácter autónomo e independiente del contrato de obra, tal como lo establece la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En tal sentido, sus obligaciones son de cumplimiento permanente y continuo, y su remuneración no debe estar condicionada al avance físico o financiero del contratista de obra.

  La interventoría ha mantenido presencia constante del equipo técnico y administrativo, elaborando informes, actas, comunicaciones, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, pese a la baja ejecución del contrato de obra.

En el marco del Contrato de Interventoría No. CAR-CM-1439-2025, mediante comunicación CAR-CM-1439-2025-378 del 18 de febrero de 2026, se radicó ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca — CAR— una solicitud de prórroga del contrato de interventoría hasta el 31 de diciembre de 2026, formulada de manera anticipada en atención a lo manifestado por la Supervisión en el Comité No. 157 del 17 de febrero de 2026, con el propósito de garantizar la continuidad del seguimiento integral durante el proceso de revisión y formalización del modificatorio del contrato de obra y la estructuración de los ítems no previstos. En concordancia con lo anterior, se solicitó igualmente una adición en valor por $188.642.608, equivalente a ocho meses adicionales de servicio, con el fin de asegurar la suficiencia presupuestal del contrato de interventoría durante el periodo adicional proyectado de ejecución del contrato vigilado.

7.5 SEGUIMIENTO FINANCIERO INTERVENTORÍA.

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato de interventoría, se presenta a continuación el listado de actividades financieras encomendadas por la entidad con las cuales debe cumplir la interventoría y que a fecha ha respondido diligentemente a sus funciones tal y como se presenta a continuación:

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
1. Realizar el control de las inversiones del contrato de obra, velando porque el contratista destine los recursos necesarios para el buen desarrollo del mismo.	S	Se ha venido llevando el control presupuestal y se ha reportado en los informes semanales de interventoría. *Ver anexo 5. Informes Semanales.*
2. Tramitar los pagos del contrato de obra de acuerdo con lo pactado en la minuta y velar porque todos los desembolsos entregados al contratista se utilicen única y exclusivamente en los gastos en que el contratista deba incurrir con ocasión de la ejecución del mismo.	S	Durante el período reportado en el presente informe, no se presentaron solicitudes de pago ante la interventoría.

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
3. Verificar y exigir mensualmente los pagos del personal vinculado al contrato de obra y los pagos de seguridad social y parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente.	S	La interventoría ha verificado el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y de seguridad industrial por parte del contratista de obra, conforme a la normatividad vigente.
4. De igual forma al presentarse obras adicionales y mayores cantidades de obra, realizará un balance financiero y de obra oportuno a fin de determinar los alcances del proyecto y recomendará la posible suscripción de contratos modificatorios que no afecten el presupuesto oficial ni el objeto del proyecto.	S	Mediante el comunicado **CAC-CAR-LP-1259-2025-230**, la interventoría da aval y traslada a la supervisión la solicitud de la inclusión de ítems no previstos, necesarios para la ejecución del contrato de obra. Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-368**, se realiza el envío formal de los compromisos del acta de comité No. 151, correspondiente a la revisión del modificatorio e inclusión de NPs Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-377**, se realiza el envío formal de los compromisos del acta de comité No. 157, correspondiente a la revisión del modificatorio e inclusión de NPs
5. Llevar actualizado el control presupuesto y de ejecución de las obras mediante memorias de cálculo de cantidades de obra para cada uno de los informes mensuales presentados a la Supervisión del contrato de interventoría.	S	El control de presupuesto y ejecución de obra se mantienen actualizados y reportados en cada informe semanal de interventoría presentado. *Ver anexo 5. Informes Semanales.*
6. Verificar y autorizar todos los informes y demás soportes necesarios para el trámite de las órdenes de pago del Contratista de Obra, teniendo en cuenta que las mismas deben contar con todos los entregables establecidos en las actividades de asesoría técnica, y serán un documento adjunto y	S	Durante el período reportado en el presente informe, no se presentaron solicitudes de pago ante la interventoría.

Actividad	Realizado S/N	Soporte / Justificación
requerido para la entrega y recibo de cada reservorio.		
7. Verificar y dar visto a todas las actividades, actas, informes y demás soportes requeridos durante las actividades de asesoría técnica del proyecto.	S	Se ha realizado la respectiva verificación y observaciones a cada uno de los soportes requeridos durante las actividades de la asesoría técnica del proyecto. Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-370**, se enviaron al contratista de obra las observaciones correspondientes al informe mensual No. 9 V2 Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-380**, se enviaron al contratista de obra las observaciones correspondientes al informe mensual No. 10.

8. ASPECTOS JURÍDICOS

En este capítulo se realiza seguimiento jurídico y legal al contrato de obra e interventoría, en el cual se observa las fechas de iniciación de los contratos, actos jurídicos y se verifica las vigencias de las pólizas.

8.1 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones legales que se han realizado al contrato de obra:

Tabla 63 Estado legal del contrato de obra

NO.	OBJETO	FECHA DE FIRMA
1	Suscripción de Contrato	29 de enero de 2025
2	Acta de Inicio	01 de abril de 2025
3	Prórroga No. 1 y Modificatorio No. 1	31 de diciembre de 2025

Fuente: Techne S.A.S.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y el CONSORCIO ADECUACIONES CAR suscribieron la Prórroga No. 1 y Modificatorio No. 1 al Contrato CAR-LP-1259-2024, cuyo objeto es la realización de adecuaciones menores e instalación de alternativas ecoeficientes para la implementación de prácticas sostenibles en entornos sostenibles, en el marco de los proyectos de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano.

Mediante este modificatorio se prorrogó el plazo del contrato por veintinueve (29) días, desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de mayo de 2026, sin generar costos adicionales ni alterar las condiciones iniciales pactadas. En consecuencia, se modificó la cláusula de plazo, estableciendo un término total de ejecución de trece (13) meses y veintinueve (29) días contados a partir del acta de inicio.

- **Pólizas contrato de obra**

A continuación, se relaciona la trazabilidad de las pólizas expedidas por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, entregadas por el contratista de obra, para las cuales se verifican los amparos y vigencias correspondientes.

Tabla 64 Pólizas iniciales contrato de obra

No. DE POLIZA	NOMBRE DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
33-44-101259500	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/02/2025	30/04/2026	$611.940.307.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/02/2025	31/12/2028	$305.970.153.50
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	12/02/2025	12/02/2030	$611.940.307.00
33-40101083955	RCE	12/02/2025	31/12/2025	$711.750.000.00

Fuente: Pólizas contrato de obra CAR-LP-1259-2025

Tabla 65 Pólizas Acta de inicio

No. DE POLIZA	NOMBRE DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
33-44-101259500	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2025	17/06/2026	$611.940.307.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2025	17/02/2029	$305.970.153.50

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/04/2025	01/04/2030	$611.940.307.00
33-40-101083955	RCE	01/04/2025	17/02/2026	$711.750.000.00

Fuente: Pólizas contrato de obra CAR-LP-1259-2025

Tabla 66 Pólizas Prórroga

No. DE POLIZA	NOMBRE DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
33-44-101259500	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2025	30/09/2026	$611.940.307.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2025	30/05/2029	$305.970.153.50
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/05/2026	30/05/2031	$611.940.307.00
33-40-101083955	RCE	01/04/2025	30/05/2026	$875.452.500.00

Fuente: Pólizas contrato de obra CAR-LP-1259-2025

8.2 ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se realiza la relación correspondiente a las diferentes modificaciones y/o actualizaciones legales que se han realizado al contrato de interventoría:

Tabla 67 Estado legal del contrato de interventoría

NO.	OBJETO	FECHA DE FIRMA
1	Suscripción de Contrato	24 de febrero de 2025
2	Acta de inicio	01 de abril de 2025
3	Prórroga No. 1 y Modificatorio No. 1	31 de diciembre de 2025

Fuente: Techne S.A.S.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y TECHNE S.A.S. suscribieron la Prórroga No. 1 y Modificatorio No. 1 al Contrato CAR-CM-1439-2025, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable de un contrato relacionado con adecuaciones menores e implementación de alternativas ecoeficientes en entornos sostenibles.

Mediante este modificatorio se prorrogó el plazo del contrato por cinco (5) meses, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026, sin generar costos adicionales ni alterar las condiciones económicas inicialmente pactadas. En consecuencia, se modificó la cláusula sexta, estableciendo un plazo total de ejecución de catorce (14) meses contados a partir del acta de inicio. Las demás cláusulas del contrato permanecen vigentes sin modificación.

- **Pólizas contrato de interventoría**

Las pólizas fueron expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, para lo cual a la fecha se han presentado las expedidas para los actos de firma de contrato y acta de inicio; pólizas expedidas de la siguiente manera:

Tabla 68 Pólizas iniciales contrato de interventoría

PÓLIZAS INICIALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
NO. PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
11-44-101249337	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/02/2025	24/07/2026	$61.308.847.60

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES	24/02/2025	24/03/2029	$30.654.423.80
	CALIDAD DEL SERVICIO	24/03/2026	24/03/2031	$61.308.847.60
11-40-101074844	RCE	24/02/2025	24/03/2026	$284.700.000.00

Fuente: Techne S.A.S.

Tabla 69 Pólizas acta de inicio

PÓLIZAS ACTA DE INICIO				
NO. PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
11-44-101249337	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2025	29/08/2026	$61.308.847.60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES	01/04/2025	29/04/2029	$30.654.423.80
	CALIDAD DEL SERVICIO	29/04/2026	29/04/2031	$61.308.84
11-40-101074844	RCE	01/04/2025	29/04/2026	$284.700.000.00

Fuente: Techne S.A.S.

10. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Conforme con lo estipulado en el contrato de interventoría, es responsabilidad del interventor velar por los intereses de la Corporación y mantener a la Supervisión informada sobre los por menores de las actividades realizadas por cuenta del contratista de obra.

Es por ello que Techne S.A.S. en calidad de interventoría, presenta la lista de chequeo de las obligaciones contractuales del Consorcio Adecuaciones CAR contratista de obra, en donde reporta el seguimiento a las obligaciones adquiridas por el consorcio contratista.

OBLIGACIÓN	CUMPLE S/N	OBSERVACIÓN
1. Realizar la instalación y adecuaciones requeridas por cada uno de los espacios de los entornos sostenibles para el fortalecimiento a la gestión ambiental bajo las estrategias enmarcadas en los proyectos a cargo de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, las cuales deberán estar validadas y avaladas por el director de obra, la interventoría y el equipo dispuesto por parte de la CORPORACIÓN.	S	Durante el presente período se avanzó con la ejecución de las actividades de obra y se hizo entrega de obra en los municipios de Apulo, Ricaurte, Guaduas, Útica, La Mesa, Bituima, Quipile, Caldas, Puerto Salgar y Anolaima. Ver Anexo 2. Actas de Comité.
2. Presentar a la interventoría previo al inicio de la ejecución de las actividades, un plan de trabajo que incluya el cronograma de actividades de acuerdo con los requerimientos de la interventoría, con plazos de entrega, teniendo en cuenta que la ejecución del contrato tendrá lugar en la Jurisdicción de la CAR, conforme a las indicaciones de la interventoría. La jurisdicción CAR incluye zonas rurales dispersas y lugares de difícil acceso, dadas las condiciones geográficas.	S	Se ha recibido y revisado el plan de trabajo entregado por el contratista en la documentación inicial y ha atendido las observaciones realizadas por la interventoría para así garantizar que se cumple con lo requerido para la correcta ejecución del contrato.
3. Informar si durante el desarrollo de las actividades se presentan nuevas condiciones, así como imprevistos, que deban ser atendidos ocasionando unas mayores y menores cantidades	S	Durante la ejecución del contrato no se han presentado nuevas condiciones ni imprevistos que generen mayores o menores cantidades de obra. En caso de que lleguen a presentarse, la interventoría procederá a su atención y aval mediante las actas suscritas por

OBLIGACIÓN	CUMPLE S/N	OBSERVACIÓN
de obra, estas serán atendidas y avaladas por la Interventoría del contrato, mediante actas suscritas por las partes, con el respectivo soporte técnico, memorias de cálculo de cantidades y balance económico del contrato. Cuando las mayores o menores cantidades de obra causen variación del valor del contrato, esté deberá ser avalado, soportado y justificado por la Interventoría del contrato y autorizadas por el ordenador del gasto de la CAR.		las partes, con el respectivo soporte técnico, memorias de cálculo de cantidades y balance económico del contrato. Asimismo, cuando estas situaciones ocasionen variación en el valor contractual, la interventoría elaborará la justificación y soporte correspondiente para su trámite y autorización por parte del ordenador del gasto de la CAR.
4. En caso de presentarse ítems no previstos, para determinar su valor, se deberá elaborar por parte del contratista de obra el respectivo APU el cual deberá ser revisado por parte de la Interventoría, quien tendrá a su cargo su aval y aprobación y será ella quien deba solicitar la elaboración del respectivo modificatorio para la aprobación del ordenador de gasto de la CAR.	S	En caso de presentarse un ítem no previsto, en el contrato, se solicitará al contratista el respectivo APU el cual será revisado y evaluado por la interventoría para su aprobación. Actualmente se encuentra en proceso de revisión de NPs para su inclusión en el contrato. Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-368**, se realiza el envío formal de los compromisos del acta de comité No. 151, correspondiente a la revisión del modificatorio e inclusión de NPs Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-377**, se realiza el envío formal de los compromisos del acta de comité No. 157, correspondiente a la revisión del modificatorio e inclusión de NPs
5. Tomar las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio y de terceros. Deberá además instalar los elementos de señalización que permitan identificar las zonas donde se adelantan los trabajos. Verificar, vigilar y controlar que los trabajadores asignados a las obras, cumplan con todas las normas de seguridad y requisitos legales aplicables en	S	Se verificará que se implementen todas las precauciones necesarias para garantizar la protección y seguridad del personal durante la ejecución de los trabajos. Mediante los informes mensuales de obra, se verifica igualmente el uso correcto de señalización y EPP en obra.

OBLIGACIÓN	CUMPLE S/N	OBSERVACIÓN
materia de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente, durante la ejecución del contrato.		
6. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente que aplicará durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la legislación vigente y someterlo a la aprobación del Interventor, quien podrá ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria; así mismo, el Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización para velar por el cumplimiento de dichas medidas, quien actuará como Coordinador HSEQ.	S	Se recibió el SG-SST y PGA de contratista de obra, luego de su revisión, mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-126** se otorga el aval del mismo y se remite a la supervisión.
7. Reportar en el informe mensual de ejecución del contrato las actividades del componente HSE donde se describan las actividades del Sistema Integrado de Gestión (Salud, seguridad y ambiental).	S	Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-370,** en el marco de las observaciones formuladas al Informe Mensual de Obra No. 9V2, y mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-380**, en el marco de las observaciones formuladas al Informe Mensual de Obra No. 10, se incluyeron las observaciones correspondientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) presentado por el contratista de obra.
8. Entregar Matriz de identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales con sus respectivos controles operacionales, así como la identificación, medidas de prevención y atención de posibles incidentes ambientales asociados a la ejecución de las actividades del contrato, previamente a la firma acta de inicio.	S	Se recibió el SG-SST y PGA de contratista de obra, luego de su revisión, mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-126** se otorga el aval del mismo y se remite a la supervisión.
9. Entregar Matriz de Identificación, análisis, evaluación y control Peligros y	S	Se recibió la matriz de Identificación, análisis, evaluación y control de Peligros y Riesgos, específica para las actividades desarrolladas, la cual, una

OBLIGACIÓN	CUMPLE S/N	OBSERVACIÓN
Riesgos; específica para las actividades desarrolladas en el objeto contractual previamente a la firma acta de inicio.		vez avalada, no ha presentado modificaciones.
10. Presentar los documentos de los instrumentos de planeación y gestión de los peligros y riesgos, aspectos e impactos ambientales identificados, tales como planes, programas, controles operacionales y otros, asociados a la ejecución de las actividades del contrato al momento de suscribir el acta de inicio.	S	Se recibió y validó la documentación referente a los instrumentos de planeación y gestión de los peligros y riesgos, aspectos e impactos ambientales identificados, tales como planes, programas, controles operacionales y otros, asociados a la ejecución de las actividades del contrato, la cual, una vez avalada, no ha presentado modificaciones.
11. Implementar los planes, programas, controles operacionales de gestión HSE durante la ejecución del contrato y mantener registro de su ejecución.	S	Se velará por la correcta implementación y control de los planes, programas y controles operacionales de gestión HSE. Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-370,** en el marco de las observaciones formuladas al Informe Mensual de Obra No. 9V2, y mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-380**, en el marco de las observaciones formuladas al Informe Mensual de Obra No. 10, se incluyeron las observaciones correspondientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Ambiental presentado por el contratista de obra.
12. Gestionar todos los residuos generados producto de la ejecución del contrato a través de un gestor autorizado y realizar la entrega de certificaciones o actas de disposición final de los residuos generados, expedidas por el gestor autorizado, relacionando las cantidades únicas generadas, producto de las actividades realizadas en el marco del contrato, en caso de generar residuos peligrosos deberá cumplir con lo	S	La interventoría velará por la adecuada gestión y disposición de los residuos generados durante la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de lo establecido en la normatividad legal y ambiental vigente. Dada la naturaleza de adecuaciones menores y que los elementos retirados se entregan por parte del contratista de obra a las instituciones mediante acta, no se configura disposición final por parte del contratista para esos elementos. En caso de generarse residuos peligrosos, se velará para cumplir con

OBLIGACIÓN	CUMPLE S/N	OBSERVACIÓN
establecido por la normatividad legal vigente.		los establecido por la normatividad legal vigente
13. Presentar el plan de emergencia y contingencias HSE asociado a las actividades desarrolladas durante el contrato.	S	Se ha recibido el plan de emergencia y contingencia HSE asociado a las actividades desarrolladas durante el contrato. Esta documentación fue allegada mediante el comunicado. CAC-CAR-LP-1259-2025-003.
14. El contratista deberá entregar los Análisis de Precios Unitarios de cada uno de los ítems ofertados en la propuesta, así como la discriminación del A.I.U. (Administración, Imprevistos y Utilidad) y la discriminación del factor multiplicador (cuando aplique), los cuales serán revisados y avalados por la interventoría.	S	Se recibió y validó la documentación referente a los APU de los ítems ofertados en la propuesta.
15. Disponer y garantizar las herramientas, equipos y demás elementos requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades contractuales. La CORPORACIÓN por medio de la interventoría podrá requerir herramientas, equipos y cualquier otro elemento adicional que sea necesario para la correcta ejecución del objeto contractual.	S	Se verificará que los equipos y herramientas dispuestas por el contratista de obra sean las adecuadas y necesarias para el correcto desarrollo de las actividades. Ver anexo 11. Bitácora de obra.
16. Asistir a las diligencias de validación con el personal encargado de la CORPORACIÓN o en su defecto el que la interventoría determine, para realizar inspección física de los espacios en cada uno de los entornos sostenibles y verificar el estado actual de los elementos con los que realizará las intervenciones. En el caso de existir alguna observación técnica frente al proceso, dar aviso al interventor, a fin de dejar constancia de las	S	Se llevaron a cabo visitas conjuntas entre la supervisión, la interventoría y el contratista, con el propósito de realizar la inspección física detallada de los espacios en cada uno de los entornos a intervenir. Estas visitas quedaron igualmente registradas en las actas de comité correspondientes. Ver Anexo 3. Actas de comité.

OBLIGACIÓN	CUMPLE S/N	OBSERVACIÓN
condiciones y/o variables que puedan afectar la ejecución de las adecuaciones e instalaciones a realizar.		
17. Verificar a través de pruebas operativas necesarias en terreno el adecuado funcionamiento de cada instalación y adecuación realizada, conforme al Anexo Especificaciones Técnicas Detalladas y determinado en el presupuesto oficial.	S	Las visitas de verificación de herramientas incluyen la ejecución de pruebas operativas para cada equipo instalado. De presentarse observaciones asociadas a adecuaciones, estas serán consignadas en el acta del comité de interventoría correspondiente, garantizando su registro formal y el respectivo seguimiento. De igual manera, al finalizar cada visita se comparten las observaciones en el grupo de WhatsApp donde participan todas las partes. Ver Anexo 3. Actas de comité
18. Realizar la verificación de cada infraestructura a intervenir previo a iniciar la ejecución de las actividades, con el fin de garantizar que no se ocasionen daños en la estructura ya existente en las instalaciones de los entornos priorizados.	S	Previo a iniciar la ejecución de actividades se realizaron visitas en cada sitio para verificar sus condiciones. Dichas visitas quedan registradas en las actas del comité de reconocimiento de entornos correspondientes. Ver Anexo 3. Actas de comité
19. Entregar aseadas las áreas intervenidas dentro del proceso de ejecución de adecuaciones menores e instalaciones, garantizando de esta forma que los entornos sostenibles puedan recibir a satisfacción las intervenciones ejecutadas.	S	Una vez finalizados los trabajos en las áreas objeto de intervención, se procederá a realizar una verificación de la limpieza y acondicionamiento de las mismas, a fin de garantizar que se entreguen en condiciones óptimas y cumpliendo con los estándares establecidos.
20. Garantizar el cumplimiento normativo para el almacenamiento, cargue, transporte y disposición final de los escombros, y aportar la certificación de disposición final al Interventor del contrato, dando cumplimiento a la normativa vigente.	S	Una vez finalizado un entorno, se realizará la verificación y el seguimiento correspondientes para garantizar el cumplimiento adecuado de la normativa aplicable al almacenamiento, carga, transporte y disposición final de los escombros. Dada la naturaleza de adecuaciones menores y que los elementos retirados se entregan por parte del contratista de obra a las instituciones mediante acta,

OBLIGACIÓN	CUMPLE S/N	OBSERVACIÓN
		no se configura disposición final por parte del contratista para esos elementos. En caso de generarse residuos peligrosos, se velará para cumplir con los establecido por la normatividad legal vigente.
21. Levantar registro fotográfico que permita evidenciar el estado inicial de cada uno de los espacios a intervenir con las adecuaciones e instalaciones, y un registro fotográfico posterior a la intervención donde se logre observar las adecuaciones e instalaciones realizadas. Este registro fotográfico deberá contar mínimo con óptima resolución, evidenciar claramente el resultado de las intervenciones realizadas, y entregarse como soporte en los informes técnicos que se entreguen por espacio intervenido.	S	Se garantizará que el contratista de obra realice el registro fotográfico correspondiente, que evidencie tanto el estado inicial como el final de los espacios intervenidos, en cumplimiento de los requisitos establecidos para su debida documentación. A través de los informes mensuales remitidos por el contratista de obra, los registros fotográficos evidencian el estado inicial y final de los entornos intervenidos.
22. Elaborar Informes técnicos definitivos y actas de recibo a satisfacción de la implementación las adecuaciones e instalaciones donde se evidencie la puesta en marcha y funcionamiento de cada uno de los proyectos implementados de acuerdo con el formato avalado por la Corporación, una vez terminada la intervención y cuando se lo solicite el interventor.	S	Los informes mensuales de obra han sido recibidos y revisados por la interventoría; cuando presentan observaciones, son devueltos al contratista para su subsanación. Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-370**, se enviaron al contratista de obra las observaciones correspondientes al informe mensual No. 9 V2 Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-380**, se enviaron al contratista de obra las observaciones correspondientes al informe mensual No. 10.
23. Señalizar las áreas que se van a intervenir. Así mismo disponer de protección en las áreas aledañas a la obra, protegiendo el mobiliario, equipos y demás elementos que se puedan deteriorar, garantizando su	S	Se ejercerá control en las áreas a intervenir, con el propósito de garantizar una adecuada señalización y la protección de los equipos, a fin de asegurar su conservación durante el desarrollo de las actividades. Adicionalmente, mediante los informes mensuales de obra se solicitará al

OBLIGACIÓN	CUMPLE S/N	OBSERVACIÓN
conservación hasta la entrega y recibo en forma definitiva por la CORPORACIÓN.		contratista el registro fotográfico que evidencie la correcta implementación de dichas señalizaciones.
24. Disponer del personal exigido por la Corporación y garantizar el desarrollo de las obligaciones indicadas en cada uno de los perfiles, conforme al anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS.	S	Se llevará a cabo un control continuo del personal asignado a la obra y su respectiva documentación, con el fin de asegurar que cumpla con los perfiles y competencias exigidos por la corporación. Mediante el comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0015, el contratista de obra presentó la solicitud de aprobación para el cambio en el personal mínimo requerido. En respuesta, la interventoría, a través del comunicado CAR-CM-1439-2025-44, emitió las observaciones correspondientes a los perfiles de los profesionales propuestos. Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-45, se da aval a la solicitud de cambio del personal profesional de obra, donde se autoriza la sustitución de los dos profesionales salientes. Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-46, se da aval al cambio del personal mínimo, donde se informa que los profesionales entrantes cumplen con el perfil técnico requerido. A la fecha, no se han presentado más modificaciones al personal.
25. Utilizar el personal mínimo idóneo para la ejecución del contrato, conforme a lo requerido en el pliego de condiciones, para lo cual el Contratista deberá presentar copia de las Hojas de Vida con sus respectivos soportes a la interventoría y al Supervisor designado por la CORPORACIÓN. Así mismo este personal deberá de contar con Carnet y/o distintivos como Chaleco que permita su fácil reconocimiento e identificación por parte de Autoridades y	S	Se mantiene control del personal dispuesto en obra con sus respectivos soportes documentales, conforme a lo requerido en el pliego de condiciones. Mediante el comunicado CAC-CAR-LP-1259-2025-0015, el contratista de obra presentó la solicitud de aprobación para el cambio en el personal mínimo requerido. En respuesta, la interventoría, a través del comunicado CAR-CM-1439-2025-44, emitió las observaciones correspondientes a los perfiles de los profesionales propuestos.

OBLIGACIÓN	CUMPLE S/N	OBSERVACIÓN
comunidad en general. Los Gastos en que incurra el Contratista están inmersos dentro de los Gastos Administrativos.		Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-45, se da aval a la solicitud de cambio del personal profesional de obra, donde se autoriza la sustitución de los dos profesionales salientes. Mediante el comunicado CAR-CM-1439-2025-46, se da aval al cambio del personal mínimo, donde se informa que los profesionales entrantes cumplen con el perfil técnico requerido. Ver tabla 2. Profesionales contrato de obra
26. Reportar en el informe mensual de obra las actividades realizadas del componente HSE.	S	Se hará el debido seguimiento al reporte de actividades del componente HSE en cada informe mensual reportado. Mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-370,** en el marco de las observaciones formuladas al Informe Mensual de Obra No. 9V2, y mediante el comunicado **CAR-CM-1439-2025-380**, en el marco de las observaciones formuladas al Informe Mensual de Obra No. 10, se incluyeron las observaciones correspondientes al componente de HSE presentado por el contratista de obra.
27. Realizar la entrega de las adecuaciones e instalaciones realizadas conforme a las condiciones técnicas establecidas. En caso de que la interventoría o supervisión no acepte o reciba la(s) obra(s), el contratista deberá llevar a cabo las actividades y correcciones a que haya lugar, asumiendo el costo total de estas.	S	Una vez el contratista de obra entregue una adecuación o instalación, se procederá a realizar la verificación correspondiente para asegurar el cumplimiento de todos los lineamientos y requisitos establecidos por las condiciones técnicas. Dichas observaciones quedarán plasmadas en las actas de comité correspondientes a cada entrega. Durante el presente período se hizo entrega de obra en los municipios de: Apulo, Ricaurte, Guaduas, Útica, La Mesa, Bituima, Quipile, Caldas, Puerto Salgar y Anolaima. Ver Anexo 2. Actas de Comité.

10 CONCLUSIONES

- Se informa a la entidad contratante CAR que la obra presenta un atraso del **-75,67%** con respecto a la programación inicialmente aprobada por la interventoría. Ante esta situación, la interventoría ha solicitado al contratista de obra la elaboración, entrega e implementación de un plan de contingencia detallado, con el propósito de nivelar el avance de las actividades y mitigar el impacto del retraso.

- A la fecha, la Corporación ha entregado 62 municipios para intervención; de estos, trece (13) se encuentran actualmente en ejecución y pendientes de finalización.

- Durante el periodo se realizaron visitas técnicas en los municipios de Apulo, Ricaurte, Guaduas, Útica, La Mesa, Bituima, Quipile, Caldas, Fúquene, Puerto Salgar y Anolaima donde se verificaron las herramientas instaladas en los diferentes entornos intervenidos en este municipio.

- A la fecha, se encuentran en ejecución intervenciones en trece (13) municipios: Parque Neusa, Puerto Salgar, Sesquilé, Ricaurte, La Vega, Cucunubá, Guaduas, Girardot, La Mesa, Suesca, Quipile, La Palma, Arbelaez, Bituima y Caldas. Se identifica que en varios de estos municipios persisten observaciones formuladas con posterioridad a las visitas de verificación realizadas.

  "Durante las visitas de verificación de herramientas, se ha evidenciado que en varios entornos algunas llaves de mesa presentan fallas de funcionamiento, manifestadas en problemas en el sellado del paso del agua o goteos continuos. Dichas novedades han quedado registradas en las actas de comité correspondientes y han sido informadas a la supervisión.

- Teniendo en cuenta las fechas en que se realizó la entrega de insumos y el reconocimiento de los entornos, se ha identificado que el contratista de obra presenta demoras en el inicio de la ejecución en varios municipios. Adicionalmente, se evidencia que se han presentado demoras en el inicio de las obras posteriores a la entrega de los insumos.

- Durante el periodo reportado en el presente informe, no se solicitaron ni se tramitaron actas parciales de pago.

- Tras el análisis de la solicitud presentada por la interventoría, se concluye que la forma de pago actual del Contrato de Interventoría No. 1439-2025 no refleja la naturaleza autónoma y continua de las obligaciones propias de la interventoría, generando un desequilibrio económico evidente frente a los costos reales asumidos por la misma.

Juan Carlos Aragón Pinzón CC. 80.021.002 de Bogotá Director de Interventoría	Fredy Leonel Gómez Rincón CC. 1.075.672.632 de Zipaquirá Residente de Interventoría	Erica Andrea Ramírez González CC. 1.076.623.516 de Tabio Inspector de Interventoría	David Santiago Guamán Panche CC. 1.072.673.097 de Chía Inspector de Interventoría

Laura Rocío Galindo Castro
CC. 1.053.615.046 de Sogamoso
Representante Legal TECHNE S.A.S
