ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN

1. INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO

N° CONTRATO	MRAM-MC-077-2025
FECHA DEL CONTRATO	QUINCE (15) DE DICIEMBRE 2025
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 2167 QUINCE (15) DE DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ NIT:891.801.280-6 R/L CAMILO ANDRES ÁVILA MÁRQUEZ CC. 72.326.507 EXPEDIDA EN RAMIRIQUI
CONTRATISTA	JOSÉ ENRIQUE MEDINA GARCÍA CC N° 7.179.663 EXPEDIDA EN TUNJA
OBJETO	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ BOYACÁ
VALOR INICIAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($39.698.400) M/CTE
VALOR ADICIONAL	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($9.234.400) M/CTE.
VALOR TOTAL	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($48.932.800) M/CTE.
PLAZO	QUINCE (15) DIAS
PRORROGA	QUINCE (15) DIAS
PLAZO TOTAL	UN (01) MES
POLIZA No.	N/A
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	N/A
SUPERVISOR	ING. CARMEN ELVIRA PÁEZ CARO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
FECHA ACTA DE INICIO	DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION N°1	VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO	SEIS (06) DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REPROGRAMADA	VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE 2026
FECHA PRESENTE DOCUMENTO	TRECE (13) FEBRERO DE 2026

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

De acuerdo al contrato N° MRAM-MC-077-2025, los ítems contratados SON los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALQUILER VOLQUETA SENCILLA	DIA	29	$ 770.000,00	$ 22.330.000,00
2	ALQUILER CAMA BAJA	VIAJE	4	$ 710.000,00	$ 2.840.000,00
2	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO	HR	63	$ 130.000,00	$ 8.190.000,00
SUBTOTAL					$ 33.360.000,00
IVA (19%)					$ 6.338.400,00
COSTO TOTAL					**$ 39.698.400**

Según documento de adición se contrató lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
1	ALQUILER VOLQUETA SENCILLA	DIA	$ 770.000,00	4	$ 3.080.000,00
2	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO	HR	$ 130.000,00	36	$ 4.680.000,00
SUBTOTAL					$ 7.760.000,00
IVA (19%)					$ 1.474.400,00
COSTO TOTAL					**$ 9.234.400**

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realiza las actividades según las especificaciones solicitadas en el proceso de contratación número MRAM-MC-077-2025, según las necesidades de ejecución en campo, los requerimientos realizados por la supervisión y los cuales fueron actualizados en el acta de mayores y menores cantidades; además teniendo en cuenta el régimen tributario del contratista, quien no es responsable del IVA, se establece que el ítem asociado a dicho impuesto no fue objeto de ejecución, por lo tanto no se realiza el cobro del mismo y se constituye como saldo a favor del contratista; como se especifican a continuación:

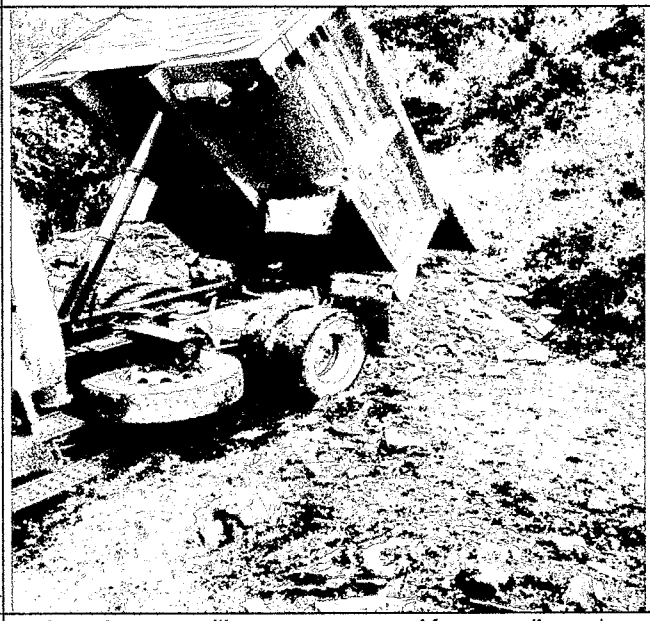
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
1	ALQUILER VOLQUETA SENCILLA	DIA	29	$ 770.000,00	33	$ 25.410.000,00
2	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO	HR	63	$ 130.000,00	120,8	$ 15.704.000,00
SUBTOTAL						$ 41.114.000,00

Se ejecutaron las actividades de mantenimiento de vías veredales mediante el alquiler de volquetas y vibro compactador, con el fin de mejorar la transitabilidad y condiciones de las vías rurales del municipio. Donde las volquetas llevaron material de escombro para los puntos más críticos de las vías y donde los campesinos a travs de mandatos apoyaron la ubicación del material; se transportó afirmadoy se utilizó el vibcrocompactador en las vías donde se encontraba el banco de maquinaría según la programación adelantada con el señor alcalde, la cual incluyo la intervención en las veredas de Ortigal, Guacamayas, Común, Farquentá, pantano largo y Santuario.

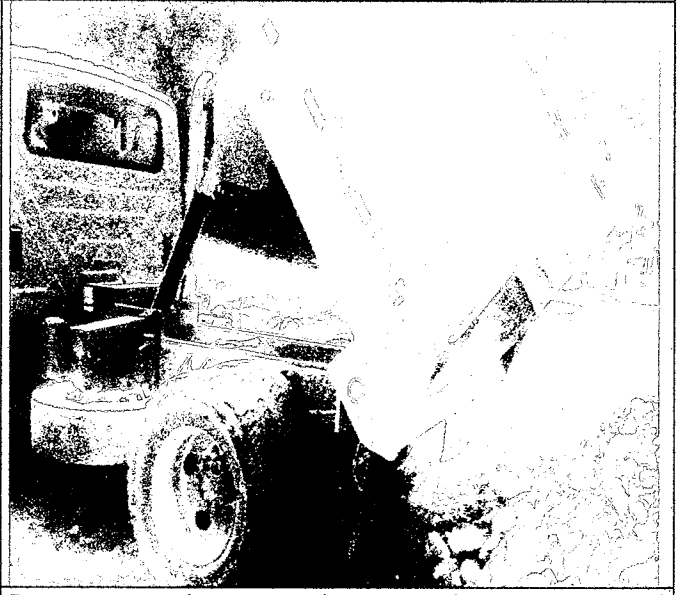
4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

A continuación, se muestra el registro fotográfico que demuestra lo realizado por el contratista.

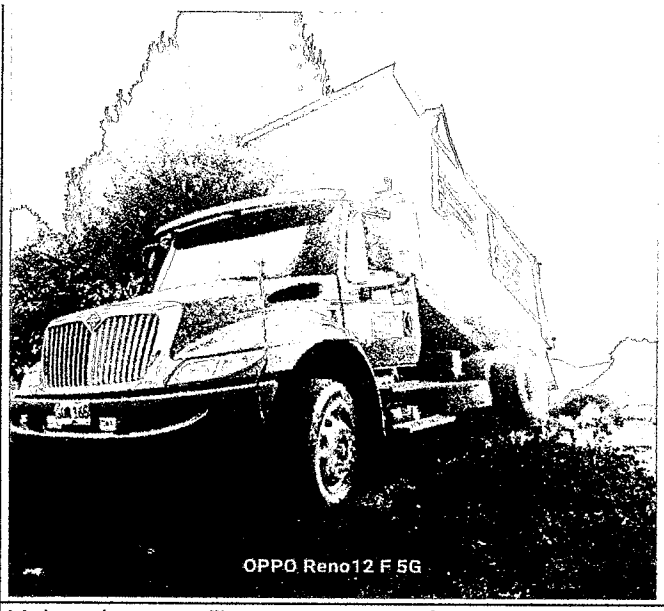
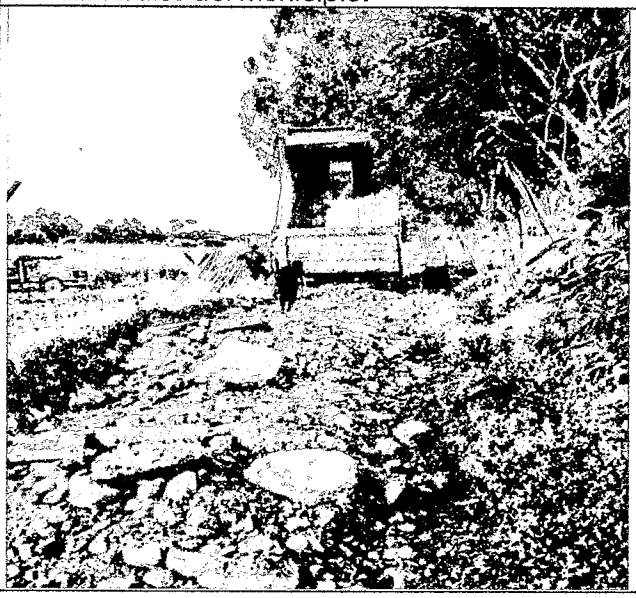
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	**ALQUILER VOLQUETA SENCILLA**	**DIA**	**33**

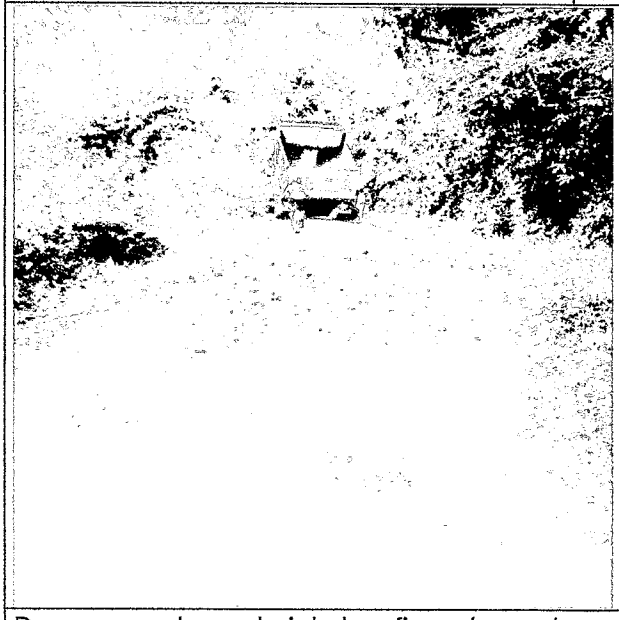
	
Volqueta sencilla en operación, realizando el transporte de escombro para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.
	
Volqueta sencilla en operación, realizando el transporte de escombro para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Volqueta sencilla en operación, realizando el transporte de escombro para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.

	
Descargue de material en tramo intervenido para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.
	
Descargue de material en tramo intervenido para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Volqueta sencilla en operación, realizando el transporte de material de afirmado para el mantenimiento de las vías del municipio.

	
Descargue de material de afirmado en tramo intervenido para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Descargue de material de afirmado en tramo intervenido para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.
	
Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.

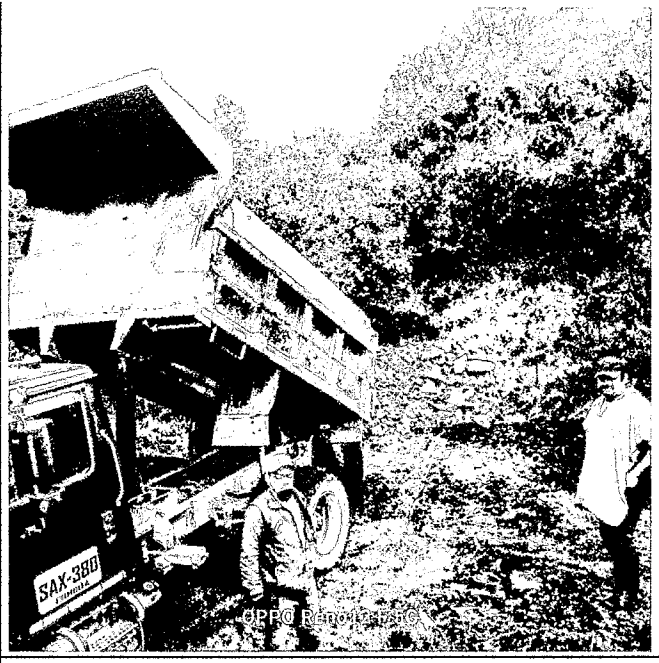
	
Descargue de material de afirmado en tramo intervenido para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Descargue de material de afirmado en tramo intervenido para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.
	
Descargue de material de afirmado en tramo intervenido para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Descargue de material de afirmado en tramo intervenido para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.

	
Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Volqueta sencilla en operación, realizando el transporte de escombro para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.
	
Volqueta sencilla en operación, realizando el transporte de escombro para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.

	
Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.
	
Descargue de material de afirmado en tramo intervenido para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Volqueta sencilla en operación, realizando el transporte de escombro para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.

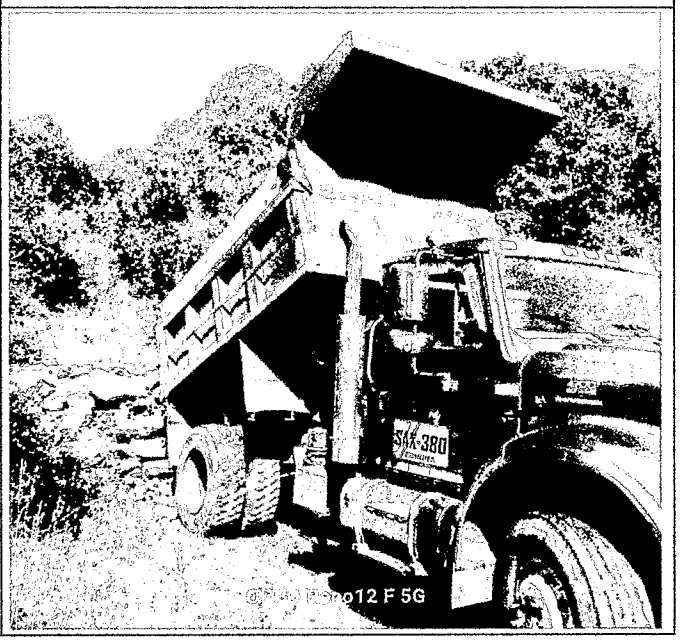


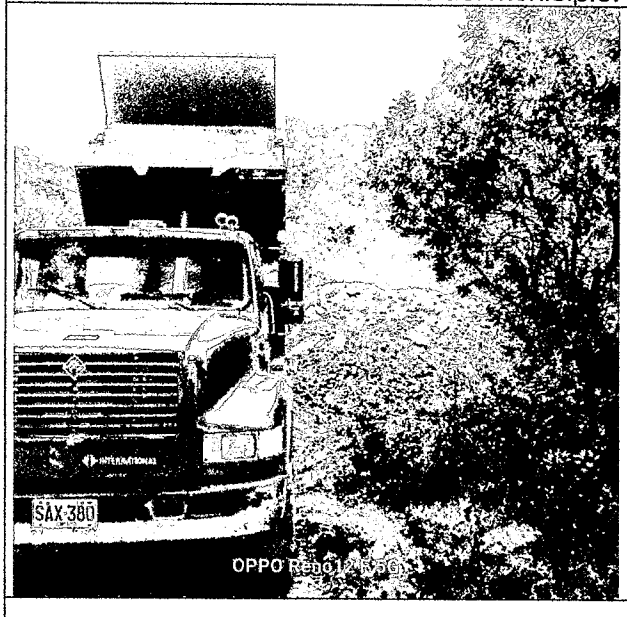
Descargue de material de afirmado en tramo intervenido para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.



Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.

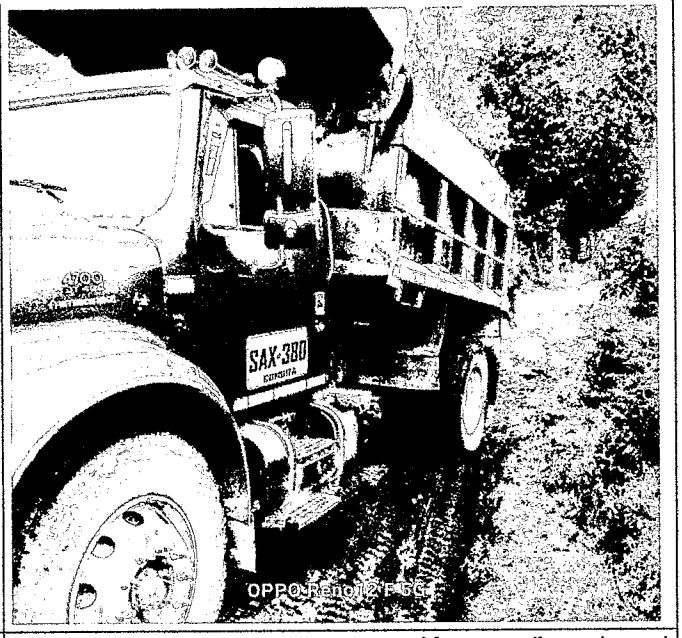




Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.
	
Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Volqueta sencilla en operación, realizando el transporte de escombro para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.
	
Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.



Volqueta sencilla en operación, realizando el transporte de escombro para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.



Volqueta sencilla en operación, realizando el transporte de escombro para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.

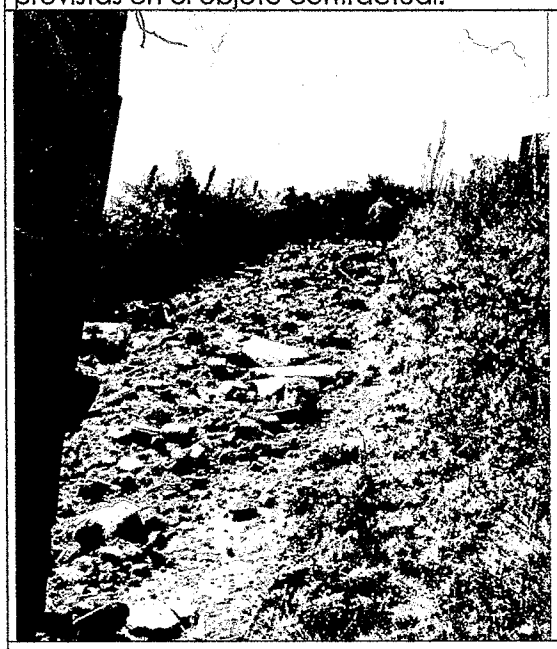
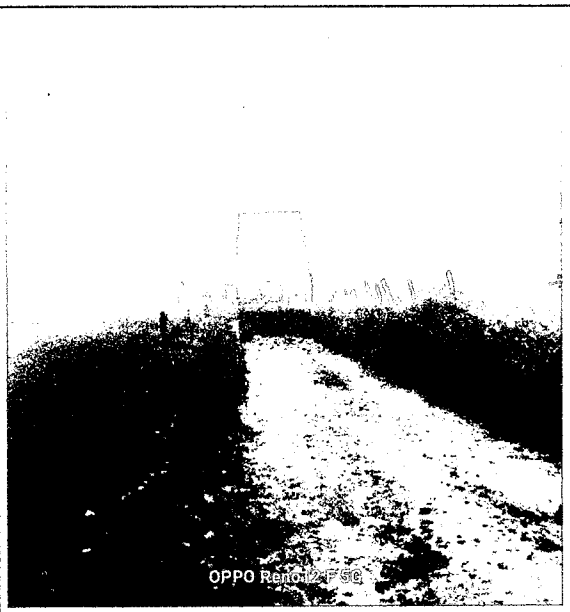


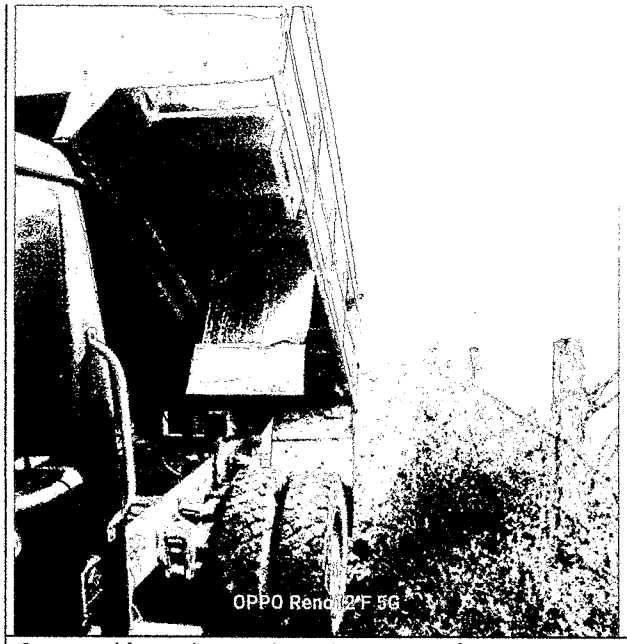
Operación de volqueta en vía rural del municipio, cumpliendo con las actividades previstas en el objeto contractual.



Descargue de material de afirmado en tramo intervenido para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.

	
Operación de volqueta en vía rural del municipio, cumpliendo con las actividades previstas en el objeto contractual.	escombro para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.
	
Operación de volqueta en vía rural del municipio, cumpliendo con las actividades previstas en el objeto contractual.	Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.

	
Operación de volqueta en vía rural del municipio, cumpliendo con las actividades previstas en el objeto contractual.	Descargue de escombro en tramo para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.
	
escombro para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Operación de volqueta en vía rural del municipio, cumpliendo con las actividades previstas en el objeto contractual.

	
Operación de volqueta en vía rural del municipio, cumpliendo con las actividades previstas en el objeto contractual.	Descargue de material de afirmado en tramo intervenido para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.
	
Descargue de material de afirmado en tramo intervenido para el mantenimiento de las vías rurales del municipio.	Operación de volqueta en vía rural del municipio, cumpliendo con las actividades previstas en el objeto contractual.

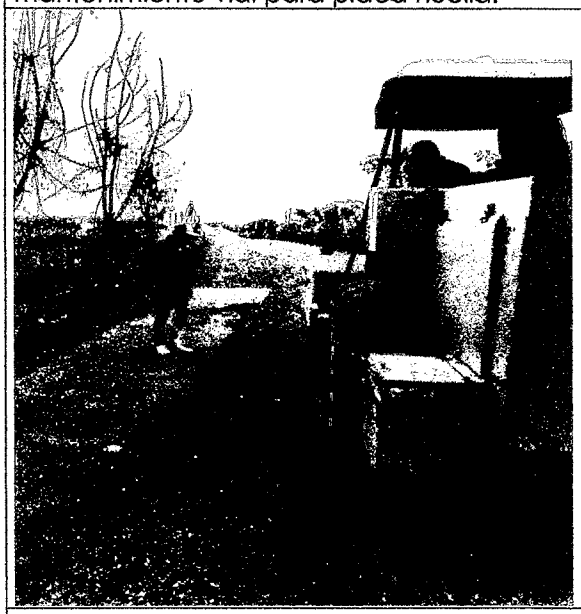
2	ALQUILER VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO	HORAS	120.8



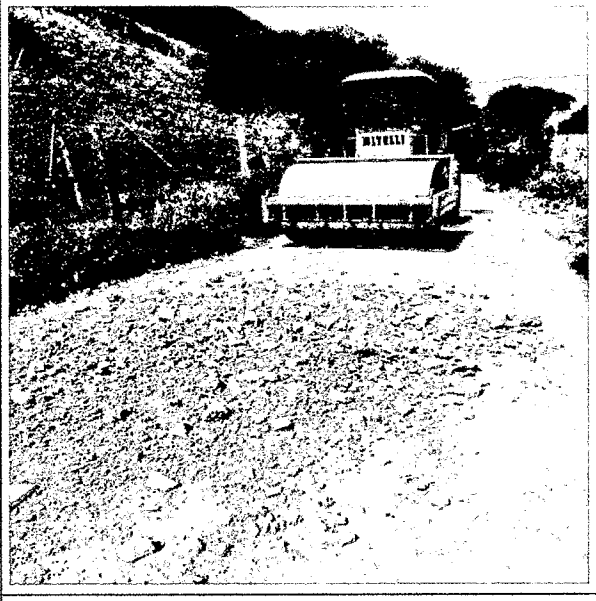
Compactación del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial para placa huella.



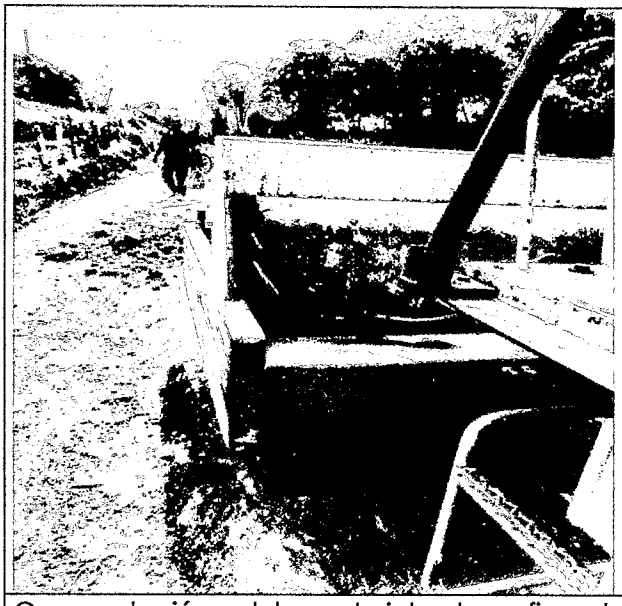
Compactación del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial para placa huella.

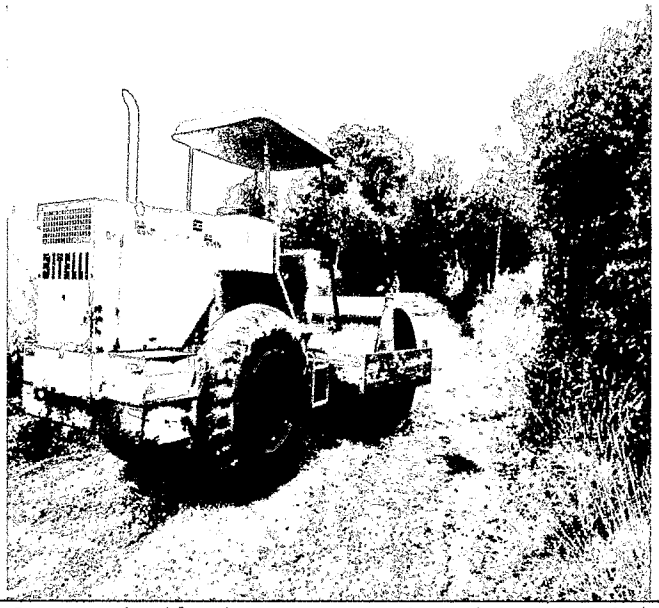


Compactación del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial para placa huella.

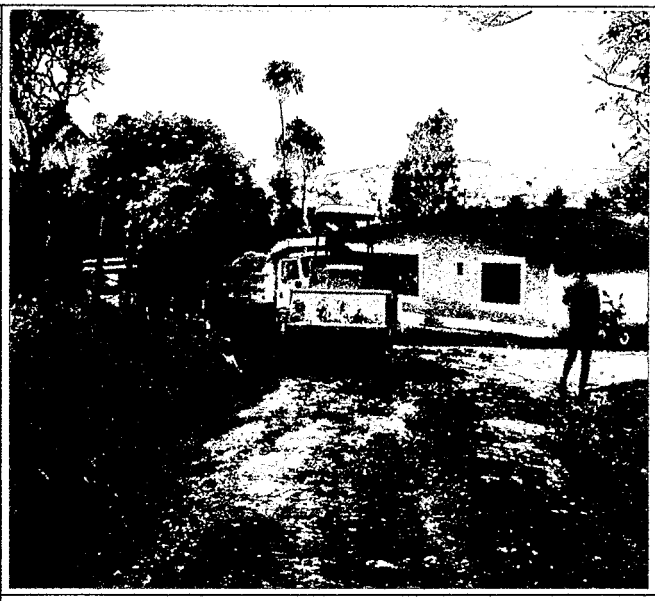


Compactación del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.

	
Compactación del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.	Compactación del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.
	
Compactación de capa rasante y del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.	Compactación de capa rasante y del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.

	
Compactación de capa rasante y del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.	Compactación de capa rasante y del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.
	
Compactación de capa rasante y del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.	Compactación de capa rasante y del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.

	
Compactación de capa rasante y del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.	Compactación de capa rasante y del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.
	
Compactación de capa rasante y del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.	Compactación de capa rasante y del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.

	
Compactación de capa rasante y del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.	Compactación de capa rasante y del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.
	
Compactación de capa rasante y del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.	Compactación de capa rasante y del material de afirmado extendido, como parte del proceso de mantenimiento vial.

FECHA	VOLQUETAS		VIBROCOMPACTADOR		
	SQW-165	SAX-380	H INICIAL	H FINAL	HORAS
20/12/2025			8240,5	8244,5	4,7
22/12/2025	1	1	8244,5	8248	3,5
23/12/2025	1		8248	8253,5	5,5
24/12/2025			8253,5	8257,5	4
6/01/2026	1	1	8257,5	8263,9	6,4
7/01/2026	1	1	8263,9	8266,5	2,6
8/01/2026			0		0
9/01/2026		1	0		0
10/01/2026			0		0
11/01/2026			0		0
12/01/2026			0		0
13/01/2026	1	1	0		0
14/01/2026	1	1	0		0
15/01/2026			8266,5	8274,5	8
16/01/2026	1	1	8274,5	8281,6	7,1
17/01/2026	0,5	0,5	8281,6	8286,4	4,8
18/01/2026			0		0
19/01/2026	1	1	8286,4	8293,9	7,5
20/01/2026	1	1	8293,9	8301	7,1
21/01/2026	1	1	8301	8307,6	6,6
22/01/2026	1		8307,6	8315,6	8
23/01/2026	1	1	8315,6	8323,6	8
24/01/2026			0		0
25/01/2026			0		0
26/01/2026	1	1	8323,6	8331,8	8,2
27/01/2026	1	1	8331,8	8340,2	8,4
28/01/2026		1	8340,2	8348,1	7,9
29/01/2026	1	1	8348,1	8355,1	7
30/01/2026	1	1	8355,1	8360,6	5,5
31/01/2026					
	16,5	**16,5**			**120,8**

5. MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Para el contrato N° MRAM-MC-077-2025 se realizó suspensión 001 debido a las fallas mecánicas presentadas en la motoniveladora, equipo indispensable para la ejecución del mantenimiento vial, las cuales requieren reparación y no pudieron ser atendidas de manera inmediata por la falta de mano de obra y repuestos durante la temporada de fin de año, imposibilitando la continuidad de las actividades contratadas

6. MOTIVO DE LA PRORROGA

Para el contrato N° MRAM-MC-077-2025 se realizó prórroga debido a que, durante la ejecución del mantenimiento de la red vial del municipio de Ramiriquí, la cantidad de horas inicialmente proyectadas resultó insuficiente, teniendo en cuenta la extensión de las vías rurales y la atención de puntos críticos. Por lo anterior, se hace necesario ampliar el plazo contractual en quince (15) días calendario para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las actividades programadas

7. MOTIVO DE LA ADICIÓN EN VALOR

Para el contrato N° MRAM-MC-077-2025 se realizó la adición debido a la necesidad de contratar un mayor número de horas de alquiler de maquinaria, especialmente de vibro compactador, ante la imposibilidad de utilizar el equipo del municipio por encontrarse fuera de servicio. contando para ello con la respectiva disponibilidad presupuestal por valor de $9.234.400

8. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN

Para el contrato N° MRAM-MC-077-2025 se realizó documentos de adición, por lo tanto, cuenta con certificado de registro presupuestal número 037, expedida por secretaria de hacienda de fecha trece (13) de enero de 2026, por un valor de nueve millones doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos ($9.234.400) m/cte.

9. FECHA DEL OTRO SÍ (DOCUMENTO MODIFICATORIO AL CONTRATO)

Para el contrato N° MRAM-MC-077-2025 se realizó documento de adición y prorroga No. 001.

10. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS

Para el contrato N° MRAM-MC-077-2025 no se solicitaron garantías.

11. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Para el contrato N° MRAM-MC-077-2025 no se realizó aprobación de garantías.

12. INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

Para el contrato N° MRAM-MC-077-2025 no se ha realizado ningún pago, por lo que según lo ejecutado por el contratista, se tiene pendiente por cancelar la suma de CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS ($41.114.000) M/CTE, según el siguiente balance

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	$39.698.400	
VALOR DEL ADICIONAL	$9.234.400	
VALOR CANCELADO EN ACTAS PARCIALES		$0
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 41.114.000
VALOR DE IVA NO COBRADO (según régimen tributario)		$7.811.660
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 7.140
SUMAS IGUALES	**$ 48.932.800**	**$ 48.932.800**

13. PROCESOS SANCIONATORIOS

Como supervisora del contrato, me permito dejar constancia que en desarrollo de la etapa contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no ha tenido que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista.

CARMEN ELVIRA PAEZ CARO
Secretaria de infraestructura pública y Movilidad
Municipio de Ramiriquí

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: *secretaria de infraestructura y movilidad urbana*
Ubicación: *Carpeta de contratación Municipio de Ramiriquí*
Elaboro: *Robinsson Castañeda -Apoyo secretaria de infraestructura pública y movilidad*
Revisó: *Carmen Elvira Páez Caro-secretaria de infraestructura pública y movilidad*
Aprobó: *Carmen Elvira Páez Caro-secretaria de infraestructura pública y movilidad*
