	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC-2056-2025 **LA URIBE - META**	

INFORME MENSUAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC-2056-2025

CONTRATISTA: GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P.

GENSA S.A. E.S.P.

CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

MME

MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA

30 DE ENERO 2026


1. INTRODUCCIÓN

El MME y GENSA S.A. ESP., suscribieron el contrato interadministrativo GGC-2056-2025 el 9 de diciembre de 2025, cuyo objeto es la *"IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE, DEPARTAMENTO DEL META*".

En ejecución del contrato en mención, se presenta a continuación el informe de las actividades adelantadas por GENSA con corte al 28 de enero de 2026.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto asociado al contrato interadministrativo se encuentra ubicado en el municipio de La Uribe, departamento del Meta.

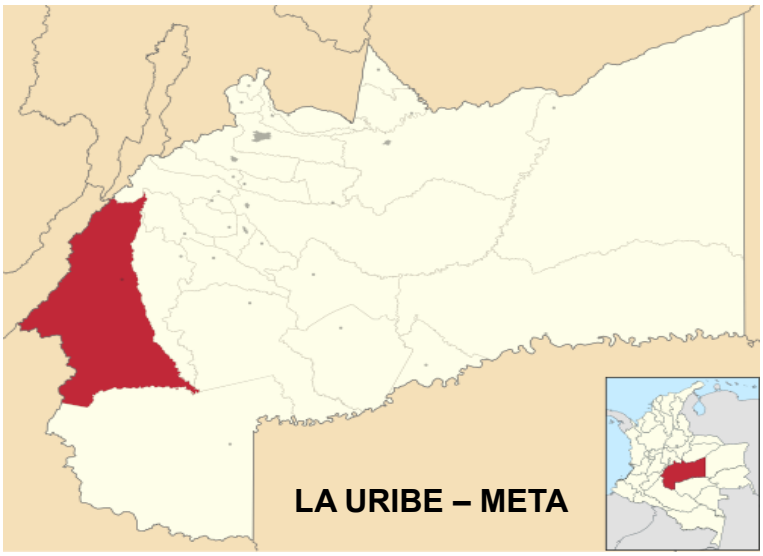

3. ALCANCE

Realizar la administración de recursos y asistencia técnica del proyecto, para lo cual deberá, gestionar, coordinar, contratar, administrar y ejecutar los recursos asignados para llevar a cabo el replanteo, el Plan de Gestión y Formación Social, la Implementación de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas SISFV en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, en el municipio de La Uribe del departamento del Meta, a través de las siguientes etapas:

- Etapa 1 – Actividades Previas y de Contratación
- Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social de la comunidad energética, Entrega Integral de la Infraestructura.
- Etapa 3 – Cierre.

4. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato Interadministrativo	GGC-2056-2025
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE, DEPARTAMENTO DEL META
Fecha de Suscripción	9/12/2025
Fecha de Inicio	27/01/2026
Plazo Inicial	31/07/2026
Valor del Contrato	TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS **$31.420’264.769**
Suscripción Encargo Fiduciario	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A 19/12/2025

4.1 PÓLIZAS

GARANTÍA		Suma Asegurada	Vigencia	
No. AB000686	**Amparo**		**Desde**	**Hasta**
Seguros La Equidad. Cumplimiento Estatal	Cumplimiento	$ 6.284.052.953,80	9/12/2025	31/01/2029
	Prestaciones Sociales	$ 1.571.013.238,45	9/12/2025	31/07/2029
	Calidad del Servicio	$ 6.284.052.953,80	9/12/2025	31/07/2027

5. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS OBRA E INTERVENTORÍA

Esta actividad se informará durante el siguiente trimestre, una vez se cumplan los hitos correspondientes.

6. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

Con corte al mes de enero de 2026 se han llevado a cabo las siguientes actividades:

- Se realiza la firma del acta de inicio del contrato interadministrativo GGC-2056-2025 con el MME el día 27 de enero de 2026.
- Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el contrato GGC-2056-2026 para el primer desembolso, se presenta ante el MME la solicitud de aprobación el día 27 de enero de 2026.

1. Suscripción del acta de inicio debidamente firmada;
2. Aprobación por parte del MME de las garantías a cargo del contratista;
3. Verificación por parte del MME, de la constitución del encargo fiduciario para el manejo de los recursos;
4. Pago de seguridad social y parafiscales por parte de GENSA;

5. Organigrama del equipo técnico y administrativo de GENSA;
6. Cronograma para los procesos de contratación de la interventoría derivada y del contratista derivado de implementación.

7. CRONOGRAMA CONTRATO GGC-2056-2025

El contrato se encuentra en el desarrollo de la Etapa 1.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. GGC-2056-2025
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE - DEPARTAMENTO DEL META

	Fecha de Suscripción Contrato: 09 Diciembre 2025	Contratista: GENSA S.A. ESP				30/01/2026
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	TIEMPO (DIAS)	FECHA FINAL	%	% Ejec.
1	**Etapa 1 - Actividades previas a la contratación y contratación**	**27/01/2026**	**53**	**20/03/2026**	**20%**	**4,0%**
1.1	Firma de Acta de Inicio con Ministerio de Minas Y Energia	27/01/2026	1	27/01/2026	1%	1,0%
1.2	Suscripción del contrato de encargo fiduciario	27/01/2026	3	29/01/2026	2%	2,0%
1.3	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad	30/01/2026	5	3/02/2026	1%	1,0%
1.4	Elaboración y publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, para la contratación de la Interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, Social, Financiera y Contable	4/02/2026	15	18/02/2026	2%	0,0%
1.5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para contrato de Interventoría	18/02/2026	7	24/02/2026	2%	0,0%
1.6	Firma de contrato de Interventoría y suscripción de Acta de inicio	25/02/2026	6	2/03/2026	2%	0,0%
1.7	Elaboración y publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, para la contratación de obra para la ejecución del proyecto	2/03/2026	10	11/03/2026	2%	0,0%
1.8	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para contrato de obra para la Implementación del proyecto	11/03/2026	7	17/03/2026	2%	0,0%
1.9	Firma de contrato de obra y suscripción de Acta de inicio	18/03/2026	6	23/03/2026	2%	0,0%
1.10	Cronograma del contratista derivado. Aprobados por interventoría y avalado por GENSA S.A. E.S.P.	23/03/2026	8	30/03/2026	1%	0,0%
1.11	Verificar la realización de Consultas Previas, existencia de servidumbres y/o permisos de paso, licencia o permiso ambiental, las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo (En caso de Aplicar).	13/03/2026	7	19/03/2026	2%	0,0%
1.12	Firma Acta de terminación actividades previas a la contratación, entre GENSA S.A. E.S.P., SU CONTRATISTA DERIVADO, EL INTERVENTOR Y EL MME	20/03/2026	1	20/03/2026	1%	0,0%

8. COMPONENTE TÉCNICO

INDIVIDUALES				
No. DE USUARIOS				
PANELES	**INVERSORES**	**CONTROLADORES**	**BATERÍAS**	**SISTEMA DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA**
2 paneles 605 W Monocristalinos tipo PERC “Half Cell”	Inversor de onda senoidal pura 24 Vdc a 2.000 W, 60 Hz	Controlador MPPT solar de 60A, 12/24V con eficiencia mínima 96% para baterías LiFePO4	Batería Litio 200A-h a 25,6 Vdc 5000 Ciclos DoD hasta el 80%	Medidor prepago monofásico con sistema de gestión de recaudo con comunicación off line, 120V 5A (80A). Telemedida.

9. INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de GENSA, se realiza seguimiento al esquema de vacunación del personal que viaja a zonas endémicas; con el fin de actualizar la información relacionada con el estado de vacunación contra fiebre amarilla y tétano.

Si el destino de desplazamiento cuenta con riesgos por enfermedades transmitidas por vectores u otras condiciones ambientales, es fundamental contar con las medidas de prevención necesarias, incluyendo las vacunas requeridas





10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

GENSA hace la verificación de la documentación de formulación entregada por el MME para cada proyecto. Para ello se cuenta con una lista de chequeo que permite validar la información existente y los posibles faltantes. Para los componentes social y ambiental se verifican, entre otros, los siguientes documentos:

- Certificación de Parque Nacionales Naturales en donde se establezca si las comunidades beneficiarias se encuentran o NO ubicadas en áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
- Certificación del trámite de la Licencia Ambiental y/o permisos ambientales complementarios o aval ambiental ante la autoridad ambiental competente, necesarios para la debida ejecución del proyecto.
- Caracterización ambiental (línea base) de los recursos naturales.
- Identificación y evaluación de impactos ambientales.
- Plan de manejo ambiental (medidas de mitigación, corrección, compensación y/o prevención, entre otras).
- Determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa.
- Actas de socialización.

11. COMPONENTE SOCIAL

- Los días 22 y 23 de enero de 2026, el ingeniero Julio Mauricio Arce Posso, como Líder de Proyectos de GENSA, asiste a las jornadas de capacitación y transferencia de conocimiento de la Escuela para la Transición Energética Justa en el marco de la estrategia Nacional de Comunidades Energéticas impartida por el MME.


En estas se marcaron como objetivos, el fortalecimiento de las capacidades; garantizar una aplicación real y coherente de los conceptos y obtener una articulación entre los actores que se centran en los equipos que el MME ha definido como social, técnico y data. Así mismo, se manifestó que serían enviadas a GENSA las presentaciones de estas jornadas, con los ajustes realizados en función de los comentarios obtenidos. A la fecha no se ha recibido dicha información.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Para los próximos informes se presentará el registro fotográfico correspondiente a este proyecto.

13. CONCLUSIONES

- El avance general del Contrato Interadministrativo GGC-2056-2025 al 30 de enero de 2026, de acuerdo con el cronograma, es del 4%, a continuación, se presenta la curva S:

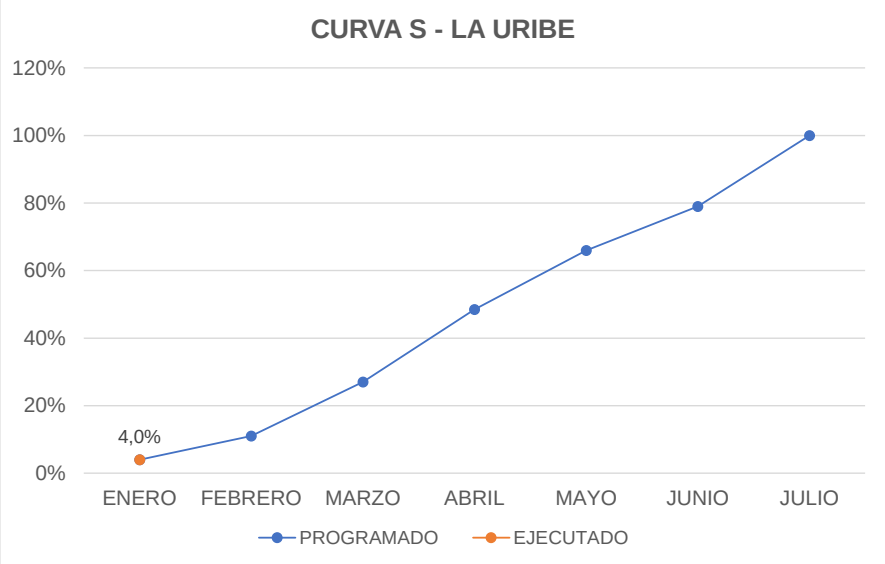

14. ANEXOS

- Cronograma general GGC-2056-2025.
- Lista de chequeo documentación formulación

Elaboró: Carlos Alberto Triana Grajales -Profesional Especializado en Proyectos GENSA

Revisó: Julio Mauricio Arce Posso - Líder de Proyectos en Sector Eléctrico GENSA
