CONSORCIO SES Guainía	**INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA**

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
MES DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DG-106-2024

OBJETO DE CONTRATO:

"CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA"

CONTRATANTE
DISPAC S.A. E.S.P.

CONTRATISTA
CONSORCIO SES GUAINIA

BOGOTÁ D.C. – FEBRERO 2026

CONSORCIO SES Guainía	INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ALCANCE DEL INFORME 5
3. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 6
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
   - 4.1 MICRORED DE 99 KWP – COMUNIDAD ZANCUDO 7
   - 4.2 MICRORED DE 56,1KWP – COMUNIDAD BELLAVISTA 8
   - 4.3 MICRORED 39,6KWP – COMUNIDAD PUNTA RATÓN 10
5. COMPONENTE SOCIAL Y TÉCNICO 11
6. SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA. 12
7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS TÉCNICO-SOCIALES 19
8. COMPONENTE SST 27

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 28

9. COMPONENTE AMBIENTAL 29
10. SEGUIMIENTO DE POLIZAS Y SEGURO 30
11. COMUNICACIÓN 34
    - 11.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA 35
12. ACTIVIDADES A REALIZAR EL PRÓXIMO MES 37
13. DIFICULTADES 37
14. CONCLUSIONES 38
15. ANEXOS 38

Datos de Tablas

Tabla 1. Aspectos Generales Del Proyecto..... 6
Tabla 2:Microred de 99KWP – Comunidad Zancudo..... 8
Tabla 3:Microred de 56,1KWp – Comunidad Bellavista..... 9
Tabla 4:Microred 39,6KWp – Comunidad Punta Ratón..... 10
Tabla 5 : SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA..... 19
Tabla 6: SEGUIMIENTO DE POLIZAS Y SEGURO..... 34
Tabla 7. Canales De Comunicación. 35
Tabla 8. Correspondencia Enviada..... 36
TABLA 9. Personal mínimo contrato DG-106-2024..... 37

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1: Informe mensual..... 20
Ilustración 2 Reunión de seguimiento 21
Ilustración 4: Remisión de diapositivas modelo..... 22
Ilustración 5 Solicitud de ajuste de cronograma – Proyectos Inírida 2 e Inírida Centralizado..... 25
Ilustración 6 Entrega de informe de avance del Proyecto Guainía – Corte 26/02/2026 26

1. INTRODUCCIÓN

Este informe describe las actividades más relevantes que ha desarrollado el contratista de obra **CONSORCIO SES GUAINÍA**, para el período del mes de febrero del año 2026, para el Proyecto Inírida centralizado, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por la suscripción del contrato DG-106-2024 cuyo objeto es “CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA”.

2. ALCANCE DEL INFORME

El siguiente documento se presenta con el fin de informar y notificar el estado de las actividades jurídicas, financieras, técnicas y demás actividades administrativas, así como el avance de ejecución de obra, desarrolladas por el contratista **CONSORCIO SES GUAINÍA**, correspondiente al periodo comprendido entre **el 01 y el 28 de febrero de 2026**, en cumplimiento de la Cláusula 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA (Gestiones de índole Técnico, literal).

3. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO:	CONTRATO DG-106-2024
CONTRATANTE:	DISPAC S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	CONSORCIO SES GUAINÍA
INTERVENTORIA:	PROINGES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JOSE LEON
OBJETO DEL PROYECTO:	"CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA".
LUGAR DE EJECUCIÓN:	INÍRIDA
TIPO DE PROYECTO:	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES VEINTIUNMIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS Y OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($5.092.021.174,84 COP)
FECHA DE INICIO:	17 DE DICIEMBRE DEL 2024
OTRO SI No. 1	Clausula Primera – Modificación: **Clausula 2 –** Plazo de ejecución
OTRO SI No. 2	Clausula Primera – Modificación: **Clausula 2 –** Plazo de ejecución
OTRO SI No. 3	Clausula Primera – Modificación: **Clausula 2 –** Plazo de ejecución
OTRO SI No. 4	Clausula Primera – Modificación: **Clausula 2 –** Plazo de ejecución
OTRO SI No. 5	Clausula Primera – Modificación: **Clausula 2 –** Plazo de ejecución
OTRO SI No. 6	Clausula Primera – Modificación: **Clausula 2 –** Plazo de ejecución
FECHA TERMINACION	30 de mayo del 2026
RESPONSABLE DEL PROYECTO:	ING. EDISON ARLEY DIAZ

Tabla 1. Aspectos Generales Del Proyecto.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo la implementación de soluciones energéticas híbridas, combinando sistemas de generación solar fotovoltaica y generación diésel, para garantizar un suministro eléctrico confiable y sostenible. La iniciativa incluye el diseño y la instalación de redes eléctricas en Media y Baja Tensión, adaptadas a las necesidades de las comunidades indígenas de Zancudo, Punta Ratón y Bellavista.

Con esta intervención, se busca energizar un total de 138 usuarios, promoviendo el acceso a una fuente de energía estable, eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Este proyecto no solo contribuirá al desarrollo económico y social de las comunidades beneficiadas, sino que también impulsará la transición hacia modelos energéticos más sostenibles en la región. En el municipio de Inírida, se instalarán sistemas solares fotovoltaicos centralizados híbridos, solar Diésel para abastecer a varias localidades rurales, que contarán con el siguiente número de usuarios:

•Sistema solar fotovoltaico centralizado en la localidad de Bellavista para 37 usuarios.
•Sistema solar fotovoltaico centralizado en la localidad de Punta Ratón para 28 usuarios.
•Sistema solar fotovoltaico centralizado en la localidad de Zancudo para 73 usuarios.

4.1 Microred de 99 KWP – Comunidad Zancudo

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CAPACIDAD
Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half-Cell" bifacial doble vidrio TIER 1 de 550 Wp: η ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Producción de energía ≥ 90% a los 12 años y ≥ 80% a los 25 años, temp de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205.	UN	180	550 Wp
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CAPACIDAD

Estructura Metálica en piso para soportar hasta 4 paneles solares, inclinación 10°, incluye accesorios propios	UN	45	Soporte para 180 paneles solares
banco de baterías de 51200 Wh a 51,2 V. Incluye rack de baterías, cables de interconexión y conexión al sistema de moniteoreo mediante protocolo CAN-BUS.(x 10 baterías)	UN	5	5 bancos de baterías de 10 baterías de 100 AH
Inversor híbrido todo-en-uno trifásico de 15kW Pantalla LCD	UN	5	15 kW
Transformador elevador 3F en aceite tipo pedestal radial de 75 KVA, 3 x 440 V / 13,2 KV, tanque en acero inoxidable, incluye seccionador 3F bajo carga, fusibles limitadores de corriente, fusibles tipo bayoneta, DPS y codos premoldeados.	UN	1	75 kVA
Red de baja tensión	UND	1	1880 m
Red de media tensión	UND	1	2200 m

Tabla 2:Microred de 99KWP – Comunidad Zancudo

4.2 Microred de 56,1KWp – Comunidad Bellavista

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CAPACIDAD
Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half-Cell" bifacial doble vidrio TIER 1 de 550 Wp: η ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Producción de energía ≥ 90% a los 12 años y ≥ 80% a los 25 años, temp de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205.	UN	102	550 Wp

Estructura Metálica en piso para soportar hasta 4 paneles solares, inclinación 10°, incluye accesorios propios	UN	26	Soporte para 102 paneles solares
banco de baterías de 51200 Wh a 51,2 V. Incluye rack de baterías, cables de interconexión y conexión al sistema de monitoreó mediante protocolo CAN-BUS.(x 10 baterías)	UN	3	3 bancos de baterías de 10 baterías de 100 AH
Inversor híbrido todo-en-uno trifásico de 15kW Pantalla LCD	UN	3	15 kW
Transformador elevador en aceite tipo pedestal radial de 45 KVA, 3 x 440 / 13,2 KV, tanque en acero inoxidable, incluye seccionador 3F bajo carga, fusibles limitadores de corriente, fusibles tipo bayoneta, DPS y codos premoldeados.	UN	1	45 kVA
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CAPACIDAD
batería, exhosto y cable hasta el gabinete de sincronismo.			
Red de baja tensión	UND	1	1000 m
Red de media tensión	UND	1	1000 m

Tabla 3:Microred de 56,1KWp – Comunidad Bellavista

4.3 Microred 39,6KWp – Comunidad Punta Ratón

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CAPACIDAD
Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half-Cell" bifacial doble vidrio TIER 1 de 550 Wp: η ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Producción de energía ≥ 90% a los 12 años y ≥ 80% a los 25 años, temp de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205.	UN	72	550 Wp
Estructura Metálica en piso para soportar hasta 4 paneles solares, inclinación 10°, incluye accesorios propios	UN	1	Soporte para 72 paneles solares
banco de baterías de 51200 Wh a 51,2 V. Incluye rack de baterías, cables de interconexión y conexión al sistema de moniteoreo mediante protocolo CAN-BUS.(x 10 baterías)	UN	1	2 bancos de baterías de 10 baterías de 100 AH
Inversor híbrido todo-en-uno trifásico de 15kW Pantalla LCD	UN	2	15 kW
Transformador elevador en aceite tipo pedestal radial de 30 KVA, 440 / 13,2 KV, tanque en acero inoxidable, incluye	UN	1	30 kVA
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CAPACIDAD
seccionador 3F bajo carga, fusibles limitadores de corriente, fusibles tipo bayoneta, DPS y codos premoldeados.			
Red de baja tensión	UND	1	1000 m
Red de media tensión	UND	1	1000

Tabla 4:Microred 39,6KWp – Comunidad Punta Ratón

5. COMPONENTE SOCIAL Y TÉCNICO

COMPONENTE SOCIAL

El componente social del proyecto tiene como objetivo principal consolidar la apropiación comunitaria de la infraestructura energética, promoviendo prácticas responsables en el uso de la energía como herramienta para el desarrollo territorial. En este sentido, se continúan ejecutando acciones de comunicación, acompañamiento y formación dirigidas a fortalecer las capacidades locales y contribuir al bienestar de la población beneficiaria. De igual forma, se impulsa la participación efectiva de la comunidad y de los actores sociales en cada etapa del proyecto, fomentando la corresponsabilidad, la sostenibilidad de la infraestructura y la atención adecuada de inquietudes a través de mecanismos de control social y espacios permanentes de diálogo.

Así mismo, el presente informe expone el desarrollo de las actividades implementadas durante el mes de febrero, en el marco de la implementación de la solución energética en el municipio de Inírida, departamento de Guainía.
Durante este periodo, las acciones se orientaron a fortalecer la articulación con comunidades, líderes locales e instituciones, actualizar la identificación de actores relevantes, dinamizar espacios de participación ciudadana y ajustar la planificación social conforme a los avances técnicos del proyecto. Asimismo, se dio continuidad al seguimiento de compromisos previamente establecidos, consolidando procesos que favorecen la transparencia, el control social y la implementación adecuada y sostenible en el territorio.

Por medio del siguiente enlace se puede evidenciar el informe mensual con sus respectivos anexos:

INFORME MENSUAL.

6. SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA.

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	
DISPAC-CENTRALIZADOS BELLA VISTA, PUNTA RATON, ZANCUDO	**380,68 días**	**lun 16/12/24**	**sáb 30/05/26**	
Gerencia de Proyectos	**379 días**	**lun 16/12/24**	**jue 28/05/26**	
Inicio	**4 días**	**lun 16/12/24**	**jue 19/12/24**	
Elaborar Acta de inicio	1 día	lun 16/12/24	lun 16/12/24	COMPLETO
H:Firma de Acta de Inicio	0 días	lun 16/12/24	lun 16/12/24	COMPLETO
Actualización de Pólizas	3 días	mar 17/12/24	jue 19/12/24	COMPLETO
Planificación	**12 días**	**mar 17/12/24**	**mié 1/01/25**	
I: Plan de Gestión de Proyecto	**10 días**	**mar 17/12/24**	**lun 30/12/24**	
Ajuste Cronograma	1 día	mar 17/12/24	mar 17/12/24	COMPLETO
Plan de adquisiciones	2 días	mié 18/12/24	jue 19/12/24	COMPLETO
Presupuesto	2 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24	COMPLETO
Plan de Recursos Humanos	2 días	mié 18/12/24	jue 19/12/24	COMPLETO
E: Plan General de trabajo	0 días	mar 17/12/24	mar 17/12/24	COMPLETO
Validación metodología interventoría	**2 días**	**lun 30/12/24**	**mié 1/01/25**	
H: Aprobación de Formatos del proyecto	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	COMPLETO
Elaboración de documentos HSEQ	2 días	mar 31/12/24	mié 1/01/25	COMPLETO
E: SGSST	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	COMPLETO
E: Plan de manejo ambiental (PMA) (ML)	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	COMPLETO
E: Matriz de Riesgos ocupacionales (ML)	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	COMPLETO
E: Plan HSEQ (ML y LP)	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	COMPLETO
E: Protocolo de pruebas de usuario	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	COMPLETO
Cierre	**10 días**	**vie 15/05/26**	**jue 28/05/26**	
Elaboración informe final	7 días	vie 15/05/26	lun 25/05/26	
Entrega a operador de red	7 días	lun 18/05/26	mar 26/05/26	
Liquidación del contrato	2 días	mié 27/05/26	jue 28/05/26	
H: Firma acta de liquidación	0 días	jue 28/05/26	jue 28/05/26	
Ingeniería de Detalle	**55 días**	**lun 15/09/25**	**vie 28/11/25**	
Validar Fichas Técnicas (Equipos de tipo importación) Bella Vista, Puerto Ratón y Zancudo	35 días	lun 15/09/25	vie 31/10/25	COMPLETO

Validación Diseño de tableros y ductos	10 días	lun 10/11/25	vie 21/11/25	COMPLETO
Validación de diseño estructural	10 días	lun 17/11/25	vie 28/11/25	COMPLETO
Validación de diseño FV Diagramas de conexione Bella Vista, Puerto Ratón y Zancudo	2 días	lun 3/11/25	mar 4/11/25	COMPLETO
E: Diseño de diagrama de conexiones Bella Vista, Puerto Ratón y Zancudo	0 días	lun 3/11/25	lun 3/11/25	COMPLETO
H: Aprobación de equipos por interventoría Bella Vista, Puerto Ratón y Zancudo	0 días	vie 7/11/25	vie 7/11/25	COMPLETO
E: solicitudes de compra de equipos de tipo Importación (Inversores, Paneles, Baterías)	0 días	vie 7/11/25	vie 7/11/25	COMPLETO
Validar Cantidades de obra (Obra civil, Red MT, BT, INTERNAS)	2 días	lun 17/11/25	mar 18/11/25	COMPLETO
E: solicitudes de compra de materiales Nacionales (Obra civil, Red MT, BT, INTERNAS)	0 días	mar 18/11/25	mar 18/11/25	COMPLETO
Adquisiciones	**117 días**	**lun 10/11/25**	**mar 21/04/26**	
Equipos y logística	**117 días**	**lun 10/11/25**	**mar 21/04/26**	
Bodega San José del Guaviare	2 días	mié 19/11/25	jue 20/11/25	COMPLETO
Compra paneles	**78 días**	**lun 10/11/25**	**mié 25/02/26**	
Orden de compra Paneles	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	COMPLETO
Transporte y Nacionalización paneles	60 días	mar 18/11/25	lun 9/02/26	COMPLETO
H: Entrega paneles a proveedor	0 días	lun 9/02/26	lun 9/02/26	COMPLETO
Transporte de paneles a Bodega de obra	12 días	mar 10/02/26	mié 25/02/26	COMPLETO
Compra inversores Hibrido	**101 días**	**lun 10/11/25**	**lun 30/03/26**	
Orden de compra inversores	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	COMPLETO
Transporte y Nacionalización inversores	90 días	mar 25/11/25	lun 30/03/26	
H: Entrega de inversores a Bodega Isla	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26	
Compra Banco de baterías	**102 días**	**lun 10/11/25**	**mar 31/03/26**	
Orden de compra Banco de baterías	2 días	lun 10/11/25	mar 11/11/25	COMPLETO
Transporte y Nacionalización de banco de baterías	90 días	mié 26/11/25	mar 31/03/26	
H: Entrega de banco de baterías a bodega Isla	0 días	mar 31/03/26	mar 31/03/26	
Compra medidores de energía	**20 días**	**vie 20/03/26**	**jue 16/04/26**	
Orden de compra medidores de energía	2 días	vie 20/03/26	lun 23/03/26	

H: Entrega de medidores de energía a proveedor	0 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26	
Compra de tableros de central de generación	**91 días**	**lun 8/12/25**	**lun 13/04/26**	
Orden de compra de Tableros y Gabinetes	1 día	lun 8/12/25	lun 8/12/25	COMPLETO
Fabricación de Tableros y Gabinetes	30 días	mar 9/12/25	lun 19/01/26	
Ensamble de protecciones	25 días	mar 20/01/26	lun 23/02/26	
Transporte de gabinetes a la bodega de obra	20 días	mar 17/03/26	lun 13/04/26	
Compra Estructura soporte Módulos FV	**97 días**	**lun 8/12/25**	**mar 21/04/26**	
Orden de compra de Estructura de soporte de módulos FV-Bella Vista, Puerto Ratón y Zancudo	2 días	lun 8/12/25	mar 9/12/25	COMPLETO
Fabricación de estructura de soporte de módulos FV-Bella Vista, Puerto Ratón y Zancudo	60 días	mié 24/12/25	mar 17/03/26	COMPLETO
Transporte de estructura a la bodega de obra-Bella Vista, Puerto Ratón y Zancudo	10 días	mié 8/04/26	mar 21/04/26	
Compra materiales obra civil (cimentación, caseta, cajas BT)	**75 días**	**lun 1/12/25**	**vie 13/03/26**	
Orden de compra materiales obra civil Bella Vista, Puerto Ratón y Zancudo	10 días	lun 1/12/25	vie 12/12/25	COMPLETO
Transporte de materiales de obra Civil	35 días	lun 26/01/26	vie 13/03/26	
H: Entrega de materiales obra civil a la obra	0 días	vie 13/03/26	vie 13/03/26	
Compra materiales eléctricos (Redes MT. BT e internas)	**37 días**	**mié 19/11/25**	**jue 8/01/26**	
Orden de compra materiales eléctricos - Bella Vista, Puerto Ratón y Zancudo	2 días	mié 19/11/25	jue 20/11/25	COMPLETO
Transporte de materiales eléctricos - Bella Vista, Puerto Ratón y Zancudo	20 días	vie 12/12/25	jue 8/01/26	
Replanteo de Usuarios y Parte técnica de proyectos	**350 días**	**mar 21/01/25**	**lun 25/05/26**	
validación de usuarios y parte técnica	160 días	mié 22/01/25	mar 2/09/25	
E: Informe de Replanteo	0 días	mar 9/09/25	mar 9/09/25	
Ejecución Centralizado Zancudo (73 Usuarios)	**95 días**	**jue 8/01/26**	**jue 21/05/26**	

CONSORCIO SES Guainía	**INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA**

Central de generación	**95 días**	**jue 8/01/26**	**jue 21/05/26**	
ETAPA 1	**74 días**	**jue 8/01/26**	**mié 22/04/26**	
Bodega Local	**74 días**	**jue 8/01/26**	**mié 22/04/26**	
H: Recibo de materiales eléctricos en Bodega	0 días	jue 8/01/26	jue 8/01/26	COMPLETO
H: Recibo de paneles en bodega de obra	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	COMPLETO
H: Recibo de gabinetes en la Bodega de obra	0 días	lun 13/04/26	lun 13/04/26	
H: Recibo de Estructura para Soportar Módulos FV	1 día	mié 22/04/26	mié 22/04/26	
Armado de kits/Casa	10 días	vie 9/01/26	jue 22/01/26	
ETAPA 2	**74 días**	**lun 9/02/26**	**jue 21/05/26**	
instalación de internas, construcción red de distribución de BT y MT	**45 días**	**vie 6/03/26**	**jue 7/05/26**	
Distribución de kits	10 días	vie 6/03/26	jue 19/03/26	PROCESO
instalación de kits internas-2 cuadrilla 2 ins x día	20 días	vie 20/03/26	jue 16/04/26	PROCESO
Construcción de redes de distribución incluye (Instalación de postes, armado de postes, tendido de redes de MT, Templetes, SPT, etc.)	30 días	vie 27/03/26	jue 7/05/26	
Implementación de Caseta de Equipos, Caseta residuos	**47 días**	**lun 2/03/26**	**mar 5/05/26**	
Construcción de caseta de equipos	20 días	lun 2/03/26	vie 27/03/26	
Instalación de tableros de baja tensión	10 días	mar 14/04/26	lun 27/04/26	
Instalación de equipos de tipo importación (Inversores/Baterías)	10 días	mié 22/04/26	mar 5/05/26	
Centros de Transformación	**48 días**	**mar 17/03/26**	**jue 21/05/26**	
Construcción de Caseta, base para Transformador Elevador	20 días	mar 17/03/26	lun 13/04/26	
Instalación de Transformador Elevador	2 días	mar 28/04/26	mié 29/04/26	
Instalación de transformadores de Distribución	10 días	vie 8/05/26	jue 21/05/26	
Instalación de estructura soporte y montaje de módulos FV	**67 días**	**lun 9/02/26**	**mar 12/05/26**	

Obra civil-Figurado de acero, zapatas, vigas y columnas soporte Estructura	20 días	lun 9/02/26	vie 6/03/26	
Obra civil-Fundición, zapatas, vigas y columnas soporte Estructura	20 días	lun 16/03/26	vie 10/04/26	
Montaje de Estructura Metálica Galvanizada	10 días	mié 22/04/26	mar 5/05/26	
Montaje de Módulos FV	10 días	mié 22/04/26	mar 5/05/26	
ETAPA 3	**8 días**	**vie 1/05/26**	**mar 12/05/26**	
Inspección y pruebas	**3 días**	**vie 8/05/26**	**mar 12/05/26**	
Pruebas Y Puesta en servicio	3 días	vie 8/05/26	mar 12/05/26	
E: Protocolo de pruebas	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26	
Capacitación de usuarios	**5 días**	**vie 1/05/26**	**jue 7/05/26**	
Capacitación de usuarios	5 días	vie 1/05/26	jue 7/05/26	
E: Actas de entrega a usuarios	0 días	jue 7/05/26	jue 7/05/26	
Ejecución Centralizado Bella Vista (37 usuarios)	**97 días**	**jue 8/01/26**	**lun 25/05/26**	
Central de generación	**97 días**	**jue 8/01/26**	**lun 25/05/26**	
ETAPA 1	**74 días**	**jue 8/01/26**	**mié 22/04/26**	
Bodega Local	**74 días**	**jue 8/01/26**	**mié 22/04/26**	
H: Recibo de materiales eléctricos en Bodega	0 días	jue 8/01/26	jue 8/01/26	COMPLETO
H: Recibo de paneles en bodega de obra	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	COMPLETO
H: Recibo de gabinetes en la Bodega de obra	0 días	mar 24/03/26	mar 24/03/26	
H: Recibo de Estructura para Soportar Módulos FV	1 día	mié 22/04/26	mié 22/04/26	
Armado de kits/Casa	10 días	vie 9/01/26	jue 22/01/26	
ETAPA 2	**57 días**	**vie 6/03/26**	**lun 25/05/26**	
instalación de internas, construcción red de distribución de BT y MT	**55 días**	**vie 6/03/26**	**jue 21/05/26**	
Distribución de kits	10 días	vie 6/03/26	jue 19/03/26	PROCESO
instalación de kits internas	45 días	vie 13/03/26	jue 14/05/26	
Construcción de redes de distribución incluye (Instalación de postes, armado de postes, tendido de redes de MT, Templetes, SPT, etc.)	45 días	vie 20/03/26	jue 21/05/26	

CONSORCIO SES Guainía	**INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA**

Implementación de Caseta de Equipos, Caseta residuos	**51 días**	**lun 16/03/26**	**lun 25/05/26**	
Construcción de caseta de equipos	50 días	lun 16/03/26	vie 22/05/26	
Instalación de tableros de baja tensión	30 días	mar 14/04/26	lun 25/05/26	
Instalación de equipos de tipo importación (Inversores/Baterías)	20 días	mar 14/04/26	lun 11/05/26	
Centros de Transformación	**28 días**	**mar 17/03/26**	**jue 23/04/26**	
Construcción de Caseta, base para Transformador Elevador	25 días	mar 17/03/26	lun 20/04/26	
Instalación de Transformador Elevador	5 días	mar 14/04/26	lun 20/04/26	
Instalación de transformadores de Distribución	10 días	vie 10/04/26	jue 23/04/26	
Instalación de estructura soporte y montaje de módulos FV	**37 días**	**mié 25/03/26**	**jue 14/05/26**	
Obra civil-Figurado de acero, zapatas, vigas y columnas soporte Estructura	10 días	mié 25/03/26	mar 7/04/26	
Obra civil-Fundición, zapatas, vigas y columnas soporte Estructura	20 días	mié 8/04/26	mar 5/05/26	
Montaje de Estructura metálica Galvanizada	10 días	mié 22/04/26	mar 5/05/26	
Montaje de Módulos FV	10 días	mié 22/04/26	mar 5/05/26	
ETAPA 3	**10 días**	**vie 1/05/26**	**jue 14/05/26**	
Inspección y pruebas	**5 días**	**vie 8/05/26**	**jue 14/05/26**	
Pruebas Y Puesta en servicio	5 días	vie 8/05/26	jue 14/05/26	
E: Protocolo de pruebas	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26	
capacitación de usuarios	**5 días**	**vie 1/05/26**	**jue 7/05/26**	
capacitación de usuarios	5 días	vie 1/05/26	jue 7/05/26	
E: Actas de entrega a usuarios	0 días	jue 7/05/26	jue 7/05/26	
Ejecución Centralizado Punta Ratón 28 usuarios	**97 días**	**jue 8/01/26**	**lun 25/05/26**	
Central de generación	**97 días**	**jue 8/01/26**	**lun 25/05/26**	
ETAPA 1	**74 días**	**jue 8/01/26**	**mié 22/04/26**	
Bodega Local	**74 días**	**jue 8/01/26**	**mié 22/04/26**	
H: Recibo de materiales eléctricos en Bodega	0 días	jue 8/01/26	jue 8/01/26	COMPLETO

H: Recibo de paneles en bodega de obra	0 días	mié 25/02/26	mié 25/02/26	COMPLETO
H: Recibo de gabinetes en la Bodega de obra	0 días	mar 24/03/26	mar 24/03/26	
H: Recibo de Estructura para Soportar Módulos FV	1 día	mié 22/04/26	mié 22/04/26	
Armado de kits/Casa	8 días	vie 9/01/26	mar 20/01/26	
ETAPA 2	**87 días**	**vie 23/01/26**	**lun 25/05/26**	
instalación de internas, construcción red de distribución de BT y MT	**85 días**	**vie 23/01/26**	**jue 21/05/26**	
distribución de kits	10 días	vie 23/01/26	jue 5/02/26	PROCESO
instalación de kits internas	10 días	vie 3/04/26	jue 16/04/26	
Construcción de redes de distribución incluye (Instalación de postes, armado de postes, tendido de redes de MT, Templetes, SPT, etc.)	45 días	vie 20/03/26	jue 21/05/26	
Implementación de Caseta de Equipos, Caseta residuos	**51 días**	**lun 16/03/26**	**lun 25/05/26**	
Construcción de caseta de equipos	45 días	lun 16/03/26	vie 15/05/26	
Instalación de tableros de baja tensión	30 días	mar 14/04/26	lun 25/05/26	
Instalación de equipos de tipo importación (Inversores/Baterías)	20 días	mar 14/04/26	lun 11/05/26	
Centros de Transformación	**28 días**	**mar 17/03/26**	**jue 23/04/26**	
Construcción de Caseta, base para Transformador Elevador	20 días	mar 17/03/26	lun 13/04/26	
Instalación de Transformador Elevador	2 días	mar 14/04/26	mié 15/04/26	
Instalación de transformadores de Distribución	10 días	vie 10/04/26	jue 23/04/26	
Instalación de estructura soporte y montaje de módulos FV	**37 días**	**mié 25/03/26**	**jue 14/05/26**	
Obra civil-Figurado de acero, zapatas, vigas y columnas soporte Estructura	10 días	mié 25/03/26	mar 7/04/26	PROCESO
Obra civil-Fundición, zapatas, vigas y columnas soporte Estructura	20 días	mié 8/04/26	mar 5/05/26	
Montaje de Estructura metálica Galvanizada	10 días	mié 22/04/26	mar 5/05/26	

Montaje de Módulos FV	10 días	mié 22/04/26	mar 5/05/26	
ETAPA 3	**10 días**	**vie 1/05/26**	**jue 14/05/26**	
Inspección y pruebas	**5 días**	**vie 8/05/26**	**jue 14/05/26**	
Pruebas Y Puesta en servicio	5 días	vie 8/05/26	jue 14/05/26	
E: Protocolo de pruebas	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26	
capacitación de usuarios	**5 días**	**vie 1/05/26**	**jue 7/05/26**	
capacitación de usuarios	5 días	vie 1/05/26	jue 7/05/26	
E: Actas de entrega a usuarios	0 días	jue 7/05/26	jue 7/05/26	
Componente Social	**340 días**	**mar 21/01/25**	**lun 11/05/26**	
Jornadas de Socialización inicial	10 días	mar 21/01/25	lun 3/02/25	COMPLETO
Jornadas de Socialización intermedia	3 días	mié 25/03/26	vie 27/03/26	PROCESO
Jornadas de Socialización final	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26	

Tabla 5 : SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA


7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS TÉCNICO-SOCIALES

• Entrega del informe mensual correspondiente al mes de enero.

Durante el mes de febrero, el equipo de ingeniería realizó la entrega del informe mensual correspondiente al mes de enero. Este documento recopiló la información general sobre las actividades ejecutadas durante dicho período, incluyendo los reportes técnicos, registros fotográficos y demás evidencias necesarias para el seguimiento del proyecto.

La actividad se desarrolló con el objetivo de mantener actualizada la documentación requerida por la interventoría y garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el cronograma de reportes. Asimismo, se verificó la correcta organización de los soportes técnicos y administrativos, asegurando que la información entregada cumpliera con los lineamientos exigidos por la entidad.

La entrega se efectuó dentro de los tiempos establecidos, contribuyendo al orden y continuidad del proceso de seguimiento y control por parte del equipo de ingeniería.

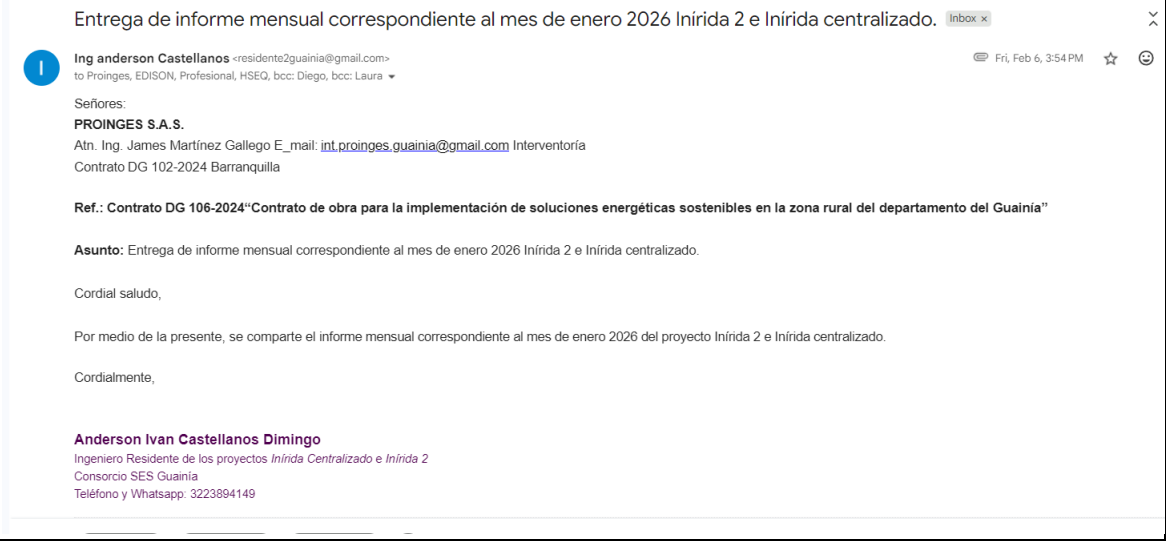

Entrega de informe mensual correspondiente al mes de enero 2026 Inírida 2 e Inírida centralizado. Inbox ×

Ing anderson Castellanos <residente2guainia@gmail.com>
to Proinges, EDISON, Profesional, HSEQ, bcc: Diego, bcc: Laura

Fri, Feb 6, 3:54 PM

Señores:
PROINGES S.A.S.
Atn. Ing. James Martínez Gallego E_mail: int.proinges.guainia@gmail.com Interventoría
Contrato DG 102-2024 Barranquilla

Ref.: Contrato DG 106-2024"Contrato de obra para la implementación de soluciones energéticas sostenibles en la zona rural del departamento del Guainía"

Asunto: Entrega de informe mensual correspondiente al mes de enero 2026 Inírida 2 e Inírida centralizado.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se comparte el informe mensual correspondiente al mes de enero 2026 del proyecto Inírida 2 e Inírida centralizado.

Cordialmente,

Anderson Ivan Castellanos Dimingo
Ingeniero Residente de los proyectos *Inírida Centralizado e Inírida 2*
Consorcio SES Guainía
Teléfono y Whatsapp: 3223894149

Ilustración 1: Informe mensual

- **Participación en reuniones de seguimiento**

Durante el mes de febrero, se participó activamente en las reuniones de seguimiento N°23 y 24 del proyecto, en el marco del contrato DG-106-2024. En estas sesiones se presentaron los avances alcanzados, se revisaron los ajustes técnicos realizados y se acordaron las acciones a seguir en respuesta a las observaciones formuladas por la interventoría.


Las presentaciones utilizadas en dichas reuniones fueron adjuntadas como parte de la documentación entregada durante el mes.



Ilustración 2 Reunión de seguimiento

- **Entrega de presentación de seguimiento N.° 24**

Durante el mes de febrero se realizó la entrega de la presentación de seguimiento N.° 24, la cual fue remitida para su respectiva revisión y validación. En esta presentación se consolidó la información relacionada con el avance de las actividades del proyecto, permitiendo realizar el seguimiento correspondiente por parte de las entidades y equipos involucrados.

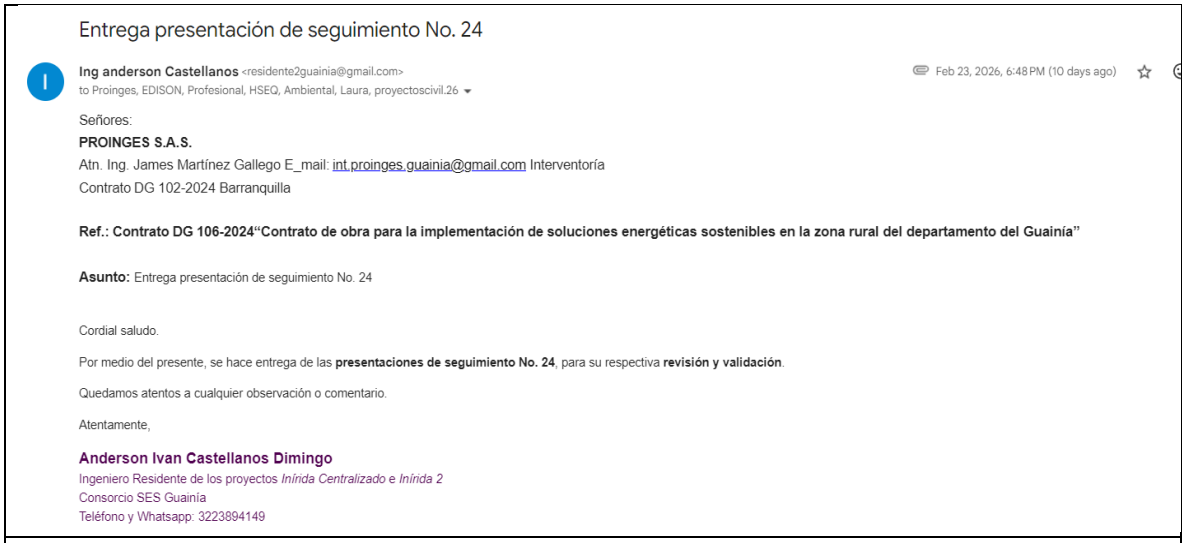

Entrega presentación de seguimiento No. 24

Ing anderson Castellanos <residente2guainia@gmail.com> Feb 23, 2026, 6:48 PM (10 days ago)
to Proinges, EDISON, Profesional, HSEQ, Ambiental, Laura, proyectoscivil.26

Señores:
PROINGES S.A.S.
Atn. Ing. James Martínez Gallego E_mail: int.proinges.guainia@gmail.com Interventoría
Contrato DG 102-2024 Barranquilla

Ref.: Contrato DG 106-2024"Contrato de obra para la implementación de soluciones energéticas sostenibles en la zona rural del departamento del Guainía"

Asunto: Entrega presentación de seguimiento No. 24

Cordial saludo.

Por medio del presente, se hace entrega de las **presentaciones de seguimiento No. 24**, para su respectiva **revisión y validación**.

Quedamos atentos a cualquier observación o comentario.

Atentamente,

Anderson Ivan Castellanos Dimingo
Ingeniero Residente de los proyectos *Inírida Centralizado* e *Inírida 2*
Consorcio SES Guainía
Teléfono y Whatsapp: 3223894149

Ilustración 3: Remisión de diapositivas modelo

- **Solicitud de ajuste de cronograma – Proyectos Inírida 2 e Inírida Centralizado**

Durante el mes de febrero se realizó la presentación formal de la solicitud de ajuste de cronograma para los proyectos Inírida 2 e Inírida Centralizado, en atención al comunicado GUA-103-26 – Llamado de Atención y Requerimiento Final Cronograma y Plan de Acción, con fecha 13 de febrero de 2026.
Para ello, se llevó a cabo un análisis técnico y de planeación, mediante el cual se identificó la necesidad de actualizar el cronograma contractual considerando las condiciones reales de ejecución del proyecto, aspectos logísticos, disponibilidad de recursos, transporte de materiales y la correcta articulación de las actividades críticas.


El ajuste propuesto mantiene como fecha de terminación contractual el 30 de mayo de 2026, enfocándose en la reprogramación interna de actividades, optimización de secuencias constructivas y compresión de fases administrativas y de cierre, garantizando la coherencia técnica del cronograma, evitando actividades vencidas y asegurando el cumplimiento del alcance contractual.
La solicitud se fundamenta principalmente en los siguientes aspectos:

- Reprogramación y sincronización de frentes de trabajo.
- Optimización de actividades de cierre y puesta en servicio.
- Condiciones logísticas y de transporte en la zona de ejecución.
- Aseguramiento de la calidad técnica y cumplimiento del alcance del proyecto.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UBICACIÓN DE INSTALACIÓN DE MATERIAL
Tomacorriente 120v con pt	UNIDAD	572	Bodega Inirida
Plafon	UNIDAD	572	Bodega Inirida
Interruptor sencillo	UNIDAD	572	Bodega Inirida
Tablero de distribucion 4 circuitos monofasico	UNIDAD	143	Bodega Inirida
Breaker 20 A 120/240 V enchufable	UNIDAD	572	Bodega Inirida
Cable de Cu N° 12 AWG NEGRO	ML	9538,1	Bodega Inirida
Cable de Cu N° 12 AWG BLANCO	ML	5720	Bodega Inirida
Cable de Cu N° 12 AWG VERDE	ML	5720	Bodega Inirida
Caja 2x4 PVC (COLOR GRIS)	UNIDAD	1144	Bodega Inirida
Caja Octogonal PVC (COLOR GRIS)	UNIDAD	572	Bodega Inirida
Tuberia EMT 1/2" x m	ML	2288	Bodega Inirida
Union EMT 1/2"	UNIDAD	2860	Bodega Inirida
Terminal EMT 1/2"	UNIDAD	3432	Bodega Inirida
Curva EMT 1/2"	UNIDAD	1573	Bodega Inirida
Abrazadera 1/2 doble ala metalica	UNIDAD	5720	Bodega Inirida
Conector autodesforre para cable 10/12	UNIDAD	2288	Bodega Inirida
Tensor de acometida	UNIDAD	280	Bodega Inirida
Cinta bandit 5/8"	UNIDAD	700	Bodega Inirida
Hebilla de acero inoxidable 5/8"	UNIDAD	700	Bodega Inirida
Capacete Galvanizado para tubería galvanizada 3/4"	UNIDAD	140	Bodega Inirida
Tuberia IMC 3/4" x 3m	UNIDAD	140	Bodega Inirida
Boquilla galvanizada de 3/4"	UNIDAD	280	Bodega Inirida
Grapa EMT 1/2"	UNIDAD	1400	Bodega Inirida
Cable monofásico concentrico 1x8+8 CU	ML	2100	Bodega Inirida
Conector de perforación EP-95 4-3/0 // 14-8	UNIDAD	140	Bodega Inirida
Interruptor atornillable pin de corte 1x30A	UNIDAD	140	Bodega Inirida
Alambre de Cobre THW N° 8 (awg) (VERDE)	ML	420	Bodega Inirida
Varilla Cobre - Cobre 5/8" x 2,44 m	UNIDAD	157	Bodega Inirida
Conector Varilla cobre 5/8" a N° 8	UNIDAD	140	Bodega Inirida
Tubo EMT 1/2 x 3m	UNIDAD	140	Bodega Inirida
Terminal EMT 1/2"	UNIDAD	140	Bodega Inirida
Caja acometida trifásica en policarbonato 4 usuarios	UNIDAD	15	Bodega Inirida
Cinta bandit 5/8"	ML	152	Bodega Inirida
Hebilla de acero inoxidable 5/8"	UNIDAD	152	Bodega Inirida
Poste en fibra de vidrio 8m 750kgf	UNIDAD	97	Bodega Inirida
Aislador tipo carrete	UNIDAD	35	Bodega Inirida
Espárrago 5/8 X 10"	UNIDAD	35	Bodega Inirida
Percha tipo pesado de 1 puestos	UNIDAD	35	Bodega Inirida
Aislador tipo carrete	UNIDAD	184	Bodega Inirida
Percha tipo pesado de 1 puestos	UNIDAD	184	Bodega Inirida
Aislador tipo tensor 3/1/2"	UNIDAD	25	Bodega Inirida
Arandela cuadrada plano 4 x 4 x 5/8 " Y TUERCA	UNIDAD	54	Bodega Inirida
Varilla de anclaje 1.5 m x 5/8"	UNIDAD	55	Bodega Inirida

CONSORCIO SES Guainía	INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

Cable galvanizado 3/8"	ML	550	Bodega Inirida
Varilla Cobre - Cobre 5/8" x 2,44 m	UNIDAD	46	Bodega Inirida
Cable Cobre THHN Nº 4	ML	368	Bodega Inirida
Conector Varilla cobre 5/8" a N° 4	UNIDAD	46	Bodega Inirida
Cinta bandit 5/8"	UNIDAD	97	Bodega Inirida
Hebilla de acero inoxidable 5/8"	UNIDAD	138	Bodega Inirida
Tubo EMT 1/2 x 3m	UNIDAD	46	Bodega Inirida
Poste en fibra de vidrio 12m 1050kgf	UNIDAD	21	Bodega Inirida
Aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV	UNIDAD	105	Bodega Inirida
Grapa de retención aluminio 6 - 2/0 AWG	UNIDAD	140	Bodega Inirida
Espárrago 5/8 X 10"	UNIDAD	105	Bodega Inirida
Tuerca de ojo redonda 5/8"	UNIDAD	105	Bodega Inirida
Diagonal de 68 cm 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16	UNIDAD	70	Bodega Inirida
Aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV	UNIDAD	72	Bodega Inirida
Grapa de retención aluminio 6 - 2/0 AWG	UNIDAD	11	Bodega Inirida
Espárrago 5/8 X 10"	UNIDAD	36	Bodega Inirida
Tuerca de ojo redonda 5/8"	UNIDAD	72	Bodega Inirida
Tuberia IMC 4" x 3m	UNIDAD	6	Bodega Inirida
Capacete Galvanizado para tuberia IMC de 4"	UNIDAD	3	Bodega Inirida
CURVA CONDUIT PVC 4" TDP	UNIDAD	3	Bodega Inirida
Cinta bandit 5/8"	UNIDAD	9	Bodega Inirida
Hebilla de acero inoxidable 5/8"	UNIDAD	9	Bodega Inirida
Esparrago 5/8X12"	UNIDAD	12	Bodega Inirida
Diagonal de 68 cm 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16	UNIDAD	16	Bodega Inirida
Collarin 2 salidas 6" - 7"	UNIDAD	8	Bodega Inirida
Cortacircuitos 15 KV	UNIDAD	12	Bodega Inirida
Dado galvanizado de 3" x 3"	UNIDAD	12	Bodega Inirida
Pararrayos 12 kV - 10 kA	UNIDAD	12	Bodega Inirida
Cable Cobre THHN Nº 1/0	ML	32	Bodega Inirida
Cable de Aluminio Aislado THW No.1/0	ML	24	Bodega Inirida
Aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV	UNIDAD	9	Bodega Inirida
Eslabón en u 5/8" forjado galvanizado	UNIDAD	9	Bodega Inirida
Esparrago 5/8" x 14"	UNIDAD	6	Bodega Inirida
Tornillo de maquina hexagonal acero galvanizado 1/2" x 1 1/2"	UNIDAD	27	Bodega Inirida
Cable ACSR Nº 2	ML	4200	Bodega Inirida
Aislador tipo tensor 4/1/4"	UNIDAD	17	Bodega Inirida
Arandela cuadrada plano 4 x 4 x 5/8 "	UNIDAD	20	Bodega Inirida
Varilla de anclaje 1.8 m x 5/8"	UNIDAD	17	Bodega Inirida
Cable galvanizado 3/8"	ML	340	Bodega Inirida
Varilla Cobre - Cobre 5/8" x 2,44 m	UNIDAD	24	Bodega Inirida
Soldadura exotermica 115 gr	UNIDAD	13	Bodega Inirida
Cinta bandit 5/8"	ML	24	Bodega Inirida
Hebilla de acero inoxidable 5/8"	UNIDAD	24	Bodega Inirida
Tubo EMT 1/2 x 3m	UNIDAD	24	Bodega Inirida
Panel Solar fotovoltaico 550W monocristalino	UNIDAD	354	Bodega Inirida
Conector MC4 Macho	UNIDAD	354	Bodega Inirida
Conector MC4 Hembra	UNIDAD	354	Bodega Inirida
Cable solar 4mm x 1m	ML	885	Bodega Inirida
Terminal tipo PIN para calibre 10-12AWG	UNIDAD	2100	Bodega Inirida
Cable Cobre Nº 2/0 AWG Desnudo	ML	51	Bodega Inirida
Varilla Cobre - Cobre 5/8" x 2,44 m	UNIDAD	9	Bodega Inirida
Soldadura exotermica de 90 Grs	UNIDAD	9	Bodega Inirida
Cruceta de 2.4m x 3 x 3 x 1/4	UNIDAD	21	Bodega Inirida
Esparrago 5/8 x 10	UNIDAD	282	Bodega Inirida

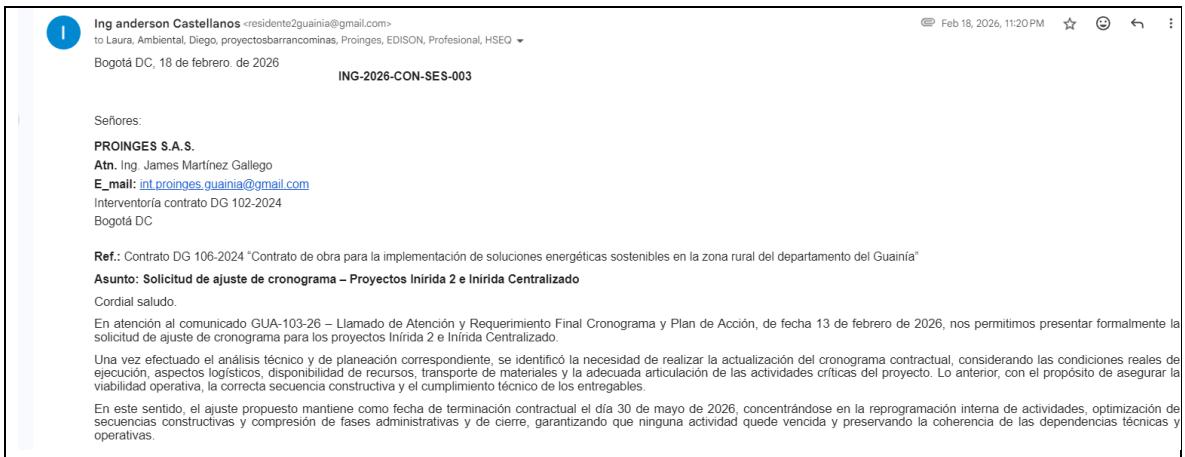

Ing anderson Castellanos <residente2guainia@gmail.com> Feb 18, 2026, 11:20 PM
to Laura, Ambiental, Diego, proyectosbarrancominas, Proinges, EDISON, Profesional, HSEQ

Bogotá DC, 18 de febrero. de 2026

ING-2026-CON-SES-003

Señores:

PROINGES S.A.S.
Atn. Ing. James Martínez Gallego
E_mail: int.proinges.guainia@gmail.com
Interventoría contrato DG 102-2024
Bogotá DC

Ref.: Contrato DG 106-2024 "Contrato de obra para la implementación de soluciones energéticas sostenibles en la zona rural del departamento del Guainía"

Asunto: Solicitud de ajuste de cronograma – Proyectos Inirida 2 e Inirida Centralizado

Cordial saludo.

En atención al comunicado GUA-103-26 – Llamado de Atención y Requerimiento Final Cronograma y Plan de Acción, de fecha 13 de febrero de 2026, nos permitimos presentar formalmente la solicitud de ajuste de cronograma para los proyectos Inírida 2 e Inírida Centralizado.

Una vez efectuado el análisis técnico y de planeación correspondiente, se identificó la necesidad de realizar la actualización del cronograma contractual, considerando las condiciones reales de ejecución, aspectos logísticos, disponibilidad de recursos, transporte de materiales y la adecuada articulación de las actividades críticas del proyecto. Lo anterior, con el propósito de asegurar la viabilidad operativa, la correcta secuencia constructiva y el cumplimiento técnico de los entregables.


En este sentido, el ajuste propuesto mantiene como fecha de terminación contractual el día 30 de mayo de 2026, concentrándose en la reprogramación interna de actividades, optimización de secuencias constructivas y compresión de fases administrativas y de cierre, garantizando que ninguna actividad quede vencida y preservando la coherencia de las dependencias técnicas y operativas.

Ilustración 4 Solicitud de ajuste de cronograma – Proyectos Inírida 2 e Inírida Centralizado

- **Entrega de informe de avance del Proyecto Guainía – Corte 26/02/2026**

Durante el mes de febrero se realizó la entrega del informe de avance del Proyecto Guainía, con corte al 26 de febrero de 2026, en el cual se presenta el detalle de las actividades ejecutadas a la fecha, el estado actual de los frentes de trabajo y los principales aspectos relacionados con el desarrollo y progreso del proyecto.

Este informe permite realizar el seguimiento técnico y administrativo de las actividades ejecutadas, así como mantener informadas a las entidades y equipos involucrados sobre el estado actual del proyecto y las acciones desarrolladas en el territorio.

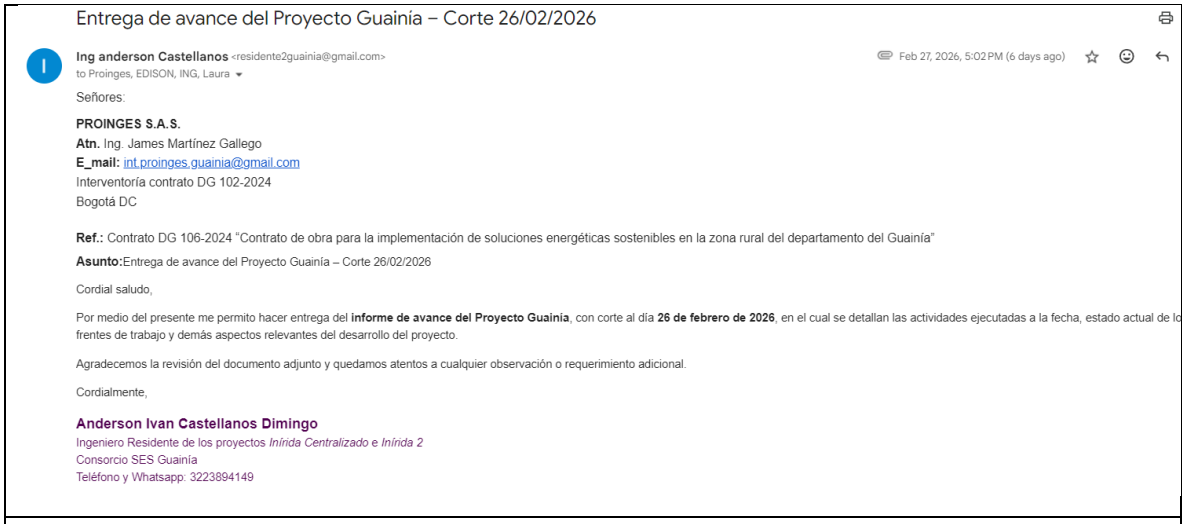

Entrega de avance del Proyecto Guainía – Corte 26/02/2026

Ing anderson Castellanos <residente2guainia@gmail.com>
to Proinges, EDISON, ING, Laura

Feb 27, 2026, 5:02 PM (6 days ago)

Señores:

PROINGES S.A.S.
Atn. Ing. James Martínez Gallego
E_mail: int.proinges.guainia@gmail.com
Interventoría contrato DG 102-2024
Bogotá DC

Ref.: Contrato DG 106-2024 "Contrato de obra para la implementación de soluciones energéticas sostenibles en la zona rural del departamento del Guainía"

Asunto: Entrega de avance del Proyecto Guainía – Corte 26/02/2026

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito hacer entrega del **informe de avance del Proyecto Guainia**, con corte al día **26 de febrero de 2026**, en el cual se detallan las actividades ejecutadas a la fecha, estado actual de lo frentes de trabajo y demás aspectos relevantes del desarrollo del proyecto.

Agradecemos la revisión del documento adjunto y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Anderson Ivan Castellanos Dimingo
Ingeniero Residente de los proyectos *Inírida Centralizado e Inírida 2*
Consorcio SES Guainía
Teléfono y Whatsapp: 3223894149

Ilustración 5 Entrega de informe de avance del Proyecto Guainía – Corte 26/02/2026

- **Gestión logística para el transporte de material nacional desde San José del Guaviare hacia Inírida, Guainía**

Durante el mes de febrero se adelantaron las gestiones logísticas necesarias para el transporte de material nacional, requerido para la ejecución de las actividades del proyecto, desde San José del Guaviare hasta Inírida, Guainía.

Estas actividades incluyeron la coordinación del cargue, organización del material, contratación y programación del transporte fluvial, así como el seguimiento a la movilización del material a lo largo de la ruta establecida. Lo anterior con el fin de garantizar el abastecimiento oportuno de materiales en la zona de ejecución del proyecto.

Esta gestión permitió asegurar la disponibilidad de los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades en territorio, manteniendo la continuidad operativa del proyecto y facilitando la posterior distribución del material hacia las comunidades intervenidas.

8. COMPONENTE SST

En cumplimiento de los requerimientos establecidos contractualmente por el componente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del proyecto, se ejecutaron las siguientes actividades, durante el periodo del 1 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026, se enlistan a continuación:


1. Ejecución, avance del SG-SST del Consorcio SES Guainía.
2. Actualización de plan de trabajo, cronograma de capacitaciones, inspecciones, programas de gestión, profesiograma y perfil sociodemográfico.
3. Reuniones mensuales por parte del COPASST y CCL.
4. Adquisición, recepción de elementos de brigada de emergencias, Epp´s, Dotación, elementos de trabajo en alturas, señalización.
5. Adecuación de la bodega con los equipos de brigada de emergencia de San José del Guaviare.
6. **Informe de Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión (SIG)**

- Capitaciones con sus registros de asistencia del siguiente temario de acuerdo al cronograma de capacitaciones:

No.	TEMA	DIA
1	Curso de las 50 horas o 20 horas	27-02-2026
2	Pausas Activas	6,13,20,27
3	Inducción específica de Sitio – Descripción del Proyecto - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial - Socio-Ambiental	10,18,23, 02-2026
4	Políticas de la Compañía y manual del viajero	22 -02-2026
5	Roles y responsabilidades frente al sistema de gestión	19-02-2026
6	Documento del plan de emergencias y análisis de vulnerabilidad	26-02-2026
7	Cambio climático	28-02-2026

Indicador de cumplimiento

De acuerdo al plan de capacitaciones establecido, se obtiene a corte del mes de **FEBRERO** indicador de cumplimiento del **17%**

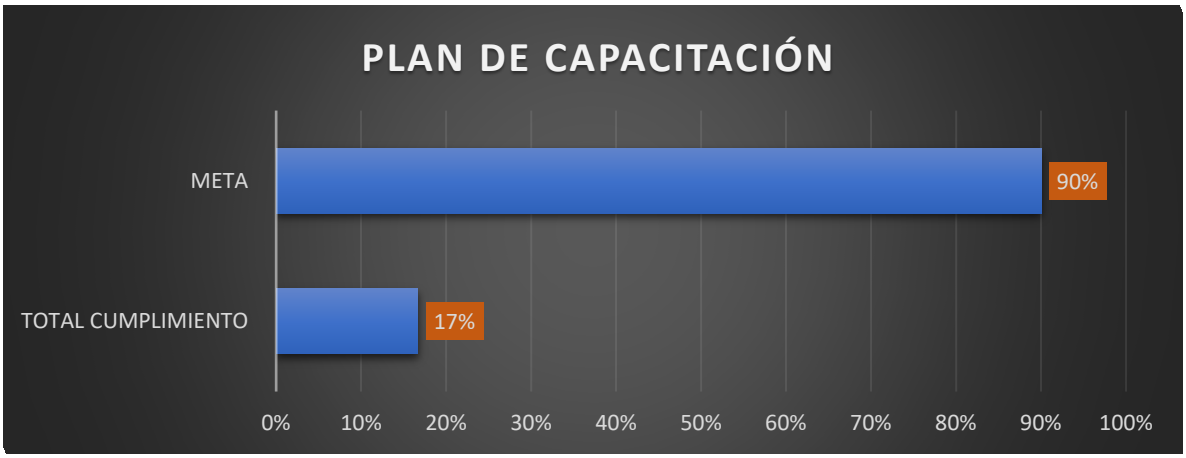

2. Novedades de personal

Durante el periodo del 1 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026, se presentaron los siguientes ingresos, se enlista a continuación:

EMPRESA	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ESTADO	NOVEDADES DEL PERSONAL	
					FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
CONSORCIO SES GUAINIA	MARTHA LUZ SOLANO BABILONIA	1118843100	PROFESIONAL SOCIAL	ACTIVO	04/02/2026	
CONSORCIO SES GUAINIA	YURI DAHJANY BUSTOS NIÑO	1121709072	ALMACENISTA	ACTIVO	04/02/2026	
A&A	BERTOLD ANDREI URBANO MUTIZ	1004517243	INGENIERO CIVIL - CAMPO	ACTIVO	16/02/2026	

Ver Anexo 1. Informe del Componente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por medio del siguiente link: SST INIRIDA CENTRALIZADOS

9. COMPONENTE AMBIENTAL

En cumplimiento de los requerimientos establecidos contractualmente por el componente de gestión ambiental del proyecto, se ejecutaron las siguientes actividades, durante el periodo de reporte:

- Se realiza la consolidación de información para la construcción del informe mensual del componente ambiental correspondiente al mes de febrero.

- Se realizó un seguimiento periódico al reporte emitido por el IDEAM, el cual presenta las predicciones climáticas para el departamento del Guainía. De acuerdo con dicho informe, a finales del mes de febrero se presenta temporada seca y aumento de incendios.

- Se inicia la actividad de instalaciones internas, para ello se realizó contacto con proveedor ASOCIACIÓN RECICLEMOS, para la entrega de material reciclable.

- Se recolecto la documentación de mineros de subsistencia en la zona para la adquisición de material pétreo, el cual se adjunta en el informe para su verificación.

Respecto a la generación de residuos peligrosos, manejo de maquinaria y equipos , se indica que para el presente periodo de reporte no se ha requerido realizar gestiones respecto a estos teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en la construcción de internas.

.

Ver Anexo 2. Informe Componente ambiental para el mes de febrero.

INFORME MENSUAL AMBIENTAL

10. SEGUIMIENTO DE POLIZAS Y SEGURO

CUADRO DE CONTROL DE GARANTÍAS GUAINÍA				
COMPAÑÍA DE SEGUROS:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			
Concepto:	**Pólizas Iniciales**			
No. DE PÓLIZA	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
45-44-101161982	Cumplimiento del contrato	$4,837,852,865.70	28/11/2024	30/04/2025
	Salarios y prestaciones sociales	$806,308,810.95	28/11/2024	30/12/2027
	Anticipo	$6,450,470,487.60	28/11/2024	30/04/2026
	Estabilidad de la obra	$4,837,852,865.70	30/12/2024	30/12/2029
	Calidad y correcto funcionamiento	$1,612,617,621.90	28/11/2024	30/12/2027
45-40-101096596	Predios, labores y operaciones	$ 806,308,810.95	28/11/2024	30/12/2026
	Contratistas y subcontratistas	$ 806,308,810.95	28/11/2024	30/12/2026
	Prejuicios extrapatrimoniales	$ 806,308,810.95	28/11/2024	30/12/2026
	Responsabilidad civil patronal	$ 806,308,810.95	28/11/2024	30/12/2026
	Vehículos propios y no propios	$ 806,308,810.95	28/11/2024	30/12/2026
Concepto:	**Pólizas Acta de Inicio**			

No. DE PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
45-44-101161982	Cumplimiento del contrato	$4,837,852,865.70	17/12/2024	19/05/2025
	Salarios y prestaciones sociales	$806,308,810.95	17/12/2024	18/01/2028
	Anticipo	$6,450,470,487.60	17/12/2024	19/05/2026
	Calidad y correcto funcionamiento	$1,612,617,621.90	17/12/2024	18/01/2028
	Estabilidad de la obra	$4,837,852,865.70	18/01/2025	18/01/2030
45-40-101096596	Predios, labores y operaciones	$806,308,810.95	17/12/2024	18/01/2027
	Contratistas y subcontratistas	$806,308,810.95	17/12/2024	18/01/2027
	Prejuicios extrapatrimoniales	$806,308,810.95	17/12/2024	18/01/2027
	Responsabilidad civil patronal	$806,308,810.95	17/12/2024	18/01/2027
	Vehículos propios y no propios	$806,308,810.95	17/12/2024	18/01/2027
Concepto:	**Modificación 1**			
No. DE PÓLIZA	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
45-44-101161982	Cumplimiento del contrato	$4,837,852,865.70	17/12/2024	16/10/2025
	Salarios y prestaciones sociales	$806,308,810.95	17/12/2024	16/06/2028
	Anticipo	$6,450,470,487.60	17/12/2024	16/10/2026
	Calidad y correcto funcionamiento	$1,612,617,621.90	17/12/2024	16/06/2028
	Estabilidad de la obra	$4,837,852,865.70	18/01/2025	18/01/2030
45-40-101096596	Predios, labores y operaciones	$806,308,810.95	17/12/2024	16/06/2027
	Contratistas y subcontratistas	$806,308,810.95	17/12/2024	16/06/2027
	Prejuicios extrapatrimoniales	$806,308,810.95	17/12/2024	16/06/2027
	Responsabilidad civil patronal	$806,308,810.95	17/12/2024	16/06/2027

	Vehículos propios y no propios	$806,308,810.95	17/12/2024	16/06/2027

COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Concepto:	**Pólizas Vigentes según Otro Sí N° 03**			
No. DE PÓLIZA	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
45-44-101161982	Cumplimiento del contrato	$4,837,852,865.70	17/12/2024	30/03/2026
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$6,450,470,487.60	17/12/2024	30/03/2027
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2028
	Calidad del servicio	$1,612,617,621.90	17/12/2024	30/11/2028
	Estabilidad y calidad de la obra	$4,837,852,865.70	30/11/2025	30/11/2030
45-40-101096596	Predios, labores y operaciones	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Contratistas y subcontratistas	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Vehículos propios y no propios	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Responsabilidad civil patronal	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Responsabilidad civil cruzada	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Gastos médicos	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Daño emergente y lucro cesante	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Perjuicios extrapatrimoniales	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027

COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
PÓLIZA N.º	Concepto	Pólizas Vigentes según Otro Sí N° 04		
	AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
45-44-101161982	Cumplimiento del contrato	$4,837,852,865.70	17/12/2024	30/03/2026
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$6,450,470,487.60	17/12/2024	30/03/2027
	Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2028
	Calidad del servicio	$1,612,617,621.90	17/12/2024	30/11/2028
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$4,837,852,865.70	17/12/2024	30/11/2030

	Estabilidad y calidad de la obra	$4,837,852,865.70	17/12/2024	30/11/2030
PÓLIZA N.º	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
	Predios, labores y operaciones	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
45-40-101096596	Contratistas y subcontratistas	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Vehículos propios y no propios	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Responsabilidad civil patronal	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Responsabilidad civil cruzada	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Gastos médicos	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Daño emergente y lucro cesante	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Perjuicios extrapatrimoniales	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027

COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
PÓLIZA N.º	Concepto	Pólizas Vigentes según Otro Sí N° 05		
	AMPAROS	***VALOR ASEGURADO***	***VIGENCIA DESDE***	***VIGENCIA HASTA***
45-44-101161982	*Cumplimiento del contrato*	*$4,837,852,865.70*	*17/12/2024*	*13/04/2026*
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	*$6,450,470,487.60*	*17/12/2024*	*13/04/2027*
	Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	*$806,308,810.95*	*17/12/2024*	*13/12/2028*
	Calidad del servicio	*$1,612,617,621.90*	*17/12/2024*	*13/12/2028*
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	*$4,837,852,865.70*	*17/12/2024*	*13/12/2027*
	Estabilidad y calidad de la obra	*$4,837,852,865.70*	*17/12/2024*	*13/12/2030*
PÓLIZA N.º	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
	Predios, labores y operaciones	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
45-40-101096596	Contratistas y subcontratistas	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Vehículos propios y no propios	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Responsabilidad civil patronal	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Responsabilidad civil cruzada	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Gastos médicos	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Daño emergente y lucro cesante	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Perjuicios extrapatrimoniales	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
PÓLIZA N.º	Concepto	Pólizas Vigentes según Otro Sí N° 06		

	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
45-44-101161982	*Cumplimiento del contrato*	*$4,837,852,865.70*	*17/12/2024*	*30/09/2026*
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	*$6,450,470,487.60*	*17/12/2024*	*30/09/2030*
	Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	*$806,308,810.95*	*17/12/2024*	*30/05/2029*
	Calidad del servicio	*$1,612,617,621.90*	*17/12/2024*	*30/05/2029*
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	*$4,837,852,865.70*	*17/12/2024*	*11/11/2029*
	Estabilidad y calidad de la obra	*$4,837,852,865.70*	*17/12/2024*	*30/05/2031*
PÓLIZA N.º	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
45-40-101096596	Predios, labores y operaciones	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Contratistas y subcontratistas	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Vehículos propios y no propios	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Responsabilidad civil patronal	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Responsabilidad civil cruzada	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Gastos médicos	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Daño emergente y lucro cesante	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027
	Perjuicios extrapatrimoniales	$806,308,810.95	17/12/2024	30/11/2027

Tabla 6: SEGUIMIENTO DE POLIZAS Y SEGURO

11. COMUNICACIÓN

Los canales de comunicación que existen dentro de la obra, con oficina central y con el cliente son por correo electrónico, correo escrito, WhatsApp corporativo o llamadas telefónicas, los cuales se detallan a continuación:

Nombre	Cargo	Correo	Numero de contacto
Edison Arley Diaz Andrade	Coordinador del proyecto	direccionproyectoszni@gmail.com	3165831404

Nombre	**Cargo**	**Correo**	**Numero de contacto**
Anderson Castellanos	Ingeniero residente	Residente2guainia@gmail.com	3223894149
Heriberto Galindo	Director del proyecto	energia1@aaconsultoriaeingenieria.com	3153521563
Ivan Tovar	Ingeniero apoyo documental	energia3@aaconsultoriaeingenieria.com	3132373657
Ingrid Correa	Ingeniera civil	controlproyectos@aaconsultoriaeingenieria.com	3143839298

Tabla 7. Canales De Comunicación.

11.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2025, se enviaron por parte del Consorcio SES Guainía las siguientes comunicaciones:

FECHA	AREA O DPTO	AÑO	CENTRO DE OPERACIONES O CENTRO DE COSTOS	CONSECUTIVO	ASUNTO	DESTINATARIO	TIPO DE CORRESPONDENCIA
4/02/2026	GES	2026	CON-SES	3	Solicitud de concepto de la situación actual de orden público en el municipio de Inírida – Proyecto Inírida Centralizados.	ALCALDÍA INÍRIDA	EXTERNA
4/02/2026	GES	2026	CON-SES	4	Solicitud de concepto de la situación actual de orden público en el municipio de Inírida – Proyecto Inírida Microredes e individuales.	ALCALDÍA INÍRIDA	EXTERNA
4/02/2026	GES	2026	CON-SES	5	Solicitud de concepto de la situación actual de orden público en el municipio de Barrancominas.	ALCALDÍA BARRANCOMINAS	EXTERNA

11/02/2026	GES	2026	CON-SES	6	Solicitud confirmación de estado de servicio de energía	EMELCE	EXTERNA
11/02/2026	GES	2026	CON-SES	7	Notificación de estado documental de usuarios correspondientes al proyecto de Barrancominas	PROINGES S.A.S	EXTERNA
13/02/2026	GES	2026	CON-SES	8	Solicitud de concepto de la situación actual de orden público en Inírida y Barrancominas.	POLICIA DEPARTAMENTAL	EXTERNA
17/02/2026	SIG	2026	CON-SES	9	Respuesta Gestión de residuos	PROINGES S.A.S	EXTERNA
18/02/2026	ING	2026	CON-SES	3	Solicitud de ajuste de cronograma – Proyectos Inírida 2 e Inírida Centralizado	PROINGES S.A.S	EXTERNA
19/02/2026	ING	2026	CON-SES	4	Solicitud de aplazamiento – Reunión de seguimiento No. 24 Contrato DG-106-2024	PROINGES S.A.S	EXTERNA
24/02/2026	GES	2026	CON-SES	9	Solicitud de renovación CAC - Inírida Microredes e Individuales	personería Municipal	EXTERNA
24/02/2026	GES	2026	CON-SES	11	Solicitud de renovación CAC - Inírida Centralizados	personería Municipal	EXTERNA
12/02/2026	SIG	2026	CON-SES	3	Cambio de profesional social y redistribución de frentes de trabajo.	PROINGES S.A.S	EXTERNA
16/02/2026	SIG	2026	CON-SES	4	Respuesta a observaciones oficio GUA-106-26 – Subsanación componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.	PROINGES S.A.S	EXTERNA
23/02/2026	SIG	2026	CON-SES	5	Respuesta a observaciones oficio GUA-106-26 – Subsanación componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.	PROINGES S.A.S	EXTERNA
24/02/2026	ING	2026	CON-SES	5	SOLICITUD DE EXTREMA URGENCIA – Requerimientos de seguimiento y ejecución del proyecto	ANMAR	INTERNA
24/02/2026	GES	2026	CON-SES	10	Remisión para revisión y aprobación de consentimiento informado para menores de edad	PROINGES S.A.S	EXTERNA

Tabla 8. Correspondencia Enviada.

PROFESIONALES SOLICITADOS CONSORCIO SES GUAINIA - ACTA INICIO 17/12/24			
CANTIDAD	**PERSONAL**	**FORMACION**	**PRESENTAR PAPELES**
1	**DIRECTOR DE PROYECTO**	Ingeniero eléctrico o electricista o electromecánico	**HERIBERTO GALINDO**
1	**INGENIERO RESIDENTE**	Ingeniero eléctrico o electricista o electromecánico	**EDISON ARLEY**
7	**SUPERVISORES EN TERRENO**	Tecnólogo o técnico electricista	**EDGAR ROMERO - FABIO CENON - HERNANDO MENDOZA - TOMAS VASQUEZ - ADA AMAYA - HENRY HIDALGO - JOHN PRADA**
1	**COORDINADORES HSEQ**	Profesional o especialista en salud ocupacional	**KAREN LORENA HOLGUIN MOYANO**
1	**PROFESIONAL SOCIAL**	Profesional en el área de la psicología o de humanidades y/o comunicación social	**MARTHA SOLANO**
1	**INGENIERO AMBIENTAL**	Profesional en ingeniería ambiental o forestal	**ANDRES PEREA SANCHEZ**
2	**INGENIERO CIVIL**	Profesional en ingeniería civil	**INGRID CORREA - MARIO MURILLO**

TABLA 9. Personal mínimo contrato DG-106-2024.

12. ACTIVIDADES A REALIZAR EL PRÓXIMO MES

- Transporte de material de la bodega principal desde san José del Guaviare hasta Inírida
- Distribución de materiales a zona de trabajos.
- Inicio de obra

13. DIFICULTADES

- **Bajo nivel del río Guaviare y afectación en el transporte de materiales**

Durante el mes de febrero se presentó como dificultad el bajo nivel del río Guaviare, principal vía fluvial utilizada para el transporte de materiales y equipos necesarios para el inicio y desarrollo de las actividades del proyecto.

Debido a esta condición, la navegabilidad en varios tramos del río se ha visto afectada, lo que ha generado restricciones en la movilidad de las embarcaciones y reducción en la capacidad de carga, impactando directamente los tiempos logísticos de transporte.

Como consecuencia de lo anterior, los tiempos de traslado del material han aumentado considerablemente, pasando de un promedio normal de 8 a 10 días a aproximadamente 15 a 16 días, lo cual genera retrasos en la llegada de los materiales a la zona de operación y afecta la programación de algunas actividades en territorio.

Esta situación ha requerido ajustes en la planificación logística y en la programación de actividades, con el fin de mitigar los impactos generados por las condiciones actuales de navegabilidad del río.

14. CONCLUSIONES

se realizaron gestiones de planeación y control del proyecto, dentro de las cuales se incluye la solicitud de ajuste del cronograma para los proyectos Inírida 2 e Inírida Centralizado, con el fin de ajustar la programación a las condiciones reales de ejecución, aspectos logísticos y disponibilidad de recursos en territorio, manteniendo la fecha de terminación contractual establecida.

En general, las actividades desarrolladas durante el periodo reportado permiten fortalecer el seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto, garantizando la correcta articulación entre los diferentes actores involucrados y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.

15. ANEXOS

ANEXO 1: Informe del Componente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SST INIRIDA CENTRALIZADOS

ANEXO 2: Informe Componente ambiental para el mes de febrero.

INFORME MENSUAL AMBIENTAL

Cordialmente

ANDRÉS PEREA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SES GUAINIA

Proyectó	**Revisó**	**No. páginas**	**Anexos**
Anderson castellanos	• Edison Arley Diaz • Heriberto Galindo	39	2
