INFORME MENSUAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC-2054-2026

CARTAGENA DEL CHAIRA -CAQUETÁ

CONTRATISTA: GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P.

GENSA S.A. E.S.P.

CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

MME

MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA

ENERO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3
3. ALCANCE 3
4. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 4
4.1 PÓLIZAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4
4.2 GRUPO DE TRABAJO GENSA 4
5. CONTRATOS DERIVADOS OBRA E INTERVENTORÍA 5
5.1 OBRA 5
5.2 INTERVENTORÍA 5
6. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO 5
7. CRONOGRAMA CONTRATO GGC-2054-2025 6
8. COMPONENTE TÉCNICO 6
9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6
10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 7
11. COMPONENTE SOCIAL 7
12. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
13. COMENTARIOS 8
14. ANEXOS 8


1. INTRODUCCIÓN

El MME y GENSA S.A. ESP., suscribieron el contrato interadministrativo GGC-2054-2025 el 9 de diciembre de 2025, cuyo objeto es "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DE CAQUETA".

En ejecución del contrato en mención, se presenta a continuación el informe de las actividades adelantadas por GENSA durante meses de enero a abril de 2026.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto asociado al contrato interadministrativo se encuentra ubicado en el municipio de Valle del Guamuez departamento de Putumayo

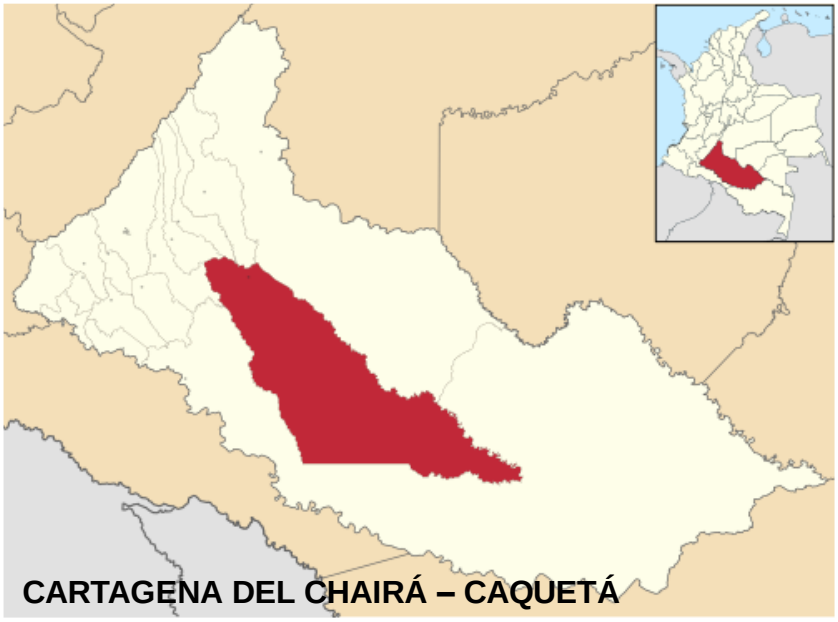

3. ALCANCE

Realizar la administración de recursos y asistencia técnica del proyecto, para lo cual deberá, gestionar, coordinar, contratar, administrar y ejecutar los recursos asignados para llevar a cabo el replanteo, el Plan de Gestión y Formación Social, la Implementación de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas SISFV en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, en el municipio de Cartagena del Chaira del departamento de Caquetá, a través de las siguientes etapas:

- Etapa 1 – Actividades Previas y de Contratación
- Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social de la comunidad energética, Entrega Integral de la Infraestructura.

- Etapa 3 – Cierre.

4. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato Interadministrativo	GGC-2054-2025
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DE CAQUETA
Fecha de Suscripción	9/12/2025
Fecha de Inicio	20/01/2026
Plazo Inicial	31/07/2026
Valor del Contrato	VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE PESOS - $**24.437.339.433**
Suscripción Encargo Fiduciario	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A 19/12/2025

4.1 PÓLIZAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

GARANTIA		SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
No. AB000685	**AMPARO**		**DESDE**	**HASTA**
EQUIDAD SEGUROS OC Seguro cumplimiento estatal	Cumplimiento del contrato	$4.887.467.866,60	09/12/2025	31/01/2029
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	$1.221.866.971,65	09/12/2025	31/07/2029
	Calidad del Servicio	$4.887.467.866,60	09/12/2025	31/07/2027

4.2 GRUPO DE TRABAJO GENSA

Se presenta a continuación el grupo de profesionales de GENSA asignado al seguimiento de los proyectos:

PROFESIONALES GENSA	CARGO
Julio Mauricio Arce Posso	Líder de Proyectos de Infraestructura en el Sector Eléctrico
Paola Martínez Serna	Profesional de Proyectos
Julián Santiago Mejía Zuluaga	Profesional de Proyectos
Carlos Alberto Triana Grajales	Profesional Especializado en Proyectos
Juan Carlos Villada Salazar	Líder de Proyectos

5. CONTRATOS DERIVADOS OBRA E INTERVENTORÍA

5.1 OBRA

Proceso contractual	Etapa de Planeación
Apertura	
Cierre	
Publicación evaluación	
Oferente seleccionado	
Carta de aceptación	
Estado	

5.2 INTERVENTORÍA

Proceso contractual	Etapa de Planeación
Apertura	
Cierre	
Publicación evaluación	
Oferente seleccionado	
Carta de aceptación	
Estado	

6. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realiza la firma del acta de inicio del contrato interadministrativo GGC-2054-2025 con el MME el día 20 de enero de 2026.
- El día 27 de enero de 2026, se presenta ante el MME la solicitud de aprobación del primer desembolso, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el contrato GGC-2054-2026:
  1. Suscripción del acta de inicio debidamente firmada;
  2. Aprobación por parte del MME de las garantías a cargo del contratista;
  3. Verificación por parte del MME, de la constitución del encargo fiduciario para el manejo de los recursos;
  4. Pago de seguridad social y parafiscales por parte de GENSA;
  5. Organigrama del equipo técnico y administrativo de GENSA;
  6. Cronograma para los procesos de contratación de la interventoría derivada y del contratista derivado de implementación.

7. CRONOGRAMA CONTRATO GGC-2054-2025

A la fecha de corte de este informe, el contrato se encuentra en el desarrollo de la Etapa 1.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES						
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. GGC-2054-2025						
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL						
	Fecha de Suscripción Contrato: 09 Diciembre 2025	Contratista: GENSA S.A. ESP				EJECUTADO ENERO
ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	TIEMPO (DIAS)	FECHA FINAL	%	3,0%
1	**Etapa 1 - Actividades previas a la contratación y contratación**	26/01/2026	54	20/03/2026	20%	3,0%
1.1	Firma de Acta de Inicio con Ministerio de Minas Y Energia	26/01/2026	1	26/01/2026	1%	1,0%
1.2	Suscripción del contrato de encargo fiduciario	26/01/2026	3	28/01/2026	2%	2,0%
1.3	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad	29/01/2026	5	2/02/2026	1%	
1.4	Elaboración y publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, para la contratación de la Interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, Social, Financiera y Contable	3/02/2026	15	17/02/2026	2%	-
1.5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para contrato de Interventoría	17/02/2026	7	23/02/2026	2%	-
1.6	Firma de contrato de Interventoría y suscripción de Acta de inicio	24/02/2026	6	1/03/2026	2%	-
1.7	Elaboración y publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, para la contratación de obra para la ejecución del proyecto	1/03/2026	10	10/03/2026	2%	-
1.8	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para contrato de obra para la Implementación del proyecto	10/03/2026	7	16/03/2026	2%	-
1.9	Firma de contrato de obra y suscripción de Acta de inicio	17/03/2026	6	22/03/2026	2%	-
1.10	Cronograma del contratista derivado. Aprobados por interventoría y avalado por GENSA S.A. E.S.P.	22/03/2026	8	29/03/2026	2%	-
1.11	Verificar la realización de las consultas previas, existencia de las servidumbres y/o permisos de paso, licencia o permiso ambientales, las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo (En caso de Aplicar)	13/03/2026	7	19/03/2026	1%	-
1.12	Firma Acta de terminación actividades previas a la contratación y contratación, entre GENSA S.A. E.S.P., SU CONTRATISTA DERIVADO, EL INTERVENTOR Y EL MME	20/03/2026	1	20/03/2026	1%	-

8. COMPONENTE TÉCNICO


Los SISFV que se implementarán en Cartagena del Chaira, tienen las siguientes características técnicas:

SISFV - No. DE USUARIOS 719				
PANELES	**INVERSORES**	**CONTROLADORES**	**BATERÍAS**	**SISTEMA DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA**
3 Paneles 670 W Monocristalino bifacial, doble cristal de alta eficiencia del módulo de 22%,	Inversor de onda senoidal pura 48Vdc a 2000 W con eficiencia superior al 91% de -15 a 60 °C	Controlador MPPT de 50A/48V con eficiencia superior a 98%	Batería Litio 120 Ah a 51.2 Vdc ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado	Medidor prepago monofásico con sistema de gestión de recaudo con comunicación off line

9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de GENSA, se realiza seguimiento al esquema de vacunación del personal que viaja a zonas endémicas; con el fin de actualizar la información relacionada con el estado de vacunación contra fiebre amarilla y tétano.

Si el destino de desplazamiento cuenta con riesgos por enfermedades transmitidas por vectores u otras condiciones ambientales, es fundamental contar con las medidas de prevención necesarias, incluyendo las vacunas requeridas

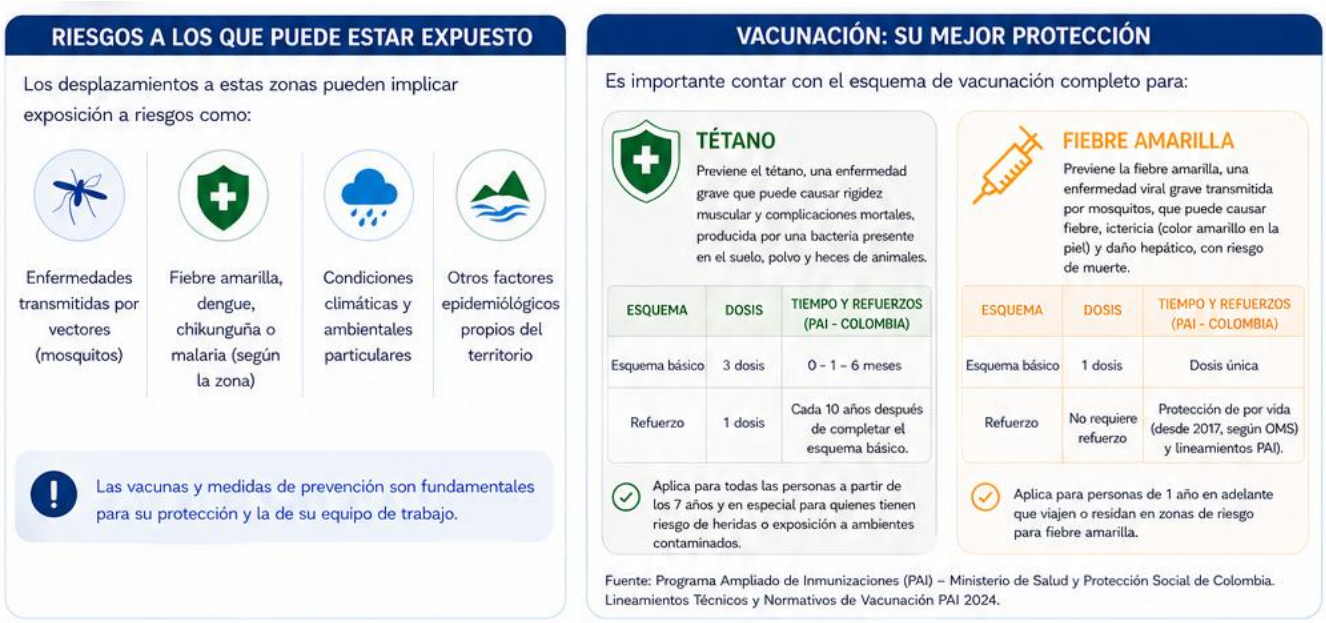

10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

GENSA hace la verificación de la documentación de formulación entregada por el MME para cada proyecto, para ello, se cuenta con una lista de chequeo que permite validar la información existente y los posibles faltantes. Para los componentes social y ambiental se verifican entre otros los siguientes documentos:

- Certificación de Parque Nacionales Naturales en donde se establezca si las comunidades beneficiarias se encuentran o NO ubicadas en áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
- Certificación del trámite de la Licencia Ambiental y/o permisos ambientales complementarios o aval ambiental ante la autoridad ambiental competente, necesarios para la debida ejecución del proyecto.
- Presentar caracterización ambiental (línea base) de los recursos naturales.
- Identificación y evaluación de impactos ambientales.
- Plan de manejo ambiental (medidas de mitigación, corrección, compensación y/o prevención, entre otras).
- Determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa.
- Actas de socialización.

Anexo a este informe se encuentran las listas de chequeo.

11. COMPONENTE SOCIAL

- Los días 22 y 23 de enero de 2026, el ingeniero Julio Mauricio Arce Posso, como líder de proyectos de GENSA, asiste a las jornadas de capacitación y transferencia de conocimiento de


la Escuela para la Transición Energética Justa en el marco de la estrategia Nacional de Comunidades Energéticas impartida por el MME.

En estas se marcaron como objetivos, el fortalecimiento de las capacidades; garantizar una aplicación real y coherente de los conceptos; y obtener una articulación entre los actores que se centran en los equipos que el MME ha definido como social, técnico y data. Así mismo, se manifestó que serían enviadas a GENSA las presentaciones de estas jornadas, con los ajustes realizados en función de los comentarios obtenidos. A la fecha no se ha recibido dicha información.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

13. COMENTARIOS

- El avance general del Contrato Interadministrativo GGC-2054-2025 al 31 de enero de 2026, de acuerdo con el cronograma, es del 3%, a continuación, se presenta la curva S:

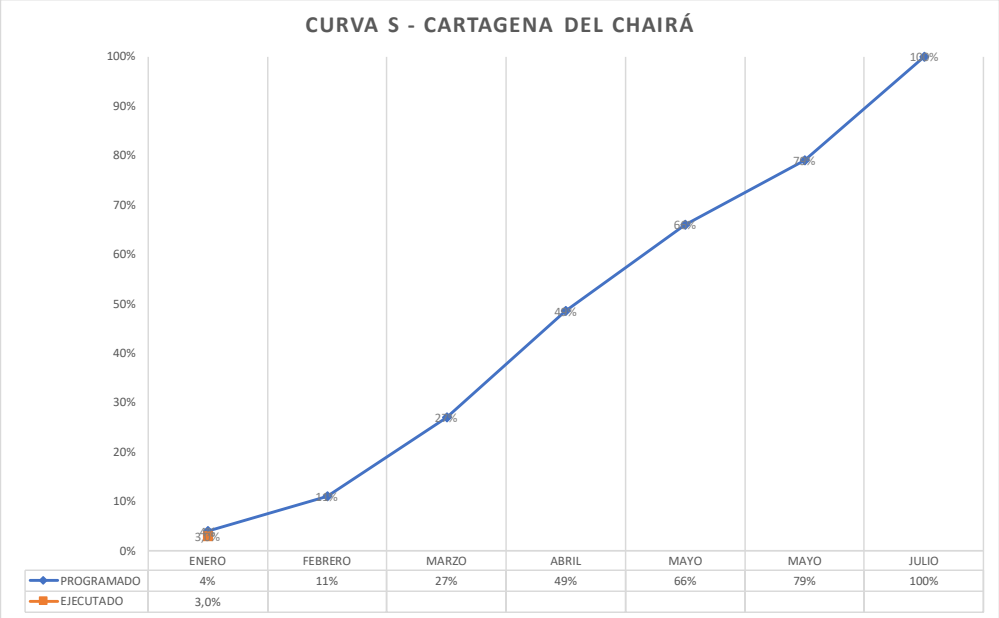

14. ANEXOS

- Cronograma general GGC-2054-2025
- Informe de la fiduciaria
- Lista de chequeo documentación formulación

Elaborado por: Juan Carlos Villada Salazar- Profesional de Proyectos.
Revisado por: Julio Mauricio Arce Posso - Líder de Proyectos de Infraestructura Sector Eléctrico.
