INFORME MENSUAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC-2055-2026

CONTRATISTA: GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P.

GENSA S.A. E.S.P.

CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

MME

MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA

MARZO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3
3. ALCANCE 3
4. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 4
4.1 PÓLIZAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4
4.2 GRUPO DE TRABAJO GENSA 4
5. CONTRATOS DERIVADOS OBRA E INTERVENTORÍA 4
5.1 OBRA 4
5.2 INTERVENTORÍA 5
6. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO 5
7. COMPONENTE TÉCNICO 5
8. CRONOGRAMA CONTRATO GGC-2055-2025 6
9. CURVA S 7
10. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 8
12. COMPONENTE SOCIAL 8
13. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8
14. ANEXOS 10

1. INTRODUCCIÓN

El MME y GENSA S.A. ESP., suscribieron el contrato interadministrativo GGC-2055-2025 el 9 de diciembre de 2025, cuyo objeto es "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO".

En ejecución del contrato en mención, se presenta a continuación el informe de las actividades adelantadas por GENSA durante el mes marzo de 2026.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto asociado al contrato interadministrativo GGC-2055-2025 se encuentra ubicado en el municipio de San Miguel departamento de Putumayo.



3. ALCANCE

Realizar la administración de recursos y asistencia técnica del proyecto, para lo cual deberá, gestionar, coordinar, contratar, administrar y ejecutar los recursos asignados para llevar a cabo el replanteo, el Plan de Gestión y Formación Social, la Implementación de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas SISFV en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, en el municipio de San Miguel del departamento de Putumayo, a través de las siguientes etapas:

- Etapa 1 – Actividades Previas y de Contratación
- Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social de la comunidad energética, Entrega Integral de la Infraestructura.
- Etapa 3 – Cierre.

4. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato Interadministrativo	GGC-2055-2025
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Fecha de Suscripción	9/12/2025
Fecha de Inicio	26/01/2026
Plazo Inicial	31/07/2026
Valor del Contrato	SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS - **$ 6.880.380.834**
Suscripción Encargo Fiduciario	FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A 19/12/2025

4.1 PÓLIZAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

GARANTÍA		SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
No.AB000687	**AMPARO**		**DESDE**	**HASTA**
LA EQUIDAD SEGUROS C.O Seguro de cumplimiento entidad estatal	Cumplimiento	$ 1.376.076.166,80	9/12/2025	31/01/2029
	Calidad del servicio	$ 1.376.076.166,80	9/12/2025	31/07/2027
	Prestaciones sociales	$ 344.019.041,70	9/12/2025	31/07/2029

4.2 GRUPO DE TRABAJO GENSA

Se presenta a continuación el grupo de profesionales de GENSA asignado al seguimiento de los proyectos en el departamento de Putumayo:

PROFESIONALES GENSA	CARGO
Julio Mauricio Arce Posso	Líder de Proyectos de Infraestructura en el Sector Eléctrico
Paola Martínez Serna	Profesional de Proyectos
Julián Santiago Mejía Zuluaga	Profesional de Proyectos
Carlos Alberto Triana Grajales	Profesional Especializado en Proyectos

5. CONTRATOS DERIVADOS OBRA E INTERVENTORÍA

5.1 OBRA

Proceso contractual	SPO-213-GENSA-2026-LG
Apertura	Marzo 17 de 2026
Cierre	Abril 13 de 2026

5.2 INTERVENTORÍA

Proceso contractual	SPO-214-GENSA-2026-LG
Apertura	Marzo 17 de 2026
Cierre	Abril 6 de 2026

6. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

Durante el mes de marzo de 2026 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Una vez aprobada la solicitud 19 de marzo, se procede a descontar de la fiduciaria el primer pago de la remuneración a GENSA, esto se da el 30 de marzo de 2026.
- Durante febrero y marzo GENSA adelanta la elaboración de los pliegos de condiciones, para la contratación de obras e interventoría en el departamento de Putumayo. Acogiendo las consideraciones del MME y valorando las ventajas de realizar un solo proceso, se optó por agrupar los proyectos de Valle del Guamuez (GGC-2051-2025), Villagarzón (GGC-2052-2025), San Miguel (GGC-2055-2025) y Puerto Guzmán (GGC-2057-2025).
- Los pliegos de condiciones incluyen requisitos específicos en aspectos jurídicos, técnicos, financieros y económicos, que, permiten validar la experiencia, capacidad técnica y financiera de los oferentes, procurando minimizar riesgos al momento de la contratación.
- El día 17 de marzo se hace la publicación de las solicitudes públicas de ofertas SPO-213-GENSA-2026-LG – obras y SPO-214-GENSA-2026-LG interventoría.
- El día 19 de marzo de 2026 se llevan a cabo las visitas obligatorias de manera simultánea en zona rural de los municipios de Valle del Guamuez y Puerto Guzmán, según lo estipulado en el pliego de condiciones, esta visita se hace con el fin que los posibles oferentes conozcan las condiciones en las que se adelantarán las labores.

7. COMPONENTE TÉCNICO

Los SISFV que se implementarán en San Miguel, tienen las siguientes características técnicas:

SISFV - No. DE USUARIOS 217				
PANELES	**INVERSORES**	**CONTROLADORES**	**BATERÍAS**	**SISTEMA DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA**
2 Paneles 710 W Monocristalino bifacial, doble cristal de alta eficiencia del módulo de 22%,	Inversor de onda senoidal pura 24 Vdc a 2000 W con eficiencia superior al 91% de -15 a 60 °C	Controlador MPPT de 60 A a 1600 W con eficiencia superior a 98%	Batería Litio 200 Ah a 25,6 Vdc con Ciclos 6000 a DoD hasta el 80%	Medidor prepago monofásico con sistema de gestión de recaudo con comunicación off line


8. CRONOGRAMA CONTRATO GGC-2055-2025

A la fecha de corte de este informe, el contrato se encuentra en el desarrollo de la Etapa 1.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. GGC-2055-2025 IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO		
	Fecha de Suscripción Contrato: 09 Diciembre 2025	**MARZO**
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**8,0%**
1	**Etapa 1 - Actividades previas a la contratación y contratación**	**8,0%**
1.1	Firma de Acta de Inicio con Ministerio de Minas Y Energia	1,0%
1.2	Suscripción del contrato de encargo fiduciario	2,0%
1.3	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad	1,0%
1.4	Elaboración y publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, para la contratación de la Interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, Social, Financiera y Contable	2,0%
1.5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para contrato de Interventoría	0,0%
1.6	Firma de contrato de Interventoría y suscripción de Acta de inicio	0,0%
1.7	Elaboración y publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, para la contratación de obra para la ejecución del proyecto	2,0%
1.8	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para contrato de obra para la Implementación del proyecto	0,0%
1.9	Firma de contrato de obra y suscripción de Acta de inicio	0,0%
1.10	Cronograma del contratista derivado. Aprobados por interventoría y avalado por GENSA S.A. E.S.P.	0,0%
1.11	Verificar la realización de las consultas previas, existencia de las servidumbres y/o permisos de paso, licencia o permiso ambientales, las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo (En caso de Aplicar)	0,0%
1.12	Firma Acta de terminación actividades previas a la contratación y contratación, entre GENSA S.A. E.S.P., SU CONTRATISTA DERIVADO, EL INTERVENTOR Y EL MME	0,0%
2	**Etapa 2 - Actividades de Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social y Entrega Integral de la Infraestructura**	**0,0%**
2,1	Verificación Comunidades Energéticas y usuarios beneficiarios del proyecto / Realizar socialización y verificacion de usuarios	0%
2,2	Entrega y aprobación de replanteo	0%
2,3	Compra de equipos importados y materiales eléctricos y civiles, y transporte a bodegas del contratista	0%
2,4	Avance de obra al 10%	0%
2,5	Avance de obra al 60%	0%
2,6	Acta de recibo final de obras 100%	0%
2,7	Capacitación a las Comunidades Energéticas y sus usuarios asociados, en el marco de la Escuela TEJ	0%
2,8	Acta de recibo y entrega final entre el administrador, contratista de obra e interventoría	0%
2,9	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el CONTRATISTA, INTERVENTOR, CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISOR DEL MINISTERIO Y COMUNIDAD ENERGETICA.	0%
3	**Etapa 3 - Actividades de Cierre**	**0,0%**
3,1	Suscribir acta de liquidación contrato derivado de implementación	0%
3,2	Suscribir acta de liquidación contrato de Interventoría	0%
3,3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre y liquidación del Encargo Fiduciario	0%
3,4	Presentación informe final y documentación soporte por parte de GENSA S.A. E.S.P.	0%
3,5	Presentar el proyecto del Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el MME, para la liquidación del contrato interadministrativo.	0%

9. CURVA S


El avance general del Contrato Interadministrativo GGC-2055-2025 al 31 de marzo de 2026, de acuerdo con el cronograma, es del 8%, a continuación, se presenta la curva S:

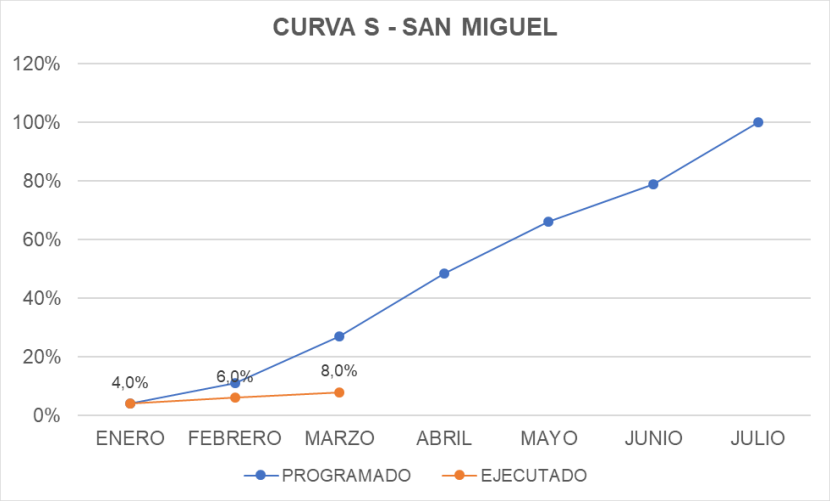

10. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de GENSA, se realiza seguimiento al esquema de vacunación del personal que viaja a zonas endémicas; con el fin de actualizar la información relacionada con el estado de vacunación contra fiebre amarilla y tétano.

Si el destino de desplazamiento cuenta con riesgos por enfermedades transmitidas por vectores u otras condiciones ambientales, es fundamental contar con las medidas de prevención necesarias, incluyendo las vacunas requeridas

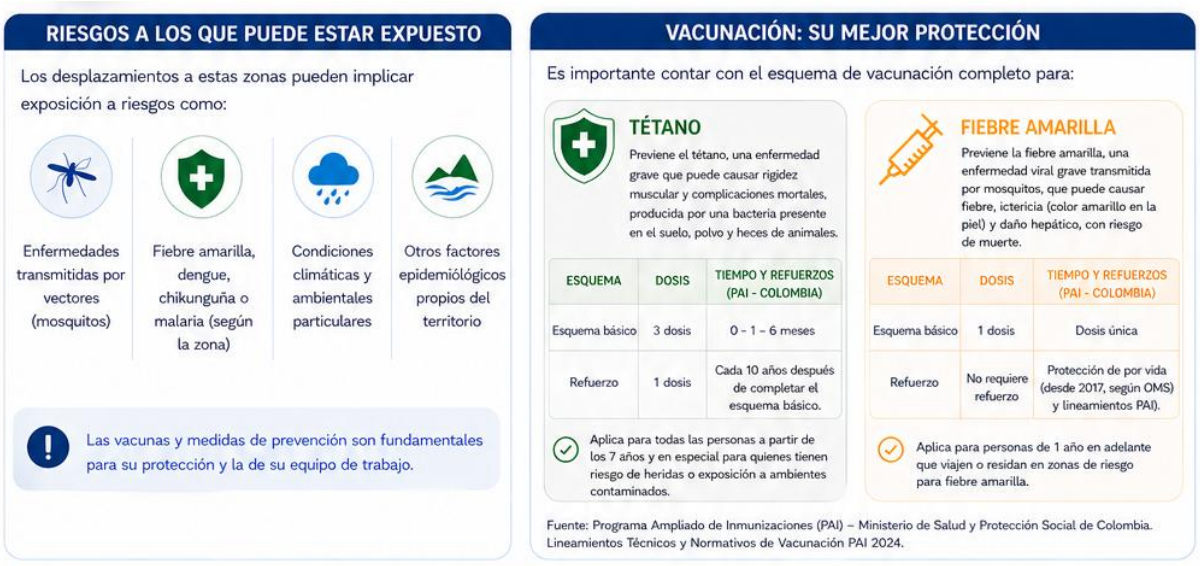

11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Desde el área de Dirección Ambiental y de Asuntos Sociales de GENSA, se adelantan la ejecución de sus programas de manera general en la sede administrativa Manizales.

12. COMPONENTE SOCIAL

Desde el área de Dirección Ambiental y de Asuntos Sociales de GENSA, se adelantan la ejecución de sus programas de manera general en la sede administrativa Manizales.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El siguiente registro fotográfico corresponde a la visita técnica obligatoria para las solicitudes de ofertas SPO-213-GENSA-2026-LG – obras y SPO-214-GENSA-2026-LG – interventoría, realizada de manera simultánea el día 19 de marzo de 2026 a las 9:00 am, en los municipios de Valle del Guamuez y Puerto Guzmán.



Lugar de la reunión: Vereda Alianza
Puerto Guzmán - Putumayo



Lugar de la reunión: Vereda La Costeñita
Valle del Guamuez – Putumayo



Representantes de GENSA, oferentes de obra e interventoría
Puerto Guzmán – Putumayo



Representantes de GENSA, oferentes de obra e interventoría
Valle del Guamuez – Putumayo

14. ANEXOS

- Cronograma general GGC-2055-2025.
- Informe de la fiduciaria

Elaborado por: Paola Martínez Serna- Profesional de Proyectos.
Revisado por: Julio Mauricio Arce Posso - Líder de Proyectos de Infraestructura Sector Eléctrico.
