CONTRATO No: 1251 DE 2026

OBJETO: "ALQUILER DE HORAS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META."

CONTRATISTA: SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."

INFORME PARCIAL No.1

VILLAVICENCIO

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES 13
1.1 Información Básica 13
1.2 Antecedentes 14
1.3 Objetivo del Contrato 15
2. INTRODUCCIÓN 15
3. LOCALIZACIÓN PUNTOS DE EJECUCIÓN 16
4. cumplimiento obligaciones del contratista 25
OBLIGACIONES GENERALES 25
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 29
5. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO-PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES 34
6. modificatoriAs y/o aclaratorios realizados al contrato 35
7. INFORMACION FINANCIERA 38
8. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS 38
9. PERSONAL 40
MARZO 2026 40
PERSONAL MINIMO DE APOYO PROFESIONAL 40
ABRIL 2026 41
PERSONAL MINIMO DE APOYO PROFESIONAL 41
PERSONAL OPERATIVO 41
MAYO 2026 41
PERSONAL MINIMO DE APOYO PROFESIONAL 41
PERSONAL OPERATIVO 42
10. pagos de seguridad social del contratista 43
MARZO 2026 43
PERSONAL MINIMO DE APOYO PROFESIONAL 43
ABRIL 2026 44
PERSONAL MINIMO DE APOYO PROFESIONAL 44
PERSONAL OPERATIVO 44
MAYO 2026 45
PERSONAL MINIMO DE APOYO PROFESIONAL 45
PERSONAL OPERATIVO 46
11. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN FISICA 48
BALANCE FINANCIERO 48
EJECUCIÓN FISICA 48
12. Presupuesto general según condiciones iniciales del contrato 50
13. PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 26 DE marzo AL 25 DE mayo de 2026. 53
14. ejecuCION DEL 26 de MARZO de 2026 al 25 de mayo de 2026 57
PUNTOS INTERVENIDOS 61
MUNICIPIO DE EL DORADO - CAÑO AGUAS ZARCAS 61
MUNICIPIO DE GRANADA - VEREDA LA MARIELA, RIO LA CUBILLERA 76
MUNICIPIO DE LA URIBE - VEREDA EL PLACER, RIO DUA 85

MUNICIPIO DE LA URIBE – VEREDA LOS PLANES 97
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA – GUAPAYA MEDIO, CAÑO GUAPAYA 108
MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA – GUAPAYA BAJO, CAÑO GUAPAYA 125
MUNICIPIO DE CABUYARO – VISO DE UPIA, RIO UPIA 138
MUNICIPIO DE CABUYARO – GUAYABAL DE UPIA, RIO UPIA 148
MUNICIPIO DE CABUYARO – PUENTE RIO HUMEA 154
15. SOCIALIZACIÓN EN LOS PUNTOS DE TRABAJO 202
16. RELACIÓN COMITÉS TECNICOS 207
17. CONCLUSIONES 208
18. anexos 209

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información basica del contrato. 13
Tabla 2.Modificaciones En el Tiempo-Prórrogas y Suspensiones 34
Tabla 3.Modificatorias y/o Aclaratorios Realizados al Contrato 35
Tabla 4. Información financiera 38
Tabla 5. Amparos del contrato 38
Tabla 6. Póliza Iniciales – Anexo 0 38
Tabla 7. Póliza según Acta de inicio – Anexo 2 39
Tabla 8. Póliza según Prorroga No.1 – Anexo 3 39
Tabla 9. Personal Apoyo profesional 40
Tabla 10. Personal Apoyo profesional 41
Tabla 11. Personal operativo 41
Tabla 12. Personal Apoyo profesional 41
Tabla 13. Personal operativo 42
Tabla 14. Seguridad social Personal Apoyo profesional 43
Tabla 15. Seguridad social Personal Apoyo profesional 44
Tabla 16. Seguridad social Personal operativo 44
Tabla 17. Seguridad social Personal Apoyo profesional 45
Tabla 18. Seguridad social Personal operativo 46
Tabla 19. Balance financiero 48
Tabla 20. Ejecución Fisica 48
Tabla 21. Presupuesto general según condiciones iniciales del contrato 50
Tabla 22. Presupuesto general según condiciones iniciales del contrato 51
Tabla 23. Presupuesto ejecutado del 26 de marzo al 25 de mayo de 2026. 53
Tabla 24. Resumen de actividades ejecutadas. 57
Tabla 25. Propuesta de intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas. 61
Tabla 26. Intervención realizada – Municipio de El Dorado – Caño Agua Zarcas. 62
Tabla 27. Maquinaria utilizada, Municipio de El Dorado – Caño Agua Zarcas. 72
Tabla 28. Reporte diario de horas excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 72

Tabla 29. Propuesta de intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela. 77
Tabla 30. Intervención realizada, Municipio De Granada - Vereda La Mariela. 78
Tabla 31. Maquinaria utilizada mes de abril de 2026, Municipio De Granada - Vereda La Mariela. 83
Tabla 32. Reporte diario de horas excavadora Shantui SE220LC MC714613 #2 83
Tabla 33. Propuesta de intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer 86
Tabla 34. Intervención realizada, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer 87
Tabla 35. Maquinaria utilizada, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer 91
Tabla 36. Reporte diario de horas excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 91
Tabla 37. Propuesta de intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes 98
Tabla 38. Actividades ejecutadas Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes 98
Tabla 39. Maquinaria utilizada – Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes 104
Tabla 40. Reporte diario de horas excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 104
Tabla 41. Propuesta de intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio 109
Tabla 42. Intervención realizada – Municipio El Castillo– Vereda El Jardin, río Cumaral. 110
Tabla 43. Maquinaria utilizada, Municipio Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio 119
Tabla 44. Reporte diario de horas excavadora Shantui SE215 MC765198#4 119
Tabla 45. Propuesta de intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo 126
Tabla 46. Intervención realizada – Municipio de Vista Hermosa – Guapaya Bajo. 126
Tabla 47. Maquinaria utilizada, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo 133
Tabla 48. Reporte diario de horas excavadora Shantui SHANTUI SE215 MC765197#5 133
Tabla 49. Propuesta de intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 138
Tabla 50. Iintervención realizada, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 139
Tabla 51. Maquinaria utilizada, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 145
Tabla 52. Reporte diario de horas excavadora CATERPILLAR 320D MC033914 #2 146
Tabla 53. Propuesta de intervención, Municipio De Cabuyaro – Guayabal de Upia, río Upia. 149
Tabla 54. Maquinaria utilizada, Municipio De Cabuyaro – Guayabal de Upia, río Upia. 152
Tabla 55. Reporte diario de horas excavadora CATERPILLAR 320D MC033914 #2 152
Tabla 56. Propuesta de intervención, Municipio De Cabuyaro – Puente río Humea. 155
Tabla 57. Iintervención realizada, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 156
Tabla 58. Maquinaria utilizada, Municipio De Cabuyaro – Puente río Humea. 165
Tabla 49. Resumen excavadora sobre oruga 20 ton 167
Tabla 50. Reporte diario de horas excavadora CATERPILLAR 320D MC020824 #1 167
Tabla 51. Resumen volqueta doble troque 172
Tabla 52. Reporte diario de horas Volqueta SJP-903 172
Tabla 53. Reporte diario de horas Volqueta VPC-808 174
Tabla 54. Reporte diario de horas Volqueta SXE-546 176
Tabla 55. Reporte diario de horas Volqueta KDJ-221 178
Tabla 56. Resumen volqueta sencilla 180
Tabla 57. Reporte diario de horas volqueta SVC-806 181
Tabla 58. Reporte diario de horas volqueta SRP 547 185
Tabla 59. Reporte diario de horas volqueta VKK-419 188
Tabla 60. Reporte diario de horas volqueta OAA-430 191
Tabla 61. Reporte diario de horas volqueta GCC-242 193

Tabla 62. Reporte diario de horas volqueta GCC-242 194
Tabla 63. Reporte diario de horas volqueta UVJ-264 195
Tabla 64. Reporte diario de horas volqueta SRA-294 197
Tabla 75. Propuesta de intervención, Municipio De El Calvario – Caño Seco. 199
Tabla 76. Maquinaria utilizada, Municipio De El Calvario – Caño Seco. 199
Tabla 77. Reporte diario de horas excavadora YANMAR VC80 MC730595 200
Tabla 78. Relación comités técnicos 207

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del departamento del Meta. 16
Ilustración 2 . Localización del Municipio de El Castillo 17
Ilustración 3. Ubicación del punto La Uribe, Vereda El Placer - Rio Dua 17
Ilustración 4. Ubicación del punto La Uribe, Vereda Los Planes 18
Ilustración 5 . Localización del Municipio de Vista Hermosa 18
Ilustración 6. Ubicación del punto Vista Hermosa, Guapayo Medio 19
Ilustración 7. Ubicación del punto Vista Hermosa, Guapayo Bajo 19
Ilustración 8. Localización del municipio de Granada 20
Ilustración 9. Ubicación del punto Granada, Vereda La Mariela 20
Ilustración 10 . Localización del Municipio de El Dorado 21
Ilustración 11. Ubicación del punto El Dorado, Caño Aguas Zarcas 21
Ilustración 12 . Localización del Municipio de Cabuyaro 22
Ilustración 13. Ubicación del punto Cabuyaro, Viso de Upia 22
Ilustración 14. Ubicación del punto Cabuyaro, Puente Rio Humea 23
Ilustración 15. Localización municipio del Calvario 24
Ilustración 16. Localización del punto, El Calvario, Caño Seco 24
Ilustración 17. Grafica avance programado vs avance ejecutado 49
Ilustración 18. Grafica inversión programada vs inversión ejecutada 49
Ilustración 19. Propuesta de intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas. 62
Ilustración 20. Intervención realizada, Municipio de El Dorado – Caño Agua Zarcas. 63
Ilustración 21. Antes de la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas 63
Ilustración 22. Antes de la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas 64
Ilustración 23. Antes de la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas 64
Ilustración 24. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas 65
Ilustración 25. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas 65
Ilustración 26. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas 66
Ilustración 27. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas 66
Ilustración 28. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas 67
Ilustración 29. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas 67
Ilustración 30. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas 68
Ilustración 31. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas 68

Ilustración 32. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas..... 69
Ilustración 33. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas..... 69
Ilustración 34. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas..... 70
Ilustración 35. Posterior a la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas. 70
Ilustración 36. Posterior a la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas. 71
Ilustración 37. Posterior a la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas. 71
Ilustración 38 . Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas. 74
Ilustración 39 . Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas. 74
Ilustración 40 . Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas. 75
Ilustración 41 . Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas. 75
Ilustración 42 . Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas. 75
Ilustración 43 . Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas. 76
Ilustración 44 . Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas. 76
Ilustración 45. Propuesta de intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela..... 77
Ilustración 46. Intervención realizada, Municipio De Granada - Vereda La Mariela..... 78
Ilustración 47. Antes de la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela. 79
Ilustración 48. Antes de la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela. 79
Ilustración 49. Antes de la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela. 80
Ilustración 50. Antes de la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela. 80
Ilustración 51. Posterior a la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela..... 81
Ilustración 52. Posterior a la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela..... 81
Ilustración 53. Posterior a la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela..... 82
Ilustración 54. Posterior a la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela..... 82
Ilustración 55 . Excavadora Shantui SE220LC MC714613 #2 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Granada - Vereda La Mariela. 84
Ilustración 56 . Excavadora Shantui SE220LC MC714613 #2 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Granada - Vereda La Mariela. 84
Ilustración 57 . Excavadora Shantui SE220LC MC714613 #2 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Granada - Vereda La Mariela. 85
Ilustración 58 . Excavadora Shantui SE220LC MC714613 #2 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Granada - Vereda La Mariela. 85
Ilustración 59. Propuesta de intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer 86
Ilustración 60. Intervención realizada, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer 87
Ilustración 61. Antes de la intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer..... 88
Ilustración 62. Antes de la intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer..... 88
Ilustración 63. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer..... 89

Ilustración 64. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer..... 89
Ilustración 65. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer..... 90
Ilustración 66. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer..... 90
Ilustración 67 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer 93
Ilustración 68 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer 93
Ilustración 69 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer 94
Ilustración 70 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer 94
Ilustración 71 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer 95
Ilustración 72 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer 95
Ilustración 73 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer 96
Ilustración 74 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer 96
Ilustración 75. Propuesta de intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes..... 97
Ilustración 76. Actividades realizadas, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes..... 98
Ilustración 77. Previo a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes 99
Ilustración 78. Previo a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes 99
Ilustración 79. Previo a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes 100
Ilustración 80. Previo a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes 100
Ilustración 81. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes..... 101
Ilustración 82. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes..... 101
Ilustración 83. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes..... 102
Ilustración 84. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes..... 102
Ilustración 85. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes..... 103
Ilustración 86. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes..... 103
Ilustración 87 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de rehabilitación de vía, Municipio De La Uribe - Vereda Los Planes..... 106
Ilustración 88 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de rehabilitación de vía, Municipio De La Uribe - Vereda Los Planes..... 106
Ilustración 89 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de rehabilitación de vía, Municipio De La Uribe - Vereda Los Planes..... 106
Ilustración 90 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de rehabilitación de vía, Municipio De La Uribe - Vereda Los Planes..... 107
Ilustración 91 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de rehabilitación de vía, Municipio De La Uribe - Vereda Los Planes..... 107
Ilustración 92 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de rehabilitación de vía, Municipio De La Uribe - Vereda Los Planes..... 107

Ilustración 93. Propuesta de intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio 108
Ilustración 94. Intervención realizada, Municipio Vista Hermosa – Guapayo Medio. 109
Ilustración 95. Antes de la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 110
Ilustración 96. Antes de la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 111
Ilustración 97. Antes de la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 111
Ilustración 98. Antes de la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 112
Ilustración 99. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 112
Ilustración 100. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 113
Ilustración 101. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 113
Ilustración 102. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 114
Ilustración 103. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 114
Ilustración 104. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 115
Ilustración 105. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 115
Ilustración 106. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio 116
Ilustración 107. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio 116
Ilustración 108. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio 117
Ilustración 109. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio 117
Ilustración 110. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio 118
Ilustración 111. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio 118
Ilustración 112 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 121
Ilustración 113 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 122
Ilustración 114 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio 122
Ilustración 115 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de canalización y conformación de Jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 123
Ilustración 116 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de canalización y conformación de Jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 123
Ilustración 117 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio 123
Ilustración 118 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de canalización y conformación de Jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 124
Ilustración 119 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de canalización y conformación de Jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio..... 124
Ilustración 120. Propuesta de intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo 125
Ilustración 121. Intervención realizada, Municipio de Vista Hermosa – Guapaya Bajo. 126
Ilustración 122. Antes de la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 127
Ilustración 123. Antes de la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 127
Ilustración 124. Antes de la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 128
Ilustración 125. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 128
Ilustración 126. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 129
Ilustración 127. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 129

Ilustración 128. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 130
Ilustración 129. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 130
Ilustración 130. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 131
Ilustración 131. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 131
Ilustración 132. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 132
Ilustración 133. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 132
Ilustración 134 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo 135
Ilustración 135 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 136
Ilustración 136 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 136
Ilustración 137 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 136
Ilustración 138 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 137
Ilustración 139 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 137
Ilustración 140 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 137
Ilustración 141 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo..... 138
Ilustración 142. Propuesta de intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 139
Ilustración 143. Intervención realizada, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 140
Ilustración 144. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 140
Ilustración 145. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 141
Ilustración 146. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 141
Ilustración 147. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 142
Ilustración 148. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 142
Ilustración 149. Posterior a la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 143
Ilustración 150. Posterior a la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 143
Ilustración 151. Posterior a la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 144
Ilustración 152. Posterior a la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 144
Ilustración 153. Posterior a la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia. 145
Ilustración 154 . CATERPILLAR 320D MC033914 #2 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia 147
Ilustración 155 . CATERPILLAR 320D MC033914 #2 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia 147
Ilustración 156 . CATERPILLAR 320D MC033914 #2 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia 148
Ilustración 157. Propuesta de intervención, Municipio De Cabuyaro – Guayabal de Upia, río Upia..... 149
Ilustración 158. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Guayabal de Upia, río Upia. 150
Ilustración 159. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Guayabal de Upia, río Upia. 150

Ilustración 160. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Guayabal de Upia, río Upia. 151
Ilustración 161. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Guayabal de Upia, río Upia. 151
Ilustración 162 . CATERPILLAR 320D MC033914 #2 realizando actividades de ampliación de canal Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia 153
Ilustración 163 . CATERPILLAR 320D MC033914 #2 realizando actividades de ampliación de canal, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia 153
Ilustración 164. Propuesta de intervención, Municipio De Cabuyaro – Puente río Humea. 155
Ilustración 165. Intervención realizada, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 156
Ilustración 166. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 157
Ilustración 167. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 157
Ilustración 168. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 158
Ilustración 169. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 158
Ilustración 170. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 159
Ilustración 171. Durante la intervención, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 159
Ilustración 172. Durante la intervención, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 160
Ilustración 173. Durante la intervención, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 160
Ilustración 174. Durante la intervención, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 161
Ilustración 175. Durante la intervención, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea, afectación por creciente del día 12/05/2026 161
Ilustración 176. Durante la intervención, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 162
Ilustración 177. Intervención realizada, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 162
Ilustración 178. Intervención realizada, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 163
Ilustración 179. Intervención realizada, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 163
Ilustración 180. Intervención realizada, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 164
Ilustración 181. Intervención realizada, Municipio De Cabuyaro – Puente rio Humea 164
Ilustración 134 . Excavadora CATERPILLAR 320D MC020824 #1 realizando actividades de instalación de geobolsas y estabilización del terreno 169
Ilustración 135 . Excavadora CATERPILLAR 320D MC020824 #1 realizando actividades de instalación de geobolsas y estabilización del terreno 169
Ilustración 136 . Excavadora CATERPILLAR 320D MC020824 #1 realizando actividades de instalación de geobolsas y estabilización del terreno 170
Ilustración 137 . Excavadora CATERPILLAR 320D MC020824 #1 realizando actividades de instalación de geobolsas y estabilización del terreno 170
Ilustración 138 . Excavadora CATERPILLAR 320D MC020824 #1 realizando actividades de instalación de geobolsas y estabilización del terreno 171
Ilustración 139 . Excavadora CATERPILLAR 320D MC020824 #1 realizando actividades de instalación de geobolsas y estabilización del terreno 171
Ilustración 140 . Volqueta SJP-903 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 173
Ilustración 141 . Volqueta SJP-903 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 174
Ilustración 142 . Volqueta VPC-808 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 175

Ilustración 143 . Volqueta VPC-808 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 176
Ilustración 144 . Volqueta SXE-546 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 177
Ilustración 145 . Volqueta SXE-546 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 178
Ilustración 146 . Volqueta KDJ-221 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 179
Ilustración 147 . Volqueta KDJ-221 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 179
Ilustración 148 . Volqueta SVC-806 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 183
Ilustración 149 . Volqueta SVC-806 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 184
Ilustración 150 . Volqueta SVC-806 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 184
Ilustración 151 . Volqueta SVC-806 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 184
Ilustración 152 . Volqueta SRP-547 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 187
Ilustración 153 . Volqueta SRP-547 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 187
Ilustración 154 . Volqueta SRP-547 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 188
Ilustración 155 . Volqueta VKK-419 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 190
Ilustración 156 . Volqueta VKK-419 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 190
Ilustración 157 . Volqueta VKK-419 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 191
Ilustración 158 . Volqueta OAA-430 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 192
Ilustración 159 . Volqueta OAA-430 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 193
Ilustración 160 . Volqueta GCC-242 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 195
Ilustración 161 . Volqueta UVJ-264 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 196
Ilustración 162 . Volqueta UVJ-264 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 196
Ilustración 163 . Volqueta SRA-294 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 197

Ilustración 164 . Volqueta SRA-294 realizando actividades de cargue de material, transporte e instalación de geobolsas 198
Ilustración 211. Propuesta de intervención, Municipio De El Calvario – Caño Seco 199
Ilustración 212 . CATERPILLAR 320D MC033914 #2 realizando actividades de rehabilitación, Municipio De El Calvario – Caño Seco 200
Ilustración 213 . CATERPILLAR 320D MC033914 #2 realizando actividades de rehabilitación de vía, Municipio De El Calvario – Caño Seco. 201
Ilustración 214 . CATERPILLAR 320D MC033914 #2 realizando actividades de rehabilitación de vía, Municipio De El Calvario – Caño Seco. 201
Ilustración 215. Socialización Municipio de El Dorado – Caño Aguas Zarcas 202
Ilustración 216. Socialización Municipio de Granada – Vereda La Mariela 202
Ilustración 217. Socialización Municipio La Uribe – Vereda El Placer 203
Ilustración 218. Socialización Municipio Vista Hermosa – Guapaya Medio 203
Ilustración 219. Socialización Municipio Vista Hermosa – Guapaya Bajo 204
Ilustración 220. Socialización Municipio La Uribe – Vereda Planes 204
Ilustración 221. Socialización Municipio Cabuyaro – Viso de Upia, rio Upia 205
Ilustración 222. Socialización Municipio Cabuyaro – Guayabal de Upia, rio Upia 205
Ilustración 223. Socialización de inicio Municipio Cabuyaro – Puente rio Humea 206
Ilustración 224. Socialización de entrega Municipio Cabuyaro – Puente rio Humea 206
Ilustración 225. Socialización Municipio El Calvario – Vía El Calvario, sector Caño Seco 207

1. ANTECEDENTES

1.1 Información Básica

Tabla 1. Información basica del contrato.

CONTRATO No.	1251 DE 2026
OBJETO:	ALQUILER DE HORAS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. SERVIMACONS S.A.S
NIT:	900.788.754-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ
CONTRATANTE:	DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – DEPARTAMENTO DEL META
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	17 DE MARZO DE 2026
FECHA DE INICIO:	26 DE MARZO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	25 DE MAYO DE 2026
TÉRMINO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES
VALOR CONTRATO:	$1.599.041.000
PERIODO DEL PRESENTE INFORME PARCIAL No.1:	DEL 26 DE MARZO DE 2026 AL 25 DE MAYO DE 2026
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME PARCIAL No.1:	$ 1.093.713.000,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO CORTE 25 DE MAYO DE 2026:	$ 1.093.713.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE INFORME PARCIAL No.1:	68,40%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO CORTE 25 DE MAYO DE 2026:	68,40%

Fuente: Propia, 2026

1.2 Antecedentes

La Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, tiene a su cargo adelantar una serie de acciones tendientes a la mitigación y reducción del riesgo en los diferentes Municipios del Departamento del Meta, que para tal fin cuenta con diversas herramientas con las cuales se presta atención a las emergencias que se presentan en la temporada de lluvias; lo cual se materializa a través de la contratación de bienes y servicios tendientes a garantía de la atención efectiva de las emergencias presentadas.

En el marco del Decreto Departamental 078 de 2025, mediante el cual se declaró la situación de calamidad pública por variabilidad climática en el Departamento del Meta, posteriormente se realiza prorroga de la calamidad pública mediante el Decreto 302 de 2025, por la cual se hace necesario actuar y continuar con las estrategias para la respuesta a las situaciones de emergencia por parte de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, continuando en lo establecido en el Plan de Acción Especifico donde se contemplan actividades tendientes a la reducción del riesgo, intervenciones que deben desarrollarse de manera obligatoria, con el fin de dar cumplimiento de este y garantizar la ejecución de acciones que conlleven a la intervención de los puntos críticos que defina la Dirección atendiendo a criterios técnicos que rigen la gestión del riesgo.

Así las cosas, con el presente, se podrá dar respuesta a necesidades en atención y mitigación de desastres que fueron identificadas en diferentes Municipios del Departamento por el equipo técnico de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

Con lo anteriormente mencionado se busca lograr la debida atención, rehabilitación y prevención de desastres en las zonas definidas como puntos críticos en el Departamento del Meta, los cuales fueron identificados a raíz de las inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos acaecidos en la presente temporada de lluvias o por efectos de la variabilidad climática.

Con lo ya dicho se pretende implementar acciones de atención y reducción de emergencias y desastres que se generen por la temporada de más lluvias en el primer y segundo semestre del año 2026.

Por lo tanto, se justifica la celebración del contrato cuyo objeto es: "ALQUILER DE HORAS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META."

Esta contratación responde a una necesidad prioritaria y estratégica para garantizar la reducción del riesgo y la atención inmediata ante eventos de origen hidrometeorológico, conforme a los mandatos legales y las competencias asignadas a esta Dirección.

1.3 Objetivo del Contrato

Mediante la prestación del servicio a través del ALQUILER DE HORAS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, se pretende atender y mitigar puntos priorizados que han sido afectados como consecuencia de las inundaciones de ríos y quebradas y remociones en masa en vías terciarias, que ponen en riesgo la vida de los habitantes y afectan el patrimonio de las familias.

2. INTRODUCCIÓN

La Dirección Departamental Para la Atención del Riesgo de Desastres a través de visitas técnicas determinó la necesidad de realizar intervención en diferentes puntos del Departamento con el apoyo de maquinaria amarilla como excavadora, cargador, vibrocompactador y volquetas que puedan generar un impacto positivo al cauce de la fuente hídrica a tratar, puesto que este puede llegar a afectar a extensos terrenos, familias, cultivos y ganado en el Departamento del Meta. Estas acciones buscan reducir el riesgo de emergencias y desastres; de igual forma proteger la población vulnerable ante la materialización de inundaciones, crecientes súbitas y eventos de remoción en masa, que corresponda los escenarios de riesgo con las mayores pérdidas y afectaciones en el departamento del Meta.

La Dirección Departamental Para la Atención del Riesgo de Desastres, cuenta con un banco de maquinaria, sin embargo, el mismo no es suficiente para dar respuesta a las situaciones de riesgo que se presentan en la temporada de más lluvias en todo el Departamento del Meta, por lo cual desde la Administración Departamental se requieren implementar acciones que garanticen que el alcance de la atención de emergencias.

La deficiencia de maquinaria para atender de manera simultánea los puntos críticos en diferentes áreas del Departamento, genera la necesidad para la Dirección de contratar maquinaria amarilla que permita intervenir de manera eficaz, eficiente y en tiempo real las emergencias que se están suscitando en Departamento, debido a la variabilidad climática que enfrenta actualmente la región.

Ante esta situación, se procedió con la contratación de alquiler de maquinaria amarilla en los municipios priorizados por la Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta contratación tiene como finalidad ejecutar intervenciones en zonas afectadas por desbordamientos de ríos, quebradas u otras fuentes hídricas, así como por deslizamientos y movimientos en masa que comprometen la funcionalidad de la infraestructura vial y los sistemas de conectividad rural.

En este contexto, se formalizó el Contrato No. 1251 de 2026, cuyo objeto es el "ALQUILER DE HORAS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META", orientado a fortalecer la capacidad operativa institucional frente a emergencias y desastres.

El presente informe técnico tiene como propósito presentar el alcance, avance físico y operativo de la ejecución del contrato suscrito entre el Departamento del Meta y la empresa Servicios, Maquinaria y Construcciones S.A.S. – SERVIMACONS S.A.S., durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2026 y el 25 de mayo de 2026.

3. LOCALIZACIÓN PUNTOS DE EJECUCIÓN

- **LIMITES DEL DEPARTAMENTO DEL META**

Este: Departamento del Vichada
Oeste: Departamento del Huila
Norte: Departamento de Cundinamarca
S u r: Departamento del Guaviare

Ilustración 1. Localización del departamento del Meta.



Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Meta_%28Colombia%29#/media/Archivo:Meta_in_Colombia_(mainland)


El departamento del meta se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas

3°27'47" latitud norte
73°42'32"latitud oeste
Tiene una superficie de 82805 km2

- **LÍMITES DEL MUNICIPIO DE LA URIBE**

Este: Municipio de Lejanías, Mesetas y Vista Hermosa
Oeste; Departamento del Huila y Caquetá
Norte: Municipio de Lejanías, Bogotá D.C y El Departamento del Huila
S u r: Municipios de Vista hermosa, La Macarena y Departamento de Caquetá

Ilustración 2 . Localización del Municipio de El Castillo

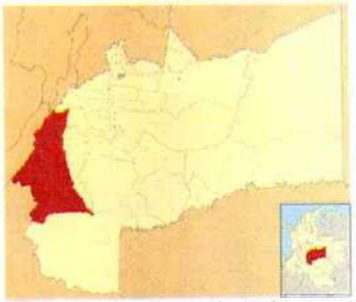

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Uribe_%28Meta%29

La Uribe se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas:
3°14'27"N Latitud Norte
74°21'13"O Latitud Oeste
Tiene una **superficie** de 6307 Kilómetros cuadrados

Ilustración 3. Ubicación del punto La Uribe, Vereda El Placer - Rio Dua



Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto La Uribe, Vereda El Placer - Rio Dua que tiene las siguientes coordenadas: Latitud: 2°56'20.87"N Longitud: 74°11'43.67"O

Ilustración 4. Ubicación del punto La Uribe, Vereda Los Planes



Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto La Uribe, Vereda Los Planes que tiene las siguientes coordenadas: Latitud: 3°17'16.29"N Longitud: 74°23'17.25"O

- **LÍMITES DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA**

Este: Municipio de Puerto Lleras, Puerto Rico.
Oeste: Municipio de Mesetas, La Uribe y La Macarena
Norte: Municipio de San Juan de Arama, Mesetas y Puerto Lleras
S u r: Municipios de La Uribe, La Macarena, Puerto Rico y San José del Guaviare.

Ilustración 5 . Localización del Municipio de Vista Hermosa



Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Vista_Hermosa_%28Meta%29

3°07'26"N Latitud Norte
73°45'05"O Latitud Oeste
Tiene una superficie de 4749 Kilómetros cuadrados.

Ilustración 6. Ubicación del punto Vista Hermosa, Guapayo Medio



Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto Vista Hermosa, Guapayo Medio que tiene las siguientes coordenadas: Latitud: 3° 2'36.17"N Longitud: 73°49'39.05"O

Ilustración 7. Ubicación del punto Vista Hermosa, Guapayo Bajo



Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto Vista Hermosa, Guapayo Bajo que tiene las siguientes coordenadas: Latitud: 3° 0'45.69"N Longitud: 73°47'30.45"O

- **LÍMITES DEL MUNICIPIO DE GRANADA**

Este: Municipio de Fuentedeoro
Oeste; Municipio de Lejanías
Norte: Municipio de San Martín
Sur: Municipio de San Juan de Arama

Ilustración 8. Localización del municipio de Granada



Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_%28Meta%29#/media/Archivo:Colombia_-_Meta_-_Granada.svg

3°32'50"N Latitud Norte
73°42'31"O Latitud Oeste
Tiene una superficie de 381 Kilómetros cuadrados.

Ilustración 9. Ubicación del punto Granada, Vereda La Mariela




Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto Granada, Vereda La Mariela que tiene las siguientes coordenadas: Latitud: 3°29'34.49"N Longitud: 73°46'3.26"O

- **LÍMITES DEL MUNICIPIO DE EL DORADO**

Este: Municipio de San Martin, Cubarral, El Castillo
Oeste; Municipio de Cubarral, El Castillo
Norte: Municipio de Cubarral
S u r: Municipios de El Castillo

Ilustración 10 . Localización del Municipio de El Dorado

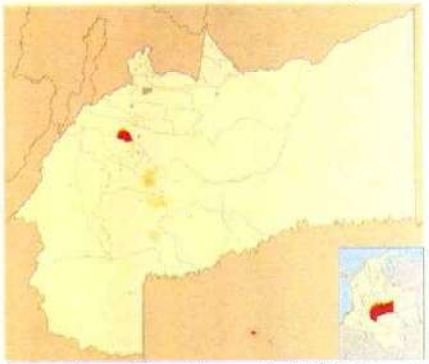

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/El_Dorado_(Meta)

El Dorado se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas:
3°44'21" Latitud Norte
73°50'07" Latitud Oeste
Tiene una superficie de 117 Kilómetros cuadrados.

Ilustración 11. Ubicación del punto El Dorado, Caño Aguas Zarcas



Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto El Dorado, Caño Aguas Zarcas que tiene las siguientes coordenadas: Latitud: 3°44'55.78"N Longitud: 73°50'6.47"O.

- **LÍMITES DEL MUNICIPIO DE CABUYARO**

Este: Municipio de Puerto López, Departamento de Casanare
Oeste; Municipio de Cumaral, Departamento de Cundinamarca
Norte: Municipio de Barranca de Upía, Departamento de Cundinamarca y Casanare
S u r: Municipios de Puerto López y Cumaral

Ilustración 12 . Localización del Municipio de Cabuyaro



Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Meta_-_Cabuyaro.svg

Cabuyaro se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas:
4°17'09"N Latitud Norte
72°47'29"O Latitud Oeste
Tiene una superficie de 832 Kilómetros cuadrados.

Ilustración 13. Ubicación del punto Cabuyaro, Viso de Upia



Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto Cabuyaro, Viso de Upia que tiene las siguientes coordenadas: Latitud: 4°22'57.61"N Longitud: 72°48'25.05"O.

Ilustración 14. Ubicación del punto Cabuyaro, Puente Rio Humea



Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto Cabuyaro, Puente rio Humea que tiene las siguientes coordenadas: Latitud: 4°10'31.11"N Longitud: 72°59'49.93"O.

Ilustración 15. Ubicación del punto Cabuyaro, Guayabal de Upia



Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto Cabuyaro, Guayabal de Upia, que tiene las siguientes coordenadas: Latitud: 4°24'7.08"N Longitud: 72°48'48.49"O.

- **LÍMITES DEL MUNICIPIO DEL CALVARIO**

Este: Municipio de Restrepo.
Oeste: Departamento de Cundinamarca, Municipio de Quetame.
Norte: Municipio de San Juanito.
S u r: Municipio de Villavicencio.

Ilustración 15. Localización municipio del Calvario



Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/El_Calvario_(Meta)#/media/Archivo:Colombia_-_Meta_-_El_Calvario.svg

El Calvario se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas:
4°21'06"N Latitud Norte
73°42'48"O Latitud Oeste
Tiene una **superficie** de 286 Kilómetros cuadrados

Ilustración 16. Localización del punto, El Calvario, Caño Seco



Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación de los puntos críticos de la vía El Calvario en el municipio de El Calvario ubicado en las coordenadas Latitud: 4°20'22.38"N Longitud: 73°44'22.59"O.

4. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES

1. **Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso.**

En la ejecución del contrato hemos acatado todas las indicaciones de la supervisión en aras de cumplir con el objeto contractual, es así como realizamos comités en los que se exponen el desarrollo del contrato y se toman decisiones encaminadas a mejorar el proceso.

2. **Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la Ley 100 de 1993, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y presentar constancia de pago durante la ejecución del contrato.**

Para nosotros es fundamental no solo el cumplimiento de las leyes sino proteger, conservar y preservar la salud y seguridad de todos nuestros empleados. Garantizando el cumplimiento de nuestras obligaciones se anexan los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y los aportes parafiscales correspondientes a todos nuestros empleados, en el periodo del presente informe, ya que antes de la ejecución de las actividades se verifica mediante la planilla de seguridad social el cumplimiento de pago a los mismos anexando los soportes correspondientes al mes verificando la cobertura de sus trabajadores.

3. **El contratista deberá allegar certificación del examen pre ocupacional respectivo una vez legalizado el contrato, dando cumplimiento al capitulo 5 articulo 18 del Decreto No.0723 de 2013 reglamentario de la ley 1562 de 2012.**

Una vez firmado el contrato y previo a la firma del acta de inicio se hizo entrega de las hojas de vida del personal mínimo requerido presentado en la propuesta, en las que se adjuntó la certificación del examen pre ocupacional. Además, en los informes mensuales, como anexo del informe de seguridad y salud en el trabajo se hace entrega de los exámenes pre ocupacionales del personal operativo que ingresó en el periodo reportado.

4. **El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, materiales, insumos de apoyo logístico necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.**

Durante la ejecución del contrato se ha garantizado los gastos de transporte, materiales e insumos de apoyo logístico en pro del cumplimiento del objeto contractual.

5. **Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de archivo).**

A medida que se desarrolla el contrato con la directriz del supervisor se ha organizado el archivo de acuerdo con la ley general de archivo.

6. **Prestar los servicios con el personal y elementos propuestos, cualquier cambio deberá ser previamente autorizado por el Supervisor siempre que no sea de perfil inferior al ofertado y/o de menor calidad en los elementos.**

La ejecución del contrato se ha realizado con el personal establecido en la propuesta, como evidencia de esto se hizo entrega de las hojas de vida del personal. Estos documentos hacen parte integral del archivo del contrato y se encuentran en la gobernación del Meta.

7. **Actuar de buena fe y diligentemente para con el supervisor designado por la Gobernación del Meta; teniendo en cuenta que el Contratista se considera un colaborador del Estado en el cumplimiento de los fines sociales que busca la contratación, acorde con el estatuto contractual. Por lo cual, además deberá avisar oportunamente de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio.**

En los comités técnicos y cuando el supervisor lo solicitó, le informamos a este sobre el desarrollo de las actividades en cada punto de trabajo, los procedimientos implementados para solucionar los problemas en los cauces activos y las mejores opciones para el aprovechamiento efectivo de las horas máquina del presupuesto del contrato. Se mantuvo informado constantemente al supervisor del contrato sobre la ejecución del Plan de Intervención Específico.

8. **Presentar informe de ejecución previo a los pagos y demás soporte documental y cada vez que sea requerido por el Supervisor.**

Con el presente informe se radicará la parcial No.1, con la que se entrega el informe de ejecución con todos los soportes documentales requeridos de acuerdo con el formato F-BS-15 Reconocimiento y pago parcial o final.

9. **Suscribir Actas de Inicio, Finalización y/o Liquidación del contrato.**

El día 26 de marzo de 2026 se suscribió el acta de inicio del contrato 1251 de 2026.

10. **Cobrar los bienes y/o servicios suministrados y certificados por el Supervisor, con cargo al contrato, para lo cual deberá radicar cuenta, con todos los soportes documentales requeridos en los formatos del Sistema Integrado de Gestión del Departamento del Meta, que se encuentran publicados en la página web de la entidad.**

Con el presente informe se radicará la parcial No.1, con la que se entrega el informe de ejecución con todos los soportes documentales requeridos de acuerdo con el formato F-BS-15 Reconocimiento y pago parcial o final.

11. **Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato; así mismo abstenerse de**

hacer uso de la información de la población objeto obtenida con ocasión o como consecuencia directa de la ejecución del contrato.

Dentro de nuestras políticas como empresa contemplamos la declaración de principios y al prestar un servicio a la Gobernación de Meta, guardamos la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos entregados en relación con la comunidad en general de cada uno de los puntos de trabajo.

12. **Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo.**

Cuando nos hacen pagos parciales, de acuerdo con el monto cobrado, asumimos los impuestos del orden Departamental y presentamos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la liquidación del Iva, ante los respectivos municipios donde se ejecute el contrato se harán los pagos respectivos de ICA y los demás impuestos que haya lugar.

13. **Cumplir todas las disposiciones y lineamientos dados en favor de la prevención, eliminación de lesiones, enfermedades y víctima mortal por ocasión del trabajo en el marco legal aplicable a los trabajadores en términos de seguridad y salud en el trabajo.**

Servimacons da cumplimiento a las disposiciones y lineamientos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a la normatividad legal vigente aplicable.

Así mismo, la empresa desarrolla actividades orientadas a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y la mitigación de riesgos asociados a las actividades operativas, a través de la identificación de peligros, valoración de riesgos, capacitaciones al personal, inspecciones de seguridad, entrega de elementos de protección personal, seguimiento a condiciones de salud, implementación de controles operacionales y acompañamiento permanente en las actividades desarrolladas.

De igual forma, Servimacons mantiene el compromiso con la promoción de ambientes de trabajo seguros y saludables, fortaleciendo continuamente las acciones preventivas y correctivas necesarias para proteger la integridad física y mental de los trabajadores, en cumplimiento del marco legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

14. **Cumplir todas las disposiciones y directrices en favor de la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente a través del control adecuado de residuos y consumo responsable de recursos.**

En el marco del Plan de Manejo Ambiental diseñado para el contrato de alquiler de maquinaria amarilla, se han implementado las medidas preventivas y de control ambiental contempladas en los programas establecidos.

Durante la fase inicial de actividades contractuales, se han socializado y puesto en marcha los lineamientos para:

- Manejo responsable de combustibles, aceites y lubricantes, evitando vertimientos y disponiendo adecuadamente envases y residuos asociados.
- Clasificación y almacenamiento temporal de residuos sólidos y peligrosos según la Resolución 2184 de 2019, para su entrega a gestores autorizados.
- Uso racional del agua y la energía en las operaciones, reduciendo consumos innecesarios y promoviendo buenas prácticas entre el personal.
- Prevención de emisiones contaminantes y control de material particulado mediante el mantenimiento preventivo de la maquinaria.
- Capacitación inicial del personal operativo y administrativo en buenas prácticas ambientales y procedimientos establecidos en el PMA.

15. Conocer y dar cumplimiento a las políticas y procedimientos de seguridad de la información establecidas por la organización, pertinentes al desarrollo del objeto contractual, de conformidad con lo estipulado en el Sistema Integrado de Gestión.

Para la ejecución del contrato 1251 de 2026, damos cumplimiento a las políticas y procedimientos de seguridad de la información pertinente al desarrollo de alquiler de maquinaria amarilla para la mitigación de riesgos y atención de desastres en los diferentes puntos críticos del departamento del Meta.

16. Las demás contenidas en la propuesta y que hacen parte integral del contrato.

Durante el desarrollo del contrato hemos cumplido todas las obligaciones contenidas en la invitación a presentar propuesta y en el estudio previo.

17. Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso del mismo.

Para la ejecución del contrato 1251 de 2026 implementamos los controles necesarios para el efectivo cumplimiento de los objetivos generales y específicos acatando el Plan de Intervención Específico de la entidad y ejecutando en cada punto de trabajo las horas máquina contratadas.

Adjuntamos en el presente informe el anexo #1 Seguimiento al plan de intervención especifico.

18. Publicar en la plataforma del Sistema Electrónico Para La Contratación Pública SECOP II, los documentos soporte de cada informe y cuenta de cobro dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del documento.

Para el cobro de actas parciales publicaremos en el secop los documentos soporte del informe.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. **El contratista realizará el desplazamiento de las máquinas a los sitios de intervención en los diferentes puntos críticos que le autorice la supervisión.**

Se realizaron los desplazamientos de la maquinaria alquilada a los diferentes puntos de trabajo establecidos en el plan de intervención especifico realizado por la supervisión.

2. **Dar cabal cumplimiento al Plan De Intervención Específico aprobado por el supervisor del contrato, en el cual especificará el tipo de maquinaria y la cantidad de horas a utilizar en la intervención para la ejecución de las actividades de mitigación y reducción del riesgo de desastres.**

Posterior a la firma del acta de inicio del día 26 de marzo de 2026, se realizó el comité técnico No.1 y días después el comité técnico No.2, en estos se programó visita previa a diversos puntos en estado de riesgo en el departamento del Meta. Con base en las visitas realizadas, se estableció el plan de intervención especifico inicial en el que la DIGERD priorizó los puntos con mayor estado de riesgo. Posteriormente el día 04 de mayo de 2026, se actualizó el plan de intervención especifico, con base en el cual se realizó la modificación No.1 del contrato. Una vez aprobada la modificación se inició la ejecución del plan de intervención actualizado, de modo que continuamos las intervenciones siguiendo la directriz de la DIGERD y así hemos dado cumplimiento al plan de intervención especifico, ingresando a los puntos de trabajo con el tipo de maquinaria establecida y ejecutando las horas indicadas. Como evidencia se adjunta en el anexo #1 Seguimiento al plan de intervención especifico.

3. **Aprobado el Plan De Intervención Específico por parte de la supervisión, el contratista con el acompañamiento del supervisor y cada Administración Municipal deberá adelantar una reunión de socialización con la comunidad afectada, en la que se expliquen claramente las acciones que se ejecutarán con las horas de maquinaria previamente aprobadas por el supervisor, reunión de la que se deberá suscribir un acta y que deberá acompañar en sus informes.**

Previo al inicio de actividades, en cada uno de los puntos de trabajo, se realizó el acta de socialización con la comunidad afectada en compañía de la supervisión y funcionarios de la alcaldía, en el que se explicó las intervenciones a realizar en el punto y se suscribió el acta de socialización, que se adjunta en los informes mensuales.

4. **En cumplimiento del Plan De Intervención Específico de la DIGERD, Toda la información cartográfica producida, actualizada y entregada en el marco del contrato El contratista deberá dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en la Resolución No. 643 de 2018, Resolución No. 471 y 529 de 2020, Resolución No. 370 y 1468 de 2021, Resolución No. 197 y 658 de 2022 del IGAC, o aquella que la modifique o sustituya; para la elaboración y entrega de cartografía temática, el contratista deberá utilizar el modelo de Geodatabase (GDB) definido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de conformidad con sus lineamientos técnicos vigentes para la presentación de información geográfica. Los productos**

cartográficos deberán entregarse en formato digital editable, incluyendo las respectivas Geodatabases (GDB), y cumplir con los modelos, estructuras y estándares señalados en las presentes obligaciones.

En comité técnico realizado con los profesionales de la DIGERD el día 13 de abril de 2026, se estableció que la información cartográfica producida durante la ejecución del contrato se entregara únicamente al finalizar la ejecución y para efectos de la liquidación del contrato.

5. **El contratista deberá contar con la organización administrativa, operativa y técnica para desplazar la maquinaria requerida y aprobada por el supervisor de la DIGERD, de manera inmediata, ya que dentro del costo de la hora máquina se contemplan los gastos por transporte de la maquinaria a los diferentes puntos de intervención.**

Servimacons SAS. cuenta con la organización administrativa, operativa y técnica para realizar los desplazamientos de la maquinaria de manera inmediata a los puntos de trabajo, es así como a medida que se realizaron las visitas previas y con autorización de la DIGERD, desplazamos maquinaria a los puntos de trabajo.

6. **El contratista durante la ejecución del contrato deberá demostrar al supervisor, de la existencia de un patio de maniobras y personal mecánico que supla las necesidades de mantenimiento de su maquinaría para evitar retrasos en la operación por maquinaria defectuosa.**

Mediante oficio radicado a la supervisión el día 08 de abril de 2026, se hizo entrega de los documentos correspondientes al patio de maniobras, con los que se evidencia la existencia y disponibilidad de estos para suplir las necesidades de mantenimiento de la maquinaria.

7. **El contratista se reunirá con el supervisor de manera permanente con el fin de recibir y acatar las observaciones y hacer frente a las necesidades de la comunidad que se ve afectada por las inundaciones, desbordamientos, deslizamientos y remociones en masa; para ello deberá contar en campo con personal técnico y supervisor que monitoree permanentemente las actividades de la maquinaria que está prestando el servicio.**

Durante el desarrollo del contrato nos hemos reunidos constantemente con el supervisor para informar el avance del contrato y recibir las observaciones del supervisor, acatando las directrices encaminadas a mejorar el proceso y atendiendo de inmediato los puntos afectados que nos indique el supervisor.

8. **Presentar informes de ejecución mensual de las actividades y adjuntar todos los anexos de control de horas (planillas), fotografía de los horómetros, información del personal, propuestas de intervención, resumen general de actividades, informe de Seguridad Y Salud En El Trabajo, programación y flujo de caja. Anexo a los informes deberá presentar un CD/DVD que contenga todos los registros fotográficos y vuelos de Dron que evidencien los trabajos ejecutados secuencialmente por cada punto de trabajo.**

Mensualmente realizamos informes de ejecución correspondiente al mes anterior, en los que describimos a detalle las actividades realizadas y el presupuesto ejecutado, además anexo al informe hacemos entrega de:

1. Resumen actividades ejecutadas y seguimiento al Plan de Intervención especifico.
2. Seguimiento a la programación y flujo de caja.
3. Ejecución de horas, planillas y horómetros.
4. Informe de seguridad y salud en el trabajo.
5. Planillas de Seguridad Social.
6. Plan de manejo ambiental.
7. Acta de socialización a la comunidad.
8. Reportes del estado del clima IDEAM y Registro fotográfico en CD.
9. **El contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la contaminación ambiental durante la ejecución de sus actividades, dando estricto cumplimiento a la normativa ambiental vigente y a las disposiciones sobre control de la contaminación establecidas en la ley. En ningún caso podrá abandonar sustancias o materiales nocivos que afecten la flora, la fauna o la salud humana y animal, ni realizar vertimientos de contaminantes en la atmósfera o en los cuerpos de agua.**

Se ha iniciado la ejecución del contrato cumpliendo las medidas previstas en el Plan de Manejo Ambiental, garantizando la prevención de la contaminación en todas las operaciones. Durante esta fase inicial se han implementado controles para:

- **Protección de cuerpos de agua**: adopción de medidas para evitar vertimientos de combustibles, aceites o cualquier sustancia nociva, incluyendo el uso de bandejas de contención y puntos autorizados para mantenimiento.
- **Manejo de sustancias peligrosas**: almacenamiento seguro de lubricantes y combustibles en áreas delimitadas, con señalización y kits de control de derrames.
- **Prevención de emisiones**: verificación del estado mecánico de la maquinaria antes de su operación, minimizando emisiones a la atmósfera.
- **Manejo de residuos**: disposición temporal controlada que representen riesgo para la fauna, flora o la salud humana.
- **Cumplimiento normativo**: aplicación de la normatividad ambiental vigente y lineamientos contractuales, en concordancia con los programas de control de contaminación incluidos en el PMA.

Con estas acciones, se asegura que no se dejen materiales nocivos en el entorno y que no se generen descargas contaminantes a cuerpos de agua o al aire, dando cumplimiento a lo estipulado en la obligación contractual.

10. **El contratista deberá formular e implementar un Plan de Manejo Ambiental acorde a las especificaciones del proyecto, el cual deberá ser presentado al inicio de la obra, teniendo en cuenta el numeral de la caracterización de aspectos e impactos ambientales del presente estudio previo.**

Mediante oficio radicado a la supervisión el día 10 de abril de 2026, se hizo entrega del Plan de Manejo Ambiental acorde a las especificaciones del proyecto.

11. **El contratista deberá cumplir estrictamente con los requerimientos establecidos en las resoluciones expedidas por la Corporación Autónoma Regional en relación con los permisos ambientales otorgados para la ejecución de la obra, y deberá atender en su totalidad como a las obligaciones correspondientes para el cierre de dichos permisos ante la misma entidad.**

Teniendo en cuenta que el presente contrato corresponde a la prestación de servicios de alquiler de maquinaria para realizar intervenciones provisionales de mitigación en puntos críticos del departamento del Meta, y que actualmente no se cuenta con permisos ambientales expedidos, su trámite, seguimiento y cierre están a cargo de la DIGERD. No obstante, suministraremos la información técnica requerida para apoyar dichos procesos ante la autoridad ambiental competente.

12. **Por ser operaciones de alto riesgo en un conducto que presenta altos niveles de caudal, se deberá monitorear por medio del visor FEWS del IDEAM, los pronósticos y alertas; con el fin de mantener sus equipos de maquinaria, supervisores y técnicos, en condiciones de seguridad, esto se soportará con los reportes diarios del IDEAM.**

Diariamente se ha monitoreado el visor FEWS del IDEAM, los pronósticos y alerta, para mantener al personal operativo informado y que así puedan trabajar en condiciones de seguridad. En el informe mensual se entrega los Reportes del estado del clima IDEAM en CD.

13. **Operar la maquinaria acordada en óptimas condiciones de funcionamiento y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.**

La maquinaria alquilada utilizada para la ejecución del contrato 1251-2026 cumple con las especificaciones técnicas requeridas y tienen óptimas condiciones de funcionamiento.

14. **Cumplir con las horas de alquiler contratadas y realizar las actividades de atención y mitigación en los puntos críticos establecidos por la Entidad, para lo cual deberá adjuntar la relación de horas realizadas, con fechas, tipo de maquina e identificación de la misma, y ubicación, esto será soportado con las planillas de control de hora y registros fotográficos.**

En el anexo 3 se adjuntan los reportes de horas, planillas y horómetros de cada una de las maquinas que trabajaron en el periodo del informe.

En el reporte de horas se informa y planillas diarias: la máquina, tipo de maquinaria, fecha, horómetro inicial, horómetro final, horas de trabajo, operador y observaciones. Además, en se hace entrega de las fotografías de los horómetros diarios.

15. **Suscribir las pólizas que amparan la ejecución del contrato.**

Una vez firmado el contrato se suscribieron las pólizas correspondientes y con la firma del acta de inicio estas fueron actualizadas, amparando así la ejecución del contrato.

16. **Aportar la seguridad social del personal contratado para operar la maquinaria.**

Mensualmente se hace entrega de las planillas de seguridad social del personal operativo. Como parte de los documentos soporte del presente cobro parcial No.1 se adjuntan las planillas de seguridad social correspondientes al periodo del 26 de marzo de 2026 al 25 de mayo de 2026.

17. **El contratista debe cumplir con todos los reglamentos de seguridad para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecución de la obra, para ello aplicará las respectivas medidas de señalización y normas de seguridad industrial, durante la ejecución de las actividades, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes.**

Servimacons, en calidad de contratista, viene dando cumplimiento a los reglamentos y lineamientos de seguridad aplicables al personal involucrado durante la ejecución de las actividades operativas, mediante la implementación de medidas preventivas orientadas a la identificación, control y mitigación de riesgos laborales.

Para el desarrollo seguro de las actividades, se realiza la aplicación de señalización preventiva, informativa y de seguridad industrial en las áreas de trabajo, así como la socialización de normas y procedimientos seguros al personal. De igual forma, se ejecutan inspecciones periódicas, acompañamiento en actividades de alto riesgo, verificación del uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), diligenciamiento de permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro (ATS), conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Así mismo, la empresa mantiene acciones de seguimiento y control encaminadas a prevenir accidentes e incidentes laborales, promoviendo condiciones de trabajo seguras y el cumplimiento de las medidas establecidas para la protección del personal durante la ejecución del contrato.

18. **Hacer entrega del programa de destinación de residuos.**

Mediante oficio radicado a la supervisión el día 10 de abril de 2026, se hizo entrega del programa de destinación de residuos.

19. **Hacer entrega del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sus anexos, de acuerdo a la normatividad legal vigente.**

Mediante oficio radicado a la supervisión el día 08 de abril de 2026, se hizo entrega del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sus anexos, de acuerdo con la normatividad legal vigente.

5. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO-PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

Tabla 2.Modificaciones En el Tiempo-Prórrogas y Suspensiones

TIPO DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	DESDE	HASTA
Prorroga No.1 del 25 de mayo de 2026	Se prorroga el tiempo de ejecución contractual en un término de dos (02) meses	26/05/2026	25/07/2026

Fuente: Propia, 2026

6. MODIFICATORIAS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

Tabla 3.Modificatorias y/o Aclaratorios Realizados al Contrato

CONTRATO ADICIONAL No.	CLAUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
Acta de modificación No.1 de 06 de mayo de 2026	**CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:** "ACTA MODIFICATORIA NO.1 AL CONTRATO NO. 1251 DE 2026 CUYO OBJETO ES: "ALQUILER DE HORAS DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META." **CLAUSULA SEGUNDA. MODIFICAR:** Las partes acuerdan realizar un balance de mayores y menores cantidades del contrato de prestación de servicios No.1251 de 2026, en los términos que se muestran a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES PRESENTE ACTA				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CANTIDAD MAYORES (+)		CANTIDAD MENORES (-)			
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL
1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 7 TONELADAS MÍNIMO INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	50,00	$ 595.000,00	$ 29.750.000,00	295,00	$ 175.525.000,00	0,00	$ 0,00	345,00	$ 205.275.000,00
2	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 12 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	10,00	$ 668.000,00	$ 6.680.000,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 6.680.000,00	0,00	$ 0,00
3	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MÍNIMO INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	1585,00	$ 820.000,00	$ 1.299.700.000,00	0,00	$ 0,00	79,70	$ 65.354.000,00	1505,30	$ 1.234.346.000,00
4	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	100,00	$ 985.000,00	$ 98.500.000,00	0,00	$ 0,00	100,00	$ 98.500.000,00	0,00	$ 0,00
5	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO INCLUYE OPERADOR	HR	50,00	$ 586.000,00	$ 29.300.000,00	0,00	$ 0,00	50,00	$ 29.300.000,00	0,00	$ 0,00

CONTRATO ADICIONAL No.	CLAUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA

	COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.										
6	ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO 4 DUMPER CARGA COLMADA 16.9 M3 O EQUIVALENTE, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	80,00	$ 854.000,00	$ 68.320.000,00	0,00	$ 0,00	80,00	$ 68.320.000,00	0,00	$ 0,00
7	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	60,00	$ 498.000,00	$ 29.880.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 29.880.000,00
8	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	10,00	$ 381.000,00	$ 3.810.000,00	330,00	$ 125.730.000,00	0,00	$ 0,00	340,00	$ 129.540.000,00
9	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	10,00	$ 479.000,00	$ 4.790.000,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 4.790.000,00	0,00	$ 0,00
10	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 7 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	61,00	$ 391.000,00	$ 23.851.000,00	0,00	$ 0,00	61,00	$ 23.851.000,00	0,00	$ 0,00
11	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 10 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	10,00	$ 446.000,00	$ 4.460.000,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 4.460.000,00	0,00	$ 0,00
				TOTAL	**$ 1.599.041.000,00**		**$ 301.255.000,00**		**$ 301.255.000,00**		**$ 1.599.041.000,00**

CONDICIONES GENERALES	
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$ 1.599.041.000,00
CANTIDAD MAYORES (+)	$ 301.255.000,00
CANTIDAD MENORES (-)	$ 301.255.000,00

CONTRATO ADICIONAL No.	CLAUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DEL META	$ 0,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 1.599.041.000,00

CLAUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No. 1251 de 2026, no modificadas por la presente acta modificatoria No.1, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLAUSULA CUARTA -GARANTÍAS: El contratista está obligado a actualizar las pólizas suscritas en el contrato inicial de acuerdo con los ajustes a que dé lugar la presente Modificatoria

CLAUSULA QUINTA -PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente modificatoria se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes

Fuente: Propia, 2026

7. INFORMACION FINANCIERA

Tabla 4. Información financiera

RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSOS	FECHA	No. RP
030701-2.3.45.4503.1000.001.2.3.2.02.02.007-20	$1.599.041.000,00	18/03/2026	3013
TOTALES	**$1.599.041.000,00**		

Fuente: Propia, 2026

8. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

El presente contrato constituyo garantía única con la compañía de Seguros del Estado. que contó con los siguientes amparos:

Tabla 5. Amparos del contrato

AMPARO	SUFICIENCIA	TÉRMINO
Cumplimiento del contrato	Por el Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Igual a su ejecución y cuatro (4) mese más
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato	Igual a la vigencia del mismo y tres (3) años más
Calidad del Servicio	Por el Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Igual a su ejecución y cuatro (4) meses más
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	Igual a su ejecución.

Fuente: Estudios previos del contrato 1251-2026.

Que se encuentran debidamente acatados con la expedición de las pólizas así: Póliza de cumplimiento en favor de entidades estatales No. CV-100060212 y póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada cumplimiento No. CV-100016967, expedida por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL.

Póliza Iniciales – Anexo 0

Tabla 6. Póliza Iniciales – Anexo 0

Póliza de Cumplimiento No.:	**CV-100060212**	**FECHA:**	17/03/2026
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	16/03/2026	15/09/2026	$159.904.100,00
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	16/03/2026	15/05/2029	$79.952.050,00
Calidad del servicio	16/03/2026	15/09/2026	$159.904.100,00

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	CV-100016967	FECHA:	17/03/2026
AMPAROS	VIGENCIA		Valor Asegurado
	DESDE	HASTA	
Predio Labores y Operaciones. Contratistas y subcontratista Vehículos propios y no propios. Responsabilidad Civil Patronal Responsabilidad Civil Cruzada Gastos médicos	16/03/2026	15/05/2026	$350.181.000,00

Fuente: Propia, 2026

Póliza según Acta de inicio – Anexo 2

Tabla 7. Póliza según Acta de inicio – Anexo 2

Póliza de Cumplimiento No.:	CV-100060212	FECHA:	27/03/2026
AMPAROS	VIGENCIA		Valor Asegurado
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/03/2026	25/09/2026	$159.904.100,00
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	26/03/2026	25/05/2029	$79.952.050,00
Calidad del servicio	26/03/2026	25/09/2026	$159.904.100,00

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	CV-100016967	FECHA:	27/03/2026
AMPAROS	VIGENCIA		Valor Asegurado
	DESDE	HASTA	
Predio Labores y Operaciones. Contratistas y subcontratista Vehículos propios y no propios. Responsabilidad Civil Patronal Responsabilidad Civil Cruzada Gastos médicos	26/03/2026	25/05/2026	$350.181.000,00

Fuente: Propia, 2026

Póliza según Acta de inicio – Anexo 3

Tabla 8. Póliza según Prorroga No.1 – Anexo 3

Póliza de Cumplimiento No.:	CV-100060212	FECHA:	26/05/2026
AMPAROS	VIGENCIA		Valor Asegurado
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	25/05/2026	25/11/2026	$159.904.100,00
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	25/05/2026	25/07/2029	$79.952.050,00

Póliza de Cumplimiento No.:	CV-100060212	FECHA:	26/05/2026
AMPAROS	VIGENCIA		Valor Asegurado
	DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	25/05/2026	25/11/2026	$159.904.100,00

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	CV-100016967	FECHA:	26/05/2026
AMPAROS	VIGENCIA		Valor Asegurado
	DESDE	HASTA	
Predio Labores y Operaciones. Contratistas y subcontratista Vehículos propios y no propios. Responsabilidad Civil Patronal Responsabilidad Civil Cruzada Gastos médicos	26/03/2026	25/07/2026	$350.181.000,00

Fuente: Propia, 2026

9. PERSONAL

A continuación, se presenta el personal que laboró durante el periodo del 26 de marzo de 2026 al 25 de mayo de 2026, en la ejecución del contrato.

MARZO 2026

PERSONAL MINIMO DE APOYO PROFESIONAL

Tabla 9. Personal Apoyo profesional

ITEM	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA
1	INGENIERO DE CAMPO	BRAYAN RICARDO GUALDRON HERRERA	1.121396424
2	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ERIKA PAOLA CORREDOR DUARTE	1.121.899.745

Fuente: Propia, 2026

ABRIL 2026

PERSONAL MINIMO DE APOYO PROFESIONAL

Tabla 10. Personal Apoyo profesional

ITEM	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA
1	INGENIERO DE CAMPO	BRAYAN RICARDO GUALDRON HERRERA	1.121396424
2	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ERIKA PAOLA CORREDOR DUARTE	1.121.899.745

Fuente: Propia, 2026

PERSONAL OPERATIVO

Tabla 11. Personal operativo

ITEM	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE FINALIZACION
1	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	JUAN CAMILO MONTENEGRO LOSADA	1.120.385.130	21/04/2025	25/04/2025
2	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	JULIO CESAR CASTIBLANCO MARTÍNEZ	1.122.130.753	21/04/2026	23/04/2026
3	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	ANDERSON HEREDIA MONTENEGRO	1.120.364.701	16/04/2026	25/04/2026
4	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	ANDERSON JULIÁN VERGARA LOAIZA	1.124.190.977	14/04/2026	25/04/2026
5	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	JOSE ALEXANDER AYA CARRILLO	80.498.355	14/04/2026	25/04/2026

Fuente: Propia, 2026

MAYO 2026

PERSONAL MINIMO DE APOYO PROFESIONAL

Tabla 12. Personal Apoyo profesional

ITEM	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA
1	INGENIERO DE CAMPO	BRAYAN RICARDO GUALDRON HERRERA	1.121396424
2	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ERIKA PAOLA CORREDOR DUARTE	1.121.899.745

Fuente: Propia, 2026

PERSONAL OPERATIVO

Tabla 13. Personal operativo

ITEM	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE FINALIZACION
1	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	JUAN CAMILO MONTENEGRO LOSADA	1.120.385.130	21/04/2025 26/04/2026	25/04/2025 15/05/2026
2	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	ANDERSON HEREDIA MONTENEGRO	1.120.364.701	16/04/2026 26/04/2026	25/04/2026 29/04/2026
3	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	ANDERSON JULIÁN VERGARA LOAIZA	1.124.190.977	14/04/2026 06/05/2026	25/04/2026 17/05/2026
4	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	JOSE ALEXANDER AYA CARRILLO	80.498.355	14/04/2026 26/04/2026	25/04/2026 15/05/2026
5	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	JOAN SEBASTIAN CESPEDES RIVEROS	1193091743	26/04/2026	21/05/2026
6	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	NESTOR FABIO CORTES DIAZ	9930285	04/05/2026	15/05/2026
7	CONDUCTOR	LUIS ANDRES CANO RUIZ	1006878839	07/05/2026	15/05/2026
8	CONDUCTOR	JAVIER HERNANDO RODRÍGUEZ OSORIO	1121914273	12/05/2026	13/05/2026
9	CONDUCTOR	LEONEL MORA	17316126	06/05/2026	15/05/2026
10	CONDUCTOR	JAIME HUMBERTO TURRIAGO PIÑEROS	17327135	09/05/2026	15/05/2026
11	CONDUCTOR	JOSE RICARDO ROJAS VIRACACHA	86045470	06/05/2026	07/05/2026
12	CONDUCTOR	MARCO ANTONIO BRICEÑO	19487437	06/05/2026	07/05/2026
13	CONDUCTOR	PEDRO JOAQUIN PEREZ VILLALOBOS	478768	07/05/2026	08/05/2026
14	CONDUCTOR	FELIX ALFREDO BUSTOS GOMEZ	80406474	07/05/2026	08/05/2026
15	CONDUCTOR	JUAN CARLOS PARALES	1121883639	05/05/2026	12/05/2026
16	CONDUCTOR	MANUEL JOSE CASTRO MACHUCA	86072175	12/05/2026	13/05/2026
17	CONDUCTOR	CARLOS ARTURO CANO CANDELA	1121823494	12/05/2026	13/05/2026
18	OPERADOR	JUAN ELEXEY GUTIERREZ HERNANDEZ	1121899295	22/05/2026	31/05/2026

Fuente: Propia, 2026

10.PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

En las siguientes tablas se presenta la información de las planillas de seguridad social del personal que laboró durante el periodo del 26 de marzo de 2026 al 25 de mayo de 2026, en la ejecución del contrato.

MARZO 2026

PERSONAL MINIMO DE APOYO PROFESIONAL

Tabla 14. Seguridad social Personal Apoyo profesional

NOMBRE	Cargo	No. PLANILLA	Periodo Cotización	IBC (Ingreso) Base de Cotización)	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL	Valor Pagado Cajas	Valor Total Pagado
BRAYAN RICARDO GUALDRON HERRERA	INGENIERO DE CAMPO	9502921118	MARZO 2026	$3.500.000	$140.000	$560.000	$243.600	$140.000	$1.083.600
ERIKA PAOLA CORREDOR DUARTE	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1080969193	MARZO 2026	$1.750.905	$218.900	$280.200	$0	$0	$499.100
ERIKA PAOLA CORREDOR DUARTE	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9502940946	MARZO 2026	$1.750.905	$0	$0	$121.900	$0	$121.900

Fuente: Propia, 2026

ABRIL 2026

PERSONAL MINIMO DE APOYO PROFESIONAL

Tabla 15. Seguridad social Personal Apoyo profesional

NOMBRE	Cargo	No. PLANILLA	Periodo Cotización	IBC (Ingreso) Base de Cotización)	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL	Valor Pagado Cajas	Valor Total Pagado
BRAYAN RICARDO GUALDRON HERRERA	INGENIERO DE CAMPO	9504637807	ABRIL 2026	$3.500.000	$140.000	$560.000	$243.600	$140.000	$1.083.600
ERIKA PAOLA CORREDOR DUARTE	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1081870347	ABRIL 2026	$1.750.905	$218.900	$280.200	$0	$0	$499.100
ERIKA PAOLA CORREDOR DUARTE	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9504638172	ABRIL 2026	$1.750.905	$0	$0	$121.900	$0	$121.900

Fuente: Propia, 2026

PERSONAL OPERATIVO

Tabla 16. Seguridad social Personal operativo

NOMBRE	Cargo	No. PLANILLA	Periodo Cotización	IBC (Ingreso) Base de Cotización)	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL	Valor Pagado Cajas	Valor Total Pagado
JUAN CAMILO MONTENEGRO LOSADA	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	9504322383	ABRIL 2026	$1.167.270	$46.700	$186.800	$81.300	$46.700	$361.500

NOMBRE	Cargo	No. PLANILLA	Periodo Cotización	IBC (Ingreso) Base de Cotización)	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL	Valor Pagado Cajas	Valor Total Pagado
JULIO CESAR CASTIBLANCO MARTÍNEZ	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	9504322383	ABRIL 2026	$933.816	$37.400	$149.500	$65.000	$37.400	$289.300
ANDERSON HEREDIA MONTENEGRO	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	9504322527	ABRIL 2026	$1.750.905	$70.100	$280.200	$70.100	$121.900	$542.300
ANDERSON JULIÁN VERGARA LOAIZA	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	9504145541	ABRIL 2026	$1.750.905	$70.100	$280.200	$70.100	$121.900	$542.300
JOSE ALEXANDER AYA CARRILLO	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	9504322383	ABRIL 2026	$1.750.905	$70.100	$280.200	$70.100	$121.900	$542.300

Fuente: Propia, 2026

MAYO 2026

PERSONAL MINIMO DE APOYO PROFESIONAL

Tabla 17. Seguridad social Personal Apoyo profesional

NOMBRE	Cargo	No. PLANILLA	Periodo Cotización	IBC (Ingreso) Base de Cotización)	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL	Valor Pagado Cajas	Valor Total Pagado
BRAYAN RICARDO GUALDRON HERRERA	INGENIERO DE CAMPO	9506197749	MAYO 2026	$3.500.000	$140.000	$560.000	$243.600	$140.000	$1.083.600
ERIKA PAOLA CORREDOR DUARTE	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y	1082586638	MAYO 2026	$1.750.905	$218.900	$280.200	$0	$0	$499.100

NOMBRE	Cargo	No. PLANILLA	Periodo Cotización	IBC (Ingreso) Base de Cotización)	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL	Valor Pagado Cajas	Valor Total Pagado
	SALUD EN EL TRABAJO								
ERIKA PAOLA CORREDOR DUARTE	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	9506197551	MAYO 2026	$1.750.905	$0	$0	$121.900	$0	$121.900

Fuente: Propia, 2026

PERSONAL OPERATIVO

Tabla 18. Seguridad social Personal operativo

NOMBRE	Cargo	No. PLANILLA	Periodo Cotización	IBC (Ingreso) Base de Cotización)	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL	Valor Pagado Cajas	Valor Total Pagado
JUAN CAMILO MONTENEGRO LOSADA	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	9505219502	MAYO 2026	$1.750.905	$70.100	$280.200	$70.100	$121.900	$542.300
ANDERSON HEREDIA MONTENEGRO	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	9506038235	MAYO 2026	$1.750.905	$70.100	$280.200	$70.100	$121.900	$542.300
ANDERSON JULIÁN VERGARA LOAIZA	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	9505725812	MAYO 2026	$1.750.905	$70.100	$280.200	$70.100	$121.900	$542.300
JOSE ALEXANDER AYA CARRILLO	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	9505219502	MAYO 2026	$1.750.905	$70.100	$280.200	$70.100	$121.900	$542.300
JOAN SEBASTIAN CESPEDES RIVEROS	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	9506197749	MAYO 2026	$2.411.898	$96.500	$386.000	$167.900	$96.500	$746.900

NOMBRE	Cargo	No. PLANILLA	Periodo Cotización	IBC (Ingreso) Base de Cotización)	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL	Valor Pagado Cajas	Valor Total Pagado
NESTOR FABIO CORTES DIAZ	OPERARIO DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA	9506197749	MAYO 2026	$3.925.567	$157.100	$628.100	$273.300	$157.100	$1.215.600
LUIS ANDRES CANO RUIZ	CONDUCTOR	9506197749	MAYO 2026	$525.272	$21.100	$84.100	$36.600	$21.900	$163.700
JAVIER HERNANDO RODRÍGUEZ OSORIO	CONDUCTOR	9506197551	MAYO 2026	$175.091	$21.900	$28.100	$12.200	$0	$62.200
LEONEL MORA	CONDUCTOR	9505378769	MAYO 2026	$1.750.905	$70.100	$280.200	$70.100	$121.900	$542.300
JAIME HUMBERTO TURRIAGO PIÑEROS	CONDUCTOR	9506197749	MAYO 2026	$3.222.522	$129.000	$515.700	$224.300	$129.000	$998.000
JOSE RICARDO ROJAS VIRAÇACHA	CONDUCTOR	9506197551	MAYO 2026	$175.091	$21.900	$28.100	$12.200	$0	$62.200
MARCO ANTONIO BRICEÑO	CONDUCTOR	9506197551	MAYO 2026	$116.727	$14.600	$18.700	$8.200	$0	$41.500
PEDRO JOAQUIN PEREZ VILLALOBOS	CONDUCTOR	9506197551	MAYO 2026	$116.727	$14.600	$18.700	$8.200	$0	$41.500
FELIX ALFREDO BUSTOS GOMEZ	CONDUCTOR	9506197551	MAYO 2026	$116.727	$14.600	$18.700	$8.200	$0	$41.500
JUAN CARLOS PARALES	CONDUCTOR								
MANUEL JOSE CASTRO MACHUCA	CONDUCTOR	9506197551	MAYO 2026	$116.727	$14.600	$18.700	$8.200	$0	$41.500
CARLOS ARTURO CANO CANDELA	CONDUCTOR	9506197551	MAYO 2026	$116.727	$14.600	$18.700	$8.200	$0	$41.500
JUAN ELEXEY GUTIERREZ HERNANDEZ	OPERADOR	91720495	MAYO 2026	$525.272	$65.700	$84.100	$36.600	$21.100	$233.900

Fuente: Propia, 2026

11. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN FISICA

BALANCE FINANCIERO

Tabla 19. Balance financiero

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.599.041.000,00	17 DE MARZO DE 2026		N/A
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 1.599.041.000,00	N/A	N/A	
PAGO PARCIAL NO. 1	$ 1.093.713.000,00	26 DE MARZO DE 2026 AL 25 DE MAYO DE 2026	68,40%	EL PORCENTAJE SE CALCULA RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
(-) AMORTIZACION ANTICIPO 40%	$ 0,00			
VALOR NETO ACTA 1	$ 1.093.713.000,00			
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 505.328.000,00	26 DE MARZO DE 2026 AL 25 DE JULIO DE 2026	31,60%	EL PORCENTAJE SE CALCULA RESPECTO AL VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO
POR AMORTIZAR	N/A		N/A	N/A

Fuente: Propia, 2026


EJECUCIÓN FISICA

Tabla 20. Ejecución Fisica

SEMANA	AVANCE DE EJECUCIÓN	
	INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA	INVERSION EJECUTADA ACUMULADA
26 MARZO - 31 MARZO	7,82%	0,00%
01 ABRIL - 25 ABRIL	41,68%	18,91%
26 ABRIL - 25 MAYO	69,86%	68,40%
26 MAYO - 25 JUNIO	84,93%	
26 JUNIO - 25 JULIO	100,00%	

Fuente: Propia, 2026


Ilustración 17. Grafica avance programado vs avance ejecutado

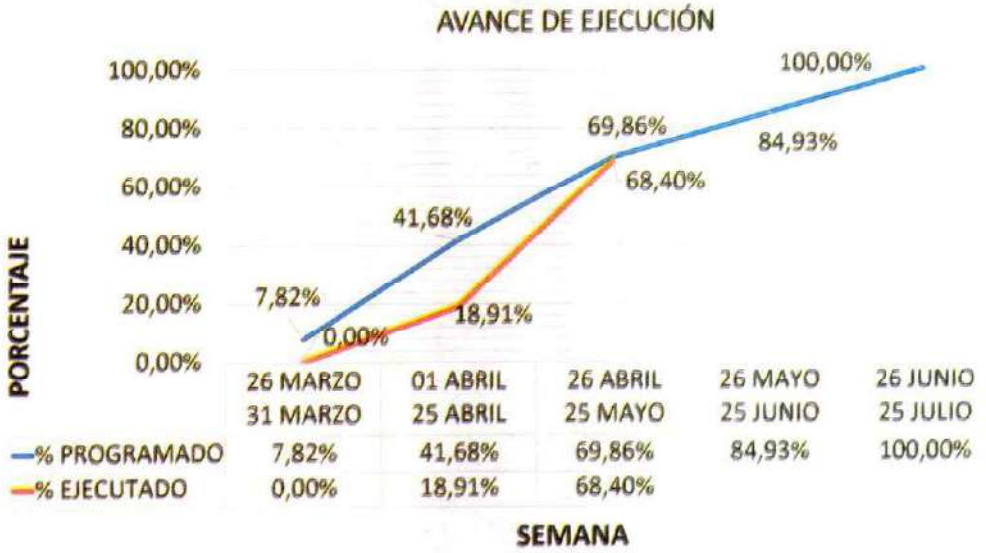

Fuente: Propia, 2026

En la grafica anterior se refleja el porcentaje programado vs el porcentaje ejecutado.

Ilustración 18. Grafica inversión programada vs inversión ejecutada

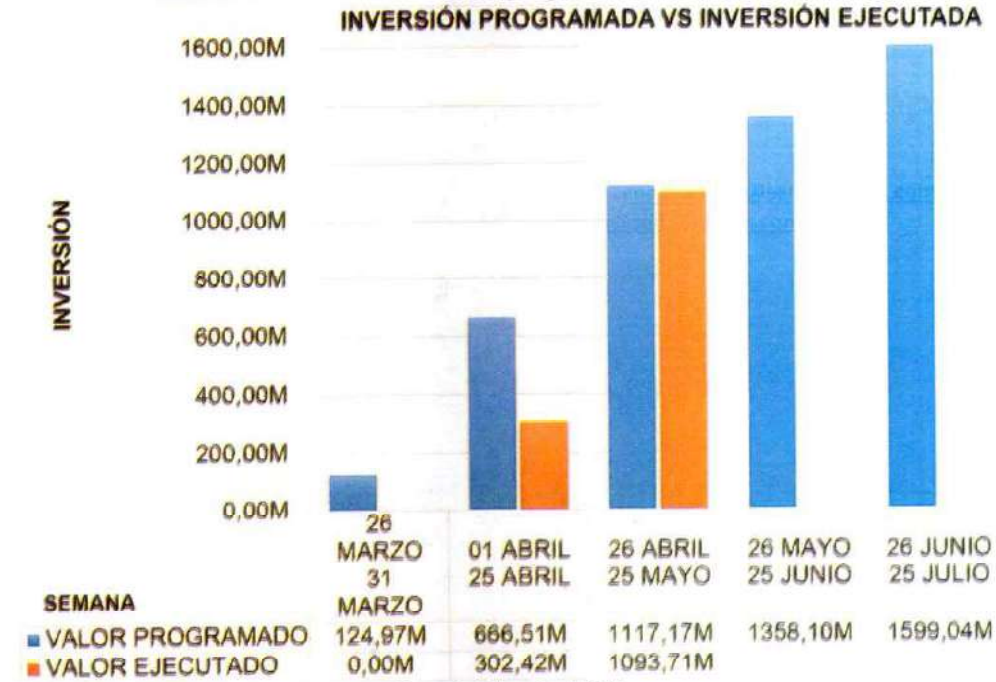

Fuente: Propia, 2026

En la grafica anterior se refleja el valor programado vs el valor ejecutado.

12. PRESUPUESTO GENERAL SEGÚN CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

Tabla 21. Presupuesto general según condiciones iniciales del contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE HORAS	VALOR TOTAL
1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 7 TONELADAS MÍNIMO INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	1	HR	$ 595.000,00	50	$ 29.750.000,00
2	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 12 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	1	HR	$ 668.000,00	10	$ 6.680.000,00
3	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MÍNIMO INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	1	HR	$ 820.000,00	1585	$ 1.299.700.000,00
4	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	1	HR	$ 985.000,00	100	$ 98.500.000,00
5	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	1	HR	$ 586.000,00	50	$ 29.300.000,00
6	ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO 4 DUMPER CARGA COLMADA 16.9 M3 O EQUIVALENTE, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	1	HR	$ 854.000,00	80	$ 68.320.000,00
7	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	1	HR	$ 498.000,00	60	$ 29.880.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE HORAS	VALOR TOTAL
8	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	1	HR	$ 381.000,00	10	$ 3.810.000,00
9	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	1	HR	$ 479.000,00	10	$ 4.790.000,00
10	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 7 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	1	HR	$ 391.000,00	61	$ 23.851.000,00
11	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 10 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	1	HR	$ 446.000,00	10	$ 4.460.000,00
					TOTAL	**$ 1.599.041.000,00**

Fuente: Propia, 2026

Tabla 22. Presupuesto general según condiciones iniciales del contrato

CONDICIONES ACTUALIZADAS					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR SUB-TOTAL
1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 7 TONELADAS MÍNIMO INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	$ 595.000,00	345,00	$ 205.275.000,00
2	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 12 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	$ 668.000,00	0,00	$ 0,00
3	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MÍNIMO INCLUYE	HR	$ 820.000,00	1505,30	$ 1.234.346.000,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR SUB-TOTAL
	OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.				
4	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	$ 985.000,00	0,00	$ 0,00
5	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	$ 586.000,00	0,00	$ 0,00
6	ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO 4 DUMPER CARGA COLMADA 16.9 M3 O EQUIVALENTE, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	$ 854.000,00	0,00	$ 0,00
7	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	$ 498.000,00	60,00	$ 29.880.000,00
8	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	$ 381.000,00	340,00	$ 129.540.000,00
9	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	$ 479.000,00	0,00	$ 0,00
10	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 7 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	$ 391.000,00	0,00	$ 0,00
11	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 10 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	$ 446.000,00	0,00	$ 0,00
			TOTAL		$ 1.599.041.000,00

Fuente: Propia, 2026

13. PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2026.

Tabla 23. Presupuesto ejecutado del 26 de marzo al 25 de mayo de 2026.

CONDICIONES ACTUALIZADAS						EJECUTADO						POR EJECUTAR	
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL
1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 7 TONELADAS MÍNIMO INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	345	$ 595.000,00	$ 205.275.000,00	0,00	$ 0,00	27,40	$ 16.303.000,00	27,40	$ 16.303.000,00	317,60	$ 188.972.000,00
2	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 12 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	0	$ 668.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MÍNIMO INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS;	HR	1505,3	$ 820.000,00	$ 1.234.346.000,00	0,00	$ 0,00	1119,50	$ 917.990.000,00	1119,50	$ 917.990.000,00	385,80	$ 316.356.000,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS						EJECUTADO						POR EJECUTAR	
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL
	PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.												
4	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 30 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	0	$ 985.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5	ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2 M3 MINIMO INCLUYE OPERADOR COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	0	$ 586.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6	ALQUILER DE VOLQUETA ARTICULADA TIPO 4 DUMPER CARGA COLMADA 16.9 M3 O EQUIVALENTE, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS;	HR	0	$ 854.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS						EJECUTADO						POR EJECUTAR	
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL
	PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.												
7	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	60	$ 498.000,00	$ 29.880.000,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 29.880.000,00	60,00	$ 29.880.000,00	0,00	$ 0,00
8	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	340	$ 381.000,00	$ 129.540.000,00	0,00	$ 0,00	340,00	$ 129.540.000,00	340,00	$ 129.540.000,00	0,00	$ 0,00
9	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	0	$ 479.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR	HR	0	$ 391.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS						EJECUTADO						POR EJECUTAR	
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL
	7 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.												
11	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 10 TONELADAS MINIMO, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HR	0	$ 446.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				TOTAL	$ 1.599.041.000,00	0,00%	$ 0,00	68,40%	$ 1.093.713.000,00	68,40%	$ 1.093.713.000,00	31,60%	$ 505.328.000,00

Fuente: Propia, 2026

14. EJECUCION DEL 26 DE MARZO DE 2026 AL 25 DE MAYO DE 2026

En el periodo del presente informe, que corresponde al periodo del 26 de marzo de 2026 al 25 de mayo de 2026, intervinimos puntos críticos en los municipios de El Dorado, Granada, La Uribe, Vista Hermosa, Cabuyaro y El Calvario. Donde desarrollamos actividades de canalización, descolmatación o limpieza del cauce, conformación de jarillones de protección en los costados de los ríos y/o caños intervenidos, además de actividades de rehabilitación de vías.

En el periodo del 26 de marzo de 2026 al 25 de mayo de 2026 se ejecutó un 68.40% del valor del contrato que corresponde a $ 1.093.713.000,00.

La maquinaria y ejecución del periodo del presente informe se presenta a continuación:

Tabla 24. Resumen de actividades ejecutadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
1	**ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 7 TON**							
	YANMAR VC80 MC730595	EL CALVARIO	CAÑO SECO	22/05/2026	25/05/2026	27,4	$ 16.303.000,00	REHABILITACION DE VIA
					TOTAL	**27,4**	**$ 16.303.000,00**	
3	**ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TON**							
	SHANTUI SE220LC MC709185 #1	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	14/04/2026	29/04/2026	150	$ 123.000.000,00	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA
	SHANTUI SE220LC MC714613 #2	GRANADA	VEREDA LA MARIELA	14/04/2026	23/04/2026	100	$ 82.000.000,00	CONFORMACION DE JARIILON
	SHANTUI SE220LC MC719388 #3	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	16/04/2026	30/04/2026	160	$ 131.200.000,00	SE REALIZA CONFORMACION JARILLLO Y CANALIZACION
	SHANTUI SE220LC MC719388 #3	LA URIBE	VEREDA PLANES	6/05/2026	17/05/2026	110	$ 90.200.000,00	SE REALIZA REMOCION DE MATERIAL POR DERRUMBE PARA APERTURA Y HABLITACION DE VIA
	SHANTUI SE215 MC765198#4	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	21/04/2026	15/05/2026	220	$ 180.400.000,00	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
	SHANTUI SE215 MC765197#5	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	21/04/2026	15/05/2026	220	$ 180.400.000,00	SE REALIZA CANALIZACIÓN DEL RIO
	CATERPILLAR 320D MC033914 #2	CABUYARO	VISO DE UPIA	4/05/2026	13/05/2026	75	$ 61.500.000,00	SE REALIZA CONFORMACION DE JARILLON Y SE CANALIZA
	CATERPILLAR 320D MC033914 #2	CABUYARO	GUAYABAL DE UPIA	21/05/2026	25/05/2026	4,5	$ 3.690.000,00	CANALIZACIÓN DEL RIO
	CATERPILLAR 320D MC020824 #1	CABUYARO	PUENTE HUMEA	5/05/2026	15/05/2026	80	$ 65.600.000,00	SE REALIZA ESTABILIZACION DE TERRENO CON GEOBOLSAS PARA MITIGAR DESBORDAMIENTO
					TOTAL	**1119,5**	**$ 917.990.000,00**	
8	**VOLQUETA DOBLE TROQUE**							
	VOLQUETA SJP-903	CABUYARO	PUENTE RIO HUMEA	5/05/2026	12/05/2026	14	$ 6.972.000,00	CARGUE DE MATERIAL PARA LLENADO DE GEOBOLSAS Y TRANSPORTE DE GEOBOLSA AL APROCHE PUENTE RIO HUMEA
	VOLQUETA UVC-808	CABUYARO	PUENTE RIO HUMEA	5/05/2026	12/05/2026	15	$ 7.470.000,00	CARGUE DE MATERIAL PARA LLENADO DE GEOBOLSAS Y TRANSPORTE DE GEOBOLSA AL APROCHE PUENTE RIO HUMEA
	VOLQUETA SXE-546	CABUYARO	PUENTE RIO HUMEA	12/05/2026	13/05/2026	15	$ 7.470.000,00	CARGUE DE MATERIAL PARA LLENADO DE GEOBOLSAS Y TRANSPORTE DE GEOBOLSA AL APROCHE PUENTE RIO HUMEA
	VOLQUETA KDJ-221	CABUYARO	PUENTE RIO HUMEA	12/05/2026	13/05/2026	16	$ 7.968.000,00	CARGUE DE MATERIAL PARA LLENADO DE GEOBOLSAS Y TRANSPORTE DE GEOBOLSA AL

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
								APROCHE PUENTE RIO HUMEA
					TOTAL	60,0	$ 29.880.000,00	
7	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA							
	VOLQUETA INTER SVC-806	CABUYARO	PUENTE HUMEA	6/05/2026	15/05/2026	109	$ 41.529.000,00	CARGUE DE MATERIAL PARA LLENADO DE GEOBOLSAS Y TRANSPORTE DE GEOBOLSA AL APROCHE PUENTE RIO HUMEA
	VOLQUETA INTER SRP-547	CABUYARO	PUENTE HUMEA	7/05/2026	15/05/2026	87	$ 33.147.000,00	CARGUE DE MATERIAL PARA LLENADO DE GEOBOLSAS Y TRANSPORTE DE GEOBOLSA AL APROCHE PUENTE RIO HUMEA
	VOLQUETA INTER VKK-419	CABUYARO	PUENTE HUMEA	9/05/2026	15/05/2026	73	$ 27.813.000,00	CARGUE DE MATERIAL PARA LLENADO DE GEOBOLSAS Y TRANSPORTE DE GEOBOLSA AL APROCHE PUENTE RIO HUMEA
	VOLQUETA OAA 430	CABUYARO	PUENTE RIO HUMEA	6/05/2026	7/05/2026	16	$ 6.096.000,00	CARGUE DE MATERIAL PARA LLENADO DE GEOBOLSAS Y TRANSPORTE DE GEOBOLSA AL APROCHE PUENTE RIO HUMEA
	VOLQUETA GCC-242	CABUYARO	PUENTE RIO HUMEA	6/05/2026	7/05/2026	15	$ 5.715.000,00	CARGUE DE MATERIAL PARA LLENADO DE GEOBOLSAS Y TRANSPORTE DE GEOBOLSA AL APROCHE PUENTE RIO HUMEA
	VOLQUETA UVJ-264	CABUYARO	PUENTE RIO HUMEA	7/05/2026	8/05/2026	21	$ 8.001.000,00	CARGUE DE MATERIAL PARA LLENADO DE GEOBOLSAS Y TRANSPORTE DE GEOBOLSA AL

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
								APROCHE PUENTE RIO HUMEA
	VOLQUETA SRA-294	CABUYARO	PUENTE RIO HUMEA	7/05/2026	8/05/2026	19	$ 7.239.000,00	CARGUE DE MATERIAL PARA LLENADO DE GEOBOLSAS Y TRANSPORTE DE GEOBOLSA AL APROCHE PUENTE RIO HUMEA
					TOTAL	**340,0**	**$ 129.540.000,00**	
						TOTAL	**$ 1.093.713.000,00**	

Fuente: Propia, 2026

PUNTOS INTERVENIDOS

MUNICIPIO DE EL DORADO - CAÑO AGUAS ZARCAS

El día 14 de abril de 2026, en el municipio de El Dorado, en reunión con los ingenieros de la DIGERD, el contratista, delegados de la alcaldía y la comunidad, se realizó un recorrido y posteriormente un vuelo de dron sobre el caño Aguas Zarcas, con el fin de evidenciar las afectaciones presentadas por el desbordamiento del caño sobre ambos costados.

De común acuerdo, se definió la conformación de tres (03) jarillones de protección en los puntos críticos por donde se desborda el caño: dos (02) ubicados sobre la margen izquierda y uno (01) sobre la margen derecha, con el fin de mitigar las afectaciones presentadas y evitar el paso del agua durante eventos de creciente.

Definida la intervención, se trasladó la maquinaria al sitio y se iniciaron las labores correspondientes.

Durante el periodo del 26 de marzo a el 25 de mayo de 2026 se iniciaron y finalizaron las labores ejecutadas con una excavadora sobre oruga en el caño Aguas Zarcas, municipio de El Dorado. En el periodo reportado se ejecutó un total de 150 horas máquina.

Con la intervención realizada se logró la protección de las márgenes en tres (3) puntos afectados. Para ello, se conformaron tres jarillones de protección.

Con lo anterior, se mitigo el riesgo de inundación, contribuyendo a la protección de las áreas aledañas.

Tabla 25. Propuesta de intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.

ACTIVIDADES PROPUESTAS					
DESCRIPCIÓN	**COORDENADA DE INICIO**	**COORDENADA FINAL**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**OBSERVACIONES**
JARILLÓN No.1	3°44'48.62"N 73°50'8.48"O	3°44'45.99"N 73°50'12.23"O	140M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN
JARILLÓN No.2	3°44'50.98"N 73°50'7.45"O	3°44'48.57"N 73°50'9.36"O	100M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN
JARILLÓN No.3	3°44'52.91"N 73°50'4.52"O	3°44'51.49"N 73°50'6.67"O	80M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN

MAQUINARIA REQUERIDA			
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MÁQUINAS
3	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HORA	1

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 19. Propuesta de intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Los trabajos realizados presentan las siguientes características:

Tabla 26. Intervención realizada – Municipio de El Dorado – Caño Agua Zarcas.

ACTIVIDADES REALIZADAS					
DESCRIPCIÓN	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	LONGITUD	ANCHO	OBSERVACIONES
JARILLÓN No.1	3°44'52.73"N 73°50'2.71"O	3°44'51.87"N 73°50'5.61"O	95M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN
JARILLÓN No.2	3°44'51.30"N 73°50'6.08"O	3°44'48.91"N 73°50'8.70"O	115M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN
JARILLÓN No.1	3°44'48.51"N 73°50'7.89"O	3°44'44.96"N 73°50'13.74"O	220M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 20. Intervención realizada, Municipio de El Dorado – Caño Agua Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Registro fotográfico

Ilustración 21. Antes de la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 22. Antes de la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 23. Antes de la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 24. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 25. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 26. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 27. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 28. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 29. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.




Fuente: Propia, 2026

Ilustración 30. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 31. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.

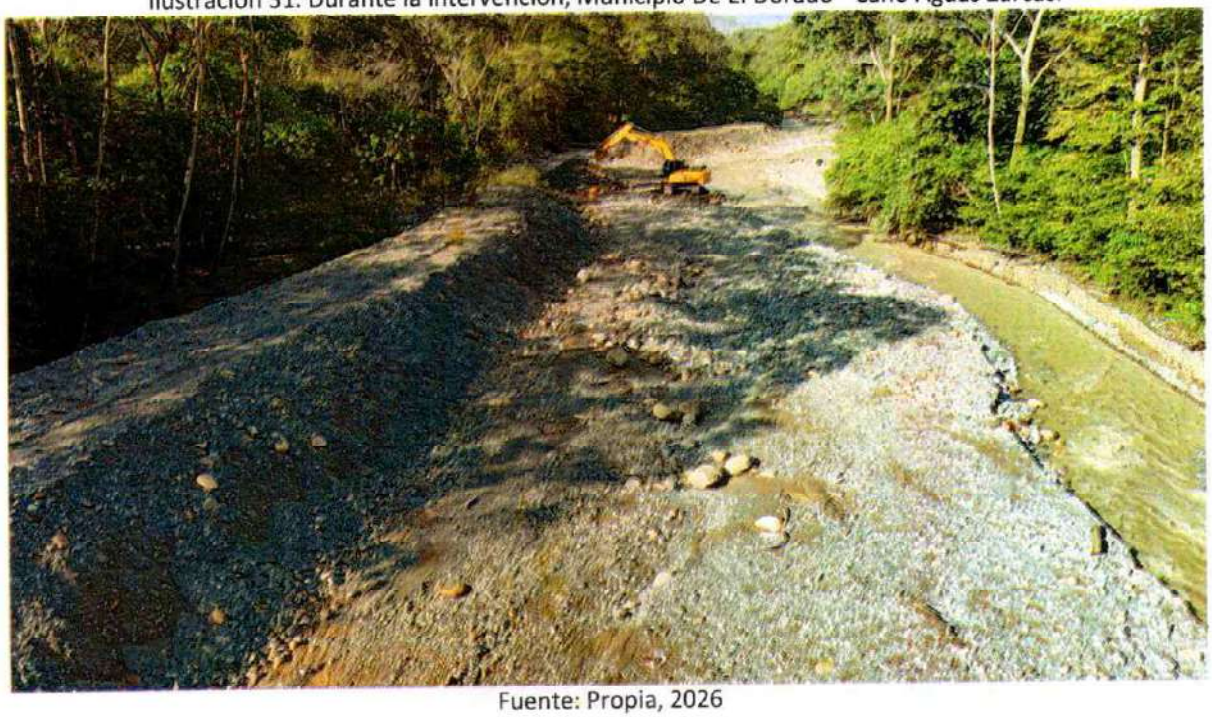

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 32. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 33. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 34. Durante la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 35. Posterior a la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 36. Posterior a la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 37. Posterior a la intervención, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

En el periodo reportado se ejecutaron 150 horas, con la siguiente maquinaria:

Tabla 27. Maquinaria utilizada, Municipio de El Dorado – Caño Agua Zarcas.

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
3	SHANTUI SE220LC MC709185 #1	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	14/04/2026	29/04/2026	150	$ 123.000.000,00	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA
						TOTAL	$ 123.000.000,00	

Fuente: Propia, 2026

Reporte diario de horas

EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MC709185 #1

Tabla 28. Reporte diario de horas excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:	SHANTUI SE220LC MC709185 #1							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
1	14/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3698,1	3705,6	7,5	SE TRANSPORTA LA MAQUINA AL PUNTO Y SE INICIA CANALIZACION PARA DESVIAR EL RIO
2	15/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3705,6	3716,8	11,2	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON
3	16/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3716,8	3728,6	11,8	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON
4	17/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3728,6	3739,3	10,7	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON
5	18/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3739,3	3750,0	10,7	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON
6	19/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3750,0	3758,0	8,0	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:		SHANTUI SE220LC MC709185 #1						
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
7	20/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3758,0	3760,7	2,7	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON
8	21/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3760,7	3772,5	11,8	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON
9	22/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3772,5	3784,1	11,6	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
10	23/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3784,1	3796,1	12,0	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
11	24/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3796,1	3806,9	10,8	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
12	25/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3806,9	3817,9	11,0	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
13	26/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3817,9	3826,4	8,5	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA
14	27/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3826,4	3837,4	11,0	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA
15	28/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3837,4	3841,8	4,4	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA POR TEMAS DE LLUVIA SE EMPIEZA TARDE EL TRABAJO
16	29/04/2026	EL DORADO	CAÑO AGUAS ZARCAS	JULIAN VERGARA	3841,8	3848,1	6,3	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA POR TEMAS DE LLUVIA SE EMPIEZA TARDE EL TRABAJO
						TOTAL	150,0	


Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:	SHANTUI SE220LC MC709185 #1							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
	14/04/2026	29/04/2026	3698,1	3848,1	150,0			
				TOTAL	150,0			

Fuente: Propia, 2026

Registro Fotográfico Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1

Ilustración 38 . Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.

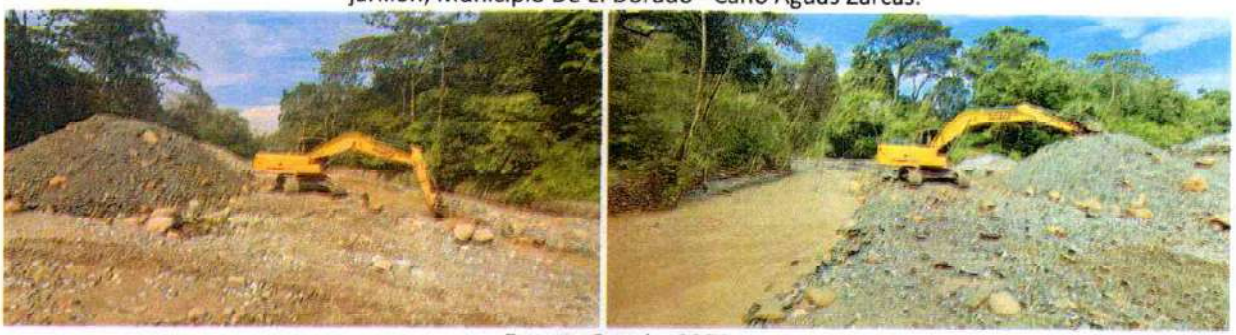

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 39 . Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 40 . Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 41 . Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 42 . Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 43 . Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 44 . Excavadora Shantui SE220LC MC709185 #1 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De El Dorado - Caño Aguas Zarcas.



Fuente: Propia, 2026

MUNICIPIO DE GRANADA - VEREDA LA MARIELA, RIO LA CUBILLERA

El día 14 de abril de 2026, en la vereda La Mariela, ubicada en el municipio de Granada, se realizó un recorrido técnico en el punto de afectación con la participación de ingenieros de la DIGERD, el contratista, delegados de la Alcaldía y miembros de la comunidad. Durante la visita se evidenció que el impacto continuo del río La Cubillera sobre la margen izquierda ha generado procesos de socavación e inundaciones que afectan directamente la zona intervenida.

Con el fin de mitigar las afectaciones y reducir el riesgo inminente, se acordó la conformación de un jarillón de protección tipo espolón, orientado a impedir el paso del agua hacia el área afectada. Para la ejecución de esta intervención, la DIGERD asignó un total de cien (100) horas de excavadora de 20 toneladas.

Definida la intervención, se trasladó la maquinaria al sitio y se iniciaron las labores correspondientes. Durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2026 y el 25 de mayo de 2026, se ejecutó la

totalidad de las horas inicialmente asignadas, logrando desarrollar el trabajo proyectado. Adicionalmente, se construyeron tres (03) jarillones complementarios, para un total de cuatro (04) jarillones de protección y/o cierre, los cuales permiten mitigar la afectación y brindar protección a los predios impactados por la dinámica del río.

Ilustración 45. Propuesta de intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.



Fuente: Propia, 2026

Tabla 29. Propuesta de intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.

ACTIVIDADES PROPUESTAS					
DESCRIPCIÓN	**COORDENADA DE INICIO**	**COORDENADA FINAL**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**OBSERVACIONES**
JARILLÓN DE PROTECCIÓN	3°29'28.96"N 73°46'3.10"O	3°29'29.74"N 73°46'14.44"O	350M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN

MAQUINARIA REQUERIDA			
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD DE MÁQUINAS**
3	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HORA	1

Fuente: Propia, 2026

Con la intervención realizada se logró conformar cuatro (04) jarillones de cierre y/o protección con las siguientes características:

Ilustración 46. Intervención realizada, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.



Fuente: Propia, 2026

Tabla 30. Intervención realizada, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.

ACTIVIDADES REALIZADAS					
DESCRIPCIÓN	**COORDENADA DE INICIO**	**COORDENADA FINAL**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**OBSERVACIONES**
JARILLÓN DE CIERRE	3°29'25.52"N 73°46'15.16"O	3°29'25.30"N 73°46'17.82"O	80M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE CIERRE
JARILLÓN DE PROTECCIÓN No.1	3°29'29.18"N 73°46'2.99"O	3°29'29.81"N 73°46'14.44"O	350M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN
JARILLÓN DE PROTECCIÓN No.2	3°29'31.47"N 73°46'4.62"O	3°29'31.86"N 73°46'7.91"O	100M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN
JARILLÓN DE PROTECCIÓN No.3	3°29'33.33"N 73°46'4.07"O	3°29'31.69"N 73°46'8.15"O	140M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN

Fuente: Propia, 2026

Registro fotográfico

Ilustración 47. Antes de la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 48. Antes de la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 49. Antes de la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 50. Antes de la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 51. Posterior a la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.




Fuente: Propia, 2026

Ilustración 52. Posterior a la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 53. Posterior a la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.

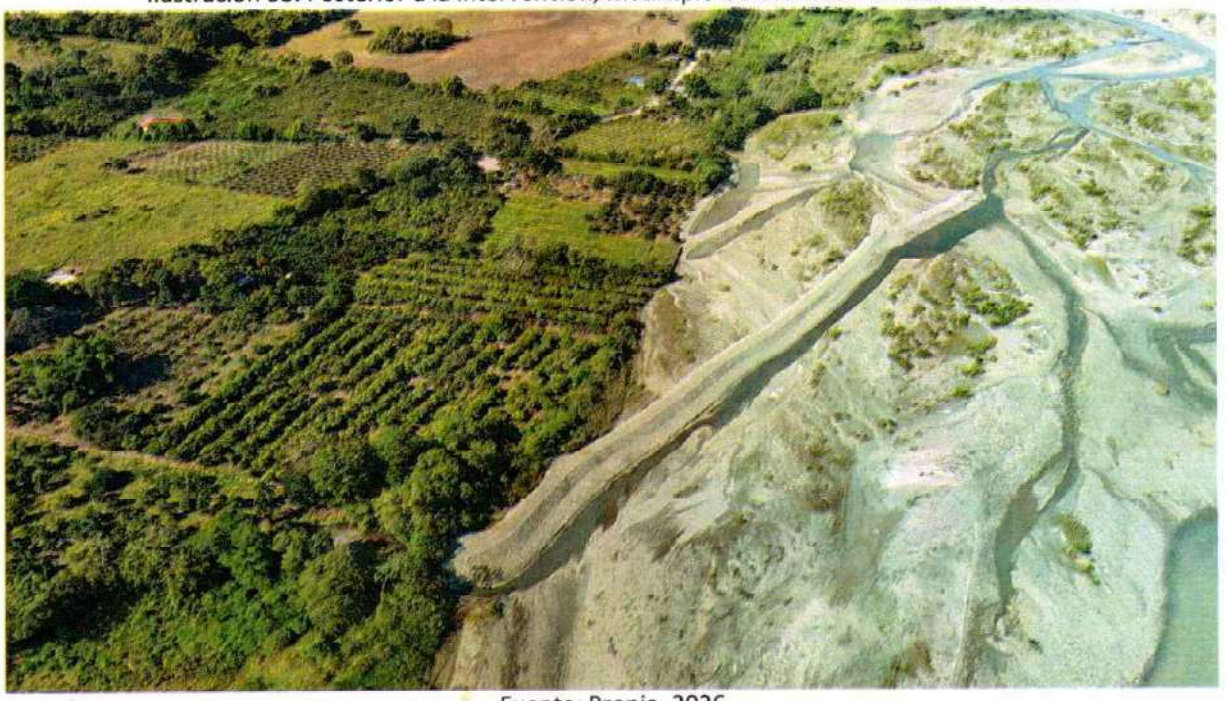

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 54. Posterior a la intervención, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.



Fuente: Propia, 2026

Durante el periodo del presente informe se ejecutaron la totalidad de horas asignadas a este punto, es decir, 100 horas de excavadora, realizadas con la siguiente maquinaria:

Tabla 31. Maquinaria utilizada mes de abril de 2026, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
3	SHANTUI SE220LC MC714613 #2	GRANADA	VEREDA LA MARIELA	14/04/2026	23/04/2026	100	$ 82.000.000,00	CONFORMACION DE JARIILON
						TOTAL	$ 82.000.000,00	

Fuente: Propia, 2026

Reporte diario de horas

EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MC714613 #2

Tabla 32. Reporte diario de horas excavadora Shantui SE220LC MC714613 #2

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:	SHANTUI SE220LC MC714613 #2							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
1	14/04/2026	GRANADA	VEREDA LA MARIELA	ALEX AYA	2286,3	2292,7	6,4	SE TRANSPORTA LA MAQUINA A PUNTO DE TRABAJO Y SE INICIA CON CONFORMACION DE JARILLON
2	15/04/2026	GRANADA	VEREDA LA MARIELA	ALEX AYA	2292,7	2304,4	11,7	CONFORMACION DE JARIILON
3	16/04/2026	GRANADA	VEREDA LA MARIELA	ALEX AYA	2304,4	2316,1	11,7	CONFORMACION DE JARIILON
4	17/04/2026	GRANADA	VEREDA LA MARIELA	ALEX AYA	2316,1	2327,6	11,5	CONFORMACION DE JARIILON
5	18/04/2026	GRANADA	VEREDA LA MARIELA	ALEX AYA	2327,6	2338,6	11,0	CONFORMACION DE JARIILON
6	19/04/2026	GRANADA	VEREDA LA MARIELA	ALEX AYA	2338,6	2349,1	10,5	CONFORMACION DE JARIILON
7	20/04/2026	GRANADA	VEREDA LA MARIELA	ALEX AYA	2349,1	2360,2	11,1	CONFORMACION DE JARIILON
8	21/04/2026	GRANADA	VEREDA LA MARIELA	CESAR CASTIBLANCO	2360,2	2368,6	8,4	CONFORMACION DE JARIILON
9	22/04/2026	GRANADA	VEREDA LA MARIELA	CESAR CASTIBLANCO	2368,6	2378,2	9,6	CONFORMACION DE JARIILON
10	23/04/2026	GRANADA	VEREDA LA MARIELA	CESAR CASTIBLANCO	2378,2	2386,3	8,1	CONFORMACION DE JARIILON
						TOTAL	100,0	

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:	SHANTUI SE220LC MC714613 #2							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
	Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total			
	14/04/2026	23/04/2026	2286,3	2386,3	100,0			
				TOTAL	100,0			

Fuente: Propia, 2026

Registro Fotográfico Excavadora Shantui SE220LC MC714613 #2

Ilustración 55 . Excavadora Shantui SE220LC MC714613 #2 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 56 . Excavadora Shantui SE220LC MC714613 #2 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 57 . Excavadora Shantui SE220LC MC714613 #2 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 58 . Excavadora Shantui SE220LC MC714613 #2 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Granada - Vereda La Mariela.



Fuente: Propia, 2026

MUNICIPIO DE LA URIBE - VEREDA EL PLACER, RIO DUA

El día 16 de abril de 2026, en la vereda El Placer del municipio de La Uribe, se realizó una reunión con ingenieros de la DIGERD, el contratista y la comunidad, durante la cual se efectuó un vuelo de dron con el fin de evidenciar las afectaciones presentadas en el costado derecho del río Duda. Este río se desborda sobre los predios aledaños, ocasionando inundaciones en cultivos, viviendas y vías internas de la vereda.


Con base en lo observado, se definió en común acuerdo la propuesta de intervención, la cual contempló la conformación de dos canales y un jarillón de cierre.

Una vez definida la intervención, se trasladó la maquinaria y se iniciaron las labores en el punto establecido. La DIGERD asignó un total de 160 horas de excavadora sobre orugas de 20 toneladas. Durante el periodo del presente informe se iniciaron y finalizaron las labores desarrolladas con una excavadora sobre oruga en el río Dua - vereda el Placer, en el municipio de La Uribe, donde la margen derecha del río presentaba afectaciones.

Con las actividades desarrolladas se logró mitigar la afectación, mediante la conformación de dos canales y un Jarillón de protección, el cual permitió redireccionar el cauce del río, alejándolo de la zona afectada. Adicionalmente, con el material producto de la excavación se conformó un Jarillón de protección.

Las intervenciones ejecutadas contribuyeron a reducir el proceso de socavación y el riesgo de inundación que afectaba vías, cultivos y viviendas.

Ilustración 59. Propuesta de intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer

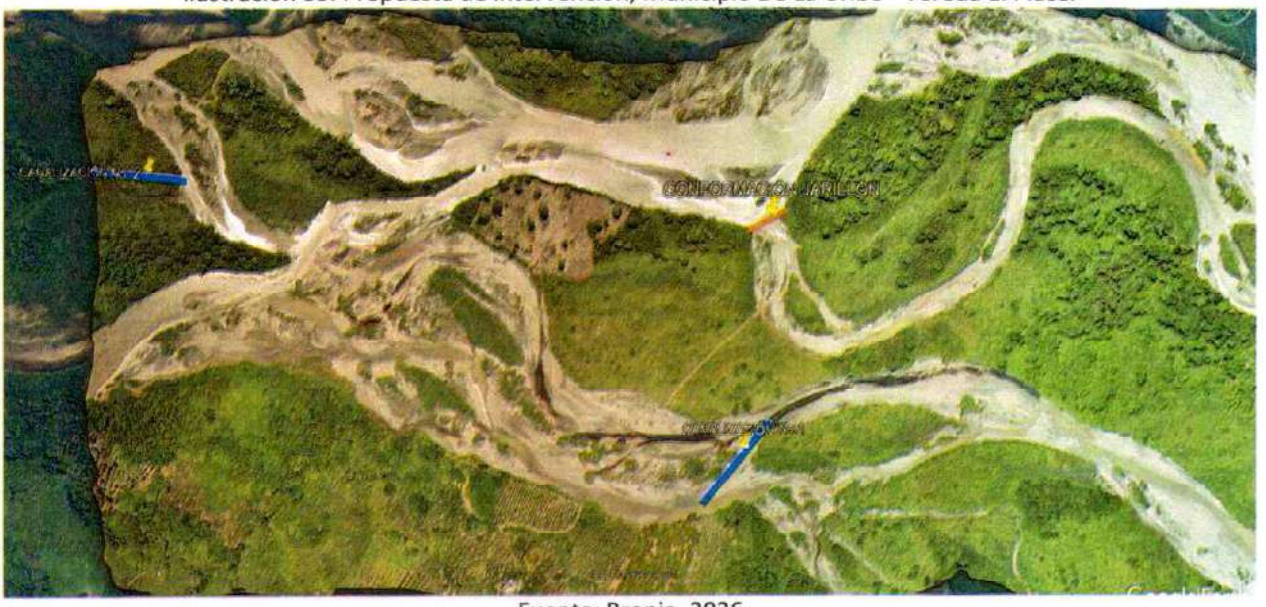

Fuente: Propia, 2026

Tabla 33. Propuesta de intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer

ACTIVIDADES PROPUESTAS					
DESCRIPCIÓN	**COORDENADA DE INICIO**	**COORDENADA FINAL**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**OBSERVACIONES**
CANALIZACIÓN No.1	2°56'28.25" 74°11'35.00"O	2°56'36.26"N 74°11'37.98"O	130M	VARIABLE	CONFORMACIÓNCANAL DE DESVIACIÓN
CONFORMACIÓN DE JARILLÓN	2°57'23.35"N 74°11'47.45"O	2°57'24.13"N 74°11'48.66"O	55M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN
CANALIZACIÓN No.2	2°57'37.17"N 74°11'57.60"O	2°57'44.26"N 74°12'9.00"O	130M	VARIABLE	CONFORMACIÓNCANAL DE DESVIACIÓN

MAQUINARIA REQUERIDA			
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD DE MÁQUINAS**
3	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HORA	1

Fuente: Propia, 2026

Los trabajos realizados presentan las siguientes características:

Tabla 34. Intervención realizada, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer

ACTIVIDADES REALIZADAS					
DESCRIPCIÓN	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	LONGITUD	ANCHO	OBSERVACIONES
CANALIZACIÓN No.1	2°57'20.29"N 74°11'53.57"O	2°57'20.76"N 74°11'56.89"O	100M	VARIABLE	CONFORMACIÓNCANAL DE DESVIACIÓN
CONFORMACIÓN DE JARILLÓN	2°57'23.73"N 74°11'45.42"O	2°57'24.91"N 74°11'47.50"O	70M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN
CANALIZACIÓN No.2	2°57'45.74"N 74°11'58.95"O	2°57'59.62"N 74°12'10.86"O	550M	VARIABLE	CONFORMACIÓNCANAL DE DESVIACIÓN

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 60. Intervención realizada, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer



Fuente: Propia, 2026

Registro fotográfico

Ilustración 61. Antes de la intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 62. Antes de la intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 63. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 64. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 65. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 66. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer



Fuente: Propia, 2026

En el periodo del 26 de marzo al 25 de mayo de 2026 se ejecutaron 160 horas de excavadora sobre oruga, con las que se finalizó la intervención proyectada:

Tabla 35. Maquinaria utilizada, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
3	SHANTUI SE220LC MC719388 #3	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	16/04/2026	30/04/2026	160	$ 131.200.000,00	SE REALIZA CONFORMACION JARILLLO Y CANALIZACION
						TOTAL	$ 131.200.000,00	

Fuente: Propia, 2026

Reporte diario de horas

EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MC719388 #3

Tabla 36. Reporte diario de horas excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:	SHANTUI SE220LC MC719388 #3							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
1	16/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	3927,8	3932,2	4,4	SE INICIAN ACTIVIDADES DE CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON EN HORAS DE LA TARDE SE PRESENTA CRECIENTE DEL RIO
2	17/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	3932,2	3940,2	8,0	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON
3	18/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	3940,2	3953,2	13,0	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON
4	19/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	3953,2	3963,2	10,0	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON
5	20/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	3963,2	3973,3	10,1	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON
6	21/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	3973,3	3984,7	11,4	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON
7	22/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	3984,7	3995,9	11,2	CANALIZACION Y CONFORMACION DE JARILLON

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:	SHANTUI SE220LC MC719388 #3							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
8	23/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	3995,9	4006,8	10,9	SE REALIZA REFUERSO DE JARILLLO Y SE TRASLADA LA MAQUINA AL NUEVO PUNTO TRABAJO
9	24/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	4006,8	4017,6	10,8	SE REALIZA REFUERSO DE JARILLLO Y TRABAJA LA MAQUINA EN EL NUEVO PUNTO TRABAJO
10	25/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	4017,6	4029,3	11,7	SE REALIZA REFUERSO DE JARILLLO Y SE CANALIZA EL BRAZO DEL RIO
11	26/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	4029,3	4040,5	11,2	SE REALIZA CONFORMACION JARILLLO Y SE CANALIZA EL BRAZO DEL RIO
12	27/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	4040,5	4052,0	11,5	SE REALIZA CONFORMACION JARILLLO Y CANALIZACION
13	28/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	4052,0	4063,9	11,9	SE REALIZA CONFORMACION JARILLLO Y CANALIZACION
14	29/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	4063,9	4075,7	11,8	SE REALIZA CONFORMACION JARILLLO Y CANALIZACION
15	30/04/2026	LA URIBE	VEREDA EL PLACER	ANDERSON HEREDIA	4075,7	4087,8	12,1	SE REALIZA CONFORMACION JARILLLO Y SE REALIZA MOVILIZACION DE LA MAQUINA A PUNTO DE CARGUE
						TOTAL	160,0	

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
16/04/2026	30/04/2026	3927,8	4087,8	160,0
			TOTAL	160,0

Fuente: Propia, 2026


Registro Fotográfico Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3

Ilustración 67 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer




Fuente: Propia, 2026

Ilustración 68 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer

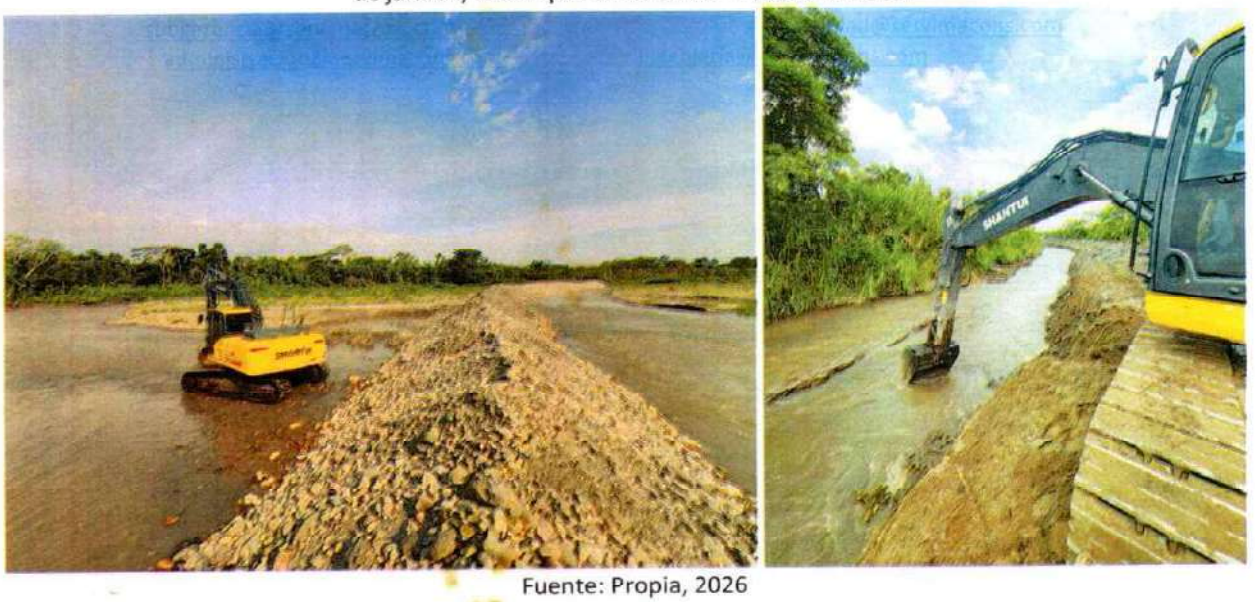

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 69 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer

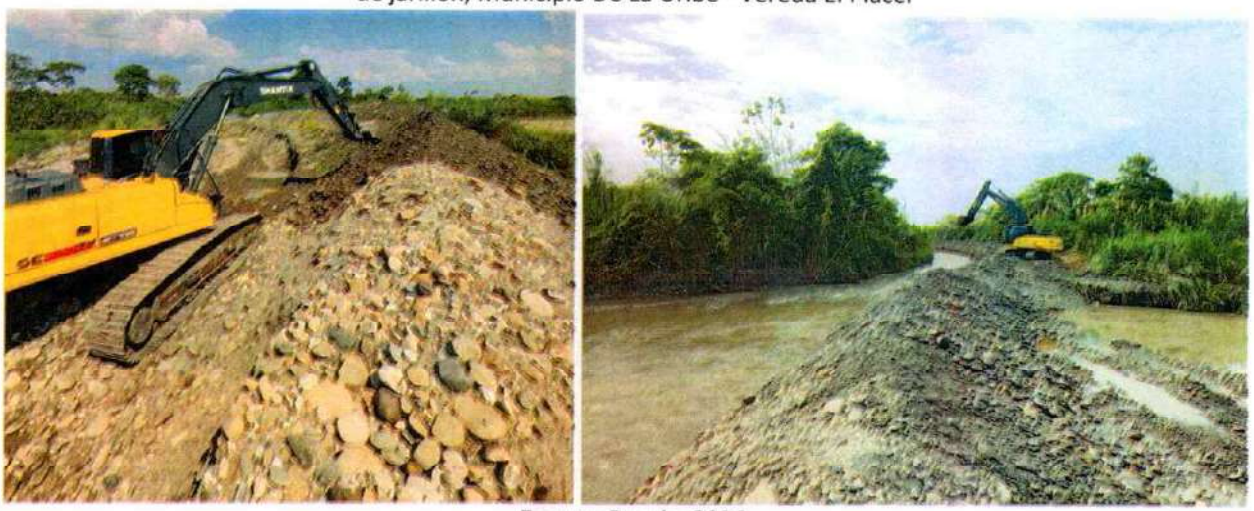

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 70 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 71 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 72 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer




Fuente: Propia, 2026

Ilustración 73 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 74 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De La Uribe - Vereda El Placer

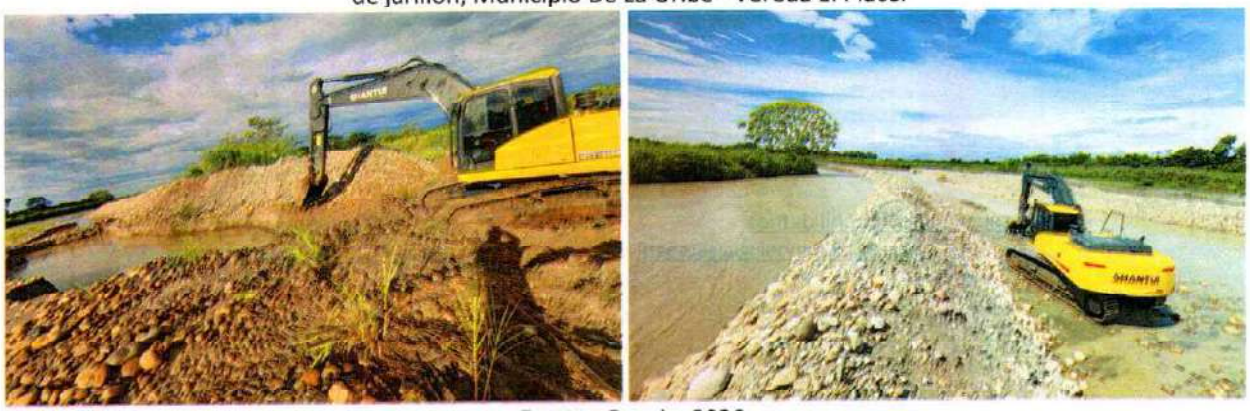

Fuente: Propia, 2026

En reunión con los ingenieros de la DIGERD, delegados de la Alcaldía Municipal, la comunidad y el contratista, se realizó un recorrido en el punto afectado ubicado en la vía de la vereda Los Planes, municipio de La Uribe. Durante la inspección se evidenció que un tramo de la vía presenta inestabilidad y perdida de la banca, lo que limita la movilidad y por tanto requiere rehabilitación.

En común acuerdo entre las partes, se definió los trabajos a realizar los cuales consisten en la rehabilitación del tramo afectado, ejecutando actividades de conformación y recuperación de la calzada, además de la disminución de la pendiente de la vía con el fin de mejorar la movilidad.

Para lo anterior la DIGERD asignó un total de ciento diez horas (110) horas de excavadora. Definida la intervención, se trasladó la maquinaria al sitio y se iniciaron las labores correspondientes. Durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2026 y el 25 de mayo de 2026, se ejecutaron la totalidad de las horas cumpliendo a satisfacción con los trabajos planteados y rehabilitando un tramo mayor del inicialmente planteado.

Ilustración 75. Propuesta de intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes



Fuente: Propia, 2026

Tabla 37. Propuesta de intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes

ACTIVIDADES PROPUESTAS					
DESCRIPCIÓN	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	LONGITUD	ANCHO	OBSERVACIONES
REHABILITACIÓN DE LA VÍA	3°17'21.01"N 74°23'16.51"O	3°17'15.16"N 74°23'17.84"O	190M	VARIABLE	REHABILITACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA VÍA

MAQUINARIA REQUERIDA			
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MÁQUINAS
3	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HORA	1

Fuente: Propia, 2026


Los trabajos realizados presentan las siguientes características:

Tabla 38. Actividades ejecutadas Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes

ACTIVIDADES REALIZADAS					
DESCRIPCIÓN	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	LONGITUD	ANCHO	OBSERVACIONES
REHABILITACIÓN DE LA VÍA	3°17'22.06"N 74°23'14.84"O	3°17'12.10"N 74°23'19.17"O	400M	VARIABLE	REHABILITACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA VÍA

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 76. Actividades realizadas, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes

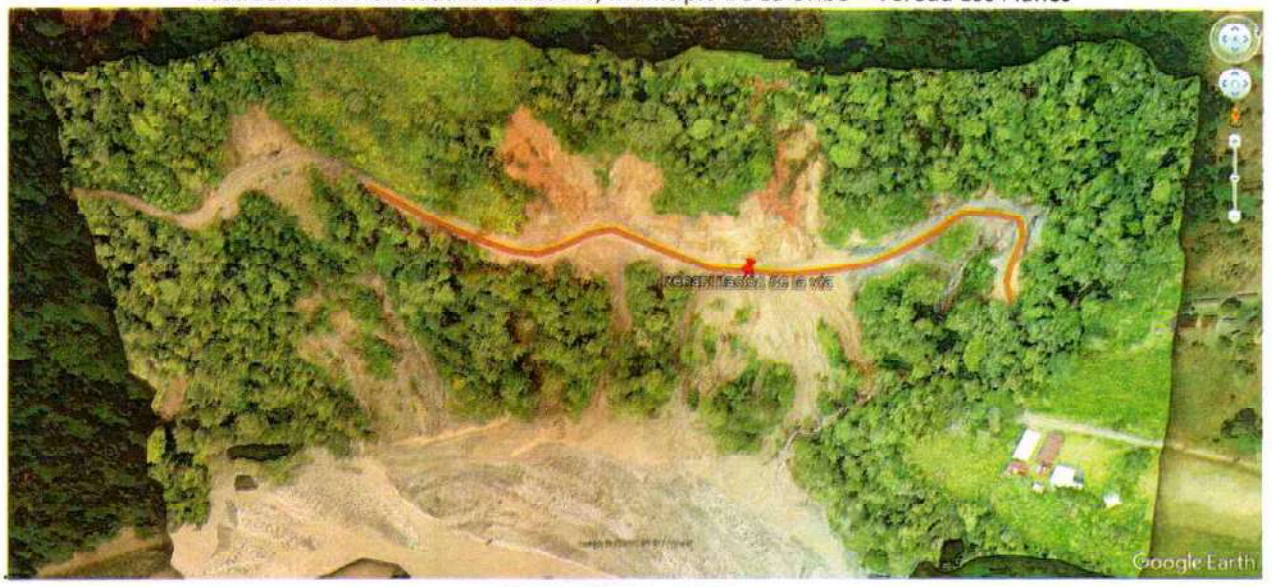

Fuente: Propia, 2026


Registro Fotográfico

Ilustración 77. Previo a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 78. Previo a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes

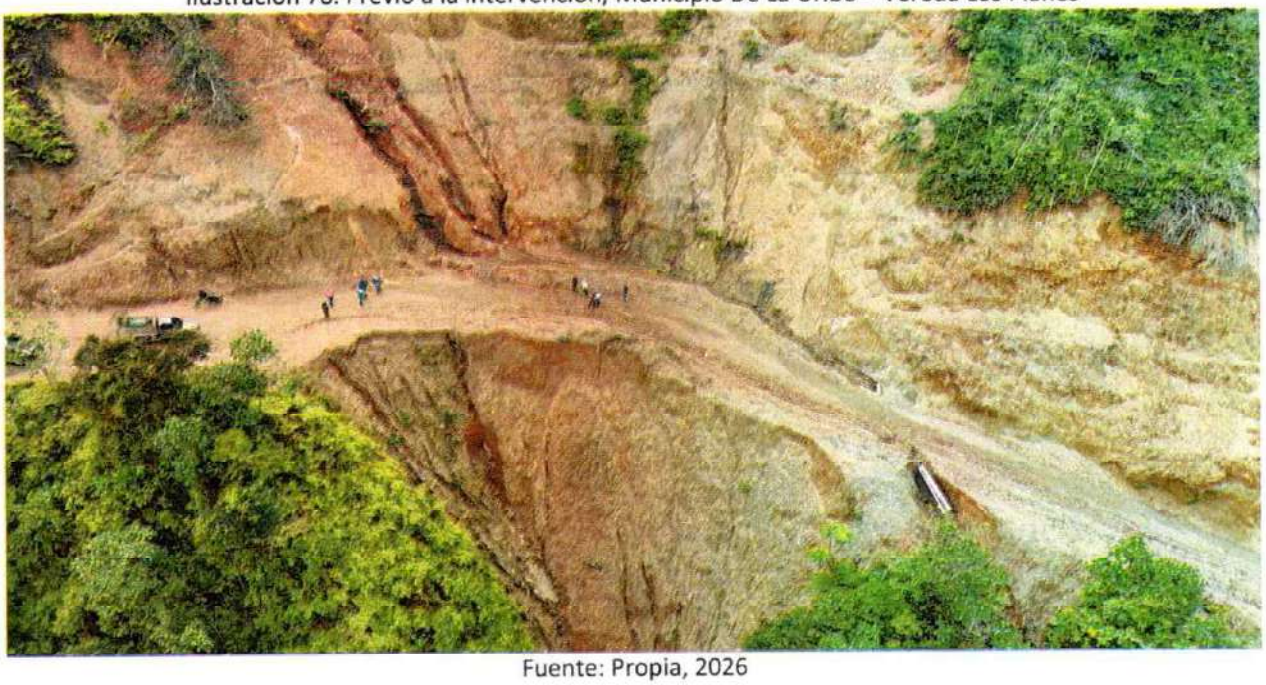

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 79. Previo a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 80. Previo a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 81. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 82. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 83. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 84. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 85. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 86. Posterior a la intervención, Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes



Fuente: Propia, 2026

En el presente periodo se ejecutó la totalidad de horas asignadas a este punto, es decir 110 horas de excavadora, con la siguiente maquinaria:

Tabla 39. Maquinaria utilizada – Municipio De La Uribe – Vereda Los Planes

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
3	SHANTUI SE220LC MC719388 #3	LA URIBE	VEREDA PLANES	06/05/2026	17/05/2026	110	$ 90.200.000,00	SE REALIZA REMOCION DE MATERIAL POR DERRUMBE PARA APERTURA Y HABLITACION DE VIA
						TOTAL	**$ 90.200.000,00**	

Fuente: Propia, 2026

Reporte diario de horas

EXCAVADORA SHANTUI SE220LC MC719388 #3

Tabla 40. Reporte diario de horas excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:	SHANTUI SE220LC MC719388 #3							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
1	06/05/2026	LA URIBE	VEREDA PLANES	ANDERSON HEREDIA	4085,1	4087,3	2,2	SE INICIAN ACTIVIDADES DE REMOCION DE MATERIAL POR DERRUMBE PARA APERTURA Y HABLITACION DE VIA
2	07/05/2026	LA URIBE	VEREDA PLANES	ANDERSON HEREDIA	4087,3	4097,4	10,1	SE REALIZA REMOCION DE MATERIAL POR DERRUMBE PARA APERTURA Y HABLITACION DE VIA
3	08/05/2026	LA URIBE	VEREDA PLANES	ANDERSON HEREDIA	4097,4	4105,4	8,0	SE REALIZA REMOCION DE MATERIAL POR DERRUMBE PARA APERTURA Y HABLITACION DE VIA
4	09/05/2026	LA URIBE	VEREDA PLANES	ANDERSON HEREDIA	4105,4	4116,7	11,3	SE REALIZA REMOCION DE MATERIAL POR DERRUMBE PARA APERTURA Y HABLITACION DE VIA
5	10/05/2026	LA URIBE	VEREDA PLANES	ANDERSON HEREDIA	4116,7	4128,1	11,4	SE REALIZA REMOCION DE MATERIAL POR DERRUMBE PARA APERTURA Y HABLITACION DE VIA

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:	SHANTUI SE220LC MC719388 #3							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
6	11/05/2026	LA URIBE	VEREDA PLANES	ANDERSON HEREDIA	4128,1	4139,5	11,4	SE REALIZA REMOCION DE MATERIAL POR DERRUMBE PARA APERTURA Y HABLITACION DE VIA
7	12/05/2026	LA URIBE	VEREDA PLANES	ANDERSON HEREDIA	4139,5	4150,4	10,9	SE REALIZA REMOCION DE MATERIAL POR DERRUMBE PARA APERTURA Y HABLITACION DE VIA
8	13/05/2026	LA URIBE	VEREDA PLANES	ANDERSON HEREDIA	4150,4	4159,6	9,2	SE REALIZA MEJORAMIENTO DE LA VIA Y REMOCION DEL DERRUMBE
9	14/05/2026	LA URIBE	VEREDA PLANES	ANDERSON HEREDIA	4159,6	4170,8	11,2	SE REALIZA MEJORAMIENTO DE LA VIA Y REMOCION DEL DERRUMBE
10	15/05/2026	LA URIBE	VEREDA PLANES	ANDERSON HEREDIA	4170,8	4180,8	10,0	SE REALIZA MEJORAMIENTO DE LA VIA Y REMOCION DEL DERRUMBE
11	16/05/2026	LA URIBE	VEREDA PLANES	ANDERSON HEREDIA	4180,8	4189,1	8,3	SE REALIZA MEJORAMIENTO DE LA VIA Y REMOCION DEL DERRUMBE
12	17/05/2026	LA URIBE	VEREDA PLANES	ANDERSON HEREDIA	4189,1	4195,1	6,0	SE REALIZA MEJORAMIENTO DE LA VIA Y REMOCION DEL DERRUMBE
						TOTAL	110,0	

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
06/05/2026	17/05/2026	4085,1	4195,1	110,0
			TOTAL	110,0

Fuente: Propia, 2026

Registro Fotográfico Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3

Ilustración 87 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de rehabilitación de vía, Municipio De La Uribe - Vereda Los Planes




Fuente: Propia, 2026

Ilustración 88 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de rehabilitación de vía, Municipio De La Uribe - Vereda Los Planes




Fuente: Propia, 2026

Ilustración 89 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de rehabilitación de vía, Municipio De La Uribe - Vereda Los Planes

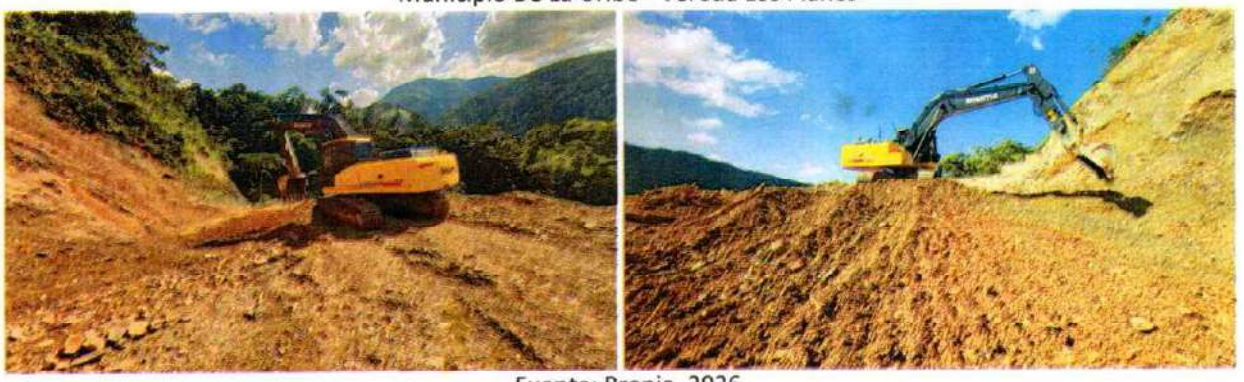

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 90 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de rehabilitación de vía, Municipio De La Uribe - Vereda Los Planes

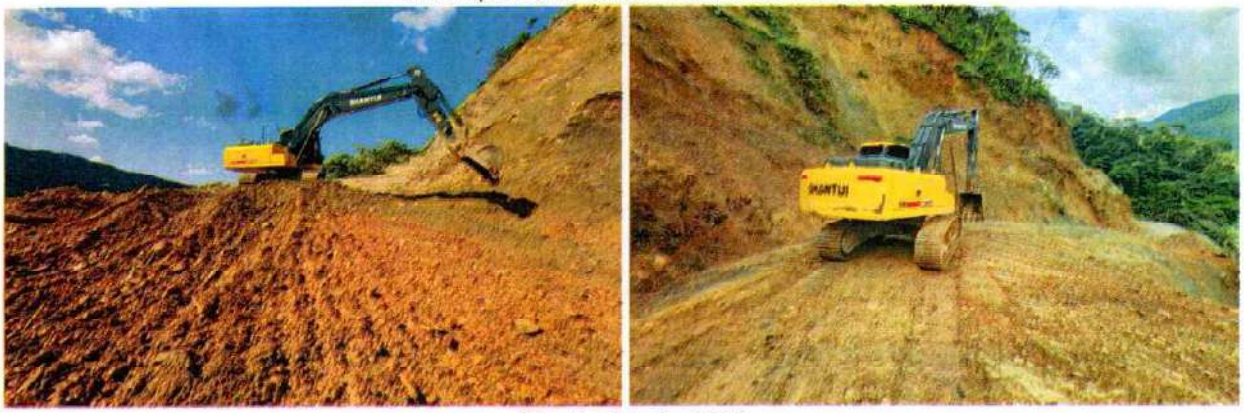

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 91 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de rehabilitación de vía, Municipio De La Uribe - Vereda Los Planes



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 92 . Excavadora Shantui SE220LC MC719388 #3 realizando actividades de rehabilitación de vía, Municipio De La Uribe - Vereda Los Planes



Fuente: Propia, 2026

En reunión con los ingenieros de la DIGERD, delegados de la alcaldía, la comunidad y el contratista se realiza recorrido en el punto afectado ubicado en la vereda Guapaya Medio, municipio de Vista Hermosa. Se evidencia como el caño Guapaya en eventos de crecientes ha afectado el estribo y el aproche derecho del puente En común acuerdo se define realizar un canal central y con el material resultante de la excavación conformar un Jarillón de protección sobre el costado derecho de tal forma que se proteja el estribo y se mitigue el daño.

Para lo anterior la DIGERD asignó un total de doscientas veinte (220) horas de excavadora. Definida la intervención, se trasladó la maquinaria al sitio y se iniciaron las labores correspondientes. Durante el periodo correspondiente del 26 de marzo al 25 de mayo de 2026 se dio inicio y finalización a las labores ejecutadas con una excavadora sobre oruga en el sector de Guapaya Medio, sobre el caño Guapaya, en el municipio de Vista Hermosa.

En el periodo reportado se registró un total de 220 horas de excavadora sobre oruga de 20 ton. Mediante la ejecución de estas actividades se logró la protección de la margen derecha, frenando el proceso de socavación que amenazaba la estructura de la aleta y el aproche del puente. Para esto, se realizó un canal central y un Jarillón de protección sobre la margen afectada.

Ilustración 93. Propuesta de intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Tabla 41. Propuesta de intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio


ACTIVIDADES PROPUESTAS					
DESCRIPCIÓN	**COORDENADA DE INICIO**	**COORDENADA FINAL**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**OBSERVACIONES**
JARILLÓN No.1	3°44'48.62"N 73°50'8.48"O	3°44'45.99"N 73°50'12.23"O	140M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN
JARILLÓN No.3	3°44'52.91"N 73°50'4.52"O	3°44'51.49"N 73°50'6.67"O	80M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN

MAQUINARIA REQUERIDA			
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD DE MÁQUINAS**
3	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HORA	1

Fuente: Propia, 2026

Los trabajos realizados presentan las siguientes características:

Ilustración 94. Intervención realizada, Municipio Vista Hermosa – Guapayo Medio.

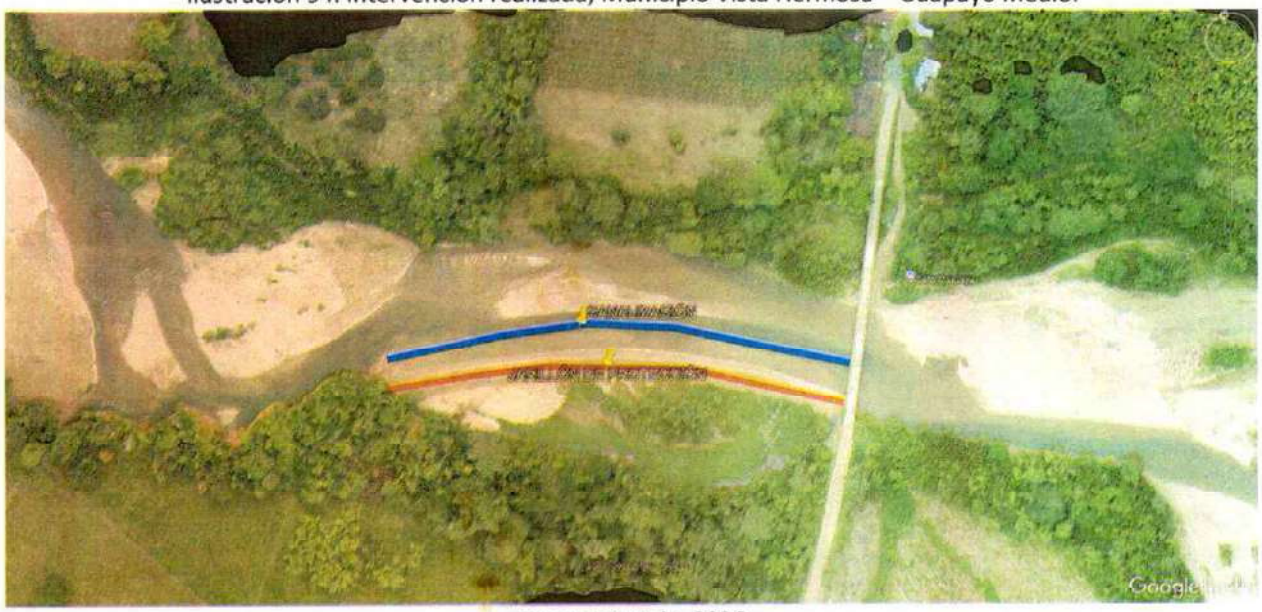

Fuente: Propia, 2026

Tabla 42. Intervención realizada – Municipio El Castillo– Vereda El Jardin, río Cumaral.

ACTIVIDADES REALIZADAS					
DESCRIPCIÓN	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	LONGITUD	ANCHO	OBSERVACIONES
JARILLÓN DE CIERRE	3° 2'37.01"N 73°49'38.77"O	3° 2'39.32"N 73°49'46.14"O	245M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN
CANALIZACIÓN	3° 2'37.68"N 73°49'38.50"O	3° 2'39.89"N 73°49'45.99"O	245M	VARIABLE	CONFORMACIÓN CANAL CENTRAL

Fuente: Propia, 2026

Registro fotográfico

Ilustración 95. Antes de la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 96. Antes de la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 97. Antes de la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 98. Antes de la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio




Fuente: Propia, 2026

Ilustración 99. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 100. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio

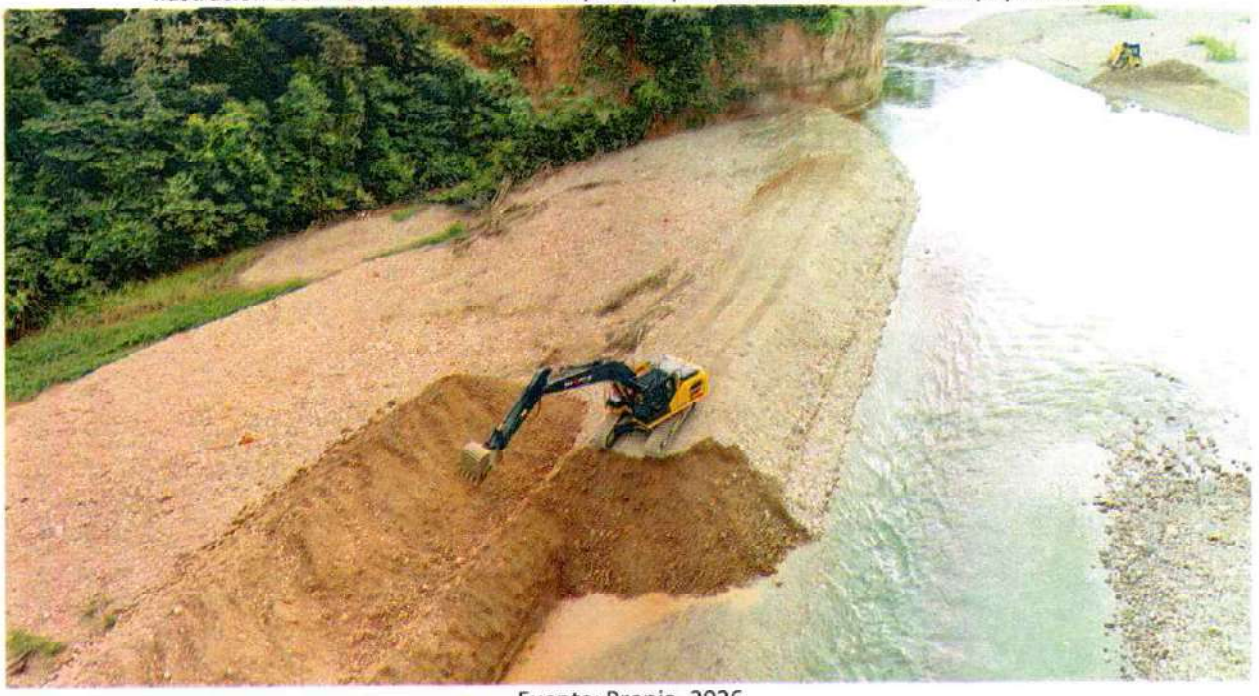

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 101. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 102. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 103. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 104. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 105. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 106. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio




Fuente: Propia, 2026

Ilustración 107. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio




Fuente: Propia, 2026

Ilustración 108. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio

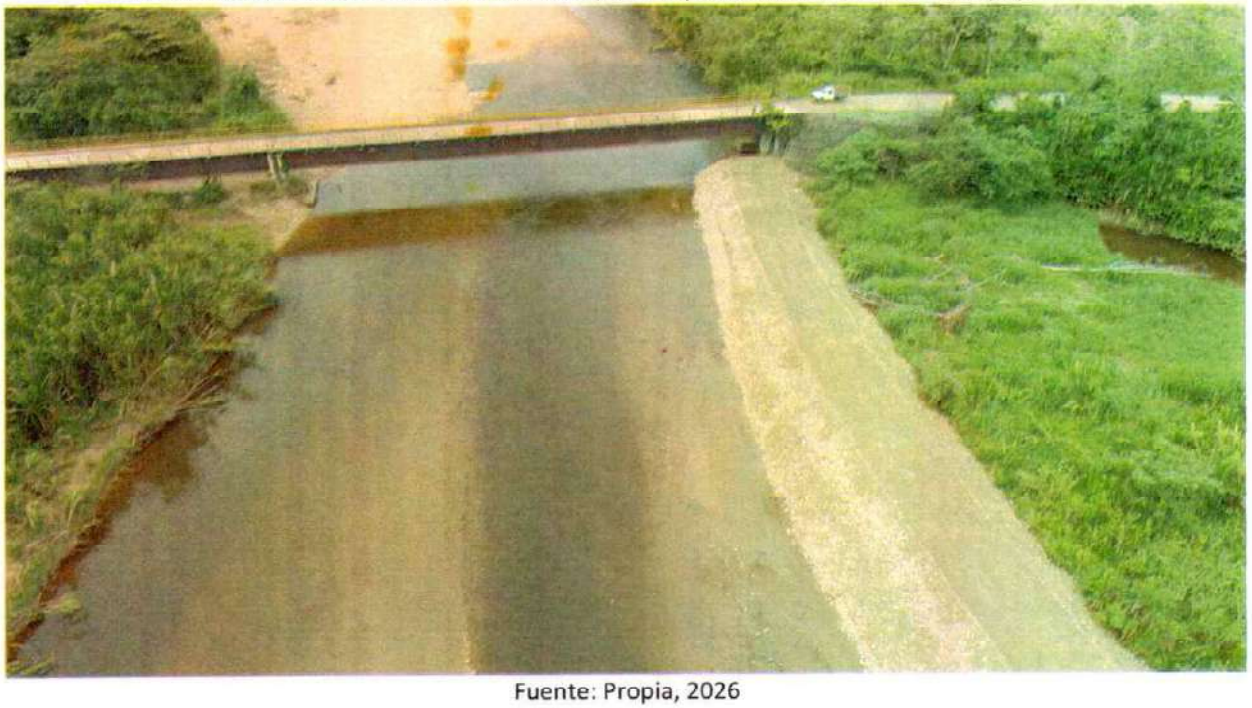

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 109. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio

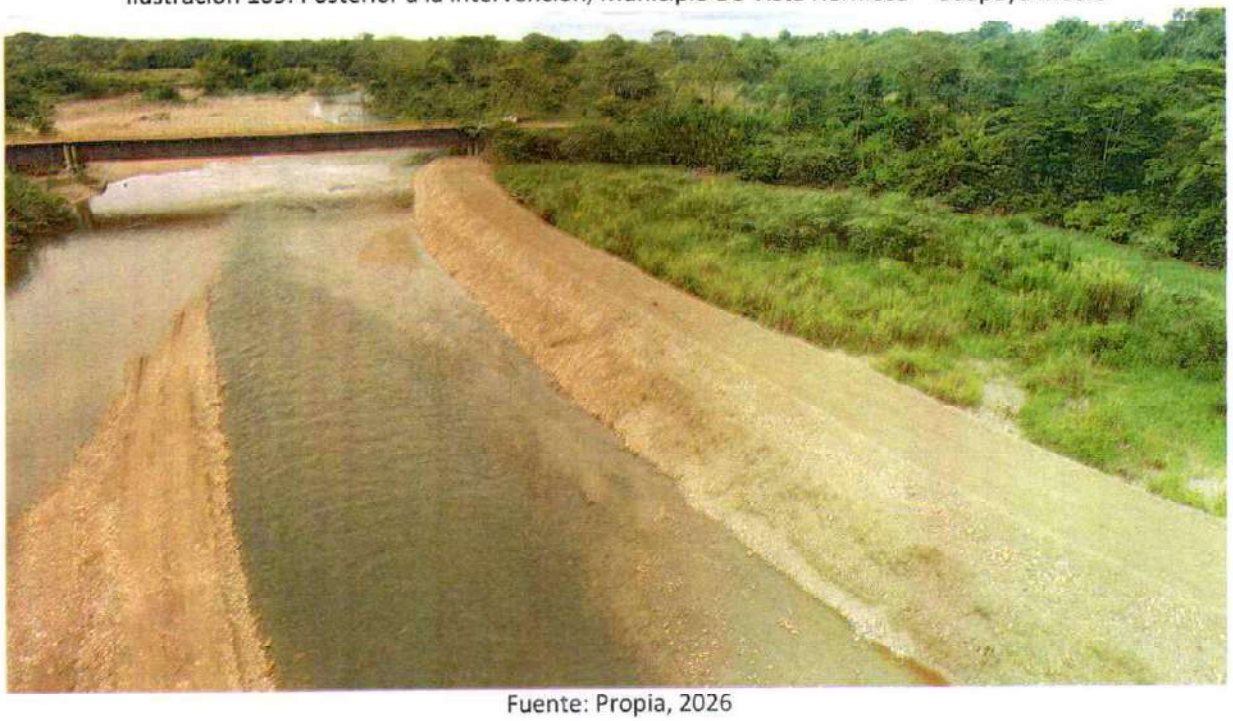

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 110. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 111. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

En el periodo del 26 de marzo al 25 de mayo del 2026 se ejecutaron 220 horas, con la siguiente maquinaria:

Tabla 43. Maquinaria utilizada, Municipio Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio

ITEM	DESCRIPCIÓN/ MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
3	SHANTUI SE215 MC765198#4	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	21/04/2026	15/05/2026	220	$ 180.400.000,00	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
						TOTAL	$ 180.400.000,00	

Fuente: Propia, 2026

Reporte diario de horas

EXCAVADORA SHANTUI SE215 MC765198#4

Tabla 44. Reporte diario de horas excavadora Shantui SE215 MC765198#4

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:	SHANTUI SE215 MC765198#4							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
1	21/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	7,1	14,6	7,5	SE DESPLAZA LA MAQUINA Y SE REALIZA CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
2	22/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	14,6	26,4	11,8	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
3	23/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	26,4	26,4	0,0	NO SE TRABAJA POR CRECIENTE EN EL RIO
4	24/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	26,4	29,4	3,0	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
5	25/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	29,4	36,4	7,0	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
6	26/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	36,4	36,4	0,0	NO SE TRABAJA POR DIA DESCANSO
7	27/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	36,4	47,4	11,0	CONFORMACION DE JARILLON
8	28/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	47,4	59,2	11,8	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:	SHANTUI SE215 MC765198#4							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
9	29/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	59,2	71,0	11,8	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
10	30/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	71,0	82,8	11,8	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
11	1/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	82,8	94,6	11,8	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
12	2/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	94,6	106,4	11,8	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
13	3/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	106,4	116,0	9,6	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
14	4/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	116,0	127,1	11,1	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
15	5/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	127,1	138,9	11,8	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
16	6/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	138,9	138,9	0,0	NO ES POSIBLE TRABAJAR POR CRECIENTE DEL RIO
17	7/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	138,9	150,7	11,8	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA
18	8/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	150,7	162,6	11,9	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA Y SE TRASPALEO JARILLON
19	9/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	162,6	172,6	10,0	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA Y SE TRASPALEO JARILLON
20	10/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	172,6	172,6	0,0	NO SE TRABAJO POR DIA DE DESCANSO
21	11/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	172,6	184,4	11,8	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA Y SE HACE REFUERZO DEL JARILLON
22	12/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	184,4	196,2	11,8	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA Y SE HACE REFUERZO DEL JARILLON

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:	SHANTUI SE215 MC765198#4							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
23	13/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	196,2	207,1	10,9	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA Y SE HACE REFUERZO DEL JARILLON
24	14/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	207,1	217,5	10,4	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA Y SE HACE REFUERZO DEL JARILLON
25	15/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA MEDIO	JUAN MONTENEGRO	217,5	227,1	9,6	CONFORMACION DE JARILLON SOBRE LA MARGEN DERECHA Y SE HACE REFUERZO DEL JARILLON
						TOTAL	220,0	

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
21/04/2026	15/05/2026	7,1	227,1	220,0
			TOTAL	220,0

Fuente: Propia, 2026

Registro Fotográfico Excavadora Shantui SE215 MC765198#4

Ilustración 112 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 113 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 114 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 115 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de canalización y conformación de Jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 116 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de canalización y conformación de Jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 117 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 118 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de canalización y conformación de Jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 119 . Excavadora Shantui SE215 MC765198#4 realizando actividades de canalización y conformación de Jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Medio



Fuente: Propia, 2026

MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA – GUAPAYA BAJO, CAÑO GUAPAYA

En reunión con los ingenieros de la DIGERD, delegados de la Alcaldía Municipal, la comunidad y el contratista, se realizó un recorrido en el punto afectado ubicado en la vereda Guapaya Bajo, municipio de Vista Hermosa. Durante la inspección se evidenció que el caño Guapaya, en eventos de creciente, afecta el costado derecho, presentando desbordamientos que ocasionan afectaciones en los cultivos y en la vía del sector.

En común acuerdo entre las partes, se definió la conformación de un canal que permitiera centrar el flujo del caño y evitar su desbordamiento sobre la margen derecha, con el fin de mitigar las afectaciones generadas durante temporadas de lluvia y crecientes.
Para lo anterior la DIGERD asignó un total de doscientas veinte (220) horas de excavadora. Definida la intervención, se trasladó la maquinaria al sitio y se iniciaron las labores correspondientes. Durante el periodo del 26 de marzo al 25 de mayo de 2026 se iniciaron y finalizaron las labores ejecutadas con una excavadora sobre oruga de 20ton en el caño Guapaya, en el sector de Guapaya Baja, jurisdicción del municipio de Vista Hermosa.

En el periodo reportado se registró un total de 220 horas de excavadora sobre oruga. Mediante la ejecución de estas actividades se logró la protección de la margen afectada, con la conformación de dos canales que centraron el cauce del caño, evitando el impacto del agua sobre la zona en riesgo y mitigando el riesgo de inundación.

Ilustración 120. Propuesta de intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Tabla 45. Propuesta de intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo


ACTIVIDADES PROPUESTAS					
DESCRIPCIÓN	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	LONGITUD	ANCHO	OBSERVACIONES
CANALIZACIÓN	3° 0'51.76"N 73°47'33.17"O	3° 0'47.57"N 73°47'37.11"O	180M	VARIABLE	CONFORMACIÓN CANAL CENTRAL

MAQUINARIA REQUERIDA			
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MÁQUINAS
3	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HORA	1

Fuente: Propia, 2026

Los trabajos realizados presentan las siguientes características:

Ilustración 121. Intervención realizada, Municipio de Vista Hermosa – Guapaya Bajo.

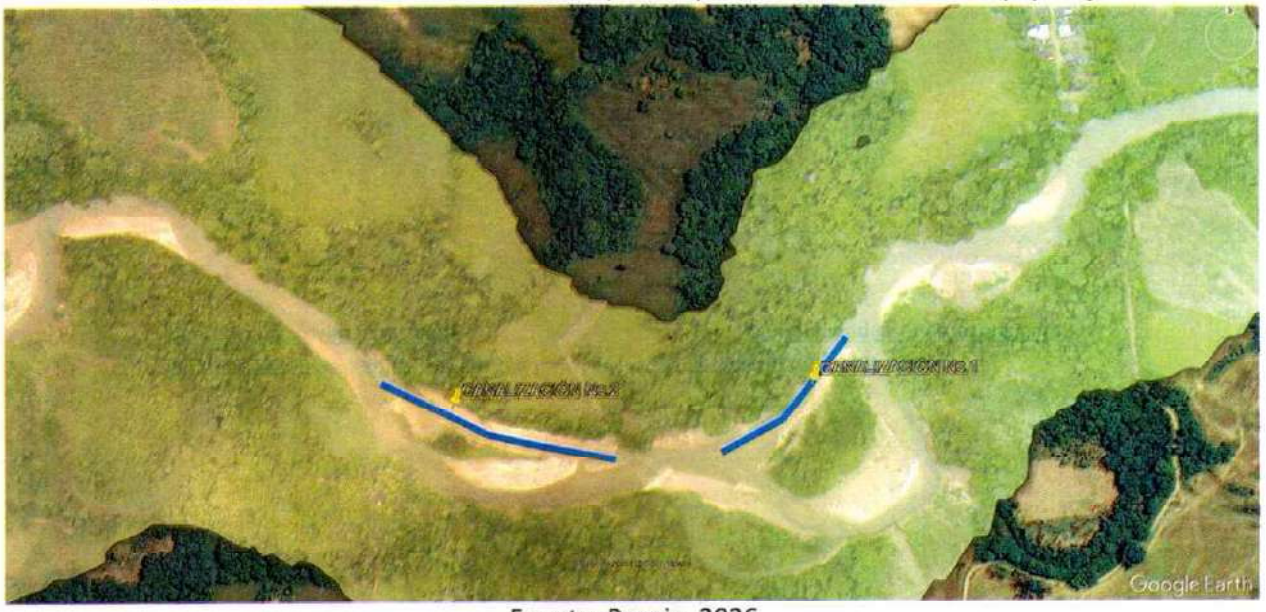

Fuente: Propia, 2026

Tabla 46. Intervención realizada – Municipio de Vista Hermosa – Guapaya Bajo.

ACTIVIDADES REALIZADAS					
DESCRIPCIÓN	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	LONGITUD	ANCHO	OBSERVACIONES
CANALIZACIÓN No.1	3° 0'52.64"N 73°47'33.83"O	3° 0'48.88"N 73°47'38.01"O	170M	VARIABLE	CONFORMACIÓN DE CANAL PARA CENTRAR EL CAUCE
CANALIZACIÓN No.2	3° 0'48.75"N 73°47'41.56"O	3° 0'51.55"N 73°47'49.29"O	250M	VARIABLE	CONFORMACIÓN DE CANAL PARA CENTRAR EL CAUCE

Fuente: Propia, 2026

Registro fotográfico

Ilustración 122. Antes de la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 123. Antes de la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 124. Antes de la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 125. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 126. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 127. Durante la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 128. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 129. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 130. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 131. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo




Fuente: Propia, 2026

Ilustración 132. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 133. Posterior a la intervención, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo

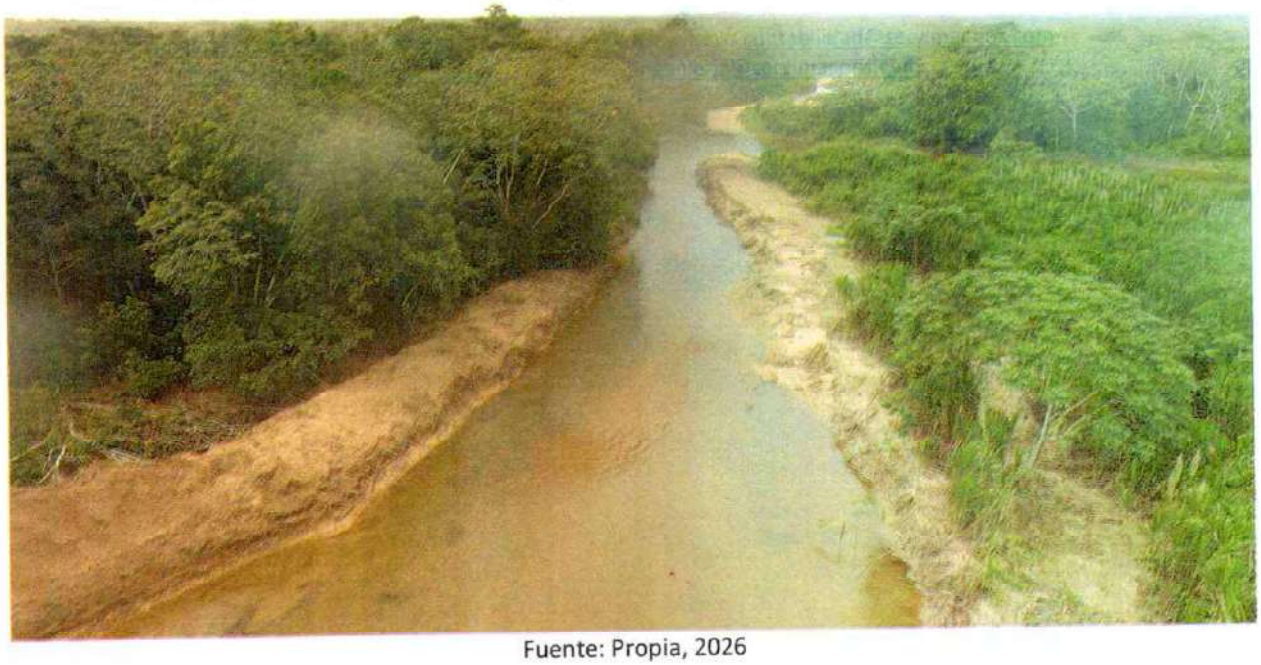

Fuente: Propia, 2026

Durante el periodo del presente informe se ejecutaron 220 horas de excavadora, realizadas con la siguiente maquinaria:

Tabla 47. Maquinaria utilizada, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
3	SHANTUI SE215 MC765197#5	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	21/04/2026	15/05/2026	220	$ 180.400.000,00	SE REALIZA CANALIZACIÓN DEL RIO
						TOTAL	$ 180.400.000,00	

Fuente: Propia, 2026

Reporte diario de horas

EXCAVADORA SHANTUI SE215 MC765197#5

Tabla 48. Reporte diario de horas excavadora Shantui SHANTUI SE215 MC765197#5

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:	SHANTUI SE215 MC765197#5							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
1	21/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	8,4	14,2	5,8	SE DESPLAZA LA MAQUINA Y SE REALIZA CONFORMACION DE JARILLON
2	22/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	14,2	25,5	11,3	SE REALIZA CONFORMACION DE JARILLON
3	23/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	25,5	26,6	1,1	SE MOVILIZA LA MAQUIONA POR CRECIENTE DEL RIO
4	24/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	26,6	26,6	0,0	NO SE TRABAJA POR CRECIENTE DEL RIO Y CAÑOS
5	25/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	26,6	26,6	0,0	NO SE TRABAJA POR CRECIENTE DEL RIO Y CAÑOS
6	26/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	26,6	26,6	0,0	NO SE TRABAJA DIA DE DESCANSO
7	27/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	26,6	38,2	11,6	SE PROCEDE A CANALIZAR
8	28/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	38,2	50,0	11,8	SE PROCEDE A CANALIZAR
9	29/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	50,0	61,3	11,3	SE PROCEDE A CANALIZAR
10	30/04/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	61,3	73,1	11,8	SE PROCEDE A CANALIZAR
11	1/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	73,1	84,3	11,2	SE PROCEDE A CANALIZAR EL RIO

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:	SHANTUI SE215 MC765197#5							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
12	2/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	84,3	95,7	11,4	SE PROCEDE A CANALIZAR EL RIO
13	3/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	95,7	107,5	11,8	SE PROCEDE A CANALIZAR EL RIO
14	4/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	107,5	119,1	11,6	SE PROCEDE A CANALIZAR EL RIO
15	5/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	119,1	130,8	11,7	SE PROCEDE A CANALIZAR EL RIO
16	6/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	130,8	130,8	0,0	NO SE TRABAJA POR CRECIENTE DEL RIO Y CAÑOS
17	7/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	130,8	134,8	4,0	SE PROCEDE A CANALIZAR EL RIO
18	8/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	134,8	146,8	12,0	SE PROCEDE A CANALIZAR EL RIO
19	9/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	146,8	158,6	11,8	SE PROCEDE A CANALIZAR EL RIO
20	10/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	158,6	170,0	11,4	SE REALIZA CANALIZACIÓN DEL RIO
21	11/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	170,0	181,4	11,4	SE PROCEDE A CANALIZAR EL RIO
22	12/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	181,4	193,3	11,9	SE PROCEDE A CANALIZAR EL RIO
23	13/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	193,3	205,2	11,9	SE PROCEDE A CANALIZAR EL RIO
24	14/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	205,2	217,0	11,8	SE PROCEDE A CANALIZAR EL RIO
25	15/05/2026	VISTA HERMOSA	GUAPAYA BAJO	ALEX AYA	217,0	228,4	11,4	SE PROCEDE A CANALIZAR EL RIO
						TOTAL	220,0	

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
21/04/2026	15/05/2026	8,4	228,4	220,0
			TOTAL	220,0

Fuente: Propia, 2026

Registro Fotográfico Excavadora Shantui SE215 MC765197#5

Ilustración 134 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 135 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 136 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 137 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 138 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 139 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 140 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 141 . Excavadora Shantui SE215 MC765197#5 realizando actividades de canalización y conformación de jarillón, Municipio De Vista Hermosa – Guapaya Bajo



Fuente: Propia, 2026

MUNICIPIO DE CABUYARO – VISO DE UPIA, RIO UPIA

El día 30 de abril de 2026, en Viso de Upia, ubicado en el municipio de Cabuyaro, se realizó recorrido técnico en el punto de afectación ubicado en la margen izquierda del rio Upia, con la participación de ingenieros de la DIGERD, el contratista, delegados de la Alcaldía y miembros de la comunidad. Durante la visita se evidenció que el impacto continuo del río Upia sobre la margen izquierda ha generado procesos de socavación e inundaciones en los predios cercanos al rio.

Con el fin de mitigar las afectaciones y reducir el riesgo, se acordó la conformación de un jarillón de protección, orientado a impedir el paso del agua hacia el área afectada. Para la ejecución de esta intervención, la DIGERD asignó 75 horas de excavadora de 20 toneladas.

Definida la intervención, se trasladó la maquinaria al sitio y se iniciaron las labores correspondientes. Durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2026 y el 25 de mayo de 2026, se ejecutaron la totalidad de horas maquina, con las cuales se logró desarrollar el trabajo proyectado. Adicionalmente, se construyeron ciento sesenta metros (160) de Jarillón complementarios, para un total de setecientos noventa (790) metros de Jarillón de protección, los cuales permiten mitigar la afectación y brindar protección a los predios impactados por la dinámica del río.


Tabla 49. Propuesta de intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.

ACTIVIDADES PROPUESTAS					
DESCRIPCIÓN	**COORDENADA DE INICIO**	**COORDENADA FINAL**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**OBSERVACIONES**
JARILLÓN DE PROTECCIÓN	4°22'55.47"N 72°48'28.68"O	4°23'9.43"N 72°48'45.19"O	630M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN

MAQUINARIA REQUERIDA			
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MÁQUINAS
3	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HORA	1

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 142. Propuesta de intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.

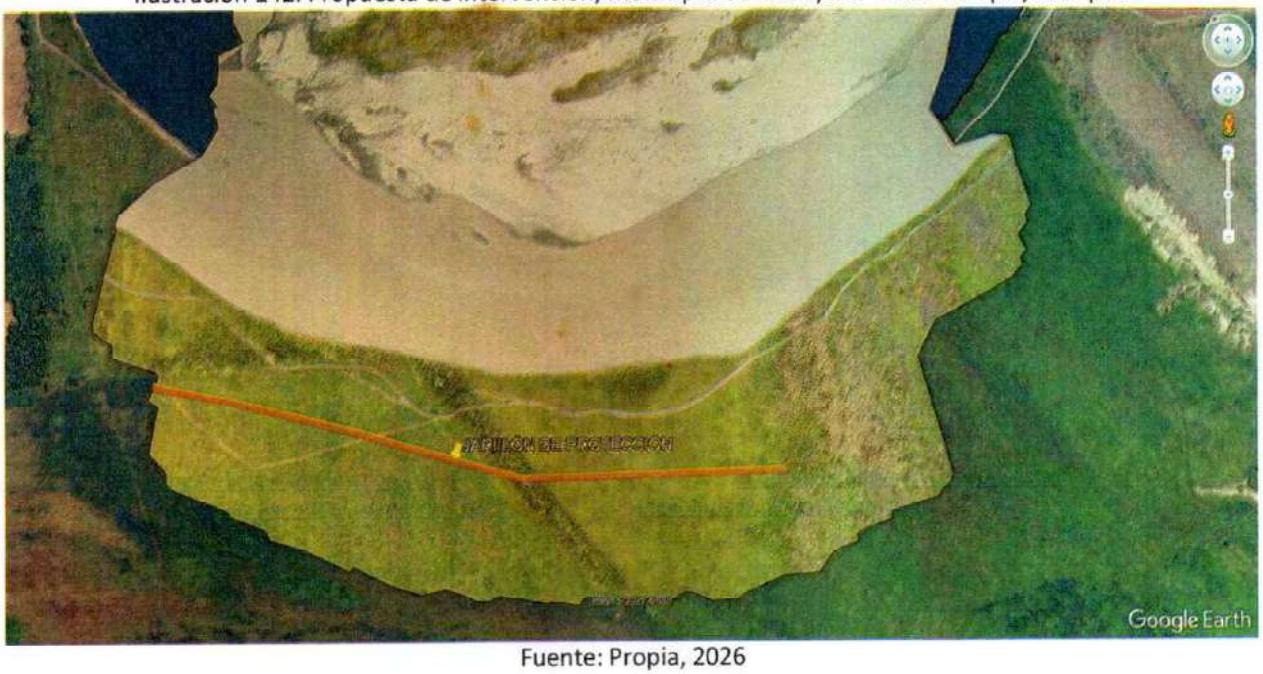

Fuente: Propia, 2026

Con la intervención realizada se logró conformar un Jarillón de protección con las siguientes características:

Tabla 50. Iintervención realizada, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.

ACTIVIDADES REALIZADAS					
DESCRIPCIÓN	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	LONGITUD	ANCHO	OBSERVACIONES
JARILLÓN DE PROTECCIÓN	4°22'55.31"N 72°48'29.15"O	4°23'13.38"N 72°48'46.57"O	790M	VARIABLE	CONFORMACIÓN JARILLÓN DE PROTECCIÓN

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 143. Intervención realizada, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.



Fuente: Propia, 2026

Registro fotográfico

Ilustración 144. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.




Fuente: Propia, 2026

Ilustración 145. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 146. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.

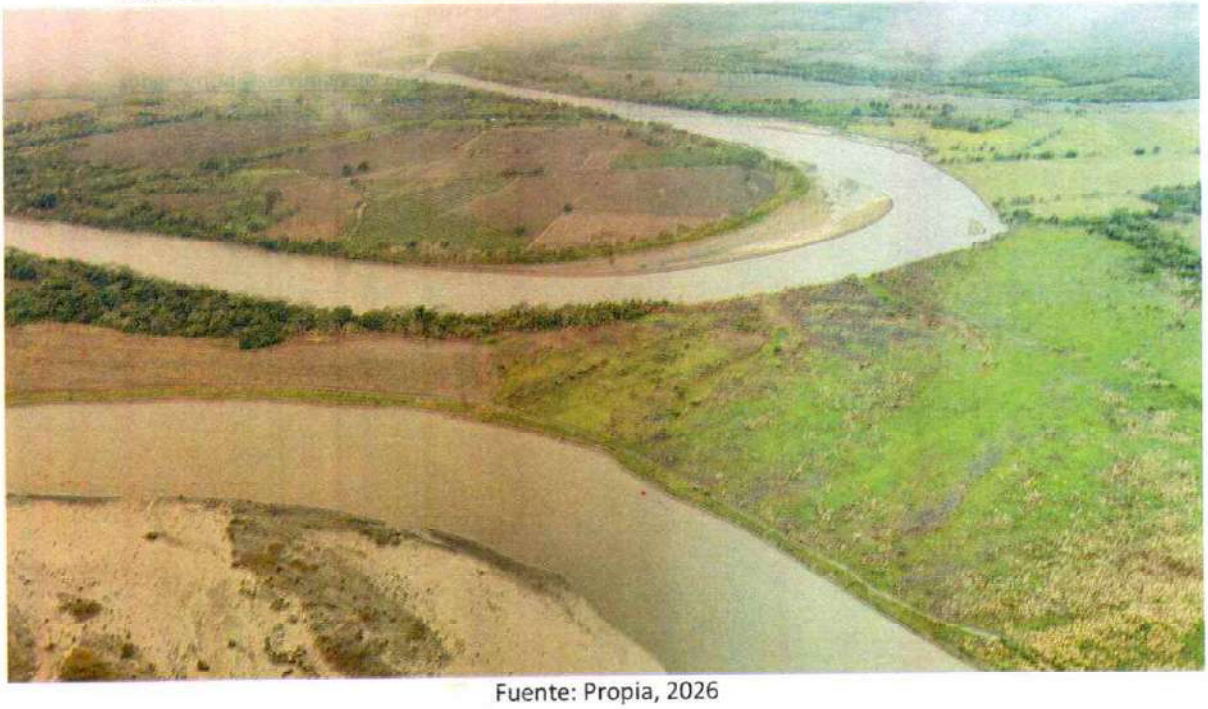

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 147. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.




Fuente: Propia, 2026

Ilustración 148. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 149. Posterior a la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.

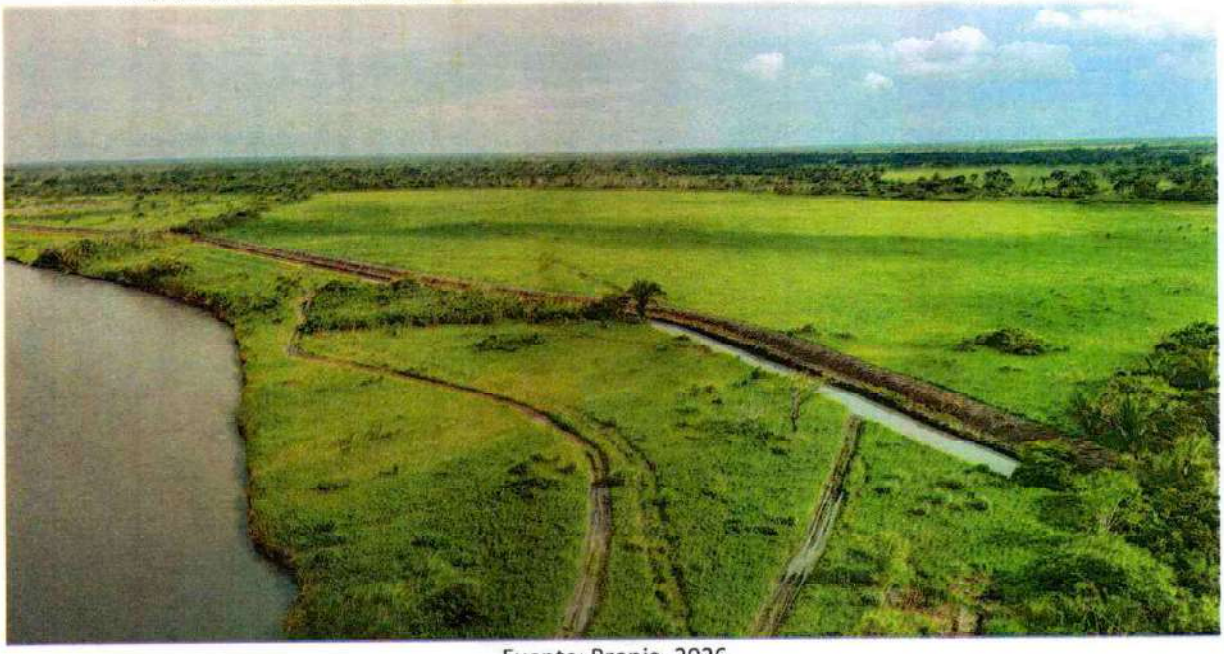

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 150. Posterior a la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.




Fuente: Propia, 2026

Ilustración 151. Posterior a la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 152. Posterior a la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.

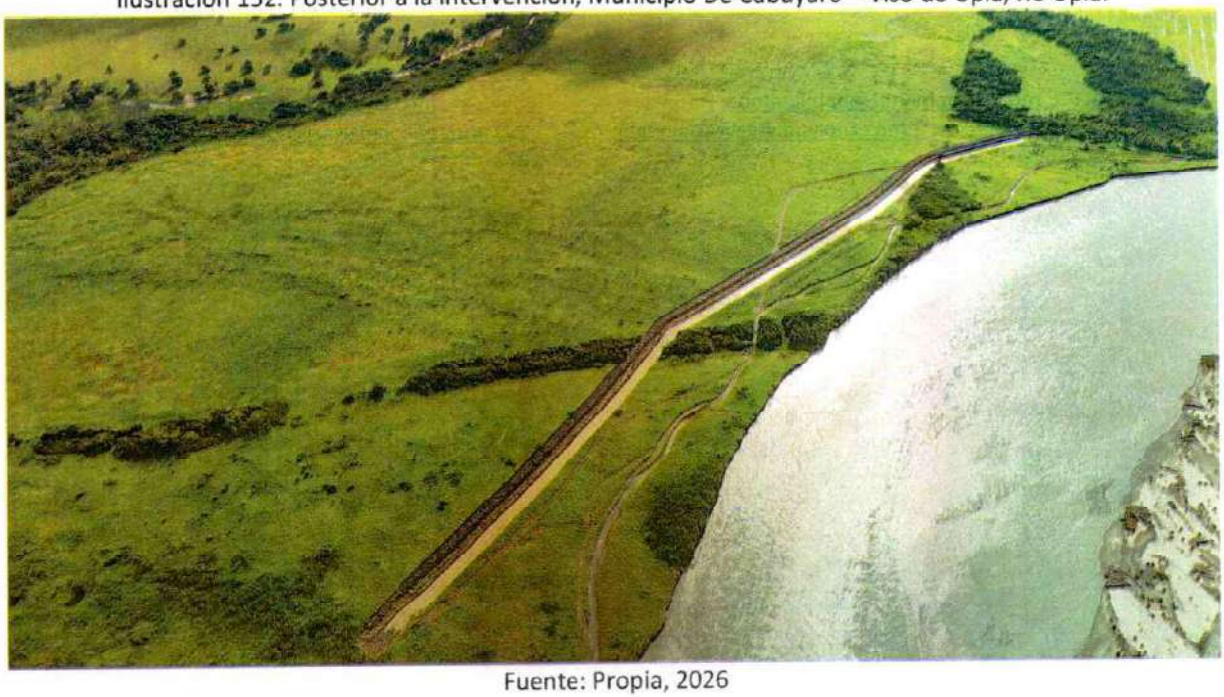

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 153. Posterior a la intervención, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.



Fuente: Propia, 2026

Durante el periodo del presente informe se ejecutaron 75 horas de excavadora, realizadas con la siguiente maquinaria:

Tabla 51. Maquinaria utilizada, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia, río Upia.

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
3	CATERPILLAR 320D MC033914 #2	CABUYARO	VISO DE UPIA	04/05/2026	13/05/2026	75	$ 61.500.000,00	SE REALIZA CONFORMACION DE JARILLON Y SE CANALIZA
						TOTAL	**$ 61.500.000,00**	

Fuente: Propia, 2026

Reporte diario de horas

EXCAVADORA CATERPILLAR 320D MC033914 #2

Tabla 52. Reporte diario de horas excavadora CATERPILLAR 320D MC033914 #2

REPORTE DE MAQUINARIA								
MAQUINA:	CATERPILLAR 320D MC033914 #2							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
1	04/05/2026	CABUYARO	VISO DE UPIA	SEBASTIAN CESPEDES	15949,9	15954,9	5,0	SE DESPLAZA LA MAQUINA Y SE REALIZA CONFORMACION DE JARILLON Y SE CANALIZA
2	05/05/2026	CABUYARO	VISO DE UPIA	SEBASTIAN CESPEDES	15954,9	15963,4	8,5	SE REALIZA CONFORMACION DE JARILLON Y SE CANALIZA
3	06/05/2026	CABUYARO	VISO DE UPIA	SEBASTIAN CESPEDES	15963,4	15963,4	0,0	NO SE TRABAJA POR CRECIENTE DEL RIO
4	07/05/2026	CABUYARO	VISO DE UPIA	SEBASTIAN CESPEDES	15963,4	15975,5	12,1	SE REALIZA CONFORMACION DE JARILLON Y SE CANALIZA
5	08/05/2026	CABUYARO	VISO DE UPIA	SEBASTIAN CESPEDES	15975,5	15986,5	11,0	SE REALIZA CONFORMACION DE JARILLON Y SE CANALIZA
6	09/05/2026	CABUYARO	VISO DE UPIA	SEBASTIAN CESPEDES	15986,5	15990,6	4,1	SE REALIZA CONFORMACION DE JARILLON Y SE CANALIZA
7	10/05/2026	CABUYARO	VISO DE UPIA	SEBASTIAN CESPEDES	15990,6	15990,6	0,0	DOMINGO, DÍA DE DESCANSO
8	11/05/2026	CABUYARO	VISO DE UPIA	SEBASTIAN CESPEDES	15990,6	15999,5	8,9	SE REALIZA CANALIZACION PARA PROTECION DEL RIO
9	12/05/2026	CABUYARO	VISO DE UPIA	SEBASTIAN CESPEDES	15999,5	16009,1	9,6	SE REALIZA CANALIZACION PARA PROTECION DEL RIO
10	13/05/2026	CABUYARO	VISO DE UPIA	SEBASTIAN CESPEDES	16009,1	16017,6	8,5	SE REALIZA CANALIZACION PARA PROTECION DEL RIO
11	14/05/2026	CABUYARO	VISO DE UPIA	SEBASTIAN CESPEDES	16017,6	16024,9	7,3	SE REALIZA CANALIZACION PARA PROTECION DEL RIO
						TOTAL	75,0	

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
04/05/2026	13/05/2026	15949,9	16024,9	75,0
			TOTAL	75,0

Fuente: Propia, 2026

Registro Fotográfico CATERPILLAR 320D MC033914 #2

Ilustración 154 . CATERPILLAR 320D MC033914 #2 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 155 . CATERPILLAR 320D MC033914 #2 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 156 . CATERPILLAR 320D MC033914 #2 realizando actividades de conformación de jarillón, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia



Fuente: Propia, 2026

MUNICIPIO DE CABUYARO – GUAYABAL DE UPIA, RIO UPIA

El día 20 de mayo de 2026, en el municipio de Cabuyaro, en el sector de Guayabal de Upia, en reunión con los ingenieros de la DIGERD, el contratista, delegados de la alcaldía y la comunidad, se realizó un recorrido y posteriormente un vuelo de dron sobre el río Upia sector Guayabal de Upia, con el fin de evidenciar las afectaciones presentadas por las crecientes del río Upia, donde la margen derecha presenta socavación y daños en viviendas.

En común acuerdo, se definieron los trabajos a realizar, los cuales consisten en el apoyo para la ampliación de un canal que la alcaldía del municipio de Cabuyaro está realizando sobre la margen izquierda, esto para disminuir la fuerza del río que impacta sobre la margen derecha afectando a la comunidad de Guayabal de Upia, por tal motivo las actividades de mitigación se desarrollaran en conjunto con la alcaldía municipal.

Definida la intervención, se trasladó la maquinaria al sitio y se iniciaron las labores correspondientes. Durante el periodo del presente informe, se ejecutaron 4,5 horas de excavadora de 20 toneladas, de las 85 horas asignadas por la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, esto debido a que el día 21 de mayo en horas de la tarde, el río presento aumento significativo en su caudal, lo que no permitió continuar con las labores ya que no es posible el ingreso de la maquinaria, está situación persiste a la fecha de corte del presente informe, es decir 25 de mayo de 2026, por tanto no ha sido posible reanudar actividades en el punto.

Ilustración 157. Propuesta de intervención, Municipio De Cabuyaro – Guayabal de Upia, río Upia.



Fuente: Propia, 2026

Tabla 53. Propuesta de intervención, Municipio De Cabuyaro – Guayabal de Upia, río Upia.

ACTIVIDADES PROPUESTAS					
DESCRIPCIÓN	COORDENADA DE INICIO	COORDENADA FINAL	LONGITUD	ANCHO	OBSERVACIONES
AMPLIACIÓN DE CANAL	4°24'13.52"N 72°48'42.29"O	4°24'23.86"N 72°48'52.19"O	400M	VARIABLE	AMPLIACIÓN DE CANAL EN CONJUNTO CON MAQUINARIA DE LA ALCALDIA

MAQUINARIA REQUERIDA			
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MÁQUINAS
3	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE AL SITIO DE LOS TRABAJOS; PARA LAS LABORES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN.	HORA	1

Fuente: Propia, 2026


Registro fotográfico

Ilustración 158. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Guayabal de Upia, río Upia.




Fuente: Propia, 2026

Ilustración 159. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Guayabal de Upia, río Upia.

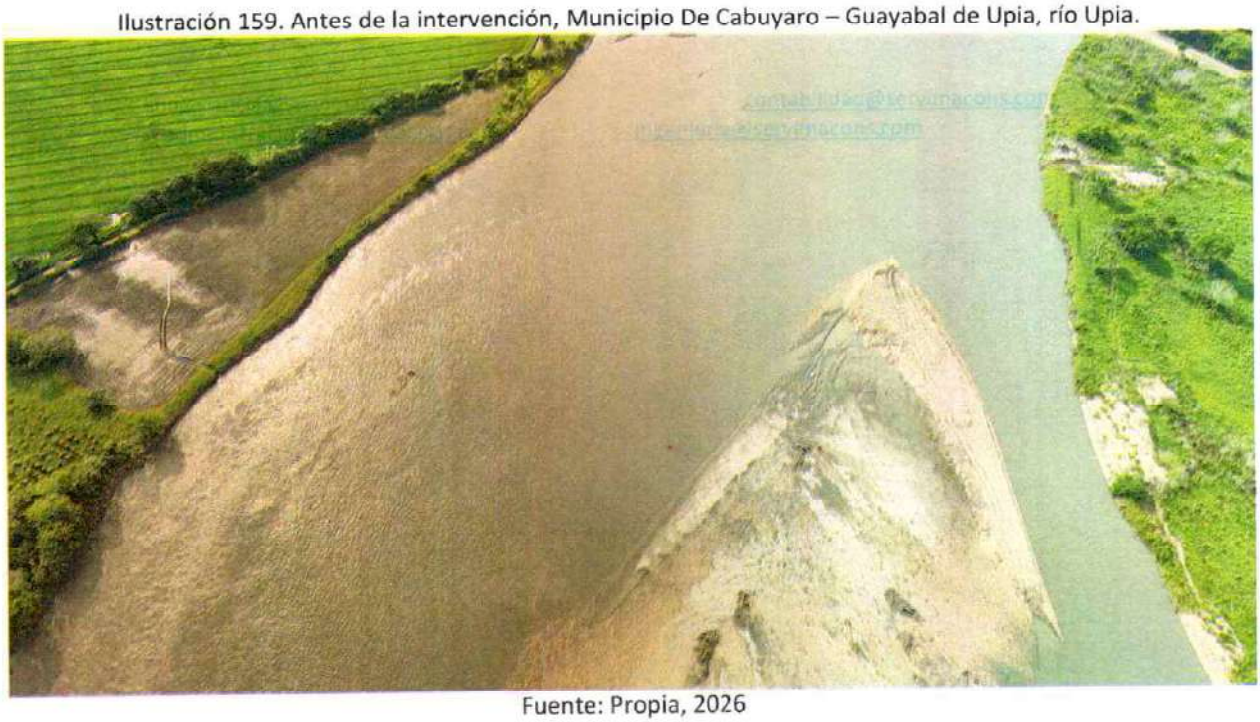

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 160. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Guayabal de Upia, río Upia.

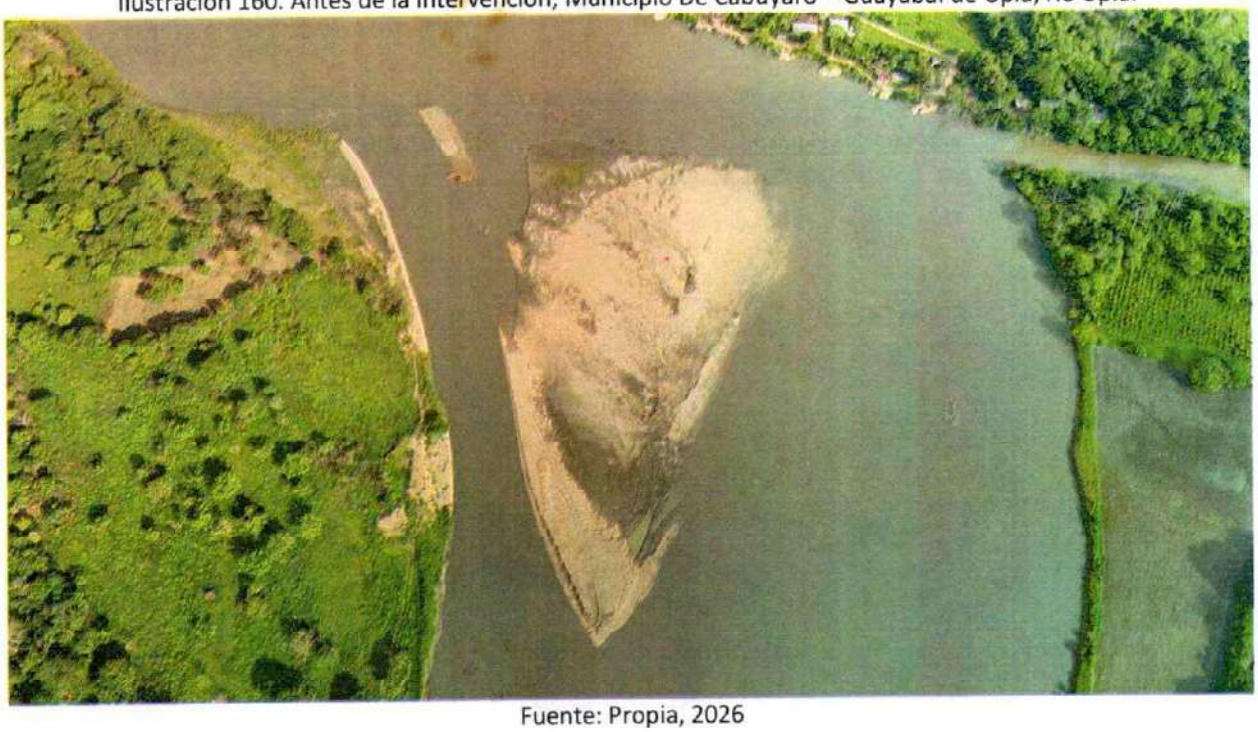

Fuente: Propia, 2026

Ilustración 161. Antes de la intervención, Municipio De Cabuyaro – Guayabal de Upia, río Upia.



Fuente: Propia, 2026

Durante el periodo del presente informe se ejecutaron 4.5 horas de excavadora, realizadas con la siguiente maquinaria:

Tabla 54. Maquinaria utilizada, Municipio De Cabuyaro – Guayabal de Upia, río Upia.

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
3	CATERPILLAR 320D MC033914 #2	CABUYARO	GUAYABAL DE UPIA	21/05/2026	25/05/2026	4,5	$ 3.690.000,00	CANALIZACIÓN DEL RIO
						TOTAL	$ 3.690.000,00	

Fuente: Propia, 2026

Reporte diario de horas

EXCAVADORA CATERPILLAR 320D MC033914 #2

Tabla 55. Reporte diario de horas excavadora CATERPILLAR 320D MC033914 #2

MAQUINA:	CATERPILLAR 320D MC033914 #2							
N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN		
1	21/05/2026	CABUYARO	GUAYABAL DE UPIA	SEBASTIAN CESPEDES	16024,9	16029,4	4,5	SE REALIZA TRANSPORTE DE MAQUINA A PUNTO GUAYABAL AL PUNTO GUAYABAL DE UPIA Y SE EMPIEZA A TRABAJAR EN EL TERRENO
2	22/05/2026 AL 25/05/2026	CABUYARO	GUAYABAL DE UPIA	SEBASTIAN CESPEDES	16029,4	16029,4	0,0	NO ES POSIBLE INGRESAR A TRABAJAR DEBIDO AL ELEVADO NIVEL DEL CAUCE QUE NO PERMITE EL PASO DE LA MAQUINA
						TOTAL	4,5	

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
21/05/2026	25/05/2026	16024,9	16029,4	4,5
			TOTAL	4,5

Fuente: Propia, 2026

Registro Fotográfico CATERPILLAR 320D MC033914 #2

Ilustración 162 . CATERPILLAR 320D MC033914 #2 realizando actividades de ampliación de canal Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia



Fuente: Propia, 2026

Ilustración 163 . CATERPILLAR 320D MC033914 #2 realizando actividades de ampliación de canal, Municipio De Cabuyaro – Viso de Upia



Fuente: Propia, 2026
