Bitácora General
de obra

Proyecto de Recuperación
de parques: la cabaña
kilómetro 41
Vivir como
ecología de
humedales

Arquitecto: Wilson Rodríguez
SST: Paola Lorena Gomez
Maestro: Benedicto Quintero

Revisor técnico: Luis Quintero S.
Coordinador: Arq. Isabel Peña

octubre 14 2023

MARTES 14 DE OCTUBRE

APERTURA DEL FRENTE DE TRABAJO EN EL PARQUE DE "LA LEONORA"

PERSONAL EN OBRA
UN MAESTRO GENERAL
DOS AYUDANTES
UN ARQUITECTO RESIDENTE

SE ESTABLECE UN PERIMETRO DE CERRAMIENTO CON "BOBONES" Y CON CINTA DE PRECAUCIÓN

SE HACE UN APIQUE EXPLORATORIO EN EL MURO ANTEPECHO QUE SE VA A DEMOLER SE ENCUENTRA QUE NO HAY ACERO DE REFUERZO EN LA VIGA DE CIMIENTO DEL MURO QUE ESTA CONSTRUIDO EN LADRILLO TOLETE CON UNA ALBAJÍA ENCIMA.
SE HACE EL COMPROMISO CON LA POLICIA DEL CAI DE QUE SE LES ENTREGARA UNA COPIA IMPRESA DEL CONTRATO

Marden

A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO NI PLANOS DE EL PROYECTO DE LA TORRE NI SE HA REALIZADO LA SOCIALIZACION EN EL FRENTE DEL KILOMETRO 41 -
AMBAS COSAS MUY IMPORTANTES PARA EL AVANCE DE ESOS FRENTES.

SE LEVANTA CAMPAMENTO DE OBRA Y SE HACE ENTREGA EN HORAS DE LA TARDE DE UNA COPIA DEL CONTRATO AL PERSONAL DEL CAI.
SE LES HACE LA SOLICITUD PARA SUMINISTRO DE AGUA.

SE SOLICITA AL ARQ FABER UNA VISITA TECNICA CON EL CALCULISTA PARA ESTABLECER EL ALCANCE DEL DISEÑO DEL MURO DE CONTENCION.

MIERCOLES Nº DE OCTUBRE

PERSONAL EN OBRA

UN ARQ. RESIDENTE
UN MAESTRO GENERAL
DOS OFICIALES
CUATRO AYUDANTES


CLIMA: SECO

ACTIVIDADES: SE LEVANTA CERRAMIENTO EN FIBRA VERDE - SE INICIA A LEVANTAR LA PLAQUETA DEL SUELO Y SE ORGANIZA ACOPIO EN LA PARTE EXTERIOR DEL CERRAMIENTO
SE ESPERA LA VISITA TECNICA EL DIA DE HOY DEL ARQUITECTO FABER CON EL INGENIERO CALCULISTA
SE DETERMINA HACER EXCAVACION PRELIMINAR A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CMS PARA PONER 10 CMS DE BASE Y 10 CMS DE LOSA EN CONCRETO
SE DETECTAN FALTANTES EN EL PRESUPUESTO COMO SON PINTURA PARA 4 EQUIPOS BIOSALUDABLES Y LA REINSTALACION Y DESMONTE DE LOS EXISTENTES.
SE TOMA LA MEDIDA LONGITUDINAL DE DONDE SE INICIO LA EXCAVACION AL BORDE

Libro Medio Oficio 80 H. Marden


DEL CERRAMIENTO 23.80 mts

CUBICACION DE ESCALAS A DEMOLER

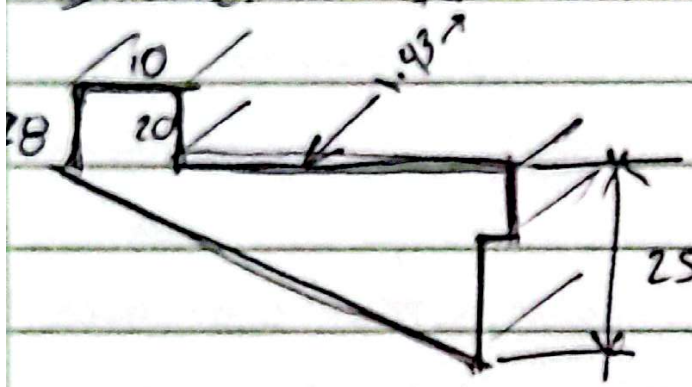

LARGO 1.43 mts

CUBICACION DEMOLICION ANTEPECHO

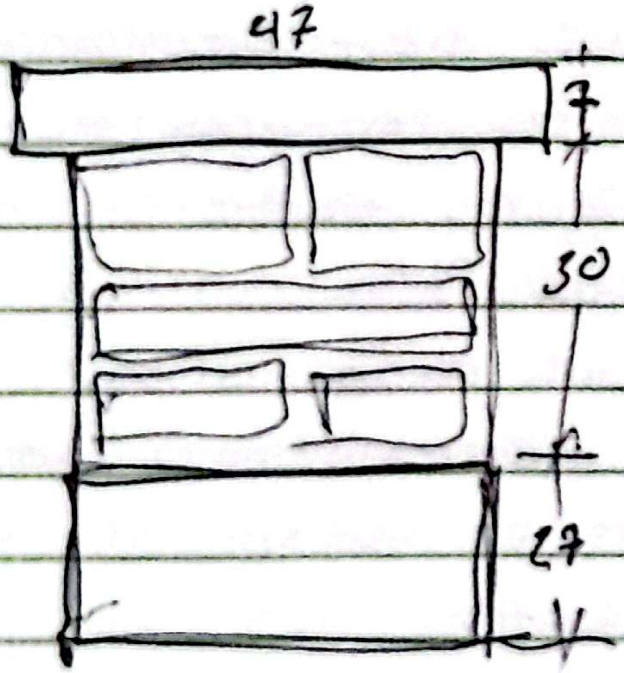

LARGO PRIMERA ETAPA 2520 A LA TERRAZA DEL CAE (25.20)

JUEVES 16 DE OCTUBRE

PERSONAL EN OBRA

UN ARQUITECTO RESID.
UN MAESTRO GENERAL
DOS OFICIALES,
CINCO AYUDANTES.

CLIMA: SECO

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DEL ANTEPECHO Y LA EXCAVACION DEL ANDEN - SE DETERMINA X EL MOMENTO QUE SE FONDEAN 10 CMS DE SUBBASE Y 10 CMS DE LOSA TAL COMO APARECE EN PRESUPUESTO

DESPUES DE LA VISITA DEL ESTRUCTURAL DE LA ALCALDIA SE SOLICITA HACER 3 APIQUES PROFUNDOS PARA BUSCAR EL NIVEL DEL SUELO BUENO
SE TRAE UN MARTILLO DEMOLEDOR HILTI EN ALQUILER PARA AGILIZAR LA DEMOLICION
DESPUES DE TENER LOS APIQUES SE DEFINIRÁ EL DISEÑO DE LA CIMENTACION.

Libro Medio Oficio 80 H. Marca

VIERNES 17 DE OCTUBRE

PERSONAL EN OBRA: UN ARQUITECTO RES
UN MAESTRO GENERAL
3 OFICIALES
5 AYUDANTES

CLIMA: SECO

ACTIVIDADES: SE TERMINA DE DEMOLER EL ANTEPECHO EN SU TOTALIDAD Y SE INICIA NIVELACION DE TERRENO PREVIO A QUE SE ESPECIFIQUE DISEÑO PARA EMPLAZAMIENTO DE VIGA.

SE DEMUELEN EN TOTAL 40,7 MTS DE MURO DE ANTEPECHO CON ALFAJIA SE ELEVANTAN EL MISMO METRAJE DE BALDOSAS RESTANDO EL LARGO DE LA LOSA DE PISO DEL CAI

A DIA DE HOY NO SE NOS HA DEFINIDO EL DISEÑO DE LA VIGA DE CIMENTACION PARA LA BARANDA.

LUNES 20 DE OCTUBRE

PERSONAL EN OBRA : UN ARQUITECTO
UN MAESTRO GENERAL
DOS OFICIALES
SEIS AYUDANTES

CLIMA: SECO

ACTIVIDADES: SE REPLANTEA Y SE EXCAVAN 40.7 MTS DE ANDEN - PROFUNDIDAD PROMEDIO 25 CMS -

SE INICIA EL REGADO Y APISONADO DEL MATERIAL PARA

- NO SE TIENE TODAVIA INFORMACION DEL DISEÑO DE LA VIGA - CONTINUAMOS RETRASANDONOS CON ESTA PROGRAMACION.
- SE PROPONE A LA COORDINACION DEL PROYECTO EL MODIFICAR EL TRAZADO DE LA RED ELECTRICA PARA EVITAR HACER LAS CAJAS EN EL NUEVO ANDEN

SE INICIA EL DESCAPOTE DE LAS DOS LOSAS PARA UBICACION DE BIOSALUDABLES.

Martes 21 de octubre

Personal en obra: un arquitecto
un maestro general
dos oficiales
seis ayudantes

Clima: seco

Actividades. Se continua con la disposicion

Visita tecnica ingeniero Mario Lopez
Para revisar instalacion "in situ"
se hacen las siguientes observaciones:
No es necesidad de instalar contador
ya que la carga es mínima
No esta contemplado el sistema a tierra:
Varilla Copperweld 5/8x2,40, conector de cobre,
caja de registro.
Se rio
Se recomienda hacer el cableado
y conexiones por la zona verde
para no afectar la presentacion
del anden con las tapas de las

RECAMARAS - ADEMAS DE QUE ASI SE EVITA EL PASO POR DEBAJO DEL CARCAMO.

PENDIENTE DEFINIR POSICION DE LAS LAMPARAS CON LA INTERVENTORIA O REVISOR/COORDINADOR

- SE NOS AUTORIZA A REGALAR LAS PLAQUETAS QUE SE HAN REMOVIDO DE LOS SENDEROS DEL PARQUE.

- A DIA DE HOY NO SE NOS HA DEFINIDO EL DISEÑO DE LA VIGA Y ESTO NOS EMPIEZA A AFECTAR EN EL CRONOGRAMA

Visita tecnica ing. Juan Miguel Henao

En visita realizada en conjunto con el Arquitecto William Rodríguez se revisa la posibilidad del tendido de redes eléctricas por zona verde y aprovechar recámaras existentes (y/o repotenciarlas), y evitar afectar el estampado del andén con la construcción de una nueva recámara para lo cual se consideraría apto este cambio desde el punto de vista eléctrico.

Juan Henao

SE DA LA INDICACION POR PARTE DEL COORDINADOR DE LA ALCALDIA DE DESPLAZAR LOS JUEGOS LO MAS POSIBLE DE LA MESA DE PIN PON PARA POSIBILITAR EL USO DE LA MISMA.

EN REUNION TECNICA EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA CON LOS COORDINADORES DEL PROYECTO SE AUTORIZA USAR LAS CAJAS ENCONTRADAS EN EL SITIO PARA LA UBICACION DE LAS LAMPARAS SE DEFINE QUE LOS JUEGOS NO SE VAN A PINTAR SOLO A MOVER Y POSIBLES REPARACIONES EN EL LUGAR QUE SE PECEN DURANTE SU TRASLADO

SE REVISO LA FALTA DEL ITEM DEL POLO A TIERRA NO FUE CONSIDERADA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL

MIERCOLES 22

PERSONAL EN OBRA: UN ARQUITECTO
UN MAESTRO
DOS OFICIALES
CUATRO AYUDANTES

CLIMA: SECO

ACTIVIDADES: SE RETOMA LA EXCAVACION DE LAS LOSAS PARA BIO-SALUDABLES HABIENDOLAS DESPLAZADO TANTO COMO NOS FUE POSIBLE.
DE ACUERDO A LA INSTRUCCION RECIBIDA
- SE DESPEJARON LAS CAJAS EXISTENTES Y SE REALIZÓ LA EXCAVACION DE LA ZAPA PARA INSTALAR EL DUCTO ELECTRICO
SE HA FRENADO LA DISPOSICION DE AFIRMADO POR UN ACCIDENTE DE TRANSITO DEL PROVEEDOR DEL MATERIAL - SE ESPERA QUE HOY PUEDA SOLUCIONARSE.
HAN APARECIDO GRANDES VOLUMENES DE CONCRETO EN EL AREA DE LAS LOSAS DE LOS JUEGOS TENDRAN QUE SER DEMOLIDOS.

JUEVES 23

PERSONAL EN OBRA: UN ARQUITECTO
UN MAESTRO GRAL
DOS OFICIALES
CUATRO AYUDANTES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES: LIMPIEZA DE CANAL Y DE TAPAS DE CARCAMO - SE RECTIFICA EL CERCADO DEL COMPACTADO DEL ANDEN

SE RIEGA Y COMPACTA EL AFIRMADO DELAS DOS TERRAZAS PARA LOS JUEGOS BIOMECANICOS.

POR PARTE DE LA ALCALDIA SE NOS SOLICITA UN APIQUE MAS EN LA PARTE ALTA DE LA CURVA DEL SITIO DONDE IRA LA VIGA. ESTO PARA DEFINIR EL DISEÑO FINAL DE ESTE ELEMENTO

- SE HACE UNA EXPLORACION DE LA EXISTENCIA DE PILOTES PARA ANCLAR CADA JUEGO SE CONFIRMA PILOTE DE 55 CMS DE PROFUNDIDAD
- SE SOLICITA LA VISITA DEL CONTRATISTA DE LOS ANCLAJES PARA QUE PROCEDA

Libro Medio Oficio 80 H.

CON LA FABRICACION DE LAS 7 PIEZAS QUE SE REQUIEREN PARA FIJAR LOS JUEGOS.

- SE ENCARGAN YA LOS ANCLAJES PARA LOS JUEGOS BIOSALUDABLES. SOLO SE PUEDE AVANZAR EN LA EXCAVACION DE LOS PILOTES PARA ESTOS JUEGOS PUES NO SE CUENTA CON DISEÑO PARA LA VIGA PRINCIPAL

SE DESMONTAN DOS DE LOS JUEGOS PARA REVISAR LA MANERA COMO ESTAN FIJADOS A LA LOSA - Y SE CONFIRMA LA NECESIDAD DE CONSTRUIR UNOS PILOTES DE FIJACIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE LOS JUEGOS

Libro Medio Oficio 80 H.

LUNES 27

PERSONAL EN OBRA = UN OFICIAL
UN MAESTRO

CLIMA LLUVIOSO

ACTIVIDADES: EXCAVACION DE PILOTES
PARA JUEGOS BIOSALUDABLES


REPASO DE EXCAVACION DE VIGA.

RECOMENDACION:

1. compacta Rampa Andén
2. bombeo del Afirmado para la placa de los biosaludables
3. TOMA AUTORIZADA LOCALIZACION TIERRA PARA LA LUMINARIA mitad o al final
4. CHEQUEO EXCAVACION para Viga a 2 mts del SITIO siendo lleno.

MARTES 28 DE OCTUBRE

POR FALTA EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA VIGA DE CIMENTACION PARA LA BARANDA Y CONTENCION DEL ANDEN - SE HA DECIDIDO SUSPENDER TEMPORALMENTE LA OBRA, MIENTRAS SE RECIBE DE PARTE DE LA ALCALDIA UN DISEÑO COMPLETO CON LAS ESPECIFICACIONES SUFICIENTES PARA PODER EJECUTAR EL TRABAJO Y DETERMINAR EL ALCANCE FINAL DE LA OBRA



SABADO 8 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN ARQUITECTO
DOS OFICIALES
DOS AYUDANTES

CLIMA SECO:

ACTIVIDADES: SE TRAEN LAS PLATINAS DE PREANCLAJES PARA LOS JUEGOS BIOSALUDABLES

Marden

LA META ES VACIAR EL DIA DE HOY LAS DOS LOSAS PARA PODER PASAR LOS JUEGOS A SU LUGAR DEFINITIVO
SE VACIO UNA DE LAS PLACAS QUEDA LA OTRA PARA EL DIA LUNES

LUNES 10 DE NOVIEMBRE
PERSONAL EN OBRA: UN ARQUITECTO
UN MAESTRO
UN OFICIAL
DOS AYUDANTES
CLIMA SECO
ACTIVIDADES: SE HACE LIMPIEZA DEL AREA DE LA SEGUNDA PLACA PARA DIOSALUDABLES SE INSTALA MALLA ELECTROSOLDADA Y SE DISPONE EL VACIADO CON TROMPO Y ESTACION GENERADORA DE ENERGIA

MARTES 11 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN ARQUITECTO
UN MAESTRO
UN OFICIAL
DOS AYUDANTES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES: SE TERMINAN DE INSTALAR LOS JUEGOS BIOSALUDABLES EN AMBAS LOSAS.
ALGUNOS DE ELLOS QUEDAN UN POCO EN ANGULO PUES DESDE EL PRINCIPIO LAS PLATINAS DE ANCLAJE SE ENCUENTRAN GIRADAS UNOS GRADOS.

QUEDA PENDIENTE POR INSTALAR LA BICICLETA ESTATICA:

NO HAY DEFINICION DE LA VIGA PARA PODER AVANZAR CON ELLO CONTINUA EL RETRASO

Libro Medio Oficio 80 H.

Bitacora de obra

Parque "Ecoparque los Alcazares"

Viernes 17 de octubre

Se hace reconocimiento de obra con el maestro encargado de la obra:

Se revisan medidas con relacion a los planos suministrados

Se encarga al maestro dejar ubicados los plomos de las columnas para solicitar visita de chequeo y validacion por parte del ingeniero estructural de la alcaldia para el dia lunes

LUNES 20 DE OCTUBRE

Se realiza visita de obra por parte de la secretaría de infraestructura siendo partícipes el ing. Oscar Zuloaga el arq. Faber Emilio y el ing. Esteban Cardona. con el contratista del reforzamiento.

Se considera que las columnas se pueden modificar en su ubicación continuando la línea diagonal de acción de la estructura

Se verifica el tamaño de la platica de placa base de 400x400x25 mm

Se verifica que el dado de amarre es de 50 cm x 50 cm y bajo este va directamente el pilote, además se aclara que no existe zapata, sino que sobre el dado se ancla la placa base colocando el tubo de columna.

Se comprueba que existen puntos de diagonales de refuerzo que no deben ser colocados para no obstaculizar

Libro Medio Oficio 80 H.


el paso peatonal por las escaleras de la estructura.

Se verifica el cambio de anclaje a la columna principal debido a que en campo se analiza que se debe realizar el anclaje en 2 guaduas identificadas como las principales cargueras del sistema.

→ Se aprueba el uso de flejes en espiral del pilote.

Ing. Esteban Cardona
Esteban Cardona.

Arq. Faber Emilio. Polo.

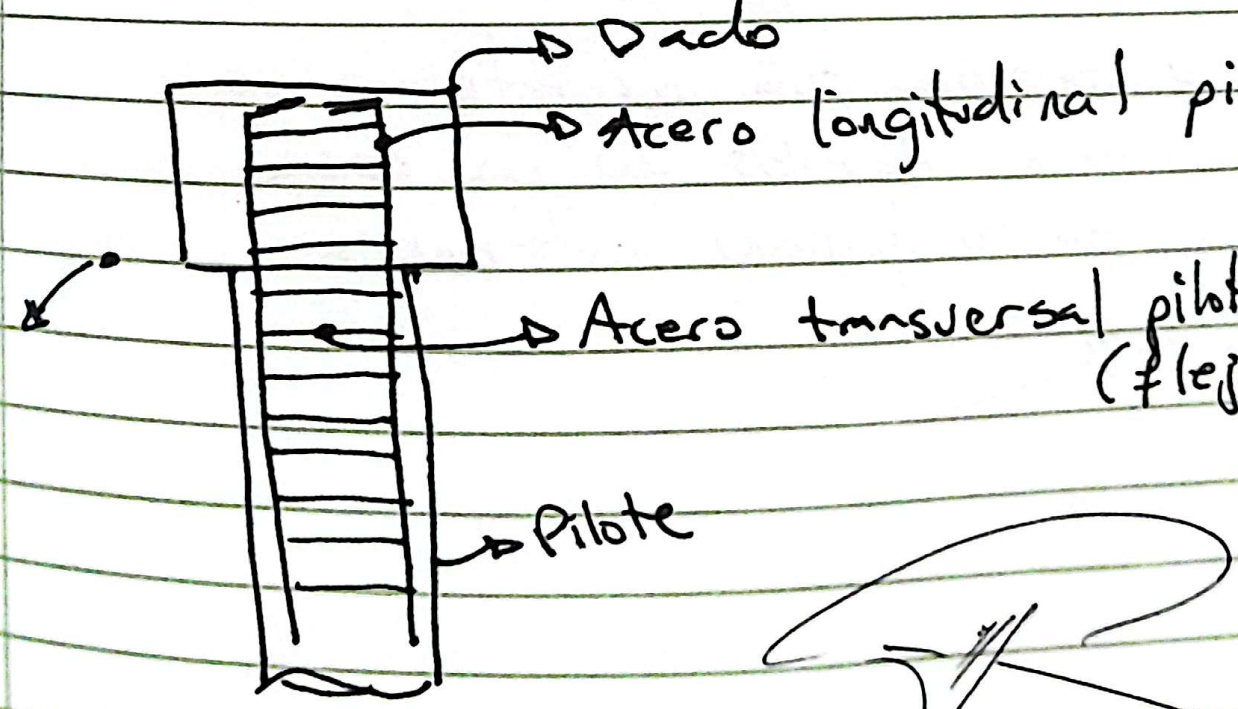

Martes 21

Personal en obra : un maestro
dos ayudantes

Clima: seco

Actividad: se procede a trazar y comenzar la excavacion de los micropilotes de 2 mts de profundidad tal como fue autorizado las zapatas no son centradas para evitar demoliciones de andenes existentes.

Se tienen al final del dia excavados todos los pilotes y parte de las zapatas

Se define que los estribos no seran hechos en la obra se contrataran externos.

MIERCOLES 22

PERSONAL EN OBRA UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

CLIMA SECO:

ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON EXCAVACION Y PERFILADO DE ZAPATAS

SE DEFINE QUE SIEMPRE SI SE HARAN LOS ESPIRALES DE 3/8 EN OBRA CON LA AYUDA DE TUBERIA NOVAFORT DE 6"

SE ESPERA LA LLEGADA DE MATERIAL PARA EL DIA DE MAÑANA: ACERO, MADERA CEMENTO

JUEVES 23

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

CLIMA: SECO

ACTIVIDAD: EXCAVACION DE ZAPATAS
LLEGA MATERIAL EN LAS DE LA TARDE Y SE DISPONEN A SU ACOMODACION

Libro Medio Oficio 80 H.

EL CEMENTO SE DEJA EN LA
TORRE A SALVO DEL AGUA
Y EL ACERO SE COMIENZA
A DISPONER PARA CORTE.

LOS PILOTES LLEGAN A PROFUN
DIDAD DE 2 MTS EXCEPTO UNO
DONDE SE ENCUENTRA ROCA
SOLIDA FALTANDO 80 CMS
PARA LA PROFUNDIDAD DE 2MTS

SE INICIA EL ENROLLADO DEL
PRIMER ESPIRAL Y EL
CORTE DE LAS PARRILLAS
PARA INICIAR SU AMARRADO

VIERNES 24

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

CLIMA: LLUVIOSO

ACTIVIDADES: SE TERMINA LA EXCAVACION DE LOS PILOTES Y SE INICIA PERFILADO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS DADOS.

SE DETERMINA QUE LA ALTURA DE LOS DADOS SERA DETERMINADA POR NIVEL DEL DADO MAS ALTO Y ESTE DETERMINARA LA ALTURA DE LOS DEMAS

SE ENCARGAN YA LAS PLATINAS PARA LOS ANCLAJES DE LA TUBERIA DE 8"

EN LA TARDE LA LLUVIA NO PERMITE TRABAJAR MAS QUE UN PAR DE HORAS

LUNES 27

PERSONAL EN OBRA:

UN MAESTRO

UN OFICIAL

UN AYUDANTE

CLIMA: LLUVIOSO

ACTIVIDADES: ARMADO DE ACERO CONFORMACION DE CASTILLOS PARA PILOTES

SE VERIFICAN MEDIDA DE PILOTES, CALIBRE DE ACERO y las distancias de los ESTRIBOS

RECOMENDACION:

DOMESTIDA ELECTRICA liberada de uno de los pilotes que no quedo Enchelada Desplazar y dejar tubería descubierta (Pilote Salia frente a Escalas)

2. TENER CONCRETADORA MECANICA PARA VACIDO DE LOS PILOTES.

3. MOSTRAR DOCIFICACION DE CONCRETO

MARTES 28

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

LLEGA LA CONCRETADORA Y SE PREPARA LA VACIADA DE PILOTES - LA EXPECTATIVA ES TENER TODOS LOS PILOTES VACIADOS PARA EL FINAL DEL DIA.

SE TOMAN TRES MUESTRAS DEL CONCRETO PARA FALLAR EN LABORATORIO

SE TOMAN LAS MUESTRAS Y SE TERMINAN DE VACIAR LOS PILOTES SIN NINGUN CONTRATIEMPO AL FINAL DEL DÍA -

SE TENDRAN QUE SUSPENDER LAS ACTIVIDADES HASTA TENER LAS PLATINAS DE ANCLAJE LISTAS PUES ANTES NO SE PODRAN VACIAR LOS DADOS.

Libro Medio Oficio 80 H. Mardon

VIERNES 07 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN ARQUITECTO
UN OFICIAL
DOS AYUDANTES

CLIMA: SECO

ACTIVIDAD: SE ENCOFRAN LOS DADOS DE SOPORTE PARA LA INSTALACION DE LAS PLATINAS QUE QUEDARAN EMBEBIDAS EN EL CONCRETO PARA SOLDAR LOS TUBOS DE 8"

SE REVISAN NIVELES Y PLOMOS DE LAS PLATINAS Y SE PROCEDE A VACIAR LOS 4 DADOS

SE TERMINA LA ACTIVIDAD A LAS 7:00 PM SIN NOVEDADES

Libro Medio Oficio 80 H.

Bitacora de obra

Parque: Kilometro 41

JUEVES 30 DE OCTUBRE

PERSONAL EN OBRA: UN ARQUITECTO
UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

CLIMA SECO:

ACTIVIDADES: SE PROCEDE A ESTABLECER EL PERIMETRO DEL LOTE Y A LIMPIAR LOS ELEMENTOS EXISTENTES EN EL AREA.
SE RETIRAN TRONCOS PIEDRAS Y JUEGOS INFANTILES ABANDONADOS

SE HACEN LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SE INSTALA EL CERRAMIENTO EN "PUTE"

SE DA INICIO AL DESCAPOTE DEL AREA

VIERNES 31 DE OCTUBRE

PERSONAL EN OBRA: UN ARQUITECTO
UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

CLIMA: SECO

ACTIVIDADES: TENIENDO YA EL TERRENO DESPEJADO SE INICIA LA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CADA UNO DE LOS EXAGONOS QUE FORMARAN LAS FUTURAS TERRAZAS

YA SE HA TERMINADO EL DESCAPOTE Y SE ESTABLECE QUE UN PEQUEÑO ARBOL EXISTENTE SERA TRASPLANTADO A OTRO LUGAR DE ACUERDO CON EL DISEÑO DEL PARQUE.

SE TERMINA LA JORNADA SIN NOVEDADES

Libro Medio Oficio 80 H.

MARTES 04 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

CLIMA SECO

ACTIVIDADES: SE REALIZA EL MOVIMIENTO DEL ARBOL AL LUGAR PREVISTO Y SE DEMARCAN LAS LINEAS POR DONDE IRAN LAS TUBERIAS PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE.

SE INICIAN LAS EXCAVACIONES PARA LAS MISMAS
SE HACE PEDIDO DE MATERIALES PARA ESTAS INSTALACIONES Y PARA EL VACIADO DE LAS LOSAS.

EN HORAS DE LA MAÑANA
SE RECIBE VOLQUETA CON AFIRMADO 8 M³.

MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE


PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

CLIMA: SECO

ACTIVIDADES: SE EXCAVAN ZAPAS PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA ELECTRICA.

SE RECIBE MAS MATERIAL DE AFIRMADO Y SE SACA UN VIAJE DE ESCOMBRO Y TIERRA.

AL FINAL DEL DIA SE TIENEN TODAS LAS BRECHAS EXCAVADAS Y SE INICIA LA DISPOSICION DE LOS PRIMEROS TUBOS CONDUIT.



LUNES 10 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
UN AYUDANTE

CUMA SECO:

ACTIVIDADES SE LLENAN LAS BRECHAS ELECTRICAS 50 ML x 0.4 x 0.4

SE RIEGA MATERIAL DE COMPACTACION Y SE APISONA CON RANA.

SE REPARTE TERRENO DE NUEVO

MARTES 11 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA UN MAESTRO
DOS OFICIALES
UN AYUDANTE

SE CONTINUA LLENANDO MATERIAL PARA COMPACTAR


SE PLANTEA LA PREGUNTA QUE SE TIENE QUE HACER UN INGRESO AL PARQUE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD


CONSULTAR LA NECESIDAD DE 4 LUCES JARDIN

CONFIRMADO NO SE HACEN LOS 30 MTS DE CANAL EN CAMINO.

REDUCIR LA TUBERIA A 1/2"

SOLICITAR EL PLANO NUEVO CON LA DISPOSICION DE BANCAS LA "GOLOSA" Y JARDINES.





DEFINIR EL FILO DE LA VIA VEHICULAR PORQUE EL ARBOL LA INVADE.

B.ta CORA DE OBRA

PARQUE VILLA CAFE
ARQ. RESIDENTE: WILLIAM R RODRIGUEZ
SST: PAMELA LOPERA GOMEZ
MAESTRO: ESNEIDER QUINTERO
JUEVES 16 DE OCTUBRE

VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO CON EL MAESTRO ENCARGADO DE LA OBRA

SE DETERMINA HACER SOLICITUD A AGUAS DE MANIZALES DE UNA ACO METIDA DE AGUA PROVISIONAL.

MARTES 21 DE OCTUBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN RECURSO SST
DOS OFICIALES
DOS AYUDANTES

CLIMA: SOLEADO

ACTIVIDADES: SE HACE LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO EN LA ZONA DEL ARBOL DE YARUMO

SE DEFINE QUE TODA EL AREA DE LA TERRAZA SE VA A DETOLER

SE PRESENTAN LAS AREAS PARA LAVADO Y PARA HIDROFUGADO DE PAREDES DE ANTEPECHOS

MIERCOLES 28 DE OCTUBRE

PERSONAL EN OBRA : UN MAESTRO
DOS OFICIALES
DOS AYUDANTES.

CLIMA: SECO
ACTIVIDADES: SE INSTALA CERRAMIENTO EN YUTE Y SE INICIA LA DEMOLICION DEL SUELO DE LA TERRAZA DEL ARBOL DE GUAYACAN

SE SOLICITA LA VISITA DEL TECNICO DE LA ALCALDIA PARA DIFINIR LO QUE SE HARA CON LA RAIZ DEL ARBOL

TODA LA TARDE SE EXCAVA ENTRE LAS RAICES DEL ARBOL.

LAS LOSETAS O ADOQUINES QUE SE LOGRAN EXTRAER ENTEROS SE CONSERVAN PARA POSTERIORES REPARACIONES MENORES

JUEVES 24 DE OCTUBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
DOS AYUDANTES

CLIMA SOLEADO:

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA EXCAVACION EN LAS RAICES DEL ARBOL Y YA SE VAN DESPEJANDO LA MAYOR PARTE DE ELLAS.
SE ENVIAN FOTOS A LA ALCALDIA PARA IDENTIFICACION DE LA ESPECIE DEL ARBOL (YARUMO BLANCO)

SE HACEN RESANES EN JUNTAS DE LADRILLO QUE SE ENCUENTRAN ABIERTAS Y YA SIN MORTERO

SE LIMPIAN ESCALERAS Y SE REEMPLAZAN ALGUNOS LADRILLOS DESPORTILLADOS Y OTROS ROTOS

Libro Medio Oficio 80 H.

VIERNES 30 DE OCTUBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
DOS AYUDANTES

CLIMA SECO:

ACTIVIDADES: SE COMPRA EL PRODUCTO QUE MENCIONO EL ESPECIALISTA DE LA ALCALDIA PARA PONERLE A LAS RAICES DEL ARBOL YA QUE SU RECOMENDACIÓN FUE NO CORTAR NINGUNA RAIZ Y PROCEDER A CUBRIRLAS DE NUEVO DESPUES DE HABER APLICADO EL PRODUCTO EN LOS PUNTOS DONDE LA RAIZ SUFRIO CORTES O DAÑO

SE CONTINUA CON EL LAVADO CON CEPILLO DE LOS ANTEPECHOS DE LAS CIRCULACIONES PARA DESPUES PROCEDER A HIDROFUGAR

MARTES 04 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
DOS AYUDANTES
UN SST

CLIMA: SECO

ACTIVIDADES: SE GESTIONA CON UN VECINO DEL PARQUE EL QUE NOS VENDA AGUA PARA LA HIDROLAVADORA Y SE HACE LA INSTALACION PERTINENTE

SE HACER REPARACIONES MENORES EN LOS ADOQUINES DEL SUELO DEL PARQUE

LA TERRAZA DEL ARBOL YA ESTA LLENA Y COMPACTADA
SE CONTINUA CON LAVADO DE PISOS CON HIDROLAVADORA



MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
DOS AYUDANTES

CLIMA: SECO

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON EL LAVADO DE PISOS MEDIANTE EL USO DE LA HIDROLAVADORA

ASI MISMO SE CONTINUA LAVANDO Y SELLANDO PAREDES DE ANTEPECHO

SE SUMINISTRA Y SE COMPACTA MATERIAL EN EL AREA DEL ARBOL, QUEDA LISTA ESA SUPERFICIE PARA EL VACIADO DE LA LOSA.

JUEVES 06 DE NOVIEMBRE

SE CONTINUA CON LAS MISMAS ACTIVIDADES DE LAVADO DE PISOS Y PAREDES

VIERNES 07 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
TRES AYUDANTES

CLIMA: SECO

ACTIVIDADES: SE TRAZA EL
ARO AL REDEDOR DEL ARBOL PARA
PREPARAR EL VACIADO DE LA LOSA

SE INSTALA TAMBIEN EL ACERO DE
REFUERZO, CONSISTENTE EN MALLA
ELECTROSOLDADA

EN HORAS DE LA TARDE SE VACIA
LA LOSA DE LA TERRAZA


SE TERMINA LA JORNADA SIN
NOVEDADES

SABADO 08 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN OFICIAL
DOS AYUDANTES


CLIMA SECO

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE LAVADO Y SELLADO CON HIDROFUGO



DOMINGO 09 DE NOVIEMBRE

LAS MISMAS PERSONAS DEL SABADO CON LAS MISMAS ACTIVIDADES DE LAVADO Y SELLADO CON HIDROFUGO



LUNES 10 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA UN MAESTRO
UN OFICIAL
DOS AYUDANTES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON EL LAVADO DE PISOS Y EL HIDROFUGADO DE PAREDES.

NO HAY DEFINICIÓN POR PARTE DE LA ALCALDIA DE LOS COLORES QUE SE VAN A USAR EN LOS JUEGOS NI LOS COLORES QUE SE VAN A USAR EN LAS GRADAS.

MIENTRAS SE CONTINUA CON EL AVANCE DE LAVADO DE PISO Y PAREDES

MARTES 11 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
UN AYUDANTE

CLIMA: LLUVIOSO

ACTIVIDADES: SE LIMPIAN GRADAS DE ACCESO AL PARQUE Y SE CONTINUA CON LAVADO Y SELLADO DE PAREDES

LLEVAMOS MAS DE 160 M² DE LAVADO CON HIDROFUGO Y MAS DE 400 M² DE LAVADO DE PISO CON AYUDA DE LA HIDROLAVADORA


JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

SE SOLICITA A LA COORDINACION DEL CONTRATO LA DEFINICION DE LOS COLORES PARA LOS JUEGOS Y PARA LAS GRADAS QUE SE REQUIEREN PINTAR.

NO HAY RESPUESTA Y SE NECESITA AVANZAR EN ESTOS FRENTES

Ya que para tal efecto se han traido dos pintores

Solo se puede avanzar en la preparacion de la superficie para la pintura de las grados asi como la limpieza de las cubiertas de los juegos infantiles y el matizado de la pintura para recibir la pintura nueva.



LA META ES VACIAR EL DIA DE HOY LAS DOS LOSAS PARA PODER PASAR LOS JUEGOS A SU LUGAR DEFINITIVO
SE VACIO UNA DE LAS PLACAS QUEDA LA OTRA PARA EL DIA LUNES

LUNES 10 DE NOVIEMBRE
PERSONAL EN OBRA: UN ARQUITECTO
UN MAESTRO
UN OFICIAL
DOS AYUDANTES

CLIMA SECO
ACTIVIDADES: SE HACE LIMPIEZA DEL AREA DE LA SEGUNDA PLACA PARA BIOSALUDABLES SE INSTALA MALLA ELECTROSOLDADA Y SE DISPONE EL VACIADO CON TROMPO Y ESTACION GENERADORA DE ENERGIA

MARTES 11 DE NOVIEMBRE
PERSONAL EN OBRA: UN ARQUITECTO
UN MAESTRO
UN OFICIAL
DOS AYUDANTES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES: SE TERMINAN DE INSTALAR LOS JUEGOS BIOSALUDABLES EN AMBAS LOSAS.
ALGUNOS DE ELLOS QUEDAN UN POCO EN ANGULO PUES DESDE EL PRINCIPIO LAS PLATINAS DE ANCLAJE SE ENCUENTRAN GIRADAS UNOS GRADOS.

QUEDA PENDIENTE POR INSTALAR LA BICICLETA ESTATICA:

NO HAY DEFINICION DE LA VIGA PARA PODER AVANZAR CON ELLO CONTINUA EL RETRASO

Powered by CamScanner

LUNES 24 DE NOVIEMBRE
PERSONAL EN OBRA UN MAESTRO
DOS OFICIALES
DOS AYUDANTES

CLIMA SECO
ACTIVIDADES: SE HACE EXCAVACION
DE ZAPPA.
SE INICIA LEVANTADO DE PLAQUETAS

SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE
PILOTES DE 4 Y 3 MTS.
ARMADO DE CASTILLOS DE ACERO
PARA EL PILOTAJE

MARTES 25 DE NOVIEMBRE
PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
DOS AYUDANTES

CLIMA: SECO
ACTIVIDADES:
EXCAVACION DE ZAPPA PARA
VIGA TERMINAN LEVANTADO DE PLAQUETAS
EXCAVACIÓN DE PILOTES Y ARMADO
DE ACERO

Marden

MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
DOS AYUDANTES

ACTIVIDADES:
ARMADO DE CASTILLOS PARA CIMENTACION
EXCAVACION DE HUECOS PARA PILOTES

SE ACOPIAN LAS PLAQUETAS QUE SE
PODRAN REUTILIZAR EN REPARACIONES
POSTERIORES.

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE
PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
DOS AYUDANTES

ACTIVIDADES:
DESCAPOTE AREA DE
ANDEN DESPUES DEL CAL
ARMADO DE ACERO DE PILOTAS
EXCAVACION DE PILOTES

Libro Medio Oficio 80 H.

Marden

Powered by CamScanner

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
PERSONAL EN OBRA UN MAESTRO
DOS OFICIALES
TRES AYUDANTES

CLIMA LLUVIOSO:
ACTIVIDADES

SE ARMA HIERRO DE VIGAS
DE PILOTES SE HACE EXCAVACION
DE ANDEN FRENTE AL CAI

SE VACIAN 11 PILOTES CON
APROBACION DE INTERVENTORIA

SABADO 29 DE NOV
PERSONAL EN OBRA
UN MAESTR
UN OFICIAL
TRES AYUDANTES

CLIMA SECO
ACTIVIDADES: SE EXCAN PILOTES
SE HACEN CASTILLOS DE VIGA.

LUNES 01 DE DICIEMBRE
UN MAESTRO
DOS OFICIALES
CUATRO AYUDANTAS

CLIMA LLUVIOSO
ACTIVIDADES: EXCAVACION DE PILOTES
SE TERMINA EXCAVACION DE VIGAS
SE APISONA BASE PARA VIGA
CON RANA
ARMADA DE CASTILLOS PARA PILOTES Y VIGA

MARTES 02 DE DICIEMBRE
UN MAESTRO
DOS OFICIALES
CUATRO AYUDANTES

CLIMA LLUVIOSO
ACTIVIDADES: EXCAVACION DE PILOTES
ARMADA DE CASTILLOS Y ARMADA DE
HIERRO DE VIGA

CamScanner
Powered by

MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE
PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
TRES AYUDANTES

CLIMA: LLUVIOSO
ACTIVIDADES: ARMADO DE ACERO
PARA VIGAS APRONTADO DE
BASE PARA VIGAS

LLEGA MATERIAL PARA PREPARACION
DE CONCRETO (MIXTO)
SE HACE EL VACIADO DE 3 PILOTES
CON LA AUTORIZACION DE LA
INTERVENTORIA.

JUEVES 04 DE DICIEMBRE
PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
CUATRO AYUDANTES

CLIMA: SECO
ACTIVIDADES:
VACIADO DE VIGA DE CIMENTACION
PRIMER TRAMO DE 24 MTS
SE CONTINUA CON LA NIVELACION DE
LA TERRAZA PARA LA FUTURA
CONSTRUCCION DEL ANDEN PARTE
FINAL DEL PARQUE

VIERNES 05 DE DICIEMBRE
PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS AYUDANTES
DOS OFICIALES
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON
EL AMARRADO DEL ACERO PARA
LA PARTE RESTANTE DE VIGA


Libro Medio Oficio 80 H. Marden

Martes 9 de diciembre

Personal en obra: un maestro
un residente
dos oficiales
cuatro ayudantes

Clima seco

Actividades: se revisan los encofrados de la viga se indica desplazar los quiebres de la viga a los puntos donde estan ubicados los pilotes a lo que se responde que el plano indica claramente que los quiebres de la viga no tienen nada que ver con los puntos donde los pilotes estan localizados




Miercoles 10 de diciembre

Personal en obra: un maestro
un residente
dos oficiales
cuatro ayudantes

Clima seco

Actividades: se continua construyendo el tramo final de la viga armado de acero y perforacion del ultimo pilote

tambien se arma el castillo del pilote final queda listo para vaciar al final del dia.




Jueves 11 de diciembre

Personal en obra: un maestro
un residente
dos oficiales
cuatro ayudantes

Clima: seco

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON EL ARMADO DE ACERO Y ENCOFRADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIGA TRAMO FINAL




SABADO 13 DE DICIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN OFICIAL
DOS MAESTROS
CUATRO AYUDANTES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES: SE TERMINA DE AJUSTAR EL ENCOFRADO PARA LA VIGA todo QUEDA LISTO Y REVISADO PARA VACIAR MAÑANA A PRIMERA HORA



Libro Medio Oficio 80 H. Marden

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA

PARQUE "ECOPARQUE LOS ALCAZARES"

VIERNES 17 DE OCTUBRE

SE HACE RECONOCIMIENTO DE OBRA CON EL MAESTRO ENCARGADO DE LA OBRA:

SE REVISAN MEDIDAS CON RELACION A LOS PLANOS SUMINISTRADOS

SE ENCARGA AL MAESTRO DEJAR UBICADOS LOS PLOMOS DE LAS COLUMNAS PARA SOLICITAR VISITA DE CHEQUEO Y VALIDACION POR PARTE DEL INGENIERO ESTRUCTURAL DE LA ALCALDIA PARA EL DIA LUNES

Libro Medio Oficio 80 H.

LUNES 27

PERSONAL EN OBRA:
UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

CLIMA: CUBIERTO

ACTIVIDADES: ARMADO DE ACERO CONFORMACION DE CASTILLOS PARA PILOTES

SE VERIFICAN MEDIDA DE PILOTES, CALIBRE DE ACERO y las distancias de los ESTRIBOS.

RECOMENDACION:
DOMETIDA ELECTRICA liberada de uno de los pilotes que no quede Embebida Desplazar y dejar tubería descubierta (Piloto Salia Inclinado a Escalas)

2. TENER CONTRETADORA MECANICA PARA VACIDO DE LOS PILOTES.

3. MUESTRAS DOCIFICACION DE CONCRETO

MARTES 28

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

LLEGA LA CONCRETADORA Y SE PREPARA LA VACIADA DE PILOTES. LA EXPECTATIVA ES TENER TODOS LOS PILOTES VACIADOS PARA EL FINAL DEL DIA.

SE TOMAN TRES MUESTRAS DEL CONCRETO PARA FALLAR EN LABORATORIO

SE TOMAN LAS MUESTRAS Y SE TERMINAN DE VACIAR LOS PILOTES SIN NINGUN CONTRATIEMPO AL FINAL DEL DÍA.

SE TENDRAN QUE SUSPENDER LAS ACTIVIDADES hasta tener las gatas DE ANCLAJES LISTAS PUES SINO NO SE PODRAN VACIAR LOS DADOS.

Powered by CamScanner

VIERNES 01 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN ARQUITECTO
UN OFICIAL
DOS AYUDANTES

CLIMA: SECO
ACTIVIDAD: SE ENCOFRAN LOS DADOS DE SOPORTE PARA LA INSTALACION DE LAS PLATINAS QUE QUEDARAN EMBEBIDAS EN EL CONCRETO PARA SOLDAR LOS TUBOS DE 8"

SE REVISAN NIVELES Y PLOMOS DE LAS PLATINAS Y SE PROCEDE A VACIAR 4DS Y DADOS

SE TERMINA LA ACTIVIDAD A LAS 3:00 PM SIN NOVEDADES

LUNES 08 DE DICIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN OFICIAL
UN MAESTRO
DOS AYUDANTES

CLIMA SECO
ACTIVIDADES: SE RECIBEN EN LA OBRA TODOS LOS TUBOS PARA LA INSTALACION DE REFUERZO DE LA VIGA.

MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE

SE RECIBEN EN OBRA LOS ANDAMIOS

DOS TORRES DE ANDAMIO CERTIFICADO PROVENIENTES DE HERCOLEZ

UNA TORRE DE 2.00 x 1.00 mts
UNA TORRE DE 1.70 x 1.70 mts

Powered by CamScanner

Usuario se autentica

Conexión en serie con el suministro que alimentará los terminales de medición

Se especifican valores y se realiza el retorno previo al inicio de un nuevo ciclo de contacto

Se determina el sistema de cuerda usando los puntos triangulares que serán instalados en la base de cada tubo tanto superior como inferior

Bitacora de obra

Parque: Kilometro 41

Libro Medio Oficio 80 H. Marden

Powered by CamScanner

MARTES 04 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

CLIMA SECO

ACTIVIDADES: SE REALIZA EL MOVIMIENTO DEL ARBOL AL LUGAR PREVISTO Y SE DEMARCAN LAS LINEAS POR DONDE IRAN LAS TUBERIAS PARA LA ILUMINACION DEL PARQUE.

SE INICIAN LAS EXCAVACIONES PARA LAS MISMAS
SE HACE PEDIDO DE MATERIALES PARA ESTAS INSTALACIONES Y PARA EL VACIADO DE LAS LOSAS.

EN HORAS DE LA MAÑANA SE RECIBE VOLQUETA CON AFIRMADO 8 MTS.

MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

CLIMA: SECO

ACTIVIDADES: SE EXCAVAN ZAPATAS PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA ELECTRICA.

SE RECIBE MAS MATERIAL DE AFIRMADO Y SE SACA UN VIAJE DE ESCOMBRO Y TIERRA.

AL FINAL DEL DIA SE TIENEN TODAS LAS BRECHAS EXCAVADAS Y SE INICIA LA DISPOSICION DE LOS PRIMEROS TUBOS CONDUIT.

Powered by CamScanner

LUNES 10 DE NOVIEMBRE
PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
UN AYUDANTE

CUMA SECO:
ACTIVIDADES SE LLENAN LAS BRECHAS
RECTAS 50 ML x 0.4 x 0.4

SE RIEGA MATERIAL DE COMPACTACION
Y SE APISONA CON RANA.

SE REPANTEA TERRENO DE NUEVO

MARTES 11 DE NOVIEMBRE
PERSONAL EN OBRA UN MAESTRO
DOS OFICIALES
UN AYUDANTE

SE CONTINUA REGANDO MATERIAL
PARA COMPACTAR

SE PLANTEA LA PREGUNTA QUE
SE TIENE QUE HACER UN INGRESO
AL PARQUE PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
CONSULTAR LA NECESIDAD DE 4 UNDES
JARDIN
CONFIRMADO NO SE HARAN LOS 30 MTS
DE CANAL EN LAMINA.
REDUCIR LA TUBERIA A 1/2"


SOLICITAR EL PLANO NUEVO CON
LA DISPOSICION DE BANCAS LA "GOLOSA"
Y JARDINES.

DEFINIR EL ALTO DE LA VIA VEHICULAR
PORQUE EL ARBOL LA INVADE.

Powered by CamScanner


Martes 18 de nov
Personal en obra: un maestro
dos oficiales
un ayudante

Clima seco
Actividades: se acomoda acerrado
de piso y se va apisonando
con la rana



Miercoles 19 nov
Personal en obra un oficial
un maestro
un ayudante

Clima: seco
Actividades:
se continua compactando y se
instala la formaleta de madera



Jueves 20 de nov.

Personal en obra: un maestro,
un ayudante
un oficial

Clima seco:
Actividades:
se continua con la compactacion
se hace visita tecnica con el revisor
de la alcaldia.
se revisa y se aprueba el trazado
de la formaleta
se revisan y validan los sectores
para fundir mañana.

Se solicita diariamente, muestras de concreto
(llegue de las medidas de los cilindros
anchos anden 1.20 m a la llegada de la
zona de bancos.



Powered by CamScanner

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA UN MAESTRO
UN AYUDANTE
UN OFICIAL

SE VACIAN TODOS LOS HEXAGONOS DEL PARQUE SIN NOVEDADES

SE HACE UN ACABADO "ESCOBADO" Y SE LIMPIAN CON ACOLLADOR TODOS LOS BORDES.

LUNES 24 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA UN MAESTRO
UN AYUDANTE
UN OFICIAL

CLIMA: SECO

ACTIVIDADES

SE REPLANTEAN LAS CIRCULACIONES DEL PARQUE

SE MARCAN LOS HILOS Y SE APRUEBA CON EL REVISOR DE LA ALCALDIA QUE TODO SE ENCUENTRA MARCADO DE MANERA CORRECTA.

MARTES 25 DE NOVIEMBRE

SE COMPACTA PISO PARA EL VACIADO DE LOS ANDENES Y SE PREPARA LA MEZCLA PARA DEJAR LISTO EL VACIADO PARA EL DÍA DE MAÑANA

Libro Medio Oficio 80 H.

Powered by CamScanner

MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE

SE TIENE LA TOTALIDAD DE LA PLATAFORMA COMPACTADA

SE INICIA PRUEBA DE COMPACTACION POR EL METODO DE CONO DE ARENA

LAS PRUEBAS DAN SATISFACTORIAS TODOS LOS TRES PUNTOS DE MUESTREO ESTAN POR ENCIMA DEL 95%

SE PROGRAMA VACIADO PARA EL DIA DE MAÑANA.

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA UN OFICIAL
UN MAESTRO
DOS AYUDANTES

CLIMA: SECO

ACTIVIDADES: SE INICIA VACIADO A LAS 9:00 AM — TODO EL PROCESO AVANZA SIN CONTRATIEMPOS A LO LARGO DE LA MAÑANA.

SE TERMINA DE VACIAR A LAS 3:50 PM.

SE DEJA "TEMPLAR" EL CONCRETO POR UNA HORA ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE ESTAMPADO DEL MOLDE.

SE TERMINA EL PROCESO DE ESTAMPADO A LAS 6:00 PM.

Libro Medio Oficio 80 H.


Powered by CamScanner

28 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN OFICIAL
DOS AYUDANTES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES: CON EL INGENIERO ELECTRICISTA ASESOR DEL CONTRATO SE DEFINE HACER MAS SENCILLO LA INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO PONER UNOS TUBOS MAS PERO AHORRAR EN CABLEADO PUES LA MANERA COMO ESTA HECHO HARÁ QUE SE CONSUMA MUCHO MAS CABLEADO



Libro Medio Oficio 80 H.

Powered by CamScanner

Bitacora de obra

PARQUE VILLA CAPRI
ARQ. RESIDENTE: WILLIAM R RODRIGUEZ
SST: PAMELA LOPERA GOMEZ
MAESTRO: ESNEIDER QUINTERO
JUEVES 16 DE OCTUBRE

Visita de reconocimiento del frente de trabajo con el maestro encargado de la obra

Se determina hacer solicitud a aguas de manizales de una acometida de agua provisional.

Libro Medio Oficio 80 H.

Powered by CamScanner

VIERNES 07 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
TRES AYUDANTES

CLIMA: SECO

ACTIVIDADES: SE TRAZA EL
APO AL REDEDOR DEL ARBOL PARA
PREPARAR EL VACIADO DE LA LOSA

SE INSTALA TAMBIEN EL ACERO DE
REFUERZO, CONSISTENTE EN MALLA
ELECTROSOLDADA

EN HORAS DE LA TARDE SE VACIA
LA LOSA DE LA TERRAZA

SE TERMINA LA JORNADA SIN
NOVEDADES

Libro Medio Oficio 80 H

SABADO 08 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN OFICIAL
DOS AYUDANTES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON
LAS ACTIVIDADES DE LAVADO
Y SELLADO CON HIDROFUGO

DOMINGO 09 DE NOVIEMBRE

LAS MISMAS PERSONAS DEL
SABADO CON LAS MISMAS
ACTIVIDADES DE LAVADO Y SELLADO
CON HIDROFUGO

Libro Medio Oficio 80 H

Powered by CamScanner

LUNES 10 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA UN MAESTRO
UN OFICIAL
DOS AYUDANTES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON EL LAVADO DE PISOS Y EL HIDROFUGADO DE PAREDES.

NO HAY DEFINICIÓN POR PARTE DE LA ALCALDIA DE LOS COLORES QUE SE VAN A USAR EN LOS JUEGOS NI LOS COLORES QUE SE VAN A USAR EN LAS GRADAS.

MIENTRAS SE CONTINUA CON EL AVANCE DE LAVADO DE PISO Y PAREDES



Mardon


MARTES 11 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
UN AYUDANTE

CLIMA: LLUVIOSO

ACTIVIDADES: SE LIMPIAN GRADAS DE ACCESO AL PARQUE Y SE CONTINUA CON LAVADO Y SELLADO DE PAREDES

LLEVAMOS MAS DE 160 M² DE LAVADO CON HIDROFUGO Y MAS DE 400 M² DE LAVADO DE PISO CON AYUDA DE LA HIDROLAVADORA



JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

SE SOLICITA A LA COORDINACION DEL CONTRATO LA DEFINICION DE LOS COLORES PARA LOS JUEGOS Y PARA LAS GRADAS QUE SE REQUIEREN PINTAR.
NO HAY RESPUESTA Y SE NECESITA AVANZAR EN ESTOS FRENTES

Mardon

Powered by CamScanner

YA QUE PARA TAL EFECTO SE HAN TRAIDO DOS PINTORES

SOLO SE PUEDE AVANZAR EN LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA LA PINTURA DE LAS GRADAS ASI COMO LA LIMPIEZA DE LAS CUBIERTAS DE LOS JUEGOS INFANTILES Y EL MATIZADO DE LA PINTURA PARA RECIBIR LA PINTURA NUEVA.

JUEVES

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

EN LA TARDE DEL DIA DE AYER, SE HA RECIBIDO DE PARTE DEL ARQUITECTO FABER EL DISEÑO ARQUITECTONICO DE LAS TERRAZAS EN LAS QUE SE UBICARAN LOS JUEGOS BIOSALUDABLES DE VILLA CAFE.

Morales

ESTOS JUEGOS SERAN RETIRADOS DE SU UBICACION ACTUAL E INSTALADOS EN UNA NUEVA TERRAZA FORMADA POR 3 HEXAGONOS CONSECUTIVOS DE 1 METRO CADA UNO DE SUS 6 LADOS

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
DOS OFICIALES
UN AYUDANTE

CLIMA SECO

ACTIVIDAD: SE ESTA LAVANDO Y PREPARANDO LA ZONA DE LAS GRADERIAS PARA SER PINTADAS CON LOS COLORES DE LA BANDERA DE MANIZALES TAL COMO SE HA INDICADO POR PARTE DE LA ALCALDIA

- PINTAR LA BANDERA DE MANERA VERTICAL.

SE LES EXPLICA A LOS OFICIALES EN OBRA EL TRAZADO DE LAS TERRAZAS PARA LOS BIOSALUDABLES

Morales

Powered by CamScanner

MARTES 18 DE NOVIEMBRE
PERSONAL EN OBRA UN MAESTRO
UN AYUDANTE
UN OFICIAL

CLIMA: SECO:
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON EL LAVADO DE PISOS Y LA APLICACION DE HIDROFUGO
LA LIMPIEZA Y ADECUACION DE LAS GRADAS PARA PINTURA
Y LA DEMOLICION DE LA LOSA DE PISO DE LA TERRAZA DEL ARBOL DE YARUMO

SE HA INICIADO YA EL DESCAPOTE PARA LAS TERRAZAS EN DONDE SE INSTALARAN LOS JUEGOS

LUNES 24 DE NOVIEMBRE
PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

CLIMA SECO:
ACTIVIDADES: SE ENCUENTRA YA TOTALMENTE EXCAVADA EL AREA DE IMPLANTACION DE LAS TERRAZAS PARA LOS BIOSALUDABLES. PERO SE RECIBE LA INSTRUCCION POR PARTE DEL ARQUITECTO FABER DE LA ALCALDIA DE MODIFICAR EL DISEÑO Y PROCEDER A REPLANTEAR DE NUEVO Y A HACER LA EXCAVACION CORRESPONDIENTE A UNA NUEVA DISPOCISIÓN DE LAS TERRAZAS QUE NOS ACABAN DE SUMINISTRAR.

SE CONTINUA CON LAVADO DE PISO Y ANTEPECHOS

MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

UNA VEZ HECHO EL NUEVO REPLANTEO SE DETERMINA LA NUEVA AREA DE VACIADO. CON ESTA NUEVA GEOMETRIA SE PROCEDE A COMPACTAR. MATERIAL

JUEVES 27 DE NOVIEMBR

PERSONAL EN OBRA: UN MAESTRO
UN OFICIAL
UN AYUDANTE

CLIMA SECO: CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVAR LA TERRAZA QUE LUEGO A DESTIEMPO SE PERDIO EL LAVADO DE LOS ANDENES PERIMETRALES Y AREA DE TRABAJO.

Marden

SE TERMINA LA COMPACTACION CON RANA Y SE INICIARA MAÑANA CON LA INSTALACION DE FORMALETA Y LA COLOCACION DE LA MALLA ELECTROSOLDADA.

9 DE DICIEMBRE

SE RETOMAN ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE CON LA RECOMPACTACION DEL TERRENO Y EL REPUNTEO DE LA FORMALETA PARA EL FINAL DEL DIA YA SE ENCUENTRA LISTA Y CON LA MALLA ELECTROSOLDADA EN POSICION

SE PLANEA VACIAR AL TIEMPO ESTA LOSA Y EL FALTANTE EN LA ZONA DEL ARBOL DE YARUMO

Libro Medio Oficio 80 H.

Marden

Powered by CamScanner

10 DE DICIEMBRE

SE INSTALAN EN EL SITIO LAS 5 PLATINAS PARA LA UBICACION POSTERIOR DE LAS PLATINAS DE ANCLAJE PARA LOS BIOSALUDABLES

SE INSTALAN CON PICOTE DE 30 CMS DE PROFUNDIDAD.

LA ALCALDIA POR INTERMEDIO DEL SUPERVISOR SOLICITAN LA FECHA DE UNA CAJA PARA ACTUAR COMO COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS QUE ENTREGARA DIRECTAMENTE SOBRE UN FILTRO FRANCES ENCONTRADO EN LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DE LA TERRAZA

11 DE DICIEMBRE

PERSONAL EN OBRA UN MAESTRO
DOS OFICIALES
DOS AYUDANTES

CLIMA SECO:

ACTIVIDADES: SE INSTALA LA MALLA ELECTROSOLDADA Y SE PROCEDE CON EL VACIADO DE LA LOSA. LA ACTIVIDAD SE DESARROLLA SIN CONTRATIEMPOS SE TERMINA EL VACIADO AL MEDIO DIA

POR OTRO LADO SE VACIA TAMBIEN LA LOSA DE LA TERRAZA DEL ARBOL DE TARCHO

Powered by CamScanner

12 DE DICIEMBRE

LA BALDOSA DE GRES PARA EL ENCHAPE DE PISO NO LLEGO COMPLETA

SOLO LLEGARON 4 DE LOS 25 MTS2 QUE SE SOLICITARON
SE TENDRA QUE HACER PEDIDO DE NUEVO PARA COMPLETAR EL MATERIAL.

Libro Medio Oficio 80 H.

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON EL ARMADO DE ACERO Y ENCOFRADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIGA TRAMO FINAL

SABADO 13 DE DICIEMBRE

PERSONAL EN OBRA: UN OFICIAL
DOS MAESTROS
CUATRO AYUDANTES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES: SE TERMINA DE AJUSTAR EL ENCOFRADO PARA LA VIGA todo QUEDA LISTO Y REVISADO PARA VACIAR MAÑANA A PRIMERA HORA

Libro Medio Oficio 80 H.

Marden

DICIEMBRE 21

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTAS DE DECOR INOX

SE TERMINA DE INSTALAR A SATISFACCION TODA LA BARANDA EN ACERO INOXIDABLE CON SUS VIDRIOS templados

TODO EL CONJUNTO SE VE BIEN FIRME Y SE RECIBE A SATISFACCION

Libro Medio Oficio 80 H.

Marden

Powered by CamScanner
