INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC No. 2064 de 2025

OBJETO:

Contrato interadministrativo suscrito entre MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – MME y la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. – ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. para la "**IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**".

LUGAR EJECUCIÓN: SANTA MARTA - MAGDALENA

PERIODO DE INFORME:
14 ENERO DE 2026 – 31 DE ENERO 2026.

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
V1.0	07/05/2026	Creación Informe Mensual No. 1 Contrato GGC No. 2064 de 2025


1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto presentar las principales actividades de seguimiento, gestión y control desarrolladas por ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. durante el período reportado, en el marco de las obligaciones derivadas del Contrato Interadministrativo **GGC No. 2064 de 2025**, cuyo objeto es la **"IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".** En este documento se describen las acciones adelantadas por la entidad para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, así como el estado de avance de las actividades técnicas, administrativas, financieras, ambientales y sociales asociadas a su ejecución, para el período comprendido entre el 14 y 31 de enero del año 2026.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto en ejecución se encuentra ubicado en el municipio de Santa Marta en el Departamento del Magdalena. En el municipio se implementarán 1.581 soluciones solares fotovoltaicas (SSFV).

Imagen 1.
Distribución geográfica beneficiarios en Santa Marta, Magdalena.

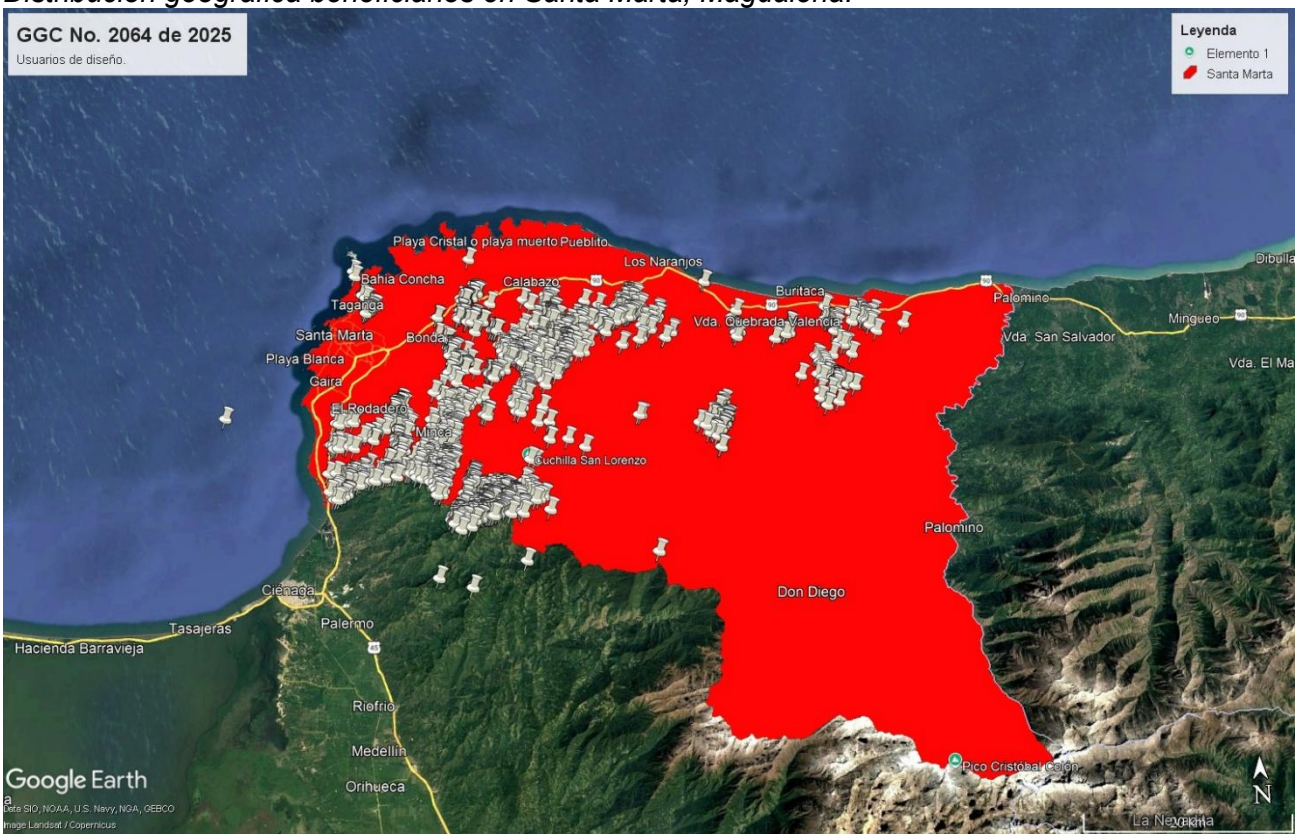

3. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe se presenta con el fin de informar y notificar las actividades jurídicas, financieras, técnicas y demás actividades administrativas desarrolladas por ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P, de conformidad con el Contrato Interadministrativo GGC No. 2064 de 2025.

4. ASPECTOS GENERALES

4.1. Contrato interadministrativo GGC No. 2064 DE 2025

Contrato	Contrato Interadministrativo GGC No. 2064 de 2025
Fecha de firma	10 de diciembre de 2025
Contratante	Ministerio de Minas y Energía
Contratista	Electrificadora del Caquetá S.A E.S.P. - ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. Nit 891.190.127-3
Objeto	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Valor inicial	CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($51.087.244.522,00)
Fecha de Acta de Inicio	14 de enero de 2026
Fecha de inicio	14 de enero de 2026
Plazo inicial de ejecución	31 de julio de 2026

4.2. Modificaciones al Contrato interadministrativo GGC No. 2064 DE 2025

Al cierre del presente informe no se han generado modificaciones contractuales en el contrato interadministrativo.

4.3. Garantías del Contrato interadministrativo GGC No. 2064 DE 2025

Teniendo en cuenta la **CLÁSULA DÉCIMA NOVENA – GARANTÍAS DEL CONTRATISTA,** del contrato interadministrativo GGC No. 2064 de 2025:

El día 10 de diciembre de 2025, se expide la póliza de cumplimiento No. 61-44-101062702 – **Anexo 0**, con Seguros del Estado S.A. Según **firma del contrato**.

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
CUMPLIMIENTO	DESDE 10/12/2025 HASTA 31/01/2029	$ 10.217.448.904,40
PRESTACIONES SOCIALES	DESDE 10/12/2025 HASTA 31/07/2029	$ 2.554.362.226,10
CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE 10/12/2025 HASTA 31/07/2027	$ 10.217.448.904,40
TOTAL		**$ 22.989.260.034,90**

Las pólizas fueron actualizadas en la plataforma SECOP II de acuerdo con las garantías solicitadas en la ejecución del contrato.

5. AVANCE CRONOGRAMA CONTRACTUAL

Durante el presente informe, se adelantan actividades de Etapa 1 y Etapa 2 del Cronograma interadministrativo, establecido con la firma del Acta de inicio.

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	TIEMPO (DIAS)	FECHA FINAL	%	Documento soporte
1	**Etapa 1 - Actividades previas a la contratación y contratación**	**21/12/2025**	**85**	**15/03/2026**	**20%**	**Entregable**
1.1	Firma de Acta de Inicio con Ministerio de Minas Y Energia	21/12/2025	25	14/01/2026	1%	Acta de Inicio Firmada
1.2	Suscripción del contrato de encargo fiduciario	21/12/2025	10	30/12/2025	5%	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
1.3	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad	21/12/2025	10	30/12/2025	1%	Certificación
1.4	Elaboración y publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, para la contratación de los Contratos derivados de obra e Interventoría.	30/12/2025	37	4/02/2026	5%	Terminos de referencia y soporte de publicación en página Web
1.5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	5/02/2026	10	14/02/2026	2%	Actas de evaluación de comité evaluador
1.6	Firma de contratos y suscripción de Acta de inicio	15/02/2026	13	27/02/2026	2%	Contrato de Interventoría y su respectiva Acta de inicio
1.7	Cronograma del contratista de Obra. Aprobado por interventoría y avalado por ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P.	28/02/2026	15	14/03/2026	1%	Cronograma de contratista de obra
1.8	Verificación de ingenieria de detalle aprobada por el interventor y el listado de usuarios y/o comunidades energéticas	28/02/2026	15	14/03/2026	2%	Informe de ajustes técnicos
1.9	Firma Acta de terminación de las Actividades previas a la contratación y contratación, entre ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P., SU CONTRATISTA DERIVADO, EL INTERVENTOR Y EL MME	15/03/2026	1	15/03/2026	1%	Acta firmada
2	**Etapa 2 - Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social de la comunidad energétiva, y Entrega Integral de la Infraestructura**	**16/03/2026**	**125**	**19/07/2026**	**70%**	**Entregable**
2.1	Verificación de listado de Comunidades Energéticas y usuarios asociados beneficiarios del proyecto	16/03/2026	12	27/03/2026	5%	Informe con soportes y Acta de Verificación
2.2	Entrega y aprobación de replanteo	16/03/2026	12	27/03/2026	5%	Informe de replanteo
2.3	Instalación de dos (2) vallas informativas	16/03/2026	30	14/04/2026	1%	Registro fotográfico

2.4	Compra de los equipos y materiales electricos y civiles y transporte a bodega	16/03/2026	15	30/03/2026	5%	Informes y ordenes de compra
2.5	Avance de obra al 10%	28/03/2026	20	16/04/2026	5%	Informe y Acta de recibo parcial - Certificación
2.6	Avance de obra al 60%	28/03/2026	80	15/06/2026	20%	Informe y Acta de recibo parcial - Certificación
2.7	Acta de recibo final de obras 100%	28/03/2026	94	29/06/2026	14%	Acta de Recibo final terminación / Inventario de equipos
2.8	Capacitación a las Comunidades Energéticas y sus usuarios asociados, en el marco de la Escuela TEJ	28/03/2026	90	25/06/2026	5%	Informes mensuales
2.9	Acta de recibo y entrega final entre el administrador, contratista de obra e interventoría	30/06/2026	10	9/07/2026	5%	Actas de recibo entre contratista de interventoria y obra
2.10	Acta de recibo y entrega de la infraestructura energizada, suscrita entre el CONTRATISTA, INTERVENTOR, CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN, SUPERVISOR DEL MINISTERIO Y COMUNIDAD ENERGÉTICA.	10/07/2026	10	19/07/2026	5%	Actas de recibo suscritas entre el MME, ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P., contratista de obra e interventoria.
3	**Etapa 3 - Actividades de Cierre**	**19/07/2026**	**12**	**31/07/2026**	**10%**	**Entregable**
3.1	Suscribir acta de liquidación contrato derivado de obra	19/07/2026	5	23/07/2026	1%	Acta de liquidación firmada por CONTRATISTA DERIVADO y ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. con VoBo de la Interventoría
3.2	Suscribir acta de liquidación contrato de Interventoría	23/07/2026	5	27/07/2026	1%	Acta de liquidación firmada por la INTERVENTORÍA y ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P.
3.3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre y liquidación del Encargo Fiduciario	23/07/2026	8	30/07/2026	2%	Acta de terminación de contrato de encargo fiduciario
3.4	Presentación informe final y documentación soporte por parte de ELECTROCAQUETA S.A E.S.P.	19/07/2026	11	29/07/2026	4%	Informe final y soportes
3.5	Presentar el proyecto del Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el MME, para la liquidación del contrato interadministrativo.	19/07/2026	13	31/07/2026	2%	Acta de liquidación

5.1. Etapa 1 – Actividades previas a la contratación

- ✓ **Item 1.1 – Firma de acta de inicio con Ministerio de Minas y Energía**

  El día 14 de enero de 2026 se suscribió Acta de inicio entre ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA para el Contrato interadministrativo GGC No. 2064 del 2025.

- ✓ **Item 1.2 – Suscripción Encargo Fiduciario**

  El día 30 de diciembre de 2025 se suscribió CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CELEBRADO ENTRE LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. Y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

- ✓ **Item 1.3 – Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad**

  La junta directiva de ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P; aprobó la incorporación de recursos al presupuesto de la entidad y la vigencia fiscal 2025 mediante certificado 247525 de 20 de noviembre de 2025.

- ✓ **Item 1.4 - Elaboración y publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, para la contratación de los Contratos derivados de obra e Interventoría.**

  De acuerdo a las estructuraciones de contratación de ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P; se elaboraron los términos de referencia de contratos derivados y se hizo su respectiva publicación en plataforma web de ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P., correspondiente a los procesos de Solicitud pública de ofertas No. GD-020-2025 y Solicitud pública de ofertas No. GD-021-2025.

- ✓ **Item 1.5 – Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas**

  Se suscribieron: Acta de evaluación No. 006 de la Solicitud pública de ofertas No. GD-020-2025 del 22 enero de 2026 y Acta de evaluación No. 007 de la Solicitud pública de ofertas No. GD-021-2025 del 22 de enero de 2026, del comité evaluador para los procesos de evaluación y adjudicación de los procesos correspondientes para la contratación de los contratistas derivados.

6. PROCESOS CONTRACTUALES

6.1. Contrato de obra

De acuerdo con el proceso de Solicitud pública de ofertas No. GD-020-2025 y el Acta de evaluación No. 006 del 22 de enero de 2026, al corte del mes de enero de 2026, se encuentra en proceso de suscripción del contrato de obra.

6.2. Contrato de prestación de servicios (interventoría)

De acuerdo con el proceso de Solicitud pública de ofertas No. GD-021-2025 y el Acta de evaluación No. 007 del 22 de enero de 2026, al corte del mes de enero de 2026, se encuentra en proceso de suscripción del contrato de prestación de servicios para la administración externa y/o interventoría de la obra.

7. GESTIÓN FINANCIERA

7.1. Contrato de Encargo Fiduciario

Para la administración de los recursos del Contrato Interadministrativo GGC No. 2064 de 2025, el día 30 de diciembre de 2025 se suscribió CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS CELEBRADO ENTRE LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. Y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. del grupo AVAL FIDUCIARIA S.A., y se dio apertura a la cuenta de ahorro No. 256-17710-6 Banco de Occidente.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúa el proceso de contratación de la obra y la administración externa (interventoría) de la obra, mediante solicitud pública de ofertas en el marco del debido proceso y con los lineamientos establecidos según el Convenio interadministrativo GGC No. 2064 DE 2025, así como la constitución del Encargo Fiduciario requerido para la administración de recursos.

9. ANEXOS

A continuación, se relacionan los anexos correspondientes, como soporte del presente informe:

- ✓ 20251211 Póliza de cumplimiento GGC-2064 Anexo 0
- ✓ 20260114 Acta de inicio GGC 2064
- ✓ 20260114 Cronograma GGC 2064 Magdalena
- ✓ ACTA DE EVALUACIÓN 6 GD-020-2025
- ✓ ACTA DE EVALUACIÓN 7 GD-021-2025
- ✓ 20251230 Términos GD-021-2025
- ✓ 20251230 Términos GD-020-2025
- ✓ 20251230 E.F GGC 2064 Magdalena
