	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORIA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 4221 DE 2024 **CONSULTOR:** Universidad Del Cauca

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2025. **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 DE 2024 **INTERVENTOR:** Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia (UPTC)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2024	1113924	C-2402-0600-16-51102A-2402041-02	10	Nación	Contrato principal	$ 10.360.000.000,00
2024	1113924	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	11	Nación	Contrato principal	$ 1.050.000.000,00
2024	1113924	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	16	Nación	Contrato principal	$ 950.000.000,00
						$ 12.360.000.000
2025	519825 4 Julio 2025	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	20	Propios	Adicion No. 1	$ 2.760.000.000,00
						$ 15.120.000.000,00

VALOR DEL CONTRATO: **$ 12.360.000.000,00**
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 15.120.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal 1113924	Saldo Registro Presupuestal 519825	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
		ANTICIPO						$ 6.180.000.000	1113924 / 18-11-2024	$ 6.180.000.000						**EL ITEM CORRESPONDE AL ANTICIPO. SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 ($ 6.180.000.000) Recurso No. 10
1		noviembre-2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.180.000.000	1113924 / 18-11-2024	$ 6.180.000.000		12.360.000.000,00				**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 ($ 6.180.000.000) Recurso No. 10
2		diciembre-2024	$ 136.922.000	$ -	$ 136.922.000	$ 68.461.000	$ 68.461.000	$ 6.111.539.000	1113924 / 18-11-2024	$ 6.111.539.000		12.223.078.000,00				**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 ($ 6.111.539.000) Recurso No. 10
3		enero-2025	$ 97.850.000	$ -	$ 97.850.000	$ 48.925.000	$ 48.925.000	$ 6.062.614.000	1113924 / 18-11-2024	$ 6.062.614.000		12.125.228.000,00				**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 ($ 6.062.614.000) Recurso No. 10
4		febrero-2025	$ 97.870.000	$ -	$ 97.870.000	$ 48.935.000	$ 48.935.000	$ 6.013.679.000	1113924 / 18-11-2024	$ 6.013.679.000		12.027.358.000,00				**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 ($ 6.013.679.000) Recurso No. 10
5		marzo-2025	$ 97.870.000	$ -	$ 97.870.000	$ 48.935.000	$ 48.935.000	$ 5.964.744.000	1113924 / 18-11-2024	$ 5.964.744.000		11.929.488.000,00				**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 ($ 5.964.744.000) Recurso No. 10
6		abril-2025	$ 97.870.000	$ -	$ 97.870.000	$ 48.935.000	$ 48.935.000	$ 5.915.809.000	1113924 / 18-11-2024	$ 5.915.809.000		11.831.618.000,00				**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 ($ 5.915.809.000) Recurso No. 10
7		mayo-2025	$ 936.122.400	$ -	$ 936.122.400	$ 468.061.200	$ 468.061.200	$ 5.447.747.800	1113924 / 18-11-2024	$ 5.447.747.800		10.895.495.600,00				**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 ($5.447.747.800) Recurso No. 10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORIA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal 1113924	Saldo Registro Presupuestal 519825	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
8		junio-2025	$ 199.582.600		$ 199.582.600	$ 99.791.300	$ 99.791.300	$ 5.347.956.500	1113924 / 18-11-2024	$ 5.347.956.500		10.695.913.000,00				**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 ($5.347.956.500) Recurso No. 10
9		julio-2025	$ 162.979.600		$ 162.979.600	$ 81.489.800	$ 81.489.800	$ 5.266.466.700	1113924 / 18-11-2024	$ 5.266.466.700	$ 2.760.000.000	13.292.933.400,00				**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 ($5.266.466.700) Recurso No. 10 C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 ($2.760.000.000) Recurso No. 20
10		agosto-2025	$ 1.831.157.615		$ 1.831.157.615	$ 183.115.762	$ 1.648.041.854	$ 5.083.350.939	1113924 / 18-11-2024	$ 3.618.424.847	$ 2.760.000.000	11.461.775.785,00				**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 ($3.618.424.847) Recurso No. 10 C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 ($2.760.000.000) Recurso No. 20
11		septiembre-2025	$ 361.206.876		$ 361.206.876	$ 36.120.687,60	$ 325.086.188,40	$ 5.047.230.250,90	1113924 / 18-11-2024	$ 3.293.338.658,10	$ 2.760.000.000	11.100.568.909,00				**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 ($1.913.338.658,1) Recurso No. 10 C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 ($2.760.000.000) Recurso No. 20
		ANTICIPO ADICIONAL No. 1						$ 1.380.000.000	519825 / 4- 7-2025	$ 1.913.338.658	$ 2.760.000.000	11.100.568.909,00				**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402041-02 ($1.913.338.658,1) Recurso No. 10 C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 ($2.760.000.000) Recurso No. 20
12		octubre-2025	$ 2.126.369.756		$ 2.126.369.756	$ 212.636.975,60	$ 1.913.732.780,40	$ 4.834.593.275	1113924 / 18-11-2024	$ -	$ 2.759.605.878	8.974.199.153,00				**SALDO DE CADA RECURSO** C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 ($2.759.605.877,7) Recurso No. 20
TOTALES			**$ 6.145.800.847,00**	**$ -**	**$ 6.145.800.847,00**	**$ 1.345.406.724,70**	**$ 4.800.394.122,30**	**$ 4.834.593.275,30**		**$ -**	**$ 2.759.605.877,70**	**$ 8.974.199.153,00**				

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
1. Acta No. 1. Noviembre 2024	$ -		**$ -**
2. Acta No. 2. Diciembre 2024	$ 136.922.000		**$ 136.922.000**
3. Acta No. 3. Enero 2025	$ 97.850.000		**$ 97.850.000**
4. Acta No. 4. Febrero 2025	$ 97.870.000		**$ 97.870.000**
5. Acta No. 5. Marzo 2025	$ 97.870.000		**$ 97.870.000**
6. Acta No. 6. Abril 2025	$ 97.870.000		**$ 97.870.000**
7. Acta No. 7. Mayo 2025	$ 936.122.400		**$ 936.122.400**
8. Acta No. 8. Junio 2025	$ 199.582.600		**$ 199.582.600**
9. Acta No. 9. Julio 2025	$ 162.979.600		**$ 162.979.600**
10. Acta No. 10. Agosto 2025	$ 1.831.157.615		**$ 1.831.157.615**
11. Acta No. 11. Septiembre 2025	$ 361.206.876		**$ 361.206.876**
12. Acta No. 12. Octubre 2025	$ 2.126.369.756		**$ 2.126.369.756**
VALOR TOTAL	$ 6.145.800.847	$ -	**$ 6.145.800.847**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 19202-153851 CAU

Firma
NOMBRE: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA PROFESIONAL No. 01193-0243 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	FORMATO DE INFORME DE INTERVENTORIA		

ANEXO 4

MEPI-MN1-IN-15-FR-12
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. uptcguapi4234@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORIA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 23/07/2025
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4221 DE 2024 **CONSULTOR:** Universidad Del Cauca

OBJETO DEL CONTRATO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

FECHA DE INICIO: 22/11/2024
PLAZO INICIAL: 1.30 Meses
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 12.360.000.000,00
VALOR ACUMULADO: $ 12.360.000.000,00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234 DE 2024 **INTERVENTOR:** Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia (UPTC)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.236.000.000,00	31	12	2024	1	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 6.180.000.000,000	31	12	2024	1	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 2.472.000.000,000	31	12	2024	31	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 3.708.000.000,000	31	12	2024	31	12	2029
Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORIA								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435 - 47 - 994000058336
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/11/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.236.000.000,00	31	10	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 6.180.000.000,000	31	10	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 2.472.000.000,000	31	10	2024	31	12	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 3.708.000.000,000	31	12	2024	31	12	2029
Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORIA								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000058336

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 6/12/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.236.000.000,00	31	10	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 6.180.000.000,000	31	10	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 2.472.000.000,000	31	10	2024	31	12	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 3.708.000.000,000	31	12	2024	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORIA								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000058336

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.236.000.000,00	31	10	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 6.180.000.000,000	31	10	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 2.472.000.000,000	31	10	2024	1	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 3.708.000.000,000	31	12	2024	31	12	2030

FECHA 23/07/2025 (Día) (Mes) (Año)

Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORIA									

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000058336

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/05/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** 2 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.512.000.000	24	6	2025	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 7.560.000.000	24	6	2025	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 3.024.000.000	24	6	2025	1	1	2029
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 4.536.000.000	31	12	2024	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de CONSULTORIA								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000058336

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 23/07/2025

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

Las polizas con los anexos No.5 y No.6 fueron expedidas por la Aseguradora con errores, razon por la cual, la poliza definitiva es la del Anexo 7.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORIA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÌAS Y SEGUROS CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	23/07/2025
	(Día) (Mes) (Año)

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma:

Nombre: Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 19202-153851 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5

MEPI-MN1-IN-2-FR-1
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
CONTRATO DE CONSULTORIA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. uptcguapi4234@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **19/09/2025**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CAUCA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 4221 de 2024 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** Universidad del Cauca

OBJETO DEL CONTRATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234 de 2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR PROYECTADO	VR MES 1	VR MES 2	VR MES 3	VR MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de honorarios del personal del contrato	$ 1.902.000.000,00	$ 700.000.000,00	$ 475.500.000,00	$ 475.500.000,00	$ 251.000.000,00	$ 1.902.000.000,00	30,78%
2	Viáticos personal del contrato	$ 100.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 100.000.000,00	1,62%
3	Comisiones de Topografía (incluye compra equipos)	$ 2.750.000.000,00	$ 687.500.000,00	$ 687.500.000,00	$ 687.500.000,00	$ 687.500.000,00	$ 2.750.000.000,00	44,50%
4	Adquisición de Cartografía	$ 30.000.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ 30.000.000,00	0,49%
5	Transportes Aéreos	$ 93.000.000,00	$ 23.250.000,00	$ 23.250.000,00	$ 23.250.000,00	$ 23.250.000,00	$ 93.000.000,00	1,50%
6	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 48.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 48.000.000,00	0,78%
7	Alquiler de Vehículo	$ 70.000.000,00	$ 17.500.000,00	$ 17.500.000,00	$ 17.500.000,00	$ 17.500.000,00	$ 70.000.000,00	1,13%
8	Otros Transportes Lanchas (incluye combustible y motorista), avioneta, helicóptero, etc.)	$ 120.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 120.000.000,00	1,94%
9	Edición de Informes (Semanales, mensuales)	$ 10.000.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 10.000.000,00	0,16%
10	Georreferenciación	$ 30.000.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	$ 30.000.000,00	0,49%
11	Barreno Manual	$ 100.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 100.000.000,00	1,62%
12	Perforaciones en Suelos	$ 207.000.000,00	$ 51.750.000,00	$ 51.750.000,00	$ 51.750.000,00	$ 51.750.000,00	$ 207.000.000,00	3,35%
13	Ensayos de Laboratorio (software)	$ 210.000.000,00	$ 52.500.000,00	$ 52.500.000,00	$ 52.500.000,00	$ 52.500.000,00	$ 210.000.000,00	3,40%
14	Dotación de oficina (adquisición de equipos, mobiliario y elementos de papelería y oficina)	$ 300.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000,00	4,85%
15	Gestiones Ambientales, Sociales y Prediales	$ 210.000.000,00	$ 52.500.000,00	$ 52.500.000,00	$ 52.500.000,00	$ 52.500.000,00	$ 210.000.000,00	3,40%
	TOTAL	**$ 6.180.000.000,00**	$ 1.994.500.000,00	$ 1.470.000.000,00	$ 1.470.000.000,00	$ 1.245.500.000,00	**$ 6.180.000.000,00**	100%

$ -

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: Fernando Nicolás Chacon Penagos
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 19202-153851 CAU

Firma:
Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	FORMATO DE INFORME DE CONSULTORIA	

ANEXO 6

MEPI-MN1-IN-2-FR-2
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

UNIVERSDIAD DEL CAUCA
Sede Central Cl 5 #4-70, Centro, Popayán, Cauca
E mail. consultoriapopayan.guapi@unicauca.edu.co

		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 5 **MES:** OCTUBRE 2025. **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4221 de 2024 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. **DE** ENTIDAD FINANCIERA:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 520334756 **BANCO** BANCO DE BOGOTA SUCURSAL: POPAYÁN
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 50 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 6.180.000.000,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN - GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234 de 2024 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
EGRESO	D611 202505688	24/09/2025	LINA VANESSA BERMUDEZ PAZ	$ 4.400.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202505689	24/09/2025	CAMILA ANDREA MUÑOZ GAMBOA	$ 3.800.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202505763	29/09/2025	FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS	$ 15.360.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202505881	3/10/2025	ANGELA PATRICIA MERA SOLARTE	$ 5.493.600	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202505879	3/10/2025	PAOLA ANDREA ACOSTA NATES	$ 5.000.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202505923	7/10/2025	JULIAN HERNANDO OROZCO LEDEZMA	$ 12.067.500	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202505924	7/10/2025	LINA MARIA AGREDO QUINTANA	$ 1.423.500	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202505925	7/10/2025	WILMER ARLEY CAMPAÑA DIAZ	$ 12.067.500	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506155	10/10/2025	ALMA ROCIO VELASCO VIDAL	$ 5.000.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506156	10/10/2025	HAROLD ANDRES ORTEGA	$ 9.182.160	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506157	10/10/2025	CAMILA ANDREA MUÑOZ GAMBOA	$ 3.800.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506154	10/10/2025	CAMILO ANDRES SALAZAR ORTEGA	$ 1.423.500	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506158	10/10/2025	WILMER ARLEY CAMPAÑA DIAZ	$ 12.067.500	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506218	14/10/2025	CLAUDIA CECILIA VALENCIA CAMARGO	$ 5.493.600	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506216	14/10/2025	GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO	$ 9.182.160	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506217	14/10/2025	YAMILETH GRANDE DIAZ	$ 3.800.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506329	17/10/2025	LINA VANESSA BERMUDEZ PAZ	$ 4.400.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506397	20/10/2025	JESSIKA CATHERINE MUESES TUPUE	$ 5.250.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506396	20/10/2025	MARIA CAMILA GUERRERO EMBUS	$ 5.250.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506437	21/10/2025	CARLOS IGNACIO PAZ ACHIPIS	$ 5.927.556	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506441	21/10/2025	FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS	$ 15.360.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506440	21/10/2025	HAROLD ANDRES ORTEGA	$ 9.182.860	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506439	21/10/2025	JULIAN HERNANDO OROZCO LEDEZMA	$ 12.067.500	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506438	21/10/2025	NAPOLEON ZAMBRANO ALFONSO	$ 5.927.556	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202506504	23/10/2025	HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ	$ 12.067.500	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	D611 202505788	30/09/2025	JUAN CARLOS CASAS ZAPATA	$ 1.200.000	1	GESTIONES AMBIENTALES Y
EGRESO	D611 202505827	1/10/2025	ALMA ROCIO VELASCO VIDAL	$ 13.330.000	1	GESTIONES AMBIENTALES Y
EGRESO	D611 202505828	1/10/2025	JAIRO ELICIO TOCANCIPA FALLA	$ 1.500.000	1	VIATICOS
EGRESO	D611 202505828	1/10/2025	JAIRO ELICIO TOCANCIPA FALLA	$ 1.000.000	1	TRANSPORTE AÉREO
EGRESO	D611 202505826	1/10/2025	PAOLA ANDREA ACOSTA NATES	$ 1.500.000	1	VIATICOS
EGRESO	D611 202505826	1/10/2025	PAOLA ANDREA ACOSTA NATES	$ 1.000.000	1	TRANSPORTE AÉREO
EGRESO	D611 202505826	1/10/2025	PAOLA ANDREA ACOSTA NATES	$ 5.000.000	1	OTROS TRANSPORTES
EGRESO	D611 202505826	1/10/2025	PAOLA ANDREA ACOSTA NATES	$ 3.600.000	1	GESTIONES AMBIENTALES Y
EGRESO	D611 202505825	1/10/2025	FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS	$ 600.000	1	VIATICOS
EGRESO	D611 202505825	1/10/2025	FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS	$ 1.609.980	1	TRANSPORTE AÉREO
EGRESO	D611 202505825	1/10/2025	FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS	$ 1.900.000	1	GESTIONES AMBIENTALES Y
EGRESO	D611 202505917	6/10/2025	WILMER ARLEY CAMPAÑA DIAZ	$ 5.500.000	1	ENSAYO DE LABORATORIO
EGRESO	D611 202505988	7/10/2025	JUAN CARLOS CASAS ZAPATA	$ 2.500.000	1	GESTIONES AMBIENTALES Y
EGRESO	D611 202506223	14/10/2025	ALMA ROCIO VELASCO VIDAL	$ 6.100.000	1	GESTIONES AMBIENTALES Y
EGRESO	D611 202506219	14/10/2025	FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS	$ 1.500.000	1	VIATICOS
EGRESO	D611 202506219	14/10/2025	FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS	$ 1.519.700	1	TRANSPORTE AÉREO
EGRESO	D611 202506220	14/10/2025	CLAUDIA CECILIA VALENCIA CAMARGO	$ 900.000	1	VIATICOS
EGRESO	D611 202506220	14/10/2025	CLAUDIA CECILIA VALENCIA CAMARGO	$ 947.530	1	TRANSPORTE AÉREO
EGRESO	D611 202506222	14/10/2025	MATEO FERNANDO DIAZ ASTAIZA	$ 1.200.000	1	VIATICOS
EGRESO	D611 202506224	14/10/2025	CAMILO ANDRES SALAZAR ORTEGA	$ 1.400.000	1	GESTIONES AMBIENTALES Y
EGRESO	D611 202506221	14/10/2025	WILMER ARLEY CAMPAÑA DIAZ	$ 1.200.000	1	VIATICOS
EGRESO	D611 202506221	14/10/2025	WILMER ARLEY CAMPAÑA DIAZ	$ 995.830	1	TRANSPORTE AÉREO
EGRESO	D611 202506316	17/10/2025	GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO	$ 4.500.000	1	VIATICOS
EGRESO	D611 202506317	17/10/2025	JEFERSON FREDDY CUBIDES	$ 4.500.000	1	VIATICOS
EGRESO	D611 202506317	17/10/2025	JEFERSON FREDDY CUBIDES	$ 1.190.000	1	GESTIONES AMBIENTALES Y
EGRESO	D611 202505831	1/10/2025	JUAN CARLOS POSADA	$ 880.592.402	1	COMISIONES DE TOPOGRAFIA

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE CONSULTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Pago de honorarios del personal del contrato	$ 1.902.000.000,00	$ 399.858.700,00	$ 184.993.992,00	$ 584.852.692,00	$ 1.317.147.308,00
2	Viáticos personal del contrato	$ 100.000.000,00	$ 23.700.000,00	$ 17.400.000,00	$ 41.100.000,00	$ 58.900.000,00
3	Comisiones de Topografía (incluye compra equipos)	$ 2.750.000.000,00	$ -	$ 880.592.402,00	$ 880.592.402,00	$ 1.869.407.598,00
4	Adquisición de Cartografía	$ 30.000.000,00			$ -	$ 30.000.000,00
5	Transportes Aéreos	$ 93.000.000,00	$ 22.241.618,00	$ 7.073.040,00	$ 29.314.658,00	$ 63.685.342,00
6	Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del	$ 48.000.000,00			$ -	$ 48.000.000,00
7	Alquiler de Vehículo	$ 70.000.000,00			$ -	$ 70.000.000,00
8	Otros Transportes Lanchas (incluye combustible y	$ 120.000.000,00	$ 83.588.480,00	$ 5.000.000,00	$ 88.588.480,00	$ 31.411.520,00
9	Edición de Informes (Semanales, mensuales)	$ 10.000.000,00			$ -	$ 10.000.000,00
10	Georreferenciación	$ 30.000.000,00			$ -	$ 30.000.000,00
11	Barreno Manual	$ 100.000.000,00			$ -	$ 100.000.000,00
12	Perforaciones en Suelos	$ 207.000.000,00			$ -	$ 207.000.000,00
13	Ensayos de Laboratorio (software)	$ 210.000.000,00	$ 118.539.006,00	$ 5.500.000,00	$ 124.039.006,00	$ 85.960.994,00
14	Dotación de oficina (adquisición de equipos, mobiliario	$ 300.000.000,00			$ -	$ 300.000.000,00
15	Gestiones Ambientales, Sociales y Prediales	$ 210.000.000,00	$ 107.151.000,00	$ 31.220.000,00	$ 138.371.000,00	$ 71.629.000,00
	TOTALES	**$ 6.180.000.000,00**		**$ 1.131.779.434,00**	**$ 1.886.858.238,00**	**$ 4.293.141.762,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (Septiembre 2025) : $ 1.145.652.00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 7.524.875,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
No. 202500074	$ 2.130.619		Marzo- abril- mayo	11/06/2025	$ 2.130.619
No. 202500089	$ 1.750.084		Junio	16/07/2025	$ 3.880.703,00
No. 202500104	$ 1.268.765		Julio	19/08/2025	$ 5.149.468,00
No. 202500113	$ 1.229.755		Agosto	10/09/2025	$ 6.379.223,00
No. 202500131	$ 1.145.652		Septiembre	9/10/2025	$ 7.524.875,00

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Consultoria
Matrícula Profesional No.: 19202-153851 CAU

Firma:
Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPTIVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Universidad del Cauca

RELACIÓN BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

RELACION MANEJO DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NUMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES
EGRESO	D611 202505688	24/09/2025	LINA VANESSA BERMUDEZ PAZ	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS LINA BERMUDEZ PAZ SEPT"
EGRESO	D611 202505689	24/09/2025	CAMILA ANDREA MUÑOZ GAMBOA	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS CAMILA ANDREA GAMBOA SEPT"
EGRESO	D611 202505763	29/09/2025	FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS FERNANDO CHACON PENAGOS CEPT"
EGRESO	D611 202505881	3/10/2025	ANGELA PATRICIA MERA SOLARTE	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS ANGELA PATRICIA MERA"
EGRESO	D611 202505879	3/10/2025	PAOLA ANDREA ACOSTA NATES	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS PAOLA NATES"
EGRESO	D611 202505923	7/10/2025	JULIAN HERNANDO OROZCO LEDEZMA	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS JULIAN HERNANDO LEDEZMA 1"
EGRESO	D611 202505924	7/10/2025	LINA MARIA AGREDO QUINTANA	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS LINA MARIA AGREDO"
EGRESO	D611 202505925	7/10/2025	WILMER ARLEY CAMPAÑA DIAZ	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS WILMER ARLEY CAMPAÑA"
EGRESO	D611 202506155	10/10/2025	ALMA ROCIO VELASCO VIDAL	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS ALMA ROCIO VELASCO 10 OCT"
EGRESO	D611 202506156	10/10/2025	HAROLD ANDRES ORTEGA	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS HAROLD ANDRES ORTEGA 10 OCT"
EGRESO	D611 202506157	10/10/2025	CAMILA ANDREA MUÑOZ GAMBOA	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS CAMILA ANDREA GAMBOA 10 OCT"
EGRESO	D611 202506154	10/10/2025	CAMILO ANDRES SALAZAR ORTEGA	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS CAMILO ANDRES SALAZAR ORTEGA 10 OCT"
EGRESO	D611 202506158	10/10/2025	WILMER ARLEY CAMPAÑA DIAZ	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS WILMER ARLEY CAMPAÑA 10 OCT"
EGRESO	D611 202506218	14/10/2025	CLAUDIA CECILIA VALENCIA CAMARGO	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS CLAUDIA CECILIA VALENCIA"
EGRESO	D611 202506216	14/10/2025	GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS GONZALO ANDRES RIVERA"
EGRESO	D611 202506217	14/10/2025	YAMILETH GRANDE DIAZ	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS YAMILETH GRANDE DIAZ"
EGRESO	D611 202506329	17/10/2025	LINA VANESSA BERMUDEZ PAZ	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS LINA BERMUDEZ PAZ OCT"
EGRESO	D611 202506397	20/10/2025	JESSIKA CATHERINE MUESES TUPUE	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPSJESSIKA MUESES"
EGRESO	D611 202506396	20/10/2025	MARIA CAMILA GUERRERO EMBUS	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS MARIA CAMILA GUERRERO"
EGRESO	D611 202506437	21/10/2025	CARLOS IGNACIO PAZ ACHIPIS	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS CARLOS IGNACIO PAZ"
EGRESO	D611 202506441	21/10/2025	FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS FERNANDO CHACON PENAGOS OCT"
EGRESO	D611 202506440	21/10/2025	HAROLD ANDRES ORTEGA	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS HAROLD ANDRES ORTEGA"
EGRESO	D611 202506439	21/10/2025	JULIAN HERNANDO OROZCO LEDEZMA	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS JULIAN HERNANDO LEDEZMA 2"
EGRESO	D611 202506438	21/10/2025	NAPOLEON ZAMBRANO ALFONSO	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS NAPOLEON ZAMBRANO ALFONSO"
EGRESO	D611 202506504	23/10/2025	HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: OPS: con nombre "OPS HENRY TROCHEZ"
EGRESO	D611 202505788	30/09/2025	JUAN CARLOS CASAS ZAPATA	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "1"
EGRESO	D611 202505827	1/10/2025	ALMA ROCIO VELASCO VIDAL	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "2"
EGRESO	D611 202505828	1/10/2025	JAIRO ELICIO TOCANCIPA FALLA	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "3"
EGRESO	D611 202505826	1/10/2025	PAOLA ANDREA ACOSTA NATES	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "4"
EGRESO	D611 202505825	1/10/2025	FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "5"
EGRESO	D611 202505917	6/10/2025	WILMER ARLEY CAMPAÑA DIAZ	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "6"
EGRESO	D611 202505988	7/10/2025	JUAN CARLOS CASAS ZAPATA	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "7"
EGRESO	D611 202506223	14/10/2025	ALMA ROCIO VELASCO VIDAL	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "8"
EGRESO	D611 202506219	14/10/2025	FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "9"
EGRESO	D611 202506220	14/10/2025	CLAUDIA CECILIA VALENCIA CAMARGO	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "10"
EGRESO	D611 202506222	14/10/2025	MATEO FERNANDO DIAZ ASTAIZA	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "11"
EGRESO	D611 202506224	14/10/2025	CAMILO ANDRES SALAZAR ORTEGA	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "12"
EGRESO	D611 202506221	14/10/2025	WILMER ARLEY CAMPAÑA DIAZ	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "13"
EGRESO	D611 202506316	17/10/2025	GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "14"
EGRESO	D611 202506317	17/10/2025	JEFERSON FREDDY CUBIDES	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "15"
EGRESO	D611 202505831	1/10/2025	JUAN CARLOS POSADA	Archivo en carpeta: Soportes Octubre: Avances: con nombre "16"

ANEXO 7

MEPI-MN1-IN-6-FR-1
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. uptcguapi4234@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 26/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4221 DEL 2014

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

PLAZO INICIAL: 1,3 Meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 13,3 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CO 22/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONSULTOR: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VALOR INICIAL (incluido IV $ 12.360.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 2.760.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 DEL 2024

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 15.120.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 nov-24	2 dic-24	3 ene-25	4 feb-25	5 mar-25	6 abr-25	7 may-25	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 2.171.076.000,00	17,57%	4,51%	% P	0,19%	3,53%	1,46%	0,78%	0,78%	1,46%	$ 0,01	
		$ 2.171.076.000,00		$ P	$ 22.965.660,00	$ 436.347.540,00	$ 180.660.000,00	$ 96.540.000,00	$ 96.540.000,00	$ 180.660.000,00	$ 180.660.000,00	100,00%
	$ 2.171.076.000,00	$ 557.264.400,00	$ 557.264.400,00	$ E		$ 63.192.000,00	$ 96.540.000,00	$ 96.540.000,00	$ 96.540.000,00	$ 96.540.000,00	$ 107.912.400,00	
		4,51%		% E	0,00%	0,51%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	$ 0,01	
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	**$ 2.171.076.000,00**											
HITO I - FASE III VÍA NUEVA - VULÚMENES DEL TRAMO GUAPI - NAPI LOG APROX 68 KM												
ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	$ 20.000.000,00	0,16%	0,06%	% P	0,01%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%	
		$ 20.000.000,00		$ P	$ 1.000.000,00	$ 19.000.000,00		$ -	$ -	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	97,33%
	$ 20.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ E							$ 8.000.000,00	
		0,06%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO	$ 140.000.000,00	1,13%	0,45%	% P	0,06%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,37%	
		$ 140.000.000,00		$ P	$ 7.000.000,00	$ 133.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 28.000.000,00	$ 56.000.000,00	96,00%
	$ 140.000.000,00	$ 56.000.000,00	$ 56.000.000,00	$ E							$ 56.000.000,00	
		0,45%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 20.000.000,00	0,16%	0,06%	% P	0,01%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%	
		$ 20.000.000,00		$ P	$ 1.000.000,00	$ 19.000.000,00	$ -	$ -		$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	94,67%
	$ 20.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ E							$ 8.000.000,00	
		0,06%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	
ESTUDIO DE GEOLOGÍA	$ 70.000.000,00	0,57%	0,23%	% P	0,03%	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	
		$ 70.000.000,00		$ P	$ 3.500.000,00	$ 66.500.000,00	$ -	$ -		$ 23.330.000,00	$ 28.000.000,00	93,33%
	$ 70.000.000,00	$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00	$ E							$ 28.000.000,00	
		0,23%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA	$ 30.000.000,00	0,24%	0,10%	% P	0,01%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	
		$ 30.000.000,00		$ P	$ 1.500.000,00	$ 28.500.000,00	$ -	$ -		$ 10.000.000,00	$ 12.000.000,00	92,00%
	$ 30.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ E							$ 12.000.000,00	
		0,10%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN FASE II AVANZADA	$ 90.000.000,00	0,73%	0,29%	% P	0,04%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,24%	
		$ 90.000.000,00		$ P	$ 4.500.000,00	$ 85.500.000,00	$ -	$ -		$ 18.000.000,00	$ 36.000.000,00	90,67%
	$ 90.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ E							$ 36.000.000,00	
		0,29%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES FASE II AVANZADA	$ 90.000.000,00	0,73%	0,29%	% P	0,04%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,24%	
		$ 90.000.000,00		$ P	$ 4.500.000,00	$ 85.500.000,00	$ -	$ -		$ 22.500.000,00	$ 36.000.000,00	89,33%
	$ 90.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ E							$ 36.000.000,00	
		0,29%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	
ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO	$ 50.000.000,00	0,40%	0,16%	% P	0,02%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,13%	
		$ 50.000.000,00		$ P	$ 2.500.000,00	$ 47.500.000,00	$ -	$ -		$ 17.000.000,00	$ 20.000.000,00	88,00%
	$ 50.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ E							$ 20.000.000,00	
		0,16%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	$ 110.000.000,00	0,89%	0,36%	% P	0,04%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,29%	
		$ 110.000.000,00		$ P	$ 5.500.000,00	$ 104.500.000,00	$ -	$ -		$ 22.000.000,00	$ 44.000.000,00	86,67%
	$ 110.000.000,00	$ 44.000.000,00	$ 44.000.000,00	$ E							$ 44.000.000,00	
		0,36%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS FASE II AVANZADA	$ 210.000.000,00	1,70%	0,68%	% P	0,08%	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	0,56%	
		$ 210.000.000,00		$ P	$ 10.500.000,00	$ 199.500.000,00	$ -	$ -		$ 42.000.000,00	$ 84.000.000,00	85,33%
	$ 210.000.000,00	$ 84.000.000,00	$ 84.000.000,00	$ E							$ 84.000.000,00	
		0,68%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	
ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 30.000.000,00	0,24%	0,10%	% P	0,01%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,08%	
		$ 30.000.000,00		$ P	$ 1.500.000,00	$ 28.500.000,00	$ -	$ -		$ 15.000.000,00	$ 12.000.000,00	84,00%
	$ 30.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ E							$ 12.000.000,00	
		0,10%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	
ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL (LINEAMIENTOS AMBIENTALES Y SOCIALES)	$ 200.000.000,00	1,62%	0,03%	% P	0,08%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,03%	
		$ 200.000.000,00		$ P	$ 10.000.000,00	$ 190.000.000,00	$ -	$ -		$ 28.600.000,00	$ 4.000.000,00	82,67%
	$ 200.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ E							$ 4.000.000,00	
		0,03%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	
ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL	$ 50.000.000,00	0,40%	0,16%	% P	0,02%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,13%	
		$ 50.000.000,00		$ P	$ 2.500.000,00	$ 47.500.000,00	$ -	$ -		$ 17.000.000,00	$ 20.000.000,00	81,33%
	$ 50.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ E							$ 20.000.000,00	
		0,16%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	
ESTUDIO GESTIÓN DEL RIESGO	$ 20.000.000,00	0,16%	0,08%	% P	0,01%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,07%	
		$ 20.000.000,00		$ P	$ 1.000.000,00	$ 19.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 8.000.000,00	$ 10.000.000,00	80,00%
	$ 20.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ E							$ 10.000.000,00	
		0,08%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	
ESTUDIO GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	$ 50.000.000,00	0,40%	0,20%	% P	0,02%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,17%	
		$ 50.000.000,00		$ P	$ 2.500.000,00	$ 47.500.000,00			$ -	$ 12.500.000,00	$ 25.000.000,00	78,67%
	$ 50.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ E							$ 25.000.000,00	
		0,20%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	
ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE CONSULTORIAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	$ 50.000.000,00	0,40%	0,08%	% P	0,02%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,07%	
		$ 50.000.000,00		$ P	$ 2.500.000,00	$ 47.500.000,00	$ -	$ -		$ 12.500.000,00	$ 10.000.000,00	77,33%
	$ 50.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ E							$ 10.000.000,00	
		0,08%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	$ 20.000.000,00	0,16%	0,08%	% P	0,01%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	
		$ 20.000.000,00		$ P	$ 1.000.000,00	$ 19.000.000,00	$ -	$ -			$ 10.000.000,00	76,00%
	$ 20.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ E							$ 10.000.000,00	
		0,08%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 26/06/2025 (Día / Mes / Año)

| | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 26/06/2025 (Día / Mes / Año)

| | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 26/06/2025 (Día / Mes / Año)

COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL.	$ 175.154.250,00	1,42%	0,00%	% P	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	2,67%
		$ 175.154.250,00		$ P											
	$ 175.154.250,00	$ -	$ -	$ E											
		0,00%		% E	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	
ESTUDIO HIDRÁULICO, GEOTÉCNICO Y ESTRUCTURAL DE UN PUENTE SOBRE EL RIO MICAY	$ 300.000.000,00	2,43%	0,00%	% P	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	1,33%
		$ 300.000.000,00		$ P											
	$ 300.000.000,00	$ -	$ -	$ E											
		0,00%		% E	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	
SUBTOTAL	**$ 1.333.154.250,00**														
TOTAL COSTOS DE VOLÚMENES (B)	**$ 3.828.754.250,00**														
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 9.120.169.750,00	73,79%	0,77%	% P	3,68%		69,96%		1,15%		0,47%		0,79%	7,10%	$ 0,00	0%
		$ 9.120.169.750,00		$ P	$ 455.134.340,00		$ 8.647.552.460,00		$ 142.030.000,00		$ 58.160.000,00		$ 97.160.000,00	$ 877.560.000,00	$ 46.060.000,00	
	$ 9.120.169.750,00	$ 95.240.000,00	$ 95.240.000,00	$ E			$ 73.730.000,00		$ 1.310.000,00		$ 1.330.000,00		$ 1.330.000,00	$ 1.330.000,00	$ 16.210.000,00	
		0,77%		% E	0,00%		0,60%		0,01%		0,01%		0,01%	0,01%	0,11%	
TOTAL COSTOS DE VOLÚMENES (C)	**$ 9.120.169.750,00**															
VALOR BÁSICO DE consultoría	**$ 15.120.000.000,00**	**100,00%**	**9,69%**													
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO	**$ 15.120.000.000,00**	**100,00%**	**$ 1.464.504.400,00**													

Reprogramación No.1

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	%	**5,00%**	**95,00%**	**2,61%**	**1,25%**	**1,57%**	**13,37%**	**7,09%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 618.000.000,00**	**$ 11.742.000.000,00**	**$ 322.690.000,00**	**$ 154.700.000,00**	**$ 193.700.000,00**	**$ 1.652.710.000,00**	**$ 1.072.720.000,00**
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**5,00%**	**100,00%**	**3,72%**	**4,97%**	**6,54%**	**19,91%**	**10,59%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$ 618.000.000,00**	**$ 12.360.000.000,00**	**$ 459.612.000,00**	**$ 614.312.000,00**	**$ 808.012.000,00**	**$ 2.460.722.000,00**	**$ 1.601.102.000,00**
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**1,11%**	**0,79%**	**0,79%**	**0,79%**	**0,79%**	**6,19%**
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 136.922.000,00	$ 97.850.000,00	$ 97.870.000,00	$ 97.870.000,00	$ 97.870.000,00	$ 936.122.400,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**1,11%**	**1,90%**	**2,69%**	**3,48%**	**4,27%**	**9,69%**
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 136.922.000,00	$ 234.772.000,00	$ 332.642.000,00	$ 430.512.000,00	$ 528.382.000,00	$ 1.464.504.400,00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
"	$ - / $ -	$ -	%
"	$ - / $ -	$ -	%
"	$ - / $ -	$ -	%
"	$ - / $ -	$ -	%
"	$ - / $ -	$ -	%
"	$ - / $ -	$ -	%
"	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de consultoría aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de consultoría programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la consultoría (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la consultoría programada se calcula con respecto al Valor Básico de consultoría (A) o el Valor Básico de consultoría Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de consultoría que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de consultoría.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO ALDEMAR COSME VARGAS
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 19000-00618 CAU

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC BYC

Aprueba
Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO.
Ordenador del Pago.
Matrícula Profesional No. 0111310666

Revisó Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1920240631 CAU

Revisó Firma:
Nombre: JENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula profesional No.: 54202095211 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultoría, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 26/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4221 DEL 2014

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 DEL 2024

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1,3 Meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 13,3 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CO: 22/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA **(A)**: $ 12.360.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 2.760.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 15.120.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA / VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	8 / jun-25	9 / jul-25	10 / ago-25	11 / sep-25	12 / oct-25	13 / nov-25	14 / dic-25	%
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 2.171.076.000,00	14,36%	3,69%	% P	1,19%	1,64%	1,64%	1,64%	1,36%	1,36%	1,36%	
		$ 2.171.076.000,00		$ P	$ 180.660.000,00	$ 247.608.000,00	$ 247.608.000,00	$ 247.608.000,00	$ 205.860.000,00	$ 205.860.000,00	$ 205.860.000,00	100,00%
	$ 2.171.076.000,00	$ 557.264.400,00	$ 557.264.400,00	$ E								
		3,69%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	**$ 2.171.076.000,00**											
HITO I - FASE III VÍA NUEVA - VULÚMENES DEL TRAMO GUAPI - NAPI LOG APROX 68 KM												
ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	$ 20.000.000,00	0,132%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,05%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	
		$ 20.000.000,00		$ P			$ 8.000.000,00	$ 4.000.000,00				97,33%
	$ 20.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ E								
		0,053%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO	$ 140.000.000,00	0,926%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	0,00%	0,19%	0,00%	
		$ 140.000.000,00		$ P				$ 56.000.000,00		$ 28.000.000,00		96,00%
	$ 140.000.000,00	$ 56.000.000,00	$ 56.000.000,00	$ E								
		0,370%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 20.000.000,00	0,132%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,05%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	
		$ 20.000.000,00		$ P			$ 8.000.000,00	$ 4.000.000,00				94,67%
	$ 20.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ E								
		0,053%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE GEOLOGÍA	$ 70.000.000,00	0,463%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,09%	0,00%	0,00%	
		$ 70.000.000,00		$ P				$ 28.000.000,00	$ 14.000.000,00			93,33%
	$ 70.000.000,00	$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00	$ E								
		0,185%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA	$ 30.000.000,00	0,198%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,08%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	
		$ 30.000.000,00		$ P			$ 12.000.000,00	$ 6.000.000,00				92,00%
	$ 30.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ E								
		0,079%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN FASE II AVANZADA	$ 90.000.000,00	0,595%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	
		$ 90.000.000,00		$ P			$ 36.000.000,00			$ 18.000.000,00		90,67%
	$ 90.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ E								
		0,238%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES FASE II AVANZADA	$ 90.000.000,00	0,595%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	
		$ 90.000.000,00		$ P			$ 36.000.000,00			$ 18.000.000,00		89,33%
	$ 90.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ E								
		0,238%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO	$ 50.000.000,00	0,331%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	
		$ 50.000.000,00		$ P			$ 20.000.000,00			$ 10.000.000,00		88,00%
	$ 50.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ E								
		0,132%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	$ 110.000.000,00	0,728%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,15%	0,00%	0,00%	
		$ 110.000.000,00		$ P				$ 44.000.000,00	$ 22.000.000,00			86,67%
	$ 110.000.000,00	$ 44.000.000,00	$ 44.000.000,00	$ E								
		0,291%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS FASE II AVANZADA	$ 210.000.000,00	1,389%	$ 0,01	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	0,00%	0,28%	0,00%	
		$ 210.000.000,00		$ P				$ 84.000.000,00		$ 42.000.000,00		85,33%
	$ 210.000.000,00	$ 84.000.000,00	$ 84.000.000,00	$ E								
		0,556%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 30.000.000,00	0,198%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,08%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	
		$ 30.000.000,00		$ P			$ 12.000.000,00	$ 6.000.000,00				84,00%
	$ 30.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ E								
		0,079%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL (LINEAMIENTOS AMBIENTALES Y SOCIALES)	$ 200.000.000,00	1,323%	$ -	% P	0,00%	0,00%	0,40%	0,50%	0,40%	0,00%	0,00%	
		$ 200.000.000,00		$ P			$ 60.000.000,00	$ 76.000.000,00	$ 60.000.000,00			82,67%
	$ 200.000.000,00	$ -	$ -	$ E								
		0,032%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL	$ 50.000.000,00	0,331%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	
		$ 50.000.000,00		$ P			$ 20.000.000,00		$ 10.000.000,00			81,33%
	$ 50.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ E								
		0,132%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO GESTIÓN DEL RIESGO	$ 20.000.000,00	0,132%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	
		$ 20.000.000,00		$ P				$ 10.000.000,00				80,00%
	$ 20.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ E								
		0,066%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	$ 50.000.000,00	0,331%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	
		$ 50.000.000,00		$ P							$ 25.000.000,00	78,67%
	$ 50.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ E								
		0,165%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE CONSULTORIAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	$ 50.000.000,00	0,331%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	
		$ 50.000.000,00		$ P							$ 40.000.000,00	77,33%
	$ 50.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ E								
		0,066%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	$ 20.000.000,00	0,132%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	
		$ 20.000.000,00		$ P					$ 10.000.000,00			76,00%
	$ 20.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ E								
		0,066%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

| | | |

| | | |

TOTAL COSTOS DE VOLÚMENES (C)	**$ 9.120.169.750,00**		
VALOR BÁSICO DE consultoría	**$ 15.120.000.000,00**	**100,00%**	**9,66%**
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO	**$ 15.120.000.000,00**	**100,00%**	**$ 1.460.504.400,00**

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	%	1,77%		12,87%		16,63%		22,99%		16,65%		14,55%	3,95%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 266.897.750,00		$ 1.945.557.000,00		$ 2.514.295.000,00		$ 3.475.765.645,00		$ 2.518.024.720,00		$ 2.200.597.885,00	$ 597.760.000,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	12,35%		25,22%		41,85%		64,84%		81,49%		96,05%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1.867.999.750,00		$ 3.813.556.750,00		$ 6.327.851.750,00		$ 9.803.617.395,00		$ 12.321.642.115,00		$ 14.522.240.000,00	$ 15.120.000.000,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ -
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	9,69%		9,69%		9,69%		9,69%		9,69%		9,69%	9,69%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1.464.504.400,00		$ 1.464.504.400,00		$ 1.464.504.400,00		$ 1.464.504.400,00		$ 1.464.504.400,00		$ 1.464.504.400,00	$ 1.464.504.400,00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
"	$ - / $ -	$ -	%
"	$ - / $ -	$ -	%
"	$ - / $ -	$ -	%
"	$ - / $ -	$ -	%
"	$ - / $ -	$ -	%
"	$ - / $ -	$ -	%
"	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B´)	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C´=(A´+B´)	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de consultoría aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de consultoría programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la consultoría (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la consultoría programada se calcula con respecto al Valor Básico de consultoría (A) o el Valor Básico de consultoría Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de consultoría que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de consultoría.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HUGO ALDEMAR COSME VARGAS
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 19000-00618 CAU

Aprueba Firma:
Nombre: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC BYC

Aprueba
Nombre: SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO.
Ordenador del Pago.
Matrícula Profesional No. 0111310666

Revisó Firma:
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1920240631 CAU

Revisó Firma:
Nombre: JENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula profesional No.: 54202095211 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultoría, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8

MEPI-MN1-IN-6-FR-2
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. uptcguapi4234@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORIA No. 12 **DE** oct-25 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE CONSULTORIA: $ 2.797.040.603

SEGUIMIENTO No. 12
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de CONSULTORIA)

CONTRATO No: 4221 DEL 2014

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

PLAZO INICIAL: 1,3 Meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 13,3 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CO 22/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONSULTOR: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VALOR INICIAL (incluido IV. **$** 12.360.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** **$** 2.760.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 DEL 2024

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$** 15.120.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 nov-24	2 dic-24	3 ene-25	4 feb-25	5 mar-25	6 abr-25	7 may-25	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 2.171.076.000,00 $ 2.171.076.000,00	17,57% $ 557.264.400,00 4,51%	4,51% $ 557.264.400,00	% P $ P $ E % E	0,19% $ 22.965.660,00 0,00%	3,53% $ 436.347.540,00 $ 53.192.000,00 0,51%	1,46% $ 180.660.000,00 $ 93540.000,00 0,78%	0,78% $ 96.540.000,00 $ 96.540.000,00 0,78%	0,78% $ 96.540.000,00 $ 96.540.000,00 0,78%	1,46% $ 180.660.000,00 $ 96.540.000,00 0,78%	$ 0,01 $ 180.660.000,00 $ 107.912.400,00 $ 0,01	100,00%
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	**$ 2.171.076.000,00**											
HITO I - FASE III VÍA NUEVA - VULÚMENES DEL TRAMO GUAPI - NAPI LOG APROX 68 KM												
ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	$ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00	0,16% $ 20.000.000,00 $ 8.000.000,00 0,06%	0,06% $ 8.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,01% $ 1.000.000,00 0,00%	0,15% $ 19.000.000,00 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,06% $ 8.000.000,00 0,00%	0,05% $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 0,05%	97,33%
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO	$ 140.000.000,00 $ 140.000.000,00	1,13% $ 140.000.000,00 $ 56.000.000,00 0,45%	0,45% $ 56.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,06% $ 7.000.000,00 0,00%	1,08% $ 133.000.000,00 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,23% $ 28.000.000,00 0,00%	0,37% $ 56.000.000,00 $ 56.000.000,00 0,37%	96,00%
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00	0,16% $ 20.000.000,00 $ 8.000.000,00 0,06%	0,06% $ 8.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,01% $ 1.000.000,00 0,00%	0,15% $ 19.000.000,00 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,06% $ 8.000.000,00 0,00%	0,05% $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 0,05%	94,67%
ESTUDIO DE GEOLOGÍA	$ 70.000.000,00 $ 70.000.000,00	0,57% $ 70.000.000,00 $ 28.000.000,00 0,23%	0,23% $ 28.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,03% $ 3.500.000,00 0,00%	0,54% $ 66.500.000,00 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,19% $ 23.330.000,00 0,00%	0,19% $ 28.000.000,00 $ 28.000.000,00 0,19%	93,33%
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA	$ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00	0,24% $ 30.000.000,00 $ 12.000.000,00 0,10%	0,10% $ 12.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,01% $ 1.500.000,00 0,00%	0,23% $ 28.500.000,00 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,08% $ 10.000.000,00 0,00%	0,08% $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00 0,08%	92,00%
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN FASE II AVANZADA	$ 90.000.000,00 $ 90.000.000,00	0,73% $ 90.000.000,00 $ 36.000.000,00 0,29%	0,29% $ 36.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,04% $ 4.500.000,00 0,00%	0,69% $ 85.500.000,00 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,15% $ 18.000.000,00 0,00%	0,24% $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00 0,24%	90,67%
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES FASE II AVANZADA	$ 90.000.000,00 $ 90.000.000,00	0,73% $ 90.000.000,00 $ 36.000.000,00 0,29%	0,29% $ 36.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,04% $ 4.500.000,00 0,00%	0,69% $ 85.500.000,00 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,18% $ 22.500.000,00 0,00%	0,24% $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00 0,24%	89,33%
ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO	$ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00	0,40% $ 50.000.000,00 $ 20.000.000,00 0,16%	0,16% $ 20.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,02% $ 2.500.000,00 0,00%	0,38% $ 47.500.000,00 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,14% $ 17.000.000,00 0,00%	0,13% $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 0,13%	88,00%
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	$ 110.000.000,00 $ 110.000.000,00	0,89% $ 110.000.000,00 $ 44.000.000,00 0,36%	0,36% $ 44.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,04% $ 5.500.000,00 0,00%	0,85% $ 104.500.000,00 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,18% $ 22.000.000,00 0,00%	0,29% $ 44.000.000,00 $ 44.000.000,00 0,29%	86,67%
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS FASE II AVANZADA	$ 210.000.000,00 $ 210.000.000,00	1,70% $ 210.000.000,00 $ 84.000.000,00 0,68%	0,68% $ 84.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,08% $ 10.500.000,00 0,00%	1,61% $ 199.500.000,00 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,34% $ 42.000.000,00 0,00%	0,56% $ 84.000.000,00 $ 84.000.000,00 0,56%	85,33%
ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00	0,24% $ 30.000.000,00 $ 12.000.000,00 0,10%	0,10% $ 12.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,01% $ 1.500.000,00 0,00%	0,23% $ 28.500.000,00 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,12% $ 15.000.000,00 0,00%	0,08% $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00 0,08%	84,00%
ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL (LINEAMIENTOS AMBIENTALES Y SOCIALES)	$ 200.000.000,00 $ 200.000.000,00	1,62% $ 200.000.000,00 $ 4.000.000,00 0,03%	0,03% $ 4.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,08% $ 10.000.000,00 0,00%	1,54% $ 190.000.000,00 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,23% $ 28.600.000,00 0,00%	0,03% $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00 0,03%	82,67%
ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL	$ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00	0,40% $ 50.000.000,00 $ 20.000.000,00 0,16%	0,16% $ 20.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,02% $ 2.500.000,00 0,00%	0,38% $ 47.500.000,00 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,14% $ 17.000.000,00 0,00%	0,13% $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 0,13%	81,33%
ESTUDIO GESTIÓN DEL RIESGO	$ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00	0,08% $ 20.000.000,00 $ 10.000.000,00 0,08%	0,08% $ 10.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,01% $ 1.000.000,00 0,00%	0,15% $ 19.000.000,00 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,06% $ 8.000.000,00 0,00%	0,07% $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 0,07%	80,00%
ESTUDIO GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	$ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00	0,40% $ 50.000.000,00 $ 25.000.000,00 0,20%	0,20% $ 25.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,02% $ 2.500.000,00 0,00%	0,38% $ 47.500.000,00 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,10% $ 12.500.000,00 0,00%	0,17% $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 0,17%	78,67%
ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE CONSULTORIAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	$ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00	0,40% $ 50.000.000,00 $ 10.000.000,00 0,08%	0,08% $ 10.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,02% $ 2.500.000,00 0,00%	0,38% $ 47.500.000,00 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,10% $ 12.500.000,00 0,00%	0,07% $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 0,07%	77,33%
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	$ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00	0,16% $ 20.000.000,00 $ 10.000.000,00 0,08%	0,08% $ 10.000.000,00	% P $ P $ E % E	0,01% $ 1.000.000,00 0,00%	0,15% $ 19.000.000,00 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,00% $ - 0,00%	0,07% $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 0,07%	76,00%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

| | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

| | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL.	$	175.154.250,00	1,42%	0,00%	% P	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	2,67%
			$ 175.154.250,00		$ P													
	$	175.154.250,00	$ -	$ -	$ E													
			0,00%		% E	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	
ESTUDIO HIDRÁULICO, GEOTÉCNICO Y ESTRUCTURAL DE UN PUENTE SOBRE EL RIO MICAY	$	300.000.000,00	2,43%	0,00%	% P	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	1,33%
			$ 300.000.000,00		$ P					$ -		$ -		$ -			$ -	
	$	300.000.000,00	$ -	$ -	$ E													
			0,00%		% E	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	
SUBTOTAL	**$**	**1.333.154.250,00**																
TOTAL COSTOS DE VOLÚMENES (B)	**$**	**3.828.754.250,00**																
OTROS COSTOS DIRECTOS	$	9.120.169.750,00	73,79%	0,77%	% P	3,68%		69,96%		1,15%		0,47%		0,79%		7,10%	$ 0,00	0%
			$ 9.120.169.750,00		$ P	$ 455.134.340,00		$ 8.647.552.460,00		$ 142.030.000,00		$ 58.160.000,00		$ 97.160.000,00		$ 877.560.000,00	$ 46.060.000,00	
	$	9.120.169.750,00	$ 95.240.000,00	$ 95.240.000,00	$ E			$ 73.730.000,00		$ 1.310.000,00		$ 1.330.000,00		$ 1.330.000,00		$ 1.330.000,00	$ 16.210.000,00	
			0,77%		% E	0,00%		0,60%		0,01%		0,01%		0,01%		0,01%	0,11%	
TOTAL COSTOS DE VOLÚMENES (C)	**$**	**9.120.169.750,00**																
VALOR BÁSICO DE consultoría	**$**	**15.120.000.000,00**	**100,00%**	**9,69%**														
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO	**$**	**15.120.000.000,00**	**100,00%**	**$ 1.464.504.400,00**														

Reprogramación No.1

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	%	5,00%	95,00%	2,61%	1,25%	1,57%	13,37%	7,09%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 618.000.000,00	$ 11.742.000.000,00	$ 322.690.000,00	$ 154.700.000,00	$ 193.700.000,00	$ 1.652.710.000,00	$ 1.072.720.000,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	5,00%	100,00%	3,72%	4,97%	6,54%	19,91%	10,59%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 618.000.000,00	$ 12.360.000.000,00	$ 459.612.000,00	$ 614.312.000,00	$ 808.012.000,00	$ 2.460.722.000,00	$ 1.601.102.000,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	0,00%	1,11%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	6,19%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 136.922.000,00	$ 97.850.000,00	$ 97.870.000,00	$ 97.870.000,00	$ 97.870.000,00	$ 936.122.400,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	1,11%	1,90%	2,69%	3,48%	4,27%	9,69%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ 136.922.000,00	$ 234.772.000,00	$ 332.642.000,00	$ 430.512.000,00	$ 528.382.000,00	$ 1.464.504.400,00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
-	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de CONSULTORIA aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de CONSULTORIA programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la CONSULTORIA (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de CONSULTORIA que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de CONSULTORIA.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del contratista de CONSULTORIA y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de CONSULTORIA y el Acta de Recibo Parcial de CONSULTORIA y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 19202-153851 CAU

Aprueba Firma:

NOMBRE: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional: 01193-0243 CPTIVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultoría, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA consultoría PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORIA No. 12 **DE** oct-25 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE CONSULTORIA: $ 2.797.040.603

SEGUIMIENTO No. 12
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de CONSULTORIA)

CONTRATO No: 4221 DEL 2014

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

PLAZO INICIAL: 1,3 Meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 13,3 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONT 22/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONSULTOR: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VALOR INICIAL (incluido IVA) **$** 12.360.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 2.760.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 DEL 2024

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 15.120.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL consultoría PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA Miles de pesos	(%) consultoría PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO consultoría PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL consultoría PROGRAMADA / VALOR consultoría EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	8 jun-25	9 jul-25	10 ago-25	11 sep-25	12 oct-25	13 nov-25	14 dic-25	%
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 2.171.076.000,00	14,36%	8,23%	% P	1,19%	1,64%	1,64%	1,64%	1,36%	1,36%	1,36%	
		$ 2.171.076.000,00		$ P	$ 180.660.000,00	$ 247.608.000,00	$ 247.608.000,00	$ 247.608.000,00	$ 205.860.000,00	$ 205.860.000,00	$ 205.860.000,00	100,00%
	$ 2.171.076.000,00	$ 1.244.280.792,00	$ 1.244.280.792,00	$ E	$ 127.239.600,00	$ 127.239.600,00	$ 127.380.000,00	$ 152.580.000,00	$ 152.577.192,00			
		8,23%		% E	0,84%	0,84%	0,84%	1,01%	1,01%	0,00%	0,00%	
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	**$ 2.171.076.000,00**											
HITO I - FASE III VÍA NUEVA - VULÚMENES DEL TRAMO GUAPI - NAPI LOG APROX 68 KM												
ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	$ 20.000.000,00	0,132%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,05%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	
		$ 20.000.000,00		$ P			$ 8.000.000,00	$ 4.000.000,00				97,33%
	$ 20.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ E								
		0,053%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO	$ 140.000.000,00	0,926%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	0,00%	0,19%	0,00%	
		$ 140.000.000,00		$ P				$ 56.000.000,00		$ 28.000.000,00		96,00%
	$ 140.000.000,00	$ 56.000.000,00	$ 56.000.000,00	$ E								
		0,370%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL	$ 20.000.000,00	0,132%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,05%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	
		$ 20.000.000,00		$ P			$ 8.000.000,00	$ 4.000.000,00				94,67%
	$ 20.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ E								
		0,053%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE GEOLOGÍA	$ 70.000.000,00	0,463%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,09%	0,00%	0,00%	
		$ 70.000.000,00		$ P				$ 28.000.000,00	$ 14.000.000,00			93,33%
	$ 70.000.000,00	$ 28.000.000,00	$ 28.000.000,00	$ E								
		0,185%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA	$ 30.000.000,00	0,198%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,08%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	
		$ 30.000.000,00		$ P			$ 12.000.000,00	$ 6.000.000,00				92,00%
	$ 30.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ E								
		0,079%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN FASE II AVANZADA	$ 90.000.000,00	0,595%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	
		$ 90.000.000,00		$ P			$ 36.000.000,00			$ 18.000.000,00		90,67%
	$ 90.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ E								
		0,238%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE MATERIALES FASE II AVANZADA	$ 90.000.000,00	0,595%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	
		$ 90.000.000,00		$ P			$ 36.000.000,00			$ 18.000.000,00		89,33%
	$ 90.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ E								
		0,238%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO	$ 50.000.000,00	0,331%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	
		$ 50.000.000,00		$ P			$ 20.000.000,00			$ 10.000.000,00		88,00%
	$ 50.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ E								
		0,132%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	$ 110.000.000,00	0,728%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,15%	0,00%	0,00%	
		$ 110.000.000,00		$ P				$ 44.000.000,00	$ 22.000.000,00			86,67%
	$ 110.000.000,00	$ 44.000.000,00	$ 44.000.000,00	$ E								
		0,291%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS FASE II AVANZADA	$ 210.000.000,00	1,389%	$ 0,01	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	0,00%	0,28%	0,00%	
		$ 210.000.000,00		$ P				$ 84.000.000,00		$ 42.000.000,00		85,33%
	$ 210.000.000,00	$ 84.000.000,00	$ 84.000.000,00	$ E								
		0,556%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO	$ 30.000.000,00	0,198%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,08%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	
		$ 30.000.000,00		$ P			$ 12.000.000,00	$ 6.000.000,00				84,00%
	$ 30.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ E								
		0,079%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL (LINEAMIENTOS AMBIENTALES Y SOCIALES)	$ 200.000.000,00	1,323%	$ -	% P	0,00%	0,00%	0,40%	0,50%	0,40%	0,00%	0,00%	
		$ 200.000.000,00		$ P			$ 60.000.000,00	$ 76.000.000,00	$ 60.000.000,00			82,67%
	$ 200.000.000,00	$ -	$ -	$ E								
		0,032%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL	$ 50.000.000,00	0,331%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	
		$ 50.000.000,00		$ P			$ 20.000.000,00		$ 10.000.000,00			81,33%
	$ 50.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ E								
		0,132%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO GESTIÓN DEL RIESGO	$ 20.000.000,00	0,132%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	
		$ 20.000.000,00		$ P				$ 10.000.000,00				80,00%
	$ 20.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ E								
		0,066%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD	$ 50.000.000,00	0,331%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	
		$ 50.000.000,00		$ P							$ 25.000.000,00	78,67%
	$ 50.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ E								
		0,165%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE CONSULTORIAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	$ 50.000.000,00	0,331%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	
		$ 50.000.000,00		$ P							$ 40.000.000,00	77,33%
	$ 50.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ E								
		0,066%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA	$ 20.000.000,00	0,132%	$ 0,00	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	
		$ 20.000.000,00		$ P					$ 10.000.000,00			76,00%
	$ 20.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ E								
		0,066%		% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

| | | |

| | | |

TOTAL COSTOS DE VOLÚMENES (C)	**$ 9.120.169.750,00**		
VALOR BÁSICO DE consultoría	**$ 15.120.000.000,00**	**100,00%**	**40,62%**
VALOR BÁSICO DE consultoría ACTUALIZADO	**$ 15.120.000.000,00**	**100,00%**	**$ 6.141.800.844,00**

INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA MES	%	1,77%		12,87%		16,63%		22,99%		16,65%		14,55%	3,95%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 266.897.750,00		$ 1.945.557.000,00		$ 2.514.295.000,00		$ 3.475.765.645,00		$ 2.518.024.720,00		$ 2.200.597.885,00	$ 597.760.000,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA PROGRAMADA ACUMULADA	%	12,35%		25,22%		41,85%		64,84%		81,49%		96,05%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1.867.999.750,00		$ 3.813.556.750,00		$ 6.327.851.750,00		$ 9.803.617.395,00		$ 12.321.642.115,00		$ 14.522.240.000,00	$ 15.120.000.000,00
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA MES	%	1,32%		1,08%		12,11%		2,39%		14,06%		0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 199.582.600,00		$ 162.979.600,00		$ 1.831.157.615,00		$ 361.206.876,00		$ 2.126.369.753,00		$ -	$ -
INVERSIÓN CONSULTORÍA EJECUTADA ACUMULADA	%	11,01%		12,08%		24,19%		26,58%		40,65%		40,65%	40,65%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 1.664.087.000,00		$ 1.827.066.600,00		$ 3.658.224.215,00		$ 4.019.431.091,00		$ 6.145.800.844,00		$ 6.145.800.844,00	$ 6.145.800.844,00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de CONSULTORIA aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de CONSULTORIA programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la CONSULTORIA (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de CONSULTORIA que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de CONSULTORIA.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del contratista de CONSULTORIA y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de CONSULTORIA y el Acta de Recibo Parcial de CONSULTORIA y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 19202-153851 CAU

Aprueba Firma:

NOMBRE JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional: 01193-0243 CPTIVC

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Consultoría, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 9

MEPI-MN-IN-14-FR-2
ACTAS DE REUNION

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. uptcguapi4234@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	PÁGINA	

FECHA: 3/10/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 48
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4221 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONSULTOR: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN - GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reunión con el objetivo de efectuar el seguimiento y control del Contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024 y del Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 4234 de 2024, donde participaron Invias , Consultor , Interventoria , todos de manera virtual

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Los temas tratados en esta acta de reunión son:

El tema principal de la reunion fue el contrato de topografia y volumenes

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la presente reunion participa Invias Interventoria y Consultoria , se hablo de la topgrafia del valor unitario de dicho item , según la adicion 3 quedo en cero y se volvio a creear el item, , se solicita al consultor tener un discriminatorio si es necesario para justificar los costos de la topografia y su ejecucion, se debe tener claro un presupuesto detallado, la consultoria esta revisando el contrato para mirar dichos costos , el valor actual que esta pagando el instituto por km de topografia es el mas alto que ha pagado , verificar la programacion de ejecucion HITO III A y IIIB, La ingeniera Yenny Xiomara manifiesta lo siguiente: "Para tranquilidad de todos el contrato de la consultoria esta en ejecucion no hay todavia diseños definitivos por lo que se estan ejecutando actividades" en relacion a las respuestas de los derechos de peticion que se estan adelantando las entidades, se solicita tambien al consultror avanzar en las entregas de los volumnes y se aclara que no es una entrega definitiva si no parcial.

INVIAS siguen invitando al consutor para trabajar y sacar el proyecto adelante para que esto no generara un incumplimiento por parte de la UNICAUCA , tambien la interventoria manifiesta su apoyo para superar los obstaculos que se han presentado.

INVIAS solicita que el canal de comunicacion sea el DIrector de la consultoria para dar tramite a todas las dudas, sugerencias y soilcitudes que surgan de las partes INVIAS e Interventoria.

Por ultimo, el INVIAS solcita en la menor brevedad posible se haga entrega del ajuste de la programacion dado que la presentada para el adicional No.1 se encuentra con fechas que no concuerda con la fecha de inico de la misma. Asi mismo para dar respuesta a derecho de peticion, la Gestora Tecnica del proyecto solicita que la Conusltoria haga entrega del cronograma en excel corregiendo lo mencionado.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Proxima reunion de seguimiento contrato consultoria	8/10/2025	Invias , Consultoria , Intrerventoria
Remitir formalmente plan de facturacion a la interventoria (URGENTE)	8/10/2025	Consultoria


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 08/10//2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1.Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Consultoría ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2.Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Interventoria			
Jose Octavio Niño	Director de Interventoria	(UPTC)	
Diego Borda	Profesional Apoyo	(UPTC)	
Invias			
Xiomara Hernandez	Gestora Tecnica	INVIAS	
Consultoria			
Fernando Chacon	Director Consultoria	UNICAUCA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/10/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 49
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4221 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONSULTOR: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN - GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Control y seguimineto de componente Tecnico; Administrativo; Finaciero del proyecto- Contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024, con la participación de representantes de la Consultorí, la Interventoría y el del INVIAS, desarrollada de manera virtual.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Los temas tratados en la presente acta de reunión son:
1.Revisión de compromisos anteriores
2. Avance del componente BIM y entorno común de datos
3. Comunicación con comunidades y acceso a territorio
4. Entrega de metodologías ajustadas (Hitos 1 y 2)
5. Cronogramas y planes de contingencia
6. Informes de socialización
7.Plan de facturación y reserva presupuestal 2024
8. Permisos sociales – Sector “El Difícil”
9. Situación actual en campo
10. Entregas de actas de costos N°11

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 8 de octubre de 2025 , se reunieron virtual, con los profesionales de la consultoría, la interventoría y el INVIAS. para revisar los componentes tecnico, administrativo y finaciero del contrato 4221 / 2024.

1.Revisión de compromisos anteriores

La interventoría realizó seguimiento a los compromisos del acta anterior, destacando el atraso en la entrega de hojas de vida del personal pendiente por contratar y el plan de trabajo consolidado del proyecto, los cuales no han sido enviados de forma oficial.
La consultoría informó cambios internos, incluyendo el nombramiento del ingeniero Jaime Rafael Obando como nuevo supervisor del contrato y la reorganización del equipo técnico. Se comprometieron a remitir la documentación completa y el plan de trabajo a más tardar el 14 de octubre de 2025

2. Avance del componente BIM y entorno común de datos
La interventoría solicitó claridad sobre el estado del entorno común de datos (CDO) y los avances en el componente BIM.

La consultoría, a través del ingeniero Wilmer Campagna, indicó que el entorno está operativo y que los volúmenes técnicos y metodologías han sido actualizados y cargados en la plataforma.

Se acordó realizar una reunión técnica específica entre los equipos BIM de ambas partes el 8 de octubre a las 2:30 p.m., para definir la ruta de revisión y programar una capacitación general para consultoría, interventoría e INVIAS sobre el flujo de información en el entorno común de datos.
La interventoría presentó además una herramienta de cuadernos digitales interactivos para apoyo y capacitación en gestión BIM.

3. Comunicación con comunidades y acceso a territorio

La consultoría informó que, según los acercamientos del profesor Jairo Tocancipá, ya se cuenta con acceso asegurado al tramo El Plateado – Napi, y se prevé confirmar el acceso al tramo Napi – Guapi el domingo 12 de octubre de 2025.
La interventoría reiteró la necesidad de informar previamente sobre las actividades de campo para permitir el acompañamiento correspondiente.

4. Entrega de metodologías ajustadas (Hitos 1 y 2)

La interventoría recordó que aún no se han recibido las metodologías ajustadas correspondientes a los hitos 1 y 2.
La consultoría indicó que se están definiendo los especialistas responsables y que dichas metodologías se entregarán junto con el cronograma general el 14 de octubre de 2025.

5. Cronogramas y planes de contingencia

La interventoría insistió en la necesidad de formalizar los cronogramas y planes de contingencia que incluyan topografía, geotecnia, extracción de muestras, laboratorios, entre otros, con cobertura total del proyecto hasta diciembre de 2025.
Se recordó que las comunicaciones deben realizarse de manera oficial y no por medios informales.
La consultoría se comprometió a presentar dicho plan en la reunión del 14 de octubre y a iniciar los trabajos de campo con la debida notificación previa.

6. Informes de socialización

La interventoría solicitó la remisión formal de los informes de socialización realizados en los sectores Huicito – Honduras, El Plateado y López de Micay.
La consultoría informó que siete informes están listos y serán remitidos oficialmente el mismo día (9 de octubre de 2025).

7. Plan de facturación y reserva presupuestal 2024

Se discutió la estrategia para asegurar la facturación de la reserva presupuestal.
La consultoría propuso dividir las entregas de volúmenes al 80%, dejando un 20% final para aprobación, y realizar las topografías y ensayos de laboratorio directamente con los laboratorios de la Universidad del Cauca, mediante resolución interna.
INVIAS e interventoría consideraron la estrategia viable, solicitando que se presente formalmente en la reunión del 14 de octubre.

8. Permisos sociales – Sector "El Difícil"

Se revisó la propuesta de ajuste de trazado en el sector "El Difícil", que reduciría aproximadamente 12,5 km del tramo.
Se acordó que la consultoría gestionará un acta social con las Juntas de Acción Comunal del sector, de manera que la comunidad solicite formalmente la modificación del trazado.

9. Situación actual en campo

La interventoría manifestó preocupación por la falta de presencia permanente de personal técnico en terreno y la ausencia de reportes formales de avance.
La consultoría informó que hubo contingencias administrativas que retrasaron las labores, pero que el personal ya fue reubicado y se retoman las actividades de topografía en los tramos Huicito–Honduras y El Plateado–Nayita.
Se estableció el compromiso de notificar oficialmente todas las actividades en campo, especificando personal, equipos y fechas.

10. Entregas de actas de costos N°11
La Ing. Yenny Xiomara Hernandez Pernaranda, gestora del proyecto solicta la redicación del acta de costos N° 11 de consultoria, para la revision y tramites correspondientes.
La consultoria manifienta que durane el transcurso del día (8 de ocubre de 2025) realizara la entrega del acta de costos.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Entregar hojas de vida y plan de trabajo consolidado	14/10/2025	Consultoria
Realizar reunión técnica BIM y definir capacitación	08/oct/2025 (2:30 p.m.)	Consultoria
Entregar metodologías ajustadas Hito 1 y 2	14/10/2025	Consultoria
Presentar cronograma general y plan de contingencia integral	14/10/2025	Consultoria
Remitir informes de socialización actualizados	9/10/2025	Consultoria
Presentar propuesta formal para facturación de la reserva 2024	14/10/2025	Consultoria
Realizar acta social con comunidad del sector "El Difícil"	14/10/2025	Consultoria
Informar oficialmente inicio y avance de actividades de campo	permanete	Consultoria
Radicar al INVIAS el acta de costos N°11	8/10/2025	Consultoria




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 14/10/2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1.Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Consultoría ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2.Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Interventoria			
José Octavio Niño Brijaldo	Director de Interventoria	(UPTC)	
Diego Fernado Cruz	Gestor Tecnico	(UPTC)	
Camilo Hernando Hernandez	Ingeniero Residente Tecnico	(UPTC)	
Milton Fidel Carabuena Mendoza	Coordinador BIM	(UPTC)	
Laura Melissa Patiño	Coordinador Tecnico	(UPTC)	
Consultoria			
Fernado Nicolas Chacón Penagos	Director consultoría	UNICAUCA	
Henry Mauricio Muñoz Trochez	Coordinador Tecnico	UNICAUCA	
Wilmer Campagna	Coordinador BIM	UNICAUCA	
Julian Orozco	Coordinaldor Ambieltal y Sicoal	UNICAUCA	
INVIAS			
Yenny Xiomara Hernandez Pernaranda	Gestora del proyecto	INVIAS	
Jorge Eduado Medina Idrobo	Supervisor del contrato de interventoría	INVIAS	
Julian Esteban Toro Rodriguez	Profesional BIM	INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/10/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 50
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4221 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONSULTOR: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN - GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reunión con el objetivo de efectuar el seguimiento de la metodologia BIM Contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024 y del Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 4234 de 2024, donde participaron Invias , Consultor , Interventoria , todos de manera virtual

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Los temas tratados en esta acta de reunión son:

Metodologia BIM , y el entorno comun de datos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia 08 de octubre se reunen de manera virtual el equipo de Invias , Consultoria e Intereventoria , para el segumiento de la metodologia BIM y el entorno Comun de datos , en dicha reunio se hablo:

Con respecto al tramo de Plateado López de Micay es empezar a hacer esa revisión de esos documentos dentro del entorno común de datos.

Tiene ya varios procesos de revisión implementados y esos procesos de revisión vienen desde el mismo web del plan de ejecución BIM y cada uno de esos procesos está modelado y documentado también. Cuando se habla de modelado está montado en el programa modelador de procesos en el cual se encuentran cada una de las tareas aquí elaboradas y tiene una descripción con los respectivos responsables.
A partir de estos modelos también se hace la documentación del proceso que es básicamente un documento en el que está el diagrama del proceso con la descripción quién ejecuta y quién es responsable.

Entonces el proceso más sencillo por así decirlo que tenemos es el proceso de revisión de documentos es básicamente la revisión de todos esos archivos en el formato Word, BDF, que pueden ser los informes, pueden ser los documentos de los volúmenes, pueden ser mapas, pueden ser planos en PDF y demás. Allí van metodologías incluidas dentro de esos documentos

Se tiene una fase interna que es dentro de la misma consultoría, una revisión externa y luego ya la entrega al contratante. En la revisión interna se hace el desarrollo del documento por parte del especialista. Una vez listo el documento, pasa a revisión del documento por parte de los coordinadores de consultoría, sea el coordinador técnico o ambiental según corresponda, y pasa una aprobación por el director de consultoría.

Una vez tenga el visto bueno, ya pasa la revisión externa, a donde llega a los especialistas o el coordinador de la interventoría, y una vez tiene el visto bueno, pasa la aprobación del director de interventoría. En caso de que no, pues pasa a que se le hagan los respectivos ajustes necesarios. Y si ya tiene el proceso de aprobación del director de interventoría, pues pasa la entrega del contratante. Todos estos procesos ya están documentados y están cargados en el entorno común de datos en el volumen técnico

Actualmente en el plan de ejecución vigente hay unas series de pasos, que es el trabajo al progreso, al estado C-01, C-02, C-03, C-04 y ya la información publicada. Entonces, para la respuesta, los tipos de flujos van a variar en función 1 del proceso. Uno va a hacer el proceso interno del body progress, del know-to-how, de la consultoría y otro, cuando ya se vaya a entregar, por ejemplo, el especialista de geotecnia, tiene que enviar algo a la interventoría, pues se deberá utilizar el estado C-03, C-04, en este caso el C-04 para un tema de aprobación,

Entonces, son flujos tipo por estado de información. Pero lo que no es tipo es la documentación o la descripción de los entregables, porque una cosa va a ser los tipos de documentos, otra cosa son los tipos de modelos, pero eso es un tema ya cuando se vengan las entregas, que seguramente habrá que documentar.

Cuando se envía para revisión los archivos, si ya este ya es un archivo BIM, el proceso de aprobación para documentos, da la opción de seleccionar, él ya está preconfigurado obviamente para que lo envíe a ciertos personajes de acuerdo al rol que ellos cumplan dentro del proyecto. Por ejemplo, aparece el coordinador ambiental y el coordinador técnico, pero se puede editar y decir si van los dos o si solo va uno de ellos. Cuando va para las especialistas, se selecciona el nombre de la especialista correspondiente para el cual va a ir esa revisión. el flujo de revisión puede ser genérico de alguna forma, en el momento de que se envia para revisión, ya se vuelve específico y ya lo asigno directamente al interesado.

Entonces, de esa manera, ya deja de ser genérico y se vuelve específico para una disciplina o una especialista en detalle. Entonces, todos estos procesos no solo pueden estar documentados, sino que también ya están implementados en la plataforma.

Con respecto a lo de los alcances, que es un tema que no se ha definido para los tramos 3 y 4, para el tramo 3, que es el Plateado López, que en este momento no tiene alcance definido, que sí se puede dar garantía ya desde este momento, entonces, que independientemente de lo que suceda, lo que es el corredor vial y lo que son las estructuras tipo puentes, sí tendrán un componente BIM.
Ya se está en la capacidad en este momento de empezar a hacer los envíos del entorno común de datos de especialistas

Se coordinará reunión para continuar con la capacitación sobre la metodología BIM y el entorno común de datos, es importante que participen los coordinadores y los profesionales que estarán encargados y manejaran la información concerniente a dicha metodología

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Proxima reunion de seguimiento Metodologia BIM	15/10/2025	Invias , Consultoria , Intrerventoria

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 15/10//2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1.Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Consultoría ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2.Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Interventoria			
Diego Borda	Profesional Apoyo Tecnico	(UPTC)	
Miguel Barreto	Coordinador SIG	(UPTC)	
Camilo Hernadez	Residente de Estudios	(UPTC)	
Milton Carabuena	Coordinador BIM	(UPTC)	
Invias			
Xiomara Hernandez	Gestora Tecnica	INVIAS	
Julian Esteban Toro	Profesional Bim	INVIAS	
Consultoria			
Henry Mauricio Muñoz	Coordinador Tecnico	UNICAUCA	
Wilmer Campaña	Coordinador BIM	UNICAUCA	
Jualian Orozco	Coordinador Ambiental y Social	UNICAUCA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/10/2025
(Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 51
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4221 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONSULTOR: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN - GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar la socialización técnica y el análisis de la propuesta de trazado alternativo presentada por el señor Fidel Ernesto Peñuela Peñuela, respecto al proyecto “Estudios y Diseños para la Conexión Vial Popayán – Guapi en el Departamento del Cauca”, dentro del marco del Contrato de Consultoría No. 4221 de 2024.
El encuentro tuvo como fin revisar la viabilidad técnica, ambiental y social de la propuesta, contrastándola con los estudios aprobados y en ejecución por parte de la Consultoría y la Interventoría.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Los temas tratados en la presente acta de reunión son:

- Presentación del señor Fidel Peñuela, quien expuso una alternativa de trazado vial entre Popayán y Guapi, basada en estudios satelitales e interpretación cartográfica.
- La interventoría ratifica que el trazado actual, avalado ambientalmente, es el que debe mantenerse para garantizar la continuidad contractual.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El señor Fidel Peñuela presentó su propuesta de trazado vial entre Popayan y guapi, basada en estudios satelitales e interpretación cartografica, argumentando que su alternativa reduciría la longitud total del corredor y disminuiría la complejidad constructiva.

La Interventoría y la Consultoría reconocieron la validez del análisis como aporte ciudadano, pero precisaron que el trazado oficial del proyecto, se detemino teniendo en cuenta la viabilidad constructiva y ambiental del corredor propuesto, considerando su longitud, condiciones topográficas y afectaciones sobre áreas de reserva.

La Subdirección de Planificación del INVIAS Tambien explicó que el corredor actual fue determinado conforme a criterios ambientales y técnicos establecidos por la autoridad ambiental, priorizando el menor impacto ecológico sobre la longitud o rectitud de la vía.

La Consultoría y el INVIAS explica sobre el estado actual del proyecto, las fases de estudios y los trazados aprobados ambientalmente por la Corporación Regional del Cauca (CRC).

La interventoria presento la revisión de las vías existentes entre El Tambo, Honduras, El Plateado, López de Micay y Guapi, y de los avances en campo por parte del equipo técnico de la consultoría.

El director de la consultoría informa que segun la consultoria cuenta con acceso seguro al territorio en el tramo Plateado - Lopez de Micay y posiblemente Plateado - Napi, tras gestiones sociales prolongadas y coordinación con las comunidades locales.

Finalmente, se acordó recibir de parte del señor Peñuela la información cartográfica de su propuesta para su revisión técnica y documental,evitando modificaciones que impliquen regresar a fases previas del proyecto vigente.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Remitir a la Interventoría y al INVIAS el plano y la información del trazado alternativo propuesto.	Permanente	Ing. Fidel Ernesto Peñuela
Revisar técnicamente la propuesta entregada por el señor Peñuela para identificar posibles aportes o coincidencias con el trazado existente.	Próximo comité técnico	Consultoría e Interventoría

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 22/10/2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1.Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Consultoría ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2.Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Interventoria			
José Octavio Niño Brijaldo	Director de Interventoria	(UPTC)	ver listado de asitencia
Diego Fernado Cruz	Apoyo tecnico Inter	(UPTC)	
Consultoria			
Fernado Nicolas Chacón Penagos	Director consultoría	UNICAUCA	
Wilmer Campaña	Coordinador BIM	UNICAUCA	
INVIAS			
Yenny Xiomara Hernandez Pernaranda	Gestora del proyecto	INVIAS	
Sirley Dabeiba Merchán Carreño	Subdirección de Planificación de Infraestructura	INVIAS	
Ing. Fidel Ernesto Peñuela Peñuela	Geologo Ms. Mp	Aporte ciudadano	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	4234 -2024
		CONTRATO DE CONSULTORÍA No	4221-2024
	LISTADO DE ASISTENCIA	FORMATO	VERSIÓN 01

FECHA: 14 - 10 - 2025
HORA: 13:00 p.m
LUGAR: Subdirección de Planificación de Infraestructura INVIAS
QUIEN CONVOCA: INVIAS
OBJETO/TEMA: Reunión con el señor peñuela

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Diego Fernando Barda Cruz	1099709733	Ingeniero	UPTC	
Yully Drissy Suárez P	33368341	Geol Amb y Socios	UPTC	
José Octavio Niño Brijaldo	79327702	Director Interventor	UPTC	
Alejandra Muñoz Gomez	1023861350	Esp. Ambiental SPI	INVIAS	
Yenny X. Hernández P.	60396934	Gestor Técnico	INVIAS	
ERNESTO PEÑUELAS P.	17.122.936	Ing GEOLOGO -	INVESPEÑUELA	
FERNANDO CHACON	10.303.455	Dir - Consultoría	UNICAUCA	
Wilmer Arley Campaña D.	1123709028	Coord. BIM	Unicauca	
Claudia Valencia C	34549473	Ing. SIG Consultoria	UNICAUCA	
Sirley Dabeiba Merchán Carreño	1049623012	Subdirectora	INVIAS	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/10/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 52
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4221 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONSULTOR: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN - GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar el seguimiento Técnico, Administrativo y Finaciero al contrato de consultoria No. 4221 de 2024 con la participación de representantes del INVIAS, la Interventoría y la Consultorí, desarrollada de manera presencial en las instalaciones del INVIAS en la Ciudad de Bogoá.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Los temas tratados en la presente acta de reunión son los siguientes:

1.Cambio de supervisor del contrato de consultoría.
2.Plan de facturación y cumplimiento de metas.
3.Contratación de estudios técnicos.
4.Ejecución técnica y avances.
5.Gestión de recursos y topografía.
6.Equipos y recursos de anticipo.
7.Comunicación y coordinación.
8.Preocupaciones de la Interventoría.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 14 de octubre de 2025, con la participación de representantes del INVIAS, la Interventoría y la Consultoría, se desarrolló de manera presencial una reunión en las instalaciones del INVIAS en la ciudad de Bogotá, con el fin de revisar el avance en la ejecución del contrato, analizar los aspectos técnicos y administrativos pendientes, definir estrategias para el cumplimiento de metas y facturación, y establecer los compromisos entre las partes involucradas.

1. Cambio de supervisor del contrato de consultoría

Se informó que el ingeniero Jaime Obando asumió como nuevo supervisor del convenio. El cambio tiene como propósito fortalecer la gestión técnica y administrativa del contrato.

2. Plan de facturación y cumplimiento de metas

La Consultoría presentó el plan de facturación ajustado, adoptando una nueva metodología del 80% para entrega parcial y 20% para entrega final, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la meta de facturación por $2.119 millones antes del cierre fiscal de octubre.

3. Contratación de estudios técnicos

Se indicó que la Universidad del Cauca realizará directamente los estudios de topografía y suelos a través de su laboratorio de topografía, conforme a una resolución interna que faculta a la Facultad de Ingeniería Civil para tal fin.

4. Ejecución técnica y avances

Se expusieron avances en los estudios topográficos, especialmente en el tramo Honduras – Huisito, con previsión de resultados hacia finales de octubre.

No obstante, la Interventoría manifestó preocupación por la falta de comunicación y de evidencias oficiales que respalden los trabajos de campo ejecutados.

5. Gestión de recursos y topografía

Se discutió la necesidad de justificar los costos de topografía, aclarando los valores por kilómetro y la inclusión de equipos y personal local dentro del contrato global.

Se acordó revisar los soportes de contratación y de compras, con el fin de brindar mayor claridad ante eventuales auditorías.

6. Equipos y recursos de anticipo

La Interventoría recordó que en el mes de junio se autorizó la compra de equipos (dos de topografía y uno de batimetría) con cargo al anticipo, solicitud que aún no ha sido formalmente cerrada.

Se propuso justificar los cambios realizados y registrar la decisión de utilizar subcontratistas con equipos propios.

7. Comunicación y coordinación

Se enfatizó la necesidad de mejorar la comunicación formal entre la Consultoría y la Interventoría, garantizando que todas las acciones técnicas, contractuales y financieras sean notificadas oficialmente, asegurando su adecuado control y trazabilidad.

8. Preocupaciones de la Interventoría

La Interventoría expresó su preocupación por el rezago técnico del contrato, estimado en un 70%, y por la falta de evidencias formales que soporten los avances. En consecuencia, instó a la Consultoría a adoptar medidas correctivas y a documentar adecuadamente cada actividad ejecutada.

Durante la sesión se presentaron los avances financieros y técnicos del contrato.

La Consultoría expuso su plan de facturación, destacando que se encuentra alineado con las áreas jurídicas y administrativas de la Universidad.

Por su parte, el INVIAS resaltó la importancia de garantizar que las actas y documentos de soporte se encuentren debidamente actualizados y respaldados con evidencias de campo.

La Interventoría reiteró la necesidad de recibir información oportuna sobre los estudios topográficos, la ejecución en campo y las decisiones adoptadas por la Consultoría, subrayando los riesgos asociados a los atrasos y a la falta de formalización documental.

Finalmente, se acordó la presentación de la información consolidada ante la Dirección Técnica, en la reunión prevista para el jueves 16 de octubre de 2025, en la cual participará el Vicerrector Administrativo de la Universidad, con el fin de definir la viabilidad técnica, jurídica y financiera de los ajustes propuestos.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Presentar soporte del plan de facturación actualizado y justificación de costos topográficos, incluyendo valores por kilómetro y contratación de equipos.	14/10/2025	Consultoria
Remitir a la Interventoría los informes oficiales de topografía y avances de campo, incluyendo planos y reportes técnicos.	25 de octubre de 2025	Consultoria
Coordinar con la Dirección Técnica la revisión de los aspectos administrativos y jurídicos de la Universidad.	16 de octubre ed 2025	Consultoria
Verificar los soportes de los pagos y desembolsos presentados en las actas de agosto, septiembre y octubre.	20 de octubre de 2025	Consultoria
Confirmar mediante oficio la decisión de no adquirir equipos con el anticipo y soportar el uso de equipos del subcontratista de topografía.	18 de octubre de 2025	Consultoria

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 16/10/2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1.Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Consultoría ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2.Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Interventoria			
Se adjunta listado de asistencia			

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	4234 -2024
		CONTRATO DE CONSULTORÍA No	4221-2024
	LISTADO DE ASISTENCIA	FORMATO	VERSIÓN 01

FECHA: 14-10-25
HORA:
LUGAR: INVIAS
QUIEN CONVOCA: INVIAS
OBJETO/TEMA: SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA N. 11221.

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Diego Fernando Borda Cruz	1099207738	Ingeniero	UPTC	
Yully Deisy Juárez P	53368841	Coord. Amb y Social	UPTC	
José Octavio Nieto B.	79722202	Director interventor	UPTC	
Alejandra Muñoz Gomez	1023861350	Esp. Ambiental SST	INVIAS	
Yeimy L. Hernández P.	60396934	Gest Técnico	INVIAS	
FERNANDO U. CHACON	10303487	Dir. Consultoría	UNICAUCA	
Wilmer Arley Campaña Diaz	1123209028	Coord. BIM	Unicauca	
Claudia Valencia Camargo	34154673	Ing. SIG	UNICAUCA	
Sirley D. Herrera Carreño	1049623012	Subdirectora	INVIAS	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/10/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 53
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4221 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONSULTOR: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN - GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar la socialización técnica y el análisis de la propuesta de trazado alternativo presentada por el señor Fidel Ernesto Peñuela Peñuela, respecto al proyecto “Estudios y Diseños para la Conexión Vial Popayán – Guapi en el Departamento del Cauca”, dentro del marco del Contrato de Consultoría No. 4221 de 2024.
El encuentro tuvo como fin revisar la viabilidad técnica, ambiental y social de la propuesta, contrastándola con los estudios aprobados y en ejecución por parte de la Consultoría y la Interventoría.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1:Revisión de compromisos adquiridos por la consultoría Universidad del Cauca.

2:Cumplimiento de la facturación de la reserva 2024.

3:Avances en los estudios y diseños de los tramos: El Plateado – López de Micay y Huisito – Honduras.

4:Programación de mesas de trabajo interdisciplinarias entre consultoría e interventoría.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Subdirectora de Planificación de Infraestructura, Ingeniera Sirley Merchán, recordó los compromisos adquiridos por la consultoría Universidad del Cauca, entre los cuales se destaca el cumplimiento de la facturación de la reserva del año 2024, que deberá estar incluida dentro del acta de octubre de 2025. Se estableció que este trámite deberá realizarse a más tardar el 30 de octubre de 2025.

Por su parte, la Interventoría, en cabeza del Director José Octavio Niño, solicitó a la consultoría organizar los documentos correspondientes y realizar su entrega lo antes posible para proceder con la revisión de anexos y permitir el cumplimiento del trámite en los tiempos establecidos.

La Directora Técnica del INVIAS tomó la vocería durante la reunión, destacando la importancia del proyecto por ser de orden nacional, e informó que el Ministerio de Transporte ya elaboró un CONPES en el cual se comprometieron recursos para que, en la vigencia 2026, se realice el proceso de licitación y contratación de la construcción de las obras correspondientes a los tramos El Plateado – López de Micay y Huisito – Honduras.
En este sentido, se instó a la consultoría a continuar con su compromiso y realizar las entregas correspondientes para garantizar el avance de los estudios y diseños. Posteriormente, el Director de la Consultoría, ingeniero Fernando Chacón, expuso la programación de actividades para el tramo El Plateado – López de Micay, señalando que las entregas se realizarán a más tardar el 31 de diciembre de 2025, cumpliendo así con lo pactado en el contrato, lo que permitirá contar con todos los estudios y diseños para el proceso de licitación y contratación de la pavimentación de esta vía
el Ingeniero José Octavio Niño, Director de la Interventoría, manifestó que si bien la consultoría presenta un cronograma de cumplimiento, la interventoría no contaría con tiempo suficiente para la revisión de los documentos si estos se entregan el 31 de diciembre, último día del plazo contractual.
Por esta razón, se solicitó a la consultoría realizar mesas de trabajo interdisciplinarias desde la semana siguiente (21 y 22 de octubre de 2025) entre las diferentes especialidades, con el fin de revisar anticipadamente los entregables y permitir que, al momento de la entrega final, los diseños ya cuenten con el aval de la interventoría.
Finalmente, se reiteró el compromiso por parte de la consultoría de coordinar y comunicar previamente cualquier socialización o trabajo de campo a la interventoría y al INVIAS. Se dejó constancia de que toda actividad no informada y avalada por la interventoría no será reconocida para pago.
La interventoría solicitó además mantener una comunicación fluida y disposición constante por parte del equipo consultor, dado el corto plazo existente para culminar los estudios y diseños de los tramos El Plateado – López de Micay y Huisito – Honduras.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Realizar la facturación de la reserva del año 2024 dentro del acta de octubre de 2025.		Consultoría Universidad del Cauca
Entregar los documentos organizados para revisión de anexos y trámite correspondiente.		Consultoría Universidad del Cauca
Desarrollar mesas de trabajo interdisciplinarias con la interventoría.		Consultoría – Interventoría
Realizar entregas finales de estudios y diseños del tramo El Plateado – López de Micay.		Consultoría Universidad del Cauca
Informar de manera anticipada todas las actividades de campo y socializaciones.		Consultoría Universidad del Cauca

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 22/10/2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1.Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Consultoría ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2.Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
			Ver listado de asistencia

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	4234 -2024
		CONTRATO DE CONSULTORÍA No	4223-2024
	LISTADO DE ASISTENCIA	FORMATO	VERSIÓN 01

FECHA: 16-10-2025
HORA:
LUGAR:
QUIEN CONVOCA:
OBJETO/TEMA:

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Diego Fernando Borda	1049204738	Ingeniero	UPTC	
Germán Eduardo Peña Vásquez	79149108	Gerente Interventoría	UPTC	
José Octavio Nieto Brijaldo	79222243	Director Interventor	UPTC	
Valbeny Lucía Herrera	1061795749	Contratista	INVIAS-SPI	
Camilo Andres Sabater O	1061763757	Contratista	UNICAUCA	
Henry Mauricio Reyes T.	1061744419	Contratista	UNICAUCA	
Fernando Chaves	10303607	Dir Consultoría	UNICAUCA	
Jorge Adrián Vélez Velasco	1061743121	Vicerrector	Unicauca	
Alejandra Mora Gómez	1128421250	SPI	INVIAS	
Santiago Sastre D	1019101947	D6/DTE	INVIAS	
Edward Franco Gamboa	7176799	DTE Popayán	INVIAS	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/10/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 54
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4221 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONSULTOR: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN - GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar el seguimiento Técnico, Administrativo y Finaciero al contrato de consultoria No. 4221 de 2024 con la participación de representantes de la Interventoría y la Consultoría, desarrollada de manera presencial en las instalaciones da la Universidad del Cauca en la Ciudad de Popayan. Para revisar el estado de avance de los levantamientos topográficos, el cumplimiento de los requerimientos técnicos del INVIAS y la planeación de las próximas actividades de campo y gestión administrativa del proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Los temas tratados en la presente acta de reunión son:

1. Revision Tecnica de Topografia y Procesamiento de la informacion
2. Revision Financiera del contrato de consultoria
3. Programacion de Obra y actividades en campo.
4. Gestion Ambiental

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Revision Tecnica de Topografia y Procesamiento de la informacion

Las reuniones se centraron en el avance topográfico de los tramos Huisito–Honduras, Aguaclara–Nayita y López de Micay, así como en la revisión del cumplimiento de los requerimientos técnicos del INVIAS para la entrega formal de los productos. La interventoría evidenció deficiencias metodológicas y documentales en el manejo del entorno común de datos, la estructuración de carpetas y la conformación de los entregables. Asimismo, se identificó la ausencia de información topográfica completa para el tramo 1. aunque para el tramo 2 presenta una documentación más sólida, con poligonales, cálculos, bitácoras y precisiones adecuadas, aunque aún carece de la topografía procesada. Cabe aclarar que los archivos cargados al entorno común de datos no constituyen todavía los entregables oficiales, ya que no cumplen con la estructura y contenido definidos por los requerimientos técnicos del INVIAS. La interventoría recalcó que la liberación técnica de los tramos solo será posible una vez se haya subsanado la entrega de la información conforme a la verificación de campo y al formato documental exigido por INVIAS. Durante la revisión técnica, la interventoría identificó una deficiencia en los modelos digitales de terreno, ya que no se incluyen las líneas de rotura, elementos fundamentales para garantizar la precisión geométrica del diseño vial. Se enfatizó que esta omisión afecta directamente el cálculo de la rasante, las secciones transversales y los volúmenes de movimiento de tierra. El consultor se comprometió a revisar la posibilidad de generar las líneas de rotura mediante software especializado y, en caso de no ser posible, realizar un nuevo levantamiento en campo.

2. Revision Financiera del contrato de consultoria

En la reunión también se analizó la necesidad de ajustar el flujo de caja actual para determinar si los recursos permiten cubrir las actividades hasta el mes de agosto de 2026. La interventoría recomendó realizar el trámite de una prórroga contractual con el fin de extender la ejecución del contrato de consultoría y evitar afectaciones por la Ley de Garantías. El consultor deberá presentar un flujo de caja actualizado, sustentando la proyección financiera y técnica de las actividades por ejecutar, a fin de respaldar la posible solicitud de prórroga ante el INVIAS.

3. Programación de obra y actividades de campo

La consultoría deberá elaborar la programación de campo y las actividades de socialización con las comunidades, incluyendo reuniones con los Consejos Comunitarios de López de Micay y los del tramo Guapi–Bocas del Napi. Asimismo, la consultoría deberá gestionar los permisos comunitarios, los carnés de identificación del personal, y coordinar la logística de transporte, alojamiento y acompañamiento social durante las jornadas de campo. Se acordó que la interventoría participará en las mesas técnicas presenciales o virtuales para validar los avances y garantizar la trazabilidad y cumplimiento de las actividades por parte del consultor.

4. Gestion ambiental

En materia ambiental, se informó que la consultoría solicitó la instalación de una mesa técnica con la CRC y la Gobernación del Cauca para definir las competencias relacionadas con el licenciamiento ambiental de los tramos del proyecto. La CRC elevará una consulta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) con el fin de evitar duplicidades y determinar oficialmente qué entidad debe tramitar las licencias. De igual manera, la interventoría recomendó incluir su participación en este proceso de gestión ambiental para consolidar un protocolo de actuación ambiental unificado entre consultoría, interventoría y entidades territoriales.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Organizar la información topográfica y geodésica conforme a la estructura de carpetas y nomenclatura exigida por el INVIAS.	25 de octubre de 2025	Consultoria
Entregar el flujo de caja actualizado con proyección de actividades hasta agosto de 2026 y sustento de la prórroga contractual.	22 de octubre de 2025	Consultoria
Tramitar ante el Comité Jurídico Universitario la conciliación laboral de los ingenieros Hugo Cosme, Carlos Paz y Napoleón Zambrano.	22 de octubre de 2025	Consultoria
Programar y realizar reuniones de socialización con los Consejos Comunitarios y comunidades locales.	30 de octubre de 2025	Consultoria - UPTC
Acompañar verificaciones de campo	noviembre de 2025	Consultoria - UPTC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 30/10/2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1.Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Consultoría ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2.Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Interventoria			
José Octavio Niño	Director de Interventoria	UPTC	
Diego Fernando Borda	Coordinador Tecnico Interventoria	UPTC	
Nik Johnatan Solarte Solarte	Ing. Auxiliar Interventoria	UPTC	
Milton Fidel Casabuena Mendoza	Coordinador BIM Interventoria	UPTC	
Yully Deissy Suarez	Coordinador Ambiental y Social Interventoria	UPTC	
John Alejandro Leon Vidal	Ing. Auxiliar Interventoria	UPTC	
Consultoria			
Fernado Nicolas Chacón Penagos	Director consultoría	UNICAUCA	
Wilmer Arley Campagna	Coordinador BIM	UNICAUCA	
Juan Orozco Ledezma	Coordinador Ambiental y Social	UNICAUCA	
Harold A. Ortega Moncayo	contratista	UNICAUCA	
Alexandra Rosas	Especialista Diseño Geometrico	UNICAUCA	
Jaime Obando	Supervisor Consultoria	UNICAUCA	
Ruben Ciacedo Celis	Asistente Consultoria	UNICAUCA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 22/10/2025
(Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 55
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4221 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONSULTOR: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN - GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234 DEL 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al Contrato de Consultoría No. 4221 de 2024, con el fin de analizar la solicitud de prórroga y adición presupuestal presentada por la interventoría y la consultoría.

Revisar el avance de actividades contractuales y definir compromisos relacionados con la ejecución y supervisión del proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Los temas tratados en la presente acta de reunión son:
1. Solicitud de prórroga y adición de recursos.
2. Posición del INVIAS
3. Aspectos técnicos y sociales del proyecto
4. Seguimiento financiero y acta de costos de octubre.
5. Próximas gestiones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 22 de octubre de 2025, se reunieron virtual, con los profesionales de la consultoría, la interventoría y el INVIAS, con el fin de analizar la solicitud de prorroga y adición presupuestal presentada por la interventoria y lla consultoria.

1. **Solicitud de prórroga y adición de recursos**:
- La interventoría presentó la solicitud de prórroga hasta el 31 de julio de 2025, justificando la necesidad de acompañamiento técnico y social durante la extensión del contrato de consultoría.
- Se expuso la necesidad de una adición de $390 millones correspondiente a tres meses del personal del grupo 1 (director, coordinadores técnico, ambiental y BIM, residente y auxiliar).
- La consultoría sustentó la prórroga debido a dificultades de orden público, condiciones climáticas, restricciones de acceso, trámites de permisos y procesos de concertación social, que han afectado el desarrollo normal de las actividades.

2. Posición del INVIAS:
- La gestora del proyecto manifestó que no existen recursos disponibles para adiciones durante 2024, por lo que los contratos deberán prorrogarse únicamente con los presupuestos actuales.

3. Aspectos técnicos y sociales del proyecto:
- La interventoría informó sobre el avance de la topografía y la coordinación con comunidades locales (especialmente en el sector Nayita–López de Micay) para autorizar el ingreso del personal técnico.
- La consultoría señaló avances en la gestión social y la planeación de ingreso a los tramos entre El Plateado y Guapi, con intención de ejecutar los contratos y actividades antes del cierre de 2025.

4. Seguimiento financiero y acta de costos de octubre:
- Se estableció que la consultoría deberá entregar los soportes técnicos y financieros del acta de octubre a más tardar el 28 de octubre de 2025, con el fin de cumplir los plazos definidos por INVIAS
- La interventoría deberá remitir el acta consolidada y los informes correspondientes el 29 de octubre de 2025.

5. Próximas gestiones:
Se acordó presentar el análisis de prórroga y adición ante la Dirección Técnica del INVIAS y socializar la información en el comité de evaluación programado para el día siguiente.

Durante la reunión, la interventoría presentó la justificación técnica y financiera de la prórroga y adición solicitadas, mostrando los impactos de las condiciones de campo sobre la ejecución.
El INVIAS, a través de la gestora del proyecto, enfatizó que por la falta de recursos presupuestales, no se podrán aprobar adiciones en la vigencia 2024, recomendando ajustar los recursos existentes.
Se propuso que la interventoría revise internamente la redistribución de cargas y personal para extender la supervisión hasta abril de 2025, mientras se gestionan recursos adicionales el próximo año.
Finalmente, se acordó elevar las observaciones a la Dirección Técnica y mantener la comunicación constante entre las partes para garantizar la continuidad y calidad del proyecto.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entregar los soportes técnicos y administrativos requeridos por la interventoría para el cierre del acta de octubre	29 de octubre de 2025	Consultoría
Remitir a INVIAS el informe técnico-financiero y acta de costos del mes de octubre con soportes completos.	29 de octubre de 2025	Interventoría (UPTC)
Presentar ante la Dirección Técnica la propuesta de prórroga y justificación técnica de interventoría y consultoría.	23 de octubre de 2025	INVIAS – Gestora del Proyecto
Asistir a reunión con la Dirección Técnica (ingeniera Sirley Merchán) para definir la viabilidad de la prórroga y adición.	23 o 24 de octubre de 2025	Interventoría (UPTC)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 23/10/2025
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1.Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Consultoría ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2.Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Interventoria			
Jose Octavio Niño	Director de Interventoria	(UPTC)	
Diego Fernando Borda	Ingeniero Profesional de Apoyo	(UPTC)	
Laura Patiño	Coordinadora Tecnica	(UPTC)	
Yuly Suarez	Coordinadora social y ambiental	(UPTC)	
Miguel Barreto	Coordinadora SIG	(UPTC)	
Camilo Hernando Hernandez	Ingeniero Residente Tecnico	(UPTC)	
Invias			
Xiomara Hernandez	Gestora Tecnica	INVIAS	
Jorge Medina	Supervisor Contrato de Interverntoria	INVIAS	
Consultoria			
Fernando Chacon	Director Consultoria	UNICAUCA	
Harold Ortega	Residente Estudios Tecnicos	UNICAUCA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 10

MEPI-MN1-IN-15-FR-7
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. uptcguapi4234@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORIA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-7 VERSIÓN: 1 PÁGINA: FECHA: 28/10/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 DE 2024 **INTERVENTOR:** Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia (UPTC)

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DEL 2025 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO DE CONSULTORI 4221 DE 2024 **CONSULTOR:** Universidad Del Cauca

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Jose Octavio Niñó (*)	74.322.702	director de interventoría.	$ 10.240.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 6.144.000		V	SANITAS	9493587117	$ 768.000	COLPENSIONES	9493587117	$ 983.040	NO	NO	NO	
2	Laura Melissa Patiño (*)	1.057.595.437	Coordinador Tecnico	$ 8.045.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 4.827.000		V	SANITAS	9492198492 9493301410	$ 603.375	PROTECCION	9492198492 9493301410	$ 772.320	NO	NO	NO	Se paga 2 planillas
3	Yully Deissy Suarez (*)	33.368.841	Coordinador ambiental y social de interventoría.	$ 8.045.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 4.830.000		V	SANITAS	7988050398	$ 603.750	COLPENSIONES	7988050398	$ 772.800	NO	NO	NO	
4	Nik Johnatan Solarte (*)	1.061.088.708	Ingeniero Auxiliar (1)	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 2.100.000		V	NUEVA E.P.S	35118887	$ 262.500	COLPENSIONES	35118887	$ 336.000	NO	NO	NO	
5	Andres Mauricio Vasquez (*)	74.081.949	Ingeniero Auxiliar (2)	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 2.100.000		V	SANITAS	80545555	$ 262.500	COLFONDOS	80545555	$ 336.000	NO	NO	NO	
6	Milton Fidel Carabuena (*)	1.049.612.751	Coordinado **BIM** y/o SIG (1)	$ 8.045.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 4.827.000		V	SANITAS	90885366	$ 603.375	COLFONDOS	90885366	$ 772.320	NO	NO	NO	
7	Miguel Arturo Salinas (*)	7.168.432	Coordinado BIM y/o **SIG** (2)	$ 8.045.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 4.827.000		V	SANITAS	90892839	$ 603.375	COLPENSIONES	90892839	$ 772.320	NO	NO	NO	
8	Camilo Hernando Hernandez (*)	1.136.880.280	Residente de Campo y/o **estudios** (1)	$ 5.850.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 3.510.000		V	SALUD TOTAL	9493859330	$ 438.750	PORVENIR	9493859330	$ 561.600	NO	NO	NO	
9	Jhon Alejandro Leon Vidal	1.061.755.871	Ingeniero Auxiliar (4)	$ 1.983.100															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1.189.860		V	NUEVA EPS	8638565876 8638614253	$ 148.733	COLPENSIONES	8638565876 8638614253	$ 190.378	NO	NO	NO	ver 2 Planillas
10	Jose Neiver Rodriguez Arboleda (*)	12.021.871	Ingeniero Residente de Campo y/o Estudios Hito III A	$ 5.850.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 3.510.000		V	SOS EPS	1075834681	$ 438.750	PORVENIR	1075834681	$ 561.600	NO	NO	NO	
11	Luis Eduardo Niño Tapias (*)	9.519.380	Ingeniero Residente de Campo y/o Estudios Hito III B	$ 3.314.610															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1.988.766		V	NUEVA EPS	4627456375	$ 248.596	COLPENSIONES	4627456375	N/A	NO	NO	NO	Pensionado
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 66.417.710																																												

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus CONSULTORs de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los CONSULTORs de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
NOMBRE: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA PROFESIONAL No. 01193-0243

Firma
NOMBRE: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MATRICULA PROFESIONAL No. 19202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JOSE OCTAVIO NIÑÓ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3046 DE 2025

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	3046 de 1 de septiembre de 2025
CONTRATISTA	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO.
CC.	74322702 de Paipa
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, Y SUS ADICIONALES AL HITO IIIA Y IIIB DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4234 de 2024".
VALOR DEL CONTRATO*	SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($61,440,000.00)
VALOR ADICION 1	N-A.
PLAZO DE EJECUCIÓN**	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA	N-A.
LUGAR DE EJECUCIÓN	TUNJA.
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TÉLLEZ, Vicerrector de Investigaciones y Extensión
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Supervisor del contrato.
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N. º 4234 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
PERIODO DEL INFORME	DEL 1 DE OCTUBRE HASTA EL30 DE OCTUBRE DE 2025.
NUMERO DEL PAGO	2 DE 4
VALOR DEL PAGO	$ 15´360.000

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.
**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

.

INTRODUCCIÓN

La Universidad del Cauca, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como ingeniero director en el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 30 de octubre 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

.

1. Se realiza seguimiento al equipo de especialistas de la interventoría que desempeñan la supervisión a cada uno de los volúmenes de los requerimientos exigidos contractualmente.
2. Octubre 21 en las instalaciones de la Unicauca se asisten a una reunión con el equipo de la Consultoría encabeza por el director, Ing. Fernando Chacón, en el nuevo supervisor Jaime Ovando y en especial con los dos especialistas de Diseño Geométrico Ingeniera,
3. tal tal tal Ingeniero Toll Toll junto con el Topografo, Juan Carlos Parada, por parte de la Interventoría la ingeniera Ambiental Yuly Suarez , el Coordinador BIM, Ingeniero Wilmer Carabuena; En esta reunión se trató el tema fundamental de las observaciones dadas a los trabajos de topografía Tramo 1 Plateado Honduras y Tramo 2 Huisito, Honduras, agua Clara, en el Tramo1 se iniciaron varias inconsistencias que se expusieron del no cumplimiento de requerimientos técnicos para esta actividad y para Tramo dos se evidenció que los trabajos están de bien referenciados y mojoniados cumpliendo todos requerimientos solicitados contractualmente para esta actividad. En conclusión, se tendrán que hacer los correctivos señalados y entregar los trabajos para dentro de ocho días. Igualmente se trató el tema sobre la proyección para la solicitud de la prórroga, tanto de la Consultoría como Interventoría, realizando los respectivos balances presupuestales y proyectándose hasta el mes de agosto del 2026 para posteriormente tener la posibilidad de una adición y prórroga. Se programó en conjunto con la Consultoría la visita para el mes de noviembre al municipio de Guapi.
4. Se revisa y se firma los soportes para proceso de consignación de rendimientos financieros cuenta de anticipo contrato No 4234 de 2024.
5. Se realiza reunión ejecutiva con el equipo de trabajo de la interventoría en las instalaciones de la Uptc, donde se definen tareas específicas de seguimiento, respecto a las actividades de cada grupo de especialistas de la consultoría y análisis de loque ellos han enviado para revisión.
6. Octubre 16. Reunión citada por la directora técnica del Invias, Doctor, Alejandra Castro y su equipo Asesor por parte de la subdirección de planificación estuvo la ingeniera Sirley Merchán subdirectora y la Ingeniera Jaime Xiomara Hernández Gestora, la Ingeniera, Alejandra Muñoz Coordinador Ambiental por parte de la Consultoría, Ingeniero, Ing. Jaime Ovando nuevo supervisor del contrato de Consultoría por parte de Unicauca, vicerrector financiero doctor Jorge Adrián León , Ingenieros Fernando Chacón Director, Henry Muñoz Coordinador Técnico, Dr. Camilo Salazar jurídico, virtualmente se conectaron el ingeniero Jorge Medina, supervisor, Interventoría, Invias, y el doctor Julián Manjarrés, por la Interventoría estuvo precedida por Germán Peña, delegado del sector de la Uptc, Diego, Borda y el suscrito. El tema fundamental es el compromiso por parte de la Consultoría para hacer entrega de los estudios y diseños de la vía al mar, tramo Plateado, López De Micay y Honduras Huisito, para mediados del mes de diciembre, toda vez que la directora operativa INIVAS, Dra. Alejandra Castro manifestó que el Conpes del Gobierno número 4041-2025, fue aprobado y está comprometida la construcción de este Tramo, el cual se sacará a licitación en el mes de enero del 2026 y es indispensable tener los estudios ya aprobados para esta fecha, Además informó que están en proceso de pliegos el Tramo Tambo - Nuchiga, Tramo Nuchiga -Huisito Honduras, Tramo plateado -Honduras, Tramo, Honduras, López, De Micay y Tramo plateado Argelia por un valor de 2.2 billones de pesos, los cuales están aprobados por presidencia de la República. Al igual se trató el tema de la facturación de la totalidad de los recursos de reserva, antes del mes de octubre y la realización de un plan de contingencia ejecutable.
7. Octubre 14 El Ing. Fidel Peñuela, presenta en físico la cartografía del análisis de la información del trazado, Plateado – Timbiquí. ; El Invias, menciona el alcance de la reunión, de acuerdo a la solicitud del Ing. Fidel Peñuela. La Interventoría presenta el Google earth, la ubicación del cada

Hito I –Hito II – Hito III – Hito IIA – Hito IIIB, conforme al alcance del proyecto.- Se presenta por parte de la consultoría, la localización de zonas de importancia ambiental y localización de Reserva forestal del pacifico, describiendo el alcance del proyecto desde el componente ambiental se menciona la existencia de Diagnóstico Ambiental de Alternativas, otorgado por la CRC Corporación Autónoma Regional de Cauca, mediante resolución No 8304, de fecha 22 de diciembre de 2015.Donde ya se encuentra definida la Alternativa, que proporciona, si bien un tramo más largo , pero garantizaría la minimización de impactos ambientales.

8. Octubre 14. Por solicitud de la ingeniera Sirley Merchán y Xiomara Hernández. Se participó en la reunión de seguimiento con la consultoría a interventoría en las oficinas del Invias. en la cual se discutieron varios temas que expuso inicialmente el director Fernando Chacón, relacionado con las estrategias y discriminación del acta para el mes de octubre por el orden de los 1900 millones, para poder cubrir la reserva y evitar que se pierdan los recursos, a la vez, informó sobre el cambio de supervisor Juan Carlos Casas de la consultoría, el director de interventoría expuso la relación de inconformidad y aclaraciones para hacerlos correctivos pertinentes como la autorización para utilizar recursos del anticipo en la compra de bienes y equipos que no se han hecho el bajo rendimiento técnico de la obra, la falta de comunicación oficial a la interventoría, la falta información de la programación de los trabajos de campo, la falta de soportes para anexar a las actas de cobro y que están pendientes por entregar, el no aprovechamiento de los permisos que han generado los actores de la región para entrar a campo. Adicionalmente se pide aclaración del valor de la topografía por kilómetro. Finalmente, la ingeniera Shirley expresó su preocupación por no cumplimiento por parte de la consultoría de compromisos adquiridos con anterioridad y la posibilidad de comenzar a ser los procesos sanatorios correspondientes.
9. Se hizo seguimiento de factura electrónica del acta de costos No. 11 del mes de septiembre de 2025, correspondiente al Contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024 INVIAS - UPTC. INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
10. Autorización de desembolso rendimientos financieros mes de septiembre de 2025 Recibidos
11. Se asiste a comiste de seguimiento abordaron varios puntos críticos relacionados con el contrato de consultoría No 4221 de 2024, destacando la urgencia de recibir las hojas de vida del personal a contratar y un plan de trabajo consolidado, con una fecha límite establecida para el 14 de diciembre. Se discutió la importancia de mantener comunicación con las comunidades locales y la necesidad de que los especialistas ambientales participen en las reuniones clave, así como la actualización de la información del componente BIM y la revisión de la documentación por parte de los coordinadores, se planteó la necesidad de agilizar los contratos de topografía y extracción de suelos, con un enfoque en la facturación y la entrega de volúmenes. Se sugirió la elaboración de una resolución para facilitar estos trabajos y se enfatizó la importancia de aclarar los costos por kilómetro en el contrato de topografía. La falta de actividades en campo y la necesidad de información sobre trabajos de topografía en otros tramos también fueron temas centrales de la discusión; se solicitó la entrega formal del programa de actividades y el plan de contingencia, subrayando que la información debe abarcar todos los aspectos del contrato.
12. Invitación: Reunión Técnica Especialista en Pavimentos directores trabaja con la especialista de pavimentos Ing. Jessica Hernández, y se da una introducción y generalidad del contrato 4221-2024 consultoría e interventoría cto 4234-2024 y sus alcances. Reunión virtual de seguimiento con la asistencia de Jorge Medina Xiomara Hernández, Julio Toro por parte de Invias, el equipo de Consultoría, la Interventoría y los dos coordinadores del área Bim se hizo un control sobre los compromisos de la última reunión en las diferentes áreas, Ambiental, social, técnica y

administrativa en los cuales se dejaron nuevos compromisos para el 14 de octubre, y de esta forma poder presentar el acta de costos para cubrir todos los recursos de reserva.

13. Se participa en reunión virtual citada por La ingeniera Jenny Xiomara Hernández, junto con el director de consultoría Ing. Fernando Chacón y la interventoría, con el propósito de hacer una aclaración y explicación del precio de la topografía por kilómetro y su discriminación.
14. Con el grupo de trabajo de la interventoría se hace una exposición en la jornada internacional de investigación y extensión GIGA Uptc, sobre el tema e impacto social de los estudios y diseños de la vía al mar, Popayán plateado Guapi y la otra vía. Estudios y diseños de la vía Cruce el Cairo, San José Del Palmar, Novita en chocó el tema tuvo una acogida especial para los alumnos, profesores y demás participantes de la conferencia.
15. Se participa en mesa técnica de trabajo en la oficina UPTC, con el gerente del contrato Germán Eduardo Peña, el supervisor del cto de interventoría Ing. Oscar Gutiérrez, la coordinadora técnica y el suscrito, con el objeto de aclarar situaciones de la consultoría respecto al cambio de director y coordinadores social y ambiental, además proyectar la presencia de los ingenieros de la interventoría para acompañar el ingreso al territorio con todas las garantías posibles. Igualmente, se tubo entrevista con los especialistas de estructuras Pedro Pacheco e Ing. Camilo Samacá de geotecnia.
16. Se organiza y se coordina la solicitud de los tiquetes para hacer el respectivo desplazamiento a los profesionales tanto de Bogotá a Popayán y viceversa para cumplir los las citas a mesas de trabajo y seguimiento del contrato en supervisión.
17. Se hace seguimiento, se revisa y se aprueban los informes semanales y mensuales que se presentan al Invias en los tiempos determinados.
18. Se efectúa reunión presencial con el equipo de profesionales de apoyo y el gerente del contrato para tratar temas de seguimiento respecto a los compromisos de la consultoría en reuniones anteriores y se oficia respectivamente.
19. Se mantiene informado al supervisor del contrato de prestación de servicios y/o a la Gerencia de la UPTC, sobre las necesidades de elementos, muebles y equipos de oficina localizada en Popayán, que se requieran para el normal funcionamiento de la Interventoría.
20. Se realiza la verificación del personal ofrecido en la propuesta por la consultoría esté desempeñando el cargo para el cual fue propuesto según lo establecido en los estudios previos dispuestos por el INVIAS.
21. Se mantiene comunicación y mesas de trabajo con el equipo profesional de apoyo que integran la interventoría y que se encuentran en campo.
22. Se supervisa y se hace seguimiento al personal profesional que labora en la interventoría perteneciente al grupo uno. Con el propósito de estar atento a cada una de las solicitudes y requerimientos del contrato de consultoría
23. Se firma y aprueban todas las actas de acuerdo al Manual de Interventoría Versión Vigente del INVIAS, entre otras actas de mensual de costos de consultoría e interventoría, Actas de modificación de cantidades de consultoría e interventoría, entre otras.
24. Se coordina, se revisa y se presentan los informes semanales y la presentación en power point mensual vía e-mail, debidamente revisados, aprobados a las diferentes dependencias.
25. Se mantiene comunicación con el Gestor del contrato, por parte del INVIAS, con el propósito de coordina el proceder y entrega según fechas dispuestas por la administración financiera para la entrega de informes, documentos y actas respectivas pendientes.
26. Se realizan labores de verificación en los diferentes requisitos precontractuales a que haya lugar, de acuerdo al Manual de Interventoría versión vigente, especialmente en lo relacionado con el instructivo para seguimiento de la ejecución del Contrato de interventoría.

27. Asesorar y suministrar la información técnica-financiera y en general cualquier información que las comisiones de seguimiento de gestores técnicos y de proyectos, de control y evaluación enviada por el Instituto Nacional de Vías y /o de las entidades de control que lo requieran
28. Rendir informes periódicos al Instituto Nacional de Vías –INVIAS- con base en las pruebas, verificaciones y cuantificaciones de los estudios que realice el consultor, sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los posibles efectos negativos del proyecto.
29. Se estudió las sugerencias y consultas del contratista, resolviéndolas oportunamente y emitir conceptos técnicos, financieros y legales según el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones remitidas al gestor técnico del contrato y a la unidad ejecutoria pertinente para su trámite, para lo cual puede contar con los especialistas de la interventoría.
30. Se realiza seguimiento y se supervisa las labores o actividades de los diferentes profesionales que conforman el equipo de trabajo de la interventoría y se expone las diferentes situaciones en el desarrollo de los contratos, tanto consultoría como interventoría, para proponer entre todos las mejores alternativas o soluciones a las circunstancias expuestas según sea el caso.
31. Con corte a 31 de octubre de 2025, el contrato presenta un avance financiero programado del 81,5 %, ante a un avance ejecutado del 40,6 %, lo que representa un atraso acumulado del 40,6 **%** respecto al valor total de la consultoría incluido el adicional. Lo anterior por la imposibilidad de entrar aun a campo por la no autorización de los actores para poder entrar a tomar información de campo según lo manifestado por la Consultoría. Se concertó estrategias del orden financiero con el visto bueno del invias, para poder facturar los recursos de reserva, los cuales tiene que ejecutarse en esta vigencia 2025, puesto que feneces si no se invierten.
32. Coordinar con la consultoría la programación para realización de socializaciones y divulgaciones de los estudios y diseños con la comunidad, entes territoriales y nacionales, entre otros actores e interesados según sea necesario, y realizar el seguimiento y acompañamiento correspondiente al desarrollo de las mismas.

ENTREGABLES

- Revisión y aprobación actas de costos de consultoría e interventoría.
- Revisión y aprobación informes semanales, mensual, actas de reunión y oficios de solicitudes y respuestas tanto al invias como al consultor.

ESTADO FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA

Nota. En Preacta el acta de costos No. 12 (octubre 2025)

PERIODO		VALOR BÁSICO	VALOR TOTAL ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL (2024)	VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL (2025)	SALDO ANTICIPO
	ANTICIPO		**$ 6.180.000.000,00**				
nov-24	1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 6.180.000.000,00
dic-24	2	$ 136.922.000,00	$ 136.922.000,00	$ 68.461.000,00	$ 68.461.000,00		$ 6.111.539.000,00
ene-25	3	$ 97.850.000,00	$ 97.850.000,00	$ 48.925.000,00	$ 48.925.000,00		$ 6.062.614.000,00
feb-25	4	$ 97.870.000,00	$ 97.870.000,00	$ 48.935.000,00	$ 48.935.000,00		$ 6.013.679.000,00
mar-25	5	$ 97.870.000,00	$ 97.870.000,00	$ 48.935.000,00	$ 48.935.000,00		$ 5.964.744.000,00

abr-25	6	$ 97.870.000,00	$ 97.870.000,00	$ 48.935.000,00	$ 48.935.000,00		$ 5.915.809.000,00
may-25	7	$ 936.122.400,00	$ 936.122.400,00	$ 468.061.200,00	$ 468.061.200,00		$ 5.447.747.800,00
jun-25	8	$ 199.582.600,00	$ 199.582.600,00	$ 99.791.300,00	$ 99.791.300,00		$ 5.347.956.500,00
jul-25	9	$ 162.979.600,00	$ 162.979.600,00	$ 81.489.800,00	$ 81.489.800,00		$ 5.266.466.700,00
ago-25	10	$ 1.831.157.615,00	$ 1.831.157.615,00	$ 183.115.761,50	$ 1.648.041.853,50		$ 5.083.350.938,50
	ANTICIPO		**$ 1.380.000.000,00**		$ 1.380.000.000,00	$ 0,00	
sep-25	11	$ 361.206.876,00	$ 361.206.876,00	$ 36.120.687,60	$ 325.086.188,40	$ 0,00	$ 5.047.230.250,90
oct-25	12	$ 2.125.931.842,33	$ 2.125.931.842,33	$ 212.593.184,23	$ 1.913.338.658,10	$ 0,00	$ 4.834.637.066,67
TOTALES		**$ 6.145.362.933,33**	**$ 6.145.362.933,33**	**$ 1.345.362.933,33**	**$ 6.180.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 4.834.637.066,67**

A finales de octubre, se presenta una proyección de avance financiero programado del 81,49 %, frente a un avance ejecutado del 40,64%, lo que representa un atraso acumulado del 40,64% respecto al valor total de la consultoría.

INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. - INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA

ACTA No.	PERIODO	VALOR BÁSICO	VALOR TOTAL ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR REAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL2024	VALOR FECTACIÓN PRESUPUESTAL (2025)	SALDO ANTICIPO
ANTICIPO			**$ 2.127.000.000,00**				
1	nov-24	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 2.127.000.000,00
2	dic-24	$ 68.209.600,00	$ 68.209.600,00	$ 34.104.800,00	$ 34.104.800,00		$ 2.092.895.200,00
3	ene-25	$ 10.271.440,00	$ 10.271.440,00	$ 5.135.720,00	$ 5.135.720,00		$ 2.087.759.480,00
4	feb-25	$ 74.344.000,00	$ 74.344.000,00	$ 37.172.000,00	$ 37.172.000,00		$ 2.050.587.480,00
5	mar-25	$ 74.344.000,00	$ 74.344.000,00	$ 37.172.000,00	$ 37.172.000,00		$ 2.013.415.480,00
6	abr-25	$ 16.131.280,00	$ 16.131.280,00	$ 8.065.640,00	$ 8.065.640,00		$ 2.005.349.840,00
7	may-25	$ 223.886.880,00	$ 223.886.880,00	$ 111.943.440,00	$ 111.943.440,00		$ 1.893.406.400,00
8	jun-25	$ 127.564.960,00	$ 127.564.960,00	$ 63.782.480,00	$ 63.782.480,00		$ 1.829.623.920,00
9	jul-25	$ 152.540.000,00	$ 152.540.000,00	$ 76.270.000,00	$ 76.270.000,00		$ 1.753.353.920,00
10	ago-25	$ 514.704.000,00	$ 514.704.000,00	$ 51.470.400,00	$ 463.233.600,00		$ 1.701.883.520,00
ANTICIPO ADICIONAL No. 1			**$ 412.000.000,00**		$ 412.000.000,00	$ 0,00	
11	sep-25	$ 191.964.000,00	$ 191.964.000,00	$ 19.196.400,00	$ 172.767.600,00	$ 0,00	$ 1.682.687.120,00
12	oct-25	$ 784.420.904,00	$ 784.420.904,00	$ 78.442.090,40	$ 705.352.720,00	$ 626.093,56	$ 1.604.245.029,60
TOTALES		**$ 2.238.381.064,00**	**$ 2.238.381.064,00**	**$ 522.754.970,40**	**$ 2.127.000.000,00**	**$ 626.093,56**	**$ 1.604.245.029,60**

En el mes de octubre del 2025, con el Acta de modificación de costos No. 4, consultoría presenta los siguientes volúmenes, para su reconocimiento parcial:

HITO II - FASE III VÍA NUEVA - VOLÚMENES DEL TRAMO NAPI – EL PLATEADO LOG APROX 58 KM. (18 VOLUMENES)


HITO IIIA - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD (FASE I) PARA LA CONEXIÓN INTERMODAL DEL MCPO DE LOPEZ DE MICAY EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA (1 METODOLOGIA Y 8 BORADORES DE CAPITULOS)

HITO III B - ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA - VOLÚMENES DEL TRAMO EL PLATEADO - LOPEZ DE MICAY LONGITUD APROXIMADA 70 Km (10 METODOLOGIAS)

En general se ha prestado asesoría y acompañamiento antes las situaciones técnicas y competentes en el área de dirección de interventoría, atendiendo oportunamente las solicitudes presentadas, en cumplimiento con las funciones contempladas en el contrato de prestación de servicios durante el desarrollo del periodo del 1 al 31 de octubre de 2025.



Fotografía 1. KMZ correspondiente al Hito I Plateado- Napi.

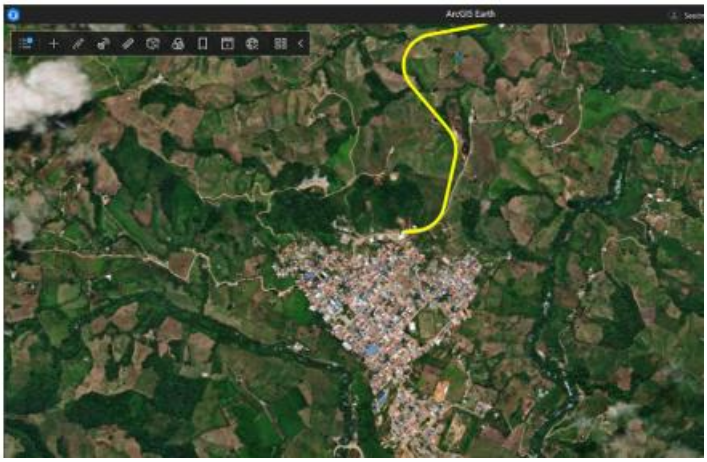

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
FOTO1. Reunión de seguimiento al contrato 4221-2025, con el equipo de consultoría con el objeto de proyectar el acta de octubre, con el nuevo supervisor.	**FOTO2.** Reunión de seguimiento al contrato 4221-2025, con el objeto de informar sobre el resultado parcial del avance de la topografía y las observaciones de la interventoría.

	
FOTO 3. Reunión con el geólogo Peñuela para escuchar sus peticiones en reiterada solicitud de derecho de petición con respecto a la ubicación de la vía al mar	**FOTO 4.** Seguimiento a los trabajos de seguimiento, diagnostico e inventario de la vía plateado -san juan de micay por la consultoría e interventoría
	
FOTO 5. Reunión en la dirección técnica del invias con la directora Alejandra castro, y su equipo de trabajo y la consultoría e interventoría	**FOTO 6.** Mesa de trabajo con la subdirectora de planificación Sirley Merchán y gestora Xiomara Hernández, el equipó consultoría e interventoría en el INVIAS Bta.

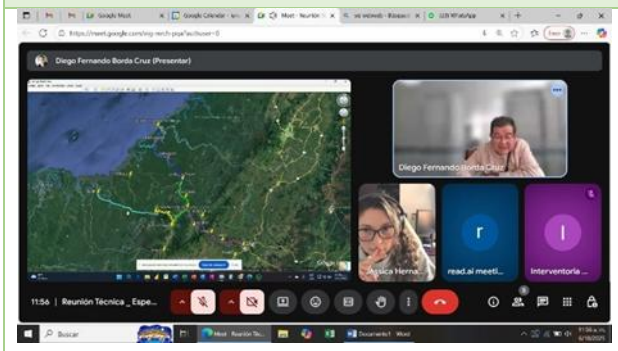
	
FOTO 7. Reunión Imagen N° 2 (Social) Guapi - 08 octubre de 2025	**FOTO 8.** Mesa de trabajo en la Oficina invias con el ing Peñuela la consultoría e Interventoría y directiva de planificación para aclarar el alcance del contrato
	
FOTO 9. Mesa de trabajo de forma virtual con la especialista de pavimentos y otros profesionales de interventoría	**FOTO 10.** Mesa de trabajo en la Uptc con el gerente y supervisor del contrato de interventoría

	
FOTO 11. Participación en evento de la vicerrectoría de investigación de la Uptc con el grupo de trabajo del contrato con el invias y todo su equipo de trabajo profesional	**FOTO 12** Participación como expositor en la JORNADA INTERNACIONAL INVESTIGACION Y EXTENSION GIGA UPTC, conferencia Impacto Social Proyectos viales Cauca, Choco y Valle del Cauca.

PRESENTADO POR:

JOSÉ OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de interventoría del contrato 4234-2024

V° B°:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74322702		NIÑO BRIJALDO JOSE OCTAVIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CORINTO SECTOR MONTESILLO	PAIPA-BOYACA	7852521	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1000000367	9493587117	I	2025/11/05	2025/10/24	BANCO DE BOGOTA	0	$1,820,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 6.170.000	No		COLPENSIONES	30	$ 6.170.000	16%	SIN RIESGO	$ 987.200	$ 0	$ 0	$ 30.900	$ 30.900	$ 0	$ 1.049.000		SANITAS	30	$ 6.170.000	12,5%	$ 771.300	$
																					$ 1.049.000						$ 771.300	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 771.300			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	1	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 771.300						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74322702		NIÑO BRIJALDO JOSE OCTAVIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CORINTO SECTOR MONTESILLO	PAIPA-BOYACA	7852521	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1000000367	9493587117	I	2025/11/05	2025/10/24	BANCO DE BOGOTA	0	$1,820,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,049,000	$0	$0	$1,049,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,049,000	$0	$0	$1,049,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$771,300	$0	$0	$771,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$771,300	$0	$0	$771,300
TOTAL				1	$1,820,300	$0	$0	$1,820,300

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 74322702		NIÑO BRIJALDO JOSE OCTAVIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CORINTO SECTOR MONTESILLO	PAIPA-BOYACA	7852521

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2025-10**	Periodo Salud	**2025-10**
Fecha límite de pago	**2025/11/05**	Fecha de pago	**2025/10/24**
Dias de mora	**0**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$1,820,300**
Intereses de mora	**$0**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$1,820,300**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9493587117**
Clave de pago	**1000000367**
Banco	**BANCO DE BOGOTA**

2025/10/28 08:20 AM

Tu pago fue exitoso

24/oct/2025 - 1:00 p. m. - IP 191.156.49.171

No. de comprobante

367942

Valor de tu pago

$1.820.300,00

Desde	**Cuenta de ahorros 6589**
Hacia	**Planilla As Aportes en Linea - Nro. de planilla 9493587117**
Costo de la transacción	**$0,00**

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO** identificado con **CC** No. **74322702**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 03/03/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 28/04/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/12/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20250101614498.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 3 días del mes de Noviembre de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
NIT. 891800330-1

DEBE A:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO.
C.C. 74.322.702

La suma de: Quince millones trescientos sesenta mil pesos MCTE ($ 15.360.000) correspondiente al pago del periodo octubre de 2025, por cumplir a satisfacción con los servicios del contrato No. 1656: (PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LA INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.), según el siguiente detalle:

- Valor de los honorarios fijados en el contrato 4234 del 2024 para el director de interventoría, según los días laborados: $10.240.000
- Factor prestacional: 0,5
- Valar total honorarios: $15.360.000 ($10.240.000 X 1,5)

Dando cumplimiento a lo establecido en los articulo 9 y 11 del decreto 2231 de 2023, para efectos de retención en la fuente, en el presente pago o abono en cuenta efectuado a mi nombre por concepto de rentas de trabajo no provenientes de una relación laboral, legal y reglamentaria, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a este pago.

Se expide el 3 de noviembre de 2025.

Cordialmente,



JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO.
C.C. 74.322.702

LAURA MELISSA PATIÑO

CORDINADOR TECNICO.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1849 DE 2025

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	1849 del 20 de mayo de 2025
CONTRATISTA	LAURA MELISSA PATIÑO SANCHEZ.
CC.	1.057.595.437 de Sogamoso Boyacá.
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
VALOR DEL CONTRATO*	$ 64.762.250
PLAZO DE EJECUCIÓN**	DEL 21 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025.
PRORROGA	N.A.
LUGAR DE EJECUCIÓN	TUNJA.
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TÉLLEZ, Vicerrector de Investigaciones y Extensión
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Supervisor del contrato
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N. º 4234 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	COORDINADOR TECNICO DE INTERVENTORIA
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.
NUMERO DEL PAGO	6 DE 6
VALOR DEL PAGO	$12.067.500

INTRODUCCIÓN

La Universidad del Cauca, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como coordinador técnico de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se describen las actividades desarrolladas entre el 01 al 31 de octubre de 2025.

1. Seguimiento y control del proyecto: Se participó en reuniones de seguimiento con el equipo de la consultoría (Universidad del Cauca), el gestor técnico del proyecto por parte del INVIAS y el supervisor del contrato de interventoría por parte de la Dirección Territorial Cauca. De dichas reuniones se levantaron las siguientes actas:
   - Acta de reunión N°48 realizada el 03 de octubre de 2025
   - Acta de reunión N°49 realizada el 08 de octubre de 2025
   - Acta de reunión N°50 realizada el 08 de octubre de 2025
   - Acta de reunión N°51 realizada el 14 de octubre de 2025
   - Acta de reunión N°52 realizada el 14 de octubre de 2025
   - Acta de reunión N°53 realizada el 16 de octubre de 2025
   - Acta de reunión N°54 realizada el 21 de octubre de 2025
   - Acta de reunión N°55 realizada el 22 de octubre de 2025

2. Gestión de la plataforma del Entorno Común de Datos (CDE): El 15 de octubre de 2025 se realizó una reunión con la Consultoría y el INVÍAS para revisar el componente técnico alojado en la plataforma CDE. Adicionalmente, el 23 de octubre de 2025 se llevó a cabo una capacitación virtual interna con el Coordinador BIM de la Interventoría, orientada a definir lineamientos de manejo y organización del entorno CDE, estandarizando la administración de la información técnica del proyecto.

3. Trámite de actas de costos: Se gestionó ante el INVIAS el trámite del acta de costos correspondiente al mes de septiembre de 2025 de interventoría y consultoría. El acta del mes de octubre se encuentra en trámite.

4. Informes de seguimiento: Se elaboraron y remitieron informes de seguimiento semanales a la Subdirección de Planificación de Infraestructura del INVIAS.
   - Informe semanal No 45 correspondiente al periodo del 29/09/2025 al 05/10/2025.
   - Informe semanal No 46 correspondiente al periodo del 06/10/2025 al 12/10//2025.
   - Informe semanal No 47 correspondiente al periodo del 13/10/2025 al 19/10//2025.
   - Informe semanal No 48 correspondiente al periodo del 20/10/2025 al 26/10//2025.

5. Reporte de avance contractual: Se mantuvo comunicación continua con la Dirección de Interventoría, la Gerencia del Contrato y el Supervisor, informando los avances, novedades y acciones correctivas implementadas.
6. Seguimiento a anticipo del contrato de interventoría y consultoría: Se efectuó el control y seguimiento al uso del anticipo de los Contratos Interadministrativos No. 4221 y 4234 de 2024, verificando el cumplimiento de los lineamientos del INVÍAS. Se realizó la revisión detallada de soportes y el diligenciamiento del formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2 “Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo – Contrato de Interventoría”**.**
7. Revisión de estudios y diseños: Se avanzó en la revisión técnica de los estudios y diseños correspondientes al Hito I – Fase III (tramo Guapi–Napi, aprox. 68 km) y Hito II – Fase III (tramo Napi–El Plateado, aprox. 58 km).
8. Seguimiento técnico-administrativo: Se hizo seguimiento a la planificación y ejecución de actividades por parte de la Universidad del Cauca, conforme al cronograma contractual.
9. Apoyo a la gestión contractual: Se brindó apoyo en el desarrollo del Contrato Interadministrativo de Interventoría, tramitando correspondencia conforme a los formatos y procedimientos establecidos, y en cumplimiento de las disposiciones del Manual de Interventoría de INVIAS vigente.
10. Seguimiento y control de hojas de vida – Contrato 4221 de 2024: Durante octubre la Consultoría remitió hojas de vida para las siguientes especialidades:
    - Especialista en Urbanismo (Hitos I y II)
    - Especialista en Sostenibilidad (Hitos I y II)
    - Especialista en Hidrogeología (Hitos I y II)
    - Especialista Ambiental (Hitos I, II y IIIB)

Se emitieron observaciones mediante los oficios C4234-234-2024, C4234-235-2024, C4234-241-2024 y C4234-242-2024, los cuales fueron devueltos a la Consultoría por no cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo Técnico del contrato 4221 de 2024. La Consultoría se encuentra realizando los ajustes correspondientes.

11. Gestión documental: Se actualizó el registro de entrada y salida de la correspondencia del contrato, garantizando trazabilidad conforme a los lineamientos del Manual de Interventoría.
    La información se encuentra archivada en las oficinas del Contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024, ubicadas en la ciudad de Tunja dentro de las instalaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Así mismo, se cuenta con el respaldo de la documentación digitalizada en el DRIVE del correo institucional: uptcguapi4234@gmail.com

12. Representación institucional: Se representó a la UPTC ante el INVIAS para adelantar trámites administrativos internos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.
13. Participación académica: El 02 de octubre de 2025 se participó en la charla “Impacto Social de Proyectos Cauca – Chocó – Valle del Cauca”, dirigida a estudiantes y docentes de la UPTC.
14. Supervisión de personal técnico: Se realizó el seguimiento a las actividades de los profesionales contratados por la UPTC, verificando el cumplimiento de cronogramas y metas establecidas.
15. Coordinación interinstitucional: Se programaron y ejecutaron reuniones internas y externas con las entidades involucradas en el proceso de estudios y diseños para la Conexión Popayán–Guapi.
16. Apoyo técnico-administrativo: Se brindó asistencia técnica y administrativa al Director de Interventoría en el desarrollo de las actividades propias del control contractual, conforme a la normativa vigente.

ESTADO DEL PROYECTO:

A continuación, se presenta la trazabilidad de los trámites efectuados durante la ejecución del Contrato de Consultoría No. 4221 de 2024, ejecutado por la Universidad del Cauca:

- Mediante directriz del INVIAS, se dio orden de inicio a los contratos interadministrativos de consultoría e interventoría el día 22 de noviembre de 2024.
- El Instituto Nacional de Vías INVIAS suscribió minutas de prórroga para los dos contratos interadministrativo de consultoría como de interventoría, con nuevo plazo comprendido desde el 31 de diciembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025 sin adición de valor.
- El 3 de diciembre de 2024, el INVIAS aprobó y registró la cuenta para el anticipo del Contrato de Consultoría No. 4221 de 2024, por un valor de $6.180.000.000.
- El 6 de diciembre de 2024, el INVIAS aprobó y registró la cuenta para el anticipo del Contrato de Interventoría No. 4234 de 2024, por un valor de $2.127.000.000.
- El 24 de junio de 2025, se formalizó la Adición No. 01 y Modificación No. 03 al Contrato de Interventoría No. 4234 de 2024, por valor de $824.000.000.
- El 25 de junio de 2025, se suscribió la Adición No. 01 y Modificación No. 02 al Contrato de Consultoría No. 4221 de 2024, por valor de $2.760.000.000.

Actas de costos – Consultoría (Contrato 4221 de 2024)

- Se radico ante el INVIAS la factura No 1 por un valor de $0,00 correspondiente al acta No 1 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4221 de 2024 noviembre 2024.

- Se radico ante el INVIAS la factura No 2 por un valor de $136.922.000,00 correspondiente al acta No 2 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4221 de 2024 diciembre 2024.
- Se remitió al INVIAS el acta No 3 por un valor de $97.850.000,00 correspondiente al acta No 3 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4221 de enero 2025 aprobada por la interventoría.
- Se remitió al INVIAS el acta No 4 por un valor de $97.870.000,00 correspondiente al acta No 4 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4221 de febrero 2025 aprobada por la interventoría.
- Se remitió al INVIAS el acta No 5 por un valor de $97.870.000,00 correspondiente al acta No 5 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4221 de marzo 2025 aprobada por la interventoría.
- Se remitió al INVIAS el acta No 6 por un valor de $97.870.000,00 correspondiente al acta No 6 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4221 de abril 2025 aprobada por la interventoría.
- Se remitió al INVIAS el acta No 7 por un valor de $936.122.400,00 correspondiente al acta No 7 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4221 de mayo 2025 aprobada por la interventoría.
- Se remitió al INVIAS el acta No 8 por un valor de $199.582.600,00 correspondiente al acta No 8 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4221 de junio 2025 aprobada por la interventoría.
- Se remitió al INVIAS el acta No 9 por un valor de $162.979.600,00 correspondiente al acta No 9 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4221 de julio 2025 aprobada por la interventoría.
- Se remitió al INVIAS el acta No 10 por un valor de $1.831.157.615,00 correspondiente al acta No 10 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4221 de agosto 2025 aprobada por la interventoría.
- Se remitió al INVIAS el acta No 11 por un valor de $361.206.876,00 correspondiente al acta No 11 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4221 de septiembre 2025 aprobada por la interventoría.
- Se encuentra en revisión por parte de la interventoría el acta No 12 por un valor aproximado de $2.125.931.842,33 correspondiente al acta No 12 de costos de consultoría contrato interadministrativo No 4221 de octubre 2025.

Actas de costos de interventoría tramitadas ante el Instituto Nacional de Vías:

1. Valor acta de costos de interventoría del mes de noviembre 2024, fue de $0,00 esta acta fue radicada en el INVIAS.
2. Valor acta de costos de interventoría del mes de diciembre 2024, fue de $68.209.600,00 esta acta fue radicada en el INVIAS.

3. Valor acta de costos de interventoría del mes de enero 2025, fue de $10.271.440,00 esta acta fue radicada en el INVIAS.
4. Valor acta de costos de interventoría del mes de febrero 2025, fue de $74.344.000,00 esta acta fue radicada en el INVIAS.
5. Valor acta de costos de interventoría del mes de marzo 2025, fue de $74.344.000,00 esta acta fue radicada en el INVIAS.
6. Valor acta de costos de interventoría del mes de abril 2025, fue de $16.131.280,00 esta acta fue radicada en el INVIAS.
7. Valor acta de costos de interventoría del mes de mayo 2025, fue de $223.886.880,00 esta acta fue radicada en el INVIAS.
8. Valor acta de costos de interventoría del mes de junio 2025, fue de $127.564.960,00 esta acta fue radicada en el INVIAS.
9. Valor acta de costos de interventoría del mes de julio 2025, fue de $ 152.540.000,00 esta acta fue radicada en el INVIAS.
10. Valor acta de costos de interventoría del mes de agosto 2025, fue de $ 514.704.000,00 esta acta fue radicada en el INVIAS.
11. Valor acta de costos de interventoría del mes de septiembre 2025, fue de $ 191.964.000,00 esta acta fue radicada en el INVIAS.
12. Valor acta de costos de interventoría del mes de octubre 2025, fue de $ 784.420.904,00 esta acta se encuentra en trámite.

Total, ejecutado acumulado a 31 de octubre de 2025 actas de costos de interventoría: **$ 2.238.381.064,00**
Anticipo amortizado a 31 de octubre 2025: $ 522.754.970,40
Saldo de anticipo a 31 de octubre de 2025: $ 1.604.245.029,60
Nota: Los contratos de consultoría e interventoría actualmente siguen en estado activo.

INVERSIÓN:
• Recursos comprometidos Consultoría $ 15.120.000.000,00
• Recursos comprometidos en Interventoría: $ 5.078.000.000,00
• **Inversión Total del Proyecto: $ 20.198.000.000,00**

NECESIDADES DEL PROYECTO:

Durante el mes de octubre de 2025, en el marco del acompañamiento técnico prestado por la interventoría al Contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024, se identificaron las siguientes necesidades y beneficios asociados al desarrollo del proyecto:

1. **Cierre técnico de metodologías**: Continuar con la concertación y aprobación de las 36 metodologías propuestas por la Consultoría, en cumplimiento de los

lineamientos establecidos por el INVÍAS, asegurando su adopción formal en todos los hitos del proyecto.

2. **Cumplimiento del plan de contingencia**: Es necesario que la Consultoría mantenga el cronograma actualizado, priorizando las entregas parciales y revisiones tempranas de productos antes de la finalización de la vigencia contractual (31 de diciembre de 2025).
3. **Fortalecimiento del componente de campo:** Se requiere intensificar la presencia de equipos técnicos y sociales en los tramos Huisitó – Honduras y El Plateado – López de Micay, con el fin de completar los levantamientos y validaciones pendientes.
4. **Mejor integración del componente BIM-SIG:** Se recomienda mejorar la correspondencia entre la información topográfica, cartográfica y ambiental cargada al CDE, especialmente en la sobreposición de shapefiles y mapas de áreas de influencia.
5. **Gestión ambiental con autoridades competentes**: Se hace necesario agilizar la concertación con la CRC, para definir pronunciamientos y requisitos ambientales aplicables a los diferentes hitos del proyecto.
6. **Entrega oportuna de productos y soportes técnicos**: Es indispensable que la Consultoría remita los entregables completos, con trazabilidad y consistencia entre los documentos técnicos, sociales y ambientales, para garantizar su revisión y aprobación por parte de la Interventoría.
7. **Gestión financiera y de actas de costos:** Acelerar la conciliación y trámite de actas pendientes para asegurar flujo oportuno de recursos y cumplimiento de las obligaciones contractuales.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

1. **Fortalecimiento técnico e institucional:** Se consolidaron los mecanismos de articulación entre INVÍAS, la Interventoría y la Consultoría, lo que permitió avanzar en la validación de información técnica, topográfica, ambiental y social, mejorando la coordinación interinstitucional.
2. **Seguimiento y control efectivo:** Las reuniones técnicas y administrativas desarrolladas los días 14 y 16 de octubre de 2025 en las instalaciones del INVÍAS facilitaron la revisión del alcance contractual, la actualización del plan de contingencia y la definición de estrategias para el cumplimiento de los cronogramas de entrega.
3. **Optimización del flujo de información:** Se fortaleció el uso del Entorno Común de Datos (CDE) y de las herramientas BIM-SIG, garantizando mayor trazabilidad, organización y eficiencia en los procesos de revisión y aprobación de productos técnicos.

4. **Avance en estudios viales estratégicos:** Se consolidó la estructuración técnica de la Conexión Vial Popayán – Guapi, con un enfoque integral, territorial y sostenible, que permitirá sustentar la futura fase constructiva del corredor.
5. **Fortalecimiento ambiental y social:** Se desarrollaron actividades de socialización y trabajo comunitario en los tramos Guapi – Napi y El Plateado – López de Micay, promoviendo la participación activa de las comunidades afrodescendientes del área de influencia directa y el enfoque diferencial en la gestión social.
6. **Control de calidad técnica:** Se aseguró la calidad de los productos entregados a través de la supervisión permanente ejercida por la Interventoría, en coherencia con los lineamientos establecidos por el INVÍAS.
7. **Transparencia en la gestión pública:** La ejecución bajo el esquema de contratación interadministrativa garantiza eficiencia, control y trazabilidad en el uso de los recursos públicos.
8. **Aporte al desarrollo regional:** El proyecto continúa generando información estratégica para la conectividad del litoral Pacífico caucano con el centro del país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico, la integración territorial y la mejora de la movilidad rural.

GESTIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS:

- Seguimiento técnico a la ejecución del contrato de consultoría, con revisión de avances en entregables, metodologías y planificación de actividades.
- Coordinación y asistencia a reuniones de seguimiento con INVIAS, la Consultoría (Universidad del Cauca) y demás actores institucionales, levantando las actas No. 48, 49, 50,51,52,53,54,55 durante el mes de octubre de 2025.
- Gestión y conciliación del Acta de Costos No. 11 correspondiente al mes de septiembre 2025, remitida al INVIAS durante octubre.
- Apoyo en trámites administrativos y gestión de correspondencia, garantizando trazabilidad y archivo físico en la sede de Tunja y digital en el drive institucional del contrato.
- Elaboración y envío de los informes semanales No. 45 al 48, correspondientes al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2025.
- Participación en mesas técnicas y espacios de coordinación con la consultoría, en el que se abordaron aspectos de facturación, seguimiento técnico y avances en cartografía social en López de Micay.
- Verificación y articulación de las actividades de los equipos profesionales de la consultoría en componentes técnicos y sociales.
- Apoyo en la programación y coordinación de actividades en territorio, especialmente las relacionadas con cartografía social y levantamientos topográficos en la zona de Guapi – Napi – El Plateado.

- Elaboración de informes de seguimiento técnico y contractual requeridos por la Subdirección de Planificación de Infraestructura del INVIAS.

ENTREGABLES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2025, la Coordinación Técnica de Interventoría presenta los siguientes entregables, en cumplimiento de las actividades desarrolladas en el marco del Contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024.

1. Copia de los informes de supervisión de los contratistas vinculados al Contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024, con registro de actividades, observaciones y seguimiento técnico-administrativo.
2. Informe consolidado del estado de trámite de las Actas de Costos mensuales de Interventoría.
3. Presentación del estado de avance contractual, que refleja el progreso técnico, administrativo y financiero del Contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024.
4. Resumen de la correspondencia recibida y enviada durante el mes, así como apoyo y trámite oportuno a requerimientos formulados por INVIAS y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, relacionados con la ejecución contractual.
5. Registro fotográfico de las reuniones internas y externas realizadas durante el mes, evidenciando la participación de los equipos técnicos de la Interventoría, Consultoría e INVÍAS.
6. Informes técnicos y administrativos elaborados por los profesionales especialistas del equipo de interventoría, conforme a las actividades desarrolladas y a los componentes técnico, ambiental, social y BIM–SIG.
7. Soportes financieros y formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2 “Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo” correspondiente al Contrato de Interventoría No. 4234 de 2024.

Durante el mes de octubre de 2025, las acciones adelantadas por la Coordinación Técnica de Interventoría permitieron fortalecer los procesos de seguimiento, control técnico y administrativo del Contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024, garantizando la trazabilidad de la información, la articulación interinstitucional y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el INVIAS.
El avance en la revisión técnica, la gestión del entorno común de datos (CDE), la coordinación con la Consultoría y el acompañamiento a los componentes social y ambiental contribuyeron al cumplimiento del objeto contractual, asegurando el progreso sostenido del proyecto “Estudios y Diseños para la Conexión Popayán – Guapi” en el departamento del Cauca.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. 02/10/2025. Participación de la Interventoría en la charla *"Impacto Social de Proyectos Cauca – Chocó – Valle del Cauca"*, realizada en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, dirigida a estudiantes y docentes.

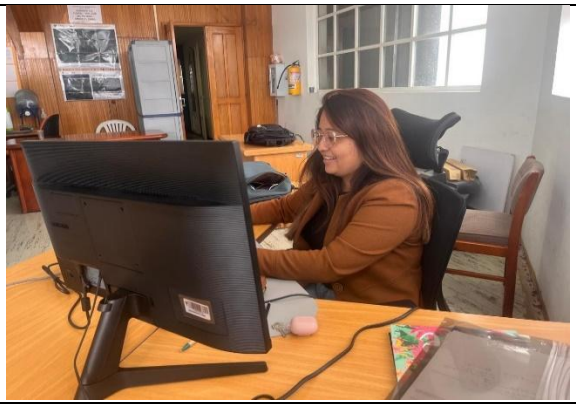


Foto 2. 06/10/2025. Revisión del acta de costos de la Consultoría correspondiente al mes de septiembre de 2025.



Foto 3. 13/10/2025.Respuesta a comunicaciones remitidas por la consultoría e Invias.



Foto 4. 17/10/2025. Reunión de revisión administrativa y técnica realizada con el Director del Contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024.



Foto 5. 17/10/2025. Asistencia al comité interno de interventoría sobre el Contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024.



Foto 6. 23/10/2025. Asistencia a capacitación virtual interna con el Coordinador BIM de la Interventoría, orientada a definir lineamientos para el manejo y organización del entorno CDE, estandarizando la administración de la información técnica del proyecto.

PRESENTADO POR:

LAURA MELISSA PATIÑO SANCHEZ
CC.1.057.595.437 de Sogamoso
Coordinador técnico de interventoría.
E-mail: Laura.sanchezing@grmail.com
Celular: 3103436374
Contratista

Vo. Bo:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057595437		PATIÑO SANCHEZ LAURA MELISSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 28 2 41	SOGAMOSO-BOYACA	3103436374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1856454588	9492198492	I	2025/11/12	2025/10/16	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1057595437	PATIÑO LAURA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057595437		PATIÑO SANCHEZ LAURA MELISSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 28 2 41	SOGAMOSO-BOYACA	3103436374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1859594022	9493301410	N	2025/11/12	2025/10/17	BANCOLOMBIA	0	$970,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1057595437	PATIÑO LAURA	230201	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS005	30	($1,423,500)	($178,000)		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1057595437	PATIÑO LAURA	230201	30	$4,827,000	$772,400	EPS005	30	$4,827,000	$603,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$3,403,500**	**$544,600**			**$3,403,500**	**$425,400**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$544,600	$0	$0	$544,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$544,600	$0	$0	$544,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$425,400	$0	$0	$425,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$425,400	$0	$0	$425,400
TOTAL				1	$970,000	$0	$0	$970,000

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.156.147.61
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9492198492
Valor:	405,800
Período de pago:	2025-10
No Transacción (CUS):	1856454588
Fecha:	2025/10/16
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9492198492
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	132.255.20.2
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9493301410
Valor:	970,000
Período de pago:	2025-10
No Transacción (CUS):	1859594022
Fecha:	2025/10/17
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9493301410
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Comprobante en línea

16 Oct 2025 09:53:42

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1856454588

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.156.147.61

Fecha
16 Oct 2025 09:53:42

Referencia 2
CC

Número de factura
9492198492

Referencia 3
1057595437

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9492198492

Valor del Pago
$405.800

Número de comprobante
TR0951394588

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0147**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Comprobante en línea

17 Oct 2025 11:01:34

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1859594022

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
132.255.20.2

Fecha
17 Oct 2025 11:01:34

Referencia 2
CC

Número de factura
9493301410

Referencia 3
1057595437

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9493301410

Valor del Pago
$970.000

Número de comprobante
TR1100514022

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0147**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **LAURA MELISSA PATIÑO SANCHEZ** identificado con **CC** No. **1057595437**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 21/05/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 21/05/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/12/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501015315372.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 03 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
NIT. 891800330-1

DEBE A:

LAURA MELISSA PATIÑO
C.C. 1.057.595.437

La suma de: Doce millones sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte. ($ 12.067.500), correspondiente al pago del mes de octubre de 2025, por cumplir a satisfacción con los servicios del contrato No. 1849: (SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA), según el siguiente detalle:

- Valor de los honorarios fijados en el contrato 4234 del 2024 para el Coordinador Técnico, según los días laborados: $ 8.045.000
- Factor prestacional: 0,5
- Valar total honorarios: $ 12.067.500 ($ 8.045.000 X 1,5)

Dando cumplimiento a lo establecido en los articulo 9 y 11 del decreto 2231 de 2023, para efectos de retención en la fuente, en el presente pago o abono en cuenta efectuado a mi nombre por concepto de rentas de trabajo no provenientes de una relación laboral, legal y reglamentaria, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a este pago.

Se expide el 3 de noviembre de 2025.

Cordialmente,



LAURA MELISSA PATIÑO
C.C. 1.057.595.437

YULLY SUAREZ

COORDINADORA AMBIENTAL Y SOCIAL.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1657 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	1657 del 28 de Abril 2025.
CONTRATISTA	Yully Deissy Suárez P
CC.	33.368.841
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR AMBIENTAL Y SOCIAL DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 73.611.750,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN**	CIENTO OCHENTA Y SIETE DIAS (187) CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 28 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	Tunja.
ORDENADOR DEL GASTO	LUIS ÁNGEL LARA GONZÁLEZ – Vicerrector Administrativo y Financiero.
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO-Supervisor del Contrato.
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N.º 4234 de 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	Coordinador Ambiental y Social de Interventoría.
PERIODO DEL INFORME	Del 1 al 31 de Octubre 2025.
NUMERO DEL PAGO	7 de 7
VALOR DEL PAGO	$12.067.500,00

INTRODUCCIÓN

La Universidad del Cauca, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como Coordinador Ambiental y Social de Interventoría en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A continuación, se describen las actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2025.

Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por el consultor se coordina el apoyo y seguimiento a las diferentes acciones con respecto a la las socializaciones e informes de las mismas acorde a lo requerimiento de INVIAS.

Se realiza seguimiento a las entregas y la información requerida por parte del consultor para el desarrollo y elaboración de documentos PAGA según lo estipula Guía de Manejo Ambiental del Proyectos de Infraestructura de carreteras, para el tramo de mejoramiento de la Vía Plateado López de Micay, así mismo mediante reuniones y mesas de trabajo se da a conocer al consultor la necesidad de iniciar la proyección de costos ambientales y sociales, acorde a los permisos requerida para este hito.

De acuerdo a las actividades que contempla en este periodo y al pronunciamiento dado por la Agencia Nacional De Tierra, el consultor realiza socialización en el tramos Guapi- Napi, para lo cual se recomienda al consultor tener en cuenta las diferentes comunidades del Área de Influencia directa.

Según la programación de las socializaciones realizadas por el consultor en el presente periodo, se verifica y realiza lo solicitado por el anexo técnico desde el componente social, acorde las necesidades de la entidad contratante.

Para el Hito I (Guapi-Napi) Estudios y diseños a Nivel de Fase III, teniendo en cuenta las socializaciones realizas en el periodo a las comunidades de municipio de Guapi se identificó lo siguiente:

- Socializaciones a Consejo comunitario Guapi Abajo- (11 de Octubre de 2025).
  Ubicación: Vereda Temuey.
  Comunidad: Comunidad afrodescendiente.
- Socializaciones tramo Soledad, Belén, San Agustín, Calle Larga y Chuare.(12 de octubre de 2025).

El consultor implementa las diferentes metodologías sociales con el fin de abordar el plan de gestión social, para el diagnóstico y evaluación del componente social, en los diferentes entregables.

Para el HITO IIIB: Estudios y Diseños a Nivel de Mejoramiento Vía Terciaria – Tramo El Plateado - López de Micay,con respecto a los compromisos adquiridos por el consultor y en aras de conocer el componente social del área de influencia directo, el consultor programo salida a campo Cañón del Micay, para adelantar recopilación de relatos y narrativas sobre poblamiento e historia vial, Municipio de El Tambo, en los corregimientos de *Huisito – Cañadas – San Juan de Micay - La Emboscada.(Del 20 al 25 de Octubre de 2025).*

Es importante mencionar que se identifican los corregimientos y veredas del Área de Influencia Directa, que se relaciona a continuación:

Municipio de Tambo: Nayita - Agua Clara – Betania – Playarica – Honduras - San juan de Micay - La emboscada - El Plateado.

Municipio de López de Micay: Cabecera Municipal de Lopez de Micay - Salto Bajo - Salto Alto y parte de Nayita.

Con respecto a la alternativa de vía para el Tramo Plateado - Napi, la comunidad del área de influencia directa, le ha manifestado al consultor una posible vía existente, para lo cual el consultor programo Reunión con líderes de la ***vereda el Difícil*** para levantamiento de acta de trazado.

De acuerdo al recorrido realizado se identifican diferentes obras de arte existentes desde el corregimiento Plateado y San Juan de Micay, así como corrientes hídricas donde se evalúan estructuras nuevas, para lo cual es posible identificar la necesidad de permisos de ocupación de cauce y de acuerdo al alineamiento de la vía existente y definitiva, se evaluará la necesidad de intervención o poda de especies arbóreas, para el PR 0 +00 al Pr 15+300 aproximadamente.

	
Inventario vial corregimiento del Plateado y San Juan de Micay Pr 10+050 al Pr 15+270	Inventario vial corregimiento del Plateado Pr 5+050 hasta el Pr 10+05.

Hito IIIA - Estudio de pre factibilidad (Fase I) para la conexión intermodal del municipio de López de Micay.

De acuerdo a las recorridos realizados y la información recolectada, el consultor se encuentra analizando la información ambiental y social con el fin de alimentar el Capítulo VI. Evaluación Ambiental Y Social Preliminar, con respecto a la Identificación de impactos y medidas de mitigación, mapeo de restricciones ambientales y culturales, evaluación de posibles PAS – Planes de Acción Social, y revisión de aplicabilidad del PAGA y requisitos de licenciamiento ambiental, para lo cual el consultor realiza la revisión cartográfica de la ubicación de zonas de importancia ambiental en el navegable, identificación de puntos críticos, para el cauce del rio San Juan de Micay.

Se realiza la coordinación con el grupo de interventoría, según la programación remitida por el consultor, las socializaciones y divulgaciones de los estudios y diseños con la comunidad, entes territoriales y nacionales, entre otros actores, teniendo en cuenta las comunicaciones remitidas por el consultor.

Se proyectan las diferentes comunicaciones acordes a las necesidades e información remitida por el consultor en los diferentes comités y mesas de trabajo realizadas en el periodo. Esto permitir evidenciar el avance y la necesidad de contar con la información secundaria importante para cada entregable de los estudios y diseño.

De acuerdo al anexo técnico, se establecen canal de comunicación con el coordinador ambiental y social de la consultoría , con el fin de hacer seguimiento a las entregas preliminares del componente ambiental y social y asegurar el cumplimiento del cronograma.

Con respecto a las actividades en campo, se recomienda a la consultoría, agilizar las consultas con la CRC, con el fin de conocer los respectivos pronunciamientos para todos los hitos, para lo cual el consultor solicita mesa de trabajo con la entidad.

Se realiza la coordinación para el seguimiento a las actividades desarrolladas por el consultor Universidad del Cauca desde el componente ambiental y social, para lo cual se convocan a los diferentes Mesas de trabajo en las siguientes fechas:

Mesas de trabajo y/o Comités desde componente Ambiental y Social: 10 de Octubre de 2025, 17 de Octubre de 2025 y 22 de octubre de 2025, donde se establecen diferentes compromisos desde cada componente:

- Solicitud a la CRC respecto a la mesa de trabajo para la contextualización del contrato 4221 respecto a los Hitos a ejecutar, haciendo énfasis en el tramo Guapi – Napi y Napi - El Plateado.
- Aclaración del alcance de las pre socializaciones y socializaciones efectuadas a la fecha en los cuatro hitos.
- Entrega de informes de socializaciones realizadas en la fecha. (Guapi 11 y 12 de Octubre de 2025).

- Información de la reprogramación de las actividades sociales que se ejecutarán en el periodo.
- Revisión de información y cartografía de acuerdo a la PQR interpuesta por el Ing Ernesto Peñuela.
- Levantamiento de acta con líderes de la localidad el Difícil en el municipio del Tambo, quienes han venido expresando que se priorice, en el trazado en la vía a mar (Programada 23 de Octubre de 2025).

Hito I (Guapi-Napi) Estudios y diseños a Nivel de Fase III

Se adelanta Socialización y coordinación de actividades para el ingreso del personal técnico al territorio: Belén, Calle Larga, San Agustín y Chuare, del 8 al 13 de octubre del 2025.

Se continua con el seguimiento a las solicitudes de la consultoría del pronunciamiento de las diferentes entidades desde el componente ambiental y social, con el fin de conocer el estado de las mismas, como insumo para los entregables de cada Hito. Así mismo se enfatiza en la trazabilidad de las comunicaciones para dar respuesta, de acuerdo a los requerimientos específicos. En el presente informe se relacionan las diferentes respuestas emitidas en el periodo.

Durante este periodo se adelantan diferentes reuniones, con el fin de realizar el seguimiento a las actividades que se encuentra desarrollando el consultor Universidad del Cauca, INVIAS e Interventoría en las siguientes fechas,08 de Octubre de 2025, 15 de octubre de 2025, 22 de Octubre de 2025 y 29 de octubre de 2025.

El consultor lleva a cabo distintas actividades en el territorio desde el componente social, con el propósito de facilitar los acercamientos con las comunidades. Estas acciones buscan preparar y asegurar el ingreso del equipo de topografía y otros profesionales a la zona de influencia directa del proyecto, específicamente en el Tramo Plateado – Guapi, para lo cual se desarrolla la socialización del 08 al 13 de Octubre de 2025.

Durante este periodo, se asiste y participa en las diversas reuniones y comités técnicos convocados o solicitados por INVIAS, en el marco del proyecto de interventoría de los estudios y diseños correspondientes al contrato interadministrativo No. 4221 del 2024. Para tal fin, se coordina la presencia del personal de interventoría de los componentes ambiental y social, según las necesidades que se presenten en el territorio.

Se asistió a las reuniones los 17 de octubre de 2025, convocada por el Gerente y el director de Interventoría, contando con la participación del personal de interventoría, con el fin de verificar y el avance a las actividades de la consultoría, compromisos y demás seguimiento. Así mismo los pendientes y posibles anomalías identificadas en el desarrollo del proyecto, desde los componentes ambiental y social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo Técnico del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), se realiza un seguimiento sistemático y semanal a las respuestas emitidas por las entidades competentes de orden nacional, departamental y regional, en atención a los requerido por la Consultoría Universidad del Cauca. Este proceso tiene como finalidad verificar la emisión oportuna de los pronunciamientos institucionales, garantizar la trazabilidad de las comunicaciones oficiales y consolidar la articulación interinstitucional necesaria para el desarrollo del proyecto

Con base en los compromisos establecidos en las actas de comité, se implementa un mecanismo de seguimiento estructurado que permite verificar el cumplimiento de cada uno de los compromisos. Para ello, la Interventoría coordina la programación y proyecta las diferentes de comunicaciones oficiales necesarias, conforme a los procedimientos definidos en el marco del proyecto

Se continua con el equipo de trabajo el análisis conjunto con el equipo de interventoría, orientado al trabajo en equipo desde todos los componentes con el fin de verificar el cumplimiento del alcance del contrato de consultoría, conforme a lo establecido en los componentes ambiental y social para cada hito del proyecto


COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS A LAS DIFERENTES ENTIDADES POR PARTE DE CONSULTOR:

TRAMO EL PLATEADO – GUAPI:

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: El 22 de Octubre de 2025, el consultor remite Respuesta al radicado de entrada No. 2025E1027481. Solicitud de información dentro del contrato interadministrativo 4221 de 2024- conexión Popayán- Guapi, departamento del Cauca **No** 21022025E2029669 de fecha 29 de septiembre de 2025.

HITO IIIB: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE MEJORAMIENTO VÍA TERCIARIA – TRAMO EL PLATEADO - LÓPEZ DE MICAY, LONGITUD APROXIMADA 70 KM.

MADS: La entidad ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emite respuesta el día 27 de agosto de 2025 – Rad No 40042025E2030863, la consultoría da respuesta a la solicitud de información adicional requerida el día 05 de septiembre de 2025, según Rad 2025E1046454, a fecha del presente informe según lo informado por la consultoría Universidad del Cauca, el estado del Documento está EN TRAMITE.
IIAP: El Consultor informa que se dio respuesta a la solicitud de la Consultoría (oficio 457_Solicitud de información) – Continua pendiente el respectivo radicado de la entidad.
La Consultoría informa de la Respuesta a solicitud de información del Instituto de Investigaciones del Pacífico IIAP, a continuación, se relaciona la información recibida:



Cada componente tiene reportes de investigaciones en el área de estudio, los cuales serán publicados en el CDE.

ICANH: La consultoría informa que remitió a ICANH mediante comunicación 8.3-55.6/640 de fecha 30 de septiembre de 2025 Respuesta radicado ICANH – 2025162000104061, requerimiento de información del proyecto “Mejoramiento vía terciaria tramo “El Plateado – López de Micay, departamento del Cauca. – **Rad No 2025184200111482 de fecha 09 de Octubre de 2025.**

CRC: La consultoría informa que Mediante comunicado 8.3-55.6/659 Asunto: Solicitud de certificación de existencia de Ecosistemas Estratégicos vía El Plateado -López de Micay. **Rad OAP-11010-2025 de fecha 15 de Octubre de 2025.**

MINEDUCACIÓN: La entidad Ministerio de Educación mediante Radicado No. 2025-EE-285530, envío de notificación radicado 20255320633551, se informó lo concerniente a los municipios de Argelia (Cauca) y López de Micay (Cauca): Proyectos de infraestructura y dotación, donde el DNP redirigió la solicitud de la Consultoría a este Ministerio.

ENTREGABLES:

Relación del estado de avance en el desarrollo en las áreas ambiental y social, teniendo encuentra las socializaciones, visitas, comités y reuniones con el fin de recolectar información del Contrato de Consultoría No 4221 de 2024.

RELACION DE ESTADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO EN EL ÁREA AMBIENTAL Y SOCIAL.		
No	**Fecha**	**Socializaciones, visitas, comités y reuniones**
1	02 de Octubre de 2025.	Reunión Interna Interventoría- Supervisor UPTC, y participación en la conferencia Impacto Social de proyectos viales Cauca, Choco y Valle del Cauca – Jornada Internacional de Investigación y extensión UPTC.
2	06 de Octubre de 2025	Comité Interno Interventoría – Alcance el proyecto de Estudios y Diseños – Gerente - Director - Coordinadores – Especialista Pavimentos.
3	08 de Octubre de 2025	Comité de seguimiento INVIAS, participantes Consultoría, Interventoría e INVIAS
4	10 de octubre de 2025	Mesa de trabajo Consultoría – Interventoría- Participación: Coordinadores Ambiental y social – Profesionales sociales de Consultoria. Avance componente Ambiental y Social
5	14 de Octubre de 2025	Se realiza reunión presencial con el fin de atender la solicitud del Ing Fidel E Peñuela a INVIAS, con respecto a las inquietudes del alcance del proyecto. Comité presencial INVIAS – Consultoría (Universidad del Cauca) - Interventoría (UPTC).Para lo cual se tratan temas relacionados con el avance del proyecto desde el componente técnico y garantizar el cumplimiento de las actividades contractuales.
6	17 de octubre de 2025	Mesa de trabajo Consultoría – Interventoría- Participación: Coordinadores Ambiental y social – Profesionales sociales de Consultoría. Avance componente Ambiental y Social
7	17 de Octubre de 2025	Comité Interno Interventoría – Alcance el proyecto de Estudios y Diseños – Gerente - Director - Coordinadores – Residentes, socialización de comités con el consultor , Invias y estado general del proyecto.
8	21 de Octubre de 2025.	Comité presencial en Popayán, Universidad del Cauca- donde socializa por parte de la interventoría y consultor el estado de avance y pendientes desde el componente Ambiental y Social y demás actividades.
9	22 de octubre de 2025.	Comité presencial en Popayán, Universidad del Cauca- Comité de seguimiento INVIAS, participantes Consultoria, Interventoría e INVIAS
10	23 de octubre de 2025	Comité virtual BIM, socialización actividades de topografía, Huisito-Honduras y Plateado- López de Micay.
11	29 de Octubre de 2025	Comité de seguimiento INVIAS, participantes Consultoria, Interventoría e INVIAS

RELACION DE SOCIALIZACIONES – PERIODO.

RELACION DE ESTADO DE AVANCE EN EL DESARROLLO COMPONENTE SOCIAL (SOLIALIZACIONES EN EL TERRITORIO)		
No	**Fecha**	**Socializaciones, visitas, comités y reuniones**
1	Del 8 al 13 de octubre del 2025.	**Tramo Plateado – Guapi:** Socialización y concertación comunitaria para el ingreso del personal técnico en las veredas Belén, Calle Larga, San Agustín y Chuare. (11 y 12 de Octubre de 2025).
2	20 al 23 de Octubre de 2025	Ejecución de salida al municipio de El Tambo- Huisitó reprogramada del 20 al 23 de octubre, con el objetivo de recopilar relatos y narrativas sobre poblamiento e historia vial, asimismo se llevó a cabo charla a estudiantes en la institución educativa de San Juan del Micay con relación a un acercamiento pedagógico en arqueología preventiva.

3	23 de octubre de 2025	Se llevó a cabo el levantamiento de un acta atendiendo la solicitud de lideres/sas de la comunidad de la vereda el Difícil, Municipio de Argelia, respecto al trazado proyectado de la vía al municipio de Guapi, con el fin de considerar alternativas que beneficien a las comunidades locales y se fortalezca la articulación con los actores territoriales.Benefi cia directamente a cinco veredas del área de influencia: La Ceiba, La Hacienda, Pambilal, Llano Grande y El Filo en las cuales habitan aproximadamente 300 personas en cada uno de los sectores.

Relación de las respuestas a los requerimientos que el INVIAS, la Universidad, los entes de control, las veedurías, entre otros, realicen sobre la ejecución del Contrato.

Comunicaciones enviadas al Consultor por parte de la Interventoría.			
No	**Fecha**	**Comunicación No**	**Asunto**
1	20 de octubre de 2025	C4234-228-2024	Respuesta oficios 8.3-55.6/663 de fecha 08 de octubre de 2025 y 8.3-55.6/683 de fecha 15 de octubre de 2025 – Convocatoria y Reprogramación comisión salida a campo Cañón del Micay, recopilación de relatos y narrativas sobre poblamiento e historia vial, Municipio de (El Tambo).Presentar informe de Actividades desarrolladas del 20 al 23 de Octubre de 2025.
2	20 de octubre de 2025	C4234-230-2024	Matriz Actualizada de consolidación información consulta a entidades, para el proyecto.
3	22 de octubre de 2025	C4234-236-2024	Respuesta 8.3-55.6/697 de fecha 20 de octubre de 2025 - Invitación para acompañar actividades de socialización y entrega de resultados del estudio de navegabilidad – Contrato 4221 de 2025, Hito III A (López de Micay). Solicitud de actividades definitivas programadas para los días, martes 28 – 29 y 30 de octubre de 2025, con respecto a entrada de equipo de topografía tramo López de Micay – Salto Nuevo
4	24 de Octubre de 2025	C4234-238-2024	Ajustes y observaciones a las diferentes metodologías y entregas preliminares de los volúmenes.
5	27 de Octubre de 2025	C4234-240-2024	Respuesta 8.3-55.6/655 de fecha 06 de octubre de 2025 – Cronograma de Socializaciones Municipio de Guapi - Salida de comisión localidades de Belén, Soledad, Calle larga, San Agustín y Chuaré.

Comunicaciones Recibidas del Consultor a la Interventoría.			
No	**Fecha**	**Comunicación No**	**Asunto**
1	06 de Octubre de 2025	8.3-55.6/655	Salida Comisión que se realizara en las localidades de Belén, soledad, Calle Larga, San Agustín y Chuare a realizarse del 08 al 13 de Octubre de 2025.
2	08 de octubre de 2025	8.3-55.6/663	Convocatoria e invitación comisión de salida a campo Cañón del Micay, recopilación de relatos y narrativas sobre poblamiento e historia vial, Municipio de (El Tambo).(16-17-18 y 19 de octubre de 2025).
3	08 de Octubre de 2025	8.3-55.6/666	Actualización de Informes de socializaciones pendientes de entrega.
4	7 de octubre de 2025	8.3-55.6/657	Respuesta al comunicado C4234-138-2024 - Solicitud Estado de avance consulta trámite de Determinación de Procedencia y Oportunidad de Consulta Previa para Proyectos.

5	8.3-55.6/625	12 de octubre de 2025	Respuesta a su comunicado C4234-196-2024 "Localización cartográfica con la Ubicación de Zonas de importancia Ambiental".
6	8.3-55.6/683	15 de octubre de 2025	Reprogramación comisión salida a campo Cañón del Micay, recopilación de relatos y narrativas sobre poblamiento e historia vial, Municipio de (El Tambo).(20-21-22-23 Octubre de 2025).
7	8.3-55.6/697	20 de octubre de 2025	Invitación para acompañar actividades de socialización y entrega de resultados del estudio de navegabilidad – Contrato 4221 de 2025, Hito III A (López de Micay)- (28 -29 30 de Octubre de 2025).
8	8.3-55.6/698	21de octubre de 2025	Respuesta a comunicación C4234-140-2024, solicitud pronunciamiento oficial Corporación Autónoma Regional de Cauca (CRC), en cumplimiento a lo requerido por INVIAS en Anexo Técnico.
9	8.3-55.6/699	20 de octubre de 2025	Respuesta a solicitud de avance consulta Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
10	8.3-55.6/716	23 de octubre de 2025	Respuesta al comunicado C4234-139-2024_Respuesta a Comunicación 8.3-55.6/204, Aclaración Alcance de Volumen Estudio Componente Ambiental y Social.

Se participa en los diferentes comités y reuniones establecidos durante el desarrollo del proyecto, tal como se detalla en el presente informe.

Se planifica la presentación del estado de avance del proyecto desde los componentes ambiental y social, con el objetivo de verificar y dar seguimiento a los compromisos asumidos por el consultor en cada reunión semanal

Se envía semanalmente la información correspondiente al avance y seguimiento del proyecto, destinada al informe que se remite a INVIAS, en cumplimiento con lo establecido en el manual de interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE EL PERIODO:



Foto 1. Reunión de interna de Interventoría - Avance y cumplimiento de compromisos.



Foto 2: Reunión INVIAS, presentación de proyecto, en solicitud del Ing. Ernesto Peñuela.



Foto 3. Reunión presencial de seguimiento avance componente Técnico- Ambiental-Social - Oficina Univ del Cauca - Asistencia de Personal de la Consultoría Unicauca y UPTC. (21-10-2025).



Foto 4: Reunión Avance componente Ambiental y Social – 17 de Octubre de 2025, Participantes: Consultoría Coordinador Ambiental y Social- Ing. Julián Orozco – Profesionales Gestión Social Jairo Tocancipa Falla – Alma Rocio Velasco Vidal, Paola Andrea Acosta Nates – Interventoria: Coordinador Ambiental y Social Ing. Yully Suarez P.

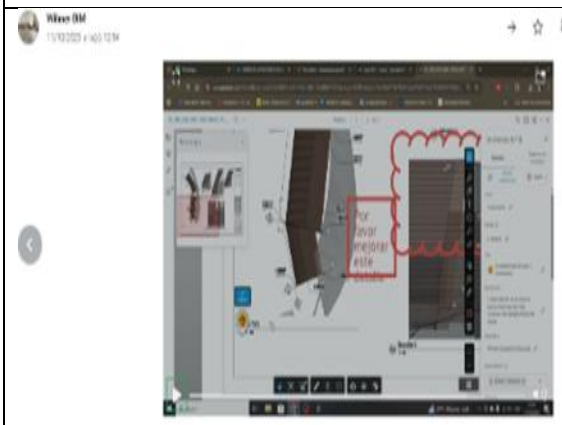


Foto 5:Revisión de material CDE - BIM



Foto 6 (Social) Camino a Presocialización-Guapi

PRESENTADO POR

YULLY DEISSY SUÁREZ P
CC. 33.368.841
yully20@hotmail.com – 313 3942823
Contratista

Vo. Bo:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría.

Bancolombia

Comprobante en línea

26 Oct 2025 12:47:07

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1879459765

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
26 Oct 2025 12:47:07

Referencia 2
CC

Número de factura
7988050398

Referencia 3
33368841

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Valor del Pago
$1.376.600

Número de comprobante
TR1245569765

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4973**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33368841
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YULLY DEISSY SUAREZ PARADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 2A NUMERO 41A -07	TELÉFONO:	3133942
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	GUAPI_UPTC - GUAPI_UPTC
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7988050398**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1879459765

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 772.800
SUBTOTAL:			1	**$ 772.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 603.800
SUBTOTAL:			1	**$ 603.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.376.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.376.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33368841
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YULLY DEISSY SUAREZ PARADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 2A NUMERO 41A -07	TELÉFONO:	3133942
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	GUAPI_UPTC - GUAPI_UPTC
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7988050398**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1879459765

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 772.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 772.800	$ 0	$ 772.800
SUBTOTALES:										**$ 772.800**	**$ 0**	**$ 772.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 603.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.800	$ 0	$ 0	$ 603.800
SUBTOTALES:													**$ 603.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 603.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																													PENSIÓN									SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 33368841	SUAREZ PARADA YULLY DEISSY	INDEPEND		$ 4.830.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.830.000	$ 772.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 772.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.830.000	$ 603.800	$ 0	$ 603.800			$ 0		$ 0		$ 0			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.376.600

Planilla Pagada

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **YULLY DEISSY SUAREZ PARADA** identificado con **CC** No. **33368841**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 28/04/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 28/04/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/12/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20250101614333.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 3 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
NIT. 891800330-1

DEBE A:

YULLY DEISSY SUAREZ
C.C. 33.368.841


La suma de: Doce millones sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte. ($12.067.500), correspondiente al pago del mes de octubre de 2025, por cumplir a satisfacción con los servicios del contrato No. 1657: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR AMBIENTAL Y SOCIAL DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA), según el siguiente detalle:

- Valor de los honorarios fijados en el contrato 4234 del 2024 para la Coordinador Ambiental y Social, según los días laborados: $8.045.000
- Factor prestacional: 0,5
- Valar total honorarios: $12.067.500 ($8.045.000 X 1,5)

Dando cumplimiento a lo establecido en los articulo 9 y 11 del decreto 2231 de 2023, para efectos de retención en la fuente, en el presente pago o abono en cuenta efectuado a mi nombre por concepto de rentas de trabajo no provenientes de una relación laboral, legal y reglamentaria, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a este pago.

Se expide el 3 de noviembre de 2025.

Cordialmente,



YULLY DEISSY SUAREZ
C.C. 33.368.841

NIK JOHNATAN SOLARTE

INGENIERO AUXILIAR (1)

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2015 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	2015 DEL 10 DE JUNIO DE 2025
CONTRATISTA	NIK JOHNATAN SOLARTE SOLARTE
CC.	1.061.088.708 FLORENCIA CAUCA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA 1 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO	VENTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($24.500.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN**	CIENTO CUARENTA Y TRES (143) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE.
PRORROGA	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	TUNJA
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TELLEZ, VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y EXTENSION
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Supervisor del Contrato
DEPENDENCIA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 4234 DE 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA
PERIODO DEL INFORME	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
NUMERO DEL PAGO	5 de 5
VALOR DEL PAGO	($ 5.250.000,00). CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE

INTRODUCCIÓN

La Universidad del Cauca, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como ingeniero auxiliar de interventoría en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A continuación, se describen las actividades desarrolladas entre el 1 al 31 de octubre de 2025.

I. Durante el transcurso del periodo de este informe se asistió a las siguientes reuniones:

FECHA	ENTIDADES PARTICIPANTES	OBJETO
08/10/2025	INTERVENTORIA (UPTC)	Citación a reunión virtual-. Con el objeto de capacitación del sistema BIM(introducción al sistema. Llevada a cabo por el ing. Milton Fidel Carabuena Mendoza
09/10/2025	INTERVENTORIA (UPTC) CONSULTORÍA (UNICAUCA) INVIAS	Control y seguimiento de componente Técnico; Administrativo; Financiero el proyecto- Contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024, con la participación de representantes de la Consultoría, la Interventoría y el del INVIAS, desarrollada de manera virtual.
14/10/2025	INTERVENTORIA (UPTC) CONSULTORÍA (UNICAUCA) INVIAS	Reunión, con el fin de revisar el avance de ejecución del contrato, analizar los aspectos técnicos y administrativos pendientes, definir estrategias para el cumplimiento de metas y facturación, y establecer los compromisos entre las partes involucradas.
16/10/2025	INTERVENTORIA UPTC-CONSULTORÍA UNICAUCA INVIAS	Se realizó acompañamiento de manera virtual, en la reunión que se llevó a cobo en las instalaciones de la Subdirección de Planificación de Infraestructura. Con el fin de realizar el seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero al contrato de consultoría No. 4221 de 2024.
21/10/2025	INTERVENTORIA UPTC-CONSULTORÍA UNICAUCA INVIAS	Reunión, con el fin de realizar el seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero al contrato de consultoría No. 4221 de 2024. Para revisar el estado de avance de los levantamientos topográficos, el cumplimiento de los requerimientos técnicos del INVIAS y la planeación de las próximas actividades de campo y gestión administrativa del proyecto.
22/10/2025	INTERVENTORIA UPTC-CONSULTORÍA UNICAUCA INVIAS	El día 22 de octubre de 2025, se participó de manera virtual, con los profesionales de la consultoría, la interventoría y el INVIAS, con el fin de analizar la solicitud de prorroga y adición presupuestal presentada por la interventoría y la consultoría.

- El día 8 de octubre de 2025, Se participo de manera virtual, en desarrolló de una reunión virtual de capacitación enfocada en el uso del sistema BIM (Building Information Modeling), como parte del proceso de implementación tecnológica en el proyecto. La sesión fue liderada por el ingeniero Milton Fidel Carabuena Mendoza, experto en gestión de información digital aplicada a la infraestructura.

  Los componentes tratados durante la jornada fueron los siguientes:

  La capacitación se centró en fortalecer las habilidades técnicas del equipo en el uso del Entorno Común de Datos (CDE, por sus siglas en inglés), una herramienta fundamental para el trabajo colaborativo y la gestión eficiente de la información dentro de la metodología BIM.

  - Acceso al Entorno Común de Datos: Se explicó el procedimiento de ingreso al sistema, incluyendo la creación de credenciales, niveles de acceso y consideraciones de seguridad para garantizar la integridad de la información.

  - Descripción del Entorno Común de Datos: Se presentaron las funcionalidades principales del CDE, su estructura jerárquica, organización de carpetas, tipos de archivos permitidos, y cómo este entorno facilita la trazabilidad y el control documental en tiempo real.

  - Flujo de Revisión: Se detalló el proceso de revisión de documentos y modelos dentro del sistema, incluyendo los roles de cada usuario, los pasos para la validación técnica y administrativa de la información, así como los mecanismos para el seguimiento de observaciones y versiones

  - Revisión a los documentos entregados por la consultoría.

- El 9 octubre de 2025, se realizó acompañamiento una la reunión virtual, La jornada contó con la participación de la gestora y la subdirectora del INVIAS, junto con la consultoría he Interventoría.

  El objetivo principal del encuentro fue socializar el alcance técnico, legal y administrativo del contrato. Durante la sesión, se revisaron los compromisos y responsabilidades de cada una de las partes involucradas, y se definieron los lineamientos para la ejecución y el seguimiento del proyecto.

  Los temas tratados fueron:

1.Revisión de compromisos anteriores
2. Avance del componente BIM y entorno común de datos
3. Comunicación con comunidades y acceso a territorio
4. Entrega de metodologías ajustadas (Hitos 1 y 2)
5. Cronogramas y planes de contingencia

6. Informes de socialización
7.Plan de facturación y reserva presupuestal 2024
8. Permisos sociales – Sector “El Difícil”
9. Situación actual en campo
10. Entregas de actas de costos N°11

- El día 14 de octubre de 2025. se llevo a cabo una reunión presencial en las instalaciones del INVIAS, La jornada conto con la participación de la consultoría, la interventoría, la gestora del proyecto y la subdirectora de planificación de infraestructura, con el fin de analizar la propuesta que llevo a cabo el señor el señor Fidel Peñuela sobre el trazado vial entre Popayán y guapi, basada en estudios satelitales e interpretación cartográfica, argumentando que su alternativa reduciría la longitud total del corredor y disminuiría la complejidad constructiva.

- El día 14 de octubre de 2025,con la participación de representantes del INVIAS, la Interventoría y la Consultoría, desarrollada de manera presencial en las instalaciones del INVIAS en la Ciudad de Bogotá. Con el fin de revisar el avance de ejecución del contrato, analizar los aspectos técnicos y administrativos pendientes, definir estrategias para el cumplimiento de metas y facturación, y establecer los compromisos entre las partes involucradas.

  Los temas tratados en la presente acta de reunión son:

  1. Cambio de supervisor del contrato de consultoría.
  2. Plan de facturación y cumplimiento de metas.
  3. Contratación de estudios técnicos.
  4.Ejecucion técnica y avances.
  5. Gestión de recursos y topografía.
  6 equipos y recursos de anticipo.
  7. Comunicación y coordinación.
  8. Preocupaciones de la interventoría.

- El día 16 de octubre de 2025, se realizó acompañamiento de manera virtual, en instalaciones de la Subdirección de Planificación de Infraestructura , en la ciudad de Bogotá, en la reunión se contó con la participación de la consultoría y la interventoría, la directora técnica del INVIAS, La subdirectora de planificación, La gestora del proyecto, el supervisor de interventoría. Con el fin de realizar el seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero al contrato de consultoría No. 4221 de 2024.

  Los temas tratados en la presente acta de reunión son:

  - Por parte de la subdirectora de planificación (Shirley Merchán), se le recordó a la consultoría, sobre el cumplimiento de facturación la reserva del 2024.

  - La directora técnica del INVIA, enfatizó que este proyecto es de orden nacional y la importancia de este con respecto a las entregas de los estudios

y diseños de los tramos Plateado López de Micay y Huisito Honduras. Esto en función a que ya se elaboró por parte del Ministerio de Transporte un COMPES y hay comprometido unos recursos para que la próxima vigencia año 2026 se realice el proceso de licitación y contratación de la construcción de estas obras. Por tal motivo se invitó a la consultoría a continuar con el compromiso y hacer las entregas correspondientes para el desarrollo de estos estudios y diseños.

- Como compromiso por parte de la consultoría, es realizar mesas de trabajo junto con los especialistas de la interventoría, informando de manera anticipada cualquier tipo de trabajo que se realice en campo, ya que la interventoría manifiesta que actividad que no sea informada a tiempo y avalada por la interventoría, no será reconocida para pago

- El día 21 de octubre de 2025, se realizó acompañamiento de manera presencial en la reunión que se llevo a cabo en las instalaciones de la universidad del Cauca en la ciudad de Popayán, en la reunión se conto con la participación de la consultoría y la interventoría. Con el fin de realizar el seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero al contrato de consultoría No. 4221 de 2024. Para revisar el estado de avance de los levantamientos topográficos, el cumplimiento de los requerimientos técnicos del INVIAS y la planeación de las próximas actividades de campo y gestión administrativa del proyecto.

  Los temas tratados en la presente acta de reunión son:

  1. Revisión técnica de topografía y Procesamiento de la información
  2. revisión financiera del contrato de consultoría
  3. Gestión Administrativa
  4. programación de Obra y actividades en campo.
  5. gestión Ambienta

- El día 22 de octubre de 2025, se participó de manera virtual, con los profesionales de la consultoría, la interventoría y el INVIAS, con el fin de analizar la solicitud de prorroga y adición presupuestal presentada por la interventoría y la consultoría.

  Los temas tratados en la presente acta de reunión son:

  1. Solicitud de prórroga y adición de recursos.
  2. Posición del INVIAS
  3. Aspectos técnicos y sociales del proyecto
  4. Seguimiento financiero y acta de costos de octubre.
  5. Próximas gestiones.

- Asistir y participar en los comités y reuniones realizados por la Interventoría en cabeza del director y Coordinadores.


- Cumplir en todos momentos con la implementación de las políticas, objetivos, planes, programas, Procedimientos, normas, reglamentos y demás directrices del sistema de gestión de calidad, seguridad, salud en el trabajo, y medio ambiente aplicables a mi labor.

- Apoyar al Coordinador técnico de Interventoría en la elaboración de informe semanal de interventoría.

- Se apoyo en la gestión documental y la logística necesaria en la oficina ubicado en la Calle 25 N.º 3-30, Urbanización Sotará, en el municipio de Popayán, Cauca.

- Apoyar al Coordinador técnico de Interventoría en la elaboración de actas de comité.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

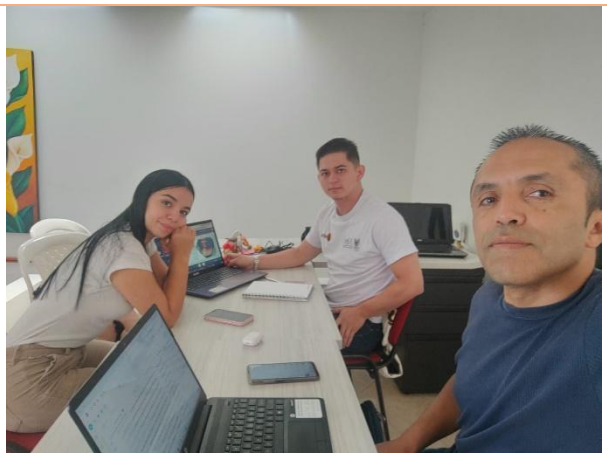

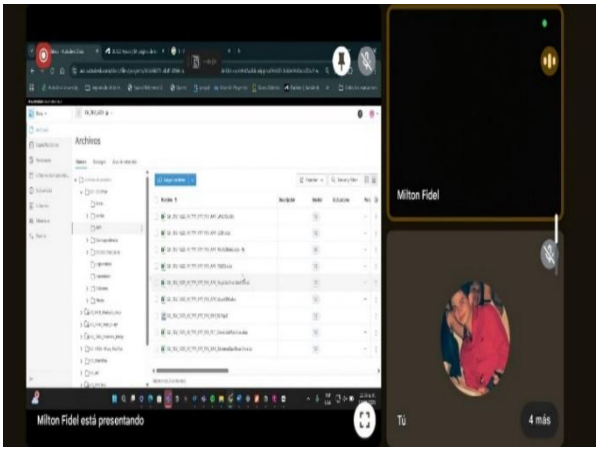
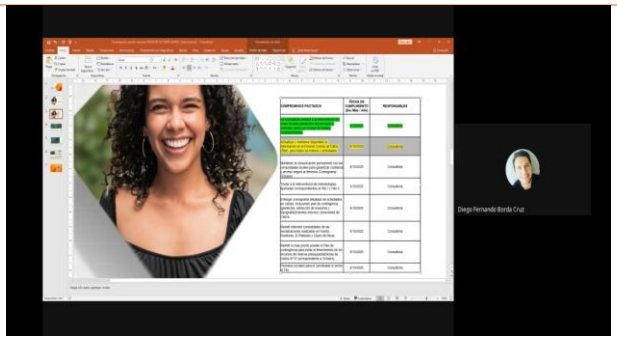


Imagen 1. El 8 de octubre de 2025 se llevó a cabo reunión virtual- capacitación Bim, llevada a cabo por el ingeniero Milton Fidel Carabuena Mendoza



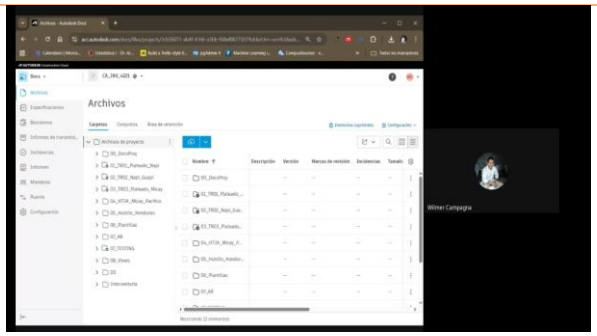


Imagen 2. El día 9 de octubre del 2025, se realizó reunión virtual, con la universidad del cauca y funcionario del INVIAS para tratar temas del componente técnico, administrativo, financiero. durante la reunión se revisaron los compromisos a desarrollar por la consultoría y temas pendientes por ejecutar del proyecto.

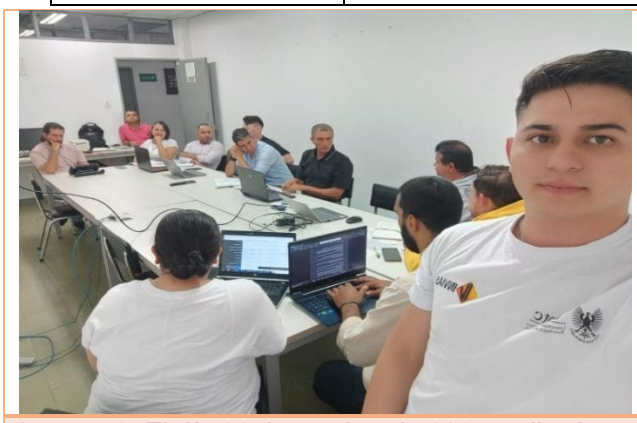




Imagen 3. El día 21 de octubre de 2025 se llevó a cabo una reunión presencial en las instalaciones de la Universidad del Cauca- seguimiento y control del Contrato Interadministrativo No. 4121 de 2024. En el componente Bim – topografía)

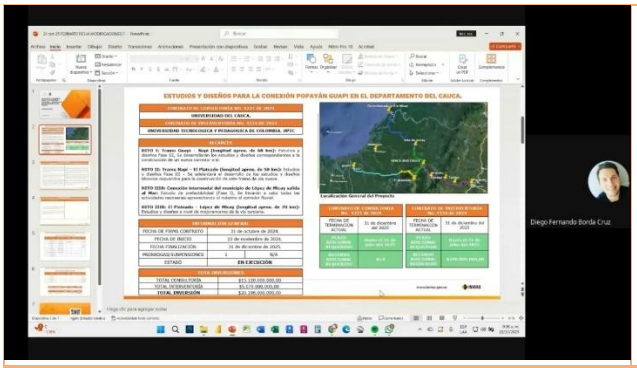




Imagen 4.El día 22 de octubre de 2025, se participó de manera virtual, con los profesionales de la consultoría, la interventoría y el INVIAS, con el fin de analizar la solicitud de prorroga y adición presupuestal presentada por la interventoría y la consultoría.

PRESENTADO POR:

NIK JOHNATAN SOLARTE S.
CC. 1.061.088.708 de Florencia Cauca.
E-mail: nikjonatan312@hotmail.com
Celular: 3215320550

Vo. Bo:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1061088708	0	NIK JOHNATAN SOLARTE SOLARTE	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CL 67N 14N 19		3215320550			NIKJONATAN312@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34507205	I	2025-09-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	598.500	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34507205	2025-10-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1061088708	SOLARTE SOLARTE NIK JOHNATAN	2.100.000																	0			30	30	0	0	COLPENSIONES-25-14	2.100.000	336.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.100.000	262.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	03	0	598.500	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1061088708	0	NIK JOHNATAN SOLARTE SOLARTE	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CL 67N 14N 19		3215320550			NIKJONATAN312@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34507205	I	2025-09-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	598.500	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34507205	2025-10-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.100.000	2.100.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	336.000	0	0	0	336.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	336.000	0	0	0	336.000
EPS(Administradoras: 1)				1	262.500	0	0	0	262.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	262.500	0	0	0	262.500
Gran Total					598.500	0	0	0	598.500

Outlook

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1795205906

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Lun 22/09/2025 3:08 PM
Para nikjonatan312@hotmail.com <nikjonatan312@hotmail.com>

¡Hola, NIK JOHNATAN SOLARTE SOLARTE!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 598.500
Empresa: ASOPAGOS
Descripción: Pago de seguridad Social Integrado
Fecha de la transacción: 22/09/2025
CUS: 1795205906

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **NIK JOHNATAN SOLARTE SOLARTE** identificado con **CC** No. **1061088708**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 11/06/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 11/06/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/12/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501016213691.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 03 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
NIT. 891800330-1

DEBE A:

NIK JOHNATAN SOLARTE
C.C. 1.061.088.708

La suma de: CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE ($ 5.250.000,00), correspondiente al pago de octubre de 2025, por cumplir a satisfacción con los servicios del contrato No. 2015: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA 1 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA), según el siguiente detalle:

- Valor de los honorarios fijados en el contrato 4234 del 2024 para el Ingeniero Auxiliar (1), según los días laborados: $5.250.000
- Factor prestacional: 0,5
- Valar total honorarios: $5.250.000 ($ 5.250.000 X 1,5)

Dando cumplimiento a lo establecido en los articulo 9 y 11 del decreto 2231 de 2023, para efectos de retención en la fuente, en el presente pago o abono en cuenta efectuado a mi nombre por concepto de rentas de trabajo no provenientes de una relación laboral, legal y reglamentaria, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a este pago.

Se expide el 3 de noviembre de 2025.

Cordialmente,



NIK JOHNATAN SOLARTE
C.C. 1.061.088.708

ANDRES MAURICIO VASQUEZ

INGENIERO AUXILIAR (2)

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2016 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	2016 DEL 11 DE JUNIO 2025.
CONTRATISTA	ANDRES MAURICIO VASQUEZ GOMEZ
CC.	74.081.949. DE SOGAMOSO
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA 2 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO	VENTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($24.500.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN**	DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. CIENTO CUARENTA Y TRES (143) DÍAS
PRORROGA	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	TUNJA
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TELLEZ, VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y EXTENSION
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Supervisor del Contrato
DEPENDENCIA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 4234 DE 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA 2
PERIODO DEL INFORME	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025
NUMERO DEL PAGO	5 de 5
VALOR DEL PAGO	($ 5.250.000). CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

INTRODUCCIÓN

La Universidad del Cauca, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como ingeniero auxiliar de interventoría en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre de 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A continuación, se describen las actividades desarrolladas entre el 01 al 31 de Octubre de 2025.

- ✓ Apoyar al Coordinador técnico de Interventoría en la transcripción de actas de reunión de seguimiento y control contrato de consultoría 4221 de 2024

FECHA	ENTIDADES PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
01-10-2025	Invias, Interventoría y Consultoría	Reunión presencial de seguimiento desde la ciudad de Popayán avance trabajos desarrollados por la consultoría.
03-10-2025	Invias, Interventoría y Consultoría	Reunión virtual de seguimiento avance trabajos desarrollados por la consultoría.
08-10-25	Invias, Interventoría y Consultoría	Reunión virtual de seguimiento avance trabajos desarrollados por la consultoría.
08-10-25	Invias, Interventoría y Consultoría	Reunión virtual de capacitación metodología BIM .

También se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ Asistir y participar en los comités y reuniones de seguimiento contrató de consultoría , donde participan Invias , Interventoría y Consultoría. (01 de octubre, 08 de octubre)
- ✓ Redacción informes de comisión equipo de interventoría a la ciudad de Popayán los días 30 de septiembre y 01 de octubre .
- ✓ Seguimiento socialización realizada por el consultor en el corregimiento de Guapi con el consejo comunitario (semana del 06 al 11 de octubre)
- ✓ Acompañamiento al consultor grabación video reconocimiento de la vía Plateado – López de Micay
- ✓ Acompañamiento y verificación de la interventoría al consultor a realizar inventario vial de la via El Plateado López de Micay, en el cual se identifican obras de arte nuevas , obras de arte existentes y puntos críticos de dicho corredor
- ✓ Apoyar al Coordinador técnico de Interventoría en la elaboración de informe semanal de interventoría
- ✓ Apoyar al Coordinador técnico de Interventoría en la elaboración de la bitácora de las actividades desarrollas por el consultor en el tramo Plateado López de Micay informe semanal de interventoría
- ✓ Cumplir en todos momentos con la implementación de las políticas, objetivos, planes, programas. Procedimientos, normas, reglamentos y demás directrices del sistema de gestión de calidad, seguridad, salud en el trabajo, y medio ambiente aplicables a mi labor.

ENTREGABLES:

- ✓ Durante este periodo del informe se asistió a las reuniones solicitadas por el director y Coordinador técnico de la interventoría, dando seguimiento y control a los requerimientos estipulados por el instituto a las actividades desarrolladas por la firma Consultora (Universidad del Cauca).
- ✓ Transcripción actas de reuniones comités de seguimiento consultor.
- ✓ Redacción informes de comisión equipo de interventoría a la ciudad de Popayán y Bogotá seguimiento contrato de consultoría

- ✓ Bitácora actividades realizadas por el consultor en el corredor Plateado López de Micay
- ✓ Actualización archivo de interventoría con el registro fotográfico y de video del acompañamiento al consultor inventario de la vía Plateado López Micay.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:


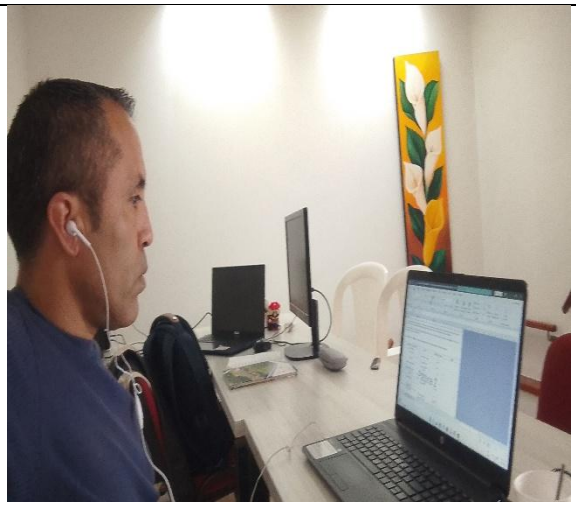
<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>FOTO 1. 03-10-25. Apoyo al coordinador técnico transcripción actas de comité de seguimiento contrato de consultoría</td><td>FOTO 2. 01-10-25. Asistencia comité de seguimiento contrato de consultoría</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>FOTO 3. 08-10-25. Asistencia comité de seguimiento contrato de consultoría</td><td>FOTO 4. 01-10-25. Redacción de informes de comisión equipo de interventoría seguimiento contrato de consultoría a la ciudad de Popayán y Bogotá</td></tr>
</table>

	
FOTO 5. 07-10-25. Seguimiento socialización realizada por el consultor con el consejo comunitario de Guapi	FOTO 6. 07-10-25. Seguimiento socialización realizada por el consultor con el consejo comunitario de Guapi
	
FOTO 7. 21-10-25. Acompañamiento a la consultoría filmación video de reconocimiento de la vía Plateado López de Micay	FOTO 8. 21-10-25. Acompañamiento a la consultoría filmación video de reconocimiento de la vía Plateado López de Micay

	
FOTO 9. 22-10-25. Acompañamiento al consultor y verificación inventario vial de la vía Plateado López de Micay , teniendo en cuenta las obras de arte existente , nuevas y puntos críticos	FOTO 10. 23-10-25. Acompañamiento al consultor y verificación inventario vial de la vía Plateado López de Micay , teniendo en cuenta las obras de arte existente , nuevas y puntos críticos
	
FOTO 11. 24-10-25. Acompañamiento al consultor y verificación inventario vial de la vía Plateado López de Micay , teniendo en cuenta las obras de arte existente , nuevas y puntos críticos	FOTO 12. 25-10-25. Acompañamiento al consultor y verificación inventario vial de la vía Plateado López de Micay , teniendo en cuenta las obras de arte existente , nuevas y puntos críticos

PRESENTADO POR:

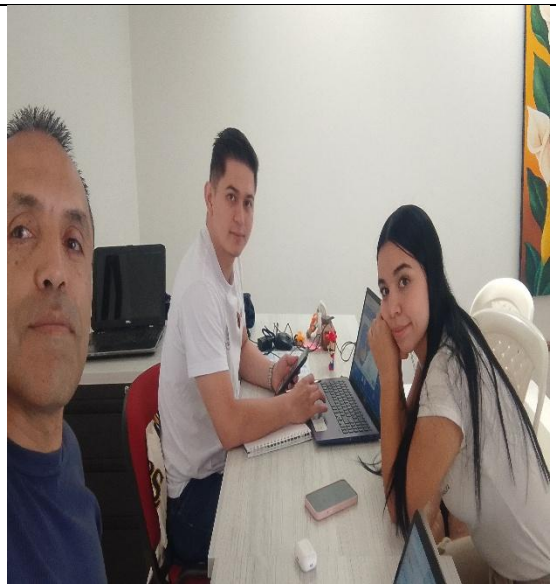

ANDRES MAURICIO VASQUEZ GOMEZ.
CC. 74.081.949 de Sogamoso.
E-mail: tecnocivil9@gmail.com
Celular: 3214988859
Contratista

Vo. Bo:



OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

Vo. Bo:



JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-17, 09:23:17 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	ANDRES MAURICIO VASQUEZ GOMEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 74081949
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8909819514 / 80545555
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	515425
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 604.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 339.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 265.000	$ 0

SubTotales:	$ 604.200	$ 0
Total a Pagar:		$ 604.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2025-10-16, 11:52:53 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8909819514

Fecha limite de pago: 2025-11-13

GUARDADA 17/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANDRES MAURICIO VASQUEZ GOMEZ				
Documento	CC74081949	**Dirección**	CR 1 ESTE #33 - 34		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6017777777		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	PAIPA	**Departamento**	BOYACA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 74081949	VASQUEZ GOMEZ ANDRES MAURICIO	03	00																0	30	30	0	0	COLFONDOS	$ 2.120.000	$ 339.200	EPS SANITAS	$ 2.120.000	$ 265.000	NINGUNA ARP	$ 0	$ 0	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 604.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 2.120.000	$ 2.120.000	$ 0	$ 0	$ 339.200	$ 0	$ 0	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 604.200	$ 0	$ 604.200

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 17/10/2025 Hora: 09:21:02

Jornada: Normal

Oficina: 1970

Terminal: CJ1970W101

Usuario: JQY

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

ARUS PILA ASISTIDA

Cuenta Convenio: **********2841

Codigo Convenio: 1225739

No. Referencia 1:

8909819514

No. Referencia 2:

74081949

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: $604,200.00

Costo transaccion: $0.00

No. Transaccion: 515425

Quien realiza la transaccion

Tipo Id: CC

Numero Id: 74081949

Transaccion exitosa en linea

Por favor verifique que la informacion impresa es correcta.

Powered by CamScanner

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **ANDRES MAURICIO VASQUEZ GOMEZ** identificado con **CC** No. **74081949**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 11/06/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 11/06/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/12/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501016213722.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 03 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
NIT. 891800330-1

DEBE A:

ANDRES MAURICIO VASQUEZ
C.C. 74.081.949

La suma de: CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE ($ 5.250.000,00), correspondiente al pago de octubre de 2025, por cumplir a satisfacción con los servicios del contrato No. 2016: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA 1 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA), según el siguiente detalle:

- Valor de los honorarios fijados en el contrato 4234 del 2024 para el Ingeniero Auxiliar (2), según los días laborados: $5.250.000
- Factor prestacional: 0,5
- Valar total honorarios: $5.250.000 ($ 5.250.000 X 1,5)

Dando cumplimiento a lo establecido en los articulo 9 y 11 del decreto 2231 de 2023, para efectos de retención en la fuente, en el presente pago o abono en cuenta efectuado a mi nombre por concepto de rentas de trabajo no provenientes de una relación laboral, legal y reglamentaria, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a este pago.

Se expide el 1 de noviembre de 2025.

Cordialmente,

Andres M Vasquez G.
ANDRES MAURICIO VASQUEZ
C.C. 74.081.949

MILTON FIDEL CARABUENA

COORDINADOR BIM DE INTERVENTORÍA

INFORME S DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2013 de 2025

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	2013 DEL 10 DE JUNIO DE 2025
CONTRATISTA	MILTON FIDEL CARABUENA MENDOZA
CC.	1.049.612.751 de Tunja.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR BIM DE INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO	$56.315.000
ADICIÓN No 01	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN**	11 de junio al 31 de octubre de 2025
PRORROGA No 01	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	Tunja.
ORDENADOR DEL GASTO	Carlos Mauricio Moreno Téllez, Vicerrector de Investigación y Extensión.
SUPERVISOR	Oscar Javier Gutiérrez Junco, Supervisor del Contrato
DEPENDENCIA	Contrato Interadministrativo N.º 4234 DE 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	COORDINADOR BIM DE INTERVENTORÍA
PERIODO DEL INFORME	01 al 31 de octubre de 2025
NUMERO DEL PAGO	5 DE 5
VALOR DEL PAGO	$12.067.500

1. INTRODUCCIÓN

La Universidad del Cauca, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como coordinador BIM de interventoría en el periodo comprendido entre el 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2025.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A continuación, se describen las actividades desarrolladas:

I. Se crearon cuadernos digitales en NoteBook LM para la gestión del proyecto BIM para la interventoría: Como parte de las labores realizadas, se llevó a cabo la creación de cuadernos digitales en NoteBook LM. Estos cuadernos incluyen un chatbot diseñado para facilitar la interpretación del Plan de Ejecución BIM, así como otro chatbot enfocado en el manejo de Autodesk Docs, incorporando las responsabilidades y necesidades específicas de la interventoría y los estados de revisión. Estas herramientas digitales contribuyen a optimizar los procesos y mejorar la gestión colaborativa dentro del proyecto BIM.

II. Durante reuniones sostenidas con el coordinador BIM de la consultoría, se solicitó una actualización prioritaria del Plan de Ejecución BIM (PEB), tomando en cuenta que durante la semana del 6 al 10 de octubre está programada la entrega de los 10 kilómetros de topografía. Es esencial que el documento del PEB refleje con precisión el levantamiento de las condiciones existentes, asegurando que la información obtenida esté actualizada y accesible para todos los equipos que participan en el proyecto. Se inicia la configuración del PEB para orientarlo hacia una guía de uso del proyecto.

III. Presentación y acceso al CDE para el INVIAS: El 10 de octubre de 2025 se presenta al profesional BIM de la entidad el entorno común de datos y el sistema de indicadores de desempeño correspondiente. El profesional solicita desarrollar una estrategia para incorporar a la ingeniera Xiomara al proyecto, considerando que no hay licencias disponibles para acceso al CDE en este momento. Se propone utilizar Power Automate para generar un duplicado de correos desde el ingeniero Julian Toro hacia la ingeniera Xiomara conforme a los estados de revisión documentados en el PEB. Además, se programan jornadas de capacitación para la entidad los días 14 y 17 de octubre de 2025, con ejercicios prácticos orientados a la validación de estados de revisión.

IV. Delimitación componente SIG: respecto al componente SIG del proyecto, se analizó con el especialista SIG de la interventoría, la trazabilidad de los flujos documentales y se acordó implementar un nuevo flujo específico desde la interventoría hacia la consultoría para registrar sistemáticamente las

comunicaciones y respuestas, fortaleciendo la transparencia y el control administrativo. Además, se definieron criterios técnicos para la publicación de archivos SHP en QGIS, estandarizando códigos y nomenclaturas, y revisando procedimientos para integrar información SIG en el entorno BIM y garantizar la interoperabilidad. Como resultado de estos ajustes, se modificó el alcance de la metodología BIM para el componente SIG en el Plan de Ejecución BIM (PEB), optimizando el flujo de información y asegurando la calidad de los datos. Finalmente, se solicitó al coordinador BIM de la consultoría la actualización integral del BEP, incorporando los lineamientos técnicos discutidos y detallando los alcances específicos de modelamiento por especialidad, para una gestión eficiente y alineada con las mejores prácticas internacionales.

V. Proceso de generación de flujos de trabajo de aprobación dentro del CDE: Durante la semana del 14 al 18 de octubre, se llevaron a cabo sesiones de capacitación especialmente orientadas a los flujos de aprobación documental, las cuales se desarrollaron utilizando el entorno común de datos (CDE) y Autodesk Docs como plataformas principales. El proceso formativo se articuló entre los distintos actores del proyecto, comenzando con la consultoría, continuando con la interventoría y llegando finalmente a la entidad. De esta manera, se garantizó que todos los procesos de gestión y remisión de la información se realizaran conforme a los criterios establecidos para la validación y aprobación de documentos.

VI. Revisión componente topografía: Se genero la revisión de la información alojada dentro del CDE para el tramo 03 (El plateado – Lopez de Micay). Se observa que los datos de las nubes de puntos, provenientes de archivos crudos, están en coordenadas no referencias arbitrarias y requieren ser ajustados al sistema de coordenadas del proyecto. Además, se evidencia la ausencia de información numérica que respalde el proceso de ajuste de la poligonal y de las coordenadas, lo que limita la disponibilidad de una lista de puntos ajustada para el desarrollo adecuado del proyecto. Adicionalmente, no se encuentra información documentada de las poligonales del proyecto por lo que no se puede realizar una comprobación de la corrección de coordenadas para los puntos tomados en campo. En la carpeta 12_OTROS (https://acc.autodesk.com/docs/files/projects/3cb36071-ab4f-4166-a3bb-f68ef08775f3?folderUrn=urn%3Aadsk.wipprod%3Afs.folder%3Aco.iWHnTYvJRN-nDfKkdpUFvw&viewModel=detail&moduleId=folders), se encuentra el archivo BordeVía_PlateadoHonduras.dwg, que es la única referencia de dibujo actual del topografía en formato AutoCAD Civil 3D de la topografía, donde se encuentran diferencias del mismo archivo en los GPS que son variables, entre

6 cm a 9 cm en cota (Elevación), y diferencias variables en coordenada Norte y Este para los diferentes GPS del sector.

VII. Presentación observaciones componente de topografía a la consultoría: Durante las reuniones celebradas con el consultor en las instalaciones de la Universidad del Cauca, se procedió a verificar el procedimiento relacionado con el volumen de topografía en los sectores Plateado – Honduras – López de Micay y Huisito – Honduras. En el primer tramo (Plateado – Honduras – López de Micay), se identificó que no existe información sobre la materialización de la poligonal ni sobre el geoposicionamiento realizado. A pesar de contar con registros de toma de datos topográficos, estos no pudieron ser validados, ya que no hubo supervisión de la interventoría durante la ejecución de los trabajos de campo. Esta situación se debió a que la consultoría no notificó oportunamente a la interventoría acerca de las labores programadas, impidiendo el acompañamiento y la verificación directa de los procedimientos realizados. En contraste, en el tramo Huisito – Honduras, sí se llevó a cabo la materialización de la poligonal junto con el correspondiente geoposicionamiento. Esto permitió revisar, validar y analizar la información levantada, garantizando así una mayor confiabilidad y trazabilidad de los datos obtenidos en esta sección. Cabe mencionar que la entrega formal de la información nunca se realizo por parte de la interventoría y debió ser consultado directamente en el CDE.

VIII. Revisión modelo digital de terreno: En reunión llevada a cabo con el consultor en las oficinas de la Universidad del Cauca, se procedió a la revisión detallada del modelo digital de terreno. Es importante señalar que, debido a la falta de notificación por parte de la consultoría sobre la programación y ejecución de las labores topográficas, la interventoría no pudo realizar la verificación directa en campo de dichos trabajos. Esta omisión impidió la supervisión y validación del procedimiento durante la toma de datos, lo cual es fundamental para asegurar la calidad y confiabilidad de la información recolectada. A pesar de esta limitación, se avanzó en la revisión del modelo digital de terreno en conjunto con los especialistas de diseño geométrico, quienes participaron activamente en el análisis. Durante este proceso, se identificó que la topografía levantada carece de líneas de rotura, un elemento esencial según los requerimientos técnicos establecidos para el cálculo de volúmenes topográficos. La ausencia de estas líneas de rotura puede generar inconvenientes en los procesos subsiguientes, ya que afectan la precisión del modelo y, por ende, la estimación de volúmenes y el desarrollo adecuado de los diseños geométricos.

IX. Capacitación información volumen de topografía para la interventoría: Debido a las condiciones identificadas durante la revisión de los procedimientos topográficos y la falta de trazabilidad en algunos tramos, se tomó la decisión de implementar capacitaciones específicas dirigidas al grupo de interventoría para fortalecer el seguimiento del volumen de topografía. Adicionalmente, se crearon cuadernos digitales que recopilan los requerimientos técnicos esenciales, con el objetivo de facilitar el acceso y comprensión de estos lineamientos por parte de todo el grupo de trabajo, promoviendo así una ejecución más rigurosa y alineada con los estándares del proyecto.

X. Revisión volumen de topografía: Se inicia revisión de la información del volumen de topografía con respecto a la red de poligonal, además de los errores de cierre, sin embargo, se solicita a la consultoría programar jornadas en campo junto al equipo de la interventoría para verificar el posicionamiento de cada uno de los mojones y conocer el estado de los puntos de control, además de la red de contra nivelación.

3. ENTREGABLES

- Se preparo el entorno común de datos directamente desde el módulo Docs para la consulta de la gestión documental de la interventoría, se aclara que la gestión documental se actualizara a lo largo del proyecto.

- Cuadernos digitales en el CDE



Numero	Nombre	Descripción	Link
1	**Autodesk Docs Manual for BIM Para interventoría**	Cuaderno digital, para manejo del CDE para la interventoría	https://notebooklm.google.com/notebook/158e0fd3-cbab-447d-b324-95faa0639fd5
2	**BEP: Popayán-Guapi Plan de Ejecución BIM**	Cuaderno digital por IA para consulta de requerimientos del BEP del proyecto	https://notebooklm.google.com/notebook/fb1c7f00-5c2e-4c33-9648-e4991a627db6


- Borrador de oficio (OFICIO ESTADO TOPOGRAFÍA TR03 PLATEADO MICAY.docx) con respecto a las observaciones del volumen de topografía.

4. REUNIONES DEL PERIODO

Fecha	Descripción
8 de octubre de 2025	Revisión de sistema de indicadores y alcance del PEB con la consultoría.
9 de octubre de 2025	Estrategia de configuración CDE como gestor espejo para Google de la interventoría
9 de octubre de 2025	Capacitación Lineamientos de Autodesk Docs y tableros de Power BI para control del proyecto.
10 de octubre de 2025	Revisión y supervisión del sistema de indicadores en el CDE para presentación a la entidad.
15 de octubre de 2025	Capacitación sobre Gestión Documental y Flujo de Revisión en Entorno Común de Datos
17 de septiembre de 2025	Capacitación del uso del para personal de la interventoría Parte 2
21 de octubre de 2025	Presentación observaciones volumen de topografía la consultoría – oficinas universidad del cauca Parte 1.
22 de octubre de 2025	Presentación observaciones volumen de topografía la consultoría – oficinas universidad del cauca Parte 2.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

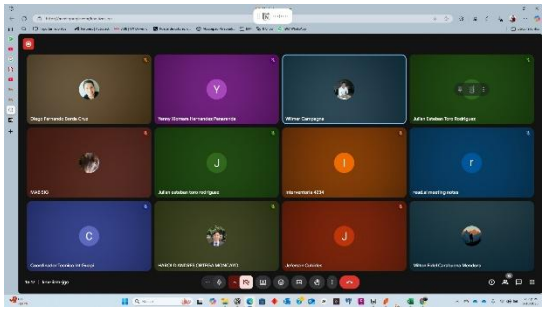	
Imagen 1. El 8 de octubre se presentan cuadernos digitales de gestión del CDE y uso del PEB para la entidad y se acuerdan jornadas de capacitación.	Imagen 2. El 10 de octubre se presentó el CDE y flujos de revisión a la entidad junto sistema de indicadores.

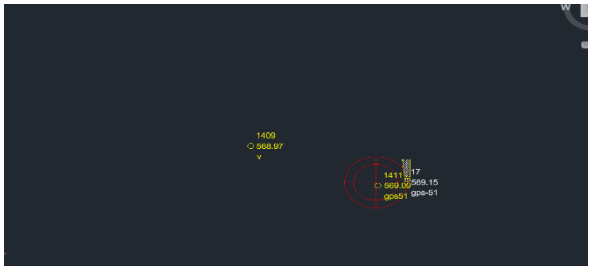	
Imagen 3. El 17 de octubre se inicia revisión del componente de topografía y estados de poligonales en el CDE.	Imagen 4. El 21 y 22 de octubre se presentan observaciones del volumen de topografía del consultor y se hace la revisión del modelo digital de terreno.

PRESENTADO POR:

MILTON FIDEL CARABUENA MENDOZA
Coordinado BIM de la interventoría
Contratista

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDDO
Director Contrato N.º 4262 de 2024
Interventoría UPTC

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato
UPTC

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1049612751	MILTON FIDEL CARABUENA MENDOZA	Calle 73 # 75 - 45 Apto 503	3107625069	mcarabuenam@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	27/10/2025	90885366	$1.401.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	603.400	0		0		0	0	0	0	603.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	772.400	0	0	0	0	0	0		772.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	25.200				25.200	0	0	25.200			252	25.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	603.400
Pensión	1	772.400	772.400
Riesgos Laborales	1	25.200	25.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.401.000	1.401.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1049612751	MILTON FIDEL CARABUENA MENDOZA		Calle 73 # 75 - 45 Apto 503	3107625069	mcarabuenam@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	27/10/2025	90885366	$1.401.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049612751	CARABUENA MENDOZA MILTON FIDEL	59	0			N																	231001	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS005	4.827.000	603.400	14-23	4.827.000	1	25.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1877379093

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
25/10/2025

Número de aprobación
00379093

Dirección IP
200.118.81.3

Valor transacción
$ 1.401.000,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
	CC	1049612751

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **MILTON FIDEL CARABUENA MENDOZA** identificado con **CC** No. **1049612751**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 11/06/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 11/06/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/12/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501016213656.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 03 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
NIT. 891800330-1

DEBE A:

MILTON FIDEL CARABUENA
C.C. 1.049.612.75

La suma de: Doce millones sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte. ($ 12.067.500), correspondiente al pago del mes de octubre de 2025, por cumplir a satisfacción con los servicios del contrato No. 2013: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR BIM DE INTERVENTORÍA, PARA DARCUMPLIMIENTO AL INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA), según el siguiente detalle:

- Valor de los honorarios fijados en el contrato 4234 del 2024 para el Coordinador BIM, según los días laborados: $ 8.045.000
- Factor prestacional: 0,5
- Valar total honorarios: $ 12.067.500 ($ 8.045.000 X 1,5)

Dando cumplimiento a lo establecido en los articulo 9 y 11 del decreto 2231 de 2023, para efectos de retención en la fuente, en el presente pago o abono en cuenta efectuado a mi nombre por concepto de rentas de trabajo no provenientes de una relación laboral, legal y reglamentaria, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a este pago.

Se expide el 3 de noviembre de 2025.

Cordialmente,



MILTON FIDEL CARABUENA
C.C. 1.049.612.75

MIGUEL ARTURO BARRETO

COORDINADOR SIG DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2012 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	2012 DE 2025.
CONTRATISTA	MIGUEL ARTURO BARRETO SALINAS
CC.	7.168.432 DE TUNJA.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR SIG DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($ 56.315.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN**	CIENTO CUARENTA Y TRES DIAS (143), CONTADOS A PARTIR DEL 11 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025.
PRORROGA	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	TUNJA.
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TELLEZ, VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y EXTENSION
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Supervisor del Contrato
DEPENDENCIA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 4234 DE 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	COORDINADOR SIG
PERIODO DEL INFORME	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
NUMERO DEL PAGO	5 de 5
VALOR DEL PAGO	($ 12.067.500). DOCE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

INTRODUCCIÓN

La Universidad del Cauca, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como Ingeniero Coordinador SIG en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A continuación, se describen las actividades desarrolladas:

I. Durante el transcurso del periodo de este informe se asistió a las siguientes reuniones y se levantaron las correspondientes actas de seguimiento, a saber:

FECHA	ENTIDADES PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
01/10/2025	BIM de Interventoría – Coordinador SIG Interventoría	Objetivo la familiarización y acceso al entorno común de datos para el Componente SIG CAPACITACION BIM ING. MILTON CARABUENA Y COORDINADOR SIG ING. MIGUEL BARRETO.
02/10/2025	Conferencia impacto social de proyectos cauca choco-valle del cauca. Interventoría, comunidad estudiantil y profesores UPTC	Se trataron temas sociales, técnicos, de orden público y generalidades BIM-SIG
8/10/2025	Consultoría UNICAUCA – Interventoría UPTC	Avance del contrato de Consultoría; No 4221 de 2024, se discutió la importancia de mantener comunicación con las comunidades locales y la necesidad de que los especialistas ambientales participen en las reuniones clave
11/10/2025	Coordinador BIM Y SIG de Interventoría	Se abordan temas relacionados con flujos de revisión y edición de documentos enviados. Se genera la necesidad de crear flujos de Interventoría hacia la Consultoría en atención a posibles requerimientos.
15/10/2025	Coordinador BIM Y SIG de Interventoría	Acceso carpetas SIG tramo 03
15/10/2025	Consultoría UNICAUCA – Interventoría UPTC	Reunión BIM SIG, proceso de revisión de documentos NO BIM.
22/10/2025	Consultoría UNICAUCA – Interventoría UPTC	Estado financiero del Contrato de Consultoría.
23/10/2025	Interventoría	Taller BIM, se realiza el recuento de topografía para el Tramo 1 El Plateado-López de Micay y tramo 2 Huisito Honduras;

- II. Durante el presente mes se realizaron 7 reuniones, correspondientes al contrato de consultoría 4221 de 2024 “**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.** En lo referente al componente Sistemas de Información Geográfica, de la Interventoría realiza una matriz con base en la

contestación. Esta matriz se refiere a los aspectos solicitados para cada Hito en cuanto al desarrollo del componente SIG de la siguiente manera: Hito 1 Napi-Guapi e Hito 2 Napi – El Plateado, hito 3A Diagnóstico de Navegabilidad, Hito 3B El Plateado – López. El 11 de octubre se realiza capacitación BIM con la participación del Coordinador Milton Carabuena y el Ing. Miguel Barreto. Se abordan temas relacionados con flujos de revisión y edición de documentos enviados. Se genera la necesidad de crear flujos de Interventoría hacia la Consultoría en atención a posibles requerimientos. En reunión BIM-SIG sostenida el día 15 de octubre de 2025, se abordaron aspectos relacionados con el proceso de revisión de documentos en el entorno común de datos. Se revisó la variabilidad de los flujos de información según la especialidad y el estado de la información, así como la posibilidad de exportar revisiones y generar reportes para mantener la trazabilidad de las aprobaciones. Se sugirió vincular la lectura de documentación necesaria a los pagos y se discutieron horarios para capacitaciones, prefiriendo sesiones después de las seis de la tarde. Se explicó el proceso de revisión de documentos no NOBIN, que incluye varias etapas desde la elaboración hasta la entrega al contratante. El Coordinador BIM de Interventoría en conjunto con El Julián Esteban Toro Rodríguez, plantearon la variabilidad de los flujos de revisión según la especialidad y la nomenclatura de los documentos. y aprobación de documentos.

ENTREGABLES:

- Se proyectó un oficio dirigido a la Consultoría la cual deberá reportar la información de manera gradual y efectiva, siguiendo la metodología general conforme al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras, para el tramo carreteable Hito 3B El Plateado – López de Micay. El comunicado se encuentra en revisión y aprobación para posteriormente ser radicado.

- La Coordinación SIG de Interventoría, realiza una matriz utilizando como fuente de información el documento BEP; lo anterior con el fin de la Información que debe ser reportada a futuro en cuanto a los sistemas de información geográfica. Se identifica los archivos que contienen SIG entre las cuales tenemos: V02_TRAZ, V04_GEO, V05_HGEO, V06_SUE, V07_TAL, V07_TAL, V09_HDR3, V10_EST, V14_RISK, V15_SOST.

- Se revisa el entorno común de datos: carpeta 01_TR01_Plateado_Napi evidenciando archivos Excel referentes a coordenadas MAGNA SIRGAS de inicio y fin de los tramos HITO I PLATEADO – NAPI, HITO II NAPI – GUAPI, HITO III B PLATEADO - LÓPEZ DE MICAY. El entorno común de datos presenta información en cuanto a mapas, entre los cuales tenemos: carpeta 01_TR01_Plateado_Napi: encontramos KMZ correspondiente al Hito I Plateado- Napi. Mapa Tramo Plateado Guapi; MAPA AMBIENTAL PLATEADO – NAPI – GÜAPI. Mapa trazado Hito 3A Diagnóstico de Navegabilidad; Otro de los mapas relacionado en el entorno común de datos corresponde a levantamiento de campo Puntos GPS Zaragoza – Noanamito. Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP: En revisión se evidencia Shape de áreas de reserva forestal ley segunda y Shape Runap. Shape áreas de reglamentación especial: Se encuentran Shape resguardo indígena formalizado y Shape Consejo comunitario titulado. Shape Hito 1 Plateado Napi: indica el trazado El Plateado – Guapi, Shape veredas del Cauca, Shape arqueología Plateado – Guapi, Shape limites departamentales municipales, cabeceras




Imagen 1. 1 de octubre 2025.Capacitación BIM ing. Milton Carabuena y coordinador SIG Ing. Miguel Barreto



Imagen 2. 02 octubre 2025. conferencia impacto social de proyectos cauca choco ante comunidad estudiantil y profesores Uptc.

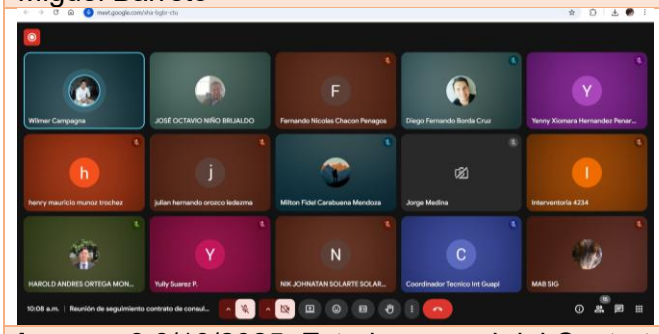


Imagen 3.8/10/2025. Estado general del Contrato. Temas relevantes hojas de vida profesionales metodologías y componente BIM introducción a capacitación.

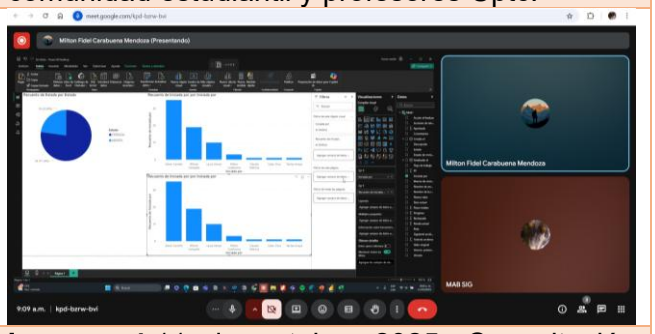


Imagen 4.11 de octubre 2025. Capacitación BIM-SIG




Imagen 5.15/10/2025 BIM acceso carpetas SIG tramo 03.

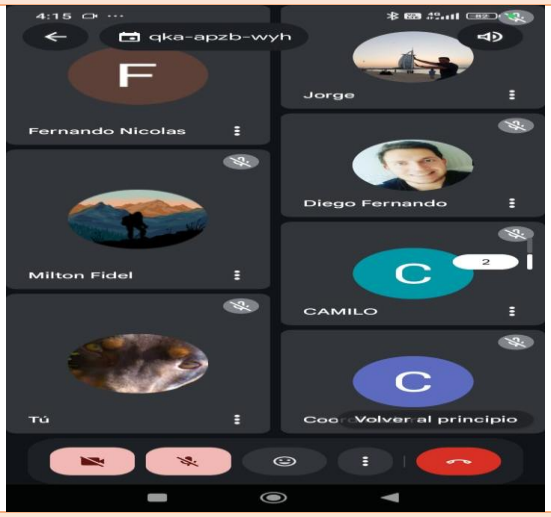


Imagen 6.15/10/2025 Reunión BIM SIG, proceso de revisión de documentos NO BIM.

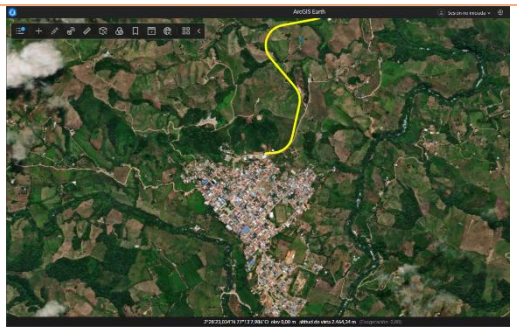
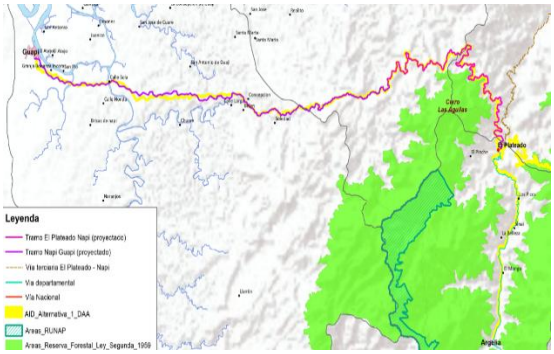


Imagen 7.23/10/2025 KMZ correspondiente al Hito I Plateado- Napi.



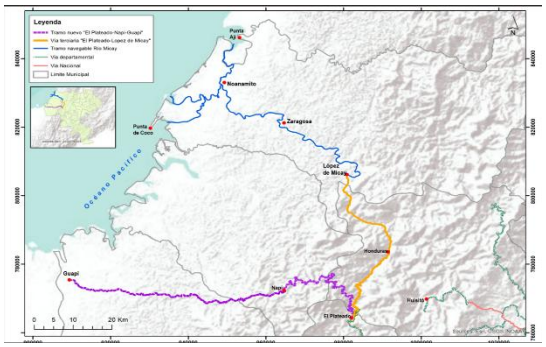


Imagen 8.24/10/2025 HITOS CAUCA.

PRESENTADO POR:

MIGUEL ARTURO BARRETO SALINAS
CC. 7.168.432 de Tunja.
E-mail: miguelarturobar@yahoo.com
Celular: 3112699244
Contratista

Vo. Bo:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7168432	MIGUEL ARTURO BARRETO SALINAS	TRANSVERSAL 17 C 32A-31	7462893	miguelarturobar@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	TUNJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	27/10/2025	90892839	$1.375.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	603.400	0		0		0	0	0	0	603.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	0	0		772.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	603.400
Pensión	1	772.400	772.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.375.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	7168432	MIGUEL ARTURO BARRETO SALINAS		TRANSVERSAL 17 C 32A-31	7462893	miguelarturobar@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	TUNJA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	27/10/2025	90892839	$1.375.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	7168432	BARRETO SALINAS MIGUEL ARTURO	3	0			N																	25-14	4.827.000	772.400	0	0	0	0	EPS005	4.827.000	603.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **MIGUEL ARTURO BARRETO SALINAS**, identificado con CC número **7168432**, aportó por **MIGUEL ARTURO BARRETO SALINAS**, identificado(a) con CC número **7168432** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-10** y salud **2025-10** de la siguiente manera:

CODIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	FSP SOLIDARIDAD	RUP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	$4.827.000	$0	$0	Octubre - 2025	90892039	27/10/2025	N
EPS005	Sanitas EPS															0		30	$4.827.000	$0	$0	Octubre - 2025	90892039	27/10/2025	N

PAGADA

El presente certificado se expide a los 27 días del mes Octubre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

¡Hola, Miguel Arturo Barreto Salinas!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 1.375.800

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha de la transacción: 27/10/2025

CUS: 1880714708

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **MIGUEL ARTURO BARRETO SALINAS** identificado con **CC** No. **7168432**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 11/06/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 11/06/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/12/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 3

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501016213621.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 02 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
NIT. 891800330-1

DEBE A:

MIGUEL ARTURO BARRETO
C.C. 7.168.432

La suma de: Doce millones sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte. ($ 12.067.500), correspondiente al pago del mes de octubre de 2025, por cumplir a satisfacción con los servicios del contrato No. 2012: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR SIG DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA), según el siguiente detalle:

- Valor de los honorarios fijados en el contrato 4234 del 2024 para el Coordinador SIG, según los días laborados: $ 8.045.000
- Factor prestacional: 0,5
- Valar total honorarios: $ 12.067.500 ($ 8.045.000 X 1,5)

Dando cumplimiento a lo establecido en los articulo 9 y 11 del decreto 2231 de 2023, para efectos de retención en la fuente, en el presente pago o abono en cuenta efectuado a mi nombre por concepto de rentas de trabajo no provenientes de una relación laboral, legal y reglamentaria, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a este pago.

Se expide el 3 de noviembre de 2025.

Cordialmente,



MIGUEL ARTURO BARRETO
C.C. 7.168.432

CAMILO HERNANDO HERNANDEZ

RESIDENTE DE CAMPO Y/O ESTUDIOS

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1653 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	1653 DEL 25 DE ABRIL 2025.
CONTRATISTA	CAMILO HERNANDO HERNÁNDEZ CASTRO
CC.	1.136.880.280 DE BOGOTÁ.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y/O ESTUDIOS DE INTERVENTORIA LOS ESTUDIOS DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 53.527.500,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN**	CIENTO OCHENTA Y SIETE DIAS (187), CONTADOS A PARTIR DEL 28 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025.
PRORROGA	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	TUNJA.
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TELLEZ, VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y EXTENSION
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Supervisor del Contrato
DEPENDENCIA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 4234 DE 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y/O ESTUDIOS,
PERIODO DEL INFORME	DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025
NUMERO DEL PAGO	7 de 7
VALOR DEL PAGO	($ 8.775.000). OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

INTRODUCCIÓN

La Universidad del Cauca, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como ingeniero residente de campo y/o estudios en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A continuación, se describen las actividades desarrolladas entre el 1 al 31 de octubre de 2025.

I. Durante el transcurso del periodo de este informe se asistió a las siguientes reuniones y se levantaron las correspondientes actas de seguimiento, a saber:

FECHA	ENTIDADES PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
3/10/2025	INTERVENTORIA - INVIAS - CONSULTORIA	Reunión de valor unitario de comisiones topográficas
8/10/2025	INTERVENTORIA - INVIAS - CONSULTORIA	Reunión virtual con participación de INVÍAS, Consultoría e Interventoría para el seguimiento y control de los Contratos Interadministrativos No. 4221 y 4234 de 2024
8/10/2025	INTERVENTORIA - INVIAS - CONSULTORIA	Componente BIM, manejo de la plataforma común de datos.
14/10/2025	INTERVENTORIA - INVIAS - CONSULTORIA	Reunión con el señor peñuela, consultoría e interventoría
14/10/2025	INTERVENTORIA - INVIAS - CONSULTORIA	se realizó reunión de seguimiento junto con la subdirectora de Planificación de Infraestructura del Invias donde la consultoría expuso su plan de contingencia para entregar los trabajos del tramo plateado. López De Micay y huesito Honduras,
16/10/2025	INTERVENTORIA - INVIAS - CONSULTORIA	En esta reunión junto con la anterior del día martes, se desarrollaron en las instalaciones del INVIAS, donde en compañía de la directora técnica del Instituto, la consultoría expuso el plan de contingencia ajustado para entregar los productos antes del 31 de diciembre de 2025,
21/10/2025	INTERVENTORIA - CONSULTORIA	Reunión presencia para proyección de adición y prorroga al contrato de interventoría y consultoría
22/10/2025	INTERVENTORIA - INVIAS - CONSULTORIA	Reunión virtual con participación de INVÍAS, Consultoría e Interventoría para el seguimiento y control de los Contratos Interadministrativos No. 4221 y 4234 de 2024

II. Para el periodo del presente informe se proyecta, coadyuva y realiza la complementación de la información solicitada por el Director de Interventoría ingeniero José Octavio Niño Brijaldo, Coordinadora técnica ingeniera Laura Melissa Patiño y demás personal del Contrato interadministrativo No. 4234 del 2024 para la Construcción de los siguientes actas, oficios e informes:

PROYECCION OFICIOS ENVIADOS Y DIRIGIDOS A:	ASUNTO
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Solicitud de aprobación hojas de vida de especialistas de interventoría
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Solicitud Entrega cronograma trabajos de Topografía y Exploración Geotécnica para el tramo El Plateado – López de Micay.
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	RATIFICACIÓN HOJAS DE VIDA - CTO INTERADMINISTRATIVO No 4221-2024 POR PARTE DEL INVIAS /PROFESIONAL TECNICO PREDIAL HITO IIIB Y PROFESIONAL SOCIAL HITO IIIB
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	RATIFICACIÓN HOJAS DE VIDA - CTO INTERADMINISTRATIVO No 4221-2024 POR PARTE DEL INVIAS /Profesional en Arqueología: Mateo Fernando Díaz Astaiza,
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Devolución acta de Costos mes de septiembre 2025 - 4221 / 2024.
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Informe Semanal No. 45, correspondiente al periodo del 29 de septiembre al 05 de octubre del 2025. del Contrato 4221 Y 4234 DEL 2024
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Solicitud de documentos, extractos bancarios y documentos, Soporte, calibración de equipos de topografía y batimetría.
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	SPI - ACTA DE COSTOS 11 SEPTIEMBRE 2025 CTO 4234-2024 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA (UPTC) BIC 891800330-1; RP 1100024; RECURSO 10; VALOR $ 191.964.000 / REVISION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Proyección acta de costos No. 11 (Septiembre 2025) para revisión preliminar de la Gestora Tecnica
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Documentos relacionados con el área de pavimentos para el contrato 4221 / 2024
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Proyección acta de costos No. 11 (Septiembre 2025) contrato 4221 /2024 para revisión preliminar de la Gestora Técnica
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Documentos pago rendimientos cuenta Anticipo Contrato 4234 del 2024 mes de agosto del 2025 / Reenvio de la informacion a la ingeniera Yenny
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	SPI - ACTA DE COSTOS 11 SEPTIEMBRE 2025 CTO 4221-2024 UNIVERSIDAD DEL CAUCA BIC NIT: 891.500.319-2; RP 1113924; RECURSO 10; VALOR $ 361.206.876
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Actualización de rendimientos financieros por parte de la consultoría / envio de documentos firmados por el ingeniero Jose Octavio
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Solicitud de aprobacion hoja de vida Residente de campo y/o estudios (2) de interventoria
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	10. Solicitud de Factura No 10. acta de costos No.11 del mes de septiembre de 2025, correspondiente al Contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024 INVIAS - UPTC. INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Solicitud de adición y prórroga para contrato de prestación de servicios.
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Solicitud de adición y prórroga para contrato de camionetas contrato 4234 de 2024
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Solicitud ingreso factura No 660109 correspondiente al acta de costos No 7 junio 2025, del contrato de interventoría No 4234 de 2024
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Factura acta de costos No 11 de interventoría 4234 Popayán - Guapi.
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	FORMATOS CONTROL DE FACTURACION GRUPO 3 CONTRATO 4221/2024
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Informe Semanal No. 46, correspondiente al periodo del 06 al 12 de octubre del 2025. del Contrato 4221 Y 4234 DEL 2024
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Solicitud de aprobación hojas de vida de especialistas de interventoría. / ESPECIALISTA EN EVALUACION ECONOMICA / PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS / PROFESIONAL EN URBANISMO / GEOLOGO / ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RIESGO

correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	"Revisión estado de topografía tramo 03 – El Plateado – López de Micay,
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	cargado en el entorno común de datos CDE."
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Solicitud de bitácoras físicas por tramo contrato 4221 / 2024 (Actividades en Campo)
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Solicitud de aprobación hojas de vida del Grupo I y Grupo II de Interventoría.
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Respuesta oficios 8.3-55.6/663 de fecha 08 de octubre de 2025 y 8.3-55.6/683 de fecha 15 de octubre de 2025 – Convocatoria y Reprogramación comisión salida a campo Cañón del Micay, recopilación de relatos y narrativas sobre poblamiento e historia vial, Municipio de (El Tambo).
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Alerta - entrega de actas de costos por parte de la consultoría
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Matriz Actualizada de consolidación información consulta a entidades, para el proyecto.
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Solicitud de firma, para proceso de consignación de rendimientos financieros cuenta de anticipo contrato No 4234 SEPTIEMBRE 2025 Recibidos
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Informe Semanal No. 47, correspondiente al periodo del 13 al 19 de octubre del 2025. del Contrato 4221 Y 4234 DEL 2024
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Observación a hoja de vida presentada para el cargo de Coordinador Técnico.
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	respuesta al oficio 2025S-VBOG-078278. / Acclaracion Hoja de vida arqutecto de interventoria
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Solicitud de aprobación hojas de vida Especialista en Estructuras contrato 4234 /2024
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Observación a hoja de vida presentada para el cargo de especialista en Sostenibilidad.
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Observación a hoja de vida presentada para el cargo de especialista en urbanismo
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Respuesta 8.3-55.6/697 de fecha 20 de octubre de 2025 - Invitación para acompañar actividades de socialización y entrega de resultados del estudio de navegabilidad – Contrato 4221 de 2025, Hito III A (López de Micay).
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Respuesta al oficio No. 8.3-55.6/712 – Reiteración de solicitud de aprobación del Plan de Exploración para Pavimentos y Obras Menores.

correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Ajustes y observaciones a las diferentes metodologías y entregas preliminares de los volúmenes.
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Cumplimiento de compromisos Comités.
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	"Respuesta 8.3-55.6/655 de fecha 06 de octubre de 2025 – Cronograma de
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Socializaciones Municipio de Guapi - Salida de comisión localidades de Belén, Soledad,
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Calle larga, San Agustín y Chuaré."
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Observación a hoja de vida presentada para el cargo Especialista en Hidrogeología para el Hito I y II.
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Observación a hoja de vida presentada para el cargo Especialista en Hidrogeología para el Hito I y II.

Asistencia y participación de las diferentes reuniones virtuales para el seguimiento y control a los contratos 4221 /2024 y 4234 / 2024.

FECHA	ENTIDADES PARTICIPANTES	OBSERVACIONES
10/10/2025	INTERVENTORIA - INVIAS - CONSULTORIA	componente ambiental y social (reunión señor Peñuela)
15/10/2025	INTERVENTORIA - INVIAS - CONSULTORIA	Componente BIM , manejo de la plataforma común de datos.
17/10/2025	INTERVENTORIA - INVIAS - CONSULTORIA	componente ambiental y social
23/10/2025	INTERVENTORIA	Capacitación Entorno común sobre la topografía del contrato

- Apoyando a la Coordinadora Técnica de la interventoría en la proyección, corrección y envió al instituto Nacional de Vías (INVIAS) los siguientes informes semanales:

  - Informe semanal No 46 con fecha 6/10//2024

.

  - Informe semanal No 47 con fecha 13/10/2024.

  - Informe semanal No 48 con fecha 20/10/2024.

  - Informe semanal No 49 con fecha 27/10/2024.

- Desarrollo de los formatos y documentos para el informe mensual de interventoría y consultoría correspondiente a:

  - Revisión, corrección y tramite informe mensual septiembre 2025 de consultoría (Acta de Costo No. 11)

- Revisión, corrección y tramite informe mensual septiembre 2025 de interventoría (Acta de Costo No. 11)

- Proyección y diligenciamiento del informe mensual octubre 2025 de interventoría (Acta de Costo No. 12)

- Apoyo a la Coordinadora Técnica de la Interventoría para verificar planillas e informes del personal del Grupo 1, que sirven como soporte para el acta de Costos al contrato interadministrativo No. 4234 del 2024.

III. Para este periodo del informe, se adelanta la recopilación, diligenciamiento y desarrollo de las tareas administrativa de la siguiente forma:

- Apoyo para la impresión y radicación de algunos documentos necesario para los trámites administrativos internos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) en cuanto a:

  - Ayudar en el proceso administrativos tramite de la solicitud de factura del acta de costos de interventoría No. 11 septiembre del 2025

  - Ayudar en el proceso administrativos con la universidad (Tesorería) remitiendo el instructivo para el pago de los rendimientos del anticipo al contrato 4234 del 2024.

  - Organización de sitio del trabajo para la comodidad y funcionamiento en el sitio físico dispuesto por la Universidad

  - Elaboración, organización y tramite del informe de gestión mensual y demás solicitados por el director de interventoría.

  - Apoyo en la proyección de los oficios para la aprobación de los volúmenes y capítulos parciales del Hito II, Hito IIIA e Hito IIIB.

- Entre la Coordinadora Técnica y el residente de estudios se realiza la Consolidación de la correspondencia enviada y recibida del contrato interadministrativo No.4221 del 2024, con el fin de informar al director los oficios y sea el caso, dar respuesta al Consultor e Instituto (INVIAS).

  Se deja claridad que la información física reposa en las oficinas del contrato interadministrativo No. 4234 del 2024 ubicada en la ciudad de Tunja dentro de las instalaciones de la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia y se cuenta con el respaldo de la documentación digitalizada en el DRIVE del correo uptcguapi4234@gmail.com.

- Se realizó y apoyó a la Coordinadora Técnica, el trabajo de oficina, adelantando y consolidando la información suministrada por el Consultor, en cuanto a los formatos de los diferentes informes semanales, lo anterior para ser presentado como anexo en los diferentes informes mensuales de interventoría.

- Atender las solicitudes de la Gestora Técnica del INVIAS ingeniera Yenny Xiomara Hernández.

- Se empieza a dar manejo de la información del DRIVE, organizando carpetas y nombres para ser cargadas en el Entorno Común de datos de AUTODESK

III. Para este periodo del informe, se asistió a una reunion presencial programada por la consultoría ejercida por la Universidad del Cauca, la cual se relaciona a continuación:

1 de octubre 2025	Consultoría – Interventoría – INVIAS	- Revisión entre las partes proyección de acta de Costos No. 11 con sus soportes, contrato 4221 del 2024.

ENTREGABLES:

- Durante este periodo del informe se asisto a las reuniones solicitadas por el director y Coordinado técnico de la interventoría, dando seguimiento y control a los requerimientos estipulados por el instituto a las actividades desarrolladas por la firma Consultora (Universidad del Cauca).

- Elaboración de la pre-acta Acta de Costos No. 12 (octubre 2025) contrato interadministrativo No. 4221 del 2024 y Contrato interadministrativo No. 4234 del 2024.

- Se carga y mantiene el archivo en Drive actualizado de la interventoría y consultoría referente a los documentos contractuales (Pliegos, Minuta, Anexos, Apéndices, propuesta, actas, contratos adicionales, otrosí, oficios etc.) Correspondientes al proyecto mediante el escaneo de los correspondientes documentos en formato PDF, según requerimientos establecidos por el director y coordinador técnico de la interventoría, con el fin que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato interadministrativo No. 4234 del 2024 (UPTC - INVIAS y contrato interadministrativo No. 4221 del 2024 (Universidad del Cauca – UPTC).

- Manejo del drive para cargar la información en el Entorno Común de Datos de AUTODESK

- Se prepara para la unidad ejecutora del INVIAS (SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA) los informes mensuales de interventoría con los diferentes formatos, teniendo en cuenta los instructivos desarrollados por el instituto, correspondientes del mes de octubre del 2025, al seguimiento y control de las actividades desarrolladas por la firma consultora (Universidad del Cauca), en el marco del contrato interadministrativo No. 4221 del 2024.

- Se coadyuvo en la documentación (facturación) para el tramite del acta de costos No.11 de septiembre 2025 ante el INVIAS.

- En el mes de octubre la Consultoría remite hojas de vida para las siguientes especialidades:

  - Especialista en Urbanismo Hito I y Hito II
  - Especialista en sostenibilidad Hito I y Hito II
  - Especialista en Hidrología Hito I y Hito II
  - Especialista en Hidrología Hito I, II y IIIB

  Están siendo corregidas por el consultor por no ser aprobadas por la interventoría según el anexo técnico del contrato 4221 de 2024

- Se cuenta con la consolidación y análisis de varias hojas de vida para el personal del grupo 1 y especialista del grupo 2 en el marco del contrato 4234 del 2024, las cuales fueron remitidas al INVIAS mediante varios oficios A la fecha del presente informe, se cuenta con la ratificación por parte del INVIAS de 34 perfiles.

- La consultoría a la fecha ha remitido a la interventoría 36 metodologías Versión 0 y 36 metodologías Versión 1 a los hitos I y II.

En el mes de octubre del 2025, con el Acta de modificación de costos No. 4, consultoría presenta los siguientes volúmenes, para su reconocimiento parcial:

HITO II - FASE III VÍA NUEVA - VOLÚMENES DEL TRAMO NAPI – EL PLATEADO LOG APROX 58 KM. **(18 VOLUMENES)**

HITO IIIA - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD (FASE I) PARA LA CONEXIÓN INTERMODAL DEL MCPO DE LOPEZ DE MICAY EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA **(1 METODOLOGIA Y 8 BORADORES DE CAPITULOS)**

HITO III B - ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA - VOLÚMENES DEL TRAMO EL PLATEADO - LOPEZ DE MICAY LONGITUD APROXIMADA 70 Km **(10 METODOLOGIAS)**

A lo anterior se da traslado al director de interventoría y coordinadora técnica para su conocimiento y fines pertinentes. Información consolidad en la matriz con nombre "*Control de Metodología 4221 del 2024".*

Se realiza reunión el 1 de octubre en la ciudad de Popayán con el equipo de la Consultoría, con el fin de poder tratar la entrega de los volúmenes y capítulos finales versión No. 1 y proyección de facturación contrato 4221 /2024.

- Se cuenta con la consolidación de la correspondencia enviada y recibida, así como la documentación relacionada al proceso Pre-contractual y contractual de los contratos interadministrativos No. 4221 del 2024 (Universidad del Cauca – INVIAS) y contrato interadministrativo No. 4234 del 2024 (UPTC – INVIAS).

- Se hace entrega al director de interventoría del informe consolidado ejecutivo del mes de octubre 2025 de los contratos de consultoría 4221 / 2024 y de interventoría 4234 / 2024.

- Se hace entrega de los formatos de viáticos de las permanencias realizadas en el mes de octubre, que son parte integral del acta de costos para este periodo, en el marco del contrato 4234 del 2024.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

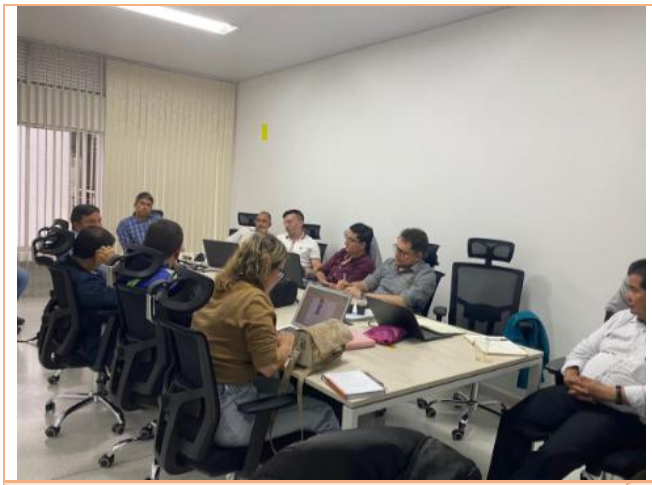


Imagen 1. 1 de octubre. Reunión interventoría, consultoría, revisar el plan de facturación contrato 4221 /2024



Imagen **2.** 2 de octubre Asistencia y participación de Congreso de la facultad de ingeniera de la UPTC



Imagen 3. Reunión virtual 08/10/2025 para el seguimiento y control al contrato 4221 / 2025.

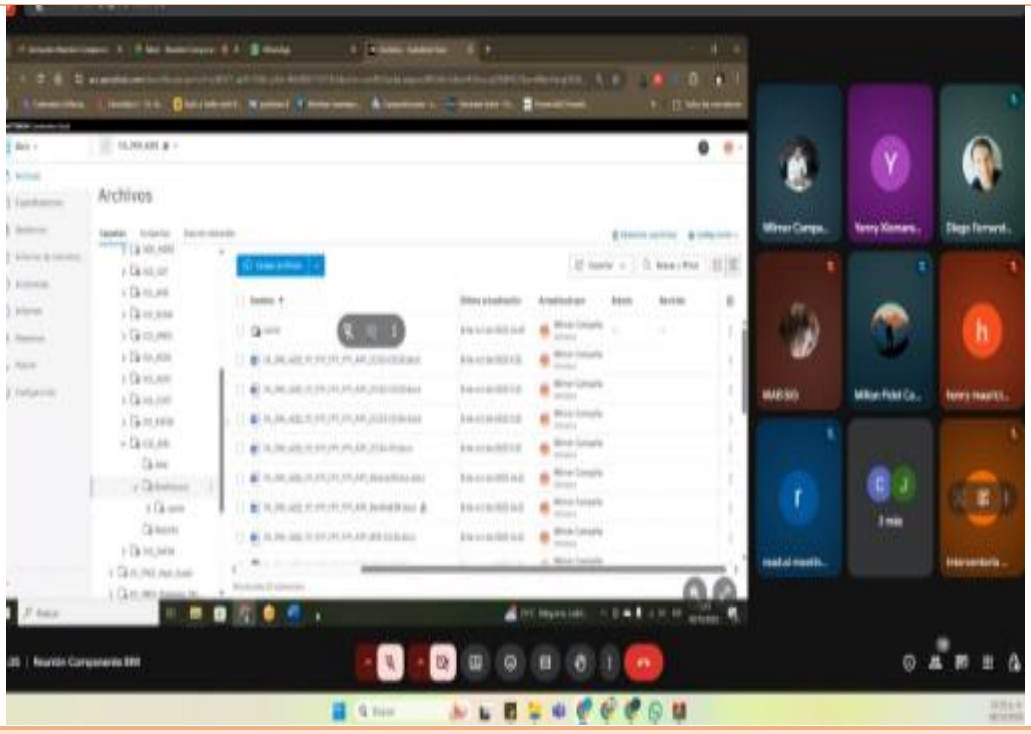


Imagen 4. Reunión virtual 8/10/2025 Componente BIM, manejo de la plataforma común de datos.



Imagen 5. Reunión Virtual 15 de octubre del 2025 manejo de la plataforma común de datos.



Imagen 6. Reunión presencial 17 de octubre del 2025 seguimiento y control del contrato 4234 del 2024

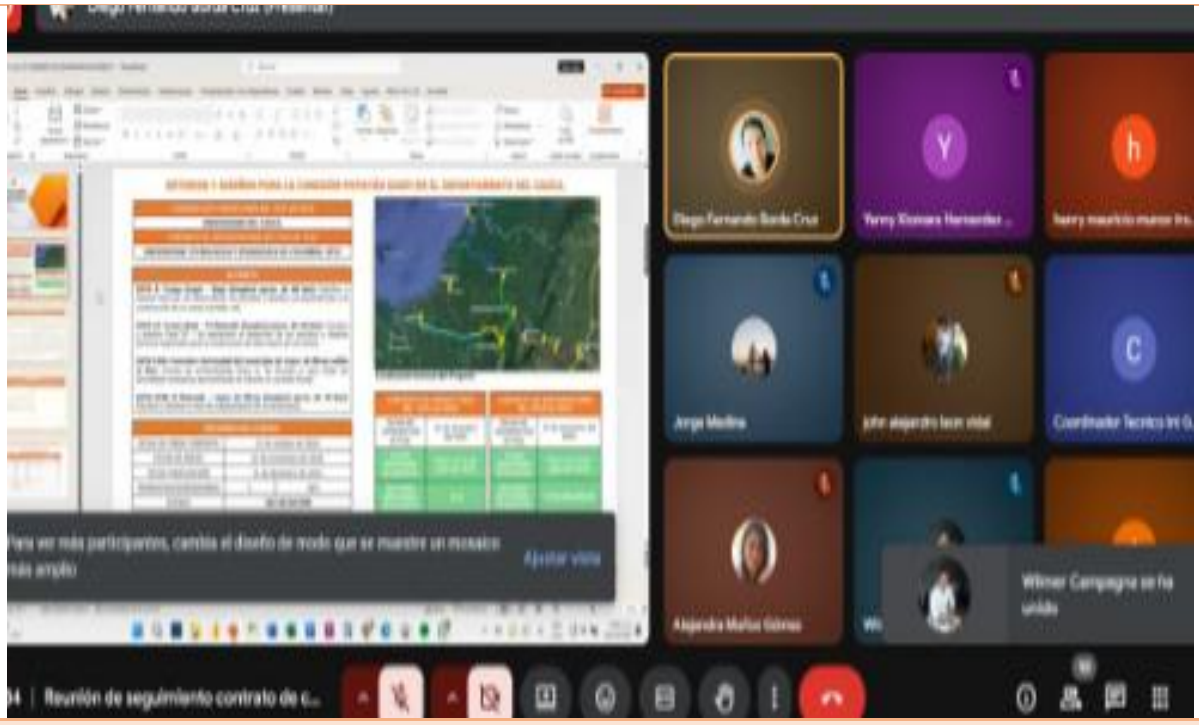


Imagen 7. Reunión virtual 22/10/2025 para el seguimiento y control al contrato 4221 / 2025.

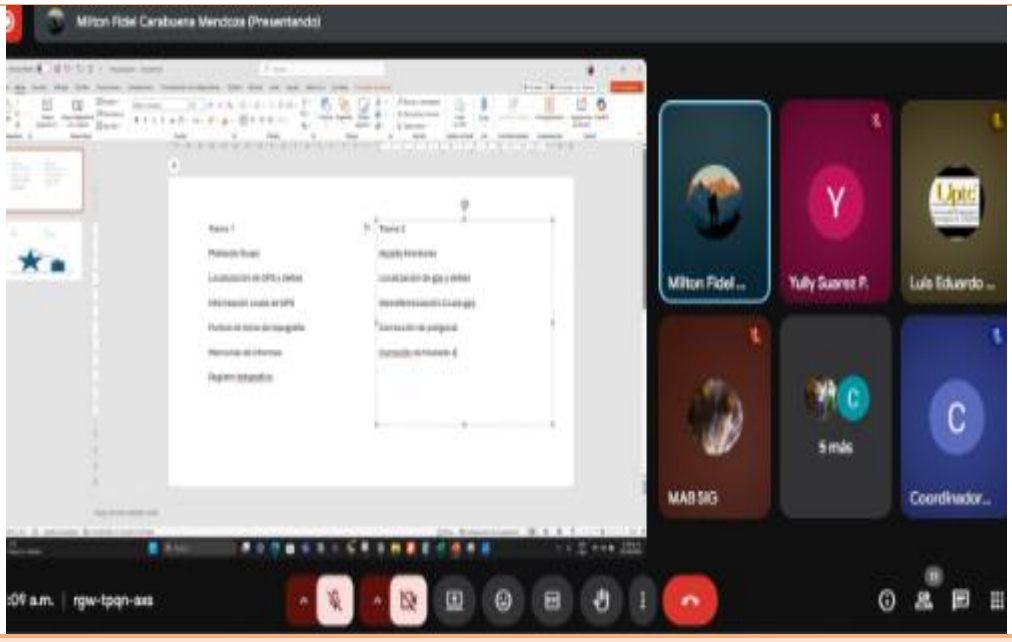


Imagen 8. 23/10/2025 Reunión virtual con el equipo de interventoría para verificar y estudiar los documentos topográficos de la Consultoría. Presentación presidida por el ingeniero Milton Carabuena

PRESENTADO POR:

CAMILO HERNANDO HERNANDEZ C.
CC. 1.136.880.280 de Bogotá.
E-mail: ingcamilohh@gmail.com
Celular: 3203363080
Contratista

Vo. Bo:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1136880280		HERNANDEZ CASTRO CAMILO HERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 No. 35-66, MESOPOTAMIA	TUNJA-BOYACA	7438521	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1878413152	9493859330	I	2025/11/21	2025/10/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,000,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,510,000	$561,600			$3,510,000	$438,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,510,000	$561,600			$3,510,000	$438,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$3,510,000	$561,600			$3,510,000	$438,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1136880280	HERNANDEZ CAMILO	230301	30	$3,510,000	$561,600	EPS002	30	$3,510,000	$438,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$3,510,000	$561,600			$3,510,000	$438,800			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1136880280		HERNANDEZ CASTRO CAMILO HERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 No. 35-66, MESOPOTAMIA	TUNJA-BOYACA	7438521	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1878413152	9493859330	I	2025/11/21	2025/10/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,000,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$561,600	$0	$0	$561,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$561,600	$0	$0	$561,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$438,800	$0	$0	$438,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$438,800	$0	$0	$438,800
TOTAL				**1**	**$1,000,400**	**$0**	**$0**	**$1,000,400**

Gmail

CAMILO HERNANDEZ <ingcamilohh@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1878413152
1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 25 de octubre de 2025, 6:42 p.m.
Para: ingcamilohh@gmail.com

¡Hola, Camilo Hernando Hernandez Castro!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 1.000.400

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9493859330

Fecha de la transacción: 25/10/2025

CUS: 1878413152

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **CAMILO HERNANDO HERNANDEZ CASTRO** identificado con **CC** No. **1136880280**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 28/04/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 28/04/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/12/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20250101614549.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 3 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
NIT. 891800330-1

DEBE A:

CAMILO HERNANDO HERNÁNDEZ CASTRO
C.C. 1.136.880.280


La suma de: Ocho millones setecientos setenta y cinco mil pesos m/cte. ($8.775.000,00), correspondiente al pago del mes de octubre de 2025, por cumplir a satisfacción con los servicios del contrato No. 1653: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y/O ESTUDIOS DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.), según el siguiente detalle:

- Valor de los honorarios fijados en el contrato 4234 del 2024 para el Ingeniero Residente de Campo y/o Estudios, según los días laborados: $5.850.000
- Factor prestacional: 0,5
- Valor total honorarios: $8.775.000,00 ($5.850.000 X 1,5)

Dando cumplimiento a lo establecido en los articulo 9 y 11 del decreto 2231 de 2023, para efectos de retención en la fuente, en el presente pago o abono en cuenta efectuado a mi nombre por concepto de rentas de trabajo no provenientes de una relación laboral, legal y reglamentaria, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a este pago.

Se expide el 3 de noviembre de 2025.

Cordialmente,



CAMILO HERNANDO HERNÁNDEZ CASTRO
C.C. 1.136.880.280

JOHN ALEJANDRO LEON VIDAL

INGENIERO AUXILIAR (4)

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3529 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	3529 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATISTA	JOHN ALEJANDRO LEON VIDAL
CC.	1.061.755.871 POPAYAN – CAUCA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA 4 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y SUS ADICIONALES AL HITO IIIA Y IIIB DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4234 DE 2024.
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTE Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($13.475.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN**	SETENTA Y OCHO (78) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE.
PRORROGA	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	TUNJA
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TELLEZ, VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y EXTENSION
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Supervisor del Contrato
DEPENDENCIA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 4234 DE 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA 4
PERIODO DEL INFORME	DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
NUMERO DEL PAGO	1 de 3
VALOR DEL PAGO	($ 2.975.000,00). DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL M/CTE

INTRODUCCIÓN

La Universidad del Cauca, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA

PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como ingeniero auxiliar de interventoría en el periodo comprendido entre el 15 al 31 de octubre de 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A continuación, se describen las actividades desarrolladas entre el 15 al 31 de octubre de 2025.

I. Durante el transcurso del periodo de este informe se asistió a las siguientes reuniones:

FECHA	ENTIDADES PARTICIPANTES	OBJETO
21/10/2025	INTERVENTORIA UPTC-CONSULTORÍA UNICAUCA	El 21 de octubre de 2025, se participó de la reunión presencial en las instalaciones de la universidad del Cauca, junto con la consultoría de la universidad del Cauca e interventoría de la UPTC.
22/10/2025	INTERVENTORIA UPTC – CONSULTORIA UNICAUCA – INVIAS.	El día 22 de octubre de 2025, se asistió al comité virtual donde participaron la consultoría de la Universidad del Cauca, Interventoría de la UPTC, Gestora del Proyecto.

- El día 21 de octubre de 2025, se participó en la reunión presencial de seguimiento técnico y administrativo del proyecto de estudios y diseños, la Universidad del Cauca (consultoría) y la UPTC (interventoría). Durante la sesión se abordaron los siguientes temas principales:

  - Revisión del avance técnico del proyecto: Se analizaron los progresos en la ejecución de las actividades topográficas, geotécnicas y ambientales, destacando la necesidad de fortalecer el cumplimiento de los entregables conforme a los requerimientos técnicos establecidos por el INVIAS.

  - Cumplimiento del cronograma contractual: Se revisó el estado de las actividades programadas frente al cronograma general de ejecución. Se evidenció un desfase en algunos productos, principalmente asociados a los componentes de campo y procesamiento de información, lo que hace necesario ajustar los tiempos de ejecución.

  - Coordinación interinstitucional: Se acordó mantener una comunicación

permanente entre las partes para la revisión de entregables, definición de cronogramas actualizados y seguimiento a las observaciones técnicas planteadas.

- El día 22 de octubre de 2025, se participó en la reunión virtual de seguimiento técnico y administrativo del proyecto de estudios y diseños, con presencia de representantes del INVIAS, la Universidad del Cauca (consultoría) y la UPTC (interventoría). Durante la sesión se abordaron los siguientes temas principales:

  - Propuesta de prórroga contractual: La consultoría y la interventoría expusieron la justificación técnica y administrativa para la prórroga del contrato, con el fin de garantizar la culminación de los estudios pendientes y la consolidación de los entregables finales. El INVIAS manifestó su viabilidad frente a la prórroga, reconociendo que es necesaria para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, siempre que no implique modificación del valor contractual.

  - Solicitud de adición presupuestal: La interventoría presentó la necesidad de una adición económica al contrato, argumentando requerimientos adicionales para atender los procesos de seguimiento, verificación técnica y cierre contractual. Sin embargo, el INVIAS indicó que no ve viable la adición presupuestal en el momento, debido a las restricciones presupuestales y al estado actual de la ejecución financiera.

- Asistir y participar en los comités y reuniones realizados por la Interventoría en cabeza del director y Coordinadores.

- Cumplir en todos momentos con la implementación de las políticas, objetivos, planes, programas, Procedimientos, normas, reglamentos y demás directrices del sistema de gestión de calidad, seguridad, salud en el trabajo, y medio ambiente aplicables a mi labor.


- Apoyar al Coordinador técnico de Interventoría en la elaboración de informe semanal de interventoría.

- Se apoyo en la gestión documental y la logística necesaria en la oficina ubicado en la Calle 25 N.º 3-30, Urbanización Sotará, en el municipio de Popayán, Cauca.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:




Fotografia 1. 21 de Octubre de 2025

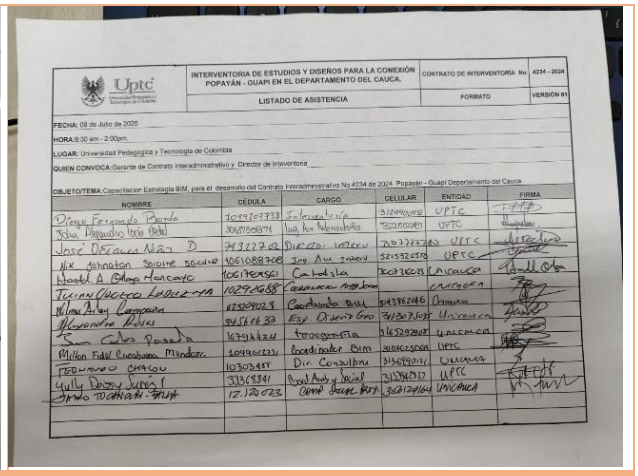

Fotografia 2. 21 de Octubre de 2025

Reunión presencial instalaciones Universidad del Cauca el día 21 de octubre de 2025, se participó de la reunión presencial en las instalaciones de la universidad del Cauca, junto con la consultoría de la universidad del Cauca e interventoría de la UPTC.

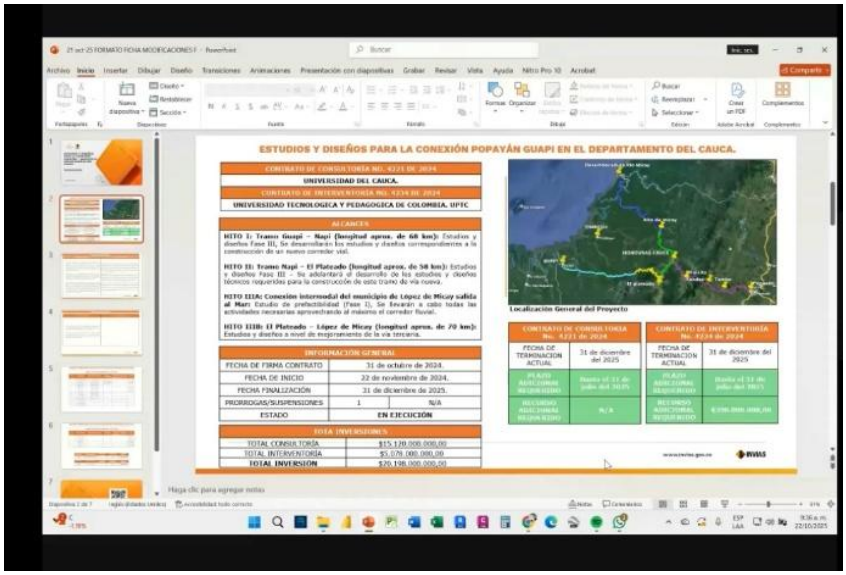

Fotografia 3. 22 de Octubre de 2025

El día 22 de octubre de 2025, se asistió al comité virtual donde participaron la consultoría de la Universidad del Cauca, Interventoría de la UPTC, Gestora del Proyecto.




Fotografia 4. 21 de Octubre de 2025




Fotografia 5. 21 de Octubre de 2025

Se apoyo en la gestión documental y la logística necesaria en la oficina ubicado en la Calle 25 N.º 3-30, Urbanización Sotará, en el municipio de Popayán, Cauca.



Fotografia 6. 21 de Octubre de 2025

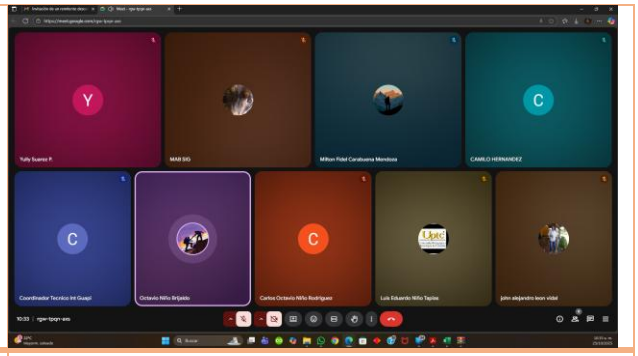

Fotografia 7. 21 de Octubre de 2025

El día 23 de octubre de 2025 se llevó a cabo una reunión virtual, capacitación BIM

PRESENTADO POR:

JOHN ALEJANDRO LEON VIDAL.
JUNCO
CC. 1.061.755.871 de Popayán – Cauca.
E-mail: leon92-sk8@hotmail.com
Celular: 3225022487

Vo. Bo:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ
Supervisor del contrato

Vo. Bo:



JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría.

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JOHN ALEJANDRO LEON VIDAL CC 1061755871 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JOHN ALEJANDRO LEON VIDAL, identificado con CC 1061755871 en la planilla número 8638565876 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-10	Número planilla	8638565876	Entidad bancaria	BANCO DE OCCIDENTE
Período Salud	2025-10	Referencia de pago	8676934606		
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-10-22		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
03	0			0	CAUCA	POPAYAN	AFP	25-14	COLPENSIONES	16	$ 759.200	0,1600000	$ 121.500
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	16	$ 759.200	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	16	$ 759.200	0,000	$ 0
							EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$ 759.200	0,1250000	$ 94.900
							ARL	SINARL	SINARL	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
X	15/10/2025																											0		

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JOHN ALEJANDRO LEON VIDAL CC 1061755871 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JOHN ALEJANDRO LEON VIDAL, identificado con CC 1061755871 en la planilla número 8638614253 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-10	Número planilla	8638614253	Entidad bancaria	BANCO DE OCCIDENTE
Período Salud	2025-10	Referencia de pago	8638614253		
Tipo de planilla	N	Fecha de pago	2025-10-27		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
3	0			CAUCA	POPAYAN	AFP	25-14	COLPENSIONES	16	$ 759.200	0,1600000	$ 121.500
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	16	$ 759.200	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	16	$ 759.200	0,000	$ 0
						EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$ 759.200	0,1250000	$ 94.900
						ARL	SINARL	SINARL	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
X	15/10/2025									A																		0		

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que JOHN ALEJANDRO LEON VIDAL CC 1061755871 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JOHN ALEJANDRO LEON VIDAL, identificado con CC 1061755871 en la planilla número 8638614253 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-10	Número planilla	8638614253	Entidad bancaria	BANCO DE OCCIDENTE
Período Salud	2025-10	Referencia de pago	8638614253		
Tipo de planilla	N	Fecha de pago	2025-10-27		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
3	0			CAUCA	POPAYAN	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	0,1600000	$ 227.800
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.423.500	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.423.500	0,000	$ 0
						EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$ 1.423.500	0,1250000	$ 178.000
						ARL	SINARL	SINARL	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
X	15/10/2025									C																		0		

FACTURAS

BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO TRANSACCION: 9699468
FECHA: 27/10/2025 HORA: 08:37:23
VENDEDOR: YEIMI KATERINE RAMOS SANDOVAL
POPAYAN
NIT: 800100375-8

CODIGO SEGURIDAD
&371246535330┐*#¡%

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8638614253
NURA: 00001139
VALOR DEL PAGO: $189,400
FECHA APLICACION: 27/10/2025
FECHA DEL PAGO: 27/10/2025 HORA: 08:37:2
2
NRO AUTORIZACION: 549681
PUNTO DE RECAUDO: 11111573
NOMBRE SORTEO: CUNDINAMARCA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2106
FECHA SORTEO: 27/10/2025

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO

DE OCCIDENTE. LA IMPRESIÓN DE ESTE

TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACIÓN.

VERIFIQUE LA INFORMACIÓN. ESTE ES EL

ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.

REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCIÓN 3

PAGO DE FACTURAS

BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO TRANSACCION: 9661699
FECHA: 22/10/2025 HORA: 14:41:26
VENDEDOR: FRANKLIN TOVAR FLOREZ
POPAYAN
NIT: 800100375-8

CODIGO SEGURIDAD
{3736?6336%%

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8676934606
NURA: 00001139
VALOR DEL PAGO: $216,400
FECHA APLICACION: 22/10/2025
FECHA DEL PAGO: 22/10/2025 HORA: 14:41:2
5
NRO AUTORIZACION: 856882
PUNTO DE RECAUDO: 11111573
NOMBRE SORTEO: VALLE
NUMERO DE 4 CIFRAS: 6926
FECHA SORTEO: 22/10/2025

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO

DE OCCIDENTE. LA IMPRESI├ôN DE ESTE

TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACI├ôN.

VERIFIQUE LA INFORMACI├ôN. ESTE ES EL

├ÜNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
NIT. 891800330-1

DEBE A:

JOHN ALEJANDRO LEON VIDAL
C.C. 1.061.755.871


La suma de: Dos millones novecientos setenta y cinco mil pesos m/cte ($2.975.000,00)., correspondiente al pago entre el 15 al 31 de octubre de 2025,, por cumplir a satisfacción con los servicios del contrato No. 3529: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA 4 PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y SUS ADICIONALES AL HITO IIIA Y IIIB DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 4234 de 2024), según el siguiente detalle:

- Valor de los honorarios fijados en el contrato 4234 del 2024 para el Ingeniero Auxiliar (2), según los días laborados: $1.983.100
- Factor prestacional: 0,5
- Valar total honorarios: $2.975.000,00. ($1.983.100 X 1,5)

Dando cumplimiento a lo establecido en los articulo 9 y 11 del decreto 2231 de 2023, para efectos de retención en la fuente, en el presente pago o abono en cuenta efectuado a mi nombre por concepto de rentas de trabajo no provenientes de una relación laboral, legal y reglamentaria, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a este pago.

Se expide el 3 de noviembre de 2025.

Cordialmente,



JOHN ALEJANDRO LEON VIDAL
C.C. 1.061.755.871

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, LEON VIDAL JOHN ALEJANDRO identificado con **CC** No. **1061755871**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
N 891800330 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	**Fecha de inicio de cobertura: 15/10/2025** **Estado Afiliación: ACTIVO** **Fecha de inicio de Contrato: 15/10/2025** **Fecha fin de Contrato: 31/12/2025** **Tipo Vinculación: INDEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 5**

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad para continuar con la cobertura.

Esta certificación se expide en la ciudad de Tunja a los 3 días del noviembre de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_F601 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

JOSE NEIVER RODRIGUEZ ARBOLEDA

RESIDENTE DE CAMPO Y/O ESTUDIOS HITO IIIA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3052 DE 2025.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	3052 del 1 DE SEPTIEMBRE 2025.
CONTRATISTA	JOSE NEIVER RODRIGUEZ ARBOLEDA
CC.	4.701.001 DE LOPEZ DE MICAY CAUCA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE CAMPO Y/O ESTUDIOS HITO IIIA DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DEL CONTRATO INREADMINISTRATIVO No. 4234 de 2024
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($17.550,000.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN**	Del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2025.
PRORROGA	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	Tunja
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TELLEZ, VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y EXTENSION
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Supervisor del Contrato
DEPENDENCIA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 4234 DE 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	RESIDENTE DE CAMPO Y/O ESTUDIOS HITO IIIA DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DPTO DEL CAUCA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.4234 de 2024.
PERIODO DEL INFORME	DEL 1 de Octubre al 31 de Octubre 2025
NUMERO DEL PAGO	2 de 2
VALOR DEL PAGO	($ 8.775.000). OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

INTRODUCCIÓN

La Universidad del Cauca, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE CAMPO Y/O ESTUDIOS HITO IIIA DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DEL CONTRATO INREADMINISTRATIVO No. 4234 de 2025.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como residente de campo y/o estudios en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de Octubre 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

A continuación, se describen las actividades desarrolladas entre el 1 al 31 de Octubre de 2025.

1. Se realiza el acompañamiento a los procesos de socializaciones y recolección de información primaria que desarrolla el consultor en las actividades e ingreso a territorio, para el componente técnico y social, en el tramo " HITO IIIA; ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y DISEÑOS (FASE I) PARA LA CONEXIÓN INTERMODAL DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY" y "HITO IIIB: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA – TRAMO EL PLATEADO- LOPEZ DE MICAY, LONGITUD APROXIMADA 70KM".

2. Se realiza informe de actividades desarrolladas en los recorridos, teniendo en cuenta las actividades en campo, para el tramo López de Micay – Salto Alto.

3. Se realizó el acompañamiento en los diferentes reuniones o acercamientos para adelantar las visita a campo adelantada, durante la ejecución del proyecto.

4. Se realizó la verificación y seguimiento al cumplimiento del programa, de acuerdo a las actividades ejecutadas en campo, como reuniones con las comunidades, reconocimiento del territorio, con el fin de dar a conocer la diferentes información primaria del Municipio de López de Micay, con sus respectivas Veredas y corregimientos etc.

5. Según las actividades desarrolladas en el periodo, se realiza recorrido con el fin de identificar la diferente información primaria evidenciadas en el territorio, de acuerdo al alcance del contrato para los HITO IIIA; Estudio De Prefactibilidad Y Diseños (Fase I) Para La Conexión Intermodal Del Municipio de López De Micay" y "HITO IIIB: Estudios Y Diseños a Nivel de Mejoramiento Vía Terciaria – Tramo El Plateado- López De Micay:

6. Se realizó el acompañamiento de las actividades técnicas desarrolladas en campo, teniendo en cuenta los recorridos programados por la consultoría en el Estudio de prefactibilidad (fase I) para la conexión intermodal del municipio de López de Micay y Estudios Y Diseños a Nivel de Mejoramiento Vía Terciaria – Tramo El Plateado- López De Micay.

7. Se realiza el recorrido en el tramo de la conexión intermodal del rio san juan de micay, donde es posible evidenciar la siguiente información para el proyecto:

Del 08 al 11 de Octubre de 2025.

Desde el componente Técnico y Social:

Se realizó en recorrido en el navegable donde identifican el desvió del rio en ciertas partes, debido a la alta pluviosidad que ocasiona meandros y socavaciones en algunos sectores del rio Micay, poniendo en riesgo la navegabilidad de las lanchas y sus tiempos de recorrido y el deterioro de los motores.

- Vereda Isla de Gallo.
- Vereda Rotura.
- Vereda Santa Ana.
- Vereda la Vuelta.
- Vereda El Bujio.

En algunos sectores se evidencian daños ambientales ocasionados por la minería en las playas, alterando el cauce existente pues se realizan excavaciones permanentes, grandes profundidades, además le agregan el químico (Azogue alude Mercurio), que impacta la fauna acuática de los diferentes sectores, así

como salud de las comunidades rio abajo, esto se presenta en el territorio en los siguientes sectores, del Municipio de López de Micay:

- Corregimiento San Antonio de Chuare.
- Corregimiento de Zaragoza.
- Corregimiento de Santa Cruz de Cigui.

Se presentan deslizamiento, continuos debido a la minería y las altas lluvias que se presentan en este periodo.

Se evidencia la necesidad de construcción de muelle en la cabecera municipal de López de Micay, para el control de lanchas, para la entrada y salida, hacia buenaventura.

Para el corregimiento se evidencia la necesidad de ubicar, saltaderos que permitan el acceso a cada comunidad, permitiendo la rapidez y facilidad en la llegada de alimentos, materiales de construcción, combustibles, insumos médicos.

Se evidencia un déficit en el servicio de energía, debido a que la interconexión quedo por debajo de los árboles, los cuales cuando se presentan los aguaceros, las ramas caen a las líneas de conexión, obstruyendo el fluido eléctrico, para la cabecera municipal, veredas y corregimientos.

Las comunidades del área de influencia, para el trasporte a la cabecera municipal, en búsqueda de agilizar los tiempos de trasporte, realizan caminos con retroexcavadoras privadas, en la ribera del rio ocasionando inestabilidad del suelo, la cual cuando el rio crece arrastra la zona de franja de rio.

En algunos sitios ya se cuenta con estos carreteables específicamente en los siguientes corregimientos, cerca de la ribera del rio en algunos casos:

- Corregimiento San Antonio a López de Micay (2.5 Km aprox rio) – Carreteable (400 metros Aprox).

- Corregimiento de San Isidro a López de Micay (7,0km aprox rio) – Carreteable (250 metros Aprox)

- Corregimiento de Valentín a López de Micay (3,5 km aprox en rio) - Carreteable (1 km aprox).

- Vereda Isla de Gallo a López de Micay (10,00 km aprox en rio) - Carreteable (500metros aprox).

- Vereda Taparal a López de Micay (12,00 km aprox en rio) - Carreteable (600 metros Aprox).

- Vereda Zaragoza a López de Micay (20,00 km aprox en rio) - Vías internas vereda (2 km Aprox) Carreteable (400 metros Aprox).

8. Se realiza el recorrido en el tramo del Estudios y Diseños para el mejoramiento Tramo Lopez de Micay – Salto Alto, donde es posible evidenciar la siguiente información para el proyecto:

Del 14 al 18 de octubre de 2025 – Cabecera Municipal Lopez de Micay – Salto Bajo.

Desde el componente Social y Técnico:

En el territorio, se realiza la identificación de los concejos comunitarios y asociaciones ubicadas en el Area de Influencia del Proyecto, para lo cual es posible informar lo siguiente:

- **Consejo de SanJo:** López de Micay – Salto bajo – Representante Legal Ebulo Riascos- (Distancia 4 Km).
- **Consejo comunitaria Sector Salto bajo – Sector Salto alto:** Representante Legal Ebulo Riascos – (Distancia 2 km).
- **Asociación Nayita (Tramo Salto Alto – Nayita):** Represente de la Asociación Juan Pablo Riascos– (Distancia 6 km).

Se realiza recorrido en el territorio evidenciando la siguiente información:

Cabecera Municipal López de Micay – Sector Salto bajo:

- Se evidencia la necesidad de puente, pues el recorrido en lancha es de aprox de 40min, aprox 4,00 km, la zona es muy fraguasa debido a la profundidad del cauce, presencia de zona montañosa y peligro por la existencia de raíces en el rio, lo que ocasiona hundimiento y fracaso de lanchas.

- Ubicada el corregimiento Correntón a margen derecha (450 habitantes), existe un afluente llamado comúnmente Quebrada Colí, que desemboca e interconecta al rio Micay.

- Ubicada la vereda San Antonio a margen Izquierda (600 habitantes), paralelo al rio Micay.

Del 19 al 22 de octubre de 2025.

Sector Salto bajo – Sector Salto alto.

- Se evidencia parte carreteable aproximadamente de 30 min – Ancho 5 metros promedio (500m) y luego navegable (Lancha) para ir a salta Alto aprox 25 minutos, distancia (600m) - Zona de alta peligrosidad por la velocidad del cauce, ocasionando remolinos y olas, etc; se requiere el análisis exhaustivo para construcción de puente.

Del 19 al 22 de octubre de 2025.

Sector Salto Alto – Nayita.

- En este momento se trasportan en lancha metálica, que resista el golpe de olas y material rocoso, aproximadamente (2 km), sin embargo, el análisis para determinar la construcción de puentes o carreteable.
- No hay minería.
- Existencia de diferentes Quebradas

8. Se verifica el cronograma de actividades propuesto por la consultoría, sin embargo debido a la logística , se han retrasado el ingreso a campo, sin embargo se adelantan los acercamientos con las comunidades de los territorios de Área de influencia directa del proyecto.

Se identifican las comunidades: Consejo comunitario de San Jo y la Asociación Nayita.

Se verifica el cumplimiento por parte del contratista de estudios el programa de actividades (cronograma) y planes de contingencia, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en él, y en los plazos previstos para el desarrollo de recolección de información obtenida en terreno.

Para este periodo del informe, se atendió y asistió a las reuniones programadas por la interventoría UPTC y consultoría ejercida por la universidad del cauca, las cuales se relacionan a continuación.

No	FECHA	OBSERVACIONES
1	Del 08 al 11 de Octubre de 2025	Identificación de información Importante del Navegable – Cabecera Municipal López de Micay – Rio López de Micay -
2	Del 14 al 18 de octubre de 2025 –	Cabecera Municipal López de Micay – Salto Bajo
3	Del 19 al 22 de octubre de 2025.	Sector Salto bajo (Ubicada el corregimiento correntón Derecha – Vereda San Antonio Izquierda) – Sector Salto Alto.
4	Del 19 al 22 de octubre de 2025.	Sector Salto Alto– Nayita

PROYECCION INFORME ENVIADO Y DIRIGIDO A:	ASUNTO
correo electrónico (dirintcauca2024@gmail.com) del director de Interventoría	Radicación de documentos para solicitud del pago del mes del 01 al 31 Octubre 2025 No.2 contrato interadministrativo No. 4234 del 2024.

ENTREGABLES:

1. Informes periódicos del estado actual de desarrollo de las actividades realizadas en campo por parte de la consultoría Universitaria del Cauca.

- Se realiza informe ejecutivo de las actividades desarrolladas en los recorridos en el rio del 08 al 11 de Octubre de 2025 y al tramo de estudios y diseños para el mejoramiento desde la cabecera Municipal – Salto Bajo – Salto Alto – Nayita desde el 14 al 22 Octubre de 2025 teniendo en cuenta los recorridos en campo desarrollados por parte de la consultoría Universidad del Cauca.

- Se realiza ubicación e identificación de de diferentes zonas críticas, a causadas por la minería, zonas rocosas en los ríos del área de influencia del proyecto.

2. Cuadro de seguimiento de avances acorde a las actividades ejecutadas en campo por parte del consultor vs su programación.

No	FECHA	OBSERVACIONES.
1	08 al 11 de Octubre de 2025	Visita de reconocimiento del territorio Navegable Rio Micay
2	14 al 22 Octubre de 2025	Visitas de reconocimiento del territorio Tramo López de Micay Sector Salto bajo (Ubicada el corregimiento correntón Derecha – Vereda San Antonio Izquierda) – Sector Salto Alto.

3. Relación de actas de reunión de seguimiento y socialización en el territorio realizadas en los diferentes comités a desarrollarse durante la ejecución del contrato de consultoría e interventoría.

   Asistencia reunión con el componente BIM realizado en la UPTC el día 23 de octubre de 2025 en plataforma Meet.

   Asistencia reunión de avance del proyecto realizado por plataforma Meet, el dia 28 de octubre de 2025.

4. Registro fotográfico de las reuniones y/o comités y/o visitas a campo a las que se asistió en el mes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Imagen 1. Vereda san Antonio - Sector salto bajo – Rio Micay



Imagen 2 Sector salto bajo a salto alto –Rio Micay



Imagen 3. **L**ugar donde se pretende construir el muelle del mpio de lopez cabecera



I**magen 4.** Barrio San diego zona donde llegan los botes de Buenaventura a López de Micay cabecera

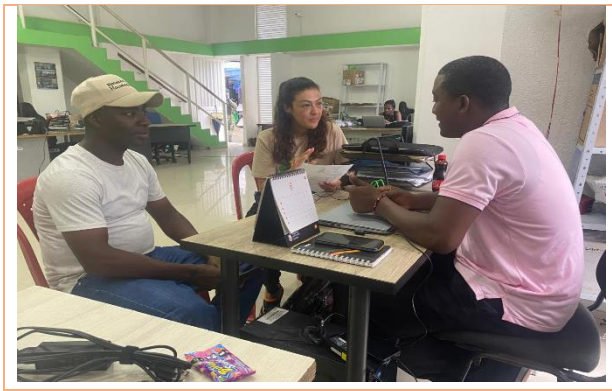


Imagen 5. Acercamiento con el Secretario de Educación y Consultoría Universidad del Cauca**.**



Imagen 5. Acercamiento con la comunidad del Cabecera del Municipio de Lopez de Micay**.**



Imagen 6. Consejo comunitario San Jo.

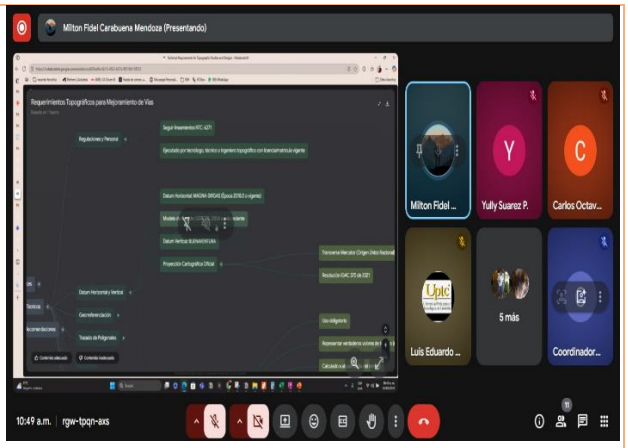


Imagen 7. Asistencia a comité Entorno común de datos y Bim (23 Octubre de 2025)

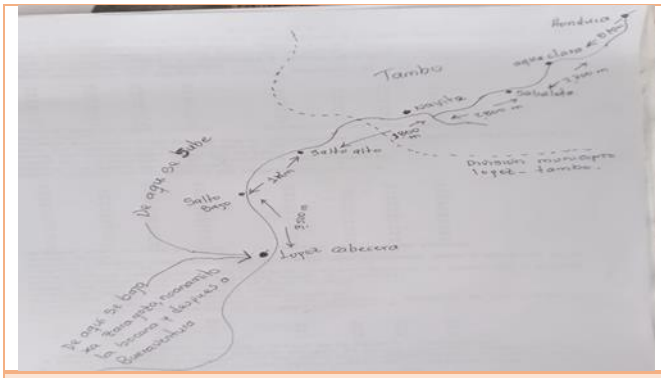


Imagen 6. Localizacion generales de la ubicación del territorio.



Imagen 7. Vista aérea Municipio de López de Micay.

PRESENTADO POR:

JOSE NEIVER RODRIGUEZ ARBOLEDA
CC. 4.701.001 de Lopez Micay- Cauca
E-mail: neiver-rodriguez@hotmail.com
Celular: 3147735344 - 3026639980
Contratista

Vo. Bo:

OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

Vo. Bo:

JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-23, 02:49:53 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075834681

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 23/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE NEIVER RODRIGUEZ ARBOLEDA		
Documento	CC4701001	**Dirección**	CL 4 #7 - 32
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8318520
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	POPAYAN	**Departamento**	CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 4701001	JOSE NEIVER RODRIGUEZ ARBOLEDA	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 3.510.000	$ 561.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 3.510.000	$ 438.800	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.510.000	$ 3.510.000	$ 0	$ 0	$ 561.600	$ 438.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.400	$ 0	$ 1.000.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-23, 02:43:37 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	JOSE NEIVER RODRIGUEZ ARBOLEDA
CEDULA CIUDADANIA	CC 4701001
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1075834681
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1873920638
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.000.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 561.600	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	$ 438.800	$ 0

SubTotales:	$ 1.000.400	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.000.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JOSE NEIVER RODRIGUEZ ARBOLEDA** identificado con **CC** No. **4701001**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - NI. 891800330	**Fecha de inicio de cobertura:** 1/09/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 1/09/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/12/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202501016213668.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 3 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
NIT. 891800330-1

DEBE A:

JOSE NEIVER RODRIGUEZ ARBOLEDA
C.C. 4.701.001

La suma de: Ocho millones setecientos setenta y cinco mil pesos m/cte. ($8.775.000,00), correspondiente al pago del mes de octubre de 2025, por cumplir a satisfacción con los servicios del contrato No. 3052: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE CAMPO Y/O ESTUDIOS HITO IIIA DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DEL CONTRATO INREADMINISTRATIVO No. 4234 de 2024), según el siguiente detalle:

- Valor de los honorarios fijados en el contrato 4234 del 2024 para el Ingeniero Residente de Campo y/o Estudios Hito IIIA, según los días laborados: $5.850.000
- Factor prestacional: 0,5
- Valar total honorarios: $8.775.000,00 ($5.850.000 X 1,5)

Dando cumplimiento a lo establecido en los articulo 9 y 11 del decreto 2231 de 2023, para efectos de retención en la fuente, en el presente pago o abono en cuenta efectuado a mi nombre por concepto de rentas de trabajo no provenientes de una relación laboral, legal y reglamentaria, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a este pago.

Se expide el 3 de noviembre de 2025.

Cordialmente,



JOSE NEIVER RODRIGUEZ ARBOLEDA
C.C. 4.701.001

LUIS EDUARDO NIÑO TAPIAS

RESIDENTE DE CAMPO Y/O ESTUDIOS HITO IIIB

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3528 DE 2025

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO	3528 de 14 de octubre de 2025
CONTRATISTA	LUIS EDUARDO NIÑO TAPIAS
CC.	9519380 de Sogamoso.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y/O ESTUDIOS HITO IIIB DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.4234 DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($22.522.500,00
PLAZO DE EJECUCIÓN**	Setenta y ocho (78) días; del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025.
PRORROGA	N/A
LUGAR DE EJECUCIÓN	TUNJA.
ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MAURICIO MORENO TELLEZ, VICERRECTOR DE INVESTIGACION Y EXTENSION
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO Supervisor del Contrato
DEPENDENCIA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 4234 DE 2024, UPTC - INVIAS.
ACTIVIDAD	INGENIERO RESIDENTE DE CAMPO Y/O ESTUDIOS HITO IIIB,
PERIODO DEL INFORME	DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
NUMERO DEL PAGO	1 de 3
VALOR DEL PAGO	($ 4.972.500). CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

INTRODUCCIÓN

La Universidad del Cauca, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4221 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Para la realización de la interventoría del contrato anteriormente mencionado, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, suscribió el contrato Interadministrativo No. 4234 de 2024 con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

HITO IIIB. Estudios y diseños a nivel de mejoramiento Vía Terciaria. Tramo Plateado – López de Micay; longitud aproximada 70 Km.

En el presente informe se describen las actividades realizadas como ingeniero residente de campo y/o estudios en el periodo comprendido entre el 15 al 31 de octubre de 2025.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **INDUCCION**: Durante los días 15 y 16 de octubre, se realizó inducción del proyecto INVIAS, Estudios y Diseños para la conexión Popayán – Guapi en el departamento del Cauca, por consultoría que realiza la

Universidad del Cauca, y la Interventoría la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por parte del Equipo de Interventoría en la oficina del convenio UPTC, me presentaron la relación de personal que hace parte de la interventoría, el alcance del proyecto en particular el HITO IIIB, solicite copia de los contratos de la consultoría y de la Interventoría, para conocer el alcance de los contratos y las obligaciones establecidas en cada uno de los contratos, además del personal de apoyo en campo.

2. Reunión Equipo Interventoría 17 octubre de 2025; El Gerente y director de Interventoría, manifiestan preocupación por un posible incumplimiento por parte de la Consultoría – INICAUCA, reflejado falta de entrega a la interventoría del cronograma de actividades o realizando actividades sin informar a la interventoría, se recomienda a los profesionales mantener actualizada la información y para informar del incumplimiento y determine un plan de contingencia.

3. **Reunión Equipo de Interventoría con director 20 de octubre**; Se informa por pate del director el rechazo por parte de INVIAS de la Hoja de vida del Arquitecto Especialista en Urbanismo, recomienda atender correos de lunes a viernes en jornada laboral; la consultoría está haciendo topografía sin informar a la interventoría, para preparar la logística para atender esas actividades; se debe hacer seguimiento ala cronograma de actividades. La consultoría tiene previsto hacer un inventario de obras existentes de López de Micay a Honduras a partir del 20 de octubre y no hay información de UNICAUCA. La consultoría esta presentando informes sin cumplir el Formato. Estudiar la posibilidad de prórroga para 2026.

4. **Supervisión de las actividades en Campo Plateado – López de Micay del 21 al 26 de octubre**: Se inicia con el reconocimiento del Mojón de Georreferenciación GPS No. 47 Plateado Nayita, y se realiza un video de reconocimiento con Cámara Insta 360X5; personal de la Consultoría dos (2) residentes de Campo, Un (1) conductor, Un (1) integrante de la Guardia Campesina, acompañados por el Ingeniero auxiliar de la Interventoría.

En desarrollo del recorrido se fue verificando obras existentes y su estado: alcantarillas, boxcoulvert, puentes, fuentes de materiales y obras necesarias; alcantarillas, muros, puentes taludes, fallas y puntos críticos, entre el 22 y 26 de octubre se recorrieron del PR0+000 El Plateado – Hasta el K20+390 San Juan de Micay se evidencia las actividades con el registro fotográfico anexo.

El 23 de octubre de 2025, Algo que Llamo la atención según informe del residente auxiliar de la interventoría, fue la citación del personal de la consultoría y la interventoría por parte de la Organización para explicar el fin del video de reconocimiento que se está levantando entre el Plateado y López de Nayita, se les dio a conocer que las actividades que se adelantan son para conocer el estado actual del carreteable con propósitos meramente técnicos.





Imagen 1.21/10/2025. Verificación Mojón de georreferenciación San Juan del Plateado.	Imagen 2. 21/10/25Corresponde GPS No. 47
	
Imagen 3.21/10/25 Grupo de topografía de Consultoría	Imagen 4. 21/10/25 Cámara 360X5 instalada en camioneta
	
Imagen 5.22/10/25 Localización de obras alcantarilla	Imagen 6. 22/10/25 Identificación de punto critico
	
Imagen 7. 23/10/25Localización de obras existentes alcantarilla	Imagen 8. 23/10/25 Localización de obras existentes puente metálico
	
Imagen 9. 23/10/25 Verificación obra existente Boxcoulvert	Imagen 10. 23/10/25Verificación obra existente alcantarilla

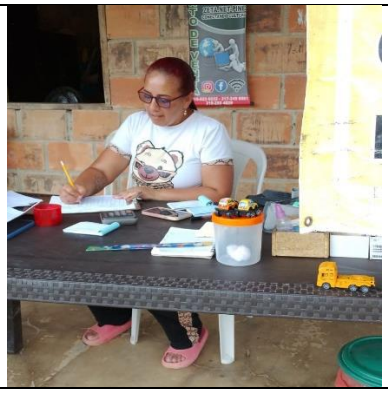
	
Imagen 11. 24/12/25	Imagen 12. 24/10/25Capacitación conteos de trafico
	
Imagen 13. 25/10/25. Se inicia aforo vehicular corredor Plateado Honduras punto de conteo peaje San Juan de Micay 25-10-25	Imagen 14. 25/10/25. Identificación de punto critico
	
Imagen 15. 25/10/25Identificación posible fuente de material	Imagen 16. 25/10/25 identificar pinto critico
	
Imagen 17. 26/10/25 Identificar punto critico	Imagen 18. 26/10/25 Identificar obra existente

	
Imagen 19. 28/10/25 determinan ancho de vía	Imagen 20. 30/10/25 Aforo de Vehículos

5. Comité UPTC – INVIAS. 22 octubre: Se asiste virtualmente al comité presencial de la Interventoría con la gestora del INVIAS y director territorial del Cauca. La interventoría da a conocer el oficio de la Consultoría, solicitando la prorroga y su justificación, al igual que el concepto de la interventoría y la necesidad de adición de recursos; La gestora manifiesta falta de recursos y la justificación de la consultoría parte de supuestos. La interventoría propone una redistribución de recursos para garantizar la interventoría después del 30 de abril, teniendo en cuenta la ley de garantías. El calculo de los recursos es de $ 390 millones.

6. Capacitación BIM con profesionales de la Interventoría: el 23 de octubre, el especialista BIM, convocó a los profesionales de la interventoría para dar a conocer la metodología aprobada para el componente de Topografía aplicada al proyecto, partiendo de las calidades del topógrafo, localización de Mojones de Georreferenciación cada 3 Km, sistema de coordenadas GTM2, traslado de los deltas, nivelación y contra nivelación, errores de cierre 1 cm longitudinal y 2 cm en vertical, equipos y método para el levantamiento, información transversal al detalle al eje cada 10 m. y finaliza haciendo el comparativo, entre el levantamiento con el acompañamiento y en ausencia de la de la interventoría.

7. Reuniones Asistencia y participación de las diferentes reuniones virtuales para el seguimiento y control a los contratos 4221 /2024 y 4234 / 2024.

FECHA	ENTIDADES PARTICIPANTES	TEMATICA
17/10/25	INTERVENTORIA	Incumplimiento de la consultoría cronograma de actividades
20/10/25	INTERVENTORIA	Atender correspondencia en jornada laboral-Consultoría debe informar a la interventoría sobre actividades en campo – adelantar bitácora
22/10/25	INTERVENTORIA – INVIAS	Solicitud de prorroga de la Consultoría UNICAUCA – Interventoría UPTC solicita adición de recursos
23/10/25	INTERVENTORIA	Capacitación virtual Especialista BIM-Componente Topografía
23/10/25	INTERVENTORIA	Seguimiento al Contrato de consultoría

8. inventario de Obras: Durante la semana del 27 al 31 de octubre se continua con los recorridos de campo, identificando las obras existentes y puntos críticos, del PR 26+560 al PR60+000, adicionalmente se están determinado el ancho de trocha, **;** las actividades las desarrollan personal de la Consultoría dos

(2) residentes de Campo, Un (1) conductor, Un (1) integrante de la Guardia Campesina, acompañados por el Ingeniero auxiliar de la Interventoría, equipos Cámara Insta 360X5.

9**. Aforo de vehículos:** la toma de información se realiza durante sábado 25 de octubre, martes 28 de octubre y jueves 30 de octubre, de acuerdo a la metodología que presento la consultoría, los aforos son tomados por señoras de la comunidad, capacitadas por la consultoría para realizar la tarea.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Imagen 21. 20-10-25. Reunión con director de interventoría

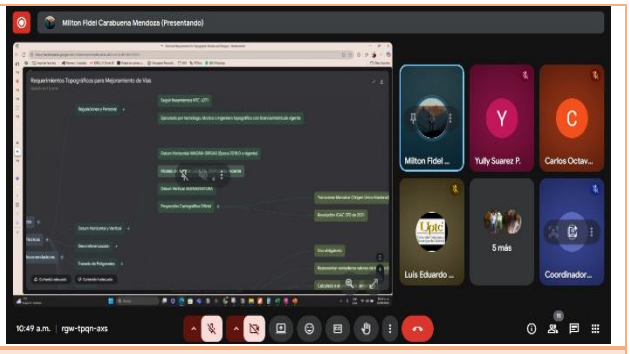


Imagen 22. 23-10-25. Capacitación BIM- Componente Topografía



Imagen 23 23/10/25. Seguimiento al contrato de consultoría



Imagen 24. 24/10/25Preparación de Informes de interventoría



Imagen 25. 24/10/25Seguimiento al inventario de campo



Imagen 26. 27/10/25. Capacitación componente BIM

PRESENTADO POR:



LUIS EDUARDO NIÑO TAPIAS
CC. 9519380 de Sogamoso
E-mail: residenteguapih3@gmail.com
Celular: 3125127661
Contratista

Vo. Bo:



JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
Director de Interventoría.

Vo. Bo:



OSCAR JAVIER GUTIERREZ JUNCO
Supervisor del contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9519380
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS EDUARDO NINO TAPIAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 9A N 14-56	TELÉFONO:	7728235
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4627456375**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994429033

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 248.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.800	$ 0	$ 0	$ 248.800
SUBTOTALES:													**$ 248.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 248.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 9519380	NINO TAPIAS LUIS EDUARDO	INDEPEND	PENS VEJ ACT					NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.990.000	$ 248.800	$ 0	$ 248.800			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 248.800

Planilla Pagada

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 6611868785 DV: 321483
Cliente 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 24/10/2025 09:50:41
PAP: 073002
Identif cacion: 9519380
Nombre: LUIS EDUARDO
Apellido 1: NIÑO
Apellido 2: ANAYA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3125127651
Codigo Planilla: 4627456375
Periodo Pago: 202510
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 9519380 Valor: $248.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
NIT. 891800330-1

DEBE A:

LUIS EDUARDO NIÑO TAPIAS
C.C. 9.519.380


La suma de: Cuatro millones novecientos setenta y dos mil quinientos pesos m/cte $4.972.500, correspondiente al pago entre el 15 al 31 de octubre de 2025, por cumplir a satisfacción con los servicios del contrato No. 3528: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESIDENTE DE CAMPO Y/O ESTUDIOS HITO IIIB DE INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXION POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DEL CONTRATO INREADMINISTRATIVO No. 4234 de 2024), según el siguiente detalle:

- Valor de los honorarios fijados en el contrato 4234 del 2024 para el Ingeniero Residente de Campo y/o Estudios Hito IIIB, según los días laborados: $3.315.000
- Factor prestacional: 0,5
- Valar total honorarios: $ 4.972.500 ($3.315.000 X 1,5)

Dando cumplimiento a lo establecido en los articulo 9 y 11 del decreto 2231 de 2023, para efectos de retención en la fuente, en el presente pago o abono en cuenta efectuado a mi nombre por concepto de rentas de trabajo no provenientes de una relación laboral, legal y reglamentaria, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a este pago.

Se expide el 3 de noviembre de 2025.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO NIÑO TAPIAS
C.C. 9.519.380

Hacienda

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, NIÑO TAPIAS LUIS EDUARDO identificado con **CC** No. **9519380**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
N 891800330 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	**Fecha de inicio de cobertura: 15/10/2025** **Estado Afiliación: ACTIVO** **Fecha de inicio de Contrato: 15/10/2025** **Fecha fin de Contrato: 31/12/2025** **Tipo Vinculación: INDEPENDIENTE** **Clase de Riesgo: 5**

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad para continuar con la cobertura.

Esta certificación se expide en la ciudad de Tunja a los 3 días de noviembre de 2025.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
APO_13_2_FR01 v_09
MIS_4_1_3_FR15 v_010

ANEXO 11

INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. uptcguapi4234@gmail.com

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4234 DE 2024 **PROYECTO** ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYÁN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
INTERVENTOR UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA **SECTOR** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4234 DE 2024 INTERVENTORIA UPTC

CONTRATO		SUB TOTAL COSTOS BASICOS	PROVISIÓN PARA AJUSTES	SUB TOTAL COSTOS BASICOS	VALOR CONTRATO	VIGENCIA 2024	VIGENCIA 2025	VIGENCIA 2026	TOTAL VIGENCIAS
CONTRATO No 4234 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	4.254.000.000,00	-	4.254.000.000,00	$ 4.254.000.000	68.209.600,00	4.185.790.400,00		4.254.000.000,00
	ADICIÓN No 1	824.000.000,00	-	824.000.000,00			$ 824.000.000,00		824.000.000,00
TOTAL		**$ 5.078.000.000**	**$ -**	**$ 5.078.000.000**	**$ 4.254.000.000**	**$ 68.209.600**	**$ 5.009.790.400**	**$ -**	**$ 5.078.000.000**

PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) AÑO 2024 / AÑO 2025

PPTO VIGENTE	TOTAL RECURSOS	COMPONENTE DEL PAGO	noviembre-2024	diciembre-2024	enero-2025	febrero-2025	marzo-2025	abril-2025	may-25	junio-2025	julio-2025
2.025	5.078.000.000,00	GRUPO 1 A GRUPO 3	-	68.209.600,00	10.271.440,00	74.344.000,00	74.344.000,00	16.131.280,00	223.886.880,00	127.564.960,00	152.540.000,00
TOTAL		VALOR TOTAL	-	68.209.600,00	10.271.440,00	74.344.000,00	74.344.000,00	16.131.280,00	223.886.880,00	127.564.960,00	152.540.000,00

PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) AÑO 2024 / AÑO 2025

PPTO VIGENTE	TOTAL RECURSOS	COMPONENTE DEL PAGO	agosto-2025	septiembre-2025	octubre-2025	noviembre-2025	diciembre-2025			VALOR ACUMULADO EJECUTADO A 2025	SALDO RECURSOS 2025
2.025	5.078.000.000,00	GRUPO 1 A GRUPO 3	514.704.000,00	191.964.000,00	784.420.904,00					2.238.381.064,00	2.839.618.936,00
TOTAL		VALOR TOTAL	514.704.000,00	191.964.000,00	784.420.904,00	-	-	-	-	2.238.381.064,00	2.839.618.936,00

ANEXO 12

MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. uptcguapi4234@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORIA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4234 DE 2024 **INTERVENTOR:** Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia (UPTC)

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DEL 2025 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO DE CONSULTORIA N 4221 DE 2024 **CONSULTOR:** Universidad Del Cauca

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor		Saldo del Acta Anterior
2024	1100024	C-2402-0600-16-51102A-2402001-02	10	Nación	Contrato principal	$ 3.126.711.391		
2024	1100024	C-2402-0600-16-51102A-2402041-02	10	Nación	Contrato principal	$ 640.000.000		
2024	1100024	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	16	Nación	Contrato principal	$ 487.288.609		
						$ 4.254.000.000		
2025	519925	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	20	Nación	Adicional No. 1	$ 824.000.000		
				TOTAL		$ 5.078.000.000		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$ 4.254.000.000**
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 5.078.000.000**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal 1100024	Saldo Registro Presupuestal 519925	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
	ANTICIPO	$ -					$ 2.127.000.000,00	1100024 / 06-11-2024	$ 2.127.000.000				**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402001-02, Recurso No. 10 ($ 2.092.895.200) C-2402-0600-16-51102A-2402041-02, Recurso No. 10 ($ 34.104.800)
1	noviembre-2024	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 2.127.000.000,00	1100024 / 06-11-2024	$ 2.127.000.000		$ 4.254.000.000		**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402001-02, Recurso No. 10 ($ 2.092.895.200) C-2402-0600-16-51102A-2402041-02, Recurso No. 10
2	diciembre-2024	$ 68.209.600,00		$ 68.209.600,00	$ 34.104.800,00	$ 34.104.800,00	$ 2.092.895.200,00	1100024 / 06-11-2024	$ 2.092.895.200		$ 4.185.790.400		**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402001-02, Recurso No. 10 (2.058.790.400) C-2402-0600-16-51102A-2402041-02, Recurso No. 10 ($ 34.104.800)
3	enero-2025	$ 10.271.440,00		$ 10.271.440,00	$ 5.135.720,00	$ 5.135.720,00	$ 2.087.759.480,00	1100024 / 06-11-2024	$ 2.087.759.480		$ 4.175.518.960		**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402001-02, Recurso No. 10 (2.053.654.680) C-2402-0600-16-51102A-2402041-02, Recurso No. 10 ($ 34.104.800)
4	febrero-2025	$ 74.344.000,00		$ 74.344.000,00	$ 37.172.000,00	$ 37.172.000,00	$ 2.050.587.480,00	1100024 / 06-11-2024	$ 2.050.587.480		$ 4.101.174.960		**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402001-02, Recurso No. 10 ($2.016.482.680) C-2402-0600-16-51102A-2402041-02, Recurso No. 10 ($ 34.104.800)
5	marzo-2025	$ 74.344.000,00		$ 74.344.000,00	$ 37.172.000,00	$ 37.172.000,00	$ 2.013.415.480,00	1100024 / 06-11-2024	$ 2.013.415.480		$ 4.026.830.960		**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402001-02, Recurso No. 10 ($1.979.310.680) C-2402-0600-16-51102A-2402041-02, Recurso No. 10 ($ 34.104.800)
6	abril-2025	$ 16.131.280,00		$ 16.131.280,00	$ 8.065.640,00	$ 8.065.640,00	$ 2.005.349.840,00	1100024 / 06-11-2024	$ 2.005.349.840		$ 4.010.699.680		**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402001-02, Recurso No. 10 ($1.971.245.040) C-2402-0600-16-51102A-2402041-02, Recurso No. 10 ($ 34.104.800)

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORIA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/10/2025 (Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal 1100024	Saldo Registro Presupuestal 519925	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
7	mayo-2025	$ 223.886.880,00		$ 223.886.880,00	$ 111.943.440,00	$ 111.943.440,00	$ 1.893.406.400,00	1100024 / 06-11-2024	$ 1.893.406.400		$ 3.786.812.800		**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402001-02, Recurso No. 10 ($ 1.859.301.600) C-2402-0600-16-51102A-2402041-02, Recurso No. 10 ($ 34.104.800)
8	junio-2025	$ 127.564.960,00		$ 127.564.960,00	$ 63.782.480,00	$ 63.782.480,00	$ 1.829.623.920,00	1100024 / 06-11-2024	$ 1.829.623.920		$ 3.659.247.840		**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402001-02, Recurso No. 10 ($ 1.795.519.120) C-2402-0600-16-51102A-2402041-02, Recurso No. 10 ($ 34.104.800)
9	julio-2025	$ 152.540.000,00		$ 152.540.000,00	$ 76.270.000,00	$ 76.270.000,00	$ 1.753.353.920,00	1100024 / 06-11-2024	$ 1.753.353.920	$ 824.000.000	$ 3.506.707.840		**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402001-02, Recurso No. 10 ($ 1.719.249.120) C-2402-0600-16-51102A-2402041-02, Recurso No. 10 ($ 34.104.800)
10	agosto-2025	$ 514.704.000,00		$ 514.704.000,00	$ 51.470.400,00	$ 463.233.600,00	$ 1.701.883.520,00	1100024 / 06-11-2024	$ 1.290.120.320	$ 824.000.000	$ 2.992.003.840		**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402001-02, Recurso No. 10 ($ 1.256.015.520) C-2402-0600-16-51102A-2402041-02, Recurso No. 10 ($ 34.104.800)
	ANTICIPO ADICIONAL No. 1						$ 412.000.000,00	519925 / 23-05-2025	$ 878.120.320	$ 824.000.000	$ 3.816.003.840		**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402001-02, Recurso No. 10 ($ 844.015.520) C-2402-0600-16-51102A-2402041-02, Recurso No. 10 ($ 34.104.800) C-2499-0600-22-51102D-2499066-02, Recurso No. 20 ($ 824.000.000)
11	septiembre-2025	$ 191.964.000,00		$ 191.964.000,00	$ 19.196.400,00	$ 172.767.600,00	$ 2.094.687.120,00	1100024 / 06-11-2024	$ 705.352.720	$ 824.000.000	$ 3.624.039.840		**SALDO DE CADA RECURSO** C-2402-0600-16-51102A-2402001-02, Recurso No. 10 ($ 671.049.920) C-2402-0600-16-51102A-2402041-02, Recurso No. 10 ($ 34.104.800) C-2499-0600-22-51102D-2499066-02, Recurso No. 20 ($ 824.000.000)
12	octubre-2025	$ 784.420.904,00		$ 784.420.904,00	$ 78.442.090,40	$ 705.978.813,60	$ 2.016.245.029,60	1100024 / 06-11-2024	$ -	$ 823.373.906,40	$ 2.839.618.936		**SALDO DE CADA RECURSO** C-2499-0600-22-51102D-2499066-02, Recurso No. 20 ($ 823.373.906,4)
TOTALES		**$ 2.238.381.064,00**	**$ -**	**$ 2.238.381.064,00**	**$ 522.754.970,40**		**$ 2.016.245.029,60**		**$ -**	**$ 823.373.906,40**	**$ 2.839.618.936,00**		

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
1. Acta No. 1. Noviembre 2024	$ -	$ -	$ -
2. Acta No. 2. Diciembre 2024	$ 68.209.600,00		$ 68.209.600,00
3. Acta No. 3. Enero 2025	$ 10.271.440,00		$ 10.271.440,00
4. Acta No. 4. Febrero 2025	$ 74.344.000,00		$ 74.344.000,00
5. Acta No. 5. Marzo 2025	$ 74.344.000,00		$ 74.344.000,00
6. Acta No. 6. Abril 2025	$ 16.131.280,00		$ 16.131.280,00
7. Acta No. 7. Mayo 2025	$ 223.886.880,00		$ 223.886.880,00
8. Acta No. 8. Junio 2025	$ 127.564.960,00		$ 127.564.960,00
9. Acta No. 9. Julio 2025	$ 152.540.000,00		$ 152.540.000,00
10. Acta No. 10. Agosto 2025	$ 514.704.000,00		$ 514.704.000,00
11. Acta No. 11. Septiembre 2025	$ 191.964.000,00		$ 191.964.000,00
12. Acta No. 12. Octubre 2025	$ 784.420.904,00		$ 784.420.904,00
VALOR TOTAL	$ 2.238.381.064,00	$ -	$ 2.238.381.064,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
NOMBRE: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA PROFESIONAL No. 01193-0243

Firma
NOMBRE: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MATRICULA PROFESIONAL No. 19202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 13

MEPI-MN1-IN-15-FR-13
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. uptcguapi4234@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORIA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 DE 2024

INTERVENTOR: Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia (UPTC)

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

FECHA DE INICIO: 22/11/2024

PLAZO INICIAL: 13,30 Meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.254.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.254.000.000,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 425.400.000,00	31	10	2024	1	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.127.000.000,00	31	10	2024	1	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 850.800.000,00	31	10	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 1.276.200.000,00	31	12	2025	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83136

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/02/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 425.400.000,00	31	10	2024	1	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.127.000.000,00	31	10	2024	1	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 850.800.000,00	31	10	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 1.276.200.000,00	31	12	2025	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83136

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 24/02/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 425.400.000,00	31	10	2024	1	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.127.000.000,00	31	10	2024	1	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 850.800.000,00	31	10	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	$ 1.276.200.000,00	31	12	2025	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83136

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 25/02/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 425.400.000,00	31	10	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.127.000.000,00	31	10	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 850.800.000,00	31	10	2024	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 1.276.200.000,00	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83136

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/02/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 425.400.000,00	31	10	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.127.000.000,00	31	10	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 850.800.000,00	31	10	2024	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 1.276.200.000,00	31	12	2025	31	12	2030

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORIA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/09/2025 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83136

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 07/05/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 425.400.000,00	31	10	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.127.000.000,00	31	10	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 850.800.000,00	31	10	2024	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 1.276.200.000,00	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83136

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/05/2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 507.800.000,00	31	10	2024	1	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 2.539.000.000,00	31	10	2024	1	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 1.056.600.000,00	31	10	2024	31	12	2028
Calidad del servicio	30%	$ 1.523.400.000,00	31	12	2025	31	12	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 83136

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/08/2025

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA CONSULTORIA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 01/09/2025

(Día / Mes / Año)

Firma

NOMBRE: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA PROFESIONAL No. 01193-0243

Firma

NOMBRE: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MATRICULA PROFESIONAL No. 19202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	FORMATO DE INFORME DE INTERVENTORIA		

ANEXO 14

MEPI-MN-IN-3-FR-1
SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. uptcguapi4234@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4234 DE 2024 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN POPAYÁN - GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Jorge Eduardo Medina Idrobo

JUSTIFICACIÓN:

Del Registro Presupuestal No. 1100024 de fecha 2024-11-06 Valor $4.254.000.000,00
para un valor total de anticipo de $ 2.127.000.000,00 equivalente al 50% como se estipula en la cláusula septima "Forma de pago" del contrato interadminsitrativo No 4234 de 2024.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago de salarios personal de interventoría	$ 1.356.600.000,00	$ 581.400.000,00			$ 1.938.000.000,00	91,11%
2	Viáticos Director, Viáticos Especialistas y oros profesionales (ncluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 28.350.000,00	$ 12.150.000,00			$ 40.500.000,00	1,90%
4	Transportes Aéreos Dinctor, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 49.000.000,00	$ 21.000.000,00			$ 70.000.000,00	3,29%
6	Alquiler de Vehiculo (#X4 de 2000 C o supenor, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o pesjes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 46.550.000,00	$ 19.950.000,00			$ 66.500.000,00	3,13%
7	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 8.400.000,00	$ 3.600.000,00			$ 12.000.000,00	0,56%
	TOTAL	**$ 1.488.900.000,00**	**$ 638.100.000,00**			**$ 2.127.000.000,00**	**100,00%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Jose Octavio Niño Brijaldo
Director de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 01193-0243 CPITVC

Firma:
Nombre: Jorge Eduardo Medina Idrobo
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-40631 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 15

MEPI-MN-IN-3-FR-2
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia Avenida Central del Norte 39-115.
E mail. uptcguapi4234@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4234 DE 2024 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 616004305 **BANCO** BANCO DE BOGOTA SUCURSAL: TUNJA

ANTICIPO OTORGADO: 50 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 2.127.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN POPAYAN GUAPI EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
EGRESO	22260	03/10/2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$ 600.000	2	VIATICOS
EGRESO	22261	03/10/2025	GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ	$ 600.000	2	VIATICOS
EGRESO	22262	03/10/2025	HERNANDEZ CASTRO CAMILO HERNANDO	$ 900.000	2	VIATICOS
EGRESO	22263	03/10/2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 900.000	2	VIATICOS
EGRESO	22264	03/10/2025	YULLY DEISSY SUAREZ PARADA	$ 900.000	2	VIATICOS
EGRESO	22265	03/10/2025	ANDRES MAURICIO VASQUEZ GOMEZ	$ 2.100.000	2	VIATICOS
EGRESO	23677	15/10/2025	CARABUENA MENDOZA MILTON FIDEL	$ 12.067.500	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	23678	15/10/2025	ANDRES MAURICIO VASQUEZ GOMEZ	$ 5.250.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	23679	15/10/2025	DIEGO FERNANDO BORDA CRUZ	$ 4.275.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	23680	15/10/2025	HERNANDEZ CASTRO CAMILO HERNANDO	$ 8.775.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	23681	15/10/2025	YULLY DEISSY SUAREZ PARADA	$ 12.067.500	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	23682	15/10/2025	NIK JOHNATAN SOLARTE SOLARTE	$ 5.250.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	23683	15/10/2025	LAURA MELISSA PATIÑO SANCHEZ	$ 12.067.500	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	23684	15/10/2025	MIGUEL ARTURO BARRETO SALINAS	$ 12.067.500	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	23685	15/10/2025	LUISA FERNANDA DOMINGUEZ BUITRON	$ 1.690.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	23914	15/10/2025	JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO	$ 15.360.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	23915	15/10/2025	JOSE NEIVER RODRIGUEZ ARBOLEDA	$ 8.775.000	1	SALARIOS/HONORARIOS
EGRESO	23911	16/10/2025	TRANSPORTES MQ SAS	$ 9.500.000	4	ALQUILER DE VEHICULO
EGRESO	23912	16/10/2025	TRANSPORTES MQ SAS	$ 19.000.000	4	ALQUILER DE VEHICULO
EGRESO	23913	16/10/2025	MONCAYO BOLIVAR SOLARTE	$ 1.500.000	5	CAMPAMENTO

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Pago de salarios personal de interventoría	$ 1.938.000.000,00	$ 490.892.000,00	$ 97.645.000,00	$ 588.537.000,00	$ 1.349.463.000,00
2	Viáticos Director, Viáticos Especialistas y oros profesionales (ncluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 40.500.000,00	$ 22.500.000,00	$ 6.000.000,00	$ 28.500.000,00	$ 12.000.000,00
3	Transportes Aéreos Dinctor, Especíalistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 70.000.000,00	$ 18.049.900,00		$ 18.049.900,00	$ 51.950.100,00
4	Alquiler de Vehiculo (#X4 de 2000 C o supenor, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o pesjes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 66.500.000,00	$ -	$ 28.500.000,00	$ 28.500.000,00	$ 38.000.000,00
5	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 12.000.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 3.000.000,00	$ 9.000.000,00
TOTALES		**$ 2.127.000.000,00**	**$ 532.941.900,00**	**$ 133.645.000,00**	$ 666.586.900,00	$ 1.460.413.100,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (12): $ 2.870.409,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 17.456.016,00
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
1495125	$ 5.166.642		5. - 6.	10/09/2025	$ 5.166.642
1495225	$ 6.393.299		7. - 8.	10/09/2025	$ 11.559.941
1725525	$ 3.025.666		9	10/10/2025	$ 14.585.607

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma
NOMBRE: JOSE OCTAVIO NIÑO BRIJALDO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTOR
MATRICULA PROFESIONAL No. 01193-0243

Firma:
NOMBRE: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MATRICULA PROFESIONAL No. 19202-40631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.
