
CONSORCIO PUTUMAYO SOLAR

"INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN DEPTO DE PUTUMAYO"

gensa Estamos on transición


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Planeado	% completado	Indicador grafico	Duración	Comienzo	Fin
1		**Contrato GENSA: Puerto Guzman 770**	**0%**	**0%**		**71 días**	**vie 24/04/26**	**vie 31/07/26**
2		**Gerencia de Proyectos**	**0%**	**0%**		**69,13 días**	**vie 24/04/26**	**jue 30/07/26**
3		**Inicio**	**0%**	**0%**		**6 días**	**vie 24/04/26**	**vie 1/05/26**
4		Adjudicación	0%	0%		1 día	vie 24/04/26	vie 24/04/26
5		Actualización de Pólizas y Firma de Contrato	0%	0%		5 días	lun 27/04/26	vie 1/05/26
6		Elaboración Acta de constitución	0%	0%		5 días	lun 27/04/26	vie 1/05/26
7		H:Firma de Acta de Inicio	0%	0%		0 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26
8		**Planificación**	**0%**	**0%**		**19 días**	**lun 4/05/26**	**jue 28/05/26**
9		**I: Plan de Gestión de Proyecto**	**0%**	**0%**		**6 días**	**lun 4/05/26**	**lun 11/05/26**
10		Ajuste Cronograma	0%	0%		1 día	lun 4/05/26	lun 4/05/26
11		Presupuesto	0%	0%		1 día	mar 5/05/26	mar 5/05/26
12		Plan General de Trabajo	0%	0%		2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26
13		E: Plan General de trabajo	0%	0%		2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26
14		**Validación metodología interventoria**	**0%**	**0%**		**13 días**	**mar 12/05/26**	**jue 28/05/26**
15		Diseño de Vallas del proyecto	0%	0%		2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26
16		H: Diseño, Validación y Aprobación Valla informativa del proyecto	0%	0%		1 día	jue 21/05/26	jue 21/05/26
17		Elaboración de valla informativa del proyecto	0%	0%		5 días	vie 22/05/26	jue 28/05/26
18		Elaboración de formatos del proyecto	0%	0%		1 día	mar 12/05/26	mar 12/05/26
19		H: Aprobación de Formatos del proyecto	0%	0%		2 días	mié 20/05/26	jue 21/05/26
20		**Ingeniería de Detalle**	**0%**	**0%**		**9 días**	**vie 8/05/26**	**mié 20/05/26**
21		Validar Fichas Técnicas	0%	0%		3 días	vie 8/05/26	mar 12/05/26
22		Validación diseño de Gabinete	0%	0%		3 días	vie 8/05/26	mar 12/05/26
23		Validación diseño del Mástil y su cimentación	0%	0%		3 días	vie 8/05/26	mar 12/05/26
24		Validación de diseño FV y Diagramas de conexiones	0%	0%		3 días	vie 8/05/26	mar 12/05/26
25		Validar Cantidades de obra	0%	0%		3 días	vie 8/05/26	mar 12/05/26
26		Solicitud de aprobación de equipos	0%	0%		1 día	mié 13/05/26	mié 13/05/26
27		E: Diseño de diagrama de conexiones	0%	0%		0 días	mié 13/05/26	mié 13/05/26
28		H: Aprobación de equipos por interventoría	0%	0%		0 días	mié 20/05/26	mié 20/05/26
29		E: solicitudes de compra de equipos	0%	0%		0 días	mié 20/05/26	mié 20/05/26
30		E: solicitudes de compra de materiales	0%	0%		0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26
31		**Monitoreo y Control**	**0%**	**0%**		**67,13 días**	**mar 28/04/26**	**jue 30/07/26**
32		**Comitè interno operativo e interventoria**	**0%**	**0%**		**67,13 días**	**mar 28/04/26**	**jue 30/07/26**
33		Comitè interno operativo e interventoria 1	0%	0%		1 hora	mar 28/04/26	mar 28/04/26
34		Comitè interno operativo e interventoria 2	0%	0%		1 hora	mar 12/05/26	mar 12/05/26
35		Comitè interno operativo e interventoria 3	0%	0%		1 hora	mar 26/05/26	mar 26/05/26
36		Comitè interno operativo e interventoria 4	0%	0%		1 hora	mar 9/06/26	mar 9/06/26
37		Comitè interno operativo e interventoria 5	0%	0%		1 hora	mar 23/06/26	mar 23/06/26
38		Comitè interno operativo e interventoria 6	0%	0%		1 hora	mar 7/07/26	mar 7/07/26
39		Comitè interno operativo e interventoria 7	0%	0%		1 hora	mar 21/07/26	mar 21/07/26

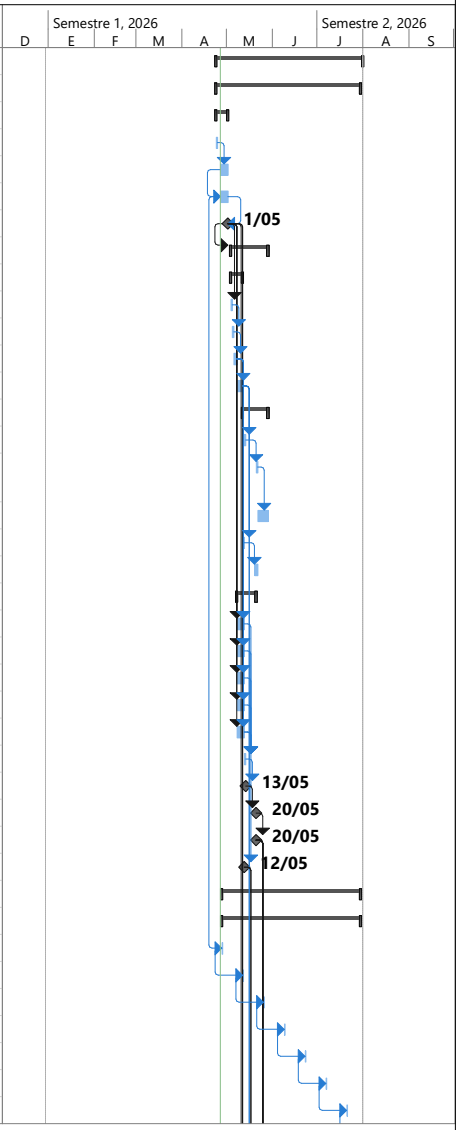

Proyecto: Putumayo.
Version: 0
Fecha: 24 Abril 2026

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Planeado	% completado	Indicador grafico	Duración	Comienzo	Fin
40		Comitè interno operativo e interventoria 8	0%	0%		1 hora	jue 30/07/26	jue 30/07/26
41		**Adquisiciones**	**0%**	**0%**		**44 días**	**lun 11/05/26**	**jue 9/07/26**
42		**Contratistas**	**0%**	**0%**		**4 días**	**mar 12/05/26**	**vie 15/05/26**
43		Mano de Obra (replanteo)	0%	0%		3 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26
44		Mano de Obra (Instalación)	0%	0%		3 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26
45		Capacitación al equipo replanteo	0%	0%		1 día	vie 15/05/26	vie 15/05/26
46		Capacitación herramientas equipo replanteo	0%	0%		1 día	vie 15/05/26	vie 15/05/26
47		**Recurso Humano**	**0%**	**0%**		**5 días**	**lun 11/05/26**	**vie 15/05/26**
48		Director	0%	0%		1 día	vie 15/05/26	vie 15/05/26
49		Residente	0%	0%		1 día	vie 15/05/26	vie 15/05/26
50		SISO	0%	0%		1 día	vie 15/05/26	vie 15/05/26
51		Trabajador social	0%	0%		1 día	lun 11/05/26	lun 11/05/26
52		**Equipos y logistica**	**0%**	**0%**		**42 días**	**mié 13/05/26**	**jue 9/07/26**
53		Bodega	0%	0%		1 día	lun 25/05/26	lun 25/05/26
54		Dotación - EPP	0%	0%		1 día	vie 15/05/26	vie 15/05/26
55		**Compra inversores**	**0%**	**0%**		**31 días**	**jue 21/05/26**	**jue 2/07/26**
56		Orden de compra inversores	0%	0%		1 día	jue 21/05/26	jue 21/05/26
57		Fabricacion, transporte y nacionalización inversores	0%	0%		30 días	vie 22/05/26	jue 2/07/26
58		H: Entrega de inversores a ensamblador gabinete	0%	0%		0 días	jue 2/07/26	jue 2/07/26
59		**Compra Controladores**	**0%**	**0%**		**31 días**	**jue 21/05/26**	**jue 2/07/26**
60		Orden de compra controladores	0%	0%		1 día	jue 21/05/26	jue 21/05/26
61		Fabricacion, transporte y nacionalización controladores	0%	0%		30 días	vie 22/05/26	jue 2/07/26
62		H: Entrega de controladores a ensamblador gabinete	0%	0%		0 días	jue 2/07/26	jue 2/07/26
63		**Compra medidores de energia**	**0%**	**0%**		**30 días**	**jue 21/05/26**	**mié 1/07/26**
64		Orden de compra medidores de energía	0%	0%		10 días	jue 21/05/26	mié 3/06/26
65		Transporte y Entrega de medidores de energía a ensamblador gabinete	0%	0%		20 días	jue 4/06/26	mié 1/07/26
66		**Compra de armado de gabinetes de gestión de energía**	**0%**	**0%**		**36 días**	**jue 21/05/26**	**jue 9/07/26**
67		Orden de compra gabinetes	0%	0%		1 día	jue 21/05/26	jue 21/05/26
68		Fabricación de gabinetes	0%	0%		20 días	vie 22/05/26	jue 18/06/26
69		Ensamble de equipos	0%	0%		3 días	vie 3/07/26	mar 7/07/26
70		Transporte de gabinetes bodega de obra	0%	0%		2 días	mié 8/07/26	jue 9/07/26
71		**Compra paneles**	**0%**	**0%**		**31 días**	**jue 21/05/26**	**jue 2/07/26**
72		Orden de compra Paneles	0%	0%		1 día	jue 21/05/26	jue 21/05/26
73		Fabricacion, transporte y nacionalización paneles	0%	0%		30 días	vie 22/05/26	jue 2/07/26
74		**Compra de Mastiles**	**0%**	**0%**		**26 días**	**jue 21/05/26**	**jue 25/06/26**
75		Orden de compra mastil	0%	0%		1 día	jue 21/05/26	jue 21/05/26
76		Fabricación	0%	0%		20 días	vie 22/05/26	jue 18/06/26
77		Transporte de mastiles a bodega de obra	0%	0%		5 días	vie 19/06/26	jue 25/06/26
78		**Compra baterias**	**0%**	**0%**		**31 días**	**jue 21/05/26**	**jue 2/07/26**

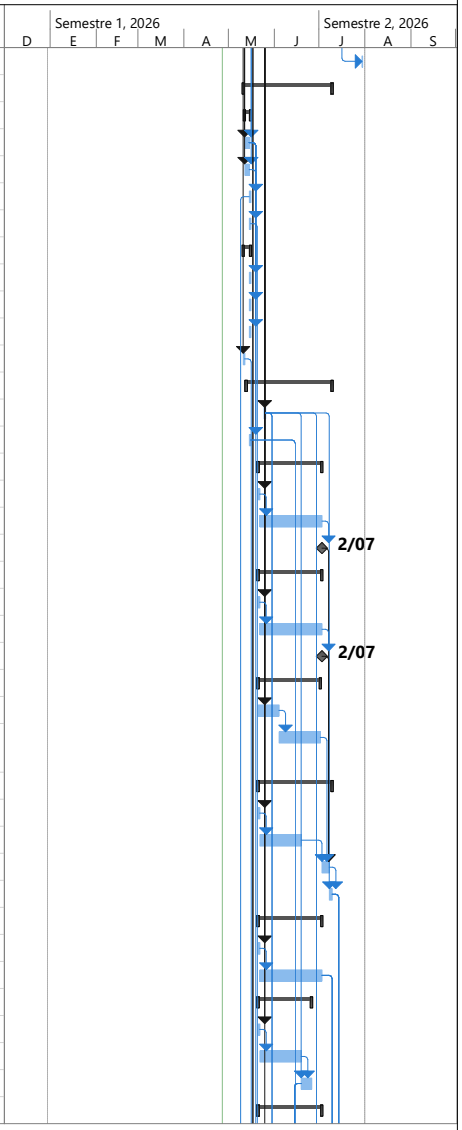

Proyecto: Putumayo.
Version: 0
Fecha: 24 Abril 2026

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Planeado	% completado	Indicador grafico	Duración	Comienzo	Fin
79		Orden de compra baterías	0%	0%		1 día	jue 21/05/26	jue 21/05/26
80		Fabricacion, transporte y nacionalizacion de baterias	0%	0%		30 días	vie 22/05/26	jue 2/07/26
81		H: Entrega de baterías a bodega	0%	0%		0 días	jue 2/07/26	jue 2/07/26
82		**Compra materiales obra civil**	**0%**	**0%**		**17 días**	**vie 15/05/26**	**lun 8/06/26**
83		Orden de compra materiales obra civil	0%	0%		1 día	vie 15/05/26	vie 15/05/26
84		Transporte de materiales obra civil a la obra	0%	0%		10 días	mar 26/05/26	lun 8/06/26
85		**Compra materiales eléctricos**	**0%**	**0%**		**11 días**	**mié 13/05/26**	**mié 27/05/26**
86		Orden de compra materiales eléctricos	0%	0%		1 día	mié 13/05/26	mié 13/05/26
87		Transporte material electrico a bodega	0%	0%		2 días	mar 26/05/26	mié 27/05/26
88		**Ejecución**	**0%**	**0%**		**53 días**	**lun 18/05/26**	**mié 29/07/26**
89		**Bodega Local**	**0%**	**0%**		**3 días**	**jue 28/05/26**	**lun 1/06/26**
90		Armado de kits internas	0%	0%		3 días	jue 28/05/26	lun 1/06/26
91		**ETAPA 1 - Replanteo**	**0%**	**0%**		**20 días**	**lun 18/05/26**	**vie 12/06/26**
92		**Replanteo**	**0%**	**0%**		**20 días**	**lun 18/05/26**	**vie 12/06/26**
93		Visita de socialización	0%	0%		2 días	lun 18/05/26	mar 19/05/26
94		Validacion de viviendas por vereda	0%	0%		15 días	mié 20/05/26	mar 9/06/26
95		Recopilación de información y elaboración de informe de replanteo	0%	0%		16 días	mié 20/05/26	mié 10/06/26
96		E: Informe de Replanteo	0%	0%		1 día	jue 11/06/26	jue 11/06/26
97		H: Aprobación de Replanteo	0%	0%		1 día	vie 12/06/26	vie 12/06/26
98		**ETAPA 2 - Internas**	**0%**	**0%**		**11 días**	**lun 15/06/26**	**lun 29/06/26**
99		Distribucion de kits internas y cimentación	0%	0%		1 día	lun 15/06/26	lun 15/06/26
100		Construcción de dados de cimentacion	0%	0%		6 días	lun 15/06/26	lun 22/06/26
101		Instalacion de kits internas	0%	0%		11 días	lun 15/06/26	lun 29/06/26
102		**ETAPA 3 - Montaje y Puesta en Marcha**	**0%**	**0%**		**14 días**	**vie 10/07/26**	**mié 29/07/26**
103		**FASE 1 - 78 Usuarios**	**0%**	**0%**		**14 días**	**vie 10/07/26**	**mié 29/07/26**
104		**Montaje de Equipos**	**0%**	**0%**		**12 días**	**vie 10/07/26**	**lun 27/07/26**
105		Distribución de gabinetes, paneles, baterias y mástil	0%	0%		5 días	vie 10/07/26	jue 16/07/26
106		Montaje de mastil, paneles y gabinete	0%	0%		12 días	vie 10/07/26	lun 27/07/26
107		**Inspección y pruebas**	**0%**	**0%**		**0 días**	**lun 27/07/26**	**lun 27/07/26**
108		Pruebas Y Puesta en servicio	0%	0%		0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26
109		E: Protocolo de pruebas	0%	0%		0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26
110		**Capacitación de usuarios**	**0%**	**0%**		**2 días**	**mar 28/07/26**	**mié 29/07/26**
111		Capacitación de usuarios y entrega de cartilla	0%	0%		2 días	mar 28/07/26	mié 29/07/26
112		E: Actas de entrega a usuarios	0%	0%		0 días	mié 29/07/26	mié 29/07/26
113		Hito pago 2 - 10% avance	0%	0%		0 días	mié 29/07/26	mié 29/07/26
114		**FASE 2 - 539 usuarios**	**0%**	**0%**		**14 días**	**vie 10/07/26**	**mié 29/07/26**
115		**Montaje de Equipos**	**0%**	**0%**		**12 días**	**vie 10/07/26**	**lun 27/07/26**
116		Distribución de gabinetes, paneles, baterias y mástil	0%	0%		5 días	vie 10/07/26	jue 16/07/26
117		Montaje de mastil, paneles y gabinete	0%	0%		12 días	vie 10/07/26	lun 27/07/26

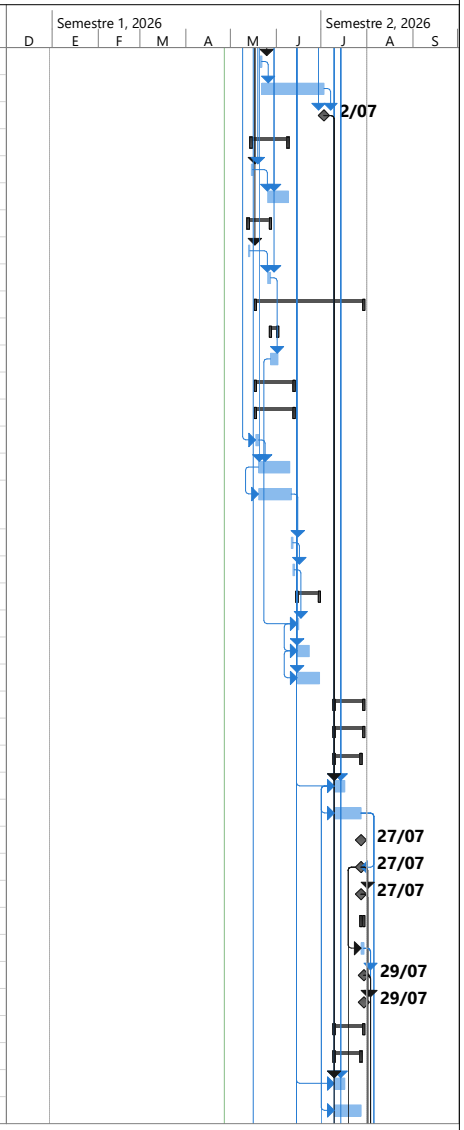

Proyecto: Putumayo.
Version: 0
Fecha: 24 Abril 2026

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% Planeado	% completado	Indicador grafico	Duración	Comienzo	Fin
118		**Inspección y pruebas**	**0%**	**0%**		**0 días**	**lun 27/07/26**	**lun 27/07/26**
119		Pruebas Y Puesta en servicio	0%	0%		0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26
120		E: Protocolo de pruebas	0%	0%		0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26
121		**Capacitación de usuarios**	**0%**	**0%**		**2 días**	**mar 28/07/26**	**mié 29/07/26**
122		Capacitación de usuarios y entrega de cartilla	0%	0%		2 días	mar 28/07/26	mié 29/07/26
123		E: Actas de entrega a usuarios	0%	0%		0 días	mié 29/07/26	mié 29/07/26
124		Hito pago 3 - 60%	0%	0%		0 días	mié 29/07/26	mié 29/07/26
125		**FASE 3 - 770 Usuarios**	**0%**	**0%**		**14 días**	**vie 10/07/26**	**mié 29/07/26**
126		**Montaje de Equipos**	**0%**	**0%**		**12 días**	**vie 10/07/26**	**lun 27/07/26**
127		Distribución de gabinetes, paneles, baterias y mástil	0%	0%		5 días	vie 10/07/26	jue 16/07/26
128		Montaje de mastil, paneles y gabinete	0%	0%		12 días	vie 10/07/26	lun 27/07/26
129		**Inspección y pruebas**	**0%**	**0%**		**0 días**	**lun 27/07/26**	**lun 27/07/26**
130		Pruebas Y Puesta en servicio	0%	0%		0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26
131		E: Protocolo de pruebas	0%	0%		0 días	lun 27/07/26	lun 27/07/26
132		**Capacitación de usuarios**	**0%**	**0%**		**2 días**	**mar 28/07/26**	**mié 29/07/26**
133		Capacitación de usuarios y entrega de cartilla	0%	0%		2 días	mar 28/07/26	mié 29/07/26
134		E: Actas de entrega a usuarios	0%	0%		0 días	mié 29/07/26	mié 29/07/26
135		Hito pago 4 - 100%	0%	0%		0 días	mié 29/07/26	mié 29/07/26
136		**Componente Social**	**0%**	**0%**		**58 días**	**mié 13/05/26**	**vie 31/07/26**
137		Jornadas de Socialización inicial	0%	0%		1 día	mié 13/05/26	mié 13/05/26
138		Jornadas de Socialización intermedia	0%	0%		5 días	mar 26/05/26	lun 1/06/26
139		Jornadas de Socialización final	0%	0%		1 día	vie 31/07/26	vie 31/07/26
140		**Cierre**	**0%**	**0%**		**2 días**	**jue 30/07/26**	**vie 31/07/26**
141		Elaboracion informe final	0%	0%		1 día	jue 30/07/26	jue 30/07/26
142		Entrega a operador de red	0%	0%		1 día	jue 30/07/26	jue 30/07/26
143		Liquidacion del contrato	0%	0%		2 días	jue 30/07/26	vie 31/07/26
144		H: Firma acta de liquidación	0%	0%		0 días	vie 31/07/26	vie 31/07/26

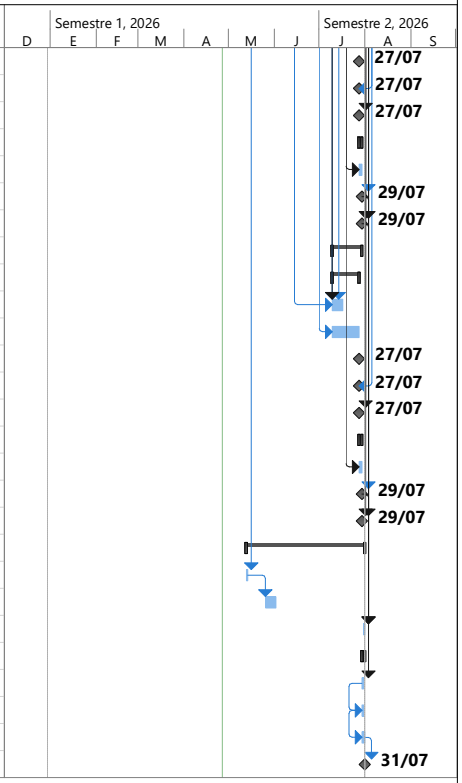

Proyecto: Putumayo.
Version: 0
Fecha: 24 Abril 2026

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	
