CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

INFORME MENSUAL No. 1

(PERÍODO: Del 7 de abril 2026 hasta el 6 de mayo de 2026)

CONTRATO DE No. SI-CMA-012-2025

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".





Oficina principal: Cr 16 A #50-20 Barrio Monteverde -Monteria – Córdoba

interventoriacrue@gmail.com

Contenido:

1. Introducción: 3
2. OBJETIVOS: 4
2.1 Objetivo General: 4
2.2 Objetivos Específicos: 4
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 5
3.1 Localización: 6
4. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS: 7
4.1 Información general del contrato de obra: 7
4.2 Información general del contrato de interventoría: 7
4.3 Control de póliza de obra: 8
4.4 Control de póliza de Interventoría: 10
5. SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 12
5.1 Gráfico se avance programado vs ejecutado: 13
5.2 Curva s programado vs ejecutado: 13
6. AVANCE EN TIEMPO 14
7. ASPECTO FINANCIERO 14
7.1 Forma de Pago del contratista: 14
7.2 Actas Parciales de obra: 15
7.3 Forma de Pago de la Interventoría: 15
7.4 Actas parciales de la Interventoría: 15
8. PERSONAL Y EQUIPO EN EL PERIODO 15
8.1 Personal y Equipos del Contratista: 15
8.2 Personal de la Interventoría: 16
9. ESTADO DEL TIEMPO 16
10. CONTROL DE CALIDAD 16
11 CONCLUSIONES 17
12 ANEXOS 18

1. Introducción:

El presente Informe N.° 1 corresponde al periodo del **7 de abril de 2026 hasta el 6 de mayo de 2026**, que corresponde a las actividades desarrolladas en el marco del contrato de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA al proyecto cuyo objeto es: "Fortalecimiento de la Red Local de Urgencias de Córdoba mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física para el correcto funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE en el municipio de Montería",** el cual tiene como finalidad garantizar el adecuado control, vigilancia y seguimiento integral a la ejecución de las obras y actividades contractuales programadas.

La interventoría se desarrolla con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas derivadas del contrato de obra, asegurando que las actividades ejecutadas se realicen conforme a los estudios, diseños, especificaciones técnicas, cronogramas establecidos, normatividad vigente y demás documentos contractuales aplicables al proyecto.

En el presente informe se consolidan las actividades de seguimiento y control efectuadas durante el período reportado, incluyendo la revisión del avance físico de las obras, el cumplimiento de los compromisos contractuales, el seguimiento al personal, materiales y recursos implementados en el proyecto, así como la verificación de aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, calidad, gestión documental y cumplimiento administrativo y financiero.

De igual manera, se presentan las observaciones, recomendaciones y conclusiones generadas por la interventoría como resultado de las visitas técnicas, reuniones de seguimiento y revisión documental realizadas, con el fin de contribuir al adecuado desarrollo del proyecto y garantizar que las obras de adecuación y rehabilitación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) se ejecuten bajo criterios de calidad, funcionalidad, eficiencia y cumplimiento contractual, fortaleciendo así la capacidad operativa de la red de atención de urgencias del departamento de Córdoba.

2. OBJETIVOS:

2.1 Objetivo General:

Realizar el seguimiento, control y verificación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al proyecto denominado "Fortalecimiento de la Red Local de Urgencias de Córdoba mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física para el correcto funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE en el municipio de Montería", garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especificaciones técnicas, cronogramas establecidos y normatividad vigente aplicable durante la ejecución del proyecto.

2.2 Objetivos Específicos:

- Verificar el avance físico y la correcta ejecución de las actividades constructivas desarrolladas en el proyecto, conforme a los estudios, diseños, especificaciones técnicas y lineamientos establecidos en el contrato y documentos que hacen parte integral del mismo.

- Realizar seguimiento y control a los aspectos administrativos, financieros, contables y documentales del contrato, validando el cumplimiento de obligaciones contractuales, presentación de soportes, ejecución presupuestal y demás requisitos exigidos para el adecuado desarrollo del proyecto.

- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas con calidad, seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental y demás condiciones técnicas y legales aplicables, con el fin de garantizar una ejecución eficiente, segura y acorde con los estándares requeridos para el funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto "Fortalecimiento de la Red Local de Urgencias de Córdoba mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física para el correcto funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE en el municipio de Montería" tiene como propósito mejorar las condiciones físicas y operativas de las instalaciones destinadas al funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del departamento de Córdoba, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a situaciones de urgencia y emergencia.

La intervención contempla la ejecución de actividades de adecuación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente, con el fin de garantizar espacios funcionales, seguros y acordes con las necesidades operativas y administrativas requeridas para la prestación eficiente de los servicios desarrollados por el CRUE. Estas actividades incluyen obras civiles, adecuaciones locativas, mejoramiento de acabados, mantenimiento y optimización de redes eléctricas, hidrosanitarias y demás componentes necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

El proyecto busca optimizar las condiciones de operación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, fortaleciendo los procesos de coordinación, regulación y referencia de pacientes dentro de la red hospitalaria del departamento de Córdoba, permitiendo una atención más eficiente, oportuna y organizada para la comunidad.

Así mismo, mediante la ejecución de las actividades planteadas, se pretende garantizar mejores condiciones de infraestructura para el personal operativo y administrativo, promoviendo espacios adecuados para el desarrollo de las funciones institucionales y contribuyendo al fortalecimiento de la red pública de atención en salud del departamento.

La interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica realizará el seguimiento y control integral del proyecto, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones contractuales, cronogramas establecidos y normatividad vigente aplicable durante la ejecución de las actividades contratadas.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato, el plazo de ejecución de la interventoría corresponde a CINCO (5) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual. Durante este período, la interventoría realizará el seguimiento continuo a la ejecución física, administrativa y financiera del proyecto, generando los respectivos informes y recomendaciones técnicas que permitan garantizar el adecuado desarrollo de las obras.

El valor del contrato de interventoría asciende a la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($179.866.682), recursos destinados a garantizar el correcto ejercicio de las actividades de seguimiento y control requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y el fortalecimiento de la infraestructura física del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE del municipio de Montería.

3.1 Localización:

El proyecto objeto de interventoría se encuentra localizado en el departamento de Córdoba, en el municipio de Montería, específicamente en el barrio Los Laureles, entre las calles 42 y 43 con carrera 8A, identificado con el número 4 de la manzana 17, en las instalaciones donde actualmente funcionan el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE y el programa de Malaria.

La ubicación del proyecto corresponde a un punto estratégico dentro del municipio, destinado a la coordinación y regulación de los servicios de urgencias y emergencias del departamento de Córdoba, permitiendo el fortalecimiento de la capacidad operativa y funcional de la red de atención en salud mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física existente.



Imagen 1. Localización del proyecto a Construir en el Municipio de Monteria – Cordoba.

4. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

4.1 Información general del contrato de obra:

CONTRATO No.	CONTRATO No. SI-LP-011-2025
OBJETO:	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DE CORDOBA
VALOR:	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.764.759.464,00)
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	07 ABRIL DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 1: Información General del contrato de obra.

4.2 Información general del contrato de interventoría:

CONTRATO No.	SI-CMA-012-2025
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DE CORDOBA
VALOR:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 179.866.682).
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	07 ABRIL DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 2: Información General del contrato de Interventoría.

4.3 Control de póliza de obra:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-44-1010433805		
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACIÓN		FEHA DE EXPEDICIÓN
0	CONTRATO		27/02/2026
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		VALOR A SEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/02/2026	04/02/2027	$ 276.475,946.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/02/2026	04/08/2029	$138.237,973.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	04/08/2026	04/08/2029	$ 276.475,946.40

Tabla 3: Póliza de Cumplimiento del contrato de obra.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-40-101014310		
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACIÓN		FEHA DE EXPEDICIÓN
0	CONTRATO		27/02/2026
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		VALOR A SEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	26/08/2026	04/08/2026	$700.362.000,00
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS	26/08/2026	04/08/2026	$700.362.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	26/08/2026	04/08/2026	$700.362.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	26/08/2026	04/08/2026	$700.362.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	26/08/2026	04/08/2026	$700.362.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	26/08/2026	04/08/2026	$700.362.000,00

Tabla 4: Póliza de responsabilidad civil extracontractual de obra.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-44-1010433805		
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACIÓN		FEHA DE EXPEDICIÓN
2	ACTA DE INICIO		14/04/2026
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		VALOR A SEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/04/2026	16/03/2027	$ 276.475,946.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07/04/2026	13/09/2029	$138.237,973.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/09/2026	13/09/2029	$ 276.475,946.40

Tabla 5: Póliza de Cumplimiento de acta de inicio de obra.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-40-101014310		
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACIÓN		FEHA DE EXPEDICIÓN
2	ACTA DE INICIO		14/04/2026
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		VALOR A SEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	07/04/2026	13/09/2026	$700.362.000,00
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS	07/04/2026	13/09/2026	$700.362.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07/04/2026	13/09/2026	$700.362.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	07/04/2026	13/09/2026	$700.362.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	07/04/2026	13/09/2026	$700.362.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	07/04/2026	13/09/2026	$700.362.000,00

Tabla 6: Póliza de responsabilidad civil extracontractual de acta de inicio de obra.

4.4 Control de póliza de Interventoría:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-44-101043738		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACIÓN**		**FEHA DE EXPEDICIÓN**
0	CONTRATO		20/02/2026
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR A SEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/02/2026	25/01/2027	$17,986,668.20
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNISACIONES, LABORALES	19/02/2026	25/07/2029	$17,986,668.20
CALIDAD DEL SERVICIO	25/07/2026	25/07/2031	$17,986,668.20

Tabla 7: Póliza de Cumplimiento del contrato de Interventoría.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-40-101014279		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACIÓN**		**FEHA DE EXPEDICIÓN**
0	CONTRATO		20/02/2026
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR A SEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00
GASTOS MEDICOS	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00

Tabla 8: Póliza de responsabilidad civil extracontractual de Interventoría.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-44-101043738		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACIÓN**		**FEHA DE EXPEDICIÓN**
2	ACTA DE INICIO		10/04/2026
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR A SEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/04/2026	13/03/2027	$17,986,668.20
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNISACIONES, LABORALES	07/04/2026	10/09/2029	$17,986,668.20
CALIDAD DEL SERVICIO	10/09/2026	10/09/2031	$17,986,668.20

Tabla 9: Póliza de Cumplimiento del acta de inicio de Interventoría.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-40-101014279		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACIÓN**		**FEHA DE EXPEDICIÓN**
2	ACTA DE INICIO		10/04/2026
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR A SEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00
GASTOS MEDICOS	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00

Tabla 10. Póliza de responsabilidad civil extracontractual de acta de inicio de Interventoría.

5. SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el período comprendido entre el 07 de abril de 2026 y el 06 de mayo de 2026, se realizaron actividades iniciales correspondientes a la etapa de adecuación, demolición y ejecución de obras civiles contempladas dentro del proyecto "Fortalecimiento de la Red Local de Urgencias de Córdoba mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física para el correcto funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE en el municipio de Montería".

En desarrollo de las actividades ejecutadas, se llevaron a cabo labores de localización, trazado y replanteo de las áreas objeto de intervención, con el fin de definir técnicamente los espacios proyectados conforme a los estudios y diseños aprobados para el proyecto.

Así mismo, se ejecutaron actividades de desmonte de cielo raso, puertas, ventanas, puntos eléctricos y cubierta existente en las áreas correspondientes al CRUE y al bloque de MALARIA, exceptuando algunas dependencias que a la fecha del presente informe no habían sido desocupadas, tales como la oficina de coordinación y el centro de reserva. Estas actividades permitieron preparar las áreas para el inicio de las adecuaciones físicas proyectadas.

Dentro de las intervenciones desarrolladas en el bloque de MALARIA, se adelantan las adecuaciones destinadas a la conformación de nuevas áreas funcionales, entre las cuales se encuentran oficina y control de insumos, sala de necropsias, área de bio residuos, unidad sanitaria, sala de informática, archivo general y oficina de salud ambiental, conforme a la distribución establecida en los estudios y diseños del proyecto.

De igual manera, se realizaron actividades de demolición de plantilla, andenes, bordillos, muros existentes, redoblón y columnas en diferentes sectores intervenidos, incluyendo la demolición de elementos ubicados en la garita existente en el área de MALARIA, con el propósito de liberar espacios y permitir la ejecución de las nuevas estructuras proyectadas.

Finalmente, se realizaron actividades de levantamiento de muros divisorios y de cerramiento en las áreas intervenidas del CRUE y bloque de MALARIA, conforme a las especificaciones técnicas y distribución arquitectónica proyectada para el adecuado funcionamiento de las nuevas áreas contempladas dentro del proyecto.

Se deja registro fotográfico y informe semanales como seguimiento de las actividades que se han realizado durante el periodo comprendido del 7 de abril hasta el 6 de mayo de 2026 correspondientes al primer mes de ejecución.

Anexo 1: Registro Fotográfico.

Anexo 2: Semanales.

5.1 Gráfico se avance programado vs ejecutado:


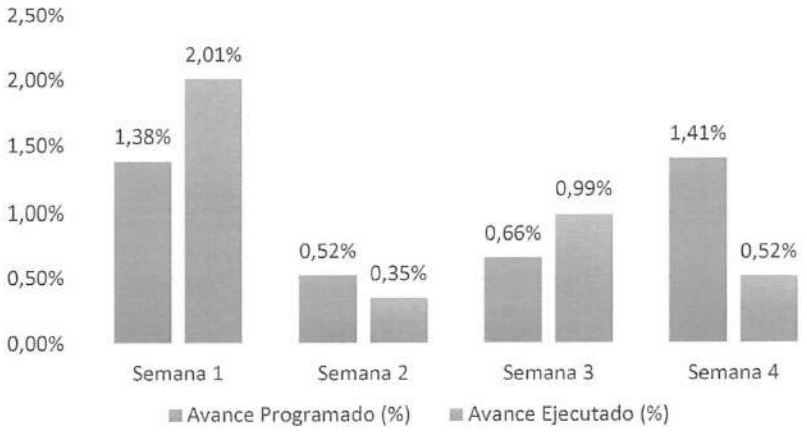


Grafico avance semanal programado vs ejecutado

La gráfica de avance programado vs. avance ejecutado evidencia variaciones en el cumplimiento de las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado. En algunas semanas, el avance ejecutado superó lo inicialmente programado, reflejando un desempeño favorable en la ejecución de las actividades; sin embargo, en otros periodos se presentaron retrasos frente a la programación establecida, generando diferencias en el cumplimiento esperado del proyecto.

5.2 Curva s programado vs ejecutado:

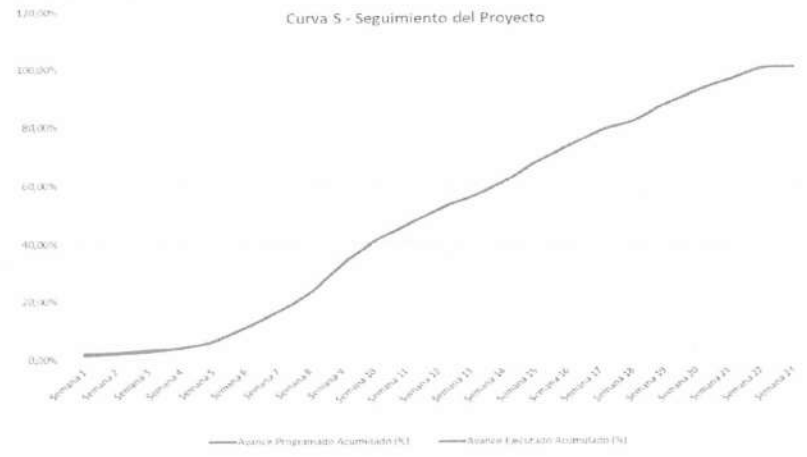

Curva S programado vs ejecutado

Durante el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 y el 06 de mayo de 2026, el Contratista registró una ejecución por valor de $106.996.191,26, equivalente al 3,87% del valor total del contrato. Para dicho periodo se tenía programada una ejecución de $110.037.426,67, correspondiente al 3,98%, evidenciándose una diferencia de $3.041.235,41, equivalente al 0,11% de atraso frente al programa de inversiones aprobado y vigente.

De acuerdo con el seguimiento realizado al avance físico y financiero del proyecto, se evidencian variaciones entre el avance programado y el avance ejecutado reportado por el contratista durante las primeras semanas de ejecución. Para la semana 1 se tenía previsto un avance acumulado del 1,38%, mientras que el avance ejecutado alcanzó el 2,01%. En la semana 2, el avance programado acumulado correspondía al 1,91% y el ejecutado fue del 2,36%. Para la semana 3, el avance acumulado programado era del 2,57%, frente a un ejecutado acumulado del 3,35%, reflejando un rendimiento superior al esperado. No obstante, para la semana 4 se evidenció una disminución en el ritmo de ejecución, registrándose un avance programado acumulado del 3,98% frente a un avance ejecutado acumulado del 3,87%, generando un leve desfase respecto a la programación establecida.

A la fecha de corte, el contrato presenta un avance en tiempo correspondiente a un (01) mes de ejecución respecto al plazo total contractual establecido.

6. AVANCE EN TIEMPO

A la fecha de corte del presente informe, el contrato presenta un avance correspondiente a un (01) mes de ejecución, contado a partir de la suscripción del acta de inicio y conforme al plazo contractual establecido. Durante este período se han desarrollado actividades iniciales de adecuación, demolición y obras civiles, orientadas al cumplimiento de las metas programadas dentro del cronograma de ejecución del proyecto.

7. ASPECTO FINANCIERO

7.1 Forma de Pago del contratista:

1.- El Departamento de Córdoba cancelara el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1.-PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, con un avance mínimo del 20% de ejecución la primera acta; no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo, certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar.

7.2 Actas Parciales de obra:

Hasta la fecha no se han presentado hasta parciales de obras.

7.3 Forma de Pago de la Interventoría:

La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de su monto. El cinco por ciento (5%) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.Nota 1: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por

encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. Nota 2: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

7.4 Actas parciales de la Interventoría:

Hasta la fecha no se han presentado hasta parciales de Interventoría.

8. PERSONAL Y EQUIPO EN EL PERIODO

8.1 Personal y Equipos del Contratista:

Durante el período comprendido entre el 07 de abril y el 06 de mayo de 2026, el contratista contó con el personal técnico, administrativo y operativo requerido para la ejecución de las actividades programadas en obra, conforme al pliego de condiciones.

PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN OBRA		
N°	CARGO	NOMBRE
1	Director de Obra	Jesús Orlando Sandoval Arciniegas
2	Ingeniero Residente	Carmen Ana Garces Negrete
3	Especialista en Seguridad Industrial y/o salud ocupacional	María González Ayuz
4	Ing. Eléctrico	Daniel José Corrales Paternina
5	Auxiliar administrativo	Ipatia Rovira Villalobos

El contratista dispone del siguiente equipo en obra, para la construcción del proyecto:

EQUIPO Y HERRAMIENTA EN OBRA		
N°	EQUIPOS	TOTAL
1	Equipo de Topografía (estación, nivel, GPS)	1
2	Volquetas	1
3	Mescladora de concreto	1
4	Herramientas menores	10

8.2 Personal de la Interventoría:

Durante el período reportado, la interventoría dispuso del personal profesional y técnico necesario para realizar las actividades de seguimiento, control y verificación del cumplimiento técnico, administrativo y contractual del proyecto.

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA		
N°	CARGO	NOMBRE
1	Director de Interventoría	Climaco Miguel Rodríguez Julio
2	Residente de Interventoría	Maria Luisa Laza Vega
3	Profesional SISO	Samir Andrés Rodríguez Baza
4	Auxiliar administrativo	Joaquin Alfredo García Mendoza
5	Contador	Lina Paola Revueltas Lozano

9. ESTADO DEL TIEMPO

Durante el período de ejecución comprendido entre el 07 de abril y el 06 de mayo de 2026, predominaron condiciones climáticas favorables, caracterizadas principalmente por días soleados, presentándose únicamente tres (03) días con lluvias.

Anexo 3: Bitácora

10. CONTROL DE CALIDAD

De acuerdo con los resultados de laboratorio presentados para los cilindros de concreto de diseño 3000 PSI, se evidencia que las resistencias obtenidas a edades de 7 y 14 días presentan un comportamiento satisfactorio y acorde con el desarrollo esperado de resistencia del concreto, cumpliendo con los parámetros técnicos establecidos para el elemento estructural ensayado. Por lo anterior, los resultados son aceptables y muestran un adecuado proceso de dosificación, colocación y curado del concreto.

Anexo 4: En ensayos de laboratorio .

11 CONCLUSIONES

Durante el periodo de ejecución del 7 de abril al 6 de mayo del 2026 la interventoría realizó seguimiento al contrato de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el control documental, la disponibilidad del personal y equipos requeridos, así como la implementación de medidas relacionadas con calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y gestión operativa del proyecto. De igual manera, se evidenció cumplimiento en la implementación de las actividades del SG-SST y del PGIO, observándose control en la afiliación del personal, entrega de elementos de protección personal, capacitaciones, inspecciones de seguridad y seguimiento a riesgos laborales, sin registrarse accidentes de trabajo ni indicadores negativos asociados a accidentalidad o enfermedad laboral durante el periodo reportado.

En cuanto al avance físico del proyecto, se identifican variaciones entre el avance programado y el avance ejecutado, observándose un comportamiento favorable durante las primeras semanas; sin embargo, para la semana cuatro se evidencia una leve disminución en el rendimiento de ejecución frente a lo programado, situación que deberá continuar siendo objeto de seguimiento por parte de la interventoría, con el fin de evitar afectaciones en el cumplimiento del cronograma contractual.

La interventoría considera que las actividades desarrolladas durante el primer mes de ejecución se han venido realizando de manera general conforme a las condiciones técnicas y contractuales del proyecto, manteniendo seguimiento permanente a los procesos constructivos, administrativos y de control, con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo de las obras y el cumplimiento de los objetivos planteados para el fortalecimiento de la infraestructura física del CRUE en el municipio de Montería.

LINA REVUELTAS LOZANO
R.L CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE

12 ANEXOS

1. Registro fotográfico
2. Semanales
3. Bitácora
4. Ensayos
5. Oficios enviados

REGISRO FOTOGRAFICO

Oficina principal: Cr 16 A #50-20 Barrio Monteverde -Montería – Córdoba

interventoriacrue@gmail.com

228

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".


Contrato de obra No. SI-LP-011-2025

Contrato de interventoria No. SI-LP-012-2025


FECHA:

7	5	2026
DIA	MES	AÑO

DIRECCIÓN: Montería- Cordoba,Barrio Los Laureles calles 42 y 43 con carrera 8A.

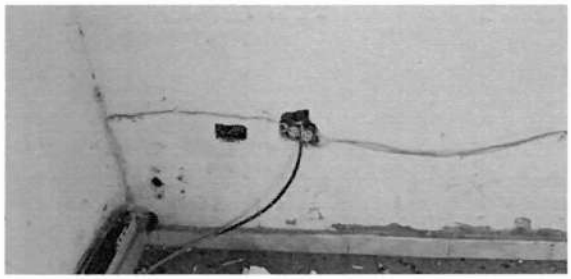

NOTA:	Desmonte de instalaciones puntos eléctricos

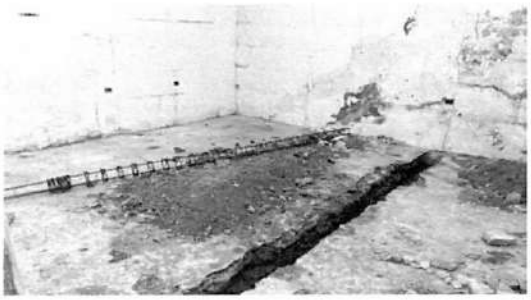

NOTA:	Excavación manual en material comun para vigas de cimentación



NOTA:	Excavación manual en material comun para vigas de cimentación



NOTA:	Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Contrato de obra No. SI-LP-011-2025

Contrato de interventoria No. SI-LP-012-2025

FECHA:

7	5	2026
DIA	MES	AÑO

DIRECCIÓN: Montería- Cordoba.Barrio Los Laureles calles 42 y 43 con carrera 8A.



NOTA:	Desmonte de cubierta en mal estado.



NOTA:	Desmonte de cubierta en mal estado.



NOTA:	Desmonte de puertas y ventadas



NOTA:	Desmonte de instalaciones puntos eléctricos

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Contrato de obra No. SI-LP-011-2025

Contrato de interventoria No. SI-LP-012-2025

FECHA:

7	5	2026
DIA	MES	AÑO

DIRECCIÓN: Monteria- Cordoba,Barrio Los Laureles calles 42 y 43 con carrera 8A.



NOTA:	Levante de muro en bloque de arena



NOTA:	Levante de muro en bloque de arena



NOTA:	Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m



NOTA:	Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Contrato de obra No. SI-LP-011-2025

Contrato de interventoria No. SI-LP-012-2025


FECHA:

7	5	2026
DIA	MES	AÑO

DIRECCIÓN: Monteria- Cordoba,Barrio Los Laureles calles 42 y 43 con carrera 8A.



NOTA: Levante de muro en bloque de arena

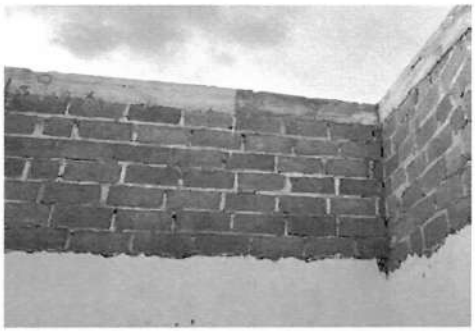

NOTA: Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi



NOTA: Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi



NOTA: Excavacion manual en material comun para vigas de cimentación

SEMANALES DE PERIODO DEL 7 DE ABRIL HASTA EL 6 de mayo de 2026

Oficina principal: Cr 16 A #50-20 Barrio Monteverde -Montería – Córdoba

interventoriacrue@gmail.com

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORMES DE INTERVENTORÍA
REPORTE SEMANAL

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 14-ABRIL-26			SEMANA No.:	1	DEL	7-abr-26	HASTA	13-abr-26

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"			OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"			
CONTRATISTA	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA				CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE		
REP. LEGAL	MARIA ELENA RIVERA HOYOS				REP. LEGAL	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO		
CONTRATO No.	88-LP-011- 2025	VALOR INICIAL	$	2.764.759.464	CONTRATO No.	84-CMA-043-2025	VALOR INICIAL	$ 179.866.682,0
PLAZO INICIAL	5 MESES	ADICIONES			PLAZO INICIAL	5 MESES	ADICIONES	$ -
INICIO	7/04/2026	VALOR TOTAL	$	2.764.759.464	INICIO	7/04/2026	VALOR TOTAL	$ 179.866.682,00
SUSPENSIÓN					SUSPENSIÓN			
REINICIO					REINICIO			
PRORROGA 1					PRORROGA 1			
PRORROGA 2					PRORROGA 2			
PRORROGA 3					PRORROGA 3			
PRORROGA 4					PRORROGA 4			
VENCIMIENTO	7/09/2026				VENCIMIENTO	7/09/2026		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


CONTRATO CON ANTICIPO 0%		PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (%)		0,00%	
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		TOTAL PAGADO ACUMULADO		$	-
ANTICIPO		PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO	0%	
PARCIAL 1			PARCIAL 1	0,0%	
PARCIAL 2			PARCIAL 2	0,00%	
PARCIAL 3	$ -		PARCIAL 3	0%	
FINAL	$ -		FINAL	0%	

III. AVANCE FISICO

LISTA GENERAL DE ACTIVIDADESACUMULADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
ADECUACION DE AREAS EXISTENTES					
Localizacion, Trazado y Replanteo	1,01	M2	1.830,50	$ 6.280,000	$ 11.495.540,00
Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante	1,02	M2	391,19	$ 31.102,000	$ 12.166.791,38
Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,03	UND	17,00	$ 83.082,000	$ 1.412.394,00
Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,04	UND	10,00	$ 58.191,000	$ 581.910,00
Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro	1,05	M2		$ 37.994,000	$ -
Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,06	UND		$ 58.191,000	$ -
Retiro de pintura existente en zonas deterioradas	1,07	M2		$ 6.410,000	$ -
Desmonte de instalaciones puntos eléctricos	1,08	UND	55,00	$ 93.815,000	$ 5.159.825,00
Desmonte de puntos hidráulicos y sanitarios	1,09	UND		$ 32.967,000	$ -
Mantenimiento de closed en mal estado	1,1	UND		$ 432.486,000	$ -
Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye entructura de soporte en madera o metalica y retiro a sitio de disposicion autorizado	1,11	M2	495,12	$ 29.012,000	$ 14.364.421,44
Limpieza de zonas verdes exteriores. Incluye retiro de material vegetal	1,12	M2	173,12	$ 25.567,000	$ 4.426.159,04
Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,13	UND		$ 46.650,000	$ -
Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro	1,14	M2	70,00	$ 24.737,000	$ 1.731.590,00
Demolición de redoblon existente. Incluye retiro de material escombro	1,15	M	50,00	$ 21.265,000	$ 1.063.250,00
Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro	1,16	M		$ 29.244,000	$ -
Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,17	M2		$ 32.967,000	$ -
Demolicion de columna Existente Garita . Incluye retiro de escombro	1,18	UND	4,00	$ 770.717,000	$ 3.082.868,00
Desmonte y traslado planta electrica a sitio autorizado	1,19	UND		$ 4.883.040,000	$ -
Excavación en material comun. Incluye retiro de material sobrante	1,2	M3		$ 35.829,000	$ -
Excavación manual en material comun para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante	1,21	M		$ 20.634,000	$ -
Suministro e instalacion de geotextil para separacion de suelos y capas granulares.	1,22	M2		$ 14.722,000	$ -
Relleno en material seleccionado compactado	1,23	M3		$ 170.777,000	$ -
Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado	1,24	M3		$ 187.376,000	$ -
Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajon, recomendación geotecnista. Incluye compactacion	1,25	M3		$ 283.698,000	$ -
				SUBTOTAL ADECUACION DE AREAS EXISTENTES	$ 55.484.748,86
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				INVERSION DE LA SEMANA	$ 55.484.748,86
				TOTAL	$ 55.484.748,86
				% EJECUTADO DURANTE LA SEMANA	2,01%

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	EJECUTADO - PROGRAMADO
ACUMULADO ANTERIOR	0,00%	0,00%	0,62%
DURANTE EL PERIODO	1,38%	2,01%	
ACUMULADO ACTUAL	1,38%	2,01%	

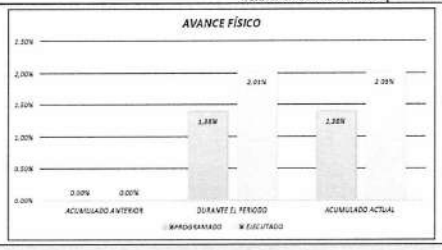

IV. ENSAYO, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Se hace seguimiento a la ejecución del PGIO del contratista.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la siguiente semana se continuará con la demolición de plantillas o andenes existentes en concreto, con espesores entre 10 y 15 cm, incluyendo el retiro y disposición adecuada de los escombros generados. Adicionalmente, se realizarán labores de excavación manual en material común para la conformación de vigas de cimentación, contemplando también el retiro y manejo del material sobrante producto de la excavación.

VI. REGISTRO FOTOGRAFICO Y ACTIVIDADES SEMANALES

En la semana No. 1, periodo que abarca desde 07-ABRIL -2026 hasta 13-ABRIL-2026, la interventoría informa por medio del presente que se ejecutaron las siguientes actividades:

- Durante la semana del 7 al 13 de abril de 2026 se realizaron actividades de adecuación del área, incluyendo localización, trazado y replanteo. Se ejecutaron desmontes de cielo raso, puertas, ventanas e instalaciones eléctricas, así como el desmonte de cubierta. También se adelantaron labores de limpieza de zonas verdes y demoliciones de muros, bordillos/redoblón y columnas. Finalmente, se llevaron a cabo trabajos de excavación en material común. Se tiene un avance semanal y general del programado vs el ejecutado del 0,62%.

VII. OBSERVACIONES

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

234

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	REGISTRO FOTOGRAFICO	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO											
FECHA DE PRESENTACIÓN: 14-ABRIL-26					SEMANA No.:	1	DEL	7-abr-26	HASTA	13-abr-26	
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA						
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"					
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE					
REP. LEGAL:	MARÍA ELENA RIVERA HOYOS				REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO					
CONTRATO No.:	SI-LP-011- 2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$ 2.764.759,464	CONTRATO No.:	SI-CMA-612-2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$	179.866.662,00	

ADECUACION DE AREAS EXISTENTES

CRUE



Desmonte de cubierta en mal estado.



Desmonte de cubierta en mal estado.



Desmonte de puertas y ventadas



Desmonte de instalaciones puntos eléctricos

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

Gobernación de Córdoba
Ahora la tasa es gratis

INFORMES DE INTERVENTORÍA
REPORTE SEMANAL

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 21-ABRIL-26			SEMANA No.:	2	DEL	14-abr-26	HASTA	20-abr-26

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA				
OBJETO	"PORTAL ECOMUENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "PORTAL ECOMUENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"			
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE			
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS				REP. LEGAL	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO			
CONTRATO No.:	SM-LP-011- 2025	VALOR INICIAL	$	2.764.733.464	CONTRATO No.:	SI-OMA-013-2025	VALOR INICIAL	$	172.866.682,0
PLAZO INICIAL:	5 MESES	ADICIONES:			PLAZO INICIAL:	5 MESES	ADICIONES	$	-
INICIO:	7/04/2026	VALOR TOTAL:	$	2.764.733.464	INICIO:	7/04/2026	VALOR TOTAL	$	172.866.682,00
SUSPENSIÓN:					SUSPENSIÓN:				
REINICIO:					REINICIO:				
PRORROGA 1:					PRORROGA 1:				
PRORROGA 2:					PRORROGA 2:				
PRORROGA 3:					PRORROGA 3:				
PRORROGA 4:					PRORROGA 4:				
VENCIMIENTO:	7/09/2026				VENCIMIENTO:	7/09/2026			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


CONTRATO CON ANTICIPO 0%		PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (%):		0,00%
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		TOTAL PAGADO ACUMULADO	$	-
ANTICIPO		PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO	0%
PARCIAL 1			PARCIAL 1	0,0%
PARCIAL 2			PARCIAL 2	0,00%
PARCIAL 3	$ -		PARCIAL 3	0%
FINAL	$ -		FINAL	0%

III. AVANCE FISICO

LISTA GENERAL DE ACTIVIDADES ACUMULADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
ADECUACION DE AREAS EXISTENTES					
Localizacion, Trazada y Replanteo	1,01	M2		$ 6.280,000	$ -
Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante	1,02	M2		$ 31.102,000	$ -
Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,03	UND		$ 83.082,000	$ -
Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,04	UND		$ 58.191,000	$ -
Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro	1,05	M2		$ 37.994,000	$ -
Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,06	UND		$ 58.191,000	$ -
Retiro de pintura existente en zonas deterioradas	1,07	M2		$ 6.410,000	$ -
Desmonte de instalaciones puntos eléctricos	1,08	UND		$ 93.815,000	$ -
Desmonte de puntos hidráulicos y sanitarios	1,09	UND		$ 32.967,000	$ -
Mantenimiento de closed en mal estado	1,1	UND		$ 432.486,000	$ -
Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye entructura de soporte en madera o metalica y retiro a sitio de disposicion autorizado	1,11	M2		$ 29.012,000	$ -
Limpieza de zonas verdes exteriores. Incluye retiro de material vegetal	1,12	M2		$ 25.567,000	$ -
Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,13	UND		$ 46.650,000	$ -
Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro	1,14	M2		$ 24.737,000	$ -
Demolición de redoblon existente. Incluye retiro de material escombro	1,15	M		$ 21.265,000	$ -
Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro	1,16	M		$ 29.244,000	$ -
Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado	1,17	M2		$ 32.967,000	$ -
Demolicion de columna Existente Garita . Incluye retiro de escombro	1,18	UND		$ 770.717,000	$ -
Desmonte y traslado planta electrica a sitio autorizado	1,19	UND		$ 4.883.040,000	$ -
Excavación en material comun. Incluye retiro de material sobrante	1,2	M3		$ 35.829,000	$ -
Excavación manual en material comun para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante	1,21	M	18,00	$ 20.634,000	$ 371.412,00
Suministro e instalacion de geotextil para separacion de suelos y capas granulares.	1,22	M2		$ 14.722,000	$ -
Relleno en material seleccionado compactado.	1,23	M3		$ 170.777,000	$ -
Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado	1,24	M3		$ 187.376,000	$ -
Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajon, recomendación geotecnista. Incluye compactacion	1,25	M3		$ 283.698,000	$ -
				SUBTOTAL ADECUACION DE AREAS EXISTENTES	$ 371.412,00
ESTRUCTURA EN CONCRETO					
Base en concreto pobre 2500 PSI, solado, espesor 5cm (baja estructuras en concreto)	2.01	M3		$ 764.387,000	$ -
Concreto de 3000 PSI para zapatas	2.02	M3		$ 1.022.682,000	$ -
Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m	2.03	M		$ 141.184,000	$ -
Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m. Incluye refuerzo 4 varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm	2.04	M		$ 188.416,000	$ -
Columnas de 0,25 mts x 0,25 mts en concreto de 21mpa (3000 psi)	2.05	M		$ 114.969,000	$ -
Viga superior de 0,25 m x 0,30 m en concreto de 3000 PSI	2.06	M		$ 161.642,000	$ -
Concreto de 3000 PSI para viga canal e=10 cm. Incluye formaletas	2.07	M2		$ 252.566,000	$ -
Levante de muro en bloque de arena - cemento vibrado de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero 1:4	2.08	M2	68,75	$ 102.009,000	$ 7.013.118,75
Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior	2.09	M2		$ 44.754,000	$ -
Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi. Incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2.10	M		$ 131.128,000	$ -
Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi. Incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2.11	M	20,00	$ 109.045,000	$ 2.180.900,00
Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi. Incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2.12	M		$ 114.091,000	$ -
Meson en concreto de 3000 psi, ref. 3/8" @ 0,15 mts , Incluye granito para placa de 0,08m, muro de apoyo enchapado y apoyo interior	2.13	M		$ 455.738,000	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, Incluye malla electrosoldada XX-106	2.14	M2		$ 167.772,000	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 15cm, incluye malla electrosoldada Malla XX-295, corte de juntas, sello alitacion	2.15	M2		$ 243.929,000	$ -
Rampa de acceso en concreto de 3000 Psi (Plantilla con malla electrosoldada E= 0.15m y Vigas 0.15 m x 0.20 mts. Refuerzo 4D 3/8 " estribos 1/4" @ 0.20m)	2.16	M2		$ 244.442,000	$ -
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m, Incluye preparación de la superficie de apoyo	2.17	M		$ 112.327,000	$ -
Suministro, corte y figuracion de acero de refuerzo Fy=4.2 Mpa	2.18	Kg		$ 10.755,000	$ -
				SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO	$ 9.194.018,75
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				INVERSION DE LA SEMANA	$ 9.565.430,75
				TOTAL	$ 9.565.430,75
				% EJECUTADO DURANTE LA SEMANA	0,55%

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	EJECUTADO - PROGRAMADO
ACUMULADO ANTERIOR	1,36%	2,01%	0,45%
DURANTE EL PERIODO	0,52%	0,55%	
ACUMULADO ACTUAL	1,91%	2,36%	



IV. ENSAYO, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Se hace seguimiento a la ejecución del PGIO del contratista. Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría solicitó al contratista la remisión de la documentación del personal en campo, incluyendo exámenes médicos ocupacionales de ingreso y soportes de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y al sistema de seguridad social integral. Así mismo, se reiteró la necesidad de garantizar la dotación completa del personal y su uso adecuado durante la ejecución de las actividades.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la siguiente semana se continuará con la demolición de plantillas o andenes existentes en concreto, con espesores entre 10 y 15 cm, incluyendo el retiro y disposición adecuada de los escombros generados. Adicionalmente, se realizarán labores de excavación manual en material común para la conformación de vigas de cimentación, contemplando también el retiro, manejo del material sobrante producto de la excavación y levante de muro.

VI. REGISTRO FOTOGRAFICO Y ACTIVIDADES SEMANALES

En la semana No. 2, periodo que abarca desde 14-ABRIL -2026 hasta 20-ABRIL-2026, la interventoria informa por medio del presente que se ejecutaron las siguientes actividades

- Durante la semana del 14 al 20 de abril de 2026 se ejecutaron principalmente actividades de demolición y excavación. Se avanzó en la demolición de plantilla o andenes en concreto existente, incluyendo el retiro de escombros, y se realizó excavación manual en material común para vigas de cimentación, con disposición del material sobrante. Estas labores corresponden a la preparación del terreno para las etapas constructivas posteriores. Se tiene un avance semanal y general del programado vs el ejecutado del 0,45%, el contratista manifiesta que ingresara mas personal para fortalecer las actividades.

VII. OBSERVACIONES

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA


236

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	REGISTRO FOTOGRAFICO	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO										
FECHA DE PRESENTACIÓN: 21-ABRIL-26					SEMANA No.:	2	DEL	14-abr-26	HASTA	20-abr-26
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA					
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"					
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE				
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS				REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO				
CONTRATO No.:	SI-LP-011- 2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$ 2.754.759.464	CONTRATO No.:	SI-CMA-012-2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$	179.866.682,00

ADECUACION DE AREAS EXISTENTES

CRUE



Desmonte de instalaciones puntos eléctricos



Excavación manual en material comun para vigas de cimentación



Excavación manual en material comun para vigas de cimentación



Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi,



Levante de muro en bloque de arena



Levante de muro en bloque de arena

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

237

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORMES DE INTERVENTORÍA
REPORTE SEMANAL

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACION: 28-ABRIL-26			SEMANA No.:	3	DEL:	21-abr-26	HASTA	27-abr-26

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA		CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE		
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS		REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO		
CONTRATO No.:	SI-LPI-011- 2025	VALOR INICIAL $ 2.764.759.464	CONTRATO No.:	SI-CMA-012-2025	VALOR INICIAL	$ 179.666.682,0
PLAZO INICIAL:	5 MESES	ADICIONES $ -	PLAZO INICIAL:	5 MESES	ADICIONES	$ -
INICIO:	7/04/2026	VALOR TOTAL $ 2.764.759.464	INICIO:	7/04/2026	VALOR TOTAL	$ 179.666.682,00
SUSPENSIÓN:			SUSPENSIÓN:			
REINICIO:			REINICIO:			
PRORROGA 1:			PRORROGA 1:			
PRORROGA 2:			PRORROGA 2:			
PRORROGA 3:			PRORROGA 3:			
PRORROGA 4:			PRORROGA 4:			
VENCIMIENTO:	7/09/2026		VENCIMIENTO:	7/09/2026		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


CONTRATO CON ANTICIPO 0%		PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (%)		0,00%	
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		TOTAL PAGADO ACUMULADO	$		-
ANTICIPO		PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO	0%	
PARCIAL 1:			PARCIAL 1:	0,0%	
PARCIAL 2:			PARCIAL 2:	0,00%	
PARCIAL 3:	$ -		PARCIAL 3:	0%	
FINAL:	$ -		FINAL:	0%	

III. AVANCE FISICO

LISTA GENERAL DE ACTIVIDADES ACUMULADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
ADECUACION DE AREAS EXISTENTES					
Localizacion, Trazado y Replanteo	1,01	M2	865,60	$ 6.280,000	$ 5.435.968,00
Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante	1,02	M2		$ 31.102,000	$ -
Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,03	UND		$ 83.082,000	$ -
Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,04	UND		$ 58.191,000	$ -
Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro	1,05	M2	114,72	$ 37.994,000	$ 4.358.671,68
Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,06	UND		$ 58.191,000	$ -
Retiro de pintura existente en zonas deterioradas	1,07	M2		$ 6.410,000	$ -
Desmonte de instalaciones puntos electricos	1,08	UND	80,00	$ 93.835,000	$ 2.814.450,00
Desmonte de puntos hidraulicos y sanitarios	1,09	UND		$ 32.967,000	$ -
Mantenimiento de closet en mal estado	1,1	UND		$ 432.486,000	$ -
Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye entructura de soporte en madera o metalica y retiro a sitio de disposicion autorizado	1,11	M2	102,51	$ 29.012,000	$ 2.974.020,12
Limpieza de zonas verdes exteriores. Incluye retiro de material vegetal	1,12	M2		$ 25.567,000	$ -
Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,13	UND		$ 46.650,000	$ -
Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro	1,14	M2		$ 24.737,000	$ -
Demolición de redablon existente. Incluye retiro de material escombro	1,15	M		$ 21.265,000	$ -
Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro	1,16	M	73,26	$ 29.244,000	$ 2.142.415,44
Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,17	M2		$ 32.967,000	$ -
Demolicion de columna Existente Garita . Incluye retiro de escombro	1,18	UND		$ 720.717,000	$ -
Desmonte y traslado planta electrica a sitio autorizado	1,19	UND		$ 4.883.040,000	$ -
Excavación en material comun. Incluye retiro de material sobrante	1,2	M3		$ 35.829,000	$ -
Excavación manual en material comun para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante	1,21	M	2,95	$ 20.634,000	$ 60.870,30
Suministro e Instalacion de geotextil para separacion de suelos y capas granulares.	1,22	M2		$ 14.722,000	$ -
Relleno en material seleccionado compactado	1,23	M3		$ 170.777,000	$ -
Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado	1,24	M3		$ 187.376,000	$ -
Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajon, recomendación geotecnista. Incluye compactacion	1,25	M3		$ 283.698,000	$ -
				SUBTOTAL ADECUACION DE AREAS EXISTENTES	$ 17.786.395,54
ESTRUCTURA EN CONCRETO					
Base en concreto psalve 2000 PSI, salada, espesor 5cm (bajo estructuras en concreto)	2,01	M3		$ 764.387,000	$ -
Concreto de 3000 PSI para zapatas	2,02	M3		$ 1.022.632,000	$ -
Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m	2,03	M	2,95	$ 141.184,000	$ 416.492,80
Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m. Incluye refuerzo x varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm	2,04	M		$ 188.416,000	$ -
Columnas de 0.25 mts x 0.25 mts en concreto de 21mpa (3000 psi)	2,05	M		$ 114.969,000	$ -
Viga superior de 0.25 m x 0.30 m en concreto de 3000 PSI	2,06	M		$ 161.642,000	$ -
Concreto de 3000 PSI para viga canal en10 cm. Incluye formaletas	2,07	M2		$ 252.566,000	$ -
Levante de mura en bloque de arena - cemento vibrado de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero 1:4	2,08	M2	58,62	$ 102.009,000	$ 5.979.767,58
Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior	2,09	M2		$ 44.754,000	$ -
Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi. Incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2,10	M	20,95	$ 131.128,000	$ 2.747.131,60
Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi. Incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2,11	M	4,10	$ 109.045,000	$ 447.084,50
Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi. Incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2,12	M		$ 114.091,000	$ -
Meson en concreto de 3000 psi, ref. 3/8" @ 0.15 mts , Incluye granito para placa de 0.68m, muro de apoyo enchapado y apoyo interior	2,13	M		$ 455.738,000	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm. Incluye malla electrosoldada XX-106	2,14	M2		$ 167.772,000	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 15cm. Incluye malla electrosoldada Malla XX-295, corte de juntas, sello dilatacion	2,15	M2		$ 243.929,000	$ -
Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI Plantilla con malla electrosoldada E= 0.15m y vigas 0.15 m x 0.20 m), #refuerzo #D 3/8" Y estribos 1/4" @ 0.20m.	2,16	M2		$ 244.442,000	$ -
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparacion de la superficie de apoyo	2,17	M		$ 112.327,000	$ -
Suministro, corte y figuracion de acero de refuerzo Fy=4.2 Mpa	2,18	Kg		$ 10.759,000	$ -
				SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO	$ 9.590.476,48
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				INVERSION DE LA SEMANA	$ 27.376.872,02
				TOTAL	$ 27.376.872,02
				% EJECUTADO DURANTE LA SEMANA	0,99%

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	EJECUTADO - PROGRAMADO
ACUMULADO ANTERIOR	1,81%	2,36%	0,78%
DURANTE EL PERIODO	0,68%	0,99%	
ACUMULADO ACTUAL	2,57%	3,35%	



IV. ENSAYO, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Se hace seguimiento a la ejecución del PGIO del contratista. Durante la semana, la interventoría solicitó la documentación correspondiente a los trámites del permiso de aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental competente, junto con sus respectivos soportes. De igual manera, se requirió la documentación de los vehículos utilizados en obra (volquetas) y la presentación del procedimiento y/o informe de disposición de residuos de construcción y demolición (RCD).

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana siguiente se continuará con las actividades de adecuación de áreas existentes y ejecución de la estructura en concreto, incluyendo labores de localización, trazado y replanteo, así como la demolición de elementos en concreto y bordillos, desmonte de instalaciones eléctricas y de cubierta en mal estado. De igual manera, se avanzará en las excavaciones manuales para vigas de cimentación y en la construcción de elementos estructurales como vigas de cimentación, muros en bloque, vigas cinta y columnas de confinamiento, dando continuidad a las actividades que se vienen desarrollando en obra. Adicionalmente, se realizarán labores de excavación manual en material común para la conformación de vigas de cimentación, contemplando también el retiro, manejo del material sobrante producto de la excavación y levante de mura.

VI. REGISTRO FOTOGRAFICO Y ACTIVIDADES SEMANALES

En la semana No. 3, periodo que abarca desde 21-ABRIL -2026 hasta 27-ABRIL-2026, la interventoría informa por medio del presente que se ejecutaron las siguientes actividades:

- Durante la semana del 21 al 27 de abril de 2026 se continúa con las actividades de ejecución de la estructura en concreto, desarrollando labores de localización, trazado y replanteo, así como la demolición de elementos en concreto y bordillos, desmonte de instalaciones eléctricas y de cubierta en mal estado. De igual manera, se avanza en las excavaciones manuales para vigas de cimentación y en la construcción de elementos estructurales como vigas de cimentación, muros en bloque, vigas cinta y columnas de confinamiento, dando continuidad a las actividades programadas en obra. Se tiene un avance semanal y general del programado vs el ejecutado del 0.78%, el contratista manifiesta que ingresara mas personal para fortalecer las actividades.

VII. OBSERVACIONES

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	REGISTRO FOTOGRAFICO	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE


I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO											
FECHA DE PRESENTACION: 21-ABRIL-26					SEMANA No.:	3	DEL	21-abr-26	HASTA	27-abr-26	
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA						
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"					
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE					
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS				REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO					
CONTRATO No.:	SI-LP-011- 2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$ 2.784.759.464	CONTRATO No.:	SI-CMA-012-2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$	179.866.682,00	

ADECUACION DE AREAS EXISTENTES

CRUE



Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m



Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m



Excavación manual en material comun para vigas de cimentación



Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto



Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto



Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto

Lina Revueltas

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

Gobernación de Córdoba
Ahora la tarea es el pueblo

INFORMES DE INTERVENTORÍA
REPORTE SEMANAL

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 05-MAYO-26	SEMANA No.:	4	DEL	28-abr-26	HASTA	4-may-26

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"			OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"			
CONTRATISTA	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA			CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE			
REP. LEGAL	MARIA ELENA RIVERA HOYOS			REP. LEGAL	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO			
CONTRATO No.	SH-P-011- 2025	VALOR INICIAL	$ 2.264.759.464	CONTRATO No.	SCMA-013-2025	VALOR INICIAL	$	179.966.582,0
PLAZO INICIAL	5 MESES	ADICIONES	$ -	PLAZO INICIAL	5 MESES	ADICIONES	$	-
INICIO	7/04/2026	VALOR TOTAL	$ 2.264.759.464	INICIO	7/04/2026	VALOR TOTAL	$	179.966.582,00
SUSPENSION				SUSPENSION				
REINICIO				REINICIO				
PRORROGA 1				PRORROGA 1				
PRORROGA 2				PRORROGA 2				
PRORROGA 3				PRORROGA 3				
PRORROGA 4				PRORROGA 4				
VENCIMIENTO	7/09/2026			VENCIMIENTO	7/09/2026			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA


CONTRATO CON ANTICIPO 0%		PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (%)		0,00%	
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		TOTAL PAGADO ACUMULADO		$	-
ANTICIPO		PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO	0%	
PARCIAL 1			PARCIAL 1	0,0%	
PARCIAL 2			PARCIAL 2	0,00%	
PARCIAL 3	$ -		PARCIAL 3	0%	
FINAL	$ -		FINAL	0%	

III. AVANCE FISICO

LISTA GENERAL DE ACTIVIDADES ACUMULADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCION	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
ADECUACION DE AREAS EXISTENTES					
Localizacion, Trasado y Replanteo	1,01	M2		$ 6.280,000	$ -
Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante	1,02	M2		$ 81.102,000	$ -
Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,03	UND		$ 83.082,000	$ -
Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,04	UND		$ 58.191,000	$ -
Demolición de plantilla o anden es 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro	1,05	M2		$ 37.994,000	$ -
Desmonte de aparatos sanitarios Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,06	UND		$ 58.191,000	$ -
Retiro de pintura existente en zonas deterioradas	1,07	M2		$ 6.410,000	$ -
Desmonte de instalaciones puntos eléctricos	1,08	UND		$ 93.815,000	$ -
Desmonte de puntos hidráulicos y sanitarios	1,09	UND		$ 32.967,000	$ -
Mantenimiento de closed en mal estado	1,1	UND		$ 432.486,000	$ -
Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye entructura de soporte en madera o metalica y retiro a sitio de disposicion autorizado	1,11	M2		$ 29.012,000	$ -
Limpieza de zonas verdes exteriores. Incluye retiro de material vegetal	1,12	M2		$ 25.567,000	$ -
Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,13	UND		$ 46.650,000	$ -
Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro	1,14	M2		$ 24.737,000	$ -
Demolición de redoblon existente. Incluye retiro de material escombro	1,15	M		$ 21.265,000	$ -
Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro	1,16	M		$ 29.244,000	$ -
Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,17	M2		$ 32.967,000	$ -
Demolicion de columna Existente Gratta . Incluye retiro de escombro	1,18	UND		$ 770.717,000	$ -
Desmonte y traslado planta electrica a sitio autorizado	1,19	UND		$ 4.883.040,000	$ -
Excavación en material comun. Incluye retiro de material sobrante	1,2	M3		$ 35.829,000	$ -
Excavación manual en material comun para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante	1,21	M	114,14	$ 20.834,000	$ 2.355.164,76
Suministro e instalacion de geotextil para separacion de suelos y capas granulares.	1,22	M2		$ 14.722,000	$ -
Relleno en material seleccionado compactado	1,23	M3		$ 170.777,000	$ -
Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado	1,24	M3		$ 187.376,000	$ -
Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajon, recomendación geotecnista. Incluye compactacion	1,25	M3		$ 283.698,000	$ -
				SUBTOTAL ADECUACION DE AREAS EXISTENTES	$ 2.355.164,76
ESTRUCTURA EN CONCRETO					
Base en concreto pobre 2000 PSI, solado, espesor 5cm (bajo estructuras en concreto)	2,01	M3		$ 764.387,000	$ -
Concreto de 3000 PSI para zapatas	2,02	M3		$ 1.022.632,000	$ -
Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m	2,03	M		$ 141.184,000	$ -
Viga de cimentacion para anderes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m. Incluye refuerzo 4 varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm	2,04	M		$ 188.416,000	$ -
Columnas de 0.25 mts x 0.25 mts en concreto de 21mpa (3000 psi)	2,05	M		$ 114.969,000	$ -
Viga superior de 0.25 m x 0.30 m en concreto de 3000 PSI	2,06	M		$ 161.642,000	$ -
Concreto de 3000 PSI para viga canal en 10 cm. Incluye formaletas	2,07	M2		$ 252.566,000	$ -
Levante de muro en bloque de arena - cemento vibrada de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero 1:4	2,08	M2	10,00	$ 102.009,000	$ 1.019.896,18
Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior	2,09	M2		$ 44.754,000	$ -
Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, Incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2,10	M	57,16	$ 131.128,000	$ 7.495.276,48
Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi, Incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2,11	M		$ 109.045,000	$ -
Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi, Incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2,12	M	30,75	$ 114.091,000	$ 3.506.016,43
Meson en concreto de 3000 psi, ref. 3/8" @ 0.15 mts , Incluye granito para placa de 0.06m, muro de apoyo enchapado y apoyo inferior	2,13	M		$ 455.738,000	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, Incluye malla electrosoldada Xx-104	2,14	M2		$ 167.772,000	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 15cm, Incluye malla electrosoldada Malla XX-295, corte de juntas, sello aislatacion	2,15	M2		$ 243.929,000	$ -
Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI (Plantilla con malla electrosoldada E= 0.15m y vigas 0.15 m x 0.20 m). Refuerzo 4D 3/8" Y estribos 1/4" @ 0.20m.	2,16	M2		$ 244.442,000	$ -
Bordilla de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparacion de la superficie de apoyo	2,17	M		$ 112.327,000	$ -
Suministro, corte y figuracion de acero de refuerzo Fy=4.2 Mpa	2,18	Kg		$ 10.755,000	$ -
				SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO	$ 12.021.189,09
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				INVERSION DE LA SEMANA	$ 14.376.353,85
				TOTAL	$ 14.376.353,85
				% EJECUTADO DURANTE LA SEMANA	0,32%

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	EJECUTADO - PROGRAMADO
ACUMULADO ANTERIOR	2,57%	3,35%	-0,11%
DURANTE EL PERIODO	1,41%	0,52%	
ACUMULADO ACTUAL	3,98%	3,87%	



IV. ENSAYO, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Se hace seguimiento a la ejecución del PGIO del contratista.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana siguiente se continuará con las actividades de adecuación de áreas existentes y ejecución de la estructura en concreto, así como la demolición de elementos en concreto y bordillos, desmonte de instalaciones eléctricas y de cubierta en mal estado. De igual manera, se avanzará en las excavaciones manuales para vigas de cimentación y en la construcción de elementos estructurales como vigas de cimentación, muros en bloque, vigas cinta y columnas de confinamiento, dando continuidad a las actividades que se vienen desarrollando en obra. Adicionalmente, se realizarán labores de excavación manual en material común para la conformación de vigas de cimentación, contemplando también el retiro, manejo del material sobrante producto de la excavación y levante de muro.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTIVIDADES SEMANALES

En la semana No. 4, periodo que abarca desde 28-ABRIL -2026 hasta 04-MAYO-2026, la interventoría informa por medio del presente que se ejecutaron las siguientes actividades:

- Durante la semana del 21 al 27 de abril de 2026 se ejecutaron actividades correspondientes a la excavación manual en material común para vigas de cimentación, incluyendo el retiro y disposición del material sobrante. Se evidenció el avance de las excavaciones conforme al trazado establecido y a las dimensiones requeridas para la conformación de los elementos de cimentación, tambien Se ejecutaron actividades correspondientes al levante de muro en bloque de drenaje, pañete en mortero 1:4 para muros interiores y exteriores, y construcción de dintel de 10x20 cm en concreto de 3000 psi con su respectivo acero de refuerzo. Se tiene un avance semanal y general del programado vs el ejecutado del -0,11% atraso, el contratista manifiesta que ingresara mas personal para fortalecer las actividades.

VII. OBSERVACIONES

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	REGISTRO FOTOGRAFICO	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO										
FECHA DE PRESENTACION: 05-MAYO-26					SEMANA No.:	4	DEL	28-abr-26	HASTA	4-may-26
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA					
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE				
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS				REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO				
CONTRATO No.:	SI-LP-011- 2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$ 2.764.759.464	CONTRATO No.:	SI-CMA-012-2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$	179.866.682,00

ADECUACION DE AREAS EXISTENTES

CRUE



Levanta de muro en bloque de arena



Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi



Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi



Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi



Excavación manual en material comun para vigas de cimentación



Excavación manual en material comun para vigas de cimentación

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

BITACORA DEL PERIODO DEL 7 DE ABRIL HASTA EL 6 de mayo de 2026

Oficina principal: Cr 16 A #50-20 Barrio Monteverde -Montería – Córdoba

interventoriacrue@gmail.com

242

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	07 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	1,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

el contratista de obra realizo actividades de acompañamiento al personal de CRUE y MALARIA en el desalojo de las areas a intervenir, esta actividad se realizo con una anterioridad de 3 semanas co respecto al acta de inicio.

El contratista de obra inicia actividades de cerramiento perimetral con lona verde de los bloques a intervenir especificados en la programacion de obra.

se realizan actividades de localizacion trazado y replanteo con comision de topografia

OBSERVACIONES

la actividad de cerramiento perimetral no se encuentra contratada dentro del presupuesto de obra por lo que se solicito sean revisadas las actividades realizadas y que no esten en presupuesto sean indicadas como ITEMS no previsto.

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	08 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	2,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de desmonte de cielo raso existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de puertas existentes en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de ventanas existentes en mal estado en bloques de malaria

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

244

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA	
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS	
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026	
FECHA:	09 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA: 3.0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de desmonte de cielo razo existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de puertas existentes en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de ventanas existentes en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de cubierta existente en mal estado en bloques de malaria

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	10 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	4,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de desmonte de cielo raso existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de puertas existentes en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de ventanas existentes en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de cubierta existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizo comité tecnico en obra con supervisiores de la gobernacion, contratista de obra e interventoria

OBSERVACIONES

Durante el comité de obra del dia de hoy quedaron pendientes los siguientes puntos:

1,0 la interventoria revisar y entregar plan de trabajo del contratista de obra.
2,0 El contratista de obra debera entregar plano arquitectonico general impreso a supervisores de la gobernacion par que realicen revision y hagan observaciones en algunas areas
3,0 el contratista de obra debera publicar la valla para acto protocolario de primera piedra.

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	11 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	5,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

MAÑANA
Se realizan actividades de desmonte de cielo razo existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de puertas existentes en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de ventanas existentes en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de cubierta existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de demolicion de columnas existentes en garita existente en mal estado en bloques de malaria

TARDE
No se realizan actividades porque se trabaja de corrido hasta la 01:00pm por ser sabado.

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	12 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	0,6

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

NO SE TRABAJA POR SER DOMINGO DIA DE DESCANSO

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026
FECHA:	13 DE ABRIL DE 2026
NUMERO DE PAGINA:	0,7

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de desmonte de cielo razo existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de cubierta existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de demolicion de muro existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de demolicion de redoblon existente en mal estado en bloques de malaria

OBSERVACIONES

Algunos trabajadores no cuentan con Epps (3) se requiere que se le dote de los equipos de proteccion pertinentes

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	14 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	0,8

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	LLUVIOSO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de desmonte de cubierta existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de demolicion de muro existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de demolicion de redoblon existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizo comité tecnico en obra con supervisiores de la gobernacion, contratista de obra e interventoria

OBSERVACIONES

Durante el comité de obra del dia de hoy quedaron pendientes los siguientes puntos:

1,0 la interventoria revisar y entregar plan de trabajo del contratista de obra.

2,0 por parte de la supervision de la gobernacion de cordoba deberan suministrar informacion de donde sera la disposicion final de materiales desmontados
3,0 El contratista de obra debera entregar documentos de trabajadores con curso del alturas y ARL

Se presentaron lluvias fuertes en horas de la tarde por un tiempo de 1 hora, las cuales retrasaron la ejecucion de actividades.

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	15 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	0,9

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en bloque de malaria
Se realizan actividades de figurado y armado de acero para vigas de cimentacion en bloque de malaria

OBSERVACIONES

Se debe realizar el retiro de los escombros dado que se ha acumulado dado que se ha acumulado mucho en la zona de acopio lo cual genera contaminacion visual y reduccion de movilidad en las areas de trabajo.

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	16 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	10,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en bloque de malaria
Se realizan actividades de figurado y armado de acero para vigas de cimentacion en bloque de malaria

OBSERVACIONES

Se debe realizar el retiro de los escombros dado que se ha acumulado dado que se ha acumulado mucho en la zona de acopio lo cual genera contaminacion visual y reduccion de movilidad en las areas de trabajo.

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	17 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	11,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	LLUVIOSO

ACTIVIDADES REALIZADAS

MAÑANA

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en bloque de malaria
Se realizan actividades de figurado y armado de acero para vigas de cimentacion en bloque de malaria
Se realiza comité tecnico en obra con supervisiores de la gobernacion, contratista de obra e interventoria

TARDE

No se realizan actividades por las lluvias presentadas que afectaron el adecuado funcionamiento de las obras programadas.

OBSERVACIONES

Durante el comité de obra del dia de hoy quedaron pendientes los siguientes puntos:

1,0 la interventoria revisar y entregar plan de trabajo del contratista de obra.

2,0 por parte de la supervision de la gobernacion de cordoba deberan suministrar informacion de donde sera la disposicion final de materiales desmontados (ACTAS)

3,0 El contratista de obra debera entregar documentos de trabajadores con curso del alturas y ARL

Se debe realizar el retiro de los escombros dado que se ha acumulado dado que se ha acumulado mucho en la zona de acopio lo cual genera contaminacion visual y reduccion de movilidad en las areas de trabajo.

Interventoria solicita plano estructural cons sus respectivas memorias de los elementos estructurales donde se realizaran levante de los nuevos muros

Se presentaran lluvias intensas en horas de la tarde las cuales impidieron la ejecucion de actividades en horas de la tarde.

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA **NIT: 9020223563**	**BITACORA DIARIA DE OBRA**

CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	17 DE ABRIL DE 2026	**NUMERO DE PAGINA:**	12,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	**TARDE**
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para viga de cimentacion en bloque MALARIA
se realizan actividades de levante de muro en bloque de 0,10x0,40x0,20 en bloque MALARIA
Se realizan actividades de figurado y armado de acero para columnetas en bloque MALARIA
TARDE
No se realizan activiades por se sabado se trabaja de corrido hasta la 01:00pm

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	**ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA**

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	19 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	13,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

NO SE TRABAJA POR SER DOMINGO DIA DE DESCANSO

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	20 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	14,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

MAÑANA

se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para viga de cimentacion en bloque MALARIA
se realizan actividades de levante de muro en bloque de 0,10x0,40x0,20 en bloque MALARIA
se realizan actividades de instalacion de formaletas en madera para vaciado de columnetas de 0,10x0,20 en bloque MALARIA

TARDE

No se realizan actividades por acto protocolario de colocacion de primera piedra.

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	21 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	15,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para viga de cimentacion en bloque MALARIA
se realizan actividades de levante de muro en bloque de 0,10x0,40x0,20 en bloque MALARIA
se realizan actividades de instalacion de vaciado de concreto de 3,000 PSI para columnetas de 0,10x0,20 en bloque MALARIA
Se realizo comité tecnico en obra con supervisiores de la gobernacion, contratista de obra e interventoria

OBSERVACIONES

Durante el comité de obra del dia de hoy quedaron pendientes los siguientes puntos:

1,0 la interventoria revisar y entregar plan de trabajo del contratista de obra.
2,0 por parte de la supervision de la gobernacion de cordoba deberan suministrar informacion de donde sera la disposicion final de materiales desmontados (ACTA
3,0 El contratista de obra debera entregar documentos de trabajadores con curso del alturas y ARL
4,0 El contratista debera entregar planos estructurales finales
5,0 el contartista debera entregar estudio de niveles topograficos.

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	22 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	16,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizan actividades de localizacion trazado y replanteo con comision de topografia, ubicación de niveles de piso.
se realizan actividades de demolicion de plantilla existente en mal estado en areas exteriores, (lado CRUE)
Se realizan actividades de desmonte de cubierta en mal estado en 1 y segundo piso de bloque CRUE
Se realizan actividades de desmonte de puntos electricos en bloque MALARIA
Se realizan actividades de demolicion de bordillos existentes en mal estado en bloque Malaria

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	23 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	17,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizan actividades de localizacion trazado y replanteo con comision de topografia, ubicación de niveles de piso.
se realizan actividades de demolicion de plantilla existente en mal estado en areas exteriores, (lado CRUE)
Se realizan actividades de desmonte de cubierta en mal estado en 1 y segundo piso de bloque CRUE
Se realizan actividades de desmonte de puntos electricos en bloque MALARIA
Se realizan actividades de demolicion de bordillos existentes en mal estado en bloque Malaria

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	24 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	18,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	LLUVIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

MAÑANA

se realizan actividades de localizacion trazado y replanteo con comision de topografia, ubicación de niveles de piso.
se realizan actividades de demolicion de plantilla existente en mal estado en areas exteriores, (lado CRUE)
Se realizan actividades de desmonte de cubierta en mal estado en 1 y segundo piso de bloque CRUE
Se realizan actividades de desmonte de puntos electricos en bloque MALARIA
Se realizan actividades de demolicion de bordillos existentes en mal estado en bloque Malaria
Se realizo comité tecnico en obra con supervisiores de la gobernacion, contratista de obra e interventoria

TARDE

No se realizan actividades por las lluvias presentadas que afectaron correcto funcionamiento de las actividades programadas.

OBSERVACIONES

Durante el comité de obra del dia de hoy quedaron pendientes los siguientes puntos:

1,0 la interventoria revisar y entregar plan de trabajo del contratista de obra.
2,0 el contratista de obra debera entregar inventario de materiales desmontados
3,0 El contratista de obra debera entregar documentos de trabajadores con curso del alturas y ARL
4,0 el contartista de obra solicita a la entidad contratante que el cambio de porcentaje de cobro para obra ya que el indicado en contarto d eobra no concuerda con el indicado en la minuta cuando se licito el proyecto
5,0 Los supervisores de la gobernacion deberan revisar el plano planta arquitectonica general y definir detalles de acabados de pisos para tener en cuenta en el presupuesto

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	25 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	19.0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

MAÑANA

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en bloque MALARIA
se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para vigas de cimentacion en bloque MALARIA
se realizan actividades de levante de muro en cuchillas bloque MALARIA
Se realizan actividades de instalacion de formaletas en madera para columnetas en bloque MALARIA
se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para columnetas en bloque MALARIA
Se realizan actividades de armado de formaleta de madera para viga cinta en BLOQUE MALARIA
Se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para viga cinta en bloque MALARIA

TARDE

No se realizan actividades porque se trabaja de corrido hasta la 01:00pm por ser sabado.

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	26 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	20,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

NO SE TRABAJA POR SER DOMINGO DIA DE DESCANSO

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	27 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	21,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para viga cinta en bloque MALARIA

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en bloque MALARIA
se realizan actividades de levante de muro en cuchillas bloque MALARIA
Se realizan actividades de instalacion de formaletas en madera para columnetas en bloque MALARIA
se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para columnetas en bloque MALARIA
Se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de armado de formaleta de madera para viga cinta en BLOQUE MALARIA

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	28 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	22,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de armado de formaleta en madera para viga cinta en bloque MALARIA
se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para ditel en puertas y ventanas en bloque MALARIA
Se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizo comité tecnico en obra con supervisiores de la gobernacion, contratista de obra e interventoria

OBSERVACIONES

Durante el comité de obra del dia de hoy quedaron pendientes los siguientes puntos:

1,0 la interventoria revisar y entregar plan de trabajo del contratista de obra.
2,0 el contratista de obra debera entregar inventario de materiales desmontados
3,0 El contratista de obra debera entregar documentos de trabajadores con curso del alturas y ARL
4,0 el contartista de obra solicita a la entidad contratante que el cambio de porcentaje de cobro para obra ya que el indicado en contarto d eobra no concuerdc
5,0 Los supervisores de la gobernacion deberan revisar el plano planta arquitectonica general y definir detalles de acabados de pisos para tener en cuenta en el presupuesto

6,0 el contratistra de obra solicita el desalojo de las oficinas de (SDSD) para poder iniciar las actividades programadas dentro de la programacion de obra
7,0 El contratista de obra solicita el desalojo del parqueadero para poder iniciar las actividades programadas dentro de la programacion de obra

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	29 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	23,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de armado de formaleta en madera para viga cinta en bloque MALARIA
se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para ditel en puertas y ventanas en bloque MALARIA
Se realizan actividades de concreto de 3.000 PSI para viga cinta en bloque MALARIA

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	30 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	24,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de armado de formaleta en madera para viga cinta en bloque MALARIA
se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para ditel en puertas y ventanas en bloque MALARIA
Se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion andenes y zonas verdes exteriores
se realizan actividades de levante de muro en bloque MALARIA

OBSERVACIONES

Interventoria indentifica un area del levante de muro en el ala oeste que se encuentra desplomado y algunos bloques con fisuras, por lo cual se solicita volver a intalar el levante y cambiar los bloques fisurados para subsanar dicha observacion.

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	30 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	25.0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se realizaron actividades por ser dia civico en conmemoracion al trabajo.

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA	
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS	
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026	
FECHA:	02 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA: 26,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
LLUVIAS Y NUBLADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

MAÑANA

Se realizan actividades de armado de formaleta en madera para viga cinta en bloque MALARIA
se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para ditel en puertas y ventanas en bloque MALARIA
Se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para viga cinta en bloque MALARIA

TARDE

No se realizan actividades porque se trabaja de corrido hasta la 01:00pm por ser sabado.

OBSERVACIONES

El contratista subsana la observacion presentada respecto al desplome del levante en el lado oeste del CRUE

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	03 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	27,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

NO SE TRABAJA POR SER DOMINGO DIA DE DESCANSO

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	04 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	28,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de armado de formaleta en madera para viga cinta en bloque MALARIA
se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para ditel en puertas y ventanas en bloque MALARIA
Se realizan actividades de concreto de 3.000 PSI para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en andenes y jardineras para zonas verdes exteriores
se realizan actividades de levante de muro en bloque MALARIA

El contratista recibe mediante correo electronico citacion por parte de la secretaria de infraestructura departamental la citacion para comité tecnico presencial en la gobernacion de condoba programado para el dia 05 de mayo de 2026 a las 03:00pm

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	05 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	29,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en andenes y jardineras para zonas verdes exteriores
Se realizan actividades de armado y figurado de acero para vigas de cimentacion en andenes y jardineras de zonas verdes exteriores
se realizan actividades de armado de formaletas metalicas para vaceado de concreto para vigas de cimentacion de andenes y jardineras de zonas verdes exteriores
se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para vigas de cimentacion de andenes y jardineras de zonas verdes y exteriores
se realizan actividades de levante de muro en bloque MALARIA

El contratista recibe mediante correo electronico citacion por parte de la secretaria de infraestructura departamental la citacion para comité tecnico presencial en la gobernacion de condoba programado para el dia 05 de mayo de 2026 a las 03:00pm

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	06 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	30,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en andenes y jardineras para zonas verdes exteriores
Se realizan actividades de armado y figurado de acero para vigas de cimentacion en andenes y jardineras de zonas verdes exteriores
se realizan actividades de armado de formaletas metalicas para vaceado de concreto para vigas de cimentacion de andenes y jardineras de zonas verdes exteriores
se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para vigas de cimentacion de andenes y jardineras de zonas verdes y exteriores
se realizan actividades de levante de muro en bloque MALARIA

El contratista recibe mediante correo electronico citacion por parte de la secretaria de infraestructura departamental la citacion para comité tecnico presencial en la gobernacion de condoba programado para el dia 05 de mayo de 2026 a las 03:00pm

OBSERVACIONES

Interventoria solicita suspender la actividad de andenes, dado que en el comité con la gobernacion el dia anterior, la supervicion manifesto que se contemplara la reduccion o la eliminacion de este en el ala oeste del CRUE, sin embargo el contratista manifiesta que continuara con los trabajos dado que es lo contratado y se necesita para proteger los muros

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	07 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	31,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en andenes y jardineras para zonas verdes exteriores
Se realizan actividades de armado y figurado de acero para vigas de cimentacion en andenes y jardineras de zonas verdes exteriores
se realizan actividades de armado de formaletas metalicas para vaceado de concreto para vigas de cimentacion de andenes y jardineras de zonas verdes exteriores
se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para vigas de cimentacion de andenes y jardineras de zonas verdes y exteriores
se realizan actividades de levante de muro en bloque MALARIA

El contratista recibe mediante correo electronico citacion por parte de la secretaria de infraestructura departamental la citacion para comité tecnico presencial en la gobernacion de condoba programado para el día 05 de mayo de 2026 a las 03:00pm

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

ENSAYOS DE LABORATORIOS

Oficina principal: Cr 16 A #50-20 Barrio Monteverde -Montería – Córdoba

interventoriacrue@gmail.com

274

JV INGENIERÍA

NIT. 10 765 474-7

LA GEOTECNIA ES NUESTRA ESPECIALIDAD, LA CALIDAD ES NUESTRA GARANTÍA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

I.N.V. - 410

Casa 011A, B/ Horizonte
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES EN A EDIFICACIÓN DE UN NIVEL CRUE MONTERÍA -CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA


3000 PSI

CILINDRO	ESTRUCTURA	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	DATOS DE DIMENSIÓN				PESO (g)	Peso Unitario (Kg/cm3)							1				CUMPLE/NO CUMPLE
						h1 (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)									CARGA (Lbf)	CARGA (KN)	PSI	%	
1	VIGA CINTA	22/04/2026	29/04/2026	7	3000	30,1	15,1	179,1	5390,3	12536,0	2,326	X						64959	285,8	2340,3	78%	CUMPLE
2		22/04/2026	6/05/2026	14	3000	30,2	15,1	179,1	5408,2	12475,0	2,307				X			78547	345,6	2829,8	94%	CUMPLE
3	VIGA DE CIMENTACIÓN	29/04/2026	6/05/2026	7	3000	30,2	15,2	181,5	5480,0	12522,0	2,285					X		65012	286,1	2311,4	77%	CUMPLE
4		29/04/2026	13/05/2026	14	3000	30,1	15,0	176,7	5319,1	12288,0	2,310					X		75918	334,0	2771,7	92%	CUMPLE
5	VIGA DE CIMENTACIÓN	8/05/2026	15/05/2026	7	3000	30,0	15,1	179,1	5372,4	12690,0	2,362		X					63596	279,8	2291,1	76%	CUMPLE

Nota: Los especímenes de concreto fallados fueron suministros por el contratista

Nota: Los resultados presentados en este documento corresponden únicamente a los especímenes ensayados

Observaciones:



JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

275

OFICIOS ENVIADOS

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

Montería, 11 de mayo de 2026

al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: SI-CMA-012-2025_030
Fecha: 11 /05 /2026

Señores:
CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA
RL: MARIA ELENA RIVERA HOYOS
consorcioredvital@gmail.com
Montería – Córdoba

Referencia: Contrato de Interventoría No. SI-CMA-012-2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Asunto: SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA NO. 1

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades y en cumplimiento de las funciones de seguimiento y control ejercidas por esta interventoría, se hace necesario requerir la entrega del **Informe Mensual de Obra No. 1**, correspondiente al periodo comprendido entre el **07 de abril de 2026 y el 07 de mayo de 2026,** junto con los respectivos soportes y demás anexos derivados de la ejecución del contrato.

La entrega oportuna de dicho informe resulta indispensable para verificar el avance físico y contractual del proyecto, efectuar el seguimiento al cronograma de ejecución, revisar las actividades desarrolladas durante el periodo alcanzado y validar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas establecidas contractualmente.

Así mismo, la remisión de esta información permite a esta interventoría elaborar el correspondiente informe mensual de seguimiento y supervisión del contrato, el cual debe ser trasladado a la entidad contratante como parte de los entregables contractuales establecidos, garantizando de esta manera el adecuado cumplimiento de las obligaciones a cargo de la interventoría dentro de los plazos definidos.

En este sentido, la presente solicitud se realiza conforme a lo establecido en **la CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**, **numeral 12 del contrato de obra,** el cual establece *"Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EL DEPARTAMENTO le solicite."* … (Copiado y cursiva fuera del texto original).

En virtud de lo anterior, se solicita efectuar la entrega de la documentación con el fin de continuar con el debido proceso de seguimiento, control y verificación contractual por parte de esta interventoría.

Atentamente;

EINA REVUELTAS LOZANO
R.L CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

Montería, 16 de mayo de 2026

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: SI-CMA-012-2025_035
Fecha: 16 /05 /2026

Señores:
CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA
RL: MARIA ELENA RIVERA HOYOS
consorcioredvital@gmail.com
Montería – Córdoba

Referencia: Contrato de Interventoría No. SI-CMA-012-2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Asunto: SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA NO. 1, bajo el Contrato de Obra N° SI-LP-011-2025

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras funciones contractuales de seguimiento y control ejercidas por esta interventoría conforme a lo establecido en el Contrato de Obra N° SI-LP-011-2025 en la …" ***CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. numeral 12) Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EL DEPARTAMENTO le solicite.***" … (Copiado, negrilla y cursiva fuera del texto original). Cuya solicitud fue realizada en la comunicación con ***radicado No. SI-CMA-012-2025_030 de fecha 11/05/2026 con Asunto: SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA N°. 1***, vía correo electrónico del día 11/05/2026 (se anexa soporte).

Este requerimiento se hace bajo la premisa del período ya transcurrido y comprendido entre el **siete (7) de abril de 2026 fecha de inicio del proyecto y el siete (7) de mayo de 2026.**

Por lo cual, nuevamente reiteramos el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la entrega oportuna del informe mensual que permite mantener informado a la entidad contratante del avance físico y financiero del proyecto, el seguimiento y control al cronograma de ejecución de las actividades desarrolladas durante el periodo alcanzado y validar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas establecidas contractualmente.

Se le recuerda a la firma contratista CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA la remisión de esta información permite a esta interventoría elaborar el correspondiente informe mensual de seguimiento y supervisión del contrato, el cual debe ser trasladado a la entidad

contratante como parte de los entregables contractuales establecidos, garantizando de esta manera el adecuado cumplimiento de las obligaciones a cargo de esta interventoría.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el período mensual vence el día siete (7) de cada mes y del cual han transcurrido nueve (9) días calendario a corte de 16/05/2026 fecha del presente comunicado, solicitamos la entrega inmediata del informe mensual con toda la documentación, anexos y soportes que hacen parte de éste, para el día martes 19/05/2026.

Se anexa: Un (1) folio.

Atentamente;

LINA REVUELTAS LOZANO
R.L **CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE**

Gmail **CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE <interventoriacrue@gmail.com>**

SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA NO. 1.

1 message

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE <interventoriacrue@gmail.com> Mon, May 11, 2026 at 6:11 PM
To: consorcioredvital@gmail.com

Señores:

CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA
RL: MARIA ELENA RIVERA HOYOS
consorcioredvital@gmail.com
Montería – Córdoba

Referencia: Contrato de Interventoría No. SI-CMA-012-2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Asunto: SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA NO. 1.

Se adjunta oficio 030.

Att:

Lina Revueltas Lozano

R. L CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

030-Solicitud de entrega de Informe Mensual de Obra No. 1.pdf
203K

280

INFORME MENSUAL No. 1
SEGUIMIENTO PGIO

(PERÍODO: Del 7 de abril 2026 hasta el 7 de mayo de 2026)

CONTRATO DE No. SI-CMA-012-2025

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".





CONTENIDO:

1. Introducción: 3
2. OBJETIVOS: 4
2.1 Objetivo General: 4
2.2 Objetivos Específicos: 4
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 5
3.1 Localización: 6
4. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS: 7
4.1 Información general del contrato de obra: 7
4.2 Información general del contrato de interventoría: 7
5. SEGUIMIENTO AL PGIO 8
5.1 PERSONAL Y EQUIPO EN EL PERIODO 9
5.1.1 Personal y Equipos del Contratista: 9
5.1.2 Personal de la Interventoría: 9
5.2 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 10
5.2.1 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES 10
5.2.2 AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES 11
5.2.3 INGRESOS E INDUCCIONES 12
5.2.4 RETIRO DE PERSONAL 13
5.2.5 SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 17
5.3 SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL PELIGRO 17
5.3.1 CHARLAS Y CAPACITACIONES 18
5.3.2 SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES DE RIESGO 18
5.3.3 SEGUIMIENTO A LA MAQUINARIA Y VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES 20
5.3.4 SEGUIMIENTO A EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 20
5.4 GESTION DE LA SALUD 21
5.4.1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 22
5.4.2 ACCIDENTES DE TRABAJO 23
5.4.3 SEGUIMIENTO Y REVISIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN 23
5.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE EMERGENCIAS 24
5.5. GESTIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS 25
5.5.1 SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 26
5.5.2 SEGUIMIENTO A SEÑALIZACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL EN OBRA 26
5.6. ACTA DE COMITÉ Y/O REUNIONES: 27
5.7. CONCLUSIONES 28
5.8. ANEXOS 29

1. Introducción:

El presente Informe N.° 1 corresponde al período comprendido entre el 07 de abril de 2026 y el 07 de mayo de 2026, y tiene como finalidad presentar las actividades de seguimiento, control y verificación realizadas por la interventoría al Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) implementado por el contratista en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la Red Local de Urgencias de Córdoba mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física para el correcto funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE en el municipio de Montería".

Durante el período reportado, la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el PGIO, verificando la implementación de las medidas técnicas, ambientales, administrativas y de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas para el adecuado desarrollo de las actividades ejecutadas en obra, conforme a la normatividad vigente y demás lineamientos contractuales aplicables al proyecto.

Así mismo, se efectuó control y seguimiento a aspectos relacionados con manejo de residuos, señalización, condiciones de seguridad en obra, uso de elementos de protección personal, control operacional, documentación del personal, manejo de materiales, gestión ambiental y demás componentes asociados a la ejecución del proyecto.

En el presente informe se consolidan las observaciones, requerimientos y recomendaciones generadas por la interventoría como resultado de las visitas técnicas, comités de seguimiento y revisiones documentales realizadas durante el período evaluado, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo de las actividades y garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad requeridas para la ejecución del proyecto.

2. OBJETIVOS:

2.1 Objetivo General:

Realizar el seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) implementado por el contratista para el proyecto "Fortalecimiento de la Red Local de Urgencias de Córdoba mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física para el correcto funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE en el municipio de Montería", garantizando la adecuada implementación de las medidas técnicas, ambientales, administrativas y de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a las obligaciones contractuales, normatividad vigente y demás lineamientos aplicables durante la ejecución del proyecto.

2.2 Objetivos Específicos:

- Verificar la implementación y cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO), relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental, señalización, control operacional y demás aspectos aplicables durante la ejecución de las actividades en obra.

- Realizar seguimiento a las condiciones de seguridad en campo, uso adecuado de elementos de protección personal, control de riesgos y cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de promover condiciones seguras para el personal y terceros.

- Verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas por el contratista, incluyendo manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), disposición de materiales, señalización ambiental y demás obligaciones asociadas al componente ambiental del proyecto.

- Realizar seguimiento a la documentación, soportes y registros requeridos dentro de la ejecución del PGIO, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos contractuales y normatividad vigente aplicable al proyecto.

- Presentar las observaciones, requerimientos y recomendaciones generadas durante las actividades de seguimiento realizadas por la interventoría, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo de las actividades y al cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad requeridas para la ejecución del proyecto.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto "Fortalecimiento de la Red Local de Urgencias de Córdoba mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física para el correcto funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE en el municipio de Montería" tiene como propósito mejorar las condiciones físicas y operativas de las instalaciones destinadas al funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del departamento de Córdoba, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a situaciones de urgencia y emergencia.

La intervención contempla la ejecución de actividades de adecuación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente, con el fin de garantizar espacios funcionales, seguros y acordes con las necesidades operativas y administrativas requeridas para la prestación eficiente de los servicios desarrollados por el CRUE. Estas actividades incluyen obras civiles, adecuaciones locativas, mejoramiento de acabados, mantenimiento y optimización de redes eléctricas, hidrosanitarias y demás componentes necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

El proyecto busca optimizar las condiciones de operación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, fortaleciendo los procesos de coordinación, regulación y referencia de pacientes dentro de la red hospitalaria del departamento de Córdoba, permitiendo una atención más eficiente, oportuna y organizada para la comunidad.

Así mismo, mediante la ejecución de las actividades planteadas, se pretende garantizar mejores condiciones de infraestructura para el personal operativo y administrativo, promoviendo espacios adecuados para el desarrollo de las funciones institucionales y contribuyendo al fortalecimiento de la red pública de atención en salud del departamento.

La interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica realizará el seguimiento y control integral del proyecto, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones contractuales, cronogramas establecidos y normatividad vigente aplicable durante la ejecución de las actividades contratadas.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato, el plazo de ejecución de la interventoría corresponde a CINCO (5) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual. Durante este período, la interventoría realizará el seguimiento continuo a la ejecución física, administrativa y financiera del proyecto, generando los respectivos informes y recomendaciones técnicas que permitan garantizar el adecuado desarrollo de las obras.

El valor del contrato de interventoría asciende a la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($179.866.682), recursos destinados a garantizar el correcto ejercicio de las actividades de seguimiento y control requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y el fortalecimiento de la infraestructura física del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE del municipio de Montería.

3.1 Localización:

El proyecto objeto de interventoría se encuentra localizado en el departamento de Córdoba, en el municipio de Montería, específicamente en el barrio Los Laureles, entre las calles 42 y 43 con carrera 8A, identificado con el número 4 de la manzana 17, en las instalaciones donde actualmente funcionan el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE y el programa de Malaria.

La ubicación del proyecto corresponde a un punto estratégico dentro del municipio, destinado a la coordinación y regulación de los servicios de urgencias y emergencias del departamento de Córdoba, permitiendo el fortalecimiento de la capacidad operativa y funcional de la red de atención en salud mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física existente.



Imagen 1. Localización del proyecto a Construir en el Municipio de Monteria – Cordoba.

4. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

4.1 Información general del contrato de obra:

CONTRATO No.	CONTRATO No. SI-LP-011-2025
OBJETO:	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DE CORDOBA
VALOR:	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.764.759.464,00)
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	07 ABRIL DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 1: Información General del contrato de obra.

4.2 Información general del contrato de interventoría:

CONTRATO No.	SI-CMA-012-2025
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DE CORDOBA
VALOR:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 179.866.682).
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	07 ABRIL DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 2: Información General del contrato de Interventoría.

5. SEGUIMIENTO AL PGIO

En el marco de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 07 de abril y el 07 de mayo de 2026, la interventoría realizó seguimiento a la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) ejecutado por el contratista Consorcio Red Vital Córdoba, en el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA". La Interventoría evidenció que estas actividades continúan desarrollándose como parte de la estrategia de promoción y prevención implementada en el proyecto, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura de autocuidado y al mejoramiento de las condiciones de seguridad en los diferentes frentes intervenidos.

El seguimiento efectuado por la interventoría estuvo orientado a verificar en campo y mediante revisión documental el cumplimiento de las acciones relacionadas con la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, control operativo, condiciones de seguridad del personal y aplicación de las medidas preventivas establecidas para las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado.

Durante las visitas de seguimiento realizadas, se verificaron aspectos asociados al proceso constructivo y a la implementación del SG-SST, entre ellos: afiliación y cobertura del personal al Sistema General de Seguridad Social, inducciones y notificación de riesgos, uso de elementos de protección personal, inspecciones de seguridad, orden y aseo en las áreas de trabajo, señalización preventiva, almacenamiento de herramientas y sustancias químicas, implementación de medidas de atención de emergencias, así como el seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores y control de actos y condiciones inseguras.

Así mismo, la interventoría evidenció el desarrollo de actividades preliminares correspondientes a localización y replanteo, desmontes de cielo raso, puertas, ventanas y aparatos sanitarios, entre otras labores iniciales contempladas dentro del alcance contractual del proyecto.

La información presentada a continuación corresponde al análisis y verificación realizada por la interventoría, teniendo en cuenta las condiciones operativas del proyecto, las actividades desarrolladas durante el periodo y los riesgos inherentes a las labores ejecutadas en las instalaciones del CRUE del municipio de Montería, Córdoba.

5.1 PERSONAL Y EQUIPO EN EL PERIODO

5.1.1 Personal y Equipos del Contratista:

Durante el período comprendido entre el 07 de abril y el 07 de mayo de 2026, el contratista contó con el personal técnico, administrativo y operativo requerido para la ejecución de las actividades programadas en obra, conforme a lo establecido en los documentos contractuales y requerimientos del proyecto.

La interventoría realizó seguimiento y verificación documental al personal vinculado al proyecto, mediante la revisión de las planillas y soportes presentados por el contratista, evidenciando la afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal relacionado para la ejecución de las actividades en obra.

PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN OBRA		
N°	CARGO	NOMBRE
1	Director de Obra	Jesús Orlando Sandoval Arciniegas
2	Ingeniero Residente	Carmen Ana Garces Negrete
3	Especialista en Seguridad Industrial y/o salud ocupacional	María González Ayuz
4	Ing. Eléctrico	Daniel José Corrales Paternina
5	Auxiliar administrativo	Ipatia Rovira Villalobos

El contratista dispuso igualmente de los equipos y herramientas requeridas para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el período reportado, conforme a las necesidades operativas del proyecto.

EQUIPO Y HERRAMIENTA EN OBRA		
N°	EQUIPOS	TOTAL
1	Equipo de Topografía (estación, nivel, GPS)	1
2	Volquetas	1
3	Mescladora de concreto	1
4	Herramientas menores	10

5.1.2 Personal de la Interventoría:

Durante el período reportado, la interventoría dispuso del personal profesional y técnico necesario para realizar las actividades de seguimiento, control y verificación del cumplimiento técnico, administrativo y contractual del proyecto, garantizando el acompañamiento requerido para la adecuada ejecución de las actividades desarrolladas en obra.

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA		
N°	CARGO	NOMBRE
1	Director de Interventoría	Climaco Miguel Rodríguez Julio

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA		
N°	CARGO	NOMBRE
2	Residente de Interventoría	Maria Luisa Laza Vega
3	Profesional SISO	Samir Andrés Rodríguez Baza
4	Auxiliar administrativo	Joaquin Alfredo García Mendoza
5	Contador	Lina Paola Revueltas Lozano

Como soporte de la vinculación y cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social Integral del personal de la interventoría, se adjunta la respectiva planilla de pago donde se evidencia la afiliación y aportes realizados al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, el Decreto 1072 de 2015 y demás disposiciones aplicables.

Ver Anexo 1. Planilla de pago de Seguridad Social Integral.

5.2 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento a la gestión de los recursos dispuestos por el contratista Consorcio Red Vital Córdoba para la ejecución del proyecto, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) y los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en la Resolución 0312 de 2019, específicamente en lo relacionado con la asignación y administración de recursos para la implementación del SG-SST.

El seguimiento efectuado estuvo orientado a evaluar la disponibilidad y suficiencia de los recursos humanos, técnicos, físicos y operativos requeridos para el desarrollo de las actividades constructivas bajo condiciones seguras y controladas, conforme a las necesidades identificadas durante la ejecución del proyecto.

Durante las visitas de seguimiento, la interventoría evidenció la designación del recurso humano responsable de la implementación del SG-SST, así como la disponibilidad de personal profesional, técnico y operativo para el desarrollo de las actividades preliminares ejecutadas en obra. De igual manera, se verificó la afiliación del personal al Sistema General de Seguridad Social, conforme al nivel de riesgo asociado a las labores desempeñadas.

5.2.1 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES

Durante el periodo comprendido entre el 07 de abril y el 07 de mayo de 2026, la interventoría realizó seguimiento y verificación a la asignación de responsables definidos por el contratista Consorcio Red Vital Córdoba para la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás requisitos normativos aplicables.

Como parte de las actividades de seguimiento, se verificó la asignación del profesional responsable del SG-SST para el proyecto, evidenciando que el contratista cuenta con profesional

encargado de liderar las actividades relacionadas con la implementación, seguimiento y control de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las actividades de obra.

La interventoría realizó revisión documental de los soportes asociados a la asignación de responsabilidades, incluyendo acto de designación, licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y certificados de formación requeridos para el desempeño de las funciones asignadas, conforme a las exigencias normativas aplicables al proyecto.

5.2.2 AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento a la afiliación del personal vinculado al proyecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social, conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás disposiciones normativas aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En desarrollo de las actividades de seguimiento, se evidenció que el contratista Consorcio Red Vital Córdoba realizó la afiliación del personal al sistema general de riesgos laborales, de acuerdo con el nivel de riesgo correspondiente a las actividades desempeñadas dentro del proyecto. Así mismo, se verificó que el personal operativo vinculado a las labores ejecutadas en obra se encontraba afiliado a la ARL en nivel de riesgo V, mientras que el personal administrativo fue afiliado conforme al nivel de riesgo aplicable a sus funciones.

La interventoría realizó verificación documental de los soportes de afiliación del personal vinculado al proyecto, como parte de las actividades de control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual manera, durante las visitas de seguimiento realizadas en obra, se verificó la presencia del personal reportado y su correspondencia con las actividades ejecutadas en el periodo, evidenciando cumplimiento frente a los requerimientos mínimos asociados a la protección y cobertura del personal vinculado al proyecto.

Así mismo, se realizó la afiliación del CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE a la Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA, como parte del cumplimiento de las obligaciones legales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ver Anexo 2. Certificado de afiliación ARL SURA.

De igual manera, la interventoría presenta los soportes correspondientes a la afiliación del personal de interventoría al Sistema General de Seguridad Social Integral y a la Administradora de Riesgos Laborales, como evidencia del cumplimiento de las obligaciones legales aplicables al personal vinculado al contrato. Ver Anexo 1. Planilla de pago de Seguridad Social Integral y Ver Anexo 3. Soportes de afiliación ARL personal de interventoría.

5.2.3 INGRESOS E INDUCCIONES

Durante el periodo comprendido entre el 07 de abril y el 07 de mayo de 2026, la interventoría realizó seguimiento a las actividades de ingreso, inducción y control documental del personal vinculado al proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA", verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

Durante el periodo evaluado, la interventoría evidenció el ingreso de personal profesional, técnico y operativo vinculado por el contratista Consorcio Red Vital Córdoba para el desarrollo de las actividades preliminares ejecutadas en obra, relacionadas con localización y replanteo, desmontes y adecuaciones iniciales contempladas dentro del alcance contractual del proyecto.

Como parte del seguimiento realizado, se verificó la ejecución de las jornadas de inducción y reinducción dirigidas al personal vinculado al proyecto, las cuales incluyeron temas relacionados con normas generales de obra, identificación de peligros y riesgos, uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), procedimientos de trabajo seguro, atención de emergencias, notificación de actos y condiciones inseguras y lineamientos generales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La interventoría verificó los respectivos soportes documentales asociados al proceso de ingreso del personal, incluyendo registros de inducción, notificación de riesgos y demás documentos requeridos para el inicio de actividades en obra. Así mismo, se efectuó seguimiento a la entrega de dotación y elementos de protección personal, evidenciando que el personal vinculado contaba con los elementos requeridos para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado.

En la siguiente tabla se relacionan los ingresos y retiros de personal registrados durante el periodo evaluado, indicando los respectivos cargos desempeñados dentro del proyecto.

INGRESOS Y RETIROS 07 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2026		
NOVEDAD / AREA	INGRESOS	RETIROS
Administrativa	5	0
Operativa	14	1
Operadores y conductores	0	0
TOTAL	20	1

Así mismo, el personal vinculado por la interventoría recibió la respectiva inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, con el propósito de socializar los riesgos asociados a las actividades del proyecto, medidas de prevención, controles operacionales, uso adecuado de elementos de protección personal y disposiciones aplicables durante la ejecución de las actividades en obra.

Como soporte de lo anterior, la interventoría presenta los registros y evidencias correspondientes a las inducciones realizadas al personal vinculado al contrato. Ver Anexo 4. Soportes de inducción personal de interventoría.

5.2.4 RETIRO DE PERSONAL

Durante el periodo evaluado se presentó el retiro de un (1) trabajador vinculado al proyecto ejecutado por el contratista Consorcio Red Vital Córdoba.

A la fecha de corte del presente informe, la interventoría se encuentra a la espera del reporte y los soportes correspondientes al proceso de retiro del trabajador, incluyendo examen médico de egreso y paz y salvo respectivo, con el fin de verificar el cierre adecuado del proceso de desvinculación laboral, conforme a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normatividad vigente aplicable.

La interventoría realizó seguimiento al movimiento de personal durante el periodo evaluado, verificando la correspondencia entre el personal reportado y las actividades desarrolladas en obra, en atención a las condiciones operativas y requerimientos del proyecto.

En la tabla anterior se evidencia la relación del personal retirado durante el periodo evaluado.

El siguiente gráfico presenta el comportamiento mensual del personal vinculado al proyecto durante el periodo evaluado, teniendo en cuenta el personal que participó en la ejecución de las actividades desarrolladas en obra.



El gráfico evidencia el comportamiento del personal vinculado al proyecto durante el periodo comprendido entre el 07 de abril y el 07 de mayo de 2026, observándose un incremento significativo en la cantidad de trabajadores al inicio de la etapa operativa del proyecto.

Para el mes de abril de 2026 se registra un total de dieciocho (18) trabajadores vinculados, cifra que se mantiene para el mes de mayo de 2026, lo cual refleja estabilidad en la planta de personal requerida para la ejecución de las actividades preliminares y operativas desarrolladas durante el periodo evaluado.


La permanencia del número de trabajadores evidencia que el contratista Consorcio Red Vital Córdoba mantuvo la disponibilidad del recurso humano necesario para atender los frentes de trabajo activos, garantizando continuidad en la ejecución de las actividades programadas y en la implementación de las medidas asociadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con el consolidado del periodo evaluado, el proyecto cuenta con un total de dieciocho (18) trabajadores activos vinculados para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 07 de abril y el 07 de mayo de 2026.

La distribución del personal evidencia que cinco (5) trabajadores corresponden a personal administrativo y trece (13) a personal operativo, siendo este último el de mayor participación dentro de la ejecución del proyecto, debido a las actividades preliminares y operativas desarrolladas en obra.

Lo anterior refleja que aproximadamente el 72% del personal activo corresponde a personal operativo, mientras que el 28% pertenece al componente administrativo, comportamiento que resulta coherente con la etapa de ejecución del proyecto y las necesidades operativas requeridas para el desarrollo de las actividades en campo.


PERSONAL CONTRATADO	
NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD
PERSONAL ADMINISTRATIVO	5
PERSONAL OPERATIVO	13
TOTAL	17

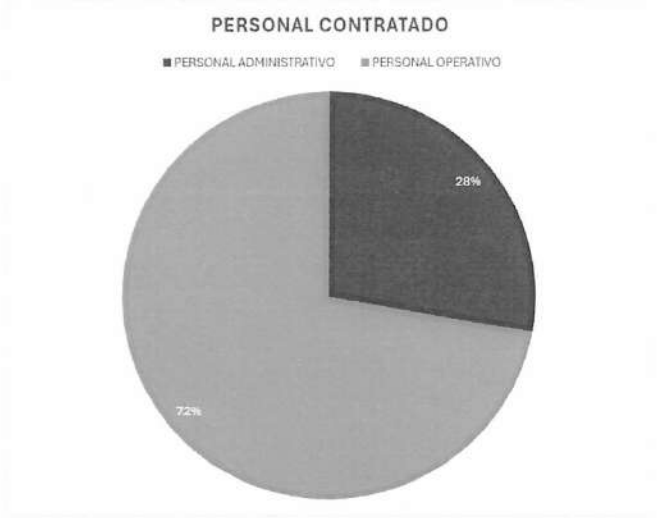


En relación con el tipo de mano de obra vinculada las GD 104 y GD 105 Puerto Libertador I y II, se observa una mayor participación de personal calificado, que representa el 71 % del total. Asimismo, se destaca la incorporación de mujeres en este grupo. A continuación, se presenta la distribución detallada.

TIPO DE MANO DE OBRA			
MANO DE OBRA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL

CALIFICADA	8	8	11
NO CALIFICADA	7	0	7
TOTAL			18

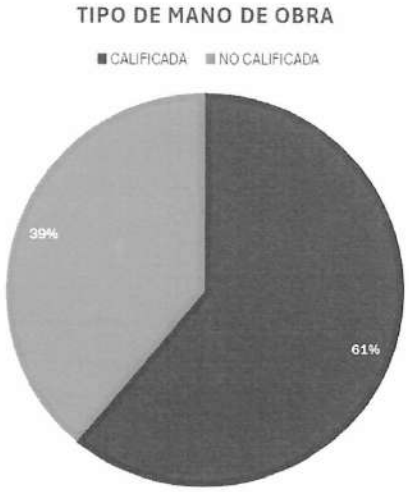

Finalmente, la información anteriormente descrita se presenta de manera gráfica, facilitando la visualización de la distribución del personal por cargos durante el periodo evaluado.

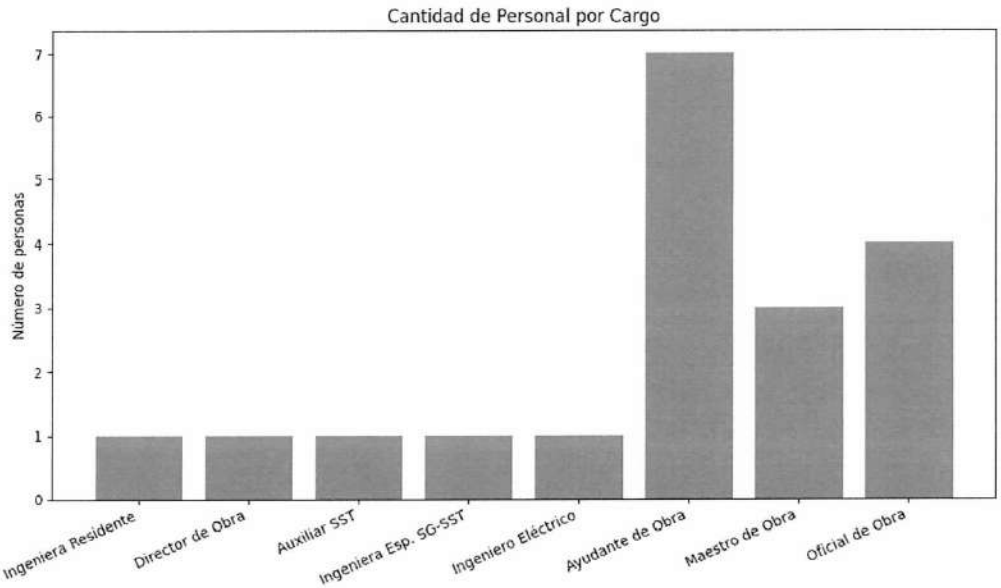

5.2.5 SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó seguimiento a la entrega y control de la dotación y elementos de protección personal suministrados por el CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA al personal vinculado al proyecto, verificando el cumplimiento de las medidas establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el PGIO.

La verificación efectuada estuvo orientada a constatar que los trabajadores contaran con los elementos de protección personal requeridos de acuerdo con las actividades ejecutadas en obra y los riesgos asociados a las mismas, promoviendo el uso adecuado de dichos elementos como medida preventiva frente a la exposición a peligros mecánicos, locativos, físicos y biomecánicos presentes durante la ejecución de las labores.

Así mismo, la Interventoría evidenció la existencia de registros de entrega de EPP y la implementación de inspecciones de seguridad orientadas a verificar el estado, uso, conservación y disponibilidad de los elementos suministrados al personal.

De acuerdo con las inspecciones realizadas durante el periodo evaluado, se efectuó seguimiento a los siguientes elementos:

5.3 SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL PELIGRO

Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento a la implementación de las actividades asociadas a la gestión del peligro y control operacional ejecutadas por el contratista Consorcio Red Vital Córdoba, verificando el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Como parte de este seguimiento, se efectuó control y verificación a la ejecución de charlas de seguridad, inducciones, inspecciones de seguridad, control del uso de elementos de protección personal, orden y limpieza en las áreas de trabajo, inspecciones de herramientas y equipos, así como seguimiento a las condiciones generales de seguridad implementadas durante el desarrollo de las actividades ejecutadas en obra.

Así mismo, la interventoría evidenció la implementación de medidas orientadas a la identificación de peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles preventivos, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones de seguridad y prevención de incidentes y accidentes de trabajo durante el periodo evaluado.

5.3.1 CHARLAS Y CAPACITACIONES

Durante el período comprendido entre el 07 de abril y el 07 de mayo de 2026, la Interventoría realizó seguimiento al cumplimiento del Programa de Inducción, Capacitación y Promoción de Estilos de Vida y Trabajo Saludable implementado por el contratista CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA, evidenciando la ejecución de actividades de socialización y capacitación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigidas al personal vinculado al proyecto.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Interventoría, se evidenció la realización de inducciones y socializaciones relacionadas con:

N°	Charla / Capacitación	Número de asistentes
1	Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas	16
2	Socialización de riesgos asociados a las actividades constructivas	16
3	Pausas activas saludables	16
4	Promoción del autocuidado y estilos de vida saludable	16
5	Notificación de actos y condiciones inseguras	16
6	Prevención y preparación para emergencias	16
7	Uso de extintores	16
8	Primeros auxilios	16
9	Evacuación y atención de emergencias	16
10	Habilidades de comunicación y resolución de conflictos	16

Así mismo, se verificó la existencia del Cronograma de Capacitaciones correspondiente al SG-SST, donde se programaron actividades periódicas de formación, seguimiento al cronograma anual de capacitaciones y actividades de promoción de estilos de vida y trabajo saludable.

La Interventoría constató que dichas actividades fueron implementadas como parte de las medidas de control y prevención establecidas dentro del PGIO y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto.

5.3.2 SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES DE RIESGO

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó seguimiento a la implementación de las notificaciones de riesgo ejecutadas por el CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA, verificando el

cumplimiento de las actividades de identificación, socialización y control de riesgos asociados a las labores desarrolladas en obra.

La verificación efectuada estuvo orientada a constatar que el personal vinculado al proyecto conociera los peligros presentes en las actividades ejecutadas, así como las medidas preventivas y controles establecidos para la ejecución segura de las labores, conforme a los lineamientos definidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el PGIO.

Así mismo, la Interventoría evidenció el diligenciamiento y socialización de formatos de notificación de riesgos asociados a las actividades preliminares, desmontes, demoliciones, excavaciones y manejo de herramientas y equipos desarrollados durante el periodo evaluado.

A continuación, se presenta el consolidado de las notificaciones de riesgo socializadas durante el periodo evaluado:

N°	Notificación de Riesgo	Cantidad de personas notificadas
1	Riesgos mecánicos asociados al uso de herramientas y equipos	16
2	Riesgos locativos derivados de áreas en demolición y tránsito de personal	16
3	Riesgos biomecánicos asociados a manipulación de cargas y posturas prolongadas	16
4	Riesgos físicos asociados a exposición solar, ruido y material particulado	16
5	Riesgos eléctricos derivados de desmontes e intervenciones de instalaciones eléctricas	16
6	Medidas preventivas para orden y limpieza en áreas de trabajo	16
7	Uso adecuado de elementos de protección personal	16
8	Reporte de actos y condiciones inseguras	16

Adicionalmente, la Interventoría realizó recomendaciones específicas al contratista para el personal que ejecutará trabajos en alturas, señalando que deben cumplir con la capacitación como trabajador autorizado según lo estipulado en la Resolución 4272 de 2021, así como contar con los equipos de prevención y protección contra caídas y los equipos de acceso seguro necesarios para la ejecución de labores en altura.

En términos generales, la Interventoría evidenció cumplimiento en la implementación de las notificaciones de riesgo realizadas durante el periodo evaluado, observando que estas fueron utilizadas como herramienta preventiva para fortalecer el control de riesgos y promover condiciones seguras durante la ejecución de las actividades desarrolladas en obra.

5.3.3 SEGUIMIENTO A LA MAQUINARIA Y VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó seguimiento a las condiciones de ingreso, control documental y verificación preoperacional de la maquinaria y vehículos utilizados para el desarrollo de las actividades ejecutadas en obra.

De acuerdo con el seguimiento realizado, hasta la fecha no se evidenció el ingreso permanente de maquinaria amarilla o equipos pesados al proyecto; sin embargo, se verificó el ingreso y operación de una volqueta utilizada para la recolección y transporte de residuos de construcción y demolición (RCD), destinados a disposición final autorizada.

La Interventoría constató la verificación documental de la volqueta y del conductor autorizado para la operación del vehículo, evidenciando cumplimiento de los requisitos exigidos para el ingreso a obra, conforme a los lineamientos establecidos dentro del PGIO y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Así mismo, se evidenció que el contratista realizó la solicitud y validación de los documentos correspondientes a la volqueta, incluyendo SOAT, revisión técnico-mecánica, licencia de tránsito y documentación del conductor.

A continuación, se presenta el consolidado de la documentación verificada para el ingreso de la volqueta al proyecto:

MAQUINARIA / VEHÍCULO	MARCA	MODELO	IDENTIFICACIÓN	N° MOTOR	N° SERIE / CHASIS	TIPO	SOAT	REVISIÓN TECNICOMECÁNICA	CONDUCTOR	LICENCIA DE CONDUCCIÓN
Volqueta placa UIJ689	Ford	1952	UIJ689	FE6-111450C	F8K2HM54904	Volqueta	Cumple – Vigencia hasta 24/03/2027	Cumple – Vigencia hasta 08/09/2026	Manuel Enrique Velásquez Mestra C.C. 1.067.891.687	Licencia categoría C2 – Vigencia hasta 01/01/2035

En términos generales, la Interventoría evidenció cumplimiento en el proceso de control documental y verificación preoperacional del vehículo utilizado durante el periodo evaluado, garantizando condiciones seguras para el ingreso y operación de la volqueta dentro del proyecto.

5.3.4 SEGUIMIENTO A EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó seguimiento al control, uso e inspección de las herramientas y equipos utilizados para el desarrollo de las actividades ejecutadas en obra, verificando la implementación de medidas preventivas orientadas a minimizar riesgos mecánicos, locativos y operacionales asociados al uso de herramientas manuales y equipos menores.

De acuerdo con el seguimiento realizado, se evidenció que el contratista efectuó el inventario de herramientas y equipos utilizados durante el periodo, así como inspecciones de seguridad orientadas a verificar el estado operativo, condiciones de almacenamiento, mantenimiento, orden

y limpieza de los elementos empleados en las actividades constructivas.

Así mismo, la Interventoría verificó que las herramientas utilizadas durante las actividades preliminares y de demolición contaran con condiciones adecuadas para su operación y manipulación segura por parte de los trabajadores.

A continuación, se presenta el consolidado de equipos y herramientas verificadas durante el periodo evaluado:

N°	Herramienta / Equipo	Cantidad	Estado
1	Pulidora	2	Bueno
2	Taladro	2	Bueno
3	Rotomartillo	2	Bueno
4	Extensiones	3	Bueno
5	Trompo	1	Bueno
6	Bombas	7	Bueno
7	Palas	70	Bueno
8	Pala draga	2	Bueno
9	Palas (sin palo)	3	Bueno
10	Monas	2	Bueno
11	Palines	2	Bueno
12	Carretas buggy	5	Bueno

5.4 GESTION DE LA SALUD

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión de la salud implementadas por el CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Las actividades de seguimiento estuvieron orientadas a la verificación de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, realización de evaluaciones médicas ocupacionales, seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores y ejecución de actividades de promoción y prevención, con el propósito de contribuir al bienestar físico de los trabajadores y prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales asociadas a las actividades desarrolladas en obra.

Así mismo, la Interventoría efectuó revisión documental y control sobre los soportes relacionados con medicina preventiva y del trabajo, evidenciando la implementación de medidas orientadas al seguimiento de condiciones de salud, control de ausentismo, aplicación de perfil sociodemográfico, seguimiento a enfermedades laborales y establecimiento de medidas preventivas frente a los riesgos identificados en el proyecto.

De igual manera, se verificó la implementación de actividades enfocadas en la promoción y prevención de la salud, tales como pausas activas, puntos de hidratación, inspecciones de botiquín y seguimiento a condiciones de trabajo y salud, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones de bienestar y seguridad del personal vinculado al proyecto.

5.4.1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó seguimiento a la ejecución de las actividades asociadas al Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo implementado por el CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA, orientadas al control y seguimiento de las condiciones de salud del personal vinculado al proyecto.

La Interventoría verificó que los trabajadores contaran con afiliación vigente al Sistema General de Seguridad Social, evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso y seguimiento a las condiciones de salud, conforme a los riesgos asociados a las actividades desarrolladas en obra.

Así mismo, se evidenció la ejecución de actividades relacionadas con perfil sociodemográfico, control de ausentismo laboral, seguimiento a enfermedades laborales, control de condiciones de salud y aplicación de medidas preventivas orientadas a minimizar la ocurrencia de enfermedades derivadas de las actividades constructivas.

De igual manera, la Interventoría verificó la implementación de medidas de promoción y prevención de la salud, tales como pausas activas, puntos de hidratación y seguimiento a condiciones de trabajo y salud, contribuyendo al fortalecimiento de las condiciones de bienestar y seguridad del personal durante el periodo evaluado.

En términos generales, la Interventoría evidenció que durante el periodo evaluado se dio cumplimiento a las actividades establecidas dentro del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo, observándose seguimiento continuo a las condiciones de salud del personal y la implementación de medidas preventivas orientadas a proteger el bienestar de los trabajadores durante la ejecución de las actividades en obra.

5.4.2 ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante el periodo evaluado no se registraron accidentes de trabajo en las actividades ejecutadas dentro del proyecto.

La Interventoría realizó seguimiento a la implementación de las medidas preventivas y controles de seguridad establecidos por el contratista, evidenciando la aplicación de actividades de inspección, socialización de riesgos, uso de elementos de protección personal y control de condiciones inseguras durante la ejecución de las labores en obra.

Así mismo, se verificó el desarrollo de actividades orientadas a la prevención de incidentes y fortalecimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo al mantenimiento de entornos de trabajo seguros para el personal vinculado al proyecto.

En general, la Interventoría evidenció cumplimiento en la implementación de medidas de prevención y control orientadas a minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo durante el periodo evaluado.

5.4.3 SEGUIMIENTO Y REVISIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó seguimiento a los indicadores de gestión establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando el comportamiento de los indicadores relacionados con accidentalidad, enfermedad laboral y ausentismo laboral, conforme a los lineamientos definidos en la Resolución 0312 de 2019.

Los indicadores objeto de seguimiento correspondieron a:

Indicador	Fórmula según Resolución 0312 de 2019	Datos utilizados	Resultado
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo × 200.000) / Horas hombre trabajadas	(0 × 200.000) / 4.320 horas trabajadas*	0
Severidad de accidentalidad	(Número de días perdidos por accidentes de trabajo × 200.000) / Horas hombre trabajadas	(0 × 200.000) / 4.320 horas trabajadas	0
Proporción de accidentes de trabajo mortales	(Número de accidentes mortales / Número total de accidentes de trabajo) × 100	(0 / 0) × 100	0%
Prevalencia de enfermedad laboral	(Número de casos de enfermedad laboral existentes × 100) / Número total de trabajadores	(0 × 100) / 18 trabajadores	0%

Indicador	Fórmula según Resolución 0312 de 2019	Datos utilizados	Resultado
Incidencia de enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral × 100) / Número total de trabajadores	(0 × 100) / 18 trabajadores	0%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por causa médica × 100) / Número de días laborados	(0 × 100) / 540 días laborados**	0%

De acuerdo con la información verificada durante el periodo evaluado, no se presentaron accidentes de trabajo, casos asociados a enfermedad laboral ni ausentismo laboral del personal vinculado al proyecto.

Así mismo, la Interventoría verificó el seguimiento realizado por el contratista a los indicadores establecidos dentro del PGIO, evidenciando el control y actualización de la información correspondiente al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En general, los indicadores de gestión se mantuvieron dentro de condiciones favorables durante el periodo evaluado, reflejando control sobre los riesgos asociados a las actividades ejecutadas y cumplimiento de las medidas preventivas implementadas en obra.

5.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó seguimiento a la implementación de las medidas establecidas dentro del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias implementado por el CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA, verificando la disponibilidad de recursos y elementos necesarios para la atención oportuna de posibles situaciones de emergencia durante la ejecución de las actividades en obra.

Como parte de las actividades de verificación, se evidenció que el proyecto cuenta con equipos básicos de emergencia y señalización preventiva, incluyendo botiquín, camilla, extintores, rutas de evacuación y punto de encuentro, los cuales se encuentran instalados e identificados para su fácil acceso y utilización en caso de emergencia.

Así mismo, la Interventoría verificó la realización de inspecciones de seguridad a los equipos de emergencia y elementos de señalización, evidenciando seguimiento al estado y condiciones de los equipos instalados en obra, con el fin de garantizar su disponibilidad y funcionamiento durante el periodo evaluado.

A continuación, se presenta el consolidado de los equipos de emergencia verificados durante el periodo evaluado:

N°	Equipo de emergencia	Cantidad	Estado	Inspección realizada
1	Camilla	1	Bueno	Se verificó estado físico, ubicación y disponibilidad
2	Extintor	1	Bueno	Se verificó manómetro, señalización y fecha de vigencia
3	Botiquín de emergencia	1	Bueno	Se verificó dotación, estado y disponibilidad de elementos

De igual manera, se evidenció la socialización de temas relacionados con atención de emergencias, rutas de evacuación y mecanismos de respuesta ante incidentes, mediante actividades de inducción y charlas de seguridad dirigidas al personal vinculado al proyecto.

En general, la Interventoría evidenció cumplimiento en la implementación de las medidas contempladas dentro del Plan de Emergencias, observándose disponibilidad de equipos básicos, señalización e inspecciones periódicas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias durante la ejecución de las actividades en obra.

5.5. GESTIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS

Durante el período evaluado, la interventoría realizó seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas por el contratista para el manejo de los residuos generados durante la ejecución de las actividades de obra, verificando el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) y demás lineamientos ambientales aplicables al proyecto.

En desarrollo de las visitas técnicas y actividades de seguimiento efectuadas en campo, se verificó la implementación de acciones orientadas al manejo adecuado de residuos de construcción y demolición (RCD), almacenamiento temporal de materiales y control de condiciones de orden y aseo en las áreas intervenidas, con el propósito de prevenir afectaciones ambientales y garantizar condiciones adecuadas durante la ejecución de las actividades constructivas.

Así mismo, la interventoría realizó seguimiento a la disposición y retiro de materiales generados en obra mediante vehículos tipo volqueta, verificando la remisión de soportes relacionados con el cargue, transporte y manejo de materiales y residuos derivados de las actividades ejecutadas durante el período reportado.

De igual manera, se verificó la implementación de señalización preventiva y punto ecológico para la segregación temporal de residuos sólidos generados en obra, promoviendo el adecuado manejo y clasificación de los residuos conforme a las condiciones operativas del proyecto.

Como resultado del seguimiento realizado, la interventoría efectuó observaciones y requerimientos orientados al fortalecimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas por el contratista, especialmente frente al control operacional, disposición de materiales y mantenimiento de condiciones adecuadas de limpieza y organización en las áreas de trabajo.

5.5.1 SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Durante el período evaluado, la interventoría realizó seguimiento al manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados durante la ejecución de las actividades de adecuación y rehabilitación desarrolladas en obra, verificando las acciones implementadas por el contratista para el retiro, cargue, transporte y disposición de los materiales resultantes de las actividades constructivas.

En el marco de las actividades de seguimiento, se evidenció la utilización de vehículos tipo volqueta para el retiro de materiales y residuos generados en obra, así como la implementación de medidas preventivas básicas durante las maniobras de cargue y descargue, con el fin de minimizar riesgos asociados al tránsito vehicular y garantizar condiciones seguras para trabajadores y usuarios del sector.

Así mismo, la interventoría realizó revisión documental de los soportes remitidos por el contratista relacionados con el manejo y retiro de materiales, incluyendo registros fotográficos, actas y demás evidencias asociadas a las actividades ejecutadas durante el período reportado.

De igual manera, se realizaron recomendaciones orientadas al fortalecimiento de las medidas de control frente al almacenamiento temporal, delimitación de materiales y manejo operativo de residuos en las áreas intervenidas, promoviendo condiciones adecuadas de orden, limpieza y seguridad durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

5.5.2 SEGUIMIENTO A SEÑALIZACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL EN OBRA

Durante las actividades de seguimiento efectuadas en el período reportado, la interventoría verificó la implementación de medidas de señalización preventiva y control operacional en las áreas intervenidas del proyecto, con el propósito de contribuir a la seguridad del personal, peatones y demás usuarios presentes en el entorno de la obra.

En desarrollo de las visitas realizadas en campo, se efectuó seguimiento a la instalación de señalización temporal para actividades de cargue y descargue de materiales, delimitación de zonas de trabajo, identificación de condiciones de riesgo y control de acceso en las áreas intervenidas.

Así mismo, la interventoría realizó seguimiento a las medidas establecidas por el contratista para el manejo del tránsito interno y operación de vehículos asociados al ingreso de materiales y retiro de residuos de construcción y demolición (RCD), verificando la implementación de controles básicos conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Señalización Vial y las disposiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables al proyecto.

Como resultado del seguimiento efectuado, se realizaron observaciones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de las condiciones de señalización, delimitación y control operacional en obra, con el fin de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades constructivas.

5.6. ACTA DE COMITÉ Y/O REUNIONES:

Durante el periodo evaluado, se contó con la participación activa del Residente de Interventoría, el Profesional SST de Interventoría, el Residente del Contratista y el Apoyo a la supervisión del contrato en las reuniones semanales del proyecto. La presencia de estos profesionales permitió realizar seguimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), revisar el cumplimiento de medidas preventivas y coordinar acciones orientadas al control de riesgos en obra.

A continuación, se presenta un consolidado de las reuniones realizadas durante el periodo:

N°	Fecha de la reunión	Asistentes
1	14 de abril de 2026	Residente de Interventoría, Profesional SST Interventoría, Residente del Contratista, Apoyo a la supervisión del contrato
2	21 de abril de 2026	Residente de Interventoría, Profesional SST Interventoría, Residente del Contratista, Apoyo a la supervisión del contrato
3	28 de abril de 2026	Residente de Interventoría, Profesional SST Interventoría, Residente del Contratista, Apoyo a la supervisión del contrato
4	5 de mayo de 2026	Residente de Interventoría, Profesional SST Interventoría, Residente del Contratista, Apoyo a la supervisión del contrato

En términos generales, la Interventoría evidenció que durante el periodo evaluado se cumplió con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), observándose la adecuada implementación de medidas preventivas, control de riesgos, entrega de EPP, inspecciones de seguridad y seguimiento a indicadores. Se constató que los trabajadores conocen los procedimientos y cuentan con los recursos necesarios para realizar sus labores de forma segura, garantizando así la protección de su salud y el fortalecimiento de la cultura de seguridad en obra.

5.7. CONCLUSIONES

Durante el período comprendido entre el 07 de abril y el 07 de mayo de 2026, la interventoría realizó seguimiento integral al contrato de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el control documental, la disponibilidad del personal y equipos requeridos, así como la implementación de medidas relacionadas con calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, gestión ambiental y control operativo del proyecto.

En desarrollo de las actividades de seguimiento efectuadas durante el período reportado, se evidenció la implementación de acciones asociadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y al Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO), relacionadas con afiliación del personal al Sistema General de Seguridad Social, entrega de elementos de protección personal, señalización preventiva, inspecciones de seguridad, manejo operativo de residuos y seguimiento a las condiciones de seguridad en obra. Así mismo, la interventoría realizó seguimiento al manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), disposición de materiales, control de orden y aseo, y medidas de manejo ambiental implementadas durante la ejecución de las actividades constructivas.

Durante el período evaluado se realizaron observaciones y requerimientos orientados al fortalecimiento de las medidas de control en campo, especialmente frente al uso adecuado de elementos de protección personal, condiciones de seguridad para trabajos de alto riesgo, señalización preventiva y control operacional asociado al ingreso de materiales y retiro de residuos en obra.

En cuanto al avance físico del proyecto, se identifican variaciones entre el avance programado y el avance ejecutado, observándose un comportamiento favorable durante las primeras semanas; sin embargo, para la semana cuatro se evidencia una leve disminución en el rendimiento de ejecución frente a lo programado, situación que continuará siendo objeto de seguimiento por parte de la interventoría, con el fin de prevenir posibles afectaciones al cronograma contractual y garantizar el adecuado desarrollo de las actividades programadas.

La interventoría considera que las actividades desarrolladas durante el primer mes de ejecución se han venido realizando de manera general conforme a las condiciones técnicas y contractuales del proyecto, manteniendo seguimiento permanente a los procesos constructivos, administrativos, ambientales y de control, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo de las obras y al cumplimiento de los objetivos establecidos para el fortalecimiento de la infraestructura física del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) en el municipio de Montería.

Lina Revueltas

LINA REVUELTAS LOZANO
R.L CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE

5.8. ANEXOS

1. Planilla de pago de Seguridad Social Integral.
2. Certificado de afiliación ARL SURA.
3. Soportes de afiliación ARL personal de interventoría.
4. Soportes de Inducción personal de Interventoría.
5. Registro fotográfico

ANEXO 1

PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902030630	0	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MONTE VERDE	MONTERIA-CORDOBA	5614154	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	290218480	9504481667	E	2026/05/11	2026/05/07	BANCOLOMBIA	0	$2,508,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$2,801,448	$448,400			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$14,800				$0	$0		$687,600
Centro de Trabajo: R1 (2 Afiliados)																							$2,801,448	$448,400			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$14,800				$0	$0		$687,600
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)																							$2,801,448	$448,400			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$112,200			$2,801,448	$14,800				$0	$0		$687,600
1	CC	1065005944	GARCIA MENDOZA JOAQUIN ALFREDO	X																23030 1	24	$1,400,724	$224,200	EPS005	24	$1,400,724	$56,100	CCF16	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	$7,400	0.522%	24	$0	$0	SI	$343,800
2	CC	50940306	REVUELTAS LOZANO LINA PAOLA	X																23100 1	24	$1,400,724	$224,200	EPS010	24	$1,400,724	$56,100	CCF16	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	$7,400	0.522%	24	$0	$0	SI	$343,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINC-R5 (3 Afiliados)																							$5,880,086	$940,900			$5,880,086	$235,400			$5,880,086	$235,400			$5,880,086	$409,400				$0	$0		$1,821,100
Centro de Trabajo: R5 (3 Afiliados)																							$5,880,086	$940,900			$5,880,086	$235,400			$5,880,086	$235,400			$5,880,086	$409,400				$0	$0		$1,821,100
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (3 Afiliados)																							$5,880,086	$940,900			$5,880,086	$235,400			$5,880,086	$235,400			$5,880,086	$409,400				$0	$0		$1,821,100
3	CC	1065014420	LAZA YEGA MARIA LUISA	X																25-14	24	$2,986,241	$477,800	EPS002	24	$2,986,241	$119,500	CCF16	24	$2,986,241	$119,500	14-11	24	$2,986,241	$207,900	6.960%	24	$0	$0	SI	$924,700
4	CC	78075531	RODRIGUEZ JULIO CLIMACO MIGUEL	X																23030 1	24	$1,400,724	$224,200	EPS048	24	$1,400,724	$56,100	CCF16	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	$97,500	6.960%	24	$0	$0	SI	$433,900
5	CC	1067922166	RODRIGUEZ BAZA SAMIR ANDRES	X																23030 1	24	$1,493,121	$238,900	EPS041	24	$1,493,121	$59,800	CCF16	24	$1,493,121	$59,800	14-11	24	$1,493,121	$104,000	6.960%	24	$0	$0	SI	$462,500
Total		**Afiliados(5)**																					$8,681,534	$1,389,300			$8,681,534	$347,600			$8,681,534	$347,600			$8,681,534	$424,200				$0	$0		$2,508,700

311

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,389,300	$0	$0	$1,389,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$224,200	$0	$0	$224,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$477,800	$0	$0	$477,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$687,300	$0	$0	$687,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$424,200	$0	$0	$424,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$424,200	$0	$0	$424,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$347,600	$0	$0	$347,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	$347,600	$0	$0	$347,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				5	$347,600	$0	$0	$347,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$56,100	$0	$0	$56,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$56,100	$0	$0	$56,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$59,800	$0	$0	$59,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$119,500	$0	$0	$119,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$56,100	$0	$0	$56,100
TOTAL				5	$2,508,700	$0	$0	$2,508,700

312

ANEXO 2

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL SURA.

Medellín, 13 de Abril de 2026

ARL | sura

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la circular externa 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera (título VI, numeral 1.5, literal g), se expide la presente constancia de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

Nombre o razón	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE
Cédula de ciudadanía o Nit	N902030630
Fecha inicio de vigencia	10/04/2026 00:00:00
Fecha fin de vigencia	AFILIADA
Estado	EN COBERTURA
Número de centros de trabajo	2
Número de afiliados dependientes	5
Número de afiliados independientes	0
Número cotizantes en mora:	0
% cotizantes en mora:	0 %
Código de actividad principal	5711001
Clase de riesgo 5	Tasa de riesgo 6.96%

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN

Nombre	Código	Clasificación	Tarifa
ADMINISTRATIVO	0000000002	1	0.522
PRINCIPAL	0000000001	5	6.96

"Mora: Es el incumplimiento que se genera cuando existiendo afiliación no se realiza la autoliquidación acompañada del respectivo pago de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en los plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes.

Entiéndase dentro de este concepto, la mora que registra el empleador respecto de algunos trabajadores a su cargo. Art 6

En el estado de cuenta integral podrás encontrar el resumen y detalle actualizado de tus moras, inexactitudes, recobros de AT, pagos de incapacidades y devoluciones disponibles. Esto dará claridad a las diferencias y la mora que presentas. Para consultar el estado de cuenta integral, ingresa a https://www.arlsura.com da clic en Empresa e inicia sesión y sigue esta ruta: Gestión Administrativa/ Mi Empresa/ Estado de Cuenta/ Estado de Cuenta Integral.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Dirección IP: 191.108.161.104, 192.230.104.7,

314

ANEXO 3

SOPORTES DE AFILIACIÓN ARL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

ARL | sura

Medellín, 25 de Mayo de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C78075531	RODRIGUEZ JULIO CLIMACO MIGUEL	10/04/2026		M221156m	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C509403062614536902

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/05/2026 10:15:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 172.226.172.8, 198.143.41.55, 172.16.42.57

3/6

ARL | sura

Medellín, 25 de Mayo de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1065014420	LAZA VEGA MARIA LUISA	10/04/2026		94135x17	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C509403062614536953

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/05/2026 10:15:53 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 172.226.172.8, 198.143.41.55, 172.16.42.57

3/7

ARL | sura

Medellín, 25 de Mayo de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1067922166	RODRIGUEZ BAZA SAMIR ANDRES	10/04/2026		A2591282	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C509403062614536984

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/05/2026 10:16:24 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 172.226.172.8, 198.143.41.55, 172.16.42.57

3/8

ARL | sura

Medellín, 25 de Mayo de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE, en el centro de trabajo 0000000002 - ADMINISTRATIVO, Clase de riesgo 1, Porcentaje de cotización 0.522%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1065005944	GARCIA MENDOZA JOAQUIN ALFREDO	10/04/2026		32184233	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C509403062614537028

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/05/2026 10:17:08 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 172.226.172.8, 198.143.41.55, 172.16.42.57

319

ARL | sura

Medellín, 25 de Mayo de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE, en el centro de trabajo 0000000002 - ADMINISTRATIVO, Clase de riesgo 1, Porcentaje de cotización 0.522%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C50940306	REVUELTAS LOZANO LINA PAOLA	10/04/2026		153214r1	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C509403062614536825

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/05/2026 10:13:45 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 172.226.172.8, 198.143.41.55, 172.16.42.57

320

ANEXO 4

SOPORTES DE INDUCCIÓN PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUZ	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: CIC-SGSST-F-006
		Versión: 001
	REGISTRO INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 02/04/2026

FECHA: 07-04-2026 **INDUCCIÓN** [X] **REINDUCCIÓN** [ ]

NOMBRE: Climaco Rodriguez Julio **CEDULA:** 78075531

DEPENDENCIA: Interventoria **CARGO:** Dir Interventoria

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Samir Andres Rodriguez Baza

OBJETIVO GENERAL

Adquirir conocimientos que permitan a los colaboradores garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Con el propósito de dar a conocer al personal de nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción y/o reinducción SST se compartirán los siguientes temas:

1. Reglamento interno de trabajo.
2. Plataforma estratégica (Misión, Visión, Valores).
3. Política de SST.
4. Política de seguridad vial
5. Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas.
6. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
7. Definiciones de SST (Peligro, riesgo, accidente de trabajo, enfermedad laboral, actos y condiciones inseguras, etc.).
8. Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL. (ARL, funciones y responsabilidades).
9. Pasos para reportar un accidente de trabajo o enfermedad y como hacer una investigación del accidente.
10. Roles y responsabilidades frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
11. Procedimiento de gestion del cambio
12. Plan estrategico de seguridad vial
13. Responsabilidades en seguridad vial
14. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, identificación de controles:

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMENOS NATURALES		

15. Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST.
16. Comité de Convivencia Laboral CCL
17. Comité de seguridad vial.
18. Pasos para actuar en una emergencia.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción:

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estándares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Climaco Rodriguez
Firma del Trabajador
C.C. 78075531

SRB
Responsable del SG-SST
C.C. 1067922766

322

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUZ	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: CIC-SGSST-F-006
		Versión: 001
	REGISTRO INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 02/04/2026

FECHA: 07-04-2026 **INDUCCIÓN** [X] **REINDUCCIÓN** [ ]

NOMBRE: Maria Luisa Lazca Vega **CEDULA:** 1065014420

DEPENDENCIA: Interventoria **CARGO:** Residente de Interventoria

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Samir Andres Rodriguez Baza

OBJETIVO GENERAL

Adquirir conocimientos que permitan a los colaboradores garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Con el propósito de dar a conocer al personal de nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción y/o reinducción SST se compartirán los siguientes temas:

1. Reglamento interno de trabajo.
2. Plataforma estratégica (Misión, Visión, Valores).
3. Politica de SST.
4. Politica de seguridad vial
5. Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas.
6. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
7. Definiciones de SST (Peligro, riesgo, accidente de trabajo, enfermedad laboral, actos y condiciones inseguras, etc.).
8. Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ARL, funciones y responsabilidades).
9. Pasos para reportar un accidente de trabajo o enfermedad y como hacer una investigación del accidente.
10. Roles y responsabilidades frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
11. Procedimiento de gestion del cambio
12. Plan estrategico de seguridad vial
13. Responsabilidades en seguridad vial
14. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, identificación de controles:

    BIOLÓGICO — FÍSICO — QUÍMICO
    PSICOSOCIAL — BIOMECÁNICOS — CONDICIONES DE SEGURIDAD
    FENOMENOS NATURALES
15. Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST.
16. Comité de Convivencia Laboral CCL
17. Comité de seguridad vial.
18. Pasos para actuar en una emergencia.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción:

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estándares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Maria Luisa Lazca V
Firma del Trabajador
C.C. 1065014420

Responsable del SG-SST
C.C. 1067922766

323

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUZ	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: CIC-SGSST-F-006
		Versión: 001
	REGISTRO INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 02/04/2026

FECHA: 07-04-2026 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Samir Andres Rodriguez Baez CEDULA: 1067922766

DEPENDENCIA: Interventoria CARGO: Profesional SST

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Samir Andres Rodriguez Baez

OBJETIVO GENERAL

Adquirir conocimientos que permitan a los colaboradores garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Con el propósito de dar a conocer al personal de nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción y/o reinducción SST se compartirán los siguientes temas:

1. Reglamento interno de trabajo.
2. Plataforma estratégica (Misión, Visión, Valores).
3. Política de SST.
4. Política de seguridad vial
5. Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas.
6. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
7. Definiciones de SST (Peligro, riesgo, accidente de trabajo, enfermedad laboral, actos y condiciones inseguras, etc.).
8. Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL. (ARL, funciones y responsabilidades).
9. Pasos para reportar un accidente de trabajo o enfermedad y como hacer una investigación del accidente.
10. Roles y responsabilidades frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
11. Procedimiento de gestion del cambio
12. Plan estrategico de seguridad vial
13. Responsabilidades en seguridad vial
14. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, identificación de controles:

    BIOLÓGICO — FÍSICO — QUÍMICO
    PSICOSOCIAL — BIOMECÁNICOS — CONDICIONES DE SEGURIDAD
    FENOMENOS NATURALES
15. Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST.
16. Comité de Convivencia Laboral CCL
17. Comité de seguridad vial.
18. Pasos para actuar en una emergencia.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción:

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estándares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Firma del Trabajador
C.C. 1067922766

Responsable del SG-SST
C.C. 1067922766

324

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUZ	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: CIC-SGSST-F-006
		Versión: 001
	REGISTRO INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 02/04/2026

FECHA: 07-04-2026 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Joaquin Garcia Mendoza CEDULA: 1065005944

DEPENDENCIA: Interventoria CARGO: Aux. Administrativo

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Samil Andres Rodriguez Baza

OBJETIVO GENERAL

Adquirir conocimientos que permitan a los colaboradores garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Con el propósito de dar a conocer al personal de nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción y/o reinducción SST se compartirán los siguientes temas:

1. Reglamento interno de trabajo.
2. Plataforma estratégica (Misión, Visión, Valores).
3. Política de SST.
4. Política de seguridad vial
5. Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas.
6. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
7. Definiciones de SST (Peligro, riesgo, accidente de trabajo, enfermedad laboral, actos y condiciones inseguras, etc.).
8. Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL. (ARL, funciones y responsabilidades).
9. Pasos para reportar un accidente de trabajo o enfermedad y como hacer una investigación del accidente.
10. Roles y responsabilidades frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
11. Procedimiento de gestion del cambio
12. Plan estrategico de seguridad vial
13. Responsabilidades en seguridad vial
14. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, identificación de controles:

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMENOS NATURALES		

15. Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST.
16. Comité de Convivencia Laboral CCL
17. Comité de seguridad vial.
18. Pasos para actuar en una emergencia.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción:

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estándares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Firma del Trabajador
C.C. 1065005944

Responsable del SG-SST
C.C. 1067922766

325

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUZ	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: CIC-SGSST-F-006
		Versión: 001
	REGISTRO INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 02/04/2026

FECHA: 07-04-2026 **INDUCCIÓN** [X] **REINDUCCIÓN** [ ]

NOMBRE: Lina Paola Revueltas Lozano **CEDULA:** 50940306

DEPENDENCIA: Interventoría **CARGO:** Contador

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Samir Andres Rodriguez Baza

OBJETIVO GENERAL

Adquirir conocimientos que permitan a los colaboradores garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Con el propósito de dar a conocer al personal de nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción y/o reinducción SST se compartirán los siguientes temas:

1. Reglamento interno de trabajo.
2. Plataforma estratégica (Misión, Visión, Valores).
3. Política de SST.
4. Política de seguridad vial
5. Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas.
6. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
7. Definiciones de SST (Peligro, riesgo, accidente de trabajo, enfermedad laboral, actos y condiciones inseguras, etc.).
8. Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL. (ARL, funciones y responsabilidades).
9. Pasos para reportar un accidente de trabajo o enfermedad y como hacer una investigación del accidente.
10. Roles y responsabilidades frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
11. Procedimiento de gestion del cambio
12. Plan estrategico de seguridad vial
13. Responsabilidades en seguridad vial
14. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, identificación de controles:
    - BIOLÓGICO
    - FÍSICO
    - QUÍMICO
    - PSICOSOCIAL
    - BIOMECÁNICOS
    - CONDICIONES DE SEGURIDAD
    - FENOMENOS NATURALES
15. Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST.
16. Comité de Convivencia Laboral CCL
17. Comité de seguridad vial.
18. Pasos para actuar en una emergencia.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción:

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estándares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Lina Revueltas
Firma del Trabajador
C.C. 50940306

Responsable del SG-SST
C.C. 1067922166

326

ANEXO 5
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUZ	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO	Código: CIC-SGSST-F-020 Versión: 0 Fecha: 02/04/2026 Página: 1 de 1

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA 1.
DESCRIPCIÓN: Seguimiento al uso adecuado de los EPP en la ejecucion de actividades.



FOTOGRAFÍA 2.
DESCRIPCIÓN: Verificacion de señalizacion y disposicion equipos de atencion a emergencias y primeros auxilios.



FOTOGRAFÍA 3.
DESCRIPCIÓN: Verificación a la instalacion de punto ecologico para los residuos solidos.



FOTOGRAFÍA 4.
DESCRIPCIÓN: Seguimiento y verificacion en campo del orden y aseo en las areas de atrabajo.



FOTOGRAFÍA 5.
DESCRIPCIÓN: Seguimiento a las charlas pre-turno.



FOTOGRAFÍA 6.
DESCRIPCIÓN: Seguimiento a la socializacion para el uso adecuado de los elementos de proteccion contra caidas.
