CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

INFORME MENSUAL No. 2

(PERÍODO: Del 7 de mayo 2026 hasta el 6 de junio de 2026)

CONTRATO DE No. SI-CMA-012-2025

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".





Oficina principal: Cr 16 A #50-20 Barrio Monteverde -Montería – Córdoba

interventoriacrue@gmail.com

329

Contenido:

1. Introducción:.... 3
2. OBJETIVOS:.... 4
2.1 Objetivo General:.... 4
2.2 Objetivos Específicos:.... 4
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO:.... 5
3.1 Localización:.... 6
4. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:.... 7
4.1 Información general del contrato de obra:.... 7
4.2 Información general del contrato de interventoría:.... 7
4.3 Control de póliza de obra:.... 8
4.4 Control de póliza de Interventoría:.... 10
5. SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.... 12
5.1 Gráfico se avance programado vs ejecutado:.... 13
5.2 Curva s programado vs ejecutado:.... 14
6. AVANCE EN TIEMPO.... 15
7. ASPECTO FINANCIERO.... 15
7.1 Forma de Pago del contratista:.... 15
7.2 Actas Parciales de obra:.... 15
7.3 Forma de Pago de la Interventoría:.... 15
7.4 Actas parciales de la Interventoría:.... 16
8. PERSONAL Y EQUIPO EN EL PERIODO.... 16
8.1 Personal y Equipos del Contratista:.... 16
8.2 Personal de la Interventoría:.... 17
9. ESTADO DEL TIEMPO.... 17
10. CONTROL DE CALIDAD.... 17
11 CONCLUSIONES.... 18
12 ANEXOS.... 19

1. Introducción:

El presente Informe N.° 2 corresponde al periodo del **7 de mayo de 2026 hasta el 6 de junio de 2026**, que corresponde a las actividades desarrolladas en el marco del contrato de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA al proyecto cuyo objeto es: "Fortalecimiento de la Red Local de Urgencias de Córdoba mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física para el correcto funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE en el municipio de Montería"**, el cual tiene como finalidad garantizar el adecuado control, vigilancia y seguimiento integral a la ejecución de las obras y actividades contractuales programadas.

La interventoría se desarrolla con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas derivadas del contrato de obra, asegurando que las actividades ejecutadas se realicen conforme a los estudios, diseños, especificaciones técnicas, cronogramas establecidos, normatividad vigente y demás documentos contractuales aplicables al proyecto.

En el presente informe se consolidan las actividades de seguimiento y control efectuadas durante el período reportado, incluyendo la revisión del avance físico de las obras, el cumplimiento de los compromisos contractuales, el seguimiento al personal, materiales y recursos implementados en el proyecto, así como la verificación de aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, calidad, gestión documental y cumplimiento administrativo y financiero.

De igual manera, se presentan las observaciones, recomendaciones y conclusiones generadas por la interventoría como resultado de las visitas técnicas, reuniones de seguimiento y revisión documental realizadas, con el fin de contribuir al adecuado desarrollo del proyecto y garantizar que las obras de adecuación y rehabilitación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) se ejecuten bajo criterios de calidad, funcionalidad, eficiencia y cumplimiento contractual, fortaleciendo así la capacidad operativa de la red de atención de urgencias del departamento de Córdoba.

2. OBJETIVOS:

2.1 Objetivo General:

Realizar el seguimiento, control y verificación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al proyecto denominado "Fortalecimiento de la Red Local de Urgencias de Córdoba mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física para el correcto funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE en el municipio de Montería", garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especificaciones técnicas, cronogramas establecidos y normatividad vigente aplicable durante la ejecución del proyecto.

2.2 Objetivos Específicos:

- Verificar el avance físico y la correcta ejecución de las actividades constructivas desarrolladas en el proyecto, conforme a los estudios, diseños, especificaciones técnicas y lineamientos establecidos en el contrato y documentos que hacen parte integral del mismo.

- Realizar seguimiento y control a los aspectos administrativos, financieros, contables y documentales del contrato, validando el cumplimiento de obligaciones contractuales, presentación de soportes, ejecución presupuestal y demás requisitos exigidos para el adecuado desarrollo del proyecto.

- Supervisar el cumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas con calidad, seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental y demás condiciones técnicas y legales aplicables, con el fin de garantizar una ejecución eficiente, segura y acorde con los estándares requeridos para el funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto "Fortalecimiento de la Red Local de Urgencias de Córdoba mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física para el correcto funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE en el municipio de Montería" tiene como propósito mejorar las condiciones físicas y operativas de las instalaciones destinadas al funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del departamento de Córdoba, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a situaciones de urgencia y emergencia.

La intervención contempla la ejecución de actividades de adecuación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente, con el fin de garantizar espacios funcionales, seguros y acordes con las necesidades operativas y administrativas requeridas para la prestación eficiente de los servicios desarrollados por el CRUE. Estas actividades incluyen obras civiles, adecuaciones locativas, mejoramiento de acabados, mantenimiento y optimización de redes eléctricas, hidrosanitarias y demás componentes necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

El proyecto busca optimizar las condiciones de operación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, fortaleciendo los procesos de coordinación, regulación y referencia de pacientes dentro de la red hospitalaria del departamento de Córdoba, permitiendo una atención más eficiente, oportuna y organizada para la comunidad.

Así mismo, mediante la ejecución de las actividades planteadas, se pretende garantizar mejores condiciones de infraestructura para el personal operativo y administrativo, promoviendo espacios adecuados para el desarrollo de las funciones institucionales y contribuyendo al fortalecimiento de la red pública de atención en salud del departamento.

La interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica realizará el seguimiento y control integral del proyecto, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones contractuales, cronogramas establecidos y normatividad vigente aplicable durante la ejecución de las actividades contratadas.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato, el plazo de ejecución de la interventoría corresponde a CINCO (5) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual. Durante este período, la interventoría realizará el seguimiento continuo a la ejecución física, administrativa y financiera del proyecto, generando los respectivos informes y recomendaciones técnicas que permitan garantizar el adecuado desarrollo de las obras.

El valor del contrato de interventoría asciende a la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($179.866.682), recursos destinados a garantizar el correcto ejercicio de las actividades de seguimiento y control requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y el fortalecimiento de la infraestructura física del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE del municipio de Montería.

3.1 Localización:

El proyecto objeto de interventoría se encuentra localizado en el departamento de Córdoba, en el municipio de Montería, específicamente en el barrio Los Laureles, entre las calles 42 y 43 con carrera 8A, identificado con el número 4 de la manzana 17, en las instalaciones donde actualmente funcionan el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE y el programa de Malaria.

La ubicación del proyecto corresponde a un punto estratégico dentro del municipio, destinado a la coordinación y regulación de los servicios de urgencias y emergencias del departamento de Córdoba, permitiendo el fortalecimiento de la capacidad operativa y funcional de la red de atención en salud mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física existente.



Imagen 1. Localización del proyecto a Construir en el Municipio de Monteria – Cordoba.

4. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

4.1 Información general del contrato de obra:

CONTRATO No.	CONTRATO No. SI-LP-011-2025
OBJETO:	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DE CORDOBA
VALOR:	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.764.759.464,00)
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	07 ABRIL DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 1: Información General del contrato de obra.

4.2 Información general del contrato de interventoría:

CONTRATO No.	SI-CMA-012-2025
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DE CORDOBA
VALOR:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 179.866.682).
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	07 ABRIL DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 2: Información General del contrato de Interventoría.

4.3 Control de póliza de obra:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-44-1010433805		
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACIÓN		FEHA DE EXPEDICIÓN
0	CONTRATO		27/02/2026
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		VALOR A SEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/02/2026	04/02/2027	$ 276.475,946.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/02/2026	04/08/2029	$138.237,973.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	04/08/2026	04/08/2029	$ 276.475,946.40

Tabla 3: Póliza de Cumplimiento del contrato de obra.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-40-101014310		
NUMERO DE ANEXO	TIPO DE MODIFICACIÓN		FEHA DE EXPEDICIÓN
0	CONTRATO		27/02/2026
NOMBRE Y AMPARO	VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN		VALOR A SEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	26/08/2026	04/08/2026	$700.362.000,00
CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS	26/08/2026	04/08/2026	$700.362.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	26/08/2026	04/08/2026	$700.362.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	26/08/2026	04/08/2026	$700.362.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	26/08/2026	04/08/2026	$700.362.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	26/08/2026	04/08/2026	$700.362.000,00

Tabla 4: Póliza de responsabilidad civil extracontractual de obra.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-44-1010433805		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACIÓN**		**FEHA DE EXPEDICIÓN**
2	ACTA DE INICIO		14/04/2026
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR A SEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/04/2026	16/03/2027	$ 276.475,946.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07/04/2026	13/09/2029	$138.237,973.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/09/2026	13/09/2029	$ 276.475,946.40

Tabla 5: Póliza de Cumplimiento de acta de inicio de obra.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-40-101014310		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACIÓN**		**FEHA DE EXPEDICIÓN**
2	ACTA DE INICIO		14/04/2026
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR A SEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	07/04/2026	13/09/2026	$700.362.000,00
CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS	07/04/2026	13/09/2026	$700.362.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07/04/2026	13/09/2026	$700.362.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	07/04/2026	13/09/2026	$700.362.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	07/04/2026	13/09/2026	$700.362.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	07/04/2026	13/09/2026	$700.362.000,00

Tabla 6: Póliza de responsabilidad civil extracontractual de acta de inicio de obra.

4.4 Control de póliza de Interventoría:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-44-101043738		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACIÓN**		**FEHA DE EXPEDICIÓN**
0	CONTRATO		20/02/2026
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR A SEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/02/2026	25/01/2027	$17,986,668.20
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNISACIONES, LABORALES	19/02/2026	25/07/2029	$17,986,668.20
CALIDAD DEL SERVICIO	25/07/2026	25/07/2031	$17,986,668.20

Tabla 7: Póliza de Cumplimiento del contrato de Interventoría.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-40-101014279		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACIÓN**		**FEHA DE EXPEDICIÓN**
0	CONTRATO		20/02/2026
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR A SEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00
GASTOS MEDICOS	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	19/02/2026	25/07/2026	$350,181,000.00

Tabla 8: Póliza de responsabilidad civil extracontractual de Interventoría.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-44-101043738		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACIÓN**		**FEHA DE EXPEDICIÓN**
2	ACTA DE INICIO		10/04/2026
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR A SEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/04/2026	13/03/2027	$17,986,668.20
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNISACIONES, LABORALES	07/04/2026	10/09/2029	$17,986,668.20
CALIDAD DEL SERVICIO	10/09/2026	10/09/2031	$17,986,668.20

Tabla 9: Póliza de Cumplimiento del acta de inicio de Interventoría.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ENTREGA A SEGURADORA	Seguros del Estado S. A		
NUMERO DE PÓLIZA	53-40-101014279		
NUMERO DE ANEXO	**TIPO DE MODIFICACIÓN**		**FEHA DE EXPEDICIÓN**
2	ACTA DE INICIO		10/04/2026
NOMBRE Y AMPARO	**VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN**		**VALOR A SEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00
GASTOS MEDICOS	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	07/04/2026	10/09/2026	$350,181,000.00

Tabla 10. Póliza de responsabilidad civil extracontractual de acta de inicio de Interventoría.

5. SEGUIMIENTO Y AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el período comprendido entre el 07 de mayo y el 06 de junio de 2026, esta interventoría realizó el seguimiento técnico, administrativo y de campo a las actividades ejecutadas por el contratista, verificando su desarrollo de conformidad con los diseños aprobados, especificaciones técnicas, normas vigentes y obligaciones contractuales establecidas para el proyecto.

En desarrollo de la programación de obra, se ejecutaron actividades preliminares orientadas a la adecuación y preparación de las áreas de intervención, incluyendo labores de localización, trazado y replanteo, desmontes de elementos arquitectónicos y de instalaciones existentes, demolición de estructuras y elementos en concreto, retiro de materiales sobrantes y limpieza general de las zonas intervenidas.

De igual manera, se adelantaron actividades relacionadas con el movimiento de tierras y conformación de la estructura de soporte de las nuevas obras, mediante excavaciones manuales para vigas de cimentación, suministro, extendido y compactación de material seleccionado, así como la ejecución de rellenos con material tipo INVÍAS, garantizando las condiciones técnicas requeridas para la construcción de los elementos proyectados.

En cuanto a la ejecución de obras estructurales, se desarrollaron actividades correspondientes a la construcción de vigas de cimentación, vigas para andenes, vigas cinta, columnetas y dinteles en concreto de 3.000 psi, así como el levantamiento de muros en mampostería de bloque de arena-cemento y la aplicación de pañetes interiores y exteriores. Estas actividades fueron objeto de seguimiento permanente por parte de esta Interventoría, verificando procedimientos constructivos, dimensiones, niveles, alineamientos y cumplimiento de las especificaciones establecidas en los diseños del proyecto.

Adicionalmente, se ejecutaron actividades asociadas a la construcción de plantillas en concreto reforzado y al inicio de la fabricación e instalación de la estructura metálica para cubierta, incluyendo la aplicación de tratamientos anticorrosivos, acabados y sistemas de anclaje conforme a los detalles constructivos aprobados.

Durante el período informado, esta interventoría efectuó inspección, revisión de procesos constructivos, control de calidad de materiales, verificación de ensayos de laboratorio y seguimiento a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, evidenciando la continuidad de las actividades programadas y el avance progresivo de la obra conforme a la etapa constructiva en ejecución.

Anexo 1: Registro Fotográfico.

Anexo 2: Semanales.

5.1 Gráfico se avance programado vs ejecutado:

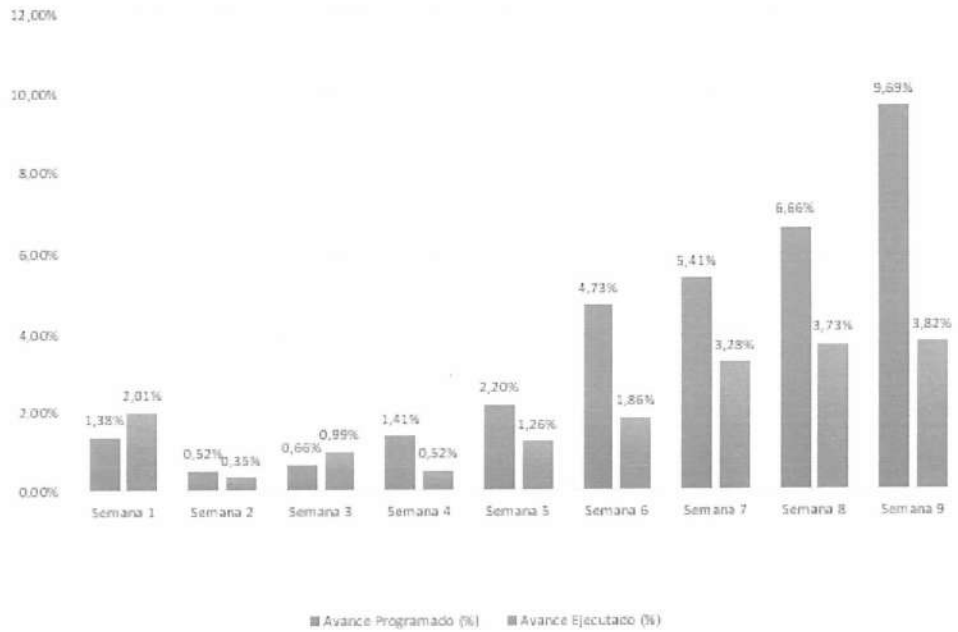


Grafico avance semanal programado vs ejecutado


Como resultado del seguimiento y control efectuado por esta interventoría al avance físico de la obra, se evidenció que al cierre de la semana 9 el proyecto presentaba un retraso significativo respecto de la programación contractual aprobada, situación que genera riesgos para el cumplimiento de los plazos establecidos dentro del contrato.

En atención a lo anterior, mediante radicado No. SI-CMA-012-2025_044 de fecha 04 de junio de 2026, esta interventoría solicitó formalmente al contratista la presentación de un plan de contingencia, con el propósito de identificar las acciones correctivas, estrategias operativas, recursos adicionales y medidas de gestión que permitieran recuperar el atraso evidenciado y encaminar la ejecución del proyecto hacia el cumplimiento de las metas programadas.

Dicha solicitud se fundamentó en el análisis comparativo realizado entre el avance programado y el avance ejecutado durante el período evaluado, del cual se concluyó la necesidad de adoptar medidas encaminadas al fortalecimiento de los frentes de trabajo, optimización de rendimientos, mejora en la coordinación de actividades y programación eficiente de recursos humanos, técnicos y logísticos, con el fin de reducir las desviaciones identificadas en el cronograma.

En este sentido, esta interventoría continuará realizando un seguimiento permanente al comportamiento de la programación de obra, verificando la implementación y efectividad de las medidas adoptadas por el contratista para la recuperación de los atrasos identificados, así como el cumplimiento de los compromisos que se establezcan en desarrollo de la ejecución contractual. Lo anterior, con el propósito de garantizar el avance oportuno de las actividades y minimizar posibles afectaciones sobre el plazo contractual del proyecto.

5.2 Curva s programado vs ejecutado:

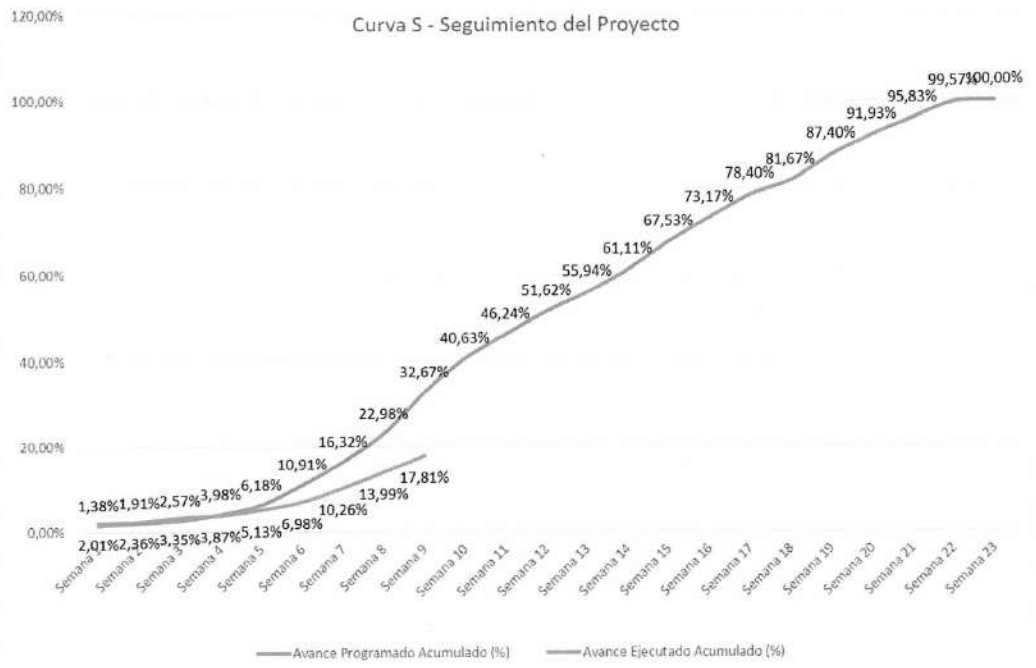

Curva S programado vs ejecutado

Con base en la Curva S de seguimiento, para la Semana 5 se tenía previsto un avance acumulado del 6,18%, alcanzándose una ejecución acumulada del 5,13%. En la Semana 6, el avance acumulado programado correspondía al 10,91%, mientras que el ejecutado fue del 6,98%. Para la Semana 7, el avance acumulado programado alcanzó el 16,32% y el ejecutado el 10,26%. Posteriormente, en la Semana 8, el avance acumulado programado fue del 22,98%, frente a un avance ejecutado del 13,99%. Finalmente, al cierre de la Semana 9, el proyecto registró un avance acumulado ejecutado del 17,81%, mientras que el avance acumulado programado era del 32,67%, generando una diferencia acumulada de 14,86%.

El avance acumulado ejecutado es del 17,81% al corte del 06 de junio de 2026 corresponde a una ejecución aproximada de $ 492.403.660,54. Por su parte, de acuerdo con la programación vigente, el proyecto debía registrar una ejecución acumulada del 32,67%, equivalente a $903.246.916,89. En consecuencia, se evidencia una diferencia aproximada de $410.843.254,35 entre el valor programado y el valor ejecutado a la fecha de corte.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que durante el período evaluado la diferencia entre el avance programado y el avance ejecutado se incrementó progresivamente. En atención a esta situación, esta interventoría mediante radicado SI-CMA-012-2025_044 del 04 de junio de 2026, solicitó al contratista la presentación de un Plan de Contingencia, con el fin de establecer las acciones necesarias para mejorar los rendimientos de ejecución y dar cumplimiento a la programación contractual.

6. AVANCE EN TIEMPO

Al corte del presente informe, correspondiente al segundo (02) mes de ejecución contractual, la interventoría realizó el seguimiento al avance de las actividades ejecutadas en obra, verificando su estado de desarrollo de acuerdo con la programación establecida para el proyecto.

7. ASPECTO FINANCIERO

7.1 Forma de Pago del contratista:

1.- El Departamento de Córdoba cancelara el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1.-PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, con un avance mínimo del 20% de ejecución la primera acta; no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo, certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar.

7.2 Actas Parciales de obra:

Hasta la fecha no se han presentado hasta parciales de obras.

7.3 Forma de Pago de la Interventoría:

La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de su monto. El cinco por ciento (5%) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.Nota 1: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por

encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. Nota 2: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

7.4 Actas parciales de la Interventoría:

Esta interventoría elaboró y radicó ante la Entidad el Acta Parcial No. 1 de Interventoría, correspondiente a los servicios efectivamente prestados y soportados. Dicha acta fue presentada por un valor de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($35.973.336,40), conforme a las condiciones establecidas en el contrato y a los avances registrados durante el período reportado.

La documentación correspondiente fue presentada para su revisión y trámite, acompañada de los soportes técnicos, administrativos, financieros y legales requeridos para su respectivo proceso de verificación y pago.

8. PERSONAL Y EQUIPO EN EL PERIODO

8.1 Personal y Equipos del Contratista:

Durante el período comprendido entre el 07 de mayo y el 06 de junio de 2026, el contratista contó con el personal técnico, administrativo y operativo requerido para la ejecución de las actividades programadas en obra, conforme al pliego de condiciones.

PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN OBRA		
N°	**CARGO**	**NOMBRE**
1	Director de Obra	Jesús Orlando Sandoval Arciniegas
2	Ingeniero Residente	Carmen Ana Garces Negrete
3	Especialista en Seguridad Industrial y/o salud ocupacional	María González Ayuz
4	Ing. Eléctrico	Daniel José Corrales Paternina
5	Auxiliar administrativo	Ipatia Rovira Villalobos

El contratista dispone del siguiente equipo en obra, para la construcción del proyecto:

EQUIPO Y HERRAMIENTA EN OBRA		
N°	**EQUIPOS**	**TOTAL**
1	Equipo de Topografía (estación, nivel, GPS)	1
2	Volquetas	1
3	Mescladora de concreto	1
4	Herramientas menores	25

8.2 Personal de la Interventoría:

Durante el período reportado, la interventoría dispuso del personal profesional y técnico necesario para realizar las actividades de seguimiento, control y verificación del cumplimiento técnico, administrativo y contractual del proyecto.

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA		
N°	CARGO	NOMBRE
1	Director de Interventoría	Climaco Miguel Rodríguez Julio
2	Residente de Interventoría	Maria Luisa Laza Vega
3	Profesional SISO	Samir Andrés Rodríguez Baza
4	Auxiliar administrativo	Joaquin Alfredo García Mendoza
5	Contador	Lina Paola Revueltas Lozano

9. ESTADO DEL TIEMPO

Durante el período de ejecución comprendido entre el 07 de mayo y el 06 de junio de 2026, las condiciones climáticas fueron variables, registrándose un total de cuatro (04) días de lluvia. Estas precipitaciones se presentaron de manera intermitente durante el período evaluado, generando afectaciones puntuales en el normal desarrollo de algunas actividades constructivas ejecutadas a la intemperie. No obstante, el contratista mantuvo la continuidad de los trabajos en la medida de las condiciones climáticas existentes y de las actividades que podían desarrollarse sin afectar la calidad de las obras.

10. CONTROL DE CALIDAD

Durante el período objeto de seguimiento se verificó la ejecución de ensayos de laboratorio sobre los materiales empleados en la obra, con el propósito de validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

Con base en los resultados de laboratorio suministrados por el contratista y revisados por esta interventoría, se evidencia que los materiales evaluados cumplen con las condiciones técnicas requeridas para su utilización en la ejecución de las actividades desarrolladas durante el período informado. En consecuencia, la interventoría emite concepto FAVORABLE respecto al control de calidad realizado, dejando constancia de que deberán mantenerse los controles y ensayos establecidos en las especificaciones técnicas y en el Plan de Calidad del proyecto para las actividades subsiguientes.

Observación de Interventoría: Se recomienda complementar periódicamente el expediente de calidad con los resultados de densidades de campo, registros de compactación y ensayos de resistencia a compresión a 28 días, con el fin de garantizar la trazabilidad y conformidad de los procesos constructivos ejecutados.

Anexo 3: Ensayos

11 CONCLUSIONES

Durante el período comprendido entre el 07 de mayo y el 06 de junio de 2026, la interventoría realizó el seguimiento y control integral a la ejecución del Contrato de Obra N.° SI-LP-011-2025, cuyo objeto corresponde al fortalecimiento de la Red Local de Urgencias de Córdoba mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física para el correcto funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE, en el municipio de Montería.

En desarrollo de las actividades de supervisión, se efectuó el control permanente a los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, así como la adecuada gestión documental requerida para el desarrollo del proyecto.

Durante el período evaluado se verificó la ejecución de actividades constructivas contempladas dentro del alcance contractual, evidenciándose la permanencia del personal profesional, técnico y operativo reportado por el contratista, así como la disponibilidad de los equipos y herramientas requeridos para la atención de los diferentes frentes de trabajo habilitados. La interventoría realizó seguimiento con el propósito de verificar la correcta ejecución de las actividades y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios y diseños del proyecto.

En materia de calidad, se realizó la revisión de los ensayos y soportes suministrados por el contratista, evidenciando el cumplimiento de los controles establecidos para los materiales y procesos constructivos ejecutados durante el período reportado. Asimismo, se recomendó mantener actualizados los registros de calidad y continuar con la ejecución de los ensayos previstos en las especificaciones técnicas y en el plan de calidad del proyecto, garantizando la trazabilidad de las actividades desarrolladas.

La interventoría realizó igualmente seguimiento a las diferentes situaciones y condiciones identificadas durante la ejecución de las actividades, dejando constancia de las observaciones y recomendaciones correspondientes a través de oficios reportados mecanismos de control contractual establecidos, con el fin de promover el adecuado desarrollo de la obra y el cumplimiento de los objetivos del contrato.

De acuerdo con la información recopilada durante el período evaluado, esta interventoría considera que el proyecto mantiene condiciones técnicas y administrativas que permiten la continuidad de la ejecución contractual, por lo que continuará ejerciendo las labores de seguimiento, control y verificación necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de las obras ejecutadas y el adecuado desarrollo del proyecto hasta su terminación.

Finalmente, esta interventoría continuará realizando acompañamiento permanente al contratista y a la entidad contratante, emitiendo las recomendaciones y requerimientos que resulten necesarios para asegurar que la ejecución del contrato se desarrolle conforme a lo contratado.

LINA REVUELTAS LOZANO
R.L CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE

12 ANEXOS

1. Registro fotográfico
2. Semanales
3. Ensayos
4. Bitácora
5. Oficios enviados
6. Informe PGIO

REGISRO FOTOGRAFICO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Contrato de obra No. SI-LP-011-2025

Contrato de interventoria No. SI-LP-012-2025

FECHA:

DIA	MES	AÑO
7	6	2026

DIRECCIÓN: Monteria- Cordoba,Barrio Los Laureles calles 42 y 43 con carrera 8A.



NOTA: Excavación manual en material comun para andenes



NOTA: Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m



NOTA: Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m



NOTA: Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m

342

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Contrato de obra No. SI-LP-011-2025

Contrato de interventoria No. SI-LP-012-2025

FECHA:

DIA	MES	AÑO
7	6	2026

DIRECCIÓN: Monteria- Cordoba,Barrio Los Laureles calles 42 y 43 con carrera 8A.




NOTA: Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi



NOTA: Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi



NOTA: Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m

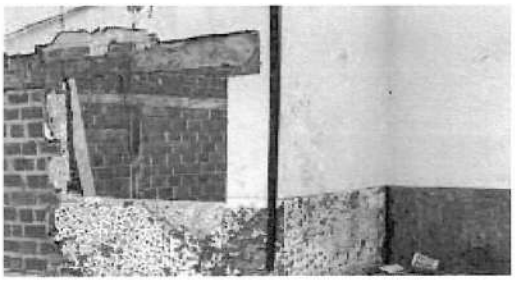

NOTA: Retiro de pintura existente en zonas deterioradas

350

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Contrato de obra No. SI-LP-011-2025

Contrato de interventoria No. SI-LP-012-2025

FECHA:

7	6	2026
DIA	MES	AÑO

DIRECCIÓN: Montería- Cordoba,Barrio Los Laureles calles 42 y 43 con carrera 8A.



NOTA:	Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro



NOTA:	Estructura para cubierta en acero estructural



NOTA:	Levante de muro en bloque de arena



NOTA:	Relleno en material seleccionado

351

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Contrato de obra No. SI-LP-011-2025

Contrato de interventoria No. SI-LP-012-2025


FECHA:

6	6	2026
DIA	MES	AÑO

DIRECCIÓN: Montería- Cordoba,Barrio Los Laureles calles 42 y 43 con carrera 8A.



NOTA:	Demolición de plantilla o andenes 10/15cm

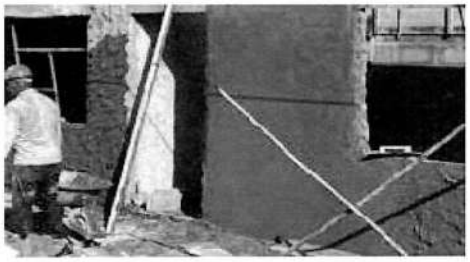

NOTA:	Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior



NOTA:	Suministro e instalacion de cubierta en lamina termoacustica



NOTA:	Estructura para cubierta en acero estructural, Pintada con base anticorrosiva

352

SEMANALES DE PERIODO DEL 7 DE MAYO HASTA EL 6 DE JUNIO 2026

Oficina principal: Cr 16 A #50-20 Barrio Monteverde -Montería – Córdoba

interventoriacrue@gmail.com

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	INFORMES DE INTERVENTORÍA REPORTE SEMANAL	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 11-MAYO-26	SEMANA No.:	5	DEL	5-may-26	HASTA	10-may-26

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"			OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE		
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS			REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO		
CONTRATO No.:	SI-LP-011-2025	VALOR INICIAL:	$ 2.764.759,464	CONTRATO No.:	SI-CMA-012-2025	VALOR INICIAL:	$ 179.866.682,0
PLAZO INICIAL:	5 MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	5 MESES	ADICIONES:	$ -
INICIO :	7/04/2026	VALOR TOTAL:	$ 2.764.759,464	INICIO :	7/04/2026	VALOR TOTAL:	$ 179.866.682,00
SUSPENSIÓN:				SUSPENSIÓN:			
REINICIO:				REINICIO:			
PRORROGA 1:				PRORROGA 1:			
PRORROGA 2:				PRORROGA 2:			
PRORROGA 3:				PRORROGA 3:			
PRORROGA 4:				PRORROGA 4:			
VENCIMIENTO:	7/09/2026			VENCIMIENTO:	7/09/2026		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

CONTRATO CON ANTICIPO 0%		PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (%)	0,00%	
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		TOTAL PAGADO ACUMULADO	$	-
ANTICIPO:		PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO:	0%
PARCIAL 1:			PARCIAL 1:	0,0%
PARCIAL 2:			PARCIAL 2:	0,00%
PARCIAL 3:	$ -		PARCIAL 3:	0%
FINAL:	$ -		FINAL:	0%

III. AVANCE FÍSICO

LISTA GENERAL DE ACTIVIDADESACUMULADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
ADECUACION DE AREAS EXISTENTES					
Localizacion, Trazado y Replanteo	1,01	M2	350,00	$ 6.280,000	$ 2.198.000,00
Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante	1,02	M2		$ 31.102,000	$ -
Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,03	UND		$ 83.082,000	$ -
Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,04	UND		$ 58.191,000	$ -
Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro	1,05	M2	10,00	$ 37.994,000	$ 379.940,00
Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,06	UND		$ 58.191,000	$ -
Retiro de pintura existente en zonas deterioradas	1,07	M2	120,00	$ 6.410,000	$ 769.200,00
Desmonte de instalaciones puntos eléctricos	1,08	UND		$ 93.815,000	$ -
Desmonte de puntos hidráulicos y sanitarios	1,09	UND		$ 32.967,000	$ -
Mantenimiento de closed en mal estado	1,1	UND		$ 432.486,000	$ -
Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye entructura de soporte en madera o metalica y retiro a sitio de disposicion autorizado	1,11	M2		$ 29.012,000	$ -
Limpieza de zonas verdes exteriores, incluye retiro de material vegetal	1,12	M2		$ 25.567,000	$ -
Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,13	UND		$ 46.650,000	$ -
Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro	1,14	M2		$ 24.737,000	$ -
Demolición de redoblon existente. Incluye retiro de material escombro	1,15	M		$ 21.265,000	$ -
Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro	1,16	M		$ 29.244,000	$ -
Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,17	M2		$ 32.967,000	$ -
Demolicion de columna Existente Garita . Incluye retiro de escombro	1,18	UND		$ 770.717,000	$ -
Desmonte y traslado planta electrica a sitio autorizado	1,19	UND		$ 4.883.040,000	$ -
Excavación en material comun. Incluye retiro de material sobrante	1,2	M3		$ 35.829,000	$ -
Excavación manual en material comun para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante	1,21	M	10,80	$ 20.634,000	$ 222.847,20
Suministro e instalacion de geotextil para separacion de suelos y capas granulares.	1,22	M2		$ 14.722,000	$ -
Relleno en material seleccionado compactado	1,23	M3		$ 170.777,000	$ -
Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado	1,24	M3		$ 187.376,000	$ -
Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajon, recomendación geotecnista. Incluye compactacion	1,25	M3		$ 283.698,000	$ -
				SUBTOTAL ADECUACION DE AREAS EXISTENTES	$ 3.569.987,20

554

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo


INFORMES DE INTERVENTORÍA
REPORTE SEMANAL

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUCE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 11-MAYO-26	SEMANA No.:	5	DEL	5-may-26	HASTA	10-may-26
ESTRUCTURA EN CONCRETO						
Base en concreto pobre 2200 PSI, solado, espesor 5cm (bajo estructuras en concreto)		2.01	M3		$ 764.387,000	$ -
Concreto de 3000 PSI para zapatas		2.02	M3		$ 1.022.632,000	$ -
Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m		2.03	M	10,80	$ 141.184,000	$ 1.524.787,20
Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m. Incluye refuerzo 4 varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm		2.04	M	116,40	$ 188.416,000	$ 21.931.622,40
Columnas de 0.25 mts x 0.25 mts en concreto de 21mpa (3000 psi)		2.05	M		$ 114.969,000	$ -
Viga superior de 0.25 m x 0.30 m en concreto de 3000 PSI		2.06	M		$ 161.642,000	$ -
Concreto de 3000 PSI para viga canal e= 10 cm. Incluye formaletas		2.07	M2		$ 252.566,000	$ -
Levante de muro en bloque de arena - cemento vibrado de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero 1:4		2.08	M2	12,00	$ 102.009,000	$ 1.224.108,00
Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior		2.09	M2		$ 44.754,000	$ -
Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm		2.10	M	46,85	$ 131.128,000	$ 6.143.346,80
Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm		2.11	M	4,00	$ 109.045,000	$ 436.180,00
Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm		2.12	M		$ 114.091,000	$ -
Meson en concreto de 3000 psi, ref. 3/8" @ 0.15 mts , incluye granito para placa de 0.08m, muro de apoyo enchapado y apoyo inferior		2.13	M		$ 455.738,000	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, incluye malla electrosoldada XX-106		2.14	M2		$ 167.772,000	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 15cm, incluye malla electrosoldada Malla XX-295, corte de juntas, sello dilatacion		2.15	M2		$ 243.929,000	$ -
Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI (Plantilla con malla electrosoldada E= 0.15m y vigas 0.15 m x 0.20 m). Refuerzo 4D 3/8" Y estribos 1/4" @ 0.20m.		2.16	M2		$ 244.442,000	$ -
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparacion de la superficie de apoyo		2.17	M		$ 112.327,000	$ -
Suministro, corte y figuracion de acero de refuerzo Fy=4.2 Mpa		2.18	Kg		$ 10.755,000	$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO	$ 31.260.044,40
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
					INVERSION DE LA SEMANA	$ 34.830.031,60
					TOTAL	$ 34.830.031,60
					% EJECUTADO DURANTE LA SEMANA	1,26%

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	EJECUTADO - PROGRAMADO
ACUMULADO ANTERIOR	3,98%	3,67%	-1,05%
DURANTE EL PERIODO	2,20%	1,26%	
ACUMULADO ACTUAL	6,18%	5,13%	

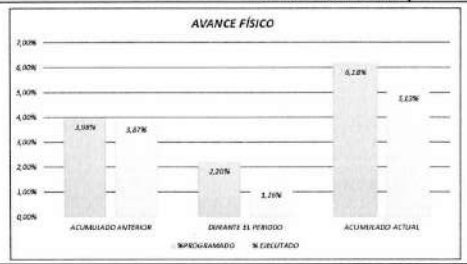

IV. ENSAYO, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Se hace seguimiento a la ejecución del PGID del contratista. Adicionalmente se realizó seguimiento al accidente presentado por desmayo de la residente de obra, asociado a fuertes olores percibidos en el área de intervención. Así mismo, se verificaron las medidas implementadas para la reanudación segura de las actividades y se solicitó al contratista la remisión de los certificados de trabajador autorizado para trabajo en alturas del personal que ejecuta estas labores en obra.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana siguiente se continuará con las actividades de adecuación de áreas existentes y ejecución de la estructura en concreto, así como la demolición de elementos en concreto y bordillos, desmonte de instalaciones eléctricas y de cubierta en mal estado. De igual manera, se avanzará en las excavaciones manuales para vigas de cimentación y en la construcción de elementos estructurales como vigas de cimentación, muros en bloque, vigas cinta y columnas de confinamiento, dando continuidad a las actividades que se vienen desarrollando en obra. Adicionalmente, se realizarán labores de excavación manual en material común para la conformación de vigas de cimentación, contemplando también el retiro, manejo del material sobrante producto de la excavación y levante de muro.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTIVIDADES SEMANALES

En la semana No. 5, periodo que abarca desde 05-MAYO -2026 hasta 10-MAYO-2026, la interventoria informa por medio del presente que se ejecutaron las siguientes actividades:

- Durante la semana del 05 al 10 de mayo de 2026 se ejecutaron actividades correspondientes a la excavacion manual en material común para vigas de cimentación, incluyendo el retiro y disposición del material sobrante. Se ejecutaron actividades correspondientes a la construcción de elementos estructurales y de confinamiento en concreto reforzado, entre las cuales se encuentran la construcción de vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI de 0.25 m x 0.30 m, la ejecución de vigas de cimentación para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20 m x 0.35 m con refuerzo de 4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" cada 15 cm, la construcción de viga cinta de 12x30 cm en concreto de 3000 PSI con acero de refuerzo de 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" cada 15 cm, así como la ejecución de columnetas de confinamiento de 10x20 cm en concreto de 3000 PSI con refuerzo de 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" cada 15 cm,. Se tiene un avance semanal y general del programado vs el ejecutado del -1,05% de atraso. el contratista manifiesta que ingresara mas personal para fortalecer las actividades.

VII. OBSERVACIONES

Durante el periodo reportado, esta interventoria remitió al contratista el oficio con radicado No. SI-CMA-012-2025_028 de fecha 06 de mayo de 2026, mediante el cual se realizó requerimiento técnico relacionado con actividades de mamposteria, evidenciándose observaciones tales como desplome y curvatura en muros, así como falta de uniformidad en los bloques de mamposteria instalados. De igual manera, durante la colocación del concreto se observó ausencia de vibrado, situación que puede generar vacios, segregación y disminución de la resistencia del elemento estructural.

Adicionalmente, se remitió el oficio con radicado No. SI-CMA-012-2025_029 de fecha 11 de mayo de 2026, mediante el cual se solicitó la evaluación técnica de los muros existentes, teniendo en cuenta la presencia de fisuras evidenciadas en la obra.

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

255

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	REGISTRO FOTOGRAFICO	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO										
FECHA DE PRESENTACION: 11-MAYO-26					SEMANA No.:	5	DEL	5-may-26	HASTA	10-may-26
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA					
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"					
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE				
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS				REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO				
CONTRATO No.:	SI-LP-011- 2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$ 2.764.759.464	CONTRATO No.:	SI-CMA-012-2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$	179.866.682.00

ADECUACION DE AREAS EXISTENTES

CRUE



Excavación manual en material comun para



Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m



Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m



Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m



Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi



Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi

Lina Revueltas

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

356

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORMES DE INTERVENTORÍA
REPORTE SEMANAL

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 18-MAYO-26	SEMANA No.:	6	DEL	11-may-26	HASTA	17-may-26

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"			OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA			CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE		
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS			REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO		
CONTRATO No.:	SI-LP-011- 2025	VALOR INICIAL:	$ 2.764.759,464	CONTRATO No.:	SI-CMA-012-2025	VALOR INICIAL:	$ 179.866.682,0
PLAZO INICIAL:	5 MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	5 MESES	ADICIONES:	$ -
INICIO :	7/04/2026	VALOR TOTAL:	$ 2.764.759,464	INICIO :	7/04/2026	VALOR TOTAL:	$ 179.866.682,00
SUSPENSIÓN:				SUSPENSIÓN:			
REINICIO:				REINICIO:			
PRORROGA 1:				PRORROGA 1:			
PRORROGA 2:				PRORROGA 2:			
PRORROGA 3:				PRORROGA 3:			
PRORROGA 4:				PRORROGA 4:			
VENCIMIENTO:	7/09/2026			VENCIMIENTO:	7/09/2026		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

CONTRATO CON ANTICIPO 0%		PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (%)	0,00%
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		TOTAL PAGADO ACUMULADO	$ -
ANTICIPO:		PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO: 0%
PARCIAL 1:			PARCIAL 1: 0,0%
PARCIAL 2:			PARCIAL 2: 0,00%
PARCIAL 3:	$ -		PARCIAL 3: 0%
FINAL:	$ -		FINAL: 0%

III. AVANCE FÍSICO

LISTA GENERAL DE ACTIVIDADESACUMULADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1. ADECUACION DE AREAS EXISTENTES					
Localizacion, Trazado y Replanteo	1,01	M2		$ 6.280,00	$ -
Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante	1,02	M2		$ 31.102,00	$ -
Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,03	UND		$ 83.082,00	$ -
Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,04	UND		$ 58.191,00	$ -
Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro	1,05	M2	20,20	$ 37.994,00	$ 767.478,80
Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,06	UND		$ 58.191,00	$ -
Retiro de pintura existente en zonas deterioradas	1,07	M2	130,00	$ 6.410,00	$ 833.300,00
Desmonte de instalaciones puntos eléctricos	1,08	UND		$ 93.815,00	$ -
Desmonte de puntos hidráulicos y sanitarios	1,09	UND		$ 32.967,00	$ -
Mantenimiento de closed en mal estado	1,1	UND		$ 432.486,00	$ -
Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye entructura de soporte en madera o metalica y retiro a sitio de disposicion autorizado	1,11	M2	31,20	$ 29.012,00	$ 905.174,40
Limpieza de zonas verdes exteriores, incluye retiro de material vegetal	1,12	M2		$ 25.567,00	$ -
Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,13	UND		$ 46.650,00	$ -
Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro	1,14	M2	9,18	$ 24.737,00	$ 227.085,66
Demolición de redoblon existente. Incluye retiro de material escombro	1,15	M		$ 21.265,00	$ -
Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro	1,16	M		$ 29.244,00	$ -
Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,17	M2		$ 32.967,00	$ -
Demolicion de columna Existente Garita . Incluye retiro de escombro	1,18	UND		$ 770.717,00	$ -
Desmonte y traslado planta electrica a sitio autorizado	1,19	UND		$ 4.883.040,00	$ -
Excavación en material comun. Incluye retiro de material sobrante	1,2	M3		$ 35.829,00	$ -
Excavación manual en material comun para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante	1,21	M	138,85	$ 20.634,00	$ 2.865.030,90
Suministro e instalacion de geotextil para separacion de suelos y capas granulares.	1,22	M2		$ 14.722,00	$ -
Relleno en material seleccionado compactado	1,23	M3		$ 170.777,00	$ -
Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado	1,24	M3		$ 187.376,00	$ -
Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajon, recomendación geotecnista. Incluye compactacion	1,25	M3		$ 283.698,00	$ -
				SUBTOTAL ADECUACION DE AREAS EXISTENTES	$ 5.598.069,76

357

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORMES DE INTERVENTORÍA
REPORTE SEMANAL


CONSORCIO INTERVENTORIA CR'LE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 18-MAYO-26 — **SEMANA No.:**

2. ESTRUCTURA EN CONCRETO						
Base en concreto pobre 2200 PSI, solado, espesor 5cm (bajo estructuras en concreto)	2.01	M3		$	764.387,00	$ -
Concreto de 3000 PSI para zapatas	2.02	M3		$	1.022.632,00	$ -
Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m	2.03	M		$	141.184,00	$ -
Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m. Incluye refuerzo 4 varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm	2.04	M	160,55	$	188.416,00	$ 30.250.188,80
Columnas de 0.25 mts x 0.25 mts en concreto de 21mpa (3000 psi)	2.05	M		$	114.969,00	$ -
Viga superior de 0.25 m x 0.30 m en concreto de 3000 PSI	2.06	M		$	161.642,00	$ -
Concreto de 3000 PSI para viga canal e= 10 cm. Incluye formaletas	2.07	M2		$	252.566,00	$ -
Levante de muro en bloque de arena - cemento vibrado de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero 1:4	2.08	M2	18,22	$	102.009,00	$ 1.858.399,96
Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior	2.09	M2		$	44.754,00	$ -
Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2.10	M	20,03	$	131.128,00	$ 2.626.493,84
Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi, Incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2.11	M		$	109.045,00	$ -
Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2.12	M	3,35	$	114.091,00	$ 382.204,85
Meson en concreto de 3000 psi, ref. 3/8" @ 0.15 mts , incluye granito para placa de 0.08m, muro de apoyo enchapado y apoyo inferior	2.13	M		$	455.738,00	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, incluye malla electrosoldada XX-106	2.14	M2		$	167.772,00	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 15cm, incluye malla electrosoldada Malla XX-295, corte de juntas, sello dilatacion	2.15	M2		$	243.929,00	$ -
Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI (Plantilla con malla electrosoldada E= 0.15m y vigas 0.15 m x 0.20 m). Refuerzo 4D 3/8" Y estribos 1/4" @ 0.20m.	2.16	M2		$	244.442,00	$ -
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m, Incluye preparacion de la superficie de apoyo	2.17	M		$	112.327,00	$ -
Suministro, corte y figuracion de acero de refuerzo Fy=4,2 Mpa	2.18	Kg		$	10.755,00	$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO	$ 35.117.287,45
5. CUBIERTA						
Mortero de Nivelacion de Placa de Cubierta e=2cm	5.01	M2			$ 49.786,00	$ -
Impermeabilizacion de placas de cubierta con emulsion asfaltica y membrana Asfaltica	5.02	M2			$ 146.866,00	$ -
Estructura para cubierta en acero estructural, Pintada con base anticorrosiva, acabado en esmalte y anclajes según diseño	5.03	Kg	350,00		$ 30.505,00	$ 10.676.750,00
Suministro e instalacion de cubierta en lamina termoacustica (incluye todos los accesorios para su correcta instalacion)	5.04	M2			$ 160.265,00	
					SUBTOTAL CUBIERTA	$ 10.676.750,00
					INVERSION DE LA SEMANA	$ 51.392.107,21
					TOTAL	$ 51.392.107,21
					% EJECUTADO DURANTE LA SEMANA	1,86%

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	EJECUTADO - PROGRAMADO
ACUMULADO ANTERIOR	6,18%	5,13%	-3,92%
DURANTE EL PERIODO	4,73%	1,86%	
ACUMULADO ACTUAL	10,91%	6,99%	

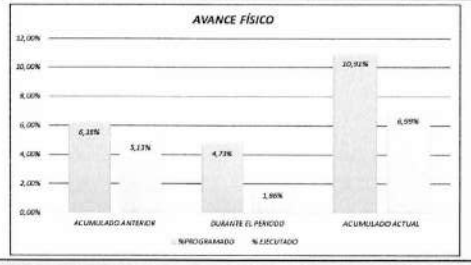

IV. ENSAYO, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Se hace seguimiento a la ejecución del PGIO del contratista. Adicionalmentese realizó seguimiento al accidente presentado por desmayo de la residente de obra, asociado a fuertes olores percibidos en el área de intervención. Así mismo, se verificaron las medidas implementadas para la reanudación segura de las actividades y se solicitó al contratista la remisión de los certificados de trabajador autorizado para trabajo en alturas del personal que ejecuta estas labores en obra.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana siguiente se continuará con las actividades de adecuación de áreas existentes y ejecución de la estructura en concreto, así como la demolición de elementos en concreto y bordillos, desmonte de instalaciones eléctricas y de cubierta en mal estado. De igual manera, se avanzará en las excavaciones manuales para vigas de cimentación y en la construcción de elementos estructurales como vigas de cimentación, muros en bloque, vigas cinta y columnas de confinamiento, dando continuidad a las actividades que se vienen desarrollando en obra. Adicionalmente se inicia la instalacion de estructura metálica de cubierta con su respectiva protección anticorrosivase. Se realizarán labores de excavación manual en material común para la conformación de vigas de cimentación, contemplando también el retiro, manejo del material sobrante producto de la excavación y levante de muro.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTIVIDADES SEMANALES

En la semana No. 6, periodo que abarca desde 11-MAYO -2026 hasta 17-MAYO-2026, la interventoria informa por medio del presente que se ejecutaron las siguientes actividades:

- Durante la semana del 11 al 17 de mayo de 2026 se adelantaron labores de demolición y desmonte de elementos existentes, incluyendo andenes, muros y cubiertas en mal estado, así como retiro de pintura deteriorade y excavaciones manuales para cimentación. De igual forma, se ejecutaron actividades relacionadas con la construcción de elementos estructurales en concreto, tales como vigas de cimentación, vigas cinta y dinteles, además del levantamiento de muros en bloque y la instalación de pañetes interiores y exteriores. Asimismo, se realizaron trabajos para la conformación de rampas de acceso en concreto reforzado y actividades asociadas a la estructura metálica de cubierta con su respectiva protección anticorrosiva. Se tiene un avance semanal y general del programado vs el ejecutado del -3,92% de atraso. el contratista manifiesta que ingresara mas personal para fortalecer las actividades.

VII. OBSERVACIONES

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

358

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 18-MAYO-26					SEMANA No.:	6	DEL	11-may-26	HASTA	17-may-26
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA					
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE				
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS				REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO				
CONTRATO No.:	SI-LP-011- 2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$ 2,764,759,464	CONTRATO No.:	SI-CMA-012-2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$	179,866,882.00

ADECUACION DE AREAS EXISTENTES

CRUE



Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m



Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m



Retiro de pintura existente en zonas deterioradas



Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro



Estructura para cubierta en acero estructural



Levante de muro en bloque de arena

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

359

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	INFORMES DE INTERVENTORÍA REPORTE SEMANAL	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 25-MAYO-26	SEMANA No.:	7	DEL	18-may-26	HASTA	24-may-26

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA				
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE			
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS				REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO			
CONTRATO No.:	SI-LP-011- 2025		VALOR INICIAL:	$ 2.764.759,464	CONTRATO No.:	SI-CMA-012-2025		VALOR INICIAL:	$ 179.866.682,0
PLAZO INICIAL:	5 MESES		ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	5 MESES		ADICIONES:	$ -
INICIO :	7/04/2026		VALOR TOTAL:	$ 2.764.759,464	INICIO :	7/04/2026		VALOR TOTAL:	$ 179.866.682,00
SUSPENSIÓN:					SUSPENSIÓN:				
REINICIO:					REINICIO:				
PRORROGA 1:					PRORROGA 1:				
PRORROGA 2:					PRORROGA 2:				
PRORROGA 3:					PRORROGA 3:				
PRORROGA 4:					PRORROGA 4:				
VENCIMIENTO:	7/09/2026				VENCIMIENTO:	7/09/2026			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

CONTRATO CON ANTICIPO 0%		PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (%)	0,00%	
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		TOTAL PAGADO ACUMULADO	$	-
ANTICIPO:		PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO:	0%
PARCIAL 1:			PARCIAL 1:	0,0%
PARCIAL 2:			PARCIAL 2:	0,00%
PARCIAL 3:	$ -		PARCIAL 3:	0%
FINAL:	$ -		FINAL:	0%

III. AVANCE FÍSICO

LISTA GENERAL DE ACTIVIDADESACUMULADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1. ADECUACION DE AREAS EXISTENTES					
Localizacion, Trazado y Replanteo	1,01	M2	300,00	$ 6.280,00	$ 1.884.000,00
Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante	1,02	M2	40,00	$ 31.102,00	$ 1.244.080,00
Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,03	UND	1,00	$ 83.082,00	$ 83.082,00
Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,04	UND	1,00	$ 58.191,00	$ 58.191,00
Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro	1,05	M2	250,00	$ 37.994,00	$ 9.498.500,00
Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,06	UND		$ 58.191,00	$ -
Retiro de pintura existente en zonas deterioradas	1,07	M2	150,00	$ 6.410,00	$ 961.500,00
Desmonte de instalaciones puntos eléctricos	1,08	UND	23,00	$ 93.815,00	$ 2.157.745,00
Desmonte de puntos hidráulicos y sanitarios	1,09	UND		$ 32.967,00	$ -
Mantenimiento de closed en mal estado	1,1	UND		$ 432.486,00	$ -
Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye entructura de soporte en madera o metalica y retiro a sitio de disposicion autorizado	1,11	M2	40,00	$ 29.012,00	$ 1.160.480,00
Limpieza de zonas verdes exteriores, incluye retiro de material vegetal	1,12	M2	150,00	$ 25.567,00	$ 3.835.050,00
Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,13	UND		$ 46.650,00	$ -
Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro	1,14	M2	45,00	$ 24.737,00	$ 1.113.165,00
Demolición de redoblon existente. Incluye retiro de material escombro	1,15	M	20,00	$ 21.265,00	$ 425.300,00
Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro	1,16	M		$ 29.244,00	$ -
Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,17	M2		$ 32.967,00	$ -
Demolicion de columna Existente Garita . Incluye retiro de escombro	1,18	UND		$ 770.717,00	$ -
Desmonte y traslado planta electrica a sitio autorizado	1,19	UND		$ 4.883.040,00	$ -
Excavación en material comun. Incluye retiro de material sobrante	1,2	M3		$ 35.829,00	$ -
Excavación manual en material comun para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante	1,21	M	45,00	$ 20.634,00	$ 928.530,00
Suministro e instalacion de geotextil para separacion de suelos y capas granulares.	1,22	M2		$ 14.722,00	$ -
Relleno en material seleccionado compactado	1,23	M3	130,00	$ 170.777,00	$ 22.201.010,00
Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado	1,24	M3		$ 187.376,00	$ -
Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajon, recomendación geotecnista. Incluye compactacion	1,25	M3		$ 283.698,00	$ -
				SUBTOTAL ADECUACION DE AREAS EXISTENTES	$ 45.550.633,00

360

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo


INFORMES DE INTERVENTORÍA
REPORTE SEMANAL

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUZ

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 25-MAYO-26	SEMANA No.:	7	DEL	18-may-26	HASTA	24-may-26
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO						
Base en concreto pobre 2200 PSI, solado, espesor 5cm (bajo estructuras en concreto)		2.01	M3		$ 764.387,00	$ -
Concreto de 3000 PSI para zapatas		2.02	M3		$ 1.022.632,00	$ -
Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m		2.03	M		$ 141.184,00	$ -
Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m, incluye refuerzo 4 varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm		2.04	M		$ 188.416,00	$ -
Columnas de 0.25 mts x 0.25 mts en concreto de 21mpa (3000 psi)		2.05	M		$ 114.969,00	$ -
Viga superior de 0.25 m x 0.30 m en concreto de 3000 PSI		2.06	M		$ 161.642,00	$ -
Concreto de 3000 PSI para viga canal e= 10 cm. Incluye formaletas		2.07	M2		$ 252.566,00	$ -
Levante de muro en bloque de arena - cemento vibrado de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero 1:4		2.08	M2	25,00	$ 102.009,00	$ 2.550.225,00
Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior		2.09	M2		$ 44.754,00	$ -
Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm		2.10	M	20,00	$ 131.128,00	$ 2.622.560,00
Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi, Incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm		2.11	M	30,00	$ 109.045,00	$ 3.271.350,00
Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi, Incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm		2.12	M		$ 114.091,00	$ -
Meson en concreto de 3000 psi, ref. 3/8" @ 0.15 mts , incluye granito para placa de 0.08m, muro de apoyo enchapado y apoyo inferior		2.13	M		$ 455.738,00	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, Incluye malla electrosoldada XX-106		2.14	M2		$ 167.772,00	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 15cm, Incluye malla electrosoldada Malla XX-295, corte de juntas, sello dilatacion		2.15	M2		$ 243.929,00	$ -
Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI (Plantilla con malla electrosoldada E= 0.15m y vigas 0.15 m x 0.20 m). Refuerzo 4D 3/8" Y estribos 1/4" @ 0.20m.		2.16	M2		$ 244.442,00	$ -
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparacion de la superficie de apoyo		2.17	M		$ 112.327,00	$ -
Suministro, corte y figuracion de acero de refuerzo Fy=4,2 Mpa		2.18	Kg		$ 10.755,00	$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO	$ 8.444.135,00
5. CUBIERTA						
Mortero de Nivelacion de Placa de Cubierta e=2cm		5.01	M2		$ 49.786,00	$ -
Impermeabilizacion de placas de cubierta con emulsion asfaltica y membrana Asfaltica		5.02	M2		$ 146.866,00	$ -
Estructura para cubierta en acero estructural, Pintada con base anticorrosiva, acabado en esmalte y anclajes según diseño		5.03	Kg	1.200,00	$ 30.505,00	$ 36.606.000,00
Suministro e instalacion de cubierta en lamina termoacustica (incluye todos los accesorios para su correcta instalacion)		5.04	M2		$ 160.265,00	
					SUBTOTAL CUBIERTA	$ 36.606.000,00
					INVERSION DE LA SEMANA	**$ 90.600.768,00**
					TOTAL	**$ 90.600.768,00**
					% EJECUTADO DURANTE LA SEMANA	**3,28%**

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	EJECUTADO - PROGRAMADO
ACUMULADO ANTERIOR	10,91%	6,90%	-6,05%
DURANTE EL PERIODO	5,41%	3,28%	
ACUMULADO ACTUAL	16,32%	10,27%	

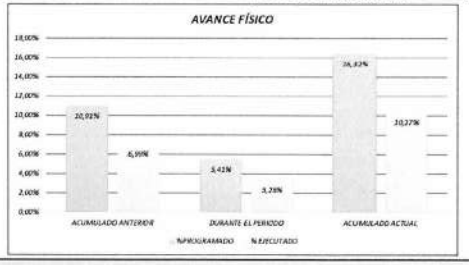

IV. ENSAYO, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Se hace seguimiento a la ejecución del PGIO del contratista. Se solicitó al contratista fortalecer las condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, así como la implementación y diligenciamiento de los formatos de control establecidos como medida preventiva para las actividades ejecutadas en campo. Igualmente, se solicita la promocion del autocuidado y el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la próxima semana se continuará con las actividades de adecuación y construcción del proyecto, avanzando en las labores de localización, trazado y replanteo, desmonte de elementos existentes como cielo raso, puertas, ventanas, cubiertas, aperatos sanitarios e instalaciones eléctricas, así como en la demolición de estructuras y superficies existentes, incluyendo muros, andenes y redoblones. Igualmente, se dará continuidad a las excavaciones para cimentación, conformación de rellenos compactados, construcción de mamposteria en bloque, ejecución de vigas cinta y columnetas de confinamiento en concreto reforzado, y al suministro, fabricación e instalación de la estructura metálica para cubierta, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estándares de calidad y las condiciones de seguridad establecidas para la obra.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTIVIDADES SEMANALES

En la semana No. 7, periodo que abarca desde 18-MAYO -2026 hasta 24-MAYO-2026, la interventoria informa por medio del presente que se ejecutaron las siguientes actividades:

- Durante la semana del 18 al 24 de mayo de 2026 se adelantaron labores de demolición y desmonte de elementos existentes, incluyendo andenes, muros y cubiertas en mal estado, así como retiro de pintura deteriorada y excavaciones manuales para cimentación. De igual forma, se ejecutaron actividades relacionadas con la construcción de elementos estructurales en concreto, tales como vigas de cimentación, vigas cinta y dinteles, además del levantamiento de muros en bloque y la instalación de pañetes interiores y exteriores. Asimismo, se realizaron trabajos para la conformación de rampas de acceso en concreto reforzado y actividades asociadas a la estructura metálica de cubierta con su respectiva protección anticorrosiva. Se tiene un avance semanal y general del programado vs el ejecutado del -6,05% de atraso, el contratista manifiesta que ingresara mas personal para fortalecer las actividades.

VII. OBSERVACIONES

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

361

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	REGISTRO FOTOGRAFICO	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO											
FECHA DE PRESENTACION: 25-MAYO-26					SEMANA No.:	7	DEL	18-may-26	HASTA	24-may-26	
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA						
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"					
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE					
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS				REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO					
CONTRATO No.:	SI-LP-011- 2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$ 2.764.759.464	CONTRATO No.:	SI-CMA-012-2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$ 179.866.682,00		

ADECUACION DE AREAS EXISTENTES

CRUE



Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente.



Estructura para cubierta en acero estructural




Estructura para cubierta en acero estructural



Relleno en material seleccionado compactado



Relleno en material seleccionado compactado



Desmonte de puertas.y Desmonte de ventanas

Lina Revueltas

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

362

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORMES DE INTERVENTORÍA
REPORTE SEMANAL

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 05-JUNIO-26	SEMANA No.:	8	DEL	25-may-26	HASTA	31-may-26

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA				
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE			
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS				REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO			
CONTRATO No.:	SI-LP-011- 2025	VALOR INICIAL:	$	2.764.759.464	CONTRATO No.:	SI-CMA-012-2025	VALOR INICIAL:	$	179.866.682,0
PLAZO INICIAL:	5 MESES	ADICIONES:			PLAZO INICIAL:	5 MESES	ADICIONES:	$	-
INICIO :	7/04/2026	VALOR TOTAL:	$	2.764.759.464	INICIO :	7/04/2026	VALOR TOTAL:	$	179.866.682,00
SUSPENSIÓN:					SUSPENSIÓN:				
REINICIO:					REINICIO:				
PRORROGA 1:					PRORROGA 1:				
PRORROGA 2:					PRORROGA 2:				
PRORROGA 3:					PRORROGA 3:				
PRORROGA 4:					PRORROGA 4:				
VENCIMIENTO:	7/09/2026				VENCIMIENTO:	7/09/2026			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

CONTRATO CON ANTICIPO 0%		PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (%)		0,00%
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		TOTAL PAGADO ACUMULADO	$	-
ANTICIPO:		PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO:	0%
PARCIAL 1:			PARCIAL 1:	0,0%
PARCIAL 2:			PARCIAL 2:	0,00%
PARCIAL 3:	$ -		PARCIAL 3:	0%
FINAL:	$ -		FINAL:	0%

III. AVANCE FÍSICO

LISTA GENERAL DE ACTIVIDADESACUMULADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1. ADECUACION DE AREAS EXISTENTES					
Localizacion, Trazado y Replanteo	1,01	M2		$ 6.280,00	$ -
Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante	1,02	M2		$ 31.102,00	$ -
Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,03	UND		$ 83.082,00	$ -
Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,04	UND		$ 58.191,00	$ -
Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro	1,05	M2	200,00	$ 37.994,00	$ 7.598.800,00
Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,06	UND		$ 58.191,00	$ -
Retiro de pintura existente en zonas deterioradas	1,07	M2	450,00	$ 6.410,00	$ 2.884.500,00
Desmonte de instalaciones puntos eléctricos	1,08	UND		$ 93.815,00	$ -
Desmonte de puntos hidráulicos y sanitarios	1,09	UND		$ 32.967,00	$ -
Mantenimiento de closed en mal estado	1,1	UND		$ 432.486,00	$ -
Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye entructura de soporte en madera o metalica y retiro a sitio de disposicion autorizado	1,11	M2		$ 29.012,00	$ -
Limpieza de zonas verdes exteriores, incluye retiro de material vegetal	1,12	M2		$ 25.567,00	$ -
Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,13	UND		$ 46.650,00	$ -
Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro	1,14	M2		$ 24.737,00	$ -
Demolición de redoblon existente. Incluye retiro de material escombro	1,15	M		$ 21.265,00	$ -
Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro	1,16	M		$ 29.244,00	$ -
Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,17	M2		$ 32.967,00	$ -
Demolicion de columna Existente Garita . Incluye retiro de escombro	1,18	UND		$ 770.717,00	$ -
Desmonte y traslado planta electrica a sitio autorizado	1,19	UND		$ 4.883.040,00	$ -
Excavación en material comun. Incluye retiro de material sobrante	1,2	M3		$ 35.829,00	$ -
Excavación manual en material comun para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante	1,21	M		$ 20.634,00	$ -
Suministro e instalacion de geotextil para separacion de suelos y capas granulares.	1,22	M2		$ 14.722,00	$ -
Relleno en material seleccionado compactado	1,23	M3		$ 170.777,00	$ -
Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado	1,24	M3		$ 187.376,00	$ -
Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajon, recomendación geotecnista. Incluye compactacion	1,25	M3		$ 283.698,00	$ -
				SUBTOTAL ADECUACION DE AREAS EXISTENTES	$ 10.483.300,00

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

INFORMES DE INTERVENTORÍA
REPORTE SEMANAL

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE


I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 06-JUNIO-26 — **SEMANA No.:** 8 — **DEL** 25-may-26 — **HASTA** 31-may-26

2. ESTRUCTURA EN CONCRETO					
Base en concreto pobre 2200 PSI, solado, espesor 5cm (bajo estructuras en concreto)	2.01	M3		$ 764.387,00	$ -
Concreto de 3000 PSI para zapatas	2.02	M3		$ 1.022.632,00	$ -
Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m	2.03	M		$ 141.184,00	$ -
Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m. Incluye refuerzo 4 varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm	2.04	M		$ 188.416,00	$ -
Columnas de 0.25 mts x 0.25 mts en concreto de 21mpa (3000 psi)	2.05	M		$ 114.969,00	$ -
Viga superior de 0.25 m x 0.30 m en concreto de 3000 PSI	2.06	M		$ 161.642,00	$ -
Concreto de 3000 PSI para viga canal e=10 cm. Incluye formaletas	2.07	M2		$ 252.566,00	$ -
Levante de muro en bloque de arena - cemento vibrado de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero 1:4	2.08	M2		$ 102.009,00	$ -
Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior	2.09	M2		$ 44.754,00	$ -
Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2.10	M		$ 131.128,00	$ -
Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2.11	M		$ 109.045,00	$ -
Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	2.12	M		$ 114.091,00	$ -
Meson en concreto de 3000 psi, ref. 3/8" @ 0.15 mts , incluye granito para placa de 0.08m, muro de apoyo enchapado y apoyo inferior	2.13	M		$ 455.738,00	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, incluye malla electrosoldada XX-106	2.14	M2	100,00	$ 167.772,00	$ 16.777.200,00
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 15cm, incluye malla electrosoldada Malla XX-295, corte de juntas, sello dilatacion	2.15	M2		$ 243.929,00	$ -
Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI (Plantilla con malla electrosoldada E= 0.15m y vigas 0.15 m x 0.20 m). Refuerzo 4D 3/8" Y estribos 1/4" @ 0.20m.	2.16	M2		$ 244.442,00	$ -
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparacion de la superficie de apoyo	2.17	M		$ 112.327,00	$ -
Suministro, corte y figuracion de acero de refuerzo Fy=4.2 Mpa	2.18	Kg		$ 10.755,00	$ -
				SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO	$ 16.777.200,00

5. CUBIERTA					
Mortero de Nivelacion de Placa de Cubierta e=2cm	5.01	M2		$ 49.786,00	$ -
Impermeabilizacion de placas de cubierta con emulsion asfaltica y membrana Asfaltica	5.02	M2		$ 146.866,00	$ -
Estructura para cubierta en acero estructural, Pintada con base anticorrosiva, acabado en esmalte y anclajes según diseño	5.03	Kg		$ 30.505,00	$ -
Suministro e instalacion de cubierta en lamina termoacustica (incluye todos los accesorios para su correcta instalacion)	5.04	M2	473,00	$ 160.265,00	$ 75.805.345,00
				SUBTOTAL CUBIERTA	$ 75.805.345,00
				INVERSION DE LA SEMANA	**$ 103.065.845,00**
				TOTAL	**$ 103.065.845,00**
				% EJECUTADO DURANTE LA SEMANA	**3,73%**

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	EJECUTADO - PROGRAMADO
ACUMULADO ANTERIOR	16,32%	10,27%	-8,98%
DURANTE EL PERIODO	6,66%	3,73%	
ACUMULADO ACTUAL	22,98%	14,00%	

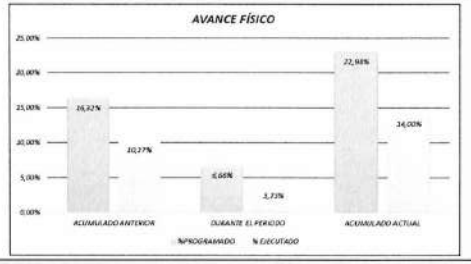

IV. ENSAYO, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Se hace seguimiento a la ejecución del PGIO del contratista. Se solicitó al contratista fortalecer las condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, así como la implementación y diligenciamiento de los formatos de control establecidos como medida preventiva para las actividades ejecutadas en campo. Igualmente, se solicita la promocion del autocuidado y el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte de los trabajadores.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la próxima semana se continuará con las actividades de demolición de plantilla o andenes en concreto existente, el retiro de pintura en zonas deterioradas, la construcción de plantilla en concreto de 3000 PSI y el suministro e instalación de cubierta en lámina termoacústica. Estas actividades se encuentran en desarrollo.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTIVIDADES SEMANALES

En la semana No. 8, periodo que abarca desde 25-MAYO -2026 hasta 31-MAYO-2026, la interventoría informa por medio del presente que se ejecutaron las siguientes actividades:

- Durante la semana del 25 al 31 de mayo de 2026 se desarrollan actividades de demolición de plantilla o andenes en concreto existente, retiro de pintura en zonas deterioradas, construcción de plantilla en concreto de 3000 PSI y suministro e instalación de cubierta en lámina termoacústica. Estas labores se ejecutan de acuerdo con la programación establecida en obra y se mantienen en desarrollo para dar continuidad a las actividades

VII. OBSERVACIONES

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

364

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	REGISTRO FOTOGRAFICO	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO										
FECHA DE PRESENTACIÓN: 05-JUNIO-26					SEMANA No.:	8	DEL	25-may-26	HASTA	31-may-26
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA					
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE				
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS				REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO				
CONTRATO No.:	SI-LP-011- 2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$ 2.764.759.464	CONTRATO No.:	SI-CMA-012-2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$	179.866.682,00

ADECUACION DE AREAS EXISTENTES

CRUE



Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, incluye malla electrosoldada XX-106



Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente.



Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, incluye malla electrosoldada XX-106



Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm



Retiro de pintura existente en zonas deterioradas



Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm

Lina Revueltas

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	INFORMES DE INTERVENTORÍA REPORTE SEMANAL	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 13-JUNIO-26	SEMANA No.:	9	DEL	1-jun-26	HASTA	7-jun-26

CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA				
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"			
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE			
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS				REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO			
CONTRATO No.:	SI-LP-011- 2025		VALOR INICIAL:	$ 2.764.759.464	CONTRATO No.:	SI-CMA-012-2025		VALOR INICIAL:	$ 179.866.682,0
PLAZO INICIAL:	5 MESES		ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	5 MESES		ADICIONES:	$ -
INICIO :	7/04/2026		VALOR TOTAL:	$ 2.764.759.464	INICIO :	7/04/2026		VALOR TOTAL:	$ 179.866.682,00
SUSPENSIÓN:					SUSPENSIÓN:				
REINICIO:					REINICIO:				
PRORROGA 1:					PRORROGA 1:				
PRORROGA 2:					PRORROGA 2:				
PRORROGA 3:					PRORROGA 3:				
PRORROGA 4:					PRORROGA 4:				
VENCIMIENTO:	7/09/2026				VENCIMIENTO:	7/09/2026			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

CONTRATO CON ANTICIPO 0%		PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO (%)	0,00%	
RESUMEN DE ACTAS PAGADAS		TOTAL PAGADO ACUMULADO	$	-
ANTICIPO:		PORCENTAJE AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO:	0%
PARCIAL 1:			PARCIAL 1:	0,0%
PARCIAL 2:			PARCIAL 2:	0,00%
PARCIAL 3:	$ -		PARCIAL 3:	0%
FINAL:	$ -		FINAL:	0%

III. AVANCE FÍSICO

LISTA GENERAL DE ACTIVIDADESACUMULADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1. ADECUACION DE AREAS EXISTENTES					
Localizacion, Trazado y Replanteo	1,01	M2		$ 6.280,00	$ -
Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante	1,02	M2		$ 31.102,00	$ -
Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,03	UND		$ 83.082,00	$ -
Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,04	UND	1,00	$ 58.191,00	$ 58.191,00
Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro	1,05	M2	225,51	$ 37.994,00	$ 8.568.026,94
Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,06	UND		$ 58.191,00	$ -
Retiro de pintura existente en zonas deterioradas	1,07	M2		$ 6.410,00	$ -
Desmonte de instalaciones puntos eléctricos	1,08	UND	15,00	$ 93.815,00	$ 1.407.225,00
Desmonte de puntos hidráulicos y sanitarios	1,09	UND		$ 32.967,00	$ -
Mantenimiento de closed en mal estado	1,1	UND		$ 432.486,00	$ -
Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye entructura de soporte en madera o metalica y retiro a sitio de disposicion autorizado	1,11	M2		$ 29.012,00	$ -
Limpieza de zonas verdes exteriores, incluye retiro de material vegetal	1,12	M2		$ 25.567,00	$ -
Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,13	UND		$ 46.650,00	$ -
Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro	1,14	M2		$ 24.737,00	$ -
Demolición de redoblon existente. Incluye retiro de material escombro	1,15	M		$ 21.265,00	$ -
Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro	1,16	M	61,90	$ 29.244,00	$ 1.810.203,60
Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1,17	M2	17,28	$ 32.967,00	$ 569.669,76
Demolicion de columna Existente Garita . Incluye retiro de escombro	1,18	UND		$ 770.717,00	$ -
Desmonte y traslado planta electrica a sitio autorizado	1,19	UND		$ 4.883.040,00	$ -
Excavación en material comun. Incluye retiro de material sobrante	1,2	M3		$ 35.829,00	$ -
Excavación manual en material comun para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante	1,21	M	34,79	$ 20.634,00	$ 717.856,86
Suministro e instalacion de geotextil para separacion de suelos y capas granulares.	1,22	M2		$ 14.722,00	$ -
Relleno en material seleccionado compactado	1,23	M3		$ 170.777,00	$ -
Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado	1,24	M3	150,00	$ 187.376,00	$ 28.106.400,00
Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajon, recomendación geotecnista. Incluye compactacion	1,25	M3		$ 283.698,00	$ -
				SUBTOTAL ADECUACION DE AREAS EXISTENTES	$ 41.237.573,16

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo


INFORMES DE INTERVENTORÍA
REPORTE SEMANAL

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 13-JUNIO-26	SEMANA No.:	9	DEL	1-jun-26	HASTA	7-jun-26
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO						
Base en concreto pobre 2200 PSI, solado, espesor 5cm (bajo estructuras en concreto)		2.01	M3		$ 764.387,00	$ -
Concreto de 3000 PSI para zapatas		2.02	M3		$ 1.022.632,00	$ -
Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m		2.03	M		$ 141.184,00	$ -
Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m. Incluye refuerzo 4 varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm		2.04	M	34,79	$ 188.416,00	$ 6.554.992,64
Columnas de 0.25 mts x 0.25 mts en concreto de 21mpa (3000 psi)		2.05	M		$ 114.969,00	$ -
Viga superior de 0.25 m x 0.30 m en concreto de 3000 PSI		2.06	M		$ 161.642,00	$ -
Concreto de 3000 PSI para viga canal e= 10 cm. Incluye formaletas		2.07	M2		$ 252.566,00	$ -
Levante de muro en bloque de arena - cemento vibrado de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero 1:4		2.08	M2	80,00	$ 102.009,00	$ 8.160.720,00
Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior		2.09	M2	210,00	$ 44.754,00	$ 9.398.340,00
Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm		2.10	M	60,00	$ 131.128,00	$ 7.867.680,00
Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm		2.11	M	27,60	$ 109.045,00	$ 3.009.642,00
Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm		2.12	M	33,90	$ 114.091,00	$ 3.867.684,90
Meson en concreto de 3000 psi, ref. 3/8" @ 0.15 mts., incluye granito para placa de 0.08m, muro de apoyo enchapado y apoyo inferior		2.13	M		$ 455.738,00	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, incluye malla electrosoldada XX-106		2.14	M2		$ 167.772,00	$ -
Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 15cm, incluye malla electrosoldada Malla XX-295, corte de juntas, sello dilatacion		2.15	M2		$ 243.929,00	$ -
Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI (Plantilla con malla electrosoldada E= 0.15m y vigas 0.15 m x 0.20 m). Refuerzo 4D 3/8" Y estribos 1/4" @ 0.20m.		2.16	M2		$ 244.442,00	$ -
Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparacion de la superficie de apoyo		2.17	M		$ 112.327,00	$ -
Suministro, corte y figuracion de acero de refuerzo Fy=4.2 Mpa		2.18	Kg		$ 10.755,00	$ -
					SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO	$ 38.859.059,54
5. CUBIERTA						
Mortero de Nivelacion de Placa de Cubierta e=2cm		5.01	M2		$ 49.786,00	$ -
Impermeabilizacion de placas de cubierta con emulsion asfaltica y membrana Asfaltica		5.02	M2		$ 146.866,00	$ -
Estructura para cubierta en acero estructural, Pintada con base anticorrosiva, acabado en esmalte y anclajes según diseño		5.03	Kg	310,50	$ 30.505,00	$ 9.471.802,50
Suministro e Instalacion de cubierta en lamina termoacustica (incluye todos los accesorios para su correcta instalacion)		5.04	M2		$ 160.265,00	
					SUBTOTAL CUBIERTA	$ 9.471.802,50
					INVERSION DE LA SEMANA	$ 89.568.435,20
					COMPONENTE PGIO	$ 16.000.000,00
					TOTAL	$ 105.568.435,20
					% EJECUTADO DURANTE LA SEMANA	3,82%

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	EJECUTADO - PROGRAMADO
ACUMULADO ANTERIOR	22,98%	14,0%	-14,66%
DURANTE EL PERIODO	9,69%	3,82%	
ACUMULADO ACTUAL	32,67%	17,81%	

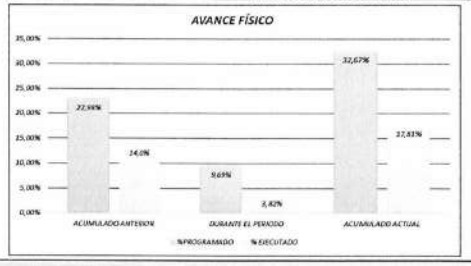

IV. ENSAYO, MEDICIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

Se hace seguimiento a la ejecución del PGIO del contratista. La interventoría reiteró al contratista la importancia de fortalecer la cultura del autocuidado entre los trabajadores, haciendo énfasis en el uso obligatorio y permanente de los elementos de protección personal (EPP) de acuerdo con los riesgos de cada actividad, así como en la responsabilidad individual y colectiva para garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las labores en obra.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la próxima semana se continuará con las actividades de adecuación y preparación del área de intervención, avanzando en el desmontaje de elementos existentes como ventanas, instalaciones eléctricas y cerramientos, así como en la demolición de andenes, bordillos y demás estructuras que interfieran con el desarrollo del proyecto. Paralelamente, se seguirán ejecutando las excavaciones para cimentaciones y las labores de conformación de rellenos con material seleccionado y debidamente compactado, garantizando las condiciones requeridas para el inicio y continuidad de las obras civiles. En el componente estructural, se continuará con la construcción de vigas de cimentación, muros en mamposteria, columnas de confinamiento, vigas de amarre y dinteles, además de la ejecución de pañetes en muros interiores y exteriores, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los acabados y el avance programado de la obra.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y ACTIVIDADES SEMANALES

En la semana No. 9, periodo que aberca desde 01-JUNIO -2026 hasta 07-JUNIO-2026, la interventoría informa por medio del presente que se ejecutaron las siguientes actividades:

- Durante la semana del 01 al 07 de junio de 2026 Durante la presente semana se ejecutaron actividades de adecuación y preparación de las áreas de intervención, incluyendo el desmontaje de elementos existentes como ventanas, instalaciones eléctricas y cerramientos, así como la demolición de andenes, bordillos y otras estructuras que interferían con el desarrollo de las obras. De igual manera, se realizaron labores de excavación para cimentaciones y la conformación de rellenos con material seleccionado debidamente compactado, garantizando las condiciones necesarias para la ejecución de las etapas posteriores. En cuanto al componente estructural, se avanzó en la construcción de vigas de cimentación, muros en mamposteria, columnas de confinamiento, vigas de amarre y dinteles, además de la aplicación de pañete en muros interiores y exteriores, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas y contribuyendo al avance programado del proyecto.. Se tiene un avance semanal y general del programado vs el ejecutado del -14,66% de atraso. el contratista manifiesta que ingresara mas personal para fortalecer las actividades. Se le solicito de manera formal un plan de accion que ayude a mitigar el retraso que presenta la obra

VII. OBSERVACIONES

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

362

Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	REGISTRO FOTOGRAFICO	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO										
FECHA DE PRESENTACIÓN: 13-JUNIO-26					SEMANA No.:	9	DEL	1-jun-26	HASTA	7-jun-26
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA					
OBJETO	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA				CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE				
REP. LEGAL:	MARIA ELENA RIVERA HOYOS				REP. LEGAL:	LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO				
CONTRATO No.:	SI-LP-011- 2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$ 2,764,759,464	CONTRATO No.:	SI-CMA-012-2025		VALOR INICIAL + ADICIONAL:	$	179,866,682.00

ADECUACION DE AREAS EXISTENTES

CRUE




Relleno en material seleccionado



Relleno en material seleccionado



Demolición de plantilla o andenes 10/15cm



Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior



Suministro e instalacion de cubierta en lamina termoacustica



Estructura para cubierta en acero estructural, Pintada con base anticorrosiva

Lina Revueltas

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORA

ENSAYOS DE LABORATORIOA

JV INGENIERÍA

NIT. 10 765 474-7

LA GEOTECNIA ES NUESTRA ESPECIALIDAD, LA CALIDAD ES NUESTRA GARANTÍA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

I.N.V. - 410

Casa 011A, B/ Horizonte
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES EN A EDIFICACIÓN DE UN NIVEL CRUE MONTERÍA -CÓRDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA


3000 PSI

CILINDRO	ESTRUCTURA	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	DATOS DE DIMENSIÓN				PESO (g)	Peso Unitario (Kg/cm3)							1				CUMPLE/NO CUMPLE
						h1 (cm)	D (cm)	A (cm2)	V(cm3)									CARGA (Lbf)	CARGA (KN)	PSI	%	
1	VIGA CINTA	22/04/2026	29/04/2026	7	3000	30,1	15,1	179,1	5390,3	12536,0	2,326	X						64959	285,8	2340,3	78%	CUMPLE
2		22/04/2026	6/05/2026	14	3000	30,2	15,1	179,1	5408,2	12475,0	2,307				X			78547	345,6	2829,8	94%	CUMPLE
3	VIGA DE CIMENTACIÓN	29/04/2026	6/05/2026	7	3000	30,2	15,2	181,5	5480,0	12522,0	2,285					X		65012	286,1	2311,4	77%	CUMPLE
4		29/04/2026	13/05/2026	14	3000	30,1	15,0	176,7	5319,1	12288,0	2,310					X		75918	334,0	2771,7	92%	CUMPLE
5	VIGA DE CIMENTACIÓN	8/05/2026	15/05/2026	7	3000	30,0	15,1	179,1	5372,4	12690,0	2,362		X					63596	279,8	2291,1	76%	CUMPLE

Nota: Los especimenes de concreto fallados fueron suministros por el contratista

Nota: Los resultados presentados en este documento corresponden únicamente a los especimenes ensayados

Observaciones:



JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

370

JV INGENIERÍA

LA GEOTECNIA ES NUESTRA ESPECIALIDAD, LA CALIDAD ES NUESTRA GARANTÍA

INGENIERÍA

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD
I.N.V. E - 125 - 13 Y E 126 - 13

NIT. 10.765.474

Ordenado por	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA	**Tipo de material**	MATERIAL SELECCIONADO DE RELLENO	**Cantera**	ORIÓN
Descripción	GRAVA LIMOSA DE PLASTICIDAD BAJA	**Fecha de mezcla**	jueves, 28 de mayo de 2026	**Fecha de ejecución**	jueves, 28 de mayo de 2026
Proyecto	CENTRO REGULADOR DE EMERGENCIA CRUE				

LÍMITE LÍQUIDO			
Recipiente Nº.	21	13	15
Peso de la muestra húmeda + recipiente (g)	35,6	39,2	36,4
Peso de la muestra seca + recipiente (g)	31,2	33,8	31,4
Peso del recipiente (g)	18,5	19,2	18,8
% DE HUMEDAD	**34,6**	**37,0**	**39,7**
NÚMERO DE GOLPES	**35**	**25**	**15**

LÍMITE PLÁSTICO		
Recipiente Nº.	9	23
Peso de la muestra húmeda + recipiente (g)	29,4	29,2
Peso de la muestra seca + recipiente (g)	27,2	27,0
Peso del recipiente (g)	19,4	19,6
% DE HUMEDAD	**28,2**	**29,7**

RESULTADOS	
LL	**37,1**
LP	**29,0**
IP	**8,1**
PLASTICIDAD BAJA	
U.S.C.	**ML**



OBSERVACIONES:

EJECUTADO POR	APROBADO POR
	Cristian DBF
JORGE LUIS VANDA	CRISTIAN BUELVAS
LABORATORISTA	INGENIERO CIVIL

JV INGENIERÍA

LA GEOTECNIA ES NUESTRA ESPECIALIDAD, LA CALIDAD ES NUESTRA GARANTÍA

INGENIERÍA

ANALISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
I.N.V. E - 123 - 13

NIT. 10.765.474

Ordenado por	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA	**Tipo de material**	MATERIAL SELECCIONADO DE RELLENO	**Cantera**	ORIÓN
Descripción	GRAVA LIMOSA DE PLASTICIDAD BAJA	**Fecha de mezcla**	jueves, 30 de mayo de 2026	**Fecha de ejecución**	jueves, 30 de mayo de 2026
Proyecto	CENTRO REGULADOR DE EMERGENCIA CRUE				


CONTENIDO DE HUMEDAD - INV E-122 - 13	
Recipiente Nº.	31
Peso de la muestra húmeda + recipiente (g)	357,8
Peso de la muestra seca + recipiente (g)	327,2
Peso del recipiente (g)	67,2
% DE HUMEDAD	**11,8**

LAVADO SOBRE TAMIZ No. 200 - INV E-214 - 13	
Recipiente Nº.	10
Peso de la muestra húmeda + recipiente (g)	2275,2
Peso de la muestra seca + recipiente (g)	1618,0
Peso del recipiente (g)	163,2
% Que pasa el tamiz No. 200	**31,1**

GRANULOMETRÍA

	Peso inicial (g)	2112,0	**Peso final (g)**	1454,8	
TAMIZ	**Abertura del tamiz (mm)**	**Masa retenida (g)**	**% Retenido**	**% Retenido acumulado**	**% Que pasa**
3"	76,2	0,0	0,0	0,0	100,0
2 1/2"	63,5	0,0	0,0	0,0	100,0
2"	50,8	0,0	0,0	0,0	100,0
1 1/2"	38,1	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	25,4	198,6	9,4	9,4	90,6
3/4"	19	119,4	5,7	15,1	84,9
1/2"	12,7	236,4	11,2	26,3	73,8
3/8"	9,51	131,6	6,2	32,5	67,5
No 4	4,76	282,6	13,4	45,9	54,1
No10	2	259,0	12,3	58,1	41,9
No. 40	0,42	169,8	8,0	66,2	33,8
No. 200	0,074	57,4	2,7	68,9	31,1
FONDO	0	0,0	0,0	68,9	31,1
Error de ensayo	**0,00%**		**< 1,0 %**	**ACEPTADO**	

RESULTADOS		
PORCENTAJE DE GRAVAS	**45,9**	
Porcentaje de gravas gruesas	0,0	
Porcentaje de gravas medias	45,9	
Porcentaje de gravas finas	13,4	
PORCENTAJE DE ARENAS	**23,0**	**GRAVA MEDIA**
Porcentaje de arenas gruesas	12,3	
Porcentaje de arenas medias	8,0	
Porcentaje de arenas finas	2,7	
PORCENTAJE DE FINOS	**31,1**	

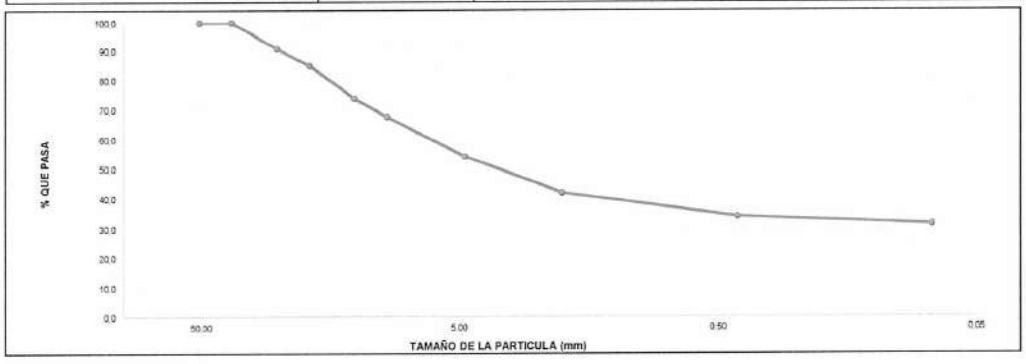

OBSERVACIONES:

EJECUTADO POR	**APROBADO POR**
	Cristian DBF
JORGE LUIS VANDA	CRISTIAN BUELVAS
LABORATORISTA	INGENIERO CIVIL

JV INGENIERÍA

LA GEOTECNIA ES NUESTRA ESPECIALIDAD, LA CALIDAD ES NUESTRA GARANTÍA


INGENIERÍA

DENSIDAD Vs HUMEDAD - PROCTOR MODIFICADO
I.N.V. E - 142 - 13

NIT. 10.765.474

Ordenado por	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA	**Tipo de material**	MATERIAL SELECCIONADO DE RELLENO	**Cantera**	ORIÓN
Descripción	GRAVA LIMOSA DE PLASTICIDAD BAJA	**Fecha de mezcla**	jueves, 30 de mayo de 2026	**Fecha de ejecución**	jueves, 30 de mayo de 2026
Proyecto	CENTRO REGULADOR DE EMERGENCIA CRUE				

PRUEBA	1	2	3
No. de golpes por capas	56	56	56
Molde no.	1	1	1
No. de capas	5	5	5
Peso de muestra húmeda + molde (g)	7241	7524	7512
Peso de molde (g)	2800	2800	2800
Peso de muestra húmeda (g)	4441	4724	4712
Volumen de molde (cm3)	2179	2179	2179
Densidad de muestra húmeda (g/cm3)	2,039	2,168	2,163
Densidad de muestra seca (g/cm3)	**1,880**	**1,951**	**1,903**
Contenido de humedad (%)	**8,4**	**11,1**	**13,6**

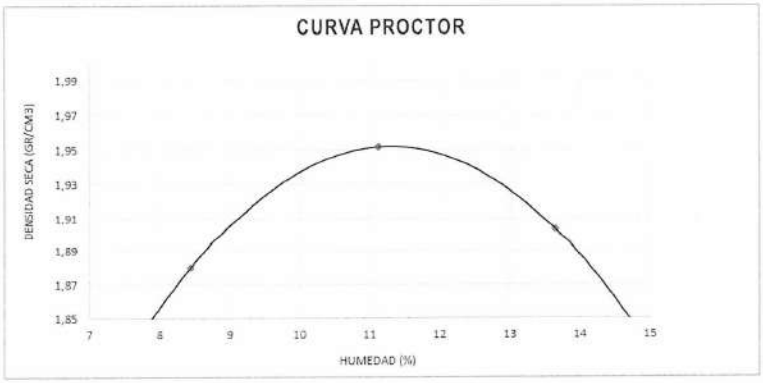

RESULTADOS DEL ENSAYO

Densidad máxima (g/cm3)	**1,952**
Humedad óptima (%)	**11,3**

OBSERVACIONES:

EJECUTADO POR	APROBADO POR
	Cristian DBF
JORGE LUIS VANDA	CRISTIAN BUELVAS
LABORATORISTA	INGENIERO CIVIL

BITACORA DEL PERIODO DEL 7 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2026

Oficina principal: Cr 16 A #50-20 Barrio Monteverde -Montería – Córdoba

interventoriacrue@gmail.com

394

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	07 DE MAYODE 2026	NUMERO DE PAGINA:	1,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en andenes y jardineras para zonas verdes exteriores
Se realizan actividades de armado y figurado de acero para vigas de cimentacion en andenes y jardineras de zonas verdes exteriores
se realizan actividades de armado de formaletas metalicas para vaceado de concreto para vigas de cimentacion de andenes y jardineras de zonas verdes exteriores
se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para vigas de cimentacion de andenes y jardineras de zonas verdes y exteriores
se realizan actividades de levante de muro en bloque MALARIA
El contratista recibe mediante correo electronico citacion por parte de la secretaria de infraestructura departamental la citacion para comité tecnico presencial en la gobernacion de condoba programado para el dia 05 de mayo de 2026 a las 03:00pm

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA	
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS	
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026	
FECHA:	08 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA: 2,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de localizacion, trazado y replanteo
demolicion de plantilla existente en mal estado en zonas exteriores
desmonte de pintura en mal estado
excavacion para vigas de cimentacion
viga de cimentacion en concreto para levante de muro en bloque 1 de malaria
levante de muro en bloque de malaria
viga cinta en concreto en bloque 1 malaria
columneta de confinamiento en bloque 1 en malaria

OBSERVACIONES

A las 10:30 am se presentaron olores fuertes en el lugar de trabajo a causa de una mala manipulacion de venenos y mantenimiento de maquinas por parte de los funcionarios de malaria, lo cual ocasionó la suspension de actividades debido a que el olor era insoportable, afectando a los trabajadores e ingenieros que se encontraban en obra.
La arquitecta Nataly espitia quien es apoyo al contratista de obra tubo que ser remitida a urgencias luego de presentar nauseas y malestar.
estos venenos son manipulados al aire libre mientras son ejecutadas actividades del contrato de obra
la secretaria de salud departamental realizo inspeccion en el sitio una vez fue notificado el incidente y tomo la decisión de suspender las actividades hasta el dia abril

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	09 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	3.0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se realizan actividades ya que las actividades se suspendieron por fuerte propagacion de veneno en el ambiente

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

3 7 7

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	10 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	4,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se realizan actividades ya que las actividades se suspendieron por fuerte propagación de veneno en el ambiente

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

378

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	11 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	5.0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	LLUVIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se realizan actividades ya que las actividades se suspendieron por fuerte propagacion de veneno en el ambiente

11

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	12 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	0,6

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

la secretaria de salud realiza visita a obra y autoriza la continuidad de las actividades
se realizana ctividades de demolicion de plantilla en mal estado en bloque 1 de malaria
Retiro de pintura en mal estado
desmonte de cubierta en mal estado en bloque 2 de malaria

OBSERVACIONES

Los profesionales SST de interventoria y gobernacion realizan charla y/o socializcion sobre los planes de contingencia y medidas preventivas para mitigar los incidentes de malos olores como el sucedido el dia viernes 8 de mayo. Se recomienda el uso de tapabocas y demas elementos de proteccion personal

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	13 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	0,7

ESTADO DEL TIEMPO	
MANANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de desmonte de cubierta existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de demolicion de muro existente en mal estado en bloques de malaria
se realizana ctividades de demolicion de plantilla en mal estado en bloque 1 de malaria
Retiro de pintura en mal estado
excavacion para vigas de cimentacion en andenes exteriores
vigas de clemntacion en andenes exteriores

OBSERVACIONES

Interventoria solicita al contratista el envio del estudio patologico realizado a las instalaciones del CRUE y Malaria dado que se indentifican muros con fisuras a los cuales se les deberia realizar trabajos de refuerzo

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA	
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS	
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026	
FECHA:	14 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA: 0,8

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
Soleado	Lluviso

ACTIVIDADES REALIZADAS

se realizan actividades solamente en la jornada de la tarde por las fuertes lluvias presentadas en la jornada de la mañana
Se realizan actividades de demolicion de muro existente en mal estado en bloques de malaria
se realizana ctividades de demolicion de plantilla en mal estado en bloque 1 de malaria
Retiro de pintura en mal estado
excavacion para vigas de cimentacion en andenes exteriores
vigas de ciemntacion en andenes exteriores

OBSERVACIONES

Interventoria manda a suspender los trabajos en alturas hasta tanto se presenten los respectivos certificados de los trabajadores para realizar esta actvidad.

Interventoria solicita demoler y volver a levantar los muros divisorios construidos en la zona de los baños dado que se evindencia la instalacion de bloques fisurados y algunos incompletos.

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	15 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	0,9

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de demolicion de muro existente en mal estado en bloques de malaria
se realizana ctividades de demolicion de plantilla en mal estado en bloque 1 de malaria
Retiro de pintura en mal estado
excavacion para vigas de cimentacion en andenes exteriores
vigas de ciemntacion en andenes exteriores
Desmonte de cubierta en mal estado
excavacion en material comun en vigas de cimentacion
levante de muro en bloque 1 de malaria
Dintel de 10x20 en ventanas y puertas

OBSERVACIONES

Interventoria manifiesta al contratista que la viga de anden del ala oeste debe mantener la linealidad durante todo el recorrido por lo tanto se solicita replantear dicha viga dado que el tramo de viga en la zona exterior del CRUE se encuentra dezplazada respecto al tramos de la zona de malaria

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	16 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	10,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MANANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizan actividades de demolicion de muro existente en mal estado en bloques de malaria
se realizana ctividades de demolicion de plantilla en mal estado en bloque 1 de malaria
Retiro de pintura en mal estado
excavacion para vigas de cimentacion en andenes exteriores
vigas de ciemntacion en andenes exteriores
Desmonte de cubierta en mal estado
excavacion en material comun en vigas de cimentacion
levante de muro en bloque 1 de malaria
Dintel de 10x20 en ventanas y puertas

OBSERVACIONES

Los trabajadores siguen presentando molestias y mal estar por el olor qu eproducen los venenos y las bombas de fumigar presentes en obra
No se realizan actividades en la jornada de la tarde por ser sabado.

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	17 DE DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	11,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MANANA	TARDE
SOLEADO	LLUVIOSO

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se trabaja por ser domingo dia de descanso

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	18 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	12,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se trabaja por ser lunes FESTIVO

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

386

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	19 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	13,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
LLUVIOSO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se ralizaron actividades debido a que los trabajadores hicieron cese de actividades hasta tanto no se les pague el sueldo de su ultima quincena

OBSERVACIONES

Los trabajadores siguen presentando molestias y mal estar por el olor que producen los venenos y las bombas de fumigar presentes en obra
se solicita el retiro de toldillos y elementos de fumigar en mal estado los cuales se encuentran en el patio de CRUE y que afentan la realizacion de actividades programadas

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

383

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	20 DE DE 2AYO 2026	NUMERO DE PAGINA:	14,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

demolicion de plantilla en andenes exteriores en mal estado.
retiro nde pintura existente en mal estado
desmonte de instalaciones y puntos electricos
desmonte de cubierta en mal estado
levante de muro en bloque
viga cinta en concreto de 3,000 PSI
columneta de confinamiento de 0,10x0,20
Loclizacion, trazado y replanteo

OBSERVACIONES

Los trabajadores siguen presentando molestias y mal estar por el olor que producen los venenos y las bombas de fumigar presentes en obra

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	21 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	15,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
LLUVIOSO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se realizaron actividades por las lluvias presentadas que afectaron la realizacion normal de las actividades programadas.

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	22 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	16,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

demolicion de plantilla en andenes exteriores en mal estado.
retiro de pintura existente en mal estado
desmonte de cubierta en mal estado
levante de muro en bloque 2 de malaria
viga cinta en concreto de 3,000 PSI en bloque 2 de malaria

OBSERVACIONES

Los trabajadores siguen presentando molestias y mal estar por el olor que producen los venenos y las bombas de fumigar presentes en obra

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	23 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	17,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

MAÑANA:
se realizan actividades de localizacion trazado y replanteo
desmonte de cielo raso, puertas y ventanas existentes en mal estado.
demolicion de plantilla en andenes exteriores en mal estado.
retiro nde pintura existente en mal estado
desmonte de instalaciones y puntos electricos
desmonte de cubierta en mal estado
levante de muro en bloque
viga cinta en concreto de 3,000 PSI
columneta de confinamiento de 0,10x0,20
TARDE: SE TRABAJA DE CORRIDO HASTA LA 01:00PM POR SER SABADO

OBSERVACIONES

Los trabajadores siguen presentando molestias y mal estar por el olor que producen los venenos y las bombas de fumigar presentes en obra

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA	
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS	
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026	
FECHA:	24 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA: 18,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	LLUVIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

NO SE TRABAJA POR SER DOMINGO DIA DE DESCANSO

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	25 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	19,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	NUBLADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Demolicion de plantillas o andenes existente en mal estado
retiro de pintura existente en mal estado
plantilla en concreto de 3,000 PSI en mal estado.
instalacion de cubierta termo acustica

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

393

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	26 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	20,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Demolicion de plantillas o andenes existente en mal estado
retiro de pintura existente en mal estado
plantilla en concreto de 3,000 PSI en mal estado.
instalacion de cubierta termo acustica upvc nueva
SE SUSPENDEN las actividades por las lluvias presentadas en la jornada de la tarde

OBSERVACIONES

Los trabajadores siguen presentando molestias y mal estar por el olor que producen los venenos y las bombas de fumigar presentes en obra

Se presentaros fuertes olores de venenos en la zona donde quedaban las bodegas de almacenamiento

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

394

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	27 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	21,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Demolicion de plantillas o andenes existente en mal estado
retiro de pintura existente en mal estado
plantilla en concreto de 3.000 PSI en mal estado.
instalacion de cubierta termo acustica upvc nueva

OBSERVACIONES

Los trabajadores siguen presentando molestias y mal estar por el olor que producen los venenos y las bombas de fumigar presentes en obra

Se presentaros fuertes olores de venenos en la zona donde quedaban las bodegas de almacenamiento

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	28 DE ABRIL DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	22,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	LLUVIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

MAÑANA:

Demolicion de plantillas o andenes existente en mal estado
retiro de pintura existente en mal estado
plantilla en concreto de 3,000 PSI en mal estado.
instalacion de cubierta termo acustica upvc nueva

TARDE:

No se realizan actividades por las lluvias presentadas que afectaron la realizacion normal de las actividades programadas

OBSERVACIONES

Los trabajadores siguen presentando molestias y mal estar por el olor que producen los venenos y las bombas de fumigar presentes en obra

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

396

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	29 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	23,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Demolicion de plantillas o andenes existente en mal estado
retiro de pintura existente en mal estado
plantilla en concreto de 3,000 PSI en mal estado.
instalacion de cubierta termo acustica upvc nueva

OBSERVACIONES

se suspenden actividades en horas de la tarde por fuerte propagacion de olor a veneno que causo mal estar y nauseas a los trabajadores

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

397

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	30 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	24,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MANANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Demolicion de plantillas o andenes existente en mal estado
retiro de pintura existente en mal estado
plantilla en concreto de 3.000 PSI en mal estado.
instalacion de cubierta termo acustica upvc nueva

OBSERVACIONES

Se trabaja de corrido hasta la 01:00pm por ser sabado.
Los trabajadores siguen presentando molestias y mal estar por el olor que producen los venenos y las bombas de fumigar presentes en obra

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	30 DE MAYO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	25,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se trabaja por ser domingo dia de descanso

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	01 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	26,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desmonte de ventana en mal estado
demolicion de plantilla de piso existente en mal estado
desmonte de instalaciones y puntos electricos
demolicion de bordillo existente en mal estado

OBSERVACIONES

Los trabajadores siguen presentando molestias y mal estar por el olor que producen los venenos y las bombas de fumigar presentes en obra

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

401

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	02 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	27,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	NUBLADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desmonte de ventana en mal estado
demolicion de plantilla de piso existente en mal estado
desmonte de instalaciones y puntos electricos
demolicion de bordillo existente en mal estado
Desmonte de malla galvanizada en mal estado
excavacion en material comun para vigas de cimentacion

OBSERVACIONES

Los trabajadores siguen presentando molestias y mal estar por el olor que producen los venenos y las bombas de fumigar presentes en obra

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	03 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	28,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
LLUVIOSO	NUBLADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desmonte de ventana en mal estado
demolicion de plantilla de piso existente en mal estado
desmonte de instalaciones y puntos electricos
demolicion de bordillo existente en mal estado
excavacion en material comun para vigas de cimentacion
relleno con material seleccionado tipo invias en jardineras de zonas verdes exteriores

OBSERVACIONES

Los trabajadores siguen presentando molestias y mal estar por el olor que producen los venenos y las bombas de fumigar presentes en obra

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	04 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	29,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
NUBLADO	NUBLADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desmonte de ventana en mal estado
demolicion de plantilla de piso existente en mal estado
demolicion de bordillo existente en mal estado
excavacion en material comun para vigas de cimentacion
relleno con material seleccionado tipo invias en jardineras de zonas verdes exteriores

OBSERVACIONES

Los trabajadores siguen presentando molestias y mal estar por el olor que producen los venenos y las bombas de fumigar presentes en obra

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

404

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA	
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS	
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026	
FECHA:	05 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA: 30,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
NUBLADO	NUBLADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desmonte de ventana en mal estado
demolicion de plantilla de piso existente en mal estado
demolicion de bordillo existente en mal estado
excavacion en material comun para vigas de cimentacion
relleno con material seleccionado tipo invias en jardineras de zonas verdes exteriores
Viga de cimentacion para andenes en jardineras y zonas verdes exteriores

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA **NIT: 9020223563**	**BITACORA DIARIA DE OBRA**

CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	06 DE JUNIO DE 2026	**NUMERO DE PAGINA:**	31,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	**TARDE**
NUBLADO	NUBLADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desmonte de ventana en mal estado
demolicion de plantilla de piso existente en mal estado
demolicion de bordillo existente en mal estado
excavacion en material comun para vigas de cimentacion
relleno con material seleccionado tipo invias en jardineras de zonas verdes exteriores
Viga de cimentacion para andenes en jardineras y zonas verdes exteriores
Levante de muro en bloque 2 malaria
pañete en mortero para muros interiore en bloque 1 malaria
viga cinta en muros de crue
dintel sobre vano en puertas y ventanas de bloque 1 malaria

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	**ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA**

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

OFICIOS ENVIADOS

Oficina principal: Cr 16 A #50-20 Barrio Monteverde -Montería – Córdoba

interventoriacrue@gmail.com

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

Montería, 16 de junio de 2026

al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: SCMA-012-2025_049
Fecha: 16 /06 /2026

Señores:
CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA
RL: MARIA ELENA RIVERA HOYOS
consorcioredvital@gmail.com
Montería – Córdoba

Con copia:
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Att: Dra. CILIA J. TOBÍAS CARRASCAL
Supervisora del Contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. SI-CMA-012-2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Asunto: SOLICITUD DE REITERACIÓN DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL No. 2 del Contrato de Obra No. SI-LP-011-2025.

Cordial saludo,

Considerando que esta interventoría, mediante oficio de fecha 04 de junio de 2026 con radicado SI-CMA-012-2025_042 y posteriormente mediante oficio de fecha 10 de junio de 2026 con radicado SI-CMA-012-2025_045, solicitó la entrega del informe mensual de obra No. 2 correspondiente al período comprendido entre el 07 de mayo de 2026 y el 06 de junio de 2026, y evidenciando que a la fecha no se ha recibido la información requerida ni justificación alguna frente a su no presentación, Esta interventoría manifiesta lo siguiente:

La omisión en la presentación del informe mensual constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista y genera una afectación directa a las funciones de seguimiento, control, verificación y reporte asignadas a esta interventoría. Esta situación afecta la validación del avance físico, administrativo, financiero, ambiental y de seguridad y salud de acuerdo al contrato, limitando la emisión oportuna de los informes y conceptos que deben ser presentados ante la entidad contratante dentro de los plazos establecidos por parte de esta interventoría.

En este sentido, la presente solicitud se realiza conforme a lo establecido en el Contrato de Obra No. SI-LP-011-2025 en la **CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, numeral 12**, el cual establece *"Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EL DEPARTAMENTO le solicite."* ... (Copiado y cursiva fuera del texto original).

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

Es importante tener en cuenta que el atraso reiterado de esta obligación contractual faculta a la interventoría para poner en conocimiento de la entidad contratante la situación presentada, con el fin de que se adelanten las actuaciones contractuales correspondientes, sin perjuicio de la aplicación de las medidas establecidas en el contrato para la imposición de multas por incumplimiento.

Al respecto, **la CLÁUSULA 15. MULTAS, numeral 8**, dispone expresamente: *"Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor."* (Copiado y cursiva fuera del texto original).

Por lo anterior, se requiere la entrega inmediata del informe mensual de obra No. 2, junto con la totalidad de los soportes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, registros fotográficos y demás documentos que respalden las actividades ejecutadas durante el período objeto de seguimiento. De esta documentación depende la entrega oportuna del informe de Interventoría.

Finalmente, se deja constancia de que la presente comunicación corresponde al tercer requerimiento formal efectuado al contratista respecto de la misma obligación contractual. En consecuencia, de persistir la falta de entrega de la documentación solicitada, esta interventoría procederá a tomar las medidas contractuales a que haya lugar, incluyendo el procedimiento para la imposición de multas previsto en el contrato, sin perjuicio de las demás acciones administrativas y contractuales que resulten procedentes.

Atentamente;

LINA REVUELTAS LOZANO
R.L CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE

409

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

Montería, 10 de junio de 2026

al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: SI-CMA-012-2025_045
Fecha: 10/ 06 /2026

Señores:
CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA
RL: MARIA ELENA RIVERA HOYOS
consorcioredvital@gmail.com
Montería – Córdoba

Referencia: Contrato de Interventoría No. SI-CMA-012-2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Asunto: Recordatorio de entrega del Informe de Obra N.º 2

Cordial saludo,

Con el fin de adelantar oportunamente las actividades de seguimiento y control a cargo de esta interventoría, así como de consolidar y presentar los informes correspondientes ante la entidad contratante, nos permitimos recordar la entrega del Informe de Obra N.º 2, correspondiente al período comprendido entre el 7 de mayo y el 6 de junio de 2026.

A la fecha no se ha recibido el mencionado informe ni sus respectivos soportes, información que resulta indispensable para la verificación de las actividades ejecutadas durante el período y para la elaboración del informe de seguimiento que esta interventoría debe presentar dentro de los plazos establecidos.

Por lo anterior, agradecemos realizar la entrega de la documentación pendiente a la mayor brevedad posible, con el fin de garantizar el adecuado seguimiento del proyecto y el cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos.

Atentamente;

LINA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE

410

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

Montería, 04 de junio de 2026

al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: SI-CMA-012-2025_042
Fecha: 04 /06 /2026

Señores:
CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA
RL: MARIA ELENA RIVERA HOYOS
consorcioredvital@gmail.com
Montería – Córdoba

Con copia:
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Att: Dra. CILIA J. TOBÍAS CARRASCAL
Supervisora del Contrato

Referencia: Contrato de Interventoría No. SI-CMA-012-2025, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Asunto: RECORDATORIO DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 2

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades y en cumplimiento de las funciones de seguimiento y control ejercidas por esta interventoría, se recuerda la entrega del **Informe Mensual de Obra No. 2**, correspondiente al periodo comprendido entre el **08 de mayo de 2026 y el 07 de junio de 2026,** junto con los respectivos soportes y demás anexos derivados de la ejecución del contrato.

La entrega oportuna de dicho informe resulta indispensable para verificar el avance físico y contractual del proyecto, efectuar el seguimiento al cronograma de ejecución, revisar las actividades desarrolladas durante el periodo alcanzado y validar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y administrativas establecidas contractualmente.

Así mismo, la remisión de esta información permite a esta interventoría elaborar el correspondiente informe mensual de seguimiento y supervisión del contrato, el cual debe ser trasladado a la entidad contratante como parte de los entregables contractuales establecidos, garantizando de esta manera el adecuado cumplimiento de las obligaciones a cargo de la interventoría dentro de los plazos definidos.

Atentamente,

LINA REVUELTAS LOZANO
R.L CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

INFORME PGIO

Oficina principal: Cr 16 A #50-20 Barrio Monteverde -Montería – Córdoba

interventoriacrue@gmail.com


CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

INFORME MENSUAL No. 2
SEGUIMIENTO PGIO

(PERÍODO: Del 7 de mayo 2026 hasta el 6 de junio de 2026)

CONTRATO DE No. SI-CMA-012-2025

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

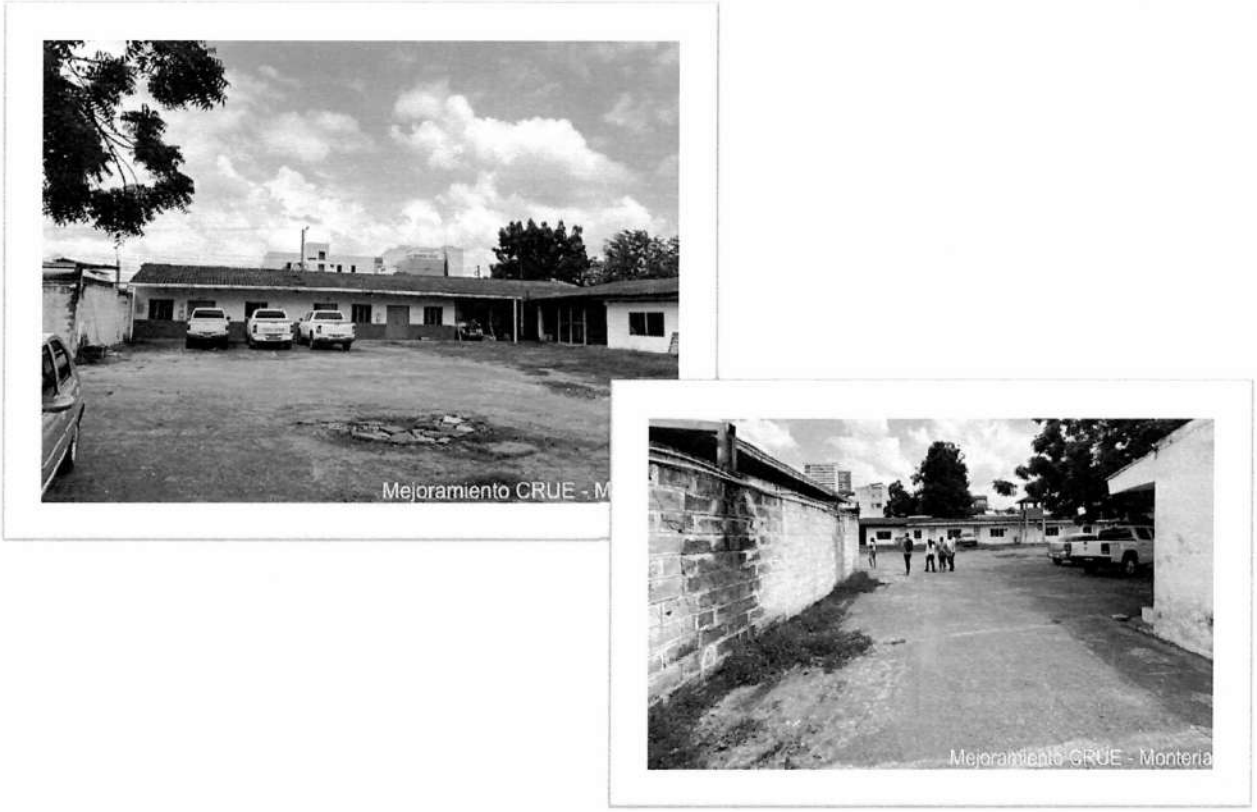

Oficina principal: Cr 16 A #50-20 Barrio Monteverde -Monteria – Córdoba

interventoriacrue@gmail.com

CONTENIDO:

1. INTRODUCCIÓN: 3
2. OBJETIVOS: 4
2.1 Objetivo General: 4
2.2 Objetivos Específicos: 4
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 5
3.1 Localización: 6
4. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS: 7
4.1 Información general del contrato de obra: 7
4.2 Información general del contrato de interventoría: 7
5. SEGUIMIENTO AL PGIO 8
5.1 PERSONAL Y EQUIPO EN EL PERIODO 9
5.1.1 Personal y Equipos del Contratista: 9
5.1.2 Personal de la Interventoría: 10
5.2 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 10
5.2.1 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES 11
5.2.2 AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES 12
5.2.3 INGRESOS E INDUCCIONES 12
5.2.4 RETIRO DE PERSONAL 13
5.2.5 SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 18
5.3 SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL PELIGRO 18
5.3.1 CHARLAS Y CAPACITACIONES 19
5.3.2 SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES DE RIESGO 20
5.3.3 SEGUIMIENTO A LA MAQUINARIA Y VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES 21
5.3.4 SEGUIMIENTO A EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 21
5.4 GESTION DE LA SALUD 23
5.4.1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 23
5.4.2 ACCIDENTES DE TRABAJO 24
5.4.3 SEGUIMIENTO Y REVISIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN 25
5.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE EMERGENCIAS 26
5.5. GESTIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS 26
5.5.1 SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 27
5.5.2 SEGUIMIENTO A SEÑALIZACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL EN OBRA 28
5.6. ACTA DE COMITÉ Y/O REUNIONES: 29
5.7. CONCLUSIONES 30
5.8. ANEXOS 31

1. INTRODUCCIÓN:

El presente Informe N.° 2 corresponde al período comprendido entre el 07 de mayo de 2026 y el 06 de junio de 2026, y tiene como finalidad presentar las actividades de seguimiento, control y verificación realizadas por la interventoría al Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) implementado por el contratista en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la Red Local de Urgencias de Córdoba mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física para el correcto funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE en el municipio de Montería".

Durante el período reportado, la interventoría continuó realizando seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el PGIO, verificando la implementación de las medidas técnicas, ambientales, administrativas y de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridas para el adecuado desarrollo de las actividades ejecutadas en obra, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos contractuales aplicables al proyecto.

Así mismo, se efectuó seguimiento a aspectos relacionados con la gestión ambiental, manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), señalización preventiva, control operacional, condiciones de seguridad en obra, documentación del personal, uso adecuado de elementos de protección personal y demás medidas establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Plan de Gestión Integral de Obra.

En el presente informe se consolidan las actividades de seguimiento realizadas por la interventoría, así como las observaciones, requerimientos y recomendaciones generadas a partir de las visitas técnicas, comités de seguimiento y revisiones documentales efectuadas durante el período evaluado, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo del proyecto y garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad requeridas para la ejecución de las actividades.

2. OBJETIVOS:

2.1 Objetivo General:

Realizar el seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) implementado por el contratista para el proyecto "Fortalecimiento de la Red Local de Urgencias de Córdoba mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física para el correcto funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE en el municipio de Montería", garantizando la adecuada implementación de las medidas técnicas, ambientales, administrativas y de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a las obligaciones contractuales, normatividad vigente y demás lineamientos aplicables durante la ejecución del proyecto.

2.2 Objetivos Específicos:

- Verificar la implementación y cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO), relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental, señalización, control operacional y demás aspectos aplicables durante la ejecución de las actividades en obra.

- Realizar seguimiento a las condiciones de seguridad en campo, uso adecuado de elementos de protección personal, control de riesgos y cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de promover condiciones seguras para el personal y terceros.

- Verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas por el contratista, incluyendo manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), disposición de materiales, señalización ambiental y demás obligaciones asociadas al componente ambiental del proyecto.

- Realizar seguimiento a la documentación, soportes y registros requeridos dentro de la ejecución del PGIO, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos contractuales y normatividad vigente aplicable al proyecto.

- Presentar las observaciones, requerimientos y recomendaciones generadas durante las actividades de seguimiento realizadas por la interventoría, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo de las actividades y al cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad requeridas para la ejecución del proyecto.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto "Fortalecimiento de la Red Local de Urgencias de Córdoba mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física para el correcto funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE en el municipio de Montería" tiene como propósito mejorar las condiciones físicas y operativas de las instalaciones destinadas al funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del departamento de Córdoba, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a situaciones de urgencia y emergencia.

La intervención contempla la ejecución de actividades de adecuación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente, con el fin de garantizar espacios funcionales, seguros y acordes con las necesidades operativas y administrativas requeridas para la prestación eficiente de los servicios desarrollados por el CRUE. Estas actividades incluyen obras civiles, adecuaciones locativas, mejoramiento de acabados, mantenimiento y optimización de redes eléctricas, hidrosanitarias y demás componentes necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

El proyecto busca optimizar las condiciones de operación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, fortaleciendo los procesos de coordinación, regulación y referencia de pacientes dentro de la red hospitalaria del departamento de Córdoba, permitiendo una atención más eficiente, oportuna y organizada para la comunidad.

Así mismo, mediante la ejecución de las actividades planteadas, se pretende garantizar mejores condiciones de infraestructura para el personal operativo y administrativo, promoviendo espacios adecuados para el desarrollo de las funciones institucionales y contribuyendo al fortalecimiento de la red pública de atención en salud del departamento.

La interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica realizará el seguimiento y control integral del proyecto, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones contractuales, cronogramas establecidos y normatividad vigente aplicable durante la ejecución de las actividades contratadas.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato, el plazo de ejecución de la interventoría corresponde a CINCO (5) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual. Durante este período, la interventoría realizará el seguimiento continuo a la ejecución física, administrativa y financiera del proyecto, generando los respectivos informes y recomendaciones técnicas que permitan garantizar el adecuado desarrollo de las obras.

El valor del contrato de interventoría asciende a la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($179.866.682), recursos destinados a garantizar el correcto ejercicio de las actividades de seguimiento y control requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y el fortalecimiento de la infraestructura física del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE del municipio de Montería.

417

3.1 Localización:

El proyecto objeto de interventoría se encuentra localizado en el departamento de Córdoba, en el municipio de Montería, específicamente en el barrio Los Laureles, entre las calles 42 y 43 con carrera 8A, identificado con el número 4 de la manzana 17, en las instalaciones donde actualmente funcionan el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE y el programa de Malaria.

La ubicación del proyecto corresponde a un punto estratégico dentro del municipio, destinado a la coordinación y regulación de los servicios de urgencias y emergencias del departamento de Córdoba, permitiendo el fortalecimiento de la capacidad operativa y funcional de la red de atención en salud mediante la adecuación y rehabilitación de la infraestructura física existente.



Imagen 1. Localización del proyecto a Construir en el Municipio de Monteria – Cordoba.

4. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS:

4.1 Información general del contrato de obra:

CONTRATO No.	CONTRATO No. SI-LP-011-2025
OBJETO:	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."
CONTRATISTA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DE CORDOBA
VALOR:	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.764.759.464,00)
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	07 ABRIL DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 1: Información General del contrato de obra.

4.2 Información general del contrato de interventoría:

CONTRATO No.	SI-CMA-012-2025
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DE CORDOBA
VALOR:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 179.866.682).
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	07 ABRIL DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tabla 2: Información General del contrato de Interventoría.

5. SEGUIMIENTO AL PGIO

En el marco de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 07 de mayo y el 06 de junio de 2026, la interventoría realizó seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) ejecutado por el contratista Consorcio Red Vital Córdoba, correspondiente al proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

El seguimiento efectuado por la interventoría estuvo orientado a verificar, mediante visitas de campo, comités de seguimiento y revisión documental, el cumplimiento de las medidas establecidas en los diferentes componentes del PGIO, incluyendo Seguridad y Salud en el Trabajo, gestión ambiental, manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), señalización, control operacional y demás actividades requeridas para la adecuada ejecución del proyecto.

Durante el período evaluado, la interventoría verificó la implementación de las medidas de prevención y control establecidas por el contratista, efectuando observaciones y requerimientos frente a las condiciones de seguridad identificadas en obra, el uso de elementos de protección personal, las condiciones para trabajos de alto riesgo, la documentación del personal, la señalización preventiva y las medidas de manejo ambiental aplicables a las actividades ejecutadas.

Así mismo, se realizó seguimiento a las acciones implementadas por el contratista frente a las situaciones presentadas durante el período, incluyendo las medidas adoptadas para garantizar la continuidad segura de las actividades y el fortalecimiento de los controles operacionales establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Plan de Gestión Integral de Obra.

La información presentada a continuación corresponde a la verificación efectuada por la interventoría durante el período evaluado, teniendo en cuenta las condiciones operativas del proyecto y las actividades desarrolladas en las instalaciones del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE del municipio de Montería. Durante este período se evidenció la ejecución de actividades asociadas al levantamiento de muros, construcción de vigas de cimentación y vigas de amarre, instalación de perfilería para cubierta, remoción de pintura, construcción de andenes y retiro de escombros, labores sobre las cuales la interventoría realizó seguimiento a la implementación de las medidas establecidas en el PGIO, verificando las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el manejo ambiental, el control operacional y las medidas preventivas requeridas para la ejecución segura de las actividades.

La interventoría evidenció que las actividades ejecutadas durante el período continuaron desarrollándose conforme al alcance contractual del proyecto, manteniendo seguimiento permanente a las condiciones de trabajo, al cumplimiento de las medidas de prevención y control,

y a la implementación de las acciones establecidas por el contratista para garantizar una ejecución segura, ordenada y ambientalmente

5.1 PERSONAL Y EQUIPO EN EL PERIODO

5.1.1 Personal y Equipos del Contratista:

Durante el período comprendido entre el 07 de mayo y el 06 de junio de 2026, el contratista contó con el personal técnico, administrativo y operativo requerido para la ejecución de las actividades desarrolladas en obra, conforme a lo establecido en los documentos contractuales y las necesidades operativas del proyecto.

La interventoría realizó seguimiento y verificación documental al personal vinculado al proyecto, mediante la revisión de las planillas de pago y soportes presentados por el contratista, evidenciando la afiliación y el pago al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal relacionado para la ejecución de las actividades en obra, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN OBRA		
N°	**CARGO**	**NOMBRE**
1	Director de Obra	Jesús Orlando Sandoval Arciniegas
2	Ingeniero Residente	Carmen Ana Garces Negrete
3	Especialista en Seguridad Industrial y/o salud ocupacional	María González Ayuz
4	Ing. Eléctrico	Daniel José Corrales Paternina
5	Auxiliar administrativo	Liseth Paola Cardenas Florez

Durante las visitas de seguimiento realizadas por la interventoría, se verificó la presencia del personal reportado y su correspondencia con las actividades ejecutadas en el período evaluado, evidenciando la participación del recurso humano requerido para el desarrollo de las labores constructivas programadas.

Así mismo, el contratista dispuso de los equipos, herramientas y maquinaria necesarios para la ejecución de las actividades desarrolladas durante el período reportado, de acuerdo con las necesidades operativas del proyecto.

EQUIPO Y HERRAMIENTA EN OBRA		
N°	**EQUIPOS**	**TOTAL**
1	Equipo de Topografía (estación, nivel, GPS)	1
2	Volquetas	1
3	Mescladora de concreto	1
4	Herramientas menores	10

La interventoría realizó seguimiento a la disponibilidad y utilización de los equipos empleados en obra, verificando su correspondencia con las actividades ejecutadas durante el período en mención.

5.1.2 Personal de la Interventoría:

Durante el período reportado, la interventoría dispuso del personal profesional y técnico necesario para desarrollar las actividades de seguimiento, control y verificación del cumplimiento técnico, administrativo, ambiental y contractual del proyecto, garantizando el acompañamiento permanente requerido para la adecuada ejecución de las actividades desarrolladas en obra.

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA		
N°	CARGO	NOMBRE
1	Director de Interventoría	Climaco Miguel Rodríguez Julio
2	Residente de Interventoría	Maria Luisa Laza Vega
3	Profesional SISO	Samir Andrés Rodríguez Baza
4	Auxiliar administrativo	Joaquin Alfredo García Mendoza
5	Contador	Lina Paola Revueltas Lozano

Como soporte de la vinculación y cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social Integral del personal de la interventoría, se realizó la verificación de las afiliaciones y aportes efectuados al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, el Decreto 1072 de 2015 y demás disposiciones legales aplicables.

Así mismo, la interventoría mantuvo vigente la afiliación del CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE a la Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA, garantizando la cobertura de los trabajadores vinculados al contrato y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual manera, se presentan los soportes correspondientes a las afiliaciones del personal de la interventoría al Sistema General de Seguridad Social Integral y a la Administradora de Riesgos Laborales, como evidencia del cumplimiento de las obligaciones legales aplicables al personal vinculado al contrato.

Ver Anexo 1. Planilla de pago de Seguridad Social Integral.

5.2 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Como parte de las actividades de seguimiento desarrolladas por la interventoría, se realizó la verificación de los recursos dispuestos por el contratista Consorcio Red Vital Córdoba para la ejecución del proyecto, evaluando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) y las disposiciones aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019.

El seguimiento efectuado estuvo orientado a evaluar la disponibilidad, suficiencia y adecuada gestión de los recursos humanos, técnicos, físicos y operativos requeridos para la ejecución de

las actividades constructivas, garantizando el desarrollo de las labores bajo condiciones seguras y acordes con las necesidades del proyecto.

Durante las visitas de seguimiento y la revisión documental realizada, la interventoría evidenció la permanencia del recurso humano responsable de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la disponibilidad del personal profesional, técnico y operativo requerido para la ejecución de las actividades desarrolladas durante el período evaluado.

De igual manera, se verificó la afiliación y cobertura del personal vinculado al proyecto al Sistema General de Seguridad Social Integral, de acuerdo con el nivel de riesgo asociado a las labores desempeñadas, como parte de las acciones de control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales aplicables.

Así mismo, se evidenció la disponibilidad de equipos, herramientas y demás recursos necesarios para la ejecución de actividades como levantamiento de muros, construcción de vigas de cimentación y vigas de amarre, instalación de perfilería para cubierta, remoción de pintura, construcción de andenes y retiro de escombros, permitiendo la continuidad de las labores programadas durante el período reportado.

La interventoría mantuvo seguimiento permanente a la gestión de los recursos implementados por el contratista, efectuando las observaciones y recomendaciones necesarias para contribuir al adecuado desarrollo de las actividades y al cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas y de seguridad requeridas para la ejecución del proyecto.

5.2.1 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES

La interventoría realizó seguimiento y verificación a la asignación de responsables definidos para la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

Como parte de las actividades de control efectuadas, se verificó la designación del profesional responsable del SG-SST por parte del contratista, evidenciando el cumplimiento de los requisitos de formación, licencia vigente y demás soportes requeridos para el desempeño de las funciones asignadas. Así mismo, mediante las visitas realizadas en campo, se evidenció su participación en las actividades de inspección, seguimiento y acompañamiento a las labores desarrolladas en obra.

Adicionalmente, durante el período evaluado se contó con el apoyo de una Inspectora de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del Consorcio Red Vital Córdoba, cuya documentación fue objeto de revisión por parte de la interventoría, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desarrollo de sus funciones.

Así mismo, se presenta la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del Consorcio Interventoría CRUE, conforme a las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, como se evidencia en el Anexo 2. Asignación de responsable del SG-SST del Consorcio Interventoría CRUE.

En este sentido, la interventoría realizó la revisión y verificación documental de los soportes presentados para dicho cargo, evidenciando el cumplimiento de los requisitos asociados a la formación, competencias y demás documentos requeridos para el desarrollo de las funciones asignadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a las disposiciones normativas aplicables y a las exigencias del proyecto.

5.2.2 AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento a la afiliación del personal vinculado al proyecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social, conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás disposiciones normativas aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En desarrollo de las actividades de seguimiento, se evidenció que el contratista Consorcio Red Vital Córdoba realizó la afiliación del personal al sistema general de riesgos laborales, de acuerdo con el nivel de riesgo correspondiente a las actividades desempeñadas dentro del proyecto. Así mismo, se verificó que el personal operativo vinculado a las labores ejecutadas en obra se encontraba afiliado a la ARL en nivel de riesgo V, mientras que el personal administrativo fue afiliado conforme al nivel de riesgo aplicable a sus funciones.

La interventoría realizó verificación documental de los soportes de afiliación del personal vinculado al proyecto, como parte de las actividades de control y seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual manera, durante las visitas de seguimiento realizadas en obra, se verificó la presencia del personal reportado y su correspondencia con las actividades ejecutadas en el periodo, evidenciando cumplimiento frente a los requerimientos mínimos asociados a la protección y cobertura del personal vinculado al proyecto.

Así mismo, se realizó la afiliación del CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE a la Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA, como parte del cumplimiento de las obligaciones legales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual manera, la interventoría presenta los soportes correspondientes a la afiliación del personal de interventoría al Sistema General de Seguridad Social Integral y a la Administradora de Riesgos Laborales, como evidencia del cumplimiento de las obligaciones legales aplicables al personal vinculado al contrato. Ver Anexo 1. Planilla de pago de Seguridad Social Integral y Anexo 3. afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales SURA.

5.2.3 INGRESOS E INDUCCIONES

Como parte de las actividades de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO), la interventoría realizó verificación al proceso de ingreso, inducción y control documental del personal vinculado al proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA", conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

Durante el período evaluado, la interventoría evidenció el ingreso de personal profesional, técnico y operativo vinculado por el contratista Consorcio Red Vital Córdoba para la ejecución de las diferentes actividades desarrolladas en obra, asociadas a levantamiento de muros, construcción de vigas de cimentación y vigas de amarre, instalación de perfilería para cubierta, remoción de pintura, construcción de andenes y retiro de escombros, entre otras labores contempladas dentro del alcance contractual del proyecto.

Como parte del seguimiento realizado, se verificó la ejecución de las jornadas de inducción y reinducción dirigidas al personal vinculado al proyecto, las cuales incluyeron temas relacionados con normas generales de obra, identificación de peligros y riesgos, uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), procedimientos de trabajo seguro, atención de emergencias, reporte de actos y condiciones inseguras y lineamientos generales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La interventoría efectuó revisión documental de los soportes asociados al proceso de ingreso del personal, incluyendo registros de inducción, notificación de peligros y demás documentos requeridos para el inicio de actividades en obra. Así mismo, se realizó seguimiento a la entrega de dotación y elementos de protección personal, verificando la disponibilidad de los elementos requeridos para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el período evaluado.

De igual manera, durante el presente período se evidenció el ingreso de dos 2 trabajadoras del área administrativa y 18 trabajadores del área operativa por parte del Consorcio Red Vital Córdoba, con el propósito de fortalecer el acompañamiento y seguimiento permanente a las actividades desarrolladas en campo. La interventoría verificó la documentación presentada para dicho cargo, evidenciando el cumplimiento de los requisitos exigidos para el ejercicio de sus funciones.

En la siguiente tabla se relacionan los ingresos y retiros de personal registrados durante el período evaluado, indicando los respectivos cargos desempeñados dentro del proyecto.

INGRESOS Y RETIROS 07 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2026		
NOVEDAD / AREA	INGRESOS	RETIROS
Administrativa	2	1
Operativa	18	1
Operadores y conductores	0	0
TOTAL	20	2

5.2.4 RETIRO DE PERSONAL

En desarrollo de las actividades de seguimiento al recurso humano vinculado al proyecto, la interventoría verificó los movimientos de personal registrados por el contratista Consorcio Red

Vital Córdoba durante el período evaluado, evidenciando el retiro de dos (2) trabajadores que participaron en la ejecución de las actividades desarrolladas en obra.

Como parte del control documental efectuado, la interventoría realizó seguimiento a los procesos de desvinculación del personal, con el propósito de verificar el adecuado cierre de las relaciones laborales y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás requisitos normativos aplicables.

Así mismo, se verificó la correspondencia entre el movimiento de personal reportado por el contratista y las necesidades operativas del proyecto, en función de las actividades ejecutadas durante el período evaluado.

A la fecha de corte del presente informe, se encuentra pendiente la remisión de los soportes asociados al proceso de retiro del personal desvinculado, incluyendo los exámenes médicos ocupacionales de egreso y demás documentos que evidencien el cierre correspondiente de la relación laboral. En este sentido, la interventoría ha solicitado al contratista Consorcio Red Vital Córdoba la presentación de la documentación respectiva, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la tabla anterior se presenta la relación del personal retirado durante el período reportado, indicando los respectivos cargos desempeñados dentro del proyecto.

El siguiente gráfico presenta el comportamiento del personal vinculado al proyecto durante el período evaluado, considerando los ingresos y retiros registrados, así como el personal que participó en la ejecución de las actividades desarrolladas en obra.



El siguiente gráfico presenta el comportamiento del personal vinculado al proyecto durante el período comprendido entre el 07 de mayo y el 06 de junio de 2026, evidenciándose un incremento gradual en la cantidad de trabajadores vinculados, en concordancia con el avance de las actividades constructivas ejecutadas en obra.

Para el mes de abril de 2026 se registraron dieciocho (18) trabajadores vinculados al proyecto; posteriormente, para el mes de mayo se evidenció un aumento a veintitrés (23) trabajadores y, finalmente, a corte de la primera semana del mes de junio de 2026 se alcanzó un total de treinta y seis (36) trabajadores activos.


El incremento del personal refleja la necesidad de fortalecer los frentes de trabajo y disponer del recurso humano requerido para la ejecución de actividades como levantamiento de muros, construcción de vigas de cimentación y vigas de amarre, instalación de perfilería para cubierta, remoción de pintura, construcción de andenes y retiro de escombros.

La evolución presentada en el número de trabajadores evidencia que el contratista Consorcio Red Vital Córdoba mantuvo la disponibilidad del recurso humano necesario para garantizar la continuidad de las actividades programadas y la implementación de las medidas establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con el consolidado del período evaluado, el proyecto cuenta con un total de treinta y seis (36) trabajadores activos, distribuidos entre personal administrativo y operativo, siendo este último el de mayor participación debido a la naturaleza de las actividades desarrolladas en obra.


Lo anterior refleja que aproximadamente el 81% del personal activo corresponde a personal operativo, mientras que el 19% pertenece al componente administrativo, comportamiento que resulta coherente con la etapa de ejecución del proyecto y las necesidades operativas requeridas para el desarrollo de las actividades en campo.

PERSONAL CONTRATADO	
NOMBRE DE LA EMPRESA	CANTIDAD
PERSONAL ADMINISTRATIVO	7
PERSONAL OPERATIVO	29
TOTAL	36

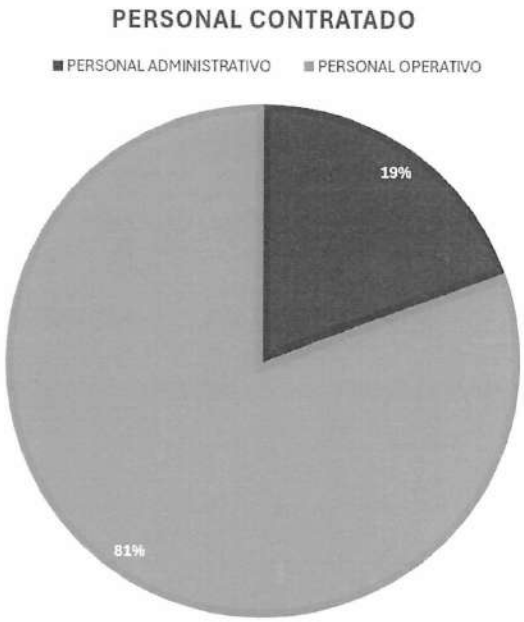


En relación con el tipo de mano de obra vinculada, se observa igual participación de personal calificado y el no calificado. Asimismo, se destaca la incorporación de mujeres en este grupo. A continuación, se presenta la distribución detallada.

TIPO DE MANO DE OBRA			
MANO DE OBRA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
CALIFICADA	14	4	18
NO CALIFICADA	18	0	18
TOTAL			36

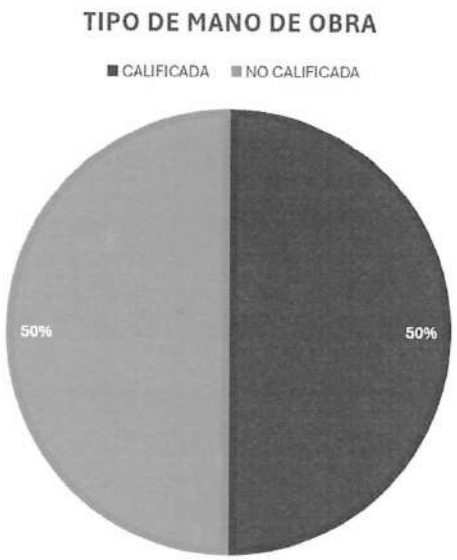

Finalmente, la información anteriormente descrita se presenta de manera gráfica, facilitando la visualización de la distribución del personal por cargos durante el periodo evaluado.

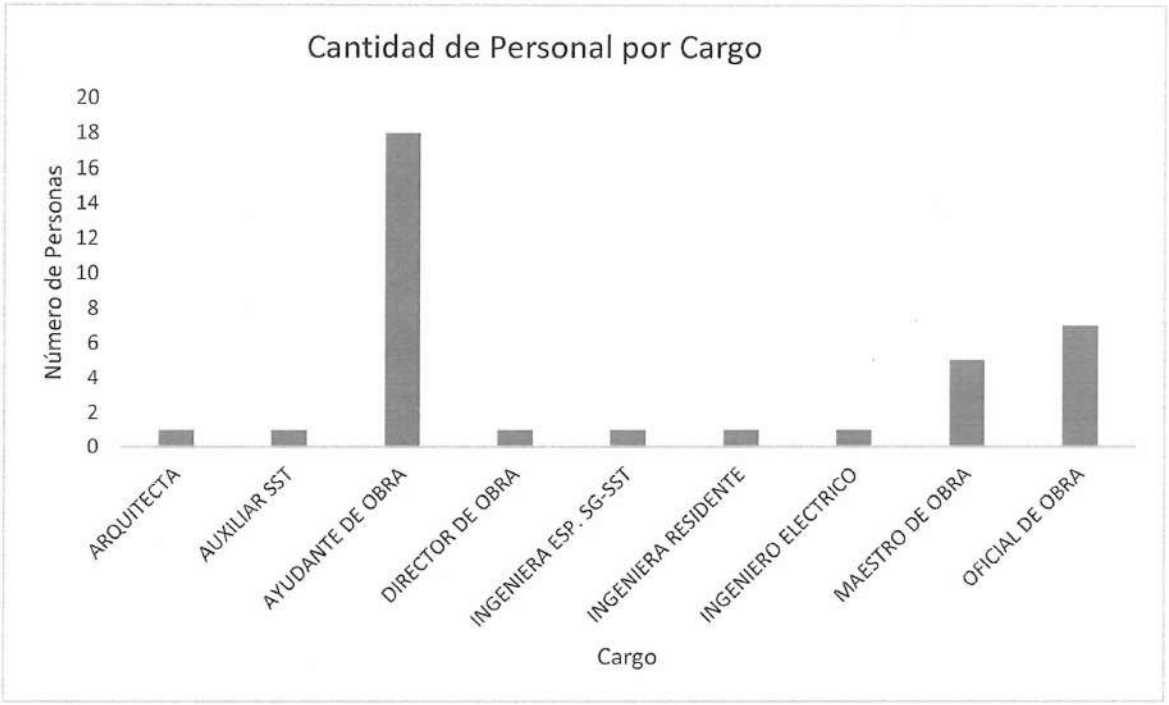

5.2.5 SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó seguimiento a la entrega y control de la dotación y elementos de protección personal suministrados por el CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA al personal vinculado al proyecto, verificando el cumplimiento de las medidas establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el PGIO.

La verificación efectuada estuvo orientada a constatar que los trabajadores contaran con los elementos de protección personal requeridos de acuerdo con las actividades ejecutadas en obra y los riesgos asociados a las mismas, promoviendo el uso adecuado de dichos elementos como medida preventiva frente a la exposición a peligros mecánicos, locativos, físicos y biomecánicos presentes durante la ejecución de las labores.

Así mismo, la Interventoría evidenció la existencia de registros de entrega de EPP y la implementación de inspecciones de seguridad orientadas a verificar el estado, uso, conservación y disponibilidad de los elementos suministrados al personal.

5.3 SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL PELIGRO

Como parte de las actividades de control y seguimiento desarrolladas por la interventoría, se realizó verificación a la entrega y uso de la dotación y elementos de protección personal suministrados por el Consorcio Red Vital Córdoba al personal vinculado al proyecto, conforme a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO).

La verificación efectuada estuvo orientada a constatar que los trabajadores contaran con los elementos de protección personal requeridos de acuerdo con las actividades ejecutadas en obra y los riesgos asociados a las mismas, promoviendo el uso adecuado de dichos elementos como medida preventiva frente a la exposición a peligros mecánicos, locativos, físicos, químicos y biomecánicos presentes durante la ejecución de las labores.

Durante las visitas de seguimiento realizadas en campo, la interventoría evidenció la existencia de registros de entrega de dotación y elementos de protección personal, así como la implementación de inspecciones orientadas a verificar el estado, uso, conservación y disponibilidad de los elementos suministrados al personal.

No obstante, durante el período evaluado se identificaron situaciones asociadas al uso inadecuado o ausencia de algunos elementos de protección personal por parte de trabajadores en determinados frentes de trabajo, razón por la cual la interventoría efectuó los respectivos requerimientos al contratista, reiterando la necesidad de fortalecer las actividades de supervisión, control y exigencia del uso obligatorio de los EPP, con el fin de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.

Así mismo, se verificó la entrega de la dotación correspondiente al personal vinculado al proyecto, evidenciándose la disponibilidad de los elementos requeridos para el desarrollo de las labores ejecutadas durante el período reportado.

5.3.1 CHARLAS Y CAPACITACIONES

En el desarrollo de las actividades de seguimiento al Programa de Capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría verificó la ejecución de las jornadas de formación, sensibilización y promoción desarrolladas por el contratista Consorcio Red Vital Córdoba, dirigidas al personal vinculado al proyecto.

Las actividades realizadas durante el período evaluado estuvieron orientadas al fortalecimiento de la cultura preventiva y al control de los riesgos identificados en las labores ejecutadas en obra, promoviendo la participación activa de los trabajadores en el cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la interventoría, se evidenció la ejecución de las siguientes charlas y capacitaciones:

N°	Charla / Capacitación	Número de asistentes
1	Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas	15
2	Socialización de riesgos asociados a las actividades constructivas	15
3	Fichas de seguridad de sustancias químicas	15
4	Procedimiento de almacenamiento seguro de sustancias quimicas	15
5	Golpe de calor	15
6	Prevención y preparación para emergencias	15
7	Uso de extintores	15
8	Primeros auxilios	15
9	Evacuación y atención de emergencias	15

Adicionalmente, durante el período reportado se efectuaron socializaciones relacionadas con el uso obligatorio de los elementos de protección personal, control de actos y condiciones inseguras, trabajo seguro en alturas y medidas preventivas frente a la exposición a agentes químicos, como parte de las acciones implementadas para fortalecer las condiciones de seguridad durante la ejecución del proyecto.

Así mismo, la interventoría verificó el seguimiento al cronograma de capacitaciones del SG-SST y la existencia de los respectivos registros de asistencia y soportes documentales, evidenciando la ejecución de las actividades programadas como parte de las medidas de prevención y control establecidas en el PGIO y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto.

5.3.2 SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES DE RIESGO

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó seguimiento a la implementación de las notificaciones de riesgo ejecutadas por el CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA, verificando el cumplimiento de las actividades de identificación, socialización y control de riesgos asociados a las labores desarrolladas en obra.

La verificación efectuada estuvo orientada a constatar que el personal vinculado al proyecto conociera los peligros presentes en las actividades ejecutadas, así como las medidas preventivas y controles establecidos para la ejecución segura de las labores, conforme a los lineamientos definidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el PGIO.

Así mismo, la Interventoría evidenció el diligenciamiento y socialización de formatos de notificación de riesgos asociados a las actividades preliminares, desmontes, demoliciones, excavaciones y manejo de herramientas y equipos desarrollados durante el periodo evaluado.

A continuación, se presenta el consolidado de las notificaciones de riesgo socializadas durante el periodo evaluado:

N°	Notificación de Riesgo	Cantidad de personas notificadas
1	Riesgos mecánicos asociados al uso de herramientas y equipos	15
2	Riesgos locativos derivados de áreas en demolición y tránsito de personal	15
3	Riesgos biomecánicos asociados a manipulación de cargas y posturas prolongadas	15
4	Riesgos físicos asociados a exposición solar, ruido y material particulado	15
5	Riesgos eléctricos derivados de desmontes e intervenciones de instalaciones eléctricas	15
6	Medidas preventivas para orden y limpieza en áreas de trabajo	15
7	Uso adecuado de elementos de protección personal	15
8	Reporte de actos y condiciones inseguras	15

Adicionalmente, durante el período reportado se efectuaron socializaciones relacionadas con el uso obligatorio de los elementos de protección personal, control de actos y condiciones inseguras, trabajo seguro en alturas y medidas preventivas frente a la exposición a agentes químicos, como parte de las acciones implementadas para fortalecer las condiciones de seguridad durante la ejecución del proyecto.

Así mismo, la interventoría verificó el seguimiento al cronograma de capacitaciones del SG-SST y la existencia de los respectivos registros de asistencia y soportes documentales, evidenciando la ejecución de las actividades programadas como parte de las medidas de prevención y control establecidas en el PGIO y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto.

5.3.3 SEGUIMIENTO A LA MAQUINARIA Y VERIFICACIÓN DE PREOPERACIONALES

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó la verificación de las condiciones de ingreso, control documental y requisitos operacionales de los vehículos y equipos utilizados para el desarrollo de las actividades ejecutadas en obra.

Durante el período evaluado no se evidenció el ingreso permanente de maquinaria amarilla o equipos pesados; sin embargo, se registró el ingreso de vehículos tipo volqueta utilizados para el suministro de materiales y el retiro de residuos de construcción y demolición (RCD) generados durante la ejecución de las actividades constructivas.

La interventoría efectuó la revisión documental de los vehículos y conductores autorizados, verificando la presentación de los documentos requeridos para su ingreso a obra, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Dentro de la documentación objeto de verificación se incluyeron el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la revisión técnico-mecánica, licencia de tránsito, licencia de conducción y demás soportes exigidos para la operación de los vehículos vinculados al proyecto.

Así mismo, durante las visitas de seguimiento se evidenció la implementación de medidas preventivas para las maniobras de cargue y descargue de materiales y retiro de RCD, incluyendo señalización temporal, control de ingreso y salida de vehículos y acompañamiento por parte del personal designado por el contratista, con el fin de minimizar riesgos para trabajadores, peatones y usuarios de la vía.

A continuación, se presenta el consolidado de la documentación verificada para los vehículos vinculados al proyecto durante el período evaluado.

MAQUINARIA / VEHÍCULO	MARCA	MODELO	IDENTIFICACIÓN	N° MOTOR	N° SERIE / CHASIS	TIPO	SOAT	REVISIÓN TECNICOMECÁNICA	CONDUCTOR	LICENCIA DE CONDUCCIÓN
Volqueta placa UIJ689	Ford	1952	UIJ689	FE6-111450C	F8K2HM54904	Volqueta	Cumple – Vigencia hasta 24/03/2027	Cumple – Vigencia hasta 08/09/2026	Manuel Enrique Velásquez Mestra C.C. 1.067.891.687	Licencia categoría C2 – Vigencia hasta 01/01/2035

5.3.4 SEGUIMIENTO A EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

En el marco de las actividades de seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría efectuó verificación al control, uso e inspección de las herramientas y equipos menores utilizados por el contratista para la ejecución de las actividades desarrolladas

en obra, con el fin de identificar condiciones que pudieran generar riesgos para los trabajadores.

Como resultado de las visitas realizadas, se evidenció que el contratista dispone de herramientas manuales y equipos menores requeridos para la ejecución de las labores constructivas, efectuando actividades de control e inspección orientadas a verificar sus condiciones de uso, almacenamiento y conservación.

La interventoría verificó la implementación de registros e inventarios de herramientas y equipos, así como la realización de inspecciones de seguridad encaminadas a evaluar las condiciones operativas de los elementos utilizados durante la ejecución de las actividades.

No obstante, durante el período evaluado se identificaron observaciones relacionadas con el uso de algunos equipos de trabajo, evidenciándose la utilización de una pulidora para actividades de corte sin contar con la respectiva guarda de seguridad, situación que fue objeto de requerimiento por parte de la interventoría, reiterando la necesidad de garantizar que todos los equipos y herramientas sean utilizados con sus dispositivos de protección y en condiciones seguras de operación.

Así mismo, se efectuó seguimiento a las condiciones de almacenamiento y conservación de las herramientas utilizadas en obra, promoviendo la adopción de medidas preventivas para minimizar riesgos mecánicos y operacionales asociados a su manipulación.

A continuación, se presenta el consolidado de los equipos y herramientas verificados durante el período evaluado.

N°	Herramienta / Equipo	Cantidad	Estado
1	Pulidora	2	Bueno
2	Taladro	2	Bueno
3	Rotomartillo	1	Bueno
4	Extensiones	3	Bueno
5	Trompo mezclador	1	Bueno
6	Barras	2	Bueno
7	Palas	9	Bueno
8	Pala draga	1	Bueno
9	Cincel	3	Bueno
10	Monas	3	Bueno
11	Palines	2	Bueno
12	Carretas buggy	4	Bueno
13	Equipo de Soldadura	1	Bueno

5.4 GESTION DE LA SALUD

Como parte del seguimiento efectuado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado por el Consorcio Red Vital Córdoba, la interventoría realizó verificación a las actividades asociadas a la gestión de la salud y medicina preventiva del personal vinculado al proyecto, conforme a los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

Las actividades de control desarrolladas estuvieron orientadas a la revisión de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, la realización de exámenes médicos ocupacionales, el seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores y la implementación de acciones de promoción y prevención encaminadas a proteger el bienestar físico del personal y prevenir la ocurrencia de enfermedades y eventos asociados a los riesgos presentes en obra.

Mediante la revisión documental realizada, la interventoría verificó la implementación de medidas relacionadas con medicina preventiva y del trabajo, incluyendo el seguimiento a las condiciones de salud del personal, control del ausentismo, aplicación del perfil sociodemográfico y actividades de promoción y prevención desarrolladas por el contratista.

De igual manera, durante el período evaluado se efectuó seguimiento a las condiciones de trabajo y salud presentes en el proyecto, evidenciándose la atención del evento presentado por exposición a fuertes olores asociados a actividades externas de manipulación y aplicación de sustancias químicas en las inmediaciones del área de intervención. Frente a esta situación, el contratista implementó medidas preventivas y de control orientadas a garantizar condiciones seguras para la reanudación de las actividades, las cuales fueron objeto de seguimiento por parte de la interventoría.

Así mismo, se verificó la ejecución de actividades orientadas a la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, tales como pausas activas, disponibilidad de puntos de hidratación, inspecciones de botiquines y seguimiento a las condiciones de bienestar del personal, contribuyendo al fortalecimiento de las medidas de prevención y protección de la salud de los trabajadores vinculados al proyecto.

5.4.1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

En desarrollo de las actividades de seguimiento al componente de Medicina Preventiva y del Trabajo, la interventoría verificó las acciones implementadas por el Consorcio Red Vital Córdoba para la protección y vigilancia de las condiciones de salud del personal vinculado al proyecto, conforme a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Mediante la revisión documental realizada, se evidenció que el personal vinculado al proyecto cuenta con afiliación vigente al Sistema General de Seguridad Social Integral y con los respectivos exámenes médicos ocupacionales requeridos de acuerdo con las actividades desempeñadas y los riesgos asociados a las labores ejecutadas en obra.

Así mismo, la interventoría verificó la implementación de actividades relacionadas con el perfil sociodemográfico, control de ausentismo, seguimiento a condiciones de salud y demás acciones de medicina preventiva orientadas a minimizar la ocurrencia de enfermedades derivadas de las actividades constructivas.

De igual manera, se evidenció la ejecución de medidas de promoción y prevención, tales como pausas activas, disponibilidad de puntos de hidratación y seguimiento a las condiciones de trabajo y salud del personal, contribuyendo al fortalecimiento del bienestar de los trabajadores vinculados al proyecto.

Durante el período evaluado se presentó un evento asociado a la exposición a fuertes olores provenientes de actividades externas de manipulación y aplicación de sustancias químicas desarrolladas en las inmediaciones del área de intervención, situación que generó afectaciones en la salud de una trabajadora del proyecto. Frente a esta situación, el contratista implementó acciones de seguimiento y control, las cuales fueron objeto de verificación por parte de la interventoría, con el propósito de garantizar condiciones seguras para la continuidad de las actividades.

En términos generales, la interventoría evidenció la ejecución de las actividades contempladas dentro del Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo, manteniendo seguimiento permanente a las condiciones de salud del personal y a la implementación de medidas orientadas a la prevención de riesgos y protección del bienestar de los trabajadores durante la ejecución del proyecto.

5.4.2 ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante el periodo evaluado no se registraron accidentes de trabajo en las actividades ejecutadas dentro del proyecto.

La Interventoría realizó seguimiento a la implementación de las medidas preventivas y controles de seguridad establecidos por el contratista, evidenciando la aplicación de actividades de inspección, socialización de riesgos, uso de elementos de protección personal y control de condiciones inseguras durante la ejecución de las labores en obra.

Así mismo, se verificó el desarrollo de actividades orientadas a la prevención de incidentes y fortalecimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo al mantenimiento de entornos de trabajo seguros para el personal vinculado al proyecto.

En general, la Interventoría evidenció cumplimiento en la implementación de medidas de prevención y control orientadas a minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo durante el periodo evaluado.

5.4.3 SEGUIMIENTO Y REVISIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó seguimiento a los indicadores de gestión establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando el comportamiento de los indicadores relacionados con accidentalidad, enfermedad laboral y ausentismo laboral, conforme a los lineamientos definidos en la Resolución 0312 de 2019.

Los indicadores objeto de seguimiento correspondieron a:

Indicador	Fórmula según Resolución 0312 de 2019	Datos utilizados	Resultado
Frecuencia de accidentalidad	(Número de accidentes de trabajo × 200.000) / Horas hombre trabajadas	(0 × 200.000) / 4.320 horas trabajadas*	0
Severidad de accidentalidad	(Número de días perdidos por accidentes de trabajo × 200.000) / Horas hombre trabajadas	(0 × 200.000) / 4.320 horas trabajadas	0
Proporción de accidentes de trabajo mortales	(Número de accidentes mortales / Número total de accidentes de trabajo) × 100	(0 / 0) × 100	0%
Prevalencia de enfermedad laboral	(Número de casos de enfermedad laboral existentes × 100) / Número total de trabajadores	(0 × 100) / 18 trabajadores	0%
Incidencia de enfermedad laboral	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral × 100) / Número total de trabajadores	(0 × 100) / 18 trabajadores	0%
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por causa médica × 100) / Número de días laborados	(0 × 100) / 540 días laborados**	0%

De acuerdo con la información verificada durante el periodo evaluado, no se presentaron accidentes de trabajo, casos asociados a enfermedad laboral ni ausentismo laboral del personal vinculado al proyecto.

Así mismo, la Interventoría verificó el seguimiento realizado por el contratista a los indicadores establecidos dentro del PGIO, evidenciando el control y actualización de la información correspondiente al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En general, los indicadores de gestión se mantuvieron dentro de condiciones favorables durante el periodo evaluado, reflejando control sobre los riesgos asociados a las actividades ejecutadas y cumplimiento de las medidas preventivas implementadas en obra.

5.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó seguimiento a la implementación de las medidas establecidas dentro del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias implementado por el CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA, verificando la disponibilidad de recursos y elementos necesarios para la atención oportuna de posibles situaciones de emergencia durante la ejecución de las actividades en obra.

Como parte de las actividades de verificación, se evidenció que el proyecto cuenta con equipos básicos de emergencia y señalización preventiva, incluyendo botiquín, camilla, extintores, rutas de evacuación y punto de encuentro, los cuales se encuentran instalados e identificados para su fácil acceso y utilización en caso de emergencia.

Así mismo, la Interventoría verificó la realización de inspecciones de seguridad a los equipos de emergencia y elementos de señalización, evidenciando seguimiento al estado y condiciones de los equipos instalados en obra, con el fin de garantizar su disponibilidad y funcionamiento durante el periodo evaluado.

A continuación, se presenta el consolidado de los equipos de emergencia verificados durante el periodo evaluado:

N°	Equipo de emergencia	Cantidad	Estado	Inspección realizada
1	Camilla	1	Bueno	Se verificó estado físico, ubicación y disponibilidad
2	Extintor	1	Bueno	Se verificó manómetro, señalización y fecha de vigencia
3	Botiquín de emergencia	1	Bueno	Se verificó dotación, estado y disponibilidad de elementos

De igual manera, se evidenció la socialización de temas relacionados con atención de emergencias, rutas de evacuación y mecanismos de respuesta ante incidentes, mediante actividades de inducción y charlas de seguridad dirigidas al personal vinculado al proyecto.

En general, la Interventoría evidenció cumplimiento en la implementación de las medidas contempladas dentro del Plan de Emergencias, observándose disponibilidad de equipos básicos, señalización e inspecciones periódicas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias durante la ejecución de las actividades en obra.

5.5. GESTIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS

En el marco de las actividades de seguimiento al componente ambiental del proyecto, la interventoría realizó verificación a las medidas implementadas por el contratista Consorcio Red Vital Córdoba para el manejo de los aspectos e impactos ambientales asociados a la ejecución de

las actividades constructivas, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) y la normatividad ambiental aplicable.

Durante las visitas técnicas efectuadas en obra, se verificó la implementación de medidas orientadas al manejo adecuado de los residuos generados durante la ejecución del proyecto, así como el mantenimiento de condiciones de orden y aseo en las áreas intervenidas, con el propósito de prevenir afectaciones al entorno y garantizar condiciones adecuadas de trabajo.

La interventoría efectuó seguimiento al retiro y disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados durante las actividades de demolición, construcción de muros, vigas, andenes y demás labores ejecutadas en el período reportado, verificando la utilización de vehículos autorizados para el transporte de materiales y la remisión de los soportes correspondientes a la disposición final de los residuos generados.

Así mismo, se evidenció la implementación del punto ecológico para la segregación temporal de residuos sólidos en obra, promoviendo la adecuada clasificación y manejo de los residuos generados durante la ejecución del proyecto.

De igual manera, la interventoría realizó seguimiento a las gestiones adelantadas por el contratista frente al trámite del permiso de aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental competente, solicitando la remisión de los soportes y documentos asociados a dicho proceso, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables al proyecto.

Como resultado del seguimiento realizado, la interventoría efectuó las observaciones y requerimientos correspondientes orientados al fortalecimiento de las medidas de manejo ambiental, control operacional, disposición de residuos y cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de la ejecución del contrato.

5.5.1 SEGUIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

En desarrollo de las actividades de seguimiento al componente ambiental del proyecto, la interventoría realizó verificación al manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados durante la ejecución de las actividades constructivas desarrolladas en obra, evaluando las acciones implementadas por el contratista para el almacenamiento temporal, cargue, transporte y disposición final de los materiales resultantes de las labores ejecutadas.

Durante el período evaluado se evidenció la generación de residuos provenientes de actividades como demolición, levantamiento de muros, construcción de vigas de cimentación y vigas de amarre, construcción de andenes, remoción de pintura y demás actividades asociadas al proceso constructivo. Para su manejo, el contratista dispuso de vehículos tipo volqueta destinados al retiro y transporte de los materiales generados.

La interventoría verificó la implementación de medidas preventivas durante las maniobras de cargue y descargue de materiales y retiro de RCD, evidenciando la utilización de señalización temporal y controles operacionales orientados a minimizar riesgos para trabajadores, peatones y usuarios de la vía.

Así mismo, se efectuó revisión documental de los soportes presentados por el contratista relacionados con el manejo y disposición final de los residuos generados, incluyendo registros

fotográficos, actas y demás evidencias asociadas a las actividades ejecutadas durante el período reportado. De igual manera, se realizó seguimiento al procedimiento de disposición final de materiales implementado por el contratista como parte de las medidas de manejo ambiental del proyecto.

Durante las visitas de seguimiento, la interventoría efectuó observaciones y recomendaciones encaminadas al fortalecimiento de las medidas de control relacionadas con el almacenamiento temporal, orden y aseo de las áreas intervenidas, promoviendo condiciones adecuadas de limpieza, seguridad y manejo ambiental durante la ejecución de las actividades.

En términos generales, se evidenció la implementación de acciones orientadas al manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición generados en obra, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) y las condiciones operativas del proyecto.

5.5.2 SEGUIMIENTO A SEÑALIZACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL EN OBRA

Como parte de las actividades de seguimiento al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo y gestión operativa del proyecto, la interventoría realizó verificación a las medidas de señalización y control operacional implementadas por el contratista en las diferentes áreas intervenidas, con el propósito de contribuir a la protección de los trabajadores, peatones y demás usuarios presentes en el entorno de la obra.

Durante las visitas de seguimiento realizadas en campo, se evidenció la instalación de señalización preventiva para la delimitación de áreas de trabajo, identificación de riesgos y control de acceso a las zonas intervenidas. Así mismo, se efectuó seguimiento a las medidas implementadas durante las maniobras de cargue y descargue de materiales y retiro de residuos de construcción y demolición (RCD), verificando la utilización de elementos de señalización temporal conforme a los compromisos establecidos por el contratista.

La interventoría realizó igualmente seguimiento a las medidas de control operacional adoptadas para el ingreso y salida de vehículos vinculados al proyecto, verificando la implementación de controles básicos orientados a minimizar riesgos asociados al tránsito interno y a las actividades desarrolladas en las inmediaciones de la obra, de conformidad con los lineamientos del Manual de Señalización Vial y las disposiciones aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

No obstante, durante el período evaluado se efectuaron observaciones y requerimientos al contratista relacionados con el fortalecimiento de la señalización en algunos frentes de trabajo y el mantenimiento de las medidas de control operacional, reiterando la necesidad de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades constructivas.

En términos generales, se evidenció la implementación de medidas de señalización y control operacional en obra; sin embargo, la interventoría mantuvo seguimiento permanente a su estado, ubicación y suficiencia, con el fin de asegurar la adecuada gestión de los riesgos presentes durante la ejecución del proyecto.

5.6. ACTA DE COMITÉ Y/O REUNIONES:

Durante el periodo evaluado, se contó con la participación activa del Residente de Interventoría, el Profesional SST de Interventoría, el Residente del Contratista y el Apoyo a la supervisión del contrato en las reuniones semanales del proyecto. La presencia de estos profesionales permitió realizar seguimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), revisar el cumplimiento de medidas preventivas y coordinar acciones orientadas al control de riesgos en obra.

A continuación, se presenta un consolidado de las reuniones realizadas durante el periodo:

N°	Fecha de la reunión	Asistentes
1	12 de mayo de 2026	Residente de Interventoría, Profesional SST Interventoría, Residente del Contratista, Apoyo a la supervisión del contrato
2	19 de mayo de 2026	Residente de Interventoría, Profesional SST Interventoría, Residente del Contratista, Apoyo a la supervisión del contrato
3	26 de mayo de 2026	Residente de Interventoría, Profesional SST Interventoría, Residente del Contratista, Apoyo a la supervisión del contrato

En términos generales, la Interventoría evidenció que durante el periodo evaluado se cumplió con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), observándose la adecuada implementación de medidas preventivas, control de riesgos, entrega de EPP, inspecciones de seguridad y seguimiento a indicadores. Se constató que los trabajadores conocen los procedimientos y cuentan con los recursos necesarios para realizar sus labores de forma segura, garantizando así la protección de su salud y el fortalecimiento de la cultura de seguridad en obra.

5.7. CONCLUSIONES

Durante el período comprendido entre el 08 de mayo y el 07 de junio de 2026, la interventoría continuó realizando seguimiento integral al contrato de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el control documental, la disponibilidad del personal y equipos requeridos, así como la implementación de medidas relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo, gestión ambiental y control operacional del proyecto.

Como resultado de las actividades de seguimiento desarrolladas, se evidenció la ejecución de acciones asociadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y al Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO), relacionadas con la afiliación del personal al Sistema General de Seguridad Social, la realización de inducciones y capacitaciones, la entrega de elementos de protección personal, el manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), la señalización preventiva y la implementación de medidas de control en los diferentes frentes de trabajo.

Durante el período evaluado, la interventoría efectuó observaciones y requerimientos al contratista orientados al fortalecimiento de las condiciones de seguridad en obra, especialmente frente al uso obligatorio de elementos de protección personal, ejecución segura de trabajos en alturas, condiciones de los equipos y herramientas utilizadas, señalización de las áreas de trabajo y control operacional asociado al ingreso y salida de materiales y residuos.

Así mismo, se realizó seguimiento al evento presentado por la presunta exposición a agentes químicos provenientes de actividades desarrolladas en las inmediaciones del proyecto, verificando las acciones implementadas por el contratista para garantizar condiciones seguras para la continuidad de las labores y solicitando la actualización de la matriz de peligros y la implementación de medidas de control frente al riesgo identificado.

En materia ambiental, la interventoría verificó la ejecución de actividades relacionadas con el manejo de residuos de construcción y demolición, la disposición final de materiales, las condiciones de orden y aseo en obra y las gestiones adelantadas por el contratista frente a los trámites ambientales requeridos para el desarrollo del proyecto.

En términos generales, la interventoría considera que las actividades ejecutadas durante el período reportado se desarrollaron conforme a las condiciones técnicas y contractuales del proyecto; no obstante, se mantuvo seguimiento permanente a los aspectos objeto de observación y a las acciones correctivas implementadas por el contratista, con el propósito de garantizar la adecuada ejecución de las obras y el cumplimiento de los objetivos establecidos para el fortalecimiento de la infraestructura física del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) del municipio de Montería.

LINA REVUELTAS LOZANO
R.L CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE

5.8. ANEXOS

1. Planilla de pago de Seguridad Social Integral.
2. Asignación de responsable del SG-SST del Consorcio Interventoría CRUE.
3. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.
4. Registro fotográfico

443

ANEXO 1

PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902030630	0	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MONTE VERDE	MONTERIA-CORDOBA	5614154	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	364993845	9505325105	E	2026/06/09	2026/06/04	BANCOLOMBIA	0	$3,135,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
Centro de Trabajo: R1 (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
1	CC	1065005944	GARCIA MENDOZA JOAQUIN ALFREDO																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
2	CC	50940306	REVUELTAS LOZANO LINA PAOLA																		23100 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINC-R5 (3 Afiliados)																						$7,350,107	$1,176,200			$7,350,107	$294,200			$7,350,107	$294,200			$7,350,107		$511,800		$0	$0		$2,276,400
Centro de Trabajo: R5 (3 Afiliados)																						$7,350,107	$1,176,200			$7,350,107	$294,200			$7,350,107	$294,200			$7,350,107		$511,800		$0	$0		$2,276,400
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (3 Afiliados)																						$7,350,107	$1,176,200			$7,350,107	$294,200			$7,350,107	$294,200			$7,350,107		$511,800		$0	$0		$2,276,400
3	CC	1065014420	LAZA VEGA MARIA LUISA																		25-14	30	$3,732,801	$597,300	EPS002	30	$3,732,801	$149,400	CCF16	30	$3,732,801	$149,400	14-11	30	$3,732,801	6.960%	$259,900	30	$0	$0	Si	$1,156,000
4	CC	78075531	RODRIGUEZ JULIO CLIMACO MIGUEL																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1067922166	RODRIGUEZ BAZA SAMIR ANDRES																		23030 1	30	$1,866,401	$298,700	EPS041	30	$1,866,401	$74,700	CCF16	30	$1,866,401	$74,700	14-11	30	$1,866,401	6.960%	$130,000	30	$0	$0	Si	$578,100
Total			**Afiliados(5)**																				$10,851,917	$1,736,600			$10,851,917	$434,400			$10,851,917	$434,400			$10,851,917		$530,200		$0	$0		$3,135,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,736,600	$0	$0	$1,736,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$597,300	$0	$0	$597,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$859,100	$0	$0	$859,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$530,200	$0	$0	$530,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$530,200	$0	$0	$530,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$434,400	$0	$0	$434,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	$434,400	$0	$0	$434,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				5	$434,400	$0	$0	$434,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$74,700	$0	$0	$74,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$149,400	$0	$0	$149,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				5	$3,135,600	$0	$0	$3,135,600

345

ANEXO 2

ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL SG-SST DEL CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE.

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** CIC-SGSST-DOC-001
		Versión: 0
	ACTA DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL SG-SST	**Fecha:** 02/02/2026
		Página 1 de 3

ACTA DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL SG-SST

CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE

CONTROL DE REVISIONES Y APROBACION DEL DOCUMENTO

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Samir Rodríguez Baza Profesional SST	Climaco Rodríguez Julio Director de Interventoría	Lina Revueltas Lozano Representante legal
Firma	**Firma**	**Firma**

CONTROL DE GESTION DEL CAMBIO

FECHA	VERSION	MODIFICACIONES
02/Febrero/2026	001	Creación de documentos

ACTA DE ASIGNACION DE RESPONSABLE DEL SG-SST

En cumplimiento de la normativa colombiana vigente, incluyendo el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, el CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE, procede a designar formalmente al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Esta asignación busca garantizar la implementación, mantenimiento y mejora continua del SG-SST, protegiendo así la salud y seguridad de todos los empleados y contratistas.

ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

Por medio de la presente acta, se designa al Ingeniero **SAMIR ANDRES RODRIGUEZ BAZA**, identificado con cédula de ciudadanía número **1067922166**, como responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de CONSORCIO INTERVENTORÍA CRUE,.

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

El Responsable del SG-SST tendrá las siguientes funciones:

1. Implementar y coordinar el SG-SST: Asegurar la implementación efectiva del sistema en todas las áreas de la empresa, cumpliendo con los estándares y normativas legales vigentes.
2. Identificar peligros y evaluar riesgos: Realizar actividades de identificación de peligros y evaluación de riesgos, estableciendo controles para mitigar los riesgos identificados.
3. Elaborar y actualizar documentos del SG-SST: Gestionar la elaboración, revisión y actualización de los documentos del SG-SST, incluyendo políticas, procedimientos, planes y registros.
4. Capacitar y sensibilizar al personal: Organizar programas de capacitación y sensibilización para todos los colaboradores, enfocándose en la prevención de riesgos y el cumplimiento de normas de seguridad.
5. Realizar auditorías internas: Planificar y ejecutar auditorías internas para evaluar el desempeño del SG-SST y proponer acciones correctivas cuando sea necesario.
6. Reportar incidentes y accidentes de trabajo: Supervisar el proceso de reporte e investigación de incidentes y accidentes laborales, asegurando el cumplimiento de la Resolución 1401 de 2007.
7. Monitorear el cumplimiento de los indicadores del SG-SST: Realizar el seguimiento de los indicadores de gestión y desempeño del SG-SST, presentando informes periódicos a la alta gerencia.

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**Código:** CIC-SGSST-DOC-001
		Versión: 0
	ACTA DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL SG-SST	**Fecha:** 02/02/2026
		Página 3 de 3




COMPROMISO DEL RESPONSABLE DEL SG-SST

El Ingeniero **SAMIR ANDRES RODRIGUEZ BAZA** acepta la responsabilidad asignada y se compromete a:

- Cumplir con las funciones establecidas en este documento.
- Respetar y aplicar las normativas legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Trabajar de manera colaborativa con todos los departamentos de la empresa para garantizar la efectividad del SG-SST.


APROBACIÓN DEL ACTA

Esta acta se firma con el fin de formalizar la asignación del responsable del SG-SST y garantizar su cumplimiento efectivo.

Nombre del Responsable	Cargo	Firma	Fecha
SAMIR ANDRES RODRIGUEZ BAZA	Responsable del SG-SST		01/04/2026
CLIMACO RODRIGUEZ	Director de Interventoría		01/04/2026
LINA REVUELTAS LOZANO	Representante Legal		01/04/2026

REVISIÓN DEL ACTA

El presente documento será revisado y actualizado anualmente, o cuando se presenten cambios en la estructura organizacional o en la normativa legal aplicable.



LINA REVUELTAS LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL
01 de Abril de 2026

ANEXO 3.

AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

451

Medellín, 13 de Abril de 2026

ARL | sura

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la circular externa 007 de 1996 de la Superintendencia Financiera (título VI, numeral 1.5, literal g), se expide la presente constancia de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

Nombre o razón	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE
Cédula de ciudadanía o Nit	N902030630
Fecha inicio de vigencia	10/04/2026 00:00:00
Fecha fin de vigencia	AFILIADA
Estado	EN COBERTURA
Número de centros de trabajo	2
Número de afiliados dependientes	5
Número de afiliados independientes	0
Número cotizantes en mora:	0
% cotizantes en mora:	0 %
Código de actividad principal	5711001
Clase de riesgo 5	Tasa de riesgo 6.96%

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN

Nombre	Código	Clasificación	Tarifa
ADMINISTRATIVO	0000000002	1	0.522
PRINCIPAL	0000000001	5	6.96

"Mora: Es el incumplimiento que se genera cuando existiendo afiliación no se realiza la autoliquidación acompañada del respectivo pago de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en los plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes.

Entiéndase dentro de este concepto, la mora que registra el empleador respecto de algunos trabajadores a su cargo. Art 6

En el estado de cuenta integral podrás encontrar el resumen y detalle actualizado de tus moras, inexactitudes, recobros de AT, pagos de incapacidades y devoluciones disponibles. Esto dará claridad a las diferencias y la mora que presentas. Para consultar el estado de cuenta integral, ingresa a https://www.arlsura.com da clic en Empresa e inicia sesión y sigue esta ruta: Gestión Administrativa/ Mi Empresa/ Estado de Cuenta/ Estado de Cuenta Integral.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:


Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Dirección IP: 191.108.161.104, 192.230.104.7,

ANEXO 4
REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

REGISTRO FOTOGRAFICO

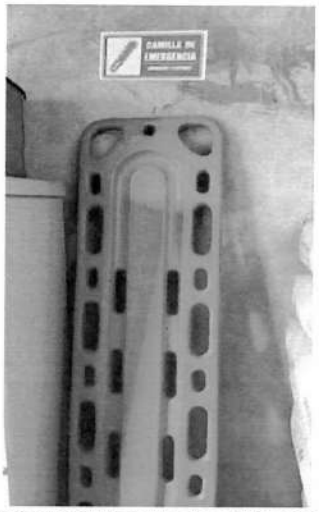

FOTOGRAFÍA 1.
DESCRIPCIÓN: Verificación a la señalización y disposición de camilla de emergencias.



FOTOGRAFÍA 2.
DESCRIPCIÓN: Verificación de señalización y disposición equipos de atención a emergencias y primeros auxilios.



FOTOGRAFÍA 3.
DESCRIPCIÓN: Verificación a la instalación de punto ecológico para los residuos solidos, con señalización.



FOTOGRAFÍA 4.
DESCRIPCIÓN: Verificación a la señalización y disposición de Extintor multipropósito.

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFÍA 5.
DESCRIPCIÓN: Seguimiento y socialización por parte de interventoría y coordinadora del CRUE, del autocuidado ante la exposición de productos químicos peligrosos.



FOTOGRAFÍA 6.
DESCRIPCIÓN: Seguimiento a pausas activas y calistenia.



FOTOGRAFÍA 7.
DESCRIPCIÓN: Seguimiento a la socialización de charlas pre turno.



FOTOGRAFÍA 8.
DESCRIPCIÓN: Seguimiento a la socialización para procedimientos de trabajo seguro.
