1121

CONSORCIO
RED VITAL CORDOBA

INFORME DE OBRA
No. 3

Carrera 6 #62b-32 Oficina 618
Centro de Negocios Sexta Avenida
Monteria – Cordoba.

consorcioredvitaf@gmaif.com

(604) 7812273
(+57) 315 4764499

INFORME MENSUAL DE OBRA No.03

CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO RED VITAL CORDOBA

PROYECTO:

REF.: "Contrato Obra No. SI-LP-011-2025, Cuyo Objeto es: FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

PERIODO DE INFORME

07 DE JUNIO DE 2026 HASTA 30 JUNIO DE 2026

Montería – 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES 3
1.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO 4
1.2 ANTECEDENTES 4
1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 5
2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 7
2.1. GARANTIAS DEL CONTRATO 8
2.1.1. pólizas según suscripción del contrato (Anexo 0) 8
2.1.2 pólizas según Acta Inicio (Anexo 2) 9
3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 10
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 30
5. INFORME DETALLADO DE OBRA 46
6. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PROYECTO 48
7. AVANCE EN TIEMPO 49
8. PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO 49
9. ESTADO DEL TIEMPO 50
10. CONTROL DE CALIDAD 50
11. PGIO (MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUATRIAL Y SALUD OCUPACIONAL) 50
12. ASPECTO FINANCIERO 51
12.1. FORMA DE PAGO 51
12.2 ACTAS PARCIALES DE OBRA 52
13. COMENTARIOS 52

1. GENERALIDADES

La Gobernación de Córdoba pone a disposición de los interesados mediante proceso de licitación pública N. SI-LP-011-2025 para la ejecución del proyecto que tiene por objeto la "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" proceso adjudicado al CONSORCIO RED VITAL CORDOBA, con NIT. No. 902.022.356-3, y representado legalmente por MARIA ELENA RIVERA HOYOS, con un valor de $ 2.764.759.464,00, y un plazo de ejecución final de CINCO (5) meses. Para la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del proyecto, se designa al CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE, representada por LINA REVUELTAS LOZANO.

El presente documento constituye el informe de avance de obra correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2026. En este informe se incluyen los aspectos técnico, económico y financiero del proyecto en el periodo, los problemas presentados en la obra, se detallan los avances de obra y registro fotográfico.

1.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el departamento de Córdoba, municipio de Montería en el barrio los laureles en la calle 42 y 43 con carrera 8 A marcado con el número 4 de la manzana 17 en las instalaciones de CRUE Y MALARIA.



IMAGEN N.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

1.2 ANTECEDENTES

Actualmente, las instalaciones ocupadas por CRUE y Malaria presentan un evidente deterioro en su infraestructura física, reflejado en afectaciones visibles en pisos, muros, cubiertas y elementos estructurales y no estructurales, producto del desgaste por uso continuo y el paso del tiempo.

Se evidencian fisuras y desprendimientos en paredes y cielorrasos, deterioro de acabados, presencia de humedad en algunos sectores, así como afectaciones en redes eléctricas e hidrosanitarias que disminuyen las condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad de las instalaciones.

Asimismo, los espacios presentan desgaste en puertas, ventanas y elementos metálicos, además de deficiencias en ventilación e iluminación, generando condiciones poco adecuadas para el desarrollo eficiente de las actividades administrativas y operativas.

De igual manera, algunas áreas muestran deterioro en andenes y zonas exteriores, así como afectaciones ocasionadas por raíces de árboles y filtraciones, comprometiendo la estabilidad y funcionalidad de ciertos sectores de la edificación.

En términos generales, el estado actual de la infraestructura física requiere intervención y adecuaciones prioritarias que permitan mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las instalaciones.

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE del Departamento de Córdoba es el centro administrativo principal encargado de coordinar y ejecutar las actividades técnico-administrativas esenciales para la gestión pública en emergencias del departamento. Esta sede debe garantizar espacios seguros, funcionales, eficientes y confortables, no solo para el personal que labora en ella, sino también para los usuarios que acceden a sus servicios, asegurando un entorno que fomente la productividad y el bienestar.

A pesar de los esfuerzos previos por mantener y mejorar las condiciones de esta sede, se ha identificado que las instalaciones actuales presentan limitaciones que afectan su operatividad. La infraestructura eléctrica, de comunicaciones y de climatización, junto con los acabados interiores, los elementos no estructurales y el mobiliario, no cumplen con los estándares actuales requeridos para responder a las demandas administrativas y de servicio del departamento. Además, el crecimiento poblacional y las necesidades operativas han generado una reducción significativa del espacio disponible, lo que ha llevado a la saturación de oficinas y al uso de áreas provisionales que no cumplen con las condiciones mínimas de comodidad y funcionalidad.

La formulación de un plan de inversión integral es fundamental para promover la mejora cualitativa y funcional de la sede, asegurando que se

cumplan las normativas técnicas y las expectativas de los usuarios y trabajadores. Este plan debe considerar las necesidades actuales y futuras, orientándose a mejorar la eficiencia, la calidad de los servicios y la experiencia en los espacios de trabajo.

El objetivo final es transformar el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE en un centro administrativo de excelencia que ofrezca entornos de trabajo óptimos, contribuyendo significativamente a la mejora de la gestión pública en el departamento de Córdoba. Para lograr esto, es necesario invertir en el mantenimiento y actualización de las instalaciones, la modernización de los sistemas eléctricos y de comunicaciones, la optimización de los espacios físicos y la dotación de mobiliario y equipos tecnológicos adecuados.

La ejecución del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" traerá numerosos beneficios, entre ellos:

- Mejora de la funcionalidad de los espacios: La reconfiguración de áreas y la habilitación de nuevos accesos permitirán optimizar el uso del espacio disponible, garantizando entornos de trabajo más cómodos y adecuados para los funcionarios.
- Incremento de la eficiencia operativa: La modernización de los sistemas eléctricos, de comunicaciones y de climatización mejorará la operatividad de los equipos y la conectividad, reduciendo tiempos de respuesta y optimizando los procesos administrativos.
- Mejora de la estética y el ornato: La renovación de acabados interiores, como pintura y cielos rasos, contribuirá a crear un ambiente más profesional y agradable para empleados y visitantes.
- Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica: La instalación de dispositivos de red modernos y conexiones certificadas garantizará una transmisión de datos más rápida y confiable, apoyando las actividades administrativas.

El proyecto consiste en el "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA", contemplando todos los elementos críticos, desde los sistemas de climatización, eléctricos y de comunicaciones, hasta los acabados interiores, la reconfiguración de espacios y la provisión de mobiliario, ubicada en el municipio de Montería, departamento de Córdoba.

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

TABLA N°1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO No. SI-LP-011-2025	
CONTRATANTE:	GOBERNACION DE CORDOBA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.764.759.464,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CINCO (05) meses
FECHA ACTA DE INICIO:	07 ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

2.1. GARANTIAS DEL CONTRATO

2.1.1. pólizas según suscripción del contrato (Anexo 0)

Tabla N. 1. Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 53-44-1010433805 de La Aseguradora Seguros del Estado S.A

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
	ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	$ 276.475,946.40	26/02/2026	04/02/2027
Salarios y prestaciones sociales	$138.237,973.20	26/02/2026	04/08/2029
Estabilidad de la obra	$ 276.475,946.40	04/08/2026	04/08/2029

Tabla N.2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 53-40-101014310 de La Aseguradora Seguros del Estado S.A

AMPARO	Valor	VIGENCIA	
	Asegurado	DESDE	HASTA
Predios labores y operaciones	$700.362.000,00	26/08/2026	04/08/2026
Contratistas y sub contratistas	$700.362.000,00	26/08/2026	04/08/2026
Vehículos propios y no propios	$700.362.000,00	26/08/2026	04/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$700.362.000,00	26/02/2026	04/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$700.362.000,00	26/02/2026	04/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$700.362.000,00	26/02/2026	04/08/2026

2.1.2 pólizas según Acta Inicio (Anexo 2)

Tabla N. 3. Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 53-44-1010433805 de La Aseguradora Seguros del Estado S.A

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
	ASEGURADO	DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	$ 276.475,946.40	07/04/2026	16/03/2027
Salarios y prestaciones sociales	$138.237,973.20	07/04/2026	13/09/2029
Estabilidad de la obra	$ 276.475,946.40	13/09/2026	13/09/2029

Tabla N.4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 53-40-101014310 de La Aseguradora Seguros del Estado S.A

AMPARO	Valor	VIGENCIA	
	Asegurado	DESDE	HASTA
Predios labores y operaciones	$700.362.000,00	07/04/2026	13/09/2026
Contratistas y sub contratistas	$700.362.000,00	07/04/2026	13/09/2026
Vehículos propios y no propios	$700.362.000,00	07/04/2026	13/09/2026
Responsabilidad civil patronal	$700.362.000,00	07/04/2026	13/09/2026
Daño emergente y lucro cesante	$700.362.000,00	07/04/2026	13/09/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$700.362.000,00	07/04/2026	13/09/2026

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance general de las actividades a realizar con el fin de mejorar y mantener en condiciones óptimas a los usuarios y trabajadores de CRUE Y MALARIA relacionado en el objeto son los siguientes:

N.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.		**ADECUACIÓN DE ÁREAS EXISTENTES**				
		PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS				
	1,01	Localización, Trazado y Replanteo	M2	3.661,00	$ 6.280,00	$ 22.991.080,00
	1,02	Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante	M2	999,85	$ 31.102,00	$ 31.097.335,00
	1,03	Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado	UND	48,00	$ 83.082,00	$ 3.987.936,00
	1,04	Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado	UND	45,00	$ 58.191,00	$ 2.618.595,00
	1,05	Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro	M2	2.431,59	$ 37.994,00	$ 92.385.830,00
	1,06	Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado	UND	8,00	$ 58.191,00	$ 465.528,00
	1,07	Retiro de pintura existente en zonas deterioradas	M2	3.139,35	$ 6.410,00	$ 20.123.234,00
	1,08	Desmonte de instalaciones puntos eléctricos	UND	151,00	$ 93.815,00	$ 14.166.065,00
	1,09	Desmonte de puntos hidráulicos y sanitarios	UND	16,00	$ 32.967,00	$ 527.472,00

	1,1	Mantenimiento de closet en mal estado	UND	8,00	$ 432.486,00	$ 3.459.888,00
	1,11	Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye estructura de soporte en madera o metálica y retiro a sitio de disposición autorizado	M2	1.249,82	$ 29.012,00	$ 36.259.778,00
	1,12	Limpieza de zonas verdes exteriores, incluye retiro de material vegetal	M2	562,85	$ 25.567,00	$ 14.390.386,00
	1,13	Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado	UND	8,00	$ 46.650,00	$ 373.200,00
	1,14	Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro	M2	270,06	$ 24.737,00	$ 6.680.474,00
	1,15	Demolición de redoblón existente. Incluye retiro de material escombro	M	220,56	$ 21.265,00	$ 4.690.208,00
	1,16	Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro	M	277,23	$ 29.244,00	$ 8.107.314,00
	1,17	Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado	M2	17,28	$ 32.967,00	$ 569.670,00
	1,18	Demolición de columna Existente Garita . Incluye retiro de escombro	UND	4,00	$ 770.717,00	$ 3.082.868,00
	1,19	Desmonte y traslado planta eléctrica a sitio autorizado	UND	1,00	$ 4.883.040,00	$ 4.883.040,00
	1,2	Excavación en material común. Incluye retiro de material sobrante	M3	11,25	$ 35.829,00	$ 403.076,00

	1,21	Excavación manual en material común para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante	M	371,03	$ 20.634,00	$ 7.655.833,00
	1,22	Suministro e instalación de geotextil para separación de suelos y capas granulares.	M2	76,87	$ 14.722,00	$ 1.131.680,00
	1,23	Relleno en material seleccionado compactado	M3	22,91	$ 170.777,00	$ 3.912.501,00
	1,24	Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado	M3	243,16	$ 187.376,00	$ 45.562.348,00
	1,25	Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajón, recomendación geotecnista. Incluye compactación	M3	3,63	$ 283.698,00	$ 1.029.824,00
Subtotal						**$ 330.555.163,00**
2.		**ESTRUCTURA EN CONCRETO**				
	2,01	Base en concreto pobre 2200 PSI, solado, espesor 5cm (bajo estructuras en concreto)	M3	1,00	$ 764.387,00	$ 764.387,00
	2,02	Concreto de 3000 PSI para zapatas	M3	2,40	$ 1.022.632,00	$ 2.454.317,00
	2,03	Viga de Cimentación en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m	M	42,29	$ 141.184,00	$ 5.970.671,00
	2,04	Viga de cimentación para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m. Incluye refuerzo 4 varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm	M	328,74	$ 188.416,00	$ 61.939.876,00
	2,05	Columnas de 0.25 mts x 0.25 mts en concreto de 21mpa (3000 psi)	M	24,00	$ 114.969,00	$ 2.759.256,00

	2,06	Viga superior de 0.25 m x 0.30 m en concreto de 3000 PSI	M	32,70	$ 161.642,00	$ 5.285.693,00
	2,07	Concreto de 3000 PSI para viga canal e=10 cm. Incluye formaletas	M2	3,37	$ 252.566,00	$ 851.147,00
	2,08	Levante de muro en bloque de arena - cemento vibrado de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero 1:4	M2	277,69	$ 102.009,00	$ 28.326.879,00
	2,09	Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior	M2	561,38	$ 44.754,00	$ 25.124.001,00
	2,1	Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	M	35,89	$ 131.128,00	$ 4.706.184,00
	2,11	Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	M	93,00	$ 109.045,00	$ 10.141.185,00
	2,12	Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	M	73,31	$ 114.091,00	$ 8.364.011,00
	2,13	Mesón en concreto de 3000 psi, ref. 3/8" @ 0.15 mts , incluye granito para placa de 0.08m, muro de apoyo enchapado y apoyo inferior	M	15,08	$ 455.738,00	$ 6.872.529,00
	2,14	Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, incluye malla electrosoldada XX-106	M2	1.419,63	$ 167.772,00	$ 238.174.164,00
	2,15	Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 15cm, incluye malla electrosoldada Malla XX-295, corte de juntas, sello dilatación	M2	1.112,84	$ 243.929,00	$ 271.453.948,00
	2,16	Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI (Plantilla con malla electrosoldada E= 0.15m y vigas 0.15 m x 0.20 m).	M2	34,54	$ 244.442,00	$ 8.443.027,00

		Refuerzo 4D 3/8" Y estribos 1/4" @ 0.20m.				
	2,17	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparación de la superficie de apoyo	M	313,50	$ 112.327,00	$ 35.214.515,00
	2,18	Suministro, corte y figuración de acero de refuerzo Fy=4,2 Mpa	Kg	1.016,76	$ 10.755,00	$ 10.935.254,00
Subtotal						**$ 727.781.044,00**
3		**PISOS Y ENCHAPES**				
	3,01	Suministro e instalación de enchape cerámico Duropiso Blanco Cara Única 0.51x0.51. Incluye mortero de nivelación de 4cm.	M2	961,32	$165.557,00	$ 159.153.255,00
	3,02	Suministro e instalación de guarda escoba con enchape cerámico Duropiso Blanco	M	655,63	$ 56.166,00	$ 36.824.115,00
	3,03	Suministro e instalación de enchape de piso cerámico fortaleza color blanco para baño 33,8 cm x 33,8 cm	M2	53,87	$ 174.213,00	$ 9.384.854,00
	3,04	Suministro e instalación de enchape cerámica 0.20x0.20 m blanco para pared, H=1.8m	M2	166,79	$ 105.570,00	$ 17.608.020,00
Subtotal						**$ 222.970.244,00**
4		**CIELO RASO ESTUCO Y PINTURA**				
	4,01	Suministro y aplicación a llana de estuco plástico acrílico tipo interior	M2	1.938,14	$ 34.939,00	$ 67.716.673,00
	4,02	Suministro y aplicación a llana de estuco plástico acrílico tipo exterior	M2	479,61	$ 34.939,00	$ 16.757.094,00
	4,03	Suministro e instalación de muro en drywall doble cara E/10cm	M2	62,72	$ 232.055,00	$ 14.554.490,00
	4,04	Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 interior, tres manos.	M2	1.808,66	$ 32.422,00	$ 58.640.375,00

	4,05	Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 exterior, tres manos.	M2	479,61	$ 35.649,00	$ 17.097.617,00
	4,06	Suministro y aplicación de pintura epoxica, dos manos.	M2	129,48	$ 85.686,00	$ 11.094.623,00
	4,07	Suministro e instalación de cielo raso en PVC incluye todos los accesorios para su correcta instalación	M2	45,54	$ 126.648,00	$ 5.767.550,00
Subtotal						**$ 191.628.422,00**
5		**CUBIERTA**				
	5,01	Mortero de Nivelación de Placa de Cubierta e=2cm	M2	93,58	$ 49.786,00	$ 4.658.974,00
	5,02	Impermeabilización de placas de cubierta con emulsión asfáltica y membrana Asfáltica	M2	93,58	$ 146.866,00	$ 13.743.720,00
	5,03	Estructura para cubierta en acero estructural, Pintada con base anticorrosiva, acabado en esmalte y anclajes según diseño	Kg	7.660,01	$ 30.505,00	$ 233.668.605,00
	5,04	Suministro e instalación de cubierta en lamina termoacústica (incluye todos los accesorios para su correcta instalación)	M2	1.014,07	$ 160.265,00	$ 162.520.515,00
Subtotal						**$ 414.591.814,00**
6		**CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA**				
	6,01	suministro e instalación de ventana tipo V-2 (2,0x1.20). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	20,00	$ 1.736.561,00	$ 34.731.220,00
	6,02	suministro e instalación de ventana tipo V-3 (2.17x1.20). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo	UND	16,00	$ 1.957.946,00	$ 31.327.136,00

		lo necesario para su correcta instalación.				
	6,03	suministro e instalación de ventana tipo V-4 (0.6x0.30). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	7,00	$ 455.466,00	$ 3.188.262,00
	6,04	suministro e instalación de ventana tipo V-5 (1.50x1.20). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	5,00	$ 1.034.319,00	$ 5.171.595,00
	6,05	suministro e instalación de ventana tipo V-7 (1,20x1,20). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	3,00	$ 885.359,00	$ 2.656.077,00
	6,06	suministro e instalación de ventana tipo V-8 (1.20x4.00). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	1,00	$ 3.266.758,00	$ 3.266.758,00
	6,07	suministro e instalación de puertas de 1.0x2.0 en madera prensada color negro. Según diseño	UND	13,00	$ 1.013.039,00	$ 13.169.507,00

	6,08	Suministro e instalación de puerta tipo P2 (1.0X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática	UND	21,00	$ 1.357.752,00	$ 28.512.792,00
	6,09	Suministro e instalación de puerta tipo P2 (1.2X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática	UND	3,00	$ 1.506.712,00	$ 4.520.136,00
	6,10	Suministro e instalación de puerta doble tipo P3 (2.0X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática	UND	4,00	$ 2.366.897,00	$ 9.467.588,00
	6,11	Suministro e instalación de puertas en acero inoxidable de 0.90x 1.50 para baños	UND	8,00	$ 706.606,00	$ 5.652.848,00
	6,12	Suministro e instalación puerta de salida de residuos (h 3.0 x l 1.6) incluye el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas, diagonales, limpieza y pintura.	UND	1,00	$ 4.079.602,00	$ 4.079.602,00
	6,13	Suministro e instalación puerta de acceso vehicular (h 3.5 x l 4.0) incluye el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas,	UND	1,00	$ 7.876.185,00	$ 7.876.185,00

		diagonales, limpieza y pintura.				
Subtotal						**$ 153.619.706,00**
7		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS**				
		TUBERIAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE				
	7,01	Suministro e instalación tubería de presión 1/2" PVC RDE 13.5, para soldar	M	2,86	$ 20.741,00	$ 59.319,00
	7,02	Suministro e instalación tubería de presión 3/4" PVC, RDE 21, para soldar	M	15,02	$ 20.713,00	$ 311.109,00
	7,03	Suministro e instalación tubería de presión 1" PVC, RDE 21, para soldar	M	99,37	$ 26.456,00	$ 2.628.933,00
	7,04	Suministro e instalación tubería de presión 1-1/4" PVC, RDE 21, para soldar	M	1,70	$ 31.163,00	$ 52.977,00
	7,05	Suministro e instalación tubería de presión 1 1/2" PVC, RDE 21, para soldar	M	46,12	$ 39.304,00	$ 1.812.700,00
	7,06	Suministro e instalación tubería de presión 2" PVC, RDE 21, para soldar	M	12,72	$ 51.716,00	$ 657.828,00
	7,07	Suministro e instalación de punto hidráulico	UND	40,00	$ 54.177,00	$ 2.167.080,00
	7,08	Suministro e instalación de micromedidor 1/2" (Referencias aprobadas por el prestador de servicio)	UND	1,00	$ 471.854,00	$ 471.854,00
	7,09	Suministro e instalación Válvula de registro 3/4" , Incluye tapa registro 15x15cm	UND	14,00	$ 60.565,00	$ 847.910,00
	7,10	Suministro e instalación Válvula de registro 1" , Incluye tapa registro 15x15cm	UND	26,00	$ 64.012,00	$ 1.664.312,00
Subtotal						**$ 10.674.022,00**
		TUBERIAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA				

	7.11	Suministro e instalación tubería sanitaria 2" PVC, para soldar	M	26,51	$ 50.404,00	$ 1.336.210,00
	7.12	Suministro e instalación tubería sanitaria 3" PVC, para soldar	M	6,56	$ 69.199,00	$ 453.945,00
	7.13	Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC, para soldar	M	150,32	$ 97.829,00	$ 14.705.655,00
	7.14	Punto sanitario 2"	UND	31,00	$ 73.856,00	$ 2.289.536,00
	7.15	Punto sanitario 4"	UND	13,00	$ 97.573,00	$ 1.268.449,00
	7.16	Construcción de caja de inspección 60x60x100 cm	UND	11,00	$ 932.209,00	$ 10.254.299,00
Subtotal						**$ 30.308.094,00**
		APARATOS SANITARIOS				
	7.17	Suministro e instalación de sanitario institucional color blanco. Incluye accesorios para su correcta instalación	UND	9,00	$ 1.197.722,00	$ 10.779.498,00
	7.18	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color blanco. Incluye abastos desagües y grifería tipo Push	UND	13,00	$ 1.156.810,00	$ 15.038.530,00
	7.19	Suministro e instalación de sanitario tipo fluxómetro. Incluye fluxómetro y todo lo necesario para su correcta instalación	UND	2,00	$ 2.847.511,00	$ 5.695.022,00
	7.20	Suministro e instalación de lavamanos ADA o Similar	UND	2,00	$ 1.200.435,00	$ 2.400.870,00
	7.21	Suministro e instalación de lavaplatos empotar 150X52cm, en acero inoxidable. Incluye grifería	UND	2,00	$ 865.338,00	$ 1.730.676,00
	7.22	Suministro e instalación de rejilla metálica de piso 2" para desagüe	UND	14,00	$ 94.278,00	$ 1.319.892,00
Subtotal						**$ 36.964.488,00**
		AGUAS LLUVIAS				

	7.23	Excavación en material común. Incluye retiro de material sobrante	M3	80,05	$ 35.829,00	$ 2.868.111,00
	7.24	Relleno en material seleccionado compactado	M3	13,96	$ 178.607,00	$ 2.493.354,00
	7.25	Suministro e instalación de Arena de rio E=5cm para cama de tubería enterrada y registro aguas Lluvias	M3	3,49	$ 208.300,00	$ 726.967,00
	7.26	Suministro e instalación de tubería 6" PVC corrugado para aguas lluvias. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalación	M	26,67	$ 162.174,00	$ 4.325.181,00
	7.27	Suministro e instalación de tubería 8" PVC Corrugado para aguas lluvias. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalación	M	76,95	$ 152.504,00	$ 11.735.183,00
	7.28	Cárcamo en concreto de 3000 PSI. Incluye B=0.20m. Incluye tapa en concreto prefabricado	M	17,25	$ 404.425,00	$ 6.976.331,00
	7.29	Cajas de registro para drenaje de aguas lluvias del patio principal en concreto de 21MPA, dimensiones 0.60x0.60x0.10 y acero de refuerzo de 3/8" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con rejilla en ángulo 1 1/2" x 1/8"	UND	6,00	$ 567.818,00	$ 3.406.908,00
	7.30	Caja de registro principal para captación de aguas lluvias en concreto de 21MPA, dimensiones 2.5x2.5x2.6 y acero de refuerzo de 1/2" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con refuerzo 1/2" @ 0.20 E.A.S con tapa metálica.	UND	1,00	$ 23.998.408,00	$ 23.998.408,00

	7.31	Caja de registro principal para llaves de control en concreto de 21MPA, dimensiones 1.5x1.65x1.10 y acero de refuerzo de 1/2" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con refuerzo 1/2" @ 0.20 E.A.S con tapa metálica.	UND	1,00	$ 14.875.137,00	$ 14.875.137,00
	7.32	Suministro e instalación de canaletas de aguas lluvias según diseño en lámina galvanizada calibre 20, incluye pintura anticorrosiva y accesorios para el buen funcionamiento	M	135,59	$ 207.235,00	$ 28.098.994,00
	7.33	Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible, Q=48L/S HDT=4.69m.c.a, en acero inoxidable, acoplada a motor sumergible monofásico 7.5 HP de 220 Volt. Incluye obra eléctrica ,niples, acoples, válvulas, pasamuros para su correcta instalación y funcionamiento	UND	2,00	$ 28.930.446,00	$ 57.860.892,00
Subtotal						**$ 157.365.466,00**
8		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
		ACOMETIDAS, GABINETES Y TABLEROS				
	8.01	Suministro e instalación de acometida Trifásica subterránea calibre 3X6F+1X6N+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4 " PVC. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería PVC 1 1/4, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	M	51,00	$ 206.852,00	$ 10.549.452,00

	8.02	Suministro e instalación de acometida Trifásica subterránea calibre 3X8F+1#8N+1#10T cobre aislado DUCTO 1 " PVC. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería PVC 1 , obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	M	53,00	$ 210.340,00	$ 11.148.020,00
	8.03	Suministro e instalación de acometida Trifásica calibre 3X8F+1#8N+1#10T cobre aislado DUCTO 1 " EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	M	36,00	$ 200.306,00	$ 7.211.016,00
	8.04	Suministro e instalación de acometida Trifásica calibre 3X6F+1X6N+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4 " EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1 1/4, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	M	35,00	$ 236.539,00	$ 8.278.865,00
	8.05	Suministro e instalación de acometida Trifásica calibre 3X4F+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4 " EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1 1/4, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	M	55,00	$ 249.967,00	$ 13.748.185,00

Subtotal						**$ 50.935.538,00**
		TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS, CAJAS DE REGISTRO				
	8.06	Suministro e instalación de Tablero Trifásico de 30 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento	UND	3,00	$ 2.394.809,00	$ 7.184.427,00
	8.07	suministro e instalación de tablero trifásico de 18 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento	UND	1,00	$ 1.714.888,00	$ 1.714.888,00
	8.08	suministro e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento	UND	2,00	$ 1.545.792,00	$ 3.091.584,00
	8.09	Suministro e instalación de Breaker Enchufable 1X20A. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	129,00	$ 53.748,00	$ 6.933.492,00
	8.10	Suministro e instalación de Breaker Enchufable 2X20A. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	12,00	$ 74.834,00	$ 898.008,00
	8.11	suministro e instalación de cajas de registro en mampostería de 0,60x0,60x0,80M NORMA RETIE	UND	4,00	$ 1.580.112,00	$ 6.320.448,00
	8.12	Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra (Malla Eléctrica en B.T) en cable 2/0 AWG, con cuatro varillas 5/8" de cobre de 2.4 metros y cuadriculas.	UND	1,00	$ 9.006.635,00	$ 9.006.635,00

		Incluye 6 colas, soldadura exotérmica, obra civil.				
Subtotal						**$ 35.149.482,00**
		SALIDA DE LUCES Y TOMA CORRIENTES				
	8.13	Suministro e instalación de salida para luminaria 110V normal con toma doble con polo a tierra 15A ref. 5320 blanco, 125v y según norma nema 5 - 15R, certificación retie y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 metálica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería EMMT 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento (salida promedio de 8 m)	UND	190,00	$ 466.870,00	$ 88.705.300,00
	8.14	Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica 110v normal con toma doble con polo a tierra 15A, ref. 5320 blanco, 125v y según la norma nema 5-15R, certificación retie y pruebas de conformidad ul. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 metálica conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su	UND	87,00	$ 487.703,00	$ 42.430.161,00

		correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 8m)				
	8.15	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica 220v con toma mirada china con protección de falla a tierra, 30a, leviton, blanco, 220v y certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metálica, con tapa suplemento, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería emt de 1/2", conductores de cobre 10 awg-cu-thhn/thwn-90°c, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio de 10 m).	UND	3,00	$ 638.996,00	$ 1.916.988,00
	8.16	Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica 110v normal con toma doble GFCI con polo a tierra 15A, ref. 5320 blanco, 125v y según la norma nema 5-15R, certificación retie y pruebas de conformidad ul. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 metálica conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 10m)	UND	1,00	$ 742.241,00	$ 742.241,00

	8.17	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de saice sencillo y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metálica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería emt de 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(salida promedio de 4 m).	UND	7,00	$ 570.793,00	$ 3.995.551,00
	8.18	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de switch doble y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metálica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería emt de 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(salida promedio de 4 m).	UND	27,00	$ 582.629,00	$ 15.730.983,00

	8.19	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de switch triple y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metálica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería emt de 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(salida promedio de 4 m).	UND	5,00	$ 604.931,00	$ 3.024.655,00
Subtotal						**$ 156.545.879,00**
		LUMINARIAS				
	8.20	Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 60x60 40w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento	UND	111,00	$ 404.449,00	$ 44.893.839,00
	8.21	Suministro e instalación luminaria hermética tipo led de 2x18w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento	UND	24,00	$ 297.028,00	$ 7.128.672,00
	8.22	Suministro e instalación luminaria tipo panel circular led 12 w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento	UND	54,00	$ 159.208,00	$ 8.597.232,00
	8.23	Suministro e instalación luminaria de emergencia tipo led 10W. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento	UND	1,00	$ 501.925,00	$ 501.925,00
Subtotal						**$ 61.121.668,00**

9		**LUMINARIAS**				
	9.01	Limpieza general	M2	3.661,00	$ 2.469,00	$ 9.039.009,00
Subtotal						**$ 9.039.009,00**
10		**EMPRADIZACIÓN Y ZONAS VERDES**				
	10.01	suministro e instalación de grama verde natural	M2	540,83	$ 42.710,00	$ 23.098.849,00
	10.02	suministro y plantación de árboles H=1.5m	UND	8,00	$ 188.848,00	$ 1.510.784,00
	10.03	suministro y plantación de plantas para jardinería Nephrolepis cordifolia	UND	30,00	$ 83.238,00	$ 2.497.140,00
	10.04	suministro y plantación de croto rojo	UND	30,00	$ 80.684,00	$ 2.420.520,00
Subtotal						**$ 29.527.293,00**
11		**FACHADA**				
	11.01	Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 exterior, tres manos.	M2	453,41	$ 35.649,00	$ 16.163.613,00
	11.02	Suministro y aplicación a llana de estuco plástico acrílico tipo exterior	M2	453,41	$ 34.939,00	$ 15.841.692,00
	11.03	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparación de la superficie de apoyo	M	261,22	$ 112.327,00	$ 29.342.059,00
Subtotal						**$ 61.347.364,00**
12		**VENTILACION MECANICA**				
	12.01	Suministro e instalación de Aire tipo mini Split de 12,000BTU, Incluye tubería de cobre y todos los accesorios para su correcta instalación	UND	1,00	$ 5.080.648,00	$ 5.080.648,00
	12.02	Suministro e instalación de Aire tipo mini Split de 18,000BTU, Incluye tubería de cobre y todos los accesorios para su correcta instalación	UND	1,00	$ 5.804.169,00	$ 5.804.169,00

	12.03	Suministro e instalación de Aire tipo mini Split de 24,000BTU, Incluye tubería de cobre y todos los accesorios para su correcta instalación	UND	1,00	$ 6.123.369,00	$ 6.123.369,00
	12.04	Suministro e instalación de Extractor para baño de 34.6x34.6x11.6cm, incluye todos los accesorios para su correcta instalación.	UND	5,00	$ 811.640,00	$ 4.058.200,00
Subtotal					$ 0,00	**$ 21.066.386,00**
13		**DOTACION**				
		MOBILIARIO				
	13,01	Suministro de mueble superior para cocina de 0.40x1.20m	UND	2,00	$ 811.588,00	$ 1.623.176,00
	13,02	Suministro de silla fija interlocutora de paño	UND	10,00	$ 186.577,00	$ 1.865.770,00
	13,03	Suministro de mesa principal para sala de crisis de 24 puestos. 1.20 x 6.40m	UND	1,00	$ 2.244.236,00	$ 2.244.236,00
	13,04	Suministro de señalización institucional de 0.30m x 0.20m, en impresión digital plastificado sobre polietileno calibre 60, en alta resolución, incluye cinta doble faz para instalación, y sistemas de fijación en muro (tornillo y chazo en caso de ser necesario).	UND	34,00	$ 21.934,00	$ 745.756,00
	13,05	S/I aviso institucional de 2m x 0.70m con instalación. caja de luz en Coll rolled con anticorrosivo, iluminación interior, tubos t8 con regleta y fotocelda para encendido y apagado autom., impr. digital en panaflex a doble pasada a 1440 dpi de resol.,	UND	1,00	$ 2.145.259,00	$ 2.145.259,00
Subtotal						**$ 8.624.197,00**
		SUBTOTAL COSTOS DE OBRA				$2.701.191.082,00
		VALOR DOTACIÓN (INCLUYE IVA)				$ 8.624.197,00

		COMPONENTE PGIO				$ 40.426.683,00
		RETIE REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS				$ 8.500.000,00
		TRAMITE Y COMPENSACION AMBIENTAL				$3.500.000,00
		TRAMITE LICENCIA DE CONSTRUCCION				$ 2.517.502,00
		VALOR TOTAL PROYECTO				**$2.764.759.464,0**

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO

Las actividades acumuladas desarrolladas en el proyecto en el periodo comprendido entre el 07 de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2026, se describe a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
1,00	**ADECUACION DE AREAS EXISTENTES**			
	PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS			
1.01	Localización, Trazado y Replanteo	$ 6.280,00	3661,00	$ 22.991.080,00
1.02	Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante	$31.102,00	434,05	$ 13.499.823,00
1.03	Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado	$83.082,00	18,00	$ 1.495.476,00
1.04	Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado	$58.191,00	12,00	$ 698.292,00
1.05	Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro	$37.994,00	949,71	$ 36.083.282,00
1.06	Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	$58.191,00		$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
1.07	Retiro de pintura existente en zonas deterioradas	$ 6.410,00	1242,04	$ 7.961.476,00
1.08	Desmonte de instalaciones puntos eléctricos	$93.815,00	123,00	$ 11.539.245,00
1.09	Desmonte de puntos hidráulicos y sanitarios	$32.967,00		$ -
1.10	Mantenimiento de closed en mal estado	$ 432.486,00		$ -
1.11	Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye estructura de soporte en madera o metálica y retiro a sitio de disposicion autorizado	$29.012,00	736,10	$ 21.355.733,00
1.12	Limpieza de zonas verdes exteriores, incluye retiro de material vegetal	$25.567,00	614,86	$ 15.720.126,00
1.13	Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	$46.650,00		$ -
1.14	Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro	$24.737,00	197,63	$ 4.888.773,00
1.15	Demolición de redoblón existente. Incluye retiro de material escombro	$21.265,00	100,11	$ 2.128.839,00
1.16	Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro	$29.244,00	263,26	$ 7.698.775,00
1.17	Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	$32.967,00	17,28	$ 569.670,00
1.18	Demolición de columna Existente Garita . Incluye retiro de escombro	$ 770.717,00	4,00	$ 3.082.868,00
1.19	Desmonte y traslado planta eléctrica a sitio autorizado	$ 4.883.040,00		$ -
1.20	Excavación en material común. Incluye retiro de material sobrante	$35.829,00		$ -
1.21	Excavación manual en material común para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante	$20.634,00	492,42	$ 10.160.594,00
1.22	Suministro e instalación de geotextil para separación de suelos y capas granulares.	$14.722,00		$ -
1.23	Relleno en material seleccionado compactado	$ 170.777,00	159,85	$ 27.298.703,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
1.24	Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado	$ 187.376,00	167,94	$ 31.467.925,00
1.25	Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajón, recomendación geotecnista. Incluye compactación	$ 283.698,00		$ -
Subtotal				**$ 218.640.680,00**
2,00	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**			
2.01	Base en concreto pobre 2200 PSI, solado, espesor 5cm (bajo estructuras en concreto)	$ 764.387,00		$ -
2.02	Concreto de 3000 PSI para zapatas	$ 1.022.632,00		$ -
2.03	Viga de Cimentación en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m	$ 141.184,00	76,38	$ 10.783.634,00
2.04	Viga de cimentación para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m. Incluye refuerzo 4 varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm	$ 188.416,00	336,35	$ 63.373.722,00
2.05	Columnas de 0.25 mts x 0.25 mts en concreto de 21mpa (3000 psi)	$ 114.969,00	6,40	$ 735.802,00
2.06	Viga superior de 0.25 m x 0.30 m en concreto de 3000 PSI	$ 161.642,00		$ -
2.07	Concreto de 3000 PSI para viga canal e=10 cm. Incluye formaletas	$ 252.566,00		$ -
2.08	Levante de muro en bloque de arena - cemento vibrado de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero 1:4	$ 102.009,00	358,04	$ 36.523.302,00
2.09	Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior	$44.754,00	493,00	$ 22.063.722,00
2.10	Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	$ 131.128,00	239,76	$ 31.439.249,00
2.11	Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	$ 109.045,00	100,00	$ 10.904.500,00
2.12	Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	$ 114.091,00	125,70	$ 14.341.239,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
2.13	Meson en concreto de 3000 psi, ref. 3/8" @ 0.15 mts , incluye granito para placa de 0.08m, muro de apoyo enchapado y apoyo inferior	$ 455.738,00		$ -
2.14	Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, incluye malla electrosoldada XX-106	$ 167.772,00	322,99	$ 54.188.756,00
2.15	Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 15cm, incluye malla electrosoldada Malla XX-295, corte de juntas, sello dilatacion	$ 243.929,00		$ -
2.16	Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI (Plantilla con malla electrosoldada E= 0.15m y vigas 0.15 m x 0.20 m). Refuerzo 4D 3/8" Y estribos 1/4" @ 0.20m.	$ 244.442,00		$ -
2.17	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparacion de la superficie de apoyo	$ 112.327,00		$ -
2.18	Suministro, corte y figuracion de acero de refuerzo Fy=4,2 Mpa	$10.755,00		$ -
Subtotal				**$ 244.353.926,00**
3,00	**PISOS Y ENCHAPES**			
3.01	Suministro e instalación de enchape ceramico Duropiso Blanco Cara Única 0.51x0.51. Iincluye mortero de nivelacion de 4cm.	$ 165.557,00		$ -
3.02	Suministro e instalación de guarda escoba con enchape ceramico Duropiso Blanco	$56.166,00		$ -
3.03	Suministro e instalacion de enchape de piso ceramico fortaleza color blanco para baño 33,8 cm x 33,8 cm	$ 174.213,00		$ -
3,04	Suministro e instalacion de enchape ceramica 0.20x0.20 m blanco para pared, H=1.8m	$ 105.570,00		$ -
Subtotal				**$ -**
4,00	**CIELO RASO ESTUCO Y PINTURA**			
4.01	Suministro y aplicación a llana de estuco plastico acrilico tipo interior	$34.939,00		$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
4.02	Suministro y aplicación a llana de estuco plastico acrilico tipo exterior	$34.939,00		$ -
4.03	Suministro e instalacion de muro en drywall doble cara E/10cm	$ 232.055,00		$ -
4.04	Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 interior, tres manos.	$32.422,00		$ -
4.05	Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 exterior, tres manos.	$35.649,00		$ -
4.06	Suministro y aplicación de pintura epoxica, dos manos.	$85.686,00		$ -
4.07	Suministro e instalación de cielo raso en PVC incluye todos los accesorios para su correcta instalacion	$ 126.648,00		$ -
Subtotal				**$ -**
5,00	**CUBIERTA**			
5.01	Mortero de Nivelación de Placa de Cubierta e=2cm	$49.786,00		$ -
5.02	Impermeabilización de placas de cubierta con emulsión asfáltica y membrana Asfáltica	$ 146.866,00		$ -
5.03	Estructura para cubierta en acero estructural, Pintada con base anticorrosiva, acabado en esmalte y anclajes según diseño	$30.505,00	2225,95	$ 67.902.605,00
5.04	Suministro e instalación de cubierta en lamina termoacústica (incluye todos los accesorios para su correcta instalación)	$ 160.265,00	473,00	$ 75.805.345,00
Subtotal				**$ 143.707.950,00**
6,00	**CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA**			
6.01	suministro e instalacion de ventana tipo V-2 (2,0x1.20). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion.	$ 1.736.561,00		$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
6.02	suministro e instalacion de ventana tipo V-3 (2.17x1.20). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion.	$ 1.957.946,00		$ -
6.03	suministro e instalacion de ventana tipo V-4 (0.6x0.30). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion.	$ 455.466,00		$ -
6.04	suministro e instalacion de ventana tipo V-5 (1.50x1.20). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion.	$ 1.034.319,00		$ -
6.05	suministro e instalacion de ventana tipo V-7 (1,20x1,20). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion.	$ 885.359,00		$ -
6.06	suministro e instalacion de ventana tipo V-8 (1.20x4.00). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion.	$ 3.266.758,00		$ -
6.07	suministro e instalacion de puertas de 1.0x2.0 en madera prensada color negro. Según diseño	$ 1.013.039,00		$ -
6.08	Suministro e instalación de puerta tipo P2 (1.0X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática	$ 1.357.752,00		$ -
6.09	Suministro e instalación de puerta tipo P2 (1.2X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática	$ 1.506.712,00		$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
6.10	Suministro e instalación de puerta doble tipo P3 (2.0X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática	$ 2.366.897,00		$ -
6.11	Suministro e instalacion de puertas en acero inoxidable de 0.90x 1.50 para baños	$ 706.606,00		$ -
6.12	Sumnistro e instalación puerta de salida de residuos (h 3.0 x l 1.6) incluye el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas, diagonales, limpieza y pintura.	$ 4.079.602,00		$ -
6.13	Sumnistro e instalación puerta de acceso vehicular (h 3.5 x l 4.0) incluye el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas, diagonales, limpieza y pintura.	$ 7.876.185,00		$ -
Subtotal				$ -
7,00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS**			
	TUBERIAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE			
7.01	Suministro e instalación tubería de presión 1/2" PVC RDE 13.5, para soldar	$20.741,00		$ -
7.02	Suministro e instalación tubería de presión 3/4" PVC, RDE 21, para soldar	$20.713,00		$ -
7.03	Suministro e instalación tubería de presión 1" PVC, RDE 21, para soldar	$26.456,00		$ -
7.04	Suministro e instalación tubería de presión 1-1/4" PVC, RDE 21, para soldar	$31.163,00		$ -
7.05	Suministro e instalación tubería de presión 1 1/2" PVC, RDE 21, para soldar	$39.304,00		$ -
7.06	Suministro e instalación tubería de presión 2" PVC, RDE 21, para soldar	$51.716,00		$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
7.07	Suministro e instalacion de punto hidraulico	$54.177,00		$ -
7.08	Suministro e instalación de micromedidor 1/2" (Referencias aprobadas por el prestador de servicio)	$ 471.854,00		$ -
7.09	Suministro e instalación Valvula de registro 3/4", Incluye tapa registro 15x15cm	$60.565,00		$ -
7.10	Suministro e instalación Valvula de registro 1", Incluye tapa registro 15x15cm	$64.012,00		$ -
Subtotal				**$ -**
	TUBERIAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA			
7.11	Suministro e instalación tubería sanitaria 2" PVC, para soldar	$50.404,00	16,10	$ 811.504,00
7.12	Suministro e instalación tubería sanitaria 3" PVC, para soldar	$69.199,00		$ -
7.13	Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC, para soldar	$97.829,00	85,10	$ 8.325.248,00
7.14	Punto sanitario 2"	$73.856,00	10,00	$ 738.560,00
7.15	Punto sanitario 4"	$97.573,00	8,00	$ 780.584,00
7.16	Construccion de caja de inspeccion 60x60x100 cm	$ 932.209,00		$ -
Subtotal				**$10.655.896,00**
	APARATOS SANITARIOS			
7.17	Suministro e instalacion de sanitario institucional color blanco. Incluye accesorios para su correcta instalacion	$ 1.197.722,00		$ -
7.18	Suministro e instalacion de lavamano de sobreponer color blanco. Incluye abastos desagues y griferia tipo Push	$ 1.156.810,00		$ -
7.19	Suministro e instalacion de sanitario tipo fluxometro. Incluye fluxometro y todo lo necesario para su correcta instalacion	$ 2.847.511,00		$ -
7.20	Suministro e instalacion de lavamanos ADA o Similar	$ 1.200.435,00		$ -
7.21	Suministro e instalacion de lavaplatos empotar 150X52cm, en acero inoxidable. Incluye griferia	$ 865.338,00		$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
7.22	Suministro e instalacion de rejilla metalica de piso 2" para desague	$94.278,00		$ -
Subtotal				$ -
	AGUAS LLUVIAS			
7.23	Excavación en material comun. Incluye retiro de material sobrante	$35.829,00		$ -
7.24	Relleno en material seleccionado compactado	$ 178.607,00		$ -
7.25	Suministro e instalacion de Arena de rio E=5cm para cama de tuberia enterrada y registro aguas Lluvias	$ 208.300,00		$ -
7.26	Suministro e instalacion de tuberia 6" PVC corrugado para aguas lluvias. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalacion	$ 162.174,00		$ -
7.27	Su inistro e instalacion de tuberia 8" PVC Corrugado para aguas lluvias. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalacion	$ 152.504,00		$ -
7.28	Carcamo en concreto de 3000 PSI. Incluye B=0.20m. Incluye tapa en concreto prefabricado	$ 404.425,00		$ -
7.29	Cajas de registro para drenaje de aguas lluvias del patio principal en concreto de 21MPA, dimensiones 0.60x0.60x0.10 y acero de refuerzo de 3/8" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con rejilla en angulo 1 1/2" x 1/8"	$ 567.818,00		$ -
7.30	Caja de registro principal para captacion de aguas lluvias en concreto de 21MPA, dimensiones 2.5x2.5x2.6 y acero de refuerzo de 1/2" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con refuerzo 1/2" @ 0.20 E.A.S con tapa matalica.	$ 23.998.408,00		$ -
7.31	Caja de registro principal para llaves de concrol en concreto de 21MPA, dimensiones 1.5x1.65x1.10 y acero de refuerzo de 1/2" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con refuerzo 1/2" @ 0.20 E.A.S con tapa matalica.	$ 14.875.137,00		$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
7.32	Suministro e instalacion de canaletas de aguas lluvias según diseño en lamina galvanizada calibre 20, incluye pintura anticorrosiva y accesorios para el buen funcionamiento	$ 207.235,00		$ -
7.33	Suministro e instalacion de equipo de bombeo sumergible, Q=48L/S HDT=4.69m.c.a, en acero inoxidable, acoplada a motor sumergible monofasico 7.5 HP de 220 Volt. Incluye obra electrica ,niples, acoples, valvulas, pasamuro para su correcta instalacion y funcionamiento	$ 28.930.446,00		$ -
Subtotal				$ -
8,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
	ACOMETIDAS, GABINETES Y TABLEROS			
8.01	Suministro e instalacion de acometida Trifasica subterranea calbre 3X6F+1X6N+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4 " PVC. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia pvc 1 1/4, obra civil y demas accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento.	$ 206.852,00		$ -
8.02	Suministro e instalacion de acometida Trifasica subterranea calbre 3X8F+1#8N+1#10T cobre aislado DUCTO 1 " PVC. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia pvc 1 , obra civil y demas accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento.	$ 210.340,00		$ -
8.03	Suministro e instalacion de acometida Trifasica calbre 3X8F+1#8N+1#10T cobre aislado DUCTO 1 " EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia EMT 1, obra civil y demas accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento.	$ 200.306,00		$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
8.04	Suministro e instalacion de acometida Trifasica calbre 3X6F+1X6N+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4" EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia EMT 1 1/4, obra civil y demas accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento.	$ 236.539,00		$ -
8.05	Suministro e instalacion de acometida Trifasica calbre 3X4F+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4" EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia EMT 1 1/4, obra civil y demas accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento.	$ 249.967,00		$ -
Subtotal				**$ -**
	TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS, CAJAS DE REGISTRO			
8.06	Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de 30 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	$ 2.394.809,00		$ -
8.07	suministro e instalacion de tablero trifasico de 18 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	$ 1.714.888,00		$ -
8.08	suministro e instalacion de tablero trifasico de 12 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	$ 1.545.792,00		$ -
8.09	Suministro e instalacion de Breaker Enchufable 1X20A. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento.	$53.748,00		$ -
8.10	Suministro e instalacion de Breaker Enchufable 2X20A. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento.	$74.834,00		$ -
8.11	suministro e instalacion de cajas de registro en mamposteria de 0,60x0,60x0,80M NORMA RETIE	$ 1.580.112,00		$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
8.12	Suministro, transporte e instalacion de sistema puesta a tierra (Malla Electrica en B.T) en cable 2/0 AWG, con cuatro varillas 5/8" de cobre de 2.4 metros y cuadriculas. Incluye 6 colas, soldadura exotermica, obra civil.	$ 9.006.635,00		$ -
Subtotal				$ -
	SALIDA DE LUCES Y TOMA CORRIENTES			
8.13	Suministro e instalacion de salida para luminaria 110V normal con toma doble con polo a tierra 15A ref 5320 blanco, 125v y según norma nema 5 - 15R, certificacion retie y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 metalica, conectores de conexion y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia EMMT 1/2", conductores de cobre 12 libre de halogenos, obra civil y demas accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento (salida promedio de 8 m)	$ 466.870,00		$ -
8.14	Suministro e instalacion de materiales para salida electrica 110v normal con toma doble con polo a tierra 15A, ref 5320 blanco, 125v y según la norma nema 5-15R, certificacion retie y pruebas de conformidad ul. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 metalica conectores de conexion y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia EMT 1/2", conductores de cobre 12 libre de halogenos, obra civil, y demas accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. (salida promedio 8m)	$ 487.703,00		$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
8.15	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica 220v con toma mirada china con protección de falla a tierra, 30a, leviton, blanco, 220v y certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, con tapa suplemento, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia emt de 1/2", conductores de cobre 10 awg-cu-thhn/thwn-90°c, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio de 10 m).	$ 638.996,00		$ -
8.16	Suministro e instalacion de materiales para salida electrica 110v normal con toma doble GFCI con polo a tierra 15A, ref 5320 blanco, 125v y según la norma nema 5-15R, certificacion retie y pruebas de conformidad ul. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 metalica conectores de conexion y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia EMT 1/2", conductores de cobre 12 libre de halogenos, obra civil, y demas accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. (salida promedio 10m)	$ 742.241,00		$ -
8.17	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de swiche sencillo y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia emt de 1/2", conductores de cobre 12 libre de halogenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(salida promedio de 4 m).	$ 570.793,00		$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
8.18	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de swiche doble y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia emt de 1/2", conductores de cobre 12 libre de halogenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(salida promedio de 4 m).	$ 582.629,00		$ -
8.19	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de swiche triple y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tuberia emt de 1/2", conductores de cobre 12 libre de halogenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(salida promedio de 4 m).	$ 604.931,00		$ -
Subtotal				**$ -**
	LUMINARIAS			
8.20	Suministro e instalacion de luminaria led tipo panel 60x60 40w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	$ 404.449,00		$ -
8.21	Suministro e instalacion luminaria hermetica tipo led de 2x18w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	$ 297.028,00		$ -
8.22	Suministro e instalacion luminaria tipo panel circular led 12 w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	$ 159.208,00		$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
8.23	Suministro e instalacion luminaria de emergencia tipo led 10W. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	$ 501.925,00		$ -
Subtotal				$ -
9,00	**LIMPIEZA GENERAL**			
9.01	Limpieza general	$ 2.469,00		$ -
Subtotal				$ -
10,00	**EMPRADIZACIÓN Y ZONAS VERDES**			
10.01	suministro e instalacion de grama verde natural	$42.710,00		$ -
10.02	suministro y plantacion de arboles H=1.5m	$ 188.848,00		$ -
10.03	suministro y plantacion de plantas para jardineria Nephrolepis cordifolia	$83.238,00		$ -
10.04	suministro y plantacion de croto rojo	$80.684,00		$ -
Subtotal				$ -
11,00	**FACHADA**			
11.01	Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 exterior, tres manos.	$35.649,00		$ -
11.02	Suministro y aplicación a llana de estuco plastico acrilico tipo exterior	$34.939,00		$ -
11.03	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparacion de la superficie de apoyo	$ 112.327,00		$ -
Subtotal				$ -
12,00	**VENTILACION MECANICA**			
12.01	Suministro e instalacion de Aire tipo mini split de 12,000BTU, Inlcuye tuberia de cobre y todos los accesorios para su correcta instalacion	$ 5.080.648,00		$ -
12.02	Suministro e instalacion de Aire tipo mini split de 18,000BTU, Inlcuye tuberia de cobre y todos los accesorios para su correcta instalacion	$ 5.804.169,00		$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
12.03	Suministro e instalacion de Aire tipo mini split de 24,000BTU, Inlcuye tuberia de cobre y todos los accesorios para su correcta instalacion	$ 6.123.369,00		$ -
12.04	Suministro e instalación de Extractor para baño de 34.6x34.6x11.6cm, incluye todos los accesorios para su correcta instalacion.	$ 811.640,00		$ -
Subtotal				$ -
13,00	**DOTACION**			
	MOBILIARIO			
13,01	Suministro de mueble superior para cocina de 0.40x1.20m	$ 811.588,00		$ -
13,02	Suministro de silla fija interlocutora de paño	$ 186.577,00		$ -
13,03	Suministro de mesa principal para sala de crisis de 24 puestos. 1.20 x 6.40m	$ 2.244.236,00		$ -
13,04	Suministro de señalización institucional de 0.30m x 0.20m, en impresión digital plastificado sobre polietileno calibre 60, en alta resolución, incluye cinta doble faz para instalación, y sistemas de fijación en muro (tornillo y chazo en caso de ser necesario).	$21.934,00		$ -
13,05	S/I aviso institucional de 2m x 0.70m con instalación. caja de luz en coll rolled con anticorrosivo, iluminación interior, tubos t8 con regleta y fotocelda para encendido y apagado autom., impr. digital en panaflex a doble pasada a 1440 dpi de resol.,	$ 2.145.259,00		$ -
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**			
NP.01	Descapote manuel. Incluye retiro de material sobrante	$36.480,00	77,11	$ 2.812.973,00
NP.02	Demolición de enchapes. Incluye retiro de escombro	$13.256,00	201,00	$ 2.664.456,00
NP.03	Retiro de pañetes en mal estado. Incluye retiro de escombro	$24.524,00	252,10	$ 6.182.500,00
Subtotal				**$11.659.929,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VR TOTAL
	SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS			$ 629.018.381,00
	VALOR DOTACIÓN. INCLUYE IVA (19%)			$ -
	COMPONENTE PGIO			$ 20.213.341,50
	RETIE REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS			$ -
	TRAMITE Y COMPENSACION AMBIENTAL			$ -
	TRAMITE LICENCIA DE CONSTRUCCION			$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO			$ 649.231.723,00


5. INFORME DETALLADO DE OBRA

1. Localización, Trazado y Replanteo
2. Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante
3. Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado
4. Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado
5. Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro
6. Retiro de pintura existente en zonas deterioradas
7. Desmonte de instalaciones puntos eléctricos
8. Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye estructura de soporte en madera o metálica y retiro a sitio de disposición autorizado
9. Limpieza de zonas verdes exteriores, incluye retiro de material vegetal Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro
10. Demolición de redoblón existente. Incluye retiro de material escombro
11. Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro
12. Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado
13. Excavación manual en material común para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante
14. Relleno en material seleccionado compactado
15. Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado
16. Viga de Cimentación en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m

17. Viga de cimentación para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m. Incluye refuerzo 4 varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm
18. Levante de muro en bloque de arena - cemento vibrado de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero 1:4
19. Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior
20. Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm
21. Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm
22. Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm
23. Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, incluye malla electrosoldada XX-106
24. Estructura para cubierta en acero estructural, Pintada con base anticorrosiva, acabado en esmalte y anclajes según diseño
25. Suministro e instalación de cubierta en lamina termoacústica (incluye todos los accesorios para su correcta instalación)
26. Suministro e instalación tubería sanitaria 2" PVC, para soldar
27. Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC, para soldar
28. Punto sanitario 2"
29. Punto sanitario 4"
30. Descapote manual. Incluye retiro de material sobrante
31. Demolición de enchapes. Incluye retiro de escombro
32. Retiro de pañetes en mal estado. Incluye retiro de escombro
33. componente PGIO.

6. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PROYECTO

GRAFICO N.1 AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

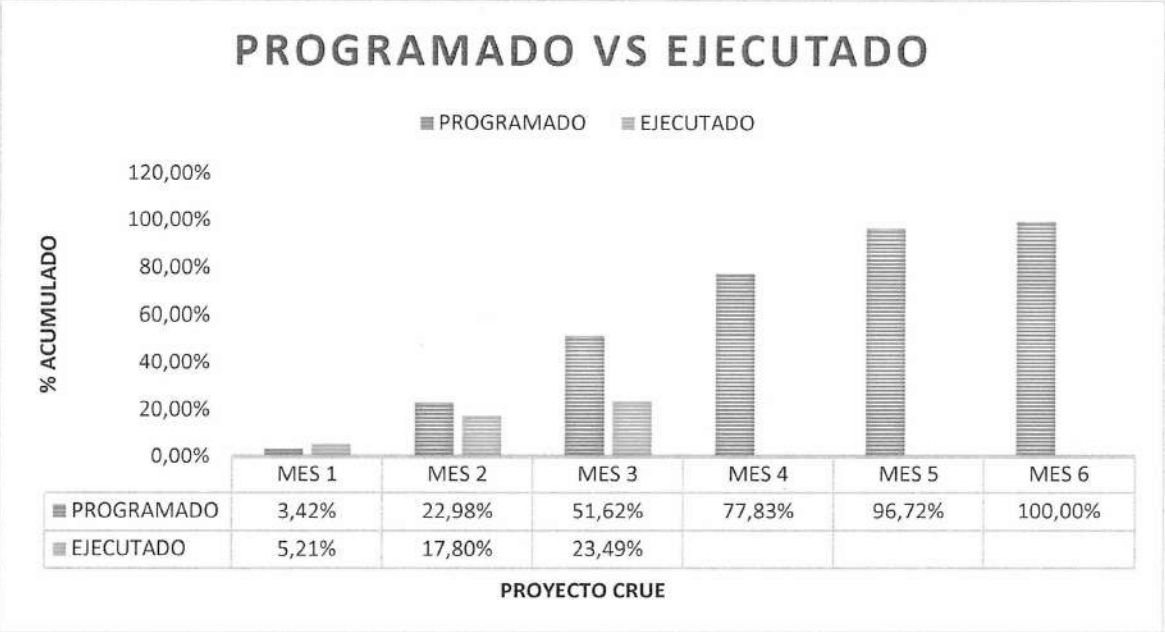

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
PROGRAMADO	3,42%	22,98%	51,62%	77,83%	96,72%	100,00%
EJECUTADO	5,21%	17,80%	23,49%			

GRAFICO N.2 CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO



En el periodo del 07 de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2026, el Contratista presenta una ejecución total de $ 649.441.998,09 equivalente a un 23,49% acumulado contra un programado acumulado de 51,62% equivalente a $ 1.427.168.835,32 del valor total del contrato de obra, lo que representa un atraso de $ 777.726.837,22 equivalente al 28,13% respecto al programa de inversiones vigente.

7. AVANCE EN TIEMPO

Hasta la fecha el contrato lleva un avance en tiempo de dos (02) meses con veintitrés (23) días de ejecución.

8. PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO

El contratista dispone del siguiente personal profesional y administrativo en obra, para la construcción del proyecto. El personal está descrito en la tabla a continuación:

Tabla N.5 . Personal profesional y administrativo en obra

No	CARGO	NOMBRE
1	Director de Obra	JESUS ORLANDO SANDOVAL ARCINIEGAS
1	Ingeniero Residente	CARMEN ANA GARCES NEGRETE
1	Especialista en Seguridad Industrial y/o salud ocupacional	MARÍA GONZÁLEZ AYUZ
1	Ing. Eléctrico	DANIEL JOSE CORRALES PATERNINA
1	Auxiliar administrativo	LISETH PAOLA CARDENAS FLOREZ

El contratista dispone del siguiente equipo en obra, para la construcción del proyecto:

Tabla N.6. Equipo y Herramienta en obra

EQUIPO	FRENTES	TOTAL
Equipo de Topografía (estación, nivel, GPS)	➢ Actividades dentro del área indicada para la ejecución del proyecto	1
Volquetas	➢ Recolección de escombros y material sobrante	1

Mezcladora de concreto	➢ Cimentaciones y elementos estructurales	1
Herramientas menores	➢ CRUE ➢ MALARIA	25

9. ESTADO DEL TIEMPO

En el periodo de ejecución del 07 de Junio al 30 de junio de 2026, predomino días soleado y se presentaron 04 días con lluvias.

10. CONTROL DE CALIDAD

Se realizaron muestras de concreto tomadas desde la ejecución de actividades como concreto de 3.000 PSI para viga de cimentación, viga cinta, viga dintel, columnetas de confinamiento y viga de andenes.

Ver anexo 01

11. PGIO (MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUATRIAL Y SALUD OCUPACIONAL)

Adoptando lo estipulado en el Plan de adaptación a la gestión ambiental aprobado para el contrato de Obra de acuerdo con el pliego de condiciones. En el que se analizan los temas de:

- Recolección, Transporte y Disposición de material.
- Manejo de Residuos Sólidos.
- Señalización de los frentes de trabajo.

De igual forma se hace seguimiento a los siguientes aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional, al cual se anexa evidencia de los mismos.

- Control de la señalización
- Listado de Maquinaria y Equipo
- Control de materiales
- Planilla de disposición de escombros
- Plan de acción para control riesgos

Para la implementación del Plan De Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional aprobado para el contrato de obra, se realiza seguimiento e

implementación al programa de higiene y seguridad industrial y de salud ocupacional en el que se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Señalización
- Afiliación al sistema de seguridad social
- Dotación y elementos de protección personal
- Tasa de accidentalidad
- Inducción, Capacitación y Entrenamiento

De igual forma se hace seguimiento a los siguientes aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional, al cual se anexa evidencia de los mismos.

- Señalización
- Valla informativa del proyecto
- Relación de trabajadores
- Certificado de Afiliación – ARL
- Planilla pagada de seguridad social
- Entrega de Dotación y EPP
- Registro asistencia a capacitaciones
- Orden y Aseo

La implementación y seguimiento de estos planes queda plasmada en los informes mensuales entregados para el componente ambiental, los de seguridad industrial y salud ocupacional a cargo del ing. María Inés González Ayuz.

Ver anexo 02 – PGIO

12. ASPECTO FINANCIERO

12.1. FORMA DE PAGO

1.- El Departamento de Córdoba cancelara el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1.-PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, con un avance mínimo del 20% de ejecución la primera acta; no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo, certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema

de seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar.

12.2 ACTAS PARCIALES DE OBRA

Se presenta acta parcial de obra N°1.

13. COMENTARIOS

- El contrato de obra N° SI-LP-011-2025, se suscribió entre el departamento de Córdoba y el **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**, contratista teniendo como fecha de acta de inicio el 07 de Abril de 2026, con un plazo de cinco (05) meses.
- El contratista mediante el oficio OF-CRVC-2026-046 con fecha del 26 de junio de 2026 Se tramitó y presentó el Plan de Contingencia del proyecto, como instrumento de gestión orientado a identificar, prever y mitigar los factores externos que han incidido en el desarrollo normal de las actividades, estableciendo las acciones y medidas necesarias para atender dichas situaciones y preservar el adecuado avance de la obra.
- Se tramitó ante la Interventoría el Balance de Obra No. 1 (Balance de Mayores y Menores Cantidades No. 1), el cual quedó debidamente avalado el día 16 de junio de 2026. Con este balance se dejó formalizada la revisión y ajuste de las cantidades de obra ejecutadas y proyectadas, garantizando la correspondencia entre lo contratado y lo efectivamente desarrollado en campo.
- Se presenta el Acta Parcial de Obra No. 1 por parte del Contratista, mediante la cual se relacionan las cantidades y actividades ejecutadas durante el periodo, para su respectiva revisión, aprobación y trámite ante la Entidad e Interventoría.
- El proyecto ha avanzado atendiendo los lineamientos técnicos y contractuales establecidos, en un contexto marcado por factores externos a la gestión de este Consorcio que han incidido en el ritmo de ejecución de algunas actividades. Las gestiones documentales adelantadas - Plan de Contingencia, Balance de Obra No. 1 y Acta Parcial de Obra No. 1, evidencian el compromiso del Contratista con la trazabilidad, el control y la transparencia en el desarrollo de la obra.

- Adelantar oportunamente la subsanaciones del trámite de la licencia de construcción, requerido para la intervención de la Sala de Crisis, con el propósito de habilitar las actividades asociadas y seguir evitando las afectaciones adicionales al cronograma.

MARIA ELENA RIVERA HOYOS
C.C 30.571.396 de Sahagún
REP. LEGAL CONSORCIO RED VITAL CORDOBA

ANEXOS

1.0 Ensayos de laboratorio
2.0 PGIO
3.0 Bitácora

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No. 1

Demolición de muro

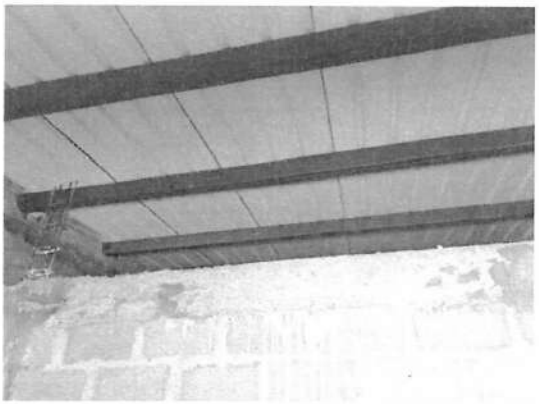


Foto No. 2

Instalación de estructura metálica para cubierta



Foto No. 3

Relleno de material seleccionado Tipo INVIAS



Foto No. 4

Relleno de material seleccionado Tipo INVIAS



Foto No. 5

Construcción de columnetas de confinamiento



Foto No. 6

Construcción de columnetas de confinamiento



Foto No. 7

Fundida de Viga de Cimentación



Foto No. 8

Fundida de Viga de andenes



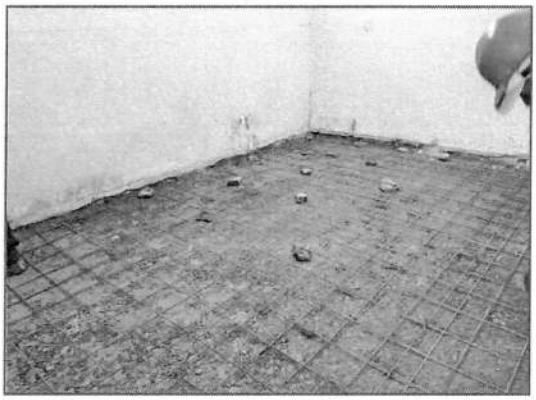
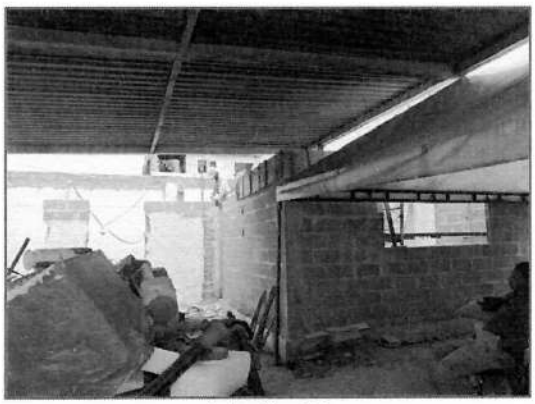


Foto No. 9 **Instalación de cubierta termoacústica**	**Foto No. 10** **Instalación de malla electrosoldada para fundir plantilla**
 **Foto No. 11** **Demolición de plantilla**	 **Foto No. 12** **Demolición de andenes frontales**
 **Foto No. 13** **Levante de muro del área del Crue**	 **Foto No. 14** **Fundida de vigas dintel**

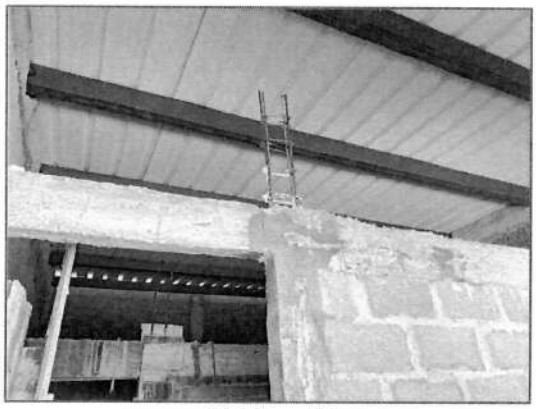


Foto No. 15

Instalación de cubierta área Malaria

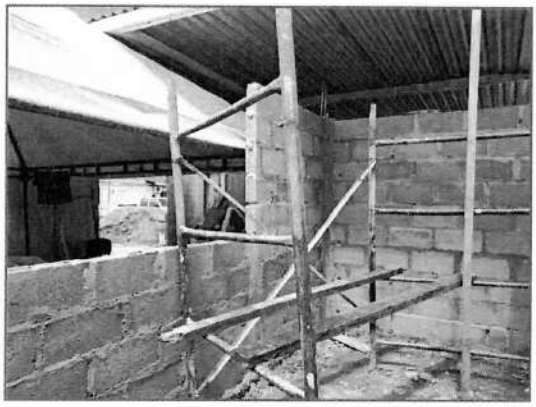


Foto No. 16

Levante de muro

1179

CONSORCIO
RED VITAL CORDOBA

BITACORA

Carrera 6 #62b-32 Oficina 618
Centro de Negocios Sexta Avenida
Monteria – Cordoba.

consorcioredvitaf@gmail.com

(604) 7812273
(+57) 315 4764499

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	08 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	1.0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se trabaja por ser festivo

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA	
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS	
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026	
FECHA:	09 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA: 0,2

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	LLUVIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

Localizacion, trazado y replanteo en zonas verdes exteriroes y parqueadero interno
desmonte de cielo raso existente en mal estado en areas de CRUE
Demolicion de plantilla existente en mal estado en areas existentes de parqueaderi interno en malaria
retiro de pintura existente en mal estado en areas de CRUE Y MALARIA
Desmonte de cubierta en mal estado en areas de CRUE
Limpieza de zonas verdes en areas exteriores CRUE
Demolicion de muro existente en mal estado en areas de CRUE
Demolicion de redoblon existente en mal estado en areas de CRUE
Demolicion de bordillo prefabricado existente en mal estado en areas exteriores de CRUE
excavacion para vigas de cimentacion en areas internas de CRUE

OBSERVACIONES

Se presentaron lluvias en horas de la tarde a partir de las 3:30 pm, las cuales impidieron la ejecucion de actividades.

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	10 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	03

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

Localizacion, trazado y replanteo en zonas verdes exteriroes y parqueadero interno
desmonte de cielo raso existente en mal estado en areas de CRUE
Demolicion de plantilla existente en mal estado en areas existentes de parqueaderi interno en malaria
retiro de pintura existente en mal estado en areas de CRUE Y MALARIA
Desmonte de cubierta en mal estado en areas de CRUE
Limpieza de zonas verdes en areas exteriores CRUE
Demolicion de muro existente en mal estado en areas de CRUE
Demolicion de redoblon existente en mal estado en areas de CRUE
Demolicion de bordillo prefabricado existente en mal estado en areas exteriores de CRUE
excavacion para vigas de cimentacion en areas internas de CRUE

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	11 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	0,4

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

Relleno con material seleccionado en areas internas de CRUE Y MALARIA
Relleno con material seleccionado tipo invias en zonas exteriores CRUE Y MALARIA
Vigas de cimentacion en concreto de 3,000 PSI de 0,25x0,30 en areas internas de CRUE
Viga de cimentacion para andenes de 0,20x0,35 en zonas exteriores MALARIA
columnas de 0,25x0,25 en area para planta electrica existente en MALARIA
Levante de muro en areas internas de CRUE Y MALARIA
Pañete en areas internas de MALARIA
Viga cinta en areas internas de Malaria
columnetas en areas internas de CRUE Y MALARIA
Dintel en areas internas de CRUE Y MALARIA

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

1184

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	12 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	0,5

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

Relleno con material seleccionado en areas internas de CRUE Y MALARIA
Relleno con material seleccionado tipo invias en zonas exteriores CRUE Y MALARIA
Vigas de cimentacion en concreto de 3.000 PSI de 0,25x0,30 en areas internas de CRUE
Viga de cimentacion para andenes de 0,20x0,35 en zonas exteriores MALARIA
columnas de 0,25x0,25 en area para planta electrica existente en MALARIA
Levante de muro en areas internas de CRUE Y MALARIA
Pañete en areas internas de MALARIA
Viga cinta en areas internas de Malaria
columnetas en areas internas de CRUE Y MALARIA
Dintel en areas internas de CRUE Y MALARIA

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	13 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	0,6

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:
Relleno con material seleccionado en areas internas de CRUE Y MALARIA
Relleno con material seleccionado tipo invias en zonas exteriores CRUE Y MALARIA
Vigas de cimentacion en concreto de 3,000 PSI de 0,25x0,30 en areas internas de CRUE
Viga de cimentacion para andenes de 0,20x0,35 en zonas exteriores MALARIA
columnas de 0,25x0,25 en area para planta electrica existente en MALARIA
Levante de muro en areas internas de CRUE Y MALARIA
Pañete en areas internas de MALARIA
Viga cinta en areas internas de Malaria
columnetas en areas internas de CRUE Y MALARIA
Dintel en areas internas de CRUE Y MALARIA
NOTA: Se trabaja hasta la 01:00pm por ser sabado

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	14 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	0,7

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES POR SER DOMINGO DIA DE DESCANSO

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	15 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	0,8

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se trabaja por ser festivo

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	16 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	0,9

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	LLUVIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

SEREALIZAN ACTIVIDADES DE:
Dintel en areas de CRUE y MALARIA
Plantilla de piso de 0,10cm y malla electrosoldada en areas de MALARIA
Estructura metalica para cubierta en areas de MALARIA
Descapote manual en areas exteriores para jardineras y zonas verdes de CRUE Y MALARIA
Demolicion de enchape enxistente en mal estado en areas de CRUE
Retiro de pañete en mal estado en areas internas de MALARIA

OBSERVACIONES

Se realiza comité en el cual participo, contratista de obra, contratista de interventoria y supervisores de la gobernacion de cordoba en el cual se acordo:
Aprobar tecnicamente en balance de obra No.01 (supervisor de la gobernacion e interventoria)
continual el traminte administrativo para la formalizacion del balance de obra No.01, acta de mayores y menores cantidades e items no previstos (Supervisor de la gobernacion)
Incorporar al expediente contractual toda documentacion soporte del balance de obra No.01 (contratista de obra e interventoria)

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

1189

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	17 DE DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	10,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
LLUVIAS	LLUVIOSO

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se realizan actividades por las lluvias presentadas que afectaron la realziacion normal de las actividades programadas.

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	18 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	11,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
LLUVIAS	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

SEREALIZAN ACTIVIDADES DE:
Dintel en areas de CRUE y MALARIA
Plantilla de piso de 0,10cm y malla electrosoldada en areas de MALARIA
Estructura metalica para cubierta en areas de MALARIA
Descapote manual en areas exteriores para jardineras y zonas verdes de CRUE Y MALARIA
Demolicion de enchape enxistente en mal estado en areas de CRUE
Retiro de pañete en mal estado en areas internas de MALARIA

OBSERVACIONES

Durante la ejecución de las actividades se identificaron fisuras en algunas paredes existentes del bloque del CRUE. En consecuencia, la interventoría solicita al contratista presentar un concepto técnico emitido por un profesional competente, con el fin de evaluar el origen y el estado de dichas fisuras y definir el procedimiento a seguir, así como el manejo y/o tratamiento más adecuado para su intervención.

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	19 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	12,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	LLUVIOSO

ACTIVIDADES REALIZADAS

SEREALIZAN ACTIVIDADES DE:

Dintel en areas de CRUE y MALARIA
Plantilla de piso de 0.10cm y malla electrosoldada en areas de MALARIA
Estructura metalica para cubierta en areas de MALARIA
Descapote manual en areas exteriores para jardineras y zonas verdes de CRUE Y MALARIA
Demolicion de enchape enxistente en mal estado en areas de CRUE
Retiro de pañete en mal estado en areas internas de MALARIA

OBSERVACIONES

Se presentaron lluvias fuertes a partir de las 4:15 pm las cuales impidieron la ejecucion de actividades.

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	20 DE DE JUNIO 2026	NUMERO DE PAGINA:	13,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

SEREALIZAN ACTIVIDADES DE:

Dintel en areas de CRUE y MALARIA
Plantilla de piso de 0,10cm y malla electrosoldada en areas de MALARIA
Estructura metalica para cubierta en areas de MALARIA
Descapote manual en areas exteriores para jardineras y zonas verdes de CRUE Y MALARIA
Demolicion de enchape enxistente en mal estado en areas de CRUE
Retiro de pañete en mal estado en areas internas de MALARIA
NOTA: se trabaja solo hasta la 01:00pm por ser sabado

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	21 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	14,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

No se trabaja por ser domingo dia de descanso.

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	22 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	15,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

Demolicion de plantilla existente en mal estado en areas de parqueadero interno en MALARIA
Pañete en areas internas de MALARIA
Plantilla en concreto de 3,000 PSI de 0,10cm de espesor y malla electrosoldada en areas internas de CRUE
Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC de 4" en area para baños y sala de necropsias en MALARIA

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	23 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	16,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

Demolicion de plantilla existente en mal estado en areas de parqueadero interno en MALARIA
Pañete en areas internas de MALARIA
Plantilla en concreto de 3,000 PSI de 0,10cm de espesor y malla electrosoldada en areas internas de CRUE
Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC de 2" en area para baños y sala de necropsias en MALARIA

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA **NIT: 9020223563**	**BITACORA DIARIA DE OBRA**	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	24 DE JUNIO DE 2026	**NUMERO DE PAGINA:**	17,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	**TARDE**
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

Demolicion de plantilla existente en mal estado en areas de parqueadero interno en MALARIA
Pañete en areas internas de MALARIA
Plantilla en concreto de 3,000 PSI de 0,10cm de espesor y malla electrosoldada en areas internas de CRUE
Excavacion para instalacion de tuberia sanitaria

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	**ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA**

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	25 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	18,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

Demolicion de plantilla existente en mal estado en areas de parqueadero interno en MALARIA

Pañete en areas internas de MALARIA

Plantilla en concreto de 3,000 PSI de 0,10cm de espesor y malla electrosoldada en areas internas de CRUE

Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC de 2" en area para baños y sala de necropsias en MALARIA

OBSERVACIONES

El contratista de obra asume el traslado de elementos y bombas de fumigar en mal estado en areas de CRUE ya que afectaban la realizacion normal de las actividades programadas y generan retrasos en las mismas

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	26 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	19,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
LLUVIOSO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

Demolicion de plantilla existente en mal estado en areas de parqueadero interno en MALARIA
Pañete en areas internas de MALARIA
Plantilla en concreto de 3,000 PSI de 0,10cm de espesor y malla electrosoldada en areas internas de CRUE
Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC de 2" en area para baños y sala de necropsias en MALARIA

OBSERVACIONES

El contratista de obra asume el traslado de elementos y bombas de fumigar en mal estado en areas de CRUE ya que afectaban la realizacion normal de las actividades programadas y generan retrasos en las mismas

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025		
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA		
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS		
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026		
FECHA:	27 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA:	20,0

ESTADO DEL TIEMPO	
MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE:

Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVC de 4" en area para baños y sala de necropsias en MALARIA
Suministro e instalacion de punto sanitario PVC de 2" en area para baños en MALARIA
Suministro e instalacion de punto sanitario PVC de 4" en area para baños en MALARIA
descapote manual en areas exteriores en jardineras y andenes de CRUE Y MALARIA
Demolicion de enchape existente en mal estado en areas internas de CRUE
Retiro de pañete en mal estado en areas internas de MALARIA

NOTA: SE TRABAJA HASTA LA 01:00PM POR SER SABADO

OBSERVACIONES

Los trabajadores siguen presentando molestias y mal estar por el olor que producen los venenos y las bombas de fumigar presentes en obra

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

1200

	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA NIT: 9020223563	BITACORA DIARIA DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No.	SI-LP-011-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA	
CONTARTISTA DE OBRA:	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS	
FECHA ACTA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026	
FECHA:	28 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE PAGINA: 21,0

ESTADO DEL TIEMPO

MAÑANA	TARDE
SOLEADO	SOLEADO

ACTIVIDADES REALIZADAS

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES POR SER DOMINGO DIA DE DESCANSO

OBSERVACIONES

NINGUNA

Carmen Garces N	María Luisa Laza V
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE	ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA

1201

CONSORCIO
RED VITAL CORDOBA

PGIO

Carrera 6 #62b-32 Oficina 618
Centro de Negocios Sexta Avenida
Monteria – Cordoba.

consorcioredvitaf@gmail.com

(604) 7812273
(+57) 315 4764499

1202

CONSORCIO RED VITAL CORDOBA	**INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE LA OBRA (CALIDAD Y SST)** **PERIODO N° 3: DEL 07 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

NOMBRE DEL PROYECTO:

"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

CONTRATISTA:

CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA

MUNICIPIO:

MONTERÍA

DEPARTAMENTO:

CÓRDOBA

I. INTRODUCCIÓN

En aras de asegurar al Contratante, GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, el cumplimiento de los requisitos asociados a la gestión de la Calidad y la Seguridad y Salud en el Trabajo, durante la ejecución del proceso de contratación **No. SI-LP-011-2025** con objeto **"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**. El **Consorcio Red Vital Córdoba** cuenta con el Plan de Gestión Integral de Obras del proyecto, teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de SST y Calidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Consorcio Red Vital Córdoba en cumplimiento de sus obligaciones en el marco del proceso de contratación **No. SI-LP-011-2025** con objeto **"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**, se elabora el presente informe de la gestión realizada durante el periodo del 07 de junio al 30 de junio del 2026, en el cual se soporta el estado de implementación de lo establecido en el PGIO.

II. OBJETIVO DEL PROYECTO

Describir en forma detallada el estado de la ejecución del proceso de contratación **No. SI-LP-011-2025** con objeto **"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**, y las obras establecidas dentro del alcance y meta física del mismo, atendiendo a los componentes de Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

III. ALCANCE DEL PLAN DE SST

El presente informe tiene como alcance describir las actividades ejecutadas relacionadas con los componentes de la implementación del Sistema Integrado de Gestión del proceso de contratación **No. SI-LP-011-2025** con objeto **"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**, durante el periodo del 07 de junio al 30 de junio del 2026.

IV. INFORMACIÓN DE PROYECTO

Tabla 1: Información General del proyecto

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	
Contratante:	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
Proceso de contratación:	No. SI-LP-011-2025
Objeto:	FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL,DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
Contratista:	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA
Representante Legal:	María Elena Rivera Hoyos
Dirección:	Cra. 6 # 6B – 32 Centro de Negocios Sexta Avenida B/ Castellana oficina 618
Teléfono:	3154764499
Correo electrónico:	Edificar.rym.sas@gmail.com
Plazo:	5 Meses

4.1. Localización del proyecto:

El proyecto se localiza en Montería - Córdoba, específicamente en la Cl. 42 #8-15, en instalaciones del CRUE CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

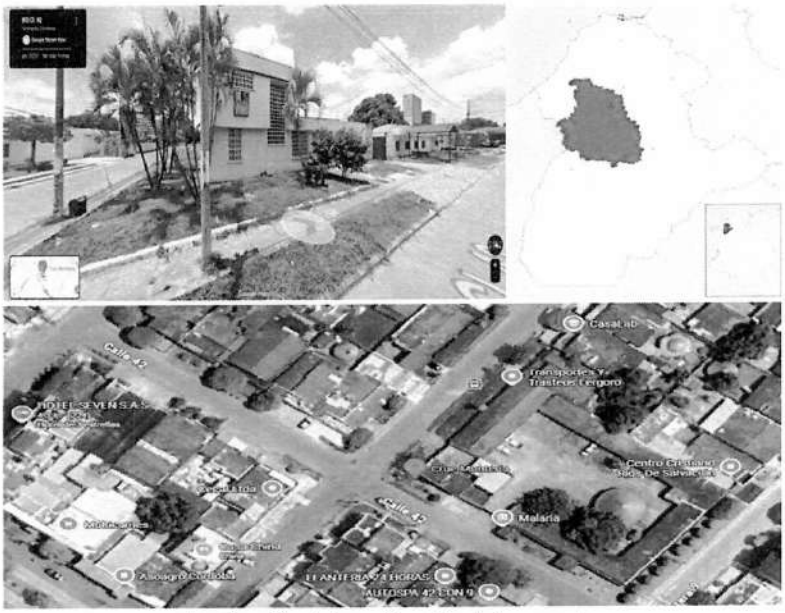


Ilustración 1. Localización del proyecto.
Fuente: Propia.

4.2. Actividades a desarrollar en el proyecto:

A continuación, se relacionan las actividades que serán ejecutadas como parte del alcance del proyecto.

Tabla 2: Actividades y cantidades de obra.

CÓDIGO EDT	CAPÍTULO	ACTIVIDAD
1.1	Gestión del Proyecto	Elaboración y aprobación del PGIO
1.2	Gestión del Proyecto	Programación del cronograma y ruta crítica
1.3	Gestión del Proyecto	Gestión documental del contrato
1.4	Gestión del Proyecto	Comunicaciones y coordinación técnica
1.5	Gestión del Proyecto	Gestión de compras y suministros
1.6	Gestión del Proyecto	Supervisión técnica y control de calidad
2.1	Preliminares y Demoliciones	Localización y replanteo del área
2.2	Preliminares y Demoliciones	Desmonte de cielo raso existente
2.3	Preliminares y Demoliciones	Desmonte de puertas
2.4	Preliminares y Demoliciones	Desmonte de ventanas
2.5	Preliminares y Demoliciones	Desmonte de aparatos sanitarios
2.6	Preliminares y Demoliciones	Desmonte de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias
2.7	Preliminares y Demoliciones	Demolición de andenes
2.8	Preliminares y Demoliciones	Demolición de plantillas
2.9	Preliminares y Demoliciones	Demolición de muros
2.10	Preliminares y Demoliciones	Demolición de bordillos y redoblones
2.11	Preliminares y Demoliciones	Excavación en tierra
2.12	Preliminares y Demoliciones	Relleno compactado
2.13	Preliminares y Demoliciones	Retiro y transporte de escombros
3.1	Estructura en Concreto	Construcción de zapatas aisladas
3.2	Estructura en Concreto	Construcción de vigas de cimentación
3.3	Estructura en Concreto	Construcción de columnas
3.4	Estructura en Concreto	Construcción de columnetas
3.5	Estructura en Concreto	Construcción de vigas superiores
3.6	Estructura en Concreto	Construcción de dinteles
3.7	Estructura en Concreto	Construcción de plantilla en concreto 10 cm
3.8	Estructura en Concreto	Construcción de plantilla en concreto 15 cm
3.9	Estructura en Concreto	Construcción de rampas en concreto
3.10	Estructura en Concreto	Instalación de bordillo prefabricado
3.11	Estructura en Concreto	Suministro y colocación de acero de refuerzo
4.1	Pisos y Enchapes	Instalación de enchape cerámico
4.2	Pisos y Enchapes	Instalación de guardaescobas
4.3	Pisos y Enchapes	Enchape de piso en baños
4.4	Pisos y Enchapes	Enchape de paredes
5.1	Cielorrasos, Estuco y Pintura	Aplicación de estuco plástico interior
5.2	Cielorrasos, Estuco y Pintura	Aplicación de estuco plástico exterior

5.3	Cielorrasos, Estuco y Pintura	Construcción de muros en drywall
5.4	Cielorrasos, Estuco y Pintura	Aplicación de pintura interior
5.5	Cielorrasos, Estuco y Pintura	Aplicación de pintura exterior
5.6	Cielorrasos, Estuco y Pintura	Aplicación de pintura epóxica
5.7	Cielorrasos, Estuco y Pintura	Instalación de cielorraso en PVC
6.1	Cubierta	Aplicación de mortero de nivelación
6.2	Cubierta	Instalación de impermeabilización
6.3	Cubierta	Construcción de estructura metálica de cubierta
6.4	Cubierta	Instalación de lámina termoacústica
7.1	Carpintería Metálica y Madera	Instalación de ventanas V2, V3, V4, V5, V7 y V8
7.2	Carpintería Metálica y Madera	Instalación de puertas en madera
7.3	Carpintería Metálica y Madera	Instalación de puertas metálicas P2 y P3
7.4	Carpintería Metálica y Madera	Instalación de puerta en acero inoxidable
7.5	Carpintería Metálica y Madera	Instalación de puerta de residuos
7.6	Carpintería Metálica y Madera	Instalación de puerta vehicular
8.1	Instalaciones Hidrosanitarias	Instalación de red de agua potable
8.2	Instalaciones Hidrosanitarias	Instalación de red sanitaria
8.3	Instalaciones Hidrosanitarias	Instalación de aparatos sanitarios
8.4	Instalaciones Hidrosanitarias	Instalación de lavaplatos
8.5	Instalaciones Hidrosanitarias	Construcción de cajas de inspección
9.1	Aguas Lluvias	Excavación y relleno para pluvial
9.2	Aguas Lluvias	Instalación de tubería corrugada 6" y 8"
9.3	Aguas Lluvias	Construcción de cárcamos
9.4	Aguas Lluvias	Instalación de cajas de registro
9.5	Aguas Lluvias	Instalación de canaletas
9.6	Aguas Lluvias	Instalación de bombas sumergibles
10.1	Instalaciones Eléctricas	Instalación de acometidas
10.2	Instalaciones Eléctricas	Instalación de tableros eléctricos
10.3	Instalaciones Eléctricas	Instalación de breakers
10.4	Instalaciones Eléctricas	Instalación del sistema de puesta a tierra
10.5	Instalaciones Eléctricas	Instalación de tomas 110 V
10.6	Instalaciones Eléctricas	Instalación de tomas 220 V
10.7	Instalaciones Eléctricas	Instalación de interruptores
10.8	Instalaciones Eléctricas	Instalación de luminarias
11.1	Limpieza General	Limpieza final de obra
12.1	Zonas Verdes	Siembra de grama
12.2	Zonas Verdes	Plantación de árboles
12.3	Zonas Verdes	Jardinería y adecuación de áreas verdes
13.1	Fachada	Aplicación de estuco exterior
13.2	Fachada	Aplicación de pintura exterior
13.3	Fachada	Instalación de bordillo prefabricado
14.1	Ventilación Mecánica	Instalación de minisplit 12.000 BTU
14.2	Ventilación Mecánica	Instalación de minisplit 18.000 BTU

14.3	Ventilación Mecánica	Instalación de minisplit 24.000 BTU
14.4	Ventilación Mecánica	Instalación de extractores de baño

V. VALOR ECONOMICO DEL CONTRATO DE OBRA

Se cuenta con el presupuesto de obra establecido para la ejecución del proyecto.

VI. INFORME ADMINISTRATIVO

Durante el periodo del 07 de junio al 30 de junio del 2026, se realizaron las siguientes actividades como parte de la gestión administrativa del proceso de contratación **No. SI-LP-011-2025.**

5.1. ACTUALIZACION DE POLIZAS

Se cuenta con póliza de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil, con respecto a la suscripción del contrato de obra y respecto a la suscripción de actas de inicio, reinicio y suspensión; aprobadas por parte de la entidad contratante.

VII. IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE LA OBRA

Con relación a la implementación de la gestión de obra (Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) para el periodo comprendido entre el 07 de junio al 30 de junio del 2026; se hace claridad que fueron ejecutadas las actividades de acuerdo con los cumplimientos exigidos en las especificaciones técnicas que cobija el proyecto.

A continuación, se relacionan las actividades implementadas en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo:

6.1. AFILIACIÓN DEL PERSONAL AL SGSS Y PAGO DE APORTES

En el anexo N°3 se encuentran los registros de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social del personal, teniendo en cuenta que los trabajadores que por sus responsabilidades están en obra afiliados a Riesgos Laborales en nivel de riesgo V. y el personal administrativo que no ejecuta sus funciones y responsabilidades en la obra afiliados al nivel de riesgo I.

Ver anexo N°3: Afiliaciones y planillas de pago de seguridad social.

6.2. MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA

Se realizó uso de la correspondencia como medio de comunicación para la entrega de la información requerida por la interventoría, la entidad y demás partes interesadas del proyecto.

6.3. INFORME FINANCIERO

Durante el período evaluado se ejecutaron y registraron en la bitácora de obra diversas actividades correspondientes a la fase inicial del proyecto, entre las que se destacan la localización y replanteo del área de

intervención, el desmonte de aparatos sanitarios, la demolición de andenes, plantillas, muros, bordillos y redoblones, la excavación manual, la ejecución de rellenos compactados, Retiro de material, la construcción de zapatas aisladas y vigas de cimentación, entre otras actividades contempladas en el alcance contractual.

6.3.1. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL PERIODO Y PORCENTAJE DE AVANCES FISICOS DE LA OBRA.

A fecha del 07 de junio al 30 de junio del 2026, se ejecutó un avance correspondiente a las actividades ejecutadas, implementación de gestión de obra.

Ver anexo N°1: Programación de obra.

6.4. POLITICAS, OBJETIVOS DE SST Y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Consorcio Red Vital Córdoba en cumplimiento de sus responsabilidades ante el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan de Calidad, estableció las siguientes políticas:

- Política de Calidad.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Política de prevención de acoso laboral .
- Política de trabajo seguro en alturas.
- Política de prevención y atención al acoso sexual y violencia basada en género.
- Política de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- Política de orden y limpieza.

Las Políticas se encuentran documentadas, firmadas por el representante legal.

Se cuenta con los objetivos de Seguridad y salud en el Trabajo alineados con las políticas, estos se encuentran documentados y firmados por el representante legal.

Además, teniendo en cuenta los riesgos priorizados se estableció un reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, el cual se encuentra documentado.

6.5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Se realizó la designación del profesional Ingeniero Especialista en SG-SST, Estableciéndose a la ingeniera María Inés González Ayuz identificada con cédula 1.067.836.657 de Montería quien tiene el cargo de Profesional Especialista SG-SST, cuenta con Licencia en Salud Ocupacional y el Curso Virtual de las 50 horas en SG-SST y su actualización de las 20 horas, el acta de designación fue aporratada en el anexo no. 4 del informe No. 1 de la gestión de obra.

Asimismo, se realizó la designación formal de la profesional/tecnóloga Liseth Paola Cardenas Florez identificada con C.C. Nº 1.003.046.257 quien asumirá las funciones de apoyo operativo en el área, el acta de designación fue aportada en el anexo no. 3 del informe No. 2 de la gestión de obra.

6.6. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Durante el período evaluado, se dio inicio a las actividades preparatorias para la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y del Comité de Convivencia Laboral. Sin embargo, con el propósito de garantizar una mayor participación del personal y asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el proceso de convocatoria y postulación de candidatos, estas actividades fueron reprogramadas y ajustadas en el cronograma del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

En consecuencia, el proceso de elección de los representantes, la conformación oficial de ambos comités y la suscripción de las actas de constitución se llevarán a cabo durante el mes de julio, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

6.7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

El Consorcio Red Vital Cordoba en cumplimiento de sus responsabilidades, suministró los recursos que fueron necesarios para la implementación del PGIO, establecido para el proceso de contratación **No. SI-LP-011-2025** con objeto **FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**.

6.7.1. RECURSO HUMANO

En el periodo evaluado se contó con un equipo de trabajo conformado por personal profesional, técnico y no calificado multidisciplinario, los cuales algunos fueron vinculados directamente por el Consorcio Red Vital Córdoba y otros como independientes o a través de contratistas.

Se presenta una relación del personal en el cual se especifica el tipo de vinculación y estado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social.

Todo el personal contratado en el periodo evaluado fue afiliado al Sistema General de Seguridad Social teniendo en cuenta que los trabajadores que por sus responsabilidades deban estar en obra están afiliados a Riesgos Laborales en nivel de riesgo V.

Ver anexo N°2. Listado de personal.
Ver anexo N°3. Afiliaciones y planillas de pago de seguridad social.

6.7.2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Para la realización de las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado se requirió de la utilización de herramientas y equipos, de los cuales se derivan peligros de origen mecánico y no mecánicos, e impactos sobre el ambiente laboral, por lo tanto, fueron identificados e inventariados para establecer las medidas de control necesarias para que no se materialicen los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ver anexo N°11. Listados e inventarios.

6.7.3. SUSTANCIAS QUÍMICAS

En el periodo evaluado se realizó el uso de sustancias químicas, las cuales fueron identificadas y almacenadas de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ficha de seguridad y procedimiento del Consorcio.

Ver anexo N°11. Listados e inventarios.

6.7.4. MATERIALES

Durante el periodo evaluado, se requirió la compra de materiales de subbase.

6.7.5. CAPACITACION, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

En aras de fomentar una cultura de autocuidado, estilos de vida saludables y que todo el personal conociera los riesgos a los cuales se encontraba expuesto, las medidas de control y sus responsabilidades con la implementación del PGIO, se realizó la inducción y reinducción a todos los trabajadores y la socialización de los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de Riesgos, de acuerdo a lo establecido en el programa de inducción y capacitaciones, además de notificar a los trabajadores de los riegos existentes derivados a las actividades a constructivas y el área de realización.

Ver anexo N°4. Inducción.
Ver Anexo N°5. Notificación de riesgo.
Ver Anexo N°8. Asistencia a capacitaciones.
Ver Anexo N°9. Evaluación de capacitaciones.
Ver Anexo N°26. Cronograma de capacitaciones.

6.8. COMUNICACIONES

Para garantizar la correcta comunicación durante la ejecución del proyecto en materia de SG-SST, se implementaron los siguientes mecanismos:

- Oficios.
- Espacios de interlocución (Comités, reuniones, capacitaciones).
- Teléfonos celulares.
- Pendones informativos.
- Comunicación directa verbal.
- Envío de correspondencia a través de correo electrónico y oficios físicos en el sitio de obra.

6.9. PLAN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Se tiene establecido un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencia para dar respuesta de manera rápida y efectiva ante cualquier situación de emergencia ocasionada por el hombre o por la naturaleza.

Además, se ha implementado las medidas para garantizar una adecuada atención frente a futuras situaciones de emergencias como:

- Se cuenta con kits de emergencias que están conformados por un botiquín dotado, camilla rígida y extintores. Estos kits se encuentran instalados e identificados para su fácil acceso, frente a una situación de emergencias.

- Se realizó inventario de la señalización en el periodo evaluado para llevar un control de la cantidad y estado de esta. de la señalización.
- Se realizaron inspecciones de seguridad a los elementos de los kits de emergencias y señalización para verificar el buen estado de los mismos.
- Se realizó una jornada de capacitación para los brigadistas y trabajadores en general.
- Se cuenta con el establecimiento de Plano de evacuación y la instalación de la señalización, según lo establecido en este.

Ver Anexo N°8. Asistencia a capacitaciones.
Ver Anexo N°9. Evaluación de capacitaciones.
Ver anexo N°10. Registro fotográfico.
Ver anexo N°19. Inspecciones de seguridad.

6.10. PLAN DE TRABAJO ANUAL

Durante el período evaluado, se elaboró y aprobó el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la vigencia 2026, estableciendo las actividades, responsables, recursos y cronograma de ejecución. Asimismo, se realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas, verificando su avance y efectuando los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el sistema.

Ver anexo N°25. Plan de trabajo anual SG-SST.

6.11. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y EVALUACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO.

Se realizó revisión de los requisitos legales y se actualizó la Matriz de Requisitos Legales con respecto a los cambios normativos aplicables.

6.12. INFORME DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Durante el periodo del 07 de junio al 30 de junio del 2026, se implementaron las medidas en Seguridad y Salud en el Trabajo y demás controles enmarcados en la legislación nacional vigente y, por ende, los establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con lo establecido en la Matriz de Requisitos Legales y el cronograma de actividades de SST.

6.12.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO

Se realizó una revisión y actualización a la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración del Riesgo teniendo en cuenta las actividades que se desarrollaron en el periodo y que están pendiente por ejecutar en el proyecto.

6.12.2. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

La actividad correspondiente al inicio del proceso de conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y del Comité de Convivencia Laboral se encontraba programada para el presente período. No obstante, con el fin de optimizar la ejecución del cronograma y garantizar una adecuada

participación de los trabajadores durante las etapas de convocatoria y postulación, la actividad fue reprogramada dentro del Plan de Trabajo Anual del SG-SST.
En consecuencia, la elección de los representantes, la conformación oficial de ambos comités y las respectivas actas de constitución se desarrollarán durante el mes de julio.

6.12.3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.

Con base en el resultado de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de las actividades que se ejecutan en el proyecto, se establecieron controles, y a partir de programas de trabajo del Sistema de Gestión de SST se estableció la forma en la que se implementarán tales controles y las demás actividades necesarias para el logro de los objetivos de SST. A continuación, se realiza una descripción de las actividades implementadas en el periodo por cada programa:

6.12.3.1. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD.

A continuación, se relacionan las actividades de seguridad y salud en el trabajo implementadas en obra, para dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Medicina Preventiva del Trabajo, Promoción y Prevención de la Salud.

- **Evaluaciones médicas y diagnóstico de condiciones de salud.**

Se cuenta con la realización por parte de un médico con Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, las evaluaciones médicas a los trabajadores que ingresaron al proyecto con el fin de identificar sus condiciones físicas para determinar la aptitud del trabajador para realizar las tareas asignadas.

- **Perfil Sociodemográfico**

Es importante conocer las características socio – culturales de la población trabajadora del proyecto, para un mejor conocimiento del Perfil Sociodemográfico de la organización y de los estilos de vida y de trabajo de los trabajadores. Esta información sirve para identificar la población más vulnerable a ciertos factores de riesgo, así como para establecer acciones y medidas preventivas y de control. Para ello, se aplicó la **FOR-013 Encuesta de Perfil sociodemográfico** a los trabajadores que ingresaron al proyecto durante el periodo, con el fin de obtener los datos asociados a las variables que determinan el perfil sociodemográfico:

- Población según tipo de vinculación y sexo.
- Población según grado de escolaridad.
- Edad.
- Estatura.
- Peso.
- Estado civil.
- Composición Familiar.
- Vivienda (propia o alquilada).
- Zona de residencia (Rural o urbana).
- Ingresos.
- Actividades económicas que realiza en el tiempo libre.
- Actividades deportivas que realiza en el tiempo libre.

A partir de la tabulación de la información de la encuesta aplicada se actualizó el perfil Sociodemográfico utilizando el formato **FOR-014 Perfil Sociodemográfico.**

Ver anexo N°6. Perfil sociodemográfico.

- **Análisis de ausentismo laboral**

Como medida de seguimiento y control del ausentismo en los trabajadores, se llevó un control del ausentismo utilizando el formato **FOR-015 Control de ausentismo,** en el cual se anota las causas del ausentismo para su análisis. En el periodo evaluado no se presentó ausentismo laboral.

Ver anexo N°12. Ausentismo laboral.

- **Primeros auxilios**

Se implementó el botiquín, como recurso básico para prestar los primeros auxilios, cuando ocurra repentinamente un accidente dentro de las instalaciones del proyecto, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención inicial oportuna y satisfactoria a las víctimas.

Durante el periodo no se requirió la utilización de los elementos del botiquín, por tal motivo no se presentaron salidas de los elementos del botiquín.

Ver Anexo N°10. Registro fotográfico.
Ver Anexo N°16. Control de salida de elementos del botiquín.
Ver Anexo N°19. Inspecciones de seguridad.

- **Autorreporte de Condiciones de Trabajo y Salud**

Se cuenta con una herramienta establecida para que todos los trabajadores y contratistas puedan notificar por escrito las condiciones adversas de seguridad y la salud que identifiquen en su lugar de trabajo, las cuales son el **PRO-013 Procedimiento para el autorreporte de condiciones de trabajo y salud**, y los siguientes formatos:

  - **FOR-020** Notificación de actos y condiciones inseguras.
  - **FOR-021** Control de Notificación de actos y condiciones inseguras.
  - **FOR-022** Autorreporte de condiciones de salud.
  - **FOR-023** Control de Autorreporte de condiciones de salud.

Sin embargo, en el periodo evaluado no se reportaron autorreportes de condiciones de salud ni notificaciones de actos y condiciones inseguras por parte del personal.

Ver Anexo N°17. Control de autorreporte de condiciones de salud.
Ver Anexo N°18. Actos y condiciones inseguras.

- **Manejo de sustancias químicas**

Se realizó la identificación de las sustancias químicas utilizadas durante el periodo. A partir de esta identificación se establecieron las directrices para el almacenamiento seguro de las mismas y la publicación de las fichas de seguridad.

Ver Anexo N°11. Listados e inventarios.
Ver Anexo N°19. Inspecciones de seguridad.

- **Campamento e Instalaciones sanitarias.**

  - Se cuenta con baños en la obra para el uso por parte de los trabajadores el cual disponen de suministro de agua potable y jabón.
  - El Consorcio cuenta con una bodega en buen estado de infraestructura para el almacenamiento de las sustancias químicas, materiales y herramientas de uso frecuente, con el fin de que estas cuenten con las medidas de almacenamientos adecuadas y conserven sus propiedades.

Teniendo en cuenta lo anterior para el periodo evaluado se realizaron las inspecciones de manejo de campamentos e instalaciones temporales, así como también, la inspección de almacenamiento de materiales y sustancias químicas

Ver Anexo N°19. Inspecciones de seguridad.

- **Sistema de vigilancia epidemiológica**

Durante la ejecución del proyecto se realizó la recolección y análisis de la información para identificar la necesidad de establecer Programas de Vigilancia Epidemiológica a riesgos específicos, a partir del seguimiento realizado a la información recolectada de la presencia de los riesgos y de casos, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la construcción del PVE.

Ver Anexo N°7. Cuestionario nórdico.

- **Investigación de enfermedades laborales**

Se realizó seguimiento al estado de salud de los trabajadores del Consorcio Red Vital Córdoba y hasta la fecha no se han reportado casos de presunta enfermedad laboral.

Ver Anexo N°13. Control de enfermedades laborales.

- **Seguimiento de Casos de salud Especiales**

Se realizó seguimiento a reportes de casos de salud especiales asociado a:

- Enfermedad laboral diagnosticada.
- Trabajadores con incapacidades mayores a 15 días.
- Trabajadores en proceso de calificación del origen de enfermedad.
- Trabajadores con recomendaciones médicas vigentes de origen común.
- Trabajadores en proceso de reintegro laboral.
- Accidentes de trabajo.

Durante el periodo evaluado no se han presentado casos de salud especial.

Ver Anexo N°15. Seguimiento a casos de salud especiales.

- **Medidas de prevención del riesgo de deshidratación.**

En aras de minimizar el riesgo de deshidratación producto de la exposición al sol, calor y las actividades, se establecieron puntos de hidratación debidamente señalizados para ser utilizados por los trabajadores durante las jornadas de trabajo.

Ver Anexo N°10. Registros fotográficos.

6.12.3.2. PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE Y CAPACITACIÓN

Como complemento del Programa de Medicina Preventiva, Promoción y Prevención de la Salud, se implementó las medidas establecidas en el Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludable y Capacitación, con el fin de disminuir los riesgos que se puedan derivar de las actividades diarias, aplicables en el periodo:

- Afiliación de los trabajadores al Sistema General de Seguridad Social.
- Durante el periodo evaluado no se realizó la programación de actividades presenciales con las EPS y ARL.
- Se socializó durante la inducción, la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, para sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos del consumo de tales sustancias tanto para su salud como para su desempeño laboral.
- Durante la ejecución del proyecto, no se identificó trabajadores que estuvieran trabajando bajo la influencia del alcohol o sustancias psicoactivas. Tampoco se identificaron trabajadores fumando en las áreas de trabajo.
- Pausas activas saludables con el fin de recuperar energía, concentración y ánimo, y prevenir lesiones por sobreesfuerzos o agotamiento físico y mental.

Ver anexo N°2. Listado personal.
Ver anexo N°3. Afiliaciones y planillas de pago de seguridad social.
Ver anexo N°4. Inducción.
Ver anexo N°10. Registro fotográfico.

- **Pausas activas saludable**

Como complemento al programa de medicina preventiva y del trabajo, y promoción del autocuidado, estilos de vida y trabajo saludable, se socializó a los trabajadores los ejercicios de pausas activas saludables. Así mismo, se realizan las pausas activas con la participación de los trabajadores independientemente del tipo de vinculación del Consorcio Red Vital Córdoba, con el fin de recuperar energía, concentración y ánimo, y así prevenir lesiones por sobreesfuerzos o agotamiento físico y mental.

Ver anexo N°10. Registro fotográfico.

6.12.3.3. PROGRAMA DE MEDICIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES

De acuerdo con la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos se identificó que dentro de las actividades del proyecto no existe alguna en la cual se haya identificado un riesgo físico con calificación alta (No aceptable o Aceptable con control) que impliquen mediciones ambientales periódicas como mecanismo de seguimiento y control de los riesgos.

6.12.3.4. PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Se realizaron las inspecciones a los puestos de trabajo según lo establecido en el Programa de Inspecciones, con el objetivo de realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad establecidas e identificar problemas asociados con:

- Condiciones de trabajo inseguras.
- Verificación del cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro.
- Fallas relacionadas con el desgaste de piezas, equipos, maquinas o daños generales que puedan generar una condición de peligro.
- Acciones inapropiadas en la forma como se realiza el trabajo y usos de los elementos de protección personal.
- Protección contra incendios (Extintores).
- Almacenamiento, orden y limpieza.

Las inspecciones de seguridad realizadas en el periodo fueron:

- Manejo de campamento e instalaciones temporales.
- Inspección de uso seguro de herramientas y equipos.
- Inspección de uso de EPP y dotación.
- Inspección de señalización.
- Inspección de orden y limpieza.
- Inspección de extintores.
- Inspección de almacenamiento de materiales.
- Inspección de almacenamiento seguro de sustancias químicas.
- Inspección preoperacional de volquetas.
- Inspección de trabajo seguro con volquetas.
- Inspección de trabajo seguro de tareas en caliente.
- Inspección de condiciones seguras para trabajo en altura.
- Análisis de trabajo seguro para trabajo en altura.
- Inspección de pre-uso de arnés.
- Inspección de escaleras.
- Entre otros.

Ver Anexo N°19. Inspecciones de seguridad

- **Normas de seguridad y operación – Procedimientos de trabajo seguro**

Se notificó a los trabajadores que ingresaron los riesgos a los que se encuentran expuestos de acuerdo con las actividades ejecutadas en el periodo evaluado, según lo establecido en la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo.

Además, se socializaron los procedimientos de trabajo seguro al personal nuevo que ingresó en el periodo evaluado, de acuerdo a las actividades a ejecutar en el proyecto. Esta socialización de los procedimientos de trabajo seguro se realizó en el proceso de inducción y como parte de las

capacitaciones programadas en materia de SST, con el fin de fortalecer los conocimientos para la implementación adecuada de las normas de seguridad relacionadas con las actividades constructivas propias.

Para la socialización a los trabajadores acerca de los riesgos a los que se encuentran se realizó la notificación de riesgos a los trabajadores que laboraron durante el periodo.

Ver anexo N°5. Notificación de riesgos.

- **Permiso de Trabajo Seguro**

Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades que implicaron la emisión de un permiso de trabajo seguro, por lo que se emitieron permisos de trabajo seguro correspondientes.

Ver anexo N°20. Permisos de trabajo seguro.
Ver anexo N°21. Certificados de curso de altura.

6.12.3.5. PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA

Se implementó la Metodología de las 5S, con el fin de efectuar las acciones y estrategias encaminadas a garantizar condiciones de trabajo seguras y un ambiente limpio y ordenado, verificando en cada etapa lo siguiente:

SEIRI (Clasificación y descarte)

En la obra, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se clasificaron y separaron los elementos necesarios y los que no son, con el fin de mantener solamente los elementos o herramientas que son de uso exclusivo para las actividades a desarrollar.
- Se definió un punto de acopio en el almacén para los elementos que fueron considerados necesarios, debidamente señalizados.
- Se estableció un punto para el acopio de las herramientas de mayor uso con el fin de que los trabajadores puedan acceder a ellas fácilmente y de manera segura.
- Se eliminaron los elementos que no tienen nada que ver con las actividades de obra a desarrollar con el fin de establecer un orden.
- Se eliminaron elementos que puedan afectar el funcionamiento de los equipos utilizados y que puedan ocasionar altos factores de riesgo para los trabajadores.
- Se estableció un kit ecológico para la segregación de los residuos generados en obra.

SEITON (Organización)

En la obra, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se cuenta con un inventario de herramientas y equipos para establecer la cantidad exacta con los que se cuenta para la ejecución de las actividades en obra.
- Se cuenta con un área destinada como almacén de materiales y herramientas ordenada y señalizada y que permite un fácil acceso a cada elemento, material o sustancia por parte del personal.

- Se cuenta con sitios segregados para la disposición de residuos.
- Se realizaba seguimiento a los trabajadores, luego de las actividades de obra con el objetivo de que cada elemento utilizado retornara a su lugar correspondiente.

SEISO (Limpieza)

En la obra, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Las áreas se encontraban libres de elementos o residuos que pudieran generar riesgos asociados a la salud y al bienestar de los trabajadores.
- Se realizaron jornadas diarias de orden y limpieza luego del desarrollo de las actividades de obra.
- Los trabajadores asumieron la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo y rutinario.
- Las herramientas, equipos y materiales utilizados en obra se encuentran en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades.

SEIKETSU (Higiene y visualización)

En cada la obra, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se ejecutaron limpiezas periódicas en las áreas de trabajo
- Se promovió y verificó el lavado, mantenimiento y correcto almacenamiento de las herramientas de trabajo al finalizar cada labor
- Se realizó la recolección y correcta disposición de los desechos y escombros generados en los puntos de acopio autorizados.

SHITSUKE (Compromiso y disciplina)

En cada uno de los frentes de obra, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se comenzó a generar una cultura de orden y limpieza en los trabajadores, con el objetivo de cumplir al máximo con las acciones establecidas a través de la sensibilización realizada en las charlas diarias de seguridad.
- Los trabajadores tienen autonomía en cuanto a la conservación del orden y limpieza en sus puestos de trabajo.
- Se realizaron inspecciones de Orden y Limpieza.

Ver Anexo N°10. Registro fotográfico.
Ver Anexo N°19. Inspecciones de seguridad.
Ver Anexo N°23. Conformación de la brigada de orden y limpieza.

6.12.3.6. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se estableció una Matriz de Elementos de Protección Personal mediante la cual se realizó la entrega de los elementos de protección personal requerido por cada uno de los trabajadores.

Se informó a los trabajadores de la responsabilidad y compromiso con el autocuidado y el uso adecuado de los elementos de protección personal suministrados.

Ver Anexo N°10. Registro fotográfico
Ver Anexo N°19. Inspecciones de seguridad
Ver Anexo N°22. Registro de entrega de EPP y dotación.

6.12.3.7. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN

Se realizó la instalación de la siguiente señalización:

- Uso obligatorio de arnés.
- Uso obligatorio del cubrebocas.
- Uso obligatorio de los EPP.
- Valla informativa.
- Punto ecológico.
- Peligro caída a distinto nivel.
- Camilla, botiquín y extintor.
- Almacenamiento del cemento.
- Prohibido fumar.
- Pausas activas.
- Delimitación de las áreas.

Ver anexo N°10. Registros fotográficos.
Ver Anexo N°19. Inspecciones de seguridad.

6.12.3.8. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Durante el periodo evaluado se implementaron las siguientes medidas de conformidad con lo establecido en el programa de mantenimiento:

- Se estableció en la obra el inventario de herramientas y equipos.
- Se definió el inventario de la maquinaria y volquetas utilizado y se verificó la documentación de esta.
- Se realizó la solicitud de la documentación de la volqueta con el fin de verificar que esta se encontrara al día, y fue suministrado por parte del subcontratista lo siguiente.

    - SOAT.
    - Certificado de revisión técnico – mecánica y de gases.
    - Licencia de tránsito.
    - Cédula del conductor.
    - Licencia de conducción del conductor.

Durante el periodo evaluado no se le realizaron mantenimientos preventivos y/o correctivos a la volqueta.

Ver Anexo N°24. Documentación de volquetas.

6.12.3.9. REPORTE, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE ACCIDENTES / INCIDENTES

Durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes de trabajo.

Ver Anexo N°14. Incidentes y accidentes de trabajo.

6.13. CALCULO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN

Se realizó el cálculo y análisis de los indicadores de gestión establecidos para hacer seguimiento al cumplimiento del PGIO.

Ver Anexo N°27. Indicadores de gestión.

Como constancia de lo anterior, firma.

María Inés González Ayuz.

María Inés González Ayuz
Ingeniera Especialista SG-SST

I. ANEXOS


ANEXO N°1. Programación de obra.
ANEXO N°2. Listado de personal.
ANEXO N°3. Afiliaciones y planillas de pago de seguridad social.
ANEXO N°4. Inducción.
ANEXO N°5. Notificación de riesgo.
ANEXO N°6. Perfil sociodemográfico.
ANEXO N°7. Cuestionario nórdico.
ANEXO N°8. Asistencia a capacitaciones.
ANEXO N°9. Evaluación de capacitaciones.
ANEXO N°10. Registros fotográficos.
ANEXO N°11. Listados e inventarios.
ANEXO N°12. Ausentismo laboral.
ANEXO N°13. Control de enfermedades laborales.
ANEXO N°14. Incidentes y accidentes de trabajo.
ANEXO N°15. Seguimiento a casos de salud especiales.
ANEXO N°16. Control de salidas de elementos del botiquín.
ANEXO N°17. Control de autorreporte de condiciones de salud.
ANEXO N°18. Actos y condiciones inseguras.
ANEXO N°19. Inspecciones de seguridad.
ANEXO N°20. Permisos de trabajo seguro.
ANEXO N°21. Certificados de curso de altura.
ANEXO N°22. Registro de entrega de EPP.
ANEXO N°23. Conformación de la brigada de orden y limpieza.
ANEXO N°24. Documentación de volquetas.
ANEXO N°25. Plan de trabajo SG-SST.
ANEXO N°26. Cronograma de capacitaciones.
ANEXO N°27. Indicadores de gestión.
ANEXO N°28. Subsanaciones.

ANEXO N°1.

PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA

SI-LP-011-2025

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA**	**118,75 días**	**lun 16/03/26**	**mar 18/08/26**		**$ 2.764.759.464,00**
2		INICIO	0 días	lun 16/03/26	lun 16/03/26		$ 0,00
3		**PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**113,38 días**	**lun 16/03/26**	**mar 11/08/26**		**$ 330.555.163,00**
4		Localizacion. Trazado y Replanteo	3 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26	2	$ 22.991.080,00
5		Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante	12 días	lun 16/03/26	mié 3/06/26	4CC	$ 31.097.335,00
6		Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	6 días	lun 16/03/26	vie 29/05/26	5CC	$ 3.987.936,00
7		Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	6 días	lun 16/03/26	sáb 30/05/26	6CC	$ 2.618.595,00
8		Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro	13 días	jue 19/03/26	mar 2/06/26	4	$ 92.385.830,00
9		Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	2 días	lun 16/03/26	mar 17/03/26	7CC	$ 465.528,00
10		Retiro de pintura existente en zonas deterioradas	5 días	jue 19/03/26	sáb 30/05/26	4	$ 20.123.234,00
11		Desmonte de instalaciones puntos eléctricos	5 días	jue 19/03/26	sáb 30/05/26	4	$ 14.166.065,00
12		Desmonte de puntos hidráulicos y sanitarios	2 días	lun 16/03/26	mar 17/03/26	9CC	$ 527.472,00
13		Mantenimiento de closed en mal estado	7 días	sáb 1/08/26	mar 11/08/26	65	$ 3.459.888,00
14		Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye entructura de soporte en madera o metalica y retiro a sitio de disposicion autorizado	15 días	lun 16/03/26	mié 3/06/26	5CC	$ 36.259.778,00
15		Limpieza de zonas verdes exteriores, incluye retiro de material vegetal	4 días	mar 12/05/26	vie 15/05/26	4CC	$ 14.390.386,00
16		Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	2 días	lun 16/03/26	mar 17/03/26	12CC	$ 373.200,00
17		Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro	6 días	jue 19/03/26	vie 27/03/26	8CC	$ 6.680.474,00
18		Demolición de redoblon existente. Incluye retiro de material escombro	6 días	lun 16/03/26	sáb 30/05/26	14CC	$ 4.690.208,00
19		Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro	4 días	mar 2/06/26	sáb 6/06/26	8	$ 8.107.314,00
20		Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado	1 día	mié 3/06/26	jue 4/06/26	5	$ 569.670,00
21		Demolicion de columna Existente Garita . Incluye retiro de escombro	4 días	jue 19/03/26	mié 25/03/26	17CC	$ 3.082.868,00
22		Desmonte y traslado planta electrica a sitio autorizado	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26	4	$ 4.883.040,00
23		Excavación en material comun. Incluye retiro de material sobrante	2 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26	172	$ 403.076,00
24		Excavación manual en material comun para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante	19 días	vie 8/05/26	lun 22/06/26	23	$ 7.655.833,00
25		Suministro e instalacion de geotextil para separacion de suelos y capas granulares.	4 días	mar 12/05/26	vie 15/05/26	24CC+2 días	$ 1.131.680,00
26		Relleno en material seleccionado compactado	5 días	sáb 16/05/26	sáb 23/05/26	25	$ 3.912.501,00
27		Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado	17 días	jue 19/03/26	mar 9/06/26	8CC	$ 45.562.348,00
28		Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajon, recomendación geotecnista. Incluye compactacion	2 días	vie 8/05/26	lun 11/05/26	23	$ 1.029.824,00
29		**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	**104,25 días**	**vie 27/03/26**	**mar 11/08/26**		**$ 727.781.044,00**

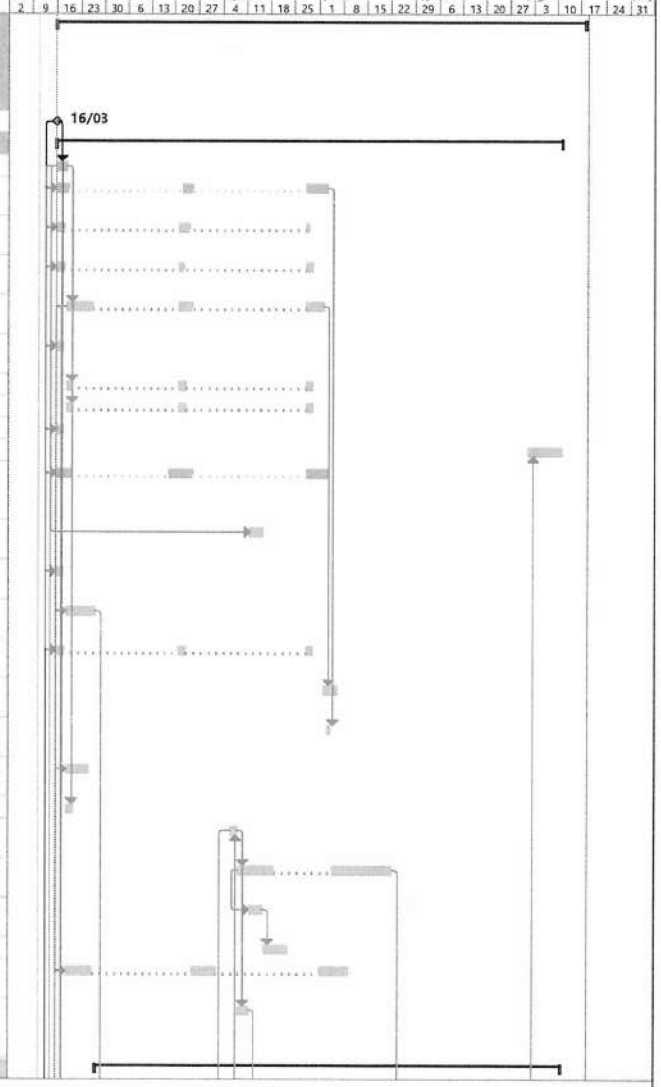


REPROGRAMACION DE OBRA

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

MARIA ELENA RIVERA HOYOS

2221

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
30		Base en concreto pobre 2200 PSI, solado, espesor 5cm (bajo estructuras en concreto)	1 día	mar 12/05/26	mar 12/05/26	28	$ 764.387,00
31		Concreto de 3000 PSI para zapatas	5 días	mié 13/05/26	mié 20/05/26	30	$ 2.454.317,00
32		Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m	5 días	mié 20/05/26	mar 26/05/26	31	$ 5.970.671,00
33		Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m. Incluye refuerzo 4 varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm	15 días	lun 22/06/26	sáb 11/07/26	24	$ 61.939.876,00
34		Columnas de 0.25 mts x 0.25 mts en concreto de 21mpa (3000 psi)	7 días	sáb 11/07/26	mar 21/07/26	33	$ 2.759.256,00
35		Viga superior de 0.25 m x 0.30 m en concreto de 3000 PSI	10 días	mar 21/07/26	lun 3/08/26	34	$ 5.285.693,00
36		Concreto de 3000 PSI para viga canal e=10 cm. Incluye formaletas	10 días	mar 21/07/26	lun 3/08/26	35CC	$ 851.147,00
37		Levante de muro en bloque de arena - cemento vibrado de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero	11 días	vie 27/03/26	mié 17/06/26	17	$ 28.326.879,00
38		Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior	5 días	vie 27/03/26	vie 12/06/26	37CC	$ 25.124.001,00
39		Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	4 días	jue 18/06/26	mar 23/06/26	37	$ 4.706.184,00
40		Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	4 días	jue 18/06/26	mar 23/06/26	37	$ 10.141.185,00
41		Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm	5 días	mar 23/06/26	mar 30/06/26	40	$ 8.364.011,00
42		Meson en concreto de 3000 psi, ref. 3/8" @ 0.15 mts , incluye granito para placa de 0.08m, muro de apoyo enchapado y apoyo inferior	5 días	vie 3/07/26	jue 9/07/26	43	$ 6.872.529,00
43		Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, incluye malla electrosoldada XX-106	30 días	lun 13/04/26	jue 2/07/26	8CC+5 días	$ 238.174.164,00
44		Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 15cm, incluye malla electrosoldada Malla XX-295, corte de juntas, sello dilatacion	30 días	lun 13/04/26	mar 28/07/26	27CC	$ 271.453.948,00
45		Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI (Plantilla con malla electrosoldada E= 0.15m y vigas 0.15 m x 0.20 m). Refuerzo 4D 3/8" Y estribos 1/4" @ 0.20m.	10 días	mié 29/07/26	mar 11/08/26	44	$ 8.443.027,00
46		Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparacion de la superficie de apoyo	15 días	vie 3/07/26	mié 22/07/26	43	$ 35.214.515,00
47		Suministro, corte y figuracion de acero de refuerzo Fy=4,2 Mpa	25 días	mar 12/05/26	vie 12/06/26	30CC	$ 10.935.254,00
48		**PISOS Y ENCHAPES**	**74 días**	**vie 24/04/26**	**mié 29/07/26**		**$ 222.970.244,00**
49		Suministro e instalación de enchape ceramico Duropiso Blanco Cara Única 0.51x0.51. Incluye mortero de nivelacion de 4cm.	30 días	vie 24/04/26	mar 28/07/26	43CC+10 días	$ 159.153.255,00
50		Suministro e instalación de guarda escoba con enchape ceramico Duropiso Blanco	30 días	vie 24/04/26	mié 29/07/26	49CC	$ 36.824.115,00
51		Suministro e instalacion de enchape de piso ceramico fortaleza color blanco para baño 33,8 cm x 33,8 cm	6 días	vie 24/04/26	vie 1/05/26	49CC	$ 9.384.854,00
52		Suministro e instalacion de enchape ceramica 0.20x0.20 m blanco para pared, H=1.8m	7 días	vie 1/05/26	sáb 9/05/26	51	$ 17.608.020,00
53		**CIELO RASO ESTUCO Y PINTURA**	**88,75 días**	**vie 24/04/26**	**mar 18/08/26**		**$ 191.628.422,00**
54		Suministro y aplicación a llana de estuco plastico acrilico tipo interior	15 días	jue 30/04/26	lun 27/07/26	49CC+5 días	$ 67.716.673,00
55		Suministro y aplicación a llana de estuco plastico acrilico tipo exterior	7 días	lun 27/07/26	mar 4/08/26	54	$ 16.757.094,00

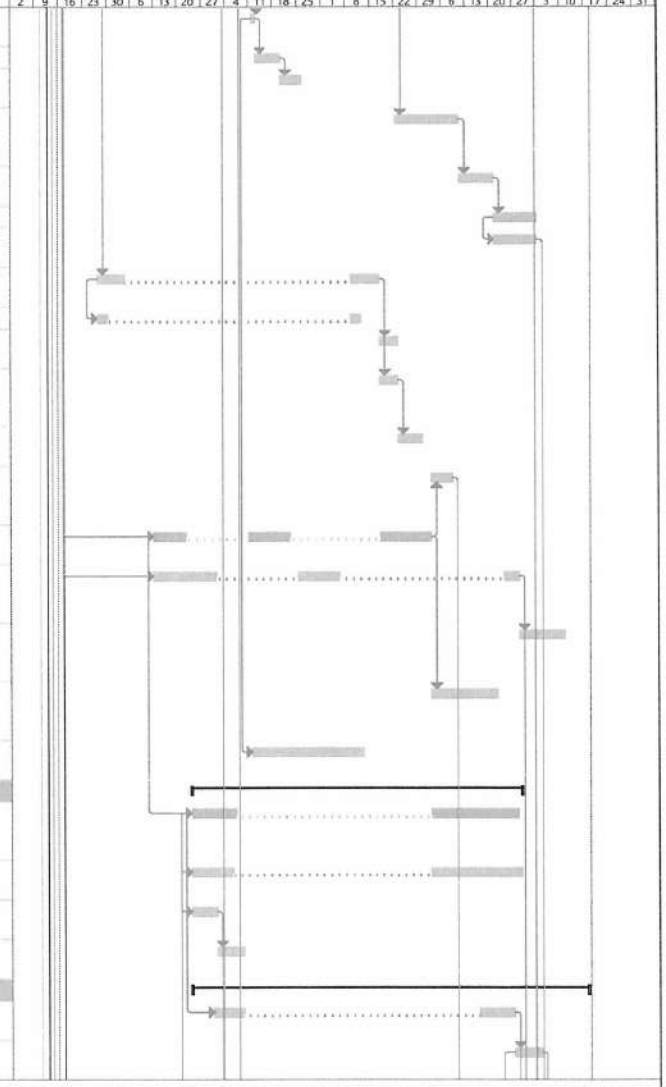

REPROGRAMACION DE OBRA


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

MARIA ELENA RIVERA HOYOS

723

SI-LP-011-2025

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
56		Suministro e instalacion de muro en drywall doble cara E/10cm	4 días	lun 27/07/26	vie 31/07/26	54	$ 14.554.490,00
57		Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 interior, tres manos.	14 días	vie 24/04/26	mar 18/08/26	49CC	$ 58.640.375,00
58		Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 exterior, tres manos.	4 días	mar 4/08/26	lun 10/08/26	55	$ 17.097.617,00
59		Suministro y aplicación de pintura epoxica, dos manos.	3 días	lun 27/07/26	jue 30/07/26	54	$ 11.094.623,00
60		Suministro e instalación de cielo raso en PVC incluye todos los accesorios para su correcta instalacion	5 días	sáb 1/08/26	sáb 8/08/26	65	$ 5.767.550,00
61		**CUBIERTA**	**90,25 días**	**lun 13/04/26**	**jue 6/08/26**		**$ 414.591.814,00**
62		Mortero de Nivelacion de Placa de Cubierta e=2cm	3 días	lun 3/08/26	jue 6/08/26	36	$ 4.658.974,00
63		Impermeabilizacion de placas de cubierta con emulsion asfaltica y membrana Asfaltica	2 días	lun 3/08/26	mié 5/08/26	62CC	$ 13.743.720,00
64		Estructura para cubierta en acero estructural, Pintada con base anticorrosiva, acabado en esmalte y anclajes según diseño	35 días	lun 13/04/26	vie 17/07/26	14CC+20 días	$ 233.668.605,00
65		Suministro e instalacion de cubierta en lamina termoacustica (incluye todos los accesorios para su correcta instalacion)	25 días	jue 30/04/26	sáb 1/08/26	64CC+15 días	$ 162.520.515,00
66		**CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA**	**82,5 días**	**lun 20/04/26**	**mar 4/08/26**		**$ 153.619.706,00**
67		Suministro e instalacion de ventana tipo V-2 (2,0x1.20). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion.	15 días	lun 20/04/26	jue 23/07/26	64CC	$ 34.731.220,00
68		Suministro e instalacion de ventana tipo V-3 (2.17x1.20). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion.	15 días	lun 20/04/26	mié 22/07/26	67CC	$ 31.327.136,00
69		Suministro e instalacion de ventana tipo V-4 (0.6x0.30). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion.	2 días	mié 22/07/26	vie 24/07/26	68	$ 3.188.262,00
70		suministro e instalacion de ventana tipo V-5 (1.50x1.20). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion.	10 días	mié 22/07/26	mar 4/08/26	69CC	$ 5.171.595,00
71		suministro e instalacion de ventana tipo V-7 (1.20x1.20). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion.	5 días	mié 22/07/26	mar 28/07/26	70CC	$ 2.656.077,00
72		suministro e instalacion de ventana tipo V-8 (1.20x4.00). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion.	5 días	mié 22/07/26	mar 28/07/26	71CC	$ 3.266.758,00
73		suministro e instalacion de puertas de 1.0x2.0 en madera prensada color negro. Según diseño	7 días	mié 22/07/26	jue 30/07/26	72CC	$ 13.169.507,00
74		Suministro e instalación de puerta tipo P2 (1.0X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática	10 días	mié 22/07/26	mar 4/08/26	73CC	$ 28.512.792,00

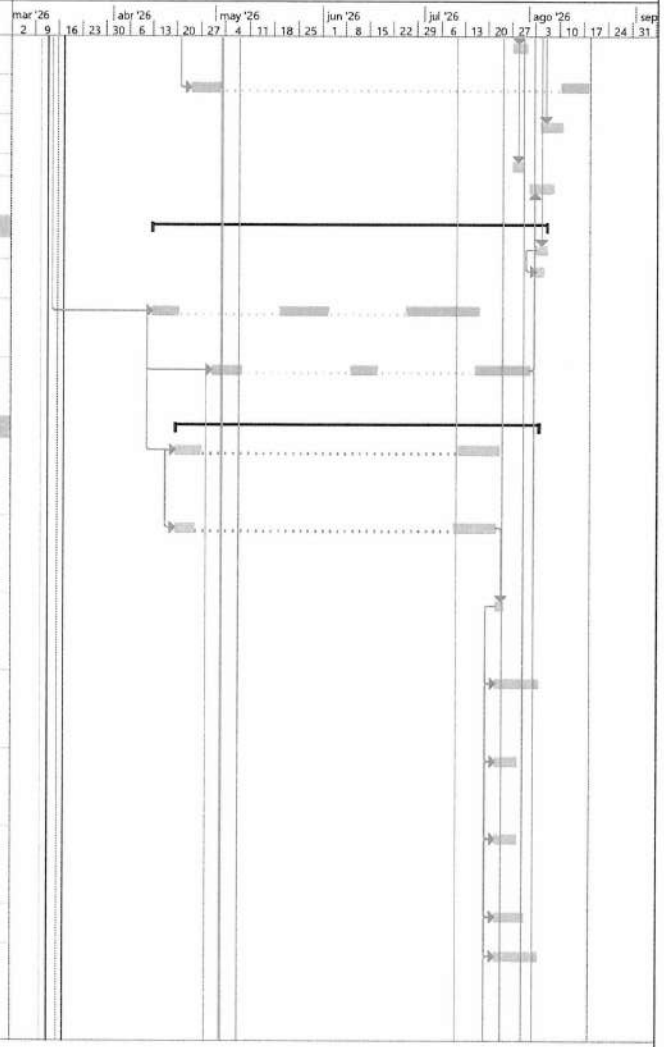

REPROGRAMACION DE OBRA


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

MARIA ELENA RIVERA HOYOS

R221

SI-LP-011-2025

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
75		Suministro e instalación de puerta tipo P2 (1.2X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática	2 días	mié 22/07/26	vie 24/07/26	74CC	$ 4.520.136,00
76		Suministro e instalación de puerta doble tipo P3 (2.0X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática	2 días	mié 22/07/26	vie 24/07/26	75CC	$ 9.467.588,00
77		Suministro e instalacion de puertas en acero inoxidable de 0.90x 1.50 para baños	3 días	mié 22/07/26	sáb 25/07/26	76CC	$ 5.652.848,00
78		Sumnistro e instalación puerta de salida de residuos (h 3.0 x l 1.6) incluye el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas, diagonales, limpieza y pin	2 días	mié 22/07/26	vie 24/07/26	77CC	$ 4.079.602,00
79		Sumnistro e instalación puerta de acceso vehicular (h 3.5 x l 4.0) incluye el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas, diagonales, limpieza y pintu	2 días	mié 22/07/26	vie 24/07/26	78CC	$ 7.876.185,00
80		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS**	**113,38 días**	**jue 19/03/26**	**vie 14/08/26**		**$ 235.312.070,00**
81		**TUBERIAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE**	**5 días**	**jue 19/03/26**	**jue 26/03/26**		**$ 10.674.022,00**
82		Suministro e instalación tubería de presión 1/2" PVC RDE 13.5, para soldar	3 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26	27CC	$ 59.319,00
83		Suministro e instalación tubería de presión 3/4" PVC, RDE 21, para soldar	3 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26	82CC	$ 311.109,00
84		Suministro e instalación tubería de presión 1" PVC, RDE 21, para soldar	3 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26	83CC	$ 2.628.933,00
85		Suministro e instalación tubería de presión 1-1/4" PVC, RDE 21, para soldar	3 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26	84CC	$ 52.977,00
86		Suministro e instalación tubería de presión 1 1/2" PVC, RDE 21, para soldar	3 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26	85CC	$ 1.812.700,00
87		Suministro e instalación tubería de presión 2" PVC, RDE 21, para soldar	3 días	jue 19/03/26	mar 24/03/26	86CC	$ 657.828,00
88		Suministro e instalacion de punto hidraulico	2 días	mar 24/03/26	jue 26/03/26	82	$ 2.167.080,00
89		Suministro e instalación de micromedidor 1/2" (Referencias aprobadas por el prestador de servicio)	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26	82CC	$ 471.854,00
90		Suministro e instalación Valvula de registro 3/4", Incluye tapa registro 15x15cm	1 día	jue 19/03/26	jue 19/03/26	83CC	$ 847.910,00
91		Suministro e instalación Valvula de registro 1", Incluye tapa registro 15x15cm	1 día	jue 19/03/26	jue 19/03/26	84CC	$ 1.664.312,00
92		**TUBERIAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA**	**5 días**	**mar 24/03/26**	**lun 30/03/26**		**$ 30.308.094,00**
93		Suministro e instalación tubería sanitaria 2" PVC, para soldar	2 días	mar 24/03/26	jue 26/03/26	82	$ 1.336.210,00
94		Suministro e instalación tubería sanitaria 3" PVC, para soldar	2 días	mar 24/03/26	jue 26/03/26	93CC	$ 453.945,00
95		Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC, para soldar	3 días	mar 24/03/26	vie 27/03/26	94CC	$ 14.705.655,00
96		Punto sanitario 2"	2 días	jue 26/03/26	sáb 28/03/26	93	$ 2.289.536,00
97		Punto sanitario 4"	2 días	vie 27/03/26	lun 30/03/26	95	$ 1.268.449,00
98		Construccion de caja de inspeccion 60x60x100 cm	5 días	mar 24/03/26	lun 30/03/26	93CC	$ 10.254.299,00

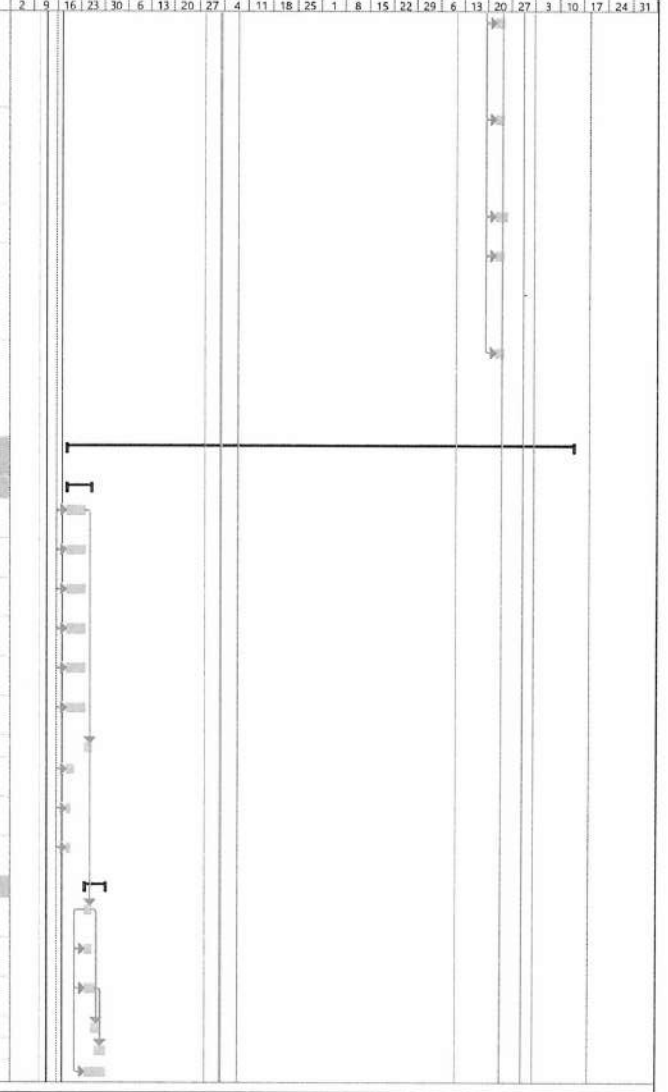

REPROGRAMACION DE OBRA


Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso

MARIA ELENA RIVERA HOYOS

125

SI-LP-011-2025

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
99		**APARATOS SANITARIOS**	**53,25 días**	**vie 1/05/26**	**vie 10/07/26**		**$ 36.964.488,00**
100		Suministro e instalacion de sanitario institucional color blanco. Incluye accesorios para su correcta	5 días	vie 1/05/26	jue 7/05/26	51	$ 10.779.498,00
101		Suministro e instalacion de lavamano de sobreponer color blanco. Incluye abastos desagues y griferia tipo Push	5 días	jue 7/05/26	mié 13/05/26	100	$ 15.038.530,00
102		Suministro e instalacion de sanitario tipo fluxometro. Incluye fluxometro y todo lo necesario para su correcta instalacion	2 días	vie 1/05/26	lun 4/05/26	100CC	$ 5.695.022,00
103		Suministro e instalacion de lavamanos ADA o Similar	2 días	vie 1/05/26	lun 4/05/26	102CC	$ 2.400.870,00
104		Suministro e instalacion de lavaplatos empotar 150X52cm, en acero inoxidable. Incluye griferia	1 día	jue 9/07/26	vie 10/07/26	42	$ 1.730.676,00
105		Suministro e instalacion de rejilla metalica de piso 2" para desague	1 día	vie 1/05/26	sáb 2/05/26	51	$ 1.319.892,00
106		**AGUAS LLUVIAS**	**76,38 días**	**mié 6/05/26**	**vie 14/08/26**		**$ 157.365.466,00**
107		Excavación en material comun. Incluye retiro de material sobrante	8 días	mié 6/05/26	vie 15/05/26	23CC	$ 2.868.111,00
108		Relleno en material seleccionado compactado	3 días	sáb 16/05/26	jue 21/05/26	107	$ 2.493.354,00
109		Suministro e instalacion de Arena de rio E=5cm para cama de tuberia enterrada y registro aguas Lluvias	2 días	sáb 16/05/26	mié 20/05/26	107	$ 726.967,00
110		Suministro e instalacion de tuberia 6" PVC corrugado para aguas lluvias. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalacion	4 días	mié 20/05/26	lun 25/05/26	109	$ 4.325.181,00
111		Su inistro e instalacion de tuberia 8" PVC Corrugado para aguas lluvias. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalacion	4 días	mié 20/05/26	lun 25/05/26	109	$ 11.735.183,00
112		Carcamo en concreto de 3000 PSI. Incluye B=0.20m. Incluye tapa en concreto prefabricado	10 días	sáb 16/05/26	vie 29/05/26	107	$ 6.976.331,00
113		Cajas de registro para drenaje de aguas lluvias del patio principal en concreto de 21MPA, dimensiones 0.60x0.60x0.10 y acero de refuerzo de 3/8" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con rejilla en angulo 1 1/2" x 1/8"	5 días	sáb 16/05/26	sáb 23/05/26	107	$ 3.406.908,00
114		Caja de registro principal para captacion de aguas lluvias en concreto de 21MPA, dimensiones 2.5x2.5x2.6 y acero de refuerzo de 1/2" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con refuerzo 1/2" @ 0.20 E.A.S con tapa matalica.	30 días	sáb 16/05/26	jue 25/06/26	113CC	$ 23.998.408,00
115		Caja de registro principal para llaves de concrol en concreto de 21MPA, dimensiones 1.5x1.65x1.10 y acero de refuerzo de 1/2" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con refuerzo 1/2" @ 0.20 E.A.S con tapa matalica.	30 días	sáb 16/05/26	jue 25/06/26	114CC	$ 14.875.137,00
116		Suministro e instalacion de canaletas de aguas lluvias según diseño en lamina galvanizada calibre 20, incluye pintura anticorrosiva y accesorios para el buen funcionamiento	10 días	sáb 1/08/26	vie 14/08/26	65	$ 28.098.994,00
117		Suministro e instalacion de equipo de bombeo sumergible, Q=48L/S HDT=4.69m.c.a, en acero inoxidable, acoplada a motor sumergible monofasico 7.5 HP de 220 Volt. Incluye obra electrica ,niples, acoples, valvulas, pasamuro para su correcta	7 días	jue 25/06/26	sáb 4/07/26	115;114	$ 57.860.892,00
118		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**80,75 días**	**lun 4/05/26**	**mar 18/08/26**		**$ 303.752.567,00**
119		**ACOMETIDAS, GABINETES Y TABLEROS**	**72,25 días**	**mié 6/05/26**	**lun 10/08/26**		**$ 50.935.538,00**

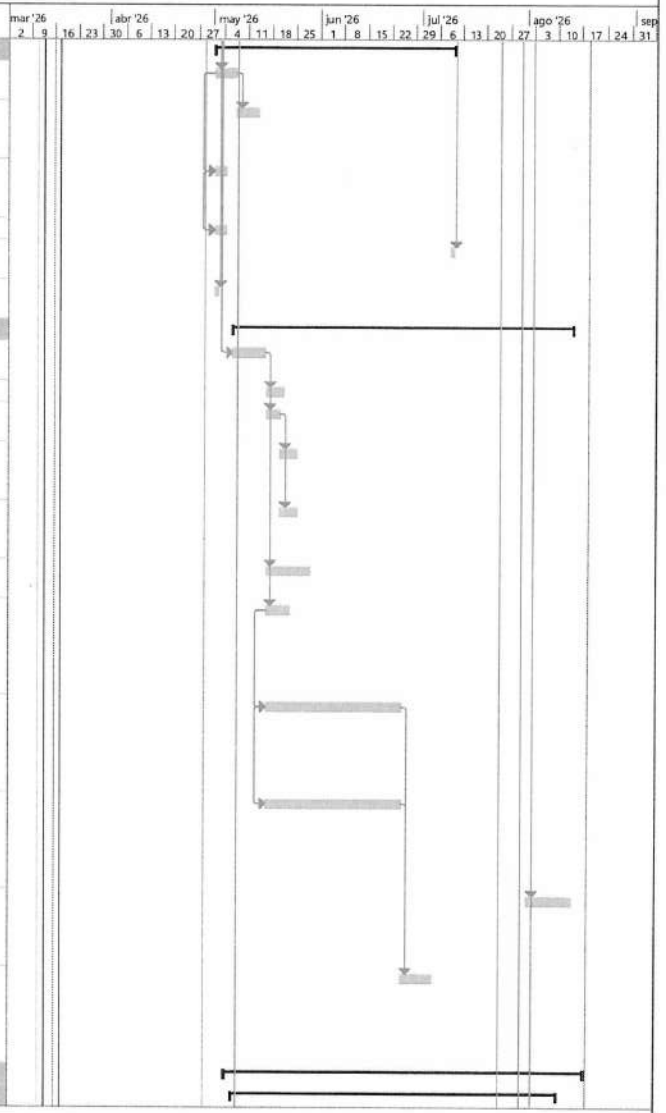


REPROGRAMACION DE OBRA

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

MARIA ELENA RIVERA HOYOS

9221

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
120		Suministro e instalacion de acometida Trifasica subterranea calbre 3X6F+1X6N+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4" PVC. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia pvc 1 1/4, obra civil y demas accesorio	12 días	mié 6/05/26	lun 10/08/26	65CC+5 días	$ 10.549.452,00
121		Suministro e instalacion de acometida Trifasica subterranea calbre 3X8F+1#8N+1#10T cobre aislado DUCTO 1" PVC. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia pvc 1 , obra civil y demas accesorios y	5 días	mié 6/05/26	mar 4/08/26	120CC	$ 11.148.020,00
122		Suministro e instalacion de acometida Trifasica calbre 3X8F+1#8N+1#10T cobre aislado DUCTO 1" EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia EMT 1, obra civil y demas accesorios y	5 días	mié 6/05/26	mar 4/08/26	121CC	$ 7.211.016,00
123		Suministro e instalacion de acometida Trifasica calbre 3X6F+1X6N+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4" EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia EMT 1 1/4, obra civil y demas accesorios y	5 días	mié 6/05/26	mar 4/08/26	122CC	$ 8.278.865,00
124		Suministro e instalacion de acometida Trifasica calbre 3X4F+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4" EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia EMT 1 1/4, obra civil y demas accesorios y elementos par	5 días	mié 6/05/26	mar 4/08/26	123CC	$ 13.748.185,00
125		**TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS, CAJAS DE REGISTRO**	**12 días**	**mié 6/05/26**	**vie 22/05/26**		**$ 35.149.482,00**
126		Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de 30 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	5 días	vie 15/05/26	vie 22/05/26	120CC+7 días	$ 7.184.427,00
127		suministro e instalacion de tablero trifasico de 18 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	5 días	vie 15/05/26	vie 22/05/26	126CC	$ 1.714.888,00
128		suministro e instalacion de tablero trifasico de 12 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	3 días	vie 15/05/26	mié 20/05/26	127CC	$ 3.091.584,00
129		Suministro e instalacion de Breaker Enchufable 1X20A. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento.	2 días	vie 15/05/26	mar 19/05/26	128CC	$ 6.933.492,00
130		Suministro e instalacion de Breaker Enchufable 2X20A. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento.	2 días	vie 15/05/26	mar 19/05/26	129CC	$ 898.008,00
131		suministro e instalacion de cajas de registro en mamposteria de 0,60x0.60x0.80M NORMA RETIE	7 días	mié 6/05/26	jue 14/05/26	120CC	$ 6.320.448,00
132		Suministro, transporte e instalacion de sistema puesta a tierra (Malla Electrica en B.T) en cable 2/0 AWG, con cuatro varillas 5/8" de cobre de 2.4 metros y cuadriculas. Incluye 6 colas, soldadura exotermica,	2 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26	120CC	$ 9.006.635,00
133		**SALIDA DE LUCES Y TOMA CORRIENTES**	**76 días**	**lun 4/05/26**	**mié 12/08/26**		**$ 156.545.879,00**
134		Suministro e instalacion de salida para luminaria 110V normal con toma doble con polo a tierra 15A ref 5320 blanco, 125v y según norma nema 5 - 15R, certificacion retie y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 metalica, conectores	15 días	lun 4/05/26	jue 6/08/26	65CC+3 días	$ 88.705.300,00

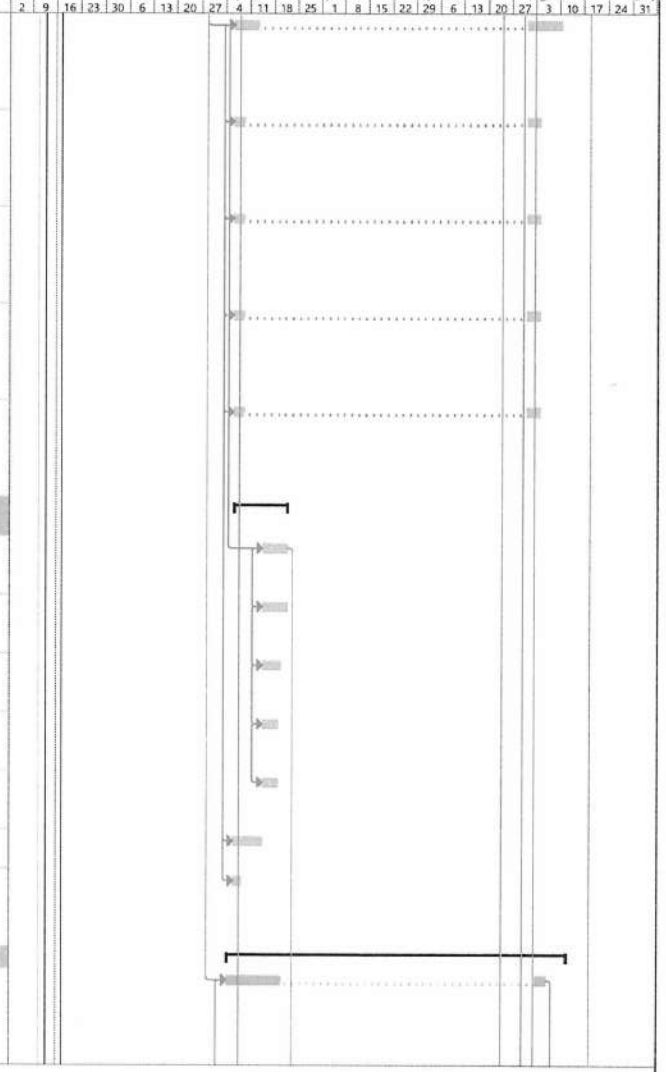

REPROGRAMACION DE OBRA


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

MARIA ELENA RIVERA HOYOS

1221

SI-LP-011-2025

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
135		Suministro e instalacion de materiales para salida electrica 110v normal con toma doble con polo a tierra 15A, ref 5320 blanco, 125v y según la norma nema 5-15R, certificacion retie y pruebas de conformidad ul. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2	15 días	lun 4/05/26	mar 11/08/26	134CC	$ 42.430.161,00
136		Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica 220v con toma mirada china con protección de falla a tierra, 30a, leviton, blanco, 220v y certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica	5 días	lun 4/05/26	sáb 9/05/26	135CC	$ 1.916.988,00
137		Suministro e instalacion de materiales para salida electrica 110v normal con toma doble GFCI con polo a tierra 15A, ref 5320 blanco, 125v y según la norma nema 5-15R, certificacion retie y pruebas de conformidad ul. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26	136CC	$ 742.241,00
138		Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de swiche sencillo y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de conexión y empalme, adaptadores	7 días	lun 4/05/26	mar 12/05/26	137CC	$ 3.995.551,00
139		Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de swiche doble y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de conexión y empalme, adaptadores	12 días	lun 4/05/26	mié 12/08/26	138CC	$ 15.730.983,00
140		Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de swiche triple y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de conexión y empalme, adaptadores	5 días	lun 4/05/26	sáb 9/05/26	139CC	$ 3.024.655,00
141		**LUMINARIAS**	**80,75 días**	**lun 4/05/26**	**mar 18/08/26**		**$ 61.121.668,00**
142		Suministro e instalacion de luminaria led tipo panel 60x60 40w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	6 días	lun 4/05/26	mar 18/08/26	134CC	$ 44.893.839,00
143		Suministro e instalacion luminaria hermetica tipo led de 2x18w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	134	$ 7.128.672,00
144		Suministro e instalacion luminaria tipo panel circular led 12 w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	3 días	jue 6/08/26	mar 11/08/26	134	$ 8.597.232,00
145		Suministro e instalacion luminaria de emergencia tipo led 10W. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento	1 día	jue 6/08/26	sáb 8/08/26	134	$ 501.925,00
146		**LIMPIEZA GENERAL**	**2 días**	**vie 14/08/26**	**lun 17/08/26**		**$ 9.039.009,00**
147		Limpieza general	2 días	vie 14/08/26	lun 17/08/26	168	$ 9.039.009,00
148		**EMPRADIZACIÓN Y ZONAS VERDES**	**4 días**	**mar 11/08/26**	**sáb 15/08/26**		**$ 29.527.293,00**
149		suministro e instalacion de grama verde natural	4 días	mar 11/08/26	sáb 15/08/26	156	$ 23.098.849,00
150		suministro y plantacion de arboles H=1.5m	2 días	mar 11/08/26	jue 13/08/26	149CC	$ 1.510.784,00
151		suministro y plantacion de plantas para jardineria Nephrolepis cordifolia	3 días	mar 11/08/26	vie 14/08/26	150CC	$ 2.497.140,00
152		suministro y plantacion de croto rojo	3 días	mar 11/08/26	vie 14/08/26	151CC	$ 2.420.520,00
153		**FACHADA**	**15 días**	**lun 27/07/26**	**vie 14/08/26**		**$ 61.347.364,00**
154		Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 exterior, tres manos.	5 días	lun 10/08/26	vie 14/08/26	155	$ 16.163.613,00

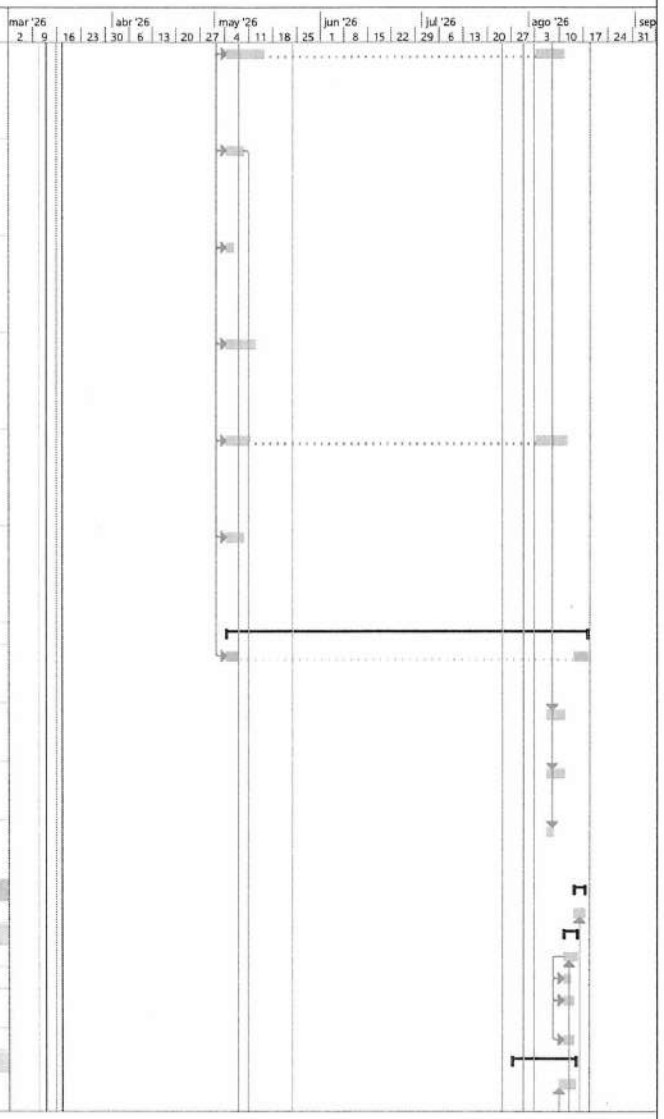

REPROGRAMACION DE OBRA


Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso

MARIA ELENA RIVERA HOYOS

8221

SI-LP-011-2025

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
155		Suministro y aplicación a llana de estuco plastico acrilico tipo exterior	10 días	lun 27/07/26	sáb 8/08/26	55CC	$ 15.841.692,00
156		Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparacion de la superficie de apoyo	10 días	mié 29/07/26	mar 11/08/26	44	$ 29.342.059,00
157		**DOTACION**	73,38 días	lun 11/05/26	vie 14/08/26		$ 29.690.583,00
158		**VENTILACION MECANICA**	5 días	lun 11/05/26	vie 15/05/26		$ 21.066.386,00
159		Suministro e instalacion de Aire tipo mini split de 12,000BTU, Inlcuye tuberia de cobre y todos los accesorios para su correcta instalacion	5 días	lun 11/05/26	vie 15/05/26	136	$ 5.080.648,00
160		Suministro e instalacion de Aire tipo mini split de 18,000BTU, Inlcuye tuberia de cobre y todos los accesorios para su correcta instalacion	5 días	lun 11/05/26	vie 15/05/26	159CC	$ 5.804.169,00
161		Suministro e instalacion de Aire tipo mini split de 24,000BTU, Inlcuye tuberia de cobre y todos los accesorios para su correcta instalacion	5 días	lun 11/05/26	vie 15/05/26	160CC	$ 6.123.369,00
162		Suministro e instalacion de Extractor para baño de 34.6x34.6x11.6cm, incluye todos los accesorios para su correcta instalacion.	1 día	lun 11/05/26	lun 11/05/26	161CC	$ 4.058.200,00
163		**MOBILIARIO**	10 días	sáb 1/08/26	vie 14/08/26		$ 8.624.197,00
164		suministro e instalacion de mueble superior para cocina de 0.40x1.20	2 días	sáb 1/08/26	mar 4/08/26	65	$ 1.623.176,00
165		suministro e instalacion de silla fija interlocutora de pañ	3 días	sáb 1/08/26	mié 5/08/26	164CC	$ 1.865.770,00
166		suministro e instalacion mesa principal para auditorio y sala de crisis	1 día	sáb 1/08/26	lun 3/08/26	165CC	$ 2.244.236,00
167		S/I señalización institucional de 0.30m x 0.20m, en impresión digital plastificado sobre polietileno calibre 60, en alta resolución, incluye cinta doble faz para instalación, y sistemas de fijación en muro (tornillo y chazo en caso de ser necesario).	1 día	mié 12/08/26	jue 13/08/26	165FC+5 días	$ 745.756,00
168		S/I aviso institucional de 2m x 0.70m con instalación. caja de luz en coll rolled con anticorrosivo, iluminación interior, tubos 18 con regleta y fotocelda para encendido y apagado autom., impr. digital en panaflex a doble pasada a 1440 dpi de resol.,	2 días	mié 12/08/26	vie 14/08/26	167CC	$ 2.145.259,00
169		Componente PGIO	118 días	lun 16/03/26	lun 17/08/26	2	$ 40.426.683,00
170		Retie Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas de Obras Proyectadas	15 días	vie 22/05/26	mié 10/06/26	126	$ 8.500.000,00
171		Tramite y Compensacion Ambiental	30 días	lun 16/03/26	vie 24/04/26	172CC	$ 3.500.000,00
172		Tramite de Licencia de Construccion	40 días	lun 16/03/26	mié 6/05/26	2CC	$ 2.517.502,00
173		FIN	0 días	mar 18/08/26	mar 18/08/26		$ 0,00

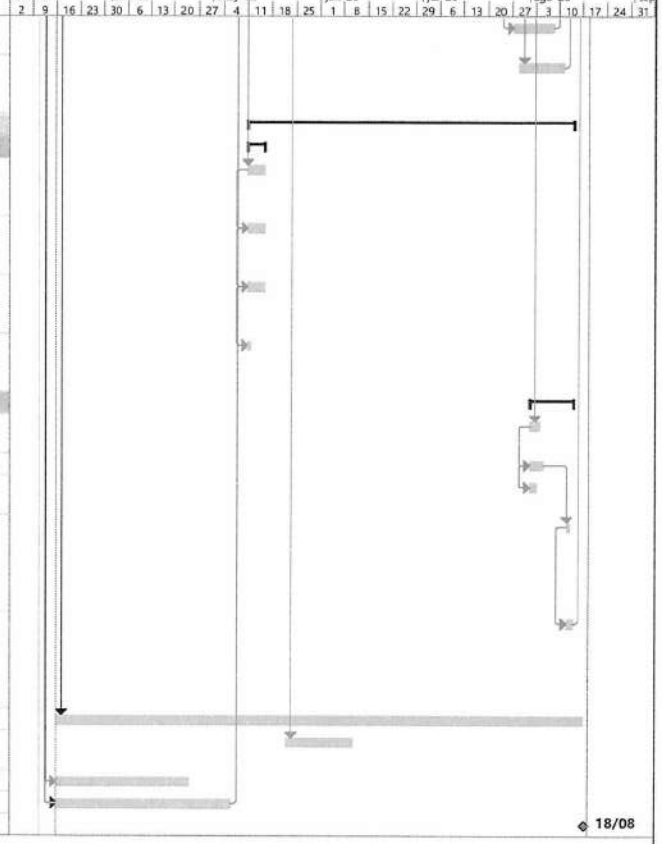

REPROGRAMACION DE OBRA

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso

MARIA ELENA RIVERA HOYOS

6221

ANEXO N°2.

LISTADO DE PERSONAL

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-033
	LISTADO DE PERSONAL	VERSIÓN:	003
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SAIP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN	MARIA INES GONZÁLEZ AYUZ	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	30/05/2026

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	FECHA DE INGRESO	ARL	EPS	FECHA DE EGRESO	¿REALIZARA TRABAJOS EN ALTURAS?
1	CARMEN ANA GARCES NEGRETE	26.176.859	INGENIERA RESIDENTE	DEPENDIENTE	23/04/2026	SURA	SANITAS		
2	JESUS ORLANDO SANDOVAL ARCINIEGAS	93.125.772	DIRECTOR DE OBRA	DEPENDIENTE	23/04/2026	SURA	EN TRAMITE		
3	IPATIA ROVIRA VILLALOBOS MOLINA	50.935.356	AUXILIAR SST	DEPENDIENTE	23/04/2026	SURA	SALUD TOTAL	15/05/2026	
4	MARIA INES GONZALEZ AYUZ	1.067.836.657	INGENIERA ESP. SG-SST	DEPENDIENTE	23/04/2026	SURA	SURA		
5	DANIEL JOSE CORRALES PATERNINA	78.748.168	INGENIERO ELECTRICO	DEPENDIENTE	23/04/2026	SURA	SANITAS		
6	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA	1.067.339.391	ARQUITECTA	DEPENDIENTE	13/05/2026	SURA	MUTUAL SER		
7	LISETH PAOLA CARDENAS FLOREZ	1.003.049.237	AUXILIAR SST	DEPENDIENTE	15/05/2026	SURA	MUTUAL SER		
				FREDYS ENRIQUE TIRADO ARCIRIA					
1	RICHARD DE JESUS RAMOS MARTINEZ	11.154.364	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	23/04/2026	SURA	SANITAS		
2	ARGUIN ANTONIO CARVAJAL RODRIGUEZ	11.004.806	MAESTRO DE OBRA	DEPENDIENTE	23/04/2026	SURA	MUTUAL SER		
3	MARIO ANTONIO VERTEL CAUSIL	6.685.013	OFICIAL DE OBRA	DEPENDIENTE	23/04/2026	SURA	MUTUAL SER		
4	ARLEN JOSE ALVAREZ BELLO	78.594.359	OFICIAL DE OBRA	DEPENDIENTE	23/04/2026	SURA	SALUD TOTAL		
5	LUIS DAVID RUIZ MUÑOZ	1.192.812.500	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	23/04/2026	SURA	PROTEGER EPS	3/06/2026	
6	MARIO RUIZ	1.062.954.579	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	23/04/2026	SURA	SALUD TOTAL	28/04/2026	
7	HUGO ANTONIO VEGA MONTIEL	6.880.870	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	23/04/2026	SURA	SALUD TOTAL		
8	RODRIGO SEGUNDO SOLORZANO GUZMAN	78.714.110	OFICIAL DE OBRA	DEPENDIENTE	23/04/2026	SURA	PROTEGER EPS		
9	ANGEL MARIA RIVERA RAMIREZ	6.871.661	MAESTRO DE OBRA	DEPENDIENTE	27/04/2026	SURA	NUEVA EPS	3/06/2026	
10	MANUEL FRANCISCO PEREZ SALGADO	15.275.012	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	27/04/2026	SURA	NUEVA EPS	3/06/2026	
11	BERNABE GUTIERREZ TEHERAN	9.104.691	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	27/04/2026	SURA	MUTUAL SER		
12	LUIS ALFREDO HURTADO	6.857.106	OFICIAL DE OBRA	DEPENDIENTE	27/04/2026	SURA	MUTUAL SER	12/05/2026	
13	FREDYS ENRIQUE TIRADO ARCIRIA	10.782.218	MAESTRO DE OBRA	DEPENDIENTE	27/04/2026	SURA	SANITAS		
14	DELFER YESITH GOMEZ	1.062.964.683	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	27/04/2026	SURA	MUTUAL SER	3/06/2026	
15	DIOMILDE CLAVER SIERRA BOLIVAR	72.018.333	OFICIAL DE OBRA	DEPENDIENTE	7/05/2026	SURA	NUEVA EPS		
16	RAMON BALLESTEROS ZARATE	15.680.642	OFICIAL DE OBRA	DEPENDIENTE	7/05/2026	SURA	MUTUAL SER	3/06/2026	
17	RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ MURILLO	10.782.173	OFICIAL DE OBRA	DEPENDIENTE	7/05/2026	SURA	MUTUAL SER		
18	SABEL EDUARDO BAENA ZABALA	1.067.666.391	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	14/05/2026	SURA	MUTUAL SER		
19	EDWAR ENRIQUE RAMOS CONDE	1.067.919.648	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	14/05/2026	SURA	SANITAS		
20	ELIECER DEL CRISTO GARCES TAMARA	15.680.389	MAESTRO DE OBRA	DEPENDIENTE	30/05/2026	SURA	NUEVA EPS	18/06/2026	
21	JOAQUIN DE JESUS ORTIZ MARQUEZ	10.975.591	MAESTRO DE OBRA	DEPENDIENTE	30/05/2026	SURA	NUEVA EPS	18/06/2026	
22	CRISTIAN DAVID PEREZ MARTINEZ	1.062.965.377	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	30/05/2026	SURA	MUTUAL SER	30/06/2026	
23	NEYL ELIECER GARCES FLOREZ	1.062.435.302	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	30/05/2026	SURA	SALUD TOTAL		
24	DEIMER EDUARDO ORTIZ IBAÑEZ	1.010.087.719	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	30/05/2026	SURA	NUEVA EPS		
25	JOSE GREGORIO MARQUEZ HERNANDEZ	78.744.534	OFICIAL DE OBRA	DEPENDIENTE	2/06/2026	SURA	MUTUAL SER		
26	IVAN LUIS ARRIETA PAYARES	10.769.595	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	2/06/2026	SURA	MUTUAL SER		
27	JOSE ORLANDO CIFUENTES	12.439.136	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	2/06/2026	SURA	NUEVA EPS		
28	JOSE ENRIQUE HERNANDEZ SOLANO	1.068.576.592	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	2/06/2026	SURA	SALUD TOTAL		
29	LUIS DANIEL CASTILLO	1062805228	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	4/06/2026	SURA	ASMET SALUD EPS		
30	JOSE RAFAEL AVILEZ ALBARADO	1.067.560.476	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	4/06/2026	SURA	MUTUAL SER		
31	ANDRES MANUEL BERRIO FERNANDEZ	78.712.688	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	4/06/2026	SURA	SALUD TOTAL	24/06/2026	
32	JULIO ALFREDO GARCIA RUIZ	78.699.971	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	4/06/2026	SURA	SALUD TOTAL		
33	CRISTOBAL DE JESUS CEDRON PAYARES	1.067.838.817	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	19/06/2026	SURA	PROTEGER EPS		
34	ARTURO JOSE PALACIO BELTRAN	1.005.706.287	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	19/06/2026	SURA	SALUD TOTAL		
35	WALTER ANTONIO MUÑOZ CASTRO	78.704.443	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	20/06/2026	SURA	SALUD TOTAL		
36	JAIME JAVIER ESPINOSA ARTEAGA	1.003.191.671	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	23/06/2026	SURA	SALUD TOTAL		
37	JORGE MIGUEL SUAREZ GENES	1.067.963.880	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	23/06/2026	SURA	NUEVA EPS		

ANEXO N°3.

AFILIACIONES Y PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO N°3.1.

AFILIACIONES

1234

Medellín, 18 de june de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que ARTURO JOSE PALACIO BELTRAN identificado(a) con cédula de ciudadanía 1005708287 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 19/06/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

TIRADO ARCIRIA FREDYS ENRIQUE C10782218

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 000000CRUE - RED VITAL

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5711001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 18/06/2026 4.46 PM

Dirección IP: 191.108.254.132, 192.230.104.18, 172.16.42.57

Medellín, 18 de june de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que CRISTOBAL DE JESUS CEDRON PAYARES identificado(a) con cédula de ciudadanía 1067839817 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 19/06/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

TIRADO ARCIRIA FREDYS ENRIQUE C10782218

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 000000CRUE - RED VITAL

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5711001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 18/06/2026 4.51 PM

Dirección IP: 191.108.254.132, 192.230.104.18, 172.16.42.57

Medellín, 22 de june de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JAIME JAVIER ESPINOSA ARTEAGA identificado(a) con cédula de ciudadanía 1003191671 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 23/06/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

TIRADO ARCIRIA FREDYS ENRIQUE C10782218

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 000000CRUE - RED VITAL

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5711001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 22/06/2026 10.26 AM

Dirección IP: 191.108.172.160, 192.230.104.17, 172.16.42.57

1237

Medellín, 22 de june de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JORGE MIGUEL SUAREZ GENES identificado(a) con cédula de ciudadanía 1067963880 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 23/06/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

TIRADO ARCIRIA FREDYS ENRIQUE C10782218

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 000000CRUE - RED VITAL

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5711001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 22/06/2026 10.28 AM

Dirección IP: 191.108.172.160, 192.230.104.17, 172.16.42.57

1238

Medellín, 22 de june de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que SAMIR ALBERTO NARVAEZ VERTEL identificado(a) con cédula de ciudadanía 1003395555 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 23/06/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

TIRADO ARCIRIA FREDYS ENRIQUE C10782218

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 000000CRUE - RED VITAL

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5711001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 22/06/2026 3.55 PM

Dirección IP: 191.108.172.160, 192.230.104.17, 172.16.42.57

Medellín, 19 de june de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que WALTER ANTONIO MUÑOZ CASTRO identificado(a) con cédula de ciudadanía 78704443 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 20/06/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

TIRADO ARCIRIA FREDYS ENRIQUE C10782218

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 000000CRUE - RED VITAL

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5711001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 19/06/2026 4.18 PM

Dirección IP: 191.108.254.132, 192.230.104.18, 172.16.42.57

ANEXO N°3.2.

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902022356	3	CONSORCIO RED VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO RED VITAL	CRA 6 N 62B 32	MONTERIA-CORDOBA	3012150759	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	1000000998	9505951952	E	2026/06/12	2026/06/04	BANCO DE BOGOTA		$5,282,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003046257	CARDENAS FLOREZ LISETH PAOLA	X																	230201	16	$933,816	$149,500	ESSC07	16	$933,816	$37,400	CCF16	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
2	CC	78748166	CORRALES PATERNINA DANIEL JOSE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	1007339391	ESPITIA VERGARA NATALY STEFANIA	X																	230201	18	$1,050,543	$168,100	ESSC07	18	$1,050,543	$42,100	CCF16	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	$73,200	18	$0	$0	Si	$325,500
4	CC	26176859	GARCES NEGRETE CARMEN ANA																		25-14	30	$7,139,029	$1,213,700	EPS005	30	$7,139,029	$285,600	CCF16	30	$7,139,029	$285,600	14-11	30	$7,139,029	$496,900	30	$0	$0	Si	$2,281,800
5	CC	1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES																		230301	30	$4,227,223	$676,400	EPS010	30	$4,227,223	$169,100	CCF16	30	$4,227,223	$169,100	14-11	30	$4,227,223	$294,300	30	$0	$0	Si	$1,308,900
6	CC	93125772	SANDOVAL ARCINIEGAS JESUS ORLANDO																			D	$0	$0	EPS002	30	$1,878,942	$75,200	CCF16	30	$1,878,942	$75,200	14-11	30	$1,878,942	$130,800	30	$0	$0	Si	$281,200
7	CC	50905356	VILLALOBOS MOLINA IPATIA ROVIRA		X																231001	14	$817,089	$130,800	EPS002	14	$817,089	$32,700	CCF16	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0	Si	$253,100
Total	**Afiliados(7)**																						$15,918,605	$2,618,700			$17,797,547	$712,200			$17,797,547	$712,200			$17,797,547	$1,239,000		$0	$0		$5,282,100

2026/06/22 02:56 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902022356	3	CONSORCIO RED VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO RED VITAL	CRA 6 N 62B 32	MONTERIA-CORDOBA	3012150759	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-06	1000000998	9505951952	E	2026/06/12	2026/06/04	BANCO DE BOGOTA		$5,282,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$2,618,700	$0	$2,618,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$130,800	$0	$130,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,213,700	$0	$1,213,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$956,600	$0	$956,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$317,600	$0	$317,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,239,000	$0	$1,239,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,239,000	$0	$1,239,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$712,200	$0	$712,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	$712,200	$0	$712,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$712,200	$0	$712,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$169,100	$0	$169,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$79,500	$0	$79,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$107,900	$0	$107,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$355,700	$0	$355,700
TOTAL				7	$5,282,100	$0	$5,282,100

2026/06/22 02:56 PM

2421

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10782218	1	FREDYS ENRIQUE TIRADO ARCIRIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 11 10 54	MONTERIA-CORDOBA	3215617214	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	1000000974	9505955682	Y	2026/06/04	2026/06/04	BANCO DE BOGOTA		$2,035,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	tri	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (26 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$29,240,118		$2,035,900		$0	$0		$2,035,900
Centro de Trabajo: BUENAVISTA RECREA (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$365,700
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,252,715		$365,700		$0	$0		$365,700
1	CC	78694359	ALVAREZ BELLO ARLEN JOSE																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
2	CC	11004806	CARVAJAL RODRIGUEZ ERGUIN ANTONIO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
3	CC	11154368	RAMOS MARTINEZ RICHARD DE JESUS																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900

1243

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RED VITAL (23 Afiliados)															$0	$0			$0	$0			$0	$0			$23,987,403		$1,670,200		$0	$0		$1,670,200
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (23 Afiliados)															$0	$0			$0	$0			$0	$0			$23,987,403		$1,670,200		$0	$0		$1,670,200
4	CC	1067950788	ALVAREZ ARRIETA LUIS FELIPE	X	T										0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	22	$1,283,997	6.960%	$89,400	0	$0	$0	No	$89,400
5	CC	1067860391	BAENA ZABALA SABEL EDUARDO	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	17	$992,180	6.960%	$69,100	0	$0	$0	No	$69,100
6	CC	15680642	BALLESTERO ZARANTE RAMON	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	24	$1,400,724	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
7	CC	1062965377	CRISTIAN DAVID PEREZ MARTINEZ	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	0	$0	$0	No	$4,100
8	CC	15680389	GARCES TAMARA ELIECER DEL CRISTO	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	0	$0	$0	No	$4,100
9	CC	1062435302	GARCES FLOREZ NEYL ELIECER	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	0	$0	$0	No	$4,100
10	CC	1062964683	GOMEZ MARTINEZ DELFER YESITH	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	24	$1,400,724	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
11	CC	10782173	GONZALEZ MURILLO RAFAEL ENRIQUE	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	24	$1,400,724	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
12	CC	9104691	GUTIERREZ TEHERAN BERNABE ENRIQUE	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	24	$1,400,724	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
13	CC	6857106	HURTADO LUIS ALFREDO	X	T										0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	6	$350,181	6.960%	$24,400	0	$0	$0	No	$24,400
14	CC	1010087719	ORTIZ IBAÑEZ DEIMER EDUARDO	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	0	$0	$0	No	$4,100
15	CC	10975591	ORTIZ MARQUEZ JOAQUIN DE JESUS	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	0	$0	$0	No	$4,100
16	CC	1065005502	PEREIRA LOPEZ OMAR YESID	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	17	$992,180	6.960%	$69,100	0	$0	$0	No	$69,100
17	CC	15275012	PEREZ SALGADO MANUEL FRANCISCO	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	24	$1,400,724	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
18	CC	1067919649	RAMOS CONDE EDWAR ENRIQUE	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	17	$992,180	6.960%	$69,100	0	$0	$0	No	$69,100
19	CC	1067874360	RUIZ TORO ANGEL DE JESUS	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	24	$1,400,724	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
20	CC	15646221	RUIZ MARTINEZ JORGE LUIS	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	17	$992,180	6.960%	$69,100	0	$0	$0	No	$69,100
21	CC	1192812500	RUIZ MUÑOZ LUIS DAVID												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
22	CC	72018203	SIERRA BOLIVAR DEOMILDE CLAVER	X											0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	24	$1,400,724	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
23	CC	78714110	SOLORZANO GUZMAN RODRIGO SEGUNDO												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
24	CC	6880870	VEGA MONTIEL HUGO ANTONIO												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
25	CC	11004491	VERGARA HOYOS RODRIGO MANUEL	X	T										0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	22	$1,283,997	6.960%	$89,400	0	$0	$0	No	$89,400
26	CC	6885013	VERTEL CAUSIL MARIO ANTONIO												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total			**Afiliados(26)**												$0	$0			$0	$0			$29,240,118		$2,035,900		$0	$0		$2,035,900				

1244

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,035,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$2,035,900
TOTAL				26	$2,035,900

ANEXO N°4.

INDUCCIÓN

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-009
	CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Consorcio Red vital córdoba
TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	INDUCCIÓN
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	Dar a conocer a los trabajadores las políticas, objetivos, planes y demas procedimientos relacionados con el trabajo y la implementación del Sistema Integrado de Gestión.
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:	19/06/2026
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO:	Todo el personal
RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN:	Liseth paola Cardenas Florez
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN:	1. Políticas y objetivos de Calidad y SST. 2. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 3. Funciones y Responsabilidades de los trabajadores asociadas a su cargo, la SST, la Calidad y la Gestión de Obra. 4. COPASST (Objetivos, Funciones y responsabilidades). 5. Comité de convivencia (Objetivos, Funciones y responsabilidades) 6. Notificación de los riesgos de acuerdo a las actividades que vaya a desarrollar el trabajador. 7. Uso de elementos de protección personal. 8. Señalización de seguridad. 9. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 10. Que hacer en caso de un accidente de trabajo. 11. Clasificación de los residuos sólidos y segregación en la fuente. 12. Importancia del autocuidado y llevar estilos de vida y de trabajo saludables. 13. Socialización PTS con herramientas manuales. 14. Socialización de PTS con volquetas. 15. Socialización de Preocedimiento de almacenamiento seguro de sustancias quimicas. 16. Socializacón PTS de tareas en caliente. 17. Socialización PTS cargue y descargue de material. 18. Socializacion PTS de trabajo con maquinaria.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
Cristobal Cedrón	1067839817	Ayudante	Cristobal Cedrón
Arturo palacio	1005708287	Ayudante	Arturo Jose Palacio

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-009
	CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Consorcio Red vital córdoba
TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	INDUCCIÓN
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	Dar a conocer a los trabajadores las politicas, objetivos, planes y demas procedimientos relacionados con el trabajo y la implementación del Sistema Integrado de Gestión.
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:	20/06/2026
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO:	TODO EL PERSONAL
RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN:	Lisetth paola Cardenas Florez
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN:	1. Políticas y objetivos de Calidad y SST. 2. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 3. Funciones y Responsabilidades de los trabajadores asociadas a su cargo, la SST, la Calidad y la Gestión de Obra. 4. COPASST (Objetivos, Funciones y responsabilidades). 5. Comité de convivencia (Objetivos, Funciones y responsabilidades). 6. Notificación de los riesgos de acuerdo a las actividades que vaya a desarrollar el trabajador. 7. Uso de elementos de protección personal. 8. Señalización de seguridad. 9. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 10. Que hacer en caso de un accidente de trabajo. 11. Clasificación de los residuos sólidos y segregación en la fuente. 12. Importancia del autocuidado y llevar estilos de vida y de trabajo saludables. 13. Socialización PTS con herramientas manuales. 14. Socialización de PTS con volquetas. 15. Socialización de Preocedimiento de almacenamiento seguro de sustancias quimicas. 16. Socializacón PTS de tareas en caliente. 17. Socialización PTS cargue y descargue de material. 18. Socializacion PTS de trabajo con maquinaria.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
Walter Muñoz	78704443	Ayudante	Walter Muñoz

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-009
	CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Consorcio Red vital córdoba
TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	INDUCCIÓN
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	Dar a conocer a los trabajadores las políticas, objetivos, planes y demas procedimientos relacionados con el trabajo y la implementación del Sistema Integrado de Gestión.
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:	23/06/2026
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO:	TODO EL PERSONAL
RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN:	Liseth paola Cardenas Florez
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN:	1. Políticas y objetivos de Calidad y SST. 2. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 3. Funciones y Responsabilidades de los trabajadores asociadas a su cargo, la SST, la Calidad y la Gestión de Obra. 4. COPASST (Objetivos, Funciones y responsabilidades). 5. Comité de convivencia (Objetivos, Funciones y responsabilidades). 6. Notificación de los riesgos de acuerdo a las actividades que vaya a desarrollar el trabajador. 7. Uso de elementos de protección personal. 8. Señalización de seguridad. 9. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 10. Que hacer en caso de un accidente de trabajo. 11. Clasificación de los residuos sólidos y segregación en la fuente. 12. Importancia del autocuidado y llevar estilos de vida y de trabajo saludables. 13. Socialización PTS con herramientas manuales. 14. Socialización de PTS con volquetas. 15. Socialización de Preocedimiento de almacenamiento seguro de sustancias químicas. 16. Socializacón PTS de tareas en caliente. 17. Socialización PTS cargue y descargue de material. 18. Socializacion PTS de trabajo con maquinaria.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
Jaime Espinosa	1003191671	Ayudante	Jaime
Jorge Suarez	1067963880	Ayudante	
Samir Narvaez	1003395555	Oficial	Samir Narvaez

Powered by CamScanner

ANEXO N°5.

NOTIFICACIÓN DE RIESGO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-010
	NOTIFICACION DE RIESGOS	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

ACTIVIDAD:	
TAREAS:	TAREAS OPERATIVAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
CARGOS:	Director de obra, Residente de obra, Maestros de obra, Inspectores de obra, Oficiales de obra, Ayudantes de obra, Topografos, Cadeneros. Operarios, Auxiliar SST, Almacenista, Celador, Mensajero, entre otros cargos operativos.
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN:	19 Junio 2026

PELIGRO			EFECTO POSIBLE
Factor de Riesgo		Clasificación	
Exposición a ruido proveniente de	Físicos	Exposición a ruido proveniente de ...	* Pérdida de capacidad auditiva * Estrés
Exposición a vibraciones provenientes de...	Físicos	Exposición a vibraciones provenientes de...	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Exposición a altas temperaturas provenientes de	Físicos	Exposición a altas temperaturas provenientes de.	* Deshidratación * Quemaduras en la piel
Exposición a bajas temperaturas provenientes de...	Físicos	Exposición a bajas temperaturas provenientes de...	* Hipotermia * Quemaduras por frio * Muerte
Cambios bruscos de temperatura debidos a	Físicos	Cambios bruscos de temperatura debidos a...	* Desmayos * Calambres
Exposición a presiones anormales o diferentes a la presión atmosférica durante	Físicos	Exposición a presiones anormales o diferentes a la presión atmosférica durante	* Perdida del conocimiento * Lesiones temporales o permanentes...
Exposición a radiaciones no ionizantes provenientes de...	Físicos	Exposición a radiaciones no ionizantes provenientes de	Depende del tipo de radiación
Exposiciones a radiaciones ionizantes provenientes de	Físicos	Exposiciones a radiaciones ionizantes provenientes de	Depende del tipo de radiación
Iluminación deficiente en sitio de trabajo debido a	Físicos	Iluminación deficiente en sitio de trabajo debido a.	* Cansancio * Fatiga visual
Transporte de productos químicos peligrosos	Químicos	Transporte de productos químicos peligrosos	* Derrames * Fugas * Contaminación ambiental * Incendio * Explosión
Almacenamiento de productos químicos peligrosos	Químicos	Almacenamiento de productos químicos peligrosos	* Derrames * Fugas * Contaminación ambiental * Incendio * Explosión
Manipulación de productos químicos peligros	Químicos	Manipulación de productos químicos peligros	* Derrames * Fugas * Contaminación ambiental * Incendio * Explosión * Quemaduras * Alergias * Irritación
Exposición a material particulado proveniente de...	Químicos	Exposición a material particulado proveniente de...	Enfermedades del Sistema respiratorio
Exposición a humos, gases o vapores provenientes de	Químicos	Exposición a humos, gases o vapores provenientes de...	Enfermedades del Sistema respiratorio
Trabajos con productos químicos combustibles, inflamables o explosivos durante	Químicos	Trabajos con productos químicos combustibles, inflamables o explosivos durante.	* Incendios * Explosiones * Quemaduras * Asfixia * Muerte
Exposicion a virus, bacterias, hongos o parásitos presentes en	Biológicos	exposición a virus, bacterias, hongos o parásitos presentes en...	Depende del microorganismo
Picaduras de animales	Biológicos	Picaduras de animales	Depende de los animales
Mordeduras de animales	Biológicos	Mordeduras de animales	Depende del estado del animal
Contacto con sangre y otros fluidos corporales de personas y animales	Biológicos	Contacto con sangre y otros fluidos corporales de personas y animales	Depende del tipo de fluido
Contacto con superficies o elementos contaminados con sangre y otros fluidos corporales de personas y animales	Biológicos	Contacto con superficies o elementos contaminados con sangre y otros fluidos corporales de personas y animales	Depende del tipo de fluido
Inhalación o contacto de productos de origen vegetal o animal.	Biológicos	Inhalación o contacto de productos de origen vegetal o animal.	Reacciones tóxicas
Inhalación o contacto con sustancias de naturaleza vegetal o animal, especialmente liberadas al medio en forma de polvo (cabellos, polen, esporas de hongos, partes de insectos, deyecciones, etc.)	Biológicos	Inhalación o contacto con sustancias de naturaleza vegetal o animal, especialmente liberadas al medio en forma de polvo (cabellos, polen, esporas de hongos, partes de insectos, deyecciones, etc.)	Reacciones alérgicas
Sobreesfuerzo por la adopción de posturas forzadas hipertensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Sobreesfuerzo por la adopción de posturas forzadas ... hipertensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Sobreesfuerzo por la adopción de postura estática prolongada ...sentado, de pie, agachado, etc.	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Sobreesfuerzo por la adopción de postura estática prolongada ...sentado, de pie, agachado, etc.	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Hábitos posturales inadecuados durante	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Hábitos posturales inadecuados durante...	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Movimientos repetitivos	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Movimientos repetitivos ...	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Levantamiento de carga	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Levantamiento de carga ...	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Transporte de carga	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Transporte de carga ...	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Empuje y arrastre de cargas	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Empuje y arrastre de cargas ...	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Aplicación de fuerza ... empujar o tirar de ... manipular hacia arriba, abajo, hacia dentro o fuera	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Aplicación de fuerza ... empujar o tirar de .... manipular hacia arriba, abajo, hacia dentro o fuera	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Uso de pedales o mandos que se deben accionar con la extremidad inferior y/o en postura sentado ... empujar o arrastrar algún objeto sin ruedas, ni guías o rodillos en postura de pie	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Uso de pedales o mandos que se deben accionar con la extremidad inferior y/o en postura sentado... empujar o arrastrar algún objeto sin ruedas, ni guías o rodillos en postura de pie	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Distribución inadecuada del puesto de trabajo	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Distribución inadecuada del puesto de trabajo	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Diseño inadecuado del puesto de trabajo	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Diseño inadecuado del puesto de trabajo	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Desplazamientos por largas jornadas a pie	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Desplazamientos por largas jornadas a pie	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Trabajo repetitivo y monótono	Psicosociales	Trabajo repetitivo y monótono	* Estrés * Cansancio * Fatiga
Trabajo con jornadas extendidas	Psicosociales	Trabajo con jornadas extendidas	* Estrés * Cansancio

Powered by CamScanner

Trabajo bajo presión o con apremio de tiempo	Psicosociales	Trabajo bajo presión o con apremio de tiempo	* Estrés * Cansancio * Fatiga
Complejidad y rapidez del trabajo por	Psicosociales	Complejidad y rapidez del trabajo por	* Estrés * Cansancio * Fatiga
Ordenes contradictorias	Psicosociales	Ordenes contradictorias	* Estrés
Acoso laboral	Psicosocial	Acoso laboral	* Estrés
Relaciones interpersonales y grupales	Psicosocial	Relaciones interpersonales y grupales	* Estrés
Factores intralaborales...	Psicosocial	Factores intralaborales.	Dependiendo del factor
Factores extralaborales...	Psicosocial	Factores extralaborales	Dependiendo del factor
Factores individuales...	Psicosocial	Factores individuales...	Dependiendo del factor
Trabajos con posibilidad de contactos eléctricos directos o indirectos durante...	Condiciones de Seguridad	Trabajos con posibilidad de contactos eléctricos directos o indirectos durante...	* Electrocución * Daños a equipos * Incendio
Atrapamientos entre mecanismos en movimiento durante...	Condiciones de Seguridad	Atrapamientos entre mecanismos en movimiento durante	* Amputaciones * Machucones * Fracturas * Luxaciones
Golpes contra objetos inmóviles	Condiciones de Seguridad	Golpes contra objetos inmóviles	Politraumatismos
Ser golpeado por... Durante...	Condiciones de Seguridad	Ser golpeado por... Durante...	Politraumatismos
Choques y atropellos con vehículos durante	Condiciones de Seguridad	Choques y atropellos con vehículos durante	* Politraumatismos * Muerte
Caída de objetos de altura durante.	Condiciones de Seguridad	Caída de objetos de altura durante.	* Politraumatismos * Muerte
Caidas al mismo nivel por	Condiciones de Seguridad	Caídas al mismo nivel por	Politraumatismos
Caídas a diferente nivel o alturas superiores a 1,50 mts durante.	Condiciones de Seguridad	Caídas a diferente nivel o alturas superiores a 2,00 mts durante.	* Politraumatismos * Muerte
Proyección de partículas (solidas, líquidas o gases) provenientes de...	Condiciones de Seguridad	Proyección de partículas (solidas, líquidas o gases) provenientes de...	* Daños oculares * Incrustación de objetos extraños * Heridas
Trabajos con elementos cortantes o cortopunzantes	Condiciones de Seguridad	Trabajos con elementos cortantes o cortopunzantes	* Heridas * Cortaduras * Presiones punzantes. * Infecciones * Desangre * Muerte
Trabajos con herramientas o equipos	Condiciones de Seguridad	Trabajos con herramientas o equipos	Accidentes de trabajo diversos
Trabajos con equipos presurizados	Condiciones de Seguridad	Trabajos con equipos presurizados	* Explosiones * Proyección de partículas * Heridas * Muerte
Trabajos en espacios confinados o en presencia de atmosferas enrarecidas.	Condiciones de Seguridad	Trabajos en espacios confinados o en presencia de atmosferas enrarecidas.	* Asfixia * Atrapamientos * Muerte
Fenómenos naturales, zona con alta probabilidad de descargas eléctricas.	Condiciones de Seguridad	Fenómenos naturales, zona con alta probabilidad de descargas eléctricas.	* Electrocución * Daños a equipos * Incendio * Muerte
Fenómenos naturales, trabajos en zonas de derrumbes.	Condiciones de Seguridad	Fenómenos naturales, trabajos en zonas de derrumbes.	* Atrapamientos * Fracturas * Traumas * Muerte
Fenómenos naturales, trabajos en zonas con vientos fuertes o cambiantes.	Condiciones de Seguridad	Fenómenos naturales, trabajos en zonas con vientos fuertes o cambiantes	* Caida de estructuras * volcamiento de equipos * Proyeccion de particulas * Caida de objetos
Trabajos en lugares inestables o en presencia de superficies irregulares, deslizantes.	Condiciones de Seguridad	Trabajos en lugares inestables o en presencia de superficies irregulares, deslizantes.	Accidentes de trabajo diversos
Contacto térmico (alta temperatura)	Condiciones de Seguridad	Contacto térmico (alta temperatura)	Quemaduras
Contacto térmico (baja temperatura)	Condiciones de Seguridad	Contacto térmico (baja temperatura)	Quemaduras
Orden y aseo deficiente del sitio de trabajo	Condiciones de Seguridad	Orden y aseo deficiente del sitio de trabajo	Accidentes de trabajo diversos
Instalaciones locativas en mal estado.	Condiciones de Seguridad	Instalaciones locativas en mal estado.	Accidentes de trabajo diversos
Traslados o trabajos en zonas de conflicto o inseguras	Condiciones de Seguridad	Traslados o trabajos en zonas de conflicto o inseguras.	* Secuestro * Robo * Atraco
Señalización inadecuada o insuficiente en.	Condiciones de Seguridad	Señalización inadecuada o insuficiente en.	Accidentes de trabajo diversos
Desconocimiento de la tarea, normas o procedimientos	Condiciones de Seguridad	Desconocimiento de la tarea, normas o procedimientos.	Accidentes de trabajo diversos
Operar a velocidad inadecuada	Condiciones de Seguridad	Operar a velocidad inadecuada	Accidentes de trabajo diversos
Exceder la capacidad de equipos o herramientas	Condiciones de Seguridad	Exceder la capacidad de equipos o herramientas	Accidentes de trabajo diversos
Vias en mal estado	Condiciones de Seguridad	Vias en mal estado	Accidentes de trabajo diversos
Transporte de cargas indivisibles extrapesadas o extra dimensionadas	Condiciones de Seguridad	Transporte de cargas indivisibles, extrapesadas o extra dimensionadas	* Accidentes de trabajo diversos * Accidentes de transito * Daños a terceros
Métodos de almacenamiento inadecuados durante	Condiciones de Seguridad	Métodos de almacenamiento inadecuados durante...	* Fugas * Derrames * Daños a personas * Daño al ambiente

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesta durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Cristobal Cedrón	1069839817	Ayudante	Cristobal Cedrón
Arturo palacio	1005708287	Ayudante	Arturo Palacio

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO	FOR.010
	NOTIFICACION DE RIESGOS	VERSIÓN	001
CONTRATANTE	GOBERNACION DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"			
ACTIVIDAD			
TAREAS	TAREAS ORDINARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"		
CARGOS	Director de obra, Residente de obra, Maestro de obra, Inspectores de obra, Oficiales de obra, Ayudantes de obra, Topografos, Cadeneros, Operarios, Auxiliar SST Almacenista, Celador, Mensajero, entre otros cargos operativos		
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN	20 Junio 2026		

PELIGRO

Factor de Riesgo		Clasificación	EFECTO POSIBLE
Exposición a ruido proveniente de	Físicos	Exposición a ruido proveniente de	* Perdida de capacidad auditiva * Estres
Exposición a vibraciones provenientes de	Físicos	Exposición a vibraciones provenientes de	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Exposición a altas temperaturas provenientes de	Físicos	Exposición a altas temperaturas provenientes de	* Deshidratación * Quemaduras en la piel
Exposición a bajas temperaturas provenientes de	Físicos	Exposición a bajas temperaturas provenientes de	* Hipotermia * Quemaduras por frio * Muerte
Cambios bruscos de temperatura debidos a	Físicos	Cambios bruscos de temperatura debidos a	* Desmayos * Calambres
Exposición a presiones anormales a diferentes a la presión atmosférica durante	Físicos	Exposición a presiones anormales a diferentes a la presión atmosférica durante	* Perdida del conocimiento * Lesiones temporales o permanentes
Exposición a radiaciones no ionizantes provenientes de	Físicos	Exposición a radiaciones no ionizantes provenientes de	Depende del tipo de radiación
Exposiciones a radiaciones ionizantes provenientes de	Físicos	Exposiciones a radiaciones ionizantes provenientes de	Depende del tipo de radiación
Iluminacion deficiente en sitio de trabajo debido a	Físicos	Iluminación deficiente en sitio de trabajo debido a	* Cansancio * Fatiga visual
Transporte de productos químicos peligrosos	Químicos	Transporte de productos químicos peligrosos	* Derrames * Fugas * Contaminación ambiental * Incendio * Explosión
Almacenamiento de productos químicos peligrosos	Químicos	Almacenamiento de productos químicos peligrosos	* Derrames * Fugas * Contaminación ambiental * Incendio * Explosión
Manipulacion de productos químicos peligros	Químicos	Manipulación de productos químicos peligros	* Derrames * Fugas * Contaminación ambiental * Incendio * Explosion * Quemaduras * Alergias * Intoxicos
Exposición a material particulado proveniente de	Químicos	Exposición a material particulado proveniente de.	Enfermedades del Sistema respiratorio
Exposicion a humos, gases o vapores provenientes de	Químicos	Exposicion a humos, gases o vapores provenientes de	Enfermedades del Sistema respiratorio
Trabajos con productos químicos combustibles, inflamables y explosivos durante	Químicos	Trabajos con productos químicos combustibles, inflamables o explosivos durante	* Incendios * Explosiones * Quemaduras * Asfixia * Muerte
Exposición a virus, bacterias, hongos o parasitos presentes en	Biológicos	exposición a virus, bacterias, hongos o parásitos presentes en	Depende del microorganismo
Picaduras de animales	Biológicos	Picaduras de animales	Depende de los animales
Mordeduras de animales	Biológicos	Mordeduras de animales	Depende del estado del animal
Contacto con sangre y otros fluidos corporales de personas y animales	Biológicos	Contacto con sangre y otros fluidos corporales de personas y animales	Depende del tipo de fluido
Contacto con superficies o elementos contaminados con sangre y otros fluidos corporales de personas y animales	Biológicos	Contacto con superficies o elementos contaminados con sangre y otros fluidos corporales de personas y animales	Depende del tipo de fluido
Inhalación y contacto de productos de origen vegetal o animal	Biológicos	Inhalación o contacto de productos de origen vegetal o animal.	Reacciones toxicas
Inhalación o contacto con sustancias de naturaleza vegetal o animal, especialmente liberadas al medio en forma de polvo (cabellos, pelos, esporas de hongos, partes de insectos, deyecciones, etc.)	Biológicos	Inhalación o contacto con sustancias de naturaleza vegetal o animal, especialmente liberadas al medio en forma de polvo (cabellos, pelos, esporas de hongos, partes de insectos, deyecciones, etc.)	Reacciones alergicas
Sobreesfuerzo por la adopción de posturas forzadas hipertensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Sobreesfuerzo por la adopción de posturas forzadas hipertensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Sobreesfuerzo por la adopción de postura estática prolongada sentado, de pie, agachado, etc.	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Sobreesfuerzo por la adopción de postura estática prolongada sentado, de pie, agachado, etc.	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Hábitos posturales inadecuados durante	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Hábitos posturales inadecuados durante	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Movimientos repetitivos	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Movimientos repetitivos	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Levantamiento de cargas	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Levantamiento de cargas	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Transporte de cargas	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Transporte de cargas	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Empuje y arrastre de cargas	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Empuje y arrastre de cargas	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Aplicación de fuerza , empujar o tirar de ... manipular hacia arriba, abajo, hacia dentro o fuera	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Aplicación de fuerza , empujar o tirar de ... manipular hacia arriba, abajo, hacia dentro o fuera	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Uso de pedales o mandos que se deben accionar con la extremidad inferior y/o en postura sentado empujar o arrastrar algun objeto sin ruedas, ni guias o rodillos en postura de pie	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Uso de pedales o mandos que se deben accionar con la extremidad inferior y/o en postura sentado empujar o arrastrar algun objeto sin ruedas, ni guias o rodillos en postura de pie	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Distribución inadecuada del puesto de trabajo	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Distribución inadecuada del puesto de trabajo	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Diseño inadecuado del puesto de trabajo	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Diseño inadecuado del puesto de trabajo	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Desplazamientos por largas jornadas a pie	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Desplazamientos por largas jornadas a pie	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Trabajo repetitivo y monotono	Psicosocial	Trabajo repetitivo y monótono	* Estres * Cansancio * Fatiga
Trabajo con jornadas extendidas	Psicosocial	Trabajo con jornadas extendidas	* Estres * Cansancio * Fatiga

Powered by CamScanner

Trabajo bajo presión o con apremio de tiempo	Psicosociales	Trabajo bajo presión o con apremio de tiempo	* Estrés * Cansancio * Fatiga
Complejidad y rapidez del trabajo por	Psicosociales	Complejidad y rapidez del trabajo por...	* Estrés * Cansancio * Fatiga
Ordenes contradictorias	Psicosociales	Ordenes contradictorias	* Estrés
Acoso laboral	Psicosocial	Acoso laboral	* Estrés
Relaciones interpersonales y grupales	Psicosocial	Relaciones interpersonales y grupales	* Estrés
Factores intralaborales..	Psicosocial	Factores intralaborales...	Dependiendo del factor
Factores extralaborales	Psicosocial	Factores extralaborales...	Dependiendo del factor
Factores individuales..	Psicosocial	Factores individuales...	Dependiendo del factor
Trabajos con posibilidad de contactos eléctricos directos o indirectos durante.	Condiciones de Seguridad	Trabajos con posibilidad de contactos eléctricos directos o indirectos durante...	* Electrocución * Daños a equipos * Incendio
Atrapamientos entre mecanismos en movimiento durante..	Condiciones de Seguridad	Atrapamientos entre mecanismos en movimiento durante...	* Amputaciones * Machucones * Fracturas * Luxaciones
Golpes contra objetos inmóviles	Condiciones de Seguridad	Golpes contra objetos inmóviles	Politraumatismos
Ser golpeado por... Durante...	Condiciones de Seguridad	Ser golpeado por... Durante...	Politraumatismos
Choques y atropellos con vehículos durante	Condiciones de Seguridad	Choques y atropellos con vehículos durante	* Politraumatismos * Muerte
Caída de objetos de altura durante	Condiciones de Seguridad	Caída de objetos de altura durante	* Politraumatismos * Muerte
Caídas al mismo nivel por	Condiciones de Seguridad	Caídas al mismo nivel por	Politraumatismos
Caídas a diferente nivel o alturas superiores a 1,50 mts durante.	Condiciones de Seguridad	Caídas a diferente nivel o alturas superiores a 2,00 mts durante.	* Politraumatismos * Muerte
Proyección de partículas (solidas, líquidas o gases) provenientes de..	Condiciones de Seguridad	Proyección de partículas (solidas, líquidas o gases) provenientes de...	* Daños oculares * Incrustación de objetos extraños * Heridas
Trabajos con elementos cortantes o cortopunzantes	Condiciones de Seguridad	Trabajos con elementos cortantes o cortopunzantes	* Heridas * Cortaduras * Presiones punzantes * Infecciones * Desangre * Muerte
Trabajos con herramientas o equipos	Condiciones de Seguridad	Trabajos con herramientas o equipos	Accidentes de trabajo diversos
Trabajos con equipos presurizados	Condiciones de Seguridad	Trabajos con equipos presurizados	* Explosiones * Proyección de partículas * Heridas * Muerte
Trabajos en espacios confinados o en presencia de atmosferas enrarecidas.	Condiciones de Seguridad	Trabajos en espacios confinados o en presencia de atmosferas enrarecidas.	* Asfixia * Atrapamientos * Muerte
Fenómenos naturales, zona con alta probabilidad de descargas eléctricas.	Condiciones de Seguridad	Fenómenos naturales, zona con alta probabilidad de descargas eléctricas.	* Electrocución * Daños a equipos * Incendio * Muerte
Fenómenos naturales, trabajos en zonas de derrumbes.	Condiciones de Seguridad	Fenómenos naturales, trabajos en zonas de derrumbes.	* Atrapamientos * Fracturas * Traumas * Muerte
Fenómenos naturales, trabajos en zonas con vientos fuertes o cambiantes.	Condiciones de Seguridad	Fenómenos naturales, trabajos en zonas con vientos fuertes o cambiantes.	* Caida de estructuras * volcamiento de equipos * Proyeccion de particulas * Caida de objetos
Trabajos en lugares inestables o en presencia de superficies irregulares, deslizantes.	Condiciones de Seguridad	Trabajos en lugares inestables o en presencia de superficies irregulares, deslizantes.	Accidentes de trabajo diversos
Contacto térmico (alta temperatura)	Condiciones de Seguridad	Contacto térmico (alta temperatura)	Quemaduras
Contacto térmico (baja temperatura)	Condiciones de Seguridad	Contacto térmico (baja temperatura)	Quemaduras
Orden y aseo deficiente del sibo de trabajo	Condiciones de Seguridad	Orden y aseo deficiente del sitio de trabajo	Accidentes de trabajo diversos
Instalaciones locativas en mal estado	Condiciones de Seguridad	Instalaciones locativas en mal estado.	Accidentes de trabajo diversos
Traslados o trabajos en zonas de conflicto o inseguras.	Condiciones de Seguridad	Traslados o trabajos en zonas de conflicto o inseguras.	* Secuestro * Robo * Atraco
Señalización inadecuada o insuficiente en..	Condiciones de Seguridad	Señalización inadecuada o insuficiente en..	Accidentes de trabajo diversos
Desconocimiento de la tarea, normas o procedimientos.	Condiciones de Seguridad	Desconocimiento de la tarea, normas o procedimientos.	Accidentes de trabajo diversos
Operar a velocidad inadecuada	Condiciones de Seguridad	Operar a velocidad inadecuada	Accidentes de trabajo diversos
Exceder la capacidad de equipos o herramientas	Condiciones de Seguridad	Exceder la capacidad de equipos o herramientas	Accidentes de trabajo diversos
Vias en mal estado	Condiciones de Seguridad	Vias en mal estado	Accidentes de trabajo diversos
Transporte de cargas indivisibles, extrapesadas o extra dimensionadas	Condiciones de Seguridad	Transporte de cargas indivisibles, extrapesadas o extra dimensionadas	* Accidentes de trabajo diversos * Accidentes de transito * Daños a terceros
Métodos de almacenamiento inadecuados durante...	Condiciones de Seguridad	Métodos de almacenamiento inadecuados durante...	* Fugas * Derrames * Daños a personas * Daño al ambiente.

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Walter Muñoz	78704443	Ayudante	Walter Muñoz

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-010
	NOTIFICACION DE RIESGOS	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		
PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"			
ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN		
TAREAS:	TAREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"		
CARGOS:	Director de Obra, Residente de Obra, Ingenieros Residentes, Especialistas SIG, Auxiliar SST, Auxiliar Administrativo, Contador, Interventoría, Inspectores de Obra, Técnicos, Ayudantes de Obra, Maestros de Obra, Oficiales de Obra, Topógrafo, Cadeneros, Operarios/Conductor, Celadores, Almacenista, Personal de Limpieza y Oficios Varios.		
FECHA DE LA NOTIFICACIÓN:	23 Junio 2026		

PELIGRO			EFECTO POSIBLE
Factor de Riesgo		Clasificación	
Exposición a ruido proveniente de ..	* Equipos * Herramientas * Maquinaria * Equipos, impresoras, fotocopiadoras	Físicos	* Pérdida de capacidad auditiva * Estrés
Exposición a vibraciones provenientes de...	* Herramientas electricas * Maquinaria.	Físicos	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Exposición a material particulado proveniente de...	* Polvo * Suciedad en el ambiente	Químicos	Enfermedades del Sistema respiratorio
Manipulación de productos químicos peligros	* Durante la realización de las actividades de construcción o administrativas * Almacenamiento de sustancias químicas * Uso de sustancias químicas	Químicos	* Derrames * Fugas * Contaminación ambiental * Incendio * Explosión * Quemaduras * Alergias * Irritacion
exposición a virus, bacterias, hongos o parásitos presentes en...	* El medio ambiente donde se realicen las labores * Incursión del COVID-19 en Colombia	Biológicos	Depende del microorganismo
Picaduras de animales	* El medio ambiente donde se realicen las labores	Biológicos	Depende de los animales
Mordeduras de animales	* El medio ambiente donde se realicen las labores	Biológicos	Depende del estado del animal
Inhalación o contacto de productos de origen vegetal o animal.	* El medio ambiente donde se realicen las labores	Biológicos	Reacciones tóxicas
Sobreesfuerzo por la adopción de posturas forzadas ... hiperfexiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en ...	En obra: * Uso de herramientas y equipos * Cargue de materiales de forma manual * Conducción de vehículos, operación de maquinaria En oficina: * Durante la manipulacion de carpetas * Al subir estantes * Al trabajar en el escritorio	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Sobreesfuerzo por la adopción de postura estática prolongada ... sentado, de pie, agachado, etc...	* Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina * Conducción de vehículos, operación de maquinaria	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Hábitos posturales inadecuados durante..	* Durante la realización de las actividades de construcción * Conducción de vehículos, operación de maquinaria * El uso de herramientas y equipos * Al trabajar en el escritorio	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Movimientos repetitivos ...	* Durante la realización de las actividades de construcción u oficina * Conducción de vehículos, operación de maquinaria * En el uso de teclados	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Levantamiento de carga ...	En obra u oficina: * Durante la realización de las actividades de construcción u oficina. * Arrastre o empuje de materiales, herramientas y equipos * Durante el almacenamiento de materiales, herramientas y equipos * Durante el transporte de materiales, herramientas y equipos * Durante la limpieza de equipos, materiales, muebles, etc	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Trabajo bajo presión o con apremio de tiempo	* Durante la realización de las actividades de construcción o administrativas * Trabajo bajo presión o apremio de tiempo en oficina u obra	Psicosociales	* Estrés * Cansancio * Fatiga
Complejidad y rapidez del trabajo por ...	* Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina * Trabajo bajo presión o apremio de tiempo en oficina u obra	Psicosociales	* Estrés * Cansancio * Fatiga
Ordenes contradictorias	Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina	Psicosociales	* Estrés
Acoso laboral	* Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina * Por relaciones interpersonales	Psicosocial	* Estrés
Relaciones interpersonales y grupales	* Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo	Psicosocial	* Estrés
Factores intralaborales ..	* Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo	Psicosocial	Dependiendo del factor
Factores extralaborales...	* Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo	Psicosocial	Dependiendo del factor
Factores individuales...	* Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo	Psicosocial	Dependiendo del factor

Powered by CamScanner

Trabajos con posibilidad de contactos eléctricos directos o indirectos durante...	Durante la realización de las actividades de construcción,conducción de vehiculos, operación de maquinaria o actividades administrativas de oficina	Condiciones de Seguridad	* Electrocución * Daños a equipos * Incendio.
Atrapamientos entre mecanismos en movimiento durante...	* Durante la operación de equipos y Herramientas * Conducción de vehiculos, operación de maquinaria * Durante la ejecución de las Actividades de supervision	Condiciones de Seguridad	* Amputaciones * Machucones * Fracturas * Luxaciones.
Golpes contra objetos inmóviles	En obra: Durante la operación de equipos y Herramientas, Conducción de vehiculos, operación de maquinaria y durante su parqueo * En oficina: Escritorios, estantes, equipos, sillas * Durante actividades de supervición	Condiciones de Seguridad	Politraumatismos
Ser golpeado por... Durante...	En obra: Materiales, equipos y herramienta durante su uso, conducción de vehiculos, operación de maquinaria y durante su parqueo, etc En oficina: Herramientas, objetos, materiales, utensilios o personas	Condiciones de Seguridad	Politraumatismos
Caidas al mismo nivel por...	En obra u oficina: * Traslados * Tropiezos * Piso resbaloso o inestable * Objetos en la via	Condiciones de Seguridad	Politraumatismos
Caida de objetos de altura durante.	* La realizacion de actividades en alturas * Durante la ejecución de las Actividades de supervision	Condiciones de Seguridad	* Politraumatismos * Muerte
Caidas a diferente nivel o alturas superiores a 2,00 mts durante.	* Condiciones de Seguridad * Actividades de supervición	Caídas a diferente nivel o alturas superiores a 2.00 mts durante.	* Politraumatismos * Muerte
Proyección de partículas (solidas, liquidas o gases) provenientes de...	* La realización de las actividades de construcción u oficina * Durante la realizacion de tareas de aseo	Condiciones de Seguridad	* Daños oculares * Incrustación de objetos extraños * Heridas
Trabajos con herramientas o equipos	Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina	Condiciones de Seguridad	Accidentes de trabajo diversos
Trabajos con elementos cortantes o cortopunzantes	* Durante las actividades constructivas o de oficina	Condiciones de Seguridad	* Heridas * Cortaduras * Presiones punzantes. * Infecciones * Desangre * Muerte
Orden y aseo deficiente del sitio de trabajo	* Durante la ejecución de las actividades	Condiciones de Seguridad	Accidentes de trabajo diversos
Señalización inadecuada o insuficiente en..	* Sitio de trabajo	Condiciones de Seguridad	Accidentes de trabajo diversos
Iluminación deficiente en sitio de trabajo debido a...	* Poca o mucha iluminación en las oficinas o en obra * Pantallas de equipos, computaoras, celulares, tablets u otros	Físicos	* Cansancio * Fatiga visual ...
Exposición a humos, gases o vapores provenientes de...	* Productos químicos de aseo	Químicos	Enfermedades del Sistema respiratorio
Trabajo con jornadas extendidas	* Durante la ejecución de las actividades en oficina o de obra	Psicosociales	* Estrés * Cansancio * Fatiga
Desconocimiento de la tarea, normas o procedimientos.	* Durante la ejecución de las actividades	Condiciones de Seguridad	Accidentes de trabajo diversos
Métodos de almacenamiento inadecuados durante...	* Durante las actividades de oficina o de obra * Acopio y almacenamiento de documentación, materiales, herramientas y equipos	Condiciones de Seguridad	* Fugas * Derrames * Daños a personas * Daño al ambiente.
Exposición a ruido proveniente de ...	La realización de las actividades de construcción o de oficina	Físicos	* Pérdida de capacidad auditiva * Estrés
Exposición a material particulado proveniente de...	La realización de las actividades de construcción	Químicos	Enfermedades del Sistema respiratorio
Desplazamientos por largas jornadas a pie	* Durante las actividades de supervisión	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Aplicación de fuerza .... empujar o tirar de .... manipular hacia arriba, abajo, hacia dentro o fuera ...	* Materiales, herramientas y equipos	Carga física – ergonómicos – Biomecánicos	Desordenes musculo esqueléticos – DME.
Trabajo repetitivo y monótono	* Durante el almacenamiento de materiales, herramientas y equipos	Psicosociales	* Estrés * Cansancio * Fatiga
Exceder la capacidad de equipos o herramientas	* Almacenamiento de materiales, utensilios, herramientas, elementos, en estantes	Condiciones de Seguridad	Accidentes de trabajo diversos
Exposición a altas temperaturas provenientes de...	* Exposición a la intemperie y sol	Físicos	* Deshidratación * Quemaduras en la piel
Exposición a radiaciones no ionizantes provenientes de...	* Exposición a la intemperie y sol	Físicos	Depende del tipo de radiación
Vías en mal estado	* En el traslado de materiales, herramientas y equipos	Condiciones de Seguridad	Accidentes de trabajo diversos
Traslados o trabajos en zonas de conflicto o inseguras.	Durante la realización de las labores	Condiciones de Seguridad	* Secuestro * Robo * Atraco

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Jaime Espinosa	1003191677	Ayudante	Jaime E.
Yorge Sharly	1067963880	Ayudante	
Samir Narvaez	1003395555	Oficial	Samir Narvaez

Powered by CamScanner

ANEXO N° 6.

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

ANEXO N°6.1.

ENCUESTAS APLICADAS

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-013
CONSORCIO	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Objetivo de la encuesta: Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

I. Registre los siguientes datos:

1.Nombre del Trabajador:	Cristobal de Jesus Cadron payares		
2. Identificación:	1067839817		
3. Cargo:	Ayudante		
4. Área (Administrativa/operativa):	Operativa		
5. Fecha de nacimiento:	16 Marzo 1985	Edad actual:	41
6. Dirección de residencia:	Mz 2 lote 21	Barrio:	La Gran victoria
7. Municipio:	Monteria		
8. Telefono / Celular:	3226268912		
9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia:	Gendi Hoyos	Parentesco:	Esposa
10. Telefono / Celular:	3148047114		

II. Marque con una X

11. Estado Civil:	a. Soltero (a)	b. Casado (a)/union libre X	c. Separado (a)/Divorciado	d. Viudo(a)		
12. Nivel de escolaridad:	a. Primaria	b. Bachillerato X	c. Técnico / Tecnólogo	d. Pregrado Universitario	e. Postgrado Universitario	
13. Tenencia de vivienda:	a. Propia X	b. Arrendada	c. Familiar	d. Compartida con otra(s) familia(s)		
14. Estrato:	a. 1 X	b. 2	c. 3	d. 4	e. 5	f. 6 o mas
15. Numero de personas a cargo:	a. Ninguna	b. 1 - 3 personas X	c. 4 - 6 personas	d. Más de 6 personas		
16. Uso del tiempo libre:	a. Otro trabajo	b. Labores domésticas	c. Recreacion y deporte	d. Estudio	e. Ninguno X	
17. Practica algún deporte:	a. No X	b. Si	Diario	Semanal	Quincenal	Ocasional
18. Promedio de Ingresos mensuales:	a. Mínimo Legal (S.M.L.) X	b. Entre 1 a 3 S.M.L.	c. Entre 4 a 5 S.M.L.	d. Entre 5 y 6 S.M.L.	e. Mas de 7 S.M.L.	
19. Antigüedad en la empresa	a. Menos de 6 meses X	b. entre 6 y 12 meses	c. Mas de 1 años			
20. Antigüedad en el cargo actual	a. Menos de 6 meses	b. entre 6 y 12 meses	c. Mas de 1 años X			
21. Fuma:	a. No X	b. Si	Prom. diario cigarrillos:			
22. Consume bebidas alcoholicas:	a. No	b. Si X	Semanal	Quincenal	Mensual	Ocasional X

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

SI X | No

Fecha de diligenciamiento:	19/06/26	Firma del trabajador:	Cristobal Cedrón

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-013
CONSORCIO	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Objetivo de la encuesta: Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

I. Registre los siguientes datos:

1.Nombre del Trabajador:	Arturo José palacio Beltran		
2. Identificación:	1005708787		
3. Cargo:	Ayudante		
4. Área (Administrativa/operativa):	Operativa		
5. Fecha de nacimiento:	02 febrero 2004	Edad actual:	25
6. Dirección de residencia:	cll 48 B N° 18 - 38	Barrio:	Rosendo García
7. Municipio:	Tolú		
8. Telefono / Celular:	3008667053		
9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia:	Jesus Ramos	Parentesco:	Cuñado
10. Telefono / Celular:	3045985768		

II. Marque con una X

11. Estado Civil:	a. Soltero (a)	b. Casado (a)/union libre X	c. Separado (a)/Divorciado	d. Viudo(a)		
12. Nivel de escolaridad:	a. Primaria	b. Bachillerato X	c. Técnico / Tecnólogo	d. Pregrado Universitario	e. Postgrado Universitario	
13. Tenencia de vivienda:	a. Propia	b. Arrendada X	c. Familiar	d. Compartida con otra(s) familia(s)		
14. Estrato:	a. 1 X	b. 2	c. 3	d. 4	e. 5	f. 6 o mas
15. Numero de personas a cargo:	a. Ninguna	b. 1 - 3 personas X	c. 4 - 6 personas	d. Más de 6 personas		
16. Uso del tiempo libre:	a. Otro trabajo	b. Labores domésticas	c. Recreacion y deporte	d. Estudio	e. Ninguno X	
17. Practica algún deporte:	a. No X	b. Si	Diario	Semanal	Quincenal	Ocasional
18. Promedio de ingresos mensuales:	a. Mínimo Legal (S.M.L.) X	b. Entre 1 a 3 S.M.L.	c. Entre 4 a 5 S.M.L.	d. Entre 5 y 6 S.M.L.	e. Mas de 7 S.M.L.	
19. Antigüedad en la empresa	a. Menos de 6 meses X	b. entre 6 y 12 meses	c. Mas de 1 años			
20. Antigüedad en el cargo actual	a. Menos de 6 meses	b. entre 6 y 12 meses	c. Mas de 1 años X			
21. Fuma:	a. No X	b. Si	Prom. diario cigarrillos:			
22. Consume bebidas alcoholicas:	a. No	b. Si X	Semanal	Quincenal	Mensual	Ocasional X

CONSENTIMIENTO INFORMADO Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.	SI X	No
Fecha de diligenciamiento: 19/06/2026	**Firma del trabajador:**	Arturo Palacio

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-013
	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Objetivo de la encuesta: Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

I. Registre los siguientes datos:

1.Nombre del Trabajador:	Walter Antonio Muñoz Castro		
2. Identificación:	78704443		
3. Cargo:	Ayudante		
4. Área (Administrativa/operativa):	operativa		
5. Fecha de nacimiento:	17 Enero 1967	Edad actual:	59
6. Dirección de residencia:	Cra 17 # 3-54	Barrio:	Camilo Torres
7. Municipio:	Montería		
8. Telefono / Celular:	3244277521		
9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia:	Damaris Altamiranda	Parentesco:	Esposa
10. Telefono / Celular:	3215655050		

II. Marque con una X

11. Estado Civil:	a. Soltero (a)	b. Casado (a)/union libre X	c. Separado (a)/Divorciado	d. Viudo(a)		
12. Nivel de escolaridad:	a. Primaria X	b. Bachillerato	c. Técnico / Tecnólogo	d. Pregrado Universitario	e. Postgrado Universitario	
13. Tenencia de vivienda:	a. Propia	b. Arrendada X	c. Familiar	d. Compartida con otra(s) familia(s)		
14. Estrato:	a. 1 X	b. 2	c. 3	d. 4	e. 5	f. 6 o mas
15. Numero de personas a cargo:	a. Ninguna	b. 1 - 3 personas X	c. 4 - 6 personas	d. Más de 6 personas		
16. Uso del tiempo libre:	a. Otro trabajo	b. Labores domèsticas	c. Recreacion y deporte	d. Estudio	e. Ninguno X	
17. Practica algún deporte:	a. No X	b. Si	Diario	Semanal	Quincenal	Ocasional
18. Promedio de Ingresos mensuales:	a. Mínimo Legal (S.M.L.) X	b. Entre 1 a 3 S.M.L.	c. Entre 4 a 5 S.M.L.	d. Entre 5 y 6 S.M.L.	e. Mas de 7 S.M.L.	
19. Antigüedad en la empresa	a. Menos de 6 meses X	b. entre 6 y 12 meses	c. Mas de 1 años			
20. Antigüedad en el cargo actual	a. Menos de 6 meses	b. entre 6 y 12 meses	c. Mas de 1 años X			
21. Fuma:	a. No X	b. Si	Prom. diario cigarrillos:			
22. Consume bebidas alcoholicas:	a. No X	b. Si	Semanal	Quincenal	Mensual	Ocasional

CONSENTIMIENTO INFORMADO Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.		SI X	No
Fecha de diligenciamiento:	20/06/26	Firma del trabajador:	Walter muñoz

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-013
	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Objetivo de la encuesta: Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

I. Registre los siguientes datos:

1.Nombre del Trabajador:	Jaime Javier Espinosa Arteaga		
2. Identificación:	1003794671		
3. Cargo:	Ayudante		
4. Área (Administrativa/operativa):	operativa		
5. Fecha de nacimiento:	16 Mayo 1997	Edad actual:	29
6. Dirección de residencia:	Mz 52 lote 21	Barrio:	Villa Cielo
7. Municipio:	Monteria		
8. Telefono / Celular:	3025286730		
9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia:	Yadiris Morales	Parentesco:	Esposa
10. Telefono / Celular:	3233198284		

II. Marque con una X

11. Estado Civil:	a. Soltero (a)	b. Casado (a)/union libre X	c. Separado (a)/Divorciado	d. Viudo(a)		
12. Nivel de escolaridad:	a. Primaria	b. Bachillerato X	c. Técnico / Tecnólogo	d. Pregrado Universitario	e. Postgrado Universitario	
13. Tenencia de vivienda:	a. Propia	b. Arrendada	c. Familiar X	d. Compartida con otra(s) familia(s)		
14. Estrato:	a. 1	b. 2 X	c. 3	d. 4	e. 5	f. 6 o mas
15. Numero de personas a cargo:	a. Ninguna	b. 1 - 3 personas X	c. 4 - 6 personas	d. Más de 6 personas		
16. Uso del tiempo libre:	a. Otro trabajo	b. Labores domésticas	c. Recreacion y deporte	d. Estudio	e. Ninguno X	
17. Practica algún deporte:	a. No X	b. Si	Diario	Semanal	Quincenal	Ocasional
18. Promedio de ingresos mensuales:	a. Mínimo Legal (S.M.L.) X	b. Entre 1 a 3 S.M.L.	c. Entre 4 a 5 S.M.L.	d. Entre 5 y 6 S.M.L.	e. Mas de 7 S.M.L.	
19. Antigüedad en la empresa	a. Menos de 6 meses X	b. entre 6 y 12 meses	c. Mas de 1 años			
20. Antigüedad en el cargo actual	a. Menos de 6 meses	b. entre 6 y 12 meses	c. Mas de 1 años X			
21. Fuma:	a. No X	b. Si	Prom. diario cigarrillos:			
22. Consume bebidas alcoholicas:	a. No	b. Si X	Semanal	Quincenal	Mensual	Ocasional X

CONSENTIMIENTO INFORMADO Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.	SI X	No

Fecha de diligenciamiento:	23/06/26	Firma del trabajador:	Jaime E.

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-013
CONSORCIO	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Objetivo de la encuesta: Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

I. Registre los siguientes datos:

1.Nombre del Trabajador:	Jorge Miguel Suarez Genes		
2. Identificación:	1067963880		
3. Cargo:	Ayudante		
4. Área (Administrativa/operativa):	operativa		
5. Fecha de nacimiento:	23 septiembre 1998	Edad actual:	28
6. Dirección de residencia:	Mz 30 lote 21	Barrio:	villa cielo
7. Municipio:	Montería		
8. Telefono / Celular:	3242848168		
9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia:	Rigoberto Martinez	Parentesco:	padre
10. Telefono / Celular:	3043976246		

II. Marque con una X

11. Estado Civil:	a. Soltero (a) X	b. Casado (a)/union libre		c. Separado (a)/Divorciado		d. Viudo(a)
12. Nivel de escolaridad:	a. Primaria	b. Bachillerato X	c. Técnico / Tecnólogo	d. Pregrado Universitario		e. Postgrado Universitario
13. Tenencia de vivienda:	a. Propia X	b. Arrendada	c. Familiar	d. Compartida con otra(s) familia(s)		
14. Estrato:	a. 1	b. 2 X	c. 3	d. 4	e. 5	f. 6 o mas
15. Numero de personas a cargo:	a. Ninguna X	b. 1 - 3 personas	c. 4 - 6 personas	d. Más de 6 personas		
16. Uso del tiempo libre:	a. Otro trabajo	b. Labores domèsticas	c. Recreacion y deporte X		d. Estudio	e. Ninguno
17. Practica algún deporte:	a. No	b. Si X	Diario	Semanal	Quincenal	Ocasional X
18. Promedio de ingresos mensuales:	a. Mínimo Legal (S.M.L.) X	b. Entre 1 a 3 S.M.L.	c. Entre 4 a 5 S.M.L.	d. Entre 5 y 6 S.M.L.	e. Mas de 7 S.M.L.	
19. Antigüedad en la empresa	a. Menos de 6 meses X		b. entre 6 y 12 meses		c. Mas de 1 años	
20. Antigüedad en el cargo actual	a. Menos de 6 meses		b. entre 6 y 12 meses		c. Mas de 1 años X	
21. Fuma:	a. No X	b. Si	Prom. diario cigarrillos:			
22. Consume bebidas alcoholicas:	a. No	b. Si X	Semanal	Quincenal	Mensual X	Ocasional

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

				Si X	No
Fecha de diligenciamiento:	23/06/2026	Firma del trabajador:			

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-013
CONSORCIO	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

Objetivo de la encuesta: Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

I. Registre los siguientes datos:

1.Nombre del Trabajador:	Samir Alberto Narvaez Vertel		
2. Identificación:	1003395555		
3. Cargo:	Oficial		
4. Área (Administrativa/operativa):	Operativa		
5. Fecha de nacimiento:	20 febrero 1985	Edad actual:	41
6. Dirección de residencia:	Km 6 via planeta rica	Barrio:	Las llamas
7. Municipio:	Montería		
8. Telefono / Celular:	3016675090		
9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia:	Margueza Camargo	Parentesco:	Esposa
10. Telefono / Celular:	3008008600		

II. Marque con una X

11. Estado Civil:	a. Soltero (a) X	b. Casado (a)/union libre		c. Separado (a)/Divorciado		d. Viudo(a)
12. Nivel de escolaridad:	a. Primaria X	b. Bachillerato	c. Técnico / Tecnólogo	d. Pregrado Universitario		e. Postgrado Universitario
13. Tenencia de vivienda:	a. Propia X	b. Arrendada	c. Familiar	d. Compartida con otra(s) familia(s)		
14. Estrato:	a. 1 X	b. 2	c. 3	d. 4	e. 5	f. 6 o mas
15. Numero de personas a cargo:	a. Ninguna	b. 1 - 3 personas	c. 4 - 6 personas X	d. Más de 6 personas		
16. Uso del tiempo libre:	a. Otro trabajo	b. Labores domèsticas	c. Recreacion y deporte		d. Estudio	e. Ninguno X
17. Practica algún deporte:	a. No X	b. Si	Diario	Semanal	Quincenal	Ocasional
18. Promedio de ingresos mensuales:	a. Mínimo Legal (S.M.L.) X	b. Entre 1 a 3 S.M.L.	c. Entre 4 a 5 S.M.L.	d. Entre 5 y 6 S.M.L.	e. Mas de 7 S.M.L.	
19. Antigüedad en la empresa	a. Menos de 6 meses X		b. entre 6 y 12 meses		c. Mas de 1 años	
20. Antigüedad en el cargo actual	a. Menos de 6 meses		b. entre 6 y 12 meses		c. Mas de 1 años X	
21. Fuma:	a. No X	b. Si	Prom. diario cigarrillos:			
22. Consume bebidas alcoholicas:	a. No X	b. Si	Semanal	Quincenal	Mensual	Ocasional

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

SI X | No

Fecha de diligenciamiento:	23/06/2026	Firma del trabajador:	Samir Narvaez

Powered by CamScanner

ANEXO N°6.2.

TABULACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-014
	PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	VERSIÓN:	001
	PARTE 1		
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SH.P-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	FECHA DE INGRESO	EPS	ARL	AFP	AREA	SUELDO / HONORARIOS	ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA	ANTIGÜEDAD EN EL CARGO	FECHA DE RETIRO
1	RICHARD DE JESUS RAMOS MARTINEZ	11.154.364	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	23/04/2026	SANITAS	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	
2	ERGUIN ANTONIO CARVAJAL RODRIGUEZ	11.004.806	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE	23/04/2026	MUTUAL SER	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	
3	MARIO ANTONIO VERTEL CAUSIL	6.885.013	OFICIAL DE OBRA	INDEPENDIENTE	23/04/2026	MUTUAL SER	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	
4	ARLEN JOSE ALVAREZ BELLO	78.694.359	OFICIAL DE OBRA	INDEPENDIENTE	23/04/2026	SALUD TOTAL	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	
5	LUIS DAVID RUIZ MUÑOZ	1.192.812.500	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	23/04/2026	PROTEGER EPS	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	3/06/2026
6	MARIO RUIZ	1.062.954.579	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	23/04/2026	SALUD TOTAL	EN TRAMITE	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	28/04/2026
7	HUGO ANTONIO VEGA MONTIEL	6.880.870	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	23/04/2026	SALUD TOTAL	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	
8	RODRIGO SEGUNDO SOLORZANO GUZMAN	78.714.110	OFICIAL DE OBRA	INDEPENDIENTE	23/04/2026	PROTEGER EPS	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	
9	MARIA INES GONZALEZ AYUZ	1.067.836.657	INGENIERA ESP, SG-SST	DEPENDIENTE	23/04/2026	SURA	SURA	EN TRAMITE	ADMINISTRATIVA/OPERATIVA	ENTRE 1 Y 6 (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	
10	ANGEL MARIA RIVERA RAMIREZ	6.891.551	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE	27/04/2026	NUEVA EPS	EN TRAMITE	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	3/06/2026
11	MANUEL FRANCISCO PEREZ SALGADO	15.275.912	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	27/04/2026	NUEVA EPS	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	3/06/2026
12	BERNABE GUTIERREZ TEHERAN	9.104.691	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	27/04/2026	MUTUAL SER	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	
13	LUIS ALFREDO HURTADO	6.857.206	OFICIAL DE OBRA	INDEPENDIENTE	27/04/2026	MUTUAL SER	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	
14	IPATIA ROVIRA VILLALOBOS MOLINA	50.905.356	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPENDIENTE	23/04/2026	SALUD TOTAL	SURA	EN TRAMITE	ADMINISTRATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	15/05/2026
15	RAFAEL ENRIQUE HERNANDEZ MURILLO	10.782.175	OFICIAL DE OBRA	INDEPENDIENTE	7/05/2026	MUTUAL SER	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	
16	DIOMILDE CLAVER SIERRA BOLIVAR	72.018.203	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	7/05/2026	NUEVA EPS	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	
17	RAMON BALLESTEROS ZARATE	15.680.642	OFICIAL DE OBRA	DEPENDIENTE	7/05/2026	MUTUAL SER	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	3/06/2026
18	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA	1.007.339.391	ARQUITECTA	DEPENDIENTE	13/05/2026	MUTUAL SER	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	ENTRE 1 A 3 (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	
19	LISETH PAOLA CARDENAS FLOREZ	1.003.046.257	AUXILIAR SST	DEPENDIENTE	15/05/2026	MUTUAL SER	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	
20	ELIECER DEL CRISTO GARCES TAMARA	15.680.389	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE	30/05/2026	NUEVA EPS	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	18/06/2026
21	DEIMER EDUARDO ORTIZ IBAÑEZ	1.010.087.719	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	30/05/2026	NUEVA EPS	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	19/06/2026
22	CRISTIAN DAVID PEREZ MARTINEZ	1.062.966.377	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	30/05/2026	MUTUAL SER	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MENOS DE 6 MESES	30/06/2026
23	NEYL ELIECER GARCES FLOREZ	1.062.435.302	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	30/05/2026	SALUD TOTAL	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	
24	JOAQUIN DE JESUS ORTIZ MARQUEZ	10.975.591	MAESTRO DE OBRA	INDEPENDIENTE	30/05/2026	NUEVA EPS	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	18/06/2026
25	JOSE ORLANDO CIFUENTES	12.459.136	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	2/06/2026	NUEVA EPS	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	
26	JOSE GREGORIO MARQUEZ HERNANDEZ	78.744.534	OFICIAL DE OBRA	INDEPENDIENTE	2/06/2026	MUTUAL SER	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	19/06/2026
27	IVAN LUIS ARRIETA PAYARES	70.769.595	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	2/06/2026	MUTUAL SER	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	
28	JOSE ENRIQUE HERNANDEZ SOLANO	1.068.576.592	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	2/06/2026	SALUD TOTAL	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	
29	JOSE RAFAEL AVILEZ ALBARADO	1.067.860.476	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	4/06/2026	MUTUAL SER	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	
30	ANDRES MANUEL BERRIO FERNANDEZ	78712688	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	4/06/2026	SALUD TOTAL	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	24/06/2026
31	JULIO ALFREDO GARCIA RUIZ	78.699.971	AYUDANTE DE OBRA	INDEPENDIENTE	4/06/2026	SALUD TOTAL	SURA	EN TRAMITE	OPERATIVA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V.)	MENOS DE 6 MESES	MAS DE 1 AÑO	

1266

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-014
	PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	VERSIÓN:	001
	PARTE 2		
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	FECHA DE NACIMIENTO	NIVEL DE ESCOLARIDAD	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	MUNICIPIO	TELEFONO	PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA	TELEFONO	ESTADO CIVIL	TENENCIA DE VIVIENDA	ESTRATO
1	RICHARD DE JESUS RAMOS MARTINEZ	11.154.364	11/08/1976	BACHILLERATO	VEREDA LEINA (SAN CARLOS)	MONTERIA	3128620208	DINA MOLINA	3128620208	CASADO/UNION LIBRE	PROPIA	1
2	ARGUIN ANTONIO CARVAJAL RODRIGUEZ	11.004.806	28/05/201977	BACHILLERATO	CALLE 8 NO 80-27 BARRIO LOS ARROYOS	MONTERIA	3215693989	CLEIRA MOLINA	3216121078	CASADO/UNION LIBRE	ARRENDADA	1
3	MARIO ANTONIO VERTEL CALISIL	6.885.013	28/08/1960	BACHILLERATO	MZ 16 LOTE 23 BARRIO VILLA CIELO	MONTERIA	3012147099	VIANI VERTEL	3132181852	CASADO/UNION LIBRE	PROPIA	1
4	ARLEN JOSE ALVAREZ BELLO	78.694.359	25/08/1967	BACHILLERATO	MZ 58 LOTE 29 BARRIO VILLA PAZ	NO INFORMA	3136403970	AMPARO ARRIETA	3218991251	CASADO/UNION LIBRE	PROPIA	1
5	LUIS DAVID RUIZ MUÑOZ	1.192.612.500	15/02/2001	PRIMARIA	MZ E LOTE 11 BARRIO NUEVO HORIZONTE	MONTERIA	3244185757	MARIA SOFIA PACHECO VIDAL	3117136273	CASADO/UNION LIBRE	FAMILIAR	1
6	MARIO RUIZ	1.062.954.579	2/11/1996	BACHILLERATO	MZ 41 LOTE 10 BARRIO SANTA FE	MONTERIA	3123489110	DENIS RAMIREZ	3135627586	SOLTERO	FAMILIAR	1
7	HUGO ANTONIO VEGA MONTIEL	6.880.870	5/05/1960	PRIMARIA	MZ 3 LOTE 13 BARRIO MOGAMBO	MONTERIA	3214364395	HUGO SERGIO VEGA	3118830041	SOLTERO	ARRENDADA	1
8	RODRIGO SEGUNDO SOLORZANO GUZMAN	78.714.119	25/05/1972	PRIMARIA	MZ 33 LOTE 10 BARRIO SANTA FE	MONTERIA	3205018189	OSMIRA MILENA SOLORZANO	3205060247	SOLTERO	FAMILIAR	1
9	MARIA INES GONZALEZ AYUZ	1.067.836.657	16/12/2026	PREGRADO UNIVERSITARIO	CARRERA 12 NO. 57 - 12 APTO 703 U.R. TORRES DE LA CASTELLANA	MONTERIA	3007923166	RICHARD RODRIGUEZ	3013707479	CASADO/UNION LIBRE	PROPIA	4
10	ANGEL MARIA RIVERA RAMIREZ	6.891.651	16/07/1954	BACHILLERATO	CRA 2 NO 249 BARRIO 7 DE MAYO	MONTERIA	3223286941	AIDE VEGA	3214861140	CASADO/UNION LIBRE	PROPIA	1
11	MANUEL FRANCISCO PEREZ SALGADO	15.275.012	28/08/1959	PRIMARIA	MZ K LOTE 3 BARRIO PAZ DEL NORTE	MONTERIA	3136943376	ISABEL PEREZ	3218380542	CASADO/UNION LIBRE	PROPIA	1
12	BERNABE GUTIERREZ TEHERAN	9.104.691	1/09/1978	BACHILLERATO	MZ E3 LOTE 19 BARRIO EL ALIVIO	MONTERIA	3005591632	DENIS HERNANDEZ	3127071756	CASADO/UNION LIBRE	ARRENDADA	1
13	LUIS ALFREDO HURTADO	6.857.206	13/07/1942	PRIMARIA	CALLE 2 NO 232 BARRIO 20 DE JULIO	MONTERIA	3114243674	ORLANDO HURTADO	NO INFORMA	CASADO/UNION LIBRE	PROPIA	1
14	IPATIA ROVIRA VILLALOBOS MOLINA	50.905.356	14/04/1974	TECNICO/TECNOLOGO	CALLE 95 NO 481 BARRIO MOCARI	MONTERIA	3173236929	DALADIEL LOPEZ	3146055544	CASADO/UNION LIBRE	PROPIA	1
15	RAFAEL ENRIQUE HERNANDEZ MURILLO	10.782.175	20/02/1979	BACHILLERATO	CALLE 2A NO. 20 - 04 BARRIO ROBINSON PITALUA	MONTERIA	3024185585	RAFAEL GONZALEZ	3135026444	SOLTERO	FAMILIAR	1
16	DIOMILDE CLAVER SIERRA BOLIVAR	72.018.203	9/09/1976	BACHILLERATO	MANZANA 9 LOTE 6 BARRIO LA PRADERA	MONTERIA	3103727663	MARIBEL SIERRA	3025275192	SEPARADO/DIVORCIADO	ARRENDADA	1
17	RAMON BALLESTEROS ZARATE	15.680.642	26/06/1956	BACHILLERATO	MANZANA 57 CALLE 3 LOTE 12 BARRIO VILLA MELISAA	LORICA	3042623913	JARDITH HERRERA B	3193724406	CASADO/UNION LIBRE	ARRENDADA	1
18	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA	1.007.339.391	12/01/1997	PREGRADO UNIVERSITARIO	CARRERA 3 NO. 1 - 45 BARRIO LOS CEDROS	CERETE	3103199848	RONALD ALMANZA	3104947496	CASADO/UNION LIBRE	PROPIA	1
19	LISETH PAOLA CARDENAS FLOREZ	1.003.046.257	16/03/1999	TECNICO/TECNOLOGO	CALLE 30 MANZANA 01 LOTE 9 BARRIO MINUTO DE DIOS	MONTERIA	3216198102	KELLYS CARDENAS FLOREZ	3146655101	SOLTERO	FAMILIAR	1
20	ELIECER DEL CRISTO GARCES TAMARA	15.680.389	24/06/1957	TECNICO/TECNOLOGO	MANZANA 41 LOTE 10 BARRIO CANTA CLARO	MONTERIA	3135140779	MARIA SUAREZ	3145731132	CASADO/UNION LIBRE	PROPIA	1
21	DEIMER EDUARDO ORTIZ IBAÑEZ	1.010.087.719	15/10/2000	BACHILLERATO	MANZANA 42 LOTE 2 BARRIO CANTA CLARO	MONTERIA	3048402448	MARIA DEL CARMEN IBAÑEZ BOLAÑO	3205477082	SOLTERO	FAMILIAR	1
22	CRISTIAN DAVID PEREZ MARTINEZ	1.062.965.377	9/12/2001	BACHILLERATO	MANZANA 45 LOTE 1 BARRIO VILLA CIELO	MONTERIA	3218406741	CARMINA DEL CARMEN	NO INFORMA	SOLTERO	FAMILIAR	1
23	NEYL ELIECER GARCES FLOREZ	1.062.436.302	8/03/2007	BACHILLERATO	MANZANA 41 LOTE 10 BARRIO CANTA CLARO	MONTERIA	3004185304	MARIA SUAREZ	3145731132	SOLTERO	FAMILIAR	1
24	JOAQUIN DE JESUS ORTIZ MARQUEZ	10.975.591	5/01/1962	PRIMARIA	MANZANA 42 LOTE 29 BARRIO CANTACLARO	MONTERIA	NO INFORMO	MARIA DEL CARMEN IBAÑEZ BOLAÑO	3205477082	CASADO/UNION LIBRE	FAMILIAR	1
25	JOSE ORLANDO CIFUENTES	12.459.136	1/06/1976	PRIMARIA	CALLE 16 NO. 23 - 03 BARRIO 06 DE MARZO	MONTERIA	3044455869	LUZ MARY MEDINA	3127170697	CASADO/UNION LIBRE	ARRENDADA	1
26	JOSE GREGORIO MARQUEZ HERNANDEZ	78.744.534	11/06/1971	PRIMARIA	MANZANA 42 LOTE 5	MONTERIA	3045783672	ANA LISETH MARQUEZ	3148240710	CASADO/UNION LIBRE	FAMILIAR	1
27	IVAN ARRIETA	70.769.595	5/06/1975	PRIMARIA	BARRIO NUEVO PARAISO	MONTERIA	3205095586	LEONOR RODRIGUEZ	3126448643	CASADO/UNION LIBRE	PROPIA	1
28	JOSE ENRIQUE HERNANDEZ SOLANO	1.068.576.592	28/06/1997	PRIMARIA	BARRIO NUEVO PARAISO	MONTERIA	3237266589	EMELIS ELENA HERNANDEZ	3239421796	SOLTERO	PROPIA	1
29	JOSE RAFAEL AVILEZ ALBARADO	1.067.869.476	12/03/1984	BACHILLERATO	MANZANA 43 LOTE 6 BARRIO COLINA REAL	MONTERIA	3106512197	PAOLA AVILEZ	3123650215	SOLTERO	ARRENDADA	1
30	ANDRES MANUEL BERRRIO FERNANDEZ	78712688	10/11/1971	BACHILLERATO	DIAGONAL 2 NO. 10 - 10 BARRIO GALILEA	MONTERIA	3143914017	MAIRA BERRIO	3044255491	CASADO/UNION LIBRE	ARRENDADA	1
31	JULIO ALFREDO GARCIA RUIZ	78.699.971	22/05/1962	PRIMARIA	CALLE 8 NO. 18 - 66 BARRIO 06 DE MARZO	MONTERIA	3217917194	MARTHA GARCIA RUIZ	3145717180	SOLTERO	PROPIA	1

1269

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-014
	PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO	VERSIÓN:	001
	PARTE 3		
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2023
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	N° PERSONAS A CARGO	USO DEL TIEMPO LIBRE	PRACTICA ALGUN DEPORTE	FRECUENCIA EN QUE PRACTICA EL DEPORTE	INGRESO PROMEDIO MENSUAL	FUMA	PROMEDIO DIARIO (CIGARRILLOS)	CONSUME BEBIDAS ALCOHLICAS	FRECUENCIADE CONSUMO
1	RICHARD DE JESUS RAMOS MARTINEZ	11.154.364	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	SI	OCASIONAL	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL
2	ARGUIN ANTONIO CARVAJAL RODRIGUEZ	11.004.806	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	SI	OCASIONAL	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL
3	MARIO ANTONIO VERTEL CAUSIL	6.885.013	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	SI	OCASIONAL	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL
4	ARLEN JOSE ALVAREZ BELLO	78.694.359	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	SI	OCASIONAL	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	SEMANAL
5	LUIS DAVID RUIZ MUÑOZ	1.192.812.500	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	NO	NO PRACTICA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	QUINCENAL
6	MARIO RUIZ	1.062.954.579	NINGUNA	RECREACION Y DEPORTE	SI	OCASIONAL	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL
7	HUGO ANTONIO VEGA MONTIEL	6.880.870	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	NO	NO PRACTICA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	SEMANAL
8	RODRIGO SEGUNDO SOLORZANO GUZMAN	78.714.110	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	NO	NO PRACTICA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL
9	MARIA INES GONZALEZ AYUZ	1.067.836.657	NINGUNA	OTRO TRABAJO	NO	NO PRACTICA	ENTRE 1 Y 5 (S.M.L.V.)	NO	NO FUMA	NO	NO CONSUME
10	ANGEL MARIA RIVERA RAMIREZ	6.891.661	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	NO	NO PRACTICA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	NO	NO CONSUME
11	MANUEL FRANCISCO PEREZ SALGADO	15.275.012	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	NO	NO PRACTICA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	NO	NO CONSUME
12	BERNABE GUTIERREZ TEHERAN	9.104.691	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	SI	OCASIONAL	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL
13	LUIS ALFREDO HURTADO	6.857.206	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	SI	OCASIONAL	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL
14	IPATIA ROVIRA VILLALOBOS MOLINA	50.905.356	1 - 3 PERSONAS	ESTUDIO	SI	OCASIONAL	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	NO	NO CONSUME
15	RAFAEL ENRIQUE HERNANDEZ MURILLO	10.782.175	1 - 3 PERSONAS	LABORES DOMESTICAS	NO	NO PRACTICA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	NO	NO CONSUME
16	DIOMILDE CLAVER SIERRA BOLIVAR	72.018.203	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	NO	NO PRACTICA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	SI	4	SI	OCASIONAL
17	RAMON BALLESTEROS ZARATE	15.680.642	1 - 3 PERSONAS	RECREACION Y DEPORTE	SI	SEMANAL	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	NO	NO CONSUME
18	NATALY STEFANIA ESPITIA VERGARA	1.007.339.391	1 - 3 PERSONAS	LABORES DOMESTICAS	SI	OCASIONAL	ENTRE 1 A 3 S.M.L.V	NO	NO FUMA	NO	NO CONSUME
19	LISETH PAOLA CARDENAS FLOREZ	1.003.046.257	1 - 3 PERSONAS	RECREACION Y DEPORTE	SI	OCASIONAL	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL
20	ELIECER DEL CRISTO GARCES TAMARA	15.680.389	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	NO	NO PRACTICA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL
21	DEIMER EDUARDO ORTIZ IBAÑEZ	1.010.087.719	1 - 3 PERSONAS	RECREACION Y DEPORTE	SI	OCASIONAL	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	NO	NO CONSUME
22	CRISTIAN DAVID PEREZ MARTINEZ	1.062.965.377	NINGUNA	RECREACION Y DEPORTE	SI	OCASIONAL	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL
23	NEYL ELIECER GARCES FLOREZ	1.062.435.302	NINGUNA	RECREACION Y DEPORTE	NO	NO PRACTICA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	SI	NO INFORMA	SI	OCASIONAL
24	JOAQUIN DE JESUS ORTIZ MARQUEZ	10.975.591	4 -6 PERSONAS	NINGUNO	NO	NO PRACTICA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL
25	JOSE ORLANDO CIFUENTES	12.459.136	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	SI	OCASIONAL	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	NO	NO CONSUME
26	JOSE GREGORIO MARQUEZ HERNANDEZ	78.744.534	4 -6 PERSONAS	OTRO TRABAJO	NO	NO PRACTICA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	SI	NO INFORMA	SI	OCASIONAL
27	IVAN ARRIETA	70.769.595	NINGUNA	RECREACION Y DEPORTE	SI	DIARIO	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	NO	NO CONSUME
28	JOSE ENRIQUE HERNANDEZ SOLANO	1.068.576.592	1 - 3 PERSONAS	RECREACION Y DEPORTE	SI	DIARIO	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL
29	JOSE RAFAEL AVILEZ ALBARADO	1.067.860.476	1 - 3 PERSONAS	RECREACION Y DEPORTE	NO	NO PRACTICA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL
30	ANDRES MANUEL BERRIO FERNANDEZ	78.712.688	1 - 3 PERSONAS	OTRO TRABAJO	NO	NO PRACTICA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL
31	JULIO ALFREDO GARCIA RUIZ	78.699.971	1 - 3 PERSONAS	NINGUNO	NO	NO PRACTICA	MINIMO LEGAL (S.M.L.V)	NO	NO FUMA	SI	OCASIONAL

1268

ANEXO N°7.

CUESTIONARIO NORDICO

ANEXO N°7.1.

ENCUESTAS APLICADAS

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-066
CONSORCIO	CUESTIONARIO NÓRDICO DME	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

Objetivo de la encuesta: Detectar síntomas de desórdenes musculoesqueléticos - DME en los trabajadores del Consorcio Red Vital Córdoba, para determinar su prevalencia, como medida del programa de vigilancia epidemiologica de lesiones osteomusculares

1.Nombre del Trabajador:	Cristobal de Jesus Cedron Payares
2. Identificación:	1067939817
3. Cargo:	Ayudante
4. Frente de obra:	Consorcio Red vital Cordoba



Este cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales.

Muchas veces no se va al médico apenas aparecen los primeros síntomas, y nos interesa conocer si existe cualquier molestia especialmente si las personas no han consultado aún por ellas.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario.

Le solicitamos responder a las siguientes preguntas, señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando con una X en Si o No segun el caso.

Partes del cuerpos	En cualquier momento durante los últimos doce meses ha tenido problemas (molestias, dolor o incomodidad) en:		¿Ha estado impedido para realizar su rutina habitual, en el trabajo o en la casa, en algún momento durante los últimos 12 meses por esta molestia?		¿Ha tenido problemas o la molestia en los últimos 7 días?	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Cuello	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Hombros	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Codos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Munecas	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Espalda Alta	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Espalda Baja	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Una o ambas caderas - muslos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Una o ambas rodillas	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Tobillos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Pies	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

SI X NO

Fecha de diligenciamiento: 19/06/26 **Firma del trabajador:** Cristobal Cedrón

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-086
	CUESTIONARIO NÓRDICO DME	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Objetivo de la encuesta: Detectar sintomas de desordenes musculoesqueleticos - DME en los trabajadores del Consorcio Red Vital Córdoba, para determinar su prevalencia, como medida del programa de vigilancia epidemiologica de lesiones osteomusculares.

1.Nombre del Trabajador:	Arturo Jose palacio
2. Identificación:	1005708287
3. Cargo:	Ayudante
4. Frente de obra:	Consorcio Red Vital Córdoba



Este cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales.

Muchas veces no se va al médico apenas aparecen los primeros síntomas, y nos interesa conocer si existe cualquier molestia, especialmente si las personas no han consultado aún por ellas.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario.

Le solicitamos responder a las siguientes preguntas, señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando con una X en Si o No según el caso.

Partes del cuerpos	En cualquier momento durante los últimos doce meses ha tenido problemas (molestias, dolor o incomodidad) en:		¿Ha estado impedido para realizar su rutina habitual, en el trabajo o en la casa, en algún momento durante los últimos 12 meses por esta molestia?		¿Ha tenido problemas o la molestia en los últimos 7 días?	
Cuello	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Hombros	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Codos	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Munecas	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Espalda Alta	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Espalda Baja	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Una o ambas caderas - muslos	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Una o ambas rodillas	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Tobillos	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Pies	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO	SI	NO	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO	SI	NO	SI	NO X

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

SI X NO

Fecha de diligenciamiento:	19/06/26	Firma del trabajador:	Arturo Palacio


Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-086
	CUESTIONARIO NÓRDICO DME	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Objetivo de la encuesta: Detectar síntomas de desordenes musculoesqueleticos - DME en los trabajadores del Consorcio Red Vital Córdoba, para determinar su prevalencia, como medida del programa de vigilancia epidemiologica de lesiones osteomusculares.

1.Nombre del Trabajador:	Walter Antonio Muñoz Castro
2. Identificación:	78704443
3. Cargo:	Ayudante
4. Frente de obra:	Consorcio Red Vital Cordoba



Este cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales.

Muchas veces no se va al médico apenas aparecen los primeros síntomas, y nos interesa conocer si existe cualquier molestia, especialmente si las personas no han consultado aún por ellas.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario.

Le solicitamos responder a las siguientes preguntas, señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando con una X en Si o No según el caso.

Partes del cuerpos	En cualquier momento durante los últimos doce meses ha tenido problemas (molestias, dolor o incomodidad) en:		¿Ha estado impedido para realizar su rutina habitual, en el trabajo o en la casa, en algún momento durante los últimos 12 meses por esta molestia?		¿Ha tenido problemas o la molestia en los últimos 7 días?	
Cuello	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Hombros	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Codos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Munecas	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Espalda Alta	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Espalda Baja	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Una o ambas caderas - muslos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Una o ambas rodillas	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Tobillos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el Izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Pies	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

SI X NO

Fecha de diligenciamiento:	20/06/26	Firma del trabajador:	Walter muñoz

Powered by CamScanner


1274

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-086
	CUESTIONARIO NÓRDICO DME	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Objetivo de la encuesta: Detectar sintomas de desordenes musculoesqueleticos - DME en los trabajadores del Consorcio Red Vital Córdoba, para determinar su prevalencia, como medida del programa de vigilancia epidemiologica de lesiones osteomusculares.

1.Nombre del Trabajador:	Jaime Javier Espinosa
2. Identificación:	1003194671
3. Cargo:	Ayudante
4. Frente de obra:	Consorcio Red vital Cordoba

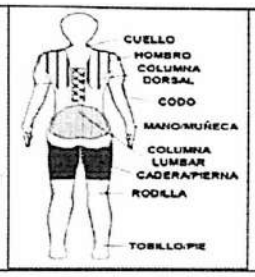

Este cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales.

Muchas veces no se va al médico apenas aparecen los primeros síntomas, y nos interesa conocer si existe cualquier molestia, especialmente si las personas no han consultado aún por ellas.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario.

Le solicitamos responder a las siguientes preguntas, señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando con una X en Si o No según el caso.

Partes del cuerpos	En cualquier momento durante los últimos doce meses ha tenido problemas (molestias, dolor o incomodidad) en:		¿Ha estado impedido para realizar su rutina habitual, en el trabajo o en la casa, en algún momento durante los últimos 12 meses por esta molestia?		¿Ha tenido problemas o la molestia en los últimos 7 días?	
Cuello	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Hombros	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Codos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Munecas	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Espalda Alta	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Espalda Baja	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Una o ambas caderas - muslos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Una o ambas rodillas	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Tobillos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Pies	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

SI X NO

Fecha de diligenciamiento:	23/06/26	Firma del trabajador:	Jaime E.


Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-086
	CUESTIONARIO NÓRDICO DME	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Objetivo de la encuesta: Detectar síntomas de desordenes musculoesqueleticos - DME en los trabajadores del Consorcio Red Vital Córdoba, para determinar su prevalencia, como medida del programa de vigilancia epidemiologica de lesiones osteomusculares.

1.Nombre del Trabajador:	Jorge Miguel Suarez
2. Identificación:	1067963880
3. Cargo:	Ayudante
4. Frente de obra:	Consorcio Red vital córdoba



Este cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales.

Muchas veces no se va al médico apenas aparecen los primeros síntomas, y nos interesa conocer si existe cualquier molestia, especialmente si las personas no han consultado aún por ellas.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario.

Le solicitamos responder a las siguientes preguntas, señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando con una X en Si o No según el caso.

Partes del cuerpos	En cualquier momento durante los últimos doce meses ha tenido problemas (molestias, dolor o incomodidad) en:		¿Ha estado impedido para realizar su rutina habitual, en el trabajo o en la casa, en algún momento durante los últimos 12 meses por esta molestia?		¿Ha tenido problemas o la molestia en los últimos 7 días?	
Cuello	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Hombros	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Codos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Munecas	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Espalda Alta	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Espalda Baja	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Una o ambas caderas - muslos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Una o ambas rodillas	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Tobillos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Pies	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

SI X NO

Fecha de diligenciamiento:	23/06/26	Firma del trabajador:	


Powered by CamScanner

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-086
	CUESTIONARIO NÓRDICO DME	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Objetivo de la encuesta: Detectar sintomas de desordenes musculoesqueleticos - DME en los trabajadores del Consorcio Red Vital Cordoba, para determinar su prevalencia, como medida del programa de vigilancia epidemiologica de lesiones osteomusculares

1.Nombre del Trabajador:	Samir Alberto Narvaez Vertel
2. Identificación:	1003955555
3. Cargo:	oficial
4. Frente de obra:	Consorcio Red Vital Córdoba



Este cuestionario sirve para recopilar información sobre molestias, dolor o incomodidad en distintas zonas corporales.

Muchas veces no se va al médico apenas aparecen los primeros síntomas, y nos interesa conocer si existe cualquier molestia, especialmente si las personas no han consultado aún por ellas.

En el dibujo se observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario.

Le solicitamos responder a las siguientes preguntas, señalando o indicándonos en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido dolores, molestias o problemas, marcando con una X en Si o No según el caso.

Partes del cuerpos	En cualquier momento durante los últimos doce meses ha tenido problemas (molestias, dolor o incomodidad) en:		¿Ha estado impedido para realizar su rutina habitual, en el trabajo o en la casa, en algún momento durante los últimos 12 meses por esta molestia?		¿Ha tenido problemas o la molestia en los últimos 7 días?	
Cuello	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Hombros	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Codos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Munecas	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Espalda Alta	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Espalda Baja	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Una o ambas caderas - muslos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Una o ambas rodillas	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Tobillos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Pies	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el derecho	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, el izquierdo	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X
Si, en ambos	SI	NO X	SI	NO X	SI	NO X

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

SI X NO

Fecha de diligenciamiento:	23/06/26	Firma del trabajador:	Samir Narvaez

Powered by CamScanner

ANEXO N°7.2.

TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO NORDICO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	TOR-027
	TABULACIÓN CUESTIONARIO MÉDICO PARTE 1	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°:	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RUTA VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO:	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO DE PROYECTO ESPECÍFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

N°	Nombres	Apellidos	Tipo de Documento	Número de Documento	Cargo	Proceso - Sub proceso	En cualquier momento durante los últimos doce meses ha tenido problemas (molestias, dolor o incomodidad) en																																	
							Codo		Hombro				Codo				Muñecas				Parte del cuerpo Espalda Alta		Espalda Baja		Una o ambas caderas - muslos		Una o ambas rodillas		Tobillos				Pies								
							SI	NO	SI			NO	SI			NO	SI			NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI			NO	SI			NO			
									El derecho	El izquierdo	En ambos		El derecho	El izquierdo	En ambos		El derecho	El izquierdo	En ambos										El derecho	El izquierdo	En ambos		El derecho	El izquierdo	En ambos				
1	RICHARD DE JESUS	RAMOS MARTINEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	11.154.364	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
2	ANGIBER ANTONIO	CARABALI RODRIGUEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	11.004.696	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO			SI			NO		NO		NO		NO				NO				NO		
3	MARIO ANTONIO	VERTEL CALISA	CEDULA DE CIUDADANIA	6.885.613	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
4	RUBEN JOSE	ALVAREZ BELLO	CEDULA DE CIUDADANIA	78.694.359	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
5	LUIS DAVID	ROJAS MUÑOZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1.152.672.049	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
6	MARIO	RUIZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1.062.694.579	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
7	HUGO ANTONIO	VEGA MONTIEL	CEDULA DE CIUDADANIA	6.886.870	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
8	RODRIGO SEGUNDO	SALDAÑO GUZMAN	CEDULA DE CIUDADANIA	78.714.110	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
9	RYTA ROSINA	VILLALOBOS MOLINA	CEDULA DE CIUDADANIA	50.903.226	AUXILIAR SST	ADMINISTRATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
10	ANGEL MARIA	REYES RAMIREZ	CEDULA DE CIUDADANIA	6.891.651	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
11	MANUEL FRANCISCO	PEREZ SALGADO	CEDULA DE CIUDADANIA	15.275.092	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
12	BYRNAIF	GUTIERREZ TERRAN	CEDULA DE CIUDADANIA	9.104.681	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
13	LUIS ALFREDO	HURTADO	CEDULA DE CIUDADANIA	9.097.096	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
14	ANIBAL INES	GONZALEZ AYUZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.436.657	INGENIERA ESP. SG-SST	ADMINISTRATIVA OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
15	LISETH PAOLA	CARDENAS FLOREZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1.063.646.297	AUXILIAR SST	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
16	NATALY ESTEFANIA	ESTRADA VERGARA	CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.279.351	ARQUITECTA RESIDENTE	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
17	JOSE RAFAEL	AVILEZ ALVARADO	CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.666.476	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
18	ANDRES MANUEL	BLANCO FERNANDEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	78.710.608	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
19	JULIO ALFREDO	DAVILA RUIZ	CEDULA DE CIUDADANIA	78.694.871	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
20	RAFAEL ENRIQUE	GONZALEZ MURILLO	CEDULA DE CIUDADANIA	10.492.513	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
21	EDGARDO CLAVER	SIERRA SOLANO	CEDULA DE CIUDADANIA	72.016.231	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
22	RAMON	SALLESTEROS DAVALE	CEDULA DE CIUDADANIA	3.940.942	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
23	JOAQUIN DE JESUS	ORTIZ MARQUEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	10.870.531	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
24	NERL EUDORO	GARCES FLOREZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1.062.435.302	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
25	CRISTIAN DAVID	PEREZ MARTINEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1.042.662.277	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
26	DENNIS EDUARDO	ORTIZ IBAÑEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1.010.667.749	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
27	ELIECER DEL CRISTO	GARCES TAMARA	CEDULA DE CIUDADANIA	78.693.399	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
28	JOSE GREGORIO	MARQUEZ HERNANDEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	78.711.534	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
29	IVAN LUIS	MARIETA PAYARES	CEDULA DE CIUDADANIA	78.703.510	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
30	JOSE ENRIQUE	HERNANDEZ OSORIO	CEDULA DE CIUDADANIA	1.065.570.552	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
31	CRISTOBAL DE JESUS	OLIVERA PAVAJEU	CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.833.847	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
32	ARTURO JOSE	PALACIO BELTRAN	CEDULA DE CIUDADANIA	1.065.700.207	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
33	WALTER ANTONIO	MUÑOZ CASTRO	CEDULA DE CIUDADANIA	78.704.443	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
34	JAIME JAVIER	ESPINOSA ARTEAGA	CEDULA DE CIUDADANIA	1.063.691.671	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
35	JORGE MISAEL	SUAREZ GENES	CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.963.689	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
36	DANIR ALBERTO	NARVAEZ VERTEL	CEDULA DE CIUDADANIA	1.063.391.505	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO		
37																																						
38																																						

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	TOY-68/
	TABULACIÓN CUESTIONARIO NÓRDICO PARTE 2	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL CÓRDOBA	CONTRATO N°	SSLP-071-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO HUV VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO D PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

N°	Nombre	Apellido	Tipo de Documento	Número de Documento	Cargo	Proceso - Sub proceso	¿Ha estado impedido para realizar su labor habitual, en el trabajo o en la casa, en algún momento durante los últimos 12 meses por esta molestia?																											
							Partes del cuerpo																										
							Cuello		Hombros				Codos				Muñecas				Espalda Alta		Espalda Baja		Una o ambas caderas - muslos		Una o ambas rodillas		Tobillos				Pies			
							SI	NO	SI			NO	SI			NO	SI			NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI			NO	SI			NO
									El derecho	El izquierdo	En ambos		El derecho	El izquierdo	En ambos		El derecho	El izquierdo	En ambos										El derecho	El izquierdo	En ambos		El derecho	El izquierdo	En ambos	
1	RICHARD DE JESUS	RAMOS MARTINEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	11.134.364	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
2	ARSEN ANTONIO	CARVAJAL RODRIGUEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	11.134.836	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
3	MARIO ANTONIO	VERTEL CANSIL	CEDULA DE CIUDADANIA	6.885.693	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
4	ARLEN JOSE	ALVAREZ BELLO	CEDULA DE CIUDADANIA	78.694.259	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
5	LUIS DAVID	RAIMUNDO	CEDULA DE CIUDADANIA	1.152.212.588	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
6	MARIO	RUIZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.914.579	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
7	HUGO ANTONIO	VISAMONTES	CEDULA DE CIUDADANIA	6.880.879	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
8	RODRIGO EDUARDO	SOLORZANO GUZMAN	CEDULA DE CIUDADANIA	78.716.110	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
9	PAOLA RIVERA	VILLALOBOS MOLINA	CEDULA DE CIUDADANIA	50.905.206	AUXILIAR SST	ADMINISTRATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
10	ANGEL MARIA	RAENA RAMIREZ	CEDULA DE CIUDADANIA	6.894.851	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
11	MANUEL FRANCISCO	PEREZ SALGADO	CEDULA DE CIUDADANIA	15.275.012	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
12	BERNARD	GUTIERREZ ECHEVARRIA	CEDULA DE CIUDADANIA	9.104.601	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
13	LUIS ALFREDO	HUNTADO	CEDULA DE CIUDADANIA	6.837.226	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
14	YAMILIS	OLIVA PEREZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.845.037	INGENIERA ESP. SG-SST	ADMINISTRATIVA OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
15	LISETH PAOLA	CARDENAS FLOREZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1.003.649.257	AUXILIAR SST	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
16	NATALY ESTEFANIA	ESTRA VERGARA	CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.933.391	ARQUITECTA RESIDENTE	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
17	JOSE RAFAEL	AVILEZ ALMANZA	CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.950.478	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
18	ANDRES MANUEL	BURNO FERNANDEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	78.713.685	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
19	JULIO ALFREDO	GARCIA RUIZ	CEDULA DE CIUDADANIA	78.698.971	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
20	RAFAEL ENRIQUE	UCHOA LE MURILLO	CEDULA DE CIUDADANIA	78.782.173	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
21	DORIS DE CLAVER	SERNA BOLIVAR	CEDULA DE CIUDADANIA	72.918.203	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
22	RAMON	BALLESTEROS ZAPATA	CEDULA DE CIUDADANIA	1.068.642	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
23	JOAQUIN DE JESUS	CASTAÑO MARQUEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	10.975.581	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
24	KEYL ELIECER	GARCES FLOREZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.430.362	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
25	CRISTIAN DAVID	PEREZ MARTINEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.945.377	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
26	DEIMER EDUARDO	ORTIZ IBAÑEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1.010.067.719	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
27	ELIECER DEL CRISTO	GARCES TAMARA	CEDULA DE CIUDADANIA	10.989.399	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
28	JOSE GREGORIO	VARGAS HERNANDEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	78.741.334	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
29	MANUEL	ARRIETA PAVARES	CEDULA DE CIUDADANIA	78.760.595	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
30	JOSE ENRIQUE	HERNANDEZ SOLANO	CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.707.652	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
31	CRISTOBAL DE JESUS	CEDRON PAVARES	CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.938.917	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
32	ARTURO JOSE	PALACIO BELTRAN	CEDULA DE CIUDADANIA	1.065.736.297	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
33	WALTER RAIMUNDO	BUNGE CASTRO	CEDULA DE CIUDADANIA	78.694.913	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
34	JAIME JAVIER	ESPAGNA ARTETAGA	CEDULA DE CIUDADANIA	1.063.191.671	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
35	JORGE MIGUEL	SUAREZ GOMES	CEDULA DE CIUDADANIA	1.067.932.889	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
36	YAMIN ALBERTO	NARVAEZ YOTTEL	CEDULA DE CIUDADANIA	1.063.385.505	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
37																																				
38																																				

1279

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO	FOR-SST
	TABULACIÓN CUESTIONARIO NÓRDICO PARTE 2	VERSIÓN	001
CONTRATANTE	COOPERANDINA DE CÓRDOBA	CONTRATO Nº	SUEPCH 2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO CONVENCIO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Nº	Nombre	Apellido	Tipo de Documento	Numero de Documento	Cargo	Proceso - Sub proceso	¿Ha tenido problemas o ha molestado en los últimos 7 días?																													
							Partes del cuerpo																														
							Cuello		Hombros				Codos				Muñecas				Espalda Alta		Espalda Baja		Una o ambas caderas - muslos		Una o ambas rodillas		Tobillos				Pies				
							SI	NO	SI			NO	SI			NO	SI			NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI			NO	SI			NO
									El derecho	El izquierdo	En ambos		El derecho	El izquierdo	En ambos		El derecho	El izquierdo	En ambos										El derecho	El izquierdo	En ambos		El derecho	El izquierdo	En ambos	
1	RICHARD DE JESUS	RAMOS MARTINEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	11,104,304	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
2	ARGEMIRO ANTONIO	CARVAJAL RODRIGUEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	11,064,808	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
3	MARIO ANTONIO	VERTEL CASSE	CEDULA DE CIUDADANIA	6,885,613	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
4	APH TRILCE	ALVAREZ NIÑO	CEDULA DE CIUDADANIA	78,694,259	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
5	LUIS DAVID	MENDEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1,193,812,938	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
6	MARIO	RUIZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1,067,954,579	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
7	HUGO ANTONIO	VIDA VENTEL	CEDULA DE CIUDADANIA	6,899,673	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
8	RODRIGO SEGUNDO	SOLORZANO GUZMAN	CEDULA DE CIUDADANIA	78,714,176	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
9	RAFAEL ROMAN	DE LA HOZ MORENO	CEDULA DE CIUDADANIA	50,965,056	HSEQ MY SST	ADMINISTRATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
10	ANGEL MARIA	ARIAS RAMIREZ	CEDULA DE CIUDADANIA	6,899,561	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
11	MIGUEL FRANCISCO	PERTUZ SUCO	CEDULA DE CIUDADANIA	11,275,612	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
12	BERNABE	GUTIERREZ TIRADO	CEDULA DE CIUDADANIA	3,744,091	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
13	LUIS ALFREDO	MATAOS	CEDULA DE CIUDADANIA	6,887,296	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
14	MARIA INES	GONZALEZ RUIZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1,067,406,457	INGENIERA ESP. SG-SST	ADMINISTRATIVA/OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
15	LISETH PAOLA	CARDENAS FLOREZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1,003,946,237	AUXILIAR SST	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
16	MAYLY STEFANIA	ESPITIA VERGARA	CEDULA DE CIUDADANIA	1,067,308,381	ARQUITECTA RESIDENTE	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
17	JOSE RAFAEL	AVENDAÑO BARRIOS	CEDULA DE CIUDADANIA	1,067,888,476	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
18	ANDRES MANUEL	BORREY DIMARCO	CEDULA DE CIUDADANIA	78,712,988	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
19	JULIO ALFREDO	GARCIA RUIZ	CEDULA DE CIUDADANIA	78,693,676	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
20	RAFAEL ENRIQUE	GONZALEZ HOYOS	CEDULA DE CIUDADANIA	78,702,173	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
21	DIOMIS DE CLAVIJO	SIERRA BOGARIN	CEDULA DE CIUDADANIA	72,319,303	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
22	RAMON	BALLESTEROS ERRATE	CEDULA DE CIUDADANIA	1,069,642	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
23	JOAQUIN DE JESUS	DIAZ MARQUEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	10,925,095	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
24	NOEL ELIECER	GARCES FLOREZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1,067,407,362	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
25	CRISTIAN DAVID	PERTUZ MARTINEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1,067,867,777	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
26	EDWIN EDUARDO	ORTIZ IBAÑEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	1,193,087,118	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
27	ELEICER DEL CARLO	GARCES PARRA	CEDULA DE CIUDADANIA	15,686,348	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
28	JOSE GREGORIO	MARCHAN HERNANDEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	78,694,334	CHOFER EN OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
29	WILLIAM	ARRIETA PAYARES	CEDULA DE CIUDADANIA	78,693,535	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
30	JOSE RAMON	HERNANDEZ GRAVO	CEDULA DE CIUDADANIA	1,045,677,037	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
31	CRISTOBAL DE JESUS	CELEDON PAYARES	CEDULA DE CIUDADANIA	1,067,224,617	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
32	ARTURO JOSE	PALOO BELTRAN	CEDULA DE CIUDADANIA	1,005,726,197	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
33	WALTER ANTONIO	MUÑOZ CASTRO	CEDULA DE CIUDADANIA	78,694,443	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
34	JAIME JAVIER	ESPINOSA ARTEAGA	CEDULA DE CIUDADANIA	1,003,191,671	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
35	JORGE MIGUEL	GAMEZ GINES	CEDULA DE CIUDADANIA	1,067,881,080	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
36	SAMIR ALBERTO	NARVAEZ MORELL	CEDULA DE CIUDADANIA	1,003,341,323	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVA		NO				NO				NO				NO		NO		NO		NO		NO				NO				NO
37																																				
38																																				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-087
	TABULACIÓN CUESTIONARIO NÓRDICO	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Año en que se realizó la encuesta:	Del 07 de junio al 30 de junio de 2026	Fecha de tabulación:	30/06/2006
Cantidad de encuestas realizadas:	6		

Anotar la cantidad de respuestas realizadas en cada item.

Partes del cuerpo	En cualquier momento durante los últimos doce meses ha tenido problemas (molestias, dolor o incomodidad) en:		¿Ha estado impedido para realizar su rutina habitual, en el trabajo o en la casa, en algún momento durante los últimos 12 meses por esta molestia?		¿Ha tenido problemas o la molestia en los últimos 7 días?	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Cuello	0	6	0	6	0	6
Hombros		6		6		6
Si, el derecho	0		0		0	
Si, el izquierdo	0		0		0	
Si, en ambos	0		0		0	
Codos		6		6		6
Si, el derecho	0		0		0	
Si, el izquierdo	0		0		0	
Si, en ambos	0		0		0	
Muñecas		6		6		6
Si, el derecho	0		0		0	
Si, el izquierdo	0		0		0	
Si, en ambos	0		0		0	
Espalda Alta	0	6	0	6	0	6
Espalda Baja	0	6	0	6	0	6
Una o ambas caderas - muslos	0	6	0	6	0	6
Una o ambas rodillas	0	6	0	6	0	6
Tobillos		6		6		6
Si, el derecho	0		0		0	
Si, el izquierdo	0		0		0	
Si, en ambos	0		0		0	
Pies		6		6		6
Si, el derecho	0		0		0	
Si, el izquierdo	0		0		0	
Si, en ambos	0		0		0	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-087
	TABULACIÓN CUESTIONARIO NÓRDICO	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		


PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".


Calcular el porcentaje con respecto al numero total de encuestas realizadas

Partes del cuerpo	En cualquier momento durante los últimos doce meses ha tenido problemas (molestias, dolor o incomodidad) en:		¿Ha estado impedido para realizar su rutina habitual, en el trabajo o en la casa, en algún momento durante los últimos 12 meses por esta molestia?		¿Ha tenido problemas o la molestia en los últimos 7 días?	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Cuello	0%	100%	0%	100%	0%	100%
Hombros		100%		100%		100%
Si, el derecho	0%		0%		0%	
Si, el izquierdo	0%		0%		0%	
Si, en ambos	0%		0%		0%	
Codos		100%		100%		100%
Si, el derecho	0%		0%		0%	
Si, el izquierdo	0%		0%		0%	
Si, en ambos	0%		0%		0%	
Muñecas		100%		100%		100%
Si, el derecho	0%		0%		0%	
Si, el izquierdo	0%		0%		0%	
Si, en ambos	0%		0%		0%	
Espalda Alta	0%	100%	0%	100%	0%	100%
Espalda Baja	0%	100%	0%	100%	0%	100%
Una o ambas caderas - muslos	0%	100%	0%	100%	0%	100%
Una o ambas rodillas	0%	100%	0%	100%	0%	100%
Tobillos		100%		100%		100%
Si, el derecho	0%		0%		0%	
Si, el izquierdo	0%		0%		0%	
Si, en ambos	0%		0%		0%	
Pies		100%		100%		100%
Si, el derecho	0%		0%		0%	
Si, el izquierdo	0%		0%		0%	
Si, en ambos	0%		0%		0%	

Realizar gráfica de frecuencia de casos presentados



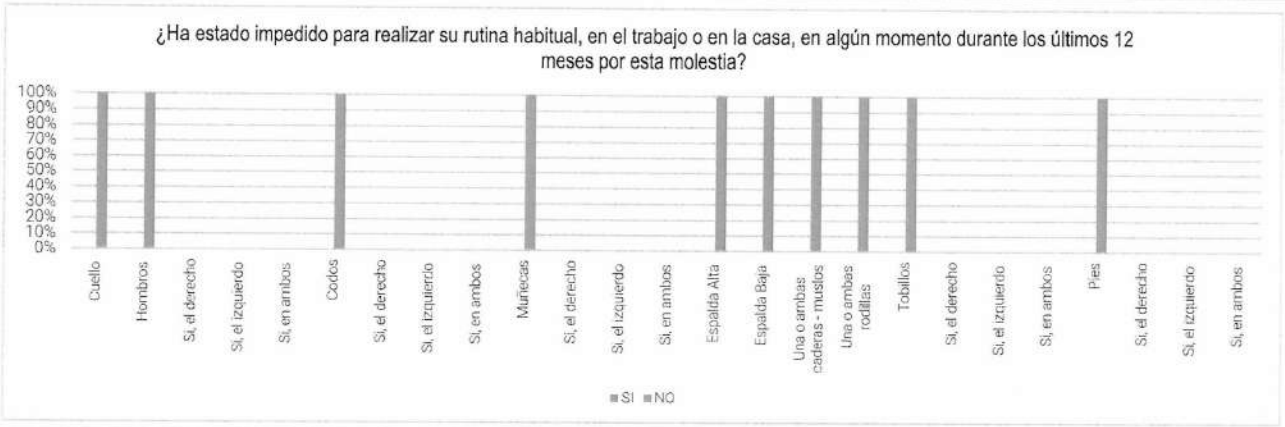



ANEXO N°8.

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-009
	CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Consorcio Red vital Córdoba
TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	RIESGOS POR EXPOSICIÓN AL RUIDO Y PROTECCION AUDITIVA
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	Los objetivos de esta charla son entender qué es el ruido y cómo escuchamos sonidos, entender los diferentes tipos de ruido y conocer los efectos de la exposición al ruido en el cuerpo humano.
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:	10/06/2026
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO:	TODO EL PERSONAL
RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN:	Lizeth paola Cardenas Florez
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN:	•Que es el ruido. •Tipos de ruido. •Como afecta el ruido al cuerpo humano.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
Rafael Gonzalez	10782473	oficial	Rafael
Mario vertel	6885013	oficial	Mario Vertel
José Marquez	78744534	Ayudante	Jortiz Marquez
José cifuentes	12459136	Ayudante	Jose C.
Julio García	78699971	Ayudante	Julio García
Andrés Berrio	78712688	Ayudante	Andres Berrio
Jose Avilez	1067860476	Ayudante	Jose Avilez
Luis Castillo	1062805228	Soldador	Luis Castillo
Sabel Baena	1067860391	Soldador	Sabel Baena
Deimer ortiz	10100087719	Ayudante	Deimer ortiz
Cristian perez	1062965371	Ayudante	cristian perez
Neil Garces	1062435302	Ayudante	NEYI GARCES
Joaquin ortiz	10975594	oficial	Jortiz Marquez
Eliecer Garces	15680389	Maestro	FREDYS TIRADO
Fredy Tirado	10782218	Maestro	Rodrigo S.C.
Rodrigo Solorzano	78714770	oficial	Eliecer Garces
Bernabé Gutierrez	9104694	Ayudante	Bernabé
Ramón Ballesteros	15680642	oficial	Ramon B.
Edvar Ramos	1067919649	Ayudante	EDVAR
Deomilde Sierra	72018203	oficial	Deomilde
Richard Ramos	1115436	Ayudante	Richard R.
Hugo vega	6880870	Ayudante	Hugo V. Montes

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-009
	CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Consorcio Red vital Córdoba
TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	USO DE EXTINTORES
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	El objetivo de esta charla es entender el manejo de los extintores para un caso de emergencias
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:	11/06/2026
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO:	TODO EL PERSONAL
RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN:	Lisethi paola Cardenas Florez
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN:	•Definición y partes de extintor. •Clasificación. •Utilización. •Mantenimiento.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
Eliecer Garcés	15680389	Maestro	Eliecer del c garces
Yoaquin ortiz	10975591	oficial	Jorlis Marquez
Neyl Garcés	1062435302	Ayudante	Neyl GARCES
Deimer ortiz	1010087719	Ayudante	Deimer ortiz
Cristian perez	1062965371	Ayudante	Cristian perez
Fredy Tirado	10782218	Maestro	FREDYS TIRADO
Rodrigo Solorzano	78714440	oficial	Rodrigo A.
Hugo Vega	6880870	Ayudante	Hugo V. Montiel
Richard Ramos	11154364	Ayudante	Richard R
Deomilde Sierra	72018203	oficial	Deomilde
Eduar Ramos	1067919649	Ayudante	EDVAM
Mario Vertel	6885013	oficial	Mario Vertel
Bernabé Gutierrez	9104691	Ayudante	Bernabé
Ramón Ballesteros	15680642	oficial	Ramón B.
Sabel Baena	1067860391	Soldador	Sabel Baena
Luis castillo	1062805228	Soldador	Luis Castillo
Andrés Berrio	78712688	Ayudante	Andrés Berrio
Josi Avilez	1067860476	Ayudante	Josc Avilez
Julio García	78699971	Ayudante	Julio García
Erguin Carvajal	11004806	oficial	Erguin Carvajal
José Cifuentes	12459136	Ayudante	Josec
Jose Marquez	78744534	Ayudante	Jorlis Marquez
Rafael Gonzalez	10782473	oficial	Rafael

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-009
	CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Consorcio Red Vital Córdoba
TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	AUTOCUIDADO
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	El objetivo de esta charla es entender lo importante que es el autocuidado en el trabajo para garantizar la seguridad de cada trabajador.
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:	17/06/2026
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO:	TODO EL PERSONAL
RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN:	Lisetth Paola Cardenas Florez
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN:	• ¿Qué es el autocuidado? • Importancia del autocuidado.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
Fredy Tirado	10782218	Maestro	FREDYS TIRADO
Evan Arrieta	10769595	Ayudante	IVAN ARRIETA
Hugo vega	6880870	Ayudante	Hugo V. Montiel
Dromilde Sierra	72018203	oficial	Debul
Rafael Gonzalez	10782173	Oficial	Rafall
Mario Vertel	6885013	oficial	Mario Vertel
Rodrigo Solarzano	78714110	oficial	Rodrigo S
Erquin Carvajal	14004806	Oficial	Erquin Carvajal
Joaquin ortiz	10975594	Oficial	Joa Ortiz Marquez
Eliecer Garety	15680389	Maestro	Eliecer de J e Garces
Cristian perez	1062965574	Ayudante	cristian perez
Deimer ortiz	1010087719	Ayudante	Deimer Ortiz
Jose Marquez	78744534	Ayudante	Jose G MH
Sabel Baena	1067860394	Soldador	Sabel Baena
Luis Castillo	1062805228	Soldador	Luis Castillo
Julio Garcia	78699494	Ayudante	Julio GARCIA
Andrés Berrio	78712688	Ayudante	Andres Berrio
José Avilez	1067860476	Ayudante	Jose Avilez
Ramon Ballesteros	15680642	Ayudante	Ramón B
Bernabe Gutierrez	9104691	Ayudante	Bernabe
José cifuentes	12459136	Ayudante	JOSE C.
Eduar Ramos	1067919649	Ayudante	EDUAR

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-009
	CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Consorcio Red vital córdoba
TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	Entender los principales tipos de protección para la cabeza y saber cómo protegerse contra lesiones en ella.
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:	18/06/2026
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO:	TODO EL PERSONAL
RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN:	Lisetl paola Cardenas Florez
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN	• Factores de riesgos comunes que afectan la cabeza. • Tipos de protección. • Normas de seguridad y uso.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
Hugo vega	6880870	Ayudante	Hugo V. Montiel
Deomilde Sierra	72018203	oficial	Deomilde
Rafael Gonzalez	10782473	oficial	Rafael
Mario vertel	6885013	oficial	Mario Vertel
Rodrigo Solorzano	78714770	oficial	Rodrigo S
Edvar Ramos	1067919649	Ayudante	EJUAM
Erguin Carvajal	11004806	oficial	Erguin Carvajal
Fredy Tirado	10782218	Maestro	FREDYS TIRADO
Cristian perez	1062965571	Ayudante	cristian perez
Jose Avilez	1067860476	Ayudante	Jose Avilez
Luis castillo	1062805228	Soldador	Luis Castillo
Sabel Baena	1067860394	Soldador	Sabel Baena
José Cifuentes	12459136	Ayudante	Jose C.
Bernabé Gutierrez	9104691	Ayudante	Bernabé

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-009
	CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Consorcio Red Vital Cordoba
TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	EJERCICIO PARA LA REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS SALUDABLES
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	El objetivo de esta charla es entender lo importante que son las pausas activas para promover actividad física enfocada a mejorar movilidad articular, realizar estiramientos y ejercicios que propicien cambios de posición y disminución de cargas osteomusculares por mantenimiento de posiciones prolongadas y/o movimientos repetitivos durante la jornada laboral.
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:	19/06/2026
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO:	TODO EL PERSONAL
RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN:	Lisetk paola Cardenas Florez
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN:	• ¿Qué son las pausas activas saludables? • Ejercicios de pausas activas saludables.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
Ivan Arrieta	10769595	Ayudante	IVAN ARRIETA
Ramon Ballesteros	15680642	Ayudante	Ramon B.
Julio Garcia	78699971	Ayudante	Julio Garcia
Andrés Berrio	78712688	Ayudante	Andrés Berrio
Jose Avilez	1067860476	Ayudante	Jose Avilez
Bernabe Gutierrez	9104694	Ayudante	
Jose Cifuentes	124591136	Ayudante	Jose C.
Luis castillo	1062805228	Soldador	Luis Castillo
Sabel Baena	1067860394	Soldador	Sabel Baena
Eduar Ramos	1067919649	Ayudante	EDUAR
Erguin Carvajal	11004805	oficial	Erguin Carvajal
Mario vertel	6885013	oficial	Mario Vertel
Rafael Gonzalez	10782173	oficial	Rafael
Rodrigo Solorzano	78714110	oficial	Rodrigo S.
Hugo vega	6880870	Ayudante	Hugo V. Montiel
Deomilde Sierra	72018203	oficial	Deivel
Fredy Tirado	10782218	Maestro	FREDYS TIRADO

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-009
	CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Consorcio Red vital córdoba
TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	COMUNICACIÓN ASERTIVA
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	Comprender el significado de comunicación asertiva y lo importante que es ésta en todos los aspectos de la organización.
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:	23/06/2026
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO:	TODO EL PERSONAL
RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN:	Lisethi paola Cardenas Florez
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN:	• Definición de comunicación asertiva. • Utilidad de la comunicación asertiva. • Ventajas de una comunicación asertiva. • ¿Cómo son las personas asertiva? • Conclusión.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
Eduar Ramos	1067919649	Ayudante	EJUAM
Erquin carvajal	1100 4806	oficial	Erquin Carvajal
Rodrigo Solorzano	7871 4110	oficial	Rodrigo S.S
Mario Vertel	6885013	oficial	Mario Vertel
Rafael Gonzalez	1078 2173	Oficial	Rafael
Deomilde Sierra	7201 8203	oficial	Deomil
Hugo Vega	6880870	Ayudante	Hugo V. Montiel
Julio Garcia	7869 9971	Ayudante	Julio GARCIA
José Avilez	1067860476	Ayudante	Jose Avilez
Jose Cifuentes	1245 8436	Ayudante	Jose C.
Ivan Arrieta	1076 9595	Ayudante	IVAN Arrieta
Bernabe Gutierrez	9104 6091	Ayudante	Bernabe
Cristian Perez	1062 965591	Ayudante	Cristian perez
Arturo Palacio	1005 708287	Ayudante	Arturo Palacio
Walter Muñoz	7870 4443	Ayudante	Walte Muñoz
FREDYS TIRADO	1078 2218	MAESTRO	FREDYS TIRADO A.
Sabel Baena	1067860391	Soldador	Sabel Baena
Luis Castillo	1062 805228	Soldador	Luis Castillo

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-009
	CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Consorcio Red vital córdoba
TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CON HERRAMIENTAS MANUALES
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	Establecer un procedimiento de trabajo seguro para las actividades que impliquen el uso de herramientas manuales, con el fin de prevenir y controlar todos los riesgos asociados.
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:	25/06/2026
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO:	TODO EL PERSONAL
RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN:	Liseth paola Cardenas Florez
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN:	• Herramientas (Normas de seguridad generales). • Clasificación de las herramientas. • Principales riesgos asociados al uso de herramientas manuales.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
Deomilde Sierra	72018203	oficial	Deomilde
Hugo vega	6880870	Ayudante	Hugo V. Montiel
Rafael Gonzalez	70782773	oficial	Rafael
Rodrigo Salazzano	78714470	Oficial	Rodrigo Sz.
Mario Vertel	6885013	oficial	Mario Vertel
Erguin Carvajal	71004806	oficial	Erguin Carvajal
Julio Garcia	78699977	Ayudante	Julio Garcia
Eduar Ramos	1067919649	Ayudante	EDUAM
Jose Cifuentes	12459136	Ayudante	Jose C.
Jose Avilez	1067860476	Ayudante	Jose Avilez
Bernabé Gutierrez	9104694	Ayudante	Bernabé
Ivan Arrieta	10769595	Ayudante	IVAN Arrieta
Cristian perez	1062965571	Ayudante	Cristian Perez
Arturo palacio	1005708267	Ayudante	Arturo Palacio
Cristobal Cedrón	1067839817	Ayudante	Cristobal cedrón
walter Muñoz	78704443	Ayudante	WALTE Muñoz
Fredy Tirado	70782218	Maestro	FREDY TIRADO
Sabel Baena	1067860394	Soldador	Sabel Baena
Luis castillo	1062805228	Soldador	Luis Castillo
Jorge Suarez	1067963880	Ayudante	Jorge Suarez
Jaime Espinosa	1003191677	Ayudante	Jaime espinosa
Samir Narvaez	1003395555	oficial	Samir Narvaez

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-009
	CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Consorcio Red vital córdoba
TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	PROTECCION DE PARTES DEL CUERPO (BRAZOS Y MANOS)
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:	El propósito de esta charla es identificar los tipos básicos de riesgos y/o peligros que pueden afectar los brazos y manos, así como comprender las medidas necesarias para prevenir lesiones y proteger estas partes del cuerpo durante la ejecución de actividades en obra.
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:	27/06/2026
PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO:	TODO EL PERSONAL
RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN:	Izeth paola Cardenas Florez
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN:	• Factores de riesgos comunes que afectan brazos y manos. • Tipos de protección. • Normas de seguridad y uso.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía)	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR
Hugo Vega	6880870	Ayudante	Hugo V. Montiel
Richard Ramos	77154364	ayudante	Richard R
Mario Vertel	6885013	oficial	Mario vertel
Rafael Gonzalez	10782173	oficial	Rafael
Edvar Ramos	1067919649	Ayudante	EDVAR
Rodrigo Solorzano	78714110	oficial	Rodrigo S
Julio Garcia	78649971	Ayudante	Julio GArcia
Sabel Baena	1067860394	Soldador	Sabel Baena
José Cifuentes	1245971 36	Ayudante	Jose Avilez
Luis Castillo	1062825228	Soldador	Luis Castillo
Samir Narvaez	1003395555	oficial	Samir Narvaez
Erquin Carvajal	44004806	Oficial	Erquin Carvajal
Arturo palacio	1005708287	Ayudante	Arturo Palacio
Fredy Tirado	10782218	Maestro	FREDY TIRADO
Ivan Arrieta	1076955	Ayudante	IVAN Arrieta
Cristobal Cedrón	1067839 8	Ayudante	Cristobal Cedron
José Avilez	1067860476	AyudanTe	Jose Avilez
Jaime Espinosa	1003491677	Ayudante	Jaime espinosa
Bernabé Gutierrez	9104691	Ayudante	Bernabe
walter Muñoz	78704443	Ayudante	WALTER MUÑOZ
Jorge Suarez	1067963880	Ayudante	Jorge Suarez
Deomilde Sierra	72018203	oficial	Deomilde

Powered by CamScanner

ANEXO N°9.

EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-094
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

NOMBRE DEL EVALUADOR:	Lisetth paola Cardenas	FIRMA:	LisethC.
NOMBRE DEL CAPACITADOR:	Lisetth paola Cardenas Flores	FIRMA:	LisethC.
FECHA DE EVALUACIÓN:	11 Junio 2026		

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Deomilde Sierra	72018203	Oficial	Deomilde
Hugo Vega	6880870	Ayudante	Hugo V. Montiel
Sabel Bacha	1067860397	Soldador	Sabel Bacha
Luis Castillo	7062805228	Soldador	Luis Castillo
Rafael Gonzalez	70782773	Oficial	Rafael
Mario Vertel	6885043	oficial	Mario Vertel
Bernabé Gutierrez	9104694	Ayudante	Bernabé
Rodrigo Solorzano	78714770	Oficial	Rodrigo S.
Eliecer Garcez	1568389	Maestro	Eliecer de la C. Garces
Rafael Gonzalez	70782773	Oficial	Raf

Responda con sus compañeros las siguientes preguntas de acuerdo con lo aprendido en las capacitaciones

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	RIESGOS POR EXPOSICIÓN AL RUIDO Y PROTECCION AUDITIVA	CALIFICACIÓN:	B
FECHA DE CAPACITACIÓN	10/06/2026		

Pregunta N°1: Mencione algunos consejos de seguridad para la protección auditiva:

A. Utilice únicamente protectores auditivos limpios y en buen estado
B. Nunca sustituya un tipo de protector por otro, a no ser que este autorizado
X C. No ingrese a un área de alto ruido sin estar previamente preparado con protección auditiva adecuada
D. Todos los anteriores.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	RIESGOS POR EXPOSICIÓN AL RUIDO Y PROTECCION AUDITIVA	CALIFICACIÓN:	B
FECHA DE CAPACITACIÓN	10/06/2026		

Pregunta N°2: Una de las partes esenciales de la capacitación sobre el riesgo de ruido es instruir al trabajador sobre el **uso correcto** del EPP. ¿Qué aspecto es crucial que el usuario asegure para la máxima efectividad de los tapones de inserción?

A. Limpiarlos con alcohol antes de cada uso.
B. Utilizarlos solo durante las primeras 4 horas de la jornada laboral.
X C. Asegurar que estén bien insertados en el canal auditivo, logrando un sellado completo.
D. Dejarlos colgando alrededor del cuello cuando no se usan.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	USO DE EXTINTORES	CALIFICACIÓN:	B
FECHA DE CAPACITACIÓN	11/06/2026		

Pregunta N°1: ¿Cuál es el significado de la sigla "ABC" en un extintor?

A. Agua, Bromo, Cloro
B. Apagar, Bloquear, Contener
X C. Combustibles sólidos, líquidos inflamables, equipos eléctricos energizados
D. Alcohol, Benceno, Caucho

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	USO DE EXTINTORES	CALIFICACIÓN:	B
FECHA DE CAPACITACIÓN	11/06/2026		

Pregunta N°2: Si encuentras un extintor con la aguja del manómetro en la zona roja, ¿qué indica esto?

A. Está completamente cargado y listo para usar
X B. La presión es demasiado baja y necesita recarga
C. La presión es demasiado alta y es peligroso usarlo.
D. Es un extintor de agua

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-094
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

NOMBRE DEL EVALUADOR:	Lisethy paola Cardenas Florez	FIRMA:	Lisethy C.
NOMBRE DEL CAPACITADOR:	Lisethy paola Cardenas Florez	FIRMA:	Lisethy C.
FECHA DE EVALUACIÓN:	19 Junio 2026		

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Ivan Arrieta	10769595	Ayudante	IVAN Arrieta
Rafael Gonzalez	10782173	oficial	Rafael
Erguin Carvajal	1100 4806	Oficial	Erguin Carvajal
Rodrigo Solorzano	1062965571	oficial	Rodrigo S.
Cristian perez	78714470	Ayudante	Cristian perez
Jose Aviles	1067860476	Ayudante	Jose Aviles
Bernabe Gutierrez	9104691	Ayudante	Bernabe
José Cifuentes	12459136	Ayudante	Jose C.
Eduar Ramos	1067919649	Ayudante	EDUAR
Hugo vega	6880870	Ayudante	Hugo V. Montiel

Responda con sus compañeros las siguientes preguntas de acuerdo con lo aprendido en las capactaciones

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	AUTOCUIDADO	CALIFICACIÓN:	B
FECHA DE CAPACITACIÓN	17/06/2026		

Pregunta N°1: ¿Cuál es el rol clave que cumple el autocuidado en la cultura de la prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo?

A. Es clave para la productividad.
B. Es la base sobre la cual cada persona adopta conductas seguras en los ambientes laborales y contribuye con su propio cuidado y el de sus compañeros.
C. Mejora las condiciones de trabajo existentes y de la organización.
D. El Autocuidado en el ambiente de trabajo es la capacidad de las personas para elegir libremente la forma segura de trabajar.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	AUTOCUIDADO	CALIFICACIÓN:	B
FECHA DE CAPACITACIÓN	17/06/2026		

Pregunta N°2: De las siguientes opciones, una NO es un referente de autocuidado en la obra.

A. Uso adecuado de los elementos de protección personal.
B. Adecuada higiene postural y manejo de cargas.
C. Juegos y bromas a los compañeros de trabajo.
D. Inspección previa de las condiciones de trabajo.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	PROTECCIÓN PARA LA CABEZA	CALIFICACIÓN:	B
FECHA DE CAPACITACIÓN	18/06/2026		

Pregunta N°1: ¿Cuáles son los EPP utilizados para proteger la cabeza?

A. Guantes.
B. Casco.
C. Gafas.
D. Todas las anteriores.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	PROTECCIÓN PARA LA CABEZA	CALIFICACIÓN:	B
FECHA DE CAPACITACIÓN	18/06/2026		

Pregunta N°2: Los cascos de protección están diseñados para proteger contra varios tipos de riesgos. Existen cuatro clases de cascos. segun la clasificación de seguridad la Clase D son los usados por los bomberos, ya que son resistentes al fuego y no conducen la electricidad.

A. Verdadero.
B. Falso.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	EJERCICIO PARA LA REALIZACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS SALUDABLES	CALIFICACIÓN:	B
FECHA DE CAPACITACIÓN	19/06/2026		

Pregunta N°1: Las pausas activas es un momento de activación que permite un cambio en la dinámica laboral, donde se puede combinar una serie de movimientos que activan el sistema:

A. Cardiovascular, Musculo esquelético y digestivo.
B. Musculo esquelético, Cardiovascular, Cognitivo y Respiratorio.
C. Respiratorio, Digestivo, Inmunológico y Nervioso.

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-094
	EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

NOMBRE DEL EVALUADOR:	Lisseth paola Cardenas Florez	FIRMA:	Lisseth Cardenas
NOMBRE DEL CAPACITADOR:	Lisseth paola Cardenas Florez	FIRMA:	Lisseth Cardenas
FECHA DE EVALUACIÓN:	27 Junio 2026		

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Hugo Vega Montiel	6880870	Ayudante	Hugo V. Montiel
Rodrigo Solorzano	79714140	oficial	Rodrigo S
Erguin Carvajal	11004806	oficial	Erguin Carvajal
Deomilde Sierra	72018203	oficial	Deomil
Edvar Ramos	1067919649	Ayudante	EDVAR
Fredy Tirado	10782218	Maestro	FREDY TIRADO
José Cifuentes	12459136	Ayudante	Jose Ci
Bernabé Gutierrez	9404691	Ayudante	Bernabe
Jorge Suarez	1067963880	Ayudante	Jorge Suarez
Arturo palacio	1005708287	Ayudante	Arturo Palacio

Responda con sus compañeros las siguientes preguntas de acuerdo con lo aprendido en las capacitaciones

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	COMUNICACIÓN ASERTIVA	CALIFICACIÓN:	B
FECHA DE CAPACITACIÓN	23/06/2026		

Pregunta N°1: Una de las siguientes opciones define a la comunicación asertiva.

A. Es la comunicacion verbal para resolver problemas del trabajo.

*B. Es la comunicación que se utiliza como vía adecuada para interactuar con las personas, en donde las palabras y gestos utilizados trasmiten claridad y al mismo tiempo una actitud de empatía con el interlocutor.

C. Charlas que se realizan mientras se trabaja.

D. Comunicación utilizada en el debate para defenderse de los argumentos del otro.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CON HERRAMIENTAS MANUALES	CALIFICACIÓN:	B
FECHA DE CAPACITACIÓN	25/06/2026		

Pregunta N°1: Al momento de utilizar un martillo o maria en la obra, ¿cual es la forma correcta de sostenerlo segun el procedimiento?

A. Muy cerca de la cabeza para golpear con más fuerza.

B. Usar el pomo del mango para dar golpes pequeños.

*C. Sostener el martillo desde el centro del mango.

D. Utilizarlo como palanca cuando no se tenga una llave a la mano.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CON HERRAMIENTAS MANUALES	CALIFICACIÓN:	B
FECHA DE CAPACITACIÓN	25/06/2026		

Pregunta N°2: ¿Qué acción se considera correcta y segura al momento de manipular o desconectar una herramienta eléctrica?

A. Tirar fuertemente del cable o cordón para desconectarla rápido.

*B. Desconectarla siempre tirando directamente de la clavija.

C. Enrollarse los cables en el cuerpo para que no estorben al caminar.

D. Transportar la herramienta colgada desde su propio cable eléctrico.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	PROTECCION DE PARTES DEL CUERPO (BRAZOS Y MANOS)	CALIFICACIÓN:	B
FECHA DE CAPACITACIÓN	27/06/2026		

Pregunta N°1: ¿Cuáles son peligros a los que se exponen las manos?

*A. Cortes y chuzones: Causados por herramientas, máquinas y manejo de objetos cortantes.

*B. Exposición química: Causada por manipulación de productos.

C. Raspaduras y excoriaciones: Causadas por mover partes y manipular objetos rugosos.

D. Todas las anteriores.

TEMA DE LA CAPACITACIÓN:	PROTECCION DE PARTES DEL CUERPO (BRAZOS Y MANOS)	CALIFICACIÓN:	B
FECHA DE CAPACITACIÓN	27/06/2026		

Pregunta N°2: Seleccione los elementos de protección personal que protegen sus brazos y manos de posibles accidentes o incidentes de trabajo.

*A. Guantes de nitrilo, látex o carnaza.

B. Manoplas, cubre-dedos y parches manuales.

C. Caretas de seguridad.

*D. Mangas y coberturas de antebrazo.

E. Diademas o protectores auditivos.



Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE LA OBRA (CALIDAD Y SST)	
CONSORCIO RED VITAL CORDOBA	ANEXOS
	"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".


ANEXO N°10.


REGISTROS FOTOGRAFICOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)		
CONSORCIO	REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME NO. 3 PERIODO: DEL 07 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026	Código: FOR-060 Versión: 001 Página 1 de 7

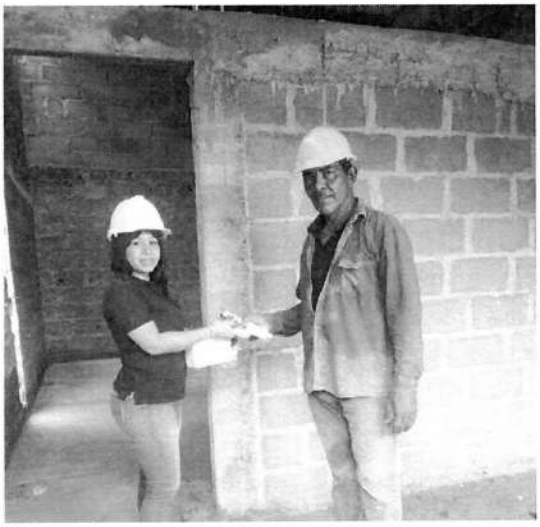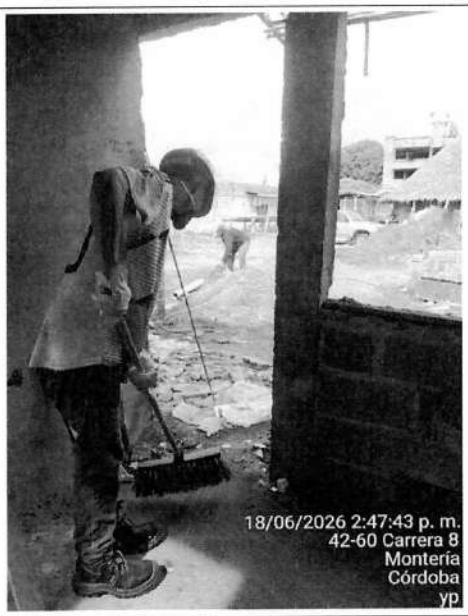Fotografía N°1	Fotografía N°2
	
Texto explicativo de la fotografía. Charla de seguridad	**Texto explicativo de la fotografía.** Entrega de EPP.
Fotografía N°3	**Fotografía N°4**
	
Texto explicativo de la fotografía. Entrega de EPP.	**Texto explicativo de la fotografía.** Jornada de orden y limpieza.

Fotografía N°5	Fotografía N°6
	
Texto explicativo de la fotografía. Jornada de orden y limpieza.	**Texto explicativo de la fotografía.** Jornada de orden y limpieza.
Fotografía N°7	**Fotografía N°8**
	
Texto explicativo de la fotografía. Jornada de orden y limpieza.	**Texto explicativo de la fotografía.** Desarrollo de actividades y uso de EPP.

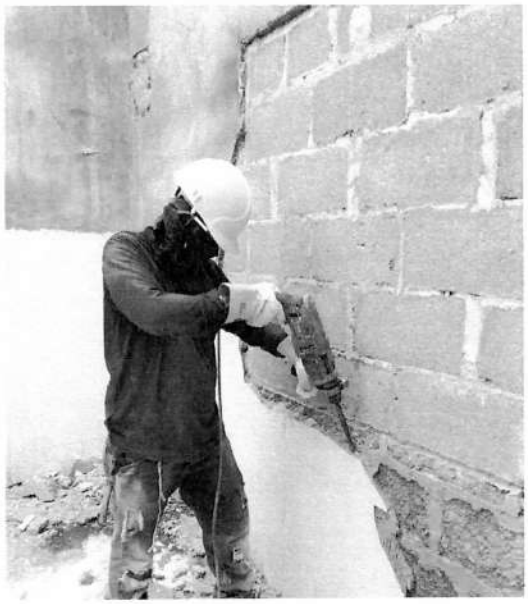
Fotografía N°9	Fotografía N°10
	
Texto explicativo de la fotografía. Desarrollo de actividades y uso de EPP.	**Texto explicativo de la fotografía.** Desarrollo de actividades y uso de EPP.
Fotografía N°11	**Fotografía N°12**
	
Texto explicativo de la fotografía. Desarrollo de actividades y uso de EPP.	**Texto explicativo de la fotografía.** Desarrollo de actividades y uso de EPP

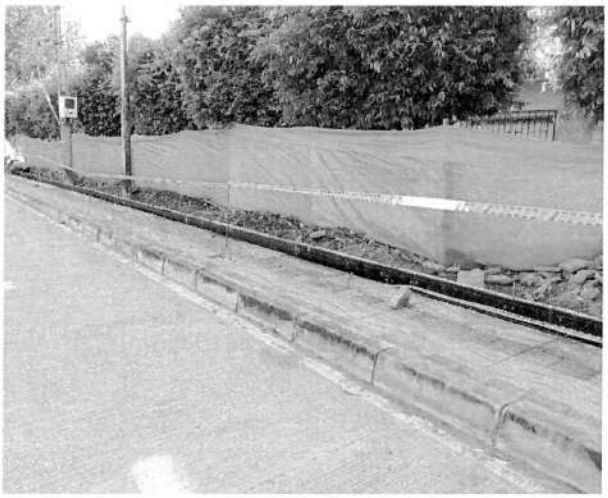Fotografía N°13	Fotografía N°14
	
Texto explicativo de la fotografía. Desarrollo de actividades y uso de EPP	**Texto explicativo de la fotografía.** Realización de pausas activas saludables.
Fotografía N°15	**Fotografía N°16**
	
Texto explicativo de la fotografía. Realización de pausas activas saludables.	**Texto explicativo de la fotografía.** Delimitación de áreas.

Fotografía N°17	Fotografía N°18
	
Texto explicativo de la fotografía. Delimitación de áreas.	**Texto explicativo de la fotografía.** Delimitación de áreas.
Fotografía N°19	**Fotografía N°20**
	
Texto explicativo de la fotografía. Señalización uso obligatorio de EPP.	**Texto explicativo de la fotografía.** Señalización y extintor.

Fotografía N°21	Fotografía N°22
	
Texto explicativo de la fotografía. Señalización uso obligatorio de arnés.	**Texto explicativo de la fotografía.** Señalización de uso obligatorio de cubrebocas.
Fotografía N°23	**Fotografía N°24**
	
Texto explicativo de la fotografía. Señalización de peligro caída a distinto nivel.	**Texto explicativo de la fotografía.** Señalización de prohibido fumar.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)		
CONSORCIO	REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME NO. 3 PERIODO: DEL 07 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026	Código: FOR-060 Versión: 001 Página 7 de 7

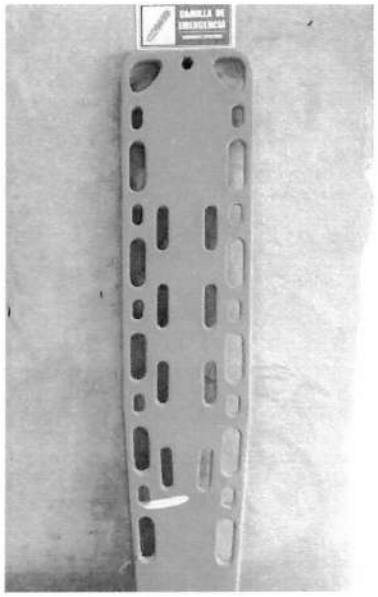Fotografía N°25	Fotografía N°26
	
Texto explicativo de la fotografía. Señalización y camilla de emergencia.	**Texto explicativo de la fotografía.** Señalización y punto ecológico.
Fotografía N°27	**Fotografía N°28**
	
Texto explicativo de la fotografía. Almacenamiento del cemento.	**Texto explicativo de la fotografía.** Botiquín y kit antiderrames.

ANEXO N°11.

LISTADOS E INVENTARIOS

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-027
	LISTA DE CHEQUEO DE ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

NOMBRE	CANTIDAD	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACION
MATERIAL PARA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LOS TEJIDOS			
Gasa Precortada y esterilizada en sobres sellados	4	29/04/2030	Se usa para limpiar y cubrir heridas es importante tenerla en sobres individuales disminuyendo así el riesgo de infección.
Aplicadores ó copitos			Se utiliza para aplicar antisépticos
Esparadrapo antialérgico: Micropore	1	01/07/2030	utilizado para sujetar gasas y Apósitos
Esparadrapo de tela	1	01/07/2030	Para sujetar vendajes y hacer compresión si hay necesidad.
Curitas			Son útiles para cubrir heridas pequeñas
Algodón	1	30/06/2030	
SOLUCIONES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (ANTISEPTICOS)			
Isodine			
Agua Mineral.	2	08/2027	
Alcohol	1		
Jabón liquido o antibacterial	1	05/08/2028	
MATERIAL PARA INMOVILIZAR			
Vendas elásticas	3		
Venditas			
Baja lenguas	1 paquete x20	03/2030	
MATERIAL DE APOYO			
Termómetro oral	1		
bisturí			
Guantes de látex	1 paquete x100	09/2026	
Tapabocas			

RESPONSABLE DE INSPECCION

Frima Lisetth Cardenas

Nombre: Lisetth paola Cardenas Florez
Cargo: Auxiliar SST
Fecha: 25/06/2026

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (CALIDAD Y SST)	CODIGO	FOR.004
	LISTADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	VERSION	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CORDOBA	CONTRATO N°	SIA P 011 2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CORDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA."

HERRAMIENTA / EQUIPO	Cantidad	Estado		OBSERVACIONES
		Bueno	Malo	
Cuerpos de andamio	15	✓		
pulidora	2	✓		
Taladro	4	✓		
Batomartillo	1	✓		
Mezcladora	1	✓		
palas	9	✓		
Monas	3	✓		
Barras	2	✓		
palines	2	✓		
cucharones	1	✓		
Martillos	3	✓		
cincel	3	✓		
Escoriador	1	✓		
Equipo de Soldadura	1	✓		
Carretillas	4	✓		

Lugar de inspección:	Consorcio Red vital córdoba
Fecha de actualización de la información:	23/06/2026
Nombre de quien actualizo la información:	Lisett Paola Cardenas Florez
Cargo de quien actualizó la información:	Auxiliar SST

Powered by CamScanner

1308

CONSORCIO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-005
	LISTADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

SUSTANCIA QUÍMICA	Ficha de seguridad en obra SI/No	Envase rotulado SI /No
Cemento	Si	Si
Gasolina	Si	Si
ACPM	Si	Si

Lugar de inspección:	Bodega de almacenamiento de sustancias quimicas
Fecha de actualización de la informacion:	27/06/2026
Nombre de quien actualizó la información:	Ipsdy paola Cardenas Florez
Cargo de quien actualizó la información:	Auxiliar SST

Powered by CamScanner

1309

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-095
	LISTADO DE VEHÍCULOS	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

N°	PLACA	AÑO	CAPACIDAD	PROPIETARIO	IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO	¿TIENE TARJETA DE PROPIEDAD?	¿TIENE TECNICO MECÁNICA VIGENTE ?	¿TIENE SOAT VIGENTE?
1	UIJ-689	1952	7.00	Manuel Velazquez	10996809	Si	Si	Si
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Responsable de actualización:	Liseth paola Cardenas	Cargo:	Auxiliar SST
Fecha de actualización:	30/06/2026	Firma:	Liseth Cardenas

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO	FOR 104
	INVENTARIO DE TAREAS CON ALTO RIESGO DE CAIDAS DE ALTURA	VERSIÓN	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011 2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

N°	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	¿ES RUTINARIA LA TAREA? INDICAR CON UNA X EN SI O NO SEGÚN EL CASO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Armado y desarmado de andamios	✓		
2	Desmonte de cubierta		✓	
3	Armado de acero	✓		
4	Amarre de acero para viga elevada	✓		
5	Encofrado de formaleta	✓		
6	Vaciado de concreto de viga elevada	✓		
7	Desencofrado de formaletas		✓	
8	Instalación de perfiles metalicos		✓	
9	Instalación de cubierta		✓	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

APROBO

FIRMA: Lisseth Cardenas
NOMBRE: Lisseth paola Cardenas
CARGO: Auxiliar SST
FECHA: 22/06/2026

Powered by CamScanner

ANEXO N°12.

AUSENTISMO LABORAL

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-015
	CONTROL DE AUSENTISMO	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

PERIODO REPORTADO

DESDE		
DD	MM	AAAA
7	6	2026

HASTA		
DD	MM	AAAA
30	6	2026

CONVENCIONES- MOTIVO la causa que origina el permiso según sea el caso: INCAPACIDAD MEDICA: **EG:** Enfermedad General, **LM:** Licencia de Maternidad, **LP:** Licencia de Paternidad, **AT:** Accidente de trabajo, **EP:**Enfermedad Profesional. PERSONAL: **CM:**Cita médica, D:diligencia, **EST:** estudios, **CD:**calamidad doméstica; **S:** Suspensión; **SJC** Sin justa causa

N°	Cédula	Apellidos y Nombres del Trabajador	EDAD	Cargo Actual	FECHA DE INICIO AUSENTISMO	MOTIVO											DURACIÓN		FECHA DE TERMINACIÓN			DIAGNOSTICO	OBSERVACIONES
						INCAPACIDAD MEDICA					PERSONAL				S	SJC							
						EG	LM	LP	AT	EP	CM	D	EST	CD			HORAS	DIAS	DD	MM	AAAA		
1																							
2																							
3			DURANTE EL PERIODO NO SE PRESENTARON CASOS DE AUSENTISMO.																				
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
					TOTAL																		

RESPONSABLE DEL REGISTRO:	MARÍA INÉS GONZÁLEZ AYUZ	Cargo:	INGENIERA ESPE. SG-SST	Firma:	María Inés González Ayuz

1312

ANEXO N°13.

CONTROL DE ENFERMEDADES LABORALES

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-624
	REGISTRO DE CASOS DE ENFERMEDAD LABORAL	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SA-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

N°	Fecha de diagnostico inicial por EPS de la EL	Fecha de diagnostico inicial por Junta / ARL de la EL Confirmada.	Nombre del Trabajador	Identificación del trabajador	Cargo	Tipo de vinculación / Relación	Ocupación habitual en la empresa.	Tiempo en la ocupación habitual en la empresa.	Jornada de trabajo habitual en la empresa (Diurna, nocturna, mixta)	Antecedente Ocupacional (Actividades realizadas con anterioridad)	Diagnostico de la EL (Decreto 2566 de 2009)	Consecuencia de la Enfermedad	Días de incapacidad	N° de días perdidos laborales	Días con restricciones	Días de tratamiento medico para rehabilitación	Se rehabilita el trabajador? S/No	Costos Directos	Costos Indirectos u ocultos.	Costos totales.

ANEXO N°14.

INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-055
	REGISTRO DE CASOS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

N°	Nombre del trabajador	Cargo	Tipo de vinculación	Ocupacion Habitual (Si / No)	Tiempo en la ocupación habitual (días)	Actividad que realizaba en el momento de ocurrencia del evento	Jornada de trabajo habitual (Diurna, nocturna, mixta)	Fecha del evento (dd-mm-aaaa)	Dia de la semana	Hora del evento (hh:mm - 24 h)	Horas trabajadas en el momento del accidente	Descripción del incidente / accidente	Sitio de ocurrencia del incidente / accidente	Tipo de Lesión / Sin lesión (Incidente)	Parte del Cuerpo afectada	Mecanismo del accidente	Generó incapacidad (Si /No)	Días de incapacidad	N° de días perdidos laborales	Días con restricciones	Costes directos	Costes indirectos y ocultos	Costes totales.
						DURANTE EL PERIODO NO SE PRESENTARON CASOS DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL CONSORCIO																	

ANEXO N°15.

SEGUIMIENTO A CASOS DE SALUD ESPECIALES

CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-026
	CONTROL DE CASOS DE SALUD ESPECIALES		
	PARTE 1	VERSIÓN:	001
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	AREA O SITIO DE TRABAJO	ARL	EPS	AFP	DIAGNOSTICO	CRITERIO DE CALIFICACIÓN COMO CASO ESPECIAL
		DURANTE EL PERIODO NO SE PRESENTARON CASOS DE SALUD ESPECIALES.						

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST)	CÓDIGO:	FOR-026
	CONTROL DE CASOS DE SALUD ESPECIALES	VERSIÓN:	001
	PARTE 2		
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CONTRATO N°	SI-LP-011-2025
EJECUTOR DEL CONTRATO	CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA	TIPO DE CONTRATO	OBRA
ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO	CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO		

PROYECTO: ""FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	¿INCAPACITADO?		CUMPLE CON TRATAMIENTO DE MEDICAMENTOS			CUMPLE CON EXÁMENES MEDICOS PERIODICOS			CUMPLE CON RECOMENDACIONES MEDICAS			CUMPLE CON RESTRICCIONES MEDICAS			FECHA DE PROXIMO CONTROL MEDICO	ESPECIALIDAD MÉDICA
			SI	NO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA		
		DURANTE EL PERIODO NO SE PRESENTARON CASOS DE SALUD ESPECIALES.																

13319
