CONSORCIO
RED VITAL CORDOBA

# INFORME DE OBRA
# No. 1

Carrera 6 #62b-32 Oficina 618
Centro de Negocios Sexta Avenida
Monteria – Cordoba.

consorcioredvital@gmail.com

(604) 7812273
(+57) 315 4764499

# INFORME MENSUAL DE OBRA No.01

**CONTRATANTE:**

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

**CONTRATISTA DE OBRA:**

CONSORCIO RED VITAL CORDOBA

**PROYECTO:**

REF.: "Contrato Obra No. SI-LP-011-2025, Cuyo Objeto es: FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

PERIODO DE INFORME

07 DE ABRIL AL 06 MAYO

Montería – 2026

## TABLA DE CONTENIDO

**1. GENERALIDADES** ..... 3
1.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO ..... 4
1.2 ANTECEDENTES ..... 4
1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO ..... 5
**2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO** ..... 7
2.1. GARANTIAS DEL CONTRATO ..... 8
**2.1.1. pólizas según suscripción del contrato (Anexo 0)** ..... 8
**2.1.2 pólizas según Acta Inicio (Anexo 2)** ..... 9
**3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO** ..... 10
**4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO** ..... 31
**5. INFORME DETALLADO DE OBRA** ..... 53
**6. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PROYECTO** ..... 55
**7. AVANCE EN TIEMPO** ..... 56
**8. PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO** ..... 56
**9. ESTADO DEL TIEMPO** ..... 57
**10. CONTROL DE CALIDAD** ..... 57
**11. PGIO (MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUATRIAL Y SALUD OCUPACIONAL)** 58
**12. ASPECTO FINANCIERO** ..... 59
12.1. FORMA DE PAGO ..... 59
12.2 ACTAS PARCIALES DE OBRA ..... 59
**13. COMENTARIOS** ..... 60


## 1. GENERALIDADES

La Gobernación de Córdoba pone a disposición de los interesados mediante proceso de licitación pública N. SI-LP-011-2025 para la ejecución del proyecto que tiene por objeto la "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" proceso adjudicado al CONSORCIO RED VITAL CORDOBA, con Nit. No. 9 0 2 0 2 2 3 5 6 3, y representado legalmente por MARIA ELENA RIVERA HOYOS, con un valor de $ 2.701.191.082,00, y un plazo de ejecución final de CINCO (5) meses. Para la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del proyecto, se designa al CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE, representada por LINA REVUELTAS LOZANO.

El presente documento constituye el inf Dorme de avance de obra correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 y el 06 de mayo de 2026. En este informe se incluyen los aspectos técnico, económico y financiero del proyecto en el periodo, los problemas presentados en la obra, se detallan los avances de obra y registro fotográfico.

## 1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el departamento de Córdoba, municipio de Montería en el barrio los laureles en la calle 42 y 43 con carrera 8 A marcado con el número 4 de la manzana 17 en las instalaciones de CRUE Y MALARIA.

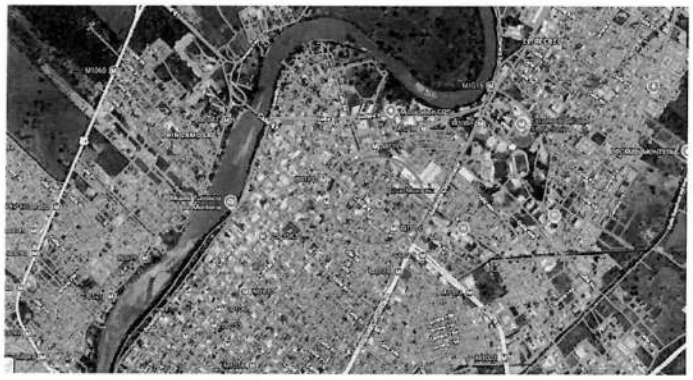

## 1.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el departamento de Córdoba, municipio de Montería en el barrio los laureles en la calle 42 y 43 con carrera 8 A marcado con el número 4 de la manzana 17 en las instalaciones de CRUE Y MALARIA.




**IMAGEN N.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO.**

## 1.2 ANTECEDENTES

Actualmente, las instalaciones ocupadas por CRUE y Malaria presentan un evidente deterioro en su infraestructura física, reflejado en afectaciones visibles en pisos, muros, cubiertas y elementos estructurales y no estructurales, producto del desgaste por uso continuo y el paso del tiempo.

Se evidencian fisuras y desprendimientos en paredes y cielorrasos, deterioro de acabados, presencia de humedad en algunos sectores, así como afectaciones en redes eléctricas e hidrosanitarias que disminuyen las condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad de las instalaciones.

Asimismo, los espacios presentan desgaste en puertas, ventanas y elementos metálicos, además de deficiencias en ventilación e iluminación, generando condiciones poco adecuadas para el desarrollo eficiente de las actividades administrativas y operativas.

De igual manera, algunas áreas muestran deterioro en andenes y zonas exteriores, así como afectaciones ocasionadas por raíces de árboles y filtraciones, comprometiendo la estabilidad y funcionalidad de ciertos sectores de la edificación.

En términos generales, el estado actual de la infraestructura física requiere intervención y adecuaciones prioritarias que permitan mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las instalaciones.

**1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO**

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE del Departamento de Córdoba es el centro administrativo principal encargado de coordinar y ejecutar las actividades técnico-administrativas esenciales para la gestión pública en emergencias del departamento. Esta sede debe garantizar espacios seguros, funcionales, eficientes y confortables, no solo para el personal que labora en ella, sino también para los usuarios que acceden a sus servicios, asegurando un entorno que fomente la productividad y el bienestar.

A pesar de los esfuerzos previos por mantener y mejorar las condiciones de esta sede, se ha identificado que las instalaciones actuales presentan limitaciones que afectan su operatividad. La infraestructura eléctrica, de comunicaciones y de climatización, junto con los acabados interiores, los elementos no estructurales y el mobiliario, no cumplen con los estándares actuales requeridos para responder a las demandas administrativas y de servicio del departamento. Además, el crecimiento poblacional y las necesidades operativas han generado una reducción significativa del espacio disponible, lo que ha llevado a la saturación de oficinas y al uso de áreas provisionales que no cumplen con las condiciones mínimas de comodidad y funcionalidad.

La formulación de un plan de inversión integral es fundamental para promover la mejora cualitativa y funcional de la sede, asegurando que se

cumplan las normativas técnicas y las expectativas de los usuarios y trabajadores. Este plan debe considerar las necesidades actuales y futuras, orientándose a mejorar la eficiencia, la calidad de los servicios y la experiencia en los espacios de trabajo.

El objetivo final es transformar el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE en un centro administrativo de excelencia que ofrezca entornos de trabajo óptimos, contribuyendo significativamente a la mejora de la gestión pública en el departamento de Córdoba. Para lograr esto, es necesario invertir en el mantenimiento y actualización de las instalaciones, la modernización de los sistemas eléctricos y de comunicaciones, la optimización de los espacios físicos y la dotación de mobiliario y equipos tecnológicos adecuados.

La ejecución del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" traerá numerosos beneficios, entre ellos:

- Mejora de la funcionalidad de los espacios: La reconfiguración de áreas y la habilitación de nuevos accesos permitirán optimizar el uso del espacio disponible, garantizando entornos de trabajo más cómodos y adecuados para los funcionarios.
- Incremento de la eficiencia operativa: La modernización de los sistemas eléctricos, de comunicaciones y de climatización mejorará la operatividad de los equipos y la conectividad, reduciendo tiempos de respuesta y optimizando los procesos administrativos.
- Mejora de la estética y el ornato: La renovación de acabados interiores, como pintura y cielos rasos, contribuirá a crear un ambiente más profesional y agradable para empleados y visitantes.
- Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica: La instalación de dispositivos de red modernos y conexiones certificadas garantizará una transmisión de datos más rápida y confiable, apoyando las actividades administrativas.

El proyecto consiste en el "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE

El proyecto consiste en el "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA", contemplando todos los elementos críticos, desde los sistemas de climatización, eléctricos y de comunicaciones, hasta los acabados interiores, la reconfiguración de espacios y la provisión de mobiliario, ubicada en el municipio de Montería, departamento de Córdoba.

## 2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

**TABLA N°1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO**

| CONTRATO No. SI-LP-011-2025 | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | GOBERNACION DE CORDOBA |
| **CONTRATISTA DE OBRA:** | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.764.759.464,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** | CINCO (05) meses |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 07 ABRIL DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |

## 2.1. GARANTIAS DEL CONTRATO

### 2.1.1. pólizas según suscripción del contrato (Anexo 0)

Tabla N. 1. Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 53-44-1010433805 de La Aseguradora Seguros del Estado S.A

| AMPARO | VALOR | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | ASEGURADO | DESDE | HASTA |
| **Cumplimiento del Contrato** | $ 276.475,946.40 | 26/02/2026 | 04/02/2027 |
| **Salarios y prestaciones sociales** | $138.237,973.20 | 26/02/2026 | 04/08/2029 |
| **Estabilidad de la obra** | $ 276.475,946.40 | 04/08/2026 | 04/08/2029 |

Tabla N.2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 53-40-101014310 de La Aseguradora Seguros del Estado S.A

| AMPARO | Valor | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | Asegurado | DESDE | HASTA |
| **Predios labores y operaciones** | $700.362.000,00 | 26/08/2026 | 04/08/2026 |
| **Contratistas y sub contratistas** | $700.362.000,00 | 26/08/2026 | 04/08/2026 |
| **Vehículos propios y no propios** | $700.362.000,00 | 26/08/2026 | 04/08/2026 |
| **Responsabilidad civil patronal** | $700.362.000,00 | 26/02/2026 | 04/08/2026 |
| **Daño emergente y lucro cesante** | $700.362.000,00 | 26/02/2026 | 04/08/2026 |
| **Perjuicios extrapatrimoniales** | $700.362.000,00 | 26/02/2026 | 04/08/2026 |

### 2.1.2 pólizas según Acta Inicio (Anexo 2)

Tabla N. 3. Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 53-44-1010433805 de La Aseguradora Seguros del Estado S.A

| AMPARO | VALOR | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | ASEGURADO | DESDE | HASTA |
| **Cumplimiento del Contrato** | $ 276.475,946.40 | 07/04/2026 | 16/03/2027 |
| **Salarios y prestaciones sociales** | $138.237,973.20 | 07/04/2026 | 13/09/2029 |
| **Estabilidad de la obra** | $ 276.475,946.40 | 13/09/2026 | 13/09/2029 |

Tabla N.4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 53-40-101014310 de La Aseguradora Seguros del Estado S.A

| AMPARO | Valor | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | Asegurado | DESDE | HASTA |
| **Predios labores y operaciones** | $700.362.000,00 | 07/04/2026 | 13/09/2026 |
| **Contratistas y sub contratistas** | $700.362.000,00 | 07/04/2026 | 13/09/2026 |
| **Vehículos propios y no propios** | $700.362.000,00 | 07/04/2026 | 13/09/2026 |
| **Responsabilidad civil patronal** | $700.362.000,00 | 07/04/2026 | 13/09/2026 |
| **Daño emergente y lucro cesante** | $700.362.000,00 | 07/04/2026 | 13/09/2026 |
| **Perjuicios extrapatrimoniales** | $700.362.000,00 | 07/04/2026 | 13/09/2026 |

## 3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance general de las actividades a realizar con el fin de mejorar y mantener en condiciones óptimas a los usuarios y trabajadores de CRUE Y MALARIA relacionado en el objeto son los siguientes:

| N. | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | **ADECUACIÓN DE ÁREAS EXISTENTES** | | | | |
| | | **PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | |
| | 1,01 | Localización, Trazado y Replanteo | M2 | 3.661,00 | $ 6.280,00 | $ 22.991.080,00 |
| | 1,02 | Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante | M2 | 999,85 | $ 31.102,00 | $ 31.097.335,00 |
| | 1,03 | Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado | UND | 48,00 | $ 83.082,00 | $ 3.987.936,00 |
| | 1,04 | Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado | UND | 45,00 | $ 58.191,00 | $ 2.618.595,00 |
| | 1,05 | Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro | M2 | 2.431,59 | $ 37.994,00 | $ 92.385.830,00 |
| | 1,06 | Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado | UND | 8,00 | $ 58.191,00 | $ 465.528,00 |
| | 1,07 | Retiro de pintura existente en zonas deterioradas | M2 | 3.139,35 | $ 6.410,00 | $ 20.123.234,00 |
| | 1,08 | Desmonte de instalaciones puntos eléctricos | UND | 151,00 | $ 93.815,00 | $ 14.166.065,00 |
| | 1,09 | Desmonte de puntos hidráulicos y sanitarios | UND | 16,00 | $ 32.967,00 | $ 527.472,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,1 | Mantenimiento de closet en mal estado | UND | 8,00 | $ 432.486,00 | $ 3.459.888,00 |
| | 1,11 | Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye estructura de soporte en madera o metálica y retiro a sitio de disposición autorizado | M2 | 1.249,82 | $ 29.012,00 | $ 36.259.778,00 |
| | 1,12 | Limpieza de zonas verdes exteriores, incluye retiro de material vegetal | M2 | 562,85 | $ 25.567,00 | $ 14.390.386,00 |
| | 1,13 | Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado | UND | 8,00 | $ 46.650,00 | $ 373.200,00 |
| | 1,14 | Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro | M2 | 270,06 | $ 24.737,00 | $ 6.680.474,00 |
| | 1,15 | Demolición de redoblón existente. Incluye retiro de material escombro | M | 220,56 | $ 21.265,00 | $ 4.690.208,00 |
| | 1,16 | Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro | M | 277,23 | $ 29.244,00 | $ 8.107.314,00 |
| | 1,17 | Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado | M2 | 17,28 | $ 32.967,00 | $ 569.670,00 |
| | 1,18 | Demolición de columna Existente Garita . Incluye retiro de escombro | UND | 4,00 | $ 770.717,00 | $ 3.082.868,00 |
| | 1,19 | Desmonte y traslado planta eléctrica a sitio autorizado | UND | 1,00 | $ 4.883.040,00 | $ 4.883.040,00 |
| | 1,2 | Excavación en material común. Incluye retiro de material sobrante | M3 | 11,25 | $ 35.829,00 | $ 403.076,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,21 | Excavación manual en material común para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante | M | 371,03 | $ 20.634,00 | $ 7.655.833,00 |
| | 1,22 | Suministro e instalación de geotextil para separación de suelos y capas granulares. | M2 | 76,87 | $ 14.722,00 | $ 1.131.680,00 |
| | 1,23 | Relleno en material seleccionado compactado | M3 | 22,91 | $ 170.777,00 | $ 3.912.501,00 |
| | 1,24 | Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado | M3 | 243,16 | $ 187.376,00 | $ 45.562.348,00 |
| | 1,25 | Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajón, recomendación geotecnista. Incluye compactación | M3 | 3,63 | $ 283.698,00 | $ 1.029.824,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 330.555.163,00** |
| **2.** | | **ESTRUCTURA EN CONCRETO** | | | | |
| | 2,01 | Base en concreto pobre 2200 PSI, solado, espesor 5cm (bajo estructuras en concreto) | M3 | 1,00 | $ 764.387,00 | $ 764.387,00 |
| | 2,02 | Concreto de 3000 PSI para zapatas | M3 | 2,40 | $ 1.022.632,00 | $ 2.454.317,00 |
| | 2,03 | Viga de Cimentación en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m | M | 42,29 | $ 141.184,00 | $ 5.970.671,00 |
| | 2,04 | Viga de cimentación para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m. Incluye refuerzo 4 varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm | M | 328,74 | $ 188.416,00 | $ 61.939.876,00 |
| | 2,05 | Columnas de 0.25 mts x 0.25 mts en concreto de 21mpa (3000 psi) | M | 24,00 | $ 114.969,00 | $ 2.759.256,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,06 | Viga superior de 0.25 m x 0.30 m en concreto de 3000 PSI | M | 32,70 | $ 161.642,00 | $ 5.285.693,00 |
| | 2,07 | Concreto de 3000 PSI para viga canal e=10 cm. Incluye formaletas | M2 | 3,37 | $ 252.566,00 | $ 851.147,00 |
| | 2,08 | Levante de muro en bloque de arena - cemento vibrado de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero 1:4 | M2 | 277,69 | $ 102.009,00 | $ 28.326.879,00 |
| | 2,09 | Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior | M2 | 561,38 | $ 44.754,00 | $ 25.124.001,00 |
| | 2,1 | Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm | M | 35,89 | $ 131.128,00 | $ 4.706.184,00 |
| | 2,11 | Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm | M | 93,00 | $ 109.045,00 | $ 10.141.185,00 |
| | 2,12 | Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm | M | 73,31 | $ 114.091,00 | $ 8.364.011,00 |
| | 2,13 | Mesón en concreto de 3000 psi, ref. 3/8" @ 0.15 mts , incluye granito para placa de 0.08m, muro de apoyo enchapado y apoyo inferior | M | 15,08 | $ 455.738,00 | $ 6.872.529,00 |
| | 2,14 | Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, incluye malla electrosoldada XX-106 | M2 | 1.419,63 | $ 167.772,00 | $ 238.174.164,00 |
| | 2,15 | Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 15cm, incluye malla electrosoldada Malla XX-295, corte de juntas, sello dilatación | M2 | 1.112,84 | $ 243.929,00 | $ 271.453.948,00 |
| | 2,16 | Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI (Plantilla con malla electrosoldada E= 0.15m y vigas 0.15 m x 0.20 m). | M2 | 34,54 | $ 244.442,00 | $ 8.443.027,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Refuerzo 4D 3/8" Y estribos 1/4" @ 0.20m. | | | | |
| | 2,17 | Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparación de la superficie de apoyo | M | 313,50 | $ 112.327,00 | $ 35.214.515,00 |
| | 2,18 | Suministro, corte y figuración de acero de refuerzo Fy=4,2 Mpa | Kg | 1.016,76 | $ 10.755,00 | $ 10.935.254,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 727.781.044,00** |
| **3** | | **PISOS Y ENCHAPES** | | | | |
| | 3,01 | Suministro e instalación de enchape cerámico Duropiso Blanco Cara Única 0.51x0.51. Incluye mortero de nivelación de 4cm. | M2 | 961,32 | $ 165.557,00 | $ 159.153.255,00 |
| | 3,02 | Suministro e instalación de guarda escoba con enchape cerámico Duropiso Blanco | M | 655,63 | $ 56.166,00 | $ 36.824.115,00 |
| | 3,03 | Suministro e instalación de enchape de piso cerámico fortaleza color blanco para baño 33,8 cm x 33,8 cm | M2 | 53,87 | $ 174.213,00 | $ 9.384.854,00 |
| | 3,04 | Suministro e instalación de enchape cerámica 0.20x0.20 m blanco para pared, H=1.8m | M2 | 166,79 | $ 105.570,00 | $ 17.608.020,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 222.970.244,00** |
| **4** | | **CIELO RASO ESTUCO Y PINTURA** | | | | |
| | 4,01 | Suministro y aplicación a llana de estuco plástico acrílico tipo interior | M2 | 1.938,14 | $ 34.939,00 | $ 67.716.673,00 |
| | 4,02 | Suministro y aplicación a llana de estuco plástico acrílico tipo exterior | M2 | 479,61 | $ 34.939,00 | $ 16.757.094,00 |
| | 4,03 | Suministro e instalación de muro en drywall doble cara E/10cm | M2 | 62,72 | $ 232.055,00 | $ 14.554.490,00 |
| | 4,04 | Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 interior, tres manos. | M2 | 1.808,66 | $ 32.422,00 | $ 58.640.375,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,05 | Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 exterior, tres manos. | M2 | 479,61 | $ 35.649,00 | $ 17.097.617,00 |
| | 4,06 | Suministro y aplicación de pintura epoxica, dos manos. | M2 | 129,48 | $ 85.686,00 | $ 11.094.623,00 |
| | 4,07 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC incluye todos los accesorios para su correcta instalación | M2 | 45,54 | $ 126.648,00 | $ 5.767.550,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 191.628.422,00** |
| **5** | | **CUBIERTA** | | | | |
| | 5,01 | Mortero de Nivelación de Placa de Cubierta e=2cm | M2 | 93,58 | $ 49.786,00 | $ 4.658.974,00 |
| | 5,02 | Impermeabilización de placas de cubierta con emulsión asfáltica y membrana Asfáltica | M2 | 93,58 | $ 146.866,00 | $ 13.743.720,00 |
| | 5,03 | Estructura para cubierta en acero estructural, Pintada con base anticorrosiva, acabado en esmalte y anclajes según diseño | Kg | 7.660,01 | $ 30.505,00 | $ 233.668.605,00 |
| | 5,04 | Suministro e instalación de cubierta en lamina termoacústica (incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | M2 | 1.014,07 | $ 160.265,00 | $ 162.520.515,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 414.591.814,00** |
| **6** | | **CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA** | | | | |
| | 6,01 | suministro e instalación de ventana tipo V-2 ( 2,0x1.20). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación. | UND | 20,00 | $ 1.736.561,00 | $ 34.731.220,00 |
| | 6,02 | suministro e instalación de ventana tipo V-3 ( 2.17x1.20). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo | UND | 16,00 | $ 1.957.946,00 | $ 31.327.136,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | lo necesario para su correcta instalación. | | | | |
| | 6,03 | suministro e instalación de ventana tipo V-4 ( 0.6x0.30). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación. | UND | 7,00 | $ 455.466,00 | $ 3.188.262,00 |
| | 6,04 | suministro e instalación de ventana tipo V-5 ( 1.50x1.20). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación. | UND | 5,00 | $ 1.034.319,00 | $ 5.171.595,00 |
| | 6,05 | suministro e instalación de ventana tipo V-7 ( 1,20x1,20). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación. | UND | 3,00 | $ 885.359,00 | $ 2.656.077,00 |
| | 6,06 | suministro e instalación de ventana tipo V-8 ( 1.20x4.00). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación. | UND | 1,00 | $ 3.266.758,00 | $ 3.266.758,00 |
| | 6,07 | suministro e instalación de puertas de 1.0x2.0 en madera prensada color negro. Según diseño | UND | 13,00 | $ 1.013.039,00 | $ 13.169.507,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6,08 | Suministro e instalación de puerta tipo P2 (1.0X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática | UND | 21,00 | $ 1.357.752,00 | $ 28.512.792,00 |
| | 6,09 | Suministro e instalación de puerta tipo P2 (1.2X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática | UND | 3,00 | $ 1.506.712,00 | $ 4.520.136,00 |
| | 6,10 | Suministro e instalación de puerta doble tipo P3 (2.0X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática | UND | 4,00 | $ 2.366.897,00 | $ 9.467.588,00 |
| | 6,11 | Suministro e instalación de puertas en acero inoxidable de 0.90x 1.50 para baños | UND | 8,00 | $ 706.606,00 | $ 5.652.848,00 |
| | 6,12 | Suministro e instalación puerta de salida de residuos ( h 3.0 x l 1.6 ) incluye el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas, diagonales, limpieza y pintura. | UND | 1,00 | $ 4.079.602,00 | $ 4.079.602,00 |
| | 6,13 | Suministro e instalación puerta de acceso vehicular ( h 3.5 x l 4.0 ) incluye el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas, | UND | 1,00 | $ 7.876.185,00 | $ 7.876.185,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | diagonales, limpieza y pintura. | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 153.619.706,00** |
| **7** | | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS** | | | | |
| | | **TUBERIAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE** | | | | |
| | 7,01 | Suministro e instalación tubería de presión 1/2" PVC RDE 13.5, para soldar | M | 2,86 | $ 20.741,00 | $ 59.319,00 |
| | 7,02 | Suministro e instalación tubería de presión 3/4" PVC, RDE 21, para soldar | M | 15,02 | $ 20.713,00 | $ 311.109,00 |
| | 7,03 | Suministro e instalación tubería de presión 1" PVC, RDE 21, para soldar | M | 99,37 | $ 26.456,00 | $ 2.628.933,00 |
| | 7,04 | Suministro e instalación tubería de presión 1-1/4" PVC, RDE 21, para soldar | M | 1,70 | $ 31.163,00 | $ 52.977,00 |
| | 7,05 | Suministro e instalación tubería de presión 1 1/2" PVC, RDE 21, para soldar | M | 46,12 | $ 39.304,00 | $ 1.812.700,00 |
| | 7,06 | Suministro e instalación tubería de presión 2" PVC, RDE 21, para soldar | M | 12,72 | $ 51.716,00 | $ 657.828,00 |
| | 7,07 | Suministro e instalación de punto hidráulico | UND | 40,00 | $ 54.177,00 | $ 2.167.080,00 |
| | 7,08 | Suministro e instalación de micromedidor 1/2" (Referencias aprobadas por el prestador de servicio ) | UND | 1,00 | $ 471.854,00 | $ 471.854,00 |
| | 7,09 | Suministro e instalación Válvula de registro 3/4" , Incluye tapa registro 15x15cm | UND | 14,00 | $ 60.565,00 | $ 847.910,00 |
| | 7,10 | Suministro e instalación Válvula de registro 1" , Incluye tapa registro 15x15cm | UND | 26,00 | $ 64.012,00 | $ 1.664.312,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | | | | **$ 10.674.022,00** |
| | | **TUBERIAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA** | | | | |
| | 7.11 | Suministro e instalación tubería sanitaria 2" PVC, para soldar | M | 26,51 | $ 50.404,00 | $ 1.336.210,00 |
| | 7.12 | Suministro e instalación tubería sanitaria 3" PVC, para soldar | M | 6,56 | $ 69.199,00 | $ 453.945,00 |
| | 7.13 | Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC, para soldar | M | 150,32 | $ 97.829,00 | $ 14.705.655,00 |
| | 7.14 | Punto sanitario 2" | UND | 31,00 | $ 73.856,00 | $ 2.289.536,00 |
| | 7.15 | Punto sanitario 4" | UND | 13,00 | $ 97.573,00 | $ 1.268.449,00 |
| | 7.16 | Construcción de caja de inspección 60x60x100 cm | UND | 11,00 | $ 932.209,00 | $ 10.254.299,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 30.308.094,00** |
| | | **APARATOS SANITARIOS** | | | | |
| | 7.17 | Suministro e instalación de sanitario institucional color blanco. Incluye accesorios para su correcta instalación | UND | 9,00 | $ 1.197.722,00 | $ 10.779.498,00 |
| | 7.18 | Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color blanco. Incluye abastos desagües y grifería tipo Push | UND | 13,00 | $ 1.156.810,00 | $ 15.038.530,00 |
| | 7.19 | Suministro e instalación de sanitario tipo fluxómetro. Incluye fluxómetro y todo lo necesario para su correcta instalación | UND | 2,00 | $ 2.847.511,00 | $ 5.695.022,00 |
| | 7.20 | Suministro e instalación de lavamanos ADA o Similar | UND | 2,00 | $ 1.200.435,00 | $ 2.400.870,00 |
| | 7.21 | Suministro e instalación de lavaplatos empotar 150X52cm, en acero inoxidable. Incluye grifería | UND | 2,00 | $ 865.338,00 | $ 1.730.676,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.22 | Suministro e instalación de rejilla metálica de piso 2" para desagüe | UND | 14,00 | $ 94.278,00 | $ 1.319.892,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 36.964.488,00** |
| | | **AGUAS LLUVIAS** | | | | |
| | 7.23 | Excavación en material común. Incluye retiro de material sobrante | M3 | 80,05 | $ 35.829,00 | $ 2.868.111,00 |
| | 7.24 | Relleno en material seleccionado compactado | M3 | 13,96 | $ 178.607,00 | $ 2.493.354,00 |
| | 7.25 | Suministro e instalación de Arena de rio E=5cm para cama de tubería enterrada y registro aguas Lluvias | M3 | 3,49 | $ 208.300,00 | $ 726.967,00 |
| | 7.26 | Suministro e instalación de tubería 6" PVC corrugado para aguas lluvias. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalación | M | 26,67 | $ 162.174,00 | $ 4.325.181,00 |
| | 7.27 | Suministro e instalación de tubería 8" PVC Corrugado para aguas lluvias. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalación | M | 76,95 | $ 152.504,00 | $ 11.735.183,00 |
| | 7.28 | Cárcamo en concreto de 3000 PSI. Incluye B=0.20m. Incluye tapa en concreto prefabricado | M | 17,25 | $ 404.425,00 | $ 6.976.331,00 |
| | 7.29 | Cajas de registro para drenaje de aguas lluvias del patio principal en concreto de 21MPA, dimensiones 0.60x0.60x0.10 y acero de refuerzo de 3/8" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con rejilla en ángulo 1 1/2" x 1/8" | UND | 6,00 | $ 567.818,00 | $ 3.406.908,00 |
| | 7.30 | Caja de registro principal para captación de aguas lluvias en concreto de 21MPA, dimensiones 2.5x2.5x2.6 y acero de refuerzo de 1/2" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de | UND | 1,00 | $ 23.998.408,00 | $ 23.998.408,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | concreto con refuerzo 1/2" @ 0.20 E.A.S con tapa metálica. | | | | |
| | 7.31 | Caja de registro principal para llaves de control en concreto de 21MPA, dimensiones 1.5x1.65x1.10 y acero de refuerzo de 1/2" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con refuerzo 1/2" @ 0.20 E.A.S con tapa metálica. | UND | 1,00 | $ 14.875.137,00 | $ 14.875.137,00 |
| | 7.32 | Suministro e instalación de canaletas de aguas lluvias según diseño en lámina galvanizada calibre 20, incluye pintura anticorrosiva y accesorios para el buen funcionamiento | M | 135,59 | $ 207.235,00 | $ 28.098.994,00 |
| | 7.33 | Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible, Q=48L/S HDT=4.69m.c.a, en acero inoxidable, acoplada a motor sumergible monofásico 7.5 HP de 220 Volt. Incluye obra eléctrica ,niples, acoples, válvulas, pasamuros para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 2,00 | $ 28.930.446,00 | $ 57.860.892,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 157.365.466,00** |
| **8** | | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | |
| | | **ACOMETIDAS, GABINETES Y TABLEROS** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.01 | Suministro e instalación de acometida Trifásica subterránea calibre 3X6F+1X6N+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4 " PVC. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería PVC 1 1/4, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 51,00 | $ 206.852,00 | $ 10.549.452,00 |
| | 8.02 | Suministro e instalación de acometida Trifásica subterránea calibre 3X8F+1#8N+1#10T cobre aislado DUCTO 1 " PVC. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería PVC 1 , obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 53,00 | $ 210.340,00 | $ 11.148.020,00 |
| | 8.03 | Suministro e instalación de acometida Trifásica calibre 3X8F+1#8N+1#10T cobre aislado DUCTO 1 " EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 36,00 | $ 200.306,00 | $ 7.211.016,00 |
| | 8.04 | Suministro e instalación de acometida Trifásica calibre 3X6F+1X6N+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4 " EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1 1/4, obra civil y demás accesorios y elementos para su | M | 35,00 | $ 236.539,00 | $ 8.278.865,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | correcta instalación y funcionamiento. | | | | |
| | 8.05 | Suministro e instalación de acometida Trifásica calibre 3X4F+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4" EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1 1/4, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 55,00 | $ 249.967,00 | $ 13.748.185,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 50.935.538,00** |
| | | **TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS, CAJAS DE REGISTRO** | | | | |
| | 8.06 | Suministro e instalación de Tablero Trifásico de 30 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 3,00 | $ 2.394.809,00 | $ 7.184.427,00 |
| | 8.07 | suministro e instalación de tablero trifásico de 18 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 1,00 | $ 1.714.888,00 | $ 1.714.888,00 |
| | 8.08 | suministro e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 2,00 | $ 1.545.792,00 | $ 3.091.584,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.09 | Suministro e instalación de Breaker Enchufable 1X20A. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 129,00 | $ 53.748,00 | $ 6.933.492,00 |
| | 8.10 | Suministro e instalación de Breaker Enchufable 2X20A. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | 12,00 | $ 74.834,00 | $ 898.008,00 |
| | 8.11 | suministro e instalación de cajas de registro en mampostería de 0,60x0,60x0,80M NORMA RETIE | UND | 4,00 | $ 1.580.112,00 | $ 6.320.448,00 |
| | 8.12 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra (Malla Eléctrica en B.T) en cable 2/0 AWG, con cuatro varillas 5/8" de cobre de 2.4 metros y cuadriculas. Incluye 6 colas, soldadura exotérmica, obra civil. | UND | 1,00 | $ 9.006.635,00 | $ 9.006.635,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 35.149.482,00** |
| | | **SALIDA DE LUCES Y TOMA CORRIENTES** | | | | |
| | 8.13 | Suministro e instalación de salida para luminaria 110V normal con toma doble con polo a tierra 15A ref. 5320 blanco, 125v y según norma nema 5 - 15R, certificación retie y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 metálica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería EMMT 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento (salida promedio de 8 m) | UND | 190,00 | $ 466.870,00 | $ 88.705.300,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.14 | Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica 110v normal con toma doble con polo a tierra 15A, ref. 5320 blanco, 125v y según la norma nema 5-15R, certificación retie y pruebas de conformidad ul. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 metálica conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 8m) | UND | 87,00 | $ 487.703,00 | $ 42.430.161,00 |
| | 8.15 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica 220v con toma mirada china con protección de falla a tierra, 30a, leviton, blanco, 220v y certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metálica, con tapa suplemento, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería emt de 1/2", conductores de cobre 10 awg-cu-thhn/thwn-90°c, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio de 10 m). | UND | 3,00 | $ 638.996,00 | $ 1.916.988,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.16 | Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica 110v normal con toma doble GFCI con polo a tierra 15A, ref. 5320 blanco, 125v y según la norma nema 5-15R, certificación retie y pruebas de conformidad ul. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 metálica conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 10m) | UND | 1,00 | $ 742.241,00 | $ 742.241,00 |
| | 8.17 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de saice sencillo y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metálica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería emt de 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(salida promedio de 4 m). | UND | 7,00 | $ 570.793,00 | $ 3.995.551,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.18 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de switch doble y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metálica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería emt de 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(salida promedio de 4 m). | UND | 27,00 | $ 582.629,00 | $ 15.730.983,00 |
| | 8.19 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de switch triple y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metálica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería emt de 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(salida promedio de 4 m). | UND | 5,00 | $ 604.931,00 | $ 3.024.655,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 156.545.879,00** |
| | | **LUMINARIAS** | | | | |
| | 8.20 | Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 60x60 40w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 111,00 | $ 404.449,00 | $ 44.893.839,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.21 | Suministro e instalación luminaria hermética tipo led de 2x18w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 24,00 | $ 297.028,00 | $ 7.128.672,00 |
| | 8.22 | Suministro e instalación luminaria tipo panel circular led 12 w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 54,00 | $ 159.208,00 | $ 8.597.232,00 |
| | 8.23 | Suministro e instalación luminaria de emergencia tipo led 10W. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | UND | 1,00 | $ 501.925,00 | $ 501.925,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 61.121.668,00** |
| **9** | | **LUMINARIAS** | | | | |
| | 9.01 | Limpieza general | M2 | 3.661,00 | $ 2.469,00 | $ 9.039.009,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 9.039.009,00** |
| **10** | | **EMPRADIZACIÓN Y ZONAS VERDES** | | | | |
| | 10.01 | suministro e instalación de grama verde natural | M2 | 540,83 | $ 42.710,00 | $ 23.098.849,00 |
| | 10.02 | suministro y plantación de árboles H=1.5m | UND | 8,00 | $ 188.848,00 | $ 1.510.784,00 |
| | 10.03 | suministro y plantación de plantas para jardinería Nephrolepis cordifolia | UND | 30,00 | $ 83.238,00 | $ 2.497.140,00 |
| | 10.04 | suministro y plantación de croto rojo | UND | 30,00 | $ 80.684,00 | $ 2.420.520,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 29.527.293,00** |
| **11** | | **FACHADA** | | | | |
| | 11.01 | Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 exterior, tres manos. | M2 | 453,41 | $ 35.649,00 | $ 16.163.613,00 |
| | 11.02 | Suministro y aplicación a llana de estuco plástico acrílico tipo exterior | M2 | 453,41 | $ 34.939,00 | $ 15.841.692,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.03 | Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparación de la superficie de apoyo | M | 261,22 | $ 112.327,00 | $ 29.342.059,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 61.347.364,00** |
| **12** | | **VENTILACION MECANICA** | | | | |
| | 12.01 | Suministro e instalación de Aire tipo mini Split de 12,000BTU, Incluye tubería de cobre y todos los accesorios para su correcta instalación | UND | 1,00 | $ 5.080.648,00 | $ 5.080.648,00 |
| | 12.02 | Suministro e instalación de Aire tipo mini Split de 18,000BTU, Incluye tubería de cobre y todos los accesorios para su correcta instalación | UND | 1,00 | $ 5.804.169,00 | $ 5.804.169,00 |
| | 12.03 | Suministro e instalación de Aire tipo mini Split de 24,000BTU, Incluye tubería de cobre y todos los accesorios para su correcta instalación | UND | 1,00 | $ 6.123.369,00 | $ 6.123.369,00 |
| | 12.04 | Suministro e instalación de Extractor para baño de 34.6x34.6x11.6cm, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. | UND | 5,00 | $ 811.640,00 | $ 4.058.200,00 |
| **Subtotal** | | | | | $ 0,00 | **$ 21.066.386,00** |
| **13** | | **DOTACION** | | | | |
| | | **MOBILIARIO** | | | | |
| | 13,01 | Suministro de mueble superior para cocina de 0.40x1.20m | UND | 2,00 | $ 811.588,00 | $ 1.623.176,00 |
| | 13,02 | Suministro de silla fija interlocutora de paño | UND | 10,00 | $ 186.577,00 | $ 1.865.770,00 |
| | 13,03 | Suministro de mesa principal para sala de crisis de 24 puestos. 1.20 x 6.40m | UND | 1,00 | $ 2.244.236,00 | $ 2.244.236,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13,04 | Suministro de señalización institucional de 0.30m x 0.20m, en impresión digital plastificado sobre polietileno calibre 60, en alta resolución, incluye cinta doble faz para instalación, y sistemas de fijación en muro (tornillo y chazo en caso de ser necesario). | UND | 34,00 | $ 21.934,00 | $ 745.756,00 |
| | 13,05 | S/I aviso institucional de 2m x 0.70m con instalación. caja de luz en Coll rolled con anticorrosivo, iluminación interior, tubos t8 con regleta y fotocelda para encendido y apagado autom., impr. digital en panaflex a doble pasada a 1440 dpi de resol., | UND | 1,00 | $ 2.145.259,00 | $ 2.145.259,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 8.624.197,00** |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE OBRA** | | | | $2.701.191.082,00 |
| | | **VALOR DOTACIÓN (INCLUYE IVA)** | | | | $ 8.624.197,00 |
| | | | | | | |
| | | COMPONENTE PGIO | | | | $ 40.426.683,00 |
| | | RETIE REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS | | | | $ 8.500.000,00 |
| | | TRAMITE Y COMPENSACION AMBIENTAL | | | | $3.500.000,00 |
| | | TRAMITE LICENCIA DE CONSTRUCCION | | | | $ 2.517.502,00 |
| | | **VALOR TOTAL PROYECTO** | | | | **$2.764.759.464,0** |

## 4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO

Las actividades desarrolladas en el proyecto en el periodo comprendido entre el 07 de abril de 2026 hasta el 07 de mayo de 2026, se describe a continuación:

| N.° | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | **ADECUACIÓN DE ÁREAS EXISTENTES** | | | | |
| | | **PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | |
| | 1,01 | Localización, Trazado y Replanteo | M2 | 3.152,50 | $ 6.280,00 | $ 19.797.700,00 |
| | 1,02 | Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante | M2 | 391,19 | $ 31.102,00 | $ 12.166.791,00 |
| | 1,03 | Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado | UND | 17,00 | $ 83.082,00 | $ 1.412.394,00 |
| | 1,04 | Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado | UND | 10,00 | $ 58.191,00 | $ 581.910,00 |
| | 1,05 | Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro | M2 | 114,72 | $ 37.994,00 | $ 4.358.672,00 |
| | 1,06 | Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado | UND | | $ 58.191,00 | $ 0,00 |
| | 1,07 | Retiro de pintura existente en zonas deterioradas | M2 | | $ 6.410,00 | $ 0,00 |
| | 1,08 | Desmonte de instalaciones puntos eléctricos | UND | 85,00 | $ 93.815,00 | $ 7.974.275,00 |
| | 1,09 | Desmonte de puntos hidráulicos y sanitarios | UND | | $ 32.967,00 | $ 0,00 |
| | 1,1 | Mantenimiento de closet en mal estado | UND | | $ 432.486,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,23 | Relleno en material seleccionado compactado | M3 | | $ 170.777,00 | $ 0,00 |
| | 1,24 | Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado | M3 | | $ 187.376,00 | $ 0,00 |
| | 1,25 | Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajón, recomendación geotecnista. Incluye compactación | M3 | | $ 283.698,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 80.685.102,00** |
| **2.** | | **ESTRUCTURA EN CONCRETO** | | | | |
| | 2,01 | Base en concreto pobre 2200 PSI, solado, espesor 5cm (bajo estructuras en concreto) | M3 | | $ 764.387,00 | $ 0,00 |
| | 2,02 | Concreto de 3000 PSI para zapatas | M3 | | $ 1.022.632,00 | $ 0,00 |
| | 2,03 | Viga de Cimentación en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m | M | 2,95 | $ 141.184,00 | $ 416.493,00 |
| | 2,04 | Viga de cimentación para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m. Incluye refuerzo 4 varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm | M | 56,40 | $ 188.416,00 | $ 10.626.662,00 |
| | 2,05 | Columnas de 0.25 mts x 0.25 mts en concreto de 21mpa (3000 psi) | M | | $ 114.969,00 | $ 0,00 |
| | 2,06 | Viga superior de 0.25 m x 0.30 m en concreto de 3000 PSI | M | | $ 161.642,00 | $ 0,00 |
| | 2,07 | Concreto de 3000 PSI para viga canal e=10 cm. Incluye formaletas | M2 | | $ 252.566,00 | $ 0,00 |
| | 2,08 | Levante de muro en bloque de arena - cemento vibrado de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero 1:4 | M2 | 153,77 | $ 102.009,00 | $ 15.685.924,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,11 | Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye estructura de soporte en madera o metálica y retiro a sitio de disposición autorizado | M2 | 597,63 | $ 29.012,00 | $ 17.338.442,00 |
| | 1,12 | Limpieza de zonas verdes exteriores, incluye retiro de material vegetal | M2 | 173,12 | $ 25.567,00 | $ 4.426.159,00 |
| | 1,13 | Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado | UND | | $ 46.650,00 | $ 0,00 |
| | 1,14 | Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro | M2 | 98,40 | $ 24.737,00 | $ 2.434.121,00 |
| | 1,15 | Demolición de redoblón existente. Incluye retiro de material escombro | M | 67,40 | $ 21.265,00 | $ 1.433.261,00 |
| | 1,16 | Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro | M | 98,86 | $ 29.244,00 | $ 2.891.062,00 |
| | 1,17 | Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposición autorizado | M2 | | $ 32.967,00 | $ 0,00 |
| | 1,18 | Demolición de columna Existente Garita . Incluye retiro de escombro | UND | 4,00 | $ 770.717,00 | $ 3.082.868,00 |
| | 1,19 | Desmonte y traslado planta eléctrica a sitio autorizado | UND | | $ 4.883.040,00 | $ 0,00 |
| | 1,2 | Excavación en material común. Incluye retiro de material sobrante | M3 | | $ 35.829,00 | $ 0,00 |
| | 1,21 | Excavación manual en material común para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante | M | 135,09 | $ 20.634,00 | $ 2.787.447,00 |
| | 1,22 | Suministro e instalación de geotextil para separación de suelos y capas granulares. | M2 | | $ 14.722,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | de la superficie de apoyo | | | | |
| | 2,18 | Suministro, corte y figuración de acero de refuerzo Fy=4,2 Mpa | Kg | | $ 10.755,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 47.629.404,00** |
| **3** | | **PISOS Y ENCHAPES** | | | | |
| | 3,01 | Suministro e instalación de enchape cerámico Duropiso Blanco Cara Única 0.51x0.51. Incluye mortero de nivelación de 4cm. | M2 | | $ 165.557,00 | $ 0,00 |
| | 3,02 | Suministro e instalación de guarda escoba con enchape cerámico Duropiso Blanco | M | | $ 56.166,00 | $ 0,00 |
| | 3,03 | Suministro e instalación de enchape de piso cerámico fortaleza color blanco para baño 33,8 cm x 33,8 cm | M2 | | $ 174.213,00 | $ 0,00 |
| | 3,04 | Suministro e instalación de enchape cerámica 0.20x0.20 m blanco para pared, H=1.8m | M2 | | $ 105.570,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| **4** | | **CIELO RASO ESTUCO Y PINTURA** | | | | |
| | 4,01 | Suministro y aplicación a llana de estuco plástico acrílico tipo interior | M2 | | $ 34.939,00 | $ 0,00 |
| | 4,02 | Suministro y aplicación a llana de estuco plástico acrílico tipo exterior | M2 | | $ 34.939,00 | $ 0,00 |
| | 4,03 | Suministro e instalación de muro en drywall doble cara E/10cm | M2 | | $ 232.055,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,09 | Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior | M2 | | $ 44.754,00 | $ 0,00 |
| | 2,1 | Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm | M | 112,61 | $ 131.128,00 | $ 14.766.324,00 |
| | 2,11 | Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm | M | 24,10 | $ 109.045,00 | $ 2.627.985,00 |
| | 2,12 | Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm | M | 30,73 | $ 114.091,00 | $ 3.506.016,00 |
| | 2,13 | Mesón en concreto de 3000 psi, ref. 3/8" @ 0.15 mts , incluye granito para placa de 0.08m, muro de apoyo enchapado y apoyo inferior | M | | $ 455.738,00 | $ 0,00 |
| | 2,14 | Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, incluye malla electrosoldada XX-106 | M2 | | $ 167.772,00 | $ 0,00 |
| | 2,15 | Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 15cm, incluye malla electrosoldada Malla XX-295, corte de juntas, sello dilatación | M2 | | $ 243.929,00 | $ 0,00 |
| | 2,16 | Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI (Plantilla con malla electrosoldada E= 0.15m y vigas 0.15 m x 0.20 m). Refuerzo 4D 3/8" Y estribos 1/4" @ 0.20m. | M2 | | $ 244.442,00 | $ 0,00 |
| | 2,17 | Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparación | M | | $ 112.327,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,04 | Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 interior, tres manos. | M2 | | $ 32.422,00 | $ 0,00 |
| | 4,05 | Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 exterior, tres manos. | M2 | | $ 35.649,00 | $ 0,00 |
| | 4,06 | Suministro y aplicación de pintura epoxica, dos manos. | M2 | | $ 85.686,00 | $ 0,00 |
| | 4,07 | Suministro e instalación de cielo raso en PVC incluye todos los accesorios para su correcta instalación | M2 | | $ 126.648,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| **5** | | **CUBIERTA** | | | | |
| | 5,01 | Mortero de Nivelación de Placa de Cubierta e=2cm | M2 | | $ 49.786,00 | $ 0,00 |
| | 5,02 | Impermeabilización de placas de cubierta con emulsión asfáltica y membrana Asfáltica | M2 | | $ 146.866,00 | $ 0,00 |
| | 5,03 | Estructura para cubierta en acero estructural, Pintada con base anticorrosiva, acabado en esmalte y anclajes según diseño | Kg | | $ 30.505,00 | $ 0,00 |
| | 5,04 | Suministro e instalación de cubierta en lamina termoacústica (incluye todos los accesorios para su correcta instalación) | M2 | | $ 160.265,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| **6** | | **CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA** | | | | |
| | 6,01 | suministro e instalación de ventana tipo V-2 ( 2,0x1.20). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo | UND | | $ 1.736.561,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | necesario para su correcta instalación. | | | | |
| | 6,02 | suministro e instalación de ventana tipo V-3 ( 2.17x1.20). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación. | UND | | $ 1.957.946,00 | $ 0,00 |
| | 6,03 | suministro e instalación de ventana tipo V-4 ( 0.6x0.30). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación. | UND | | $ 455.466,00 | $ 0,00 |
| | 6,04 | suministro e instalación de ventana tipo V-5 ( 1.50x1.20). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación. | UND | | $ 1.034.319,00 | $ 0,00 |
| | 6,05 | suministro e instalación de ventana tipo V-7 ( 1,20x1,20). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación. | UND | | $ 885.359,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6,06 | suministro e instalación de ventana tipo V-8 ( 1.20x4.00). incluye carpintería en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalación. | UND | | $ 3.266.758,00 | $ 0,00 |
| | 6,07 | suministro e instalación de puertas de 1.0x2.0 en madera prensada color negro. Según diseño | UND | | $ 1.013.039,00 | $ 0,00 |
| | 6,08 | Suministro e instalación de puerta tipo P2 (1.0X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática | UND | | $ 1.357.752,00 | $ 0,00 |
| | 6,09 | Suministro e instalación de puerta tipo P2 (1.2X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática | UND | | $ 1.506.712,00 | $ 0,00 |
| | 6,10 | Suministro e instalación de puerta doble tipo P3 (2.0X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática | UND | | $ 2.366.897,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6,11 | Suministro e instalación de puertas en acero inoxidable de 0.90x 1.50 para baños | UND | | $ 706.606,00 | $ 0,00 |
| | 6,12 | Suministro e instalación puerta de salida de residuos ( h 3.0 x l 1.6 ) incluye el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas, diagonales, limpieza y pintura. | UND | | $ 4.079.602,00 | $ 0,00 |
| | 6,13 | Suministro e instalación puerta de acceso vehicular ( h 3.5 x l 4.0 ) incluye el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas, diagonales, limpieza y pintura. | UND | | $ 7.876.185,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| **7** | | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS** | | | | |
| | | **TUBERIAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE** | | | | |
| | 7,01 | Suministro e instalación tubería de presión 1/2" PVC RDE 13.5, para soldar | M | | $ 20.741,00 | $ 0,00 |
| | 7,02 | Suministro e instalación tubería de presión 3/4" PVC, RDE 21, para soldar | M | | $ 20.713,00 | $ 0,00 |
| | 7,03 | Suministro e instalación tubería de presión 1" PVC, RDE 21, para soldar | M | | $ 26.456,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,04 | Suministro e instalación tubería de presión 1-1/4" PVC, RDE 21, para soldar | M | | $ 31.163,00 | $ 0,00 |
| | 7,05 | Suministro e instalación tubería de presión 1 1/2" PVC, RDE 21, para soldar | M | | $ 39.304,00 | $ 0,00 |
| | 7,06 | Suministro e instalación tubería de presión 2" PVC, RDE 21, para soldar | M | | $ 51.716,00 | $ 0,00 |
| | 7,07 | Suministro e instalación de punto hidráulico | UND | | $ 54.177,00 | $ 0,00 |
| | 7,08 | Suministro e instalación de micromedidor 1/2" (Referencias aprobadas por el prestador de servicio ) | UND | | $ 471.854,00 | $ 0,00 |
| | 7,09 | Suministro e instalación Válvula de registro 3/4" , Incluye tapa registro 15x15cm | UND | | $ 60.565,00 | $ 0,00 |
| | 7,10 | Suministro e instalación Válvula de registro 1" , Incluye tapa registro 15x15cm | UND | | $ 64.012,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| | | **TUBERIAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA** | | | | |
| | 7.11 | Suministro e instalación tubería sanitaria 2" PVC, para soldar | M | | $ 50.404,00 | $ 0,00 |
| | 7.12 | Suministro e instalación tubería sanitaria 3" PVC, para soldar | M | | $ 69.199,00 | $ 0,00 |
| | 7.13 | Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC, para soldar | M | | $ 97.829,00 | $ 0,00 |
| | 7.14 | Punto sanitario 2" | UND | | $ 73.856,00 | $ 0,00 |
| | 7.15 | Punto sanitario 4" | UND | | $ 97.573,00 | $ 0,00 |
| | 7.16 | Construcción de caja de inspección 60x60x100 cm | UND | | $ 932.209,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| | | **APARATOS SANITARIOS** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.17 | Suministro e instalación de sanitario institucional color blanco. Incluye accesorios para su correcta instalación | UND | | $ 1.197.722,00 | $ 0,00 |
| | 7.18 | Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer color blanco. Incluye abastos desagües y grifería tipo Push | UND | | $ 1.156.810,00 | $ 0,00 |
| | 7.19 | Suministro e instalación de sanitario tipo fluxómetro. Incluye fluxómetro y todo lo necesario para su correcta instalación | UND | | $ 2.847.511,00 | $ 0,00 |
| | 7.20 | Suministro e instalación de lavamanos ADA o Similar | UND | | $ 1.200.435,00 | $ 0,00 |
| | 7.21 | Suministro e instalación de lavaplatos empotar 150X52cm, en acero inoxidable. Incluye grifería | UND | | $ 865.338,00 | $ 0,00 |
| | 7.22 | Suministro e instalación de rejilla metálica de piso 2" para desagüe | UND | | $ 94.278,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| | | **AGUAS LLUVIAS** | | | | |
| | 7.23 | Excavación en material común. Incluye retiro de material sobrante | M3 | | $ 35.829,00 | $ 0,00 |
| | 7.24 | Relleno en material seleccionado compactado | M3 | | $ 178.607,00 | $ 0,00 |
| | 7.25 | Suministro e instalación de Arena de rio E=5cm para cama de tubería enterrada y registro aguas Lluvias | M3 | | $ 208.300,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.26 | Suministro e instalación de tubería 6" PVC corrugado para aguas lluvias. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalación | M | | $ 162.174,00 | $ 0,00 |
| | 7.27 | Suministro e instalación de tubería 8" PVC Corrugado para aguas lluvias. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalación | M | | $ 152.504,00 | $ 0,00 |
| | 7.28 | Cárcamo en concreto de 3000 PSI. Incluye B=0.20m. Incluye tapa en concreto prefabricado | M | | $ 404.425,00 | $ 0,00 |
| | 7.29 | Cajas de registro para drenaje de aguas lluvias del patio principal en concreto de 21MPA, dimensiones 0.60x0.60x0.10 y acero de refuerzo de 3/8" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con rejilla en ángulo 1 1/2" x 1/8" | UND | | $ 567.818,00 | $ 0,00 |
| | 7.30 | Caja de registro principal para captación de aguas lluvias en concreto de 21MPA, dimensiones 2.5x2.5x2.6 y acero de refuerzo de 1/2" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con refuerzo 1/2" @ 0.20 E.A.S con tapa metálica. | UND | | $ 23.998.408,00 | $ 0,00 |
| | 7.31 | Caja de registro principal para llaves de control en concreto de 21MPA, dimensiones 1.5x1.65x1.10 y acero de refuerzo de 1/2" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con refuerzo 1/2" @ 0.20 | UND | | $ 14.875.137,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E.A.S con tapa metálica. | | | | |
| | 7.32 | Suministro e instalación de canaletas de aguas lluvias según diseño en lámina galvanizada calibre 20, incluye pintura anticorrosiva y accesorios para el buen funcionamiento | M | | $ 207.235,00 | $ 0,00 |
| | 7.33 | Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible, Q=48L/S HDT=4.69m.c.a, en acero inoxidable, acoplada a motor sumergible monofásico 7.5 HP de 220 Volt. Incluye obra eléctrica ,niples, acoples, válvulas, pasamuros para su correcta instalación y funcionamiento | UND | | $ 28.930.446,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| **8** | | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | |
| | | **ACOMETIDAS, GABINETES Y TABLEROS** | | | | |
| | 8.01 | Suministro e instalación de acometida Trifásica subterránea calibre 3X6F+1X6N+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4 " PVC. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería PVC 1 1/4, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | M | | $ 206.852,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02 | Suministro e instalación de acometida Trifásica subterránea calibre 3X8F+1#8N+1#10T cobre aislado DUCTO 1 " PVC. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería PVC 1 , obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | M | | $ 210.340,00 | $ 0,00 |
| | 8.03 | Suministro e instalación de acometida Trifásica calibre 3X8F+1#8N+1#10T cobre aislado DUCTO 1 " EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | M | | $ 200.306,00 | $ 0,00 |
| | 8.04 | Suministro e instalación de acometida Trifásica calibre 3X6F+1X6N+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4 " EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1 1/4, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | M | | $ 236.539,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.05 | Suministro e instalación de acometida Trifásica calibre 3X4F+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4 " EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1 1/4, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | M | | $ 249.967,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| | | **TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS, CAJAS DE REGISTRO** | | | | |
| | 8.06 | Suministro e instalación de Tablero Trifásico de 30 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | UND | | $ 2.394.809,00 | $ 0,00 |
| | 8.07 | suministro e instalación de tablero trifásico de 18 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | UND | | $ 1.714.888,00 | $ 0,00 |
| | 8.08 | suministro e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | UND | | $ 1.545.792,00 | $ 0,00 |
| | 8.09 | Suministro e instalación de Breaker Enchufable 1X20A. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | | $ 53.748,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.10 | Suministro e instalación de Breaker Enchufable 2X20A. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | | $ 74.834,00 | $ 0,00 |
| | 8.11 | suministro e instalación de cajas de registro en mampostería de 0,60x0,60x0,80M NORMA RETIE | UND | | $ 1.580.112,00 | $ 0,00 |
| | 8.12 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra (Malla Eléctrica en B.T) en cable 2/0 AWG, con cuatro varillas 5/8" de cobre de 2.4 metros y cuadriculas. Incluye 6 colas, soldadura exotérmica, obra civil. | UND | | $ 9.006.635,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| | | **SALIDA DE LUCES Y TOMA CORRIENTES** | | | | |
| | 8.13 | Suministro e instalación de salida para luminaria 110V normal con toma doble con polo a tierra 15A ref. 5320 blanco, 125v y según norma nema 5 - 15R, certificación retie y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 metálica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería EMMT 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento (salida promedio de 8 m) | UND | | $ 466.870,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.14 | Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica 110v normal con toma doble con polo a tierra 15A, ref. 5320 blanco, 125v y según la norma nema 5-15R, certificación retie y pruebas de conformidad ul. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 metálica conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 8m) | UND | | $ 487.703,00 | $ 0,00 |
| | 8.15 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica 220v con toma mirada china con protección de falla a tierra, 30a, leviton, blanco, 220v y certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metálica, con tapa suplemento, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería emt de 1/2", conductores de cobre 10 awg-cu-thhn/thwn-90°c, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | | $ 638.996,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (salida promedio de 10 m). | | | | |
| | 8.16 | Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica 110v normal con toma doble GFCI con polo a tierra 15A, ref. 5320 blanco, 125v y según la norma nema 5-15R, certificación retie y pruebas de conformidad ul. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 metálica conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tubería EMT 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 10m) | UND | | $ 742.241,00 | $ 0,00 |
| | 8.17 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de saice sencillo y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metálica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería emt de 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos | UND | | $ 570.793,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | para su correcta instalación y funcionamiento.(salida promedio de 4 m). | | | | |
| | 8.18 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de switch doble y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metálica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería emt de 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(salida promedio de 4 m). | UND | | $ 582.629,00 | $ 0,00 |
| | 8.19 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de switch triple y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metálica, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillos, tubería emt de 1/2", conductores de cobre 12 libre de halógenos, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta | UND | | $ 604.931,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | instalación y funcionamiento.(salida promedio de 4 m). | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| | | **LUMINARIAS** | | | | |
| | 8.20 | Suministro e instalación de luminaria led tipo panel 60x60 40w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | UND | | $ 404.449,00 | $ 0,00 |
| | 8.21 | Suministro e instalación luminaria hermética tipo led de 2x18w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | UND | | $ 297.028,00 | $ 0,00 |
| | 8.22 | Suministro e instalación luminaria tipo panel circular led 12 w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | UND | | $ 159.208,00 | $ 0,00 |
| | 8.23 | Suministro e instalación luminaria de emergencia tipo led 10W. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento | UND | | $ 501.925,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| **9** | | **LUMINARIAS** | | | | |
| | 9.01 | Limpieza general | M2 | | $ 2.469,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| **10** | | **EMPRADIZACIÓN Y ZONAS VERDES** | | | | |
| | 10.01 | suministro e instalación de grama verde natural | M2 | | $ 42.710,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.02 | suministro y plantación de árboles H=1.5m | UND | | $ 188.848,00 | $ 0,00 |
| | 10.03 | suministro y plantación de plantas para jardinería Nephrolepis cordifolia | UND | | $ 83.238,00 | $ 0,00 |
| | 10.04 | suministro y plantación de croto rojo | UND | | $ 80.684,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| **11** | | **FACHADA** | | | | |
| | 11.01 | Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 exterior, tres manos. | M2 | | $ 35.649,00 | $ 0,00 |
| | 11.02 | Suministro y aplicación a llana de estuco plástico acrílico tipo exterior | M2 | | $ 34.939,00 | $ 0,00 |
| | 11.03 | Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparación de la superficie de apoyo | M | | $ 112.327,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| **12** | | **VENTILACION MECANICA** | | | | |
| | 12.01 | Suministro e instalación de Aire tipo mini Split de 12,000BTU, Incluye tubería de cobre y todos los accesorios para su correcta instalación | UND | | $ 5.080.648,00 | $ 0,00 |
| | 12.02 | Suministro e instalación de Aire tipo mini Split de 18,000BTU, Incluye tubería de cobre y todos los accesorios para su correcta instalación | UND | | $ 5.804.169,00 | $ 0,00 |
| | 12.03 | Suministro e instalación de Aire tipo mini Split de 24,000BTU, Incluye tubería de cobre y todos los accesorios para su correcta instalación | UND | | $ 6.123.369,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.04 | Suministro e instalación de Extractor para baño de 34.6x34.6x11.6cm, incluye todos los accesorios para su correcta instalación. | UND | | $ 811.640,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | $ 0,00 | **$ 0,00** |
| **13** | | **DOTACION** | | | | |
| | | **MOBILIARIO** | | | | |
| | 13,01 | Suministro de mueble superior para cocina de 0.40x1.20m | UND | | $ 811.588,00 | $ 0,00 |
| | 13,02 | Suministro de silla fija interlocutora de paño | UND | | $ 186.577,00 | $ 0,00 |
| | 13,03 | Suministro de mesa principal para sala de crisis de 24 puestos. 1.20 x 6.40m | UND | | $ 2.244.236,00 | $ 0,00 |
| | 13,04 | Suministro de señalización institucional de 0.30m x 0.20m, en impresión digital plastificado sobre polietileno calibre 60, en alta resolución, incluye cinta doble faz para instalación, y sistemas de fijación en muro (tornillo y chazo en caso de ser necesario). | UND | | $ 21.934,00 | $ 0,00 |
| | 13,05 | S/I aviso institucional de 2m x 0.70m con instalación. caja de luz en Coll rolled con anticorrosivo, iluminación interior, tubos t8 con regleta y fotocelda para encendido y apagado autom., impr. digital en panaflex a doble pasada a 1440 dpi de resol., | UND | | $ 2.145.259,00 | $ 0,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 0,00** |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE OBRA** | | | | $ 128.314.506,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VALOR DOTACIÓN (INCLUYE IVA)** | | | | $ - |
| | | | | | | |
| | | COMPONENTE PGIO | | | | $ 15.707.426,60 |
| | | RETIE REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS | | | | |
| | | TRAMITE Y COMPENSACION AMBIENTAL | | | | |
| | | TRAMITE LICENCIA DE CONSTRUCCION | | | | |
| | | **VALOR TOTAL PROYECTO** | | | | **$ 144.021.932,60** |

## 5. INFORME DETALLADO DE OBRA

1.0 Se realizaron actividades de localización trazado y replanteo en áreas intervenidas

2.0 Se realizan actividades de desmonte de cielo raso en CRUE excepto (oficina de coordinación y centro de reserva que a la fecha no han sido desocupadas) bloque de MALARIA donde se proyecta según estudios y diseño queden las áreas para oficina y control de insumos, sala de necropsias, bio residuos, unidad sanitaria, sala de informática, archivo general y oficina de salud ambiental.

3.0 Se realizan actividades de desmonte de puertas y ventanas en CRUE excepto (oficina de coordinación y centro de reserva que a la fecha no han sido desocupadas) bloque de MALARIA donde se proyecta según estudios y diseño queden las áreas para oficina y control de insumos, sala de necropsias, bio residuos, unidad sanitaria, sala de informática, archivo general y oficina de salud ambiental.

4.0 Demolición de plantilla y andenes en exteriores.

5.0 Desmonte de puntos eléctricos en CRUE, bloque de MALARIA donde se proyecta según estudios y diseño queden las áreas para oficina y control de insumos, sala de necropsias, bio residuos, unidad sanitaria, sala de informática, archivo general y oficina de salud ambiental.

6.0 Se realizan actividades de desmonte de cubierta existente en CRUE excepto (oficina de coordinación y centro de reserva que a la fecha

no han sido desocupadas) bloque de MALARIA donde se proyecta según estudios y diseño queden las áreas para oficina y control de insumos, sala de necropsias, bio residuos, unidad sanitaria, sala de informática, archivo general y oficina de salud ambiental.

7.0 Limpieza en zonas verdes exteriores.

8.0 Demolición de muros existentes en MALARIA donde se proyecta según estudios y diseño queden las áreas para oficina y control de insumos, sala de necropsias, bio residuos, unidad sanitaria, sala de informática, archivo general y oficina de salud ambiental.

9.0 Demolición de redoblón CRUE, bloque de MALARIA donde se proyecta según estudios y diseño queden las áreas para oficina y control de insumos, sala de necropsias, bio residuos, unidad sanitaria, sala de informática, archivo general y oficina de salud ambiental.

10.0 Demolición de bordillos existentes en zonas exteriores.

11.0 Demolición de columnas existentes en garita ubicada en MALARIA

12.0 Excavación manual para vigas de cimentación en muros divisorios en MALARIA donde se proyecta según estudios y diseño queden las áreas para oficina y control de insumos, sala de necropsias, bio residuos, unidad sanitaria, sala de informática, archivo general y oficina de salud ambiental Y confinamiento de andenes exteriores y jardineras.

13.0 Viga de cimentación de 0.25x0.30 en muros divisorios en MALARIA donde se proyecta según estudios y diseño queden las áreas para oficina y control de insumos, sala de necropsias, bio residuos, unidad sanitaria, sala de informática, archivo general y oficina de salud ambiental Y confinamiento de andenes exteriores y jardineras.

14.0 Viga superior de 0.25x0.30 en muros divisorios en MALARIA donde se proyecta según estudios y diseño queden las áreas para oficina y control de insumos, sala de necropsias, bio residuos, unidad sanitaria, sala de informática, archivo general y oficina de salud ambiental Y confinamiento de andenes exteriores y jardineras.

15.0 Levante de muro en CRUE, bloque de MALARIA donde se proyecta según estudios y diseño queden las áreas para oficina y control de insumos, sala de necropsias, bio residuos, unidad sanitaria, sala de informática, archivo general y oficina de salud ambiental


16.0 Viga cinta en bloque de MALARIA donde se proyecta según estudios y diseño queden las áreas para oficina y control de insumos, sala de necropsias, bio residuos, unidad sanitaria.

17.0 Columnetas de confinamientos para muros de cuchillas y muros divisorios.


18.0 Dintel para vanos de puertas y ventanas.

## 6. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PROYECTO

### GRAFICO N.1 AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO

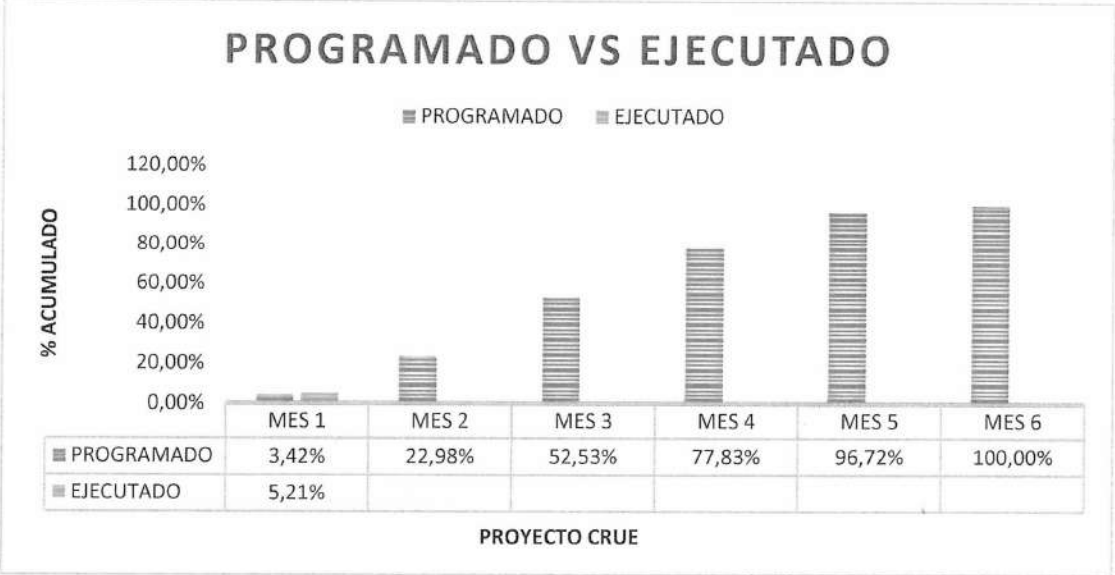


| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMADO | 3,42% | 22,98% | 52,53% | 77,83% | 96,72% | 100,00% |
| EJECUTADO | 5,21% | | | | | |

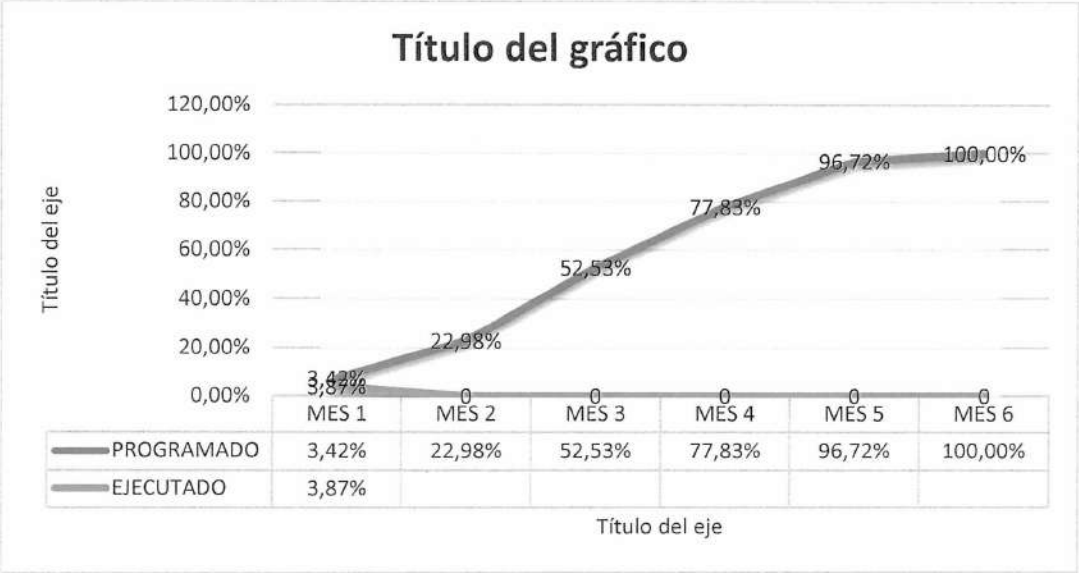


En el periodo del 07 de abril de 2026 y el 06 de mayo de 2026, el Contratista presenta una ejecución de $106.996.191,26 equivalente al 3,87% contra un programado a ejecutar de $110.037.426,67 equivalente al 3,98% del valor total del contrato de obra, lo que representa un atraso de $ 3.041.235,41 equivalente al 0,11% respecto al programa de inversiones vigente.

Hasta la fecha el contrato lleva un avance en tiempo del tiempo total de ejecución, correspondiente a un (01) mes de ejecución.

## 8.0 PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA EN EL PERIODO

El contratista dispone del siguiente personal profesional técnico en obra, para la construcción del proyecto. El personal está descrito en la tabla a continuación:

Cuadro N.5 . Personal profesional en obra

| No | CARGO | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | Director de Obra | JESUS ORLANDO SANDOVAL ARCINIEGAS |
| 1 | Ingeniero Residente | CARMEN ANA GARCES NEGRETE |
| 1 | Especialista en Seguridad Industrial y/o salud ocupacional | MARÍA GONZÁLEZ AYUZ |
| 1 | Ing. Eléctrico | DANIEL JOSE CORRALES PATERNINA |

El contratista dispone del siguiente equipo en obra, para la construcción del proyecto:

Cuadro N.6. Equipo y Herramienta en obra

| EQUIPO | FRENTES | TOTAL |
|---|---|---|
| **Equipo de Topografía ( estación, nivel, GPS)** | ➢ Actividades dentro del área indicada para la ejecución del proyecto | 1 |
| **Volquetas** | ➢ Recolección de escombros y material sobrante | 1 |
| **Mescladora de concreto** | ➢ Cimentaciones y elementos estructurales | 1 |
| **Herramientas menores** | ➢ CRUE<br>➢ MALARIA | 10 |

## 7.0 ESTADO DEL TIEMPO

En el periodo de ejecución del 07 de abril al 06 de mayo de 2026, predomino se presentaron 3 días con lluvias.

## 8.0 CONTROL DE CALIDAD

Se realizaron muestras de concreto tomadas desde la ejecución de actividades como concreto de 3.000 PSI para viga de cimentación y viga cinta.

Ver anexo 01

## 9.0 PGIO (MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUATRIAL Y SALUD OCUPACIONAL)

Adoptando lo estipulado en el Plan de adaptación a la gestión ambiental aprobado para el contrato de Obra de acuerdo al pliego de condiciones. En el que se analizan los temas de:

- Recolección, Transporte y Disposición de material.
- Manejo de Residuos Sólidos.
- Señalización de los frentes de trabajo.

## 11. PGIO (MANEJO AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUATRIAL Y SALUD OCUPACIONAL)

Adoptando lo estipulado en el Plan de adaptación a la gestión ambiental aprobado para el contrato de Obra de acuerdo con el pliego de condiciones. En el que se analizan los temas de:

- Recolección, Transporte y Disposición de material.
- Manejo de Residuos Sólidos.
- Señalización de los frentes de trabajo.

De igual forma se hace seguimiento a los siguientes aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional, al cual se anexa evidencia de los mismos.

- Control de la señalización
- Listado de Maquinaria y Equipo
- Control de materiales
- Planilla de disposición de escombros
- Plan de acción para control riesgos

Para la implementación del Plan De Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional aprobado para el contrato de obra, se realiza seguimiento e implementación al programa de higiene y seguridad industrial y de salud ocupacional en el que se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Señalización
- Afiliación al sistema de seguridad social
- Dotación y elementos de protección personal
- Tasa de accidentalidad
- Inducción, Capacitación y Entrenamiento

De igual forma se hace seguimiento a los siguientes aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional, al cual se anexa evidencia de los mismos.

- Señalización
- Valla informativa del proyecto
- Relación de trabajadores
- Certificado de Afiliación – ARL
- Planilla pagada de seguridad social
- Entrega de Dotación y EPP

- Registro asistencia a capacitaciones
- Orden y Aseo

La implementación y seguimiento de estos planes queda plasmada en los informes mensuales entregados para el componente ambiental, los de seguridad industrial y salud ocupacional a cargo del ing. María Inés González Ayuz.

**Ver anexo 02 – PGIO**

## 12. ASPECTO FINANCIERO

### 12.1. FORMA DE PAGO

1.- El Departamento de Córdoba cancelara el valor del presente contrato de la siguiente manera: 1.-PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, con un avance mínimo del 20% de ejecución la primera acta; no obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo, certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales del personal que emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar.

### 12.2 ACTAS PARCIALES DE OBRA

Hasta la fecha no se han presentado hasta parciales de obras.

## 13. COMENTARIOS

- El contrato de obra N° SI-LP-011-2025, se suscribió entre el departamento de Córdoba y el **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**, contratista teniendo como fecha de acta de inicio el 07 de Abril de 2026, con un plazo de cinco (05) meses.
- Se realiza la legalización y aprobación de pólizas por parte de la entidad de Córdoba, a través del portal SECOP 2.
- Se realiza la instalación de la valla del contrato de obra, conforme a los requisitos de la gobernación de Córdoba.
- El día 20 de abril se realiza el acto protocolario de primera piedra.
- Se ejecutan actividades de desmonte de cubierta en mal estado, demoliciones, levante de muro y demás elementos estructurales.
- El contratista mediante el oficio OF-CRVC-2026-020 con fecha del 24 de abril de 2026 solicito el desalojo de las oficinas de centro de reserva y coordinación en CRUE con el fin de intervenir de manera total las instalaciones de CRUE.
- El contratista mediante el oficio OF-CRVC-2026-021 con fecha de 24 de abril de 2026 solicito el desalojo de las oficinas de BODEGA DE MEDICAMENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA y CUARTO FRIO para almacenamiento de medicamentos PAI en MALARIA con el fin de adelantar actividades programadas dentro de la programación de obra y no se vean afectados los porcentajes de avance.
- El contratista de obra mediante el oficio OF-CRVC-2026-013 del 17 de abril de 2026 solicita ante la corporación autónoma regional de los valles del Sinú y san Jorge la solicitud de concepto técnico para la tala de árboles frutales dentro del proyecto los cuales están generando afectaciones estructurales a las instalaciones existentes evidenciándose deterioro en pisos, cimentaciones y otras áreas intervenidas, lo cual compromete la estabilidad de las obras y dificulta el normal desarrollo de las actividades constructivas dentro de la ejecución del contrato.


María Elena Rivera Hoyos.

**MARIA ELENA RIVERA HOYOS**
C.C 30.571.396 de Sahagún
REP. LEGAL CONSORCIO RED VITAL CORDOBA

## ANEXOS

1.0 Ensayos de laboratorio
2.0 PGIO
3.0 Bitácora


## REGISTRO FOTOGRAFICO

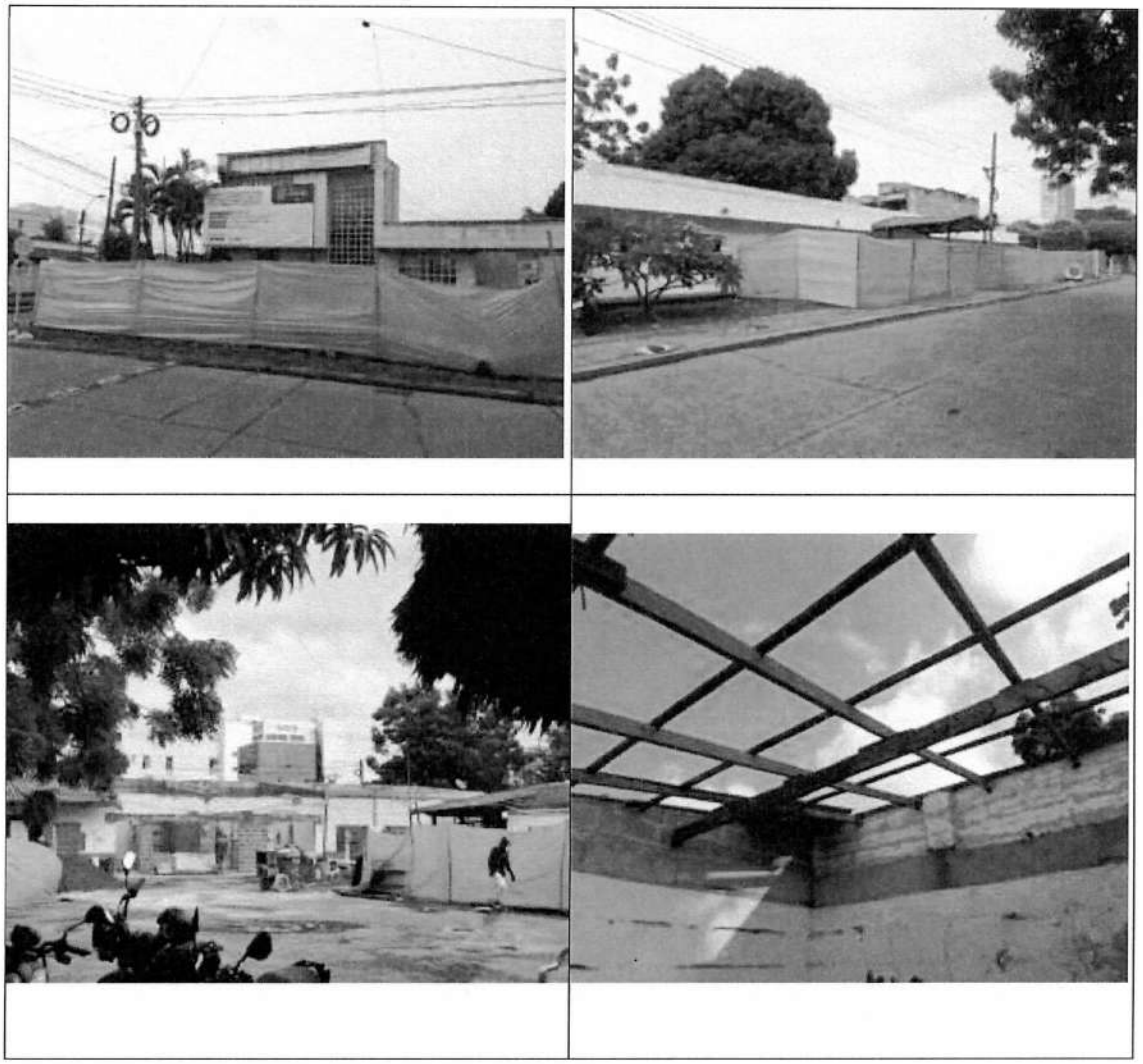







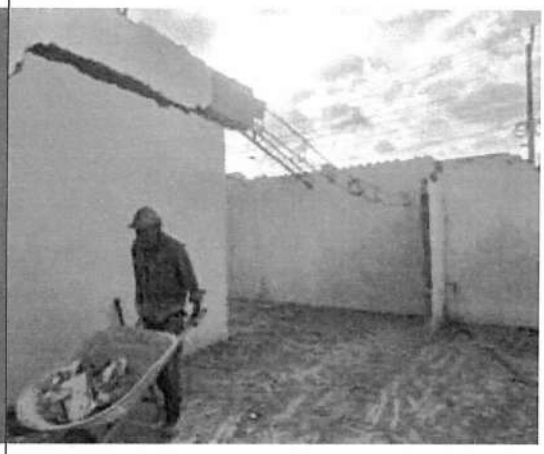










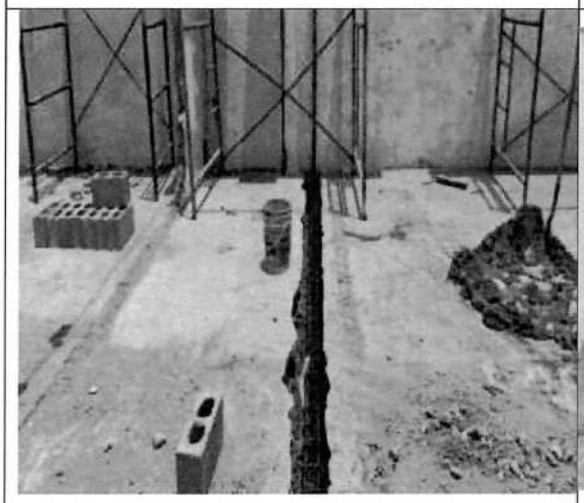











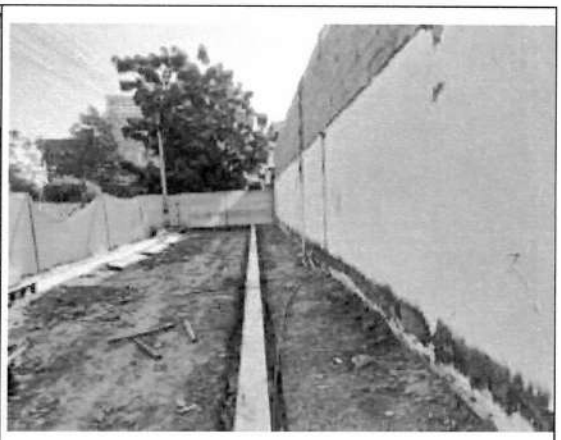

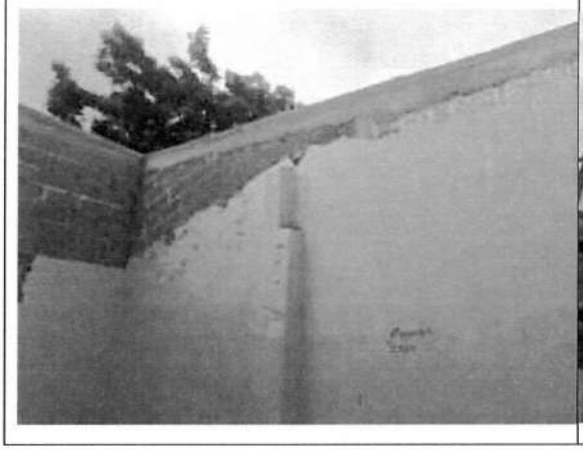



CONSORCIO
RED VITAL CORDOBA

# RESULTADO DE MUESTRAS DE LABORATORIO A CONCRETOS

Carrera 6 #62b-32 Oficina 618
Centro de Negocios Sexta Avenida
Monteria – Cordoba.

consorcioredvital@gmail.com

(604) 7812273
(+57) 315 4764499

# JV INGENIERÍA

NIT. 10 765 474-7

**LA GEOTECNIA ES NUESTRA ESPECIALIDAD, LA CALIDAD ES NUESTRA GARANTÍA**
**ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO**
**I.N.V. - 410**

Casa 011A, B/ Horizonte
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES EN A EDIFICACIÓN DE UN NIVEL CRUE MONTERÍA -CÓRDOBA**

**CONTRATISTA: CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA**


**3000 PSI**

| CILINDRO | ESTRUCTURA | FECHA TOMA | FECHA ROTURA | DIAS | DISEÑO PSI | DATOS DE DIMENSIÓN | | | | PESO (g) | Peso Unitario (Kg/cm3) | | | | | | | 1 | | | | CUMPLE/NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | h1 (cm) | D (cm) | A (cm2) | V(cm3) | | | | | | | | | CARGA (Lbf) | CARGA (KN) | PSI | % | |
| 1 | VIGA CINTA | 22/04/2026 | 29/04/2026 | 7 | 3000 | 30,1 | 15,1 | 179,1 | 5390,3 | 12536,0 | 2,326 | X | | | | | | 64959 | 285,8 | 2340,3 | 78% | CUMPLE |
| 2 | | 22/04/2026 | 6/05/2026 | 14 | 3000 | 30,2 | 15,1 | 179,1 | 5408,2 | 12475,0 | 2,307 | | | | X | | | 78547 | 345,6 | 2829,8 | 94% | CUMPLE |
| 3 | VIGA DE CIMENTACIÓN | 29/04/2026 | 6/05/2026 | 7 | 3000 | 30,2 | 15,2 | 181,5 | 5480,0 | 12522,0 | 2,285 | | | | | X | | 65012 | 286,1 | 2311,4 | 77% | CUMPLE |
| 4 | | 29/04/2026 | 13/05/2026 | 14 | 3000 | 30,1 | 15,0 | 176,7 | 5319,1 | 12288,0 | 2,310 | | | | | X | | 75918 | 334,0 | 2771,7 | 92% | CUMPLE |
| 5 | VIGA DE CIMENTACIÓN | 8/05/2026 | 15/05/2026 | 7 | 3000 | 30,0 | 15,1 | 179,1 | 5372,4 | 12690,0 | 2,362 | | X | | | | | 63596 | 279,8 | 2291,1 | 76% | CUMPLE |

Nota: Los especímenes de concreto fallados fueron suministros por el contratista

Nota: Los resultados presentados en este documento corresponden únicamente a los especímenes ensayados

**Observaciones:**




JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZÁLEZ
LABORATORISTA

CONSORCIO
RED VITAL CORDOBA

# BITACORA

Carrera 6 #62b-32 Oficina 618
Centro de Negocios Sexta Avenida
Monteria - Cordoba.

consorcioredvital@gmail.com

(604) 7812273
(+57) 315 4764499

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 07 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 1,0 |

| ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|
| MAÑANA | TARDE |
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

el contratista de obra realizo actividades de acompañamiento al personal de CRUE y MALARIA en el desalojo de las areas a intervenir, esta actividad se realizo con una anterioridad de 3 semanas co respecto al acta de inicio.

El contratista de obra inicia actividades de cerramiento perimetral con lona verde de los bloques a intervenir especificados en la programacion de obra.

se realizan actividades de localizacion trazado y replanteo con comision de topografia

**OBSERVACIONES**

la actividad de cerramiento perimetral no se encuentra contratada dentro del presupuesto de obra por lo que se solicito sean revisadas las actividades realizadas y que no esten en presupuesto sean indicadas como ITEMS no previsto.

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 08 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 2,0 |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| MAÑANA | TARDE |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de desmonte de cielo razo existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de puertas existentes en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de ventanas existentes en mal estado en bloques de malaria

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**<br>**NIT: 9020223563** | **BITACORA DIARIA DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **SI-LP-011-2025** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA** | | |
| **CONTARTISTA DE OBRA:** | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS** | | |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS** | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | **07 DE ABRIL DE 2026** | | |
| **FECHA:** | **09 DE ABRIL DE 2026** | **NUMERO DE PAGINA:** | **3.0** |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| **MAÑANA** | **TARDE** |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de desmonte de cielo razo existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de puertas existentes en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de ventanas existentes en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de cubierta existente en mal estado en bloques de malaria

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| **RESIDENTE DE OBRA** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE** | **ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA** |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 10 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 4,0 |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| MAÑANA | TARDE |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de desmonte de cielo razo existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de puertas existentes en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de ventanas existentes en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de cubierta existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizo comité tecnico en obra con supervisiores de la gobernacion, contratista de obra e interventoria

**OBSERVACIONES**

**Durante el comité de obra del dia de hoy quedaron pendientes los siguientes puntos:**

1,0 la interventoria revisar y entregar plan de trabajo del contratista de obra.
2,0 El contratista de obra debera entregar plano arquitectonico general impreso a supervisores de la gobernacion par que realicen revision y hagan observaciones en algunas areas
3,0 el contratista de obra debera publicar la valla para acto protocolario de primera piedra.

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 11 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 5,0 |

| ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|
| MAÑANA | TARDE |
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

**MAÑANA**

Se realizan actividades de desmonte de cielo razo existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de puertas existentes en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de ventanas existentes en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de cubierta existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de demolicion de columnas existentes en garita existente en mal estado en bloques de malaria

**TARDE**

No se realizan actividades porque se trabaja de corrido hasta la 01:00pm por ser sabado.

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**<br>**NIT: 9020223563** | **BITACORA DIARIA DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | SI-LP-011-2025 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| **CONTARTISTA DE OBRA:** | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| **FECHA:** | 12 DE ABRIL DE 2026 | **NUMERO DE PAGINA:** | 0,6 |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| **MAÑANA** | **TARDE** |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

NO SE TRABAJA POR SER DOMINGO DIA DE DESCANSO

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| **RESIDENTE DE OBRA** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE** | **ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA** |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 13 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 0,7 |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| MAÑANA | TARDE |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de desmonte de cielo razo existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de cubierta existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de demolicion de muro existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de demolicion de redoblon existente en mal estado en bloques de malaria

**OBSERVACIONES**

Algunos trabajadores no cuentan con Epps (3) se requiere que se le dote de los equipos de proteccion pertinentes

| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
|---|---|
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 14 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 0,8 |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| MAÑANA | TARDE |
|---|---|
| SOLEADO | LLUVIOSO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de desmonte de cubierta existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de demolicion de muro existente en mal estado en bloques de malaria
Se realizan actividades de desmonte de demolicion de redoblon existente en mal estado en bloques de malaria
Se realiza comité tecnico en obra con supervisiores de la gobernacion, contratista de obra e interventoria

**OBSERVACIONES**

**Durante el comité de obra del dia de hoy quedaron pendientes los siguientes puntos:**

1.0 la interventoria revisar y entregar plan de trabajo del contratista de obra.

2,0 por parte de la supervision de la gobernacion de cordoba deberan suministrar informacion de donde sera la disposicion final de materiales desmontados
3,0 El contratista de obra debera entregar documentos de trabajadores con curso del alturas y ARL

Se presentaron lluvias fuertes en horas de la tarde por un tiempo de 1 hora, las cuales retrasaron la ejecucion de actividades.

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

532

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**<br>**NIT: 9020223563** | **BITACORA DIARIA DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **SI-LP-011-2025** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA** | | |
| **CONTARTISTA DE OBRA:** | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS** | | |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS** | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | **07 DE ABRIL DE 2026** | | |
| **FECHA:** | **15 DE ABRIL DE 2026** | **NUMERO DE PAGINA:** | **0,9** |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| **MAÑANA** | **TARDE** |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en bloque de malaria
Se realizan actividades de figurado y armado de acero para vigas de cimentacion en bloque de malaria

**OBSERVACIONES**

Se debe realizar el retiro de los escombros dado que se ha acumulado dado que se ha acumulado mucho en la zona de acopio lo cual genera contaminacion visual y reduccion de movilidad en las areas de trabajo.

| | |
|---|---|
| **RESIDENTE DE OBRA** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE** | **ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA** |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 16 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 10,0 |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| MAÑANA | TARDE |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en bloque de malaria
Se realizan actividades de figurado y armado de acero para vigas de cimentacion en bloque de malaria

**OBSERVACIONES**

Se debe realizar el retiro de los escombros dado que se ha acumulado dado que se ha acumulado mucho en la zona de acopio lo cual genera contaminacion visual y reduccion de movilidad en las areas de trabajo.

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 17 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 11,0 |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| MAÑANA | TARDE |
|---|---|
| SOLEADO | LLUVIOSO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

**MAÑANA**

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en bloque de malaria
Se realizan actividades de figurado y armado de acero para vigas de cimentacion en bloque de malaria
Se realizo comité tecnico en obra con supervisiores de la gobernacion, contratista de obra e interventoria

**TARDE**

No se realizan actividades por las lluvias presentadas que afectaron el adecuado funcionamiento de las obras programadas.

**OBSERVACIONES**

**Durante el comité de obra del dia de hoy quedaron pendientes los siguientes puntos:**

1,0 la interventoria revisar y entregar plan de trabajo del contratista de obra.

2,0 por parte de la supervision de la gobernacion de cordoba deberan suministrar informacion de donde sera la disposicion final de materiales desmontados (ACTAS)
3,0 El contratista de obra debera entregar documentos de trabajadores con curso del alturas y ARL

Se debe realizar el retiro de los escombros dado que se ha acumulado dado que se ha acumulado mucho en la zona de acopio lo cual genera contaminacion visual y reduccion de movilidad en las areas de trabajo.

Interventoria solicita plano estructural cons sus respectivas memorias de los elementos estructurales donde se realizaran levante de los nuevos muros

Se presentaron lluvias intensas en horas de la tarde las cuales impidieron la ejecucion de actividades en horas de la tarde.

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**<br>**NIT: 9020223563** | **BITACORA DIARIA DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | SI-LP-011-2025 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| **CONTARTISTA DE OBRA:** | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| **FECHA:** | 17 DE ABRIL DE 2026 | **NUMERO DE PAGINA:** | 12,0 |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| MAÑANA | TARDE |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

se realizan actividades de concreto de 3.000 PSI para viga de cimentacion en bloque MALARIA
se realizan actividades de levante de muro en bloque de 0,10x0,40x0,20 en bloque MALARIA
Se realizan actividades de figurado y armado de acero para columnetas en bloque MALARIA
**TARDE**
No se realizan activiades por se sabado se trabaja de corrido hasta la 01:00pm

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| **RESIDENTE DE OBRA** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE** | **ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA** |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 19 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 13,0 |

| ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|
| MAÑANA | TARDE |
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

NO SE TRABAJA POR SER DOMINGO DIA DE DESCANSO

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

537

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**<br>**NIT: 9020223563** | **BITACORA DIARIA DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | SI-LP-011-2025 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| **CONTARTISTA DE OBRA:** | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| **FECHA:** | 20 DE ABRIL DE 2026 | **NUMERO DE PAGINA:** | 14,0 |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| MAÑANA | TARDE |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

**MAÑANA**

se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para viga de cimentacion en bloque MALARIA
se realizan actividades de levante de muro en bloque de 0,10x0,40x0,20 en bloque MALARIA
se realizan actividades de instalacion de formaletas en madera para vaciado de columnetas de 0,10x0,20 en bloque MALARIA

**TARDE**

No se realizan actividades por acto protocolario de colocacion de primera piedra.

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| **RESIDENTE DE OBRA** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE** | **ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA** |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 21 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 15,0 |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| MAÑANA | TARDE |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para viga de cimentacion en bloque MALARIA
se realizan actividades de levante de muro en bloque de 0,10x0,40x0,20 en bloque MALARIA
se realizan actividades de instalacion de vaciado de concreto de 3,000 PSI para columnetas de 0,10x0,20 en bloque MALARIA
Se realiza comité tecnico en obra con supervisiores de la gobernacion, contratista de obra e interventoria

**OBSERVACIONES**

**Durante el comilé de obra del dia de hoy quedaron pendientes los siguientes puntos:**

1,0 la interventoria revisar y entregar plan de trabajo del contratista de obra.
2,0 por parte de la supervision de la gobernacion de cordoba deberan suministrar informacion de donde sera la disposicion final de materiales desmontados (ACTA
3,0 El contratista de obra debera entregar documentos de trabajadores con curso del alturas y ARL
4,0 El contratista debera entregar planos estructurales finales
5,0 el contartista debera entregar estudio de niveles topograficos.

| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
|---|---|
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA |
|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | |
| FECHA: | 22 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: 16,0 |

| ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|
| MAÑANA | TARDE |
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

se realizan actividades de localizacion trazado y replanteo con comision de topografia, ubicación de niveles de piso.
se realizan actividades de demolicion de plantilla existente en mal estado en areas exteriores, (lado CRUE)
Se realizan actividades de desmonte de cubierta en mal estado en 1 y segundo piso de bloque CRUE
Se realizan actividades de desmonte de puntos electricos en bloque MALARIA
Se realizan actividades de demolicion de bordillos existentes en mal estado en bloque Malaria

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**<br>**NIT: 9020223563** | **BITACORA DIARIA DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **SI-LP-011-2025** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA** | | |
| **CONTARTISTA DE OBRA:** | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS** | | |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS** | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | **07 DE ABRIL DE 2026** | | |
| **FECHA:** | **23 DE ABRIL DE 2026** | **NUMERO DE PAGINA:** | **17,0** |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| **MAÑANA** | **TARDE** |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

se realizan actividades de localizacion trazado y replanteo con comision de topografia, ubicación de niveles de piso.
se realizan actividades de demolicion de plantilla existente en mal estado en areas exteriores, (lado CRUE)
Se realizan actividades de desmonte de cubierta en mal estado en 1 y segundo piso de bloque CRUE
Se realizan actividades de desmonte de puntos electricos en bloque MALARIA
Se realizan actividades de demolicion de bordillos existentes en mal estado en bloque Malaria

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| **RESIDENTE DE OBRA** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE** | **ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA** |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 24 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 18,0 |

| ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|
| MAÑANA | TARDE |
| SOLEADO | LLUVIAS |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

**MAÑANA**

se realizan actividades de localizacion trazado y replanteo con comision de topografia, ubicación de niveles de piso.
se realizan actividades de demolicion de plantilla existente en mal estado en areas exteriores, (lado CRUE)
Se realizan actividades de desmonte de cubierta en mal estado en 1 y segundo piso de bloque CRUE
Se realizan actividades de desmonte de puntos electricos en bloque MALARIA
Se realizan actividades de demolicion de bordillos existentes en mal estado en bloque Malaria
Se realizo comité tecnico en obra con supervisiores de la gobernacion, contratista de obra e interventoria

**TARDE**

No se realizan actividades por las lluvias presentadas que afectaron correcto funcionamiento de las actividades programadas.

**OBSERVACIONES**

**Durante el comité de obra del dia de hoy quedaron pendientes los siguientes puntos:**

1,0 la interventoria revisar y entregar plan de trabajo del contratista de obra.
2,0 el contratista de obra debera entregar inventario de materiales desmontados
3,0 El contratista de obra debera entregar documentos de trabajadores con curso del alturas y ARL
4,0 el contartista de obra solicita a la entidad contratante que el cambio de parcentaje de cobro para obra ya que el indicado en contarto d eobra no concuerda con el indicado en la minuta cuando se licito el proyecto
5,0 Los supervisores de la gobernacion deberan revisar el plano planta arquitectonica general y definir detalles de acabados de pisos para tener en cuenta en el presupuesto

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 25 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 19,0 |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| MAÑANA | TARDE |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

**MAÑANA**

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en bloque MALARIA
se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para vigas de cimentacion en bloque MALARIA
se realizan actividades de levante de muro en cuchillas bloque MALARIA
Se realizan actividades de instalacion de formaletas en madera para columnetas en bloque MALARIA
se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para columnetas en bloque MALARIA
Se realizan actividades de armado de formaleta de madera para viga cinta en BLOQUE MALARIA
Se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para viga cinta en bloque MALARIA

**TARDE**

No se realizan actividades porque se trabaja de corrido hasta la 01:00pm por ser sabado.

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
|---|---|
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 26 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 20,0 |

| ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|
| MAÑANA | TARDE |
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

NO SE TRABAJA POR SER DOMINGO DIA DE DESCANSO

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**<br>**NIT: 9020223563** | **BITACORA DIARIA DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | SI-LP-011-2025 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| **CONTARTISTA DE OBRA:** | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| **FECHA:** | 27 DE ABRIL DE 2026 | **NUMERO DE PAGINA:** | 21,0 |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| MAÑANA | TARDE |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para viga cinta en bloque MALARIA

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en bloque MALARIA
se realizan actividades de levante de muro en cuchillas bloque MALARIA
Se realizan actividades de instalacion de formaletas en madera para columnetas en bloque MALARIA
se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para columnetas en bloque MALARIA
Se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de armado de formaleta de madera para viga cinta en BLOQUE MALARIA

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| **RESIDENTE DE OBRA** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE** | **ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA** |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 28 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 22,0 |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| MAÑANA | TARDE |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de armado de formaleta en madera para viga cinta en bloque MALARIA
se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para ditel en puertas y ventanas en bloque MALARIA
Se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizo comité tecnico en obra con supervisiores de la gobernacion, contratista de obra e interventoria

**OBSERVACIONES**

**Durante el comité de obra del dia de hoy quedaron pendientes los siguientes puntos:**

1,0 la interventoria revisar y entregar plan de trabajo del contratista de obra.
2,0 el contratista de obra debera entregar inventario de materiales desmontados
3,0 El contratista de obra debera entregar documentos de trabajadores con curso del alturas y ARL
4,0 el contartista de obra solicita a la entidad contratante que el cambio de porcentaje de cobro para obra ya que el indicado en contarto d eobra no concuerda
5,0 Los supervisores de la gobernacion deberan revisar el plano planta arquitectonica general y definir detalles de acabados de pisos para tener en cuenta en el presupuesto

6,0 el contratistra de obra solicita el desalojo de las oficinas de (SDSD) para poder iniciar las actividades programadas dentro de la programacion de obra
7,0 El contratista de obra solicita el desalojo del parqueadero para poder iniciar las actividades programadas dentro de la programacion de obra

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 29 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 23.0 |

| ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|
| MAÑANA | TARDE |
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de armado de formaleta en madera para viga cinta en bloque MALARIA
se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para ditel en puertas y ventanas en bloque MALARIA
Se realizan actividades de concreto de 3.000 PSI para viga cinta en bloque MALARIA

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

547

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**<br>**NIT: 9020223563** | **BITACORA DIARIA DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | SI-LP-011-2025 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| **CONTARTISTA DE OBRA:** | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| **FECHA:** | 30 DE ABRIL DE 2026 | **NUMERO DE PAGINA:** | 24,0 |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| **MAÑANA** | **TARDE** |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de armado de formaleta en madera para viga cinta en bloque MALARIA
se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para dítel en puertas y ventanas en bloque MALARIA
Se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion andenes y zonas verdes exteriores
se realizan actividades de levante de muro en bloque MALARIA

**OBSERVACIONES**

Interventoria indentifica un area del levante de muro en el ala oeste que se encuentra desplomado y algunos bloques con fisuras, por lo cual se solicita volver a intalar el levante y cambiar los bloques fisurados para subsanar dicha observacion.

| | |
|---|---|
| **RESIDENTE DE OBRA** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE** | **ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA** |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 30 DE ABRIL DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 25,0 |

| ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|
| MAÑANA | TARDE |
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

No se realizaron actividades por ser dia civico en conmemoracion al trabajo.

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 02 DE MAYO DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 26,0 |

| ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|
| MAÑANA | TARDE |
| LLUVIAS Y NUBLADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

**MAÑANA**

Se realizan actividades de armado de formaleta en madera para viga cinta en bloque MALARIA
se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para ditel en puertas y ventanas en bloque MALARIA
Se realizan actividades de concreto de 3.000 PSI para viga cinta en bloque MALARIA

**TARDE**

No se realizan actividades porque se trabaja de corrido hasta la 01:00pm por ser sabado.

**OBSERVACIONES**

El contratista subsana la observacion presentada respecto al desplome del levante en el lado oeste del CRUE

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

| | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>NIT: 9020223563 | BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | SI-LP-011-2025 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA | | |
| CONTARTISTA DE OBRA: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 07 DE ABRIL DE 2026 | | |
| FECHA: | 03 DE MAYO DE 2026 | NUMERO DE PAGINA: | 27,0 |

| ESTADO DEL TIEMPO | |
|---|---|
| MAÑANA | TARDE |
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

NO SE TRABAJA POR SER DOMINGO DIA DE DESCANSO

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE | ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA |

551

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**<br>**NIT: 9020223563** | **BITACORA DIARIA DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **SI-LP-011-2025** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA** | | |
| **CONTARTISTA DE OBRA:** | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS** | | |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS** | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | **07 DE ABRIL DE 2026** | | |
| **FECHA:** | **04 DE MAYO DE 2026** | **NUMERO DE PAGINA:** | **28,0** |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| **MAÑANA** | **TARDE** |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de armado de formaleta en madera para viga cinta en bloque MALARIA
se realizan actividades de armado y figurada de acero de refuerzo para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de armado y figurado de acero de refuerzo para dintel en puertas y ventanas en bloque MALARIA
Se realizan actividades de concreto de 3.000 PSI para viga cinta en bloque MALARIA
Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en andenes y jardineras para zonas verdes exteriores
se realizan actividades de levante de muro en bloque MALARIA

El contratista recibe mediante correo electronico citacion por parte de la secretaria de infraestructura departamental la citacion para comité tecnico presencial en la gobernacion de cordoba programado para el dia 05 de mayo de 2026 a las 03:00pm

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| **RESIDENTE DE OBRA** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE** | **ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**<br>**NIT: 9020223563** | **BITACORA DIARIA DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **SI-LP-011-2025** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA** | | |
| **CONTARTISTA DE OBRA:** | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS** | | |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS** | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | **07 DE ABRIL DE 2026** | | |
| **FECHA:** | **05 DE MAYO DE 2026** | **NUMERO DE PAGINA:** | **29,0** |

| **ESTADO DEL TIEMPO** | |
|---|---|
| **MAÑANA** | **TARDE** |
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en andenes y jardineras para zonas verdes exteriores
Se realizan actividades de armado y figurado de acero para vigas de cimentacion en andenes y jardineras de zonas verdes exteriores
se realizan actividades de armado de formaletas metalicas para vaceado de concreto para vigas de cimentacion de andenes y jardineras de zonas verdes exteriores
se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para vigas de cimentacion de andenes y jardineras de zonas verdes y exteriores
se realizan actividades de levante de muro en bloque MALARIA

El contratista recibe mediante correo electronico citacion por parte de la secretaria de infraestructura departamental la citacion para comité tecnico presencial en la gobernacion de condoba programado para el dia 05 de mayo de 2026 a las 03:00pm

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| **RESIDENTE DE OBRA** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE** | **ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**<br>**NIT: 9020223563** | **BITACORA DIARIA DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **SI-LP-011-2025** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA** | | |
| **CONTARTISTA DE OBRA:** | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS** | | |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS** | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | **07 DE ABRIL DE 2026** | | |
| **FECHA:** | **06 DE MAYO DE 2026** | **NUMERO DE PAGINA:** | **30,0** |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| **MAÑANA** | **TARDE** |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en andenes y jardineras para zonas verdes exteriores
Se realizan actividades de armado y figurado de acero para vigas de cimentacion en andenes y jardineras de zonas verdes exteriores

se realizan actividades de armado de formaletas metalicas para vaceado de concreto para vigas de cimentacion de andenes y jardineras de zonas verdes exteriores
se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para vigas de cimentacion de andenes y jardineras de zonas verdes y exteriores
se realizan actividades de levante de muro en bloque MALARIA

El contratista recibe mediante correo electronico citacion por parte de la secretaria de infraestructura departamental la citacion para comité tecnico presencial en la gobernacion de cordoba programado para el dia 05 de mayo de 2026 a las 03:00pm

**OBSERVACIONES**

Interventoria solicita suspender la actividad de andenes, dado que en el comité con la gobernacion el dia anterior, la supervicion manifesto que se contemplara la reduccion o la eliminacion de este en el ala oeste del CRUE, sin embargo el contratista manifiesta que continuara con los trabajos dado que es lo contratado y se necesita para proteger los muros

| | |
|---|---|
| **RESIDENTE DE OBRA** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE** | **ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA** |

554

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**<br>**NIT: 9020223563** | **BITACORA DIARIA DE OBRA** | |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | **SI-LP-011-2025** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTYERIA** | | |
| **CONTARTISTA DE OBRA:** | **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA - RL. MARIA ELENA RIVERA HOYOS** | | |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | **CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE - RL. LINA REVUELTAS** | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | **07 DE ABRIL DE 2026** | | |
| **FECHA:** | **07 DE MAYO DE 2026** | **NUMERO DE PAGINA:** | **31.0** |

**ESTADO DEL TIEMPO**

| **MAÑANA** | **TARDE** |
|---|---|
| SOLEADO | SOLEADO |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizan actividades de excavacion manual para vigas de cimentacion en andenes y jardineras para zonas verdes exteriores
Se realizan actividades de armado y figurado de acero para vigas de cimentacion en andenes y jardineras de zonas verdes exteriores
se realizan actividades de armado de formaletas metalicas para vaceado de concreto para vigas de cimentacion de andenes y jardineras de zonas verdes exteriores
se realizan actividades de concreto de 3,000 PSI para vigas de cimentacion de andenes y jardineras de zonas verdes y exteriores
se realizan actividades de levante de muro en bloque MALARIA

El contratista recibe mediante correo electronico citacion por parte de la secretaria de infraestructura departamental la citacion para comité tecnico presencial en la gobernacion de condoba programado para el dia 05 de mayo de 2026 a las 03:00pm

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| | |
|---|---|
| **RESIDENTE DE OBRA** | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA** |
| **ING. CIVIL CARMEN ANA GARCES NEGRETE** | **ING. CIVIL MARIA LUISA LAZA VEGA** |

CONSORCIO
RED VITAL CORDOBA

# ANEXO 2 - PGIO

Carrera 6 #62b-32 Oficina 618
Centro de Negocios Sexta Avenida
Monteria – Cordoba.

consorcioredvital@gmail.com

(604) 7812273
(+57) 315 4764499

CONSORCIO
RED VITAL CORDOBA

# COMPONENTE PGIO

Carrera 6 #62b-32 Oficina 618
Centro de Negocios Sexta Avenida
Monteria – Cordoba.

consorcioredvital@gmail.com

(604) 7812273
(+57) 315 4764499

| SOPORTES PGIO | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **FACTURA** | **FECHA** | **VALOR** |
| DOTACION A TRABAJADORES | EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS 117392 | 16/04/2026 | $ 1.982.000 |
| SUMINISTRO DE TELA VERDE E INSTALACION DE CERRAMIENTO | FREDYS TIRADO ARCIRIA | 16/04/2026 | $ 12.323.800 |
| GUANTES TIPO INGENIERO Y GAFAS DE SEGURIDAD | DISTRIAS 58761 | 27/04/2026 | $ 329.695 |
| BOTAS DE SEGURIDAD | EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS 119132 | 12/05/2026 | $ 675.000 |
| GUANTES, GAFAS, CASCOS, ARNES, ESLINGA, LINEA DE VIDA | DISTRIAS 60589 | 14/05/2026 | $ 2.493.136 |
| CAPACITACION EN TRABAJO EN ALTURAS | ARPA CONSULTORIAS SAS 6547 | 20/05/2026 | $ 1.350.001 |
| GAFAS NEGRAS DE SEGURIDAD | DISTRIAS 61625 | 26/05/2026 | $ 549.030 |
| GUANTES DE CARNAZA | DISTRIAS 63288 | 11/06/2026 | $ 608.028 |
| GUANTES INGENIERO Y GAFAS | EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS 122677 | 30/06/2026 | $ 305.000 |
| **TOTAL** | | | **$ 20.615.690** |

557

559

# EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

**Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva**

Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba

equipsegplus@outlook.com

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**<br>**NI No. :** 902022356-3<br>**DIRECCION :** CR 6 # 62 B - 32 ED SEXTA AVENIDA OF 618<br>**E-MAIL FE :** consorcioredvital@gmail.com<br>**TELEFONO :**<br>**CIUDAD :** MONTERÍA **PAIS :** Colombia | **16/04/2026** | **$ 1.982.000,00** |
| | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | |
| | **EPM117392** | |
| | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| | 24/04/2026 | CTC-2604539 |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | IVA | DCTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1316 | CAMISA DRIL RAZA KAKI TALLA L | 11 UND | $33.193,28 | 19% | 0 % | $365.126,05 |
| 2 | 1317 | CAMISA DRIL RAZA KAKI TALLA XL | 1 UND | $33.193,28 | 19% | 0 % | $33.193,28 |
| 3 | 1326 | PANTALON DOTACION HOMBRE EN JEANS TALLA 30 | 1 UND | $30.252,10 | 19% | 0 % | $30.252,10 |
| 4 | 1327 | PANTALON DOTACION HOMBRE EN JEANS TALLA 32 | 4 UND | $30.252,10 | 19% | 0 % | $121.008,40 |
| 5 | 1328 | PANTALON DOTACION HOMBRE EN JEANS TALLA 34 | 5 UND | $30.252,10 | 19% | 0 % | $151.260,50 |
| 6 | 1329 | PANTALON DOTACION HOMBRE EN JEANS TALLA 36 | 2 UND | $30.252,10 | 19% | 0 % | $60.504,20 |
| 7 | 1680 | BOTA SEG FALCON T-40 | 2 UND | $60.504,20 | 19% | 0 % | $121.008,40 |
| 8 | 1681 | BOTA SEG FALCON T-41 | 9 UND | $60.504,20 | 19% | 0 % | $544.537,82 |
| 9 | 1682 | BOTA SEG FALCON T-42 | 1 UND | $60.504,20 | 19% | 0 % | $60.504,20 |
| 10 | 1304 | CAMISA OXFORD DAMA TIPO PRINCESA TALLA L | 1 UND | $31.932,77 | 19% | 0 % | $31.932,77 |
| 11 | 1006 | CASCO TIPO IND. AZUL BENGAL | 12 UND | $12.184,87 | 19% | 0 % | $146.218,49 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 11

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 1.665.546,21 |
| IVA liquidado | $ 1.665.546,21 | 19% | $ 316.453,79 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 1.982.000,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 24/04/2026 | $ 1.982.000,00 |

**VALOR (en letras) :** UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55%
Resolución DIAN: 18764095363118. Prefijo: EPM. Rango: 100001 al 130001. Vigencia: 8/07/2025 hasta 8/07/2027.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 11
Factura a crédito, plazo hasta 24/04/2026.

---

Favor realizar transferencias a Bancolombia Corriente No. 68000011089 . Banco Bogota Cuenta Corriente No. 880057674 a nombre de EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS.
Numeracion Autorizado por la DIAN segun formulario Dian N 18764095363118

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

Rj9XEQhNHuNhjW0jWN0mbLmogtloWCmXfQz6rV7diRgt++Fbr3GcGhlKiPHJJozA8E7k9q6972Z54oTYL2CAec+ll3hVqLP3NwhxYxdTcyASAP8qPNy+yrVt2D8
Ejj7yXc2n0hyrqFyNSpVQvxF1Q3ijgaQFJQExIDMZZjtcF9XzrdO392bQJb6Pu9cmZqOr+xmsJuwXZC9uBsypQIL94+QxricX1qxu2KQA6jRdLdyB7hrnh4wNpi0fs
Q/TD5qq+vJhobkv2jfe0GLzk/Fw6Mi46freYPBFoci3yxrsozO0niUCoHuRWxh9BqmgkuyQcdtwF3KjKQvA==

**CUFE:** f64ccbd682230e18f806de5bc1e317297d3322904d8365f5ae2ce7df7fee89b6f17f244f91efb0378b93afa3194c6dfe

**Fecha emisión:** 2026-04-16 15:31:06 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-16 15:31:08-05:00

**Proveedor Tecnológico:** NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com



Resolución DIAN: 18764095363118. Prefijo: EPM. Rango: 100001 al 130001. Vigencia: 8/07/2025 hasta 8/07/20

559

Montería, 16 de abril de 2026

**CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**

NIT. 902.022.356-3

DEBE A:

**FREDYS ENRIQUE TIRADO ARCIRIA**

CC. 10.782.218 de Montería

LA SUMA DE:

DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTI TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($12.323.800)

POR CONCEPTO DE:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO.

Atentamente,

**FREDYS ENRIQUE TIRADO ARCIRIA**
CC. 10.782.218 de Montería

560

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14852343057

(415)7707212489984(8020) 000001485234305 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 7 8 2 2 1 8 | 1 | Impuestos y Aduanas de Montería 1 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 7 8 2 2 1 8 | 2 0 0 2 1 0 0 3 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| TIRADO | ARCIRIA | FREDYS | ENRIQUE |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Córdoba 2 3 | Montería 0 0 1 |

41. Dirección principal
MZ 3 LT 18 BRR MOGAMBO

42. Correo electrónico fredys.tirado.arciria@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 1 5 6 1 7 2 1 4 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 1 1 1 | 2 0 1 2 0 8 1 3 | | | | 7 2 1 2 | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 21 / 21 : 02: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TIRADO ARCIRIA FREDYS ENRIQUE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

561

Distrias
Hogar & Construcción

DISTRIAS S.A.S.
NIT. 900377621
CARRERA 2 NRO. 44 110
MONTERÍA, Colombia
TEL: 6047890172 - 3106060000
EMAIL: info@grupodistrias.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**N° DM58761**

No somos grandes contribuyentes. No somos autorretenedores. Responsable de IVA. Somos Autoretenedores de ICA.

**CUFE:** 36664099d7f171a71e24fd2cfe7657713b35dd9a0b68c736a7d29f60c9b1481f1713c1c7ab5636ba8d411ae05f957f38

| DATOS CLIENTE | DATOS FACTURA | FACTURA: |
|---|---|---|
| **Nombre:** CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>**NIT:** 902022356<br>**Dirección:** CR 6 # 62 B - 32 ED SEXTA AVENIDA OF 618<br>**Ciudad:** MONTERÍA<br>**Teléfono:** +57 315 4764499<br>**Correo DIAN:** edificar.rym.sas@gmail.com | **Fecha de emisión:** 27-04-2026 08:07:00<br>**Fecha vencimiento:** 27-05-2026<br>**Orden de venta:** S149960<br>**Vendedor:** JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA | **Plazo de pago:** 30 días<br>**Medio de pago:** Credit<br>**Forma de pago:** Instrumento no definido<br>**Remisión:** DI/OUT/87040<br>**Peso total:** 989,6 kg |

**MONTERIA - OC # 014**

ENVIAR **A *Centro Regulador de Urgencias y Emergencias* CRUE -**
*Calle 42 No 8-15 - REC ARQ JUAN CARLOS BURGOS Cel. 3103675834*

| REFERENCIA | COD. PROV | PESO | DESCRIPCIÓN | CANT | UdM | PRECIO | DCTO (%) | SUBTOTAL | IVA (%) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367 | 101035 | 21,48 Kg | [1367] PHR-C 160 x 60 C 16 (1.5) ANTICORROSIVO | 45,00 | Units | 124.765,00 | 12,00 | $ 4.940.694,00 | 19% | $ 5.755.908,51 |
| 6304095 | D-44286 | 0,00 Kg | [6304095] DISCO DIAMANT SEGMENTADO 7" SECO / CONCRETO DORADO | 5,00 | Units | 51.644,00 | 5,00 | $ 245.309,00 | 19% | $ 285.784,98 |
| 6304371 | D-79572 | 0,00 Kg | [6304371] DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2" X 1,8 MM CONCRETO ESTANDARD | 6,00 | Units | 10.720,00 | 5,00 | $ 61.104,00 | 19% | $ 71.186,16 |
| 6304239 | D-75524 | 0,00 Kg | [6304239] DISCO ABRAS-CORTE ACERO INOX 4-1/2" X 1MM X 7/8" WA46 | 12,00 | Units | 2.400,00 | 0,00 | $ 28.800,00 | 19% | $ 33.552,00 |
| 0841 | 841 | 0,50 Kg | [0841] PUNTILLA C/C 2.1/2 PAQ 500 GRS | 20,00 | lb | 4.400,00 | 0,00 | $ 88.000,00 | 19% | $ 102.520,00 |
| 0842 | 842 | 0,50 Kg | [0842] PUNTILLA C/C 3 PAQ 500 GRS | 20,00 | lb | 4.400,00 | 0,00 | $ 88.000,00 | 19% | $ 102.520,00 |
| 9298 | IS01 | 0,00 Kg | [9298] GUANTE TIPO INGENIERO SENCILLO AMARILLO ECO | 20,00 | Units | 8.000,00 | 0,00 | $ 160.000,00 | 19% | $ 186.400,00 |
| 2339 | 11889020 | 0,00 Kg | [2339] GAFAS BLANCAS DE SEGURIDAD | 15,00 | Units | 8.200,00 | 0,00 | $ 123.000,00 | 19% | $ 143.295,00 |
| 4804 | 4804 | 0,50 Kg | [4804] CLAVO ACERO CONCRETO 2 x 400 GRS | 4,00 | lb | 6.640,00 | 0,00 | $ 26.560,00 | 19% | $ 30.942,40 |
| 4806 | 4806 | 0,50 Kg | [4806] CLAVO ACERO CONCRETO 3 x 400 GRS | 2,00 | lb | 6.640,00 | 0,00 | $ 13.280,00 | 19% | $ 15.471,20 |

**CANALES DE PAGO**

Consignar en cuenta corriente a favor de Distrias S.A.S en los siguientes Bancos:

| | | |
|---|---|---|
| AGRARIO:327030 007832 | OCCIDENTE: 892000738 | BOGOTA: 438503708 |
| BBVA: 612-030775 | BANCOLOMBIA: 09165117542 | DAVIVIENDA: 156069998524 |

| | |
|---|---|
| **Valor bruto** | $ 6.464.605,00 |
| Descuento | $ -689.858,00 |
| **Base imponible** | $ 5.774.747,00 |
| IVA 19% on $ 5.774.747,00 | $ 1.097.201,93 |
| R REN 2.5% on $ 5.774.747,00 | $ -144.368,68 |
| AR ICA on $ 5.774.747,00 | $ 0,00 |
| AR REN on $ 5.774.747,00 | $ 0,00 |

| | |
|---|---|
| Factura elaborada por:<br>JEYSON JOSE RODRIGUEZ ARRIETA | **Recibido por:** SELLO<br>Nombre: C.C.<br>Firma: |
| Imprime: DistriasBot | Fecha de impresión:27-04-2026 08:12:00 |

562

# EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

**Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva**

Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba

equipsegplus@outlook.com

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA** | **12/05/2026** | **$ 675.000,00** |
| **NI No. :** 902022356-3 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | |
| **DIRECCION :** CR 6 # 62 B - 32 ED SEXTA AVENIDA OF 618 | **EPM119132** | |
| **E-MAIL FE :** consorcioredvital@gmail.com | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| **TELEFONO :** | | |
| **CIUDAD :** MONTERÍA **PAIS :** Colombia | 12/05/2026 | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | IVA | DCTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1679 | BOTA SEG FALCON T-39 | 2 UND | $63.025,21 | 19% | 0 % | $126.050,42 |
| 2 | 1681 | BOTA SEG FALCON T-41 | 2 UND | $63.025,21 | 19% | 0 % | $126.050,42 |
| 3 | 1682 | BOTA SEG FALCON T-42 | 3 UND | $63.025,21 | 19% | 0 % | $189.075,63 |
| 4 | 1683 | BOTA SEG FALCON T-43 | 2 UND | $63.025,21 | 19% | 0 % | $126.050,42 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 4

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 567.226,89 |
| IVA liquidado | $ 567.226,89 | 19% | $ 107.773,11 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 675.000,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| Contado (banco) # 1 | | $ 675.000,00 |

**VALOR (en letras) :** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55%
Resolución DIAN: 18764095363118. Prefijo: EPM. Rango: 100001 al 130001. Vigencia: 8/07/2025 hasta 8/07/2027.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 4
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

---

Favor realizar transferencias a Bancolombia Corriente No. 68000011089 . Banco Bogota Cuenta Corriente No. 880057674 a nombre de EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS.
Numeracion Autorizado por la DIAN segun formulario Dian N 18764095363118
del 08/07/2025 desde el EPM 100,001 a EPM 130,001. facturacion electronica, vigencia 24 meses.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 de Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

P6UV1UkBeROaRpbKQF/9XkPNO7YNNsBjrD42ZmXkbZqKG3NJHgy1tGGwKpsy4FHiqug3LNB8zB4vxOOMLotnP5YixtpJ1UlfsaS8AxhOuZesclZOY6O7lxl0S
NRVgqAQ177CPenljvLb06/PyjelegbdFpGvpv1TH1gV8nfXaVq17sVjwQwL+u53/lasHLoR/ShkgQU/fTCev2RPiebuW69GWsGw93KZ5djGCHyS3X4j21Z47mZS
HUibm0oB2hlYpa7AnG+yyVp17rEqMExE173ripLfA5rasIM1rzfYYulgl6clz9Fq6KN63HpcGcnYCxBiHdenvA==

**CUFE:** 0bc55a08b6aaf0468913fd3171753de8138a55ec7af2f6bd79fa330e0f63f77724d30593040c3325d59e7446f1790fec

**Fecha emisión:** 2026-05-12 08:48:33 **Fecha validación DIAN:** 2026-05-12 08:48:37-05:00

**Proveedor Tecnológico:** NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.



Resolución DIAN: 18764095363118. Prefijo: EPM. Rango: 100001 al 130001. Vigencia: 8/07/2025 hasta 8/07/20

563

**Distrias**
Hogar & Construcción

DISTRIAS S.A.S.
NIT. 900377621
CARRERA 2 NRO. 44 110
MONTERÍA, Colombia
TEL: 6047890172 - 3106060000
EMAIL: info@grupodistrias.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**N° DM60589**

No somos grandes contribuyentes. No somos autorretenedores. Responsable de IVA. Somos Autoretenedores de ICA.

**CUFE:** 1237047a0d2e3eac88af3e453ef6a92febaa2d1ffcec58904ea6ab4e788ffb8fc4974f89a0466b267d4b1169377c5821

| DATOS CLIENTE | DATOS FACTURA | FACTURA: |
|---|---|---|
| **Nombre:** CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>**NIT:** 902022356<br>**Dirección:** CR 6 # 62 B - 32 ED SEXTA AVENIDA OF 618<br>**Ciudad:** MONTERÍA<br>**Teléfono:** +57 315 4764499<br>**Correo DIAN:** edificar.rym.sas@gmail.com | **Fecha de emisión:** 14-05-2026 10:58:27<br>**Fecha vencimiento:** 13-06-2026<br>**Orden de venta:** S154495<br>**Vendedor:** ADRIANA LISETH GARCIA CARBONO | **Plazo de pago:** 30 días<br>**Medio de pago:** Credit<br>**Forma de pago:** Instrumento no definido<br>**Remisión:** DI/OUT/89743<br>**Peso total:** 19,5 kg |

## ORDEN DE COMPRA N. 027

## RETIRA EN BODEGA SR LEANDRO ROSSO

| REFERENCIA | COD. PROV | PESO | DESCRIPCIÓN | CANT | UdM | PRECIO | DCTO (%) | SUBTOTAL | IVA (%) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | 11931111 | 0,50 Kg | [1848] GUANTE TIPO INGENIERO BLANCO | 20,00 | Units | 17.000,00 | 0,00 | $ 340.000,00 | 19% | $ 396.100,00 |
| 3598 | 11889025 | 0,00 Kg | [3598] GAFAS NEGRAS DE SEGURIDAD | 10,00 | Units | 8.200,00 | 0,00 | $ 82.000,00 | 19% | $ 95.530,00 |
| 6304239 | D-75524 | 0,00 Kg | [6304239] DISCO ABRAS-CORTE ACERO INOX 4-1/2" X 1MM X 7/8" WA46 | 24,00 | Units | 2.400,00 | 0,00 | $ 57.600,00 | 19% | $ 67.104,00 |
| 5067 | KCC8063 | 0,00 Kg | [5067] CASCO SUPERIOR BLANCO NORMA EN397 | 1,00 | Units | 16.410,00 | 0,00 | $ 16.410,00 | 19% | $ 19.117,65 |
| 5637 | UTA4H | 1,00 Kg | [5637] ARNES MULTIPROPOSITO 4 ARGOLLAS TIPO H UNITED ANSI/ASSE Z359.11 CE EN 361 | 3,00 | Units | 85.000,00 | 0,00 | $ 255.000,00 | 19% | $ 297.075,00 |
| 5638 | UTESGG | 0,50 Kg | [5638] ESLINGA SENCILLA DE ABSORCION GANCHO GRANDE UNITED ANSI Z359.13 CE EN 354 | 5,00 | Units | 100.750,00 | 0,00 | $ 503.750,00 | 19% | $ 586.868,75 |
| 5639 | UTLV30M | 1,00 Kg | [5639] LINEA DE VIDA X 30MTRS GANCHO GRANDE UNITED EN 354-2010 | 4,00 | Units | 309.000,00 | 5,00 | $ 1.174.200,00 | 19% | $ 1.367.943,00 |
| 5064 | KCC8060 | 0,00 Kg | [5064] CASCO SUPERIOR AMARILLO NORMA EN397 | 8,00 | Units | 16.410,00 | 0,00 | $ 131.280,00 | 19% | $ 152.941,20 |

**CANALES DE PAGO**

Consignar en cuenta corriente a favor de Distrias S.A.S en los siguientes Bancos:

| | | |
|---|---|---|
| AGRARIO:327030007832 | OCCIDENTE:892000738 | BOGOTA:438503708 |
| BBVA: 612-030775 | BANCOLOMBIA:09165117542 | DAVIVIENDA:156069998524 |

| | |
|---|---|
| **Valor bruto** | $ 2.622.040,00 |
| Descuento | $ -61.800,00 |
| **Base imponible** | $ 2.560.240,00 |
| IVA 19% on $ 2.560.240,00 | $ 486.445,60 |
| R REN 2.5% on $ 2.560.240,00 | $ -64.006,00 |
| AR ICA on $ 2.560.240,00 | $ 0,00 |
| AR REN on $ 2.560.240,00 | $ 0,00 |
| **Total** | $ 2.982.679,60 |

**TOTAL EN LETRAS:** DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS Y SESENTA CENTAVOS

| | |
|---|---|
| Factura elaborada por:<br>ADRIANA LISETH GARCIA CARBONO | Recibido por:<br>Nombre: C.C.<br>Firma:<br>SELLO |
| Imprime: DistriasBot | Fecha de impresión:14-05-2026 11:00:53 |

564

# ARPA CONSULTORIAS SAS

ASISTENCIA EN RIESGOS Y PREVENCION EN ALTURAS S.A.S. - NIT 900778417-1

CALLE 53 # 6-35, Montería, Córdoba,
Tel: 3137638354
Arpaconsultorias@gmail.com ; www.arpaconsultorias.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE6547**
Responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | CR 6 # 62 B-32 ED SEXTA AVENIDA OF 618, Colombia, Montería, Córdoba, 230001 | | 20/05/2026 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | 3154764499 | **NIT** 902022356-3 | 23/05/2026 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPACITACIÓN EN TRABAJADOR AUTORIZADO - Ref:01 | Unidad | $151.261 | 5 | | $756.305 |
| 2 | CAPACITACIÓN EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO - Ref:02 | Unidad | $126.050 | 3 | | $378.150 |

Millón trescientos cincuenta mil un pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-05-20 14:25:00-05:00
Validación DIAN: 2026-05-20 14:26:01-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

**CUFE: 491ac6ae52cf53c8188390210f7fe132c414aa8be8326ffb58d21d267f5d29a0f34060d92b6e672d528950be606d0777**

Pagar en cuenta de ahorros Bancolombia N° 79032373793 a nombre de ARPA CONSULTORIAS SAS. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $1.134.455 |
| IVA (19.00%) | $215.546 |
| Total | $1.350.001 |

**Total de lineas: 2**

Jenny D. Vanegas M.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764109711134 de 2026-05-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE6502 hasta FE7502 con vigencia hasta 2028-05-12

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

DISTRIAS S.A.S.
NIT. 900377621
CARRERA 2 NRO. 44 110
MONTERÍA, Colombia
TEL: 6047890172 - 3106060000
EMAIL: info@grupodistrias.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**Nº DM61625**

No somos grandes contribuyentes. No somos autorretenedores. Responsable de IVA. Somos Autoretenedores de ICA.

**CUFE:** 4f6e191f656e90e85faa2f054911a41440ba5ebc1109ef81fe62800f612058f0bfaafef45869261762cf8385f8feb0f3

| DATOS CLIENTE | DATOS FACTURA | FACTURA: |
|---|---|---|
| **Nombre:** CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>**NIT:** 902022356<br>**Dirección:** CR 6 # 62 B - 32 ED SEXTA AVENIDA OF 618<br>**Ciudad:** MONTERÍA<br>**Teléfono:** +57 315 4764499<br>**Correo DIAN:** edificar.rym.sas@gmail.com | **Fecha de emisión:** 26-05-2026 07:44:59<br>**Fecha vencimiento:** 25-06-2026<br>**Orden de venta:** S156915<br>**Vendedor:** JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA | **Plazo de pago:** 30 días<br>**Medio de pago:** Credit<br>**Forma de pago:** Instrumento no definido<br>**Remisión:** DI/OUT/91257<br>**Peso total:** 0,24 kg |

**MONTERÍA - CALLE 42 - OC # 31**

ENVIAR **A *Centro Regulador de Urgencias y Emergencias* CRUE -**
*Calle 42 No 8-15 - REC ARQ JUAN CARLOS BURGOS Cel. 3103675834*

| REFERENCIA | COD. PROV | PESO | DESCRIPCIÓN | CANT | UdM | PRECIO | DCTO (%) | SUBTOTAL | IVA (%) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1637 | 10240452 | 0,02 Kg | [1637] SEGUETA NICHOLSON 18 D | 12,00 | Units | 3.460,00 | 5,00 | $ 39.444,00 | 19% | $ 46.938,36 |
| 2937 | | 0,00 Kg | [2937] MALLA METALICA ZARANDA 6 X 6 0.9MTS ALTO X 30MTS | 3,00 | m | 9.500,00 | 0,00 | $ 28.500,00 | 19% | $ 33.915,00 |
| 4414 | | 0,00 Kg | [4414] MALLA METALICA ZARANDA 8 X 8 0.9MTS ALTO X 30MTS | 3,00 | m | 8.770,00 | 0,00 | $ 26.310,00 | 19% | $ 31.308,90 |
| 3598 | 11889025 | 0,00 Kg | [3598] GAFAS NEGRAS DE SEGURIDAD | 12,00 | Units | 8.200,00 | 0,00 | $ 98.400,00 | 19% | $ 117.096,00 |
| 2339 | 11889020 | 0,00 Kg | [2339] GAFAS BLANCAS DE SEGURIDAD | 12,00 | Units | 8.200,00 | 0,00 | $ 98.400,00 | 19% | $ 117.096,00 |
| 5912 | 11910732 | 0,00 Kg | [5912] GUANTE DE CARNAZA Y TELA TALLA UNICA | 12,00 | Units | 14.940,00 | 5,00 | $ 170.316,00 | 19% | $ 202.676,04 |

**CANALES DE PAGO**

Consignar en cuenta corriente a favor de Distrias S.A.S en los siguientes Bancos:

| | | |
|---|---|---|
| AGRARIO:327030007832 | OCCIDENTE: 892000738 | BOGOTA: 438503708 |
| BBVA: 612-030775 | BANCOLOMBIA: 09165117542 | DAVIVIENDA: 156069998524 |

| | |
|---|---|
| **Valor bruto** | $ 472.410,00 |
| Descuento | $ -11.040,00 |
| **Base imponible** | $ 461.370,00 |
| IVA 19% on $ 461.370,00 | $ 87.660,30 |
| AR ICA on $ 461.370,00 | $ 0,00 |
| AR REN on $ 461.370,00 | $ 0,00 |
| **Total** | $ 549.030,30 |

**TOTAL EN LETRAS:** QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS Y TREINTA CENTAVOS

Número de autorización de facturación: 18764104928903 Fecha: 23-01-2026 Rango autorizado desde: DM 50.001 Hasta DM 100.000 Valida desde: 23-01-2026 hasta 23-01-2028 Representación gráfica de facturación electrónica impresa por computador por DISTRIAS S.A.S., generada en el software licenciado Odoo.

1. La obligación adquirida será cancelada en el domicilio principal de la empresa DISTRIAS S.A.S. ubicada en la CARRERA 2 NRO. 44 110 del municipio de MONTERÍA

2. Se entenderá la aceptación tácita de la factura por el remitente, en el evento en que no se presente reclamaciones sobre el contenido de la misma dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. se entenderá como irrevocablemente aceptada. art 621 y 773 cód de comercio Quien firma esta factura se entenderá estar plenamente facultado por el

| | |
|---|---|
| **Factura elaborada por:**<br>NATALIA JIMENEZ TENORIO | **Recibido por:** **SELLO**<br>Nombre: C.C.<br>Firma: |
| Imprime: DistriasBot | Fecha de impresión:26-05-2026 07:50:22 |

566

**Distrias**
Hogar & Construcción

DISTRIAS S.A.S.
NIT. 900377621
CARRERA 2 NRO. 44 110
MONTERÍA, Colombia
TEL: 6047890172 - 3106060000
EMAIL: info@grupodistrias.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**N° DM63288**

No somos grandes contribuyentes. No somos autorretenedores. Responsable de IVA. Somos Autoretenedores de ICA.

**CUFE:** 28aecb67174b5700a09a4d481842fcdf10a74458b06483edfda3c00d642b802743c4064fb2bb0fd3cd914d6f092b02ad

| DATOS CLIENTE | DATOS FACTURA | FACTURA: |
|---|---|---|
| **Nombre:** CONSORCIO RED VITAL CORDOBA<br>**NIT:** 902022356<br>**Dirección:** CR 6 # 62 B - 32 ED SEXTA AVENIDA OF 618<br>**Ciudad:** MONTERÍA<br>**Teléfono:** +57 315 4764499<br>**Correo DIAN:** edificar.rym.sas@gmail.com | **Fecha de emisión:** 11-06-2026 09:59:48<br>**Fecha vencimiento:** 11-07-2026<br>**Orden de venta:** S160681<br>**Vendedor:** JOVANI DE JESUS HERAZO RIVERA | **Plazo de pago:** 30 días<br>**Medio de pago:** Credit<br>**Forma de pago:** Instrumento no definido<br>**Remisión:** DI/OUT/93683<br>**Peso total:** 18,0 kg |

## RETIRA JUAN BURGOS

| REFERENCIA | COD. PROV | PESO | DESCRIPCIÓN | CANT | UdM | PRECIO | DCTO (%) | SUBTOTAL | IVA (%) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6304239 | D-75524 | 0,00 Kg | [6304239] DISCO ABRAS-CORTE ACERO INOX 4-1/2" X 1MM X 7/8" WA46 | 12,00 | Units | 2.400,00 | 0,00 | $ 28.800,00 | 19% | $ 34.272,00 |
| 6304177 | D-65975 | 1,00 Kg | [6304177] DISCO ABRAS-CORTE ACERO INOX 7" X 2MM X 7/8" WA46R | 12,00 | Units | 8.494,00 | 5,00 | $ 96.831,60 | 19% | $ 115.229,60 |
| 5501025 | 70184624364 | 0,50 Kg | [5501025] DISCO PRO SEGMENTADO 4"PL - 110X7.5X22.23 NORTON(CONCRETO) | 12,00 | Units | 17.165,00 | 5,00 | $ 195.681,00 | 19% | $ 232.860,39 |
| 5912 | 11910732 | 0,00 Kg | [5912] GUANTE DE CARNAZA Y TELA TALLA UNICA | 36,00 | Units | 14.940,00 | 5,00 | $ 510.948,00 | 19% | $ 608.028,12 |

**CANALES DE PAGO**

Consignar en cuenta corriente a favor de Distrias S.A.S en los siguientes Bancos:

| | | |
|---|---|---|
| AGRARIO:327030 007832 | OCCIDENTE: 892000738 | BOGOTA: 438503708 |
| BBVA: 612-030775 | BANCOLOMBIA: 09165117542 | DAVIVIENDA: 156069998524 |

| | |
|---|---|
| **Valor bruto** | $ 874.548,00 |
| Descuento | $ -42.287,40 |
| **Base imponible** | $ 832.260,60 |
| IVA 19% on $ 832.260,60 | $ 158.129,51 |
| AR ICA on $ 832.260,60 | $ 0,00 |
| AR REN on $ 832.260,60 | $ 0,00 |
| **Total** | $ 990.390,11 |

**TOTAL EN LETRAS:** NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS Y ONCE CENTAVOS

Número de autorización de facturación: 18764104928903 Fecha: 23-01-2026 Rango autorizado desde: DM 50.001 Hasta DM 100.000 Valida desde: 23-01-2026 hasta 23-01-2028 Representación gráfica de facturación electrónica impresa por computador por DISTRIAS S.A.S., generada en el software licenciado Odoo.

1. La obligación adquirida será cancelada en el domicilio principal de la empresa DISTRIAS S.A.S. ubicada en la CARRERA 2 NRO. 44 110 del municipio de MONTERÍA

2. Se entenderá la aceptación tácita de la factura por el remitente, en el evento en que no se presente reclamaciones sobre el contenido de la misma dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. se entenderá como irrevocablemente aceptada. art 621 y 773 cód de comercio Quien firma esta factura se entenderá estar plenamente facultado por el representante legal, y no podrá éste, alegar desconocimiento alguno con respecto a las implicaciones legales que del incumplimiento de esta obligación puedan generarse. Esta factura electrónica de venta es un título valor y el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritas en este título valor.

| | |
|---|---|
| **Factura elaborada por:**<br>MADERLEY PEREZ GONZALEZ | **Recibido por:** SELLO<br>Nombre: C.C.<br>Firma: |
| Imprime: DistriasBot | Fecha de impresión:11-06-2026 10:01:11 |

# EQUIPSEG PLUS MONTERIA SAS

**Nit. 901.247.755-1 Responsable de Iva**

Cra 4 No 42-26 Barrio los Laureles Tel.: 7818162 - 3013668691 Montería- Cordoba

equipsegplus@outlook.com

567

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **CONSORCIO RED VITAL CORDOBA**<br>**NI No. :** 902022356-3<br>**DIRECCION :** CR 6 # 62 B - 32 ED SEXTA AVENIDA OF 618<br>**E-MAIL FE :** consorcioredvital@gmail.com<br>**TELEFONO :**<br>**CIUDAD :** MONTERÍA **PAIS :** Colombia | **30/06/2026** | **$ 545.000,00** |
| | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | |
| | **EPM122677** | |
| | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| | 25/07/2026 | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | IVA | DCTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46074 -ABRA | DISCO CORTE SUPER FINO 7" ABRACOL 46074 | 12 UND | $5.882,35 | 19% | 0 % | $70.588,24 |
| 2 | 46094 -ABRA | DISCO CORTE SUPER FINO 9" ABRACOL 46094 | 12 UND | $10.924,37 | 19% | 0 % | $131.092,44 |
| 3 | 1219 | GUANTE INGENIERO SENCILLO | 30 PAR | $6.302,52 | 19% | 0 % | $189.075,63 |
| 4 | 1049 | GAFAS LENTE OSCURO DEPORTIVO NIK-08002 | 20 UND | $3.361,34 | 19% | 0 % | $67.226,89 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 4

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 457.983,20 |
| IVA liquidado | $ 457.983,20 | 19% | $ 87.016,80 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 545.000,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 25/07/2026 | $ 545.000,00 |

**VALOR (en letras) :** QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55%
Resolución DIAN: 18764095363118. Prefijo: EPM. Rango: 100001 al 130001. Vigencia: 8/07/2025 hasta 8/07/2027.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 4
Factura a crédito, plazo hasta 25/07/2026.

---

Favor realizar transferencias a Bancolombia Corriente No. 68000011089 . Banco Bogota Cuenta Corriente No. 880057674 a nombre de EQUIPSEGPLUS MONTERIA SAS.
Numeracion Autorizado por la DIAN segun formulario Dian N 18764095363118
del 08/07/2025 desde el EPM 100,001 a EPM 130,001. facturacion electronica, vigencia 24 meses.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el articulo 774 de Código de Comercio, y en conformidad a la Ley 1231 de julio 17 de 2008.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

ITazxW5iRnVBBpnMSzvt80T7O/43RFNjDJXGg3MjGwjLWtZGsRU4XEvrMoYS9h+YOmowmk0/FSoDDeSNfVAZC9dNCGGNDfRkTfJAMFI7zLZxFJglEBZDWy
MEOwokWWeojrD4scsT8m1w/t3aFQMKhSN5WXRoLivS97RysEkKUo2CVmm4lD5N4HHqnJC0nN4zVAsCZF9Zgd4XwrGuihpQLHLOlQ/Yvj+txWxnJzFV/PKG
gtyws2AJGahUj6xBJEl8h7sAGrEoSaHPcABJd87f739zEqv21qkJ4BCYWifywXb0WAbPwa4XyQMTOXytXbJcl671odKCEMRw==

**CUFE:** 75d19dc8555e8ed801930eaa75bfdc8ee1ece800dcbae3479172530f6d01b9c7f1522f140a02d56d7b4564d444997843

**Fecha emisión:** 2026-06-30 10:26:57 **Fecha validación DIAN:** 2026-06-30 10:26:59-05:00

**Proveedor Tecnológico:** NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.



Resolución DIAN: 18764095363118. Prefijo: EPM. Rango: 100001 al 130001. Vigencia: 8/07/2025 hasta 8/07/20

| | |
|---|---|
| CONSORCIO RED VITAL CORDOBA | **INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE LA OBRA (CALIDAD Y SST)**<br>**PERIODO N° 1: DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2026** |

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

**CONTRATISTA:**

CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA

**MUNICIPIO:**

MONTERÍA

**DEPARTAMENTO:**

CÓRDOBA

## I. INTRODUCCIÓN

En aras de asegurar al Contratante, GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, el cumplimiento de los requisitos asociados a la gestión de la Calidad y la Seguridad y Salud en el Trabajo, durante la ejecución del proceso de contratación **No. SI-LP-011-2025** con objeto **"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**. El **Consorcio Red Vital Córdoba** cuenta con el Plan de Gestión Integral de Obras del proyecto, teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de SST y Calidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Consorcio Red Vital Córdoba en cumplimiento de sus obligaciones en el marco del proceso de contratación **No. SI-LP-011-2025** con objeto **"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**, se elabora el presente informe de la gestión realizada durante el periodo del 07 de abril al 06 de mayo del 2026, en el cual se soporta el estado de implementación de lo establecido en el PGIO.

## II. OBJETIVO DEL PROYECTO

Describir en forma detallada el estado de la ejecución del proceso de contratación **No. SI-LP-011-2025** con objeto **"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**, y las obras establecidas dentro del alcance y meta física del mismo, atendiendo a los componentes de Calidad y de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

## III. ALCANCE DEL PLAN DE SST

El presente informe tiene como alcance describir las actividades ejecutadas relacionadas con los componentes de la implementación del Sistema Integrado de Gestión del proceso de contratación **No. SI-LP-011-2025** con objeto **"FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**, durante el periodo del 07 de abril al 06 de mayo del 2026.

## IV. INFORMACIÓN DE PROYECTO

**Tabla 1:** Información General del proyecto

| INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO | |
|---|---|
| **Contratante:** | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA |
| **Proceso de contratación:** | No. SI-LP-011-2025 |
| **Objeto:** | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL,DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. |
| **Contratista:** | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA |
| **Representante Legal:** | María Elena Rivera Hoyos |
| **Dirección:** | Cra. 6 # 6B – 32 Centro de Negocios Sexta Avenida B/ Castellana oficina 618 |
| **Teléfono:** | 3154764499 |
| **Correo electrónico:** | Edificar.rym.sas@gmail.com |
| **Plazo:** | 5 Meses |

### 4.1. Localización del proyecto:

El proyecto se localiza en Montería - Córdoba, específicamente en la Cl. 42 #8-15, en instalaciones del CRUE CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

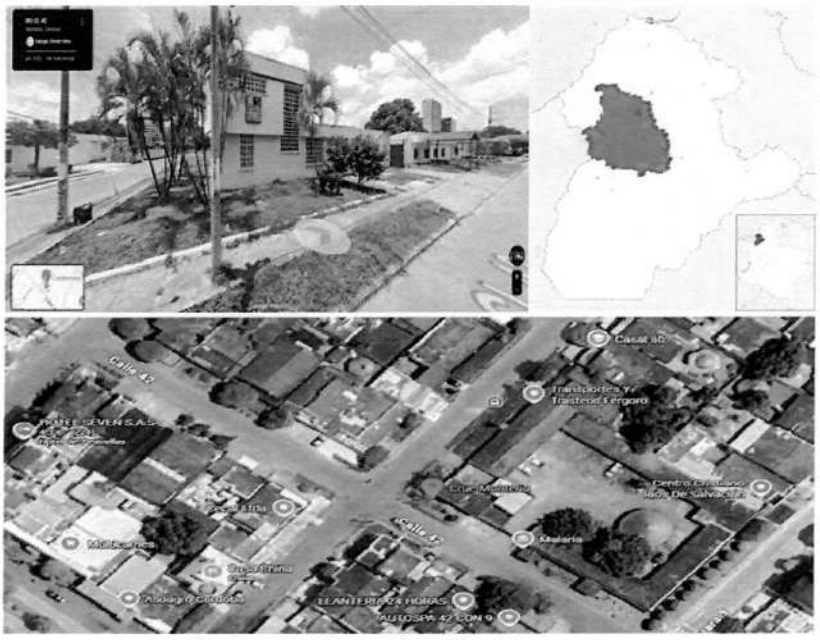



**Ilustración 1.** Localización del proyecto.
**Fuente:** Propia.

### 4.2. Actividades a desarrollar en el proyecto:

A continuación, se relacionan las actividades que serán ejecutadas como parte del alcance del proyecto.

**Tabla 2:** Actividades y cantidades de obra.

| CÓDIGO EDT | CAPÍTULO | ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| 1.1 | Gestión del Proyecto | Elaboración y aprobación del PGIO |
| 1.2 | Gestión del Proyecto | Programación del cronograma y ruta crítica |
| 1.3 | Gestión del Proyecto | Gestión documental del contrato |
| 1.4 | Gestión del Proyecto | Comunicaciones y coordinación técnica |
| 1.5 | Gestión del Proyecto | Gestión de compras y suministros |
| 1.6 | Gestión del Proyecto | Supervisión técnica y control de calidad |
| 2.1 | Preliminares y Demoliciones | Localización y replanteo del área |
| 2.2 | Preliminares y Demoliciones | Desmonte de cielo raso existente |
| 2.3 | Preliminares y Demoliciones | Desmonte de puertas |
| 2.4 | Preliminares y Demoliciones | Desmonte de ventanas |
| 2.5 | Preliminares y Demoliciones | Desmonte de aparatos sanitarios |
| 2.6 | Preliminares y Demoliciones | Desmonte de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias |
| 2.7 | Preliminares y Demoliciones | Demolición de andenes |
| 2.8 | Preliminares y Demoliciones | Demolición de plantillas |
| 2.9 | Preliminares y Demoliciones | Demolición de muros |
| 2.10 | Preliminares y Demoliciones | Demolición de bordillos y redoblones |
| 2.11 | Preliminares y Demoliciones | Excavación en tierra |
| 2.12 | Preliminares y Demoliciones | Relleno compactado |
| 2.13 | Preliminares y Demoliciones | Retiro y transporte de escombros |
| 3.1 | Estructura en Concreto | Construcción de zapatas aisladas |
| 3.2 | Estructura en Concreto | Construcción de vigas de cimentación |
| 3.3 | Estructura en Concreto | Construcción de columnas |
| 3.4 | Estructura en Concreto | Construcción de columnetas |
| 3.5 | Estructura en Concreto | Construcción de vigas superiores |
| 3.6 | Estructura en Concreto | Construcción de dinteles |
| 3.7 | Estructura en Concreto | Construcción de plantilla en concreto 10 cm |
| 3.8 | Estructura en Concreto | Construcción de plantilla en concreto 15 cm |
| 3.9 | Estructura en Concreto | Construcción de rampas en concreto |
| 3.10 | Estructura en Concreto | Instalación de bordillo prefabricado |
| 3.11 | Estructura en Concreto | Suministro y colocación de acero de refuerzo |
| 4.1 | Pisos y Enchapes | Instalación de enchape cerámico |
| 4.2 | Pisos y Enchapes | Instalación de guardaescobas |
| 4.3 | Pisos y Enchapes | Enchape de piso en baños |
| 4.4 | Pisos y Enchapes | Enchape de paredes |
| 5.1 | Cielorrasos, Estuco y Pintura | Aplicación de estuco plástico interior |
| 5.2 | Cielorrasos, Estuco y Pintura | Aplicación de estuco plástico exterior |

| | | |
|---|---|---|
| 5.3 | Cielorrasos, Estuco y Pintura | Construcción de muros en drywall |
| 5.4 | Cielorrasos, Estuco y Pintura | Aplicación de pintura interior |
| 5.5 | Cielorrasos, Estuco y Pintura | Aplicación de pintura exterior |
| 5.6 | Cielorrasos, Estuco y Pintura | Aplicación de pintura epóxica |
| 5.7 | Cielorrasos, Estuco y Pintura | Instalación de cielorraso en PVC |
| 6.1 | Cubierta | Aplicación de mortero de nivelación |
| 6.2 | Cubierta | Instalación de impermeabilización |
| 6.3 | Cubierta | Construcción de estructura metálica de cubierta |
| 6.4 | Cubierta | Instalación de lámina termoacústica |
| 7.1 | Carpintería Metálica y Madera | Instalación de ventanas V2, V3, V4, V5, V7 y V8 |
| 7.2 | Carpintería Metálica y Madera | Instalación de puertas en madera |
| 7.3 | Carpintería Metálica y Madera | Instalación de puertas metálicas P2 y P3 |
| 7.4 | Carpintería Metálica y Madera | Instalación de puerta en acero inoxidable |
| 7.5 | Carpintería Metálica y Madera | Instalación de puerta de residuos |
| 7.6 | Carpintería Metálica y Madera | Instalación de puerta vehicular |
| 8.1 | Instalaciones Hidrosanitarias | Instalación de red de agua potable |
| 8.2 | Instalaciones Hidrosanitarias | Instalación de red sanitaria |
| 8.3 | Instalaciones Hidrosanitarias | Instalación de aparatos sanitarios |
| 8.4 | Instalaciones Hidrosanitarias | Instalación de lavaplatos |
| 8.5 | Instalaciones Hidrosanitarias | Construcción de cajas de inspección |
| 9.1 | Aguas Lluvias | Excavación y relleno para pluvial |
| 9.2 | Aguas Lluvias | Instalación de tubería corrugada 6" y 8" |
| 9.3 | Aguas Lluvias | Construcción de cárcamos |
| 9.4 | Aguas Lluvias | Instalación de cajas de registro |
| 9.5 | Aguas Lluvias | Instalación de canaletas |
| 9.6 | Aguas Lluvias | Instalación de bombas sumergibles |
| 10.1 | Instalaciones Eléctricas | Instalación de acometidas |
| 10.2 | Instalaciones Eléctricas | Instalación de tableros eléctricos |
| 10.3 | Instalaciones Eléctricas | Instalación de breakers |
| 10.4 | Instalaciones Eléctricas | Instalación del sistema de puesta a tierra |
| 10.5 | Instalaciones Eléctricas | Instalación de tomas 110 V |
| 10.6 | Instalaciones Eléctricas | Instalación de tomas 220 V |
| 10.7 | Instalaciones Eléctricas | Instalación de interruptores |
| 10.8 | Instalaciones Eléctricas | Instalación de luminarias |
| 11.1 | Limpieza General | Limpieza final de obra |
| 12.1 | Zonas Verdes | Siembra de grama |
| 12.2 | Zonas Verdes | Plantación de árboles |
| 12.3 | Zonas Verdes | Jardinería y adecuación de áreas verdes |
| 13.1 | Fachada | Aplicación de estuco exterior |
| 13.2 | Fachada | Aplicación de pintura exterior |
| 13.3 | Fachada | Instalación de bordillo prefabricado |
| 14.1 | Ventilación Mecánica | Instalación de minisplit 12.000 BTU |
| 14.2 | Ventilación Mecánica | Instalación de minisplit 18.000 BTU |

| | | |
|---|---|---|
| 14.3 | Ventilación Mecánica | Instalación de minisplit 24.000 BTU |
| 14.4 | Ventilación Mecánica | Instalación de extractores de baño |

## V. VALOR ECONOMICO DEL CONTRATO DE OBRA

Se cuenta con el presupuesto de obra establecido para la ejecución del proyecto.

## VI. INFORME ADMINISTRATIVO

Durante el periodo del 07 de abril al 06 de mayo del 2026, se realizaron las siguientes actividades como parte de la gestión administrativa del proceso de contratación **No. SI-LP-011-2025.**

### 5.1. ACTUALIZACION DE POLIZAS

Se cuenta con póliza de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil, con respecto a la suscripción del contrato de obra y respecto a la suscripción de actas de inicio, reinicio y suspensión; aprobadas por parte de la entidad contratante.

## VII. IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE LA OBRA

Con relación a la implementación de la gestión de obra (Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) para el periodo comprendido entre el 07 de abril al 06 de mayo del 2026; se hace claridad que fueron ejecutadas las actividades de acuerdo con los cumplimientos exigidos en las especificaciones técnicas que cobija el proyecto.

A continuación, se relacionan las actividades implementadas en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo:

### 6.1. AFILIACIÓN DEL PERSONAL AL SGSS Y PAGO DE APORTES

En el anexo N°7 se encuentran los registros de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social del personal, teniendo en cuenta que los trabajadores que por sus responsabilidades están en obra afiliados a Riesgos Laborales en nivel de riesgo V. y el personal administrativo que no ejecuta sus funciones y responsabilidades en la obra afiliados al nivel de riesgo I.

**Ver anexo N°7:** Afiliaciones y planillas de pago de seguridad social.

### 6.2. MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA

Se realizó uso de la correspondencia como medio de comunicación para la entrega de la información requerida por la interventoría, la entidad y demás partes interesadas del proyecto.

### 6.3. INFORME FINANCIERO

Durante el periodo evaluado se realizaron actividades preliminares como Localización y replanteo del área, Desmonte de cielo raso existente, Desmonte de puertas y ventanas, Desmonte de aparatos sanitarios, entre otras, las cuales fueron registradas a través de la bitácora de obra.

### 6.3.1. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL PERIODO Y PORCENTAJE DE AVANCES FISICOS DE LA OBRA.

A fecha del 07 de abril al 06 de mayo del 2026, se ejecutó un avance correspondiente a las actividades ejecutadas, implementación de gestión de obra.

### 6.4. POLITICAS, OBJETIVOS DE SST Y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El Consorcio Red Vital Córdoba en cumplimiento de sus responsabilidades ante el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan de Calidad, estableció las siguientes políticas:

- Política de Calidad.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- Política de prevención de acoso laboral .
- Política de trabajo seguro en alturas.
- Política de prevención y atención al acoso sexual y violencia basada en género.
- Política de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- Política de orden y limpieza.

Las Políticas se encuentran documentadas, firmadas por el representante legal.

Se cuenta con los objetivos de Seguridad y salud en el Trabajo alineados con las políticas, estos se encuentran documentados y firmados por el representante legal.

Además, teniendo en cuenta los riesgos priorizados se estableció un reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, el cual se encuentra documentado.

### 6.5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Se realizó la designación del profesional Ingeniero Especialista en SG-SST, Estableciéndose a la ingeniera María Inés González Ayuz identificada con cédula 1.067.836.657 de Montería quien tiene el cargo de Profesional SG-SST, cuenta con Licencia en Salud Ocupacional y el Curso Virtual de las 50 horas en SG-SST y su actualización de las 20 horas.

**Ver anexo N°4** Designación de responsabilidades.

### 6.6. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Durante el periodo evaluado no se tenía programado realizar la gestión para la conformación de los comités de:

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
- Comité de convivencia laboral.

## 6.7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

El Consorcio Red Vital Cordoba en cumplimiento de sus responsabilidades, suministró los recursos que fueron necesarios para la implementación del PGIO, establecido para el proceso de contratación **No. SI-LP-011-2025** con objeto **FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA**.

### 6.7.1. RECURSO HUMANO

En el periodo evaluado se contó con un equipo de trabajo conformado por personal profesional, técnico y no calificado multidisciplinario, los cuales algunos fueron vinculados directamente por el Consorcio Red Vital Córdoba y otros como independientes o a través de contratistas.

Se presenta una relación del personal en el cual se especifica el tipo de vinculación y estado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social.

Todo el personal contratado en el periodo evaluado fue afiliado al Sistema General de Seguridad Social teniendo en cuenta que los trabajadores que por sus responsabilidades deban estar en obra están afiliados a Riesgos Laborales en nivel de riesgo V.

**Ver anexo N°7.** Afiliaciones y planillas de pago de seguridad social.

### 6.7.2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Para la realización de las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado se requirió de la utilización de herramientas y equipos, de los cuales se derivan peligros de origen mecánico y no mecánicos, e impactos sobre el ambiente laboral, por lo tanto, fueron identificados e inventariados para establecer las medidas de control necesarias para que no se materialicen los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**Ver anexo N°11**. Listados e inventarios.

### 6.7.3. SUSTANCIAS QUÍMICAS

En el periodo evaluado se realizó el uso sustancias químicas, las cuales fueron identificadas y almacenadas de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ficha de seguridad y procedimiento del Consorcio.

**Ver anexo N°11**. Listados e inventarios.

### 6.7.4. MATERIALES

Durante el periodo evaluado, no se requirió la compra de materiales de subbase.

### 6.7.5. CAPACITACION, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

En aras de fomentar una cultura de autocuidado, estilos de vida saludables y que todo el personal conociera los riesgos a los cuales se encontraba expuesto, las medidas de control y sus responsabilidades con la

implementación del PGIO, se realizó la inducción y reinducción a todos los trabajadores y la socialización de los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de Riesgos, de acuerdo a lo establecido en el programa de inducción y capacitaciones, además de notificar a los trabajadores de los riegos existentes derivados a las actividades a constructivas y el área de realización.

**Ver anexo N°5.** Inducción.
**Ver Anexo N°6**. Notificación de riesgo.

### 6.8. COMUNICACIONES

Para garantizar la correcta comunicación durante la ejecución del proyecto en materia de SG-SST, se implementaron los siguientes mecanismos:

- Oficios.
- Espacios de interlocución (Comités, reuniones, capacitaciones).
- Teléfonos celulares.
- Pendones informativos.
- Comunicación directa verbal.
- Envío de correspondencia a través de correo electrónico y oficios físicos en el sitio de obra.

### 6.9. PLAN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Se tiene establecido un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencia para dar respuesta de manera rápida y efectiva ante cualquier situación de emergencia ocasionada por el hombre o por la naturaleza.

Además, se ha implementado las medidas para garantizar una adecuada atención frente a futuras situaciones de emergencias como:

- Se cuenta con kits de emergencias que están conformados por un botiquín dotado, camilla rígida y extintores. Estos kits se encuentran instalados e identificados para su fácil acceso, frente a una situación de emergencias.

- Se realizó inventario de la señalización en el periodo evaluado para llevar un control de la cantidad y estado de esta. de la señalización.

- Se realizaron inspecciones de seguridad a los elementos de los kits de emergencias y señalización para verificar el buen estado de los mismos.

- Se cuenta con el establecimiento de Plano de evacuación y la instalación de la señalización, según lo establecido en este.

**Ver anexo N°12.** Registro fotográfico.
**Ver anexo N°18.** Inspecciones de seguridad.

### 6.10. PLAN DE TRABAJO ANUAL

Se realizó la programación del Plan de Trabajo para el año 2026, y se realizó el seguimiento a la ejecución de las actividades programadas.

**Ver anexo N°21.** Cronograma de trabajo anual.

### 6.11. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y EVALUACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO.

Se realizó revisión de los requisitos legales y se actualizó la Matriz de Requisitos Legales con respecto a los cambios normativos aplicables.

### 6.12. INFORME DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Durante el periodo del 07 de abril al 06 de mayo del 2026, se implementaron las medidas en Seguridad y Salud en el Trabajo y demás controles enmarcados en la legislación nacional vigente y, por ende, los establecidos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con lo establecido en la Matriz de Requisitos Legales y el cronograma de actividades de SST.

#### 6.12.1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO

Se realizó una revisión y actualización a la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración del Riesgo teniendo en cuenta las actividades que se desarrollaron en el periodo y que están pendiente por ejecutar en el proyecto.

#### 6.12.2. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Durante el periodo evaluado no se tenía programada la gestión para la conformación de los comités de:

- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Comité de Convivencia Laboral.

#### 6.12.3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES.

Con base en el resultado de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de las actividades que se ejecutan en el proyecto, se establecieron controles, y a partir de programas de trabajo del Sistema de Gestión de SST se estableció la forma en la que se implementarán tales controles y las demás actividades necesarias para el logro de los objetivos de SST. A continuación, se realiza una descripción de las actividades implementadas en el periodo por cada programa:

##### 6.12.3.1. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD.

A continuación, se relacionan las actividades de seguridad y salud en el trabajo implementadas en obra, para dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Medicina Preventiva del Trabajo, Promoción y Prevención de la Salud.

- **Evaluaciones médicas y diagnóstico de condiciones de salud.**

Se cuenta con la realización por parte de un médico con Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, las evaluaciones médicas a los trabajadores que ingresaron al proyecto con el fin de identificar sus condiciones físicas para determinar la aptitud del trabajador para realizar las tareas asignadas.

**Ver anexo N°10.** Exámenes médicos ocupacionales.

- **Perfil Sociodemográfico**

Es importante conocer las características socio – culturales de la población trabajadora del proyecto, para un mejor conocimiento del Perfil Sociodemográfico de la organización y de los estilos de vida y de trabajo de los trabajadores. Esta información sirve para identificar la población más vulnerable a ciertos factores de riesgo, así como para establecer acciones y medidas preventivas y de control. Para ello, se aplicó la **FOR-013 Encuesta de Perfil sociodemográfico** a los trabajadores que ingresaron al proyecto durante el periodo, con el fin de obtener los datos asociados a las variables que determinan el perfil sociodemográfico:

- Población según tipo de vinculación y sexo.
- Población según grado de escolaridad.
- Edad.
- Estatura.
- Peso.
- Estado civil.
- Composición Familiar.
- Vivienda (propia o alquilada).
- Zona de residencia (Rural o urbana).
- Ingresos.
- Actividades económicas que realiza en el tiempo libre.
- Actividades deportivas que realiza en el tiempo libre.

A partir de la tabulación de la información de la encuesta aplicada se actualizó el perfil Sociodemográfico utilizando el formato **FOR-014 Perfil Sociodemográfico**.

**Ver anexo N°8.** Perfil sociodemográfico.

- **Análisis de ausentismo laboral**

Como medida de seguimiento y control del ausentismo en los trabajadores, se llevó un control del ausentismo utilizando el formato **FOR-015 Control de ausentismo,** en el cual se anota las causas del ausentismo para su análisis. En el periodo evaluado no se presentó ausentismo laboral.

**Ver anexo N°13.** Ausentismo laboral.

- **Primeros auxilios**

Se implementó el botiquín, como recurso básico para prestar los primeros auxilios, cuando ocurra repentinamente un accidente dentro de las instalaciones del proyecto, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención inicial oportuna y satisfactoria a las víctimas.

Durante el periodo no se requirió la utilización de los elementos del botiquín, por tal motivo no se presentaron salidas de los elementos del botiquín.

**Ver Anexo N°12.** Registro fotográfico.
**Ver Anexo N°16.** Control de salida de elementos del botiquín.
**Ver Anexo N°18.** Inspecciones de seguridad.

- **Autorreporte de Condiciones de Trabajo y Salud**

Se cuenta con una herramienta establecida para que todos los trabajadores y contratistas puedan notificar por escrito las condiciones adversas de seguridad y la salud que identifiquen en su lugar de trabajo, las cuales son el **PRO-013 Procedimiento para el autorreporte de condiciones de trabajo y salud**, y los siguientes formatos:

- FOR-020 Notificación de actos y condiciones inseguras.
- FOR-021 Control de Notificación de actos y condiciones inseguras.
- FOR-022 Autorreporte de condiciones de salud.
- FOR-023 Control de Autorreporte de condiciones de salud.

Sin embargo, en el periodo evaluado no se reportaron autorreportes de condiciones de salud por parte del personal.

En el periodo evaluado se reportaron notificaciones de actos y condiciones de trabajo inseguras.

**Ver Anexo N°17.** Control de Notificación de actos y condiciones inseguras.

- **Manejo de sustancias químicas**

Se realizó la identificación de las sustancias químicas utilizadas durante el periodo. A partir de esta identificación se establecieron las directrices para el almacenamiento seguro de las mismas y la publicación de las fichas de seguridad.

**Ver Anexo N°18.** Inspecciones de seguridad.

- **Campamento e Instalaciones sanitarias.**

- Se cuenta con baños en la obra para el uso por parte de los trabajadores el cual disponen de suministro de agua potable y jabón.
- El Consorcio cuenta con una bodega en buen estado de infraestructura para el almacenamiento de las sustancias químicas, materiales y herramientas de uso frecuente, con el fin de que estas cuenten con las medidas de almacenamientos adecuadas y conserven sus propiedades.

Teniendo en cuenta lo anterior para el periodo evaluado se realizaron la inspección de manejo de campamentos e instalaciones temporales, así como también, la inspección de almacenamiento de materiales y sustancias químicas

**Ver Anexo N°18.** Inspecciones de seguridad.

- **Sistema de vigilancia epidemiológica**

Durante la ejecución del proyecto se realizó la recolección y análisis de la información para identificar la necesidad de establecer Programas de Vigilancia Epidemiológica a riesgos específicos, a partir del seguimiento realizado a la información recolectada de la presencia de los riesgos y de casos, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la construcción del PVE.

**Ver Anexo N°9.** Cuestionario nórdico.

- **Investigación de enfermedades laborales**

Se realizó seguimiento al estado de salud de los trabajadores del Consorcio Red Vital Córdoba y hasta la fecha no se han reportado casos de presunta enfermedad laboral.

**Ver Anexo N°14.** Control de enfermedades laborales.

- **Seguimiento de Casos de salud Especiales**

Se realizó seguimiento a reportes de casos de salud especiales asociado a:

- Enfermedad laboral diagnosticada.
- Trabajadores con incapacidades mayores a 15 días.
- Trabajadores en proceso de calificación del origen de enfermedad.
- Trabajadores con recomendaciones médicas vigentes de origen común.
- Trabajadores en proceso de reintegro laboral.
- Accidentes de trabajo.

Durante el periodo evaluado no se han presentado casos de salud especial.

**Ver Anexo N°15.** Seguimiento de casos de salud.

- **Medidas de prevención del riesgo de deshidratación.**

En aras de minimizar el riesgo de deshidratación producto de la exposición al sol, calor y las actividades, se establecieron puntos de hidratación debidamente señalizados para ser utilizados por los trabajadores durante las jornadas de trabajo.

**Ver Anexo N°12.** Registro fotográfico.

### 6.12.3.2. PROGRAMA DE ESTILO DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE Y CAPACITACIÓN

Como complemento del Programa de Medicina Preventiva, Promoción y Prevención de la Salud, se implementó las medidas establecidas en el Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludable y Capacitación, con el fin de disminuir los riesgos que se puedan derivar de las actividades diarias, aplicables en el periodo:

- Se socializó durante la inducción, la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, para sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos del consumo de tales sustancias tanto para su salud como para su desempeño laboral.
- Afiliación de los trabajadores al Sistema General de Seguridad Social.

- Durante la ejecución del proyecto, no se identificó trabajadores que estuvieran trabajando bajo la influencia del alcohol o sustancias psicoactivas. Tampoco se identificaron trabajadores fumando en las áreas de trabajo.
- Pausas activas saludables con el fin de recuperar energía, concentración y ánimo, y prevenir lesiones por sobreesfuerzos o agotamiento físico y mental.

**Ver anexo N°3.** Listado personal.
**Ver anexo N°5.** Inducción.
**Ver anexo N°7.** Afiliaciones y planillas de pago de seguridad social.
**Ver anexo N°12.** Registro fotográfico.

- **Pausas activas saludable**

Como complemento al programa de medicina preventiva y del trabajo, y promoción del autocuidado, estilos de vida y trabajo saludable, se socializó a los trabajadores los ejercicios de pausas activas saludables. Así mismo, se realizan las pausas activas con la participación de los trabajadores independientemente del tipo de vinculación del Consorcio Red Vital Córdoba, con el fin de recuperar energía, concentración y ánimo, y así prevenir lesiones por sobreesfuerzos o agotamiento físico y mental.

### 6.12.3.3. PROGRAMA DE MEDICIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES

De acuerdo con la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos se identificó que dentro de las actividades del proyecto no existe alguna en la cual se haya identificado un riesgo físico con calificación alta (No aceptable o Aceptable con control) que impliquen mediciones ambientales periódicas como mecanismo de seguimiento y control de los riesgos.

### 6.12.3.4. PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Se realizaron las inspecciones a los puestos de trabajo según lo establecido en el Programa de Inspecciones, con el objetivo de realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad establecidas e identificar problemas asociados con:

- Condiciones de trabajo inseguras.
- Verificación del cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro.
- Fallas relacionadas con el desgaste de piezas, equipos, maquinas o daños generales que puedan generar una condición de peligro.
- Acciones inapropiadas en la forma como se realiza el trabajo y usos de los elementos de protección personal.
- Protección contra incendios (Extintores).
- Almacenamiento, orden y limpieza.

Las inspecciones de seguridad realizadas en el periodo fueron:

- Manejo de campamento e instalaciones temporales.
- Inspección de uso seguro de herramientas y equipos.
- Inspección de uso de EPP y dotación.
- Inspección de señalización.
- Inspección de orden y limpieza.

- Inspección de extintores.
- Inspección de almacenamiento de materiales.
- Inspección de almacenamiento seguro de sustancias químicas.

**Ver Anexo N°18.** Inspecciones de seguridad

### 6.12.3.5. PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA

Se implementó la Metodología de las 5S, con el fin de efectuar las acciones y estrategias encaminadas a garantizar condiciones de trabajo seguras y un ambiente limpio y ordenado, verificando en cada etapa lo siguiente:

**SEIRI (Clasificación y descarte)**

En la obra, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se clasificaron y separaron los elementos necesarios y los que no son, con el fin de mantener solamente los elementos o herramientas que son de uso exclusivo para las actividades a desarrollar.
- Se definió un punto de acopio en el almacén para los elementos que fueron considerados necesarios, debidamente señalizados.
- Se estableció un punto para el acopio de las herramientas de mayor uso con el fin de que los trabajadores puedan acceder a ellas fácilmente y de manera segura.
- Se eliminaron los elementos que no tienen nada que ver con las actividades de obra a desarrollar con el fin de establecer un orden.
- Se eliminaron elementos que puedan afectar el funcionamiento de los equipos utilizados y que puedan ocasionar altos factores de riesgo para los trabajadores.
- Se estableció un kit ecológico para la segregación de los residuos generados en obra.

**SEITON (Organización)**

En la obra, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se cuenta con un inventario de herramientas y equipos para establecer la cantidad exacta con los que se cuenta para la ejecución de las actividades en obra.
- Se cuenta con un área destinada como almacén de materiales y herramientas ordenada y señalizada y que permite un fácil acceso a cada elemento, material o sustancia por parte del personal.
- Se cuenta con sitios segregados para la disposición de residuos.
- Se realizaba seguimiento a los trabajadores, luego de las actividades de obra con el objetivo de que cada elemento utilizado retornara a su lugar correspondiente.

**SEISO (Limpieza)**

En la obra, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Las áreas se encontraban libres de elementos o residuos que pudieran generar riesgos asociados a la salud y al bienestar de los trabajadores.
- Se realizaron jornadas diarias de orden y limpieza luego del desarrollo de las actividades de obra.
- Los trabajadores asumieron la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo y rutinario.

- Las herramientas, equipos y materiales utilizados en obra se encuentran en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades.

**SEIKETSU (Higiene y visualización)**

En cada la obra, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se ejecutaron limpiezas periódicas en las áreas de trabajo
- Se promovió y verificó el lavado, mantenimiento y correcto almacenamiento de las herramientas de trabajo al finalizar cada labor
- Se realizó la recolección y correcta disposición de los desechos y escombros generados en los puntos de acopio autorizados.

**SHITSUKE (Compromiso y disciplina)**

En cada uno de los frentes de obra, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se comenzó a generar una cultura de orden y limpieza en los trabajadores, con el objetivo de cumplir al máximo con las acciones establecidas a través de la sensibilización realizada en las charlas diarias de seguridad.
- Los trabajadores tienen autonomía en cuanto a la conservación del orden y limpieza en sus puestos de trabajo.
- Se realizaron inspecciones de Orden y Limpieza.

**Ver Anexo N°12.** Registro fotográfico.
**Ver Anexo N°18.** Inspecciones de seguridad.

### 6.12.3.6. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se estableció una Matriz de Elementos de Protección Personal mediante la cual se realizó la entrega de los elementos de protección personal requerido por cada uno de los trabajadores.

Se informó a los trabajadores de la responsabilidad y compromiso con el autocuidado y el uso adecuado de los elementos de protección personal suministrados.

**Ver Anexo N°12.** Registro fotográfico
**Ver Anexo N°18.** Inspecciones de seguridad
**Ver Anexo N°19.** Registro de entrega de EPP.

### 6.12.3.7. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN

Se realizó la instalación de la siguiente señalización:

- Señalización de rutas de evacuación y punto de encuentro en caso de emergencias.
- Señalización de punto ecológico.
- Señalización de la camilla, botiquín y extintor.
- Valla informativa del proyecto.

**Ver anexo N°12.** Registros fotográficos.
**Ver Anexo N°18.** Inspecciones de seguridad.

### 6.12.3.8. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Durante el periodo evaluado se implementaron las siguientes medidas de conformidad con lo establecido en el programa de mantenimiento:

- Se estableció en la obra el inventario de herramientas y equipos.
- Se definió el inventario de la maquinaria y volquetas utilizado y se verificó la documentación de la misma.
- Se realizó la solicitud de la documentación de la volqueta con el fin de verificar que esta se encontrara al día, y fue suministrado por parte del subcontratista lo siguiente.

  - SOAT.
  - Certificado de revisión técnico – mecánica y de gases.
  - Licencia de tránsito.
  - Cédula del conductor.
  - Licencia de conducción del conductor.

Durante el periodo evaluado no se le realizaron mantenimientos preventivos y/o correctivos a la volqueta.

**Ver Anexo N°20.** Documentación de volqueta.

### 6.12.3.9. REPORTE, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE ACCIDENTES / INCIDENTES

Durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes de trabajo.

## 6.13. CALCULO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN

Se realizó el cálculo y análisis de los indicadores de gestión establecidos para hacer seguimiento al cumplimiento del PGIO.

**Ver Anexo N°23.** Indicadores de gestión.

Como constancia de lo anterior, firma.

María Inés González Ayuz.

María Inés González Ayuz
Ingeniera Especialista SG-SST

## I. ANEXOS

**ANEXO N°1.** Acta de inicio.
**ANEXO N°2.** Programación de obra.
**ANEXO N°3.** Listado de personal.
**ANEXO N°4.** Designación de responsabilidades.
**ANEXO N°5.** Inducción.
**ANEXO N°6.** Notificación de riesgo.
**ANEXO N°7.** Afiliaciones y planillas de pago de seguridad social.
**ANEXO N°8.** Perfil sociodemográfico.
**ANEXO N°9.** Cuestionario nórdico.
**ANEXO N°10.** Evaluaciones medicas ocupacionales.
**ANEXO N°11.** Listados e inventarios.
**ANEXO N°12.** Registro fotográfico.
**ANEXO N°13.** Ausentismo laboral.
**ANEXO N°14.** Control de enfermedades laborales.
**ANEXO N°15** Seguimiento a casos de salud.
**ANEXO N°16** Control de salidas de elementos del botiquín.
**ANEXO N°17** Actos y condiciones inseguras.
**ANEXO N°18** Inspecciones de seguridad.
**ANEXO N°19** Registro de entrega de EPP.
**ANEXO N°20.** Documentación de volqueta.
**ANEXO N°21.** Plan de trabajo SG-SST.
**ANEXO N°22.** Cronograma de capacitaciones.
**ANEXO N°23.** Indicadores de gestión.

586

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

## ACTA DE INICIO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA** | No. SI-LP-011-2025 |
| **CONTRATANTE** | DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA<br>NIT: 902.022.356-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | MARIA ELENA RIVERA HOYOS, identificada con C.C No. 30.571.396 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **VALOR DEL CONTRATO DE OBRA** | DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($2.764.759.464,00MCTE.). |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CINCO (05) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | SIETE (07) DE ABRIL DE 2026 |

En Montería, el día siete (07) de abril de 2026 en las oficinas de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** de la Gobernación de Córdoba se reunieron: la Doctora **CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL**, identificada con C.C. No. 50.882.640, en su calidad de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,** quien actúa como Supervisora designada del contrato de Obra de la referencia y **MARIA ELENA RIVERA HOYOS**, identificado con C.C. No. 30.571.396 en calidad de Representante legal del **CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA** NIT: 902.022.356-3, en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato en mención.

Las partes socializaron las obligaciones establecidas en el contrato y manifestaron estar de acuerdo con la ejecución de las mismas a partir de la fecha.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron el día siete (07) de abril de 2026.

**MARIA ELENA RIVERA HOYOS**
C.C. No. 30.571.396
R/L CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA
CONTRATISTA DE OBRA

**LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO**
C.C. No. 50.940.306
R/L CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE
INTERVENTORIA

| ELABORADO POR: | ELABORADO POR: | REVISADO POR: |
|---|---|---|
| Nombre: Carolina Tamayo Ricardo | Nombre: Victoria Lugo Orozco | Nombre: Cristina Mesa |
| Cargo: Contratista Externa S.I.D. | Cargo: Contratista Externa S.I.D. | Cargo: Contratista Externo S.I.D. |
| Firma | Firma | Firma |


| INFORME MENSUAL DE GESTIÓN DE LA OBRA (CALIDAD Y SST) | |
|---|---|
| CONSORCIO RED VITAL CORDOBA | ANEXOS |
| | "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA". |

# ANEXO N° 2.

# PROGRAMACIÓN DE OBRA

SI-LP-011-2025

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA** | **118,75 días** | **lun 16/03/26** | **mar 18/08/26** | | **$ 2.764.759.464,00** |
| 2 | | INICIO | 0 días | lun 16/03/26 | lun 16/03/26 | | $ 0,00 |
| 3 | | **PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **113,38 días** | **lun 16/03/26** | **mar 11/08/26** | | **$ 330.555.163,00** |
| 4 | | Localizacion, Trazado y Replanteo | 3 días | lun 16/03/26 | mié 18/03/26 | 2 | $ 22.991.080,00 |
| 5 | | Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro de material sobrante | 12 días | lun 16/03/26 | mié 3/06/26 | 4CC | $ 31.097.335,00 |
| 6 | | Desmonte de puertas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado | 6 días | lun 16/03/26 | vie 29/05/26 | 5CC | $ 3.987.936,00 |
| 7 | | Desmonte de ventanas. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado | 6 días | lun 16/03/26 | sáb 30/05/26 | 6CC | $ 2.618.595,00 |
| 8 | | Demolición de plantilla o andenes 10/15cm en concreto existente. Incluye retiro de escombro | 13 días | jue 19/03/26 | mar 2/06/26 | 4 | $ 92.385.830,00 |
| 9 | | Desmonte de aparatos sanitarios. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado | 2 días | lun 16/03/26 | mar 17/03/26 | 7CC | $ 465.528,00 |
| 10 | | Retiro de pintura existente en zonas deterioradas | 5 días | jue 19/03/26 | sáb 30/05/26 | 4 | $ 20.123.234,00 |
| 11 | | Desmonte de instalaciones puntos eléctricos | 5 días | jue 19/03/26 | sáb 30/05/26 | 4 | $ 14.166.065,00 |
| 12 | | Desmonte de puntos hidráulicos y sanitarios | 2 días | lun 16/03/26 | mar 17/03/26 | 9CC | $ 527.472,00 |
| 13 | | Mantenimiento de closed en mal estado | 7 días | sáb 1/08/26 | mar 11/08/26 | 65 | $ 3.459.888,00 |
| 14 | | Desmonte de cubierta en mal estado. Incluye entructura de soporte en madera o metalica y retiro a sitio de disposicion autorizado | 15 días | lun 16/03/26 | mié 3/06/26 | 5CC | $ 36.259.778,00 |
| 15 | | Limpieza de zonas verdes exteriores, incluye retiro de material vegetal | 4 días | mar 12/05/26 | vie 15/05/26 | 4CC | $ 14.390.386,00 |
| 16 | | Desmonte de lavamanos. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado | 2 días | lun 16/03/26 | mar 17/03/26 | 12CC | $ 373.200,00 |
| 17 | | Demolición de muro existente. Incluye retiro de material escombro | 6 días | jue 19/03/26 | vie 27/03/26 | 8CC | $ 6.680.474,00 |
| 18 | | Demolición de redoblon existente. Incluye retiro de material escombro | 6 días | lun 16/03/26 | sáb 30/05/26 | 14CC | $ 4.690.208,00 |
| 19 | | Demolición de bordillos existentes. Incluye retiro de escombro | 4 días | mar 2/06/26 | sáb 6/06/26 | 8 | $ 8.107.314,00 |
| 20 | | Desmonte de malla galvanizada. Incluye retiro a sitio de disposicion autorizado | 1 día | mié 3/06/26 | jue 4/06/26 | 5 | $ 569.670,00 |
| 21 | | Demolicion de columna Existente Garita . Incluye retiro de escombro | 4 días | jue 19/03/26 | mié 25/03/26 | 17CC | $ 3.082.868,00 |
| 22 | | Desmonte y traslado planta electrica a sitio autorizado | 2 días | jue 19/03/26 | vie 20/03/26 | 4 | $ 4.883.040,00 |
| 23 | | Excavación en material comun. Incluye retiro de material sobrante | 2 días | mié 6/05/26 | vie 8/05/26 | 172 | $ 403.076,00 |
| 24 | | Excavación manual en material comun para vigas de cimentación. Incluye retiro de material sobrante | 19 días | vie 8/05/26 | lun 22/06/26 | 23 | $ 7.655.833,00 |
| 25 | | Suministro e instalacion de geotextil para separacion de suelos y capas granulares. | 4 días | mar 12/05/26 | vie 15/05/26 | 24CC+2 días | $ 1.131.680,00 |
| 26 | | Relleno en material seleccionado compactado | 5 días | sáb 16/05/26 | sáb 23/05/26 | 25 | $ 3.912.501,00 |
| 27 | | Relleno en material seleccionado TIPO INVIAS compactado | 17 días | jue 19/03/26 | mar 9/06/26 | 8CC | $ 45.562.348,00 |
| 28 | | Reemplazo o mejoramiento del terreno debajo de zapata en piedra rajon, recomendación geotecnista. Incluye compactacion | 2 días | vie 8/05/26 | lun 11/05/26 | 23 | $ 1.029.824,00 |
| 29 | | **ESTRUCTURA EN CONCRETO** | **104,25 días** | **vie 27/03/26** | **mar 11/08/26** | | **$ 727.781.044,00** |

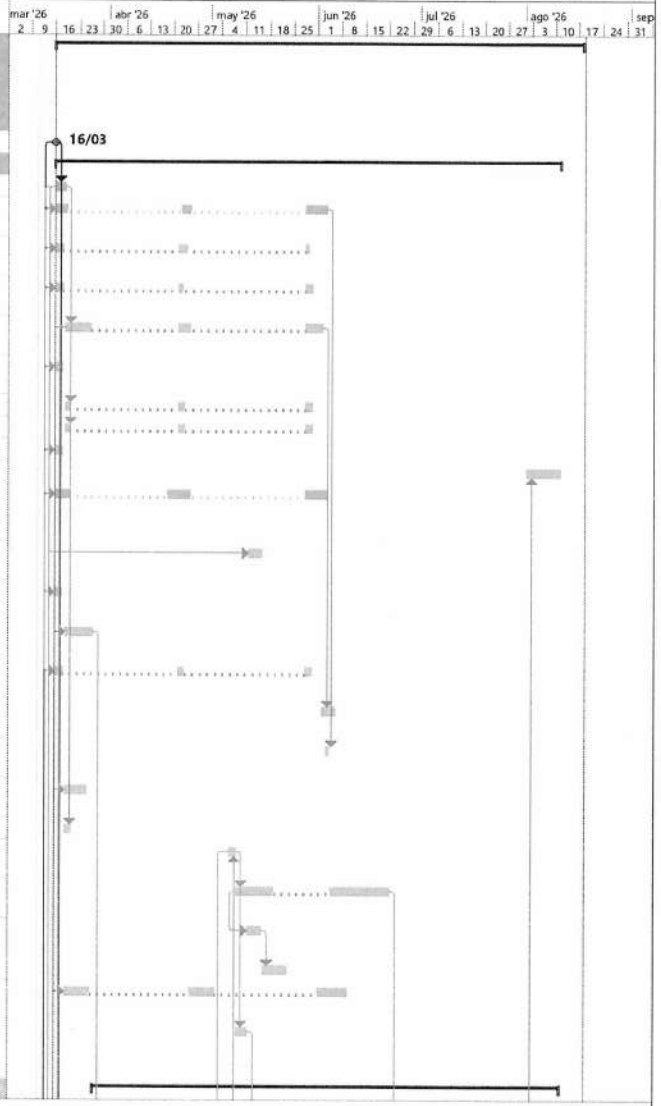


REPROGRAMACION DE OBRA


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual



MARIA ELENA RIVERA HOYOS

588

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | Base en concreto pobre 2200 PSI, solado, espesor 5cm (bajo estructuras en concreto) | 1 día | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 | 28 | $ 764.387,00 |
| 31 | | Concreto de 3000 PSI para zapatas | 5 días | mié 13/05/26 | mié 20/05/26 | 30 | $ 2.454.317,00 |
| 32 | | Viga de Cimentacion en Concreto de 3000 PSI de 0.25m X 0.30m | 5 días | mié 20/05/26 | mar 26/05/26 | 31 | $ 5.970.671,00 |
| 33 | | Viga de cimentacion para andenes en concreto de 3000 PSI de 0.20m x 0.35m. Incluye refuerzo 4 varillas 1/2" y estribos 3/8" @ 15cm | 15 días | lun 22/06/26 | sáb 11/07/26 | 24 | $ 61.939.876,00 |
| 34 | | Columnas de 0.25 mts x 0.25 mts en concreto de 21mpa (3000 psi) | 7 días | sáb 11/07/26 | mar 21/07/26 | 33 | $ 2.759.256,00 |
| 35 | | Viga superior de 0.25 m x 0.30 m en concreto de 3000 PSI | 10 días | mar 21/07/26 | lun 3/08/26 | 34 | $ 5.285.693,00 |
| 36 | | Concreto de 3000 PSI para viga canal e=10 cm. Incluye formaletas | 10 días | mar 21/07/26 | lun 3/08/26 | 35CC | $ 851.147,00 |
| 37 | | Levante de muro en bloque de arena - cemento vibrado de 0.09 m x 0.19m x 0.39m con pega de mortero | 11 días | vie 27/03/26 | mié 17/06/26 | 17 | $ 28.326.879,00 |
| 38 | | Pañete en mortero 1:4 para muros interior y exterior | 5 días | vie 27/03/26 | vie 12/06/26 | 37CC | $ 25.124.001,00 |
| 39 | | Viga Cinta de 12x30 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm | 4 días | jue 18/06/26 | mar 23/06/26 | 37 | $ 4.706.184,00 |
| 40 | | Columneta de confinamiento de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm | 4 días | jue 18/06/26 | mar 23/06/26 | 37 | $ 10.141.185,00 |
| 41 | | Dintel de 10x20 en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 4 varillas 3/8 y estribos 1/4" @ 15cm | 5 días | mar 23/06/26 | mar 30/06/26 | 40 | $ 8.364.011,00 |
| 42 | | Meson en concreto de 3000 psi, ref. 3/8" @ 0.15 mts , incluye granito para placa de 0.08m, muro de apoyo enchapado y apoyo inferior | 5 días | vie 3/07/26 | jue 9/07/26 | 43 | $ 6.872.529,00 |
| 43 | | Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 10cm, incluye malla electrosoldada XX-106 | 30 días | lun 13/04/26 | jue 2/07/26 | 8CC+5 días | $ 238.174.164,00 |
| 44 | | Plantilla en concreto de 3000Psi, espesor: 15cm, incluye malla electrosoldada Malla XX-295, corte de juntas, sello dilatacion | 30 días | lun 13/04/26 | mar 28/07/26 | 27CC | $ 271.453.948,00 |
| 45 | | Rampa de acceso en concreto de 3000 PSI (Plantilla con malla electrosoldada E= 0.15m y vigas 0.15 m x 0.20 m). Refuerzo 4D 3/8" Y estribos 1/4" @ 0.20m. | 10 días | mié 29/07/26 | mar 11/08/26 | 44 | $ 8.443.027,00 |
| 46 | | Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparacion de la superficie de apoyo | 15 días | vie 3/07/26 | mié 22/07/26 | 43 | $ 35.214.515,00 |
| 47 | | Suministro, corte y figuracion de acero de refuerzo Fy=4,2 Mpa | 25 días | mar 12/05/26 | vie 12/06/26 | 30CC | $ 10.935.254,00 |
| 48 | | **PISOS Y ENCHAPES** | **74 días** | **vie 24/04/26** | **mié 29/07/26** | | **$ 222.970.244,00** |
| 49 | | Suministro e instalación de enchape ceramico Duropiso Blanco Cara Única 0.51x0.51. Iincluye mortero de nivelacion de 4cm. | 30 días | vie 24/04/26 | mar 28/07/26 | 43CC+10 días | $ 159.153.255,00 |
| 50 | | Suministro e instalación de guarda escoba con enchape ceramico Duropiso Blanco | 30 días | vie 24/04/26 | mié 29/07/26 | 49CC | $ 36.824.115,00 |
| 51 | | Suministro e instalacion de enchape de piso ceramico fortaleza color blanco para baño 33,8 cm x 33,8 cm | 6 días | vie 24/04/26 | vie 1/05/26 | 49CC | $ 9.384.854,00 |
| 52 | | Suministro e instalacion de enchape ceramica 0.20x0.20 m blanco para pared, H=1.8m | 7 días | vie 1/05/26 | sáb 9/05/26 | 51 | $ 17.608.020,00 |
| 53 | | **CIELO RASO ESTUCO Y PINTURA** | **88,75 días** | **vie 24/04/26** | **mar 18/08/26** | | **$ 191.628.422,00** |
| 54 | | Suministro y aplicación a llana de estuco plastico acrilico tipo interior | 15 días | jue 30/04/26 | lun 27/07/26 | 49CC+5 días | $ 67.716.673,00 |
| 55 | | Suministro y aplicación a llana de estuco plastico acrilico tipo exterior | 7 días | lun 27/07/26 | mar 4/08/26 | 54 | $ 16.757.094,00 |

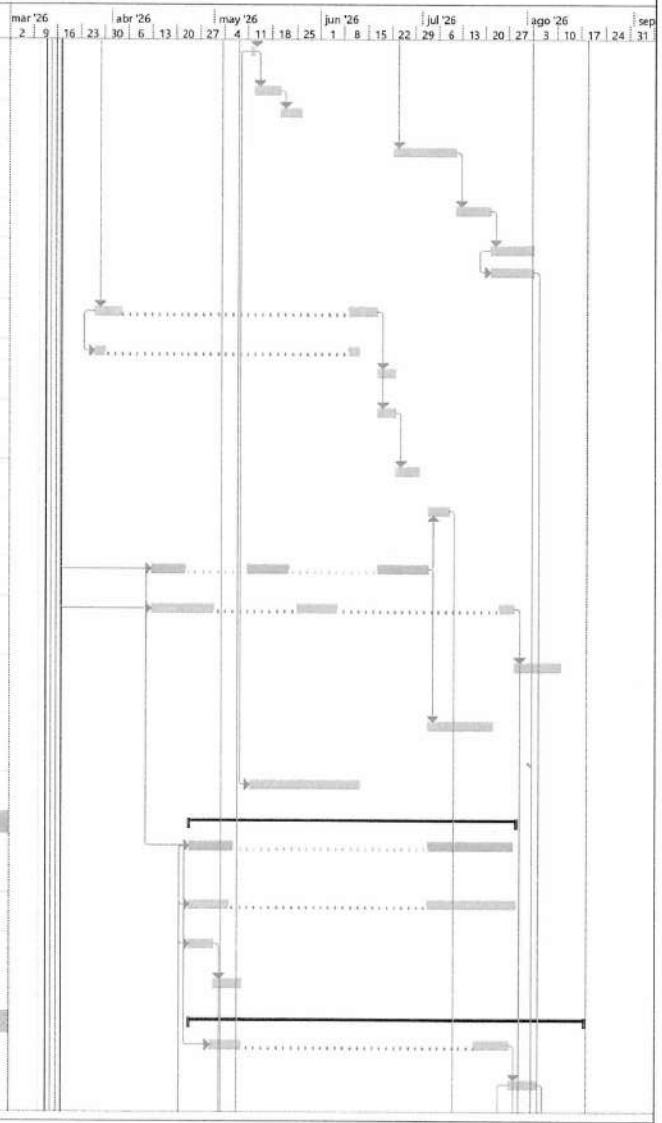


REPROGRAMACION DE OBRA

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual




MARIA ELENA RIVERA HOYOS

584

SI-LP-011-2025

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | | Suministro e instalacion de muro en drywall doble cara E/10cm | 4 días | lun 27/07/26 | vie 31/07/26 | 54 | $ 14.554.490,00 |
| 57 | | Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 interior, tres manos. | 14 días | vie 24/04/26 | mar 18/08/26 | 49CC | $ 58.640.375,00 |
| 58 | | Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 exterior, tres manos. | 4 días | mar 4/08/26 | lun 10/08/26 | 55 | $ 17.097.617,00 |
| 59 | | Suministro y aplicación de pintura epoxica, dos manos. | 3 días | lun 27/07/26 | jue 30/07/26 | 54 | $ 11.094.623,00 |
| 60 | | Suministro e instalación de cielo raso en PVC incluye todos los accesorios para su correcta instalacion | 5 días | sáb 1/08/26 | sáb 8/08/26 | 65 | $ 5.767.550,00 |
| 61 | | **CUBIERTA** | **90,25 días** | **lun 13/04/26** | **jue 6/08/26** | | **$ 414.591.814,00** |
| 62 | | Mortero de Nivelacion de Placa de Cubierta e=2cm | 3 días | lun 3/08/26 | jue 6/08/26 | 36 | $ 4.658.974,00 |
| 63 | | Impermeabilizacion de placas de cubierta con emulsion asfaltica y membrana Asfaltica | 2 días | lun 3/08/26 | mié 5/08/26 | 62CC | $ 13.743.720,00 |
| 64 | | Estructura para cubierta en acero estructural, Pintada con base anticorrosiva, acabado en esmalte y anclajes según diseño | 35 días | lun 13/04/26 | vie 17/07/26 | 14CC+20 días | $ 233.668.605,00 |
| 65 | | Suministro e instalacion de cubierta en lamina termoacustica (incluye todos los accesorios para su correcta instalacion) | 25 días | jue 30/04/26 | sáb 1/08/26 | 64CC+15 días | $ 162.520.515,00 |
| 66 | | **CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA** | **82,5 días** | **lun 20/04/26** | **mar 4/08/26** | | **$ 153.619.706,00** |
| 67 | | Suministro e instalacion de ventana tipo V-2 ( 2,0x1.20). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion. | 15 días | lun 20/04/26 | jue 23/07/26 | 64CC | $ 34.731.220,00 |
| 68 | | Suministro e instalacion de ventana tipo V-3 ( 2.17x1.20). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion. | 15 días | lun 20/04/26 | mié 22/07/26 | 67CC | $ 31.327.136,00 |
| 69 | | Suministro e instalacion de ventana tipo V-4 ( 0.6x0.30). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion. | 2 días | mié 22/07/26 | vie 24/07/26 | 68 | $ 3.188.262,00 |
| 70 | | suministro e instalacion de ventana tipo V-5 ( 1.50x1.20). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion. | 10 días | mié 22/07/26 | mar 4/08/26 | 69CC | $ 5.171.595,00 |
| 71 | | suministro e instalacion de ventana tipo V-7 ( 1,20x1,20). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion. | 5 días | mié 22/07/26 | mar 28/07/26 | 70CC | $ 2.656.077,00 |
| 72 | | suministro e instalacion de ventana tipo V-8 ( 1.20x4.00). incluye carpinteria en aluminio blanco o negro corrediza, vidrio 6mm, con chapa y manija en aluminio y todo lo necesario para su correcta instalacion. | 5 días | mié 22/07/26 | mar 28/07/26 | 71CC | $ 3.266.758,00 |
| 73 | | suministro e instalacion de puertas de 1.0x2.0 en madera prensada color negro. Según diseño | 7 días | mié 22/07/26 | jue 30/07/26 | 72CC | $ 13.169.507,00 |
| 74 | | Suministro e instalación de puerta tipo P2 (1.0X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática | 10 días | mié 22/07/26 | mar 4/08/26 | 73CC | $ 28.512.792,00 |

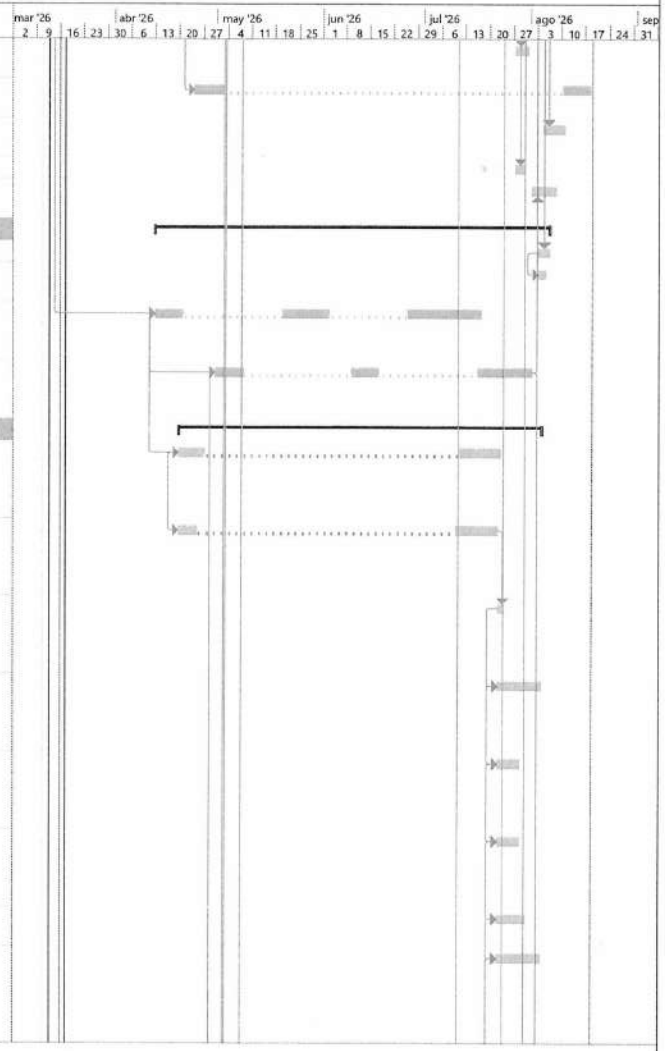


REPROGRAMACION DE OBRA


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual



MARIA ELENA RIVERA HOYOS

590

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | | Suministro e instalación de puerta tipo P2 (1.2X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática | 2 días | mié 22/07/26 | vie 24/07/26 | 74CC | $ 4.520.136,00 |
| 76 | | Suministro e instalación de puerta doble tipo P3 (2.0X2.0); en lámina Cold Rolled calibre 18, entamborada lisa, incluye marco en acero de 15 cm y bisagras, cerradura con chapa de seguridad de pasador, pintada con pintura electroestática | 2 días | mié 22/07/26 | vie 24/07/26 | 75CC | $ 9.467.588,00 |
| 77 | | Suministro e instalacion de puertas en acero inoxidable de 0.90x 1.50 para baños | 3 días | mié 22/07/26 | sáb 25/07/26 | 76CC | $ 5.652.848,00 |
| 78 | | Sumnistro e instalación puerta de salida de residuos ( h 3.0 x l 1.6 ) incluye el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas, diagonales, limpieza y pin | 2 días | mié 22/07/26 | vie 24/07/26 | 77CC | $ 4.079.602,00 |
| 79 | | Sumnistro e instalación puerta de acceso vehicular ( h 3.5 x l 4.0 ) incluye el suministro, transporte e instalación de la puerta, los postes y su fundación, goznes, malla si se requiere, sistema de cierre, ángulos y platinas, diagonales, limpieza y pintu | 2 días | mié 22/07/26 | vie 24/07/26 | 78CC | $ 7.876.185,00 |
| 80 | | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS** | **113,38 días** | **jue 19/03/26** | **vie 14/08/26** | | **$ 235.312.070,00** |
| 81 | | **TUBERIAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE** | **5 días** | **jue 19/03/26** | **jue 26/03/26** | | **$ 10.674.022,00** |
| 82 | | Suministro e instalación tubería de presión 1/2" PVC RDE 13.5, para soldar | 3 días | jue 19/03/26 | mar 24/03/26 | 27CC | $ 59.319,00 |
| 83 | | Suministro e instalación tubería de presión 3/4" PVC, RDE 21, para soldar | 3 días | jue 19/03/26 | mar 24/03/26 | 82CC | $ 311.109,00 |
| 84 | | Suministro e instalación tubería de presión 1" PVC, RDE 21, para soldar | 3 días | jue 19/03/26 | mar 24/03/26 | 83CC | $ 2.628.933,00 |
| 85 | | Suministro e instalación tubería de presión 1-1/4" PVC, RDE 21, para soldar | 3 días | jue 19/03/26 | mar 24/03/26 | 84CC | $ 52.977,00 |
| 86 | | Suministro e instalación tubería de presión 1 1/2" PVC, RDE 21, para soldar | 3 días | jue 19/03/26 | mar 24/03/26 | 85CC | $ 1.812.700,00 |
| 87 | | Suministro e instalación tubería de presión 2" PVC, RDE 21, para soldar | 3 días | jue 19/03/26 | mar 24/03/26 | 86CC | $ 657.828,00 |
| 88 | | Suministro e instalacion de punto hidraulico | 2 días | mar 24/03/26 | jue 26/03/26 | 82 | $ 2.167.080,00 |
| 89 | | Suministro e instalación de micromedidor 1/2' (Referencias aprobadas por el prestador de servicio ) | 2 días | jue 19/03/26 | vie 20/03/26 | 82CC | $ 471.854,00 |
| 90 | | Suministro e instalación Valvula de registro 3/4" , Incluye tapa registro 15x15cm | 1 día | jue 19/03/26 | jue 19/03/26 | 83CC | $ 847.910,00 |
| 91 | | Suministro e instalación Valvula de registro 1" , Incluye tapa registro 15x15cm | 1 día | jue 19/03/26 | jue 19/03/26 | 84CC | $ 1.664.312,00 |
| 92 | | **TUBERIAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA** | **5 días** | **mar 24/03/26** | **lun 30/03/26** | | **$ 30.308.094,00** |
| 93 | | Suministro e instalación tubería sanitaria 2" PVC, para soldar | 2 días | mar 24/03/26 | jue 26/03/26 | 82 | $ 1.336.210,00 |
| 94 | | Suministro e instalación tubería sanitaria 3" PVC, para soldar | 2 días | mar 24/03/26 | jue 26/03/26 | 93CC | $ 453.945,00 |
| 95 | | Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC, para soldar | 3 días | mar 24/03/26 | vie 27/03/26 | 94CC | $ 14.705.655,00 |
| 96 | | Punto sanitario 2" | 2 días | jue 26/03/26 | sáb 28/03/26 | 93 | $ 2.289.536,00 |
| 97 | | Punto sanitario 4" | 2 días | vie 27/03/26 | lun 30/03/26 | 95 | $ 1.268.449,00 |
| 98 | | Construccion de caja de inspeccion 60x60x100 cm | 5 días | mar 24/03/26 | lun 30/03/26 | 93CC | $ 10.254.299,00 |

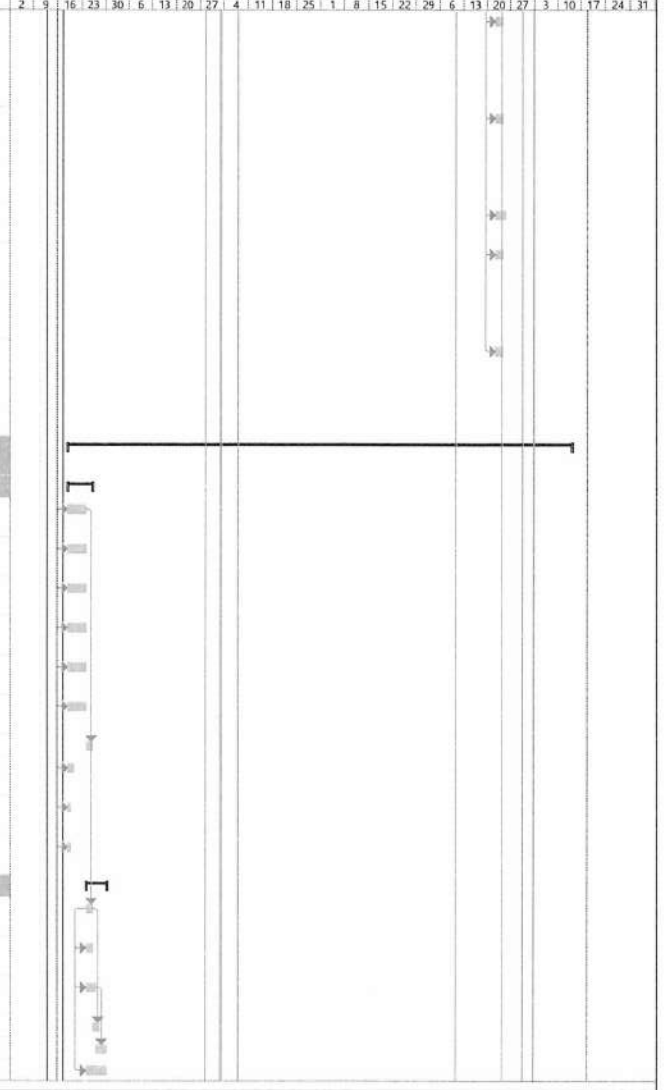


REPROGRAMACION DE OBRA

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso




MARIA ELENA RIVERA HOYOS

591

SI-LP-011-2025

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | | **APARATOS SANITARIOS** | **53,25 días** | **vie 1/05/26** | **vie 10/07/26** | | **$ 36.964.488,00** |
| 100 | | Suministro e instalacion de sanitario institucional color blanco. Incluye accesorios para su correcta | 5 días | vie 1/05/26 | jue 7/05/26 | 51 | $ 10.779.498,00 |
| 101 | | Suministro e instalacion de lavamano de sobreponer color blanco. Incluye abastos desagues y griferia tipo Push | 5 días | jue 7/05/26 | mié 13/05/26 | 100 | $ 15.038.530,00 |
| 102 | | Suministro e instalacion de sanitario tipo fluxometro. Incluye fluxometro y todo lo necesario para su correcta instalacion | 2 días | vie 1/05/26 | lun 4/05/26 | 100CC | $ 5.695.022,00 |
| 103 | | Suministro e instalacion de lavamanos ADA o Similar | 2 días | vie 1/05/26 | lun 4/05/26 | 102CC | $ 2.400.870,00 |
| 104 | | Suministro e instalacion de lavaplatos empotar 150X52cm, en acero inoxidable. Incluye griferia | 1 día | jue 9/07/26 | vie 10/07/26 | 42 | $ 1.730.676,00 |
| 105 | | Suministro e instalacion de rejilla metalica de piso 2" para desague | 1 día | vie 1/05/26 | sáb 2/05/26 | 51 | $ 1.319.892,00 |
| 106 | | **AGUAS LLUVIAS** | **76,38 días** | **mié 6/05/26** | **vie 14/08/26** | | **$ 157.365.466,00** |
| 107 | | Excavación en material comun. Incluye retiro de material sobrante | 8 días | mié 6/05/26 | vie 15/05/26 | 23CC | $ 2.868.111,00 |
| 108 | | Relleno en material seleccionado compactado | 3 días | sáb 16/05/26 | jue 21/05/26 | 107 | $ 2.493.354,00 |
| 109 | | Suministro e instalacion de Arena de rio E=5cm para cama de tuberia enterrada y registro aguas Lluvias | 2 días | sáb 16/05/26 | mié 20/05/26 | 107 | $ 726.967,00 |
| 110 | | Suministro e instalacion de tuberia 6" PVC corrugado para aguas lluvias. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalacion | 4 días | mié 20/05/26 | lun 25/05/26 | 109 | $ 4.325.181,00 |
| 111 | | Su inistro e instalacion de tuberia 8" PVC Corrugado para aguas lluvias. Incluye accesorios necesarios para su correcta instalacion | 4 días | mié 20/05/26 | lun 25/05/26 | 109 | $ 11.735.183,00 |
| 112 | | Carcamo en concreto de 3000 PSI. Incluye B=0.20m. Incluye tapa en concreto prefabricado | 10 días | sáb 16/05/26 | vie 29/05/26 | 107 | $ 6.976.331,00 |
| 113 | | Cajas de registro para drenaje de aguas lluvias del patio principal en concreto de 21MPA, dimensiones 0.60x0.60x0.10 y acero de refuerzo de 3/8" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con rejilla en angulo 1 1/2" x 1/8" | 5 días | sáb 16/05/26 | sáb 23/05/26 | 107 | $ 3.406.908,00 |
| 114 | | Caja de registro principal para captacion de aguas lluvias en concreto de 21MPA, dimensiones 2.5x2.5x2.6 y acero de refuerzo de 1/2" @ 0.20 E.A.S. Incluye tapa de concreto con refuerzo 1/2" @ 0.20 E.A.S con tapa matalica. | 30 días | sáb 16/05/26 | jue 25/06/26 | 113CC | $ 23.998.408,00 |
| 115 | | Caja de registro principal para llaves de concrol en concreto de 21MPA, dimensiones 1.5x1.65x1.10 y acero de refuerzo de 1/2" @ 0.20 E.A.S. incluye tapa de concreto con refuerzo 1/2" @ 0.20 E.A.S con tapa matalica. | 30 días | sáb 16/05/26 | jue 25/06/26 | 114CC | $ 14.875.137,00 |
| 116 | | Suministro e instalacion de canaletas de aguas lluvias según diseño en lamina galvanizada calibre 20, incluye pintura anticorrosiva y accesorios para el buen funcionamiento | 10 días | sáb 1/08/26 | vie 14/08/26 | 65 | $ 28.098.994,00 |
| 117 | | Suministro e instalacion de equipo de bombeo sumergible, Q=48L/S HDT=4.69m.c.a, en acero inoxidable, acoplada a motor sumergible monofasico 7.5 HP de 220 Volt. Incluye obra electrica ,niples, acoples, valvulas, pasamuro para su correcta | 7 días | jue 25/06/26 | sáb 4/07/26 | 115;114 | $ 57.860.892,00 |
| 118 | | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | **80,75 días** | **lun 4/05/26** | **mar 18/08/26** | | **$ 303.752.567,00** |
| 119 | | **ACOMETIDAS, GABINETES Y TABLEROS** | **72,25 días** | **mié 6/05/26** | **lun 10/08/26** | | **$ 50.935.538,00** |

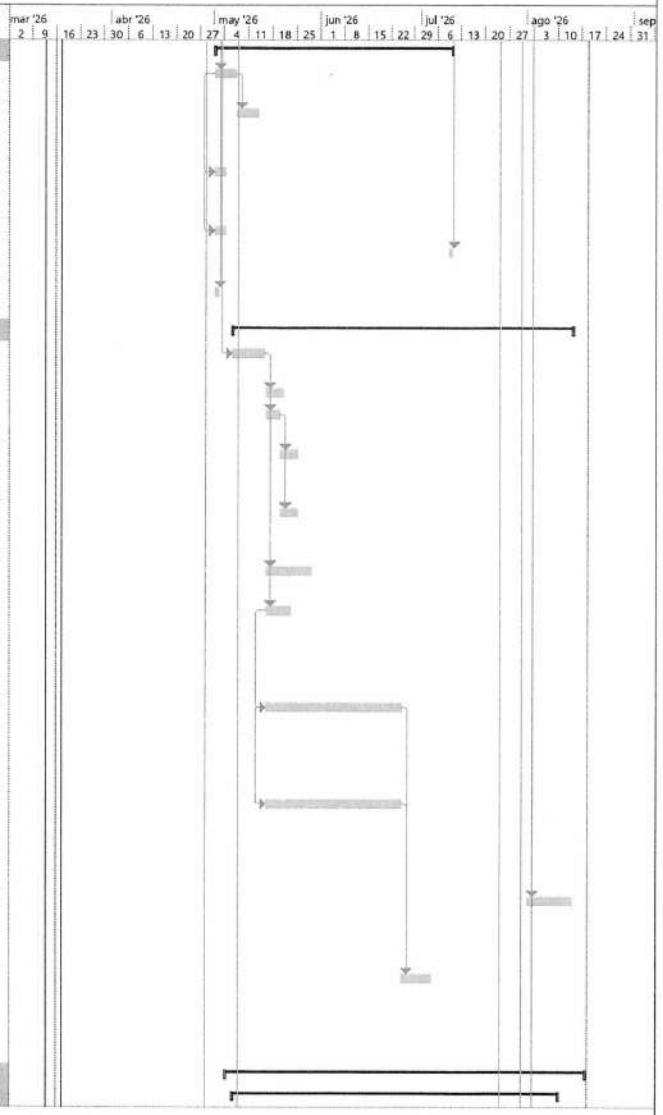


REPROGRAMACION DE OBRA


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual



MARIA ELENA RIVERA HOYOS

592

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | | Suministro e instalacion de acometida Trifasica subterranea calbre 3X6F+1X6N+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4 " PVC. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia pvc 1 1/4, obra civil y demas accesorio | 12 días | mié 6/05/26 | lun 10/08/26 | 65CC+5 días | $ 10.549.452,00 |
| 121 | | Suministro e instalacion de acometida Trifasica subterranea calbre 3X8F+1#8N+1#10T cobre aislado DUCTO 1 " PVC. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia pvc 1 , obra civil y demas accesorios y | 5 días | mié 6/05/26 | mar 4/08/26 | 120CC | $ 11.148.020,00 |
| 122 | | Suministro e instalacion de acometida Trifasica calbre 3X8F+1#8N+1#10T cobre aislado DUCTO 1 " EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia EMT 1, obra civil y demas accesorios y | 5 días | mié 6/05/26 | mar 4/08/26 | 121CC | $ 7.211.016,00 |
| 123 | | Suministro e instalacion de acometida Trifasica calbre 3X6F+1X6N+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4 " EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia EMT 1 1/4, obra civil y demas accesorios y | 5 días | mié 6/05/26 | mar 4/08/26 | 122CC | $ 8.278.865,00 |
| 124 | | Suministro e instalacion de acometida Trifasica calbre 3X4F+1X8T cobre aislado DUCTO 1 1/4 " EMT. Incluye conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, uniones, tornillo, tuberia EMT 1 1/4, obra civil y demas accesorios y elementos par | 5 días | mié 6/05/26 | mar 4/08/26 | 123CC | $ 13.748.185,00 |
| 125 | | **TABLEROS DE DISTRIBUCION DE CIRCUITOS, CAJAS DE REGISTRO** | **12 días** | **mié 6/05/26** | **vie 22/05/26** | | **$ 35.149.482,00** |
| 126 | | Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de 30 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento | 5 días | vie 15/05/26 | vie 22/05/26 | 120CC+7 días | $ 7.184.427,00 |
| 127 | | suministro e instalacion de tablero trifasico de 18 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento | 5 días | vie 15/05/26 | vie 22/05/26 | 126CC | $ 1.714.888,00 |
| 128 | | suministro e instalacion de tablero trifasico de 12 circuitos. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento | 3 días | vie 15/05/26 | mié 20/05/26 | 127CC | $ 3.091.584,00 |
| 129 | | Suministro e instalacion de Breaker Enchufable 1X20A. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | 2 días | vie 15/05/26 | mar 19/05/26 | 128CC | $ 6.933.492,00 |
| 130 | | Suministro e instalacion de Breaker Enchufable 2X20A. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento. | 2 días | vie 15/05/26 | mar 19/05/26 | 129CC | $ 898.008,00 |
| 131 | | suministro e instalacion de cajas de registro en mamposteria de 0,60x0,60x0,80M NORMA RETIE | 7 días | mié 6/05/26 | jue 14/05/26 | 120CC | $ 6.320.448,00 |
| 132 | | Suministro, transporte e instalacion de sistema puesta a tierra (Malla Electrica en B.T) en cable 2/0 AWG, con cuatro varillas 5/8" de cobre de 2.4 metros y cuadriculas. Incluye 6 colas, soldadura exotermica, | 2 días | mié 6/05/26 | vie 8/05/26 | 120CC | $ 9.006.635,00 |
| 133 | | **SALIDA DE LUCES Y TOMA CORRIENTES** | **76 días** | **lun 4/05/26** | **mié 12/08/26** | | **$ 156.545.879,00** |
| 134 | | Suministro e instalacion de salida para luminaria 110V normal con toma doble con polo a tierra 15A ref 5320 blanco, 125v y según norma nema 5 - 15R, certificacion retie y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 metalica, conectores | 15 días | lun 4/05/26 | jue 6/08/26 | 65CC+3 días | $ 88.705.300,00 |

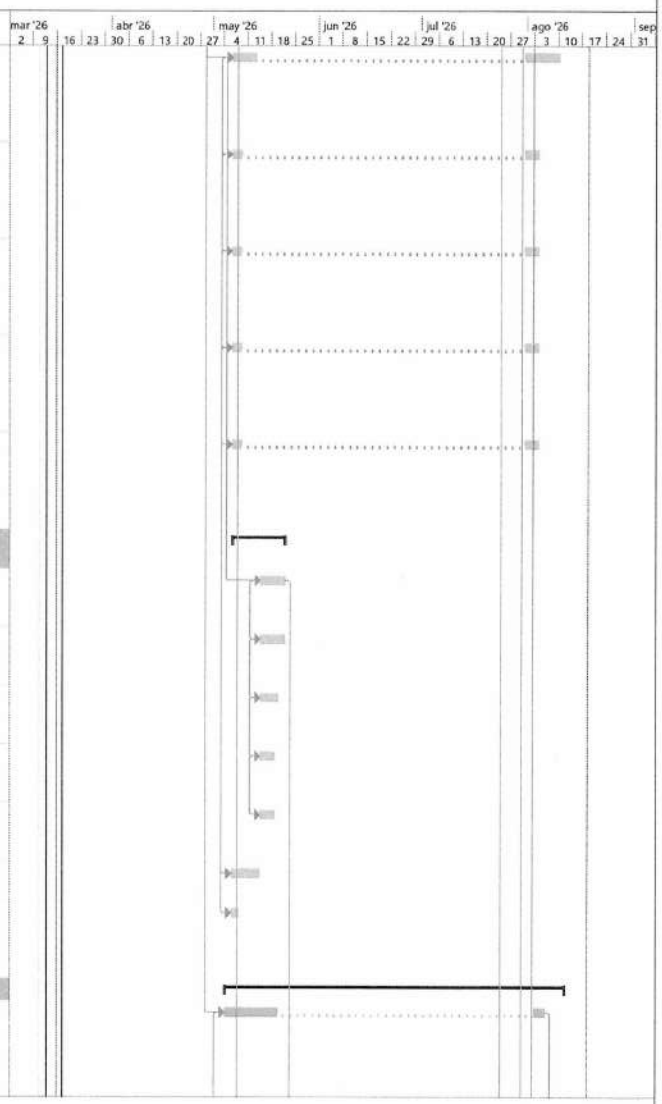


REPROGRAMACION DE OBRA


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual



MARIA ELENA RIVERA HOYOS

573

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | | Suministro e instalacion de materiales para salida electrica 110v normal con toma doble con polo a tierra 15A, ref 5320 blanco, 125v y según la norma nema 5-15R, certificacion retie y pruebas de conformidad ul. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 | 15 días | lun 4/05/26 | mar 11/08/26 | 134CC | $ 42.430.161,00 |
| 136 | | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica 220v con toma mirada china con protección de falla a tierra, 30a, leviton, blanco, 220v y certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica | 5 días | lun 4/05/26 | sáb 9/05/26 | 135CC | $ 1.916.988,00 |
| 137 | | Suministro e instalacion de materiales para salida electrica 110v normal con toma doble GFCI con polo a tierra 15A, ref 5320 blanco, 125v y según la norma nema 5-15R, certificacion retie y pruebas de conformidad ul. Incluye toma, la tapa, cajas 4x2 | 2 días | lun 4/05/26 | mié 6/05/26 | 136CC | $ 742.241,00 |
| 138 | | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de swiche sencillo y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de conexión y empalme, adaptadores | 7 días | lun 4/05/26 | mar 12/05/26 | 137CC | $ 3.995.551,00 |
| 139 | | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de swiche doble y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de conexión y empalme, adaptadores | 12 días | lun 4/05/26 | mié 12/08/26 | 138CC | $ 15.730.983,00 |
| 140 | | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida de swiche triple y según la norma nema 5-15r, certificación retie y pruebas de conformidad ul. incluye toma, la tapa, cajas 4"x2" metalica, conectores de conexión y empalme, adaptadores | 5 días | lun 4/05/26 | sáb 9/05/26 | 139CC | $ 3.024.655,00 |
| 141 | | **LUMINARIAS** | **80,75 días** | **lun 4/05/26** | **mar 18/08/26** | | **$ 61.121.668,00** |
| 142 | | Suministro e instalacion de luminaria led tipo panel 60x60 40w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento | 6 días | lun 4/05/26 | mar 18/08/26 | 134CC | $ 44.893.839,00 |
| 143 | | Suministro e instalacion luminaria hermetica tipo led de 2x18w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento | 3 días | jue 6/08/26 | mar 11/08/26 | 134 | $ 7.128.672,00 |
| 144 | | Suministro e instalacion luminaria tipo panel circular led 12 w. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento | 3 días | jue 6/08/26 | mar 11/08/26 | 134 | $ 8.597.232,00 |
| 145 | | Suministro e instalacion luminaria de emergencia tipo led 10W. Incluye accesorios y elementos para su correcta instalacion y funcionamiento | 1 día | jue 6/08/26 | sáb 8/08/26 | 134 | $ 501.925,00 |
| 146 | | **LIMPIEZA GENERAL** | **2 días** | **vie 14/08/26** | **lun 17/08/26** | | **$ 9.039.009,00** |
| 147 | | Limpieza general | 2 días | vie 14/08/26 | lun 17/08/26 | 168 | $ 9.039.009,00 |
| 148 | | **EMPRADIZACIÓN Y ZONAS VERDES** | **4 días** | **mar 11/08/26** | **sáb 15/08/26** | | **$ 29.527.293,00** |
| 149 | | suministro e instalacion de grama verde natural | 4 días | mar 11/08/26 | sáb 15/08/26 | 156 | $ 23.098.849,00 |
| 150 | | suministro y plantacion de arboles H=1.5m | 2 días | mar 11/08/26 | jue 13/08/26 | 149CC | $ 1.510.784,00 |
| 151 | | suministro y plantacion de plantas para jardineria Nephrolepis cordifolia | 3 días | mar 11/08/26 | vie 14/08/26 | 150CC | $ 2.497.140,00 |
| 152 | | suministro y plantacion de croto rojo | 3 días | mar 11/08/26 | vie 14/08/26 | 151CC | $ 2.420.520,00 |
| 153 | | **FACHADA** | **15 días** | **lun 27/07/26** | **vie 14/08/26** | | **$ 61.347.364,00** |
| 154 | | Suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 exterior, tres manos. | 5 días | lun 10/08/26 | vie 14/08/26 | 155 | $ 16.163.613,00 |

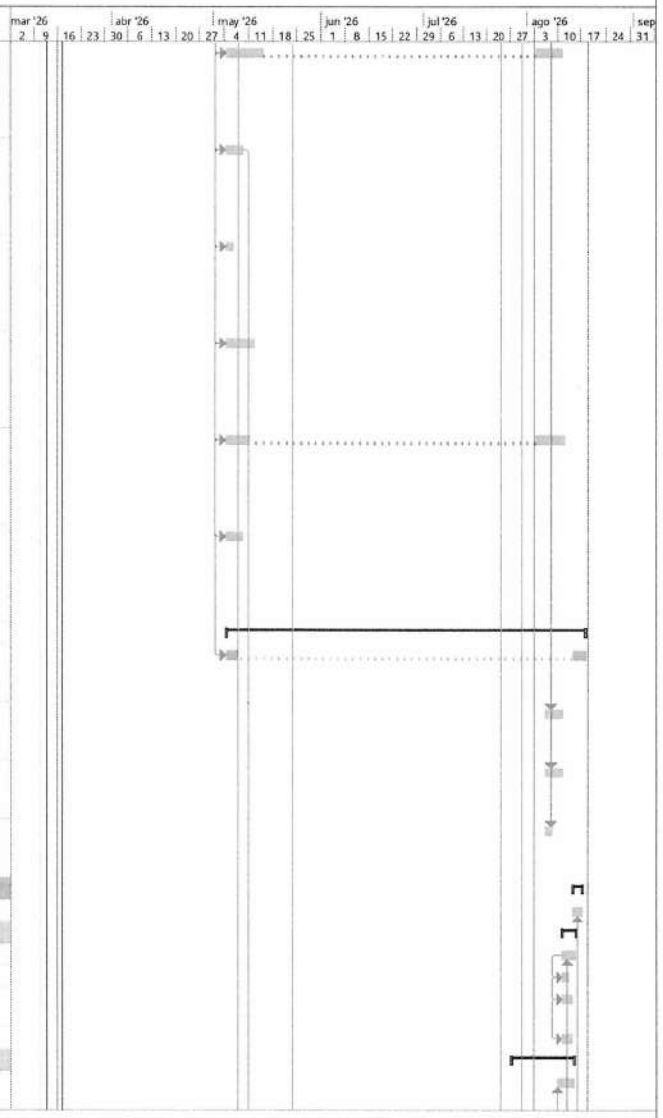


REPROGRAMACION DE OBRA


Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso



MARIA ELENA RIVERA HOYOS

SI-LP-011-2025

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | | Suministro y aplicación a llana de estuco plastico acrilico tipo exterior | 10 días | lun 27/07/26 | sáb 8/08/26 | 55CC | $ 15.841.692,00 |
| 156 | | Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 0.20x0.50x0.80m. Incluye preparacion de la superficie de apoyo | 10 días | mié 29/07/26 | mar 11/08/26 | 44 | $ 29.342.059,00 |
| 157 | | **DOTACION** | **73,38 días** | **lun 11/05/26** | **vie 14/08/26** | | **$ 29.690.583,00** |
| 158 | | **VENTILACION MECANICA** | **5 días** | **lun 11/05/26** | **vie 15/05/26** | | **$ 21.066.386,00** |
| 159 | | Suministro e instalacion de Aire tipo mini split de 12,000BTU, Inlcuye tuberia de cobre y todos los accesorios para su correcta instalacion | 5 días | lun 11/05/26 | vie 15/05/26 | 136 | $ 5.080.648,00 |
| 160 | | Suministro e instalacion de Aire tipo mini split de 18,000BTU, Inlcuye tuberia de cobre y todos los accesorios para su correcta instalacion | 5 días | lun 11/05/26 | vie 15/05/26 | 159CC | $ 5.804.169,00 |
| 161 | | Suministro e instalacion de Aire tipo mini split de 24,000BTU, Inlcuye tuberia de cobre y todos los accesorios para su correcta instalacion | 5 días | lun 11/05/26 | vie 15/05/26 | 160CC | $ 6.123.369,00 |
| 162 | | Suministro e instalacion de Extractor para baño de 34.6x34.6x11.6cm, incluye todos los accesorios para su correcta instalacion. | 1 día | lun 11/05/26 | lun 11/05/26 | 161CC | $ 4.058.200,00 |
| 163 | | **MOBILIARIO** | **10 días** | **sáb 1/08/26** | **vie 14/08/26** | | **$ 8.624.197,00** |
| 164 | | suministro e instalacion de mueble superior para cocina de 0.40x1.20 | 2 días | sáb 1/08/26 | mar 4/08/26 | 65 | $ 1.623.176,00 |
| 165 | | suministro e instalacion de silla fija interlocutora de pan | 3 días | sáb 1/08/26 | mié 5/08/26 | 164CC | $ 1.865.770,00 |
| 166 | | suministro e instalacion mesa principal para auditorio y sala de crisis | 1 día | sáb 1/08/26 | lun 3/08/26 | 165CC | $ 2.244.236,00 |
| 167 | | S/I señalización institucional de 0.30m x 0.20m, en impresión digital plastificado sobre polietileno calibre 60, en alta resolución, incluye cinta doble faz para instalación, y sistemas de fijación en muro (tornillo y chazo en caso de ser necesario). | 1 día | mié 12/08/26 | jue 13/08/26 | 165FC+5 días | $ 745.756,00 |
| 168 | | S/I aviso institucional de 2m x 0.70m con instalación. caja de luz en coll rolled con anticorrosivo, iluminación interior, tubos t8 con regleta y fotocelda para encendido y apagado autom., impr. digital en panaflex a doble pasada a 1440 dpi de resol., | 2 días | mié 12/08/26 | vie 14/08/26 | 167CC | $ 2.145.259,00 |
| 169 | | Componente PGIO | 118 días | lun 16/03/26 | lun 17/08/26 | 2 | $ 40.426.683,00 |
| 170 | | Retie Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas de Obras Proyectadas | 15 días | vie 22/05/26 | mié 10/06/26 | 126 | $ 8.500.000,00 |
| 171 | | Tramite y Compensacion Ambiental | 30 días | lun 16/03/26 | vie 24/04/26 | 172CC | $ 3.500.000,00 |
| 172 | | Tramite de Licencia de Construccion | 40 días | lun 16/03/26 | mié 6/05/26 | 2CC | $ 2.517.502,00 |
| 173 | | FIN | 0 días | mar 18/08/26 | mar 18/08/26 | | $ 0,00 |

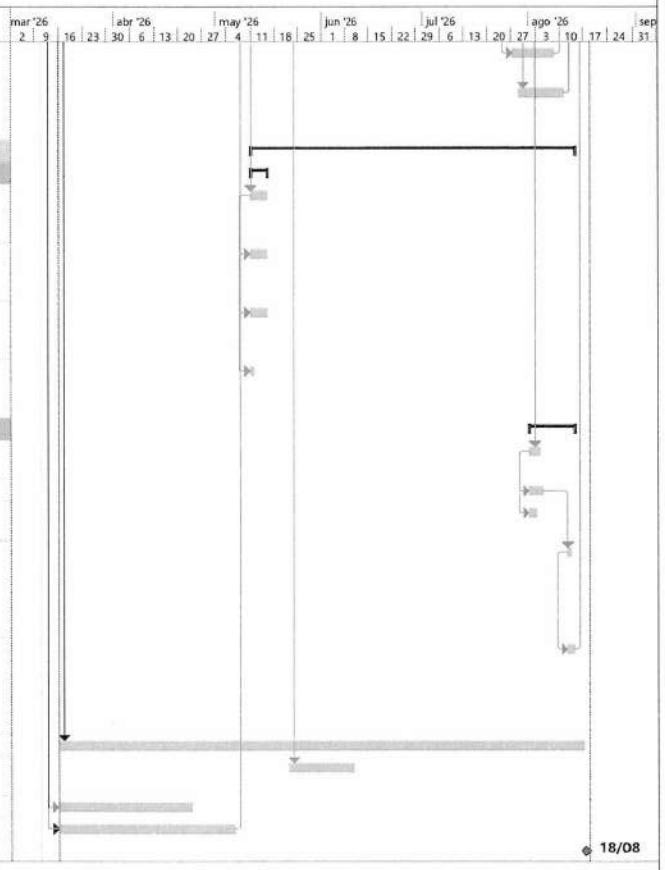


REPROGRAMACION DE OBRA

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual



MARIA ELENA RIVERA HOYOS

# ANEXO N° 3.

# LISTADO DE PERSONAL

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-003 |
|---|---|---|---|
| | LISTADO DE PERSONAL | VERSIÓN: | 003 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO Nº | SILP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

| RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN: | MARIA INES GONZALEZ AYUZ | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 7/05/2026 |
|---|---|---|---|

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | CARGO | TIPO DE VINCULACIÓN | FECHA DE INGRESO | ARL | FECHA DE EGRESO | ¿REALIZARA TRABAJOS EN ALTURAS? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN ANA GARCES NEGRETE | 26.176.869 | INGENIERA RESIDENTE | DEPENDIENTE | 23/04/2026 | SURA | | |
| 2 | JESUS ORLANDO SANDOVAL ARGINIEGAS | 93.125.772 | DIRECTOR DE OBRA | DEPENDIENTE | 23/04/2026 | SURA | | |
| 3 | IPATIA ROVIRA VILLALOBOS MOLINA | 50.905.356 | AUXILIAR SST | DEPENDIENTE | 23/04/2026 | SURA | | |
| 4 | MARIA INES GONZALEZ AYUZ | 1.067.836.657 | INGENIERA ESP. SG-SST | DEPENDIENTE | 23/04/2026 | SURA | | |
| 5 | DANIEL JOSE CORRALES PATERNINA | 78.748.166 | INGENIERO ELECTRICO | DEPENDIENTE | 23/04/2026 | SURA | | |
| | FREDYS ENRIQUE TIRADO ARCIRIA | | | | | | | |
| 1 | RICHARD DE JESUS RAMOS MARTINEZ | 11.154.364 | AYUDANTE DE OBRA | DEPENDIENTE | 23/04/2026 | SURA | | |
| 2 | ARGLIN ANTONIO CARVAJAL RODRIGUEZ | 11.004.806 | MAESTRO DE OBRA | DEPENDIENTE | 23/04/2026 | SURA | | |
| 3 | MARIO ANTONIO VERTEL CAUSIL | 6.885.013 | OFICIAL DE OBRA | DEPENDIENTE | 23/04/2026 | SURA | | |
| 4 | ARLEN JOSE ALVAREZ BELLO | 78.694.369 | OFICIAL DE OBRA | DEPENDIENTE | 23/04/2026 | SURA | | |
| 5 | LUIS DAVID RUIZ MUÑOZ | 1.192.812.500 | AYUDANTE DE OBRA | DEPENDIENTE | 23/04/2026 | SURA | | |
| 6 | MARIO RUIZ | 1.062.954.579 | AYUDANTE DE OBRA | DEPENDIENTE | 23/04/2026 | SURA | 28/04/2026 | |
| 7 | HUGO ANTONIO VEGA MONTIEL | 6.880.670 | AYUDANTE DE OBRA | DEPENDIENTE | 23/04/2026 | SURA | | |
| 8 | RODRIGO SEGUNDO SOLORZANO GUZMAN | 78.714.110 | OFICIAL DE OBRA | DEPENDIENTE | 23/04/2026 | SURA | | |
| 9 | ANGEL MARIA RIVERA RAMIREZ | 6.991.951 | MAESTRO DE OBRA | DEPENDIENTE | 27/04/2026 | SURA | | |
| 10 | MANUEL FRANCISCO PEREZ SALGADO | 15.275.012 | AYUDANTE DE OBRA | DEPENDIENTE | 27/04/2026 | SURA | | |
| 11 | BERNABE GUTIERREZ TEHERAN | 9.104.691 | AYUDANTE DE OBRA | DEPENDIENTE | 27/04/2026 | SURA | | |
| 12 | LUIS ALFREDO HURTADO | 6.857.205 | OFICIAL DE OBRA | DEPENDIENTE | 27/04/2026 | SURA | | |
| 13 | FREDYS ENRIQUE TIRADO ARCIRIA | 10.782.216 | MAESTRO DE OBRA | DEPENDIENTE | 27/04/2026 | SURA | | |
| 14 | DELFER YESITH GOMEZ | 1.062.954.583 | AYUDANTE DE OBRA | DEPENDIENTE | 27/04/2026 | SURA | | |

# ANEXO N° 4.

# DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

| | |
|---|---|
| **Rol:** | Responsable del SG-SST |
| **Nombre de quien se designa:** | María Inés González Ayuz |

**RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES**

- Diseñar, revisar y mantener actualizado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Dirigir la Planeación, organización, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación.
- Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
- Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
- Asesorar a la Alta Dirección para la formulación de normas, procedimientos administrativos, objetivos y en la solución de problemas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Asesorar a la Alta dirección en la evaluación de los impactos sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos y externos y proponer medidas de prevención y control antes de su implementación.
- Realizar la evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con respecto a los requisitos establecidos por el ministerio del trabajo.
- Elaborar, revisar y mantener actualizada la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, promoviendo la participación y compromiso de todos los niveles de la organización y socializar los cambios a la alta dirección, el COPASST y todo el personal.
- Elaborar, revisar y actualizar el Plan de Trabajo Anual de seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta la evaluación inicial, los controles establecidos en la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos, el cumplimiento de los requisitos legales en materia de riesgos laborales, así como otros registros e información que considere pertinente derivada de la implementación del SG-SST, y verificar su ejecución y cumplimiento.
- Definir y requerir los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
- Establecer las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del SG-SST por parte de la empresa.
- Supervisar durante el desarrollo de actividades contratadas, el cumplimiento de la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los trabajadores cooperados, en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.
- Definir indicadores mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST, y hacer seguimiento a los mismos.
- Identificar las necesidades de formación en seguridad y salud en el trabajo y establecer el Programa de Inducción y capacitaciones.
- Asegurar que se realice la inducción a los trabajadores que ingresan por primera vez en temas asociados a la Seguridad y Salud en el Trabajo, y reinducción de acuerdo a lo establecido en el Programa de Inducción y capacitaciones.
- Interpretar leyes, directivas y ordenanzas de las entidades oficiales relacionadas con Seguridad y Salud en el trabajo, mantener actualizada la matriz de requisitos legales y verificar su cumplimiento.
- Establecer campañas de motivación y divulgación de normas y conocimientos técnicos tendientes a mantener un interés activo por la Seguridad y salud en el trabajo en todo el personal.

- Participar activamente de las actividades y las reuniones donde se traten temas de Seguridad y salud en el trabajo.
- Investigar problemas especiales de Seguridad y salud en el trabajo, así como participar de los equipos de investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Supervisar el cumplimiento de las políticas de SST por todos los miembros del proyecto e informar a la Alta Dirección sobre las actividades y situaciones de Seguridad y Salud en el trabajo presentadas durante la ejecución del proyecto
- Verificar y asegurar que todo el personal en obra se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social.
- Desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores, mediante la coordinación de la realización de las evaluaciones medicas laborales, y programas de vigilancia epidemiológica, con el apoyo de los profesionales de la salud con Licencia en Salud ocupacional pertinentes y la ARL, con el propósito de identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control.
- Promover que el personal cuente con el conocimiento acerca de los riesgos a los que se encuentra expuesto y tenga conciencia y cultura de autocuidado.
- Promover que se cuente con las condiciones de trabajos seguras para los trabajadores en obra.
- Recolectar la información de seguridad y salud en el trabajo necesaria para la elaboración de informes, y cálculo y análisis de indicadores del SG-SST.
- Revisar y hacer seguimiento a las estadísticas de accidentalidad y enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral.
- Llevar el control de los documentos y registros que evidencian la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Establecer los mecanismos de comunicación interna y externa relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
- Mantener informado a la alta Dirección, de las actividades y situaciones de Seguridad y Salud en el trabajo presentadas durante la ejecución del proyecto, que puedan dar lugar a cambios en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo del Sistema Integral de Gestión.
- Informar al director o residente de obra las condiciones de trabajo inseguras que requieran de medidas de intervención para su mejora, y si es necesario requerir que no se continúe con las actividades.
- Rendir cuentas internamente en relación con su desempeño, acorde a las responsabilidades asignadas en materia de SST.
- Establecer el alcance del programa de auditoría de acuerdo con los objetivos pertinentes y cualquier restricción conocida.
- Determinar las cuestiones externas e internas, y los riesgos y oportunidades que pueden afectar al programa de auditoría, e implementar acciones para tratarlos, integrando estas acciones en todas las actividades de auditoría pertinentes, según sea apropiado.
- Establecer todos los procesos pertinentes para la gestión del programa de auditoría, con la participación del COPASST y aprobación de la Alta dirección.
- Asegurar la selección de los equipos auditores y la competencia general para las actividades de auditoría, asignando roles, responsabilidades, autoridades, y respaldando el liderazgo, según sea apropiado.
- Determinar y asegurar la provisión de los recursos necesarios para la realización de Programa de auditorías Internas.
- Asegurarse de que se prepara y mantiene la información documentada apropiada, incluyendo los registros del programa de auditoría.
- Hacer seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditoría.
- Comunicar el programa de auditoría al cliente de la auditoría y, según sea apropiado, a las partes interesadas pertinentes.

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO | ACTA DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES | Código: FOR-030 |
| | | Versión: 001 |
| | | Página 3 de 3 |

- Liderar el establecimiento acciones correctivas, preventivas y para la mejora en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Recibir visitas y auditorías externas de entes de control en Seguridad y Salud en el Trabajo, recibir informes de hallazgos y coordinar la gestión de los planes de mejoramiento.

Yo, María Ines González Ayuz identificado con C.C. 1.067.836.657 acepto las responsabilidades y autoridades establecidas en este documento, independientemente de las responsabilidades y autoridades asociadas a mi cargo, y me comprometo a darles cumplimiento.

Lo anterior se firma a los 23 días del mes abril del año 2026.

**Designa:**

María Elena Rivera Hoyos.

**Nombre:** María Elena Rivera Hoyos
**Cargo:** Representante Legal

**Acepta:**

María Inés González Ayuz

**Nombre:** María Inés González Ayuz
**Cargo:** Responsable del SG-SST

602

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO | ACTA DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES | Código: FOR-030 |
| | | Versión: 001 |
| | | Página 1 de 2 |

| | |
|---|---|
| **Rol:** | Auxiliar SST |
| **Nombre de quien se designa:** | Ipatia Rovira Villalobos Molina |

**RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES**

- Verificar que todo el personal en obra se encuentre afiliado y se dé la correcta promoción y prevención de la salud de los trabajadores.
  - Verificar el personal que se encuentra trabajando en cada frente e identificar personal nuevo y estado de afiliación a ARL, EPS y AFP.
  - Identificar y registrar las novedades de ingreso, retiro, suspensión y reingreso de cada uno de los trabajadores.
  - Llevar el control de ausentismo de los trabajadores, teniendo en cuenta las causalidades de ausentismo.
- Verificar que los trabajadores cuenten con la aptitud ocupacional para realizar la labor, así como la idoneidad según las labores que lo requieran.
  - Cuando ingrese personal nuevo, se debe solicitar a la trabajadora social el certificado de aptitud médica de ingreso del trabajador (Con énfasis en altura o énfasis osteomuscular según aplique) y los certificados de formación que sean requeridos de acuerdo a las labores a realizar como es el certificado de los cursos de altura para los trabajadores que realizarán trabajos en alturas.
  - Cuando se identifique que se retira un trabajador, se debe solicitar la remisión o realización de exámenes médicos de egreso a la trabajadora social.
- Asegurar que todo el personal cuente con el conocimiento acerca de los riesgos a los que se encuentra expuesto y tenga conciencia y cultura de autocuidado.
  - Realizar inducción o reinducción según el caso al personal en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  - Realizar encuesta de perfil sociodemográfico.
  - Realizar notificación de riesgos.
  - Realizar capacitaciones de seguridad a todo el personal que se encuentra en obra.
  - Coordinar la realización de las pausas activas saludables.
- Asegurar que se cuente con las condiciones de trabajos seguras para los trabajadores en obra.
  - Realizar análisis de trabajo seguro a las actividades que lo requieran.
  - Generar permisos de trabajo para tareas de alto riesgo (trabajo en alturas, trabajos eléctricos, trabajos en caliente – Corte y soldadura, espacios confinados, etc.)
  - Identificar la necesidad del uso de elementos de protección personal por parte de los trabajadores teniendo en cuenta la tarea a realizar y la matriz de elementos de protección personal. En caso de que no se cuente con los EPP necesarios, realizar la solicitud de compra de estos al responsable de las compras con copia a la oficina de PGIO.
  - Realizar la entrega de los EPP y dotación al personal y dejar registro de dicha entrega.
  - Realizar inspecciones de seguridad.
  - Realizar inspecciones de trabajo seguro.
  - Verificar que se encuentre en obra el kit de emergencias (Camillas rígida, extintores, botiquín, etc.) en las cantidades y ubicación que sea necesaria para asegurar la atención de una emergencia.
  - Identificar la necesidad de cambio o recarga del extintor.
  - Llevar control de las salidas de elementos del botiquín y la reposición de los mismos solicitando al responsable de las compras.
  - Verificar el adecuado almacenamiento y manejo de sustancias químicas.

- Verificar que los equipos, herramientas y maquinas se encuentren en buen estado de funcionamiento, y mantener actualizado el listado de máquinas y el listado de herramientas y equipos.
- Identificar la necesidad de compra de señalización preventiva e informativa y de seguridad.
- Asegurar que se realice la instalación de la señalización preventiva, informativa y de seguridad y el cerramiento de los frentes de trabajo.
- Informar las condiciones de trabajo inseguras que requieran de medidas de intervención para su mejora e Informar las actividades y situaciones de Seguridad que puedan dar lugar a cambios en el SG-SST.
- Evidenciar la publicación de las políticas y reglamentos, así como la instalación de la señalización de seguridad (Punto de encuentro, Rutas de evacuación, uso de EPP, Baño en la obra, Uso de arnés, Riesgo eléctrico etc.)
- Promover en los Trabajadores el autorreporte de condiciones de Salud.
- Verificar y asegurar que se implemente la metodología de las 5S para asegurar el orden y limpieza.
- Apoyar en la realización de actividades para la conformación de Comités y brigadas de emergencias.

- Recolectar la información de seguridad y salud en el trabajo necesaria para la elaboración de informes, y cálculo y análisis de indicadores del SG-SST.
- Realizar reportes internos de accidentes de trabajo.
- Participar en la investigación de accidentes de trabajo.
- Coordinar la gestión de no conformidades, acciones correctivas y preventivas.
- Asegurar la Publicación de las Políticas, objetivos, reglamento y demás información del SG-SST.

Yo, Ipatia Rovira Villalobos Molina identificado con C.C. 50.905.356 acepto las responsabilidades y autoridades establecidas en este documento, independientemente de las responsabilidades y autoridades asociadas a mi cargo, y me comprometo a darles cumplimiento.

Lo anterior se firma a los 23 días del mes abril del año 2026.

**Designa:**

María Elena Rivera Hoyos.

**Nombre:** María Elena Rivera Hoyos
**Cargo:** Representante Legal

**Acepta:**

Ipatia Villalobos

**Nombre:** Ipatia Rovira Villalobos Molina
**Cargo:** Auxiliar SST

# ANEXO N° 5.

# INDUCCIÓN

605

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-009 |
|---|---|---|---|
| | CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."**

| | |
|---|---|
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA |
| TEMA DE LA CAPACITACIÓN: | **INDUCCIÓN** |
| OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN: | Dar a conocer a los trabajadores las políticas, objetivos, planes y demas procedimientos relacionados con el trabajo y la implementación del Sistema Integrado de Gestión. |
| FECHA DE LA CAPACITACIÓN: | 23/04/2026 |
| PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO: | TODO EL PERSONAL |
| RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN: | MARIA ELENA RIVERA HOYOS |
| CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN: | 1. Políticas y objetivos de Calidad y SST.<br>2. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.<br>3. Funciones y Responsabilidades de los trabajadores asociadas a su cargo, la SST, la Calidad y la Gestión de Obra.<br>4. COPASST (Objetivos, Funciones y responsabilidades).<br>5. Comité de convivencia (Objetivos, Funciones y responsabilidades).<br>6. Notificación de los riesgos de acuerdo a las actividades que vaya a desarrollar el trabajador.<br>7. Uso de elementos de protección personal.<br>8. Señalización de seguridad.<br>9. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.<br>10. Que hacer en caso de un accidente de trabajo.<br>11. Clasificación de los residuos sólidos y segregación en la fuente.<br>12. Importancia del autocuidado y llevar estilos de vida y de trabajo saludables.<br>13. Socialización PTS con herramientas manuales.<br>14. Socialización de PTS con volquetas.<br>15. Socialización de Preocedimiento de almacenamiento seguro de sustancias quimicas.<br>16. Socializacón PTS de tareas en caliente.<br>17. Socialización PTS cargue y descargue de material.<br>18. Socializacion PTS de trabajo con maquinaria. |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía) | CARGO | FIRMA DEL TRABAJADOR |
|---|---|---|---|
| MARIA INES GONZALEZ AYUZ | 1.067.836.657 | INGENIERA ESP. SG-SST | María Ines González Ayuz |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

606

| | (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-009 |
|---|---|---|---|
| | CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."**

| | |
|---|---|
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA |
| TEMA DE LA CAPACITACIÓN: | **INDUCCIÓN** |
| OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN: | Dar a conocer a los trabajadores las políticas, objetivos, planes y demas procedimientos relacionados con el trabajo y la implementación del Sistema Integrado de Gestión. |
| FECHA DE LA CAPACITACIÓN: | 23/04/2026 |
| PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO: | TODO EL PERSONAL |
| RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN: | Mario Ines Gonzalez Ayos |
| CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN: | 1. Políticas y objetivos de Calidad y SST.<br>2. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.<br>3. Funciones y Responsabilidades de los trabajadores asociadas a su cargo, la SST, la Calidad y la Gestión de Obra.<br>4. COPASST (Objetivos, Funciones y responsabilidades).<br>5. Comité de convivencia (Objetivos, Funciones y responsabilidades).<br>6. Notificación de los riesgos de acuerdo a las actividades que vaya a desarrollar el trabajador.<br>7. Uso de elementos de protección personal.<br>8. Señalización de seguridad.<br>9. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.<br>10. Que hacer en caso de un accidente de trabajo.<br>11. Clasificación de los residuos sólidos y segregación en la fuente.<br>12. Importancia del autocuidado y llevar estilos de vida y de trabajo saludables.<br>13. Socialización PTS con herramientas manuales.<br>14. Socialización de PTS con volquetas.<br>15. Socialización de Preocedimiento de almacenamiento seguro de sustancias quimicas.<br>16. Socializacón PTS de tareas en caliente.<br>17. Socialización PTS cargue y descargue de material.<br>18. Socializacion PTS de trabajo con maquinaria. |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadania) | CARGO | FIRMA DEL TRABAJADOR |
|---|---|---|---|
| IPATIA ROVIRA VILLALOBOS MOLINA | 50.905.356 | AUXILIAR SST | Ipatia R. Villalobos |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Powered by CamScanner

67

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO | FOR-003 |
|---|---|---|---|
| | CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN | VERSIÓN | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SMP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

| | |
|---|---|
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA. |
| TEMA DE LA CAPACITACIÓN: | INDUCCIÓN |
| OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN: | Dar a conocer a los trabajadores las políticas, objetivos, planes y demas procedimientos relacionados con el trabajo y la implementación del Sistema Integrado de Gestión. |
| FECHA DE LA CAPACITACIÓN: | 27-04-2026 |
| PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO: | Maestros - oficiales - Ayudantes en obra. |
| RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN: | Paulina Villalobos M - Aux - SST |
| CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN: | 1. Políticas y objetivos de Calidad y SST.<br>2. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.<br>3. Funciones y Responsabilidades de los trabajadores asociadas a su cargo, la SST, la Calidad y la Gestión de Obra.<br>4. COPASST (Objetivos, Funciones y responsabilidades).<br>5. Comité de convivencia (Objetivos, Funciones y responsabilidades).<br>6. Notificación de los riesgos de acuerdo a las actividades que vaya a desarrollar el trabajador.<br>7. Uso de elementos de protección personal.<br>8. Señalización de seguridad.<br>9. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.<br>10. Que hacer en caso de un accidente de trabajo.<br>11. Clasificación de los residuos sólidos y segregación en la fuente.<br>12. Importancia del autocuidado y llevar estilos de vida y de trabajo saludables.<br>13. Socialización PTS con herramientas manuales.<br>14. Socialización de PTS con volquetas.<br>15. Socialización de Preocedimiento de almacenamiento seguro de sustancias quimicas.<br>16. Socialización PTS de tareas en caliente.<br>17. Socialización PTS cargue y descargue de material.<br>18. Socializacion PTS de trabajo con maquinaria. |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía) | CARGO | FIRMA DEL TRABAJADOR |
|---|---|---|---|
| Luis David Ruiz. | 1192812500 | Ayudante. | Luis David Ruiz |
| Arlen Alvarez | 78614356 | oficial | |
| Hugo vega M. | 6.850.870 | Ayudante | Hugo Vega Montiel |
| Mario Ruiz | 1062954379 | oficial | |
| Argein carvajal | 11004806 | Maestro | Argein Carvajal |
| Richard Ramos | 11154364 | Ayudante | |
| Rodrigo sojano | 78714710. | oficial. | |
| Mario A. Vertel C. | 6.885013. | oficial. | Mario Vertel |
| Fredy Arcra | 7078 22 18 | Maestro | Fredy Arcra |



Powered by CamScanner

608

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-009 |
|---|---|---|---|
| | CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

| | |
|---|---|
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA. |
| TEMA DE LA CAPACITACIÓN: | INDUCCIÓN |
| OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN: | Dar a conocer a los trabajadores las políticas, objetivos, planes y demas procedimientos relacionados con el trabajo y la implementación del Sistema Integrado de Gestión. |
| FECHA DE LA CAPACITACIÓN: | 27-04-2026 |
| PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDO: | TODO EL PERSONAL |
| RESPONSABLE (S) CAPACITACIÓN: | Ronia villalobos - SST |
| CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN: | 1. Políticas y objetivos de Calidad y SST<br>2. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial<br>3. Funciones y Responsabilidades de los trabajadores asociadas a su cargo la SST, la Calidad y la Gestión de Obra<br>4. COPASST (Objetivos, Funciones y responsabilidades)<br>5. Comite de convivencia (Objetivos, Funciones y responsabilidades)<br>6. Notificación de los riesgos de acuerdo a las actividades que vaya a desarrollar el trabajador<br>7. Uso de elementos de protección personal<br>8. Señalización de seguridad<br>9. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias<br>10. Que hacer en caso de un accidente de trabajo<br>11. Clasificación de los residuos sólidos y segregación en la fuente<br>12. Importancia del autocuidado y llevar estilos de vida y de trabajo saludables<br>13. Socialización PTS con herramientas manuales<br>14. Socialización de PTS con volquetas<br>15. Socialización de Preocedimiento de almacenamiento seguro de sustancias quimicas<br>16. Socializacon PTS de tareas en caliente<br>17. Socialización PTS cargue y descargue de material<br>18. Socialización PTS de trabajo con maquinaria |

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadania) | CARGO | FIRMA DEL TRABAJADOR |
|---|---|---|---|
| Dorfer Yesith gomez | 10629648 | Ayudante. | Dorfer Yesith gomez |
| Manuel Perez | 15275012 | Ayudante. | Manuel Perez |
| Luis Hurtado | 6.857706 | Oficial | Luis Hurtado |
| Angel Mª Rivero | 6.871651 | Maestro | Angel Mª Rivero |
| Bernabe Gutierrez | 9104691 | Ayudante. | Bernabe Gutierrez |



Powered by CamScanner

# ANEXO N° 6.

# NOTIFICACIÓN DE RIESGO

610

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CODIGO: | FOR-010 |
|---|---|---|---|
| | NOTIFICACION DE RIESGOS | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

| | |
|---|---|
| ACTIVIDAD: | CONSTRUCCIÓN |
| TAREAS: | TAREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" |
| CARGOS: | Director de Obra. Residente de Obra. Ingenieros Residentes. Especialistas SIG. Auxiliar SST. Auxiliar Administrativo. Contador. Interventoría. Inspectores de Obra. Técnicos. Ayudantes de Obra. Maestros de Obra. Oficiales de Obra. Topografo. Cadeneros. Operarios/Conductor. Celadores. Almacenista. Personal de Limpieza y Oficios Varios |
| FECHA DE LA NOTIFICACIÓN: | 23/04/2026 |

| PELIGRO | | | |
|---|---|---|---|
| Factor de Riesgo | | Clasificación | EFECTO POSIBLE |
| Exposición a ruido proveniente de ... | * Equipos<br>* Herramientas<br>* Maquinaria<br>* Equipos, impresoras, fotocopiadoras | Físicos | * Pérdida de capacidad auditiva<br>* Estrés |
| Exposición a vibraciones provenientes de... | * Herramientas electricas<br>* Maquinaria. | Físicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Exposición a material particulado proveniente de... | * Polvo<br>* Suciedad en el ambiente | Químicos | Enfermedades del Sistema respiratorio |
| Manipulación de productos químicos peligros | * Durante la realización de las actividades de construcción o administrativas<br>* Almacenamiento de sustancias químicas<br>* Uso de sustancias químicas | Químicos | * Derrames<br>* Fugas<br>* Contaminación ambiental<br>* Incendio<br>* Explosión<br>* Quemaduras<br>* Alergias<br>* Irritación |
| exposición a virus, bacterias hongos o parásitos presentes en... | * El medio ambiente donde se realicen las labores<br>* Incursión del COVID-19 en Colombia | Biológicos | Depende del microorganismo |
| Picaduras de animales | * El medio ambiente donde se realicen las labores | Biológicos | Depende de los animales |
| Mordeduras de animales | * El medio ambiente donde se realicen las labores | Biológicos | Depende del estado del animal |
| Inhalación o contacto de productos de origen vegetal o animal. | * El medio ambiente donde se realicen las labores | Biológicos | Reacciones tóxicas |
| Sobreesfuerzo por la adopción de posturas forzadas ... hipertensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en ... | En obra:<br>* Uso de herramientas y equipos<br>* Cargue de materiales de forma manual<br>* Conducción de vehículos, operación de maquinaria<br><br>En oficina:<br>* Durante la manipulacion de carpetas<br>* Al subir estantes<br>* Al trabajar en el escritorio | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Sobreesfuerzo por la adopción de postura estática prolongada ...sentado, de pie, agachado, etc... | * Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina<br>* Conducción de vehículos, operación de maquinaria | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME. |
| Hábitos posturales inadecuados durante... | * Durante la realización de las actividades de construcción<br>* Conducción de vehículos, operación de maquinaria<br>* El uso de herramientas y equipos<br>* Al trabajar en el escritorio | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME. |
| Movimientos repetitivos ... | * Durante la realización de las actividades de construcción u oficina<br>* Conducción de vehículos, operación de maquinaria<br>* En el uso de teclados | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME. |
| Levantamiento de carga ... | En obra u oficina:<br>* Durante la realización de las actividades de construcción u oficina<br>* Arrastre o empuje de materiales, herramientas y equipos<br>* Durante el almacenamiento de materiales, herramientas y equipos<br>* Durante el transporte de materiales, herramientas y equipos<br>* Durante la limpieza de equipos, materiales, muebles, etc | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME. |
| Trabajo bajo presión o con apremio de tiempo | * Durante la realización de las actividades de construcción o administrativas<br>* Trabajo bajo presión o apremio de tiempo en oficina u obra | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Complejidad y rapidez del trabajo por ... | * Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina<br>* Trabajo bajo presión o apremio de tiempo en oficina u obra | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Ordenes contradictorias | Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina | Psicosociales | * Estrés |
| Acoso laboral | * Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina<br>* Por relaciones interpersonales | Psicosocial | * Estres |
| Relaciones interpersonales y grupales | * Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | * Estrés |
| Factores intralaborales... | * Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | Dependiendo del factor |
| Factores extralaborales... | * Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | Dependiendo del factor |
| Factores individuales... | * Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | Dependiendo del factor |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trabajos con posibilidad de contactos eléctricos directos o indirectos durante.. | Durante la realización de las actividades de construcción conducción de vehiculos, operación de maquinaria o actividades administrativas de oficina | Condiciones de Seguridad | * Electrocución<br>* Daños a equipos<br>* Incendio. |
| Atrapamientos entre mecanismos en movimiento durante.. | * Durante la operación de equipos y Herramientas<br>* Conducción de vehiculos, operacion de maquinaria<br>* Durante la ejecución de las Actividades de supervision | Condiciones de Seguridad | * Amputaciones<br>* Machucones<br>* Fracturas<br>* Luxaciones. |
| Golpes contra objetos inmóviles | En obra: Durante la operación de equipos y Herramientas, Conducción de vehiculos, operación de maquinaria y durante su parqueo<br>* En oficina: Escritorios, estantes, equipos, sillas<br>* Durante actividades de supervición | Condiciones de Seguridad | Politraumatismos |
| Ser golpeado por.... Durante... | En obra: Materiales, equipos y herramienta durante su uso, conducción de vehiculos, operación de maquinaria y durante su parqueo, etc<br>En oficina: Herramientas, objetos, materiales, utensilios o personas | Condiciones de Seguridad | Politraumatismos |
| Caidas al mismo nivel por.. | En obra u oficina:<br><br>* Traslados<br>* Tropiezos<br>* Piso resbaloso o inestable<br>* Objetos en la via | Condiciones de Seguridad | Politraumatismos |
| Caida de objetos de altura durante. | * La realizacion de actividades en alturas<br>* Durante la ejecución de las Actividades de supervision | Condiciones de Seguridad | * Politraumatismos<br>* Muerte |
| Caidas a diferente nivel o alturas superiores a 2,00 mts durante. | * Condiciones de Seguridad<br>* Actividades de supervición | Caidas a diferente nivel o alturas superiores a 2,00 mts durante. | * Politraumatismos<br>* Muerte |
| Proyección de particulas (solidas, liquidas o gases) provenientes de.. | * La realización de las actividades de construcción u oficina<br>* Durante la realizacion de tareas de aseo | Condiciones de Seguridad | * Daños oculares<br>* Incrustacion de objetos extraños<br>* Heridas |
| Trabajos con herramientas o equipos | Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Trabajos con elementos cortantes o cortopunzantes | * Durante las actividades constructivas o de oficina | Condiciones de Seguridad | * Heridas<br>* Cortaduras<br>* Presiones punzantes.<br>* Infecciones<br>* Desangre<br>* Muerte |
| Orden y aseo deficiente del sitio de trabajo | * Durante la ejecución de las actividades | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Señalizacion inadecuada o insuficiente en... | * Sitio de trabajo | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Iluminación deficiente en sitio de trabajo debido a.. | * Poca o mucha iluminación en las oficinas o en obra<br>* Pantallas de equipos, computadoras, celulares, tablets u otros | Físicos | * Cansancio<br>* Fatiga visual ... |
| Exposición a humos, gases o vapores provenientes de... | * Productos quimicos de aseo | Químicos | Enfermedades del Sistema respiratorio |
| Trabajo con jornadas extendidas | * Durante la ejecución de las actividades en oficina o de obra | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Desconocimiento de la tarea, normas o procedimientos. | * Durante la ejecución de las actividades | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Métodos de almacenamiento inadecuados durante... | * Durante las actividades de oficina o de obra<br>* Acopio y almacenamiento de documentación, materiales, herramientas y equipos | Condiciones de Seguridad | * Fugas<br>* Derrames<br>* Daños a personas<br>* Daño al ambiente. |
| Exposición a ruido proveniente de ... | La realización de las actividades de construcción o de oficina | Físicos | * Pérdida de capacidad auditiva<br>* Estrés |
| Exposición a material particulado proveniente de ... | La realización de las actividades de construcción | Químicos | Enfermedades del Sistema respiratorio |
| Desplazamientos por largas jornadas a pie | * Durante las actividades de supervisión | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Aplicación de fuerza ... empujar o tirar de ... manipular hacia arriba, abajo, hacia dentro o fuera ... | * Materiales, herramientas y equipos | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Trabajo repetitivo y monotono | * Durante el almacenamiento de materiales, herramientas y equipos | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Exceder la capacidad de equipos o herramientas | * Almacenamiento de materiales, utensilios, herramientas, elementos, en estantes | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Exposición a altas temperaturas provenientes de... | * Exposición a la intemperie y sol | Físicos | * Deshidratación<br>* Quemaduras en la piel |
| Exposición a radiaciones no Ionizantes provenientes de... | * Exposición a la intemperie y sol | Físicos | Depende del tipo de radiación |
| Vias en mal estado | * En el traslado de materiales, herramientas y equipos | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Traslados o trabajos en zonas de conflicto o inseguras. | Durante la realizacion de las labores | Condiciones de Seguridad | * Secuestro<br>* Robo<br>* Atraco |

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento.

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | IDENTIFICACION | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| IPATIA ROVIRA VILLALOBOS MOLINA | 50 905 356 | AUXILIAR SST | Ipatia R Villalobos |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Powered by CamScanner

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CODIGO: | FOR-010 |
|---|---|---|---|
| | NOTIFICACION DE RIESGOS | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**

| | |
|---|---|
| ACTIVIDAD: | CONSTRUCCIÓN |
| TAREAS: | TAREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" |
| CARGOS: | Director de Obra, Residente de Obra, Ingenieros Residentes, Especialistas SIG, Auxiliar SST, Auxiliar Administrativo, Contador, Interventoria, Inspectores de Obra, Tecnicos, Ayudantes de Obra, Maestros de Obra, Oficiales de Obra, Topografo, Cadeneros, Operarios/Conductor, Celadores, Almacenista, Personal de Limpieza y Oficios Varios |
| FECHA DE LA NOTIFICACIÓN: | 23/04/2026 |

| PELIGRO | | | |
|---|---|---|---|
| Factor de Riesgo | | Clasificación | EFECTO POSIBLE |
| Exposición a ruido proveniente de ... | * Equipos<br>* Herramientas<br>* Maquinaria<br>* Equipos, impresoras, fotocopiadoras | Físicos | * Perdida de capacidad auditiva<br>* Estrés |
| Exposición a vibraciones provenientes de... | * Herramientas electricas<br>* Maquinaria. | Físicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME. |
| Exposición a material particulado proveniente de.. | * Polvo<br>* Suciedad en el ambiente | Químicos | Enfermedades del Sistema respiratorio |
| Manipulación de productos químicos peligros | * Durante la realización de las actividades de construcción o administrativas<br>* Almacenamiento de sustancias químicas<br>* Uso de sustancias químicas | Químicos | * Derrames<br>* Fugas<br>* Contaminación ambiental<br>* Incendio<br>* Explosión<br>* Quemaduras<br>* Alergias<br>* Irritacion |
| exposición a virus, bacterias, hongos o parásitos presentes en... | * El medio ambiente donde se realicen las labores<br>* Incursión del COVID-19 en Colombia | Biológicos | Depende dal microorganismo |
| Picaduras de animales | * El medio ambiente donde se realicen las labores | Biológicos | Depende de los animales |
| Mordeduras de animales | * El medio ambiente donde se realicen las labores | Biológicos | Depende del estado del animal |
| Inhalación o contacto de productos de origen vegetal o animal. | * El medio ambiente donde se realicen las labores | Biológicos | Reacciones tóxicas |
| Sobreesfuerzo por la adopción de posturas forzadas ... hipertensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en .. | En obra:<br>* Uso de herramientas y equipos<br>* Cargue de materiales de forma manual<br>* Conducción de vehículos, operación de maquinaria<br><br>En oficina:<br>* Durante la manipulacion de carpetas<br>* Al subir estantes<br>* Al trabajar en el escritorio | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME. |
| Sobreesfuerzo por la adopción de postura estática prolongada ...sentado, de pie, agachado, etc.... | * Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina<br>* Conducción de vehículos, operación de maquinaria | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME. |
| Hábitos posturales inadecuados durante... | * Durante la realización de las actividades de construcción<br>* Conducción de vehículos, operación de maquinaria<br>* El uso de herramientas y equipos<br>* Al trabajar en el escritorio | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Movimientos repetitivos ... | * Durante la realización de las actividades de construcción u oficina<br>* Conducción de vehículos, operación de maquinaria<br>* En el uso de teclados | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Levantamiento de carga ... | En obra u oficina:<br>* Durante la realización de las actividades de construcción u oficina.<br>* Arrastre o empuje de materiales, herramientas y equipos<br>* Durante el almacenamiento de materiales, herramientas y equipos<br>* Durante el transporte de materiales, herramientas y equipos<br>* Durante la limpieza de equipos, materiales, muebles, etc | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Trabajo bajo presión o con apremio de tiempo | * Durante la realización de las actividades de construcción o administrativas<br>* Trabajo bajo presión o apremio de tiempo en oficina u obra | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Complejidad y rapidez del trabajo por ... | * Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina<br>* Trabajo bajo presión o apremio de tiempo en oficina u obra | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Ordenes contradictorias | Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina | Psicosociales | * Estrés |
| Acoso laboral | * Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina<br>* Por relaciones interpersonales | Psicosocial | * Estrés |
| Relaciones interpersonales y grupales | * Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | * Estrés |
| Factores intralaborales... | * Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | Dependiendo del factor |
| Factores extralaborales ... | * Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | Dependiendo del factor |
| Factores individuales... | * Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | Dependiendo del factor |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trabajos con posibilidad de contactos eléctricos directos o indirectos durante... | Durante la realización de las actividades de construcción,conducción de vehiculos, operación de maquinaria o actividades administrativas de oficina | Condiciones de Seguridad | * Electrocución<br>* Daños a equipos<br>* Incendio. |
| Atrapamientos entre mecanismos en movimiento durante... | * Durante la operación de equipos y Herramientas<br>* Conducción de vehiculos, operación de maquinaria<br>* Durante la ejecución de las Actividades de supervision | Condiciones de Seguridad | * Amputaciones<br>* Machucones<br>* Fracturas<br>* Luxaciones. |
| Golpes contra objetos inmóviles | En obra: Durante la operación de equipos y Herramientas, Conducción de vehiculos, operación de maquinaria y durante su parqueo<br>* En oficina: Escritorios, estantes, equipos, sillas<br>* Durante actividades de supervición | Condiciones de Seguridad | Politraumatismos |
| Ser golpeado por... Durante ... | En obra: Materiales, equipos y herramienta durante su uso, conducción de vehiculos, operación de maquinaria y durante su parqueo, etc<br>En oficina: Herramientas, objetos, materiales, utensilios o personas | Condiciones de Seguridad | Politraumatismos |
| Caidas al mismo nivel por... | En obra u oficina.<br><br>* Traslados<br>* Tropiezos<br>* Piso resbaloso o inestable<br>* Objetos en la via | Condiciones de Seguridad | Politraumatismos |
| Caida de objetos de altura durante. | * La realizacion de actividades en alturas<br>* Durante la ejecución de las Actividades de supervision | Condiciones de Seguridad | * Politraumatismos<br>* Muerte |
| Caidas a diferente nivel o alturas superiores a 2.00 mts durante. | * Condiciones de Seguridad<br>* Actividades de supervición | Caidas a diferente nivel o alturas superiores a 2.00 mts durante. | * Politraumatismos<br>* Muerte |
| Proyección de particulas (solidas, licuidas o gases) provenientes de... | * La realización de las actividades de construcción u oficina<br>* Durante la realizacion de tareas de aseo | Condiciones de Seguridad | * Daños oculares<br>* Incrustación de objetos extraños<br>* Heridas |
| Trabajos con herramientas o equipos | Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Trabajos con elementos cortantes o cortopunzantes | * Durante las actividades constructivas o de oficina | Condiciones de Seguridad | * Heridas<br>* Cortaduras<br>* Presiones punzantes<br>* Infecciones<br>* Desangre<br>* Muerte |
| Orden y aseo deficiente del sitio de trabajo | * Durante la ejecución de las actividades | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Señalización inadecuada o insuficiente en.. | * Sitio de trabajo | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Iluminación deficiente en sitio de trabajo debido a... | * Poca o mucha iluminación en las oficinas o en obra<br>* Pantallas de equipos, computadoras, celulares, tablets u otros | Fisicos | * Cansancio<br>* Fatiga visual ... |
| Exposición a humos, gases o vapores provenientes de ... | * Productos quimicos de aseo | Quimicos | Enfermedades del Sistema respiratorio |
| Trabajo con jornadas extendidas | * Durante la ejecución de las actividades en oficina o de obra | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Desconocimiento de la tarea, normas o procedimientos. | * Durante la ejecución de las actividades | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Métodos de almacenamiento inadecuados durante ... | * Durante las actividades de oficina o de obra<br>* Acopio y almacenamiento de documentación, materiales, herramientas y equipos | Condiciones de Seguridad | * Fugas<br>* Derrames<br>* Daños a personas<br>* Daño al ambiente. |
| Exposición a ruido proveniente de ... | La realización de las actividades de construcción o de oficina | Fisicos | * Pérdida de capacidad auditiva<br>* Estrés |
| Exposición a material particulado proveniente de... | La realización de las actividades de construcción | Quimicos | Enfermedades del Sistema respiratorio |
| Desplazamientos por largas jornadas a pie | * Durante las actividades de supervisión | Carga fisica – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME. |
| Aplicación de fuerza ... empujar o tirar de ... manipular hacia arriba, abajo, hacia dentro o fuera ... | * Materiales, herramentas y equipos | Carga fisica – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Trabajo repetitivo y monótono | * Durante el almacenamiento de materiales, herramientas y equipos | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Exceder la capacidad de equipos o herramientas | * Almacenamiento de materiales, utensilios, herramientas, elementos, en estantes | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Exposición a altas temperaturas provenientes de... | * Exposición a la intemperie y sol | Fisicos | * Deshidratación<br>* Quemaduras en la piel |
| Exposicion a radiaciones no ionizantes provenientes de... | * Exposición a la intemperie y sol | Fisicos | Depende del tipo de radiación |
| Vias en mal estado | * En el traslado de materiales, herramientas y equipos | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Traslados o trabajos en zonas de conflicto o inseguras | Durante la realización de las labores | Condiciones de Seguridad | * Secuestro<br>* Robo<br>* Atraco |

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | IDENTIFICACION | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| MARIA INES GONZALEZ AYUZ | 1.067.836.657 | INGENIERA ESP. SG-SST | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Powered by CamScanner

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-010 |
|---|---|---|---|
| | NOTIFICACION DE RIESGOS | VERSIÓN | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CORDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACION DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CORDOBA MEDIANTE LA ADECUACION Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

| | |
|---|---|
| ACTIVIDAD: | CONSTRUCCION |
| TAREAS | TAREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" |
| CARGOS: | Director de Obra, Residente de Obra, Ingenieros Residentes, Especialistas SIG, Auxiliar SST, Auxiliar Administrativo, Contador, Interventoría, Inspectores de Obra, Tecnicos, Ayudantes de Obra, Maestros de Obra, Oficiales de Obra, Topografo, Cadeneros, Operarios/Conductor, Celadores, Almacenista, Personal de Limpieza y Oficios Varios |
| FECHA DE LA NOTIFICACION | 27-04-2026 |

| PELIGRO | | | |
|---|---|---|---|
| Factor de Riesgo | | Clasificación | EFECTO POSIBLE |
| Exposicion a ruido proveniente de | * Equipos<br>* Herramientas<br>* Maquinaria<br>* Equipos, impresoras, fotocopiadoras | Físicos | * Perdida de capacidad auditiva<br>* Estres |
| Exposición a vibraciones provenientes de | * Herramientas electricas<br>* Maquinaria | Físicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Exposición a material particulado proveniente de... | * Polvo<br>* Suciedad en el ambiente | Químicos | Enfermedades del Sistema respiratorio |
| Manipulacion de productos químicos peligros | * Durante la realización de las actividades de construcción o administrativas<br>* Almacenamiento de sustancias químicas<br>* Uso de sustancias quimicas | Químicos | * Derrames<br>* Fugas<br>* Contaminación ambiental<br>* Incendio<br>* Explosión<br>* Quemaduras<br>* Alergias<br>* Irritación |
| exposición a virus, bacterias, hongos o parásitos presentes en | * El medio ambiente donde se realicen las labores<br>* Incursión del COVID-19 en Colombia | Biológicos | Depende del microorganismo |
| Picaduras de animales | * El medio ambiente donde se realicen las labores | Biológicos | Depende de los animales |
| Mordeduras de animales | * El medio ambiente donde se realizen las labores | Biológicos | Depende del estado del animal |
| Inhalacion o contacto de productos de origen vegetal o animal | * El medio ambiente donde se realicen las labores | Biológicos | Reacciones tóxicas |
| Sobreesfuerzo por la adopción de posturas forzadas ... hiperflexiones, hiperflexiones, y/o hiperrotaciones en | En obra:<br>* Uso de herramientas y equipos<br>* Cargue de materiales de forma manual<br>* Conducción de vehículos, operación de maquinaria<br>En oficina:<br>* Durante la manipulacion de carpetas<br>* Al subir estantes<br>* Al trabajar en el escritorio | Carga física – ergonómicos – Biomecanicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Sobreesfuerzo por la adopción de postura estática prolongada ... sentado, de pie, agachado, etc | * Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina<br>* Conducción de vehículos, operación de maquinaria | Carga física – ergonómicos – Biomecanicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Habitos posturales inadecuados durante ... | * Durante la realización de las actividades de construccion<br>* Conducción de vehículos, operación de maquinaria<br>* El uso de herramientas y equipos<br>* Al trabajar en el escritorio | Carga física – ergonómicos – Biomecanicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Movimientos repetitivos | * Durante la realización de las actividades de construcción u oficina<br>* Conducción de vehículos, operación de maquinaria<br>* En el uso de teclados | Carga física – ergonómicos – Biomecanicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Levantamiento de carga | En obra u oficina:<br>* Durante la realizacion de las actividades de construcción u oficina<br>* Arrastre o empuje de materiales, herramientas y equipos<br>* Durante el almacenamiento de materiales, herramientas y equipos<br>* Durante el transporte de materiales, herramientas y equipos<br>* Durante la limpieza de equipos, materiales, muebles, etc | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Trabajo bajo presión o con apremio de tiempo | * Durante la realización de las actividades de construcción o administrativas<br>* Trabajo bajo presión o apremio de tiempo en oficina u obra | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Complejidad y repitez del trabajo por | * Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina<br>* Trabajo bajo presión o apremio de tiempo en oficina u obra | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Ordenes contradictorias | Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina | Psicosociales | * Estrés |
| Acoso laboral | * Durante la realizacion de las actividades de construcción o de oficina<br>* Por relaciones interpersonales | Psicosocial | * Estres |
| Relaciones interpersonales y grupales | * Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | * Estrés |
| Factores intralaborales | * Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | Dependiendo del factor |
| Factores extralaborales | * Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | Dependiendo del factor |
| Factores individuales | * Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | Dependiendo del factor |



Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trabajos con posibilidad de contactos eléctricos directos o indirectos durante... | Durante la realización de las actividades de construcción conducción de vehículos, operación de maquinaria o actividades administrativas de oficina | Condiciones de Seguridad | * Electrocución<br>* Daños a equipos<br>* Incendio |
| Atrapamientos entre mecanismos en movimiento durante... | * Durante la operación de equipos y Herramientas<br>* Conducción de vehículos, operación de maquinaria<br>* Durante la ejecución de las Actividades de supervisión | Condiciones de Seguridad | * Amputaciones<br>* Machucones<br>* Fracturas<br>* Luxaciones |
| Golpes contra objetos inmóviles | En obra: Durante la operación de equipos y Herramientas. Conducción de vehículos, operación de maquinaria y durante su parqueo<br>* En oficina: Escritorios, estantes, equipos, sillas<br>* Durante actividades de supervición | Condiciones de Seguridad | Politraumatismos |
| Ser golpeado por ... Durante... | En obra: Materiales, equipos y herramienta durante su uso, conducción de vehículos, operación de maquinaria y durante su parqueo, etc<br>En oficina: Herramientas, objetos, materiales, utensilios o personas | Condiciones de Seguridad | Politraumatismos |
| Caidas al mismo nivel por | En obra u oficina:<br><br>* Traslados<br>* Tropiezos<br>* Piso resbaloso o inestable<br>* Objetos en la vía | Condiciones de Seguridad | Politraumatismos |
| Caida de objetos de altura durante. | * La realizacion de actividades en alturas<br>* Durante la ejecución de las Actividades de supervision | Condiciones de Seguridad | * Politraumatismos<br>* Muerte |
| Caidas a diferente nivel o alturas superiores a 2,00 mts durante. | * Condiciones de Seguridad<br>* Actividades de supervición | Caidas a diferente nivel o alturas superiores a 2,00 mts durante. | * Politraumatismos<br>* Muerte |
| Proyección de particulas (solidas, liquidas o gases) provenientes de ... | * La realizacion de las actividades de construcción u oficina<br>* Durante la realizacion de tareas de aseo | Condiciones de Seguridad | * Daños oculares<br>* Incrustación de objetos extraños<br>* Heridas |
| Trabajos con herramientas o equipos | Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Trabajos con elementos cortantes o cortopunzantes | * Durante las actividades constructivas o de oficina | Condiciones de Seguridad | * Heridas<br>* Cortaduras<br>* Presiones punzantes<br>* Infecciones<br>* Desangre<br>* Muerte |
| Orden y aseo deficiente del sitio de trabajo | * Durante la ejecución de las actividades | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Señalización inadecuada o insuficiente en... | * Sitio de trabajo | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Iluminación deficiente en sitio de trabajo debido a... | * Poca o mucha iluminación en las oficinas o en obra<br>* Pantallas de equipos, computadoras, celulares, tablets u otros | Físicos | * Cansancio<br>* Fatiga visual |
| Exposición a humos, gases o vapores provenientes de... | * Productos químicos de aseo | Químicos | Enfermedades del Sistema respiratorio |
| Trabajo con jornadas extendidas | * Durante la ejecución de las actividades en oficina o de obra | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Desconocimiento de la tarea, normas o procedimientos. | * Durante la ejecución de las actividades | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Métodos de almacenamiento inadecuados durante... | * Durante las actividades de oficina o de obra<br>* Acopio y almacenamiento de documentación, materiales, herramientas y equipos | Condiciones de Seguridad | * Fugas<br>* Derrames<br>* Daños a personas<br>* Daño al ambiente. |
| Exposición a ruido proveniente de ... | La realización de las actividades de construcción o de oficina | Físicos | * Pérdida de capacidad auditiva<br>* Estrés |
| Exposición a material particulado proveniente de... | La realización de las actividades de construcción | Químicos | Enfermedades del Sistema respiratorio |
| Desplazamientos por largas jornadas a pie | * Durante las actividades de supervisión | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Aplicación de fuerza ... empujar o tirar de ... manipular hacia arriba, abajo, hacia dentro o fuera ... | * Materiales, herramientas y equipos | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Trabajo repetitivo y monótono | * Durante el almacenamiento de materiales, herramientas y equipos | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Excedar la capacidad de equipos o herramientas | * Almacenamiento de materiales, utensilios, herramientas, elementos, en estantes | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Exposición a altas temperaturas provenientes de... | * Exposición a la intemperie y sol | Físicos | * Deshidratación<br>* Quemaduras en la piel |
| Exposición a radiaciones no ionizantes provenientes de... | * Exposición a la intemperie y sol | Físicos | Depende del tipo de radiación |
| Vias en mal estado | * En el traslado de materiales, herramientas y equipos | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Traslados o trabajos en zonas de conflicto o inseguras. | Durante la realización de las labores | Condiciones de Seguridad | * Secuestro<br>* Robo<br>* Atraco |

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | IDENTIFICACION | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Richar Ramos | 111547647 | Ayudante | Richar Ramos |
| Erguin Carvajal | 71004406 | Maestro | Erguin Carvajal |
| Brien Alvarez | 78694351 | Oficial | Brien Alvarez |
| Mario Ruiz | 10621.545.5M | Ayudante. | Mario Ruiz |
| Rodrigo Solorzano | 78214110 | Oficial | Rodrigo Solorzano |
| Mario vertel | 6.885013 | Oficial | Mario vertel |
| Luis Ruiz | 1.192.812506 | Ayudante. | Luis Ruiz |
| Hugo vega | 6.880.870 | Ayudante | Hugo vega |
| Fredy Arcia | 7078221R | Maestro | Fredy Arcia |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Powered by CamScanner

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-010 |
|---|---|---|---|
| | NOTIFICACION DE RIESGOS | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

| | |
|---|---|
| ACTIVIDAD: | CONSTRUCCION |
| TAREAS: | TAREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" |
| CARGOS: | Director de Obra, Residente de Obra, Ingenieros Residentes, Especialistas SIG, Auxiliar SST, Auxiliar Administrativo, Contador, Interventoria, Inspectores de Obra, Técnicos, Ayudantes de Obra, Maestros de Obra, Oficiales de Obra, Topografo, Cadeneros, Operarios/Conductor, Celadores, Almacenista, Personal de Limpieza y Oficios Varios |
| FECHA DE LA NOTIFICACIÓN: | 27-04-2026 |

| PELIGRO | | | |
|---|---|---|---|
| Factor de Riesgo | | Clasificacion | EFECTO POSIBLE |
| Exposición a ruido proveniente de ... | * Equipos<br>* Herramientas<br>* Maquinaria<br>* Equipos, impresoras, fotocopiadoras | Fisicos | * Pérdida de capacidad auditiva<br>* Estrés |
| Exposición a vibraciones provenientes de... | * Herramientas electricas<br>* Maquinaria, | Fisicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Exposición a material particulado proveniente de... | * Polvo<br>* Suciedad en el ambiente | Quimicos | Enfermedades del Sistema respiratorio |
| Manipulacion de productos químicos peligros | * Durante la realizacion de las actividades de construcción o administrativas<br>* Almacenamiento de sustancias químicas<br>* Uso de sustancias químicas | Químicos | * Derrames<br>* Fugas<br>* Contaminación ambiental<br>* Incendio<br>* Explosión<br>* Quemaduras<br>* Alergias<br>* Irritacion |
| exposición a virus, bacterias, hongos o parásitos presentes en ... | * El medio ambiente donde se realicen las labores<br>* Incursión del COVID-19 en Colombia | Biológicos | Depende del microorganismo |
| Picaduras de animales | * El medio ambiente donde se realicen las labores | Biológicos | Depende de los animales |
| Mordeduras de animales | * El medio ambiente donde se realicen las labores | Biológicos | Depende del estado del animal |
| Inhalación o contacto de productos de origen vegetal o animal | * El medio ambiente donde se realicen las labores | Biológicos | Reacciones toxicas |
| Sobreesfuerzo por la adopcion de posturas forzadas, hipertensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones en ... | En obra<br>* Uso de herramientas y equipos<br>* Cargue de materiales de forma manual<br>* Conducción de vehiculos, operación de maquinaria<br><br>En oficina<br>* Durante la manipulacion de carpetas<br>* Al subir estantes<br>* Al trabajar en el escritorio | Carga fisica – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Sobreesfuerzo por la adopcion de postura estática prolongada ... sentado, de pie, agachado, etc... | * Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina<br>* Conducción de vehiculos, operación de maquinaria | Carga fisica – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Hábitos posturales inadecuados durante ... | * Durante la realización de las actividades de construcción<br>* Conducción de vehiculos, operación de maquinaria<br>* El uso de herramientas y equipos<br>* Al trabajar en el escritorio | Carga fisica – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Movimientos repetitivos ... | * Durante la realización de las actividades de construcción u oficina<br>* Conducción de vehiculos, operación de maquinaria<br>* En el uso de teclados | Carga fisica – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Levantamiento de carga ... | En obra u oficina<br>* Durante la realización de las actividades de construcción u oficina<br>* Arrastre o empuje de materiales, herramientas y equipos<br>* Durante el almacenamiento de materiales, herramientas y equipos<br>* Durante el transporte de materiales, herramientas y equipos<br>* Durante la limpieza de equipos, materiales, muebles, etc | Carga fisica – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME |
| Trabajo bajo presión o con apremio de tiempo | * Durante la realización de las actividades de construcción o administrativas<br>* Trabajo bajo presión o apremio de tiempo en oficina u obra | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Complejidad y rapidez del trabajo por ... | * Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina<br>* Trabajo bajo presión o apremio de tiempo en oficina u obra | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Ordenes contradictorias | Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina | Psicosociales | * Estres |
| Acoso laboral | * Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina<br>* Por relaciones interpersonales | Psicosocial | * Estrés |
| Relaciones interpersonales y grupales | * Durante la realización de las actividades de construccion, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | * Estrés |
| Factores intralaborales ... | * Durante la realización de las actividades de construccion, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | Dependiendo del factor |
| Factores extralaborales ... | * Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | Dependiendo del factor |
| Factores individuales ... | * Durante la realización de las actividades de construcción, de oficina u teletrabajo | Psicosocial | Dependiendo del factor |



Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trabajos con posibilidad de contactos eléctricos directos o indirectos durante... | Durante la realización de las actividades de construcción,conducción de vehículos, operación de maquinaria o actividades administrativas de oficina | Condiciones de Seguridad | * Electrocución<br>* Daños a equipos<br>* Incendio. |
| Atrapamientos entre mecanismos en movimiento durante... | * Durante la operación de equipos y Herramientas<br>* Conducción de vehículos, operación de maquinaria<br>* Durante la ejecución de las Actividades de supervision | Condiciones de Seguridad | * Amputaciones<br>* Machucones<br>* Fracturas<br>* Luxaciones. |
| Golpes contra objetos inmóviles | En obra: Durante la operación de equipos y Herramientas. Conducción de vehículos, operación de maquinaria y durante su parqueo<br>* En oficina: Escritorios, estantes, equipos, sillas<br>* Durante actividades de supervición | Condiciones de Seguridad | Politraumatismos |
| Ser golpeado por... Durante... | En obra: Materiales, equipos y herramienta durante su uso, conduccion de vehiculos, operación de maquinaria y durante su parqueo, etc<br>En oficina: Herramientas, objetos, materiales, utensilios o personas | Condiciones de Seguridad | Politraumatismos |
| Caidas al mismo nivel por ... | En obra u oficina:<br>* Traslados<br>* Tropiezos<br>* Piso resbaloso o inestable<br>* Objetos en la vía | Condiciones de Seguridad | Politraumatismos |
| Caida de objetos de altura durante | * La realizacion de actividades en alturas<br>* Durante la ejecución de las Actividades de supervision | Condiciones de Seguridad | * Politraumatismos<br>* Muerte |
| Caidas a diferente nivel o alturas superiores a 2.00 mts durante. | * Condiciones de Seguridad<br>* Actividades de supervición | Caidas a diferente nivel o alturas superiores a 2.00 mts durante. | * Politraumatismos<br>* Muerte |
| Proyección de particulas (solidas, liquidas o gases) provenientes de... | * La realización de las actividades de construcción u oficina<br>* Durante la realizacion de tareas de aseo | Condiciones de Seguridad | * Daños oculares<br>* Incrustación de objetos extraños<br>* Heridas |
| Trabajos con herramientas o equipos | Durante la realización de las actividades de construcción o de oficina | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Trabajos con elementos cortantes o cortopunzantes | * Durante las actividades constructivas o de oficina | Condiciones de Seguridad | * Heridas<br>* Cortaduras<br>* Presiones punzantes.<br>* Infecciones<br>* Desangre<br>* Muerte |
| Orden y aseo deficiente del sitio de trabajo | * Durante la ejecución de las actividades | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Señalización inadecuada o insuficiente en.. | * Sitio de trabajo | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Iluminación deficiente en sitio de trabajo debido a... | * Poca o mucha iluminacion en las oficinas o en obra<br>* Pantallas de equipos, computadoras, celulares, tablets u otros | Físicos | * Cansancio<br>* Fatiga visual ... |
| Exposición a humos, gases o vapores provenientes de... | * Productos químicos de aseo | Químicos | Enfermedades del Sistema respiratorio |
| Trabajo con jornadas extendidas | * Durante la ejecución de las actividades en oficina o de obra | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Desconocimiento de la tarea, normas o procedimientos. | * Durante la ejecución de las actividades | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Métodos de almacenamiento inadecuados durante | * Durante las actividades de oficina o de obra<br>* Acopio y almacenamiento de documentación, materiales, herramientas y equipos | Condiciones de Seguridad | * Fugas<br>* Derrames<br>* Daños a personas<br>* Daño al ambiente. |
| Exposición a ruido proveniente de ... | La realización de las actividades de construcción o de oficina | Físicos | * Pérdida de capacidad auditiva<br>* Estrés |
| Exposición a material particulado proveniente de... | La realización de las actividades de construcción | Químicos | Enfermedades del Sistema respiratorio |
| Desplazamientos por largas jornadas a pie | * Durante las actividades de supervisión | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME. |
| Aplicación de fuerza ... empujar o tirar de ... manipular hacia arriba, abajo, hacia dentro o fuera ... | * Materiales, herramientas y equipos | Carga física – ergonómicos – Biomecánicos | Desordenes musculo esqueléticos – DME. |
| Trabajo repetitivo y monotono | * Durante el almacenamiento de materiales, herramientas y equipos | Psicosociales | * Estrés<br>* Cansancio<br>* Fatiga |
| Exceder la capacidad de equipos o herramientas | * Almacenamiento de materiales, utensilios, herramientas, elementos, en estantes | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Exposición a altas temperaturas provenientes de... | * Exposición a la intemperie y sol | Físicos | * Deshidratación<br>* Quemaduras en la piel |
| Exposición a radiaciones no ionizantes provenientes de... | * Exposición a la intemperie y sol | Físicos | Depende del tipo de radiación |
| Vías en mal estado | * En el traslado de materiales, herramientas y equipos | Condiciones de Seguridad | Accidentes de trabajo diversos |
| Traslados o trabajos en zonas de conflicto o inseguras. | Durante la realización de las labores | Condiciones de Seguridad | * Secuestro<br>* Robo<br>* Atraco |

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | IDENTIFICACION | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Derfer Yesith Gomez | 10629648 | Ayudante. | Derfer Yesith Gomez |
| Manuel Perez | 15275012 | Ayudante. | Manuel Perez |
| Luis Hurtado | 6.857706 | Oficial | Luis Hurtado |
| Angel Mª Rivero | 6.271651 | Maestro | Angel Mª Rivero |
| Bernabe Gutierrez | 9104691 | Ayudante. | Bernabe Gutierrez |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Powered by CamScanner

# ANEXO N° 7.

# AFILIACIONES Y PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

# ANEXO N° 7.1.

# AFILIACIONES

629

Medellín, 22 de april de 2026

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

## CERTIFICA:

Que ARLEN JOSE ALVAREZ BELLO identificado(a) con cédula de ciudadanía 78694359 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
**Fecha inicio cobertura:** 23/04/2026 **Fecha fin cobertura:**

### INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

**TIRADO ARCIRIA FREDYS ENRIQUE C10782218**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

**CENTRO DE TRABAJO:** 000000CRUE - RED VITAL

**CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5711001

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 22/04/2026 5.40 PM

Dirección IP: 191.108.239.41, 192.230.104.18, 172.16.42.57

ARL | sura

62

Medellín, 22 de April de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO RED VITAL CORDOBA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL CORDOBA | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C26176859 | GARCES NEGRETE CARMEN ANA | 23/04/2026 | | 12q25014 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2026 15:58:10 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.239.41, 192.230.104.18, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 22 de April de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO RED VITAL CORDOBA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL CORDOBA | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C78748166 | CORRALES PATERNINA DANIEL JOSE | 23/04/2026 | | 132c1245 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2026 16:00:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.239.41, 192.230.104.18, 172.16.42.57

623

Medellín, 22 de april de 2026

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

## CERTIFICA:

Que ERGUIN ANTONIO CARVAJAL RODRIGUEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 11004806 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
**Fecha inicio cobertura:** 23/04/2026 **Fecha fin cobertura:**

### INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

**TIRADO ARCIRIA FREDYS ENRIQUE C10782218**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

**CENTRO DE TRABAJO:** 000000CRUE - RED VITAL

**CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5711001

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 22/04/2026 5.44 PM

Dirección IP: 191.108.239.41, 192.230.104.18, 172.16.42.57

624

Medellín, 22 de april de 2026

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

## CERTIFICA:

Que HUGO ANTONIO VEGA MONTIEL identificado(a) con cédula de ciudadanía 6880870 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
**Fecha inicio cobertura:** 23/04/2026 **Fecha fin cobertura:**

### INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

**TIRADO ARCIRIA FREDYS ENRIQUE C10782218**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

**CENTRO DE TRABAJO:** 000000CRUE - RED VITAL

**CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5711001

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

**Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:**

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 22/04/2026 5.52 PM

Dirección IP: 191.108.239.41, 192.230.104.18, 172.16.42.57

ARL | sura

625

Medellín, 22 de April de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO RED VITAL CORDOBA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL CORDOBA | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C50905356 | VILLALOBOS MOLINA IPATIA ROVIRA | 23/04/2026 | | 25135164 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2026 16:06:09 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.239.41, 192.230.104.18, 172.16.42.57

626

ARL | sura

Medellín, 22 de April de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO RED VITAL CORDOBA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL CORDOBA | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C93125772 | SANDOVAL ARCINIEGAS JESUS ORLANDO | 23/04/2026 | | 15219164 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2026 15:54:09 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.239.41, 192.230.104.18, 172.16.42.57

679

Medellín, 22 de april de 2026

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

## CERTIFICA:

Que LUIS DAVID RUIZ MUÑOZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 1192812500 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
**Fecha inicio cobertura:** 23/04/2026 **Fecha fin cobertura:**

### INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

**TIRADO ARCIRIA FREDYS ENRIQUE C10782218**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

**CENTRO DE TRABAJO:** 000000CRUE - RED VITAL

**CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5711001

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

## Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 22/04/2026 5.56 PM

Dirección IP: 191.108.239.41, 192.230.104.18, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 22 de April de 2026

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO RED VITAL CORDOBA.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL CORDOBA | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C1067836657 | GONZALEZ AYUZ MARIA INES | 23/04/2026 | | q38222O0 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2026 16:03:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.239.41, 192.230.104.18, 172.16.42.57

671

Medellín, 22 de april de 2026

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

## CERTIFICA:

Que MARIO ANTONIO VERTEL CAUSIL identificado(a) con cédula de ciudadanía 6885013 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

**Fecha inicio cobertura:** 23/04/2026 **Fecha fin cobertura:**

### INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

**TIRADO ARCIRIA FREDYS ENRIQUE C10782218**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

**CENTRO DE TRABAJO:** 000000CRUE - RED VITAL

**CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5711001

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 22/04/2026 5.50 PM

Dirección IP: 191.108.239.41, 192.230.104.18, 172.16.42.57

Medellín, 22 de april de 2026

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

## CERTIFICA:

Que RICHARD DE JESUS RAMOS MARTINEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 11154368 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

**Fecha inicio cobertura:** 23/04/2026 **Fecha fin cobertura:**

### INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

**TIRADO ARCIRIA FREDYS ENRIQUE C10782218**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

**CENTRO DE TRABAJO:** 000000CRUE - RED VITAL

**CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5711001

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 22/04/2026 5.48 PM

Dirección IP: 191.108.239.41, 192.230.104.18, 172.16.42.57

63

Medellín, 22 de april de 2026

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

## CERTIFICA:

Que RODRIGO SEGUNDO SOLORZANO GUZMAN identificado(a) con cédula de ciudadanía 78714110 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
**Fecha inicio cobertura:** 23/04/2026 **Fecha fin cobertura:**

### INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

**TIRADO ARCIRIA FREDYS ENRIQUE C10782218**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5411101 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, CASAS Y EDIFICIOS, MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

**CENTRO DE TRABAJO:** 000000CRUE - RED VITAL

**CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

**ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

**CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5711001

**CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

## Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

***Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:***

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

***Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.***

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 22/04/2026 6.01 PM

Dirección IP: 191.108.239.41, 192.230.104.18, 172.16.42.57

# ANEXO N° 7.2.

# PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 10782218 | 1 | FREDYS ENRIQUE TIRADO ARCIRIA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | DG 11 10 54 | MONTERIA-CORDOBA | 3215617214 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-03 | 299982239 | 9504588676 | Y | 2026/04/08 | 2026/05/11 | BANCOLOMBIA | | $174,600 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 78694359 | ALVAREZ BELLO ARLEN JOSE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 14 | $817,089 | 6.960% | $56,900 | 0 | $0 | $0 | No | $56,900 |
| 2 | CC | 11004806 | CARVAJAL RODRIGUEZ ERGUIN ANTONIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 14 | $817,089 | 6.960% | $56,900 | 0 | $0 | $0 | No | $56,900 |
| 3 | CC | 11154368 | RAMOS MARTINEZ RICHARD DE JESUS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 14 | $817,089 | 6.960% | $56,900 | 0 | $0 | $0 | No | $56,900 |
| Total | Afiliados( 3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $2,451,267 | | $170,700 | | $0 | $0 | | $170,700 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $170,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $170,700 |
| TOTAL | | | | 3 | $170,700 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 10782218 | 1 | FREDYS ENRIQUE TIRADO ARCIRIA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | DG 11 10 54 | MONTERIA-CORDOBA | 3215617214 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-04 | 292274377 | 9504514374 | Y | 2026/05/07 | 2026/05/08 | BANCOLOMBIA | | $756,300 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tap | tdp | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 78694359 | ALVAREZ BELLO ARLEN JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 0 | $0 | $0 | No | $121,900 |
| 2 | CC | 11004806 | CARVAJAL RODRIGUEZ ERGUIN ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 0 | $0 | $0 | No | $121,900 |
| 3 | CC | 11154368 | RAMOS MARTINEZ RICHARD DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | 6.960% | $121,900 | 0 | $0 | $0 | No | $121,900 |
| 4 | CC | 1192812500 | RUIZ MUÑOZ LUIS DAVID | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 24 | $1,400,724 | 6.960% | $97,500 | 0 | $0 | $0 | No | $97,500 |
| 5 | CC | 78714110 | SOLORZANO GUZMAN RODRIGO SEGUNDO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 24 | $1,400,724 | 6.960% | $97,500 | 0 | $0 | $0 | No | $97,500 |
| 6 | CC | 6880870 | VEGA MONTIEL HUGO ANTONIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 24 | $1,400,724 | 6.960% | $97,500 | 0 | $0 | $0 | No | $97,500 |
| 7 | CC | 6885013 | VERTEL CAUSIL MARIO ANTONIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 24 | $1,400,724 | 6.960% | $97,500 | 0 | $0 | $0 | No | $97,500 |
| Total Afiliados( 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $10,855,611 | | $755,700 | | $0 | $0 | | $755,700 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $755,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 7 | $755,700 |
| TOTAL | | | | 7 | $755,700 |



634

# ANEXO N° 8.

# PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

# ANEXO N° 8.1.

# ENCUESTAS APLICADAS

637

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-013 |
|---|---|---|---|
| | ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**

**Objetivo de la encuesta:** Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

**I. Registre los siguientes datos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Nombre del Trabajador: | Richar de Jesus Ramos Martinez | | |
| 2. Identificación: | 1115467888 | | |
| 3. Cargo: | Ayudante. | | |
| 4. Área (Administrativa/operativa): | Operativo | | |
| 5. Fecha de nacimiento: | 11-08-1976 | Edad actual: 50 | |
| 6. Dirección de residencia: | Vereda leiba Csancarlos. | Barrio: | |
| 7. Municipio: | Montería | | |
| 8. Telefono / Celular: | 3128620208 | | |
| 9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia: | Dina molino | Parentesco: | Esposa. |
| 10. Telefono / Celular: 3128620208. | | | |

**II. Marque con una X**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Estado Civil: | a. Soltero (a) | b. Casado (a)/union libre X | c. Separado (a)/Divorciado | d. Viudo(a) | | |
| 12. Nivel de escolaridad: | a. Primaria | b. Bachillerato X | c. Técnico / Tecnólogo | d. Pregrado Universitario | e. Postgrado Universitario | |
| 13. Tenencia de vivienda: | a. Propia X | b. Arrendada | c. Familiar | d. Compartida con otra(s) familia(s) | | |
| 14. Estrato: | a. 1 X | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | f. 6 o mas |
| 15. Numero de personas a cargo: | a. Ninguna | b. 1 - 3 personas X | c. 4 - 6 personas | d. Más de 6 personas | | |
| 16. Uso del tiempo libre: | a. Otro trabajo | b. Labores domésticas | c. Recreacion y deporte | d. Estudio | e. Ninguno X | |
| 17. Practica algún deporte: | a. No | b. Si X | Diario | Semanal | Quincenal | Ocasional X |
| 18. Promedio de ingresos mensuales: | a. Mínimo Legal (S.M.L.) X | b. Entre 1 a 3 S.M.L. | c. Entre 4 a 5 S.M.L. | d. Entre 5 y 6 S.M.L. | e. Mas de 7 S.M.L. | |
| 19. Antigüedad en la empresa | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 20. Antigüedad en el cargo actual | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 21. Fuma: | a. No X | b. Si | Prom. diario cigarrillos: | | | |
| 22. Consume bebidas alcoholicas: | a. No | b. Si X | Semanal | Quincenal | Mensual | Ocasional X |

| | | |
|---|---|---|
| **CONSENTIMIENTO INFORMADO** Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación. | Si X | No |
| Fecha de diligenciamiento: 27-04-2026 | Firma del trabajador: | X Richar Ramos M |



Powered by CamScanner

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-013 |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO | ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**

**Objetivo de la encuesta:** Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

**I. Registre los siguientes datos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Nombre del Trabajador: | Arquin Antonio Carvajal Padrazo. | | |
| 2. Identificación: | 11004306 | | |
| 3. Cargo: | Maestro de obra. | | |
| 4. Área (Administrativa/operativa): | Operativo | | |
| 5. Fecha de nacimiento: | 28-05-1977 | Edad actual: | |
| 6. Dirección de residencia: | Calle 8 # 8027 | Barrio: | Los Araujos |
| 7. Municipio: | Montería. | | |
| 8. Telefono / Celular: | 3215693989. | | |
| 9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia: | Cleira molina. | Parentesco: | Esposa. |
| 10. Telefono / Celular: | 3216121078. | | |

**II. Marque con una X**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Estado Civil: | a. Soltero (a) | b. Casado (a)/union libre X | c. Separado (a)/Divorciado | d. Viudo(a) | | |
| 12. Nivel de escolaridad: | a. Primaria | b. Bachillerato X | c. Técnico / Tecnólogo | d. Pregrado Universitario | e. Postgrado Universitario | |
| 13. Tenencia de vivienda: | a. Propia | b. Arrendada X | c. Familiar | d. Compartida con otra(s) familia(s) | | |
| 14. Estrato: | a. 1 X | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | f. 6 o mas |
| 15. Numero de personas a cargo: | a. Ninguna | b. 1 - 3 personas X | c. 4 - 6 personas | d. Más de 6 personas | | |
| 16. Uso del tiempo libre: | a. Otro trabajo | b. Labores domèsticas | c. Recreacion y deporte | d. Estudio | e. Ninguno X | |
| 17. Practica algún deporte: | a. No | b. Si X | Diario | Semanal | Quincenal | Ocasional X |
| 18. Promedio de ingresos mensuales: | a. Mínimo Legal (S.M.L.) X | b. Entre 1 a 3 S.M.L. | c. Entre 4 a 5 S.M.L. | d. Entre 5 y 6 S.M.L. | e. Mas de 7 S.M.L. | |
| 19. Antigüedad en la empresa | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 20. Antigüedad en el cargo actual | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 21. Fuma: | a. No X | b. Si | Prom. diario cigarrillos: | | | |
| 22. Consume bebidas alcoholicas: | a. No | b. Si X | Semanal | Quincenal | Mensual | Ocasional X |

**CONSENTIMIENTO INFORMADO**
Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

| Si | No |
|---|---|
| X | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento: 27-04-2026 | | Firma del trabajador: | X Arquin Carvajal |



Powered by CamScanner

639

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-013 |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO | ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**

**Objetivo de la encuesta:** Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

**I. Registre los siguientes datos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Nombre del Trabajador: | Moño antonio Verbel causil | | |
| 2. Identificación: | 6.885.013. | | |
| 3. Cargo: | oficial | | |
| 4. Área (Administrativa/operativa): | operativo | | |
| 5. Fecha de nacimiento: | 28-08-1960 | Edad actual: 66 | años |
| 6. Dirección de residencia: M2 16 Lot 23 | . | Barrio: villa celo | |
| 7. Municipio: | | | |
| 8. Telefono / Celular: 3012147099. | | | |
| 9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia: | Viani Verbel | Parentesco: | hija. |
| 10. Telefono / Celular: 3132181852. | | | |

**II. Marque con una X**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Estado Civil: | a. Soltero (a) | b. Casado (a)/union libre X | c. Separado (a)/Divorciado | d. Viudo(a) | | |
| 12. Nivel de escolaridad: | a. Primaria | b. Bachillerato X | c. Técnico / Tecnólogo | d. Pregrado Universitario | e. Postgrado Universitario | |
| 13. Tenencia de vivienda: | a. Propia X | b. Arrendada | c. Familiar | d. Compartida con otra(s) familia(s) | | |
| 14. Estrato: | a. 1 X | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | f. 6 o mas |
| 15. Numero de personas a cargo: | a. Ninguna | b. 1 - 3 personas X | c. 4 - 6 personas | d. Más de 6 personas | | |
| 16. Uso del tiempo libre: | a. Otro trabajo | b. Labores domésticas | c. Recreacion y deporte | d. Estudio | e. Ninguno X | |
| 17. Practica algún deporte: | a. No | b. Si X | Diario | Semanal | Quincenal | Ocasional X |
| 18. Promedio de ingresos mensuales: | a. Mínimo Legal (S.M.L.) X | b. Entre 1 a 3 S.M.L. | c. Entre 4 a 5 S.M.L. | d. Entre 5 y 6 S.M.L. | e. Mas de 7 S.M.L. | |
| 19. Antigüedad en la empresa | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 20. Antigüedad en el cargo actual | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 21. Fuma: | a. No X | b. Si | Prom. diario cigarrillos: | | | |
| 22. Consume bebidas alcoholicas: | a. No | b. Si X | Semanal | Quincenal | Mensual | Ocasional X |

**CONSENTIMIENTO INFORMADO**

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SI X | No | |
| Fecha de diligenciamiento: 27-04-2026 | | Firma del trabajador: | Moño Verbel |



Powered by CamScanner

640

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-013 |
|---|---|---|---|
| | ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**

**Objetivo de la encuesta:** Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

**I. Registre los siguientes datos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Nombre del Trabajador: | Arlen. Jose Alvarez Bello | | |
| 2. Identificación: | 78694359. | | |
| 3. Cargo: | Oficial de obra. | | |
| 4. Área (Administrativa/operativa): | Operativa. | | |
| 5. Fecha de nacimiento: | 25-08-1967 | Edad actual: 59 | años |
| 6. Dirección de residencia: | MZ 58 Lot 29. | Barrio: Villa Paz | |
| 7. Municipio: | | | |
| 8. Telefono / Celular: | 3136403970 | | |
| 9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia: | Amparo ameta. | Parentesco: | Esposa. |
| 10. Telefono / Celular: 3216991851 | | | |

**II. Marque con una X**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Estado Civil: | a. Soltero (a) | b. Casado (a)/union libre X | c. Separado (a)/Divorciado | d. Viudo(a) | | |
| 12. Nivel de escolaridad: | a. Primaria | b. Bachillerato X | c. Técnico / Tecnólogo | d. Pregrado Universitario | e. Postgrado Universitario | |
| 13. Tenencia de vivienda: | a. Propia X | b. Arrendada | c. Familiar | d. Compartida con otra(s) familia(s) | | |
| 14. Estrato: | a. 1 X | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | f. 6 o mas |
| 15. Numero de personas a cargo: | a. Ninguna | b. 1 - 3 personas X | c. 4 - 6 personas | d. Más de 6 personas | | |
| 16. Uso del tiempo libre: | a. Otro trabajo | b. Labores domésticas | c. Recreacion y deporte | d. Estudio | e. Ninguno X | |
| 17. Practica algún deporte: | a. No | b. Si X | Diario | Semanal | Quincenal | Ocasional X |
| 18. Promedio de ingresos mensuales: | a. Mínimo Legal (S.M.L.) X | b. Entre 1 a 3 S.M.L. | c. Entre 4 a 5 S.M.L. | d. Entre 5 y 6 S.M.L. | e. Mas de 7 S.M.L. | |
| 19. Antigüedad en la empresa | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 20. Antigüedad en el cargo actual | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 21. Fuma: | a. No X | b. Si | Prom. diario cigarrillos: | | | |
| 22. Consume bebidas alcoholicas: | a. No | b. Si X | Semanal X | Quincenal | Mensual | Ocasional |

**CONSENTIMIENTO INFORMADO**
Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

Si X | No

**Fecha de diligenciamiento:** 27-04-2026 | **Firma del trabajador:** X



Powered by CamScanner

| CONSORCIO | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-013 |
|---|---|---|---|
| | ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**

**Objetivo de la encuesta:** Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

**I. Registre los siguientes datos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Nombre del Trabajador: | Luis David Ruiz Muñoz. | | |
| 2. Identificación: | 1112.812.500 | | |
| 3. Cargo: | Ayudante de construcción. | | |
| 4. Área (Administrativa/operativa): | Operativo. | | |
| 5. Fecha de nacimiento: | 15-02-2001 | Edad actual: 24 | años |
| 6. Dirección de residencia: | MZ E Lot 11 | Barrio: nuevo Horizonte | |
| 7. Municipio: | Montería. | | |
| 8. Telefono / Celular: | 324 418 5757 | | |
| 9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia: | Mario Sofia Pacheco Vidal | Parentesco: | esposa. |
| 10. Telefono / Celular: 311 713 6273. | | | |

**II. Marque con una X**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Estado Civil: | a. Soltero (a) | b. Casado (a)/union libre X | c. Separado (a)/Divorciado | d. Viudo(a) | | |
| 12. Nivel de escolaridad: | a. Primaria X | b. Bachillerato | c. Técnico / Tecnólogo | d. Pregrado Universitario | e. Postgrado Universitario | |
| 13. Tenencia de vivienda: | a. Propia | b. Arrendada | c. Familiar X | d. Compartida con otra(s) familia(s) | | |
| 14. Estrato: | a. 1 X | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | f. 6 o mas |
| 15. Numero de personas a cargo: | a. Ninguna | b. 1 - 3 personas X | c. 4 - 6 personas | d. Más de 6 personas | | |
| 16. Uso del tiempo libre: | a. Otro trabajo | b. Labores domésticas | c. Recreacion y deporte | d. Estudio | e. Ninguno X | |
| 17. Practica algún deporte: | a. No X | b. Si | Diario | Semanal | Quincenal | Ocasional |
| 18. Promedio de ingresos mensuales: | a. Mínimo Legal (S.M.L.) X | b. Entre 1 a 3 S.M.L. | c. Entre 4 a 5 S.M.L. | d. Entre 5 y 6 S.M.L. | e. Mas de 7 S.M.L. | |
| 19. Antigüedad en la empresa | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 20. Antigüedad en el cargo actual | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 21. Fuma: | a. No X | b. Si | Prom. diario cigarrillos: | | | |
| 22. Consume bebidas alcoholicas: | a. No | b. Si X | Semanal | Quincenal X | Mensual | Ocasional |

**CONSENTIMIENTO INFORMADO**

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

SI X | No

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento: 27-04-2026 | | Firma del trabajador: | LUIS RUIZ MUÑOZ |



Powered by CamScanner

642

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-013 |
| | ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**

**Objetivo de la encuesta:** Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

**I. Registre los siguientes datos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Nombre del Trabajador: | Mario Ruiz. | | |
| 2. Identificación: | 1062954579. | | |
| 3. Cargo: | Ayudante de obra. | | |
| 4. Área (Administrativa/operativa): | Operativa | | |
| 5. Fecha de nacimiento: | 2-11-1996 | Edad actual: | 29 años. |
| 6. Dirección de residencia: | MZ-41-Lot 70 | Barrio: | Santa Fe |
| 7. Municipio: | Montería. | | |
| 8. Telefono / Celular: | 3123489110. | | |
| 9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia: | Denis Ramires. | Parentesco: | Madre. |
| 10. Telefono / Celular: | 3135627586 | | |

**II. Marque con una X**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Estado Civil: | a. Soltero (a) X | b. Casado (a)/union libre | c. Separado (a)/Divorciado | d. Viudo(a) | | |
| 12. Nivel de escolaridad: | a. Primaria | b. Bachillerato X | c. Técnico / Tecnólogo | d. Pregrado Universitario | e. Postgrado Universitario | |
| 13. Tenencia de vivienda: | a. Propia | b. Arrendada | c. Familiar X | d. Compartida con otra(s) familia(s) | | |
| 14. Estrato: | a. 1 X | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | f. 6 o mas |
| 15. Numero de personas a cargo: | a. Ninguna X | b. 1 - 3 personas | c. 4 - 6 personas | d. Más de 6 personas | | |
| 16. Uso del tiempo libre: | a. Otro trabajo | b. Labores domèsticas | c. Recreacion y deporte X | d. Estudio | e. Ninguno | |
| 17. Practica algún deporte: | a. No | b. Si X | Diario | Semanal | Quincenal | Ocasional X |
| 18. Promedio de ingresos mensuales: | a. Mínimo Legal (S.M.L.) X | b. Entre 1 a 3 S.M.L. | c. Entre 4 a 5 S.M.L. | d. Entre 5 y 6 S.M.L. | e. Mas de 7 S.M.L. | |
| 19. Antigüedad en la empresa | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 20. Antigüedad en el cargo actual | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 21. Fuma: | a. No X | b. Si | Prom. diario cigarrillos: | | | |
| 22. Consume bebidas alcoholicas: | a. No | b. Si X | Semanal | Quincenal | Mensual | Ocasional X |

**CONSENTIMIENTO INFORMADO**

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | SI X | No |
| Fecha de diligenciamiento: 27-04-2026 | | Firma del trabajador: | X |



Powered by CamScanner

643

| CONSORCIO | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-013 |
|---|---|---|---|
| | ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**

**Objetivo de la encuesta:** Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

**I. Registre los siguientes datos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Nombre del Trabajador: | Hugo Antonio Vega montiel | | |
| 2. Identificación: | 6.850.870. | | |
| 3. Cargo: | Ayudante de construcción | | |
| 4. Área (Administrativa/operativa): | Operativa | | |
| 5. Fecha de nacimiento: | 5-05-1960 | Edad actual: 66 | años |
| 6. Dirección de residencia: | Mz 3 Lot 13. | Barrio: Mogambo | |
| 7. Municipio: | Montería. | | |
| 8. Telefono / Celular: | 3214364395. | | |
| 9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia: | Hugo Sergio Vega | Parentesco: | Hijo |
| 10. Telefono / Celular: 3115830041 | | | |

**II. Marque con una X**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Estado Civil: | a. Soltero (a) X | b. Casado (a)/union libre | c. Separado (a)/Divorciado | d. Viudo(a) | | |
| 12. Nivel de escolaridad: | a. Primaria X | b. Bachillerato | c. Técnico / Tecnólogo | d. Pregrado Universitario | e. Postgrado Universitario | |
| 13. Tenencia de vivienda: | a. Propia | b. Arrendada X | c. Familiar | d. Compartida con otra(s) familia(s) | | |
| 14. Estrato: | a. 1 X | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | f. 6 o mas |
| 15. Numero de personas a cargo: | a. Ninguna | b. 1 - 3 personas X | c. 4 - 6 personas | d. Más de 6 personas | | |
| 16. Uso del tiempo libre: | a. Otro trabajo | b. Labores domésticas | c. Recreacion y deporte | d. Estudio | e. Ninguno X | |
| 17. Practica algún deporte: | a. No X | b. Si | Diario | Semanal | Quincenal | Ocasional |
| 18. Promedio de ingresos mensuales: | a. Mínimo Legal (S.M.L.) X | b. Entre 1 a 3 S.M.L. | c. Entre 4 a 5 S.M.L. | d. Entre 5 y 6 S.M.L. | e. Mas de 7 S.M.L. | |
| 19. Antigüedad en la empresa | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 20. Antigüedad en el cargo actual | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 21. Fuma: | a. No X | b. Si | Prom. diario cigarrillos: | | | |
| 22. Consume bebidas alcoholicas: | a. No | b. Si X | Semanal X | Quincenal | Mensual | Ocasional |

**CONSENTIMIENTO INFORMADO**
Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

SI X | No

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento 27-04-2026 | | Firma del trabajador: | Hugo Vega Monti |



Powered by CamScanner

644

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-013 |
| | ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**

**Objetivo de la encuesta:** Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

**I. Registre los siguientes datos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Nombre del Trabajador: | Rodrigo segundo Solarsano Guzman | | |
| 2. Identificación: | 78714710 | | |
| 3. Cargo: | oficial de construccion | | |
| 4. Área (Administrativa/operativa): | operativa. | | |
| 5. Fecha de nacimiento: | 25-05-1972. | Edad actual: 54 | años. |
| 6. Dirección de residencia: | MZ. 33 - Lot. #70 | Barrio: Santa Fe. | |
| 7. Municipio: | monteria | | |
| 8. Telefono / Celular: | 3205018189. | | |
| 9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia: | osmira milena solorza. | Parentesco: | Hermana. |
| 10. Telefono / Celular: 3205060247. | | | |

**II. Marque con una X**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Estado Civil: | a. Soltero (a) X | b. Casado (a)/union libre | c. Separado (a)/Divorciado | d. Viudo(a) | | |
| 12. Nivel de escolaridad: | a. Primaria X | b. Bachillerato | c. Técnico / Tecnólogo | d. Pregrado Universitario | e. Postgrado Universitario | |
| 13. Tenencia de vivienda: | a. Propia | b. Arrendada | c. Familiar X | d. Compartida con otra(s) familia(s) | | |
| 14. Estrato: | a. 1 X | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | f. 6 o mas |
| 15. Numero de personas a cargo: | a. Ninguna | b. 1 - 3 personas X | c. 4 - 6 personas | d. Más de 6 personas | | |
| 16. Uso del tiempo libre: | a. Otro trabajo | b. Labores domésticas | c. Recreacion y deporte | d. Estudio | e. Ninguno X | |
| 17. Practica algún deporte: | a. No X | b. Si | Diario | Semanal | Quincenal | Ocasional |
| 18. Promedio de ingresos mensuales: | a. Mínimo Legal (S.M.L.) X | b. Entre 1 a 3 S.M.L. | c. Entre 4 a 5 S.M.L. | d. Entre 5 y 6 S.M.L. | e. Mas de 7 S.M.L. | |
| 19. Antigüedad en la empresa | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 20. Antigüedad en el cargo actual | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 21. Fuma: | a. No X | b. Si | Prom. diario cigarrillos: | | | |
| 22. Consume bebidas alcoholicas: | a. No | b. Si X | Semanal | Quincenal | Mensual | Ocasional X |

**CONSENTIMIENTO INFORMADO**
Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

SI X · No

**Fecha de diligenciamiento:** 27-04-2026 **Firma del trabajador:** Rodrigo Solorzano



Powered by CamScanner

645

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-013 |
|---|---|---|---|
| | ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

**Objetivo de la encuesta:** Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

I. Registre los siguientes datos:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Nombre del Trabajador: | Angel Maria Rivera Ramirez. | | |
| 2. Identificación: | 6.871.651 | | |
| 3. Cargo: | maestro de obra. | | |
| 4. Área (Administrativa/operativa): | Operativa. | | |
| 5. Fecha de nacimiento: | 16-07-1954 | Edad actual: 72 | Años |
| 6. Dirección de residencia: | Kr. 2 # 241. | Barrio: 7 de mayo. | |
| 7. Municipio: | Montería. | | |
| 8. Telefono / Celular: | 3223286941. | | |
| 9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia: | Aide vega. | Parentesco: | Esposa. |
| 10. Telefono / Celular: | 3214861140. | | |

II. Marque con una X

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Estado Civil: | a. Soltero (a) | b. Casado (a)/union libre X | c. Separado (a)/Divorciado | d. Viudo(a) | | |
| 12. Nivel de escolaridad: | a. Primaria | b. Bachillerato X | c. Técnico / Tecnólogo | d. Pregrado Universitario | e. Postgrado Universitario | |
| 13. Tenencia de vivienda: | a. Propia X | b. Arrendada | c. Familiar | d. Compartida con otra(s) familia(s) | | |
| 14. Estrato: | a. 1 X | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | f. 6 o mas |
| 15. Numero de personas a cargo: | a. Ninguna | b. 1 - 3 personas X | c. 4 - 6 personas | d. Más de 6 personas | | |
| 16. Uso del tiempo libre: | a. Otro trabajo | b. Labores domésticas | c. Recreacion y deporte | d. Estudio | e. Ninguno X | |
| 17. Practica algún deporte: | a. No X | b. Si | Diario | Semanal | Quincenal | Ocasional |
| 18. Promedio de ingresos mensuales: | a. Minimo Legal (S.M.L.) X | b. Entre 1 a 3 S.M.L. | c. Entre 4 a 5 S.M.L. | d. Entre 5 y 6 S.M.L. | e. Mas de 7 S.M.L. | |
| 19. Antigüedad en la empresa | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 20. Antigüedad en el cargo actual | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 21. Fuma: | a. No X | b. Si | Prom. diario cigarrillos: | | | |
| 22. Consume bebidas alcoholicas: | a. No X | b. Si | Semanal | Quincenal | Mensual | Ocasional |

| | | |
|---|---|---|
| CONSENTIMIENTO INFORMADO<br>Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación. | Si | No |
| Fecha de diligenciamiento: 27-04-26 | Firma del trabajador: X Angel Rivera | |



Powered by CamScanner

646

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-013 |
|---|---|---|---|
| | ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**

**Objetivo de la encuesta:** Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

**I. Registre los siguientes datos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Nombre del Trabajador: | Manuel Francisco Perez Salgado. | | |
| 2. Identificación: | 15275.012. | | |
| 3. Cargo: | Ayudante de obra. | | |
| 4. Área (Administrativa/operativa): | Operativa. | | |
| 5. Fecha de nacimiento: | 28-08-1959. | Edad actual: 67 | años |
| 6. Dirección de residencia: | MZ-K- Lot #3 | Barrio: paz del | Norte. |
| 7. Municipio: | Montería. | | |
| 8. Telefono / Celular: | 3136943376. | | |
| 9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia: | Isabel Perez | Parentesco: | hija. |
| 10. Telefono / Celular: | 3218380542. | | |

**II. Marque con una X**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Estado Civil: | a. Soltero (a) | b. Casado (a)/union libre X | c. Separado (a)/Divorciado | d. Viudo(a) | | |
| 12. Nivel de escolaridad: | a. Primaria X | b. Bachillerato | c. Técnico / Tecnólogo | d. Pregrado Universitario | e. Postgrado Universitario | |
| 13. Tenencia de vivienda: | a. Propia X | b. Arrendada | c. Familiar | d. Compartida con otra(s) familia(s) | | |
| 14. Estrato: | a. 1 X | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | f. 6 o mas |
| 15. Numero de personas a cargo: | a. Ninguna | b. 1 - 3 personas X | c. 4 - 6 personas | d. Más de 6 personas | | |
| 16. Uso del tiempo libre: | a. Otro trabajo | b. Labores domèsticas | c. Recreacion y deporte | d. Estudio | e. Ninguno X | |
| 17. Practica algún deporte: | a. No X | b. Si | Diario | Semanal | Quincenal | Ocasional |
| 18. Promedio de ingresos mensuales: | a. Minimo Legal (S.M.L.) X | b. Entre 1 a 3 S.M.L. | c. Entre 4 a 5 S.M.L. | d. Entre 5 y 6 S.M.L. | e. Mas de 7 S.M.L. | |
| 19. Antigüedad en la empresa | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 20. Antigüedad en el cargo actual | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 21. Fuma: | a. No X | b. Si | Prom. diario cigarrillos: | | | |
| 22. Consume bebidas alcoholicas: | a. No X | b. Si | Semanal | Quincenal | Mensual | Ocasional |

| | | |
|---|---|---|
| **CONSENTIMIENTO INFORMADO**<br>Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, asi como su posterior actualización y rectificación. | Si X | No |
| Fecha de diligenciamiento: 27-04-2026 | Firma del trabajador: | X Manuel Perez |



Powered by CamScanner

647

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-013 |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO | ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**

**Objetivo de la encuesta:** Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

**I. Registre los siguientes datos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Nombre del Trabajador: | Bernabe Gutierrez Tehenan. | | |
| 2. Identificación: | 9104691 | | |
| 3. Cargo: | Ayudante | | |
| 4. Área (Administrativa/operativa): | Operativa | | |
| 5. Fecha de nacimiento: | 01-07-1978 | Edad actual: 48 | años |
| 6. Dirección de residencia: | B/MZ E-3 Lot-#17. | Barrio: | El Alivio. |
| 7. Municipio: | Montería. | | |
| 8. Telefono / Celular: | 3005591632. | | |
| 9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia: | Denis Hernandez | Parentesco: | Esposa. |
| 10. Telefono / Celular: 3127077756. | | | |

**II. Marque con una X**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Estado Civil: | a. Soltero (a) | b. Casado (a)/union libre X | c. Separado (a)/Divorciado | d. Viudo(a) | | |
| 12. Nivel de escolaridad: | a. Primaria | b. Bachillerato X | c. Técnico / Tecnólogo | d. Pregrado Universitario | e. Postgrado Universitario | |
| 13. Tenencia de vivienda: | a. Propia | b. Arrendada X | c. Familiar | d. Compartida con otra(s) familia(s) | | |
| 14. Estrato: | a. 1 X | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | f. 6 o mas |
| 15. Numero de personas a cargo: | a. Ninguna | b. 1 - 3 personas X | c. 4 - 6 personas | d. Más de 6 personas | | |
| 16. Uso del tiempo libre: | a. Otro trabajo | b. Labores domèsticas | c. Recreacion y deporte | d. Estudio | e. Ninguno X | |
| 17. Practica algún deporte: | a. No | b. Si | Diario | Semanal | Quincenal | Ocasional X |
| 18. Promedio de ingresos mensuales: | a. Mínimo Legal (S.M.L.) X | b. Entre 1 a 3 S.M.L. | c. Entre 4 a 5 S.M.L. | d. Entre 5 y 6 S.M.L. | e. Mas de 7 S.M.L. | |
| 19. Antigüedad en la empresa | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 20. Antigüedad en el cargo actual | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 21. Fuma: | a. No X | b. Si | Prom. diario cigarrillos: | | | |
| 22. Consume bebidas alcoholicas: | a. No | b. Si X | Semanal | Quincenal | Mensual | Ocasional X |

| | | |
|---|---|---|
| **CONSENTIMIENTO INFORMADO**<br>Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación. | SI X | No |
| Fecha de diligenciamiento: 27-04-26 | Firma del trabajador: | |



Powered by CamScanner

648

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-013 |
|---|---|---|---|
| | ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**

**Objetivo de la encuesta:** Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

**I. Registre los siguientes datos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Nombre del Trabajador: | Luis Alfredo Urtado | | |
| 2. Identificación: | 6-857-706 | | |
| 3. Cargo: | oficial de obra. | | |
| 4. Área (Administrativa/operativa): | Operativa. | | |
| 5. Fecha de nacimiento: | 13-07-1942. | Edad actual: 83 | años. |
| 6. Dirección de residencia: | Calle 2 # 232 | Barrio: 20 de Julio. | |
| 7. Municipio: | Montería. | | |
| 8. Telefono / Celular: | 3114243674. | | |
| 9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia: | orlando Hurtado | Parentesco: | Hijo. |
| 10. Telefono / Celular: | | | |

**II. Marque con una X**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Estado Civil: | a. Soltero (a) | b. Casado (a)/union libre X | c. Separado (a)/Divorciado | d. Viudo(a) | | |
| 12. Nivel de escolaridad: | a. Primaria X | b. Bachillerato | c. Técnico / Tecnólogo | d. Pregrado Universitario | e. Postgrado Universitario | |
| 13. Tenencia de vivienda: | a. Propia X | b. Arrendada | c. Familiar | d. Compartida con otra(s) familia(s) | | |
| 14. Estrato: | a. 1 X | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | f. 6 o mas |
| 15. Numero de personas a cargo: | a. Ninguna | b. 1 - 3 personas X | c. 4 - 6 personas | d. Más de 6 personas | | |
| 16. Uso del tiempo libre: | a. Otro trabajo | b. Labores domèsticas | c. Recreacion y deporte | d. Estudio | e. Ninguno X | |
| 17. Practica algún deporte: | a. No | b. Si X | Diario | Semanal | Quincenal | Ocasional X |
| 18. Promedio de ingresos mensuales: | a. Mínimo Legal (S.M.L.) X | b. Entre 1 a 3 S.M.L. | c. Entre 4 a 5 S.M.L. | d. Entre 5 y 6 S.M.L. | e. Mas de 7 S.M.L. | |
| 19. Antigüedad en la empresa | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 20. Antigüedad en el cargo actual | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 21. Fuma: | a. No X | b. Si | Prom. diario cigarrillos: | | | |
| 22. Consume bebidas alcoholicas: | a. No | b. Si X | Semanal | Quincenal | Mensual | Ocasional X |

| | | |
|---|---|---|
| **CONSENTIMIENTO INFORMADO**<br>Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación. | Si | No |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento: 27-04-26 | | Firma del trabajador: | X No Firma. |



Powered by CamScanner

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-013 |
|---|---|---|---|
| | ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

**PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**

**Objetivo de la encuesta:** Recolectar información para establecer el perfil sociodemografico de la población trabajadora, como herramienta complementaria para la gestión de la seguridad y salud en el Trabajo del proyecto.

**I. Registre los siguientes datos:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Nombre del Trabajador: | Epatia Rosa Villalobos Molina. | | |
| 2. Identificación: | 50905356 | | |
| 3. Cargo: | Aux - SST | | |
| 4. Área (Administrativa/operativa): | Administrativa. | | |
| 5. Fecha de nacimiento: | 14-04-1974. | Edad actual: 52 | años |
| 6. Dirección de residencia: | calle 95 #481 | Barrio: Mocarí | Sec-Parcela |
| 7. Municipio: | Montería. | | |
| 8. Telefono / Celular: | 3173236929. | | |
| 9. Nombre de persona de contacto en caso de una emergencia: | Daladiel Lopez. G. | Parentesco: | Esposo. |
| 10. Telefono / Celular: 3146055544. | | | |

**II. Marque con una X**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Estado Civil: | a. Soltero (a) | b. Casado (a)/union libre X | c. Separado (a)/Divorciado | d. Viudo(a) | | |
| 12. Nivel de escolaridad: | a. Primaria | b. Bachillerato | c. Técnico / Tecnólogo X | d. Pregrado Universitario | e. Postgrado Universitario | |
| 13. Tenencia de vivienda: | a. Propia X | b. Arrendada | c. Familiar | d. Compartida con otra(s) familia(s) | | |
| 14. Estrato: | a. 1 X | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5 | f. 6 o mas |
| 15. Numero de personas a cargo: | a. Ninguna | b. 1 - 3 personas X | c. 4 - 6 personas | d. Más de 6 personas | | |
| 16. Uso del tiempo libre: | a. Otro trabajo | b. Labores domèsticas | c. Recreacion y deporte | d. Estudio X | e. Ninguno | |
| 17. Practica algún deporte: | a. No | b. Si X | Diario | Semanal | Quincenal | Ocasional X |
| 18. Promedio de ingresos mensuales: | a. Minimo Legal (S.M.L.) X | b. Entre 1 a 3 S.M.L. | c. Entre 4 a 5 S.M.L. | d. Entre 5 y 6 S.M.L. | e. Mas de 7 S.M.L. | |
| 19. Antigüedad en la empresa | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 20. Antigüedad en el cargo actual | a. Menos de 6 meses X | b. entre 6 y 12 meses | c. Mas de 1 años | | | |
| 21. Fuma: | a. No X | b. Si | Prom. diario cigarrillos: | | | |
| 22. Consume bebidas alcoholicas: | a. No X | b. Si | Semanal | Quincenal | Mensual | Ocasional |

| | | |
|---|---|---|
| **CONSENTIMIENTO INFORMADO**<br>Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación. | Si | No |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento: 27-04-2026 | | Firma del trabajador: | Epatia R. Villalobos. |



Powered by CamScanner

# ANEXO N° 8.2.

# TABULACIÓN DEL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-014 |
|---|---|---|---|
| | PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| | PARTE 1 | | |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SI-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE CIUDADANIA | CARGO | TIPO DE VINCULACIÓN | FECHA DE INGRESO | EPS | ARL | AFP | AREA | SUELDO / HONORARIOS | ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA | ANTIGÜEDAD EN EL CARGO | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD DE JESUS RAMOS MARTINEZ | 11.154.364 | AYUDANTE DE OBRA | INDEPENDIENTE | 23/04/2026 | EN TRAMITE | SURA | EN TRAMITE | OPERATIVA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V.) | MENOS DE 6 MESES | MENOS DE 6 MESES | |
| 2 | ARGUIN ANTONIO CARVAJAL RODRIGUEZ | 11.004.806 | MAESTRO DE OBRA | INDEPENDIENTE | 23/04/2026 | EN TRAMITE | SURA | EN TRAMITE | OPERATIVA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V.) | MENOS DE 6 MESES | MENOS DE 6 MESES | |
| 3 | MARIO ANTONIO VERTEL CAUSIL | 6.885.013 | OFICIAL DE OBRA | INDEPENDIENTE | 23/04/2026 | EN TRAMITE | SURA | EN TRAMITE | OPERATIVA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V.) | MENOS DE 6 MESES | MENOS DE 6 MESES | |
| 4 | ARLEN JOSE ALVAREZ BELLO | 78.694.359 | OFICIAL DE OBRA | INDEPENDIENTE | 23/04/2026 | EN TRAMITE | SURA | EN TRAMITE | OPERATIVA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V.) | MENOS DE 6 MESES | MENOS DE 6 MESES | |
| 5 | LUIS DAVID RUIZ MUÑOZ | 1.192.812.590 | AYUDANTE DE OBRA | INDEPENDIENTE | 23/04/2026 | EN TRAMITE | SURA | EN TRAMITE | OPERATIVA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V.) | MENOS DE 6 MESES | MENOS DE 6 MESES | |
| 6 | MARIO RUIZ | 1.062.954.579 | AYUDANTE DE OBRA | INDEPENDIENTE | 23/04/2026 | EN TRAMITE | EN TRAMITE | EN TRAMITE | OPERATIVA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V.) | MENOS DE 6 MESES | MENOS DE 6 MESES | 28/04/2026 |
| 7 | HUGO ANTONIO VEGA MONTIEL | 6.880.879 | AYUDANTE DE OBRA | INDEPENDIENTE | 23/04/2026 | EN TRAMITE | SURA | EN TRAMITE | OPERATIVA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V.) | MENOS DE 6 MESES | MENOS DE 6 MESES | |
| 8 | RODRIGO SEGUNDO SOLORZANO GUZMAN | 78.714.110 | OFICIAL DE OBRA | INDEPENDIENTE | 23/04/2026 | EN TRAMITE | SURA | EN TRAMITE | OPERATIVA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V.) | MENOS DE 6 MESES | MENOS DE 6 MESES | |
| 9 | ANGEL MARIA RIVERA RAMIREZ | 6.891.651 | MAESTRO DE OBRA | INDEPENDIENTE | 27/04/2026 | EN TRAMITE | EN TRAMITE | EN TRAMITE | OPERATIVA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V.) | MENOS DE 6 MESES | MENOS DE 6 MESES | |
| 10 | MANUEL FRANCISCO PEREZ SALGADO | 15.275.012 | AYUDANTE DE OBRA | INDEPENDIENTE | 27/04/2026 | EN TRAMITE | SURA | EN TRAMITE | OPERATIVA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V.) | MENOS DE 6 MESES | MENOS DE 6 MESES | |
| 11 | BERNABE GUTIERREZ TEHERAN | 9.104.691 | AYUDANTE DE OBRA | INDEPENDIENTE | 27/04/2026 | EN TRAMITE | SURA | EN TRAMITE | OPERATIVA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V.) | MENOS DE 6 MESES | MENOS DE 6 MESES | |
| 12 | LUIS ALFREDO HURTADO | 6.857.206 | OFICIAL DE OBRA | INDEPENDIENTE | 27/04/2026 | EN TRAMITE | SURA | EN TRAMITE | OPERATIVA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V.) | MENOS DE 6 MESES | MENOS DE 6 MESES | |
| 13 | IPATIA ROVIRA VILLALOBOS MOLINA | 50.905.356 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | DEPENDIENTE | 23/04/2026 | EN TRAMITE | SURA | EN TRAMITE | ADMINISTRATIVA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V.) | MENOS DE 6 MESES | MENOS DE 6 MESES | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



151

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-014 |
| | PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| | PARTE 2 | | |
| CONTRATANTE | GOBERNACION DE CORDOBA | CONTRATO N° | SILP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CORDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA."

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE CIUDADANIA | FECHA DE NACIMIENTO | NIVEL DE ESCOLARIDAD | DIRECCIÓN DE RESIDENCIA | MUNICIPIO | TELEFONO | PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA | TELEFONO | ESTADO CIVIL | TENENCIA DE VIVIENDA | ESTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD DE JESUS RAMOS MARTINEZ | 11.154.364 | 11/08/1976 | BACHILLERATO | VEREDA LEBIA (SAN CARLOS) | MONTERIA | 3126020208 | DINA MOLINA | 3126020208 | CASADO/UNION LIBRE | PROPIA | 1 |
| 2 | ARGLIN ANTONIO CARVAJAL RODRIGUEZ | 11.004.806 | 28/05/1977 | BACHILLERATO | CALLE 8 NO 80-27 BARRIO LOS ARROYOS | MONTERIA | 3215093989 | CLEIRA MOLINA | 3218121078 | CASADO/UNION LIBRE | ARRENDADA | 1 |
| 3 | MARIO ANTONIO VERTEL CAUSIL | 6.885.013 | 25/08/1960 | BACHILLERATO | MZ 16 LOTE 23 BARRIO VILLA CIELO | MONTERIA | 3012147099 | VIANI VERTEL | 3132181852 | CASADO/UNION LIBRE | PROPIA | 1 |
| 4 | ARLEN JOSE ALVAREZ BELLO | 78.694.359 | 25/08/1967 | BACHILLERATO | MZ 58 LOTE 29 BARRIO VILLA PAZ | NO INFORMA | 3136403970 | AMPARO ARRIETA | 3216991251 | CASADO/UNION LIBRE | PROPIA | 1 |
| 5 | LUIS DAVID RUIZ MUÑOZ | 1.192.812.500 | 15/02/2001 | PRIMARIA | MZ E LOTE 11 BARRIO NUEVO HORIZONTE | MONTERIA | 3244185757 | MARIA SOFIA PACHECO VIDAL | 3117136273 | CASADO/UNION LIBRE | FAMILIAR | 1 |
| 6 | MARIO RUIZ | 1.062.954.579 | 2/11/1996 | BACHILLERATO | MZ 41 LOTE 10 BARRIO SANTA FE | MONTERIA | 3123489110 | DENIS RAMIREZ | 3135627586 | SOLTERO | FAMILIAR | 1 |
| 7 | HUGO ANTONIO VEGA MONTIEL | 6.880.870 | 5/05/1969 | PRIMARIA | MZ 3 LOTE 13 BARRIO MOGAMBO | MONTERIA | 3214364395 | HUGO SERGIO VEGA | 3118830041 | SOLTERO | ARRENDADA | 1 |
| 8 | RODRIGO SEGUNDO SOLORZANO GUZMAN | 78.714.110 | 25/05/1972 | PRIMARIA | MZ 33 LOTE 10 BARRIO SANTA FE | MONTERIA | 3295018189 | OSMIRA MILENA SOLORZANO | 3205060247 | SOLTERO | FAMILIAR | 1 |
| 9 | ANGEL MARIA RIVERA RAMIREZ | 6.891.651 | 16/07/1954 | BACHILLERATO | CRA 2 NO 249 BARRIO 7 DE MAYO | MONTERIA | 3223286941 | AIDE VEGA | 3214861140 | CASADO/UNION LIBRE | PROPIA | 1 |
| 10 | MANUEL FRANCISCO PEREZ SALGADO | 15.275.012 | 28/08/1959 | PRIMARIA | MZ K LOTE 3 BARRIO PAZ DEL NORTE | MONTERIA | 3136943376 | ISABEL PEREZ | 3218380542 | CASADO/UNION LIBRE | PROPIA | 1 |
| 11 | BERNABE GUTIERREZ TEHERAN | 9.104.691 | 16/09/1978 | BACHILLERATO | MZ E31 LOTE 19 BARRIO EL ALMIO | MONTERIA | 3005591632 | DENIS HERNANDEZ | 3127071756 | CASADO/UNION LIBRE | ARRENDADA | 1 |
| 12 | LUIS ALFREDO HURTADO | 6.857.206 | 13/07/1942 | PRIMARIA | CALLE 2 NO 232 BARRIO 20 DE JULIO | MONTERIA | 3114243674 | ORLANDO HURTADO | NO INFORMA | CASADO/UNION LIBRE | PROPIA | 1 |
| 13 | IPATIA ROVIRA VILLALOBOS MOLINA | 50.905.356 | 14/04/1974 | TECNICO/TECNOLOGO | CALLE 95 NO 481 BARRIO MOCARI | MONTERIA | 3173239929 | BALADIEL LOPEZ | 3148055644 | CASADO/UNION LIBRE | PROPIA | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |



52

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CALIDAD Y SST) | CÓDIGO: | FOR-014 |
|---|---|---|---|
| | PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | VERSIÓN: | 001 |
| | PARTE 3 | | |
| CONTRATANTE | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA | CONTRATO N° | SS-LP-011-2025 |
| EJECUTOR DEL CONTRATO | CONSORCIO RED VITAL CÓRDOBA | TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| ALCANCE DE APLICACIÓN DEL FORMATO | CONTRATO O PROYECTO ESPECIFICO | | |

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL, DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE CIUDADANIA | N° PERSONAS A CARGO | USO DEL TIEMPO LIBRE | PRACTICA ALGUN DEPORTE | FRECUENCIA EN QUE PRACTICA EL DEPORTE | INGRESO PROMEDIO MENSUAL | FUMA | PROMEDIO DIARIO (CIGARRILLOS) | CONSUME BEBIDAS ALCOHLICAS | FRECUENCIA DE CONSUMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD DE JESUS RAMOS MARTINEZ | 11.154.364 | 1 - 3 PERSONAS | NINGUNO | SI | OCASIONAL | MINIMO LEGAL (S.M.L.V) | NO | NO FUMA | SI | OCASIONAL |
| 2 | ARGUIN ANTONIO CARVAJAL RODRIGUEZ | 11.004.806 | 1 - 3 PERSONAS | NINGUNO | SI | OCASIONAL | MINIMO LEGAL (S.M.L.V) | NO | NO FUMA | SI | OCASIONAL |
| 3 | MARIO ANTONIO VERTEL CAUSIL | 6.885.013 | 1 - 3 PERSONAS | NINGUNO | SI | OCASIONAL | MINIMO LEGAL (S.M.L.V) | NO | NO FUMA | SI | OCASIONAL |
| 4 | ARLEN JOSE ALVAREZ BELLO | 78.694.359 | 1 - 3 PERSONAS | NINGUNO | SI | OCASIONAL | MINIMO LEGAL (S.M.L.V) | NO | NO FUMA | SI | SEMANAL |
| 5 | LUIS DAVID RUIZ MUÑOZ | 1.192.812.500 | 1 - 3 PERSONAS | NINGUNO | NO | NO PRACTICA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V) | NO | NO FUMA | SI | QUINCENAL |
| 6 | MARIO RUIZ | 1.062.954.579 | NINGUNA | RECREACION Y DEPORTE | SI | OCASIONAL | MINIMO LEGAL (S.M.L.V) | NO | NO FUMA | SI | OCASIONAL |
| 7 | HUGO ANTONIO VEGA MONTIEL | 6.880.870 | 1 - 3 PERSONAS | NINGUNO | NO | NO PRACTICA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V) | NO | NO FUMA | SI | SEMANAL |
| 8 | RODRIGO SEGUNDO SOLORZANO GUZMAN | 78.714.110 | 1 - 3 PERSONAS | NINGUNO | NO | NO PRACTICA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V) | NO | NO FUMA | SI | OCASIONAL |
| 9 | ANGEL MARIA RIVERA RAMIREZ | 6.891.651 | 1 - 3 PERSONAS | NINGUNO | NO | NO PRACTICA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V) | NO | NO FUMA | NO | NO CONSUME |
| 10 | MANUEL FRANCISCO PEREZ SALGADO | 15.275.012 | 1 - 3 PERSONAS | NINGUNO | NO | NO PRACTICA | MINIMO LEGAL (S.M.L.V) | NO | NO FUMA | NO | NO CONSUME |
| 11 | BERNABE GUTIERREZ TEHERAN | 9.104.691 | 1 - 3 PERSONAS | NINGUNO | SI | OCASIONAL | MINIMO LEGAL (S.M.L.V) | NO | NO FUMA | SI | OCASIONAL |
| 12 | LUIS ALFREDO HURTADO | 6.857.295 | 1 - 3 PERSONAS | NINGUNO | SI | OCASIONAL | MINIMO LEGAL (S.M.L.V) | NO | NO FUMA | SI | OCASIONAL |
| 13 | IPATIA ROVIRA VILLALOBOS MOLINA | 50.905.356 | 1 - 3 PERSONAS | ESTUDIO | SI | OCASIONAL | MINIMO LEGAL (S.M.L.V) | NO | NO FUMA | NO | NO CONSUME |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



653

# ANEXO N° 9.

# CUESTIONARIO NORDICO
