INFORME DE ACTIVIDADES No. 4

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC No. 2071 de 2025

OBJETO:

Contrato interadministrativo suscrito entre MINISTERIOR DE MINAS Y ENERGÍA – MME y la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. – ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. para la "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"

LUGAR EJECUCIÓN: NORTE DE SANTANDER

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
V1.0	16/06/2026	Creación Informe Mensual No. 4 Contrato GGC No. 2071 de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3

3. ALCANCE DEL INFORME 4

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4

4.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC NO. 2071 DE 2025 4
4.2 MODIFICACIONES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4
4.3 GARANTÍAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4
4.4 AVANCE CRONOGRAMA CONTRACTUAL 5
4.4.1 ETAPA 1 – ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN 6

5. PROCESOS CONTRACTUALES 7

5.1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ADMINISTRACIÓN EXTERNA) – CON26-13EC 7
5.1.1 MODIFICACIONES CON26-13EC 7
5.1.2 GARANTÍAS CON26-13EC 7
5.2 CONTRATO DE OBRA – CON26-16EC 8
5.2.1 GARANTÍAS CON24-65EC 9

6. GESTIÓN FINANCIERA 9

6.1 CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO 9
6.2 INFORMES ENCARGOS FIDUCIARIOS 9
6.3 BALANCE FINANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC NO. 2071-2025. 9
6.4 BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – CON26-13EC 10
6.5 BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA – CON26-16EC 10

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10

1. INTRODUCCIÓN

Este informe describe las actividades más relevantes que ha desarrollado el ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P en cumplimiento de las obligaciones contraídas por la suscripción del Contrato Interadministrativo GGC No. 2071 de 2025 cuyo objeto es ***"IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"***

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto en ejecución se encuentra ubicado en los municipios de Teorama, El Carmen, Convención, Hacarí, San Calixto y Tibú en el Departamento Norte de Santander, cuya capital departamental es Cúcuta. En el departamento se implementarán 3783 soluciones fotovoltaicas.

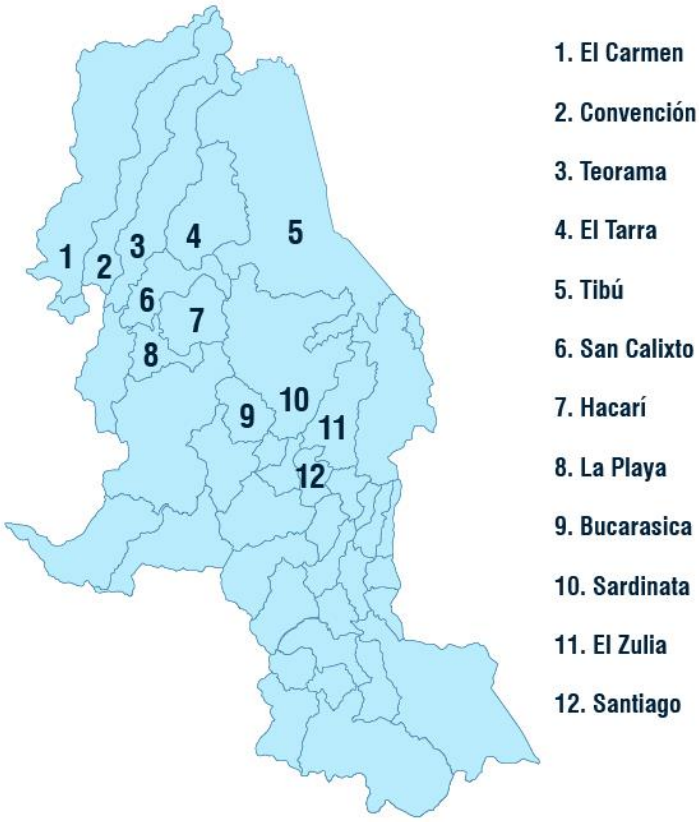


Imagen 1. Norte de Santander

3. ALCANCE DEL INFORME

El presente informe se presenta con el fin de informar y notificar las actividades jurídicas, financieras, técnicas y demás actividades administrativas desarrolladas por ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P, de conformidad con el Contrato Interadministrativo GGC No. 2071 de 2025.

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

4.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC NO. 2071 DE 2025

Contrato	Contrato Interadministrativo GGC No. 2071 de 2025
Fecha de firma	10 de diciembre de 2025
Contratante	Ministerio de Minas y Energía
Contratista	Electrificadora del Caquetá S.A E.S.P - ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P Nit 891.190.127-3
Objeto	IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARESFOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
Valor inicial	CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 121.589.085.878,00)
Fecha de Acta de Inicio	14 de enero de 2026
Fecha de inicio	14 de enero de 2026
Plazo inicial de ejecución	31 de JULIO DE 2026

4.2 MODIFICACIONES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Al cierre del presente informe no se han generado modificaciones contractuales en el contrato interadministrativo.

4.3 GARANTÍAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Teniendo en cuenta la **CLÁSULA DÉCIMA NOVENA – GARANTÍAS DEL CONTRATISTA,** del contrato interadministrativo GGC No. 2071 de 2025:

El día 10 de diciembre de 2025, se expide la póliza de cumplimiento No. CHU-100064682 – **Anexo 0**, con la COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Según **firma del contrato**.

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
CUMPLIMIENTO	DESDE 10/12/2025 HASTA 31/01/2029	$ 24.317.817.175,60
PRESTACIONES SOCIALES	DESDE 10/12/2025 HASTA 31/07/2029	$ 6.079.454.293,90
CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE 10/12/2025 HASTA 31/07/2027	$ 24.317.817.175,60
TOTAL		**$ 54.715.088.645,10**

Las Pólizas fueron actualizadas en la plataforma SECOP II de acuerdo con las garantías solicitadas en la ejecución del contrato.

4.4 AVANCE CRONOGRAMA CONTRACTUAL

Durante el presente informe, se adelantan actividades de Etapa 1 y Etapa 2 del cronograma interadministrativo.

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	TIEMPO (DIAS)	FECHA FINAL	%	Documento soporte
1	**Etapa 1 - Actividades previas a la contratación y contratación**	**21/12/2025**	**85**	**15/03/2026**	**20%**	**Entregable**
1,1	Firma de Acta de Inicio con Ministerio de Minas y Energía	21/12/2025	25	14/01/2026	1%	Acta de Inicio Firmada
1,2	Suscripción del contrato de encargo fiduciario	21/12/2025	10	30/12/2025	5%	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
1,3	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad	21/12/2025	10	30/12/2025	1%	Certificación
1,4	Elaboración y publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, para la contratación de los Contratos derivados de obra e Interventoría.	30/12/2025	37	4/02/2026	5%	Términos de referencia y soporte de publicación en página Web
1,5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	5/02/2026	10	14/02/2026	2%	Actas de evaluación de comité evaluador
1,6	Firma de contratos y suscripción de Acta de inicio	15/02/2026	13	27/02/2026	2%	Contrato de Interventoría y su respectiva Acta de inicio
1,7	Cronograma del contratista de Obra. Aprobado por interventoría y avalado por ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P.	28/02/2026	15	14/03/2026	1%	Cronograma de contratista de obra
1,8	Verificación de ingeniería de detalle aprobada por el interventor y el listado de usuarios y/o comunidades energéticas	28/02/2026	15	14/03/2026	2%	Informe de ajustes técnicos
1,9	Firma Acta de terminación de las Actividades previas a la contratación y contratación, entre ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P., SU CONTRATISTA DERIVADO, EL INTERVENTOR Y EL MME	15/03/2026	1	15/03/2026	1%	Acta firmada
2	**Etapa 2 - Ejecución de Recursos, Supervisión, Plan de Gestión y Formación Social de la comunidad energética, y Entrega Integral de la Infraestructura**	**16/03/2026**	**125**	**19/07/2026**	**70%**	**Entregable**
2,1	Verificación de listado de Comunidades Energéticas y usuarios asociados beneficiarios del proyecto	16/03/2026	12	27/03/2026	5%	Informe con soportes y Acta de Verificación
2,2	Entrega y aprobación de replanteo	16/03/2026	12	27/03/2026	5%	Informe de replanteo
2,3	Instalación de dos (2) vallas informativas	16/03/2026	30	14/04/2026	1%	Registro fotográfico
2,4	Compra de los equipos y materiales electricos y civiles y transporte a bodega	16/03/2026	15	30/03/2026	5%	Informes y órdenes de compra
2,5	Avance de obra al 10%	28/03/2026	20	16/04/2026	5%	Informe y Acta de recibo parcial - Certificación
2,6	Avance de obra al 60%	28/03/2026	80	15/06/2026	20%	Informe y Acta de recibo parcial - Certificación
2,7	Acta de recibo final de obras 100%	28/03/2026	94	29/06/2026	14%	Acta de Recibo final terminación / Inventario de equipos
2,8	Capacitación a las Comunidades Energéticas y sus usuarios asociados, en el marco de la Escuela TEJ	28/03/2026	90	25/06/2026	5%	Informes mensuales
2,9	Acta de recibo y entrega final entre el administrador, contratista de obra e interventoría	30/06/2026	10	9/07/2026	5%	Actas de recibo entre contratista de interventoría y obra
2,10	Acta de recibo y entrega de la infraestructura energizada, suscrita entre el CONTRATISTA, INTERVENTOR, CONTRATISTA DERIVADO DE IMPLEMENTACIÓN,	10/07/2026	10	19/07/2026	5%	Actas de recibo suscritas entre el MME, ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P., contratista de obra e interventoría.

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	TIEMPO (DIAS)	FECHA FINAL	%	Documento soporte
	SUPERVISOR DEL MINISTERIO Y COMUNIDAD ENERGÉTICA.					
3	**Etapa 3 - Actividades de Cierre**	**19/07/2026**	**12**	**31/07/2026**	**10%**	**Entregable**
3,1	Suscribir acta de liquidación contrato derivado de obra	19/07/2026	5	23/07/2026	1%	Acta de liquidación firmada por CONTRATISTA DERIVADO y ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. con Vo.Bo. de la Interventoría
3,2	Suscribir acta de liquidación contrato de Interventoría	23/07/2026	5	27/07/2026	1%	Acta de liquidación firmada por la INTERVENTORÍA y ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P.
3,3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre y liquidación del Encargo Fiduciario	23/07/2026	8	30/07/2026	2%	Acta de terminación de contrato de encargo fiduciario
3,4	Presentación informe final y documentación soporte por parte de ELECTROCAQUETA S.A E.S.P.	19/07/2026	11	29/07/2026	4%	Informe final y soportes
3,5	Presentar el proyecto del Acta de Liquidación con los respectivos soportes solicitados por el MME, para la liquidación del contrato interadministrativo.	19/07/2026	13	31/07/2026	2%	Acta de liquidación

4.4.1 ETAPA 1 – ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN

✓ **Item 1.1 - Firma de Acta de Inicio con Ministerio de Minas y Energía**

El día 14 de enero de 2026 se suscribió Acta de Inicio entre ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC No. 2071 de 2025.

✓ **Item 1.2 – Suscripción Encargo fiduciario**

Se suscribió Contrato de Encargo fiduciario irrevocable de administración y pagos celebrado entre la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. y Fiduciaria de Occidente S.A.

✓ **Item 1.3 – Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad**

La junta directiva de ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P; aprobó la incorporación de recursos al presupuesto de la entidad y la vigencia fiscal 2025 mediante Registro Presupuestal RP 781125 firmado el día 11 de diciembre de 2025 según información Acta de Inicio.

✓ **Item 1.4 - Elaboración y publicación de pliegos invitación, términos de referencia o documento equivalente, para la contratación de los Contratos derivados de obra e Interventoría.**

De acuerdo con las estructuraciones de contratación de ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P; se elaboraron los términos de referencia de contratos derivados y se hizo su respectiva publicación en plataforma web de ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P.

✓ **Item 1.5 – Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas**

Se suscriben Actas de evaluación del comité evaluador de los contratistas derivados.

✓ **Item 1.6 – Firma de contratos y suscripción de Acta de Inicio**

Se suscriben contratos derivado de la siguiente manera: Contrato de Prestación de Servicios No. CON26-13EC (Administración externa) y Contrato de Obra No. CON26-16EC.
Se suscriben Actas de inicio de los contratos derivados.

- ✓ **Item 1.7 - Cronograma del contratista de Obra. Aprobado por interventoría y avalado por ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P.**

  Se presentan cronograma de obra avalado por parte de interventoría del día 30 de marzo de 2025.

5. PROCESOS CONTRACTUALES

5.1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ADMINISTRACIÓN EXTERNA) – CON26-13EC

Se suscribe el día 05 de febrero de 2026, el contrato de prestación de servicios No. CON26-13EC con el objetivo de realizar la administración externa de las obras del contrato interadministrativo No. 205-2024.

Contrato de Obra No.	CON26-13EC
Contratante	Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
Contratista	UNION TEMPORAL ENERGÍA SOLAR INTEGRAL
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN EXTERNA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE TEOREMA. EL CARMEN, CONVENCIÓN, HACARÍ, SAN CALIXTO Y TIBÚ, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2071-2025.
Valor contrato	Cinco mil cuatrocientos setenta y un millones veintidós mil novecientos treinta y ocho pesos m/cte ($ 5.471.022.938,00)
Plazo de ejecución contractual	Seis (06) meses
Firma del Contrato	05 de febrero de 2026
Otrosí No. 01	23 de febrero de 2026
Acta de Inicio	06 de marzo de 2026
Finalización según Acta de Inicio:	05 de septiembre de 2026

5.1.1 MODIFICACIONES CON26-13EC

El día 23 de febrero de 2026, se suscribe **Otrosí No. 01** al contrato de prestación de servicios CON26-13EC.

El día 06 de marzo de 2026, se suscribe **Acta de Inicio** del contrato de Prestación de servicios CON26-13EC con finalización al 05 de septiembre de 2026.

5.1.2 GARANTÍAS CON26-13EC

Teniendo en cuenta la **CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS,** del contrato de prestación de servicios CON26-13EC:

El día 20 de febrero de 2026 se emite aprobación por parte de la ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P, de la póliza de cumplimiento No. 11-45-101183173 – Anexo 0, con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 16/10/2024 HASTA 26/06/2025	$ 2.777.330.763,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	DESDE 16/10/2024 HASTA 26/06/2025	$ 4.628.884.604,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL	DESDE 16/10/2024 HASTA 26/12/2027	$ 1.388.665.382,00
CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE 16/10/2024 HASTA 26/12/2026	$ 1.388.665.382,00
ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA	DESDE 26/12/2024 HASTA 26/12/2029	$ 2.777.330.763,00
CALIDAD DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	DESDE 16/10/2024 HASTA 26/12/2025	$ 2.777.330.763,00
TOTAL		**$ 15.738.207.657,00**

El día 20 de febrero de 2026 se emite aprobación por parte de la ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P, de la póliza de cumplimiento No. 11-45-101089258 – Anexo 0, con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	DESDE 05/02/2026 HASTA 05/02/2027	$ 1.029.204.587,60
TOTAL		**$ 1.851.553.842,00**

5.2 CONTRATO DE OBRA – CON26-16EC

Se suscribe el día 06 de febrero de 2026, el contrato de obra No. CON26-16EC con el objetivo de realizar la implementación de obras del contrato interadministrativo No. 205-2024.

Contrato de Obra No.	CON26-16EC
Contratante	Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
Contratista	UNION TEMPORAL ENERGÍA SOLAR INTEGRAL
Objeto:	CONSTRUIR SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA USUARIOS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA, EL CARMEN, CONVENCIÓN, HACARÍ, SAN CALIXTO Y TIBU, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2071-2025.
Valor contrato	CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 110.673.154.520,99)
Plazo de ejecución contractual	Seis (06) meses
Firma del Contrato	06 de febrero de 2026
Acta de Inicio	11 de marzo de 2026
Finalización según Acta de Inicio:	10 de septiembre de 2026

El día 11 de marzo de 2026, se suscribe **Acta de Inicio** del contrato de Obra CON26-16EC con finalización al 10 de septiembre de 2026.

5.2.1 GARANTÍAS CON24-65EC

Teniendo en cuenta la **CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS,** del contrato de obra CON26-16EC

El día 25 de marzo de 2026 se emite aprobación por parte de la INTERVENTORÍA del contrato de obra CON26-16EC, de la póliza de cumplimiento No. 96-45-101090059 – Anexo 0, con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A; de la siguiente manera:

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
CUMPLIMIENTO	6/02/2026 HASTA 6/02/2027	$ 22,134,630,904.20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	6/02/2026 HASTA 6/02/2027	$ 55,336,577,260.50
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6/02/2026 HASTA 6/08/2029	$ 16,600,973,178.15
CALDIAD DE SERVICIO	6/02/2026 HASTA 6/08/2028	$ 16,600,973,178.15
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 0 DIAS	$ 33,201,946,356.30
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 0 DIAS	$ 33,201,946,356.30
TOTAL, VALOR ASEGURADO		$ 177,077,047,233.60

También, el día 25 de marzo de 2026 se emite aprobación por parte de la INTERVENTORÍA del contrato de obra CON26-16EC, de la póliza de cumplimiento No. 96-40-1011072870 – Anexo 0, con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A; de la siguiente manera:

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	6/02/2026 HASTA 6/02/2027	$ 22,134,630,904.20
TOTAL, VALOR ASEGURADO		$ 22,134,630,904.20

6. GESTIÓN FINANCIERA

6.1 CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO

Para la administración de los recursos del Contrato Interadministrativo No. 205 de 2024 el día 30 de diciembre de 2025 se suscribió Contrato de Encargo Fiduciario con AVAL FIDUCIARIA.

6.2 INFORMES ENCARGOS FIDUCIARIOS

Se genera informe mensual correspondiente al mes de abril de 2026 y su anexo adjunto. ***(Anexo 6.2)***

6.3 BALANCE FINANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC NO. 2071-2025.

Actualmente se ha tramitado y recibido el pago del PRIMER DESEMBOLSO del contrato interadministrativo GGC 2071 de 2025.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC No. 2071 DE 2025.			
DESEMBOLSO	**PORCENTAJE**	**VALOR**	**NOVEDAD**
1	50%	$ 60,794,542,939.00	**PAGADO**
2	26%	$ 31,613,162,328.00	**SIN TRAMITAR**
3	14%	$ 17,022,472,023.00	**SIN TRAMITAR**

4	10%	$	12,158,908,588.00	**SIN TRAMITAR**
TOTAL		**$**	**121,589,085,878.00**	

Al cierre del presente informe no se han tramitado más desembolsos.

6.4 BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – CON26-13EC

CONTRATO DE OBRA CON26-16EC	
VALOR	$ 5.471.022.938,00
VALOR PAGADO	
SALDO	**$ 5.471.022.938,00**

En el presente mes no se tramitó desembolso al contratista derivado.

6.5 BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA – CON26-16EC

CONTRATO DE OBRA CON26-16EC	
VALOR	$ 110.673.154.520,99
ANTICIPO 50% ANTES DE IVA	$ 55.336.577.260,50
SALDO	$ 55.336.577.260,49

En el presente mes se realizó el trámite del pago por anticipo del 50% antes de IVA del valor total del contrato de obra CON26-16EC.

7. AVANCES CONTRATOS DERIVADOS

7.1 INFORMES MENSUALES

Durante el presente mes abril de realizaron avances en la actividad de replanteo en los municipios de TEORAMA, SAN CALIXTO, HACARÍ, TIBÚ.

Los detalles de dichos avances de replanteo se relacionan en el **ANEXO 7.1 – INFORME INTERVENTORÍA**, el cual cuenta con revisión del **INFORME DE OBRA.**

En el presente informe se adjuntan informes mensuales del mes de marzo y abril de 2026, de los contratistas derivados.
