INFORME TÉCNICO CONVENIO 2347 DE 2025, MINISTERIO DEL INTERIOR - MUNICIPIO DE SAN PABLO, NARIÑO
PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO"

VALOR:	**$ 2.450.000.000**

LOCALIZACIÓN	**CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO**

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO			
DESCRIPCION	**ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA**	**INTERVENTORÍA**	**TOTAL PROYECTO**
VALOR PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 149.827.981,00		
VALOR PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 84.123.457,00	
VALOR PRESUPUESTO DE OBRA	$ 1.846.883.748,00		
VALOR PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA DE OBRA		$ 369.164.814,00	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 1.996.711.729,00**	**$ 453.288.271,00**	**$ 2.450.000.000,00**

VALOR DEL CONVENIO	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($2,450,000,000), incluídos todos los impuestos a que haya lugar, los cuales serán aportados de la siguiente manera: APORTES DEL MINISTERIO – FONSECON: Para la ejecución del proyecto, aporta la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS M/CTE ($2.450.000.000), discriminados así: C. Vigencia 2025. Con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 38225 de fecha 7 de noviembre de 2025 con un saldo por comprometer de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS PESOS MC/TE ($857.500.000), rubro presupuestal A-03-03-01-032 Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON. D. Vigencia 2026. Con cargo al cupo de vigencias futuras autorizadas por el Director General del Presupuesto Público Nacional, mediante radicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público número 2-2025-009332 de fecha 14 de febrero de 2025, el cual se afectará en la suma de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC/TE ($1.592.500.000) APORTES DEL MUNICIPIO: El Municipio de SAN PABLO Departamento de NARIÑO aportará el lote de terreno en el que se ejecutará la obra de infraestructura, individualizado e identificado así:
	<table><tr><th>Datos de identificación</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Dirección actual</td><td>Cra 3. No. 5 - 08 Barrio Bolivar San Pablo</td></tr><tr><td>Nomenclatura y localización</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Número de matrícula inmobiliaria</td><td>246-7654</td></tr><tr><td>No. Catastral:</td><td>526930100000000300017000000000</td></tr><tr><td>Propietario actual</td><td>SAN PABLO-NARIÑO</td></tr><tr><td>Área de predio que pertenece al propietario en referencia</td><td>6.400,00m²</td></tr><tr><td>Servicios públicos con los que cuenta el predio:</td><td>N/A</td></tr></table>
PORTE MINISTERIO DEL INTERIO	$ 2.450.000.000,00

BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO

EJECUTOR:	MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO

FECHA DE CONVENIO:	NOVIEMBRE 7 DE 2025
PLAZO:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 12 DE 2025
FECHA FINAL:	JULIO 31 DE 2026
PÓLIZA No.:	775-47-994000003078 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
SUPERVISOR MUNICIPIO:	ALCALDE MUNICIPAL SAN PABLO

SUPERVISOR MINISTERIO:	MANUEL ANTONIO LINARES

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO"

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	El Municipio de San Pablo, se caracteriza por ser un Municipio receptor de familias víctimas del desplazamiento, la mayoría de ellas ubicadas en la zona rural, a la fecha el Municipio no cuenta con la estrategia de caracterización aplicada, pero se apoya con la información que proporciona la Red Nacional de información de la Unidad para las Victimas, con los datos suministrados por RNI, se pueden adelantar diseños de programas o planes de gobierno, para contribuir en el goce efectivo de derechos de la población víctima. En el municipio, en el año 2019 se presentaron 6 casos de riñas, un hurto a personas y un homicidio, de acuerdo a cifras de la Policía Nacional, y en el primer trimestre de 2020 se presentó un caso de lección por accidente tránsito y una muerte por accidente de tránsito. Aunado a lo anterior, se observa en la siguiente grafica que la tasa de hurtos a comercio presentó un alza considerable desde el 2016 hasta el 2018, mientras que la tasa de hurtos a residencias se redujo en este mismo periodo. Frente a los delitos sexuales, para el año 2019 se presentó una reducción significativa, como se observa en la siguiente gráfica, demostrando que las acciones preventivas y reeducativas tiene efectos positivos en el mediano plazo. Además, la violencia también se presenta contra la pareja, flagelo que debilita la unión familiar, afectando directamente el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes. Violencia intrafamiliar Niños, niñas y adolescentes/Violencia social. A nivel nacional en cuanto al tipo de violencia intrafamiliar en Colombia, la proporción de casos violencia hacia niños, niñas y adolescentes está en tercer lugar (13,7%), después de la violencia de pareja (64,33%) y por otros familiares (20,11%). Al igual que el resto de las violencias intrafamiliares, la mujer es la víctima más frecuente. En el año 2014 se realizaron 10.402 dictámenes por violencia contra niños, niñas y adolescentes; la diferencia con el 2013 es de 694 casos y la tasa por 100.000 habitantes es de 67,14. Se observa que en la última década este tipo de violencia intrafamiliar presenta una tendencia al descenso, más evidente en los tres últimos años. La recreación por su parte es vista como un campo con formado por políticas, instituciones, y organizaciones públicas, privadas, sociales y solidarias, actores, recursos, lenguajes que lo diferencian de otros campos y por un capital simbólico, económico y cultural. Tiene a su cargo la responsabilidad de aportar las condiciones para garantizar a los miembros de una sociedad el acceso al ejercicio de la recreación en un marco de equidad, igualdad y justicia. Teniendo en cuenta la problemática existente en el municipio de San Pablo, se evidencia una descomposición familiar o desintegración familiar, lo cual genera las diferentes problemáticas de violencia intrafamiliar que conllevan a la inasistencia alimentaria, problemas psicológicos y emocionales, posibles casos de abuso sexual, baja autoestima, deserción escolar, consumo de sustancias psicoactivas, y por ende descomposición social evidenciada en la primera infancia, la infancia y la adolescencia del municipio.

JUSTIFICACIÓN:	La Ley 62 de 1993 establece los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana como una herramienta de planeación que atiende las situaciones que alteran la convivencia y la seguridad ciudadana. En este sentido, formular el Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), facilita el trabajo de las autoridad es de policía, pues se convierte en la hoja de ruta que permite priorizar acciones, optimizar el uso de los recursos, realizar una coordinación interinstitucional, y mejora el proceso de seguimiento y evaluación de las estrategias de convivencia y seguridad ciudadana, en todos los municipios y departamentos de Colombia. Teniendo en cuenta la problemática existente en el municipio de San pablo, se evidencia una descomposición familiar o desintegración familiar, lo cual genera las diferentes problemáticas de violencia intrafamiliar que conllevan a la inasistencia alimentaria, problemas psicológicos y emocionales, posibles casos de abuso sexual, baja autoestima, deserción escolar, consumo de sustancias psicoactivas, y por ende descomposición social evidenciada en la primera infancia, la infancia y la adolescencia del municipio. Se deben implementar estrategias, programas, acciones o proyectos de convivencia basados en la unión familiar, el respeto y el amor. Esto con el fin de que la desintegración familiar no afecte internamente a la convivencia del municipio. Teniendo en cuenta que los problemas planteados que influyen directamente en la segregación espacial de la población, es importante que el proyecto permita el desarrollo de las libertades deportivas, recreativas y de actividad física de los niños, jóvenes y población en general, favoreciendo las interacciones, el proyecto proporcionara la ejecución de acciones y programas que se deben realizar en el municipio, dirigidos a la primera infancia, jóvenes, adolescentes y adultos; todo lo anterior con el objeto mejorar la percepción de seguridad y convivencia ciudadana, reduciendo los factores de riesgo y causas asociadas a los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia, por medio del liderazgo interinstitucional y estableciendo una cultura ciudadana de legalidad y sana Convivencia. En virtud de lo anterior es importante dotar al municipio de una INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA, que es un proyecto que se concibe como un espacio de encuentro que promueve el fortalecimiento del tejido social, brindando escenarios de paz, convivencia e inclusión social; en el cual las comunidades podrán disfrutar el tiempo libre positivamente, ya que estos espacios son lugares especiales para la diversión y permiten desarrollar habilidades sociales a los niños, jóvenes y la sociedad en general, fortaleciendo y mejorando, la sana convivencia ciudadana a través de la cultura, la recreación y el deporte, así como la calidad de vida. La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social. En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal (tiene que alcanzar a todas las personas) para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Para esto, existen las fuerzas de seguridad (como la policía), que trabajan en conjunto con el Poder Judicial. Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez que están curso. También es función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de establecer los castigos correspondientes de acuerdo a la ley. Por lo general, las grandes ciudades sufren problemas de seguridad pública, al presentar altas tasas de delitos. En cambio, los pequeños pueblos suelen ofrecer mejores condiciones de seguridad. Esto, en cierta forma, está vinculado a la masividad, ya que los millones de habitantes de una urbe se vuelven anónimos. En los pueblos, es menos probable que una persona pueda delinquir sin que nadie se entere.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	EL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN”, Proyecto que se concibe como un espacio de encuentro que promueve el fortalecimiento del tejido social, brindando escenarios de paz, convivencia e inclusión social; en el cual las comunidades podrán disfrutar el tiempo libre positivamente, ya que estos espacios multifuncionales son lugares especiales que incentivan la integración permitiendo desarrollar habilidades sociales a los niños, jóvenes y la sociedad en general, fortaleciendo y mejorando, la sana convivencia ciudadana a través de la cultura, la recreación y el deporte, así como la calidad de vida. Los siguientes espacios conforman el proyecto Centro de Convivencia Ciudadana “Paz a lo Bien” – Configuración 1A: Área: 1116 m2 • Área polivalente multipropósito • Edificio de servicios • Gimnasio biosaludable • Pista de trote • Zona de juegos infantiles • Urbanismo

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE A INTERVENIR:	Número Matricula: 246-7654 Propietario: San Pablo Nariño Área: 6.400 m²


TIEMPO DE EJECUCIÓN:	Contratación y legalización estudios, diseños, obra e interventorías: 3.5 meses Ejecución estudios y diseños: 1 meses Ejecución de la construcción: 5 meses Retie - Retilap: 1 mes

1. COMPONENTE TÉCNICO **PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:**	Luego de adelantar los procesos licitatorios de los Estudios, Diseños y Obra Civil y la Interventoría, se procederá a iniciar Obra, cuyas principales actividades para ejecutar son las siguientes: Área: 1116 m2 • Área polivalente multipropósito • Edificio de servicios • Gimnasio biosaludable • Pista de trote • Zona de juegos

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	A continuación se relacionan las diferentes comunicaciones entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Pablo con los temas tratados, referentes al Convenio 2347 de 2025.

CORREOS RECIBIDOS DESDE EL MINISTERIO DEL INTERIOR

#	FECHA	ENVIADO POR	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
1	Junio 2 de 2026	Luís Guillermo Torres	Citación a comité presencial del día 02 de junio de 2026 a las 9:00 a.m. para entrega de los estudios y diseños del Convenio 2347 de 2025 suscrito con el municipio de San Pablo – Nariño.	Sin anexos

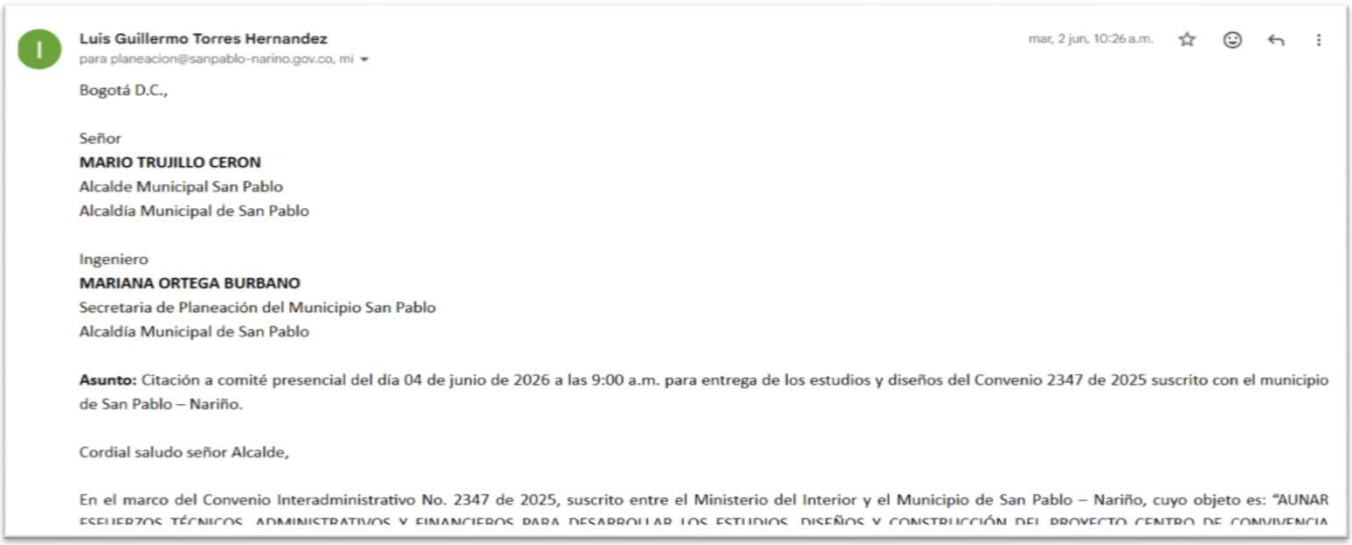

Luis Guillermo Torres Hernandez
para planeacion@sanpablo-narino.gov.co, mi

mar, 2 jun, 10:26 a.m.

Bogotá D.C.,

Señor
MARIO TRUJILLO CERON
Alcalde Municipal San Pablo
Alcaldía Municipal de San Pablo


Ingeniero
MARIANA ORTEGA BURBANO
Secretaria de Planeación del Municipio San Pablo
Alcaldía Municipal de San Pablo

Asunto: Citación a comité presencial del día 04 de junio de 2026 a las 9:00 a.m. para entrega de los estudios y diseños del Convenio 2347 de 2025 suscrito con el municipio de San Pablo – Nariño.

Cordial saludo señor Alcalde,

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 2347 de 2025, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Pablo – Nariño, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA

2	Junio 3 de 2026	Manuel Antonio Linares Donato	ControlDoc - Correspondencia: Se le ha asignado un nuevo documento: 779026 (2026-2-003122-029042)	* AdjuntosDoc_779026 * 779026

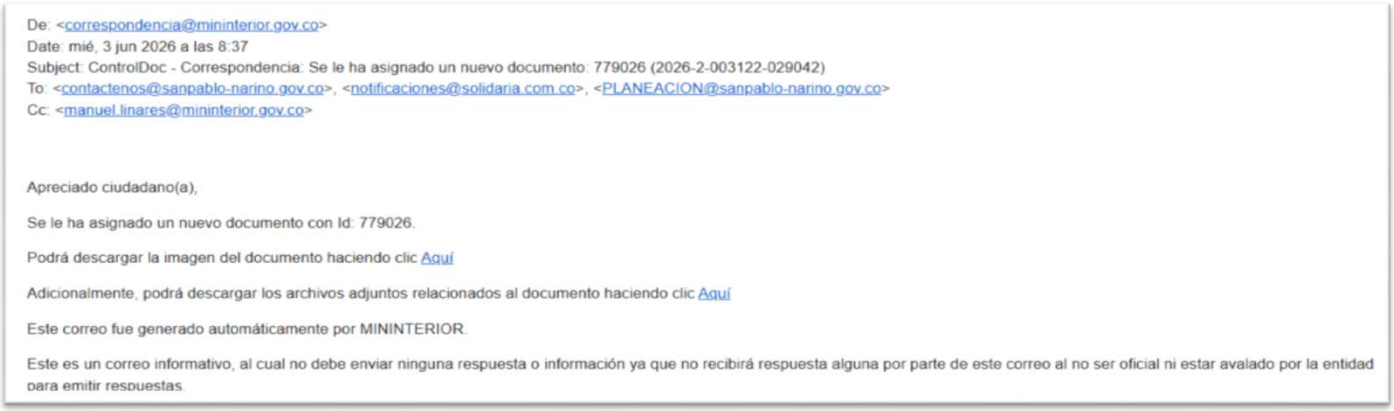

De: <correspondencia@mininterior.gov.co>
Date: mié, 3 jun 2026 a las 8:37
Subject: ControlDoc - Correspondencia: Se le ha asignado un nuevo documento: 779026 (2026-2-003122-029042)
To: <contactenos@sanpablo-narino.gov.co>, <notificaciones@solidaria.com.co>, <PLANEACION@sanpablo-narino.gov.co>
Cc: <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Apreciado ciudadano(a),

Se le ha asignado un nuevo documento con Id: 779026.

Podrá descargar la imagen del documento haciendo clic Aquí

Adicionalmente, podrá descargar los archivos adjuntos relacionados al documento haciendo clic Aquí

Este correo fue generado automáticamente por MININTERIOR.

Este es un correo informativo, al cual no debe enviar ninguna respuesta o información ya que no recibirá respuesta alguna por parte de este correo al no ser oficial ni estar avalado por la entidad para emitir respuestas.

3	jUnio 9 de 2026	Luis Guillermo Torres	Citación a comité virtual seguimiento del convenio 2347 de 2025 San Pablo – Nariño	Sin anexos

De: **Luis Guillermo Torres Hernandez** <luisg.torres@mininterior.gov.co>
Date: mar, 9 jun 2026 a las 15:50
Subject: Citación a comité virtual seguimiento del convenio 2347 de 2025 San Pablo – Nariño
To: planeacion@sanpablo-narino.gov.co <planeacion@sanpablo-narino.gov.co>, Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Cordial saludo

Me dirijo a ustedes en el marco del Convenio No. 2347 de 2025, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Pablo, Nariño. Con el propósito de coordinar un comité de seguimiento del mencionado convenio, se convoca a todas las partes interesadas con el fin de realizar seguimiento a las obligaciones pactadas en el marco del convenio.

Cordialmente;

4	Junio 16 de 2026	Luis Guillermo Torres	Citación a comité virtual seguimiento del convenio 2347 de 2025 San Pablo – Nariño	Sin anexos

De: **Luis Guillermo Torres Hernandez** <luisg.torres@mininterior.gov.co>
Date: mar, 16 jun 2026 a las 9:07
Subject: Citación a comité virtual seguimiento del convenio 2347 de 2025 San Pablo – Nariño
To: planeacion@sanpablo-narino.gov.co <planeacion@sanpablo-narino.gov.co>, Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Cordial saludo

Me dirijo a ustedes en el marco del Convenio No. 2347 de 2025, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Pablo, Nariño. Con el propósito de coordinar un comité de seguimiento del mencionado convenio, se convoca a todas las partes interesadas con el fin de realizar seguimiento a las obligaciones pactadas en el marco del convenio.

Cordialmente;

5	Junio 23 de 2026	Luis Guillermo Torres	Citación a comité virtual seguimiento del convenio 2347 de 2025 San Pablo – Nariño	Sin anexos

De: **Luis Guillermo Torres Hernandez** <luisg.torres@mininterior.gov.co>
Date: mar, 23 jun 2026 a las 22:53
Subject: Citación a comité virtual seguimiento del convenio 2347 de 2025 San Pablo – Nariño
To: planeacion@sanpablo-narino.gov.co <planeacion@sanpablo-narino.gov.co>, Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Cordial saludo

Me dirijo a ustedes en el marco del Convenio No. 2347 de 2025, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Pablo, Nariño. Con el propósito de coordinar un comité de seguimiento del mencionado convenio, se convoca a todas las partes interesadas con el fin de realizar seguimiento a las obligaciones pactadas en el marco del convenio.

CORREOS ENVIADOS AL MINISTERIO DEL INTERIOR

	FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
1	Junio 3 de 2026	* Manuel Antonio Linares Donato * Luis Guillermo Torres	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” CONFIGURACIÓN TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO – NARIÑO	* DISEÑO ARQUITECTONICO CCPB SAN PABLO.pdf * V1. Presupuesto General - copia.xls



Planeacion sanpablo-narino.gov.co
para Manuel, luisg.torres, Cco:mí

3 jun 2026, 10:30 a.m.

Arquitecto:
MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Profesional Especializado
Supervisor Convenio 2347 de 2025 Ministerio del Interior

Por medio de la presente, adjunto la información necesaria para subsanar los últimos requerimientos relacionados con el proyecto del Convenio 2347 de 2025 del Ministerio del Interior.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que requiera.

DISEÑO ARQUITECTONICO CCPB SAN PABLO.pdf

V1. Presupuesto General - copia.xls

Cordialmente,

2	Junio 4 de 2026	* Manuel Linares * Luis Guillermo Torres	Solicitud de prórroga del Convenio 2347 de 2025	OFICIO SOLICITUD PRÓRROGA AL CONVENIO 2347 DE 2025



Planeacion sanpablo-narino.gov.co
para Manuel, luisg.torres, mí

jue, 4 jun, 7:46 a.m.

Arquitecto:
MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Profesional Especializado
Supervisor Convenio 2347 de 2025 Ministerio del Interior


Por medio de la presente, adjunto el oficio mediante el cual solicitamos formalmente evaluar la posibilidad de prorrogar el plazo de ejecución del Convenio 2347 de 2025 del Ministerio del Interior.

Quedo a su entera disposición para proporcionar cualquier aclaración adicional o documentación necesaria que requiera al respecto.

Atentamente,

MARIANA ORTEGA BURBANO
Secretaria de Planeación
Municipio de San Pablo Nariño
Carrera 3 No. 5 - 08, Barrio Bolívar
Código Postal 521040

3	Junio 17 de 2026	* Manuel Linares * Nicoll Rojas	Informe de avance del convenio 2347 de 2025 correspondiente al mes de Mayo de 2026	* 1 INFORME TÉCNICO MAYO 2026 * 2 INFORME FINANCIERO CV 2347-25 JUNIO 2026 * 3 EXTRACTO CUENTA BANCARIA * CRONOGRAMA CV 2347-25 SAN PABLO MAYO DE 2026

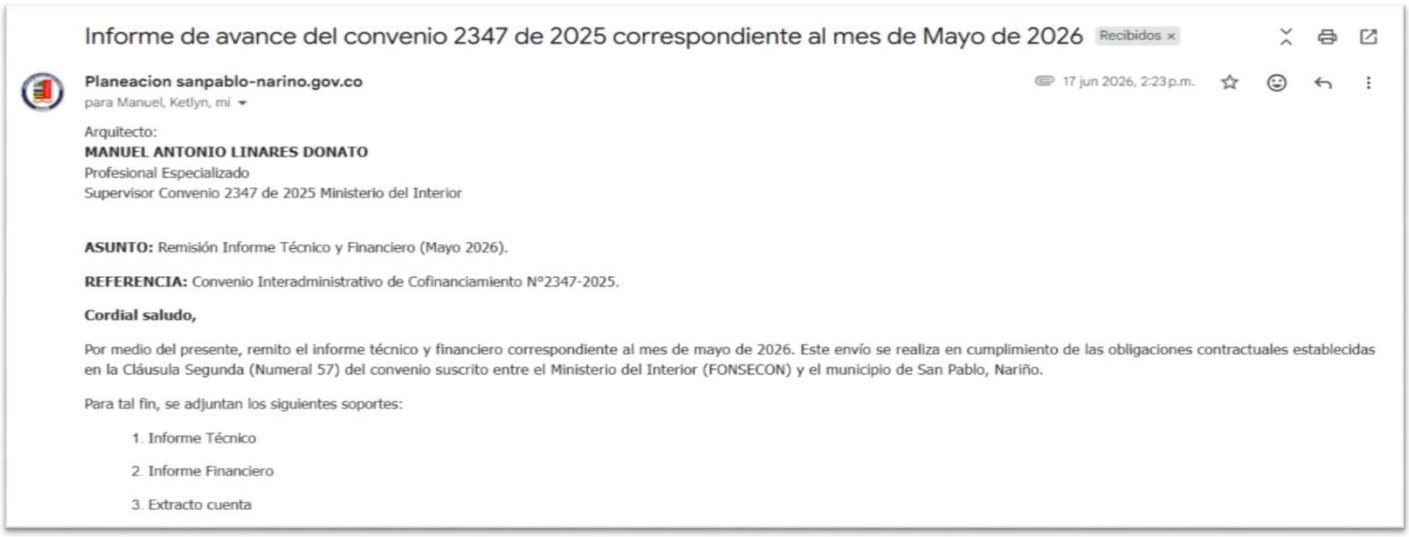

Informe de avance del convenio 2347 de 2025 correspondiente al mes de Mayo de 2026 Recibidos ×

Planeacion sanpablo-narino.gov.co
para Manuel, Ketlyn, mi

17 jun 2026, 2:23 p.m.

Arquitecto:
MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Profesional Especializado
Supervisor Convenio 2347 de 2025 Ministerio del Interior

ASUNTO: Remisión Informe Técnico y Financiero (Mayo 2026).

REFERENCIA: Convenio Interadministrativo de Cofinanciamiento N°2347-2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente, remito el informe técnico y financiero correspondiente al mes de mayo de 2026. Este envío se realiza en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en la Cláusula Segunda (Numeral 57) del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior (FONSECON) y el municipio de San Pablo, Nariño.

Para tal fin, se adjuntan los siguientes soportes:

1. Informe Técnico
2. Informe Financiero
3. Extracto cuenta

4	Junio 25 de 2026	Mauel Linares Luis Guillermo Torres	Informe No. 2 con los avances en las acometidas de servicios públicos. - SAN PABLO N	INFORME No. 2 AVANCE ACOMETIDAS SERVICIOS PÚBLICOS PAZ A LO BIEN



Planeacion sanpablo-narino.gov.co
para luisg.torres, Manuel, mi

jue, 25 jun, 7:16 a.m. (hace 11 días)

Arquitecto:
MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Profesional Especializado
Supervisor Convenio 2347 de 2025 Ministerio del Interior

ASUNTO: Remisión Informe No 2 Avances .

REFERENCIA: Convenio Interadministrativo de Cofinanciamiento N°2347-2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente, remito el Informe No. 2 referente a los avances en las acometidas de servicios públicos en el predio del proyecto: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO – NARIÑO", en el marco del Convenio Interadministrativo de Cofinanciamiento N° 2347-2025.

3. COMPONENTE FINANCIERO	A la fecha los contratos de los Estudios, Diseños y Construcción y el de Interventoría, se encuentran en ejecución desde el día 17 de marzo de 2026. En este período el contratista de Estudios, Diseños y Construcción solicita cesión de porcentajes de participación de los miembros del Consorcio, por lo que el trámite de anticipo se realizará con los nuevos integrantes del Consorcio.

Para la adición de recursos del convenio No. 2347 de 2025 firmado con el Ministerio del interior se realizó el siguiente procedimiento; mediante acuerdo No. 018 del 28 de noviembre del año 2025 se autorizó al alcalde Municipal De San Pablo - Nariño, Para Comprometer Vigencias Futuras Excepcionales para ejecución del Proyecto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y construcción del Proyecto Centro de Convivencia Ciudadana "Paz A Lo Bien" Tipo 1 del municipio de San Pablo – Nariño; mediante decreto No. 001 del 01 de enero del año en curso se hizo la incorporación de recursos en el presupuesto Municipal.
Con fecha 02 de enero de 2026 se expide Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 2026000157 por valor de $453,288,271 con el siguiente objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO; además se expide Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 2026000158 con el siguiente objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN" CONFIGURACION TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO – NARIÑO, por valor de $1,996,711,729.

4. COMPONENTE JURÍDICO	A la fecha los contratos para los Estudios, Diseños y Obra, así como la Interventoría, se encuentran en ejecución. En la plataforma Secop se encuentra la siguiente información:

AVANCE A LA FECHA:

•Proceso licitatorio para Contratación de Estudios, Diseños y Construcción:

Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53139&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4v6x4_p3xQkBk8siPhX6JQYGGF3VD8hZcPx05Vlr68DqHd20EetNXm1T0D_NYSsVAcNSVc4acuyBWCt6FoofP6mOP-i_0PtmQ72YOa0BD3ECFkDsP_CRdWyPTq5J8VkBwQbMUjesq3XxbCKGRQ62lj_30CNqswbShpkw5fVy7vHx-Rikg74_DbVtrf48JDBlv9yv60ePZRMuf3tiMZY4ga8ORn2pHJJiBhegVe2CPChfQsrG42jc6PrDTRu9tdu6s49dPQYcSyuIfPGw226uN1tdyCpdBDGv75Se0jiwD_z026IAYOXAlGR5AN3EfmjcnNVAs2gTcfYtJH_epruFG_XuFtewuJaDO1cje1x_bt4ctfcKWCACjiQjGSkq0Eq0j6CfWsMMU3z2lH_bsFztVfKTA7FaB_b10RK93ex_SU79gI1J8fhUneP0mf-ayM65wWEzvA1Z9tpHMxl3T4mIJPaOK4hePou719vcN5Ru24BllFkKp-_cKVJQqYWkRHFhY3T2uText02BDlW0c9t_5OA7LiwP8PsMcN8RyYf_HXUdzrIaIJ4NxLiYmJf4ti2N8mj93UDCRtMEwdowyjszbioMB8ixJzVXd851YJrQLLDaTPsbt7rJrUrNWsL8Avxcq8rn9bFGvSC0sRTR_ZJ6ZPCjpCUwtidBcewsk9bEUmk-ZK8iQx7SD-DefyMxq2f1JEwR4tTVEz9-o6Wxqwea8pT_NrrSWbSiQvD27UFLsiYI99b_7LtrW0-cPgB9k0oPxlhkEjkzPuolW2XUyu0r-1hAvzdHKwqIceVG14ugSP9mhjEGZO1RFcF_X9JCB1P4clX4ioMvgUGXAx2FSkWsOCWwfDp83md5tdbAIFo7mzSMPzmIKvNkKDj7A--tcvowDCczVn4VV1MFMU-fLbdvFKnl6Lh1RWHkl9jwSSMN0-bhX2-nM

TRAZABILIDAD DEL PROCESO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:	
Cuantía a contratar:	$ 1.996.711.729
Estado:	Adjudicado
Tipo de proceso:	Licitación obra pública
Proyecto de pliego de	Publicación Secop Diciembre 18 de 2025
Estudios Previos:	Publicación Secop Diciembre 18 de 2025
Aviso de licitación:	Publicación Secop Diciembre 18 de 2025
Análisis del sector:	Publicación Secop Diciembre 28 de 2025
Resolución de Apertura:	Publicación Secop Diciembre 28 de 2025
Pliego de condiciones definitivo:	Publicación Secop Diciembre 28 de 2025
Acta de audiencia de asignación de riesgos y aclaración de Pliegos de Condiciones:	Publicación Secop Diciembre 31 de 2025
Adenda No. 1	Publicación Secop Diciembre 31 de 2025
Acta de cierre:	Publicación Secop Enero 19 de 2026
Adenda No. 2	Publicación Secop Enero 19 de 2026
Informe Preliminar de Evaluación:	Publicación Secop Enero 19 de 2026
Informe final de evaluación documentos Sobre No. 1	Publicación Secop Febrero 3 de 2026
Acta de Adjudicación	Publicación Secop Febrero 3 de 2026
Resolución de adjudicación	Publicación Secop Febrero 3 de 2026

El contrato para Estudios, diseños y construcción fue adjudicado al CONSORCIO CONVIVENCIA SAN PABLO, representado legalmente por HERNAN DARIO MALTE. Valor propuesta: $1,996,711,729

En mayo 28 de 2026 la Interventoría radica al Municipio el Aval para la cesión de participaciones de los miembros del CONSORCIO CONVIVENCIA SAN PABLO así:

Los miembros del CONSORCIO CONVIVENCIA SAN PABLO con NIT. 902044988-2: ARQUISUR con NIT. 901460923-4, representado legalmente por HERNAN DARÍO MALTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.230.128 expedida en Ipiales (N) con una participación del 10% y FRANCISCO JAVIER MORA CASTRO, obrando en calidad de persona natural identificado con cédula de ciudadanía No. 13.066.587 de Túquerres (N) con una participación del 90%, manifestaron su voluntad, de efectuar una cesión de participaciones a las empresas CONSTRUCTORA INGENIERÍA GALERAS S.A.S con NIT 900324090-9 y QUALITE CONSTRUCTORA S.A.S con NIT 901274888-7, representados legalmente por MARIA JOSÉ ROSERO PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.004.190.009 expedida en Pasto (N) y MIGUEL GERARDO DELGADO JOJOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.464.415 expedida en Bogotá D.C, respectivamente.

El Municipio acepta la solicitud efectuada y se adelanta la CESIÓN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN LP-005-2025 SAN PABLO.
Así mismo, el 30 de mayo se firma el Modificatorio No. 1 donde se ratifica la cesión y se nombra como representante legal del Consorcio al arq. Brayan Alexánder Cárdenas Villota identificado con CC No. 1.085.298.708 de Pasto.
El 11 de junio se firma el Modificatorio No. 2 donde se ajusta el plazo para el proyecto hasta el 31 de julio de 2026, conservando el plazo del Convenio entre el Municipio de San Pablo y el Ministerio del Interior.

•Proceso licitatorio para Contratación de Interventoría:

Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-15-14612120&g-recaptcha-response=0cAFcWeA63YeM_EnuW0o6azqG-XMoCk0uXks8s8NZW2qJXy6y-ouMKKU_LGZKTzdcRZ5AttH4_blSecknIVq5Esp3bsnpBG3SeoUrQzdIfipY_6P5KA8DxLmb36XTK04POOaG_kLpekE5uXZuvmS41mRWtdytJTG1JLHoFiURrDy1IpfIKAppJIQSFJ9TnduhcIGmRbhC9z2eCTfim5FUSmIRy4pItTtGRNtLWoVk3gvzHnV4tJierbIaNaqn_jM--HWp2tW3Bcu_8IpTyTQ9USFRQd43OYiOy8f23SsfZL8ksRX5RKZ9lsxCgfDhRLju_ua3wXoysm4i6mWQjgBWVlySHOOqmLzV6OfjkHtTlh6NWoTPEkTwrnapyTAIIB6qPE96TyJHljU_aViuA6y-N_AICX2qetcWaKNGXfiQMWHpBXyZSZb9-6ZcHrwgh2aCLgWZ7yOXfNpRgobjcd9A_YBmJvKi8GDgduLB_vaxRxOHm7xbSPWxDAKxh3BeXSTNki710M04eeePo4KpG7HJVo_fwdG0EumvH2gBbferC_7K7esVwt0k4Q-ovlMWt4h3rhSrVSNMqfzhOkUHgbtPMzg9J0WeJektbuUhhM_YIuvLozp7H003jcjJR5ElQI8gaRoGFFgC65I9wNxoyBnI8lTXo35gcxdMCSK-h8w5WLcK2gxMZevG_73Z4pcxsqywOj4xtIQ_XfC2fWiX6wVE8shKT7tSULkpQCwaXAi5rPJzlpO7z9i5v---I_1IdG611Hs6Ug4bqeJ_I8unmXrEiEer75amFkBpiNYKcIWO5AKlCHaMEkc5U815s4_XlapC0gRlWgkznfaRLRMnLAVcNZ1UDmux5nYB5ZecPYrilligQpS2to-L3yk8Ztahc9dAsizogNw_nfX8A39BhkaHZuALFJLvd--MbGBayjFifEWT_Zha6zR7bIN4

TRAZABILIDAD DEL PROCESO Y POSIBLE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:	
Cuantía a contratar:	$ 453.288.271
Estado:	Convocado
Tipo de proceso:	Concurso de Méritos Abierto
Proyecto de pliego de	Publicación Secop Enero 19 de 2025
Estudios Previos:	Publicación Secop Enero 19 de 2025
Aviso de la convocatoria:	Publicación Secop Enero 19 de 2025
Análisis del sector:	Publicación Secop Enero 28 de 2025
Aviso:	Publicación Secop Enero 29 de 2025
Acto que ordena Apertura del proceso:	Publicación Secop Enero 29 de 2025
Pliego de condiciones definitivo:	Publicación Secop Enero 29 de 2025
Adenda No. 1	Publicación Secop Febrero 4 de 2025
Cierre del proceso de contratación	Publicación Secop Febrero 10 de 2025
Adenda No. 2	Publicación Secop Febrero 10 de 2025
Informe preliminar de evaluación	Publicación Secop Febrero 10 de 2025
Informe final de evaluación	Publicación Secop Febrero 20 de 2025
Acta de adjudicación	Publicación Secop Febrero 20 de 2025
Resolución de adjudicación	Publicación Secop Febrero 20 de 2025

El contrato para la"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DECONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO" fue adjudicado al CONSORCIO iINTERVENTORPIA CONVIVENCIA SP, representado legalmente por DARIO FERNANDO PATIÑO CAMPIÑO. Valor propuesta: $453.288.271.
El 11 de junio se firma el Modificatorio No. 1 donde se ajusta el plazo para el proyecto hasta el 31 de julio de 2026, conservando el plazo del Convenio entre el Municipio de San Pablo y el Ministerio del Interior.

5. EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Contratos en ejecución. Se programan mesas técnicas de seguimiento y se sostiene comunicación permanente con los contratistas de Estudios, Diseños y Construcción e Interventoría. El 13 de abril se realizó la entrega de los diseños al Ministerio del Interior y desde esa fecha se han adelantado varias mesas técnicas virtuales y presenciales con el fin de ajustar el proyecto y poder tener el aval del Ministerio para poder continuar con la fase de Construcción. A la fecha aún no se cuenta con dicha aprobación de los diseños para el inicio de obra. El 4 de junio el Municipio solicitó prórroga del Convenio ante el Ministerio del Interior hasta el 31 de diciembre, se espera aprobación.

REUNIONES PROGRAMADAS CON CONTRATISTAS

REUNIÓN: 7
FECHA: Junio 2 de 2026
LUGAR: Oficina 402 Edificio Toro Villota - Pasto

ASUNTOS TRATADOS	COMPROMISOS
3. Subsanaciones ante el Ministerio del Interior: El jueves 4 de junio se realizará una reunión presencial e Bogotá para la entrega física de los ajustes arquitectónicos solicitados. Para proceder, es obligatorio radicar previamente por correo electrónico los planos y el presupuesto general de obra (este último aún en espera de su versión final). • Compromiso: El contratista entregará y radicará el presupuesto ajustado el día de hoy, incorporando la totalidad de los cambios solicitados. 4.Documentación faltante Contratista de Estudios, Diseños y Construcción y Contratista de Interventoría: Se solicita: •Complementación y ajustes pendientes de la documentación de ambos contratos. •Informes del mes de mayo de 2026.	1 Entrega de Presupuesto ajustado – Junio de 2026 Contratista de Estudios, Diseños Construcción - Interventoría 2 Completar y ajustar documentación – Juni 5 2026 Contratista de Estudios, Diseños Construcción - Interventoría 3 Informes del mes de Mayo de 2026 – Juni 5 de 2026 Contratista de Estudios, Diseños Construcción - Interventoría

REUNIÓN: 8
FECHA: Junio 23 de 2026
LUGAR: Oficina 402 Edificio Toro Villota - Pasto

ASUNTOS TRATADOS	COMPROMISOS
3.Estado de Subsanaciones ante el Ministerio del Interior El Contratista de Obra informó que el día de ayer radicó formalmente en la sede del Ministerio del Interior en Bogotá la documentación debidamente ajustada, la cual incluye los diseños eléctricos y el presupuesto respectivo. Con el fin de mantener el archivo técnico actualizado, la Supervisión/Interventoría solicitó al contratista la entrega de la versión consolidada y definitiva de dichos diseños presentados ante el Ministerio. 4.Avance de Compromisos Municipales La Administración Municipal presentó el reporte de servicios públicos del predio: •Agua potable y energía eléctrica: Redes de acometidas completamente finalizadas. • Alcantarillado: Redes en etapa de ejecución, con fecha estimada de terminación para el próximo fin d semana. Asimismo, el Municipio se comprometió a remitir el día de mañana el informe detallado de estos avances sectoriales al Ministerio del Interior. 5.Requerimiento de Documentación Pendiente (Obra e Interventoría) Se solicitó de manera urgente a los contratistas la entrega y actualización de los siguientes soportes: • Contratista de Estudios, Diseños y Construcción: Actualización de las pólizas de cesión y lo modificatorios contractuales correspondientes; así como la planilla específica del ingeniero Javier Enríquez correspondiente al mes de abril de 2026. • Contratista de Interventoría: Planillas de pago de seguridad social del personal de los meses de marzo abril y mayo de 2026. 6.Siguientes Pasos y Cierre de Fase I Se concluyó que el proyecto se encuentra a la espera de los lineamientos técnicos por parte del Ministerio del Interior. Estas instrucciones permitirán realizar el diligenciamiento formal del Anexo 22, para dar por aprobada y finalizada la Fase I (Estudios y Diseños) y obtener el aval técnico definitivo para el inicio de la Fase II (Construcción del proyecto).	1 Entrega de Documentación pendiente Inmediato Contratista de Estudios, Diseños Construcción - Interventoría 2 Informe No. 2 Avance Acometidas al Ministerio del Interior – Junio 24 d 2026Municipio

CORREOS RECIBIDOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

	FECHA	ENVIADO POR	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
1	Junio 1 de 2026	Contratista Estudios, Diseños y Construcción	Entrega de documentos	* 1. PMA - SAN PABLO vs 1 * INFORME MES ABRIL crr * PLAN DE CALIDAD * Especificaciones Tecnicas * PLAN DE GESTION SOCIAL * PLAN DE SST * 1. PMA - SAN PABLO vs 1

CONSTRUCTORA INGENIERIA GALERAS SAS <galeras.sas@gmail.com>
para mí, planeacion@sanpablo-narino.gov.co

lun, 1 jun, 9:29 a.m.

Pasto, 01 de junio de 2026 SP 015

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO
Municipio de San Pablo

Referencia: CONTRATO No. LP 005 205: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" CONFIGURACIÓN TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO – NARIÑO.

Asunto: Entrega de documentos

Cordial saludo,

En atención a los compromisos establecidos durante la mesa técnica realizada el día 28 de mayo del presente año, y con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos y observaciones efectuadas, se hace entrega de la documentación correspondiente para su revisión y seguimiento.

Los documentos remitidos son los siguientes:

- Plan de Manejo Ambiental (PMA).
- Especificaciones Técnicas del proyecto.
- Informes Mensuales correspondientes a los meses de marzo y abril


2	Junio 2 de 2026	Contratista Interventoría	REMISIÓN INFORMES SUBSANADOS	* INFORME MESUAL DE AVANCE MARZO SUB * INTERSP 009.2026 REMISIÓN INFORMES CORREGIDOS * INFORME MESUAL DE AVANCE ABRIL SUB



3	Junio 3 de 2026	Contratista Estudios, Diseños y Construcción	PRESUPUESTO CCV SAN PABLO	* V1. Presupuesto General - copia



4	Junio 9 de 2026	Contratista Estudios, Diseños y Construcción	Remisión de hoja de vida de Especialista en Geotecnia y soportes de seguridad social	* 3. marzo - 2026 * 3. MARZO * Edgar David Mesias Maigual Marzo * Planilla Javier Enriquez Marzo 2026 * 4. abril 2026 * 4. ABRIL * 16.Remisión de hoja de vida de Especialista en Geotecnia y soportes parafiscales * DOCUMENTOS ING DAVID MESIAS MAIGUAL -1 * Edgar David Mesias Maigual Abril

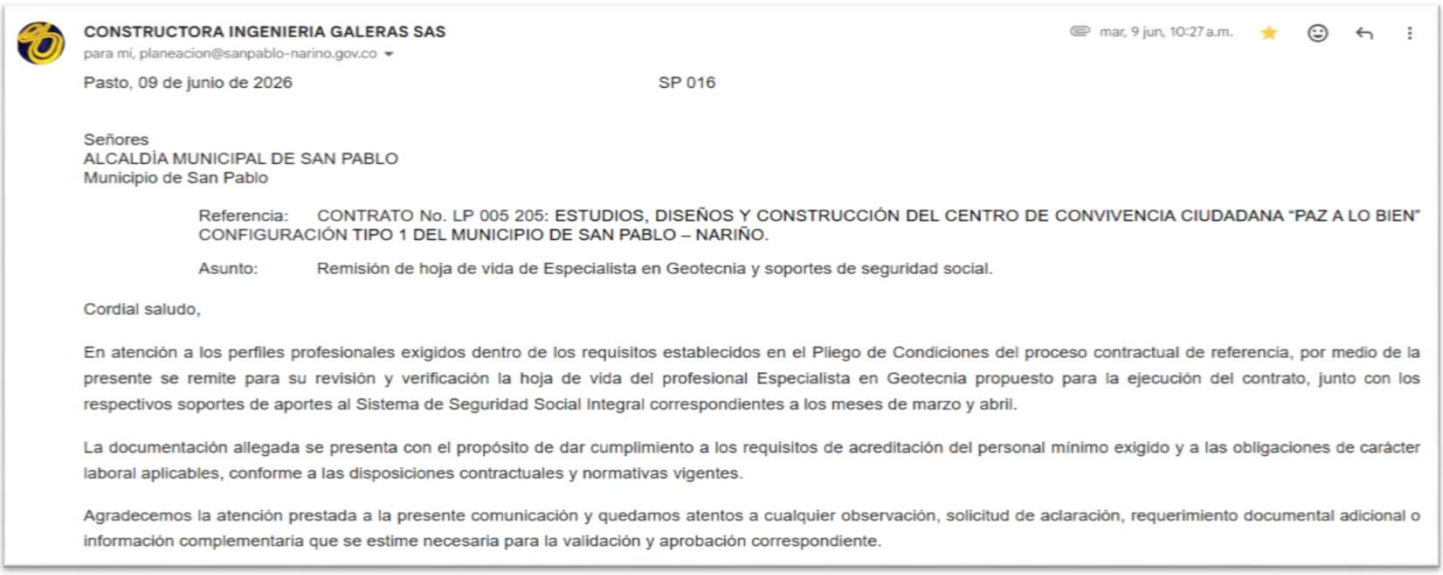

CONSTRUCTORA INGENIERIA GALERAS SAS
para mí, planeacion@sanpablo-narino.gov.co
mar, 9 jun, 10:27 a.m.

Pasto, 09 de junio de 2026 SP 016

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO
Municipio de San Pablo

Referencia: CONTRATO No. LP 005 205: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" CONFIGURACIÓN TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO – NARIÑO.

Asunto: Remisión de hoja de vida de Especialista en Geotecnia y soportes de seguridad social.


Cordial saludo,

En atención a los perfiles profesionales exigidos dentro de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones del proceso contractual de referencia, por medio de la presente se remite para su revisión y verificación la hoja de vida del profesional Especialista en Geotecnia propuesto para la ejecución del contrato, junto con los respectivos soportes de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes a los meses de marzo y abril.

La documentación allegada se presenta con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos de acreditación del personal mínimo exigido y a las obligaciones de carácter laboral aplicables, conforme a las disposiciones contractuales y normativas vigentes.

Agradecemos la atención prestada a la presente comunicación y quedamos atentos a cualquier observación, solicitud de aclaración, requerimiento documental adicional o información complementaria que se estime necesaria para la validación y aprobación correspondiente.

5	Junio 9 de 2026	Contratista Interventoría Estudios, Diseños y Construcción	INFORMES ACTUALIZADOS VERSIÓN FINAL	* INTERSP 010.2026 REMISIÓN INFORMES CORREGIDOS * 1. INFORME MESUAL DE AVANCE MARZO * 2. INFORME MESUAL DE AVANCE ABRIL



INFORMES ACTUALIZADOS VERSIÓN FINAL Recibidos ×

Proyectos Civiles
para planeacion, mi
mar, 9 jun, 5:01 p.m.

Atento saludo,

Remito versión final de los informes correspondientes a los meses de marzo y abril de 2.026. Por favor, no tener en cuenta el correo inmediatamente anterior, sino el actual.

Agradezco su atención,

DARIO PATIÑO


Representante Legal

CONSORCIO INTERVENTORIA CONVIVENCIA SP

6	Junio 12 de 2026	Contratista Interventoría Estudios, Diseños y Construcción	INFORMES ACTUALIZADOS MARZO Y ABRIL INTERVENTORÍA	INTERSP 011.2026 REMISION INFORMES * v2. INFORME MESUAL DE AVANCE MARZO * v2. INFORME MESUAL DE AVANCE ABRIL



7	Junio 23 de 2026	Contratista Interventoría Estudios, Diseños y Construcción	ACTUALIZACIÓN PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	* INTERSP 014.2026 REMISIÓN DE PÓLIZA * Póliza 101303817-3

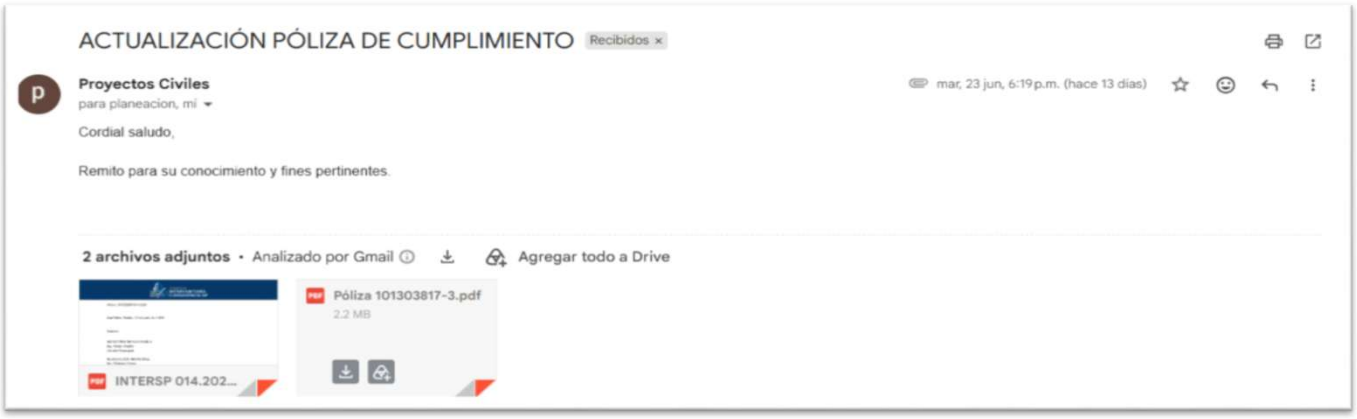

8	Junio 30 de 2026	Contratista Estudios, Diseños y Construcción	Remisión de pólizas actualizadas	* 17.Remisión de pólizas actualizadas * 3. C 101303803-3 * 3. RC 101059677-3



Remision de polizas actualizadas Recibidos ×

CONSTRUCTORA INGENIERIA GALERAS SAS
para mi, planeacion@sanpablo-narino.gov.co, proyectoscivilesnar@gmail.com

mar, 30 jun, 10:54 a.m. (hace 6 días)

Pasto, 30 de junio de 2026 SP 017

Señores,
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO
Municipio de San Pablo

CONSORCIO INTERVENTORIA CONVIVENCIA SP
Atn. Dario Patiño

Referencia: CONTRATO No. LP 005 205: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" CONFIGURACIÓN TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO – NARIÑO.

Asunto: Remisión de pólizas actualizadas

CORREOS ENVIADOS A CONTRATISTAS

	FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
1	Junio 3 de 2026	* Contratista Estudios, Diseños y Construcción *Contratista Interventoría	Oficio No. 4 - Contratistas Paz a lo Bien - Documentación pendiente	* OFICIO 4 CONTRATISTAS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN - INTERVENTORÍA PAZ A LO BIEN - DOCUMENTACIÓN PENDIENTE * 779026



Oficio No. 4 - Contratistas Paz a lo Bien - Documentación pendiente

Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com>
para galeras.sas, Planeacion, Alcaldia, proyectoscivilesnar

mié, 3 jun, 4:51 p.m.

Cordial saludo.

Remitimos Oficio No. 4 con solicitud de documentación pendiente con entrega a más tardar el viernes 5 de junio de 2026.

Anexamos comunicación del Ministerio del Interior.

Atentos a la radicación oportuna de los soportes requeridos,

Atentamente,

Lorena Chaves Méndez
Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Planeación
Municipio de San Pablo - Nariño

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail Agregar todo a Drive


2	Junio 11 de 2026	* Contratista Estudios, Diseños y Construcción *Contratista Interventoría	ACTA DE REUNIÓN No. 7 JUNIO 2 - 2026 PROYECTO PAZ A LO BIEN	* ACTA No. 7 JUNIO 2 DE 2026 PAZ A LO BIEN



3	Junio 16 de 2026	* Contratista Estudios, Diseños y Construcción *Contratista Interventoría	Citación a comité virtual seguimiento del convenio 2347 de 2025 San Pablo – Nariño	Sin Anexos



4	Junio 17 de 2026	* Contratista Estudios, Diseños y Construcción *Contratista Interventoría	Citación a comité virtual seguimiento del convenio 2347 de 2025 San Pablo – Nariño	Sin anexos



Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com>
para galeras.sas, proyectoscivilesnar, Alcaldía

mié, 17 jun, 11:29 a.m.

Cordial saludo.
Nos reprogramaron la reunión para las 4 pm. Remito link.


Gracias,

Lorena Chaves M-

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

invite.ics Descargar

5	Junio 22 de 2026	* Contratista de Estudios, Diseños y Construcción * Contratista de Interventoría	Programación reunión de seguimiento Martes 23 de junio 2026 - Paz a lo bien	Sin anexos

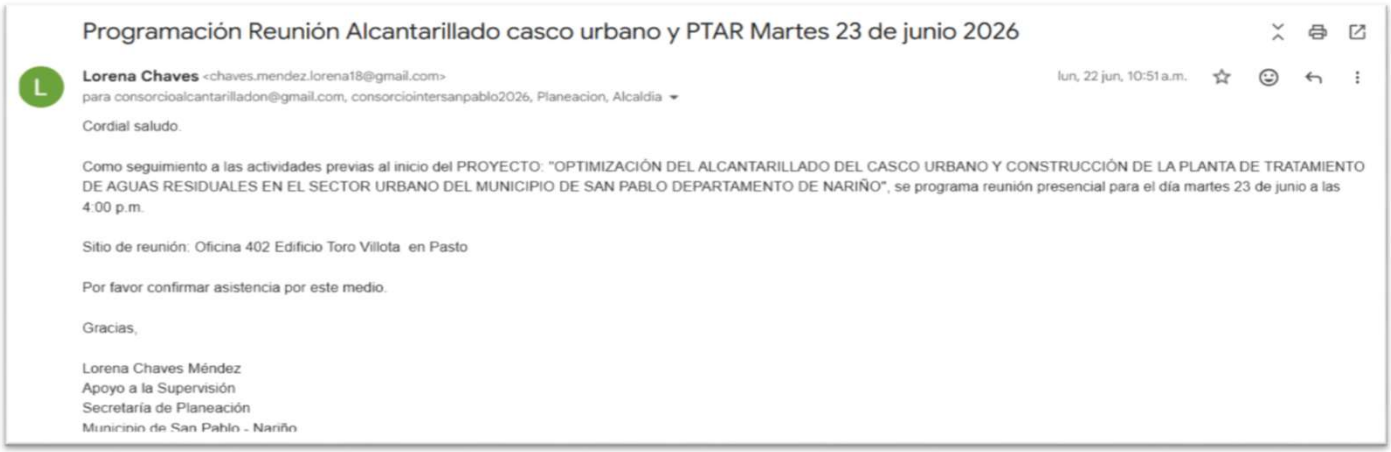

Programación Reunión Alcantarillado casco urbano y PTAR Martes 23 de junio 2026

Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com>
para consorcioalcantarilladon@gmail.com, consorciointersanpablo2026, Planeacion, Alcaldía

lun, 22 jun, 10:51 a.m.

Cordial saludo.

Como seguimiento a las actividades previas al inicio del PROYECTO: "OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO", se programa reunión presencial para el día martes 23 de junio a las 4:00 p.m.

Sitio de reunión: Oficina 402 Edificio Toro Villota en Pasto

Por favor confirmar asistencia por este medio.

Gracias,

Lorena Chaves Méndez
Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Planeación
Municipio de San Pablo - Nariño

6	Julio 3 de 2026	* Contratista de Estudios, Diseños y Construcción * Contratista de Interventoría	Acta de reunión No. 7 de junio 23 de 2026	* Acta de reunión No. 7 de junio 23 de 2026



Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com>
para consorcioalcantarilladon@gmail.com, consorciointersanpablo2026, Planeacion, Alcaldia

3 jul 2026, 9:39 a.m. (hace 3 días)

Cordial saludo.
Remitimos Acta de Reunión No. 7 de junio 23 del proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

Gracias,

Lorena Chaves M.
Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Planeación
Municipio de San Pablo - Nariño

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive

ACTA DE REUNIÓ...

6, CONCLUSIONES O JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE	* Los Estudios y diseños del proyecto continúan con ajustes de caracter arquitectónico y de forma en la presentación de los planos. * Se espera el aval del proyecto para poder iniciar la etapa de obra. * Se modifican los contratos en cuanto al plazo, dejando como fecha final el 31 de julio de 2026, unificando el plazo con el del Convenio entre el Municipio y el Ministerio del Interior. * El Municipio solicitó prórroga del Convenio 2347 de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026.

RESPONSABLE:

FIRMA:	
NOMBRE:	MARIO ALBERTO TRUJILLO CERÓN
CARGO:	ALCALDE MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO
FECHA:	JULIO 7 DE 2026
