INFORME TÉCNICO CONVENIO 1463 DE 2025
PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

PROYECTO:	CONVENIO DE USO DE RECURSOS No.1463 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO- NARINO

VALOR:	**$ 39.221.761.882**

LOCALIZACIÓN	**CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO**

COMPONENTES	PGB VIGENCIAS FUTURAS 2026	PGN VIGENCIAS FUTURAS 2027	TOTAL
OBRAS CIVILES, SUMINISTROS Y PUESTA EN MARCHA	$ 5.459.602.593,00	$ 30.937.748.029,00	$ 36.397.350.622,00
INTERVENTORÍA DE OBRAS, SUMINISTROS Y PUESTA EN MARCHA	$ 308.303.566,00	$ 1.747.053.540,00	$ 2.055.357.106,00
SEGUIMIENTO MVCT (2%)	$ 115.358.123,00	$ 653.696.031,00	$ 769.054.154,00
TOTAL	**$ 5.883.264.282,00**	**$ 33.338.497.600,00**	**$ 39.221.761.882,00**

EROGACIÓN PRESUPUESTAL:	Según la Clásusula Décima Segunda del Convenio: VALOR DEL CONVENIIO: El presente CONVENIO no genera erogación presupuestal entre las PARTES, toda vez que de conformidad con lo establecido en artículo 2.3.3.1.8.7 del Decreto 1425 de 2019 que subrogó el Decreto 1077 de 20156, en concordancia con lo establecido en el inciso 2 del artículo 2.3.3.1.8.6 ibidem, este CONVENIO se celebra con el fin de establecer exigible el pago del apoyo financiero de la nación al MUNICIPIO, para la realización del PROYECTO.

APORTE MINISTERIO DE VIVIENDA:	$ 39.221.761.882,00

BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO

EJECUTOR:	MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO

FECHA DE CONVENIO:	NOVIEMBRE 7 DE 2025
PLAZO:	VEINTISIETE (27) MESES
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 11 DE 2025
FECHA FINAL:	FEBRERO 10 DE 2028
PÓLIZA No.:	NO APLICA
SUPERVISOR MUNICIPIO:	ALCALDE MUNICIPAL SAN PABLO
SUPERVISOR MINISTERIO:	SUBDIRECTOR DE PROYECTOS MIN VIVIENDA

OBJETO:	Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de San Pablo del departamento de Nariño, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrative de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: Optimización del alcantarillado del casco urbano y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el sector urbano del municipio de San Pablo departamento de Nariño" en adelante el "PROYECTO". PROYECTO: "OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARINO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	El municipio de San Pablo, ubicado en el departamento de Nariño, enfrenta serios problemas relacionados con la recolección y separación de aguas combinadas y el tratamiento de las aguas residuales en su casco urbano. La infraestructura de alcantarillado actual es insuficiente, lo que genera desbordamientos, contaminación del medio ambiente y riesgos para la salud pública. Además, la falta de una planta de tratamiento adecuada contribuye al vertido de aguas residuales sin tratar, afectando tanto los recursos hídricos como la calidad de vida de los habitantes. Este contexto plantea una urgente necesidad de optimizar el sistema de alcantarillado combinado existente y construir una planta de tratamiento de aguas residuales para mejorar la sanidad y sostenibilidad del municipio, garantizando un manejo adecuado de las aguas servidas y un entorno más saludable para la población.

DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR:	Actualmente el casco urbano del Municipio de San Pablo, Nariño, cuenta con un sistema de alcantarillado combinado, que recoge aguas lluvias provenientes de áreas verdes, tejados y patios, así como aguas negras domésticas e industriales. Esta red cuenta con un 43% de redes en PVC y un 57% de redes en Concreto. La infraestructura existente cuenta con 103 Pozos de inspección, de los cuales la mayoría se encuentran colmatados, producto de la falta de descarga de las redes existentes. Un total de 82 sumideros existentes que no cumplen con las condiciones de recolección de escorrentía para drenar a través de las calles. La red está compuesta por tuberías de PVC y concreto, de acuerdo con el PSMV los componentes más antiguos del sistema tienen más de 30 años. Dado el tiempo de construcción inicial de la infraestructura existente, la falta de empalmes de los colectores con las estructuras de conexión y la falta de mantenimiento conllevo al colapso total de esta fase de alcantarillado construida, encontrándose totalmente sedimentado. Adicionalmente, hay sectores sin cobertura, tramos en contrapendiente y falta de capacidad hidráulica para lo que actualmente se encuentra en la zona. Por otro lado, no se cuenta con un sistema de tratamiento adecuado, lo cual se ha logrado identificar que de acuerdo al PSMV existen 5 vertimientos directos a cuerpos de agua: • Vertimiento No. 1 Cementerio: Este vertimiento se encuentra ubicado al norte del casco urbano municipal, cerca de la entrada del antiguo cementerio, la descarga sanitaria la realiza un emisario final en Concreto con diámetro de 12 pulgadas. • Vertimiento No. 2 Bateros: Este vertimiento se encuentra ubicado al noroeste de la cabecera municipal, debajo de la urbanización Villa Cristina, La descarga sanitaria se genera mediante una tubería de 16 pulgadas de diámetro, en material PVC. • Vertimiento No. 3 La Playa: Este vertimiento se encuentra ubicado al suroeste de la cabecera municipal, por la avenida La Playa, que es la misma Calle 8, salida hacia Florencia Cauca. El vertimiento está en la mitad de la estructura Box Coulvert construida para canalizar la Quebrada Bateros. • Vertimiento No. 4 Puente Río Mayo: Este vertimiento se encuentra ubicado al sur de la cabecera municipal, a aproximadamente 20m aguas abajo del puente vehicular sobre el río Mayo, La descarga sanitaria se genera mediante una tubería de 24 pulgadas de diámetro, en material PVC. • Vertimiento No. 5 Estadio: En el sector del estadio del municipio de San Pablo se evidencia un colector tipo rejilla con tubería la cual atraviesa la cancha del estadio y va hacia la quebrada para descargar. Se requiere la implementación de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para dar cumplimiento al PSMV, mejorar la calidad de vida de los habitantes, contribuir al saneamiento de la quebrada Bateros y el río Mayo, evitando la afectación de pescadores, usuarios del río y de las instalaciones e infraestructura que se encuentra aguas abajo, en cercanía, de los puntos de descarga.

LOCALIZACIÓN:	El Municipio de San Pablo está ubicado en el departamento de Nariño, cuenta con 26 barrios y 4 corregimientos compuestos de 47 veredas, pertenece a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Nariño “CORPONARIÑO”. Las coordenadas geográficas son 05° 00´ Latitud Norte, 73° 54´ Longitud Oeste, altitud de 1400 a 3350 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 10ºC, hasta los 18ºC. Su localización a nivel Municipal y Departamental se puede ver en la figura 1.1.




1. COMPONENTE TÉCNICO **PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:**	Para la ejecución del proyecto el municipio está en la obligación de adelantar los procesos licitatorios para la contratación de Encargo Fiduciario, Obra Civil e Interventoría. Las principales actividades para ejecutar en el proyecto son las siguientes: Se construirá el sistema total de alcantarillado (acometidas, redes colectoras, estructuras de conexión, sumideros emisarios, Planta de tratamiento de agua residual (PTAR) y descarga final) con el fin de garantizar la recolección y transporte de las aguas residuales domésticas y las aguas lluvias, realizar el tratamiento del afluente y el posterior vertido del efluente en condiciones adecuadas, en cumplimiento de la normatividad ambiental; aportando ostensiblemente al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al cuidado del medio ambiente.

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	A continuación se relacionan las diferentes comunicaciones entre el Ministerio de Vivienda y el Municipio de San Pablo con los temas tratados, referentes al Convenio 1463 de 2025.

CORREOS RECIBIDOS DESDE EL MINISTERIO DE VIVIENDA

#	FECHA	ENVIADO POR	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
1	JUNIO 11 DE 2026	JULIÁN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES	Notificación de cambio de profesional de apoyo a la supervisión – Convenio No. 1463 de 2025, San Pablo, Nariño	Sin Anexos

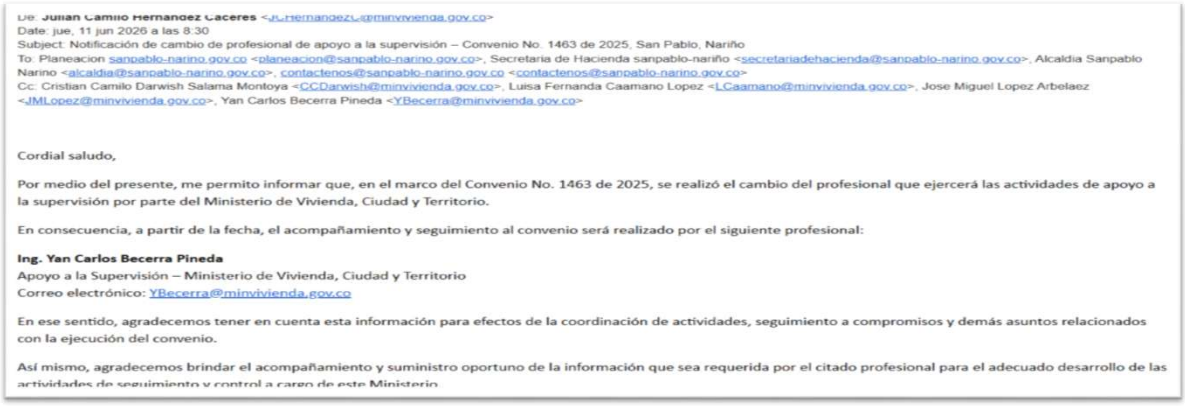

De: **Julian Camilo Hernandez Caceres** <JL.Hernandez.L@minvivienda.gov.co>
Date: jue, 11 jun 2026 a las 8:30
Subject: Notificación de cambio de profesional de apoyo a la supervisión – Convenio No. 1463 de 2025, San Pablo, Nariño
To: Planeacion sanpablo-narino.gov.co <planeacion@sanpablo-narino.gov.co>, Secretaria de Hacienda sanpablo-nariño <secretariadehacienda@sanpablo-narino.gov.co>, Alcaldia Sanpablo Narino <alcaldia@sanpablo-narino.gov.co>, contactenos@sanpablo-narino.gov.co <contactenos@sanpablo-narino.gov.co>
Cc: Cristian Camilo Darwish Salama Montoya <CCDarwish@minvivienda.gov.co>, Luisa Fernanda Caamano Lopez <LCaamano@minvivienda.gov.co>, Jose Miguel Lopez Arbelaez <JMLopez@minvivienda.gov.co>, Yan Carlos Becerra Pineda <YBecerra@minvivienda.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito informar que, en el marco del Convenio No. 1463 de 2025, se realizó el cambio del profesional que ejercerá las actividades de apoyo a la supervisión por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.


En consecuencia, a partir de la fecha, el acompañamiento y seguimiento al convenio será realizado por el siguiente profesional:

Ing. Yan Carlos Becerra Pineda
Apoyo a la Supervisión – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Correo electrónico: YBecerra@minvivienda.gov.co

En ese sentido, agradecemos tener en cuenta esta información para efectos de la coordinación de actividades, seguimiento a compromisos y demás asuntos relacionados con la ejecución del convenio.

Así mismo, agradecemos brindar el acompañamiento y suministro oportuno de la información que sea requerida por el citado profesional para el adecuado desarrollo de las actividades de seguimiento y control a cargo de este Ministerio.

2	JUNIO 26 DE 2026	YAN CARLOS BECERRA PINEDA	Reunión de seguimiento – Convenio No. 1463 de 2025	Sin Anexos



De: Yan Carlos Becerra Pineda <ybecerra@minvivienda.gov.co>
Date: vie, 26 de jun de 2026, 7:02 p.m.
Subject: Reunión de seguimiento – Convenio No. 1463 de 2025
To: Planeacion sanpablo-narino.gov.co <planeacion@sanpablo-narino.gov.co>, Secretaria de Hacienda sanpablo-nariño <secretariadehacienda@sanpablo-narino.gov.co>, Alcaldia Sanpablo Narino <alcaldia@sanpablo-narino.gov.co>, contactenos@sanpablo-narino.gov.co <contactenos@sanpablo-narino.gov.co>, chaves.mendez.lorena18@gmail.com <chaves.mendez.lorena18@gmail.com>, Julian Camilo Hernandez Caceres <JCHernandezC@minvivienda.gov.co>, Cristian Camilo Darwish Salama Montoya <CCDarwish@minvivienda.gov.co>

Cordial saludo.

En el marco del Convenio No. 1463 de 2025, nos permitimos informar que se realizó el cambio del profesional que ejercerá las actividades de apoyo a la supervisión por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En este sentido, extendemos una cordial invitación a participar en la reunión de seguimiento, la cual se llevará a cabo el día martes 30 de junio de 2026 a las 2:00 p. m., con el propósito de realizar la presentación del nuevo profesional designado y dar continuidad al seguimiento de las actividades y compromisos asociados al convenio.

Agradecemos de antemano su participación y puntual asistencia.

CORREOS ENVIADOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA

FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
1 JUNIO 11 DE 2026	Yan Carlos Becerra Pineda Julian Camilo Hernandez Caceres	Informe de avance del convenio 1463 de 2025 correspondiente al mes de Mayo de 2026	* FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V5-1.xlxs * FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V5-1.pdf * INFORME TÉCNICO CONVENIO 1463 DE 2025.pdf * INFORME FINANCIERO MAYO.pdf



Planeacion sanpablo-narino.gov.co
para YBecerra, Julian, mi
11 jun 2026, 5:04 p.m.

Cordial Saludo,

Julián Camilo Hernández Cáceres
Subdirección de Proyectos - Zona Pacífico de Colombia
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

Yan Carlos Becerra Pineda
Apoyo a la Supervisión – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Cordial saludo.


En cumplimiento de la Cláusula Décima Séptima del Convenio 1463 de 2025, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Municipio de San Pablo - Nariño, adjunto remito el Informe Técnico correspondiente al mes de mayo de 2026, junto con el Informe Financiero del proyecto y el flujo de fondos del convenio de alcantarillado y PTAR.

Quedo atenta a cualquier requerimiento adicional o aclaración que consideren necesaria.

Cordialmente,

MARIANA ORTEGA BURBANO

2	JUNIO 26 DE 2026	Rosa Emilia Mesa Espinosa Yan Carlos Becerra Pineda	Invitación: Socialización de Proyecto "Optimización del alcantarillad... vie 26 jun 2026 5pm - 6pm (COT)	Sin Anexos

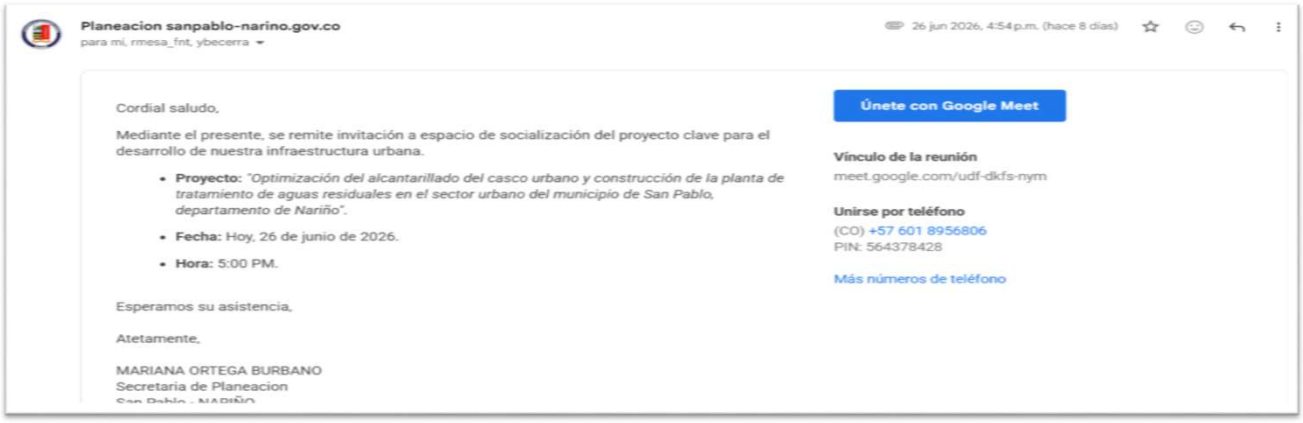

Planeacion sanpablo-narino.gov.co
para mi, rmesa_fnt, ybecerra

26 jun 2026, 4:54 p.m. (hace 8 días)

Cordial saludo,

Mediante el presente, se remite invitación a espacio de socialización del proyecto clave para el desarrollo de nuestra infraestructura urbana.

- **Proyecto:** *"Optimización del alcantarillado del casco urbano y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el sector urbano del municipio de San Pablo, departamento de Nariño".*
- **Fecha:** Hoy, 26 de junio de 2026.
- **Hora:** 5:00 PM.

Esperamos su asistencia,

Atetamente,

MARIANA ORTEGA BURBANO
Secretaria de Planeacion
San Pablo - NARIÑO

Únete con Google Meet

Vínculo de la reunión
meet.google.com/udf-dkfs-nym

Unirse por teléfono
(CO) +57 601 8956806
PIN: 564378428

Más números de teléfono

3. COMPONENTE FINANCIERO	A la fecha se encuentran adjudicados los Contratos de Obra e Interventoria. El proceso para la contratación del Encargo Fiduciario se encuentra en trámite por cuarta ocasión. En el presente período no hay desembolsos de dinero por parte del Ministerio hacia el Municipio de San Pablo

4. COMPONENTE JURÍDICO	A continuación se relaciona la información de cada proceso licitatorio que adelanta el municipio de San Pablo:

AVANCE A LA FECHA:

•Proceso licitatorio para Encargo Fiduciario:

Al momento se han publicado 3 procesos licitatorios para la contratación del Encargo Fiduciario, de los cuales dos se han declarado desiertos en su momento y el tercer proceso tampoco tuvo propuestas y se declarará desierto según el cronograma establecido.
A continuación se relaciona la información del primer proceso:

1 Publicación en Plataforma Secop: Declarado Desierto

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-1-244352&g-recaptcha-response=0cAFcWeA45Jj63dOpYtRlmVyXWv9PnLexLTPTnRLGd6AYPyFXpDDOX8_Y1pLzwB7_tapnw00wXN9YMqzoV7IHdK6oP_UqFZj2vTHiu1iz4nhLm5xqg68_ZbKj34PoyCt8FbOwG4pch828wIN360tdqsUTglGMo7u-nimWEHXOULQTut0RpMw7Lqf57J-MzdEsZH7hLNOvDS94aMHQ6K-b6lTkyJP9tnFE1OhGxGuUU7Ri0qjdtqTLw9VTOdFa2P-FDccPMqrm9x7YHy9CJBoscWjUg6lgkglPy5Hv9N15l6DRxRIPc68QyhAvc2jy79HuKAwoKOzdbTQkQuZ3YzmdEc7o_rN33FS7a6imUi2pldty95kzXebl0zV7J1fOtd3suEwNPevSgPiT5MKf42VFFhbYp8VW43Rw2Okbv5WNbSXquYoI6oPlvTQaLUvvqfwQv_uIszvajmYb3ONMXL1hwn75k3Cxy2BUSeVhbaAf4LTd72COwBB_5MF0Ux4e3J9cS2MIM4z2HlzYG1bdw2Da3WrRyYqdCUJshevIrWsJQ8p4FLsXRy5FyK2SSYRpWpBasqnPvZG1p2k8dlupg8Yk3Sheir-Um5LXvzgodzB2ZM_aTC-ef31onv4XstPrergdSJeKqUEtSSxPzCPQqtA2ZFgfm7IGv7Ko0_XhFZ6uS5DGEpKMqjeyAGYSDyx5BjWXhG1HP6MBNlUih7nKDtM0fCVQ45gCDZUB1kf0RuusCIEt4tA8l990KGWdbzLa6QBkX_D0sypmD68YXxS6dOGtYMl1AvZHYqOwhYOJejm9C3awUjvLCo5Kt_jMnXTn8TPiLoUy36wtZEnlNuXAPoEVGE-W20G21Q-oOgA

TRAZABILIDAD DEL PROCESO	
Cuantía a contratar:	$49,984,000
Estado:	Terminado anormalmente después de convocado
Motivo de terminación anormal después de convocado:	Declara desierto
Tipo de proceso:	Licitación pública
Proyecto de pliego de condiciones:	Publicación Secop Diciembre 12 de 2025
Estudios Previos:	Publicación Secop Diciembre 12 de 2025
Análisis del sector:	Publicación Secop Diciembre 22 de 2025
Resolución de Apertura:	Publicación Secop Diciembre 23 de 2025
Pliego de condiciones definitivo:	Publicación Secop Diciembre 23 de 2025
Constancia de No Observaciones:	Publicación Secop Diciembre 23 de 2025
Acta de audiencia de asignación de riesgos y aclaración de los Pliegos de condiciones:	Publicación Secop Diciembre 27 de 2025
Fecha de cierre:	Diciembre 31 de 2025
Fecha de terminación anormal después de convocado:	Diciembre 31 de 2025
Acto de declaratoria de desierta o de terminación anormal	Enero 14 de 2026

A continuación se relaciona la información del segundo proceso, igualmente declarado desierto:

2 Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14615074&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6nh1PSq5jubd947a85WhlxN96oN5plceUh1CyYwA4-wH416dG4bTOneE0xUlGfWodXsOi_JNp0DzdL_nYf6RaT9lpS21eSxcbLxE0xk6Drfy6C7T1cL2Ozr6dAXn5JiXH8FCepsZ90G9YmiblLaGYMcWYlBi6DmawkqNlp2u3YNfDm04p6XHPH3toNat_bpHKnodX1U-BUytWt3gPCOlBlcCRrdURagSK7te_LjGe1hl7VNrKlpfeYYA--fg5X2kDonnc8WS0uKWgXFgLcgoc5Stkd6-x7CCOT0nOipEqwcQu86e36tlpgX68zZ9msdMIbNjH2r5q5VLRz84mGKzc7vjDSZQS93j6Zv97GpmgUeyUiTdF4GnK2CwnlBVjX6J4pxHALMysS6OR2ly-krh7oJGtO_tp8RKqmP_GWcaagI1b7DASFG02H8xMBZWhv9KRRE0OZ3HcD8EVDqPJwn3UzpApwWq_VYheIT526_UJy4eWpo_fxRTUVf-x91S-LAraHGl_U_D5W4OvQ7csTi9L_QiH3rlvVdccpzcGpzDupKsGkpdL41cXSjhkHyPeL85a63dsgxYVK19i0Sjj3QLOyhfsVUCtgSaXgBdKYLoUSpji6YdnFsFJkf-JMehsPtgezPF_w4DRPZ4mx1SwlkLhOwcoLikSYQoBu_XqRU-vFscsufr4QThRVvmMWVWxcKOUyZ1jnXb4YEf-auClfR8fhSNSSMziWh_ewm4cdgkNB3TwwuOsU6hssqHCSxyghWCP9RRMexHw81hvsQu4Agf3GYybCkSno4hS7zu01BQtrKFd6pYJ1HX5AC_B7ogqgNrp-1ltHSqksNth91SSAOXplZV3tB54582arsHMCxvpezyOHN8IsSycDpDins6UpGgjNsqS_KSnlCxUi7vg1xrRimn2pyN53Gp3BWRC96xLbo3JXwXGiB5PxcQYV8D7D1VdvlWxR

TRAZABILIDAD DEL PROCESO	
Cuantía a contratar:	$49,984,000
Estado:	Terminado Anormalmente después de Convocado
Tipo de proceso:	Selección Abreviada de Menor Cuantía
Proyecto de pliego de condiciones:	Publicación Secop Enero 20 de 2026
Estudios Previos:	Publicación Secop Enero 20 de 2026
Aviso de la convocatoria:	Publicación Secop Enero 20 de 2026
Análisis del sector:	Publicación Secop Enero 20 de 2026
Aviso 1	Publicación Secop Enero 29 de 2026: postergando el proceso hasta una nueva fecha, por revisión de documentación técnica del proceso.
Observaciones al proceso	Publicación Secop Febrero 26 de 2026
Respuesta a observaciones	Publicación Secop Febrero 26 de 2026
CDP	Publicación Secop Febrero 26 de 2026
Apertura del proceso	Publicación Secop Febrero 26 de 2026
Pliego de condiciones definitivo	Publicación Secop Febrero 26 de 2026
Acta audiencia asignación de riesgos	Publicación Secop Marzo 3 de 2026
Resolución declara desierta	Publicación Secop Marzo 19 de 2026

La siguiente es la información del tercer proceso que adelantó el Municipio para la contratación del Encargo fiduciario, en el cual no se recibieron propuestas:

3 Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14705971&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6a27HD1AW_Javy2eFKRKt7-GlGqHkT-c8EpQMmcUFz2o93O_YNYrNxdQbZFA6LSaTM4z9Pqnl3xXJmh9Rqv3rPDTA8Lu1RkrOteI1mYK_nT_StSzU1OX57r7zEl4xcsHsfAyMaiAWcXlmlPtruOhAJFdx95gnzhCh7adN5LczTwlZJ38w4KGv7uCwh7gaA9T3AYfTbRsFu2ossJhhKnvnqDk8dwawhbT7mpap0xw7QpU_3Kzxjl5cRft4yImfAGBijRTvABOZoSvv0Vx7nCkXR5UH4rCvV9G2IV26T8TnfVAfK-5F59phHxw4C1gO_YH4rTEhKmUSAQGivoOlJ71-aE30y68pW0E_mMdiH30u_n0eVjSpJgJTUht6MkFICfMzKlHXZQHS3Lla-rHEqmhNYfwjBnNfOlkmJTPlAcdvJh7nSOYnH4q2f_UZ89AAP3zP3gYSNe-p2B1fl8N5aOyUCo46cflNCxU-sJulVUu7jSziXCBuURMf_mUxhFajKJYOKGipSLqGCiglRppFs1WLchVkwJyQ_L0Mfcw8oSuE5_XXsfUGg4w_afeXfrJV_CKCdZOoWnoY5FzPWKZoj9mGeUZJU2vxMwwHjH-0tCZ7VoJ_b02kveVXLpL9z9wGPzcGkJbYWDeJ2pGR50jeDT5jtPTO6-WDO95ugs7ob2znKhjs06iXPGlmFaD4gN2_3Uk6yLaVvnPhlX3HSbLGM8YavU4legaC7J2Ps8_AiI2g9RFq9ZqJdGnNMGKFuMgUpmVef3LQfenNlr1m20lLSpXNQAdYiE5Otk873bB-rCJST4UQc118vmaYy2lEaWbxAVDV_XE9_EgVMDHWTiXPkZFe20zEZ35jnNK8VXfGRegj41zet9bfR0pmI1ThPHxKOpBrVvnyeEnwv0qccyJVBIwThjoCLr-K9ZME3MVDTi35tthq3QsZjY2MfeBN_pNT3Q_QLu2WOk2QFRx__8MZ00U6ym8Tu6CsaSh1E6AN8158e7bfcIH8YCK15dt4WctDyBi3KZ4KGdchcFE40QuazOPdRimCgZpZUQW1PCBqOqkF06RZXS9JZcMDoN_i-ATz3l4JzwVdU

TRAZABILIDAD DEL PROCESO	
Cuantía a contratar:	$49,984,000
Estado:	Terminado Anormalmente después de Convocado
Tipo de proceso:	Selección Abreviada de Menor Cuantía
Análisis del sector:	Publicación Secop Abril 13 de 2026
Proyecto de Pliego de condiciones	Publicación Secop Abril 13 de 2026
Estudios Previos	Publicación Secop Abril 13 de 2026
Aviso convocatoria	Publicación Secop Abril 13 de 2026
Matriz de riesgos	Publicación Secop Abril 13 de 2026
Observación 1	Publicación Secop Abril 19 de 2026
Respuesta a observación 1	Publicación Secop Abril 19 de 2026
Pliego de condiciones definitivo	Publicación Secop Abril 19 de 2026
Anexos	Publicación Secop Abril 19 de 2026
Observación 2	Publicación Secop Abril 20 de 2026
Respuesta a observación 2	Publicación Secop Abril 20 de 2026
Resolución de apertura	Publicación Secop Abril 20 de 2026
Pliego de condiciones definitivo	Publicación Secop Abril 20 de 2026
Adenda No. 1	Publicación Secop Abril 23 de 2026
Actas de asignación de riesgos	Publicación Secop Abril 25 de 2026
Adenda No. 2	Publicación Secop Mayo 1 de 2026
Adenda No. 3	Publicación Secop Mayo 5 de 2026
Estudios previos ajustados	Publicación Secop Mayo 8 de 2026
Adenda No. 4	Publicación Secop Mayo 8 de 2026
Declaratoria de desierta	Publicación Secop Junio 2 de 2026

ACCIONES DEL MUNICIPIO:
Tras declararse desiertas una Licitación Pública y dos Selecciones Abreviadas de Menor Cuantía por falta de oferentes, la Administración Municipal analizó las causas del desinterés en el proceso de adjudicación del Encargo Fiduciario. Con el fin de incentivar la participación, se incrementó el valor del presupuesto luego de adelantar un trámite ante el Concejo Municipal para la aprobación de Vigencias Futuras, por lo cual en el mes de junio se publiçó nuevamente una Licitación Pública para la contratación del Encargo Fiduciario del proyecto.

4 Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-1-245986&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7ObiaUqqx7f5WoH-hFoV8vd1gif9JQNRdZUn5pSPs8BE_TX87fTtaYx8EaFRAzpJDQmMuntauz5Wn3I0WXgaBoiCiAGl414aQjQoxVESlWp2RGmCzBvK1ZDGvrSf10bFkHG3opJAvzT9N_z1SgffR3fVMEUHh98JDKuL2qxfpL_2FPWU2AnQgpJLlYytP2lJykY09rDImhDpGeZ6AYYd4KqW4PwmprUp2nVL1aj2urLYWnB92iEzJdtrUliotlf8-2L36ufuQaCzY96fMmOae_d_ZveyyvvHxYb3yarlDVQ5jQokqG8g9NIs6RtMAAdEaRrqDa8SUXFq8b1RxIg4S7iAfPfIp_wXVNPXBjd_tm4-6Rvfnol2QtQCVjI7uqvgpHep-8RqN8j5xAptBNR7ikolOXnq36Gj0JPhORMIyykO5B-voqJryvcH8VuKtoHyQhA4bvLU4TMoHwVn0vfh1Kajg1t3DIOJvSdNKOewxEvOCHGYbgPVfwgVgFUI4isfqaUxDxLx-M-LPy5v055cbfvkdt1b57THa3DFA71qeGK6JNVQzK9IpxGrBwu6M5q09-o9RAXsYkSjPltrHMIlaXAzQNlWXzr6MT95OUNUGMS9_i_ltosQAz7wgQ2GViZ8wdbNg7csk3RwApfRY_GLJcu2j4g_XP9blYZjZcZZq6K7sq40YP45oYCVe-PZ_fJfFj-7gf8T2VRLi9KpUqEeowbkBOPQ5lI21t6f7mZoSKCAuEn3BnBQ3fVxuKqD_VF0M14UhE6tsfkIlwf8l7bljCkqJp2AMabVVe-4RVzDvQlrZxGo8xamj-hx1CtWUPCT6zc6lnGfHlyv2FVF1eUnlWXrvOzWDvbSKgBfGb9oKLDvBZssGB7dXGywUMY-nFTY5pkym58VveV8kbhT9HrJ6RojN2u9pEnCzvam0cLQU6JR79fNhZh10oXVQkNRLqVMs5H063saeo8WipjooPeQ76xlyc9pEVVCB9980BRVmoLTFB33r7BWB0sNJYHzFxF4Pmi3102EbhZZDUT8Rf-HKiT9yqDlRv_7R73iFf3lUNRQVhzUd2Wejdm5nohJWFxXdQS2cEMfFiHv1sphgmgVSwQ7SzRg

TRAZABILIDAD DEL PROCESO	
Cuantía a contratar:	$110,379,000
Estado:	Borrador
Tipo de proceso:	Licitación Pública
Proyecto de Pliego de condiciones	Publicación Secop Junio 22 de 2026
Estudios Previos	Publicación Secop Junio 22 de 2026
Aviso	Publicación Secop Junio 22 de 2026
Anexos	Publicación Secop Junio 22 de 2026
Matriz de riesgos	Publicación Secop Junio 22 de 2026
Análisis del sector	Publicación Secop Junio 22 de 2026

•Proceso licitatorio para Contratación de Obra Civil:
Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53092&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7rlgbwnTd3mTu9llMXdyFlBJh-HIc3cAofiO1GYbgQuCFj5Lu9Bm9il1-reJHRPU5pNPijaWDVD9fso7d5eyAHkhag9Ms8OnDZZ2depqV0t0qDUPGOTeWnddk3HvCnkoIQR596cZoytscKHX5f-l-xfLJwwlZfKXpyNr6Q3xV65VcAcU7YCMrX9hDufpv7ZcQXbwDqV0Tny5hkSTRc3H2bW410_-p9GhN85Capjg1_XYUYYBK1D9k3MC1NIA60YSvrXsoSN-PZ1fBoTfLS10MUBcMY30yl3FNgEgZiEMPYzveGm5832b2990pRDdCt4JsxeicgWXbRxgYw2WoluHWkDQCti3cjUdF8uHv7iQ2kJ_nvkeBpJSE8Q7oRuIbB64mnIJxV8r0O8DEOu3zwVlrLXwPodj-9BllZzEuOuMur-8_HpYXD1kAORXgElMJRh_9avwupaJKcUXMItbdVVrQDz9RFwpXtyT0fGJJtEVOy-6KKo_yioe389cgqUOR-xFXYweapEv8FNveZYE8IoLDzcgveSHS_gfpONuPgBKGrh5Rx1HOD7Wz5H2KNPwF-hwxkwVHAll27ruv_e5TCDQi-9cVwv6t1cm1_2YebYOHgloTEzfe14On1Il6HRy6hr5y4s91QKlbTxMTRxZ3Tkf0U_nK8luY0HFrBaj5AIIRmIWCjwE_NAN4eSwyBmB_469lMdpyJeOGA_wF3d1pqKdz8v_IfXWiKo9optCb9wv4zkZCoX9sMxPD6gGY0s_CFSptPkEsRrcQ3AakY_D-CO5xmepzOcIxoHsc9GKNy9RJRcVj_Avc9lm80hnUkdIJIGBxfR5-aqDxVP8y3mxLbk_kNEjhqTw

TRAZABILIDAD DEL PROCESO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:	
Cuantía a contratar:	$36,397,350,622
Estado:	Celebrado
Tipo de proceso:	Licitación obra pública
Proyecto de pliego de condiciones:	Publicación Secop Diciembre 12 de 2025
Estudios Previos:	Publicación Secop Diciembre 12 de 2025
Análisis del sector:	Publicación Secop Diciembre 22 de 2025
Resolución de Apertura:	Publicación Secop Diciembre 22 de 2025
Pliego de condiciones definitivo:	Publicación Secop Diciembre 22 de 2025
Acta de audiencia de asignación de riesgos:	Publicación Secop Diciembre 26 de 2025
Adenda No. 1 Modificatoria LP 004-2025	Publicación Secop Diciembre 27 de 2025
Fecha de cierre:	Publicación Secop Enero 14 de 2026
Adenda No. 2	Publicación Secop Enero 14 de 2026
Informe de Evaluación:	Publicación Secop Enero 14 de 2026
Informe final de Evaluación:	Publicación Secop Enero 30 de 2026
Acta de la Audiencia de Adjudicación:	Publicación Secop Enero 30 de 2026
Resolución de Adjudicación:	Publicación Secop Enero 30 de 2026
Contrato:	Publicación Secop Abril 22 de 2026
Compromiso:	Publicación Secop Abril 22 de 2026

El contrato se encuentra adjudicado al Consorcio PM ALCANTARILLADO SP 2025, representado legalmente por LUZ AMPARO JOJOA. E

•Proceso licitatorio para Contratación de Interventoría:
Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-15-14610325&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6tXEABoBu5Rk66OhyrcmWiHX9vdtLD7z0ewTqMFzb4B3ilESkPdHTnN6CJQ_hcFj3NbCxDLxbJFIOKC_MIzc70d2KWOKdLMUNywKXS-UweqlkCtBFm8uut4U2NiSdRgS-ns5ywlO--zTfxDclizSEpX6VzGlcuU-UQ0Y407FcrQ5kri_ivZ20w5OjHyR0izeTpKYOkatetnLQ9clTupNwLkw_wwgivjYqQc6MH4jFhPom4yUmEj8GF51qQb2x9SUlgWQDzW6mdSzaeJWW09qluMCw02-h4_1WZ_g5Ajn580ACGDV4q0OMa7aORfFdASGN144ltDOgjk0zuwe3bIm7fMiAj8Gs_w7AiwjpKOwn5y9fu3PVf60j6PPx1s1e3vF7OtvljKzJJS0vxrWMfJxuO_op_LU7z2HSlCsdJ39OSl7IliAF3zQLqhXf9n12xtxWe8ah5rcS23MTgCwA76Xtk4LAERUGFZoZseP1DvtMR54YZKAofMit2D3duUl-95_2azH94DqDKph0GFCEQi_VePBFHtz51-tj2AhHUd1EZhg5mMleUm8u8Rjof8uP1H7rps9jfH9OWsXAdbvvN3rNRXy-7l_Yr6gfTIG3eiaNBuaNqyfGXpRqfaTXSjlXO5jqzctH4aFfkbfzTBc5UcbjoNimEU8vmJfCvJgAm7wmLQA0YglouTzVSxRhyE2zR66c4jHpy5DTW1AGaunEhvAnzfK2mwLoziZv4EjXSS_fdVWnC1c8ZGKMU9tfOqHMgIH-o9HDXf3bHfQxvreF92lqGr7jEuWROjirkuszJyRq5Ikqym8PVryB--KZsP4EP1zoGrEPX2hq1i_6FzsXRQEFEc9WJ2lR2R3iYftWGZhSdD8ePTUVAZeuqVM41BFz-aVbpef1h-h7-j_ChBEoOWMXWFEi-aFGS4NyOiLKHBNsBgy9sEWReOmu_h6mAxT-uLy8wIR3d

TRAZABILIDAD DEL PROCESO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:	
Cuantía a contratar:	$ 2.055.357.106
Estado:	Adjudicado
Tipo de proceso:	Concurso de Méritos Abierto
Estudios Previos:	Publicación Secop Enero 19 de 2026
Proyecto de pliego de condiciones:	Publicación Secop Enero 19 de 2026
Aviso de convocatoria pública:	Publicación Secop Enero 19 de 2026
Análisis del sector:	Publicación Secop Enero 26 de 2026
Aviso No. 1:	Publicación Secop Enero 26 de 2026
Resolución de apertura:	Publicación Secop Enero 27 de 2026
Pliego de condiciones definitivo:	Publicación Secop Enero 27 de 2026
Adenda No. 1	Publicación Secop Febrero 6 de 2026
Acta de cierre	Publicación Secop Febrero 10 de 2026
Informe preliminar de evaluación	Publicación Secop Febrero 10 de 2026
Acta de audiencia de adjudicación	Publicación Secop Febrero 20 de 2026
Informe final de evaluación	Publicación Secop Febrero 20 de 2026
Resolución de adjudicación	Publicación Secop Febrero 21 de 2026

El contrato se encuentra adjudicado al CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 , representado legalmente por DANIEL FERNANDO ALARCÓN ALARCÓN.

5. INICIO DE OBA Y SOCIALIZACIÓN CON COMUNIDAD	Se firma Acta de inicio con contratistas de Obra e Interventoría el 25 de junio y se realiza la Socialización con la Comunidad el 26 de junio de 2026.







6. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN	**Estado de Contratación**: Firmados: Contratos de Obra e Interventoría. **Pendiente**: Constitución del Encargo Fiduciario. **Planificación y Gestión**: Se programaron mesas de trabajo con los contratistas de Obra e Interventoría para estructurar la planificación detallada del proyecto. Debido al alto impacto de esta obra para el municipio, se realiza un acompañamiento conjunto que prioriza el diseño de la programación por sectores y la consolidación de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) optimizado que minimice las afectaciones a la movilidad en la zona de influencia. **Inicio de Obra:** Se firmó Acta de Inicio con Contratistas y se programó Socialización con la Comunidad.

REUNIONES PROGRAMADAS CON CONTRATISTAS

REUNIÓN: 4
FECHA: Junio 2 de 2026
LUGAR: Pasto

ASUNTOS TRATADOS	COMPROMISOS

	3. Observaciones a documentación enviada por Interventoría el pasado 21 de mayo d 2026. Se analizan las observaciones del Oficio No. 3 de la documentación recibida el pasado 21 de mayo, donde se tienen requerimientos a: * Presupuesto y APUS. * Soportes para la aprobación de los equipos del Contratista de Obra así como del equipo de Interventoría, de acuerdo con los requisitos presentes en los Anexos Técnicos y en los Estudios Previos del proceso de licitación de cada contrato para su fiel cumplimiento. * Plan de calidad * Maquinaria * Plan de manejo ambiental 4.Lectura del Acta anterior. El Apoyo a la Supervisión da lectura al acta de la reunión precedente y en conjunto se verifica el estado de los compromisos, así: a.Documentación contratistas de Obra e Interventoría: • Con solicitud de complementación y ajustes por parte del Municipio, cuyo compromis se fija para el 11 de junio de 2026. b. Contrato Encargo Fiduciario: El alcalde informó que el tercer proceso de licitación par el encargo fiduciario del proyecto se va a declarar desierto nuevamente, por lo que se encuentra en trámite ante el Concejo la aprobación de Vigencias Futuras para incrementar el presupuesto del proceso, para publicar una nueva Licitación en el mes de Julio. c. Socialización con la comunidad: Como se tiene una fecha de inicio acordada co Contratistas para el 16 de Junio, el alcalde solicitó comunicación con la Supervisión Técnica y Social del Ministerio de Vivienda para la programación en conjunto de la Socialización con la comunidad, con una fecha propuesta para el 19 de junio de 2026. d. Comisión de topografía en campo para verificación. La Interventoría del proyect informó que la Comisión de Topografía se encuentra trabajando en sitio desde el 1 de junio, levantando información de puntos específicos para el inicio de la obra y verificación de información en los tramos ejecutados por el Municipio en los últimos años. El Alcalde solicitó un informe con el avance de estos trabajos para la próxima reunión. e.Revisión y Plan de acción para la Optimización del Plan de Manejo de Tránsito PMT - Estado Actual del PMT: Se analiza el archivo recibido el día de hoy denominad PMT_OPTIMIZACION_ALCANTARILLADO_SAN_PABLO_LP004-2025_v1, donde se eliminaron las rutas críticas y se mantiene la ejecución de los trabajos mediante cuatro frentes de obra analizados en la reunión anterior. Requerimientos y Directrices de la Alcaldía: El Alcalde Municipal reiteró la necesidad de optimizar la presentación gráfica de los planos, garantizando una delimitación precisa por colores del tramo a intervenir y una secuencia temporal clara de las obras. Esta información debe estar rigurosamente vinculada al cronograma de ejecución y al flujo de inversión mensual como soporte para la próxima Socialización con la comunidad. Asimismo, se recalcó la importancia de implementar un plan de medios y señalización integral. Este debe incluir pasos peatonales demarcados, pasacalles, volantes continuos y cuñas radiales para mantener a la ciudadanía oportunamente informada sobre los cambios en la movilidad local. 5.Próxima reunión Se programa reunión presencial para revisión de ajustes solicitados en documentación para el 9 de junio de 2026 a las 9:00 a.m. en la oficina 402 del Edificio Toro Villota en Pasto.	
1		* Complementación y ajustes de documentación – 11 de junio de 2026 Contratistas d Obra e Interventoría * Publicación cuarto proceso para Contrato Encargo Fiduciario – mes de Julio d 2026Municipio * Acordar fecha para Socialización con Ministerio de Vivienda Municipio * Informe de avance Topografía – 9 de junio de 2026 Contratistas de Obra Interventoría * Ajustes al PMT teniendo en cuenta cronograma de actividades y flujo de inversión - 11 de junio de 2026Contratistas de Obra e Interventoría * Presentación previa de Socialización ante el Municipio – 11 de junio d 2026Contratistas de Obra e Interventoría

REUNIÓN: 5
FECHA: Junio 9 de 2026
LUGAR: Pasto

ASUNTOS TRATADOS	COMPROMISOS
3.Lectura del Acta anterior El Apoyo a la Supervisión dió lectura al acta de la reunión precedente y en conjunto se verificó el estado de los compromisos, así: a.Observaciones a documentación Contratistas. Para el próximo 11 de junio la Interventoría del proyecto tiene el compromiso de radicar la documentación completa que subsane los requerimientos del Oficio No. 3 enviado por el Municipio y analizado en la anterior mesa técnica. b. Contrato Encargo Fiduciario: El apoyo a la Supervisión comentó que continúa e trámite la aprobación para incrementar el presupuesto del proceso y así poder publicar una nueva Licitación. c. Socialización con la comunidad: El apoyo a la Supervisión informó que lo profesionales del Ministerio de Vivienda tienen agenda disponible para el viernes 26 de junio de 2026 para realizar la Socialización del proyecto con la Comunidad. d. Comisión de topografía en campo para verificación. La Interventoría manifestó que n se había elaborado un informe formal sobre el avance de los trabajos. Por tal motivo, se comunicó vía telefónica durante la reunión con el topógrafo del proyecto, el señor Roger Rengifo, quien presentó el reporte de las actividades ejecutadas desde el 1 de junio, destacando las siguientes labores: • Localización topográfica: Se ubicaron las cámaras 157 a 161 en el sector de La Playa un viaducto y el tramo hasta el punto 021 en la parte superior de la PTAR. • Inspección de vías pavimentadas: Se revisaron los tramos donde el municipio y realizó intervenciones de alcantarillado, levantando información sobre diámetros y materiales para su posterior confrontación con los diseños originales. • Verificación en la zona de apartamentos: Se identificó la existencia de tubería de PV de 10 y 12 pulgadas, la cual cumple con las especificaciones del diseño propuesto. Como plan de trabajo para la presente semana, se estableció completar el levantamiento de información en campo, priorizando los tramos iniciales, y realizar la respectiva comparación con los diseños del proyecto. e.Plan de Manejo de Tránsito PMT La Interventoría solicitó apoyo a Planeación para que el documento propuesto para el Plan de manejo de Tránsito sea analizado por el Inspector de Policía el señor Mármol, para poder contar con un Plan más ajustado a la realidad del municipio. 4.Acta de Inicio La fecha programada para el inicio de la obra es el 16 de junio de 2026. La Interventoría solicitó que en el Acta de Inicio se establezca el plazo para que el Municipio suscriba el Contrato del Encargo Fiduciario.	* Complementación y ajustes de documentación, PMT, Presentación de Socialización – 11 de junio de 2026Contratistas de Obra e Interventoría * Publicación cuarto proceso para Contrato Encargo Fiduciario – mes de Julio d 2026Municipio * PMT a Inspector de Policía para observaciones – 11 de junio de 2026Municipio * Proyección Acta de Inicio – Junio 16 de 2026Municipio

REUNIÓN: 6
FECHA: Junio 17 de 2026
LUGAR: Virtual

ASUNTOS TRATADOS	COMPROMISOS
3.Lectura del Acta anterior El Apoyo a la Supervisión dio lectura al acta de la reunión precedente y en conjunto se verificó el estado de los compromisos, así: 4.Observaciones a documentación Contratistas. La Interventoría del proyecto manifestó que se encuentra consolidando la información pendiente para ser remitida al Municipio a más tardar el 18 de junio de 2026. 5. Contrato Encargo Fiduciario: El apoyo a la Supervisión indicó que el Municipio est próximo a publicar la licitación pública para la contratación del Encargo Fiduciario. 6. Socialización con la comunidad: El apoyo a la Supervisión confirmará con lo profesionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la realización de la jornada de socialización del proyecto, la cual se encuentra programada para el viernes 26 de junio de 2026.. 7. Comisión de topografía en campo para verificación. La Interventoría manifestó que l verificación topográfica realizada en las viviendas cercanas al Pozo 9 (ubicadas sobre la plaza principal) arrojó una pendiente del 1% hacia dicha cámara. Con el fin de optimizar el funcionamiento del tramo, se evaluará la viabilidad de profundizar un poco más la estructura. 8.Plan de Manejo de Tránsito PMT La Interventoría se comprometió a radicar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) debidamente ajustado el viernes 19 de junio de 2026.. 9.Acta de Inicio • Contrato de Obra: El apoyo a la Supervisión presentó para revisión la proyección d Acta de Inicio correspondiente. • Contrato de Interventoría: Se encuentra pendiente la entrega de la proyección de est acta por parte del equipo jurídico del Municipio. • Maquinaria: La Interventoría informó que el Contratista de Obra dispondrá de l maquinaria en el sitio del proyecto a partir del miércoles 24 de junio de 2026. • Requisitos del personal: El apoyo a la Supervisión reiteró la obligación de que todo e personal operativo y el equipo de profesionales cuenten con sus contratos al día, afiliaciones vigentes al Sistema de Seguridad Social y la dotación reglamentaria antes del inicio de las actividades.	* Complementación y ajustes de documentación - 18 de junio de 2026 Contratistas d Obra e Interventoría * Publicación cuarto proceso para Contrato Encargo Fiduciario – finales de Junio de 2026Municipio * Confirmación Socialización con profesionales del Ministerio de Vivienda Municipio * PMT ajustado – 19 de junio de 2026Municipio * Proyección Acta de Inicio Interventoría Municipio * Maquinaria en San Pablo para inicio de actividades – 24 de junio Contratista de Obra

3

REUNIÓN: 7
FECHA: Junio 23 de 2026
LUGAR: Pasto

ASUNTOS TRATADOS	COMPROMISOS

3	3.Lectura del Acta anterior El Apoyo a la Supervisión dio lectura al acta de la reunión precedente y en conjunto se verificó el estado de los compromisos, así: 4.Observaciones a documentación Contratistas. La Interventoría del proyecto radicó la documentación el 18 de junio de 2026, la cual se encuentra actualmente en proceso de revisión. Con respecto al componente presupuestal, se presentan las siguientes observaciones: • Consistencia del SMLV: Mantener unificado el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV correspondiente al año 2026 en la totalidad del documento. • Ajuste del AIU y Personal: Revisar y ajustar la estructura del equipo de profesionale dentro del AIU, garantizando el estricto cumplimiento del Anexo Técnico, el plazo de ejecución de 15 meses y la revisión de los gravámenes municipales aplicables. • Coherencia Económica: Asegurar que el presupuesto guarde total correspondencia co la propuesta económica presentada originalmente al municipio. 5. Contrato Encargo Fiduciario: El alcalde indicó que el día de ayer se publicó en l plataforma SECOP I la licitación pública para la contratación del Encargo Fiduciario. 6.Socialización con la comunidad: • Programación y modalidad: El apoyo a la supervisión comunicó la solicitud de l profesional social del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de realizar el evento en la fecha acordada. Debido a las restricciones de traslado de la funcionaria, se definió un formato híbrido (presencial y virtual). El evento se llevará a cabo el viernes 26 de junio de 2026 a las 5:00 p.m. en la Alcaldía de San Pablo. • Revisión de contenidos: Se analizó el material de soporte, el cual contiene l información general del proyecto, su alcance, frentes de trabajo e intervenciones en la red vial. • Requerimientos de la Alcaldía: El Alcalde solicitó que la presentación sea de alt precisión e incorpore detalles específicos sobre: el equipo profesional en obra, el método constructivo, la implementación de la oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), el plan de manejo ambiental y de escombros, las conexiones domiciliarias, los pasos peatonales, los cerramientos y el cronograma de ejecución detallado por tramos y tiempos de intervención por calle. • Conformación de Veeduría ciudadana: Durante el espacio de socialización, s extenderá una invitación formal a los asistentes para la conformación de la Veeduría Ciudadana del proyecto. • Estrategia de comunicación comunitaria: La Interventoría enfatizó en la necesidad d implementar canales informativos continuos como cuñas radiales, entrega de volantes y la señalización informativa del proyecto durante toda la ejecución de la obra. Esto con el fin de garantizar que la comunidad esté permanentemente informada sobre los avances y los tramos viales a intervenir. 7. Comisión de topografía en campo para verificación. La Interventoría manifestó que e informe de la verificación topográfica de los tramos a intervenir se entregará después de la firma del Acta de Inicio. Asimismo, informó que las zonas verificadas cumplen con los diámetros de tuberías, cotas y pendientes requeridos, y que se procederá con la reposición de los pozos existentes y la construcción de sumideros. Se aclaró que se dio prioridad a los tramos iniciales de la intervención. Por último, el chequeo técnico del estado y la calidad de las tuberías intervenidas se programará para realizarse conjuntamente entre los profesionales de obra, la interventoría y el municipio. 8. Plan de Manejo de Tránsito PMT. El inicio de la obra estaba proyectado inicialmen en el sector de La Playa y la Institución Antonio Nariño. Sin embargo, debido a la falta de disponibilidad inmediata en el mercado local de tuberías de 24" y 36" (las cuales se fabrican bajo pedido), se reestructuró el plan de intervención. Los trabajos comenzarán de manera simultánea en dos frentes que cuentan con materiales disponibles: • Frente 1 (Planta de agua potable): Intervención desde la Calle 4 con avance hacia l Calle 3, con una longitud aproximada de 200 metros lineales, para la instalación de tubería de 12" y 18". •Frente 2 (Sector Plaza de Mercado): Intervención para la instalación de tubería de 8". El tiempo promedio estimado para la ejecución de estos tramos es de un (1) mes. Actualmente, se dispone de la maquinaria, el equipo y los materiales necesarios para dar inicio inmediato a las actividades.	* Ajustes PresupuestoContratistas de Obra e Interventoría * Ajustes Socialización – Junio 25 de 2026Contratistas de Obra e Interventoría * Socialización con la comunidad – Junio 26 de 2026 Contratistas de Obra Interventoría * Firma de Actas de Inicio – Junio 25 de 2026 Contratistas de Obra e Interventoría Municipio * Contratos con personal, dotaciones, afiliaciones a seguridad social – previo al inicio de las obrasContratistas de Obra e Interventoría

9.Acta de Inicio •La firma de las Actas de Inicio quedó programada para el jueves 25 de junio de 2026. • El contratista de obra, a través de la interventoría, solicitó autorización para l subcontratación de tramos específicos, verificándose el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para su protocolización. • Requisitos del personal: El apoyo a la supervisión reiteró la obligación de que tanto e personal operativo como el equipo profesional cuenten con contratos vigentes, afiliaciones al Sistema de Seguridad Social al día y la dotación reglamentaria antes del inicio de las actividades.	

CORREOS RECIBIDOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

	FECHA	ENVIADO POR	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
1	Junio 2 de 2026	CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025	Envio corrección plan de manejo de tránsito	PMT_OPTIMIZACION_ALCANTARILLADO_SAN_PABLO_LP004-2025_v1


De: **CONSORCIO PM ALCANTARILLADO SP 2025** <consorciopalcantarillado@gmail.com>
Date: mar, 2 jun 2026 a las 5:06
Subject: envio correccion plan de manejo de transito
To: <alcaldia@sanpablo-narino.gov.co>, <planeacion@sanpablo-narino.gov.co>, <consorciointersanpablo2026@gmail.com>

cordial saludo

por medio de la presente envio el PLan de manejo de transito en medio editable con los ajustes solicitados editable con el fin de ajustar lo que haya necesidad por las partes


Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

2	Junio 13 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA	Envío presentación de socialización	SOCIALIZACION_INICIO_OBRA_LP004-2025 AJUSTADA


CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA
para mi, alcaldia@sanpablo-narino.gov.co, planeacion
sáb, 13 jun, 9:48 a.m.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

3	Junio 18 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA	Respuesta a observaciones – entrega de documentación precontractual subsanada en su totalidad	* ANEXOS CM-001-2026 RADICACO 009-2026.rar

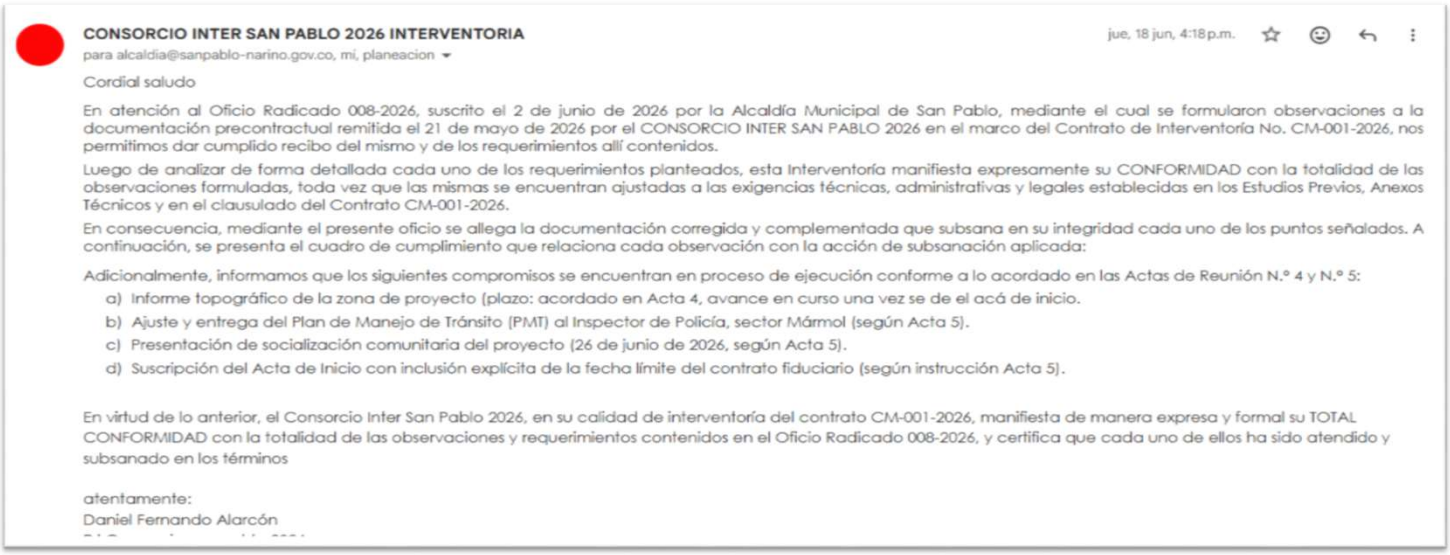

CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA jue, 18 jun, 4:18 p.m.

para alcaldia@sanpablo-narino.gov.co, mi, planeacion

Cordial saludo

En atención al Oficio Radicado 008-2026, suscrito el 2 de junio de 2026 por la Alcaldía Municipal de San Pablo, mediante el cual se formularon observaciones a la documentación precontractual remitida el 21 de mayo de 2026 por el CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 en el marco del Contrato de Interventoría No. CM-001-2026, nos permitimos dar cumplido recibo del mismo y de los requerimientos allí contenidos.

Luego de analizar de forma detallada cada uno de los requerimientos planteados, esta Interventoría manifiesta expresamente su CONFORMIDAD con la totalidad de las observaciones formuladas, toda vez que las mismas se encuentran ajustadas a las exigencias técnicas, administrativas y legales establecidas en los Estudios Previos, Anexos Técnicos y en el clausulado del Contrato CM-001-2026.

En consecuencia, mediante el presente oficio se allega la documentación corregida y complementada que subsana en su integridad cada uno de los puntos señalados. A continuación, se presenta el cuadro de cumplimiento que relaciona cada observación con la acción de subsanación aplicada:

Adicionalmente, informamos que los siguientes compromisos se encuentran en proceso de ejecución conforme a lo acordado en las Actas de Reunión N.° 4 y N.° 5:

a) Informe topográfico de la zona de proyecto (plazo: acordado en Acta 4, avance en curso una vez se de el acá de inicio.
b) Ajuste y entrega del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) al Inspector de Policía, sector Mármol (según Acta 5).
c) Presentación de socialización comunitaria del proyecto (26 de junio de 2026, según Acta 5).
d) Suscripción del Acta de Inicio con inclusión explícita de la fecha límite del contrato fiduciario (según instrucción Acta 5).

En virtud de lo anterior, el Consorcio Inter San Pablo 2026, en su calidad de interventoría del contrato CM-001-2026, manifiesta de manera expresa y formal su TOTAL CONFORMIDAD con la totalidad de las observaciones y requerimientos contenidos en el Oficio Radicado 008-2026, y certifica que cada uno de ellos ha sido atendido y subsanado en los términos


atentamente:
Daniel Fernando Alarcón

CORREOS ENVIADOS A CONTRATISTAS

	FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
1	Junio 3 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA	Oficio No. 3	* OFICIO 3 INTERVENTORÍA ALCANTARILLADO CASCO URBANO Y PTAR - RESPUESTA DOCUMENTACIÓN MAYO 21



2	Junio 11 de 2026	consorcioalcantarilladon@gmail.com consorciointersanpablo2026@gmail.com	Acta de reunión No. 4 del 2 de junio de 2026.	ACTA DE REUNIÓN No. 4 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO JUNIO 2 DE 2026.pdf

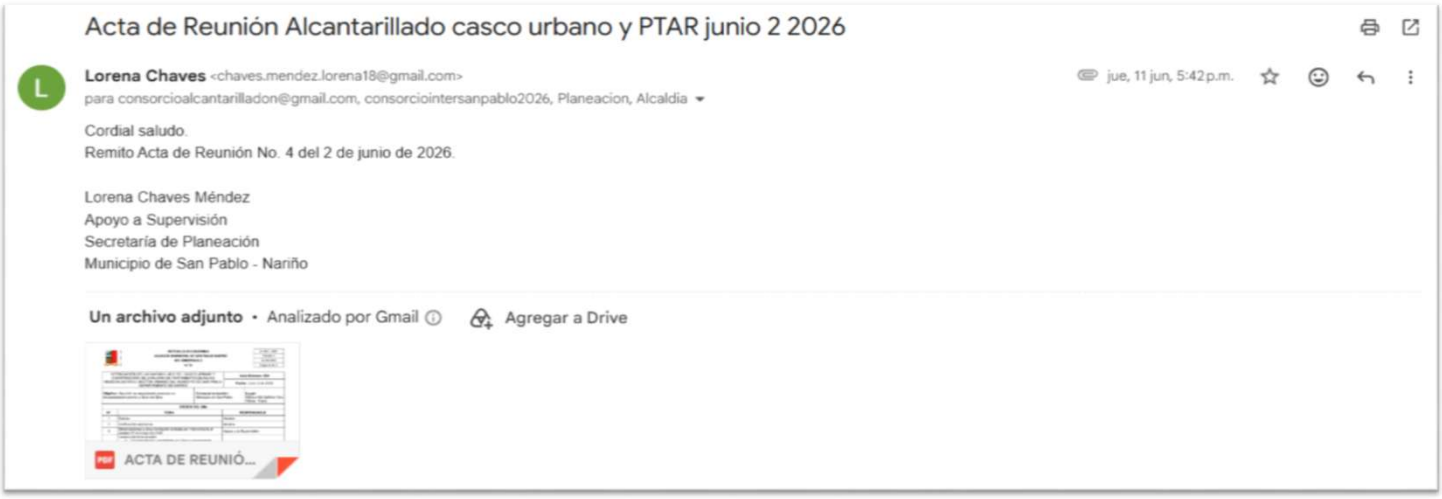

3	Junio 9 de 2026	consorcioalcantarilladon@gmail.com consorciointersanpablo2026@gmail.com	Acta de reunión No. 5 del 9 de junio de 2026.	ACTA DE REUNIÓN No. 5 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO JUNIO 9 DE 2026.pdf

Acta de Reunión 5 Alcantarillado casco urbano y PTAR junio 9 2026

Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com>
para consorcioalcantarilladon@gmail.com, consorciointersanpablo2026, Planeacion, Alcaldia

lun, 22 jun, 10:48 a.m. (hace 12 dias)

Cordial saludo.
Remito Acta de Reunión No. 5 del 9 de junio de 2026.


Lorena Chaves Méndez
Apoyo a Supervisión
Secretaría de Planeación
Municipio de San Pablo - Nariño

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive



ACTA DE REUNIÓ...

4	Junio 12 de 2026	consorcioalcantarilladon@gmail.com consorciointersanpablo2026@gmail.com	Programación Reunión Alcantarillado casco urbano y PTAR Miércoles 17 de junio 2026	Sin Anexos

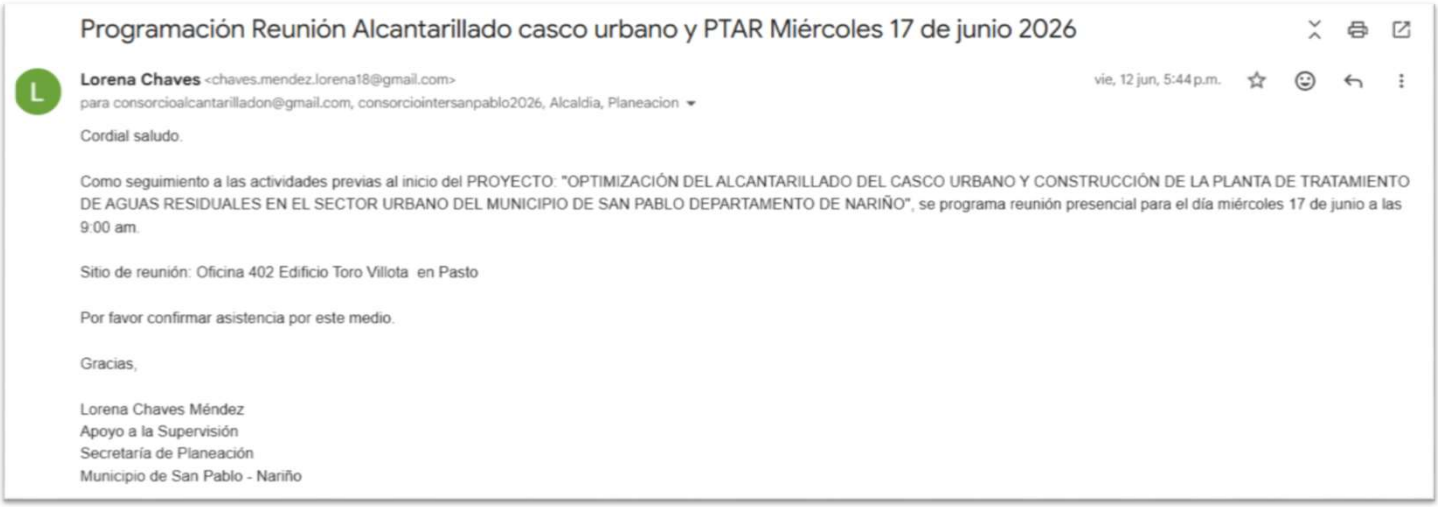

Programación Reunión Alcantarillado casco urbano y PTAR Miércoles 17 de junio 2026

Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> vie, 12 jun, 5:44 p.m.
para consorcioalcantarilladon@gmail.com, consorciointersanpablo2026, Alcaldia, Planeacion

Cordial saludo.

Como seguimiento a las actividades previas al inicio del PROYECTO: "OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO", se programa reunión presencial para el día miércoles 17 de junio a las 9:00 am.


Sitio de reunión: Oficina 402 Edificio Toro Villota en Pasto

Por favor confirmar asistencia por este medio.

Gracias,

Lorena Chaves Méndez
Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Planeación
Municipio de San Pablo - Nariño

5	Junio 22 de 2026	consorcioalcantarilladon@gmail.com consorciointersanpablo2026@gmail.com	Programación Reunión Alcantarillado casco urbano y PTAR Martes 23 de junio 2026	Sin Anexos

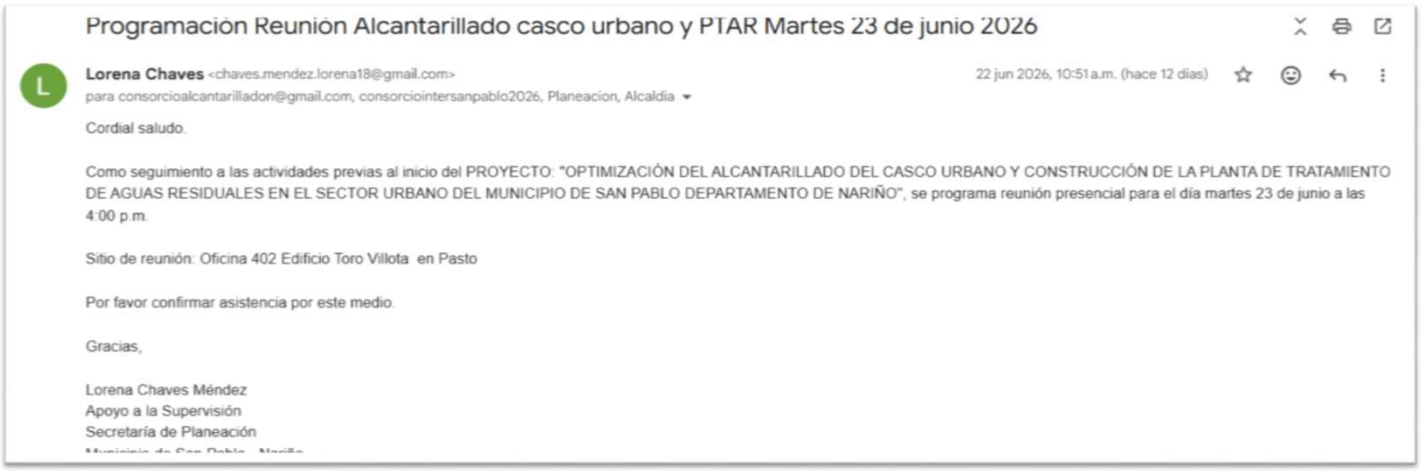

Programacion Reunion Alcantarillado casco urbano y PTAR Martes 23 de junio 2026

Lorena Chaves <chaves.mendez.lorena18@gmail.com> 22 jun 2026, 10:51 a.m. (hace 12 días)
para consorcioalcantarilladon@gmail.com, consorciointersanpablo2026, Planeacion, Alcaldia

Cordial saludo.

Como seguimiento a las actividades previas al inicio del PROYECTO: "OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO", se programa reunión presencial para el día martes 23 de junio a las 4:00 p.m.


Sitio de reunión: Oficina 402 Edificio Toro Villota en Pasto

Por favor confirmar asistencia por este medio.


Gracias,

Lorena Chaves Méndez
Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Planeación

6	Junio 24 de 2026	consorcioalcantarilladon@gmail.com consorciointersanpablo2026@gmail.com	Actar de reunión No. 6 del 17 de junio 2026	ACTA DE REUNIÓN No. 6 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO JUNIO 17 DE 2026

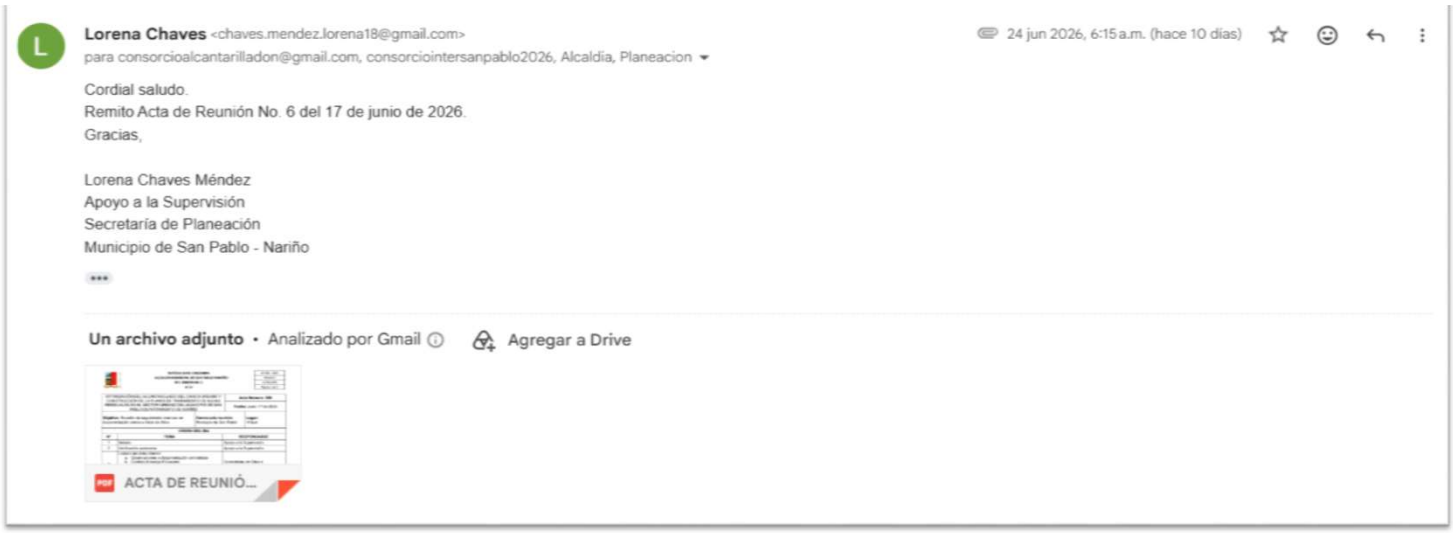

7	Junio 25 de 2026	consorcioalcantarilladon@gmail.com consorciointersanpablo2026@gmail.com	Certificaciones Corponariño Permiso de vertimientos proyecto Alcantarillado y PTAR	12. Certificacion Corponariño- Permiso de vertimientos -1 RESO0LUCION VSC-028-25 Permiso de Vertimientos PTAR -1

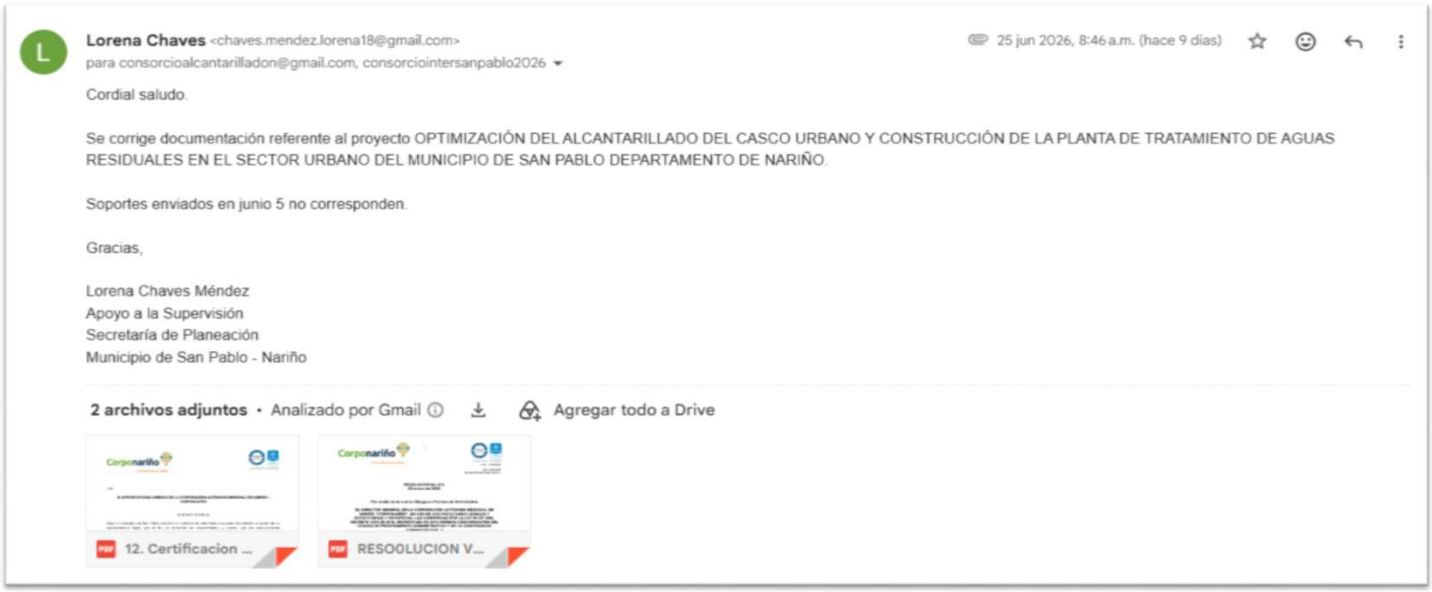

8	Julio 3 de 2026	consorcioalcantarilladon@gmail.com consorciointersanpablo2026@gmail.com	Acta de reunión No. 7 Junio 23 de 2026	ACTA DE REUNIÓN No. 7 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO JUNIO 23 DE 2026



7. CONCLUSIONES O JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE	* En el período del presente informe se firmó el Inicio del proyecto el 25 de junio de 2026. * Se inició nuevo proceso licitatorio para la contratación del Encargo Fiduciario del Proyecto.

RESPONSABLE:

FIRMA:	
NOMBRE:	MARIO ALBERTO TRUJILLO CERÓN
CARGO:	ALCALDE MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO
FECHA:	JULIO 10 DE 2026
