Neiva 05 de diciembre de 2024

INF-003-CO

Señores
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA – GEBERNACION DEL HUILA
ING. ALAVARO LIS ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
NEIVA - HUILA

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORIA 959 DE 2024**

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ESMEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA**

Asunto: **INFORME OCTUBRE DE INTERVENTORIA 959 DE 2024**

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted en mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL,** con número NIT. **901840107-1,** nos permitimos hacer entrega del Informe de Obre e Interventoria del 01 al 31 de Octubre de 2024, con los siguientes anexos:

1. Informe de Interventoria del 01 al 30 de Noviembre y Anexos
2. Informe de Obra del 01 al 31 de Octubre y Anexos
3. Polizas de Obra
4. Polizas de Interventoria
5. Personal Afiliaciones Obra

Lo anterior, para los trámites correspondientes del desarrollo del contrato de obra y/o comunicaciones de la supervisión del proyecto y/o entidad contratante.

Cualquier aclaración, observación y/o comunicación que se genere, favor remitir al correo consorciointerconstruccionvial@gmail.com

Atentamente,

Juan Garcia R.

JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
Representante Legal CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
C.C 1.001.276.642 DE NEIVA.

INFORME DE INTERVENTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO No. 959 de 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ESMEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

PERIODO: DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024

MUNICIPIOS: ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA

DEPARTAMENTO: HUILA



TABLA DECONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
2.1. MUNICIPO DE ELIAS 4
2.2. MUNICIPIO DE YAGUARA 4
2.3. MUNICIPIO DE PALERMO, SANTA MARIA Y NEIVA 5
2.4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1 CONTROL DE POLIZAS 8
4. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS OBRAS EJECUTADA 8
5. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE CONTRATISTA DE OBRA 9
6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 9
7. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA 9
8. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE OBRA 10
9. TIEMPO DE EJECUCIÓN 11
10. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 12
10.1. CONTROL DE POLIZAS INTERVENTORIA 12
10.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 13
10.2.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 13
10.2.2. ACTIVIDADES GENERALES 14
10.2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS 14
10.2.4. ACTIVIDADES FINANCIERAS 14
10.2.5. ACTIVIDADES ESPECIFICAS 14
10.3. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORIA 15
10.4. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA 15
10.5. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA INTERVENTORIA 15
11. PLAN DE CALIDAD 16
11.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 16
11.2. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DEL INTERVENTOR 16
12. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 17
13. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 17

1. INTRODUCCIÓN

En desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 959 se ve la necesidad de fortalecer la comunicación vial y la inversión en el sector transporte constituye para el país uno de los pilares fundamentales para el desarrollo, pues a partir de éste se pueden generar cambios, los cuales permitan reducir las brechas referentes a infraestructura para la intercomunicación municipal y al mismo tiempo mejorar las dinámicas comerciales de los territorios, propendiendo por un panorama más alentador para el sector productivo local. En muchas de las zonas de Colombia, pero sobre todo en la parte rural se cuenta con serias limitaciones en relación con la prestación de servicios e infraestructura, por lo que se hace necesario emprender todo tipo de acciones que contribuyan a la disminución de las disparidades presentadas entre las zonas urbanas y rurales, y al mismo tiempo permita mejorar las condiciones de competitividad de los territorios.

Bajo este contexto y como parte de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, el mejoramiento y desarrollo de infraestructura vial terciaria en el país se constituye en uno de los principales referentes en la apuesta por dignificar y reducir las brechas tan marcadas en las zonas rurales de Colombia. Es así como el presente proyecto de obra tiene como propósito mejorar la red vial terciaria de los Municipios de Elías, Palermo, Yaguará, Santa María y Neiva, lo cual permitirá un mejor acceso. De esta manera se aportará el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas aledañas.

Igualmente, en desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 959 DE 2024 y mediante la Resolución No.135 de 2024 adjudicó el proceso de Concurso de Mérito No SVCMIN0032-23, cuyo objeto es: " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ESMEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. La cual fue adjudicada al proponente CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL, por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL ($443.156.000) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, representado legalmente por JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ, con cedula de ciudadanía No. 1.001.276.642 de Neiva y con un plazo estimado de OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La fecha de Inicio del Proyecto es el 19 de septiembre del 2024 y Para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos se realiza el presente Informe Mensual que sería el No. 3 de Interventoría, correspondiente a las labores ejecutadas en el periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2024.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1. MUNICIPO DE ELIAS

Elías es un municipio colombiano localizado al suroriente del departamento del Huila. Yace sobre la Serranía de la Ceja y las estribaciones de la cordillera central. Hace parte de la región Subsur del departamento. Su extensión territorial es de 82 km², su altura es de 1425 msnm y su temperatura promedio es de 20 °C.



Imagen 1. Localización Municipio Elías - Huila en Colombia – Fuente Wikipedia

2.2. MUNICIPIO DE YAGUARA

Yaguará es un municipio colombiano ubicado en el centro del departamento del Huila. Yace entre los valles del río Yaguará y el río Magdalena, en la vertiente oriental de la cordillera central. Hace parte de la región SubNorte del departamento. Su extensión territorial es de 329 km², su altura es de 560 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 25 °C.5



Imagen 2 Localización Municipio de Yaguará– Fuente Wikipedia.

2.3. MUNICIPIO DE PALERMO, SANTA MARIA Y NEIVA

Palermo es un municipio colombiano ubicado en el noroccidente del departamento del Huila. Hace parte de la región andina, localizado en el alto del valle del Magdalena al oriente de la cordillera Central y hace parte de la región Sub-Norte del departamento. Su extensión territorial es de 917 km², su altura es de 690 msnm y su temperatura promedio es de 27 °C.

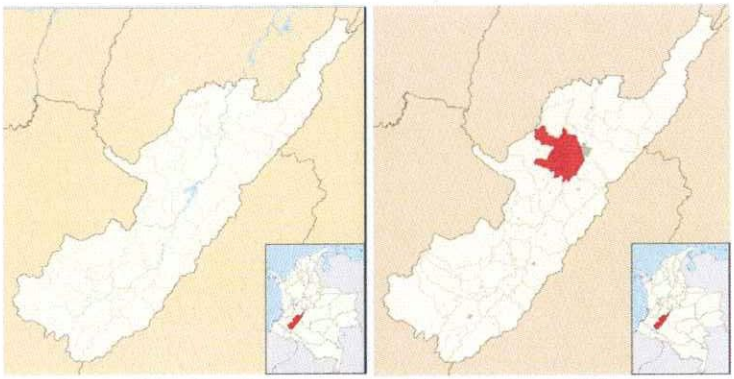


Imagen 2 Localización Municipio de Palermo – Fuente Wikipedia.

2.4. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La placa huella es una técnica utilizada para mejorar vías terciarias, ésta tiene uso difundido en el país, particularmente en convenios establecidos entre el INVIAS y las entidades territoriales. Es importante mencionar que las afectaciones o deterioro de las vías regularmente están asociadas a la existencia de condiciones críticas que afectan las condiciones de esta como es el caso del drenaje, estabilidad de taludes o condiciones geológicas o geotécnicas. De igual forma es necesario tener en cuenta que la técnica de placa huella está basada para ser funcional en condiciones de bajo tránsito de vías terciarias.

Específicamente la placa huella se ha utilizado en el mejoramiento de vías terciarias afectadas en su superficie, con continuas suspensiones del tránsito vehicular, en tramos con pendientes longitudinales iguales o mayores al 10%. La placa huella consiste en una configuración de placas de concreto hidráulico, separadas entre sí por piedra pegada; las placas están confinadas por viguetas reforzadas. En la capa de relleno inferior de 15 cm de subbase granular se deberá considerar la conformación de una pendiente transversal mínima del 2% para generar el bombeo que facilitará el escurrimiento del agua sobre la placa huella hacia las cunetas.

Para el presente proyecto la infraestructura constará en realizar el mejoramiento de un total de 4400 metros de vías terciarias en el Departamento del Huila mediante la construcción de placas huellas, distribuidos así:

- MUNICIPIO DE ELIAS

VEREDA SECTOR TRAMO	LONGITUD (M)
Vereda El progreso - Sector Alto oritoguaz.	200
Vereda Oritoguaz - Sector alto oritoguaz	200
Vereda Gallardito - Sector delicias	200
Vereda Oritoguaz - Sector La esperanza T1	100
Vereda Oritoguaz - Sector La esperanza T2	200
LONGITUD TOTAL PARA INTERVENIR (mt)	**900**

- MUNICIPIO DE YAGUARA

TRAMO - VEREDA	LONG.
Vereda upar - subida y bajada finca las nubes tramo 1	120
Vereda upar - subida y bajada finca las nubes tramo 2	180
Vereda la paz - sector subida finca San Nicolas	100
Vereda la paz- sector finca Miraflores y la Esmeralda	100
Vereda viso - sector subida antes de llegar al primer cruce	250
Vereda viso - sector subida antes de llegar al primer cruce olivo	100
Vereda viso bajo 1	100
Vereda viso bajo 2	100
Vereda arenoso - sector subida finca buenos aires tramo 1	120
Vereda arenoso - sector la escuela	80
Vereda Arenoso	150
Vereda Vilu alto	200
Vereda Vilu bajo	100
Vereda la floresta	100
LONGITUD TOTAL PARA INTERVENIR (mt)	**1800**

- MUNICIPIO DE PALERMO, SANTA MARIA Y NEIVA

MUNICIPIO	VEREDA - SECTOR - TRAMO	LONGITUD (METROS)
PALERMO	Vereda Buenos Aires	200
PALERMO	Vereda San Gerardo	150
PALERMO	Vereda Porvenir	150
PALERMO	Vereda Alto San Pedro	150
PALERMO	Vereda Bajo San Pedro T 1	90
PALERMO	Vereda Bajo San Pedro T 2	60
PALERMO	Vereda Alto Sardinata	150
PALERMO	Vereda Nazareth	150

PALERMO	Vereda El Carmen - Sector Dos Quebradas T2	75
PALERMO	Vereda El Mirador T1	75
PALERMO	Vereda El Mirador T2	75
NEIVA	Vereda Quebradon	150
	Vereda Quebradon	150
SANTA MARIA	Vereda El Carmen - Sector Dos Quebradas T1	75
LONG. TOTAL (mts)		**1700**

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	867 DE 2024		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	**NIT:**	901825668 - 9
REPRESENTANTE LEGAL:	VICTOR ANDERSON VALBUENA QUIROGA	**C.C:**	1.019.072.761 BOGOTA D.C
FECHA DE INICIO (D/M/A):	19 SEPTIEMBRE 2024		
PLAZO EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO		
PLAZO CONTRATO TOTAL:	$ 6.022.807.641.00 M/CTE		
	Valor en Letras: SEIS MIL VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE		
PERSONAL DE OBRA			
DIRECTOR DE OBRA	NESTOR ROJAS TORRES		
RESIDENTE DE OBRA	LUIS FERNANDO GARCIA PEÑA		
INSPECTOR DE OBRA 1	DIANA PAOLA RAMIREZ ORTIZ		
INSPECTOR DE OBRA 2	RAUL CARVAJAL CORTES		
PROFESIONAL SISOMA	JHON EDINSON YAIME BORRERO		
PROFESIONAL AMBIENTAL	KAREN BREGETTE SALAZAR ZULETA		
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	ALFONSO RENDON VALENCIA		
ESPECIALISTA GEOTÉCNICO	CARLOS NEFTALI BENAVIDES CUADROS		
TOPOGRAFO	MILTON RAFAEL PAEZ GONZALEZ		

3.1 CONTROL DE POLIZAS

El contrato de Obra fue amparado con los seguros expedidos por la compañía Mundial de Seguros, las pólizas iniciales correspondientes fueron revisadas y aprobadas, por la Gobernación del Huila Departamento Administrativo Jurídico, conforme al **Anexo N° 1.**

4. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS OBRAS EJECUTADA

Hasta la fecha, el avance de la obra se encuentra dentro de los márgenes establecidos en el programa de trabajo, con una diferencia mínima entre lo programado y lo ejecutado. De acuerdo con la planificación inicial, se había proyectado completar para el presente mes un avance del **8.00%**, y actualmente hemos logrado un avance del **1.26%**, lo que indica un cumplimiento cercano al **100%**. Para el municipio de Elias tiene un avance del **6.46%,** para Palermo, hemos logrado un avance del **9.21%**, para Yaguara, se ha obtenido un avance del **17.63%,** Santa María un avance del **0.01%,** Neiva un avance del **0.01%.** Para el presente mes, se realizaron las siguientes actividades;

- Se realizó localización y replanteo en el municipio de Elías, vereda El progreso – sector Alto oritoguaz, vereda Oritoguaz – sector alto de oritoguaz, vereda Oritoguaz – sector la esperanza T1, Vereda Oritoguaz – sector la esperanza T2.
- Se realiza la activad de suministro, instalación de recebo para nivelación de subrasante, en el municipio de Elías, vereda El progreso – sector Alto oritoguaz, vereda Oritoguaz – sector la esperanza T1, Vereda Oritoguaz – sector la esperanza T2.
- Se realiza la actividad de suministro, instalación, extendida, nivelación, humedecimiento, o aireación y compactación de subbase granular cbr ≥ 40%. Esp. 320-22 inv
- Se realiza figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal N°4, y refuerzo transversal N°2, para placas y vigas riostra.
- Se realiza instalación de concreto 3.000 PSI, para placas y vigas riostras en las veredas El progreso –sector alto oritoguaz, y sector la esperanza T2, sector alto de oritoguaz
- Se realiza instalación de concreto ciclópeo para huellas 60% en concreto 3.000 PSI, 40% piedra en el municipio de elias y sector la esperanza T2, el progreso –sector alto oritoguaz,
- Se realiza localización y replanteo, en el municipio de Palermo, vereda Buenos Aires, vereda Porvenir, vereda Nazareth, vereda San Gerardo, vereda el Carmen – sector dos quebradas.
- Se realiza excavación mecánica, (explanación) en la vereda Buenos Aires.
- Se realiza excavación manual para vigas riostras en la vereda Buenos Aires.
- Se realiza, suministro, instalación de material granular (recebo) para nivelación y compactación para mejoramiento de subrasante, en la vereda buenos aires
- Se realiza suministro, instalación de material granular cbr >40%, para subbase, en la vereda buenos aires.
- Se realiza, figurado y armado de acero, para refuerzo longitudinal N°4, y refuerzo transversal N°2, en placas, y vigas riostras.

- Se realiza instalación de concreto ciclópeo para huellas 60% en concreto 3.000 PSI, 40% piedra en el municipio de Palermo vereda Buenos Aires, Porvenir, Nazareth.
- Se realizó la actividad localización y replanteo por parte del contratista en el Municipio de Yaguara, vereda Upar 1, Upar 2, La Paz 1, La Paz 2, Viso 1, Viso 2. Viso Bajo 1, Viso Bajo 2, Arenoso Tramo 1, Arenoso sector escuela, vereda arenosa, vilu alto, vilu bajo, La Floresta. Con equipo de comisión topográfica para una correcta ejecución de obra.
- Se realizo la actividad de suministro, instalación extendida, de recebo para nivelación, de subrasante con compactación con maquinaria tipo vibro compactador en el municipio de Palermo, vereda Upar 1, Viso Bajo 2,
- Se realiza la actividad de suministro, instalación, extendida, nivelación, humedecimiento, o aireación y compactación de subbase granular cbr ≥ 40%. Esp. 320-22 inv, en el municipio de Yaguara, vereda Upar 2, La Paz Tramo 1, La Paz Tramo 2, Viso Bajo 2, Viso Bajo 1
- Se realiza figurado y armado de acero de refuerzo longitudinal N°4, y refuerzo transversal N°2, para placas y vigas riostra.
- Se realiza instalación de concreto 3.000 PSI, para placas y vigas riostras en las veredas Upar 1, Upar 2, La Paz 1, La Paz 2, Viso Alto, Viso Bajo 1, Viso Bajo 2.
- Se realiza instalación de concreto ciclópeo para huellas 60% en concreto 3.000 PSI, 40% piedra en el municipio en las veredas s Upar 1, Upar 2, La Paz 1, La Paz 2, Viso Alto, Viso Alto 1, Viso Bajo 1, Viso Bajo 2, Arenoso 1, Arenoso 2, Arenoso 3, Vilu Alto, Vilu Bajo, La Floresta.
- Se realizó la socialización del proyecto mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en sitios críticos en el municipio de Yaguará, santa maría y Neiva del departamento del huila, en instalaciones de la alcaldía municipal de Yaguara.

En el transcurso de estos 30 días de ejecución contractual, El presente informe hace referencia a las actividades ejecutadas durante el periodo de tiempo entre el 01 de noviembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2024.

5. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE CONTRATISTA DE OBRA

- Observar **Anexo N° 2** y **Anexo N° 2.1**

6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

- Observar **Anexo N° 3**

7. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA

- Observar **Anexo N° 4**

8. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE OBRA

- Observar **Anexo N° 5**

9. TIEMPO DE EJECUCIÓN

CUADRO TIEMPO DE EJECUCIÓN CONTRATO			
TIEMPO TOTAL		TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO POR EJECUTAR
8	MES		
TIEMPO PRORROGA			
0	MESES		
TIEMPO TOTAL			
8	MESES	2.40	5.60



10. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

APOYO A LA SUPERVISIÓN	INTERVENTORIA	**ENTIDAD**	GOBERNACIÓN DEL HUILA
INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	959 DE 2024		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ESMEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	**NIT:**	901840107 - 1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	**C.C:**	1.001.276.642 DE NEIVA (H)
FECHA DE INICIO (D/M/A):	19 SEPTIEMBRE 2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
PLAZO CONTRATO TOTAL:	$ 443.156.000 M/CTE **Valor en Letras:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		
INGENIERO DIRECTOR INTERVENTORIA	**AIDENI BOLAÑOS JIMENEZ**		
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	**NELSON VARGAS ALMARIO**		

10.1. CONTROL DE POLIZAS INTERVENTORIA

El contrato de Interventoría fue amparado con los seguros expedidos por la compañía Mundial de Seguros, las pólizas correspondientes fueron revisadas y aprobadas, por la Gobernación del Huila Departamento administrativo Jurídico, conforme al **ANEXO 6.**

10.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

10.2.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Trámite ante la Gobernación del Huila – Comunicaciones Oficiales recibidas de la solicitud anticipo al contrato de obra 867 del 2024, incluyendo todos los soportes exigidos por la entidad contratante.
- Dando cumplimiento a las disposiciones de carácter laboral establecidas por el Código sustantivo del trabajo, todo el personal a su cargo se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), así como el cumplimiento del pago de obligaciones Parafiscales.
- Adicionalmente permanentemente se ha realizado seguimiento al Contratista de Obra en este aspecto, con la solicitud inicial por medio de oficio con el fin de hacer cumplir lo estipulado por la Ley y las exigencias contractuales. Dicha documentación entregada respecto a afiliaciones de Director y residente se encuentran en el presente informe y hace parte de los soportes exigidos por la interventoría al contratista, pero también se le solicito la seguridad social planilla pagada pero no fue entregada por el Contratista de Obra.
- Durante toda la ejecución del proyecto las inquietudes y sugerencias planteadas por el contratista fueron atendidas buscando de forma diligente solucionarlas para el bien del proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como económico.
- Elaboración de Informes semanales de avance de obra, fundamentales para el control del estado financiero de la construcción.
- Elaboración de registro fotográfico y registro en bitácora de las actividades en la obra.
- Elaboración del informe mensual, de actividades de construcción e interventoría según modelos de la Gobernación del Huila – secretaria de Vías e Infraestructura.
- Cuantificación, valoración semanal y mensual de obra ejecutada.

10.2.2. ACTIVIDADES GENERALES

- Localización y replanteo.
- Revisión de programación financiera del contrato de construcción y verificación cumplimiento del programa de obra
- Verificación cumplimiento normas de seguridad industrial.
- Control legal y administrativo de contrato de construcción.
- Registro diario de correspondencia y archivo.
- Registro diario de incidencias en bitácora de obra.
- Inspección diaria a sitios de ejecución de obra.
- Elaboración registro fotográfico.
- Elaboración del informe mensual, de actividades de construcción e Interventoría según modelos Gobernación del Huila – secretaria de Vías e Infraestructura.
- Cuantificación, valoración semanal y mensual de obra ejecutada.

10.2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS

- Se exigió al contratista el PMT (Plan de Manejo de Transito) para su Control y seguimiento a la instalación de la señalización vertical y horizontal de acuerdo con las exigencias del manual.
- Exigir al contratista la ejecución idónea del contrato, siguiendo siempre lo recomendado en la Especificaciones Técnicas de Carreteras.
- Cuantificación diaria de las actividades realizadas en la obra por el contrista, actividades que se relacionan en el libro de obra y se cuantifican en los informes semanales y mensuales entregados por la Interventoría.
- Apoyo permanente al trabajo social realizado por el contratista para adelantar los cierres de las actas de vecindad ante propietarios de predios intervenidos.

10.2.4. ACTIVIDADES FINANCIERAS

- Revisar, controlar y supervisar el estado del buen desarrollo financiero del contrato.
- Controlar el manejo del Anticipo en cuanto sea entregado al Contratista.
- Cuantificación semanal de las actividades realizadas por el contratista en la obra para determinar avances y atrasos.

10.2.5. ACTIVIDADES ESPECIFICAS

- Nuevamente se le solicito Instalar una valla en el sitio de ejecución de la obra de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que serían suministradas por la Gobernación del Huila. Al igual que Todas las licencias y permisos exigidos (copia de ellos) según la normatividad vigente a subcontratistas y. proveedores de materiales y servicios,
- Revisión de programación financiera contrato de construcción y seguimiento al cumplimiento del programa de obra.

- Control legal y administrativo de contrato de construcción.
- Elaboración registro fotográfico del avance de obra en cada uno de los sitios de trabajo, detallando cada una de las etapas constructivas.
- Actuar oportunamente, de tal manera que por causas imputables a la entidad; no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

10.3. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORIA

- Observar **Anexo N° 7**

10.4. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA

- Observar **Anexo N° 8** y **Anexo N° 8.1**

10.5. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA INTERVENTORIA

- Para el presente informe correspondiente del 01 al 30 de noviembre, no aplico detalle financiero.

11. PLAN DE CALIDAD

11.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

Durante el transcurso de este mes se realizaron labores representativas en la Ejecución del Contrato, por la cual la interventoría realizó el seguimiento a cada etapa en la obra, basados en el Plan de Calidad del Constructor, y en el transcurso del proyecto se hará énfasis en la toma de muestras de materiales para la fabricación de concretos, mezclas, así como también de materiales utilizados para conformar las capas de la estructura la placa huella.

11.2. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DEL INTERVENTOR

Permanentemente el equipo humano encargado del control de calidad al contratista estará en actividad, realizando el seguimiento a los procesos constructivos para que estén acorde a las exigencias de la entidad contratante y tomando muestras tanto de materias primas como de productos terminados para verificar la calidad de estos; Es así como durante el mes de inicio de labores en el proyecto se realizaran las siguientes actividades:

Aunque durante esta etapa inicial se realizaron este tipo de ensayos, puesto que las actividades que se ejecutaron lo ameritaron, se hace un resumen del trabajo de campo y laboratorio que se ejercerá permanentemente por el personal de la interventoría.

- Ensayos de laboratorio en campo: Granulometrías al material utilizado para Mejoramiento de la Subrasante.
- Ensayos de laboratorio en campo: Granulometrías al material utilizado para Subbase Granular.
- Ensayos de laboratorio: Caracterización de Materiales Granulares para Concretos.
- Toma de muestras de concreto utilizado para las obras de drenaje, cunetas, placa huella.

Como labores de oficina tanto en Neiva como en obra, se llevan Carpetas independientes con la siguiente información: Documentación total del contrato de construcción, Documentación total del contrato de Interventoría, Bitácora diaria de obra, resultados ensayos de laboratorio, correspondencia despachada y correspondencia recibida, Especificaciones Técnicas de Carreteras, Informes semanales.

12. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

- Observar **Anexo N° 9**

13. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Actualmente los ítems ejecutado en obra

Actualmente no se encuentra recibida ningún ítem ejecutado en la Obra, se espera que en el próximo mes el Contratista de Obra se ponga al día en el cronograma de obra y transporte al sitio del proyecto la maquinaria ofertada en la propuesta económica.

De acuerdo con conversaciones entre la obra y la interventoría, se tomarán en cuenta los documentos solicitados mediante oficios y el contratista se compromete a entregar estos en el menor tiempo posible. Para cumplir las obligaciones contractuales.

Se recomienda realizar la construccion de la placa huella de acuerdo a todas las especificaciones, secciones, pendientes y cotas indicadas en los planos, en caso de presentarse situaciones no previstas en los estudios y diseños que fueron entregados por la GOBERNACION DEL HUILA, deberam comunicarse a la interventoria.

El corredor vial definido para el proyecto se desarrolla en zona de montaña, por tal razón las vías poseen un buen drenaje, donde en época de lluvias abundantes no se genera inundación o encharcamiento de áreas representativas.

CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
R.L. JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
C.C 1.001.276.642 DE NEIVA

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME N° 3: POLIZAS DEL CONTRATO INTERVENTORIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
						DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDAL DE SEGUROS	0	CHU-100026301	29/07/2024	Cumplimiento del contrato	$ 1,204,561,528.20	29/06/2024	28/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1,806,842,292.30	29/06/2024	28/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 602,280,746.10	29/06/2024	28/02/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	$ 1,204,561,528.20	29/06/2024	28/02/2028

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ACTA DE INICIO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
						DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDAL DE SEGUROS	2	CHU-100026301	18/10/2024	Cumplimiento del contrato	$ 88,631,200.00	19/09/2024	18/11/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	$ 132,946,800.00	19/09/2024	18/11/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 88,631,200.00	19/09/2024	20/05/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	$ 88,631,200.00	19/09/2024	20/05/2028

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDAL DE SEGUROS	0	CHU-100005514	19/09/2024	$ 260,000,000.00	29/06/2024	28/02/2025

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ACTA DE INCIO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDAL DE SEGUROS	2	CHU-100005514	18/10/2024	$ 260,000,000.00	19/09/2024	21/05/2025

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interventoria:	959 DE 2024
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 3: EQUIPO DEL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION EN INTERVENTORIA

EQUIPO	PERIODO DE EJECUCIÓN 01 NOVIEMBRE 2024 A 30 NOVIEMBRE 2024																													
	NOVIEMBRE																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D
EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA	X	X			X	X	X					X				X					X	X			X	X	X			X	
LABORATORIO DE SUELOS												X	X	X													X	X			
ALQUILER DE VEHICULO	X	X			X	X	X						X	X						X	X	X					X	X	X	X	

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Objeto de Interventoria:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 3: PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

PERSONAL	PERIODO DE EJECUCIÓN 01 NOVIEMBRE 2024 A 30 NOVIEMBRE 2024																														
	NOVIEMBRE																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	
AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ	X		X																												
NELSON VARGAS ALMARIO	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
JUAN CARLOS GARCIA	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	
SERGIO STEVEN ACOSTA	X	X	X				X	X					X	X	X					X	X							X	X	X	
JUAN SEBASTIAN BAUTISTA	X	X	X		X		X	X					X	X	X					X	X							X	X	X	
YUDI XIOMARA SANCHEZ PERDOMO						X		X	X		X		X	X			X				X	X			X				X	X	
YISETH CHAVEZ SOTO KEIDY																															
ANDRES FELIPE RAMIREZ BASTO	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X						

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Objeto de Interventoria:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 3: SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE EJECUCIÓN 01 NOVIEMBRE 2024 A 30 NOVIEMBRE 2024

ITEM	Nombre y Apellido	Cedula	Cargo	Tipo de contrato	Fecha inicio de contrato	Fecha terminación de contrato	N° Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF	PARAFISCALES
1	AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ	57,306,696	DIRECTORA	TERMINO FIJO	1/09/2024	OCHO (8) MESES	31938610	$ 12,000.00	$ 3,000.00	$ 5,300.00	$ 3,000.00	$ 0.00
2	NELSON VARGAS ALMARIO	12,116,869	RESIDENTE	TERMINO FIJO	2/09/2024	OCHO (8) MESES	31938610	$ 560,000.00	$ 140,000.00	$ 243,600.00	$ 14,000.00	$ 0.00
3	KEIDY YISETH CHAVEZ SOTO	1,075,282,725	AMBIENTAL	TERMINO FIJO	2/09/2024	OCHO (8) MESES	31938610	$ 480,000.00	$ 120,000.00	$ 208,800.00	$ 120,000.00	$ 0.00
4	JUAN CARLOS GARCIA	1,001,276,642	INSPECTOR 1	TERMINO FIJO	2/09/2024	OCHO (8) MESES	31938610	$ 320,000.00	$ 80,000.00	$ 139,200.00	$ 80,000.00	$ 0.00
5	SERGIO STEVEN ACOSTA	1,031,155,214	TOPOGRAFO	TERMINO FIJO	2/09/2024	OCHO (8) MESES	31938610	$ 377,600.00	$ 94,400.00	$ 164,300.00	$ 94,400.00	$ 0.00
6	JUAN SEBASTIAN BAUTISTA	1,075,305,203	CADENERO	TERMINO FIJO	2/09/2024	OCHO (8) MESES	31938610	$ 208,000.00	$ 52,000.00	$ 90,500.00	$ 52,000.00	$ 0.00
7	GLORIA ESTFANIA DIAZ QUINTERO	1,075,297,556	SISO	TERMINO FIJO	2/09/2024	OCHO (8) MESES	31938610	$ 352,000.00	$ 88,000.00	$ 153,200.00	$ 88,000.00	$ 0.00
8	ANDRES FELIPE RAMIREZ BASTO	1,075,306,355	INSPECTOR 2	TERMINO FIJO	2/09/2024	OCHO (8) MESES	31938610	$ 320,000.00	$ 80,000.00	$ 139,200.00	$ 80,000.00	$ 0.00

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interven:	959 DE 2024
Objeto de Interventoria:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901840107	1	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	B	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 70 2W 02		3133727612			OCIMACSSAS@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31938610	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.125.000	44.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	31938610	2024-12-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 12116869	VARGAS ALMARIO NELSON	3.500.000	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.500.000	560.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.500.000	140.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.500.000	140.000	3.500.000	243.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.083.600	S	1471101
2	CC 57306696	BOLAÑO JIMENEZ AIDENI JUDITH	2.250.000	F	X														0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	75.000	12.000	0	0	SANITAS-EPS005	75.000	3.000	COMFACAUCA-CCF14	75.000	3.000	75.000	5.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	23.300	S	5711001
3	CC 1001276642	GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	2.000.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
4	CC 1031155214	ACOSTA HERMOSO SERGIO STEVEN	2.360.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.360.000	377.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.360.000	94.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.360.000	94.400	2.360.000	164.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	730.700	S	5711001
5	CC 1075268348	SANCHEZ PERDOMO YUDI XIOMARA	2.250.000	F	X														0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	2.175.000	348.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.175.000	87.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.175.000	87.000	2.175.000	151.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	673.400	S	5711001
6	CC 1075282725	CHAVEZ SOTO KEIDY YISETH	3.000.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.000.000	480.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.000.000	120.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S	1471101
7	CC 1075305203	BAUTISTA DURAN JUAN SEBASTIAN	1.300.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
8	CC 1075306355	RAMIREZ BASTO ANDRES FELIPE	2.000.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901840107	1	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL	B	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 70 2W 02		3133727612			OCIMACSSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31938610	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.125.000	44.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	31938610	2024-12-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.410.000	16.410.000	16.410.000	16.410.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				8	2.625.600	0	22.800	0	2.648.400
PORVENIR	230301	800224808	8	6	2.053.600	0	17.800	0	2.071.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	572.000	0	5.000	0	577.000
EPS(Administradoras: 3)				8	656.400	0	5.800	0	662.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	135.000	0	1.200	0	136.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	427.000	0	3.700	0	430.700
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	94.400	0	900	0	95.300
ARP(Administradoras: 1)				8	1.142.300	0	9.900	0	1.152.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	1.142.300	0	9.900	0	1.152.200
CCF(Administradoras: 2)				8	656.400	0	5.800	0	662.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	7	653.400	0	5.700	0	659.100
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	1	3.000	0	100	0	3.100
Gran Total					5.080.700	0	44.300	0	5.125.000

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME No 3: CORRESPONDENCIA ENVIADA

PERIODO DE EJECUCIÓN 01 NOVIEMBRE 2024 A 30 NOVIEMBRE 2024

N° OFICIO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
OFI-019-CO	SOLICITUD ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	ALVARO LIS ROJAS
OFI-020-CO	PROGRAMACION COMITÉ N°5	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
OFI-021-CO	SOLICITUD DE DESGLOSE DE AIU	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
OFI-022-CO	SOLICITUD DE CAMBIO DE DE HOJA DE VIDA - DIRECTORA DE INTERVENTORIA 50% ESPECIALISTA EN VIAS 15%	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	ALVARO LIS ROJAS

INFORME No 1: CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	N° OFICIO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
Bogota, D.C., 01 de noviembre de 2027	GOB-HUILA-867/2024-OFC-0011	COBRO PAGO ANTICIPO	CONSORCIO PLACAS HUILA CI	CONSORCIO INTER CONSTRUCCION VIAL

Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL
Contrato Interventoria:	959 DE 2024
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

GOBERNACIÓN DE HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA VIAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME NOVIEMBRE

PERSONAL	PERIODO DE EJECUCIÓN 01 NOVIEMBRE 2024 A 30 NOVIEMBRE 2024	
	NOVIEMBRE	
	CARGO	SALARIO
AIDEN JUDITH BOLAÑO JIMENEZ	DIRECTORA DE INTERVENTORIA CON DEDICACIÓN 50% ESPECIALISTA EN VIAS CON DEDICACIÓN 15%	$ 2,250,000.00
NELSON VARGAS ALMARIO	INGENIERO RESIDENTE	$ 3,500,000.00
KEIDY YISETH CHAVEZ SOTO	INGENIERO AMBIENTAL	$ 3,000,000.00
JUAN CARLOS GARCIA	INSPECTOR	$ 2,000,000.00
SERGIO STEVEN ACOSTA	TOPOGRAFO	$ 2,360,000.00
JUAN SEBASTIAN BAUTISTA	CADENERO	$ 1,300,000.00
GLORIA ESTFANIA DIAZ QUINTERO	TEGNOLOGO SISO	$ 2,200,000.00
ANDRES FELIPE RAMIREZ BASTO	INSPECTOR	$ 2,000,000.00
Interventor:	CONSORCIO INTER CONSTRUCCIÓN VIAL	
Contrato Interven:	959 DE 2024	
Objeto de Interventoria:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	


REGISTRO FOTOGRAFICO NOVIEMBRE

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL MUNICIPIO DE ELIAS







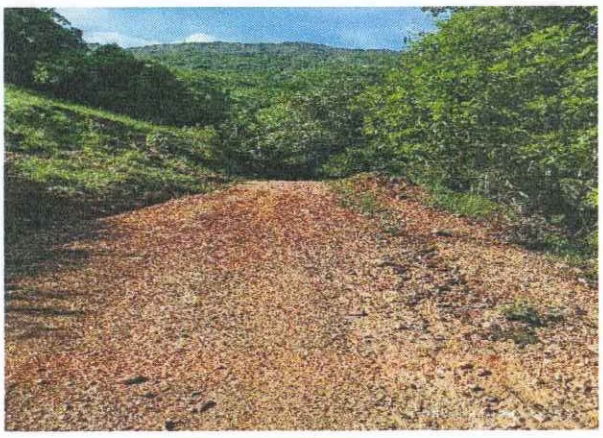

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL MUNICIPIO DE ELIAS










1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL MUNICIPIO DE ELIAS



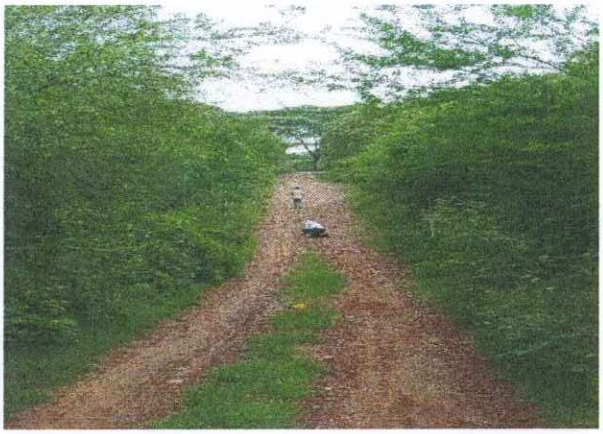





1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL MUNICIPIO DE ELIAS












1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA



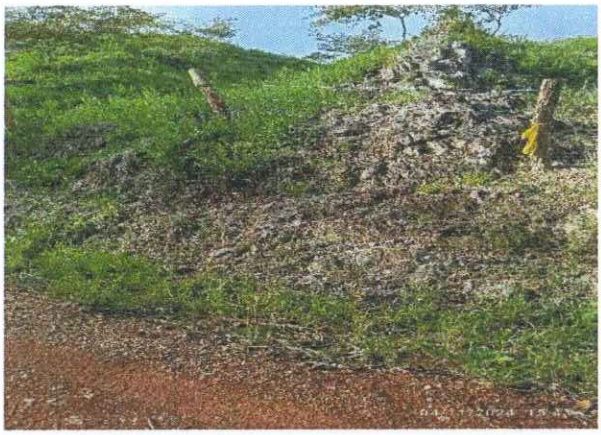

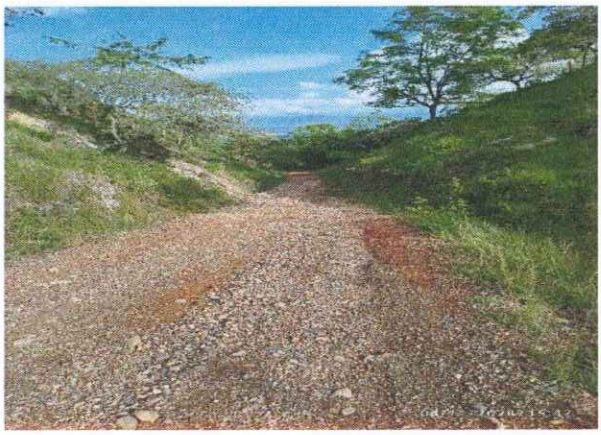


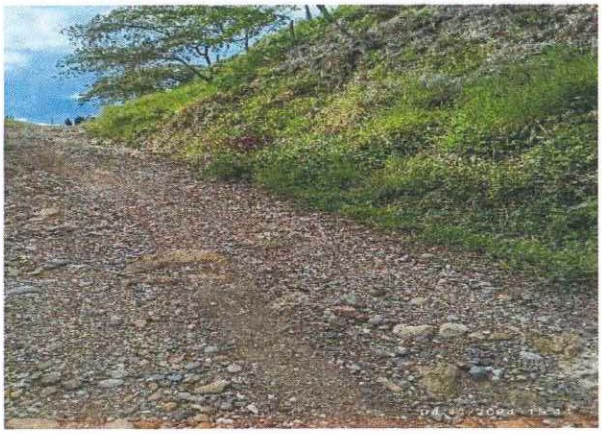


1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA



1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA

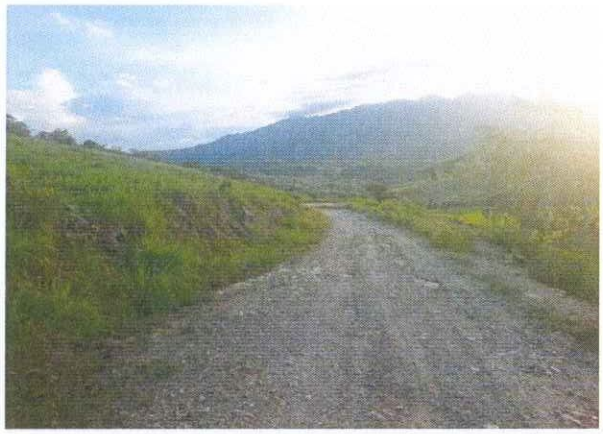

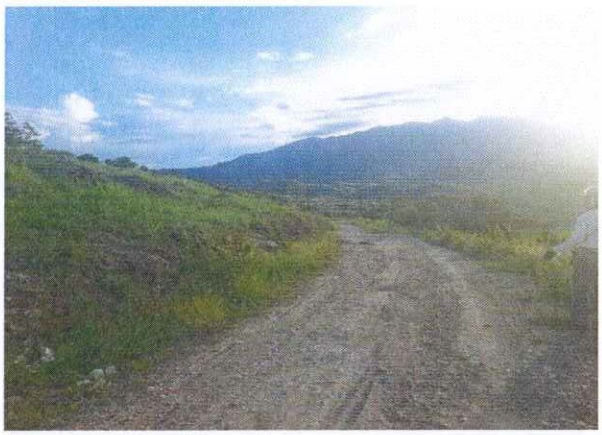






1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA



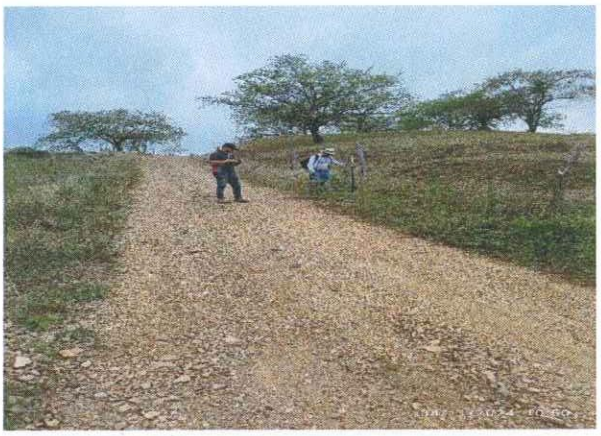






1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA







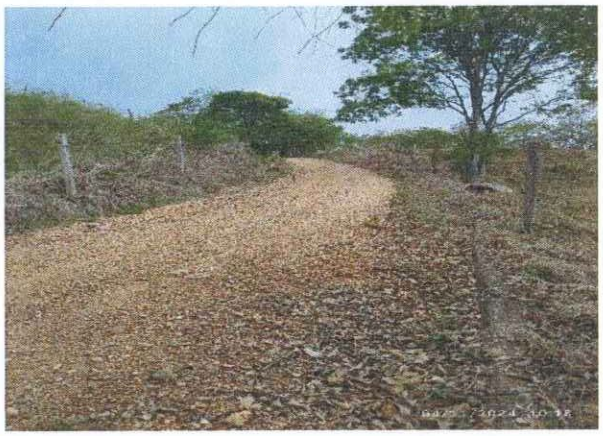


1.2. LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA







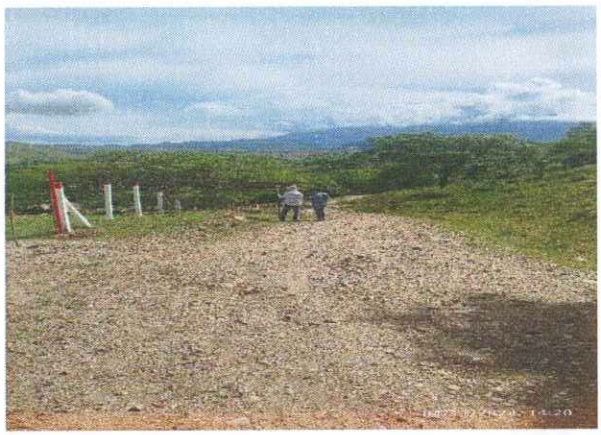

1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA









1.2. LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA










2.1. EXCAVACIÓN MECÁNICA (EXPLANACIÓN). ESP. 210-22 INV. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A DISPOSICIÓN FINAL DEL MISMO.







2.2. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO.)

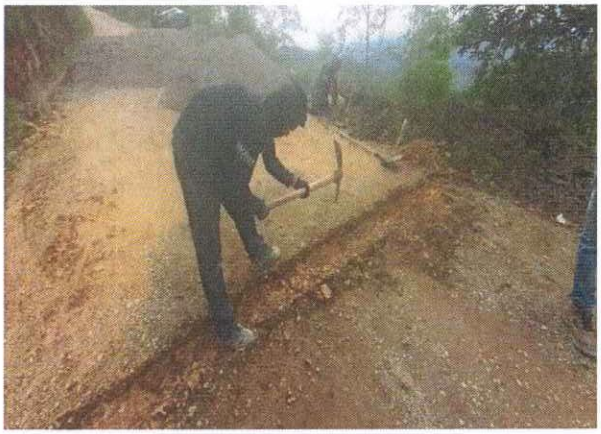








2.3. SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE MEDIANTE MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO COMO SELECCIONADO. ESP. 311.1

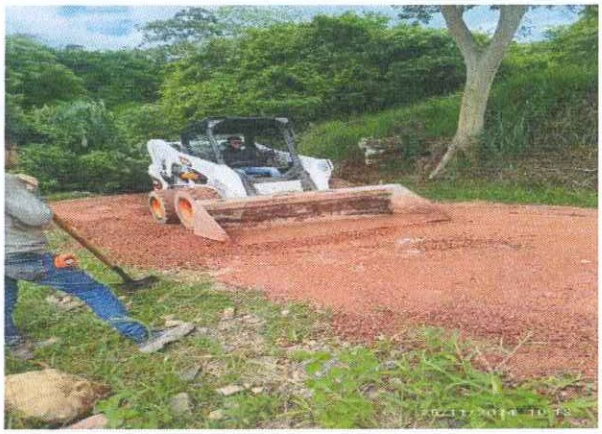










2.4. SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENDIDA, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO O AIREACION Y COMPACTACION DE SUBBASE GRANULAR CBR ≥ 40%. ESP. 320-22 INV.

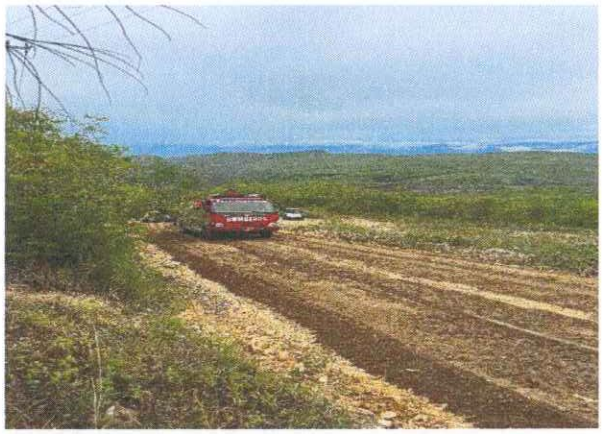



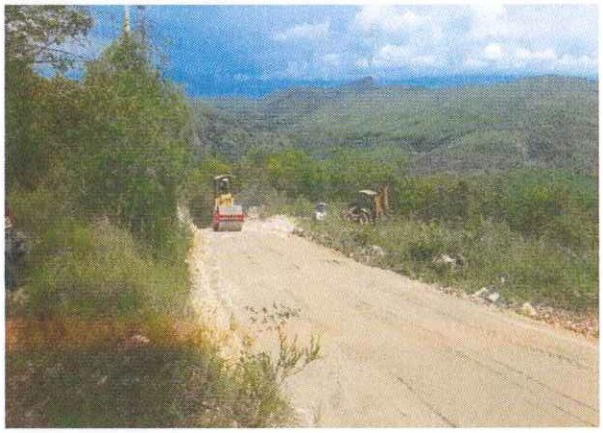

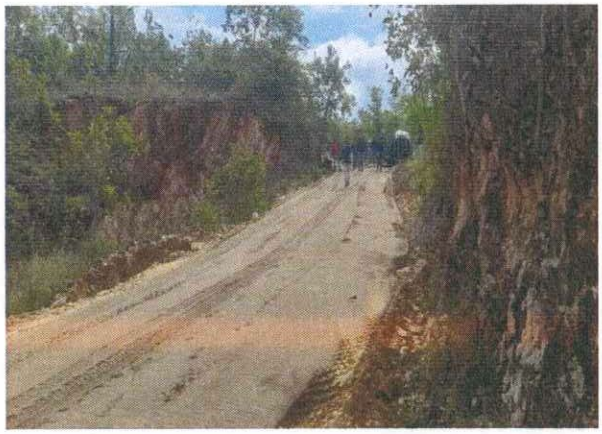


2.5. ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI) ESP.640-22 INV. PARA PLACAS, RIOSTRAS, CUNETAS, BORDILLOS Y DENTELLONES








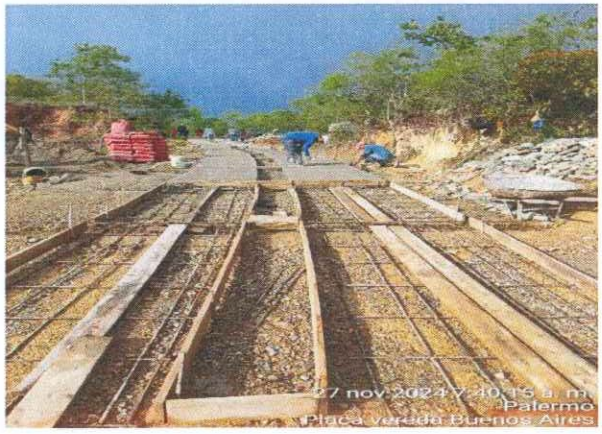

2.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO NORMAL CLASE D - (F´C=210 KGF/CM2) O (3.000 PSI) PARA DENTELLONES- PLACAS - RIOSTRAS - CUNETAS - BORDILLO.





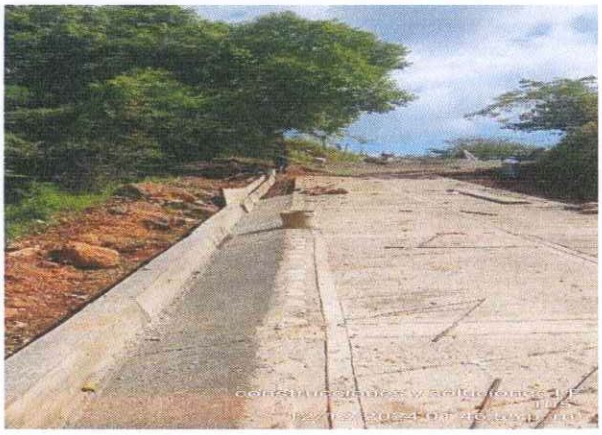



2.7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) ESPESOR 0,15 M.60% CONCRETO NORMAL DE 210 KG/CM² (3.000 PSI) , 40% PIEDRA ESP. 630-22 INV. PARA HUELLAS.









PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)













TOMA DE MUESTRA DE CILINDROS Y CONSISTENCIA DE CONCRETOS

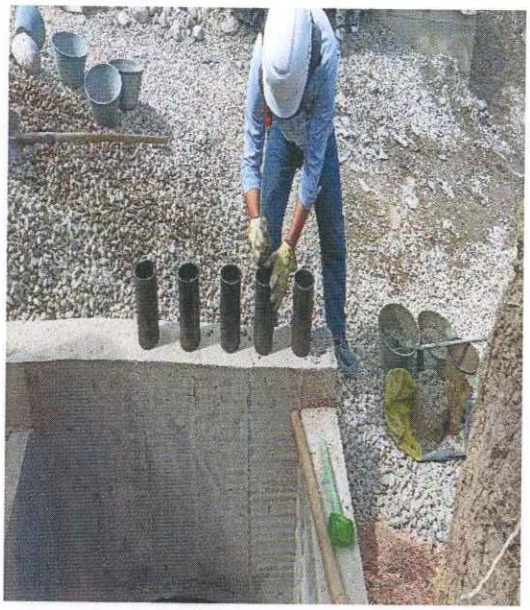

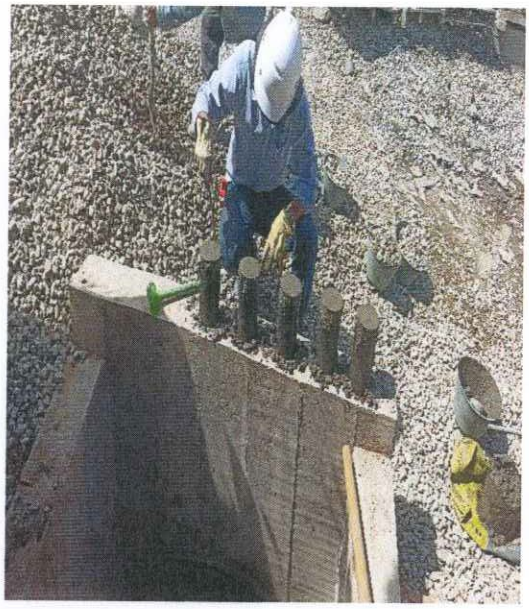

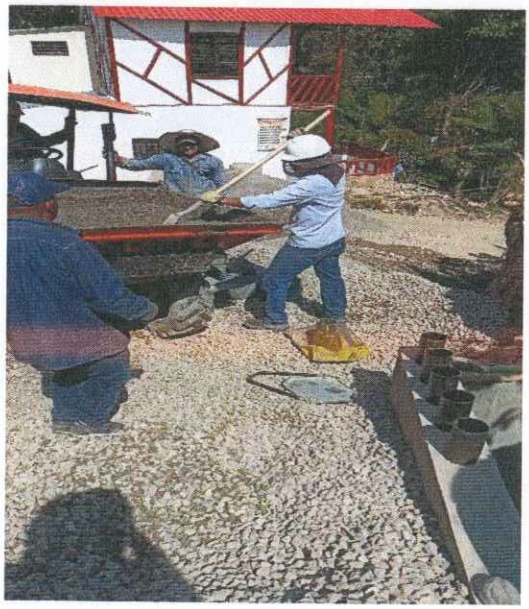

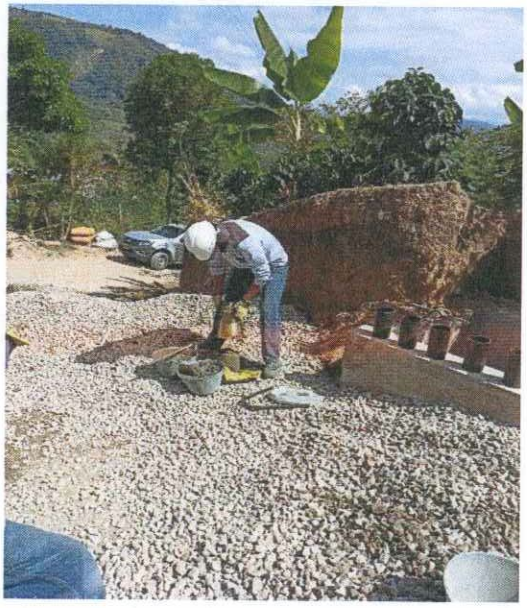

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA



CONTRATO DE OBRA N° 867 de 2024

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 3

DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONSORCIO
PLACAS HUILA CI

HUILA 1905

Gobernación del Huila

Huila, diciembre de 2024

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 03- DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Lista de chequeo Informe mensual de Actividades

Ítem	Documento	Versión	Estado
1	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 3 – MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1	

FORMATO DE REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS


TITULO: **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No.03 – DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

1. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DESTINATARIOS
INTERVENTORIA- CONSORCIO INTERCONSTRUCCIÓN VIAL

2. ÍNDICE Y APROBACIÓN DE MODIFICACIONES

No. DE REVISIÓN	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
0			
1			
2			

APROBACIÓN		No DE REVISIÓN		
		0		
RESPONSABLE POR REVISIÓN	NOMBRE	Interventoría Juan Carlos García Rodríguez		
	FIRMA			
	FECHA	Diciembre 05 de 2024		
Vo.Bo. DIRECTOR PROYECTO	NOMBRE	Director de obra Néstor Rojas Torres		
	FIRMA			
	FECHA	Diciembre 03 de 2024		

Las modificaciones al documento serán comunicadas al Director del Proyecto quien autorizará los cambios a que haya lugar.

INTRODUCCIÓN

En el Plan de Desarrollo Departamental "HUILA CRECE", previsto para el periodo 2020-2023, adoptado mediante la Ordenanza No. 020 del 2020, Debido al mal estado de la red vial que afecta principalmente al sector productivo del departamento del Huila, se estableció dentro del Sector TRANSPORTE, el Programa HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL con el objetivo de garantizar condiciones de movilidad vehicular en las vías a cargo del departamento en la conservación, rehabilitación y mejoramiento asegurando la conectividad entre los territorios y la integración de nuestra región, fomentando el turismo y el agro. De igual manera, apoyar a los 37 municipios del departamento mediante el mejoramiento de sus vías.

De conformidad con el diagnóstico contenido en el Plan de Desarrollo Departamental "HUILA CRECE", la red vial de tercer orden a cargo del Departamento tiene una extensión de 689.56 km de los cuales, 109.39 km se encuentran pavimentados y en buen estado, 34.77 km pavimentados en regular estado, 28.92 en afirmado en buen estado, 451.76 en afirmado en regular estado y 61.54 km en afirmado en mal estado, red que se debe mantener de acuerdo a sus condiciones iniciales para que no sufran más deterioro.

Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural de los municipios de Elías, Palermo, Yaguará, Santa María y Neiva debido a que las vías se encuentran en mal estado y con deficiente mantenimiento. Algunas de las vías presentan deterioro de la superficie de rodadura o no se han atendido los puntos críticos. De igual manera se presentan situaciones que generan el deterioro, tales como el hecho de que algunos tratamientos anteriores han sido realizados con deficiencias; y no existe un mantenimiento periódico o rutinario de las vías por parte de los municipios.

Las situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de viaje y baja comercialización de productos de los municipios, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-económico de la zona.

Algunas de las vías presentan deterioro de la superficie, de los 419,3 km que conforman la red vial terciaria aproximadamente el 86% se encuentra en regular y mal estado, generando situaciones de deterioro; lo cual hace necesario una rápida y oportuna intervención de estas vías para contribuir al cierre de brechas en los municipios intervenidos.

El tiempo de desplazamiento entre las veredas de los municipios con el casco urbano es de 12,3 horas en promedio para un trayecto de 419,3 km (Desplazamiento de la zona rural a las cabeceras Municipales), pero se presentan tramos críticos que suman 4,4 Km lineales en malas condiciones, que impiden el tránsito a velocidad constante de los vehículos.

Conforme a lo anterior, la Gobernación del Huila, adelantó los procesos de licitación correspondientes para iniciar las actividades de MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, el cual fue adjudicado a CONSORCIO PLACAS HUILA CI, mediante formalización del contrato N° 867 de 2024

El presente documento, corresponde al informe mensual de ejecución de los trabajos del periodo del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024, en el cual se presenta la información relacionada con el avance de la ejecución de las diferentes actividades del contrato de obra.

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 1
1.1. Localización general del contrato 1
1.1.1. Municipio de Elías 1
1.1.2. Municipio de Yaguará 1
1.1.3. Municipio de Palermo, Santa Maria y Neiva 1
1.2. Objetivo general del contrato 4
INFORME EJECUTIVO MENSUAL 4
2. SUPERVISOR / INTERVENTOR DE LA OBRA 4
3. CONTRATO DE OBRA 5
3.1. Pólizas del contrato 5
3.2. Documentos y Actas 6
4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 7
5. COMPONENTE TÉCNICO 8
5.1. Cronograma de actividades actualizado 8
5.2. Ejecución de obra 8
5.3. Acta de avance de obra 8
5.4. Actividades realizadas 19
5.4.1. Municipio de Palermo 19
5.4.2. Municipio De Yaguará 21
5.4.3. Municipio de Elías 22
5.5. Resultados de pruebas de laboratorio 23
5.6. Certificado de calidad de materiales 23
5.7. Reporte de lluvias 23
5.8. Registro fotográfico 23
5.8.1. Municipio de Palermo 23
5.8.2. Municipio de Yaguará 27
5.9. Seguimiento mensual de obra civil 32

CONSORCIO PLACAS HUILA CI

6. COMPONENTE SISOMA 34
6.1. Indicadores 34
6.1.1. Ausentismo en el proyecto. 35
6.1.2. Accidentalidad del proyecto, consolidado de indicadores 35
6.1.3. Indicadores noviembre 2024 35
6.2. Medicina preventiva 36
6.3. Agenda de seguridad 37
6.3.1. Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo 39
6.3.2. Grafica ejecución de capacitación 39
6.3.3. Inspección de botiquín de primeros auxilios 40
7. COMPONENTE AMBIENTAL 42
8. COMPONENTE SOCIAL 43
8.1. Fomento de empleo - atención a recepción de hojas de vida 43
8.1.1. Empleos personal mano de obra calificada y no calificada 44
8.2. Piezas comunicativas e informativas 45
8.3. Reuniones con comunidad 46
8.4. Atención a la comunidad 46
8.5. Conformacion comité de veeduria ciudadana 47
8.6. Levantamiento actas de vecindad 48
8.7. Conclusiones 49

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1 Localización intervención municipio de Elias 2
Tabla No. 2 Localización intervención municipio de Yaguará 3
Tabla No. 3 Localización intervención municipio de Palermo 4
Tabla No. 4 Localización intervención municipio de Santa María 4
Tabla No. 5. Supervisión de la obra 4
Tabla No. 6 Valor del contrato 5
Tabla No. 7 Actualización de pólizas conforme al contrato de obra 5
Tabla No. 8 Actualización de pólizas conforme al acta de inicio 5

Tabla No. 9 Documentos y actas suscritos para el contratista 6
Tabla No. 10 Sistema integral de seguridad social del contratista 7
Tabla No. 11 Ejecución de actividades 8
Tabla No. 12 Avance de ejecución de obra 9
Tabla No. 13 Toma de muestras 23
Tabla No. 14. Seguimiento mensual de la obra civil 32
Tabla No. 15 Días trabajados 34
Tabla No. 16 Ausentismo laboral 35
Tabla No. 17 Índice de accidentalidad 35
Tabla No. 18 Indicadores 35
Tabla No. 19 Medicina preventiva 36
Tabla No. 20 Agenda de seguridad 37
Tabla No. 21 Capacitación 39
Tabla No. 22 Charlas de seguridad 5 minutos 40
Tabla No. 23 Charlas de seguridad 40
Tabla No. 24 Botiquín y primeros auxilios 41
Tabla No. 25 Gestión ambiental 42
Tabla No. 26 Fomento de empleo 43
Tabla No. 27 Piezas informativas 45
Tabla No. 28 Reunión extraordinaria 46
Tabla No. 29 Actas de vecindad veredas de palermo 48

CONSORCIO PLACAS HUILA CI

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización general del proyecto 2

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1.1. Localización general del contrato

De acuerdo al plan de Desarrollo Departamental, Debido al mal estado de la red vial que afecta principalmente al sector productivo del departamento del Huila, con el objetivo de garantizar condiciones de movilidad vehicular en las vías a cargo del departamento en la conservación, rehabilitación y mejoramiento asegurando la conectividad entre los territorios y la integración de nuestra región, fomentando el turismo y el agro. De igual manera, apoyar a los 37 municipios del departamento mediante el mejoramiento de sus vías.

El proyecto cuyo Objeto es "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1.1.1. Municipio de Elías

Limita por el norte con el municipio de Tarqui, al este con los municipios de Altamira y Timaná, por el sur con Pitalito y al oeste con Oporapa y Saladoblanco. Es un territorio Montañoso y su relieve corresponde a la cordillera Oriental; de la cual se desprende una serie de farallones. En él encontramos la serranía de la Ceja que va a terminar al alto de Pericongo, en la confluencia del río Timana con el río Magdalena en donde forma una meseta denominada potrero alto.

1.1.2. Municipio de Yaguará

Yaguará es un municipio colombiano ubicado en el centro del departamento del Huila.

Yace entre los valles del río Yaguará y el río Magdalena, en la vertiente oriental de la cordillera central. Hace parte de la región SubNorte del departamento. Su extensión territorial es de 329 km², su altura es de 560 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 25 °C.5

1.1.3. Municipio de Palermo, Santa Maria y Neiva

Palermo es un municipio colombiano ubicado en el noroccidente del departamento del Huila. Hace parte de la región andina, localizado en el alto del valle del Magdalena al oriente de la cordillera Central y hace parte

de la región Sub-Norte del departamento. Su extensión territorial es de 917 km², su altura es de 690 msnm y su temperatura promedio es de 27 °C.

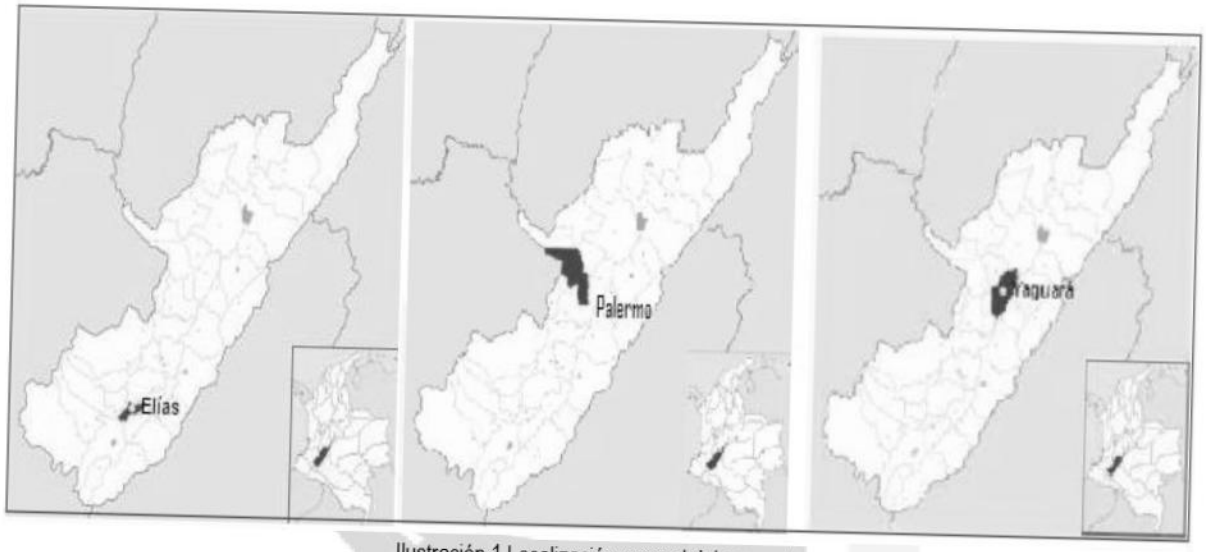


Ilustración 1 Localización general del proyecto
Fuente: Google Maps

Tabla No. 1 Localización intervención municipio de Elias

VEREDA - SECTOR - TRAMO Municipio Elias	LONGITUD (METROS)	COORDENADAS INICIO	COORDENADAS FIN
Vereda El progreso - Sector Alto oritoguaz.	200	X=1117647.812 Y=709463.559	X=1117680.715 Y=709353.679
Vereda Oritoguaz - Sector alto oritoguaz	200	X=1118410.233 Y=709153.147	X=1118487.536 Y=709087.240
Vereda Gallardito - Sector delicias	200	X=1123204.701 Y=713487.257	X=1123082.214 Y=713378.879
Vereda Oritoguaz - Sector La esperanza T1	100	X=1118924.762 Y=711223.875	X=1118997.271 Y=711222.787
Vereda Oritoguaz - Sector La esperanza T2	200	X=1120098.845 Y=711462.819	X=1120216.542 Y=711419.744
LONGITUD TOTAL A INTERVENIR (mt)	900		

Tabla No. 2 Localización intervención municipio de Yaguará

TRAMO - VEREDA Municipio de yaguara	LONG.	COORD. INICIO	COORD. FIN
Vereda upar - subida y bajada finca las nubes tramo 1	120	X=845704.687 Y=794959.068	X=845822.591 Y=794937.001
Vereda upar - subida y bajada finca las nubes tramo 2	180	X=842736.4920 Y=794023.7765	X=842733.2432 Y=794117.0068
Vereda la paz - sector subida finca San Nicolas	100	X=842474.7924 Y=791069.8843	X=842556.2817 Y=791016.0685
Vereda la paz- sector finca Miraflores y la Esmeralda	100	X=841964.433 Y=791685.076	X=842048.035 Y=791632.495
Vereda viso - sector subida antes de llegar al primer cruce	250	X=839544.1459 Y=789407.7565	X=839633.8240 Y=789662.7110
Vereda viso - sector subida antes de llegar al primer cruce olivo	100	X=839112.3083 Y=790727.6564	X=839144.5362 Y=790821.4318
Vereda viso bajo 1	100	X=836890.2942 Y=787389.4704	X=836956.7184 Y=787315.3664
Vereda viso bajo 2	100	X=836154.5766 Y=787793.9482	X=836243.7801 Y=787751.5748
Vereda arenoso - sector subida finca buenos aires tramo 1	120	X=835214.3916 Y=778005.6269	X=835251.2632 Y=777803.9668
Vereda arenoso - sector la escuela	80	X=835109.7724 Y=778198.7414	X=835151.4765 Y=778270.7440
Vereda Arenoso	150	X=836337.4859 Y=781840.8000	X=836422.9796 Y=781962.1638
Vereda Vilu alto	200	X=835424.1819 Y=776985.2737	X=835561.1313 Y=776123.2965
Vereda Vilu bajo	100	X=841323.448 Y=785347.388	X=841380.369 Y=785265.171
Vereda la floresta	100	X=835790.5895 Y=783730.1270	X=835769.1450 Y=783634.1496
LONGITUD TOTAL A INTERVENIR (mt)	**1800**		

PLACAS HUILA CI

Tabla No. 3 Localización intervención municipio de Palermo

MUNICIPIO	VEREDA - SECTOR - TRAMO	LONGITUD (METROS)	COORD. INICIO	COORD. FIN
PALERMO	Vereda Buenos Aires	200	X=848403.9811 Y=809651.8299	X=848575.0731 Y=809952.8505
PALERMO	Vereda San Gerardo	150	X=834831.3812 Y=804013.3393	X=834951.2000 Y=804081.8234
PALERMO	Vereda Porvenir	150	X=855749.0001 Y=818359.4960	X=855863.7115 Y=818435.6398
PALERMO	Vereda Alto San Pedro	150	X=839415.8431 Y=824876.5330	X=839362.5819 Y=824988.1584
PALERMO	Vereda Bajo San Pedro T 1	90	X=841035.2686 Y=823946.6912	X=841053.7332 Y=824026.0414
PALERMO	Vereda Bajo San Pedro T 2	60	X=841074.8434 Y=824090.2213	X=841114.461 Y=824109.807
PALERMO	Vereda Alto Sardinata	150	X=856655.1067 Y=805850.6689	X=856774.5929 Y=805839.4705
PALERMO	Vereda Nazareth	150	X=850555.7249 Y=809521.6586	X=850629.4980 Y=809645.1572
PALERMO	Vereda El Carmen - Sector Dos Quebradas T2	75	X=837793.6207 Y=821355.1710	X=837853.2247 Y=821376.7179
PALERMO	Vereda El Mirador T1	75	X=834607.4239 Y=833217.6560	X=834649.7284 Y=833157.3001
PALERMO	Vereda El Mirador T2	75	X=834524.8849 Y=833580.7437	X=834564.6888 Y=833528.2329
NEIVA	Vereda Quebradon	150	X=839423.4920 Y=830664.6929	X=839483.6977 Y=830797.9407
	Vereda Quebradon	150	X=837581.7536 Y=831754.7169	X=837708.9217 Y=831762.2190

Tabla No. 4 Localización intervención municipio de Santa María

SANTA MARIA	Vereda El Carmen - Sector Dos Quebradas T1	75	X=838330.1156 Y=821183.1572	X=838392.3200 Y=821122.0626
LONG. TOTAL (mts)		1700		

1.2. Objetivo general del contrato

El objeto del contrato de obra No. 287 de 2024, que tiene como objeto el mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en sitios críticos de los municipios de Elías, Palermo, Yaguara, Santa María y Neiva del departamento del Huila.

INFORME EJECUTIVO MENSUAL

CONSORCIO PLACAS HUILA CI

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1 de noviembre de 2024	Y EL	30 de noviembre de 2024
OBJETO	**MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATO No.:	867 DE 2024				

CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACAS HUILA CI
PLAZO INICIAL:	8 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de septiembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN (ACTA DE INICIO):	19 de mayo de 2024
PRÓRROGA No. 1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN (Prórroga No. 1)	N/A
PRÓRROGA No. 2	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN (Prórroga No. 2)	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	8 meses
VALOR INICIAL :	$ 6.022.807.641,00
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.022.807.641,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.806.842.292,30
VALOR AMORTIZADO:	$ 0,00
VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 6.022.807.641

1. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

1.1 SEGÚN CONTRATO DE OBRA


CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	10-jul-24	10-jul-25	$ 1.204.651.528,20
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	10-jul-24	10-jul-25	$ 1.806.842.292,30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS MUNDIAL	10-jul-24	10-mar-28	$ 602.280.764,10
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SEGUROS MUNDIAL	10-mar-25	10-mar-30	$ 1.204.561.528,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	10-jul-24	10-mar-25	$ 520.000.000,00

1.2 SEGÚN SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO

CONCEPTO	ASEGURADORA	VIGENTE (Fechas)		VALOR
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	19-sep-24	19-sep-25	$ 1.204.561.528,20
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	SEGUROS MUNDIAL	19-sep-24	19-sep-25	$ 1.806.842.292,30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS MUNDIAL	19-sep-24	20-may-28	$ 602.280.764,10
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SEGUROS MUNDIAL	19-sep-24	20-may-30	$ 1.204.561.528,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	19-sep-24	20-may-25	$ 520.000.000,00

2. CURVA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

	MES	PROGRAMADO %	EJECUTADO %	PAGADO %
1	30/10/2024	1,98%	1,26%	0,00%
2	30/11/2024	8,00%	27,53%	0,00%
3				
4				
5				
6				
7				
8				

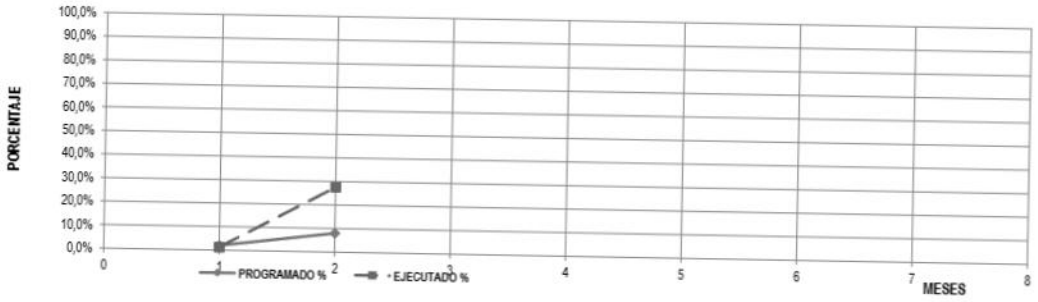

3. RESUMEN DE PAGOS

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
VALOR FACTURADO TOTAL		$ -

4. COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCIÓN

ESTAN VIGENTES LAS POLIZAS?	SI
TIENE RECLAMACIONES?	NO

2. SUPERVISOR / INTERVENTOR DE LA OBRA

A continuación, se presenta la información correspondiente a la supervisión de la obra:

Tabla No. 5. Supervisión de la obra

NO. DE CONTRATO	OBJETO DE LA DELEGACIÓN	SUPERVISOR
Contrato No. 959 de 2024	INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	CONSORCIO INTERCONSTRUCCIÓN VIAL

CONSORCIO
PLACAS HUILA CI

3. CONTRATO DE OBRA

De conformidad con la aprobación y protocolización del contrato de obra, en la Tabla No. 6 se relaciona el valor pactado.

Tabla No. 6 Valor del contrato

OBJETO DEL CONTRATO	VALOR ($) DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	$6.022.807.641,00
TOTAL DEL CONTRATO	$6.022.807.641,00

- **CONTRATO Nº:** 267 de 2024
- **CONTRATISTA:** CONSORCIO PLACAS HUILA CI
- **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
- **VALOR INICIAL:** $6.022.807.641,00
- **PLAZO INICIAL:** 8 meses
- **FECHA INICIO:** 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
- **FECHA DE TERMINACIÓN:** 19 DE MAYO DE 2024
- **VALOR TOTAL:** $6.022.807.641,00

3.1. Pólizas del contrato

En el Anexo 1 se muestran las pólizas del contrato.

Tabla No. 7 Actualización de pólizas conforme al contrato de obra

PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	Cumplimiento	10-jul-24	10-jul-25	$1.204.651.528,20
	Buen manejo de anticipo	10-jul-24	10-jul-25	$1.806.842.292,30
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10-jul-24	10-mar-28	$602.280.764,10
	Estabilidad de la obra	10-mar-25	10-mar-30	$1.204.561.528,20
RCE	Responsabilidad civil extracontractual	10-jul-24	10-mar-25	$520.000.000,00

Tabla No. 8 Actualización de pólizas conforme al acta de inicio

PÓLIZA	AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	Cumplimiento	19-sep-24	19-sep-25	$1.204.651.528,20
	Buen manejo de anticipo	19-sep-24	19-sep-25	$1.806.842.292,30
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19-sep-24	20-may-28	$602.280.764,10
	Estabilidad de la obra	19-sep-24	20-may-30	$1.204.561.528,20
RCE	Responsabilidad civil extracontractual	19-sep-24	20-may-25	$520.000.000,00

3.2. Documentos y Actas

Desde el inicio de este contrato se han suscrito los siguientes documentos y Actas. (Ver Tabla No. 9)

Tabla No. 9 Documentos y actas suscritos para el contratista

No.	DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	Firma y protocolización del contrato No. 867 de 2024	El 14 de mayo de 2024	GOBERNACIÓN DEL HUILA Y CONSORCIO PLACAS HUELLA CI, celebran el contrato de obra No. 267 de 2024, para el mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huella en sitios críticos de los municipios de Elías, Palermo, Yaguara, Santa María y Neiva del departamento del Huila
2	Acta de Inicio	El 19 de septiembre de 2024	Orden de inicio de las actividades correspondientes al Contrato No. 867 de 2024

CONSORCIO
PLACAS HUILA CI

4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

A continuación, se presenta el listado de los trabajadores que se encuentran vinculados al proyecto.

Tabla No. 10 Sistema integral de seguridad social del contratista

Cargo	Nombre
DIRECTOR DE OBRA	ING. NESTOR ROJAS TORRES
RESIDENTE DE OBRA	LUIS FERNANDO GARCÍA PEÑA
INSPECTOR 1	DIANA PAOLA RAMIREZ ORTIZ
INSPECTOR 2	RAUL DARÍO CARVAJAL CORTÉS
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	CARLOS NEFTALI BENAVIDES CUADROS
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ALFONSO RENDON VALENCIA
PROFESIONAL AMBIENTAL	KAREN SALAZAR ZULETA
SISOMA	JHON EDINSON YAIME BORRERO
TOPÓGRAFO	MILTON RAFAEL PAEZ GONZALEZ

CONSORCIO
PLACAS HUILA CI

5. COMPONENTE TÉCNICO

Durante el periodo en análisis, se realizan actividades de acuerdo al objeto del contrato y actividades contratadas, lo cual se enuncia a continuación

5.1. Cronograma de actividades actualizado

Adjunto a la presente de emite el cronograma de obra actualizado (ver Anexo 2).

5.2. Ejecución de obra

En la Tabla No. 11, se muestra el avance de actividades del contrato de obra ejecutadas a la fecha:

Tabla No. 11 Ejecución de actividades

5.3. Acta de avance de obra

En este periodo se procedió a presentar un acta de cobro por un valor de $1.080.824.683,00 correspondiente al 48% del avance de obra.

CONSORCIO
PLACAS HUILA CI

Tabla No. 12 Avance de ejecución de obra

No	Item de pago	Especificaciones		Descripcion	Condiciones originales				Septiembre			Octubre			Noviembre			Acumulada		
		General	Particular		Und	Cantidad	Vr/unit	Vr/total	Cantidad	Valor total	%	Cantidad	Valor total	%	Cant	Valor / total	%	Cantidad	Valor	%
				1. Municipio de elias																
				Preliminares																
1	1,1	1p		Localizacion y replanteo	Ml	900,00	$4.536,00	$4.082.400,0							900,00	$4.082.400	0,07 %	900,00	$4.082.400,00	0,07 %
				Subtotal				***$4.082.400,0***								***$4.082.400,0***	***0,07 %***		***$4.082.400,0***	***0,07 %***
				Estructura de pavimento placa huella																
2	2,1		Esp. 210-22 inv	Excavación mecánica (explanación). Esp. 210-22 inv. Incluye retiro de material proveniente de la excavación a disposición final del mismo.	M3	356,00	$29.227,000	$10.404.812,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
3	2,2	2p		Excavacion manual en material seco (incluye transporte a sitio autorizado.)	M3	99,00	$41.861,000	$4.144.239,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
4	2,3		Esp. 311-1 inv.	Suministro, instalacion, extendida, nivelacion, humedecimiento o aireacion y compactacion de mejoramiento de la sub rasante mediante material granular clasificado como seleccionado. Esp. 311.1	M3	405,00	$44.159,000	$17.884.395,0							130,00	$5.740.670,00	0,10 %	130,00	$5.740.670	0,10 %
5	2,4		Esp. 320-22 inv.	Suministro, instalacion, extendida, nivelacion, humedecimiento o aireacion y compactacion de subbase granular cbr ≥ 40%. Esp. 320-22 inv.	M3	572,00	$126.500,000	$72.358.000,0							190,00	$24.035.000,00	0,40 %	190,00	$24.035.000	0,40 %
6	2,5		Esp.640-22 inv.	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-22 inv. Para placas, riostras, cunetas, bordillos y dentellones	Kg	38.538,00	$8.385,000	$323.141.130,0							13.000,00	$109.005.000,00	1,81 %	13.000,00	$109.005.000	1,81 %
7	2,6		Art. 630 inv	Suministro e instalación de concreto normal clase d - (f´c=210 kgf/cm2) o (3.000 psi) para dentellones- placas - riostras - cunetas - bordillo.	M3	671,00	$702.349,000	$471.276.179,0							220,00	$154.516.780,00	2,57 %	220,00	$154.516.780	2,57 %
8	2,7		Esp. 630-22 inv.	Suministro e instalación de concreto ciclópeo de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m.60% concreto normal de 210 kg/cm²	M3	164,00	$462.424,000	$75.837.536,0							39,00	$18.034.536,00	0,30 %	39,00	$18.034.536	0,30 %

No	Item de pago	Especificaciones		Descripcion	Condiciones originales				Septiembre			Octubre			Noviembre			Acumulada		
		General	Particular		Und	Cantidad	Vr/unit	Vr/total	Cantidad	Valor total	%	Cantidad	Valor total	%	Cant	Valor / total	%	Cantidad	Valor	%
				(3.000 psi) , 40% piedra esp. 630-22 inv. Para huellas.																
Subtotal								***$975.046.291,0***								***$311.331.986,0***	***5,17 %***		***$311.331.986,0***	***5,17 %***
				Obras de drenaje y complementarias: alcantarillas																
9	3,1	3p		Suministro e instalación de solado de limpieza en concreto normal clase f- (f´c=140 kgf/cm2). Para obras de arte.	M3	15,00	$583.952,000	$8.759.280,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
10	3,2		Art. 630 inv	Suministro e instalación de concreto normal clase d- (f´c=210 kgf/cm2). Para construccion de cabezotes, muros, encoles, descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas.	M3	42,00	$701.232,000	$29.451.744,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
11	3,3		Esp. 661-22 inv.	Suministro e intalacion de tuberia en concreto f=36", l=1m. Esp. 661-22 inv.	M	25,00	$508.290,000	$12.707.250,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
12	3,4		Esp.640-22 inv.	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-22 inv. Para alcantarilla, box, muros, incluye transporte	Kg	2.895,00	$8.385,000	$24.274.575,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
13	3,5		Esp. 673-22 inv.	Suministro e instalacion material granular filtrante. Esp. 673-22 inv.	M3	72,00	$194.230,000	$13.984.560,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
14	3,6		Esp. 220.1-22 inv.	Terraplen / mejoramiento conformado con material seleccionado. Esp. 220.1-22 inv.	M3	35,00	$46.847,000	$1.639.645,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
Subtotal								***$90.817.054,0***								***$-***	***0,00 %***		***$-***	***0,00 %***
Subtotal municipio de elias																***$315.414.386,0***			***$-***	***0,00 %***
2. Municipio de palermo																				
				Preliminares																
15	1,1	1p		Localizacion y replanteo	Ml	1.325,00	$4.536,000	$6.010.200,0	662,50	$3.005.100	50,0%	237,50	$1.077.300	17,9 %	0,00	$-	0,00 %	900,00	$4.082.400,00	0,07 %
Subtotal								***$6.010.200,0***		***$3.005.100,0***			***$1.077.300,0***			***$-***	***0,00 %***		***$4.082.400,0***	***0,07 %***

N°	Item de pago	Especificaciones		Descripcion	Condiciones originales				Septiembre			Octubre			Noviembre			Acumulada		
		General	Particular		Und	Cantidad	Vr/unit	Vr/total	Cantidad	Valor total	%	Cantidad	Valor total	%	Cant	Valor / total	%	Cantidad	Valor	%
				Estructura de pavimento placa huella																
16	2,1		Esp. 210-22 inv	Excavación mecánica (explanación). Esp. 210-22 inv. Incluye retiro de material proveniente de la excavación a disposición final del mismo.	M3	1.145,00	$29.227,000	$33.464.915,0				162,00	$4.734.774	14,1 %	0,00	$-	0,00 %	162,00	$4.734.774	0,08 %
17		2p		Excavacion manual en material seco (incluye transporte a sitio autorizado.)	M3	145,00	$41.861,000	$6.069.845,0				0,00	$-	0,0 %	18,09	$757.265,49	0,01 %	18,09	$757.265	0,01 %
18	2,2		Esp. 311-1 inv.	Suministro, instalacion, extendida, nivelacion, humedecimiento o aireacion y compactacion de mejoramiento de la sub rasante mediante material granular clasificado como seleccionado. Esp. 311.1	M3	298,00	$144.181,000	$42.965.938,0				251,55	$36.268.731	84,4 %	0,00	$-	0,00 %	251,55	$36.268.731	0,60 %
19	2,3		Esp. 320-22 inv.	Suministro, instalacion, extendida, nivelacion, humedecimiento o aireacion y compactacion de subbase granular cbr ≥ 40%. Esp. 320-22 inv.	M3	842,00	$197.258,000	$166.091.236,0				121,50	$23.966.847	14,4 %	51,47	$10.152.622,69	0,17 %	172,97	$34.119.470	0,57 %
20	2,4		Esp.640-22 inv.	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-22 inv. Para placas, riostras, cunetas, bordillos y dentellones	Kg	56.736,00	$8.416,000	$477.490.176,0				0,00	$-	0,0 %	22.211,96	$186.935.855,36	3,10 %	22.211,96	$186.935.855	3,10 %
21	2,5		Art. 630 inv	Suministro e instalación de concreto normal clase d - (f´c=210 kgf/cm2) o (3.000 psi) para dentellones- placas - riostras - cunetas - bordillo.	M3	988,00	$756.189,000	$747.114.732,0				0,00	$-	0,0 %	463,54	$350.523.849,06	5,82 %	463,54	$350.523.849	5,82 %
22	2,6		Esp. 630-22 inv.	Suministro e instalación de concreto ciclópeo de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m.60% concreto normal de 210 kg/cm² (3.000 psi) , 40% piedra esp. 630-22 inv. Para huellas.	M3	242,00	$517.294,000	$125.185.148,0				0,00	$-	0,0 %	54,59	$28.239.079,46	0,47 %	54,59	$28.239.079	0,47 %
Subtotal								***$1.598.381.990,0***		***$-***			***$64.970.351,6***			***$576.608.672,1***	***9,57 %***		***$641.579.023,0***	***10,65 %***
				Obras de drenaje y complementarias: alcantarillas																

No	Item de pago	Especificaciones		Descripcion	Condiciones originales				Septiembre			Octubre			Noviembre			Acumulada		
		General	Particular		Und	Cantidad	Vr/unit	Vr/total	Cantidad	Valor total	%	Cantidad	Valor total	%	Cant	Valor / total	%	Cantidad	Valor	%
23	3,1	3p		Suministro e instalación de solado de limpieza en concreto normal clase f- (f´c=140 kgf/cm2). Para obras de arte.	M3	33,00	$638.013,000	$21.054.429,0				0,00	$-	0,0 %	0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
24	3,2		Art. 630 inv	Suministro e instalación de concreto normal clase d- (f´c=210 kgf/cm2). Para construccion de cabezotes, muros, encoles, descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas.	M3	93,00	$745.353,000	$69.317.829,0				0,00	$-	0,0 %	0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
25	3,3		Esp. 661-22 inv.	Suministro e intalacion de tuberia en concreto f=36", l=1m. Esp. 661-22 inv.	M	55,00	$536.425,000	$29.503.375,0				0,00	$-	0,0 %	0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
26	3,4		Esp.640-22 inv.	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-22 inv. Para alcantarilla, box, muros, incluye transporte	Kg	6.368,00	$8.416,000	$53.593.088,0				0,00	$-	0,0 %	0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
27	3,5		Esp. 673-22 inv.	Suministro e instalacion material granular filtrante. Esp. 673-22 inv.	M3	72,00	$219.238,000	$15.785.136,0				0,00	$-	0,0 %	0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
28	3,6		Esp. 220.1-22 inv.	Terraplen / mejoramiento conformado con material seleccionado. Esp. 220.1-22 inv.	M3	77,00	$150.870,000	$11.616.990,0				0,00	$-	0,0 %	0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
				Subtotal				***$200.870.847,0***		***$-***	***$-***		***$-***	***$-***		***$-***	***0,00 %***		***$-***	***0,00 %***
				Subtotal municipio de palermo												***$576.608.672,1***			***$-***	***0,00 %***
				3. Municipio de yaguara																
				Preliminares																
29	1,1	1p		Localizacion y replanteo	Ml	1.800,00	$4.536,000	$8.164.800,0	900,00	$4.082.400	50,00 %				900,00	$4.082.400	0,07 %	1.800,00	$8.164.800,00	0,14 %
				Subtotal				***$8.164.800,0***		***$4.082.400,0***						***$4.082.400,0***	***0,07 %***		***$8.164.800,0***	***0,14 %***
				Estructura de pavimento placa huella																
30	2,1		Esp. 210-22 inv	Excavación mecánica (explanación). Esp. 210-22 inv. Incluye retiro de material proveniente de la excavación a disposición final del mismo.	M3	1.466,00	$29.227,000	$42.846.782,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %

No	Item de pago	Especificaciones		Descripcion	Condiciones originales				Septiembre			Octubre			Noviembre			Acumulada		
		General	Particular		Und	Cantidad	Vr/unit	Vr/total	Cantidad	Valor total	%	Cantidad	Valor total	%	Cant	Valor / total	%	Cantidad	Valor	%
31	2,2	2p		Excavacion manual en material seco (incluye transporte a sitio autorizado.)	M3	197,00	$41.861,000	$8.246.617,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
32			Esp. 311-1 inv.	Suministro, instalacion, extendida, nivelacion, humedecimiento o aireacion y compactacion de mejoramiento de la sub rasante mediante material granular clasificado como seleccionado. Esp. 311.1	M3	405,00	$174.446,000	$70.650.630,0							130,00	$22.677.980,00	0,38 %	130,00	$22.677.980	0,38 %
33	2,3		Esp. 320-22 inv.	Suministro, instalacion, extendida, nivelacion, humedecimiento o aireacion y compactacion de subbase granular cbr ≥ 40%. Esp. 320-22 inv.	M3	1.143,00	$228.734,000	$261.442.962,0							380,00	$86.918.920,00	1,44 %	380,00	$86.918.920	1,44 %
34	2,4		Esp.640-22 inv.	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-22 inv. Para placas, riostras, cunetas, bordillos y dentellones	Kg	77.074,00	$8.373,000	$645.340.602,0							19.000,00	$159.087.000,00	2,64 %	19.000,00	$159.087.000	2,64 %
35	2,5		Art. 630 inv	Suministro e instalación de concreto normal clase d - (f´c=210 kgf/cm2) o (3.000 psi) para dentellones- placas - riostras - cunetas - bordillo.	M3	1.343,00	$792.507,000	$1.064.336.901,0							460,00	$364.553.220,00	6,05 %	460,00	$364.553.220	6,05 %
36	2,6		Esp. 630-22 inv.	Suministro e instalación de concreto ciclópeo de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m.60% concreto normal de 210 kg/cm² (3.000 psi) , 40% piedra esp. 630-22 inv. Para huellas.	M3	329,00	$548.770,000	$180.545.330,0							85,00	$46.645.450,00	0,77 %	85,00	$46.645.450	0,77 %
Subtotal								***$2.273.409.824,0***								***$679.882.570,0***	***11,29 %***		***$679.882.570,0***	***11,29 %***
				Obras de drenaje y complementarias: alcantarillas																
37	3,1	3p		Suministro e instalación de solado de limpieza en concreto normal clase f- (f´c=140 kgf/cm2). Para obras de arte.	M3	41,00	$673.605,000	$27.617.805,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
38	3,2		Art. 630 inv	Suministro e instalación de concreto normal clase d- (f´c=210 kgf/cm2). Para construccion de cabezotes, muros, encoles,	M3	118,00	$777.348,000	$91.727.064,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %

No	Item de pago	Especificaciones		Descripcion	Condiciones originales				Septiembre			Octubre			Noviembre			Acumulada		
		General	Particular		Und	Cantidad	Vr/unit	Vr/total	Cantidad	Valor total	%	Cantidad	Valor total	%	Cant	Valor / total	%	Cantidad	Valor	%
				descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas.																
39	3,3		Esp. 661-22 inv.	Suministro e intalacion de tuberia en concreto f=36", l=1m. Esp. 661-22 inv.	M	70,00	$505.075,000	$35.355.250,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
40	3,4		Esp.640-22 inv.	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-22 inv. Para alcantarilla, box, muros.	Kg	8.105,00	$8.373,000	$67.863.165,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
41	3,5		Esp. 673-22 inv.	Suministro e instalacion material granular filtrante. Esp. 673-22 inv.	M3	24,00	$243.450,000	$5.842.800,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
42	3,6		Esp. 220.1-22 inv.	Terraplen / mejoramiento conformado con material seleccionado. Esp. 220.1-22 inv.	M3	98,00	$182.346,000	$17.869.908,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
				Subtotal				***$246.275.992,0***								***$-***	***0,00 %***		***$-***	***0,00 %***
				Subtotal municipio de yaguará												***$683.964.970,0***			***$-***	***0,00 %***
				4. Municipio de santa maria																
				Preliminares																
43	1,1	1p		Localizacion y replanteo	Ml	75,00	$4.536,000	$340.200,0	75,00	$340.200	100,00 %					$-	0,00 %	75,00	$340.200,00	0,01 %
				Subtotal				***$340.200,0***		***$340.200***						***$-***	***0,00 %***		***$340.200,0***	***0,01 %***
				Estructura de pavimento placa huella																
44	2,1		Esp. 210-22 inv	Excavación mecánica (explanación). Esp. 210-22 inv. Incluye retiro de material proveniente de la excavación a disposición final del mismo.	M3	79,00	$29.227,000	$2.308.933,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
45	2,2	2p		Excavacion manual en material seco (incluye transporte a sitio autorizado.)	M3	8,00	$41.861,000	$334.888,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
46			Esp. 311-1 inv.	Suministro, instalacion, extendida, nivelacion, humedecimiento o aireacion y compactacion de mejoramiento de la sub rasante mediante material granular	M3	17,00	$177.582,000	$3.018.894,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %

No	Item de pago	Especificaciones		Descripcion	Condiciones originales				Septiembre			Octubre			Noviembre			Acumulada		
		General	Particular		Und	Cantidad	Vr/unit	Vr/total	Cantidad	Valor total	%	Cantidad	Valor total	%	Cant	Valor / total	%	Cantidad	Valor	%
				clasificado como seleccionado. Esp. 311.1																
47	2,3		Esp. 320-22 inv.	Suministro, instalacion, extendida, nivelacion, humedecimiento o aireacion y compactacion de subbase granular cbr ≥ 40%. Esp. 320-22 inv.	M3	48,00	$231.995,000	$11.135.760,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
48	2,4		Esp.640-22 inv.	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-22 inv. Para placas, riostras, cunetas, bordillos y dentellones	Kg	3.212,00	$8.455,000	$27.157.460,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
49	2,5		Art. 630 inv	Suministro e instalación de concreto normal clase d - (f´c=210 kgf/cm2) o (3.000 psi) para dentellones- placas - riostras - cunetas - bordillo.	M3	56,00	$796.271,000	$44.591.176,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
50	2,6		Esp. 630-22 inv.	Suministro e instalación de concreto ciclópeo de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m.60% concreto normal de 210 kg/cm² (3.000 psi) , 40% piedra esp. 630-22 inv. Para huellas.	M3	14,00	$552.033,000	$7.728.462,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
Subtotal								***$96.275.573,0***								***$-***	***0,00 %***		***$-***	***0,00 %***
				Obras de drenaje y complementarias: alcantarillas																
51	3,1	3p		Suministro e instalación de solado de limpieza en concreto normal clase f- (f´c=140 kgf/cm2). Para obras de arte.	M3	3,00	$677.293,000	$2.031.879,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
52	3,2		Art. 630 inv	Suministro e instalación de concreto normal clase d- (f´c=210 kgf/cm2). Para construccion de cabezotes, muros, encoles, descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas.	M3	8,00	$780.663,000	$6.245.304,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
53	3,3		Esp. 661-22 inv.	Suministro e intalacion de tuberia en concreto f=36", l=1m. Esp. 661-22 inv.	M	5,00	$569.949,000	$2.849.745,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
54	3,4		Esp.640-22 inv.	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-22 inv. Para alcantarilla, box, muros.	Kg	579,00	$8.455,000	$4.895.445,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %

No	Item de pago	Especificaciones		Descripcion	Condiciones originales				Septiembre			Octubre			Noviembre			Acumulada		
		General	Particular		Und	Cantidad	Vr/unit	Vr/total	Cantidad	Valor total	%	Cantidad	Valor total	%	Cant	Valor / total	%	Cantidad	Valor	%
55	3,5		Esp. 673-22 inv.	Suministro e instalacion material granular filtrante. Esp. 673-22 inv.	M3	12,00	$245.960,000	$2.951.520,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
56	3,6		Esp. 220.1-22 inv.	Terraplen / mejoramiento conformado con material seleccionado. Esp. 220.1-22 inv.	M3	7,00	$185.608,000	$1.299.256,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
Subtotal								***$20.273.149,0***								***$-***	***0,00 %***		***$-***	***0,00 %***
Subtotal municipio santa maría																***$-***			***$-***	***0,00 %***
5. Municipio de neiva																				
				Preliminares																
57	1,1	1p		Localizacion y replanteo	Ml	300,00	$4.536,000	$1.360.800,0	150,00	$680.400	50,00 %				0,00	$-	0,00 %	150,00	$680.400,00	0,01 %
Subtotal								***$1.360.800,0***		***$680.400,0***						***$-***	***0,00 %***		***$680.400,0***	***0,01 %***
				Estructura de pavimento placa huella																
58	2,1		Esp. 210-22 inv	Excavación mecánica (explanación). Esp. 210-22 inv. Incluye retiro de material proveniente de la excavación a disposición final del mismo.	M3	259,00	$29.227,000	$7.569.793,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
59	2,2	2p		Excavacion manual en material seco (incluye transporte a sitio autorizado.)	M3	33,00	$41.861,000	$1.381.413,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
60			Esp. 311-1 inv.	Suministro, instalacion, extendida, nivelacion, humedecimiento o aireacion y compactacion de mejoramiento de la sub rasante mediante material granular clasificado como seleccionado. Esp. 311.1	M3	68,00	$227.556,000	$15.473.808,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
61	2,3		Esp. 320-22 inv.	Suministro, instalacion, extendida, nivelacion, humedecimiento o aireacion y compactacion de subbase granular cbr ≥ 40%. Esp. 320-22 inv.	M3	191,00	$283.967,000	$54.237.697,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
62	2,4		Esp.640-22 inv.	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-22 inv. Para placas, riostras, cunetas, bordillos y dentellones	Kg	12.846,00	$8.530,000	$109.576.380,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %

No	Item de pago	Especificaciones		Descripcion	Condiciones originales				Septiembre			Octubre			Noviembre			Acumulada		
		General	Particular		Und	Cantidad	Vr/unit	Vr/total	Cantidad	Valor total	%	Cantidad	Valor total	%	Cant	Valor / total	%	Cantidad	Valor	%
63	2,5		Art. 630 inv	Suministro e instalación de concreto normal clase d - (f´c=210 kgf/cm2) o (3.000 psi) para dentellones- placas - riostras - cunetas - bordillo.	M3	224,00	$856.238,000	$191.797.312,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
64	2,6		Esp. 630-22 inv.	Suministro e instalación de concreto ciclópeo de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m.60% concreto normal de 210 kg/cm² (3.000 psi) , 40% piedra esp. 630-22 inv. Para huellas.	M3	55,00	$604.004,000	$33.220.220,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
Subtotal								***$413.256.623,0***								***$-***	***0,00 %***		***$-***	***0,00 %***
				Obras de drenaje y complementarias: alcantarillas																
65	3,1	3p		Suministro e instalación de solado de limpieza en concreto normal clase f- (f´c=140 kgf/cm2). Para obras de arte.	M3	6,00	$736.061,000	$4.416.366,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
66	3,2		Art. 630 inv	Suministro e instalación de concreto normal clase d- (f´c=210 kgf/cm2). Para construccion de cabezotes, muros, encoles, descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas.	M3	17,00	$833.492,000	$14.169.364,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
67	3,3		Esp. 661-22 inv.	Suministro e intalacion de tuberia en concreto f=36", l=1m. Esp. 661-22 inv.	M	10,00	$633.070,000	$6.330.700,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
68	3,4		Esp.640-22 inv.	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm² (60.000 psi) esp.640-22 inv. Para alcantarilla, box, muros.	Kg	1.158,00	$8.530,000	$9.877.740,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
69	3,5		Esp. 673-22 inv.	Suministro e instalacion material granular filtrante. Esp. 673-22 inv.	M3	24,00	$285.938,000	$6.862.512,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
70	3,6		Esp. 220.1-22 inv.	Terraplen / mejoramiento conformado con material seleccionado. Esp. 220.1-22 inv.	M3	14,00	$237.579,000	$3.326.106,0							0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
Subtotal								***$44.982.788,0***								***$-***	***0,00 %***		***$-***	***0,00 %***
Subtotal municipio de neiva																***$-***			***$-***	***0,00 %***

No	Item de pago	Especificaciones		Descripcion	Condiciones originales				Septiembre			Octubre			Noviembre			Acumulada		
		General	Particular		Und	Cantidad	Vr/unit	Vr/total	Cantidad	Valor total	%	Cantidad	Valor total	%	Cant	Valor / total	%	Cantidad	Valor	%
Subtotal obras								***$5.979.548.531,0***		***$8.108.100,0***			***$66.047.651,6***			***$1.575.988.028,1***			***$1.650.143.779,0***	
				Plan de manejo de transito (pmt)				$16.320.000,0				0,10	$1.632.000,00		0,40	$6.528.000,00	0,11 %	0,50	$8.160.000	0,14 %
				Paga				$26.939.110,0				0,00	$-		0,00	$-	0,00 %	0,00	$-	0,00 %
				Valor total				***$6.022.807.641,0***					***$67.679.651,6***			***$1.582.516.028,1***	***26,28 %***		***$1.658.303.779,0***	***27,53 %***

CONSORCIO PLACAS HUILA CI

5.4. Actividades realizadas

Durante este periodo hubo un avance programado de 8.00% con un ejecutado del 27.53%.

Se avanza con el desarrollo de las siguientes actividades:

5.4.1. Municipio de Palermo

Semana 1: 1 al 9 de noviembre del 2024

Se adelanta trabajos del área administrativa en cuanto cotización de materiales-solicitud de proformas para compra de materiales.
Se realiza nuevamente replanteo con topografía dado a que por las lluvias y comunidad se han llevado las estacas instaladas por la topografía.
Inicia a llegar material granular de cantera como mixto y subbase granular.
Llega maquinaria como vibro compactador, para continua con las actividades de compactación de subbase granular.

Semana 2: 12 al 16 de noviembre

Se recibe material en obra como cemento y acero.
Se continua con el suministro de material granular de cantera.
Se avanza con el extendido de material subbase con su respectiva compactación en la vereda buenos aires.
Se realiza la toma de los ensayos de densidades al material instalado como la subbase granular y recebo de nivelación.
Se adelanta trabajos de corte y figurado de acero de refuerzo para riostras-placa huellas para la vereda buenos aires del municipio de Palermo.
Se recibe madera para la conformación de las formaletas para los concretos ciclópeos en la vereda buenos aires del municipio de Palermo.
Se presenta fuertes lluvias durante la semana, lo que ha impedido que las actividades se desarrollen normalmente.
Se ha presentado inconvenientes por las lluvias, donde hay arrastre de material granular instalado y compactado, por las grandes pendientes que tiene la vía, la lluvia a formado surcos donde desprende y arrastra material instalado y compactado.
Se avanza con la construcción e instalación de formaleta en madera para los concretos ciclópeos en el tramo de la vereda buenos Aires.

Por lluvias presentadas durante noche y el día, el equipo alquilado vibro compactador sigue marcando el stand by del equipo en la vereda buenos Aires del municipio de Palermo.

Semana 3: 18 al 24 de noviembre

Por fuertes lluvias presentadas el 18 de noviembre-2024, el personal solo pudo subir hasta después de medio a realiza labores en la vereda Buenos aires del municipio de Palermo.
Ya se tiene área lista para realizar vaciados de concretos, pero las lluvias no han permitido iniciar con esa labor.
Se tiene dificultades con el suministro de agua para la preparación de los concretos, por las fuertes lluvias presentadas durante la semana. Dado a que el agua se debe comprar y se compra a bomberos, pero ellos no han podido subir con el vehiculó ya que la vía no lo permite, área muy saturadas y lisas que no permiten el buen tránsito de vehículos, en la vereda buenos aires del municipio de Palermo
Se toma acciones con el fin de poder suministra agua en el punto de intervención, contratando una retro pajarita para que ayude a subir al carro de los bomberos y así poder tener el preciado líquido; en la vereda Buenos aires del municipio de Palermo.
Se inicia con vaciados de concretos ciclópeos desde la accisa 0+00 hasta 0+036, de acuerdo a los diseños.
Se avanza con las excavaciones manuales para las riostras.
Se adelanta el armado de acero para las huellas, de acuerdo a los diseños.
Se avanza con los vaciados de los concretos reforzados de la huella en la accisa 0+00 hasta 0+041,23 en la vereda buenos aires del municipio de Palermo
Se realiza la toma de las muestras a los concretos de los elementos fundidos en el tramo de la vereda buenos aires del municipio de Palermo.
Se realiza hidratación a los concretos instalados.

Semana 4: 25 al 30 de Noviembre

Se adelanta instalación de formaleta para los concretos ciclópeos.
Se realiza armado de aceros de refuerzo para las huellas en el tramo de la vereda buenos aires del municipio de Palermo.
Se realiza suministro de material granular de cantera.
Se avanza con las excavaciones para riostras en el tramo.
Se avanza con el vaciado de concretos para las huellas reforzadas en el tramo de la accisa 0+41.23 hasta 0+063,21 en la vereda buenos aires del municipio de Palermo.
Se realiza la toma de las muestras a los concreto de los elementos fundidos en la vereda buenos aires del municipio de Palermo.

Se realiza compra de agua los bomberos, y de igual manera se realiza la misma acción de contratar la retro pajarita para poder subir el carro de los bomberos y nos suministren el agua.
Se hidrata constantemente los elementos fundidos.
Se realiza vaciado de concreto para los concretos ciclópeos desde la accisa 0+036 hasta 0+060.24.
Se deja el precedente que, ante las lluvias fuertes presentadas durante el mes, han realizado arrastre de material granular como la subbase instalada y compactada, esto se debe a que las lluvias son muy fuertes y la pendiente del tramo a intervenir son demasiadas inclinadas, lo que permite que la fuerza del agua realiza surcos por el área y socave el material.

5.4.2. Municipio De Yaguará

Semana 1: 1 al 9 de noviembre del 2024

- Se realiza localización de bodega, para almacenar materiales y equipos
- Se inician trabajos topográficos de localización de los 14 tramos, en las veredas Upar, La paz, Viso, Arenoso, Vilu y la Floresta
- Se realizan trabajos administrativos, de localización de material granular y pétreo

Semana 2: 12 al 16 de noviembre

- Se realiza trabajo en oficina, planos topográficos e informe de localización
- Se reciben maquinas amarillas, vibro compactador y mini cargador (Bodcat)
- Se continua con trabajos topográficos de replanteo en los tramos de la vereda Upar, La paz y Viso alto
- se continua con la búsqueda de proveedores para material granular.
- Se programa reunión de socialización para el viernes 22 de nov. con la comunidad (presidentes de junta de acción comunal), con el fin de presentar el proyecto e informar cuales son los tramos que se van a iniciar con la intervención

Semana 3: 18 al 23 de noviembre

- Se realizan visitas a las diferentes canteras y puntos de explotación de material de la zona, con la intención de tomar muestras y enviarlas a laboratorio
- Se solicita material granular con la asociación de volqueteros de Yaguará, para dar inicio de trabajo en el tramo 2 de la vereda Upar (180m)
- La reunión programada con la comunidad se cancela por petición de los presidentes de las juntas de acción comunal y se reprograma para el viernes 29 de nov.

Semana 4: 25 al 30 de Noviembre

- Llega al tramo 2 de la vereda Upar, 90m3 de material granular para conformar la sub rasante de dicho tramo
- Se trasladan los equipos (vibro compactador y mini cargador), para dar inicio a la extendida y compactación del material granular
- Se marca y/o delimita el ancho total de la placa huella, para que la sub rasante quede bien conformada
- Se presentan fuertes lluvias en las noches de los días 26,27 y 28 de nov, lo cual limita un poco el avance en el tramo, ya que el suelo se satura y no es posible el uso de los equipos
- Llega acero de refuerzo varillas 1/2 x6mtr (14.910kg), varillas 1/2x9mtr (3.757,32kg), varilla 1/4x6 (1.494kg), flejes 15x20 en varilla 1/4" (1.254,96kg), flejes en **S** 40x10 en varilla de 3/8 (2.755,2kg); para un total de **24.171,48kg**
- Se inicia amarre y corte de acero de refuerzo
- Continua el extendido de la base granular y compactación de la misma

5.4.3. Municipio de Elías

Semana 1: 1 al 9 de noviembre del 2024

- Se realizan actividades administrativas
- Se programa reunión de socialización con la comunidad, presidentes de junta de acción comunal de las veredas Oritoguaz, Gallardito y El progreso

Semana 2: 12 al 16 de noviembre

- Se realizan trabajos topográficos, localización y replanteo
- Se realizan trabajos administrativos

Semana 3: 18 al 23 de noviembre

- Se programa entrega de materiales granular y pétreo
- Se continúan trabajos topográficos
- Se realizan trabajos administrativos, cotización de materiales, cemento y acero de refuerzo

Semana 4: 25 al 30 de Noviembre

- Llega material granular al tramo de la vereda Oritoguaz - Sector La esperanza T1
- Se da inicio a extendido y posterior compactación del material granular
- Llega a obra acero de refuerzo

5.5. Resultados de pruebas de laboratorio

Para el presente informe se tiene resultados de los ensayos de densidades de subbase y recebo compactados en el tramo de la vereda buenos aires del municipio de Palermo, de igual se tiene el registro de la toma de muestras de los concretos de los elementos fundidos, aun sin resultados de resistencia por no cumplir con el tiempo de rotura.

Tabla No. 13 Toma de muestras

FORMATO DE TOMA MUESTRAS

LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE PALERMO
OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
DESCRIPCION: CONCRETO DE 3.000 PSI-

Muestra N°	FECHA FUNDICIÓN	DESCRIPCIÓN	RESISTENCIA REQUERIDA	EDAD	N° DE MUESTRAS
CPH-B.A.-# 1	21/11/2024	PLACA HUELLA DESDE LA ACCISA 0+000 HASTA 0+041.23 - CON HUELLA DE 1.10 Y 1.35 DE ANCHO CON ESPESOR DE 15 CM.	3000 PSI	7	4
CPH-B.A.-# 1	21/11/2024		3000 PSI	14	
CPH-B.A.-# 1	21/11/2024		3000 PSI	28	
CPH-B.A.-# 1	21/11/2024		3000 PSI		
Muestra N°	**FECHA FUNDICIÓN**	**DESCRIPCIÓN**	**RESISTENCIA REQUERIDA**	**EDAD**	**N° DE MUESTRAS**
CPH-B.A.-# 2	26/11/2024	PLACA HUELLA DESDE LA ACCISA 0+041.23 HASTA 0+063.21 -CON HUELLA DE 1.10 Y 1.35 DE ANCHO CON ESPESOR DE 15 CM.	3000 PSI	7	4
CPH-B.A.-# 2	26/11/2024		3000 PSI	14	
CPH-B.A.-# 2	26/11/2024		3000 PSI	28	
CPH-B.A.-# 2	26/11/2024		3000 PSI		

5.6. Certificado de calidad de materiales

Al presente informe se adjunta certificados de calidad del acero y cemento suministrado en la obra (Anexo 3).

5.7. Reporte de lluvias

En el Anexo 4 se evidencia el reporte de lluvias mensual.


5.8. Registro fotográfico

5.8.1. Municipio de Palermo

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Descripción: Se recibe material en obra, acero de refuerzo en vereda buenos aires.	***Descripción:*** Se recibe material en obra, cemento en la vereda buenos aires.
	
Descripción: Se realiza verificación de niveles con topografia, para continaur con la instalación de la subbase granular.	***Descripción:*** Se avanza con el extendido de material-subbase granular.
	
Descripción: Se avanza con extendido y compactación de subbase granular en la vereda buenos aires.	***Descripción*** : se avanza con verificación de niveles con la topografia de la subbase granular.
	
Descripción : Se continua con compactación de subbase granular	**Descripción**: Se inicia con excavaciones para riostras.


	
Descripción: acero en obra	***Descripción*** : se realiza el ensayo de densidades al recebo de nivelación antes de instalar subbase granular. Vereda buenos aires
	
Descripción: Se realiza toma de densidades a la instalación de la subbase granular y se avanza con instalación de formaleta para concretos ciclopeos.	***Descripción*** : dificultades en ingreso de vehículos para el suministro del agua a la obra.
	
Descripción: Se suministra agua a la obra con la compra a bomberos. Vereda buenos aires palermo	***Descripción:*** llega señalización a obra y se realiza su debida instalación.
	
Descripción: Se adelanta corte-figurado y armado de acero para riostras, vereda Buenos aires de palermo.	***Descripción***: Se avanza con la instalación de formaleta para los concretos ciclopeos, en la vereda buenos Aires de Palermo.

	
Descripción: Se avanza con armado de acero para la huella, en vereda buenos aires.	***Descripción:*** Se avanza con el vaciado de los concretos de la huellas.
	
Descripción: Acabado de la huellas, se avanza con fundición de las mismas	***Descripción:*** avance del tramo con la fundición de placa huellas en la vereda buenos aires del municipio de palermo.
	
Descripción: avance en armarre de acero para la huella.	***Descripción:*** avance del tramo con la fundición de placa huellas en la vereda buenos aires del municipio de palermo.
	
Descripción: Se realiza el texturizado a la huella de la espina de pescado.	***Descripción:*** Se realiza el texturizado de la placa huela con el escobiado.

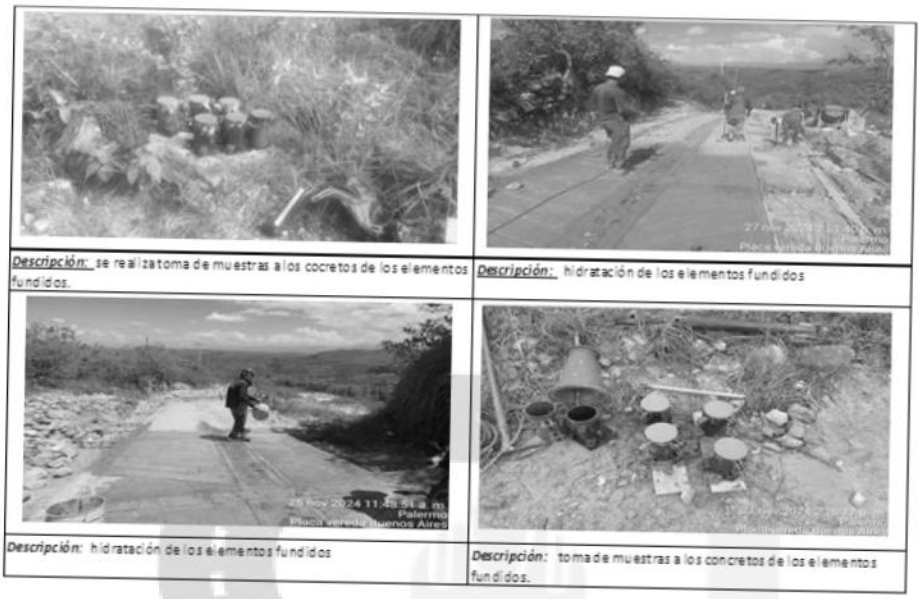

Descripción: se realizatoma de muestras a los cocretos de los elementos fundidos.	***Descripción:*** hidratación de los elementos fundidos
Descripción: hidratación de los elementos fundidos	***Descripción:*** toma de muestras a los concretos de los elementos fundidos.

5.8.2. Municipio de Yaguará

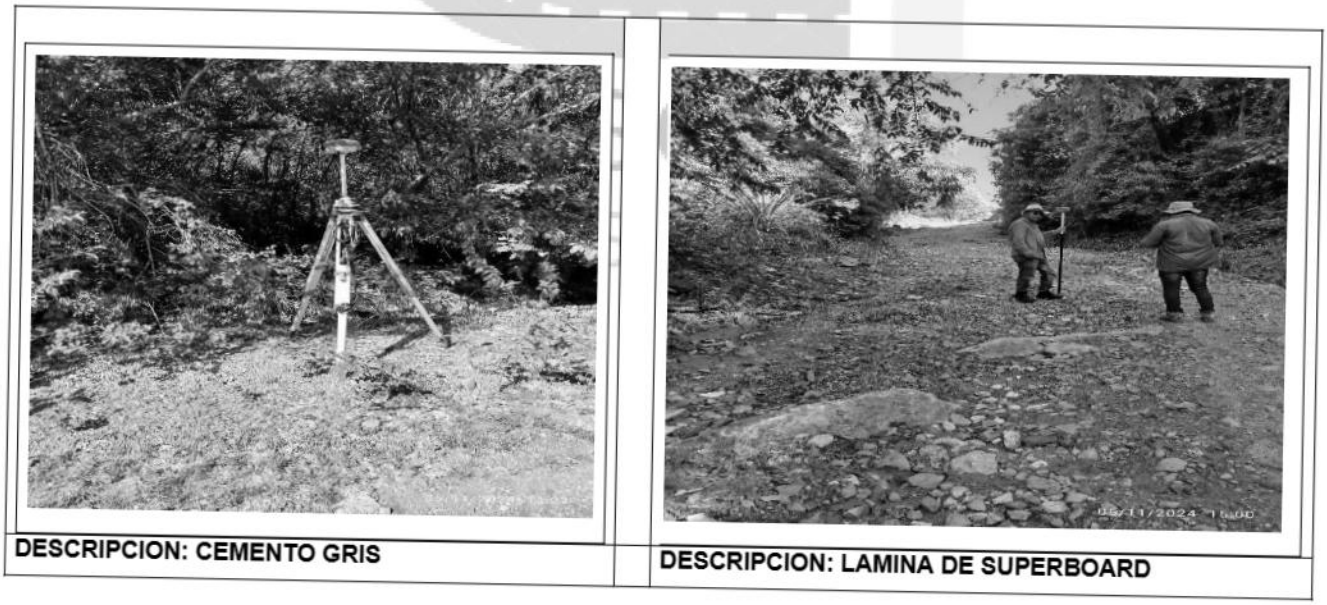


DESCRIPCION: CEMENTO GRIS	**DESCRIPCION: LAMINA DE SUPERBOARD**




DESCRIPCION: LAMINA DE DRYWALL




DESCRIPCION: BLOQUE N°5

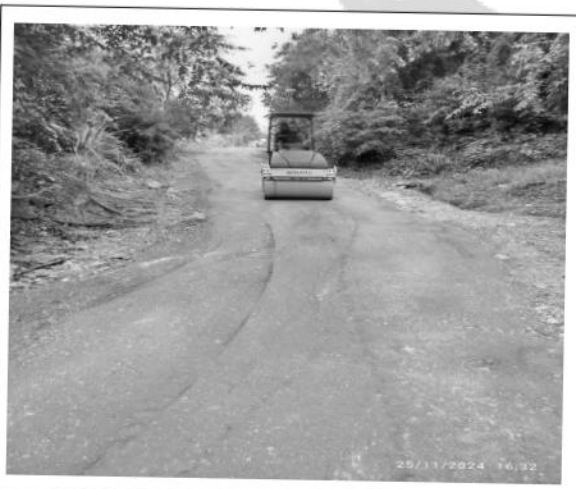


DESCRIPCION: PINTURA KORAZA

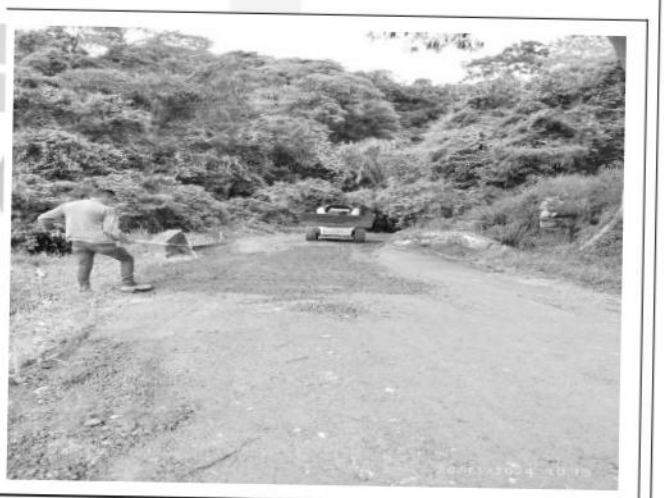

DESCRIPCION: MEGA JUNTAS

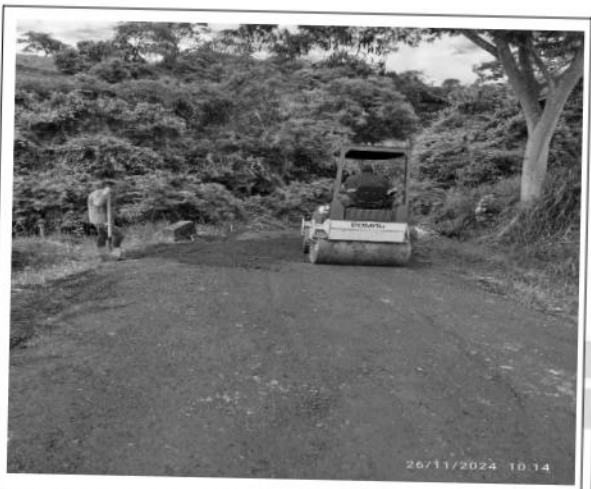

DESCRIPCION: SUPERMASTIK

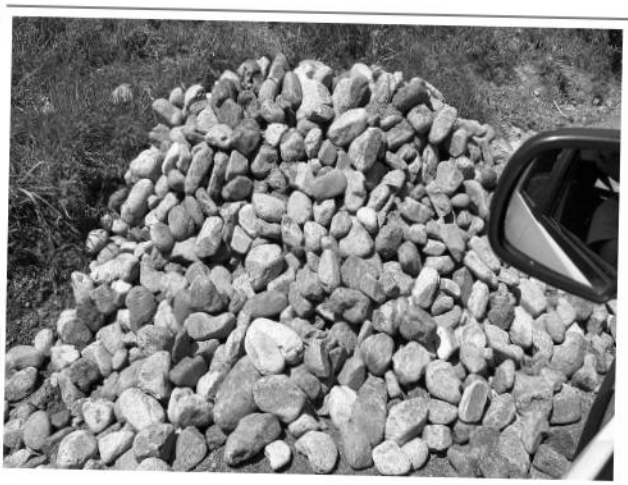

DESCRIPCION: TUBERIA SCH40



DESCRIPCION: ACCESORIOS RCI



DESCRIPCION: ACCESORIOS RCI



DESCRIPCION: COMPLEMENTOS INSTALACION RCI



DESCRIPCION: ACCESORIOS RCI



DESCRIPCION: ACCESORIOS RCI



DESCRIPCION: ACCESORIOS RCI



DESCRIPCION: ACCESORIO RCI




DESCRIPCION: ACCESORIO RCI



DESCRIPCION: ACCESORIOS RCI



DESCRIPCION: COMPLEMENTOS INSTALACION RCI

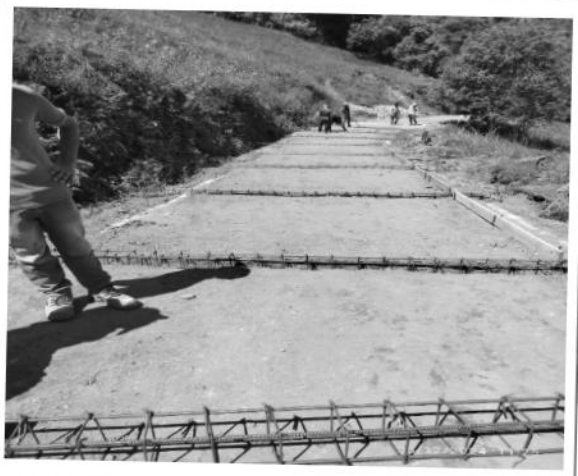

DESCRIPCION: ACCESORIOS RCI



DESCRIPCION: COMPLEMENTOS INSTALACION RCI



DESCRIPCION: ACCESORIOS RCI



DESCRIPCION: COMPLEMENTOS INSTALACION RCI


5.9. Seguimiento mensual de obra civil

Durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024, correspondiente al segundo mes de ejecución del contrato de obra, se ejecutaron las actividades que general el avance que se muestra a continuación.

Tabla No. 14. Seguimiento mensual de la obra civil

	MES	PROGRAMADO %	EJECUTADO %
1	30/10/2024	1,98%	1,26%
2	30/11/2024	8,00%	27,53%

Gráfico 1. Curva S

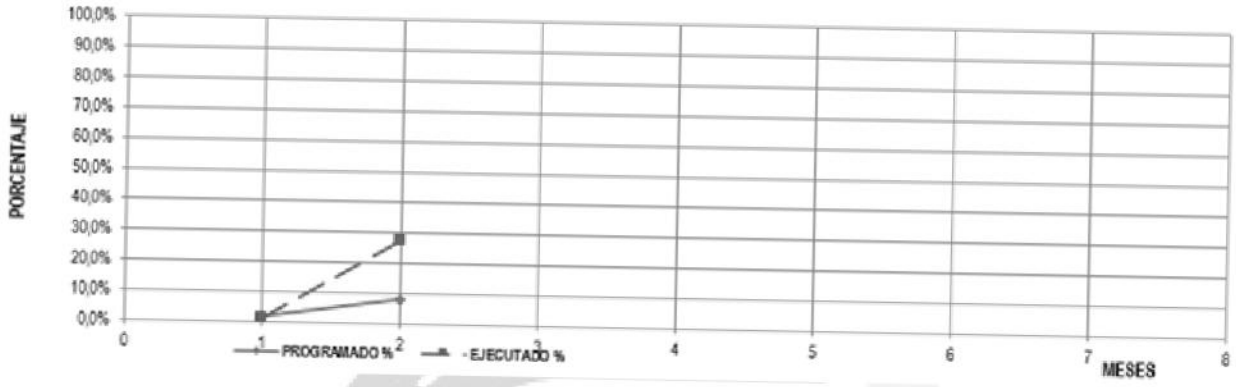

CONSORCIO
PLACAS HUILA CI

6. COMPONENTE SISOMA

En la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE ELÍAS, PALERMO, YAGUARA, SANTA MARÍA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."** se contemplan indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los cuales nos permiten evaluar la gestión de SST y sus diferentes variaciones durante cada periodo de ejecución, a continuación, se relacionan cada uno de los indicadores para el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024.

6.1. Indicadores

Para las labores ejecutadas en este proyecto, los resultados obtenidos durante el periodo objeto de este informe, se determinó que el personal operativo de la obra trabajó las horas estipuladas y el ausentismo no tuvo incidencias en el proyecto como se relación en la siguiente tabla:

Tabla No. 15 Días trabajados

AÑO 2024	Horas trabajadas en el dia	Trabajadores	Dias trabajados	Dias de ausentismo laboral	Semanas laboradas	Total, horas trabajadas acumuladas
Septiembre	9	2	10	0	4.2	180
Octubre	9	8	26	0	4.3	1.404
Noviembre	9	17	24	0	4.2	3.042



Gráfico 1 Horas trabajadas

En la gráfica anterior, se evidencia que se realizó un trabajo continuo en la ejecución del proyecto, tanto personal administrativo como operativo, dando avance en la ejecución de la obra correspondiente al tramo que se esta ejecutando durante el mes de noviembre 2024, con **3042** horas hombre laboradas.

6.1.1. Ausentismo en el proyecto.

Durante el periodo laboral comprendido desde el día 01 al 30 noviembre del 2024, se registró 02 días de ausentismo laboral en el proyecto.

Tabla No. 16 Ausentismo laboral

Nombre y apellido	contratista	Fecha inicio incapacidad	Fecha de fin incapacidad	dias de incapacidad	ausentismo laboral	cie 10
Libio Erney Losada Rojas	Sociedad de apoyo a la construcción	25-NOV-2024	26-NOV-2024	02	SI	0000 Sin informe de diagnostico

6.1.2. Accidentalidad del proyecto, consolidado de indicadores

Durante el periodo laboral comprendido desde el día 01 al 30 de noviembre del 2024. **NO SE PRESENTO ACCIDENTE LABORAL.**

Tabla No. 17 Índice de accidentalidad

INDICE MENSUAL	I-FA	I-SA	I-PAM	I-PEL	I-IEL	I-ACM
Septiembre	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	8.33
CONSOLIDADO 2024	**0**	0	0			8.33%

6.1.3. Indicadores noviembre 2024

Estándares Mínimos - Resolución 0312 de 2019 - noviembre 2024

Tabla No. 18 Indicadores

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Frecuencia de Accidentalidad	(# Accidentes de trabajo en el mes / # de trabajadores en mes) *100	0
Severidad de Accidentalidad	(# de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes/ # de trabajadores en mes) *100	0
Proporción de accidentes mortales	(# Accidentes de mortales presentados en el año /Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) *100	0
Prevalencia de la enfermedad laboral	Por cada 100.000 trabajadores existen # casos de enfermedad laboral en el periodo Z	0

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
Incidencia de la enfermedad laboral.	Por cada 100.000 trabajadores existen # casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	0
Ausentismo por causa médica	(# Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / # de días de trabajo programados en el mes) *100	8.33

6.2. Medicina preventiva

En el mes de noviembre de 2024, ingresaron 09 trabajadores al proyecto, los cuales efectuaron examen ocupacional de ingreso dando cumplimiento a la normatividad colombiana y a las directrices del proyecto, identificando recomendaciones importante al momento de realizar labores como el uso adecuado de los epp, y algunas recomendaciones de seguimiento por su respectiva eps, también se realizaron inducciones al personal que ingreso con el objetivo que identifiquen los riesgo a los cuales están expuesto durante el proyecto y que se pueda tomar una acción de correctiva.

A este personal se les realizo entrega de EPP de seguridad para el uso diario durante la realización de sus actividades laborales (casco, guantes, gafas, tapa oídos), Afiliación a seguridad social como EPS, AFP y ARL.

Tabla No. 19 Medicina preventiva

	
Realización de inducción de seguridad	Realización de examen de ingreso ocupacional
	
Afiliación a seguridad social	Afiliación a la ARL



6.3. Agenda de seguridad

Para el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del 2024 se realizaron las actividades de acompañamiento del personal en campo, verificando la realización de las actividades siempre con el enfoque de la seguridad ocupacional y medio ambiente. Fueron realizadas las siguientes actividades con la supervisión del Ing. SISOMA:

- Instalación de señalización al rededor del proyecto a ejecutar
- Instalación de señalización de seguridad vial.
- Ubicación de punto de recolección de residuos (punto ecológico)
- Ubicación de botiquín de primero auxilios.
- Recolección y acopio de materiales contaminantes para luego ser dispuestos (bolsas de cemento)
- Acompañamiento a la realización de actividades de fundición de placas e instalación de aceros.

Tabla No. 20 Agenda de seguridad

	
Señalización de seguridad vial	Señalización de seguridad vial
	
Señalización de seguridad vial	Señalización de seguridad vial

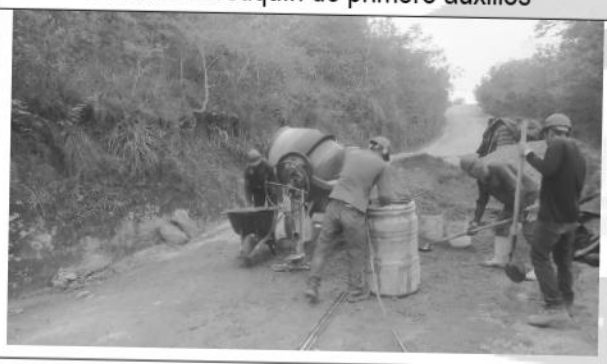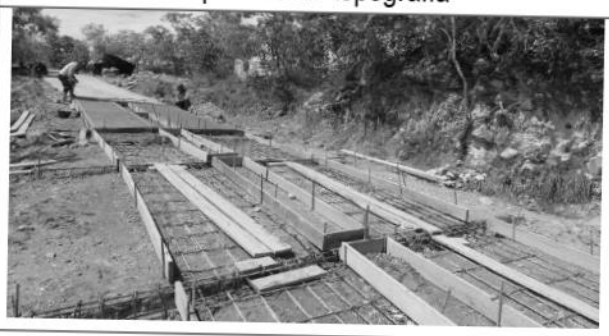	
Ubicación botiquín de primero auxilios	Ubicación de punto ecológico
	
Preparación de concreto	Figurado de acero
	
Figurado de acero	Replanteo de topografía
	
Fundición de placa huellas	Armado de cajones

	
Fundición de ciclópeo	Excavación manual

6.3.1. Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo

En el mes de noviembre se realizó capacitación en el tema correspondiente al cronograma de capacitación del proyecto, también se realizaron charlas de seguridad de 5 minutos al inicio de la jornada, de esta forma el personal toma conciencia de la importancia del auto cuidado durante la ejecución de las actividades laborales.

6.3.2. Grafica ejecución de capacitación



Gráfico 2 Capacitación

Tabla No. 21 Capacitación

FECHA	TEMA
Septiembre 2024	Inducción- evaluación y socialización de riesgo
Octubre 2024	Inducción- evaluación y socialización de riesgo

FECHA	TEMA
Noviembre 2024	Capacitación caída de mismo nivel

Tabla No. 22 Charlas de seguridad 5 minutos

FECHA	TEMA
14-11-2024	Importancia del uso y cuidado de los EPP de seguridad
16-11-2024	Disposición de residuos – basura clasificación orden y aseo
20-11-2024	Importancia de la conservación de los recursos hídricos
22-11-2024	Orden y seo- riesgo locativo- uso de los EPP de seguridad
26-11-2024	Observo- analizo- actuó- uso de los EPP de seguridad
28-11-2024	Uso de los EPP de seguridad- Uso obligatorio dentro del proyecto

Tabla No. 23 Charlas de seguridad

	
Capacitación	Charla de seguridad

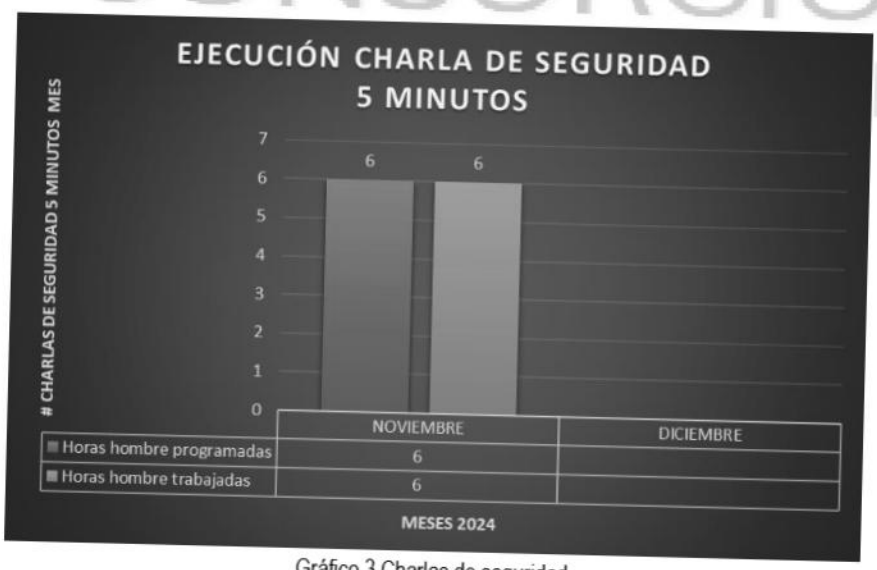


Gráfico 3 Charlas de seguridad

6.3.3. Inspección de botiquín de primeros auxilios

En el mes de noviembre se organiza el botiquín de primeros auxilios, con los elementos necesarios para usar en caso de una emergencia, se socializa al personal la existencia del mismo y se dan recomendaciones de uso y de la importancia que los elementos permanezcan completos

Tabla No. 24 Botiquín y primeros auxilios


	
Ubicación de botiquín de primeros auxilios	Inspección de botiquín

CONSORCIO
PLACAS HUILA CI

7. COMPONENTE AMBIENTAL

En el mes de noviembre del 2024 en temas ambientales se realizó ubicación de punto ecológico dentro de la obra, se ha recolectado las bolsas de cemento y se han organizado dentro de bolsas para acopiarlas y hacer la disposición final con la empresa serví ambiental, ya se está adelantando el proceso para que dicha empresa nos preste el servicio. En la ejecución de la placa huella de la vereda buenos aires, no se cuenta con agua del mismo sector, por tal razón nos hemos visto en la necesidad de contar con el apoyo de el cuerpo de bomberos del municipio de Palermo los cuales nos suministran 3700 litros de agua, cada vez que sea necesario. (mes de noviembre # 4 viajes)

Tabla No. 25 Gestión ambiental

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Punto ecológico</td><td>Acopio de material – bolas de cemento</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Suministro de agua industrial</td><td>Gestión con serví ambiental</td></tr>
</table>

8. COMPONENTE SOCIAL

De acuerdo al objetivo del plan de gestión social, como es el conjunto de actividades interinstitucionales y comunitarias que identifican los posibles cambios y transformaciones del entorno ambiental, social y económico de los habitantes, generados como resultado de la ejecución del proyecto, es por ello fundamental prevenir los impactos negativos que se podrían presentar en la ejecución del proyecto frente a la comunidad, promoviendo al sentido de pertenencia, con el propósito de fortalecer los canales de comunicación entre el proyecto y la comunidad en general, entes territoriales, donde se suscita a la utilización de los espacios o mecanismos de participación, adelantando acciones y estrategias de socialización, sensibilización que facilitan la relación con la comunidad.

- Apoyo a todas las áreas del proyecto, para su dinamización.
- Contacto con comunidad para información oportuna sobre del proyecto.

La estructura del informe describe en forma sistemática las actividades ejecutadas por la Profesional en Atención a la Comunidad del equipo social del Contratista para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre 2024, puntualizando en las actividades ejecutadas en cada uno de los programas.

8.1. Fomento de empleo - atención a recepción de hojas de vida

Dentro del desarrollo de este programa se pretende maximizar la generación de empleo en la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, de esta manera durante el periodo del 01 al 30 de noviembre 2024, se recepcionaron hojas de vidas en la oficina del proyecto, las cuales fueron remitidas al área técnica, así mismo es de resaltar el apoyo de los líderes de las juntas de acción comunal de las veredas con la divulgación de las vacantes y medios de recepción.

Tabla No. 26 Fomento de empleo



Registro fotográfico N°1- Recepción hojas de vidas

8.1.1. Empleos personal mano de obra calificada y no calificada

Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre 2024, se inició con la contratación de personal de mano de obra no calificada, a continuación, se relaciona cuadro, donde se identifica las Mano de obras no calificadas del proyecto.

PERSONAL CONTRATADA EN EL PROYECTO								
No	**Nombres y Apellidos**	**Cargo**	**Calificada**	**No Calificada**	**De la zona de influencia**	**Otras partes del pais**	**Activo**	**Inactivo**
1	Diana Ramírez	Residente de obra	X		X		x	
2	Fernando Gracia	Director de obra	X			X	X	
3	John Jaime	Prof. SISOMA	X		x		x	
4	Yesica Escobar	Prof. Social	x			X	x	
5	José Balbino Patiño	Operador vibro compactador		x	X		x	x
6	Jesús Antonio Conde	Ayudante de obra		X	X		x	x
7	Cristian Gordo Ramírez	Ayudante de obra		X	X		x	
8	Duberney Pérez C.	Ayudante de obra		X	X		x	
9	Gustavo Trujillo M	Ayudante de obra		X	X		x	
10	Jesús Trujillo M.	Ayudante de obra		X	X		x	
11	Rubén González C.	Ayudante de obra		X	X		x	
12	Daniel Ramírez G.	Ayudante de obra		X	X		x	
13	Libio Losada R.	Ayudante de obra		X		X	x	
14	Diego Alejandro	Ayudante de obra		X		X	x	
15	Luis Humberto Fajardo	Maestro		X		X	x	

A continuación, se relaciona grafica del fomento de empleo en la zona de influencia, donde se identifica la región del personal de obra.



Gráfico 4 Fomento de empleo

De acuerdo a los resultados cabe anotar que el 80% del personal contratado durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, corresponde al municipio de Palermo, municipios vecinos del departamento del Huila (Palermo y veredas vecinas) y el 20% personas son de otras zonas del país.

8.2. Piezas comunicativas e informativas

En cuanto a la entrega de piezas comunicativas y de información, durante el periodo del 01 al 30 de noviembre 2024, se continúa realizando la divulgación de cierre de vía de la vereda Buenos Aires, con el objetivo de informar a la comunidad de influencia sobre la vía alterna que se estableció para no afectar el desarrollo del proyecto y que la vía se encuentra cerrada.

Tabla No. 27 Piezas informativas



Piezas informativas


Así mismo cabe mencionar que se comparte volante informativo para reunión extraordinaria en la vereda Nazaret.



8.3. Reuniones con comunidad

El día 20 de noviembre 2024, se lleva a cabo reunión de con los miembros de la comunidad de la vereda Nazaret, lideres, veeduría ciudadana, contratista e interventoría, con el objetivo de aclarar inquietudes con respecto a las coordenadas de la ubicación de la placa huella, identificándose el alcance de la ejecución del mismo, de esta manera la comunidad indica que requieren que se modifique las coordenadas, puesto que el punto crítico no corresponde a la ubicación actual, se les aclara que el contratista e interventoría, no tiene la autoridad para poder hacer esos cambios, lo cual se debe solicitar formalmente a la secretaria de planeación departamental para su respectiva respuesta.


Tabla No. 28 Reunión extraordinaria

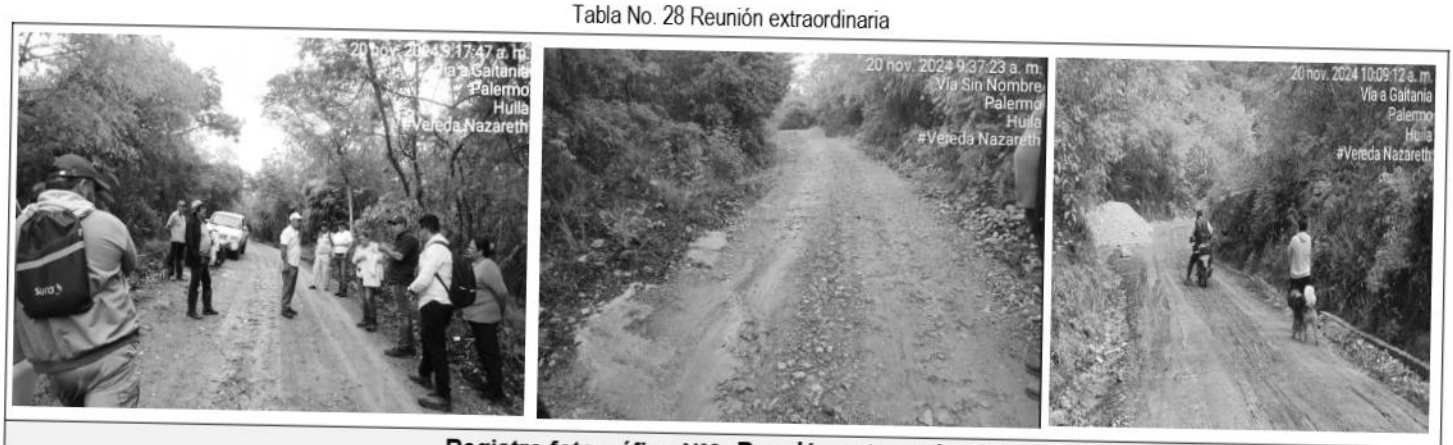

Registro fotográfico N°3- Reunión extraordinaria

8.4. Atención a la comunidad

Esta actividad se implementa en pro de promover la atención a la comunidad, donde orienta a generar un mecanismo eficiente de atención al ciudadano (recepción y respuesta a inquietudes, solicitudes, quejas y reclamos), lo cual el día 07 de noviembre 2024, se recibe una solicitud por parte de la junta de acción comunal de la vereda Nazaret por medio del correo de atención a la comunidad, donde requerían reunión para aclarar inquietudes y verificación de las coordenada de la ubicación del tramo a intervenir, de esta manera se remite a las áreas encargadas y se realizo reunión atendiendo esa solicitud.

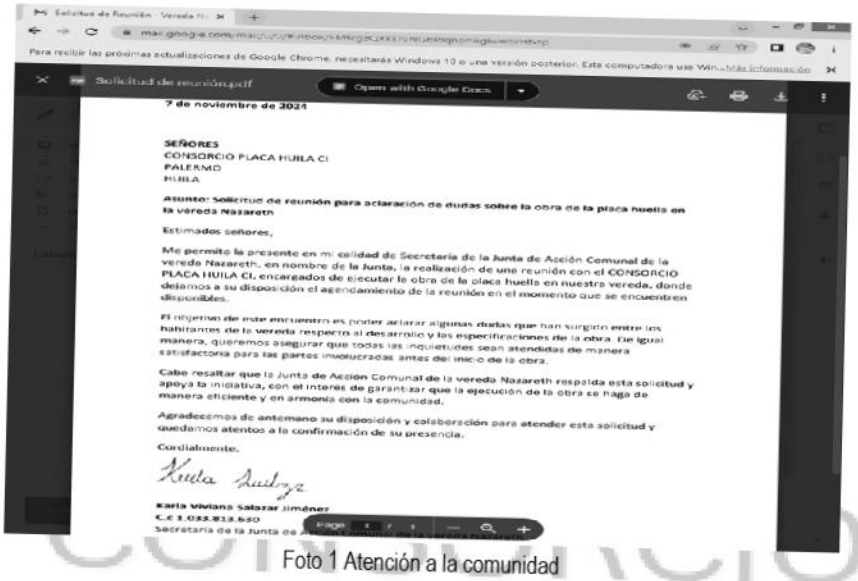

7 de noviembre de 2024

SEÑORES
CONSORCIO PLACA HUILA CI
PALERMO
HUILA

Asunto: Solicitud de reunión para aclaración de dudas sobre la obra de la placa huella en la vereda Nazareth

Estimados señores,

Me permito la presente en mi calidad de Secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nazareth, en nombre de la Junta, la realización de una reunión con el CONSORCIO PLACA HUILA CI, encargados de ejecutar la obra de la placa huella en nuestra vereda, donde dejamos a su disposición el agendamiento de la reunión en el momento que se encuentren disponibles.

El objetivo de este encuentro es poder aclarar algunas dudas que han surgido entre los habitantes de la vereda respecto al desarrollo y las especificaciones de la obra. De igual manera, queremos asegurar que todas las inquietudes sean atendidas de manera satisfactoria para las partes involucradas antes del inicio de la obra.

Cabe resaltar que la Junta de Acción Comunal de la vereda Nazareth respalda esta solicitud y apoya la iniciativa, con el interés de garantizar que la ejecución de la obra se haga de manera eficiente y en armonía con la comunidad.

Agradecemos de antemano su disposición y colaboración para atender esta solicitud y quedamos atentos a la confirmación de su presencia.

Cordialmente,

Karla Viviana Salazar Jiménez
C.C 1.083.913.650
Secretaria de la Junta de

Foto 1 Atención a la comunidad

Información, gestión y horario de atención en la obra: Atención al Ciudadano y datos de personas de Contacto. TS Yesica Paola Escobar Meza, Celular 3142625657 - Correo: atencionalusuarioplacashuella@gmail.com. En horario de atención a la comunidad los viernes o sábados de 8:00 am a 12.00 p.m., Se continúa promoviendo la participación ciudadana por medio de la sensibilización.

8.5. Conformacion comité de veeduria ciudadana

El día 23 de octubre 2024, en la reunión de inicio del proyecto se realizó la conformación del comité de la veeduría ciudadana, lo cual en unanimidad de todos los representantes de las veredas del municipio de Palermo eligieron a dos delegados para velar, apoyar y vigilar el cumplimiento de la ejecución del proyecto a satisfacción. A continuación, se relaciona tabla de miembros que conforman la veeduría ciudadana y se incluye anexo#3: acta de conformación del comité de veeduría.

DIRECTORIO MIEMBROS DE LA VEEDURIA CIUDADANA PALERMO FECHA: 23 OCTUBRE 2024					
No	**Nombre**	**Vereda**	**Municipio**	**Cedula**	**Celular**
Veedor 1	Víctor Polania Vanegas	Rep. Vereda Nazaret		12.126.879	3185896177

DIRECTORIO MIEMBROS DE LA VEEDURIA CIUDADANA PALERMO FECHA: 23 OCTUBRE 2024					
No	**Nombre**	**Vereda**	**Municipio**	**Cedula**	**Celular**
Veedor 2	Luz Mery Muñoz Moreno	Presidente vereda alto de san pedro	Palermo	36.166.265	3165393221

Con el objetivo de tener a los miembros de la veeduría Ciudadana informada, se crea un grupo de WhatsApp, donde se les informa sobre los avances del proyecto y novedades, logrando de esta manera una comunicación asertiva con los veedores y el proyecto. A continuación, se relaciona registro fotográfico del grupo informativo.



Foto 2 Interacción con la comunidad

CONSORCIO PLACAS HUILA CI

8.6. Levantamiento actas de vecindad

El acta de vecindad es una herramienta que se utiliza para conocer el estado previo de vías e inmuebles, y verificar la presencia de deterioro preexistente, con el fin de evitar que este sea imputado posteriormente por los propietarios, poseedores o representante a las actividades de la obra constructiva. En el mes de octubre 2024, se realizó el levantamiento de las actas de vecindad en las diferentes veredas a intervenir del municipio de Palermo, Huila, a continuación, se relaciona tabla de actas levantadas.

Tabla No. 29 Actas de vecindad veredas de palermo

ACTAS DE VECINDAD VEREDAS			
VEREDA SAN GERARDO			
NUMERO	**DIRECCION O LUGAR**	**PROPIETARIO /POSEEDOR**	**FIRMADO POR**
1	Placa huella existente	Eliecer Ramírez Lozada	Presidente J.A.C.
VEREDA NAZARET			
NUMERO	**DIRECCION O LUGAR**	**PROPIETARIO /POSEEDOR**	**FIRMADO POR**
1	Cunetas y bordillo	Mercedes Pérez	Presidente J.A.C.
VEREDA EL QUEBRADON			
NUMERO	**DIRECCION O LUGAR**	**PROPIETARIO /POSEEDOR**	**FIRMADO POR**
1	Puente de madera peatonal	Antonio Vélez	Presidente J.A.C.

ACTAS DE VECINDAD VEREDAS			
VEREDA EL MIRADOR			
NUMERO	**DIRECCION O LUGAR**	**PROPIETARIO /POSEEDOR**	**FIRMADO POR**
1	Muro de contención	Diomedes Montano	Propietario
2	Placas huellas	Andrea Ceran	Presidente J.A.C.
VEREDA EL CARMEN- SECTOR LAS BRISAS			
NUMERO	**DIRECCION O LUGAR**	**PROPIETARIO /POSEEDOR**	**FIRMADO POR**
1	Finca Caicedonia	Jorge Ruiz – Autorizado	Presidente J.A.C.
2	Finca Villa Natalia	Pedro Halconde	Propietario
VEREDA ALTO DE SARDINATA			
NUMERO	**DIRECCION O LUGAR**	**PROPIETARIO /POSEEDOR**	**FIRMADO POR**
1	Cárcamo	José Antonio Cabrera	Presidente J.A.C.
2	Finca Alemántico	Eliecer López- José Cabrera	Presidente J.A.C.
3	Finca Juanchito	Darley Mateus	Propietario
4	Portón N°1	José Antonio Cabrera	Presidente J.A.C.
5	Placa huella existente	José Antonio Cabrera	Presidente J.A.C.
6	Finca san Gregorio – cerrada	Olga Aldana	Propietaria
VEREDA SAN PEDRO BAJO			
NUMERO	**DIRECCION O LUGAR**	**PROPIETARIO /POSEEDOR**	**FIRMADO POR**
1	Puente metálico	Francy Elena Polania	Presidente J.A.C.
2	Finca la Rosalía	María Valenzuela	Propietaria
VEREDA ALTO DE SAN PEDRO			
NUMERO	**DIRECCION O LUGAR**	**PROPIETARIO /POSEEDOR**	**FIRMADO POR**
1	puente peatonal	Luz Mery Muñoz	Presidente J.A.C.

8.7. Conclusiones

CONSORCIO PLACAS HUILA CI

Durante el mes de noviembre 2024, se logró informar sobre los espacios de atención a la comunidad y divulgar los avances del proyecto de la vereda Buenos Aires a la veeduría ciudadana y atender las inquietudes de la comunidad, lideres de la vereda Nazaret.

Por otra parte, en el municipio de Yaguará, se realizó socialización a la comunidad respecto al desarrollo del proyecto el día 28 de noviembre de 2024, en el cual, se recibieron y resolvieron las diferentes dudas de la comunidad y líderes comunitarios; se indicó adicionalmente, los mecanismos existentes para solución de dudas y atención al ciudadano.

Por todo lo anteriormente mencionado se evidencia apropiación de los líderes y lideresas de las veredas, veedores, resaltando el apoyo al proceso constructivo, iniciando con la promoción y divulgación de personal de influencia a las intervenciones para la generación de empleo de la zona en el desarrollo de mano de obra no calificada, así mismo se promueve el sentido de pertenencia a trabajadores y comunidad en general por el empoderamiento del proyecto, logrando que la población conozca, analice, participe y haga seguimiento

a las decisiones que afectan su entorno y a mitigar los impactos sociales que se generen por el desarrollo del mismo, como así mismo con el propósito de informar oportunamente a las diferentes organizaciones sociales y a los actores sociales (comunidad directa e indirecta), lo relacionado con las diferentes fases del proyecto; implementando herramientas pedagógicas que generen en los actores sociales aceptación y respaldo social al proyecto y que faciliten su proceso de construcción.

Recomendaciones: Continuar promoviendo el sentido de pertenencia para el desarrollo efectivo de las actividades a todos los líderes y la comunidad en general por medio de los espacios de participación ciudadana.

CONSORCIO
PLACAS HUILA CI
