INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 219 DE 2025

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 138 DE 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME MENSUAL No. 08

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONSORCIO INTERVENCIÓN A.C.

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

BOGOTÁ D.C., 01 DE DICIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 8
2. Descripción del proyecto 10
2.1 Localización 10
2.2 Estado inicial de la vía 10
3 Información Contrato de Obra 10
3.1 Información general contrato de obra 10
3.2 Actividades ejecutadas en el mes 12
3.2.1 Actividades ejecutadas en el mes componente técnico 12
3.2.2 Actividades Fase II Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervenciones 14
3.2.3 Actividades Fase III Construcción, ver en tabla No.6. 17
3.2.4 Actividades ejecutadas en el mes componente ambiental 30
3.2.5 Actividades ejecutadas en el mes componente social 32
3.2.6 Actividades ejecutadas en el mes componente SST 45
3.2.6.1 Reportes ejecución mensual contrato de obra 46
3.2.6.1.1 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 46
3.2.6.1.2 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 46
4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 52
4.1 Estado General del Tiempo 53
4.2 Resumen Ensayos de Laboratorio 53
4.3 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 64
4.4 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia) 65
4.5 Otros documentos seguimiento mensual 66
4.5.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 66
4.5.2 Seguimiento Programa de Inversión 66
4.5.3 Seguimiento Programa de Obra 67
5 Información contrato de interventoría 70

5.1 Información general del contrato de interventoría 70

Fuente: elaboración propia 71

5.2 Informe semanal 71

5.3 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 71

5.4 Informes especialistas y profesionales 72

5.5 Informe del Programa Anual de Caja – PAC 72

6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría 74

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 74

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 74

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 76

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 77

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 77

6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría 77

Se realiza el control de calidad mediante la implementación de capacitaciones y charlas del componente ambiental y SST. 77

Para la fase III del contrato, se reportan los ensayos y contrastación de resultados de laboratorio para concretos e intervención de rasantes estabilizadas 77

6.6 Otros Documentos seguimiento mensual 77

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 77

6.7 Actas de Comité de Obra 78

7 Conclusiones y recomendaciones 79

7.1 Conclusiones y recomendaciones área técnica 79

7.2 Conclusiones y recomendaciones área ambiental 80

7.3 Conclusiones y recomendaciones área social 81

7.4 Conclusiones y recomendaciones área SST 82

8 Anexos 83

8.2 Componente social 83

8.3 Componente SST 83

8.4 Componente Ambiental 83
8.5 Informes de buen manejo del anticipo de obra 83
8.6 Informe mensual integral del Contratista de obra 83
9 Registro fotográfico del avance de las obras. 83
9.1 Correspondencia 102
9.2 Bitácora de obra 115
9.3 Certificación componente ambiental y social 116

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Aprobaciones informes de topografía, Fase I del proyecto 13
Tabla 2. Registro fotográfico reconstrucción de muro alcantarilla PR4+407 18
Tabla 3. Resumen ejecución alcantarillas 19
Tabla 4. Definición de sectores homogéneos tramo Sueva – San Francisco – El Valle – Junín, espesores definidos. 20
Tabla 5. Registro fotográfico actividades mejoramiento de rasante con cemento y aditivo 20
Tabla 6.Avance mejoramiento de rasante tramo municipio de Junín provincia Guavio 23
Tabla 7. Definición de sectores homogéneos tramo El Rosario - La Caja – Chatasuga - La Llanada – Ferralarada - Barro Negro – Granadillo – Chivate - Resguardo Bajo, espesores definidos. 24
Tabla 8. Registro fotográfico actividades mejoramiento de rasante con cemento y aditivo 25
Tabla 9. Atención de solicitudes ciudadanas – noviembre 2025 33
Tabla 10. Puntos SAU – noviembre 2025 34
Tabla 11. Buzones satelitales – noviembre 2025. 35
Tabla 12. Actas de las reuniones preliminares realizadas 36
Tabla 13. Reuniones de inicio – noviembre 2025 37
Tabla 14. Actas de las reuniones de inicio realizadas 37
Tabla 15. Acta reunión extraordinaria No. 2 38
Tabla 16. Estado de las piezas de divulgación– noviembre 2025 38
Tabla 17. Estado de las cartas personalizadas – noviembre 2025 39
Tabla 18. Estado de las vallas a la Entidad 39
Tabla 19. Estado de los grupos de WhatsApp 40
Tabla 20. Estado del levantamiento de actas de vecindad – Municipio de Ubalá 40

Tabla 21. Estado del levantamiento de actas de vecindad – Municipio de Junín 41
Tabla 22. Estado del levantamiento de actas de vecindad – Municipio de Gama..... 41
Tabla 23. Estado del levantamiento de actas de vecindad – Municipio de Choachí 41
Tabla 24. Estado de actas de vecindad para el municipio de Sibaté..... 42
Tabla 25. Comités de Participación Ciudadana: 42
Tabla 26. Mano de obra no calificada – Provincia del Guavio 43
Tabla 27. Mano de obra no calificada – Provincia de Oriente 43
Tabla 28. Mano de obra no calificada – Provincia de Soacha..... 43
Tabla 29. Paridad laboral..... 44
Tabla 30. Informes semanales del contratista..... 44
Tabla 31. Mesas de trabajo 44
Tabla 32. Personal contratista 47
Tabla 33. Personal del Subcontratista – Jefferson Enrique Amézquita Picón..... 49
Tabla 34. Personal del Subcontratista – Tecnisuelos Pavimentos y Concretos SAS..... 49
Tabla 35. Personal del Subcontratista – Urbanuz Construcciones 49
Tabla 36. Personal Retirado..... 50
Tabla 37. tabla de control presupuesto ejecutado semanal del contratista..... 52
Tabla 38. Resumen precipitaciones mensual..... 53
Tabla 39. Resumen giros den anticipo de obra..... 67
Tabla 40. Avance físico del contrato..... 68
Tabla 41. Avance financiero de acuerdo con los capítulos de ejecución 69
Tabla 42. Avance de actividades de obra por capítulos en ejecución 69
Tabla 43. Diagrama anual de caja de la interventoría..... 73
Tabla 44. Personal de la interventoría 74
Tabla 45. Personal de interventoría-personales especialistas..... 75
Tabla 46. Personal de interventoría - Retirado 75
Tabla 47. Valor acumulado de actividades ejecutadas por parte de la interventoría... 76

RESUMEN MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

El Informe Mensual de Interventoría No. 8, correspondiente al mes de noviembre de 2025, presenta un balance detallado de las actividades ejecutadas por el contratista en el marco de la supervisión técnica, administrativa y documental del contrato de obra. En el componente técnico, se finalizó en un 100% la Fase I relacionada con el diagnóstico y la caracterización vial, en relación a la Fase II se tiene un 99,5% en relación a la caracterización de materiales de los cuales durante el transcurso del mes se entregaron los informes pendientes para finalizar con esta fase pero 6 de los 11 informes se encuentran con observaciones y 5 con requerimientos por parte del ICCU y la Fase III la cual se viene ejecutando en las provincias del Guavio y Oriente, concentrándose en la construcción de obras de drenaje y mejoramiento de rasante en los municipios de Junín y Choachí; Finalmente, el informe describe los aspectos generales del proceso de interventoría, destacando el alcance de las labores ejecutadas y el seguimiento a los compromisos establecidos.

Durante el periodo se evidenciaron avances en la entrega de los entregables correspondientes a la Fase II del contrato de obra, se realizó entrega de la reprogramación de obra En el componente financiero, la ejecución acumulada alcanzó la suma de $ 4.213.946.944, se realizó la aprobación del giro No 5 del anticipo de obra, y se emitieron las certificaciones de cumplimiento para el cobro del segundo y tercer 25% de la fase de caracterización. La interventoría mantuvo un seguimiento integral a los aspectos técnicos, financieros, de calidad, sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos contractuales y la mitigación de riesgos en la ejecución.

Durante el mes de noviembre se realizó la aprobación de redistribución de actividades a corte del 31 de diciembre en conjunto con plan de contingencia que permita la recuperación de la línea base del cronograma a partir de la implementación de 5 frentes

de obra en simultaneo, de los cuales 3, son de intervención de la rasante, proyectándose en el tercer frente de ejecución en el municipio de Sibaté de la provincia de Soacha a inicios del mes de diciembre del 2025. En este orden de ideas, se hizo llamado de atención al contratista para el inicio de actividades hidráulicas en los municipios de Gama y Sibaté.

En la gestión administrativa de la interventoría se pudo viabilizar el informe del buen manejo del anticipo de obra del mes de agosto del 2025. Se emitió la aprobación del presupuesto definitivo de los municipios de Choachí, Junín y Sibaté, y aprobación condicionada del presupuesto del municipio de Ubalá.

A nivel técnico, se encuentra en trámite una segunda alternativa de intervención de cunetas que contemple el anclaje al talud y optimice la instalación de afirmado para la conformación de estas, para ello se realizó mesa técnica con el proveedor de la geomembrana considerada en el diseño viabilizado.

1. Introducción

Con el propósito de fomentar el progreso económico, social y ambiental del Departamento de Cundinamarca, mejorar la interconectividad entre los municipios y facilitar su crecimiento en diversos ámbitos, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ha considerado pertinente llevar a cabo diversas obras viales para satisfacer las necesidades de la comunidad. Estas acciones buscan garantizar la transitabilidad y el bienestar de los usuarios en el Departamento, al mismo tiempo que se promueve el respeto por el entorno natural y la seguridad de los trabajadores.

Dentro de este marco, el Departamento de Cundinamarca, a través del Instituto de caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), en el LOTE 1, firmó el Contrato No. ICCU-138-2025 con el CONSORCIO SOFAN C-031 para desarrollar el proyecto cuyo objetivo es la **"Intervención de las vías que conforman el Programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse, en las Provincias de Medina, Guavio, Oriente y Soacha, en el Departamento de Cundinamarca"**. Este proyecto no solo busca mejorar la infraestructura vial, sino también crear un impacto positivo en las comunidades a través de la creación de empleos, la optimización del acceso a servicios básicos, y el impulso al desarrollo local.

Así mismo, dando aplicación al artículo 32 de la ley 80 de 1993 realizó el Contrato No. ICCU-219-2025 con el CONSORCIO INTERVENCIÓN A.C. cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

La supervisora de los contratos de obra e interventoría para el LOTE 1 es **Laura Daniela Nieto Gutiérrez**, quien conto con el apoyo inicialmente de **Dairon Andrés Solano Duran** desde el 9 de abril hasta **30 de mayo**, luego de **Adriana Martín** en

apoyo del 30 de mayo hasta el **19 de junio** posterior a la fecha quedo a cargo la Arquitecta **Luz Angela Sanabria** quien estuvo en la supervisión de las actividades de este mes hasta el **22 de julio del 2025**, actualmente como supervisor asignado se encuentra **Adriana Martín** quien reemplazó al Ingeniero **Juan Sebastián Sánchez Estrada** durante la última semana del mes de octubre del 2025.

Durante el mes de noviembre de 2025, el Informe Mensual de Interventoría señaló que en la **Fase I – Diagnóstico y Caracterización Vial** se cuenta con la aprobación de 9 de los 11 municipios incluidos en el contrato, mientras que los dos restantes continúan con observaciones por parte de la Interventoría y están a la espera de aprobación. Respecto a la **Fase II – Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervenciones**, se registra aprobación total para los municipios de Gama, Junín, Choachí y Sibaté, así como aprobación parcial para Ubalá; los otros seis municipios se encuentran en revisión o en proceso de subsanación por parte del contratista. Finalmente, se reporta la continuidad de las actividades de la **Fase III – Ejecución de Obras**, especialmente en la Provincia del Guavio (municipio de Junín) y en la Provincia de Oriente (municipio de Choachí), donde se desarrollaron labores de intervención y mejoramiento de la rasante existente.

En el municipio Gama provincia Guavio, se iniciaron actividades de construcción de alcantarillas las actividades de construcción de alcantarillas con la intervención de 1 de las 3 alcantarillas que se tienen proyectadas, mientras que el municipio de Ubalá el contratista realizo la subsanación de la alcantarilla realizado la reconstrucción del muro de descole de la alcantarilla del PR 0+407 tramo correspondiente entre casa rosada a laguna azul.

Se mantuvo la ejecución de los componentes social, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en cumplimiento de la normativa vigente. La Interventoría continuó con su gestión en los ámbitos técnico, administrativo y contractual, velando

por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada ejecución del proyecto. A la fecha de corte, el contrato presenta un retraso del 6,83% respecto al cronograma contractual establecido con la reprogramación entregada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría el día 10 de noviembre del 2025.

2. Descripción del proyecto

2.1 Localización

El Proyecto para la intervención de vías se localiza en las Provincias del oriente de Cundinamarca: **Medina, Guavio, Oriente y Soacha**, toda la información en referente a la localización de cada provincia se encuentra dentro del anexo del componente técnico, actas de localización.

2.2 Estado inicial de la vía

Todo el registro fotográfico referente al estado inicial de la vía ya se encuentra referenciado dentro del contenido de los informes mensuales N°1, 2, 3, y 4 correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, y julio concerniente a todos los tramos existentes del proyecto, este registro fotográfico se hace con el fin de contar con evidencia del antes y el después de la intervención del contrato de obra.

3 Información Contrato de Obra

3.1 Información general contrato de obra

Apertura del proceso de contratación	**No.:** ICCU-LP-031 de 2024.
Resolución de adjudicación del contrato	**No.:** 1053 de 2024
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y Fecha	DIS-2025000077 de miércoles, 22 de enero de 2025 y DIS-2025000080 de miércoles, 22 de enero de 2025.

RP (Registro Presupuestal) y Fecha:	RES-2025000367 de lunes, 17 de febrero de 2025 y RES-2025000368 de lunes, 17 de febrero de 2025.
Contrato ICCU No.:	138 DE 2025.
Fecha de suscripción del contrato:	27 de enero de 2025.
Objeto del contrato:	Intervención de las vías que conforman el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse, en las provincias de Medina, Guavio, Oriente y Soacha, en el departamento de Cundinamarca.
Contratista:	CONSORCIO SOFAN C-031, NIT. 901.906.842 – 2 SOFAN INGENIERIA S.A.S identificada con NIT 800.012.888 – 7 constituida mediante Escritura Pública No. 1769 del 31 de julio de 1987 de la Notaria 1a. De Montería. inscrito en la Cámara de Comercio el 11 de agosto de 1987, con el No. 3560 del Libro IX, representada legalmente por ANDRES GABRIEL SOFAN SANCHEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.553.192 de Bogotá D.C, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Montería, con una participación del noventa por ciento (90%). ANDRES GABRIEL SOFAN SANCHEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.553.192 de Bogotá D.C, quien obra en nombre

	propio con una participación del diez por ciento (10%).
Valor inicial:	$ 35.350.235.228,00
Adiciones:	NINGUNA.
Valor acumulado del contrato:	$35.350.235.228,00
Modificaciones:	Modificatorio 1: la modificación de la cláusula 7 de contrato de Obra N° ICCU-138 de 2025 (Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-2025000418 del 10 de julio de 2025)
Aclaraciones:	NINGUNA
Suspensiones:	NINGUNA
Cesiones de participación contractual:	NINGUNA
Plazo:	Once (11) meses y quince (15) días o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra.
Fecha de inicio:	9 de abril de 2025.
Fecha de terminación actual del contrato:	31 de diciembre de 2025.

Fuente: elaboración propia

3.2 Actividades ejecutadas en el mes

3.2.1 Actividades ejecutadas en el mes componente técnico

- ✓ **Actividades Fase I Geoposicionamiento, Topografía y Caracterización de materiales. Ver en tabla No.1**

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de noviembre del 2025 se continúan desarrollando las actividades por Provincia que se describen la siguiente tabla:

Tabla 1. Aprobaciones informes de topografía, Fase I del proyecto

MUNICIPIO	ESTADO	OFICIO	FECHA
PROVINCIA GUAVIO			
GAMA	Aprobado	766-307	14/10/25
JUNIN	Aprobado	766-309	15/10/25
UBALA	Aprobado	766-316	16/09/25
PROVINCIA MEDINA			
MEDINA	Observado		12/11/25
PARATEBUENO	Observado		12/11/25
PROVINCIA ORIENTE			
CHOACHI	Aprobado	766-420	19/11/25
FOSCA	Aprobado	766-307	14/10/25
CHIPAQUE	Aprobado	766-330	22/10/25
FOMEQUE	Aprobado	766-381	05/11/25
QUETAME	Aprobado	766-381	05/11/25
PROVINCIA SOACHA			
SIBATE	Aprobado	766-343	28/10/25

Fuente: elaboración propia, interventoría

En conclusión, y considerando el estado de cada uno de los municipios vinculados al contrato de obra, se registra una aprobación general en 9 de los 11 municipios. Para los municipios de la Provincia de Medina, la Interventoría emitió observaciones de la versión V1 del documento, las cuales fueron observadas mediante el oficio 766-434. En dichas observaciones se solicitó ajustar aspectos de forma y estandarización de formatos, así como corregir inconsistencias en las capas geográficas entregadas y complementar la información que fue presentada de manera incompleta. En consecuencia, la Interventoría requirió la correspondiente subsanación; sin embargo, a la fecha de cierre del mes, dicha información no se entregó por el contratista.

3.2.2 Actividades Fase II Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervenciones

A. Provincia del Guavio

Se realizo aprobación condicionada del informe de diseño de estabilización y estructura de pavimento del **municipio de Ubalá** mediante oficio 766-390 del 10 de noviembre del 2025, dando respuesta al oficio **SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-378, el cual corresponde a la versión N°4 del informe de laboratorio,** quedando pendiente una única observación "Como comentario adicional, no se evidencia en el documento la realización de ensayos sobre el material granular estabilizado únicamente con cemento (3%), sin la inclusión de aditivos adicionales,. En este sentido, se solicita complementar la información incorporando los resultados correspondientes a dicha condición base, de manera que sea posible cuantificar y comparar el valor adicional que aportan los aditivos empleados frente al comportamiento del material granular estabilizado solo con 3% de cemento", una vez se entregue esta información quedara completamente aprobado este informe por parte de la interventoría, verificar si por esto es la aprobación condicionada, pero a la fecha de este informe no fueron atendidas por lo que la intervendría mediante oficio 766-482 realiza un llamado de atención para que sean atendidas estas observaciones.

Se realizó la aprobación del informe de **caracterización del municipio de Junín mediante oficio 766-356 del 31 de octubre del 2025**, donde se logró la subsanación total de las observaciones que se habían realizado mediante **oficio 766-322 y MT2725-CM467-2025 con la versión 4** de este informe.

El informe del **municipio de Gama** quedo subsanado por parte del contratista mediante **oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-423** en el cual presentaba la subsanación de cada uno de los puntos observados, si bien no se cumplió con las

fechas establecidas en comités anteriores se **comité N°24** donde el contratista había quedado de entregar el **día 31 de octubre del 2025**, este fue entregado hasta el 13 de noviembre del 2025, y aprobado por la interventoría mediante **oficio 766-421 el día 19 de noviembre del 2025.**

B. Provincia de Medina

Durante el mes de noviembre, el contratista realizo ensayos de laboratorio a las muestras tomadas en los apiques realizados en el tramo comprendido entre Humea – San Cristóbal – Gazatavena – San Luis del Retiro del **municipio de Medina**; y culminó la ejecución de los 32 apiques programados con sus respectivos ensayos en la subrasante en el tramo comprendido entre Buena Vista Altor redondo – Engaño del municipio de Paratebueno e inició los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas en dichos apiques. Si bien presentaron problemas para la elaboración de las briquetas en laboratorio debido a los sobre tamaños del material extraído, lograron realizar cada uno de los laboratorios y presentaron los informes correspondientes mediante **oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-429** radicación final informe caracterización municipio de medina y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-431 radicación final informe caracterización municipio de medina ambos **entregados el 14 de noviembre del 2025**, los cuales a la fecha de este informe se encuentran en revisión por parte de los especialistas de la interventoría.

C. Provincia de Oriente

Se realizó la aprobación del Informe de Caracterización del **municipio de Choachí** mediante el oficio **766-355** del **30 de octubre de 2025**, en el cual se evidenció la subsanación total de las observaciones formuladas previamente a través de los oficios **766-323** y **MT2684-CM467-2025**, con la **versión 7** del informe. Posteriormente, mediante el comunicado **ICCU-I-2025-0017417** del **25 de noviembre**, se dio alcance al comunicado **ICCU-I-2025-0016450**, remitiendo

nuevas observaciones al oficio **766-355-ICCU – Aprobación Informe de Caracterización V7 del municipio de Choachí**. Dichas observaciones fueron trasladadas por la Interventoría mediante el comunicado **766-482**, en el cual, de manera conjunta, se realizó un llamado de atención, dado que a la fecha de corte del presente informe no han sido atendidas.

Durante el mes de noviembre, para el **municipio de Fómeque**, la Interventoría emitió observaciones al **Informe de Resultados de Laboratorio – Tramo Fómeque**, remitido mediante el comunicado **SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-358** del **23 de octubre de 2025**. Dichas observaciones fueron emitidas mediante el comunicado **766-374** del **04 de noviembre de 2025**. Posteriormente, a través del comunicado **SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-424** del **13 de noviembre de 2025**, el Contratista de obra dio respuesta a las observaciones generadas. Una vez revisada la información remitida, se formularon nuevas observaciones, las cuales fueron enviadas mediante el comunicado **766-471**, correspondiente a las **Observaciones al informe de caracterización Fómeque V1**. Al corte del presente informe, se encuentra pendiente la respuesta a dichas observaciones.

Durante el mes de noviembre, para el **municipio de Chipaque**, la Interventoría emitió observaciones al **Informe de Resultados de Laboratorio – Tramo Chipaque**, remitido mediante el comunicado **SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-380** del **30 de octubre de 2025**. Dichas observaciones fueron emitidas mediante el comunicado **766-403** del **11 de noviembre de 2025**. Posteriormente, a través del comunicado **SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-427** del **14 de noviembre de 2025**, el Contratista de obra dio respuesta a las observaciones generadas. Una vez revisada la información remitida, se formularon nuevas observaciones, las cuales fueron enviadas mediante el comunicado **766-467**, correspondiente a las

Observaciones al informe de caracterización Chipaque V1. Al corte del presente informe, se encuentra pendiente la respuesta a dichas observaciones.

D. Provincia de Soacha

Para el tramo comprendido entre la Vereda San Rafael – Vereda Alto Charco – Sector Alto de La Virgen – Vereda La Unión del municipio de Sibaté se emitió la aprobación del informe mediante el oficio *766-412 Aprobación informe de caracterización Sibaté-SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-403-Respuesta observaciones punto a punto al comunicado MT-2748-CM467-2025*.

3.2.3 Actividades Fase III Construcción, ver en tabla No.6.

A. Provincia del Guavio

- **Tramo Casa Rosada – Laguna Azul, ubicado en el municipio de Ubalá**.

Tras una suspensión temporal ocasionada por las actividades adelantadas por el municipio relacionadas con la construcción de placas huella, el contratista reinició labores en el municipio de Ubalá, retomando la reconstrucción del muro de descole de la **alcantarilla ubicada en el PR 0+407 el día 10 de noviembre de 2025** realizando actividades de demolición y reconstrucción, que incluyeron la remoción de la estructura existente, la instalación de formaleta, el vaciado de concreto y el desencofre final, culminando dichas actividades el 25 de noviembre.

Tabla 2. Registro fotográfico reconstrucción de muro alcantarilla PR4+407

<table>
<tr><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="2">Demolicion de estrutura muro de descole</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Instalacion de formaleta y lloraderos del muro de descole</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Desencofrado de muro y terminados de muro de descole</td></tr>
</table>

Fuente: elaboración propia interventoría

Se establece cuadro resumen de las alcantarillas que a la fecha el contratista a ejecutado hasta la fecha, a medida que el contratista vaya ejecutando

Tabla 3. Resumen ejecución alcantarillas

No	PR	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	PR5+900	Ejecutada 95%	Falta relleno estructural
2	PR0+407	Ejecutada 95%	Falta demolición y reconstrucción muro descole
3	PR6+800	Ejecutada 100%	Alcantarilla funcional terminada
4	PR7+775	Ejecutada 95%	Falta excavación de descole
5	PR13+800	Ejecutada 95%	Falta realizar relleno estructural
6	PR14+000	Ejecutada 95%	Falta realizar relleno estructural

Fuente: elaboración propia

- **Tramo Sueva – San francisco – el valle - Junín municipio de Junín**

Durante el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2025 el contratista continúo realizando actividades de mejoramiento de la rasante existente mediante adición de cemento y aditivos estabilizantes. A la fecha el contratista ha realzado un avance de cada uno de los tramos seleccionados de la siguiente manera:

De acuerdo con las actividades ejecutadas en los dos primeros tramos, se ha venido manejando un espesor promedio de 24 cm, ajustado a los anchos existentes de la vía. La mezcla del material estabilizado se ha elaborado con una dosificación aproximada de 3% de cemento y una proporción de aditivo conforme a la hoja de cálculo de diseño, la cual define los volúmenes de agua y aditivo necesarios para garantizar una conformación homogénea de la rasante. Cabe resaltar que, aunque los anchos y espesores de los tramos homogéneos de intervención presentan variaciones, estos deben ajustarse a las condiciones topográficas del terreno y a las tablas de espesores establecidas en el informe de caracterización aprobado por la interventoría, tal como se presenta en la tabla siguiente.


Tabla 4. Definición de sectores homogéneos tramo Sueva – San Francisco – El Valle – Junín, espesores definidos.

Sector	Abscisa	CBR subrasante (%)	Espesor de la Capa de Mejoramiento (cm
1	K0+000 – K1+690	2.42	24
2	K1+690 – K3+310	3.33	21
3	K3+310 – K6+280	3.59	20
4	K6+280 – K7+900	3.51	20
5	K7+900 – K9+250	3.03	22
6	K9+250 – K13+370	2.85	23
7	K13+370 – K15+700	2.46	24

Fuente: informe caracterización V4, municipio de Junín.

Tabla 5. Registro fotográfico actividades mejoramiento de rasante con cemento y aditivo



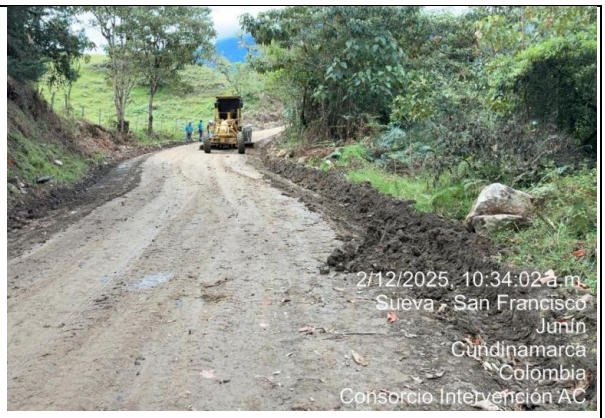

Retiro material vejetal y barro de las cunetas





Escarificación





Retiro de sobre tamaños





Instalación de cemento





Instalación de aditivo + agua





Homogenización de solidos





Céreo y compactación

Fuente: elaboración propia

En resumen, el proyecto presenta un avance de obra en el municipio de Junín del 26,95 %, correspondiente a un total de 2561 metros lineales (ml). Dicho avance se detalla en la siguiente tabla, en la cual se discriminan los tramos de intervención programados y ejecutados para cada una de las veredas objeto de intervención, conforme al alcance establecido del proyecto.

Tabla 6.Avance mejoramiento de rasante tramo municipio de Junín provincia Guavio

RESUMEN DEL AVANCE FASE III EN EL MUNICIPIO DE JUNIN							
VEREDA	TRAMO	PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD INTERVENIR	LONGITUD EJECUTADA	ESPESOR	%
SAN FRANCISCO 4,55KM	1	PR0+000	PR0+131	131	131	24	100
	2	PR0+939	PR1+701	762	762	24	100
	3	PR1+882	PR2+982	1100	1318	21	120
	4	PR3+540	PR4+100	560	350	20	63
	5	PR4+400	PR6+460	2060	0	20	0
VALLE 3,75KM	1	PR7+500	PR8+600	1100	0	22	0
	2	PR10+130	PR11+680	1550	0	22	0
	3	PR11+830	PR12+930	1100	0	23	0
ALEMANIA	1	PR12+930	PR14+130	1200	0	24	0

Fuente: elaboración propia

B. Provincia de Oriente

Para el tramo El Rosario - La Caja – Chatasuga - La Llanada – Ferralarada - Barro Negro – Granadillo – Chivate - Resguardo Bajo, ubicado en el municipio de Choachí, se continúa la ejecución de actividades correspondientes a la estabilización del afirmado de la rasante de la vía a una profundidad de 18 cm y 22 cm, utilizando cemento portland tipo 1 al 3% y aditivo marca PROES en segmentos viales definidos durante recorridos conjuntos realizados entre representantes de la Alcaldía, la Supervisión del ICCU, el Contratista de obra y la Interventoría, además en el recorrido se determinó la construcción de obras de drenaje tipo alcantarilla, con el objetivo de garantizar el adecuado manejo y control de las aguas lluvias sobre la vía.

Para el desarrollo de estas labores se contó con el apoyo de maquinaria pesada tipo recicladora, motoniveladora, minicargador y motoniveladora, utilizada para las actividades de intervención en la rasante de la vía y limpieza y/o conformación de cunetas, así como volqueta con tanque de agua para su transporte y suministro. El

contratista empleó mano de obra calificada y herramientas menores para la correcta ejecución de las actividades.

La estabilización del afirmado de la rasante permite mejorar la capacidad portante de la vía y proporcionar una base estable para la aplicación de una capa de protección, optimizando la durabilidad y el comportamiento ante el tránsito vehicular y condiciones climáticas adversas.

Aunque los anchos y espesores de los tramos homogéneos de intervención presentan variaciones, estos deben ajustarse a las condiciones topográficas del terreno y a las tablas de espesores establecidas en el informe de caracterización aprobado por la interventoría, tal como se presenta en la tabla siguiente.

Tabla 7. Definición de sectores homogéneos tramo El Rosario - La Caja – Chatasuga - La Llanada – Ferralarada - Barro Negro – Granadillo – Chivate - Resguardo Bajo, espesores definidos.

Sector	Abscisa	CBR subrasante (%)	Espesor de la Capa de Mejoramiento (cm
1	K0+000 – K3+445	4.52	18
2	K3+445 – K9+120	2.97	22
3	K9+120 – K14+535	2.99	22
4	K14+535 – K21+000	2.89	22

Fuente: informe caracterización V4, municipio de Choachí.

Durante el mes de noviembre se intervinieron 1.753 metros de la capa de afirmado y los tramos estabilizados fueron:

- ✓ **Tramo 3** de **2,26 Km** en vereda **La Caja:** 1.753 metros del PR01+613,00 al PR03+366 con un espesor de 18cm, con un ancho variable de entre 3,8 m a 3,5 m, dando un total estabilizado al mes de noviembre de 3.804,90 metros. Cabe aclarar que para la vereda **La Caja** se tenía previsto estabilizar **Tramo 1, Tramo**

2 y **Tramo 3,** pero dadas las condiciones del terreno encontradas en los **Tramos 1** y **2**, se trasladaron las longitudes a ejecutar directamente al **Tramo 3**.

Tabla 8. Registro fotográfico actividades mejoramiento de rasante con cemento y aditivo

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Retiro material vejetal y barro de las cunetas</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Escarificación</td></tr>
</table>





Retiro de sobre tamaños





Instalación de cemento









Reciclado de afirmado con cemento













Instalación de aditivo + agua






19 nov 2025 2:19:01 p.m.
4°37'45.696"N 73°53'9.768"W
Perimetral de Oriente de Cundinamarca
La Calera
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC


21 nov 2025 2:22:25 p.m.
4°37'46.822"N 73°52'58.391"W
Chocachí
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC


21 nov 2025 2:06:40 p.m.
4°37'34.955"N 73°53'18.235"W
Perimetral de Oriente de Cundinamarca
La Calera
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC


19 nov 2025 2:22:18 p.m.
4°37'45.678"N 73°53'9.522"W
Perimetral de Oriente de Cundinamarca
La Calera
Cundinamarca
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

Ceréo



Compactación

Fuente: elaboración propia

3.2.4 Actividades ejecutadas en el mes componente ambiental

A. Gestión documental PAGA

Se realiza la entrega del PAGA provincia del Guavio de acuerdo con los ajustes solicitados por la entidad contratante y las observaciones emitidas en las mesas de trabajo conjuntas entre contratista, interventoría y la supervisión, el cual cuenta con la aprobación de interventoría por medio de oficio 766-332, actualmente se espera la revisión respuesta oficial de aprobación del ICCU.

De igual forma se realiza la entrega del PAGA provincia de Oriente de acuerdo con los ajustes solicitados por la entidad contratante y las observaciones emitidas en las mesas de trabajo conjuntas entre contratista, interventoría y la supervisión, el cual

cuenta con la aprobación de interventoría por medio de oficio 766-333, actualmente se espera la revisión respuesta oficial de aprobación del ICCU.

B. Capacitaciones e Inducciones

Se desarrollaron las inducciones, capacitación, entrenamiento de los colaboradores en los temas referentes a los componentes ambiental, Atención a emergencias, Manejo de residuos sólidos, especiales y RCD, Manejo de materiales de construcción para prevenir, minimizar y/o corregir los impactos ambientales del proyecto durante su etapa constructiva.

Se realizaron 3 capacitaciones en temas ambiental donde se capacitó al 100% del personal en obra para el tramo de Sueva - Junín.

Se realizaron 3 capacitaciones en temas ambiental donde se capacitó al 100% del personal en obra para el tramo del municipio de Choachí.

C. Recorridos de obra

Se realizaron recorridos de obra a fin de inspeccionar las actividades diarias, señalización en los puntos de intervención de obras de drenaje, estado de campamentos y unidades sanitarias. Se verificó el cumplimiento de la señalización del PMT la cual comprende la tipología de diseño adoptando un esquema de control típico en vías rurales, donde se establecen zonas de espera seguras, reducción de velocidad, pasos alternos y advertencias claras para los conductores, estas acciones permitieron la ejecución continua de las actividades de obra sin afectar de manera significativa la movilidad local, y minimizaron los riesgos asociados a la presencia de maquinaria en la vía.

La inspección del campamento se ejecutó una vez en el periodo con la revisión de estado la estructura, organización y limpieza de las áreas de trabajo y baterías

sanitarias, segregación de materiales, manejo de residuos y suministro de agua para hidratación del personal.

D. Recorridos de inspección previa de alcantarillas

Se ejecutan las actividades de reconocimiento de puntos de intervención de obras de drenaje o alcantarillas de acuerdo a las indicaciones aportadas por el área técnica, en estos recorridos se evalúan las condiciones iniciales de tuberías, taludes y pasos existentes de descarga de escorrentías a los costados de la vía.

3.2.5 Actividades ejecutadas en el mes componente social

Desde el Consorcio Intervención AC, se realizó el seguimiento y control de las actividades realizadas por el Contratista en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre, en el marco del Plan de Gestión Social, teniendo en cuenta que, estas dependen del avance del área técnica en las provincias del Guavio, Oriente, Medina y Soacha.

A. Programa de Atención a la Comunidad:

A continuación, se relacionan las actividades de control y seguimiento realizadas durante el periodo reportado en el presente informe (de 1 al 30 de noviembre) relacionadas con el programa de atención a la comunidad:

Atención de PQRSD:

En el periodo reportado en el presente informe (1 al 30 de noviembre), no se radicaron PQRSD a través de los canales de atención del Punto SAU.

No obstante, se realizaron diferentes atenciones sin apertura de PQRSD.

Tabla 9. Atención de solicitudes ciudadanas – noviembre 2025

Atención de solicitudes – noviembre 2025				
Provincia del Guavio				
Municipio de Ubalá				
Medio	**Fecha**	**Solicitud**	**Fecha**	**Respuesta**
WhatsApp Grupo Ubalá	10 de noviembre	Solicitud Secretaría de Planeación – reunión de inicio: Información sobre la programación de la reunión que se encontraba pendiente (inicio No. 5)	17 de noviembre	Se determinó realizar una reunión virtual con la administración municipal el 12 de noviembre y el 19 de noviembre una reunión con recorrido en campo
WhatsApp Grupo Ubalá	18 de noviembre	Solicitud Secretaría de Planeación – Punto SAU: requerimiento para reinstalar del Punto SAU en Ubalá,	18 de noviembre	Se explicó por el Contratista y la Interventoría que contractualmente sólo aplica un Punto SAU por provincia.
Municipio de Junín				
Medio	**Fecha**	**Solicitud**	**Fecha**	**Respuesta**
WhatsApp Grupo Junín	2 de noviembre	Solicitud del señor Luis Acosta de información de las actividades realizadas el 1 de noviembre	2 de noviembre	El Contratista aclaró que se estaban realizando actividades para mejorar la vía provisionalmente para evitar accidentes durante la intervención
WhatsApp Grupo Junín	24 de noviembre	Señor Luis Acosta: inconformidad por presunto incumplimiento de la longitud de los tramos priorizados	25 de noviembre	El Contratista explicó lo adelantado hasta la fecha de respuesta, soportando la información con el acta del recorrido No. 2
Provincia de Oriente				
Municipio de Choachí				
Medio	**Fecha**	**Solicitud**	**Fecha**	**Respuesta**
WhatsApp Grupo Choachí	30 de octubre	Secretaría de Planeación: inquietudes por cambios en los frentes de obra	1 de noviembre	El Contratista explicó las razones del cambio de los frentes de obra a la funcionaria
WhatsApp Grupo Choachí	11 de noviembre	Javier Santiago: reportó la ruptura de una red de acueducto en la vereda La Caja	14 de noviembre	El Contratista contactó telefónicamente al peticionario confirmando que el daño fue arreglado, así lo corroboró la señora Sandra García quien envió evidencia de esto a través del grupo de WhatsApp
Provincia de Soacha				
Municipio de Sibaté				
Medio	**Fecha**	**Solicitud**	**Fecha**	**Respuesta**

Atención de solicitudes – noviembre 2025				
Correo electrónico del Punto SAU	27 de noviembre	Lenin Pescador: Información contractual y técnica	27 de noviembre	El Contratista remitió por el mismo medio la presentación proyectada en la reunión No. 4 del municipio de Sibaté, como respuesta a la solicitud

Fuente: elaboración propia

Para más detalle de las acciones realizadas y sus respectivos soportes: **ver Informe Social No. 8.**

Punto SAU

Durante el periodo reportado en el presente informe (1 al 30 de noviembre), se realizó la instalación de los Puntos SAU en las provincias del Guavio y Oriente, para el control y revisión de la atención presencial a la comunidad. De la siguiente manera:

Tabla 10. Puntos SAU – noviembre 2025

Puntos SAU – noviembre 2025			
Provincia	**Municipio**	**Dirección**	**Estado**
Guavio	Gachetá	Calle 5 # 4 – 20 piso 2	En proceso de revisión
Oriente	Choachí	Carrera 3 # 3 – 8	En proceso de revisión

Fuente: elaboración propia

Para más detalles de las gestiones realizadas durante el mes de noviembre relacionadas con los Puntos SAU **ver Informe Social No. 8.**

Buzones Satelitales:

Los buzones satelitales constituyen una estrategia para ampliar la cobertura de la atención a la comunidad, ya que se instalan en puntos estratégicos de los tramos de intervención, estos se componen de una cartelera con los datos del contrato y las piezas de divulgación vigentes, además de una caja donde las personas pueden radicar sus PQRSD.

A continuación, se relaciona una tabla – resumen de los buzones satelitales del mes de noviembre:

Tabla 11. Buzones satelitales – noviembre 2025.

Buzones satelitales – noviembre 2025			
Provincia	**Municipio**	**Lugar**	**Estado**
Guavio	Ubalá	Tienda "Donde Lucho" Inspección de Laguna Azul	Repuesto
		Vereda San Luis Sector La Primavera	Instalado
		Vereda San Antonio Sector Casa Rosada	Instalado
	Junín	Alcaldía de Junín	Instalado
		Campamento Sueva	Instalado
	Gama	Predio PR 0+000	Instalado
Oriente	Choachí	Predio PR 0+250	Instalado

Fuente: elaboración propia

Para conocer en detalle las gestiones y revisiones de los buzones satelitales Ver en el informe social No. 8.

B. Programa de información y divulgación

A continuación, se describen las actividades realizadas durante el periodo reportado en el presente informe (1 al 30 de noviembre) relacionadas con el Programa de Información y Divulgación por provincias:

Acciones de información:

En este apartado se describen las gestiones y acciones relacionadas con las reuniones participativas en las provincias del Guavio, Oriente, Medina y Soacha:

Reuniones preliminares:

Estas reuniones fueron requeridas por la Entidad con el fin de socializar a la comunidad, el objetivo de las fases I y II en cada uno de los municipios y presentar al equipo de trabajo, encargado por parte del ICCU, Interventoría y Contratista del proyecto "Caminos vecinales, caminos para quedarse" – Lote 1; no obstante, teniendo en cuenta que estas fases se encuentran a punto de terminar, se acordó entre las partes que no se realizarían más ya que quedarían obsoletas, por lo tanto, en los

municipios faltantes (Chipaque, Quetame, Fosca y Fomeque), se realizarán únicamente reuniones de inicio.

No obstante, se relaciona el estado y las gestiones realizadas durante el mes de noviembre en torno a las actas de las reuniones preliminares realizadas en los meses de junio, agosto y septiembre.

Tabla 12. Actas de las reuniones preliminares realizadas

Actas de las reuniones preliminares realizadas					
No.	**Fecha**	**Provincia**	**Municipio**	**Proceso**	**Estado**
1	11 de junio	Guavio	Ubalá – Junín - Gama	Enviado a los asistentes	Finalizado
2	19 de agosto	Medina	Paratebueno	Enviado a los asistentes	Finalizado
3	20 de agosto	Medina	Medina	Enviado a los asistentes	Finalizado
4	21 de agosto	Soacha	Sibaté	Enviado a los asistentes	Finalizado
5	4 de septiembre	Oriente	Choachí	Enviado a los asistentes	Finalizado

Fuente: elaboración propia

Dando por finalizadas las actividades y gestiones relacionadas con las reuniones preliminares para el proyecto.

Para conocer en detalle las gestiones y revisiones de los buzones satelitales Ver en el informe social No. 8.

Reuniones de inicio:

Las reuniones de inicio se realizan con el fin de informar a la comunidad, lideres comunitarios, entes y entidades territoriales acerca de la fase III del proyecto, es decir, del proceso de mejoramiento de la rasante de las vías terciaras, por lo tanto, se describen las trazabilidades, a continuación:

Tabla 13. Reuniones de inicio – noviembre 2025

Reuniones de inicio – noviembre 2025			
No.	**Fecha**	**Provincia**	**Municipio**
5	12 de noviembre	Guavio	Ubalá
	19 de noviembre		

Fuente: elaboración propia

Adicionalmente, se relaciona el estado de las actas de las reuniones de inicio realizadas en los meses de

Tabla 14. Actas de las reuniones de inicio realizadas

Actas de las reuniones inicio realizadas					
No.	**Fecha**	**Provincia**	**Municipio**	**Proceso**	**Estado**
1	29 de septiembre	Oriente	Choachí	Enviada a los asistentes	Finalizado
2	6 de octubre	Guavio	Junín	En revisión de la Interventoría	En proceso
3	21 de octubre	Guavio	Gama	En revisión de la Interventoría	En proceso
4	27 de octubre	Sibaté	Soacha	En revisión de la Interventoría	En proceso

Fuente: elaboración propia

Para mayor detalle ver **el Informe social No. 8.**

Reuniones extraordinarias:

Estas reuniones se realizan a solicitud de la comunidad, entes de control o entidades, con el fin de tratar temas de interés puntuales, relacionados con el proyecto en ejecución.

En ese sentido, durante el mes reportado se requirió la realización de la reunión extraordinaria No. 3, para el municipio de Ubalá, sin embargo, por temas logísticos esta se realizará en el mes de diciembre del 2025.

No obstante, se relaciona el estado del acta de la reunión extraordinaria No. 2 en el mes de noviembre.

Tabla 15. Acta reunión extraordinaria No. 2

Acta de la reunión extraordinaria No.2					
No.	**Fecha**	**Provincia**	**Municipio**	**Proceso**	**Estado**
2	31 de julio	Guavio	Ubalá	Enviada a los asistentes	Finalizado

Fuente: elaboración propia

Por lo que se dan por finalizadas las gestiones relacionadas con esta reunión. Para mayor detalle ver **el Informe social No. 8.**

Acciones de divulgación:

Elaboración y distribución de piezas de divulgación

En este ítem se relacionan los volantes y folletos diseñados y difundidos para informar a la comunidad:

Tabla 16. Estado de las piezas de divulgación– noviembre 2025

Estado de piezas de divulgación – noviembre 2025					
Provincia	**Municipio**	**Tipo/número**	**Objetivo**	**Fecha de difusión**	**Medios de difusión**
Guavio	Gama	Folleto No. 5	Notificación de inicio de actividades hidráulicas	27 de noviembre	WhatsApp
	Gama	Volante No. 15	Contratación de Mano de Obra No Calificada	N/A	No realizado
	Gama	Volante No. 16	Levantamiento de actas de vecindad	N/A	No realizado
	Ubalá	Volante No. 17	Invitación reunión de inicio No. 5	24 de noviembre	WhatsApp
	Junín	Volante No. 19	Invitación al comité de participación No. 2	N/A	No realizado
Oriente	Choachí	Volante No. 18	Invitación al comité de participación No. 1	24 de noviembre	WhatsApp
Soacha	Sibaté	Volante No. 13	Contratación de Mano de Obra No Calificada	12 de noviembre	WhatsApp
		Volante No. 14	Levantamiento de actas de vecindad	N/A	No realizado
		Folleto No. 6	Inicio de actividades de obra	27 de noviembre	WhatsApp

Fuente: Elaboración propia

Para mayor detalle ver **el Informe social No. 8.**

Elaboración de cartas personalizadas

Durante el periodo reportado en el presente informe se realizó la elaboración y distribución de cartas personalizadas, por lo tanto, se realizaron las gestiones en la provincia de Oriente, las cuales se describen a continuación:

Tabla 17. Estado de las cartas personalizadas – noviembre 2025

. Estado de las cartas personalizadas – noviembre 2025						
Provincia	**Municipio (s)**	**No.**	**Asunto**	**Destinatario**	**Medio de radicación**	**Fecha**
Guavio	Ubalá	33	Invitación a la reunión de inicio No. 5	Alcaldía municipal	Correo electrónico	11 de noviembre
	Ubalá	34	Invitación a la reunión de inicio No. 5	Secretaría de Planeación municipal	Correo electrónico	11 de noviembre
	Gama	35	Inicio de actividades hidráulicas	Alcaldía municipal	No se realizó	N/A
Soacha	Sibaté	36	Inicio de actividades de obra	Alcaldía municipal	No se realizó	N/A

Fuente: Elaboración propia

Para mayor detalle ver **el Informe social No. 8.**

Vallas informativas:

A continuación, se informan las gestiones realizadas durante el mes de noviembre con respecto a las vallas del proyecto:

Tabla 18. Estado de las vallas a la Entidad

Estado de las vallas		
Provincia	**Municipio**	**Estado**
Guavio	Ubalá	Instalada
	Junín	Instalada
	Gama	Pendiente instalación
Oriente	Choachí	Instalada
	Chipaque	Pendiente instalación
	Fomeque	Pendiente instalación
	Quetame	Pendiente instalación
	Fosca	Pendiente instalación
Medina	Medina	Pendiente solicitud del diseño.
	Paratebueno	Pendiente solicitud del diseño.
Soacha	Sibaté	Diseño solicitado a la Entidad

Fuente: Elaboración propia

Para mayor detalle ver **el Informe social No. 8.**

Grupos de WhatsApp:

A continuación, se relacionan los grupos de WhatsApp por municipio, que representan una estrategia de información y divulgación, efectiva para tener contacto con la comunidad:

Tabla 19. Estado de los grupos de WhatsApp

Estado de los grupos de WhatsApp		
Provincia	**Municipio**	**Estado**
Guavio	Ubalá	Creado
	Junín	Creado
	Gama	Creado
Oriente	Choachí	Creado
	Chipaque	Pendiente creación
	Fomeque	Pendiente creación
	Quetame	Pendiente creación
	Fosca	Pendiente creación
Medina	Medina	Pendiente creación
	Paratebueno	Pendiente creación
Soacha	Sibaté	Creado

Fuente: Elaboración propia

Para mayor detalle ver **el Informe social No. 8.**

C. Programa de manejo de infraestructura de predios y servicios públicos

En este ítem se describen las actividades realizadas desde el componente social relacionadas con la ejecución técnica del proyecto.

Actas de vecindad de inicio:

En este apartado se realiza la relación de las actas de vecindad aprobadas con corte al 30 de noviembre del 2025, en las provincias del Guavio, Oriente y Sibaté

PROVINCIA DEL GUAVIO:

Tabla 20. Estado del levantamiento de actas de vecindad – Municipio de Ubalá

Estado del levantamiento de actas de vecindad inicio Municipio de Ubalá			
Condición	**Previstas**	**Aprobadas**	**Faltantes**
Predios que se encuentran a 3 metros de la vía	23	23	0

Solicitud ciudadana	N/A	1	0
Entorno	5	0	5
Construcción de alcantarillas	11	0	11
Total	**39**	**24**	**16**

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21. Estado del levantamiento de actas de vecindad – Municipio de Junín

Estado del levantamiento de actas de vecindad inicio Municipio de Junín			
Condición	**Previstas**	**Aprobadas**	**Faltantes**
Predios que se encuentran a 3 metros de la vía	33	33	0
Solicitud ciudadana	N/A	N/A	N/A
Entorno	3	3	0
Construcción de alcantarillas*	4	2	2
Total	**40**	**38**	**2**

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. Estado del levantamiento de actas de vecindad – Municipio de Gama

Estado del levantamiento de actas de vecindad inicio Municipio de Gama			
Condición	**Previstas**	**Aprobadas**	**Faltantes**
Predios que se encuentran a 3 metros de la vía	25	0	25
Solicitud ciudadana	N/A	N/A	N/A
Entorno	2	2	0
Construcción de alcantarillas*	3	3	0
Total	**30**	**5**	**25**

Fuente: Elaboración propia

PROVINCIA DE ORIENTE:

Tabla 23. Estado del levantamiento de actas de vecindad – Municipio de Choachí

Estado del levantamiento de actas de vecindad inicio Municipio de Choachí			
Condición	**Previstas**	**Aprobadas**	**Faltantes**
Predios que se encuentran a 3 metros de la vía	51	51	0
Solicitud ciudadana	N/A	N/A	0
Entorno	8	7	1
Construcción de alcantarillas*	1	0	1
Total	60	58	2

Fuente: Elaboración propia

PROVINCIA DE SOACHA

Tabla 24. Estado de actas de vecindad para el municipio de Sibaté

Estado del levantamiento de actas de vecindad inicio Municipio de Sibaté			
Condición	**Previstas**	**Aprobadas**	**Faltantes**
Predios que se encuentran a 3 metros de la vía	13	13	0
Solicitud ciudadana	N/A	N/A	0
Entorno	2	2	0
Construcción de alcantarillas*	1	0	1
Total	**16**	**15**	**1**

Fuente: elaboración propia.

Para mayor detalle ver **el Informe social No. 8.**

D. Programa de cultura vial y participación ciudadana.

Cultura vial:

Dentro el periodo reportado en el presente informe (1 al 30 de noviembre) no se adelantaron actividades del programa de cultura vial.

Participación ciudadana:

A continuación, se relaciona el estado actual de los comités de participación ciudadana:

Tabla 25. Comités de Participación Ciudadana:

Comités de Participación Ciudadana		
Provincia	**Municipio**	**Cantidad de integrantes**
Guavio	Junín	4
	Gama	4
	Ubalá	7
Oriente	Choachí	6
Soacha	Sibaté	10

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, se realizó el comité de participación No. 1. para el municipio de Choachí el 28 de noviembre, en modalidad virtual, donde se contó con 1 asistente de la comunidad, a quien se le socializaron los avances del proyecto y se resolvieron inquietudes.

Para ampliar la información **Ver informe social No. 8**

E. Programa de contratación de mano de obra.

Mano de obra no calificada local:

De acuerdo con lo reportado por el Contratista se relacionan los datos de mano de obra no calificada en las provincias del Guavio, Oriente y Sibaté:

Tabla 26. Mano de obra no calificada – Provincia del Guavio

Mano de obra no calificada Provincia del Guavio	
Total, MONC	31
MONCL Ubalá	2
MONCL Junín	10
Porcentaje de cumplimiento	**39 %**

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27. Mano de obra no calificada – Provincia de Oriente

Mano de obra no calificada Provincia de Oriente	
Total, MONC	31
MONCL Choachí	10
Porcentaje de cumplimiento	**32 %**

Fuente: Elaboración propia

Tabla 28. Mano de obra no calificada – Provincia de Soacha

Mano de obra no calificada Provincia de Soacha	
Total, MONC	**31**
MONCL Soacha	**1**
Porcentaje de cumplimiento	**3 %**

Con lo anterior, el Contratista está dando cumplimiento a la Contratación de Mano de Obra No Calificada, teniendo en cuenta que el porcentaje requerido es del 30 % en el Guavio y en Oriente, no obstante, debido a que las contrataciones de Mano de Obra No Calificada para Sibaté se formalizaron para el 1 de diciembre, no se da cumplimiento durante el mes de noviembre en este municipio.

Paridad laboral:

De acuerdo con lo reportado por el Contratista se relacionan los datos de la vinculación de mujeres al proyecto:

Tabla 29. Paridad laboral

Paridad laboral	
Personal MONC	31
Mujeres	2
Porcentaje de cumplimiento	**6 %**

Fuente: Elaboración propia

Por lo anterior, se dio cumplimiento a lo requerido contractualmente, con un 6 %.

Los soportes y trazabilidades de las gestiones relacionadas con la vinculación de mano de obra no calificada local y paridad laboral se detallan el **informe social No. 8**

f. Reportes, seguimiento y coordinación del componente social

Durante el mes de noviembre se realizaron las siguientes gestiones de seguimiento:

Informes semanales del Contratista

A continuación, se relacionan los informes semanales reportados por el contratista durante el mes:

Tabla 30. Informes semanales del contratista

Informes semanales del contratista		
No.	**Fecha de envío**	**Periodo reportado**
19	4 de noviembre	27 de octubre al 2 de noviembre
20	8 de noviembre	1 al 8 de noviembre.
21	16 de noviembre	9 al 15 de noviembre
22	24 de noviembre	16 al 21 de noviembre

Fuente: Elaboración propia

Para ampliar la información ver el **informe social No. 7**

Mesas de trabajo – Componente social:

Las mesas de trabajo se realizan de manera semanal para llevar realizar control y seguimiento del componente social:

Tabla 31. **Mesas de trabajo**

Mesas de trabajo			
No.	**Fecha**	**Participantes**	**Estado de las actas**
30	10 de noviembre	Profesionales sociales del ICCU, Contratista e Interventoría	Firmada
31	14 de noviembre	Profesionales sociales del ICCU, Contratista e Interventoría	Firmada

Mesas de trabajo			
No.	**Fecha**	**Participantes**	**Estado de las actas**
32	21 de noviembre	Profesionales sociales del Contratista e Interventoría	Firmada
33	24 de noviembre	Profesionales sociales del Contratista e Interventoría	Firmada
34	28 de noviembre	Profesionales sociales del ICCU, Contratista e Interventoría	En construcción de la Interventoría

Fuente: Elaboración propia

3.2.6 Actividades ejecutadas en el mes componente SST

Durante el mes de noviembre se evidenció avance en las actividades programadas, por medio de los puntos de atención ciudadana se recopilan las hojas de vida del personal de la región, posteriormente se realizan entrevistas, de acuerdo con la información suministrada por cada uno de los participantes, se recopila y se realiza una mesa técnica, para revisar y tomar decisiones con relación a los perfiles de los candidatos.

Una vez seleccionado el personal se envía a los exámenes médicos para analizar su estado de salud, y una vez se tenga la respuesta se afilian a las 4 entidades EPS, ARL, CCF, AFP una vez la información esta efectuada se realiza la respectiva contratación.

Se continua con el proceso de inducción, entrega de elementos de protección y dotación alistamiento y recopilación de la documentación para radicación a la interventoría, una vez aprobado ingresa al proyecto.

3.2.6.1 Reportes ejecución mensual contrato de obra

3.2.6.1.1 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Se cuenta con el reporte que se entregó en el informe del mes de octubre donde se soportaba la siguiente maquinaria:

a. 1 recicladora Caterpillar
b. 1 motoniveladora Caterpillar
c. 1 vibro Compactador Atlas Cop Dynapac
d. 1 minicargador Caterpillar
e. 1 retroexcavadora New Holland
f. 1 minicargador New Holland
g. 1 tractor Deutz Fahr
h. 1 compactadora Hamm
i. 1 retroexcavadora Jcb
j. 4 estaciones De Topografía
k. 4 niveles
l. Camioneta
m. Volqueta
n. Dodge Carrotanque
o. camión Doble Cabina
p. Otros Elementos De Laboratorio

3.2.6.1.2 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A. Relación de personal del contratista

A continuación, se presenta la información correspondiente a las contrataciones directas y de subcontratistas realizadas por parte del CONSORCIO SOFAN C-

031. La base de datos de personal se encuentra en el Anexo 1. Listado del personal vinculado del Componente SST.

Tabla 32. Personal contratista

Nombre completo	Cargo	Fecha de ingreso
Wilson Gerardo Loaiza Galindo	Director de Obra	01/04/2025
Marcela Pinto Blanco	Residente SST	01/04/2025
Elizabeth Giovanna Daza Socarrás	Residente Ambiental	22/04/2025
Manuel Alexander Rojas Hernández	Residente Social	27/07/2025
Yesica Raigoso Díaz	Residente Técnico	01/04/2025
Carlos Daniel Tinoco Sopo	Residente Técnico	27/07/2025
Henry Augusto García Martínez	Director de Obra	15/09/2025
Kimberly Mendoza Morena	Residente social	15/09/2025
Edixon Eduardo Beltrán Calderón	Cadenero Primero	15/04/2025
Luis Jaime Cruz Molano	Conductor	01/04/2025
José Manuel Pérez	Almacenista	6/05/2025
Fanny Acosta Bejarano	Insp. SST – MA	12/05/2025
Juan José Orjuela Pava	Inspector Técnico	27/07/2025
Jorge Sánchez	Esp. de Pavimentos	01/04/2025
Armando Ruiz	Espe. de Geotecnia	01/04/2025
Darwin Gonzalo Moreno	Residente técnico	06/10/2025
Ginna Marcela Perilla	Administradora de proyectos	21/10/2025
Yensy Nicolas Medina	Cadenero 1	27/07/2025
Miller Giovanni Barriga Ramos	Conductor	02/07/2025
Oscar Mauricio Gómez	Conductor	02/07/2025
Yoseth Alfonso Salcedo Sierra	Operador Retroexcavadora	02/07/2025
Oscar Mauricio Gómez	Conductor	11/09/2025
Leidy Yohana Ruiz Ladino	Inspectora SST-MA	29/09/2025
Jhon Faber Romero	Inspector de Obra	29/09/2025

Nombre completo	Cargo	Fecha de ingreso
Oscar Andrés García Quevedo	Operador de Motoniveladora	29/09/2025
Luis Hernández Fandiño	Operador minicargador	01/10/2025
Juan Humberto Rodríguez	Almacenista Conductor	01/10/2025
José Darío Gómez	Operador Recicladora	01/10/2025
Héctor Pulido	Ayudante	01/10/2025
Wilmer Alberto Pulido	Ayudante	01/10/2025
Gabriel Ferney Raigoso	Ayudante	01/10/2025
Robinson Salcedo Pulido	Ayudante	01/10/2025
José Rubiel Sabogal Novoa	Ayudante	09/10/2025
Masedonio Barreto Pulido	Ayudante	18/10/2025
Belarmino Hortua Ríos	Ayudante	20/10/2025
Yilmer Estiven Martínez calderón	Operador de Tractor	07/10/2025
Yined Consuelo Castillo Acosta	Auxiliar de Trafico	09/10/2025
Oscar Alfredo Gómez	Ayudante	09/10/2025
Siervo Alfonso Castillo Acosta	Ayudante	09/10/2025
Nelson Andrés Urrego García	Ayudante	09/10/2025
Jonathan Alexander Urrego Obando	Ayudante	09/10/2025
Juan pablo Urrego acosta	Ayudante	09/10/2025
Andrés Esteban Urrego Obando	Ayudante	09/10/2025
Camilo Andrés Medellín Obando	Ayudante	09/10/2025
Edwin David Rodríguez Velásquez	Ayudante	09/10/2025
Yaid Ferney león	Ayudante	09/10/2025
Arturo Marroquín	Operador Recicladora	03/10/2025
Jorge Enrique Castro Pérez	Operador de Retroexcavadora	10/10/2025

Fuente: informe gerencial del contratista de obra

Tabla 33. Personal del Subcontratista – Jefferson Enrique Amézquita Picón

Nombre completo	Cargo	Fecha de ingreso
Carlos Mauricio Cifuentes Riaño	Topógrafo	09/04/2025
Fabian Camilo Rodríguez Escamilla	Cadenero Primero	15/05/2025
Cristian Iván García Medina	Dib. Cadenero 1ero	28/05/2025
Carlos Rafael Meza Alba	Cadenero Primero	27/07/2025
Nelson Echeverry Córdoba	Cadenero Primero	28/06/2025
Miguel Antonio Retavisca	Cadenero Segundo	28/06/2025
Jefferson Enrique Amézquita	topógrafo	30/07/2025

Fuente: informe gerencial del contratista de obra

Tabla 34. Personal del Subcontratista – Tecnisuelos Pavimentos y Concretos SAS

Nombre completo	Cargo	Fecha de ingreso
Camilo Andrés Pintor Torres	Laboratorista	01/04/2025
Wilson Efraín Pintor Bolívar	Laboratorista Inspector	01/04/2025
Luis Felipe Bermúdez Avendaño	Laboratorista	01/04/2025

Fuente: informe gerencial del contratista de obra

Tabla 35. Personal del Subcontratista – Urbanuz Construcciones

Nombre completo	Cargo	Fecha de ingreso
Ángelo Wilmer Hernández Herrera	Ayudante	13/05/2025
Héctor Pablo Morales Vega	Ayudante	19/05/2025
Wilson Manuel Castellanos Hernández	Ayudante	19/05/2025
Nacianseno Sánchez Zamora	Ayudante	6/02/2025
Rafael Moreno Yépez	Ayudante	17/08/2025
Yeison Ronald Garzón Muse	Ayudante	18/01/2025
Ambrosio Morera Beltrán	Ayudante	11/07/2025
Ramiro Morera Babativa	Ayudante	10/07/2025
José Israel Timón García	Ayudante	10/07/2025

Nombre completo	Cargo	Fecha de ingreso
Yeison Hernando González Herrera	Ayudante	10/07/2025
Cristian Yesid León Rodríguez	Ayudante	21/08/2025
Nelson Reinaldo Parra Muete	Ayudante	21/08/2025
Roberto Carlos Novoa Arrieta	Ayudante	26/08/2025
John Jairo Morera Diaz	Ayudante	03/09/2025

Fuente: informe gerencial del contratista de obra

Tabla 36. Personal Retirado

No	Nombre y apellidos	Cedula	Cargo	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Contratista / Empresa
1	Henry Otálora Silvestre	93.478.532	Operador de maquinaria	20/10/25	21/11/25	CONSORCIO SOFAN C-031
2	Orlando Amaya Quintero	19.869.313	Operador de vibro	1/10/25	15/11/25	CONSORCIO SOFAN C-031
3	Julián Alonso Vargas Cruz	1.024.472.708	AUX. SOCIAL	25/08/2025	25/11/25	CONSORCIO SOFAN C-031
4	Henry Augusto García Martínez	79.157.918	Director de obra	11/09/2025	15/11/2025	CONSORCIO SOFAN C-031
5	Karen Julieth Rodríguez García	1.068.972.251	Auxiliar de trafico	1/10/2025	3/11/2025	CONSORCIO SOFAN C-031
6	José Israel Timón García	1005824634	Ayudante	10/07/2025	30/11/2025	URBANUZ CONSTRUCCIONES
7	Nelson Reinaldo Parra Muete	3.215.869	Ayudante	21/08/2025	1/11/2025	URBANUZ CONSTRUCCIONES
8	Roberto Carlos Novoa Arrieta	1.049.347.801	Oficial de Obra	26/08/2025	1/11/2025	URBANUZ CONSTRUCCIONES
9	John Jairo Morera Díaz	1.079.034.566	Ayudante	2/09/2025	1/11/2025	URBANUZ CONSTRUCCIONES

Fuente: informe gerencial del contratista de obra

De acuerdo con las actividades de este periodo el contratista entrega la seguridad social que se encuentra en el anexo 2, Anexos Consorcio Sofán vinculado, Componente SST, del siguiente personal:

A. Consorcio Sofán
B. Sofán Ingeniero
C. Tecnisuelos y Pavimentos
D. Urbanuz Construcciones
E. Jefferson Amézquita
F. Jorge Sánchez (Especialistas).
G. Armando Ruiz (Especialista).
H. Jefferson Amézquita (Independiente).
I. Carlos Mauricio Cifuentes (Independiente)
J. Fiza SAS
K. Hugo Fernando Marroquín Escobar.
L. Jesús Buitrago (Rotativo)

4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

De acuerdo con la propuesta económica presentada por el Contratista de Obra, CONSORCIO SOFAN C-031, para el Lote 1, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU lo contrató por un valor total de **treinta y cinco mil trescientos cincuenta millones doscientos treinta y cinco mil doscientos veintiocho pesos ($35.350.235.228).**

Para el informe mensual el contratista reporta el valor ejecutado mensual de **Ochocientos ochenta y tres millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos veintiséis pesos con noventa y cinco centavos $ 883.188.426,95)** lo cual corresponde a las actividades de las fases I, II, Y III del proyecto durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025. Por lo tanto, se tiene un acumulado ejecutado de **Cuatro mil doscientos trece millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($ 4.213.946.944)** hasta la fecha.

Tabla 37. tabla de control presupuesto ejecutado semanal del contratista

		PROGRAMACION				EJECUCION				INDICADORES	
		TOTALES				TOTALES				VARIACION	IEP
No.	Fecha	SEMANA	ACUMULADO	CPTP(Millones)	% PROG.	SEMANA	ACUMULADO	CPTR (Millones)	% EJEC	% EJEC - % PROG.	CPTR/CPTP
semana 1	16/04/2025	$ 16.874.004,30	$ 16.874.004,30	$ 16,87	0,05%	$ 43.661.486,00	$ 43.661.486,00	$ 43,66	0,12%	0,08%	2,59
semana 2	25/04/2025	$ 71.111.875,23	$ 87.985.879,53	$ 87,99	0,25%	$ 61.611.208,17	$ 105.272.694,17	$ 105,27	0,30%	0,05%	1,20
semana 3	2/05/2025	$ 55.744.478,47	$ 143.730.357,99	$ 143,73	0,41%	$ 63.074.310,74	$ 168.347.004,91	$ 168,35	0,48%	0,07%	1,17
semana 4	9/05/2025	$ 157.338.037,49	$ 301.068.395,48	$ 301,07	0,85%	$ 296.404.548,09	$ 464.751.553,00	$ 464,75	1,31%	0,50%	1,54
semana 5	16/05/2025	$ 199.494.927,25	$ 500.563.322,73	$ 500,56	1,42%	$ 258.847.011,65	$ 723.598.564,65	$ 723,60	2,05%	0,69%	1,45
semana 6	23/05/2025	$ 166.745.415,42	$ 667.308.738,15	$ 667,31	1,89%	$ 125.990.876,85	$ 849.589.441,50	$ 849,59	2,40%	0,59%	1,27
semana 7	30/05/2025	$ 180.716.896,91	$ 848.025.635,07	$ 848,03	2,40%	$ 132.744.400,84	$ 982.333.842,34	$ 982,33	2,78%	0,46%	1,16
semana 8	6/06/2025	$ 281.338.648,42	$ 1.129.364.283,49	$ 1.129,36	3,19%	$ 41.478.569,23	$ 1.023.812.411,57	$ 1.023,81	2,90%	-0,21%	0,91
semana 9	13/06/2025	$ 260.487.774,16	$ 1.389.852.057,64	$ 1.389,85	3,93%	$ 98.562.080,84	$ 1.122.374.492,41	$ 1.122,37	3,18%	-0,76%	0,81
semana 10	20/06/2025	$ 332.536.623,38	$ 1.722.388.681,03	$ 1.722,39	4,87%	$ 56.953.759,79	$ 1.179.328.252,20	$ 1.179,33	3,34%	-1,54%	0,68
semana 11	27/06/2025	$ 373.544.117,98	$ 2.095.932.799,00	$ 2.095,93	5,93%	$ 67.837.316,00	$ 1.247.165.568,20	$ 1.247,17	3,53%	-2,40%	0,60
semana 12	4/07/2025	$ 371.397.703,56	$ 2.467.330.502,55	$ 2.467,33	6,98%	$ 70.586.372,53	$ 1.317.751.941,00	$ 1.317,75	3,73%	-3,25%	0,53
semana 13	11/07/2025	$ 344.598.744,22	$ 2.811.929.246,76	$ 2.811,93	7,95%	$ 47.542.714,44	$ 1.365.294.655,17	$ 1.365,29	3,86%	-4,09%	0,49
semana 14	18/07/2025	$ 759.387.682,03	$ 3.571.316.928,80	$ 3.571,32	10,10%	$ 79.717.426,83	$ 1.445.012.082,00	$ 1.445,01	4,09%	-6,01%	0,40
semana 15	25/07/2025	$ 822.872.298,22	$ 4.394.189.227,03	$ 4.394,19	12,43%	$ 48.635.647,25	$ 1.493.647.729,25	$ 1.493,65	4,23%	-8,21%	0,34
semana 16	1/08/2025	$ 906.147.843,12	$ 5.300.337.070,15	$ 5.300,34	14,99%	$ 33.661.131,13	$ 1.527.308.860,37	$ 1.527,31	4,32%	-10,67%	0,29
semana 17	8/08/2025	$ 972.953.608,32	$ 6.273.290.678,49	$ 6.273,29	17,75%	$ 64.246.379,65	$ 1.591.555.240,02	$ 1.591,56	4,50%	-13,24%	0,25
semana 18	15/08/2025	$ 800.147.227,63	$ 7.073.437.906,11	$ 7.073,44	20,01%	$ 83.876.846,14	$ 1.675.432.086,16	$ 1.675,43	4,74%	-15,27%	0,24
semana 19	22/08/2025	$ 1.073.638.193,85	$ 8.147.076.099,96	$ 8.147,08	23,05%	$ 36.751.440,51	$ 1.712.183.526,67	$ 1.712,18	4,84%	-18,20%	0,21
semana 20	29/08/2025	$ 982.196.191,80	$ 9.129.272.291,75	$ 9.129,27	25,83%	$ 186.400.993,55	$ 1.898.584.520,23	$ 1.898,58	5,37%	-20,45%	0,21
semana 21	5/09/2025	$ 773.270.563,77	$ 9.902.542.855,52	$ 9.902,54	28,01%	$ 217.151.381,08	$ 2.115.735.901,31	$ 2.115,74	5,99%	-22,03%	0,21
semana 22	12/09/2025	$ 897.933.564,08	$ 10.800.476.419,58	$ 10.800,48	30,55%	$ 68.010.756,69	$ 2.183.746.658,00	$ 2.183,75	6,18%	-24,38%	0,20
semana 23	19/09/2025	$ 788.401.131,34	$ 11.588.877.550,92	$ 11.588,88	32,78%	$ 113.514.921,41	$ 2.297.261.579,41	$ 2.297,26	6,50%	-26,28%	0,20
semana 24	26/09/2025	$ 937.875.310,87	$ 12.526.752.861,81	$ 12.526,75	35,44%	$ 18.968.806,68	$ 2.312.239.722,77	$ 2.312,24	6,54%	-28,90%	0,18
semana 25	3/10/2025	$ 1.317.898.987,44	$ 13.844.651.849,24	$ 13.844,65	39,16%	$ 61.512.509,36	$ 2.377.742.895,45	$ 2.377,74	6,73%	-32,44%	0,17
semana 26	10/10/2025	$ 1.403.736.117,44	$ 15.248.387.966,66	$ 15.248,39	43,14%	$ 197.820.608,50	$ 2.575.563.503,95	$ 2.575,56	7,29%	-35,85%	0,17
semana 27	17/10/2025	$ 920.647.732,67	$ 16.169.035.699,34	$ 16.169,04	45,74%	$ 294.380.229,06	$ 2.869.943.733,01	$ 2.869,94	8,12%	-37,62%	0,18
semana 28	24/10/2025	$ 1.097.811.581,30	$ 17.266.847.280,66	$ 17.266,85	48,85%	$ 148.436.361,71	$ 3.018.380.094,71	$ 3.018,38	8,54%	-40,31%	0,17
semana 29	31/10/2025	$ 1.151.330.177,87	$ 18.418.177.458,52	$ 18.418,18	52,10%	$ 312.378.422,28	$ 3.330.758.517,00	$ 3.330,76	9,42%	-42,68%	0,18
semana 30	7/11/2025	$ 1.136.926.999,56	$ 19.555.104.458,09	$ 19.555,10	55,32%	$ 161.428.539,06	$ 3.492.187.056,06	$ 3.492,19	9,88%	-45,44%	0,18
semana 31	14/11/2025	$ 988.441.084,52	$ 4.798.839.913,25	$ 4.798,84	13,58%	$ 363.269.475,94	$ 3.855.456.531,99	$ 3.855,46	10,91%	-2,67%	0,80
semana 32	21/11/2025	$ 867.199.990,19	$ 5.666.039.903,44	$ 5.666,04	16,03%	$ 198.054.852,15	$ 4.053.511.384,14	$ 4.053,51	11,47%	-4,56%	0,72
semana 33	28/11/2025	$ 960.834.740,83	$ 6.626.874.644,27	$ 6.626,87	18,75%	$ 160.435.559,80	$ 4.213.946.943,94	$ 4.213,95	11,92%	-6,83%	0,64
semana 34	5/12/2025	$ 1.354.839.595,00	$ 7.981.714.239,27	$ 7.981,71	22,58%						
semana 35	12/12/2025	$ 2.122.882.445,39	$ 10.104.596.684,66	$ 10.104,60	28,58%						
semana 36	19/12/2025	$ 2.134.666.289,64	$ 12.239.262.974,30	$ 12.239,26	34,62%						
semana 37	26/12/2025	$ 10.637.355.130,59	$ 22.876.618.104,89	$ 22.876,62	64,71%						
semana 38	31/12/2025	$ 11.458.227.243,37	$ 35.350.235.228,00	$ 35.350,24	100,00%						

Fuente: informe semanal 33

4.1 Estado General del Tiempo

La interventoría reporta el certificado de comportamiento de los días del mes conforme aparece en la base de datos de IDEAM, el cual cuenta con registro diario del estado general del tiempo de las estaciones pluviométricas que se encuentran activas cercanas a cada municipio de cada una de las provincias donde se ejecutan actividades. Esta información permite llevar un control detallado de las condiciones climáticas donde el contratista viene desarrollando actividades, de igual manera el contratista también lleva registro de novedad de lluvias mediante bitácora de obra, este registro es comparado con los reportes de información Hidrometeorológica de DHIME del IDEAM de los cuales la interventoría toma como referencia para verificar la información entregada por el contratista de obra.

A continuación, se detallan el valor de la precipitación mensual de cada provincia:

Tabla 38. Resumen precipitaciones mensual

Provincia	Precipitación (mm)
Guavio	83.4
Medina	145
Soacha	58.1
Oriente	62.2

Fuente: elaboración propia

4.2 Resumen Ensayos de Laboratorio

Se realizó la aprobación condicionada de los informes de caracterización geotécnica de los municipios de Choachí, Junín, Sibaté y Gama.


Actualmente se encuentran en aprobación condicionada el informe del municipio de Ubalá.

A. Provincia Oriente, Municipio de Choachí, Tramo El Rosario - La Caja - Chatasuga – La Llanada-Ferralarada -Barro Negro -Granadillo - Chivate -Resguardo Bajo


La metodología constructiva busca elevar las propiedades mecánicas de la capa granular remanente a través de la estabilización con cemento Portland (3%) y aditivos no tradicionales, principalmente PROES, recomendado como la opción más equilibrada en resistencia inicial, aunque con vulnerabilidad frente a la humedad.

Ilustración 1. Alternativas de estabilización-Choachí

- **Sector 1 K0+000 AL K3+445**

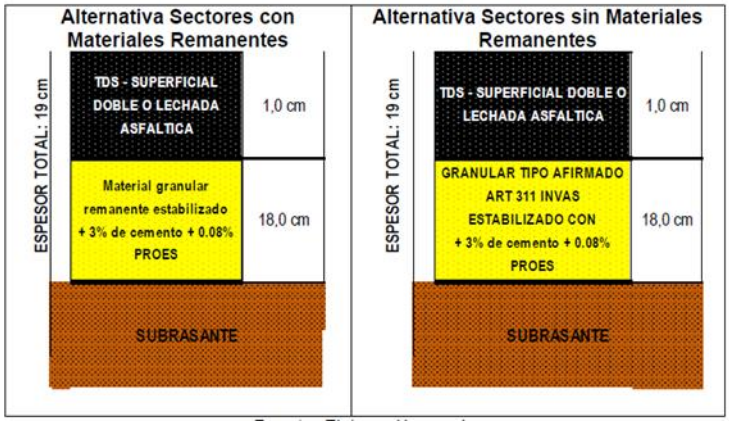


- **Sector 2 K3+445 AL K9+120**

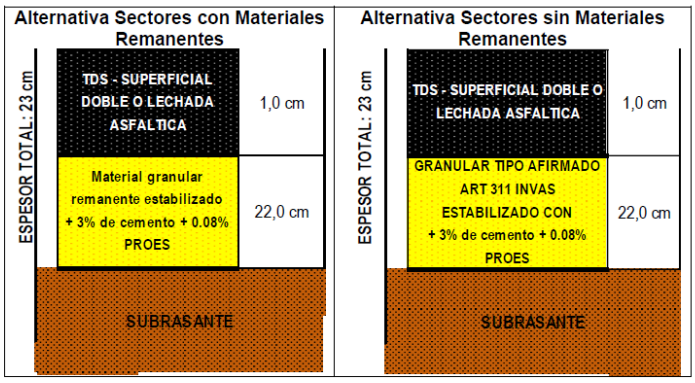

Fuente: informe técnico, consorcio Sofán

- **Sector 3 K9+120 AL K14+535**

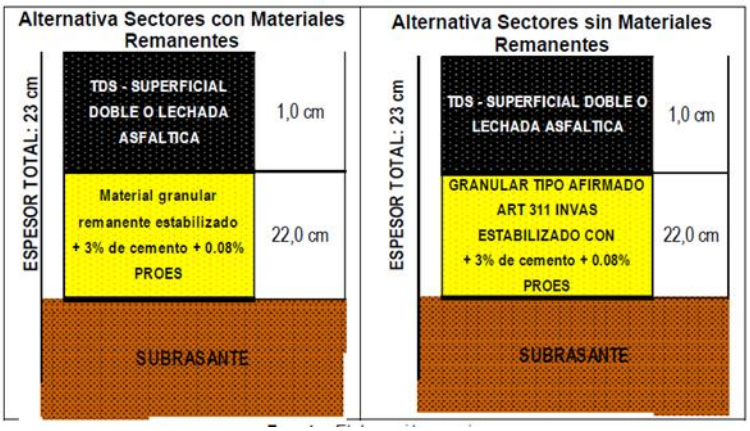

Fuente: informe técnico, consorcio Sofán


La información completa presentada por el contratista de obra fue radicada mediante el oficio **SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-226.** La interventoría emitió la aprobación condicionada a través del oficio **766-240** *Notificación Aprobación condicionada Informe de laboratorio municipio de Choachí y Junín- Respuesta oficio comunicación SOFAN- FOR-CO-03- ICCU031-226 y comunicación SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-229 respectivamente.*

B. Provincia Guavio, Municipio de Junín, Tramo Sueva - San Francisco- Valle Del Junín.


Se optó por estabilización con cemento portland + aditivos químicos no tradicionales (PROES®), evaluado mediante resistencia a compresión y ensayos de durabilidad.

Ilustración 2. Alternativas de estabilización-Junín

- Sector 1 K0+000 HASTA K1+690

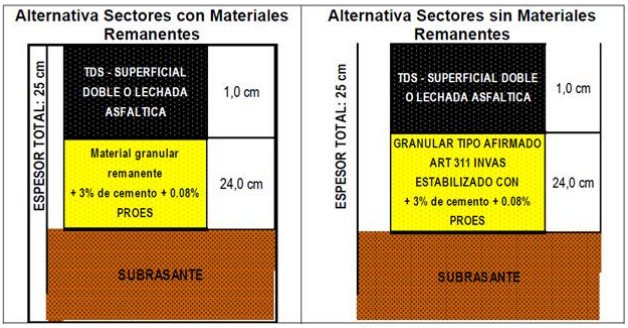


- Sector 2 K1+690 HASTA K3+310

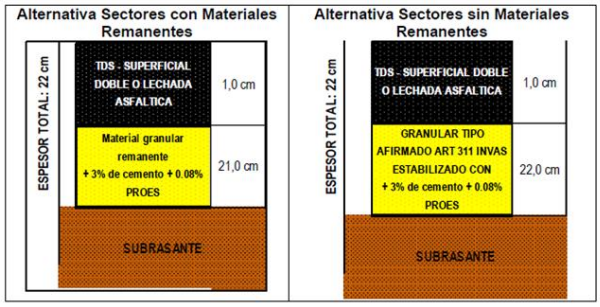


- Sector 3 K3+310 HASTA K6+280




- Sector 4 K6+280 HASTA K7+900

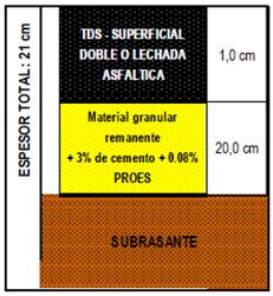


- Sector 5 K7+900 HASTA K9+250

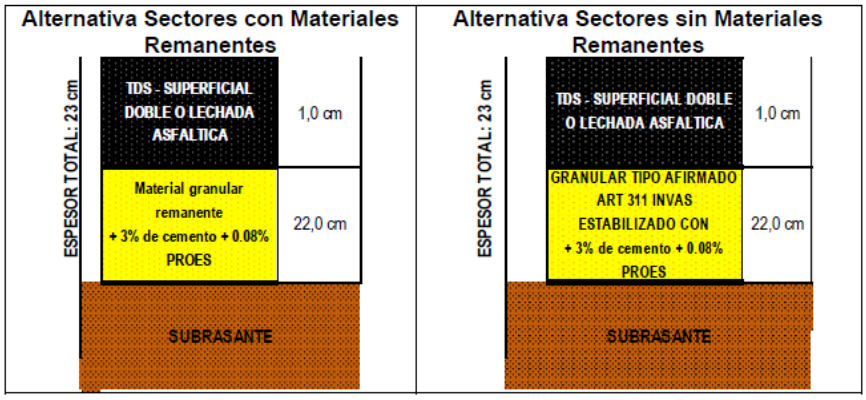

- Sector 6 K9+250 HASTA K12+370

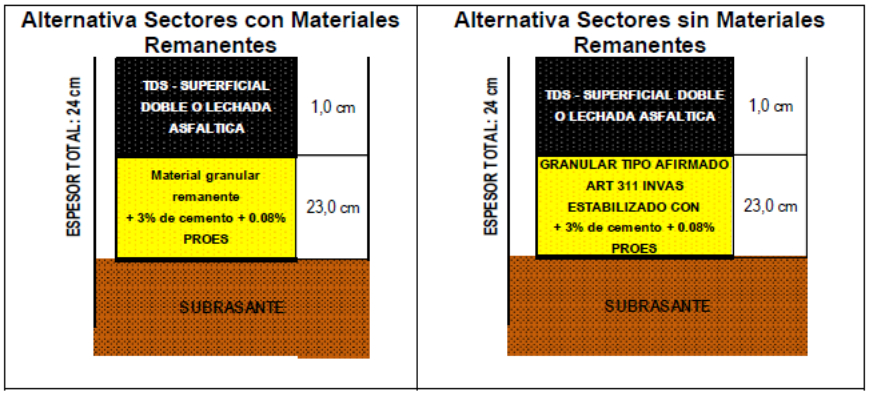

- Sector 7 K12+370 HASTA K15+700

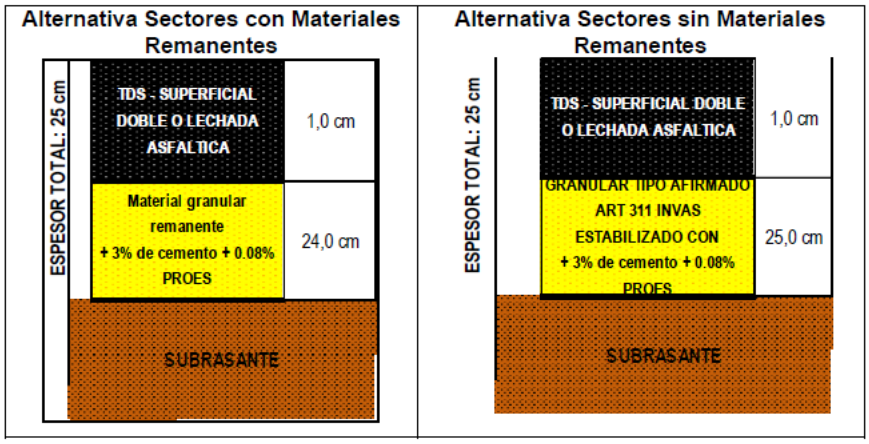

Fuente: informe técnico, consorcio Sofán

La información completa presentada por el contratista de obra fue radicada mediante el oficio **SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-226.** La interventoría emitió la aprobación condicionada a través del oficio **766-240** *Notificación Aprobación condicionada Informe de laboratorio municipio de Choachí y Junín- Respuesta oficio comunicación SOFAN- FOR-CO-03- ICCU031-226 y comunicación SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-229 respectivamente.*

C. Provincia Guavio, Municipio de Gama, Tramo Clemente – Palenque – Río Sucio.


Se optó por estabilización con cemento portland + aditivos químicos no tradicionales (PROES®), evaluado mediante resistencia a compresión y ensayos de durabilidad.

Los ensayos de laboratorio demuestran que la estabilización con cemento Portland + aditivos no tradicionales incrementa la resistencia a la compresión y la durabilidad frente a ciclos de humedecimiento-secado.


A continuación, se evidencia el resumen de las alternativas de intervención propuesta para cada uno de los sectores:

Ilustración 3. Alternativas de estabilización-Gama


- **SECTOR 1 K0+000 AL K0+600**

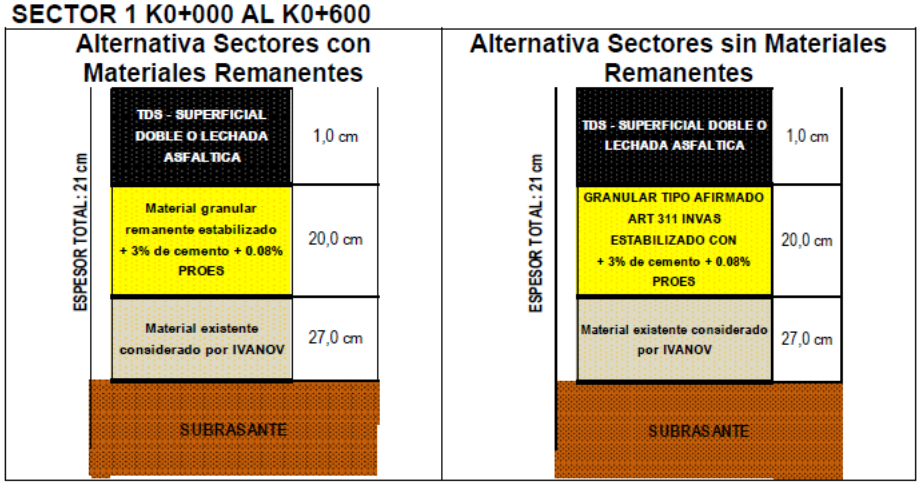


- **SECTOR 2 K0+600 AL K1+100**

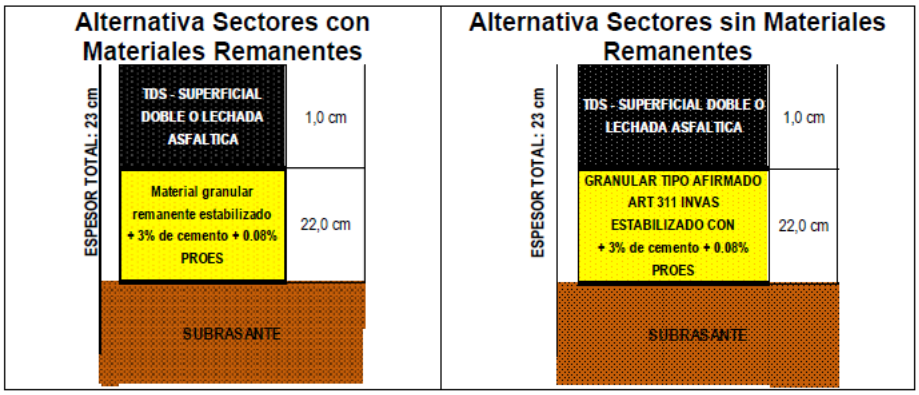


- **SECTOR 3 K1+100 AL K2+350**

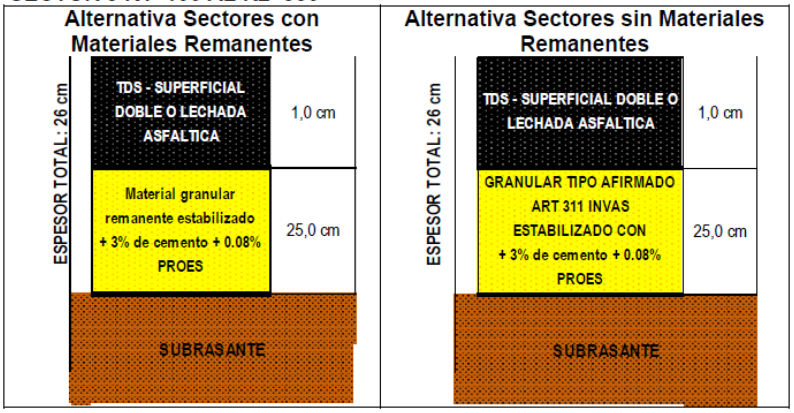


- **SECTOR 4 K2+350 AL K2+850**

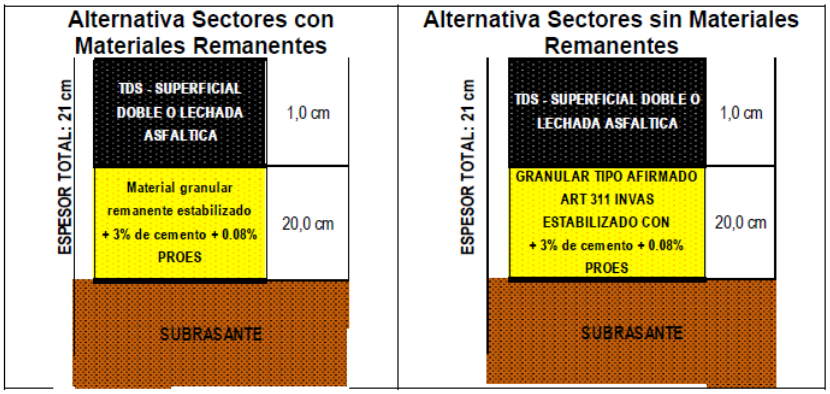


- **SECTOR 5 K2+850 AL K3+600**

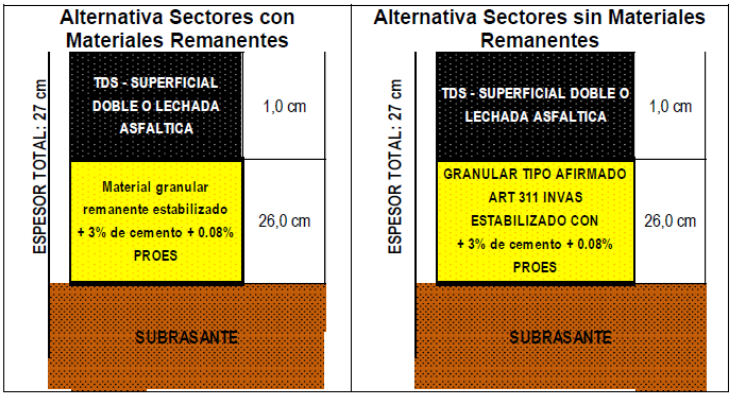

- **SECTOR 6 K3+600 AL K4+100**

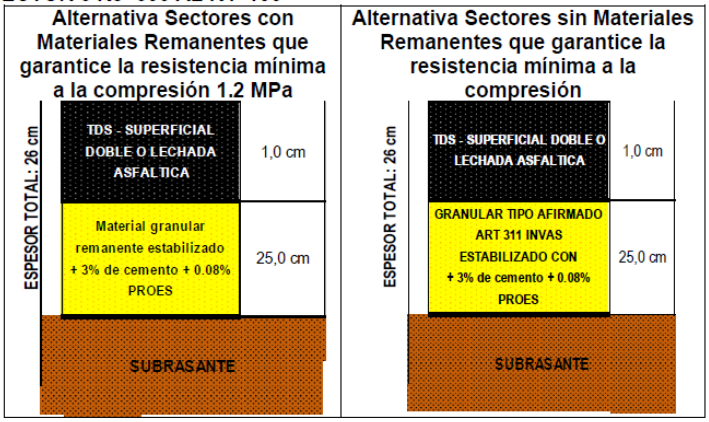

- **SECTOR 7 K4+100 AL K5+100**

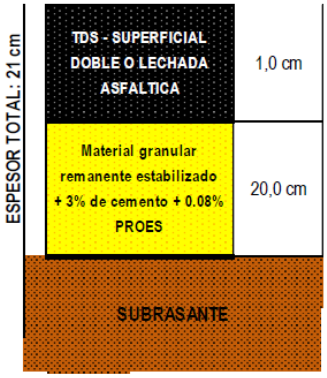

Fuente: informe técnico, consorcio Sofán


D. Provincia Soacha, Municipio de Sibaté, Tramo Vereda San Rafael – Vereda Alto Charco Sector Alto De La Virgen - Vereda La Unión.

La estabilización con cemento Portland al 3% combinado con el aditivo químico no tradicional PROESTECH (dosificación de 0.08%) demostró ser la alternativa más efectiva, alcanzando resistencias a la compresión inconfinada a 7 días de 0.78–0.98 MPa, cumpliendo con los requisitos mínimos de INVIAS en la mayoría de los sectores (2, 3 y 4). PROESTECH mostró un desempeño adecuado en durabilidad, con pérdidas de masa por cepillado (0.95%–6.44%) dentro de los límites establecidos (≤10% para A-2-6 y ≤14% para A-2-4), destacándose en los sectores 2, y 4. Sin embargo, en el Sector 1, la resistencia alcanzó solo 0.78 MPa, ligeramente por debajo del mínimo requerido de 1.2 MPa, lo que indica la necesidad de aumentar la dosificación de cemento Portland (al 4% o ajustar la proporción de PROESTECH para mejorar la resistencia a la compresión inconfinada y garantizar el cumplimiento de las especificaciones de INVIAS en este sector específico.


A continuación, se evidencia el resumen de las alternativas de intervención propuesta para cada uno de los sectores:

Ilustración 4. Alternativas de estabilización-Sibaté

- Sector 1 K0+000 HASTA K1+900, sector 3 K3+037 - K3+582(±250m)

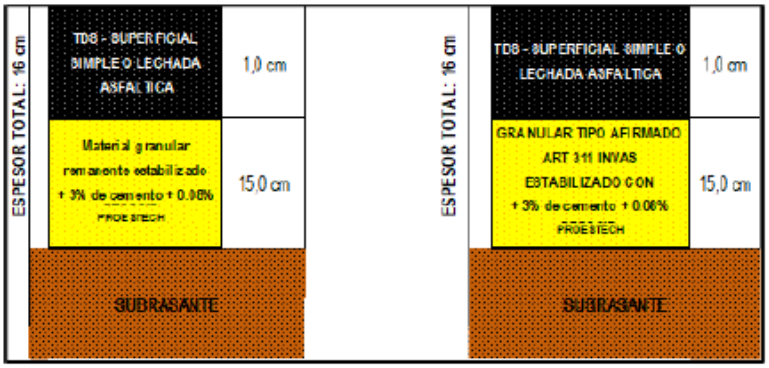

- Sector 2 K1+900 HASTA K3+037

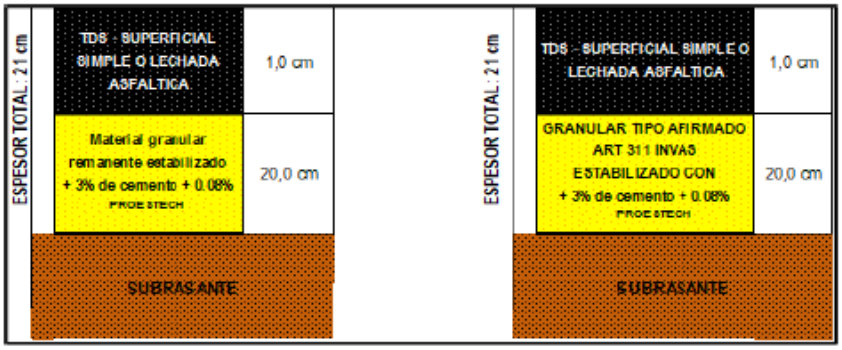


Fuente: informe técnico, consorcio Sofán

De acuerdo con el registro fotográfico del estado de los tramos 3 Y 4 y de las condiciones de mejoramiento actuales se presentan las siguientes alternativas para estos sectores:

Para las alternativas a proponer, es necesario se realizar reparaciones puntuales sello de fisuras y/o grietas existentes con la reparación de baches y/o parches existentes y la construcción y/o mejoramiento de cunetas en ambos costados, estabilizar taludes y bordes con vegetación.

ALTERNATIVAS 2 Tratamiento superficial + Rap reciclado (50%) + granular existente (50%)+ emulsión asfáltica + 2% cemento

Ilustración 5. Alternativas de estabilización-Sibaté

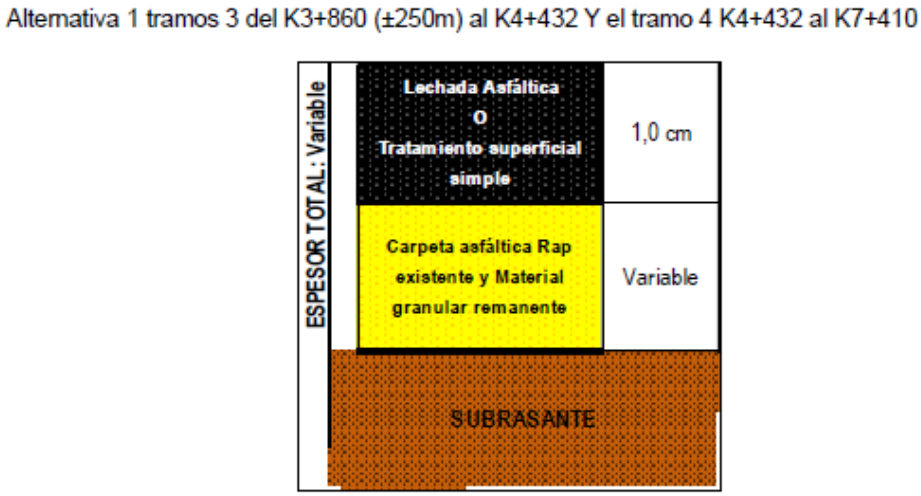

Fuente: informe técnico, consorcio Sofán

ALTERNATIVAS 2 Tratamiento superficial + Rap reciclado (50%) + granular existente (50%) + emulsión asfáltica + 2% cemento


Para esta alternativa, con los siguientes parámetros teóricos, se realizaron los cálculos para definir los espesores de material reciclado que se requiere como mejoramiento para darle vida útil al RAP existente, sin embargo, previo a su realización se debe hacer el diseño de dicha mezcla, adicional se debe adelantar reparación de baches y/o parches en las zonas con afectaciones a nivel estructural.

Ilustración 6. Alternativas de estabilización RAP-Sibaté

PARAMETROS MATERIAL RECICLADO DE RAP EXISTENTE (50%)+ GRANULAR EXISTENTE (50%)+EMULSIÓN ASFALTICA +CEMENTO(2%)		
TRANSITO DE DISEÑO		VALOR
Número de ejes equivalentes de 8.2 Ton		5,56E+02
PARAMETRO		VALOR
Confiabilidad	R	60%
Desviación normal estándar	Z_R	0,253
Error normal combinado	So	0,45
Serviciabilidad inicial	Po	4,2
Serviciabilidad final	Pt	2,2
Pérdida de serviciabilidad	ΔPSI	2,00
CBR Equivalente	(%)	Sector 1- 2.63% Sector 2- 3,28%
Modulo equivalente (MR)	(Kg/cm2)	Sector 1- 259 Sector 2- 304
MATERIAL RECICLADO DE RAP EXISTENTE (50%)+ GRANULAR EXISTENTE (50%)+EMULSIÓN ASFALTICA +CEMENTO(2%) (TEORICO)		
Coeficiente de aporte		0,2
Coeficiente de drenaje		0,9

Fuente: Elaboración propia

Alternativa 2 tramos 3 del K3+860 (±250m) al K4+432

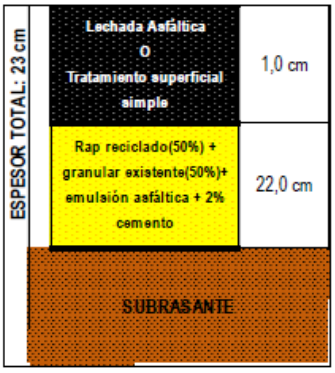

Fuente: informe técnico, consorcio Sofán

4.3 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Entre el **01 y el 30 de noviembre de 2025**, la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) presentado por el contratista, verificando que se esté implementando las acciones para el cumplimiento de los componentes implicados durante la ejecución de actividades del mes.

Dentro de las actividades ejecutadas se está dando cumplimiento a la ejecución de los procesos de construcción de la capa estabilizada de acuerdo a lo establecido en los informes de caracterización, haciéndose ensayos de humedad y densidad, antes

del proceso constructivo, y posterior a este, se realizan los controles de densidad y módulo de rigidez, como criterios de recibos de las secciones intervenidas.

Adicionalmente, se realiza el seguimiento a la calibración de equipos topográficos y certificados de calidad de los materiales pétreos y demás utilizados para la intervención de la rasante y alcantarillas.

Por otro lado, en el componente SST se realiza el seguimiento de la implementación de los PMT aprobados como se puede apreciar en el anexo técnico 3. Componente SST.

4.4 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)

La Interventoría realizó durante el periodo del presente informe el seguimiento al plan de gerencia del contratista, y teniendo en cuenta las líneas base del cronograma, presupuesto y alcance; se realizaron las siguientes actuaciones administrativas: 766-366 Requerimiento de información técnica conforme a oficio ICCU-I-2025-0014136; 766-367 Respuesta al oficio ICCU-S-2025-0007481 – Cumplimiento contractual y entrega de productos fases 1 y 2 – Contrato de obra ICCU-138-2025; 766-368 Observaciones desglose 6AIU V2-SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-354; 766-388 APREMIO DE INCUMPLIMIENTO GRAVE por no subsanación y entrega definitiva de productos topográficos del tramo Choachí (Fase I)-; 766-387 Respuesta comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-376 Observaciones de maquinaria; 766-397 Respuesta Oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-379-Respuesta al Oficio No. 766-275-ICCU – Requerimientos para inicio de intervenciones en Choachí y Junín; 766-399 Notificación Redistribución de actividades y actualización del Plan de Contingencia-Respuesta al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-394 –; 766-450 Observación sobre bajos rendimientos en estabilización de capa de afirmado por fallas en maquinaria y falta de materiales y operarios.

4.5 Otros documentos seguimiento mensual

4.5.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

La Interventoría realizó seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo presentado por el Contratista de Obra CONSORCIO SOFAN C-031, registrando la aprobación del Giro N° 5 del anticipo por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SITE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($995,267,441.00), aprobado mediante *766-436 Respuesta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-446 Aprobación Giro 5 Anticipo obra*.

En este sentido, la Interventoría continúa realizando un control detallado de la legalidad, trazabilidad y correcta aplicación de los recursos girados al Contratista, con el fin de garantizar que el anticipo se destine al cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos, emitiendo la aprobación de los informes de buen manejo del anticipo de los meses de julio, agosto y septiembre, mediante los oficios:

- 766-479 Aprobación informe No. 1 y No. 3 del buen manejo de anticipo de obra contrato ICCU-138-2025- RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-398 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-466
- 766-445 Aprobación informe de buen manejo del anticipo N° 2- Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-433-Respuesta a Observaciones Oficio 766-410 – Informe de Anticipo No. 2 y Observaciones informe N° 3-SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-445
- 766-551 Aprobación informe No.4 del buen manejo de anticipo de obra contrato ICCU-138-2025- RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-480

4.5.2 Seguimiento Programa de Inversión

Como se puede evidenciar en el anexo 5 de este informe integral, en el informe del buen manejo del anticipo N° 4 a corte del 31 de noviembre, se ha tramitado y aprobado un

total acumulado de $4,821,900,759,00 COP y un saldo pendiente de $ 5,294,599,602 COP, en la siguiente tabla se relacionan los giros ejecutados y los valores acumulados:

Tabla 39. Resumen giros den anticipo de obra

No.	Descripción del Ítem	Giro No. 1 (COP)	Giro No. 2 (COP)	Giro No. 3 (COP)	Giro No. 4 (COP)
1	Costo de mano de obra (personal directo e indirecto)	$ 783.192.365	—	$165.227.448	$14.213.994
2	Insumos y materiales	$ 801.498.636	—	$46.837.454	$915.934.875
3	Compra de maquinaria y equipos	$ 220.571.152	$1.362.621.635	—	$ 393,500,000
4	Repuestos para maquinaria y equipos	—	—	—	—
5	Transporte de materiales	—	—	$118.303.200	—
6	Contribución especial (5%)	—	—	—	—
Total General		**$ 1.805.262.153**	**$1.362.621.635**	**$330.368.102**	**$ 1,323,648,869**

Fuente: informe mensual inversión y buen manejo del anticipo N° 4

La interventoría ha realizado la revisión de la inversión de los giros realizados hasta el mes de octubre a partir del informe recibido del buen manejo del anticipo de obra N° 4, y sobre el cual se realizó el informe de buen manejo del anticipo de obra por parte de la interventoría y que se remiten en los anexos de este informe. En dicho informe se realiza el seguimiento de los giros anteriores que se encuentran en proceso de legalización por el procedimiento de emisión de facturas, o por agotamiento del rubro consignado por el contratista hacia sus proveedores.

4.5.3 Seguimiento Programa de Obra

En el Informe Semanal No.33 correspondiente a este período se registró el control de programación así:

Tabla 40. Avance físico del contrato

AVANCE FISICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	**% EJECUTADO HASTA LA FECHA**	**DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)**
Acumulado anterior	16,03%	11,47%	-4,56%
Durante el periodo	3,67%	0,45%	-3,22%
Acumulado Actual	18,75%	11,92%	-6,83%
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	234,00	33	-18,22

Fuente: informe semanal No. 33

Se registró un porcentaje de ejecución acumulado del 11.92% de acuerdo con la redistribución de actividades viabilizada a corte del 31 de diciembre. Es decir un porcentaje de avance del 2.5% durante el mes de noviembre. Esto se traduce en un porcentaje de retraso del 6.83%, por lo que la interventoría emitió comunicados para conminar al contratista a garantizar los 5 frentes de ejecución simultaneas en aras de mantener la línea base del cronograma.

La Interventoría para el avance físico y de inversión de las actividades de las Fases I, II y III del contrato de obra, presenta en este periodo reporte negativo respecto al seguimiento y control de la obra con base en la **PROGRAMACION GENERAL INTEGRAL DE OBRA V-1**, como resultado de las labores en ejecución que arrojan a la fecha un **Avance Ejecutado** de Obra del **11,92%** respecto al **18,75% Programado**; resultando en un retraso del 6,83%.

Este seguimiento es realizado con base en la redistribución de actividades viabilizadas mediante el oficio 766-391 Respuesta al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-394 – Redistribución de actividades y actualización del Plan de Contingencia del 10 de noviembre del 2025.

El contratista ha manifestado que el retraso debe a condiciones de afloramientos rocosos en algunos tramos del municipio de Junín, sin embargo, a la fecha del presente informe

no se evidencian 5 frentes de obra simultáneos como lo establece el anexo técnico del contrato ICCU-138-2025. Por tal motivo, se realizó llamado de atención mediante el oficio *766-450 Observación sobre bajos rendimientos en estabilización de capa de afirmado por fallas en maquinaria y falta de materiales y operarios*.

A continuación se presenta el avance financiero del contrato de obra ICCU-138-2025:

Tabla 41. Avance financiero de acuerdo con los capítulos de ejecución

No.	Indicadores	Valores (+AIU)	Porcentaje valor total del contrato	Diferencia (+) adelanto (-) atraso
1	valor acumulado programado	$ 6.626.874.644,27	**18,75%**	**-6,83%**
2	Valor acumulado ejecutado	$ 4.213.946.943,94	**11,92%**	

Fuente: Elaboración propia, interventoría

Con base en el criterio de valor ganado se reporta un retraso del 6.83% con respecto a la redistribución de actividades a corte del 31 de diciembre del 2025.

Tabla 42. Avance de actividades de obra por capítulos en ejecución

EDT	Descripción de la actividad	Avance de obra (% ejecutada inversión acumulada)		
		Por capitulo		Diferencia (+) adelanto (-) atraso
		Programado	Ejecutado	
0	**Redistribución de actividades**	**18,75%**	**11,92%**	**-6,83%**
A	fase 1 - caracterización	100,00%	99,54%	-0,46%
B	fase 2 - laboratorios	99,66%	97,89%	-1,77%
C	fase 3 - obra	12,21%	4,68%	-7,54%
D	componentes	0%	0%	0%

Fuente: elaboración propia, interventoría

5 Información contrato de interventoría

5.1 Información general del contrato de interventoría

Número del proceso de selección	ICCU-CM-050 de 2024.
Resolución de adjudicación del contrato No.:	099 de 2025.
No. CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y Fecha:	DIS- 2025000090 de lunes, 27 de enero de 2025.
No RP (Registro Presupuestal) y Fecha	RES- 000425 de lunes, 10 de marzo de 2025.
Número del contrato ICCU:	219 DE 2025.
Fecha de suscripción del contrato:	30 de marzo de 2025.
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Contratista:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC, NIT. 901.915.404 – 8, representado legalmente por **SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA** y conformado por: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC., con NIT.:901.915.404-8, con una participación del noventa por ciento (50%). CANJI DISEÑOS E INTERVENTORÍAS S.A.S., con NIT.:901.324.813-0, con una participación del noventa por ciento (50%).
Valor inicial:	$3.865.474.620,00 TRESMIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.
Adiciones:	NINGUNA.
Modificaciones:	Once (11) meses y quince (15) días o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra.
Aclaraciones:	NINGUNA.
Suspensiones:	NINGUNA.
Cesiones de participación contractual:	NINGUNA.
Plazo:	Once (11) meses y quince (15) días o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra.
Fecha de inicio:	9 de abril de 2025.
Fecha de terminación actual del contrato:	31 de diciembre de 2025.

Fuente: elaboración propia

5.2 Informe semanal

Durante el periodo mensual de Agosto la Interventoría envió al ICCU los Informes Semanales **No.30, No.31, No.32, y No.33** correspondientes a las semanas dentro de este período, cabe resaltar que todos los informes presentados a continuación fueron también presentados en formato Excel y contienen cada uno de los componentes de obra del contrato técnico, social, ambiental y salud y seguridad y un registro fotográfico detallado de cada una de las actividades realizadas cada semana, mediante el formato MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA. Estos son anexados en un paquete formato Excel y en PDF de la carpeta de componente técnico. Ver anexo 1.2 Informes semanales, dentro de la carpeta 1. Componente técnico de los anexos del informe mensual del mes de octubre.

5.3 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante este período la Interventoría realizaron las siguientes actividades:

- Se presentaron los informes semanales **No.30, No.31, No.32, y No.33** en las condiciones establecidas para la correcta ejecución de la interventoría.
- Se revisaron los informes de los meses de septiembre y octubre del contratista de obra y se solicitaron subsanaciones de estos, de igual manera se reiteró al contratista de las fechas de entrega a fin de que se puede gestionar el informe gerencia por parte de interventoría a la supervisión ICCU.
- Se asiste de manera presencial y/o virtual a las **reuniones programadas** dentro del desarrollo del contrato de interventoría, las cuales se realizan semanalmente los **miércoles o jueves**, con el fin de efectuar seguimiento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo al proyecto.

- Se otorgó aprobación condicionada al informe de caracterización geotécnica del municipio de Ubalá. Asimismo, se concedió aprobación total a los informes correspondientes a los municipios de Choachí, Sibaté, Gama y Junín. En cuanto a los informes asociados a la provincia de Medina, se encuentran actualmente en proceso de revisión por parte de la interventoría
- Se realizó aprobación para el trámite del giro N° 5 del anticipo y cobro del segundo y tercer 25% de la fase de caracterización del contratista de obra a través del comunicado *766-447 Certificación cumplimiento Aprobación pago actas N°2 y N° 3 de fase de la caracterización por el segundo y tercer 25% (1)*

5.4 Informes especialistas y profesionales

Durante el presente período, desde la interventoría se realizó la revisión de los informes de caracterización de los municipios de Chipaque (MT-2788-CM467-2025); Fomeque (MT-2775-CM467-2025), Gama (MT-2785-CM467-2025), Sibaté (MT-2796-CM467-2025) y Ubalá (MT-2784-CM467-2025).

5.5 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Se reporta una ejecución de ciento ochenta y cuatro millones ciento ochenta y un mil seiscientos cincuenta y cinco pesos cm/cte. ($ 184.181.655,00) en comparación con lo que se tenía establecido de acuerdo con el Programa Anual de Caja (PAC) presentado por la Interventoría, en el cual para el mes de noviembre se tenía establecido ejecutar ($ 364.955.745), sin tener en cuenta el veinte por ciento (20%) por amortización del anticipo.

Tabla 43. Diagrama anual de caja de la interventoría

	PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC									
MESES	**abr-25**	**may-25**	**jun-25**	**jul-25**	**ago-25**	**sep-25**	**oct-25**	**nov-25**	**dic-25**	**TOTAL**
COSTOS DE PERSONAL	$ 33.810.000	$ 129.996.000	$ 180.895.000	$ 340.929.000	$ 272.941.000	$ 260.900.500	$ 260.900.500	$ 260.900.500	$ 1.006.445.500	**$ 2.747.718.000**
OTROS COSTOS	$ 9.030.000	$ 27.900.000	$ 45.475.000	$ 60.360.000	$ 45.785.000	$ 45.785.000	$ 45.785.000	$ 45.785.000	$ 174.675.000	**$ 500.580.000**
SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 42.840.000	$ 157.896.000	$ 226.370.000	$ 401.289.000	$ 318.726.000	$ 306.685.500	$ 306.685.500	$ 306.685.500	$ 1.181.120.500	**$ 3.248.298.000**
IVA 19%	$ 8.139.600	$ 30.000.240	$ 43.010.300	$ 76.244.910	$ 60.557.940	$ 58.270.245	$ 58.270.245	$ 58.270.245	$ 224.412.895	**$ 617.176.620**
TOTAL VALOR DE LA INTERVENTORÍA	**$ 50.979.600**	**$ 187.896.240**	**$ 269.380.300**	**$ 477.533.910**	**$ 379.283.940**	**$ 364.955.745**	**$ 364.955.745**	**$ 364.955.745**	**$ 1.405.533.395**	**$ 3.865.474.620**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	**$ 10.195.920**	**$ 37.579.248**	**$ 53.876.060**	**$ 95.506.782**	**$ 75.856.788**	**$ 72.991.149**	**$ 72.991.149**	**$ 72.991.149**	**$ 281.106.679**	**$ 773.094.924**
TOTAL VALOR A PAGAR POR MES	**$ 40.783.680**	**$ 150.316.992**	**$ 215.504.240**	**$ 382.027.128**	**$ 303.427.152**	**$ 291.964.596**	**$ 291.964.596**	**$ 291.964.596**	**$ 1.124.426.716**	**$ 3.092.379.696**
									VALOR COBRADO A LA FECHA	**$ 813.878.604**
									VALOR POR FACTURAR	**$ 3.051.596.016**
									PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 3.865.474.620**

Fuente: elaboración propia, interventoría, formato Excel.

6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

A la fecha de este informe se mantiene la misma cantidad de vehículos y equipos utilizados para las actividades que debe ejecutar la interventoría para este periodo, de igual manera con los programas y aplicativos necesarios, estas se encuentran reportadas en el primer informe de interventoría.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

A continuación, se presenta la información correspondiente a las contrataciones directas y de subcontratistas realizadas por parte del Consorcio Intervención AC.

Tabla 44. Personal de la interventoría

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEDICACIÓN
Cristian Moreno Arias	Director de Obra	100%
Roberto Carlos López	Director de Obra	100%
Byron Aguirre Díaz	Ingeniero Residente Técnico	100%
Anderson Sierra	Ingeniero Residente Técnico	100%
Cristian Liñán	Profesional Ingeniero Apoyo	100%
Laura Peñuela	Residente Social	100%
Julieth Africano	Residente Social	100%
Cristian Camilo Silva	Residente Social	100%
Lady Johanna Jiménez	Residente Salud y Seguridad	100%
Hernán David Pantoja	Residente Salud y Seguridad	100%
Catherine Castellanos	Especialista Ambiental	100%
Helbert Casallas	Topógrafo	100%
Natalia Chasoy	Topógrafo	100%
Nelson Ávila	Cadenero 1	100%
Cristian Mancipe	Cadenero 2	100%
Esteban Barrera	Cadenero 3	100%

Marcela Aguilar	Cadenero 4	100%
Tania Jiménez	Cadenero 5	100%
Diana Casallas	Secretaria	100%
Juan Camilo Cruz	Inspector Vial	100%

Fuente: personal de interventoría informe componente SST

Tabla 45. Personal de interventoría-personales especialistas

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEDICACIÓN
Angela Salazar Herrera	Geotecnia	40%
Luis Felipe Morales	Geotecnia	40%
Oscar Javier Caballero Chaves	Geotecnia	40%
Daniel Vargas Rozo	Pavimentos	50%
Neymar Castaño Peláez	Pavimentos	50%
Néstor Bahos Canencio	Pavimentos	50%

Fuente: personal de interventoría informe componente SST

Tabla 46. Personal de interventoría - Retirado

Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha de Retiro
Jorge Sarmiento	Conductor	01/11/2025
Aura María Espinosa	Conductor	01/11/2025

Fuente: personal de interventoría informe componente SST

De acuerdo con las actividades de este periodo la Interventoría presenta la seguridad social que se encuentra en el anexo 2 SS Planilla dentro de la carpeta Anexos Informe N° 8 de la carpeta de la interventoría. Para este período no hubo retiro de personal por parte de la Interventoría de Obra. También se anexa Formato MS-GC-FR-013 herramienta de base revisión cálculo de seguridad social que se encuentra en la carpeta Anexo 3 cálculo del IBC vinculado.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

De acuerdo con la propuesta económica de la Interventoría de Obra el CONSORCIO INTERVENCIÓN AC para el LOTE 1 El ICCU la contrató por un valor de **tres mil ochocientos sesenta y cinco millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos ($3.865.474.620)**, para el presente Informe Mensual se reporta una ejecución ciento ochenta y cuatro millones ciento ochenta y un mil seiscientos cincuenta y cinco pesos cm/cte. ($ 184.181.655,00) de las actividades correspondientes a las Fases I, II y III que se desarrollaron durante el período del **primero (01) al treinta (30) de noviembre de 2025.** A continuación, se refleja el registro acumulado del total ejecutado por la interventoría.

Tabla 47. Valor acumulado de actividades ejecutadas por parte de la interventoría

No.	MES	VALOR
1	Abril	$ 70.693.378
2	Mayo	$ 110.773.530
3	Junio	$ 120.908.760
4	Julio	$ 138.042.975
5	Agosto	$ 151.180.575
6	Septiembre	$185.919.650
7	Octubre	$188.396.087
8	Noviembre	$ 184.181.655
	VALOR ACUMULADO	**$ 1.**179.697.265

Fuente: elaboración propia

Este valor acumulado correspondería a **veintiséis puntos cero nueve por ciento (26,09%)** de los recursos destinados para el contrato de interventoría.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A partir del acta de inicio firmada el **09 de abril de 2025**, se firmó acta de inicio del contrato de obra, a la fecha no se ha generado ninguna suspensión del contrato de obra. Dado el modificatorio N° 1 se actualizaron las pólizas del acta de inicio al anexo 3 de la póliza de responsabilidad civil extracontractual y póliza de cumplimiento de esta manera se anexa la actualización mencionada anteriormente. Ver anexo 1.3 Actas aprobación de pólizas

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría

Se realiza el control de calidad mediante la implementación de capacitaciones y charlas del componente ambiental y SST.

Para la fase III del contrato, se reportan los ensayos y contrastación de resultados de laboratorio para concretos e intervención de rasantes estabilizadas

6.6 Otros Documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

La Interventoría presentó El Plan de Inversión del anticipo mensualizado y fue aprobado por el ICCU, se recibió el desembolso del Anticipo inicial de la Interventoría. Los movimientos detallados de la utilización del anticipo controlando su saldo mensual y el reintegro de los rendimientos causados, el formato los rendimientos generados en el mes anterior al mes del informe, el Informe mensual de los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros, notificación de aplicación del pago expedidos por la Subgerencia Administrativa y Financiera del ICCU, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente

Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos serán entregados en conjunto con este informe.

6.7 Actas de Comité de Obra

Durante el periodo comprendido entre el **1 al 30 noviembre** se realizaron tres actas en campo, y se cumplió con las cuatro reuniones de seguimiento entre contratista, interventoría y la supervisión del ICCU a fin de revisar el avance de obra que se vienen ejecutando, estas fueron diligenciadas en el formato ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION. Ver anexo

- Acta de comité de obra fecha: 06-11-25
- Acta de comité de obra fecha: 13-11-25
- Acta de comité de obra fecha: 20-11-25
- Acta de comité de obra fecha: 26-11-25

Tanto las actas de comité de obra como las actas de reunión se encuentran en trámite de ser firmadas por los asistentes.

7 Conclusiones y recomendaciones

7.1 Conclusiones y recomendaciones área técnica

- ✓ Durante el periodo evaluado, se realizó una redistribución de las actividades relacionadas con la primera programación entregada por el contratista a fin de reducir los porcentajes de atraso y redistribuir las actividades en los días con los que cuenta el contrato a la fecha.
- ✓ El 26 de noviembre de 2025, el contratista de obra presentó por primera vez una solicitud de prórroga contractual, mediante el oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-456, hasta el 31 de julio del 2026. Dicha solicitud fue objeto de observaciones por parte de la interventoría; no obstante, a la fecha de emisión del presente informe, se encuentra pendiente la respuesta del contratista, así como la presentación de las subsanaciones requeridas.
- ✓ la cual fue aprobada por la interventoría evidenció un atraso del avance físico y financiero del proyecto, reflejado en un avance ejecutado del 9,42% frente al 51,10% programado, lo que representa un retraso acumulado del -42,68% respecto al cronograma establecido en la Programación General de Obra, este comportamiento responde principalmente a los retrasos que se vienen acumulando con respecto a la fase 3 del contrato de obra, y el bajo rendimiento que ha llevado al incumplimiento de los entregables de la fase I y II.
- ✓ La interventoría ha ejercido seguimiento permanente a la ejecución de la obra, dejando constancia de hallazgos y observaciones mediante actas y oficios con registros fotográfico. A la fecha de este informe el contratista tiene suspendidas las actividades en el municipio de Ubalá donde a la fecha quedo se realizó la construcción de 6 alcantarillas en el tramo de casa rosada a laguna azul y 1 alcantarilla de estas se encuentra en proceso de subsanación donde realizaran actividades de demolición y reconstrucción a inicios del próximo mes como quedo establecido en el acta N°24.

- ✓ La interventoría reitera que el cumplimiento estricto de especificaciones técnicas, normativas y contractuales es obligatorio y cualquier desviación compromete la estabilidad y funcionalidad de las obras.
- ✓ Se evidencia cumplimiento en los lineamientos generales de la interventoría, incluyendo control técnico, administrativo y documental del proyecto.
- ✓ Finalmente, la interventoría reitera la preocupación por los continuos incumplimientos en las entregas de los productos topográficos y documentos técnicos requeridos, los cuales han sido objeto de múltiples reprogramaciones sin evidencia de avances significativos. Se hace un llamado al contratista para fortalecer la planeación y el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos, especialmente en lo relacionado con las subsanaciones pendientes, la entrega de los informes geotécnicos y presupuestos preliminares, así como la presentación del análisis integral técnico, jurídico y financiero. El cumplimiento de estos requerimientos es fundamental para garantizar la adecuada ejecución de las actividades programadas y evitar afectaciones en el cronograma general del proyecto.

7.2 Conclusiones y recomendaciones área ambiental

- ✓ Durante el mes de octubre de 2025, se realiza recorrido inicial en el Municipio Junín y de igual forma en el Municipio de Choachí, esto con el fin de definir los lugares a intervenir, esto se da el día 10 de octubre en presencia del ICCU, Interventoría, Contratista y Comunidad.
- ✓ Adicionalmente en el trascurso del mes de octubre de 2025 se mantuvo la ejecución progresiva de las actividades del contrato de obra ICCU-CTO-138 de 2025, avanzando en las fases de diagnóstico, caracterización vial y obras de drenaje, desde el área técnica se trabaja en la definición de la metodología y la búsqueda de alternativas de estabilización.

- ✓ Se recomienda que el contratista realice recorridos previos al inicio de actividades constructivas para definir los tramites de permisos menores que se requieran en la zona de intervención.
- ✓ Se recomienda al contratista que el manejo de RCD generados en obra debe ser consultado con la supervisión y la interventoría para definir el destino de estos, ya que, no se puede entregar a terceros el 100% de estos RCD Fino no expansivos generados.

7.3 Conclusiones y recomendaciones área social

- ✓ Durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025, el componente social presentó avances sostenidos en el seguimiento, control y acompañamiento por parte de la Interventoría, evidenciándose la implementación de mecanismos de atención a la comunidad y espacios de articulación con actores locales; no obstante, se identifican oportunidades de mejora en la planeación y oportunidad de las actividades sociales por parte del Contratista.
- ✓ Los canales de atención a la comunidad (Punto SAU, buzones satelitales y medios virtuales) permitieron atender inquietudes y solicitudes ciudadanas de manera oportuna; sin embargo, se requiere fortalecer su difusión, verificación periódica y adecuada trazabilidad, a fin de garantizar su funcionamiento efectivo y permanente.
- ✓ El Plan de Gestión Social requiere ser actualizado y ajustado conforme a las observaciones realizadas por la Interventoría y la Entidad, asegurando que refleje de manera integral las actividades ejecutadas, los compromisos sociales adquiridos y la dinámica real del proyecto, en estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- ✓ Se evidencia la necesidad de mejorar la oportunidad y calidad en la entrega de insumos sociales (actas, presentaciones, piezas comunicativas y soportes), los cuales deberán remitirse dentro de los plazos establecidos, debidamente diligenciados en los formatos contractuales, para facilitar su revisión y aprobación.

- ✓ Es indispensable reforzar la trazabilidad y el soporte documental de todas las acciones del componente social, garantizando registros completos, verificables y coherentes que permitan el adecuado control, seguimiento y reporte ante la Interventoría y la Entidad.
- ✓ Se recomienda fortalecer la articulación entre el componente social y el componente técnico, con el fin de anticipar impactos sociales, mejorar la gestión de expectativas comunitarias y prevenir conflictos asociados al avance de obra.
- ✓ El Contratista deberá optimizar las estrategias de convocatoria y participación comunitaria, evaluando alternativas que permitan ampliar la asistencia y representatividad en los espacios de socialización, reduciendo el desgaste administrativo y fortaleciendo el control social.
- ✓ En general, se concluye que la gestión social avanza conforme a los lineamientos establecidos; sin embargo, resulta necesario reforzar la planeación, oportunidad, coordinación interna entre los componentes y cumplimiento contractual, con el fin de asegurar una ejecución social eficiente, transparente y alineada con los requerimientos del ICCU.

7.4 Conclusiones y recomendaciones área SST

- ✓ De acuerdo con las actividades desarrolladas en las Fases I Y II, se han implementado estrategias de autocuidado mediante la recopilación y análisis de la información, fortaleciendo la capacidad de integrar el bienestar y la seguridad los colaboradores. Estas acciones han permitido generar conciencia en cada uno de los frentes de trabajo y en todo el personal, manteniendo presente los riesgos y peligros inherentes a las actividades ejecutadas, así como aquellas situaciones que exceden los limites humanos.
- ✓ Los comportamientos seguros constituyen la base fundamental para la búsqueda de alternativas de prevención, orientadas a la mitigación de accidentes laborales y a la definición de soluciones sustentadas en la matriz de riesgos.

8 Anexos

8.2 Componente social

8.3 Componente SST

8.4 Componente Ambiental

8.5 Informes de buen manejo del anticipo de obra

8.6 Informe mensual integral del Contratista de obra

9 Registro fotográfico del avance de las obras.

Registro fotográfico componente técnico otras actividades realizadas
Municipio de Ubalá provincia Guavio

	
Demolición alcantarilla PR0+407	Reconstrucción alcantarilla PR0+407
Municipio de Junín provincia Guavio	
	
Retito de sobretamaños PR3+200	Escarificación PR 3+050
	
Homogenización PR3+100	Conformación con FAE PR3+000

	
Extendido de cemento PR2+800	Humectación de solidos PR 2+740
	
Terminado mejoramiento rasante PR3+740	Terminado mejoramiento rasante PR3+540
	
Limpieza de alcantarillas PR0+021	Limpieza de alcantarillas PR0+70
Municipio de Gama provincia Guavio	





Excavacion para alcantarilla PR3+890

Fuente: elaboración propia, interventoría

Registro fotográfico componente técnico otras actividades realizadas

Municipio de Choachí provincia del Oriente





Retiro material vejetal y barro de las cunetas





Escarificación





Retiro de sobre tamaños





Instalación de cemento





Reciclado de afirmado con cemento





Instalación de aditivo + agua





Ceréo





Compactación

Fuente: elaboración propia

Registro fotográfico componente social












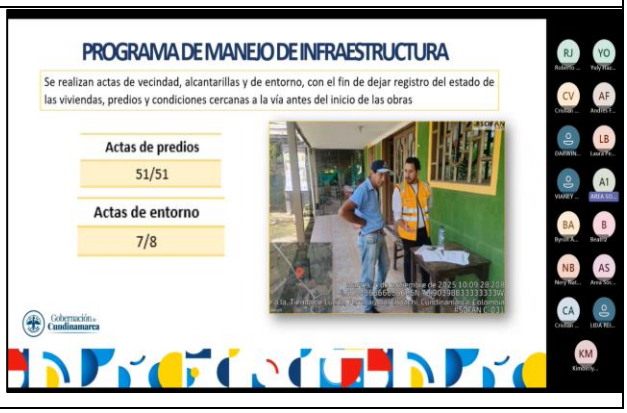

Fuente: elaboración propia, interventoría

Registro fotográfico de componente SST

	
Charla SST	Kit de emergencia
	
Validación PMT	Recorrido de obra

	
Entrega de dotación para invierno	Descargue de material
	
Charla SST	Charla SST

	
Validación de PMT	Punto ecológico
	
Validación de PMT	Pausas Activas
	
Charlas diarias sector de Junín	Orden y aseo

	
Inspección de botiquín	Inspección de extintor
	
Inspección de kit de derrames	Pausas Activas

Fuente: elaboración propia, interventoría

Registro fotográfico de componente ambiental GUAVIO	
JORNADAS DE ORDEN Y ASEO:	
	





VERIFICACION DE ACCESO AL CAMPAMENTO, ZONA DE ACOPIO Y SEGREGACION DE MATERIALES.









CAPACITACIONES E INDUCCIONES AMBIENTALES





ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS









PMT









UNIDAD SANITARIA CAMPAMENTO





INSPECCION CAMPAMENTO

	
Acopio temporal de materiales.	**Rotulación de sustancias Químicas.**
	
Instalación de movil a la maquinaria	**Señalización de herramietna manual**
	

Registro fotográfico de componente ambiental ORIENTE
JORNADAS DE ORDEN Y ASEO:





SEÑALIZACIÓN





CAPACITACIONES E INDUCCIONES AMBIENTALES









ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS












PMT

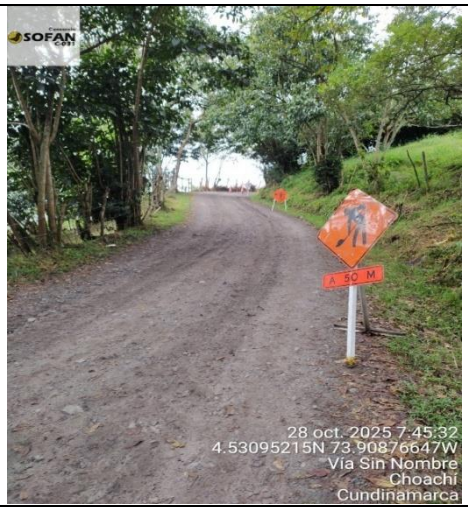

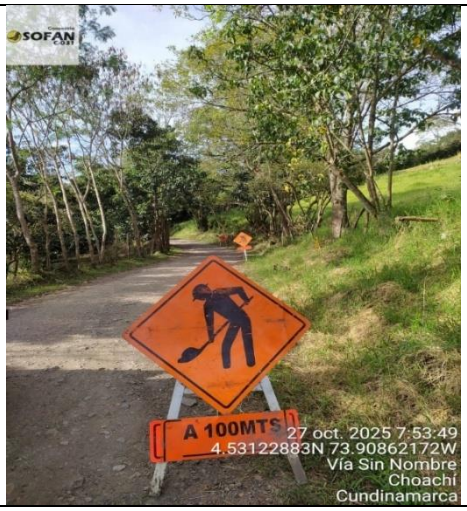

UNIDAD SANITARIA CAMPAMENTO

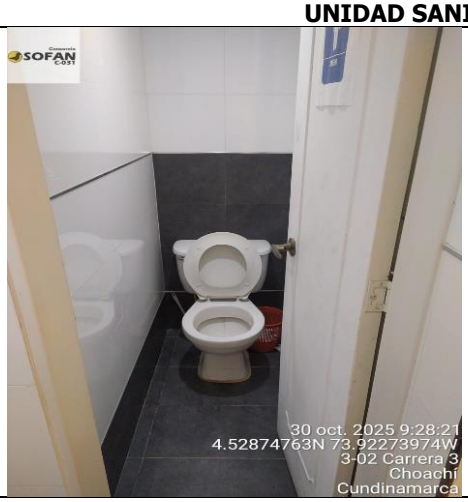



INSPECCION CAMPAMENTO

	
Acopio temporal de materiales.	**Acopio de materiales.**
	
Instalación de movil a la maquinaria	**Protección de sumidero.**
	

Fuente: elaboración propia, interventoría

9.1 Correspondencia

Se presenta el informe del Control de Correspondencia Recibida por la Interventoría durante el mes de octubre de 2025, en el cual se detallan las comunicaciones recibidas y las respectivas respuestas emitidas, atendiendo a su prioridad, pertinencia y oportunidad, conforme a los procedimientos establecidos:

Se presenta el Control de Correspondencia Recibida por la Interventoría en el mes de noviembre de 2025:

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITENTE	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-379	07/11/2025	Respuesta al Oficio No. 766-275-ICCU – Requerimientos para inicio de intervenciones en Choachí y Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-389	04/11/2025	Radicación Levantamiento Topográfico – Tramo Fómeque	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-392	04/11/2025	Respuesta al Oficio No. 766-334-ICCU – Observaciones Topografía Tramo Quetame – Yerbabuena hacia Fómeque	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-394	06/11/2025	Respuesta al Oficio No. 766-372 – Observaciones al Plan de Contingencia (Oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-384).	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-396	06/11/2025	Respuesta al Oficio No. 766-310-ICCU – Remisión Ítem NP1 suscrito y en archivo PDF – Provincia del Oriente	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-399	06/11/2025	Confirmación de atención integral a los Oficios No. 766-214, 766-361, 766-358, y 766-360 de la Interventoría – Plan de Contingencia, Reprogramación y Disponibilidad Operativa	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-400	06/11/2025	Respuesta aclaratoria al Oficio No. 766-383 – Aclaraciones al Procedimiento Constructivo del Sello de Arena-Asfalto (SAA – INV 432-	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITENTE	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
		22) según Oficio ICCU-I-2025-001463		
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-401	06/11/2025	Respuesta al Oficio No. 766-368-ICCU – Observaciones Desglose AIU V2	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-402	06/11/2025	Respuesta al Oficio No. 766-315-ICCU – Presupuesto Preliminar Tramo Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-403	07/11/2025	Respuesta observaciones punto a punto al comunicado MT-2748-CM467-2025	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-408	10/11/2025	Respuesta al Oficio No. 766-371 – Tipología y detalle constructivo de cuneta vial a implementar incluido el presupuesto.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-410	10/11/2025	Respuesta al Oficio No. 766-370-ICCU – Presupuesto Preliminar Tramo Sibaté	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-418	12/11/2025	Remisión de Informe Técnico – Identificación y exclusión de tramos críticos en los corredores Choachí y Sueva–Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-420	12/11/2025	Respuesta al Oficio No. 766-396-ICCU – Presupuesto Preliminar Tramo Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-421	12/11/2025	Respuesta al oficio 766-366. Con presupuesto actualizado - Tramo de Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-422	13/11/2025	Radicación Levantamiento de Capas – Tramo Choachí (Versión 3)	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-424	13/11/2025	Respuesta observaciones punto a punto al comunicado MT-2775-CM467-2025	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-425	13/11/2025	Respuesta al Oficio No. 766-369-ICCU – Presupuesto Preliminar Tramo Gama	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITENTE	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-426	13/11/2025	Respuesta al Oficio No. 766-263-ICCU – Presupuesto Preliminar Tramo Ubalá	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-427	14/11/2025	Respuesta observaciones punto a punto al comunicado MT-2788-CM467-2025	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-428	14/11/2025	Radicación Informe de Laboratorio – Tramo Fosca – Quinchita – Saname	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-429	14/11/2025	Radicación Informe Final – Tramo Humea – San Cristóbal – Gazatavena – San Luis del Retiro	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-431	14/11/2025	Radicación Informe Final – Tramo Buenavista – Altorredondo – Engaño	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-432	14/11/2025	Respuesta observaciones punto a punto al comunicado MT-2784-CM467-2025	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-433	14/11/2025	Respuesta a Observaciones Oficio 766-410 – Informe de Anticipo No. 2	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-434	14/11/2025	Radicación Informe Final – Tramo Quetame - Yerbabuena Hacia Fomeque	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-435	18/11/2025	Radicación de Acta de Costos General Consultoría No.2 ICCU-138-2025 - Segundo 25% Fase II	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-439	19/11/2025	Atención oficio 766-408 Observaciones Desglose Presupuesto PAGAS por provincia	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-441	20/11/2025	Radicación Levantamiento de Capas – Tramo Medina	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-443	20/11/2025	FOR-CO-03-443 Radicación de Acta de Costos General Consultoría No.3 ICCU-138-2025 - Tercer 25% Fase II	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITENTE	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-444	20/11/2025	Aclaración y solicitud de definición técnica definitiva – Tramo en intervención Municipio de Ubalá	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-445	20/11/2025	Radicación Informe de Seguimiento del Anticipo No. 3 – septiembre de 2025	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-449	21/11/2025	FOR-CO-03-449 Respuesta al Oficio 766-357 – Requerimientos al Contratista de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-450	21/11/2025	Respuesta al Oficio 766-384 – Observaciones Informe de Anticipo	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-455	24/11/2025	Atención a observaciones Informe mensual Ambiental N°6 septiembre 2025 Provincia Guavio- oficio 766-417	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-456	26/11/2025	Solicitud de prórroga del Contrato ICCU–CTO–138–2025 hasta el 31 de julio de 2026, con fundamento técnico, jurídico, administrativo y financiero	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-459	25/11/2025	Radicación Acta de Cobro de Obra N.º 1	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-460	25/11/2025	Respuesta al oficio 766-411 con Presupuesto Actualizado - Tramo de Sibaté	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-463	26/11/2025	Solicitud de revisión y aprobación del Ajuste del Plan de Inversión del Anticipo – Versión 3	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-465	28/11/2025	Respuesta observaciones punto a punto al comunicado MT-2792-CM467-2025.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-466	28/11/2025	Respuesta a observaciones Oficio 766-445 – Informe de Anticipo No. 3 (septiembre 2025)	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO

Se presenta el Control de Correspondencia Enviada por la Interventoría en el mes de noviembre de 2025:

COMUNICACIÓN		**ASUNTO**	**REMITIDO AL**	**FIRMADO**
CONSECUTIVO No.	**FECHA**			
766-321-ICCU	05/11/2025	Notificación Viabilidad alternativas Presupuesto Preliminar Choachí V8 y NP1 Sello Arena-Asfalto	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-365-ICCU	04/11/2025	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 26,27 y 28 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-219-2025	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-366-ICCU	04/11/2025	Requerimiento de información técnica conforme a oficio ICCU-I-2025-0014136	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-367-ICCU	05/11/2025	Respuesta al oficio ICCU-S-2025-0007481 – Cumplimiento contractual y entrega de productos fases 1 y 2 – Contrato de obra ICCU-138-2025	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-368-ICCU	04/11/2025	Observaciones desglose AIU V2-SOFAN- FOR-CO-03-ICCU0	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-369-ICCU	04/11/2025	Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-353-Respuesta al Oficio No. 766-319-ICCU – Presupuesto Preliminar Tramo Gama – Provincia del Guavio	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-370-ICCU	04/11/2025	Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-356-Radicación Presupuesto Preliminar – Tramo Sibaté	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-371-ICCU	05/11/2025	Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-373-Radicación de tipología y detalle de cuneta vial a implementar – Todos los tramos del proyecto	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-372-ICCU	04/11/2025	Observaciones Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-384-Complemento Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-363 Plan de Contingencia-Solicitud de reprogramación	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-373-ICCU	10/11/2025	REQUERIMIENTO SOBRE LA TOPOGRAFÍA (REPLANTEO,	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
		NIVELACIÓN y ABSCISADO) TRAMO CHOACHÍ		MORENO ARIAS
766-374-ICCU	04/11/2025	Observaciones informes de caracterización Fómeque-Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-358 Radicación Informe de Resultados de Laboratorio – Tramo Fómeque	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-375-ICCU	04/11/2025	Reiteración solicitud de maquinaria en Respuesta al oficio SOFAN-FOR-CO- 03-ICCU031-361 Respuesta al oficio No. 766-311 y 329	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-376-ICCU	04/11/2025	Respuesta al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-369 Radicación de acta, informando tramos que ejecutar por veredas, conciliados con los presidentes de las JAC – Tramo JUNIN	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-377-ICCU	05/11/2025	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 29 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-219-2025	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-378-ICCU	05/11/2025	Respuesta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-386 aprobación actas de vecindad entrega 5- municipios de Choachí y Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-379-ICCU	05/11/2025	APROBACIÓN CONDICIONADA PARA LA APERTURA DE ATENCIÓN EN EL PUNTO SAU – PROVINCIA DE ORIENTE	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-380-ICCU	05/11/2025	Respuesta Comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-332 observaciones maquinaria Municipio de Junín.	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-381-ICCU	05/11/2025	RESPUESTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-392 Radicación Topografía – Tramo Quetame y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-389 Topografía Tramo Fómeque	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-382-ICCU	05/11/2025	Respuesta al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-366 Radicación de acta, informando tramos que ejecutar por veredas, conciliados con los presidentes de las JAC –Tramo Choachí.	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
766-383-ICCU	06/11/2025	Aclaraciones del procedimiento constructivo del sello de arena-asfalto según oficio-ICCU-I-2025-0014638	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-384-ICCU	06/11/2025	Observaciones sobre el informe de buen manejo del anticipo- Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-383	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-385-ICCU	06/11/2025	RESPUESTA AL OFICIO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-351 - DESGLOSE PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-386-ICCU	06/11/2025	Notificación Viabilidad DESGLOSE PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-387-ICCU	07/11/2025	Respuesta Comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-376 observaciones maquinaria Municipio de Junín.	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-388-ICCU	10/11/2025	APREMIO DE INCUMPLIMIENTO GRAVE por no subsanación y entrega definitiva de productos topográficos del tramo Choachí (Fase I)-RESPUESTA SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-385 TOPOGRAFÍA CHOACHÍ	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-389-ICCU	10/11/2025	Observaciones Informe Diseño de Estabilización y Estructura de Pavimento Provincia del Guavio Tramo – Clemente-Palenque-Río Sucio – Gama En Versión 4-Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-381, Radicación Informe de Resultados de Laboratorio – Tramo Gama.	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-390-ICCU	10/11/2025	Aprobación condicionada informe diseño de estabilización y estructura de pavimento provincia del Guavio tramo – Casa Rosada-San Luis – Ubalá en versión 4-Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-378	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-391-ICCU	10/11/2025	Respuesta al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-394 – Redistribución de actividades y actualización del Plan de Contingencia y Respuesta Oficio SOFANFOR-CO-03-ICCU031-399	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
766-392-ICCU	10/11/2025	Alcance oficio 766-310– Viabilidad NP1 Sello Arena-Asfalto- Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-396-Respuesta al Oficio No. 766-310-ICCU – Remisión Ítem NP1 suscrito y en archivo PDF – Provincia del Oriente	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-393-ICCU	10/11/2025	RESPUESTA A SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-404 GEOPOSICIONAMIENTO GNSS MEDINA	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-394-ICCU	10/11/2025	Validación y Aceptación de Aclaraciones al Procedimiento Constructivo del Sello de Arena-Asfalto (SAA - INV 432-22)	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-395-ICCU	10/11/2025	Validación y Viabilidad Técnica y Financiera del Desglose del AIU (31.5%) V3 para el Contrato ICCU-CTO-138-2025	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-396-ICCU	10/11/2025	Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-402-Respuesta al Oficio No. 766-315-ICCU – Presupuesto Preliminar Tramo Junín v4	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-397-ICCU	10/11/2025	Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-379-Respuesta al Oficio No. 766-275-ICCU – Requerimientos para inicio de intervenciones en Choachí y Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-398-ICCU	20/11/2025	Atención AUTO DE TRAMITE – Proceso presunto incumplimiento contrato de obra 138 de 2025 de fecha 11 de noviembre de 2025.	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-399-ICCU	10/11/2025	Notificación Redistribución de actividades y actualización del Plan de Contingencia-Respuesta al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-394	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-400-ICCU	10/11/2025	Notificación Validación y Aceptación de Aclaraciones al Procedimiento Constructivo del Sello de Arena-Asfalto (SAA - INV 432-22)	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-401-ICCU	11/11/2025	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 30 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-219-2025	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
766-402-ICCU	11/11/2025	Segunda revisión, observaciones informe mensual N°6 correspondiente al mes de septiembre.	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-403-ICCU	11/11/2025	Observaciones comunicación SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-380, Radicación Informe de Resultados de Laboratorio – Tramo Chipaque	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-404-ICCU	11/11/2025	RESPUESTA A SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-409 GEOPOSICIONAMIENTO GNSS PARATEBUENO	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-405-ICCU	11/11/2025	Observaciones situación presentada alcantarilla PR1+670, provincia Guavio, municipio de Junín, tramo suevo – Junín, vereda san Francisco.	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-406-ICCU	11/11/2025	Análisis de resultados reportados por el contratista de obra a la fecha de resistencia del concreto del municipio de Ubalá, provincia Guavio-oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-405.	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-407-ICCU	19/11/2025	Observaciones informe mensual N°7 correspondiente al mes de octubre	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-408-ICCU	11/11/2025	RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-352. Desglose Presupuesto PAGAS por provincia	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-409-ICCU	12/11/2025	Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-408-Respuesta al Oficio No. 766-371-Tipología y detalle constructivo de cuneta vial a implementar incluido el presupuesto	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-410-ICCU	12/11/2025	Rta. SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-417 Observaciones informe Anticipo N° 2	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-411-ICCU	13/11/2025	Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-410-Respuesta al Oficio No. 766-370-ICCU – Presupuesto Preliminar Tramo Sibaté	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-412-ICCU	14/11/2025	Aprobación informe de caracterización Sibaté-SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-403-Respuesta observaciones punto a	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
		punto al comunicado MT-2748-CM467-2025		LÓPEZ JULIO
766-413-ICCU	14/11/2025	Notificación Aprobación informe de caracterización Sibaté-SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-403-Respuesta observaciones punto a punto al comunicado MT-2748-CM467-2025	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-414-ICCU	18/11/2025	Observaciones SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-382-Comportamiento de la resistencia a la compresión inconfinada	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-415-ICCU	18/11/2025	Presupuesto definitivo municipio de Junín-Rta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-420-Respuesta al Oficio No. 766-396-ICCU – Presupuesto Preliminar Tramo Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-416-ICCU	18/11/2025	Notificación Viabilidad Presupuesto definitivo municipio de Junín-Rta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-420-Respuesta al Oficio No. 766-396-ICCU – Presupuesto Preliminar Tramo Junín	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-417-ICCU	24/11/2025	Tercera revisión, observaciones informe mensual N°6 correspondiente al mes de septiembre	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-418-ICCU	19/11/2025	Presupuesto definitivo municipio de Choachí-Rta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-421-Respuesta al oficio 766-366. Con presupuesto actualizado - Tramo de Choachí.	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-419-ICCU	19/11/2025	Notificación viabilidad Presupuesto definitivo municipio de Choachí-Rta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-421-Respuesta al oficio 766-366. Con presupuesto actualizado - Tramo de Choachí	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-420-ICCU	19/11/2025	RESPUESTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-422 RADICACIÓN INFORME TOPOGRAFÍA – TRAMO CHOACHÍ	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-421-ICCU	19/11/2025	Aprobación informe de caracterización Gama-SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-423-Respuesta observaciones punto a	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
		punto al comunicado MT-2785-CM467-2025		
766-422-ICCU	19/11/2025	Notificación Aprobación informe de caracterización Gama-SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-423- Respuesta observaciones punto a punto al comunicado MT-2785-CM467-2025	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-423-ICCU	19/11/2025	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 31 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-219-2025	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-424-ICCU	19/11/2025	Respuesta Comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-412 y 413. Subsanación ingreso de maquinaria Junín.	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-425-ICCU	19/11/2025	Solicitud de atención a observaciones del Tramo 1 – K0+000 a K0+130 y del Tramo 2 - K0+940 a K1+700 y el tramo 3 PR1+882 a PR2+350 Sueva – Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-426-ICCU	19/11/2025	RESPUESTA COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-387-SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE PERSONAL JUNIN	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-427-ICCU	19/11/2025	RESPUESTA COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-388-SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE PERSONAL CHOACHI.	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-428-ICCU	19/11/2025	APROBACIÓN DEL PUNTO SAU – PROVINCIA DEL GUAVIO.	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-429-ICCU	19/11/2025	RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-407 APROBACIÓN PUNTO SAU – PROVINCIA DE ORIENTE	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-430-ICCU	20/11/2025	Actualización Entregables aprobados y en revisión de la Fase I y Fase II del contrato ICCU-138-2025	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-431-ICCU	20/11/2025	Presupuesto definitivo Gama- RTA Oficio-SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-425- Respuesta al Oficio No. 766-369-ICCU – Presupuesto Preliminar Tramo Gama	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
766-432-ICCU	20/11/2025	Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-437 ORDEN DE GIRO No. 5 Anticipo Contrato de obra ICCU-138-2025	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-433-ICCU	21/11/2025	Notificación Viabilidad Presupuesto definitivo Gama- RTA Oficio-SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-425- Respuesta al Oficio No. 766-369-ICCU – Presupuesto Preliminar Tramo Gama	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-434-ICCU	21/11/2025	REESPUESTA A TOPOGRAFÍA Y CAPAS GEOGRÁFICAS PARATEBUENO Y MEDINA (FOR-CO-03-ICCU031-440 Y FOR-CO-03-ICCU031-441 RESPECTIVAMENTE)	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-435-ICCU	21/11/2025	Solicitud de ajustes y correcciones a los estudios y diseños aprobados – Aplicación de observaciones del comunicado ICCU-I-2025-0016450	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-436-ICCU	25/11/2025	Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-446 APROBACIÓN GIRO 5 Anticipo Contrato de obra ICCU-138-2025	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-437-ICCU	24/11/2025	Respuesta a oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-269-Respuesta Oficio No. 766-224-ICCU – Presupuesto Preliminar Ubalá	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-438-ICCU	24/11/2025	Notificación Viabilidad Presupuesto condicionado Municipio-Ubalá-Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-426 – Presupuesto Preliminar Ubalá	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-440-ICCU	25/11/2025	Remisión de tramos por vereda y solicitud de definición de secciones a intervenir-Municipio de Ubalá-	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-441-ICCU	24/11/2025	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 32 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-219-2025	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-442-ICCU	25/11/2025	Respuesta SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-452 Concepto actas de vecindad sexta entrega. - municipios de Choachí, Junín, Gama y Sibaté	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
766-443-ICCU	25/11/2025	Respuesta al oficio FOR-CO-03-451 - Radicación – Puesta en conocimiento por afectación a capa estabilizada por mal manejo de aguas de la comunidad	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-444-ICCU	25/11/2025	Observaciones ingreso de personal en obra Municipio de Choachí-Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-442-RADICACIÓN DOCUMENTOS PERSONAL CHOACHI	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-445-ICCU	26/11/2025	Aprobación informe de buen manejo del anticipo N° 2- Respuesta oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-433-Respuesta a Observaciones Oficio 766-410 – Informe de Anticipo No. 2 y Observaciones informe N° 3-SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-445	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-446-ICCU	26/11/2025	Presupuesto definitivo municipio de Sibaté- RTA oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-460	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-447-ICCU	28/11/2025	Certificación de cumplimiento - Aprobación de actas N°2 y N° 3 de fase de la caracterización por el segundo y tercer 25%- respuesta oficios SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-435 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-443	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-448-ICCU	26/11/2025	Subsanación informe mensual N° 5 Mes de Agosto Interventoría V3.	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-449-ICCU	27/11/2025	Aprobación de documentación para ingreso de personal en obra Municipio de Choachí-Respuesta oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-461-Subsanaciòn de documentos personal Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-450-ICCU	27/11/2025	Observación sobre bajos rendimientos en estabilización de capa de afirmado por fallas en maquinaria, falta de materiales y operarios en los municipios de Choachí y Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-451-ICCU	26/11/2025	Notificación viabilidad Presupuesto definitivo municipio de Sibaté- RTA oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-460	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
766-452-ICCU	26/11/2025	Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-462 ORDEN DE GIRO No. 6 Anticipo Contrato de obra ICCU-138-2025	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-453-ICCU	27/11/2025	APROBACION HOJA DE VIDA IN. ANDRES SOFAN-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-438-RADICACION HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBRA-ANDRES GABRIEL SOFAN	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-454-ICCU	27/11/2025	Aprobación hoja de vida Ing. Andrés Sofán-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-438-radicacion hoja de vida director de obra-Andrés Gabriel Sofán	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-455-ICCU	27/11/2025	Solicitud de remisión de certificados de calibración de equipos de topografía en actividades en las Provincias Oriente y Guavio	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-456-ICCU	27/11/2025	Observaciones último tramo intervenido sueva – Junín, provincia del Guavio	CONSORCIO SOFAN C-031	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO
766-457-ICCU	28/11/2025	Entrega del Informe mensual N° 6 de Interventoría-septiembre de 2025 Contrato ICCU-219-2025	ICCU	ROBERTO CARLOS LÓPEZ JULIO

9.2 Bitácora de obra

Este documento refleja las principales actividades ejecutadas, novedades técnicas, observaciones relevantes, instrucciones impartidas y hechos relevantes ocurridos durante el periodo del **1 al 30 de noviembre**, constituyéndose en una herramienta fundamental para la trazabilidad y verificación del avance físico y administrativo del proyecto. En la siguiente carpeta se presentan las bitácoras de las provincias de Guavio, Oriente, Medina y Soacha en donde se vienen realizando actividades de obra a la fecha. Ver anexo 1.7 Bitácora de obra

9.3 Certificación componente ambiental y social

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE SANCIONES, MULTAS O INCUMPLIMIENTOS COMPONENTES AMBIENTAL Y/O SOCIAL

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, se permite CERTIFICAR que:

A corte del mes de noviembre del 2025, el Consorcio SOFAN C-031 no se encuentra sancionado ni tiene procesos de incumplimiento o multas en curso relacionados con el Contrato ICCU No. 138 del 2025, en lo que respecta a asuntos ambientales y/o sociales.

Dada a los tres (3) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

Laura Peñuela Botia
Laura Peñuela Botia
Profesional social de Interventoría

Catherine Castellanos
Especialista Ambiental Interventoría

Cristian Camilo Moreno Arias
Cristian Camilo Moreno Arias
Director de la Interventoría de Obra

AFILIADO CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

Firma:



Roberto Carlos López Julio

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

Director de Interventoría Fase III

Anexo: Carpeta con 6 componentes en sus anexos
Preparó: Equipo de trabajo Consorcio Intervención AC
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
