INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 219 DE 2025

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 138 DE 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME MENSUAL No. 13

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONSORCIO INTERVENCIÓN A.C.

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

BOGOTÁ D.C., 01 DE MAYO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 9
2. Descripción del proyecto 12
   2.1 Localización 12
   2.2 Estado inicial de la vía 12
3 Información Contrato de Obra 12
   3.1 Información general contrato de obra 12
   3.2 Actividades ejecutadas en el mes 14
   3.2.1 Actividades ejecutadas en el mes componente técnico 14
   3.2.2 Actividades Fase II Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervenciones 14
   3.2.3 Actividades Fase III Construcción 16
   3.2.3.1 Topografía 41
   3.2.4 Actividades ejecutadas en el mes componente ambiental 43
   3.2.4.1 cumplimiento del plan de adaptación a la guía ambiental (paga). 43
   3.2.5 Actividades ejecutadas en el mes componente social 47
   3.2.5.1 Programa de Atención a la Comunidad: 47
   3.2.5.2 Programa de información y divulgación 51
   3.2.5.3 Programa de manejo de infraestructura de predios y servicios públicos 54
   3.2.5.4 Programa de cultura vial y participación ciudadana. 55
   3.2.5.5 Programa de contratación de mano de obra. 56
   3.2.6 Actividades ejecutadas en el mes componente SST 58
   3.2.7 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 62
4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 63
   4.1 Estado General del Tiempo 64
   4.2 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 65
   4.2.1 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 69
   4.3 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia) 74

4.3.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 77
4.3.2 Seguimiento Programa de Obra 78
5 Información contrato de interventoría 80
5.1 Información general del contrato de interventoría 80
5.2 Informe semanal 82
5.3 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 82
5.4 Informes especialistas y profesionales 84
5.5 Informe del Programa Anual de Caja – PAC 85
6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría 85
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 85
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 85
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 88
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 89
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 89
6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría 89
6.6 Otros Documentos seguimiento mensual 89
6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 89
6.7 Actas de Comité de Obra 90
7 Conclusiones y recomendaciones 91
7.1 Conclusiones y recomendaciones área ambiental 93
7.2 Conclusiones y recomendaciones área social 93
7.3 Conclusiones y recomendaciones área SST 94
8 Anexos 95
8.1 Carpeta componente técnico 95
8.2 Carpeta componente social 95
8.3 Carpeta componente SST 95
8.4 Carpeta componente ambiental 95
8.5 Informe de buen manejo del anticipo de obra 95

8.6 Informe mensual de obra en observación 95
8.7 Informe de buen manejo del anticipo de Interventoría 95
9 Registro fotográfico del avance de las obras. 96
9.1 Correspondencia 112
9.2 Bitácora de obra.....112
9.3 Certificación componente ambiental y social.....113

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Aprobaciones informes de topografía, Fase I del proyecto 14
Tabla 2. Aprobaciones entregables fase 1 y 2 15
Tabla 3. Actividades de estabilización de rasante municipio de Ubalá tramo de prueba. 17
Tabla 4. Alcantarillas intervenidas dentro del periodo del 21 de julio al 10 de octubre, suspensión de actividades. 19
Tabla 5.Registro fotográfico Ubalá 19
Tabla 6. Avance de obra por vereda, estabilización de rasante municipio de Junín provincia Guavio. 20
Tabla 7. Relación de alcantarillas ejecutadas y porcentaje de avance. 21
Tabla 8. Alcantarillas construidas en el municipio de gama. 21
Tabla 9. Definición de sectores homogéneos tramo El Rosario – La Caja – Chatasuga – La Llanada – Ferralarada – Barro Negro – Granadillo – Chivate – Resguardo Bajo..... 23
Tabla 8. Registro fotográfico actividades tratamiento superficial simple - municipio de Choachí..... 23
Tabla 11. Avance tratamiento superficial simple municipio de Choachí provincia Oriente 27
Tabla 12. Definición de sectores homogéneos tramo Fomeque Cáqueza..... 28
Tabla 13. Registro fotográfico actividades mejoramiento de rasante con cemento municipio de Fomeque. 28
Tabla 14. Avance mejoramiento de rasante tramo municipio de Fomeque provincia Oriente 33
Tabla 15. Definición de sectores homogéneos tramo Siecha – Caldera – Potrero Grande. 34
Tabla 16. Registro fotográfico actividades mejoramiento de rasante con cemento municipio de Chipaque. 34

Tabla 17. Avance mejoramiento de rasante tramo municipio de Chipaque provincia Oriente 39
Tabla 18. Definición de sectores homogéneos tramo Vereda San Rafael - Vereda Altocharco - Sector alto de la Virgen - Vereda La Unión..... 40
Tabla 19. Avance mejoramiento de rasante tramo Municipio de Sibaté de la PROVINCIA DE SOACHA..... 41
Tabla 20. Registro fotográfico actividades topografía Guavio. 42
Tabla 21. Registro fotográfico actividades topografía Oriente. 43
Tabla 22. Cuadro de capacitaciones 44
Tabla 23. Manejo de residuos peligrosos 45
tabla 24. adquisición de agua para actividades de obra 46
Tabla 25. Gestión de RCD 47
Tabla 26 PQRSD del mes de ABRIL. 48
Tabla 27. Puntos SAU 48
Tabla 28. Estado de los buzones satelitales – abril 2026..... 49
Tabla 29. Recorridos internos – abril 2026..... 50
Tabla 30. Recorridos con la comunidad – abril 2026..... 51
Tabla 31. Acciones de información – reuniones participativas 52
Tabla 32. Estado de los volantes y folletos– abril 2026 52
Tabla 33. Estado de las cartas personalizadas– abril 2026 53
Tabla 34. Estado de las vallas – abril 2026 53
Tabla 35. Actas de vecindad aprobadas- marzo del 2026..... 54
Tabla 36. Actas de compromiso – abril 2026 55
Tabla 37. Comités de participación comunitaria 55
Tabla 38. Mano de obra no calificada – abril 2026 56
Tabla 39. Paridad laboral..... 57
Tabla 40. Informes semanales de contratista – abril 2026 57
Tabla 41. Mesas de abril 2026: 58
Tabla 42. Distribución de maquinaria del lote 1 a la fecha del mes de abril del 2026. 59
Tabla 43. Resumen Distribución del personal del contratista para el mes de abril 2026 62
Tabla 44. tabla de control presupuesto ejecutado semanal del contratista 63
Tabla 44. Resumen precipitaciones mensual..... 65
Tabla 46. Avance físico del contrato 79
Tabla 47. Avance financiero de acuerdo con los capítulos de ejecución 80
Tabla 48. Avance de actividades de obra por fases 80
Tabla 49. Personal de la interventoría, periodo mes de febrero..... 85
Tabla 50. Personal de interventoría-personales especialistas..... 87

Tabla 51. Retiro de personal de interventoría 87
Tabla 52. Valor acumulado de actividades ejecutadas por parte de la interventoría... 88
Tabla 53. Estado actual del anticipo de Interventoría CTO ICCU-219-2025 90

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Resultados ensayos de Interventoría 70
Ilustración 2. Resultados ensayos de Interventoría 72
Ilustración 3. Resultados ensayos de Interventoría 74
Ilustración 4. Control inversión del anticipo de obra a corte del 30 de abril del 2026 . 78

RESUMEN MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

El Informe Mensual de Interventoría No. 13, correspondiente al mes de abril de 2026, presenta un balance detallado de las actividades ejecutadas por el contratista en el marco de la supervisión técnica, administrativa, financiera y documental del contrato de obra ICCU-138-2025. En relación con la Fase I correspondiente al diagnóstico y caracterización vial alcanzó un avance del 100 % al 12 de diciembre de 2025, de igual forma la Fase II correspondiente a la caracterización de materiales y propuesta de intervenciones alcanzó un avance del 100% al 24 de abril de 2026.

La Fase III correspondiente a la intervención de las vías, para el mes de abril de las actividades realizadas se desglosan de la siguiente manera; para la provincia de Guavio se finalizó con las actividades de mejoramiento de rasante en los municipios de Junín con una intervención total de 9261 ml de intervención con un volumen total aproximado de 8860 m3 de material estabilizado, mientras que para el municipio de Gama se realizó la estabilización de 3000 ml con un volumen 2585 m3 aproximadamente.

En la provincia de Oriente se finalizaron las actividades de estabilización de la rasante en el municipio de Choachí, con una intervención total según levantamiento topográfico de 11.645,12 ml y un volumen total aproximado de 9.539,71 m³ de material estabilizado.

Adicionalmente se iniciaron las actividades del tratamiento superficial simple, con una intervención para el mes de abril de 4.047,51 ml y un área aproximada de 16.190,04 m^2. Por otra parte, se continua con actividades de estabilización de rasante en el municipio de Fomeque, con una intervención para el mes abril de 1.270 ml y un volumen aproximado de 1.365,25 m^3 de material estabilizado. Así mismo en el municipio de Chipaque se iniciaron actividades de estabilización de rasante las cuales se finalizaron durante este periodo, con una intervención aproximada de 2.400,00 ml y un volumen aproximado de 1.968,00 m^3.

En la provincia de Soacha se finalizaron las actividades de estabilización de la rasante en el municipio de Sibaté, con una intervención de 3.783,24 ml y un volumen total aproximado de 2.890,26 m^3 de material estabilizado. De igual forma se finalizaron actividades de recubrimiento superficial con una intervención aproximada de 17.276,79 m^2.

De este modo, la Fase III la cual corresponde a las actividades de obra, se viene ejecutando en las provincias del Guavio y Oriente, concentrándose en el mejoramiento de rasante para este mes en los municipios de Junín, Choachí, Fomeque y Chipaque; resultando así en una ejecución acumulada del 42.63%, y del 7,30% durante el periodo, y un retraso del 7,9%. Se registra un avance físico de 33.561,39 ml de capa estabilizada con proes plus más cemento, según los informes de caracterización aprobados para cada municipio. Finalmente, el informe describe los aspectos generales del contrato ICCU-219-2025 de interventoría, destacando el alcance de las labores ejecutadas y el seguimiento a los compromisos establecidos.

Durante el periodo se evidenciaron subsanaciones de los entregables correspondientes a la Fase II del contrato de obra, de la provincia de Medina, las cuales dieron como resultado la aprobación de este componente. En el componente financiero, la ejecución acumulada alcanzó la suma de $14.636.848.195,17 y de $2.506.903.846,81, durante el

periodo. La interventoría mantuvo un seguimiento integral a los aspectos técnicos, financieros, de calidad, sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos contractuales y la mitigación de riesgos en la ejecución.

A corte del presente informe se mantienen 3 municipios con ejecución simultanea de actividades de instalación de tratamiento superficial simple TSS (Choachí, oriente), estabilización de rasante (Ubalá, Guavio) y (fomeque, oriente); por lo que la Interventoría ha conminado al contratista contar con 5 tramos de intervención, los 2 faltantes con intervenciones posibles con construcción de alcantarillas en el municipio de Chipaque y fosca para dar cumplimiento al anexo técnico del contrato. En la fase de intervención, se encuentra en evaluación por parte de entidad las alternativas de cunetas en concreto reforzado, previo análisis técnico y presupuestal por parte de la interventoría de los APUS para esta actividad y escenarios de intervención bajo esa alternativa, balanceando el contrato de obra al presupuesto inicial con los ajustes requeridos que permiten la máxima ejecución posible de los corredores, incluyendo las demás actividades contractuales para cada municipio.

Así las cosas, la interventoría deja constancia expresa que la definición de esta actividad es crucial para garantizar la estabilidad y calidad de los corredores que ya cuentan con la capa estabilizada, y que probablemente puedan tener deterioros a causa de la falta de intervención y ejecucion de las cunetas, y que esta interventoría ha venido evaluando desde el inicio del contrato ICCU-138-2028, sin obtener aun la definición institucional. Por otro lado, se conminó al contratista mediante comunicación formal, la implementación del TTS en estos tramos como medida de mitigación antes los eventos climáticos acrecentados en este periodo por la temporada invernal. En este sentido, la interventoria no será responsable ante las posibles afectaciones que cause la situación expuesta en este párrafo.

1. Introducción

Dentro de este marco, el Departamento de Cundinamarca, a través del Instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca (ICCU), en el LOTE 1, firmó el Contrato No. ICCU-138-2025 con el CONSORCIO SOFAN C-031 para desarrollar el proyecto cuyo objetivo es la **"Intervención de las vías que conforman el Programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse, en las Provincias de Medina, Guavio, Oriente y Soacha, en el Departamento de Cundinamarca"**. Este proyecto no solo busca mejorar la infraestructura vial, sino también crear un impacto positivo en las comunidades a través de la creación de empleos, la optimización del acceso a servicios básicos, y el impulso al desarrollo local.

Así mismo, dando aplicación al artículo 32 de la ley 80 de 1993 realizó el Contrato No. ICCU-219-2025 con el CONSORCIO INTERVENCIÓN A.C. cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

La supervisora de los contratos de obra e interventoría para el LOTE 1 es **Laura Daniela Nieto Gutiérrez**, quien conto con el apoyo inicialmente de **Dairon Andrés Solano Duran** desde el 9 de abril hasta **30 de mayo**, luego de **Adriana Martín** en apoyo del 30 de mayo hasta el **19 de junio** posterior a la fecha quedo a cargo la Arquitecta **Luz Angela Sanabria** quien estuvo en la supervisión de las actividades de este mes hasta el **22 de julio del 2025**, actualmente como supervisor asignado se encuentra **Adriana Martín** quien reemplazó al Ingeniero **Juan Sebastián Sánchez Estrada** durante la última semana del mes de octubre del 2025, actualmente se cuenta con la supervisión del ingeniero **Juan Sebastián Sánchez y de Adriana Martin** a la fechas de este informe.

Durante el mes de abril de 2026, el Informe Mensual de Interventoría señala que en la **Fase I – Diagnóstico y Caracterización Vial** se cuenta con la aprobación total de los 11 municipios incluidos en el contrato finalizada el día 12/12/2025. De igual forma al corte del presente informe la **Fase II – Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervenciones**, se cuenta con la aprobación total de los 11 municipios incluidos en el lote 1 y que fue finalizada el día 24/04/2026 y se radicó ante la entidad mediante el comunicado *766-777 Actualización documentos-FASES I-II-III-Respuesta oficio ICCU-I-2026-0004255,* el 30 de abril del 2026. Finalmente, se reporta la continuidad de las actividades de la **Fase III – Intervención de las vías**, con un **29,71%** de avance en esta FASE; especialmente se realizan actividades en la Provincia del Guavio (municipio de Junín y Gama) y en la Provincia de Oriente (municipio de Choachí, Fomeque y Chipaque), y en la provincia de Soacha (municipio de Sibaté) donde finalizaron las labores de intervención y mejoramiento de la rasante existente.

En la provincia del Guavio, específicamente en el municipio de Gama, se finalizó con las actividades de construcción de cuatro (4) alcantarillas e intervención de tres (3) km de mejoramiento de rasante el 28 de febrero del 2026 se encuentra pendiente actividades de construcción de cunetas y recubrimiento superficial. En el municipio de Junín se finalizó con la construcción de 4 de las 5 alcantarillas y la estabilización de la restante de 9,2 km, los cuales detuvieron mientras se cuenta con el equipo de TSS. Se continuaron las actividades en el municipio de Ubalá con actividades de mejoramiento de rasante en el municipio de Ubalá a la fecha del 30 de abril se cuenta con una intervención inicial de 850 ml de intervención de un total de 8600 ml.

En la provincia de Oriente se finalizaron las actividades de estabilización de la rasante en el municipio de Choachí, con una intervención total según levantamiento topográfico de 11.645,12 ml y un volumen total aproximado de 9.539,71 m³ de material estabilizado. Adicionalmente se iniciaron las actividades del tratamiento superficial simple, con una

intervención para el mes de abril de 4.047,51 ml y un área aproximada de 16.190,04 m^2. Por otra parte, se continua con actividades de estabilización de rasante en el municipio de Fomeque, con una intervención para el mes abril de 1.270 ml y un volumen aproximado de 1.365,25 m^3 de material estabilizado. Así mismo en el municipio de Chipaque se iniciaron actividades de estabilización de rasante las cuales se finalizaron el mismo mes de abril, con una intervención aproximada de 2.400,00 ml y un volumen aproximado de 1.968,00 m^3.

Adicionalmente, en la provincia de Soacha se finalizaron las actividades de estabilización de la rasante en el municipio de Sibaté, con una intervención de 3.783,24 ml y un volumen total aproximado de 2.890,26 m^3 de material estabilizado. De igual forma se finalizaron actividades de recubrimiento superficial con una intervención aproximada de 17.276,79 m^2.

Se mantuvo la ejecución de los componentes social, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en cumplimiento de la normativa vigente. La Interventoría continuó con su gestión en los ámbitos técnico, administrativo y contractual, velando por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada ejecución del proyecto. A la fecha de corte, el contrato presenta un **atraso del 7,90%** respecto al cronograma establecido con la reprogramación con línea base 4 entregada por el contratista de obra y aprobada por la interventoría el día 19 de diciembre del 2025.

Se espera que, con la próxima definición de las obras de drenaje longitudinal, se intervengan las cunetas en los municipios con intervención de capa estabilizada, y así garantizar la estabilidad total de las obras ejecutadas.

2. Descripción del proyecto

2.1 Localización

El Proyecto para la intervención de vías se localiza en las Provincias del oriente de Cundinamarca: **Medina, Guavio, Oriente y Soacha**, toda la información en referente a la localización de cada provincia se encuentra dentro del anexo del componente técnico, actas de localización.

2.2 Estado inicial de la vía

Todo el registro fotográfico referente al estado inicial de la vía ya se encuentra referenciado dentro del contenido de los informes mensuales N°1, 2, 3, y 4 correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, y julio concerniente a todos los tramos existentes del proyecto, este registro fotográfico se hace con el fin de contar con evidencia del antes y el después de la intervención del contrato de obra.

3 Información Contrato de Obra

3.1 Información general contrato de obra

Durante el presente periodo de este informe, no se presentaron modificaciones del contrato de obra ICCU 138 del 2025 hasta el 31 de agosto del 2026.

Apertura del proceso de contratación	**No.:** ICCU-LP-031 de 2024.
Resolución de adjudicación del contrato	**No.:** 1053 de 2024
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y Fecha	DIS-2025000077 de miércoles, 22 de enero de 2025 y DIS-2025000080 de miércoles, 22 de enero de 2025.
RP (Registro Presupuestal) y Fecha:	RES-2025000367 de lunes, 17 de febrero de 2025 y RES-2025000368 de lunes, 17 de febrero de 2025.
Contrato ICCU No.:	138 DE 2025.
Fecha de suscripción del contrato:	27 de enero de 2025.
Objeto del contrato:	Intervención de las vías que conforman el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse, en las provincias de Medina, Guavio, Oriente y Soacha, en el departamento de Cundinamarca.

Contratista:	CONSORCIO SOFAN C-031, NIT. 901.906.842 – 2 SOFAN INGENIERIA S.A.S identificada con NIT 800.012.888 – 7 constituida mediante Escritura Pública No. 1769 del 31 de julio de 1987 de la Notaria 1a. De Montería. inscrito en la Cámara de Comercio el 11 de agosto de 1987, con el No. 3560 del Libro IX, representada legalmente por ANDRES GABRIEL SOFAN SANCHEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.553.192 de Bogotá D.C, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Montería, con una participación del noventa por ciento (90%). ANDRES GABRIEL SOFAN SANCHEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.553.192 de Bogotá D.C, quien obra en nombre propio con una participación del diez por ciento (10%).
Valor inicial:	$ 35.350.235.228,00
Adiciones:	NINGUNA.
Valor acumulado del contrato:	$35.350.235.228,00
Modificaciones:	Modificatorio 1: la modificación de la cláusula 7 de contrato de Obra N° ICCU-138 de 2025 (Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-2025000418 del 10 de julio de 2025)
Aclaraciones:	NINGUNA
Suspensiones:	NINGUNA
Cesiones de participación contractual:	NINGUNA
Plazo:	Once (11) meses y quince (15) días o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra.
Prorroga 1:	8 meses hasta el 31 de agosto del 2026
Plazo total	19 meses y quince días
Fecha de terminación inicial del contrato:	31 de diciembre de 2025.
Fecha de terminación actual del contrato	31 de agosto del 2026

Fuente: elaboración propia

3.2 Actividades ejecutadas en el mes

3.2.1 Actividades ejecutadas en el mes componente técnico

- ✓ **Actividades Fase I Geoposicionamiento, Topografía y Caracterización de materiales.**

Durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero del 2026 se finalizó con las actividades relacionadas con la fase 1 de cada una de las provincias, a continuación, se describe cada uno de los municipios en la siguiente tabla:

Tabla 1. Aprobaciones informes de topografía, Fase I del proyecto

Municipio	Estado	Oficio	Fecha
Provincia Guavio			
Gama	Aprobado	766-307	14/10/25
Junín	Aprobado	766-309	15/10/25
Ubalá	Aprobado	766-216	16/09/25
Provincia Medina			
Medina	Aprobado	766-498	12/12/25
Paratebueno	Aprobado	766-498	12/12/25
Provincia Oriente			
Choachí	Aprobado	766-420	19/11/25
Fosca	Aprobado	766-307	14/10/25
Chipaque	Aprobado	766-330	22/10/25
Fómeque	Aprobado	766-381	05/11/25
Quetame	Aprobado	766-381	05/11/25
Provincia Soacha			
Sibaté	Aprobado	766-343	28/10/25

Fuente: elaboración propia, interventoría

En conclusión, y considerando el estado de cada uno de los municipios vinculados al contrato de obra, se registra una aprobación general de los 11 municipios.

3.2.2 Actividades Fase II Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervenciones

Se realizo aprobación completa de los informes de caracterización y formula de estabilización de todos los municipios de la provincia de Oriente, Medina, Guavio y

Soacha, según consta en los comunicados oficial de Interventoría: *766-581 Entrega de Informes de Caracterización – Provincias de Oriente, Soacha y Guavio y 766-774 y 775 informes de caracterización v4 provincia de medina. Cumpliendo con el 100% de los informes entregados y subsanados.*

Ver oficio *766-777 Actualización documentos-FASES I-II-III-Respuesta oficio ICCU-I-2026-0004255* del 30 de abril del 2026, con el cual se actualizan los productos correspondientes a las FASES 1y 2 y se cargan en el drive designado por la entidad.

Tabla 2. Aprobaciones entregables fase 1 y 2

Municipio	Fase 1	Entrega	Fase 2	Entrega
1.1. Tramo 1 - Gama	https://drive.google.com/drive/folders/1ZwNoGQ3bdObvgywHTKsbPkpuPFJFjjWd?usp=drive_link	766-307.1	https://drive.google.com/drive/folders/1KLxJXQOq7Y92TZsp49omj3xkZnHnjIqX?usp=drive_link	766-598
1.2. Tramo 2 - Junin	https://drive.google.com/drive/folders/1_wGtLCJqPs_jzgP3Gg6JV-UKtLgvICD3?usp=drive_link	766-309.1	https://drive.google.com/drive/folders/1fLyLo5hSs9FTfZ6wAGMp7aFrM1cwJHwE?usp=drive_link	
1.3. Tramo 3 - Ubalá	https://drive.google.com/drive/folders/1-gr840SHIVFiw0xCHfd77TheWnSxwA4_?usp=drive_link	766-216.1	https://drive.google.com/drive/folders/1TifQ0ZGekfbs3SBzrozh2Q69vBOvMLEW?usp=drive_link	
1.4. Tramo 4 - Medina	https://drive.google.com/drive/folders/1McVQMZNB_aTlWaohGrghseRM369NWBSY?usp=drive_link	766-498.2	https://drive.google.com/drive/folders/1k8T5MwKNpQY4a9rvw_4Xr9yAsduvKQYc?usp=sharing	766-777
1.5. Tramo 5 - Paratebueno	https://drive.google.com/drive/folders/1liDKjqQfjcjh-B4MpHQqdVKCadPe9Qzy?usp=drive_link	766-498.1	https://drive.google.com/drive/folders/1EJwVpCZvYlsB0unrHkdM8p_5OSr1que2?usp=drive_link	
1.6. Tramo 6 - Choachi	https://drive.google.com/drive/folders/10WYMdPGftPFSCsLhpMd82SaYfWWJ1rKH?usp=drive_link	766-420.1	https://drive.google.com/drive/folders/1VCVtbAAzomewjkH06zxSSuA7bdCAOpkf?usp=drive_link	766-605

1.7. Tramo 7 - Fosca	https://drive.google.com/drive/folders/1PFEEK3hj-jGhRXA2ksqHrOqJxSAAs94x?usp=drive_link	766-307.2	https://drive.google.com/drive/folders/1Z71kBuRUOw_u9ggGch3eEKM5Y7Rt1cJ?usp=drive_link	
1.8. Tramo 8 - Fomequ e	https://drive.google.com/drive/folders/1uzIMZJvB7EHQ2S-YCeSBaR-uWNAhW7VB?usp=drive_link	766-381.1	https://drive.google.com/drive/folders/1qNx-n7FQ7d9R2eeJV0baoWxwN73UilOn?usp=drive_link	
1.9. Tramo 9 - Quetame	https://drive.google.com/drive/folders/195ueDia4vZtd2qgyGE46t7CuxInbY4_8?usp=drive_link	766-381.2	https://drive.google.com/drive/folders/1G5kejQQGLP10VrNARQXnf32BKlEhgmDE?usp=drive_link	
1.11. Tramo 11- Chipaqu e	https://drive.google.com/drive/folders/1z7illeJAnjfLrzPDLS2AIgWsMX1-DnNF?usp=drive_link	766-330.1	https://drive.google.com/drive/folders/1ySlQ5_Ayfz-1R00Lq_bQvD1DBYEwlxjO?usp=drive_link	
1.10. Tramo 10 -Sibaté	https://drive.google.com/drive/folders/1EqbUZ8K8UH_mhsvcdjQQjS1xWhTfbHiO?usp=drive_link	766-343.1	https://drive.google.com/drive/folders/1Ec9tiI0ZYWuzTlgHBifhD5piFQzD0A2J?usp=drive_link	766-599

Fuente: elaboración propia, interventoría

3.2.3 Actividades Fase III Construcción

A. Provincia del Guavio

- **Tramo Casa Rosada – Laguna Azul, ubicado en el municipio de Ubalá**.

Tras una detención temporal de actividades a partir del 10 de octubre, ocasionada por intervenciones realizadas por el municipio dentro del tramo del proyecto, el contratista retomó labores en el municipio de Ubalá el 10 de noviembre. Posteriormente, un mes después, ejecutó actividades de demolición y reconstrucción del muro de descole de una alcantarilla.

No obstante, el 25 de noviembre el contratista suspendió nuevamente las actividades, una vez finalizada la intervención mencionada. Con el fin de definir el reinicio de las

obras en este municipio, se programó una reunión para el 17 de enero de 2026; sin embargo, esta no se llevó a cabo por incumplimiento del contratista. En consecuencia, la reunión fue reprogramada para el 5 de febrero de 2026, fecha que igualmente no fue atendida por el contratista. Ante esta situación, finalmente el contratista reinicio las actividades en el municipio de Ubalá el día 26 de marzo del 2026, con la realización de algunos tramos de prueba al inicio del tramo iniciando así con las actividades de estabilización de rasante en una extensión de 200 ml como tramo de prueba.

Durante el mes de abril se continuaron ejecutando las actividades de estabilización de la rasante, las cuales incluyeron la escarificación del material existente, instalación de cemento, adición del aditivo PROES, homogenización, conformación mediante cereo y compactación de la rasante, ejecutando a la fecha un total de 1.725 ml, equivalente aproximadamente a 1.590 m³ de material estabilizado; a continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades desarrolladas.

Tabla 3. Actividades de estabilización de rasante municipio de Ubalá tramo de prueba.

	
Escarificación de rasante	Instalación de cemento

	
Homogenización	Instalación de aditivo PROES
	
Cereo	Compactación

Fuente: registro fotográfico interventoría

Se solicito al contratista realizar el ajuste del sistema de riego del carrotanque, teniendo en cuenta que, para el 14 de abril del 2026, parte del sistema llamado flauta del carrotanque se dañó, por lo cual el contratista implemento un riego manual con manguera, la interventoría envió oficio 766-802 solicitando reparación del sistema para continuar cumpliendo con las actividades conforme se establecen en el informe de caracterización, a final de mes este daño no ha sido subsanado.

Se establece cuadro resumen de las alcantarillas que a la fecha el contratista ha ejecutado hasta la fecha:

Tabla 4. Alcantarillas intervenidas dentro del periodo del 21 de julio al 10 de octubre, suspensión de actividades.

No	PR	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	PR5+900	Ejecutada 95%	Falta Relleno Estructural
2	PR0+407	Ejecutada 95%	Falta Demolición Y Reconstrucción Muro Descole
3	PR6+800	Ejecutada 100%	Alcantarilla Funcional Terminada
4	PR7+775	Ejecutada 95%	Falta Excavación De Descole
5	PR13+800	Ejecutada 95%	Falta Realizar Relleno Estructural
6	PR14+000	Ejecutada 95%	Falta Realizar Relleno Estructural

Fuente: elaboración propia

El día 18 de abril de 2026 se reactivaron las actividades de construcción de alcantarillas en el municipio de Ubalá, iniciando la intervención de la primera de las cinco (5) alcantarillas actualmente pendientes de ejecución, correspondientes a un total de once (11) estructuras contempladas en el presupuesto del proyecto. En la alcantarilla ubicada en el PR 1+240 se ejecutaron actividades de excavación, instalación de solado y tubería, atraque y relleno, así como el amarre de acero para la conformación de la zarpa y el muro de descole. A continuación, se muestra registro fotográfico del avance de las actividades.

Tabla 5.Registro fotográfico Ubalá

Excavaciones	Instalación y atraque de tubería
	
Amarre de acero	Instalación de formaleta

Fuente: elaboración propia

No	PR	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
7	PR1+240	Ejecutada 25%	Falta estructuras de encole y descole

Fuente: elaboración interventoría

- **Tramo Sueva – San Francisco – el Valle - Junín municipio de Junín**

Durante el periodo del 1 al 30 de abril del 2026 el contratista no ejecuto actividades se Encuentra a la espera de continuar con la instalación del tratamiento superficial simple. Las actividades de estabilización de rasante finalizaron el día 20 de marzo del 2026, se realizó una revisión profunda de los tramos estabilizados ajustando el valor de 9268 ml a un valor de 9261 ml de estabilización equivalentes a un total de 8860 m3 ejecutados de acuerdo con los ítems del contrato arrojando la siguiente tabla.

Tabla 6. Avance de obra por vereda, estabilización de rasante municipio de Junín provincia Guavio.

Fuente: diapositivas comité N°47 municipio de Junín.

La construcción alcantarillas en el municipio de Junín se ejecutó desde el 26 de febrero hasta el día 9 de abril, a continuación, se muestra tabla resumen.

Tabla 7. Relación de alcantarillas ejecutadas y porcentaje de avance.

Alcantarilla	Avance	Observaciones
Alcantarilla 1 PR 1+620	100%	Completada
Alcantarilla 2 PR 7+550	100%	Falta ajuste de cerca
Alcantarilla 3 PR 12+780	100%	Completada
Alcantarilla 4 PR 13+780	100%	Completada
Alcantarilla 5 PR 14+800	100%	Completada

Fuente: elaboración interventoría

- **Clemente – Palenque - Río Rucio, Municipio de Gama**

Entre el 1 y el 30 de abril de 2026, en el municipio de Gama no se ejecutaron actividades de obra, debido a que el contratista se encuentra a la espera de la disponibilidad de la maquinaria requerida para la instalación del tratamiento superficial simple. Como balance general del proyecto, se culminó la ejecución de 3.000 ml de mejoramiento de rasante y la construcción de las cuatro (4) alcantarillas proyectadas para este tramo del municipio de Junín. A la fecha, la alcantarilla ubicada en el PR 4+200 presenta observaciones y se encuentra pendiente de la construcción de un par de pie de amigos en la zona de descole del muro.

Tabla 8. Alcantarillas construidas en el municipio de gama.

No	PR	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
1	PR2+900	Ejecutada 100%	Completada
2	PR3+980	Ejecutada 100%	completada
3	PR4+100	Ejecutada 100%	Completada
4	PR3+200	Ejecutada 100%	Falta construcción de pie de amigo muro de descole

Fuente: elaboración propia interventoría.

Se ejecutaron actividades de limpieza y mantenimiento de alcantarillas, interviniendo un total de nueve (9) unidades, labores que fueron verificadas por la interventoría para su correspondiente validación. Estas actividades se desarrollaron con el fin de garantizar el adecuado manejo y conducción de las aguas, así como prevenir procesos de colmatación y asegurar el correcto funcionamiento de las estructuras hidráulicas existentes.

B. Provincia de Oriente

- **Tramo El Rosario – La Caja – Chatasuga – La Llanada – Ferralarada – Barro Negro – Granadillo – Chivate – Resguardo Bajo, municipio de Choachí.**

Para el periodo del presente informe se finalizaron las actividades correspondientes a la estabilización del afirmado de la rasante de la vía a una profundidad de 18 cm y 22 cm, utilizando cemento portland tipo 1 al 3% y aditivo marca PROES en segmentos viales definidos previamente en recorridos conjuntos realizados entre representantes de la Alcaldía, la Supervisión del ICCU, el Contratista de obra y la Interventoría y la Supervisión.

Para el desarrollo de estas labores se contó con el apoyo de maquinaria pesada tipo recicladora, minicargador y motoniveladora, utilizada para las actividades de intervención en la rasante de la vía y limpieza y/o conformación de cunetas, así como volqueta con tanque de agua para su transporte y suministro. El contratista empleó mano de obra calificada y herramientas menores para la correcta ejecución de las actividades. Así mismo durante el periodo del presente informe iniciaron las actividades del tratamiento superficial simple.

Aunque los anchos y espesores de los tramos homogéneos de intervención presentan variaciones, estos deben ajustarse a las condiciones topográficas del terreno y a las tablas de espesores establecidas en el informe de caracterización aprobado por la

interventoría sectores homogéneos tramo **El Rosario – La Caja – Chatasuga – La Llanada – Ferralarada – Barro Negro – Granadillo – Chivate – Resguardo Bajo.**

Tabla 9. Definición de sectores homogéneos tramo El Rosario – La Caja – Chatasuga – La Llanada – Ferralarada – Barro Negro – Granadillo – Chivate – Resguardo Bajo.

Sector	Abscisa	CBR subrasante (%)	Espesor de la Capa de Mejoramiento (cm)
1	K0+000 – K3+445	4.52	18
2	K3+445 – K9+120	2.97	22
3	K9+120 – K14+535	2.99	22
4	K14+535 – K21+000	2.89	22

Fuente: Informe caracterización V10, municipio de Choachí.

Tabla 10. Registro fotográfico actividades tratamiento superficial simple - municipio de Choachí







Retiro de material granular sobre la vía





















Tratamiento superficial simple



Sellado de tratamiento

Fuente: elaboración propia

Durante el mes de abril se finalizaron las actividades de estabilización de la rasante, con una intervención total de **11.645,12 ml**, distribuidos en las veredas de **Resguardo Norte, Resguardo Parte Baja, La Caja, Chatasuga, La Llanada, Maza,**

Ferralarada y **Barronegro**. Dado lo anterior se iniciaron las actividades del tratamiento superficial simple con una intervención para el mes de abril de **4.047,51 ml** y un área aproximada de **16.190,04 m²** distribuidos en las veredas de **Resguardo Norte, Resguardo Parte Baja, La Llanada** y **Chatasuga.** Frente a lo anterior se aprecia en la siguiente tabla la discriminación de los tramos a intervenir, según los programado y ejecutado, conforme al alcance del proyecto.

Tabla 11. Avance tratamiento superficial simple municipio de Choachí provincia Oriente

FASE III AVANCE DE OBRA - MUNICIPIO DE CHOACHI				
VEREDA	**TRAMO**	**LONGITUD EJECUT (m)**	**TSS (m)**	**AVANCE %**
LA CAJA	TRAMO 1	2260	0	0%
CHATASUGA	TRAMO 1	1306	0	0%
	TRAMO 2	1510	835,61	55%
LA LLANADA	TRAMO 1	1040	1040	100%
	TRAMO 2	200	120	60%
MAZA	TRAMO 1	420	0	0%
	TRAMO 2	600	0	0%
FERRALARADA	TRAMO UNICO	1200	0	0%
BARRONEGRO	TRAMO 1	787,22	0	0%
RESGUARDO PARTE BAJA	TRAMO 1	270	0	0%
	TRAMO 2	1718,2	1718,2	100%
RESGUARDO NORTE	TRAMO UNICO	333,7	333,7	100%

Fuente: elaboración propia

- **Tramo Fomeque Cáqueza, municipio de Fomeque.**

Para el periodo del presente informe se continua con la ejecución de actividades correspondientes a la estabilización del afirmado de la rasante de la vía a una profundidad de 25 cm, utilizando cemento portland tipo 1 al 3% y aditivo marca PROES en segmentos viales definidos durante recorridos conjuntos realizados entre

representantes de la Alcaldía, la Supervisión del ICCU, el Contratista de obra y la Interventoría y la Supervisión, además en el recorrido se determinó la construcción de obras de drenaje tipo alcantarilla, con el objetivo de garantizar el adecuado manejo y control de las aguas lluvias sobre la vía.

Para el desarrollo de estas labores se contó con el apoyo de maquinaria tipo FAE y motoniveladora, utilizada para las actividades de intervención en la rasante de la vía y limpieza y/o conformación de cunetas, así como volqueta con tanque de agua para su transporte y suministro. El contratista empleó mano de obra calificada y herramientas menores para la correcta ejecución de las actividades.

Aunque los anchos y espesores de los tramos homogéneos de intervención presentan variaciones, estos deben ajustarse a las condiciones topográficas del terreno y a las tablas de espesores establecidas en el informe de caracterización aprobado por la interventoría sectores homogéneos tramo **Fomeque Cáqueza.**

Tabla 12. Definición de sectores homogéneos tramo Fomeque Cáqueza.

Sector	Abscisa	CBR subrasante (%)	Espesor de la Capa de Mejoramiento (cm)
1	K0+000 – K1+400	2.61	25,00
2	K1+400 – K5+000	2.61	25,00
3	K5+000 – K8+550	2.61	25,00
4	K8+550 – K10+000	2.61	25,00
5	K10+000 – K13+600	2.61	25,00
6	K13+600 – K19+000	2.61	25,00

Fuente: Informe caracterización V2, municipio de Fomeque.

Tabla 13. Registro fotográfico actividades mejoramiento de rasante con cemento municipio de Fomeque.





Escarificación





Retiro de sobre tamaños









Instalación de cemento









Homogeneización de afirmado con cemento









Instalación de aditivo + agua









Céreo









Compactación

Fuente: elaboración propia

Durante el mes de abril se intervinieron aproximadamente **1.270,00 ml**, desde el **PR02+800,0** hasta el **PR05+450,0**, distribuidos en la vereda **Laderas**, con un

espesor de **25 cm** y un ancho promedio de **4,3 m**. En resumen, en el **municipio de Fomeque** se presenta un avance de obra del **22,55%**, lo que equivale a un total de **2.270,00 ml**. Frente a lo anterior se aprecia en la siguiente tabla la discriminación de los tramos a intervenir, según los programado y ejecutado, conforme al alcance del proyecto.

Tabla 14. Avance mejoramiento de rasante tramo municipio de Fomeque provincia Oriente

FASE III AVANCE DE OBRA - MUNICIPIO DE FOMEQUE							
VEREDA	**TRAMO**	**ABSCISA INICIAL**	**ABSCISA FINAL**	**LONGITUD A INTERV (m)**	**LONGITUD EJECUT (m)**	**ESPESOR (cm)**	**AVANCE %**
	TRAMO 1	K01+800,00	K03+500,00	1700	1700	25	100%
	TRAMO 2	K04+880,00	K05+860,00	980	570	25	58%
	TRAMO 3	K05+980,00	K06+960,00	980	0	25	0%
	TRAMO 4	K08+040,00	K09+200,00	1160	0	25	0%
	TRAMO 5	K09+480,00	K10+580,00	1100	0	25	0%
	TRAMO 6	K10+740,00	K11+250,00	510	0	25	0%
	TRAMO 7	K12+240,00	K12+720,00	480	0	25	0%
	TRAMO 8	K13+160,00	K13+660,00	500	0	25	0%
	TRAMO 9	K14+450,00	K16+000,00	1550	0	25	0%
	TRAMO 10	K16+250,00	K17+860,00	1610	0	25	0%
	TRAMO 11	K18+170,00	K18+600,00	430	0	25	0%

Fuente: elaboración propia

- **Tramo Siecha – Caldera – Potrero Grande, municipio de Chipaque.**

Para el periodo del presente informe se iniciaron y finalizaron las actividades correspondientes a la estabilización del afirmado de la rasante de la vía a una profundidad de 20 cm y 22 cm, utilizando cemento portland tipo 1 al 3% y aditivo marca PROES en segmentos viales definidos previamente en recorridos conjuntos realizados

entre representantes de la Alcaldía, la Supervisión del ICCU, el Contratista de obra y la Interventoría y la Supervisión.

Para el desarrollo de estas labores se contó con el apoyo de maquinaria pesada tipo recicladora, minicargador y motoniveladora, utilizada para las actividades de intervención en la rasante de la vía y limpieza y/o conformación de cunetas, así como volqueta con tanque de agua para su transporte y suministro. El contratista empleó mano de obra calificada y herramientas menores para la correcta ejecución de las actividades.

Aunque los anchos y espesores de los tramos homogéneos de intervención presentan variaciones, estos deben ajustarse a las condiciones topográficas del terreno y a las tablas de espesores establecidas en el informe de caracterización aprobado por la interventoría sectores homogéneos tramo **Siecha – Caldera – Potrero Grande.**


Tabla 15. Definición de sectores homogéneos tramo Siecha – Caldera – Potrero Grande.

Sector	Abscisa	CBR subrasante (%)	Espesor de la Capa de Mejoramiento (cm)
1	K0+000 – K1+082	3.64	20
2	K1+082 – K2+935	2.95	22
3	K2+935 – K5+340	3.56	20

Fuente: Informe caracterización V2, municipio de Chipaque.

Tabla 16. Registro fotográfico actividades mejoramiento de rasante con cemento municipio de Chipaque.



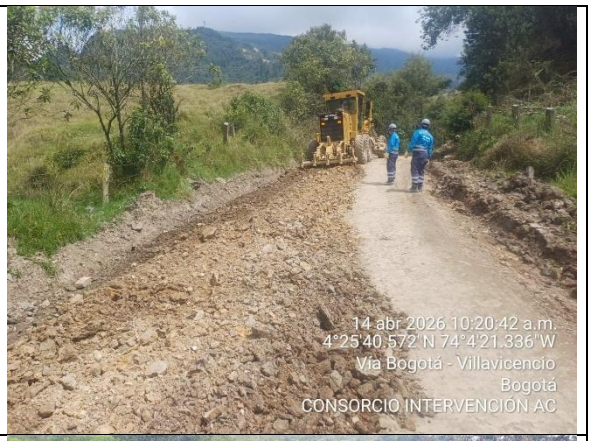





Escarificación









Retiro de sobre tamaños









Instalación de cemento









Homogeneización de afirmado con cemento









Instalación de aditivo + agua









Céreo



Compactación

Fuente: elaboración propia

Durante el mes de abril se intervinieron aproximadamente **2.400,00 ml**, desde el **PR00+200,0** hasta el **PR04+480,0**, distribuidos en la vereda **Siecha, Caldera** y **Potrero Grande.**, con un espesores entre **20 cm** y **22 cm** y un ancho promedio de **4,1 m**. En resumen, en el **municipio de Chipaque** se presenta un avance de obra del **100%**, lo que equivale a un total de **2.400,00 ml**. Frente a lo anterior se aprecia en la siguiente tabla la discriminación de los tramos a intervenir, según los programado y ejecutado, conforme al alcance del proyecto.

Tabla 17. Avance mejoramiento de rasante tramo municipio de Chipaque provincia Oriente

FASE III AVANCE DE OBRA - MUNICIPIO DE FOMEQUE							
VEREDA	TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD A INTERV (m)	LONGITUD EJECUT (m)	ESPESOR (cm)	AVANCE %
Caldera	TRAMO 1	K00+200,00	K01+200,00	1000	1000	20	100%
Caldera	TRAMO 2	K01+680,00	K02+680,00	1000	1000	22	100%
Siecha	TRAMO 3	K04+080,00	K04+480,00	400	400	20	100%

Fuente: elaboración propia

C. Provincia de Soacha

Para el tramo **Vereda San Rafael - Vereda Altocharco - Sector alto de la Virgen - Vereda La Unión**, ubicado en el municipio de **Sibaté**, en el mes de abril se terminó la ejecución de actividades correspondientes a la **estabilización del afirmado de la rasante de la vía con 3783,24 metros lineales a una profundidad de 15 cm y 20 cm**, utilizando cemento portland tipo 1 al 3% y aditivo marca PROES en el segmento vial definido durante **el recorrido conjunto** realizado entre representantes de **la Alcaldía**, **la Supervisión del ICCU, el Contratista de obra y la Interventoría**, además en el recorrido se determinó que no se requiere la **construcción de obras de drenaje tipo alcantarilla** debido a que las existentes se encuentran funcionales y están prestando el servicio requerido, y solo se requiere la **construcción o limpieza de cunetas existentes** con el objetivo de garantizar el adecuado **manejo y control de las aguas lluvias** sobre la vía.

Aunque los anchos y espesores de los **tramos homogéneos de intervención** presentan variaciones, estos deben ajustarse a las condiciones topográficas del terreno y a las **tablas de espesores establecidas** en el **informe de caracterización** aprobado por la interventoría, tal como se presenta en la tabla siguiente.

Tabla 18. Definición de sectores homogéneos tramo Vereda San Rafael - Vereda Altocharco - Sector alto de la Virgen - Vereda La Unión.

Sector	Abscisa	CBR a partir del LWD MR (%)	Espesor de la Capa de Mejoramiento (cm

1	K3+540 - K4+150	8.17	15
2	K4+150 - K5+620	4.06 - 6.93	20
3	K5+620 - K7+330	10.00	15

Fuente: informe caracterización V10, municipio de Sibaté.

En el mes de abril se finalizaron actividades de recubrimiento superficial con una intervención aproximada de 17.276,79 m².

Tabla 19. Avance mejoramiento de rasante tramo Municipio de Sibaté de la PROVINCIA DE SOACHA.

FASE III AVANCE DE OBRA - MUNICIPIO DE SIBATÉ						
Vereda	**Tramo**	**Abscisa inicial**	**Abscisa final**	**Longitud a interv (m)**	**Longitud TSS (m)**	**Avance %**
Altocharco	Tramo 1	Pr03+540	Pr04+150	610	610	100%
San Rafael	Tramo 2	Pr04+150	Pr05+620	1470	1470	100%
San Rafael	Tramo 3	Pr0+5+620	Pr07+330	1710	1710	100%

Fuente: elaboración propia

3.2.3.1 Topografía

- Provincia del Guavio

Durante el mes de abril de 2026 se registraron avances en las actividades topográficas en el municipio de Ubalá. En el municipio de Junín se mantiene el replanteo 9503 m, pero aún sin inicio del levantamiento topográfico final.

En Gama no hay actividades de topografía, quedando el levantamiento topográfico en 1600 metros (PR0+000 – PR1+600; 53 % del tramo, como el mes pasado).

En el municipio de Ubalá se continúan labores de replanteo, donde se logra un avance de 2050 metros (PR0+000 – PR1+100, PR1+500 a PR1+900, PR3+750 a PR4+300). Se hace control de niveles en la alcantarilla PR1+240 en obra.

Tabla 20. Registro fotográfico actividades topografía Guavio.





Revisión replanteo Ubalá y verificación nivel muro descole alcantarilla.

- Provincia de Oriente

En la Provincia de Oriente, durante el mes de abril de 2026 se ejecutaron actividades de levantamiento topográfico en el tramo de Choachí, el cual queda terminado con una longitud de 11712 metros, mostrando un avance de 1650 metros.

En el municipio de Fómeque luego del posicionamiento GNSS de cuatro vértices de control (GPS 1F, GPS2F, GPS 3F, GPS 4F) y ejecutada la poligonal correspondiente se continúa con el replanteo llegando a 3860 metros (PR1+800 a PR3+500, PR4+880 a PR5+860). Luego de la intervención de mejoramiento en estos tramos, el Contratista ejecuta levantamiento topográfico final del PR1+800 a PR3+500, PR4+880 a PR5+500 llegando a 1620 m.

En el municipio de Chipaque, similar al municipio de Fómeque, se hace un posicionamiento GNSS de cuatro puntos de control topográfico (GPS 3CH, GPS 4CH, GPS

1CH, GPS 2CH) con su respectivas poligonales. Luego se ejecutan actividades de replanteo entre las abscisas PR0+200 a PR1+200, PR1+680 a PR2+680 yPR4+090 a PR5+080 llegando a 2900 m. Después de las actividades de mejoramiento, se ejecuta levantamiento topográfico final del PR0+200 a PR1+200 y PR1+680 a PR2+680 con un avance de 2000 metros.

Tabla 21. Registro fotográfico actividades topografía Oriente.





Posicionamiento GNSS Chipaque, levantamiento topográfico final Fómeque

- Provincia de Soacha

En el municipio de Sibaté, finalizado el levantamiento topográfico final, el Contratista envía una primera entrega de los productos topográficos finales mediante comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-721. La Interventoría procede a hacer la respectiva revisión de estos productos y emite un comunicado en respuesta 766-772 el 28 de abril con las respectivas observaciones.

3.2.4 Actividades ejecutadas en el mes componente ambiental

3.2.4.1 cumplimiento del plan de adaptación a la guía ambiental (paga).

Durante el periodo de reporte, las actividades ejecutadas corresponden al desarrollo de los programas de dicho documento para cada una de las provincias. A continuación, se

evidencian las actividades desde el componente ambiental para las provincias del Guavio y Oriente.

- Capacitaciones.

A continuación, se presentan las capacitaciones correspondientes al **mes de abril del 2026**, dando cumplimiento a los lineamientos y programas establecidos en el PAGA de cada una de las provincias intervenidas.

Tabla 22. Cuadro de capacitaciones

PROVINCIA	MUNICIPIO	TEMA DE CAPACITACIÓN	FECHA	ASISTENTES
GUAVIO	**Junín**	Manejo de Materiales de Construcción	10 abril 2026.	13
		Manejo Integral de residuos sólidos (Plan de gestión de residuos RCD, Plan de Gestión de Residuos Sólidos).	17 abril 2026.	14
		Prevención, control y atención a emergencias.	28 abril 2026.	14
ORIENTE	**Choachí**	Manejo de Materiales de Construcción	09 de abril 2026	14
		Manejo Integral de residuos Sólidos.	15 de abril 2026	17
		Prevención, control y atención a emergencias.	28 abril 2026	11

Fuente: Interventoría.

- **Gestión e instalación señalización respectiva en sitios requeridos.**

Durante el mes reportado, se implementó el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) conforme al diseño típico aprobado por la Interventoría, con el objetivo de garantizar condiciones seguras de circulación para peatones, vehículos y personal de obra durante las actividades de intervención vial. Cada una de las provincias cuentan con la siguiente señalización:

- Tipo de señales:

2 señales SIO-01 (trabajos en la vía).

2 señales SR-30 (Velocidad máxima 30 KPH)

4 señales SP0-01 (Obra en la Vía a 100 mts)

1 señal SP-31 (reducción de calzada).

- **Gestión y manejo de los residuos generados.**

Se realiza separación de los residuos regenerados el desarrollo de las actividades diarias, para ello, se implementa el código de colores y la separación en la fuente, para el periodo no se cuentan con puntos de depósitos plásticas, pero se realiza la adecuada separación de los residuos

Para cada una de las provincias se tienen instalados 2 puntos ecológicos distribuidos en los diferentes tramos de intervención.

- Manejo de residuos peligrosos:

Durante el periodo de reporte se generaron los siguientes residuos peligrosos en cada una de las provincias:

Tabla 23. Manejo de residuos peligrosos

PROVINCIA	MUNICIPIO	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD (Unidades)	Kg
Guavio	**Ubalá**	**Bolsas de cemento**	**0**	**0**
Oriente	**Fómeque**		**1270**	**254**
Oriente	**Chipaque**		**0**	**0**

Fuente: Interventoría.

- adquisición de agua (industrial y/o potable):

Para el periodo se reporta la compra de agua industrial para cada uno de los municipios intervenidos, en la siguiente tabla se evidencia las cantidades suministradas según la provincia y el municipio.

tabla 24. adquisición de agua para actividades de obra

PROVINCIA	MUNICIPIO	Volumen utilizado (Lt)	Lugar de Captación
Guavio	Junín	19700	Acueducto Junín
Oriente	Choachí	73000	Acueducto Choachí
Oriente	Fomeque	80500	Acueducto Fómeque

Fuente: Interventoría.

- Inspección de campamento:

Se realiza inspección de campamento, a fin de prevenir minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal.

- Unidades sanitarias portátiles USP:

Para las provincias de Oriente y Guavio, no se cuenta con unidades sanitarias portátiles, actualmente se hace uso del campamento fijo el cual tiene batería sanitaria completa con tratamiento individual de residuos líquidos, no obstante, se realizó cotización de baños portátiles para los municipios de Fómeque, Chipaque y Ubalá, se obtuvo respuesta negativa por parte de los proveedores por condiciones de cobertura en los municipios.

- Maquinaria y equipos proyecto:

Se mantienen las acciones de mantenimiento rutinario y preventivo, Verificación y seguimiento de las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos.

Se presentan las certificaciones técnico mecánica y de gases de los vehículos trabajando en obra. La gestión de la ficha se aborda desde el área SST.

- **Gestión de los RDC pétreos, de material sobrante o RCD´s aprovechables.**

Durante el periodo se reporta la generaron de material de excavación en las actividades realizadas de estabilización de rasante en cada uno de los municipios intervenidos, en la siguiente tabla se evidencia las cantidades de RCD generados en el periodo.

Tabla 25. Gestión de RCD

PROVINCIA	MUNICIPIO	Tipo de RCD	Cantidad (m3)
Guavio	Junín y Gama	Pétreos	117,2
		Finos no Expansivos	1054,4
Oriente	Choachí	Pétreos	333,9
		Finos no Expansivos	3005,3

Fuente: Interventoría.

3.2.5 Actividades ejecutadas en el mes componente social

En cumplimiento del contrato de interventoría No. 219 de 2025, correspondiente al contrato de obra No. 138 de 2025, se presenta el balance gerencial de las actividades adelantadas en el componente social durante el mes de abril del 2026. Este reporte resume las acciones en las provincias de Guavio, Medina, Soacha y Oriente, destacando los avances en los programas establecidos en el Plan de Gestión social, con el objetivo de dar cumplimiento con el fortalecimiento de la participación ciudadana, la transparencia y la articulación institucional.

De acuerdo con lo anterior se relacionan los avances del componente social en cada uno de los programas aplicables al proyecto:

3.2.5.1 Programa de Atención a la Comunidad:

En este programa se relacionan las actividades relacionadas con solicitudes ciudadanas y el uso de canales de comunicación, garantizando la comunicación entre la comunidad, el Contratista, la interventoría y la Entidad.

- **Atención de PQRSD:**

A corte del mes de abril del 2026, a continuación, se presenta el estado de las PQRSD recibidas por el Contratista a través de los canales oficiales habilitados para la atención a la comunidad:

Tabla 26 PQRSD del mes de ABRIL.

PQRSD a corte del mes de abril de 2026								
No.	**Provincia**	**Municipio**	**Peticionario**	**Recepción**	**Envío a revisión**	**Envío a revisión**	**Fecha de cierre**	**Fecha de respuesta**
5	Oriente	Choachí	Vianey Amórtegui (Integrante JAC Maza)	05/03/2026	23/03/2026	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025
6	Guavio	Ubalá	Secretaría Municipal de Planeación	05/03/2026	17/01/2026	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025
7	Oriente	Choachí	Julio Rivera	27/03/2026	16/04/2026	N/A	18/04/2026	22/04/2026
8	Oriente	Choachí	Aura Amorteguí	27/03/2026	06/04/2026	N/A	18/04/2026	08/04/2026
9	N. A	N. A	Stephany Laiton	07/04/2026	13/04/2026		23/04/2026	14/04/2026

Fuente: elaboración propia

Para mayor detalle ver el Informe social No. 13.

- **Puntos SAU:**

Los Puntos SAU (Sistema de atención al Usuario) corresponden a oficinas físicas que tienen el objetivo de ser un espacio para brindar atención a la ciudadanía, estas se determinaron para instalación de una (1) por provincia y tendrán horario de atención un (1) día a la semana, por lo tanto, a continuación, se relacionan las oficinas de atención presencial que se encontraron activas durante el mes de marzo del 2026:

Tabla 27. Puntos SAU

PUNTOS SAU ACTIVOS – ABRIL 2026

Provincia	Municipio de Ubicación	Dirección	Horario de atención
Guavio	Ubalá	Kr 3 # 03 21	Viernes, 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Oriente	Choachí	Calle 3 # 03 - 02	Miércoles, 8:00 a.m. a 4:00 p.m
Soacha	Sibaté	Salón Comunal Vereda Alto Charco	Lunes, 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fuente: elaboración propia

Este sistema de atención se complementa con los siguientes canales virtuales activos y disponibles para la comunidad en general:

WhatsApp y teléfono: 320 2451798

Correo electrónico: social138@sofaningenieria.com

Para mayor detalle ver el Informe social No. 13.

- **Buzones Satelitales:**

Los buzones satelitales constituyen una estrategia para ampliar la cobertura de la atención a la comunidad, ya que se instalan en puntos estratégicos de los tramos de intervención, donde la comunidad puede disponer sus peticiones, quejas, reclamos y/o felicitaciones.

Durante el mes de abril del 2026, se encontraban instalados de la siguiente manera:

Tabla 28. Estado de los buzones satelitales – abril 2026.

Estado de los buzones satelitales – abril 2026				
Provincia	**Municipio**	**Ubicación**	**Estado**	**Observaciones**
Guavio	Ubalá	Tienda "Donde Lucho" Inspección de Laguna Azul	Instalado	Revisado y verificado periódicamente

Estado de los buzones satelitales – abril 2026				
Provincia	**Municipio**	**Ubicación**	**Estado**	**Observaciones**
		Vereda San Luis Sector La Primavera	Instalado	Revisado y verificado periódicamente
		Vereda San Antonio Sector Casa Rosada	Instalado	Revisado y verificado periódicamente
	Junín	Alcaldía de Junín	Instalado	Revisado y verificado periódicamente
		Campamento Sueva	Instalado	Revisado y verificado periódicamente
	Gama	Predio PR 0+000	Instalado	Revisado y verificado periódicamente
Oriente	Choachí	Predio PR 0+250	Instalado	Revisado y verificado periódicamente
	Fómeque	Alcaldía de Fómeque	Instalado	Revisado y verificado periódicamente
Soacha	Sibaté	Junta de Acción Comunal Vereda de Alto Charco	Repuesto	Revisado y verificado periódicamente

Fuente: elaboración propia

Para mayor detalle ver el Informe social No. 13.

- **Recorridos de Obra**

Se usan como una estrategia para mejorar el alcance en la atención a la comunidad, haciendo presencia al área de influencia directa del proyecto, adicionalmente, se realizar recorridos con la comunidad de acuerdo con lo requerido por el área técnica o la misma comunidad, administraciones municipales, entes y /o entidades municipales:

Recorridos internos: Recorridos que se realizan para brindar atención en campo a la comunidad.

Tabla 29. Recorridos internos – abril 2026

Recorridos internos – abril 2026			
Provincia	**Municipio**	**Fecha**	**Actividad**

Guavio	Junín	01-04-2026	Atención a la comunidad
		08-04-2026	Atención a la comunidad
		17-04-2026	Atención a la comunidad
		21-04-2026	Atención a la comunidad
	Ubalá	01-04-2026	Atención a la comunidad
		24-04-2026	Atención a la comunidad
		29-04-2026	Definición alcantarillas
	Gama	08-04-2026	Atención a la comunidad
		13-04-2026	Atención a la comunidad
		22-04-2026	Atención a la comunidad
Oriente	Choachí	09-04-2026	Atención a la comunidad
	Fómeque	15-04-2026	Atención a la comunidad
Soacha	Sibaté	06-04-2026	Atención a la comunidad
		13-04-2026	Atención a la comunidad
		20-04-2026	Atención a la comunidad
		28-04-2026	Atención a la comunidad

Fuente: elaboración propia

Recorridos con la comunidad:

Tabla 30. Recorridos con la comunidad – abril 2026

Recorridos comunidad – abril 2026				
No.	**Provincia**	**Municipio**	**Fecha**	**Actividad**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: elaboración propia

Para mayor detalle ver el Informe social No. 13.

3.2.5.2 Programa de información y divulgación

El Programa de Información y Divulgación tiene como propósito garantizar una comunicación clara, oportuna y transparente entre el proyecto, las comunidades y las autoridades locales. A través de reuniones de socialización, elaboración y distribución de piezas comunicativas, cartas personalizadas, instalación de vallas y el uso de medios alternativos

- **Acciones de información:**

Este ítem hace referencia a la gestión, logística, desarrollo y elaboración de soportes de las reuniones participativas con la comunidad:

Tabla 31. Acciones de información – reuniones participativas

Reuniones participativas – abril 2026				
No de la reunión.	**Tipo**	**Provincia**	**Municipio**	**Fecha**
4	Extraordinaria	Oriente	Choachí	15-04-2026

Fuente: elaboración propia

Para mayor detalle ver el Informe social No. 13.

- **Acciones de divulgación:**

Elaboración y distribución de piezas de divulgación

En este ítem se relacionan los volantes y folletos diseñados y difundidos para informar a la comunidad:

Tabla 32. Estado de los volantes y folletos– abril 2026

Estado de los volantes– abril 2026					
No.	**Tipo**	**Provincia**	**Municipio**	**Objetivo**	**Medios de difusión**
38	Volante	Guavio	Ubalá	Comité de participación No. 13 – municipio de Ubalá	Grupo de WhatsApp
36	Volante	Oriente	Choachí	Invitación al comité de participación No. 11 – municipio de Choachí	Grupo de WhatsApp
37	Volante	Oriente	Fómeque	Invitación al comité de participación No. 10 – municipio de Junín	No distribuido
39	Volante	Oriente	Fosca	Contratación MONC– municipio de Fosca	WhatsApp
40	Volante	Oriente	Fosca	Levantamiento actas de vecindad	En trámite
11	Folleto	Oriente	Chipaque	Inicio de actividades de obra – municipio de Chipaque	Grupo de WhatsApp

Fuente: elaboración propia.

Para mayor detalle ver el Informe social No. 13.

- **Elaboración de cartas personalizadas**

A continuación, se relacionan las cartas personalizadas elaboradas y radicadas durante el mes de abril 2026:

Tabla 33. Estado de las cartas personalizadas– abril 2026

Estado de las cartas personalizadas– abril 2026						
No.	**Asunto**	**Provincia**	**Municipio**	**Destinatario**	**Medio de radicación**	**Fecha**
50	Solicitud de rocería	Guavio	Ubalá	Secretaría de Planeación	Presencial	10 de abril del 2026
51	Solicitud de rocería	Guavio	Ubalá	Alcaldía municipal	Presencial	10 de abril del 2026
52	Solicitud de rocería	Guavio	Ubalá	JACS	Presencial	10 de abril del 2026

Fuente: elaboración propia

Para mayor detalle ver el Informe social No. 13.

- **Vallas**

Contractualmente, se debe instalar una valla con la información del proyecto en cada tramo de intervención (11), por lo tanto, se relacionan las gestiones que se realizaron con respecto a estas:

Tabla 34. Estado de las vallas – abril 2026

Estado de las vallas - abril *2026*

Provincia	Municipio	Fecha de instalación	Estado
Guavio	Ubalá	28 de octubre	Instalada
	Junín	23 de octubre	Instalada
	Gama	11 de diciembre	Instalada
Oriente	Choachí	31 de octubre	Instalada
	Fómeque	21 de enero 2026	Instalada
	Chipaque	10 de marzo de 2026	Instalada
	Fosca	Pendiente	Diseños recibidos
	Quetame	Pendiente	Diseños recibidos
Medina	Medina	Pendiente	Diseños recibidos
	Paratebueno	Pendiente	Diseños recibidos
Soacha	Sibaté	19 de diciembre	Instalada

Fuente: elaboración propia.

Para mayor detalle ver el Informe social No. 13.

3.2.5.3 Programa de manejo de infraestructura de predios y servicios públicos

En este programa se reportan las actividades relacionadas con el acompañamiento social a las actividades técnicas. Para el periodo reportado únicamente se realizaron actividades en el municipio de Ubalá – provincia del Guavio, relacionadas con el levantamiento de las actas de vecindad de inicio.

- **Actas de vecindad de inicio:**

A corte del presente informe, se relaciona el estado del levantamiento de actas de vecindad:

Tabla 35. Actas de vecindad aprobadas- marzo del 2026

***A*ctas de vecindad aprobadas- abril del 2026**				
Provincia	**Municipio**	**Previstas**	**Aprobadas**	**Faltantes**
Guavio	Ubalá	39	34	5
	Junín	40	39	1
	Gama	31	31	0
Oriente	Choachí	60	59	1
	Fómeque	62	50	12
Soacha	Sibaté	15	15	0

Total	247	228	19

Fuente: elaboración propia

Para mayor detalle ver el Informe social No. 13.

- **Actas de compromiso:**

Un acta de compromiso es un documento formal mediante el cual una o varias partes dejan constancia escrita de los acuerdos, obligaciones y responsabilidades que asumen en relación con el proyecto de intervención; en ese sentido, se realizaron las siguientes gestiones durante el mes de abril del 2026, al respecto.

Tabla 36. Actas de compromiso – abril 2026

***A*ctas de compromiso- abril del 2026**				
Provincia	**Municipio**	**Asunto**	**Apertura**	**Cierre**
Soacha	Sibaté	Donación de material	29/12/2025	31/03/2026

Fuente: elaboración propia

Para mayor detalle ver el Informe social No. 13.

3.2.5.4 Programa de cultura vial y participación ciudadana.

- **Comités de participación comunitaria:**

A continuación, se relacionan las gestiones relacionadas con los comités de participación ciudadana, en cuanto a su conformación y las reuniones realizadas:

Tabla 37. Comités de participación comunitaria

Comités de participación comunitaria - abril del 2026				
Provincia	**Municipio**	**No. Asistentes**	**No. Reunión**	**Fecha**
Oriente	Choachí	3	11	23 de abril
Oriente	Fómeque	N/A	12	Cancelado
Guavio	Gama	N/A	No programada	N/A
Guavio	Junín	N/A	No programada	N/A
Guavio	Ubalá	N/A	13	Cancelado

Oriente	Fómeque	N/A	No programada	N/A
Oriente	Chipaque	N/A	No programada	N/A
Oriente	Fosca	N/A	No programada	N/A

Fuente: elaboración propia

Para mayor detalle ver el Informe social No. 13.

3.2.5.5 Programa de contratación de mano de obra.

En este programa se reporta el porcentaje de cumplimiento en cuento a vinculación de mano de obra no calificada local y paridad laboral.

- **Mano de obra no calificada local:**

Durante el periodo reportado sólo aplica el municipio de Ubalá – provincia del Guavio, ya que allí se adelantaron actividades hidráulicas, cabe aclarar que, de acuerdo con los requerimientos contractuales, el 30 % de la mano de obra no calificada vinculada del proyecto debe ser de la zona. Por lo tanto, de acuerdo con lo reportado por el Contratista se dio cumplimiento de la siguiente manera:

Tabla 38. Mano de obra no calificada – abril 2026

Mano de obra no calificada – abril 2026		
Provincia	**% MONCL**	**% Total**
Guavio	20 %	**40 %**
Oriente	20 %	

Fuente: elaboración propia

Por lo anterior, se evidencia que se dio cumplimiento a lo requerido contractualmente.

Para mayor detalle ver el Informe social No. 13.

- **Paridad laboral:**

Contractualmente, se debe garantizar que, el 5 % del personal contratado esté conformado por mujeres, por ende, de acuerdo con lo reportado por el Contratista para el mes en curso se dio cumplimiento así:

Tabla 39. Paridad laboral

Paridad laboral Provincia del Guavio	
Personal MONC total	99
Mujeres	12
Porcentaje de cumplimiento	**12 %**

Fuente: elaboración propia

Por lo anterior, se dio cumplimiento a lo requerido contractualmente, con un 12 %.

Para mayor detalle ver el Informe social No. 13.

Reportes, seguimiento y coordinación del componente social

Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes gestiones de seguimiento:

- **Informes semanales del Contratista – abril 2026:**

A continuación, se relacionan los informes semanales reportados por el contratista durante el mes de febrero:

Tabla 40. Informes semanales de contratista – abril 2026

Informes semanales del Contratista – abril 2026		
No.	**Fecha de envío**	**Periodo reportado**
42	13 de abril	4 al 10 de abril del 2026
43	21 de abril	11 al 17 de abril del 2026
44	30 de abril	18 al 24 de abril del 2026
45	4 de mayo	25 al 30 de abril del 2026

Fuente: elaboración propia

- **Mesas de trabajo – Componente social:**

Las mesas de trabajo se realizan de manera semanal para llevar realizar control y seguimiento del componente social:

Tabla 41. Mesas de abril 2026:

Mesas de trabajo – abril 2026			
No.	**Fecha**	**Participantes**	**Estado de las actas**
54	6 de abril	Profesionales sociales y del Contratista la Interventoría	Firmada
55	14 de abril	Profesionales sociales del Contratista y la Interventoría.	Firmada

Fuente: elaboración propia

3.2.6 Actividades ejecutadas en el mes componente SST

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, se ejecutaron actividades de estabilización de rasante y obras hidráulicas correspondientes a las: Fases I y II, ubicadas en la provincia del Oriente Choachi y Chipaque y en la provincia del Guavio – Ubalá.

En estos frentes de trabajo se desarrollaron actividades propias de la inspección del área de seguridad y salud en el trabajo evidenciando:

- Verificación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

En donde se evidencia el cumplimiento del plano del PMT e instalación de señales viales y el funcionamiento de los respectivos controladores viales para el paso de vehículos de hacia las veredas o municipios aledaños. Evitando así posibles accidentes de tránsito o caídas dados los avances de la obra.

- Verificación del pago de seguridad social SS:

De acuerdo con la cantidad de trabajadores, se solicita la planilla de pago de seguridad social, verificando el cubrimiento de las respectivas entidades como son ARL, EPS, CCF,

AFP y que esté de acuerdo con el nivel de riesgo establecido para esa actividad, se verifica también la seguridad social de subcontratistas en la obra.

- Inspecciones preoperacionales de vehículos y maquinaria, herramientas:

Seguimiento a la realización de preoperacionales de manera diaria y correcto diligenciamiento de estas. Se evidencia esta maquinaria en los frentes de obra.

Tabla 42. Distribución de maquinaria del lote 1 a la fecha del mes de abril del 2026.

MAQUINA	FRENTE DE OBRA
Retroexcavadora New Holand B95B	Ubalá
Vibrocompactador HAMM	
Motoniveladora Caterpillar 87V10029	
Tractor Deutz-Fahr 6180	
Volqueta WER185	
Carro tanque WTC498	
Retroexcavadora JCB 3CX	Fomeque
Motoniveladora Deere 670	
Recicladora Caterpillar RR250	
Vibrocompactador Bitelli	
Minicargador Nex Holland L223	
Volqueta INB 498	
FAE – Deutz Fahr	
Minicargador CAT	Chipaque
Motoniveladora Caterpillar	
Recicladora Caterpillar	
Vibro compactador Dinapac	

Fuente: elaboración interventoria, informe SST.

Inspecciones de camillas, botiquines, extintores y kit de derrames: Verificación de manera mensual de camilla, botiquín y se realiza la inspección de fechas de vencimiento de los insumos, la maquinaria debe tener asignado el extintor y estar en buenas condiciones. El kit de derrames debe estar en obra, cerca de la maquinaria para utilización en caso fortuito.

- Recolección de bolsas de cemento:

Esta recolección se realiza de manera diaria si se realiza actividades de estabilización o fundición de alcantarillas, deben recolectarse en su respectiva bolsa de color rojo y garantizar el traslado hasta el punto de acopio, y los demás residuos en su respectivo color de bolsa y correcta disposición.

- Entrega de dotación y reposición de elementos de protección personal (EPP):

Se evidencia la entrega de dotación para el personal nuevo y la reposición de elementos de protección personal para personal que lo necesite según su desgaste o daño.

- Actividades de orden y aseo:

Se inspecciona los frentes de trabajo al terminar la jornada laboral o al inicio. Se debe dejar los lugares de trabajo sin ningún obstáculo que genere un acto o condición insegura, para los trabajadores o para terceros.

Se solicita en el área de la bodega realizar orden y aseo, este se notifica de manera verbal y también en oficio solicitando un programa de orden y aseo que sea funcional y se cumpla. Se acompaña de solicitud por la parte ambiental.

Mesa de trabajo con el contratista: Se realiza el día 21 de abril del 2026 y se socializa las recomendaciones con cada uno de los ítems que se encontraron en el informe gerencial para su mejora.

Se repasan los compromisos pendientes del comité de seguimiento de parte del contratista e interventoría para su cumplimiento.

- Cronograma de actividades de la profesional en campo – Ubalá.
- Informe de cada provincia, entregables, Excel del personal, colocar en las fotografías la ubicación y que sean del mes en mención.
- Tarjetas de observación anexar 2 por mes, 1 por provincia.
- Entrega de ATS por la actividad de obras hidráulicas.

- Respuesta de oficio emitido por la documentación del SG-SST.

Mesa de trabajo Interventoría: componentes social, ambiental y SST, reunión realizada el 30 de abril del 2026, donde se tratan temas del PMT y PAGA.

- Señalización y delimitación de excavaciones:

En el frente de obra de Junin se realiza inspección de las obras hidráulicas ya que están asociadas al control de condiciones y actos inseguros, por la ausencia o deficiencia en la demarcación y señalización de las áreas intervenidas. Se solicita que se realice la respectiva señalización al termino de cada jornada laboral dejando con evidencia el registro fotográfico.

La adecuada instalación de señalización preventiva, delimitación perimetral y elementos de protección colectiva constituye una medida fundamental de control para la prevención de caídas a distinto nivel, atrapamientos o incidentes derivados del tránsito no controlado en zonas de excavación.

Revisión y aprobación de documentación: se realiza la revisión de los informes semanales y mensuales enviados de los frentes de obra de Chipaque y Ubalá, para su respectiva aprobación o subsanación, así como la elaboración de los respectivos oficios administrativos.

- Inspección actividades de construcción:

Supervisión en las actividades como el cargue y descargue de cemento, uso correcto de los elementos de protección personal, manejo de cargas en el traslado de campamento.

- Señalización de carrotanque:

Se evidencia que el contratista acato las recomendaciones emitidas por el área ambiental y retiro los logos que no eran del producto que transportaba del camión.

3.2.7 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A. Relación de personal del contratista

Toda la relación referente al personal del contratista se encuentra consignada en el informe del componente SST, ver en anexo 11 carpeta componente SST.

De acuerdo con las actividades de este periodo el contratista entrega la seguridad social que se encuentra en el anexo 2, Anexos Consorcio Sofán vinculado, Componente SST, del siguiente personal:

A. Consorcio Sofán
B. Sofán Ingeniero
C. Tecnisuelos y Pavimentos
D. Urbanuz Construcciones
E. Jefferson Amézquita
F. Jorge Sánchez (Especialistas).
G. Armando Ruiz (Especialista).
H. Jefferson Amézquita (Independiente).
I. Carlos Mauricio Cifuentes (Independiente)
J. Fiza SAS
K. Hugo Fernando Marroquín Escobar.
L. Jesús Buitrago (Rotativo)

Tabla 43. Resumen Distribución del personal del contratista para el mes de abril 2026

Choachi	Fomeque	Chipaque	Ubalá	Administración
2 trabajadores	27 trabajadores	17 trabajadores	22 trabajadores	17 trabajadores

Fuente: elaboración interventoría, informe SST

4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Para el informe mensual el contratista reporta el valor ejecutado mensual de DOS MIL QUINIENTO SEIS MILLLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS **($ 2.506.903.846,81)** lo cual corresponde a las actividades de la fase III del proyecto durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026. Por lo tanto, se tiene un acumulado ejecutado de **CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENT Y CINCO PESOS CON DIECISIETE PESOS ($ 14.636.848.195,17)** hasta la fecha.

Tabla 44. tabla de control presupuesto ejecutado semanal del contratista

PROGRAMACION						EJECUCION				INDICADORES	
		TOTALES				TOTALES				VARIACION	IEP
No.	Fecha	SEMANA	ACUMULADO	CPTP(Millones)	% PROG.	SEMANA	ACUMULADO	CPTR (Millones)	% EJEC	% EJEC - % PROG.	CPTR/CPTP
semana 1	16/04/2025	$ 16.874.004,30	$ 16.874.004,30	$ 16,87	0,05%	$ 43.661.486,00	$ 43.661.486,00	$ 43,66	0,12%	0,08%	2,59
semana 2	25/04/2025	$ 71.111.875,23	$ 87.985.879,53	$ 87,99	0,25%	$ 61.611.208,17	$ 105.272.694,17	$ 105,27	0,30%	0,05%	1,20
semana 3	2/05/2025	$ 55.744.478,47	$ 143.730.357,99	$ 143,73	0,41%	$ 63.074.310,74	$ 168.347.004,91	$ 168,35	0,48%	0,07%	1,17
semana 4	9/05/2025	$ 157.338.037,49	$ 301.068.395,48	$ 301,07	0,85%	$ 296.404.548,09	$ 464.751.553,00	$ 464,75	1,31%	0,50%	1,54
semana 5	16/05/2025	$ 199.494.927,25	$ 500.563.322,73	$ 500,56	1,42%	$ 258.847.011,65	$ 723.598.564,65	$ 723,60	2,05%	0,69%	1,45
semana 6	23/05/2025	$ 166.745.415,42	$ 667.308.738,15	$ 667,31	1,89%	$ 125.990.876,85	$ 849.589.441,50	$ 849,59	2,40%	0,59%	1,27
semana 7	30/05/2025	$ 180.716.896,91	$ 848.025.635,07	$ 848,03	2,40%	$ 132.744.400,84	$ 982.333.842,34	$ 982,33	2,78%	0,46%	1,16
semana 8	6/06/2025	$ 281.338.648,42	$ 1.129.364.283,49	$ 1.129,36	3,19%	$ 41.478.569,23	$ 1.023.812.411,57	$ 1.023,81	2,90%	-0,21%	0,91
semana 9	13/06/2025	$ 260.487.774,16	$ 1.389.852.057,64	$ 1.389,85	3,93%	$ 98.562.080,84	$ 1.122.374.492,41	$ 1.122,37	3,18%	-0,76%	0,81
semana 10	20/06/2025	$ 332.536.623,38	$ 1.722.388.681,03	$ 1.722,39	4,87%	$ 56.953.759,79	$ 1.179.328.252,20	$ 1.179,33	3,34%	-1,54%	0,68
semana 11	27/06/2025	$ 373.544.117,98	$ 2.095.932.799,00	$ 2.095,93	5,93%	$ 67.837.316,00	$ 1.247.165.568,20	$ 1.247,17	3,53%	-2,40%	0,60
semana 12	4/07/2025	$ 371.397.703,56	$ 2.467.330.502,55	$ 2.467,33	6,98%	$ 70.586.372,53	$ 1.317.751.941,00	$ 1.317,75	3,73%	-3,25%	0,53
semana 13	11/07/2025	$ 344.598.744,22	$ 2.811.929.246,76	$ 2.811,93	7,95%	$ 47.542.714,44	$ 1.365.294.655,17	$ 1.365,29	3,86%	-4,09%	0,49
semana 14	18/07/2025	$ 759.387.682,03	$ 3.571.316.928,80	$ 3.571,32	10,10%	$ 79.717.426,83	$ 1.445.012.082,00	$ 1.445,01	4,09%	-6,01%	0,40
semana 15	25/07/2025	$ 822.872.298,22	$ 4.394.189.227,03	$ 4.394,19	12,43%	$ 48.635.647,25	$ 1.493.647.729,25	$ 1.493,65	4,23%	-8,21%	0,34
semana 16	1/08/2025	$ 906.147.843,12	$ 5.300.337.070,15	$ 5.300,34	14,99%	$ 33.661.131,13	$ 1.527.308.860,37	$ 1.527,31	4,32%	-10,67%	0,29
semana 17	8/08/2025	$ 972.953.608,32	$ 6.273.290.678,49	$ 6.273,29	17,75%	$ 64.246.379,65	$ 1.591.555.240,02	$ 1.591,56	4,50%	-13,24%	0,25
semana 18	15/08/2025	$ 800.147.227,63	$ 7.073.437.906,11	$ 7.073,44	20,01%	$ 83.876.846,14	$ 1.675.432.086,16	$ 1.675,43	4,74%	-15,27%	0,24
semana 19	22/08/2025	$ 1.073.638.193,85	$ 8.147.076.099,96	$ 8.147,08	23,05%	$ 36.751.440,51	$ 1.712.183.526,67	$ 1.712,18	4,84%	-18,20%	0,21
semana 20	29/08/2025	$ 982.196.191,80	$ 9.129.272.291,75	$ 9.129,27	25,83%	$ 186.400.993,55	$ 1.898.584.520,23	$ 1.898,58	5,37%	-20,45%	0,21
semana 21	5/09/2025	$ 773.270.563,77	$ 9.902.542.855,52	$ 9.902,54	28,01%	$ 217.151.381,08	$ 2.115.735.901,31	$ 2.115,74	5,99%	-22,03%	0,21
semana 22	12/09/2025	$ 897.933.564,08	$ 10.800.476.419,58	$ 10.800,48	30,55%	$ 68.010.756,69	$ 2.183.746.658,00	$ 2.183,75	6,18%	-24,38%	0,20
semana 23	19/09/2025	$ 788.401.131,34	$ 11.588.877.550,92	$ 11.588,88	32,78%	$ 113.514.921,41	$ 2.297.261.579,41	$ 2.297,26	6,50%	-26,28%	0,20
semana 24	26/09/2025	$ 937.875.310,87	$ 12.526.752.861,81	$ 12.526,75	35,44%	$ 18.968.806,68	$ 2.312.239.722,77	$ 2.312,24	6,54%	-28,90%	0,18
semana 25	3/10/2025	$ 1.317.898.987,44	$ 13.844.651.849,24	$ 13.844,65	39,16%	$ 61.512.509,36	$ 2.377.742.895,45	$ 2.377,74	6,73%	-32,44%	0,17
semana 26	10/10/2025	$ 1.403.736.117,44	$ 15.248.387.966,66	$ 15.248,39	43,14%	$ 197.820.608,50	$ 2.575.563.503,95	$ 2.575,56	7,29%	-35,85%	0,17
semana 27	17/10/2025	$ 920.647.732,67	$ 16.169.035.699,34	$ 16.169,04	45,74%	$ 294.380.229,06	$ 2.869.943.733,01	$ 2.869,94	8,12%	-37,62%	0,18
semana 28	24/10/2025	$ 1.097.811.581,30	$ 17.266.847.280,66	$ 17.266,85	48,85%	$ 148.436.361,71	$ 3.018.380.094,71	$ 3.018,38	8,54%	-40,31%	0,17
semana 29	31/10/2025	$ 1.151.330.177,87	$ 18.418.177.458,52	$ 18.418,18	52,10%	$ 312.378.422,28	$ 3.330.758.517,00	$ 3.330,76	9,42%	-42,68%	0,18
semana 30	7/11/2025	$ 1.136.926.999,56	$ 19.555.104.458,09	$ 19.555,10	55,32%	$ 161.428.539,06	$ 3.492.187.056,06	$ 3.492,19	9,88%	-45,44%	0,18
semana 31	14/11/2025	$ 988.441.084,52	$ 4.798.839.913,25	$ 4.798,84	13,58%	$ 363.269.475,94	$ 3.855.456.531,99	$ 3.855,46	10,91%	-2,67%	0,80
semana 32	21/11/2025	$ 867.199.990,19	$ 5.666.039.903,44	$ 5.666,04	16,03%	$ 198.054.852,15	$ 4.053.511.384,14	$ 4.053,51	11,47%	-4,56%	0,72
semana 33	28/11/2025	$ 960.834.740,83	$ 6.626.874.644,27	$ 6.626,87	18,75%	$ 160.435.559,80	$ 4.213.946.943,94	$ 4.213,95	11,92%	-6,83%	0,64
semana 34	5/12/2025	$ 1.354.839.595,00	$ 7.981.714.239,27	$ 7.981,71	22,58%	$ 196.380.381,53	$ 4.410.327.325,47	$ 4.410,33	12,48%	-10,10%	0,55
semana 35	12/12/2025	$ 2.122.882.445,39	$ 10.104.596.684,66	$ 10.104,60	28,58%	$ 150.331.648,46	$ 4.560.658.973,93	$ 4.560,66	12,90%	-15,68%	0,45
semana 36	19/12/2025	$ 467.871.246,67	$ 4.968.281.366,16	$ 4.968,28	14,47%	$ 475.115.138,19	$ 5.035.774.112,11	$ 5.035,77	14,25%	0,19%	1,01
semana 37	26/12/2025	$ 389.892.705,54	$ 5.358.174.071,70	$ 5.358,17	15,61%	$ 248.027.166,16	$ 5.283.801.278,28	$ 5.283,80	14,95%	-0,21%	0,99
semana 38	2/01/2026	$ 393.104.531,54	$ 5.751.278.603,24	$ 5.751,28	16,75%	$ 58.561.180,37	$ 5.342.362.458,65	$ 5.342,36	15,11%	-1,16%	0,93
semana 39	9/01/2026	$ 493.943.587,85	$ 6.245.222.191,09	$ 6.245,22	18,19%	$ 104.098.298,39	$ 5.446.460.757,04	$ 5.446,46	15,41%	-2,26%	0,87
semana 40	16/01/2026	$ 547.800.508,82	$ 6.793.022.699,91	$ 6.793,02	19,22%	$ 190.943.672,95	$ 5.637.404.429,99	$ 5.637,40	15,95%	-3,27%	0,83
semana 41	23/01/2026	$ 405.594.408,33	$ 6.211.850.197,66	$ 6.211,85	18,09%	$ 826.396.098,69	$ 6.463.800.528,68	$ 6.463,80	18,29%	0,71%	1,04
semana 42	30/01/2026	$ 344.401.728,11	$ 6.556.251.925,77	$ 6.556,25	19,10%	$ 458.162.737,90	$ 6.921.963.266,58	$ 6.921,96	20,16%	1,07%	1,06
semana 43	6/02/2026	$ 474.130.732,50	$ 7.030.382.658,27	$ 7.030,38	20,48%	$ 361.834.379,82	$ 7.283.797.646,40	$ 7.283,80	21,21%	0,74%	1,04
semana 44	13/02/2026	$ 686.150.079,99	$ 7.716.532.738,25	$ 7.716,53	22,47%	$ 1.764.711.868,97	$ 9.048.509.515,36	$ 9.048,51	26,35%	3,88%	1,17
semana 45	20/02/2026	$ 700.298.198,82	$ 8.416.830.937,09	$ 8.416,83	24,51%	$ 729.030.913,62	$ 9.777.540.428,99	$ 9.777,54	28,48%	3,96%	1,16
semana 46	27/02/2026	$ 776.060.093,90	$ 9.192.891.030,99	$ 9.192,89	26,77%	$ 366.279.692,78	$ 10.143.820.121,77	$ 10.143,82	29,54%	2,77%	1,10
semana 47	6/03/2026	$ 917.756.973,24	$ 10.110.648.004,23	$ 10.110,65	29,45%	$ 261.695.020,84	$ 10.405.515.142,60	$ 10.405,52	30,31%	0,86%	1,03
semana 48	13/03/2026	$ 1.247.639.912,05	$ 11.358.287.916,30	$ 11.358,29	33,08%	$ 822.329.518,64	$ 11.227.844.661,24	$ 11.227,84	32,70%	-0,38%	0,99
semana 49	20/03/2026	$ 1.089.604.138,94	$ 12.447.892.055,25	$ 12.447,89	36,25%	$ 526.472.172,22	$ 11.754.316.833,47	$ 11.754,32	34,23%	-2,02%	0,94
semana 50	27/03/2026	$ 847.512.441,46	$ 13.295.404.496,72	$ 13.295,40	38,72%	$ 375.627.514,90	$ 12.129.944.348,36	$ 12.129,94	35,33%	-3,39%	0,91
semana 51	3/04/2026	$ 758.018.898,59	$ 14.053.423.395,32	$ 14.053,42	40,93%						
semana 52	10/04/2026	$ 763.908.187,41	$ 14.817.331.582,74	$ 14.817,33	43,16%						

Fuente: informe semanal 50

4.1 Estado General del Tiempo

La interventoría reporta el certificado de comportamiento de los días del mes conforme aparece en la base de datos de IDEAM, el cual cuenta con registro diario del estado general del tiempo de las estaciones pluviométricas que se encuentran activas cercanas a cada municipio de cada una de las provincias donde se ejecutan actividades. Esta información permite llevar un control detallado de las condiciones climáticas donde el contratista viene desarrollando actividades, de igual manera el contratista también lleva registro de novedad de lluvias mediante bitácora de obra, este registro es comparado con los reportes de información Hidrometeorológica de DHIME del IDEAM de los cuales la interventoría toma como referencia para verificar la información entregada por el contratista de obra.

A continuación, se detallan el valor de la precipitación mensual de cada provincia:

Tabla 45. Resumen precipitaciones mensual

Provincia	Precipitación (mm)
Guavio	181,4
Medina	242.4
Soacha	209,7
Oriente	86,7

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con los últimos datos tomados en el mes de abril es evidente el aumento de las lluvias en cada una de las provincias pertenecientes al lote 1, De igual manera se anexan los registros pluviométricos por cada provincia en su municipio más representativo, ver en la carpeta componente técnico n°1.11 reportes IDEAN CLIMA.

4.2 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Entre el **01 y el 30 de abril de 2026**, la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad, verificando que se esté implementando las acciones para el cumplimiento de los componentes implicados durante la ejecución de actividades del mes, a continuación se realiza un resumen de los resultados obtenidos de igual manera todos los resultados representados en este capítulo se encuentran dentro de la carpeta del componente técnico anexo 1.9 resultados de laboratorio.

CONCRETOS

- **Resultados resistencia a la compresión, alcantarillas, municipio de Junin.**

A la fecha de elaboración del presente informe se cuenta con los resultados obtenidos por el laboratorio de la interventoría y contratista de las 4 alcantarillas ejecutadas en el municipio de Junin. De acuerdo con la revisión realizada de los resultados del contratista

y comprobada con los resultados obtenidos por interventoría todas las muestras cumplieron con la resistencia equivalente a 3000 PSI para estructuras de drenaje como lo solicitan las especificaciones NSR-10.

- **Resultados resistencia a la compresión, alcantarillas, municipio de Gama.**

A la fecha del presente informe, el contratista de obra realizó la entrega del archivo ajustado conforme a la solicitud efectuada, teniendo en cuenta que la versión inicialmente presentada no incluía la identificación ni el nombre de los elementos correspondientes a cada registro.

De acuerdo con la información suministrada por el contratista, se anexaron los resultados de resistencia correspondientes a las cuatro (4) alcantarillas ejecutadas en este municipio. Una vez revisados los resultados entregados, se evidencia que estos cumplen con los valores de resistencia requeridos, considerando la edad de falla de las muestras y la resistencia especificada para cada elemento evaluado.

Los resultados tanto de interventoría como de contratista se anexan al presente informe en la carpeta **Anexo 1.9 – Resultados de laboratorio**, dentro del componente técnico.

DENSIDADES

- **Densidades rasantes estabilizada con cemento más aditivo Proes municipio de Junín.**

Dando seguimiento a las actividades que viene desarrollando el contratista de obra en relación a la estabilización de 9,2 km de vía en el municipio de Junín y dando seguimiento a las condiciones en que el terreno queda estabilizado el contratista de obra ha venido realizado una serie de ensayos de laboratorio en campo con densímetro nuclear a fin de determinar la densidad del material y el porcentaje(%) de compactación de la estructura

de la capa final del tramo antes de su ejecución y después, teniendo en cuenta lo anterior se tiene un avance del 100% del tramo ejecutado lo que equivale a un longitud intervenida de 9261 ml. Se espera seguir realizado actividades de laboratorio en campo a fin de terminar de consolidar la información esto teniendo en cuenta que ya se cumple con los 28 días de curado del suelo cemento.

El contratista de obra ha realizado la toma de densidades y LWD pero no ha realizado entrega de los resultados densidades y LWD obtenidos de laboratorio desde el PR 4+220 hasta el PR9+286 estos, estos no han sido entregados por parte del contratista teniendo en cuenta que se presentan problemas financieros con el laboratorio debido a que no se han podido tramitar las primeras actas de pago al contratista, lo que dificulta al contratista el pago al subcontratista de laboratorio, se está a la espera de que el contratista logre solucionar esta situación y pueda entregar esta información teniendo en cuenta que en campo ya fue tomada.

- **Resultados ensayos a la rasante estabilizada con cemento más aditivo Proes municipio de Choachí.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control a las obras de tratamiento superficial simple en las diferentes veredas de Choachí. Por parte del Contratista de obra se encuentran pendientes las tomas de densidad in situ del PR13+330 al PR14+320, ejecutadas conforme a la norma INVIAS 164-13, y mediciones con equipo de deflectómetria de impacto ligero (LWD), realizados de acuerdo con la norma INVIAS E 826-22 de los tramos intervenidos durante el mes de marzo, esto con el fin de evaluar las condiciones de compactación y la capacidad estructural de la capa estabilizada. De igual forma se encuentra pendiente la toma de la medida del coeficiente de resistencia al deslizamiento usando el péndulo británico conforme a la norma INVIAS 792-13. Adicionalmente se

adjuntan los certificados de materiales en el Anexo 1. Componente técnico / 1.9 Resultados de laboratorios.

- **Resultados ensayos a la rasante estabilizada con cemento más aditivo Proes municipio de Fomeque.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control a las obras de estabilización de rasante en las diferentes veredas de Fomeque. Por parte del Contratista de obra se encuentran pendientes las tomas de densidad in situ del Tramo 1 desde PR01+800 al PR03+500, ejecutadas conforme a la norma INVIAS 164-13, y mediciones con equipo de deflectómetria de impacto ligero (LWD), realizados de acuerdo con la norma INVIAS E 826-22 de los tramos intervenidos durante el mes de marzo y abril, esto con el fin de evaluar las condiciones de compactación y la capacidad estructural de la capa estabilizada.

- **Resultados ensayos a la rasante estabilizada con cemento más aditivo Proes municipio de Chipaque.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control a las obras de estabilización de rasante en las diferentes veredas de Chipaque. Por parte del Contratista de obra se encuentran pendientes las tomas de densidad in situ del Tramo 1 desde PR00+200 al PR01+240, ejecutadas conforme a la norma INVIAS 164-13, y mediciones con equipo de deflectómetria de impacto ligero (LWD), realizados de acuerdo con la norma INVIAS E 826-22 de los tramos intervenidos durante el mes de abril, esto con el fin de evaluar las condiciones de compactación y la capacidad estructural de la capa estabilizada.

- **Resultados ensayos a la rasante estabilizada con cemento más aditivo Proes municipio de Sibaté.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control a las obras de tratamiento superficial simple en las diferentes veredas de Sibaté. Por parte del Contratista de obra se encuentran pendientes la toma de la medida del coeficiente de resistencia al deslizamiento usando el péndulo británico conforme a la norma INVIAS 792-13. Adicionalmente se adjuntan los certificados de materiales en el Anexo 1. Componente técnico / 1.9 Resultados de laboratorios.


4.2.1 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

- **Resultados ensayos Interventoría municipio de Choachí.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control a las obras de estabilización de rasante en las diferentes veredas intervenidas en el municipio de Choachí. Como parte del control de calidad, por parte de la Interventoría se realizaron ensayos de laboratorio en campo, consistentes en la toma de densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena in situ, ejecutadas conforme a la norma INVIAS 161-13. Estos ensayos se aplicaron en los diferentes tramos intervenidos con el fin de evaluar las condiciones de compactación y la capacidad estructural de la capa estabilizada, cuyos resultados se presentan y analizan en el presente informe.

Por parte de la Interventoría se tomaron ensayos en la vereda **Chatasuga, La Llanada, Maza, Ferralarada y Barronegro.** De acuerdo con las densidades tomadas por interventoría se tienen los siguientes resultados los cuales se exponen en la siguiente gráfica:

Ilustración 1. Resultados ensayos de Interventoría

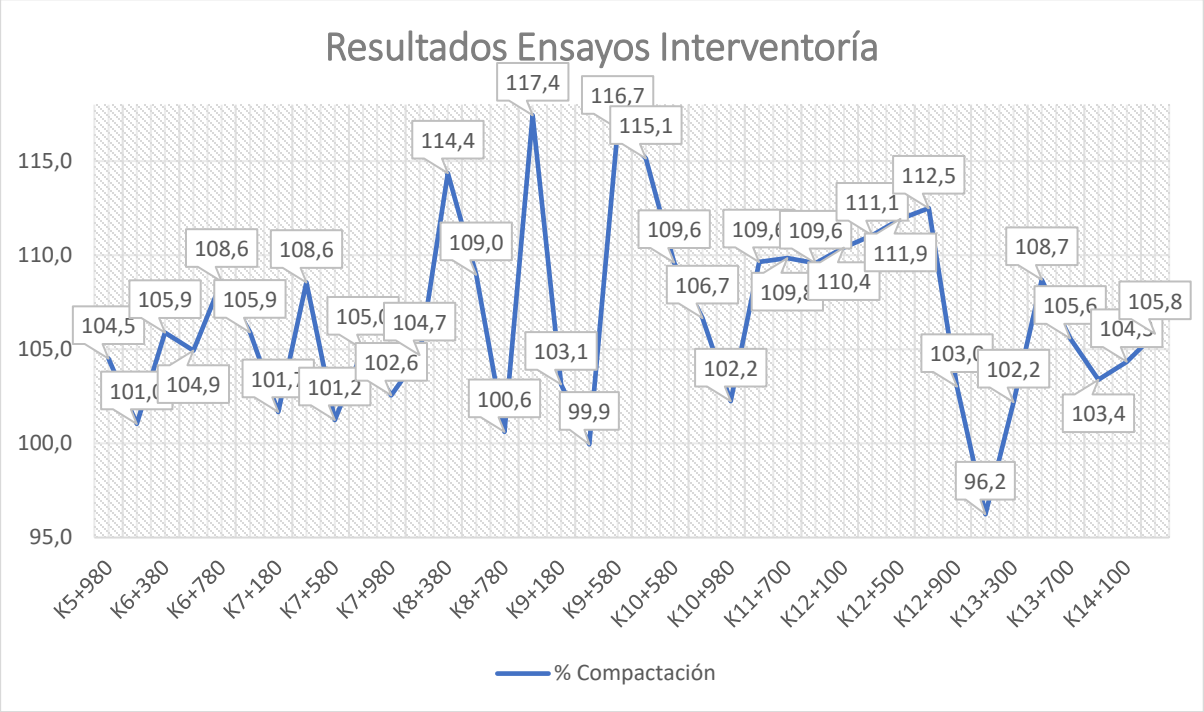

Fuente: elaboración propia


Del análisis de los resultados obtenidos en los ensayos de densidad, se evidencia que se tiene un promedio del 106,7% de compactación, frente a esto se concluye que los valores registrados cumplen con los parámetros y criterios establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto y en la normativa aplicable. En consecuencia, las capas estabilizadas presentan condiciones satisfactorias de compactación y comportamiento estructural, evidenciando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para las actividades de mejoramiento de vías terciarias. De igual forma se adjuntan los resultados en el Anexo 1. Componente técnico / 1.9 Resultados de laboratorios.

- **Resultados ensayos Interventoría municipio de Fomeque.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control a las obras de estabilización de rasante en las diferentes veredas intervenidas en el municipio de Fomeque. Como parte del control de calidad, por parte de la Interventoría se realizaron ensayos de laboratorio en campo, consistentes en la toma de densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena in situ, ejecutadas conforme a la norma INVIAS 161-13. Estos ensayos se aplicaron en los diferentes tramos intervenidos con el fin de evaluar las condiciones de compactación y la capacidad estructural de la capa estabilizada, cuyos resultados se presentan y analizan en el presente informe.

Por parte de la Interventoría se tomaron ensayos en las diferentes veredas intervenidas**.** De acuerdo con las densidades tomadas por interventoría se tienen los siguientes resultados los cuales se exponen en la siguiente gráfica:

Ilustración 2. Resultados ensayos de Interventoría

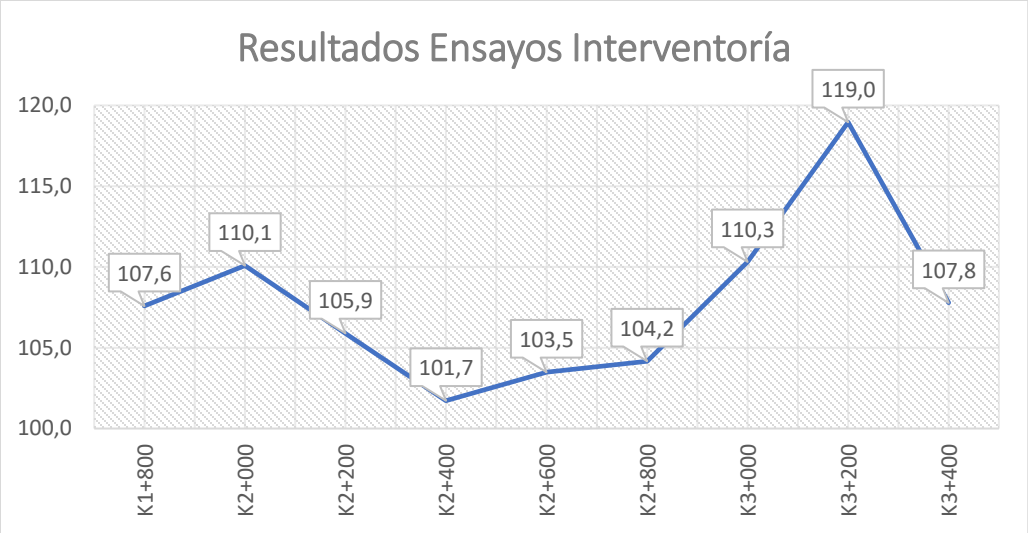

Fuente: elaboración propia

Del análisis de los resultados obtenidos en los ensayos de densidad, se evidencia que se tiene un promedio del 107,8% de compactación, frente a esto se concluye que los valores registrados cumplen con los parámetros y criterios establecidos en las especificaciones técnicas del proyecto y en la normativa aplicable. En consecuencia, las capas estabilizadas presentan condiciones satisfactorias de compactación y comportamiento estructural, evidenciando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para las actividades de mejoramiento de vías terciarias. De igual forma se adjuntan los resultados en el Anexo 1. Componente técnico / 1.9 Resultados de laboratorios.

- **Resultados ensayos Interventoría municipio de Chipaque.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control a las obras de estabilización de rasante en las diferentes veredas intervenidas en el municipio de Choachí. Por parte de la Interventoría

se encuentra pendiente la toma de densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena in situ, ejecutadas conforme a la norma INVIAS 161-13. Dado que a la fecha del presente informe no se han cumplido los 28 días para que la rasante alcance su máxima resistencia.

- **Resultados ensayos Interventoría municipio de Sibaté.**

Durante el período correspondiente al mes del presente informe, se llevaron a cabo actividades de seguimiento y control a las obras del TSS (Recubrimiento Superficial Simple) en las diferentes veredas intervenidas en el municipio de Sibaté. Como parte del control de calidad, por parte de la Interventoría se realizaron ensayos de laboratorio sobre agregados gruesos, finos y suelos asociados. Dentro de estos se incluyeron el análisis granulométrico, resistencia al desgaste mediante máquina de Los Ángeles y ensayo Micro-Deval, evaluación de solidez frente a sulfatos, determinación de la limpieza superficial, índice de aplanamiento y alargamiento, porcentaje de partículas fracturadas y ensayo de adherencia en bandeja.

Adicionalmente, se realizaron ensayos sobre materiales finos y suelos, tales como la determinación de los límites de Atterberg (límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad), equivalente de arena y valor de azul de metileno. Los resultados obtenidos permiten caracterizar el comportamiento físico-mecánico de los materiales y verificar su cumplimiento con las especificaciones técnicas vigentes.

Los resultados obtenidos se adjuntan en el anexo 1.9 Resultados de laboratorio.


- **Resultados ensayos Interventoría municipio de Junín.**
- **CONCRETOS**

Por parte de interventoría también fueron enviadas las muestras a laboratorio y se reportan los resultados en el próximo periodo.

DENSIDADES Y LWD

La interventoría ha realizado un seguimiento de las densidades mediante el método de cono y arena, después de la intervención realizado por el contratista de obra desde el PR0+000 hasta el PR 3+800 realizando una revisión de los trabajos ejecutados que cumplan con los 28 días de curado del cemento para la estabilización de la rasante, los cuales se encuentran en revisión por parte de los especialistas de pavimento y geotecnia. De acuerdo con las densidades tomadas por interventoría se tienen los siguientes resultados consolidados:

Ilustración 3. Resultados ensayos de Interventoría

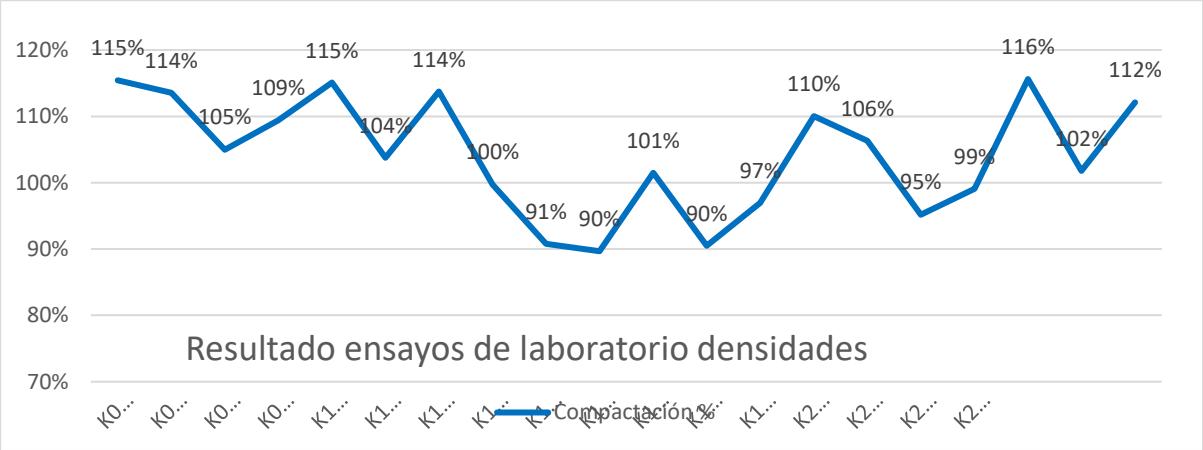

Fuente: elaboración propia

4.3 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)

La Interventoría realizó durante el periodo del presente informe el seguimiento al plan de gerencia del contratista, y teniendo en cuenta las líneas base del cronograma, presupuesto y alcance; se realizaron las siguientes actuaciones administrativas:

- Se realizó la relación de facturas y cuentas cobro como soportes de la inversión del anticipo de Interventoría, mediante el comunicado 766-718 Respuesta al comunicado ICCU-I-2026-0003847. Relación mes a mes de facturas y cuentas de cobro pagadas con el desembolso al proveedor JASB del 30 de marzo del 2026.

- Se emitió el oficio 766-723 Incumplimiento pago Seguridad Social marzo 31 2026, por el no pago de aportes (salud, pensión, ARL), correspondiente a pensión de febrero, salud de marzo con NIT 900.012.888-7.
- Se realizó aprobación de materiales instalados en Sibaté tras la revisión y control de ensayos recibidos del Contratista, contrastado con los ensayos realizados por Interventoría. Ver oficio 766-731 Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-647 Aprobación resultados de ensayos de laboratorio de agregados pétreos y emulsión asfáltica.
- Mediante el comunicado 766-728 Aprobación INFORME MENSUAL MES DE DICIEMBRE V4.-RTA Oficio N.º SOFAN-FOR-CO-031-ICCU031-683, se aprobó el informe del mes de enero del 2026. Por otro lado, se dio aprobación y viabilidad técnica de los APUS de los NP6, NP7y NP8 a través del oficio 766-729 Revisión y aprobación de APUS de las actividades TSS, Berma Cuneta Concreto y Cunetas en material estabilizado-RTA SOFAN 672-678-68 y 766-735 Aprobación y viabilidad técnica de los Análisis de Precios Unitarios (APU) ajustados para las actividades NP6, NP7 y NP8. Finalmente, se dio traslado al contratista por requerimiento de la entidad de Registro Fotográfico de actividades en los municipios Intervenidos, antes, durante y después de la ejecución de actividades.
- Se reiteró la entrega del informe subsanado del mes de enero del 2026 mediante el oficio 766-747 Solicitud de remisión y subsanación de INFORME MENSUAL No. 10 ENERO V3
- Se remitió incumplimiento por la no entrega del informe mensual del mes de marzo del 2026, mediante el comunicado, 766-744 Incumplimiento en la entrega de informe mensual # 12 del mes de marzo de 2026-CTO 138-2025. Por otro lado, se dio respuesta al oficio ICCU 04255 para atender observaciones de forma y complementar oficios radicados a la entidad. Ver oficio 766-748 Respuesta oficio ICCU-I-2026-0004255-Complementación y ajuste de documentos-FASES I-II-III.

Adicionalmente se remitió aclaración al informe de buen manejo del anticipo del mes de agosto del 2026 mediante el comunicado 766-749 Respuesta oficio ICCU-I-2026-0004766-aclaración del comunicado 766-718

- En este aspecto se radicó al contratista observaciones al desfase de la línea base del cronograma N4 mayor al 5%, donde se requiere y se conmina al contratista a la entrega inmediata del plan de contingencia para el restablecimiento de la reprogramación de obra. Ver oficio 766-758 Observaciones por desfase del cronograma de obra a corte del 21 de abril del 2026-CTO-138-2025 Lote 1.
- Se remitió al contratista la revisión integral del informe de marzo del 2026, con el comunicado 766-750 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL MES DE MARZO 2026 V1 RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-702. Se realizó la viabilidad técnica y aprobación de los APUS NP7.1 Y NP7.2 berma cuneta en concreto del 3000 PSI E=0,12 M y ancho de 0,80 y 0,60 m respectivamente, mediante el comunicado 766-752 Aprobación y Revisión oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-700 Radicación ajustada de APUs NP.7 – Berma cuneta en concreto y 766-761 Aprobación y Revisión oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-713 Alcance al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-700 – Radicación de APUs de cunetas de concreto por provincia. Se emitió la aprobación del informe mensual del mes de enero del 2026, a través del oficio 766-759 Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-706, aprobación del informe mensual del mes de enero N°10, V4. y de febrero del 2026 con el comunicado 766-760 Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-710, aprobación del informe mensual del mes de FEBRERO N°11, V3.
- Se radicó a la entidad la aprobación de APUS de berma cunetas en concreto de 3000 PSI mediante el oficio 766-763 Notificación- Aprobación APUS Berma Cunetas Concreto Provincias Lote 1.
- Se realizó la aprobación de los informes de caracterización de la fase dos de la provincia de Medina, a través del oficio 766-769 Aprobación informe de

caracterización Medina V4-Revisión oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-702 y 766-770 Aprobación informe de caracterización Paratebueno V4-Revisión oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-707. Se e emitieron observaciones al registro fotográfico recibido, para que sean atendidas según el oficio 766-773 Respuesta y revisión SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-708- solicitud de registro fotográfico – Radicado ICCU-I-2026-0004836.

- Se emitió la viabilidad de los escenarios en versión N° 3 de los presupuestos de intervención de los municipios del lote 1 con la inclusión de los ítems de cunetas en concreto reforzado fundida in situ mediante el comunicado 766-768 Notificación-Viabilidad de escenarios para las cuatro provincias del Lote 1- RTA FOR-CO-03-720 y 725 entrega de Balances actualizados. Fueron radicados en la entidad los productos de las fases I, II y III del CTO 138 del 2025 mediante el comunicado 766-776 Entrega de presupuestos oficiales y productos fase II PROVINCIA MEDINA-RTA ICCU-I-2026-0000124. Asimismo, fue cargado en el drive la información anterior según lo señalado en los oficios y anexos del comunicado 766-777 Actualización documentos-FASES I-II-III-Respuesta oficio ICCU-I-2026-0004255.

4.3.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

La Interventoría realizó seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo presentado por el Contratista de Obra CONSORCIO SOFAN C-031, por un total acumulado aprobado y tramitado por interventoría de $10.105.667.370,00 del anticipo de obra del contrato ICCU-138-2025, conforme al plan de inversión del anticipo de obra V4 aprobado mediante el comunicado *766- 664 Revisión y aprobación – Plan de Inversión Anticipo V4 – Respuesta al comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-622* del 05 de marzo del 2026.

Se realizó aprobación del informe de buen manejo del anticipo del mes de noviembre del 2025, mediante el comunicado *766-764 Aprobación Informe Buen Manejo del Anticipo No. 5 versión 4 – Noviembre del contrato ICCU – 138 – 2025 Respuesta SOFAN–F OR–CO–03–ICCU031–712* del 23 de abril de 2026. Se encuentra observado el informe de buen manejo de anticipo de obra de diciembre del 2025, por faltantes de soportes, aspectos de forma, entre otros como consta en los comunicados *766-633 Observaciones Informe buen manejo del anticipo- Rta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-587* (mes de diciembre del 2025). Adicionalmente, fue recibido y se encuentra en revisión el informe de inversión del mes de enero del 2026.

De acuerdo con el seguimiento al plan de inversión del anticipo de obra, se tiene el siguiente estado:

Ilustración 4. Control inversión del anticipo de obra a corte del 30 de abril del 2026

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO V4	*DESEMBOLSO GIRO N° 10*	*SALDO APROBADO RESTANTE DESPUÉS DE GIRO N°10*
1	COSTO DE MANO DE OBRA (PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO)	$ 2.652.935.144,79	$ 198.401.019,79	$ -
2	INSUMOS Y MATERIALES	$ 4.642.015.015,21	$ 389.167.009,00	$ 10.832.991,00
3	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 2.571.481.979,00		$ -
4	REPUESTOS PARA MAQUINARA Y EQUIPOS	$ 126.017.708,00		$ -
5	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 124.050.514,00		$ -
6	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	$ (488.570.207,00)		$ -
TOTAL				
		$ 10.116.500.361,00	$ 587.568.028,79	$ 10.832.991,00

Fuente: elaboración propia

Así las cosas, se ha invertido a la fecha un 99,89% del anticipo de obra, manteniendo los rubros del plan de inversión de acuerdo con la versión 4 del plan de inversión del anticipo de obra aprobado durante este periodo.

4.3.2 Seguimiento Programa de Obra

En el Informe Semanal No.55 correspondiente al período semanal del 1 al 30 de abril del 2026, se registró el control de programación así:

Tabla 46. Avance físico del contrato

AVANCE FISICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO A LA FECHA	**% EJECUTADO HASTA LA FECHA**	**DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)**
Acumulado anterior	47,91%	40,05%	-7,86%
Durante el periodo	2,62%	2,58%	-0,04%
Acumulado Actual	50,53%	42,63%	-7,90%

Fuente: informe semanal No.55

Se registró un porcentaje de ejecución acumulado del 42.63% de acuerdo con la reprogramación de actividades de la prórroga N°1 hasta el 31 de agosto del 2026. Es decir, un porcentaje de avance del 5,86% durante el mes de abril. Esto se traduce en un porcentaje de atraso del -7,90%, no obstante, por parte de esta interventoría se emitió comunicado frente a los frecuentes daños de la maquinaria y de igual forma para que el contratista a garantice los 5 frentes de ejecución simultaneas en aras de mantener la línea base del cronograma en los siguientes periodos, así y cumplir con el anexo técnico.

En cuanto al avance físico de la capa estabilizada, se tiene un avance de 33.561,39 ml, ejecutados en las provincias de Oriente y Guavio, esto es la sumatoria de haber completado satisfactoriamente la ejecución de estabilización de rasante en los municipios de Junín y Gama, y los adelantos en los municipios de Choachí, Chipaque y Fomeque.

A continuación, se presenta el avance presupuestal del contrato de obra ICCU-138-2025:

Tabla 47. Avance financiero de acuerdo con los capítulos de ejecución

No.	Indicadores	Valores (+AIU)	Porcentaje valor total del contrato	Diferencia (+) adelanto (-) atraso
1	Valor acumulado programado	$ 17.349.651.677,00	**49,08%**	**-7,67%**
2	Valor acumulado ejecutado	$ 14.636.848.195,00	**41,41%**	

Fuente: Elaboración propia, interventoría

Se reporta un retraso del -7,67% en el avance financiero con respecto a la reprogramación de actividades de la prórroga N° 1 al contrato de obra.

Tabla 48. Avance de actividades de obra por fases

EDT	Descripción de la actividad	Avance de obra (% ejecutada inversión acumulada)		
		Por capitulo		Diferencia (+) adelanto (-) atraso
		Programado	Ejecutado	
0	**Redistribución de actividades**	**49,08%**	**41,41%**	**-7,67%**
A	Fase 1 – Caracterización	100,00%	100,00%	0%
B	Fase 2 – Laboratorios	100,00%	100,00%	0%
C	Fase 3 – Obra	50,53%	42,63%	-7,90%

Fuente: elaboración propia, interventoría

5 Información contrato de interventoría

5.1 Información general del contrato de interventoría

Durante el presente periodo de este informe, no se presentaron modificaciones del contrato ICCU-219-2025.

Número del proceso de selección	ICCU-CM-050 de 2024.
Resolución de adjudicación del contrato No.:	099 de 2025.
No. CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y Fecha:	DIS- 2025000090 de lunes, 27 de enero de 2025.

No RP (Registro Presupuestal) y Fecha	RES- 000425 de lunes, 10 de marzo de 2025.
Número del contrato ICCU:	219 DE 2025.
Fecha de suscripción del contrato:	30 de marzo de 2025.
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Contratista:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC, NIT. 901.915.404 – 8, representado legalmente por **SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA** y conformado por: • ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC., con NIT.:901.915.404-8, con una participación del noventa por ciento (50%). • CANJI DISEÑOS E INTERVENTORÍAS S.A.S., con NIT.:901.324.813-0, con una participación del noventa por ciento (50%).
Valor inicial:	$3.865.474.620,00 TRESMIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.
Adiciones:	NINGUNA.
Modificaciones:	MODIFICATORIO NO 1 EN CUAL SE ACLARA QUE EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES LA NO DIS-2025000420 Y AL ACLARATORIO NO 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO ICC-219 DE 2025
Aclaraciones:	NINGUNA.
Suspensiones:	NINGUNA.
Cesiones de participación contractual:	NINGUNA.
Plazo:	Once (11) meses y quince (15) días o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra.

Prorroga 1:	8 meses hasta el 31 de agosto del 2026
Fecha de inicio:	9 de abril de 2025.
Fecha de terminación contractual:	31 de diciembre de 2025.
Fecha de terminación actualizada prorroga 1	31 de agosto del 2026

Fuente: elaboración propia

5.2 Informe semanal

Durante el periodo mensual de abril la Interventoría envió al ICCU los Informes Semanales **No.51, No.52, No.53, No.54 y No.55** correspondientes a las semanas dentro de este período, cabe resaltar que todos los informes presentados a continuación fueron también presentados en formato Excel y contienen cada uno de los componentes de obra del contrato técnico, social, ambiental y salud y seguridad y un registro fotográfico detallado de cada una de las actividades realizadas cada semana, mediante el formato MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA. Estos son anexados en un paquete formato Excel y en PDF de la carpeta de componente técnico. Ver anexo 1.2 Informes semanales, dentro de la carpeta 1. Componente técnico de los anexos del informe mensual del mes de abril.

5.3 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante este período la Interventoría realizaron las siguientes actividades:

- Se presentaron los informes **semanales No.51, No.52, No.53, No.54 y No.55** en las condiciones establecidas para la correcta ejecución de la interventoría.
- Se reiteró al contratista la obligación de cumplir con las fechas establecidas para la entrega de informes, con el fin de que la interventoría pudiera gestionar oportunamente el informe de gerencia ante la supervisión ICCU. No obstante, el contratista de obra incumplió la entrega del informe correspondiente a marzo de 2026. En consecuencia, mediante **oficio No. 766-744**, la interventoría notificó el

incumplimiento de las fechas establecidas. Como respuesta, el contratista remitió el oficio No. **SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-702** y realizó la entrega del informe el día 15 de abril de 2026, de manera extemporánea. Posteriormente, la interventoría radicó el **oficio No. 766-750**, en el cual se consignaron las observaciones correspondientes a todos los componentes del informe. Se espera que dichas observaciones sean atendidas en un plazo **no mayor a tres (3) días hábiles**, contados a partir de la fecha de remisión del oficio correspondiente a las observaciones del mes de marzo.

- Se asiste de manera presencial y/o virtual a las **reuniones programadas** dentro del desarrollo del contrato de interventoría, las cuales se realizaron 4 reuniones de comité de obra los días 04, 12, 18 y 25 de marzo del 2026, de manera semanal los **miércoles o jueves**, con el fin de efectuar seguimiento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo al proyecto.
- Se continuó con la evaluación de alternativas de intervención de cunetas para las 4 provincias del Lote 1, realizando la aprobación de APUS para cunetas en concreto, incluyendo afirmado y acero de refuerzo, y por otro lado en material estabilizado con aditivos no convencionales. Se aprobó igualmente el APU NP6 Tratamiento Superficial Simple, toda vez que en los resultados de prueba del Sello de arena-asfalto presento desgaste prematuro y alto desprendimiento de partículas, razón por la cual se dio viabilidad al recubrimiento con esta actividad, en virtud de las opciones recomendadas en los informes de caracterización aprobados de la fase dos del contrato ICCU-138-2025
- Se requirió al contratista de obra la remisión de un plan de contingencia para recuperar el desfase actual del reprogramación de obra, que se cuantifica a corte del presente informe en 7,9%, donde se incluyan la intervención en 5 frentes simultáneos de obra, preferiblemente con la ejecución del recubrimiento superficial en los municipios que ya fueron finalizados en la actividad de capa estabilizada. Se

remitió para tal fin el comunicado *766-758 Observaciones por desfase del cronograma de obra a corte del 21 de abril del 2026-CTO-138-2025 Lote 1* del 23 de abril del 2026.

5.4 Informes especialistas y profesionales

Durante el presente período se emitieron los siguientes conceto por parte de los especialistas de Interventoría:

- MT-3219-CM467-2026. Revisión Comunicación Sofan-707 Buenavista – Altorredondo – Engaño V.4; aprobación informe de caracterización en versión 4 del municipio de Paratebueno.
- MT-3218-CM467-2026. Revisión Comunicación Sofan-702 Humea-San Cristóbal-Gazatavena-San Luis del Retiro V4; aprobación informe de caracterización en versión 4 del municipio de Medina.
- MT-3186-CM467-2026. Revisión Comunicación Sofan-678 Tratamiento superficial TSS. Se emite la viabilidad del cambio del sello de arena asfalto al TTS, en tanto la documentación revisada permite establecer que el TSS ofrece ventajas objetivas frente al recubrimiento inicialmente previsto, particularmente en términos de macrotextura, adherencia, durabilidad, comportamiento frente al tránsito y capacidad de protección de la capa estabilizada. De igual manera, la información aportada muestra que la alternativa propuesta no corresponde a una modificación arbitraria, sino al resultado de una evaluación técnica apoyada tanto en criterios especializados como en observaciones de campo derivadas de la ejecución del proyecto.

5.5 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Se reporta una ejecución de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO PEZO cm/cte. (309.236.199,48) de acuerdo con lo que se tenía establecido de acuerdo con el Programa Anualizado de Caja remitido con la justificación de la prórroga N° 1 al contrato de Interventoría ICCU-219-2025 (309.236.199ja (PAC) presentado por la Interventoría, en el cual para el mes de MARZO se tenía establecido ejecutar $306.658.152,24 sin tener en cuenta el veinte por ciento (20%) por amortización del anticipo. Ver Anexo 1.8 dentro de la carpeta 1. Componente técnico

6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

A la fecha de este informe se mantiene la misma cantidad de vehículos y equipos utilizados para las actividades que debe ejecutar la interventoría para este periodo, sin embargo, se realizó cambio de camioneta de la interventoría, toda la documentación relacionada con la camioneta de placas LZN651 se anexara en la carpeta indicada al final de este párrafo, de igual manera con los programas y aplicativos necesarios para los informes de interventoría. Ver en carpeta componente SST, anexo 11, informe.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

A continuación, se presenta la información correspondiente a las contrataciones directas y de subcontratistas realizadas por parte del Consorcio Intervención AC.

Tabla 49. Personal de la interventoría, periodo mes de febrero

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEDICACIÓN
Cristian Moreno Arias	Director de Obra	100%
Roberto Carlos López	Director de Obra	100%

Byron Aguirre Díaz	Ingeniero Residente Técnico	100%
Anderson Sierra	Ingeniero Residente Técnico	100%
Cristian Liñán	Profesional Ingeniero Apoyo	100%
Cristian Camilo Silva	Residente Social	100%
Lady Johanna Jiménez	Residente Salud y Seguridad	100%
Catherine Castellanos	Especialista Ambiental	100%
Helbert Casallas	Topógrafo	100%
Natalia Chasoy	Topógrafo	100%
Nelson Ávila	Cadenero 1	100%
Cristian Mancipe	Cadenero 2	100%
Esteban Barrera	Cadenero 3	100%
Marcela Aguilar	Cadenero 4	100%
Tania Jiménez	Cadenero 5	100%
Diana Casallas	Secretaria	100%
Natalia Rodríguez	Especialista Ambiental 1	100%
Erica Mendoza V	Profesional Siso 2	100%
Manuel Mueses	Profesional Siso 2	100%
Mirna González	Topógrafo 3	100%
Robinson Hernández	Topógrafo 4	100%
Yuly Emma Cristancho	Profesional Gestor Social 2	100%
Wendy Delgado	Profesional Gestor Social 4	100%
Ana María Houghton	Profesional Gestor Social 5	100%
Laurenth Melissa Copete	Cadenero 2	100%
Ana María Correa	Cadenero 4	100%

Fuente: personal de interventoría informe componente SST

Tabla 50. Personal de interventoría-personales especialistas

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEDICACIÓN
Angela Salazar Herrera	Geotecnia	40%
Luis Felipe Morales	Geotecnia	40%
Oscar Javier Caballero Chaves	Geotecnia	40%
Daniel Vargas Rozo	Pavimentos	50%
Neymar Castaño Peláez	Pavimentos	50%
Néstor Bahos Canencio	Pavimentos	50%

Fuente: personal de interventoría informe componente SST

De acuerdo con las actividades de este periodo la Interventoría presenta la Seguridad Social que se encuentra en el Anexo 2.

10. RETIRO DE PERSONAL INTERVENTORÍA:

Para el periodo evaluado, se presentaron dos retiros por parte de la interventoría.

Tabla 51. Retiro de personal de interventoría

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEDICACIÓN
Laura Peñuela	Residente Social	100%
Juan Camilo Cruz	Inspector Vial	100%

Fuente: personal de interventoría informe componente SST

De acuerdo con las actividades de este periodo la Interventoría presenta la seguridad social que se encuentra en el anexo 2 SS Planilla dentro de la carpeta Anexos Informe N° 9 de la carpeta de la interventoría. Para este período no hubo retiro de personal por parte de la Interventoría de Obra. También se anexa Formato MS-GC-FR-013 herramienta de base revisión cálculo de seguridad social que se encuentra en la carpeta Anexo 3 cálculo del IBC vinculado.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

De acuerdo con la propuesta económica de la Interventoría de Obra el CONSORCIO INTERVENCIÓN AC para el LOTE 1 El ICCU la contrató por un valor de **tres mil ochocientos sesenta y cinco millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos ($3.865.474.620)**, para el presente Informe Mensual se reporta una ejecución de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO PEZO cm/cte. (309.236.199,48) de las actividades correspondientes a las Fases II y III que se desarrollaron durante el período del **primero (01) al treinta (30) de abril de 2026.** A continuación, se refleja el registro acumulado del total ejecutado por la interventoría.

Tabla 52. Valor acumulado de actividades ejecutadas por parte de la interventoría

No.	MES	VALOR
1	Abril	$ 70.693.378,00
2	Mayo	$ 113.748.530,00
3	Junio	$ 117.933.760,00
4	Julio	$ 123.536.875,00
5	Agosto	$ 151.180.575,00
6	Septiembre	$ 185.919.650,00
7	Octubre	$ 188.396.087,60
8	Noviembre	$ 213.782.310,00
9	Diciembre	$ 224.729.754,27
10	ene-26	$ 213.782.310,00
11	feb-26	$ 213.782.310,00
12	mar-26	$ 306.658.152,24
13	abr-26	$ 309.236.199,48
	VALOR ACUMULADO	**$ 2.433.379.891,59**

Fuente: elaboración propia

Este valor acumulado correspondería SESENTA Y DOS PUNTO NOVENTA Y CINCO PORCIENTO (62,95%) de los recursos destinados para el contrato de interventoría.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A partir del acta de inicio firmada el **09 de abril de 2025**, se firmó acta de inicio del contrato de obra, a la fecha no se ha generado ninguna suspensión del contrato de obra. Dado el modificatorio N° 1 se actualizaron las pólizas del acta de inicio al anexo 3 de la póliza de responsabilidad civil extracontractual y póliza de cumplimiento de esta manera se anexa la actualización mencionada anteriormente. Se realizó la prórroga 1 al contrato de interventoría ICCU-219-2025, por lo que se actualizaron las pólizas de este, y se encuentran dentro de los anexos.

Ver anexo 1.3 Actas aprobación de pólizas

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría

Se realizo verificación de la documentación de los vehículos y conductores de la maquinaria que se reportó en el mes por parte de la interventoría, dentro de la documentación se verifico estado de tarjeta de propiedad del vehículo SOAT, tecno mecánica, licencias de conducción de los conductores del contratista de obra.

Adicionalmente se han realizado los ensayos correspondientes a las intervenciones de actividades de la fase 3, que se anexan en la carpeta de laboratorios.

6.6 Otros Documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

La Interventoría presentó El Plan de Inversión del anticipo mensualizado y fue actualizado para aprobación del ICCU, se recibió el desembolso del Anticipo inicial de la Interventoría. Se presenta el informe de buen manejo del anticipo de Interventoria de abril 2026.

Tabla 53. Estado actual del anticipo de Interventoría CTO ICCU-219-2025

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	EGRESO ACUMULADO 30 de Abril 2026	% INVERTIDO	SALDO A CORTE DEL 30 de abril 2026
1	HONORARIOS Y NÓMINA	$ 132.984.030,35	17,20%	$ 154.102.576,18
2	ALQUILER Y/O COMPRA DE VEHICULOS	$ 351.840.180,00	45,51%	$ -
3	EQUIPOS DE MEDICIÓN, ENSAYO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFIA	$ 52.568.160,00	6,80%	$ -
4	DOTACIÓN OFICINA, ARRENDAMIENTOS, INSUMOS Y SUMINISTROS	$ 26.874.617,65	3,48%	$ 22.242.379,82
5	DEDUCCIONES IMPUESTO TIMBRE	$ -		
6	RETIRO ADICIONAL POR ERROR DE TESORERIA-PTE DEVOLUCIÓN	$ 55.625.433,00		
7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 32.507,49		
8	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS	$ 28.511,00		
9	IMPUESTOS Y COMISIONES BANCARIAS	$ 3.656.938,00		$ (3.656.938,00)
10	PENDIENTE DEVOLUCIÓN RENDIMIENTO	$ 3.996,49		$ 3.996,49
11	SALDO A FAVOR DE INTERVENTORIA			$ 1.048.631,15
12	DEVOLUCION RETIROS NO AUTORIZADOS	$ 55.723.443,00		
	TOTAL	**$ 567.817.923,02**	**72,99%**	**$ 173.740.645,64**

Fuente: elaboración propia

Ver Anexo 1.13 Informe de buen manejo del anticipo de Interventoría

6.7 Actas de Comité de Obra

Durante el periodo comprendido entre el **1 al 30 de abril** se realizaron tres actas en campo, y se cumplió con las cuatro reuniones de seguimiento entre contratista, interventoría y la supervisión del ICCU a fin de revisar el avance de obra que se vienen ejecutando, estas fueron diligenciadas en el formato ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION. Ver anexo

- Acta de comité de obra fecha: 01/04/2026
- Acta de comité de obra fecha: 09/04/2026
- Acta de comité de obra fecha: 15/04/2026
- Acta de comité de obra fecha: 22/04/2026
- Acta de comité de obra fecha: 29/04/2026

Tanto las actas de comité de obra como las actas de reunión se encuentran en trámite de ser firmadas por los asistentes.

7 Conclusiones y recomendaciones

Durante el mes de abril de 2026, la interventoría mantuvo el seguimiento integral a los componentes técnico, administrativo, financiero, legal, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo del contrato de obra ICCU-138-2025, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría ICCU-219-2025.

En relación con el avance de las fases del contrato de obra, se reporta que la Fase I – Diagnóstico y Caracterización Vial cuenta con aprobación del 100% de los 11 municipios del Lote 1, finalizada el 12 de diciembre de 2025. De igual forma, la Fase II – Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervenciones alcanzó el 100% de aprobación, finalizada el 24 de abril de 2026, y radicada ante la entidad mediante el comunicado 766-777 del 30 de abril de 2026. La Fase III – Intervención de las vías registra una ejecución acumulada del 42,63% y un avance durante el periodo del 7,30%, con un atraso del 7,90% respecto a la reprogramación de actividades con línea base N°4 aprobada el 19 de diciembre de 2025.

En el componente financiero, la ejecución acumulada del contrato de obra alcanzó la suma de $14.636.848.195,17 y la ejecución durante el periodo fue de $2.506.903.846,81, lo que representa un avance financiero acumulado del 41,41% frente al valor total del contrato, con un desfase del -7,67% respecto a lo programado.

En materia administrativa y gerencial, la interventoría realizó la aprobación de los informes mensuales de los meses de enero y febrero de 2026, y remitió observaciones al informe del mes de marzo de 2026, cuya entrega fue extemporánea por parte del contratista. Adicionalmente, se emitió comunicado de incumplimiento por la no entrega oportuna del informe mensual N°12 del mes de marzo, mediante el oficio 766-744. De igual forma, se notificó al contratista el incumplimiento en el pago de aportes a seguridad social correspondientes al mes de marzo de 2026, mediante el oficio 766-723.

Frente al desfase del cronograma de obra, la interventoría emitió el comunicado 766-758 del 23 de abril de 2026, en el cual se requirió al contratista la entrega de un plan de contingencia para el restablecimiento de la reprogramación de obra, incluyendo la intervención en cinco (5) frentes simultáneos. Dicho plan fue recibido el 30 de abril de 2026 y a la fecha del presente informe se encuentra en proceso de revisión y observación por parte de la interventoría.

Durante el periodo, la interventoría continuó con la evaluación técnica y presupuestal de las alternativas de intervención de cunetas para las cuatro provincias del Lote 1. En este sentido, se realizó la aprobación y viabilidad técnica de los Análisis de Precios

Unitarios (APU) correspondientes a los ítems NP6, NP7 y NP8, a través de los comunicados 766-729, 766-735, 766-752 y 766-761. Asimismo, se emitió la viabilidad de los escenarios de intervención en su versión N°3, con la inclusión de los ítems de cunetas en concreto reforzado fundida in situ, mediante el comunicado 766-768. No obstante, lo anterior, al corte del 30 de abril de 2026, la entidad contratante no ha emitido una definición institucional sobre la alternativa de intervención de cunetas a implementar en los corredores viales del proyecto.

La interventoría reitera que la definición oportuna de las obras de drenaje longitudinal resulta determinante para garantizar la estabilidad y calidad de los corredores que ya cuentan con la capa estabilizada, los cuales podrían verse afectados por la ausencia de cunetas, especialmente ante las condiciones climáticas propias de la temporada invernal que se presenta en el periodo actual. Ante esta situación, se conminó al contratista mediante comunicación formal a la implementación del tratamiento superficial simple (TSS) en los tramos que ya cuentan con capa estabilizada, como medida de mitigación frente a los eventos climáticos.

Se recomienda a la entidad contratante emitir a la mayor brevedad posible la definición institucional sobre la alternativa de intervención de cunetas, con el fin de que el contratista pueda programar e iniciar estas actividades en los municipios que ya finalizaron la estabilización de rasante, garantizando así la protección de las obras ejecutadas y el cumplimiento integral del objeto contractual dentro de los plazos establecidos.

Se recomienda al contratista de obra dar cumplimiento estricto a los plazos establecidos para la entrega de informes mensuales, informes de buen manejo del anticipo y demás entregables contractuales, a fin de no afectar la gestión oportuna de la interventoría ante la supervisión del ICCU.

Se recomienda al contratista garantizar el pago oportuno de los aportes a seguridad social de su personal y subcontratistas, en cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones contractuales adquiridas.

Se recomienda al contratista de obra implementar las medidas necesarias para mantener los cinco (5) frentes de ejecución simultánea requeridos, de conformidad con el anexo técnico del contrato, con el propósito de recuperar el desfase del cronograma de obra y dar cumplimiento a la fecha de terminación del contrato

7.1 Conclusiones y recomendaciones área ambiental

- ✓ Durante el mes de abril de 2026 se evidenció un avance significativo en el desarrollo de las actividades correspondientes a la Fase III del proyecto en la Provincia del Guavio y Oriente. Se dio continuidad a los frentes de trabajo en los municipios de Ubalá, Fómeque y Chipaque. Se finalizan actividades en el municipio de Chipaque el día 30 de abril.
- ✓ No se presentaron incidentes ni accidentes ambientales y no fueron requeridos permisos adicionales ni trámites ante autoridades ambientales, dado que las actividades ejecutadas no generaron impactos que lo exigieran. Asimismo, se mantuvo el cumplimiento del 100% de los compromisos adquiridos.
- ✓ Durante el periodo se da cumplimiento al cronograma de capacitaciones establecido en cada una de las Provincias según el PAGA aprobado por la entidad.
- ✓ Se recomienda que el contratista realice recorridos previos al inicio de actividades constructivas para definir los tramites de permisos menores que se requieran en la zona de intervención.
- ✓ Se recomienda al contratista que el manejo de RCD generados en obra debe ser consultado con la supervisión y la interventoría para definir el destino de estos, ya que, no se puede entregar a terceros el 100% de estos RCD Fino no expansivos generados, pétreos y otros.

7.2 Conclusiones y recomendaciones área social

- ✓ Se evidencia un seguimiento continuo y estructurado por parte de la interventoría al componente social, con avances en la implementación del Plan de Gestión Social y en los canales de atención a la comunidad.
- ✓ Los mecanismos de atención (Punto SAU, buzones y medios digitales) han permitido mantener comunicación activa con la comunidad y atender solicitudes de manera oportuna.

- ✓ Se identifican retrasos en la planeación y ejecución de actividades sociales, incluyendo incumplimientos en programaciones.
- ✓ Existen inconformidades comunitarias en algunos sectores frente a decisiones técnicas del proyecto, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de socialización y claridad en la información.
- ✓ Se presentan oportunidades de mejora en la gestión documental, debido a retrasos, inconsistencias y falta de completitud en los soportes entregados por el contratista.
- ✓ Fortalecer la planeación, coordinación interna y ejecución de las actividades sociales, asegurando su cumplimiento según lo programado y su adecuada socialización con la comunidad.
- ✓ Mejorar la articulación entre los componentes técnico, social y ambiental para garantizar información clara, coherente y oportuna hacia la comunidad.
- ✓ Optimizar la gestión de PQRSD, cumpliendo los tiempos legales y asegurando respuestas completas con soportes técnicos desde la primera entrega.
- ✓ Fortalecer los procesos de socialización y relacionamiento comunitario, promoviendo espacios de diálogo oportunos, transparentes y efectivos.
- ✓ Garantizar la presencia en territorio mediante puntos SAU, recorridos y reuniones comunitarias debidamente programadas.
- ✓ Implementar estrategias de mejora continua que incluyan seguimiento a compromisos, evaluación de resultados y ajustes en la intervención social.

7.3 Conclusiones y recomendaciones área SST

- ✓ Las mesas de trabajo y la correcta comunicación entre el contratista e interventoría, es de vital importancia para manejar tiempos correctos de entrega, revisión y aprobación del informe gerencial.
- ✓ La correcta implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo reduce accidentes y enfermedades, lo que se traduce en un mayor rendimiento laboral y

menos interrupciones por lo anterior mencionado para el mes de abril NO se presentaron accidentes e incidentes laborales.

- ✓ Las inspecciones realizadas en el mes de abril permitieron determinar el nivel de riesgo, verificar el cumplimiento normativo e identificar actos y condiciones inseguras. Así se permite establecer medidas correctivas inmediatas y proteger la integridad física de los trabajadores, para ello se utilizan las tarjetas de observación.
- ✓ Hay que recordar que el pago de la planilla de seguridad social es una obligación y que de incurrir en el no pago oportuno acarreara sanciones económicas, responsabilidad civil e investigaciones por la UGPP (unidad de Gestión Pensional y parafiscales).

8 Anexos

8.1 Carpeta componente técnico

8.2 Carpeta componente social

8.3 Carpeta componente SST

8.4 Carpeta componente ambiental

8.5 Informe de buen manejo del anticipo de obra

8.6 Informe mensual de obra en observación

8.7 Informe de buen manejo del anticipo de Interventoría

9 Registro fotográfico del avance de las obras.

Registro fotográfico componente técnico otras actividades realizadas	
Municipio de Ubalá provincia de Guavio	
Construccion de alcantarillas	

Fuente: elaboración propia, interventoría

Registro fotográfico componente técnico otras actividades realizadas	
Municipio de Choachí provincia de Oriente	
	
	





Retiro de material granular sobre la vía









	
	
	
Tratamiento superficial simple	













Sellado de tratamiento

Fuente: elaboración propia

Registro fotográfico componente técnico otras actividades realizadas
Municipio de Fomeque provincia de Oriente





Escarificación





Retiro de sobre tamaños









Instalación de cemento









Homogeneización de afirmado con cemento









Instalación de aditivo + agua









Céreo










Compactación

Fuente: elaboración propia

Registro fotográfico componente técnico otras actividades realizadas
Municipio de Chipaque provincia de Oriente



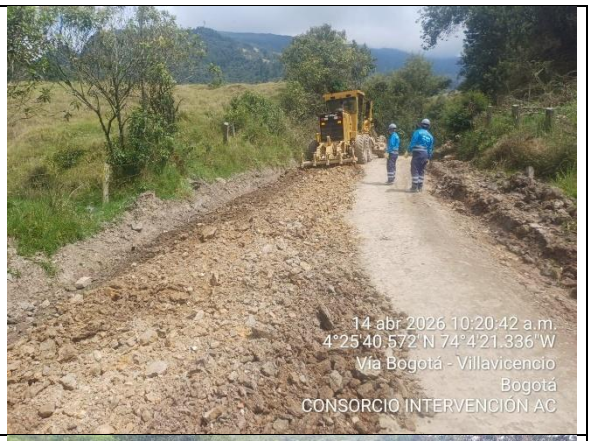





Escarificación









Retiro de sobre tamaños









Instalación de cemento









Homogeneización de afirmado con cemento









Instalación de aditivo + agua









Céreo









Compactación

Fuente: elaboración propia

Registro fotográfico componente social
Provincia de oriente





Socializaciones con la comunidad





Buzones satelitales

Fuente: elaboración propia, interventoría

Registro fotográfico componente ambiental

Provincia oriente





Recolección de bolsas de cemento






Capacitaciones | Punto ecológico

Provincia Guavio	
	
Señalización PMT	Punto ecológico
	
Recoleccion de bolsas de cemento	Capacitaciones

Fuente: elaboración propia, interventoría

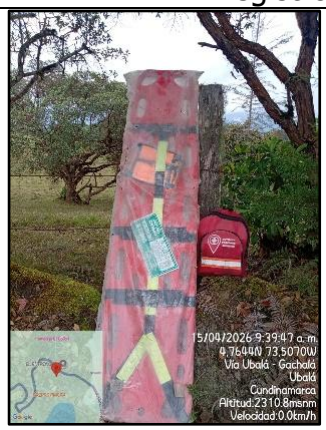Registro fotográfico componente SST	
	
Kit de emergencias	Entrega de dotacion
	
Señalización	Preoperacional de maquinarias
	
Revisión de epps descargue de cemento	Epps de obra

Fuente: elaboración propia, interventoría

9.1 Correspondencia

Se presenta documento del Control de Correspondencia Recibida y enviada por la Interventoría durante el mes de abril de 2026, en el cual se detallan las comunicaciones recibidas y las respectivas respuestas emitidas, atendiendo a su prioridad, pertinencia y oportunidad, conforme a los procedimientos establecidos, este cuadro de relación de correspondencia se encuentra anexado dentro de la carpeta el componente técnico, carpeta 1.12 correspondencia.

9.2 Bitácora de obra

Este documento refleja las principales actividades ejecutadas, novedades técnicas, observaciones relevantes, instrucciones impartidas y hechos relevantes ocurridos durante el periodo del **1 al 30 de abril del 2026**, constituyéndose en una herramienta fundamental para la trazabilidad y verificación del avance físico y administrativo del proyecto. En la siguiente carpeta se presentan las bitácoras de las provincias de Guavio, Oriente, Medina y Soacha en donde se vienen realizando actividades de obra a la fecha. Ver anexo 1.7 Bitácora de obra

9.3 Certificación componente ambiental y social

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE SANCIONES, MULTAS O INCUMPLIMIENTOS COMPONENTES AMBIENTAL Y/O SOCIAL

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, se permite CERTIFICAR que:

A corte del mes de marzo del 2026, el Consorcio SOFAN C-031 no se encuentra sancionado ni tiene procesos de incumplimiento o multas en curso relacionados con el Contrato ICCU No. 138 del 2025, en lo que respecta a asuntos ambientales y/o sociales.

Dada a los veintitrés (23) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

Wendy Delgado
Profesional social de Interventoría.


Catherine Castellanos
Especialista Ambiental Interventoría.

Cristian Camilo Moreno Arias
Director de la Interventoría de Obra.

AFILIADO CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS

Firma:



Roberto Carlos López Julio

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

Director de Interventoría Fase III

Anexo: Carpeta con 4 componentes y sus anexos
Preparó: Equipo de trabajo Consorcio Intervención AC
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Roberto C. López J.
